INFORME CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 017 – 2023

CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA NIT: 891.180.016-1 RECTORA GLORIA GONZALEZ PERDOMO
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTO OCI&SOI NIT 901757910-5 R/LEGAL KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ C.C.1.075.244.857 NEIVA
OBJETO:	ADECUACIÓN DE CIELO RASOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS REQUERIDAS; ASÍ MISMO LAS REPARACIONES ELECTRICAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS SIN SUPERAR EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS. ($ 59.929.375,00) MCTE.






VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS. ($ 59.927.877,50) MCTE.

FECHA DE INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE OCTUBRE DE 2023


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

10 AULAS PEDAGOGICAS INTERVENIDAS: AULA 02, AULA 03, AULA 10, AULA 11, AULA 26, AULA 27, AULA 32, AULA 33, AULA 34 Y AULA 35.

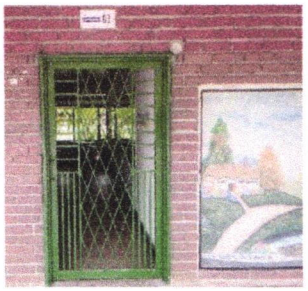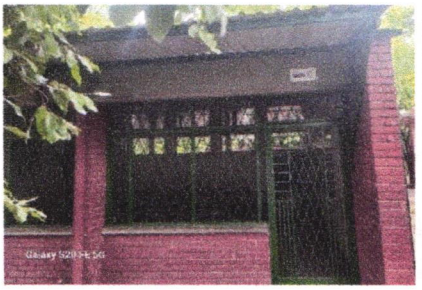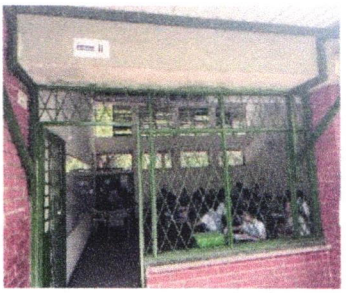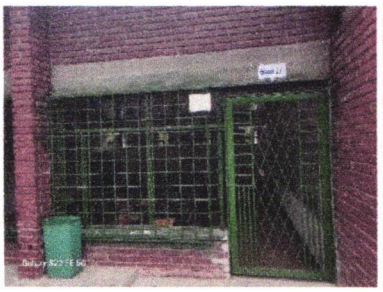




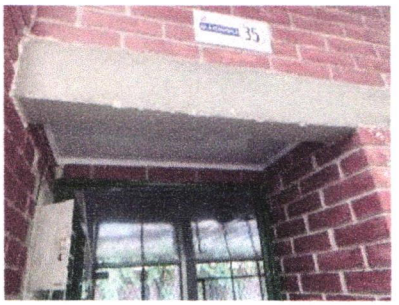


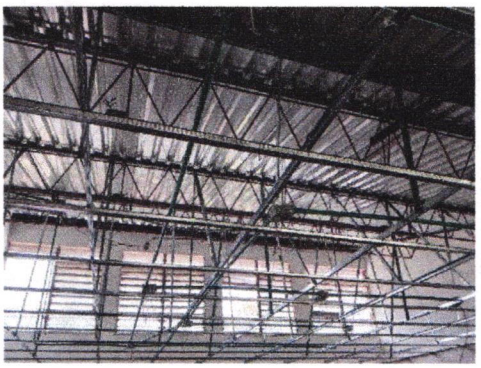


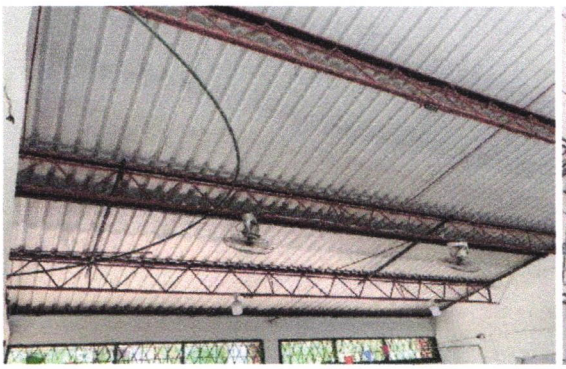


SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA PUNTOS ELÉCTRICOS DE LÁMPARAS Y VENTILADORES, INCLUYE INTERRUPTORES, CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. INSTALARON 12 PUNTOS POR SALÓN CONFORMADOS POR: 7 PUNTOS ELECTRICOS PARA LAMPARAS, 4 PUNTOS ELECTRICOS PARA VENTILADORES Y 1 PUNTO ELECTRICO PARA INTERRUPTOR, PARA UN TOTAL DE 120 UNIDADES.








SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 526,94 M2 DE CIELO RASO BLANCO MADERA PVC 9 MM, QUE CORRESPONDE A LAS 10 AULAS PEDAGOGICAS.


SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 70 UNIDADES DE PANELES LED REDONDO INCRUSTAR DE 24 W. INSTALACIÓN DE 40 VENTILADORES EXISTENTES.

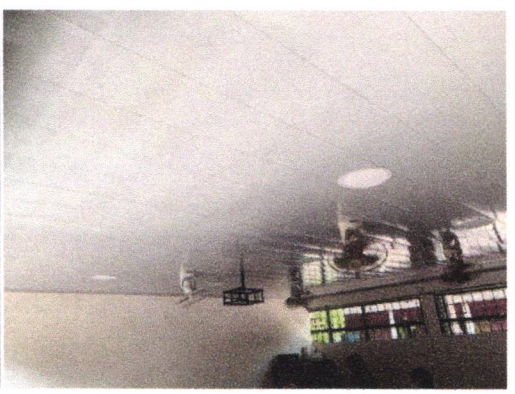

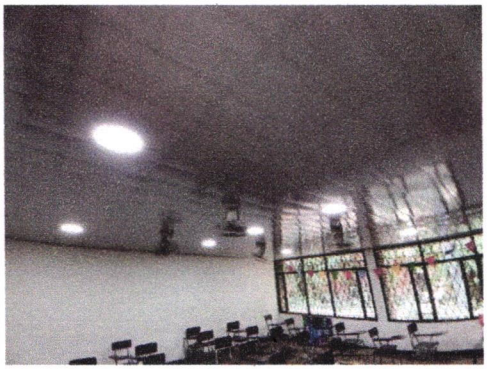

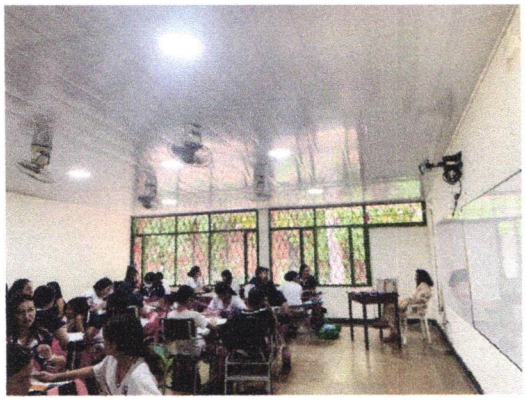GLORIA GONZALEZ PERDOMO
RECTORA

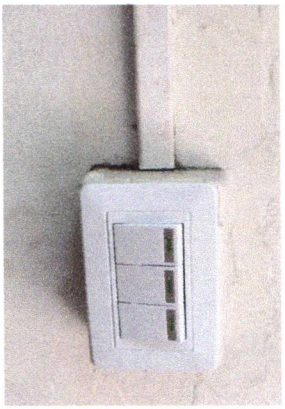VLADIMIR IVÁN LOSADA CONDE
APOYO SUPERVISIÓN ALCALDÍA DE NEIVA
