CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE	
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	ÁREA : VIVIENDA Y ELECTRIFICACION
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ELECTRICA EJECUTADA - PREACTA	

CONTRATO N°:	092_2022	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y/O BAJA TENSION Y/O ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LAS VEREDAS CHANYÓ II ETAPA, RESGUARDO DE COHETANDO Y VEREDA PASTALES, RESGUARDO DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GSR POR FLUJO DE LODO.


CONTRATISTA:	ING RAFAEL HERNAN CEBALLOS	ACTA # :	1	DESDE:	2022-03-01	HASTA:	MAYO DE 2022

ITEM DEL PRESUPUESTO		UNIDAD	CANTIDAD ACTA A PAGAR					NODOS
ITEM N°:	DESCRIPCION DE ITEM				AVANCE TOTAL	TOTAL PASTALES	TOTAL CHANYO	454
I	REDES MEDIA TENSION							
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO MT							
1.1	(localizacion, estaquillado, replanteo...)	KM	3,50		3,50	3,31	0,19	20,00
2	APOYOS MT							
2.1	MATERIALES E INSTALACION POSTE DE FIBRA DE VIDRIO 12X510	UND	34,00		34,00	34,00	0,00	2,00
3	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN	UND						
3,1	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TSN211P	UND	4,00		4,00	4,00	0,00	
3.2	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TSN212P	UND	4,00		4,00	4,00	0,00	
3.3	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TSN213PC	UND	4,00		4,00	4,00	0,00	
3,4	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TSN215C	UND	2,00		2,00	2,00	0,00	
3.5	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BSN211P	UND	7,00		7,00	7,00	0,00	
3.6	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BSN212P	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.7	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BSN213PC	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.8	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BSN215C	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.9	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA RH231	UND	1,00		1,00	1,00	0,00	
3,10	MATERIALES E INSTALACIÓN AMORTIGUADORES 805	UND	48,00		48,00	48,00	0,00	
3,11	MATERIALES E INSTALACIÓN CORTACIRCUITOS 5621	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA R506	UND	2,00		2,00	2,00	0,00	
3.13	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA R505	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.14	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA RH230	UND	3,00		3,00	3,00	0,00	
4	TENDIDO RED MT							
4.1	INSTALACIÓN DE RED MONOFÁSICA ACSR 2X1/0	KM	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.2	INSTALACIÓN DE RED TRIFÁSICA ACSR 3X1/0	KM	3,48		3,48	3,31	0,00	20,00
5	TEMPLETES MT							
5.1	INSTALACIÓN RETENIDA DIRECTA A TIERRA (13.2KV) RTD2	UND	60,00		60,00	60,00	0,00	2,00
II	REDES EN BAJA TENSION							
6	LOCALIZACION Y REPLANTEO BT							
6.1	(localizacion, estaquillado, replanteo...)	KM	3,00		3,00	0,00	0,00	0
7	APOYOS BT							
7.1	MATERIALES E INSTALACIÓN POSTE DE FIBRA DE VIDRIO9 M X 510 Kg	UND	14,00		14,00	14,00	0,00	
8	VESTIDA / ARMADA POSTES BT							
8.1	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT01	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.2	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT02	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.3	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TERMINAL O SALIDA BT03	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	

8.4	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCUTRA BT CON CAJA DERIVACIÓN EN VANO BT10	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	
9	TENDIDO RED BT							
9.1	TENDIDO DE RED TRENZADA TRIPLEX 2X2+2	KM	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TENDIDO DE RED TRENZADA TRIPLEX 2X1/0+2	KM			0,00	0,00	0,00	
	LUMINARIA AP RALED I 16 LED 36W CON FOTOCELDA 5 PINES	UND	0,00					
10	TEMPLETES BT							
10.1	INSTALACIÓN RETENIDA DIRECTA A TIERRA B.T. RTD1	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	
11	PUESTA A TIERRA BT		0,00					
11.1	INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA RED DE B.T. PTBT22TA	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	
III	**TRANSFORMADORES, MARCACION, ACOMETIDAS E INTERNAS**							
12	**TRANSFORMADORES**							
12.1	MONTAJE CENTRO TRANSFORMACION BIFÁSICO 10KVA CTB21	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	
	MONTAJE CENTRO TRANSFORMACION BIFÁSICO 15KVA CTB21	UND	1,00		1,00	1,00	0,00	
12.2	MONTAJE PROTECCIONES TRANSF MONOFASICO PTCT22TA	UND	3,00		3,00	3,00	0,00	
13	**MARCACION DE APOYOS**							
13.1	MARCACION DE APOYOS DE ACUERDO A NORMA CEO	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	
14	ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERNAS		0,00					
14.1	INSTALACION DE ACOMETIDA DE NOD CEO HASTA MEDIDOR	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	
14.2	INSTALACION TABLERO 1F 6 CIRCUITOS	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	
14.3	INSTALACION DE TIERRA PARA TABLERO 1F	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	
14.4	INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	
14.5	INSTALACION SALIDA TOMA DOBLE	UND	0,00		0,00	0,00	0,00	
							TOTAL	

Elaboró:				Revisó/ Aprobó					
Hector A. Valencia D									
Profesional Apoyo (Residente)				**Supervisor**					

PASTALES														
458	470	471	474	474A	483- TRAFO	495	503	504-TRAFO	504A	517-TRAFO	520	521	524	525
260,00	400,00	160,00	130,00	250,00	0,00	374,00	302,00	458,00	360,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	2	2	2	2	2	3	3	3	1	1	1	1
		1				1							1	1
				1							1			
										1				
												2		
		1									1	1	1	1
1														
				10				12		18				
								1	1					
				1	1	1								
260	400	160	130	250		374	302	458	360	600				
5	5		3		5	5	5	8	8	6	1	2	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					12					2				

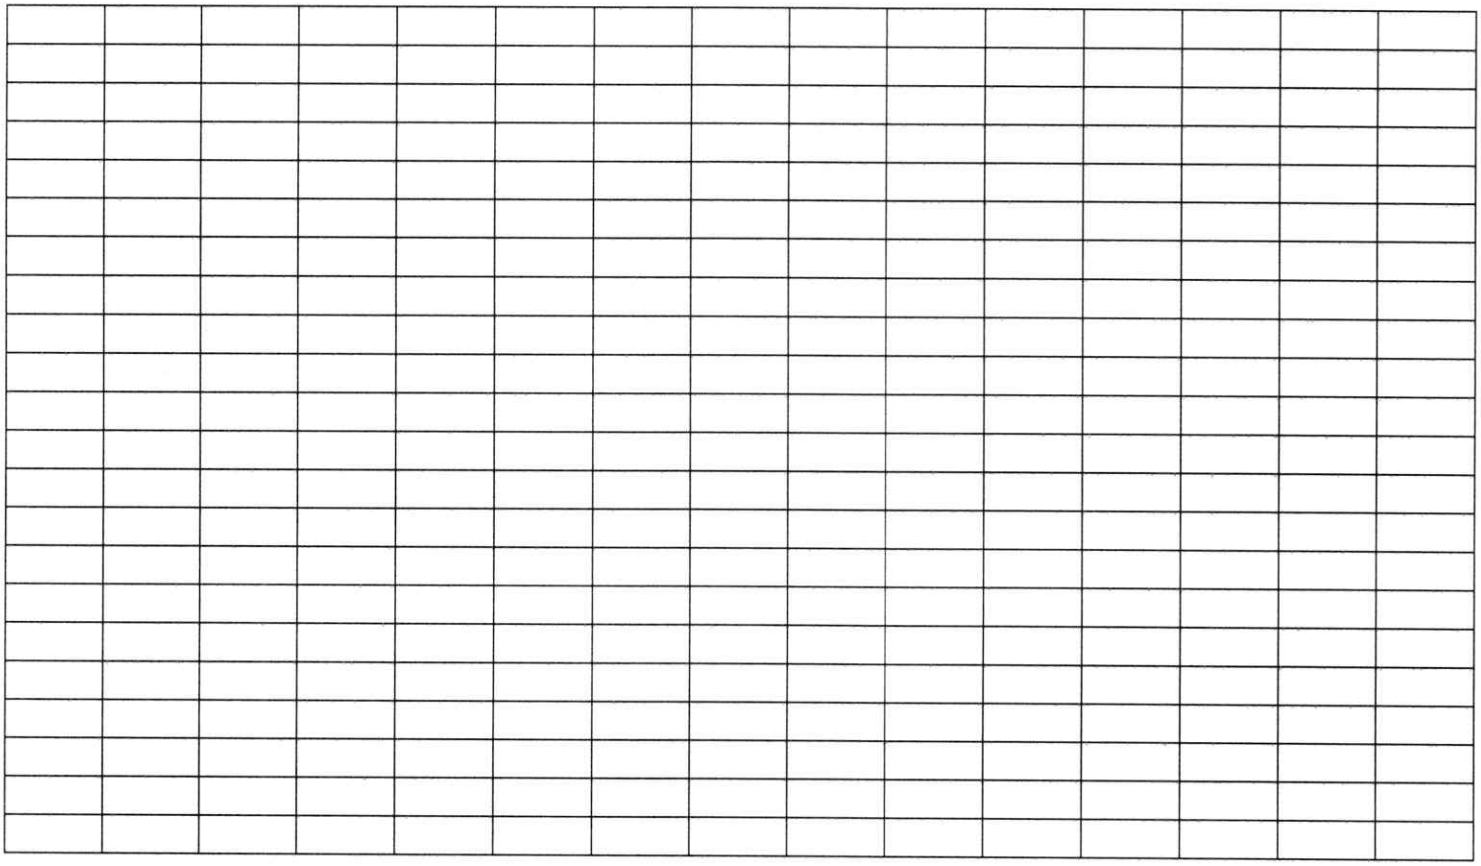

									CHANYO	
526	527	528	530-TRAFO	471A	468	TOTAL CHANYO	550	548	591- TRAFO	586 - TRAFO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	185,00	0,00
1	1	1	1			0,00				
						0,00				
						0,00				
1		1				0,00				
	1		1	1		0,00				
						0,00				
1	1					0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
				8		0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0				
	2	1	1			0				
				717						
0	0	0	0			0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				

						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
				0		0				
			1			0				
			1	2		0				
