
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	% completado
1		**ATENDER SITIOS CRETICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, ENVIAS A CARGO DE LA RECICCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**	**186 días?**	**jue 29/06/23 8:00 a. m.**	**dom 31/12/23 5:00 p. m.**		**$ 98.300.000,27**	**38%**
2		INICIO	0 días	jue 29/06/23	jue 29/06/23		$ 0,00	100%
3		**EXCAVACIONES**	**186 días**	**jue 29/06/23**	**dom 31/12/2**		**$ 14.250.000,00**	**34%**
4		REMOCIÓN DE DERRUMBES	186 días	jue 29/06/23	dom 31/12/2	2	$ 14.250.000,00	34%
5		**ESTRUCTURAS**	**20 días**	**mié 19/07/2**	**lun 7/08/23 5**		**$ 25.000.000,00**	**100%**
6		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	20 días	mié 19/07/23	lun 7/08/23 5:00 p. m.	4CC+20 días	$ 4.000.000,00	100%
7		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	20 días	mié 19/07/23	lun 7/08/23 5:00 p. m.	4CC+20 días	$ 1.000.000,00	100%
8		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTOS DE ZINC	20 días	mié 19/07/23 8:00 a. m.	lun 7/08/23 5:00 p. m.	4CC+20 días	$ 20.000.000,00	100%
9		**TRANSPORTE**	**186 días**	**jue 29/06/23**	**dom 31/12/2**		**$ 19.950.000,00**	**34%**
10		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS	186 días	jue 29/06/23 8:00 a. m.	dom 31/12/23 5:00 p. m.	4CC	$ 19.950.000,00	34%
11		**ITEMS NO PREVISTOS**	**46 días**	**mié 16/08/2**	**sáb 30/09/23**		**$ 38.392.270,27**	**37%**
12		CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa(D) - MEZCLA IN SITU	46 días	mié 16/08/23	sáb 30/09/23	10CC	$ 30.743.146,00	35%
13		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 M	46 días	mié 16/08/2	sáb 30/09/23	10CC	$ 1.291.331,27	35%
14		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	30 días	vie 1/09/23 8	sáb 30/09/23	10CC	$ 4.059.776,00	40%
15		CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA, INCLUYE TUBO DE CERRAMIENTO	30 días	vie 1/09/23 8:00 a. m.	sáb 30/09/23 5:00 p. m.	10CC	$ 2.298.017,00	40%
16		**INDIRECTOS**	**186 días**	**jue 29/06/23**	**dom 31/12/2**		**$ 707.730,00**	**34%**
17		PLAN DE ADAPATACIÓN AL A GUIA AMBIENTAL - PAGA	186 días	jue 29/06/23 8:00 a. m.	dom 31/12/23		$ 0,00	34%
18		IVA 19% PAGA	186 días	jue 29/06/23	dom 31/12/2		$ 0,00	34%
19		PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	186 días	jue 29/06/23 8:00 a. m.	dom 31/12/23 5:00 p. m.		$ 0,00	34%
20		VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	186 días	jue 29/06/23 8:00 a. m.	dom 31/12/23		$ 707.730,00	34%
21		FIN	0 días	dom 31/12/2	dom 31/12/2	10	$ 0,00	0%

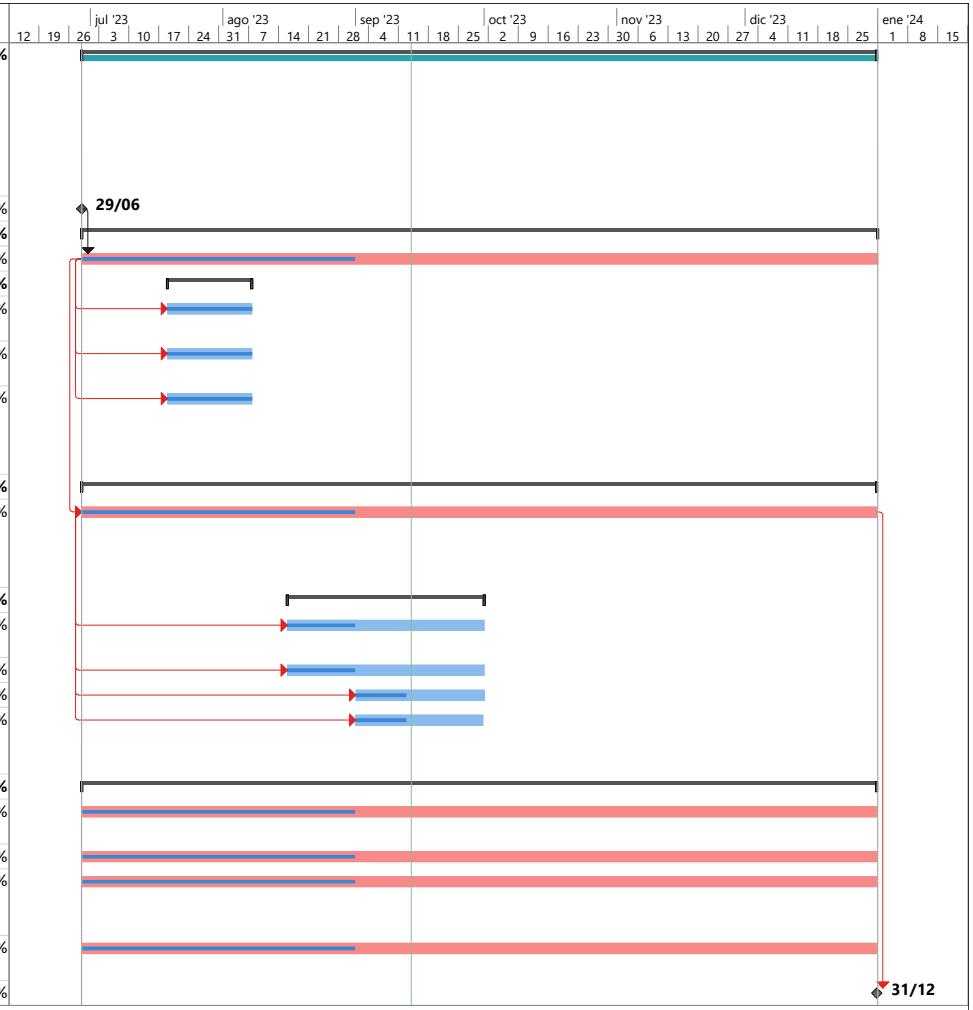

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: jue 14/09/23 6:03 p. m.

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
