	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		ACTA 2
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SAB-03-007-23		
	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ATENDIENDO AL FALLO DE TUTELA N.° 5 DE 2023 CON RADICADO 202300003 EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA		
	CONTRATISTA:	SOTARCO S.A.S	
	SUPERVISIÓN:	CARLOS ARTURO MEJIA GARCIA	
	VALOR INICIAL:	$ 238.805.494	VALOR: $ 127.783.877
	VALOR ADICION:	$ 0	FECHA: Octubre 2023

PRESUPUESTO CONTRACTUAL ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ATENDIENDO AL FALLO DE TUTELA N.º 5 DE 2023 CON RADICADO 202300003 EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA						ACTA No.1		ACTA No.2		ACUMULADO		SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	
ID	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 5.000.000								
1.1	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m, puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. Cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	m	200,00	$ 25.000	$ 5.000.000	60,00	$ 1.500.000		$ 0	60,00	$ 1.500.000	140,00	$ 3.500.000
2	DESMONTE Y DEMOLICION				$ 13.310.176								
2.1	DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIA, toma, suiches, tubería, caja, adaptadores, bombillas en cualquier material y diseño. Incluye cargue, retiro y disposición final según indicaciones de la entidad	Und	150,00	$ 14.800	$ 2.220.000	132,00	$ 1.953.600		$ 0	132,00	$ 1.953.600	18,00	$ 266.400
2.2	DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO EN MAMPOSTERÍA con o sin enchape y/o revoque en cualquier material, diseño y espesor. Incluye cargue, retiro y disposición final hasta un sitio autorizado	m2	77,16	$ 24.454	$ 1.886.871	54,05	$ 1.321.770		$ 0	54,05	$ 1.321.770	23,11	$ 565.100
2.3	DESMONTE Y RETIRO DE CIELO FALSO Y SU ESTRUCTURA en cualquier material y diseño. Incluye cargue, retiro y disposición final según indicaciones de la entidad	m2	807,40	$ 11.000	$ 8.881.400	481,56	$ 5.297.160	181,09	$ 1.991.990	662,65	$ 7.289.150	144,75	$ 1.592.250
2.4	DESMONTE Y RETIRO REJA en cualquier material y diseño, metal y peso. Incluye cargue, retiro y disposición final según indicaciones de la entidad	m2	7,20	$ 15.190	$ 109.368	12,24	$ 185.926		$ 0	12,24	$ 185.926	-5,04	-$ 76.558
2.5	DESMONTE Y RETIRO DE TEJAS en cualquier material y diseño. Incluye cargue, retiro y disposición final según indicaciones de la entidad	m2	5,50	$ 14.378	$ 79.079	21,43	$ 308.121		$ 0	21,43	$ 308.121	-15,93	-$ 229.042
2.6	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS en cualquier material y diseño. Incluye cargue, retiro y disposición final según indicaciones de la entidad	Und	6,00	$ 22.243	$ 133.458	3,00	$ 66.729		$ 0	3,00	$ 66.729	3,00	$ 66.729
3	ELEMENTOS DE CONCRETO				$ 2.380.102								

3.1	Construcción de COLUMNA DE AMARRE EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA de sección 15x20cm. Concreto fabricado en obra. Dimensiones indicadas en planos. Conservar elementos perfectamente plomados y alineados. Incluye suministro, transporte y vaciado del concreto, formaleta, desmoldante, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción. Incluye acero de refuerzo. Medido en sitio	m	8,00	$ 102.889	$ 823.112	7,65	$ 787.101		$ 0	7,65	$ 787.101	0,35	$ 36.011
3.2	Construcción de VIGA DE AMARRE Y/O DINTEL EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA de sección 15x20cm. Concreto fabricado en obra. Dimensiones indicadas en planos. Conservar elementos perfectamente plomados y alineados. Incluye suministro, transporte y vaciado del concreto, formaleta, desmoldante, vibrado, antisol y todo lo necesario para su correcta construcción. Incluye acero de refuerzo. Medido en sitio	m	8,00	$ 107.146	$ 857.168		$ 0		$ 0	0,00	$ 0	8,00	$ 857.168
3.3	Construcción de LOSA EN CONCRETO PULIDO DE 21 MPa. Concreto fabricado en obra. Modulado segun las dimensiones indicadas en planos. Incluye suministro, transporte y vaciado del concreto, formaleta, desmoldante, vibrado, antisol, varilla de dilatación, acabado con allanadora, marcación de dilataciones con cortadora de concreto y todo lo necesario para su correcta construcción. Medido en sitio. No incluye excavación ni acero de refuerzo, los mismos se pagarán en sus respectivo ítems	m3	0,67	$ 1.041.402	$ 699.822	0,68	$ 709.703		$ 0	0,68	$ 709.703	-0,01	-$ 9.881
4	**DIVISIONES Y REVOQUE**				**$ 1.908.360**								
4.1	Aplicación de REVOQUE SOBRE MUROS con mortero 1:4 en mampostería, drywall o materiales similares, una mano o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	61,56	$ 31.000	$ 1.908.360	88,69	$ 2.749.499		$ 0	88,69	$ 2.749.499	-27,13	-$ 841.139
5	**ESTUCO, PINTURA E IMPERMEABILIZACION**				**$ 16.725.322**								
5.1	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	570,00	$ 20.000	$ 11.400.000	207,12	$ 4.142.400	103,56	$ 2.071.200	310,68	$ 6.213.600	259,32	$ 5.186.400
5.2	Aplicación de PINTURA PLASTICA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA de primera calidad sobre muros de fachada revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. El personal debe contar con certificado y equipo para trabajos en altura.	m2	122,40	$ 27.000	$ 3.304.800		$ 0		$ 0	0,00	$ 0	122,40	$ 3.304.800

5.3	Aplicación de PINTURA EPOXICA de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye catalizador, filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	44,64	$ 40.756	$ 1.819.348	71,92	$ 2.931.204		$ 0	71,92	$ 2.931.204	-27,28	-$ 1.111.856
5.4	Aplicación de PINTURA ESMALTE PARA METAL Y/O MADERA de primera calidad con compresor, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	6,60	$ 30.481	$ 201.175		$ 0		$ 0	0,00	$ 0	6,60	$ 201.175
6	**CUBIERTA Y CIELO FALSOS**				**$ 113.077.808**								
6.1	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA CON MANTO ASFALTICO. Se debe preparar la superficie, aplicar una capa de Emulsión Asfáltica Sika o similar diluida, extender manto asfaltico Fiberglass de 3mm o similar, aplicar otra capa de Emulsión Asfáltica Sika o similar sin diluir, extender manto asfaltico en granulo mineral de 3.5mm o similar. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, chaflán entre losa y paredes, emboquillado de bajantes y gárgolas, regatas y su respectivo sellado, plateo de bajantes, ajuste de tuberías y equipos de aire para instalar el manto y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	392,40	$ 119.000	$ 46.695.600	129,88	$ 15.455.720	402,11	$ 47.851.090	531,99	$ 63.306.810	-139,59	-$ 16.611.210
6.2	Suministro e instalación de TECHO EN LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6mm O SIMILAR de acuerdo a lo señalado en los Planos Arquitectónicos. Color a definir según aprobación de la entidad o interventoría. Dimensiones indicadas en planos. Incluye suministro, transporte e instalación de láminas en policarbonato de 6mm de cualquier dimensión, tornillos, conectores HCP, cinta microperforada, cinta sellante y todo lo necesario para su correcta instalación. Medido a lo largo de la pendiente. No incluye estructura metálica, el mismo se pagará en su respectivo ítem	m2	17,18	$ 104.203	$ 1.790.208		$ 0		$ 0	0,00	$ 0	17,18	$ 1.790.208

6.3	Suministro e instalación de CIELO FALSO EN PANEL YESO (DRYWALL) 1/2". Incluye suministro, transporte e instalación de lámina en panel yeso de 1/2", masilla, tornillos, perfiles para estructura de soporte y accesorios. Incluye también estuco plástico, pintura vinilo tipo 2 tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	m2	807,40	$ 80.000	$ 64.592.000	211,99	$ 16.959.200	450,66	$ 36.052.800	662,65	$ 53.012.000	144,75	$ 11.580.000
7	**COMPONENTE ELECTRICO**				**$ 28.816.985**					0			
7.1	Suministro e instalación de LUMINARIA PANEL LED 18W BLANCA REDONDA empotrada en cielo raso de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, luminaria, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE	Und	24,00	$ 23.026	$ 552.624		$ 0	110	$ 2.532.860	110,00	$ 2.532.860	-86,00	-$ 1.980.236
7.2	Suministro e instalación de LUMINARIA PANEL LED 36W BLANCA REDONDA empotrada en cielo raso de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, luminaria, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE	Und	107,00	$ 57.000	$ 6.099.000		$ 0	7	$ 399.000	7,00	$ 399.000	100,00	$ 5.700.000
7.3	Suministro e instalación de REFLECTOR CUADRADO LED 100W BLANCA DE ANCLAR de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, reflector, accesorios, cable encauchetado 3x16, clavija en caucho polo a tierra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE	Und	4,00	$ 198.490	$ 793.960		$ 0		$ 0	0,00	$ 0	4,00	$ 793.960
7.4	Suministro e instalación de TUBERÍA METALICA EMT DE 1/2" de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería EMT, accesorios, adaptador EMT, unión EMT, abrazaderas, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE	m	50,00	$ 18.868	$ 943.400		$ 0		$ 0	0,00	$ 0	50,00	$ 943.400
7.5	Suministro e instalación de CABLE DE COBRE AISLADO x3 No.12 AWG THHN de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, cable de cobre y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE. No incluye tubería, la misma se pagará en su respectivo ítem	m	50,00	$ 12.115	$ 605.750		$ 0		$ 0	0,00	$ 0	50,00	$ 605.750
7.6	SALIDA DE TOMA DOBLE GFCI EN TUBERIA PVC de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Se estima una longitud promedio de 2m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería PVC 1/2", accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3, resanes, conector, cable de cobre aislado No.12 AWG THHN (Fase, neutro y tierra), tomacorriente doble GFCI, caja rectangular, adaptador terminal y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la	Und	3,00	$ 150.022	$ 450.066		$ 0		$ 0	0,00	$ 0	3,00	$ 450.066

7.7	SALIDA DE TOMA DOBLE EN TUBERIA PVC de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Se estima una longitud promedio de 2m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería PVC 1/2", accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3, resanes, conector, cable de cobre aislado No.12 AWG THHN (Fase, neutro y tierra), tomacorriente doble, caja rectangular, adaptador terminal y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE	Und	24,00	$ 100.000	$ 2.400.000		$ 0	3	$ 300.000	3,00	$ 300.000	21,00	$ 2.100.000
7.8	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA PVC de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Se estima una longitud promedio de 3m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería PVC 1/2", accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3, resanes, conector, cable de cobre aislado No.12 AWG THHN (Fase, neutro y tierra), interruptor sencillo, caja rectangular, adaptador terminal y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE	Und	15,00	$ 102.248	$ 1.533.720		$ 0		$ 0	0,00	$ 0	15,00	$ 1.533.720
7.9	SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBERIA PVC SCH de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Se estima una longitud promedio de 4m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería PVC 1/2", accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3, resanes, conector, cable de cobre aislado No.12 AWG THHN (Fase, neutro y tierra), tomacorriente doble, caja rectangular EMT, adaptador terminal y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE. No incluye luminaria, la misma se pagará en su respectivo ítem	Und	34,00	$ 180.000	$ 6.120.000		$ 0		$ 0	0,00	$ 0	34,00	$ 6.120.000
7.10	Suministro e instalación de TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, accesorios, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE	Und	1,00	$ 318.685	$ 318.685		$ 0	1	$ 318.685	1,00	$ 318.685	0,00	$ 0
7.11	Suministro e instalación de CABLE DE COBRE AISLADO 3xNo.8 + 2xNo.8 AWG THHN de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, cable de cobre y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE. No incluye tubería, la misma se pagará en su respectivo ítem	m	50,00	$ 39.000	$ 1.950.000		$ 0		$ 0	0,00	$ 0	50,00	$ 1.950.000
7.12	Suministro e instalación de TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1" de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE	m	50,00	$ 16.875	$ 843.750		$ 0		$ 0	0,00	$ 0	50,00	$ 843.750

7.13	Suministro e instalación de CABLE DE COBRE AISLADO 3xNo.4 + 2xNo.6 AWG THHN de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, cable de cobre y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE. No incluye tubería, la misma se pagará en su respectivo ítem	m	50,00	$ 83.400	$ 4.170.000		$ 0		$ 0	0,00	$ 0	50,00	$ 4.170.000
7.14	Suministro e instalación de TUBERÍA PVC CONDUIT DE 2" de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE	m	50,00	$ 30.190	$ 1.509.500		$ 0		$ 0	0,00	$ 0	50,00	$ 1.509.500
7.15	Suministro e instalación de BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE 1x20A de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, breaker y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE	Und	6,00	$ 25.343	$ 152.058		$ 0	13	$ 329.459	13,00	$ 329.459	-7,00	-$ 177.401
7.16	Suministro e instalación de BREAKER BIPOLAR ENCHUFABLE 2x20A de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, breaker y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE	Und	6,00	$ 62.412	$ 374.472		$ 0		$ 0	0,00	$ 0	6,00	$ 374.472
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 2.758.887**								
8.1	Suministro e instalación de SANITARIO TIPO MONTECARLO REDONDO DE CORONA O SIMILAR de primera calidad. Incluye suministro y transporte de los materiales, aparato sanitario, cemento blanco, grifería, silicona antihongos, acople en acero, niple roscado, brida sanitaria, demoliciones menores, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	Und	3,00	$ 700.000	$ 2.100.000	2,00	$ 1.400.000	1	$ 700.000	3,00	$ 2.100.000	0,00	$ 0
8.2	Suministro e instalación de LAVATRAPERO PREFABRICADO EN CONCRETO 50x50x40cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, lavatrapero, cemento blanco, llave de jardín, silicona antihongos, demoliciones menores, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	Und	3,00	$ 219.629	$ 658.887	2,00	$ 439.258	1	$ 219.629	3,00	$ 658.887	0,00	$ 0
9	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 8.235.410**								
9.1	REINSTALACIÓN DE REJA, PUERTA O VENTANA METÁLICA. Una mano de pintura, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales y la reinstalación de la puerta o ventana con su marco, empaques, sellado (interior y exterior) con silicona transparente antihongos, demoliciones menores, accesorios, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	m2	7,20	$ 73.907	$ 532.130		$ 0			0,00	$ 0	7,20	$ 532.130

9.2	Suministro e instalación de PERFILES TUBULARES ESTRUCTURALES (PTE) en acero A500 Grado C. La sección puede ser redonda, cuadrada o rectangular. Las dimensiones y la distribución de los perfiles según planos estructurales. Los anclajes y conexiones se sumarán al peso total de los perfiles. Incluye suministro y transporte de los materiales, montaje, soldadura, anclajes y/o conexiones, pintura anticorrosiva, pintura esmalte, equipos necesarios, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	Kg	427,96	$ 18.000	$ 7.703.280		$ 0			0,00	$ 0	427,96	$ 7.703.280
OE													
OE1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL 1.2X3 INCLUYE ENCAHUCHETADO	Und	45,00	$ 258.608	$ 11.637.382			39	$ 10.085.731				

COSTOS DIRECTOS		$ 192.213.050	$ 56.207.391	$ 102.852.444	$ 148.974.103	$ 43.238.946
TOTAL COSTO ADMINISTRACION	19,84%	$ 38.135.069	$ 11.151.546	$ 20.405.925	$ 29.556.462	$ 8.578.607
UTILIDAD 5%	4,40%	$ 8.457.374	$ 2.473.125	$ 4.525.508	$ 6.554.861	$ 1.902.514
TOTAL CD +AU		$ 46.592.443				
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		$ 238.805.494	$ 69.832.062	$ 127.783.877	$ 185.085.426	$ 53.720.067


CARLOS ARTURO MEJIA
SUPERVISION Y VIGILANCIA DEL CONTRATO
SEC. INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MUNICIPIO DE SABANETA

SANTIAGO ANDRES TABORDA ECHAVARRIA
REPRESENTANTE LEGAL
SOTARCO S.A.S

	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
	NUMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SAB-03-007-23
	OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ATENDIENDO AL FALLO DE TUTELA N.° 5 DE 2023 CON RADICADO 202300003 EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CALCULO

2	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**807,40**	**FECHA CORTE:**	**Octubre 2023**	
2.3	DESMONTE Y RETIRO DE CIELO FALSO Y SU ESTRUCTURA en cualquier material y diseño. Incluye cargue, retiro y disposición final según indicaciones de la entidad			**UND**	**m2**

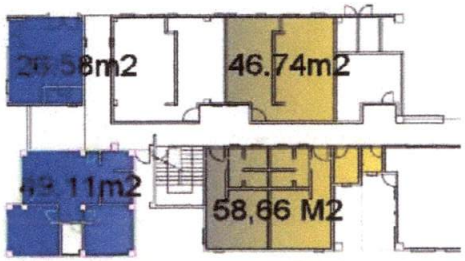




DESCRIPCION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	No. ELEM	MEDIDA TOTAL
CANTIDAD DE UNIDADES RETIRADAS					
Acceso estacion					26,58
Casa Fiscal					49,11
Dormitorio Mujeres					58,66
Dormitorio Hombres y baños					46,74
TOTAL					181,09
Nota: Medidas tomadas en Autocad según levantamiento Arquitectonico					

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	**481,56**
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	**181,09**
ACUMULADO MEMORIA	**662,65**

SANTIAGO ANDRES TABORDA ECHAVARRIA
Representante Legal
SOTARCO S.A.S
Contratista


CARLOS ARTURO MEJIA GARCIA
Supervision y vigilancia del Contrato
Secretaria de Infraestructura Fisica
Municipio de Sabaneta
VoBo de La Supervision

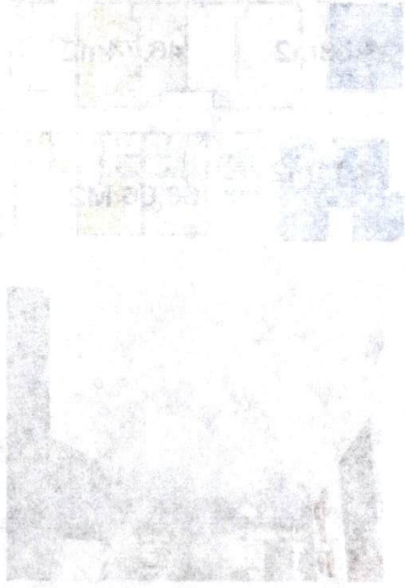

	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
	NUMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SAB-03-007-23
	OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ATENDIENDO AL FALLO DE TUTELA N.° 5 DE 2023 CON RADICADO 202300003 EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CALCULO

5	**ELEMENTOS DE CONCRETO**	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**570,00**	**FECHA CORTE:**	**Octubre 2023**	
5.1	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.				**UND**	**m2**

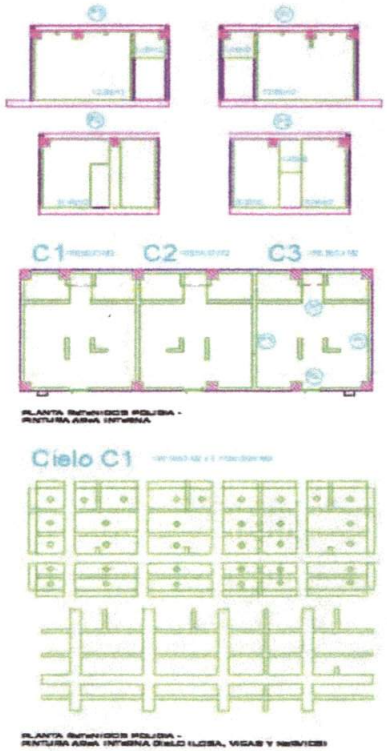

DESCRIPCION	DIMENSIONES			No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	ALTO	LARGO	OTRAS AREAS A SUMAR O RESTAR		
Carceleta 1	2,92	37,12	4,64		103,56
TOTAL AREA					103,56

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	**207,12**
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	**103,56**
ACUMULADO MEMORIA	**310,68**

SANTIAGO ANDRES TABORDA ECHAVARRIA
Representante Legal
SOTARCO S.A.S
Contratista


CARLOS ARTURO MEJIA GARCIA
Supervision y vigilancia del Contrato
Secretaria de Infraestructura Fisica
Municipio de Sabaneta
VoBo de La Supervision

	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
	NUMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SAB-03-007-23
	OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ATENDIENDO AL FALLO DE TUTELA N.° 5 DE 2023 CON RADICADO 202300003 EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA


MEMORIAS DE CALCULO

6	**ELEMENTOS DE CONCRETO**	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**392,40**	**FECHA CORTE:**	**Octubre 2023**
6.1	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA CON MANTO ASFALTICO. Se debe preparar la superficie, aplicar una capa de Emulsión Asfáltica Sika o similar diluida, extender manto asfaltico Fiberglass de 3mm o similar, aplicar otra capa de Emulsión Asfáltica Sika o similar sin diluir, extender manto asfaltico en granulo mineral de 3.5mm o similar. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, chaflán entre losa y paredes, emboquillado de bajantes y gárgolas, regatas y su respectivo sellado, plateo de bajantes, ajuste de tuberías y equipos de aire para instalar el manto y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.			**UND**	**m2**



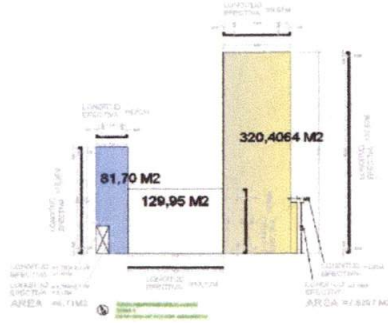

DESCRIPCION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	No. ELEM	MEDIDA TOTAL
zona Administrativa					320,41
					81,70
Nota: Medidas tomadas en Autocad según levantamiento Arquitectonico					
TOTAL AREA					

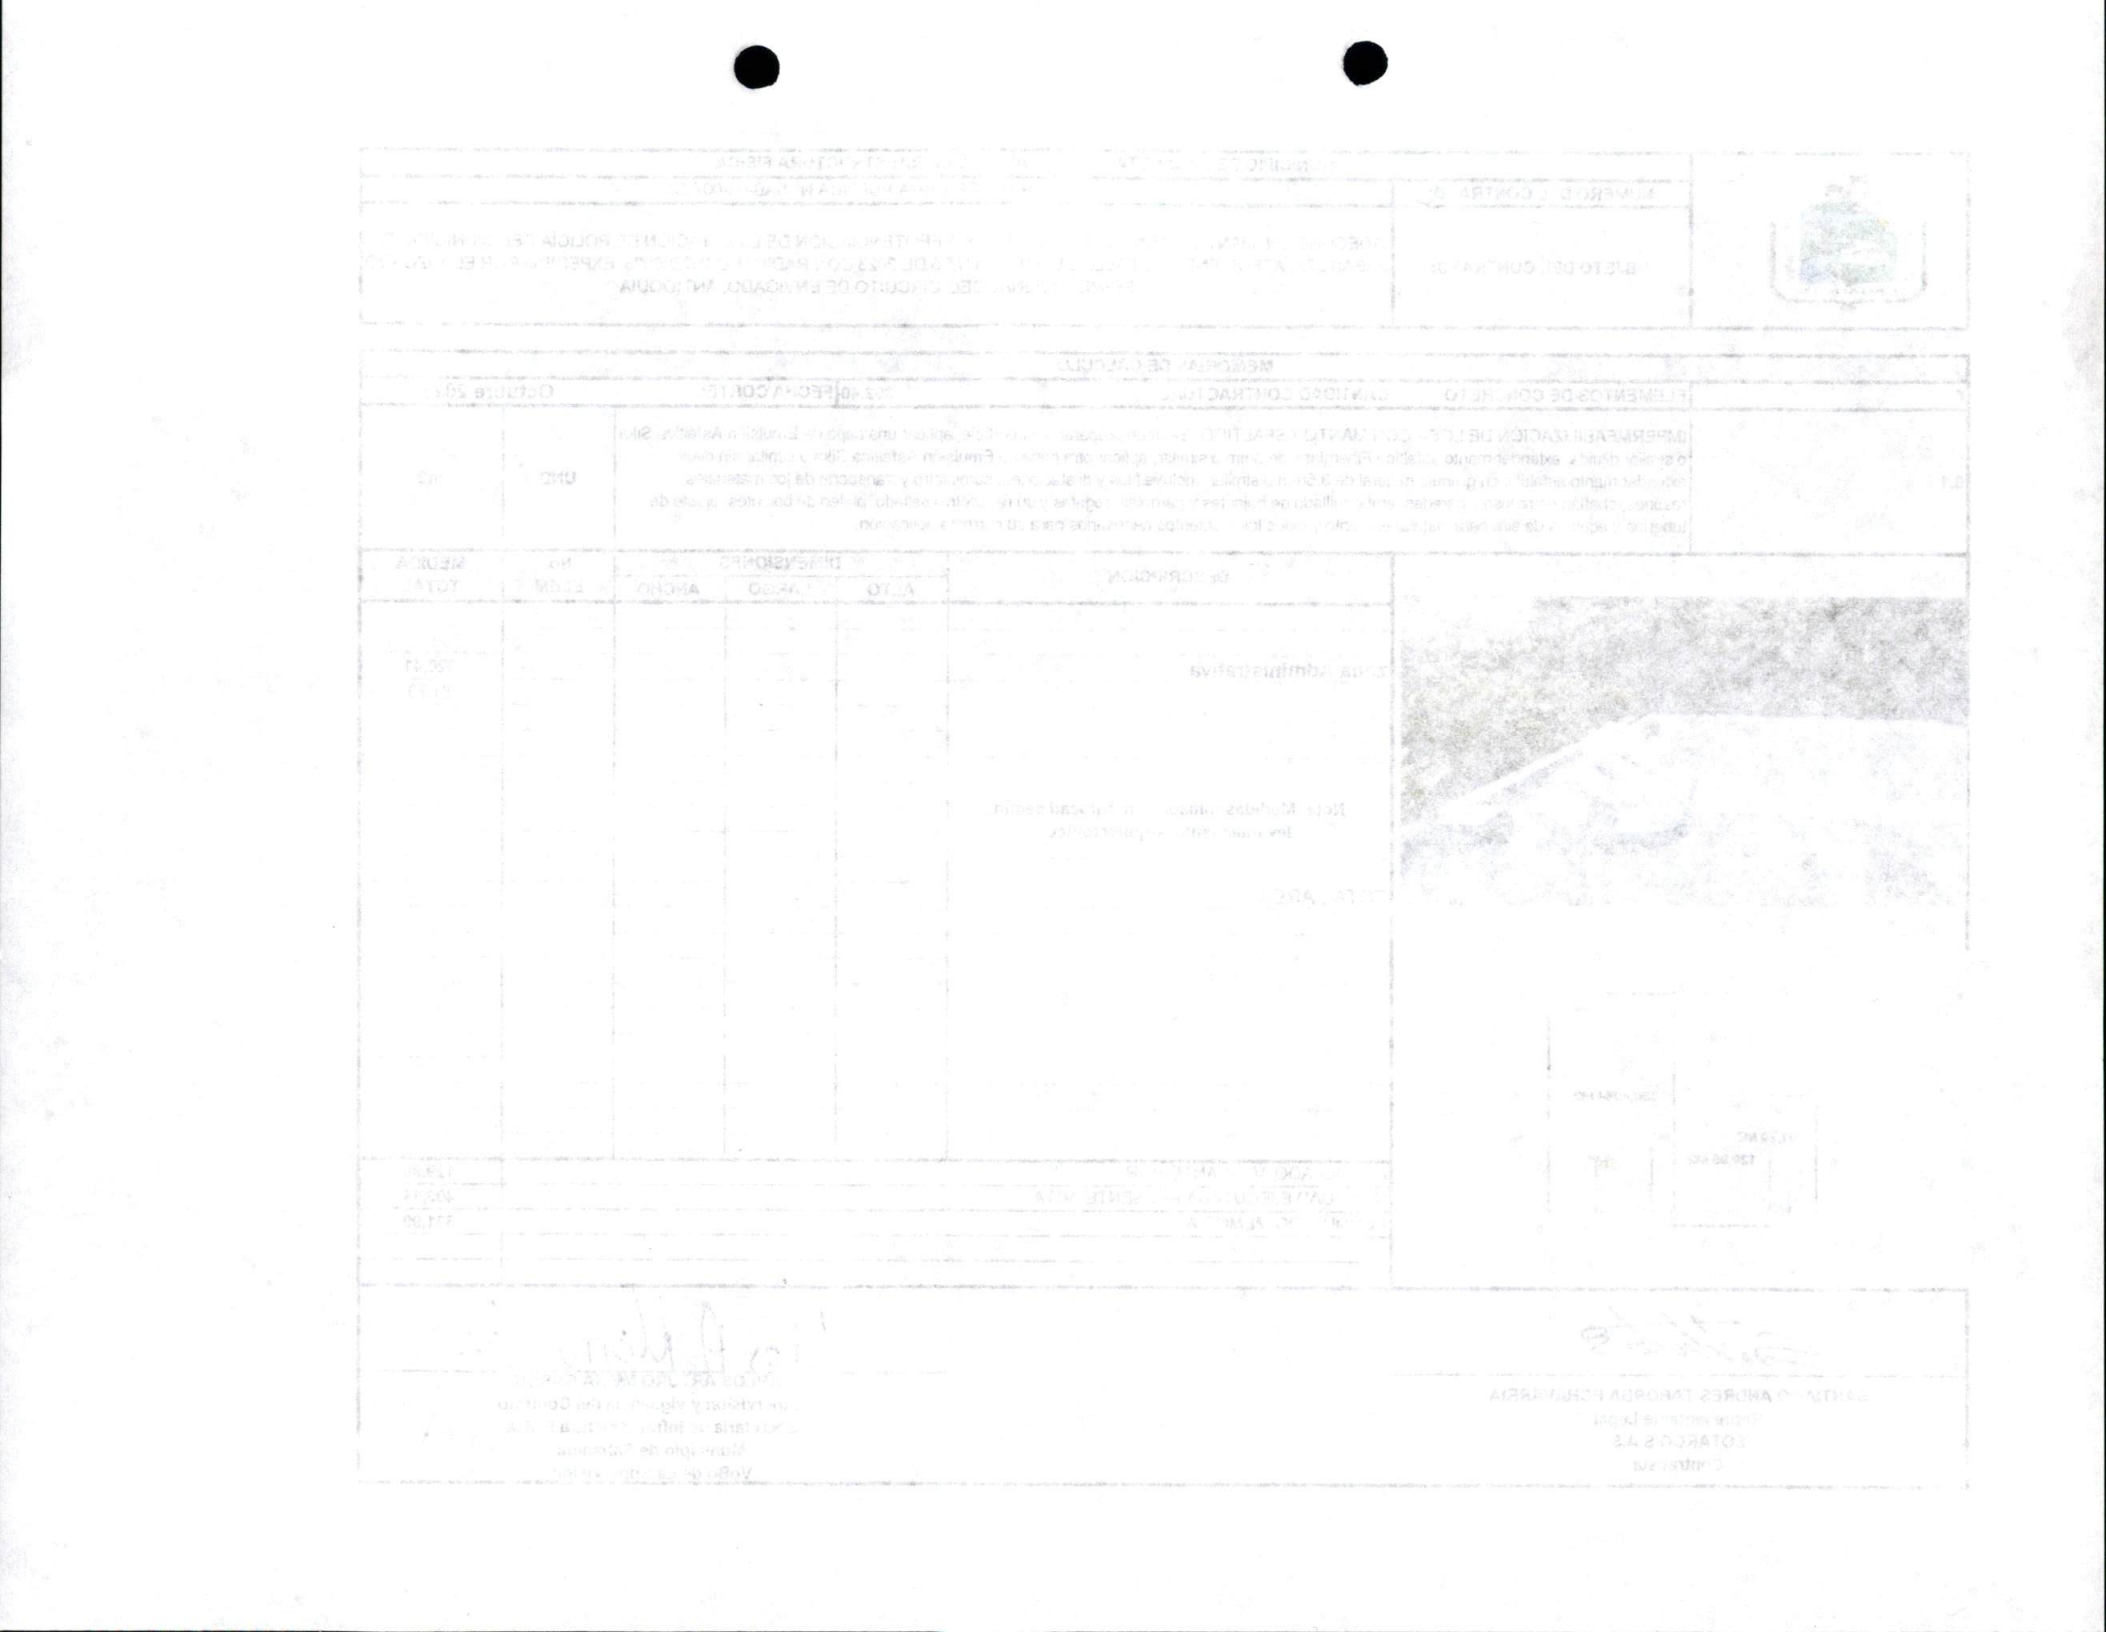


	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
	NUMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SAB-03-007-23
	OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ATENDIENDO AL FALLO DE TUTELA N.° 5 DE 2023 CON RADICADO 202300003 EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CALCULO

6	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**807,40**	**FECHA CORTE:**	**Octubre 2023**	
6.3	Suministro e instalación de CIELO FALSO EN PANEL YESO (DRYWALL) 1/2". Incluye suministro, transporte e instalación de lámina en panel yeso de 1/2", masilla, tornillos, perfiles para estructura de soporte y accesorios. Incluye también estuco plástico, pintura vinilo tipo 2 tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación			**UND**	**m2**



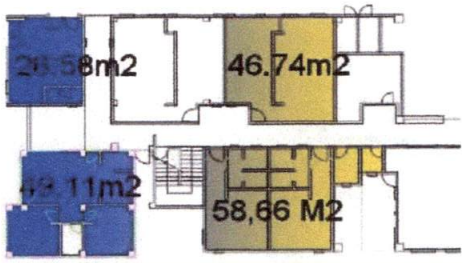

AREA DRYWALL
PINA CORREDOR
ESTACION DE POLICIA

DESCRIPCION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	No. ELEM	MEDIDA TOTAL
Zona administrativa					269,57
Acceso estacion					26,58
Casa Fiscal					49,11
Dormitorio Mujeres					58,66
Dormitorio Hombres y baños					46,74
TOTAL					450,66
Nota: Medidas tomadas en Autocad según levantamiento Arquitectonico					
ACUMULADO ACTA ANTERIOR					**211,99**
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA					**450,66**
ACUMULADO MEMORIA					**662,65**

SANTIAGO ANDRES TABORDA ECHAVARRIA
Representante Legal
SOTARCO S.A.S
Contratista

CARLOS ARTURO MEJIA GARCIA
Supervision y vigilancia del Contrato
Secretaria de Infraestructura Fisica
Municipio de Sabaneta
VoBo de La Supervision

	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
	NUMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SAB-03-007-23
	OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ATENDIENDO AL FALLO DE TUTELA N.° 5 DE 2023 CON RADICADO 202300003 EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA


MEMORIAS DE CALCULO

7	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**24,00**	**FECHA CORTE:**	**Octubre 2023**
7.1	Suministro e instalación de LUMINARIA PANEL LED 18W BLANCA REDONDA empotrada en cielo raso de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, luminaria, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE		**UND**	**Und**









DESCRIPCION	DIMENSIONES		CANTIDAD	No. ELEM	MEDIDA TOTAL
Carceleta 1			6		
Carceleta 2			6		
Carceleta 3			6		
Corredor			16		
Armerillo			1		
patio comedor			2		
Casa fiscal			12		
Cuarto util escaleras			1		
Guardia			5		
Dormitorio mujeres			12		
Dormitorio hombres y baño			11		
Locker y baños			11		
Baños externos			3		
Corredor oficinas			7		
Baño mayor			1		
cuarto tecnico			1		
Cocineta, y baños oficina principal			9		
Total			110		
ACUMULADO ACTA ANTERIOR					
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA					**110,00**
ACUMULADO MEMORIA					**110,00**


SANTIAGO ANDRES TABORDA ECHAVARRIA
Representante Legal
SOTARCO S.A.S
Contratista

CARLOS ARTURO MEJIA GARCIA
Supervision y vigilancia del Contrato
Secretaria de Infraestructura Fisica
Municipio de Sabaneta
VoBo de La Supervision

	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
	NUMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SAB-03-007-23
	OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ATENDIENDO AL FALLO DE TUTELA N.° 5 DE 2023 CON RADICADO 202300003 EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CALCULO

7	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**107,00**	**FECHA CORTE:**	**Octubre 2023**
7.2	Suministro e instalación de LUMINARIA PANEL LED 36W BLANCA REDONDA empotrada en cielo raso de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, luminaria, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE		**UND**	**Und**

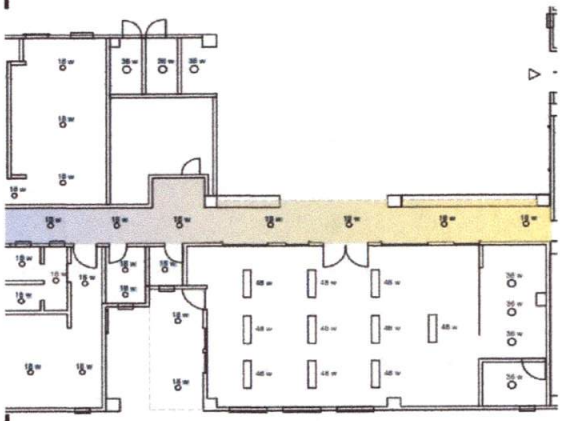

DESCRIPCION	DIMENSIONES		CANTIDAD	No. ELEM	MEDIDA TOTAL
Cocina			4,00		
Cuarto de maquinas			3,00		
TOTAL					7,00

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	**7,00**
ACUMULADO MEMORIA	**7,00**

SANTIAGO ANDRES TABORDA ECHAVARRIA
Representante Legal
SOTARCO S.A.S
Contratista

CARLOS ARTURO MEJIA GARCIA
Supervision y vigilancia del Contrato
Secretaria de Infraestructura Fisica
Municipio de Sabaneta
VoBo de La Supervision

	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
	NUMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SAB-03-007-23
	OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ATENDIENDO AL FALLO DE TUTELA N.° 5 DE 2023 CON RADICADO 202300003 EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CALCULO

7	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**24,00**	**FECHA CORTE:**	**Octubre 2023**
7.7	SALIDA DE TOMA DOBLE EN TUBERIA PVC de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Se estima una longitud promedio de 2m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería PVC 1/2", accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3, resanes, conector, cable de cobre aislado No.12 AWG THHN (Fase, neutro y tierra), tomacorriente doble, caja rectangular, adaptador terminal y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE		**UND**	**Und**



DESCRIPCION	DIMENSIONES			No. ELEM	MEDIDA TOTAL
			CANTIDAD		
Carceleta 1			1,00		
Carceleta 2			1,00		
Carceleta 3			1,00		
TOTAL					3,00

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	**3,00**
ACUMULADO MEMORIA	**3,00**

SANTIAGO ANDRES TABORDA ECHAVARRIA
Representante Legal
SOTARCO S.A.S
Contratista

CARLOS ARTURO MEJIA GARCIA
Supervision y vigilancia del Contrato
Secretaria de Infraestructura Fisica
Municipio de Sabaneta
VoBo de La Supervision

	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
	NUMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SAB-03-007-23
	OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ATENDIENDO AL FALLO DE TUTELA N.° 5 DE 2023 CON RADICADO 202300003 EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CALCULO

7	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**1,00**	**FECHA CORTE:**	**Octubre 2023**	
7.10	Suministro e instalación de TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, accesorios, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE			**UND**	**Und**



DESCRIPCION	DIMENSIONES		CANTIDAD	No. ELEM	MEDIDA TOTAL
Carceletas			1,00		
TOTAL					1,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR					
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA					**1,00**
ACUMULADO MEMORIA					**1,00**

SANTIAGO ANDRES TABORDA ECHAVARRIA
Representante Legal
SOTARCO S.A.S
Contratista

CARLOS ARTURO MEJIA GARCIA
Supervision y vigilancia del Contrato
Secretaria de Infraestructura Fisica
Municipio de Sabaneta
VoBo de La Supervision

	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
	NUMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SAB-03-007-23
	OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ATENDIENDO AL FALLO DE TUTELA N.° 5 DE 2023 CON RADICADO 202300003 EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CALCULO

7	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**6,00**	**FECHA CORTE:**	**Octubre 2023**
7.15	Suministro e instalación de BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE 1x20A de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, breaker y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE		**UND**	**Und**





DESCRIPCION	DIMENSIONES			No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	ALTO	LARGO	ANCHO		
Caja la guardia			6,00		
Caja carceletas			7,00		
TOTAL					13,00

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	**13,00**
ACUMULADO MEMORIA	**13,00**

SANTIAGO ANDRES TABORDA ECHAVARRIA
Representante Legal
SOTARCO S.A.S
Contratista

CARLOS ARTURO MEJIA GARCIA
Supervision y vigilancia del Contrato
Secretaria de Infraestructura Fisica
Municipio de Sabaneta
VoBo de La Supervision

	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
	NUMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SAB-03-007-23
	OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ATENDIENDO AL FALLO DE TUTELA N.° 5 DE 2023 CON RADICADO 202300003 EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CALCULO

8	**DESMONTE Y DEMOLICION**	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**3,00**	**FECHA CORTE:**	**Octubre 2023**
8.1	Suministro e instalación de SANITARIO TIPO MONTECARLO REDONDO DE CORONA O SIMILAR de primera calidad. Incluye suministro y transporte de los materiales, aparato sanitario, cemento blanco, grifería, silicona antihongos, acople en acero, niple roscado, brida sanitaria, demoliciones menores, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación			**UND**	**Und**



DESCRIPCION	DIMENSIONES			No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	ALTO	LARGO	ANCHO		
CANTIDAD DE UNIDADES RETIRADAS					
Carceleta 3					
Inhodoro				1,00	1,00
TOTAL					1,00

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	**2,00**
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	**1,00**
ACUMULADO MEMORIA	**3,00**

SANTIAGO ANDRES TABORDA ECHAVARRIA
Representante Legal
SOTARCO S.A.S
Contratista

CARLOS ARTURO MEJIA GARCIA
Supervision y vigilancia del Contrato
Secretaria de Infraestructura Fisica
Municipio de Sabaneta
VoBo de La Supervision

	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
	NUMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SAB-03-007-23
	OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ATENDIENDO AL FALLO DE TUTELA N.° 5 DE 2023 CON RADICADO 202300003 EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CALCULO

8	**DESMONTE Y DEMOLICION**	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**3,00**	**FECHA CORTE:**	**Octubre 2023**
8.2	Suministro e instalación de LAVATRAPERO PREFABRICADO EN CONCRETO 50x50x40cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, lavatrapero, cemento blanco, llave de jardín, silicona antihongos, demoliciones menores, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación			**UND**	**Und**



DESCRIPCION	DIMENSIONES			No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	ALTO	LARGO	ANCHO		
CANTIDAD DE UNIDADES RETIRADAS					
Carceleta 3					
lavatraperos				1,00	1,00
TOTAL					1,00

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	**2,00**
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	**1,00**
ACUMULADO MEMORIA	**3,00**


SANTIAGO ANDRES TABORDA ECHAVARRIA
Representante Legal
SOTARCO S.A.S
Contratista

CARLOS ARTURO MEJIA GARCIA
Supervision y vigilancia del Contrato
Secretaria de Infraestructura Fisica
Municipio de Sabaneta
VoBo de La Supervision

	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
NUMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SAB-03-007-23
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ATENDIENDO AL FALLO DE TUTELA N.° 5 DE 2023 CON RADICADO 202300003 EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CALCULO

OE	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**45,00**	**FECHA CORTE:**	**Octubre 2023**
OE1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL 1,2X3 INCLUYE ENCAHUCHETADO PRENSA,ESTOPA,CORREAS,CONECTORES DE RESORTE		**UND**	**Und**

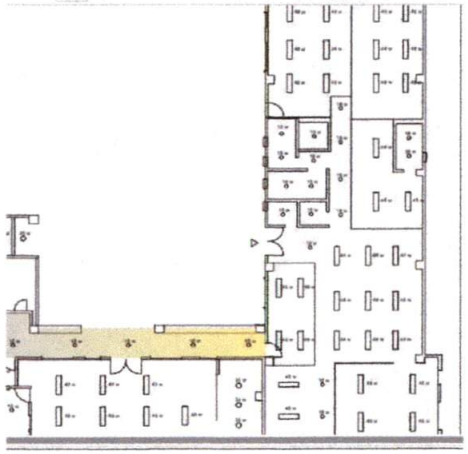

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
			CANTIDAD		
Oficinas			39		
Cocina					
TOTAL					39,00

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	**39,00**
ACUMULADO MEMORIA	**39,00**

SANTIAGO ANDRES TABORDA ECHAVARRIA
Representante Legal
SOTARCO S.A.S
Contratista

CARLOS ARTURO MEJIA GARCIA
Supervision y vigilancia del Contrato
Secretaria de Infraestructura Fisica
Municipio de Sabaneta
VoBo de La Supervision
