ANZA
Ingeniería S A S BIC

Nit. 900.893.208-0

Bogotá D.C., Octubre 26 de 2023

SDHT-2023-061

Señores:
COINCO SAS
EDUARDO MANRIQUE PINZÓN
Representante Legal
Carrera 7#109-28
Bogotá D,C.

"**CTO # 986 DE 2023,** CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. **GRUPO 2-2023.**

Asunto: Aprobación informes mensual del mes de septiembre de 2023 TÉCNICO-SOCIAL-SST Y AMBIENTAL del CTO de obra No.915 de 2023

Respetado Señor,

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente y de acuerdo con las funciones de esta interventoría, me permito hacer entrega del aval correspondiente al informe del mes de septiembre de 2023 de acuerdo a los componentes TÉCNICO-SOCIAL-SST Y AMBIENTAL del CTO de obra No.915 de 2023.

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente

ARQ. EDGAR EDUARDO ROA CASTILLO
DIRECTOR INTERVENTORÍA
ANZA INGENIERIA SAS BIC

INFORME MENSUAL 3

CONTRATO 915- 2023

CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO SAS

SEPTIEMBRE 2023

COINCO	**COMPONENTE TÉCNICO GRUPO 2**
	INFORME TÉCNICO MENSUAL No 3

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO	
N.º CONTRATO	915 DE 2023
OBJETO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2– 2023
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
VALOR DEL CONTRATO	$ 5.783.760.000
FECHA DE INICIO	7 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÒN	7 DE FEBRERO DE 2024
VIGENCIA	7 MESES
NÚMERO DE VIVIENDAS A INTERVENIR	277 UNIDADES DE INTERVENCIÓN
INTERVENTORIA	ANZA INGENIERIA SAS BIC

EQUIPO MINIMO DEL CONTRATO.

EQUIPO MINIMO CONTRATO 915-2023		
NOMBRE DEL PROFESIONAL	**CARGO**	**DEDICACIÓN**
DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	DIRECTOR DE OBRA	100%
XIMENA SANTANA ROMERO	COORDINADORA SOCIAL	100%
DAVID JULIAN FLOREZ GAMBOA	RESIDENTE TÉCNICO	100%
CINDY LIZETH QUEVEDO TEJADA	RESIDENTE TÉCNICO	100%
MAURICIO MARTINEZ JEREZ	RESIDENTE TÉCNICO	100%
CAMILO ANDRES GUTIERREZ TORRES	RESIDENTE TÉCNICO	100%
YULY ANDREA CASAS MERCHAN	RESIDENTE SOCIAL	100%
SINDY YESENIA SIERRA MARIN	RESIDENTE SOCIAL	100%
JULIANA CAROLINA GOMEZ CHIQUIZA	RESIDENTE SOCIAL	100%
JUAN CARLOS COLORADO CASTRO	RESIDENTE SOCIAL	100%
JUAN FELIPE MOSQUERA SANTAMARIA	INGENIERO AMBIENTAL	100%
JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	PROFESIONAL SST	100%

COINCO	COMPONENTE TÉCNICO GRUPO 2
	INFORME TÉCNICO MENSUAL No 3

RESUMEN DE EJECUCIÓN

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN MENSUAL											30-sep-23
CONTRATISTA:											
Contrato de obra	915-2023						Plazo	7 MESES			
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2–2023.						Valor del contrato	$ 5.783.760.000			
Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras			
Profesional	Usme	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución			
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	Acta de Entrega a Satisfacción
INGENIERO	MAURICIO MARTINEZ	EL PORTAL II ETAPA	29	29	29	0	0	10	12	7	12
T. SOCIAL	JULIANA GOMEZ										
INGENIERO	CAMILO GUTIERREZ	NUEVO PORVENIR	2	2	2	0	0	0	2	0	2
T. SOCIAL	YULY CASAS	EL PORTAL II ETAPA	25	25	25	0	0	10	11	4	11
ARQUITECTA	LIZETH QUEVEDO	EL PORTAL II ETAPA	27	27	27	0	0	9	14	4	14
T. SOCIAL	JUAN COLORADO										
ARQUITECTO	DAVID FLOREZ	EL PORTAL II ETAPA	23	23	23	0	0	9	13	1	13
		EL PORTAL DEL DIVINO	5	5	5	0	0	4	0	1	0
T. SOCIAL	YESENIA SIERRA	BELLA FLOR	2	2	2	0	0	1	0	1	0
Subtotal			113	113	113	0	0	43	52	18	52

ASPECTOS FINANCIEROS

En la tabla 1 se puede observar el balance actual del contrato; donde el valor inicial del contrato es de **$5.783.760.00,00 M/CTE,** para lo cual se estableció un valor del 30% como anticipo, es decir, **$1.783.128.000,00.** La fecha de pago de las primeras ordenes de giro del anticipo se realizó el 26 de julio del 2023 de la entidad a la fiducia, como se observa en la ilustración 1 y de la fiducia al contratista el 31 de agosto del 2023, como se observa en la ilustración 2.

De igual forma, en el ANEXO 1 – SOPORTES DE PAGO FINANCIEROS, se podrán encontrar los soportes de las ilustraciones 1 y 2, para una mejor visualización.


Tabla 1. Balance del contrato.

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL:	$	5.783.760.000,00
VALOR TOTAL ANTICIPO (30%):	$	1.783.128.000,00
VALOR TOTAL COBRADO:	$	-

COINCO	COMPONENTE TÉCNICO GRUPO 2
	INFORME TÉCNICO MENSUAL No 3

VALOR SALDO POR COBRAR:	$ 5.783.760.000,00
SUMSA IGUALES:	$ 5.783.760.000,00

Ilustración 1. Soporte de pago anticipo de la entidad a la fiducia.

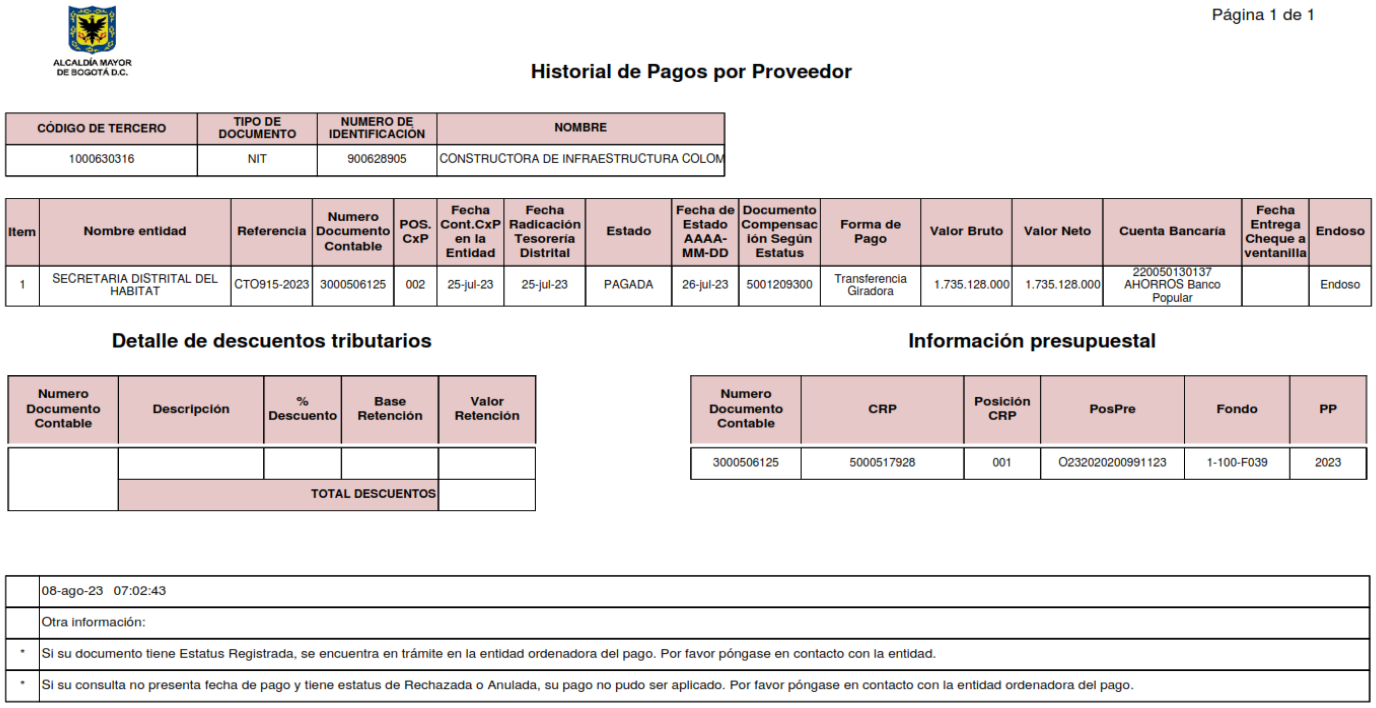

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Página 1 de 1

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000630316	NIT	900628905	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOM

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO915-2023	3000506125	002	25-jul-23	25-jul-23	PAGADA	26-jul-23	5001209300	Transferencia Giradora	1.735.128.000	1.735.128.000	220050130137 AHORROS Banco Popular		Endoso

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
	TOTAL DESCUENTOS			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000506125	5000517928	001	O232020200991123	1-100-F039	2023

	08-ago-23 07:02:43
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.

Para el contrato de obra **No. 915 de 2021**, la SDHT considera necesario para cubrir la compra de materiales, adquisición y/o alquiler de equipos, contratación de mano de obra, y en general todos los costos necesarios para iniciar la ejecución del objeto contractual la entrega de un anticipo de hasta el **treinta (30%)** por ciento del valor del contrato dados los diferentes frentes de obra que se deberán adelantar. A la fecha el anticipo se ha invertido de la siguiente manera:

Tabla 2. Inversión del anticipo.

INVERSIÓN DEL ANTICPO					
CONCEPTO	**BENEFICIARIO**	**CC O NIT**	**FECHA**	**VALOR**	**No. ORDEN DE GIRO**
MATERIALES DE CONSTRUCCION	AHME CONSTRUCCIONES SAS	900.540.320	31/08/2023	$ 500.000.584,00	1
MATERIALES DE CONSTRUCCION	SODIMAC COLOMBIA S.A.	800.242.106	31/08/2023	$ 239.649.238,00	2
MATERIALES DE CONSTRUCCION	CONSORCIO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR COINCO SAS	901.626.120	31/08/2023	$ 387.752.775,00	3
TOTAL INVERTIDO A LA FECHA				$ 1.127.402.597,00	

De esta manera se evidencia que el valor del anticipo se ha invertido en un 63% en materiales de construcción, dicha inversión fue previamente evaluada y aprobada por la firma interventora.

Ilustración 2. Soporte de desembolso fiducia

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ
NIT. 900.247.285-8

fiduciaria popular
NIT. 800141235

Página 1 de 2
Número de Identificación: 31061

P.A. ANTICIPO COINCO HABITAT
CR 7 109 28
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC
250 - 1 / 2

Fiduliquidez
Fondo de Inversión Colectiva Abierto

Extracto de cuenta: Periodo del 1 Agosto 2023 al 31 Agosto 2023 — Número de Encargo: XXXXXXX0465-7

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 1 Agosto 2023		$ 0.00
Aportes	$ 1,735,128,000.00	
Retiros	$ -1,127,402,597.00	
Gravamen a los movimientos financieros	$ -4,509,610.39	
Rendimientos	$ 25,190,691.49	
Retención en la fuente	$ 0.00	
Saldo final a 31 Agosto 2023		$ 628,406,484.10

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/08/2023 AL 31/08/2023		11,505.342727	0.000000	11,649.648897	53,942.096425	628,406,484.1

Detalle Movimientos del Mes de la Inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
10/08/2023	APORTES	150,461.534202	1,735,128,000.00	11,532.037136	150,461.534202	1,735,128,000
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-42,919.798565	-500,000,584.00	11,649.648897	106,022.715959	1,235,127,416
31/08/2023	GMF-4X1000	-171.679195	-2,000,002.34	11,649.648897	105,851.036765	1,233,127,413.66
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-415.157576	-4,836,440.00	11,649.648897	105,435.879189	1,228,290,973.66
31/08/2023	GMF-4X1000	-1.660630	-19,345.76	11,649.648897	105,434.218558	1,228,271,627.9
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-181.006829	-2,108,666.00	11,649.648897	105,253.211730	1,226,162,961.9
31/08/2023	GMF-4X1000	-0.724027	-8,434.66	11,649.648897	105,252.487703	1,226,154,527.24
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-103.432473	-1,204,952.00	11,649.648897	105,149.055229	1,224,949,575.24
31/08/2023	GMF-4X1000	-0.413730	-4,819.81	11,649.648897	105,148.641499	1,224,944,755.43
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-17.834443	-207,765.00	11,649.648897	105,130.807056	1,224,736,990.43
31/08/2023	GMF-4X1000	-0.071338	-831.06	11,649.648897	105,130.735718	1,224,736,159.37
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-5,463.740973	-63,650,664.00	11,649.648897	99,666.994745	1,161,085,495.37
31/08/2023	GMF-4X1000	-21.854964	-254,602.66	11,649.648897	99,645.139781	1,160,830,892.71
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-35.668886	-415,530.00	11,649.648897	99,609.470895	1,160,415,362.71
31/08/2023	GMF-4X1000	-0.142676	-1,662.12	11,649.648897	99,609.328219	1,160,413,700.59
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-41.613700	-484,785.00	11,649.648897	99,567.714519	1,159,928,915.59
31/08/2023	GMF-4X1000	-0.166455	-1,939.14	11,649.648897	99,567.548064	1,159,926,976.45
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-23.779257	-277,020.00	11,649.648897	99,543.768807	1,159,649,956.45
31/08/2023	GMF-4X1000	-0.095117	-1,108.08	11,649.648897	99,543.673690	1,159,648,848.37
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1,606.448758	-18,714,564.00	11,649.648897	97,937.224932	1,140,934,284.37
31/08/2023	GMF-4X1000	-6.425795	-74,858.26	11,649.648897	97,930.799136	1,140,859,426.11
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1,289.132070	-15,017,936.00	11,649.648897	96,641.667066	1,125,841,490.11
31/08/2023	GMF-4X1000	-5.156528	-60,071.74	11,649.648897	96,636.510538	1,125,781,418.37
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-47.394561	-552,130.00	11,649.648897	96,589.115977	1,125,229,288.37
31/08/2023	GMF-4X1000	-0.189578	-2,208.52	11,649.648897	96,588.926398	1,125,227,079.85
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-838.069549	-9,763,216.00	11,649.648897	95,750.856849	1,115,463,863.85
31/08/2023	GMF-4X1000	-3.352278	-39,052.86	11,649.648897	95,747.504571	1,115,424,810.99
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-907.598168	-10,573,200.00	11,649.648897	94,839.906403	1,104,851,610.99
31/08/2023	GMF-4X1000	-3.630393	-42,292.80	11,649.648897	94,836.276010	1,104,809,318.19
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-3,554.592105	-41,409,750.00	11,649.648897	91,281.683905	1,063,399,568.19
31/08/2023	GMF-4X1000	-14.218368	-165,639.00	11,649.648897	91,267.465536	1,063,233,929.19
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2,741.557302	-31,938,180.00	11,649.648897	88,525.908234	1,031,295,749.19
31/08/2023	GMF-4X1000	-10.966229	-127,752.72	11,649.648897	88,514.942005	1,031,167,996.47
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-3,175.052770	-36,988,250.00	11,649.648897	85,339.889235	994,179,746.47
31/08/2023	GMF-4X1000	-12.700211	-147,953.00	11,649.648897	85,327.189024	994,031,793.47
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-129.290592	-1,506,190.00	11,649.648897	85,197.898432	992,525,603.47
31/08/2023	GMF-4X1000	-0.517162	-6,024.76	11,649.648897	85,197.381270	992,519,578.71
31/08/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-33,284.503116	-387,752,775.00	11,649.648897	51,912.878154	604,766,803.71
31/08/2023	GMF-4X1000	-133.138012	-1,551,011.10	11,649.648897	51,779.740141	603,215,792.61
31/08/2023	SALDO FINAL	0.000000	0.00	0.000000	0.000000	628,406,484.1

Tipo de Participación.	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación.	Valor Promedio del Fondo en el Mes
	2.00 %	699,376,836,589.53


COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	**COMPONENTE TÉCNICO GRUPO 2**
	INFORME TÉCNICO MENSUAL No 3

ANALISIS DE EJECUCIÓN

En relación con la ejecución del proyecto, se informa por parte del contratista se ha procedido con la apertura de las obras en total de 95 viviendas. Según la programación, para el 30 de septiembre se debería haber entregado 60 viviendas, lo que representa un 33% del avance total. En el momento se cuenta con la entrega de 52 viviendas, lo que representa un avance en ejecución del 45,6 % viviendas en la zona de Usme.


Es importante destacar que, desde el punto financiero, se ha ejecutado un monto de $ 2.024.316.000, lo que equivale al 35% del presupuesto total. Además de acuerdo con el flujo de caja proyectado para finales de este mes en curso, se ha alcanzado un valor de $1908.640.800, equivale al 33%.

Cabe aclarar que tenemos varias viviendas en ejecución con más de un 80% de su ejecución, por tal motivo es que la ejecución presupuestaria está por encima de la programación.

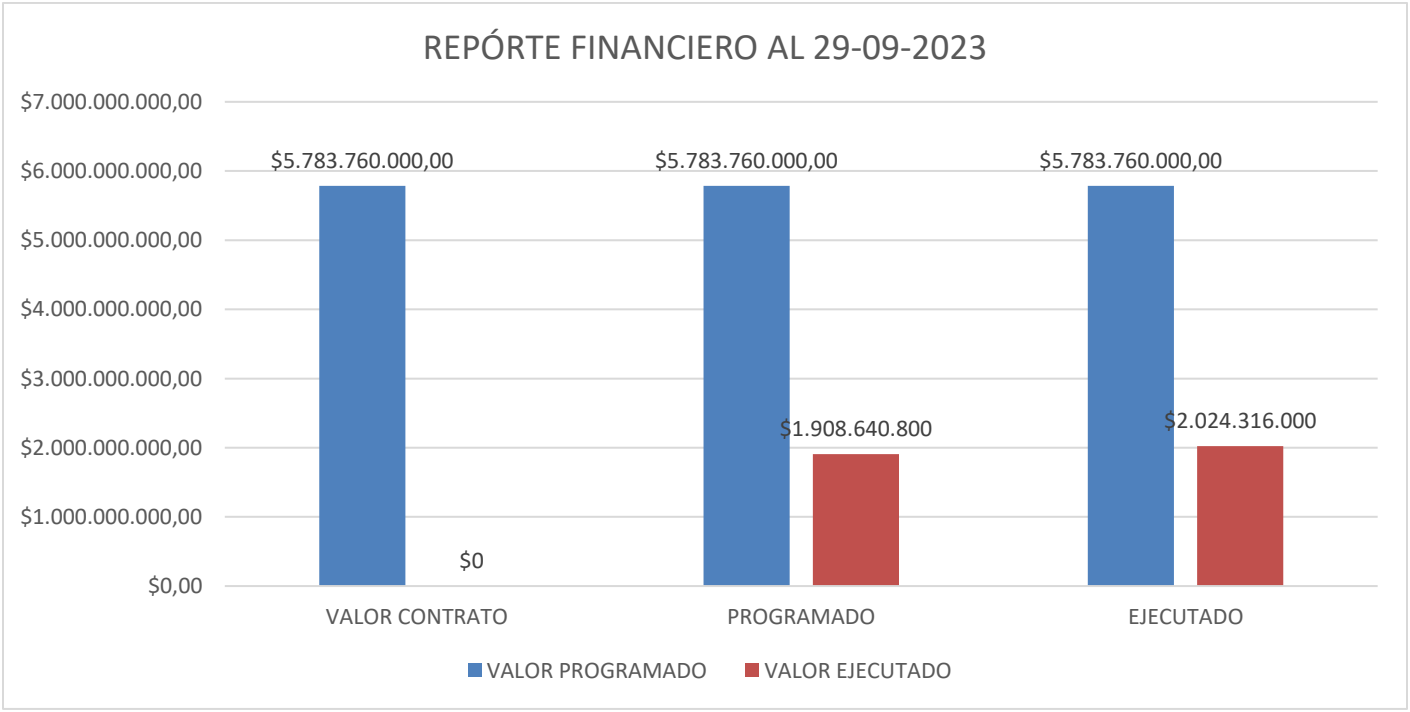

COINCO	COMPONENTE TÉCNICO GRUPO 2
	INFORME TÉCNICO MENSUAL No 3

RELACIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE.

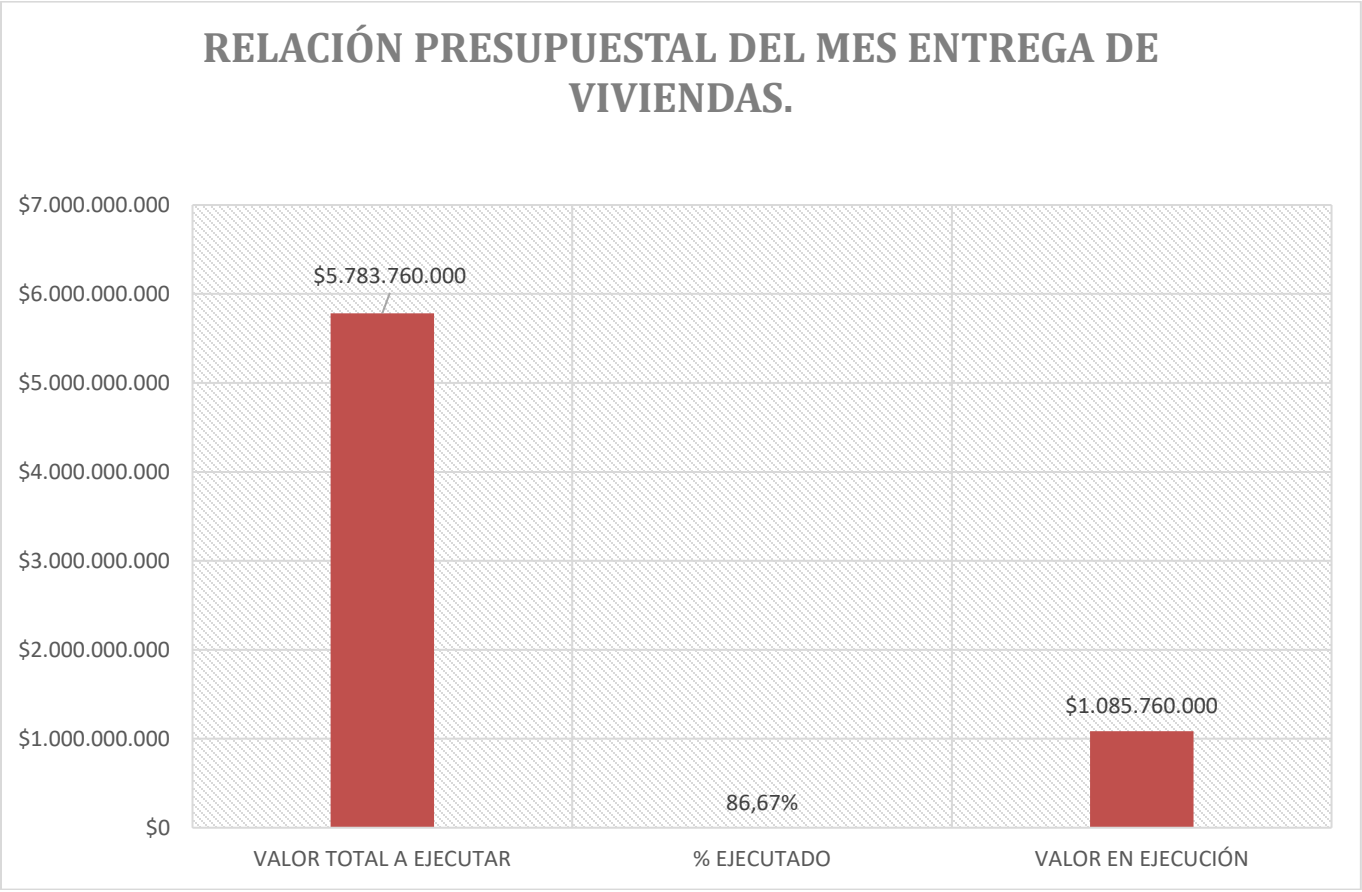

Con respecto a los eventos programados para el mes de septiembre, es de relevancia subrayar que se procederá con la entrega de un número de viviendas, concretamente un total de 52 unidades. Este no solo refleja nuestro continuo compromiso con la ejecución del proyecto.

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**

INFORME SOCIAL MENSUAL No 3
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha: 30-09-2023	**Periodo:** Del 1 al 30 de septiembre de 2023		**Informe:** No.3
	Proyecto: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022		
Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT			**Contrato No.:** 915 DE 2023

DATOS DEL PROYECTO	
N.º CONTRATO	915 DE 2023
OBJETOS	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 – 2021.
CONTRATISTA	CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA COINCO SAS
INTERVENTORÍA	ANZA INGENIERIA SAS BIC

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA: 3

1.CONVOCATORIAS A SOCIALIZACIONES. 3

2.ALISTAMIENTO SOCIALIZACIONES. 3

3.EJECUCIÓN SOCIALIZACIONES. 4

4.ALISTAMIENTO VALIDACIONES 5

5.CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL 5

6.APERTURAS 5

6.1 APERTURA NO EFECTIVA 8

7.SEGUIMIENTOS RELEVANTES 9

8.ATENCIÓN PQRS 66

9.ENTREGAS 67

..... 70

10.ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 70

11.HISTORIAS DE VIDA 71

12.ALERTAS (Conflictos, anomalías y análisis de causas). 73

13.RENUNCIAS..... 74

14.CONSOLIDADO MES 3 74

***15.CONSOLIDADO FINAL** 75*

COINCO	**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
	INFORME SOCIAL MENSUAL No 3 **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA:

1.CONVOCATORIAS A SOCIALIZACIONES.

Durante el periodo en mención se desarrollaron las siguientes actividades:

Teniendo en cuenta el número de beneficiarios entregados por Secretaria Distrital del Hábitat, se conforman un grupo, pensando en la atención a la población en términos de calidad y tiempos.

BENEFICIARIOS PARA CONVOCAR PARA LA SOCILIZACIÓN INICIAL		
GRUPO	**DESARROLLO**	**NUMERO DE BENEFICIARIOS A CONVOCAR**
1	USME	1
	SAN CRISTOBAL SUR	89
TOTAL		**90**

Posteriormente se realiza contacto con dignatario de la Junta de Acción Comunal del barrio Puerta al Llano, el señor Pedro Gómez al número de contacto 3103025356 con el fin de solicitar el préstamo del Salón Comunal para el día 26 de septiembre del 2023 con el fin de realizar la socialización inicial del proyecto de Mejoramiento de Vivienda., quien confirma la disponibilidad del lugar, en el horario de 9:00 am a 1:00pm
Confirmado el lugar para el encuentro, se realiza convocatoria telefónica a cada uno de los beneficiarios; durante el establecimiento de contacto se desarrolla presentación del profesional, motivo de la llamada, invitación a la actividad, información de día, hora, fecha y lugar. Es importante resaltar que con los beneficiarios que no se logró el contacto telefónico se envió correo certificado a la dirección registrada, con la información necesaria y oportuna para la participación en el ejercicio. Y en cuanto a la beneficiaria de Usme, se le brindo toda la información, haciendo la salvedad que si tenia dificultades para el desplazamiento se realizaría la socialización de manera personalizada en la vivienda.

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA.			
GRUPO	**NÚMERO DE BENEFICIARIOS A CONVOCAR**	**NÚMERO DE LLAMADAS EFECTIVAS**	**NÚMERO DE CORREOS CERTIFICADOS**
1	1 Usme	1	0
	89 San Cristóbal	87	2
TOTAL	**90**	**88**	**2**

2.ALISTAMIENTO SOCIALIZACIONES.

Desde el componente social se preparan los recursos tecnológicos y materiales para el desarrollo de la reunión, entre esos se encuentran:

- Contratación de medios tecnológicos visuales y de sonido.
- Alistamiento de refrigerios para comunidad y colaboradores.
- Elaboración de ficha metodológica.
- Distribución de funciones.

- Alistamiento de papelería requerida (listados de asistencia comunidad, listados de asistencia profesionales)
- Recursos materiales

3.EJECUCIÓN SOCIALIZACIONES.

Posterior a la convocatoria se realizan la socialización inicial de la siguiente manera:

PROGRAMACION SOCIALIZACION INICIAL				
GRUPO	**FECHA**	**LUGAR**	**HORA**	**ASISTENTES**
1	26/09/2023	SALÓN COMUNAL SAN JOSE SUR ORIENTAL -CALLE 42 SUR # 8 A 28 ESTE	9:30 am	75 beneficiarios y/o autorizados

Teniendo en cuenta la tabla anterior se destaca la participación en las socializaciones iniciales de 75 beneficiarios de 90 personas convocadas, representando un porcentaje de asistencia del 81%.



Es importante resaltar que, de las inasistencias, no incluyen a las beneficiarias con quienes no se pudo establecer comunicación telefónica y a las cuales se les envió correo certificado; ya que se presentaron al encuentro.





4.ALISTAMIENTO VALIDACIONES

Durante el periodo en mención no se desarrollaron actividades de este tipo.

5.CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL

Durante el periodo no se realizaron caracterizaciones

VALIDACIONES						
Nº	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA VALIDACIÓN**	**OBSERVACIONES**

6.APERTURAS

Durante las aperturas en cada una de las visitas ; en primera instancia se realiza presentación de los profesionales de los componentes técnico y social de interventoría y contratista, así como al maestro encargado de la obra, posteriormente se retroalimenta la información brindada en la socialización inicial , en procura de que haya claridad frente al alcance y la corresponsabilidad de cada uno de los actores; adicionalmente se da a conocer la carta del trato digno a través de la generación de un espacio reflexivo, orientado al respeto y el conducto regular a seguir en caso de situaciones que se puedan presentar. Por otra parte, el componente técnico informa cada una de las actividades a ejecutar en la vivienda, basados en el presupuesto y haciendo claridad frente a la estructura de costos (75% costos directos y 25% costos indirectos) igualmente se aclara la posibilidad de que el presupuesto este sujeto a cambios por improvistos de obra, se firman los documentos respectivos (Acta de inicio. presupuesto inicial, carta del trato digno, MEDEVAC y bitácora) y se orienta frente al proceso inicial de ejecución. Por último, se entrega la bitácora, haciendo hincapié en la importancia de él buen uso y cuidado de esta, además de informar sobre el punto de atención al ciudadano.

APERTURAS USME						
Nº	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
1	MV_00710	KR 7 H ESTE 103 26 SUR	EL PORTAL II ETAPA	LILIA DORIS COMETA FLOR	01/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
2	MV_00547	DG 98C SUR 8-80 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ISABEL LOPEZ VELA	4/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
3	MV_00812	CL 105 SUR 7H-61 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	SANDRA MARINA TRIANA VILLAMARIN	4/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
4	MV_00730	CL 103 SUR 7H 71 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE EMILIO FIRIGUA BASTIDAS	5/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
5	MV_00635	CL 103 SUR 7H 96 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	OVEIMAR PEDRAZA VILLALOBOS	6/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario

6	MVAL_00873	CALLE 104 SUR 8D 17 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LUZ DARY YUSUNGUAIRA NIETO	6/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
7	MVAL_00874	CALLE 104 SUR 8D 23 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LIBIA MARISOL SIERRA PIÑEROS	6/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
8	MVAL_00877	KR 8 F ESTE 104 27 SUR	EL PORTAL II ETAPA	BERENICE ESCOBAR HERNANDEZ	6/09/2023	Se realiza visita de apertura la cual es recibida por autorizado de la beneficiaria, el señor Ciro Lancheros de parentesco conyugue
9	MVAL_00513	DG 98B SUR 8 10 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA ADELAIDA ZAMUDIO CUERVO	8/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
10	MVAL_00891	KR 8 C ESTE 102 -28 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIELA HERNADEZ ROJAS	8/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
11	MV_00620	DG 99A SUR 8-08 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ROGELIO ARIAS VASQUEZ	11/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
12	MVAL_02785	CL 109 SUR 9 67 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	ANA DEICY PACHON ARANDIA	11/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
13	MV_03030	CL 111A SUR 9 47 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	BLANCA MIRYAN VALENCIA MEDINA	11/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
14	MV_00519	DG 98 A SUR 8-11 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ELISERIO OSPINA VASQUEZ	12/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
15	MVAL_00850	KR 8 F ESTE 104 06 SUR	EL PORTAL II ETAPA	JUAN DAVID ALFONSO GALINDO	12/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
16	MV_02861	CL 111A SUR 8A 68 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	LUIS CARLOS VARGAS	12/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
17	MV_00629	DG 99 SUR 8-51 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	DAGOBERTO LOPEZ AGUDELO	13/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
18	MV_00599	DG 99 SUR 8 14 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ANDREA MARIA REY CRUZ	13/09/2023	Se realiza visita de apertura la cual es recibida por autorizado de la beneficiaria, el señor Santiago Isaac Portela de parentesco hijo
19	MV_00587	CL 102 SUR 8 36 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	EDUIN JAVIER VILLALOBOS BERNAL	13/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
20	MV_00508	DG 98B SUR 8-40 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MADELAINE LARA GUZMAN	13/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria

21	MV_00500	DG 98B SUR 8 72 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIELINA CRUZ CANTE	13/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
22	MV_00693	CL 104 SUR 7H 66 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ALFONSO BALLESTEROS	13/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
23	MV_00752	CL 105 SUR 7H 54 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JORGE DE JESUS PALACIO	13/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
24	MV_00791	CL 105 A SUR 7H 70 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA GLADYS ZARATE	14/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
25	MVAL_00890	KR 8C ESTE 102 -34 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA INES YARA YAIMA	15/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
26	MVAL_00879	KR 8 F ESTE 105 09 SUR	EL PORTAL II ETAPA	JOHN ALEXANDER PARRA BLANCO	18/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
27	MVAL_00851	CALLE 104 SUR 8F 15 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LEYDI PAOLA ATUESTA GUARIN	18/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
28	MV_00770	CL 104 SUR 7H-35 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LIDIA TRIANA GUERRERO	19/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
29	MV_03129	CL 112A SUR 8C 14 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	JESUS MARIA PULIDO BERNAL	19/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
30	MV_00558	DG 98C SUR 8-28 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	RUBEN DARIO VANEGAS PEREZ	20/09/2023	Se realiza visita de apertura la cual es recibida por autorizada del beneficiario, la señora Viviana Paola Linares de parentesco conyugue
31	MVAL_00932	KR 8C ESTE 102 13 SUR	EL PORTAL II ETAPA	SEGUNDO ANTONIO CRUZ MENDOZA	20/09/2023	Se realiza visita de apertura la cual es recibida por autorizada del beneficiario, la señora María Celina Flórez de parentesco conyugue
32	MVAL_00849	KR 8 F ESTE 104-12 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ERIKA PAOLA CASTILLO MOLINA	21/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
33	MV_00774	CL 104 SUR 7H 43 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	DAVID MENDEZ RADA	22/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
34	MV_00511	DG 98B SUR 8 18 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MESIAS SOTO DIAZ	25/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
35	MVAL_00966	KR 8 A ESTE 102 - 04 SUR	EL PORTAL II ETAPA	FLOR MARIA RICO COLMENARES	26/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria

36	MV_14696	KR 7D ESTE 98B 61 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA BERTHA BETANCOURT DE PADILLA	27/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
37	MV_00758	CL 105 SUR 7H 24 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	TERESA MORALES CARO	27/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
38	MV_00632	DG 99 SUR 8-61 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	GILBERTO VILLALOBOS	29/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
39	MV_00624	DG 99 SUR 8 27 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	OBED CARREÑO VELANDIA	29/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
40	MV_14698	CL 105 SUR 7H 04 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	NEFTALI SASTOQUE NIÑO	29/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
41	MV_00569	DG 98B SUR 8 17 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	SEGUNDA HILDA ARCILA PARDO	29/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
APERTURAS CIUDAD BOLIVAR						
42	MVBF_1455	CL 74B SUR 27B 24	BELLA FLOR	FLOR HERELIA ESCOBAR VARGAS	26/09/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria





6.1 APERTURA NO EFECTIVA

APERTURA NO EFECTIVA BELLA FLOR						
Nº	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA VALIDACIÓN**	**OBSERVACIONES**

1	MVBF_00097	KR 26F 75A 63 SUR	BELLA FLOR	MARIA ESPERANZA BELTRAN	56/09/2023	Se realiza acercamiento a la vivienda con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos; sin embargo, en el marco de la apertura la beneficiaria refiere no entender el proceso, pese a las explicaciones realizadas y consignadas en actas por dos profesionales, adicionalmente se encuentra construyendo un muro en área de patio, en consecuencia, no se realiza apertura y se generan nuevos compromisos.



7.SEGUIMIENTOS RELEVANTES

Durante el periodo se realizaron los siguientes seguimientos

SEGUIMIENTOS						
Nº	**ID_DMV**	**DIRECCION**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
1	MVAL_00497	DG 98B SUR 8 88 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ALIRIO TOLOZA HERRERA	01/09/2023	Se lleva a cabo seguimiento de la vivienda con acompañamiento del beneficiario, durante la visita el componente técnico social evidencia ejecución de obra en actividad de pañete habitaciones 3 y 4. Por parte del beneficiario se presenta

						inconformidad por el retraso en las obras, se generan compromisos orientados en términos de tiempos y alcance. Finaliza la semana con avance del 12%
2	MV_00533	DG 98A SUR 8-65 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ORLANDO FORERO AGUILAR	01/09/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica que falta arreglar filo de puerta de baño e instalar puerta de habitación 1, el beneficiario se encuentra en la vivienda y no reporta novedad. Finaliza semana con avance al 95%
3	MV_00543	DG 98A SUR 8 91 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	FLORENTINO GELVEZ QUEVEDO	01/09/2023	En la visita de seguimiento se evidencia personal de obra, en actividad, se identifica Instalación de puerta en baño, se finalizó enchape de hall y zona de lavado piso y pared, se encuentra en actividad aplicación de vinilo en zona de lavado en el primer piso. No se reporta novedad por parte del beneficiario. Finaliza semana con avance del 85%
4	MV_00535	DG 98A SUR 8 71 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ELVIRA SUAREZ RODRIGUEZ	01/09/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en: Enchape de piso en todas las áreas a intervenir con respectiva boquilla. Queda pendiente instalación de cielo raso en habitación 3. Se encuentra el personal de obra y la beneficiaria no se reporta novedad. Finaliza la semana con avance del 95%
5	MVAL_01007	CLL 102 SUR 8C 14 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	GUILLERMO ENRIQUE MURILLO LOZANO	01/09/2023	Se realiza seguimiento por parte del componente técnico y social, el beneficiario se encuentra en la vivienda y refiere conformidad con relación a las actividades ejecutadas. Está pendiente la instalación de puerta en habitación 3. Finaliza semana con avance del 90%
6	MVAL_00925	KR 8B ESTE 102 38 SUR	EL PORTAL II ETAPA	CRUZ ELENO LEUDO	01/09/2023	Se realiza visita de seguimiento técnico social en donde se evidencian las siguientes

						actividades faltantes: Instalación de puerta en habitación (1) y en el baño. El beneficiario se encuentra en la vivienda y no reporta novedades en bitácora. Finaliza semana con avance del 90%
7	MVAL_00974	KR 8B ESTE 102 51 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA AMPARO AROCA TIQUE	01/09/2023	Se lleva a cabo el seguimiento de la vivienda en compañía de la beneficiaria quien estará al tanto de la ejecución de la obra. Durante la visita el componente técnico social evidencia material en vivienda (enchape y cemento). Se realiza modificación en actividades respecto a; cambió de cielo raso en habitaciones por piso en sala y comedor primer piso, con firma a conformidad de las partes y registro en bitácora, Finaliza semana con avance del 5%
8	MVAL_00958	CL 104 SUR 8 A 12 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	NANCY CLEOTILDE GIRALDO BEDOYA	01/09/2023	Se realiza visita de seguimiento por parte del contratista e interventoría, la beneficiaria se encuentra en la vivienda. El mesón cuenta con enchape culminado, en cuanto a zona de lavado se encuentra con enchape y pintura. Se denota personal de obra en actividad de instalación de cielo raso en habitación (2). La interventoría solicita la preparación de muro antes de la aplicación de. vinilo en paredes. Observación: se solicita retiro de electrodoméstico TV ya que no se responde por algún daño. Se solicita movilizar el cableado eléctrico por instalación de cielo raso. Firma a conformidad las partes. Finaliza semana con avance del 65%
9	MVAL_00882	CALLE 104 SUR 8 C 12 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	GLORIA ESPERANZA DELGADO RODRIGUEZ	01/09/2023	Se lleva a cabo visita en la vivienda con acompañamiento de la beneficiaria, se observan actividades desarrolladas en su

						totalidad, se está ejecutando cielo raso en baño. No se reportan novedades
10	MV_00670	CL 102 SUR 8-17 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	FABIOLA PADILLA MENJURA	01/09/2023	Se realiza recorrido técnico y social, en el que se evidencia labores en instalación de enchape de cocina, pintura en área de baño y subsanaciones solicitadas en cubierta. Finaliza semana con avance del 75%
11	MVAL_00662	CL 102 SUR 7H 13 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	NELSON MARTINEZ GONZALEZ	01/09/2023	En seguimiento se evidencia terminación n ejecución piso de la sala y zona de ropas, enchape en el baño, así como construcción y pañete del muro en mampostería de la habitación, instalación de cielo raso y pintura. El beneficiario refiere conformidad con las actividades desarrolladas. Finaliza semana con avance del 92%
12	MV_00663	CL 102 SUR 7H-17 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA ISABEL ARBOLEDA BARAHONA	01/09/2023	Se realiza seguimiento en el que se evidencia, alistamiento del piso y pañete en general, enchape de baño y cocina. Falta boquilla, otra mano de pintura. No se presentan novedades desde el área social. Finaliza semana con avance del 85%
13	MV_00660	KR 7H ESTE 102-20 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA DEL CARMEN ACOSTA LOPEZ	01/09/2023	Se realiza seguimiento en donde se evidencian trabajos en pañete de hall. Sin novedades desde el área social. Finaliza semana con avance del 10%
14	MV_00646	CL 103 SUR 7H-62 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	NORBERTO BETANCOURTH JARAMILLO	01/09/2023	Se realiza seguimiento en donde se evidencia que faltan instalación de cielo raso de baño cocinas, sala y hall, además de remates y boquilla en algunas zonas, El beneficiario no refiere inconformidades, ni inquietudes. Finaliza semana con avance del 87%
15	MV_00746	CL 105 SUR 7H 74 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA DEL TRANSITO RODRIGUEZ DE VALENCIA	01/09/2023	Se realiza seguimiento en el que se evidencia enchape en el área de baño y habitación 2, enchape en el segundo piso,

						pañete y pintura en el Hall de segundo piso. No se presentan novedades desde el área social. Finaliza semana con avance del 70%
16	MV_00816	CL 105 SUR 7H 77 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LUZ ADRIANA RODRIGUEZ MARTINEZ	01/09/2023	Se realiza seguimiento social y técnico en el que se evidencia enchape de los pisos de habitación y zonas húmedas, placa de zona de ropas, instalación de cielo raso, y mampostería perimetral. Falta rematar pintura y boquilla. La beneficiaria refiere conformidad hasta el momento. Finaliza semana con avance del 91%
17	MV_00837	CL 105A SUR 7H 33 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE EDILSON MARTINEZ ROCHA	01/09/2023	Se realiza seguimiento en el que se evidencia construcción de entrepaño del mesón; lijado de los muros de la habitación 1 en proceso. El beneficiario está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 50%
18	MVAL_00997	KR 8B ESTE 104 65 SUR	EL PORTAL II ETAPA	HELENA JACINTA BAEZ ROJAS	01/09/2023	Se realiza seguimiento en el que se evidencia lavamanos instalado; lavaplatos instalado; pintura completa en el hall y cocina; cielo raso instalado y pintura en la parte superior del baño; sobre piso terminado en la habitación 2. la beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 70%
19	MVAL_00945	KR 8B ESTE 104 32 SUR	EL PORTAL II ETAPA	RAFAEL OCTAVIO SARMIENTO BEJARANO	01/09/2023	Se realiza seguimiento en el que se evidencia cielo raso instalado en el baño; enchape del piso en proceso, en la habitación 3. en la habitación 3 solo se hará el enchape del piso, al ser la última actividad que permite el presupuesto, no se hará la intervención en la cocina, debido a que la cocina integral está anclada al piso y a la pared y al intentar moverla es posible que se dañe el mueble, adicionalmente, se le aclara a la autorizada que no se

						instalará la puerta en el baño por ser metálica anclada al muro, está actividad se reemplazó por refuerzos metálicos en perfiles para la cubierta en la zona posterior. De acuerdo con inquietud del beneficiario, se le aclara que se incluirá un codo y se adecuará la canal, para que pueda desaguar frente a la vivienda y no sobre la vivienda vecina del costado derecho. Finaliza semana con avance del 95%
20	MVAL_00904	KR 8 C ESTE 104 - 60 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ANA DELIA PIÑEROS CRUZ	01/09/2023	Se realiza seguimiento en donde se evidencia pañete en la habitación 3 finalizado y pañete en proceso en la sala comedor y en el baño. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 20%
21	MV_00907	KR 8C ESTE 104 50 SUR	EL PORTAL II ETAPA	GLADYS ESTELA URREGO	01/09/2023	Se realiza seguimiento en donde se evidencia demolición del enchape de piso en la habitación 1; pañete de los muros del baño en proceso y desmonte del lavadero. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 15%
22	MVAL_00905	KR 8 C ESTE 104 - 54 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ALBA YOLANDA LOPEZ VEGA	01/09/2023	Se realiza seguimiento en donde se evidencia enchape de los muros del baño en proceso; pañete de los muros de la cocina. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 15%
23	MV_00016	DG 100B SUR 6F 19 ESTE	NUEVO PORVENIR	GENARO HERNADEZ TRUJILLO	01/09/2023	Sin novedad por parte del beneficiario, expresa conformidad con el avance de la obra. Con relación a la instalación de la nueva cubierta, el beneficiario indica que por el momento no se ha presentado filtraciones de agua. Finaliza semana con avance del 80%
24	MV_00621	KR 8 ESTE 99-18 SUR	EL PORTAL II ETAPA	YANETTE GUZMAN	4/09/2023	El área técnica realiza revisión de actividades; indicando que

						falta la instalación de lavadero, y subsanación instalación en tabletas cocas. Sin novedad con relación a las actividades ejecutadas. Finaliza con avance del 95%
25	MVAL_00904	KR 8 C ESTE 104 - 60 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ANA DELIA PIÑEROS CRUZ	4/09/2023	Se evidencia pañete de los muros del baño en proceso. La beneficiaria y su esposo solicitan que no se cambie el enchape del piso en las dos habitaciones y en el hall; se aclara que en la apertura del 28 de agosto se socializaron las actividades y el presupuesto en presencia del autorizado, quien estuvo de acuerdo y firmó los documentos a satisfacción, posteriormente, el hogar revisó la bitácora y consideró que dicho enchape se encuentra en buen estado por tener poco tiempo de ser instalado (aproximadamente 8 años), por esta razón, prefieren que se cambie la actividad, de ser posible por el cielo raso en la habitación 3. se aclara que el programa se enfoca en la intervención de los espacios completos y no por partes, aun así, la solicitud es reiterada por la beneficiaria, la cual entrará en revisión y en la próxima visita se brindará una respuesta.
26	MV_00779	CL 104 SUR 7H 65 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA DELCY VILLANUEVA CANO	4/09/2023	Se hace acercamiento al predio por parte del contratista e interventoría, la beneficiaria se encontraba en la visita. Se evidencia material constructivo. La beneficiaria refiere estar conforme con las actividades adelantadas hasta el momento y manifiesta que ha mantenido buena comunicación con el personal de obra.
27	MVAL_00984	KR 8A ESTE 104 24 SUR	EL PORTAL II ETAPA	NUBIA ESPERANZA LOPEZ GUARIN	4/09/2023	Se evidencia enchape de los muros de la cocina en proceso; pañete terminado en los muros

						del baño. Por medio de contacto telefónico, se solicita nuevamente a la beneficiaria el corte de la puerta de la fachada, para proceder con la intervención en la sala comedor.
28	MVAL_00958	CL 104 SUR 8 A 12 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	NANCY CLEOTILDE GIRALDO BEDOYA	4/09/2023	Se realiza visita de seguimiento por parte del contratista e interventoría, la beneficiaria no se encuentra en la vivienda. Se evidencia zona de lavado con pared enchapada, baño culminado con aparato sanitario instalado enchape terminado, zona de cocina culminado, habitación 2 con cielo raso se evidencia enchape general en vivienda.
29	MV_00750	CL 105 SUR 7H 60 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LEYDI YOHANA VEGA LOPEZ	4/09/2023	Atiende la visita la beneficiaria. Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría, se observa personal y materiales en el predio. La beneficiaria refleja conformidad, no indica dudas e inquietudes.
30	MV_00804	CL 105 SUR 7H-27 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA DEL PILAR TIQUE	4/09/2023	La beneficiaria no se encontraba en el predio. Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría, se observa persona en actividades de enchape de cocina. La beneficiaria no se encuentra en el predio.
31	MV_00660	KR 7H ESTE 102-20 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA DEL CARMEN ACOSTA LOPEZ	4/09/2023	Se hace seguimiento por parte técnica y social del contratista e interventoría, se observa materiales en el predio. La beneficiaria refiere conformidad hasta el momento; se observa avance significativo. Los maestros no se encontraban en el predio, sin embargo, la señora María refiere que han laborado continuamente
32	MV_00710	KR 7 H ESTE 103 26 SUR	EL PORTAL II ETAPA	LILIA DORIS COMETA FLOR	4/09/2023	Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría, se observa personal y materiales en el predio. La

						beneficiaria refiere conformidad hasta el momento
33	MVAL_00954	KR 8C ESTE 104 21 SUR	EL PORTAL II ETAPA	LUCELY VELASCO ORTEGA	4/09/2023	Se evidencia pañete de los muros en proceso, en el baño 2.se indica a la beneficiaria que en el punto fijo se instalará teja traslúcida, que permitirá la entrada de luz
34	MV_00652	CL 103 SUR 7 H 40 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ENERIO LINARES AMAYA	4/09/2023	Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría. Se observa personal de obra en el predio ejecutando actividades de enchape en área de baño. El beneficiario no se encontraba en la vivienda
35	MV_00837	CL 105A SUR 7H 33 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE EDILSON MARTINEZ ROCHA	4/09/2023	Se evidencia, puerta instalada en la habitación 1 y en el baño; cielo raso instalado en el baño, cocina y en sala comedor; aplicación de pintura completa en las habitaciones, muros de la escalera y del hall; enchape del mesón en proceso; preparación del muro en la zona del taller. Los beneficiarios compraron un tragaluz en policarbonato que fue instalado como parte del cielo raso.
36	MVAL_00997	KR 8B ESTE 104 65 SUR	EL PORTAL II ETAPA	HELENA JACINTA BAEZ ROJAS	4/09/2023	Se evidencia enchape del piso terminado con guarda escoba en la habitación 2, además de pintura e instalación del cielo raso; encoroce de la sala comedor en proceso. Se evidencia que parte del piso de la sala comedor está vacío, por consiguiente, se pondrá relleno para estabilizar el piso y corregir el nivel para enchapar, este relleno irá en la esquina derecha del espacio hacia la cocina. La beneficiaria está conforme con las obras.
37	MVAL_00976	KR 8 A ESTE 105 A 22 SUR	EL PORTAL II ETAPA	GLORIA STELLA AYALA RATIVA	4/09/2023	Se evidencia instalación completa de la cubierta en la cocina, construcción del mesón en proceso; enchape completo de los muros en el baño, con boquilla, también se evidencia

						la puerta instalada. La beneficiaria está conforme con las obras.
38	MVAL_00974	KR 8B ESTE 102 51 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA AMPARO AROCA TIQUE	5/09/2023	Se lleva a cabo l seguimientos de la obra el cual es atendido por la, beneficiaria quien estará al tanto de la ejecución de la obra. Durante la visita el componente técnico social, se evidencia avance de obra en las siguientes actividades: Demolición y alistado de enchape en sala comedor y se adelanta actividad tramo sanitario baño tercer nivel y demolición de enchape zona de lavado.
39	MVAL_00497	DG 98B SUR 8 88 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ALIRIO TOLOZA HERRERA	5/09/2023	Se lleva a cabo seguimiento de obra el cual es atendido por el beneficiario. Durante la visita el componente técnico social, de contratista e interventoría, se evidencian actividades en: Modificación en presupuesto acordé a las siguientes actividades, estuco en paredes por cielo raso en PVC en habitaciones. Se hace salvedad que no se efectuará garantía por filtración de agua en cubierta.
40	MVAL_00962	KR 8 A ESTE 103 06 SUR	EL PORTAL II ETAPA	JOSE DEL CARMEN MARTINEZ ROCHA	5/09/2023	Se lleva a cabo el seguimiento de la obra en compañía del beneficiario, quien estará al tanto de la ejecución. Durante la visita el componente técnico evidencia personal de obra en la vivienda efectuando actividades relacionadas con: pañete de habitación 1, avance de demolición en mesón y enchape de cocina
41	MVAL_00882	CALLE 104 SUR 8 C 12 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	GLORIA ESPERANZA DELGADO RODRIGUEZ	5/09/2023	Se lleva a cabo visita de seguimiento con atención de la beneficiaria. Se observan actividades desarrolladas en su totalidad respecto, sin embargo, está pendiente recoger sobrante de material y herramienta y se deja

						anotación en bitácora con relación algunos remates para cierre de actividades.
42	MV_00543	DG 98A SUR 8 91 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	FLORENTINO GELVEZ QUEVEDO	5/09/2023	En la visita de seguimiento por parte de contratista e interventoría se reporta novedad por parte del beneficiario dado que fue cubierto el sifón de baño y de zona de lavado. Por lo tanto, la interventoría solicita; dejar sifones funcionales (baño y zona de lavado y realizar remates para cierre de obra.
43	MV_00746	CL 105 SUR 7H 74 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA DEL TRANSITO RODRIGUEZ DE VALENCIA	6/09/2023	Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría, se observa personal en actividades de terminación de enchape de zona de ropas. La beneficiaria no se encontraba en el momento de la visita, pero se observa avance significativo.
44	MV_00837	CL 105A SUR 7H 33 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE EDILSON MARTINEZ ROCHA	6/08/2023	Se evidencia puerta instalada en la habitación 2 y en el hall de acceso; enchape terminado del mesón, cielo raso instalado en la cocina y en el taller; pintura en los muros de la sala comedor; resanes y pintura en los muros del taller. El beneficiario está conforme con las obras.
45	MVAL_00904	KR 8 C ESTE 104 - 60 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ANA DELIA PIÑEROS CRUZ	6/09/2023	Se evidencia enchape de los muros del baño en proceso; alistado del piso en la zona social. debido al alistado del piso, se evidencia que el enchape quedará al nivel de la claraboya. Se especifican las actividades que se ejecutarán, teniendo en cuenta el ajuste en el presupuesto, de acuerdo, a la solicitud de los beneficiarios de no cambiar el enchape de las habitaciones y del hall: instalación de cielo raso y estuco en la habitación 3, instalación de puertas en la

						habitación 1 y 2.La semana finaliza con avance del 55%
46	MV_00016	DG 100B SUR 6F 19 ESTE	NUEVO PORVENIR	GENARO HERNADEZ TRUJILLO	6/09/2023	Se realizo revisión previa, con hallazgo de subsanación de las siguientes actividades: instalación de la puerta de baño, ajustar lavamanos y realizar cuchilla central de la cubierta. Sin novedad por parte del beneficiario, expresa conformidad con el avance de la obra. Finaliza semana con avance del 95%
47	MVAL_00997	KR 8B ESTE 104 65 SUR	EL PORTAL II ETAPA	HELENA JACINTA BAEZ ROJAS	6/09/2023	Se evidencia enchape del piso terminado con guarda escoba y pintura, en la sala comedor; sanitario instalado. Se realiza guarda escoba retrocedido del muro en la sala, para abrir la tubería sanitaria expuesta. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 95%
48	MV_00488	KR 8 ESTE 98C 07 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ROSA MARIA LEGUIZAMON MARTINEZ	6/09/2023	Avance de obra en demolición de enchape de piso, y mesón en área de cocina; instalación de enchape de mesón y piso; pañete de muros y alistado de piso en zona de lavado; adecuación de punto hidráulico en cocina. Sin novedad por parte de la beneficiaria, expresa conformidad con el avance de la obra.
49	MV_00604	DG 98C SUR 8 39 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LUIS ALBERTO ROMERO ORTIZ	6/09/2023	Avance en actividades en enchapes de mesón, muros y piso de cocina; instalación de cielo raso en habitación 3, cocina y baño; aplicación de pintura en habitación 3. Se realiza recomendación a los beneficiarios de no utilizar el escombro en la vía pública. Finaliza semana con avance del 70%
50	MV_00560	DG 98C SUR 8-20 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	FLOR ALBA MARTINEZ ROCHA	6/09/2023	Avance en actividades en enchapes de mesones y muros de cocina; distribución de redes de suministro de agua y desagüe en baño y zona de lavado; pañete de muros en

						baño y zona de lavado. Al momento de la visita no se encontraba la beneficiaria en el predio.
51	MV_00552	DG 98C SUR 8-50 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ANGELINO MARTINEZ ROCHA	6/09/2023	Avance en actividades en demolición de mesón y construcción de nuevo mesón; construcción de placa en sobre piso de cocina; enchape de mesón e inicio de enchape de muros en cocina; enchape de piso e instalación de cielo raso en habitación 1; instalación de estructura para cielo raso en baño. Al momento de la visita, no se encontraba la persona autorizada por el beneficiario en el predio.
52	MV_00548	DG 98C SUR 8 76 ESTE	PORTAL II	JORGE ENRIQUE GARCIA SANCHEZ	6/09/2023	Avance en actividades en terminación de enchapes en habitación 1 y 2; aplicación de estuco en habitación 1 y 2; enchapes de muros en baño y en piso; construcción de mesón, enchape de muros en cocina y alistado de piso en cocina. La autorizada reporta conformidad con el personal de obra asignado y con las actividades ejecutadas hasta el momento. Por otro lado, el área técnica informa a la autorizada que por los temas de humedad existentes en la vivienda no se garantizara que estas se mitiguen a pesar de las preparaciones de muros que se realizaron para la aplicación de estuco y pintura.
53	MV_00547	DG 98C SUR 8-80 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ISABEL LOPEZ VELA	6/09/2023	Alistado de pisos en cocina y zona social; no se puede ingresar a la vivienda, por la actividad de alistado de piso realizado por el personal operativo.
54	MVAL_00984	KR 8A ESTE 104 24 SUR	EL PORTAL II ETAPA	NUBIA ESPERANZA LOPEZ GUARIN	6 /09/2023	Se evidencia muros de la cocina enchapados; enchape de los muros y del piso del baño, en proceso. Se recuerda lo descrito en el acta firmada por la beneficiaria, en la que se

						explicó que las condiciones físicas del predio se evidenciaron en su totalidad, una vez iniciada la obra y debido a que el hogar desocupó todos los espacios; por las divisiones en drywall y materiales livianos y al cerramiento artesanal de la zona posterior, no fue posible constatar las condiciones del terreno aledaño a la vivienda. teniendo en cuenta la necesidad del cambio de cubierta, de construir el muro lateral y de mejorar los espacios de baño y cocina, además, de que la beneficiaria aclara que en los 28 años que ha vivido en este lugar no se han presentado emergencias como desprendimiento de material de la montaña, se continúa con el mejoramiento. La beneficiaria realizó el corte de la puerta de la fachada y se terminó de alistar el piso de la sala comedor. La beneficiaria está conforme con las obras.
55	MV_00746	CL 105 SUR 7H 74 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA DEL TRANSITO RODRIGUEZ DE VALENCIA	6/09/2023	Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría, se observa personal y materiales en el predio. La beneficiaria observa avance significativo en la ejecución de obra. Finaliza semana con avance del 96%
56	MV_00836	CL 105A SUR 7H 27 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ABADIAS MENDEZ RADA	6/09/2023	Se evidencia enchape del muro bajo el mesón. la interventoría solicita que se terminen las actividades con relación al encoroce en los muros perimetrales y subsanar el acabado de la pintura, así como la limpieza de todos los espacios. El beneficiario dispondrá del tiempo para que el personal de obra culmine con las actividades. Se programar la entrega de obra

57	MV_00478	KR 7D ESTE 98B 51 SUR	EL PORTAL II ETAPA	BELARMINA MALES	7/09/2023	Se instalo la puerta pendiente, se tomó el registro fotográfico final, para la liberación de espacios. La beneficiaria se encuentra a la espera de la entrega del mejoramiento de vivienda. 100%
58	MV_00670	CL 102 SUR 8-17 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	FABIOLA PADILLA MENJURA	7/09/2023	Atiende la visita el autorizado. Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría, no se observa personal de obra, por terminación de actividades La familia refleja conformidad, sin embargo, se indica que la parte técnica hará revisión minuciosa del presupuesto para verificar que se haya ejecutado la totalidad del mejoramiento de vivienda. Se programa entrega para la siguiente semana
59	MV_00730	CL 103 SUR 7H 71 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE EMILIO FIRIGUA BASTIDAS	7/09/2023	Se hace seguimiento por parte técnica y social del contratista e interventoría, se observa materiales en el predio. El beneficiario refiere conformidad. Finaliza semana con avance del 10%
60	MV_00652	CL 103 SUR 7 H 40 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ENERIO LINARES AMAYA	7/09/2023	Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría. Se observa personal de obra en el predio y avance en pañete, alistado de piso y enchape de cocina y ropas. El beneficiario no se encontraba en la vivienda. Finaliza semana con avance del 60%
61	MV_00660	KR 7H ESTE 102-20 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA DEL CARMEN ACOSTA LOPEZ	7/09/2023	Se hace seguimiento por parte técnica y social del contratista e interventoría, se observa materiales en el predio. La beneficiaria refiere conformidad hasta el momento; se observa avance significativo. La señora María refiere que han laborado continuamente los maestros. Finaliza semana con avance del 50%
62	MV_00652	CL 103 SUR 7 H 40 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ENERIO LINARES AMAYA	7/09/2023	Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría.

						Se observa personal de obra en el predio y avance en pañete, alistado de piso y enchape de cocina y ropas. El beneficiario no se encontraba en la vivienda. Finaliza semana con avance del 60%
63	MV_00710	KR 7 H ESTE 103 26 SUR	EL PORTAL II ETAPA	LILIA DORIS COMETA FLOR	7/09/2023	Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría componentes técnico y social, se observa personal y materiales en el predio, así como actividades en cuchillas e instalación de perfilería metálica y pañete La beneficiaria no se encontraba en la vivienda. Finaliza semana con avance del 40%
64	MV_00779	CL 104 SUR 7H 65 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA DELCY VILLANUEVA CANO	7/09/2023	Se hace acercamiento al predio por parte del contratista e interventoría, la beneficiaria se encontraba en la visita. Se evidencia material constructivo. La beneficiaria Refiere estar conforme con las actividades adelantadas hasta el momento a saber pañete, pintura y enchape en general. Finaliza semana con avance del 90%
65	MV_00652	CL 103 SUR 7 H 40 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ENERIO LINARES AMAYA	7/09/2023	Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría. Se observa personal de obra en el predio y avance en pañete, alistado de piso y enchape de cocina y ropas. El beneficiario no se encontraba en la vivienda. Finaliza semana con avance del 60%
66	MV_00812	CL 105 SUR 7H-61 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	SANDRA MARINA TRIANA VILLAMARIN	7/09/2023	La beneficiaria se encontraba en el predio. Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría, se observa personal ejecutando actividades de cubierta y materiales en la vivienda. La señora Sandra manifiesta un interrogante técnico el cuál es resuelto. Finaliza semana con avance del 40%

67	MV_00804	CL 105 SUR 7H-27 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA DEL PILAR TIQUE	7/09/2023	La beneficiaria no se encontraba en el predio. Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría, se observa personal ejecutando actividades de enchape en baño y zona de ropas. Finaliza semana con avance de
68	MV_00750	CL 105 SUR 7H 60 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LEYDI YOHANA VEGA LOPEZ	7/09/2023	Atiende la visita la beneficiaria. Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría, se observa personal en actividades de enchape y pintura. La beneficiaria refleja conformidad, no indica dudas ni inquietudes. Finaliza semana con avance del 80%
69	MV_00560	DG 98C SUR 8-20 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	FLOR ALBA MARTINEZ ROCHA	8/09/2023	Afinado de pañetes de patio 1 y hall. Se realiza claridad de actividades nuevamente y recomendaciones orientadas a la no intervención de redes eléctricas. Finaliza semana con avance del 30%
70	MV_00552	DG 98C SUR 8-50 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ANGELINO MARTINEZ ROCHA	8/09/2023	Avance en actividades de terminación de enchapes de muros en cocina; enchape de piso en hall, demolición de enchape de piso en baño y enchape nuevo, instalación de cielo raso en baño; instalación de combo sanitario. A solicitud del beneficiario se realiza la liberación de espacios en habitación 1 para adecuación de enceres, adicionalmente solicita la no instalación de cielo raso en cocina. Finaliza semana con avance del 70%
71	MV_00548	DG 98C SUR 8 76 ESTE	PORTAL II	JORGE ENRIQUE GARCIA SANCHEZ	8/09/2023	Avance en demolición de enchape de piso en sala comedor; finalización de estuco y pintura en habitación 1 y 2; instalación de cielo raso en habitación 1 y 2; enchapes de piso en cocina; instalación de combo sanitario. El área técnica realiza liberación de espacio en habitación 2 para movimiento de enceres. El beneficiario se encuentra

						realizando actividades en lijado de muros por estuco existente en la vivienda. Finaliza semana con avance del 60%
72	MV_00547	DG 98C SUR 8-80 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ISABEL LOPEZ VELA	8/08/2023	Avance en actividades en alistado de piso en habitación 1 y 2 e instalación de enchapes; demolición de enchape en mesón e inicio de enchape; alistado de piso en zona de lavado. Al momento de la visita no se encontraba la beneficiaria en el predio. Finaliza semana con avance del 20%
73	MVAL_00497	DG 98B SUR 8 88 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ALIRIO TOLOZA HERRERA	8/08/2023	Durante visita de seguimiento se evidencia pañete en habitaciones y cocina, adicionalmente se está ejecutando el mesón. El Beneficiario no presenta novedades. Finaliza semana con avance del 20%
74	MVAL_00962	KR 8 A ESTE 103 06 SUR	EL PORTAL II ETAPA	JOSE DEL CARMEN MARTINEZ ROCHA	8/089/2023	Durante visita de seguimiento se evidencia pañete en habitación, hall, cocina comedor y baño. Sin novedades desde el área social. Finaliza semana con avance del 15%
75	MVAL_00974	KR 8B ESTE 102 51 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA AMPARO AROCA TIQUE	8/09/2023	Durante visita de seguimiento se evidencia enchapé de piso en sala comedor, zona de lavado, se está ejecutando el mesón y se está pañetando el baño. No se presentan dudas, ni inquietudes con relación a la ejecución de las obras, ni aspectos sociales. Finaliza semana con avance del 20%
76	MV_00837	CL 105A SUR 7H 33 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE EDILSON MARTINEZ ROCHA	8/09/2023	Se evidencia finalización de las actividades de estuco y pintura en todos los espacios intervenidos. Se realiza la liberación de los espacios, ya que, los beneficiarios requieren acomodar sus enseres, aunque se recomienda cuidar los acabados. la autorizada solicita acelerar la ejecución de las actividades faltantes y

						programar la entrega del mejoramiento, por la preocupación de perder su trabajo. Finaliza la semana con avance del 90%
77	MVAL_00976	KR 8 A ESTE 105 A 22 SUR	EL PORTAL II ETAPA	GLORIA STELLA AYALA RATIVA	8/09/2023	se evidencia enchape del mesón en proceso; muros enchapados de la cocina y alistado del piso. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 90%
78	MVAL_00984	KR 8A ESTE 104 24 SUR	EL PORTAL II ETAPA	NUBIA ESPERANZA LOPEZ GUARIN	8/09/2023	Se evidencia pañete en los muros del hall y de la sala; enchape de los muros, piso y del mesón completos, en la cocina; enchape de los muros del baño en proceso; primera capa de pintura en los muros de la sala. la beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance de 75%
79	MV_00907	KR 8C ESTE 104 50 SUR	EL PORTAL II ETAPA	GLADYS ESTELA URREGO	8/09/2023	Se evidencia enchape del piso terminado en hall; enchape del piso de la habitación en proceso; sanitario instalado. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 35%
80	MVAL_00954	KR 8C ESTE 104 21 SUR	EL PORTAL II ETAPA	LUCELY VELASCO ORTEGA	8/09/2023	Se evidencia instalación de la cubierta en proceso; pañete de los muros de las habitaciones, en proceso. los beneficiarios proyectan aprovechar el espacio entre las cubiertas, para instalar una ventana que provea de luz natural a los baños y punto fijo. Se le aclara a la beneficiaria que no se pueden hacer obras paralelas durante la ejecución del mejoramiento, dado que, el hogar propone adecuar unos perfiles para ubicar la canal; se revisará la canal de desarrollo 50, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y las condiciones físicas del espacio, para así definir la instalación de este elemento. se genera el

						compromiso de comunicar al contratista y al personal de obra, cualquier novedad relacionada con la ausencia de los beneficiarios por citas médicas, que pueda pausar las obras. Finaliza la semana con avance del 40%
81	MVAL_00912	KR 8 C ESTE 104 - 20 SUR	EL PORTAL II ETAPA	CARLOS JULIO PARRA BLANCO	8/09/2023	Se evidencia en la zona de ropas, pañete terminado en los muros e instalación de la cubierta en proceso. El beneficiario está conforme con las obras.
82	MVAL_00905	KR 8 C ESTE 104 - 54 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ALBA YOLANDA LOPEZ VEGA	8/09/2023	Se evidencia enchape del piso terminado en la habitación; enchape del piso en la cocina, en proceso y construcción del mesón en proceso; instalación de la cubierta en proceso. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 50%
83	MVAL_00497	DG 98B SUR 8 88 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ALIRIO TOLOZA HERRERA	11/09/2023	Se lleva a cabo seguimiento de la vivienda, durante el ejercicio no se encuentra el beneficiario. Se evidencian actividades de enchape de piso en zona de ropas enchape de piso en muro de baño, enchape de muro en cocina con su respectiva cenefa, pintura en habitación 3 y 4.
84	MVAL_00962	KR 8 A ESTE 103 06 SUR	EL PORTAL II ETAPA	JOSE DEL CARMEN MARTINEZ ROCHA	11/09/2023	Se lleva a cabo seguimiento de la vivienda en compañía del beneficiario. Durante la visita el componente técnico evidencia personal de obra en la vivienda efectuando actividades relacionada con instalación de teja arquitectónica con respectiva teja traslúcida y pañete en hall, baño y cocina. El beneficiario no refiere inquietudes ni inconformidades
85	MV_00488	KR 8 ESTE 98C 07 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ROSA MARIA LEGUIZAMON MARTINEZ	11/09/2023	Avance de obra en encoroce perimetral de muros; dintel de ventana e instalación de bajante de aguas lluvias. Sin

						novedad por parte de la beneficiaria, expresa conformidad con el avance de la obra.
86	MVAL_00974	KR 8B ESTE 102 51 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA AMPARO AROCA TIQUE	11/09/2023	Se lleva a cabo el seguimiento de la vivienda en compañía de la beneficiaria, quien estará al tanto de la ejecución de la obra. Se evidencia avance de obra en las siguientes actividades en demolición y alistado de enchape en sala comedor se adelanta ejecución de enchape de piso en baño y cocina y enchape de muro en baño, cocina y zona de lavado.
87	MVAL_00513	DG 98B SUR 8 10 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA ADELAIDA ZAMUDIO CUERVO	11/09/2023	Se lleva a cabo el seguimiento de la vivienda, atiende visita familiar autorizado, se observa; demolición de piso en hall y habitaciones alistado de piso en habitación tres (3) ejecución de pañete en hall, se encuentra personal de obra y material para ejecución
88	MV_00635	CL 103 SUR 7H 96 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	OVEIMAR PEDRAZA VILLALOBOS	11/09/2023	Se hace seguimiento por parte de la interventoría y contratista. Se observa personal de obra en el predio ejecutando actividades se dan claridades frente a actividad de enchape en zona de lavado, cielo raso en habitaciones y baño. El beneficiario no se encontraba en la vivienda.
89	MV_00750	CL 105 SUR 7H 60 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LEYDI YOHANA VEGA LOPEZ	12/09/2023	Atiende la visita la beneficiaria. Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría, no se observa personal ni materiales en el predio, 3debido a culminación de actividades. Se le indica a que aun hacen falta algunos pendientes los cuales debe culminar el personal constructivo. Se programa entrega
90	MV_00016	DG 100B SUR 6F 19 ESTE	NUEVO PORVENIR	GENARO HERNADEZ TRUJILLO	12/09/2023	Falta la instalación de la puerta y remates de cuchilla. Sin novedad por parte del beneficiario, expresa

						conformidad con el avance de la obra.
91	MV_00812	CL 105 SUR 7H-61 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	SANDRA MARINA TRIANA VILLAMARIN	12/09/2023	a beneficiaria se encontraba en el predio. Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría, se observa personal ejecutando actividades y materiales en la vivienda. La señora Sandra manifiesta estar de acuerdo con las obras hasta el momento. Se programa entrega
92	MV_00804	CL 105 SUR 7H-27 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA DEL PILAR TIQUE	12/09/2023	Atiende la visita la beneficiaria. Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría, se observa personal y materiales en el predio. La beneficiaria refleja conformidad con las labores constructivas. Se programa entrega
93	MVAL_00904	KR 8 C ESTE 104 - 60 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ANA DELIA PIÑEROS CRUZ	12/09/2023	Se evidencia enchape de los muros y del piso finalizado en el baño; estuco completo en la habitación y en proceso enchape del piso. La beneficiaria está conforme con las obras.
94	MVAL_00954	KR 8C ESTE 104 21 SUR	EL PORTAL II ETAPA	LUCELY VELASCO ORTEGA	12/09/2023	Se evidencia instalación completa de la cubierta; muros en proceso de afinación del pañete en las habitaciones. se verifica que la canal de menor desarrollo no cabe en el espacio dispuesto y los beneficiarios harán cambios a mediano plazo, por ende, se instalará la canal sobre la cubierta existente con perfiles soportados sobre ladrillos que fueron instalados por los beneficiarios; se les aclara que la garantía por este elemento se limita a inconvenientes por filtraciones o daños en la canal y no por fallas en el ladrillo. La beneficiaria refiere que, durante las lluvias fuertes presentadas, no se

						evidenciaron goteras ni movimiento de las tejas.
95	MV_00907	KR 8C ESTE 104 50 SUR	EL PORTAL II ETAPA	GLADYS ESTELA URREGO	12/09/2023	Se evidencia lavadero listo para su instalación; enchape del piso de la habitación 1 completo, está pendiente la aplicación de boquilla; alistado del piso de la cocina en proceso y mesón en construcción; instalación completa de la cubierta. La beneficiaria está conforme con las obras.
96	MV_00710	KR 7 H ESTE 103 26 SUR	EL PORTAL II ETAPA	LILIA DORIS COMETA FLOR	12/09/2023	Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría componentes técnico y social, se observa personal y materiales en el predio. La beneficiaria no se encontraba en la vivienda. Finaliza semana con avance del 85%
97	MV_00547	DG 98C SUR 8-80 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ISABEL LOPEZ VELA	12/09/2023	Avance en actividades de finalización enchape de mesón; enchape de piso en cocina, hall, zona social; inicio de estuco en general. Se le informa a la beneficiaria que, aunque se realizó la preparación de muros para la aplicación de estuco, se evidencia humedad existente. Por otro lado, se recomienda la liberación de espacios en la zona de lavado para ejecutar actividades.
98	MV_00548	DG 98C SUR 8 76 ESTE	PORTAL II	JORGE ENRIQUE GARCIA SANCHEZ	12/09/2023	Avance en actividades en Instalación cielo raso en sala comedor. Frente a inquietud, se realiza claridad al beneficiario y a la familia que la zona de las escaleras no será intervenida.
99	MV_00552	DG 98C SUR 8-50 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ANGELINO MARTINEZ ROCHA	12/09/2023	Avance en actividades en enchapes de piso en habitación 2; enchape de piso en sala comedor; preparación de muros en habitación 2 para aplicación de pintura; instalación de boca puertas. La autorizada no manifiesta inconformidad referente a la ejecución de la obra.

100	MVAL_00877	KR 8 F ESTE 104 27 SUR	EL PORTAL II ETAPA	BERENICE ESCOBAR HERNANDEZ	12/09/2023	Se evidencia enchape completo de los muros del baño; enchape del piso del hall y de la sala comedor en proceso; enchape del piso terminado en la habitación 2 y muro pañetado. El autorizado no se encuentra por estar en una cita médica con la beneficiaria. se generó el compromiso de no dejar la bitácora bajo llave, además, en la próxima visita se le explicará nuevamente el presupuesto ante inconformidades por no ejecutar actividades que solicita, pero que sobrepasan el monto asignado.
101	MVAL_00912	KR 8 C ESTE 104 - 20 SUR	EL PORTAL II ETAPA	CARLOS JULIO PARRA BLANCO	12/09/2023	Se evidencia enchape del piso de la zona de ropas en proceso y cubierta instalada. El beneficiario estucó los muros de la zona de ropas en ausencia del maestro, (domingo), antes del proceso de pintura.
102	MVAL_00874	CALLE 104 SUR 8D 23 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LIBIA MARISOL SIERRA PIÑEROS	12/09/2023	Se evidencian muros pañetados de las habitaciones y del hall; se completó la mampostería en todos los muros. La beneficiaria solicitó cambiar la actividad de demolición del muro, construcción y enchape del mismo por el enchape del mesón únicamente y que este presupuesto se emplee en la instalación de cielo raso en una habitación, por consiguiente, se le aclara que las actividades no tienen los mismos valores y no se pueden equilibrar presupuestalmente. se acuerda revisar el presupuesto para brindarle una respuesta concreta.
103	MVAL_00905	KR 8 C ESTE 104 - 54 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ALBA YOLANDA LOPEZ VEGA	12/09/2023	Se evidencia enchape del muro de la cocina terminado y enchape del mesón en proceso; instalación completa de la cubierta. La beneficiaria está conforme con las obras.

104	MV_00560	DG 98C SUR 8-20 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	FLOR ALBA MARTINEZ ROCHA	12/09/2023	Avance en actividades en alistado de piso en cocina, sala y comedor, hall, e inicio de enchape de piso en hall, alistado de piso en habitación 1 y patio 1. No se presentan novedades por parte de la beneficiaria.
105	MV_00730	CL 103 SUR 7H 71 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE EMILIO FIRIGUA BASTIDAS	12/09/2023	se hace seguimiento por parte técnica y social del contratista e interventoría, se observa materiales en el predio. El beneficiario no estaba en el momento de la visita.
106	MV_00660	KR 7H ESTE 102-20 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA DEL CARMEN ACOSTA LOPEZ	13/09/2023	Se hace seguimiento por parte técnica y social del contratista e interventoría, no se observa materiales en el predio ni maestros. La beneficiaria no estaba en el predio. La parte técnica revisará las actividades para verificar que la vivienda se encuentre lista para la entrega. Finaliza semana con avance del 85%
107	MV_00488	KR 8 ESTE 98C 07 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ROSA MARIA LEGUIZAMON MARTINEZ	13/09/2023	Se realiza acercamiento a la vivienda, sin embargo, no es posible el ingreso, debido a a que la beneficiaria no se encontraba en el predio. Finaliza semana con avance del 90%
108	MVAL_00974	KR 8B ESTE 102 51 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA AMPARO AROCA TIQUE	13/09/2023	Se lleva a cabo el seguimiento de la vivienda en compañía de la beneficiaria quien estará al tanto de la ejecución de la obra. Durante la visita del componente técnico social se evidencia avance de obra en las siguientes actividades: Demolición y alistado de enchape en sala comedor, enchape muro cocina, enchape de muro en baño con bordillo de la ducha con respectiva cenefa, pendiente boquilla. En dialogo con la beneficiaria persiste con preguntas relacionadas a otras actividades (arreglos) y está

						llevando a cabo obra simultánea, con el personal de obra. Por ende, se le notifica que no puede llevar a cabo actividades por su cuenta mientras estemos ejecutando la vivienda, así como llegar acuerdos con los maestros para otras adecuaciones.
109	MVAL_00984	KR 8A ESTE 104 24 SUR	EL PORTAL II ETAPA	NUBIA ESPERANZA LOPEZ GUARIN	13/09/2023	Se evidencia pintura de los perfiles en proceso; aplicación de la boquilla en cocina y sala. La beneficiaria está conforme con las obras.
110	MV_03030	CL 111A SUR 9 47 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	BLANCA MIRYAN VALENCIA MEDINA	13/09/2023	Se evidencia demolición del lavadero; alistado de piso en proceso, en el hall y las habitaciones. durante la obra se evidenció que el lavadero existente está roto, de acuerdo con solicitud de la beneficiaria y a revisión del presupuesto se cambiará el enchape del piso del baño por un lavadero, aclarando que este piso tiene condiciones aceptables para mantenerlo. Sé constata que la beneficiaria desocupó la mayoría de los espacios, excepto en la sala comedor donde se ubica, un armario, una lavadora y una nevera.
111	MVAL_00976	KR 8 A ESTE 105 A 22 SUR	EL PORTAL II ETAPA	GLORIA STELLA AYALA RATIVA	13/09/2023	Enchape del mesón y del piso en la cocina finalizado; pintura completa en los muros exteriores del baño y de la parte superior del enchape de los muros en la cocina; guarda escoba en el borde del vacío. A beneficiaria está conforme con las obras. solicita que sea arreglado el borde de las escaleras, porque se desportillaron con el traslado y ubicación de los materiales. Se programa entrega
112	MV_00837	CL 105A SUR 7H 33 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE EDILSON MARTINEZ ROCHA	13/09/2023	Está en proceso la construcción de mochetas e instalación del lavadero. La autorizada requiere que la obra termine

						antes del 18 de septiembre, porque debe regresar a su trabajo. Finaliza semana con avance del 92%
113	MVAL_00962	KR 8 A ESTE 103 06 SUR	EL PORTAL II ETAPA	JOSE DEL CARMEN MARTINEZ ROCHA	13/09/2023	Se lleva a cabo seguimiento de la vivienda en compañía del beneficiario, durante la visita se evidencia personal de obra en la vivienda efectuando actividades relacionadas con ejecución del mesón, alistado de piso a intervenir, aplicación de vinilo en hall y habitaciones. No se presentan novedades
114	MVAL_00904	KR 8 C ESTE 104 - 60 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ANA DELIA PIÑEROS CRUZ	13/09/2023	se observa pañete de los muros en proceso, en la sala comedor; alistado del piso en las habitaciones; demolición del mesón en la cocina. Se evidencia que el hogar desocupó todos los espacios, para dar celeridad a las obras, aprovechando que en el segundo piso disponen del lugar para trasladar sus enseres.
115	MVAL_00497	DG 98B SUR 8 88 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ALIRIO TOLOZA HERRERA	13/09/2023	Se lleva a cabo seguimiento de la vivienda en presencia del beneficiario, durante la visita se evidencian actividades en: Boquilla en enchape en muro cocina, mesón finalizado y zona de lavado. No se presentan novedades en el área social.
116	MVAL_00513	DG 98B SUR 8 10 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA ADELAIDA ZAMUDIO CUERVO	13/09/2023	Se lleva a cabo visita de seguimiento, en anotación se identifican las siguientes Actividades: Aplicación de vinilo en habitación (3) y continúan en ejecución de pañete. La beneficiaria solicito la suspensión del sifón en zona de ropas, cubrimiento con enchape. La beneficiaria no se encuentra dentro de la vivienda firma el cónyuge a conformidad las partes.
117	MV_00560	DG 98C SUR 8-20 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	FLOR ALBA MARTINEZ ROCHA	14/09/2023	Avance en actividades de enchape de piso en habitación 1, cocina, hall. A solicitud de la beneficiaria se corre punto

						sanitario que afectaba el uso del aparato sanitario. Finaliza semana con avance del 60%
118	MVAL_00877	KR 8 F ESTE 104 27 SUR	EL PORTAL II ETAPA	BERENICE ESCOBAR HERNANDEZ	14/09/2023	Se evidencia enchape completo del piso en el hall y en la sala comedor; construcción del mesón en proceso. Pese a aclararle el alcance del presupuesto y las particularidades del programa, el autorizado insiste en que el presupuesto debe alcanzar para la intervención completa del baño, (cielo raso, enchapes, combo sanitario y puerta), además del cielo raso y puerta en la habitación, instalación de cubierta; se toma la decisión de pausar las obras mientras se solicita una visita de la SDHT. en la tarde, el beneficiario se comunicó con la profesional social, explicando que no quiere atrasos en la ejecución y que aceptará las actividades socializadas. Finaliza semana con avance del 50%
119	MV_00547	DG 98C SUR 8-80 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ISABEL LOPEZ VELA	14/09/2023	Avance en enchape de piso y muros en la zona de lavado; instalación de sanitario; instalación de cielo raso en sala comedor, habitación 1 y 2. Sin novedad por parte de la beneficiaria, expresa conformidad con el avance de la obra. Finaliza semana con avance del 75%
120	MVAL_00874	CALLE 104 SUR 8D 23 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LIBIA MARISOL SIERRA PIÑEROS	14/09/2023	Se evidencia afinado del pañete en las habitaciones. Se le confirma a la beneficiaria que se instalará el cielo raso en la habitación, a su vez, no se enchaparán completamente los muros a 1.80m y no se ampliará en l el mesón, de acuerdo con la solicitud de la beneficiaria. Finaliza semana con avance del 35%
121	MVAL_00912	KR 8 C ESTE 104 - 20 SUR	EL PORTAL II ETAPA	CARLOS JULIO PARRA BLANCO	14/09/2023	Se evidencia enchape del piso de la zona de ropas completo, muros pintados; remates de la

						boquilla. El beneficiario está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 55%
122	MVAL_00905	KR 8 C ESTE 104 - 54 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ALBA YOLANDA LOPEZ VEGA	14/09/2023	Se evidencia enchape del mesón terminado; puerta instalada en el baño; pintura completa en la habitación y la sala. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 95%
123	MVAL_00873	CALLE 104 SUR 8D 17 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LUZ DARY YUSUNGUAIRA NIETO	14/09/2023	Se evidencia instalación del enchape de los muros en proceso, en el baño. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 10%
124	MV_00552	DG 98C SUR 8-50 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ANGELINO MARTINEZ ROCHA	14/09/2023	Avance en actividades de estructura para instalación de cielo raso en habitación 2; enchape de piso en hall de acceso; aplicación de pintura en general. A solicitud de la autorizada se verifica la instalación y ubicación de la puerta del baño, ya que solicita el cambio de posición, desde el área técnica se indica que dicha ubicación obedece al tamaño del lavamanos y en consecuencia la funcionalidad de esta; ante la explicación la autorizada refiere conformidad. Finaliza semana con avance del 85%
125	MVAL_00904	KR 8 C ESTE 104 - 60 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ANA DELIA PIÑEROS CRUZ	14/09/2023	Se evidencia enchape del piso de la habitación 3 terminado; enchape del piso de la sala comedor en proceso. La beneficiaria solicita no instalar una baldosa contigua a la columna central del costado derecho, para pasar la instalación hidrosanitaria próximamente para una cocina integral, por consiguiente, se entrega la pieza. Finaliza semana con avance del 75%
126	MVAL_00954	KR 8C ESTE 104 21 SUR	EL PORTAL II ETAPA	LUCELY VELASCO ORTEGA	14/09/2023	Se evidencia afinación de pañetes en los muros del baño,

						en proceso; definición de lineales de la puerta. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 60%
127	MV_00548	DG 98C SUR 8 76 ESTE	PORTAL II	JORGE ENRIQUE GARCIA SANCHEZ	14/09/2023	Avance en actividades en pintura en general, terminación de enchapes de muro en baño. Se realiza preentrega por parte de interventoría. Finaliza semana con avance del 95%
128	MVAL_00850	KR 8 F ESTE 104 06 SUR	EL PORTAL II ETAPA	JUAN DAVID ALFONSO GALINDO	14/09/2023	Se evidencia enchape del mesón y enchape de los muros de la cocina en proceso. El beneficiario está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 20%
129	MV_00907	KR 8C ESTE 104 50 SUR	EL PORTAL II ETAPA	GLADYS ESTELA URREGO	14/09/2023	Se evidencia fundición del mesón de la cocina; pendiente la instalación del flanche en el costado derecho de la cubierta. La beneficiaria refiere que el vidrio que estaba fisurado en el portón de la fachada se terminó de romper a causa de la instalación de la cubierta y de la manipulación de materiales cerca de este. se verificará el registro fotográfico para evidenciar el estado del vidrio. Finaliza semana con avance del 60%
130	MVAL_00891	KR 8 C ESTE 102 -28 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIELA HERNADEZ ROJAS	15/09/2023	Se realiza seguimiento técnico social por parte de interventoría y contratista donde se identifica que en la vivienda se encuentra teja arquitectónica y perfiles para instalación, se evidencia actividad de pañete en zona de lavado y cocina, no se encuentran maestros en la vivienda y se deja en bitácora que por situación climática no se ha podido realizar cambio de cubierta. La beneficiaria no presenta novedad. Finaliza semana con avance del 12%
131	MVAL_00497	DG 98B SUR 8 88 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ALIRIO TOLOZA HERRERA	15/09/2023	Se realiza seguimiento técnico social por parte de

						interventoría y contratista donde se identifica zona de baño con combo sanitario instalado, enchapes de muro y piso culminados en zona de cocina y baño, se encuentra personal de obra realizando actividad de instalación de cielo raso, la interventoría solicita que se instale boca puerta en la zona qué divide el área del hall y cocina ya que se instaló un enchape de piso diferente. Se evidencia actividad de pintura en habitaciones. El beneficiario se encuentra en la vivienda y no reporta novedad. Finaliza semana con avance del 75%
132	MVAL_00962	KR 8 A ESTE 103 06 SUR	EL PORTAL II ETAPA	JOSE DEL CARMEN MARTINEZ ROCHA	15/09/2023	Se realiza seguimiento técnico social por parte de interventoría y contratista donde se identifica actividad de enchape en ejecución zona de cocina (poyo) y baño, se evidencia cielo raso instalado en habitación, la vivienda se encuentra con actividad de pintura y cubierta ya instalada. Hay personal de obra y el beneficiario no reporta novedad. Finaliza semana con avance del 75%
133	MVAL_00974	KR 8B ESTE 102 51 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA AMPARO AROCA TIQUE	15/09/2023	Se realiza seguimiento técnico social por parte de interventoría y contratista donde se identifica actividad de pintura en sala comedor e instalación de puertas en habitaciones 1 y 2, la zona de baño se encuentra con enchape de muro y piso al igual que la cocina y zona de lavado, falta actividad de boquilla. La beneficiaria consulta si existe la posibilidad de que los techos se pinten por lo que se le informa que la actividad no está contemplada en el presupuesto. Finaliza semana con avance del 60%

134	MVAL_00513	DG 98B SUR 8 10 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA ADELAIDA ZAMUDIO CUERVO	15/09/2023	Se realiza seguimiento técnico social por parte de interventoría y contratista donde se identifica personal de obra en la vivienda, instalación de tableta de piso en habitación 1 y 3 con actividad de pintura. No se reporta novedad. Finaliza semana con avance del 20%
135	MV_00519	DG 98 A SUR 8-11 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ELISERIO OSPINA VASQUEZ	15/09/2023	Se realiza seguimiento técnico social por parte de interventoría y contratista donde se identifica actividad de picado en piso y material para ejecución. El beneficiario reporta no estar de acuerdo con que el material ingresado en su vivienda sea trasladado ya que sugiere que ese le puede servir para otras intervenciones como la mejora de la escalera, se le informa que el contratista entrega una obra terminada y que el material que sobre puede ser retirado ya que se cumple con un presupuesto ejecutado, adicional se le informa que la zona de sala comedor no irá con cielo raso ya que se priorizaron las 4 habitaciones, además de recordar que se debe realizar un sobre piso para la instalación óptima de los enchapes ya que no lo consideraba necesario. Se firma a conformidad de la información todas las partes. Finaliza semana con avance del 5%
136	MV_00508	DG 98B SUR 8-40 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MADELAINE LARA GUZMAN	15/09/2023	Se realiza seguimiento técnico social por parte de interventoría, contratista y SDHT donde se dialoga con el señor Álvaro Alvear esposo de la beneficiaria MADELAINE LARA quien manifiesta no estar de acuerdo con que las actividades del presupuesto cubran solamente el área de la

						cocina, baño y cubierta, se le explica al señor que el presupuesto tiene un tope y que se conforma de un costo directo e indirecto por lo que se le priorizan espacios necesarios para la mejora de las condiciones de habitabilidad, también se aclara qué el material que quede de las actividades el contratista las puede retirar. Por otro lado, la beneficiaria y su esposo se comprometen a adecuar la parte hidráulica de la cocina para iniciar con intervenciones de esa área el lunes 18 de septiembre. El señor Álvaro Alvear manifiesta no querer ser autorizado para estar al tanto de las mejoras de la vivienda, pero si solicita qué el mesón quede en L y que le den tiempo para realizar la adecuación hidráulica en su casa a pesar de que este compromiso esta desde la fecha de validación. Finaliza semana con avance del 5%
137	MV_00652	CL 103 SUR 7 H 40 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ENERIO LINARES AMAYA	15/09/2023	Se realiza Preentrega casa 64. Se evidencian observaciones pendientes por subsanar, se le informa al maestro. Desde la parte social el beneficiario refiere conformidad con la ejecución de obras en la vivienda. Finaliza semana con avance del 90%
138	MV_00635	CL 103 SUR 7H 96 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	OVEIMAR PEDRAZA VILLALOBOS	15/09/2023	En visita de seguimiento se evidencia alistado de piso, pañete en perimetral de los muros de habitaciones y baño, demolición de enchape existente, construcción de poyo de lavadero y lavadora, y enchape de piso en habitaciones 1 y 2. No se presentan novedades desde el área social. Finaliza semana con avance del 35%

139	MV_00779	CL 104 SUR 7H 65 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA DELCY VILLANUEVA CANO	15/09/2023	Durante el seguimiento se evidencian remates pendientes para cierre de obra. Beneficiario conforme con las actividades realizadas. Finaliza semana con avance del 95%
140	MV_00629	DG 99 SUR 8-51 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	DAGOBERTO LOPEZ AGUDELO	15/09/2023	Avance en actividades de fundimiento de entrepaño en mesón y bordillo ducha. Sin novedad por parte del beneficiario, expresa conformidad con el avance de la obra. Finaliza la semana con avance del 5%
141	MV_02861	CL 111A SUR 8A 68 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	LUIS CARLOS VARGAS	15/09/2023	Muros pañetados de la habitación 1; en el baño se acomodó la tubería para mover los puntos y así, reacomodar los aparatos. en la ducha no se dejará el pollo, sino el espacio de ducha hundida para evitarle al beneficiario tropiezos. El beneficiario está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 15%
142	MVAL_00984	KR 8A ESTE 104 24 SUR	EL PORTAL II ETAPA	NUBIA ESPERANZA LOPEZ GUARIN	15/09/2023	Se evidencian enchapes finalizados del piso en la cocina y en la sala. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 85%
143	MVAL_00904	KR 8 C ESTE 104 - 60 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ANA DELIA PIÑEROS CRUZ	15/09/2023	Se evidencia pañete de los muros en proceso, en la sala comedor; alistado del piso en las habitaciones; demolición del mesón en la cocina. Beneficiarios conformes con las actividades desarrolladas hasta el momento. Finaliza semana con avance del 20%
144	MV_03030	CL 111A SUR 9 47 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	BLANCA MIRYAN VALENCIA MEDINA	13/09/2023	Se evidencia pañete de los muros de la cocina en proceso; alistado de los pisos finalizado en las habitaciones y el hall; demolición del enchape de la zona de ropas. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 20%
145	MVAL_00850	KR 8 F ESTE 104 06 SUR	EL PORTAL II ETAPA	JUAN DAVID ALFONSO GALINDO	18/09/2023	Durante la visita de seguimiento se evidencia

						enchape de los muros, del piso y del mesón completos en la cocina; enchape del piso del hall, en proceso, al igual que la pintura; enchape del piso terminado en la sala comedor con guarda escoba y muros pintados; enchape del piso terminado con guarda escoba y muros pintados en la habitación 1; pañete de los muros en proceso en la zona de ropas. el beneficiario refiere conformidad con las obras ejecutadas hasta el momento.
146	MVAL_00874	CALLE 104 SUR 8D 23 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LIBIA MARISOL SIERRA PIÑEROS	18/09/2023	Se evidencia pañete de los muros de todas las áreas y remates de los filos de los vanos; demolición del mesón. La beneficiaria está conforme con las obras.
147	MVAL_00890	KR 8C ESTE 102 -34 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA INES YARA YAIMA	19/09/2023	Se realiza seguimiento de obra durante la visita se evidencia inicio de actividades en enchape de piso sin terminar hall y habitaciones, se llevó a cabo el desmonte de la cubierta. La beneficiaria no refiere inconformidades
148	MV_00907	KR 8C ESTE 104 50 SUR	EL PORTAL II ETAPA	GLADYS ESTELA URREGO	19/09/2023	Se evidencia instalación del lavadero; pintura en proceso en el hall; enchape de los muros de la cocina en proceso y mesón construido; enchape completo del piso de la sala comedor .la beneficiaria está conforme con las obras.
149	MVAL_00904	KR 8 C ESTE 104 - 60 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ANA DELIA PIÑEROS CRUZ	19/09/2023	Durante la visita de seguimiento se indica a los beneficiarios que debido a que ellos compraron cielo raso en PVC para instalarlo en la sala comedor, no pueden ejecutarse obras de manera paralela, por ende, se genera el compromiso de guardar este material en el primer piso y disponer de este posterior a la entrega del mejoramiento. Por otra parte, se observa enchape del piso completo en la sala

						comedor y pintura de las habitaciones en proceso.
150	MVAL_00974	KR 8B ESTE 102 51 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA AMPARO AROCA TIQUE	19/09/2023	Se lleva a cabo el seguimiento de la vivienda en compañía de la beneficiaria quien estará al tanto de la ejecución de la obra. Durante la visita del componente técnico social. Se evidencia avance de obra en las siguientes actividades: Se realiza corrección en puertas con boquilla, habitaciones con vinilo culminadas, baño y cocina terminada.
151	MVAL_00891	KR 8 C ESTE 102 -28 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIELA HERNADEZ ROJAS	19/09/2023	Se realiza seguimiento, en el momento no se encuentra la beneficiaria. se observa avance desmonte de cubierta, levantamiento de cuchillas.
152	MV_00500	DG 98B SUR 8 72 ESTE	PORTAL II	MARIELINA CRUZ CANTE	19/09/2023	Se realiza visita de seguimiento en el que se evidencia: Instalación de perfilería de teja arquitectónica, instalación de canal, pañete en hall. Se encuentra personal y material de obra. No se presentan inconformidades.
153	MV_00508	DG 98B SUR 8-40 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MADELAINE LARA GUZMAN	19/09/2023	Durante la visita se evidencia que el beneficiario cumplió con las acometidas en cocina y adicional en actividad de pañete en baño e instalación de tubería hidrosanitaria. Se observa personal de obra y material. Finaliza semana con avance del 60%
154	MV_02861	CL 111A SUR 8A 68 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	LUIS CARLOS VARGAS	19/09/2023	El beneficiario está conforme con las obras en seguimiento se evidencia; afinado de los pañetes en el baño y en la habitación 1. en estos espacios se evidencia que los muros y las columnas se encontraban totalmente disparejos, por lo que posiblemente el enchape del baño no quedará uniforme, sino ligeramente inclinado.
155	MV_03030	CL 111A SUR 9 47 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	BLANCA MIRYAN VALENCIA MEDINA	19/09/2023	Se evidencia alistado del piso del hall y de habitaciones; pañete de los muros de la

						cocina terminado y alistado del piso en proceso. se aclara que no fue necesario modificar el punto hidrosanitario del lavaplatos, ya que, se mantuvo el desagüe y la llegada del agua en la vivienda. La beneficiaria está conforme con las obras.
156	MVAL_00984	KR 8A ESTE 104 24 SUR	EL PORTAL II ETAPA	NUBIA ESPERANZA LOPEZ GUARIN	19/09/2023	Durante la visita de seguimiento la beneficiaria refiere conformidad con las obras. Se evidencia enchape completo del mesón; enchape completo del piso de la sala comedor; pañete completo del muro del costado izquierdo. Finaliza semana con avance del 90%
157	MVAL_00873	CALLE 104 SUR 8D 17 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LUZ DARY YUSUNGUAIRA NIETO	19/09/2023	Se evidencia instalación de la cubierta en proceso; demolición del enchape en la cocina y desmonte del enchape decorativo del muro. La beneficiaria está conforme con las obras.
158	MVAL_02785	CL 109 SUR 9 67 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	ANA DEICY PACHON ARANDIA	19/09/2023	Se evidencia pañete de los muros en el baño; pañete de los muros en la cocina y construcción del mesón en proceso; enchape de los pisos en proceso de la sala comedor y de la habitación 2.la beneficiaria está conforme con las obras.
159	MVAL_00877	KR 8 F ESTE 104 27 SUR	EL PORTAL II ETAPA	BERENICE ESCOBAR HERNANDEZ	19/09/2023	Atendiendo la solicitud del autorizado se instalará cielo raso, puerta y combo sanitario en el baño, además, en la habitación 1 se instalará cielo raso y la habitación 2, quedará con enchape del piso y pintura, enchape completo del mesón; cambio de la cubierta completo y encoroce en proceso; pintura de la habitación 2.
160	MVAL_00912	KR 8 C ESTE 104 - 20 SUR	EL PORTAL II ETAPA	CARLOS JULIO PARRA BLANCO	19/09/2023	Se evidencia instalación completa de la cubierta en el segundo piso; instalación del cielo raso en la habitación y en el baño del segundo piso; en el primer piso, enchape de los

						muros de la zona de ropas. El beneficiario está conforme con las obras.
161	MVAL_00954	KR 8C ESTE 104 21 SUR	EL PORTAL II ETAPA	LUCELY VELASCO ORTEGA	19/09/2023	Se evidencia enchape completo del piso con guarda escoba en las dos habitaciones y pintura de los muros; enchape de los muros y del piso en los dos baños e instalación de sanitarios. Los beneficiarios hicieron un acabado en gravilla en las cabinas de los dos baños, en ausencia del maestro, debido a esta actividad, se les informa que el presupuesto se modificará levemente.
162	MV_00635	CL 103 SUR 7H 96 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	OVEIMAR PEDRAZA VILLALOBOS	21/09/2023	En visita no se encontraba el beneficiario en el predio, se evidencia alistado y enchape del piso, aplicación de pintura y se está terminando de instalar enchape de cocina y baño. Finaliza semana con avance del 70%
163	MV_00730	CL 103 SUR 7H 71 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE EMILIO FIRIGUA BASTIDAS	21/09/2023	En visita de seguimiento no se encontraba el beneficiario. En ejecución de obra falta terminar de rematar la vivienda en pintura, boquilla y cielo raso. Finaliza semana con avance del 86%
164	MVAL_00874	CALLE 104 SUR 8D 23 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LIBIA MARISOL SIERRA PIÑEROS	21/09/2023	Se evidencia enchape de los pisos en las habitaciones, en proceso. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 55%
165	MVAL_00873	CALLE 104 SUR 8D 17 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LUZ DARY YUSUNGUAIRA NIETO	21/09/2023	Se evidencia cubierta completamente instalada y encoroce en proceso; enchape del piso en el baño, instalación del combo sanitario; enchape de la cocina en proceso. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 65%
166	MV_00710	KR 7 H ESTE 103 26 SUR	EL PORTAL II ETAPA	LILIA DORIS COMETA FLOR	21/09/2023	En visita se le indica a la beneficiaria que dentro del mejoramiento de vivienda no se realizan intervenciones eléctricas; que estos trabajos

						son a cargo del beneficiario y que si llegan a realizar negociación con el personal operativo es bajo su propia responsabilidad. Se evidencia instalación de cubierta, enchape del baño y zona de ropas e instalación de combo y lavadero. Finaliza semana con avance del 86%
167	MVAL_00912	KR 8 C ESTE 104 - 20 SUR	EL PORTAL II ETAPA	CARLOS JULIO PARRA BLANCO	21/09/2023	Se evidencia instalación del cielo raso completo en el segundo piso. El beneficiario está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 95%
168	MV_00693	CL 104 SUR 7H 66 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ALFONSO BALLESTEROS	21/09/2023	En visita no se encontraba el beneficiario. Durante el seguimiento se evidencia enchape de piso y aplicación de pintura en la sala y comedor, enchape en el baño del primer piso. Finaliza semana con avance del 45%
169	MV_00752	CL 105 SUR 7H 54 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JORGE DE JESUS PALACIO	21/09/2023	En visita no se encontraba el beneficiario. Se pañeto y alistó el área de ropas y hall. Adicionalmente se instaló perfilería en cubierta. Finaliza semana con avance del 50%
170	MV_00791	CL 105 A SUR 7H 70 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA GLADYS ZARATE	21/09/2023	En visita de seguimiento se evidencia demolición de enchape de piso y paredes para los vanos, se da inicio al pañete y alistado de piso de habitaciones, cocina baño y zona de ropas Durante la visita no se encuentra la beneficiaria. Finaliza semana con avance del 30%
171	MV_03030	CL 111A SUR 9 47 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	BLANCA MIRYAN VALENCIA MEDINA	21/09/2023	Se evidencia construcción del mesón en proceso; enchape del piso de la sala comedor en proceso. Se evidencia que el hogar desmontó la escalera en madera, para permitir la intervención del piso en la sala comedor. Finaliza semana con avance del 40%
172	MVAL_00877	KR 8 F ESTE 104 27 SUR	EL PORTAL II ETAPA	BERENICE ESCOBAR HERNANDEZ	21/09/2023	Se evidencia encoroce en proceso; cielo raso instalado en

						la habitación 1. El autorizado refiere que se contactará con la SDHT después de la entrega del mejoramiento, para aclarar dudas en cuanto a los precios de los materiales. Finaliza semana con avance del 95%
173	MVAL_00851	CALLE 104 SUR 8F 15 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LEYDI PAOLA ATUESTA GUARIN	21/09/2023	Se evidencia preparación de los muros de la cocina para pañetar. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 5%
174	MVAL_00879	KR 8 F ESTE 105 09 SUR	EL PORTAL II ETAPA	JOHN ALEXANDER PARRA BLANCO	21/09/2023	Durante la visita de seguimiento el beneficiario manifiesta estar conforme con las obras. Se evidencia alistado de los muros para el proceso de pañete, en el baño. Finaliza semana con avance del 10%
175	MVAL_02785	CL 109 SUR 9 67 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	ANA DEICY PACHON ARANDIA	21/09/2023	Se evidencia enchape del piso completo en la sala comedor y en las habitaciones 1 y 2; pintura de todos los espacios en proceso; mesón en proceso de construcción. La beneficiaria está conforme con las obras. finaliza semana con avance del 60%
176	MVAL_00850	KR 8 F ESTE 104 06 SUR	EL PORTAL II ETAPA	JUAN DAVID ALFONSO GALINDO	21/09/2023	Durante la visita de seguimiento se evidencia cielo raso instalado en la habitación 1; enchape del piso del hall terminado; enchape del piso de la habitación 2 en proceso; cambio de cubierta terminado. El beneficiario está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 75%
177	MV_00508	DG 98B SUR 8-40 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MADELAINE LARA GUZMAN	22/09/2023	Se realiza visita técnico social en donde se evidencia personal de obra en la vivienda, avance en actividades de desmonte de cubierta, instalación de perfilería y pañete en cocina. En la zona del baño se denota instalación de tableta. Durante el seguimiento refiere la beneficiaria que requiere que el baño sea habilitado con urgencia por el número de

						personas que habitan en la vivienda
178	MV_00500	DG 98B SUR 8 72 ESTE	PORTAL II	MARIELINA CRUZ CANTE	22/09/2023	Se realiza visita de seguimiento en donde a solicitud de la beneficiaria no se lleva a cabo la cuchilla posterior, avance de actividad de cubierta nueva y canal con respectiva perfilería, pañete y estuco en hall. Finaliza semana con avance del 65%
179	MVAL_00513	DG 98B SUR 8 10 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA ADELAIDA ZAMUDIO CUERVO	22/09/2023	Se lleva a cabo visita de seguimiento, en la que se da respuesta a la consulta de la beneficiaria, orientada a los tiempos de ejecución; se expone que el mejoramiento tiene una duración de ejecución aproximada de 30 días, por lo tanto, estamos en los tiempos adecuados en pertinencia con el alcance y dinámica del mejoramiento. Se evidencia avance de obra; en enchape de baños y construcción de mesón en cocina. Finaliza semana con avance del 60%
180	MV_00519	DG 98 A SUR 8-11 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ELISERIO OSPINA VASQUEZ	22/09/2023	Se realiza seguimiento técnico social se dónde identifican actividades de obra en instalación de tableta en sala comedor, se encuentra personal de obra en la vivienda. Sin inquietudes, ni informidades por parte del beneficiario. Finaliza semana con avance del 8%
181	MVAL_00891	KR 8 C ESTE 102 -28 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIELA HERNADEZ ROJAS	22/09/2023	Se realiza seguimiento, en el momento no se encuentra la beneficiaria. se observa avance en instalación de cubierta. Finaliza semana con avance del 55%
182	MVAL_00890	KR 8C ESTE 102 -34 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA INES YARA YAIMA	22/09/2023	Se realiza seguimiento, en el que se observa avance en instalación teja arquitectónica enchapé de piso en hall y habitaciones. No se presentan novedades desde el área social. Finaliza semana con avance del 45%

183	MVAL_00932	KR 8C ESTE 102 13 SUR	EL PORTAL II ETAPA	SEGUNDO ANTONIO CRUZ MENDOZA	22/09/2023	Se realiza seguimiento en donde se evidencia asignación de trabajadores de obra e ingreso de material. Finaliza semana con avance del 3%
184	MV_02861	CL 111A SUR 8A 68 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	LUIS CARLOS VARGAS	22/09/2023	Durante el seguimiento el beneficiario refiere estar conforme con las obras. Se evidencia enchape del piso en proceso en la habitación 1 y alistado terminado. Finaliza semana con avance del 35%
185	MVAL_00904	KR 8 C ESTE 104 - 60 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ANA DELIA PIÑEROS CRUZ	22/09/2023	Se evidencia instalación del cielo raso en las tres habitaciones y en el baño; puerta en proceso de instalación en la habitación 2.la beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 85%
186	MV_00907	KR 8C ESTE 104 50 SUR	EL PORTAL II ETAPA	GLADYS ESTELA URREGO	22/09/2023	Se evidencia pintura de la sala comedor en proceso; enchape del piso de la cocina en proceso y enchape completo de los muros; filos terminados de la ventana de la cocina y de la columna. en la sala comedor bajo la escalera sobresale una viga en concreto, esta se rodeará para no dañar el elemento estructural que puede ser funcional para el hogar. La beneficiaria está conforme con la obra. Finaliza la semana con avance del 85%
187	MVAL_00954	KR 8C ESTE 104 21 SUR	EL PORTAL II ETAPA	LUCELY VELASCO ORTEGA	22/09/2023	Se evidencia instalación de las puertas en los baños y en las habitaciones; pintura completa de todos los muros. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 85%
188	MV_00620	DG 99A SUR 8-08 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ROGELIO ARIAS VASQUEZ	22/09/2023	Beneficiario conforme con la ejecución hasta la fecha, se le recomienda no realizar limpieza de zonas durante el desmonte de cubierta, se evidencia preparación de muros para instalación de enchape en cocina. Finaliza semana en avance del 30%

189	MV_00488	KR 8 ESTE 98C 07 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ROSA MARIA LEGUIZAMON MARTINEZ	22/09/2023	Desde la parte técnica se solicita subir los muros de la cocina y baño, se evidencia enchape existente en cocina además de la demolición de enchape en baño. La beneficiaria no se encuentra en la vivienda. Finaliza semana con avance del 95%
190	MV_00599	DG 99 SUR 8 14 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ANDREA MARIA REY CRUZ	22/09/2023	Desde la parte técnica se evidencia correcta instalación de cubierta. Actualmente se encuentra demolición de enchape en cocina, alistado de muros en baño para la instalación de enchape. Falta pintura general, enchape en cocina y baño. Desde la parte social se evidencia que la vivienda se encuentra deshabitada. Finaliza semana con avance del 40%
191	MV_00587	CL 102 SUR 8 36 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	EDUIN JAVIER VILLALOBOS BERNAL	22/09/2023	Desde la parte técnica se evidencia instalación de la mitad de la cubierta. Falta encorozar. Desde el parte social beneficiario solicita poner más tejas traslúcidas para dar más claridad al primer piso. Beneficiario conforme con la ejecución de la obra. Finaliza semana con avance del 25%
192	MV_00558	DG 98C SUR 8-28 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	RUBEN DARIO VANEGAS PEREZ	22/09/2023	Desde la parte técnica se evidencia que el beneficiario no ha realizado algunas actividades como reparar pared existente en la zona de cocina pues el muro se encuentra fracturado, se demolió un muro que desde la parte técnica se aconsejó no hacerlo pues era un muro de carga. Desde la parte social se le solicita al beneficiario, cumplir con los compromisos adquiridos el día de la apertura, recordándole que no se pueden ejecutar obras paralelas en la vivienda.

						Finaliza semana con avance del 25%
193	MVAL_00513	DG 98B SUR 8 10 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA ADELAIDA ZAMUDIO CUERVO	25/09/2023	Se lleva a cabo visita de seguimiento en donde se observa personal de obra ejecutando enchape de mesón, finalización de enchape baño y pared cocina con respectiva cenefa, está el suministro de puertas, instalación de sanitario aplicación de pintura en sala comedor y habitaciones. La beneficiaria manifiesta que a partir de la otra semana no se encontrará en la vivienda y que necesita por cuestiones laborales la culminación del mejoramiento, se le recuerda a la beneficiaria la dinámica de tiempos del proyecto y se genera compromiso de atender su solicitud, en la medida de lo posible.
194	MVAL_00879	KR 8 F ESTE 105 09 SUR	EL PORTAL II ETAPA	JOHN ALEXANDER PARRA BLANCO	25/09/2023	Enchape de los muros del baño en proceso y pañete completo; pañete de los muros de la cocina en proceso; cubierta instalada en su totalidad y encoroce en proceso. el beneficiario solicita revisar el presupuesto, para aumentar el área de enchape del piso de la cocina y de la sala comedor, por lo cual, se verificarán las actividades y en la próxima visita se brindará una respuesta concreta. Se le recuerda al beneficiario que la bitácora debe permanecer dentro de la vivienda, de igual manera, se deben cuidar todos los documentos que contiene, además, de no arrancar el presupuesto y el acta de inicio, en caso de que se generen inquietudes con referencia a las actividades, remitirse al canal de atención del contratista o en las visitas de seguimiento.

195	MV_00519	DG 98 A SUR 8-11 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ELISERIO OSPINA VASQUEZ	25/09/2023	Se lleva a cabo el seguimiento por parte del componente técnico social. Durante de visita se evidencia culminación de enchape sala-comedor y dos habitaciones, pintura en dos habitaciones y sala comedor. El beneficiario no refiere novedades.
196	MVAL_00850	KR 8 F ESTE 104 06 SUR	EL PORTAL II ETAPA	JUAN DAVID ALFONSO GALINDO	25/09/2023	Cubierta instalada en la zona de ropas; enchape de los muros y de las mochetas para el lavadero y pintura de los muros; muros del baño pintados; enchape del piso terminado con guarda escoba en la habitación 2. el beneficiario está conforme con las obras.
197	MVAL_00874	CALLE 104 SUR 8D 23 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LIBIA MARISOL SIERRA PIÑEROS	25/09/2023	En el baño: pintura de los muros en proceso, enchape completo del piso, enchape de los muros en proceso; en la zona de ropas: enchape del piso completo, pintura en proceso, enchape completo de los muros; en la habitación 1: enchape del piso terminado y pintura en proceso; en la habitación 2: pintura en proceso; en la cocina: mesón en proceso de construcción. La beneficiaria levantó una hilera y media de bloque entre la cocina y la escalera y el dintel para cerrar la ventana, se aclara que se pañetará del costado de la cocina; esta actividad se hizo el fin de semana, en ausencia del personal de obra.
198	MV_00508	DG 98B SUR 8-40 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MADELAINE LARA GUZMAN	25/09/2023	Se realiza visita técnico social, en donde se evidencia personal de obra en la vivienda, avance de obra en las siguientes actividades: cubierta parcialmente instalada, instalación de tableta en zona de baño pared con respectiva cenefa. Se recuerda a la beneficiaria que es necesario

						que la bitácora esté en un lugar visible para su respectivo seguimiento. Manifiestan urgencia en la terminación de la zona del baño ya que en la casa habitan 9 personas
199	MV_00500	DG 98B SUR 8 72 ESTE	PORTAL II	MARIELINA CRUZ CANTE	25/09/2023	Durante el seguimiento se evidencia avance en instalación de cielo raso y primera mano de pintura, interventoría solicita ajustes en algunas actividades. El beneficiario no refiere novedades, sin embargo, solicita más cumplimiento con relación a los horarios d ellos trabajadores.
200	MVAL_00932	KR 8C ESTE 102 13 SUR	EL PORTAL II ETAPA	SEGUNDO ANTONIO CRUZ MENDOZA	25/09/2023	En visita de seguimiento se evidencian actividades realizadas a saber: instalación de cubierta con teja traslúcida y respectivos perfiles. El beneficiario se encuentra en la vivienda y no reporta novedad
201	MVAL_00891	KR 8 C ESTE 102 -28 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIELA HERNADEZ ROJAS	25/09/2023	Se realiza seguimiento de obra en donde se identifican actividades realizadas en instalación de cubierta con respectiva teja traslúcida y perfiles, pañete en zona de lavado, cocina y baño. La beneficiaria manifiesta que requiere con urgencia la culminación del mejoramiento ya que considera que han pasado varios días, se le recuerda a la beneficiaria la dinámica de tiempos del proyecto y se genera compromiso de atender su solicitud, en la medida de lo posible.
202	MVAL_00873	CALLE 104 SUR 8D 17 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LUZ DARY YUSUNGUAIRA NIETO	25/09/2023	Encoroce en proceso en las habitaciones; puerta instalada en el baño; enchape del piso, de muros y del mesón en proceso, en la cocina. Se da respuesta a la beneficiaria frente a dudas, con relación al encoroce en las áreas del baño y de las habitaciones, ya que,

						esta actividad está en ejecución, además, se revisará la altura del mesón y del entrepaño para mejorar la distancia entre uno y otro. se socializan los canales de atención del componente social, para aclarar inquietudes de la beneficiaria y de su hijo.
203	MVAL_00890	KR 8C ESTE 102 -34 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA INES YARA YAIMA	25/09/2023	Se realiza seguimiento en donde se identifica avance en actividades de instalación de tableta en habitaciones 3 y 4, instalación de cubierta y alistado de baño. La beneficiaria no reporta novedad y se encuentra personal de obra en la vivienda
204	MV_00693	CL 104 SUR 7H 66 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ALFONSO BALLESTEROS	25/09/2023	En visita de seguimiento se evidencia enchape de piso, aplicación de pintura en la sala y el comedor, enchape de los baños del primer y tercer piso , instalación de cielo raso en baño de tercer piso. La autorizada no manifiesta inconformidad alguna frente a la ejecución.
205	MV_00635	CL 103 SUR 7H 96 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	OVEIMAR PEDRAZA VILLALOBOS	25/09/2023	En visita de seguimiento se evidencia alistamiento del piso, enchape de piso, aplicación de pintura y se está terminando de instalar enchape de cocina y baño, instalación cielo raso. En visita no se encontraba el beneficiario.
206	MV_00693	CL 104 SUR 7H 66 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ALFONSO BALLESTEROS	25/09/2023	Durante visita de seguimiento se realiza revisión de actividades y preentrega con aval de interventoría. Beneficiario sin novedades. Finaliza semana con avance del 90%
207	MVAL_00851	CALLE 104 SUR 8F 15 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LEYDI PAOLA ATUESTA GUARIN	25/09/2023	Alistado del piso de las dos habitaciones en proceso; pañete en la zona superior del muro divisorio entre las habitaciones y la cocina, y mampostería nueva. Se evidencia que los beneficiarios demolieron parte del muro

						divisorio entre la cocina y la zona de ropas, también retiraron las divisiones en materiales livianos, que separaban las habitaciones 3 y 4.
208	MV_00752	CL 105 SUR 7H 54 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JORGE DE JESUS PALACIO	25/09/2023	Se evidencia en visita de seguimiento alistamiento, enchape y aplicación de pintura en zona de ropas y hall. En visita no se encontraba el beneficiario; se realiza llamada telefónica pero no fue efectiva.
209	MVAL_00849	KR 8 F ESTE 104-12 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ERIKA PAOLA CASTILLO MOLINA	25/09/2023	Cubierta instalada desde la fachada hasta la zona de ropas y encoroce con cuchillas en proceso. La beneficiaria está conforme con las obras.
210	MV_00587	CL 102 SUR 8 36 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	EDUIN JAVIER VILLALOBOS BERNAL	26/09/2023	Se realiza visita técnico social Durante el seguimiento se evidencia avance de obra en cuanto a la instalación de cubierta. Se denota personal de obra, realizando actividades de instalación teja traslúcida, se solicita por parte del componente técnico de interventoría ajuste de teja en culata a ras. Finaliza semana con avance del 95%
211	MV_00488	KR 8 ESTE 98C 07 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ROSA MARIA LEGUIZAMON MARTINEZ	26/09/2023	Se realiza visita de seguimiento. Durante la visita se evidencia personal de obra desempeñando actividades de obra respecto a: Cierre perimetral de muros en baño, cocina y habitación, enchape de muros, inicio de filos en cocina y ventana en cocina, pañete de columna en baño. La beneficiaria refiere conformidad con relación a las actividades desarrolladas hasta el momento.
212	MV_00620	DG 99A SUR 8-08 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ROGELIO ARIAS VASQUEZ	26/09/2023	Se lleva a cabo seguimiento, durante la visita se evidencia: Culminación de enchape muros en cocina y baño, pendiente remate de muro perimetral en canal y luces perimetrales en cubierta. El beneficiario refiere

						conformidad con las actividades desarrolladas hasta el momento. Finaliza semana con avance del 90%
213	MV_00774	CL 104 SUR 7H 43 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	DAVID MENDEZ RADA	27/09/2023	Durante visita de seguimiento se evidencia alistamiento de piso en habitación, sala, cocina y baño; pañete en la pared del hall. Sin novedad por parte del beneficiario. Finaliza semana con avance del 20%
214	MV_00770	CL 104 SUR 7H-35 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LIDIA TRIANA GUERRERO	27/09/2023	Durante la visita de seguimiento se evidencia pañete en muros de cocina, habitaciones y baño; se subió muro de baño. No se encontraba la beneficiaria al momento de la visita. Finaliza semana con avance del 20%
215	MV_02861	CL 111A SUR 8A 68 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	LUIS CARLOS VARGAS	27/09/2023	El beneficiario solicita que el poyo en el baño no se haga en forma de “L” sino recto, para que él pueda instalar una puerta plástica de cerramiento, esta actividad se hará después de la entrega del mejoramiento. se aclara que de esta forma el sanitario quedaría dentro del espacio de la ducha, el beneficiario está de acuerdo, debido a que quiere darle uso a esta puerta.
216	MV_00907	KR 8C ESTE 104 50 SUR	EL PORTAL II ETAPA	GLADYS ESTELA URREGO	27/09/2023	Enchape completo de los muros de la cocina; pintura de los muros del hall y de la cocina; construcción de poyo sobre elemento estructural en el espacio de la sala y comedor. La beneficiaria está conforme con las obras.
217	MV_00629	DG 99 SUR 8-51 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	DAGOBERTO LOPEZ AGUDELO	27/09/2023	Atendiendo solicitud de la beneficiaria respecto a no realizar actividad aplicación de vinilo en superficies en general debido a la afección de salud a miembro de la familia se hará la respectiva revisión para remplazar dicha actividad: solo será aplicado el vinilo en las zonas donde se requiere; cocina, baño, en cubierta

218	MV_03030	CL 111A SUR 9 47 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	BLANCA MIRYAN VALENCIA MEDINA	27/09/2023	Enchape completo del piso de la sala comedor; enchape completo del piso del hall; enchape completo del piso de la habitación 1 y en proceso guarda escoba; en proceso la instalación de la estructura para el cielo raso. Se encuentra el hijo de la beneficiaria, quien refiere que el hogar está conforme con las obras y con el personal de obra. no manifiesta inquietudes con relación a la ejecución de las actividades.
219	MV_00752	CL 105 SUR 7H 54 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JORGE DE JESUS PALACIO	27/09/2023	Durante visita de seguimiento se realiza revisión de actividades y preentrega con aval de interventoría. Beneficiario sin novedades. Finaliza semana con avance del 90%
220	MVAL_00904	KR 8 C ESTE 104 - 60 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ANA DELIA PIÑEROS CRUZ	27/09/2023	Instalación de las puertas en las dos habitaciones; pintura de todos los muros. La beneficiaria manifiesta inconformidad con respecto a los acabados del guarda escoba y muros, además, de fuga en el lavamanos, limpieza de las ventanas; el área técnica verifica los acabados para comunicarse con el encargado y el personal de obra, quien hará las respectivas subsanaciones.
221	MV_03129	CL 112A SUR 8C 14 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	JESUS MARIA PULIDO BERNAL	27/19/2023	Avance en el sobre piso de la habitación y del hall; muros de cerramiento del hall. No se encuentra al beneficiario, según información brindada por el maestro, el señor Jesús viajó a donde su hermana.
222	MVAL_02785	CL 109 SUR 9 67 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	ANA DEICY PACHON ARANDIA	27/09/2023	Enchape completo del piso de la habitación 3; pintura de las habitaciones en proceso; enchape de los muros del baño en proceso; mesón construido y alistado del piso de la cocina. La beneficiaria cerró el vano de la ventana de la habitación 3

						para separarlo de la puerta, esta actividad se hizo durante el fin de semana en ausencia de los maestros.
223	MV_00635	CL 103 SUR 7H 96 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	OVEIMAR PEDRAZA VILLALOBOS	28/09/2023	En visita de seguimiento se evidencia que falta arreglar enchape bajo el mesón, boquilla y llave de lavaplatos. El beneficiario no refiere novedades. Finaliza semana con avance del 95%
224	MVAL_00849	KR 8 F ESTE 104-12 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ERIKA PAOLA CASTILLO MOLINA	28/09/2023	En el baño se evidencia avance en demolición del enchape, desmonte de aparatos sanitarios y alistado del piso; encoroce en la sala comedor, en hall, cocina y baño. para priorizar las actividades relacionadas con la cubierta, en cuanto a cuchillas y a muros en general, así como en pintura, no se hará intervención en el piso de la sala comedor, del hall y del patio. La beneficiaria cambió el sentido de la puerta del baño de la habitación al hall, obra que realizó en ausencia de los maestros, por ende, se continuará con la intervención en el baño, como se había socializado en la apertura de obra. Finaliza semana con avance del 45%
225	MVAL_00851	CALLE 104 SUR 8F 15 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LEYDI PAOLA ATUESTA GUARIN	28/09/2023	Enchape completo del piso en las dos habitaciones (pendiente guarda escoba y aplicación de la boquilla); alistado del piso en la cocina, enchape de los muros en proceso, mesón en proceso de construcción; pañete de los muros de la cocina y en la zona de ropas; demolición del enchape de los muros del baño. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 40%
226	MVAL_00850	KR 8 F ESTE 104 06 SUR	EL PORTAL II ETAPA	JUAN DAVID ALFONSO GALINDO	28/09/2023	Mochetas enchapadas e instalación del lavadero; puerta instalada en el baño y en la habitación 1. La autorizada

						Marisol Sierra transmite las inquietudes del beneficiario, con relación a la instalación del flanche y terminación de la boquilla en la sala comedor; el área técnica hace revisión de las actividades que están en ejecución, para que el personal de obra haga las correcciones pertinentes. Finaliza semana con avance del 95%
227	MVAL_00874	CALLE 104 SUR 8D 23 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LIBIA MARISOL SIERRA PIÑEROS	28/09/2023	Enchape completo de los muros del baño; en la habitación 2, enchape completo del piso; en la habitación 3, enchape completo del piso (pendiente la aplicación de la boquilla); enchape de los muros de la cocina en proceso; pañete del muro nuevo en la cocina; pintura de los muros del hall en proceso. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 75%
228	MV_00791	CL 105 A SUR 7H 70 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA GLADYS ZARATE	28/09/2023	En visita de seguimiento se evidencia demolición de enchape de piso, paredes para los vanos, pañete y alistado del piso de habitaciones, cocina baño y zona de ropas, se subió mampostería de baño y de la puerta de la habitación y se inicia enchape de cocina. La beneficiaria refiere conformidad con las actividades desarrolladas hasta el momento. Finaliza semana con avance del 50%
229	MVAL_00879	KR 8 F ESTE 105 09 SUR	EL PORTAL II ETAPA	JOHN ALEXANDER PARRA BLANCO	28/09/2023	Enchape completo de los muros y piso del baño, sanitario instalado, pintura en proceso (pendiente la boquilla y el enchape del piso de la ducha); enchape completo de los muros de la cocina, en proceso enchape del mesón (pendiente la aplicación de la boquilla); encoroce en proceso en la sala y comedor. se

						construyó placa con malla electrosoldada en el hall, la cocina, la sala y comedor. Por medio de contacto telefónico se acuerda con el beneficiario priorizar la construcción de la placa con la malla electrosoldada, es decir, que con esta intervención el presupuesto queda a tope, por lo cual, no se harán más actividades. Finaliza semana con avance del 85%
230	MVAL_00873	CALLE 104 SUR 8D 17 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LUZ DARY YUSUNGUAIRA NIETO	28/09/2023	Enchape de los muros y del piso de la cocina terminado, enchape del mesón en proceso; habitación 2, con enchape del piso. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 85%
231	MVAL_00984	KR 8A ESTE 104 24 SUR	EL PORTAL II ETAPA	NUBIA ESPERANZA LOPEZ GUARIN	28/09/2023	Se evidencia actividad de encoroce terminada. En anteriores visitas no se logró hacer el seguimiento, porque la vivienda se encontraba cerrada. Finaliza semana con avance del 90%
232	MV_00511	DG 98B SUR 8 18 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MESIAS SOTO DIAZ	29/09/2023	Se realiza seguimiento en donde se identifica avance de obra en instalación de malla de piso (que estaba en estado natural) Se encuentra personal de obra en la vivienda, no hay novedad de intervención. Finaliza semana con avance del 5%
233	MVAL_00513	DG 98B SUR 8 10 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA ADELAIDA ZAMUDIO CUERVO	29/09/2023	Se realiza seguimiento en donde se identifica que la beneficiaria no se encuentra satisfecha con el enchape del poyo del mesón y parte inferior del muro de la cocina ya que este es diferente al que se estaba instalando inicialmente. interventoría solicita hacer este ajuste Se encuentra personal de obra en la vivienda realizando actividad de boquilla en piso de hall, cocina y zona de lavado.

						Finaliza semana con avance del 80%
234	MV_00519	DG 98 A SUR 8-11 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ELISERIO OSPINA VASQUEZ	29/09/2023	Se realiza seguimiento en donde se identifica cielo raso instalado en habitaciones 3 y 4, alistado de piso en hall y enchape en pared zona de lavado. No se presenta novedad y se encuentra personal de obra en la vivienda. Finaliza semana con avance del 35%
235	MV_00500	DG 98B SUR 8 72 ESTE	PORTAL II	MARIELINA CRUZ CANTE	29/09/2023	Se realiza seguimiento en donde se identifican áreas culminadas en cuanto a instalación de cielo raso y aplicación de pintura. La beneficiaria manifiesta inconformidad por la forma en que se instaló la bajante de aguas ya que alcanza a colindar con el lote del vecino, además afirma que los trabajadores partieron un vidrio cuando se estaba instalando la bajante al igual que una lámpara qué se encuentra en malas condiciones. Desde el área social se le informa que la responsabilidad de la parte eléctrica es de la beneficiaria y que es importante verificar la responsabilidad e relación al daño del vidrio, en el caso de ser una situación generada por los maestros, el contratista asumirá el costo. Finaliza semana con avance del 99%
236	MV_00508	DG 98B SUR 8-40 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MADELAINE LARA GUZMAN	29/09/2023	Se realiza visita de seguimiento en donde se identifica avance de obra en enchape de mesón de cocina, muro con respectiva cenefa y piso. Se encuentra personal de obra en la vivienda y se evidencia que en el muro del mesón de la cocina el cual hace la división de la zona de lavado presenta constante humedad por lo que se cree que es una filtración de un tubo

						de la zona. Al llamar al esposo de la beneficiaria manifiesta que él realizó una intervención de puntos hidráulicos por esa zona la cual va a revisar para descartar daño. Finaliza semana con avance del 80%
237	MVAL_00890	KR 8C ESTE 102 -34 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA INES YARA YAIMA	29/09/2023	Se realiza visita de seguimiento en donde se identifica zona de lavado culminada con enchape de piso y pared, dos habitaciones con tableta de piso y boquilla, pintura en áreas de intervención, cubierta totalmente instalada. Se encuentra la beneficiaria quien no reporta novedad. Finaliza semana al 100% se programa entrega
238	MVAL_00891	KR 8 C ESTE 102 -28 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIELA HERNADEZ ROJAS	29/09/2023	Se realiza visita de seguimiento en donde se identifica enchape de muro cocina con cenefa y zona de lavado, aplicación de pintura en las áreas de intervención, la beneficiaria consulta que cuando se terminará la intervención, la parte social le informa que estamos en el tiempo preciso para culminar el proceso. Finaliza semana con avance del 60%
239	MVAL_00966	KR 8 A ESTE 102 - 04 SUR	EL PORTAL II ETAPA	FLOR MARIA RICO COLMENARES	29/09/2023	Se realiza visita de seguimiento en donde se evidencia demolición en baldosas de piso, la beneficiaria no presenta inquietudes, finaliza semana con avance del 15%
240	MVAL_00932	KR 8C ESTE 102 13 SUR	EL PORTAL II ETAPA	SEGUNDO ANTONIO CRUZ MENDOZA	29/09/2023	Se realiza visita de seguimiento en donde se identifica pañete en culatas. El beneficiario no refiere novedades y finaliza la semana con avance del 15%
241	MV_00758	CL 105 SUR 7H 24 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	TERESA MORALES CARO	29/09/2023	Durante visita de seguimiento de evidencia que se inicia proceso de estuco. La Sin novedad por parte del beneficiario. La beneficiaria no refiere novedades. Finaliza semana con avance del 5%

242	MV_14696	KR 7D ESTE 98B 61 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA BERTHA BETANCOURT DE PADILLA	29/09/2023	Se evidencia inicio de desmonte para la instalación de las hiladas laterales. Beneficiaria conforme con la ejecución hasta el día de hoy. Finaliza semana con avance del 5%
243	MV_03129	CL 112A SUR 8C 14 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	JESUS MARIA PULIDO BERNAL	29/09/2023	Alistado del piso de la cocina; construcción de las mochetas y pañetes de los muros del cerramiento; adecuación de tubería nueva en el baño y la cocina. Se evidencia que el beneficiario no se encuentra en la vivienda, el personal de obra refiere que el lunes 25 de septiembre el señor Jesús les informó que se iría a vivir a Tenjo, Cundinamarca donde su hermana, mientras se ejecutan las actividades. estará pendiente por contacto telefónico, de la fecha de la entrega para regresar a Bogotá; el beneficiario desocupó la vivienda, a excepción de la estufa que se ubica en la habitación. Finaliza semana con avance del 25%
244	MV_02861	CL 111A SUR 8A 68 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	LUIS CARLOS VARGAS	29/09/2023	Enchape de los muros de la cocina en proceso; pañete del muro de la sala y comedor. El beneficiario está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 55%
245	MVAL_00904	KR 8 C ESTE 104 - 60 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ANA DELIA PIÑEROS CRUZ	29/09/2023	La interventoría solicitó varias subsanaciones, posterior a la verificación de las actividades y teniendo en cuenta las inconformidades de la beneficiaria; está pendiente realizar estas correcciones para programar la entrega del mejoramiento. La beneficiaria refiere que estará en la vivienda hasta el 06 de octubre, ya que, su esposo y ella deben regresar al trabajo. Finaliza semana con avance del 95%
246	MV_00907	KR 8C ESTE 104 50 SUR	EL PORTAL II ETAPA	GLADYS ESTELA URREGO	29/09/2023	Muros pintados de la sala y del costado de la escalera. Se

						verifican las actividades y los acabados para proyectar la entrega del mejoramiento de vivienda. La beneficiaria está conforme con las obras. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 95%
247	MVAL_02785	CL 109 SUR 9 67 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	ANA DEICY PACHON ARANDIA	29/09/2023	Enchape de los muros de la cocina en proceso; enchape completo de la cabina del baño. el área técnica le aclara al personal de obra, que el enchape antideslizante del piso abarca el baño, la cocina y el acceso al baño. La beneficiaria está conforme con las obras. Finaliza semana con avance del 80%
248	MV_03030	CL 111A SUR 9 47 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	BLANCA MIRYAN VALENCIA MEDINA	29/09/2023	Guarda escoba completo en la habitación 1, está pendiente la aplicación de la boquilla; cielo raso instalado en la sala y comedor, la habitación 2 y hall, en proceso de instalación en la cocina y en la habitación 1.en la vivienda se encuentra al hijo de la beneficiaria, quien menciona que ella tuvo que ausentarse por unas diligencias personales, se le recuerda que puede generar una autorización con un familiar, para que pueda firmar la bitácora y estar pendiente de la ejecución de las actividades. Finaliza semana con avance del 70%
249	MV_00558	DG 98C SUR 8-28 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	RUBEN DARIO VANEGAS PEREZ	29/09/2023	Se realiza visita de seguimiento en donde se evidencia avance de obra t satisfacción por parte del beneficiario frente a las actividades ejecutadas hasta el momento. Finaliza semana con avance del 50%
250	MV_00604	DG 98C SUR 8 39 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LUIS ALBERTO ROMERO ORTIZ	29/09/2023	Se evidencian actividades próximas a finalizar, se programa preentrega. Finaliza semana con avance del 95%
251	MV_00599	DG 99 SUR 8 14 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ANDREA MARIA REY CRUZ	29/09/2023	Se evidencian actividades próximas a finalizar, se

						programa preentrega. Finaliza semana con avance del 90%
252	MV_00599	DG 99 SUR 8 14 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ANDREA MARIA REY CRUZ	29/09/2023	Se evidencian actividades próximas a finalizar, se programa preentrega. Finaliza semana con avance del 90%





8.ATENCIÓN PQRS

Durante el periodo se registró el siguiente PQRS

PQRS				
Nº	**ID_DMV**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
	MVBF_00097	**MARIA ESPERANZA BELTRAN**	**ABIERTO**	**13/09/2023:** Se recibe derecho de petición, el cual indica en el cuerpo del documento que obedece a intereses particulares, se realiza programación de visita para el día 19 de septiembre del año en curso
1	**MVBF_00097**	**MARIA ESPERANZA BELTRAN**	**EN PROCESO**	**19/09/2023:** Se realiza acercamiento a la vivienda con el fin de atender requerimiento; durante el ejercicio se indaga acerca de la inconformidad de la beneficiaria; quien indica que, desde hace aproximadamente 2 años, ha recibido visitas de profesionales vinculados al proyecto y que hasta el momento su mejoramiento no es una realidad, adicionalmente refiere no tener claridad frente a la dinámica y el alcance de este. Desde el componente social se contextualiza a la beneficiaria acerca del proyecto y genera compromiso de apertura de obras para el día 26 de septiembre del año en curso; se diligencia acta la cual es firmada a conformidad por la beneficiaria.

	MVBF_00097	**MARIA ESPERANZA BELTRAN**	**CERRADO**	**26/09/2023:** Se realiza acercamiento a la vivienda con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos; sin embargo, en el marco de la apertura la beneficiaria refiere no entender el proceso, pese a las explicaciones realizadas y consignadas en actas por dos profesionales, adicionalmente se encuentra construyendo un muro en área de patio, en consecuencia, no se realiza apertura y se generan nuevos compromisos.

9.ENTREGAS

Durante el periodo se realizaron las siguientes entregas

ENTREGAS DE OBRA					
Nº	**ID_DMV**	**DIRECCION**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA ENTREGA DE OBRAS**
1	MV_00673	CL 102 SUR 8 33 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ANA JULIA MORENO GARCIA	1/09/2023
2	MV_00023	DG 100B SUR 7 17 ESTE	NUEVO PORVENIR	DOMINGA BONILLA BONILLA	1/09/2023
3	MVAL_00995	KR 8B ESTE 104 37 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ASTRID SUSANA JIMENEZ VIDAL	1/09/2023
4	MV_00617	DG 99A SUR 8-32 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	BLANCA NIEVES ARIAS VASQUEZ	1/09/2023
5	MV_00479	DG 100 SUR 7D 04 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	GLADYS JUDITH SANCHEZ SANCHEZ	4/09/2023
6	MV_00535	DG 98A SUR 8 71 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ELVIRA SUAREZ RODRIGUEZ	4/09/2023
7	MVAL_01007	CLL 102 SUR 8C 14 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	GUILLERMO ENRIQUE MURILLO LOZANO	4/09/2023
8	MVAL_00925	KR 8B ESTE 102 38 SUR	EL PORTAL II ETAPA	CRUZ ELENO LEUDO	4/09/2023
9	MV_00463	DG 100 SUR 7C 20 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	OSCAR RODRIGO SANCHEZ SANCHEZ	5/09/2023
10	MVAL_00945	KR 8B ESTE 104 32 SUR	EL PORTAL II ETAPA	RAFAEL OCTAVIO SARMIENTO BEJARANO	5/09/2023
11	MVAL_00882	CALLE 104 SUR 8 C 12 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	GLORIA ESPERANZA DELGADO RODRIGUEZ	6/09/2023
12	MV_00646	CL 103 SUR 7H-62 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	NORBERTO BETANCOURTH JARAMILLO	6/09/2023

13	MV_00816	CL 105 SUR 7H 77 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LUZ ADRIANA RODRIGUEZ MARTINEZ	6/09/2023
14	MV_01015	DG 99A SUR 8 23 ESTE	PORTAL II	CARMEN MIRIAN CRISTIANO BENITEZ	7/09/2023
15	MV_00473	KR 7D ESTE 98B-21 SUR	EL PORTAL II ETAPA	LUZ HERMINDA ROMERO FANDIÑO	8/09/2023
16	MV_00533	DG 98A SUR 8-65 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ORLANDO FORERO AGUILAR	8/09/2023
17	MV_00543	DG 98A SUR 8 91 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	FLORENTINO GELVEZ QUEVEDO	8/09/2023
18	MVAL_00958	CL 104 SUR 8 A 12 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	NANCY CLEOTILDE GIRALDO BEDOYA	8/09/2023
19	MV_00670	CL 102 SUR 8-17 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	FABIOLA PADILLA MENJURA	11/09/2023
20	MV_00746	CL 105 SUR 7H 74 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA DEL TRANSITO RODRIGUEZ DE VALENCIA	11/09/2023
21	MVAL_00997	KR 8B ESTE 104 65 SUR	EL PORTAL II ETAPA	HELENA JACINTA BAEZ ROJAS	11/09/2023
22	MV_00836	CL 105A SUR 7H 27 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ABADIAS MENDEZ RADA	12/09/2023
23	MV_00621	KR 8 ESTE 99-18 SUR	EL PORTAL II ETAPA	YANETTE GUZMAN	13/09/2023
24	MV_00478	KR 7D ESTE 98B 51 SUR	EL PORTAL II ETAPA	BELARMINA MALES	14/09/2023
25	MVAL_00662	CL 102 SUR 7H 13 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	NELSON MARTINEZ GONZALEZ	15/09/2023
26	MV_00750	CL 105 SUR 7H 60 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LEYDI YOHANA VEGA LOPEZ	15/09/2023
27	MV_00812	CL 105 SUR 7H-61 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	SANDRA MARINA TRIANA VILLAMARIN	15/09/2023
28	MV_00804	CL 105 SUR 7H-27 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA DEL PILAR TIQUE	15/09/2023
29	MVAL_00976	KR 8 A ESTE 105 A 22 SUR	EL PORTAL II ETAPA	GLORIA STELLA AYALA RATIVA	15/09/2023
30	MV_00837	CL 105A SUR 7H 33 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE EDILSON MARTINEZ ROCHA	18/09/2023
31	MV_00016	DG 100B SUR 6F 19 ESTE	NUEVO PORVENIR	GENARO HERNADEZ TRUJILLO	21/09/2023
32	MV_00552	DG 98C SUR 8-50 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ANGELINO MARTINEZ ROCHA	21/09/2023

33	MV_00660	KR 7H ESTE 102-20 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA DEL CARMEN ACOSTA LOPEZ	21/09/2023
34	MV_00779	CL 104 SUR 7H 65 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA DELCY VILLANUEVA CANO	21/09/2023
35	MVAL_00905	KR 8 C ESTE 104 - 54 SUR	EL PORTAL II ETAPA	ALBA YOLANDA LOPEZ VEGA	21/09/2023
36	MV_00547	DG 98C SUR 8-80 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	ISABEL LOPEZ VELA	22/09/2023
37	MVAL_00497	DG 98B SUR 8 88 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ALIRIO TOLOZA HERRERA	22/09/2023
38	MVAL_00974	KR 8B ESTE 102 51 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA AMPARO AROCA TIQUE	22/09/2023
39	MVAL_00962	KR 8 A ESTE 103 06 SUR	EL PORTAL II ETAPA	JOSE DEL CARMEN MARTINEZ ROCHA	22/09/2023
40	MV_00826	CL 106 SUR 7I 12 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	VIVIANA FARIDES CANCHILA GUTIERREZ	22/09/2023
41	MV_00652	CL 103 SUR 7 H 40 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ENERIO LINARES AMAYA	25/09/2023
42	MVAL_00912	KR 8 C ESTE 104 - 20 SUR	EL PORTAL II ETAPA	CARLOS JULIO PARRA BLANCO	25/09/2023
43	MVAL_00877	KR 8 F ESTE 104 27 SUR	EL PORTAL II ETAPA	BERENICE ESCOBAR HERNANDEZ	25/09/2023
44	MV_00560	DG 98C SUR 8-20 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	FLOR ALBA MARTINEZ ROCHA	26/09/2023
45	MV_00548	DG 98C SUR 8 76 ESTE	PORTAL II	JORGE ENRIQUE GARCIA SANCHEZ	27/09/2023
46	MVAL_00954	KR 8C ESTE 104 21 SUR	EL PORTAL II ETAPA	LUCELY VELASCO ORTEGA	27/09/2023
47	MV_00710	KR 7 H ESTE 103 26 SUR	EL PORTAL II ETAPA	LILIA DORIS COMETA FLOR	28/09/2023
48	MV_00730	CL 103 SUR 7H 71 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE EMILIO FIRIGUA BASTIDAS	29/09/2023





10.ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

El punto de atención a la comunidad se encuentra ubicado en la calle 105 a sur # 7 h 82 Este, en el barrio Puerta el Llano. El horario de atención son los martes, jueves y sábado de 9:00 am a 12:30 pm. Adicionalmente se cuenta con el número de contacto 3003662941 y el correo electrónico habitatg2coinco@gmail.com.
Sin registros telefónicos, ni correos vía electrónica.

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD					
Nº	**ID_DMV**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
1	N/A	N/A	2/09/2023	N/A	No se presentaron novedades de ningún tipo
2	N/A	N/A	5/09/2023	N/A	No se presentaron novedades de ningún tipo
3	N/A	HABITANTE DEL SECTOR	7/09/2023	CERRADO	Realiza acercamiento al punto de atención habitante del sector para solicitar información acerca del trámite de solicitud del subsidio de mejoramiento de vivienda, profesionales brindan atención orientada a los canales de comunicación con la entidad
4	N/A	N/A	9/09/2023	N/A	No se presentaron novedades de ningún tipo
5	N/A	N/A	12/09/2023	N/A	No se presentaron novedades de ningún tipo

6	N/A	N/A	14/09/2023	N/A	No se presentaron novedades de ningún tipo
7	N/A	N/A	16/09/2023	N/A	No se presentaron novedades de ningún tipo
8	N/A	N/A	19/09/2023	N/A	No se presentaron novedades de ningún tipo
9	N/A	N/A	21/09/2023	N/A	No se presentaron novedades de ningún tipo
10	N/A	N/A	23/09/2023	N/A	No se presentaron novedades de ningún tipo
11	N/A	N/A	26/09/2023	N/A	No se presentaron novedades de ningún tipo
12	N/A	N/A	28/09/2023	N/A	No se presentaron novedades de ningún tipo
	N/A	N/A	30/09/2023	N/A	No se presentaron novedades de ningún tipo

11.HISTORIAS DE VIDA

Durante el periodo se postularon las siguientes historias de vida.

HISTORIAS DE VIDA				
Nº	**ID_DMV**	**DIRECCION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**DESARROLLO**
1	**MVAL_00958**	**CL 104 SUR 8 A 12 ESTE**	**NANCY CLEOTILDE GIRALDO BEDOYA**	La beneficiaria Nancy Clotilde Giraldo Bedoya nació en la ciudad de Bogotá, tiene 53 años y actualmente vive en la localidad de Usme en el barrio El Portal Segunda Etapa, cuenta con una familia monoparental donde ella ha sido la principal proveedora de 4 hijos. Anteriormente, vivía en la modalidad de arriendo y obtuvo su vivienda propia comprando un lote que fue edificando durante siete años por medio de su trabajo en servicios varios, esto mientras sus hijos estaban en etapa escolar. La señora Nancy accedió al beneficio de mejoramiento de vivienda con el fin de poder adecuar sus habitaciones, sala y comedor, cocina, baño y zona de

				lavado. Estos espacios se evidencian con humedad, sin tableta de piso o pared y no cuenta con división de baño y cocina. Este aporte contribuye a que la beneficiaria y su familia habiten en espacios de calidad que no se han podido intervenir completamente debido a que actualmente ella y sus hijos mayores asumen varias de las responsabilidades básicas del hogar, lo que influye a que las mejoras de la casa se hagan de manera esporádica.
2	**MV_00746**	**CL 105 SUR 7H 74 ESTE**	**MARIA DEL TRANSITO RODRIGUEZ DE VALENCIA**	Beneficiaria perteneciente a la séptima década de vida quien ha vivido en Bogotá toda su vida, la beneficiaria es separada y cuenta con 5 hijos de su primera convivencia. Durante gran parte de su vida se desempeñó como auxiliar de servicios generales después de 15 años de convivencia con su ex¬ esposo toma la decisión de separarse ya que sufría de violencia física y psicológica, en ese momento la beneficiaria se quedó con la custodia de dos de sus hijos, los tres restantes quedan con el progenitor quien se muda a vivir a Cúcuta. Ella a habitado en varios barrios del sur de la ciudad como la victoria, san Carlos y Danubio. Antes de llegar a la localidad 5 de Usme en donde gracias a sus ahorros y una colecta de los hijos lograron comprar entre todos el lote en el que actualmente vive. En este lote en un principio construyen una vivienda de manera artesanal con tejas de zinc, madera y piso en tierra, en la cual todos los hijos vuelven a convivir con la beneficiaria, al trascurrir los años cada uno de los hijos va tomando su rumbo dejándola sola, hace 20 años una de sus hijas, la mayor, vuelve a la casa y le realiza una propuesta , la cual es que le venda la mitad del lote y que ella le paga la totalidad del mismo construyéndole su vivienda, ambas partes aceptan este negocio, debido a que la construcción artesanal del lote estaba afectado la salud de la beneficiaria. Su hija cumple con su palabra, le realiza en la mitad del lote la vivienda de dos pisos construida solo en bloque en la cual la beneficiaria habita desde ese momento hasta la actualidad. La beneficiaria actualmente cuenta con varios problemas de salud, como los son diabetes, epoc pulmonar, problemas lumbares y de movilidad en sus piernas. Por lo cual la responsabilidad económica recae en sus cinco hijos quienes responden por todos los gastos económicos y de alimentación.

12.ALERTAS (Conflictos, anomalías y análisis de causas).

MV_00774 DAVID MENDEZ RADA

Se realiza acercamiento a la vivienda con el fin de realizar apertura, durante la socialización de las actividades priorizadas se establece el cambio de cubierta total, el beneficiario refiere que no está de acuerdo con dicha actividad y que él solicita que solo se realice media cubierta, aduciendo que no habita en todo el predio, desde el componente técnico se explica la importancia de desarrollar la actividad como está programada, sin embargo él se niega aceptar lo propuesto e indica acercarse directamente a SDHT, teniendo en cuenta que la supervisión se encuentra en el sector, profesional técnico se acerca a explica al beneficiario los riesgos de la media cubierta, sin embargo ante la negativa se indica se realizara revisión y se programara visita nuevamente.

MVAL_00877 BERENICE ESCOBAR HERNANDEZ

En visita de seguimiento pese a aclararle el alcance del presupuesto y las particularidades del programa, a la beneficiaria y autorizado; estos insisten en que el presupuesto debe alcanzar para la intervención completa del baño, (cielo raso, enchapes, combo sanitario y puerta), además del cielo raso y puerta en la habitación e instalación de cubierta; se toma la decisión de pausar las obras mientras se solicita una visita de la SDHT. Posterior a ello en horas de la tarde, la beneficiaria se comunicó con la profesional social, explicando que no quiere atrasos en la ejecución y que aceptará las actividades socializadas.

MVBF_00097 MARIA ESPERANZA BELTRAN

Se realiza acercamiento a la vivienda con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos; sin embargo, en el marco de la apertura la beneficiaria refiere no entender el proceso, pese a las explicaciones realizadas y consignadas previamente en actas por dos profesionales, adicionalmente se encuentra construyendo un muro en área de patio, en consecuencia, no se realiza apertura y se generan nuevos compromisos.

MV_00571 MARTA DIAZ MORENO

Autorizado de la beneficiaria indica que las actividades que se plantean ejecutar en el mejoramiento no son acordes a los diseños que tienen planteados por ellos. Se indica el alcance y la dinámica de la priorización de espacios para la ejecución. Autorizado solicita no pañetar muros internos ya que quieren ladrillos a la vista. No quiere ejecución en enchape completo en zona de baño debido a que los terminados que quieren son ladrillos a la vista; adicionalmente refiere que ya tiene material existente para terminar obras en la vivienda. Desde la parte social se solicita visita de secretaría debido a que el beneficiario tiene unos planes particulares para la vivienda y los espacios no se pueden entregar terminados.

MVAL_03072 GERMAN SACRISTAN GONZALEZ

Durante los seguimientos realizados con el fin de evidenciar el avance del beneficiario en relación a las actividades a las cuales previamente se habían comprometido (cuchillas, muros, instalación de puerta, puntos eléctricos; entre otros) se evidencia avance del 5% en el lapso de 15 días, frente a la situación, la autorizada se compromete a culminar actividades

la primera semana de octubre del año 2023, desde el área social se sensibiliza nuevamente frente a los tiempos de ejecución y la importancia de cumplir con los compromisos; se establece próxima visita para el día 6/10/2023

MV_00663 MARIA ISABEL ARBOLEDA BARAHONA

Posible Entrega Unilateral: El autorizado de la beneficiaria refiere no estar conforme con las actividades desarrolladas con relación al valor de estas, adicionalmente retiene la bitácora. Desde los componentes técnico y social, se realiza socialización del presupuesto, se revisa actividad por actividad y se sensibiliza frente al alcance y dinámica del proyecto, sin embargo, el autorizado mantiene su posición, en consecuencia, con aval de interventoría se hace entrega de kit ecológico y manuales. Posterior a ello se envía correo de solicitud de entrega de la bitácora y se cita a la beneficiaria para encuentro en la vivienda con equipo de la entidad el día 2 de octubre del año 2023.

13.RENUNCIAS

Durante el periodo no se presentaron renuncias

RENUNCIAS					
Nº	**ID_DMV**	**DIRECCION**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**MOTIVO**

14.CONSOLIDADO MES 3

Convocatoria socializaciones	1
Ejecución socializaciones	1
Caracterizaciones	113
Caracterizaciones no efectivas	0
Aperturas	42
Apertura no efectiva	1
Cierres atención PAC	1
Cierres PQR	1
Seguimientos	252
Renuncias	0
Historias de Vida	2
Cierres	48

15.CONSOLIDADO FINAL

Convocatoria socializaciones	3
Ejecución socializaciones	3
Caracterizaciones	113
Caracterizaciones no efectivas	3
Aperturas	95
Apertura no efectiva	2
Cierres atención PAC	2
Cierres PQR	2
Seguimientos	501
Renuncias	2
Historias de Vida	10
Cierres	52



INFORME MENSUAL 03
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
COMPONENTE SST
CONTRATO DE OBRA 915-2023
CONTRATO INTERVENTORIA 986-2023

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 2023

RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
CONTRATO DE OBRA N° 915 - 2023

1. PROGRAMACION MENSUAL

En cumplimiento al contrato No 915 de 2023, contratista COINCO S.A.S , realiza el informe mensual, de acuerdo al avance de obra, se realiza seguimiento de la intervención, en Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizaa seguimiento al personal activo en obra en el uso y la entrega de los elementos de protección personal, charlas de seguridad semanales que incluyen temas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y ambientales respectivamente, se realizaran en su momento acompañamientos en cambios de cubierta, con inspecciones de las condiciones generales de seguridad de los trabajadores, inspecciones periódicas generales y de herramientas eléctricas, verificación y entrega de documentos de afiliación de los trabajadores activos en obra, inducciones del personal operativo y administrativo que va ingresando gradualmente a las obras, verificación de recolección de escombros de las obras cuando se presenten. Realizando las diferentes consolidaciones documentales y anexos como soportes, al presente informe mensual.

Las actividades programadas corresponden a 41 aperturas de viviendas, correspondiente al mes del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023, se tuvo el acompañamiento y la supervisión por parte del personal de interventoría.

BARRIO	N° MEJORAMIENTOS	LOCALIDAD
PUERTA AL LLANO II SECTOR	112	USME
BELLA FLOR	2	CIUDAD BOLIVAR
SAN CRISTOBAL	163	SAN CRISTOBAL
TOTAL	**277**	

2.CUBIERTAS

Durante el periodo se presentaron los siguientes cambios de cubierta.

STICKER	MV	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	NOMBRE BENEFICIARIO (A) - SEGÚN RESOLUCION DE ASIGNACION DEL SUBSIDIO - BASE DE DATOS ENTREGADA	CEDULA
100	MV_00907	Usme	KR 8C ESTE 104 50 SUR	GLADYS ESTELA URREGO	51792691
11	MV_00488	Usme	KR 8 ESTE 98C 07 SUR	ROSA MARIA LEGUIZAMON MARTINEZ	35493788
69	MV_00710	Usme	KR 7 H ESTE 103 26 SUR	LILIA DORIS COMETA FLOR	40271602
63	MV_00660	Usme	KR 7H ESTE 102-20 SUR	MARIA DEL CARMEN ACOSTA LOPEZ	35313140
56	MVAL_00962	Usme	KR 8 A ESTE 103 06 SUR	JOSE DEL CARMEN MARTINEZ ROCHA	3234324
98	MVAL_00954	Usme	KR 8C ESTE 104 21 SUR	LUCELY VELASCO ORTEGA	51690739
99	MVAL_00912	Usme	KR 8 C ESTE 104 - 20 SUR	CARLOS JULIO PARRA BLANCO	80758930
101	MVAL_00905	Usme	KR 8 C ESTE 104 - 54 SUR	ALBA YOLANDA LOPEZ VEGA	52554924
84	MV_00812	Usme	CL 105 SUR 7H-61 ESTE	SANDRA MARINA TRIANA VILLAMARIN	20699909
67	MV_00730	Usme	CL 103 SUR 7H 71 ESTE	JOSE EMILIO FIRIGUA BASTIDAS	4899631
47	MVAL_00891	Usme	KR 8 C ESTE 102 -28 SUR	MARIELA HERNADEZ ROJAS	51660628
103	MVAL_00873	Usme	CALLE 104 SUR 8D 17 ESTE	LUZ DARY YUSUNGUAIRA NIETO	40356938
105	MVAL_00877	Usme	KR 8 F ESTE 104 27 SUR	BERENICE ESCOBAR HERNANDEZ	41479358
108	MVAL_00850	Usme	KR 8 F ESTE 104 06 SUR	JUAN DAVID ALFONSO GALINDO	79665819
15	MV_00620	Usme	DG 99A SUR 8-08 ESTE	ROGELIO ARIAS VASQUEZ	19304372
20	MV_00599	Usme	DG 99 SUR 8 14 ESTE	ANDREA MARIA REY CRUZ	52896357
21	MV_00587	Usme	CL 102 SUR 8 36 ESTE	EDUIN JAVIER VILLALOBOS BERNAL	80254233

18	MV_00629	Usme	DG 99 SUR 8-51 ESTE	DAGOBERTO LOPEZ AGUDELO	5816313
79	MV_00752	Usme	CL 105 SUR 7H 54 ESTE	JORGE DE JESUS PALACIO	14277957
35	MV_00500	Usme	DG 98B SUR 8 72 ESTE	MARIELINA CRUZ CANTE	24197589
34	MV_00508	Usme	DG 98B SUR 8-40 ESTE	MADELAINE LARA GUZMAN	22600848
48	MVAL_00890	Usme	KR 8C ESTE 102 -34 SUR	MARIA INES YARA YAIMA	52452924
50	MVAL_00932	Usme	KR 8C ESTE 102 13 SUR	SEGUNDO ANTONIO CRUZ MENDOZA	5570031
107	MVAL_00849	Usme	KR 8 F ESTE 104-12 SUR	ERIKA PAOLA CASTILLO MOLINA	52232585
106	MVAL_00879	Usme	KR 8 F ESTE 105 09 SUR	JOHN ALEXANDER PARRA BLANCO	1032389463
71	MV_00693	Usme	CL 104 SUR 7H 66 ESTE	ALFONSO BALLESTEROS	7219177

3. PERSONAL DE OBRA

Administrativo:

NOMBRE DEL PROFESIONAL	CARGO	DEDICACIÓN
Diego Alejandro Saray	Director de Obra	100%
Mauricio Martinez Jerez	Residente de Obra 1	100%
David Julian Florez Gamboa	Residente de obra 2	100%
Francisco Murillo	Residente de Obra 3	100%
Cindy Lizeth Quevedo Tejada	Residente de obra 4	100%
Ana Maria Trujillo	Residente de obra 5	100%
Sandra Chavez	Residente de obra 5	100%
Adriana Ximena Santana Romero	Coordinadora Social	100%
Juan Carlos Colorado Castro	Trabajador Social 1	100%
Yuly Andrea Casas Merchán	Trabajador Social 2	100%
Sindy Yesenia Sierra Marin	Trabajador Social 3	100%
Juliana Carolina Gomez Chiquiza	Trabajador Social 4	100%
Milena Pinzon	Trabajador Social 5	100%
Jasbleidy Forigua Castillo	Profesional SST	100%
Juan Felipe Mosquera	Profesional Ambiental	100%

3.1. Personal Contratista Administrativo

NOBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	DEDICACION EN TERRENO	FECHA DE INGRESO	EPS	PENSION	ARL
JASBLEIDY FORIGUA CASTILLO	52326579	PROFESIONAL SST	100 %	10/7/2023	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA
ALEJANDRO SARAY TORRES	1068972008	DIRECTOR DE OBRA	100 %	10/7/2023	COMPENSAR EPS	PROTECCION	SURA
MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1019004481	RESIDENTE TECNICO	100 %	10/7/2023	FAMISANAR	PROTECCION	SURA
YULI CASAS MERCHAN	1032387457	PROFESIONAL SOCIAL	100 %	10/7/2023	FAMISANAR	PROTECCION	SURA
XIMENA SANTANA ROMERO	52476338	COORDINADORA SOCIAL	100 %	10/7/2023	FAMISANAR	PROTECCION	SURA
LIZETH QUEVEDO TEJADA	1110556014	RESIDENTE TECNICO	100 %	10/7/2023	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA
JUAN CARLOS COLORADO CASTRO	1014258624	PROFESIONAL SOCIAL	100 %	10/7/2023	EPS SANITAS	PORVENIR	SURA
YESENIA SIERRA MARIN	1030563658	PROFESIONAL SOCIAL	100 %	10/7/2023	EPS SANITAS	PROTECCION	SURA
JULIANA GOMEZ CHIQUIZA	1033775288	PROFESIONAL SOCIAL	100 %	10/7/2023	FAMISANAR	PORVENIR	SURA
FELIPE MOSQUERA SANTAMARIA	1014233478	PROFESIONAL AMBIENTAL	100 %	10/7/2023	COMPENSAR EPS	PROTECCION	SURA
DAVID FLOREZ GAMBOA	1022332591	RESIDENTE TECNICO	100 %	10/7/2023	EPS SURA	PORVENIR	SURA
FRANCISCO MURILLO	80072431	RESIDENTE TECNICO	100 %	10/7/2023	FAMISANAR	PORVENIR	SURA
ANA MARIA TRUJILLO	1.234.640.705	RESIDENTE TECNICO	100 %	10/7/2023	EPS SANITAS	COLPENSIONES	SURA
SANDRA CHAVEZ	25273429	RESIDENTE TECNICO	100 %	20/09/2023	COMPENSAR	PORVENIR	SURA
MILENA PINZON	52731034	PROFESIONAL SOCIAL	100 %	29/09/2023	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	SURA

Personal Total Operativo Contratista

NOBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA EXAMEN OCUPACIONAL	EPS	PENSION	ARL
ALIRIO DIAZ VELANDIA	79.570.885	ENCARGADO	7/26/2023	11/2/2022	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA
HERNAN IGNACIO SANCHEZ LARA	1022970444	OFICIAL	7/26/2023	8/3/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
LIBORIO SANCHEZ GOMEZ	79517946	ENCARGADO	7/26/2023	4/19/2023	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA
VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CASTIBLANCO	79444038	ENCARGADO	7/26/2023	8/5/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
FRANKLIN RUBIO HERRERA	1032388322	CONDUCTOR	7/31/2023	9/28/2022	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA
ALEXANDER RAMIREZ CASTRO	79986225	OFICIAL DE CONSTRUCCION	31/07/2023	11/10/2022	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
JHONNY ROJAS QUINTERO	5855467	OFICIAL DE CONSTRUCCION	7/31/2023	11/22/2022	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA
WILFREDO TORRES FLORES	7137076	OFICIAL	7/31/2023	7/29/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
CESAR AGUSTIN VICTORINO MESA	80.109.309	OFICIAL	7/31/2023	7/29/2023	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA
JOSE DANIEL CABEZAS GARZON	11315256	OFICIAL	7/31/2023	8/2/2023	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA
MARTIN ENRIQUE GUZMAN COLLANTE	77165310	MAESTRO DE OBRA	7/31/2023	10/11/2022	SURA	COLFONDOS	POSITIVA
VICTOR MANUEL BLANCO	6683921	OFICIAL	7/31/2023	7/29/2023	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA
ENDER EDUARDO ROJAS	2100970	OFICIAL	7/31/2023	10/3/2022	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
CARLOS EDUARDO RIAÑO MACIAS	80253412	AYUDANTE	7/31/2023	8/1/2023	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA
DALADIER CUELLAR GONGORA	79637053	MAESTRO DE OBRA	7/31/2023	9/13/2022	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA
GRIMALDO OSPINO OROZCO	1045170913	OFICIAL	7/31/2023	1/28/2023	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA
JORGE RAFAEL VIZCAINO VENENCIA	72158125	MAESTRO DE OBRA	7/31/2023	9/28/2022	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA
MIGUEL ANGEL LOPEZ PORTILLA	5763050	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	7/31/2023	9/24/2022	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
ORLANDO HERNANDEZ	5842300	OFICIAL DE CONSTRUCCION	7/31/2023	9/24/2022	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
HERIBERTO CARMELO ANAYA BARRIOS	73269251	OFICIAL DE CONSTRUCCION	7/31/2023	8/3/2023	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA
JOSE ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ	7214812	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	7/31/2023	8/3/2023	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA
LEANDRO CARRILLO	72174994	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	10/25/2022	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA
RAMIRO LEON ARANGO	80053384	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/3/2023	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA
ALIRIO CANON CARRILLO	1.057.014.684	MAESTRO DE OBRA	8/3/2023	8/3/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA

ANDREA KATERINE CLAVIJO MEDINA	1026594793	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/9/2023	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
JOSBER JAVIER MANUARE PARADA	5842091	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/1/2023	CAJACOPI	PORVENIR	POSITIVA
JOSE EDEXNEIDER CAÑON CARRILLO	1.010.199.482	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/3/2023	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA
LUIS ALEJANDRO BELTRAN GONZALEZ	1022940432	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/4/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
LUIS ORLANDO RAMIREZ CARVAJAL	3090178	OFICIAL DE OBRA	8/3/2023	8/5/2023	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA
OSBAR RENE BERNAL PAEZ	80778371	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/5/2023	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA
ENRIQUE CABRERA BOLAÑOS	1022955478	AYUDANTE DE OBRA	8/3/2023	8/5/2023	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA
JEISSON CAMILO LESMES SALAMANCA	1023005648	AYUDANTE DE OBRA	8/3/2023	1/4/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
YEFERSON ANDRES SANCHEZ CLAROS	1031133072	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	11/19/2022	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA
LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	OFICIAL SST	8/3/2023	10/13/2022	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA
WILLIAM YOVANNY LESMES	79823330	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	1/4/2023	CAPITAL SALUD	COLFONDOS	POSITIVA
JHON FREDY SERRANO VALBUENA	1023006710	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/4/2023	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
JULIO CESAR EPIEYU MONTIEL	5.623.699	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/3/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
EPIAYU MONTIEL LUIS ARTURO	6.353.981	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/3/2023	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA
ENRIQUE CABRERA HOYOS	83180945	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/7/2023	8/5/2023	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
GABRIEL ANTONIO GARAVITO SALAMANCA	79345951	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/7/2023	8/5/2023	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA
HAINSER ESNEIDER BUSTOS ARTUNDUAGA	1024520008	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/7/2023	8/8/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
SOLMAR HERNAN PINEDA ORDOÑEZ	79721578	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/7/2023	8/8/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
ANDERSON MAYUSA VALBUENA	80116098	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	2/27/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
ANDREY JAVIER LOZANO GUTIERREZ	1024520452	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	8/5/2023	COMPENSAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA
EDILBERTO SANCHEZ ALONSO	80767247	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	8/5/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
EDSON JOHAN ROMERO LOPEZ	1024604236	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	10/31/2022	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA
FABIAN ANDRES CAICEDO PINZON	1024519826	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	8/9/2023	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA
JAIR SANCHEZ DURAN	93435094	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	8/9/2023	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA
JOSE MIGUEL ALONSO CASTILLO	1033730983	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	8/9/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
JOSE MAURICIO QUINTERO MEDINA	80047232	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	8/4/2023	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
LUIS FELIPE ROMERO LOPEZ	79477829	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	8/9/2023	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
ROBER JOSE CESPEDES MIQUELENA	5751410	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	8/9/2023	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA
ALEJANDRO SANCHEZ MOSQUERA	82383972	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/11/2023	8/8/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA

DANY JAVIER VILLEGAS OCHOA	5709178	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/11/2023	10/3/2022	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
EDWIN ANDRES PULIDO LOPEZ	1088008546	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/10/2023	8/10/2023	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA
FREDY ALONSO TOVAR ALVAREZ	80894735	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/11/2023	8/9/2023	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA
HOLMAN ALVAREZ CARDONA	1024478246	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/10/2023	8/9/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
JEISSON CAMILO DIAZ ROMERO	1022993926	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/10/2023	8/9/2023	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA
JESUS RUIZ PIRELA	5348814	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/11/2023	8/9/2023	ASMET	PORVENIR	POSITIVA
JHONATAN VARGAS HERRERA	1193499046	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/10/2023	2/7/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
EDWIN VARGAS	1006158053	OFICIAL DE CONSTRUCCION	10/08/2023	01/02/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
LUIS ALBERTO OSPINO OJEDA	1192910231	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/11/2023	8/2/2023	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA
LUIS ALBERTO VARGAS HERRERA	1193492533	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/10/2023	2/1/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
NELSON MARTINEZ GONZALEZ	79.409.617	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/10/2023	2/1/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
RICHAR MAURICIO CUPITRA HUERTAS	1024562912	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/11/2023	8/11/2023	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA
JANIER ESPINOSA MARTINEZ	1007056864	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/12/2023	8/11/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
RENNY JOSE MONTERO ZAMORA	2874474	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/12/2023	8/9/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
VICTOR RIZO	1066097223	OFICIAL DE CONSTRUCCION	17/08/2023	17/08/2023	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA
JOSE MARTINEZ	79666136	OFICIAL DE CONSTRUCCION	16/08/2023	24/09/2022	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA
ALBERTO PACHECO	1045169796	OFICIAL DE CONSTRUCCION	16/08/2023	12/8/2023	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA
FERNANDO MORENO	3199429	OFICIAL DE CONSTRUCCION	18/06/2023	27/09/2022	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
LUIS TRIANA	80321737	OFICIAL DE CONSTRUCCION	16/08/2023	15/08/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
JUAN TRIANA	1000455392	OFICIAL DE CONSTRUCCION	16/08/2023	15/08/2023	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA
BERNARDINO LASTRA	1044331516	OFICIAL DE CONSTRUCCION	24/08/2023	23/08/2023	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA
LUIS GARCIA	79668467	OFICIAL DE CONSTRUCCION	23/08/2023	5/8/2023	CAPITAL SALUD	COLFONDOS	POSITIVA
HERQUIN PEREZ	79537584	OFICIAL DE CONSTRUCCION	24/08/2023	22/02/2023	SURA	PORVENIR	POSITIVA
EDILBERTO SOTELO	19460529	OFICIAL DE CONSTRUCCION	22/08/2023	22/08/2023	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA
YORGELIS CALVO	PPT.2832993	OFICIAL DE CONSTRUCCION	23/08/2023	29/10/2022	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
ALCIDES RODRIGUEZ	PPT.6726606	OFICIAL DE CONSTRUCCION	22/08/2023	22/08/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
HUMBERTO BORDA	79815559	OFICIAL DE CONSTRUCCION	30/08/2023	21/12/2022	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA
JUAN MANUEL SORIA	1001056923	OFICIAL DE CONSTRUCCION	30/08/2023	30/08/2023	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA
JOSE FETECUA	5934230	OFICIAL DE CONSTRUCCION	30/08/2023	18/08/2023	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA
CAMILO PINZON	1021512335	OFICIAL	05/09/2023	25/08/2023	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA
SEBASTIAN BORDA	1000002953	OFICIAL	05/09/2023	21/12/2022	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
JAVIER CONTRERAS	1001173099	OFICIAL	08/09/2023	07/09/2023	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA
JHON MARTINEZ	1129497079	OFICIAL	08/09/2023	07/09/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
HERVER GOMEZ	1006700960	OFICIAL	08/09/2023	07/09/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
WILSON FETECUA	80896669	OFICIAL	13/09/2023	13/09/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
JOSE LUIS CAÑON	79452832	OFICIAL	13/09/2023	04/09/2023	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA

CAMPO ELIAS GALINDO	14251909	OFICIAL	07/09/2023	04/09/2023	FAMISANAR	PORVENIR	SURA
CRISTIAN CAÑON	1022996459	OFICIAL	07/09/2023	08/09/2023	MUTUALSER	PORVENIR	SURA
EDILBERTO CASTILLO	1007868467	OFICIAL	07/09/2023	01/09/2023	CAPITAL SALUD	COLFONDOS	SURA
GIOVANY SANCHEZ	1233890268	OFICIAL	07/09/2023	01/09/2023	SURA	PORVENIR	SURA
GLORIA LOZANO	52795204	OFICIAL	07/09/2023	01/09/2023	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA
JORGE LACHE	7333126	OFICIAL	07/09/2023	01/09/2023	FAMISANAR	PORVENIR	SURA
JOSE TEHERAN	1100336118	OFICIAL	07/09/2023	01/09/2023	MUTUALSER	PROTECCION	SURA
PARMENIO CORDOBA	11570156	OFICIAL	07/09/2023	01/09/2023	MUTUALSER	COLPENSIONES	SURA
ROGER HIGUERA	80778610	OFICIAL	07/09/2023	01/09/2023	FAMISANR	PORVENIR	SURA
CRISTIAN JIMENEZ	1010220973	OFICIAL	07/09/2023	01/09/2023	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA
JOSE MERCADO	1102845196	OFICIAL	15/09/2023	15/09/2023	CAJA COOPI	PORVENIR	SURA
OSCAR JIMENEZ	1030658718	OFICIAL	27/09/2023	08/09/2023	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA

Anexo matriz de seguridad social

REGISTROS FOTOGRAFICOS DE ACOMPAÑAMIENTO EN CAMBIOS DE CUBIERTA







4. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se entregan documentación completa del personal operativo activo en obra, se anexo carpeta de cada una de las 81 personas operativas , también de 15 administrativos activos presentes en obra (drive) con las afiliaciones al sistema general de seguridad social

Se realiza verificación y se adjunta a este informe las afiliaciones al sistema de seguridad social CEDULA, ARL, EPS, FONDO DE PENSIONES, otros documentos, certificado médico, certificado de trabajo en alturas si lo tienen, registro de inducción, registro de notificación de riesgos, registrode entrega de EPP.

Anexo: Planilla de seguridad social personal operativo del mes de septiembre, y personal administrativo del mes de agosto respectivamente .

5. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD.

Durante el mes de septiembre se realizon capacitaciones mensuales, y charlas semanales, en temas se seguridad y salud en el trabajo, al personal operativo de menara aleatoria, las inducciónes del personal nuevo se encuentran anexadas en la carpeta , DOCUMENTACION PERSONAL, COINCO S.A.S.

Durante el periodo de septiembre, se realizaron las siguientes charlas y se adiciona la capacitacion de la conformacion de brigada de emergencias, por el simulacro nacional de evacuacion :

INDUCCION A OBRA :Capacitacion
DIVULGACION PLANO DE RUTA DE EVACUACION Y MEDEVAC A BENEFICIARIOS Y OPÉRATIVOS : Charla de seguridad
USO OBLIGATORIO DE EPP: Capacitacion, charla de seguridad
POSTURAS ADECUADAS. Charla de seguridad
USO DE HERRAMIENTAS MENORES: charla , admon y operativos
CONFORMACION BRIGADA DE EMERGENCIAS: Capacitacion, charla

Nota: Anexos formatos diligenciados y firmados PDF, y cronograma de capacitaciones.

5.1. INSPECCIONES

Durante el periodo se realizaron inspecciones aleatorias de herramientas electricas y plataformas de acceso para cambio de cubierta, del personal operativo , en los diferentes mv en obra, tales como:

Inspeccion de taladros
Inspeccion de pulidoras
Inspeccion de andamios convencionales
Inspeccion de cortadora de enchape
Inspeccion de herramientas menores

Nota: se anexaran formatos diligenciados y firmados PDF

5.1 PLAN DE EMERGENCIAS

Se realiza divulgacion del medevac en las bitacoras de obra en el momento de la apertura a los beneficiarios y de plano de rutas de evacuacion los cuales son pegados al interior de las viviendas en ejecucion y en las bitacoras para revision de la supervision, se les comparte la informacion al personal operativo y beneficiarios, en los diferentes frentes de obra.

Al momento de la entrega de cada una de las viviendas en ejecucion, se le obsequira al beneficiario un folleto informativo ,sobre que hacer en caso de emergencia, el cual tambien va pegado en las bitacoras de obra. Se conforma la brigada de emergencia, se realiza convocatoria para la conformacion, se realiza capacitacion de la brigada , se les entregan los chalecos distintivos, se anexan hojas de vida de los brigadistas.

- Anexo registro fotografico general de planos de ruta de evacuacion en las viviendas en obra, documentos de conformacion de brigada de emergencias

6. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Se realiza entrega de dotacion, al personal administrativo y operativo activo en el proyecto segun manual de indumentaria dado por la SDH, y elementos de proteccion, tales como:
Operativos dotacion: se compone de overol de dos piezas, botas de seguridad, casco de seguridad con barbuquejo para los trabajos en alturas
Operativos EPP: gafas de seguridad, guantes de nitrilo, tapabocas industrial
Personal administrativo dotacion: Chaqueta , casco de seguridad, botas de seguridad


Anexo matriz de EPP

- **Registro Fotografico tabla 6.1**

6.1

CAPACITACIÓN	INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS MANUALES	SEÑALIZACION PLAN DE EMERGENCIAS
		

SEGUIMIENTO CAMBIO DE CUBIERTA	VERIFICACION DE ARMADO DE ANDAMIOS	ENTREGA DE FOLLETOS PLAN DE EMERGENCIAS
		

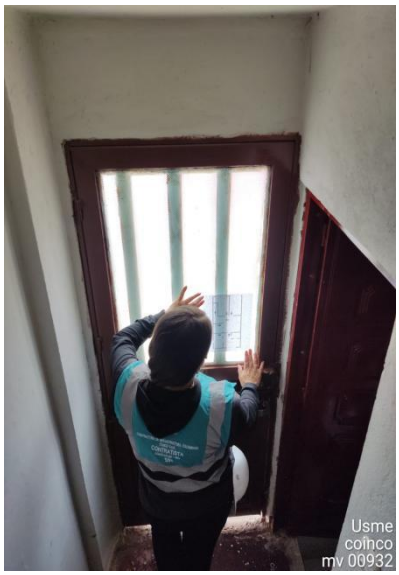CAPACITACION BRIGADA DE EMERGENCIA	INSTALACION RUTAS DE EVACUACION	CHARLA MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS ADMON
		
INSTALACION DE PLANOS DE RUTAS DE EVACUACION	CHARLAS DE SEGURIDAD	TOMA DE PERMISOS DE TRABAJO/ CAMBIOS DE CUBIERTA A MAS DE 2.0 Mtrs
		

Tel: (031) 300 3019
Móvil: 317 6816442
Carrera 7 No. 109-28
Bogotá - Colombia

REPOSICION DE EPP	INSTALACION DE RUTA DE EVACUACION Y SEÑALIZACION	INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS
	 	
ACOMPAÑAMIENTO ENCAMBIO DE CUBIERTAS	CHARLAS DE SEGURIDAD	CONFORMACION DE BRIGADA DE EMERGENCIAS
		

7. ACTIVIDADES DE CAMBIO DE CUBIERTA

Durante el mes de septiembre se realizaron; seguimientos, acompañamientos y verificación de las condiciones de obra, y del personal operativo capacitado para la ejecucion del cambio de cubierta, inspecciones a los trabajos referentes al desmonte y montaje de cubiertas, desde la parte inferior de una manera segura, haciendo uso de escaleras y plataformas de trabajo(andamios convencionales) se establecio el uso de una sección de andamio con plataforma, lo cual no nos da lugar a una caída libre.

Anexo informes ejecutivos, de cambio de cubiertas, de las viviendas donde se realizo dicha actividad.
Ver tabla numero 2

8. AUSENTISMO LABORAL

A la fecha no se generaron ningún tipo de ausentismo laboral, procedente de las condiciones de trabajo del entorno o incidente laboral, a la fecha no se lleva ningún indicador de índice de accidentalidad, por parte del personal contratista COINCO S.A.S

9. RETIRO DE PERSONAL


Al finalizar el periodo de septiembre, no se reportan retiros correspondientes al personal administrativo, y del personal operativo los mismos 15 retiros del periodo anterior , del contratista COINCO S.A.S.

10. ANEXO

- FORMATO DE CAPACITACION (Formato PDF)
- CARPETAS DE LA DOCUMENTACION PERSONAL ACTIVO
- FORMATOS CHARLAS DE SEGURIDAD.
- PLAN DE TRABAJO
- REGISTROS DE INDUCCION
- INFORMES EJECUTIVOS CAMBIO DE CUBIERTAS
- PERMISOS DE TRABAJO
- MATRIZ DE EPP
- MATRIZ DE SEGURIDAD SOCIAL
- CARPETAS DE DOCUMENTACION PERSONAL ADMON NUEVO
- SOPORTE DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO
- DOCUMENTACION CONFORMACION DE BRIGADA DE EMERGENCIAS

JASBLEIDY FORIGUA CASTILLO
PROFESIONAL SST
COINCO S.A.S

Tel: (031) 300 3019
Móvil: 317 6816442
Carrera 7 No. 109-28
Bogotá - Colombia

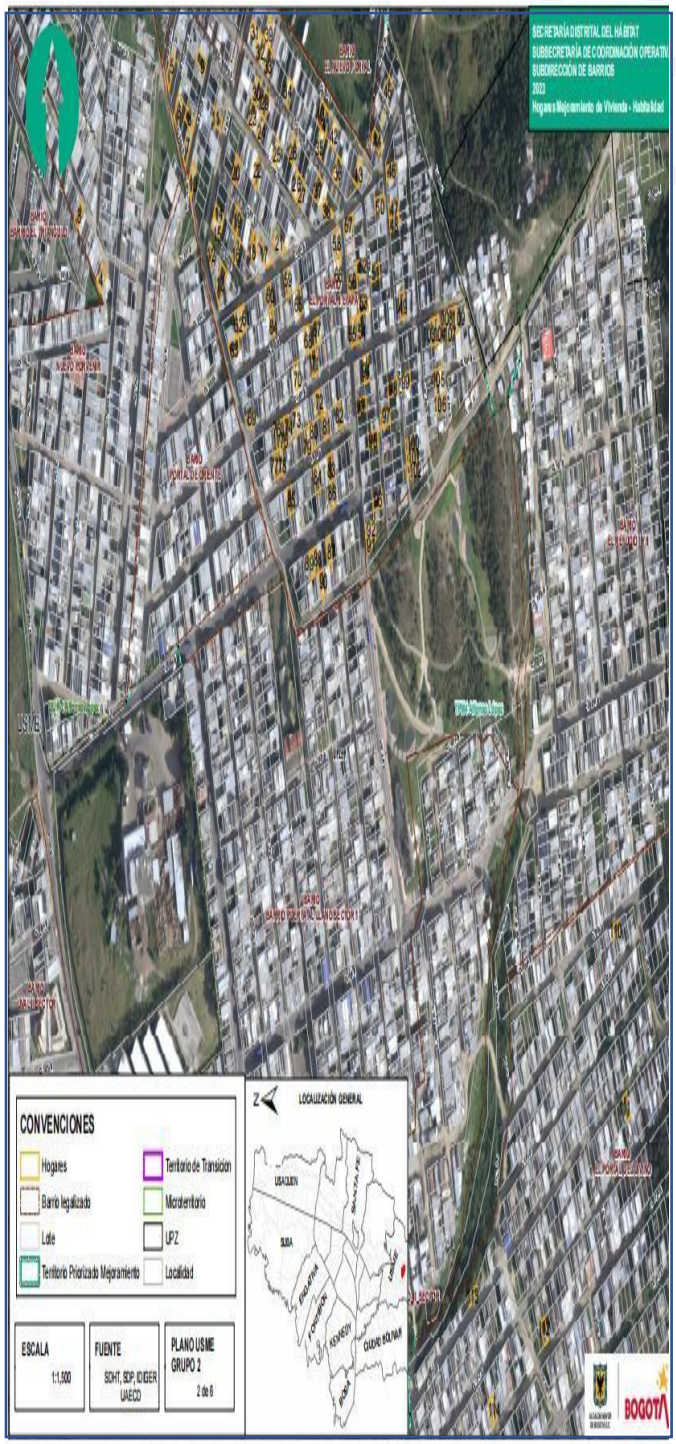

INFORME MENSUAL 03
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 COMPONENTE AMBIENTAL
CONTRATO DE OBRA 915-2023
CONTRATO INTERVENTORIA986-2023

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 2023

RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA CONTRATO DE OBRA 915-2023

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer, la gestión realizada durante el periodo correspondiente en materia de Medio Ambiente, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la obra.

El Plan de trabajo del Medio Ambiente es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los trabajos que realizara la empresa **Constructora de Infraestructura Colombianas S.A.S** con el propósito de reducir al mínimo los accidentes y daños al Ambiente, mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar los daños a la propiedad, al Medio Ambiente y evitar las pérdidas para la Empresa.

En cumplimiento al contrato N° 915 de 2023, Como ejecutor de obra se realizará seguimiento y ejecución de los informes Mensuales en la mejora continua para el proyecto en materia del Plan de Gestión Ambiental, se realizan las diferentes consolidaciones documentales y anexos como soportes al presente informe, ejecutadas durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

2.1. OBJETIVO GENERAL

El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo fundamental, involucrar la protección ambiental buscando prevenir, minimizar, mitigar los efectos ambientales negativos de la intervención "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA URBANA - LOCALIDAD DE USME DE BOGOTÀ D, C.", y optimizando en lo posible los efectos positivos del mismo.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir las actividades para realizar el debido almacenamiento, manejo y disposición de los residuos de la construcción, demolición y materiales, generados en el desarrollo de las actividades de **Constructora de Infraestructura Colombianas S.A.S**, en el marco del contrato de obra 915 de 2023.
- Proponer medidas de manejo y disposición de materiales sólidos con el fin de prevenir, controlar o mitigar el deterioro ambiental.

3. ALCANCE

El presente plan aplica para la ejecución de todas las obras en el marco del contrato 915 de 2023.

4. GESTIÓN DOCUMENTAL

Durante el período del informe, se llevaron a cabo diversas actividades fundamentales para el desarrollo y mejora de la gestión ambiental del proyecto. A continuación, se detallan las principales actividades realizadas:

4.1 SUBSANACIÓN DE HALLAZGOS:

Durante el período evaluado, se atendieron de manera oportuna y diligente todas las observaciones y hallazgos presentados por parte de la interventoría.

5. COMITÉS INTEGRALES

Durante el periodo del informe, se llevó a cabo exitosamente dos Comité Integral con el objetivo de abordar de manera integral los aspectos clave del proyecto. Este comité representó un espacio de colaboración y participación de los diferentes actores involucrados.

6. CHARLAS AMBIENTALES

De acuerdo con el plan de trabajo que se presenta en el informe se realizaron charla informativa y una capacitación en el mes de septiembre, los temas tratados fueron Anexo 1 y Anexo 2:

TEMA	CHARLA O CAPACITACIÓN	FECHA
Consumo responsable del recurso hídrico	Charla	1-8 de septiembre de 2023
Cuerpos de agua, sumideros y alcantarillado	Charla	10-15 de septiembre de 2023
Transporte de residuos	Charla	18-22 de septiembre de 2023
Socialización plan de manejo ambiental	Charla	14 de septiembre de 2023
Manejo kit de derrames	Capacitación	25-29 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO














Usme
coinco
mv 00558


Usme
coino
mv 00599


Usme
coinco
mv 00879




Usme
coinco
pac


8-66 Calle 102 Sur
Usme
Bogotá
coinco
mv 00535













7. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

El manejo de los residuos generados en la oficina (PAC) fueron dispuestos de manera correcta, los cuales fueron recolectados a través de las ESP (Empresas de Servicio Público) y las jornadas de recolección del barrio. Cabe aclarar que el volumen generado no fue muy grande por lo que no se generó impacto en el bienestar del personal.

Los residuos generados en obra se les dio disposición en la escombrera de Tunjuelo – CEMEX.

7.1 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Durante el periodo del presente informe, los residuos de demolición y construcción (RCD) se acopiaron en acopios temporales hasta que se generó la cantidad suficiente para ser dispuestos en la escombrera autorizada de CEMEX Tunjuelito. En la siguiente tabla se relacionan los días de disposición, según lo evidencian el certificado de disposición final como se evidencia en el Anexo 3.

CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN							
Fecha	**Remisión**	**Placa de Volqueta**	**Numero Pin De La Volqueta**	**Residuos de Construcción y Demolición Generados**			**Sitio en los que fueron dispuestos los RCD[5]**
				Cantidad Generada[3]			
				Cargue Sencillo	**Cargue Doble**	**Total ,m3**	
04/09/2023	DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	AJB 574	N/A	X		7	ESCOMBRERA TUNJUELO - CEMEX
06/09/2023	DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	AJB 574	N/A	X		7	ESCOMBRERA TUNJUELO - CEMEX
08/09/2023	DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	AJB 574	N/A	X		7	ESCOMBRERA TUNJUELO - CEMEX
TOTALES							**21 M3**

7.2 RESPEL.

Durante el periodo del informe, no se generó el volumen necesario de residuos peligrosos para su disposición. Por tal motivo, se encuentran acopiados de manera adecuada en un espacio seguro y controlado, hasta que se alcance el

volumen necesario para su disposición final, los cuales se dispondrán con D3A-DISTRIBUIDORES AMBIENTALES S.A.S

7.2 RESIDUOS APROVECHABLES.

Se genero una pequeña cantidad de estos residuos por tal motivo no se realizó una disposición en el presente informe al no contar con el volumen requerido, adicional se está en la búsqueda del gestor autorizado para la disposición de estos.



7.3 RESIDUOS NO APROVECHABLES.

El manejo de los residuos no aprovechables generados en la oficina (PAC) fueron dispuestos de manera correcta, los cuales fueron recolectados a través de las ESP (Empresas de Servicio Público) y las jornadas de recolección del barrio. Cabe aclarar que el volumen generado no fue muy grande por lo que no se generó impacto en el bienestar del personal. Como los residuos se disponen semanales no se cuentan con acopio temporal.


8. LISTADO DE VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA OBRA

Los vehículos encargados de realizar la recolección de los RCD y posterior disposición final, así como los que se dispusieron para trasegar el material, a los diferentes puntos de trabajo y utilizados en el mes son los relacionados a continuación dejando constancia que están en buenas condiciones mecánicas y cumpliendo con todos los documentos exigidos por el ministerio de transporte para su movilización información que se verifica en el formato control de vehículos Anexo 4.

Maquinaria y o equipo			periodo	Pin Ambiental	Actividad para ejecutar
Modelo	Tipo	Placa			
1952	Volqueta	AJB574	Septiembre	1945	Recolección de escombro
1978	Camioneta	LDI361	Septiembre	N/A	Entrega de material y recolección de escombro
1975	Camión	NBF998	Septiembre	N/A	Entrega de material
1985	Camioneta	GYB750	Septiembre	N/A	Entrega de material

9. PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE ESCOMBRO EN LAS VIVIENDAS ENTREGADAS

En el interior de las viviendas a intervenir se realiza una correcta separación de residuos. Cuando se cuenta con una gran cantidad de residuos, se dejan al exterior de la fachada, señalizados con el fin de ser retirados lo más pronto posible. Una vez retirados, se realiza una nueva clasificación para realizar una correcta separación de residuos y se trasladan a un acopio temporal, en donde se espera tener el volumen necesario para su disposición final.

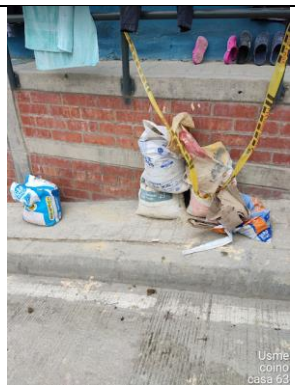







10. LICENCIA AMBIENTAL

Para el presente proyecto no se requirió licencias ambientales ya que no hubo afectaciones ambientales a ninguno de los ecosistemas (agua, suelo, aire, fauna y flora), ya que las obras que se realizaron no fueron de levantamiento estructurales solo fueron de ejecuciones internar de la vivienda.


Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la secretaría distrital del hábitat. grupo 2 2023.

11. COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

Actualmente, estamos llevando a cabo un proceso de verificación y actualización exhaustiva de los certificados de compra de materia prima en respuesta a los hallazgos identificados por la intervención. Como parte de nuestro compromiso con la transparencia y la mejora continua, destacando nuestra dedicación para garantizar la calidad y la integridad de nuestros registros de adquisiciones de materia prima con los nuevos certificados que se evidenciaran en el anexo 7.

12. PUNTO ECOLÓGICO PAC Y EN LAS VIVIENDAS QUE SE ADELANTAN MEJORAMIENTOS.

Durante el periodo del presente informe, se cuenta con un punto ecológico en el PAC. Adicional, se implementaron puntos ecológicos en cada vivienda que se encontraba en proceso de mejoramiento. Los puntos ecológicos fueron socializados a los maestros de obra para su correcto uso.

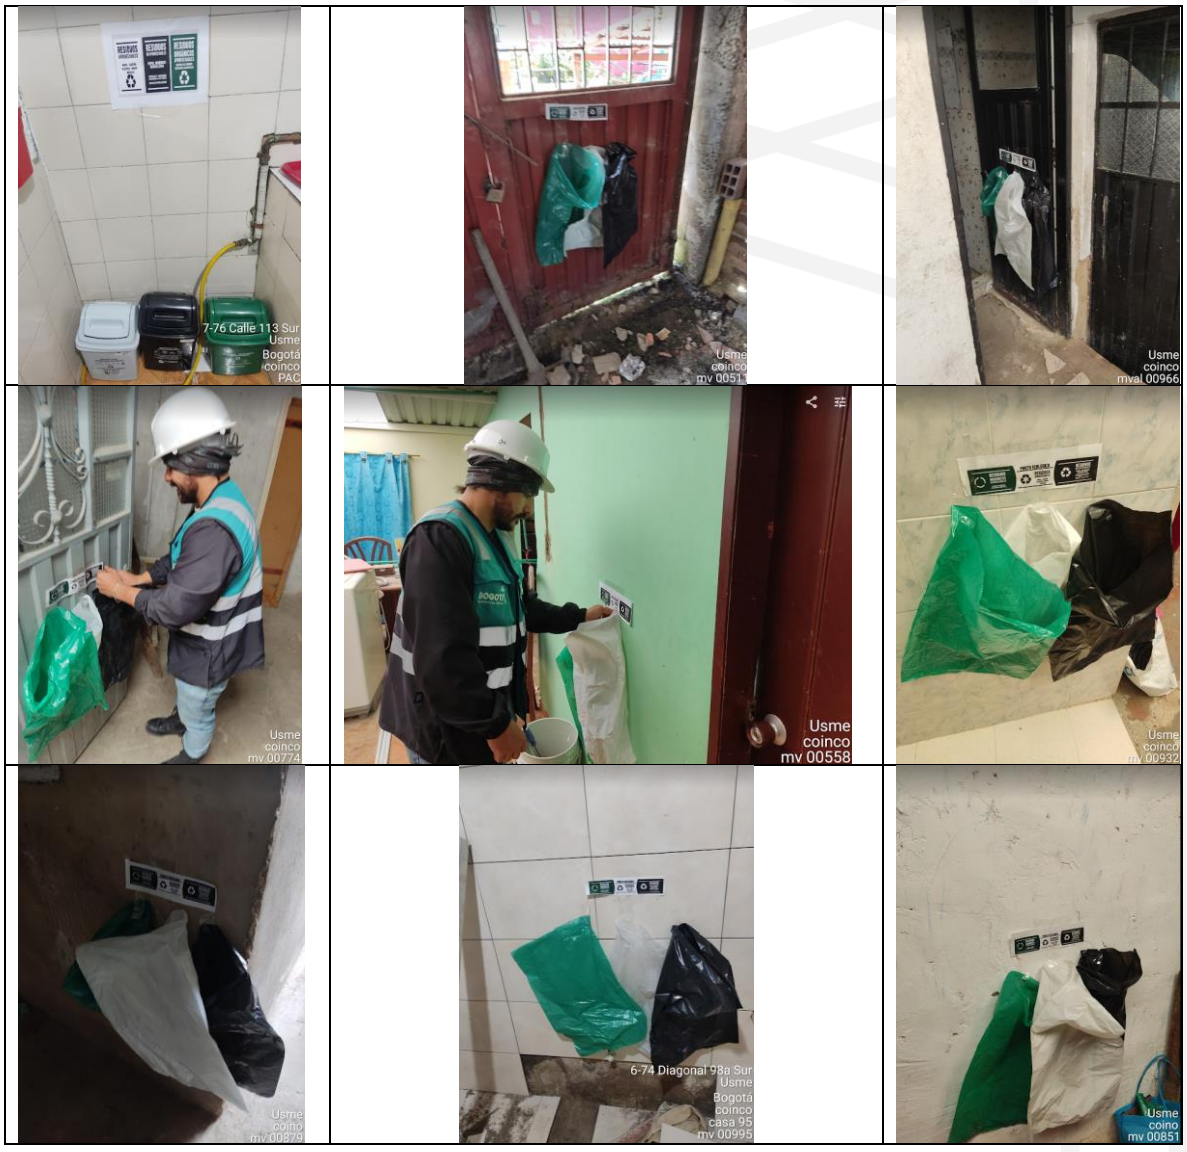





13. MANUAL DEL USO ADECUADO DE LAS CANECAS (KIT DEL PUNTO ECOLÓGICO).

Al realizar la entrega de las viviendas, se da un punto ecológico con 10 bolsas para el uso de los beneficiarios. Junto con el punto ecológico, se entrega un folleto informativo que relaciona su uso con otras prácticas ambientales. Esta información es socializada al beneficiario por medio de nuestro grupo de trabajo administrativo, el cual fue capacitado para brindar dicha información.



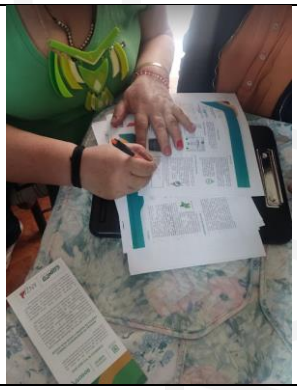

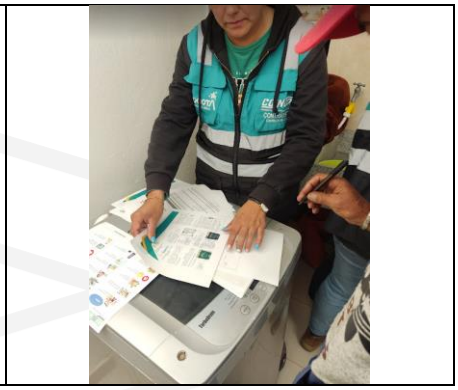

14. PUNTO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Durante el mes del presente informe, se realizó la recolección de residuos peligrosos y RCD. Estos residuos se encuentran resguardados del sol y del agua para evitar la contaminación en acopios temporales. Con el fin de contar con el volumen mínimo exigido por la empresa encargada para su disposición final.

Cemento	Pegador	Pintura	RCD
			
Epps usados	**Tarros PVC**	**Tarros silicona**	**Acopio**
			

15. PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS.

Dando cumplimiento al plan de manejo ambiental, al finalizar cada jornada de trabajo se hará una limpieza general separando los residuos químicos y

disponiéndose de forma temporal en lonas para su recolección y llevar ente encargado de dar su disposición final a estos residuos químicos

- Bolsas de pegante.
- Bolsas de cemento.
- Bolsas tarros de pintura.
- Tarros de PVC
- Tarros de silicona
- EPPs utilizados

Durante el tiempo que los residuos se encuentra en cada vivienda, se disponen en lona mientras que se traslada al punto de recolección temporal. En la separación de residuos, en algunas ocasiones verificamos que nuestro personal operativo no realiza la recolección adecuada de los residuos químicos y por tal motivo la interventoría ha realizado las debidas observaciones sobre ese proceso. Las medidas adecuadas que tomamos para que el personal realice bien el procedimiento de la separación de los residuos químicos es realizando capacitaciones y charlas del procedimiento adecuado.



16. EMERGENCIA POR DERRAMES

Durante el periodo del presente informe no se presentaron emergencias por derrames. Sin embargo, para la atención de estas situaciones, se cuenta con un kit

de derrames en el PAC. Además, se llevó a cabo una capacitación dirigida al personal administrativo y de obra con el propósito de dotar a los empleados del conocimiento necesario para gestionar eficazmente la respuesta ante posibles derrames



17. IMPLEMENTACIÓN DE FOLLETO GUÍA DE COMPRAS SOSTENIBLES


Se ha elaborado un folleto informativo sobre compras sostenibles, el cual se fundamenta en la Guía de Compras Públicas Sostenibles y el Procedimiento del Programa de Consumo Sostenible. Este material proporciona valiosa información y directrices para la adquisición responsable de bienes y servicios, alineando nuestras prácticas con los principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.



18. ANEXOS

- ANEXO 1. CHARLAS AMBIENTALES
- ANEXO 2. CAPACITACIÓN AMBIENTAL
- ANEXO 3. CONTROL DE RESIDUOS.
- ANEXO 4. CONTROL DE VEHÍCULOS.
- ANEXO 5. CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL RCD
- ANEXO 6. LICENCIA DE LA ESCOMBRERA CEMEX
- ANEXO 7. CERTIFICADO DONDE SE COMPRA LA MATERIA PRIMA
- ANEXO 8. LICENCIAS D3A- DISTRIBUIDORES AMBIENTALES S.A.S
- ANEXO 9. DOCUMENTOS DE LOS VEHÍCULOS
- ANEXO 10. CONTROL DE MATERIAL
- ANEXO 11. ENTREGA DEL KIT PUNTO ECOLÓGICO.
- ANEXO 12. FOLLETO DE COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES
- ANEXO 13. REMISIONES COMPRA DE MATERIAL
- ANEXO 14. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Elaborado por:



JUAN FELIPE MOSQUERA SANTAMARIA
CC.Nº1.014.233.478 de Bogotá
Profesional Ambiental
