Candelaria, Valle del Cauca 23 de octubre de 2023 OFICIO:042

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS CANDELARIA
Interventores C.O. No. **203-13-05-009 DE 2022**
Candelaria

Referencia: CONTRATO No. 203-13-05-009 DE 2022 Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS EN PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE EN LA CABECERA Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA – VALLE DEL CAUCA",

Asunto: **SOLICITUD PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO. 203-13-05-009 DE 2022**

Cordial Saludo

Teniendo en cuenta que, a fecha de hoy, se continúan ejecutando actividades contractuales, tales como: EXCAVACION DE LA EXPLANACION DE VIA, CANALES INCLUYE RETIRO, RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO, BASE GRANULAR SBG-50y Fundiciones de PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 en los frentes de obra del proyecto entre los corregimientos de El carmelo, San Joaquín, Cabecera Candelaria y Villa Gorgona. Sin embargo, el rendimiento en dicha ejecución no ha sido lo esperado y programado, presentando atrasos en actividades como excavaciones, rellenos, Fundición de concreto MR42, construcción de sardineles, Nivelación de cámaras, Andenes en concreto, entre otras, debido a los siguientes hechos:


1. FACTOR CLIMATICO

Todos somos conocedores del gran incremento en régimen de lluvias que ha sufrido el País en los últimos meses del año 2023 y el mes de octubre de acuerdo a los reportes del IDEAM, en donde los modelos muestran que en lo que resta del mes de octubre, las precipitaciones se incrementarán principalmente y las condiciones de temporadas de lluvias en el país aumentarán, alcanzando su pico más alto en el mes de diciembre de 2023.

El factor climático es uno de los más importantes, toda vez que para poder realizar la instalación de material granular que genera la pista de la Instalación del concreto para el pavimento no se puede ejecutar mientras las condiciones climáticas no lo permitan, ya que es un factor que incide directamente en la calidad del pavimento y directamente en la garantía de las obras ejecutadas.

actividades de explanacion tales como excavaciones, y rellenos se han visto muy afectadas, pues al tener las excavaciones profundas, por las lluvias constantes se inundan, generando así un atraso, pues debemos retirar el agua y volver a conformar la excavación, al igual que la Instalación del concreto MR42, teniendo que cancelar los pedidos de la planta productora de concreto por estos factores climáticos.

De acuerdo con la información recopilada por el IDEAM se tiene que: para el mes de septiembre de 2023, el incremento de la precipitación total mensual en mm estuvo por encima de 1000 mm.

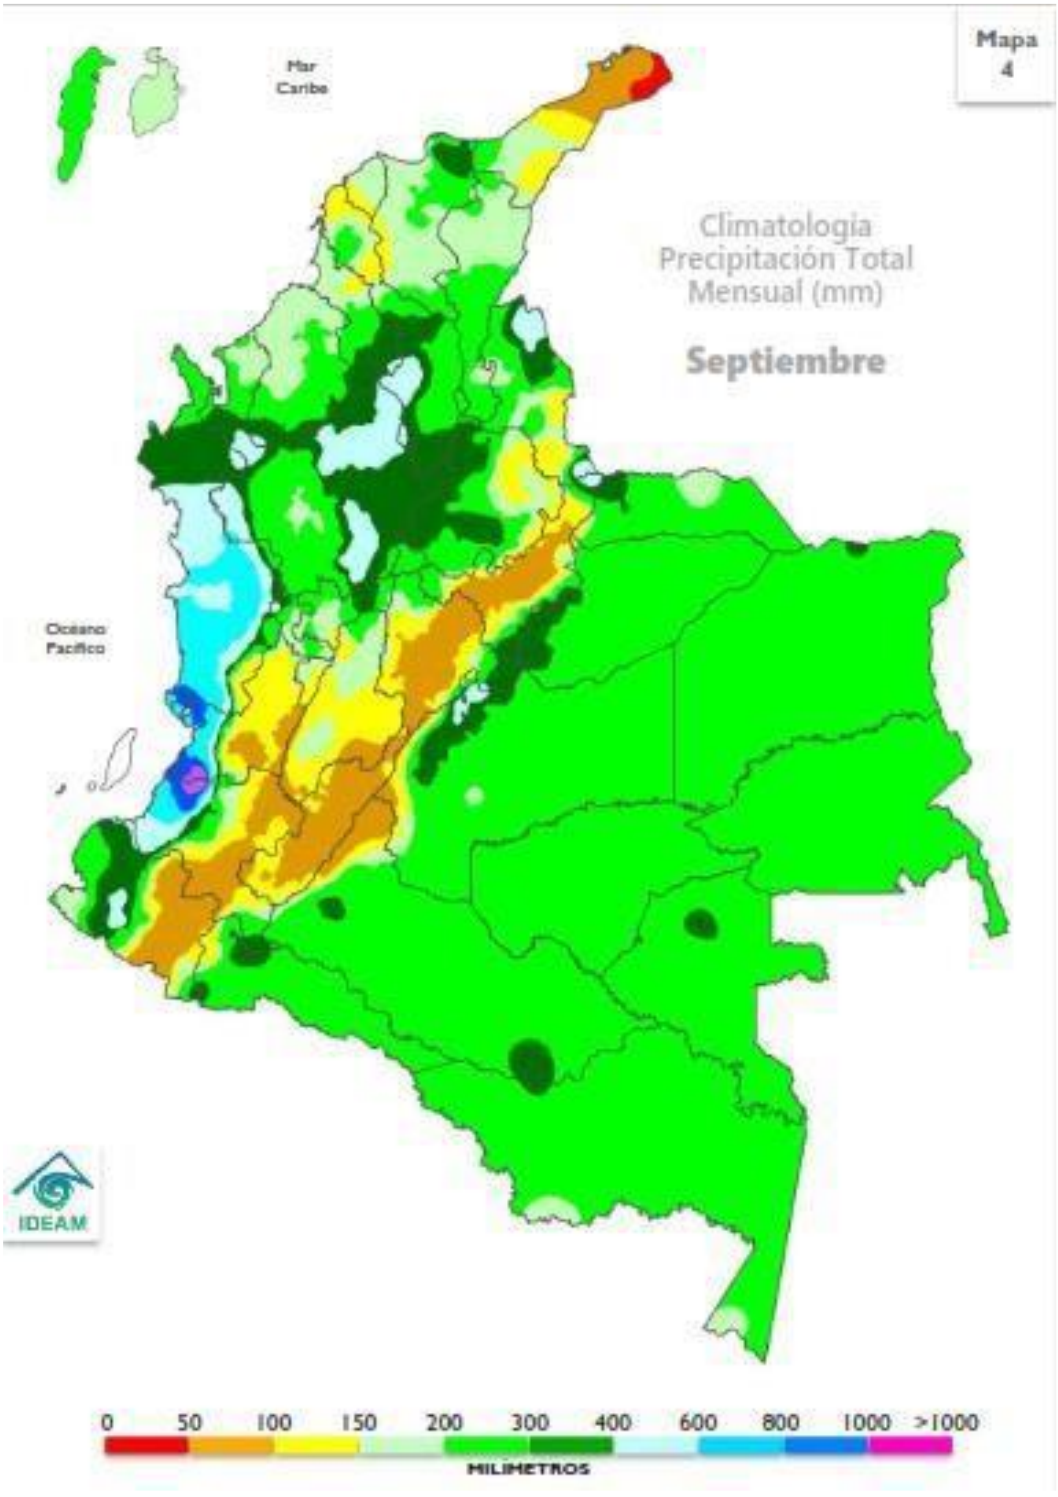

Como se puede evidenciar en el siguiente registro las dificultades presentadas:

CORREGIMIENTO EL CARMELO



CORREGIMIENTO EL CARMELO




KDT 718



CORREGIMIENTO VILLA GORGONA



CORREGIMIENTO SAN JOAQUIN



SOLICITUD

Por todo lo anterior y habida cuenta que se encuentran todos los hechos que dan fe de que las causas que han provocado el atraso son ajenas a nuestra voluntad, además de ser consideradas de fuerza mayor y como es nuestro caso se debe analizar la Prórroga del Contrato, de manera comedida le solicito me sea aprobada por parte de la Interventoria y la Entidad Contratante, una Prórroga de treinta Días a partir del 29 de octubre de 2023 hasta el 29 de noviembre de 2023, mientras las condiciones de lluvias disminuyan, lo anterior como una solución para evitar atrasos en la obra y con el fin de cumplir con la ejecución y el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales.

Atentos a su oportuna respuesta, agradeciendo de antemano la atención y gestión a esta solicitud.

Cordialmente,



LUIS HERNANDO BUENO GARCIA
CC. 16.274.366 de Palmira
Representante legal Vida Nueva Arquitectura e Ingeniería
