Bogotá D.C, 6 de Octubre de 2023

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Ciudad.

Referencia: PRORROGA CONTRATO No.457 DE 2023

Respetados Señores:

Conforme a lo manifestado por la entidad y en aras de llevar a buen fin la ejecución del contrato en mención, luego de analizados los pormenores presentados por las modificaciones a los diseños iniciales, se concluye que se requiere además de los recursos presentados en la propuesta económica adjunta, un tiempo adicional para ejecutar las actividades suscritas en el contrato No.457 de 2023.

Por lo anterior nos permitimos solicitar muy comedidamente a la Entidad nos sea aprobada una prórroga de treinta (30) días mas a la terminación del contrato, es decir hasta el 30 de noviembre de 2023 con el fin de cumplir a cabalidad con el objeto contractual sin contra tiempos.

Sin otro particular agradecemos la atención prestada, en espera de una respuesta positiva a la presente solicitud, como mencionamos con el fin de concluir eficientemente el objeto del contrato.

Atentamente,



YANIRA MESA CRUZ
Representante Legal
Suministros e Ingeniería MASECA S.A.S

Bogotá D.C, 6 de Octubre de 2023

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILARIOS
Ciudad.

Referencia: PRESUPUESTO ADICIONAL PERGOLA No.457 de 2023

Respetados Señores:

En vista de los acontecimientos presentados en el análisis y evaluación efectuado a los diseños iniciales proporcionados por parte de la superintendencia, a los cuales se hizo necesario replantear y realizar ajustes técnicos con el fin de llevar a buen término la ejecución del contrato en mención, nos permitimos presentar la siguiente propuesta económica adicional al presupuesto pactado en el contrato No.457 de 2023.

ADICIONALES PERGOLA- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO
1	**CUBIERTAS**					**$ 58,724,286**
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA CON CUBIERTA PLANA CON PENDIENTE EN VIDRIO. (PENDIENTE MÍNIMA PARA CORRECTO DESAGÜE)	M2	69.19	$310,924.37	$ 21,512,857.16	
2.2	SUMINISTRO E INTALACION VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO CRISTAL COLOR BRONCE O SIMILAR DE 6MM, INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON PROTECCION UV 35%,SELLADO CON SILICONA ACETICA TRANSPARENTE	M2	69.19	$537,815.13	$ 37,211,428.84	
	SUB TOTAL					**$ 58,724,286**
	IVA 19%					$ 11,157,614
	TOTAL					**$ 69,881,900**

Sin otro particular agradecemos la atención prestada en espera de una pronta respuesta.

Atentamente,

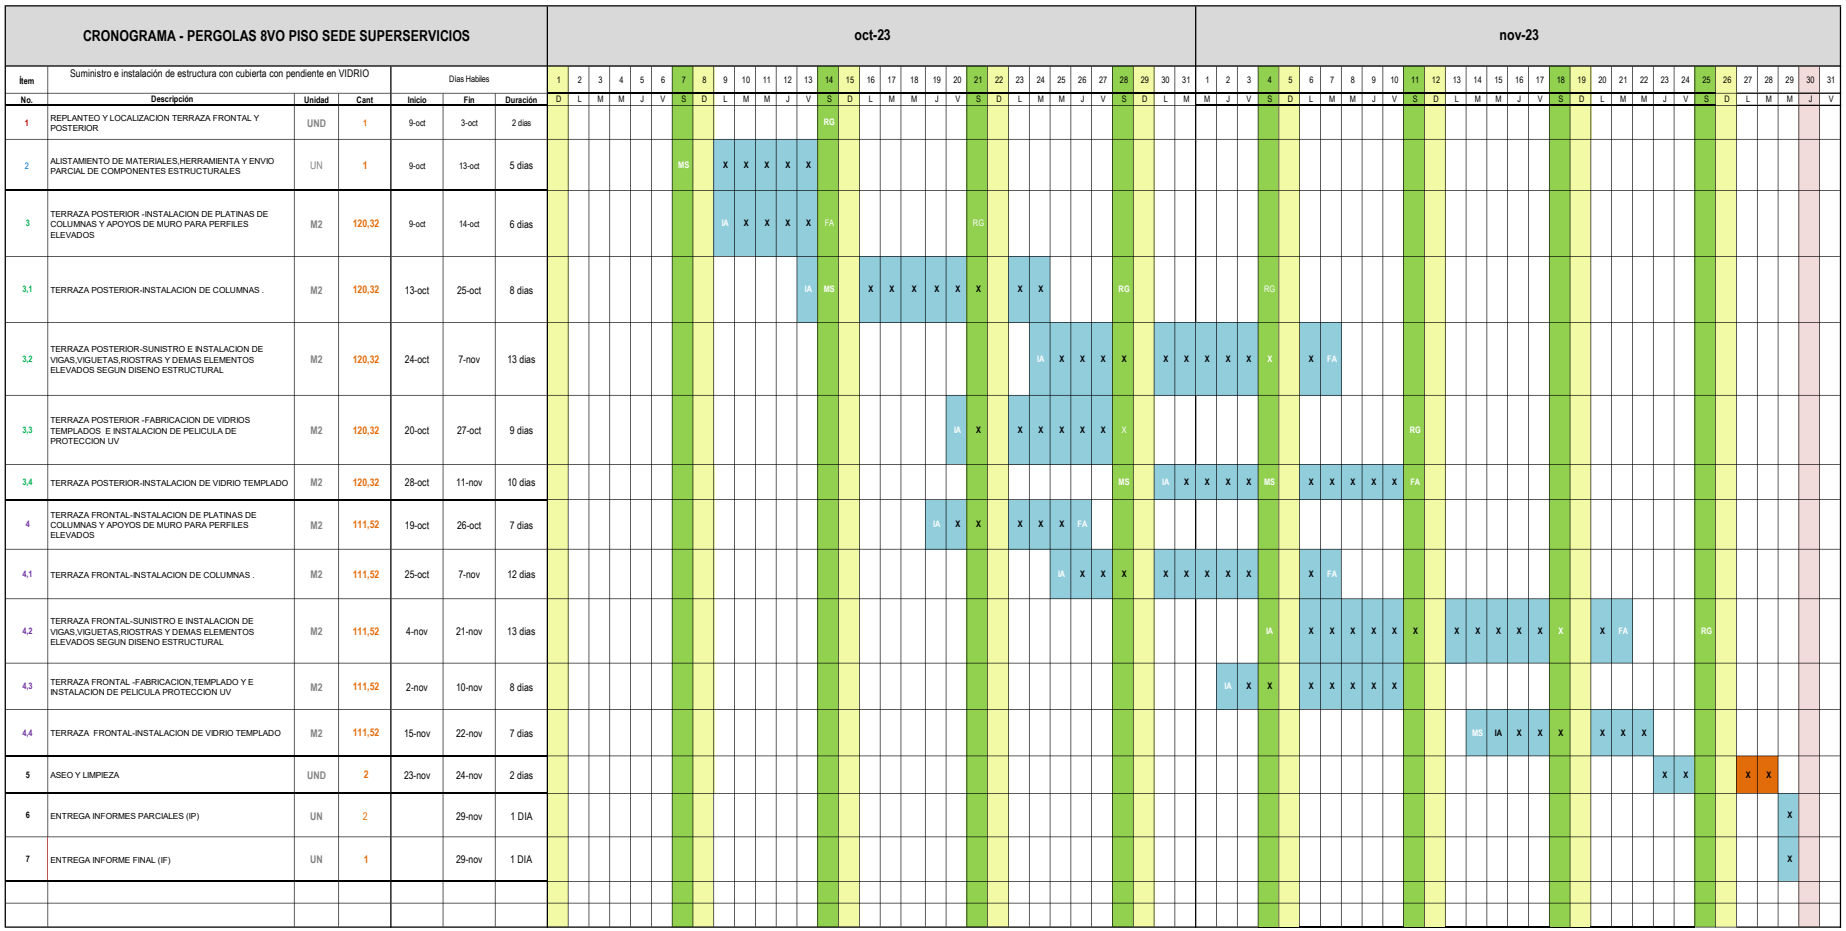


YANIRA MESA CRUZ
Representante Legal
Suministros e Ingeniería MASECA S.A.S

MATERIALES EN SITIO	MS
REVISION GENERAL	RG
INICIO ACTIVIDAD	IA
DESARROLLO ACTIVIDAD	X
FIN ACTIVIDAD	FA

CRONOGRAMA - PERGOLAS 8VO PISO SEDE SUPERSERVICIOS

Ítem	Suministro e instalación de estructura con cubierta con pendiente en VIDRIO			Días Hábiles		
No.	Descripción	Unidad	Cant	Inicio	Fin	Duración
1	REPLANTEO Y LOCALIZACION TERRAZA FRONTAL Y POSTERIOR	UND	1	9-oct	3-oct	2 dias
2	ALISTAMIENTO DE MATERIALES,HERRAMIENTA Y ENVIO PARCIAL DE COMPONENTES ESTRUCTURALES	UN	1	9-oct	13-oct	5 dias
3	TERRAZA POSTERIOR -INSTALACION DE PLATINAS DE COLUMNAS Y APOYOS DE MURO PARA PERFILES ELEVADOS	M2	120,32	9-oct	14-oct	6 dias
3,1	TERRAZA POSTERIOR-INSTALACION DE COLUMNAS .	M2	120,32	13-oct	25-oct	8 dias
3,2	TERRAZA POSTERIOR-SUNISTRO E INSTALACION DE VIGAS,VIGUETAS,RIOSTRAS Y DEMAS ELEMENTOS ELEVADOS SEGUN DISENO ESTRUCTURAL	M2	120,32	24-oct	7-nov	13 dias
3,3	TERRAZA POSTERIOR -FABRICACION DE VIDRIOS TEMPLADOS E INSTALACION DE PELICULA DE PROTECCION UV	M2	120,32	20-oct	27-oct	9 dias
3,4	TERRAZA POSTERIOR-INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO	M2	120,32	28-oct	11-nov	10 dias
4	TERRAZA FRONTAL-INSTALACION DE PLATINAS DE COLUMNAS Y APOYOS DE MURO PARA PERFILES ELEVADOS	M2	111,52	19-oct	26-oct	7 dias
4,1	TERRAZA FRONTAL-INSTALACION DE COLUMNAS .	M2	111,52	25-oct	7-nov	12 dias
4,2	TERRAZA FRONTAL-SUNISTRO E INSTALACION DE VIGAS,VIGUETAS,RIOSTRAS Y DEMAS ELEMENTOS ELEVADOS SEGUN DISENO ESTRUCTURAL	M2	111,52	4-nov	21-nov	13 dias
4,3	TERRAZA FRONTAL -FABRICACION,TEMPLADO Y E INSTALACION DE PELICULA PROTECCION UV	M2	111,52	2-nov	10-nov	8 dias
4,4	TERRAZA FRONTAL-INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO	M2	111,52	15-nov	22-nov	7 dias
5	ASEO Y LIMPIEZA	UND	2	23-nov	24-nov	2 dias
6	ENTREGA INFORMES PARCIALES (IP)	UN	2		29-nov	1 DIA
7	ENTREGA INFORME FINAL (IF)	UN	1		29-nov	1 DIA


oct-23
nov-23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
