1.02.2-42/23
Santiago de Cali, Octubre 26 de 2.023

Doctor
Daniel Alexander Narváez
Dir. Jurídico
Oficina Asesora de Jurídica
UNIAJC
Cali

Ref: Solicitud de otro sí al Contrato No. DJC-SA.08.02-223-2023.


Como supervisor asignado al contrato de la referencia, me permito presentar para su análisis y aprobación la siguiente solicitud:

Nos encontramos en la última etapa de ejecución del contrato, sin embargo, desde la dirección de Tecnología, Información y Comunicación D-Tic en conjunto con el área de Samrt Campus están desarrollando una serie de intervenciones en el marco de renovación tecnológica de networking en todas las sedes de la Institución y una vez verificado los centros de cableado estructurado se identificó que los aires acondicionados del NOC principal del tercer piso, el Centro de distribución intermedia ubicado en Gestión Humana y El centro de Datos de la Estación 1 presenta n constantes fallas a pesar de que son equipos que reciben mantenimiento periódico pero su bastante antiguos, exponiendo a fallas para los equipos activos.

De acuerdo con la normatividad aplicable norma EIATIA 568A/568B, se debe garantizar el óptimo desempeño y la vida útil de los equipos instalados en los centros de datos con una temperatura constante de 19°, en tal sentido, es necesario adelantar renovación de los aires acondicionados y así, evitar posibles garantías.

Adicionalmente y aprovechando que la entidad cuenta con los recursos necesarios y el contrato puede soportar con mayores cantidades la adquisición de equipos, se pretende dotar de aires acondicionados para el proyecto que se encuentra en ejecución para el mejoramiento del piso 6 del Edificio Avenida Estación I, donde se encuentran ubicadas las Facultades de Ciencias Empresariales y Ciencias Sociales y humanas , las cuales albergan aproximadamente 30 personal y que en la actualidad no cuentan con un sistema adecuado de climatización que brinde confort dadas las altas temperaturas que se están presentando pero también que faciliten el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. (Ver Layout proyecto).

LAYOUT PROY. FACULTADES ED. AVENIDA ESTACIÓN 1.

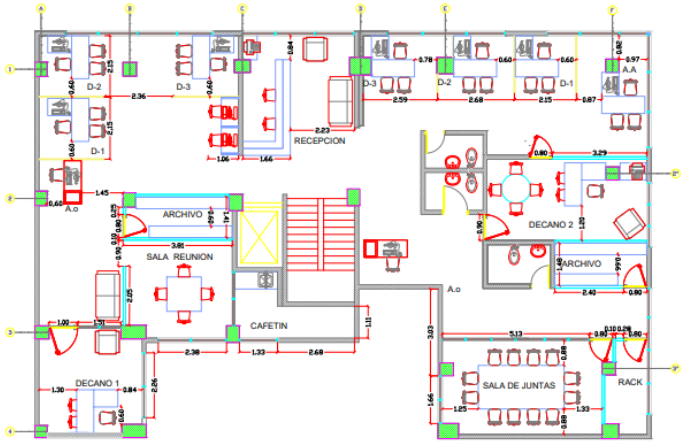

Con base en lo anterior, se solicitó al Contratista Consorcio DHIC, adjudicatario del contrato, que presentará la propuesta económica para los equipos requeridos con base en los precios adjudicados para estimar el valor de la adición presupuestal así:

EQUIPOS PARA ADICIÓN CONTRATO N° DJC-SA-08.02-223-2023 CONSORCIO OBRA DHIC						
ADECUACION PISO 6 EDIFICIO ESTACIO 1						
ESPACIO FÍSICO	RECURSO FÍSICO	TIPO EQUIPO	CAPACIDAD	CANT,	VR. Unt (IVA)	VR. Total (IVA)
PISO 6	RACK	Mini Split	12000 Btu	1	$ 5.048.075	$ 5.048.075
PISO 6	DECANO 1	Mini Split	12000 Btu	1	$ 5.048.075	$ 5.048.075
PISO 6	DECANO 2	Mini Split	12000 Btu	1	$ 5.048.075	$ 5.048.075
PISO 6	SALA DE REUNION DECANO 1	Mini Split	12000 Btu	1	$ 5.048.075	$ 5.048.075
PISO 6	SALA DE JUNTAS	Mini Split	18000 Btu	1	$ 7.803.574	$ 7.803.574
PISO 6	PUESTOS DE TRABAJO DEC1	Piso Techo	40000 Btu	1	$ 12.898.112	$ 12.898.112
PISO 6	PUESTOS DE TRABAJO DEC2	Piso Techo	40000 Btu	1	$ 12.898.112	$ 12.898.112
VARIOS	DATA CENTER D-TIC	Piso Techo	12000 Btu	3	$ 5.048.075	$ 15.144.225
				10	TOTAL	$ 68.936.323

En consecuencia, se solicita gestionar otrosí de adición al contrato por valor de Sesenta y ocho millones novecientos treinta y seis mil trescientos veintitrés pesos m/cte. ($ 68.936.323.oo) que corresponden al 21,2% sobre el valor inicial del contrato, para este trámite adjunto los siguientes documentos.

- Copia propuesta económica contratista Consorcio DHIC para adición.
- Copia correo de solicitud de climatización de espacios D-Tic.
- Documento de ajuste al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.14975 Rubro presupuestal No.23201010030106

Cordialmente,



Mauricio A. Gómez
Supervisor
Oficina Asesora de Planeación
Área Gestión Infraestructura Física (E.)
