# INFORME MENSUAL DE OBRA No. 08

## DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



**Proyecto**

**REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)**

**INFORME MENSUAL DE OBRA No. 08**

**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

**PROYECTO: "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA EN VALLEDUPAR (CESAR)."**

## 1. GENERALIDADES

**CONTRATO DE OBRA:**

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No | : CO1.PCCNTR.4332011 No 323 del 29 de diciembre de 2022 |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN | : LICITACIÓN PÚBICA No. 10 de 2022 |
| CONTRATISTA | : CONSORCIO JUDICIALES (Integrante 1- JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO 5% Integrante 2- SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGIENERIA Y CONSTRUCCIÓN 29%, Integrante 3 CONSTRUVAL INGENIERIA SAS 33%- Integrante 4 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTV SAS 33%) |
| OBJETO | : REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR) |
| VALOR DEL CONTRATO | : CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($49.420.492.192) Incluido impuestos y contribuciones de Ley. |
| PLAZO INICIAL | : TREINTA Y CINCO (35) MESES |
| FECHA DE INICIO | : 11 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA FINAL | : 10 DE DICIEMBRE DE 2025 |

# Descripción de las obras en general

## Obras

### 1. CRITERIOS GENERALES DEL PROYECTO

- **Descripción**

En este octavo informe se describe de manera detallada del control técnico administrativo de las actividades ejecutadas a la fecha por parte del Consorcio Obras Judiciales para *REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)*

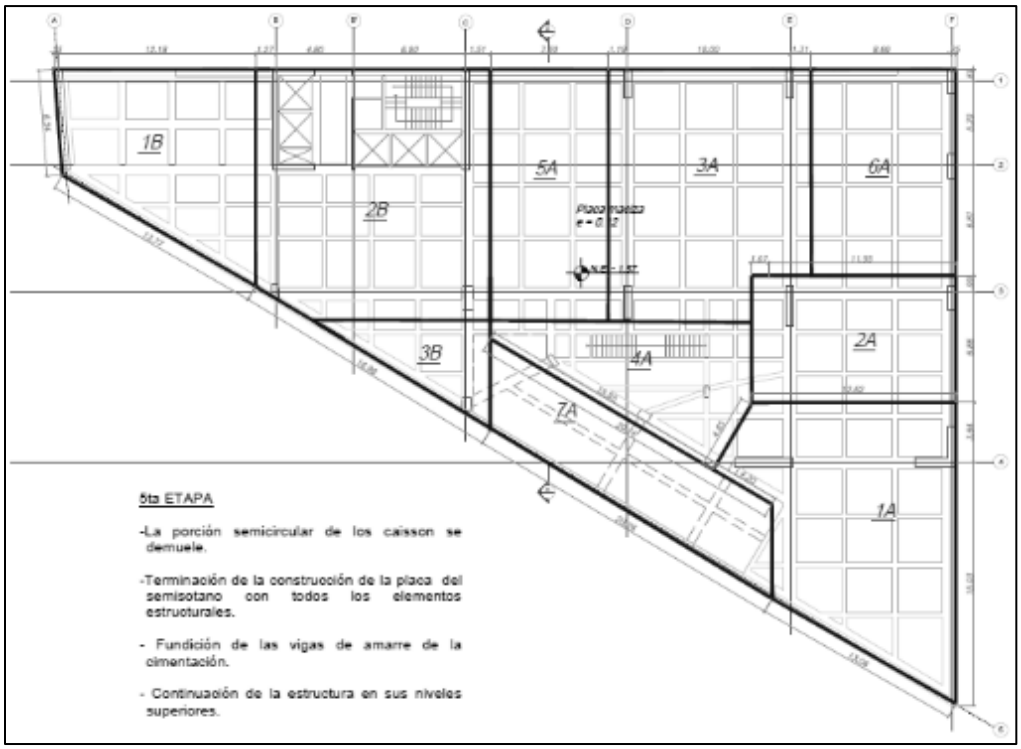



**Figura. 1:** Proceso constructivo ajustado.

## 2. ANTECEDENTES

En las antiguas instalaciones del parqueadero del Palacio de Justicia, se está ejecutando la ampliación de la misma, habiéndose concluido la construcción de los caissons como parte del proceso constructivo para estabilización del terreno y posterior demolición.

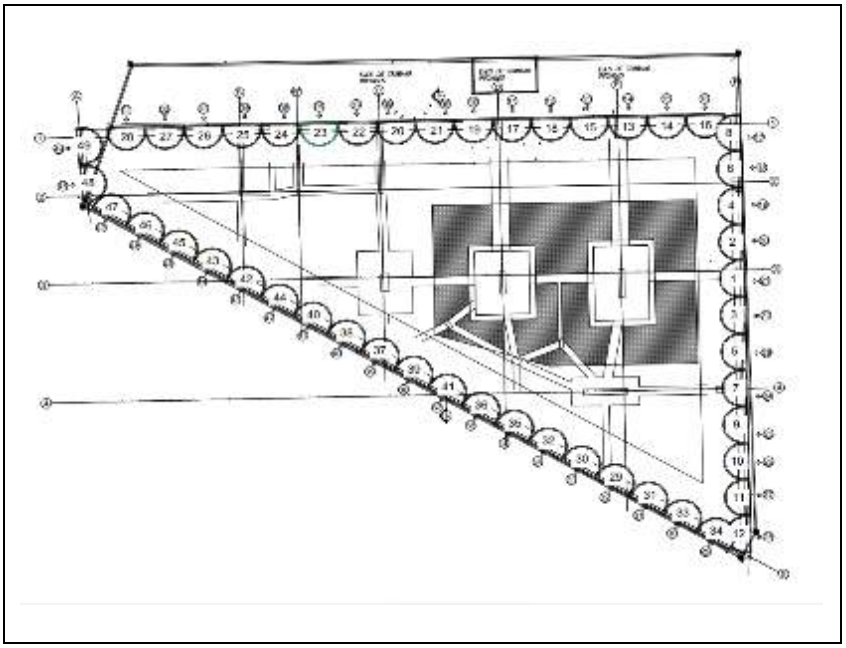


**Figura. 2:** Implantación sistema de caisson y estructura

## 3. INFORMACION GENERAL:

En este informe se encontrará información sobre el proceso y estado actual del Contrato de CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA EN VALLEDUPAR (CESAR). Ejecutado por el Consorcio Obras Judiciales

Con fecha 11 de enero de 2022 se firma el acta de inicio de Obras con Consorcio obras judiciales en calidad de contratista con su representante legal Julio Roberto Balbuena Alarcón, el señor Néstor Camilo Artunduaga Ávila como representante legal del consorcio Intervalledupar 2022 en calidad de interventoría externa y el arquitecto Jorge Enrique Fernández Becerra profesional universitario grado 20 del grupo de proyectos especiales de infraestructura de la dirección ejecutiva de administración judicial en calidad de coordinador de proyecto y la señora Ángela Aránzazu Montoya coordinadora grupo de proyectos especiales de infraestructura.

Se posesiona de parte del Consorcio Obras Judiciales al Ingeniero Julián Andrés Cogollo como Representante legal.

Que mediante Otro Si #1 con fecha 22 de febrero de 2023, el Consorcio Obras Judiciales delega al Señor Víctor Anderson Valbuena Quiroga como nuevo Representante Legal del Consorcio, y al Señor Julián Andrés Cogollo y al Señor Sergio Sereda Martínez como Representantes Suplentes del Consorcio.

**Dificultades Presenciadas Durante el Desarrollo del Contrato**

En el transcurso del mes de septiembre de 2023 el desarrollo del proyecto ha tenido retrasos frente a cronograma presentado debido a diversas variables, descritas a continuación:

- El hallazgo de rocas de sobre tamaño durante de las excavaciones para la instalación del geodren tipo vial, haciendo que interventoría suspenda las actividades en ese tramo hasta que los especialistas definieran el plan de acción.
- La demolición parcial de las rocas para evitar la interferencia con la estructura de la zarpa de la nueva edificación.
- Se detuvo el armado de los muros pantalla mientras los especialistas estructurales definían detalle de armado en los nodos generados entre los mismos, obstaculizando el avance sobre el primer tramo de placa de entre piso a ser erigida.
- Según revisión del asesor estructural del contratista, la zapata Z-9 no tiene contemplado la excentricidad a la que está sometida en su dimensionamiento, por lo tanto, se encuentra en revisión por parte del STI de interventoría y del diseñador estructural el ingeniero Jaime Buitrago.
- En los diseños entregados no existe un detalle que indique la transición del refuerzo de los elementos estructurales entre vigas-zarpas, zapata-zarpa, muro de contención-zapata y muro de contención-muro portante; los tiempos esperando estas definiciones han ocasionado retrasos en el desarrollo de las actividades del proceso constructivo aprobado.
- La concretera con la que se venía trabajando suspende operaciones en la zona, por lo que tocó iniciar un nuevo proceso con la única que está disponible, adicional, no cuentan con concreto de 6.000 psi y están realizando los ensayos pertinentes antes de poder suministrarlo, lo que conlleva a pausar la fundición de los elementos verticales.

### 3.1 SITUACIÓN DE LA OBRA.

Al finalizar el 30 de septiembre de 2023, las actividades del Proyecto han progresado como a continuación se describe:

| |
|---|
| LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO PARA UBICACIÓN Y MARCADO EN EL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN LOS EJES PRINCIPALES, PARALELOS Y PERPENDICULARES SEÑALADOS EN EL PLANO DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS LINDEROS DEL MISMO. |
| EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN PARA ELEMENT - INCLUYE LA CONFORMACION DE TALUDES Y TRINCHERAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL |
| EXCAVACION MECANICA EN ROCA PARA CONFORMACION DE HUELLAS DE ELEMENTOS DE CIMENTACION - ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL |
| EXCAVACION MANUAL CAISSONS CONSTRUCTIVOS |
| EXCAVACION MANUAL EN ROCA PARA CONFORMACION DE HUELLAS DE ELEMENTOS DE CIMENTACION - ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL |
| PERFILADA FONDO DE EXCAVACION ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL |
| BASES EN CONCRETO CICLOPEO TIPO_1 3000 PSI - 60% RAJON 40% CONCRETO - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS |

| |
|---|
| ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) |
| ZAPATAS EN CONCRETO TIPO_1 5000 PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) |
| ZARPA MUROS DE CONTENCION TIPO_2 4000 PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) |
| VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO TIPO_1 5000 PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLOS DE CAISSON EN CONCRETO TIPO_1 3000 PSI INCLUYE POSTERIOR DEMOLICION - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 1.500PSI (CONCRETO DE LIMPIEZA) SEGÚN PROCESO CONSTRUCTIVO Y/O DISEÑO ESTRUCTURAL |
| COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO A LA VISTA TIPO_1 DE 6000PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LAS DEFINICIONES ARQUITECTONICAS DEL CONCRETO, SEGUN DISEÑO |
| SUMINISTRO Y MANEJO DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA INCLUYE ALAMBRE NEGRO DE AMARRE |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE DE TALUDES SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS |
| EXCAVACION MANUAL PARA REDES DE TUBERIAS SEGÚN PLANOS HIDROSANITARIOS |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO |
| INSTALACION DE GEODREN TIPO VIAL |
| INSTALACION DE TECDREN |
| ASEO GENERAL |

### 3.2 CONTROLES DE OBRA

Controles Generales de procesos

De acuerdo con el desempeño de las actividades y procesos que se llevan a cabo para asegurar que los objetivos de la empresa y las obras contractuales sean alcanzados.

### 3.3 CONTROLES TÉCNICOS

Se cumple con las especificaciones técnicas en las ejecuciones de actividades realizadas a la fecha cumpliendo con todos los estándares de calidad y especificaciones técnicas.

- Se realizan actas de liberación de excavaciones, acero y concretos para los elementos estructurales tales como vigas de cimentación, zapatas y zarpas.

- Se realizan actas de liberación para instalación de drenajes tipo geodren vial y tecdren.
- Se realizan ensayos a los concretos fundidos en obra de acuerdo con el artículo C.5.1.3 de la NSR-10. Los resultados indican que se obtienen resistencias de hasta el 90% a los 7 días.

### 3.4 Controles Generales

Se realiza el seguimiento según el nuevo cronograma del proceso constructivo, se está monitoreando semanalmente el avance de los trabajos, sin embargo, es necesario ajustarlo dados los hallazgos presentados en campo y limitaciones del sector.

### 3.5. Controles Generales de Subcontratistas

Los trabajos son realizados por personal de mano de obra calificada, siendo únicamente un subcontratista principal que viene desarrollando trabajos de excavación y retiro de material.

### 3.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

LOCALIZACION Y REPLANTEO.

- Se realiza levantamiento topográfico para la ubicación y verificación de ejes estructurales del proyecto

EXCAVACION MANUAL Y A MAQUINA

- Excavación para caisson, sótano, vigas y zapatas principales.

ARMADO DE ACERO

- Armado y figurado de acero manual para caisson, armado de aceros para zapatas Z-2, Z-13, columna B-3 y C-3', muros M-8 y M-9, vigas 02, 03, 06, 07, 10, 11, 12 y 15.

CONSTRUCCION DE CAISSON

- Suministro e instalación de anillos de caisson en concreto tipo_1 3.000 psi incluye posterior demolición - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento).

FUNDICION DE CIMENTACIONES

- Zapatas en concreto de baja permeabilidad 5000 psi - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento).

- Zarpa muros de contención tipo_2 4000 psi - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento).

- Vigas de cimentación en concreto tipo_1 5000 psi - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento).

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO

- Columnas rectangulares en concreto a la vista tipo_1 de 6000psi - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento) se deberá tener en cuenta las definiciones arquitectónicas del concreto, según diseño.

CONDICIONES CLIMATICAS

- Durante la ejecución de las obras correspondientes al mes de septiembre de 2023 se presentaron días de lluvia; impidiendo la ejecución de las actividades durante 45 HH/m.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOLEADO** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **NORMAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NUBLADO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LLOVIZNA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LLUVIOSO** | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |

PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

Para el desarrollo de las actividades del presente contrato, Consorcio Obras Judiciales utilizó el siguiente personal:

| PERSONAL | CANT. | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|---|---|---|
| Director | 1 | Dirección de actividades de construcción de obras, dirección del personal de obra, dirección de obras, administración de materiales. |
| Arq. Residente de Obra | 1 | Supervisión de actividades técnicas ejecutadas Actividades de construcción de Obras inherentes al contrato. |
| Ing. Residente de Obra | 1 | Supervisión de actividades técnicas ejecutadas Actividades de construcción de Obras inherentes al contrato. |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Actividades administrativas, compras, recepción de Documentos, etc. |

| | | |
|---|---|---|
| Delineante arquitectónico y de ingeniería | 1 | Realizar los ajustes, modificaciones y generación de planos récord que se requieran |
| Residente SST | 2 | Actividades de seguridad y salud en el trabajo |

CONTRATISTA TOPOGRAFÌA

| | | |
|---|---|---|
| Topógrafo | 1 | Trazado y levante de ejes estructurales |
| Auxiliar de topografía | 1 | Ayudante trazado y levante de ejes estructurales demolición de muros y retiro de materiales |

CONTRATISTA EXCAVACION.

| | | |
|---|---|---|
| Operario maquinaria | 1 | Excavación mecánica. |

MATERIALES UTILIZADOS.

- Acero
- Alambre negro
- Tablas
- Cemento UG
- Arena
- Gravilla

EQUIPOS UTILIZADOS.

Los equipos usados para la ejecución de las obras objeto del presente contrato fueron las siguientes:

- Tronzadora.
- Taladro.
- Taladro demoledor.
- Mezcladora de concreto
- Herramientas menores
- Volquetas.
- Excavadora.
- Mixer.
- Bombas de succión de lodos.

## 4. CONTROL DE ACTIVIDADES

### 4.1 Actividades Realizadas

- Se realizó revisión completa de los contratos en el mes, tiempo de entrega, revisión de actividades, ajuste de programación de instalación de actividades a realizar.

- Se ha supervisado que se inicie cada actividad con los respectivos implementos de seguridad.
- Se lleva un control del proceso constructivo de cada actividad en todas las obras supervisadas.
- Elaboración de registros fotográficos de todas las actividades desde su inicio en el transcurso de las mismas.
- Revisión de entrega y revisión física de cantidades de obra ejecutada.
- Revisión y supervisión de los materiales utilizados en la obra.
- Se supervisa que se trabaje con las herramientas adecuadas en los procesos constructivos de las obras.
- Se controla que se mantenga despejado y limpio el área de trabajo para no crear congestión o traumas en el tiempo y espacio del desarrollo del contrato.
- De cada actividad en la construcción de las obras, el control de actividades está basado en la revisión de cada ítem y de las medidas de cada ítem en el desarrollo de las obras.
- Todo se está llevando de acuerdo con las normas de la construcción y las especificaciones técnicas.

A. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

A continuación, se hace la relación de las actividades administrativas realizadas por el Consorcio Obras Judiciales en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2023:

- Comités de obra: Durante el periodo del presente informe se realizaron los siguientes comités de seguimiento de obra:
- 08 de septiembre de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 33 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ.
- 15 de septiembre de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 34 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
- 22 de septiembre de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 35 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
- 28 de septiembre de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 36 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ

- Bitácora: Se ha diligenciado normalmente la bitácora de obra del proyecto por parte de interventoría

## 5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- Se presentan mayores tiempos de ejecución a los contemplados en cronograma en las actividades previstas dentro del proceso constructivo ajustado, por hallazgos en el terreno y definiciones de algunos elementos estructurales.

- Se radica factura acta parcial No. 3.

## 6. RELACIÓN DE PAGOS:

| No. O.P. | Fecha | Valor Factura | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022/12/29 | $ 9.884.098.438 | Anticipo 20% |
| DESEMBOLSO | 2023/02/13 | $ 9.884.098.438 | Anticipo 20% |
| FE 04 | 2023/06/28 | $ 99.782.870,00 | Acta 01 |
| FE 06 | 2023/09/06 | $ 142.171.005,00 | Acta 02 |

Nota: Ver en anexo reporte de rendimientos financieros del desembolso

## 7. CORREPONDECIA ENVIADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9/1/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 371 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | INFORME SST MES DE AGOSTO 2023 |
| 9/2/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 373 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | DOCUMENTOS DE INGRESO A OBRA - CONTRATISTAS SECURITY ELITE SAS - TRANSPORTE ASCANIO |
| 9/1/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 374 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | ENTREGA No.4 DE RELACIÓN DE FACTURAS PARA LEGALIZACIÓN DE ANTICIPO |
| 9/2/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 375 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | NUEVO APU PARA LA PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRA |
| 9/4/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 376 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | INFORME MENSUAL DE OBRA PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR MES DE AGOSTO DE 2023 |
| 9/6/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 377 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | ENTREGA INFORME NOVEDADES HIDRAULICAS |
| 9/7/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 378 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | DOCUMENTACIÓN DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO OBRAS JUDICIALES |
| 9/8/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 379 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | SOLICITUD DE LIBERACIÓN ZONAS DE TRABAJO |
| 9/8/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 380 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS MODIFICATORIA No.1 |
| 9/8/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 381 | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR | RADICACIÓN INFORME FORESTAL RESOLUCIÓN 0017 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023 EXPEDIENTE CG-RNEEAP 012-2023 |
| 9/14/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 382 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | HALLAZGOS EN PLANOS PALACIO DE JUSTICIA No.3 |
| 9/13/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 384 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023 - CONSORCIO OBRAS JUDICIALES |
| 9/13/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 385 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | INFORME OBRAS ALEDAÑAS CON NIVEL FREATICO |
| 9/14/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 386 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | LIBERACIÓN ZONA DE TRABAJO CAISSON 4 Y 5 |
| 9/15/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 387 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | DOCUMENTOS PARA REINTEGRO LABORAL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9/15/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 388 | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR | RADICACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS) |
| 9/16/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 389 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA ANILLOS - CONTRATISTA TRANSPORTE ASCANIO |
| 9/18/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 390 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | ENTREGA BALANCE DE OBRA MODIFICACIÓN No.2 |
| 9/19/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 391 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023 - CONTRATISTA JER TOPOGRAFIA |
| 9/19/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 392 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | DETALLES EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA |
| 9/21/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 394 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | DOCUMENTOS DE INGRESO A OBRA - CONTRATISTA SECURITY FORCE |
| 9/20/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 395 | GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS | DOCUMENTOS ORDEN DE TRABAJO OBJ-PLJ-OT-029-23 |
| 9/21/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 396 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | DETALLES EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA 2 |
| 9/22/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 397 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | DETALLES EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA 3 |
| 9/22/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 398 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | DESVIO DE SISTEMA DE FILTRO POR ROCAS |
| 9/22/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 399 | PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR | SOLICITUD DE ENTREGA DE ZONAS PISO 1 Y 2 |
| 9/25/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 400 | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR | RESPUESTA A PETICIÓN RADICADOS N 07908, 07010 DE FECHA DE 11 DE AGOSTO DE 2023 Y 08352, 08360 DE FECHA DE 24 DE AGOSTO DE 2023, RADICADO SGAGA CGITGRF . NO 1057 |
| 9/26/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 401 | RAMA JUDICIAL | SOLICITUD DE AJUSTE PROGRAMACIÓN Y PAC |
| 9/26/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 402 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | ENTREGA PROPUESTA DE AJUSTES DETALLES ESTRUCTURA |
| 9/28/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 403 | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR | RADICACIÓN INFORME TRIMESTRAL |
| 9/29/2023 | CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 404 | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | DOCUMENTACIÓN PARA PAGO DEL ACTA DE CORTE DE OBRA No.3 |

## 8. ANEXOS.

| **REGISTRO FOTOGRÀFICO** | |
|---|---|
|  |  |
| Excavación caisson | Excavación zarpa |
|  |  |
| Excavación zarpa | Perfilada de fondo para zapata |
|  |  |
| Excavación mecánica y retiro de material | Excavación mecánica para Z-6 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Excavación mecánica y retiro de material | Descargue de acero para cimentación |
|  |  |
| Fundición zapata Z-7 y Z-8 | Armado de acero para zarpa tipo 2 |
|  |  |
| Fundición de zarpa tipo 2 | Fundición vigas de cimentación |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Pañete de taludes | Armado de acero muro M-7 |
|  |  |
| Instalación geodren tipo vial | Instalación tecdren |
|  |  |
| Armado de acero para muros de contención | Armado de acero zapata Z-13 |

t: (**601**) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN**

**MES DE AGOSTO DEL 2023**

**FIDEICOMISO PARA REALIAR LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CODIGO SIFI 112122**

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 1/25/2023, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

**Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios**
**Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.**

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu ahorro
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 4000006315

**SUCURSAL CENTRO 93**

FIDEICOMISO CONSTRUCCI¨N NUEVA TORRE P

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE


**Evolucionamos nuestra imagen**
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.




¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

## RESUMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 7,289,551,633.46 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 7,155,856,424 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 5,482,918.68 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 301,216,307.48 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 4,540,318.68 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 6,993,818,244.66 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,193,574.78 | 7,290,745,208.24 |
| 9/08 | PAGO INTERBANC CONSORCIO OBRAS | | | 942,600.00 | 7,291,687,808.24 |
| 17/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,343,178.87 | 7,293,030,987.11 |
| 18/08 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -960.09 | 7,293,030,027.02 |
| 18/08 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -1,200,064.97 | 7,291,829,962.05 |
| 18/08 | PAGO A PROVE SODIMAC COLOMBI | | | -300,015,100.00 | 6,991,814,862.05 |
| 18/08 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -182.42 | 6,991,814,679.63 |
| 31/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,003,565.03 | 6,993,818,244.66 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

112122 - FIDEICOMISO PARA REALIAR LA CONSTRUCCION

**ORDEN DE PAGO**

NUMERO : 19

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : ANULADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 29/09/2023 Fecha de Registro de la Orden: 29/09/2023 Fecha de Pago: 29/09/2023

Proveedor: 899999090 - 2 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL Teléfono:

Tipo de Retención: Gran Contribuyente Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: GP_525953 -GIRO DE RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AGOSTO 2023

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| GP | 525953 | 29/09/2023 | 4,540,318.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 4,540,318.00 | 0.00 | 0 | 4,540,318.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP | OTROS DESCUENTOS | | 4,540,318.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 4,540,318.00 | 0.00 | 0.00 |

Valor a Girar: 4,540,318.00

## Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 19 Periodo: 202309

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110501001 | PROVEEDORES | | | 899999090 - 2 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | | 4,540,318.00 |
| 25700101003 | RENDIMIENTOS ACREEDORES | | | 899999090 - 2 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 4,540,318.00 | |
| | | | | | | 4,540,318.00 | 4,540,318.00 |

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202 | |

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES

| FORMATO DE LIBERACION DE ACTIVIDADES | CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022<br>CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR) |
|---|---|

FECHA: 3/9/23

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CARRERA 14 CON CALLE 14

CONTRATO DE OBRA No: 323 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

ACTIVIDAD:
Zapata 5

| OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | N.A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| CONCRETO DE LIMPIEZA | ✓ | | | Concreto ciclopeo |
| DISTANCIAMIENTO DE LOS REFUERZOS EN ACERO | ✓ | | | Segun planos estructurales |
| CALIBRE DEL ACERO DE REFUERZO | ✓ | | | Segun planos estructurales |
| RECUBRIMIENTO DEL ACERO | ✓ | | | |
| PANELAS DE DISTANCIAMIENTO | ✓ | | | 7.5 cms. |
| ARMADO DE FORMALETA | ✓ | | | metalicas. |
| TIPO Y RESISTENCIA DE CONCRETO | ✓ | | | 3000 PSI. Bajo Permeabilidad |
| PRUEBA DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO | ✓ | | | |
| TIPO DE ELEMEMENTO A FUNDIR | ✓ | | | ZAPATA |
| DIMENSIONES DEL ELEMENTO | ✓ | | | 5.30 X 2.50 X 1.0 |
| EQUIPO DE VIBRADO DEL CONCRETO | ✓ | | | Electrica |
| MATERIAL DE CURADO UTILIZADO | ✓ | | | Agua |
| TIPO DE ACABADO | | | ✓ | |
| EQUIPO DE COLOCACION DEL CONCRETO | | | | |
| TIPO DE CURADO DEL CONCRETO | | | | |
| MUESTRAS DE CONCRETO REALIZADAS | ✓ | | | 5 UNDS. |

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | Carlos [illegible] - Maestro de obra | Ing. Lenis Garcia - Residente de obra |
| CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | Ing. Miguel Angel Algarin | Arq. Alejandro Gomez - Residente interventoria |

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES

| FORMATO DE LIBERACION DE ACTIVIDADES | CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022<br>CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR) |
|---|---|

FECHA: 20/9/25

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CARRERA 14 CON CALLE 14

CONTRATO DE OBRA No: 323 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

ACTIVIDAD:
INSTALACION DE SOPORTE Y TUBERIA (EJE 5A-5B)

| OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | N.A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| TUBERIA 4" | ✓ | | | |
| Pendiente tuberia | ✓ | | | 5% |
| Traslapo TEE PPR - CODO PPR | ✓ | | | 90 CMS |
| Traslapo TEE PPR - TEE PPR | ✓ | | | 30 CMS. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | Ernesto Arrieta Valle - Maestro de obra | Ing. Emel Cerpa - Residente de obra |
| CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | Ingeniero Miguel Angel Algarin | Arq. Alejandro Cerpa - Residente interventoria |

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES

| FORMATO DE LIBERACION DE ACTIVIDADES | CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022<br>CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR) |
|---|---|

FECHA: 21/9/23

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** CARRERA 14 CON CALLE 14

**CONTRATO DE OBRA** No: 323 de 2022

**CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

**ACTIVIDAD:**

VACIADO ZAPATA TIPO 2 DE LOS EJES 3B y 5C

| OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | N.A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| CONCRETO DE LIMPIEZA | ✓ | | | Solado e= 5 cm |
| DISTANCIAMIENTO DE LOS REFUERZOS EN ACERO | ✓ | | | |
| CALIBRE DEL ACERO DE REFUERZO | ✓ | | | Según diseños estructurales |
| RECUBRIMIENTO DEL ACERO | ✓ | | | 7.5 cms |
| PANELAS DE DISTANCIAMIENTO | ✓ | | | |
| ARMADO DE FORMALETA | | | ✓ | |
| TIPO Y RESISTENCIA DE CONCRETO | ✓ | | | 5000 PSI, baja permeabilidad |
| PRUEBA DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO | | | | |
| TIPO DE ELEMEMENTO A FUNDIR | ✓ | | | zapata |
| DIMENSIONES DEL ELEMENTO | ✓ | | | 1.50 X 1.85 X 0.70 |
| EQUIPO DE VIBRADO DEL CONCRETO | ✓ | | | Vibrador electrico |
| MATERIAL DE CURADO UTILIZADO | | | | |
| TIPO DE ACABADO | | | | |
| EQUIPO DE COLOCACION DEL CONCRETO | ✓ | | | |
| TIPO DE CURADO DEL CONCRETO | | | | |
| MUESTRAS DE CONCRETO REALIZADAS | | | | |

**RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD**

| | | |
|---|---|---|
| **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** | Ing. Ernesto Arrieta - Director de obra | Ing. Ernel Larios - Residente de obra |
| **CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022** | Inspector Miguel Angel Aguirre | Arq. Alejandro Gómez - Residente Interventoría |

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES

| FORMATO DE LIBERACION DE ACTIVIDADES | CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022<br>CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR) |
|---|---|

FECHA: 21/9/23

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CARRERA 14 CON CALLE 14

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

ACTIVIDAD: VIGA CIMENTACION 006 EJES 4E - 5E

| OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | N.A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Concreto de limpieza | ✓ | | | Concreto ciclopeo |
| Distanciamiento de los refuerzos | ✓ | | | |
| Calibre del Acero | ✓ | | | Segun Diseños estructurales |
| Recubrimiento del Acero | ✓ | | | 7.5 cm |
| Paneles de distanciamiento | ✓ | | | |
| Armano De formaleta | ✓ | | | formaleta metalica |
| Tipo y Dosistencia del concreto | | | | 3000 PSI bajo Permeabilidad |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD**

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | Emiro Quintero - Maestro de obra | Ing. Emel Larios - Residente de obra |
| CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | Ingeniero Miguel Angel Aguirre | Arq. Alejandro Gomez - Residente interventoria |

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.661.448-8

| FORMATO DE LIBERACION DE ACTIVIDADES | CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022<br>CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR) |
|---|---|

FECHA: 21/04/23

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CARRERA 14 CON CALLE 14

CONTRATO DE OBRA No: 323 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

ACTIVIDAD:
ZAPATA M-2

| OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | N.A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Concreto de limpieza | ✓ | | | Solado e:5 cm |
| Distanciamiento de los aceros | ✓ | | | |
| Cubrimiento del Acero de refuerzo | ✓ | | | Segun Diseños estructurales |
| Recubrimiento del Acero | ✓ | | | 7.5 cm. |
| Parrilla de Reforzamiento | ✓ | | | |
| Tipo y Resistencia de concreto | ✓ | | | 4000 PSI Bajo Premezclado |
| Elemento a fundar | ✓ | | | Zapata |
| Dimensiones del elemento | ✓ | | | 2.5 X 1.50 X 0.50 |

**RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD**

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | Emiro Arrieta - Maestro de obra | Ing. Ewel Lopez - Residente de obra |
| CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | Ingeniero Miguel Angel Algarin | Arq. Alejandro Gómez - Residente interventoría |

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.445.448-8

| FORMATO DE LIBERACION DE ACTIVIDADES | CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022<br>CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR) |
|---|---|

FECHA: 27/9/23

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CARRERA 14 CON CALLE 14

CONTRATO DE OBRA No: 323 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

ACTIVIDAD:

Instalaciones Geodesia y Topografia (EJE 4P - 5P)

| OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | N.A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Tuberia 4" | ✓ | | | |
| Pendiente tuberia | ✓ | | | 1.5% |
| Traslapo Topografia - Geodesia | ✓ | | | 80 cms |
| Traslapo Topografia - Topografia | ✓ | | | 30 cms |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | Ing. Andres [illegible] - Maestro de obra | Ing. Emel Larios - Residente de obra |
| CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | Arq. Miguel Angel Rojano | Arq. Alejandro Gomez - Residente interventoria |

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES

| FORMATO DE LIBERACION DE ACTIVIDADES | CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022<br>CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR) |
|---|---|

FECHA: 28/9/23

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** CARRERA 14 CON CALLE 14

**CONTRATO DE OBRA** No: 323 de 2022

**CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

**ACTIVIDAD:** Zarpa entre eje (4-F) y (5-F)

| OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | N.A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| CONCRETO DE LIMPIEZA | ✓ | | | |
| DISTANCIAMIENTO DE LOS REFUERZOS EN ACERO | ✓ | | | |
| CALIBRE DEL ACERO DE REFUERZO | ✓ | | | |
| RECUBRIMIENTO DEL ACERO | ✓ | | | |
| PANELAS DE DISTANCIAMIENTO | ✓ | | | |
| ARMADO DE FORMALETA | ✓ | | | |
| TIPO Y RESISTENCIA DE CONCRETO | ✓ | | | |
| PRUEBA DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO | ✓ | | | |
| TIPO DE ELEMEMENTO A FUNDIR | | | | Zarpa |
| DIMENSIONES DEL ELEMENTO | | | | 11,50 - 0,50 - 1.20m. |
| EQUIPO DE VIBRADO DEL CONCRETO | | | | Eléctrico. |
| MATERIAL DE CURADO UTILIZADO | | | | Agua. |
| TIPO DE ACABADO | | | | N/A. |
| EQUIPO DE COLOCACION DEL CONCRETO | | | | Bomba estacionaria. |
| TIPO DE CURADO DEL CONCRETO | | | | |
| MUESTRAS DE CONCRETO REALIZADAS | | | | |

**RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD**

| | | |
|---|---|---|
| **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** | Enuer Avendaño - Maestro de obra | Ing. Emell Larios - Residente de obra |
| **CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022** | Ing. Miguel Angel Aguirre | Arq. Alejandro Gomez - Residente interventoria |

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES

| FORMATO DE LIBERACION DE ACTIVIDADES | CONTRATO DE OBRA No. 123 de 2022<br>CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR) |
|---|---|

FECHA: 29/9/23

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CARRERA 14 CON CALLE 14

CONTRATO DE OBRA No: 123 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

ACTIVIDAD:
ZAPATA 13

| OBSERVACION | CUMPLE | NO CUMPLE | N.A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| CONCRETO DE LIMPIEZA | ✓ | | | Concreto ciclopeo |
| DISTANCIAMIENTO DE LOS REFUERZOS EN ACERO | ✓ | | | |
| CALIBRE DEL ACERO DE REFUERZO | ✓ | | | Segun Planos estructurales |
| RECUBRIMIENTO DEL ACERO | ✓ | | | |
| PANELAS DE DISTANCIAMIENTO | ✓ | | | 7.5 cm |
| ARMADO DE FORMALETA | ✓ | | | Metalica |
| TIPO Y RESISTENCIA DE CONCRETO | | | | 3000 PSI Bajo Perfil Medio |
| PRUEBA DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO | | | | |
| TIPO DE ELEMENTO A FUNDIR | | | | Zapata |
| DIMENSIONES DEL ELEMENTO | ✓ | | | |
| EQUIPO DE VIBRADO DEL CONCRETO | | | | Electrico |
| MATERIAL DE CURADO UTILIZADO | | | | Agua |
| TIPO DE ACABADO | | | ✓ | |
| EQUIPO DE COLOCACION DEL CONCRETO | | | | Bomba estacionaria |
| TIPO DE CURADO DEL CONCRETO | | | | |
| MUESTRAS DE CONCRETO REALIZADAS | | | | |

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | Ing. [illegible] - Maestro de obra | Ing. Elver Larios - Residente de obra |
| CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 | Ingeniero Miguel Angel Algarin | Arq. Alejandro Gomez - Residente interventoria |

| | | |
|---|---|---|
| ALMASA — LA EVOLUCIÓN DEL ACERO | GESTIÓN INTEGRAL | CÓDIGO: GI-R-154 |
| | FORMATO | VERSIÓN: 04 |
| | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS | FECHA: 2022-06-07 |

**FACTURA(S):** 76725 - 10028
**CARTILLA:** 4485-2

**FECHA INFORME:** 2023-09-12
**CONSECUTIVO:** VTF-3223

| DIAMETRO | 1/4" | | | 3/8" | | | 1/2" | | | 5/8" | | | 3/4" | | | 7/8" | | | 1" | | | 1 1/4" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLADA | - | - | - | - | - | - | BTY025569 | - | - | AU100387134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137434 | - | - | - | - |
| FABRICANTE | - | - | - | - | - | - | [illegible] | - | - | [illegible] | - | - | - | - | - | - | - | - | [illegible] | - | - | - | - |

**NORMA APLICADA:** NTC 2289

| No. Designación Barra Acesa | PROPIEDADES MECANICAS | | | | | PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO | | | | | | | | | | | PROPIEDADES DIMENSIONALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fluencia (kgf/mm²) | Resistencia (kgf/mm²) | Fluencia (PSI) | Fluencia (MPa) | % Elongación (200mm) | C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Carbono Equivalente | Peso metro (kg) | | Altura de resaltes (mm) | | Espaciamiento (mm) | | Separación extremos resaltos (mm) | |
| MIN | 42,90 | 56,93 | 60900 | 420 | (1/4" a 3/8" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%) | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor |
| MAX | 55,00 | N.E. | 78000 | 540 | | 0,33 | 1,56 | 0,55 | 0,043 | 0,053 | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | 0,55 | MIN | | MIN | | MAX | | MAX | |
| 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/2" | 50,02 | 63,39 | 71.145 | 491 | 15,0 | 0,27 | 1,11 | 0,18 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | - | 0,46 | 0,934 | 0,962 | 0,31 | 0,78 | 8,9 | 8,3 | 4,9 | 3,0 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 5/8" | 47,35 | 63,40 | 67.345 | 464 | 16,0 | 0,27 | 1,52 | 0,20 | 0,011 | 0,035 | - | - | - | - | - | 0,48 | 1,459 | 1,512 | 0,71 | 1,17 | 11,1 | 12,7 | 6,1 | 4,0 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 3/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 7/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 1" | 69,68 | 84,31 | 70.377 | 483 | 15,5 | 0,27 | 0,68 | 0,15 | 0,036 | 0,016 | - | - | - | - | - | 0,40 | 3,715 | 3,859 | 1,27 | 1,93 | 17,8 | 16,0 | 9,7 | 4,0 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 1 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

**OBSERVACIONES:**

**Elaborado por:** Auditor de Aseguramiento

**Aprobado por:** Director del Sistema de Gestion Integral

| | GESTIÓN INTEGRAL | CÓDIGO: GI-R-154 |
|---|---|---|
| ALMASA | FORMATO | VERSIÓN: 04 |
| | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS | FECHA: 2022-06-07 |

**FACTURA(S):** 76274 - 10029
**CARTILLA:** 4486-2

**FECHA INFORME:** 2023-09-12
**CONSECUTIVO:** VTF-0222

| DIAMETRO | 1/4" | | | 3/8" | | | 1/2" | | | 5/8" | | | 3/4" | | | 7/8" | | | 1" | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLADA | - | - | - | BTY0109580 | - | - | BTY0253089 | - | - | BTY0102446 | - | - | 132845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FABRICANTE | | | | [illegible] | | | [illegible] | | | [illegible] | | | [illegible] | | | | | | | | | |

**NORMA APLICADA:** NTC 2289

| No. Designación Barra Acero | PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | | PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO | | | | | | | | | | | PROPIEDADES DIMENSIONALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fluencia (kgf/cm²) | Resistencia (kgf/cm²) | Fluencia (PSI) | Fluencia (MPa) | % Elongación (200mm) | C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Carbono Equivalente | Peso metro (kg) | | Altura de resaltes (mm) | | Espaciamiento (mm) | | Separación extremos resaltos (mm) | |
| MIN | 42.00 | 56.00 | 60000 | 420 | [illegible] | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor |
| MAX | 55.00 | N.E. | 79800 | 540 | [illegible] | 0,13 | 1,56 | 0,55 | 0,041 | 0,053 | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | 0,55 | MIN | | MIN | | MAX | | MAX | |
| 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/8" | 52,60 | 72,82 | 74 673 | 515 | 16,0 | 0,20 | 1,13 | 0,16 | 0,009 | 0,005 | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,329 | 0,372 | 0,38 | 0,61 | 4,7 | 3,6 | 3,0 | 2,4 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1/2" | 50,02 | 63,35 | 71 140 | 491 | 15,0 | 0,27 | 1,11 | 0,19 | 0,006 | 0,008 | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,554 | 0,962 | 0,51 | 0,75 | 9,9 | 8,3 | 4,9 | 3,0 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 5/8" | 46,89 | 60,73 | 66 993 | 462 | 14,0 | 0,27 | 1,05 | 0,20 | 0,004 | 0,008 | - | - | - | - | - | 0,45 | 1,458 | 1,523 | 0,71 | 0,86 | 11,5 | 10,7 | 6,1 | 3,0 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3/4" | 50,08 | 63,72 | 71 260 | 491 | 16,5 | 0,27 | 0,99 | 0,17 | 0,010 | 0,013 | - | - | - | - | - | 0,48 | 2,191 | 2,150 | 0,97 | 1,11 | 13,3 | 12,9 | 7,3 | 4,0 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 7/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

**OBSERVACIONES:**

**Elaborado por:** Auditor de Aseguramiento

**Aprobado por:** Director del Sistema de Gestion Integral

| | | |
|---|---|---|
| ALHASA La Evolución del Acero | GESTIÓN INTEGRAL | CÓDIGO: GI-R-154 |
| | FORMATO | VERSIÓN: 04 |
| | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS | FECHA: 2022-06-07 |

FACTURA(S): 10030
CARTILLA: 4493-2

FECHA INFORME: 2023-09-12
CONSECUTIVO: VTF-3224

| DIAMETRO | 1/4" | | | 3/8" | | | 1/2" | | | 5/8" | | | 3/4" | | | 7/8" | | | 1" | | | 1 1/4" | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [illegible] | - | - | [illegible] | - | - | - | - | - | [illegible] | - | - | - | - | - | - |
| FABRICANTE | | | | | | | | | | [illegible] | | | [illegible] | | | | | | [illegible] | | | | | | |

NORMA APLICADA: NTC 2289

| No. Designación Barra Acero | PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | | PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO | | | | | | | | | | | PROPIEDADES DIMENSIONALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fluencia (kg/mm²) | Resistencia (Kg/mm²) | Fluencia (PSI) | Fluencia (MPa) | % Elongación (200mm) | C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Carbono Equivalente | Peso metro (kg) | | Altura de resaltos (mm) | | Espaciamiento (mm) | | Separación extremos resaltos (mm) | |
| MIN | 42,90 | 56,00 | 60000 | 420 | (1/4" a 3/4" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%) | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor |
| MAX | 55,80 | N.E. | 79000 | 540 | | 0,33 | 1,56 | 0,55 | 0,043 | 0,053 | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | 0,35 | MIN | | MIN | | MAX | | MAX | |
| 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/8" | 47,35 | 63,43 | 67 368 | 464 | 16,2 | 0,27 | 1,12 | 0,20 | 0,011 | 0,035 | - | - | - | - | - | 0,49 | | 1,512 | | 1,17 | | 10,7 | | 4,3 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,404 | - | 0,77 | - | 11,1 | - | 8,1 | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 3/4" | 50,09 | 63,70 | 71 200 | 491 | 16,5 | 0,27 | 0,99 | 0,17 | 0,010 | 0,013 | - | - | - | - | - | 0,46 | | 2,139 | | 1,11 | | 12,9 | | 4,3 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,101 | - | 0,97 | - | 13,3 | - | 7,3 | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 7/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 1" | 49,48 | 64,31 | 70 377 | 486 | 15,5 | 0,27 | 0,98 | 0,15 | 0,009 | 0,016 | - | - | - | - | - | 0,45 | | 3,800 | | 1,83 | | 16,6 | | 4,3 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,705 | - | 1,37 | - | 17,8 | - | 9,7 | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 1 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |

N.E.: NO ESPECIFICA N.D.: NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento

Aprobado por: Director del Sistema de Gestion Integral

| | | |
|---|---|---|
| ALMASA | GESTIÓN INTEGRAL | CÓDIGO: GI-R-154 |
| | FORMATO | VERSIÓN: 04 |
| | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS | FECHA: 2022-06-07 |

FACTURA(S): 76284 - 10036
CARTILLA: 4485-3

FECHA INFORME: 2023-09-14
CONSECUTIVO: VTF-3232

| DIÁMETRO | 1/4" | | | 3/8" | | | 1/2" | | | 5/8" | | | 3/4" | | | 7/8" | | | 1" | | | 1 1/4" | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLADA | - | - | - | BTY0109992 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137992 | - | - | 137943 | - | - | 138029 | - | - | - | - | - |
| FABRICANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**NORMA APLICADA:** NTC 2289

| No. Designación Barra Acero | PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | | PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO | | | | | | | | | | | PROPIEDADES DIMENSIONALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fluencia (kg/mm²) | Resistencia (kg/mm²) | Fluencia (PSI) | Fluencia (MPa) | % Elongación (200mm) | C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Carbono Equivalente | Peso metro (kg) | | Altura de resaltes (mm) | | Espaciamiento (mm) | | Separación extremos resaltes (mm) | |
| MIN | 42,00 | 56,00 | 60000 | 420 | (1/4" a 3/8" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%) | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor |
| MAX | 55,99 | N.E. | 79999 | 548 | | 0,33 | 1,56 | 0,55 | 0,043 | 0,053 | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | 0,55 | MIN | | MIN | | MAX | | MAX | |
| 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/8" | 52,50 | 72,62 | 74.673 | 515 | 16,0 | 0,20 | 1,13 | 0,18 | 0,004 | 0,005 | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,526 | 0,572 | 0,58 | 0,61 | 6,7 | 5,8 | 3,6 | 2,4 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 5/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 3/4" | 49,95 | 65,63 | 71.046 | 490 | 15,9 | 0,28 | 0,98 | 0,16 | 0,013 | 0,010 | - | - | - | - | - | 0,46 | 2,501 | 2,150 | 0,97 | 1,09 | 13,3 | 12,7 | 7,3 | 4,9 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 7/8" | 45,36 | 60,99 | 65.398 | 451 | 16,3 | 0,29 | 1,01 | 0,12 | 0,008 | 0,033 | - | - | - | - | - | 0,47 | 2,659 | 2.949 | 1,12 | 1,10 | 15,5 | 14,9 | 8,3 | 5,8 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 1" | 48,12 | 62,05 | 68.443 | 472 | 15,1 | 0,29 | 0,70 | 0,14 | 0,003 | 0,016 | - | - | - | - | - | 0,43 | 3,758 | 3.829 | 1,27 | 1,86 | 17,5 | 17,4 | 9,7 | 4,6 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 1 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

**OBSERVACIONES:**

**Elaborado por:** Auditor de Aseguramiento

**Aprobado por:** Director del Sistema de Gestion Integral

| | | |
|---|---|---|
| ALMASA | GESTIÓN INTEGRAL | CÓDIGO: GI-R-154 |
| | FORMATO | VERSIÓN: 04 |
| | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS | FECHA: 2022-06-07 |

**FACTURA(S):** 76282 - 10037
**CARTILLA:** 4486-3

**FECHA INFORME:** 2023-09-14
**CONSECUTIVO:** VTF-3230

| DIAMETRO | 1/4" | | | 3/8" | | | 1/2" | | | 5/8" | | | 3/4" | | | 7/8" | | | 1" | | | 1 1/4" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLADA | - | - | - | BTY0109550 | - | - | BTY0253689 | - | - | - | - | - | 137650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FABRICANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**NORMA APLICADA:** NTC 2289

| No. Designación Barra Acero | PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | | PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO | | | | | | | | | | | PROPIEDADES DIMENSIONALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fluencia (kgf/mm²) | Resistencia (kgf/mm²) | Fluencia (PSI) | Fluencia (MPa) | % Elongación (200mm) | C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Carbono Equivalente | Peso metro (kg) | | Altura de resaltes (mm) | | Espaciamiento (mm) | | Separación extremos resaltes (mm) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor |
| MIN | 42,20 | 56,90 | 60000 | 420 | (1/4" a 3/4" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%) | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | MIN | | MIN | | MAX | | MAX | |
| MAX | 59,00 | N.E. | 78000 | 540 | | 0,33 | 1,56 | 0,55 | 0,043 | 0,053 | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | 0,55 | | | | | | | | |
| 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/8" | 52,50 | 72,80 | 74 673 | 515 | 16,0 | 0,29 | 1,13 | 0,18 | 0,008 | 0,005 | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,526 | 0,572 | 0,38 | 0,61 | 6,7 | 9,8 | 3,6 | 2,4 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 1/2" | 50,02 | 85,56 | 71 145 | 491 | 16,0 | 0,27 | 1,11 | 0,16 | 0,009 | 0,008 | - | - | - | - | - | 0,46 | 0,934 | 0,982 | 0,51 | 0,78 | 9,3 | 9,3 | 4,9 | 3,0 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 5/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 3/4" | 49,95 | 65,63 | 71 040 | 490 | 15,6 | 0,28 | 0,98 | 0,16 | 0,010 | 0,014 | - | - | - | - | - | 0,46 | 2,101 | 2,150 | 0,97 | 1,39 | 13,3 | 12,7 | 7,0 | 4,9 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 7/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 1 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

**OBSERVACIONES:**

**Elaborado por:** Auditor de Aseguramiento

**Aprobado por:** Director del Sistema de Gestion Integral

| | GESTIÓN INTEGRAL | CÓDIGO: GI-R-154 |
|---|---|---|
| ALMASA LA EVOLUCIÓN DEL ACERO | FORMATO | VERSIÓN: 04 |
| | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS | FECHA: 2022-06-07 |

**FACTURA(S):** 76283 - 10038
**CARTILLA:** 4493-3

**FECHA INFORME:** 2023-09-14
**CONSECUTIVO:** VTF-3231

| DIAMETRO | 1/4" | | | 3/8" | | | 1/2" | | | 5/8" | | | 3/4" | | | 7/8" | | | 1" | | | 1 1/4" | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137943 | - | - | 136609 | - | - | - | - | - |
| FABRICANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEACERO | - | - | DEACERO | - | - | - | - | - |

**NORMA APLICADA:** NTC 2289

| No. Designación Barra Acero | PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | | PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO | | | | | | | | | | | PROPIEDADES DIMENSIONALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fluencia (kgf/mm²) | Resistencia (kgf/mm²) | Fluencia (PSI) | Fluencia (MPa) | % Elongación (200mm) | C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Carbono Equivalente | Peso metro (kg) | | Altura de resaltes (mm) | | Espaciamiento (mm) | | Separación extremos resaltes (mm) | |
| MIN | 42,00 | 56,00 | 60000 | 420 | (1/4" a 3/8" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%) | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor |
| MAX | 55,00 | N.E. | 78000 | 540 | | 0,33 | 1,56 | 0,55 | 0,043 | 0,053 | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | 0,55 | MIN | | MIN | | MAX | | MAX | |
| 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/8" | 45,99 | 60,89 | 65399 | 451 | 16,3 | 0,29 | 1,01 | 0,12 | 0,009 | 0,030 | - | - | - | - | - | 0,47 | 2,959 | 2,940 | 1,12 | 1,50 | 15,5 | 14,5 | 8,5 | 3,0 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 1" | 48,12 | 62,03 | 68463 | 472 | 15,1 | 0,29 | 0,70 | 0,16 | 0,009 | 0,016 | - | - | - | - | - | 0,43 | 3,735 | 3,820 | 1,27 | 1,86 | 17,8 | 17,4 | 9,7 | 4,0 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 1 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

**OBSERVACIONES:**

**Elaborado por:** Auditor de Aseguramiento

**Aprobado por:** Director del Sistema de Gestion Integral

| | GESTIÓN INTEGRAL | CÓDIGO: GI-R-154 |
|---|---|---|
| ALMASA | FORMATO | VERSIÓN: 04 |
| | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS | FECHA: 2022-06-07 |

**FACTURA(S):** 76296 - 10049
**CARTILLA:** 4485-1

**FECHA INFORME:** 2023-09-19
**CONSECUTIVO:** VTF-3242

| DIAMETRO | 1/4" | | | 3/8" | | | 1/2" | | | 5/8" | | | 3/4" | | | 7/8" | | | 1" | | | 1 1/4" | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BTY010244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FABRICANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tensor del Eje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**NORMA APLICADA:** NTC 2289

| No. Designación Barra Acero | PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | | PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO | | | | | | | | | | | PROPIEDADES DIMENSIONALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fluencia (kg/cm²) | Resistencia (kg/cm²) | Fluencia (PSI) | Fluencia (MPa) | % Elongación (200mm) | C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Carbono Equivalente | Peso metro (kg) | | Altura de resaltes (mm) | | Espaciamiento (mm) | | Separación extremos resaltes (mm) | |
| MIN | 42,00 | 56,00 | 60000 | 420 | (1/8" a 3/4" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%) | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor |
| MAX | 55,00 | N.E. | 78000 | 540 | | 0,33 | 1,56 | 0,55 | 0,043 | 0,053 | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | 0,55 | MIN | | MIN | | MAX | | MAX | |
| 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/8" | 66,80 | 82,73 | 66600 | 660 | 14,0 | 0,27 | 1,09 | 0,20 | 0,004 | 0,008 | - | - | - | - | - | 0,45 | 1,469 | 1,523 | 0,71 | 0,86 | 11,1 | 10,7 | 8,1 | 3,5 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 3/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

**OBSERVACIONES:**

**Elaborado por:** Auditor de Aseguramiento

**Aprobado por:** Director del Sistema de Gestion Integral

| | | |
|---|---|---|
| ALMASA | GESTIÓN INTEGRAL | CÓDIGO: GI-R-154 |
| | FORMATO | VERSIÓN: 04 |
| | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS | FECHA: 2022-06-07 |

**FACTURA(S):** 76297 - 10050
**CARTILLA:** 4486-1

**FECHA INFORME:** 2023-09-19
**CONSECUTIVO:** VTF-3243

| DIAMETRO | 1/4" | | | 3/8" | | | 1/2" | | | 5/8" | | | 3/4" | | | 7/8" | | | 1" | | | 1 1/4" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLADA | - | - | - | STY0309568 | - | - | STY0253699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FABRICANTE | - | - | - | [illegible] | - | - | [illegible] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**NORMA APLICADA:** NTC 2289

| No. Designación Barra Acero | PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | | PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO | | | | | | | | | | | PROPIEDADES DIMENSIONALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fluencia (kgf/mm²) | Resistencia (kgf/mm²) | Fluencia (PSI) | Fluencia (MPa) | % Elongación (200mm) | C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Carbono Equivalente | Peso metro (kg) | | Altura de resaltes (mm) | | Espaciamiento (mm) | | Separación extremos resaltes (mm) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor |
| MIN | 42.00 | 56.00 | 60000 | 420 | (1/4" a 3/4" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%) | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | MIN | | MIN | | MAX | | MAX | |
| MAX | 55.00 | N.E. | 78000 | 540 | | 0,33 | 1,56 | 0,55 | 0,043 | 0,053 | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | 0,55 | | | | | | | | |
| 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/8" | 52,50 | 72,62 | 74 671 | 515 | 15,0 | 0,29 | 1,13 | 0,13 | 0,004 | 0,005 | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,526 | 0,572 | 0,38 | 0,01 | 6,7 | 5,8 | 3,8 | 2,4 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 1/2" | 52,02 | 83,36 | 73 145 | 491 | 16,0 | 0,27 | 1,11 | 0,13 | 0,006 | 0,008 | - | - | - | - | - | 0,46 | 0,934 | 0,982 | 0,61 | 0,79 | 5,3 | 8,3 | 4,9 | 3,0 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 5/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 3/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 7/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 1 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

**OBSERVACIONES:**

**Elaborado por:** Auditor de Aseguramiento

**Aprobado por:** Director del Sistema de Gestion Integral

| | | |
|---|---|---|
| ALMASA — LA EVOLUCIÓN DEL ACERO | GESTIÓN INTEGRAL | CÓDIGO: GI-R-154 |
| | FORMATO | VERSIÓN: 04 |
| | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS | FECHA: 2022-06-07 |

**FACTURA(S):** 76298 - 10051
**CARTILLA:** 4493-1

**FECHA INFORME:** 2023-09-19
**CONSECUTIVO:** VTF-3244

| DIÁMETRO | 3/4" | | | 3/8" | | | 1/2" | | | 5/8" | | | 3/4" | | | 7/8" | | | 1" | | | 1 1/4" | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STY0802440 | - | - | - | - | - | 137582 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FABRICANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**NORMA APLICADA:** NTC 2289

| No. Designación Barra Acero | PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | | PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO | | | | | | | | | | | PROPIEDADES DIMENSIONALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fluencia (kgf/mm²) | Resistencia (kgf/mm²) | Fluencia (PSI) | Fluencia (MPa) | % Elongación (200mm) | C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Carbono Equivalente | Peso metro (kg) | | Altura de resaltes (mm) | | Espaciamiento (mm) | | Separación extremos resaltes (mm) | |
| MIN | 42,00 | 56,00 | 60000 | 420 | (1/4" a 3/4" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%) | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor | LIMITES | Valor |
| MAX | 55,00 | N.E. | 78000 | 540 | | 0,33 | 1,56 | 0,55 | 0,043 | 0,053 | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | 0,55 | MIN | | MIN | | MAX | | MAX | |
| 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/8" | 46,69 | 60,73 | 66.650 | 460 | 14,0 | 0,27 | 1,09 | 0,20 | 0,004 | 0,008 | - | - | - | - | - | 0,45 | 1,403 | 1,523 | 0,71 | 0,89 | 11,1 | 10,7 | 6,1 | 3,5 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 3/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/8" | 45,98 | 93,99 | 65.399 | 451 | 16,3 | 0,29 | 1,31 | 0,12 | 0,009 | 0,033 | - | - | - | - | - | 0,47 | 2,859 | 2,940 | 1,12 | 1,50 | 15,5 | 14,9 | 8,5 | 3,6 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

**OBSERVACIONES:**

**Elaborado por:** Auditor de Aseguramiento

**Aprobado por:** Director del Sistema de Gestion Integral

www.almasa.com.co
Tel. (575) 3769220
Sector Parque Ind. Malambo SA. PIMSA Km 3

| PROALCO BEKAERT | ALAMBRES CON TRATAMIENTO TERMICO | CODIGO | AC-F-008 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 4 |

| NUMERO DE INFORME |
|---|
| DCE-180-2022 |

| FECHA DE ELABORACION |
|---|
| 8/06/2022 |

| | CLIENTE | CIUDAD |
|---|---|---|
| | ALAMBRES Y MALLAS SA | MALAMBO |
| PRODUCTO : | ALAMBRE RECOCIDO NEGRO Ø 1,47mm | |

| CODIGO DEL PRODUCTO: | 672460 | LOTES DE PRODUCCION: | FABQ005011 |
|---|---|---|---|
| | | DESARROLLO: | NA |
| | | FICHA TECNICA : | AC-F-008 |

| ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACION | CALIBRE (BWG) | DIÁMETRO (mm) | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kgf/mm²) | PROMEDIO (kgf/mm²) | ELONGACION (%) | REDUCCIÓN DE ÁREA (%) | OVALIDAD |
| | 17 | 1,47 +/- 0,02 | Max 42 | 38 | 30 | 80 | MAX 0,02 |

| CARACTERÍSTICAS DEL DESPACHO | | |
|---|---|---|
| NUMERO DE UNIDADES (UND) | PESO PROMEDIO (Kg) | PESO TOTAL ( kg) |
| NO APLICA | NO APLICA | 5.017,8 |

OBSERVACIONES :

Material libre de Radiactividad

PROALCO BEKAERT

"Se recomienda que la selección, aplicación y disposición de residuos de los Productos de Proalco SAS, se realice de acuerdo a la Norma técnica Colombiana GTC 24"

# GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS S.A.S

INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN EXPLORACIONES DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS

FOR-EO-16
VERSION 1
FECHA: 01-10-2021

# RESULTADOS CILINDROS COMPRESION SIMPLE

OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR

HOJA No. 1 De 1

SOLICITANTE: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

FECHA:11/09/2023

COD.CLIENTE: G024

RESISTENCIA ESPECIFICADA: 5000 y 6000 PSI

| FECHA DE TOMA | FECHA DE ENSAYO | EDAD | RESIST. | RESIST. | ASENTAMIENTO | LOCALIZACION | TIPO DE FALLA | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIAS | PSI | (KG/CM$^2$) | | | | |
| 25-ago | 8-sep | 14 | 5421 | 379 | NO REPORTA | ZAPATA Z-7 M2 | Cono | F´C=5000PSI |
| 25-ago | 8-sep | 14 | 5437 | 381 | | | Cono | |
| 25-ago | 8-sep | 14 | 5615 | 393 | | ZAPATA Z-7 M3 | Cono | |
| 25-ago | 8-sep | 14 | 5616 | 393 | | | Cono | |
| 4-sep | 11-sep | 7 | 3722 | 261 | | VIGA 012 ENTRE EJESZ 3E - E4 Y ZP8 M6 | Cono | |
| 4-sep | 11-sep | 7 | 3851 | 270 | | | Cono | |
| 4-sep | 11-sep | 7 | 5524 | 387 | | COLUMNAS B3 M5 | Cono | F´C=6000PSI |
| 4-sep | 11-sep | 7 | 5540 | 388 | | | Cono | |

NOTA: LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS, ROTULADAS Y TRANSPORTADAS POR EL SOLICITANTE.

NOTA 2: De acuerdo con el artículo C.5.1.3 de la NSR-10 los resultados normativos son a 28 días a menos que se indique lo contrario en los planos.

ING. JEFE LABORATORIO


**Sede operativa: Diagonal 20B # 18B - 63 Local #2 Tel: 3173310685 - Valledupar**
**E-mail: administrativo@geoexplolab.com; gerencia@geoexplolab.com**

**INFORME TOPOGRAFICO DEL CONTRATO DE OBRA "CONSTRUCCION NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR-CESAR".**

**SEPTIEMBRE 2023**


**TOPOGRAFO**

**JOEL ENRIQUE ROCHA WILCHEZ**



**CC. 1065580756**


**VALLEDUPAR 2023**

## CONTENIDO


1. GENERALIDADES
2. OBJETIVOS
3. LOCALIZACION
4. ORGANIZACION
5. PERSONAL Y EQUIPOS
6. ASPECTOS TECNICOS
7. CONDICIONES LABORALES
    a. Condiciones climaticas
    b. Condiciones de orden publico
    c. Condiciones tecnicas
8. ACTIVIDADES DE CAMPO

## 1. GENERALIDADES

A continuación, se presenta un informe técnico detallado donde se describen las principales actividades realizadas necesarias para lograr un desarrollo de acuerdo con los diseños arquitectónicos y estructurales de la nueva torre y dotación del Palacio de Justicia del municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

## 2. OBJETIVOS

- Aplicar conocimientos básicos de topografía para la generación de información usando equipos (Nivel de precisión, Estación total de alta precisión)
- Localizar con precisión el área haciendo los amarres en coordenadas y cotas, y la edición de planos topográficos definitivos al diseño a realizar.

## 3. LOCALIZACION

Este proyecto arquitectónico se encuentra ubicado en el municipio de Valledupar en el Departamento del Cesar en la dirección Calle 14 Nro. 14-189, esquina.

A continuación, se presenta una imagen general del predio objeto de proyecto.

## 4. ORGANIZACION

Las actividades topográficas fueron realizadas por el topógrafo Joel Enrique Rocha Wilches; quien tuvo bajo su responsabilidad las siguientes actividades:

- Programar, coordinar y controlar las diferentes etapas de las labores de campo y oficina.
- Realizar las actividades necesarias para la toma de la información y la generación de cálculos de volúmenes

## 5. PERSONAL Y EQUIPOS

Para el desarrollo de las actividades de campo se conformó un (1) grupo de topografía los cuales fueron encargados de suministrar y tomar la información pertinente en base a los diseños estructurales y arquitectónicos del objeto en ejecución.

La comisión de trabajo se conformó por el siguiente personal y equipos:

**Personal**

- Un (1) topógrafo
- Un (1) cadenero primero
- Un (1) cadenero segundo

**Equipos**

- Una (1) estación total (marca stonex)
- Un (1) nivel de precisión (marca topcon AT-B4)
- Herramientas menores (Estacas, puntillas, cincel, flexómetro, etc)

## 6. ASPECTOS TECNICOS

- **Complementación técnica:** Esta comisión de topografia establecio los controles pertinentes de cada estructura ejecutada durante este periodo.
- **Inspección de Obra:** Inicialmente la comision de topografia realiza el control de las actividades en el frente de trabajo, revisando que estas cumplan con las especificaciones tecnicas y constructivas del proyecto.

## 7. CONDICIONES LABORALES

- **Condiciones Climaticas:** En general, el desarrollo de la obra se ha dado en unas condiciones climaticas optimas aunque se han presentado precipitaciones pero no han afectado a la obra, solo se suspende mientras se presenta dichas precipitaciones.
- **Condiciones de Orden Publico:** No se ha presentado problema alguno en lo referente al orden publico con la ejecucion de los trabajos.
- **Condiciones Tecnicas**: Las obras se desarrollan según las instrucciones dadas por el director y el residente de obra contando con la participacion de la comision de topografia.

Se estan ejecutando las actividades descritas con las caracteristicas indicadasen los respectivos pliegos de condiciones y especificaciones constructivas entregadas al contratista de obra, con las respectivas cotas y lineamientos.

A continuacion se encuentra descrita la continuidad de las actividades ralizadas durante el desarrollo de la obra teniendo en cuenta la fecha de inicio ejecucion del proyecto.

## 8. ACTIVIDADES EN CAMPO

- **Replanteo**: Se procede a hacer el replanteo de ejes, para luego realizar las localizaciones de las zapatas tipo Z-2, Z-6, Z-8, Z-10 y Z-13; las vigas 005, 006, 007, 010, 012 y 015; muro tipo 2 y M-7 y columnas B3 y C5.







- **Excavaciones**: Se avanza la excavación mecánica de las zapatas Z-2, Z-6, Z-10 y Z-13; Zarpas, vigas y contrapiso.





- **Armado de hierro:** Se realiza el armado de hierro para la zapata Z-8, zarpa tipo 1, vigas 005,006, 007, 010 y 012; columna C-3; y muros M-7 y tipo 2.






- **Fundida:** Se avanza en la fundida de elementoss estrucurales como zarpas,columnas, vigas, zapatas y caisson.

- Fundida de la columna E-3.






- Fundida de la zapata Z-8 y la viga 012 correspondiente a las medidas 80x120cm






- Fundida de Zarpas tipo 1, zapatas Z-2 y Z-13 y viga 006 con medidas de 80x120cm.







- Fundida de anillos de caisson





- **Niveles:** Se realiza la verificacion de los niveles de zapatas, zarpas, geodren, contrapiso y columnas a alturas de semi-sotano.





- **Verticalidad:** Es el control de alta precisión de la estructura existente en el que verificamos si está teniendo algún movimiento horizontal o vertical.





| CARTERA DEL CONTROL VERTICALIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE VERIFICACION:** 26 septiembre del 2023 | | | | | |
| **INSTRUMENTO DE VERIFICACION:** Estación total KOLIDA CTS-632 | | | | | |
| **No. PUNTO** | **COORDENADAS SEPTIEMBRE** | | **COORDENADAS AGOSTO** | | **DIFERENCIA** |
| | **NORTE** | **ESTE** | **NORTE** | **ESTE** | |
| 1 | 1650179,088 | 1090339,803 | 1650179,082 | 1090339,807 | 0,001 |
| 2 | 1650181,125 | 1090369,835 | 1650181,121 | 1090369,829 | 0,005 |
| 3 | 1650181,73 | 1090379,012 | 1650181,728 | 1090379,02 | -0,003 |
| 4 | 1650182,601 | 1090392,029 | 1650182,596 | 1090392,025 | 0,005 |
| 5 | 1650183,2 | 1090400,975 | 1650183,195 | 1090400,986 | -0,003 |
| 6 | 1650179,789 | 1090350,259 | 1650179,782 | 1090350,258 | 0,004 |
| 7 | 1650181,407 | 1090374,003 | 1650181,41 | 1090374,009 | -0,005 |
| 8 | 1650179,822 | 1090350,488 | 1650179,817 | 1090350,486 | 0,003 |
| 9 | 1650180,801 | 1090365,165 | 1650180,804 | 1090365,171 | -0,005 |
| 10 | 1650182,633 | 1090392,136 | 1650182,62 | 1090392,148 | 0,000 |
| 11 | 1650179,816 | 1090350,208 | 1650179,813 | 1090350,2 | 0,006 |
| 12 | 1650181,411 | 1090374,036 | 1650181,412 | 1090374,042 | -0,003 |
| 13 | 1650182,454 | 1090389,32 | 1650182,444 | 1090389,318 | 0,006 |
| 14 | 1650170,798 | 1090346,503 | 1650170,798 | 1090346,505 | -0,001 |
| 15 | 1650165,644 | 1090364,298 | 1650165,642 | 1090364,301 | -0,000 |
| 16 | 1650170,78 | 1090346,524 | 1650170,78 | 1090346,521 | 0,002 |
| 17 | 1650165,674 | 1090364,668 | 1650165,672 | 1090364,666 | 0,002 |


- **Levantamientos topográficos:** Se realiza levantamiento topográfico con el fin de determinar el cálculo de volumen en movimientos de terreno y cimentación, para visualizar el avance de obra.












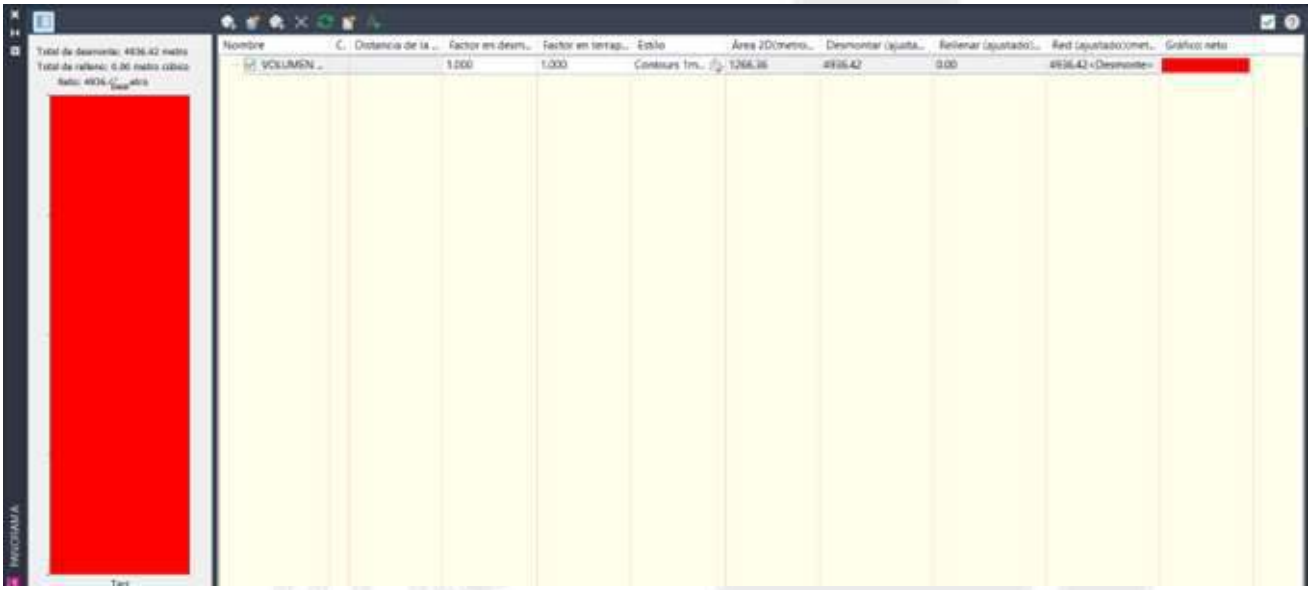

| CARTERA DE EXCAVACION DE AVANCE DEL MES DE SEPTIEMBRE<br>TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR-CESAR". | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.K. | Área de desmonte (metros cuadrados) | Volumen de desmonte (metros cúbicos) | Volumen reutilizable (metros cúbicos) | Vol. desmonte acumul. (metros cúbicos) | Vol. reutilizable acumul. (metros cúbicos) | Vol. neto acumul. (pies cúbicos) |
| 0+000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0+002.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0+004.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0+006.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0+008.000 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 |
| 0+010.000 | 35.24 | 57.82 | 57.82 | 80.39 | 80.39 | 80.39 |
| 0+012.000 | 41.6 | 76.84 | 76.84 | 157.23 | 157.23 | 157.23 |
| 0+014.000 | 46.4 | 88 | 88 | 245.23 | 245.23 | 245.23 |
| 0+016.000 | 50.89 | 97.29 | 97.29 | 342.52 | 342.52 | 342.52 |
| 0+018.000 | 62.07 | 112.96 | 112.96 | 455.48 | 455.48 | 455.48 |
| 0+020.000 | 62.76 | 124.83 | 124.83 | 580.31 | 580.31 | 580.31 |
| 0+022.000 | 74.87 | 137.62 | 137.62 | 717.93 | 717.93 | 717.93 |
| 0+024.000 | 86.94 | 161.81 | 161.81 | 879.74 | 879.74 | 879.74 |
| 0+026.000 | 85.42 | 172.36 | 172.36 | 1052.1 | 1052.1 | 1052.1 |
| 0+028.000 | 84.1 | 169.51 | 169.51 | 1221.61 | 1221.61 | 1221.61 |
| 0+030.000 | 71.55 | 155.65 | 155.65 | 1377.26 | 1377.26 | 1377.26 |
| 0+032.000 | 50.24 | 121.8 | 121.8 | 1499.06 | 1499.06 | 1499.06 |
| 0+034.000 | 41.94 | 92.19 | 92.19 | 1591.25 | 1591.25 | 1591.25 |
| 0+036.000 | 47.9 | 89.84 | 89.84 | 1681.09 | 1681.09 | 1681.09 |
| 0+038.000 | 58.98 | 106.88 | 106.88 | 1787.97 | 1787.97 | 1787.97 |
| 0+040.000 | 87.37 | 146.35 | 146.35 | 1934.32 | 1934.32 | 1934.32 |
| 0+042.000 | 112.35 | 199.72 | 199.72 | 2134.04 | 2134.04 | 2134.04 |
| 0+044.000 | 123.2 | 235.55 | 235.55 | 2369.59 | 2369.59 | 2369.59 |
| 0+046.000 | 128.22 | 251.42 | 251.42 | 2621.01 | 2621.01 | 2621.01 |
| 0+048.000 | 129.36 | 257.59 | 257.59 | 2878.6 | 2878.6 | 2878.6 |
| 0+050.000 | 134.27 | 263.64 | 263.64 | 3142.23 | 3142.23 | 3142.23 |
| 0+052.000 | 144.01 | 278.28 | 278.28 | 3420.51 | 3420.51 | 3420.51 |
| 0+054.000 | 132.89 | 276.89 | 276.89 | 3697.4 | 3697.4 | 3697.4 |
| 0+056.000 | 119.41 | 252.3 | 252.3 | 3949.7 | 3949.7 | 3949.7 |
| 0+058.000 | 111.88 | 231.29 | 231.29 | 4180.98 | 4180.98 | 4180.98 |
| 0+060.000 | 100.7 | 212.57 | 212.57 | 4393.56 | 4393.56 | 4393.56 |
| 0+062.000 | 90.01 | 190.71 | 190.71 | 4584.26 | 4584.26 | 4584.26 |
| 0+064.000 | 71.36 | 161.38 | 161.38 | 4745.64 | 4745.64 | 4745.64 |
| 0+066.000 | 38.66 | 110.02 | 110.02 | 4855.66 | 4855.66 | 4855.66 |
| 0+068.000 | 16.94 | 55.6 | 55.6 | 4911.26 | 4911.26 | 4911.26 |
| 0+070.000 | 2.61 | 19.55 | 19.55 | 4930.81 | 4930.81 | 4930.81 |
| 0+070.227 | 1.2 | 0.43 | 0.43 | 4931.25 | 4931.25 | 4931.25 |

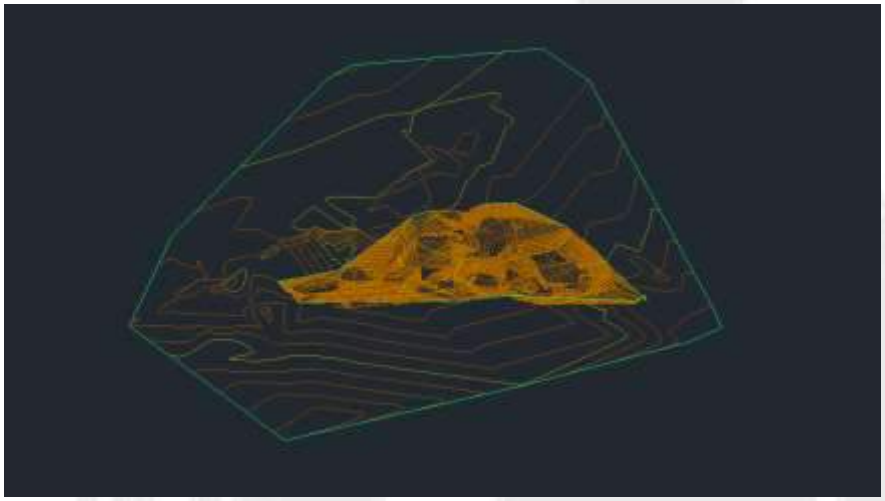

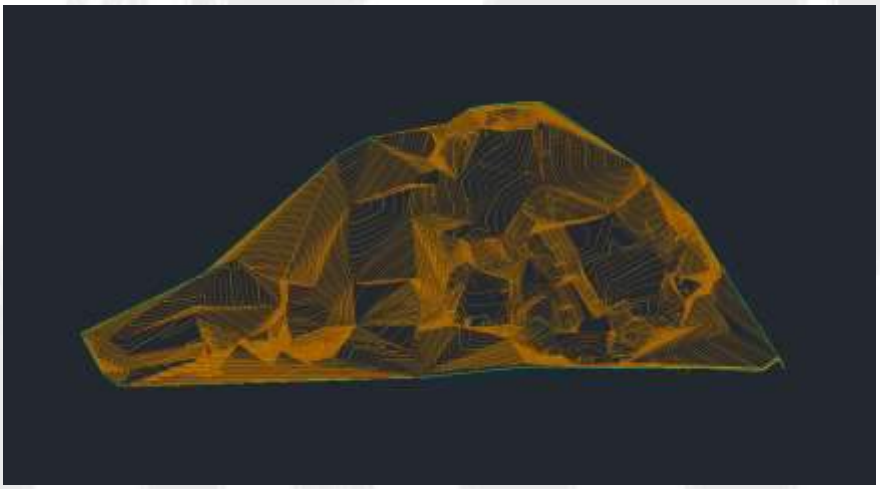

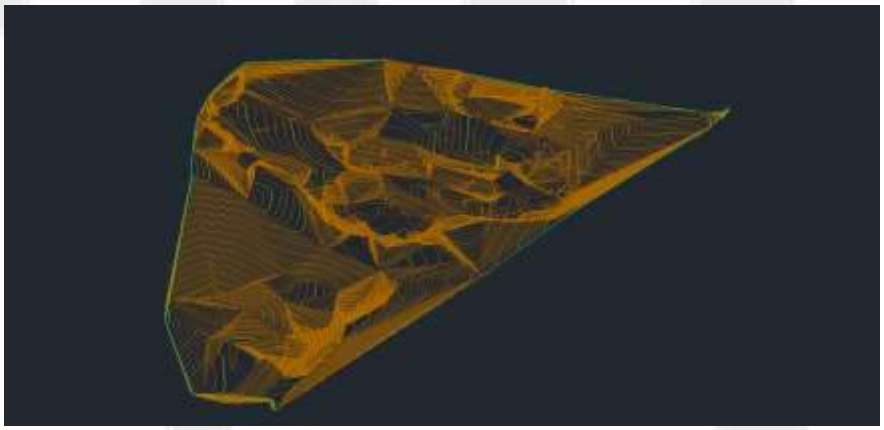



JOEL ENRIQUE ROCHA WILCHEZ
C.c. 1.065.580.756 de Valledupar
Tel:3167 833981-3217342538

## Tabla de contenido


***1. INTRODUCCIÓN ..... 2***

***2. GENERALIDADES DEL PROYECTO ..... 2***

2.1 Descripción del proyecto ..... 2

2.1.1 Localización general del proyecto ..... 2

2.1.2 Contrato de Obra ..... 3

***3. PERSONAL DEL PROYECTO ..... 4***

3.1 Personal Administrativo del proyecto ..... 4

3.2 Detalles del personal Administrativo y operativo en obra ..... 4

***4. INDICADORES ..... 7***

4.1 Horas hombres Trabajadas Personal Operativo ..... 7

4.2 Ausentismo en el proyecto. ..... 10

4.3 Accidentalidad del Proyecto ..... 10

***5. MEDICINA PREVENTIVA LABORAL ..... 11***

***6. ACTIVIDADES EN OBRA ..... 12***

***Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre del presente año se realizaron las siguientes actividades: ..... 12***

6.1 Registro de inspecciones planeadas y permisos de trabajo. ..... 13

6.2 Formación de personal en Seguridad y Salud en el Trabajo ..... 14

***7. SEGURIDAD INDUSTRIAL ..... 15***

***8. ANEXOS ..... 26***

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se presenta con el fin de asegurar y evidenciar la gestión de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto **CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR** de acuerdo con las actividades definidas en el CONTRATODE OBRA No. 323 DEL 2022.

## 2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

### 2.1 Descripción del proyecto

El proyecto se encuentra situado en el municipio de Valledupar en el departamento del Cesar, zona urbana, en la calle14 # 12-189 (Palacio de justicia) sitio de ejecución.

#### 2.1.1 Localización general del proyecto

El proyecto se desarrollará en el bloque de parqueaderos y áreas complementarias del Palacio de Justicia.

**Ubicación Palacio de Justicia**




**Figura 1.** Localización del palacio de justicia (Valledupar)

**Fuente:** Google Earth



**Figura 2.** Localización de edificio Palacio de Justicia (Valledupar)

### 2.1.2 Contrato de Obra

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE: | CONCEJO SUPERIOR DE JUDICATURA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES |
| OBJETO: | "REALIZAR OBRA DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR) " |
| PLAZO INICIAL DEEJECUCIÓN: | TREINTA Y CINCO MESAR (35) contados a partir de la respectiva acta de inicio, previa legalización del contrato. |
| VALOR PRESUPUESTO: | CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (49.420.492.192) incluidos impuestos y contribuciones de ley |

**Tabla No. 1**

## 3. PERSONAL DEL PROYECTO

El proyecto se ha integrado en el periodo de la presentación del siguiente informe desde el 01 Al 30 de Septiembre del 2023 respectivamente.

### 3.1 Personal Administrativo del proyecto

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre del presente año, se mantiene el personal operativo en el proyecto el cual desarrolla las actividades de obra civil.

### 3.2 Detalles del personal Administrativo y operativo en obra

Desde el 01 al 30 de Septiembre de 2023 se contó con la participación permanente del siguiente personal en obra.

**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**

| Información Trabajadores | | | | | | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | CC | Nombres y apellidos del Trabajador | No ASIGNADO | Cargo | Area | Activo | Fecha ingreso | Fecha retiro (cuando aplique) |
| | | | | | | | | |
| 1 | 72339619 | EMEL DARIO LARIOS MEDINA | 3 | RESIDENTE DE OBRA | ADMINISTRATIVA | SI | 06/03/2023 | NA |
| 2 | 40960020 | LUZDAMARYS SALCEDO VALDEBLANQUEZ | 5 | RESIDENTE SST | ADMINISTRATIVA | SI | 15/04/2023 | NA |
| 3 | 1065809341 | WENNDY JULIETH QUIRIZ AYOLA | 6 | RESIDENTE ADMON | ADMINISTRATIVA | SI | 25/04/2023 | NA |
| 4 | 1065657761 | OSCAR EDUARDO BUSTILLO ECHAVEZ | 7 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 16/05/2023 | NA |
| 5 | 1065842379 | JESÚS DAVID QUIROZ LÓPEZ | 8 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 16/05/2023 | NA |
| 6 | 1193403152 | JUAN YESITH BRITO ZABALETA | 10 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 16/05/2023 | NA |
| 7 | 1193561205 | SEGUNDO ANTONIO MARTÍNEZ CALDERA | 11 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 16/05/2023 | NA |
| 8 | 1062398032 | JUAN CARLOS MURGAS MINDIOLA | 12 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 16/05/2023 | NA |
| 9 | 1065837582 | DUBAN ENRIQUE PERALTA PORTO | 13 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 16/05/2023 | NA |
| 10 | 77028189 | WILMAN IGNACIO CORONADO SILVA | 14 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 16/05/2023 | NA |
| 11 | 1004502067 | FARID ALBERTO VAN STRALRN VIZCAINO | 15 | OFICIAL DE OBRA CIVIL | OPERATIVO | SI | 16/05/2023 | NA |
| 12 | 77186837 | JOSE LUIS CAMPO CALDERÓN | 16 | AUXILIAR OF. VARIOS | OPERATIVO | NO | 16/05/2023 | 15/09/2023 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 77186289 | CESAR RAFAEL NÚÑEZ ACUÑA | 17 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 16/05/2023 | NA |
| 14 | 1003376653 | CESAR LUIS NÚÑEZ ARRIETA | 18 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 16/05/2023 | NA |
| 15 | 91526911 | JORGE USECHUE | 23 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 25/05/2023 | NA |
| 16 | 77155343 | LUIS ALBERTO CASTILLO CAMELO | 25 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 25/05/2023 | NA |
| 17 | 77026504 | REINALDO MOSCOTE PACHECO | 26 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 25/05/2023 | NA |
| 18 | 1007392140 | LUIS GABRIEL MARQUEZ JULIO | 27 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 25/05/2023 | NA |
| 19 | 1065235505 | JHON JAVIER OSMA ORTEGA | 28 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 25/05/2023 | NA |
| 20 | 1052080418 | CARLOS ANDRES OLIVERA FRANCO | 29 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 25/05/2023 | NA |
| 21 | 5165243 | YESMAN ENRRIQUE MENDOZA MENDOZA | 30 | OFICIAL DE OBRA CIVIL | OPERATIVO | SI | 25/05/2023 | NA |
| 22 | 1048600194 | JHON JAIRO MORALES CABRERA | 31 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 25/05/2023 | NA |
| 23 | 1064711685 | JUAN DAVID MEJIA CINN | 32 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 25/05/2023 | NA |
| 24 | 1080431816 | JEINER DAVID MENDOZA RODRIGUEZ | 33 | OFICIAL DE OBRA CIVIL | OPERATIVO | SI | 06/06/2023 | NA |
| 25 | 85442542 | DANIEL ENRIQUE AGUILAR VANEGAS | 34 | OFICIAL DE OBRA CIVIL | OPERATIVO | SI | 06/06/2023 | NA |
| 26 | 77154925 | ANIBAL JOSE JIMENEZ ESCORCIA | 37 | OFICIAL DE OBRA CIVIL | OPERATIVO | SI | 06/06/2023 | NA |
| 27 | 1065626852 | LUIS MIGUEL GOMEZ GUTIERREZ | 38 | OFICIAL DE OBRA CIVIL | OPERATIVO | SI | 06/06/2023 | NA |
| 28 | 1065809820 | ALDAIR LUIS DIAZ OÑATE | 39 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 06/06/2023 | NA |
| 29 | 77171396 | PEDRO JULIO SANDOVAL VANEGAS | 42 | OFICIAL DE OBRA CIVIL | OPERATIVO | SI | 06/06/2023 | NA |
| 30 | 1006714113 | EDUARDO ENRIQUE RIVERA ALVAREZ | 48 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 07/06/2023 | NA |
| 31 | 106556239 | GEOVALDI ENRIQUE FONTALVO MATOS | 49 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | NO | 07/06/2023 | 25/09/2023 |
| 32 | 1065823637 | CARLOS ANDRES MOSQUERA PALMERA | 50 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | NO | 07/06/2023 | 15/09/2023 |
| 33 | 77183812 | WILLIAM ENRIQUE PALMERA SANTANA | 54 | AYUDANTE DE OBRA | OPERATIVO | SI | 14/06/2023 | NA |
| 34 | 1032449361 | JUAN CAMILO VELAZCO VALDERRAMA | 55 | RESIDENTE DE OBRA | ADMINISTRATIVA | SI | 21/06/2023 | NA |
| 35 | 1120748067 | KAREN KATIUSCA SOTO FUENTES | 56 | RESIDENTE SST | ADMINISTRATIVA | SI | 07/07/2023 | NA |
| 36 | 79750423 | YUBER FERNANDO BERNAL CONTENTO | 57 | DIRECTOR DE OBRA | ADMINISTRATIVA | SI | 08/07/2023 | NA |
| 37 | 8664000 | EMIRO EVENDAÑO GUERRA | 58 | MAESTRO DE OBRA | OPERATIVO | SI | 21/07/2023 | NA |

**Tabla No. 2**

## JER TOPOGRAFIA

| Informacion Trabajadores | | | | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Nombres y apellidos del Trabajador | Cargo | Area | Activo | Fecha ingreso | Fecha retiro (cuando aplique) |
| 1003240689 | ASNER ROCHA WILCHES | TOPOGRAFO | TOPOGRAFIA | SI | 17/03/2023 | |
| 1065576867 | RAFAEL AUGUSTO BALCAZAR VERDECIA | CADENERO 2 | TOPOGRAFIA | SI | 17/03/2023 | |
| 1065815762 | ELIANETH PALOMINO RANGEL | AUX TOPOGRAFO | TOPOGRAFIA | SI | 25/04/2023 | |

**Tabla No. 3**

## ANILLOS DE SEGURIDAD

| Informacion Trabajadores | | | | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Nombres y apellidos del Trabajador | Cargo | Area | Activo | Fecha ingreso | Fecha retiro (cuando aplique) |
| 77185068 | ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR | GUARDA DE SEGURIDAD | SEGURIDAD FISICA | SI | 20/03/2023 | 31/08/2023 |
| 1062400397 | HAWIN NAVARRO ANGARITA | GUARDA DE SEGURIDAD | SEGURIDAD FISICA | SI | 20/03/2023 | 31/08/2023 |
| 11800493 | YELMER EMIR CORDOBA MENA | GUARDA DE SEGURIDAD | SEGURIDAD FISICA | SI | 20/03/2023 | 31/08/2023 |

**Tabla No. 4**

## SECURITY ELYTE

| Informacion Trabajadores | | | | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Nombres y apellidos del Trabajador | Cargo | Area | Activo | Fecha ingreso | Fecha retiro (cuando aplique) |
| 77185068 | ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR | GUARDA DE SEGURIDAD | SEGURIDAD FISICA | SI | 01/09/2023 | 20/09/2023 |
| 1065595702 | FABIAN CORRALES HERRERA | GUARDA DE SEGURIDAD | SEGURIDAD FISICA | SI | 01/09/2023 | 20/09/2023 |
| 6084471 | RICARDO JAVIER ROMERO PETIT | GUARDA DE SEGURIDAD | SEGURIDAD FISICA | SI | 01/09/2023 | 20/09/2023 |

**Tabla No. 5**

## TRANSPORTE ASCANIO

| Informacion Trabajadores | | | | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Nombres y apellidos del Trabajador | Cargo | Area | Activo | Fecha ingreso | Fecha retiro (cuando aplique) |
| 1065639870 | OLBER DONADO VILLAFAÑE | OPERADOR DE MAQUINARIA | OPERATIVA | SI | 01/09/2023 | N/A |

**Tabla No. 6**

## SECURITY FORCE

| Informacion Trabajadores | | | | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Nombres y apellidos del Trabajador | Cargo | Area | Activo | Fecha ingreso | Fecha retiro (cuando aplique) |
| 77185068 | ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR | GUARDA DE SEGURIDAD | SEGURIDAD FISICA | SI | 21/09/2023 | N/A |
| 1122396146 | JEISON ANDRES CHAMORRO SARIA | GUARDA DE SEGURIDAD | SEGURIDAD FISICA | SI | 21/09/2023 | N/A |
| 1065646526 | JOSE ALBERTO GUTIERREZ SANTIAGO | GUARDA DE SEGURIDAD | SEGURIDAD FISICA | SI | 21/09/2023 | N/A |

**Tabla No. 7**

**Anexo 1** Documentos para ingreso a obra (C.C, ARL, EPS, AFP, CCF, Examen médicos)

## 4. INDICADORES

Para este contrato se contemplan indicadores de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales nos permiten evaluar la gestión de SST y sus diferentes variaciones durante cada periodo de ejecución del proyecto a continuación se relacionan cada uno de los indicadores para el periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2023.

### 4.1 Horas hombres Trabajadas Personal Operativo

Para las labores ejecutadas en este proyecto, los resultados obtenidos durante el periodo objeto de este informe se determinó que se trabajaron las horas estipuladas. Así mismo se evidencia el reporte del ausentismo que tuvo incidencia en el proyecto durante el mes de julio como se relaciona en la siguiente tabla.

| Versión:1 | INDICADORES DE GESTION PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES - VALLEDUPAR | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES NIT. 901.665.448-8 |
|---|---|---|
| Fecha: 31/05/2023 | | |
| Clsificación: Interno | | |

**PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES.**

| MES | Días Labor | N. Trabajadores | Horas Hombre Trabajadas | H.E | Ausentismo laboral | | | Ausencia Justificada | TOTAL DIAS PERDIDOS 2023 | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Por Accidente Laboral | Por Enfermedad comun | Ausencia no Justificada | | | |
| MARZO | 26 | 13 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | |
| ABR | 23 | 27 | 4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| MAY | 23 | 42 | 7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| JUN | 24 | 50 | 9600 | 0 | 2 | 37 | 6 | | 45 | |
| JUL | 24 | 37 | 7104 | 0 | 0 | 37 | 0 | 28 | 65 | Ausentismo por licencia de paternidad (trabajadores: Segundo Martinez, Juan Carlos Murgas. |
| AGO | 25 | 36 | 7200 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 50 | |
| SEP | 26 | 36 | 7488 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 42 | Trabajador Carlos Mosquera presenta incapacidad medica emitida por EPS. Trabajador Juan Yesith Brito y Aldair |
| **TOTAL** | **171** | **34** | **46792** | **0** | **2** | **140** | **41** | **28** | **202** | |

**Tabla No. 8**

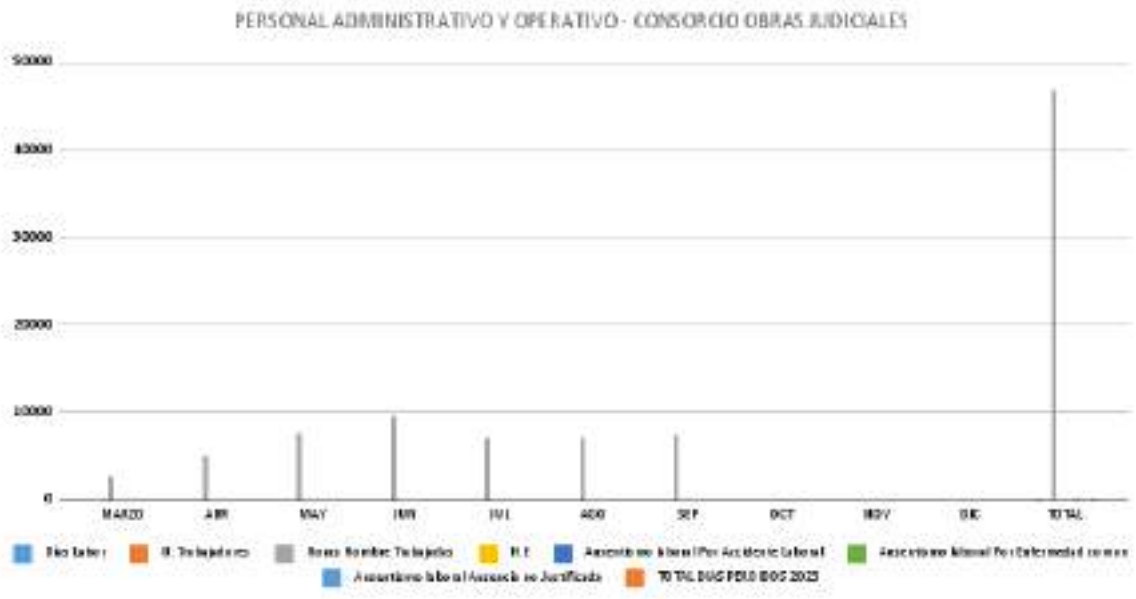



**Gráfico No. 1**

| Versión:1 | INDICADORES DE GESTION PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES - VALLEDUPAR | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES NIT. 901.665.448-8 |
|---|---|---|
| Fecha: 31/05/2023 | | |
| Clsificación: Interno | | |

| PERSONAL CONTRATISTAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | Días Labor | N. Trabajadores | Horas Hombre Trabajadas | H.E | Ausentismo laboral | | | | TOTAL DIAS 2023 | OBSERVACIÓN |
| | | | | | Accidente Laboral | Enfermedad comun | Ausencia no Justificada | | | |
| MARZO | 13 | 6 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ABR | 23 | 6 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| MAY | 23 | 19 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| JUN | 24 | 13 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| JUL | 24 | 8 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| AGO | 25 | 7 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| SEP | 26 | 7 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **TOTAL** | ***158*** | **9** | **12112** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | |

**Tabla No. 9**

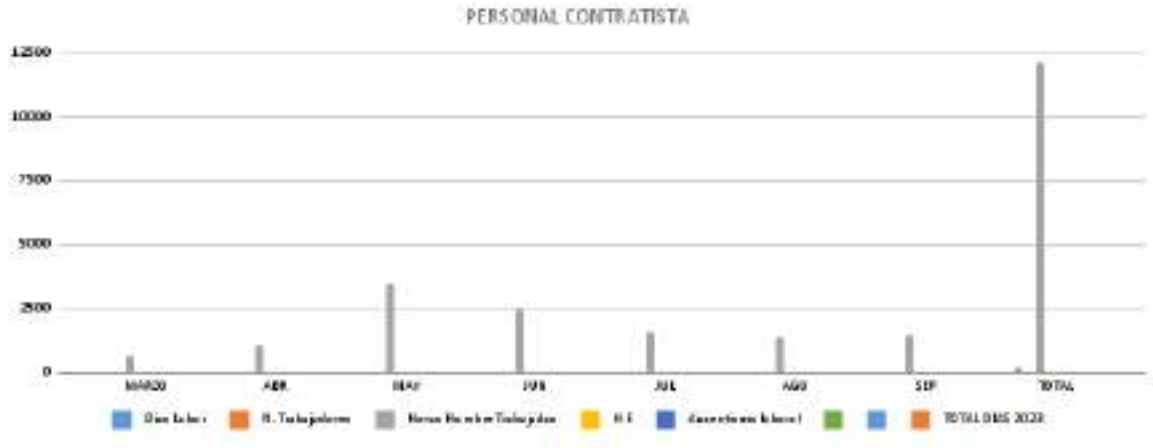



**Gráfico No. 2**

Se evidencia que el periodo de este informe no se aumentó los tiempos de labores en obra, por la cantidad de personal que hizo presencia en el mismo.

### 4.2 Ausentismo en el proyecto.

En el periodo de presentación de este informe se presentan ausentismo en el proyecto, los cuales son relacionados a continuación.

| INCAPACIDADES AGOSTO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | CONTRATISTA | CARGO | FECHA INICIO DE INCAPACIDAD | FECHA FIN DE INCAPACIDAD | DIAS DE INCAPACIDAD ACCIDENTE LABORAL | DIAS DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD COMUN | DIAS DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD LABORAL | DIAS TOTAL DE INCAPACIDAD |
| DUVAN ENRIQUE PERALTA PORTO | 1065837582 | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 28/07/2023 | 13/09/2023 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| CARLOS ANDRES MOSQUERA PALMERA | 1065823637 | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 01/09/2023 | 03/09/2023 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ALDAIR LUIS DIAZ OÑATE | 1065809820 | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JUAN YESITH BRITO ZABALETA | 1193403152 | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 08/09/2023 | 10/09/2023 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| JEINER DAVID MENDOZA RODRIGUEZ | 1080431816 | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | OFICIAL DE OBRA | 08/09/2023 | 09/09/2023 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| JHON JAIRO MORALES CABRERA | 1048600194 | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | OFICIAL DE OBRA | 11/09/2023 | 19/09/2023 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| LUIS GABRIEL MARQUEZ JULIO | 1007392140 | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GEOVALDI ENRIQUE FONTALVO MATOS | 1065562392 | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | | | | | | 0 | 17 | 0 | 17 |

**Tabla No. 10**

### 4.3 Accidentalidad del Proyecto

Para el periodo de este informe comprendido desde el día 01 al 30 de Septiembre del 2023 no se presentó accidente laboral en el proyecto.

| INDICE MENSUAL | I.F | I.S | I.L.I |
|---|---|---|---|
| sep-23 | NA | NA | NA |
| CONSOLIDADO 2023 | | | |

| INDICE MENSUAL | I.F | I.S | I.L.I |
|---|---|---|---|
| ene-23 | N/A | N/A | N/A |
| feb-23 | N/A | N/A | N/A |
| mar-23 | N/A | N/A | N/A |
| abr-23 | N/A | N/A | N/A |
| may-23 | N/A | N/A | N/A |
| jun-23 | 2,08 | 2,08 | 0 |
| jul-23 | N/A | N/A | N/A |
| ago-23 | N/A | N/A | N/A |
| sep-23 | N/A | N/A | N/A |

**Tabla No. 11**

## 5. MEDICINA PREVENTIVA LABORAL

Durante el mes de Septiembre del 2023 se presentó nuevo ingreso de personal a obra, los cuales se valida todo lo reglamentario con Seguridad Social (ARL, EPS, AFP, CCF) y posteriormente se procede a realizar la inducción SST, evaluación, Notificación de Riesgos.

**Anexo 2** Inducción SST, Evaluación, Notificación de Riesgos.



**Fotografía N°1: Fotografía N°1: Inducción personal Contratista Security Elite**



**Fotografía N°2: Fotografía N°2: Inducción personal Contratista Transporte Ascanio**

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Fotografía N°3: Fotografía N°3: Reinducción personal Consorcio Obras Judiciales** | **Fotografía N°4: Fotografía N°4: Inducción personal Contratista Security Force** |

**Anexo 3 Notificación de riesgo visitante**

## 6. ACTIVIDADES EN OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre del presente año se realizaron las siguientes actividades:

- **Topografía**

Toma de niveles para excavación de caissón, zapatas vigas y columnas.

Localización de puntos de zapatas y columnas.

Verificación de verticalidad.

- **Obra civil**

Excavación manual para caissón

Retiro manual de material.

Corte de acero

Armado de acero para caissón

Encofrado para fundir anillos

Fundida de anillos para caissón

Instalación de filtros Geodren Tecdren

Armado de acero para zapata

Colocación y aplomado de formaletas

Fundida de zarpa y zarpa

Desencofrado de zapata

### 6.1 Registro de inspecciones planeadas y permisos de trabajo.

En el periodo de este informe se realizaron las siguientes inspecciones.

**Anexo 4** Pre operacionales

**Anexo 5** ATS, Permisos para trabajo en excavación, permisos para trabajo en Alturas.

| GESTIÓN DOCUMENTAL SST | MES DE EJECUCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Inspección de pulidora, taladro, trazadora, Sierra circular mezclador de concreto, herramientas manuales, Bomba estacionaria, Bomba de agua, Inspección de botiquín, Camilla, extintores. | Septiembre | 40 |
| Inspección de EPCC | Septiembre | 26 |
| Análisis de Trabajo Seguro | Septiembre | |
| Permiso para trabajo en excavación. | Septiembre | 24 |
| Permiso para trabajo en Alturas. | Septiembre | 58 |
| Permiso para trabajo en caliente. | Septiembre | 17 |

**Tabla No. 12**

## 6.2 Formación de personal en Seguridad y Salud en el Trabajo

**Charla SST – Capacitación.**

| Fecha | Tipo de actividad | Tema | Duración |
|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | Charla SST | Protección facial | 12 Minutos |
| 02/09/2023 | Charla SST | Protección de la flora y la fauna | 10 Minutos |
| 04/09/2023 | Charla SST | Seguridad en el uso de eslinga | 8 Minutos |
| 05/09/2023 | Charla SST | Protección de los recursos hídricos, prohibiciones al respeto | 12 Minutos |
| 06/09/2023 | Charla SST | Riesgo del ruido | 10 Minutos |
| 07/09/2023 | Charla SST | Golpe de calor | 10 Minutos |
| 08/09/2023 | Charla SST | Manejo de los residuos líquidos o Vertimiento, permisos y obligaciones | 12 Minutos |
| 09/09/2023 | Charla SST | Manejo integral de residuos sólidos, domésticos y peligrosos | 10 Minutos |
| 11/09/2023 | Charla SST | Socialización ATS | 10 Minutos |
| 12/09/2023 | Charla SST | Resbalones, Tropezones y caídas | 12 Minutos |
| 13/09/2023 | Charla SST | Pensar antes de actuar, Practicando el autocuidado | 15 Minutos |
| 14/09/2023 | Capacitación | Manejo de materiales sobrantes y materiales de construcción | 12 Minutos |
| 15/09/2023 | Charla SST | Respetar la señalización en obra | 10 Minutos |
| 16/09/2023 | Charla SST | Responsabilidad social en un adecuado manejo | 15 Minutos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ambiental en obra | |
| 18/09/2023 | Capacitación | Cambios climáticos | 8 Minutos |
| 19/09/2023 | Charla SST | Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas. | 7 Minutos |
| 20/09/2023 | Charla SST | Riesgos básicos de seguridad | 5 Minutos |
| 21/09/2023 | Capacitación | Ahorro de recursos Hídricos | 1 Hora |
| 22/09/2023 | Charla SST | Cuidado de los equipos o elementos de protección personal | 9 Minutos |
| 23/09/2023 | Charla SST | Respeto mutuo entre compañeros | 7 Minutos |
| 25/09/2023 | Capacitación | Prevención consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas | 1 Hora |
| 26/09/2023 | Charla SST | Inspeccionar las herramientas antes de usar | 10 Minutos |
| 27/09/2023 | Charla SST | Trabajo en equipo | 12 Minutos |
| 28/09/2023 | Charla SST | Orden y aseo | 12 Minutos |
| 29/09/2023 | Charla SST | Practica el Autocuidado | 12 Minutos |
| 30/09/2023 | Charla SST | Cuido mis manos | 10 Minutos |

**Tabla No. 13**

## 7. SEGURIDAD INDUSTRIAL

La prevención de accidentes como factor primordial en el proyecto se ha efectuado gracias a la colaboración obtenida por parte del personal y el área SST. Quienes mutuamente por medio de actividades de inspección, control, aprendizaje y mejora continua. Ayudan a prevenir la ocurrencia de factores que sean potenciales en la influencia para la generación de actos y condiciones inseguras.

En la siguiente tabla se exponen a manera de resumen algunas de las actividades potencialmente relevantes encaminadas a contribuir con la seguridad y salud en el trabajo durante el mes de Septiembre de 2023.

| DESCRIPCION | REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|
| **Charlas de seguridad:** las charlas de seguridad se realizan todos los días antes de iniciar la jornada laboral con el objetivo de informar y concienciar a los trabajadores sobre su propia seguridad y salud en el trabajo. |     |

| | |
|---|---|
| **Orden y aseo:** El orden y el aseo en obra son factores importantes para la prevención de incidentes y accidentes ayudan a mejorar las condiciones de seguridad en general. |     |
| **Aseo parte externa de la obra** |   |

| | |
|---|---|
| **Pausas activas:** su finalidad es contribuir con la liberación, descanso y esparcimiento del sistema locomotor de cada individuo. |     |
| **Inspección pre operacional de herramientas, equipos y maquinaria a utilizar:** Se realiza con el fin de revisar y examinar el estado de cada uno de estos y determinar si están aptos para ser utilizados. |   |

| | |
|---|---|
| |   |
| **Entrega de EPP:** Se realiza la entrega del elemento y se les recuerda la importancia del su uso. (protegerse minimizando los riesgos de accidente) |   |
| **Señalización áreas intervenidas:** Se realiza con el fin mitigar el riesgo o peligro existente. |   |

<table>
<tr><td></td><td> </td></tr>
<tr><td>Inspección de EPCC: Se realiza la inspección cada vez que se va a utilizar con el fin de verificar que no tenga ningún desgaste, daños o corrosivos.</td><td> <br> </td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **Reunión de COPASST** se realizan reuniones mensuales con el comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, así dando cumplimiento a la normatividad establecida. |   |
| **Capacitación:**<br><br>**Funciones y responsabilidades del COPASST.**<br>**Funciones y responsabilidades Comité de Convivencia Laboral.**<br><br>**Prevención de consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.** |     |

| | |
|---|---|
| **Instalación de sendero peatonal provisional:** Se instala sendero peatonal provisional con el fin de garantizar el paso del peatonal durante el descargue de material en obra. |   |

| **Actos y condiciones inseguras**<br>Se anexan formatos de actos y condiciones inseguras. | |
|---|---|
| **Acto inseguro:** Los trabajadores Carlos Andrés Mosquera Palmera, Aníbal José Jiménez Escorcia, Eduardo Enrique Rivera Álvarez, Juan David Mejía Cinin, Aldair Luis Díaz Oñate, Rafael Augusto Balcázar Verdecia, se encontraban en un caissón a una altura negativa aproximadamente de 4.70 Mts, sin la debida protección. Se evidencian trabajadores sin EPCC (Equipo de Protección Contra Caída) y los que tienen no se encuentran anclados a una línea de vida.<br>Vale la pena aclarar que este sistema se requiere de uso obligatorio como medida preventiva en caso de presentarse una emergencia (Desplome de caissón) poder identificar al personal que se encuentra expuesto para un posible rescate.<br><br> | Se corrige el acto inseguro realizando un llamado de atención al personal el cual se evidencia cometiendo el acto inseguro. |

| | |
|---|---|
| **Acto inseguro:** Se evidencia al señor Emiro Avendaño Maestro de obra, cometiendo acto inseguro, sentado de una manera no apropiada en el borde de un muro a una altura aproximada de 5 mts, sin EPCC (Elemento de Proteccion Contra Caida) siendo este una medida obligatorio por norma vigente (Resolucion 4272 de 2021) Donde se establecen los requisitos minimos para trabajo en altura despues de 2.0 Mts, como medida preventiva para riesgo de caida.<br><br><br><br> | Se corrige el acto inseguro realizando llamado de atención y asignando un arnés con eslinga al colaborador. |
| | |

| | |
|---|---|
| **Condición insegura:** Se evidencia sendero peatonal obstruido por material desorganizado.<br> | Se corrige la condicion insegura organizando nuevamente y señalizando sendero peatonal.<br> |
| **Condición insegura:** Se evidencia áreas con condiciones inseguras sin señalización, debido a las excavaciones para llevar a cabo las actividades de la máquina.<br> | Se corrige condicion insegura realizando demarcacion con señalizacion de colombinas con malla, por terrenos con diferencias de nivel.<br> |

**Tabla No. 14**


## 8. ANEXOS

- Anexo 1 Documentos para ingreso a obra (C.C, ARL, EPS, AFP, CCF, Examen médicos, Certificado de competencia).
- Anexo 2 Inducción, evaluación de inducción, notificación de riesgo.
- Anexo 3 Notificación de Riesgos visitantes.
- Anexo 4 Pre operacionales.
- Anexo 5 ATS –Permisos.
- Anexo 6 Planilla de seguridad Social.
- Anexo 7 Asistencia Charla SST.
- Anexo 8 Evaluación Capacitación.
- Anexo 9 Acta reunión COPASST.
- Anexo 10 Inspección de pre-uso equipos de alturas.
- Anexo 11 Entrega de EPP.
- Anexo 12 Documentos maquinaria amarilla (Tarjeta de registro, Declaración de importación, Mantenimiento)
- Anexo 13 Actos y Condiciones inseguras.

| |
|---|
| |
| **Residente SST** |
| **KAREN SOTO FUENTES** |
| **CC: 1120748067** |
| **Resolución 1348 del 26 de Diciembre del 2017** |


1.065.595.702
CORRALES HERRERA
FABIAN


14-MAY-2001
VALLEDUPAR
1.70
A+
M

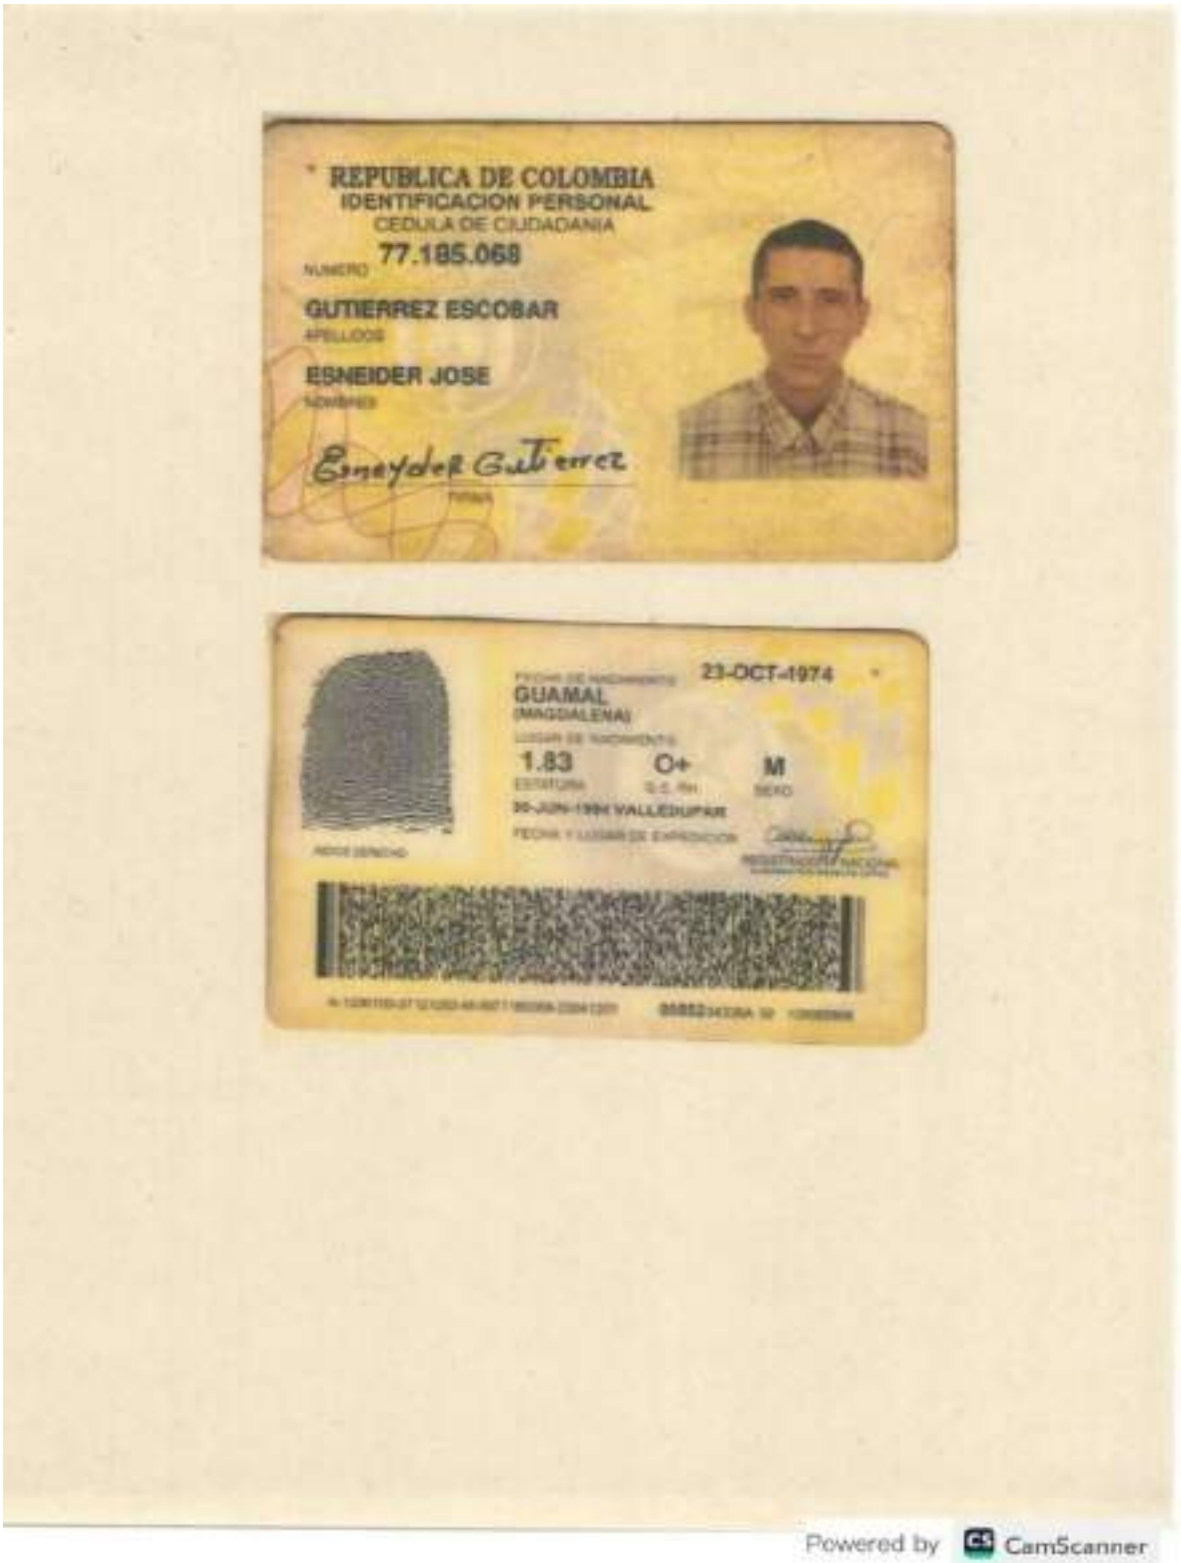
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
77.185.068
GUTIERREZ ESCOBAR
ESNEIDER JOSE
23-OCT-1974
GUAMAL
(MAGDALENA)
1.83
O+
M
VALLEDUPAR
Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN

No. 6084471

ROMERO PETIT
APELLIDOS

RICARDO JAVIER
NOMBRES

VEN
NACIONALIDAD

M
SEXO

14385250
DNI (VE)

08-11-1979
FECHA DE NACIMIENTO

15-10-2021 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

30-03-2031
FECHA DE VENCIMIENTO



L1947064

INDICE DERECHO

El titular de este documento debe reportar a Migración Colombia cualquier cambio en la condición o información migratoria.

MIGRACIÓN
www.migracioncolombia.gov.co

IPCOL6084471<<4<<<<<<<<<<<<<<<
7911082M3105308VENE1947864<<<9
ROMERO<PETIT<<RICARDO<JAVIER<<

Powered by CamScanner

F. I
19/09/2023

EPS
Sanitas

AFP
Porvenir







REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
77.185.068
NUMERO
GUTIERREZ ESCOBAR
APELLIDOS
ESNEIDER JOSE
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
23-OCT-1974
GUAMAL
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.83
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
30-JUN-1994 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

F. I.
19/09/2023
EPS.
Sanitas
A.F.P.
Colpensiones






OLBER DONADO VILLAFAÑE







Powered by CamScanner



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

**COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/08/2023**

**DATOS DE LA EMPRESA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo documento: | Nit | Número de documento: | 901216088 | Cédula Usuario: | CC 37336066 |
| Nombre: | SECURITY ELITE SAS | | | | |
| Dirección: | CLL 16 C NO 21-27 | | | | |
| Departamento: | CESAR | Municipio: | VALLEDUPAR | | |
| Correo electrónico: | seguridadelite3020@gmail.com | | | | |
| Teléfono: | 3175486874 | Tarifa: | 4.350 | | |
| Actividad Ecoodmica: | 4801001 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA, INCLUYE SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | | | | |

**DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN**

| Cédula Usuario | Nombres y Apellidos del Usuario |
|---|---|
| CC 37336066 | SANDRA PATRICIA GALEANO LOPEZ |

**DATOS AFILIADOS RADICADOS**

| Radicado | Cobertura | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 143 | 31/08/2023 | CC 77186068 | GUTIERREZ ESCOBAR ESNEIDER | 4 | 4.35000 | Dependiente |

**OBSERVACIONES**

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

**Gerencia de Afiliaciones y Novedades**
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**

153TD4A23CB89239787559118CABCD82 Certificado impreso el día 8/30/2023 7:28:17 PM por el portal de empresas Edeal

Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170, Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co
Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia

El emprendimiento es de todos

Powered by CamScanner



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 31/08/2023

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario
CC 91538306

Nombres y Apellidos del Usuario
SANDRA PATRICIA GALEANO LOPEZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

| Radicado | Calificación | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 144 | 31/08/2023 | CC 1065602752 | CORRALES HERRERA FABIAN | 4 | 4.350% | Dependiente |

OBSERVACIONES

Cordial saludo.

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Positiva Compañía de Seguros S.A. • NIT 860.011.153-6 • Línea gratuita 01-8000-111-170
Bogotá 340-1000 / Portal Web: www.positiva.gov.co
Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia

El empleador es de todos

Powered by CamScanner

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

**CERTIFICADO DE AFILIACIÓN**

**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

**HACE CONSTAR QUE:**

Verificada la base de datos de afiliación en el ramo de Riesgos Laborales de **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A**, se identificó que **RICARDO JAVIER ROMERO PETIT** con **PT** No. **6084171**, registra afiliación en nuestra ARL, con la siguiente información:

| Datos del Empleador | Datos de la Relación Laboral |
|---|---|
| **Empleador:** N 901216068 - SECURITY ELITE SAS | **Fecha de última cobertura:** 19/10/2022<br>**Estado Afiliación:** ACTIVO<br>**Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE<br>**Clase de Riesgo:** 4<br>**Cargo :** SUPERVISOR RECORRE DOR PATRULLA SEGURIDAD Y VIGILANCIA<br>**Fecha fin de Retiro:** SIN FECHA DE RETIRO |

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código [válido por un mes]: 20230101853864 9.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 30 días del mes de agosto de 2023.

Cordialmente

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES**
**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**




© Positiva Compañía de Seguros S.A. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.


MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

AXA COLPATRIA

## INGRESO EMPLEADO

### DATOS DE LA EMPRESA

**Tipo de Identificación:** NIT
**Número de documento:** 900020118
**Número Afiliación:** 183343
**Razón social:** SECURITY FORCE LTDA

### DATOS DEL EMPLEADO:

**Tipo de documento:** CÉDULA
**Número de Documento** 1065646526
**Nombre:** JEISON ANDRES CHAMORRO SARIA
**Fecha Ingreso:** 19/09/2023
**Salario básico:** 1,160,000
**Nit empresa en misión:** 0
**Código Sucursal:** SUCURSAL 1
**Centro de trabajo:** 005
**Tasa:** 6.960
**Fecha hora transacción:** 18/09/2023 04:13:41 p.m.

AXA COLPATRIA

## INGRESO EMPLEADO

### DATOS DE LA EMPRESA

**Tipo de Identificación:** NIT
**Número de documento:** 900020118
**Número Afiliación:** 183343
**Razón social:** SECURITY FORCE LTDA

### DATOS DEL EMPLEADO:

**Tipo de documento:** CÉDULA
**Número de Documento** 1122396146
**Nombre:** JOSE ALBERTO GUTIERREZ SANTIAGO
**Fecha Ingreso:** 19/09/2023
**Salario básico:** 1,160,000
**Nit empresa en misión:** 0
**Código Sucursal:** SUCURSAL 1
**Centro de trabajo:** 005
**Tasa:** 6.960
**Fecha hora transacción:** 18/09/2023 04:03:22 p.m.

AXA COLPATRIA


## INGRESO EMPLEADO

### DATOS DE LA EMPRESA

**Tipo de Identificación:** NIT
**Número de documento:** 900020118
**Número Afiliación:** 183343
**Razón social:** SECURITY FORCE LTDA

### DATOS DEL EMPLEADO:

**Tipo de documento:** CÉDULA
**Número de Documento** 77185068
**Nombre:** ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR
**Fecha Ingreso:** 21/09/2023
**Salario básico:** 1,160,000
**Nit empresa en misión:** 0
**Código Sucursal:** SUCURSAL 1
**Centro de trabajo:** 005
**Tasa:** 6.960
**Fecha hora transacción:** 18/09/2023 04:20:38 p.m.

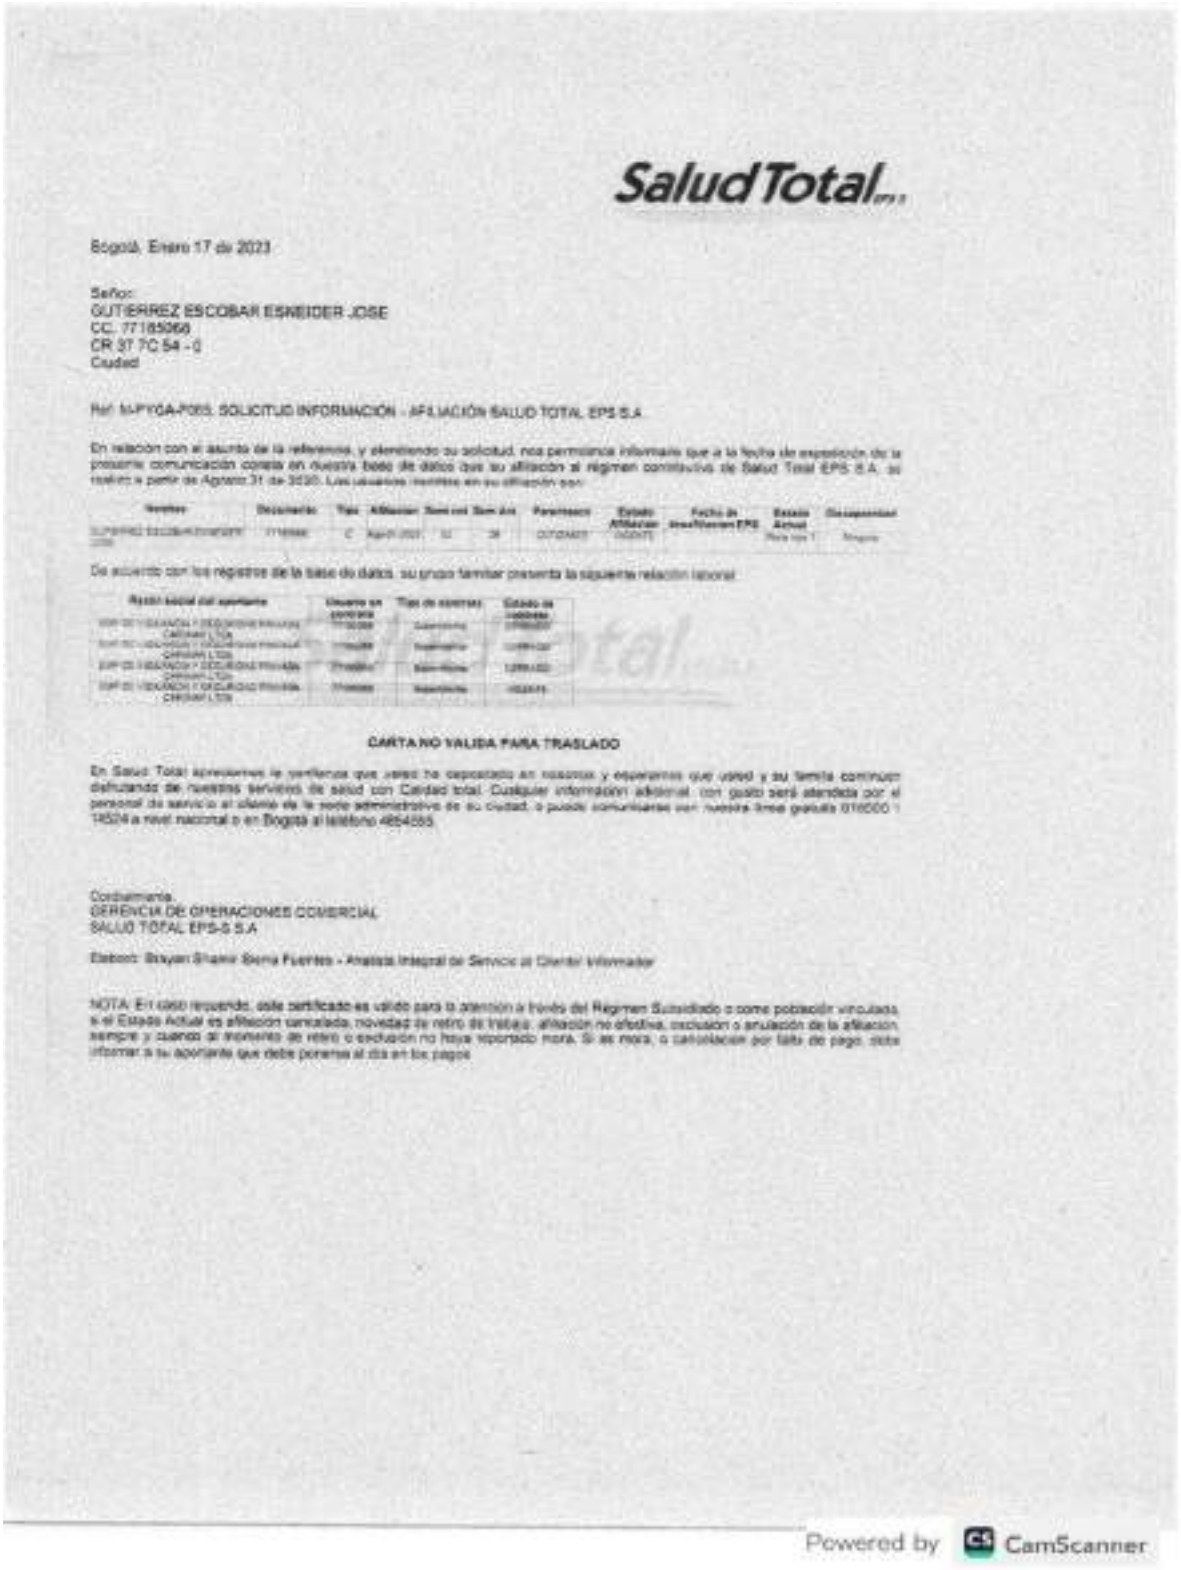

Salud Total

Bogotá, Enero 17 de 2023

Señor:
GUTIERREZ ESCOBAR ESNEIDER JOSE
CC. 77185066
CR 37 7C 54 - 0
Ciudad

Ref: M-PYGA-P065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Agosto 31 de 2020. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

| Nombre | Documento | Tipo | Afiliación | Semanas | Semanas | Parentesco | Estado Afiliación | Fecha de Inactivación EPS | Estado Actual | Discapacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTIERREZ ESCOBAR ESNEIDER JOSE | 77185066 | C | Agosto 2020 | 52 | 38 | COTIZANTE | ACTIVO | | Para los 1 | Ninguna |

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

| Razón social del aportante | Usuario en cotización | Tipo de cotizante | Estado de cotización |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | 77185066 | Cotizante | ACTIVO |
| CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | 77185066 | Cotizante | ACTIVO |
| CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | 77185066 | Cotizante | ACTIVO |
| CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | 77185066 | Cotizante | ACTIVO |

**CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO**


En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 18524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854585.


Cordialmente,
GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIAL
SALUD TOTAL EPS-S S.A

Elaboró: Brayan Shamir Sierra Fuentes - Analista Integral de Servicio al Cliente Informador

NOTA: En caso requerido, este certificado es valido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación siempre y cuando el motivo de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos.

Powered by CamScanner

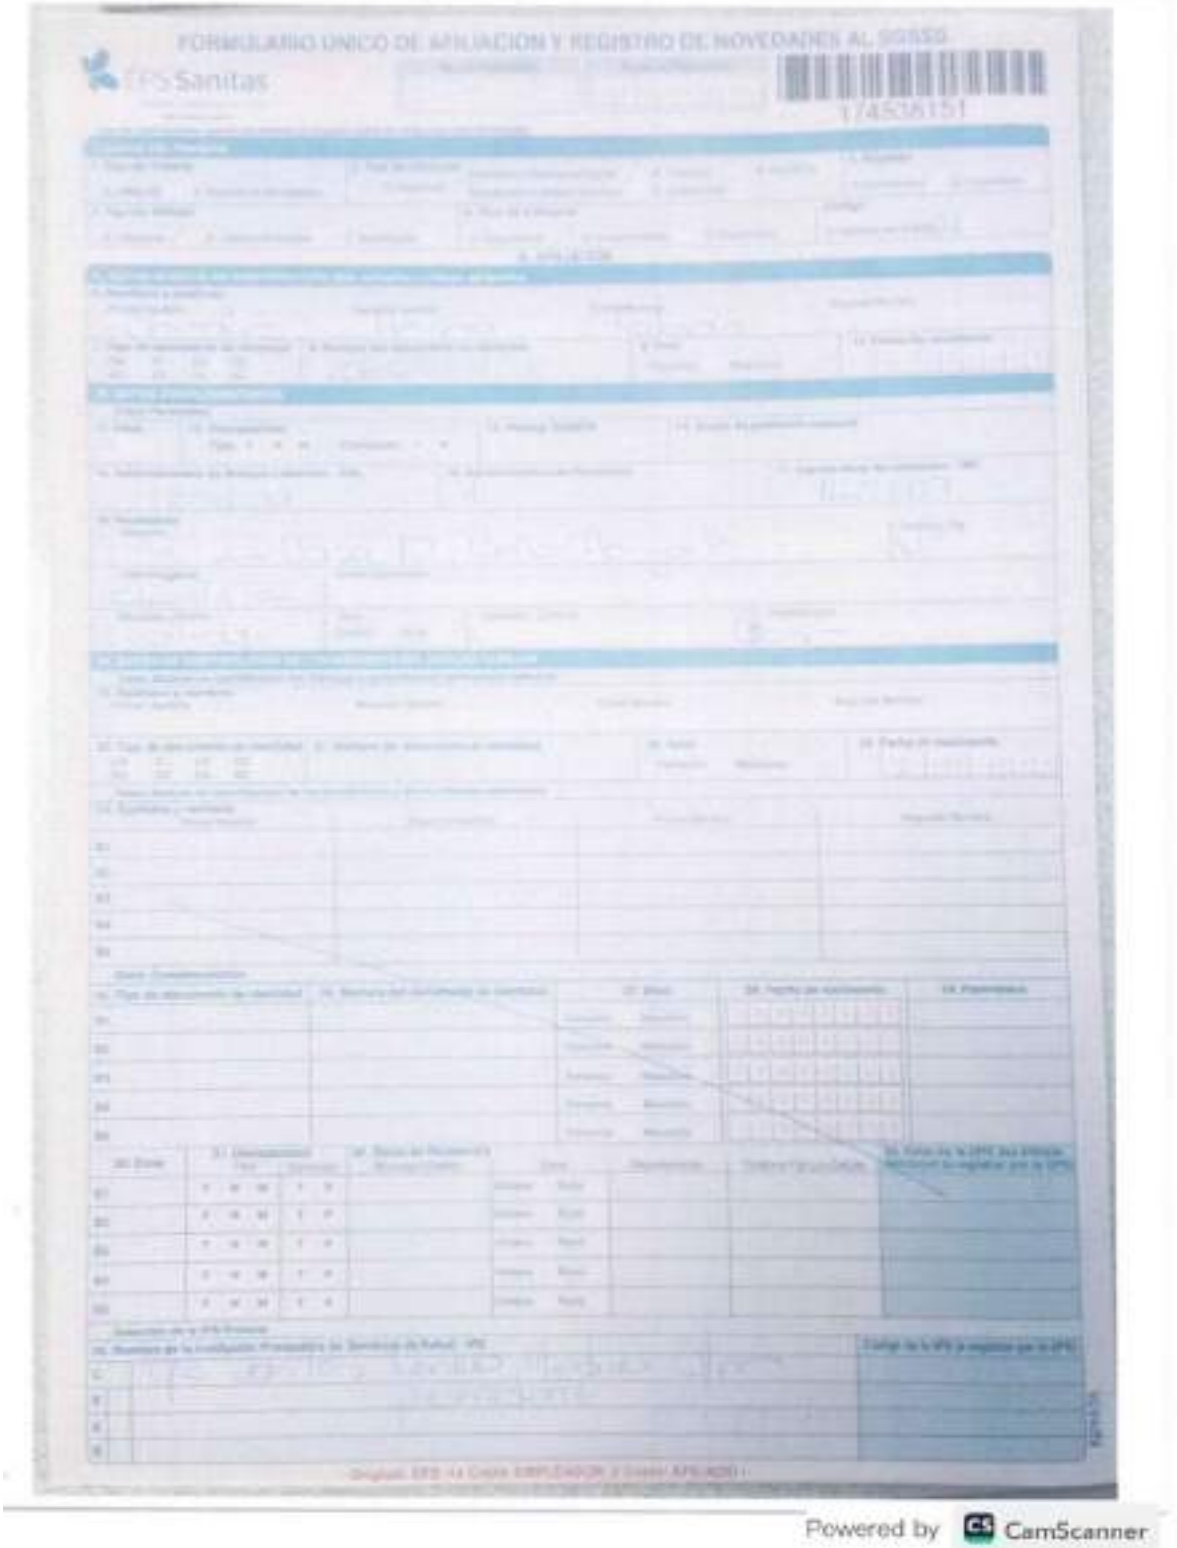
FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS
EPS Sanitas
Powered by CamScanner

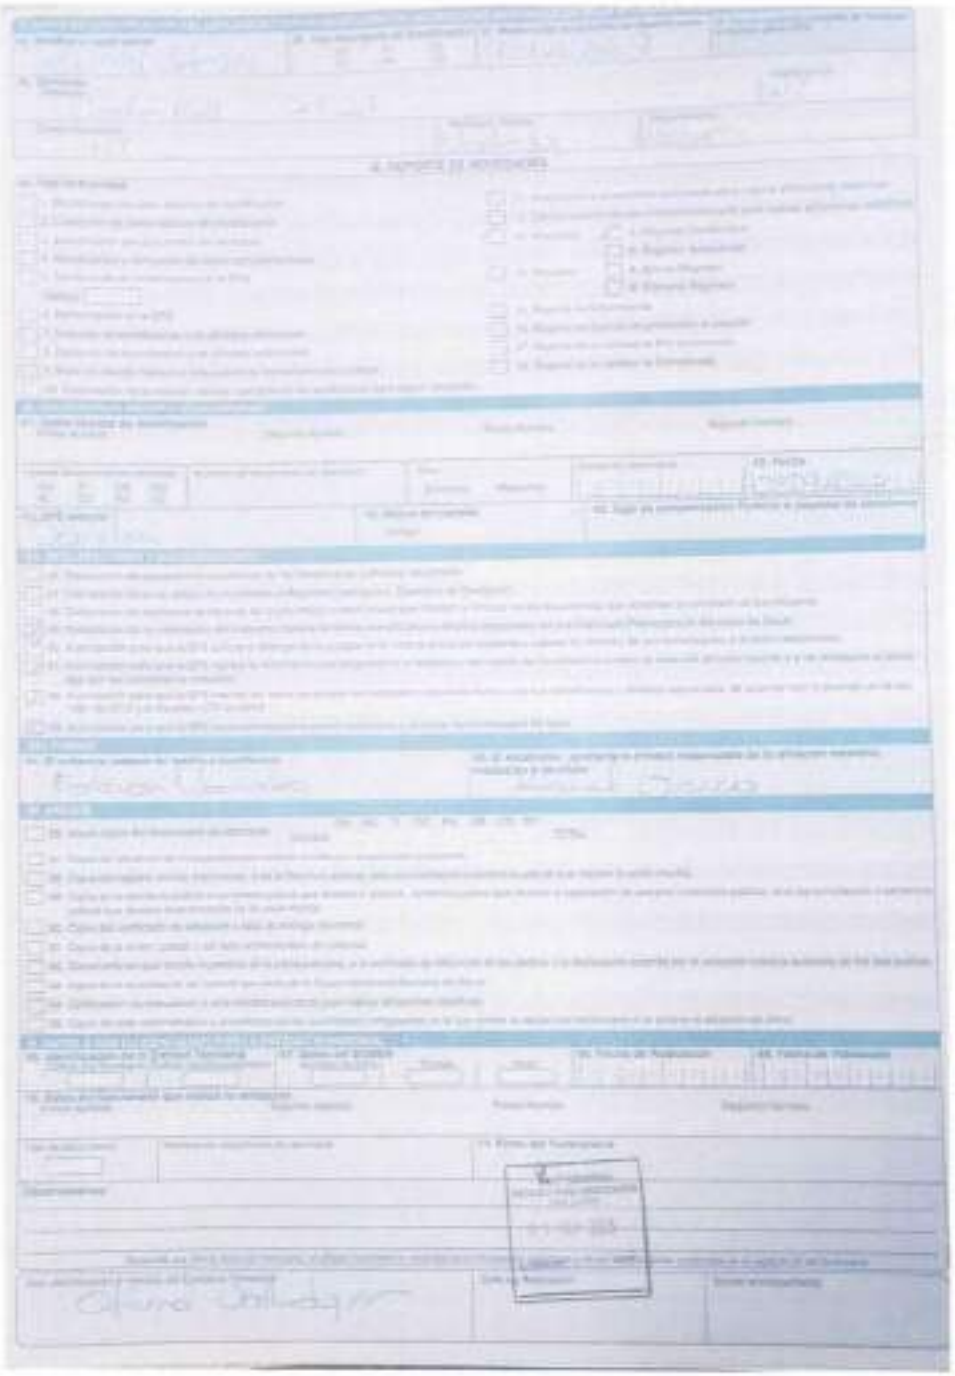

Powered by CamScanner

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

## CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

**La EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado **EPS SANITAS,**

**CERTIFICA**

Que **Ricardo Javier Romero Petit** identificado(a) con **PERMISO POR PROTECCION TEMPORAL** número **6084471,** está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

| | |
|---|---|
| TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | PT 6084471 |
| NOMBRES Y APELLIDOS | Ricardo Javier Romero Petit |
| TIPO DE AFILIADO | Titular |
| PARENTESCO | Titular |
| FECHA DE NACIMIENTO | 11/06/1979 |
| ESTADO DE LA AFILIACIÓN | 8 No Ha Iniciado Cobertura Integral |
| CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN | 27 - Afiliación Aún No Inicia Cobertura En La Eps |
| FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS | 01/09/2023 |
| FECHA RETIRO LABORAL / EPS SANITAS | Activo(a) |
| SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS | Sin semanas reportadas en EPS SANITAS |
| SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS | Sin semanas reportadas en EPS SANITAS |
| SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO | Sin semanas reportadas en EPS SANITAS |
| RÉGIMEN | Contributivo |
| FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN | 01/09/2023 |
| NIVEL SISBEN | No aplica |

EMPLEADOR(ES)*

N.I.T. 901216068 SECURITY ELITE SAS Desde 01/09/2023 - Vigente

*Se reportan, a partir de la fecha de este certificado, los empleadores con los cuales ha estado afiliado en EPS SANITAS en los últimos 12 meses.

Generado por oficinales 31/08/2023

**ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS**



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

EPS Sanitas

175258778

A. AFILIACION

| | |
|---|---|
| Primer Apellido | CHAMORRO |
| Segundo Apellido | SANIA |
| Primer Nombre | JEISON |
| Segundo Nombre | ANDRES |
| 8. Número del documento de identidad | 1 065 646 526 |
| 10. Fecha de nacimiento | 22/11/1992 |
| 15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL | AXA |
| 16. Administradora de Pensiones | PORVENIR |
| 17. Ingreso base de cotización - IBC | 1.160.000 |
| 19. Residencia Dirección | MZ A CS 12 A |
| Teléfono Celular | 3015757144 |
| Correo Electrónico | Jeisonchamorro66@gmail.com |
| Departamento | CESAR |

34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS: IPS VALLE


SECURITY FORCE
900 020 118
9. REPORTE DE NOVEDADES
Sanitas Activo
Jeison Chamorro
EPS SANITAS
19/09/2023



No de Radicacion
40110003809

Página 2 de 2

II. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Inactivación temporal de identificación
2. Corrección datos básicos de identificación
3. Actualización documento de identidad
4. Actualización y/o corrección datos complementarios
5. Terminación de la inscripción en la EPS
Código:
6. Reingreso en la EPS
7. Inclusión de beneficiarios y de afiliados adicionales
8. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
9. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
11. Inactivación como entidad autorizada para realizar afiliaciones individuales
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
13. Movilidad A. Régimen Contributivo
B. Régimen Subsidiado
14. Traslado A. Mismo régimen
B. Diferente régimen
15. Reporte de Novedades
16. Reporte del inicio de protección al cesante
17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
18. Reporte de la calidad de pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| Tipo documento de identidad | Número documento de identidad | Sexo: Femenino ☐ Masculino ☐ | Fecha de nacimiento | 42. Fecha: 21/08/2020 |

43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado Código: | 45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
47. ☐ Declaración de no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
48. ☐ Declaración de existencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acrediten la condición de beneficiarios
49. ☐ Declaración de no interrupción del cotizante objeto de fallo, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud
50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
51. ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran
52. ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con la prevista en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
53. ☐ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como medio de prueba

VIII. FIRMAS

| 54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario | 55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio |
|---|---|
| Yeneider Cortazar | María Díaz |

IX. ANEXOS

56. ☐ Anexo Copia del documento de identidad: CN ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☐ PA ☐ CE ☐ CD ☐ SC ☐
Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Total: 0

57. ☐ Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. ☐ Copia registro civil de nacimiento, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
59. ☐ Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital
60. ☐ Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
61. ☐ Copia sentencia judicial o acto administrativo de custodia
62. ☐ Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, civil, certificado de defunción de los padres o la declaración escrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
63. ☐ Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
64. ☐ Certificado de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
65. ☐ Copia del acto administrativo y presentación de los documentos competentes en la que conste la calidad de beneficiario y/o cotizante para afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del municipio | Código del Departamento | 67. Datos del SISBEN: Número ficha | Puntaje | Nivel | 68. Fecha de radicación | 69. Fecha de validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

70. Datos funcionario que realiza la validación

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| Tipo documento de identidad | Número documento de identidad | 71. Firma del funcionario | |

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas por el diligenciado en el capítulo VII Declaraciones y 8. Autorizaciones, así como la veracidad de los demás información registrada.

MEPRLA-F001 V1.0-2020

## FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

| No de Radicacion | Fecha de Radicación |
|---|---|
| 4011002809 | 9/09/2020 |

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran antes de este formulario antes de diligenciarlo) Página 1 de 2

1.Tipo de tramite: A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒
2.Tipo Afiliado: A. Individual ☐ B. Colectivo ☐
3.Regimen: A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
Código (a registrar por la EPS)

### A. AFILIACION

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 6.Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ (Primer apellido) | ESCOBAR (Segundo apellido) | ESNEIDER (Primer nombre) | JOSE (Segundo nombre) |

| 7.Tipo documento de identidad | 8.Número del documento de identidad | 9.Sexo | 10.Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CC | 77[illegible]68 | Femenino ☐ Masculino ☒ | 23/03/1974 |

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

| 11.Etnia | 12.Discapacidad | 13.Puntaje SISBEN | 14.Grupo de poblacion especial |
|---|---|---|---|
| 6 | Tipo [illegible] Condicion [illegible] | | |

| 15. Administradora de riesgos Laborales - ARL | 16. Administradora de Pensiones | 17. Ingreso base de cotizacion - IBC |
|---|---|---|
| AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A | PORVENIR FPC | 1160000 |

| 18.Residencia | | | |
|---|---|---|---|
| CR 37 2C 54 Direccion | Telefono fijo | 3126348028 Telefono celular | ESNEIDERGUTIERREZESCOBAR77@GMAIL.COM Correo electronico |

| Municipio/Distrito | | Zona | Localidad / comuna | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| VALLEDUPAR | 2000 | Urbano ☒ Rural ☐ | 57 | CESAR |

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

| 19. Apellidos y nombres completos | | | |
|---|---|---|---|
| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |

| 20. Tipo documento de identidad | 21. Numero documento identidad | 22. Sexo | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | Femenino ☐ Masculino ☐ | |

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| 24. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| 05 | | | |

| 25. Tipo documento de identidad | 26. Número de identidad | 27.Sexo | | 28.Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | Femenino | Masculino | |
| 01 | | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |

Datos complementarios

| 29.Parentesco | 30. Etnia | 31.Discapacidad | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tipo F | Tipo M | Tipo M | Condición I | Condición F |
| 01 | | | | | | |
| 02 | | | | | | |
| 03 | | | | | | |
| 04 | | | | | | |
| 05 | | | | | | |

32. Datos de residencia

| | Municipio/Distrito | Zona Urbana | Zona Rural | Departamento | Telefono Fijo y/o celular | 33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | | |
| 02 | | | | | | |
| 03 | | | | | | |
| 04 | | | | | | |
| 05 | | | | | | |

Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la Institucion Prestadora de Salud - IPS | Codigo de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | VSCLINICALOPERENA - VSCLINICALOPERENA | VSCLOPEREN - VSCLOPEREN |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA/INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de identificación | 37. Numero de documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| SECURITY FORCE LTDA | NIT | 900820198 | 01 |

| 39.Ubicacion | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CL 67 NUM 9E 31 Direccion | 3104438855 Telefono | SECURITYVIG@HOTMAIL.COM Correo electronico | MEDELLIN Municipio/distrito | ANTIOQUIA Departamento |

M-FPGA-Ver V 1.0-2015



porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

**FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**

NIT 800.144.331-3

**CERTIFICA QUE:**

**ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **77.185.968**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 30 de Agosto del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

*Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a* www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

Grupo AVAL

Powered by CamScanner



porvenir

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

FABIAN CORRALES HERRERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.065.599.702, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 31 de Agosto del 2020.

Cordialmente,


Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por qué? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Grupo AVAL

Powered by CamScanner

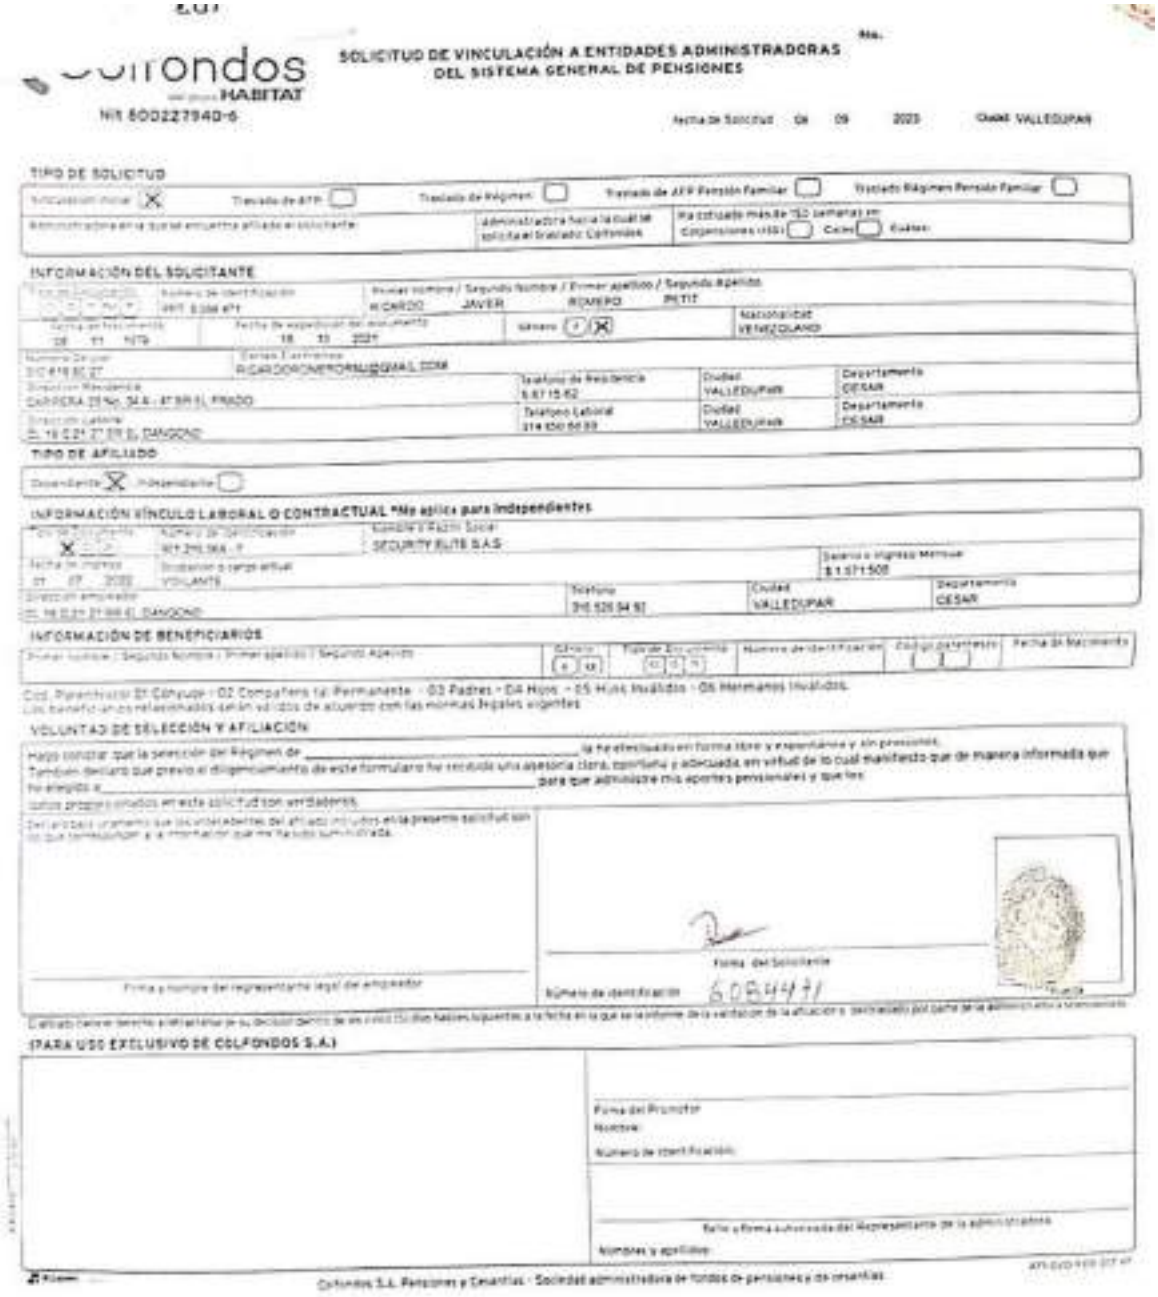

SOLICITUD DE VINCULACIÓN A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Colfondos HABITAT

NIT 800227940-6

No.

Fecha de Solicitud 08 09 2023 Ciudad VALLEDUPAR

TIPO DE SOLICITUD

Vinculación Inicial X | Traslado de AFP | Traslado de Régimen | Traslado de AFP Pensión Familiar | Traslado Régimen Pensión Familiar

Administradora en la que actualmente afiliado el solicitante | Administradora hacia la cual solicita el traslado: Colfondos | Ha estado más de 52 semanas en: Cesantías | Cuotas

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Tipo de Identificación | Número de Identificación: 1065 [illegible] | Primer nombre / Segundo Nombre / Primer apellido / Segundo Apellido: RICARDO JAVIER ROMERO PETIT

Fecha de nacimiento: 08 11 1979 | Fecha de expedición del documento: 18 11 2021 | Género: M X | Nacionalidad: VENEZOLANO

Número de celular: 310 [illegible] | Correo Electrónico: RICARDOROMEROPETIT@GMAIL.COM

Dirección Residencia: CARRERA 28 No. 34 A - 47 SIR EL PRADO | Teléfono de Residencia: 5 87 15 62 | Ciudad: VALLEDUPAR | Departamento: CESAR

Dirección Laboral: CL 16 D 21 2 39 EL DANCING | Teléfono Laboral: 314 530 60 89 | Ciudad: VALLEDUPAR | Departamento: CESAR

TIPO DE AFILIADO

Dependiente X | Independiente

INFORMACIÓN VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL *No aplica para independientes

Tipo de Documento: X | Número de Identificación: 901 [illegible] - 7 | Nombre o Razón Social: SECURITY ELITE S.A.S

Fecha de ingreso: 27 07 2022 | Ocupación o cargo actual: VIGILANTE | Salario o ingreso Mensual: $ 1.071.508

Dirección empleador: CL 16 D 21 2 39 EL DANCING | Teléfono: 310 529 34 51 | Ciudad: VALLEDUPAR | Departamento: CESAR

INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS

Primer nombre / Segundo Nombre / Primer apellido / Segundo Apellido | Género | Tipo de Documento | Número de Identificación | Código parentesco | Fecha de Nacimiento

Cód. Parentesco: 01 Cónyuge - 02 Compañero (a) Permanente - 03 Padres - 04 Hijos - 05 Hijos Inválidos - 06 Hermanos Inválidos.
Los beneficiarios relacionados serán validos de acuerdo con las normas legales vigentes

VOLUNTAD DE SELECCIÓN Y AFILIACIÓN

Hago constar que la selección del Régimen de _____ la he efectuado en forma libre y espontánea y sin presiones.
También declaro que previo al diligenciamiento de este formulario he recibido una asesoría clara, oportuna y adecuada en virtud de lo cual manifiesto que de manera informada que he elegido a _____ para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos.

Declaro bajo juramento que los datos del afiliado incluidos en la presente solicitud son de mi conocimiento y la información que me fueron suministrada.

Firma y nombre del representante legal del empleador

Firma del Solicitante

Número de identificación 6 0 6 4 4 7 1

Huella

Cualquier tercero interesado puede solicitar la verificación de la afiliación y corrección por parte de la administradora a la cual pertenece dentro de los [illegible] siguientes a la fecha en la que se informe de la vinculación de la afiliación o corrección por parte de la administradora a la cual pertenece.

(PARA USO EXCLUSIVO DE COLFONDOS S.A.)

Firma del Promotor

Nombre:

Número de Identificación:

Sello y firma autorizada del Representante de la administradora

Nombres y apellidos

Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías - Sociedad administradora de fondos de pensiones y de cesantías

AFI-DVO-FOR-017 v1

Powered by CamScanner

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

## CERTIFICA QUE:

**JEISON ANDRES CHAMORRO SARIA,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.065.646.526**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 18 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

**FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**

NIT 800.144.331-3

## CERTIFICA QUE:

**ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **77.185.068**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 19 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

*Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a* www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

Colfondos HABITAT

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) JOSE ALBERTO GUTIERREZ SANTIAGO identificado(a) con C.C No. 1.122.396.146, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.


Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el dia 15 de septiembre del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.


Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción PQR's, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 601 748 48 88, Barranquilla 605 386 98 88, Bucaramanga 607 698 58 88, Cali 602 489 98 88, Cartagena 605 694 98 88, Medellín 604 604 28 88 y en el resto del país 01 800 05 10000.

Leonardo Cáceres García
Gerente Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

Powered by CamScanner

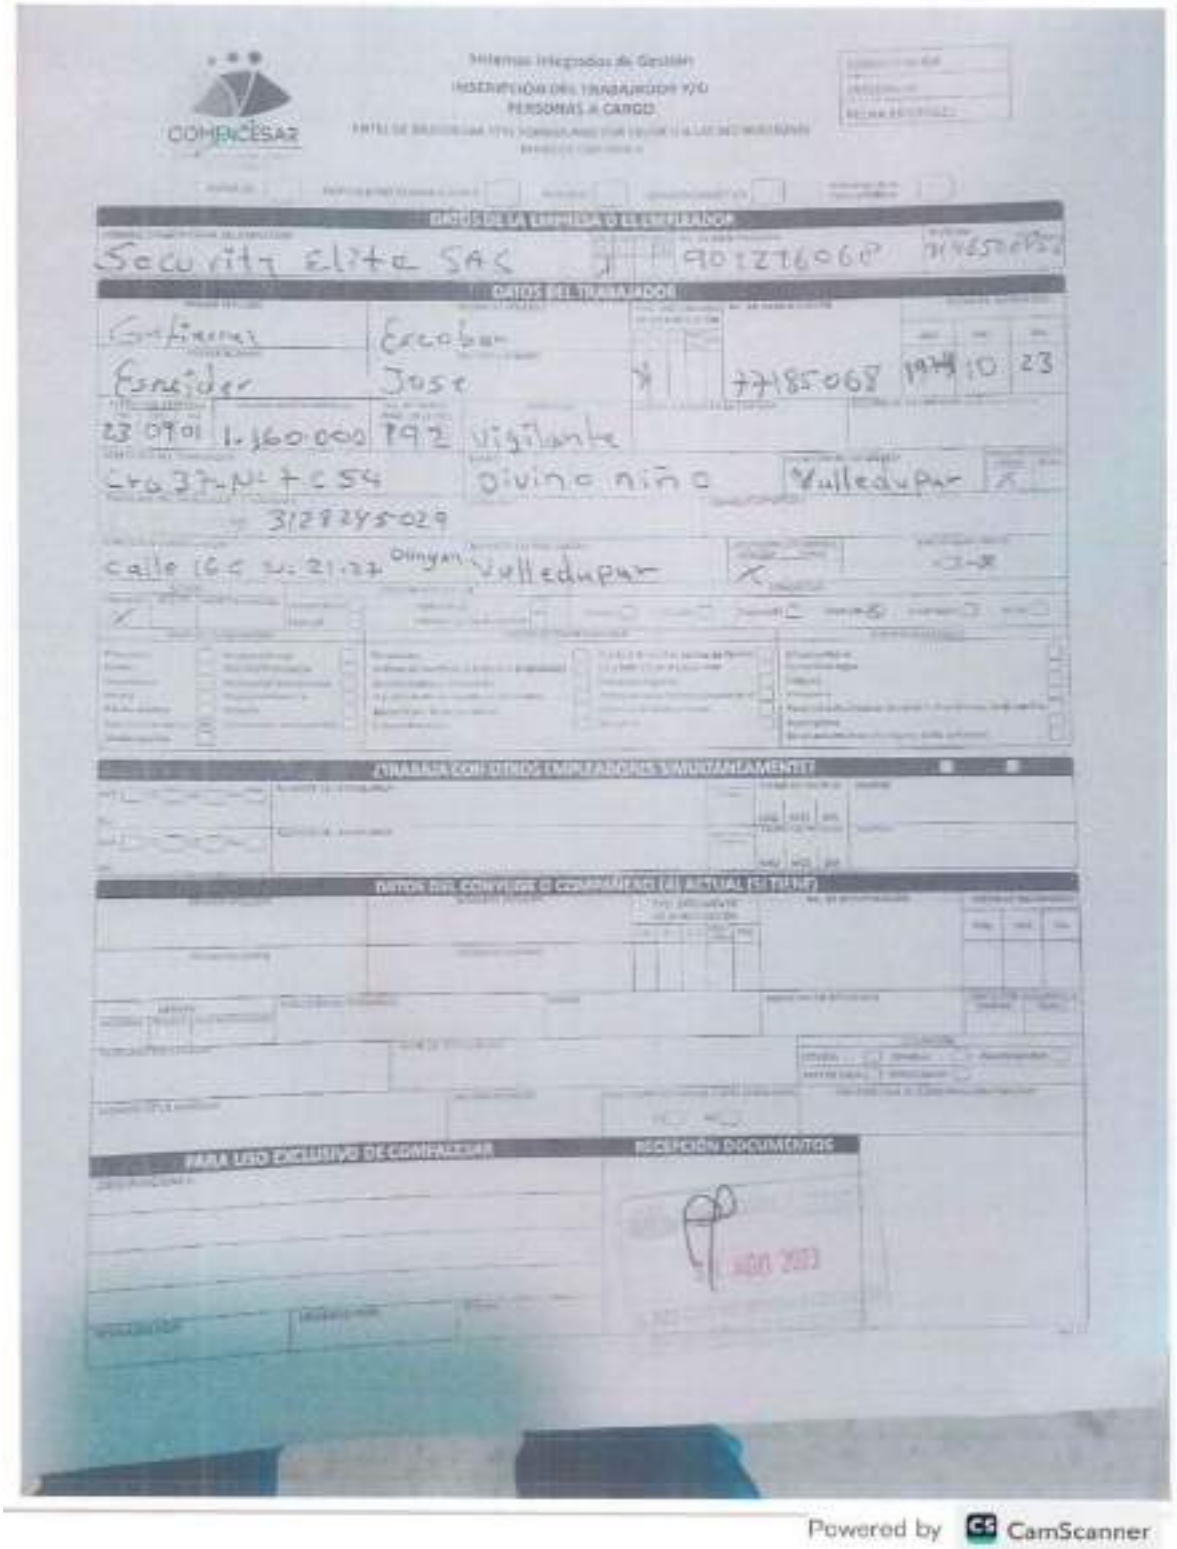


Powered by CamScanner

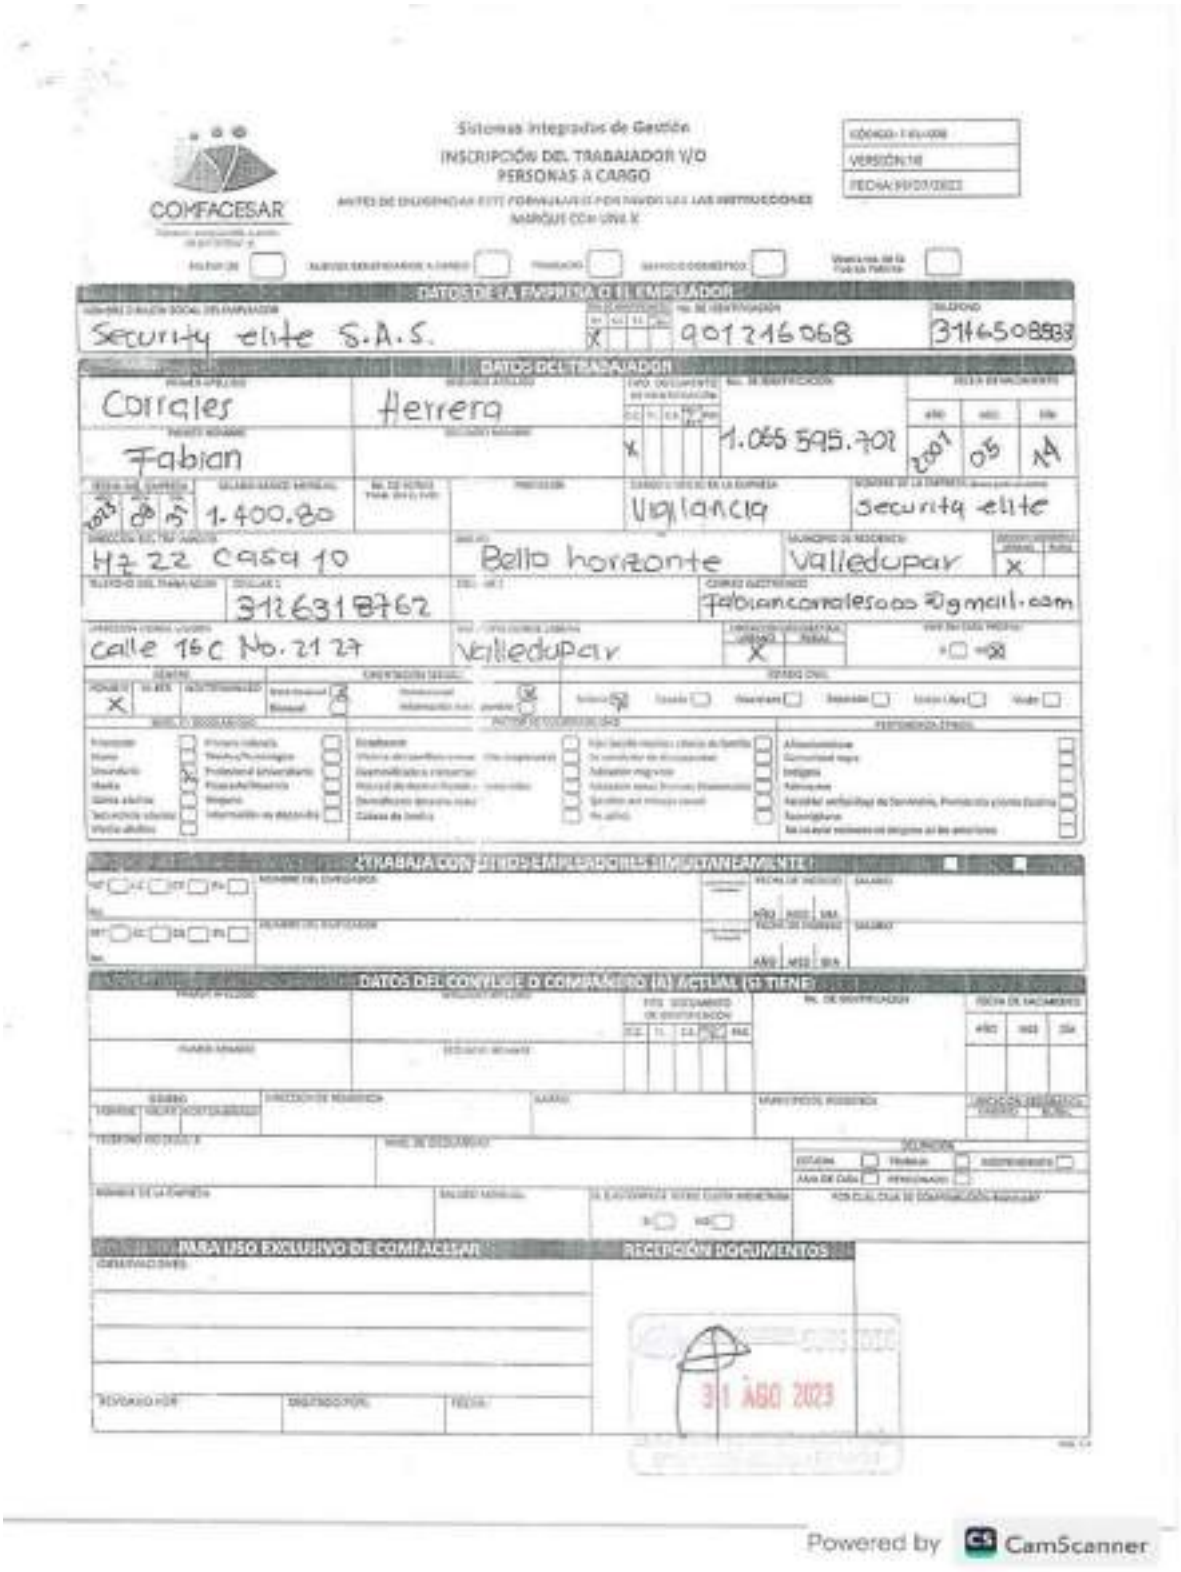

COMFACESAR

Sistemas Integrados de Gestión

INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR Y/O PERSONAS A CARGO

DATOS DE LA EMPRESA O EL EMPLEADOR

Security elite S.A.S. — 901216068 — 3146508833

DATOS DEL TRABAJADOR

Corrales — Herrera — Fabian — 1.065 595.701 — 2001 05 14

1.400.80 — Vigilancia — Security elite

Hz 22 casa 10 — Bello horizonte — Valledupar — X

3126318762 — fabiancorales000@gmail.com

Calle 16C No. 21 27 — Valledupar — X

X

TRABAJA CON OTRO EMPLEADOR SIMULTANEAMENTE


DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO (A) ACTUAL (SI TIENE)

PARA USO EXCLUSIVO DE COMFACESAR — RECEPCIÓN DOCUMENTOS

31 AGO 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

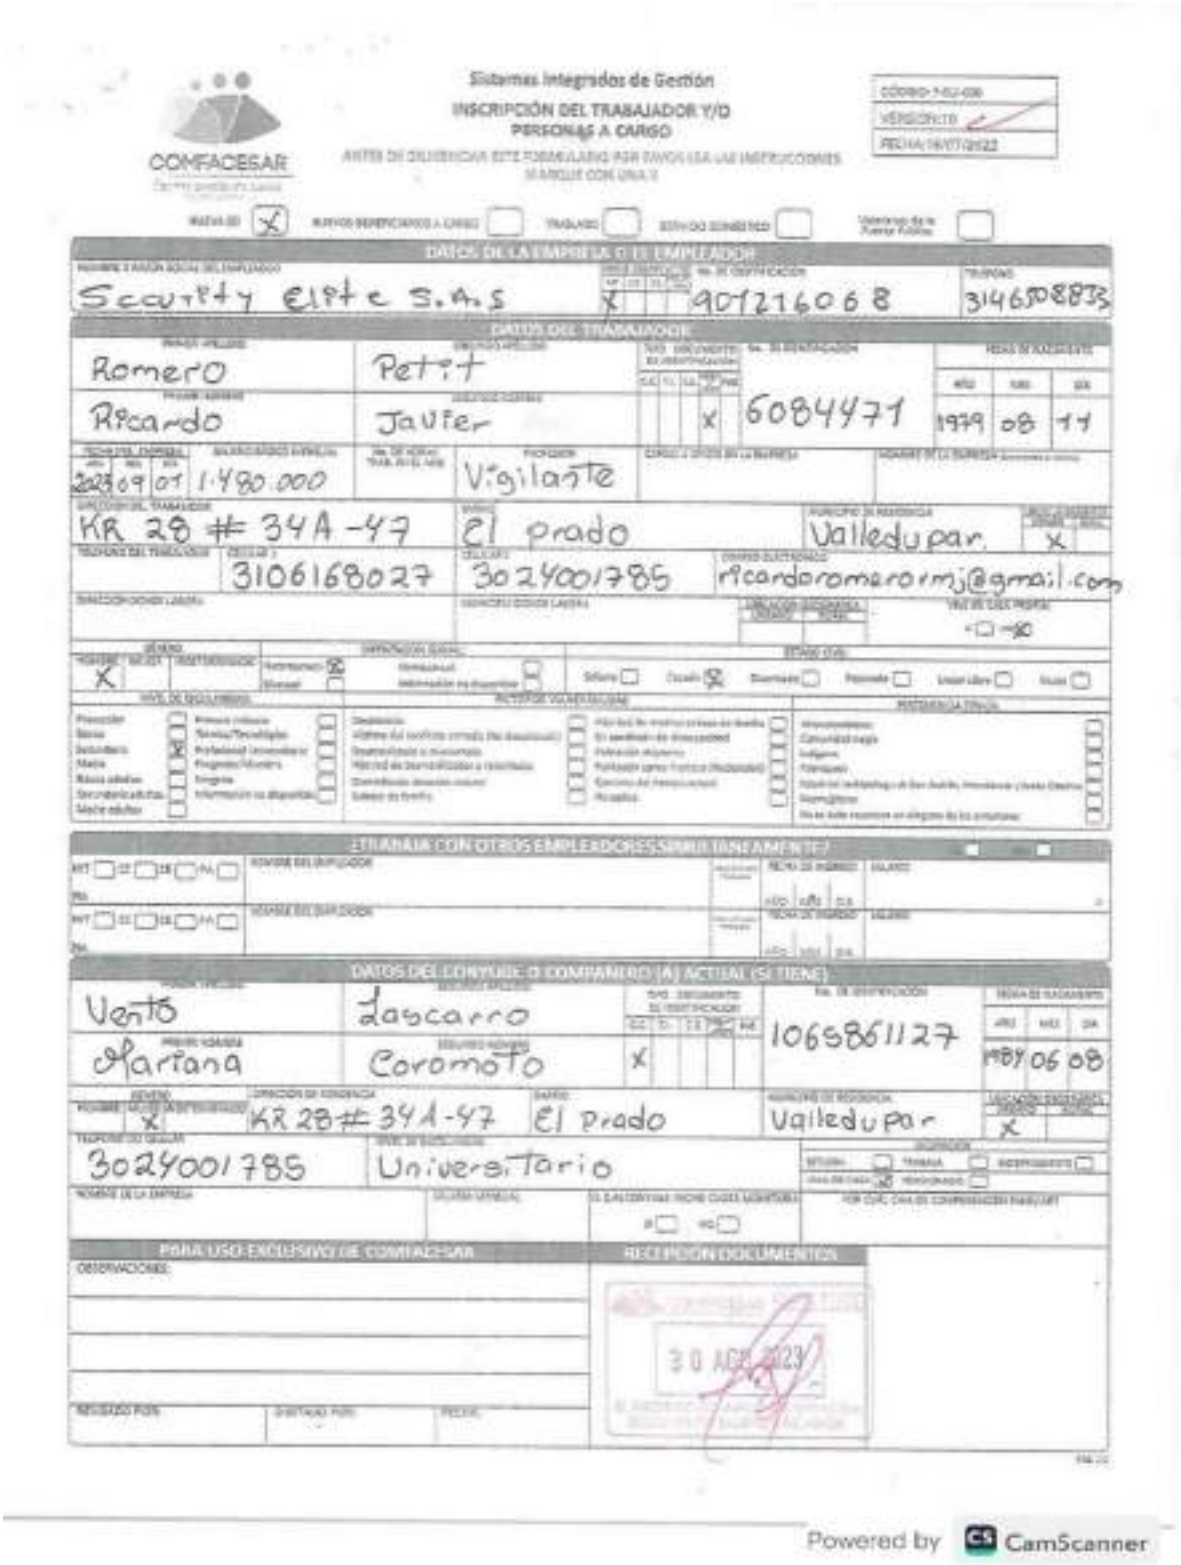

COMFACESAR

Sistemas Integrados de Gestión

INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR Y/O PERSONAS A CARGO

DATOS DE LA EMPRESA O EL EMPLEADOR

Security Elite S.A.S — 901216068 — 3146508833

DATOS DEL TRABAJADOR

Romero Petit — Ricardo Javier — 6084471 — 1979 08 11

2023 09 01 — 1.480.000 — Vigilante

KR 28 # 34A -47 — El prado — Valledupar — X

3106168027 — 3024001785 — ricardoromerormj@gmail.com

X

¿TRABAJA CON OTROS EMPLEADORES SIMULTÁNEAMENTE?

DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO (A) ACTUAL (SI TIENE)

Vento Lascarro — Mariana Coromoto — X — 1065861127 — 1989 06 08

KR 28 # 34A-47 — El Prado — Valledupar — X

3024001785 — Universitario


PARA USO EXCLUSIVO DE COMFACESAR

OBSERVACIONES:

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

30 AGO 2023

Powered by CamScanner

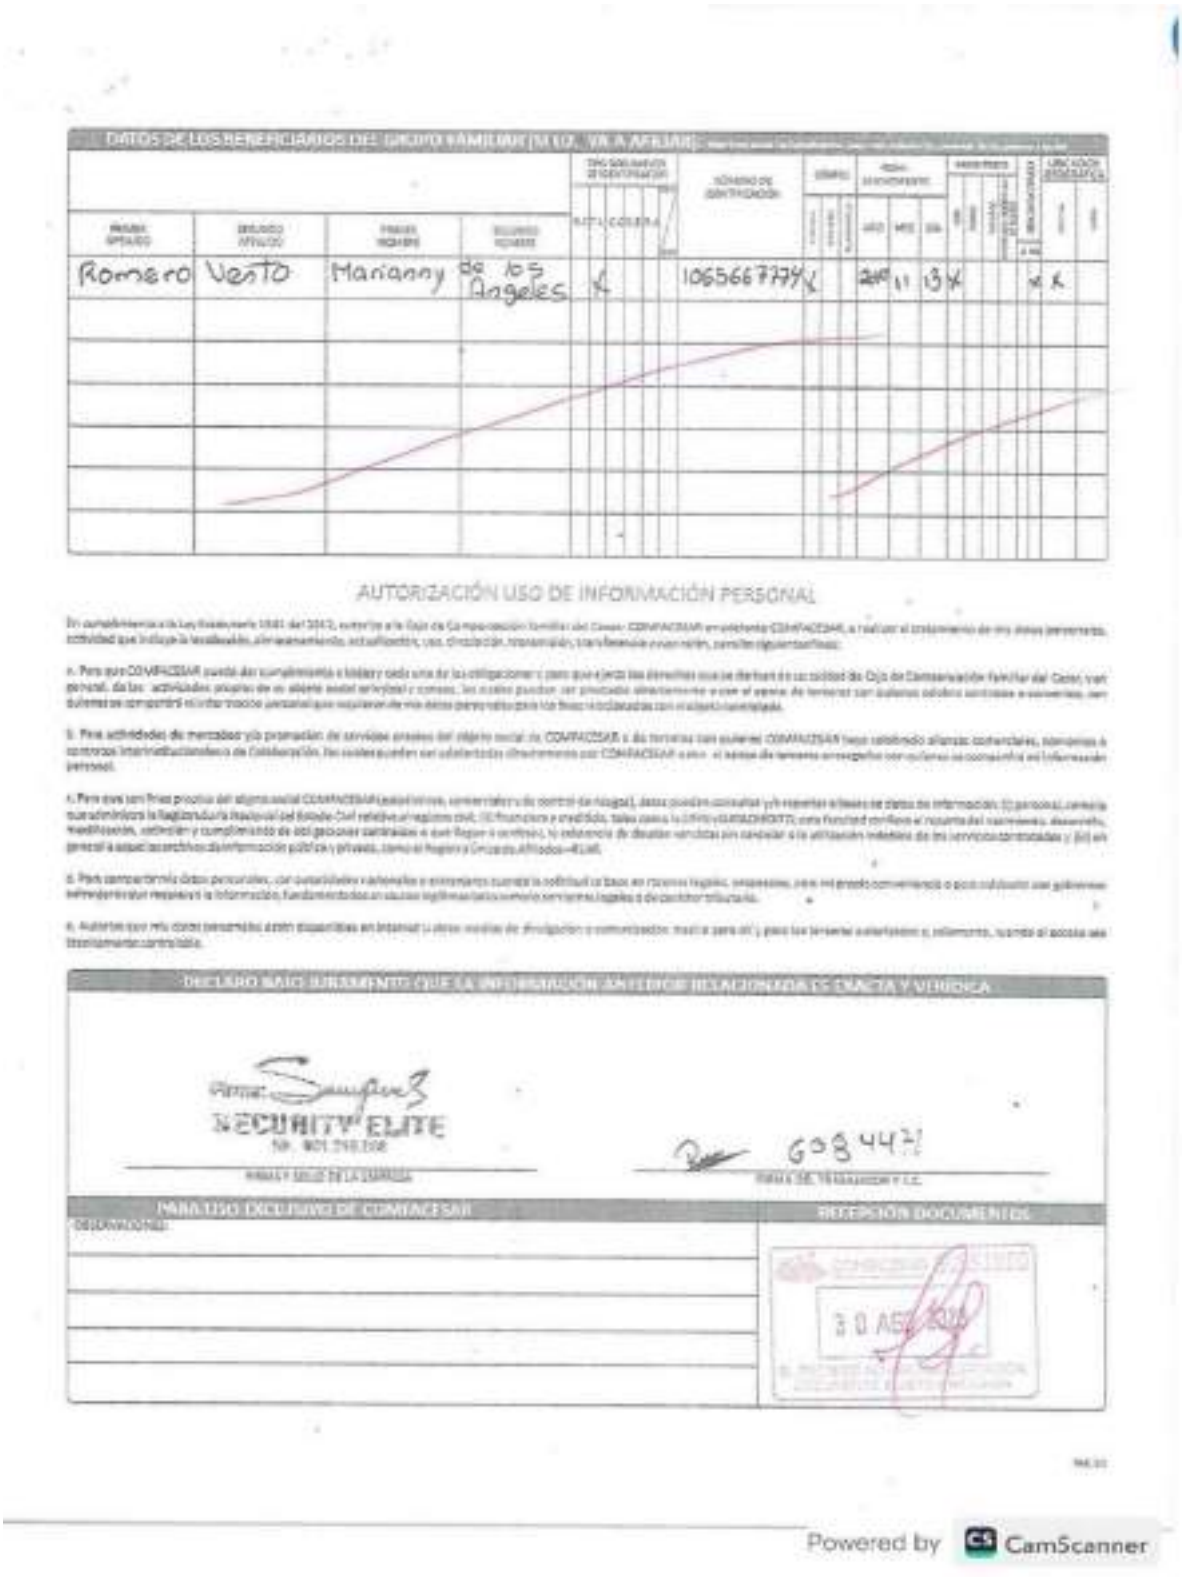

DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL GRUPO FAMILIAR (A LO QUE VA A AFILIAR)

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | GÉNERO | FECHA DE NACIMIENTO | PARENTESCO | UBICACIÓN RESIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero | Vesto | Marianny | de los Angeles | | 1065667779 | | 21 11 13 | | |

AUTORIZACIÓN USO DE INFORMACIÓN PERSONAL

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR RELACIONADA ES EXACTA Y VERÍDICA

Firma: Security Elite

NIT. 901.210.558

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

608447

FIRMA DE TRABAJADOR Y C.C.


PARA USO EXCLUSIVO DE COMFACESAR

OBSERVACIONES:

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

30 AGO 2020

Powered by CamScanner

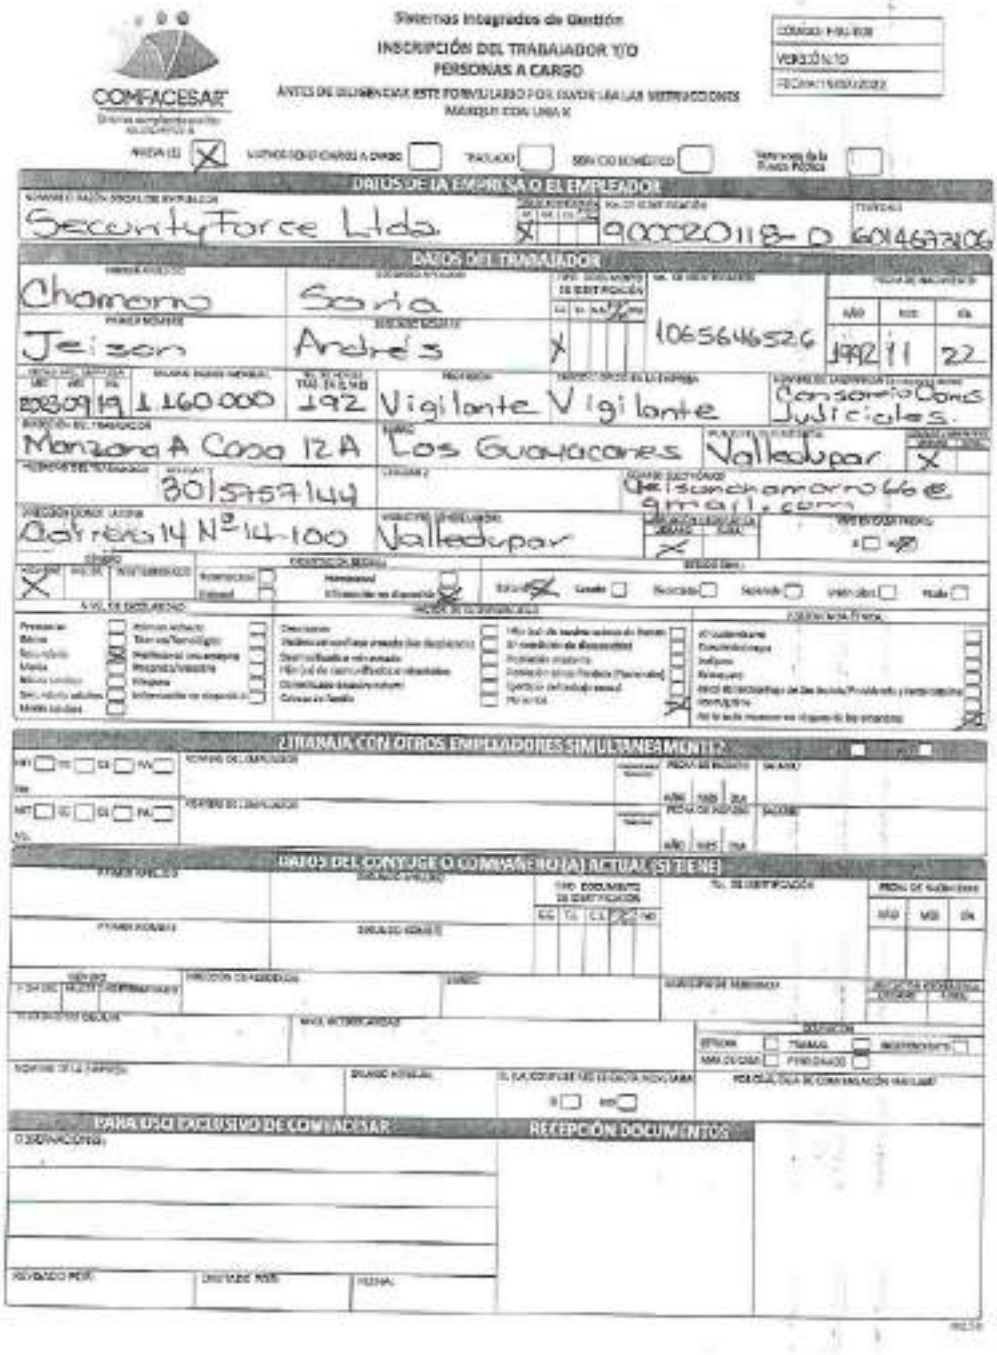

COMFACESAR

Sistemas Integrados de Gestión

INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR Y/O PERSONAS A CARGO

DATOS DE LA EMPRESA O EL EMPLEADOR

SecurityForce Ltda. 900220118-0 6014673106

DATOS DEL TRABAJADOR

Chamorro Soria

Jeison Andres 1065646526

1992 11 22

20230919 1.160.000 192 Vigilante Vigilante Consorio Cons Judiciales.

Manzana A Casa 12A Los Guayacanes Valledupar

3015759144 deisonchamorro66@gmail.com


Carrera 14 Nº 14-100 Valledupar

¿TRABAJA CON OTROS EMPLEADORES SIMULTANEAMENTE?

DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO(A) ACTUAL (SI TIENE)

PARA USO EXCLUSIVO DE COMFACESAR

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

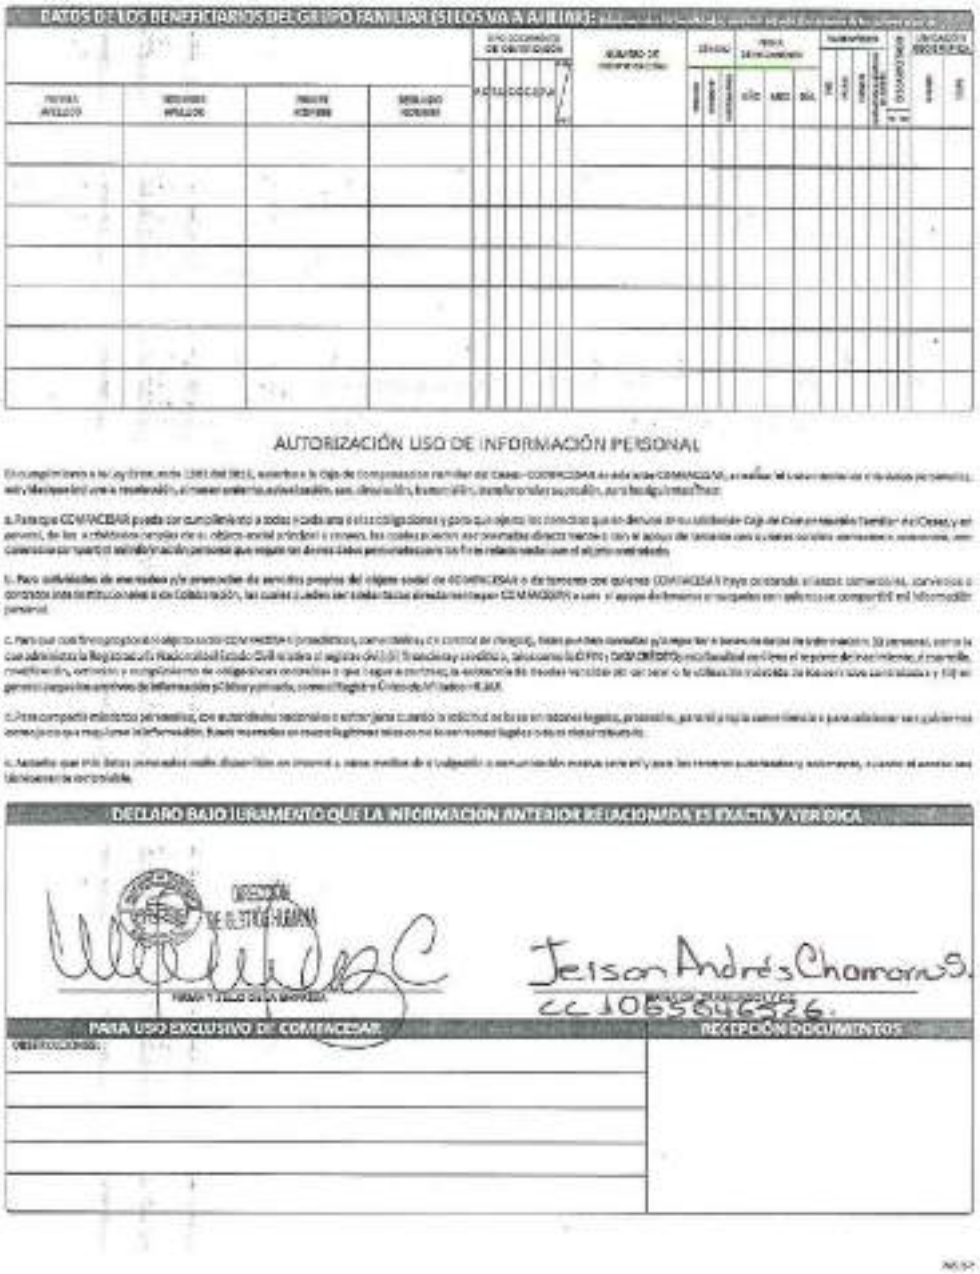

DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL GRUPO FAMILIAR (ELLOS VA A AFILIAR):

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | TIPO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (P.E. T.I. C.C. C.E. P.A. R.C.) | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | EDAD (AÑOS / MESES / DÍAS) | PARENTESCO (CÓNYUGE / COMPAÑERO PERMANENTE / HIJO / PADRE / MADRE / HERMANO / OTRO) | DISCAPACIDAD (SI / NO) | CERTIFICADO DISCAPACIDAD (SI / NO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


AUTORIZACIÓN USO DE INFORMACIÓN PERSONAL

En cumplimiento a la Ley [illegible] de 2012, autorizo a la Caja de Compensación familiar del Cesar–COMFACESAR, a recibir, almacenar, usar y suministrar mis datos personales, así como los de mi grupo familiar, para fines estadísticos, de información, promoción, mercadeo, divulgación, fidelización, actualización, para los siguientes fines:

a. Para que COMFACESAR pueda dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones y para que ejerza los derechos que se derivan de su calidad de Caja de Compensación Familiar en el Cesar, y en general, de las relaciones propias de su objeto social principal o conexo, las cuales pueden ser ejecutadas directamente o con el apoyo de terceros con quienes celebre convenios o contratos, con ocasión de cualquier información personal que llegare a tener dentro de la relación nacida con el objeto contratado.

b. Para actividades de mercadeo y/o promoción de servicios propios del objeto social de COMFACESAR o de terceros con quienes COMFACESAR haya celebrado alianzas comerciales, convenios o contratos interinstitucionales o de Colaboración, las cuales pueden ser desarrolladas directamente por COMFACESAR o con el apoyo de terceros encargados con quienes se comparte la información personal.

c. Para que sea tenida en cuenta mi hoja de vida para futuros procesos de selección, convocatorias y/o ofertas laborales, y para que COMFACESAR pueda verificar la veracidad de la información suministrada en la misma, así como la que reposa en bases de datos de antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales, de medidas correctivas, de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses, entre otras, que administra la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Policía Nacional, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, el Sistema de Información de Registros Sancionatorios a Servidores Públicos – SIRI, el Boletín de Responsables Fiscales, el Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC, el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, el Sistema de Información de Inhabilidades y Antecedentes Disciplinarios – SIRI, el Sistema de Información de Inhabilidades – SIRI

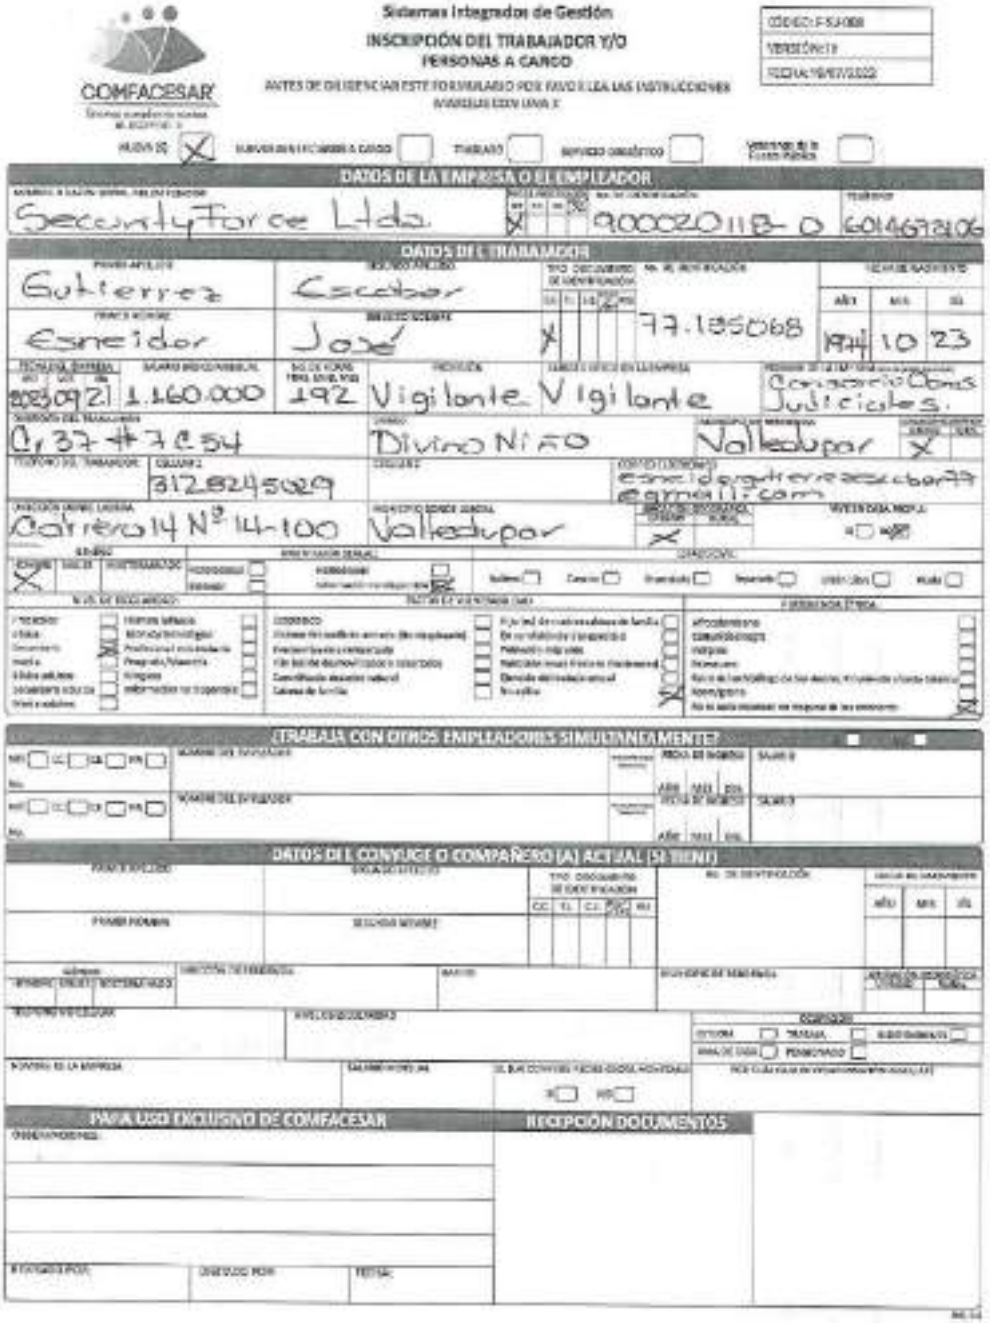

COMFACESAR

Sistemas Integrados de Gestión

INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR Y/O PERSONAS A CARGO

ANTES DE DILIGENCIAR ESTE FORMULARIO POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES

NUEVA [X] ACTUALIZACIÓN DE DATOS [ ] TRASLADO [ ] RETIRO [ ]

DATOS DE LA EMPRESA O EL EMPLEADOR

Security Force Ltda. | 900020118-0 | 6014672806

DATOS DEL TRABAJADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gutierrez | Escobar | [X] | 77.185068 | 1944 | 10 23 |
| Esneider | Jose | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2023021 | 1.160.000 | 192 | Vigilante | Vigilante | Consorcio Obras Judiciales S. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0,37 # 7 C 54 | Divino Niño | Valledupar | X |
| 3128245029 | esneidgutierrezescobar77@gmail.com | | |
| Carrera 14 N° 14-100 | Valledupar | X | |

¿TRABAJA CON OTROS EMPLEADORES SIMULTÁNEAMENTE?

DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO (A) ACTUAL (SI TIENE)

PARA USO EXCLUSIVO DE COMFACESAR | RECEPCIÓN DOCUMENTOS

**DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL GRUPO FAMILIAR (SI LOS VA A AFILIAR):**

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | TIPO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (RC / TI / CC / CE / PA / PEP) | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | SEXO (M / F) | PARENTESCO (CÓNYUGE / HIJO / PADRE) | FECHA DE NACIMIENTO (AÑO / MES / DÍA) | DISCAPACIDAD (SI / NO) | ESTUDIANTE (SI / NO) | HIJASTRO (SI / NO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## AUTORIZACIÓN USO DE INFORMACIÓN PERSONAL


En cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 del 2012, autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cesar.–COMFACESAR en adelante COMFACESAR, a realizar el tratamiento de mis datos personales, entendiendo que incluye la recolección, almacenamiento, actualización, uso, circulación, transmisión, transferencia y supresión, para los siguientes fines:

a. Para que COMFACESAR pueda dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones y garantizar ejercer los derechos que se deriven de su calidad de Caja de Compensación Familiar del Cesar y en general, de las actividades propias de su objeto social principal y conexo, las cuales pueden ser ejecutadas directamente o con el apoyo de terceros con quienes celebre contratos o alianzas, así mismo podrá suministrar mi información personal a nuestros aliados comerciales para el fortalecimiento académico de mi objeto contractual.

b. Para actividades de mercadeo y/o promoción de servicios propios o de otras cajas con las que COMFACESAR tenga convenios o alianzas comerciales, comerciales o convenios interinstitucionales o de Telemercadeo, las cuales pueden ser ejecutadas directamente por COMFACESAR, o con el apoyo de las personas naturales con quienes se comparta mi información personal.

c. Para que con fines estadísticos, históricos, comerciales y de control de riesgos, pueda consultar mi información en bases de datos de información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la que administre la Registraduría Nacional del Estado Civil, relativa al origen, ubicación y manejo de mis datos personales, tales como la DIAN y CIFIN o DATACREDITO, esta facultad conlleva el reporte del nacimiento, ocurrencia, modificación, extinción y cumplimiento de obligaciones contraídas o que llegue a contraer, la existencia de deudas vencidas o la utilización indebida de los servicios otorgados a CBI en general a aquellos archivos de información público y privada, como el Registro Único de Afiliados –RUAF.

d. Para compartir mis datos personales, con el objeto de obtener beneficios a favor de mi hijo(a) o terceros que tenga a mi cargo, en razón legales, procesales, y con el propósito de mantenerme siempre informado(a) sobre los productos y servicios que ofrece COMFACESAR y que puedan ser de mi interés, autorizo expresamente a COMFACESAR para que consulte, solicite, suministre, reporte, procese y modifique la información financiera y crediticia que se refiere a mi comportamiento como usuario de servicios financieros, comerciales y crediticios, ante cualquier operador de información y riesgo crediticio, financiero, comercial o de servicios, nacional o extranjero, o ante cualquier entidad que maneje o administre bases de datos con fines de información financiera, crediticia

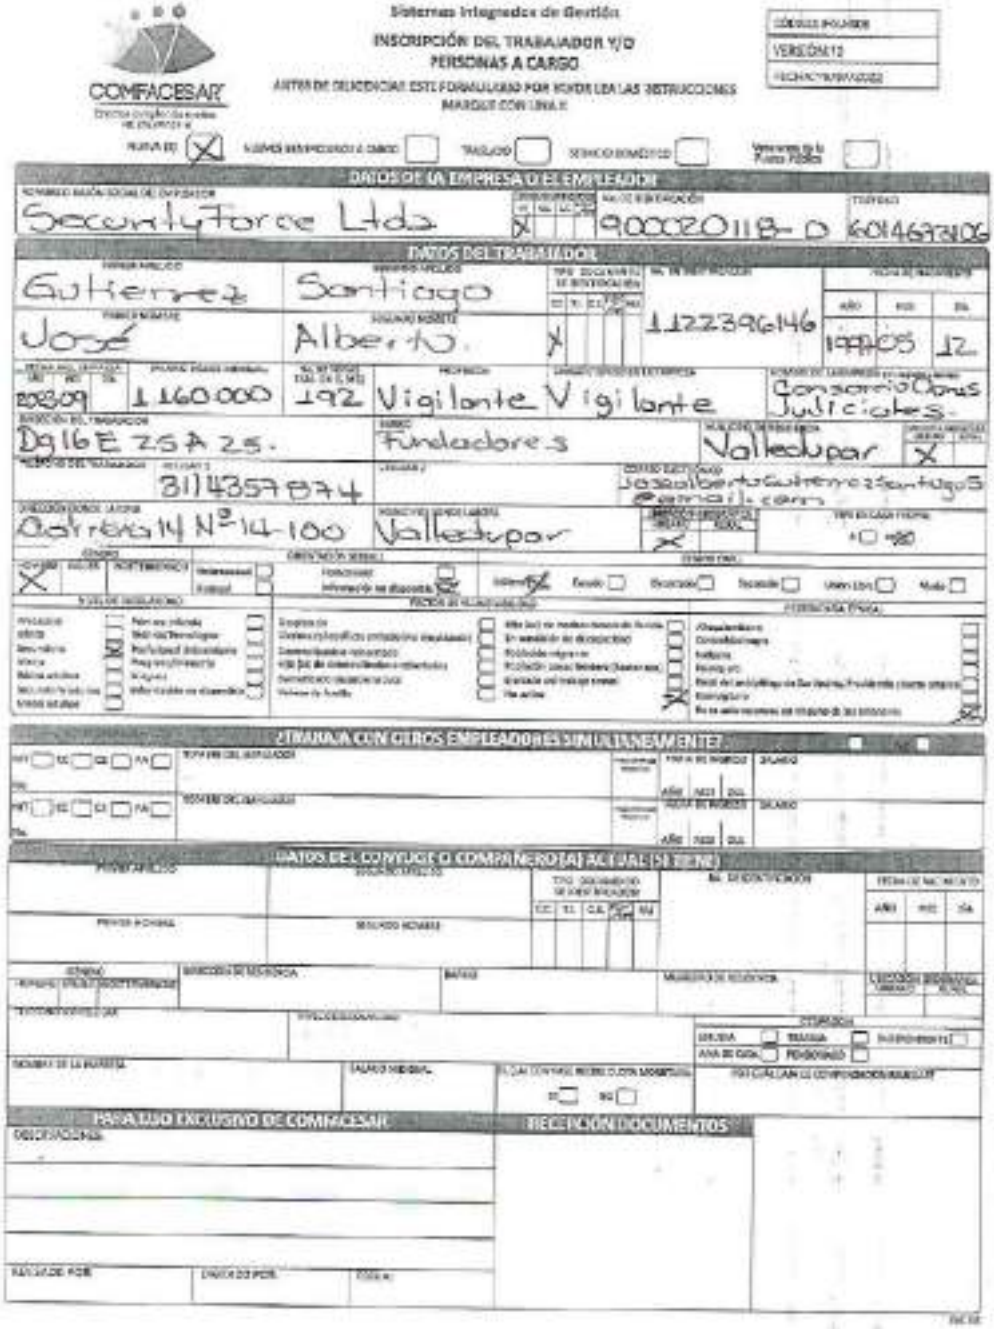

COMFACESAR

Sistemas Integrados de Gestión

INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR Y/O PERSONAS A CARGO

DATOS DE LA EMPRESA O EL EMPLEADOR

Security Force Ltda — 900020118-0 — 6014693106

DATOS DEL TRABAJADOR

Gutierrez Santiago Jose Alberto — 1122396146 — 1990/05/12

208/09 — 1.160.000 — 192 — Vigilante Vigilante — Consorcio Obras Judiciales

Dg 16E 25A 25. — Fundadores — Valledupar

3114357974 — jasalbertogutierrez@gmail.com

Carrera 14 N° 14-100 — Valledupar

¿TRABAJA CON OTROS EMPLEADORES SIMULTANEAMENTE?

DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO(A) ACTUAL (SI TIENE)

PARA USO EXCLUSIVO DE COMFACESAR — RECEPCIÓN DOCUMENTOS



DATOS DE LOS MENORES DEL GRUPO FAMILIAR (SI LOS VA A AFILIAR)

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: NUIP / CÉDULA / TARJETA DE IDENTIDAD / REGISTRO CIVIL | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | SEXO: F / M | FECHA DE NACIMIENTO: AÑO / MES / DÍA | PARENTESCO: HIJO / HIJASTRO / HERMANO / NIETO / SOBRINO / OTRO | ESTUDIANTE: SI / NO | DISCAPACIDAD: SI / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

AUTORIZACIÓN USO DE INFORMACIÓN PERSONAL

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cesar - COMFACESAR de acuerdo con la Política de Tratamiento de mis datos personales, entregados con ocasión de mi vínculo laboral, afiliación, uso, actualización, rectificación, transferencia y supresión, para los siguientes fines:

a. Para que COMFACESAR pueda dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones y para que ejerza los derechos que se derivan de su calidad de Caja de Compensación Familiar del Cesar, y en general, en las actividades propias de su objeto social principal y conexas, así como también las previstas en disposiciones vigentes aplicables o que llegaren a expedirse, con fundamento en la autorización para la libre recolección con el exclusivo propósito.

b. Para actividades de mercadeo y/o promoción de servicios propios del objeto social de COMFACESAR o de terceros con quienes COMFACESAR haya celebrado alianzas comerciales, convenios o contratos interadministrativos o de colaboración, los cuales puedan ser ofrecidos directamente por COMFACESAR o con el apoyo de terceros encargados con los mismos compartiendo mi información personal.

c. Para que con fines propios del objeto social COMFACESAR prevención, contratación y de control de riesgos, pueda enviar, transferir o transmitir a bases de datos de información, el personal, contacto que el ministerio de la Protección Social del Estado Civil realice al aspirante civil, (si fuere el caso) y las que, tales como: ADRES, CUENTA FUTURO, más las que modifique el reporte e el tratamiento, desarrollo, uso, titulares, vinculados y cuales terceros de obligaciones contraídas en su trabajo o contrato, la información de datos derivados en la ejecución, ejecución de los servicios contratados y (3) en general aquellos relativos en la normatividad pública y privada, con el Registro Único de Afiliados-RUAF.

d. Para acceder a mis datos personales, con el objetivo de consultarlos o actualizarlos cuando la solicitud se haga en razón a registros, personales, para el propio conocimiento o cuando se obtenga de otras organizaciones que manejen o la información, fundamentados en sus deberes legales o contractuales, para con la ley que se realizar la consulta.

e. Los datos que mis datos personales sean dispuestos en internet o en otros medios de divulgación o comunicación masiva para mí y para los terceros autorizados y, solamente, cuando el acceso sea técnicamente controlable.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR RELACIONADA ES EXACTA Y VERÍDICA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Jose Alberto Gutierrez S.
cc 1.122.396.146.

PARA USO EXCLUSIVO DE COMFACESAR

OBSERVACIONES:

RECEPCIÓN DOCUMENTOS



APREHSI Group

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL DE PREINGRE

INFORMACIÓN GENERAL

EXAMENES REALIZADOS

EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

CONCEPTOS ESPECIFICOS

OSTEOMUSCULAR

VALORACION OSTEOMUSCULAR NORMAL

RECOMENDACIONES GENERALES

Powered by CamScanner

APREHSI Group

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL DE PREINGRESO

Ingreso No 337935
Fecha Atención: 2023-08-31 09:57:26.0
Fecha Concepto: 2023-08-31 10:55:37.0

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | FABIAN CORRALES HERRERA | Documento: | CC 1065585702 |
| F. Nacimiento: | 2001-05-14 | C. Nacimiento: | CESAR - VALLEDUPAR |
| Edad: | 22 | Genero: | M |
| Estado Civil: | SOLTERO(A) | No. Hijos: | 0 |
| Dirección: | MZ 32 CBA 10 | Ciudad Res: | CESAR - VALLEDUPAR |
| Telefono: | 3126318782 | Telefono Cont: | 3234627860 |
| Contacto: | LUZDARIS HERRERA (MAMA) | EPS: | EPS SANITAS - CM |
| Escolaridad: | NO APLICA (INCOMPLETA) | Ocupación: | VIGILANTE |
| Empresa: | PARTICULAR | | |
| Emp. Misión: | PARTICULAR | | |
| Ciudad Atención: | CESAR - VALLEDUPAR | | |



INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados
No presenta carnet de vacunación para revisión

EXAMENES REALIZADOS

| Nombre del Examen | Concepto | Recomendaciones |
|---|---|---|
| EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL: | Limites normales para el perfil del cargo | |

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL
CUMPLE CON EL PERFIL DEL CARGO

CONCEPTOS ESPECIFICOS

| Enfasis | Concepto |
|---|---|
| OSTEOMUSCULAR | VALORACION OSTEOMUSCULAR NORMAL |

RECOMENDACIONES GENERALES
Autocuidado; Cumplir los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo; Dieta balanceada; Ejercicio Regular; Evite tocarse la boca, ojos y nariz; antes de llevarse las manos. Hábitos de estilo de vida sana; Higiene Postural; Lave y desinfecte frecuentemente objetos y superficies de trabajo;

Firma del Profesional
Nombre: LINA MARCELA RIVERA CANTILLO
Cargo: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
Licencia S. 0138 de 2021 Registro Medico: 1065612489

Firma del Paciente

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos exigidos por el empleador en el perfil del cargo. Tambien establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MEDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ella cuando la requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico

Fecha de Impresión: 2023-08-31 10:59 AM
Impreso por: MAYERLIN MARIA LOPEZ RESTREPO



Powered by CamScanner

APREHSI Group

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL DE PREINGRESO

Ingreso No 337359
Fecha Atención: 2023-08-30 10:38:31.0
Fecha Concepto: 2023-08-30 10:57:41.0



INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | RICARDO JAVIER ROMERO PETIT | Documento: | PE 6084471 |
| F. Nacimiento: | 1976-11-08 | C. Nacimiento: | Venezuela |
| Edad: | 43 | Genero: | M |
| Estado Civil: | CASADO(A) | No. Hijos: | 2 |
| Direccion: | CAM 25 3A A 47 | Ciudad Res: | CESAR - VALLEDUPAR |
| Telefono: | 3136158027 | Telefono Cont: | 3107021208 |
| Contacto: | NORIS JIMENEZ (ABUELA) | EPS: | NUEVA EPS S.A |
| Escolaridad: | BACHILLER (COMPLETA) | Ocupacion: | VIGILANTE |
| Empresa: | PARTICULAR | | |
| Emp. Mision: | PARTICULAR | | |
| Ciudad Atencion: | CESAR - VALLEDUPAR | | |

INMUNIZACIONES Relacion de biológicos aplicados
SARS nCOV2 (2022)

EXAMENES REALIZADOS

| Nombre del Examen | Concepto | Recomendaciones |
|---|---|---|
| EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL: | Limites normales para el perfil del cargo | |

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL
CUMPLE CON EL PERFIL DEL CARGO

CONCEPTOS ESPECIFICOS

| Enfasis | Concepto |
|---|---|
| OSTEOMUSCULAR | VALORACION OSTEOMUSCULAR NORMAL |

Movilidad Preexistente SARS-CoV2 (COVID-19): Sin movilidad preexistentes identificados como factores de riesgo para COVID - 19
La presente evaluación médica se hace con el fin de evaluar el estado de salud del trabajador posterior al periodo de aislamiento obligatorio. En el momento no presenta ninguna enfermedad o antecedente importante que lo haga susceptible ante el contagio con COVID - 19

Respiratorio SARS-CoV2 (COVID-19): Sin Síntomas Respiratorios Asociados a SARS-CoV2 (COVID-19)
La presente evaluación médica se hace con el fin de evaluar el estado de salud del trabajador posterior al periodo de aislamiento obligatorio. En el momento no presenta ningún signo o síntoma relacionado con COVID - 19

RECOMENDACIONES GENERALES
Autocuidado: Cambio frecuente de posturas; Comportamiento seguro; Cumplir los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo; Dieta balanceada; Ejercicio Regular; Hábitos de estilo de vida sana; Higiene Postural; Pausas activas; Uso de EPP; Uso permanente de tapabocas;

Firma del Profesional
Nombre: RICARDO JAVIER BORREGO DE LA CRUZ
Cargo: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
Licencia S... 3184 Registro Medico: 44.614.2210

Firma del Paciente

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MEDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clínica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, según lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Fecha de Impresión: 2023-08-30 10:59 AM
Impreso por: MAYERLIN MARIA LOPEZ RESTREPO

Página 1 de 1

Powered by CamScanner

Omnisalud

## CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

Dando cumplimiento a la Resolución 2346 del Ministerio de Protección Social, a la empresa solo se le enviará el informe con el concepto respectivo y el resultado de los exámenes generados en la consulta.



| Nombre de la Empresa | | Empresa en Misión | | |
|---|---|---|---|---|
| SECURITY FORCE LTDA | | | | |
| NIT | Dirección Empresa | Teléfono Empresa | Ciudad | |
| 900320119 | CR 64 CL 35 47 | 5813099 | Bogota, D.C. | |

**INFORMACIÓN DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR**

| Apellidos y Nombres | | Documento de Identidad | Edad | Genero |
|---|---|---|---|---|
| CHAMORRO SARIA JESON ANDRES | | CC 1082648526 | 30 Años | M |
| Lugar de Nacimiento | | Lugar de Residencia | | Estado Civil |
| VALLEDUPAR | | Valledupar | | SOLTERO |
| Telefono Fijo | | Dirección | | Celular |
| 3015757144 | | MANZ A CASA 12 | | 3128563004 |
| Correo Electronico | | Grado de Escolaridad | | Hemoclasificacion |
| JHESONCHAMORRO95@GMAIL.COM | | BACHILLER | | AB + |
| IMC | | Hijos | EPS | |
| 23.84 | | 0 | SANITAS EPS SA | |
| VACUNACION COVID-19 | COVID-19 DOSIS | VACUNA | | VACUNA REFUERZO |
| SI | NO APLICADA | 1° NO APLICA<br>2° NO APLICA | | NO APLICA |

**INFORMACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL**

| Cargo | Fecha | Hora Ingreso | Hora Inicio Atencion | Hora Salida Atencion |
|---|---|---|---|---|
| GUARDA DE SEGURIDAD | 2023-06-19 | | 06:21:07 | 10:55:54 |
| Lugar de realizacion examen | VALLEDUPAR | | | |

**EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL**

| Tipo de examen realizado | |
|---|---|
| PREINGRESO | |
| CONCEPTO | TIPO DE RESTRICCIONES |
| CUMPLE PARA EL CARGO/ SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO | NO APLICA |
| MOTIVO | CERTIFICADOS ADICIONALES |
| NO APLICA | NINGUNO |
| AREA DE LAS RESTRICCIONES | INGRESO AL PROGRAMA PREVENTIVO |
| APTITUD DE TAREAS | |

**EXAMENES COMPLEMENTARIOS**

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO: SE REALIZA
VISIOMETRIA OCUPACIONAL: SE REALIZA
EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL: SE REALIZA
ENFASIS OSTEOMUSCULAR: SE REALIZA

Fecha y hora de impresion: 2023-06-19 10:56:16 Pg. 1/3

| ANEXOS EXAMENES COMPLEMENTARIOS |
|---|
| **VALORACION COMPLEMENTARIA (EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL)** |
| Su capacidad auditiva es: adecuada |
| **MEDICAS PERSONALES** |
| Ninguna |
| **CONDUCTAS -(CONDUCTAS RESTRICTIVAS)** |
| Ninguna |
| **CONDUCTAS -(CONDUCTAS PREVENTIVAS)** |
| Ninguna |
| **OBSERVACIONES GENERALES (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)** |
| Cumplir Con Los Procedimientos Definidos Para Desarrollar Su Trabajo. Informar Oportunamente De Los Peligros Identificados En El Trabajo. Participar En Las Actividades Que Se Desarrollen En El Sistema De Gestión Y Seguridad Y Salud En El Trabajo. Desplácese En Forma Segura , si va manejar cargas cumple Con La Normatividad De Manejo O Manipulación De Cargas, Mantenga Buena Higiene Postural, Ubicando Adecuadamente La Pantalla De Su Monitor. Si Va Estar Expuesto Utilizar Protección Respiratoria Y Auditiva, Utilizar La Dotación Y Los Elementos De Protección Personal Suministrados por El Empleador./ Dar Aviso A Supervisor O Superior Si Sus Condiciones De Salud Se Han Modificados Y Presenta Alguna Limitación O Restricción Para Realizar La Labor |
| **OTRAS OBSERVACIONES** |
| Ninguna |
| **OBSERVACION Y CONCLUSION FINAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)** |
| ENFASIS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA: Este examen Médico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y está enfocado en una revisión, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares reformadas y columna, durante su evaluación no se evidenció patología o sintomatología de origen osteomuscular que pudieran genera limitaciones o riesgo para desempeñar sus funciones laborales |
| **OBRERVACIÓN AREA DE VACUNACIÓN** |
| Durante su evaluación médico ocupacional se realizó revisión de los antecedentes de vacunación, en el momento no cuenta con vacunación para prevencion de infeccion por sars cov-2, se recomienda iniciar y completar el esquema de vacunacion contra el covid-19, se indica cumplir con las medidas generales de bioseguridad |

| | | |
|---|---|---|
| CLASIFICACION GATISO OSTEOMUSCULAR: SI | TIPO: 1 | GRUPO: D |
| EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS | ENFASIS OSTEOMUSCULAR | |
| INGRESARLO AL PVE PREVENTIVO | | |
| REMISION Y CONTROLES POR SU EPS | NINGUNA | |
| ESTÁ EN CONTROLES CON LA ARL | NO | |

**CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVO A LOS EXAMENES**

Las respuestas dadas por mi en este(os) examen(es) están completas y son verificadas autorizo a la IPS para que suministre las recomendaciones médicas ocupacionales descritas Anteriormente, dando cumpliendo al decreto 1072 del 2015 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, para retroalimentar los SVE (SISTEMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO) / programas de salud y se recomienda realizar exámenes ocupacionales anualmente acorde a la matriz de peligro y profesiograma.

Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o retiro), dando cumpliendo con la (Resolución 2346 del 2007 Art. 10), y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud.

Según lo contemplado en las resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009,la resolucion 0312 del 23 de marzo del 2017 y Decreto 1072/2615 - Artículo 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2 del ministerio de trabajo y salud y protección social, y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, las evaluaciones médicas ocupacionales tiene como objeto monitorear la exposición a factores de riesgo ocupacional e identificar las posibles alteraciones de la salud tempranas, permanentes o secundarias a la labor o por el medio ambiente de trabajo al cual está expuesto el trabajador, y para detectar precozmente enfermedades de origen común agravadas por la exposición a los mismos. Fortaleciendo los sistemas de prevención y protección de la salud de los trabajadores. Dichas resoluciones hacen énfasis en la confidencialidad de la Historia clínica ocupacional, la reserva profesional de la misma, y el hecho de que dicha información queda bajo nuestra guarda y custodia y solo se obtendrá dicha información bajo los requerimientos legales establecidos por la ley o cuando el trabajador lo demande, solo los certificados médicos serán conocidos por la empresa.

RIVERA RAMOS TATIANA
1065664329
RM: 000295
Firma y sello del médico evaluador

JEISON ANDRES CHAMORRO SARIA
Documento: 1065649528
Firma del trabajador

La información incluida en este concepto es copia fiel de los datos contenidos en la historia clínica ocupacional.

Omnisalud

## CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

Dando cumplimiento a la Resolución 2346 del Ministerio de Protección Social, a la empresa solo se le enviará el informe con el concepto respectivo y el resultado de los exámenes generados en la consulta.

| Nombre de la Empresa | | Empresa en Misión | |  |
|---|---|---|---|---|
| SECURITY FORCE LTDA | | | | |
| NIT | Dirección Empresa | Teléfono Empresa | Ciudad | |
| 900320118 | CR 84 CL 35 47 | 9813000 | Bogota, D.C. | |

**INFORMACIÓN DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR**

| Apellidos y Nombres | Documento de Identidad | Edad | Género |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ ESCOBAR ENRIEDER JOSE | CC 77180088 | 48 Años | M |
| **Lugar de Nacimiento** | **Lugar de Residencia** | | **Estado Civil** |
| GUAMAL MAGDALENA | Valledupar | | UNION LIBRE |
| **Teléfono Fijo** | **Dirección** | | **Celular** |
| 5728295020 | CRA 37 #70-54 DIVINO NIÑO | | 3001660728 |
| **Correo Electrónico** | **Grado de Escolaridad** | | **Hemoclasificación** |
| ENRIEDERGUTIERREZESCOBAR77@GMAIL.COM | BACHILLER | | O + |
| **IMC** | **Hijos** | **EPS** | |
| 20.9 | 0 | SALUD TOTAL S.A.E.P.S. | |

| VACUNACION COVID-19 | COVID-19 DOSIS | VACUNA | VACUNA REFUERZO |
|---|---|---|---|
| SI | ESQUEMA COMPLETO CON REFUERZO | 1° JANSSEN<br>2° NO APLICA | JANSSEN |

**INFORMACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL**

| Cargo | Fecha | Hora Ingreso | Hora Inicio Atencion | Hora Salida Atencion |
|---|---|---|---|---|
| GUARDA DE SEGURIDAD | 2023-09-18 | | 08:17:25 | 10:25:20 |
| **Lugar de realizacion examen** | VALLEDUPAR | | | |

**EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL**

| Tipo de examen realizado | |
|---|---|
| PREINGRESO | |
| **CONCEPTO** | **TIPO DE RESTRICCIONES** |
| CUMPLE PARA EL CARGO SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO | NO APLICA |
| **MOTIVO** | **CERTIFICADOS ADICIONALES** |
| NO APLICA | NINGUNO |
| **AREA DE LAS RESTRICCIONES** | **INGRESO AL PROGRAMA PREVENTIVO** |
| **APTITUD DE TAREAS** | |

**EXÁMENES COMPLEMENTARIOS**

**EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO:** SE REALIZA
**VISIOMETRIA OCUPACIONAL:** SE REALIZA
**EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL:** SE REALIZA
**ENFASIS OSTEOMUSCULAR:** SE REALIZA

| ANEXOS EXAMENES COMPLEMENTARIOS |
|---|
| **VALORACION COMPLEMENTARIA (EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL)** |
| Su capacidad auditiva es adecuada |
| **MEDICAS PERSONALES** |
| Ninguna |
| **CONDUCTAS - (CONDUCTAS RESTRICTIVAS)** |
| Ninguna |
| **CONDUCTAS - (CONDUCTAS PREVENTIVAS)** |
| Ninguna |
| **OBSERVACIONES GENERALES (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)** |
| Cumplir Con Los Procedimientos Definidos Para Desarrollar Su Trabajo. Informar Oportunamente De Los Peligros Identificados En El Trabajo. Participar En Las Actividades Que Se Desarrollen En El Sistema De Gestión Y Seguridad Y Salud En El Trabajo. Desplácese En Forma Segura , si va manejar cargas cumple Con La Normatividad De Manejo O Manipulación De Cargas. Mantenga Buena Higiene Postural, Ubicando Adecuadamente La Pantalla De Su Monitor. Si Va Estar Expuesto Utilizar Protección Respiratoria Y Auditiva, Utilizar La Dotación Y Los Elementos De Protección Personal Suministrados por El Empleador./ Dar Aviso A Supervisor O Superior Si Sus Condiciones De Salud Se Han Modificados Y Presenta Alguna Limitación O Restricción Para Realizar La Labor |
| **OTRAS OBSERVACIONES** |
| Ninguna |
| **OBSERVACION Y CONCLUSION FINAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)** |
| ENFASIS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA: Este examen Medico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y esta enfocado en una revision, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares sintomáticas y columna, durante su evaluación no se evidenció patología o sintomatologia de origen osteo muscular que pudieran genere limitaciones o riesgo para desempeñar sus funciones laborales |
| **OBRERVACIÓN AREA DE VACUNACIÓN** |
| Durante su evaluación médico ocupacional se realizó revisión de los antecedentes de vacunación, en el momento cuenta con esquema de vacunación completo para prevencion de infeccion por sars cov-2; debe seguir tomando las medidas preventivas; cumpliendo con las medidas generales de bioseguridad |

| | | |
|---|---|---|
| CLASIFICACION GATISO OSTEOMUSCULAR: SI | TIPO: 1 | GRUPO: A |
| EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS | ENFASIS OSTEOMUSCULAR | |
| INGRESARLO AL PVE PREVENTIVO | | |
| REMISION Y CONTROLES POR SU EPS | NINGUNA | |
| ESTÁ EN CONTROLES CON LA ARL | NO | |

**CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVO A LOS EXAMENES**

Las respuestas dadas por mi en este(os) examen(es) están completas y son verificadas autorizo a la IPS para que suministre las recomendaciones médicas ocupacionales descritas Anteriormente, dando cumpliendo el decreto 1072 del 2015 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, para retroalimentar los SVE (SISTEMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO) / programas de salud y se recomienda realizar exámenes ocupacionales anualmente acorde a la matriz de peligro y profesiograma.

Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o retiro), dando cumpliendo con la (Resolución 2346 del 2007 Art. 10), y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud.

Según lo contemplado en las resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009,la resolucion 0312 del 23 de marzo del 2017 y Decreto 1072/2615 - Artículo 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2 del ministerio de trabajo y salud y protección social, y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, las evaluaciones médicas ocupacionales tiene como objeto monitorear la exposición a factores de riesgo ocupacional e identificar las posibles alteraciones de la salud tempranas, permanentes o secundarias a la labor o por el medio ambiente de trabajo al cual está expuesto el trabajador, y para detectar precozmente enfermedades de origen común agravadas por la exposición a los mismos. Fortaleciendo los sistemas de prevención y protección de la salud de los trabajadores. Dichas resoluciones hacen énfasis en la confidencialidad de la Historia clínica ocupacional, la reserva profesional de la misma, y el hecho de que dicha información queda bajo nuestra guarda y custodia y solo se obtendrá dicha información bajo los requerimientos legales establecidos por la ley o cuando el trabajador lo demande, solo los certificados médicos serán conocidos por la empresa.

Tatiana Rivera — Edder Gutierrez

RIVERA RAMOS TATIANA
1065664329
RM: 000295
Firma y sello del médico evaluador

EDNEDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR
Documento: 77185068
Firma del trabajador

La información incluida en este concepto es copia fiel de los datos contenidos en la historia clínica ocupacional.

Omnisalud

## CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

Dando cumplimiento a la Resolución 2346 del Ministerio de Protección Social, a la empresa solo se le enviará el informe con el concepto respectivo y el resultado de los exámenes generados en la consulta.

| Nombre de la Empresa | | Empresa en Misión | |  |
|---|---|---|---|---|
| SECURITY FORCE LTDA | | | | |
| NIT | Dirección Empresa | Teléfono Empresa | Ciudad | |
| 900320118 | CR 84 CL 35 47 | 9813000 | Bogota, D.C. | |

**INFORMACIÓN DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR**

| Apellidos y Nombres | Documento de Identidad | Edad | Género |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ SANTIAGO JOSE ALBERTO | CC 1122668448 | 26 Años | M |
| **Lugar de Nacimiento** | **Lugar de Residencia** | **Estado Civil** | |
| SAN JUAN DEL CESAR | Valledupar | SOLTERO | |
| **Teléfono Fijo** | **Dirección** | **Celular** | |
| 5114357874 | DIAGONAL 16E #25A 25 LOS FUNDADORES | 3208273742 | |
| **Correo Electronico** | **Grado de Escolaridad** | **Hemoclasificación** | |
| JOSEALBERTOGUTIERREZSANTIAGO5@GMAIL.COM | BACHILLER | A + | |

| IMC | Hijos | EPS |
|---|---|---|
| 20.91 | 0 | SANITAS EPS SA |

| VACUNACION COVID-19 | COVID-19 DOSIS | VACUNA | VACUNA REFUERZO |
|---|---|---|---|
| SI | SEGUNDA DOSIS | 1° ASTRAZENECA<br>2° ASTRAZENECA | NO APLICA |

**INFORMACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL**

| Cargo | Fecha | Hora Ingreso | Hora Inicio Atencion | Hora Salida Atencion |
|---|---|---|---|---|
| GUARDA DE SEGURIDAD | 2023-09-18 | | 08:07:06 | 10:25:50 |

| Lugar de realización examen | VALLEDUPAR |
|---|---|

**EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL**

**Tipo de examen realizado**

PREINGRESO

| CONCEPTO | TIPO DE RESTRICCIONES |
|---|---|
| CUMPLE PARA EL CARGO SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO | NO APLICA |
| **MOTIVO** | **CERTIFICADOS ADICIONALES** |
| NO APLICA | NINGUNO |
| **AREA DE LAS RESTRICCIONES** | **INGRESO AL PROGRAMA PREVENTIVO** |
| **APTITUD DE TAREAS** | |

**EXAMENES COMPLEMENTARIOS**

**EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO:** SE REALIZA
**EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL:** SE REALIZA
**VISIOMETRIA OCUPACIONAL:** SE REALIZA
**ENFASIS OSTEOMUSCULAR:** SE REALIZA

Fecha y hora de impresion: 2023-09-18 10:27:30 Pg. 03

| ANEXOS EXAMENES COMPLEMENTARIOS |
|---|
| **VALORACION COMPLEMENTARIA (EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL)** |
| Su capacidad auditiva es adecuada |
| **MEDICAS PERSONALES** |
| Se informa evaluar o continuar en controles preventivos por el medico o especialista tratante (cirujano General) para definir conducta a seguir. |
| **CONDUCTAS - (CONDUCTAS RESTRICTIVAS)** |
| Ninguna |
| **CONDUCTAS - (CONDUCTAS PREVENTIVAS)** |
| Ninguna |
| **OBSERVACIONES GENERALES (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)** |
| Cumplir Con Los Procedimientos Definidos Para Desarrollar Su Trabajo. Informar Oportunamente De Los Peligros Identificados En El Trabajo. Participar En Las Actividades Que Se Desarrollen En El Sistema De Gestión Y Seguridad Y Salud En El Trabajo. Desplácese En Forma Segura , si va manejar cargas cumple Con La Normatividad De Manejo O Manipulación De Cargas. Mantenga Buena Higiene Postural, Ubicando Adecuadamente La Pantalla De Su Monitor. Si Va Estar Expuesto Utilizar Protección Respiratoria Y Auditiva, Utilizar La Dotación Y Los Elementos De Protección Personal Suministrados por El Empleador./ Dar Aviso A Supervisor O Superior Si Sus Condiciones De Salud Se Han Modificados Y Presenta Alguna Limitación O Restricción Para Realizar La Labor |
| **OTRAS OBSERVACIONES** |
| Ninguna |
| **OBSERVACION Y CONCLUSION FINAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)** |
| ENFASIS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA: Este examen Medico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y esta enfocado en una revision, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares: extremidades y columna, durante su evaluación no se evidenció patología o sintomatologia de origen osteomuscular que pudieran generar limitaciones o riesgo para desempeñar sus funciones laborales |
| **OBRERVACIÓN AREA DE VACUNACIÓN** |
| Durante su evaluación médico ocupacional se realizó revisión de los antecedentes de vacunación, en el momento cuenta con esquema de vacunación completo para prevencion de infeccion por sars cov-2; debe seguir tomando las medidas preventivas; cumpliendo con las medidas generales de bioseguridad. |

| | | |
|---|---|---|
| CLASIFICACION GATISO OSTEOMUSCULAR: SI | TIPO: 1 | GRUPO: E |
| EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS | ENFASIS OSTEOMUSCULAR | |
| INGRESARLO AL PVE PREVENTIVO | | |
| REMISION Y CONTROLES POR SU EPS | CIRUGIA GENERAL | |
| ESTÁ EN CONTROLES CON LA ARL | NO | |

**CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVO A LOS EXAMENES**

Las respuestas dadas por mi en este(os) examen(es) están completas y son verificadas autorizo a la IPS para que suministre las recomendaciones médicas ocupacionales descritas Anteriormente, dando cumpliendo al decreto 1072 del 2015 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, para retroalimentar los SVE (SISTEMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO) / programas de salud y se recomienda realizar exámenes ocupacionales anualmente acorde a la matriz de peligro y profesiograma.

Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o retiro), dando cumpliendo con la (Resolución 2346 del 2007 Art. 10), y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud.

Según lo contemplado en las resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009,la resolucion 0312 del 23 de marzo del 2017 y Decreto 1072/2615 - Artículo 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2 del ministerio de trabajo y salud y protección social, y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, las evaluaciones médicas ocupacionales tiene como objeto monitorear la exposición a factores de riesgo ocupacional e identificar las posibles alteraciones de la salud tempranas, permanentes o secundarias a la labor o por el medio ambiente de trabajo al cual está expuesto el trabajador, y para detectar precozmente enfermedades de origen común agravadas por la exposición a los mismos. Fortaleciendo los sistemas de prevención y protección de la salud de los trabajadores. Dichas resoluciones hacen énfasis en la confidencialidad de la Historia clínica ocupacional, la reserva profesional de la misma, y el hecho de que dicha información queda bajo nuestra guarda y custodia y solo se obtendrá dicha información bajo los requerimientos legales establecidos por la ley o cuando el trabajador lo demande, solo los certificados médicos serán conocidos por la empresa.

RIVERA RAMOS TATIANA
1065664329
RM: 000295
Firma y sello del médico evaluador

JOSE ALBERTO GUTIERREZ SANTIAGO
Documento: 1122395148
Firma del trabajador

La información incluida en este concepto es copia fiel de los datos contenidos en la historia clínica ocupacional.

MEPSI

NIT: 900933659

**DIRECCION:**
Calle 16B N° 19-54 BARRIO. DANGON
TEL: 5737972 CEL: 301 4503792
VALLEDUPAR-CESAR

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN



**Ciudad:** Valledupar-Cesar **Fecha:** 28-ago.-23
**Paciente:** DUBER DONADO VILLAFAÑE
**Fecha nacimiento:** 15/03/1992 **Edad:** 31 Años 5 Meses y 13 Días
**Estado Civil:** UNIÓN LIBRE **N° Documento:** 1065590870 **Tipo:** CC
**Teléfonos:** 3113145548 **Dirección:** VALENCIA DE JESUS
**Nombre de la empresa:** RAMON ASCANIO ROCHA
**Cargo:** OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

**TIPO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL:** INGRESO

## DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

**EXAMENES REALIZADOS:**
EXAMEN MEDICO OSTEMUSCULAR CON ENFASIS EN MAQUINARIA PESADA :NORMAL

**RECOMENDACIONES AUDIOMETRÍA:**
NORMAL
CONTROL ANUAL

**RECOMENDACIONES ESPIROMETRÍA:**
N.R

**RECOMENDACIONES EVALUACIÓN VISUAL:**
NORMAL
CONTROL ANUAL

**RECOMENDACIONES MEDICAS:**
VALORACION POR NUTRICIÓN
ESTILO DE VIDA SALUDABLE
ACTIVIDAD FISICA
USO DE EPI
HIGIENE POSTURAL
MANEJO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19
CONTROL MEDICO ANUAL

**REMISIÓN:**
Apto para Trabajo en altura: SI: ☐ NO: ☐ NO APLICA: ☒

**Concepto de Aptitud:** APTO CON PATOLOGIA MODIFICABLE CON ESTILO DE VIDA SALUDABLES

Katia Y. Pérez D.

Nombre : KATIA YANETH PEREZ DOMINGUEZ
Especialidad : MEDICINA OCUPACIONAL
Licencia S.O. : R.M. 5830 LIC. 3745

Nombre : DUBER DONADO VILLAFAÑE
N° y Tipo Documento : CC 1065590870



MARSHALS SERVICE LTDA.

Nit. 830083378-5

ACADEMIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Resolución de Aprobación Licencia de Funcionamiento 46737 del 12-09-2020 hasta 2029

Resolución de Aprobación P.E.I.S 0144867-033687 de 2022

MARSHALS SERVICE LTDA

VIGILADO SUPERVIGILANCIA

CERTIFICA QUE:

GUTIERREZ ESCOBAR ESNEIDER JOSE

Cédula de Ciudadanía No 77.185.068

Asistió al: CURSO REENTRENAMIENTO VIGILANCIA

Con una Capacitación de 20 Horas.

NRO ECSP1124-1217267

Terminación del Curso: 21-01-2023 Acta No975

DIRECTORA GENERAL

DIRECTORA ACADEMICA

PARA VERIFICAR AUTENTICIDAD COMUNIQUESE AL

CEL.: 311 329 1976 - 310 573 6681 - TEL: 772 2517

marshalsservicia@gmail.com - registroycontrol@marshalsseguridad.com

AVENIDA PASTRANA KRA 16 No. 26-08 BARRIO SIMON BOLIVAR

MARSHALS SERVICE LTDA.

ACASEP

CAMARA



República de Colombia
Ministerio de Defensa Nacional
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
y en su nombre la

ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO
EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AESS LTDA.

AESS

Hace constar que:
FABIAN CORRALES HERRERA
C.C. 1.045.705.782
Asistió y aprobó el programa académico de:
FUNDAMENTACION DE VIGILANCIA

AESS

Valledupar, [illegible] de 2021



República Bolivariana de Venezuela
Gobernación del Estado Monagas
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Dirección General de Policía

Academia de Policía
Maturín

Diploma

Que se otorga a

Ricardo J. Romero P.

Por haber aprobado el Curso No. 1 de

Formación de Agentes de Seguridad y Orden Público

Promoción Ramón Arcides Jiménez Caripe



República de Colombia
Ministerio de Defensa Nacional Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESCUELA DE CAPACITACIÓN EN VIGILANCIA PRIVADA
ANTORCHA LTDA.
NIT. 900.994.890-8
Licencia de funcionamiento según Resolución No. 20204640014277 del 19/04/2020
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Ministerio de Defensa

CERTIFICA QUE:

JEISON ANDRES CHAMORRO SARIA

Con cédula de ciudadanía N° 1,065,646,526 de Valledupar

Asistió y aprobó el curso de:

REENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA

Expedida en la ciudad de Valledupar el 28 de abril 2023
Con una intensidad teórica de 30 horas

NROECSP3014-E506570 NCI-015570

CHRISTIAN RODRIGUEZ
Director General

MARLENY ZAMBRANO
Director Academico

SuperVigilancia

El presente Certificado solo es valido con la firma y el sello seco.
Dirección: Calle 16 C No. 21 - 27 Barrio Dangond - Tel. 580 5717 - Cel. 311 404 2579 - 317 397 8003 - 304 577 1319
E-mail: secretaria@escueladeseguridadantorcha.com pagina web: www.escueladeseguridadantorcha.com



MARSHALS SERVICE LTDA.

Nit. 830083378-5

ACADEMIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Resolución de Aprobación Licencia de Funcionamiento 46737 del 12-09-2020 hasta 2029

Resolución de Aprobación P.E.I.S 0144847-053687 de 2022

MARSHALS SERVICE LTDA

VIGILADO SUPERVIGILANCIA

**CERTIFICA QUE:**

*GUTIERREZ ESCOBAR ESNEIDER JOSE*

Cédula de Ciudadanía No 77.185.068

Asistió al: CURSO REENTRENAMIENTO VIGILANCIA

Con una Capacitación de 30 Horas.

NRO ECSP1124-1217367

Terminación del Curso: 21-01-2023 Acta No975

DIRECTORA GENERAL

DIRECTORA ACADEMICA

PARA VERIFICAR AUTENTICIDAD COMUNIQUESE AL

CEL.: 311 229 1976 - 300 573 6841 - TEL.: 772 2517

marshalsservice1@gmail.com - registroycontrol@academiadeseguridad.com

AVENIDA PASTRANA KRA 16 No. 24-08 BARRIO SIMON BOLIVAR

MARSHALS SERVICE LTDA

ACASEP

CAMARA

Libertad y orden
RÉPUBLICA DE COLOMBIA

# El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

*En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015*
*otorga*
*Certificado de Competencia Laboral a*

## OLBER DONADO VILLAFAÑE

Con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1065639870

Quien demostró su Competencia Laboral en la
*Norma*

**Operar maquinaria pesada de acuerdo con manual del fabricante y tipo de labor / Excavadora hidráulica - NIVEL AVANZADO**

*Código: 270101120 - Versión: 1*

*En testimonio de lo anterior. se firma el presente en MOSQUERA. A los veintidos (22) días del mes de Junio de dos mil veintitres (2023)*

Firmado Digitalmente por

1597732 - 22/06/2023
No Y FECHA REGISTRO

NELSON OCTAVIO GÓMEZ BOTERO
Subdirector CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA
REGIONAL CUNDINAMARCA

Vigencia:
hasta el 22 de Junio de 2026


La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 95120027010112022311CC1065639870C.

| Versión 01 | | |
|---|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interna | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Consorcio obras Judiciales | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Induccion sst. Politica sst, Politica de alcohol y drogas, Reglamento de higiene y sst, notificacion de Riesgo, evaluacion sst. | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD: | | CHARLA DE SEGURIDAD | ✓ | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | DURACIÓN: | 1 Hora |
| FECHA: | 01-09-2023 | | | LUGAR: | Palacio de Justicia |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Corrales M | 1065595702 | Security Elite | Fabian Corrales |
| 2 | Ricardo Romero | 6084471 | Security Elite | Ricardo Romero |
| 3 | Eneider Gutierrez | 77185068 | Security Elite | Eneider Gutierrez |

OBSERVACIONES

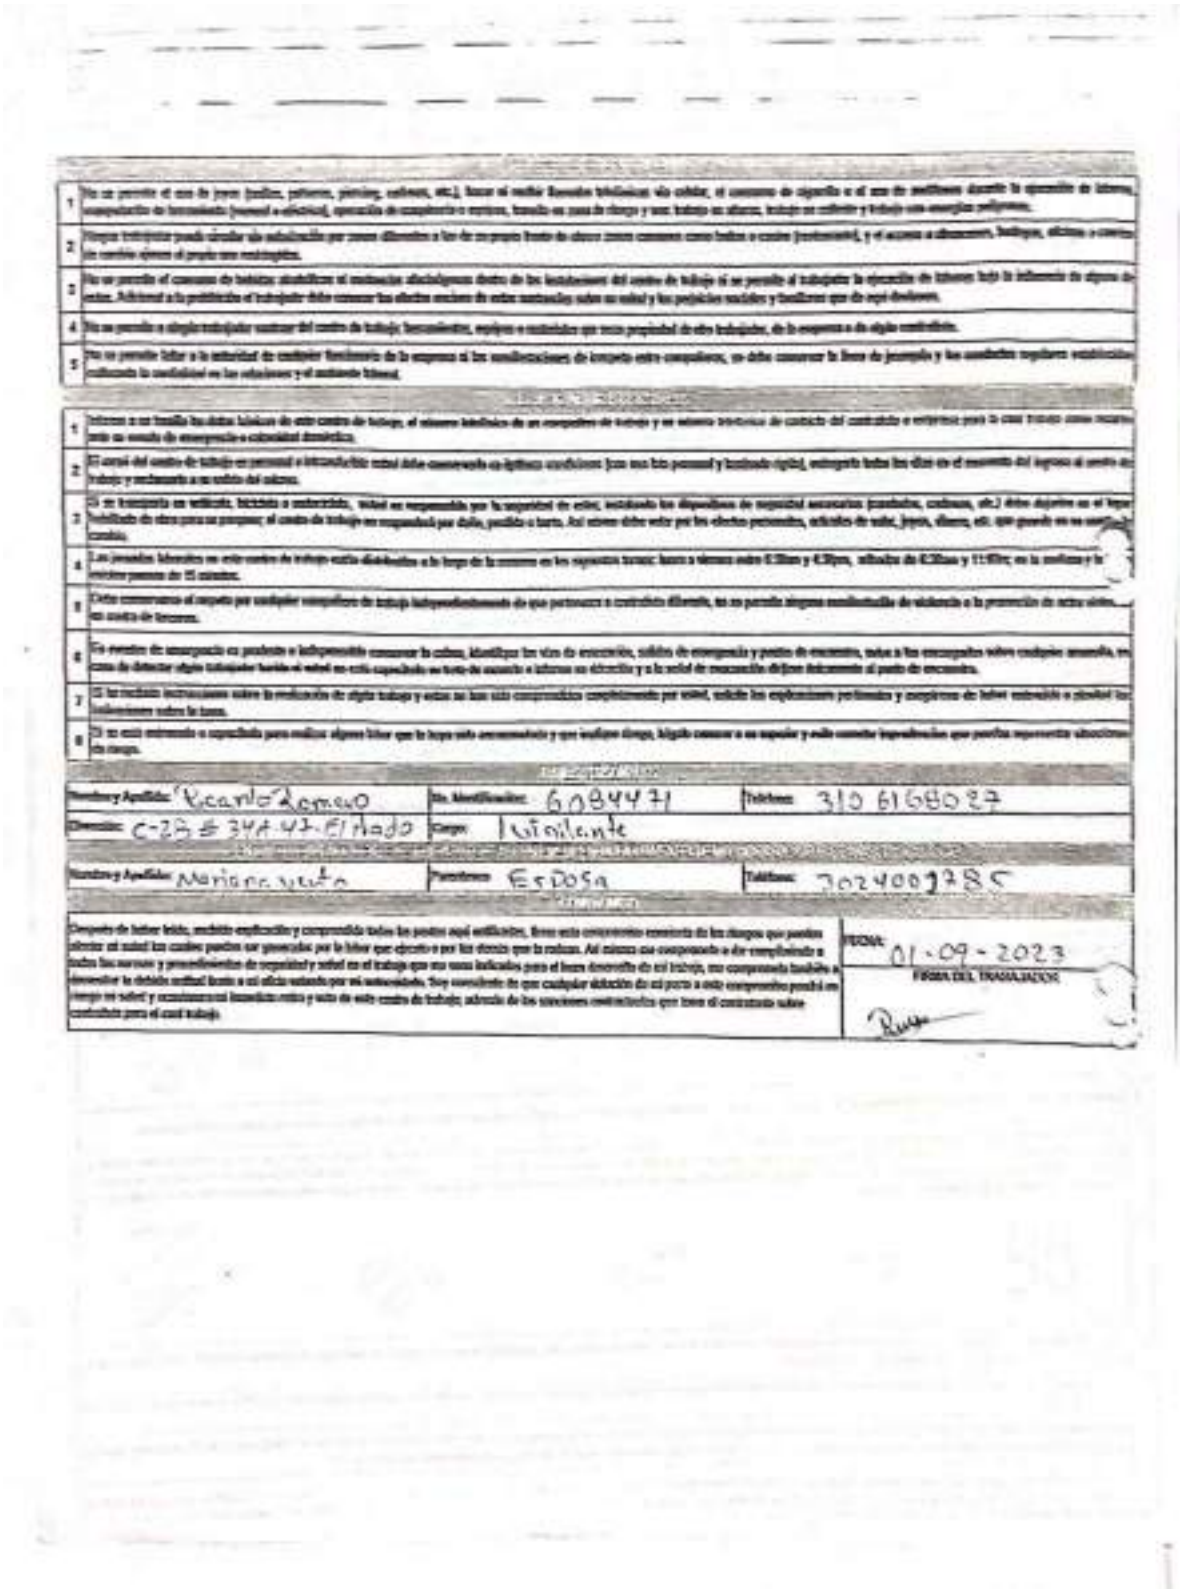



Versión: 01
Fecha: 21/03/2023
Clasificación: Interna

NOMBRE: Ricardo Romero CÉDULA: 608447

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a. Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b. Proteger y promover la salud
c. Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X d. Todas las anteriores

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

a. Política SST
b. Política de alcohol y tabaquismo
c. Política de Calidad
X d. Todas las anteriores

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a. Quemaduras | X | d. Lesiones osteomusculares | X | g. Caídas del mismo nivel |
| X | b. Fractura - Esguince | | e. Perdida de peso | | h. Todas las anteriores |
| X | c. Cuerpo extraño en ojos | X | f. Mareos | | i. a, b, d |

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) USO EPP
b) Inspeccion de Elementos de trabajo
c) asistir capacitaciones
d) Inspecciones de area asignada

5. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | a. | Protección auditiva | e. | Casco facial | i. | X | Casco |
| X | b. | Botas de seguridad con puntera | f. | Respirador de doble cartucho | j. | X | Camisa manga larga |
| X | c. | Tapabocas | g. | Guantes plásticos | k. | X | Tapaoidos de inserción / Copa |
| | d. | Guantes de carnaza / Baquetá | h. | Guantes de nitrilo | l. | X | Gafas de seguridad |

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo afiecde y a quien debe reportarlo en obra:

Informar al SST

7. Marque con un X los tipos de comité que existen en la Organización

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. X | Comité Paritario de Salud | d. | Comité de Convivencia |
| b. | Comité de Bienes y negocios | | |
| c. X | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | | |

8. Marque con un X las prohibiciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Utilización de joyas y relojes | d. | | Laborar sin EPP |
| b. | Ingerir en estado de embriaguez | e. | | No portar identificación |
| c. | Consumir sustancias alucinógenas | f. | X | a, b, d |

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo

a. Trabajos en Caliente
b. Trabajos con energías peligrosas
c. Trabajo en alturas
d. X Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo

a. Utilización de Taladro, cortadora o pulidora
b. Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente
c. Ninguna
d. X Respuesta a y b

OBSERVACIONES:

Firma del Trabajador
No. Identificación 608447

| Versión:02 | | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |

Conforme a lo expuesto yo, Erneider Gutierrez Escobar portador de la cedula de ciudadanía 77185068 desempeñando el cargo de Guarda de Seguridad he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz. |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual, guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras físicas (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | No comer bebes fumar en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Fluidos corporales (sangre) | |

| Versión 02<br>Fecha: 22/5/2017<br>Clasificación: Interno | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo<br>Cumplimiento de las señales de tránsito |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Enreider Gutierrez

Firma: Enreider Gutierrez Fecha: 07-09-2023

Versión: 01
Fecha: 20/01/2020
Clasificación: Interna

INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 07-09-2023 | Nombre y Apellido: Emilio Gutierrez | Contratista: Security Elite

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, Ejerce a través de su Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometido con llevar a cabo sus procesos de manera que proteja la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, al mismo tiempo vela por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, mejorando continuamente con procesos por ello la gerencia se compromete a asignar los recursos necesarios para ejecutarlos y cumplirlos

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Consorcio obras judiciales se compromete a la gestión de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a todo nivel en la Organización a través del cuidado de la integridad física, la protección y la promoción de la salud de nuestros equipos de trabajo, contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementado y estableciendo la mejora continua el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas orientados al autocuidado, minimizando el ausentismo, los accidentes, enfermedades laborales.
Siendo consientes de los impactos que genera nuestra labor y es por ello que Consorcio obras judiciales promueve en sus colaboradores la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, vehículos, o durante la realización de equipos, empalmería y locaciones de los clientes. De igual manera, no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo sistemas de embriagarse o bajo efectos de drogas de tipo alucinógenas, evitando la compañía en cumplimiento a la presente política adoptamos pruebas aleatorias de alcoholemia.

Para todos los trabajadores que ingresen a la empresa se deben tener requisito y cumplimiento legal los afiliaciones al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluya administradora de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que salud laboral realizar los aportes mensuales al sistema, descontando y retirar los porcentajes establecidos en la ley.


Un accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
El accidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe directo y al residente SST del proyecto, quien le dirá en que ARL será atendido de acuerdo a la afiliación realizada por su patrón, en el caso de los contratistas.

Al interior de la organización se ha conformado un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que se encargara de vigilar el desarrollo del sg-sst y participar de actividades que tiendan a mejorar la seguridad en el trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores, actividades como: inspecciones, capacitaciones, investigación de accidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conducta de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, en donde se resuelven conflictos de convivencia suscitados al interior de la Organización, los deberes no pueden ser unilaterales.

Cualquier incumplimiento o falta a las normas de seguridad en el trabajo o omisión a la colaboración en este documento por parte del trabajador es incumplimiento al compromiso que se pone dentro el contrato de su labor y promueve su cese de actividades.

| | |
|---|---|
| 1 | El uso del casco de protección para la cabeza dentro de este centro de trabajo es permanente y obligatorio bajo ninguna circunstancia se permite usar debajo de este elementos diferentes a los que le indique su (gorras, pañoletas, trapos, etc.). |
| 2 | El uso de los elementos de protección personal para ojos, oídos respiratorios y cabeza es obligatorio, al igual que el uso de elementos como guantes, ropa o calzado de trabajo. Los tipos de elementos dependen de la labor que se ejecute en el ambiente dentro del cual se desarrollan las labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de la dotación apropiada y los elementos de protección personal adecuados, así mismo responsabilidad del trabajador su uso debido y cuidado necesario para garantizar la efectividad de la protección son proporcionas |
| 3 | Las áreas de trabajo deben permanecer en completo orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor usted debe velar por el aseo del área de trabajo y el orden en material o equipo utilizado. |
| 4 | Todo trabajo que se ejecute y que tenga riesgo en caída por encima de 2.0 metros, en de trabajo en alturas, para realizarlo es necesario tener el certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas e inspector SST. (Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas) es responsabilidad del trabajador y del coordinador tener el correspondiente permiso de trabajo, hacer correcto uso de los elementos y equipo de protección personal suministrados para el desarrollo de la labor así como el montaje de andamios y andamios. |
| 5 | Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior encargado, al monitor general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para brindarle la atención necesaria y seguir el debido procedimiento. |
| 6 | Todo trabajador debe notificar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeña o en la que sea ejecutado por otra persona y que pueda generar sobre salud o sobre los demás trabajadores daños en la salud. |
| 7 | Todo trabajador debe permanecer atento y respetar todo la señalización instalada en obra: uso de elementos de protección personal, rutas de evacuación, salidas de emergencia, punto de encuentro, zonas de cargue y descargue de materiales, zonas restringidas, conteners de cinta en zonas de riesgo, cerramientos, equipos de emergencias (extintores), encerramientos, etc. |
| 8 | Todo herramienta eléctrica que utilice diario de corte, equipo que cuente con transmisión de polea o equipo con resorte por ningún motivo debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiera como guardas de disco, poseías de poleas, topes, etc. si en el trabajo con pulidoras, cortadoras, planeas, sierra, cangrejos, alimentores, trompos, etc. usted detecta la falta de este dispositivo, debe notificar inmediatamente a su encargado, el coordinador general o al inspector o residente SST. |

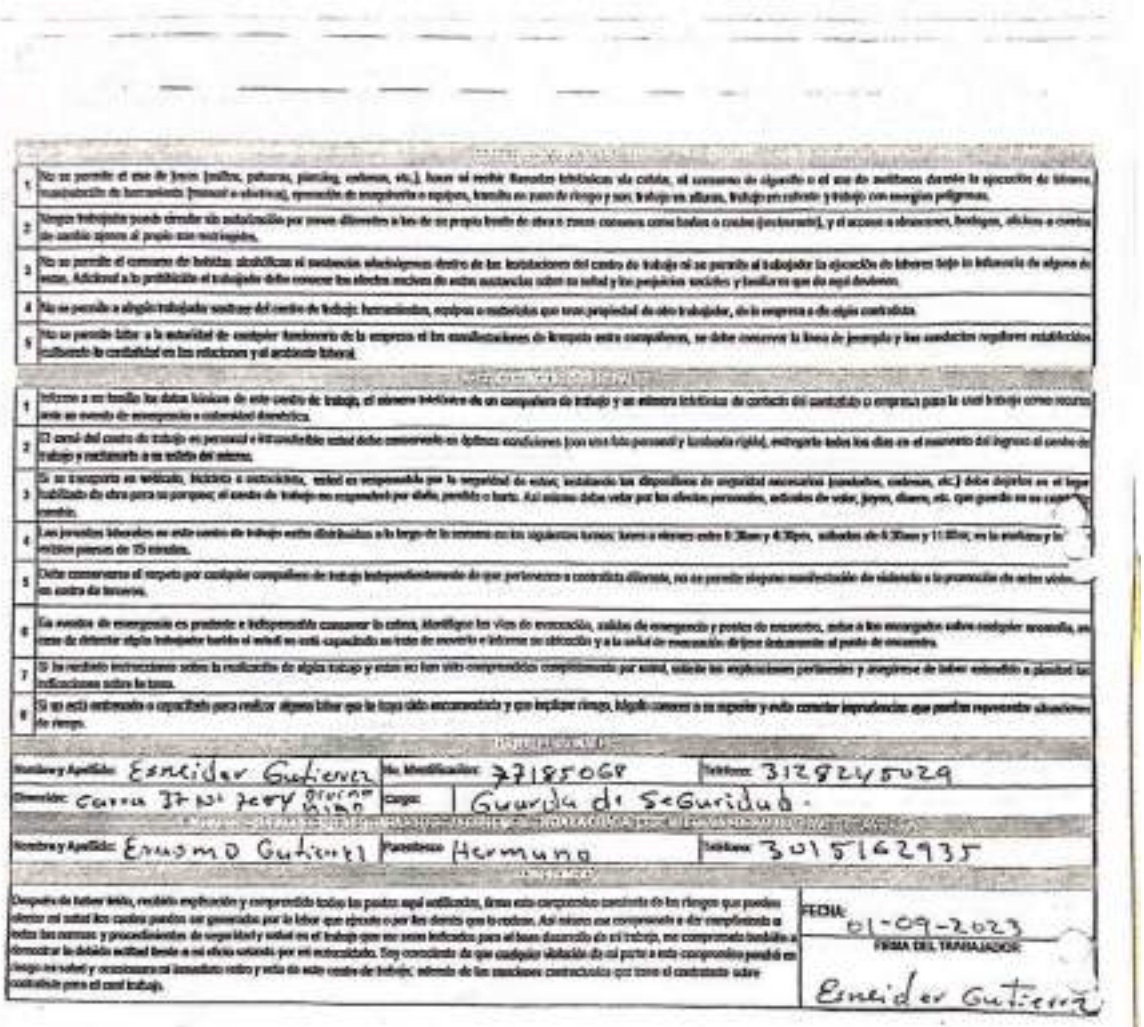

| | |
|---|---|
| 1 | No se permite el uso de joyas (anillos, pulseras, piercing, cadenas, etc.), bajo ni ningún concepto. |
| 2 | Ningún trabajador puede circular sin autorización por zonas diferentes a las de su propio frente de obra o zonas comunes como baños o cocina (restaurante), y el acceso a almacenes, bodegas, oficinas o cuartos de cambio ajenos al propio son restringidos. |
| 3 | No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni sustancias alucinógenas dentro de las instalaciones del centro de trabajo ni se permite al trabajador la ejecución de labores bajo la influencia de alguna de estas. Adicional a la prohibición el trabajador debe conocer los efectos nocivos de estas sustancias sobre su salud y los perjuicios sociales y familiares que de ello devienen. |
| 4 | No se permite a ningún trabajador sustraer del centro de trabajo: herramientas, equipos o materiales que sean propiedad de otro trabajador, de la empresa o de algún contratista. |
| 5 | No se permite faltar a la autoridad de cualquier funcionario de la empresa ni los cumplimientos de respeto entre compañeros, se debe conservar la línea de jerarquía y las conductas regulares establecidas cultivando la cordialidad en las relaciones y el ambiente laboral. |
| 1 | Informe a su familia los datos básicos de este centro de trabajo, el número telefónico de un compañero de trabajo y un número telefónico de contacto del contratista o empresa para la cual trabaja como recurso ante un evento de emergencia o calamidad doméstica. |
| 2 | El canal del centro de trabajo es personal e intransferible usted debe conservarlo en óptimas condiciones (uso con fines personal) y bandolera rígida), entregarlo todos los días en el momento del ingreso al centro de trabajo y reclamarlo a su salida del mismo. |
| 3 | Si su transporte es vehículo, bicicleta o motocicleta, usted es responsable por la seguridad de estos; instalando los dispositivos de seguridad necesarios (candados, cadenas, etc.) debe dejarlos en el lugar habilitado de obra para su parqueo; el centro de trabajo no responderá por daño, pérdida o hurto. Así mismo debe velar por los efectos personales, artículos de valor, joyas, dinero, etc. que guarde en su casillero. |
| 4 | Las jornadas laborales en este centro de trabajo serán distribuidas a lo largo de la semana en los siguientes turnos: lunes a viernes entre 8:30am y 4:30pm, sábados de 8:30am y 11:30m; en la mañana y la tarde tendrán pausas de 15 minutos. |
| 5 | Debe conservarse el respeto por cualquier compañero de trabajo independientemente de que pertenezca a contratista diferente, no se permite ningún manifestación de violencia o la promoción de actos vicios... en contra de terceros. |
| 6 | En eventos de emergencia es prudente e indispensable conservar la calma, identifique las vías de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, estar a las encargados sobre cualquier novedad, en caso de detectar algún trabajador herido el señal no está capacitado no trate de moverlo e informe su ubicación y a la unidad de evacuación diríjase inmediatamente al punto de encuentro. |
| 7 | Si las medidas instrucciones sobre la realización de algún trabajo y estas no han sido comprendidas completamente por usted, solicite las explicaciones pertinentes y asegúrese de haber entendido a plenitud las indicaciones sobre la tarea. |
| 8 | Si no está entrenado o capacitado para realizar alguna labor que le haya sido encomendada y que implique riesgo, infórmelo a su superior y evite cometer imprudencias que puedan representar situaciones de riesgo. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre y Apellido: | Ernesto Gutierrez | No. Identificación: | 77185068 |
| Dirección: | Carrera 37 N° 76 B 39 Piso 2 | Cargo: | Guarda de Seguridad. |
| Teléfono: | 3128245029 | | |
| Nombre y Apellido: | Ernesto Gutierrez | Parentesco: | Hermano |
| Teléfono: | 3015162935 | | |

Después de haber leído, recibido explicación y comprendido todos los puntos aquí establecidos, firmo este compromiso conciente de los riesgos que pueden afectar mi salud los cuales pueden ser generados por la labor que ejecuto o por los demás que lo rodean. Así mismo me comprometo a dar cumplimiento a todas las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que me sean indicados para el buen desarrollo de mi trabajo, me comprometo también a demostrar la debida actitud frente a mi oficio entendiendo por mi autocuidado. Soy consciente de que cualquier violación de mi parte a este compromiso pondrá en riesgo mi salud y ocasionara mi inmediato retiro y veto de este centro de trabajo, además de las sanciones contractuales que tiene el contratista sobre contratante para el cual trabajo.

FECHA: 01-09-2023

FIRMA DEL TRABAJADOR:

Ernesto Gutierrez

3

Versión: 01
Fecha: 21/07/2021
Clasificación: Interna

NOMBRE: Esneider Gutierrez CÉDULA: 3178245029

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:
   - a. Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
   - b. Proteger y promover la salud
   - c. Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
   - X Todas las anteriores

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo
   - a. Política SST
   - b. Política de alcohol y tabaquismo
   - c. Política de Calidad
   - X Todas las anteriores

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.
   - a. Quemaduras
   - X Lesiones osteomusculares
   - X Golpes del mismo nivel
   - X a. Fractura - Esguince
   - g. Perdida de peso
   - h. Todas las anteriores
   - X c. Cuerpo extraño en ojos
   - X Mareos
   - i. a, b, d

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.
   a) Uso de Epp.
   b) Inspección de elementos de Trabajo.
   c) Asistir a capacitaciones
   d) Inspección antes de trabajo

5. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.
   - X a. Protección auditiva
   - e. Careta facial
   - X Casco
   - X b. Botas de seguridad con puntera
   - f. Respirador de doble cartucho
   - X Camisa manga larga
   - X c. Tapabocas
   - g. Guantes plásticos
   - k. Tapaoidos de inserción / Copa
   - d. Guantes de carnaza / Etiqueta
   - h. Guantes de nitrilo
   - X Gafas de seguridad

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarlo en obra:
   Informar al SST -

7. Marque con un X los tipos de comité que existen en la Organización
   - a. Comité Paritario de Salud
   - X Comité de Convivencia
   - b. Comité de Riesgos y seguros
   - X c. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

8. Marque con un X las prohibiciones
   - a. Utilización de joyas y relojes
   - d. Laborar sin EPP
   - b. Ingerir en estado de embriaguez
   - e. No portar herramientas
   - c. Consumir sustancias alucinógenas
   - X c, b, d

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo
   - a. Espacios en Caliente
   - b. Trabajos con energías peligrosas
   - c. Trabajo en alturas
   - X d. Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren precperacional o permiso de trabajo
   - a. Utilización de taladro, cortadora o pulidora
   - b. Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente
   - c. Ninguna
   - X Respuesta a y b

OBSERVACIONES:

Firma del Trabajador: Esneider Gutierrez
No. Identificación: cc 1118550681


| Versión: 01<br>Fecha: 15/04/2023<br>Clasificación: Interna | FORMATO<br>ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción nueva Torre palacio de Justicia | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Reinducción: notificación de riesgos, Política SST, Política de alcohol y drogas, Reglamento de higiene y seguridad, inducción, evaluación de inducción, notificación Restricciones medicas. | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | / | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | DURACIÓN: | 1 Hora | |
| FECHA: | 13/09/23 | LUGAR: | palacio de justicia | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duvan Peralta | 1065833582 | Consorcio | Duvan |

OBSERVACIONES

Trabajador Duvan Peralta identificado con cedula N°: 1065833582 se le realiza reinducción para ingreso a obra. Se le notifica restricción medica. Se le informa que todo debe transitar por el area de las oficinas y el pasillo del mismo. Se le prohibe ingresar a campo portar cordones tenidos en caso de hacer caso omiso es su responsabilidad. Duvan
Trabajador

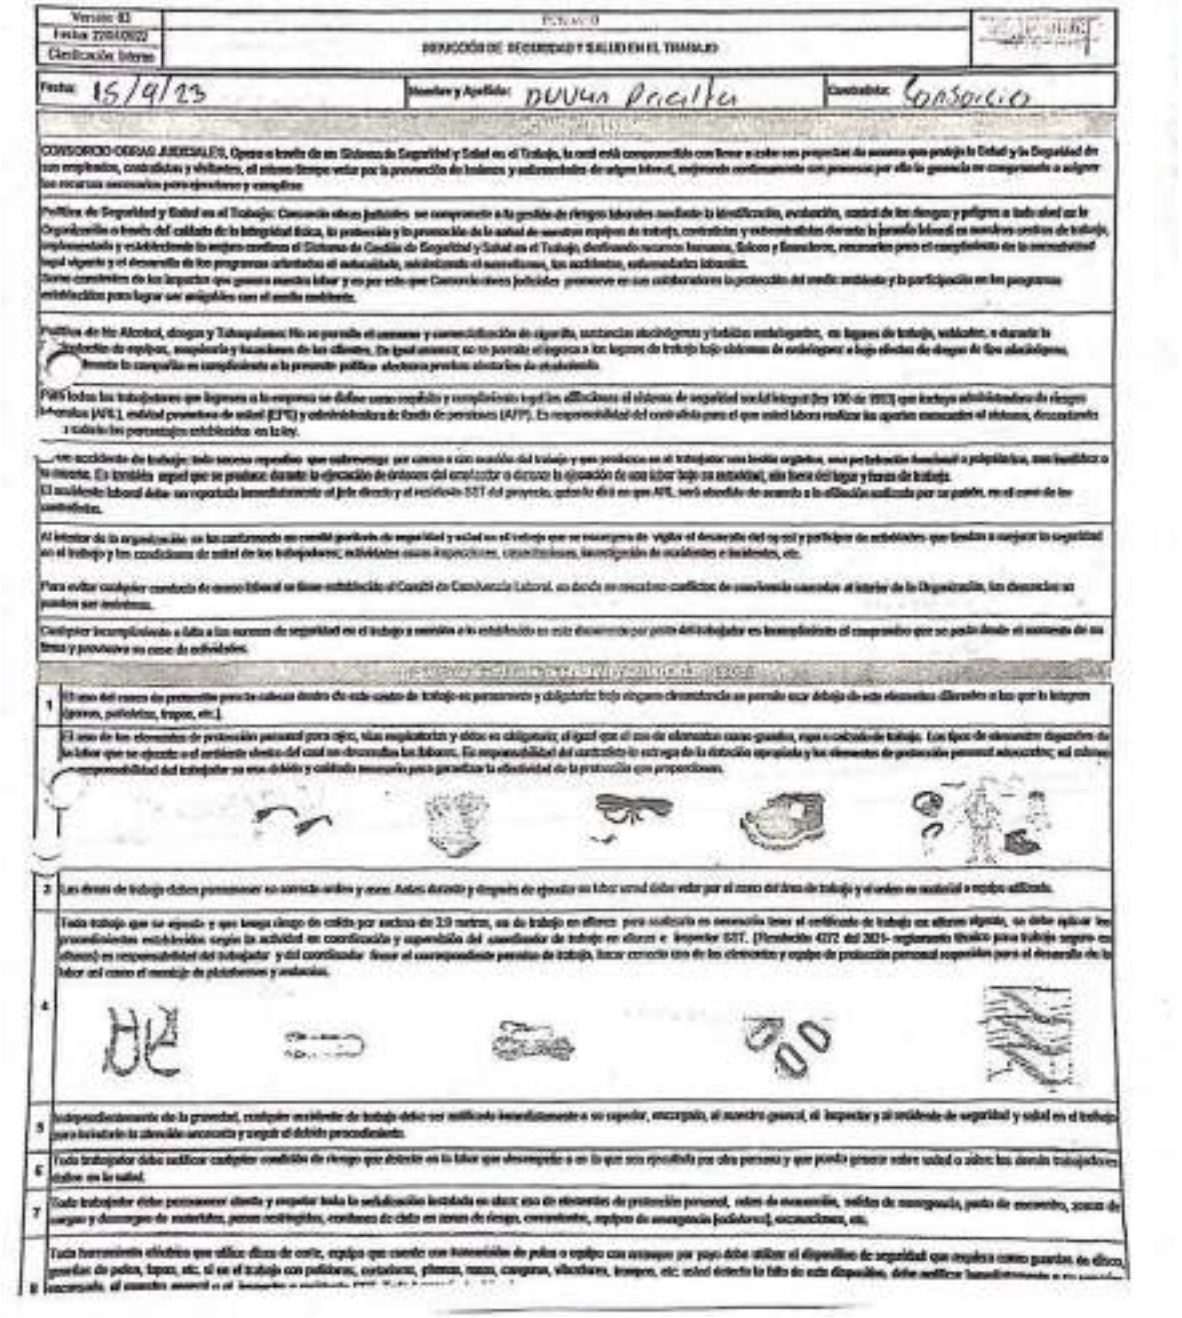

Versión: 03
Fecha: 22/04/2022
Clasificación: Interna

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 15/9/23 | Nombre y Apellido: [illegible] | Contratista: Consorcio

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, Opera a través de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometido con llevar a cabo sus propósitos de asumir que protejo la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, al mismo tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, mejorando continuamente sus procesos por ello la gerencia se compromete a asignar los recursos necesarios para ejecutarse y cumplirse

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete a la gestión de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a todo nivel en la Organización a través del cuidado de la integridad física, la protección y la promoción de la salud de nuestros equipos de trabajo, contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementado y estableciendo la mejora continua el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, disponiendo recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas orientados al autocuidado, minimizando el ausentismo, los accidentes, enfermedades laborales.
Somos conscientes de los impactos que genera nuestra labor y es por esto que Consorcio obras judiciales promueve en sus colaboradores la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, vehículos, o durante la [illegible] de equipos, maquinaria y locaciones de los clientes. De igual manera, no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo síntomas de embriaguez o bajo efectos de drogas de tipo alucinógenas, durante la campaña en cumplimiento a la presente política aplicamos pruebas aleatorias de alcoholemia

Para todos los trabajadores que ingresen a la empresa se define como requisito y cumplimiento legal los afiliaciones al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluye administradora de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que usted labora realizar los aportes mensuales al sistema, descontando a todos los porcentajes establecidos en la ley.

Un accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
El accidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe directo y al residente SST del proyecto, quien le dirá en que ARL será atendido de acuerdo a la afiliación realizada por su patrón, en el caso de los contratistas.

Al interior de la organización se ha conformado un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que se encargara de vigilar el desarrollo del reglamento de higiene y seguridad en el trabajo y los condiciones de salud de los trabajadores; realizando visitas inspecciones, investigaciones de accidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conducta de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, en donde se resuelven conflictos de convivencia suscitados al interior de la Organización, los cuales no pueden ser anónimos.

Cualquier incumplimiento o falta a las normas de seguridad en el trabajo o accidente en este documento por parte del trabajador es incumplimiento al compromiso que se pacto desde el momento de su firma y promueve su cese de actividades.

1 El uso del casco de protección para la cabeza dentro de este centro de trabajo es permanente y obligatorio bajo ninguna circunstancia se permite usar debajo de este elementos diferentes a los que lo integran (gorras, pañoletas, trapos, etc.).

El uso de los elementos de protección personal para ojos, vías respiratorias y oídos es obligatorio; el igual que el uso de elementos contra caídas, cuya o cabeza de trabajo. Los tipos de elementos dispuestos de la labor que se ejecute y el ambiente donde del cual se desarrollan las labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de la dotación apropiada y los elementos de protección personal adecuados; así mismo responsabilidad del trabajador su uso debido y cuidado necesario para garantizar la efectividad de la protección que proporcionan.



2 Las áreas de trabajo deben permanecer en correcto orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor usted debe velar por el aseo del área de trabajo y el orden en material o equipo utilizado.

4 Toda trabajo que se ejecute y que tenga riesgo de caída por encima de 1.8 metros, sea de trabajo en alturas para realizarlo es necesario tener el certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas e inspector SST. (Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas) es responsabilidad del trabajador y del coordinador llevar el correspondiente permiso de trabajo, hacer correcto uso de los elementos y equipo de protección personal requeridos para el desarrollo de la labor así como el montaje de plataformas y andamios.




5 Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior, encargado, al maestro general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para brindarle la atención necesaria y seguir el debido procedimiento.

6 Todo trabajador debe notificar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeña o en la que sea ejecutada por otra persona y que pueda generar sobre salud o sobre los demás trabajadores cliente en la salud.

7 Todo trabajador debe permanecer atento y respetar todas las señalizaciones instaladas en obra: uso de elementos de protección personal, cintas de demarcación, vallas de contención, puntos de encuentro, zonas de cargues y descargues de materiales, pasos restringidos, cruzamos de cinta en zonas de riesgo, constantemente, equipos de emergencia (ambulancia), excavaciones, etc.

8 Toda herramienta eléctrica que utilice: discos de corte, equipo que cuente con interruptor de pedal o equipo con accesorio por piso debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiera como guardas de discos, guardas de pedal, topes, etc. si en el trabajo con palustres, cortadores, pitones, rastra, cargueras, vibradores, trompos, etc. usted detecte la falta de este dispositivo, debe notificar inmediatamente a su [illegible] encargado, al maestro general o al [illegible]

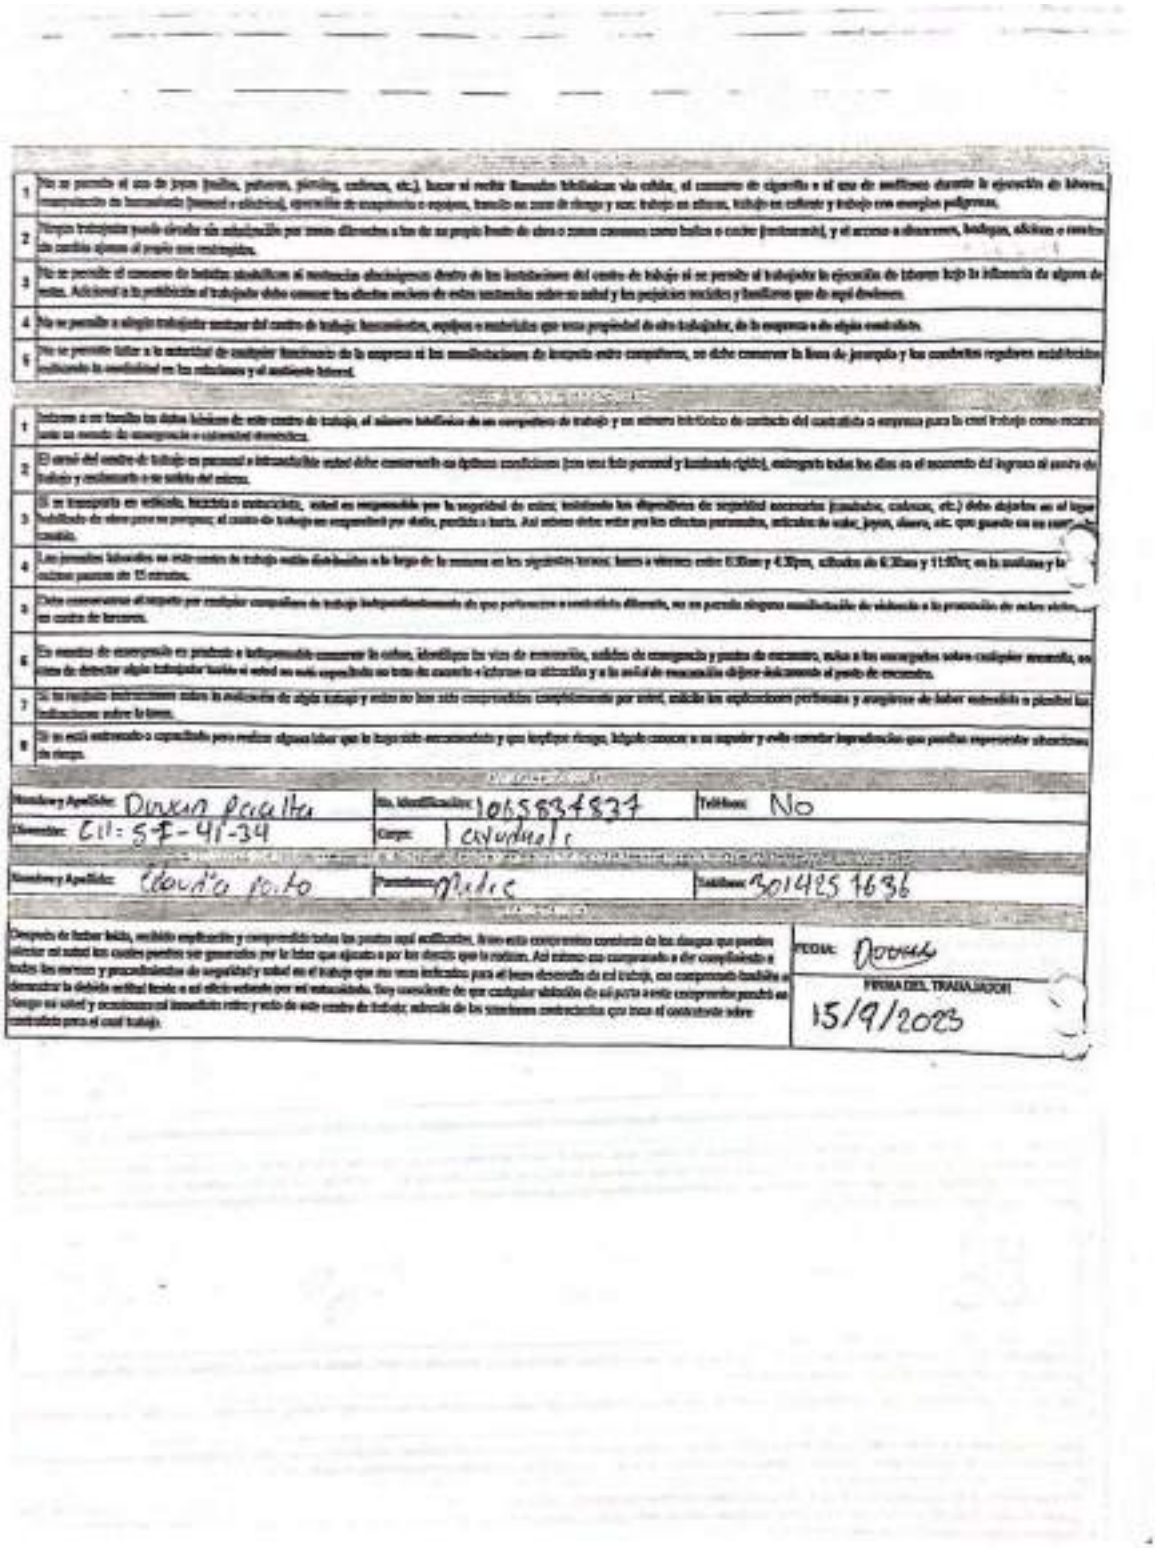

| | |
|---|---|
| 1 | Dio se permite el uso de joyas (anillos, pulseras, piercing, cadenas, etc.), hacer uso reciba llamadas telefónicas vía celular, el consumo de cigarrillo o el uso de audífonos durante la ejecución de labores, manipulación de herramientas (manuel o eléctrica), operación de maquinaria o equipos, tránsito en zonas de riesgo y uso: trabajo en alturas, trabajo en caliente y trabajo con energías peligrosas. |
| 2 | Ningún trabajador puede circular sin autorización por zonas diferentes a las de su propio frente de obra o zonas comunes como baños o casino (restaurante), y el acceso a almacenes, bodegas, oficinas o cuartos de cambios ajenos al propio son restringidos. |
| 3 | Dio se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni sustancias alucinógenas dentro de las instalaciones del centro de trabajo ni se permite al trabajador la ejecución de labores bajo la influencia de alguna de estas. Adicional a la prohibición el trabajador debe conocer los efectos nocivos de estas sustancias sobre su salud y los perjuicios sociales y familiares que de aquí devienen. |
| 4 | Dio se permite a ningún trabajador sustraer del centro de trabajo: herramientas, equipos o materiales que sean propiedad de otro trabajador, de la empresa o de algún contratista. |
| 5 | Dio se permite faltar a la autoridad de cualquier funcionario de la empresa ni las manifestaciones de respeto entre compañeros, no debe conocerse la línea de jerarquía y las conductas regulares establecidas mediando la cordialidad en las relaciones y el ambiente laboral. |
| 1 | Informar a mi familia los datos básicos de este centro de trabajo, el número telefónico de mi compañero de trabajo y mi número telefónico de contacto del contratista o empresa para la cual trabajo como recurso ante un evento de emergencia o calamidad doméstica. |
| 2 | El aseo del centro de trabajo es personal e intransferible usted debe conservarlo en óptimas condiciones [con una foto personal y bandeada rígida], entregarlo todos los días en el momento del ingreso al centro de trabajo y reclamarlo a su salida del mismo. |
| 3 | Si su transporte es vehicular, bicicleta o motocicleta, usted es responsable por la seguridad de estos; inicialmente los dispositivos de seguridad necesarios (guardabarros, cadenas, etc.) debe dejarlos en el lugar habilitado de obra para su parqueo; el centro de trabajo no responderá por daños, pérdida o hurto. Así mismo debe retirar por los efectos personales, artículos de valor, joyas, dinero, etc. que guarde en su casillero asignado. |
| 4 | Las jornadas laborales en este centro de trabajo están distribuidas a lo largo de la semana en los siguientes turnos: horas a viernes entre 8:30am y 4:30pm, sábados de 8:30am y 11:00m; en la mañana y la tarde tendrán derecho a 15 minutos. |
| 5 | Debe conservarse el respeto por cualquier compañero de trabajo independientemente de que pertenezcan a contratista diferente, no se permite ningún manifestación de violencia o la promoción de malos ánimos en el centro de labores. |
| 6 | En caso de emergencia se prohíbe o irrespetuoso consumir licor, identifique las vías de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, todos a los encargados sobre cualquier anomalía, en caso de detectar algún trabajador bajo los efectos del consumo o síntomas de alteración y a la salida de evacuación dirijase inmediatamente al punto de encuentro. |
| 7 | En las reuniones informativas sobre la realización de algún trabajo y antes de los ATS correspondientes cumplimentado por usted, solicite las explicaciones pertinentes y asegúrese de haber entendido a plenitud las indicaciones sobre la tarea. |
| 8 | Si no está entrenado o capacitado para realizar alguna labor que le hayan encomendado y que implique riesgo, infórmele conocer a su superior y evite cometer imprudencias que puedan representar situaciones de riesgo. |

| | | |
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: Dixsan Peralta | No. Identificación: 1055834837 | Teléfono: No |
| Dirección: Cll: 57-41-34 | Cargo: Estudiante | |
| Nombres y Apellidos: Claudia Soto | Parentesco: Madre | Teléfono: 3014851636 |

Después de haber leído, recibido explicación y comprendido todos los puntos aquí enunciados, firmo este compromiso consciente de los riesgos que pueden afectar mi salud los cuales pueden ser generados por la labor que ejecuto o por los diversos que la rodean. Así mismo me comprometo a dar cumplimiento a todas las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que me sean indicados para el buen desarrollo de mi trabajo, me comprometo también a demostrar la debida actitud frente a mi oficio evitando por mi autocuidado. Soy consciente de que cualquier violación de mi parte a este compromiso pondrá en riesgo mi salud y ocasionará mi inmediato retiro y veto de este centro de trabajo, adicional de las sanciones contractuales que trae el contratante sobre contratista para el cual trabajo.

FECHA: Dorada

FIRMA DEL TRABAJADOR

15/9/2023

| Versión 02 | |
|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interna | |

Conforme a lo expuesto yo, Fabian Correa Herrera portador de la cedula de ciudadanía 1055595709 desempeñando el cargo de Guarda de seguridad, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Rickettsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | El usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos sin excepción a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentario) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras físicas (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | No consumir bebidas frías en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión:02 | | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |

Conforme a lo expuesto yo, Diana Patricia Soto, portador de la cedula de ciudadanía 1065839582 desempeñando el cargo de auxiliar, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.


**INFORMACIÓN DE RIESGOS**

| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
|---|---|---|
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, diligenciar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Rickettsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI. |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frio) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados.<br>Disminuir el tiempo de exposición. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras Blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión:02<br>Fecha: 22/07/2022<br>Clasificación: Interna | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| Fenómenos naturales | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: -Duvan Peralta Pacha

Firma: -Duvan- Fecha: 15/9/2023

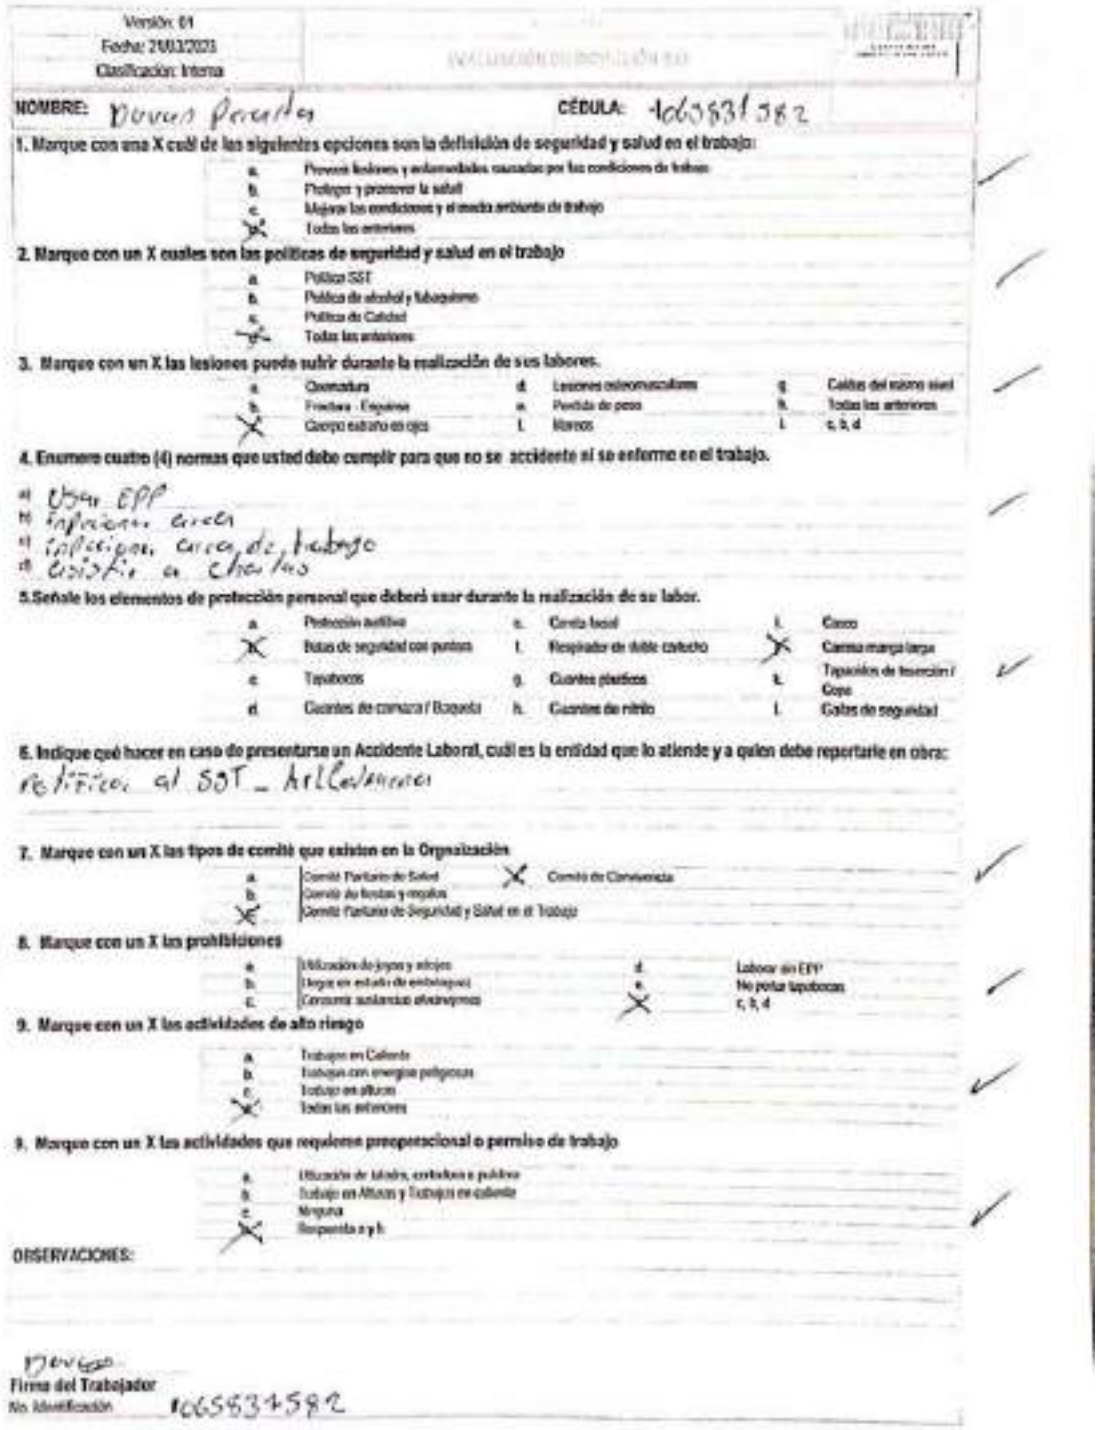

Versión: 01
Fecha: 26/03/2021
Clasificación: Interna

NOMBRE: Devan Peralta CÉDULA: 1065831582

**1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:**

a. Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b. Proteger y promover la salud
c. Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X Todas las anteriores

**2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo**

a. Política SST
b. Política de alcohol y tabaquismo
c. Política de Calidad
X Todas las anteriores

**3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Quemadura | d. | Lesiones osteomusculares | g. | Caídas del mismo nivel |
| b. | Fractura - Esguince | e. | Pérdida de peso | h. | Todas las anteriores |
| X | Cuerpo extraño en ojos | f. | Mareos | i. | c, b, d |

**4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.**

a) Usar EPP
b) Inspección área
c) Inspección área de trabajo
d) Asistir a charlas

**5. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Protección auditiva | e. | Careta facial | i. | Casco |
| X | Botas de seguridad con puntera | f. | Respirador de doble cartucho | X | Camisa manga larga |
| c. | Tapabocas | g. | Guantes plásticos | k. | Tapaoídos de inserción / Copa |
| d. | Guantes de carnaza / Baqueta | h. | Guantes de nitrilo | l. | Gafas de seguridad |

**6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarle en obra:**

Reportar al SST _ ArlSeguridad

**7. Marque con un X los tipos de comité que existen en la Organización**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Comité Paritario de Salud | X | Comité de Convivencia |
| b. | Comité de fiestas y regalos | | |
| X | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | | |

**8. Marque con un X las prohibiciones**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Utilización de joyas y relojes | d. | Laborar sin EPP |
| b. | Llegar en estado de embriaguez | e. | No portar tapabocas |
| c. | Consumir sustancias alucinogenas | X | c, b, d |

**9. Marque con un X las actividades de alto riesgo**

a. Trabajos en Caliente
b. Trabajos con energías peligrosas
c. Trabajo en alturas
X Todas las anteriores

**9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo**

a. Utilización de taladro, cortadora o pulidora
b. Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente
c. Ninguna
X Respuesta a y b

OBSERVACIONES:

Devan
Firma del Trabajador
No. Identificación 1065831582

| Versión: 1.0 | Formato | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES |
|---|---|---|
| Fecha: 21/04/2023 | RECOMENDACIONES MEDICAS OCUPACIONALES | |
| Clasificación: Interna | | |

Valledupar, 15 de Septiembre de 2023

**Señor:** DUVAN ENRIQUE PERALTA PORTO
**Numero D.I. (C.C):** 1065837582
**Cargo:** Ayudante de obra

**Tipo de Examen Médico:** Post incapacidad

A partir de dicho documento en donde se especifican las recomendaciones y restricciones médicas ocupacionales para que usted pueda desarrollar sus labores son:

**Recomendaciones:**

- Higiene postural estilo de vida saludable dieta y ejercicio extremar medida de bioseguridad.
- Pausas activas cada 2 hrs.
- Control por ortopedia control por EPS.

**Restricciones laborales:**

- Evitar subir y bajar escaleras.
- Evitar levantamiento de peso > 5 kg.
- Evitar permanecer mucho tiempo de pie.
- Evitar movimiento repetitivo miembros inferiores.
- Evitar caminar por terrenos irregulares.

Las anteriores recomendaciones y restricciones deben ser aplicadas en su totalidad por su parte, para que sus condiciones de salud mejoren, se le informa la restricción del ingreso al área operativa, solo debe transitar por áreas de oficina.
Es necesario que solicite las citas médicas respectivas con su EPS y mantener informada a la empresa de cualquier evento de salud que presente.
Es necesario que cualquier recomendación médica realizada por su EPS, sea notificada y entregada por escrito a la Residente SST a la mayor brevedad posible.
Si llega a presentar algún tipo de molestia o malestar en su jornada o condición insegura en su puesto de trabajo debe reportarla de manera inmediata a la Residente SST.

Firma
KAREN SOTO
Cargo: Residente SST

Firma del Trabajador
DUVAN ENRIQUE PERALTA PORTO
Cargo: Ayudante de obra

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interno | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia. | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Notificación de Riesgo, Inducción, Política de alcohol y drogas, Reglamento de higiene y SST, Evaluación SST. | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | ✓ | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | | DURACIÓN: | 1 Hora |
| FECHA: | 21-09/2023 | | | LUGAR: | Palacio de Justicia. |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| | José Alberto Gutierrez | 1122396446 | Security force | José Gutierrez |
| | Jeison Andres Charamo | 1065646525 | Security force | Jeison Charamo |
| | Edneider Gutierrez | 77185068 | Security Force | Edneider Gutierrez |

OBSERVACIONES

| Versión:02 | |
|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interna | |

Conforme a lo expuesto yo Eneider Gutierrez, portador de la cedula de ciudadanía 77185068 desempeñando el cargo de Vigilante, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de más funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

**INFORMACION DE RIESGOS**

| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
|---|---|---|
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnes de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Fluido (especie intermitente y continua) | Si usted ingresa a una zona húmeda debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frio) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras Blindaje (plomo)<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |



FORMATO


Versión:02
Fecha: 22/07/2022
Clasificación: Interno

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

| | | |
|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Esnaider Gutierrez

Firma: Esnaider Gutierrez Fecha: 21-09-2023

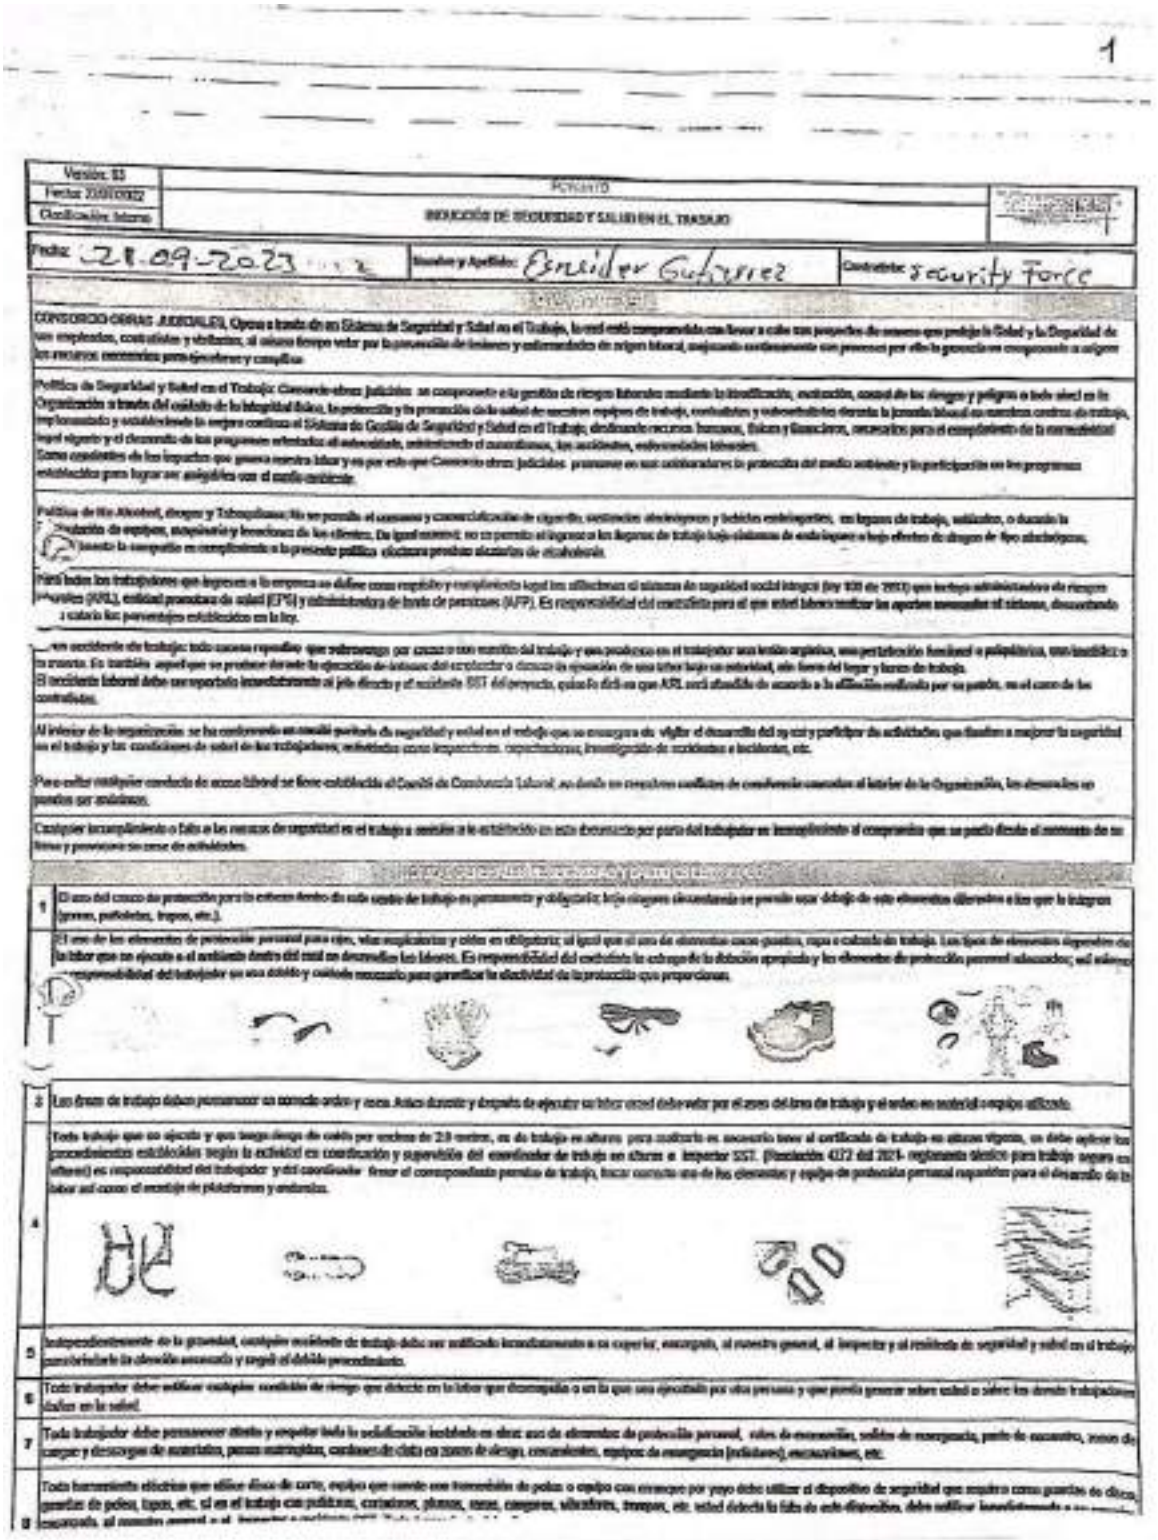

1

Versión: 03
Fecha: 23/01/2022
Clasificación: Interna

INFORME

INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 21-09-2023

Nombre y Apellido: Ernesto Gutierrez

Contratista: Security Force

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, Opera a través de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometida con llevar a cabo sus proyectos de manera que proteja la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, al mismo tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, asignando continuamente los procesos por ello la gerencia se compromete a asignar los recursos necesarios para ejecutarlos y cumplirlos

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete a la gestión de riesgo laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a todo nivel en la Organización a través del cuidado de la integridad física, la protección y la promoción de la salud de nuestros equipos de trabajo, contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementado y estableciendo la mejora continua al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas orientados al autocuidado, ambientales, accidentes, enfermedades laborales.
Como cumplimiento de los impactos que genera nuestra labor y en pro este que Consorcio obras judiciales promueve en sus colaboradores la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias psicotrópicas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, vehículos, o durante la [illegible] de equipos, maquinaria y herramientas de los clientes. De igual manera, no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo efectos de alcohol o bajo efectos de drogas de tipo alucinógenas, [illegible] cumplido en cumplimiento a la presente política estamos prestos a sanciones de alcoholemia.

Para todos los trabajadores que ingresen a la empresa se deben cumplir y cumplimiento legal los afiliaciones al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluye administradora de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que usted labora realizar los aportes mensuales al sistema, descontando el salario los porcentajes establecidos en la ley.

Un accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
El incidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe directo y el residente SST del proyecto, quien lo dirá en que ARL será afiliada de acuerdo a la afiliación realizada por su patrón, no el caso de los contratistas.

Al interior de la organización se ha conformado un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que se encargara de vigilar el desarrollo del sg-sst y participar de actividades que ayuden a mejorar la seguridad en el trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores, estableciendo como inspecciones, capacitaciones, investigación de accidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conducta de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, en donde se resuelven conflictos de convivencia suscitados al interior de la Organización, los denuncias se pueden dar anónimas.

Cualquier incumplimiento o falta a las normas de seguridad en el trabajo o omisión a lo establecido en este documento por parte del trabajador se incumplimiento al compromiso que se pacto desde el momento de su ingreso y provocara las sanas de sanciones.

| | |
|---|---|
| 1 | El uso del casco de protección para la cabeza dentro de este centro de trabajo es permanente y obligatorio, bajo ninguna circunstancia se permite usar debajo de este elementos diferentes a los que la indiquen (gorras, pañoletas, trapos, etc.). |
| | El uso de los elementos de protección personal para ojos, vías respiratorias y oídos es obligatorio, al igual que el uso de elementos como guantes, ropa o calzado de trabajo. Los tipos de elementos dependen de la labor que se ejecute o el ambiente dentro del cual se desarrollan las labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de la dotación apropiada y los elementos de protección personal adecuados; así mismo responsabilidad del trabajador su uso debido y cuidado necesario para garantizar la efectividad de la protección que proporcionan. |
| 3 | Los áreas de trabajo deben permanecer en completo orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor usted debe velar por el aseo del área de trabajo y el orden en material o equipo utilizado. |
| 4 | Todo trabajo que se ejecute y que tenga riesgo de caída por encima de 2.0 metros, en de trabajo en alturas para realizarlo es necesario tener el certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas e inspector SST. (Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas) es responsabilidad del trabajador y del coordinador tener el correspondiente permiso de trabajo, hacer correcto uso de los elementos y equipo de protección personal requeridos para el desarrollo de la labor así como el montaje de plataformas y andamios. |
| 5 | Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior, encargado, al maestro general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para brindarle la atención necesaria y seguir el debido procedimiento. |
| 6 | Todo trabajador debe notificar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeña o en la que una ejecutada por otra persona y que pueda generar sobre salud o sobre los demás trabajadores dañar en la salud. |
| 7 | Todo trabajador debe permanecer atento y enquitar toda la señalización instalada en obra: uso de elementos de protección personal, rutas de evacuación, salidas de emergencia, punto de encuentro, zonas de cargue y descargue de materiales, puntos autorizados, cantidad de ciclos en zonas de riesgo, encerramientos, equipos de emergencia (extintores), excavaciones, etc. |
| 8 | Todo herramienta eléctrica que utilice discos de corte, equipo que cuente con transmisión de poleas o equipo con resorte por yoyo debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiera como guardas de discos, guardas de poleas, topes, etc. si en el trabajo con polichorro, cortadoras, planos, sierras, cinceles, alicates, trompos, etc. usted detecta la falta de este dispositivos, debe notificar inmediatamente a su encargado, al maestro general o al inspector o residente SST. Todo [illegible] |

| | |
|---|---|
| 1 | No se permite el uso de joyas (anillos, pulseras, piercing, cadenas, etc.). Hacer uso de ropa holgada, botas de seguridad, casco, gafas, tapabocas, guantes de nitrilo, protección auditiva, protección solar, overol, chaleco reflectivo, arnés de seguridad, línea de vida, eslinga doble, mosquetones, gancho doble, gancho de seguridad, gancho de seguridad, gancho de seguridad



| Versión: 01 | FORMATO |
|---|---|
| Fecha: 21/02/2023 | EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST |
| Clasificación: Interna | |

NOMBRE: Esneider Gutierrez CÉDULA: 77185068

100/100

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

| | |
|---|---|
| a. | Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo |
| b. | Proteger y promover la salud |
| c. | Mejora las condiciones y el medio ambiente de trabajo |
| X d. | Todas las anteriores |

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

| | |
|---|---|
| a. | Política SST |
| b. | Política de alcohol y tabaquismo |
| c. | Política de Calidad |
| d. Y | Todas las anteriores |

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Quemadura | d. | Lesiones osteomusculares | g. | Caídas del mismo nivel |
| b. | Fracturas - Esguinces | e. | Perdida de pose | h. | Todas las anteriores |
| c. | Cuerpo extraño en ojos | f. | Mareos | i. X | a, b, d |

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) usando los elementos de seguridad
b) Respetando las señales
d) no meterse en Areas no autorizadas
e) no venir Borracho

5.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Protección auditiva | e. | Careta facial | X c. | Casco |
| b. X | Botas de seguridad con puntera | f. | Respirador de doble cartucho | i. X | Gambas manga larga |
| c. | Tapabocas | g. | Guantes plasticos | k. | Tapaoidos de insercion / Copa |
| d. | Guantes de carnaza / Baqueta | h. | Guantes de nitrilo | l. ✓ | Gafas de seguridad |

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarle en obra:

Reportarle al supervisor
Y calla S.S
ARL Colpatria

7. Marque con un X las tipos de comité que existen en la Organización

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Comité Paritario de Salud | X. | Comité de Convivencia |
| b. | Comité de fiestas y regalos | | |
| Y | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | | |

8. Marque con un X las prohibiciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. X | Utilización de joyas y anillos | d. X | Laborar sin EPP |
| b. Y | Llegar en estado de embriaguez | e. | No portar tapaoidos |
| c. Y | Consumir sustancias alucinogenas | i. | c, b, d |

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo

| | |
|---|---|
| Y a. | Trabajos en Caliente |
| Y b. | Trabajos con energías peligrosas |
| Y c. | Trabajo en alturas |
| Y d. | Todas las anteriores |

9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo

| | |
|---|---|
| a. | Utilización de taladro, cortadora o pulidora |
| b. | Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente |
| c. | Ninguna |
| Y d. | Respuesta a y b |

OBSERVACIONES:

Firma del Trabajador
No. Identificación Esneider Gutierrez CC. 77185068 -

| Versión 02 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 23/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de transito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| | Espacios Confinados | |
| Fenómenos naturales | Sismo | Conocer y aplicar el plan de emergencias |
| | Terremoto | |
| | Vendaval | |
| | Inundación | |
| | Derrumbe | |
| | Precipitaciones | |

Nombre: Fabian Corrales

Firma: Fabian Corrales H Fecha: 01-09-2023

| Versión:02 | |
|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interno | |

Conforme a lo expuesto yo, Yeison Andres Chanova Sierra, portador de la cedula de ciudadanía, 1069[illegible], desempeñando el cargo de Vigilante, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contexto de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS

| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
|---|---|---|
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar las correspondientes de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados.<br>Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras de aislamiento (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |



Versión:02
Fecha: 22/07/2022
Clasificación: Interno

FORMATO

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

| | | |
|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización. |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Jerson Andres chaparro Sarmiento

Firma: Jerson Andres chaparro

Fecha: 21/09/2023

2

| Versión: 03 | POLITICA |
|---|---|
| Fecha: 2020/2022 | |
| Clasificación: Interna | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |

Fecha: 21/09/2023 Nombre y Apellidos: Nelson Andres Clavijo Contratista: Security Voice

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, Opera a través de su Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometida con llevar a cabo sus proyectos de manera que proteja la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, el mayor tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, asegurando continuamente sus procesos por ello la garantía se compromete a asignar los recursos necesarios para ejecutarlos y cumplirlos

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete a la gestión de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a toda salud en la Organización a través del cuidado de la integridad física, la protección y la promoción de la salud de nuestros equipos de trabajo, contratistas y colaboradores durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementando y estableciendo la empresa cumplirá el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas orientados al autocuidado, mitigando el ausentismo, los accidentes, enfermedades laborales.
Somos conscientes de los impactos que genera nuestra labor y es por esto que Consorcio obras judiciales promueve en sus colaboradores la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, vehículos, o durante la ejecución de turnos, cumplimiento y funciones de los oficios. De igual manera no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo síntomas de embriaguez o bajo efectos de drogas de tipo alucinógenas. Consorcio cumple en cumplimiento a la presente política aleatorias pruebas de alcoholemia.

Para todos los trabajadores que ingresen a la empresa se define como requisito y cumplimiento legal las afiliaciones al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluye administradora de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que estos labores realizar las afiliaciones mencionadas al sistema, documentado y cubrir los parámetros establecidos en la ley.

Un accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y hora de trabajo.
El accidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe directo y al residente SST del proyecto, quien le dirá en que ARL será atendido de acuerdo a la afiliación realizada por su parte, en el caso de los contratistas.

Al interior de la organización se ha conformado un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que se encargara de vigilar el desarrollo del sg-sst y participar de actividades que tiendan a mejorar la seguridad en el trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores; actividades como inspecciones, capacitaciones, investigación de accidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conducta de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, en donde se resuelven conflictos de convivencia generados al interior de la Organización, los denuncios se reciben por anónimos.

Cualquier incumplimiento o falta a las normas de seguridad en el trabajo o omisión a la utilización de este documento por parte del trabajador se incumplimiento al compromiso que se pacto desde el momento de su firma y generara su causa de actividades.

1 El uso del equipo de protección para la cabeza dentro de este centro de trabajo es permanente y obligatorio bajo ninguna circunstancia se permite usar dotación de este elemento diferentes a los que le brindan (gorras, pañoletas, trapos, etc.).

El uso de los elementos de protección personal para ojos, oídos respiratorios y oídos es obligatorio, al igual que el uso de elementos como guantes, ropa o calzado de trabajo. Los tipos de elementos dependen de la labor que se ejecute o el ambiente donde del cual se desarrollan las labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de la dotación apropiada y los elementos de protección personal adecuados, así mismo responsabilidad del trabajador en uso debido y cuidado necesario para que utilice la efectividad de la protección con proporcionan.



2 Las áreas de trabajo deben permanecer en completo orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor usted debe velar por el aseo del área de trabajo y el orden en material o equipo utilizado.

4 Todo trabajo que se ejecute y que tenga riesgo de caída por encima de 1.8 metros, en de trabajo en alturas para realizarlo es necesario tener el certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas e inspector SST. (Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas) es responsabilidad del trabajador y del coordinador llenar el correspondiente permiso de trabajo, hacer entrega uso de los elementos y equipos de protección personal requeridos para el desarrollo de la labor así como el montaje de plataformas y andamios.




5 Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior, encargado, al maestro general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para suministrarle la atención necesaria y seguir el debido procedimiento.

6 Todo trabajador debe notificar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeñe o en la que sea ejecutada por otra persona y que pueda generar sobre salud o sobre los demás trabajadores dañar en la salud.

7 Todo trabajador debe permanecer atento y cumplir todo lo establecido instituido en cinco: uso de elementos de protección personal, rutas de evacuación, salidas de emergencia, punto de encuentro, zonas de cargue y descargue de materiales, zonas restringidas, condiciones de riesgo en zonas de riesgo, contratistas, equipos de emergencia (señaleros), encuentros, etc.

8 Todo herramienta eléctrica que utilice disco de corte, equipo que cuente con transmisión de poleas o equipo con arranque por jalar debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiera como guardas de disco, guardas de poleas, bandas, etc. si en el trabajo con pulidoras, cortadoras, planas, manos, cinceles, alicates, tenazas, etc usted observa la falta de este dispositivo, debe notificar inmediatamente a su encargado, al maestro general o al [illegible]

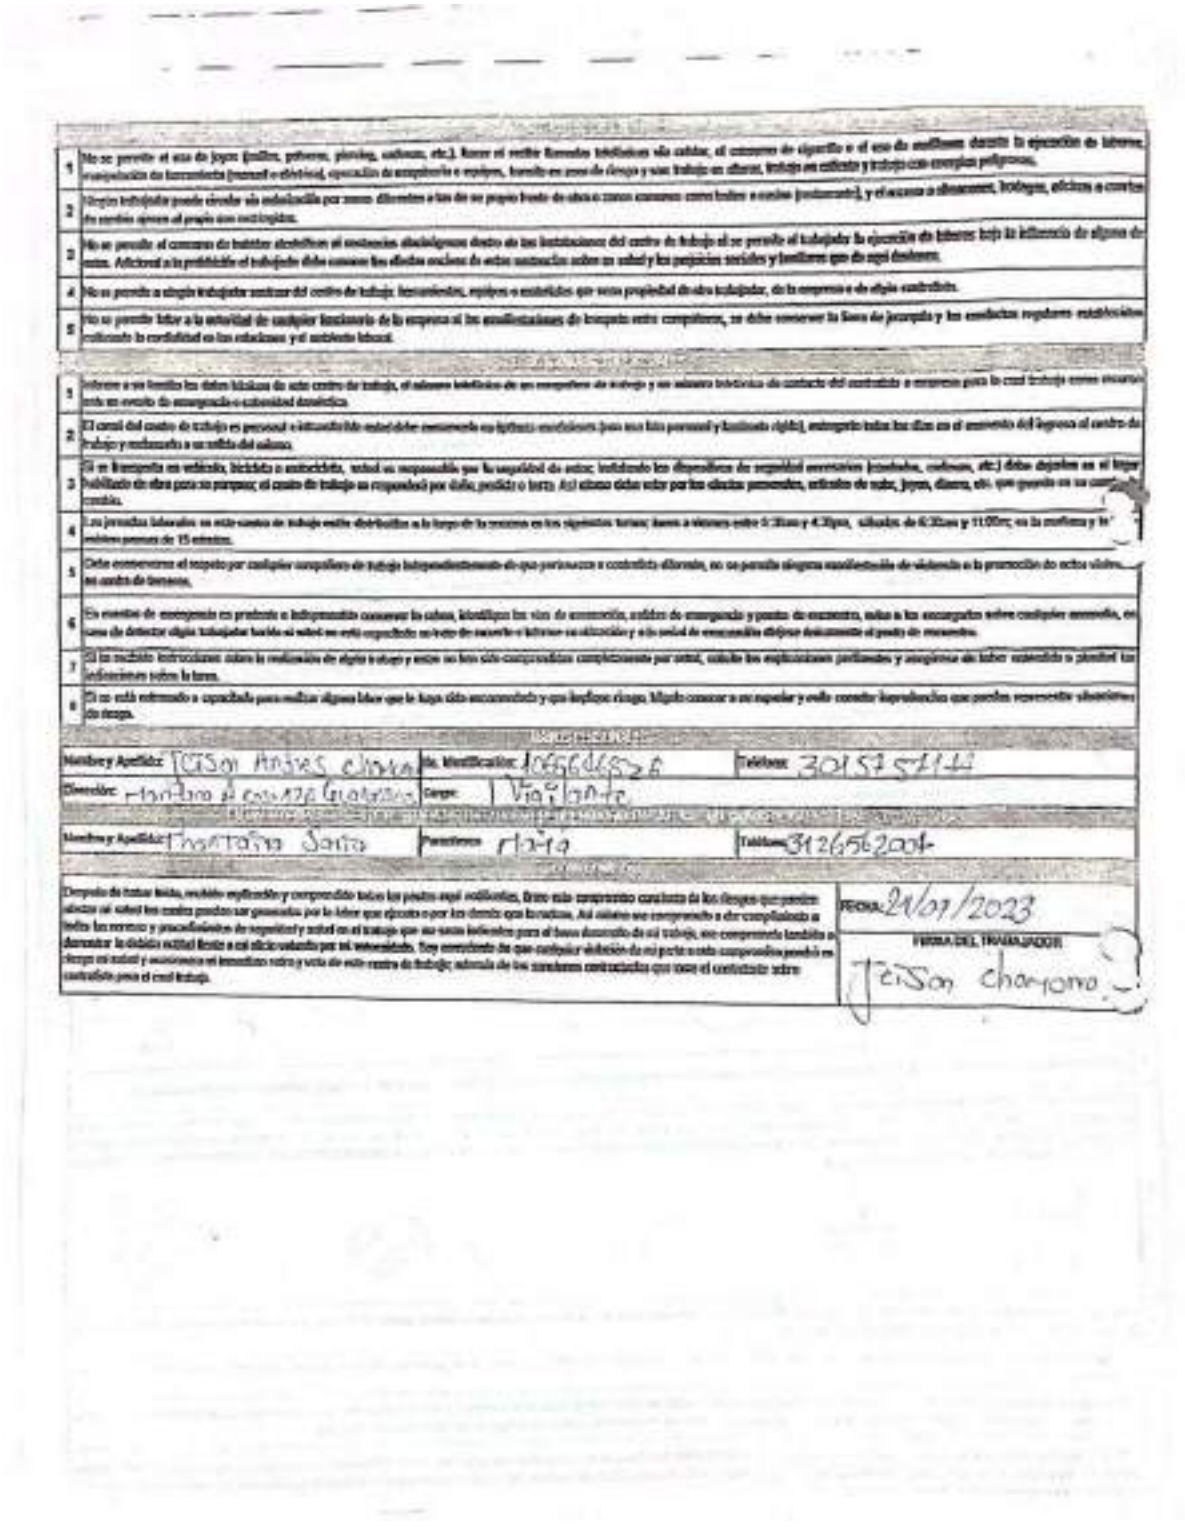

| | |
|---|---|
| 1 | No se permite el uso de joyas (anillos, pulseras, piercing, cadenas, etc.). Hacer el verificar llamadas telefónicas vía celular, el consumo de cigarrillo o el uso de audífonos durante la ejecución de labores, manipulación de herramienta (manual o eléctrica), operación de equipos/vehículos o equipos, durante las zonas de riesgo y vías trabajo en alturas, trabajos en caliente y trabajos con energías peligrosas. |
| 2 | Ningún trabajador puede circular sin autorización por zonas diferentes a las de su propio frente de obra o zonas comunes como baños o cocina (restaurante), y el acceso a almacenes, bodegas, oficinas o cuartos de control sin el propio son restringidos. |
| 3 | No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni sustancias alucinógenas dentro de las instalaciones del centro de trabajo ni se permite al trabajador la ejecución de labores bajo la influencia de alguna de estas. Adicional a la prohibición el trabajador debe conocer los efectos nocivos de estas sustancias sobre su salud y los perjuicios sociales y familiares que de aquí devienen. |
| 4 | No se permite a ningún trabajador sustraer del centro de trabajo herramientas, equipos o materiales que sean propiedad de otro trabajador, de la empresa o de algún contratista. |
| 5 | No se permite faltar a la autoridad de cualquier funcionario de la empresa ni las manifestaciones de irrespeto entre compañeros, se debe conservar la línea de jerarquía y las conductas requieren establecidas cultivando la cordialidad en las relaciones y el ambiente laboral. |
| 1 | Informar a mi familia los datos básicos de este centro de trabajo, el número telefónico de mi compañero de trabajo y mi número telefónico de contacto del contratista o empresa para la cual trabajo como encargado en caso de emergencia o calamidad doméstica. |
| 2 | El canal del centro de trabajo es personal e intransferible salud debe conservarlo en óptimas condiciones (uso mis botas personal y limpiarlo diario), entregarlo todos los días en el momento del ingreso al centro de trabajo y reclamarlo a mi salida del mismo. |
| 3 | Si me transporto en motocicleta, bicicleta o automóvil, salud es responsable que los seguridad de estos; implementos de seguridad necesarios (casco, cadenas, etc.) debo dejarlos en el lugar habilitado de obra para tal propósito; el centro de trabajo no responderá por daño, pérdida o hurto. Así mismo debo estar portar los placas personales, artículos de valor, joyas, dinero, etc. que guarde en mi compañero contrato. |
| 4 | Las jornadas laborales en este centro de trabajo están distribuidas a la largo de la semana en los siguientes horas; hasta a viernes entre 5:30am y 4:30pm, sábados de 6:30am y 11:00m; en la mañana y la tarde existen pausas de 15 minutos. |
| 5 | Debo conservarme el respeto por cualquier compañero de trabajo independientemente de que pertenezca a contratista diferente, no se permite ninguna manifestación de violencia o la promoción de actos violentos en centro de labranza. |
| 6 | En eventos de emergencia en primeros o indispensable conservar la calma, identificar las vías de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, estar a las encargados sobre cualquier anomalía, en caso de detectar algún trabajador herido en salud en este capacitado en este de socorro e informar en ubicación y a la salud de emergencias dirigirse inmediatamente al punto de encuentro. |
| 7 | Si las recibido instrucciones sobre la realización de algún trabajo y estas no han sido comprendidas completamente por salud, solicito las explicaciones pertinentes y asegúrese de haber entendido a plenitud las indicaciones sobre la tarea. |
| 8 | Si no estoy informado o capacitado para realizar alguna labor que le haya sido encomendada y que implique riesgo, debo comunicar a mi superior y evitar cometer imprudencias que pueden ocasionarle situaciones de riesgo. |


| | | |
|---|---|---|
| Nombre y Apellido: Teison Andres Chamorro | No. Identificación: 1065615526 | Teléfono: 3015757144 |
| Dirección: Frente al colegio Gimnasio | Cargo: Vigilante | |
| Nombre y Apellido: Tomasina Santa | Parentesco: mama | Teléfono: 3126562004 |

Después de haber leído, recibido explicación y comprendido todos los puntos aquí señalados, Estoy más comprometo conscientes de los riesgos que pueden afectar mi salud los cuales pueden ser generados por la labor que ejecuto o por los demás que laboran. Así mismo me comprometo a dar cumplimiento a todas las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que me sean indicados para el buen desarrollo de mi trabajo, me comprometo también a denunciar la violación notificar frente a mi oficio cualquier por mi seguridad. Soy consciente de que cualquier violación de mi parte a este compromiso pondrá en riesgo mi salud y seguridad mi bienestar como y vida de este centro de trabajo; además de las sanciones contractuales que tiene el contratista sobre contratista para el cual trabajo.

FECHA: 24/07/2023

FIRMA DEL TRABAJADOR

Teison Chamorro

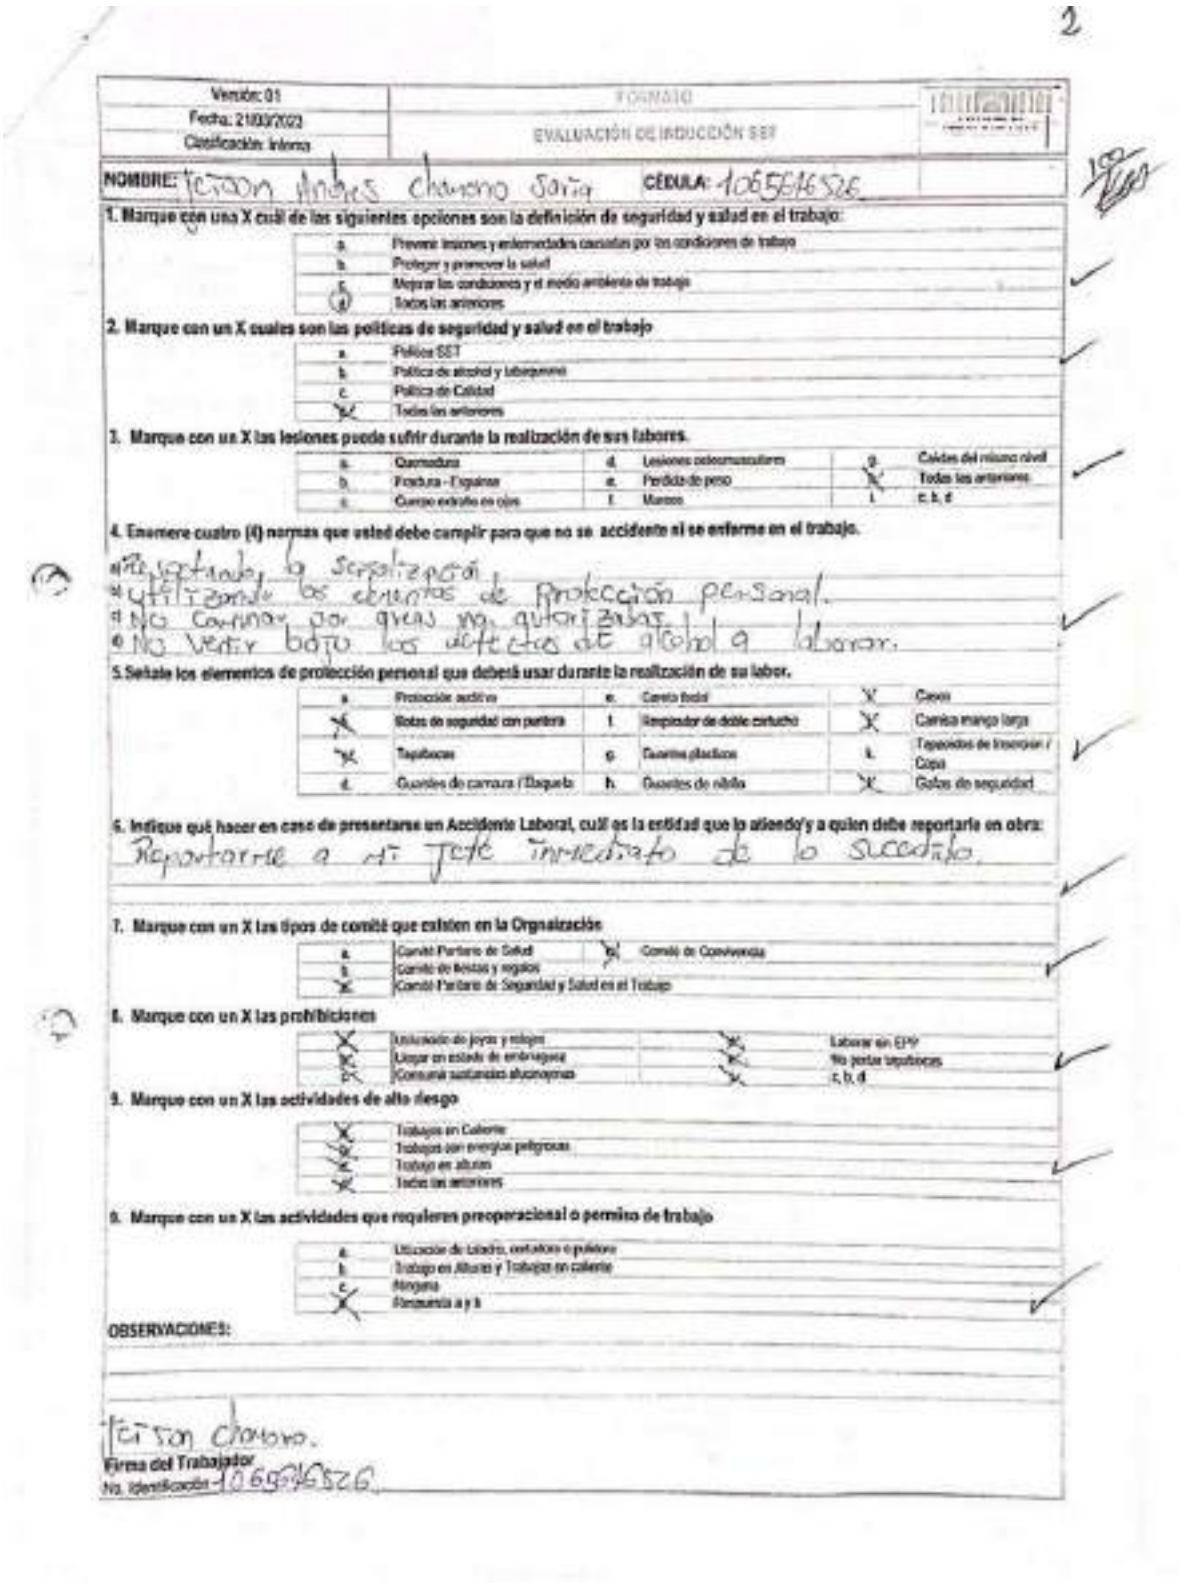

2

| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 21/03/2023 | EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST | |
| Clasificación: Interna | | |

NOMBRE: Teison Andres Chamorro Soria CÉDULA: 1065846526

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

| | |
|---|---|
| a. | Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo |
| b. | Proteger y preservar la salud |
| c. | Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo |
| (d) | Todas las anteriores |

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

| | |
|---|---|
| a. | Política SST |
| b. | Política de alcohol y tabaquismo |
| c. | Política de Calidad |
| X | Todas las anteriores |

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Quemadura | d. | Lesiones osteomusculares | g. | Caídas del mismo nivel |
| b. | Fractura - Esguinse | e. | Perdida de peso | X | Todas las anteriores |
| c. | Cuerpo extraño en ojos | f. | Mareos | i. | a, b, d |

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) Respetando la Señalización.
b) Utilizando los elementos de Protección personal.
c) No Caminar por áreas no autorizadas.
d) No Verter bajo los efectos del alcohol a laborar.

5. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Protección auditiva | e. | Careta facial | X | Casco |
| X | Botas de seguridad con puntera | f. | Respirador de doble cartucho | X | Camisa manga larga |
| X | Tapabocas | g. | Guantes plásticos | k. | Tapaoidos de inserción / Copa |
| d. | Guantes de carnaza / Baquela | h. | Guantes de nitrilo | X | Gafas de seguridad |

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarle en obra:

Reportarme a mi Jefe Inmediato de lo sucedido.

7. Marque con un X los tipos de comité que existen en la Organización

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Comité Paritario de Salud | X | Comité de Convivencia |
| b. | Comité de fiestas y regalos | | |
| X | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | | |

8. Marque con un X las prohibiciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Utilización de joyas y relojes | X | Laborar sin EPP |
| X | Llegar en estado de embriaguez | X | No portar tapabocas |
| X | Consumir sustancias alucinogenas | X | c, b, d |

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo

| | |
|---|---|
| X | Trabajos en Caliente |
| X | Trabajos con energías peligrosas |
| X | Trabajo en alturas |
| X | Todas las anteriores |

9. Marque con un X las actividades que requieren precperacional o permiso de trabajo

| | |
|---|---|
| a. | Utilización de taladro, esmeriles o pulidora |
| b. | Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente |
| c. | Ninguna |
| X | Ninguna a y b |

OBSERVACIONES:

Teison Chamorro.
Firma del Trabajador
No. Identificación 1065846526

3

| Versión:02 | |
|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interna | |

Conforme a lo expuesto yo, Jose Alberto Gutierrez Gualdrón, portador de la cedula de 1122.396.146 ciudadanía 1122.396.146 desempeñando el cargo de Vigilante, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACIÓN DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar las correspondientes de vacunación. Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Rickettsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | El aseo ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Mantener siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras Aislantes (plomo)<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión:02<br>Fecha: 22/07/2022<br>Clasificación: Interna | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfaze persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de sección de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: jose alberto Cabrera Santiago.

Firma: [signature] Fecha: 21/09/23

3

| Versión: 03 | |
|---|---|
| Fecha: 20/01/2022 | INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| Clasificación: Interna | |

Fecha: 21/09/23 | Nombre y Apellido: Jose Alberto Gutierrez | Contratista: Security force

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES: Opera a través de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometida con llevar a cabo sus proyectos de manera que proteja la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, al mismo tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, mejorando continuamente sus procesos por ello la gerencia se compromete a asignar los recursos necesarios para ejecutarse y cumplirse

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete a la gestión de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a todo nivel en la Organización a través del cuidado de la integridad física, la protección y la promoción de la salud de nuestros equipos de trabajo, contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementando y estableciendo la mejora continua el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas orientados al autocuidado, mantenimiento preventivo, los accidentes, enfermedades laborales.
Somos conscientes de los impactos que genera nuestra labor y es por esto que Consorcio obras judiciales promueve en sus colaboradores la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, vehículos, o durante la [illegible] de equipos, maquinaria y locaciones de los clientes. De igual manera no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo sistemas de embriaguez o bajo efectos de drogas de tipo alucinógeno, nuestra compañía en cumplimiento a la presente política efectuara pruebas aleatorias de alcoholemia.

Para todos los trabajadores que ingresen a la empresa se define como requisito y cumplimiento legal los afiliaciones al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluyen administradora de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que usted labora realizar los aportes mensuales al sistema, descontando y cubriendo los porcentajes establecidos en la ley.


Un accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
El accidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe directo y al residente SST del proyecto, quien le dirá en que ARL será afiliado de acuerdo a la afiliación realizada por su patrón, en el caso de los contratistas.

Al interior de la organización se ha conformado un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que se encargara de vigilar el desarrollo del sgsst y participar de actividades que busquen mejorar la seguridad en el trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores; actividades como inspecciones, capacitaciones, investigación de accidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conducta de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, en donde se resuelven conflictos de convivencia suscitados al interior de la Organización, los denuncios se pueden ser anónimos.

Cualquier incumplimiento o falta a las normas de seguridad en el trabajo o omisión a lo establecido en este documento por parte del trabajador en incumplimiento al compromiso que se pacto desde el momento de su firma y proveerse en caso de actividades.

| | |
|---|---|
| 1 | El uso del casco de protección para la cabeza dentro de este centro de trabajo es permanente y obligatorio; bajo ninguna circunstancia se permite usar debajo de este elementos diferentes a los que la integren (gorras, pañoletas, trapos, etc.). |
| 2 | El uso de los elementos de protección personal para ojos, vías respiratorias y oídos es obligatorio; al igual que el uso de elementos como guantes, ropa o calzado de trabajo. Los tipos de elementos dependen de la labor que se ejecute y el ambiente dentro del cual se desarrolla las labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de la dotación apropiada y los elementos de protección personal adecuados; así mismo es responsabilidad del trabajador su uso debido y cuidado necesario para garantizar la efectividad de la protección que proporcionan.  |
| 3 | Los áreas de trabajo deben permanecer en correcto orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor usted debe velar por el aseo del área de trabajo y el orden en material o equipo utilizado. |
| 4 | Todo trabajo que se ejecute y que tenga riesgo de caída por encima de 1.8 metros, en su trabajo en alturas para realizarlo es necesario tener el certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas e inspector SST. [Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas] es responsabilidad del trabajador y del coordinador tener el correspondiente permiso de trabajo, hacer correcto uso de los elementos y equipo de protección personal requeridos para el desarrollo de la labor así como el montaje de plataformas y andamios.  |
| 5 | Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior, encargado, al maestro general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para brindarle la atención necesaria y seguir el debido procedimiento. |
| 6 | Todo trabajador debe notificar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeña o en la que sea ejecutada por otro personal y que pueda generar sobre salud o sobre los demás trabajadores daños en la salud. |
| 7 | Todo trabajador debe permanecer atento y respetar toda la señalización instalada en obra; uso de elementos de protección personal, rutas de evacuación, salidas de emergencia, punto de encuentro, zonas de cargue y descargue de materiales, pasos restringidos, cordones de cinta en zonas de riesgo, cerramientos, equipos de emergencia (extintores), excavaciones, etc. |
| 8 | Toda herramienta eléctrica que utilice discos de corte, equipo que cuente con transmisión de poleas o equipo con accesorios por pegue debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiera como guardas de discos, guardas de poleas, topes, etc. si en el trabajo con pulidoras, cortadoras, planeas, rotos, cinceles, vibradores, taladros, etc. usted detecta la falla de este dispositivo, debe notificar inmediatamente a su encargado, al maestro general o al [illegible] |

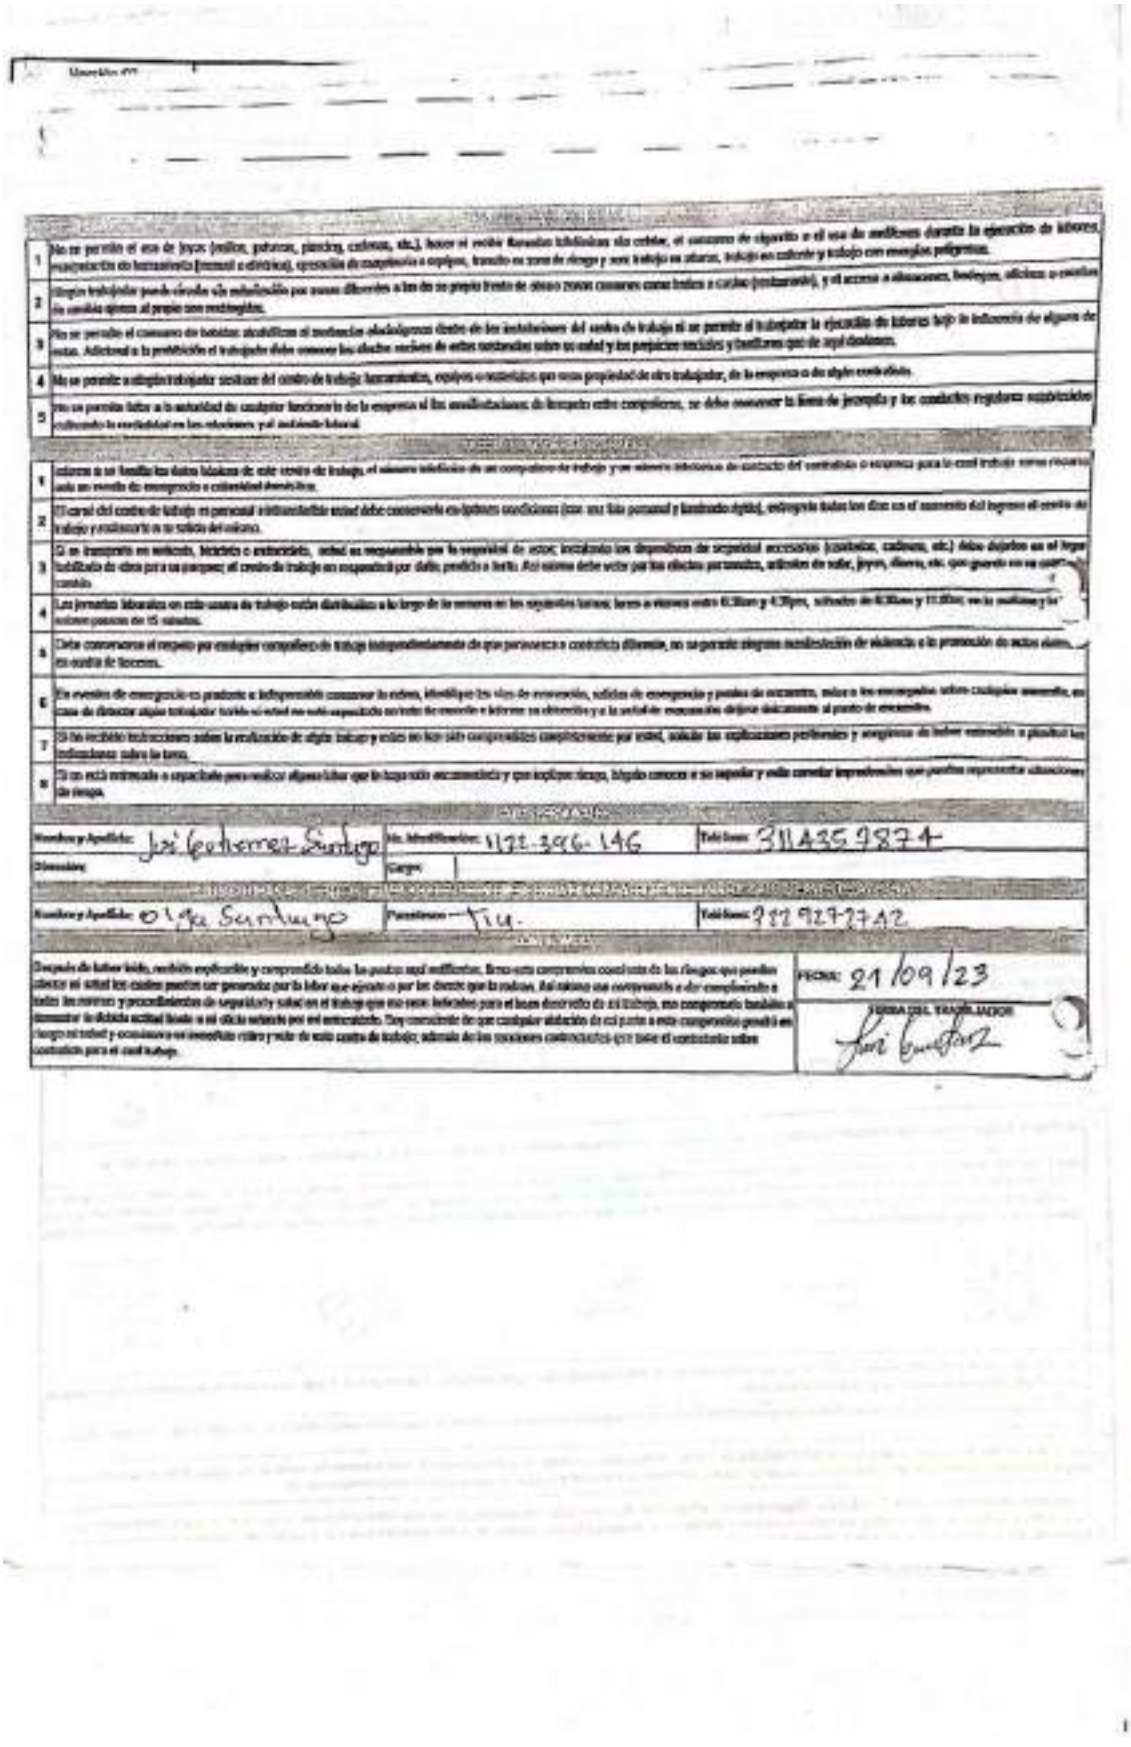

| | |
|---|---|
| 1 | No se permite el uso de joyas (anillos, pulseras, pinchos, cadenas, etc.), hacer el recibo llamadas telefónicas sin cobro, el consumo de cigarrillo o el uso de audífonos durante la ejecución de labores, manipulación de herramienta (manual o eléctrica), operación de maquinaria o equipos, tránsito en zonas de riesgo y sobre trabajos en alturas, trabajo en caliente y trabajo con energías peligrosas. |
| 2 | Ningún trabajador puede circular sin autorización por zonas diferentes a las de su propio frente de trabajo zonas comunes como baños o cocina (restaurante), y el acceso a almacenes, bodegas, oficinas o cuartos de control ajenos al propio sin restricción. |
| 3 | No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni sustancias alucinógenas dentro de las instalaciones del centro de trabajo ni se permite el trabajador la ejecución de labores bajo la influencia de alguna de estas. Adicional a la prohibición el trabajador debe conocer los efectos nocivos de estas sustancias sobre su salud y los perjuicios sociales y familiares que de aquí devienen. |
| 4 | No se permite a ningún trabajador sustraer del centro de trabajo herramientas, equipos o materiales que sean propiedad de otro trabajador, de la empresa o de algún contratista. |
| 5 | No se permite faltar a la moralidad de cualquier funcionario de la empresa ni los contratistas, de llegarse estos comportarse, se debe comunicar la línea de denuncia y las conductas reguladas sancionables realizando la verificación en los reglamentos y el contrato laboral. |

| | |
|---|---|
| 1 | Informar a su familia los datos básicos de este centro de trabajo, el número telefónico de un compañero de trabajo y con número telefónico de contacto del contratista o empresa para lo cual trabaja como reporte caso un evento de emergencia o calamidad doméstica. |
| 2 | El canal del centro de trabajo es personal e intransferible usted debe conservarlo en óptimas condiciones (use una bolsa personal y plastificado rígido), entregarlo todos los días en el momento del ingreso al centro de trabajo y reintegrarlo a su salida del mismo. |
| 3 | Si se transporta en motocicleta, bicicleta o automóvil, usted es responsable que la empresa le entregue los dispositivos de seguridad accesorios (cascos, cadenas, etc.) debe dejarlos en el lugar habilitado de obra para su parqueo; el centro de trabajo no responderá por daño, pérdida o hurto. Así mismo debe velar por los efectos personales, utilizados de valor, joyas, dinero, etc. que guarde en su casillero o candado. |
| 4 | Las jornadas laborales en este centro de trabajo están distribuidas a lo largo de las semanas en las siguientes horas; horas a viernes entre 6:30am y 4:30pm, sábados de 8:30am y 11:30m; en la mañana y los mismos poseen de 15 minutos. |
| 5 | Debe conservar el respeto por trabajador compañero de trabajo independientemente de que pertenezca a contratista diferente, no se permite ningún tipo de manipulación de evidencia o la promoción de actos dentro, en contra de terceros. |
| 6 | En eventos de emergencia es prudente e indispensable conocer la salida, identificar los sitios de evacuación, señales de emergencia y puntos de encuentro, saber a los encargados sobre circulación asignada, en caso de detectar algún trabajador herido o enfermo no debe movilizarlo ni retirar su elemento y a la salida de emergencia dirigirse inmediatamente al punto de encuentro. |
| 7 | Si ha recibido instrucciones sobre la realización de algún trabajo y estas no han sido comprendidas completamente por usted, solicite las explicaciones pertinentes y asegúrese de haber entendido a plenitud las indicaciones sobre la tarea. |
| 8 | Si no está entrenado o capacitado para realizar alguna labor que le haya sido encomendada y que explique riesgo, ningún conozca o no sepa usar y evite cometer improvisaciones que puedan representar situaciones de riesgo. |

| | | |
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: José Gustavo Santiago | No. Identificación: 1122-396-146 | Teléfono: 3114359874 |
| Dirección: | Cargo: | |
| Nombres y Apellidos: Olga Santiago | Parentesco: Tía. | Teléfono: 317 927 77 42 |

Después de haber leído, recibido explicación y comprendido todos los puntos aquí establecidos. Firmo este compromiso consciente de los riesgos que pueden ocurrir en salud los cuales pueden ser generados por la labor que ejecuto o por los demás que la realicen. Así mismo me comprometo a dar cumplimiento a todos los reglamentos y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que me sean indicados para el buen desarrollo de mi labor, me comprometo también a reportar la debida actitud hacia mi salud y la de mis compañeros. Soy consciente de que cualquier violación de mi parte a este compromiso generará un riesgo mi salud y ocasionará un incumplimiento grave y motivo de este centro de trabajo, además de las sanciones contractuales que tiene el contratista sobre contratista para el cual trabaja.

FECHA: 21/09/23

FIRMA DEL TRABAJADOR

José Gustavo

3

| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 21/03/2023 | EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST | |
| Clasificación: Interna | | |

NOMBRE: Jose Alberto Fuderner Cortazo CÉDULA: 1.123.96.146

10 Vale

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

| | |
|---|---|
| a. | Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo |
| b. | Proteger y promover la salud |
| c. | Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo |
| X | Todas las anteriores |

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

| | |
|---|---|
| a. | Política SST |
| b. | Política de alcohol y tabaquismo |
| c. | Política de Calidad |
| X | Todas las anteriores |

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Quemaduras | d. | Lesiones osteomusculares | g. | Caídas del mismo nivel |
| b. | Fractura - Esguince | e. | Pérdida de peso | h. | Todas las anteriores |
| c. | Cuerpo extraño en ojos | f. | Mareos | X | a, b, d |

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

1) No trabajar en Pareo no autorizados
2) respetar las Señalizacion
3) No ingerir bajo el efecto del alcohol.
4) Utilizando los elementos de protección

5. Señalo los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Protección auditiva | e. | Careta facial | i. | Casco |
| X | Botas de seguridad con puntera | f. | Respirador de doble cartucho | X | Camisa manga larga |
| X | Tapabocas | g. | Guantes plastizos | k. | Repuestos de inserción / Copa |
| d. | Guantes de carnaza / Baquela | h. | Guantes de nitrilo | X | Gafas de seguridad |

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarle en obra:

Comunicar a nuestro Superior del Cargo, indicandole los Sucesos Capataz

7. Marque con un X las tipos de comité que existen en la Organización

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | a. Comité Paritario de Salud | X | Comité de Convivencia |
| | b. Comité de fiestas y eventos | | |
| X | c. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | | |

8. Marque con un X las prohibiciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | a. | Utilización de joyas y relojes | d. | X | Laborar sin EPP |
| X | b. | Llegar en estado de embriaguez | e. | X | No portar tapabocas |
| X | c. | Consumir sustancias alucinógenas | f. | X | c, b, d |

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo

| | | |
|---|---|---|
| | a. | Trabajos en Caliente |
| | b. | Trabajos con energías peligrosas |
| | c. | Trabajo en alturas |
| X | d. | Todas las anteriores |

9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo

| | | |
|---|---|---|
| X | a. | Utilización de taladro, contadora o polidora |
| X | b. | Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente |
| | c. | Ninguna |
| | d. | Respuesta a y b |

OBSERVACIONES:

Firma del Trabajador

No Identificación 1123 396 146

1

| Versión: 03 | INFORME | |
|---|---|---|
| Fecha: 27/07/2022 | INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |
| Clasificación: Interna | | |

Fecha: 01-09-2023 Nombre y Apellido: Fabio Carvajal H Contratista: security ltda

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, Opera a través de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometido con llevar a cabo sus proyectos de manera que proteja la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, al mismo tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, mejorando continuamente sus procesos por ello la gerencia se compromete a asignar los recursos necesarios para ejecutarlos y cumplirlos

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete a la gestión de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a todo nivel en la Organización a través del cuidado de la integridad física, la protección y la promoción de la salud de nuestros equipos de trabajo, contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementando y estableciendo la mejora continua al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas orientados al autocuidado, estableciendo el reconocimiento, las accidentes, enfermedades laborales.
Somos conscientes de los impactos que genera nuestra labor y es por esto que Consorcio obras judiciales promueve en sus colaboradores la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, vehículos, o durante la [illegible] de equipos, maquinaria y locaciones de los clientes. De igual manera, no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo síntomas de embriaguez o bajo efectos de drogas de tipo alucinógenas, siendo la compañía en cumplimiento a la presente política efectuara pruebas aleatorias de alcoholemia.

Para todos los trabajadores que ingresen a la empresa se deben cumplir y cumplimiento legal los afiliaciones al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluyen administradora de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que usted labora realizar las aportes mensuales al sistema, descontando a solicitar los porcentajes establecidos en la ley.

Un accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
El accidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe directo y al asistente SST del proyecto, quien le dirá en que ARL está afiliado de acuerdo a la afiliación realizada por su patrón, en el caso de los contratistas.

Al interior de la organización se ha conformado un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que se encargara de vigilar el desarrollo del mismo y participar de actividades que buscan mejorar la seguridad en el trabajo y los condiciones de salud de los trabajadores; actividades como inspecciones, capacitaciones, investigación de accidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conducta de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, en donde se conocerán conflictos de convivencia suscitados al interior de la Organización, las denuncias se pueden dar anónimas.

Cualquier incumplimiento o falla a las normas de seguridad en el trabajo a omisión a la solidaridad en esta dimensión por parte del trabajador es incumplimiento al compromiso que se pacto desde el momento de su firma y proseguirá en caso de actividades.

1 El uso del casco de protección para la cabeza dentro de todo centro de trabajo es permanente y obligatorio hasta ninguna circunstancia se permite usar debajo de este elementos diferentes a los que lo integran (gorras, pañoletas, trapos, etc.).

2 El uso de los elementos de protección personal para ojos, oídos respiratorios y oídos es obligatorio; al igual que el uso de elementos como guantes, ropa o calzado de trabajo. Los tipos de elementos dependen de la labor que se ejecute o el ambiente dentro del cual se desarrollan las labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de la dotación completa y los elementos de protección personal adecuados; así mismo responsabilidad del trabajador su uso adecuado y cuidado necesario para garantizar la efectividad de la protección con proporcionan.



3 Los áreas de trabajo deben permanecer en correcto orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor usted debe velar por el aseo del lugar de trabajo y el orden en materiales o equipos utilizados.

4 Todo trabajo que se ejecute y que tenga riesgo de caída por encima de 1.5 metros, en de trabajo en altura para realizarlo es necesario tener el certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas e inspector SST. (Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas) es responsabilidad del trabajador y del coordinador llevar al correspondiente permiso de trabajo, hacer correcto uso de los elementos y equipos de protección personal suministrados para el desarrollo de la labor así como el montaje de plataformas y andamios.




5 Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior, encargado, al maestro general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para brindarle la atención necesaria y seguir el debido procedimiento.

6 Todo trabajador debe notificar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeña o en la que sea ejecutado por otra persona y que pueda generar algún salud o sobre los demás trabajadores cercanos en la salud.

7 Todo trabajador debe permanecer atento y respetar todo la señalización instalada en obra: uso de elementos de protección personal, rutas de evacuación, salidas de emergencia, punto de encuentro, zonas de cargue y descargue de materiales, pasos restringidos, cordones de vida en zonas de riesgo, cerramientos, equipos de emergencia (extintores), escaleras, etc.

8 Toda herramienta eléctrica que utilice discos de corte, equipo que cuente con accesibilidad de polea o equipo con accesorios por ello debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiere como guardas de discos, guardas de poleas, topes, etc. si en el trabajo con poleadoras, cortadoras, planas, sierra, sierpres, vibradores, trompos, etc. usted detecta la falta de este dispositivo, debe realizar [illegible] al supervisor inmediato.

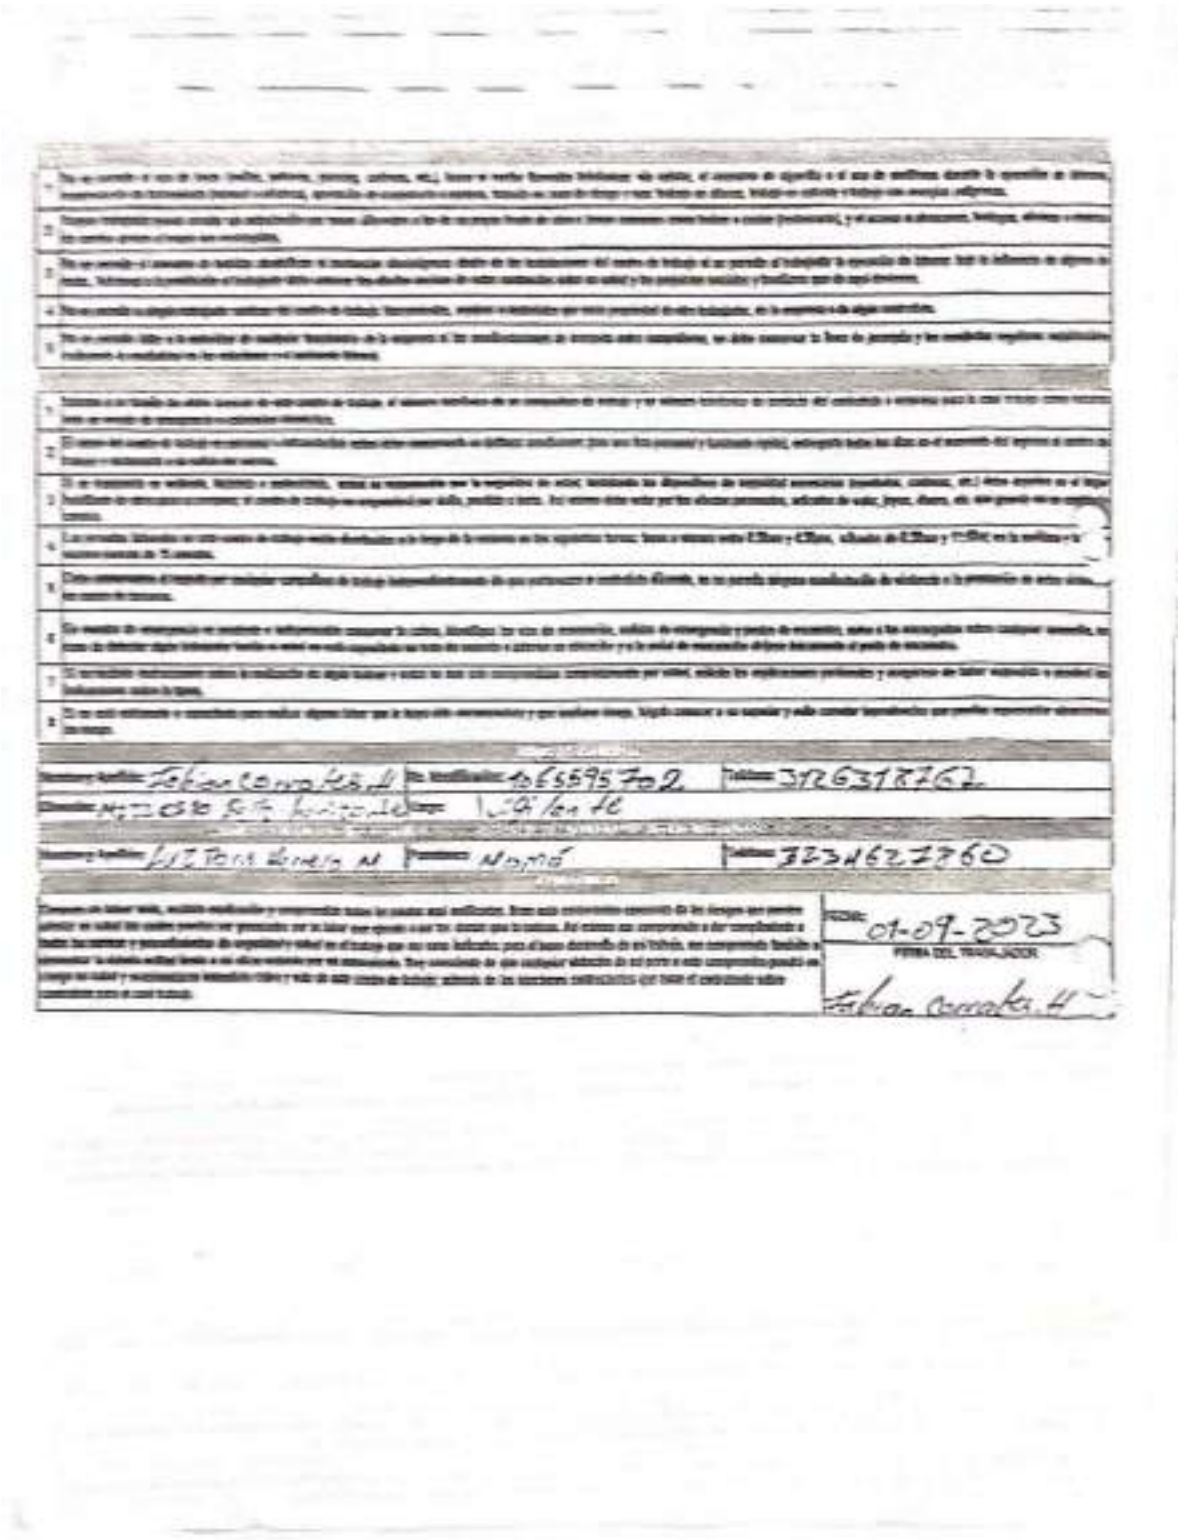

1

Versión: 01
Fecha: 21/03/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST

NOMBRE: Fabian Corrales Herrera CÉDULA: 1065595702

**1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:**

| | | |
|---|---|---|
| a. | Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo | ✓ |
| b. | Proteger y promover la salud | |
| c. | Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo | |
| X | Todas las anteriores | |

**2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo**

| | | |
|---|---|---|
| a. | Política SST | |
| b. | Política de alcohol y tabaquismo | ✓ |
| c. | Política de Calidad | |
| X | Todas las anteriores | |

**3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Quemadura | X | Lesiones osteomusculares | X | Caídas del mismo nivel |
| X | Fractura - Esguinse | e. | Perdida de peso | h. | Todas las anteriores |
| X | Cuerpo extraño en ojos | X | Mareos | i. | c, b, d |

**4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.**

a) Uso de EPP
b) Inspeccion de elementos de trabajo
c) Acatar la capacitaciones
d) Inspeccionar el area de trabajo

**5.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | Protección auditiva | e. | Careta facial | X | Casco |
| X | Botas de seguridad con puntera | f. | Respirador de doble cartucho | X | Camisa manga larga |
| X | Tapabocas | g. | Guantes plásticos | k. | Tapaoidos de inserción / Copa |
| d. | Guantes de carnaza / Reciaeta | h. | Guantes de nitrilo | X | Gafas de seguridad |

**6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarlo en obra:**

Notificar al SST - Ir de inmediato - Colpatria

**7. Marque con un X los tipos de comité que existen en la Organización**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Comité Paritario de Salud | X | Comité de Convivencia |
| b. | Comité de tiendas y regalos | | |
| X | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | | |

**8. Marque con un X las prohibiciones**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Utilización de joyas y relojes | d. | Laborar sin EPP |
| b. | Llegar en estado de embriaguez | e. | No portar tapabocas |
| c. | Consumir sustancias alucinogenas | X | c, b, d |

**9. Marque con un X las actividades de alto riesgo**


| | |
|---|---|
| a. | Trabajos en Caliente |
| b. | Trabajos con energias peligrosas |
| c. | Trabajo en alturas |
| X | Todas las anteriores |

**9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo**

| | |
|---|---|
| a. | Utilización de taladro, cortadora o pulidora |
| b. | Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente |
| c. | Ninguna |
| X | Respuesta a y b |

**OBSERVACIONES:**

Fabian Corrales
Firma del Trabajador
No. Identificación 1065595702

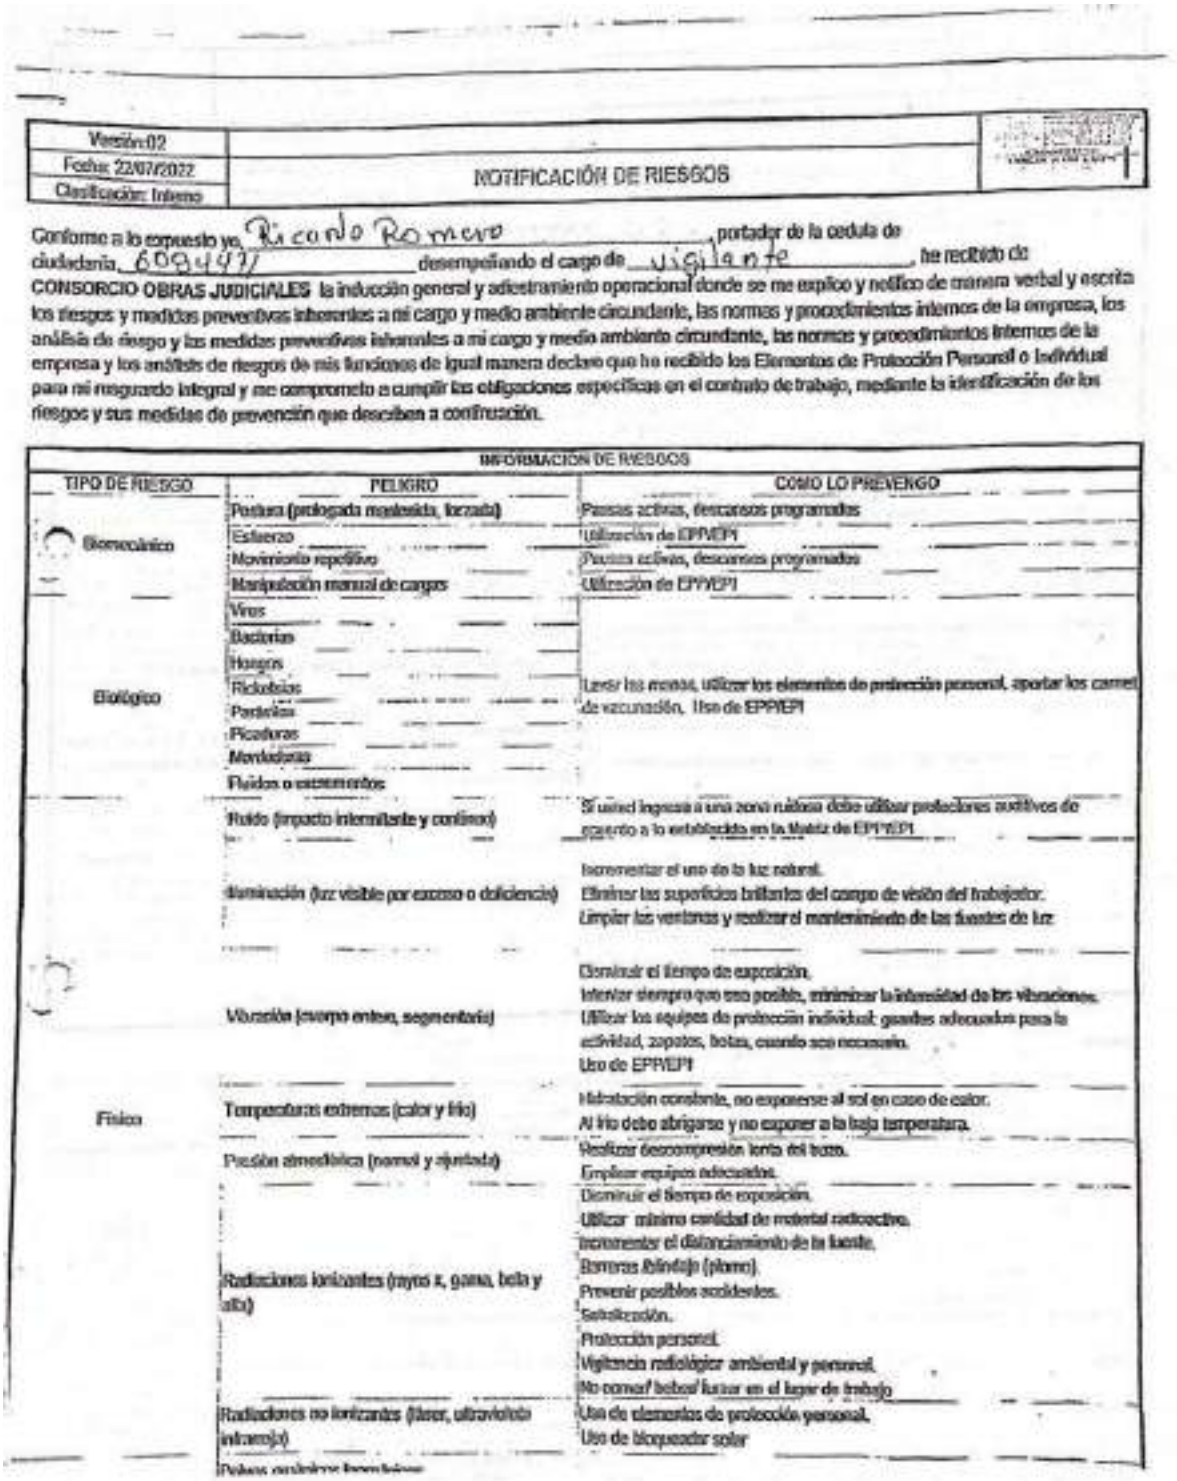

| Versión:02 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | | |
| Clasificación: Interno | | |

Conforme a lo expuesto yo, Ricardo Romero portador de la cedula de ciudadanía 6094497 desempeñando el cargo de vigilante he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Rickettsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras Blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |



| Versión 02 | | |
|---|---|---|
| Fecha: 20/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interna | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito |
| | Públicos | Cuidarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Aguidizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar mas información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños, y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Ricardo Romero

Firma: [signature] Fecha: 01-09-2023

2

| | | |
|---|---|---|
| Versión: 01 | | |
| Fecha: [illegible] | INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |
| Clasificación: Interna | | |

Fecha: 01-09-2023 | Nombre y Apellido: Ricardo Romero | Contratista: Security Fito

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, Opera a través de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha sido está comprometida con brindar a todos sus proyectos de manera que protejan la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, al mismo tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, mejorando continuamente sus procesos; por ello la gerencia se compromete a asignar los recursos necesarios para ejecutarlos y cumplirlos

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete a la gestión de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a todo nivel en la Organización a través del cuidado de la integridad física, la protección y la promoción de la salud de nuestros equipos de trabajo, contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementando y estableciendo los mejores medios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas orientados al autocuidado, entrenamiento y concientización, los accidentes, enfermedades laborales.
Como consecuencia de los impactos que genera nuestra labor y es por esto que Consorcio obras judiciales promueve en sus colaboradores la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, vehículos, o durante la [illegible] de equipos, maquinaria y herramientas de los clientes. De igual manera, no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo influencia de embriagantes o bajo efectos de drogas de tipo alucinógenas, durante la compañía en cumplimiento a lo presente política. disciplinas previstas en reglamento de trabajo

Para todos los trabajadores que ingresen a la empresa se deben contar requisito y cumplimiento legal los afiliaciones al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluye administradora de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que usted labora realizar los aportes mensuales al sistema, descontando a salario los porcentajes establecidos en la ley.

Un accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y hora de trabajo.
El accidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe directo y al [illegible] del proyecto, quien dirá en que ARL está afiliado de acuerdo a la afiliación realizada por su parte, en el caso de los contratistas.

Al interior de la organización se ha conformado un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que se encargara de velar el desarrollo del sig-sst y participar de actividades que brinden a mejorar la seguridad en el trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores; actividades como inspecciones, capacitaciones, investigación de accidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conducta de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, en donde se recibirán conductas de conocimiento concretos al interior de la Organización, las denuncias se pueden ser anónimas.

Cualquier incumplimiento o falta a las normas de seguridad en el trabajo o omisión a lo establecido en este documento por parte del trabajador en incumplimiento al compromiso que se pacto desde el momento de su firma y generara su causa de actuaciones.

1 El uso del casco de protección para la cabeza dentro de este centro de trabajo es permanente y obligatorio; bajo ninguna circunstancia se permite usar dichos de este elemento diferentes a los que los ingenieros (gorras, pañoletas, bragas, etc.).

El uso de los elementos de protección personal para ojos, vías respiratorias y oídos es obligatorio; siempre que el uso de elementos como guantes, ropa o calzado de trabajo. Los tipos de elementos dependen de la labor que se ejecute en el ambiente dentro del cual se desarrollan las labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de la dotación apropiada y los elementos de protección personal necesarios; así mismo responsabilidad del trabajador su uso debido y cuidado necesario para garantizar la efectividad de la protección con proporciones.



2 Las áreas de trabajo deben permanecer en correcto orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor mantenga esta área de trabajo y el orden en material o equipo utilizado.

4 Todo trabajo que se ejecute y que tenga riesgo de caída por encima de 1.8 metros, en de trabajo en alturas para realizarlo es necesario tener el certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas o inspector SST. (Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas) es responsabilidad del trabajador y del coordinador llenar el correspondiente permiso de trabajo, tener correcta uso de los elementos y equipo de protección personal requeridos para el desarrollo de la labor así como el montaje de plataformas y andamios.



5 Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior, encargado, al asesino general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para tomarle la atención necesaria y seguir el debido procedimiento.

6 Todo trabajador debe notificar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeña o en la que sea ejecutado por otra persona y que pueda generar sobre salud o sobre los demás trabajadores daños en la salud.

7 Todo trabajador debe permanecer atento y acatar toda la señalización instalada en obra: uso de elementos de protección personal, salas de evacuación, salidas de emergencia, punto de encuentro, zonas de cargue y descargue de materiales, pasos peatonales, cuidados de cada en zonas de riesgo, excavaciones, equipos de emergencia (ambulancia), excavaciones, etc.


8 Todo herramienta eléctrica que utilice discos de corte, equipo que cuente con transmisión de polea o equipo con resorte por poco debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiera como guardas de discos, protector de poleas, bujes, etc. si en el trabajo son pulidoras, cortadoras, pistolas, taladros, esmeriles, vibradores, bisagras, etc. usted observa la falta de este dispositivos, debe notificar inmediatamente a su encargado, al asesino general o al [illegible]

| Versión: 01<br>Fecha: 15/04/2020<br>Clasificación: Interna | FORMATO<br>ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nuevo Torre Palacio de Justicia. | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Inducción SST, Política SST, Política de alcohol y drogas, Reglamento de higiene y SST, Notificación de Riesgo, Evaluación SST. | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | ✓ | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | | DURACIÓN: | 1 Hora |
| FECHA: | 01-09/2023 | | | LUGAR: | Palacio de Justicia |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | 1066[illegible] | [illegible] | |

OBSERVACIONES

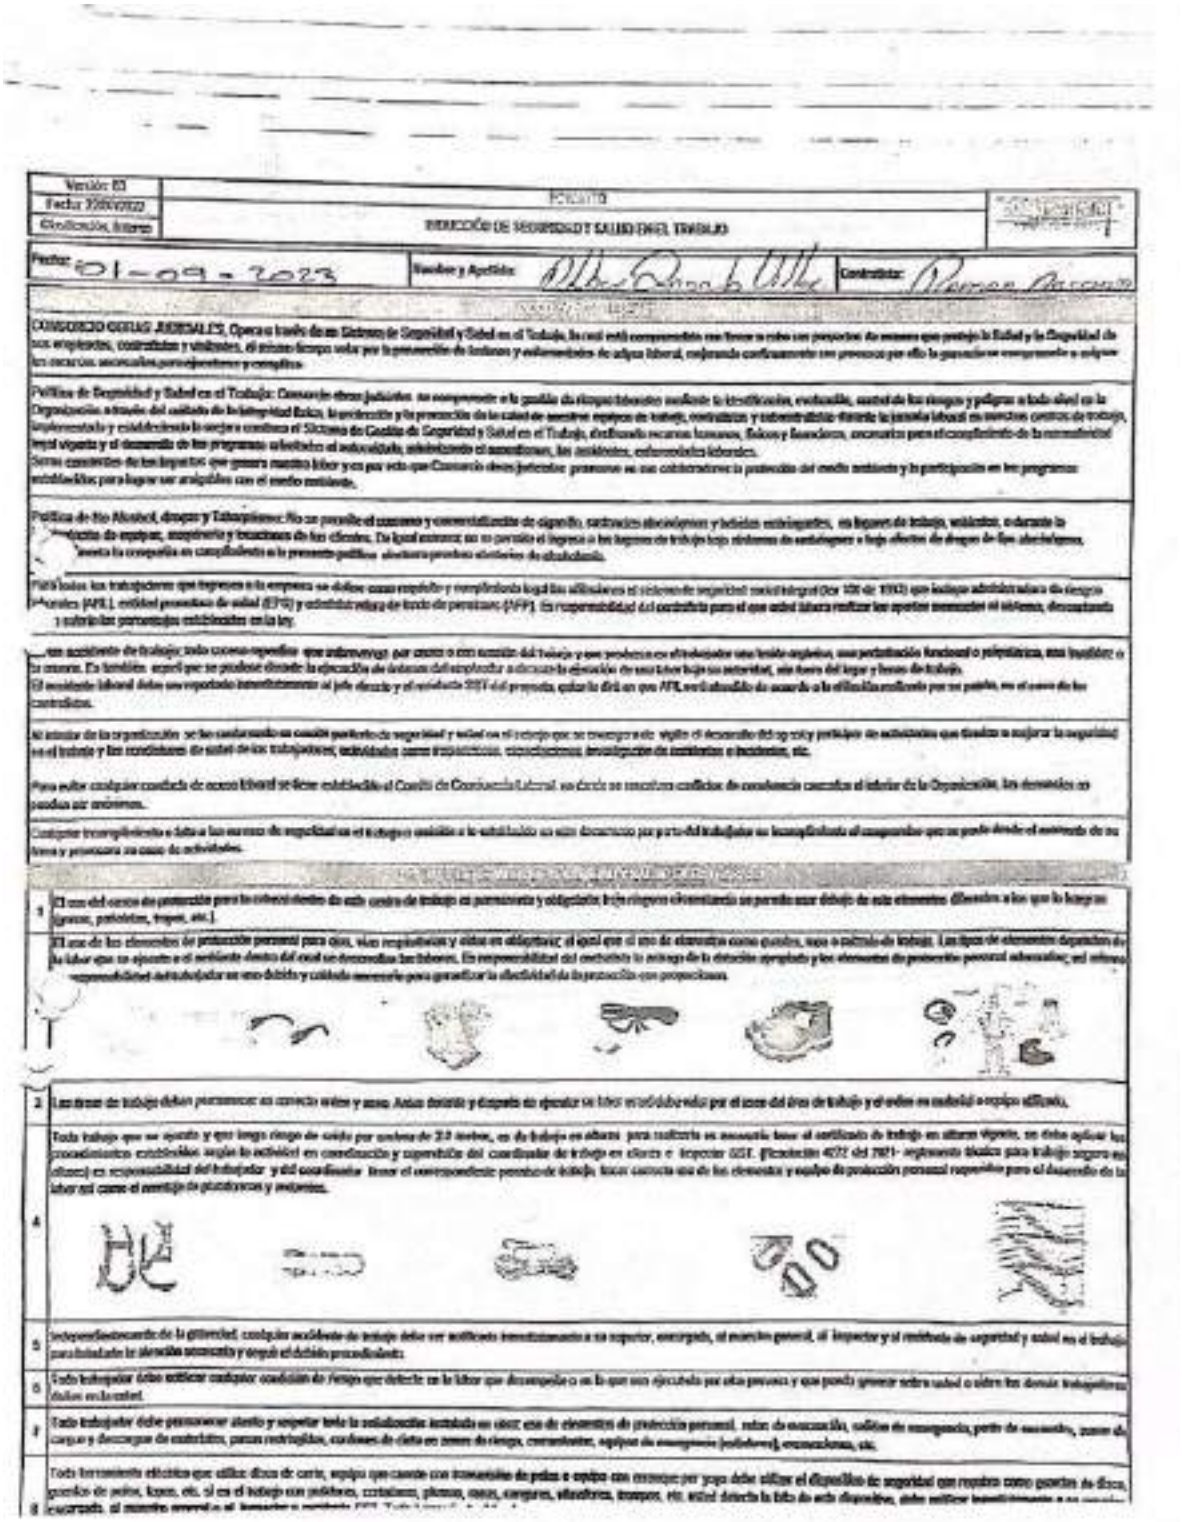

Versión: 03
Fecha: 20/04/2022
Clasificación: Interna

FORMATO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 01-09-2023

Nombre y Apellido:

Contratista:

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES Opera a través de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometido con brindar a todos sus proyectos de manera que proteja la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, el mismo tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, cumpliendo cumplimiento con procesos por ello la gerencia se compromete a asignar los recursos necesarios para implementar y cumplirlos.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete en la gestión de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a todo nivel en la Organización, atención del cuidado de la integridad física, la protección y la promoción de la salud de nuestros equipos de trabajo, contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementado y establecido la mejora continua el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, disponiendo recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas saludables al colaborador, minimizando el ausentismo, los incidentes, enfermedades laborales.
Somos conscientes de los impactos que genera nuestro labor y es por esto que Consorcio obras judiciales promueve en sus colaboradores la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, vehículos, o durante la prestación de equipos, maquinaria y vacaciones de los clientes. De igual manera no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo síntomas de embriaguez o bajo efectos de drogas de uso alucinógenas, frente la compañía en cumplimiento a la presente política aplicara procesos disciplinarios de alcoholismo.

Para todos los trabajadores que ingresen a la empresa se deben estar afiliados y cumplimiento legal los afiliados al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluyen administradora de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y entidad administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que usted labora realizar los aportes mensuales al sistema, descontando lo establecido porcentajes establecidos en la ley.

Un accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.
El accidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe directo y el incidente [illegible] del proyecto, quien le dirá en que ARL será atendido de acuerdo a la eficacia suministrado por su patrón, en el caso de los contratistas.

Al interior de la organización se ha conformado un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que se encargara de vigilar el desarrollo del programa y participar de actividades que tiendan a mejorar la seguridad en el trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores, actividades como inspecciones, capacitaciones, investigación de accidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conducta de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, en donde se resuelven conflictos de convivencia suscitados al interior de la Organización, las denuncias se pueden dar anónimas.

Cualquier incumplimiento o falta a las normas de seguridad en el trabajo cometido o no subsanado en este documento por parte del trabajador no incumplimiento al empleador que se puede desde el contrato de una hora y proceder en caso de actividades.

1 El uso del casco de protección para la cabeza dentro de este centro de trabajo es permanente y obligatorio. Evite ningún elemento que pueda estar debajo de este elemento. (Llaveros, aros que lo lleguen en (gorras, pañoletas, tapas, etc.).

El uso de los elementos de protección personal para ojos, vías respiratorias y oídos es obligatorio; el igual que el uso de elementos como guantes, botas o calzado de trabajo. Los tipos de elementos dependen de la labor que se ejecute y el ambiente dentro del cual se desarrollan las labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de la dotación apropiada y los elementos de protección personal adecuados; así mismo responsabilidad del trabajador un uso debido y cuidado necesario para garantizar la efectividad de la protección que proporcionan.



2 Los sitios de trabajo deben permanecer en correcto orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor es responsabilidad por el sitio del área de trabajo y el orden en general o equipo utilizado.

4 Todo trabajo que se ejecute y que tenga riesgo de caída por encima de 2.0 metros, es de trabajo en alturas para realizarlo es necesario tener el certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas o inspector SST. (Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas) es responsabilidad del trabajador y del coordinador tener el correspondiente permiso de trabajo, hacer correcto uso de los elementos y equipos de protección personal requeridos para el desarrollo de la labor así como el montaje de plataformas y andamios.




5 Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior, encargado, al maestro general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para brindarle la atención necesaria y seguir el debido procedimiento.

6 Todo trabajador debe notificar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeña o en la que son ejecutada por otras personas y que pueda generar sobre salud o sobre los demás trabajadores dentro en la salud.

7 Todo trabajador debe permanecer atento y respetar toda la señalización instalada en obra: uso de elementos de protección personal, salida de evacuación, salidas de emergencia, punto de encuentro, zonas de cargue y descargue de materiales, zonas restringidas, cordones de cinta en zonas de riesgo, cerramientos, equipos de emergencia (señalización), extracciones, etc.

8 Todo herramiento eléctrico que utilice discos de corte, equipo que cuente con transmisión de poleas o equipo con engranaje por ningún debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiere como guardas de discos, guardas de poleas, bayas, etc. si en el trabajo con pulidoras, cortadoras, planos, sierras, cargueras, alimadoras, trompos, etc. usted detecta la falta de este dispositivo, debe notificar inmediatamente a su encargado, el mismo procederá a [illegible]

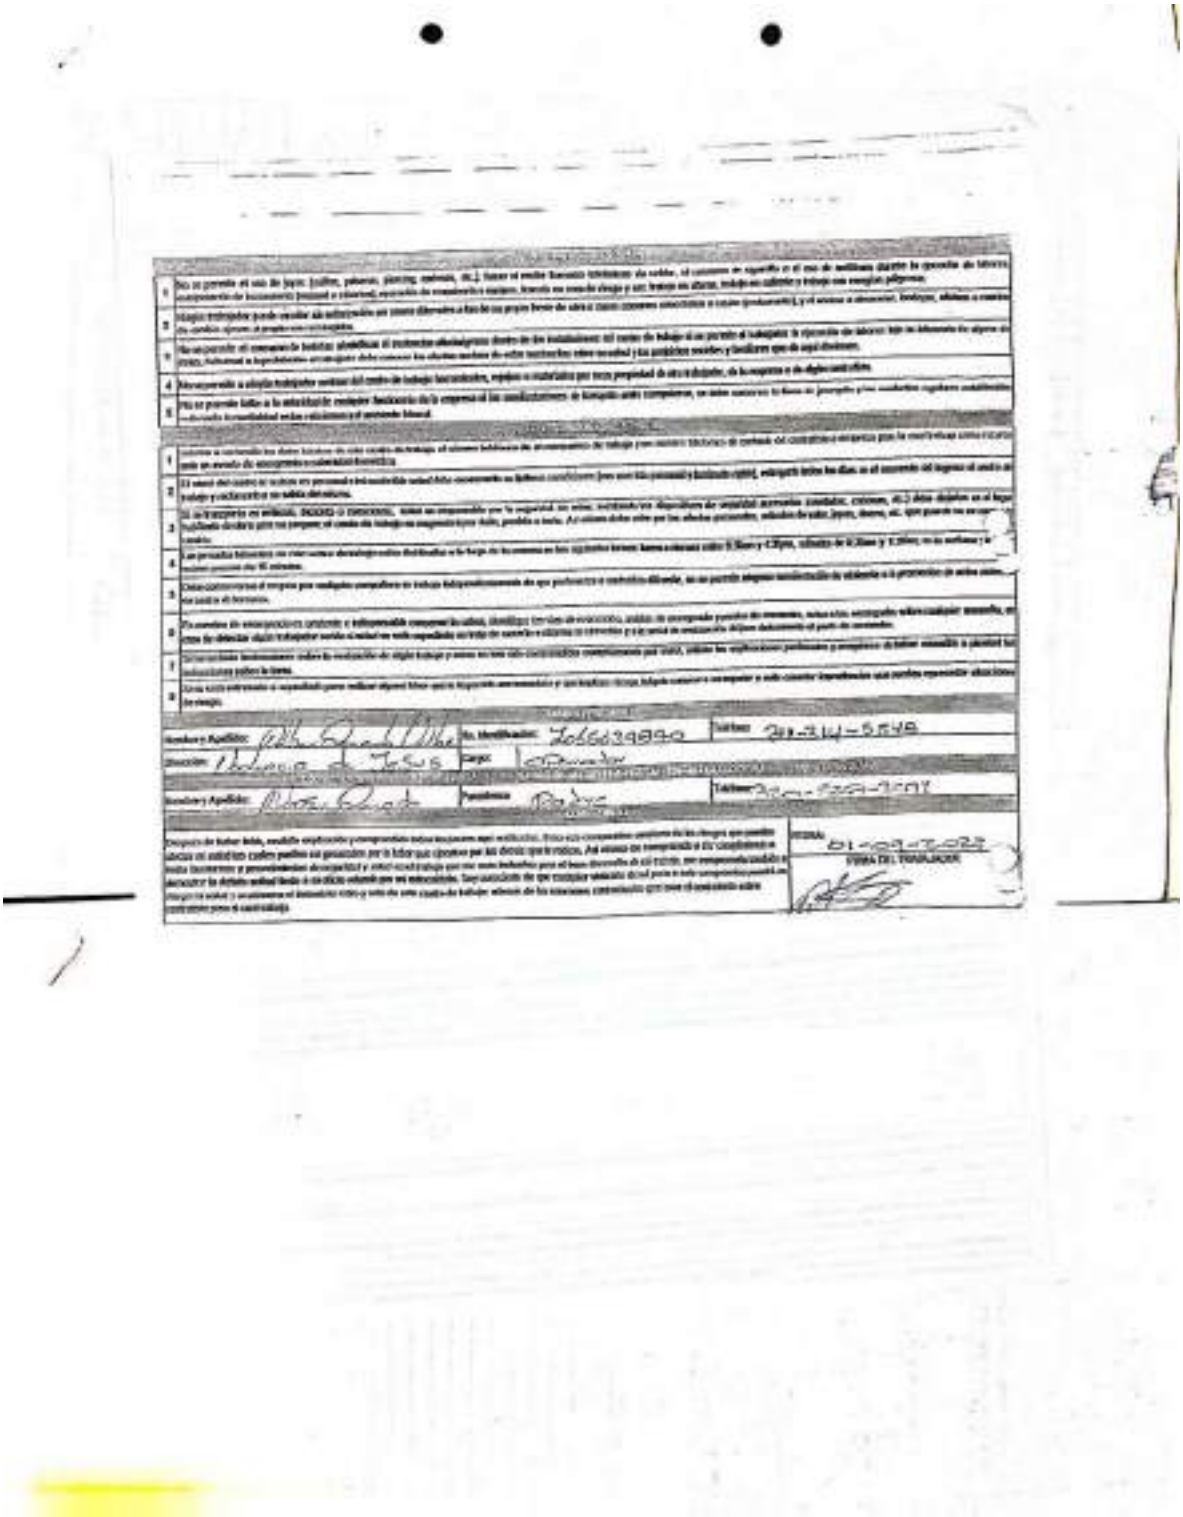

| | | |
|---|---|---|
| Versión:02 | | |
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interna | | |

Conforme a lo expuesto yo, _____, portador de la cedula de ciudadanía _____ desempeñando el cargo de _____, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Roedores | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (Impacto intermitente y continuo) | El ruido ingresa a una zona nociva debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI. |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentario) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual; guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, casco si son necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frio) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y elevada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados.<br>Disminuir el tiempo de exposición. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras Absorbe (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión 02 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las maquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de transito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| | Espacios Confinados | |
| Fenómenos naturales | Sismo | Conocer y aplicar el plan de emergencias |
| | Terremoto | |
| | Vendaval | |
| | Inundación | |
| | Derrumbe | |
| | Precipitaciones | |

Nombre: [illegible]

Firma:

Fecha: 01-09-2022

Versión: 01
Fecha: 21/03/2023
Clasificación: Interna

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST

NOMBRE: Alba Lucia Ulloa [illegible] CÉDULA: 1065639870

**1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones con la definición de seguridad y salud en el trabajo:**

| | | |
|---|---|---|
| a. | Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo | |
| b. | Proteger y promover la salud | |
| c. | Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo | |
| X | Todas las anteriores | |

**2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo**

| | | |
|---|---|---|
| a. | Política SST | |
| b. | Política de alcohol y tabaquismo | |
| c. | Política de Calidad | |
| X | Todas las anteriores | |

**3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Dermatitis | d. | Lesiones osteomusculares | g. | Caídas del mismo nivel |
| b. | Fracturas - Esguinces | e. | Pérdida de peso | h. | Todas las anteriores |
| c. | Cuerpo extraño en ojos | f. | Mareos | X | c, b, d |

**4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.**

a) Respetar la señalización
b) usar EPP
c) asistir a charla
d) Inspeccionar areas de trabajo

**5.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | Protección auditiva | e. | Careta facial | X | Casco |
| X | Botas de seguridad con puntera | f. | Respirador de doble cartucho | j. | Camisa manga larga |
| X | Tapabocas | g. | Gafas plásticas | X | Tapaoidos de inserción / Copa |
| d. | Guantes de carnaza / Ruspeña | X | Guantes de nitrilo | X | Gafas de seguridad |

**6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarlo en obra:**

Informar al SST, positivo.

**7. Marque con un X las tipos de comité que existen en la Organización**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Comité Paritario de Salud | X | Comité de Convivencia |
| b. | Comité de Ventas y reparto | | |
| X | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | | |

**8. Marque con un X las prohibiciones**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Utilización de joyas y relojes | d. | Laborar sin EPP |
| b. | Llegar en estado de embriaguez | e. | No portar locatemos |
| c. | Consumir sustancias alucinógenas | X | c, b, d |

**9. Marque con un X las actividades de alto riesgo**

| | |
|---|---|
| a. | Trabajos en Caliente |
| b. | Trabajos con energías peligrosas |
| c. | Trabajo en alturas |
| X | Todas las anteriores |

**9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo**

| | |
|---|---|
| a. | Utilización de taladro, martillos o pulidora |
| b. | Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente |
| c. | Ninguna |
| X | Respuesta a y b |

**OBSERVACIONES:**

Firma del Trabajador
No. Identificación 1065639870

| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interna | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva torre Palacio de Justicia. | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Notificación de Riesgo, Inducción, Política de alcohol y drogas, Reglamento de higiene y SST, Evaluación SST. | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD: | | CHARLA DE SEGURIDAD | ✓ | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | | | DURACIÓN: | 1 Hora | |
| FECHA: | 21-09/2023 | | | LUGAR: | Palacio de Justicia. | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| | José Alberto Gutierrez | 1122.996.486 | Security force | |
| | Jeison Arches Chamorro | 1065646526 | Security force | |
| | Esneider Gutierrez | 77185068 | Security force | |

OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| Versión:02 | |
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interno | |

Conforme a lo expuesto yo, Yeison Andres Chamorro Sarria, portador de la cedula de ciudadanía 1065646528, desempeñando el cargo de Vigilante, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

**INFORMACION DE RIESGOS**


| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
|---|---|---|
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar los esquemas de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz. |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Mientras siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual; guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frio) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras /blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Presión ambiental (hiperbárica) | |

| Versión:02<br>Fecha: 22/07/2022<br>Clasificación: Interno | FORMATO<br>NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| | Espacios Confinados | |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |


Nombre: Jairson Andres chaparro Sanz

Firma: Jairson Andres chaparro

Fecha: 21/09/2023

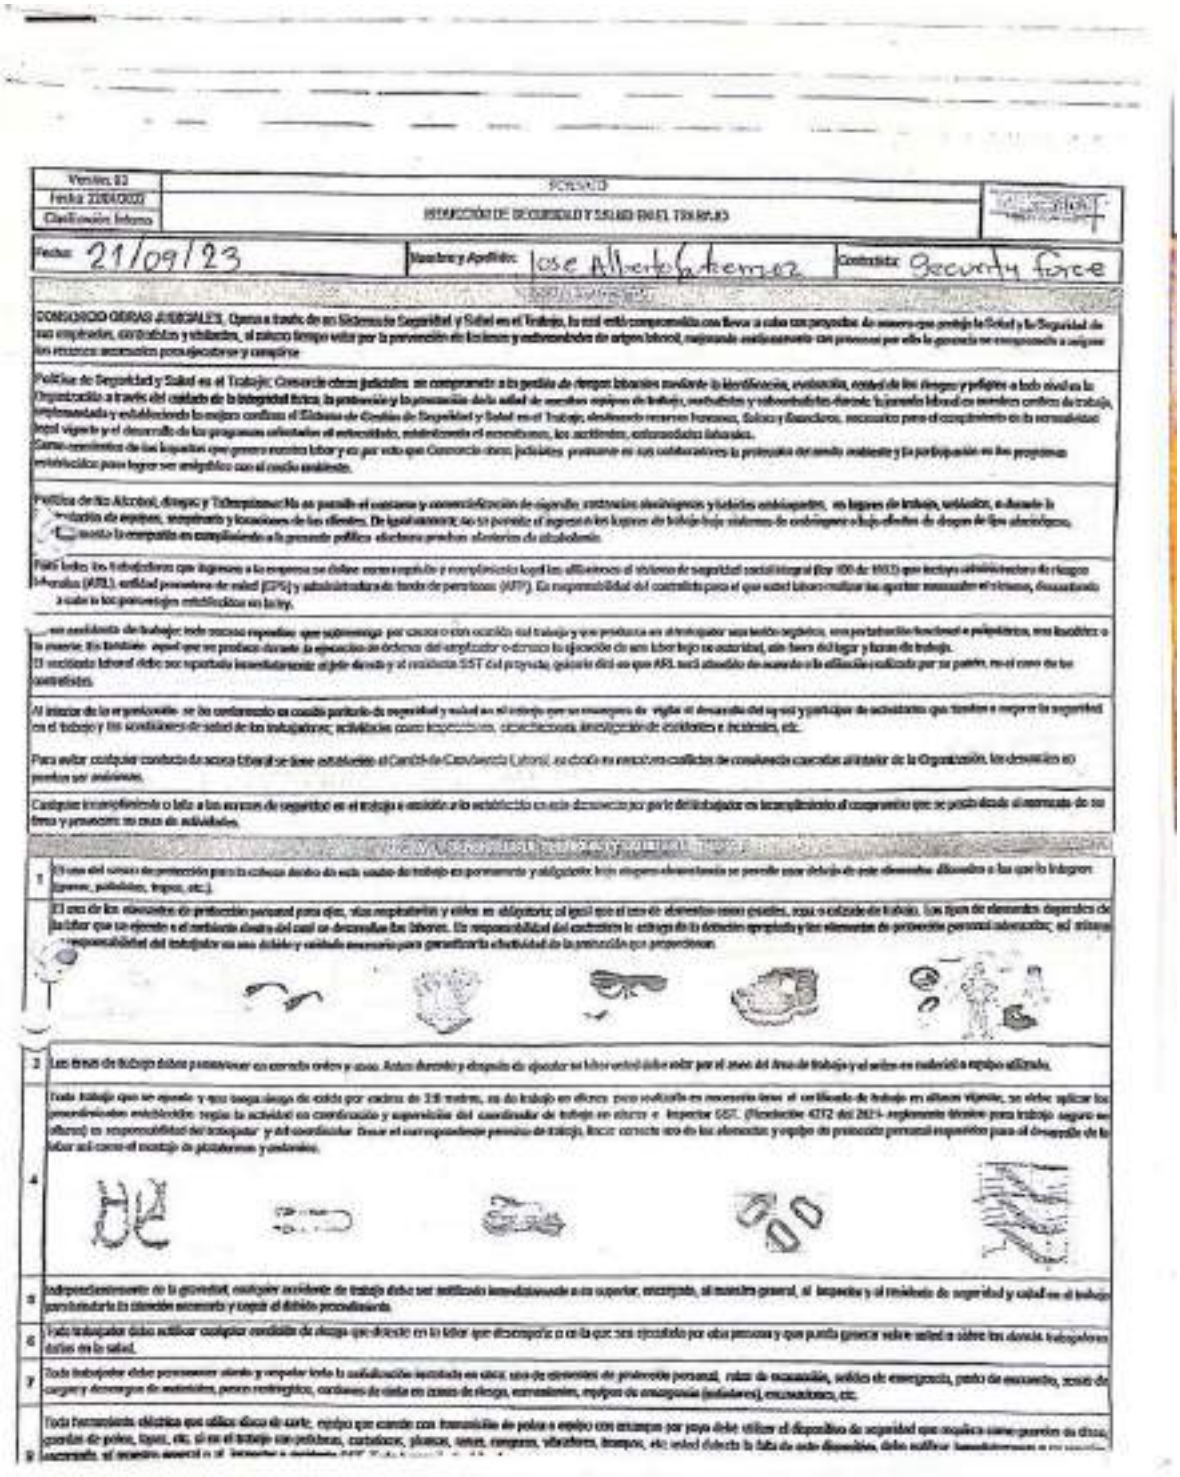

Fecha: 21/09/23 | Nombre y Apellido: Jose Alberto Gutierrez | Contratista: Security force

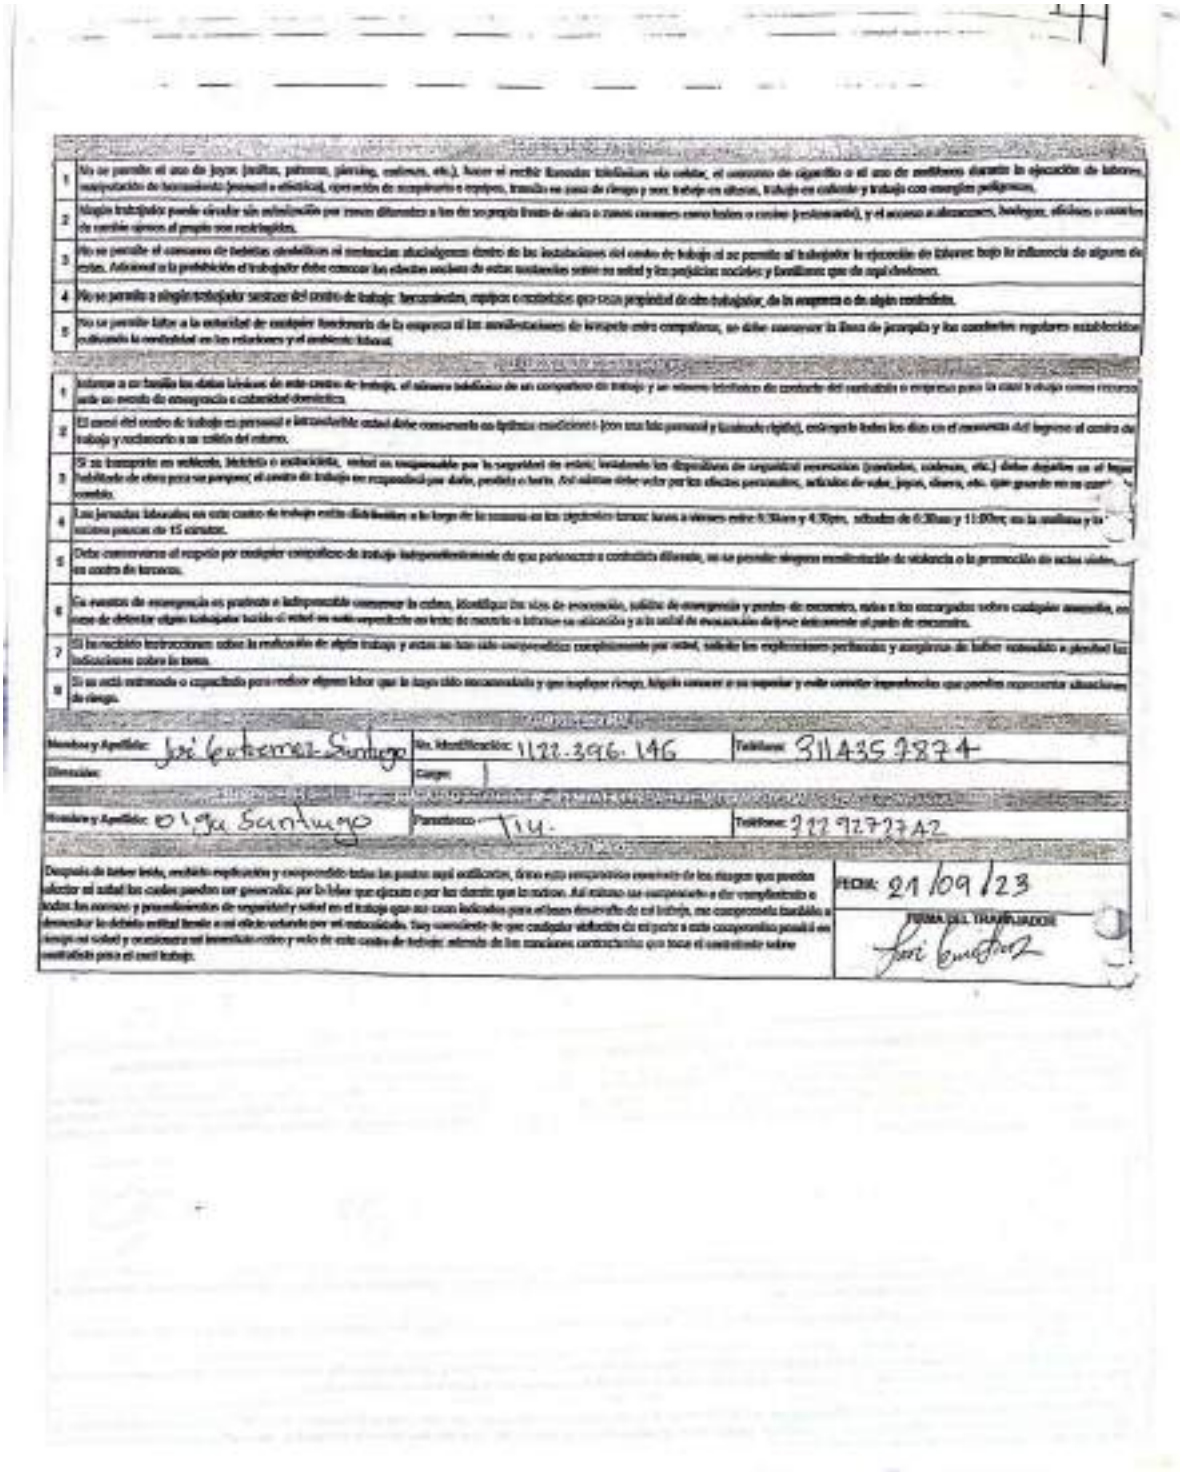

| | |
|---|---|
| 1 | No se permite el uso de joyas (anillos, pulseras, piercing, cadenas, etc.), hacer el recibo llamadas telefónicas sin soldar, el consumo de cigarrillo o el uso de audífonos durante la ejecución de labores, manipulación de herramienta (manual o eléctrica), operación de equipamiento o equipos, tránsito en zona de riesgo y para trabajo en alturas, trabajo en caliente y trabajo con energías peligrosas. |
| 2 | Ningún trabajador puede circular sin autorización por zonas diferentes a las de su propio frente de obra o zonas comunes como baños o cocina (refrigerante), y el acceso a almacenes, bodegas, oficinas o cuartos de control ajenos al propio son restringidos. |
| 3 | No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni sustancias alucinógenas dentro de las instalaciones del centro de trabajo ni se permite al trabajador la ejecución de labores bajo la influencia de alguno de estos. Adicional a la prohibición el trabajador debe conocer los efectos nocivos de estas sustancias sobre su salud y los perjuicios sociales y familiares que de aquí devienen. |
| 4 | No se permite a ningún trabajador sustraer del centro de trabajo herramientas, equipos o materiales que sean propiedad de este trabajador, de la empresa o de algún contratista. |
| 5 | No se permite faltar a la autoridad de cualquier funcionario de la empresa ni las amonestaciones de respeto entre compañeros, se debe conservar la línea de jerarquía y las cuadrillas regulares establecidas evaluando la confiabilidad en las relaciones y el ambiente laboral. |

| | |
|---|---|
| 1 | Informar a un familiar los datos básicos de este centro de trabajo, el número telefónico de un compañero de trabajo y un número telefónico de contacto del contratista o empresa para la cual trabaja como recurso ante un evento de emergencia o calamidad doméstica. |
| 2 | El carné del centro de trabajo es personal e intransferible estará debe conservarlo en óptimas condiciones (con una foto personal y facilmente legible), entregarlo todos los días en el momento del ingreso al centro de trabajo y reclamarlo a su salida del mismo. |
| 3 | Si su transporte es suministrado, hablando o contratado, usted es responsable por la seguridad de estos; teniendo los dispositivos de seguridad necesarios (cinturones, cuñeros, etc.) debe dejarlos en el lugar habilitado de obra para su parqueo, el centro de trabajo no responderá por daños, pérdida o hurto. Así mismo debe velar por los efectos personales, artículos de valor, joyas, dinero, etc. que guarde en su carro cambio. |
| 4 | Las jornadas laborales en este centro de trabajo están distribuidas a lo largo de la semana en los siguientes horarios: horas a viernes entre 8:30am y 4:30pm, sábados de 8:30am y 11:00m; con la semana y la misma pausa de 15 minutos. |
| 5 | Debe conservarse el respeto por cualquier compañero de trabajo independientemente de que pertenezca a contratista diferente, no se permite ninguna manifestación de violencia o la promoción de actos viole en contra de terceros. |
| 6 | En eventos de emergencia es prudente e indispensable conservar la calma, identificar las vías de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, estas o los encargados sobre cualquier anomalía, en caso de detectar algún trabajador lesión o enfermedad en este suspenderle en forma de inmediato e informar su ubicación y a la salida de evacuación dirijase inmediatamente al punto de encuentro. |
| 7 | Si he recibido instrucciones sobre la realización de algún trabajo y estas no han sido comprendidas completamente por usted, solicite las explicaciones pertinentes y asegúrese de haber entendido a plenitud las indicaciones sobre la tarea. |
| 8 | Si no está entrenado o capacitado para realizar alguna labor que le haya sido encomendada y que implique riesgo, dígalo siempre a su superior y evite cometer imprudencias que puedan representar situaciones de riesgo. |

| | | |
|---|---|---|
| Nombre y Apellido: José Eudomar Santiago | No. Identificación: 1122.396.146 | Teléfono: 3114357874 |
| Dirección: | Cargo: | |
| Nombre y Apellido: Olga Santiago | Parentesco: Tia. | Teléfono: 3127927742 |

Después de haber leído, entendido explicación y comprendido todos los puntos aquí establecidos, firmo este compromiso consciente de los riesgos que pueden afectar mi salud los cuales pueden ser generados por la labor que ejecuto o por los demás que la rodean. Así mismo me comprometo a dar cumplimiento a todos los normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que me sean indicados para el buen desarrollo de mi trabajo, me comprometo también a denunciar los delitos contra la salud de los cuales sea víctima por mi contratación. Soy consciente de que cualquier violación de mi parte a este compromiso podrá ser causa mi salud y ocasionarme mi inmediato retiro y veto de este centro de trabajo, además de las sanciones contractuales que tiene el contratista sobre cualquiera para el cual trabaje.

FECHA: 21/09/23

FIRMA DEL TRABAJADOR

| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 21/03/2023 | EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST | |
| Clasificación: Interna | | |

NOMBRE: José Alberto Echeverri Cartagena CÉDULA: 1128396146

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

| | |
|---|---|
| a. | Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo |
| b. | Proteger y promover la salud |
| c. | Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo |
| X | Todas las anteriores |

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

| | |
|---|---|
| a. | Política SST |
| b. | Política de alcohol y tabaquismo |
| c. | Política de Calidad |
| X | Todas las anteriores |

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Quemaduras | d. | Lesiones osteomusculares | g. | Caidas del mismo nivel |
| b. | Fracturas - Esguinces | e. | Perdida de peso | h. | Todas las anteriores |
| c. | Cuerpo extraño en ojos | f. | Mareos | X | a, b, d |

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) No mezclar en Pesos no autorizadas
b) respetar las Señalizacion
c) No ingerir bajo el efecto del alcohol.
d) Utilizando los elementos de proteccion

5.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Protección auditiva | e. | Camisa tipical | i. | Casco |
| X | Botas de seguridad con puntera | f. | Respirador de doble cartucho | X | Camisa manga larga |
| X | Tapabocas | g. | Guantes plasticos | k. | Tapaoidos de inserccion / Copa |
| d. | Guantes de cuero / Nitrilo | h. | Guantes de nitrilo | X | Gafas de seguridad |

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarle en obra:

Comunicar a nuestro Superior los Cargos, indicandole los Sucesos Colpatria

7. Marque con un X los tipos de comité que existen en la Organización

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Comité Paritario de Salud | X | Comité de Convivencia |
| | Comité de fiestas y regalos | | |
| X | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | | |

8. Marque con un X las prohibiciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | Utilización de joyas y relojes | | d. | X | Laborar sin EPP |
| X | Llegar en estado de embriaguez | | e. | X | No portar tapabocas |
| X | Consumir sustancias alucinógenas | | f. | X | a, b, d |

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo

| | |
|---|---|
| a. | Trabajos en Caliente |
| b. | Trabajos con energías peligrosas |
| c. | Trabajo en alturas |
| X | Todas las anteriores |

9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo

| | |
|---|---|
| a. | Ubicación de taludes, cortados o pedrero |
| X | Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente |
| | Ninguna |
| X | Respuesta a y b |

OBSERVACIONES:

Firma del Trabajador
No. identificación 1128 396 146

| Versión:02 | |
|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interno | |

Conforme a lo expuesto yo, José Alberto Echeverri Cardenas, portador de la cedula de 1122.396.146 ciudadanía 1122 396 146 desempeñando el cargo de Vigilante, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.


| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Rickettsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (espacio intermitente y continuo) | El aseo (agrega a una zona nuestra debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, casco si necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frio) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Cumplir equipos adecuados.<br>Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínimo cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras difindje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | No comer dentro fumar en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Presión anormal (hiperbarica) | |



| Versión:02 | | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de los maquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de transito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: José Alberto Gutierrez Santos.

Firma: Fecha: 21/04/23

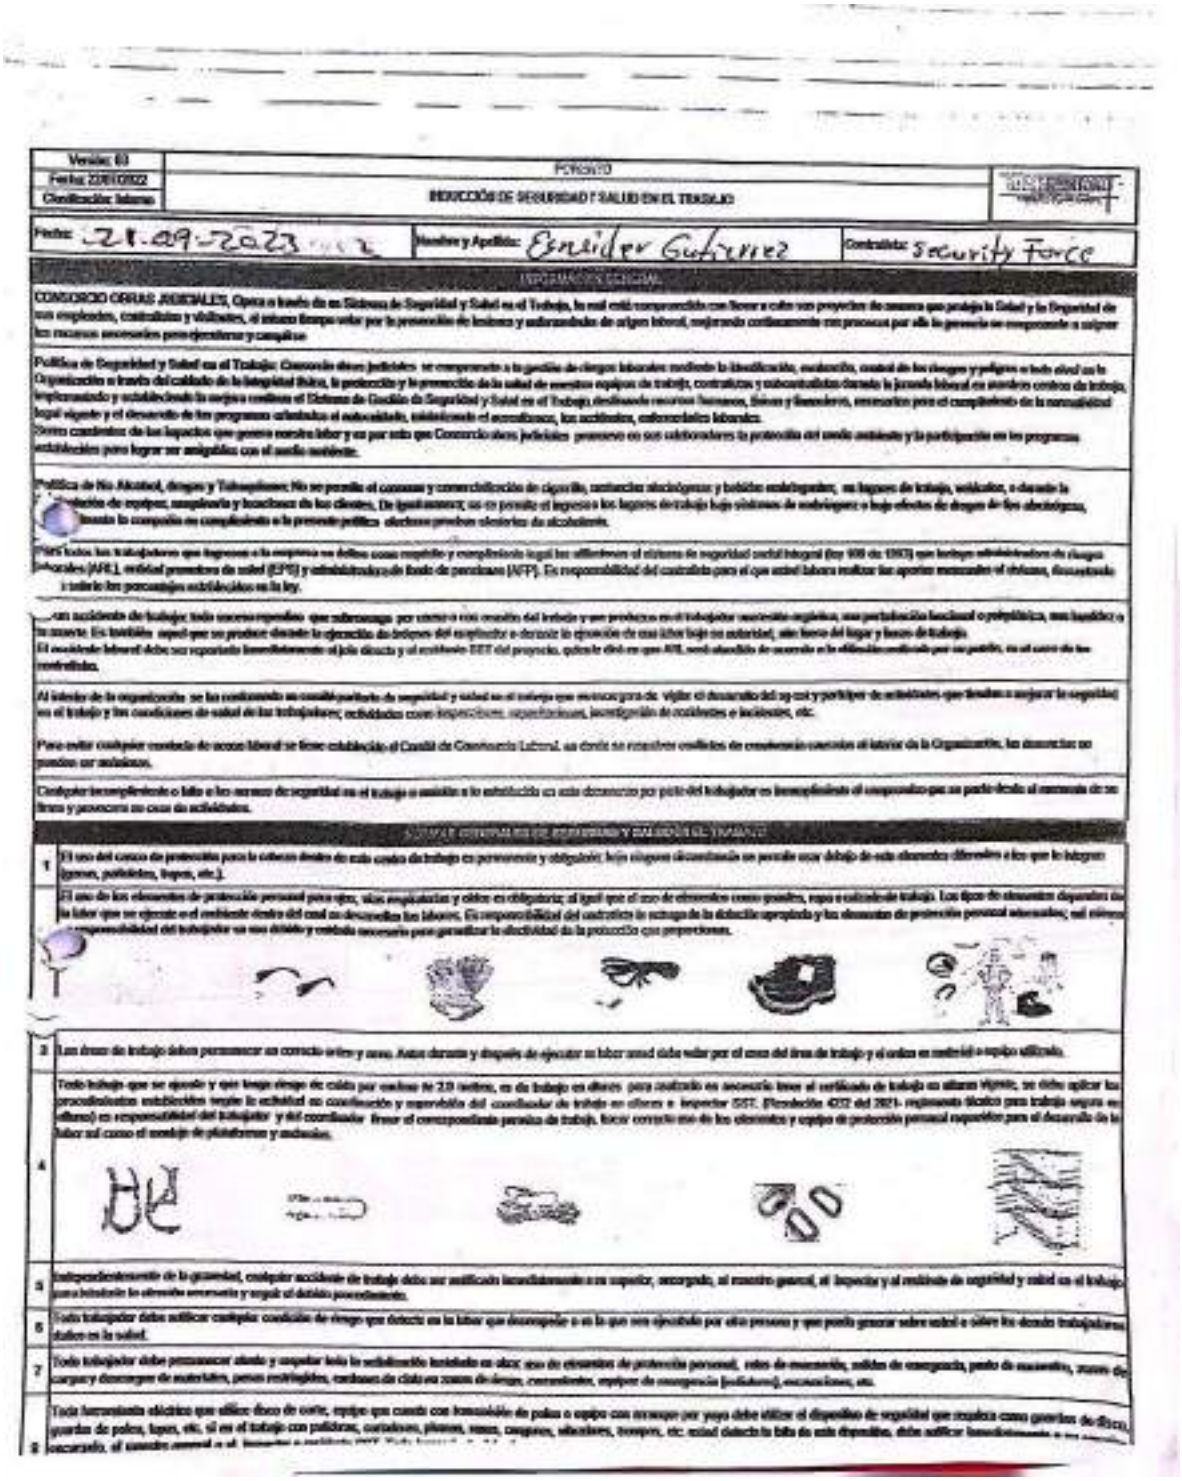

Versión: 03
Fecha: 20/01/2022
Clasificación: Interna

PONANTO

REDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 21-09-2023

Nombre y Apellido: Ernesto Gutierrez

Contratista: Security Force

INFORMACIÓN GENERAL

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, Opera a través de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometida con llevar a cabo sus proyectos de manera que proteja la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, el mismo tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, mejorando continuamente con procesos por ello la gerencia se compromete a asignar los recursos necesarios para ejecutarlos y cumplirlos.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete a la gestión de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a todo nivel en la Organización a través del cuidado de la integridad física, la protección y la prevención de la salud de nuestros equipos de trabajo, contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementando y estableciendo las mejores medidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas orientados al autocuidado, enfocándose en accidentes, enfermedades laborales.
Dentro cumplimos de los impactos que genera nuestra labor y es por esto que Consorcio obras judiciales promueve en sus colaboradores la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, vehículos, o durante la [illegible] de equipos, maquinaria y locaciones de los clientes. De igual manera, no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo síntomas de embriaguez o bajo efectos de drogas de tipo alucinógenas, durante la campaña no cumplimiento a la presente política conlleva pruebas aleatorias de alcoholemia.

Para todos los trabajadores que ingresen a la empresa es deber como requisito y cumplimiento legal los afiliemos al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluye administradora de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que usted labora realizar los aportes mensuales al sistema, descontando lo debido los porcentajes establecidos en la ley.

Un accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
El accidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe directo y al residente SST del proyecto, quien de ser una ARL será atendido de acuerdo a la afiliación realizada por su patrón, en el caso de los contratistas.

Al interior de la organización se ha conformado un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que encargara de vigilar el desarrollo del sg-sst y participar de actividades que tiendan a mejorar la seguridad en el trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores, actividades como inspecciones, capacitaciones, investigación de incidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conducta de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, en donde se resuelven conflictos de convivencia suscitados al interior de la Organización, las denuncias se pueden dar anónimas.

Cualquier incumplimiento o falla a las normas de seguridad en el trabajo o omisión a lo establecido en este documento por parte del trabajador es incumplimiento al compromiso que se pacto desde el momento de su firma y generara no pago de actividades.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


1. El uso del casco de protección para la cabeza dentro de este centro de trabajo es permanente y obligatorio; bajo ninguna circunstancia se permite usar debajo de este elementos diferentes a los que le integran (gorras, pañoletas, tapas, etc.).
2. El uso de los elementos de protección personal para ojos, vías respiratorias y oídos es obligatorio; al igual que el uso de elementos como guantes, ropa o calzado de trabajo. Los tipos de elementos dependen de la labor que se ejecute en el ambiente dentro del cual se desarrollen las labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de la dotación apropiada y los elementos de protección personal necesarios; así mismo responsabilidad del trabajador su uso debido y continuo necesario para garantizar la efectividad de la protección que proporcionan.



3. Las áreas de trabajo deben permanecer en correcto orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor usted debe velar por el aseo del área de trabajo y el orden en material o equipo utilizado.
4. Todo trabajo que se ejecute y que tenga riesgo de caída por encima de 2.0 metros, en de trabajo en alturas para realizarlo es necesario tener el certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas e inspector SST. (Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas) es responsabilidad del trabajador y del coordinador tener el correspondiente permiso de trabajo, hacer correcto uso de los elementos y equipo de protección personal requeridos para el desarrollo de la labor así como el montaje de plataformas y andamios.



5. Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior, encargado, al maestro general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo, para la iniciación las ordenes necesarias y seguir el debido procedimiento.
6. Todo trabajador debe notificar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeña o en la que sea ejecutada por otra persona y que pueda generar sobre salud o sobre los demás trabajadores daños en la salud.
7. Todo trabajador debe permanecer atento y cumplir todo lo establecido haciendo uso obligatorio de elementos de protección personal, rutas de evacuación, salidas de emergencia, punto de encuentro, zonas de cargue y descargue de materiales, partes restringidas, cerramos de cinta con zonas de riesgo, convencionales, equipos de emergencia (botiquines), extintores, etc.
8. Toda herramienta eléctrica que utilice disco de corte, equipo que cuente con transmisión de poleas o equipo con acoples por yugo debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiera como guardas de discos, guardas de poleas, topes, etc. si en el trabajo con palidoras, cortadoras, planos, sierras, cinceles, taladros, etc. usted detecte la falta de este dispositivo, debe notificar inmediatamente a su encargado, el usuario general o al [illegible]

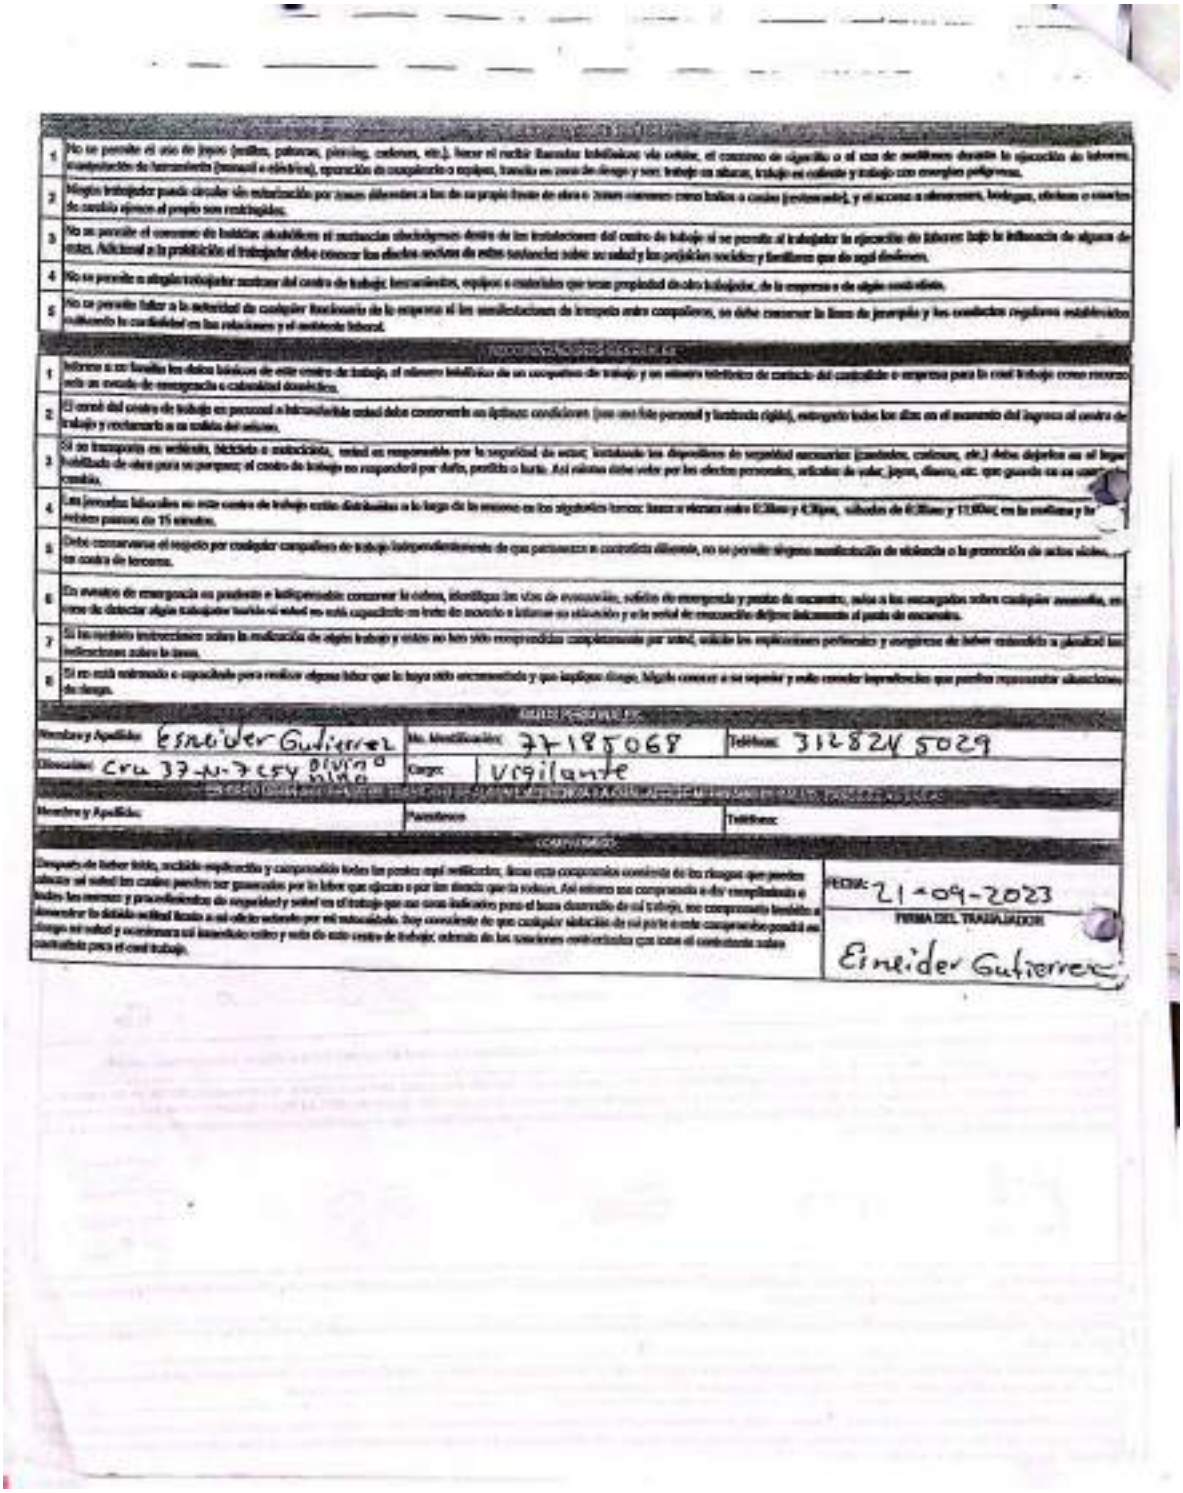

| | |
|---|---|
| 1 | No se permite el uso de joyas (anillos, pulseras, piercing, cadenas, etc.), hacer el cachir llamadas telefónicas vía celular, el consumo de cigarrillo o el uso de medicamentos durante la ejecución de labores, manipulación de herramienta (manual o eléctrica), operación de cargadores o equipos, tránsito en zona de riesgo y ser trabajo en alturas, trabajo en caliente y trabajo con energías peligrosas. |
| 2 | Ningún trabajador puede circular sin autorización por zonas diferentes a las de su propio frente de obra o áreas comunes como baños o casino (restaurante), y el acceso a almacenes, bodegas, oficinas o cuartos de control ajenos el propio son restringidos. |
| 3 | No se permite el consumo de bebidas alcohólicas, alucinógenos dentro de las instalaciones del centro de trabajo ni se permite al trabajador la ejecución de labores bajo la influencia de alguna de estas. Adicional a la prohibición el trabajador debe conocer los efectos nocivos de estas sustancias sobre su salud y las peleas sociales y familiares que de aquí devienen. |
| 4 | No se permite a ningún trabajador sustraer del centro de trabajo herramientas, equipos o materiales que sean propiedad de otro trabajador, de la empresa o de algún contratista. |
| 5 | No se permite faltar a la autoridad de cualquier funcionario de la empresa ni los manifestaciones de irrespeto entre compañeros, se debe conservar la línea de jerarquía y las condiciones cordiales establecidas salvaguarda la cordialidad en las relaciones y el ambiente laboral. |

| | |
|---|---|
| 1 | Informar a sus familias los datos básicos de este centro de trabajo, el número telefónico de un ocupante de trabajo y un número telefónico de contacto del contratista o empresa para la cual trabaja como recurso ante un evento de emergencia o calamidad doméstica. |
| 2 | El correcto del centro de trabajo es personal e intransferible usted debe conservarlo en óptimas condiciones (uso con fin personal y limitación rígida), entregarlo todos los días en el momento del ingreso al centro de trabajo y reclamarlo a su salida del mismo. |
| 3 | Si se transporta en motocicleta, bicicleta o motocicleta, usted es responsable por la seguridad de estos; verificando los dispositivos de seguridad necesarios (cascos, cobijas, etc.) debe dejarlos en el lugar habilitado de obra para su parqueo; el centro de trabajo no responderá por daño, pérdida o hurto. Así mismo debe velar por los efectos personales, artículos de valor, joyas, dinero, etc. que guarde en su casillero o candado. |
| 4 | Las jornadas laborales en este centro de trabajo están distribuidas a lo largo de la semana en los siguientes horarios: lunes a viernes entre 8:30am y 4:30pm, sábados de 8:30am y 11:00am; en la mañana y la tarde tendrán pausas de 15 minutos. |
| 5 | Debe conservarse el respeto por cualquier compañero de trabajo independientemente de que pertenezca a contratista diferente, no se permite ningún manifestación de violencia o la promoción de actos violentos en contra de terceros. |
| 6 | En eventos de emergencia no prudente e indispensable conservar la calma, identifique las vías de evacuación, señales de emergencia y puntos de encuentro, sobre a los encargados sobre cualquier anomalía, en caso de detectar algún trabajador herido o enfermo que no está capacitado en brote de incendio e informar su ubicación y si la salud de evacuación dejarlo inmediatamente al punto de encuentro. |
| 7 | Si las mismas instrucciones sobre la realización de algún trabajo y estas no han sido comprendidas completamente por usted, solicite los explicaciones pertinentes y asegúrese de haber entendido a plenitud las indicaciones sobre la tarea. |
| 8 | Si no está entrenado o capacitado para realizar alguna labor que le haya sido encomendada y que implique riesgo, infórmelo a su superior y evite cometer imprudencias que puedan representar situaciones de riesgo. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: | Einelder Gutierrez | No. Identificación: | 77185068 |
| Teléfono: | 3128245029 | Dirección: | Cra 37-N-7c54 Divino Niño |
| Cargo: | Vigilante | | |

| | | |
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: | Parentesco | Teléfono: |


COMPROMISO

Después de haber leído, recibido explicación y comprendido todos los puntos aquí redactados, hacen este compromiso consciente de los riesgos que pueden afectar mi salud los cuales pueden ser generados por la labor que ejecuto o por los diversos que la rodean. Así mismo me comprometo a dar cumplimiento a todas las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que me sean indicados para el buen desarrollo de mi trabajo, me comprometo también a denunciar la debida oportunidad frente a mi cubrir solicitado por mi naturaleza. Doy consistente de que cualquier violación de mi parte a este compromiso pondrá en riesgo mi salud y ocasionara mi inmediato retiro y retiro de este centro de trabajo, además de las sanciones contractuales con como el contratante sobre contratista para el cual trabajo.

FECHA: 21-09-2023

FIRMA DEL TRABAJADOR

Einelder Gutierrez

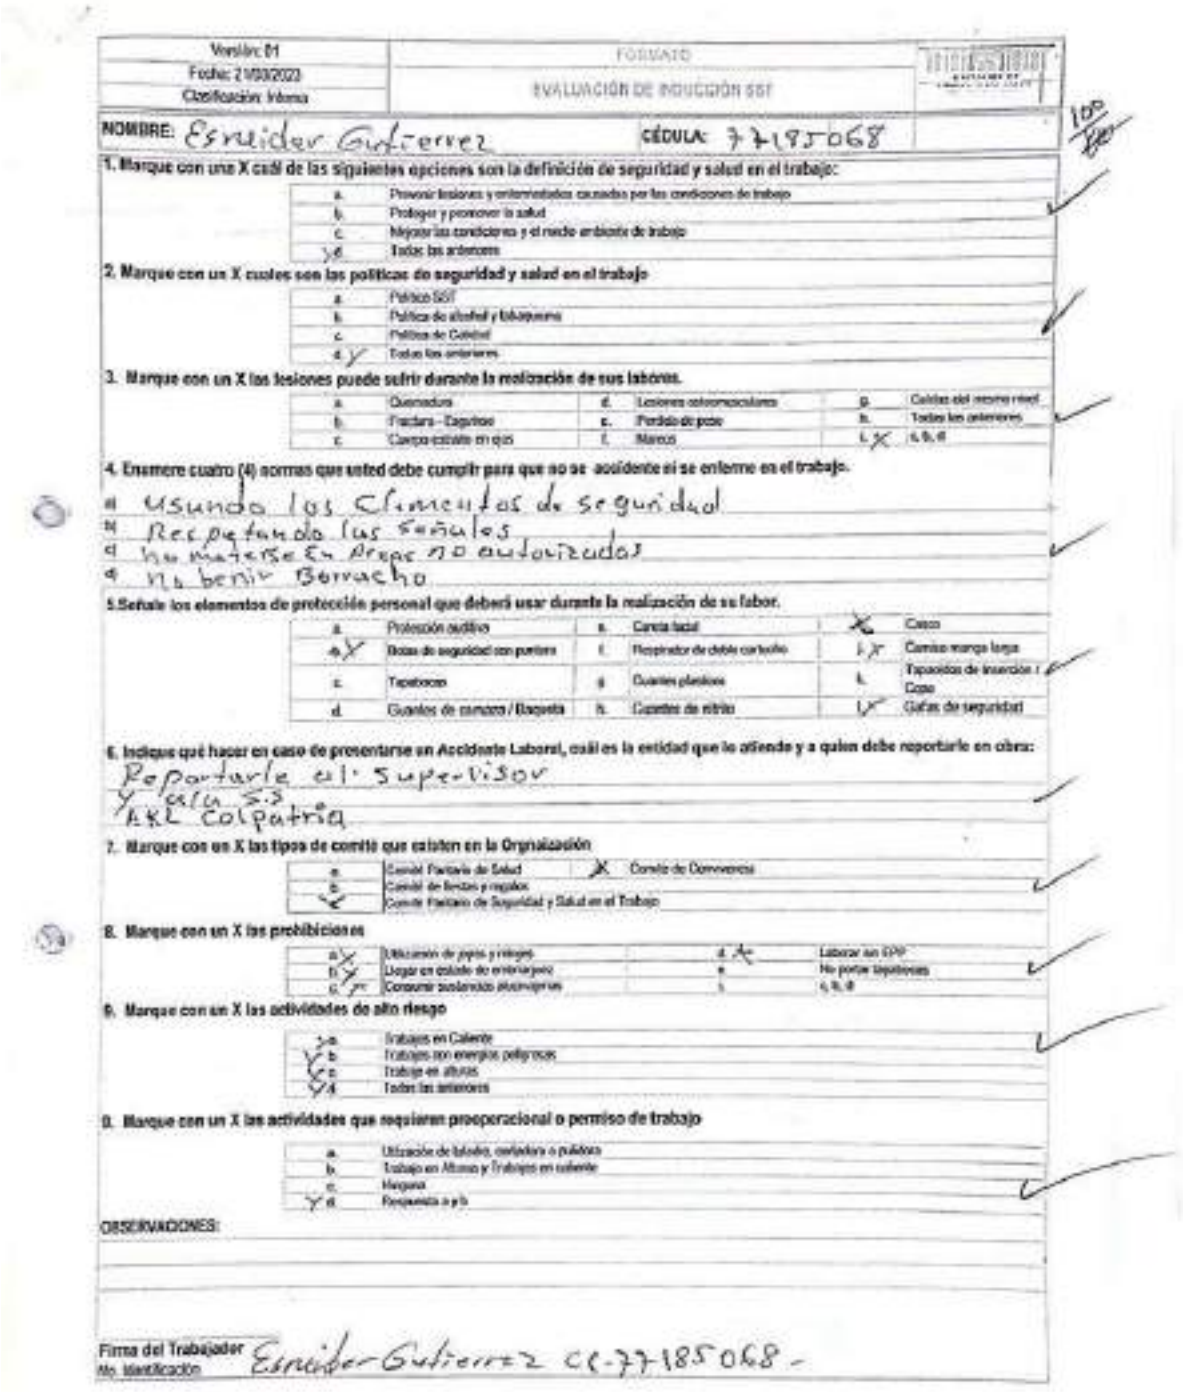

| Versión: 01 | FORMATO |
|---|---|
| Fecha: 21/03/2022 | EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST |
| Clasificación: Interna | |

NOMBRE: Esnaider Gutierrez CÉDULA: 77185068

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

| | |
|---|---|
| a. | Provocar lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo |
| b. | Proteger y promover la salud |
| c. | Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo |
| X d. | Todas las anteriores |

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

| | |
|---|---|
| a. | Política SST |
| b. | Política de alcohol y tabaquismo |
| c. | Política de Calidad |
| X d. | Todas las anteriores |

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Quemaduras | d. | Lesiones osteomusculares | g. | Caídas del mismo nivel |
| b. | Fracturas - Esguinces | e. | Perdida de pelo | h. | Todas las anteriores |
| c. | Cuerpo extraño en ojos | f. | Mareos | i. X | a, b, d |

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente si se enferme en el trabajo.

1 Usando los Elementos de seguridad
2 Respetando las señales
3 No meterse en Areas no autorizadas
4 No venir Borracho

5. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Protección auditiva | e. | Careta facial | X | Casco |
| a. X | Botas de seguridad con puntera | f. | Respirador de doble cartucho | i. X | Camisa manga larga |
| c. | Tapabocas | g. | Guantes plásticos | k. | Tapaoidos de inserción / Copa |
| d. | Guantes de carnaza / Baqueta | h. | Cuantes de nitrilo | l. X | Gafas de seguridad |

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarlo en obra:

Reportarle al Supervisor
Y acta S.S
ARL Colpatria

7. Marque con en X las tipos de comité que existen en la Organización

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Comité Paritario de Salud | X | Comité de Convivencia |
| b. | Comité de Bienes y regalos | | |
| c. X | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | | |

8. Marque con un X las prohibiciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. X | Utilización de joyas y relojes | d. X | Laborar sin EPP |
| b. X | Llegar en estado de embriaguez | e. | No portar licencias |
| c. X | Consumir sustancias alucinógenas | i. | a, b, d |

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo

| | |
|---|---|
| X a. | Trabajos en Caliente |
| X b. | Trabajos con energías peligrosas |
| X c. | Trabajo en alturas |
| X d. | Todas las anteriores |

10. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo

| | |
|---|---|
| a. | Utilización de taladro, martillera o pulidora |
| b. | Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente |
| c. | Ninguna |
| X d. | Respuesta a y b |

OBSERVACIONES:

Firma del Trabajador Esnaider Gutierrez C.C. 77185068
No. Identificación

| | | |
|---|---|---|
| Versión:02 | | |
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |


Conforme a lo expuesto yo, Ernesto Gutierrez, portador de la cedula de ciudadanía 7718508 desempeñando el cargo de Vigilante, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Rickettsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a esta zona nuestra debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras (blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión 02 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Esnider Gutierrez

Firma: Esnider Gutierrez Fecha: 21-09-2023

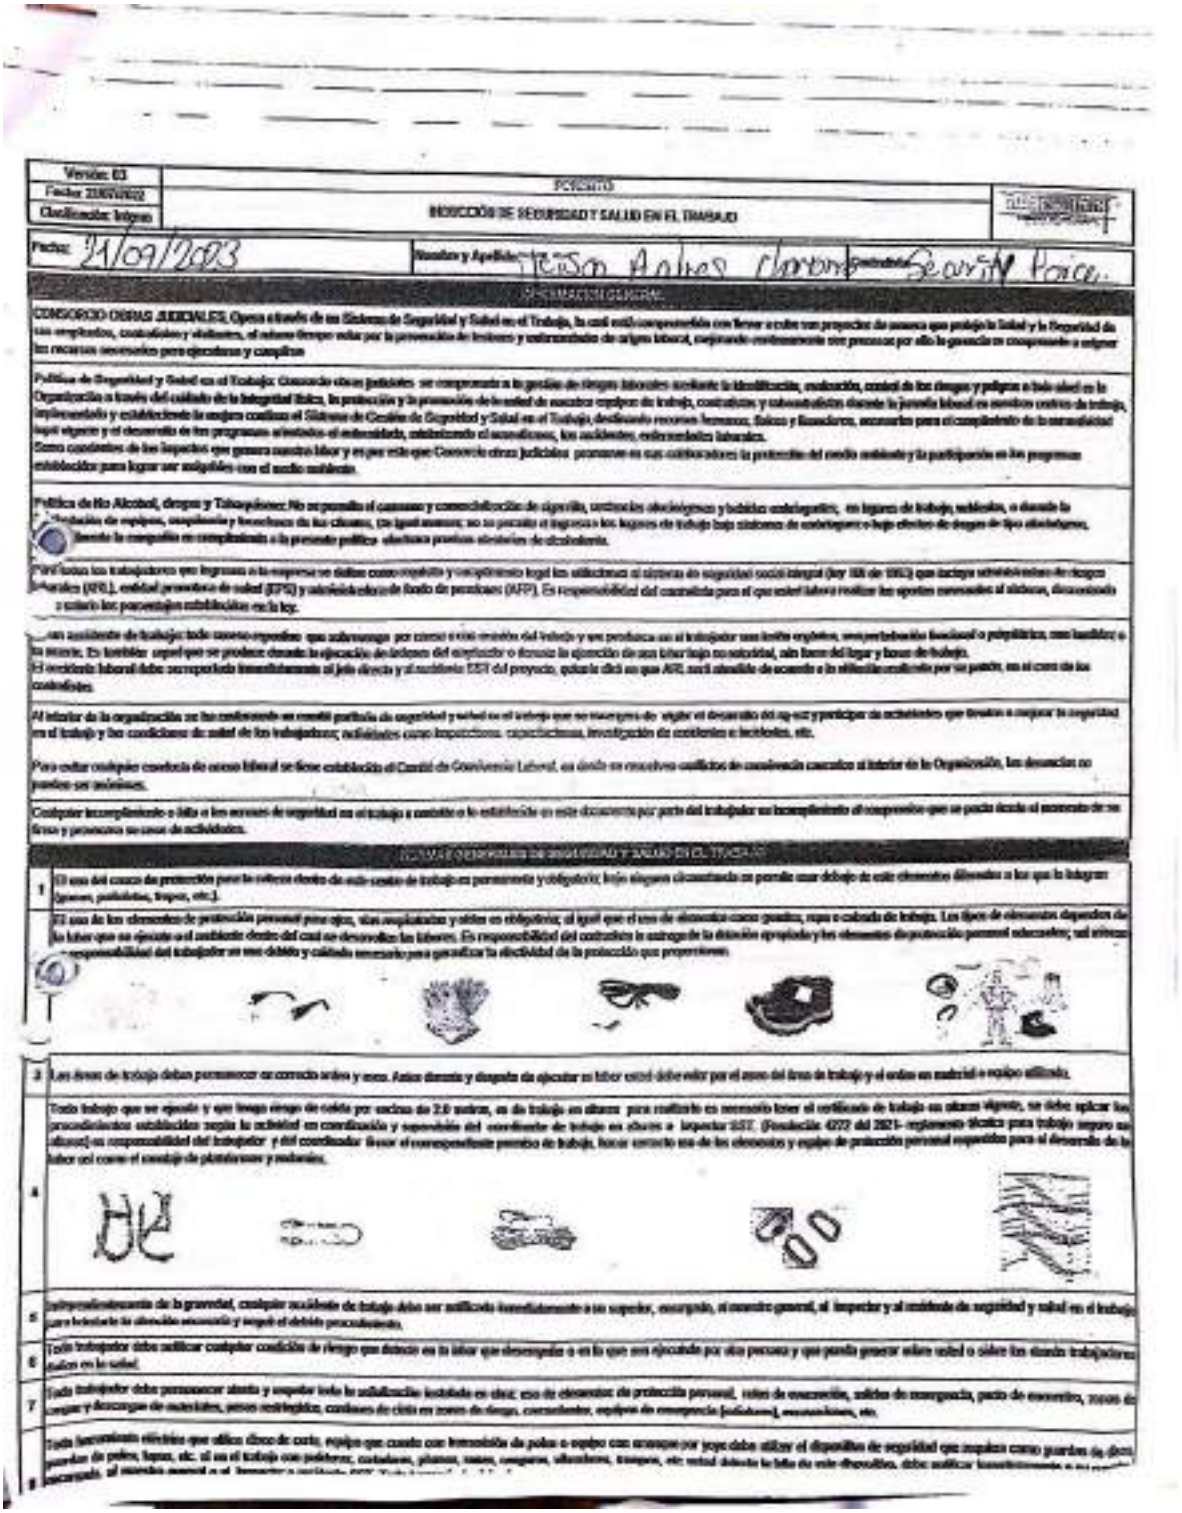

Versión: 03
Fecha: 23/03/2022
Clasificación: Interna

FORMATO

INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 21/09/2023

Nombre y Apellidos: Jesus Andres Clavijo

Contratista: Seguridad Poica.

INFORMACIÓN GENERAL

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, Opera a través de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometida con llevar a cabo un proyecto de mejora que proteja la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, al mismo tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, mejorando continuamente con procesos por ello la garantía en cumplimiento a mejorar los recursos necesarios para ejecutarlos y cumplirlos

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete en la gestión de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a toda salud en la Organización a través del cuidado de la Integridad física, la protección y la promoción de la salud de nuestros equipos de trabajo, contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementando y estableciendo la mejora continua el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas orientados al autocuidado, minimizando el ausentismo, los accidentes, enfermedades laborales.
Somos conscientes de los impactos que genera nuestro labor y es por esto que Consorcio obras judiciales promueven en sus colaboradores la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, vehículos, o durante la realización de equipos, ocupaciones y funciones de las citadas, (en igual manera) no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo sistemas de embriaguez o bajo efectos de drogas de tipo alucinógenas, siendo la compañía en cumplimiento a la presente política adoptara practicas alternativas de alcoholismo.

Para todos los trabajadores que ingresan a la empresa se deben cumplir y cumplimiento legal los afiliaciones al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluye administradoras de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que usted labora realizar los aportes mensuales al sistema, dicho mismo a todos los porcentajes establecidos en la ley.

Un accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y hora de trabajo.
El accidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe directo y al residente SST del proyecto, quien le dirá en que ARL usará afiliado de acuerdo a la afiliación realizada por su patrón, en el cual de los contratos.

Al interior de la organización se han conformado un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que se encargara de velar el desarrollo del sig-saz y participar de actividades que tiendan a mejorar la seguridad en el trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores; actividades como inspecciones, capacitaciones, investigación de accidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conducta de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, en donde se resuelven conflictos de convivencia suscitados al interior de la Organización, las denuncias no pueden ser anónimas.

Cualquier incumplimiento o falta a los acuerdo de seguridad en el trabajo a contribir o lo establecido en este documento por parte del trabajador un incumplimiento al compromiso que se pacto desde el momento de su firma y permanencia en casa de actividades.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1 El uso del casco de protección para la cabeza dentro de este centro de trabajo es permanente y obligatorio; bajo ninguna circunstancia se permite usar debajo de este elementos diferentes a los que la Integran (gorras, pañoletas, trapos, etc.).

2 El uso de los elementos de protección personal para ojos, vías respiratorias y oídos es obligatorio; al igual que el uso de elementos contra guantes, ropa o calzado de trabajo. Los tipos de elementos dependen de la labor que se ejecute en el ambiente dentro del cual se desarrollan las labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de la dotación apropiada y los elementos de protección personal adecuados; así mismo es responsabilidad del trabajador un uso debido y cuidado necesario para garantizar la efectividad de la protección que proporcionan.



3 Las áreas de trabajo deben permanecer en correcto orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor usted debe velar por el aseo del área de trabajo y el orden en material o equipo utilizado.

4 Todo trabajo que se ejecute y que tenga riesgo de caída por encima de 2.0 metros, en de trabajo en alturas para realizarlo es necesario tener el certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas e inspector SST. (Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas) es responsabilidad del trabajador y del coordinador firmar el correspondiente permiso de trabajo, hacer correcto uso de los elementos y equipos de protección personal requeridos para el desarrollo de la labor así como el montaje de plataformas y andamios.




5 Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior, encargado, al maestro general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para brindarle la atención necesaria y seguir el debido procedimiento.

6 Todo trabajador debe notificar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeñe o en la que sea ejecutada por otra persona y que pueda generar sobre salud o sobre los demás trabajadores daños en la salud.

7 Todo trabajador debe permanecer atento y respetar todas las señalizaciones instaladas en obra: uso de elementos de protección personal, rutas de evacuación, salidas de emergencia, punto de encuentro, zonas de cargue y descargue de materiales, zonas restringidas, cordones de cinta en zonas de riesgo, corredores, equipos de emergencia (señalización), extintores, etc.

8 Todo herramienta eléctrica que utilice disco de corte, equipo que cuente con herramienta de golpe o equipo con arranque por jeye debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiera como guardas de disco, protector de polvo, lupas, etc. al no el trabajo con polvorines, cortadores, pilatos, cascos, cosqueras, silicadores, trapos, etc. usted debe de la falta de este dispositivo, debe notificar inmediatamente a su [illegible]

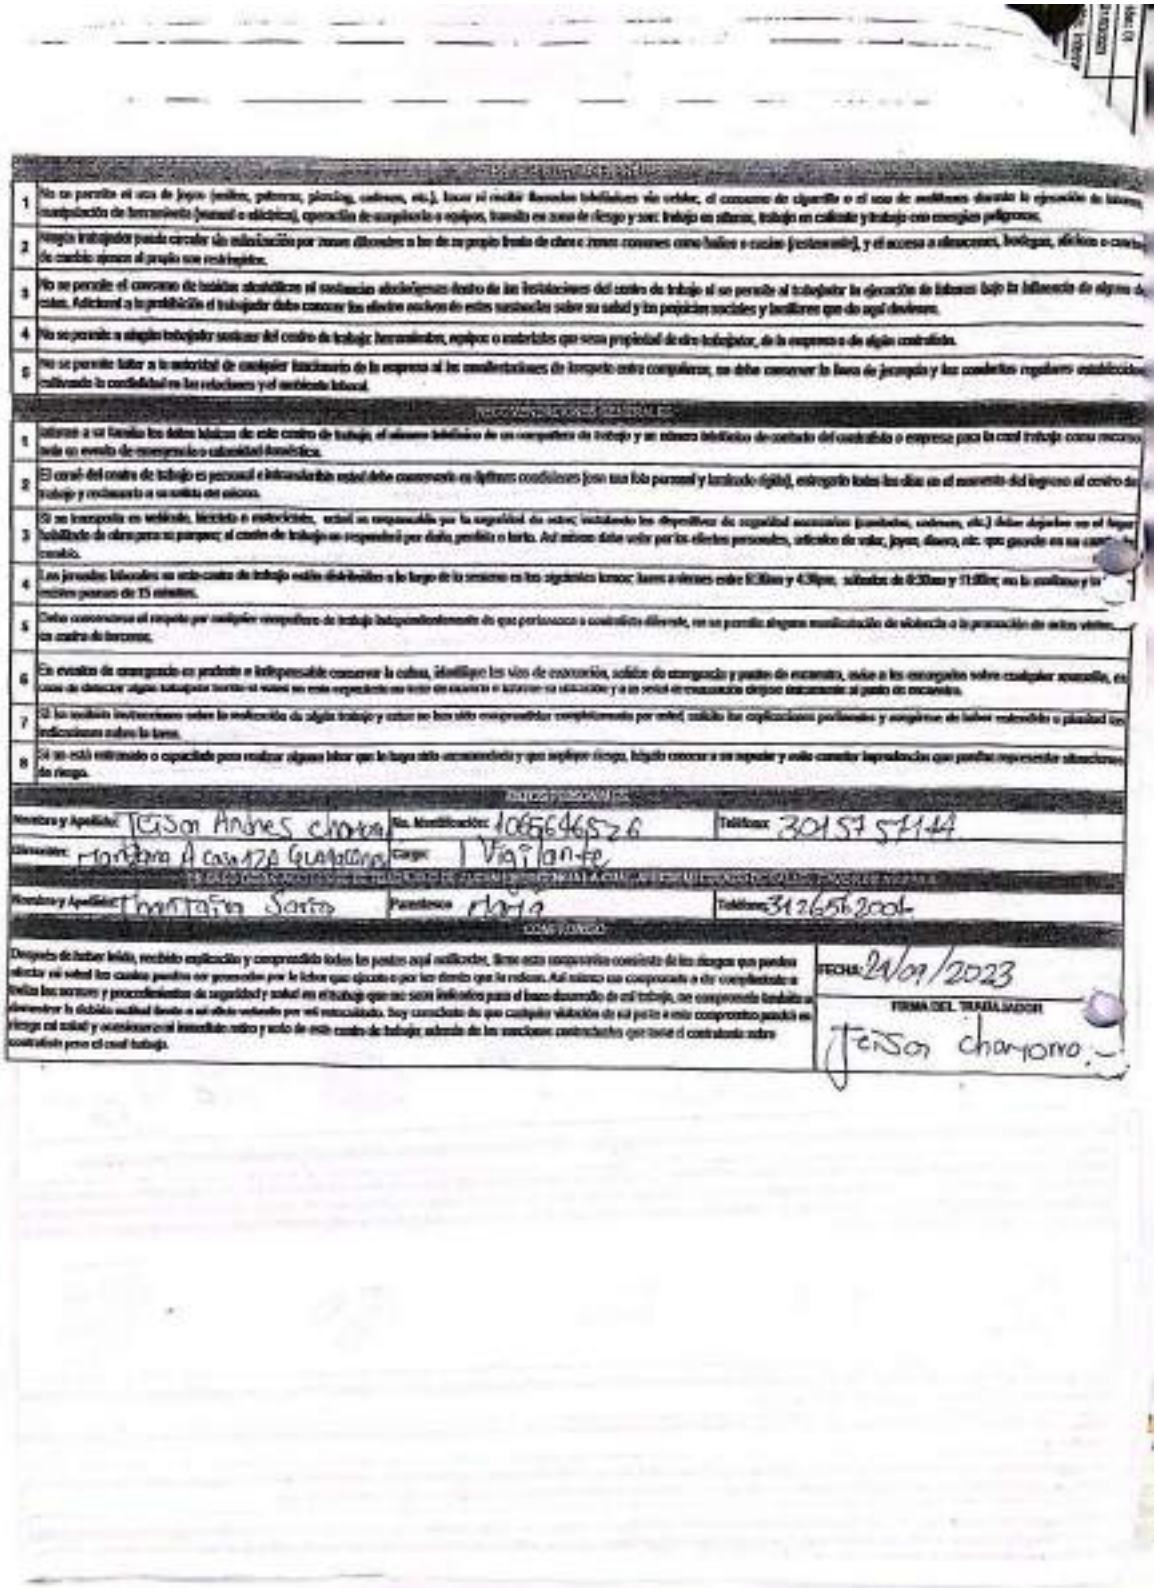

| | |
|---|---|
| 1 | No se permite el uso de joyas (anillos, pulseras, piercing, cadenas, etc.), hacer uso de celular durante labores de orden, el consumo de cigarrillo o el uso de medicamentos durante la ejecución de labores, manipulación de herramienta (manual o eléctrica), operación de maquinaria o equipos, tránsito en zona de riesgo y son: trabajo en alturas, trabajo en caliente y trabajo con energías peligrosas. |
| 2 | Ningún trabajador puede circular sin autorización por zonas diferentes a las de su propio frente de obra o zonas comunes como baños o cocina (restaurante), y el acceso a almacenes, bodegas, oficinas o cuartos de control ajenos al propio son restringidos. |
| 3 | No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni sustancias alucinógenas dentro de las instalaciones del centro de trabajo ni se permite al trabajador la ejecución de labores bajo la influencia de alguna de estas. Adicional a la prohibición el trabajador debe conocer los efectos nocivos de estas sustancias sobre su salud y las peijuicios sociales y laborales que de aquí devienen. |
| 4 | No se permite a ningún trabajador sustraer del centro de trabajo herramientas, equipos o materiales que sean propiedad de otro trabajador, de la empresa o de algún contratista. |
| 5 | No se permite faltar a la autoridad de cualquier funcionario de la empresa ni las manifestaciones de irrespeto entre compañeros, se debe conservar la buena de jerarquía y las conductas regulares establecidas cultivando la cordialidad en las relaciones y el ambiente laboral. |

**RECOMENDACIONES GENERALES**

| | |
|---|---|
| 1 | Informar a su familia los datos básicos de este centro de trabajo, el número telefónico de un compañero de trabajo y un número telefónico de contacto del contratista o empresa para la cual trabaja como recurso ante un evento de emergencia o calamidad doméstica. |
| 2 | El carné del centro de trabajo es personal e intransferible usted debe conservarlo en óptimas condiciones (con una foto personal y legislado digital), entregarlo todos los días en el momento del ingreso al centro de trabajo y reclamarlo a su salida en oficina. |
| 3 | Si un trabajador en embriaguez, bicicleta o motocicleta, usted es responsable por la seguridad de estos; suministrar los dispositivos de seguridad necesarios (guantes, cascos, etc.) debe dejarlos en el lugar habilitado de obra para su parqueo; el centro de trabajo no responderá por daños, pérdida o hurto. Así mismo debe velar por los efectos personales, artículos de valor, joyas, dinero, etc. que guarde en su casillero. |
| 4 | Las jornadas laborales en este centro de trabajo están distribuidas a lo largo de la semana en los siguientes horas: lunes a viernes entre 8:30am y 4:30pm, sábados de 8:30am y 11:00m; en la mañana y la tarde tendrán quince de 15 minutos. |
| 5 | Todas conversaciones el respecto por cualquier compañero de trabajo independientemente de que pertenezca a contratista diferente, no se permite ningún manifestación de violencia o la generación de estos ventos en centro de trabajo. |
| 6 | En eventos de emergencia es prudente e indispensable conservar la calma, identifique las vías de evacuación, señales de emergencia y puntos de encuentro, avise a los encargados sobre cualquier anomalía, en caso de detectar algún trabajador herido en usted no evite capacidad no trate de auxiliarlo o levantar su ubicación y a la señal de evacuación diríjase inmediatamente al punto de encuentro. |
| 7 | Si las medidas implementadas sobre la realización de algún trabajo y estas no han sido comprendidas completamente por usted, solicite las explicaciones pertinentes y asegúrese de haber entendido a plenidad las indicaciones sobre la tarea. |
| 8 | Si no está entrenado o capacitado para realizar alguna labor que le haya sido encomendada y que implique riesgo, háganlo conocer a su superior y evite cometer improvisación que pueden representar situaciones de riesgo. |

**DATOS PERSONALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre y Apellido: | Jesus Andres chamorro | No. Identificación: | 1066646526 |
| Dirección: | manzana A casa 12A Guayacanes | Cargo: | Vigilante |
| Teléfono: | 3015755144 | | |

**EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE CON**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre y Apellido: | Jonatan Soto | Parentesco | Novio |
| Teléfono: | 3126562001 | | |

**COMPROMISO**

Después de haber leído, recibido explicación y comprendido todos los puntos aquí mencionados, firmo este compromiso consiente de los riesgos que pueden afectar mi salud los cuales pueden ser generados por la labor que ejecuto o por los demás que la rodean. Así mismo me comprometo a dar cumplimiento a todas las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que me sean indicados para el buen desarrollo de mi trabajo, me comprometo también a observar la debida cautela durante el uso de los elementos suministrados por mi empleador. Soy consciente de que cualquier violación de mi parte a este compromiso pondrá en peligro mi salud y ocasionará mi inmediato retiro y retiro de este centro de trabajo además de las sanciones contractuales que tiene el contratista sobre trabajador para el cual trabaja.

FECHA: 24/09/2023

FIRMA DEL TRABAJADOR

Jesus chamorro

| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 21/03/2022 | EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST | |
| Clasificación: Interna | | |

NOMBRE: Teison Andres Chamorro Soria CÉDULA: 1065646526

**1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:**

| | |
|---|---|
| a. | Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo |
| b. | Proteger y preservar la salud |
| c. | Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo |
| d. X | Todas las anteriores |

**2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo**

| | |
|---|---|
| a. | Política SST |
| b. | Política de alcohol y tabaquismo |
| c. | Política de Calidad |
| d. X | Todas las anteriores |

**3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Quemadura | d. | Lesiones osteomusculares | g. | Golpes de mismo nivel |
| b. | Fracturas - Esguinces | e. | Pérdida de peso | h. X | Todas las anteriores |
| c. | Golpe contra objetos | f. | Mareos | i. | c, b, d |

**4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.**

1) Respetando la Señalización
2) Utilizando los elementos de protección personal.
3) No Conducir por áreas no autorizadas
4) No Venir bajo los efectos del alcohol a laborar.

**5.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Protección auditiva | e. | Camisa jean | j. X | Casco |
| b. X | Botas de seguridad con puntera | f. | Respirador de doble cartucho | k. X | Camisa manga larga |
| c. X | Tapabocas | g. | Guantes plásticos | l. | Tapaoidos de inserción / Copa |
| d. | Guantes de carnaza / Raqueta | h. | Guantes de látex | m. X | Gafas de seguridad |

**6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarlo en obra:**

Reportarme a mi Jefe Inmediato de lo sucedido.

**7. Marque con un X los tipos de comité que existen en la Organización**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Comité Paritario de Salud | X | Comité de Convivencia |
| b. | Comité de Orden y Higiene | | |
| c. X | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | | |

**8. Marque con un X las prohibiciones**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. X | Utilización de joyas y relojes | d. X | Laborar sin EPP |
| b. X | Ingerir un estado de embriaguez | e. X | No portar herramientas |
| c. X | Consumir sustancias alucinogenas | f. X | a, b, d |

**9. Marque con un X las actividades de alto riesgo**

| | |
|---|---|
| a. X | Trabajos en Caliente |
| b. X | Trabajos con energías peligrosas |
| c. X | Trabajo en alturas |
| d. X | Todas las anteriores |

**9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo**

| | |
|---|---|
| a. | Utilización de taladro, cortadora o pulidora |
| b. | Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente |
| c. X | Ninguno |
| d. | Respuesta a y b |

**OBSERVACIONES:**

Teison Chamorro.
**Firma del Trabajador**
No. Identificación 1065646526.

Interventoría

| | | |
|---|---|---|
| Versión 02 | | |
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interna | | |

Conforme a lo expuesto yo, Angela Manzano portador de la cedula de ciudadanía 43048151 desempeñando el cargo de Coord. Grupo Proy. Desc. he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACIÓN DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar los correctivos de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Física | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI. |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frio) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Aseo debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras físicas (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | No comer beber fumar en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Presión anormal (hiperbarias | |

| Versión:02 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Glendy Jimenez Pedroza

Firma: Glendy Jimenez Fecha: 10-09-2023

| Versión:02 | |
|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interno | |

Conforme a lo expuesto yo, DIEGO G. PAPPA T, portador de la cedula de ciudadanía 7184210 desempeñando el cargo de Asesor Estructural, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, ejecutar las correctas de evacuación. Uso de EPP/EPI |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras (blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | No consumir bebidas/fumar en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión:02 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No ordenar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Aguilizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Tormenta<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbo<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: DIEGO G. PAPPA TORRES

Firma:

Fecha: 11-09-23

Proveedor

| Versión:02 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | | |
| Clasificación: Interno | | |

Conforme a lo expuesto yo, Cristian Samuel Luis Vélez, portador de la cedula de ciudadanía: 1010219934 desempeñando el cargo de Proveedor Técnico Obras, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Rickettsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras Blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | No comer beber fumar en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión 02 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológicos | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Cristhian S. León Uribe

Firma:

Fecha: Septiembre 11 de 2025

| Versión 02 | | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |

Conforme a lo expuesto yo, Eduardo Medina Rey portador de la cedula de ciudadanía 9637061 desempeñando el cargo de Ejecutivo C14 he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (espectro intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual, guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras Blindaje (plomo).<br>Prever posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer beber fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión:02 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Leonardo Medina

Firma:

Fecha: 14 Septiembre 2023

Proveedor

| | |
|---|---|
| Versión:02 | |
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interno | |

Conforme a lo expuesto yo, Abad Magaa Prado portador de la cedula de ciudadanía 1120349141 desempeñando el cargo de Jefe de Operaciones, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánicos | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Rickettsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frio) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados.<br>Disminuir el tiempo de exposición. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras Blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Fuentes endógenas (metabólicos) | |



NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

| | | |
|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas antes de operar de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Aguzar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se las puede ver bien vestidas, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Tormenta<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Alberto Marcos Pinto

Firma: Pinto M.


Fecha: 16-09-2023

Proveedor

| Versión: 02 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | | |
| Clasificación: Interno | | |

Conforme a lo expuesto yo, carlos contreras, portador de la cedula de ciudadanía, 84.009116 desempeñando el cargo de oficial civil, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Rickettsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI. |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras /blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

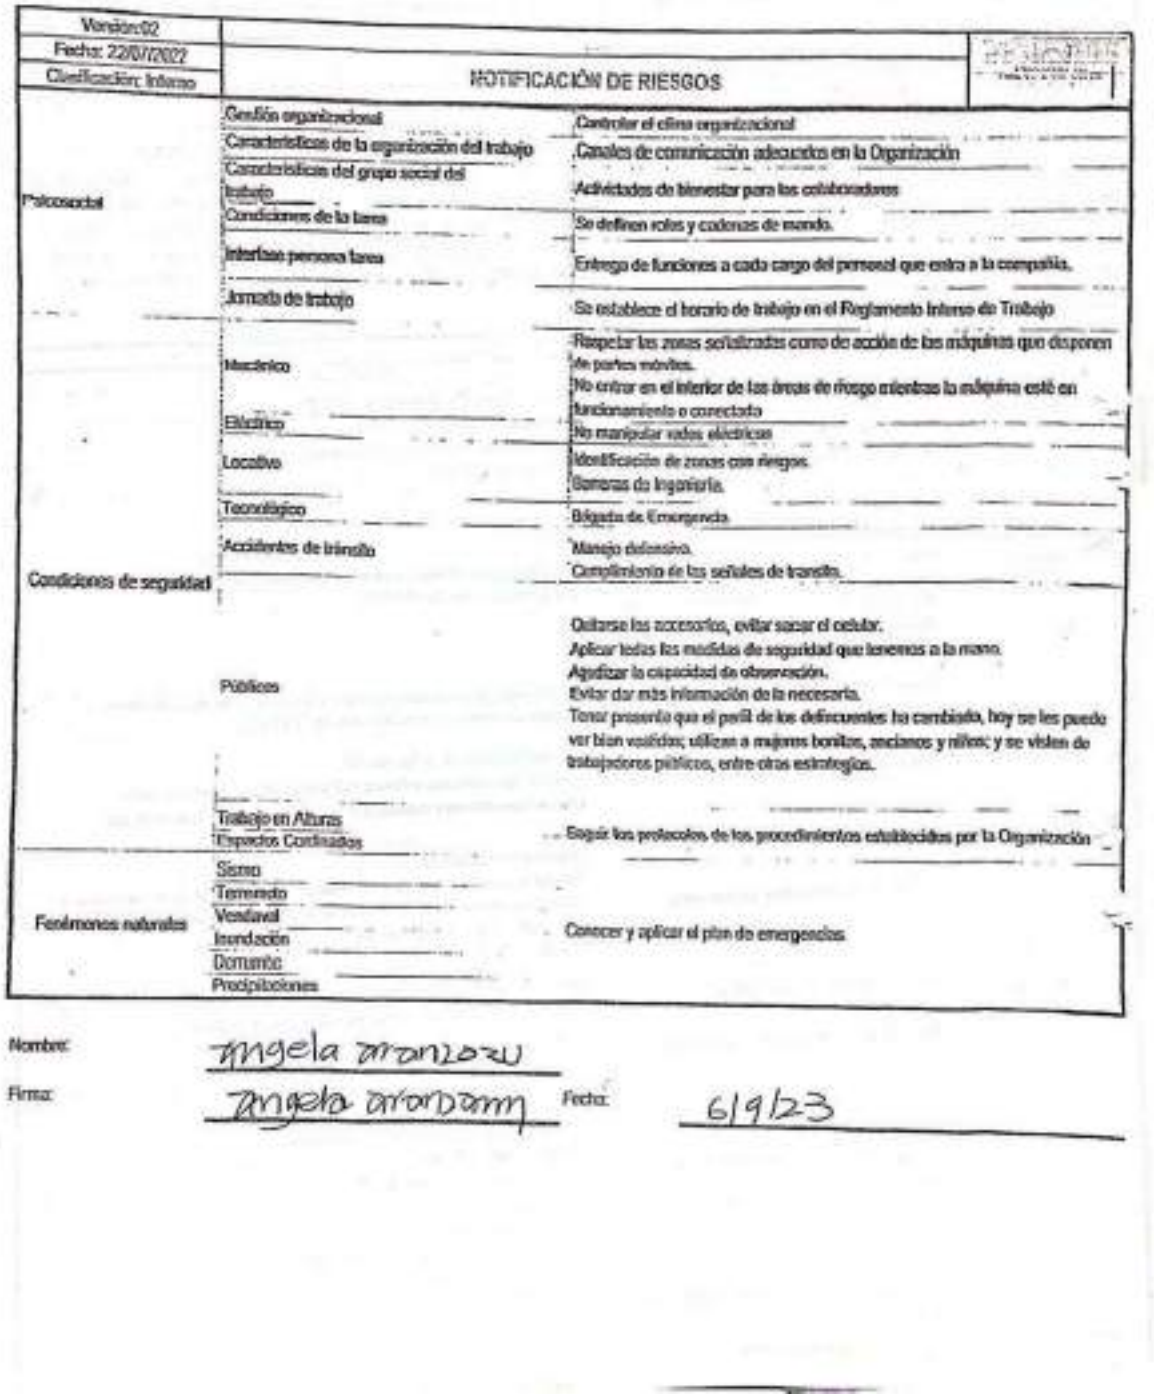

Versión:02
Fecha: 22/07/2022
Clasificación: Interno

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

| | | |
|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular cables eléctricos |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Ocultarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Temporal<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |


Nombre: Angela Arandzu


Firma: Angela Arandzu Fecha: 6/9/23

| Versión:02 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interface persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: carlos contreras

Firma: carlos c. Fecha: 16-09-2023

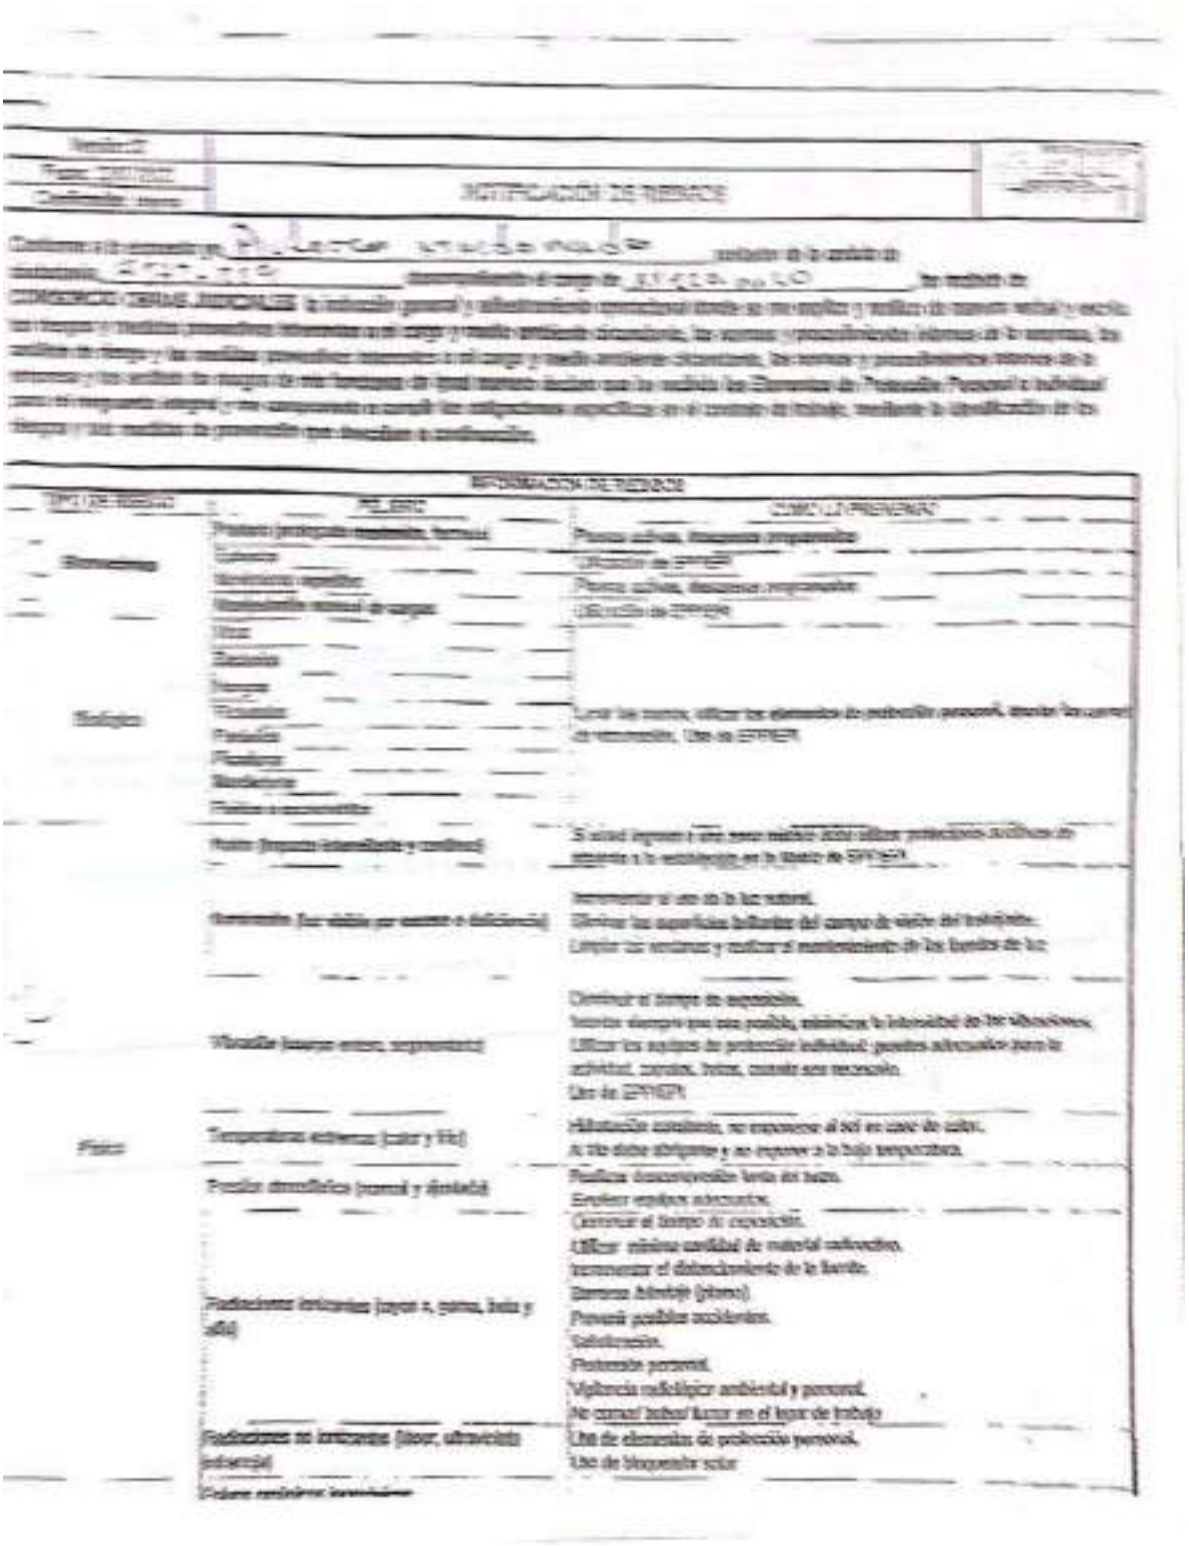

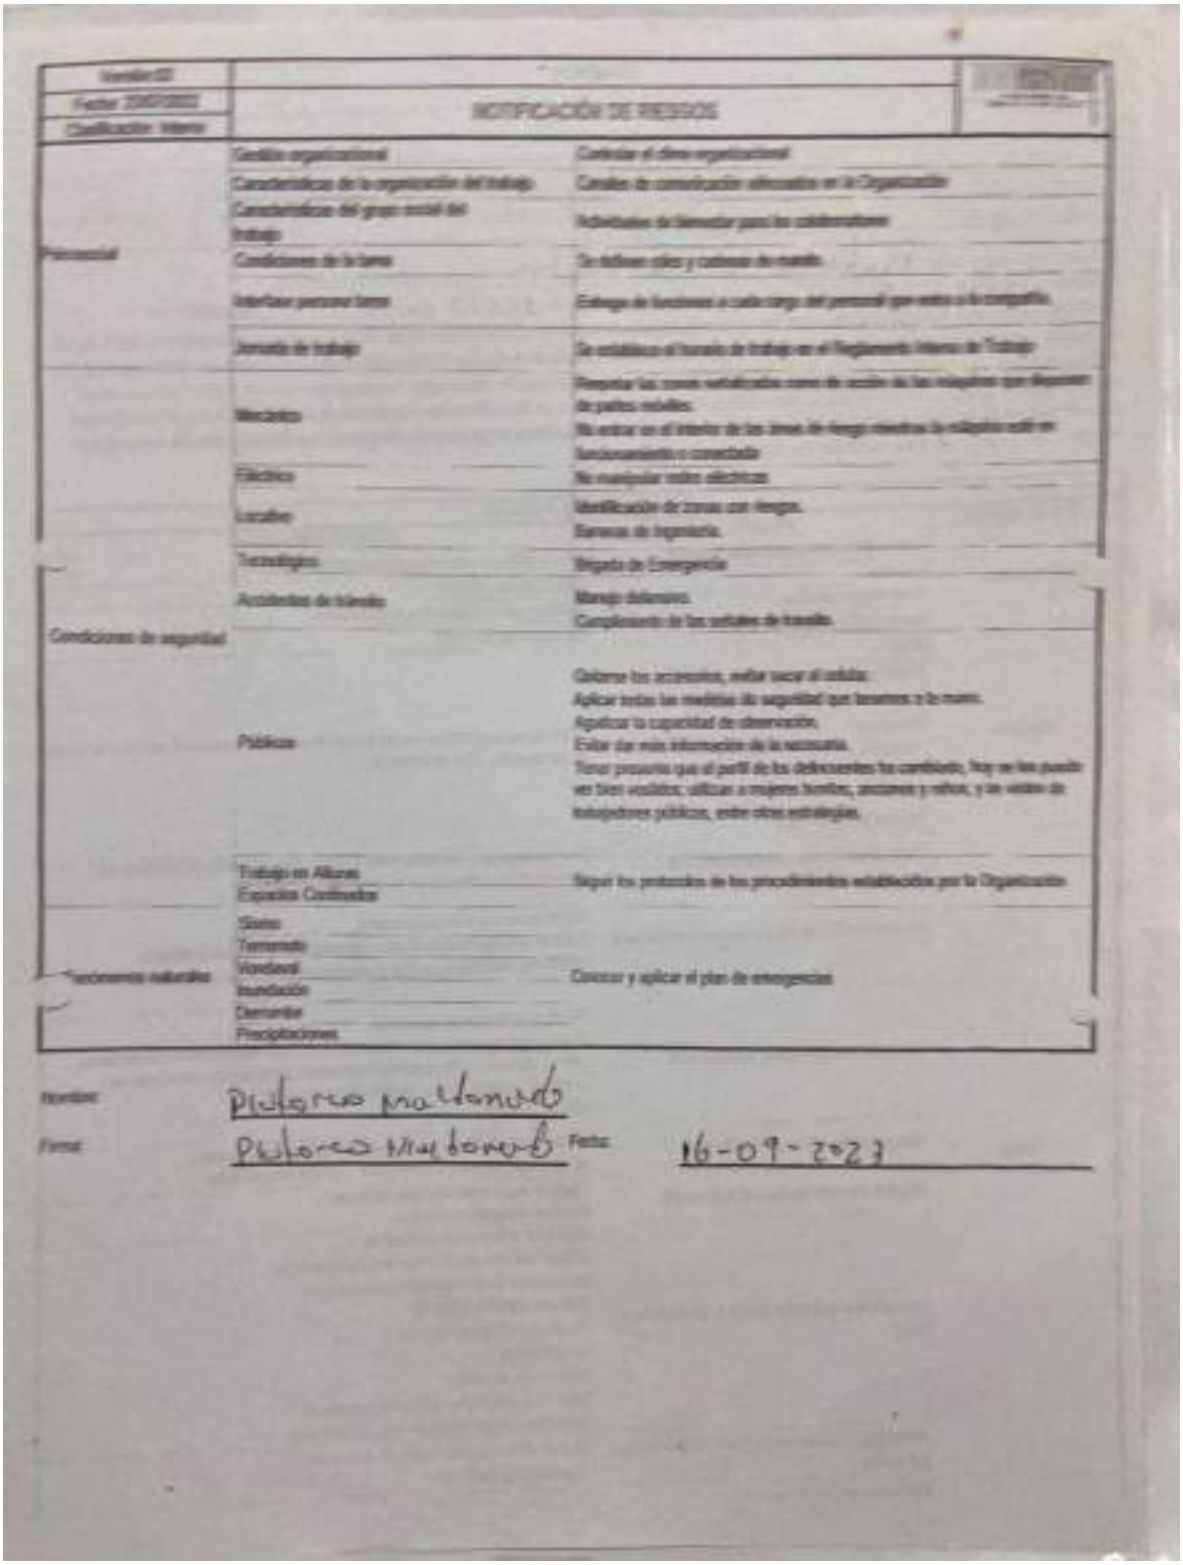

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

| | | |
|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando |
| | Interfase persona-tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánicos | Preoperar las zonas verticalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de ingeniería. |
| | Tecnológicos | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Cubrirse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Aguzar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres hombres, ancianos y niños, y las víctimas de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Pedro Maldonado

Firma: Pedro Maldonado Fecha: 16-09-2021

| | | |
|---|---|---|
| Versión:02 | | |
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interna | | |

Conforme a lo expuesto yo, Harold Montaño Jaimes portador de la cedula de ciudadanía 93.130.10 desempeñando el cargo de proyectista elect. mecanico B, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENIGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI. |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras /blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Pulsos electromagnéticos | |

| | | |
|---|---|---|
| Versión 02<br>Fecha 20/07/2021<br>Clasificación Interna | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños, y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Marcela Montaña J

Firma:

Fecha: 18 Septiembre 2023

| Versión:02 | |
|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interna | |

Conforme a lo expuesto yo, Efrain Fuentes Quintero, portador de la cedula de ciudadanía, 15194985 desempeñando el cargo de Ing. Gestor, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifica de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS

| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
|---|---|---|
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras /blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Pulsos ondulatorios inaudibles | |



NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

| | | |
|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Comunicar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación utilizados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o accesible |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Elementos de ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Público | Cubrirse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Aguzar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños, y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Tormenta<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Efrain Fuentes Ortiz

Firma:

Fecha: 18 Septiembre 2023

| Versión 02 | |
|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interna | |

Conforme a lo expuesto yo, Ricardo Marcia, portador de la cedula de ciudadania, 79309010 desempeñando el cargo de Director De Obra, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Llevar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parasitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frio) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados.<br>Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Barreras (blindaje (plomo)<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infarroja) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Pobres condiciones ergonómicas | |

| | | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
|---|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional | |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación establecidos en la Organización | |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores | |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. | |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. | |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo | |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas (sus diversas partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada | |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas | |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Elementos de Ingeniería. | |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia | |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. | |
| | Público | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. | |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización | |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Temporal<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias | |

Nombre: Ricardo Murcia

Firma: [signature] Fecha: 19- Sep 2023

Proveedor Directo

| | |
|---|---|
| Versión:02 | |
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interna | |

Conforme a lo expuesto yo, JAVIER REIZA WAYE, portador de la cedula de ciudadanía, 77 67 635 desempeñando el cargo de O.P AUTOCAMBA, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

**INFORMACION DE RIESGOS**

| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
|---|---|---|
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | El aseo ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI. |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz. |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frio) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radiactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras Absorbe (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | No comer, beber, fumar en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos combustibles (orgánicos) | |

| | |
|---|---|
| Versión:02 | |
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interna | |

Conforme a lo expuesto yo, Francisco Herrera Caldenón, portador de la cedula de ciudadanía 79.481.231 desempeñando el cargo de Auxiliar Contabilidad, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENIDO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | El aseo ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Usamos blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarrojo) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión:02 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/01/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interface persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: JAVIER AREZA

Firma:

Fecha: 19- SEP- 23

| Versión:02 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | |
| Clasificación: Interna | |

Conforme a lo expuesto yo, Jhon Faloz R, portador de la cédula de ciudadanía 1065 694.652 desempeñando el cargo de Topógrafo, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACIÓN DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENIMOS |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados.<br>Disminuir el tiempo de exposición. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras /blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Peligros ambientes inundables | |

| Versión:02<br>Fecha: 22/07/2022<br>Clasificación: Interno | FORMATO<br>NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Thonis Fraboto

Firma: [signature]

Fecha: 26/Sep/2023

| | | |
|---|---|---|
| Versión:02 | | |
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |

Conforme a lo expuesto yo, Rafael Ortiz Cortés, portador de la cedula de ciudadanía 1172409139 desempeñando el cargo de Topografo, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACIÓN DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI. |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Mientras siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, botas, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados.<br>Disminuir el tiempo de exposición. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras /blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |



Versión:02 FORMATO

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

| Versión:02 | | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbo<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Rafael Cielo Conde

Firma:

Fecha: 26/09/23

| | | |
|---|---|---|
| Versión:02 | | |
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |

Conforme a lo expuesto yo, Brayan Perez Guerrero, portador de la cedula de ciudadanía 1045 [illegible] desempeñando el cargo de Ayudante de cuadrilla, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Rickettsias | |
| | Parasitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentario) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frio) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados.<br>Disminuir el tiempo de exposición. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>(barreras /blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarrojo) | No comer bebes/ fumar en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión:02 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | | |
| Clasificación: Interna | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Aguzar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Torrencia<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Diana Ponce C

Firma:

Fecha: 27-09/2023

| | |
|---|---|
| Versión:02 | |
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interno | |

Conforme a lo expuesto yo, [illegible], portador de la cedula de ciudadanía [illegible] desempeñando el cargo de [illegible], he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACIÓN DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánicos | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Rickettsias | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresará a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI. |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no espere a sentir sed en caso de calor.<br>Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados.<br>Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Barreras (blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarrojo) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión:02<br>Fecha: 22/07/2022<br>Clasificación: Interno | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Antagus Cumbal

Firma: Antagus Cumbal


Fecha: 27-09/2023

Inducción

| Versión:02 | |
|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interna | |

Conforme a lo expuesto yo, Jhon Davi Montiesgo Méndez, portador de la cedula de ciudadanía 1077071679, desempeñando el cargo de Inspector de seguridad, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACIÓN DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI. |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínimo cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras Atenuación (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer beber fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

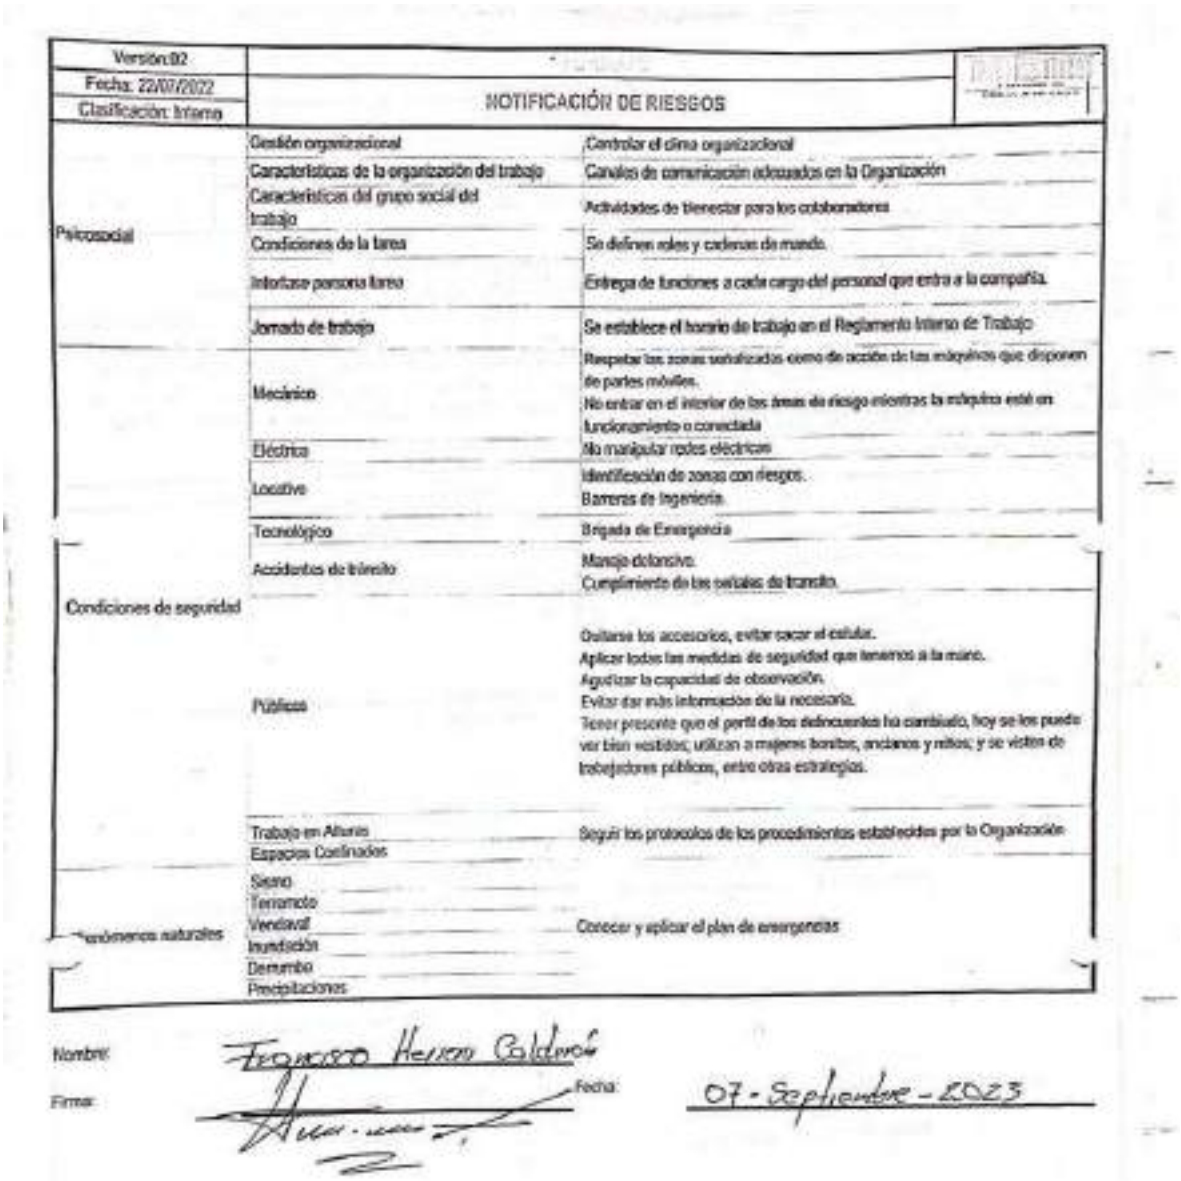

Versión:02
Fecha: 22/07/2022
Clasificación: Interna


NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

| | | |
|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de los equipos que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| | Espacios Confinados | |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbo<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Francisco Heiron Calderón

Firma:

Fecha: 07 - Septiembre - 2023

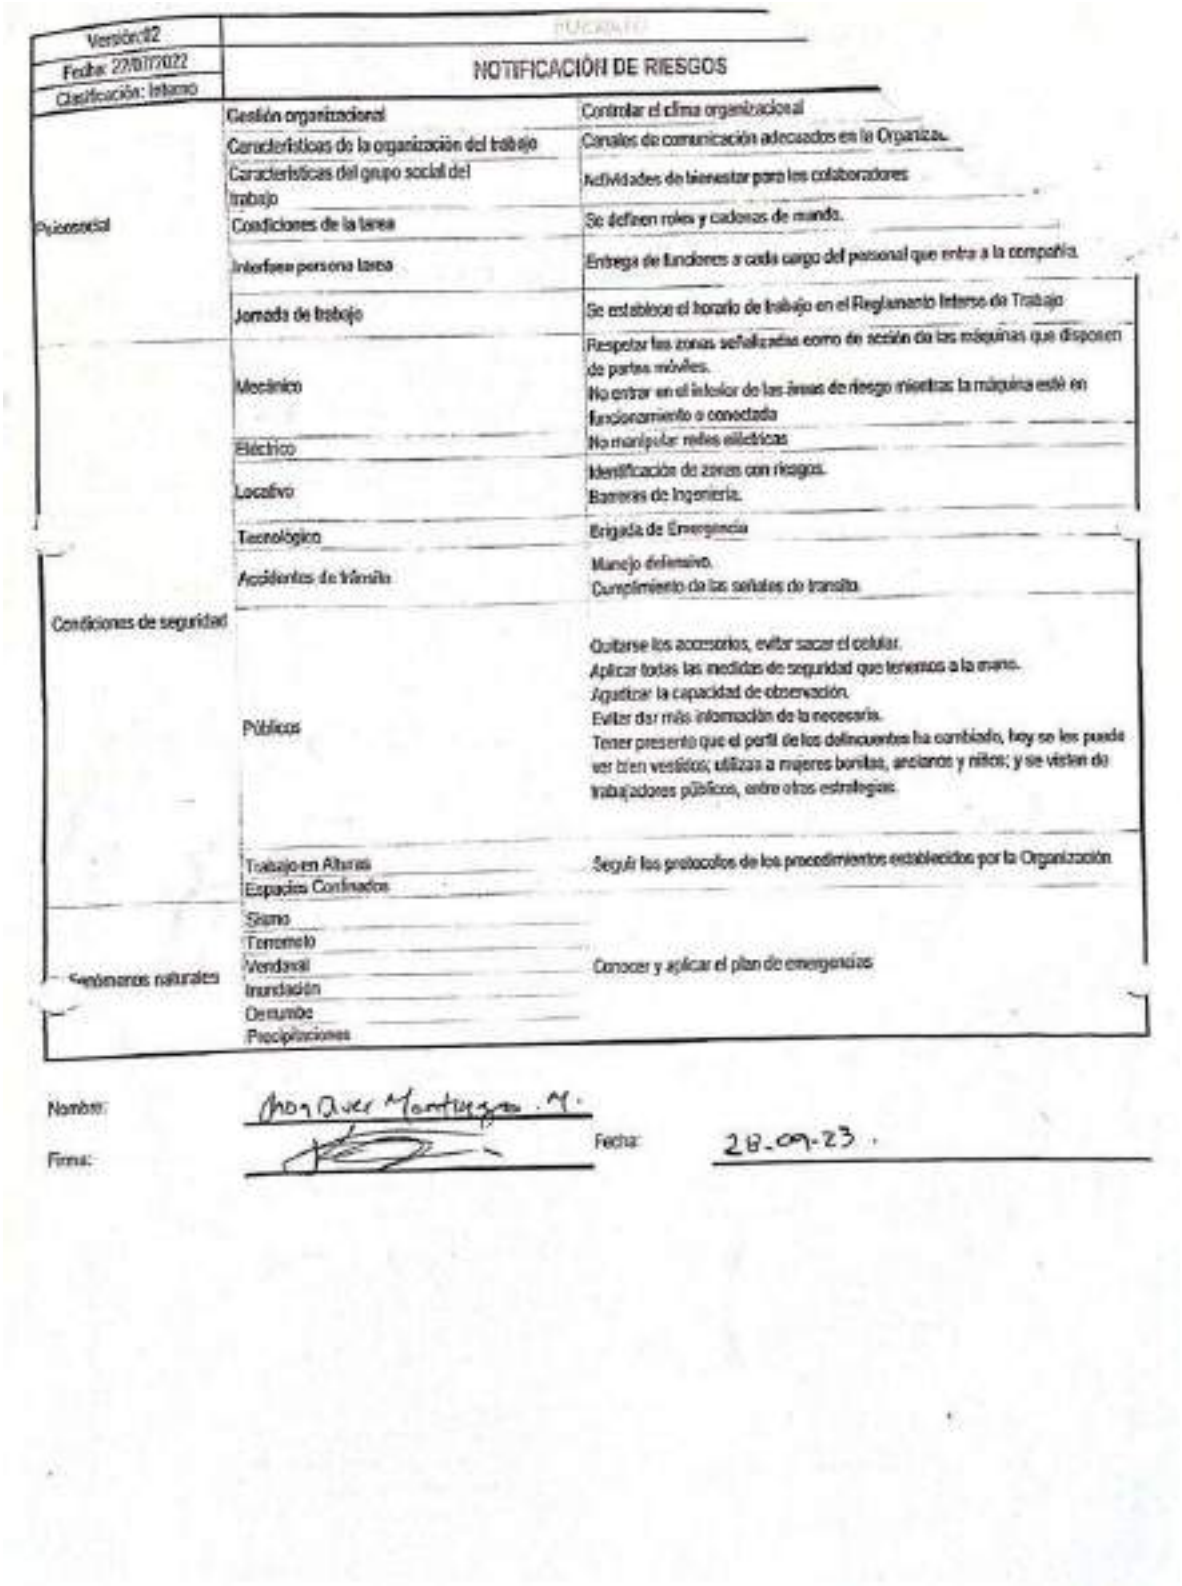

Versión:02
Fecha: 27/07/2022
Clasificación: Interno

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

| | | |
|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organiza. |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otros estrategias |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Jhoyver Montoya M.

Firma:

Fecha: 28-09-23

| Versión:02 | |
|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interna | |

Conforme a lo expuesto yo, Julian D. Chaca Silva portador de la cedula de ciudadanía 91083476 desempeñando el cargo de Tec. Unies Hsmo, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y aclaro de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

**INFORMACIÓN DE RIESGOS**

| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
|---|---|---|
| Biomecánicos | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frio) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados.<br>Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Barrera Aislante (plomo)<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer, beber o fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión 02 | | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interna | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos: utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Temporal<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Nelson Chaparro

Firma:

Fecha: 28/Sep/2023

| Versión 02 | |
|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interna | |

Conforme a lo expuesto yo, Christian David Peluso M., portador de la cedula de ciudadanía 1098584910 desempeñando el cargo de supervisor (a) contrato 322, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

**INFORMACION DE RIESGOS**

| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
|---|---|---|
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Rickettsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI. |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz. |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frio) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados.<br>Disminuir el tiempo de exposición. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras (blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | no comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión 02 | | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar mas información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños, y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Tormenta<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Christian D. Peña Monroy

Firma: Christian Peña Fecha: 28/09/23

| Versión 02 | |
|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interno | |

Conforme a lo expuesto yo, Sandra Lucia Roma J portador de la cedula de ciudadanía 52261860 desempeñando el cargo de Auditor, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los casos de enfermedad, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parasitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz. |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frio) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Emplear equipos adecuados.<br>Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras (blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | No comer helados fuera en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión:02 | * FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Aguzar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| | Espacios Confinados | |
| Fenómenos naturales | Sismo | Conocer y aplicar el plan de emergencias |
| | Terremoto | |
| | Vendaval | |
| | Inundación | |
| | Derrumbe | |
| | Precipitaciones | |

Nombre: Sandra Lucía Roma J.

Firma:

Fecha: 28 / Sep / 2023

Preventivo

| | | |
|---|---|---|
| Versión:02<br>Fecha: 22/07/2022<br>Clasificación: Interno | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |

Conforme a lo expuesto yo, Gerardo Adair De Angel, portador de la cedula de Ciudadanía 7586537 desempeñando el cargo de Oficial de Bordo, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contexto de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

**INFORMACIÓN DE RIESGOS**

| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
|---|---|---|
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| | Virus | |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| Biológico | Roedores | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los casos de vacunación. Uso de EPP/EPI |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| Físico | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar disminuyeno sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados.<br>Disminuir el tiempo de exposición. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Blindaje (plomo)<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer/beber/fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión:02 | | |
|---|---|---|
| Fecha: 27/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: [illegible]

Firma: [signature]

Fecha: 29-Sep-2023

| Versión 02 | |
|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interno | |

Conforme a lo expresado yo, Félix E Badillo G, portador de la cedula de ciudadanía 12646125 desempeñando el cargo de Aux Bomba, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**


| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
|---|---|---|
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Mientras tiempo que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Posturas: descomposición lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados.<br>Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Barreras (blindaje (plomo)<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer/beber/fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

Cantabana

| | |
|---|---|
| Versión:02 | |
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interno | |

Conforme a lo expuesto yo, Yaison Cortés Cardona portador de la cedula de ciudadanía, 1340233 desempeñando el cargo de Auxiliar Cantabana, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.


| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar los correctos de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parasitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frio) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras (blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infarrojo) | No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos combinados (neumoconiosis) | |

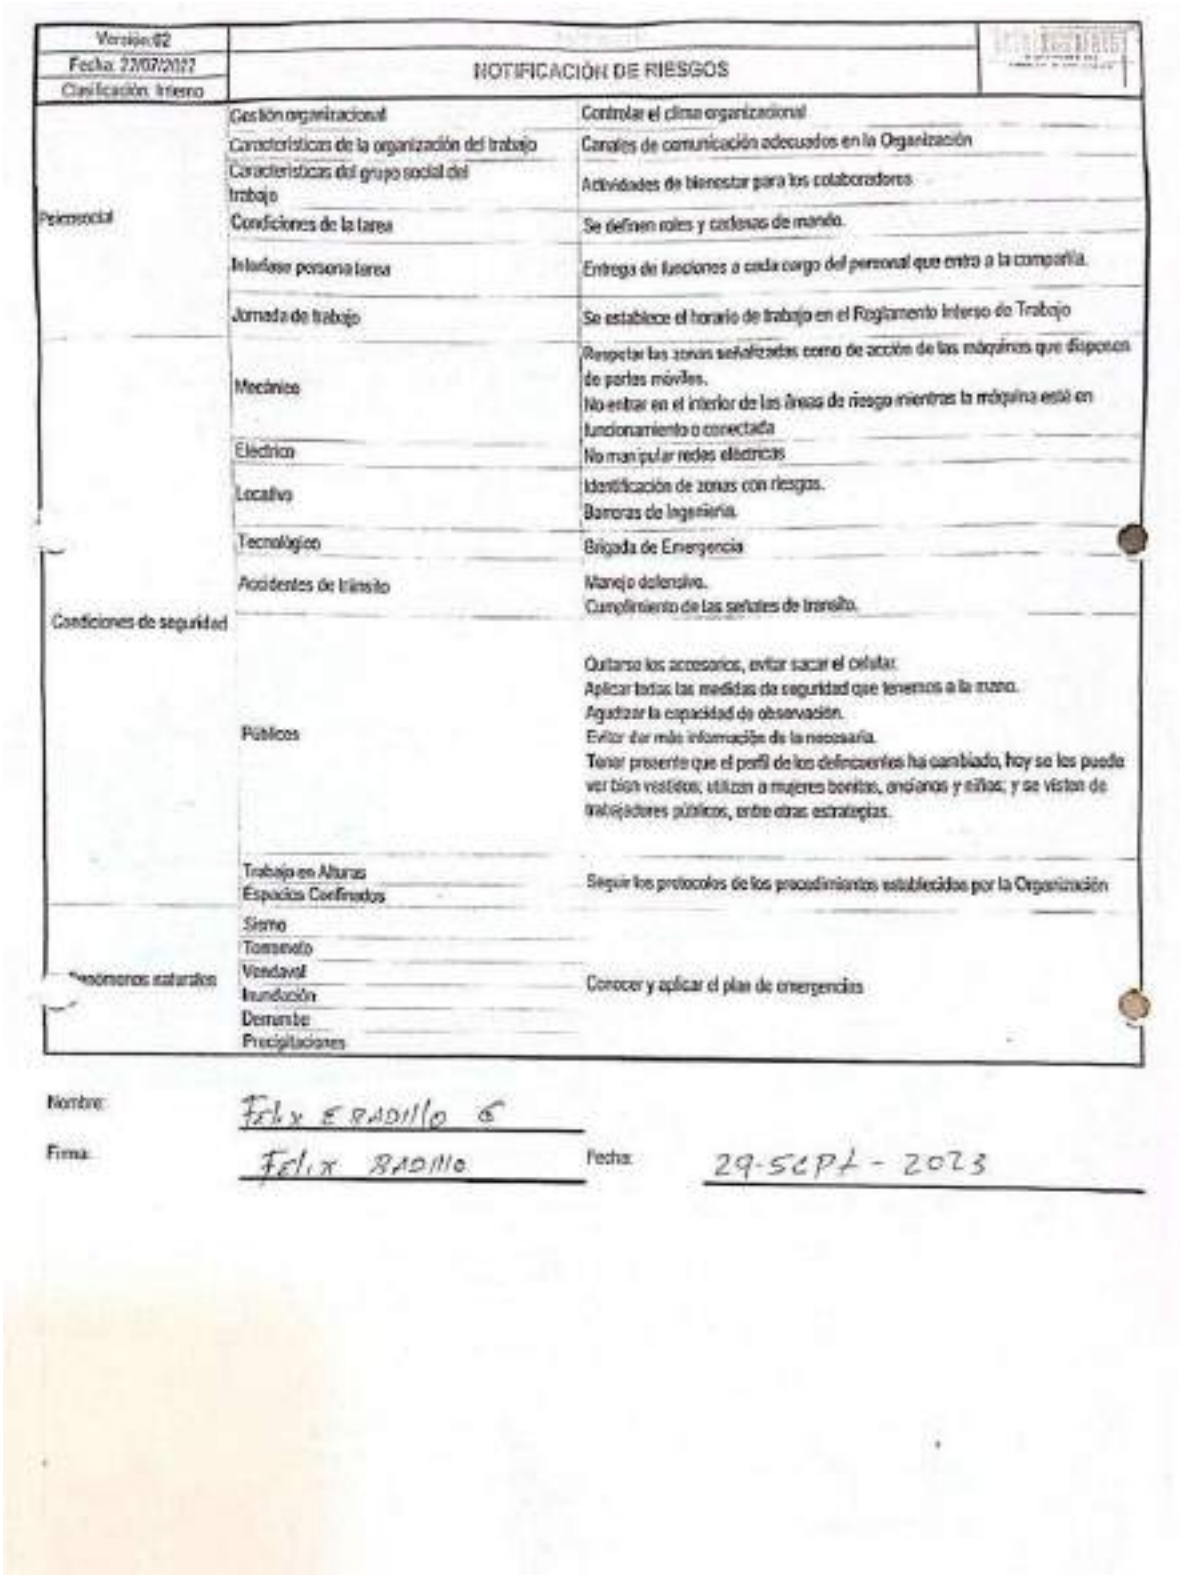

| Versión:02 | | |
|---|---|---|
| Fecha: 27/07/2017 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Tormenta<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Felix E RADILLO G

Firma: Felix RADILLO Fecha: 29-SEPT-2023

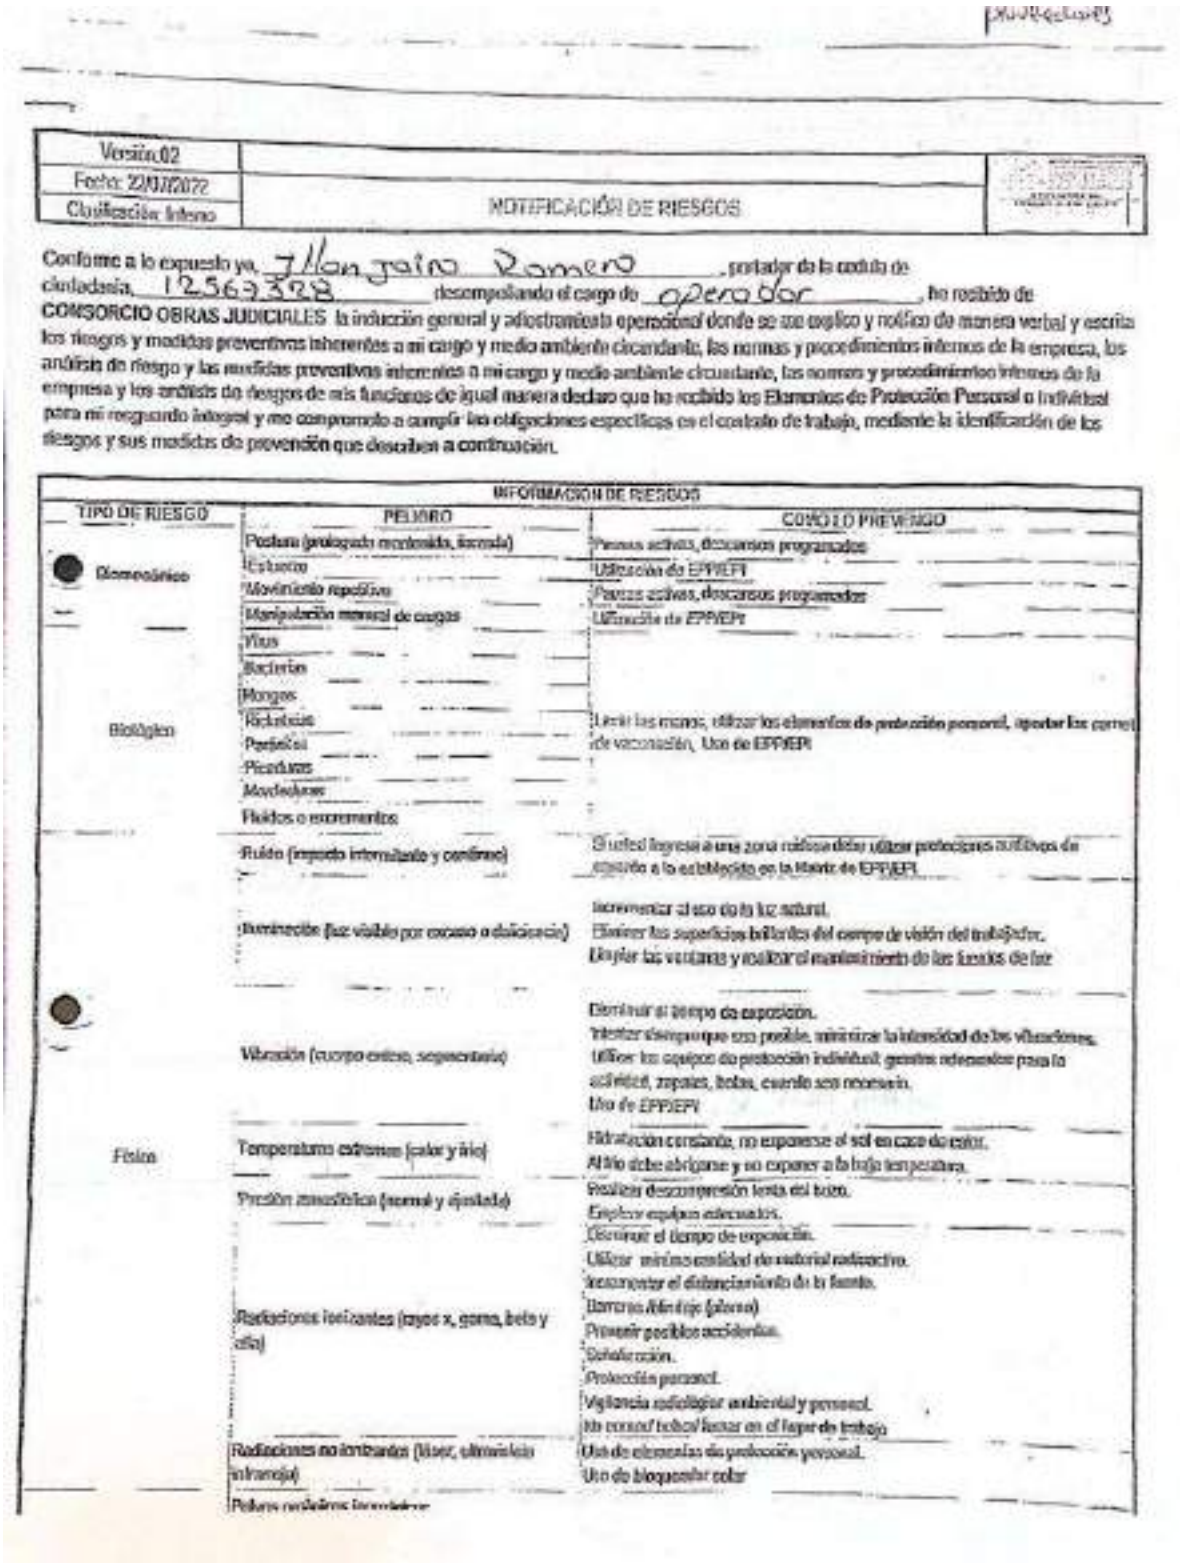

| Versión 02 | |
|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interno | |

Conforme a lo expuesto yo, Yilmanjaino Romero, portador de la cedula de ciudadanía, 12563328 desempeñando el cargo de operador, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | CONTROLO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Rickettsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentario) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar disminuirlas en lo posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual genéricos necesarios para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperatura extremas (calor y frio) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta en el buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras Absorbe (plomo)<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No consumir bebidas licores en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (laser, ultravioleta infrarroja) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Peligros cardiovasculares | |

| Versión:02<br>Fecha: 22/01/2022<br>Clasificación: Interno | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Caracteristicas de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Caracteristicas del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de transito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otros estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Gilberto Ramos

Firma: Gilberto R

Fecha: 29-09-23

| | |
|---|---|
| Versión:02 | |
| Fecha: 22/07/2013 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interno | |

Conforme a lo expuesto yo, Sandra Julia Pena J, portador de la cedula de ciudadanía, 52261860 desempeñando el cargo de Auditor, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describes a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVERGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, atender las correct de vacunación. Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | El aseo ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentario) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frio) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras Absorbo (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | No comer/beber/fumar en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión 02 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de transito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños, y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Sandra Lucía Parra J.


Firma:

Fecha: 28 / Sep / 2023

| Versión 02 | |
|---|---|
| Fecha: 27/07/2020 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interna | |

Conforme a lo expuesto yo, Julian D. Chaca Silva portador de la cedula de ciudadanía 91083476 desempeñando el cargo de Ayudante, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilizacion de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilizacion de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Rickettsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de copa o la establecida en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, casco si sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Abrigo debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta en la tarea.<br>Emplear equipos adecuados.<br>Disminuir el tiempo de exposición. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Utilizar mínima cantidad de material radiactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barrera Absoluta (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infarroja) | No comer, beber, fumar en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Fuerzas mecánicas (herramientas | |

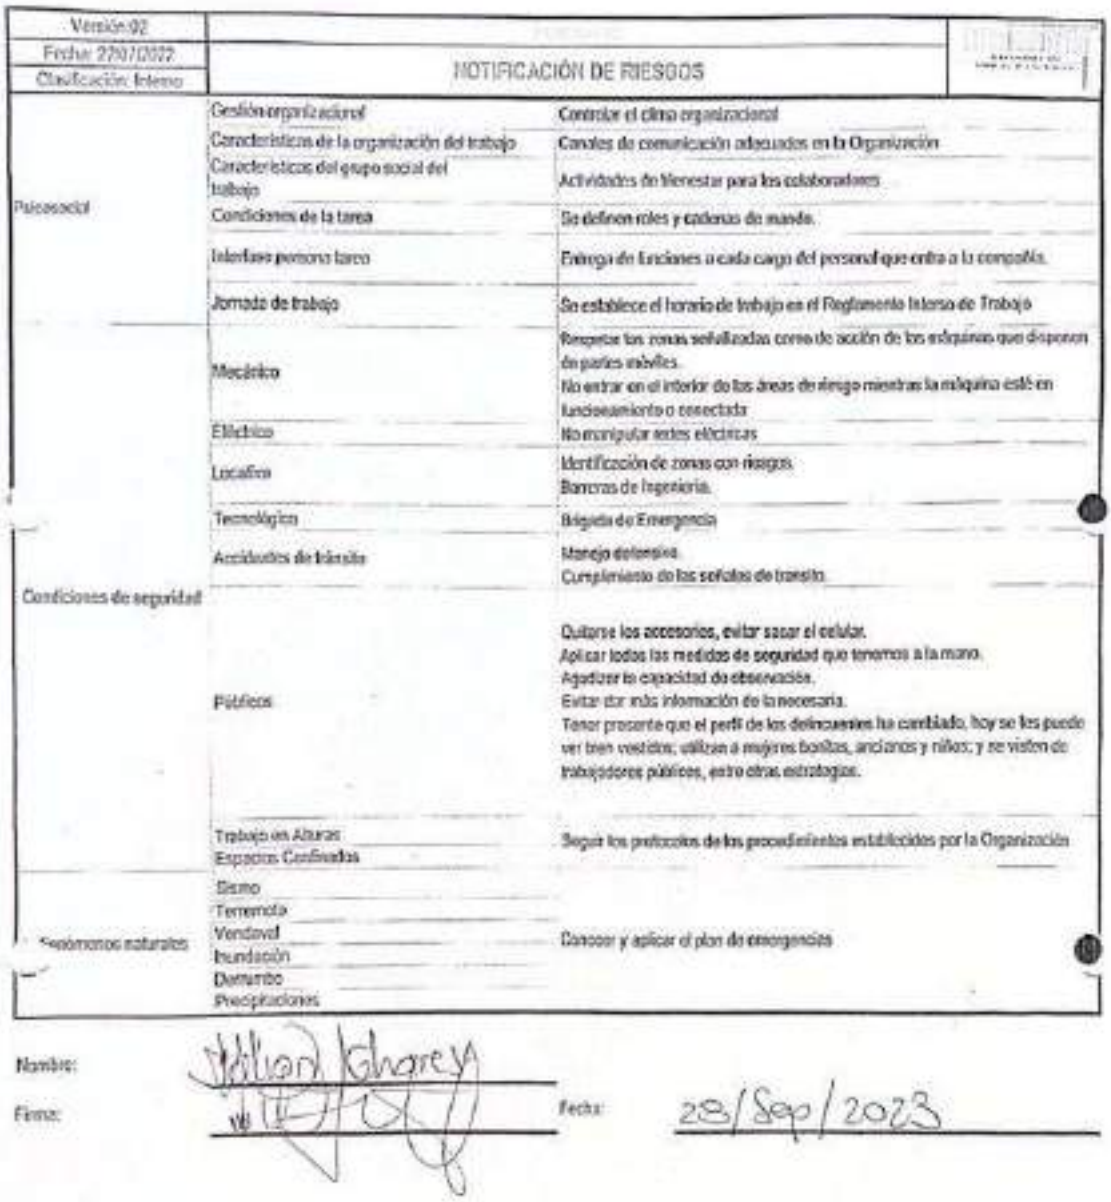


| Versión:02 | | |
|---|---|---|
| Fecha: 27/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de los maquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo<br>Cumplimiento de las señales de tránsito |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Temenoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbo<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Hillari Charry

Firma:


Fecha: 28/Sep/2023

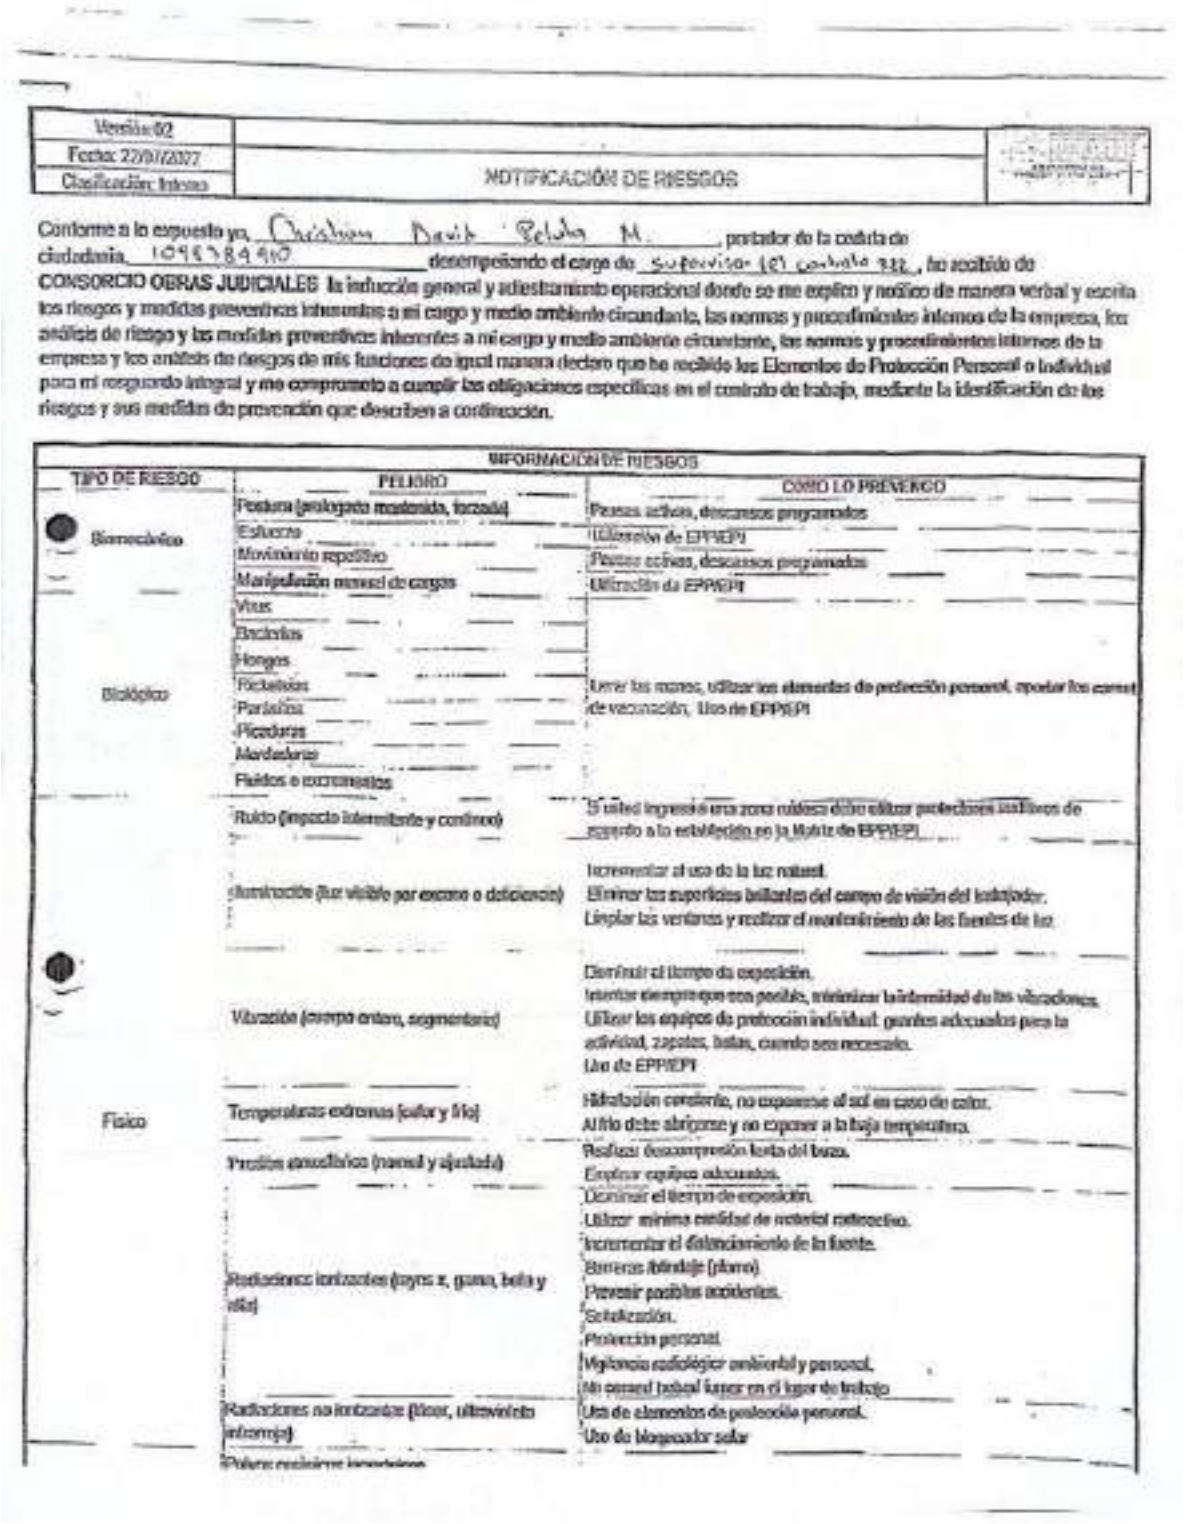

| Versión:02 | |
|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interna | |

Conforme a lo expuesto yo, Cristhian David Beltrán M. portador de la cedula de ciudadanía 1098384910 desempeñando el cargo de Supervisor de contrato 332, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACIÓN DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentario) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras filtrantes (plomo)<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal. |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | Mi sentido habitual fijarse en el lugar de trabajo<br>Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

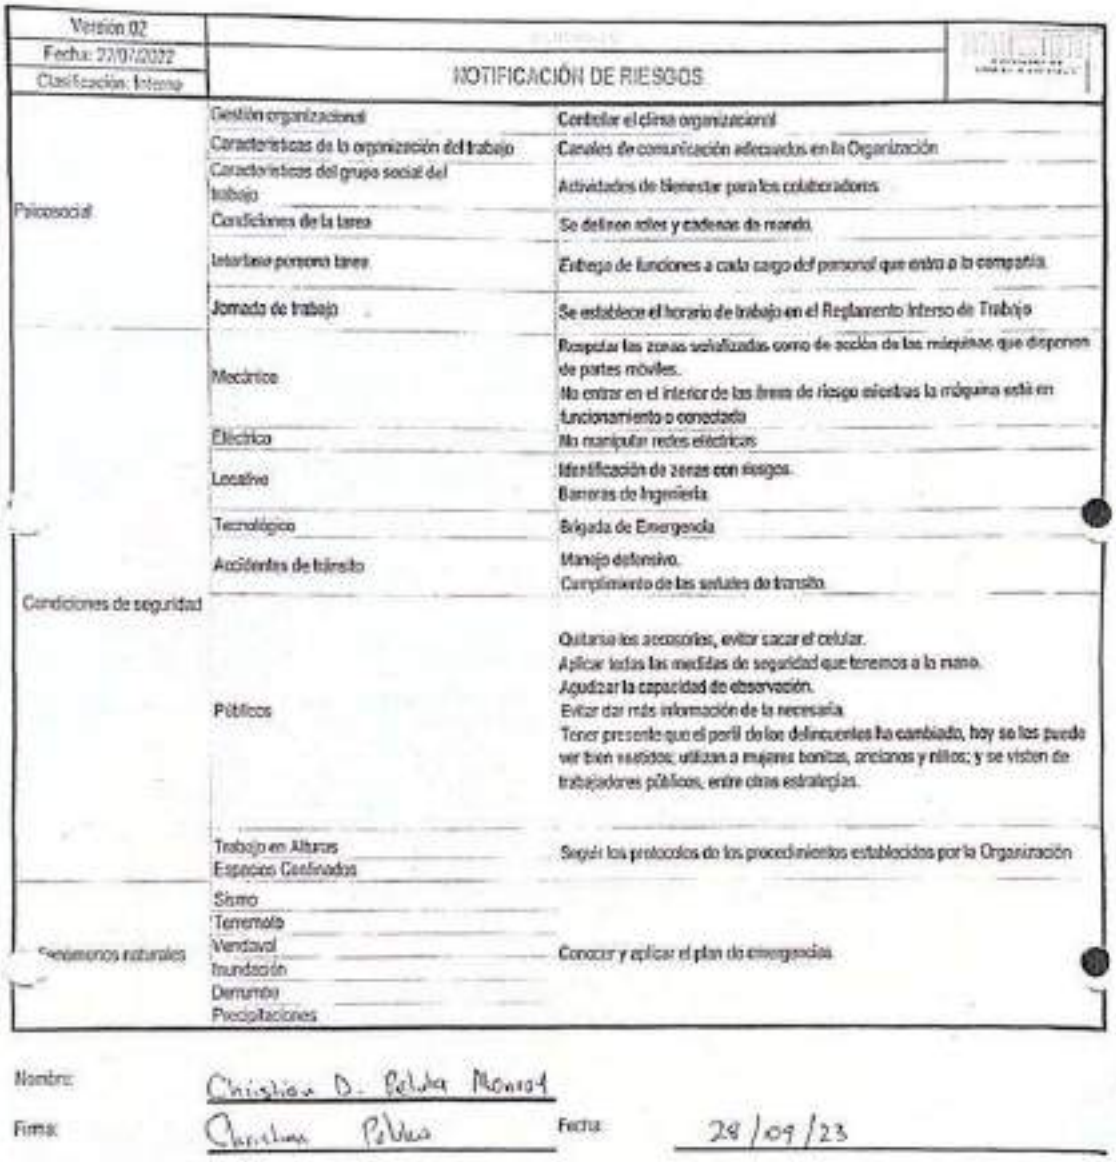

| Versión 02<br>Fecha: 27/07/2022<br>Clasificación: Interna | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Según los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Christian D. Peluso Monroy

Firma: [signature] Fecha: 28/09/23

| Versión 02 | | |
|---|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cadenas de mando. |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía. |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Yasmin Cortés

Firma:

Fecha: 7/09/23

| Versión 02 | |
|---|---|
| Fecha: 22/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| Clasificación: Interna | |

Conforme a lo expuesto yo, Julio Carrillo, portador de la cedula de ciudadanía 11 [illegible], desempeñando el cargo de Rep legal, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACIÓN DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Ricketsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (espacio intermitente y continuo) | El usiad ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realizar descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras /blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión 02<br>Fecha: 22/07/2022<br>Clasificación: Interno | FORMATO<br>NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
|---|---|---|
| Psicosocial | Gestión organizacional | Controlar el clima organizacional |
| | Características de la organización del trabajo | Canales de comunicación adecuados en la Organización |
| | Características del grupo social del trabajo | Actividades de bienestar para los colaboradores |
| | Condiciones de la tarea | Se definen roles y cademas de mando |
| | Interfase persona tarea | Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía |
| | Jornada de trabajo | Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo |
| Condiciones de seguridad | Mecánico | Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.<br>No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada |
| | Eléctrico | No manipular redes eléctricas |
| | Locativo | Identificación de zonas con riesgos.<br>Barreras de Ingeniería. |
| | Tecnológico | Brigada de Emergencia |
| | Accidentes de tránsito | Manejo defensivo.<br>Cumplimiento de las señales de tránsito. |
| | Públicos | Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular.<br>Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano.<br>Agudizar la capacidad de observación.<br>Evitar dar más información de la necesaria.<br>Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. |
| | Trabajo en Alturas<br>Espacios Confinados | Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización |
| Fenómenos naturales | Sismo<br>Terremoto<br>Vendaval<br>Inundación<br>Derrumbe<br>Precipitaciones | Conocer y aplicar el plan de emergencias |

Nombre: Julio Cortés

Firma:

Fecha: 07-09-2023

| Versión:02 | | |
|---|---|---|
| Fecha: 23/07/2022 | NOTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| Clasificación: Interno | | |

Conforme a lo expuesto yo, Glendy Jimenez Pedroza, portador de la cedula de ciudadanía 1067595122 desempeñando el cargo de Sicologa, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

| INFORMACION DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| TIPO DE RIESGO | PELIGRO | COMO LO PREVENGO |
| Biomecánico | Postura (prolongada mantenida, forzada) | Pausas activas, descansos programados |
| | Esfuerzo | Utilización de EPP/EPI |
| | Movimiento repetitivo | Pausas activas, descansos programados |
| | Manipulación manual de cargas | Utilización de EPP/EPI |
| Biológico | Virus | Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI |
| | Bacterias | |
| | Hongos | |
| | Rickettsias | |
| | Parásitos | |
| | Picaduras | |
| | Mordeduras | |
| | Fluidos o excrementos | |
| Físico | Ruido (impacto intermitente y continuo) | Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI |
| | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Incrementar el uso de la luz natural.<br>Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.<br>Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz |
| | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones.<br>Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario.<br>Uso de EPP/EPI |
| | Temperaturas extremas (calor y frío) | Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor.<br>Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura. |
| | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Realice descompresión lenta del buzo.<br>Emplear equipos adecuados. |
| | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) | Disminuir el tiempo de exposición.<br>Utilizar mínima cantidad de material radioactivo.<br>Incrementar el distanciamiento de la fuente.<br>Barreras /blindaje (plomo).<br>Prevenir posibles accidentes.<br>Señalización.<br>Protección personal.<br>Vigilancia radiológica ambiental y personal.<br>No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo |
| | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja) | Uso de elementos de protección personal.<br>Uso de bloqueador solar |
| | Polvos orgánicos inorgánicos | |

| Versión: 1 |
|---|
| Fecha: 18/05/2022 |
| Clasificación: Interna |

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 28-08/2023 al 02-09/2023

HORA: 07:00A – 05:00p.m.

OBRA: Construcción palacio de justicia

CONTRATISTA: Consorcio obras judiciales

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESTADO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cumple | No Cumple | N Aplica | |
| A | HERRAMIENTAS MANUALES | | | | |
| 1 | Se usa la(s) herramienta(s) adecuada al trabajo | ✓ | | | |
| 2 | Estado de la Herramienta | ✓ | | | |
| 3 | Estado de Almacenamiento y de filos | ✓ | | | |
| 4 | Estado de los mangos de madera | ✓ | | | |
| 5 | Se usan prensas de banco | | | ✓ | |
| B | HERRAMIENTAS DE CORTE | | | | |
| 1 | Estado de la cabeza de los cinceles | | | ✓ | |
| 2 | Filo de los cinceles | | | ✓ | |
| 3 | Estado de los dientes de las serrajes macho o hembra | | | ✓ | |
| 4 | Instalación de las hojas de segueta | ✓ | | | |
| 5 | Estado de los mangos de las limas | | | ✓ | |
| 6 | Empuñaduras y dientes de los serruchos | ✓ | | | |
| 7 | Estado de los Mangos y fundas de los cuchillos | | | ✓ | |
| C | HERRAMIENTAS DE GOLPE | | | | |
| 1 | Se emplea el martillo adecuado según la labor ? | ✓ | | | |
| 2 | Sus caras y bordes están en buen estado? | ✓ | | | |
| 3 | Estado en que se encuentra el mango | ✓ | | | |
| D | HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES | | | | |
| 1 | Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas ? | | | ✓ | |
| 2 | Estado de huellas y gatancas de la llave | | | ✓ | |
| 3 | Se disponen de llaves para golpear? | | | ✓ | |
| 4 | Estado de las mordazas de las llaves | | | ✓ | |
| 5 | Estado de las herramientas para trabajos electrico | | | ✓ | |
| 6 | Aislamiento de las herramientas para los trabajos electricos | | | ✓ | |
| 7 | Estado de la punta y cabe de los destornilladores | | | ✓ | |
| 8 | Se dispone de herramientas que no producen chispas? | | | ✓ | |
| E | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | | | | |
| 1 | Las herramientas son adecuadas según el riesgo (humedad, vapor etc)? | | | ✓ | |
| 2 | Uso de los Elementos de protección Personal de acuerdo al uso de la herramienta | ✓ | | | |
| 3 | Limpieza y lubricación de las herramientas | ✓ | | | |
| 4 | Guardas de seguridad | ✓ | | | |
| 5 | Aislamientos y sistemas de fijación | ✓ | | | |
| 6 | Estado del cable y enchufe | ✓ | | | |
| 7 | Estado y manejo de los estados | | | ✓ | |
| 8 | Diametro, especificación y estado de la broca para el plomo a usar | | | ✓ | |
| 9 | Los esmeriles cuentan con guardas de Seguridad? | | | ✓ | |
| 10 | Los esmeriles cuentan los soportes de los discos o piedras son los adecuados? | | | ✓ | |

| Versión: 1 | FORMATO |
|---|---|
| Fecha: 28/04/2023 | PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO MANUAL (TROMPO) |
| Clasificación: Interno | |

Maquina: A
Obra: Judiciales
Horas inicio: 7:00 am
Horas fin: 5:00 pm.

Semana: 04 Al 09 Septiembre /23

| INSPECCIÓN VISUAL | | APLICA | | LUN | | MAR | | MIERC | | JUEV | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN | Verifique que la estructura es conforme | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| LLANTAS | Verifique la condición de las llantas | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| VALVERAS Y BUJES DE ROTACIÓN | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| MECANISMO PARA VACIADO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| FRENO EN BUEN ESTADO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| VALVULAS | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| PATAS DE ANCLAJE EN BUENA CONDICIÓN | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| **INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR) | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| TAPA DEL MOTOR CON SEGURO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| ENCENDIDO DEL MOTOR | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE | Verifique su funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |

| | |
|---|---|
| Fecha ultimo mantenimiento del equipo: | |
| Observación: | |

| | REVISÓ (Operador del equipo) | APROBÓ (Residente SST) |
|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | CASTILLO | Damaris Salcedo |
| CARGO: | HSE | Residente SST |
| FIRMA: | CASTILLO | DSalc |

| Versión: 1 | FORMATO |
|---|---|
| Fecha: 20/04/2023 | PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO MANUAL (TROMPO) |
| Clasificación: Interno | |

Maquina: _____
Obra: Ciudad Judicial.
Horas Inicio: 07:00 AM
Horas fin: 05:00 PM

Semana 11 de 03 al 16-03/23

| INSPECCIÓN VISUAL | | APLICA | | LUN | | MAR | | MIERC | | JUEV | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN | Verifique que la estructura es conforme | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| LLANTAS | Verifique la condición de las llantas | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| VALIERAS Y BUJES DE ROTACIÓN | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| MECANISMO PARA VACIADO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| FRENO EN BUEN ESTADO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| VALVULAS | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| PATAS DE ANCLAJE EN BUENA CONDICIÓN | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| **INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR) | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| TAPA DEL MOTOR CON SEGURO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ENCENDIDO DEL MOTOR | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE | Verifique su funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |

| Fecha ultimo mantenimiento del equipo: | |
|---|---|

| Observación: |
|---|
| |

| | REVISÓ (Operador del equipo) | APROBÓ (Residente SST) |
|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | Luis Castillo | Karen Soto |
| CARGO: | Ayc | Resid. SST |
| FIRMA: | Castillo | |

| | |
|---|---|
| Versión: 1 | FORMATO |
| Fecha: 28/04/2023 | PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO MANUAL (TROMPO) |
| Clasificación: Interna | |

Maquina: 01
Obra: Palacio de Justicia
Hora inicio: 08:00 a.m.
Hora fin: 05:00 p.m.

Semana: 18 al 23 sept 23

| INSPECCIÓN VISUAL | | APLICA | | LUN | | MAR | | MIERC | | JUEV | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN | Verifique que la estructura en conforme | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| LLANTAS | Verifique la condición de las llantas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| VALVERAS Y BUJES DE ROTACIÓN | Verifique funcionamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| MECANISMO PARA VACIADO | Verifique funcionamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| FRENO EN BUEN ESTADO | Verifique funcionamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| VALVULAS | Verifique funcionamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| PATAS DE ANCLAJE EN BUENA CONDICIÓN | Verifique funcionamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| **INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN | Verifique funcionamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR) | Verifique funcionamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR | Verifique funcionamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO | Verifique funcionamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| TAPA DEL MOTOR CON SEGURO | Verifique funcionamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO | Verifique funcionamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| ENCENDIDO DEL MOTOR | Verifique funcionamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE | Verifique su funcionamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Fecha ultimo mantenimiento del equipo: | |
| Observación: | |

| | REVISÓ (Operador del equipo) | APROBÓ (Residente SST) |
|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | CASTILLO | Katen Soto |
| CARGO: | H.Y.E | R. SST |
| FIRMA: | CASTILLO | |

| Versión: 1 | FORMATO |
|---|---|
| Fecha: 20/04/2023 | PREOPERACIONAL DE RECICLADORA DE CONCRETO MANUAL (TROMPO) |
| Clasificación: Interno | |

Maquina:
Obra: Palacio de Justicia
Horas inicio: 09:00 hrs
Horas fin: 05:00 pm


Semana: 25/07/23 al 30/07/23

| INSPECCIÓN VISUAL | | APLICA | | LUN | | MAR | | MIERC | | JUEV | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN | Verifique que la estructura es conforme | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| LLANTAS | Verifique la condicion de las llantas | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| VALVERAS Y BUJES DE ROTACIÓN | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| MECANISMO PARA VACIADO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| FRENO EN BUEN ESTADO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| VALVULAS | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| PATAS DE ANCLAJE EN BUENA CONDICION | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| **INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| ESTADO DE PASADORES (EJE/TROMPO) | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| TAPA DEL MOTOR CON SEGURO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| ENCENDIDO DEL MOTOR | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE | Verifique su funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |

Fecha último mantenimiento del equipo:

Observacion:

| | REVISÓ (Operador del equipo) | APROBÓ (Residente SST) |
|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | Luis Alberto Castillo | Karen Soto |
| CARGO: | Ayudante | R. SST |
| FIRMA: | CASTILLO | KAS |

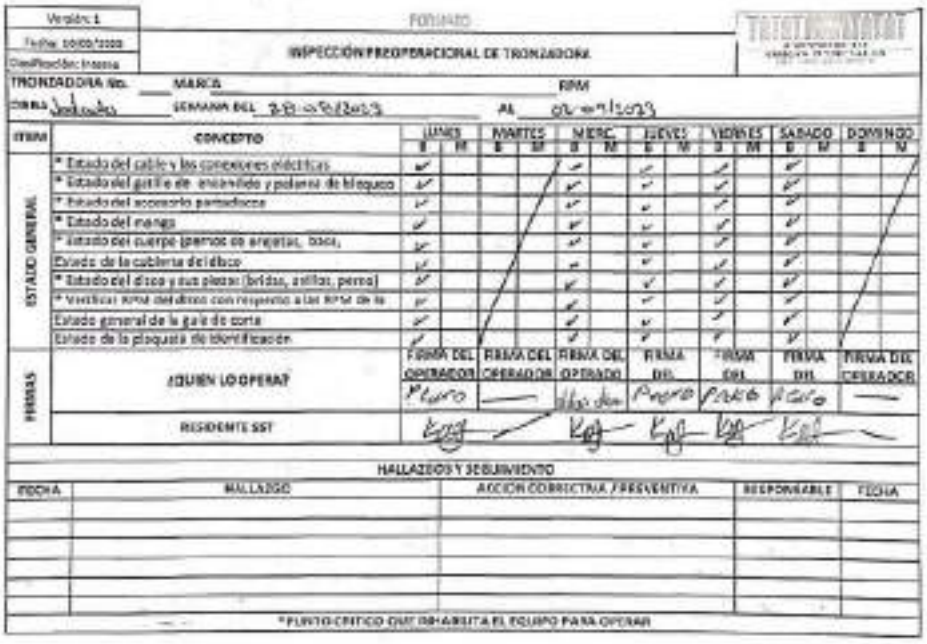

Versión: 1

FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA

TRONZADORA No. MARCA RPM


OBRA SEMANA DEL AL

| ITEM | CONCEPTO | LUNES B | LUNES M | MARTES B | MARTES M | MIERC. B | MIERC. M | JUEVES B | JUEVES M | VIERNES B | VIERNES M | SABADO B | SABADO M | DOMINGO B | DOMINGO M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del guarda de seguridad y palanca de bloqueo | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del accesorio portadisco | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del mango | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del cuerpo (pernos de anclajes, base, | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de la cubierta del disco | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del disco y sus platos (bridas, arillos, perno) | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado general de la guía de corte | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| FIRMAS | ¿QUIEN LO OPERA? | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADO | | FIRMA DEL | | FIRMA DEL | | FIRMA DEL | | FIRMA DEL OPERADOR | |
| | RESIDENTE SST | | | | | | | | | | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

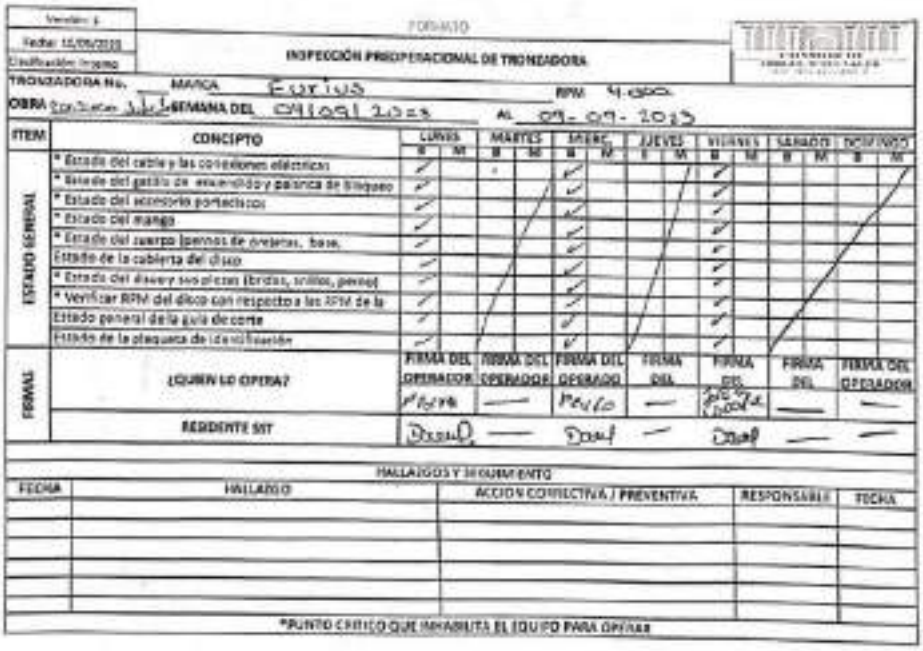

FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TROMBADORA

TROMBADORA No. ___ MARCA Eurus RPM 4.500


OBRA [illegible] SEMANA DEL 04/09/2023 AL 09-09-2023

| ITEM | CONCEPTO | LUNES B | LUNES M | MARTES B | MARTES M | MIERC. B | MIERC. M | JUEVES B | JUEVES M | VIERNES B | VIERNES M | SABADO B | SABADO M | DOMINGO B | DOMINGO M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * Estado del gatillo de seguridad y palanca de bloqueo | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * Estado del accesorio portaelectrodo | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * Estado del mango | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado de la cubierta del disco | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, pernos) | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado general de la guía de corte | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado de la pleaguera de identificación | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| FIRMAS | ¿QUIEN LO OPERA? | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADO | | FIRMA DEL | | FIRMA DEL | | FIRMA DEL OPERADOR | | | |
| | RESIDENTE SST | [illegible] | — | [illegible] | — | [illegible] | — | [illegible] | — | — | — | — | — | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

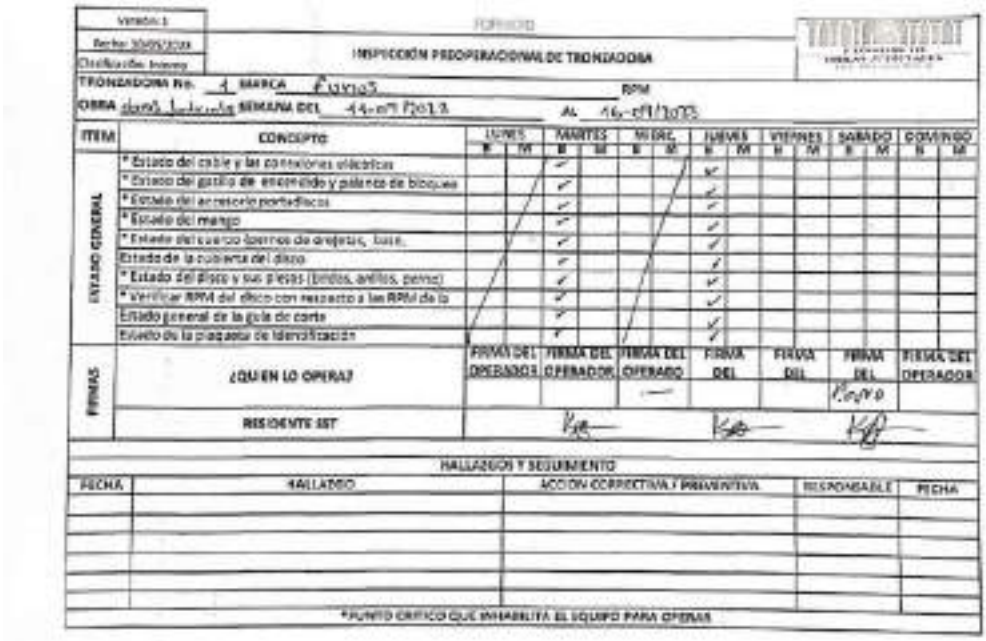

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA

TRONZADORA No. 1 MARCA Eurus RPM


OBRA [illegible] SEMANA DEL 14-07-2020 AL 16-07-2020

| ITEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del arrancador portátil/cuerda | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del mango | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del cuerpo (carros de alojamiento, base, | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado de la cubierta del disco | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno) | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado general de la guía de corte | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado de la plataforma de alimentación | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | |
| FIRMAS | ¿QUIEN LO OPERA? | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADO | | FIRMA DEL | | FIRMA DEL | | FIRMA DEL OPERADOR | | | |
| | RESIDENTE SST | | | | | | | | | | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

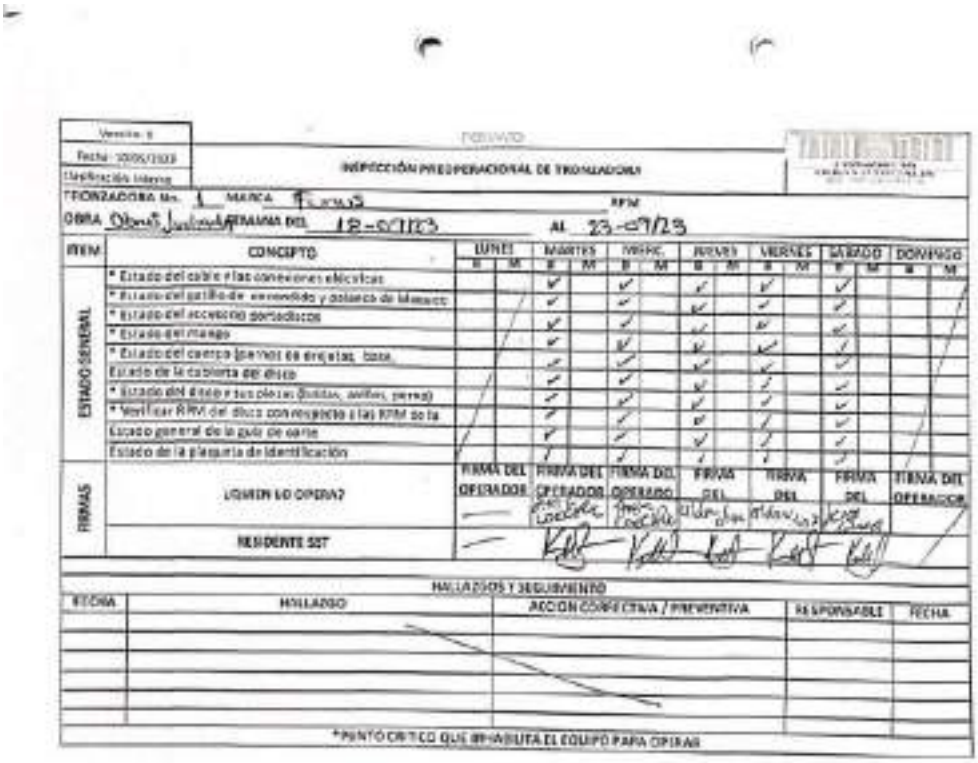

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORAS

TRONZADORA No. 1 MARCA [illegible] RPM

OBRA Obras Judiciales SEMANA DEL 12-07/23 AL 23-07/23

| ITEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del pulido de seguridad y palanca de bloqueo | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del accesorio portadisco | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del mango | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del cuerpo (cortes de aristas, base | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de la cubierta del disco | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del disco y sus piezas (dientes, aletas, perno) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Verificar RPM del disco correspondan a las RPM de la | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado general de la guía de corte | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| FIRMAS | QUIEN LO OPERA? | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL | | FIRMA DEL | | FIRMA DEL | | FIRMA DEL OPERADOR | |
| | RESIDENTE SST | — | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR



INSPECCIÓN PRECOPERACIONAL DE TRONZADORA

TRONZADORA No. 1 MARCA Evans RPM

OBRA Obras Judiciales SEMANA DEL 23-07-2023 AL 30-07-2023

| ITEM | CONCEPTO | LUNES B | LUNES M | MARTES B | MARTES M | MIERC. B | MIERC. M | JUEVES B | JUEVES M | VIERNES B | VIERNES M | SABADO B | SABADO M | DOMINGO B | DOMINGO M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del sistema de encendido y palanca de bloqueo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del accesorio portadiscos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del mango | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del cuerpo (perno de oreintal, tuvo, | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | estado de la cubierta del disco | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del disco y sus piezas (brical, orificio, perno) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Estado general de la guía de corte | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado de la oblaqueta de identificación | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| FIRMAS | ¿QUIEN LO OPERA? | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADO | | FIRMA DEL | | FIRMA DEL | | FIRMA DEL | | FIRMA DEL OPERADOR | |
| | RESIDENTE SST | KG | | KG | | KG | | KG | | | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/23 | La tronzadora obtuvo Aprobatorio | Se pasa a Mantenimiento preventivo | Contratista | 31-07-23 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Versión: 1
Fecha: 10/08/2023
Clasificación: Interna

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR**

TALADRO No 1 MARCA TRUPER EXPERT

OBRA Consorcio Obras J. SEMANA DEL 28/08/2023 AL 02/09/2023

| ITEM | CONCEPTO | LUNES B | LUNES M | MARTES B | MARTES M | MIERC. B | MIERC. M | JUEVES B | JUEVES M | VIERNES B | VIERNES M | SABADO B | SABADO M | DOMINGO B | DOMINGO M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | * Estado del interruptor encendido y palanca de bloqueo | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | * La carcasa se encuentra limpia y en buen estado libre de roturas, grase, pintura, o daños estructurales | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | * El seguro de uña o dindel se nuentra operativo y en buen estado | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | * Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | * El o los cinceles se encuentran en buen estado, sin desgastes excesivo o daños visibles | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | * El reten se encuentra en buen estado | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | * Equipo sin daño estructural | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| FIRMAS | ¿QUIEN LO OPERA? | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | |
| | | CESAR | | CESA | | | | | | | | | | | |
| | RESIDENTE SST | | | | | | | | | | | | | | |

**HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO**

| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

| Versión: 1 |
|---|
| Fecha: 18/05/2023 |
| Clasificación: Interna |

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 28-08/2023 al 02-09/2023

HORA: 07:00 a.m - 05:00 p.m


OBRA: Construcción Palacio de Justicia

CONTRATISTA: Consorcio Obras Judiciales.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESTADO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cumple | No Cumple | N Aplica | |
| 11 | Los cilindros conectan en diámetro y están instalados según el oficio? | | | ✓ | |
| 12 | Estado de las mangueras o tramo en las zonas aledañas. | | | ✓ | |
| 13 | Almacenamiento de los pulmones y discos | ✓ | | | |
| F | HERRAMIENTAS NEUMATICAS | | | | |
| 1 | Estado de las mangueras y acoples | | | ✓ | |
| 2 | Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta? | | | ✓ | |
| 3 | Presiones indicadas | | | ✓ | |
| 4 | Descarga de la herramienta | | | ✓ | |
| G | HERRAMIENTA POR DETONACIÓN | | | | |
| 1 | El personal es autorizado | ✓ | | | |
| 2 | Emplean los elementos de protección | ✓ | | | |
| 3 | Descarga y almacenamiento de la herramienta | ✓ | | | |
| H | SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL | | | | |
| 1 | El personal que utiliza los equipos y herramientas, ha recibido instrucción? | ✓ | | | |
| 2 | Las herramientas son seleccionas correctamente para el trabajo a realizar? | ✓ | | | |
| 3 | Transporte y almacenamiento al sitio del trabajo | ✓ | | | |
| 4 | Los labores de mantenimiento como: limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados. | ✓ | | | |
| 5 | Almacenamiento | ✓ | | | |
| 6 | Herramientas y equipos en buen estado | ✓ | | | |
| 7 | Se utilizan correctamente | ✓ | | | |
| 8 | Se encuentran señalizados los equipos que revelan peligros especiales tales como alto voltaje, etc. | ✓ | | | |

Nota: Los ítem del numeral H siempre deben ser diligenciados independiente del tipo de herramienta que se encuentre en el lugar de obra.

| | REVISO | APROBO |
|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | Pedro Julio Sanchez | Karen Soto |
| CARGO | Ayudante | R. SST |
| FIRMA | pedrojulio | |

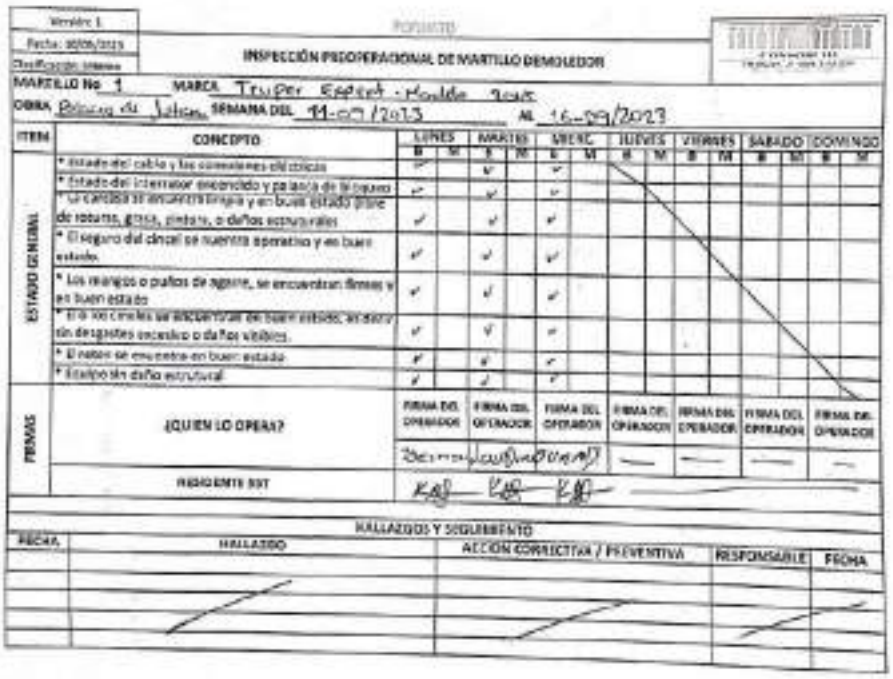

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR


MARTILLO No. 1 MARCA Truper Expert - Kondor 2015

OBRA Palacio de Justicia SEMANA DEL 11-09/2023 AL 16-09/2023

| ITEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | * Estado del interruptor encendido y palanca de bloqueo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | * El cincel se encuentra limpio y en buen estado sin fisuras, grietas, cortes, o daños estructurales | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | * El seguro del cincel se muestra operativo y en buen estado. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | * Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | * El kit de cinceles se encuentra en buen estado, sin daños, sin desgastes excesivo o daños visibles. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | * El motor se encuentra en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | * El cuerpo sin daño estructural | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| FIRMAS | ¿QUIEN LO OPERA? | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | |
| | RESIDENTE SST | | | | | | | | | | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

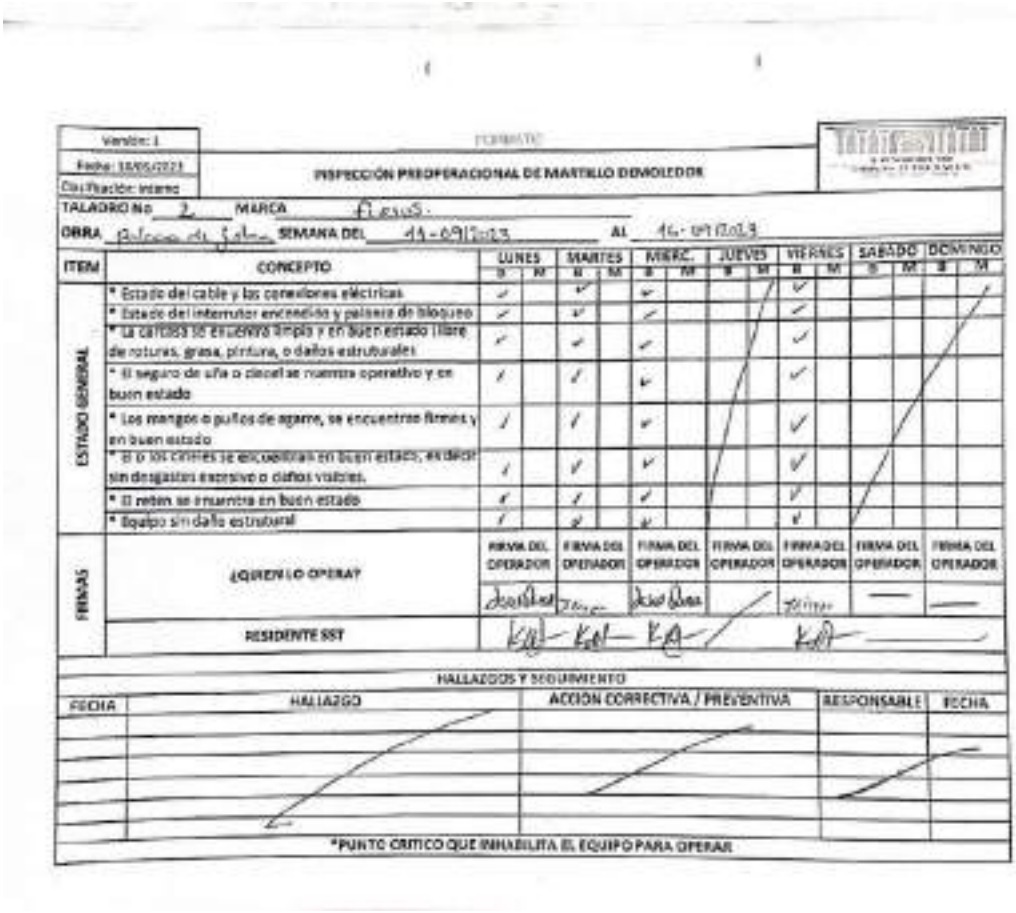

Versión: 1
Fecha: 18/05/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR**

TALADRO No 2 MARCA Fiesus

OBRA Palacio de Justicia SEMANA DEL 11-09-2023 AL 16-09-2023

| ITEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * Estado del interruptor encendido y palanca de bloqueo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * La carcasa se encuentra limpia y en buen estado libre de roturas, grasa, pintura, o daños estructurales | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * El seguro de sujeción o cincel se muestra operativo y en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * El o los cinceles se encuentran en buen estado, evidencia sin desgastes excesivo o daños visibles. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * El retén se encuentra en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * Equipo sin daño estructural | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| FIRMAS | ¿QUIEN LO OPERA? | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RESIDENTE SST | KA | | KA | | KA | | | | KA | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Versión: 1

FORMATO

Fecha: 18/05/2022

Clasificación: Interna

**INSPECCIÓN PRECOPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR**

TALADRO No 01 MARCA Trupper Expert


OBRA Palacio de Justicia SEMANA DEL 18 AL 23 Sept 2023

| ITEM | CONCEPTO | LUNES B | LUNES M | MARTES B | MARTES M | MIERC. B | MIERC. M | JUEVES B | JUEVES M | VIERNES B | VIERNES M | SABADO B | SABADO M | DOMINGO B | DOMINGO M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| | * Estado del interruptor encendido y palanca de bloqueo | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| | * La carcasa se encuentra limpia y en buen estado (sin de roturas, grasa, pintura, o daños estructurales | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| | * El seguro de uña o cincel se muestra operativo y en buen estado | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| | * Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| | * El o los cinceles se encuentran en buen estado, es decir sin desgastes excesivo o daños visibles | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| | * El retén se encuentra en buen estado | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| | * Equipo sin daño estructural | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| FIRMAS | ¿QUIEN LO OPERA? | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | |
| | RESIDENTE SST | | | | | | | | | | | | | | |

**HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO**

| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

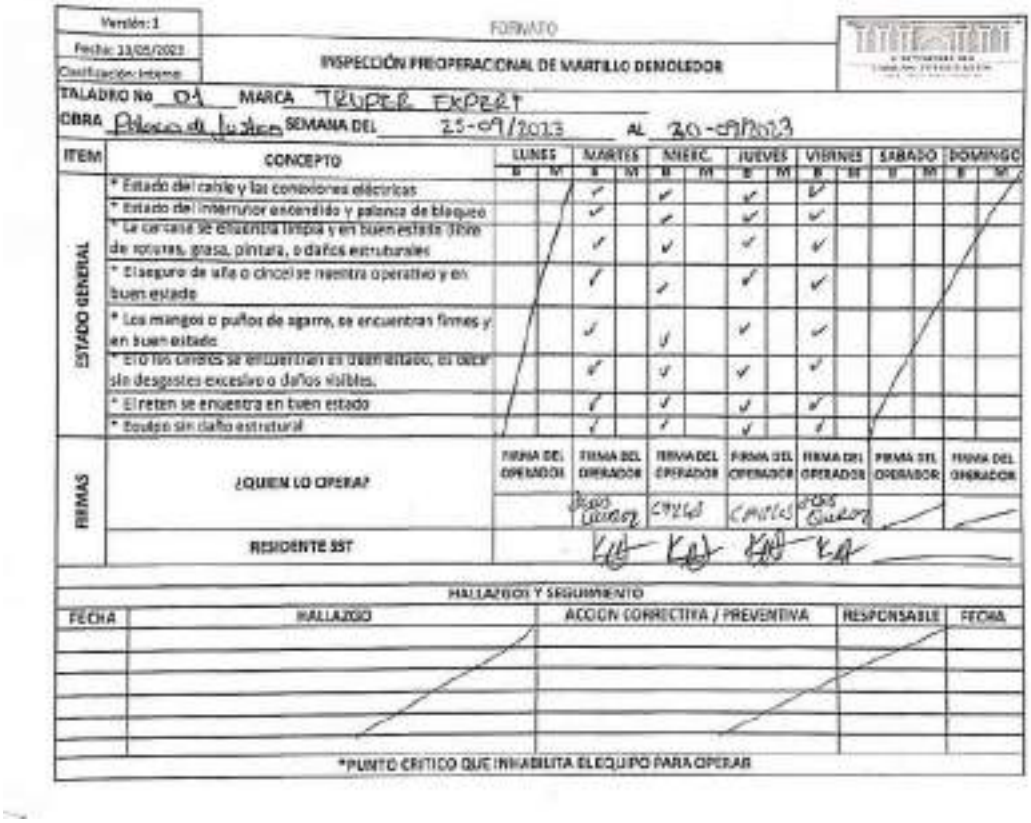

Versión: 1
Fecha: 13/05/2021
Clasificación: Interna

FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR

TALADRO No 04 MARCA TRUPER EXPERT


OBRA Palacio de Justicia SEMANA DEL 23-09/2023 AL 30-09/2023

| ITEM | CONCEPTO | LUNES B | LUNES M | MARTES B | MARTES M | MIERC. B | MIERC. M | JUEVES B | JUEVES M | VIERNES B | VIERNES M | SABADO B | SABADO M | DOMINGO B | DOMINGO M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | * Estado del interruptor encendido y palanca de bloqueo | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | * La carcasa se encuentra limpia y en buen estado (libre de roturas, grasa, pintura, o daños estructurales | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | * El seguro de alfa o cincel se nuestra operativo y en buen estado | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | * Los mangos o puños de agarre, se encuentras firmes y en buen estado | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | * El o los cinceles se encuentran en buen estado, es decir sin desgastes excesivo o daños visibles. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | * El reten se enuentra en buen estado | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | * Soulgo sin daño estructural | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| FIRMAS | ¿QUIEN LO OPERA? | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL OPERADOR | |
| | | | | Jesus Quiroz | | Carlos | | Carlos | | Jesus Quiroz | | | | | |
| | RESIDENTE SST | | | | | | | | | | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

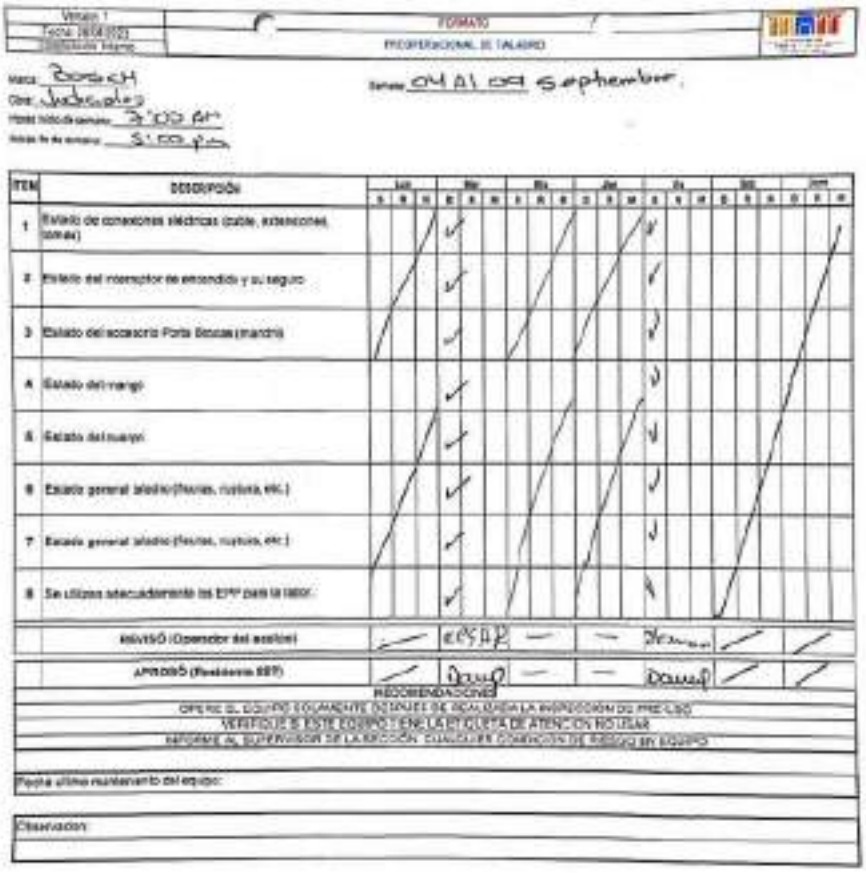

FORMATO

PREOPERACIONAL DE TALADRO

Marca: Bosch

Obra: Judiciales

Hora inicio de semana: 3:00 PM

Hora fin de semana: 5:00 p.m.

Semana 04 al 09 September.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | Lun | | | Mar | | | Mie | | | Jue | | | Vie | | | Sab | | | Dom | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S | M | N | S | M | N | S | M | N | S | M | N | S | M | N | S | M | N | S | M | N |
| 1 | Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas) | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| 2 | Estado del interruptor de encendido y su seguro | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| 3 | Estado del accesorio Porta Brocas (mandril) | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| 4 | Estado del rango | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| 5 | Estado del cuerpo | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| 6 | Estado general aliado (fisuras, rupturas, etc.) | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| 7 | Estado general aliado (fisuras, rupturas, etc.) | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| 8 | Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor. | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| | REVISÓ (Operador del equipo) | — | | | ESSAP | | | — | | | — | | | Dennis | | | — | | | — | | |
| | APROBÓ (Residente SST) | — | | | Daniel | | | — | | | — | | | Daniel | | | — | | | — | | |

RECOMENDACIONES


OPERE EL EQUIPO ÚNICAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN DE PRECISO

VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA HOJA DE ATENCIÓN NO USAR

INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCIÓN CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO EN EQUIPO

Fecha último mantenimiento del equipo:

Observación:

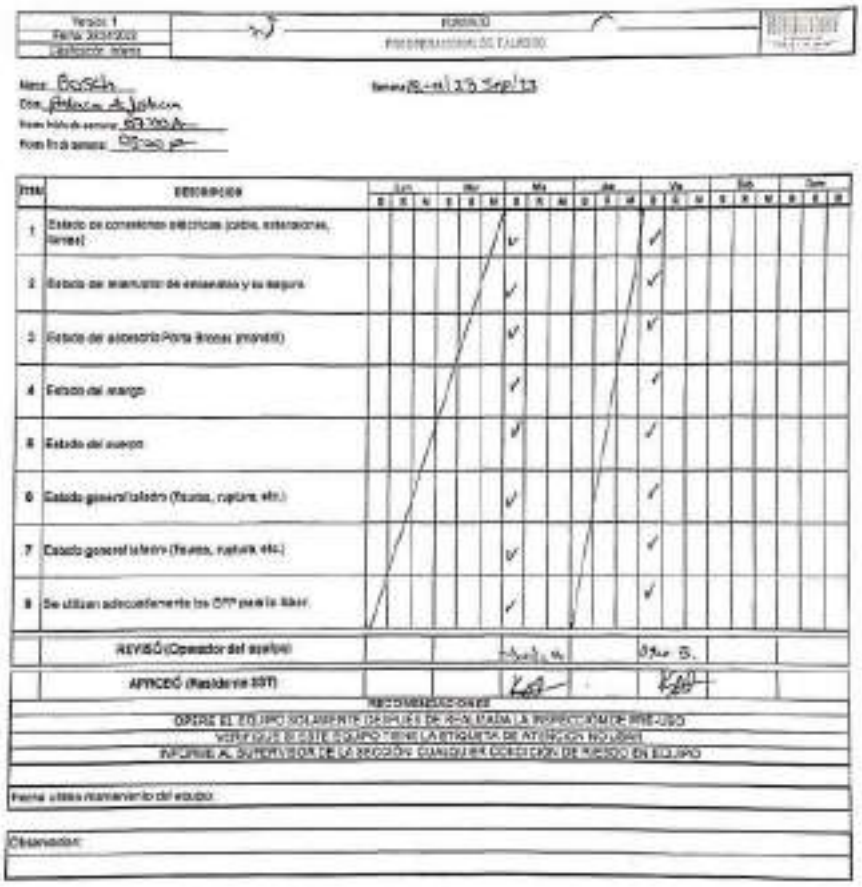

Versión: 1
Fecha: 30/3/2020
Clasificación: Interna

FORMATO
PROGRAMA MENSUAL DE TRABAJO

Mes: Bogotá
Obra: Palacio de Justicia
Fecha inicio de semana: 09 Sep/20
Fecha fin de semana: 12 Sep/20

Semana: 8 - 12 | 15 Sep/20


| ITEM | DESCRIPCION | Lun. | | | Mar. | | | Mie. | | | Jue. | | | Vie. | | | Sab. | | | Dom. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D | T | N | D | T | N | D | T | N | D | T | N | D | T | N | D | T | N | D | T | N |
| 1 | Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas) | | | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| 2 | Estado de mantenimiento de extintores y su seguro | | | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| 3 | Estado de asesoría Porta líneas (montaje) | | | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| 4 | Estado del arnés | | | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| 5 | Estado del cuerpo | | | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| 6 | Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.) | | | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| 7 | Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.) | | | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| 8 | Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor | | | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| | REVISÓ (Operador del equipo) | | | | | | | [illegible] | | | | | | Diaz S. | | | | | | | | |
| | APROBÓ (Residente SST) | | | | | | | [illegible] | | | | | | [illegible] | | | | | | | | |


RECOMENDACIONES


ORDENE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE INICIO
VERIFIQUE QUE EL EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION INICIAL
INFORME AL SUPERVISOR DE LA EMPRESA CUALQUIER DEFICIENCIA DE INICIO EN EQUIPO


Fecha última intervención del equipo:

Observación:

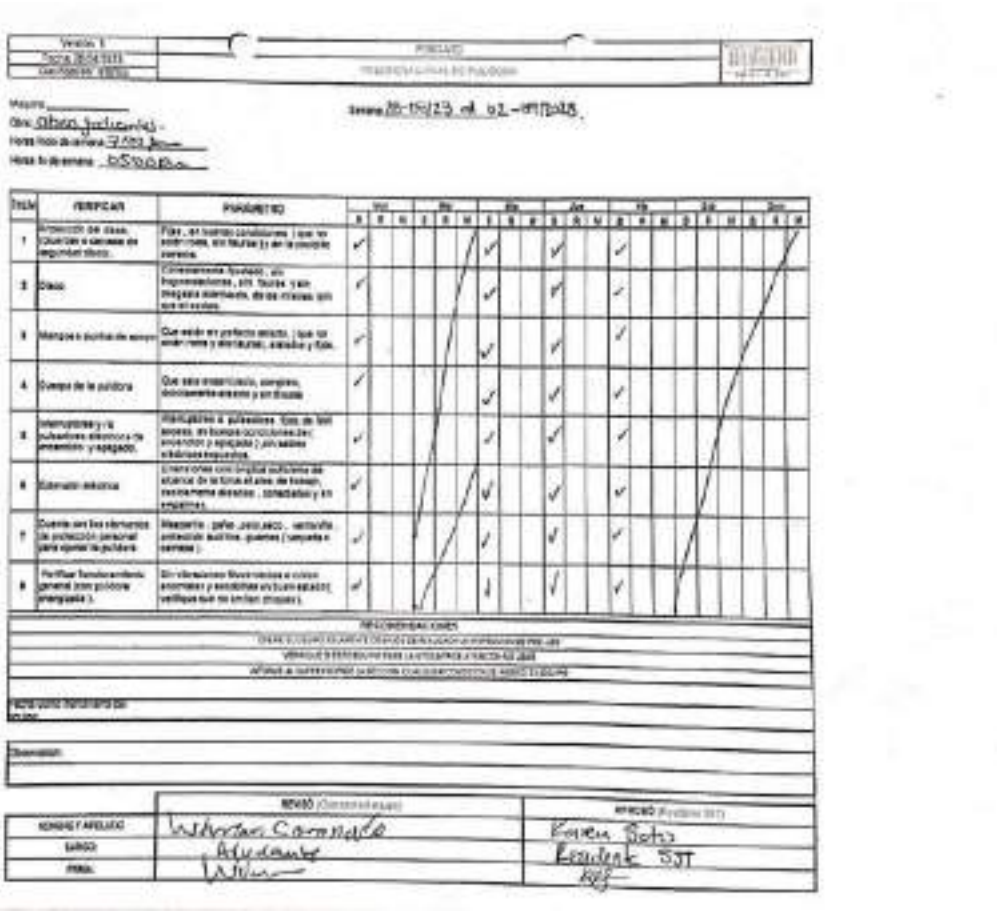

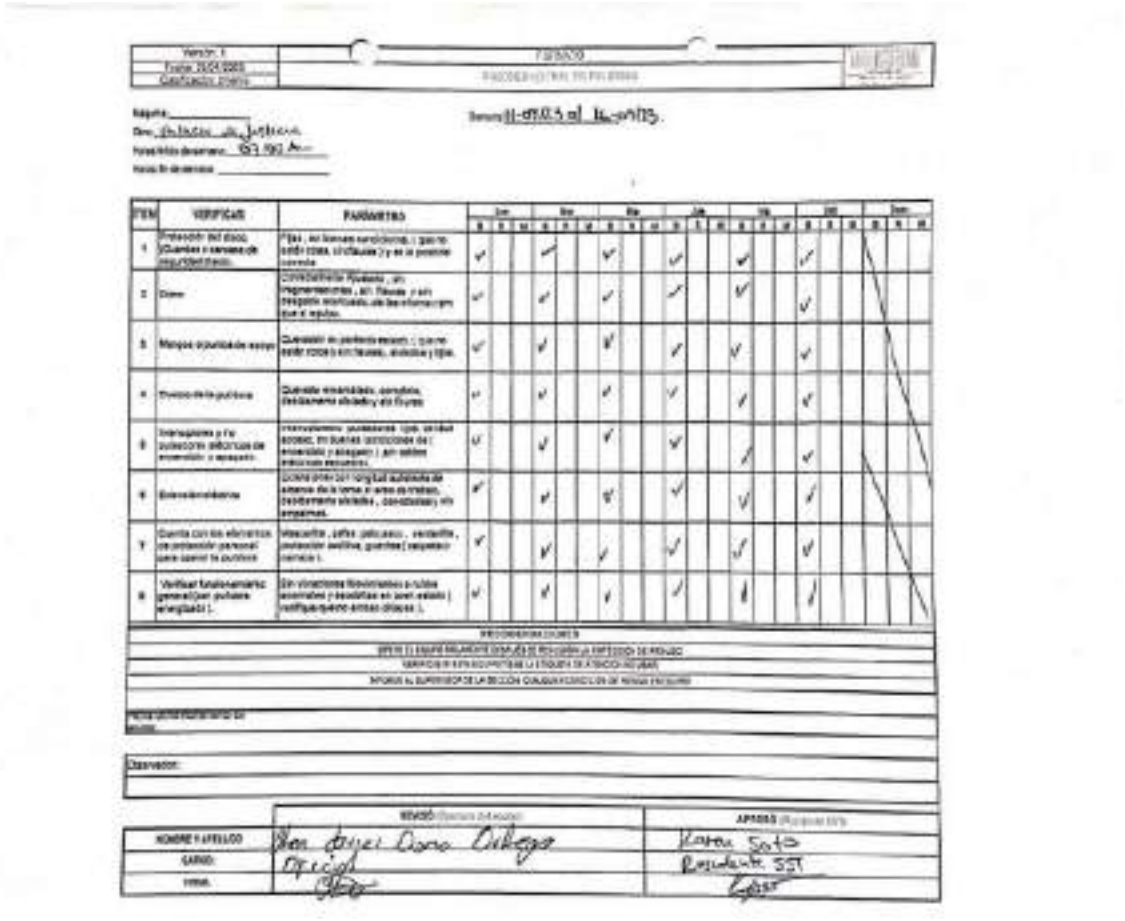

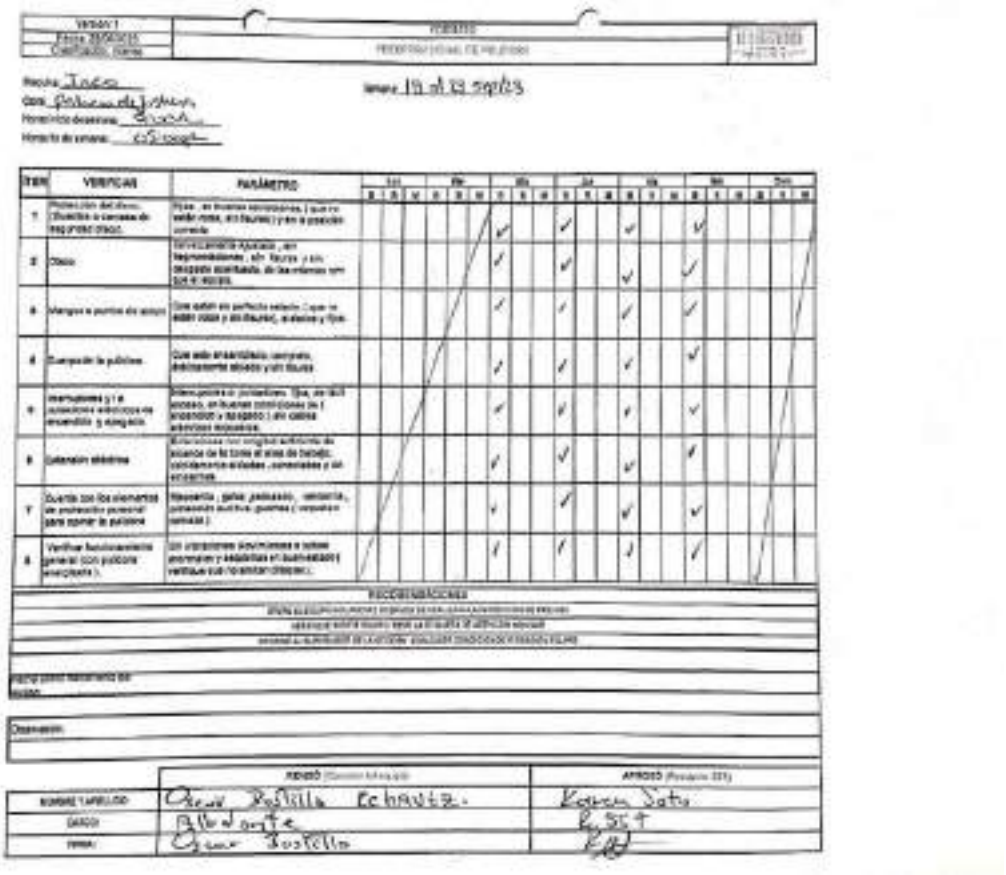

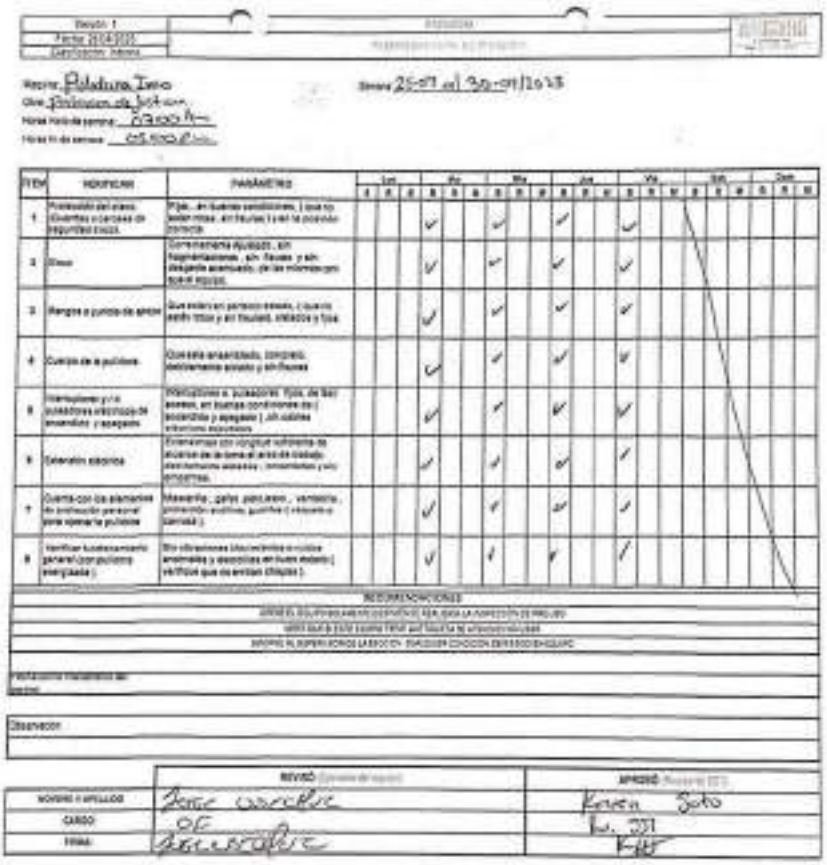

Recurso: Soldadura Tipo
Clase: Soldadura de Soldadura
Horas Hábil de semana: 08:00 A.m
Horas fin de semana: 05:00 P.m
Semana 25-07 al 30-07/2023

| ITEM | VERIFICAR | PARAMETRO | Lun | | | Mar | | | Mie | | | Jue | | | Vie | | | Sab | | | Dom | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | P | d | B | S | R | B | S | R | B | S | R | B | S | R | B | S | R | B | S | R |
| 1 | Protección del área (Cuentas o cercas de seguridad cinta. | Vigía...en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) con la posición correcta | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | |
| 2 | Cinta | Correctamente ajustado, sin fragmentaciones, sin fisuras y sin desgaste acentuado, (de las mismas por lo el equipo). | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | |
| 3 | Rangos o puntos de apoyo | Que estén en perfecto estado, (cuenta sello roto y sin fisuras), estables y fijos. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | |
| 4 | Cuerpo de a polainas | Que este ensamblado, completo, medianamente ajustado y sin fisuras | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | |
| 5 | Interruptores y/o pulsadores electricos de encendido y apagado | Interruptores o pulsadores, Tipo, de fácil acceso, en buenas condiciones de ( accesible y apagado ) sin cables eléctricos expuestos | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | |
| 6 | Extensión eléctrica | Encontramos con conjetur extremo de alcance de la zona al área de trabajo, sin humos excesos , cementados y no empalmes. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | |
| 7 | Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulsora | Maseerilla , gafas, para oído , ventaria , protección auditiva, guantes ( resistente a cortes ). | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | |
| 8 | Verificar funcionamiento general (con pulsora energizada ) | Sin vibraciones (fluctuantes o ruidos anormales y electricos en buen estado ( verifique que no existan chispas ). | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | |

RECOMENDACIONES

Observacion

| | REVISO | APROBO |
|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | Jose Carrillo | Karen Soto |
| CARGO | OE | Ing. SST |
| FIRMA | | |

| Versión: 1 |
|---|
| Fecha: 16/04/2020 |
| Clasificación: Interna |

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS


FECHA: 11-07/2023 al 17-07/2023

HORA: 07:30 A.M.

OBRA: Construcción Palacio de Justicia

CONTRATISTA: Consorcio Obras Judiciales

| ITEM | DESCRIPCION | ESTADO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cumple | No Cumple | N Aplica | |
| A | HERRAMIENTAS MANUALES | | | | |
| 1 | Se usa la(s) herramienta(s) adecuada al trabajo | ✓ | | | |
| 2 | Estado de la Herramienta | ✓ | | | |
| 3 | Estado de Almacenamiento y de Uso | ✓ | | | |
| 4 | Estado de los mangos de madera | ✓ | | | |
| 5 | Se usan prensas de banco | | | | |
| B | HERRAMIENTAS DE CORTE | | | | |
| 1 | Estado de la cabeza de los cinceles | | | ✓ | |
| 2 | Filos de los cinceles | | | ✓ | |
| 3 | Estado de los dientes de las tenajas macho o hembra | | | ✓ | |
| 4 | Inclinación de los filos de segueta | | | ✓ | |
| 5 | Estado de los mangos de las limas | | | ✓ | |
| 6 | Empuñaduras y dientes de los serruchos | | | ✓ | |
| 7 | Estado de los Mangos y fundas de los cuchillos | | | ✓ | |
| C | HERRAMIENTAS DE GOLPE | | | | |
| 1 | Se emplea el martillo adecuado según la labor ? | ✓ | | | |
| 2 | Sus cocas y bordes están en buen estado? | ✓ | | | |
| 3 | Estado en que se encuentra el mango | ✓ | | | |
| D | HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES | | | | |
| 1 | Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas ? | | | ✓ | |
| 2 | Estado de fuelles y pasadores de la llave | | | ✓ | |
| 3 | Se dispone de llaves para pujavas? | | | ✓ | |
| 4 | Estado de las mordazas de las llaves | | | ✓ | |
| 5 | Estado de las herramientas para trabajos electricos | | | ✓ | |
| 6 | Suficiencia de las herramientas para los trabajos electricos | | | ✓ | |
| 7 | Estado de la punta y cuna de los destornilladores | ✓ | | - | |
| 8 | Se dispone de herramientas que no produzcan chispas? | ✓ | | | |
| E | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | | | | |
| 1 | Las herramientas son adecuadas segun el Ambiente (humedad, vapores)? | | | ✓ | |
| 2 | Uso de los Elementos de protección Personal de acuerdo al uso de la herramienta | ✓ | | | |
| 3 | Limpieza y Lubricación de las herramientas | ✓ | | | |
| 4 | Guardas de seguridad | ✓ | | | |
| 5 | Aislamientos y sistemas de tierra | ✓ | | | |
| 6 | Estado del cable y enchufe | ✓ | | | |
| 7 | Estado y manejo de los taladros | | | ✓ | |
| 8 | Diametro, especificación y estado de la broca para el taladro a usar | | | ✓ | |
| 9 | Los esmeriles cuentan con guardas de Seguridad? | | | ✓ | |
| 10 | Los esmeriles cuentan los soportes de los discos o piedras son los adecuados? | | | ✓ | |

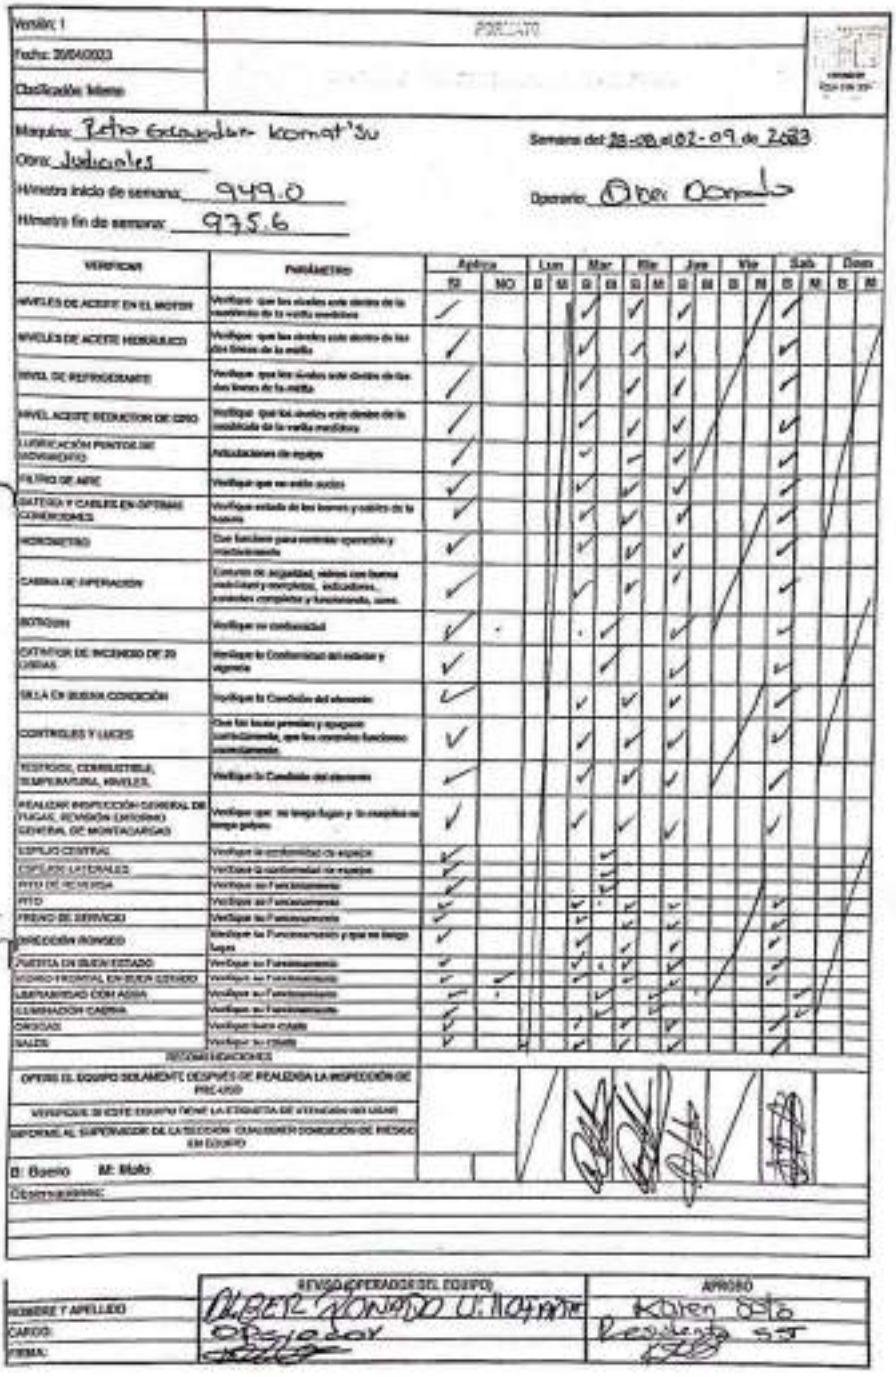

Versión: 1
Fecha: 20/04/2023
Clasificación: Interna


Maquina: Retro Excavador- komatsu
Obra: Judiciales
Horómetro inicio de semana: 949.0
Horómetro fin de semana: 975.6
Semana del: 28-08 al 02-09 de 2023
Operario: Oscar Acosta

| VERIFICAR | PARÁMETRO | Aplica SI | Aplica NO | Lun B | Lun M | Mar B | Mar D | Mié B | Mié M | Jue B | Jue M | Vie B | Vie M | Sáb B | Sáb M | Dom B | Dom M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR | Verifique que los niveles este dentro de la | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| NIVELES DE ACEITE HIDRAULICO | Verifique que los niveles este dentro de los | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| NIVEL DE REFRIGERANTE | Verifique que los niveles este dentro de los | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| NIVEL ACEITE REDUCTOR DE GIRO | Verifique que los niveles este dentro de la | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| LUBRICACIÓN PUNTOS DE MOVIMIENTO | Articulaciones de equipo | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| FILTRO DE AIRE | Verifique que no este sucio | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| BATERIA Y CABLES EN OPTIMAS CONDICIONES | Verifique estado de los bornes y cables de la | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| HORÓMETRO | Que funcione para controlar operación y | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| CABINA DE OPERACION | Cinturon de seguridad, vidrios con buena | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| BOTIQUIN | Verifique su contenidad | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| EXTINTOR DE INCENDIO DE 20 LIBRAS | Verifique la Conformidad del extintor y | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| SILLA EN BUENA CONDICIÓN | Verifique la Condición del elemento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| CONTROLES Y LUCES | Que los luces prendan y apagues | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| NIVELES, COMBUSTIBLE, TEMPERATURA, NIVELES | Verifique la Condición del elemento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, DERRAME (ACEITES) GENERAL DE MONTACARGAS | Verifique que no tenga fugas y la maquina no tenga golpes | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| ESPEJO CENTRAL | Verifique la conformidad de espejo | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPEJOS LATERALES | Verifique la conformidad de espejo | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| PITO DE REVERSA | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| PITO | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| FRENO DE SERVICIO | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| DIRECCIÓN ROMCO | Verifique su Funcionamiento y que no tenga | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| LLANTAS EN BUEN ESTADO | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| VIDRIO FRONTAL EN BUEN ESTADO | Verifique su Funcionamiento | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| LIMPIABRISAS CON AGUA | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| ILUMINACION CABINA | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| CHASIS | Verifique buen estado | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| SALES | Verifique su estado | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| RECOMENDACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN DE PRE-USO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE APROBACION DEL LUGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B: Bueno M: Malo

Observaciones:

| | REVISO OPERADOR DEL EQUIPO | APROBO |
|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | ALBERTO RONALDO U. HOYOS | Kuren Ortiz |
| CARGO | Operador | Residente SST |
| FIRMA | | |

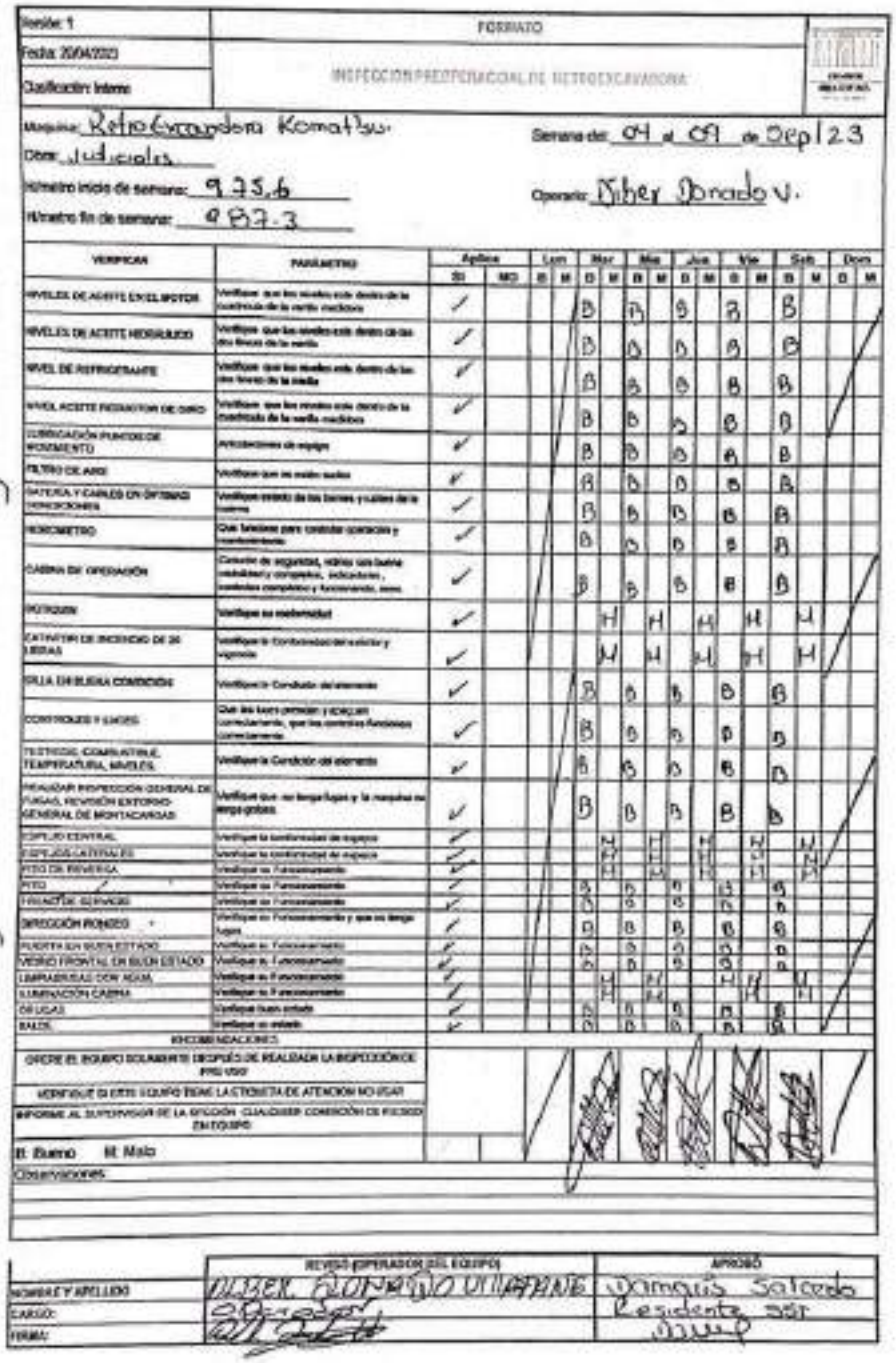

Versión: 1 | FORMATO

Fecha: 20/04/2020 | INSPECCION PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

Clasificación: Interna

Maquina: Retroexcavadora Komatsu. Semana de: 04 al 09 de Sept 23

Obra: Judiciales. Operario: Niber Dorado V.

Horometro inicio de semana: 9.735.6

Horometro fin de semana: 9.837.3

| VERIFICAR | PARAMETRO | Aplica SI | Aplica NO | Lun D | Lun M | Mar D | Mar M | Mie D | Mie M | Jue D | Jue M | Vie D | Vie M | Sab D | Sab M | Dom D | Dom M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR | Verifique que los niveles esté dentro de la marca de la varilla medidora | ✓ | | | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| NIVELES DE ACEITE HIDRAULICO | Verifique que los niveles esté dentro de las dos líneas de la varilla | ✓ | | | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| NIVEL DE REFRIGERANTE | Verifique que los niveles esté dentro de las dos líneas de la varilla | ✓ | | | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| NIVEL ACEITE REDUCTOR DE GIRO | Verifique que los niveles esté dentro de la marca de la varilla medidora | ✓ | | | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| LUBRICACIÓN PUNTOS DE MOVIMIENTO | Articulaciones de equipo | ✓ | | | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| FILTRO DE AIRE | Verifique que no estén sucios | ✓ | | | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| BATERIA Y CABLES EN OPTIMAS CONDICIONES | Verifique estado de los bornes y cables de la batería | ✓ | | | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| HORIOMETRO | Que funcione para controlar rotación y mantenimiento | ✓ | | | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| CABINA DE OPERACIÓN | Cinturón de seguridad, vidrios con buena visibilidad y completos, indicadores, controles completos y funcionando, aseo | ✓ | | | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| EXTINTOR | Verifique su vencimiento | ✓ | | | | H | | H | | H | | H | | H | | | |
| EXTINTOR DE INCENDIO DE 20 LIBRAS | Verifique la Conformidad del estado y vigencia | ✓ | | | | H | | H | | H | | H | | H | | | |
| SILLA DE BUENA CONDICIÓN | Verifique la Condición del elemento | ✓ | | | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| CONTROLES Y LUCES | Que las luces prendan y apagan correctamente, que los controles funcionen correctamente | ✓ | | | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| TESTIGOS, COMBUSTIBLE, TEMPERATURA, NIVELES | Verifique la Condición del elemento | ✓ | | | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, REVISIÓN ENTORNO GENERAL DE MONTACARGAS | Verifique que no tenga fugas y la maquina no tenga golpes | ✓ | | | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| ESPEJO CENTRAL | Verifique la conformidad del espejo | ✓ | | | | H | | H | | H | | H | | H | | | |
| ESPEJOS LATERALES | Verifique la conformidad del espejo | ✓ | | | | H | | H | | H | | H | | H | | | |
| PITO DE REVERSA | Verifique su funcionamiento | ✓ | | | | H | | H | | H | | H | | H | | | |
| PITO | Verifique su funcionamiento | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| FRENO DE SERVICIO | Verifique su funcionamiento | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| DIRECCIÓN RONDEO | Verifique su funcionamiento y que no tenga fugas | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| PUERTA EN BUEN ESTADO | Verifique su funcionamiento | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| VIDRIO FRONTAL EN BUEN ESTADO | Verifique su funcionamiento | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| LIMPIABRISAS CON AGUA | Verifique su funcionamiento | ✓ | | H | | H | | H | | H | | H | | H | | | |
| ILUMINACIÓN CABINA | Verifique su funcionamiento | ✓ | | H | | H | | H | | H | | H | | H | | | |
| DE LUCES | Verifique buen estado | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| BAJOS | Verifique su estado | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORDENE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN DE PRE USO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFIQUE QUE ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORME AL SUPERVISOR DE LA OBRA CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO EN EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B: Bueno M: Malo

Observaciones

| | REVISO (OPERADOR DEL EQUIPO) | APROBÓ |
|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | NIBER ALONSO DORADO VILLAMIZAR | Damaris Salcedo |
| CARGO: | Operador | Residente SST |
| FIRMA: | | |



Versión: 1 | FORMATO

Fecha: 20/04/2023

Clasificación: Interna

INSPECCION PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

Maquina: Retro Excavadora Komatsu — Semana del: 11 al 16 de Sept/23

Obra: Obras Judiciales

Horometro inicio de semana: 9860

Horometro fin de semana: 12139.7

Operario: Olber Dorado

| VERIFICAR | PARAMETRO | Aplica SI | Aplica NO | Lun B | Lun M | Mar D | Mar M | Mie N | Mie M | Jue D | Jue M | Vie D | Vie M | Sab N | Sab M | Dom D | Dom M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR | Verifique que los niveles este dentro de la medida de la varilla medidora | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| NIVELES DE ACEITE HIDRAULICO | Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la varilla | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| NIVEL DE REFRIGERANTE | Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la varilla | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| NIVEL ACEITE REDUCTOR DE GIRO | Verifique que los niveles este dentro de la marca de la varilla medidora | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| LUBRICACION PUNTOS DE MONTAJE | Articulaciones de equipo | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| FILTRO DE AIRE | Verifique que no estén sucios | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| BATERIA Y CABLES EN OPTIMAS CONDICIONES | Verifique estado de los bornes y cables de la batería | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| HORIOMETRO | Que funcione para controlar operación y mantenimiento | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| CABINA DE OPERACIÓN | Cinturón de seguridad, vidrios con buena visibilidad y completos, extintores, botiquines completos y funcionando, aseo | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| BOTIQUIN | Verifique su conformidad | ✓ | | | M | | M | | M | | M | | M | | M | | |
| EXTINTOR DE INCENDIO EC 20 LIBRAS | Verifique la Conformidad del extintor y vigencia | ✓ | | | M | | M | | M | | M | | M | | M | | |
| OLLA EN BUENA CONDICIÓN | Verifique la Condición del elemento | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| CONTROLES Y LUCES | Que los luces prendan y apagues correctamente, que los controles funcionen correctamente | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| NIVELES, COMBUSTIBLE, TEMPERATURA, NIVELES, | Verifique la Condición del elemento | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, REVISIÓN ENTORNO GENERAL DE MONTACARGAS | Verifique que no tenga fugas o la maquina no tenga golpes | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| ESPEJO CENTRAL | Verifique la condicionalidad de espejos | ✓ | | | M | | M | | M | | M | | M | | M | | |
| ESPEJOS LATERALES | Verifique la condicionalidad de espejos | ✓ | | | M | | M | | M | | M | | M | | M | | |
| PITO DE REVERSA | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | | | | M | | | | | | | | | | |
| PITO | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| FRENO DE SERVICIO | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| DIRECCIÓN ROMEO | Verifique su Funcionamiento y que no tenga fugas | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| PUESTA EN BUEN ESTADO | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| ASIENTO PROPIAL EN BUEN ESTADO | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| LIMPIABRISAS CON AGUA | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | | | | | | | | | | M | | M | | |
| ILUMINACIÓN CABINA | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIRCULINAS | Verifique Buen estado | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |
| RADIO | Verifique su estado | ✓ | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | | |

RECOMENDACIONES

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCIÓN DE PRE USO

VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCIÓN NO USAR


INFORME AL SUPERVISOR DE LA SI EXISTEN CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO EN EQUIPO

B: Bueno M: Malo

OBSERVACIONES: SE Solicita al Contratista dejar en Buenas Condiciones Locativas y Ambientales Ambientales con Baliques y Extintor el Personal.

| | REVISÓ (OPERADOR DEL EQUIPO) | APROBÓ |
|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO: | Olber Enrique Dorado | Karen Soto |
| CARGO: | Operador | Residente SST |
| FIRMA: | | |



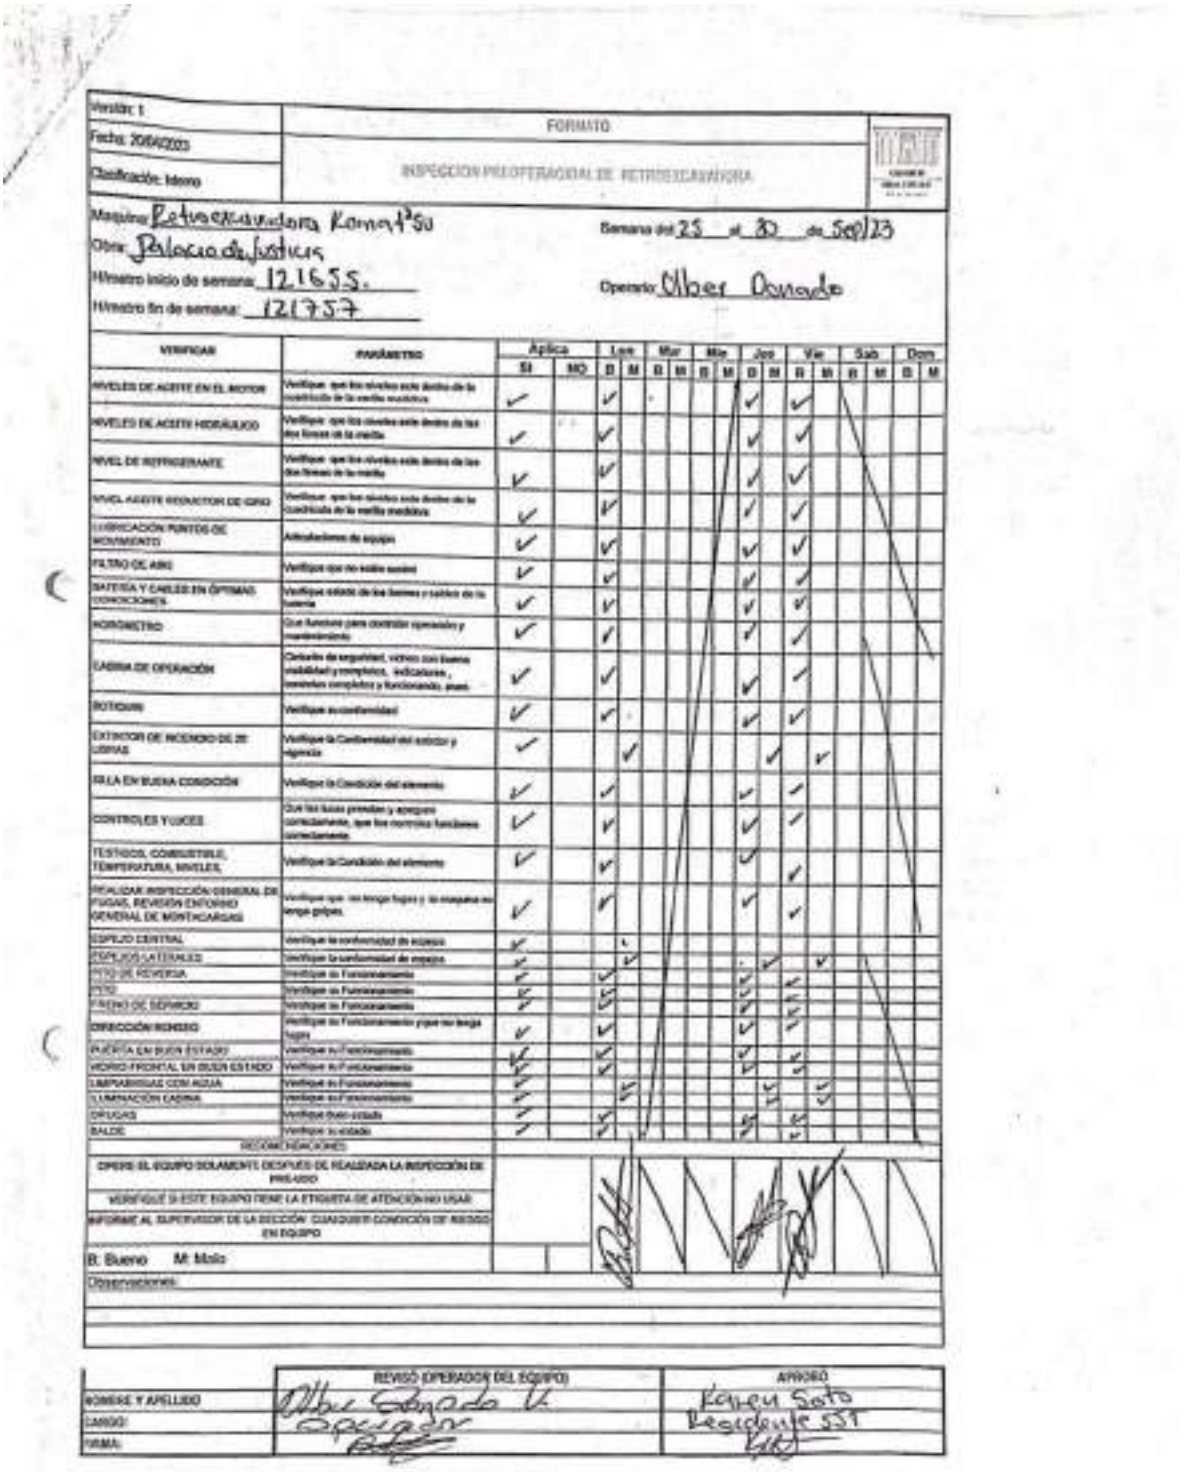

Versión: 1
Fecha: 20/04/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

Maquina: Retroexcavadora Komatsu
Obra: Palacio de Justicia
Horometro inicio de semana: 121655
Horometro fin de semana: 121757

Semana del 25 al 30 de Sept/23
Operario: Ober Dorado

| VERIFICAR | PARAMETRO | Aplica SI | Aplica NO | Lun D | Lun M | Mar D | Mar M | Mie D | Mie M | Jue D | Jue M | Vie D | Vie M | Sab D | Sab M | Dom D | Dom M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR | Verifique que los niveles este dentro de la graduación de la varilla medidora | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| NIVELES DE ACEITE HIDRÁULICO | Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la varilla | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| NIVEL DE REFRIGERANTE | Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la varilla | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| NIVEL ACEITE REDUCTOR DE GIRO | Verifique que los niveles este dentro de la graduación de la varilla medidora | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| LUBRICACIÓN PUNTOS DE MOVIMIENTO | Articulaciones de equipo | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| FILTRO DE AIRE | Verifique que no estén sucios | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| BATERÍA Y CABLES EN ÓPTIMAS CONDICIONES | Verifique estado de los bornes y cables de la batería | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| HORÓMETRO | Que funcione para controlar operación y mantenimiento | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| CABINA DE OPERACIÓN | Cinturón de seguridad, vidrios con buena visibilidad y completos, indicadores, controles completos y funcionando, pisos | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| BOTIQUÍN | Verifique su contenido(a) | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| EXTINTOR DE INCENDIO DE 20 LIBRAS | Verifique la Confiabilidad del extintor y vigencia | ✓ | | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| SILLA EN BUENA CONDICIÓN | Verifique la Condición del elemento | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| CONTROLES Y LUCES | Que las luces prendan y apaguen correctamente, que los controles funcionen correctamente | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| TESTIGOS, COMBUSTIBLE, TEMPERATURA, NIVELES, | Verifique la Condición del elemento | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, REVISIÓN ENTORNO GENERAL DE MONTACARGAS | Verifique que no tenga fugas y la maquina no tenga golpes | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| ESPEJO CENTRAL | Verifique la conformidad de espejos | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| ESPEJOS LATERALES | Verifique la conformidad de espejos | ✓ | | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| PITO DE REVERSA | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| PITO | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| FRENO DE SERVICIO | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| DIRECCIÓN RONDEO | Verifique su Funcionamiento y que no tenga fugas | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| PUERTA EN BUEN ESTADO | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| VIDRIO FRONTAL EN BUEN ESTADO | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| LIMPIABRISAS CON AGUA | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| ILUMINACIÓN CABINA | Verifique su Funcionamiento | ✓ | | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| DRUGAS | Verifique buen estado | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| BALDE | Verifique su estado | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |

RECOMENDACIONES

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN DE PREUSO


VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR

INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCIÓN CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO EN EQUIPO

B: Bueno M: Malo

Observaciones:

| | REVISÓ (OPERADOR DEL EQUIPO) | APROBÓ |
|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | Ober Dorado V. | Karen Soto |
| CARGO: | Operador | Residente SST |
| FIRMA: | | |

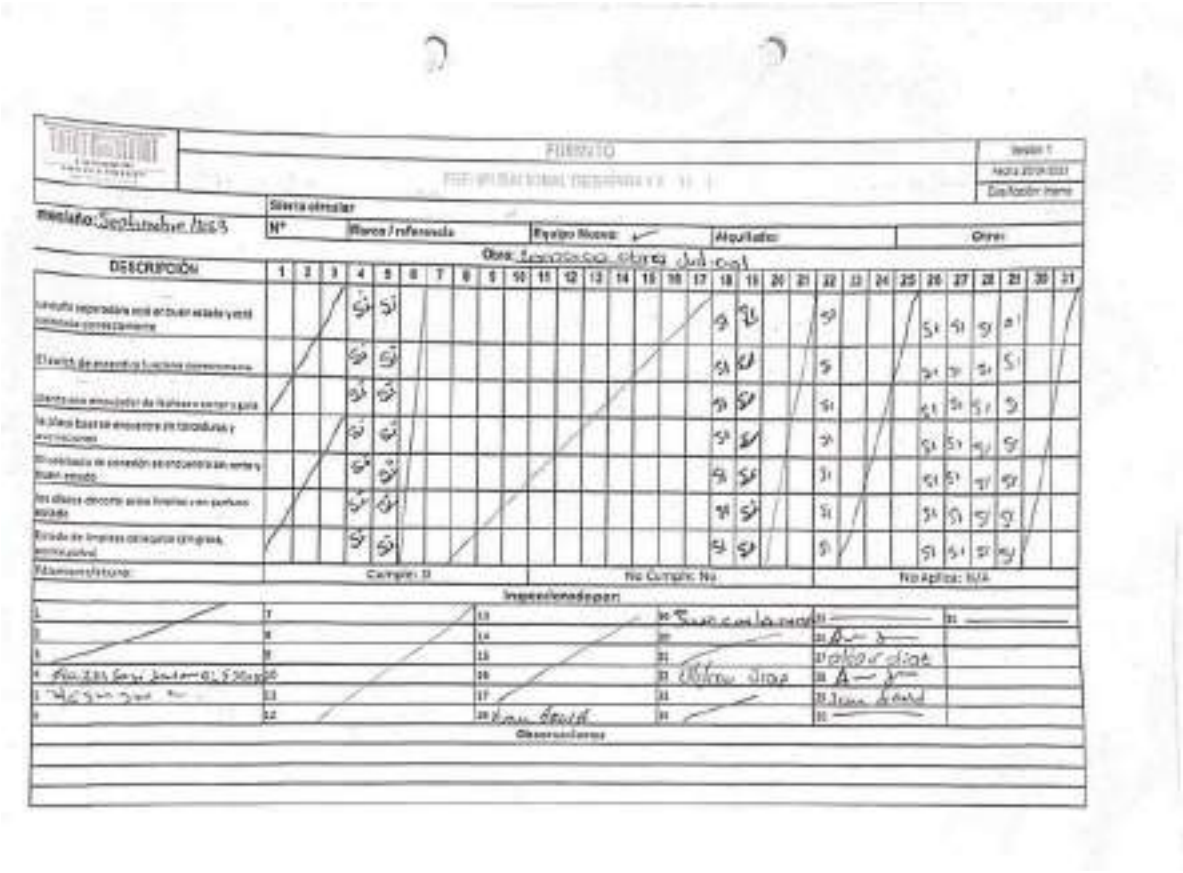

**FORMATO PREOPERACIONAL EQUIPO MOVIL AUTOBOMBA**



INSPECCIONADO POR: Javier Ariza — CARGO: Operador de Autobombas

FECHA DE INSPECCION: DESDE 22-09/2023 — HASTA:

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Javier Ariza — PLACA DEL VEHICULO: TLY-920

SOAT: FECHA DE EXPEDICION: 20-09/2023 — FECHA DE VENCIMIENTO: 19-09/2024

REVISION TECNICO MECANICA: FECHA DE EXPEDICION: 24-01/2022 — FECHA DE VENCIMIENTO: 24-01/2024

| ELEMENTOS DE OPERACIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUEV | | VIER | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCES | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| De Trabajo delanteras | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| De trabajo traseras | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Direccionales Del. Y Traseras | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| luces de parqueo | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Stop Traseros | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| CABINA | LUN | | MAR | | MIER | | JUEV | | VIER | | SABA | | DOM | |
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Documentos del vehiculo | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Espejos laterales | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Alarma (o pito) de Retroceso | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Estado de los pedales de mando | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Pito Normal | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Switch Encendido | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Frenos de Servicio | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Freno de emergencia | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Dirección/suspensión(Terminales). | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Cinturones de Seguridad | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Estado de la puertas | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Vidrio frontal en buen estado. | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Limpia brisas | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Equipo de carreteras | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Extintor (10 lbs) P.Q.S | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Botiquín Primeros Auxilios | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Estado de los asientos | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| *Indicadores (Hidráulico- voltimetro). | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| *Motor- Refrigerante- aceite-tra, aire). | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| * Velocimetro | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Estado de palancas de mando | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Bateria y cables | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| EXTERIOR | LUN | | MAR | | MIER | | JUEV | | VIER | | SABA | | DOM | |
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Estado de grapas, muelles y barras tensoras | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Estado de las llantas, sin cortaduras profundas y sin abultamientos | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado físico ( No fisuras). | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Estado del gato elevador del volco | | | | | | | | | ✓ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de los pasadores | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado del volco | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado de las vigas | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO MECANICO | LUN | | MAR | | MIER | | JUEV | | VIER | | SABA | | DOM | | |
| | B | M | B | M | B | M | B | N | B | M | B | M | B | M | |
| Control de fugas hidráulicas | | | | | | | | | ✓ | | | | | | |
| * Estado de correas | | | | | | | | | ✓ | | | | | | |
| Caja de cambios en buen estado. | | | | | | | | | ✓ | | | | | | |
| Radiador | | | | | | | | | ✓ | | | | | | |
| abrazaderas | | | | | | | | | ✓ | | | | | | |
| Mangueras en general | | | | | | | | | ✓ | | | | | | |

VO BO OPICO
N/A

PEQUEÑAS FUGAS

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Firma Conductor:

Notificado Responsable del área: Fecha: 22-07-23 Fecha de Cierre:

Fecha seguimiento compromisos:

LUNES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

MARTES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION


MIECOLES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

JUEVES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

VIERNES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

SABADO: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

Vo.Bo. ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

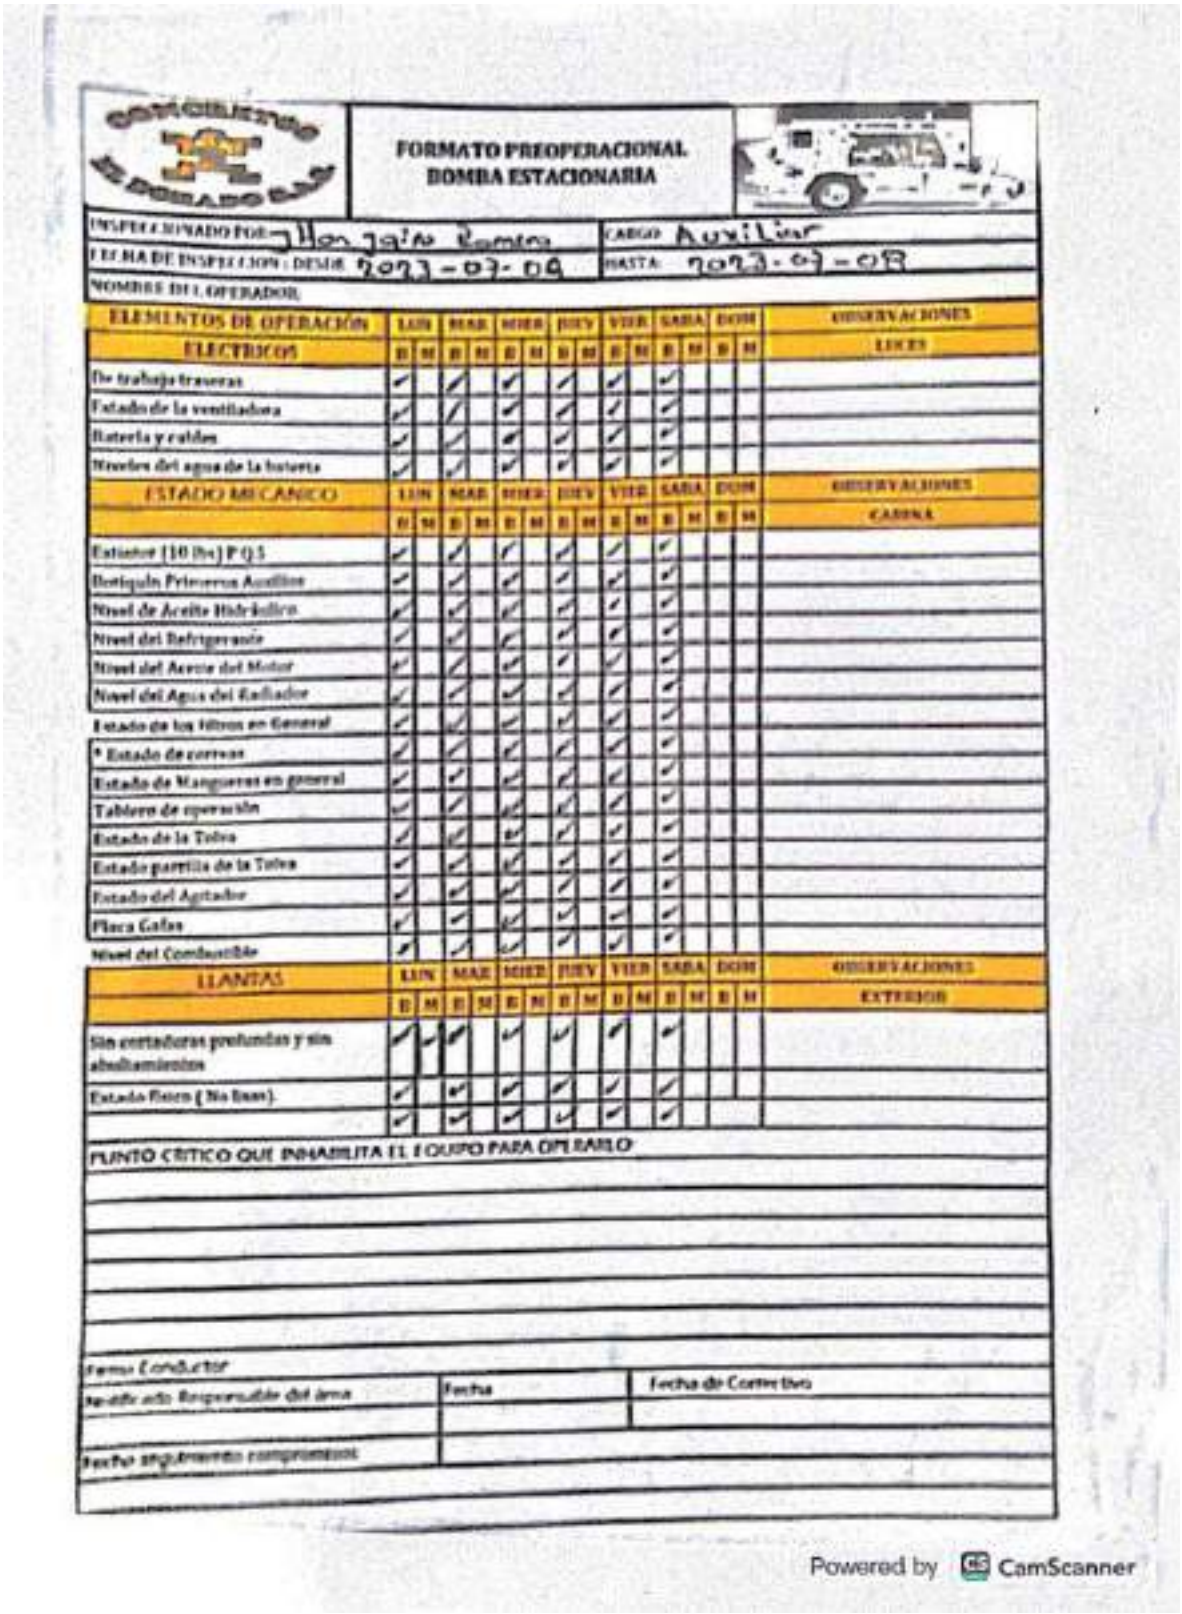

**FORMATO PREOPERACIONAL BOMBA ESTACIONARIA**

INSPECCIONADO POR: Hanjair Ramos — CARGO: Auxiliar

FECHA DE INSPECCION: DESDE: 2023-07-09 — HASTA: 2023-07-08

NOMBRE DEL OPERADOR:

| ELEMENTOS DE OPERACIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUEV | | VIER | | SABA | | DOM | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICOS | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | LUCES |
| De trabajo traseras | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Estado de la ventiladora | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Bateria y cables | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Niveles del agua de la bateria | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| ESTADO MECANICO | LUN | | MAR | | MIER | | JUEV | | VIER | | SABA | | DOM | | OBSERVACIONES |
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | CABINA |
| Extintor (10 lbs) PQS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Botiquin Primeros Auxilios | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Nivel de Aceite Hidráulico | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Nivel del Refrigerante | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Nivel del Aceite del Motor | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Nivel del Agua del Radiador | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Estado de los filtros en General | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| * Estado de correas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Estado de Mangueras en general | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Tablero de operación | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Estado de la Tolva | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Estado parrilla de la Tolva | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Estado del Agitador | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Placa Gafas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Nivel del Combustible | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| LLANTAS | LUN | | MAR | | MIER | | JUEV | | VIER | | SABA | | DOM | | OBSERVACIONES |
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | EXTERIOR |
| Sin cortaduras profundas y sin abultamientos | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Estado Fisico ( No lisas). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO

Firma Conductor

| Nombre y/o Responsable del área | Fecha | Fecha de Correctivo |
|---|---|---|
| | | |
| Fecha seguimiento compromisos | | |

Powered by CamScanner

**PAVIMENTOS EL DORADO**

**FORMATO PREOPERACIONAL CAMIONETA TURBO JAC**



| ESTADO MECANICO | LUN | | MAR | | MIER | | JUEV | | VIER | | SABA | | DOM | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | ESTADO MECANICO |
| Control de fugas hidráulicas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| * Estado de correas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Caja de cambios en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Radiador | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Estado Tanque de combustible y abrazaderas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Mangueras en general | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Firma Conductor:

| Notificado Responsable del Area: | Fecha | Fecha de Correctivo |
|---|---|---|
| | | |
| Fecha seguimiento compromisos: | | |

Jhon Jairo Romero
LUNES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

Jhon Jairo Romero
MARTES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

Jhon Jairo Romero
MIECOLES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

Jhon Jairo Romero
JUEVES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

Jhon Jairo Romero
VIERNES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

Jhon Jairo Romero
SABADO: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

RE FORMATO SOLO ES VALIDO SI CUENTA CON LA APROBACION DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Vo.Bo. ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Km 3 via La Popa -La Mesa, Valledupar-Cesar
Email:plantas@concretosdorado.com

Powered by CamScanner

| Versión: 1 |
|---|
| Fecha: 18/05/2023 |
| Clasificación: Interna |

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 11-07/2023 al 16-07/2023

HORA: 07:00 A.M - 05:00 P.M

OBRA: Construcción Palacio de Justicia

CONTRATISTA: Consorcio Obras Judiciales.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESTADO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cumple | No Cumple | N/Aplica | |
| 11 | Las cuñaines conicien en diámetro y están instaladas según el mango? | | | ✓ | |
| 12 | Estado de las mazas o martillos en las zonas abrasivas. | | | ✓ | |
| 13 | Almacenamiento de los pulidores y discos | ✓ | | | |
| F | HERRAMIENTAS NEUMATICAS | | | | |
| 1 | Estado de las mangueras y acoples | | | ✓ | |
| 2 | Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta? | | | ✓ | |
| 3 | Presiones indicadas | | | ✓ | |
| 4 | Descarga de la herramienta | | | ✓ | |
| G | HERRAMIENTA POR DETONACIÓN | | | - | |
| 1 | El personal es autorizado | ✓ | | | |
| 2 | Emplean los elementos de protección | ✓ | | | |
| 3 | Descargo y almacenamiento de la herramienta | ✓ | | | |
| H | SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL | | | | |
| 1 | El personal que utiliza los equipos y herramientas, ha recibido instrucción? | ✓ | | | |
| 2 | Las herramientas se seleccionan correctamente para el trabajo a realizar? | ✓ | | | |
| 3 | Transporte y almacenamiento al sitio del trabajo | ✓ | | | |
| 4 | Los labores de mantenimiento como: limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados. | ✓ | | | |
| 5 | Almacenamiento | ✓ | | | |
| 6 | Herramientas y equipos en buen estado | ✓ | | | |
| 7 | Se utilizan correctamente | ✓ | | | |
| 8 | Se encuentran señalizados los equipos que existen peligros especiales tales como alto voltaje, etc. | ✓ | | | |

*Nota: Los ítem del numeral H siempre deben ser diligenciados independiente del tipo de herramienta que se encuentre en el frente de obra.*

| | REVISO | APROBO |
|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | Paola Julio Sandoval | Paola Soto |
| CARGO | | Residente SST |
| FIRMA | | |

| Versión: 1 | FORMATO |
|---|---|
| Fecha: 24/8/2023 | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO |
| Clasificación: Interna | |

Proyecto: Consorcio obras Judiciales

Semana del 04 al 09 de Septiembre / 23

Vibrador N°: 01

Marca: Makita

| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SÁB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Botella vibradora en buenas condiciones | X | | | | | | | | | | | | | |
| Flexible en buen estado | X | | | | | | | | | | | | | |
| Cuerpo de acople en buenas condiciones | X | | | | | | | | | | | | | |
| Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo. | X | | | | | | | | | | | | | |
| Rodamiento de giro (acople) en buen estado. | X | | | | | | | | | | | | | |
| Motor en buen estado de funcionamiento. | X | | | | | | | | | | | | | |
| Estructura Metálica en buen estado | X | | | | | | | | | | | | | |
| Estado físico general del equipo (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Condiciones de Aseo. | X | | | | | | | | | | | | | |
| Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes. | X | | | | | | | | | | | | | |

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) ó M (malo) según inspeccione el equipo

Nombre del operador: Luis Castillo Firma: Luis Castillo Marquez — — — — — —

Vo.Bo. Residente SST: Damaris S. Firma: — — — — — —

OBSERVACIONES:

| Versión: 1 | FORMATO |
|---|---|
| Fecha: 14/08/2019 | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO |
| Clasificación: Interna | |

Proyecto: ampliación obras Judiciales

Semana del 04 al 09 de Septiembre /23

Vibrador N°: 02

Marca: Maíta

| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SÁB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Botella vibradora en buenas condiciones | X | | | | | | | | | | | | | |
| Flexible en buen estado | X | | | | | | | | | | | | | |
| Cuerpo de acople en buenas condiciones | X | | | | | | | | | | | | | |
| Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo. | X | | | | | | | | | | | | | |
| Rodamiento de giro (acople) en buen estado | X | | | | | | | | | | | | | |
| Motor en buen estado de funcionamiento | X | | | | | | | | | | | | | |
| Estructura Metálica en buen estado | X | | | | | | | | | | | | | |
| Estado físico general del equipo (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras,Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Condiciones de Aseo. | X | | | | | | | | | | | | | |
| Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral,protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes. | X | | | | | | | | | | | | | |

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del operador: Jesus David Q Firma | Jesus David Q | — | — | — | — | — | — | — |
| Visto Residente SST: Damaris S. Firma | Dasp | — | — | — | — | — | — | — |

OBSERVACIONES:

| Versión: 1 | |
|---|---|
| Fecha: 24/01/2021 | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO |
| Clasificación: Interna | |

Proyecto: Consorcio Obras Judiciales — Semana del 18 al 23 de Sept. 2023

Vibrador N°: 01 — Marca: Bosch


| DESCRIPCIÓN | LUN B | LUN M | MAR B | MAR M | MIE B | MIE M | JUE B | JUE M | VIE B | VIE M | SÁB B | SÁB M | DOM B | DOM M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella vibradora en buenas condiciones | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Flexible en buen estado | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Cuerpo de acople en buenas condiciones | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Rodamiento de giro (acople) en buen estado | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Motor en buen estado de funcionamiento | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Estructura Metálica en buen estado | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Estado físico general del equipo (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Roturas, Rejillas libres para ventilación y Condiciones de Aseo | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes. | | | | | | | | | ✓ | | | | | |

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según las pruebas el equipo

Nombre del operador: Jesus David Cuadr Firma: Jesus Cuadr

Vobo Residente SST: Yeimy Soto Firma:

OBSERVACIONES:

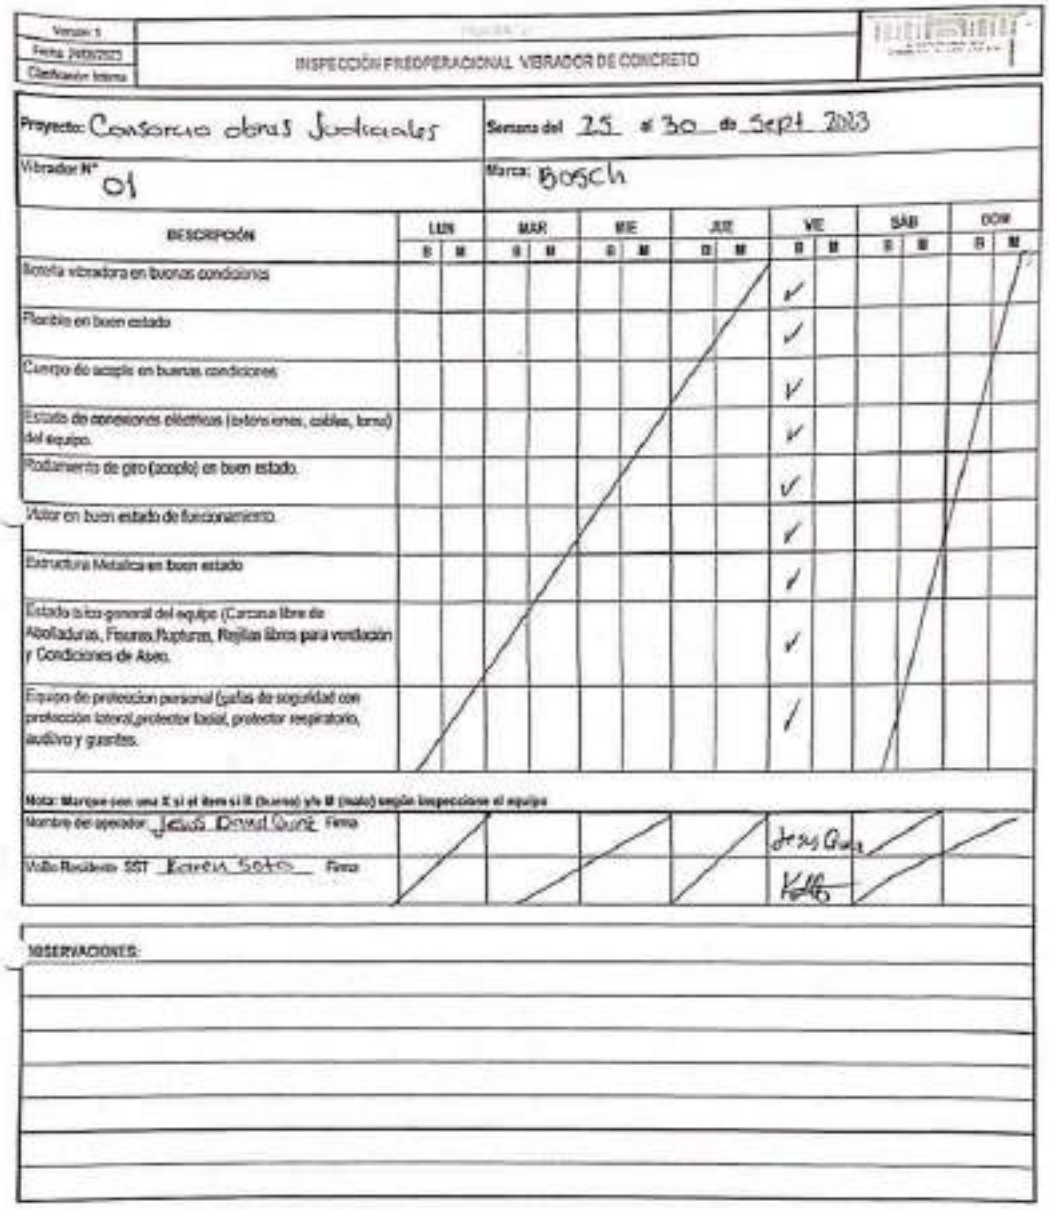

Versión: 1
Fecha: 28/09/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO

Proyecto: Consorcio obras Judiciales — Semana del 25 al 30 de Sept 2023

Vibrador N° 01 — Marca: Bosch

| DESCRIPCIÓN | LUN B | LUN M | MAR B | MAR M | MIE B | MIE M | JUE B | JUE M | VIE B | VIE M | SÁB B | SÁB M | DOM B | DOM M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomba vibradora en buenas condiciones | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Plomito en buen estado | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Cuerpo de acople en buenas condiciones | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo. | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Rodamiento de giro (acople) en buen estado. | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Motor en buen estado de funcionamiento | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Estructura Metálica en buen estado | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Estado físico general del equipo (Carcasa libre de Abolladuras., Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Condiciones de Aseo. | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes. | | | | | | | | | ✓ | | | | | |

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

Nombre del operador: Jesús Daniel Cruz — Firma: Jesus Cruz

Vo.Bo. Residente SST: Estefa Soto — Firma: Estefa

OBSERVACIONES:

| Versión: 1 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 30/04/2021 | INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOBOMBA | |
| Clasificación: Interna | | |


EQUIPO: MOTOBOMBA — SEMANA: 25 al 30 Sept/2023

PROYECTO U OBRA: Consorcio Obras Judiciales — MARCA: KTC Group 13Hp 196cc.

| INSPECCIÓN VISUAL | | APLICA | | LUN | | MAR | | MIERC | | JUEV | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| PERNOS | Verificar que se encuentren en buen estado y completos | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ENCENDIDO | Verificar que se encuentre en buen estado | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| YOYO | Verificar que se encuentre en buen estado y funcione correctamente | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| FILTROS | Verifique que los filtros estén libres de fugas. Verifique que los filtros no estén rotos, flojos, deteriorados | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ACOPLES | Verifique que se encuentren completos, en buen estado y sin fisuras | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ACEITE | Verificar que se encuentre en el nivel requerido y la bomba está sin fugas. | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| COMBUSTIBLE | Verificar que se encuentre en el nivel requerido y la bomba está sin fugas. | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ESTADO ESTRUCTURA EN GENERAL | Verifique que la estructura no presente agrietamientos, ovallamientos | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |

OBSERVACIONES

| | REVISO (OPERADOR DEL EQUIPO) | APROBO |
|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | ANIBAL Jimenez Escurcia | Karen Soto |
| CARGO: | Oficial | R. SST |
| FIRMA: | | |

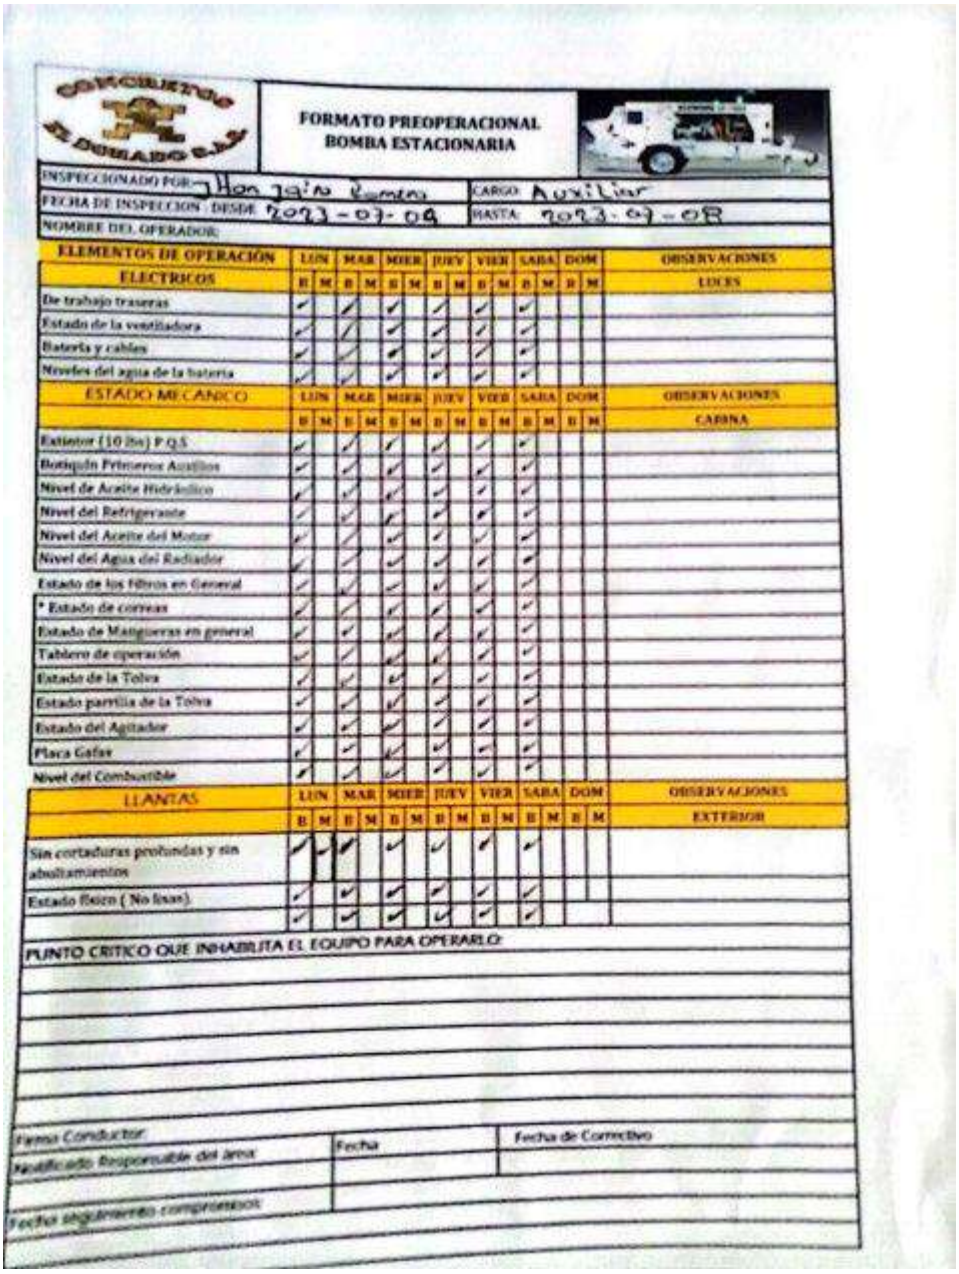

CONCRETO EL DORADO S.A.S

**FORMATO PREOPERACIONAL BOMBA ESTACIONARIA**

INSPECCIONADO POR: Hernando Ramos — CARGO: Auxiliar


FECHA DE INSPECCION: DESDE 2023-07-04 — HASTA: 2023-07-08

NOMBRE DEL OPERADOR:

| ELEMENTOS DE OPERACIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUEV | | VIER | | SABA | | DOM | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICOS | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | LUCES |
| De trabajo traseras | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Estado de la ventiladora | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Bateria y cables | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Niveles del agua de la bateria | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| ESTADO MECANICO | LUN | | MAR | | MIER | | JUEV | | VIER | | SABA | | DOM | | OBSERVACIONES |
| | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | CABINA |
| Extintor (10 lbs) P.Q.S | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Botiquin Primeros Auxilios | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Nivel de Aceite Hidráulico | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Nivel del Refrigerante | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Nivel del Aceite del Motor | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Nivel del Agua del Radiador | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Estado de los filtros en General | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| * Estado de correas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Estado de Mangueras en general | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Tablero de operación | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Estado de la Tolva | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Estado parrilla de la Tolva | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Estado del Agitador | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Placa Gafas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Nivel del Combustible | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| LLANTAS | LUN | | MAR | | MIER | | JUEV | | VIER | | SABA | | DOM | | OBSERVACIONES |
| | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | EXTERIOR |
| Sin cortaduras profundas y sin abultamientos | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Estado Rin ( No fisas) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

| | | |
|---|---|---|
| Firma Conductor | | |
| Nombre y cargo Responsable del área | Fecha | Fecha de Correctivo |
| Fecha seguimiento compromisos | | |

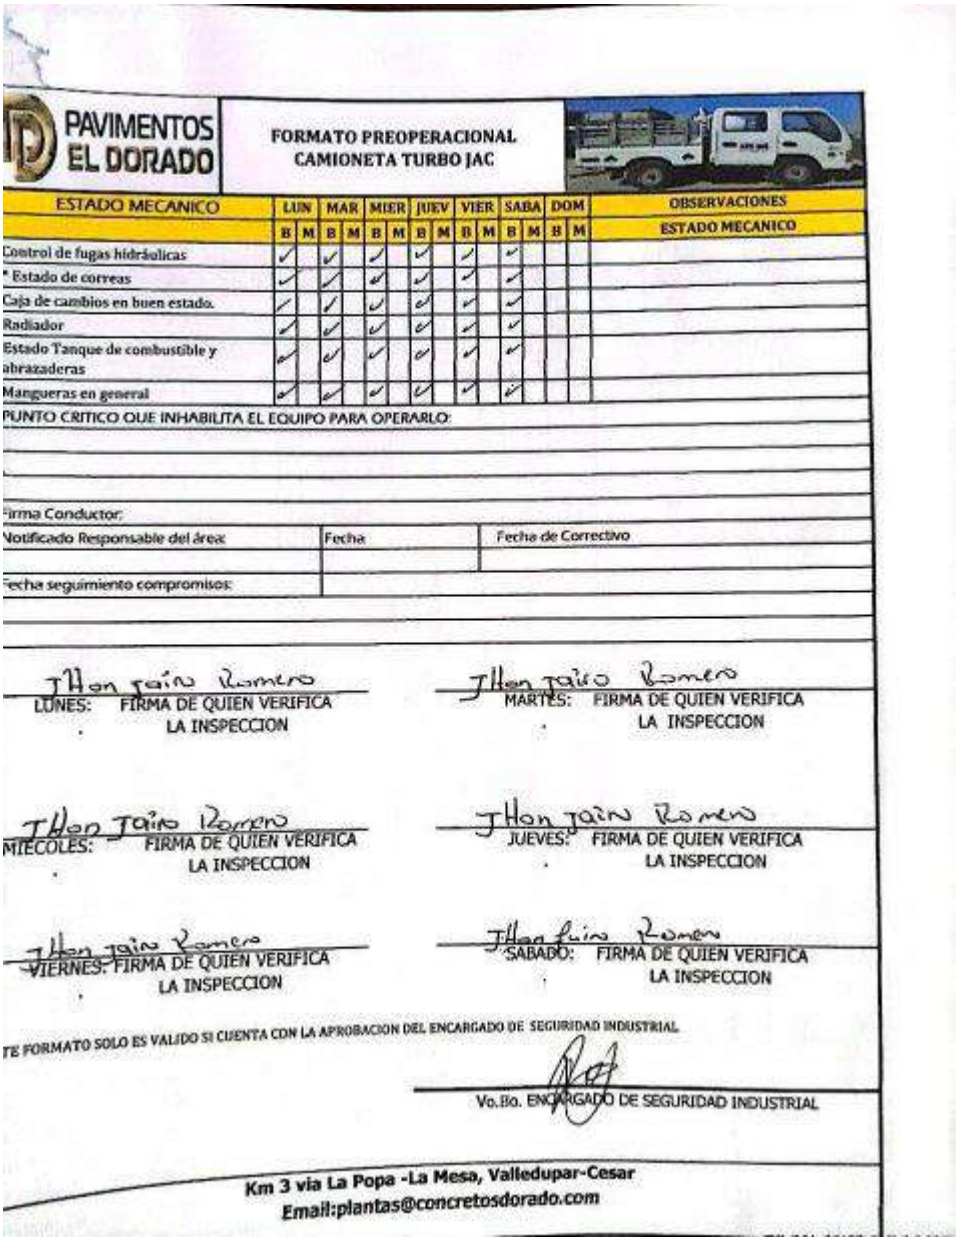

PAVIMENTOS EL DORADO

FORMATO PREOPERACIONAL
CAMIONETA TURBO JAC

| ESTADO MECANICO | LUN | | MAR | | MIER | | JUEV | | VIER | | SABA | | DOM | | OBSERVACIONES ESTADO MECANICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| Control de fugas hidráulicas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| * Estado de correas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Caja de cambios en buen estado. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Radiador | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Estado Tanque de combustible y abrazaderas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Mangueras en general | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Firma Conductor:

| Notificado Responsable del área: | Fecha | Fecha de Correctivo |
|---|---|---|
| Fecha seguimiento compromisos: | | |

LUNES: Jhon Jairo Romero FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

MARTES: Jhon Jairo Romero FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

MIECOLES: Jhon Jairo Romero FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

JUEVES: Jhon Jairo Romero FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

VIERNES: Jhon Jairo Romero FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

SABADO: Jhon Jairo Romero FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

TE FORMATO SOLO ES VALIDO SI CUENTA CON LA APROBACION DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Vo.Bo. ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Km 3 via La Popa -La Mesa, Valledupar-Cesar
Email:plantas@concretosdorado.com

CONCRETOS EL DORADO S.A.S

**FORMATO PREOPERACIONAL BOMBA ESTACIONARIA**



Jhon Jairo Romero
LUNES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

Jhon Jairo Romero
MARTES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

Jhon Jairo Romero
MIECOLES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

Jhon Jairo Romero
JUEVES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

Jhon Jairo Romero
VIERNES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION


Jhon Jairo Romero
SABADO: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

DOMINGO: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

ESTE FORMATO SOLO ES VALIDO SI CUENTA CON LA APROBACION DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Vo.Bo. ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


Carrera 16A No. 80-63 Oficina 702 Teléfono: 6 212161 Fax: 6911809
principal@concretosdorado.com -Bogotá D.C.
Valledupar: Km 3 Vía la Popa – La mesa
plantas@concretosdorado.com

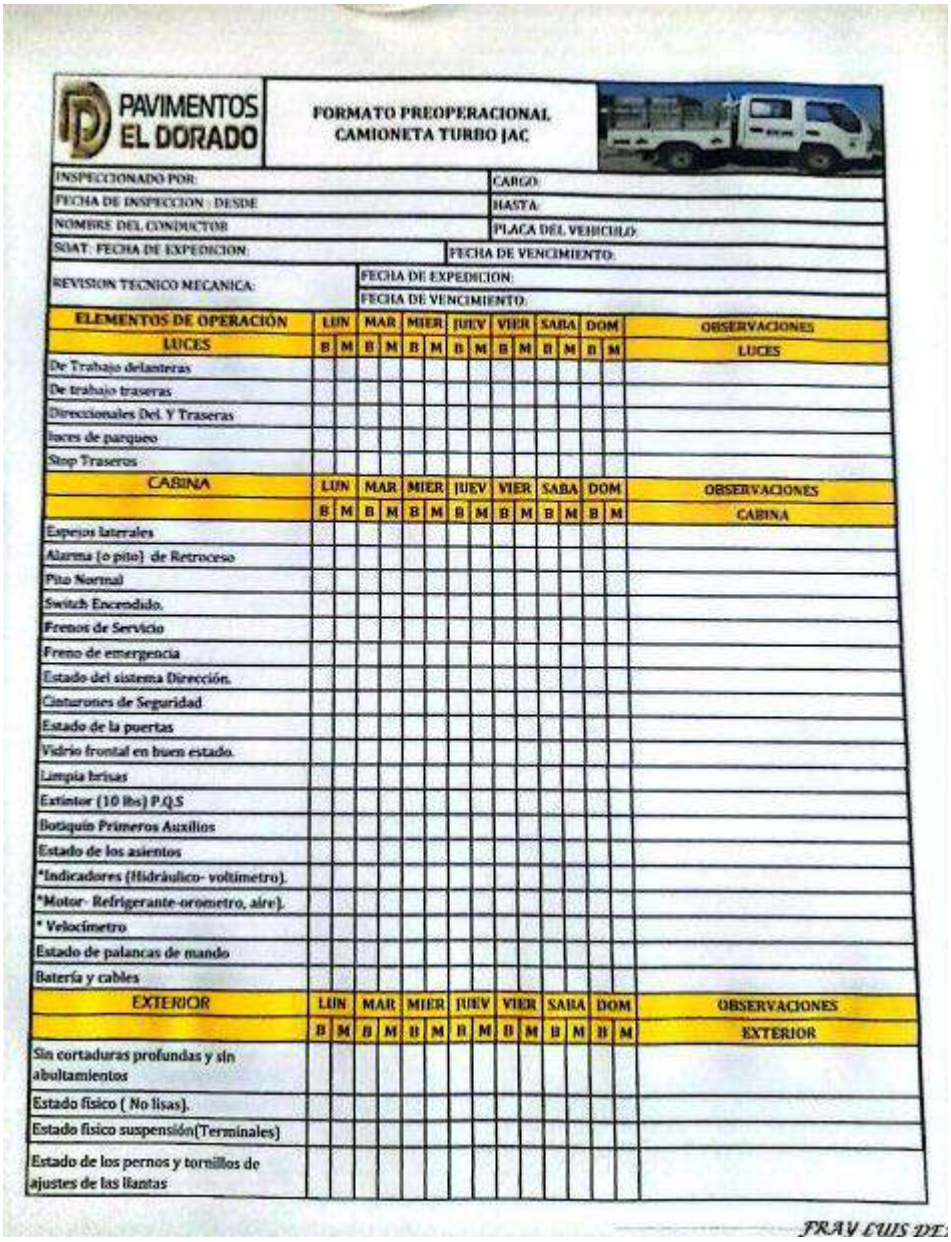

**PAVIMENTOS EL DORADO**

**FORMATO PREOPERACIONAL CAMIONETA TURBO JAC**

| | |
|---|---|
| INSPECCIONADO POR: | CARGO: |
| FECHA DE INSPECCION : DESDE | HASTA: |
| NOMBRE DEL CONDUCTOR: | PLACA DEL VEHICULO: |
| SOAT: FECHA DE EXPEDICION: | FECHA DE VENCIMIENTO: |
| REVISION TECNICO MECANICA: | FECHA DE EXPEDICION: |
| | FECHA DE VENCIMIENTO: |

| ELEMENTOS DE OPERACIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUEV | | VIER | | SABA | | DOM | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCES | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | LUCES |
| De Trabajo delanteras | | | | | | | | | | | | | | | |
| De trabajo traseras | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direccionales Del. Y Traseras | | | | | | | | | | | | | | | |
| luces de parqueo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stop Traseros | | | | | | | | | | | | | | | |
| CABINA | LUN | | MAR | | MIER | | JUEV | | VIER | | SABA | | DOM | | OBSERVACIONES |
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | CABINA |
| Espejos laterales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alarma [o pito] de Retroceso | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pito Normal | | | | | | | | | | | | | | | |
| Switch Encendido. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frenos de Servicio | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freno de emergencia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado del sistema Dirección. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cinturones de Seguridad | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado de la puertas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vidrio frontal en buen estado. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpia brisas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extintor (10 lbs) P.Q.S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Botiquín Primeros Auxilios | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado de los asientos | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Indicadores (Hidráulico- voltimetro). | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Motor- Refrigerante-orometro, aire). | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Velocímetro | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado de palancas de mando | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batería y cables | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXTERIOR | LUN | | MAR | | MIER | | JUEV | | VIER | | SABA | | DOM | | OBSERVACIONES |
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | EXTERIOR |
| Sin cortaduras profundas y sin abultamientos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado físico ( No lisas). | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado físico suspensión(Terminales) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado de los pernos y tornillos de ajustes de las llantas | | | | | | | | | | | | | | | |

FRAY LUIS DE

| Versión: 1 |
|---|
| Fecha: 18/07/2023 |
| Clasificación: Interna |

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 18-07/2023 al 23-07/2023

HORA: 07:00A - 05:00P

OBRA: Obra en Construcción palacio de Justicia

CONTRATISTA:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESTADO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cumple | No Cumple | N/Aplica | |
| A | HERRAMIENTAS MANUALES | | | | |
| 1 | Se usa la(s) herramienta(s) adecuada al trabajo | ✓ | | | |
| 2 | Estado de la Herramienta | ✓ | | | |
| 3 | Estado de Almacenamiento y de Uso | ✓ | | | |
| 4 | Estado de los mangos de madera | ✓ | | | |
| 5 | Se usan prensas de banco | | | ✓ | |
| B | HERRAMIENTAS DE CORTE | | | ✓ | |
| 1 | Estado de la cabeza de los cinceles | | | ✓ | |
| 2 | Filos de los cinceles | | | ✓ | |
| 3 | Estado de los dientes de las limajas macho o hembra | ✓ | | | |
| 4 | Instalación de las hojas de segueta | ✓ | | | |
| 5 | Estado de los mangos de las limas | | | ✓ | |
| 6 | Empuñaduras y dientes de los remaches | ✓ | | | |
| 7 | Estado de los Mangos y filosos de los cuchillos | | | ✓ | |
| C | HERRAMIENTAS DE GOLPE | | | | |
| 1 | Se emplea el martillo adecuado segun la labor ? | ✓ | | | |
| 2 | Sus caras y bordes están en buen estado? | ✓ | | | |
| 3 | Estado en que se encuentra el mango | ✓ | | | |
| D | HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES | | | | |
| 1 | Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas ? | | | ✓ | |
| 2 | Estado de bocas y palancas de la llave | | | ✓ | |
| 3 | Se dispone de llaves para golpear? | | | ✓ | |
| 4 | Estado de las mordazas de las llaves | | | ✓ | |
| 5 | Estado de las herramientas para trabajos electricos | | | ✓ | |
| 6 | Aislamiento de las herramientas para los trabajos electricos | | | ✓ | |
| 7 | Estado de la punta y cabo de los destornilladores | | | ✓ | |
| 8 | Se dispone de herramientas que no produzcan chispas? | | | ✓ | |
| E | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | | | ✓ | |
| 1 | Las herramientas son adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)? | | | ✓ | |
| 2 | Uso de los elementos de protección Personal de acuerdo al uso de la herramienta | ✓ | | | |
| 3 | Limpieza y Lubricación de las herramientas | ✓ | | | |
| 4 | Guardas de seguridad | ✓ | | | |
| 5 | Aislamientos y uniones de fibras | ✓ | | | |
| 6 | Estado del cable y enchufe | ✓ | | | |
| 7 | Estado y nivel de los taladros | | | ✓ | |
| 8 | Diametro, especificación y estado de la broca para el taladro a usar | | | ✓ | |
| 9 | Los esmeriles cuentan con guardas de Seguridad? | | | ✓ | |
| 10 | Los esmeriles cuentan los soportes de los discos o piedras con los adecuados? | | | ✓ | |

| Versión: 1 |
|---|
| Fecha: 18/09/2023 |
| Clasificación: Interna |

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 18 al 23 sep/2023

HORA: 7:00 a.m. - 03:00 p.m.

OBRA: Construcción Palacio de Justicia

CONTRATISTA: Consorcio obras judiciales

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESTADO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cumple | No Cumple | N/Aplica | |
| 11 | Las collarines conectan en diámetro y están instalados bien en el eslinga? | | | ✓ | |
| 12 | Estado de las roscas o tornillo en las partes abrasivas. | | | ✓ | |
| 13 | Almacenamiento de las pulidoras y discos | | | ✓ | |
| F | HERRAMIENTAS NEUMATICAS | | | | |
| 1 | Estado de las mangueras y acoples | | | ✓ | |
| 2 | Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta? | | | ✓ | |
| 3 | Presiones indicadas | | | ✓ | |
| 4 | Descarga de la herramienta | | | ✓ | |
| G | HERRAMIENTA POR DETONACIÓN | | | ✓ | |
| 1 | El personal es autorizado | | | ✓ | |
| 2 | Emplean los elementos de protección | | | ✓ | |
| 3 | Descarga y almacenamiento de la herramienta | | | ✓ | |
| H | SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL | | | | |
| 1 | El personal que utiliza los equipos y herramientas, ha recibido instrucción? | ✓ | | | |
| 2 | Las herramientas se seleccionan correctamente para el trabajo a realizar? | ✓ | | | |
| 3 | Transporte y almacenamiento al sitio del trabajo | ✓ | | | |
| 4 | Las labores de mantenimiento como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados | ✓ | | | |
| 5 | Almacenamiento | ✓ | | | |
| 6 | Herramientas y equipos en buen estado | ✓ | | | |
| 7 | Se utilizan correctamente | ✓ | | | |
| 8 | Se encuentran señalizadas los equipos que revisten peligros especiales tales como alta voltaje, etc. | ✓ | | | |

*Nota: Los ítems del numeral H alcance deben ser diligenciados independiente del tipo de herramienta que se encuentre en el frente de obra.*

| | REVISO | APROBO |
|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | Oscar Castillo | Ronald Soto |
| CARGO: | Aux | R. SST |
| FIRMA: | | |

| Versión: 1 |
|---|
| Fecha: 13/05/2020 |
| Clasificación: Interna |

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 25-09/2023 al 30-09/2023

HORA: 07:00A - 05:00Pm

OBRA: Construcción Palacio de Justicia

CONTRATISTA: Consorcio obras Judiciales

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESTADO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cumple | No Cumple | N Aplica | |
| A | HERRAMIENTAS MANUALES | | | | |
| 1 | Se usa la(s) herramienta(s) adecuada al trabajo | ✓ | | | |
| 2 | Estado de la Herramienta | ✓ | | | |
| 3 | Estado de Almacenamiento y de Uso | ✓ | | | |
| 4 | Estado de los mangos de martero | ✓ | | | |
| 5 | Se usan prensas de bancos | ✓ | | | |
| B | HERRAMIENTAS DE CORTE | | | | |
| 1 | Estado de la cabeza de los cinceles | | | | |
| 2 | Filos de los cinceles | | | | |
| 3 | Estado de los dientes de las serrojas machos o hembra | | | ✓ | |
| 4 | Instalación de las hojas de segueta | ✓ | | | |
| 5 | Estado de las mangos de los limas | | | ✓ | |
| 6 | Empuñaduras y dientes de los serruchos | ✓ | | | |
| 7 | Estado de los Mangos y textos de los cuchillos | | | ✓ | |
| C | HERRAMIENTAS DE GOLPE | | | | |
| 1 | Se emplea el martillo adecuado según la labor ? | ✓ | | | |
| 2 | Sus caras y bordes están en buen estado? | ✓ | | | |
| 3 | Están ensanchados el mango | ✓ | | | |
| D | HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES | | | | |
| 1 | Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas ? | | | ✓ | |
| 2 | Estado de las bocas y palancas de tubos | | | ✓ | |
| 3 | Se dispone de llaves para golpear? | | | ✓ | |
| 4 | Estado de las mordazas de las llaves | | | ✓ | |
| 5 | Estado de las herramientas para trabajos eléctricos | | | ✓ | |
| 6 | Aislamiento de las herramientas para los trabajos eléctricos | | | ✓ | |
| 7 | Estado de la punta y cabo de los destornilladores | ✓ | | | |
| 8 | Se dispone de herramientas que no produzcan chispas? | ✓ | | | |
| E | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | | | | |
| 1 | Las herramientas son adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)? | | | ✓ | |
| 2 | Uso de los Elementos de protección Personal de acuerdo a la de la herramienta | ✓ | | | |
| 3 | Limpieza y lubricación de las herramientas | ✓ | | | |
| 4 | Guardas de seguridad | ✓ | | | |
| 5 | Aislamientos y sistemas de fijación | ✓ | | | |
| 6 | Estado del cable y enchufe | ✓ | | | |
| 7 | Estado y aseo de los taladros | ✓ | | | |
| 8 | Diámetro, especificación y estado de la broca para el taladro a usar | ✓ | | | |
| 9 | Las esmeriles cuentan con guardas de Seguridad? | ✓ | | | |
| 10 | Las esmeriles cuentan los soportes de las discos o piedras son los adecuados? | | | ✓ | |

| Versión: 1 |
|---|
| Fecha: 18/08/2023 |
| Clasificación: Interna |

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 25-09-2023 al 30-09-2023

HORA: 07:30 A.M. - 05:00 P.M.

OBRA: Construcción Palacio de Justicia

CONTRATISTA: Consorcio Obras Judiciales

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESTADO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cumple | No Cumple | N.A. | |
| 11 | Los extintores cumplen en diámetro y están instalados según el estudio? | | | ✓ | |
| 12 | Estado de las mangueras o tornillo en las mantas abrazaderas. | | | ✓ | |
| 13 | Almacenamiento de los pulidores y discos | ✓ | | | |
| F | HERRAMIENTAS NEUMATICAS | | | | |
| 1 | Estado de las mangueras y acoples | | | ✓ | |
| 2 | Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta? | | | ✓ | |
| 3 | Presiones indicadas | | | ✓ | |
| 4 | Descarga de la herramienta | | | ✓ | |
| G | HERRAMIENTA POR DETONACIÓN | | | | |
| 1 | El personal es autorizado | ✓ | | | |
| 2 | Emplean los elementos de protección | ✓ | | | |
| 3 | Descarga y almacenamiento de la herramienta | ✓ | | | |
| H | SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL | | | | |
| 1 | El personal que utiliza los equipos y herramientas, los recibió instrucción? | ✓ | | | |
| 2 | Las herramientas se seleccionan correctamente para el trabajo a realizar? | ✓ | | | |
| 3 | Transporte y almacenamiento al sitio del trabajo | ✓ | | | |
| 4 | Las labores de mantenimiento como limpieza, lubricación, afinar o regulación se efectúan con los equipos apagados. | ✓ | | | |
| 5 | Almacenamiento | ✓ | | | |
| 6 | Herramientas y equipos en buen estado | ✓ | | | |
| 7 | Se utilizan correctamente | ✓ | | | |
| 8 | Se encuentran señalizados los equipos que emiten peligros especiales tales como alto voltaje, etc. | ✓ | | | |

*Nota: Los ítem del numeral IV siempre deben ser diligenciados independiente del tipo de herramienta que se encuentre en el frente de obra.*

| | REVISO | ATENDIO |
|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | Oscar Portilla | Fanny Soto |
| CARGO: | Prof. | Residente SST |
| FIRMA: | | |

| Versión: 1 | FORMATO |
|---|---|
| Fecha: 20/04/2023 | PREOPERACIONAL DE RECICLADORA DE CONCRETO MANUAL (TROMPO) |
| Clasificación: Interna | |


Maquina:
Obra: Obras Judiciales
Horas inicio: 7:00 a.m.
Hora fin: 05:00 p.m.


Semana: 29/03/23 al 02/09/23

| INSPECCIÓN VISUAL | | APLICA | | LUN | | MAR | | MIERC | | JUEV | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN | Verifique que la estructura es conforme | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| LLANTAS | Verifique la condicion de las llantas | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| VALVERAS Y BUJES DE ROTACION | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| MECANISMO PARA VACIADO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| FRENO EN BUEN ESTADO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| VALVULAS | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| PATAS DE ANCLAJE EN BUENA CONDICIÓN | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR) | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| TAPA DEL MOTOR CON SEGURO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| ENCENDIDO DEL MOTOR | Verifique funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE | Verifique su funcionamiento | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |

| Fecha ultimo mantenimiento del equipo: | |
|---|---|
| Observacion: | |


| | REVISÓ (Operador del equipo) | APROBÓ (Residente SST) |
|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | Luis A. Castillo | Kevin Soto |
| CARGO: | Ayudante C | R. SST |
| FIRMA: | CASTILLO | |

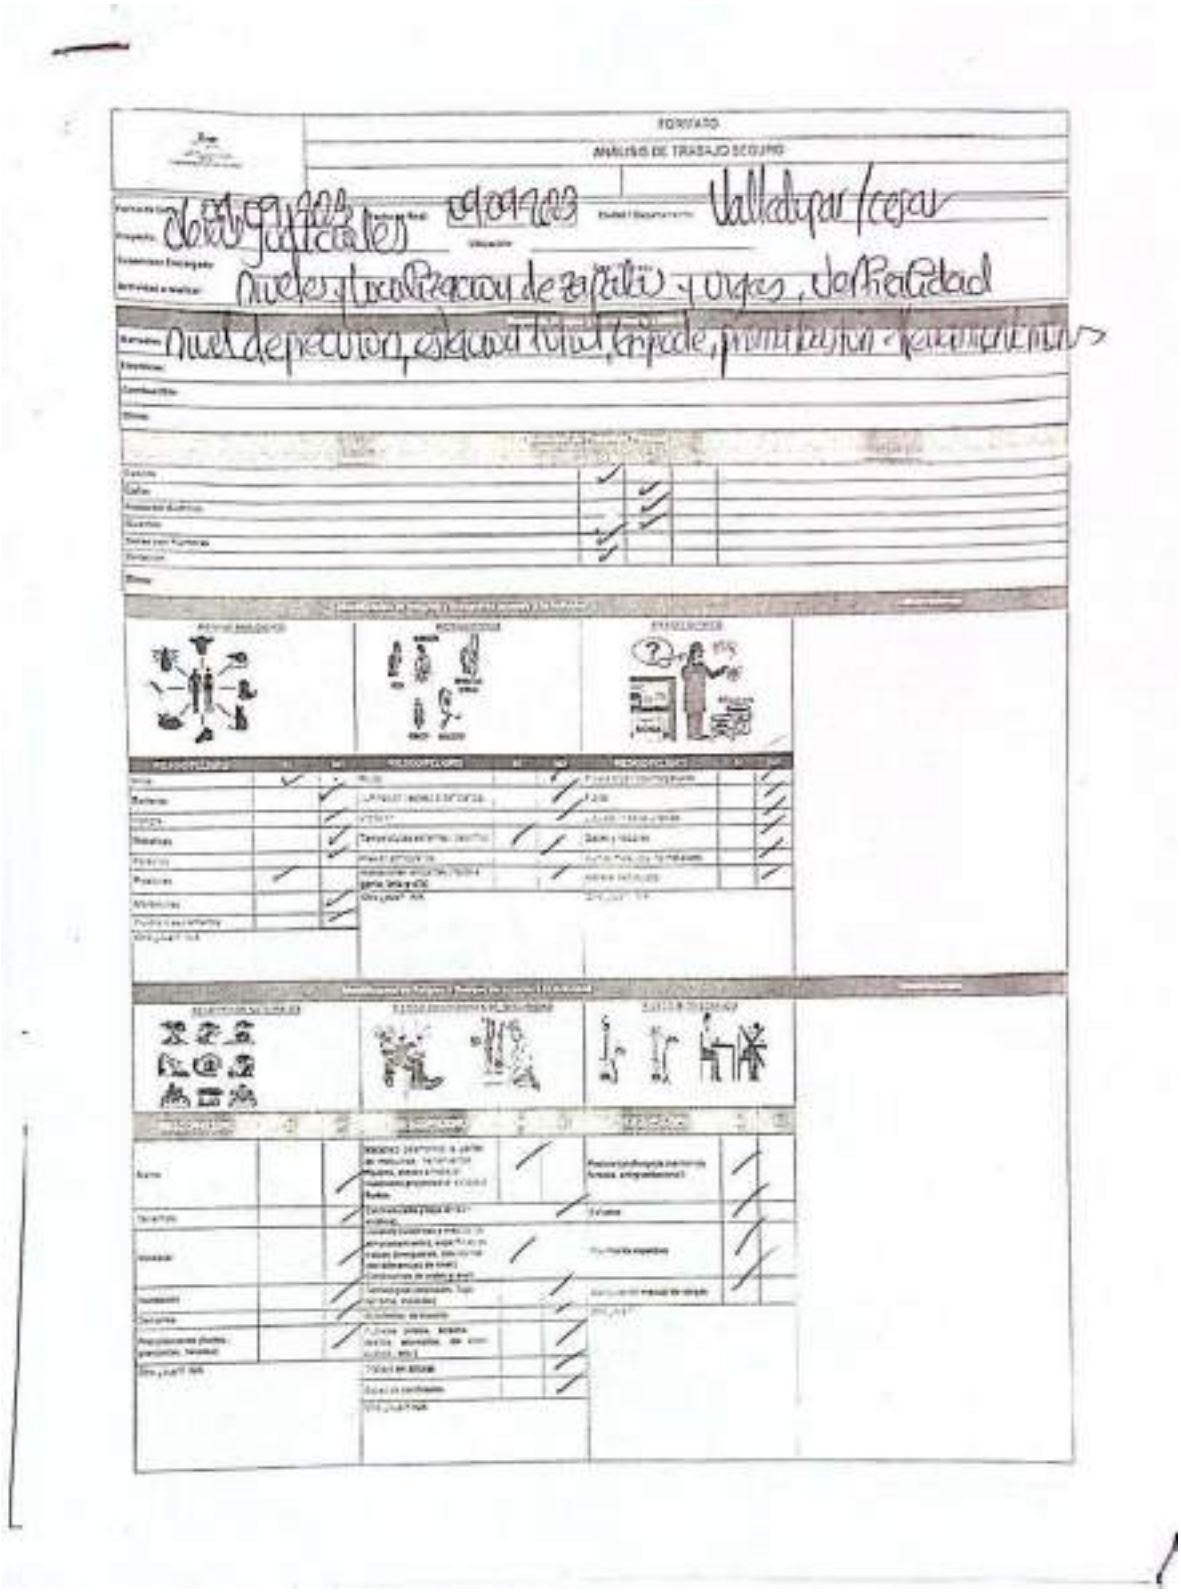
FORMATO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

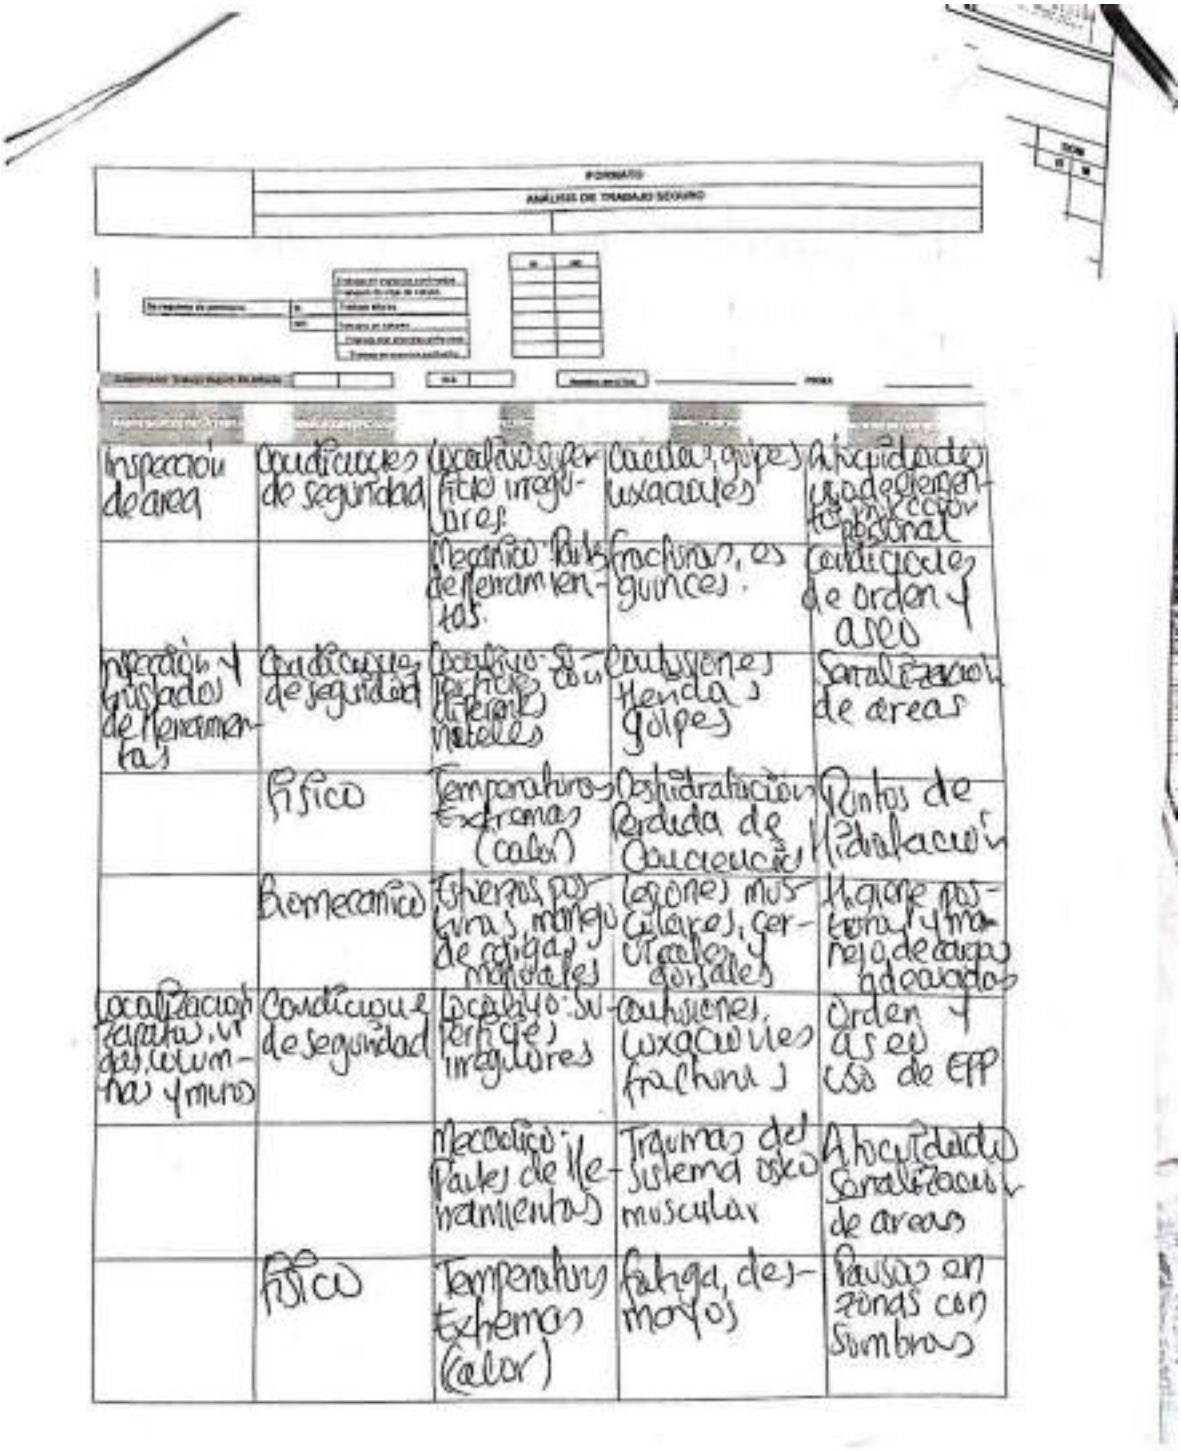

FORMATO
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inspección de área | Condiciones de seguridad | Locativo: Superficie irregulares. | Caídas, golpes, luxaciones | Falta de elementos de protección personal |
| | | Mecánico: Fallas de herramientas. | Fracturas, esguinces. | Condiciones de orden y aseo |
| Operación y guiados de herramientas | Condiciones de seguridad | Locativo: Superficie irregulares, cables eléctricos | Contusiones, herida, golpes | Señalización de áreas |
| | Físico | Temperaturas extremas (calor) | Deshidratación, Perdida de Conciencia | Puntos de Hidratación |
| | Biomecánico | Esfuerzos por posturas, manejo de cargas manuales | Lesiones musculares, cervicales y dorsales | Higiene postural y manejo de cargas adecuados |
| Localización (espalda, vértebras, columna y muñeca) | Condiciones de seguridad | Locativo: Superficie irregulares | Contusiones, luxaciones fracturas | Orden y aseo uso de EPP |
| | | Mecánico: Fallas de herramientas | Traumas del sistema osteomuscular | Señalización de áreas |
| | Físico | Temperaturas extremas (calor) | Fatiga, desmayos | Pausas en zonas con sombras |

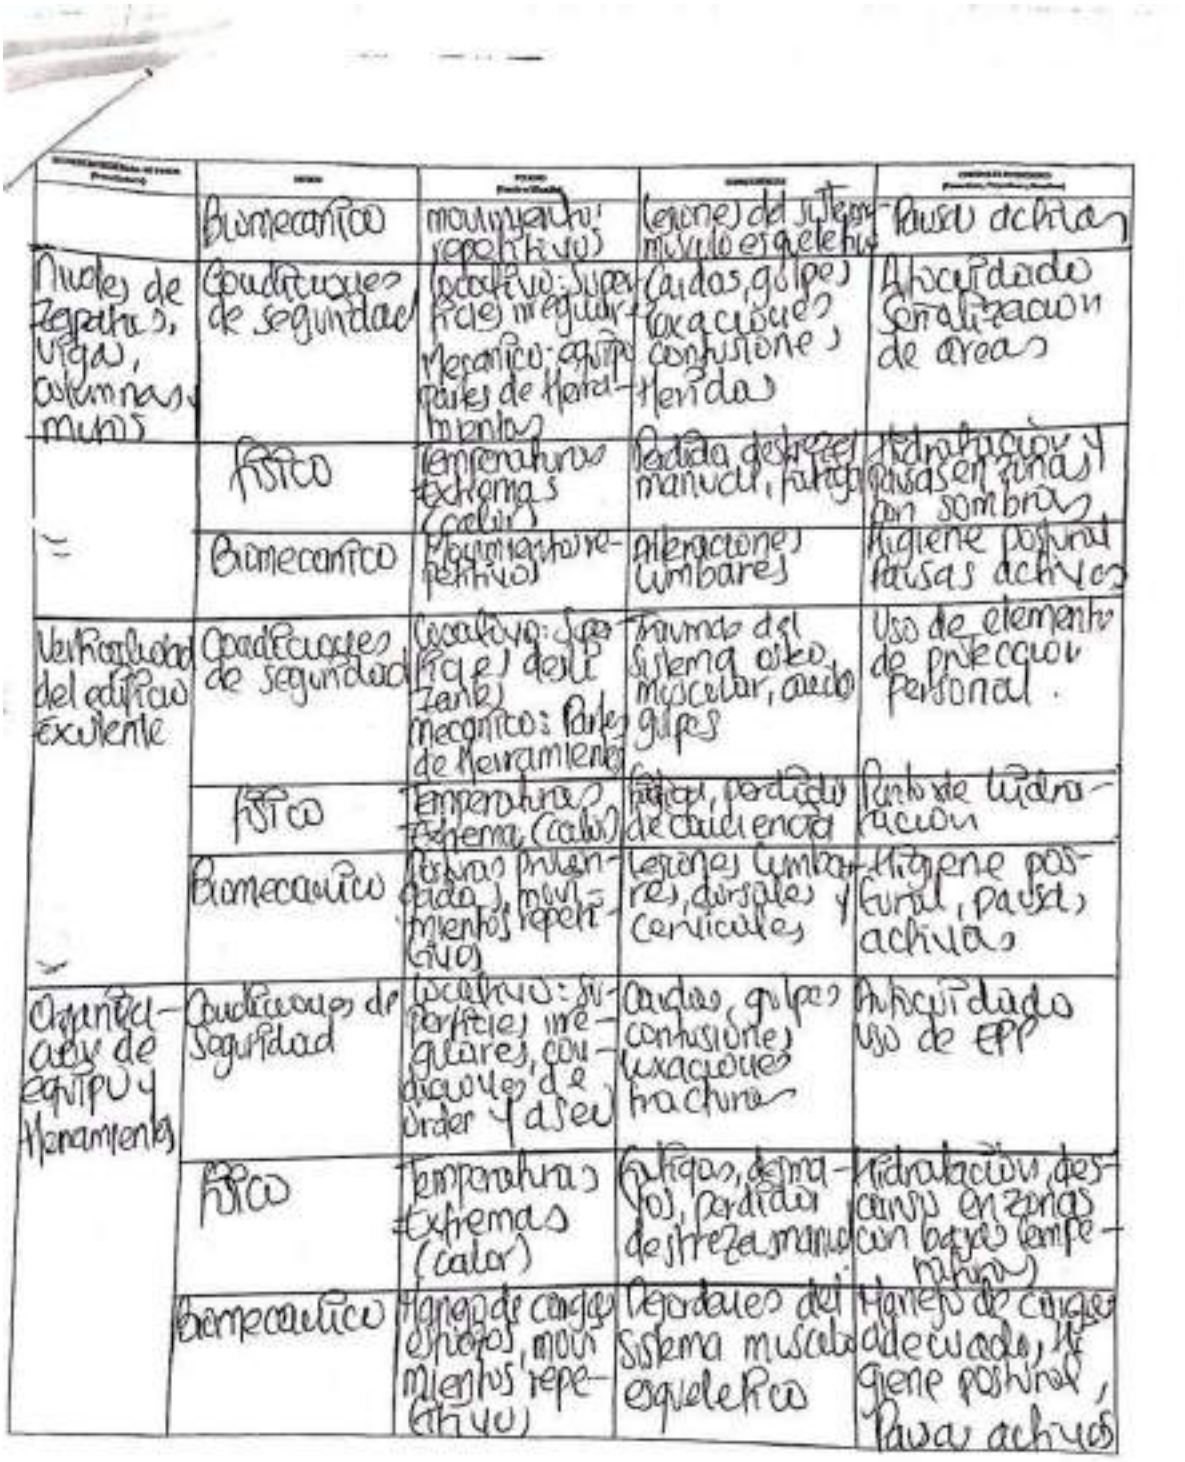



FORMATO

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

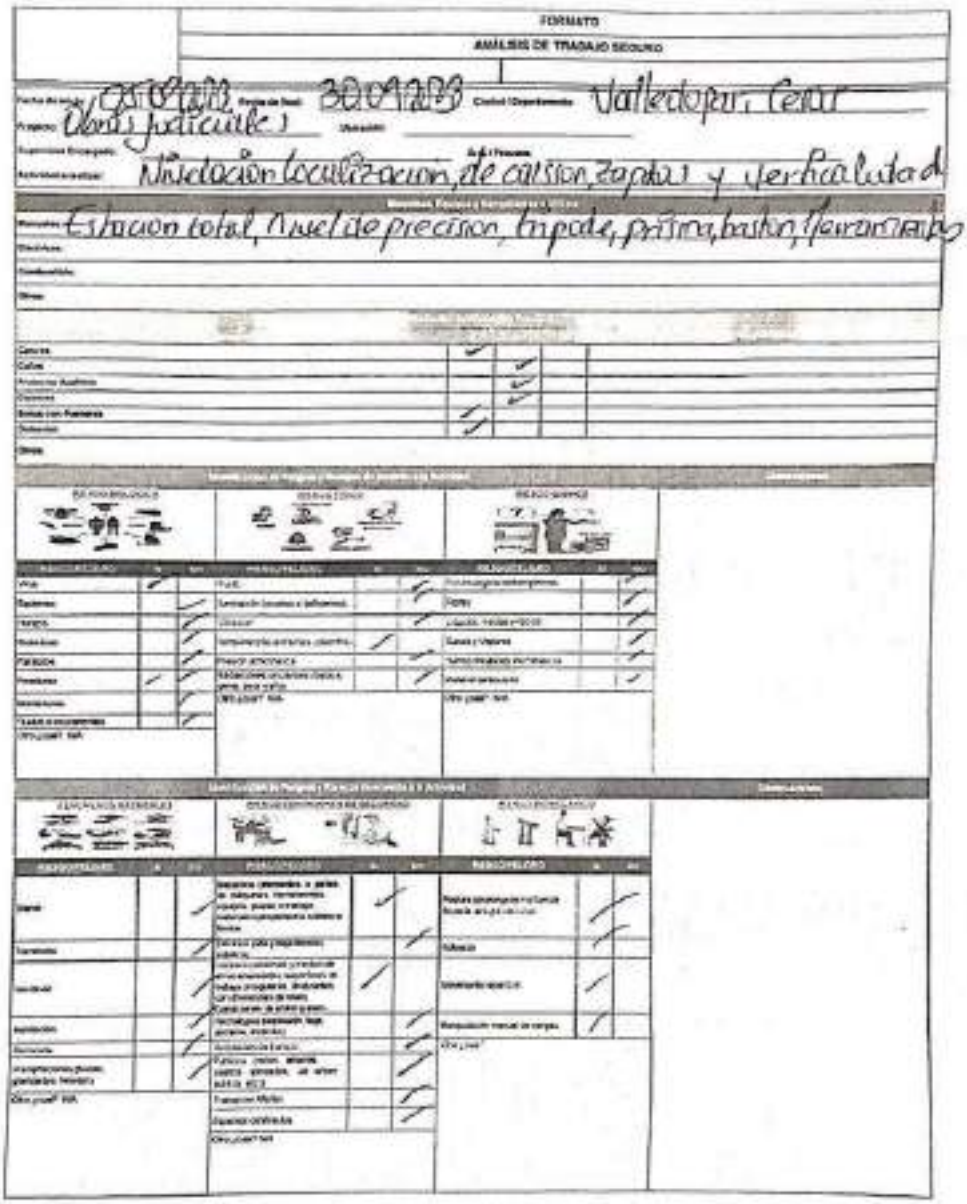

FORMATO


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Valledupar, Cesar

Obras judiciales

Nivelación localización, de cimentación, zapatas y verticalidad

Estación total, Nivel de precisión, trípode, prisma, baston, Herramienta



INSPECCIÓN PRECOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO


Semana del al



FORMATO


ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inspeccion de area | Condiciones de Seguridad | Locativo: Superficies irregulares | Caidas, golpes Luxaciones | Adecuado uso de elementos de proteccion personal |
| | | Mecanico: Caida de Herramientas | fracturas, esguinces | Condiciones de orden y aseo |
| Inspeccion y traslado de Herramientas | Condiciones de seguridad | Locativo: Superficies con diferencia de nivel | Contusiones Heridas | Señalizacion de areas |
| | Fisico | Temperaturas extremas (calor) | Deshidratacion Perdida de conciencia | Pontes de hidratacion |
| | Biomecanico | Esfuerzos, manejo de cargas manuales | lesiones musculares, cervicales y dorsales | Higiene postural y carga adecuada |
| Verificacion del edificio existente | Condiciones de seguridad | Locativo: superficies irregulares | Traumas, contusiones, luxaciones | Prevencion y autocuidado |
| | | Mecanico: equipos, material acopiados | Golpes, caidas fracturas | Uso de elementos de Proteccion Personal. |
| | Fisico | Temperaturas extremas (calor) | fatigas, desmayos | Descanso en zonas con bajas temperaturas |

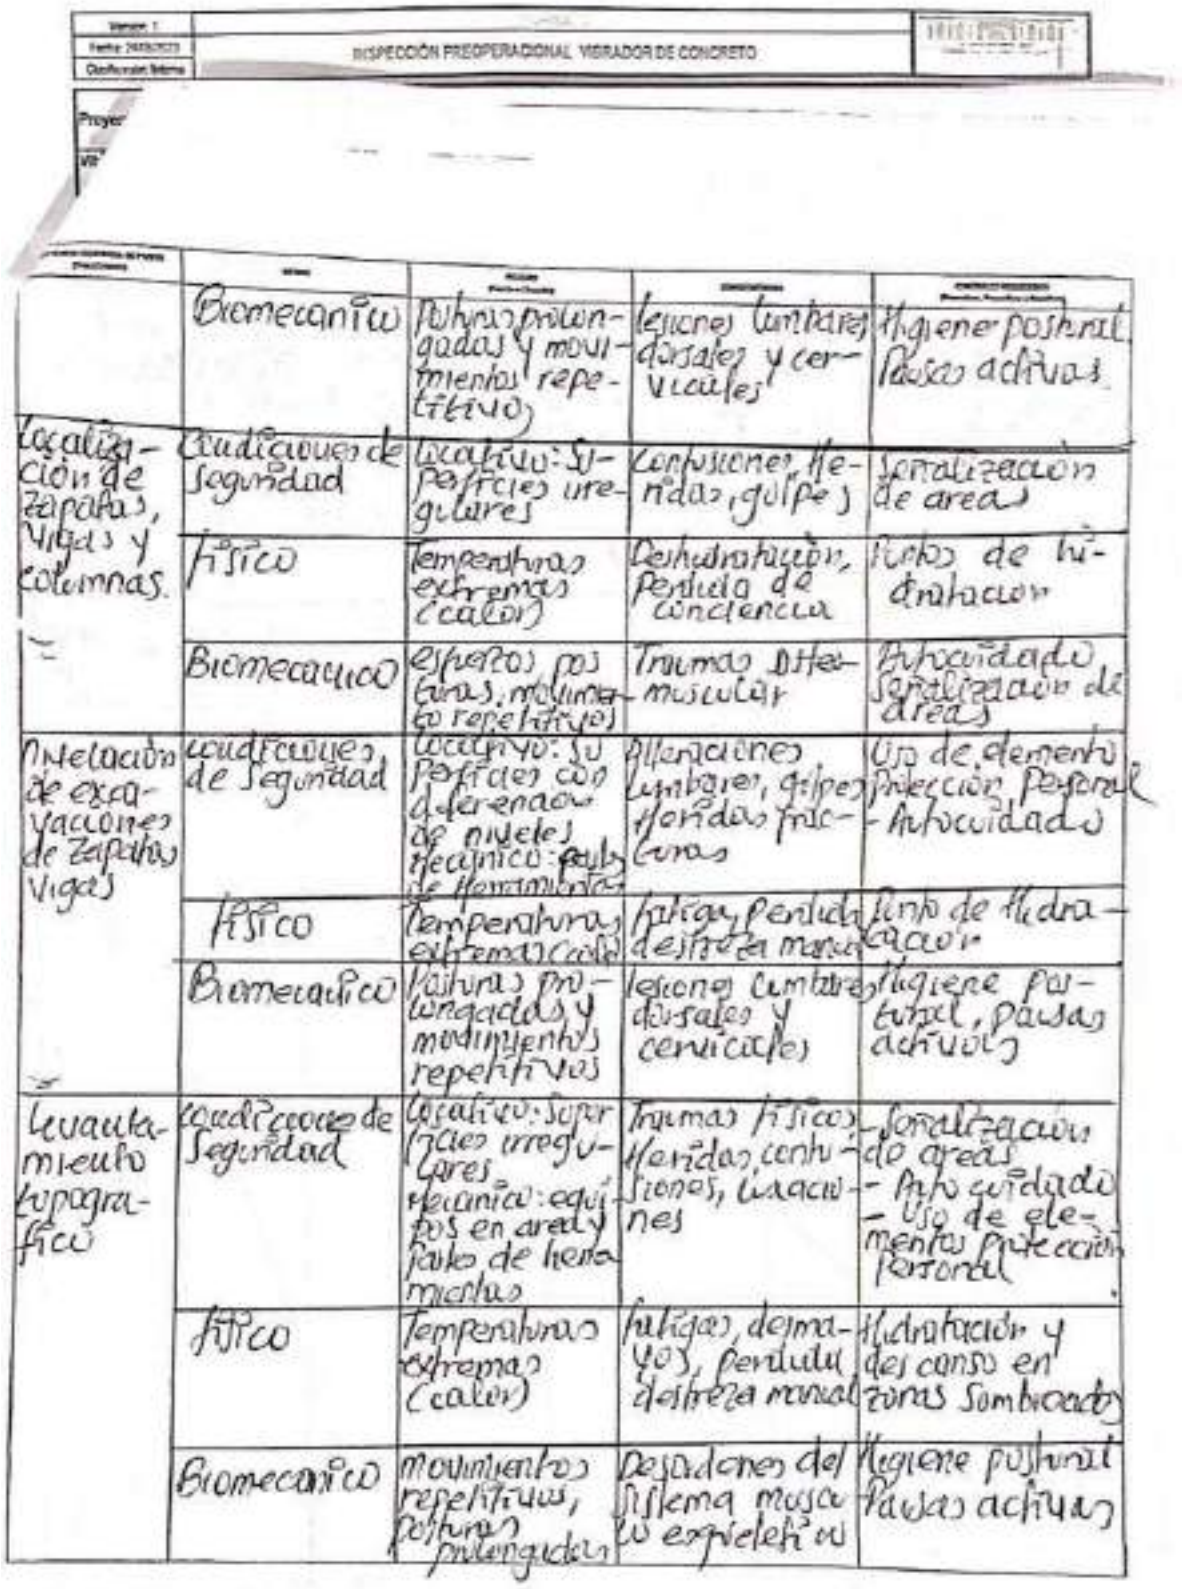

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Biomecanico | Posturas prolongadas y movimientos repetitivos | lesiones lumbares dorsales y cervicales | Higiene postural Pausas activas |
| Localización de zapatas, vigas y columnas. | Condiciones de Seguridad | Locativo: Superficies irregulares | Caídas, golpes | Señalización de áreas |
| | Físico | Temperaturas extremas (calor) | Deshidratación, perdida de conciencia | Puntos de hidratación |
| | Biomecanico | esfuerzos posturas, movimientos repetitivos | Trauma Musculo esqueletico | Autocuidado Señalización de áreas |
| Excavaciones de zapatas vigas | condiciones de Seguridad | Locativo: Superficies con diferencias de niveles Mecanico: falta de herramientas | Afecciones lumbares, golpes heridas fracturas | Uso de elementos protección personal - Autocuidado |
| | Físico | Temperaturas extremas (calor) | fatiga, perdida destreza manual | Punto de hidratación |
| | Biomecanico | Posturas prolongadas y movimientos repetitivos | lesiones lumbares dorsales y cervicales | Higiene postural, pausas activas |
| Levantamiento topografico | Condiciones de Seguridad | Locativo: Superficies irregulares Mecanico: equipos en area y falta de herramientas | Traumas físicos Heridas contusiones, fracturas | - Señalización de áreas - Autocuidado - Uso de elementos protección personal |
| | Físico | Temperaturas extremas (calor) | fatigas, deshidratación, perdida destreza manual | Hidratación y descanso en zonas sombreadas |
| | Biomecanico | movimientos repetitivos, posturas prolongadas | Desordenes del sistema musculo esqueletico | Higiene postural Pausas activas |

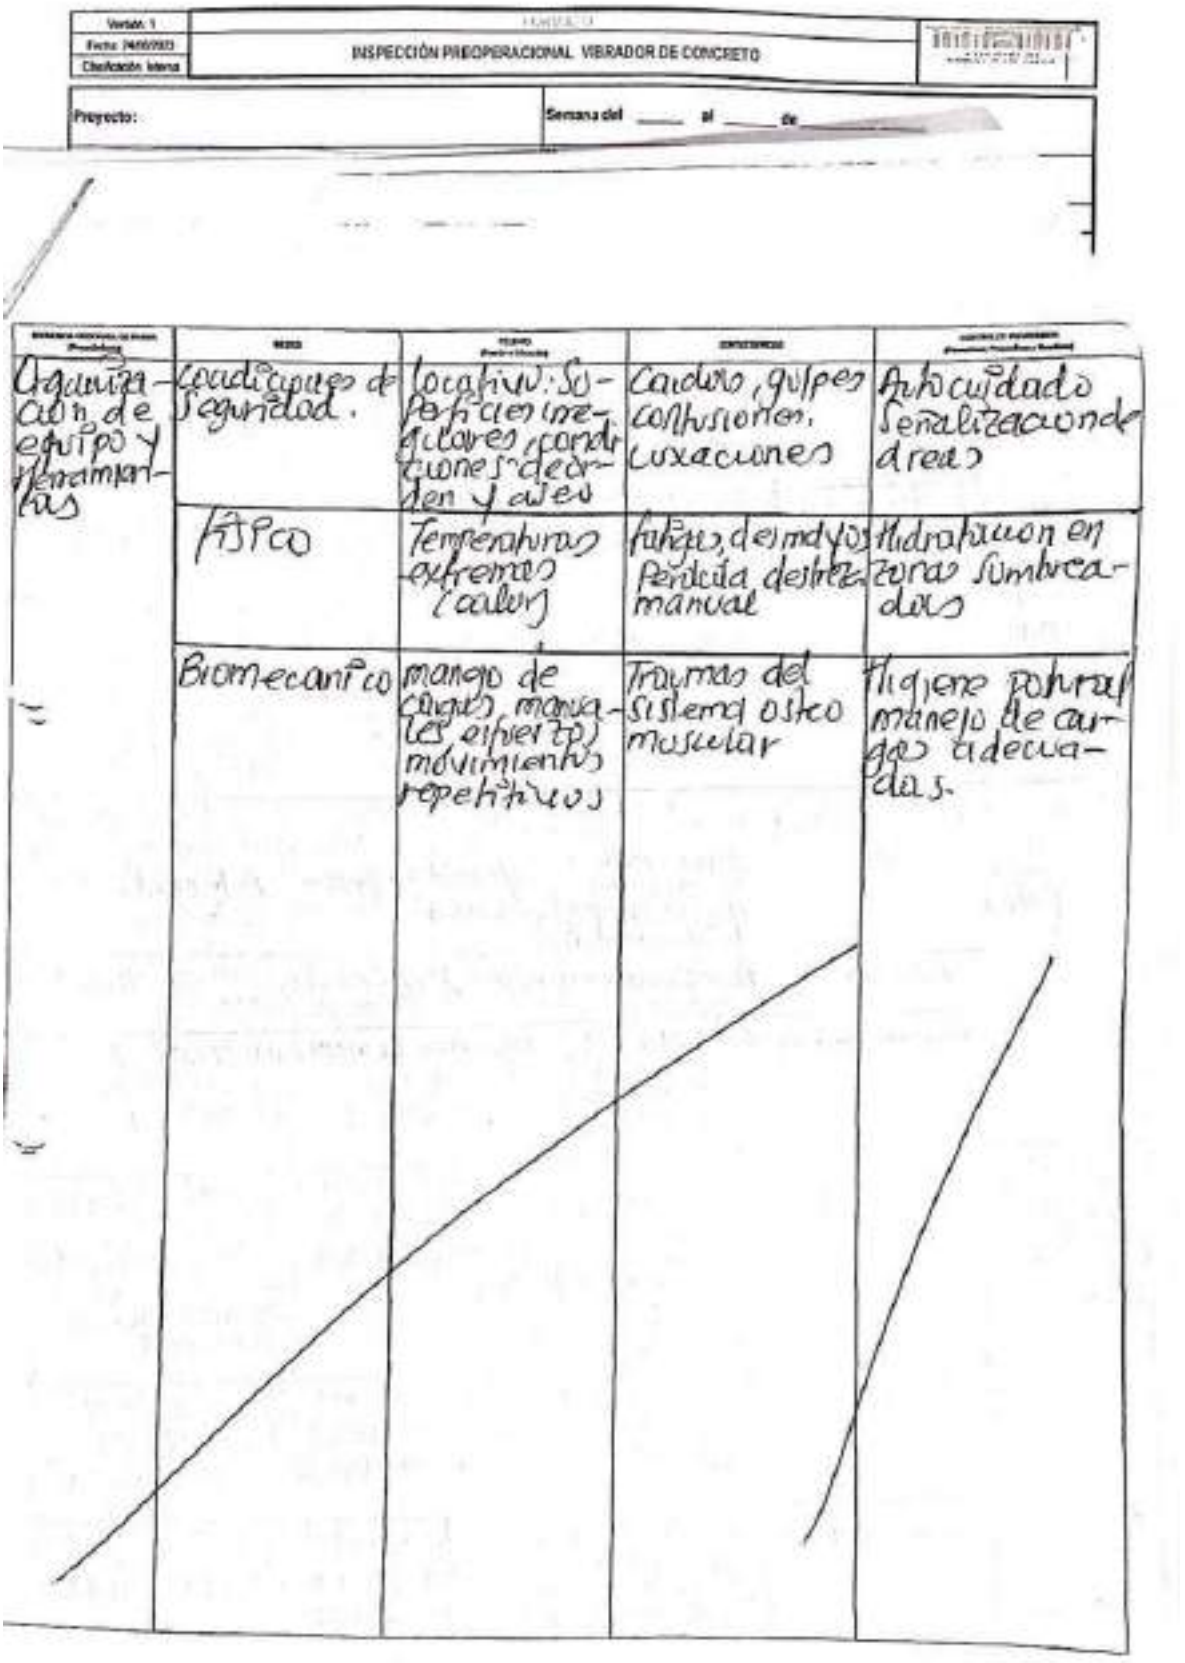

Versión: 1
Fecha: 24/05/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO


Proyecto:

Semana del ____ al ____ de ____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Organización de equipo y herramientas | Condiciones de seguridad. | Locativo: Superficies irregulares, condiciones de orden y aseo | Caidas, golpes contusiones, luxaciones | Autocuidado Señalizacion de areas |
| | Físico | Temperaturas extremas (calor) | Fatiga, deshidratacion, perdida destreza manual | Hidratacion en zonas sombreadas |
| | Biomecanico | manejo de cargas, manuales, esfuerzos, movimientos repetitivos | Traumas del sistema osteo muscular | Higiene postural manejo de cargas adecuadas. |


Vibrador


FORMATO

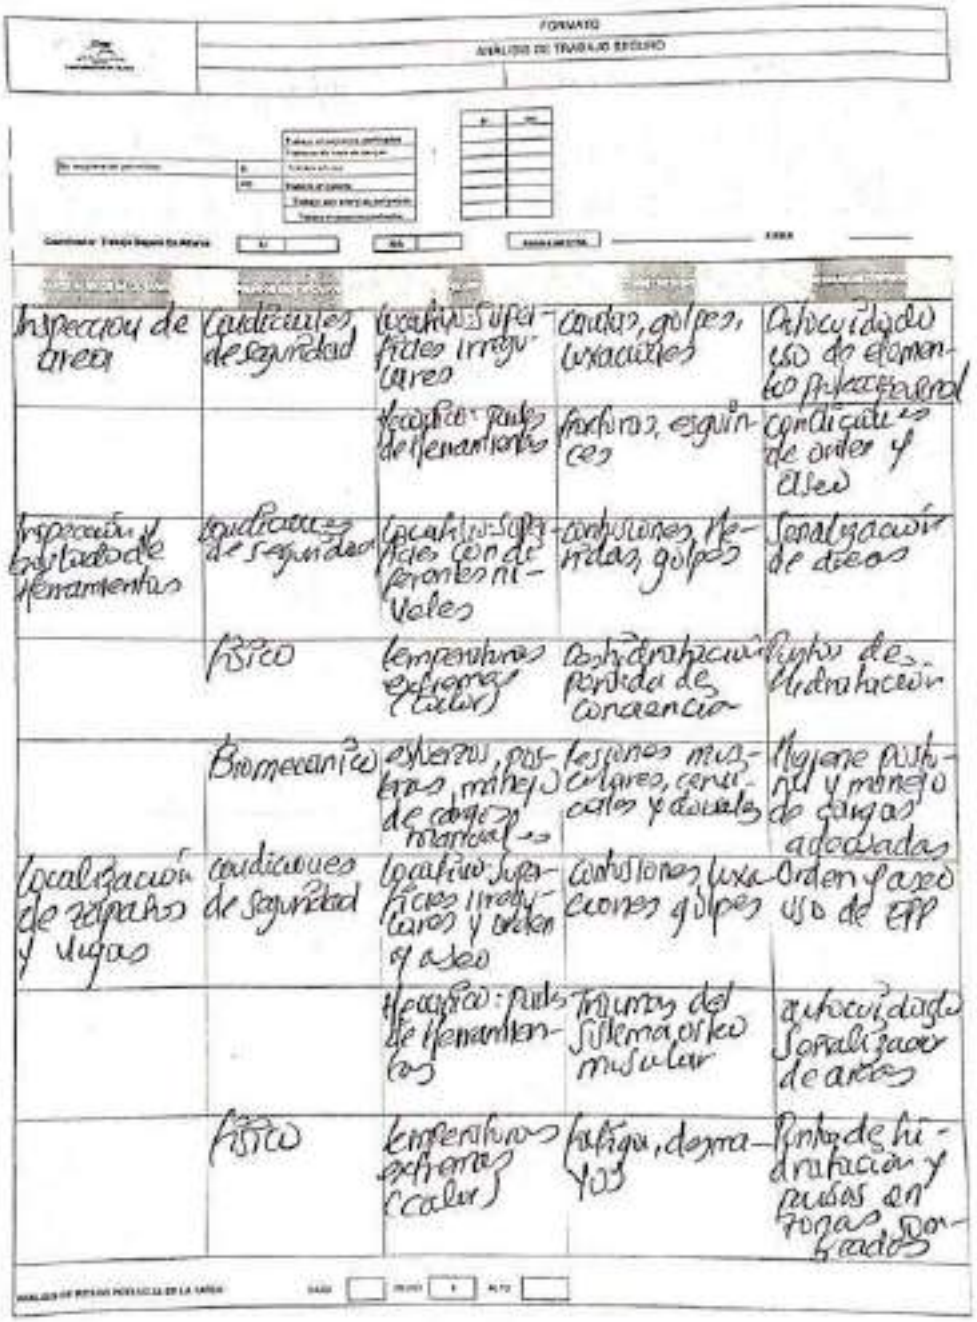


FORMATO

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inspección de área | Condiciones de seguridad | Locativo: Superficies irregulares | Caídas, golpes, luxaciones | Atención uso de elementos de protección personal |
| | | Locativo: Pausas de herramientas | Fracturas, esguinces | Condiciones de orden y aseo |
| Inspección y estado de herramientas | Condiciones de seguridad | Locativo: Superficies con diferentes niveles | Contusiones, heridas, golpes | Señalización de áreas |
| | Físico | Temperaturas extremas (calor) | Deshidratación, pérdida de concentración | Pausas de hidratación |
| | Biomecánico | Esfuerzos, posturas, manejo de cargas manuales | Lesiones musculares, cervicales y dorsales | Higiene postural y manejo de cargas adecuadas |
| Localización de zapatos y tuyas | condiciones de seguridad | Locativo: Superficies irregulares y orden y aseo | Contusiones, luxaciones golpes | Orden y aseo uso de EPP |
| | | Ergonómico: Pausas de herramientas | Trauma del sistema osteo muscular | Atención señalización de áreas |
| | Físico | Temperaturas extremas (calor) | Fatiga, deshidratación | Pausas de hidratación y pausas en zonas sombreadas |


ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES EN LA TAREA — BAJO [ ] MEDIO [ ] ALTO [ ]

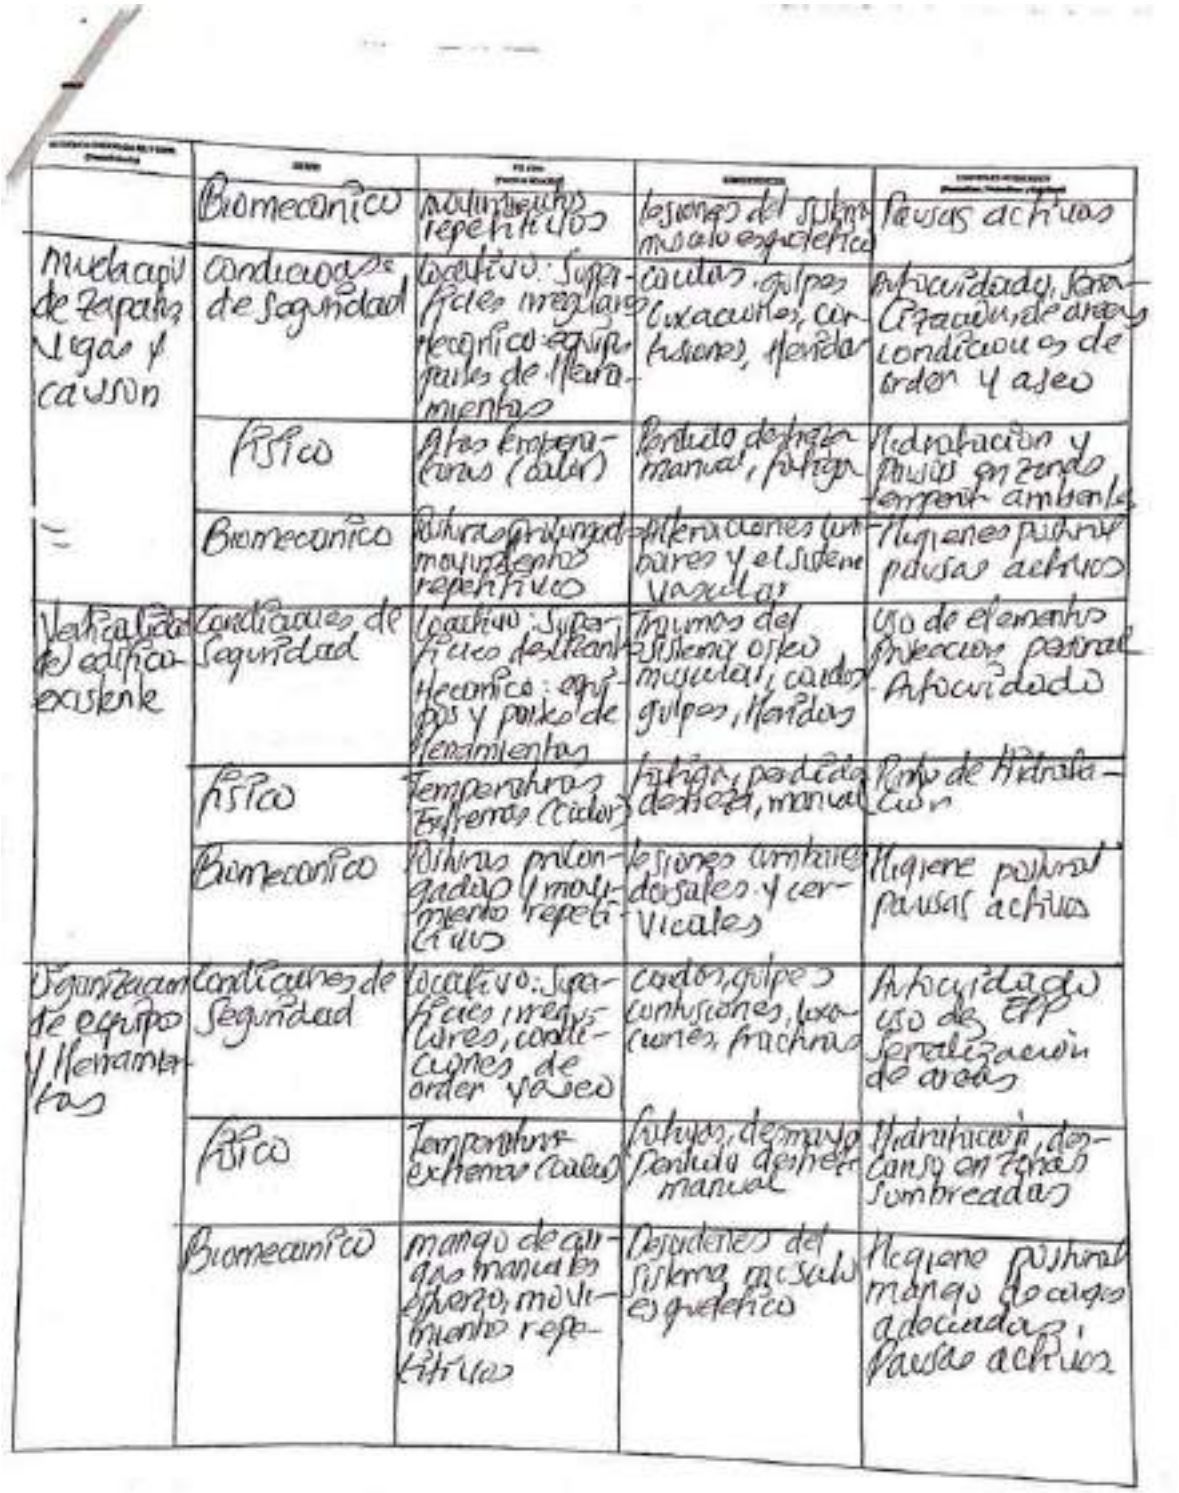

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Biomecanico | movimientos repetitivos | lesiones del sistema musculo esqueletico | Pausas activas |
| Mudanza de Zapatas Vigas y cajon | condiciones de Seguridad | locativo: Superficies irregulares mecanico equipos de Herramientas | caidas, golpes, Luxaciones, contusiones, Herida | Autocuidado, Señalizacion de areas condiciones de orden y aseo |
| | Fisico | Altas temperaturas (calor) | Perdida de fuerza manual, fatiga | Hidratacion y pausas en zonas temperatura ambiente |
| | Biomecanico | Posturas prolongadas movimientos repetitivos | Afectaciones lumbares y el Sistema Vascular | Higiene postural pausas activas |
| Verticalizacion de edificacion existente | Condiciones de Seguridad | locativo: Superficies desniveles mecanico: equipos y parte de Herramientas | Traumas del Sistema osteo muscular, caidas golpes, Heridas | Uso de elementos proteccion personal Autocuidado |
| | Fisico | Temperaturas Extremas (calor) | fatiga, perdida de fuerza, manual | Punto de Hidratacion |
| | Biomecanico | Posturas prolongadas y movimiento repetitivos | lesiones lumbares dorsales y cervicales | Higiene postural pausas activas |
| Organizacion de equipo y Herramientas | Condiciones de Seguridad | locativo: Superficies irregulares, condiciones de orden y aseo | caidas, golpes contusiones, luxaciones, fracturas | Autocuidado uso de EPP Señalizacion de areas |
| | Fisico | Temperaturas extremas (calor) | fatigas, dermatitis perdida de fuerza manual | Hidratacion, descanso en zonas sombreadas |
| | Biomecanico | manejo de cargas manuales esfuerzo, movimiento repetitivos | Trastornos del Sistema musculo esqueletico | Higiene postural manejo de cargas adecuadas, pausas activas |


FORMATO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO


FORMATO
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
11/07/2020
16/07/2020
Valledupar/Cesar
Obras judiciales
Nivelación, Localización de Zapatas, columnas y vigas
Nivel de precisión, estación total, prisma, trípode, radio, Herramientas menores

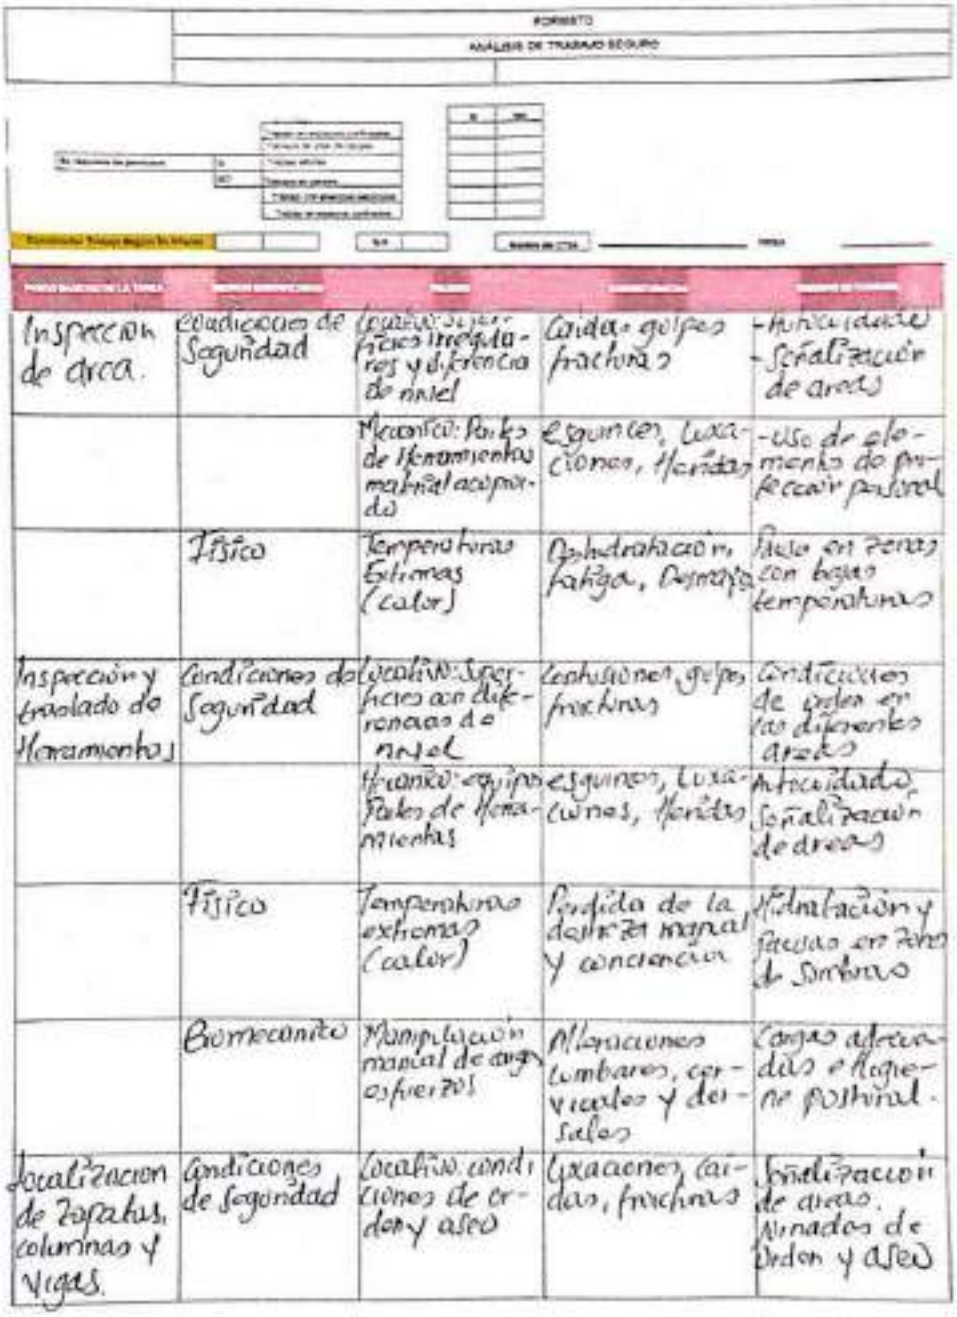



FORMATO


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inspección de área. | Condiciones de Seguridad | Locativo: Superficies irregulares y diferencia de nivel | Caídas, golpes fracturas | -Uso de calzado de seguridad<br>-Señalización de áreas |
| | | Mecánico: Partes de Herramientas material acopiado | Esguinces, Luxaciones, Heridas | -Uso de elementos de protección personal |
| | Físico | Temperaturas Extremas (calor) | Deshidratación, fatiga, Desmayo | Pausas activas con bajas temperaturas |
| Inspección y traslado de Herramientas | Condiciones de Seguridad | Locativo: Superficies con diferencias de nivel | Contusiones, golpes, fracturas | Condiciones de orden en las diferentes áreas |
| | | Mecánico: equipos Partes de Herramientas | Esguinces, Luxaciones, Heridas | Uso de calzado, Señalización de áreas |
| | Físico | Temperaturas extremas (calor) | Perdida de la destreza manual y concentración | Hidratación y pausas en zonas de Sombras |
| | Biomecánico | Manipulación manual de cargas esfuerzos | Alteraciones lumbares, cervicales y dorsales | Cargas adecuadas e higiene postural. |
| Localización de Zapatas, columnas y vigas. | Condiciones de Seguridad | Locativo: condiciones de orden y aseo | Quemaduras, caídas, fracturas | Señalización de áreas. Avisados de orden y aseo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Mecánico: golpes de herramientas | fracturas, esguinces caídas, golpes | Autocuidado uso de EPP |
| | Físico | Temperaturas extremas (calor) | Deshidratación fatiga, dermatosis | Puntos de hidratación |
| | Biomecánico | Movimientos repetitivos, posturas prolongadas | Lesiones del sistema musculo-esquelético | Higiene postural y pausas activas |
| Niveles de Excavación de zapatas, vigas. | Condiciones de Seguridad | Locativo: Superficies irregulares<br>Mecánico: golpes de herramientas | Heridas, golpes, fracturas<br>luxaciones y contusiones. | Autocuidado señalización de áreas, uso de elementos protección personal. |
| | Físico | Temperaturas Extremas (calor) | Perdida de destreza manual, fatiga | Puntos de hidratación |
| | Biomecánico | Movimientos repetitivos, esfuerzos | Lesiones osteo-muscular | Higiene postural y movimientos pausados |
| Niveles de Pisos | Condiciones de Seguridad | Locativo: Superficies con diferencias de nivel | Luxaciones, contusiones, golpes | Autocuidado uso de EPP. |
| | Físico | Temperatura extrema (calor) | Perdidas destreza manual | Punto de hidratación pausas en zonas sombra |
| | Biomecánico | Posturas forzadas movimiento repetitivo | Lesiones del sistema musculo esquelético | Posturas adecuadas |
| Verticalidad Edificio existente | Condiciones de Seguridad | Locativo: Superficies irregulares | Caídas esguinces fracturas | Señalización de áreas |
| | Físico | Temperaturas extremas (calor) | Fatiga, dermatosis | Puntos de hidratación |
| | Biomecánico | Movimientos repetitivos, posturas mantenidas | Lesiones osteo-muscular | Higiene postural pausas activas |
| Organización de Herramientas y equipos | Condiciones de Seguridad | Locativo: Superficies irregulares<br>Mecánico: Partes de herramientas, material acopiado | Heridas, golpes fracturas, contusiones luxaciones, esguinces | Autocuidado, uso de elementos de protección personal Orden y aseo, señalización de áreas |
| | Físico | Temperaturas extremas (calor) | Dermatosis, Perdida de la destreza manual fatiga | Hidratación, y pausas en zonas de bajas temperaturas |
| | Biomecánico | Posturas forzadas prolongadas | Afecciones lumbares, cervicales y dorsales | Higiene postural manejo de cargas adecuados Pausas activas |

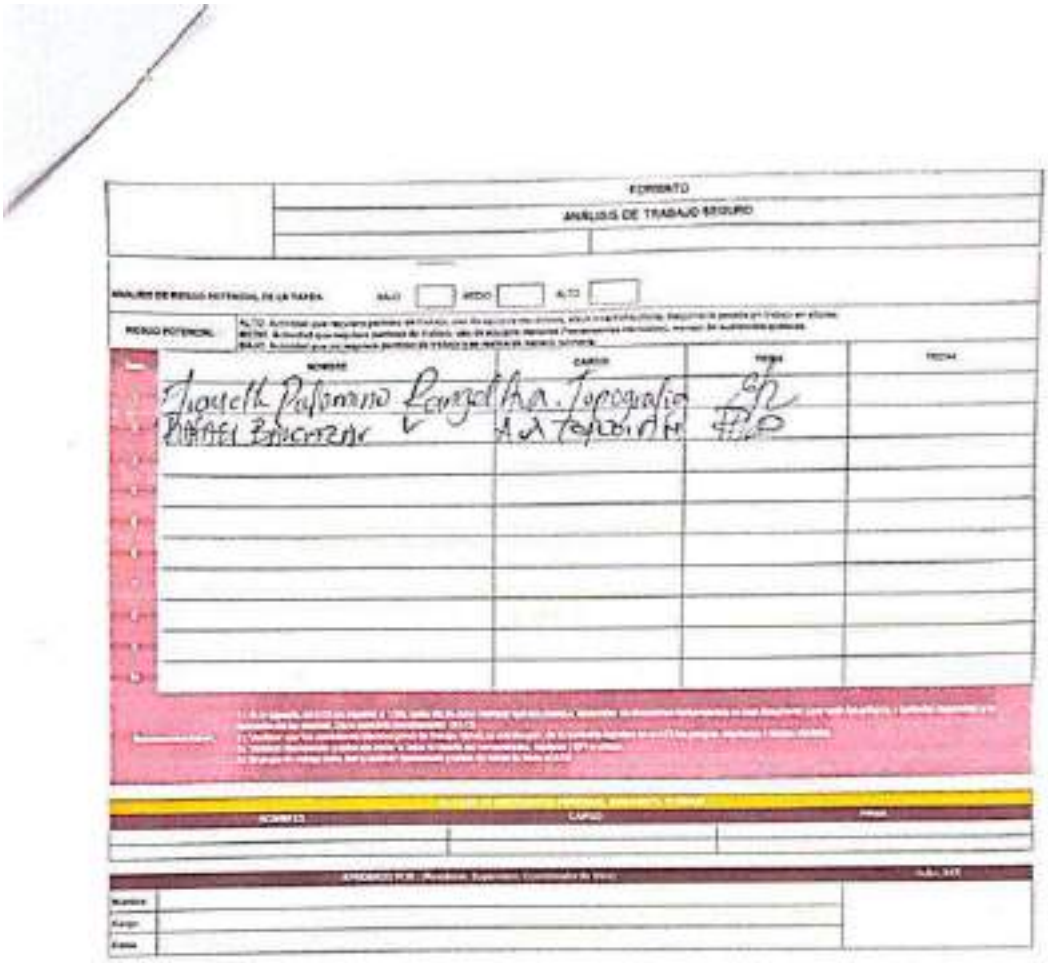
FORMATO
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
NOMBRE
CARGO
FIRMA
FECHA

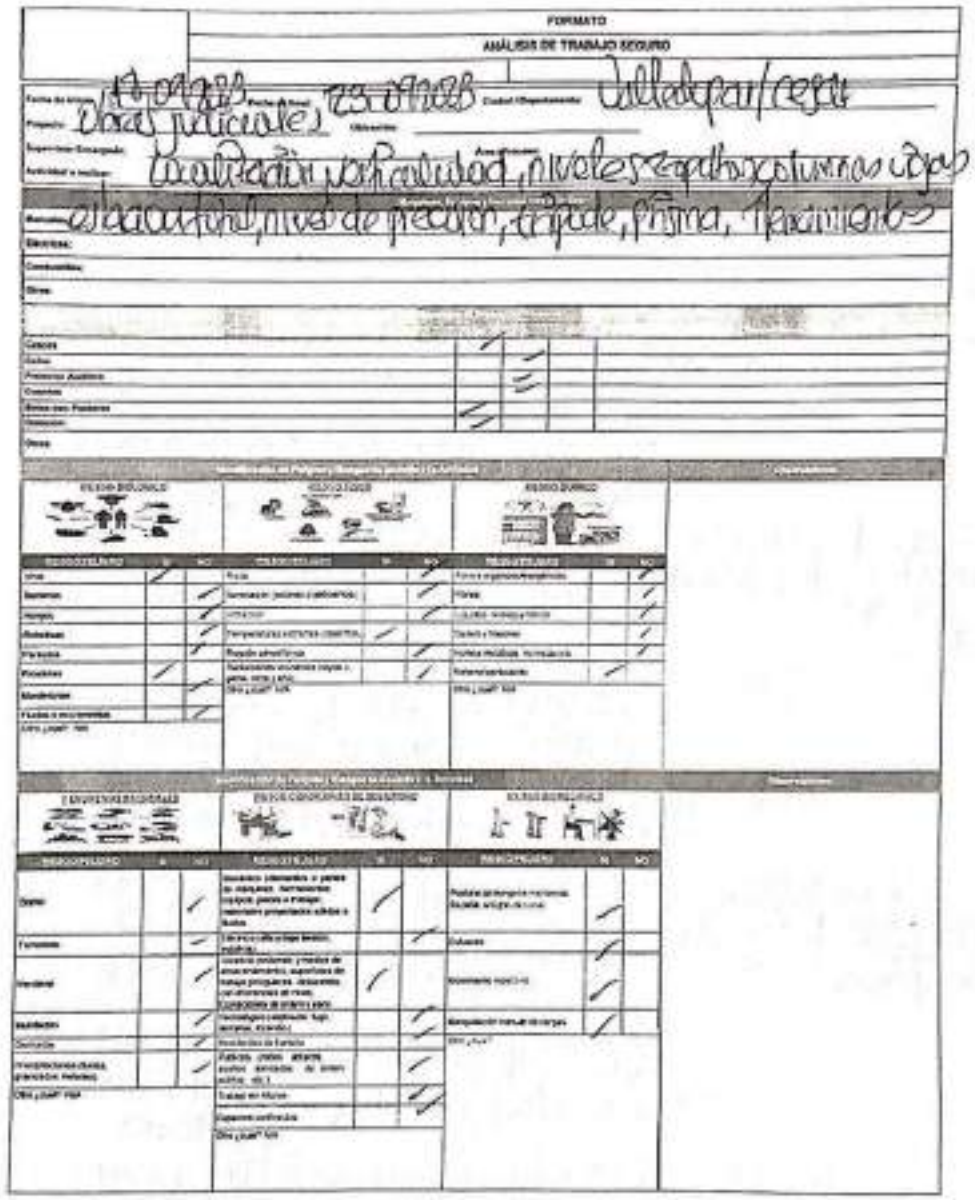
FORMATO
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

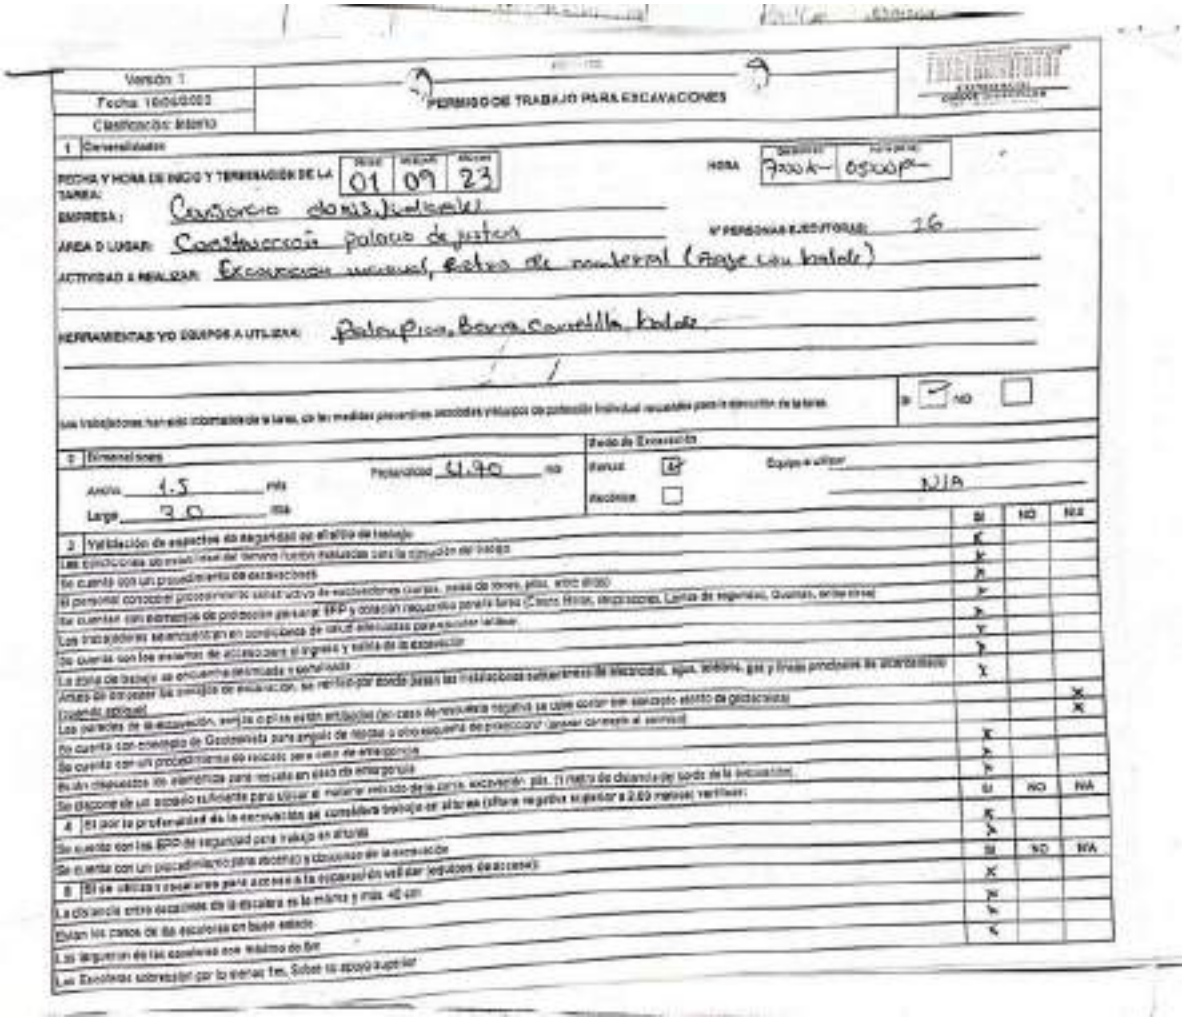

Versión: 1
Fecha: 16/06/2003
Clasificación: Interno

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: Día 01 Mes 09 Año 23 — HORA 7:00 A.M. – 05:00 P.M.

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

AREA O LUGAR: Construcción palacio de justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 16

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual, retiro de material (Arroje con balde)

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Palas, Picas, Barra, Carretilla, balde


Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea — SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.5 mts — Profundidad 1.90 mts — Largo 3.0 mts

Medio de Excavación: Manual ☑ Mecánico ☐ — Equipo a utilizar: N/A

| 3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Las condiciones climatológicas del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | X | | |
| El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (cargas, pesos de torres, pilas, entre otros) | X | | |
| Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y colectiva requeridos para la tarea (Cascos, Botas, antiparras, Cuerdas, de seguridad, Guantes, entre otros) | X | | |
| Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor | X | | |
| Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación | X | | |
| La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada | X | | |
| Antes de ejecutar las labores de excavación, se verifico por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, telefonía, gas y líneas presiones de acueductos (cuando aplique) | | | X |
| Las paredes de la excavación, zanja o pilas están entibadas (en caso de resultado negativo se debe cesar las actividades hasta que se instale el sistema de entibado) | | | X |
| Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo o alternativa de protección (anexar concepto al permiso) | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia | X | | |
| Se dispone de los elementos para rescate en caso de emergencia | X | | |
| Se dispone de un acopio suficiente para situar el material excavado de la zona excavación, mín. (1 metro de distancia del borde de la excavación) | SI | NO | N/A |
| 4 El piso la profundidad de la excavación se cumplirá trabajo en altura (altura requiere superior a 2.00 metros) verificar: | X | | |
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en altura | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación | SI | NO | N/A |
| 5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación verificar lo(s)ítem(s) de acceso) | X | | |
| La distancia entre escalones de la escalera es la misma y mas de cm | N | | |
| Están las patas de las escaleras en buen estado | X | | |
| Las alturan de las escaleras son mínimo de 5m | X | | |
| Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior | | | |

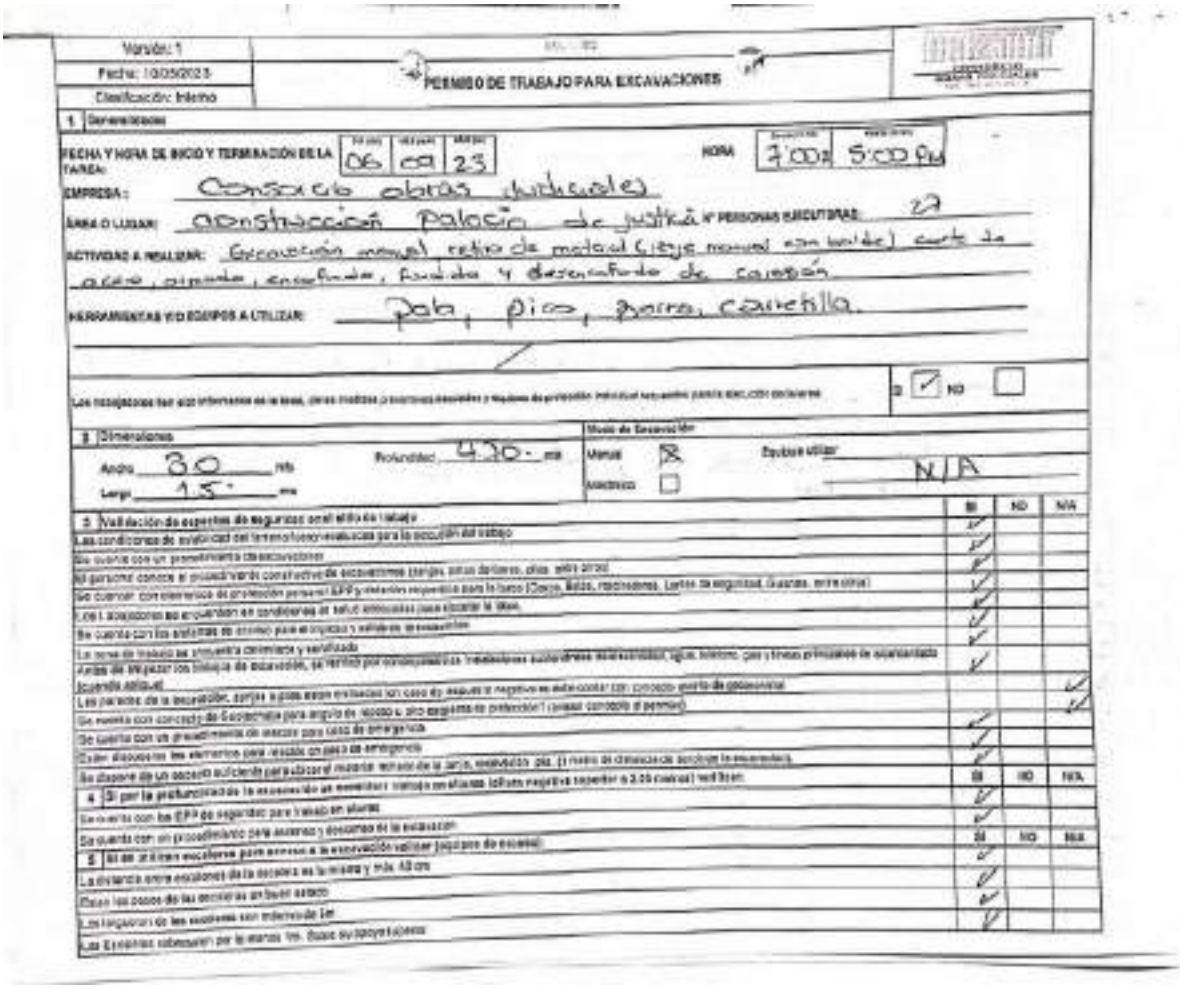

Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interno

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 06 09 23 HORA 7:00a 5:00 pm

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: construcción Palacio de justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 27

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual retiro de material (viga manual con bolde) corte de acero, zapatas, encofrado, fundida y desencofrado de cimientos

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pico, barra, carretilla.

Los trabajadores han sido informados de los tipos, clases, medidas y sistemas existentes y equipos de protección individual necesarios para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐


2 Dimensiones

Ancho 3.0 mts Profundidad 4.20 mts

Largo 1.5 mts


Modo de Excavación: Manual ☒ Mecánico ☐ Equipos utilizar: N/A

| | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| 3 Validación de expertos de seguridad en el sitio de trabajo | | | |
| Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | ✓ | | |
| El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (tiempo, pasos de trabajo, otros aplica) | ✓ | | |
| Se cuenta con elementos de protección personal (EPP) y protección respectiva para la tarea (Casco, botas, reflectivos, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros) | ✓ | | |
| Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor. | ✓ | | |
| Se cuenta con los soportes de ingreso para el ingreso y retiro de excavación | ✓ | | |
| La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada | ✓ | | |
| Antes de ingresar los trabajos de excavación, se verifico por consiguiente las instalaciones subterráneas existentes(red, agua, teléfono, gas y líneas principales de suministro) (cuando aplique) | | | ✓ |
| Las paredes de la excavación, zanjas o pozos serán evaluadas con cada día inicio o reinicio de actividades con concepto experto de geotecnista | | | ✓ |
| Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo o plan estructural de protección? (anexar concepto al permiso) | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para casos de emergencia | ✓ | | |
| Existen elementos de elementos para rescate en casos de emergencia | ✓ | | |
| Se dispone de un acceso suficiente para subir y el material retirado de la zanja, establecido (a) (1 metro de distancia de borde de excavación) | ✓ | | |
| 4 Si por la profundidad de la excavación se requieren sistemas entibados (Para negativa superior a 2.00 cuales) verificar: | SI | NO | N/A |
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación | ✓ | | |
| 5 En el caso de utilizar escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de escalera) | SI | NO | N/A |
| La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más 40 cm | ✓ | | |
| Todos los pasos de las escaleras se hacen sobre estos | ✓ | | |
| Las largueros de las escaleras son sobresalen 1m | ✓ | | |
| Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Hacia su apoyo superior | ✓ | | |

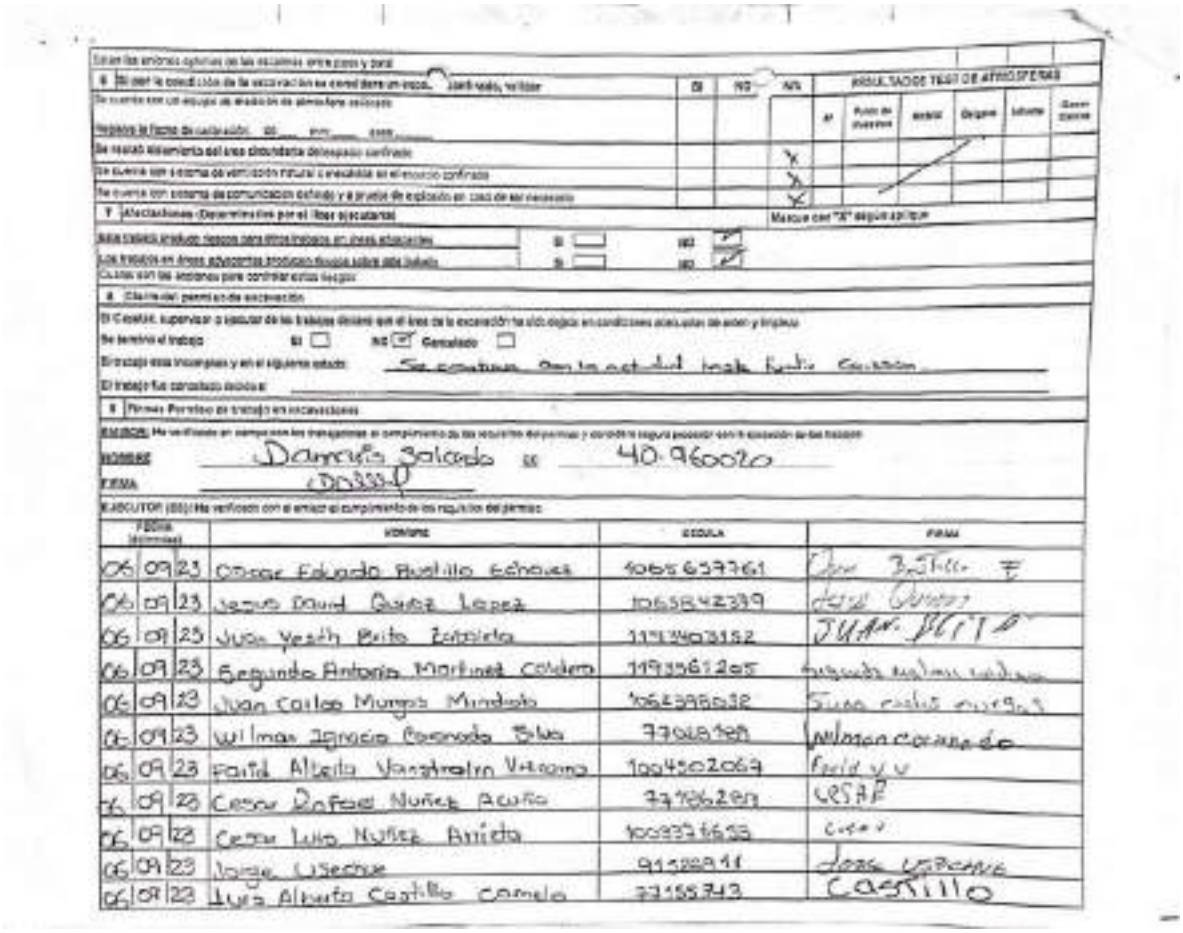


Listar las personas capacitadas de las actividades antes descritas y firmar

| FECHA (dd/mm/aa) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 06/09/23 | Oscar Eduardo Avellito Echeverri | 1065637761 | |
| 06/09/23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1065842339 | |
| 06/09/23 | Juan Yesith Brito Zapata | 1193403152 | |
| 06/09/23 | Segundo Antonio Martinez Caldera | 1193561205 | |
| 06/09/23 | Juan Carlos Murgas Mendoza | 1064998038 | |
| 06/09/23 | Wilmar Ignacio Coronado Silva | 77068769 | |
| 06/09/23 | Farid Alberto Vanstralen Velasco | 1004502069 | |
| 06/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77196209 | |
| 06/09/23 | Cesar Luis Nuñez Barrios | 1003936633 | |
| 06/09/23 | Jorge Usechue | 91288911 | |
| 06/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77155743 | |

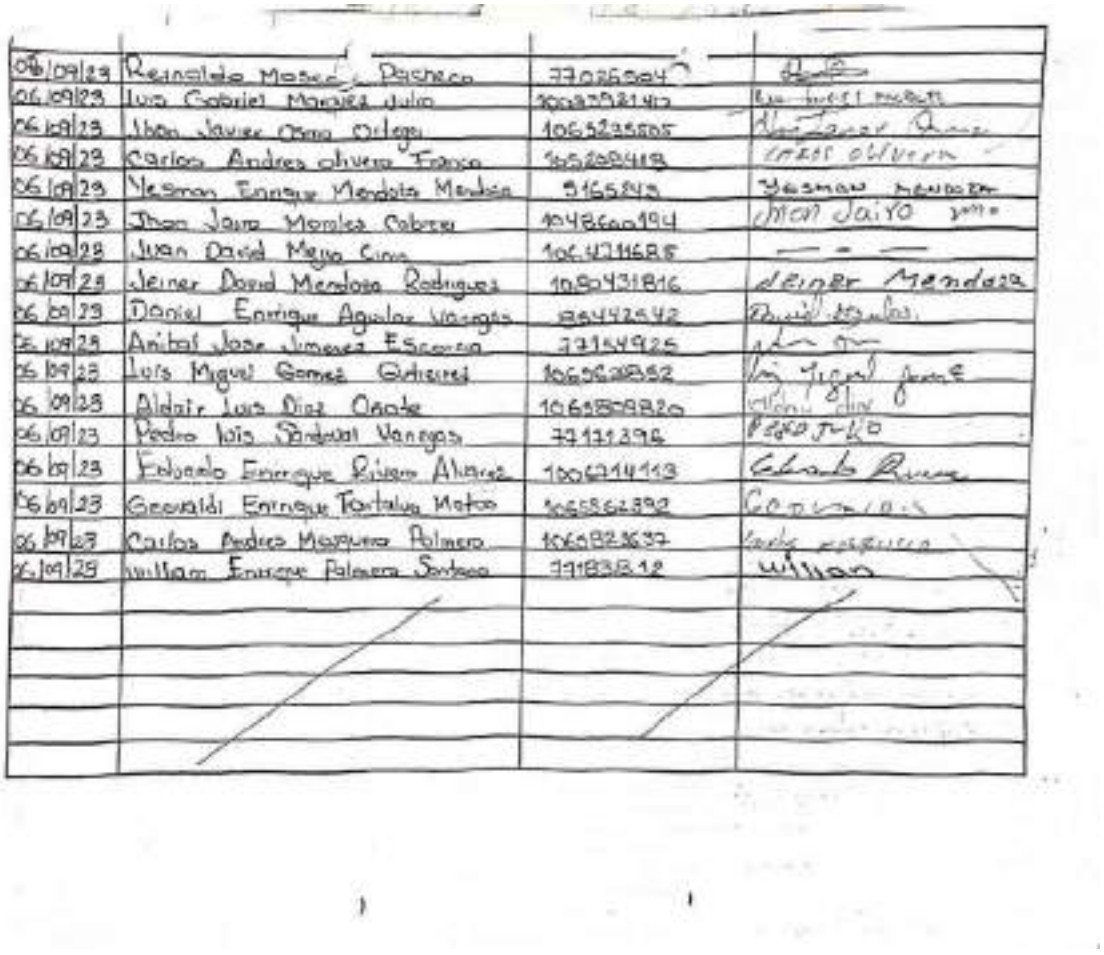

| | | | |
|---|---|---|---|
| 06/09/23 | Reynaldo Mosca Pacheco | 77026504 | |
| 06/09/23 | Luis Gabriel Morales Julio | 1003731412 | |
| 06/09/23 | Jhon Javier Ossa Ortega | 1065235505 | |
| 06/09/23 | Carlos Andres Olivera Franco | 1052084118 | |
| 06/09/23 | Yesman Enrique Mendoza Mendoza | 9165843 | |
| 06/09/23 | Jhon Jairo Morales Cabrera | 1048600194 | |
| 06/09/23 | Juan David Mejia Cano | 1064711685 | |
| 06/09/23 | Jeiner David Mendoza Rodriguez | 1050431816 | |
| 06/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Vanegas | 85442542 | |
| 06/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 77164925 | |
| 06/09/23 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1065628852 | |
| 06/09/23 | Aldair Luis Diaz Conde | 1065859820 | |
| 06/09/23 | Pedro Luis Sandoval Vanegas | 77171396 | |
| 06/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006214113 | |
| 06/09/23 | Geovaldi Enrique Tortolus Matos | 1065862892 | |
| 06/09/23 | Carlos Andres Mosquera Palmera | 1064823637 | |
| 06/09/23 | William Enrique Palmera Santana | 1118338312 | |

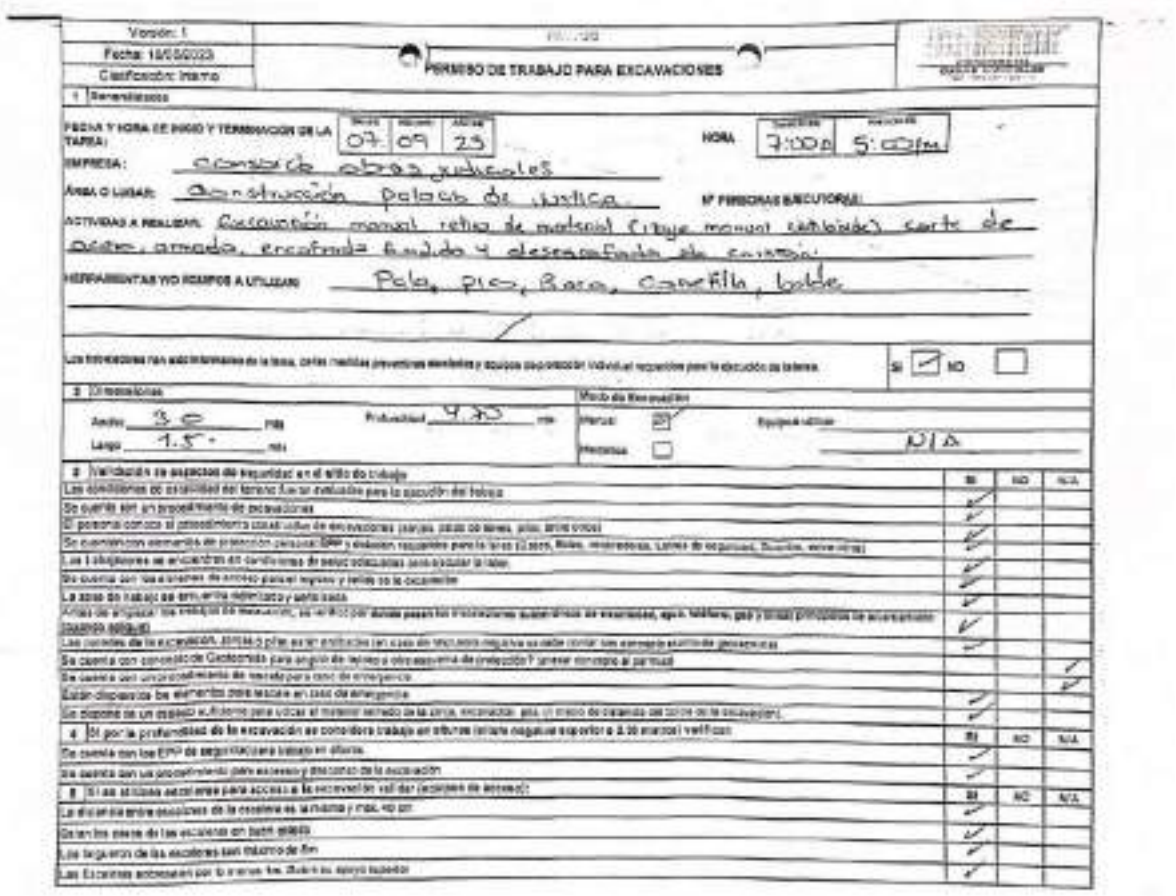

Versión: 1
Fecha: 18/08/2020
Clasificación: Interna

**PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES**

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: Día 07 Mes 09 Año 23 — HORA 7:00a 5:00pm

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: construcción palacio de justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS:

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual retiro de material (haya manual cantidad) corte de suelos, armado, encofrado fundido y desencofrado de cimientos

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pico, Barra, Carretilla, balde


Las instrucciones han sido informadas de la tarea, sobre medidas preventivas existentes y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho: 3.5 mts — Profundidad: 4.30 mts — Largo: 1.5 mts


Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánica ☐ — Equipo utilizar: N/A

| 3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del terreno fue/se evaluada para la ejecución del trabajo | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | ✓ | | |
| El personal conoce el procedimiento para ejecución de excavaciones (zanjas, pozos de lumbre, pilas, entre otros) | ✓ | | |
| Se cuenta con elementos de protección personal (EPP) y elevación requeridos para la tarea (Cascos, Botas, antiparras, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros) | ✓ | | |
| Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor | ✓ | | |
| Se cuenta con las escaleras de acceso para el ingreso y retiro de la excavación | ✓ | | |
| La zona de trabajo se encuentra señalizada y aseada | ✓ | | |
| Antes de ingresar, las medidas de mitigación, se verificó que estuvieran bajo los requerimientos establecidos en excavación, agua, teléfono, gas y demás procesos de acompañamiento (cuando aplique) | ✓ | | |
| Las cuentas de la excavación, zanjas o pilas se han entibado (en caso de requerirlo según lo establecido en el procedimiento de excavación) | ✓ | | |
| Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de talud u otro sistema de protección? (anexar concepto si aplica) | | | ✓ |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia | | | ✓ |
| Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia | ✓ | | |
| Se dispone de un espejo o alterno para vigilar el material retirado de la zona excavación, así como el cierre de cuenta de borde de la excavación | ✓ | | |
| 4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (mayor negativa superior a 1.50 mts) se verifica: | SI | NO | N/A |
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento para acceso y descenso de la excavación | ✓ | | |
| 5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación se verifica (escalera de acceso): | SI | NO | N/A |
| La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más no es | ✓ | | |
| Están los pasos de las escaleras en buen estado | ✓ | | |
| Las tapas de las escaleras son mismo de fin | ✓ | | |
| Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior | ✓ | | |

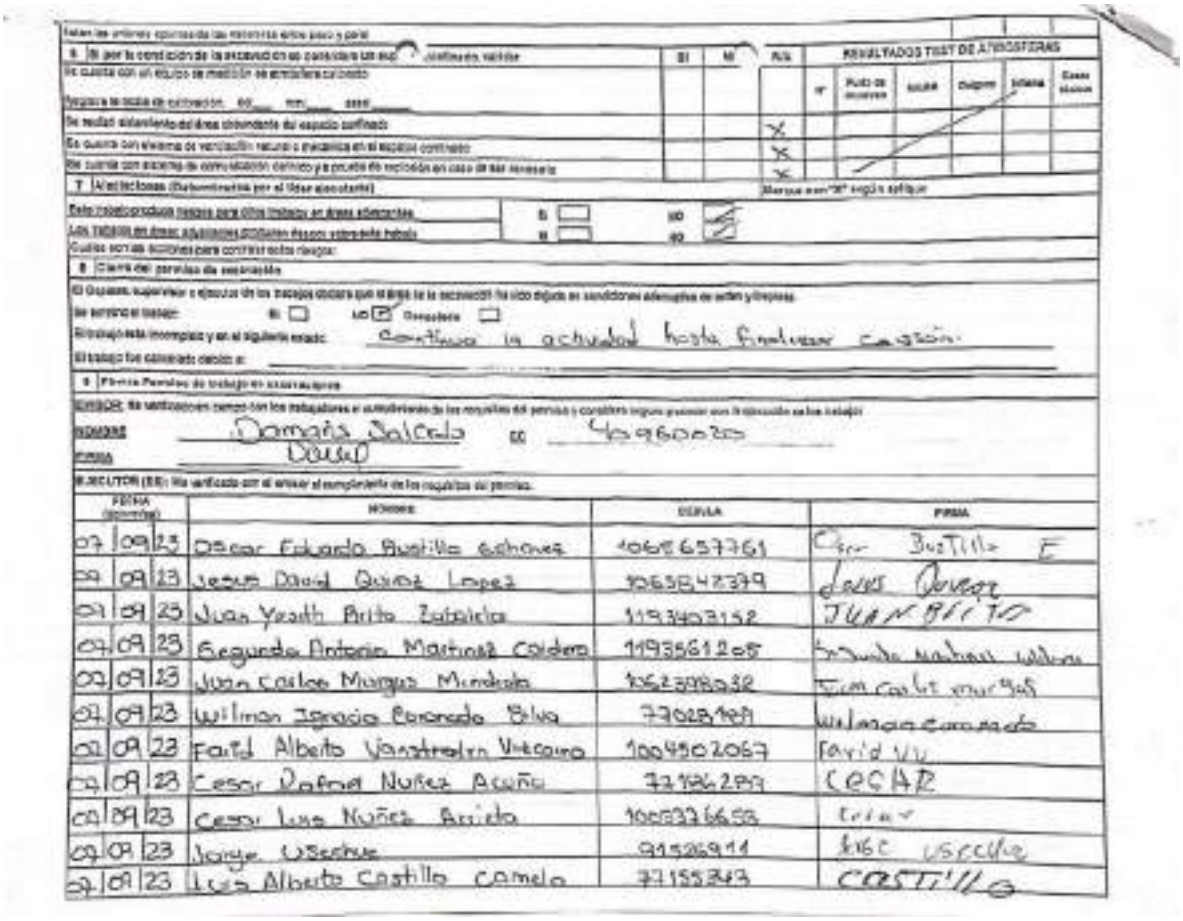


Damaris Salcedo

| FECHA | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 07/09/23 | Oscar Eduardo Bustillo Echeverr | 1066657761 | Bustillo E |
| 09/09/23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1065842379 | Jesus Quiroz |
| 07/09/23 | Juan Yeuth Brito Zabaleta | 1193403152 | JUAN BRITO |
| 07/09/23 | Segundo Antonio Martinez Caldera | 1193561205 | Segundo Martinez Caldera |
| 07/09/23 | Juan Carlos Murgas Mendoza | 1062398932 | Juan Carlos murgas |
| 07/09/23 | Wilmar Ignacio Coronado Silva | 7702819 | Wilmar Coronado |
| 07/09/23 | Farid Albeiro Vanstralen Vasquez | 1004902067 | Farid V.V. |
| 07/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 7219862 | CECHAR |
| 07/09/23 | Cesar Luis Nuñez Arrieta | 1065837658 | Cesar |
| 07/09/23 | Jorge Usecha | 91526911 | Jorge Usecha |
| 07/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77155343 | CASTILLO |

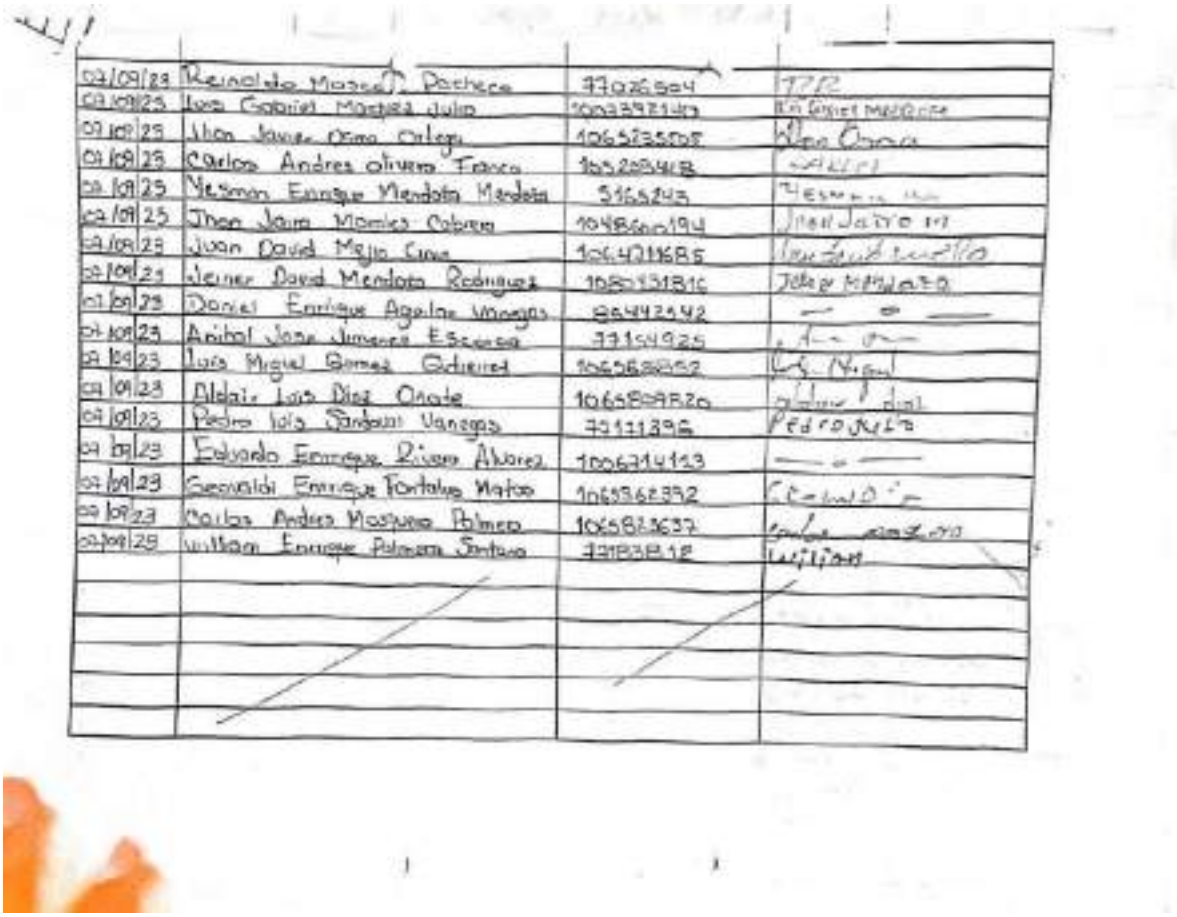

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04/09/25 | Reinaldo Manuel Pacheco | 77026504 | |
| 03/09/25 | Juan Gabriel Montiel Julio | 1003397149 | |
| 03/09/25 | Jhon Jairo Oma Ortega | 1065235058 | |
| 01/09/25 | Carlos Andres Olivera Franco | 1052094418 | |
| 02/09/25 | Nesmon Enrique Mendoza Medina | 5165243 | |
| 02/09/25 | Jhon Jairo Montes Cabrera | 1048600194 | |
| 02/09/25 | Juan David Mejia Cuao | 1064211685 | |
| 02/09/25 | Jaimer David Mendoza Rodriguez | 1085131816 | |
| 01/09/25 | Daniel Enrique Agelan Vanegas | 85442542 | |
| 01/09/25 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 77154925 | |
| 01/09/25 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1065868852 | |
| 01/09/25 | Alcides Luis Diaz Conde | 1065899820 | |
| 01/09/25 | Pedro Luis Sanjuan Vanegas | 77111396 | |
| 01/09/25 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006314113 | |
| 01/09/25 | Gerardo Enrique Fontalvo Mateo | 1065962392 | |
| 01/09/25 | Carlos Andres Mosquera Palmera | 1065823637 | |
| 01/09/25 | William Enrique Palmera Santana | 77183818 | |

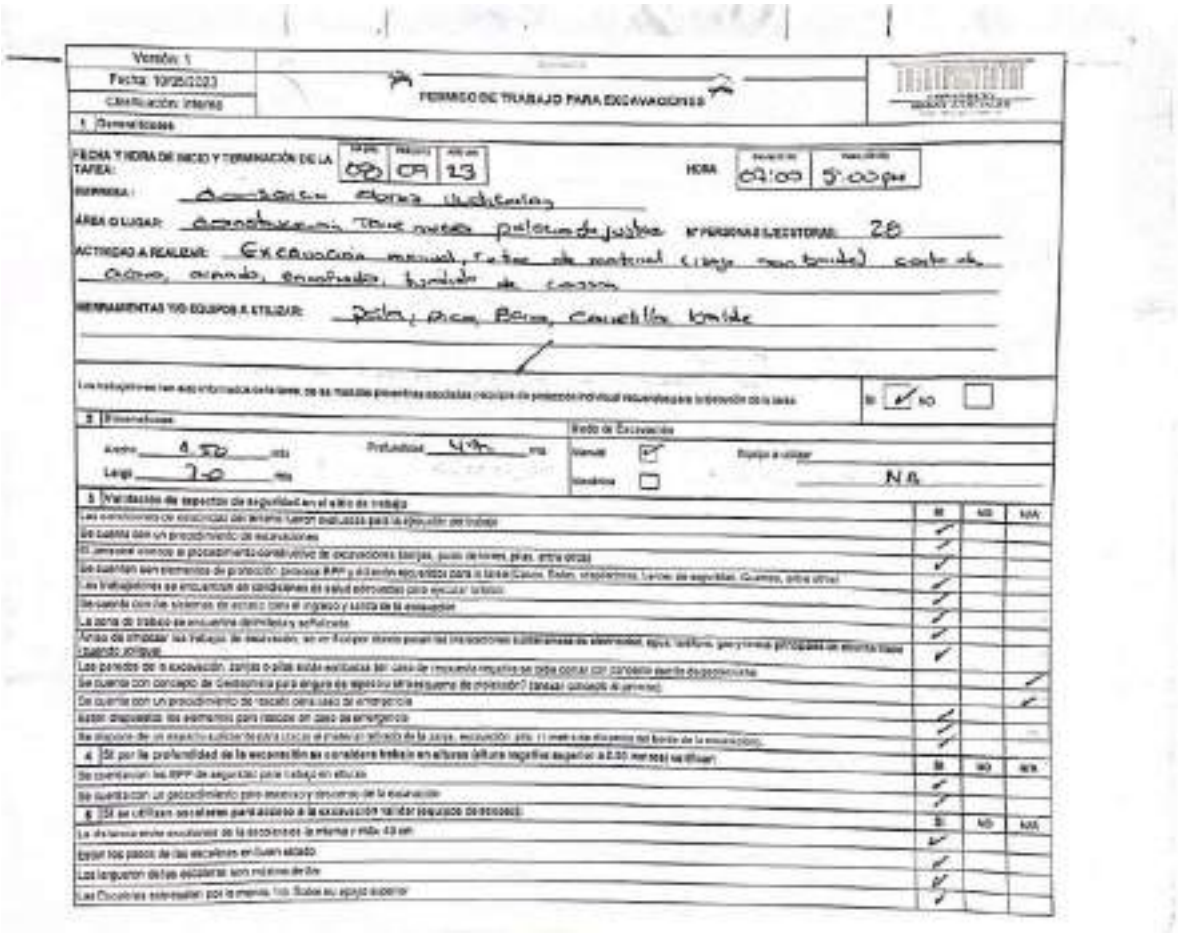

Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1. Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 09 / 09 / 23 HORA 07:00 5:00 pm

EMPRESA: Asesorías obras industriales

ÁREA O LUGAR: Cundinamarca, Tribunal nuevo palacio de justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 28

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual, retiro de material (capa vegetal) corte de raíces, cuando encontrado, limpieza de cuneta

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pica, Barra, Cavadilla, Martillo

Los trabajadores han sido informados sobre los riesgos, de las medidas preventivas asociadas y recibido de protección individual requeridas para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

2. Dimensiones


Ancho 1.50 mts Profundidad 4.00 mts Largo 7.0 mts

Medio de Excavación: Manual ☑ Mecánico ☐ Equipo a utilizar: N.A.


| 3. Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | ✓ | | |
| El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pozos de inspección, pilas, entre otras) | ✓ | | |
| Se cuentan con elementos de protección personal (cascos, EPP y dotación requeridos para la tarea (Botas, Botas, impermeables, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros) | ✓ | | |
| Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar labores | ✓ | | |
| Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación | ✓ | | |
| La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada | ✓ | | |
| Antes de ingresar los trabajos de excavación, se ha revisado minuciosamente para identificar cualquier peligro potencial, como cables eléctricos, tuberías de gas o agua, y se han tomado las medidas necesarias para mitigar estos riesgos | ✓ | | |
| Los paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de encontrar material de relleno contar con concepto previo de ingeniería) | | | ✓ |
| Se cuenta con concepto de Geotecnia para ángulos de apoyo o alternativas de protección? (anexar concepto de ingeniería) | | | ✓ |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia | | | ✓ |
| Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia | ✓ | | |
| Se dispone de un espacio suficiente para colocar el material retirado de la zanja, excavación, etc. (mínimo dos metros del borde de la excavación) | ✓ | | |


| 4. Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros se diligencia) | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Se cuentan con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento para ingreso y descenso de la excavación | ✓ | | |

| 5. Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación (anexar registros de revisión) | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| La distancia entre escalones de la escaleras la interna y más 40 cm | ✓ | | |
| Existen los pasos de las escaleras en buen estado | ✓ | | |
| Las longitudes de las escaleras son mayores de 6m | ✓ | | |
| Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior | ✓ | | |

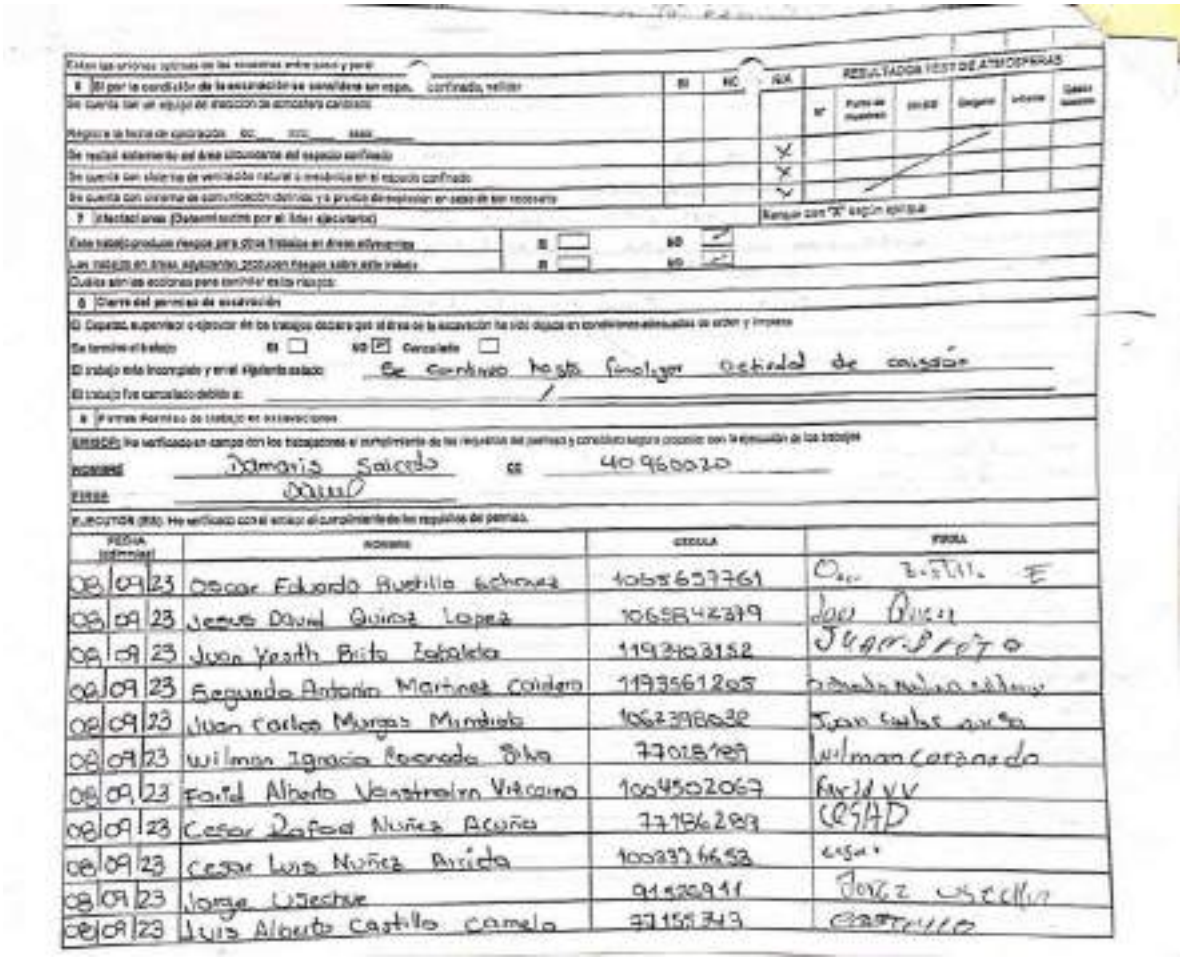

| FECHA (ddmmaa) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 08/09/23 | Oscar Eduardo Bustillo Echeverz | 1065637761 | |
| 08/09/23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1065842319 | |
| 08/09/23 | Juan Yeath Brito Estrada | 1192103152 | |
| 08/09/23 | Segundo Antonio Martinez Caldera | 1193561205 | |
| 08/09/23 | Juan Carlos Murgas Mendieta | 1063980032 | |
| 08/09/23 | Wilmar Ignacio Coronado Silva | 77018769 | |
| 08/09/23 | Farid Alberto Valderrama Vizcaino | 1004502067 | |
| 08/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77186289 | |
| 08/09/23 | Cesar Luis Nuñez Arrieta | 1003376658 | |
| 08/09/23 | Jorge Ustariz | 91529911 | |
| 08/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77155343 | |

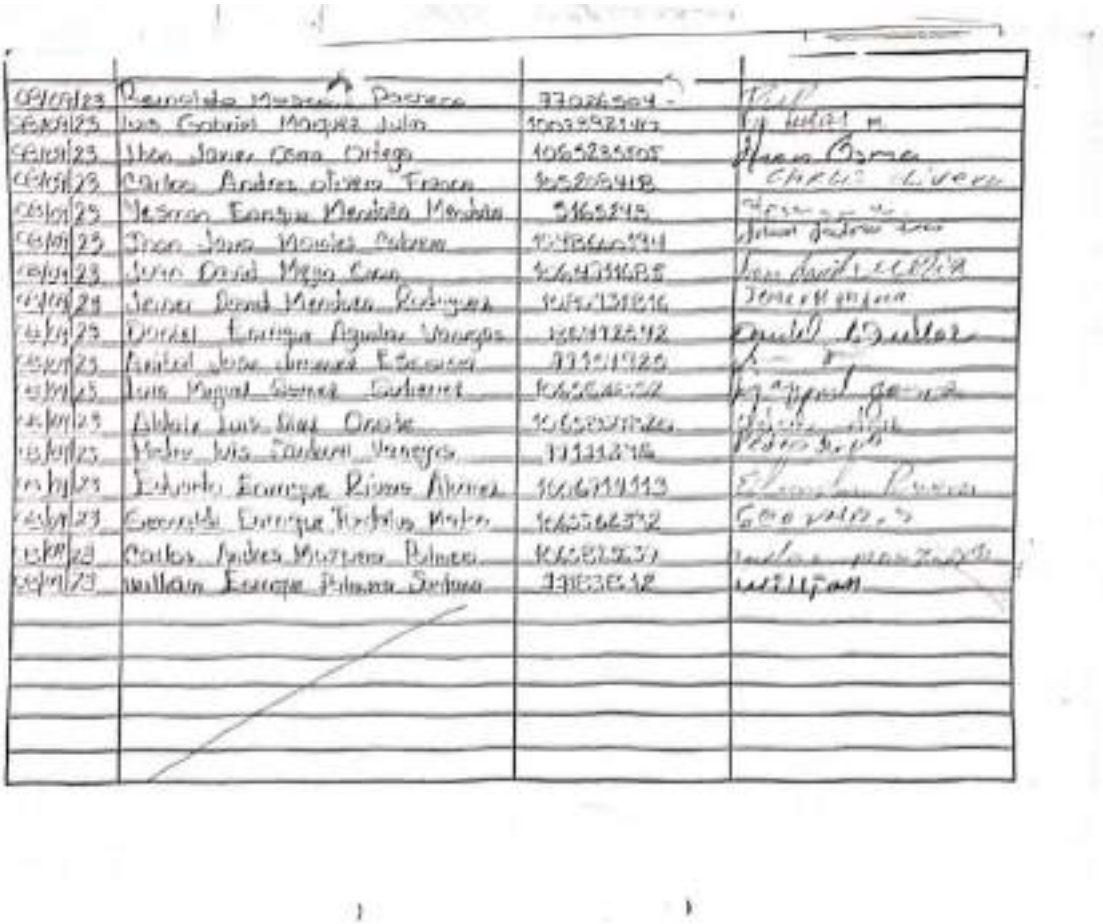

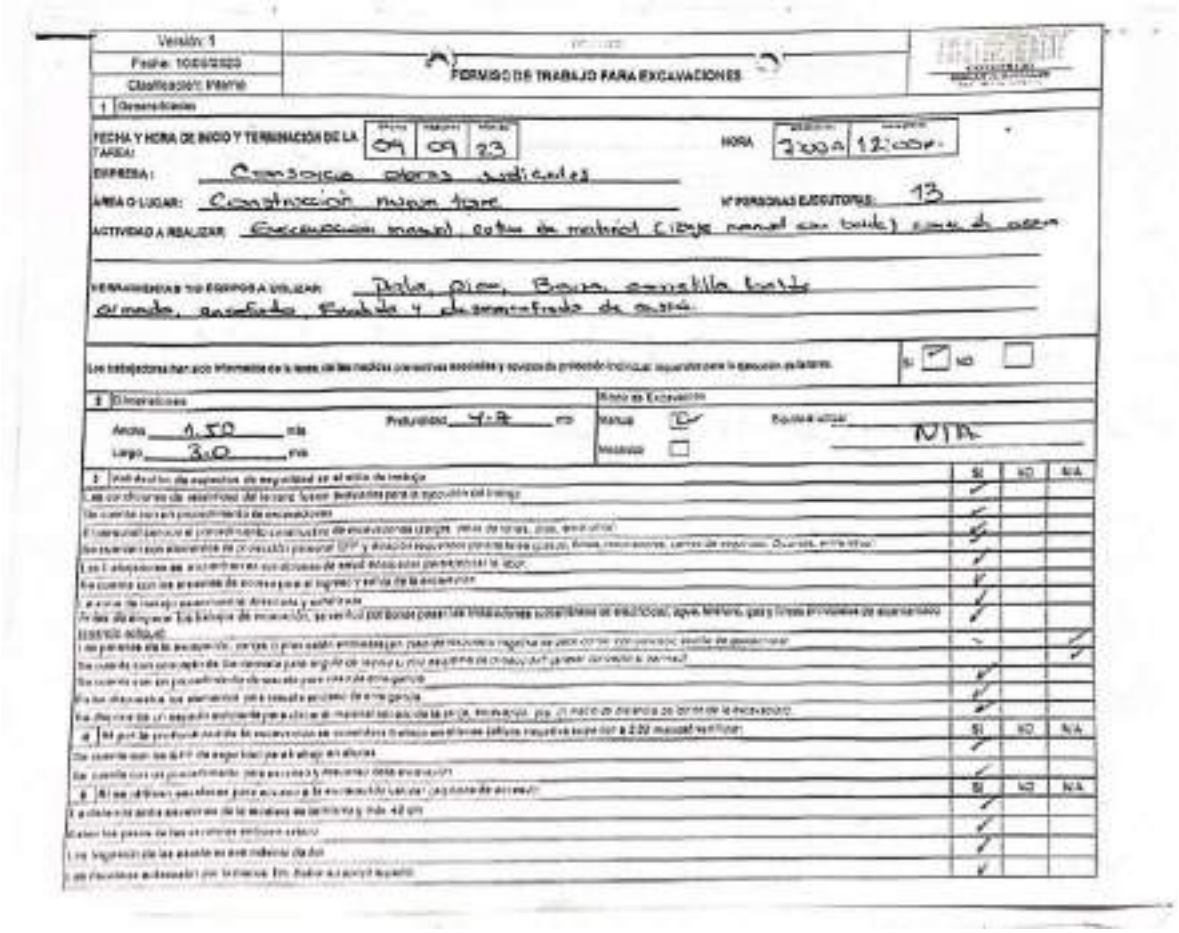

Versión: 1
Fecha: 10/03/2020
Clasificación: Interna

FORMATO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACION DE LA TAREA: 04 09 23 HORA 7:00a 12:00p.

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

AREA O LUGAR: Construcción Nuevo Itagüí N° PERSONAS EJECUTORAS: 13

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual, retiro de material (cargue manual con balde) zona de cocina

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pica, Barra, cargable, balde, cinceles, guantes, botas y elementos de aseo.

Los trabajadores han sido informados de los tipos de riesgos prevalentes asociados y medidas de protección individual requeridas para la ejecución de labores. SI ☑ NO ☐


2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts Profundidad 4.8 mts

Largo 3.0 mts

Tipo de Excavación: Manual ☑ Mecánico ☐ Equipo utilizado: N/A

| | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| 1 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo | | | |
| Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo | ✓ | | |
| Se cuenta con el procedimiento de excavación | ✓ | | |
| El personal cuenta con el entrenamiento y conocimiento de excavaciones (riesgos, zona de caídas, zona de retiro) | ✓ | | |
| Se cuenta con elementos de protección personal (EPP) y dotación requeridos para la tarea (botas, casco, protección auditiva, gafas de seguridad) | ✓ | | |
| Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para realizar la labor | ✓ | | |
| Se cuenta con la presencia de vigía para el ingreso y salida de la excavación | ✓ | | |
| Se cuenta con señalización de seguridad (cinta de peligro, conos, barreras) | ✓ | | |
| Antes de iniciar la labor se verifica por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y otras previstas de suministro (postes, antiguos) | | | ✓ |
| Los permisos de la excavación, cortes o pozos están entregados por escrito al responsable inmediato de la labor con las condiciones, medio de comunicación | | | ✓ |
| Se cuenta con un plan de rescate para ingreso de personal a excavaciones mayores a 1.20 mts (escalera, cuerda de vida, arnés) | | | ✓ |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para casos de emergencia | ✓ | | |
| Se han dispuesto los elementos para rescate en caso de emergencia | ✓ | | |
| Se dispone de un equipo extintor para atender el material inflamable de la zona de trabajo, en el caso de presencia de gases en el excavación | ✓ | | |
| 2 Si por la profundidad de la excavación se requieren trabajos verticales (altura mayor a 2.00 mts) verificar: | SI | NO | N/A |
| Se cuenta con un plan de seguridad para trabajo en alturas | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación | ✓ | | |
| 3 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación (en caso de derrumbe) | SI | NO | N/A |
| La escalera está asegurada en la parte superior y sobresale 1 mt | ✓ | | |
| Existen los pasos de las escaleras en buen estado | ✓ | | |
| La ubicación de las escaleras es la indicada | ✓ | | |
| Las escaleras sobresalen por lo menos 1m sobre el suelo | ✓ | | |

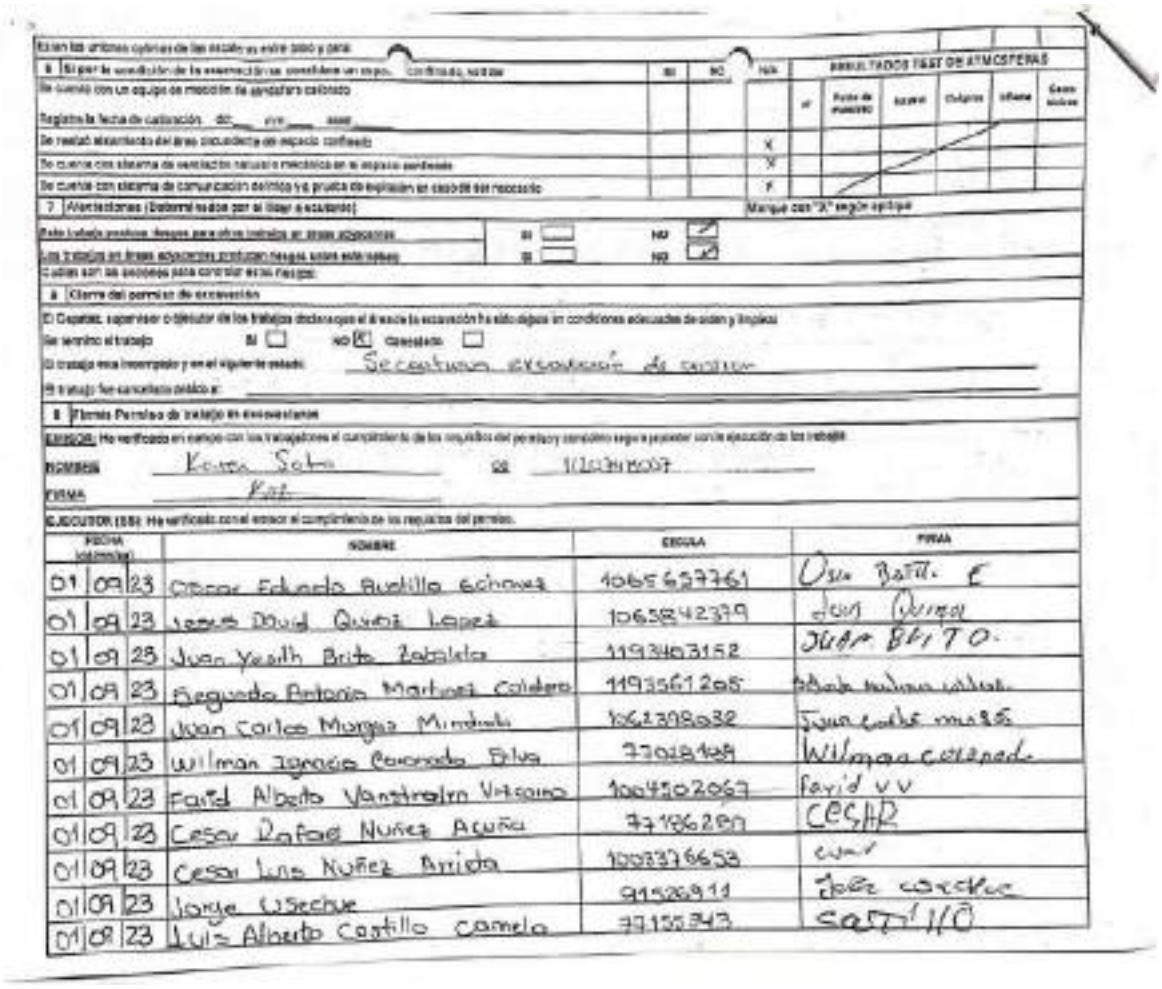

Entre las últimas opciones de las escalas se evite bajo y para

8 | Si por la condición de la excavación se considere un espa... confinado, realizar | SI | NO | N/A | RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS: Hr | Punto de muestreo | Oxigeno | Explosivo | Inflama | Gases nocivos

Se cuenta con un equipo de medición de atmosfera calibrado
Registre la fecha de calibración dd/ mm/ aaaa
Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado — N/A
Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado — N/A
Se cuenta con sistema de comunicación definido y el, prueba de explosión en caso de ser necesario — N/A

7 | Advertencias (Diligenciar todos por el líder o ejecutor) | Marque con "X" según aplique

Existe trabajo previos después para oficios realizados en áreas adyacentes — SI ☐ NO ☒
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo — SI ☐ NO ☒
Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:

8 | Cierre del permiso de excavación


El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza
Se termino el trabajo — SI ☐ NO ☒ Inacabado ☐
El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: Se continua excavación de canaleta
El trabajo fue cancelado debido a:

9 | Firmas Permiso de trabajo en excavaciones

EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos
NOMBRE: Kevin Soto — CC: 1[illegible]007
FIRMA: Kev

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.


| FECHA (dd/mm/aa) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 01/09/23 | Cesar Eduardo Bustillo Echeverz | 1065627761 | |
| 01/09/23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1063842379 | |
| 01/09/23 | Juan Yeith Brito Zabaleta | 1193403152 | |
| 01/09/23 | Segundo Antonio Martinez Calderon | 1193561205 | |
| 01/09/23 | Juan Carlos Murgas Mendoza | 1062398032 | |
| 01/09/23 | Wilman Ignacio Coronado Silva | 77018198 | |
| 01/09/23 | Farid Alberto Vanstralen Vergara | 1064902067 | |
| 01/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77196289 | |
| 01/09/23 | Cesar Luis Nuñez Arrieta | 1003376653 | |
| 01/09/23 | Jorge Ustche | 91526911 | |
| 01/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77155343 | |

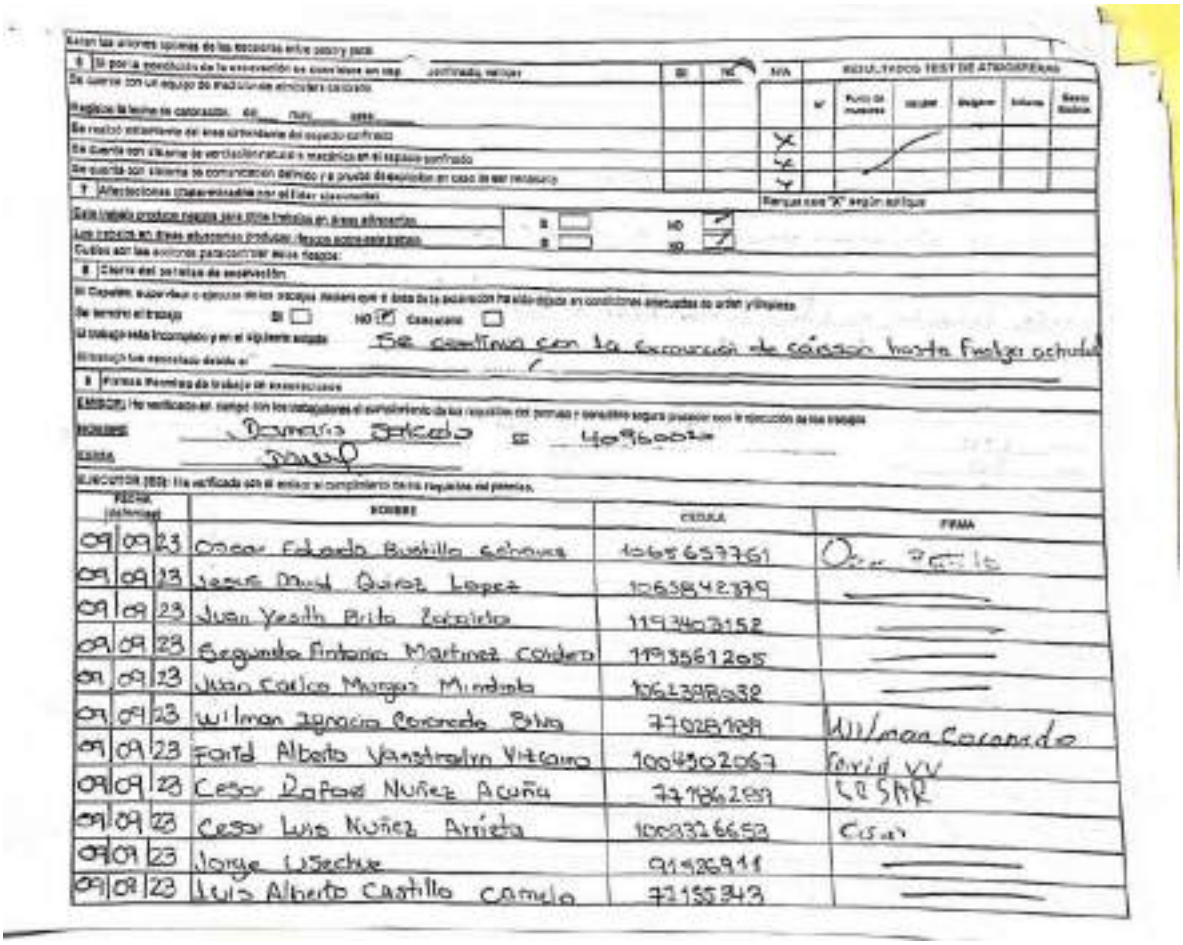


Marque con "X" según aplique

Se continua con la excavacion de sótano hasta fecha actual

| FECHA (dd/mm/aa) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 09/09/23 | Cesar Eduardo Bustillo Echeverri | 1065657761 | |
| 09/09/23 | Jesus Manuel Quiroz Lopez | 1065842879 | |
| 09/09/23 | Juan Yeaith Brito Zapateiro | 1193403152 | |
| 09/09/23 | Segundo Fintano Martinez Cordero | 1193561205 | |
| 09/09/23 | Juan Carlos Morgan Mendoza | 1063988038 | |
| 09/09/23 | Wilman Ignacio Coronado Pena | 7702819 | Wilman Coronado |
| 09/09/23 | Farid Alberto Vanstralen Vergara | 1004502067 | |
| 09/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 7719862 | |
| 09/09/23 | Cesar Luis Nuñez Arrieta | 1003326653 | |
| 09/09/23 | Jorge Usechue | 91526911 | |
| 09/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 72155343 | |

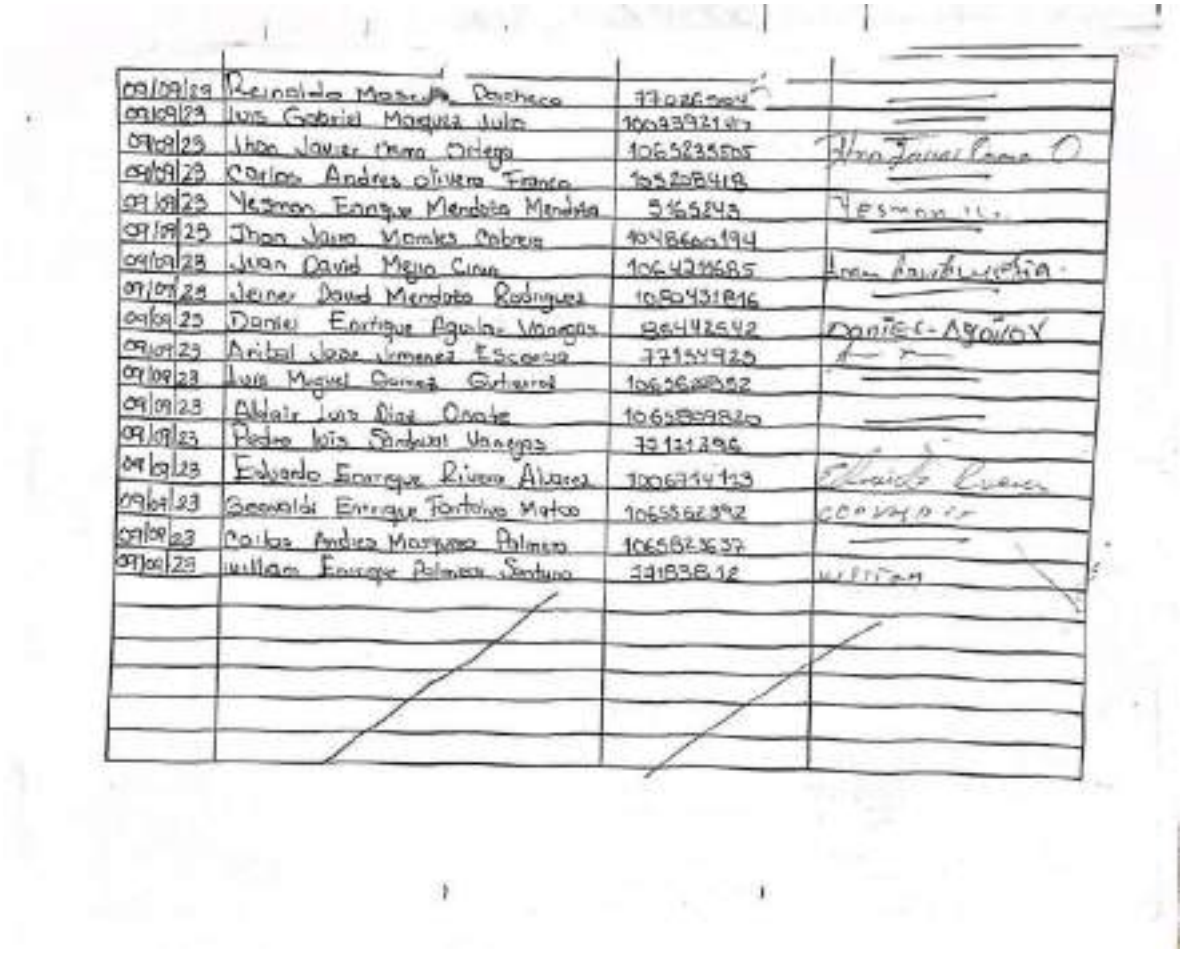

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09/09/23 | Reinaldo Manuel Pacheco | 77026204 | |
| 09/09/23 | Luis Gabriel Maquea Julio | 1069392183 | |
| 09/09/23 | Jhon Javier Cano Ortega | 1065835505 | |
| 09/09/23 | Carlos Andres Olivera Franco | 1065258418 | |
| 09/09/23 | Yesmon Enrique Mendoza Mendoza | 9165243 | |
| 09/09/23 | Jhon Jairo Montes Cabrera | 1048660194 | |
| 09/09/23 | Juan David Mejia Cano | 1064211685 | |
| 09/09/23 | Jeiner David Mendoza Rodriguez | 1080431816 | |
| 09/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Vanegas | 86442642 | |
| 09/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 77154925 | |
| 09/09/23 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1065628552 | |
| 09/09/23 | Alblair Luis Diaz Conde | 1065899820 | |
| 09/09/23 | Pedro Luis Sanchez Vanegas | 77131396 | |
| 09/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006714133 | |
| 09/09/23 | Gerardo Enrique Fontalvo Mateo | 1065562892 | |
| 09/09/23 | Carlos Andres Marquez Palmera | 1065823637 | |
| 09/09/23 | William Enrique Palmera Santana | 1911938.12 | |

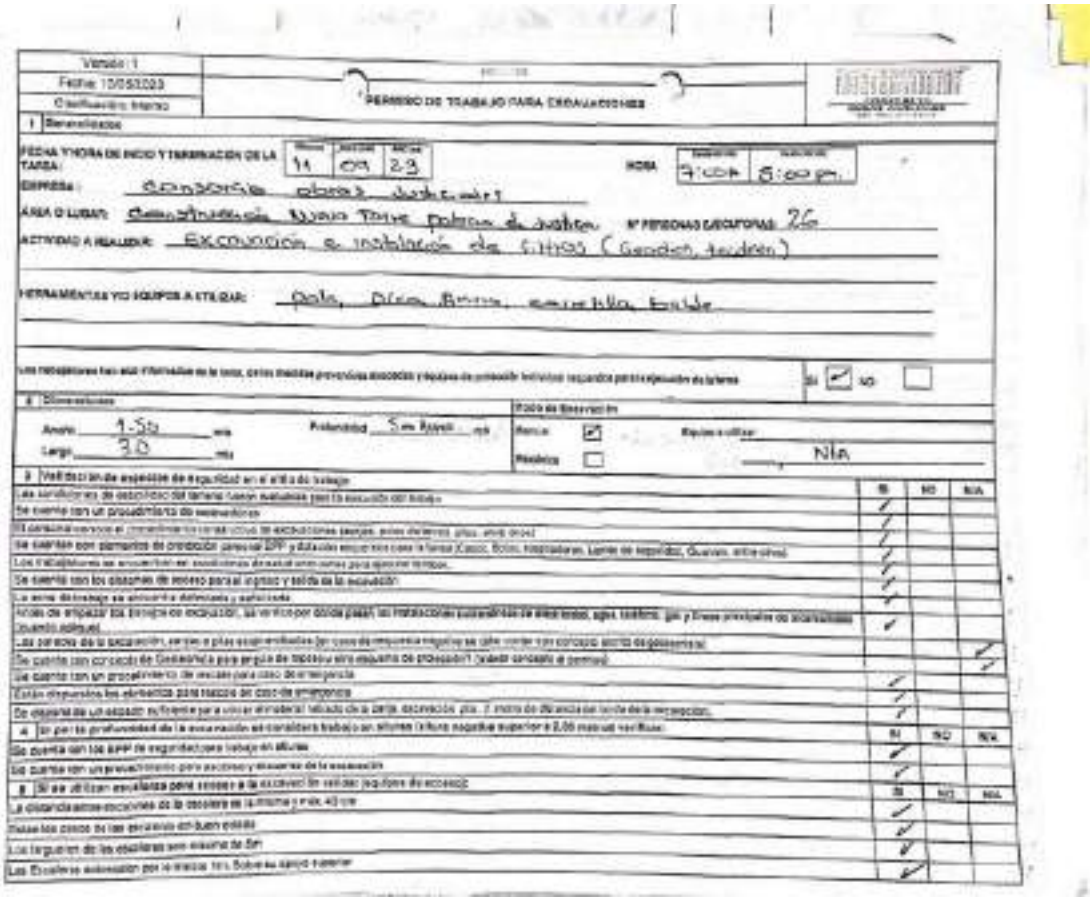

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACION DE LA TAREA: 11 09 23 HORA 7:00a 5:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

AREA O LUGAR: Construcción nuevo Tribunal Palacio de Justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de cimios (Cimientos)

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, martillo, Escalera

Los trabajadores han sido informados de los tipos, clases de excavación, métodos requeridos para la ejecución de labores Si ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho: 1.50 mts Profundidad: 5m Aprox mts

Largo: 30 mts


Tipo de Excavación: Manual ☑ Mecánica ☐ Equipo a utilizar: N/A


3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo

| | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | ✓ | | |
| El personal conoce el procedimiento de trabajo seguro de excavaciones (equipo, pasos de trabajo, entre otros) | ✓ | | |
| Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (casco, botas, impermeables, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros) | ✓ | | |
| Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud optimas para ejecutar la tarea | ✓ | | |
| Se cuenta con los elementos de acceso para el ingreso y salida de la excavación | ✓ | | |
| La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada | ✓ | | |
| Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de alta tensión, agua, teléfono, gas y líneas principales de acometidas (cuando aplique) | ✓ | | |
| Las personas de la excavación, vecinos o play ajenas a las actividades (en caso de requerirse) se cuenta con concepto escrito de autorización | | | ✓ |
| Se cuenta con concepto de Geotecnia para ángulo de reposo y/o sistema de protección? (cuando aplique el permiso) | | | ✓ |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia | ✓ | | |
| Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia | ✓ | | |
| De disponer de un equipo auxiliar para evacuar el material retirado de la parte excavación, por lo menos de distancia de borde de la excavación. | ✓ | | |
| 4 En que profundidad de la excavación se considera trabajo en altura (altura superior a 2,00 mts sobre nivel) | SI | NO | N/A |
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación | ✓ | | |
| 5 Si se utilizan escaleras para acceder a la excavación se cuenta con los siguientes requisitos de acceso: | SI | NO | N/A |
| La distancia entre escalones de la escalera es la misma y mide 40 cm | ✓ | | |
| Todos los peldaños de las escaleras se encuentran en buen estado | ✓ | | |
| Las longitudes de las escaleras son mayores de 5m | ✓ | | |
| Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre el nivel superior | ✓ | | |



| FECHA | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 11/09/23 | Oscar Eduardo Bustillo Echeverz | 1065657761 | |
| 11/09/23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1065842379 | |
| 11/09/23 | Juan Yesith Brito Zabaleta | 1193603158 | |
| 11/09/23 | Segundo Antonio Martinez Calderin | 1193612015 | |
| 11/09/23 | Juan Carlos Munoz Mendoza | 1063280838 | |
| 11/09/23 | Wilman Ignacio Coronado Silva | 77018769 | |
| 11/09/23 | Farid Alberto Vanstralen Vitalino | 1064502063 | |
| 11/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77086259 | |
| 11/09/23 | Cesar Luis Nuñez Arrieta | 1003876653 | |
| 11/09/23 | Jorge Usechue | 91525911 | |
| 11/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77155343 | |

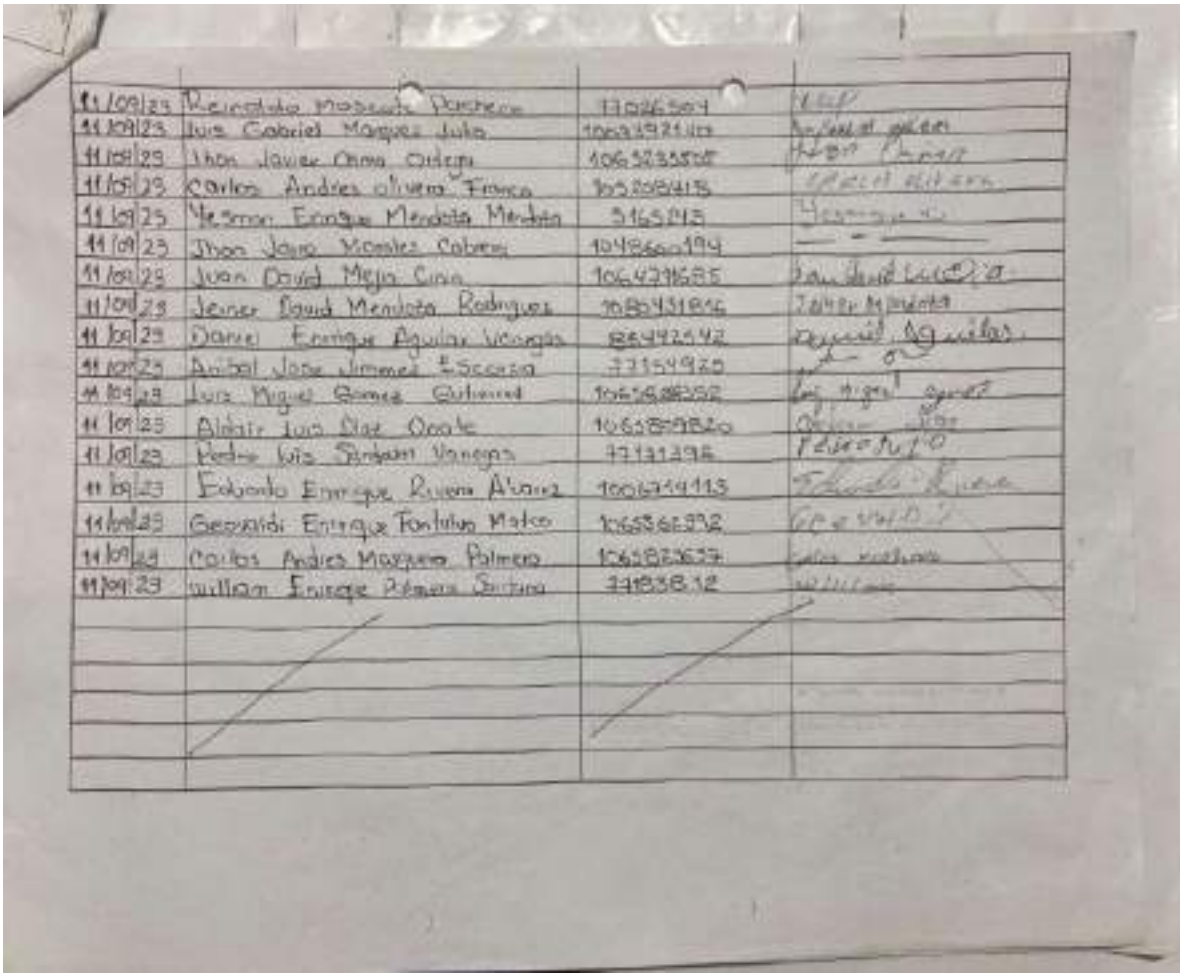

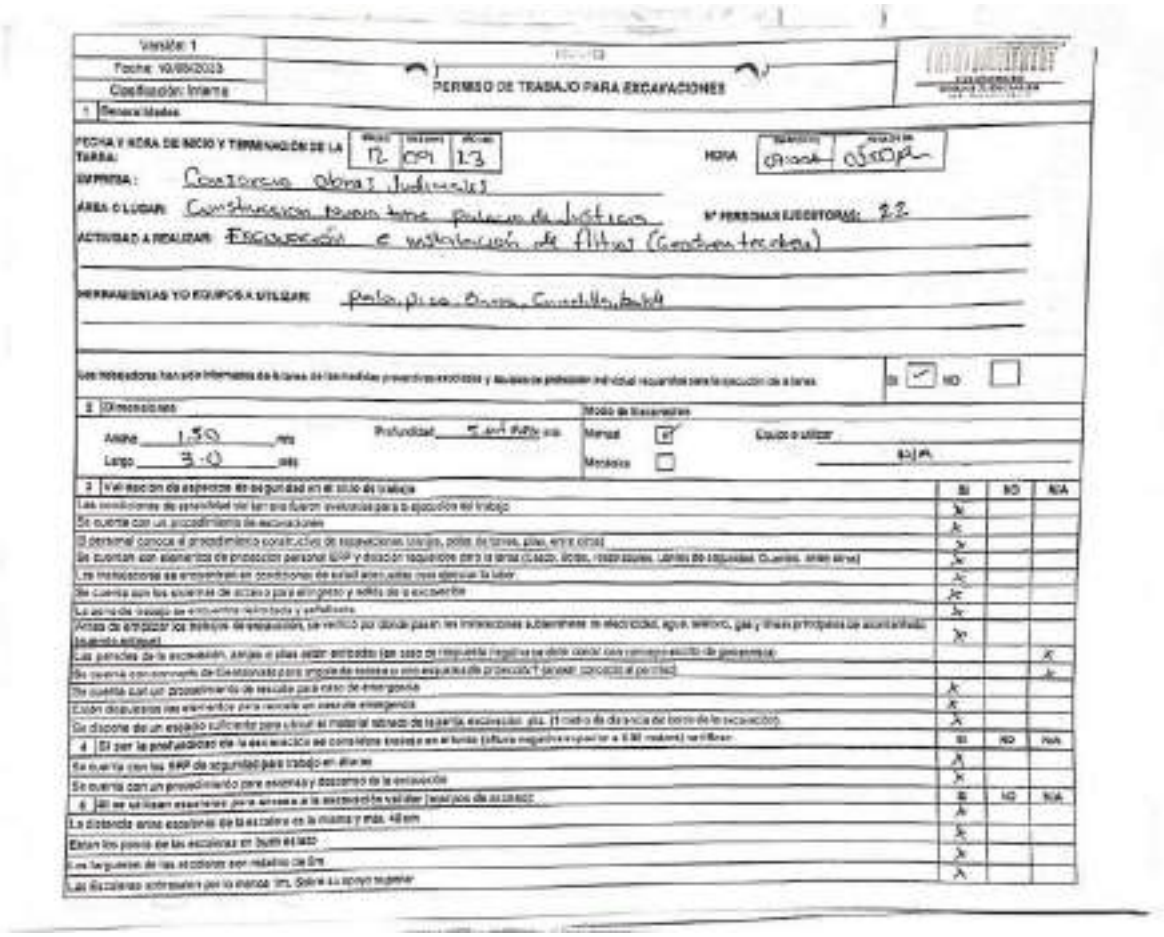

Versión: 1
Fecha: 10/08/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 12 / 09 / 23 — HORA: 07:00 a.m. — 05:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción torre tres Palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 22

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de filtros (Construcción)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pica, Barra, Canastilla, Badil

Los trabajadores han sido informados de todas las medidas preventivas existentes y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea — SI ☑ NO ☐


2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts — Profundidad 5 mts Máx mts


Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánica ☐ — Equipo a utilizar: N/A


| 3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | X | | |
| El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (cargas, pesos de tierras, pilas, entre otros) | X | | |
| Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y dotación requeridos para la tarea (casco, botas, respiradores, Gafas de seguridad, Guantes, arnés entre) | X | | |
| Las instalaciones se encuentran en condiciones de orden antes para ejecutar la labor | X | | |
| Se cuenta con las escaleras de acceso para el ingreso y salida de la excavación | X | | |
| La zona de trabajo se encuentra señalizada y señalizada | X | | |
| Antes de efectuar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de acueducto (cuando aplique) | X | | |
| Las paredes de la excavación, antes o días están entibadas (en caso de requerirlo según estudio de suelos) con personal escrito de ingeniería | | | X |
| Se cuenta con personal de Coordinador para ingreso de terreno o con espacios de profundidad (anexar copia al permiso) | | | X |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia | X | | |
| Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia | X | | |
| Se dispone de un espacio suficiente para dejar el material retirado de la parte excavación, ejs. (1 metro de distancia del borde de la excavación) | X | | |
| 4 El pan la profundidad de la excavación se considera riesgosa en el lugar (altura negativa superior a 0.80 metros) se deben: | SI | NO | N/A |
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento para entrada y descenso de la excavación | X | | |
| 5 Si se utilizan escaleras para acceder a la excavación valorar los siguientes ítems: | SI | NO | N/A |
| La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más. 40cm | X | | |
| Están los pasos de las escaleras en buen estado | X | | |
| Los largueros de las escaleras son rebasan de 0m | X | | |
| Las escaleras sobrepasan por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior | X | | |

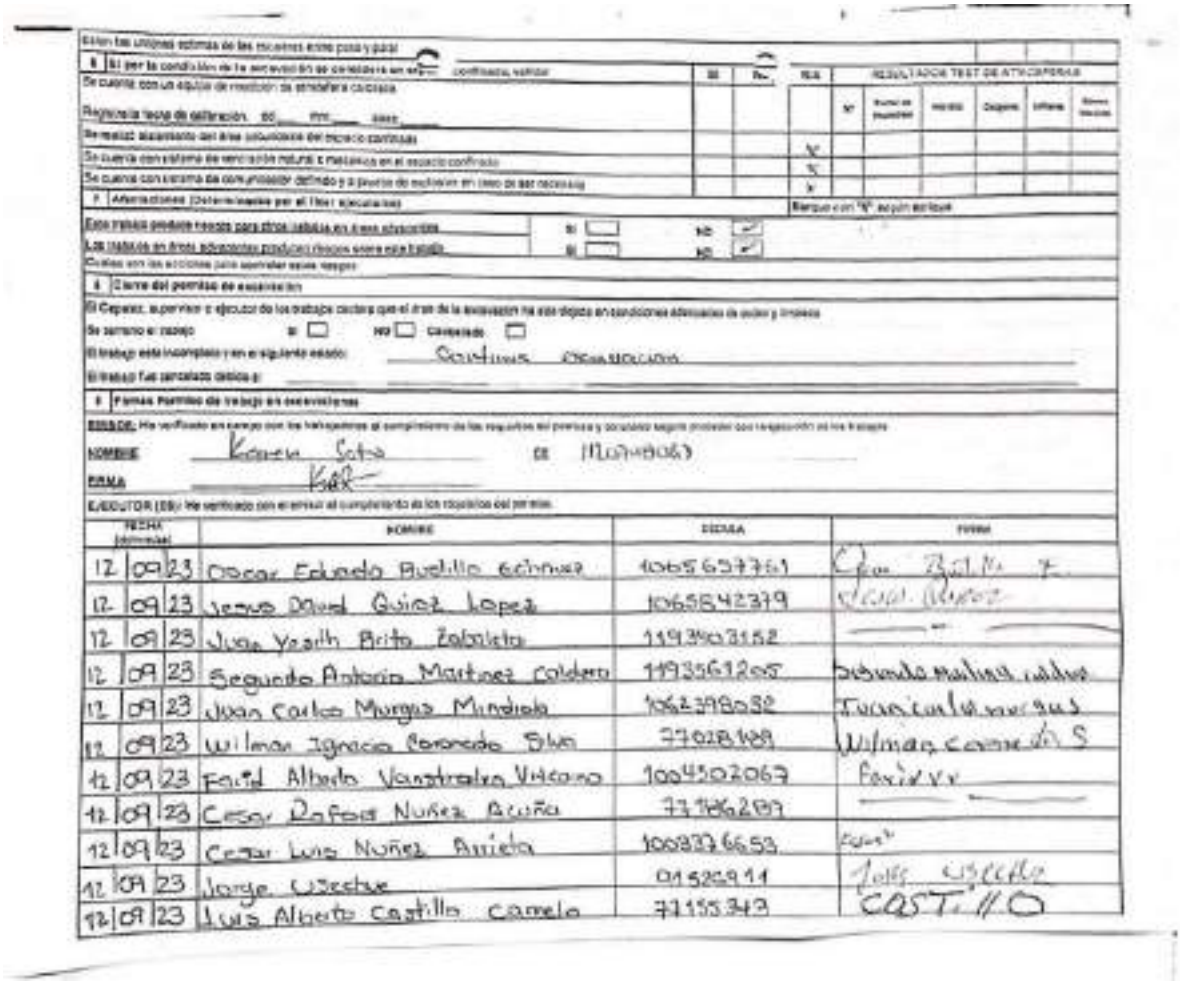

| FECHA (dd/mm/aa) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 12/09/23 | Oscar Eduardo Bustillo Echavez | 1065637761 | |
| 12/09/23 | Jesus David Guiez Lopez | 1065842379 | |
| 12/09/23 | Juan Yoaith Brito Zabaleta | 1193903152 | |
| 12/09/23 | Segundo Antonio Martinez Calderon | 1193561205 | |
| 12/09/23 | Juan Carlos Murgas Mendiola | 1062398032 | |
| 12/09/23 | Wilmar Ignacio Coronado Silva | 77018109 | |
| 12/09/23 | Farid Alberto Vanstralen Villarreal | 1004502067 | |
| 12/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77076289 | |
| 12/09/23 | Cesar Luis Nuñez Avilez | 1003776653 | |
| 12/09/23 | Jorge Ustche | 01525911 | |
| 12/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77155343 | |

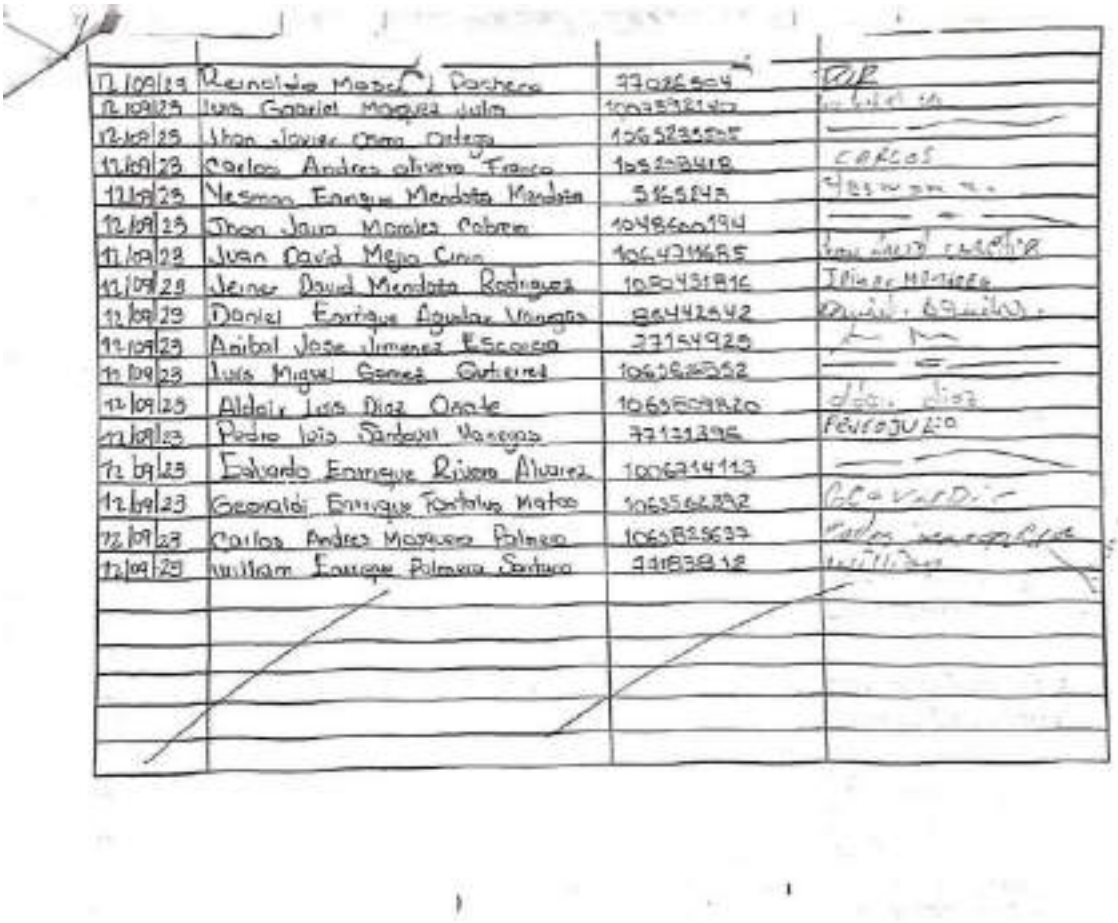

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12/09/23 | Reinaldo Manuel Pacheco | 77026504 | |
| 12/09/23 | Juan Gabriel Maquea Julio | 1065838143 | |
| 12/09/23 | Jhon Javier Otero Ortega | 1065235505 | |
| 12/09/23 | Carlos Andres olivera Franco | 1065078418 | CARLOS |
| 12/09/23 | Yesmar Enrique Mendoza Mendoza | 5165148 | |
| 12/09/23 | Jhon Jairo Morales Cabrera | 1048600194 | |
| 12/09/23 | Juan David Mejia Cano | 1064711655 | |
| 12/09/23 | Jeiner David Mendoza Rodriguez | 1064931816 | |
| 12/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Venegas | 86442642 | |
| 12/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 73154925 | |
| 12/09/23 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1065628552 | |
| 12/09/23 | Aldair Luis Diaz Conde | 1065809820 | |
| 12/09/23 | Pedro Luis Sanchez Venegas | 77131396 | |
| 12/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006214113 | |
| 12/09/23 | Geovaldi Enrique Fontalvo Mateo | 1065566392 | |
| 12/09/23 | Carlos Andres Manjarres Polanco | 1065825637 | |
| 12/09/23 | William Enrique Polanco Sanjuan | 91038918 | |

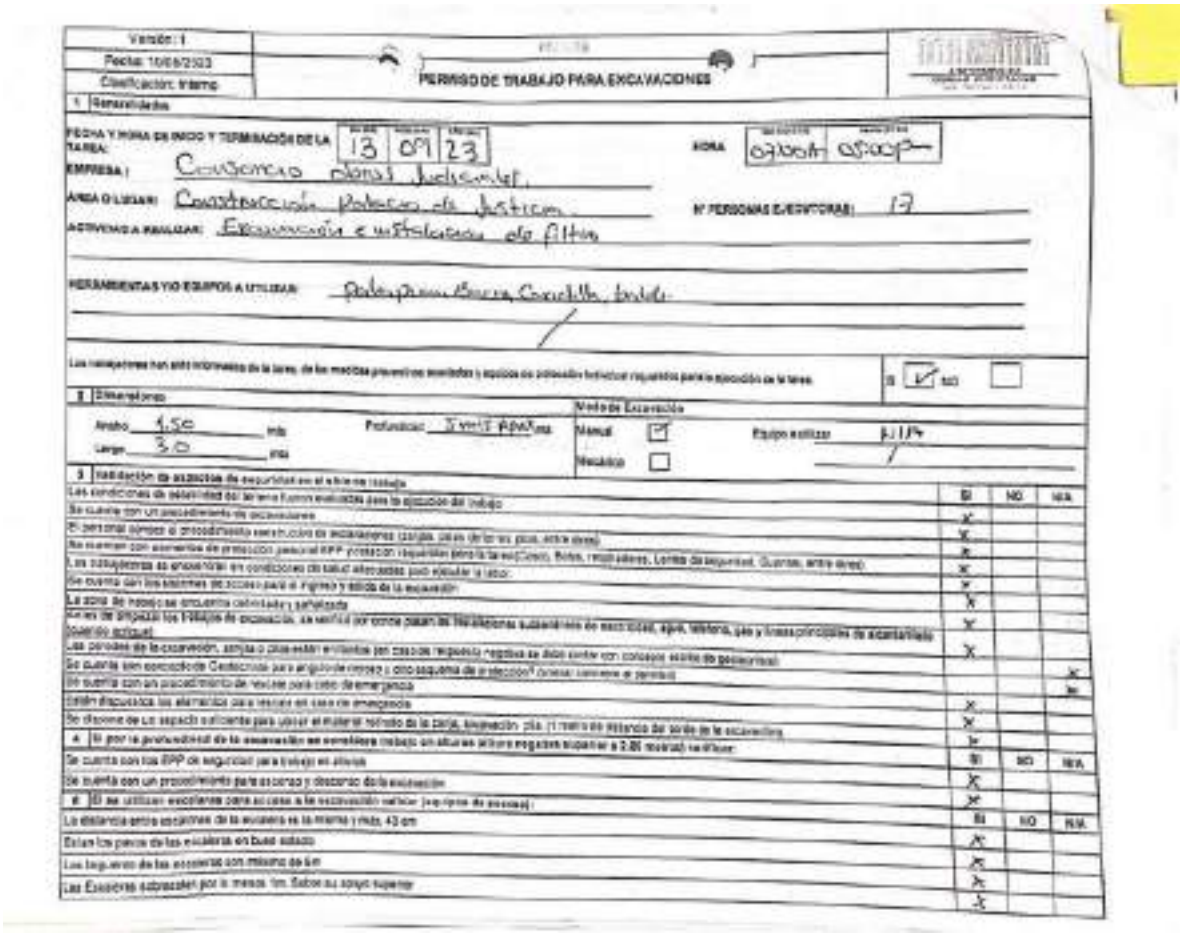

Versión: 1
Fecha: 10/09/2003
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1. Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 13 09 23 — HORA: 07:00 a.m. 05:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 12

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de filtros

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Retroexcavadora, Barra, Carretilla, Pala


Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y aquellas de actuación frente a las emergencias requeridas para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

2. Excavación

Ancho: 1.50 mts — Profundidad: 3 mts 6pulgadas — Tipo de Excavación: Manual ☑ Mecánica ☐ — Equipo a utilizar: N/A

3. Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo

| | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | X | | |
| El personal conoce el procedimiento para ejecución de excavaciones (cargas, clases de tipo de vías, entre otras) | X | | |
| Se cuenta con elementos de protección personal EPP (protección respiratoria para la excavación, Botas, Impermeables, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros) | X | | |
| Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor | X | | |
| Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación | X | | |
| La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada | X | | |
| Antes de iniciar los trabajos de excavación, se verifica por cortes pasos de instalaciones subterráneas de gas, agua, telefonía, gas y líneas principales de acantarillado (cuando aplique) | X | | |
| Las paredes de la excavación, zanjas o pozos están entibadas (en caso de requerirlo) o cortadas de tal forma que cuenta con concepto escrito de geotecnista) | | | X |
| Se cuenta con escalera de Gestionada para ángulo de corte y otro esquema de protección? (cuales cuentan y tamaño) | | | X |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia | X | | |
| Están dispuestas las alarmas para rescate en caso de emergencia | X | | |
| Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila (1 metro de distancia del borde de la excavación) | X | | |
| 4. Si por la profundidad de la excavación se requiere trabajo en alturas (altura mayores superior a 2.00 mts/mts) verificar: | | | |
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | SI | NO | N/A |
| Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación | X | | |
| 5. Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación señalar (requisitos de acceso): | X | | |
| La distancia entre escalones de la escalera es la misma y mide 43 cm | SI | NO | N/A |
| Están los pies de las escaleras en buen estado | X | | |
| Los largueros de las escaleras son mínimo de 6m | X | | |
| Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m sobre su apoyo superior | X | | |
| | X | | |

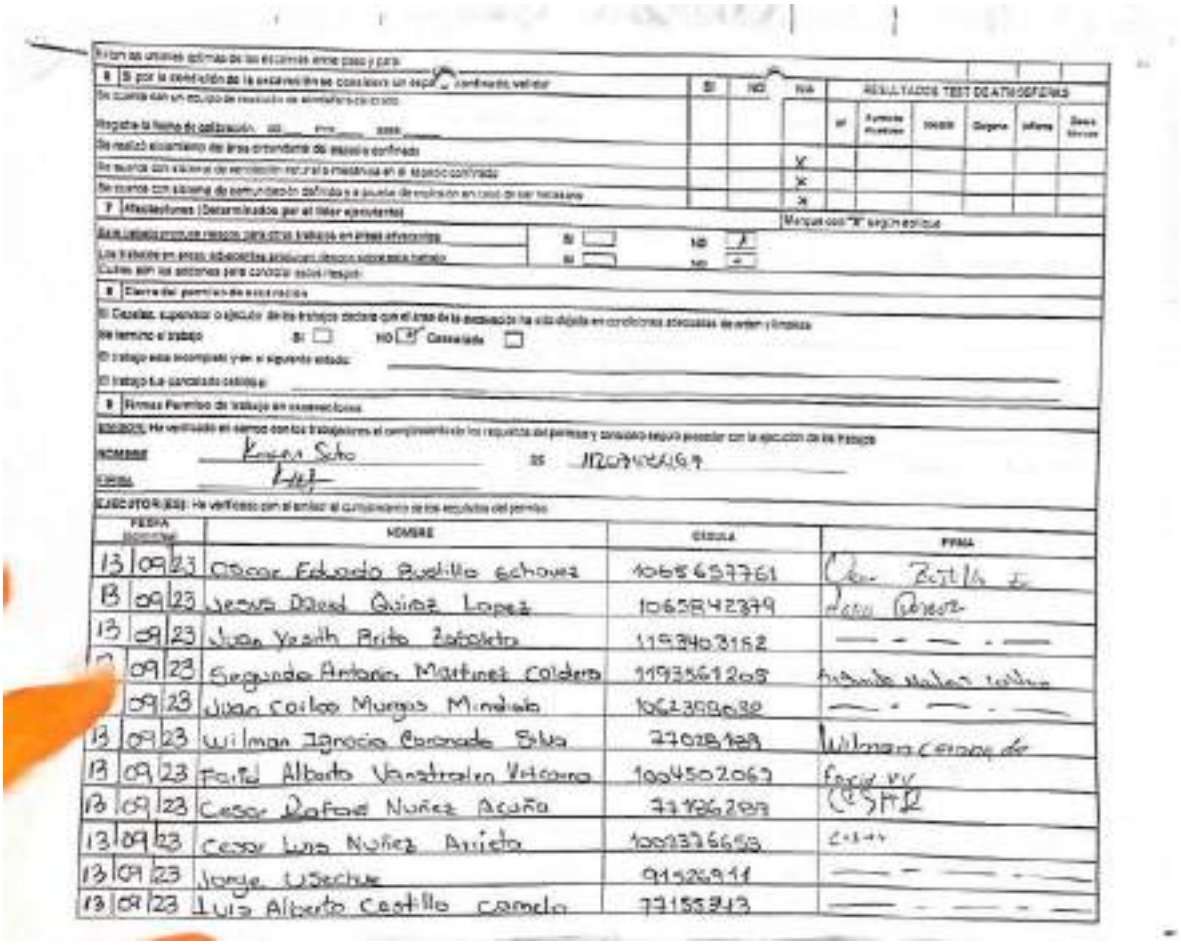


| FECHA | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 13/09/23 | Oscar Eduardo Portillo Echaves | 1068657761 | |
| 13/09/23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1065842379 | |
| 13/09/23 | Juan Yesith Brito Zapateta | 1193403162 | |
| 13/09/23 | Segundo Antonio Martinez Caldera | 1193561208 | |
| 13/09/23 | Juan Carlos Murgas Mendoza | 1062300630 | |
| 13/09/23 | Wilman Ignacio Coronado Silva | 72028188 | |
| 13/09/23 | Farid Alberto Vanstralen Velasco | 1004502067 | |
| 13/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77196203 | |
| 13/09/23 | Cesar Luis Nuñez Arrieta | 1003376658 | |
| 13/09/23 | Jorge Ustche | 91526911 | |
| 13/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 72155343 | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 01/09/23 | Reinaldo Marquez Pacheco | 77026504 | |
| 01/09/23 | Luis Gabriel Marquez Julio | 1003931412 | |
| 01/09/23 | Jhon Javier Osma Ortega | 1065235595 | |
| 01/09/23 | Carlos Andres Oliveros Franco | 1143208418 | |
| 01/09/23 | Yesman Enrique Mendoza Mendoza | 3165243 | |
| 01/09/23 | Jhon Jairo Morales Cabrera | 1048600194 | |
| 01/09/23 | Juan David Mejia Cian | 1064211685 | |
| 01/09/23 | Jeiner David Mendoza Rodriguez | 1080431816 | |
| 01/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Vanegas | 86443542 | |
| 01/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 77154929 | |
| 01/09/23 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1065628852 | |
| 01/09/23 | Alcides Luis Diaz Conde | 1065809820 | |
| 01/09/23 | Pedro Luis Sandoval Vanegas | 72131396 | |
| 01/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006214113 | |
| 01/09/23 | Geovanni Enrique Fontalvo Mateo | 1065562392 | |
| 01/09/23 | Carlos Andres Marquez Palmera | 1065829637 | |
| 01/09/23 | William Enrique Palmera Santana | 77183812 | |
| 0 | | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 12/09/23 | Reinaldo Miguel Pacheco | 92045504 | |
| 13/09/23 | Juan Gabriel Marquez Avila | 1003393140 | |
| 13/09/23 | Libardo Javier Cano Ortega | 1065235505 | |
| 13/09/23 | Carlos Andres Olivera Franco | 1052084118 | |
| 13/09/23 | Nelson Enrique Mendoza Mendoza | 5165845 | |
| 13/09/23 | Jhon Jairo Montes Cabrera | 1048600194 | |
| 13/09/23 | Juan David Mejia Cano | 1064211685 | |
| 13/09/23 | Jeiner David Mendoza Rodriguez | 1052431816 | |
| 13/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Vanegas | 85447542 | |
| 13/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 77154925 | |
| 13/09/23 | Luis Miguel Correa Gutierrez | 1065868032 | |
| 13/09/23 | Aldair Luis Diaz Conde | 1065808820 | |
| 13/09/23 | Pedro Luis Sandoval Vanegas | 73131396 | |
| 13/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006214113 | |
| 13/09/23 | Gerardo Enrique Fontalvo Matos | 1065562392 | |
| 13/09/23 | Carlos Andres Mosquera Palmera | 1065825637 | |
| 13/09/23 | William Enrique Palmera Santana | 73158812 | |

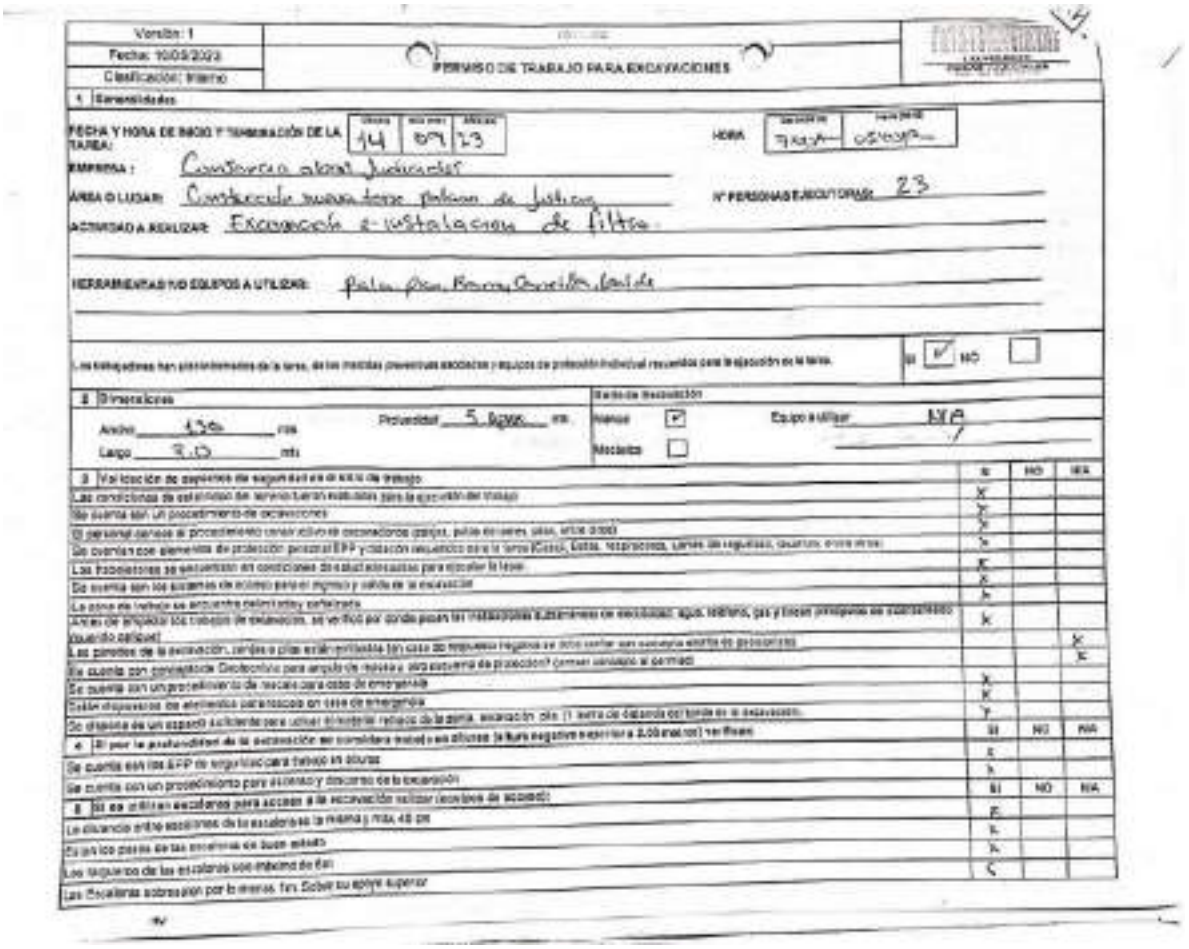

Versión: 1
Fecha: 10/03/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 14 / 07 / 23 — HORA: 7:30 a.m. — 05:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción nueva torre palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 23

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de filtro.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pica, Barra, Carretilla, Martillo


Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [✓] NO [ ]

2 Dimensiones


Ancho: 1.50 mts — Profundidad: 5 Apox mts — Largo: 9.10 mts

Medio de excavación: Manual [✓] Mecánico [ ] — Equipo a utilizar: N/A


| 3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | X | | |
| El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (pasos, pulso de suelos, usos, entre otros) | X | | |
| Se cuenta con elementos de protección personal EPP y colectivo requeridos para la tarea (Cascos, botas, respiradores, gafas de seguridad, guantes, entre otros) | X | | |
| Las instalaciones se encuentran en condiciones de estabilidad seguras para ejecutar la tarea | X | | |
| Se cuenta con los accesos de acceso para el ingreso y salida de la excavación | X | | |
| La zona de trabajo se encuentra debidamente señalizada | X | | |
| Antes de iniciar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y demás presentes en subterráneo (cuando aplique) | X | | |
| Las paredes de la excavación, cercas o pilas están protegidas (en caso de requerir registro se debe contar con autorización escrita de propietario) | | | X |
| Se cuenta con cerramiento Definitivo para ampliación de vecinos y otra externa de protección? (cerrar vecinos al cerrado) | | | X |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia | X | | |
| Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia | Y | | |
| Se dispone de un espantó suficiente para cubrir el material retirado de la pared excavación (de 1 metro de espanto por cada 1m de excavación) | SI | NO | NA |
| 4 El por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 mts) se debe: | X | | |
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento para ataques y descenso de la excavación | SI | NO | NA |
| 5 Si se utilizan escaleras para acceder a la excavación indicar (escalera de acceso): | X | | |
| La distancia entre escalones de la escalera es la misma y mide 40 cm | X | | |
| Si son los pasos de las escaleras en buen estado | X | | |
| Los largueros de las escaleras son mayores de 6m | X | | |
| Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior | X | | |

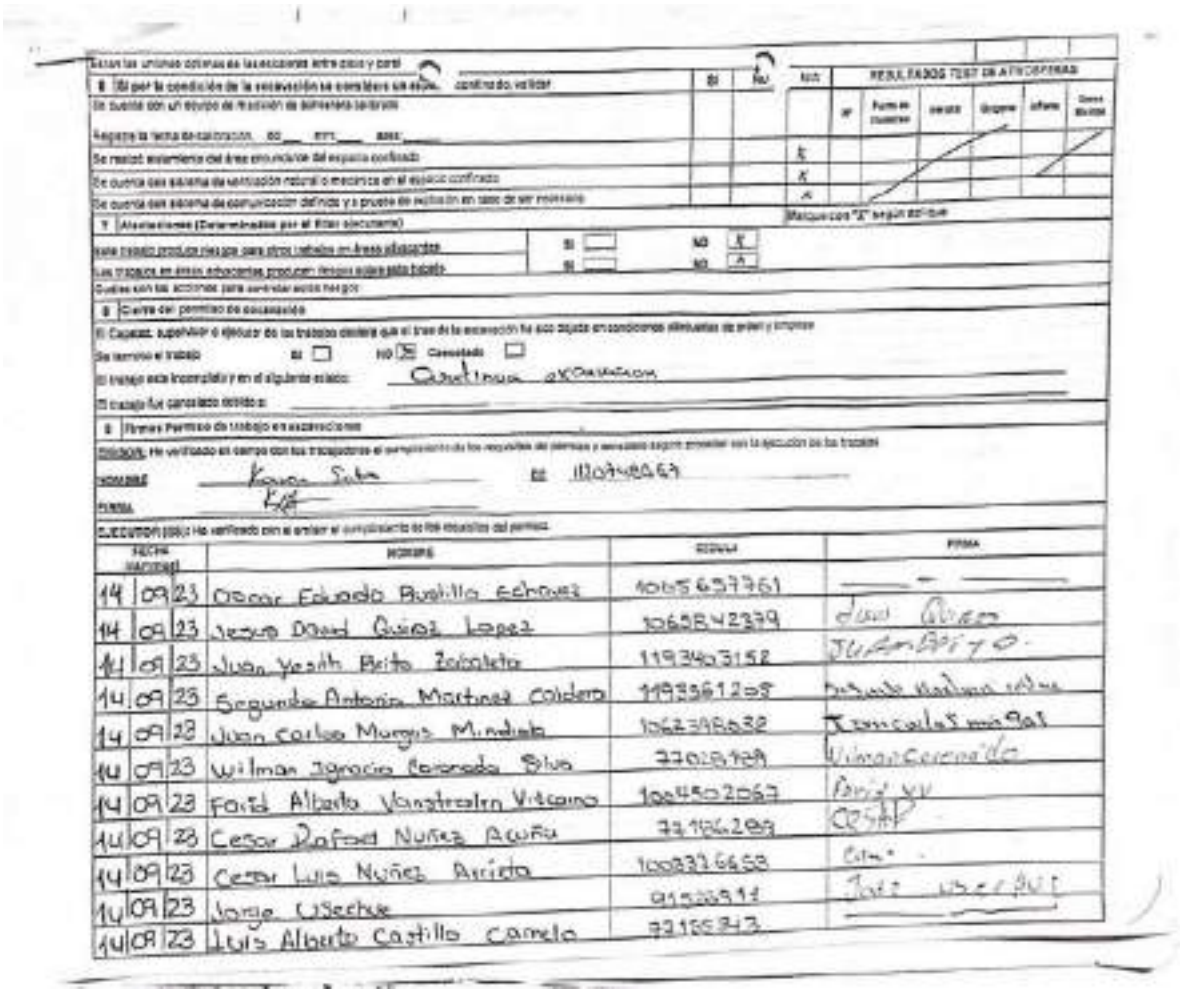

| FECHA (dd/mm/aa) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 14 09 23 | Oscar Eduardo Bustillo Echenes | 1065657761 | |
| 14 09 23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1068842379 | |
| 14 09 23 | Juan Yesith Brito Zabaleta | 1193403152 | |
| 14 09 23 | Segundo Antonio Martinez Caldera | 1193561295 | |
| 14 09 23 | Juan Carlos Murgas Mendiola | 1062388632 | |
| 14 09 23 | Wilman Ignacio Coronado Silva | 72018709 | |
| 14 09 23 | Farid Alberto Vanstralen Vitcino | 1064502067 | |
| 14 09 23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 72196209 | |
| 14 09 23 | Cesar Luis Nuñez Arrieta | 1003326658 | |
| 14 09 23 | Jorge Usechue | 91530991 | |
| 14 09 23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 72196943 | |

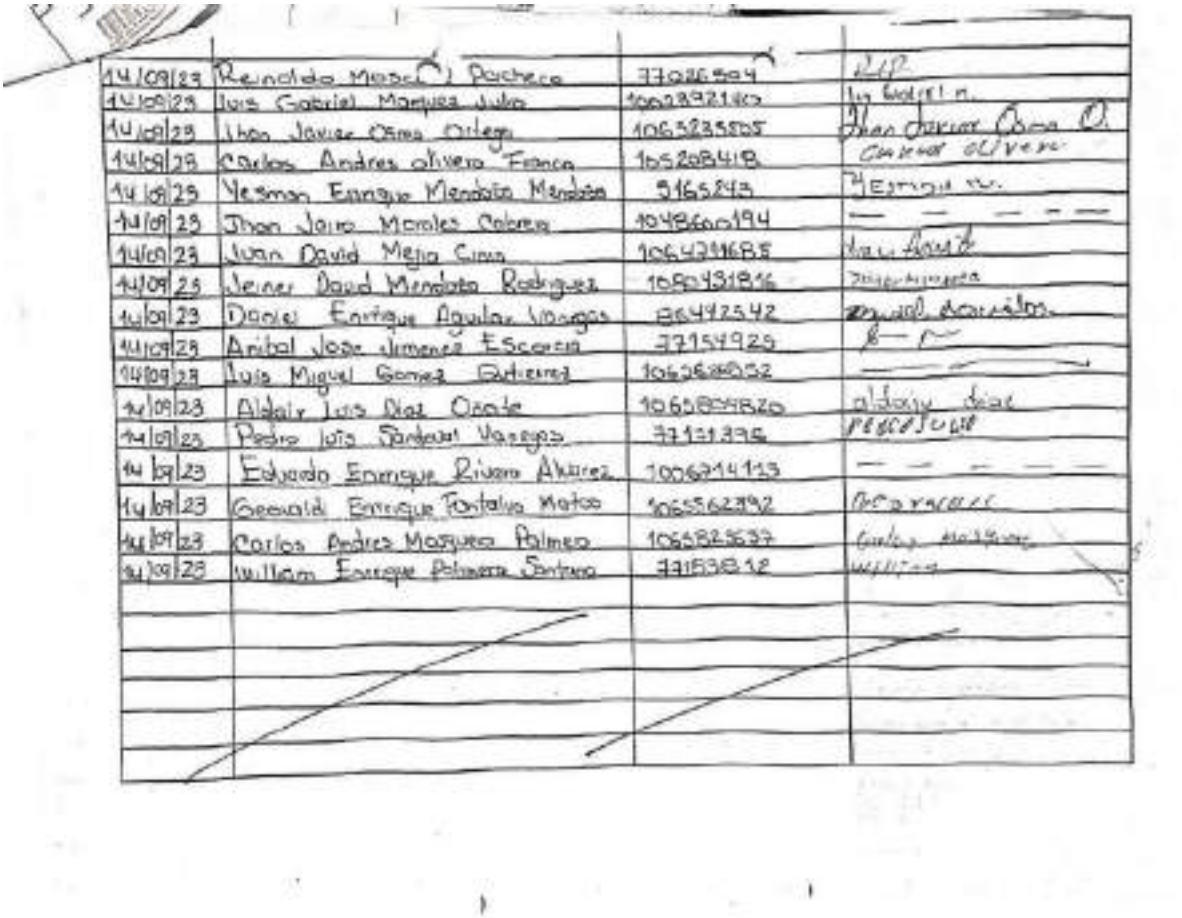

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14/09/23 | Reinaldo Miguel Pacheco | 77026504 | |
| 14/09/23 | Luis Gabriel Marquez Julio | 1065892163 | |
| 14/09/23 | Juan Javier Obra Ortega | 1065235805 | |
| 14/09/23 | Carlos Andres Olivera Franco | 1052084118 | |
| 14/09/23 | Yesman Enrique Mendoza Mendoza | 5165243 | |
| 14/09/23 | Jhon Jairo Morales Cabrera | 1048600194 | |
| 14/09/23 | Juan David Mejia Cuna | 1064711685 | |
| 14/09/23 | Jeiner David Mendoza Rodriguez | 1050431816 | |
| 14/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Vanegas | 86492542 | |
| 14/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 77154929 | |
| 14/09/23 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1065628032 | |
| 14/09/23 | Aldair Luis Diaz Conde | 1065854820 | |
| 14/09/23 | Pedro Luis Sanjuan Vanegas | 77131396 | |
| 14/09/23 | Eduardo Enrique Rivero Alvarez | 1006914113 | |
| 14/09/23 | Geovanis Enrique Fontalvo Matos | 1065562892 | |
| 14/09/23 | Carlos Andres Mosquera Palmera | 1065865637 | |
| 14/09/23 | William Enrique Polanco Santana | 77158312 | |

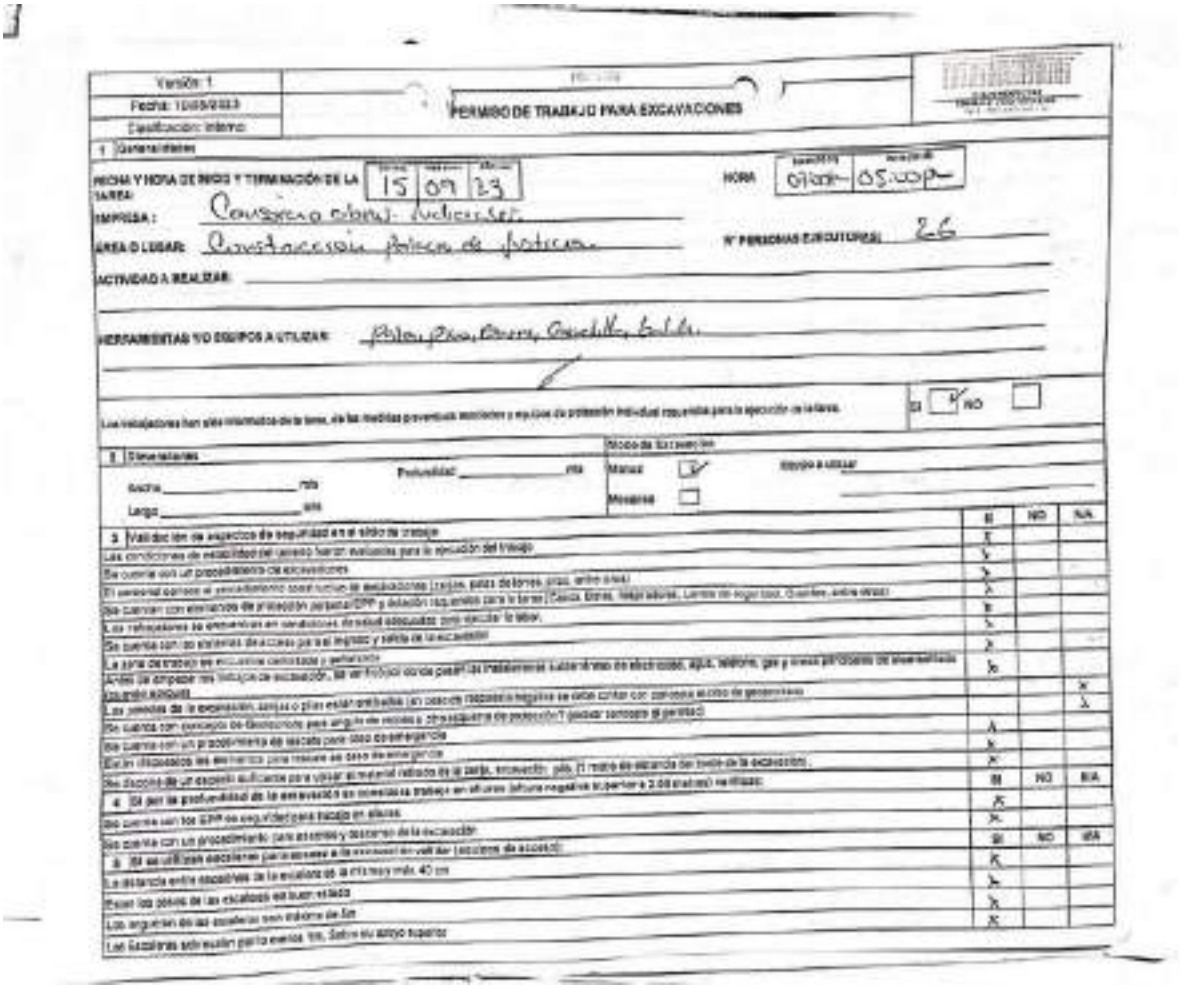

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 15 09 23 HORA 07:00 - 05:00

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

AREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia

N° PERSONAS EJECUTORES: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR:

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Palas, Picas, Barras, Canastilla, Escalera

Las instalaciones han sido informadas de la tarea, de las medidas preventivas, correctivas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI X NO

1 Generalidades


Modo de Excavación: Manual X Mecánica

Ancho _____ mts Profundidad _____ mts Largo _____ mts


| 2 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | X | | |
| El personal conoce el procedimiento seguro de excavaciones (zanjas, pozos de torres, pozos, entre otros) | X | | |
| Se cuenta con elementos de protección personal/EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, Guantes, Gafas, Ropa de trabajo, Overoles, entre otros) | X | | |
| Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor. | X | | |
| Se cuenta con los sistemas de acceso y salida de la excavación | X | | |
| La zona de trabajo se encuentra señalizada y aislada | X | | |
| Antes de empezar la jornada de excavación, se verificará con los prestadores de servicios públicos la presencia de redes eléctricas, agua, teléfono, gas y otros prestadores de servicios públicos | | | X |
| Los niveles de la excavación zanjas o pilas están protegidos (en caso de requerirse negativo se debe contar con concepto técnico de geotecnia) | | | X |
| Se cuenta con personal de Gestionistas para ángulo de reposo o cimentación de protección? (pedir concepto al geotec) | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para una emergencia | X | | |
| En los trabajos en altura para retirar se tiene un plan de emergencia | X | | |
| Se dispone de un espacio suficiente para volcar el material retirado de la zanja, excavación, pila, (1 metro de distancia del borde de la excavación) | X | | |

| 4 Si por la profundidad de la excavación se requieren trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar: | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación | X | | |

| 5 Si se utilizan escaleras para ascenso a la excavación en vez de rampas (escalera de acceso): | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| La distancia entre escalones de la escalera es de máximo más 40 cm | X | | |
| Estan los pasos de las escaleras en buen estado | X | | |
| Los angulos de las escaleras son inferior de 5H | X | | |
| Las escaleras sobresalen parte superior 1m, Sobre su apoyo superior | X | | |

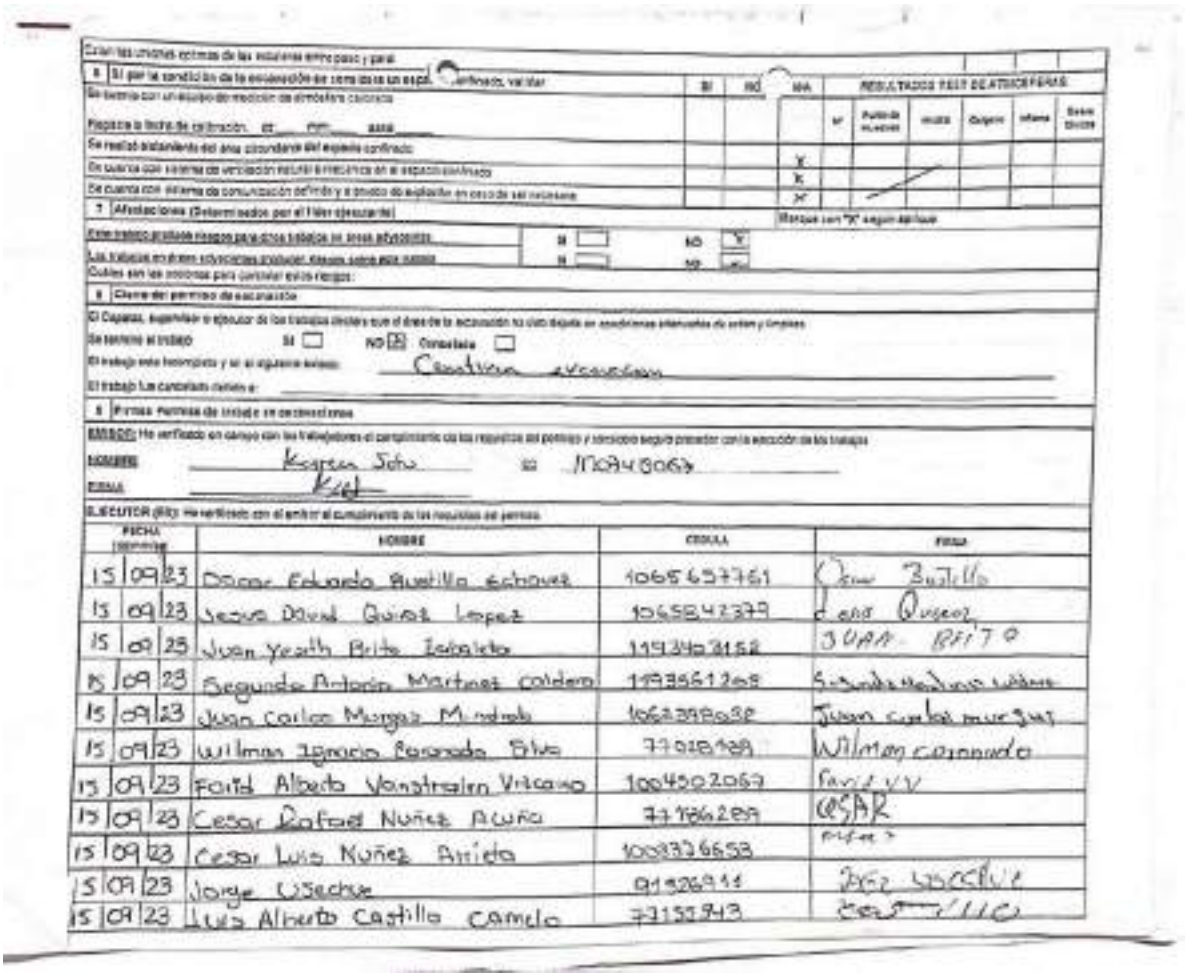

| FECHA | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 15/09/23 | Oscar Eduardo Bustillo echaves | 1065657761 | |
| 15/09/23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1065842379 | |
| 15/09/23 | Juan Yesith Brito Iglesias | 1193403168 | |
| 15/09/23 | Segundo Antonio Martinez caldera | 1193961208 | |
| 15/09/23 | Juan Carlos Murgas Montero | 1062398038 | |
| 15/09/23 | Wilman Ignacio Coronado Silva | 77018188 | |
| 15/09/23 | Farid Alberto Vanstralen Vitcano | 1064502063 | |
| 15/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77186209 | |
| 15/09/23 | Cesar Luis Nuñez Arrieta | 1003326653 | |
| 15/09/23 | Jorge Usecha | 91926911 | |
| 15/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77155943 | |

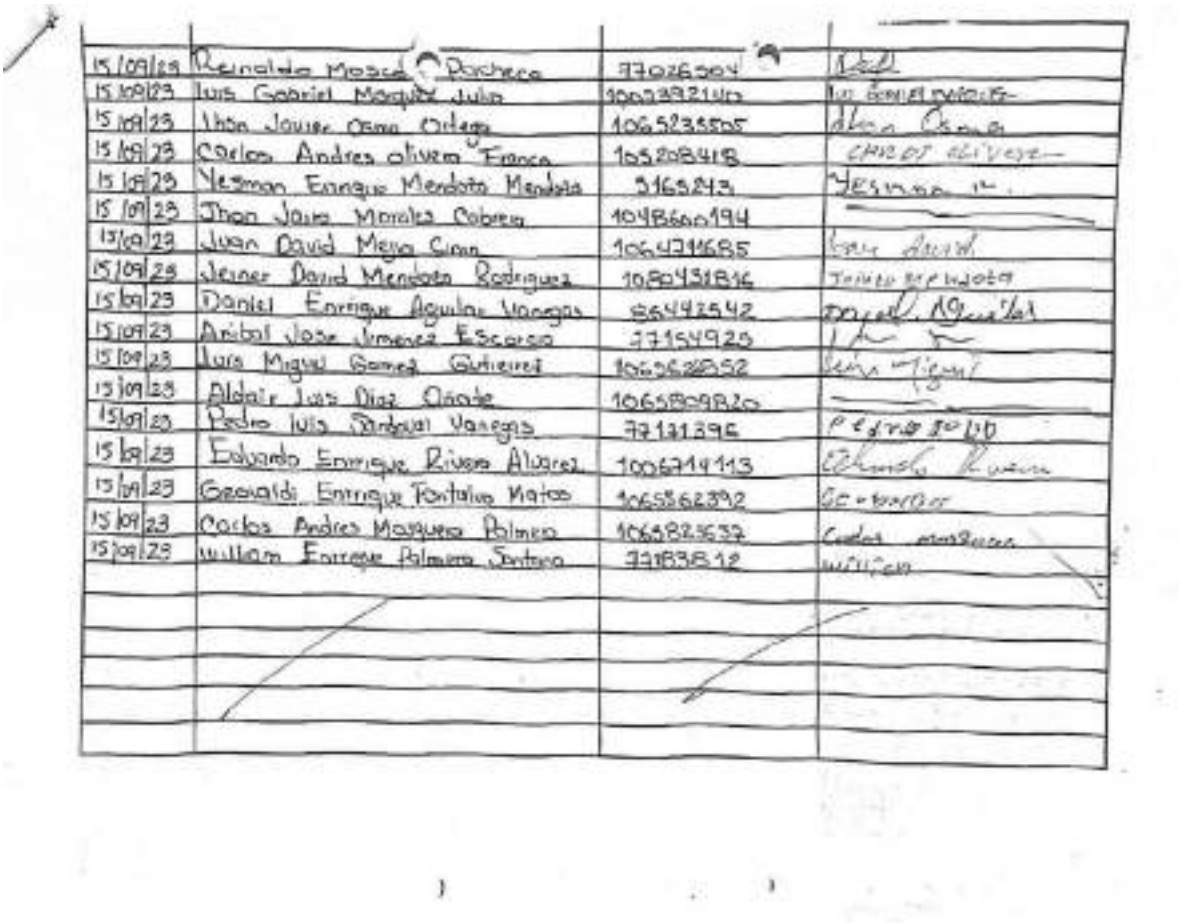

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15/09/23 | Reinaldo Mesa Pacheco | 77026304 | |
| 15/09/23 | Luis Gabriel Marquez Julio | 1002392102 | |
| 15/09/23 | Jhon Jairo Osma Ortega | 1065235505 | |
| 15/09/23 | Carlos Andres oliveros Franco | 1052088418 | |
| 15/09/23 | Yesman Enrique Mendoza Mendoza | 3165243 | |
| 15/09/23 | Jhon Jairo Morales Cabrera | 1048660194 | |
| 15/09/23 | Juan David Mejia Simanca | 1064711685 | |
| 15/09/23 | Jesner David Mendoza Rodriguez | 1080431816 | |
| 15/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Vanegas | 85443542 | |
| 15/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 77154925 | |
| 15/09/23 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1065628952 | |
| 15/09/23 | Aldair Luis Diaz Conde | 1065809820 | |
| 15/09/23 | Pedro Luis Bonivel Vanegas | 77131395 | |
| 15/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006714113 | |
| 15/09/23 | Gerardo Enrique Fontalvo Matos | 1065562392 | |
| 15/09/23 | Carlos Andres Mayguera Palmera | 1065825637 | |
| 15/09/23 | William Enrique Palmera Santana | 77189812 | |



Versión: 1
Fecha: 10/09/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1. Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 16 / 09 / 23 — HORA: 07:00 a.m. – 05:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de filtro

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Balde.


Las indicaciones han sido informadas de la tarea, de las medidas preventivas necesarias y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea: SI [✓] NO [ ]

2. Dimensiones

Ancho: 1.50 m — Profundidad: 3.0 m — Largo: 2.0 m

Modo de Excavación: Manual [✓] Mecánica [ ] — Equipo a utilizar: N/A


| 3. Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de apariencia del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | X | | |
| El personal cuenta el procedimiento constructivo de excavaciones (cercas, zonas de tránsito, pisos, entre otras) | X | | |
| Se cuenta con elementos de protección personal EPP y colectiva requeridos para la tarea (Cascos, Botas, reflectivos, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros) | X | | |
| Las instalaciones se encuentran en condiciones de seguridad adecuadas para ejecutar la tarea | X | | |
| Se cuenta con la señales de tránsito para el ingreso y salida de la excavación | X | | |
| La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada | X | | |
| Antes de ejecutar las labores de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, alcantarillado, gas y líneas principales de acueducto (marcar) | X | | |
| Las cercas de la excavación, zanjas o pilas están anchadas sin caída de resortes o negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista | | | X |
| Se cuenta con cerramiento de Seguridad para ángulo de retiros y otro esquema de protección (proveer señalización peatonal) | | | X |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia | X | | |
| Contar disponible los elementos para rescate en caso de emergencia | X | | |
| Se dispone de un equipo suficiente para colocar a material excavado a una distancia de borde excavación, pila (1 metro de distancia del borde de la excavación) | X | | |
| 4. Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 1.50 metros) verificar: | SI | NO | N/A |
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación | X | | |
| 5. Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación indicar (opciones de acceso): | SI | NO | N/A |
| La escalera sobre sobresale de la excavación de manera mín. 40 cm | X | | |
| Están los pasos de las escaleras en buen estado | X | | |
| Los peldaños de las escaleras son máximo de 3m | X | | |
| Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior | X | | |

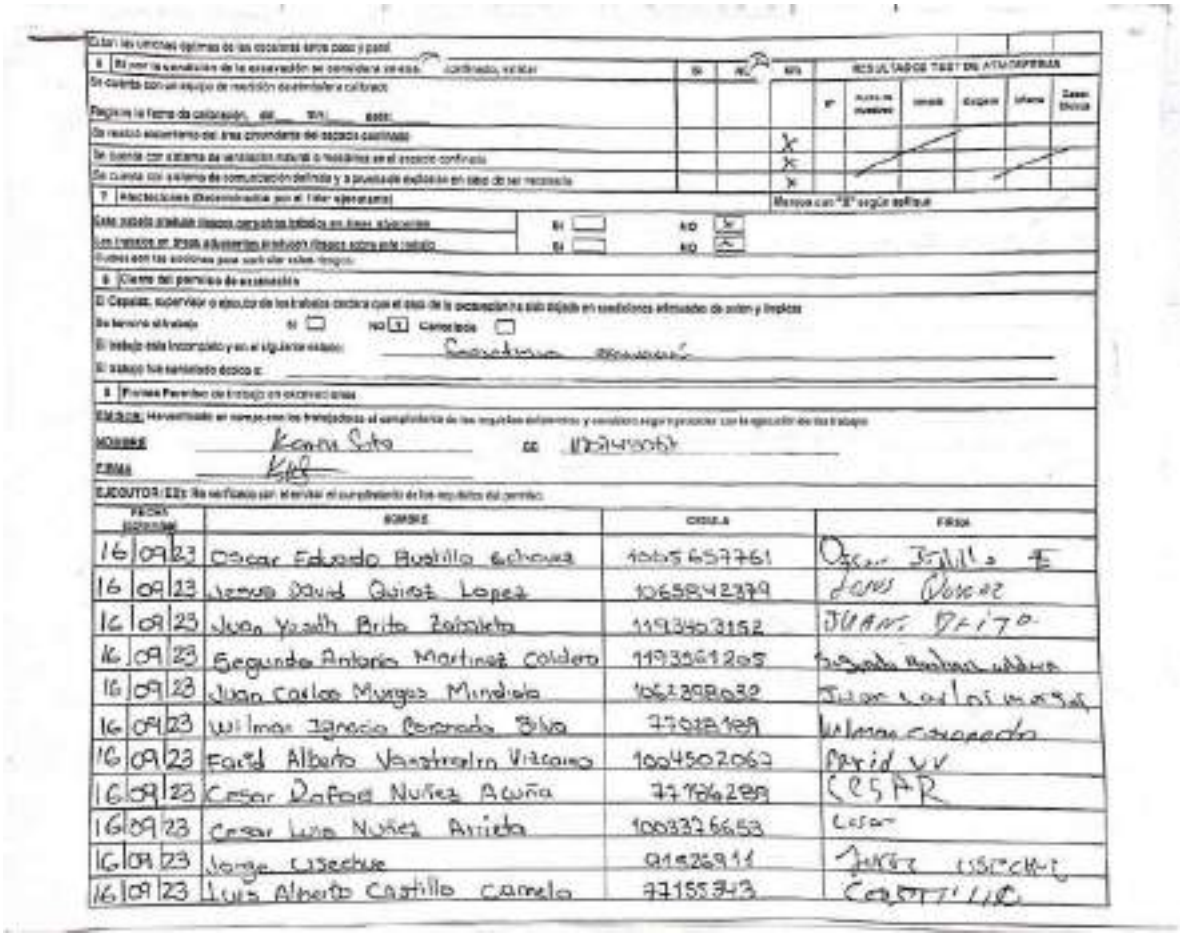

| FECHA | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 16/09/23 | Cesar Eduardo Bustillo Echeverria | 1065657761 | |
| 16/09/23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1065842379 | |
| 16/09/23 | Juan Yoseth Brito Zalabata | 1193453152 | |
| 16/09/23 | Segundo Antonio Martinez Calderon | 1193561205 | |
| 16/09/23 | Juan Carlos Murgas Mendiola | 1061398032 | |
| 16/09/23 | Wilmar Ignacio Coronado Silva | 73128169 | |
| 16/09/23 | Farid Alberto Vanstralen Vizcaino | 1004502062 | |
| 16/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77196289 | |
| 16/09/23 | Cesar Luis Nuñez Arrieta | 1003326653 | |
| 16/09/23 | Jorge Escobar | 91526911 | |
| 16/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77155343 | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/09/23 | Reynaldo Manuel Pacheco | 77026504 | |
| 16/09/23 | Juan Gabriel Maques Julio | 1003397403 | |
| 16/09/23 | Jhon Javier Cama Ortega | 1065235505 | |
| 16/09/23 | Carlos Andres Olivera Tirado | 1065088418 | |
| 16/09/23 | Yesmen Enrique Mendoza Medina | 3663243 | |
| 16/09/23 | Jhon Jairo Morales Cabeza | 1049660194 | |
| 16/09/23 | Juan David Mejia Cuan | 1064711685 | |
| 16/09/23 | Jeiner David Mendoza Rodriguez | 1080131836 | |
| 16/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Vanegas | 86442542 | |
| 16/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 73154925 | |
| 16/09/23 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1065588362 | |
| 16/09/23 | Aldair Luis Diaz Conde | 1065509820 | |
| 16/09/23 | Pedro Luis Sandoval Vanegas | 73131396 | |
| 16/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006714113 | |
| 16/09/23 | Oswaldi Enrique Fontalvo Mateo | 1065662382 | |
| 16/09/23 | Carlos Andres Marquez Palmera | 1065833637 | |
| 16/09/23 | William Enrique Palmera Santana | 73183818 | |

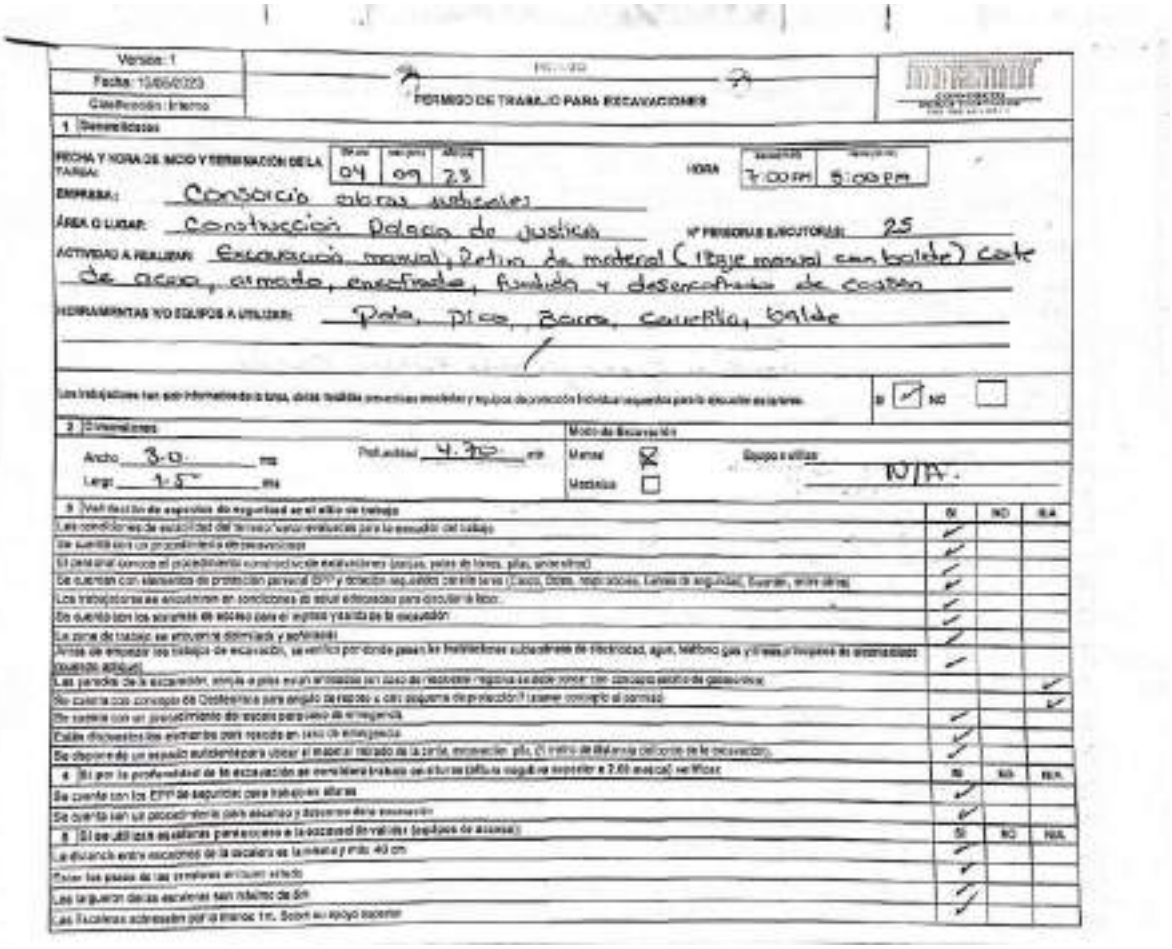

Versión: 1
Fecha: 12/06/2020
Clasificación: Interno

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 04 09 23 HORA 7:00 PM 5:00 PM

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual, Retiro de material (Traje manual con balde) corte de acero, armado, encofrado, fundida y desencofrado de cortina

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, balde


Los trabajadores han sido informados de todos, dichas medidas preventivas establecidas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea: SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 3.0 mts Profundidad 4.30 mts Largo 1.5 mts

Modo de Excavación: Manual ☒ Mecánica ☐ Equipo a utilizar: N/A.

| 3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo | SI | NO | N.A |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del terreno han sido evaluadas para la ejecución del trabajo | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | ✓ | | |
| El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pozos de luces, pilas, entre otros) | ✓ | | |
| Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y protección seguridad con alta visibilidad (Casco, Botas, reflectivos, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros) | ✓ | | |
| Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para desarrollar la labor | ✓ | | |
| Se cuenta con los accesos de acceso para el ingreso y salida de la excavación | ✓ | | |
| La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada | ✓ | | |
| Antes de empezar los trabajos de excavación, se verifico por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y el resto e impacto de construcciones (cuando aplique) | ✓ | | |
| Las paredes de la excavación, antes o pies evan en taludes en caso de requerirse registros se debe contar con concepto técnico de geotecnia | | | ✓ |
| Se cuenta con concepto de Ordenamiento para ángulo de reposo o con esquema de protección? (cuenta con concepto al permiso) | | | ✓ |
| Se cuenta con un procedimiento de escape para caso de emergencia | ✓ | | |
| Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia | ✓ | | |
| Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pilo (1 metro de distancia del borde de la excavación) | ✓ | | |
| 4 Si por la profundidad de la excavación se requieren trabajos en altura (altura mayor a superior a 2.00 mts) se verifica: | SI | NO | N/A |
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajos en alturas | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación | ✓ | | |
| 5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación (verificar lo siguiente) | SI | NO | N/A |
| La distancia entre escalones de la escalera es la misma y mide 40 cm | ✓ | | |
| Todos los pasos de las escaleras se encuentran sólidos | ✓ | | |
| Las laterales de las escaleras son rebasan de 5m | ✓ | | |
| Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior | ✓ | | |

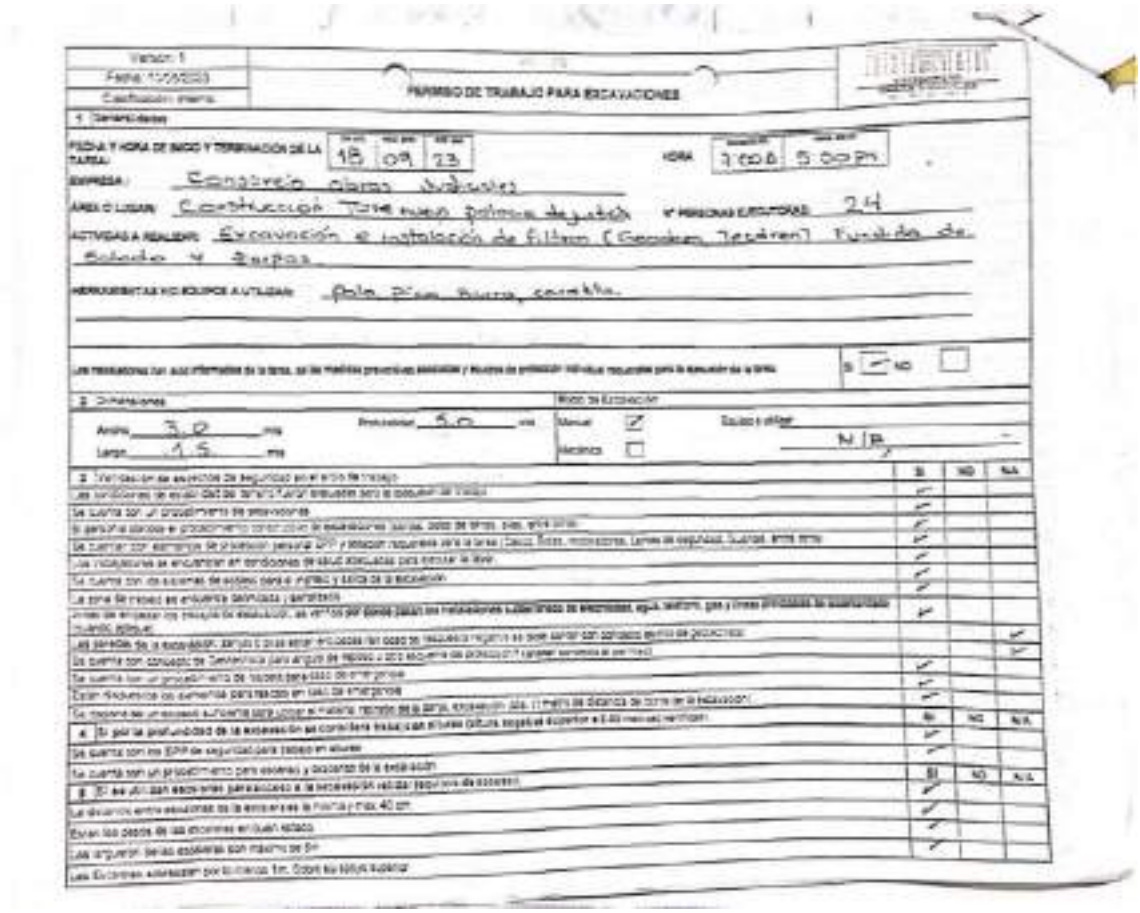

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 18 09 23 HORA 7:00 a 5:00 pm

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Torre nueva palmira de gallo N° PERSONAS EXPUESTAS: 24

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de filtros (Geodren, Tesaren) Fundida de Soluvia y Zapata

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, carretilla.

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de los riesgos presentes asociados y medidas de protección individual requeridas para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐


2. Dimensiones

Ancho 3.0 mts Profundidad 5.0 mts

Largo 4.5 mts

Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánico ☐ Equipo a utilizar N/A

| | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| 3. Verificación de elementos de seguridad en el sitio de trabajo | | | |
| Las condiciones de acceso del sitio de trabajo cuentan con las medidas de seguridad | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavación | ✓ | | |
| El personal conoce el procedimiento correspondiente de excavaciones (zonas, tipos de tierra, entre otros) | ✓ | | |
| Se cuenta con elementos de protección personal (EPP) y protección requeridos para la tarea (Casco, Botas, antiparras, Líneas de seguridad, Guantes, entre otros | ✓ | | |
| Las instalaciones se encuentran en condiciones de salud adecuadas para realizar la labor | ✓ | | |
| Se cuenta con un sistema de aviso contra incendios y zonas de evacuación | ✓ | | |
| La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada | ✓ | | |
| Antes de iniciar los trabajos de excavación, se verifica por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y otras previstas de suministros (cuando aplique) | ✓ | | |
| La pendiente de la excavación, ademas o cajas están en buen estado (en caso de requerirlo) se han tomado las precauciones de seguridad | | | ✓ |
| Se cuenta con extintor de Dióxido de Carbono para ataque de riesgos eléctricos (cuando aplique) | | | ✓ |
| Se cuenta con un procedimiento de trabajo para caso de emergencia | ✓ | | |
| Están habilitados los elementos para rescates en caso de emergencias | ✓ | | |
| Se requiere de un permiso autorizado para excavar a mayores de la parte superior de la zanja, excavación, etc. (Tiempo de duración de cierre de la excavación) | | | |
| 4. Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo con alturas (altura superior a 1.50 mts sobre nivel) | SI | NO | N/A |
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento para escalera y descanso de la zanja (cada | SI | NO | N/A |
| 5. Si se utilizan escaleras para acceder a la excavación (en caso de requerirlo) | | | |
| Se encuentra dentro especificado de la escalera a la horizontal y mas 40 cm | ✓ | | |
| Están los pasos de las escaleras en buen estado | ✓ | | |
| Las angulares de las escaleras son mayores de 5m | ✓ | | |
| Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre la altura superior | ✓ | | |

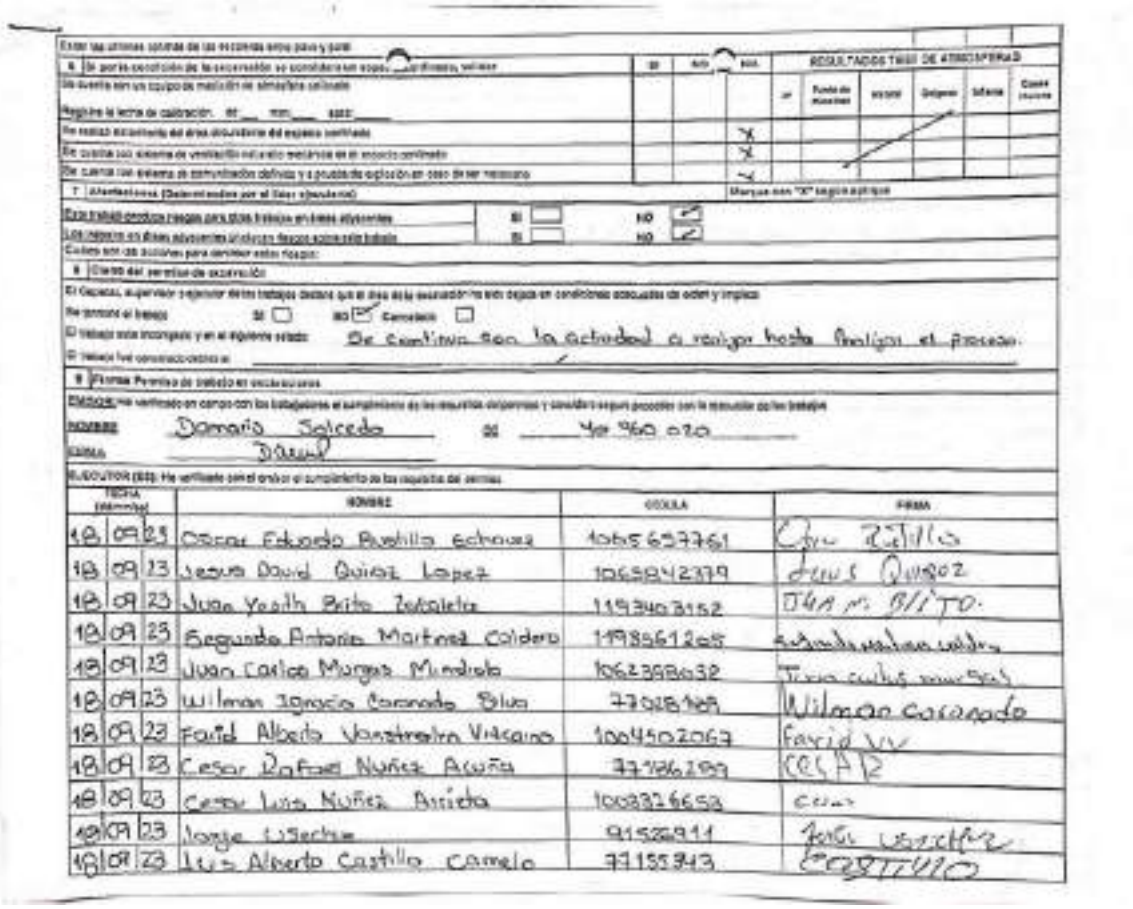

Entre las últimas normas de las reuniones entre para y para

9 | De parte excepción de la intervención se considera en espacio confinado, valorar

Se cuenta con un equipo de medición de atmosfera calibrado

Registre la fecha de calibración: dd: mm: aaaa:

Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado

Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado

Se cuenta con sistema de comunicación definida y a prueba de explosión en caso de ser necesario

| ID | N/A | SI/A | RESULTADOS TABLA DE ATMOSFERAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | Punto de inflamación | oxígeno | Oxígeno | Inflama | Causa incierta |
| | | X | | | | | | |
| | | X | | | | | | |
| | | X | | | | | | |

7 | Alternativas (Deberán ser por el líder ejecutante)

Marque con "X" según aplique

| | | |
|---|---|---|
| Exist alguna condición riesgosa para otros trabajos en áreas adyacentes | SI ☐ | NO ☒ |
| Los trabajos en áreas adyacentes ¿afectan riesgos existentes? | SI ☐ | NO ☒ |

Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:

8 | Cierre del permiso de ocupación

El Ejecutor, supervisor y ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termina el trabajo SI ☐ NO ☒ Cancelado ☐

El trabajo está incompleto y en el siguiente estado: De continua con la actividad o realiza hasta finalizar el proceso.

El trabajo fue comunicado efectivo al:

9 | Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos de permisos y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE: Damaris Salcedo CC 40 960 020


FIRMA: Damaris

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso

| FECHA (dd/mm/aa) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 18/09/23 | Cesar Eduardo Revilla Echeverri | 1065637761 | Cesar Revilla |
| 18/09/23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1065842379 | Jesus Quiroz |
| 18/09/23 | Juan Yeath Brito Zabaleta | 1193403152 | JUAN BRITO. |
| 18/09/23 | Segundo Antonio Martinez Caldero | 1198561265 | Segundo Martinez |
| 18/09/23 | Juan Carlos Murgas Mendiola | 1062398632 | Juan Carlos Murgas |
| 18/09/23 | Wilman Ignacio Coronado Silva | 77018169 | Wilman Coronado |
| 18/09/23 | Farid Alberto Vanstralen Vizcaino | 1064502067 | Farid VV |
| 18/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77186199 | CESAR |
| 18/09/23 | Cesar Luis Nuñez Barrios | 1003326653 | Cesar |
| 18/09/23 | Jorge Ustariz | 91528911 | Jorge Ustariz |
| 18/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 91155343 | CASTILLO |

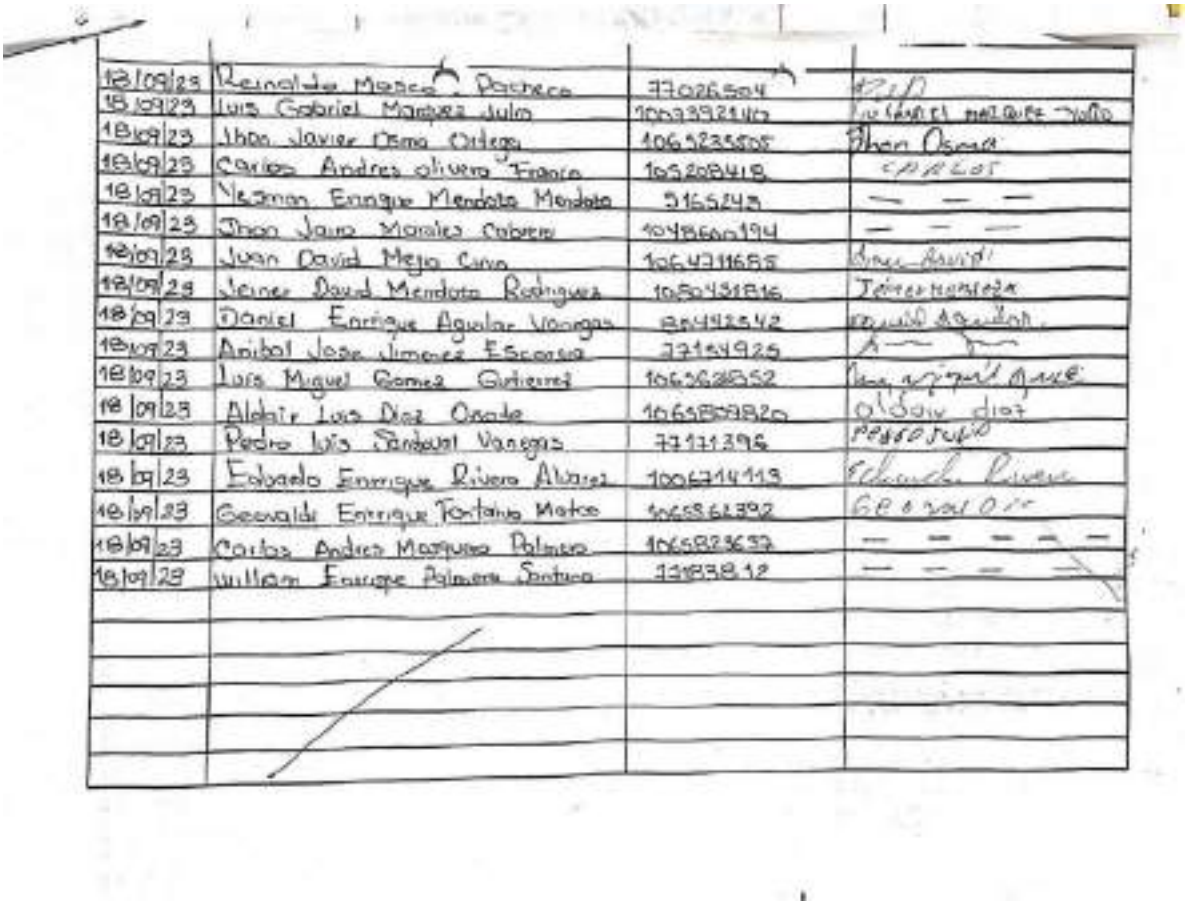

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18/09/23 | Reinaldo Mateo Pacheco | 77026504 | |
| 18/09/23 | Luis Gabriel Marquez Julio | 1003932102 | |
| 18/09/23 | Ibon Javier Osma Ortega | 1065235805 | |
| 18/09/23 | Carlos Andres Oliveira Freyle | 1052088418 | |
| 18/09/23 | Nesman Enrique Mendoza Mendoza | 3165243 | |
| 18/09/23 | Jhon Jairo Morales Cabrera | 1045660194 | |
| 18/09/23 | Juan David Mejia Cano | 1064311685 | |
| 18/09/23 | Jaiver David Mendoza Rodriguez | 1050431816 | |
| 18/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Noriega | 85442542 | |
| 18/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 73154925 | |
| 18/09/23 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1062628552 | |
| 18/09/23 | Alcair Luis Diaz Conde | 1065859820 | |
| 18/09/23 | Pedro Luis Sanjuan Noriega | 77131396 | |
| 18/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006714113 | |
| 18/09/23 | Geovaldi Enrique Fontalvo Mateo | 1065862392 | |
| 18/09/23 | Carlos Andres Mosquera Palmera | 1065823637 | |
| 18/09/23 | William Enrique Palmera Santana | 1118938112 | |

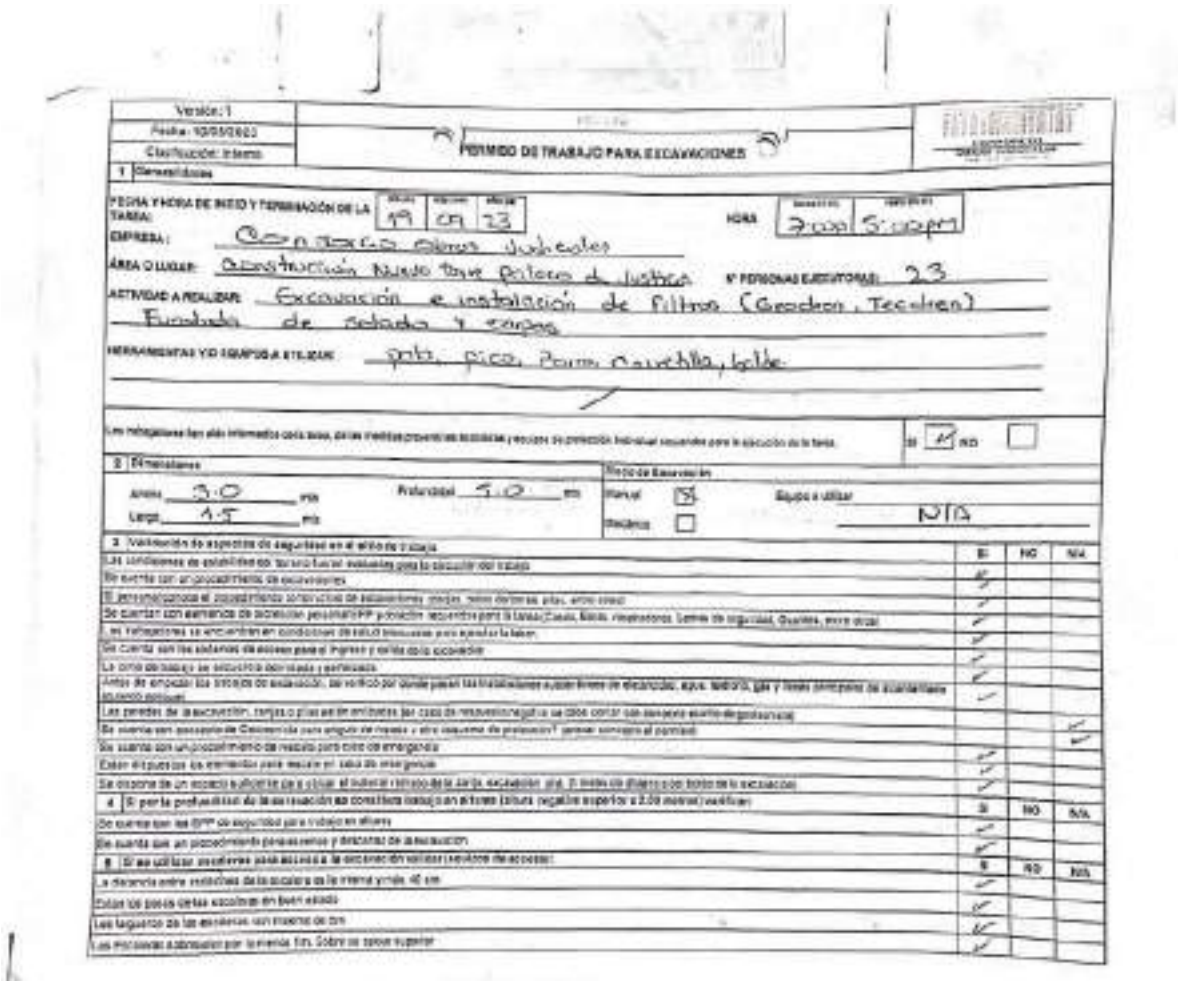

Versión: 1
Fecha: 10/09/2020
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 19 09 23 — HORA 7:00 5:00pm

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Nuevo Tipo Palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 23

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de Filtros (Geodren, Tecnitren) Excavado de retiro y cargue

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: pala, pica, Palin, Carretilla, Taladro

Los trabajadores han sido informados sobre todas las medidas preventivas de seguridad y equipos de protección individual necesarios para la ejecución de la tarea. SI [X] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 3.0 mts — Profundidad 5.0 mts — Largo 1.5 mts

Tipo de Excavación: Manual [X] Mecánica [ ] — Equipo a utilizar: N/A

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo


| | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | ✓ | | |
| El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (orden, retiro de tierra, entre otros) | ✓ | | |
| Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y protección respectiva para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros) | ✓ | | |
| Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud necesarias para ejecutar la labor. | ✓ | | |
| Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación | ✓ | | |
| La zona de trabajo se encuentra demarcada y señalizada | ✓ | | |
| Antes de empezar las labores de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y otras semejantes de acuerdo a los planos aprobados | ✓ | | |
| Las paredes de la excavación, cortes o pilas están protegidas por caso de precipitaciones para que no sean cortes con peligro eventual de deslizamiento | | | ✓ |
| Se cuenta con personal de Coordinación para ayuda de rescate y otro siguiente de protección? (anexar soportes al permiso) | | | ✓ |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia | ✓ | | |
| Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia | ✓ | | |
| Se dispone de un acceso suficiente de y salida al interior mismo de la zona excavación (ej. 1 metro de distancia de borde de la excavación) | ✓ | | |

4 Si parte la profundidad de la excavación se constata trabajo en altura (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:

| | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento para rescates y atención de accidentes | ✓ | | |


5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación señalar cantidad de escalas:

| | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| La distancia entre escalones de la escalera de la misma mide 40 cm | ✓ | | |
| Están las patas de las escaleras en buen estado | ✓ | | |
| Las seguridad de las escaleras con mínimo de 1m | ✓ | | |
| Las escaleras sobrepasan por lo menos 1m. Sobre la zona superior | ✓ | | |

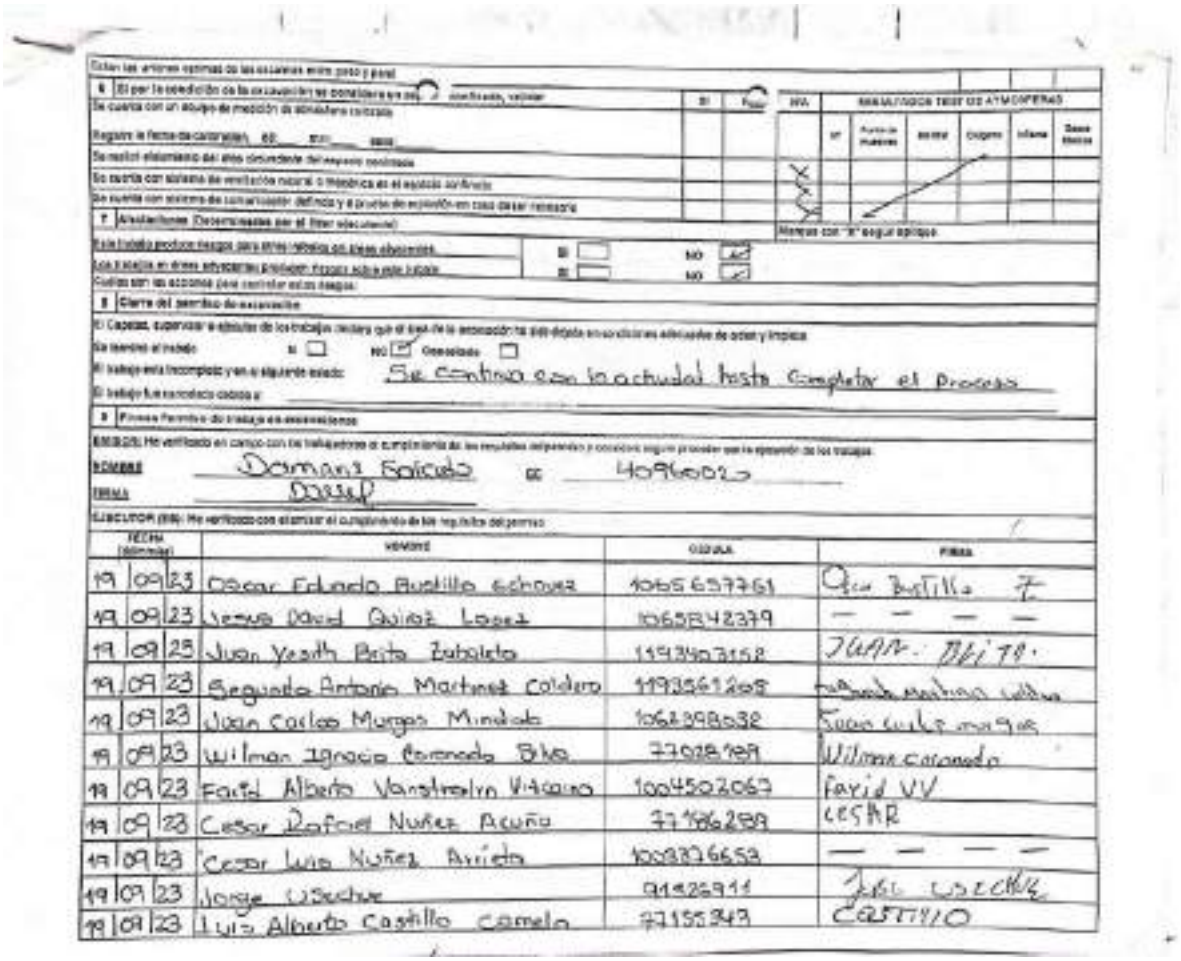


Se continua con la actividad hasta Completar el Proceso

| FECHA (dd/mm/aa) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 19/09/23 | Cesar Eduardo Bustillo Echavez | 1065637761 | Ces Bustillo E. |
| 19/09/23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1065842379 | — — — — |
| 19/09/23 | Juan Yesith Brito Zabaleta | 1193903158 | JUAN. BRITO. |
| 19/09/23 | Segundo Antonio Martinez Calderin | 1193561208 | [illegible] |
| 19/09/23 | Juan Carlos Murgas Mendoza | 1063898038 | [illegible] |
| 19/09/23 | Wilman Ignacio Coronado Brito | 77018789 | Wilman Coronado |
| 19/09/23 | Farid Alberto Vanstralen Vizcaino | 1004502067 | Farid VV |
| 19/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77186289 | CESAR |
| 19/09/23 | Cesar Luis Nuñez Arrieta | 1003826653 | — — — — |
| 19/09/23 | Jorge Ustariz | 91526911 | [illegible] |
| 19/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77155343 | CASTILLO |

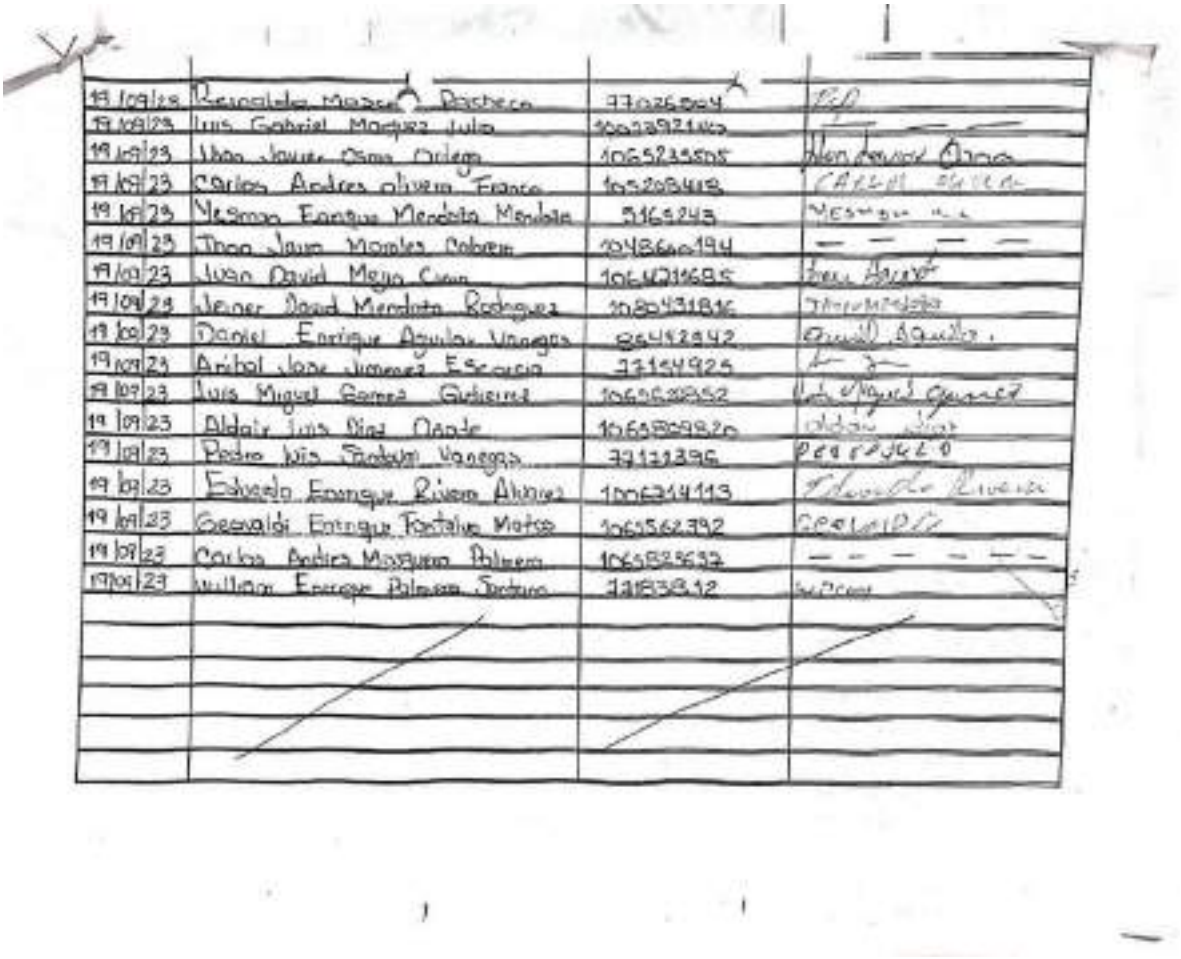

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19/09/23 | Reynaldo Manuel Pacheco | 77026804 | |
| 19/09/23 | Luis Gabriel Marquez Julio | 1065239214 | |
| 19/09/23 | Jhon Jairo Osma Ortega | 1065235505 | |
| 19/09/23 | Carlos Andres oliven Franco | 1065208418 | |
| 19/09/23 | Nesmon Enrique Mendoza Mendoza | 5165243 | |
| 19/09/23 | Jhon Jairo Morales Cabrera | 1048660194 | |
| 19/09/23 | Juan David Mejia Cano | 1064021685 | |
| 19/09/23 | Jeiner David Mendoza Rodriguez | 1080431816 | |
| 19/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Venegas | 85492842 | |
| 19/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 73154925 | |
| 19/09/23 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1065628952 | |
| 19/09/23 | Aldair Luis Diaz Conde | 1065809820 | |
| 19/09/23 | Pedro Luis Tordecilla Venegas | 73131396 | |
| 19/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006314113 | |
| 19/09/23 | Gerardo Enrique Fontalvo Matos | 1065562392 | |
| 19/09/23 | Carlos Andres Marquez Palmera | 1065825632 | |
| 19/09/23 | Wilmer Enrique Palmera Santana | 73183912 | |

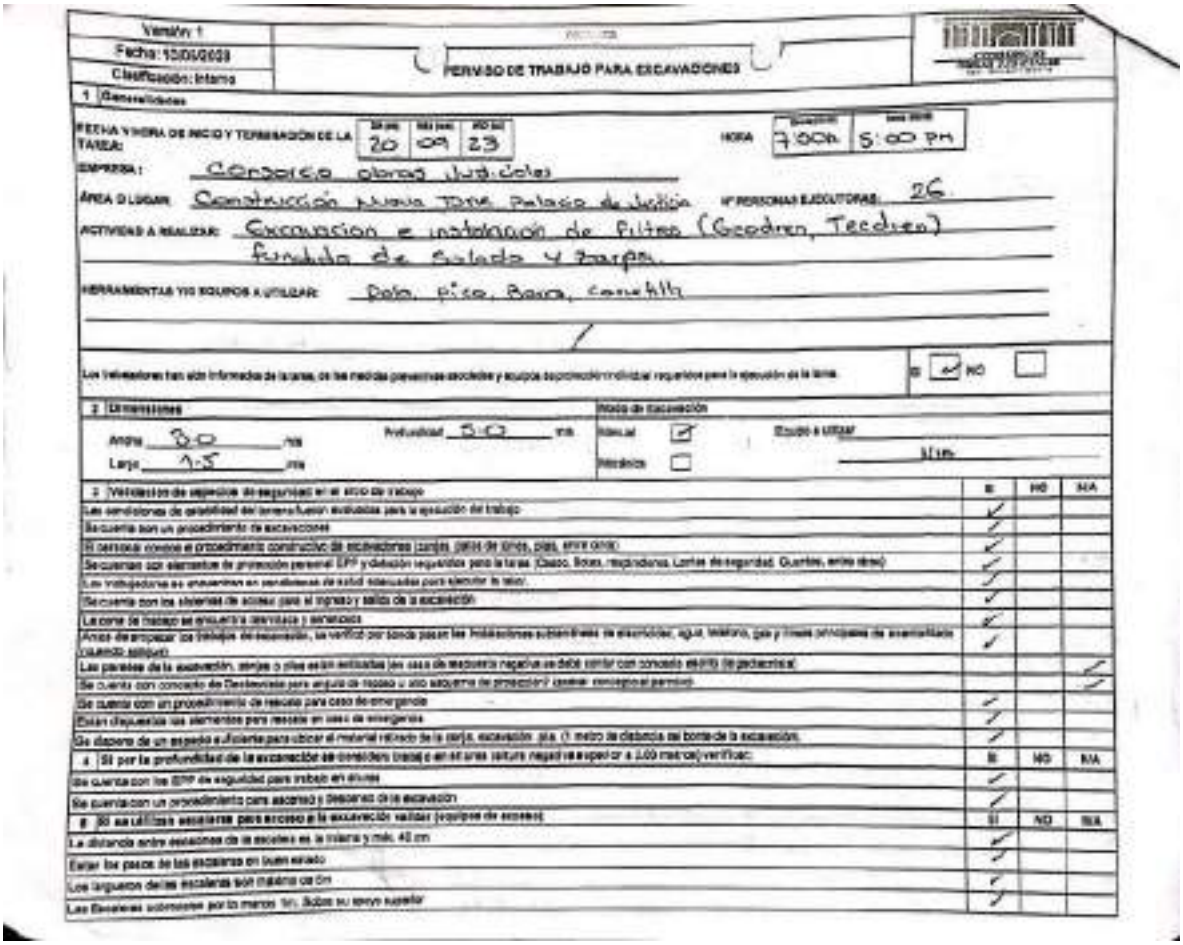

Versión: 1
Fecha: 10/06/2020
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 20 | 09 | 23 HORA 7:00h 5:00 PM

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción nueva Torre Palacio de Justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de Filtros (Geodren, Tecdren) fundida de Solado y Zarpas.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pica, Barra, cornetilla


Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 3.0 mts Profundidad 3.00 mts Largo 1.5 mts

Modo de excavación: Manual ☑ Mecánico ☐ Equipo a utilizar: Mini.


| 3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | ✓ | | |
| El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pozos de sines, pilas, entre otros) | ✓ | | |
| Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Gafas de seguridad, Guantes, entre otros) | ✓ | | |
| Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor. | ✓ | | |
| Se cuenta con las escalas de acceso para el ingreso y salida de la excavación | ✓ | | |
| La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada | ✓ | | |
| Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de eventuales (cuando aplique) | ✓ | | |
| Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de requerirlo negativo se debe contar con concepto escrito de geotecnista) | | | ✓ |
| Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo o uso adecuado de protección (taludes, entibados o pantallas) | | | ✓ |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia | ✓ | | |
| Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia | ✓ | | |
| Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, a 1 metro de distancia al borde de la excavación. | ✓ | | |
| 4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2,00 metros) verificar: | SI | NO | NA |
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación | ✓ | | |
| 5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso) | SI | NO | NA |
| La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más 40 cm | ✓ | | |
| Estar los pasos de las escaleras en buen estado | ✓ | | |
| Los largueros de las escaleras son mayores de 6m | ✓ | | |
| Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior | ✓ | | |

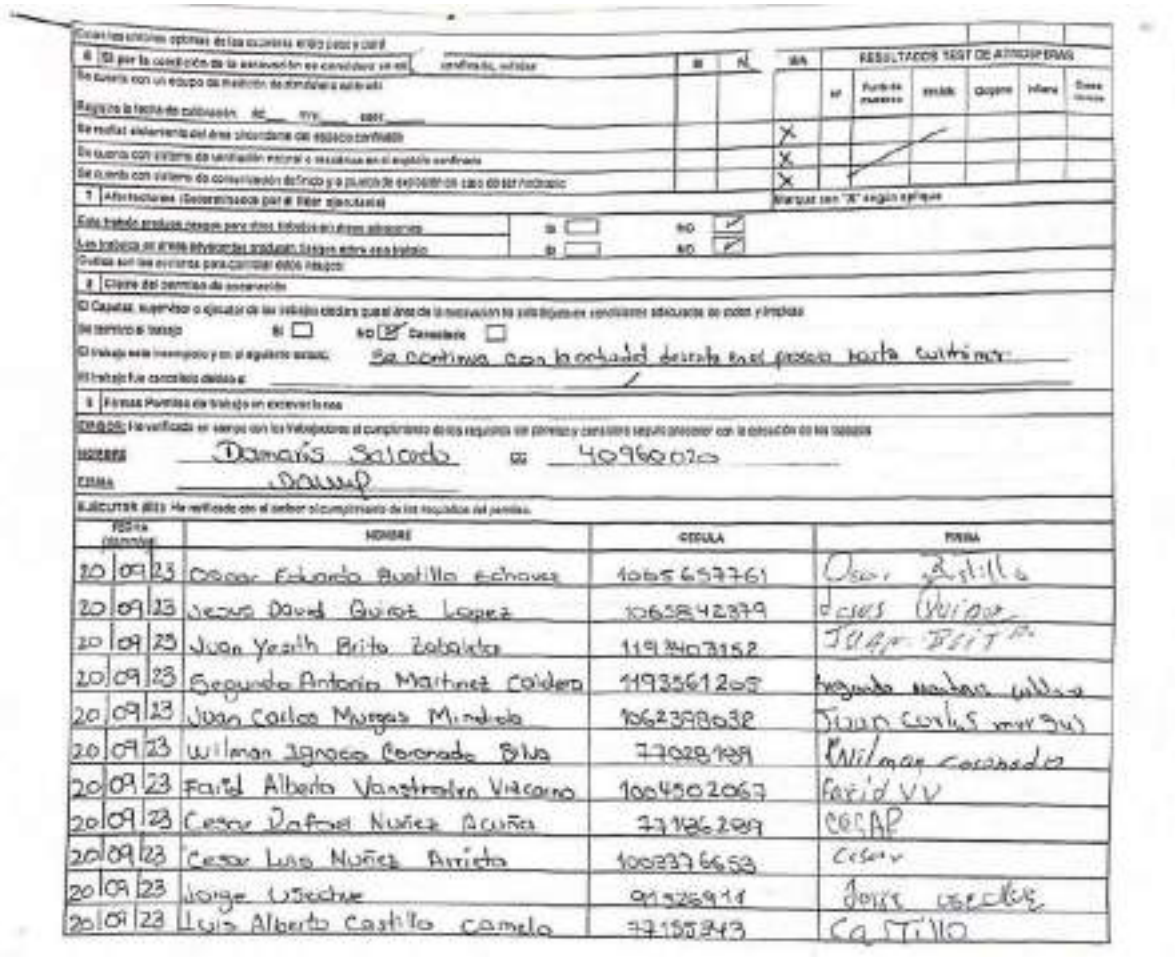


Se continua con la actividad dejada en el proceso hasta culminar.

Damaris Salcedo CC 40960070

| FECHA (dd/mm/aa) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 20/09/23 | Cesar Eduardo Avellia Echeverr | 1065657761 | |
| 20/09/23 | Jesus David Guiot Lopez | 1065842379 | |
| 20/09/23 | Juan Yesith Brito Zabaleta | 1193403152 | |
| 20/09/23 | Segundo Antonio Martinez Caldera | 1193561208 | |
| 20/09/23 | Juan Carlos Murgas Mendoza | 1062398038 | |
| 20/09/23 | Wilman Ignacio Coronado Silva | 77028198 | |
| 20/09/23 | Farid Alberto Vanstraalen Vizcaino | 1064502067 | |
| 20/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77186209 | |
| 20/09/23 | Cesar Luis Nuñez Arrieta | 1002376653 | |
| 20/09/23 | Jorge Usecheve | 91326911 | |
| 20/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77155343 | |

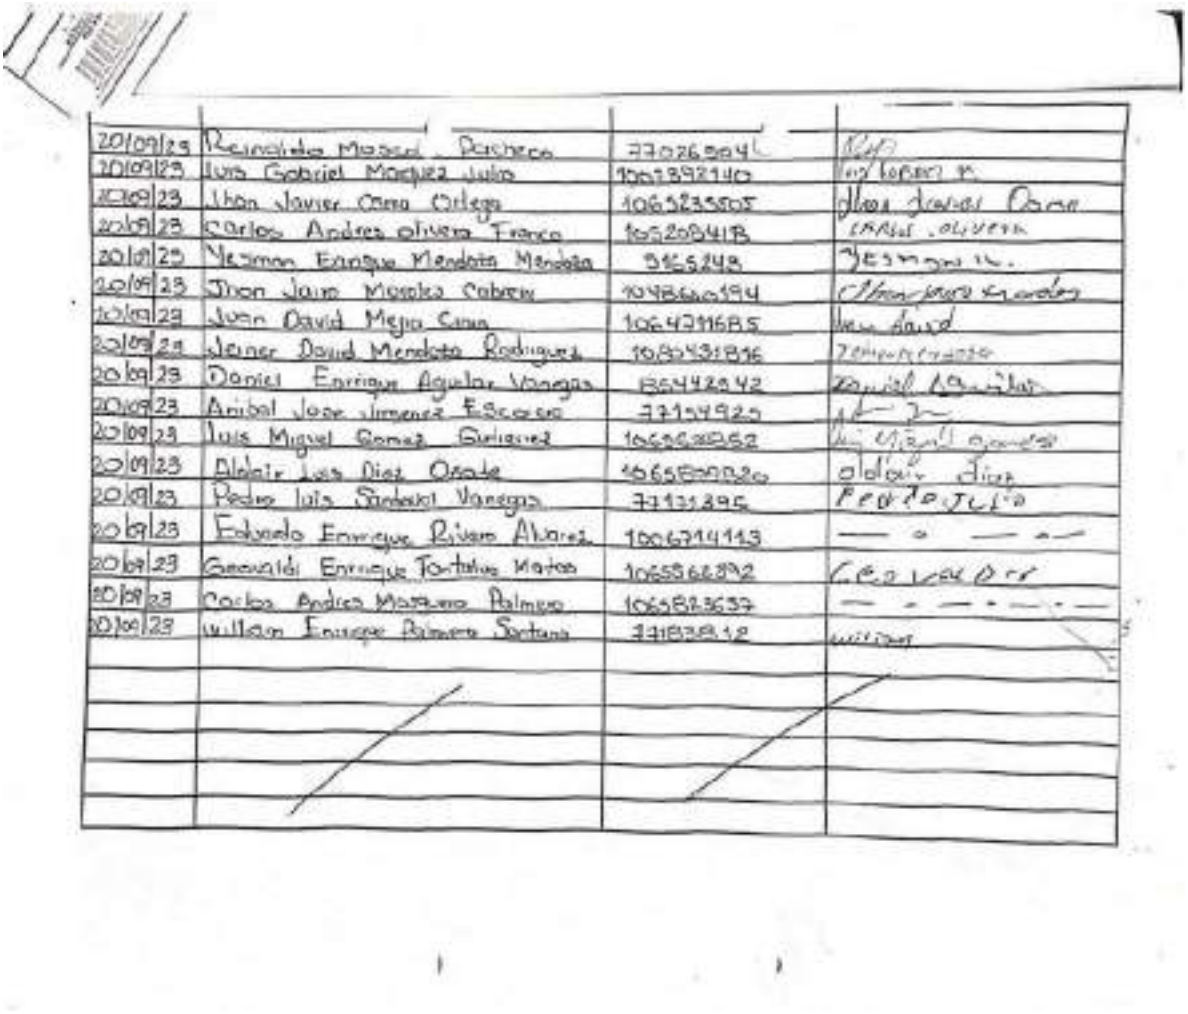

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20/09/23 | Reinaldo Manuel Pacheco | 77026904 | |
| 20/09/23 | Luis Gabriel Marquez Julio | 1063892140 | |
| 20/09/23 | Jhon Javier Cano Ortega | 1065235505 | |
| 20/09/23 | Carlos Andres oliveta Franco | 1065209418 | |
| 20/09/23 | Yesman Enrique Mendoza Mendoza | 9165248 | |
| 20/09/23 | Jhon Jaime Mesa Cabrera | 1048660194 | |
| 20/09/23 | Juan David Mejia Cano | 1064211685 | |
| 20/09/23 | Jaiver David Mendoza Rodriguez | 1082431816 | |
| 20/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Vanegas | 85442842 | |
| 20/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 77154925 | |
| 20/09/23 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1065620252 | |
| 20/09/23 | Didier Luis Diaz Conde | 1065800826 | |
| 20/09/23 | Pedro Luis Sandoval Vanegas | 77131895 | |
| 20/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1066714113 | |
| 20/09/23 | Gerardo Enrique Fontalvo Matos | 1065568892 | |
| 20/09/23 | Carlos Andres Manjarres Palmera | 1065823637 | |
| 20/09/23 | William Enrique Romero Santana | 77182818 | |

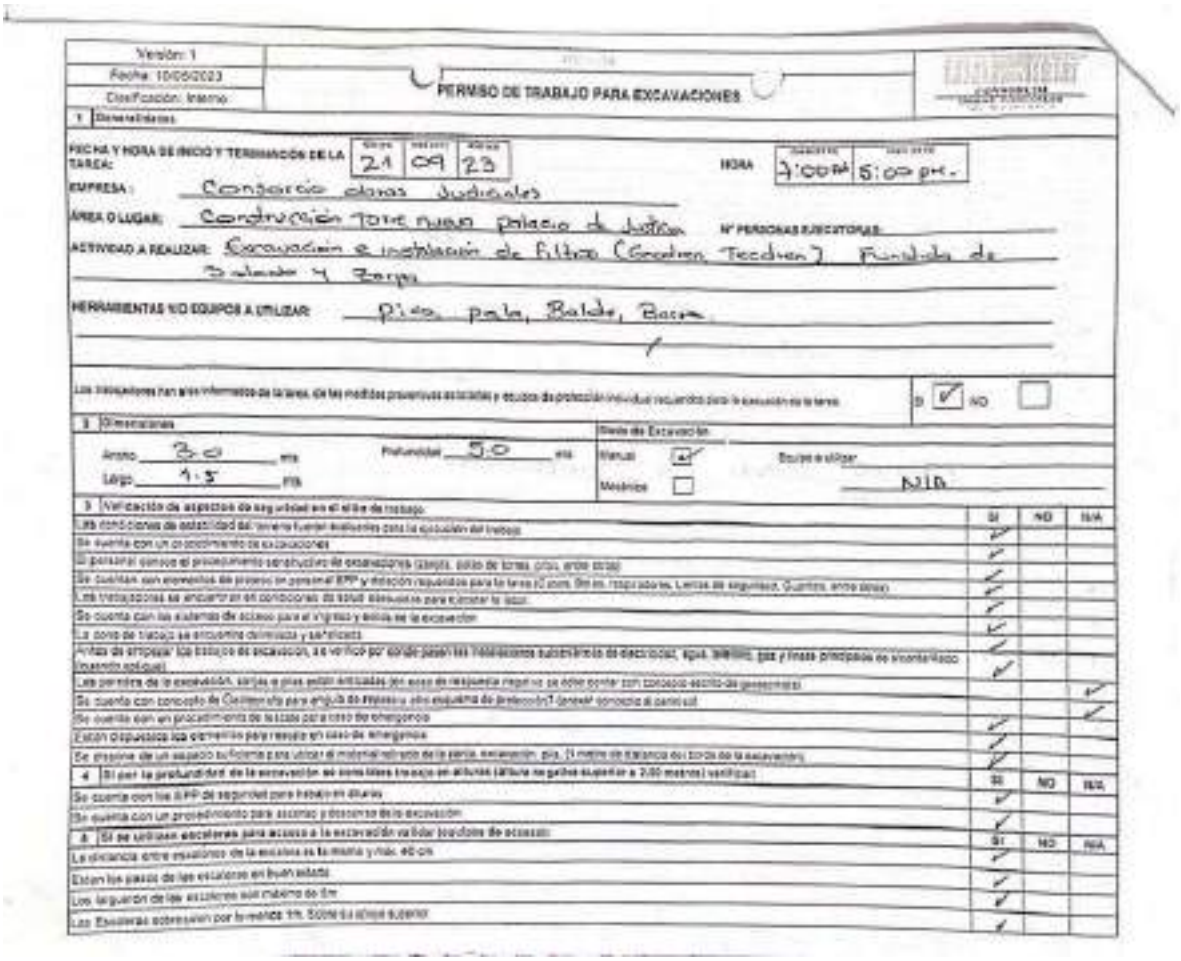

Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: DÍA 21 MES 09 AÑO 23 HORA 7:00 AM 5:00 pm.

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Torre nueva Palacio de Justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS:

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de filtros (Geodren, Teodren) Fundida de Salmuera y Barro

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pico, pala, Balde, Barra

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 3.0 mts Profundidad 5.0 mts Largo 1.5 mts

Tipo de Excavación: Manual ☑ Mecánica ☐ Equipo a utilizar: N/A

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo


| | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | ✓ | | |
| El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (riesgos, sitios de botes, orden, entre otros) | ✓ | | |
| Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, Respiradores, Gafas de seguridad, Guantes, entre otros) | ✓ | | |
| Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor | ✓ | | |
| Se cuenta con las vías de acceso para el ingreso y salida de la excavación | ✓ | | |
| La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada | ✓ | | |
| Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y redes principales de alcantarillado (cuando aplique) | ✓ | | |
| Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de requerirse) según lo establecido con concepto escrito del geotecnista | | | ✓ |
| Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo y otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso) | | | ✓ |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para el caso de emergencia | ✓ | | |
| Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia | ✓ | | |
| Se dispone de un espacio suficiente para utilizar el material retirado de la perforación, pico, (1 metro de distancia del borde de la excavación) | ✓ | | |

4 Si por la profundidad de la excavación se van a tener trabajos en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:

| | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación | ✓ | | |

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (cordón de acceso):

| | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más de 0m | ✓ | | |
| Están los pasos de las escaleras en buen estado | ✓ | | |
| Los largueros de las escaleras son macizos de 0m | ✓ | | |
| Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre la altura superior | ✓ | | |

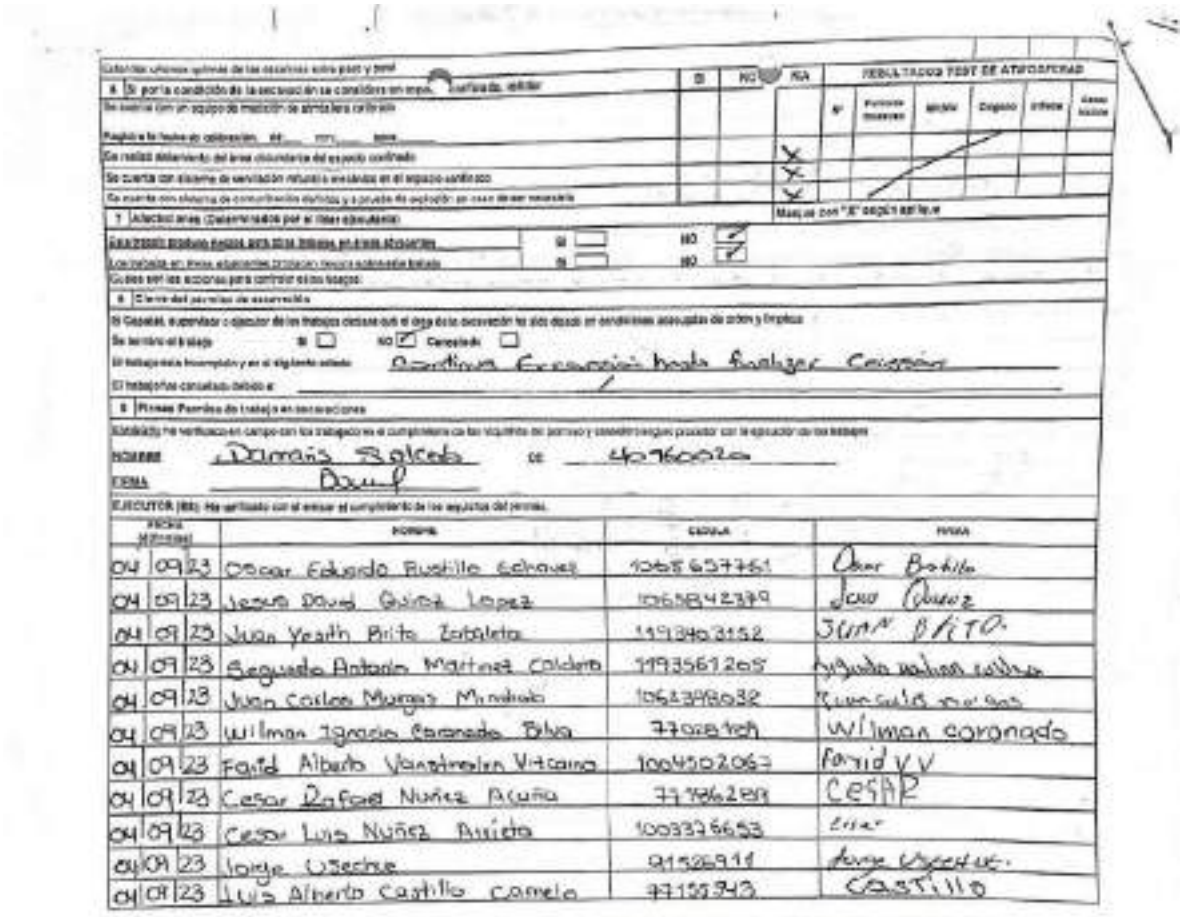

Continúa ordenes ejecutor de las excavaciones antes para y pare

| | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| 4 Si por la condición de la excavación se considera un espa... confinado, aplicar | | | |
| Se cuenta con un equipo de medición de atmósfera calibrado | | | |
| Registro de fecha de calibración: dd: mm: aaaa: | | | |
| Se realiza diariamente, del área circundante del espacio confinado | | | X |
| Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánico en el espacio confinado | | | X |
| Se cuenta con sistema de comunicación efectivo y puesto de vigilancia en caso de ser necesario | | | X |

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERA

| N° | Porcentaje oxigeno | gases | Organico | Inflam | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

7 Adjuntar anexo (Determinado por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Para el trabajo realizado hacen parte de las labores en áreas encerradas | | X |
| Los trabajos en áreas encerradas (Espacio) tienen relación con este trabajo | | X |

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo: SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: Continua Excavación hasta finalizar Cerramiento

El trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


Verificado he verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y condiciones seguras previstas con la ejecución de los trabajos

NOMBRE: Damián Salcedo CC: 4076002x

FIRMA: Damf

EJECUTOR (RE): He verificado con el anexo el cumplimiento de los requisitos del permiso

| Fecha (dd/mm/aa) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 04/09/23 | Oscar Eduardo Bustillo Galvez | 1065637761 | Oscar Bustillo |
| 04/09/23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1065842379 | Jesus Quiroz |
| 04/09/23 | Juan Yeaith Brito Zabaleta | 1193403152 | JUAN BRITO. |
| 04/09/23 | Segundo Antonio Martinez Caldera | 1193561205 | Segundo Martinez Caldera |
| 04/09/23 | Juan Carlos Munoz Mendoza | 1063898032 | Juan Carlos Munoz |
| 04/09/23 | Wilman Ignacio Coronado Silva | 77028769 | Wilman Coronado |
| 04/09/23 | Farid Alberto Vanderbeken Vitcana | 1004502063 | Farid V V |
| 04/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77086289 | CESAR |
| 04/09/23 | Cesar Luis Nuñez Bustillo | 1003396653 | Cesar |
| 04/09/23 | Jorge Ussehue | 91526911 | Jorge Ussehue. |
| 04/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77155743 | Castillo |

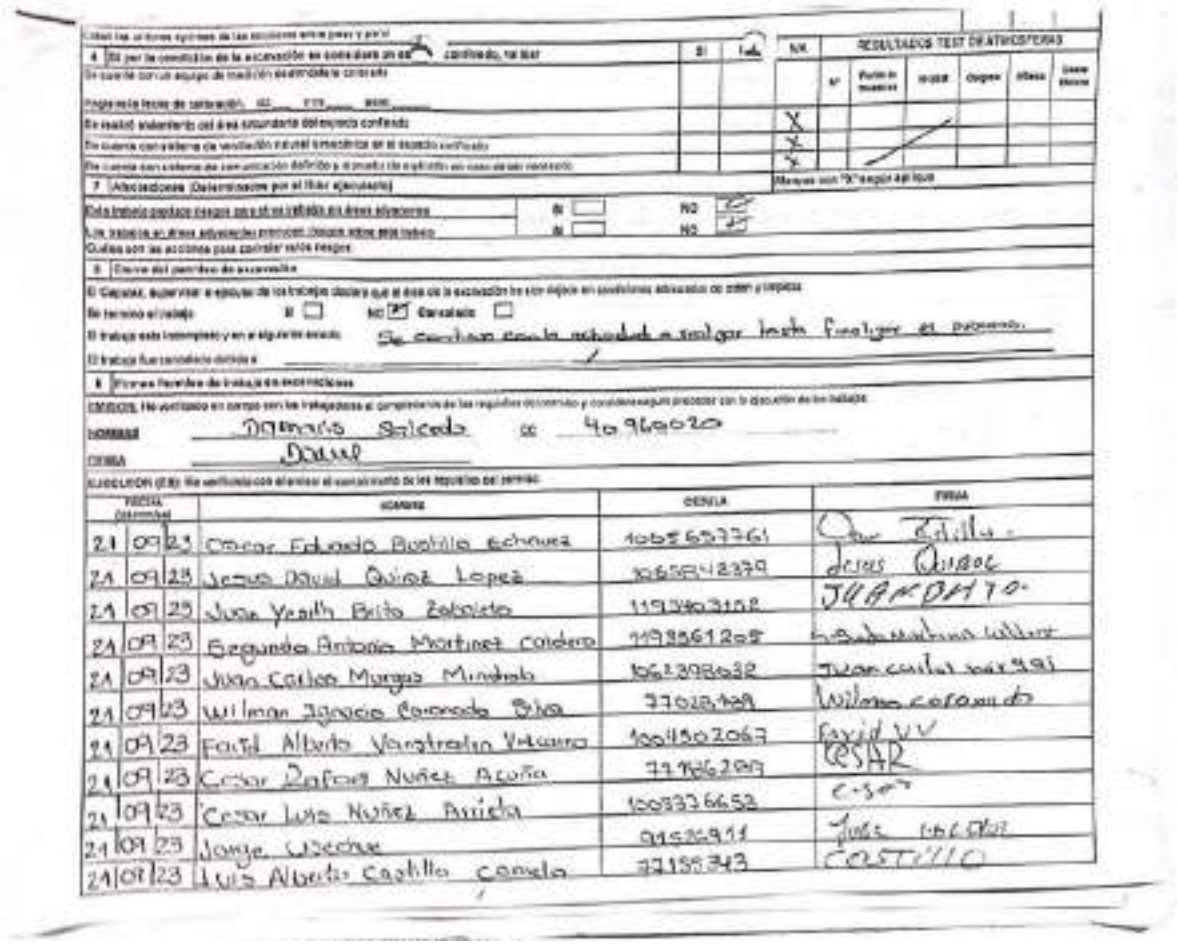

4 [illegible] confinado, tal cual — SI / NA

RESULTADOS TEST ATMOSFERAS

| | SI | NA | N° | Punto de muestreo | Hora | Oxigeno | Gases | Vapores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | | | |
| | | X | | | | | | |
| | | X | | | | | | |

7 Afectaciones Determinación por el líder ejecutante — Marque con "X" según aplique

Este trabajo produce riesgos que aún no estén en las áreas adyacentes — SI ☐ NO ☑

Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo — SI ☐ NO ☑

Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se terminó el trabajo — SI ☐ NO ☑ Parcialmente ☐

El trabajo está incompleto y en el siguiente estado: Se cierran con la actividad a realizar hasta finalizar el proceso.

El trabajo fue cancelado debido a

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


CRITERIO: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos de control y condiciones seguras para iniciar con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Dagoberto Salcedo CC 4096020


FIRMA Dagoberto

EJECUCIÓN (Día): He verificado con diligencia el cumplimiento de los requisitos del permiso

| FECHA (dd mm aa) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 21 09 23 | Oscar Eduardo Bustillo Echavez | 1065657761 | Oscar Bustillo |
| 21 09 23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1065842379 | Jesus Quiroz |
| 21 09 23 | Juan Yeaith Brito Zabaleta | 1193403102 | JUANCHITO |
| 21 09 23 | Segunda Antonia Martinez Caldera | 1198561208 | Segunda Martinez |
| 21 09 23 | Juan Carlos Murgas Mendoza | 1063898632 | Juan Carlos Murgas |
| 21 09 23 | Wilman Ignacio Coronado Silva | 77028709 | Wilman Coronado |
| 21 09 23 | Fayid Alberto Vanstralen Velasco | 1001502067 | Fayid VV |
| 21 09 23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77966209 | CESAR |
| 21 09 23 | Cesar Luis Nuñez Bustillo | 1003376652 | C-Luis |
| 21 09 23 | Jorge Ustecho | 94526911 | Jorge Ustecho |
| 21 09 23 | Luis Alberto Castillo Canela | 77155343 | CASTILLO |

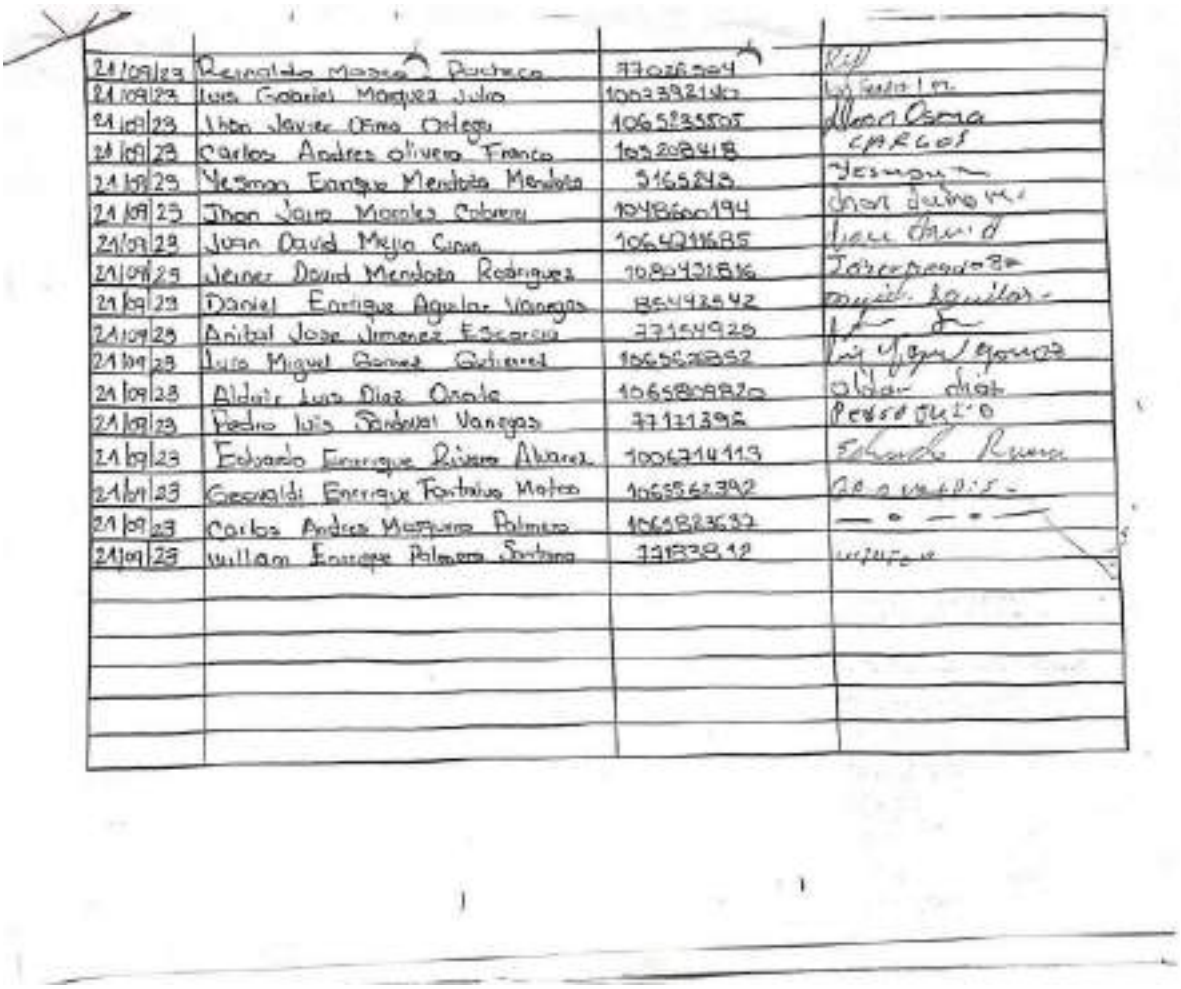

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21/09/23 | Reynaldo Marcos Pacheco | 77026204 | |
| 21/09/23 | Luis Gabriel Marquez Julio | 1003921982 | |
| 21/09/23 | Jhon Javier Ospino Ortega | 1065835505 | |
| 21/09/23 | Carlos Andres Olivera Franco | 1052084418 | |
| 21/09/23 | Yesman Enrique Mendoza Mendoza | 5165248 | |
| 21/09/23 | Jhon Jairo Morales Cabrera | 1048600194 | |
| 21/09/23 | Juan David Mejia Cano | 1064211685 | |
| 21/09/23 | Jeiner David Mendoza Rodriguez | 1084921816 | |
| 21/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Vanegas | 85443542 | |
| 21/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 73154926 | |
| 21/09/23 | Luis Miguel Gomez Galvan | 1065628852 | |
| 21/09/23 | Aldair Luis Diaz Conde | 1065809820 | |
| 21/09/23 | Pedro Luis Sandoval Vanegas | 77171396 | |
| 21/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006714113 | |
| 21/09/23 | Oswaldi Enrique Fontalvo Mateo | 1065562392 | |
| 21/09/23 | Carlos Andres Marquez Palmera | 1065823632 | |
| 21/09/23 | William Enrique Palmera Santana | 73183812 | |

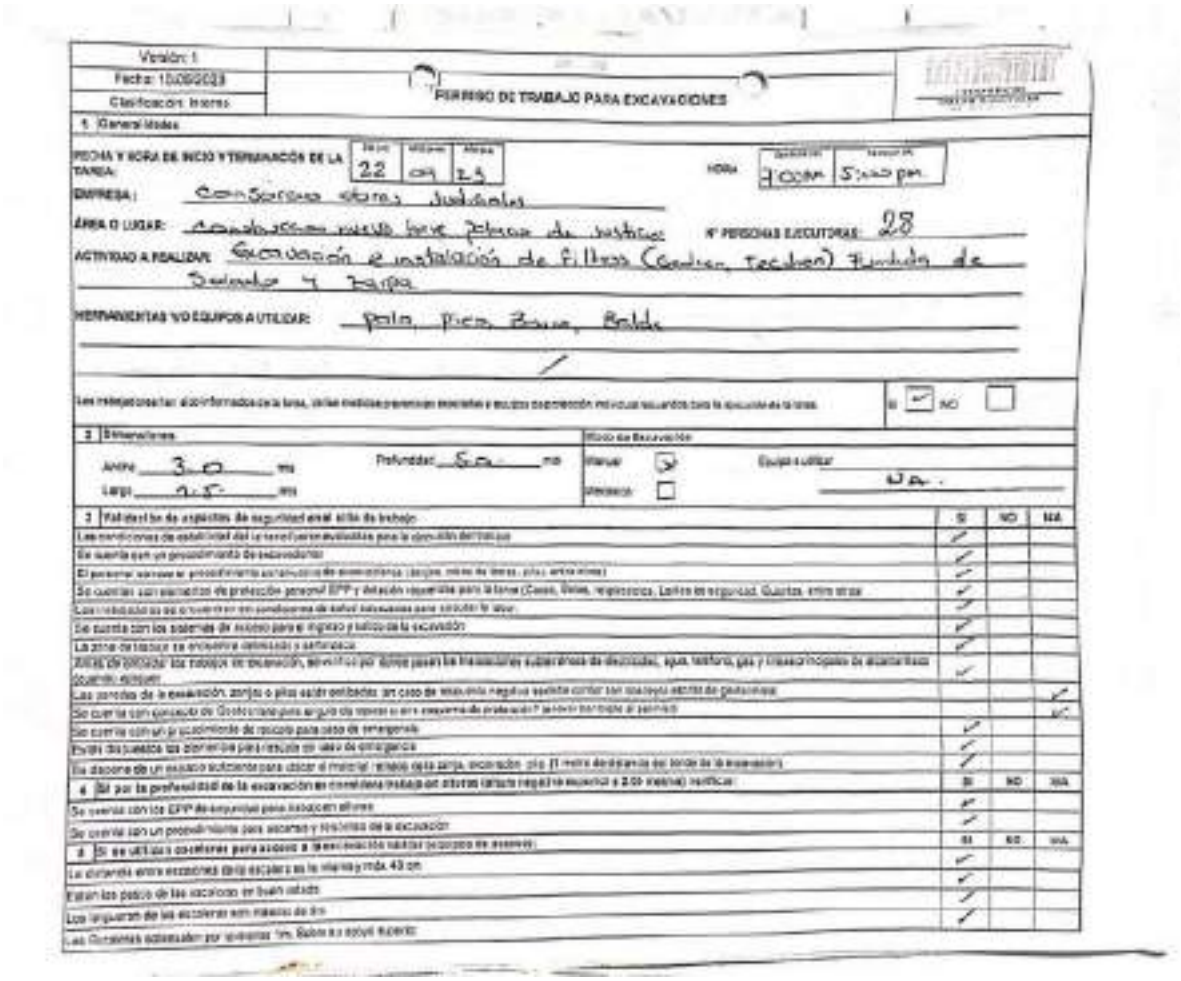

Versión: 1
Fecha: 15/09/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1. Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: Día 22 Mes 09 Año 23 — Hora 7:00am 5:00 pm

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción nueva sede Palacio de Justicia — N° PERSONAS EJECUTORAS: 28

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de filtros (Cenizas, Tecknon) Fundida de Bodega y Tanque

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Balde


Los trabajadores están informados de la tarea, de las medidas preventivas necesarias y de los elementos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

2. Dimensiones

Ancho: 3.0 m — Profundidad: 5.0 m — Largo: 9.5 m


Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánico ☐ — Equipo a utilizar: N.A.

| 3. Validación de aspectos de seguridad antes inicio de trabajo | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del terreno son evaluadas para la ejecución del trabajo | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavación | ✓ | | |
| El personal conoce el procedimiento para ejecución de excavaciones (según tipo de obra, plan, entre otros) | ✓ | | |
| Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requerida para la tarea (Casco, Botas, respirador, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros | ✓ | | |
| Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor | ✓ | | |
| Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación | ✓ | | |
| La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada | ✓ | | |
| Antes de iniciar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y cualquier tipo de alcantarillado cuando aplique | ✓ | | |
| Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas, en caso de resultado negativo justificar con concepto técnico de profesional | | | ✓ |
| Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo o en caso de la profundidad lo requiera el permiso | | | ✓ |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia | ✓ | | |
| Existe disposición de planes de para rescate en caso de emergencia | ✓ | | |
| Es posible de un acceso adecuado para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila (1 metro de distancia del borde de la excavación) | ✓ | | |
| 4. Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (mayor negativo mayores a 2.00 metros) verificar: | SI | NO | NA |
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajos en alturas | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación | ✓ | | |
| 5. Si se utilizan escaleras para acceso a excavación validar lo siguiente en escalera: | SI | NO | NA |
| La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más 40 cm | ✓ | | |
| Están los pasos de las escaleras en buen estado | ✓ | | |
| Los largueros de las escaleras son metálicos de 6m | ✓ | | |
| Las Escaleras sobresalen por encima 1m. Sobre el nivel superior | | | |

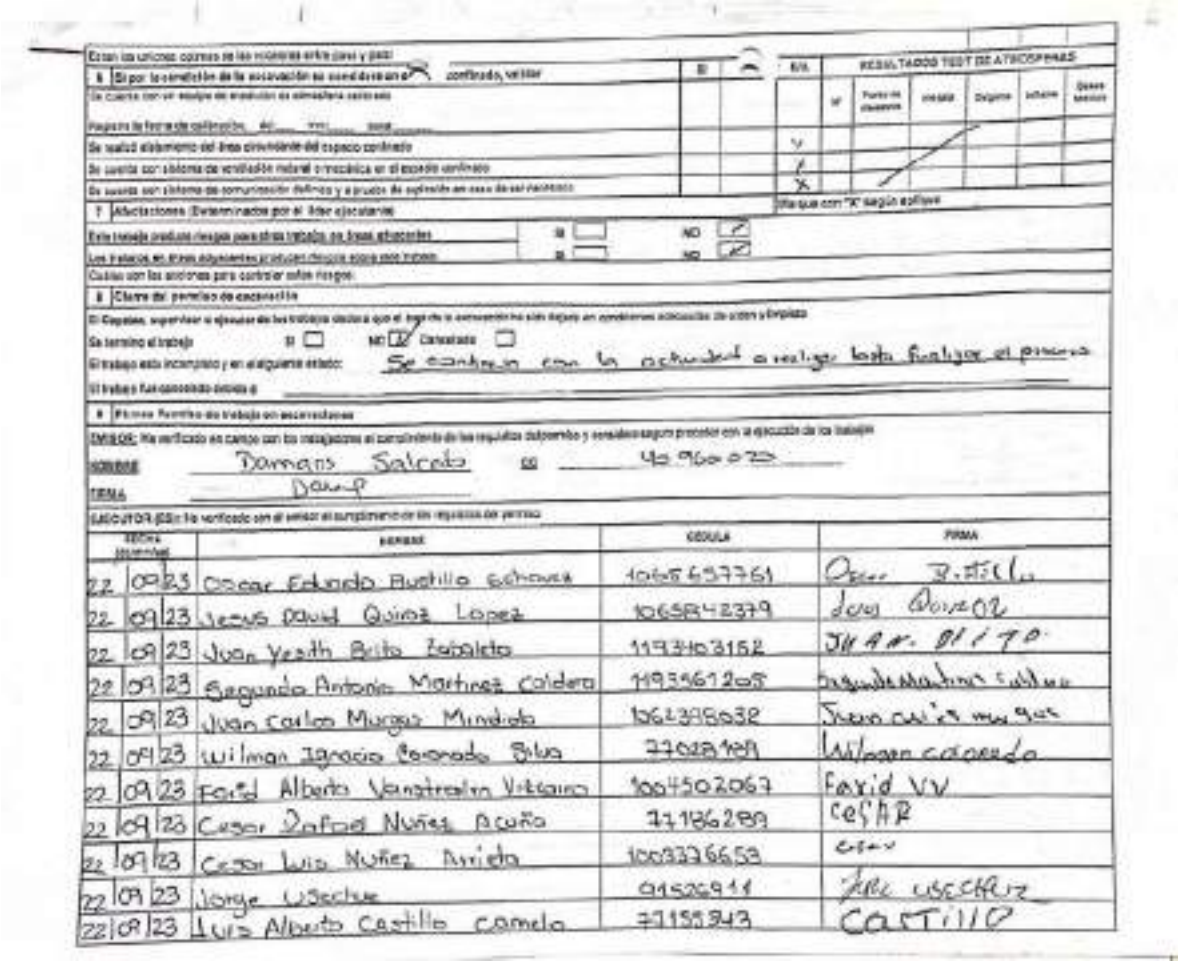


Se cambio con la actividad a realizar hasta finalizar el proceso

| FECHA (dd/mm/aa) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 22/09/23 | Oscar Eduardo Bustillo Echeverri | 1065637761 | |
| 22/09/23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1065842379 | |
| 22/09/23 | Juan Yeath Brito Bolaños | 1193463162 | |
| 22/09/23 | Segundo Antonio Martinez Caldera | 1193612085 | |
| 22/09/23 | Juan Carlos Murgas Mendoza | 1063395038 | |
| 22/09/23 | Wilman Ignacio Coronado Silva | 1064504067 | |
| 22/09/23 | Farid Alberto Valdesalva Vergara | 1064502067 | |
| 22/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77196289 | |
| 22/09/23 | Cesar Luis Nuñez Arrieta | 1003336653 | |
| 22/09/23 | Jorge Ustariz | 91526911 | |
| 22/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77155343 | |

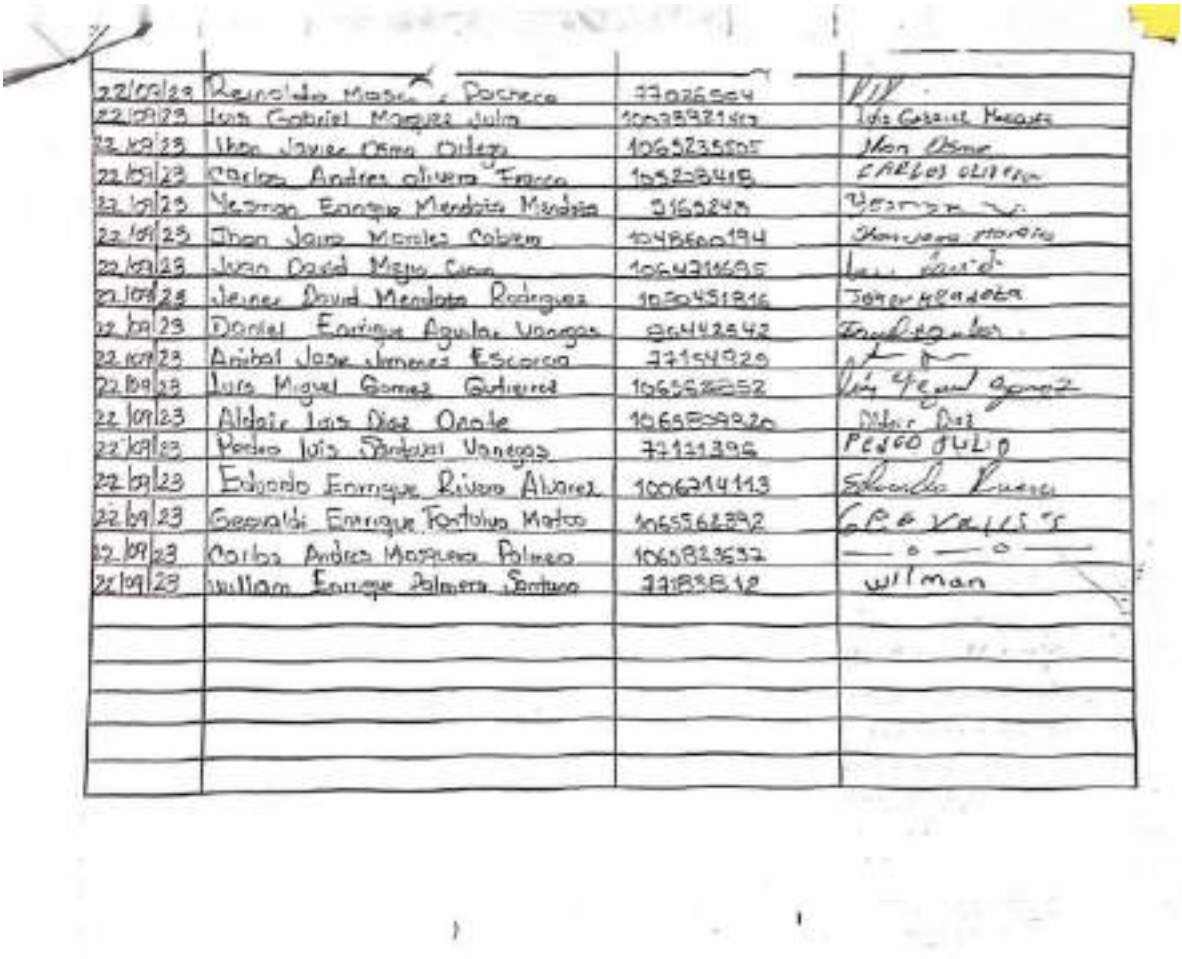


| | | | |
|---|---|---|---|
| 22/09/23 | Reinaldo Mateo Pacheco | 77026564 | |
| 22/09/23 | Luis Gabriel Marquez Julio | 1003892163 | |
| 22/09/23 | Ivan Javier Osma Ortega | 1065235505 | |
| 22/09/23 | Carlos Andres oliveros Franco | 1052338418 | |
| 22/09/23 | Yesman Enrique Mendoza Mendoza | 9169248 | |
| 22/09/23 | Jhon Jairo Morales Cabrera | 1048600194 | |
| 22/09/23 | Juan David Mejia Cano | 1064211695 | |
| 22/09/23 | Jeiner David Mendoza Rodriguez | 1050451816 | |
| 22/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Vanegas | 9644542 | |
| 22/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 77154920 | |
| 22/09/23 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1065588552 | |
| 22/09/23 | Alfair Luis Diaz Conde | 1065809820 | |
| 22/09/23 | Pedro Luis Sanjuan Vanegas | 77111395 | |
| 22/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006714113 | |
| 22/09/23 | Geovaldi Enrique Fontalvo Mateo | 1065566892 | |
| 22/09/23 | Carlos Andres Marquez Palmera | 1065833637 | |
| 22/09/23 | William Enrique Palmera Santana | 77185812 | |

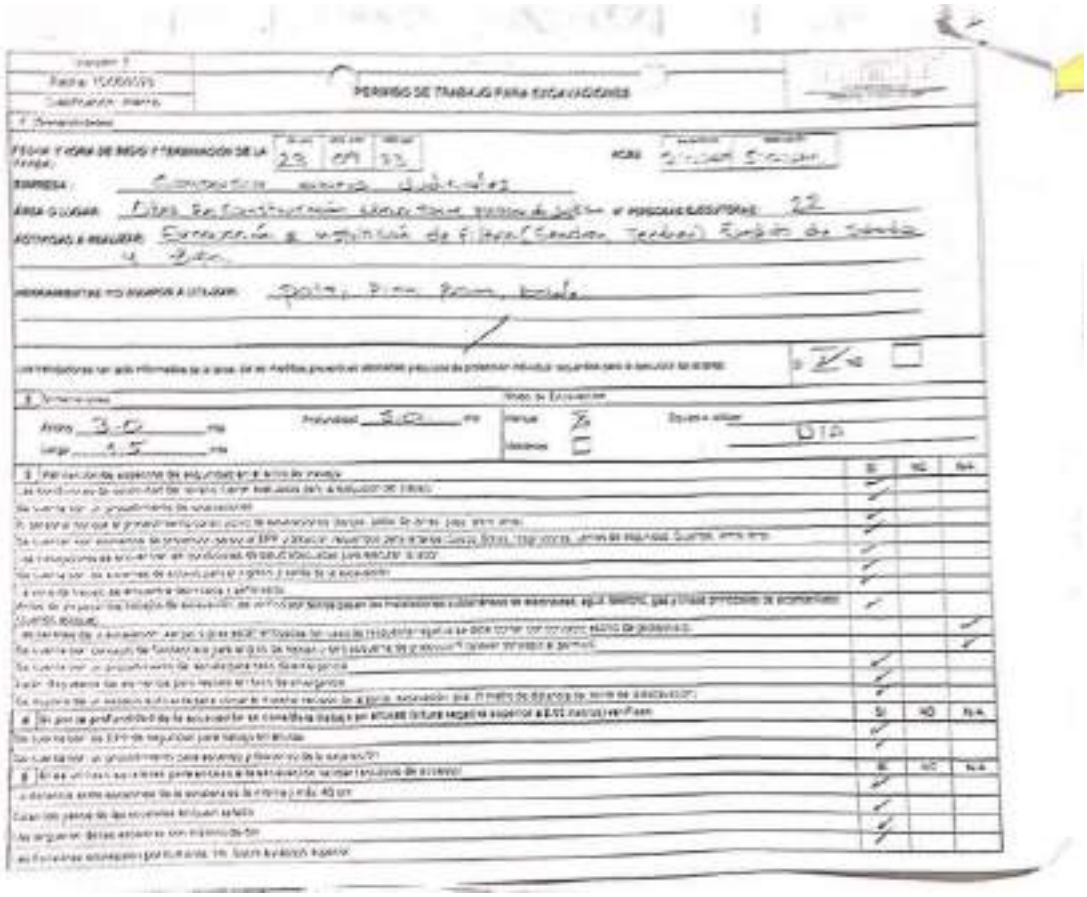




Se continua con la actividad hasta finalizar el turno

| FECHA (dd/mm/aa) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 23/09/23 | Oscar Eduardo Portillo Chaves | 1065657361 | |
| 23/09/23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1062842379 | |
| 23/09/23 | Juan Yesith Brito Caballero | 1193403152 | |
| 23/09/23 | Segundo Antonio Martinez Calderon | 1193561208 | |
| 23/09/23 | Juan Carlos Munoz Miranda | 1062399082 | |
| 23/09/23 | Wilman Ignacio Coronado Silva | 77028129 | |
| 23/09/23 | Farid Alberto Vanstralen Viscaino | 1004502067 | |
| 23/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77066269 | |
| 23/09/23 | Cesar Luis Nuñez Avila | 1003376653 | |
| 23/09/23 | Jorge Ujueta | 91526911 | |
| 23/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77155843 | |

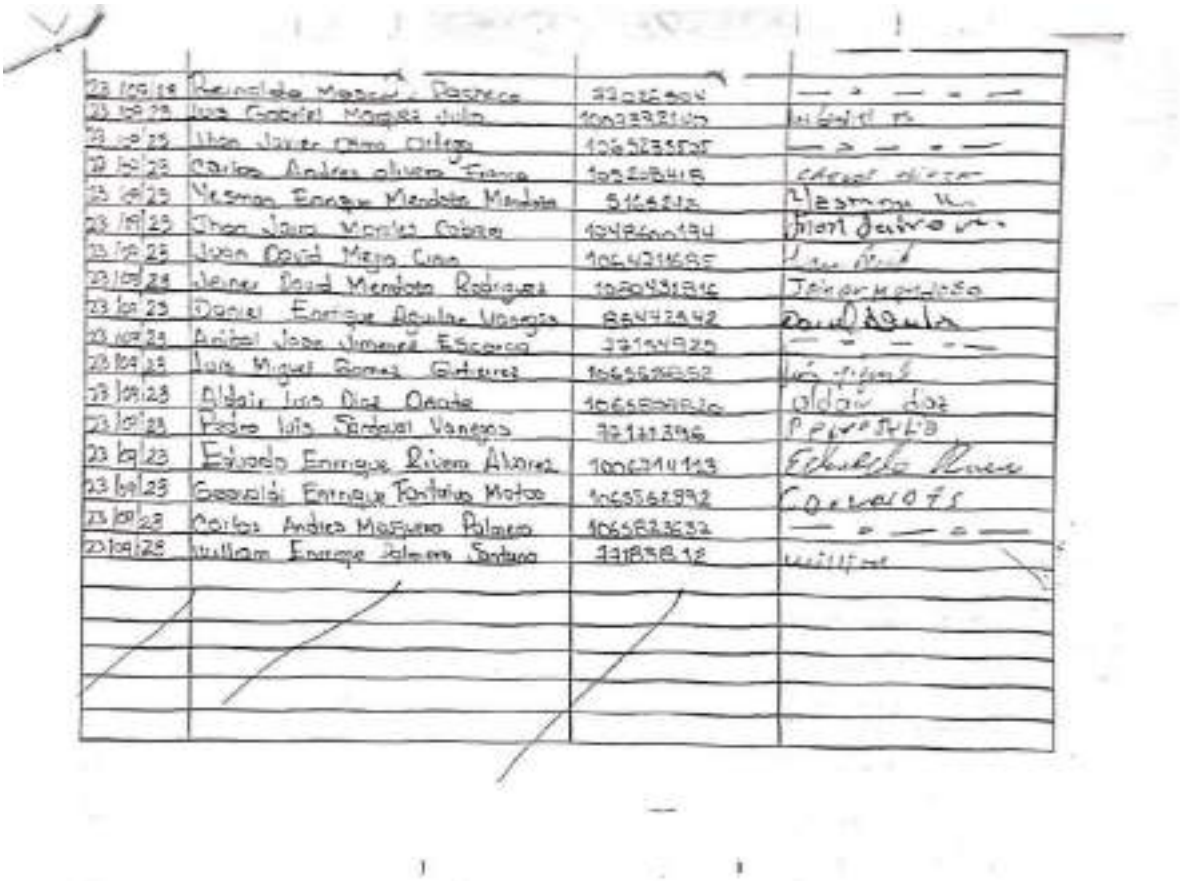

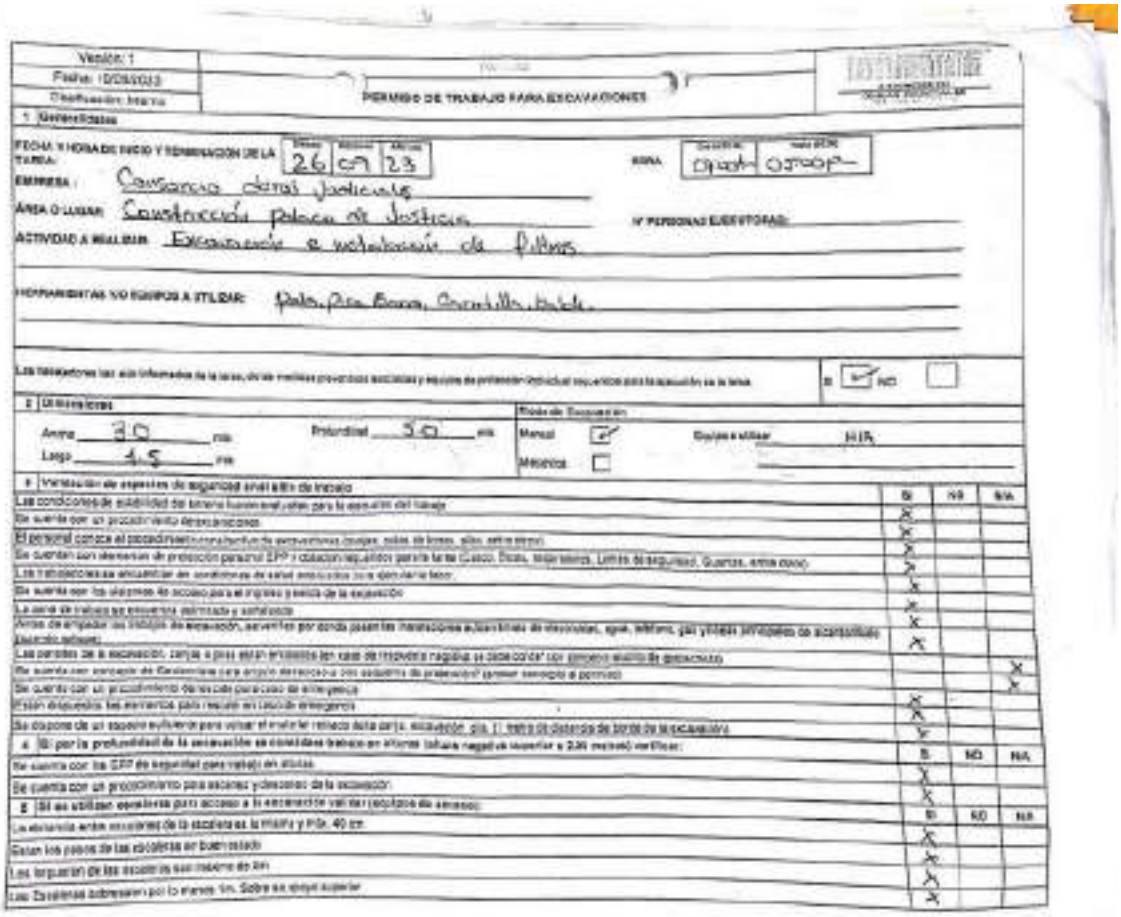

Versión: 1
Fecha: 10/05/2013
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 26 09 23 — HORA: 09:00 — 03:00

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia — N° PERSONAS EJECUTORAS:

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de Pilotes

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Palas, Pica Barra, Cornetilla, Retro.

Los trabajadores han sido informados de los riesgos, de los medios preventivos colectivos y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea — SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones


Ancho 3.0 mts — Profundidad 5.0 mts — Largo 1.5 mts

Frente de Excavación: Manual ☑ Mecánica ☐ — Equipo a utilizar: Mini Retro

| 3 Verificación de aspectos de seguridad antes del inicio de trabajo | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del terreno han sido evaluadas para la ejecución del trabajo | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | X | | |
| El personal conoce el procedimiento y la identificación de peligros y riesgos (cuerpos, redes de líneas, pilas, entre otros) | X | | |
| Se cuentan con elementos de protección personal EPP y cotización requeridos para la tarea (Casco, Botas, Gafas de seguridad, Guantes, entre otros) | X | | |
| Las condiciones se encuentran en condiciones de salud apropiadas para ejecutar la labor | X | | |
| Se cuenta con los elementos de acceso para el ingreso y salida de la excavación | X | | |
| La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada | X | | |
| Antes de empezar las labores de excavación, se verifica por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y demás servicios de acometidas (durante labores) | X | | |
| Las paredes de la excavación, zanja o pozo están entibadas en caso de requerirlo o según se determine con concepto escrito de geotecnista | | | X |
| Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo o uso adecuado de protección? (anexar concepto si permite) | | | X |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia | X | | |
| Están disponibles las herramientas para rescate en caso de emergencia | X | | |
| Se dispone de un equipo auxiliar para subir el material retirado de la zanja, excavación, p/a. El metro de distancia de borde de la excavación) | X | | |


| 4 Si por la profundidad de la excavación se requieren bancas en diferentes niveles (altura mayor de superior a 2,00 metros) verificar: | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento para escalas y pescantes de la excavación | X | | |

| 5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación verificar aspectos de ancho: | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| La distancia entre escalones de la escalera es la misma y mín. 40 cm | X | | |
| Están los pasos de las escaleras en buen estado | X | | |
| Las longitudes de las escaleras son mayores de 6m | X | | |
| Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior | X | | |

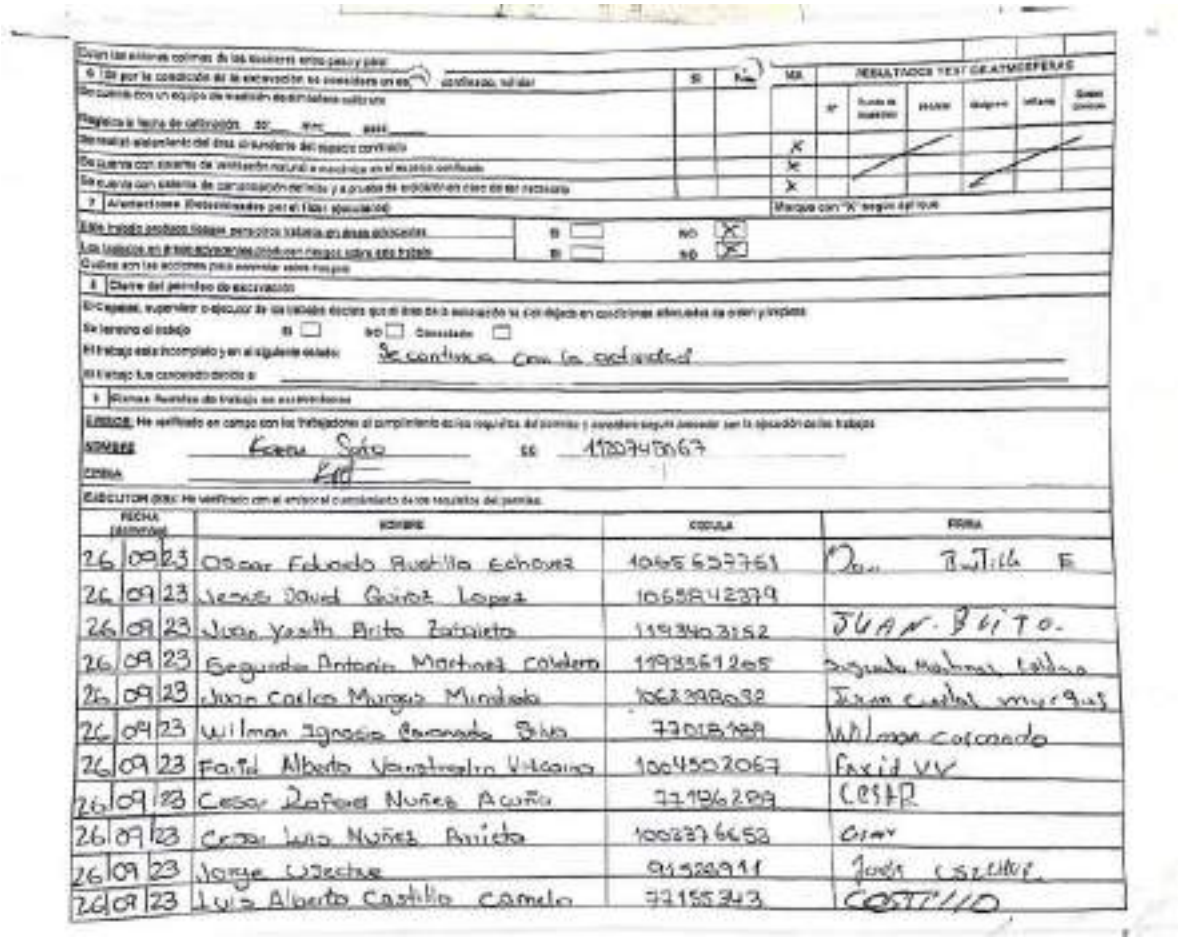


Se continua con la actividad

| FECHA (dd/mm/aa) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 26/09/23 | Oscar Eduardo Avendaño Echeverz | 1065627761 | |
| 26/09/23 | Jeiner David Gomez Lopez | 1065842379 | |
| 26/09/23 | Juan Yesith Brito Zapateta | 1193403162 | JUAN BRITO. |
| 26/09/23 | Segundo Antonio Martinez Calderon | 1193561205 | |
| 26/09/23 | Juan Carlos Murgas Mendoza | 1062398032 | |
| 26/09/23 | Wilman Ignacio Coronado Silva | 77018189 | |
| 26/09/23 | Farid Alberto Valderrama Vergara | 1064502067 | |
| 26/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77196299 | |
| 26/09/23 | Cesar Luis Nuñez Barrios | 1003376658 | |
| 26/09/23 | Jorge Sanchez | 91529911 | |
| 26/09/23 | Luis Alberto Castilla Camelo | 77155343 | |

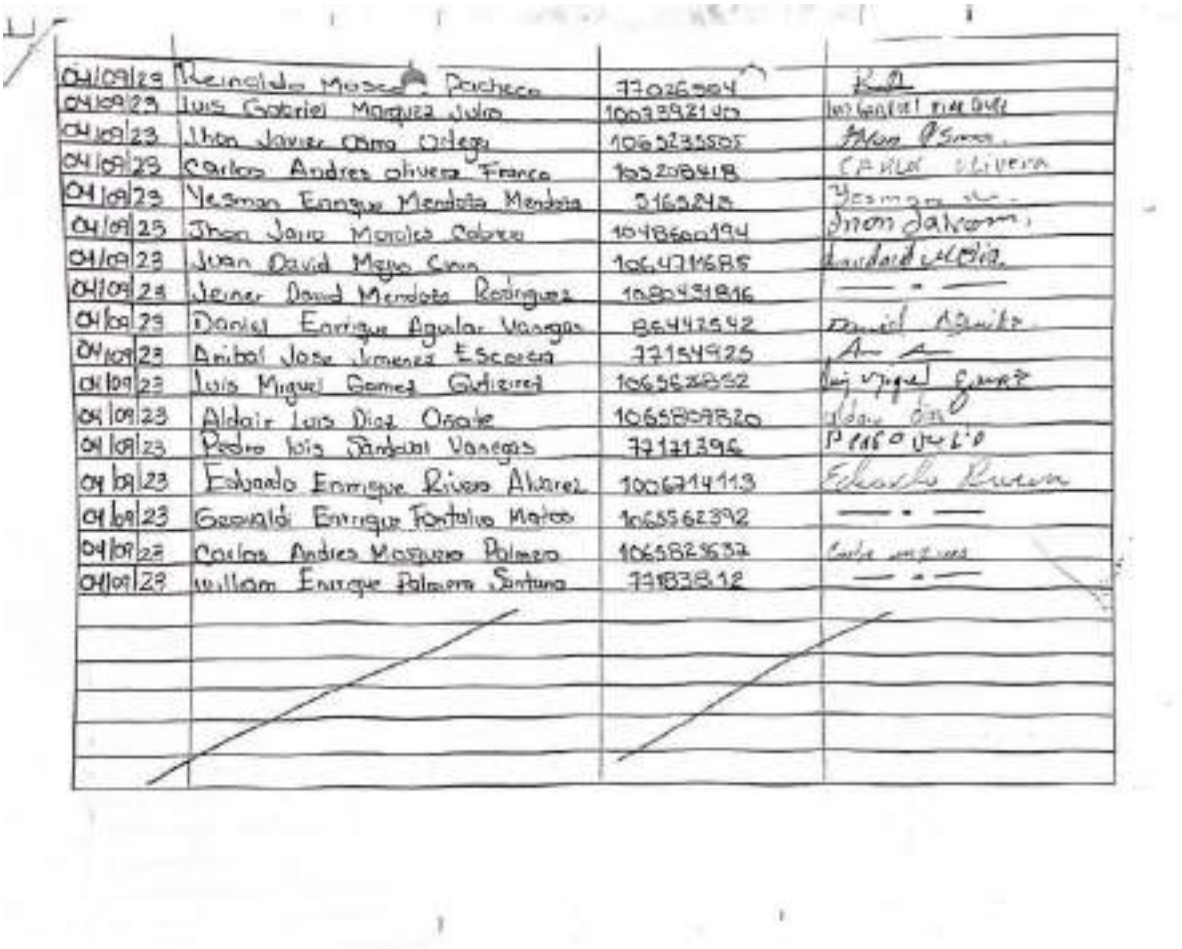

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04/09/23 | Reinaldo Moises Pacheco | 77026904 | |
| 04/09/23 | Luis Gabriel Marquez Julio | 1003392140 | |
| 04/09/23 | Jhon Javier Ome Ortega | 1065235505 | |
| 04/09/23 | Carlos Andres Olivera Franco | 1052088418 | |
| 04/09/23 | Yesman Enrique Mendoza Mendoza | 3163248 | |
| 04/09/23 | Jhon Jairo Morales Cabrera | 1048660194 | |
| 04/09/23 | Juan David Mejia Cano | 1064711685 | |
| 04/09/23 | Jeiner David Mendoza Rodriguez | 1080491816 | |
| 04/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Vanegas | 86447542 | |
| 04/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 77154925 | |
| 04/09/23 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1065628852 | |
| 04/09/23 | Aldair Luis Diaz Osorio | 1065809820 | |
| 04/09/23 | Pedro Luis Sandoval Vanegas | 77171396 | |
| 04/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006714113 | |
| 04/09/23 | Gabriel Enrique Fontalvo Mateo | 1065562392 | |
| 04/09/23 | Carlos Andres Mosquera Palmera | 1065826537 | |
| 04/09/23 | William Enrique Palmera Santana | 77183812 | |

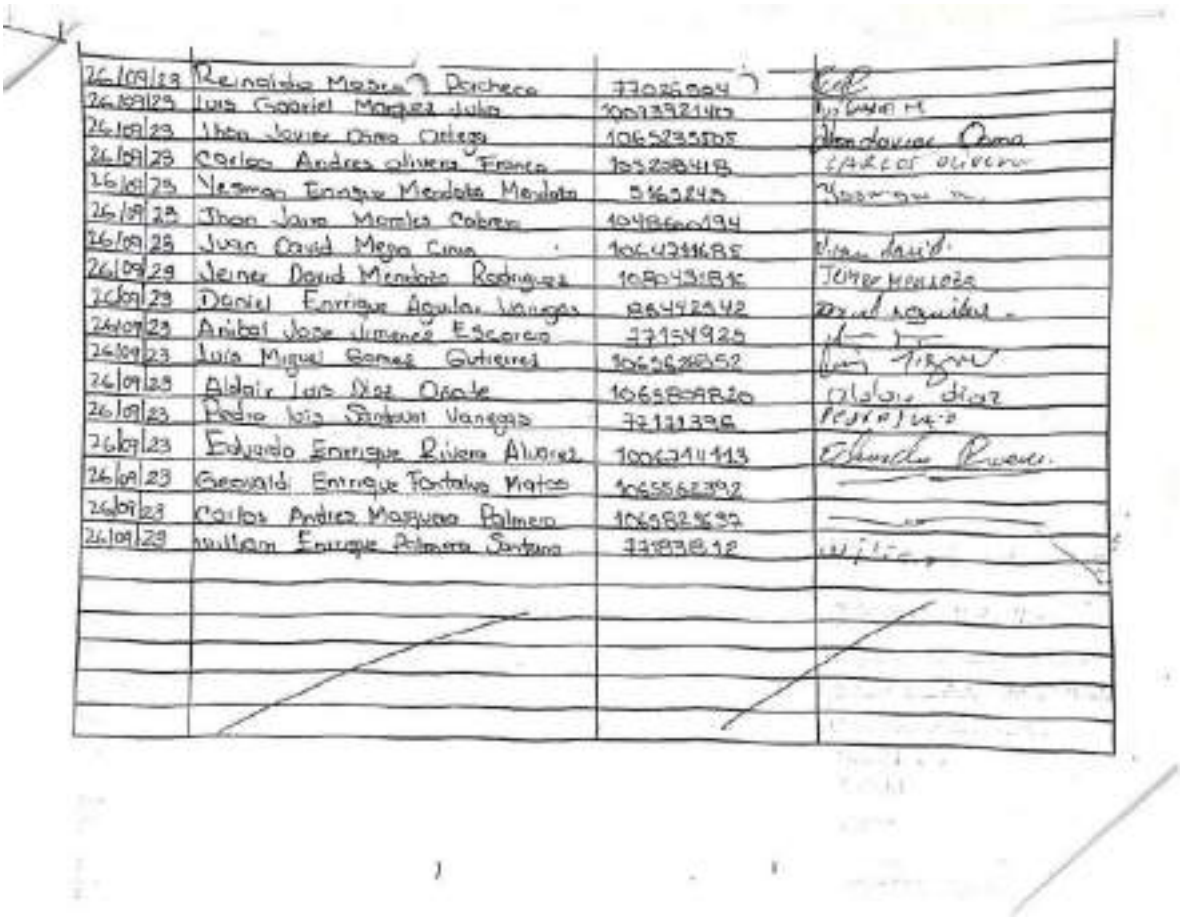

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26/09/23 | Reinaldo Madera Pacheco | 77026984 | |
| 26/09/23 | Luis Gabriel Marquez Julio | 1067392142 | |
| 26/09/23 | Jhon Javier Oviedo Ortega | 1065235505 | |
| 26/09/23 | Carlos Andres Olivera Franco | 1052084118 | |
| 26/09/23 | Yesman Enrique Mendoza Mendoza | 8563245 | |
| 26/09/23 | Jhon Jairo Montes Cabrera | 1048660194 | |
| 26/09/23 | Juan David Mejia Cuna | 1064744685 | |
| 26/09/23 | Jeiner David Mendoza Rodriguez | 1082431816 | |
| 26/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Vanegas | 86442542 | |
| 26/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 77154925 | |
| 26/09/23 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1065268552 | |
| 26/09/23 | Aldair Luis Diaz Oyola | 1065899820 | |
| 26/09/23 | Pedro Luis Sanjuan Vanegas | 72131396 | |
| 26/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006314113 | |
| 26/09/23 | Geovanis Enrique Fontalvo Mateus | 1065562392 | |
| 26/09/23 | Carlos Andres Mosquera Palmera | 1065825697 | |
| 26/09/23 | Wuilian Enrique Palmera Santana | 77189818 | |



| | |
|---|---|
| Versión: 1 | |
| Fecha: 10/05/2023 | PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES |
| Clasificación: Interno | |

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACION DE LA TAREA: Día 27 Mes 09 Año 23 HORA: 07:00 A 05:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

AREA O LUGAR: Construcción nuevo edificio Palacio de Justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 24

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de filtro (Geodren, Tecnofil)

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pica, barra, canastilla, balde.

Los trabajadores han sido informados de los riesgos, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [x] NO [ ]

2 Dimensiones


Ancho 3.0 mts Profundidad 5.0 mts Largo 4.5 mts

Modo de Excavación: Manual [x] Mecánico [ ] Equipo a utilizar:


| 3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del terreno (serán evaluadas para la ejecución del trabajo) | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | X | | |
| El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pozos de torres, pilas, entre otros) | X | | |
| Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y demás requeridos para la tarea (casco, botas, impermeables, cambio de ropa, luz, Guantes, entre otros) | X | | |
| Las instalaciones se encuentran en condiciones de aseo adecuadas para ejecutar la labor. | X | | |
| Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación | X | | |
| La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada | X | | |
| Antes de iniciar los trabajos de excavación, se realizó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y fuentes principales de abastecimiento (acueducto, alcantari | X | | |
| Las paredes de la excavación (zanjas o pilas) están entibadas (en caso de requerirlo negativo se debe contar con concepto escrito de geotecnista) | | | X |
| Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo u otro esquema de protección (pantalla de pilotes) | | | X |
| Se cuenta con un procedimiento de escala para caso de emergencia | X | | |
| Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia | X | | |
| Se dispone de un espacio suficiente para izaje el material retirado de la zanja, excavación, pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación). | X | | |

| 4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en Alturas (altura vertical superior a 2.00 metros) verificar: | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación | X | | |

| 5 Si se utilizan escaleras para acceder a la excavación se debe cumplir con lo siguiente: | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| La distancia entre escalones de la escalera es la misma y mide 40 cm | X | | |
| Están los pasos de las escaleras en buen estado | X | | |
| Los largueros de las escaleras son iguales de fin | X | | |
| Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre el apoyo superior | X | | |

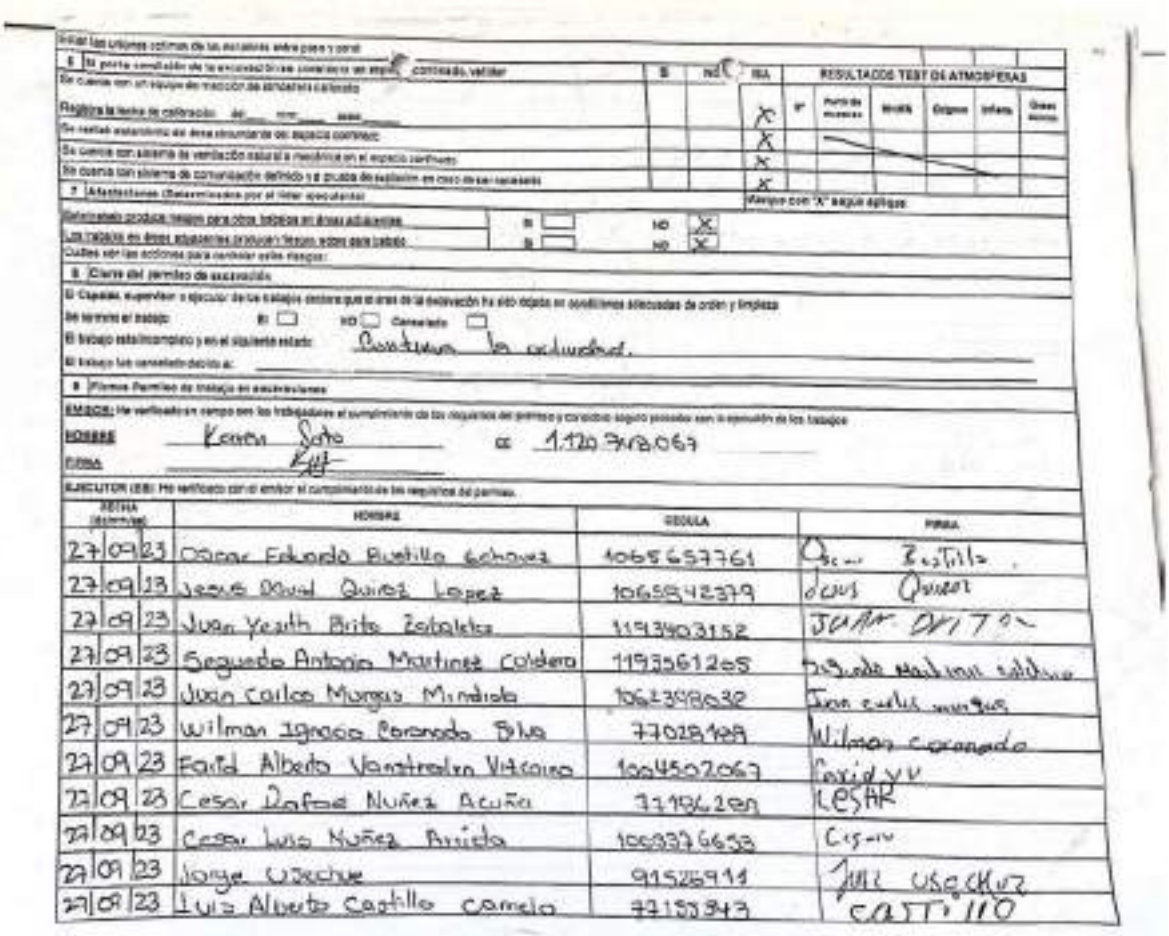

| FECHA (dd/mm/aa) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 27/09/23 | Oscar Eduardo Bustillo Echavez | 1065657761 | |
| 27/09/23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1065842379 | |
| 27/09/23 | Juan Yeath Brito Zabaleta | 1193403152 | |
| 27/09/23 | Segundo Antonio Martinez Coldera | 11935612es | |
| 27/09/23 | Juan Carlos Murgas Mendiola | 1063398632 | |
| 27/09/23 | Wilman Ignacio Coronado Silva | 77028198 | |
| 27/09/23 | Farid Alberto Ventrolera Vizcaino | 1064502067 | |
| 27/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77196209 | |
| 27/09/23 | Cesar Luis Nuñez Bustillo | 1063376653 | |
| 27/09/23 | Jorge Usechue | 91525911 | |
| 27/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77193343 | |

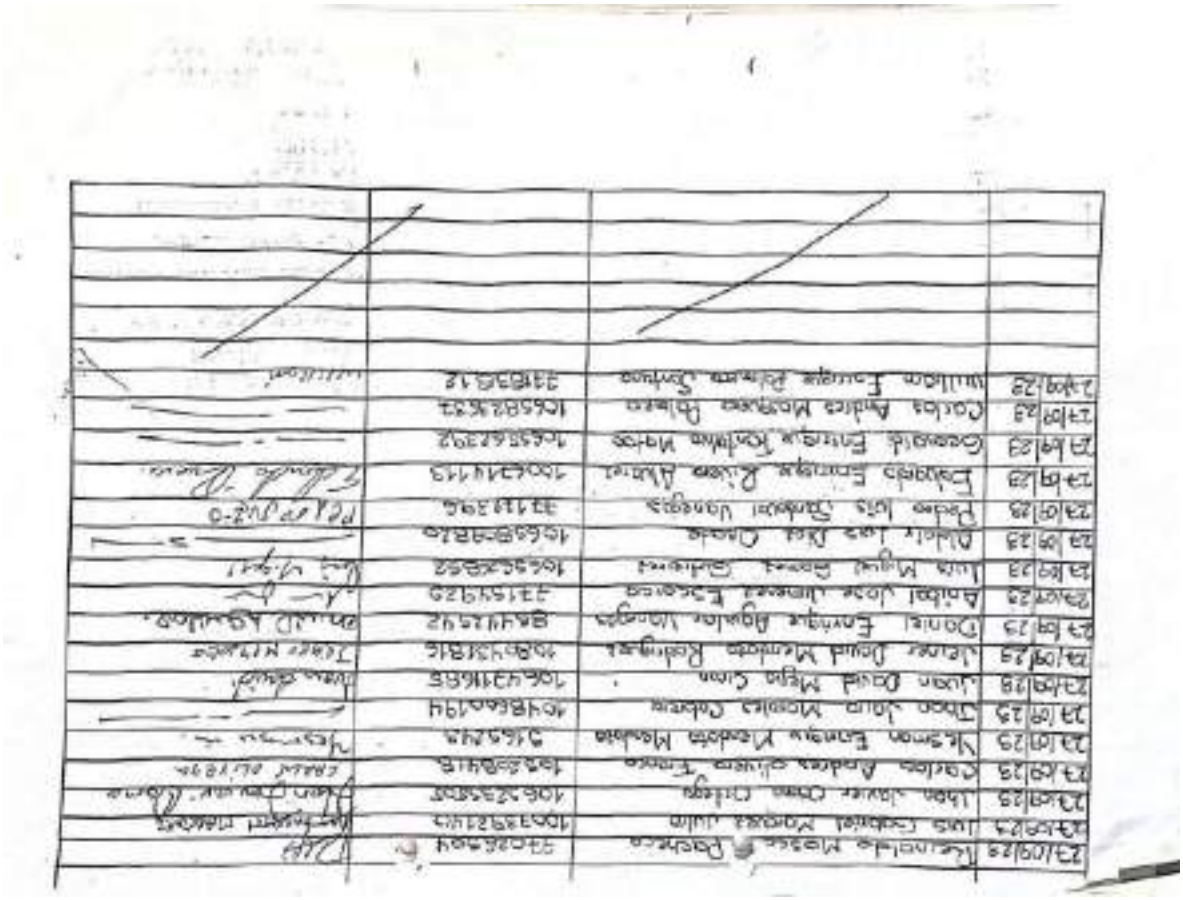



Versión: 1
Fecha: 11/05/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 28 / 09 / 23 — HORA: 0700 a 0500 p

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Nueva torre palacio de justicia — Nº PERSONAS EJECUTORES: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de filtros (Geodre-Tecnitex)

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Palas, Picas, Barra, Cuerdas, Inhibe.


Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho: 3.0 mts — Profundidad: 3.0 mts — Largo: 1.3 mts

Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánico ☐ — Equipo a utilizar: N/A

| 3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavación | X | | |
| El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (cortes, pilote de borde, pilas, entre otros) | X | | |
| Se cuentan con elementos de protección personal EPP y colectiva requeridos para la tarea (Casco, Botas, reata personal, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros) | X | | |
| Las instalaciones se encuentran en condiciones de orden adecuados para ejecutar la labor | X | | |
| Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación | X | | |
| La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada | X | | |
| Antes de ejecutar los trabajos de excavación, se ha revisado donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, alcantarillado, gas y cruce principales de abastecimiento cuerpo aéreo? | X | | |
| Las paredes de la excavación, cortes o pilas están entibadas (en caso de requerirlo) recuerde que debe contar con concepto escrito de geotecnista) | | | X |
| Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo, sin esquema de protección? (anexar concepto si permite) | | | X |
| Se cuenta con un plan de rescate para casos de emergencia | X | | |
| Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia | X | | |
| Se dispone de un espacio suficiente para alojar el material retirado de la zanja, excavación, pilo, (1 metro de distancia del borde de la excavación) | X | | |
| 4 Si por la profundidad de la excavación el operario trabajo en alturas (altura requerida superior a 2.00 metros) verifique: | SI | NO | NA |
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | X | | |
| Se cuenta con procedimiento para ascenso y descenso de la excavación | X | | |
| 5 Si se utilizan escaleras para ingreso a la excavación validar requisitos de acceso: | SI | NO | NA |
| La distancia entre escalones de la escalera es la misma y mide 40 cm | X | | |
| Existen pasos de las escaleras en buen estado | X | | |
| Los largueros de las escaleras son mínimo de 3m | X | | |
| Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior | X | | |

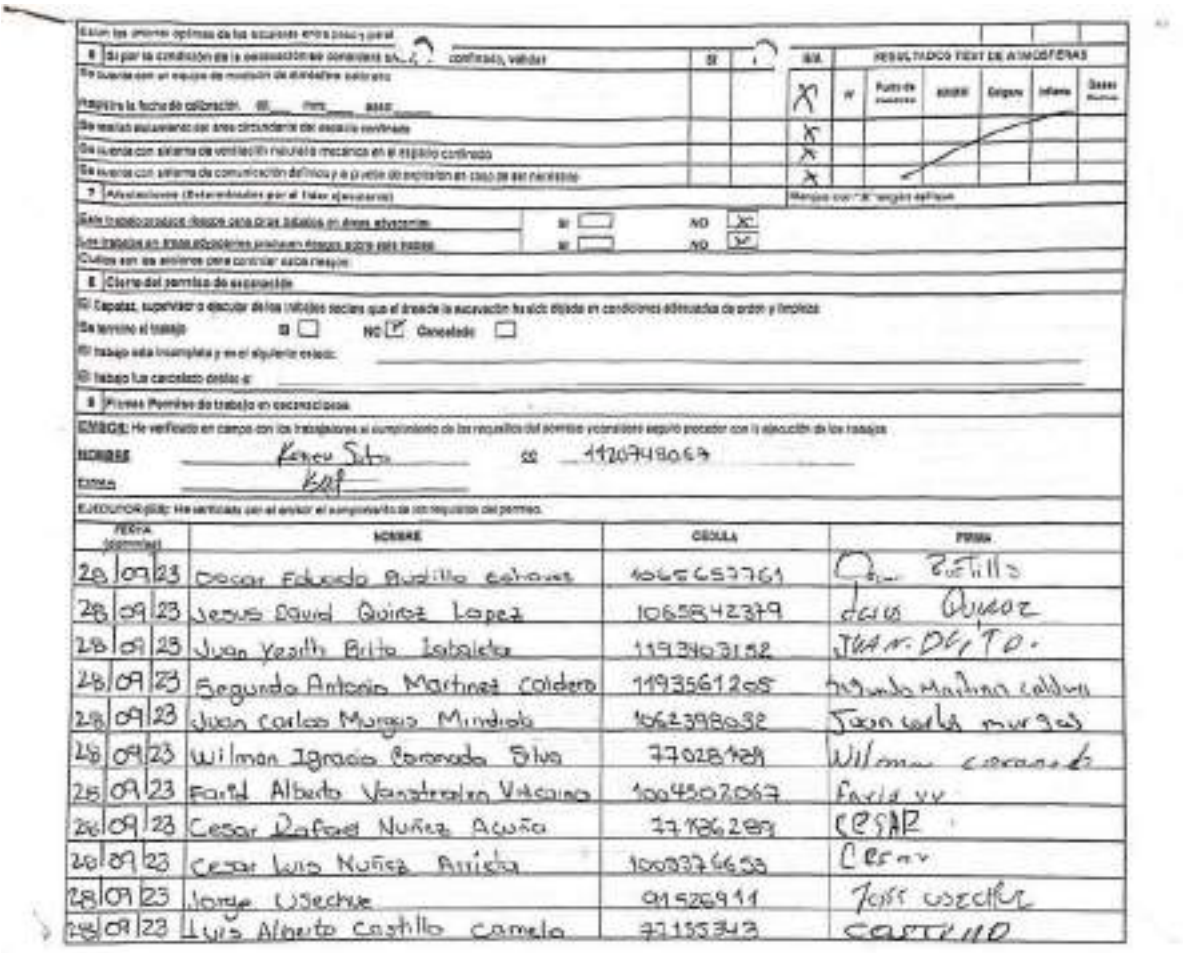

Estan las alturas optimas de las escaleras entre pisos y piso

8 Si por la condición de la excavación se considera sin confinar, validar — SI / X

Se cuenta con un equipo de medición de atmosfera adecuado — X

Registre la fecha de calibración: dd mm aaaa

Se realiza aislamiento del área circundante del espacio confinado — X

Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado — X

Se cuenta con sistema de comunicación definido y a la vista de ingresantes en caso de ser necesario — X

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS: M | Punto de muestreo | Oxigeno | Inflama | Gases

7 Afectaciones (Determinadas por el Líder ejecutante) — Medidas correctivas según aplique

Este trabajo requiere mayor cerramiento temporal o barrera adicional? SI ☐ NO ☒

Los trabajos en estas alturas generan riesgos extra para terceros? SI ☐ NO ☒

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de las labores seguras que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


ENTREGA: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso vigente para proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Kenny Silva CC 1120748069


FIRMA

EJECUTOR (ES): He verificado con el anterior el cumplimiento de los requisitos del permiso.

| FECHA (dd/mm/aa) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 28/09/23 | Cesar Eduardo Bustillo Estevez | 1065653761 | |
| 28/09/23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1065842379 | |
| 28/09/23 | Juan Yesith Brito Isabelle | 1193463158 | |
| 28/09/23 | Segundo Antonio Martinez Caldera | 11935612 08 | |
| 28/09/23 | Juan Carlos Murgas Mendoza | 1063398038 | |
| 28/09/23 | Wilman Ignacio Coronado Silva | 77028128 | |
| 25/09/23 | Farid Alberto Vanstralen Velasco | 1004502067 | |
| 26/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77186289 | |
| 26/09/23 | Cesar Luis Nuñez Arrieta | 1003376658 | |
| 28/09/23 | Jorge Usechie | 91526911 | |
| 28/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77155343 | |

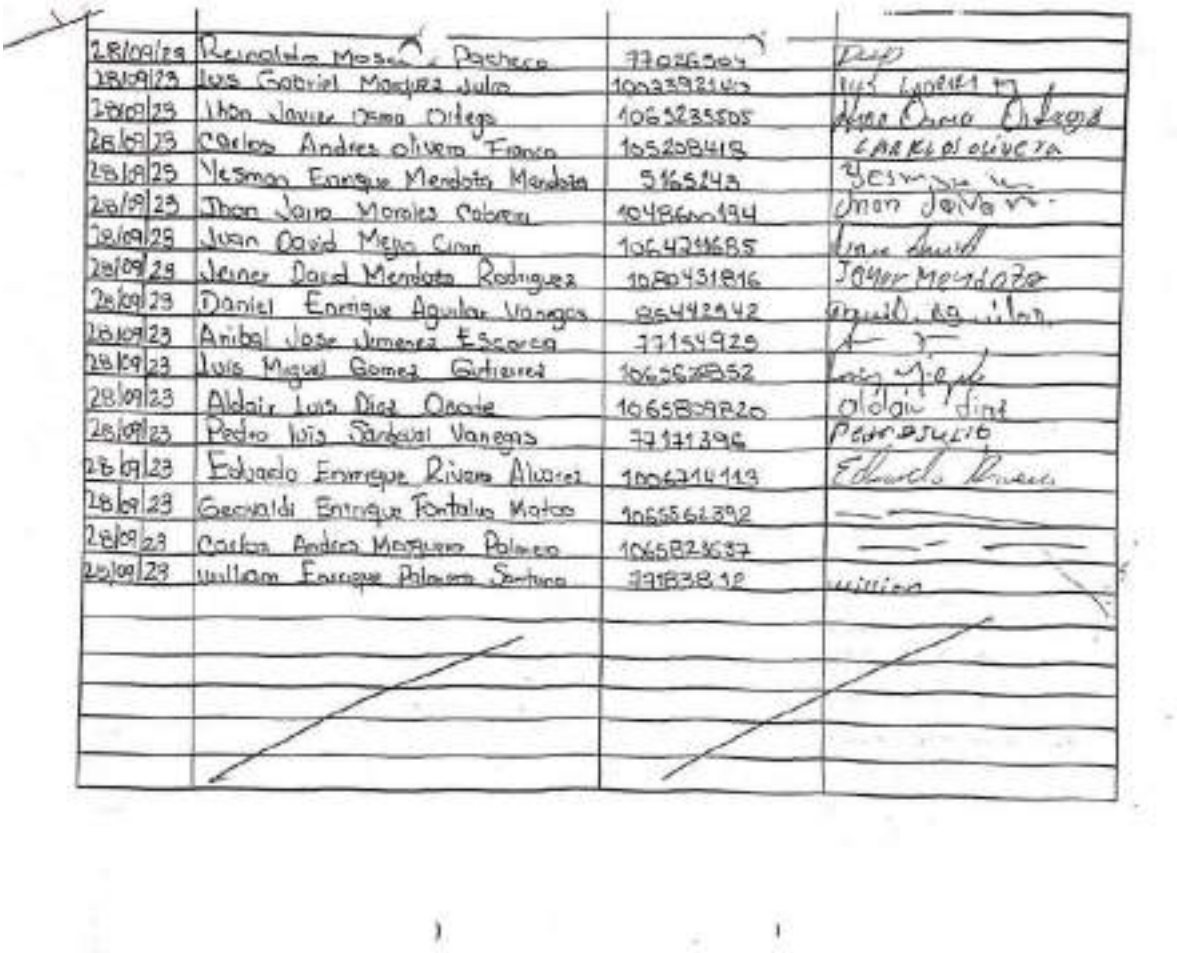

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28/09/23 | Reynaldo Mosq[illegible] Pacheco | 77026304 | |
| 28/09/23 | Luis Gabriel Maquez Julio | 1003931403 | |
| 28/09/23 | Ihan Javier Osma Ortega | 1065235505 | |
| 28/09/23 | Carlos Andres olivera Franco | 1052088418 | |
| 28/09/23 | Nesman Enrique Mendoza Mendoza | 5165248 | |
| 28/09/23 | Ihan Jairo Morales Cabrera | 1048660194 | |
| 28/09/23 | Juan David Mejia Cuan | 1064246685 | |
| 28/09/23 | Jaimes David Mendoza Rodriguez | 1080431816 | |
| 28/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Vanegas | 85442542 | |
| 28/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 77154929 | |
| 28/09/23 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1065628852 | |
| 28/09/23 | Aldair Luis Diaz Ospino | 1065839820 | |
| 28/09/23 | Pedro luis Sandoval Vanegas | 77171396 | |
| 28/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006216113 | |
| 28/09/23 | Geovaldi Enrique Fontalvo Matos | 1065861392 | |
| 28/09/23 | Carlos Andres Manjarres Polanco | 1065823637 | |
| 28/09/23 | William Enrique Palomino Santana | 1918388 12 | |

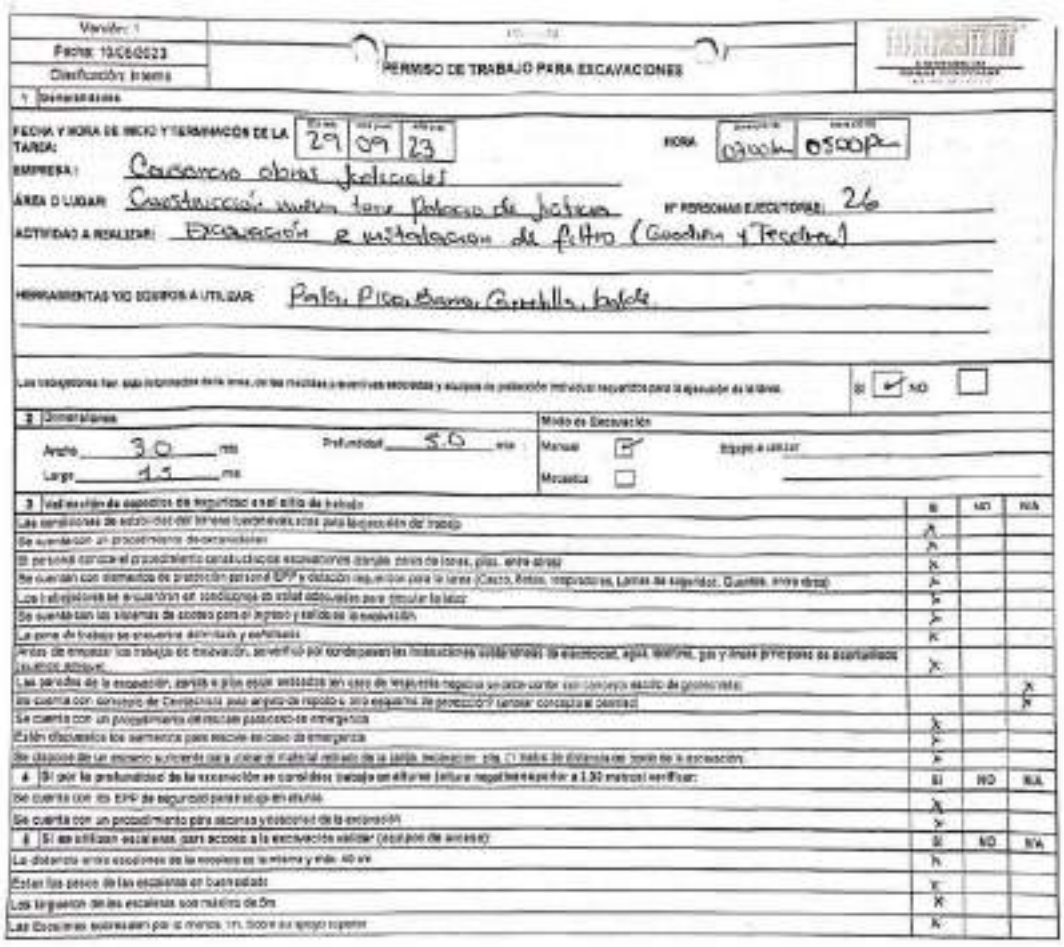

Versión: 1
Fecha: 19/06/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 29 / 09 / 23 — HORA: 07:00 a.m. — 05:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción nueva torre Palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de filtro (Geodren y Tradicional)

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Guadaña, balde


Los trabajadores han sido informados de los riesgos y medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [x] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 3.0 mts — Profundidad 5.0 mts — Largo 1.5 mts

Medio de Excavación: Manual [x] — Equipo a utilizar: Mecánica [ ]

| 3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del terreno (pendientes) son para la ejecución del trabajo | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | X | | |
| El personal conoce el procedimiento para ejecutar excavaciones (riesgos, zona de cargas, pisos, entre otros) | X | | |
| Se cuentan con elementos de protección personal EPP's y dotación requerida para la tarea (Casco, Botas, Impermeables, Gafas de seguridad, Guantes, entre otros) | X | | |
| Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para realizar la labor | X | | |
| Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de excavación | X | | |
| La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada | X | | |
| Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por cuerdas para las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, alcantarillado, gas y otros principales se ubicaron y marcaron adecuadamente | X | | |
| Las paredes de la excavación, zanja o pozo están entibadas en caso de requerirlo según un plan diseñado con concepto escrito de profesional | | | X |
| Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo o otro esquema de protección (anexar concepto al permiso) | | | X |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para casos de emergencia | X | | |
| Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia | X | | |
| Se dispone de un equipo auxiliar para izar el material retirado de la zanja excavación, p/e: Malacate, polea, trípode o similar para izar la excavación | X | | |
| 4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en altura (altura negativa superior a 1.50 metros) verificar: | SI | NO | N/A |
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación | X | | |
| 5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipo de acceso) | SI | NO | N/A |
| La distancia entre escalones de la escalera es la misma y esta: 40 cm | X | | |
| Están los pasos de las escaleras en buen estado | X | | |
| Las longitudes de las escaleras son máximo de 5m | X | | |
| Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. sobre su apoyo superior | X | | |

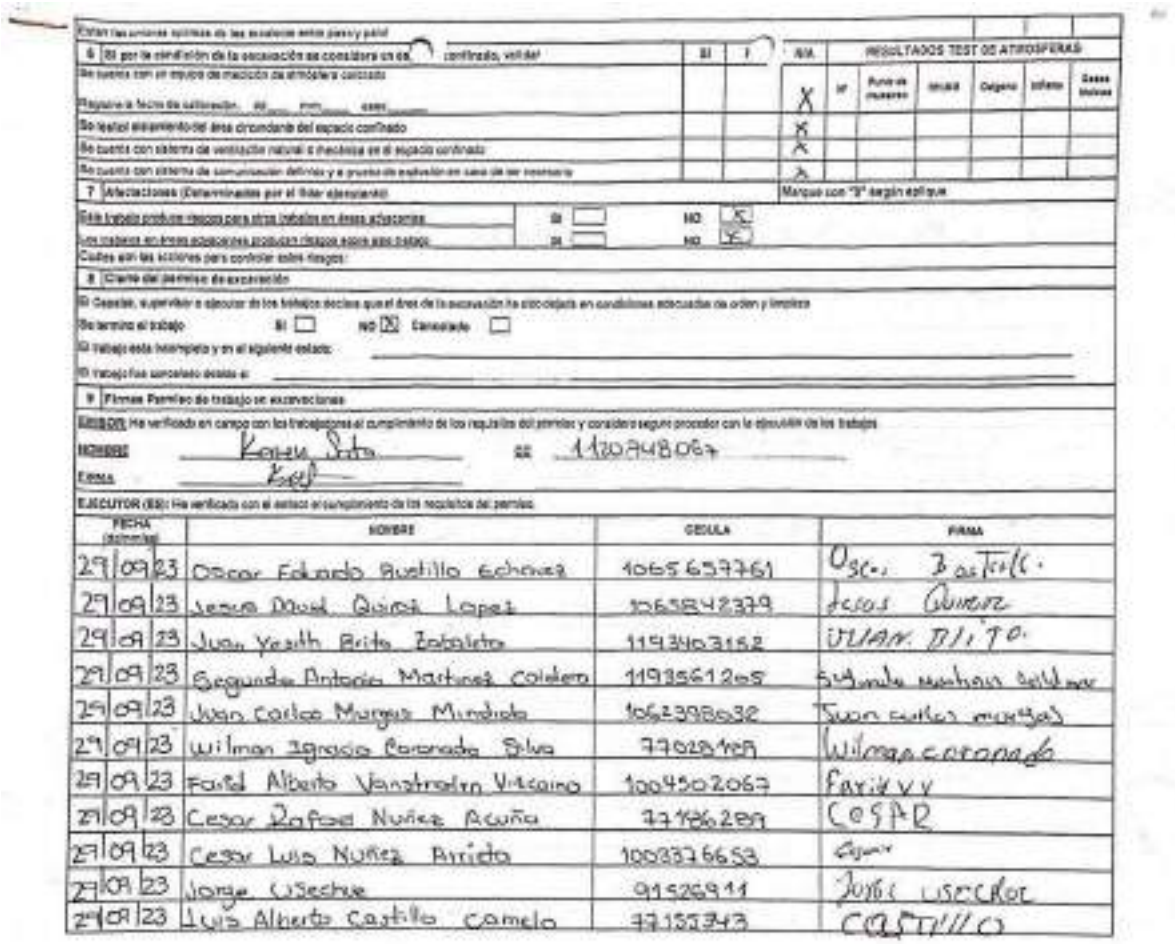

Antes las anteriores opciones de las excavaciones entre pares y pares

6 | El por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar | SI | X | N/A

Se cuenta con un equipo de medición de atmósfera calibrado — Registre la fecha de calibración: dd mm aaaa — X

Se realizó el aislamiento del área circundante del espacio confinado — X

Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado — X

Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario — X

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS: Nº | Punto de muestreo | Oxigeno | Inflamables | Gases tóxicos

7 | Afectaciones (Determinadas por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes — SI ☐ NO ☒

Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo — SI ☐ NO ☒

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:

8 | Diario del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termina el trabajo — SI ☐ NO ☒ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

9 | Firmas Permiso de trabajo en excavaciones

EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos


NOMBRE: Karen Soto — CC 1120948067

Firma: Karen

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso

| FECHA (dd/mm/aa) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 29/09/23 | Oscar Eduardo Bustillo Echavez | 1065637761 | Osc. Bustillo. |
| 29/09/23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1063842379 | Jesus Quiroz |
| 29/09/23 | Juan Yesith Brito Zabaleta | 1193403152 | JUAN D. B. T. |
| 29/09/23 | Segundo Antonio Martinez Coley | 1193561205 | Segundo martinez coley |
| 29/09/23 | Juan Carlos Murgas Mendiola | 1063998032 | Juan carlos murgas |
| 29/09/23 | Wilman Ignacio Coronado Silva | 77029169 | Wilman coronado |
| 29/09/23 | Farid Alberto Vanstralen Villaino | 1004902067 | Farid V V |
| 29/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77196289 | CESAR |
| 29/09/23 | Cesar Luis Nuñez Brito | 1003376653 | Cesar |
| 29/09/23 | Jorge Useche | 91526911 | Jorge Useche |
| 29/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77155343 | CASTILLO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29/09/23 | Reinaldo Manuel Pacheco | 77026904 | Rep |
| 29/09/23 | Luis Gabriel Marquez Julio | 1002392142 | |
| 29/09/23 | Jhon Javier Osma Ortega | 1065235505 | |
| 29/09/23 | Carlos Andres Olivera Franco | 1052084118 | |
| 29/09/23 | Yesman Enrique Mendoza Mendoza | 5165143 | |
| 29/09/23 | Jhon Jairo Morales Cabrera | 1048660194 | |
| 29/09/23 | Juan David Mejia Cano | 1064211685 | |
| 29/09/23 | Jeiner David Mendoza Rodriguez | 1082431816 | |
| 29/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Vanegas | 85442942 | |
| 29/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 77154925 | |
| 29/09/23 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1065628852 | |
| 29/09/23 | Aldair Luis Diaz Osorio | 1065829820 | |
| 29/09/23 | Pedro Luis Sandoval Vanegas | 77171396 | |
| 29/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006714113 | |
| 29/09/23 | Geovald Enrique Fontalvo Mojica | 1065562392 | |
| 29/09/23 | Carlos Andres Mosquera Palmera | 1065823637 | |
| 29/09/23 | William Enrique Palmera Santana | 1193928118 | |

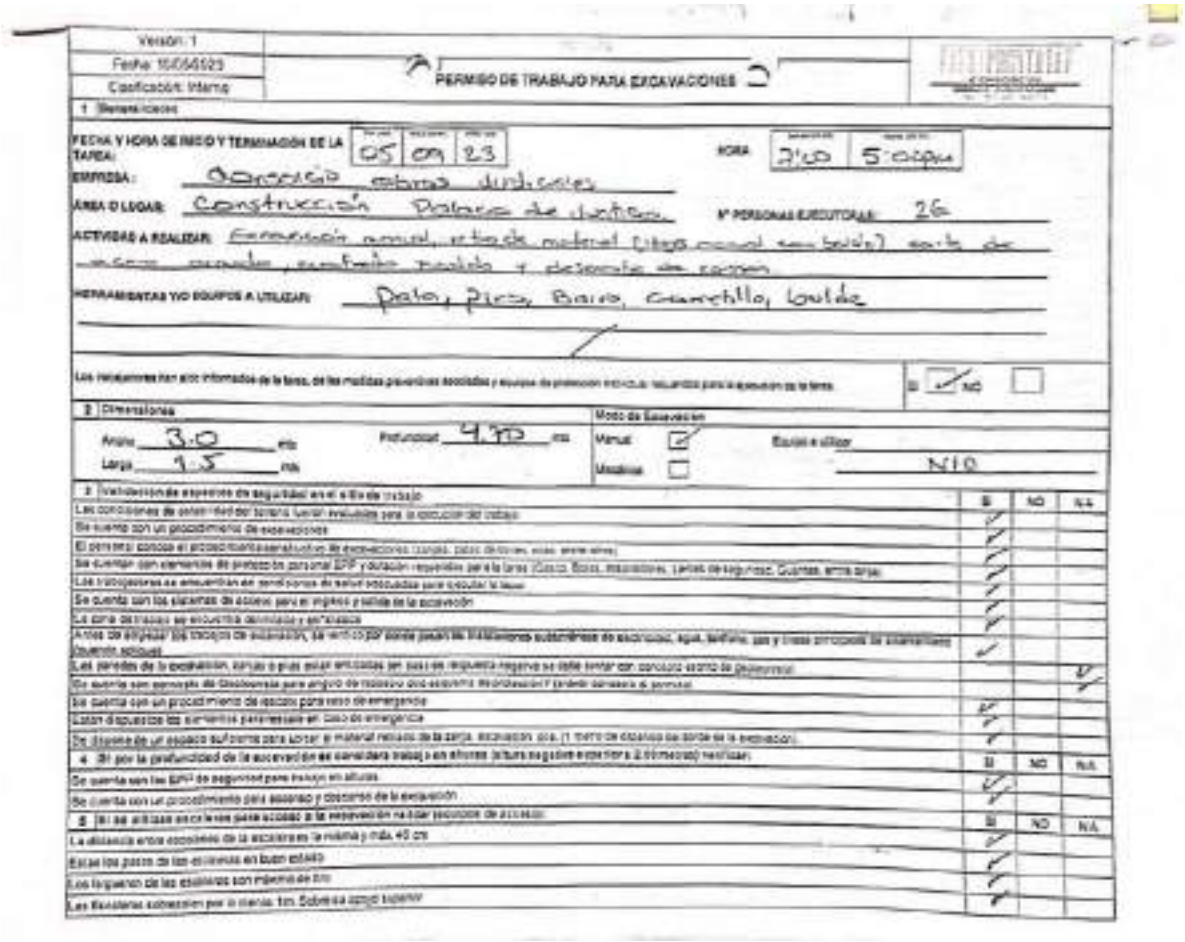

Versión: 1
Fecha: 15/04/2020
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 05 09 23 HORA 7:00 5:00pm

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia. Nº PERSONAS EJECUTARÁ: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual, retiro de material (viga manual con balde) cerca de cerca, cuerdas, canaletas rasilla y pedestales de concreto

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Lutda

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual necesarios para la ejecución de la tarea. SI ✓ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 3.0 mts Profundidad 4.90 mts


Largo 9.5 mts

Modo de Excavación

Manual ✓ Equipo a utilizar NIO

Mecánica ☐


| 3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo | SI | NO | N.A |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del terreno (serán evaluadas para la ejecución del trabajo) | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavaciones | ✓ | | |
| El personal conoce el procedimiento seguro de excavaciones (riesgos, peligros, medidas, equipo, entre otros) | ✓ | | |
| Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, mascarillas, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros) | ✓ | | |
| Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor | ✓ | | |
| Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación | ✓ | | |
| La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada | ✓ | | |
| Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y otras, procurando la suficiente cautela aplicada | ✓ | | |
| Las paredes de la excavación, zanjas o pozos serán entibadas en caso de requerirlo, reforzar con concreto contra los derrumbes | | | ✓ |
| Se cuenta con aprobación de Ordenanza para ingreso de vehículo dos ejes/mts (Movilización y tiempo autorizado de permiso) | | | ✓ |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia | ✓ | | |
| Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia | ✓ | | |
| Se dispone de un espacio suficiente para acopiar el material retirado de la zanja, excavación, etc. (1 metro de distancia de borde de la excavación) | ✓ | | |
| 4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura mayor a 1.5 mts) verificar: | SI | NO | N.A. |
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | ✓ | | |
| Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación | ✓ | | |
| 5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación se debe asegurar: | SI | NO | N.A. |
| La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más 40 cm | ✓ | | |
| Están los pasos de los escalones en buen estado | ✓ | | |
| Los largueros de las escaleras son material de alto | ✓ | | |
| Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre el apoyo superior | ✓ | | |

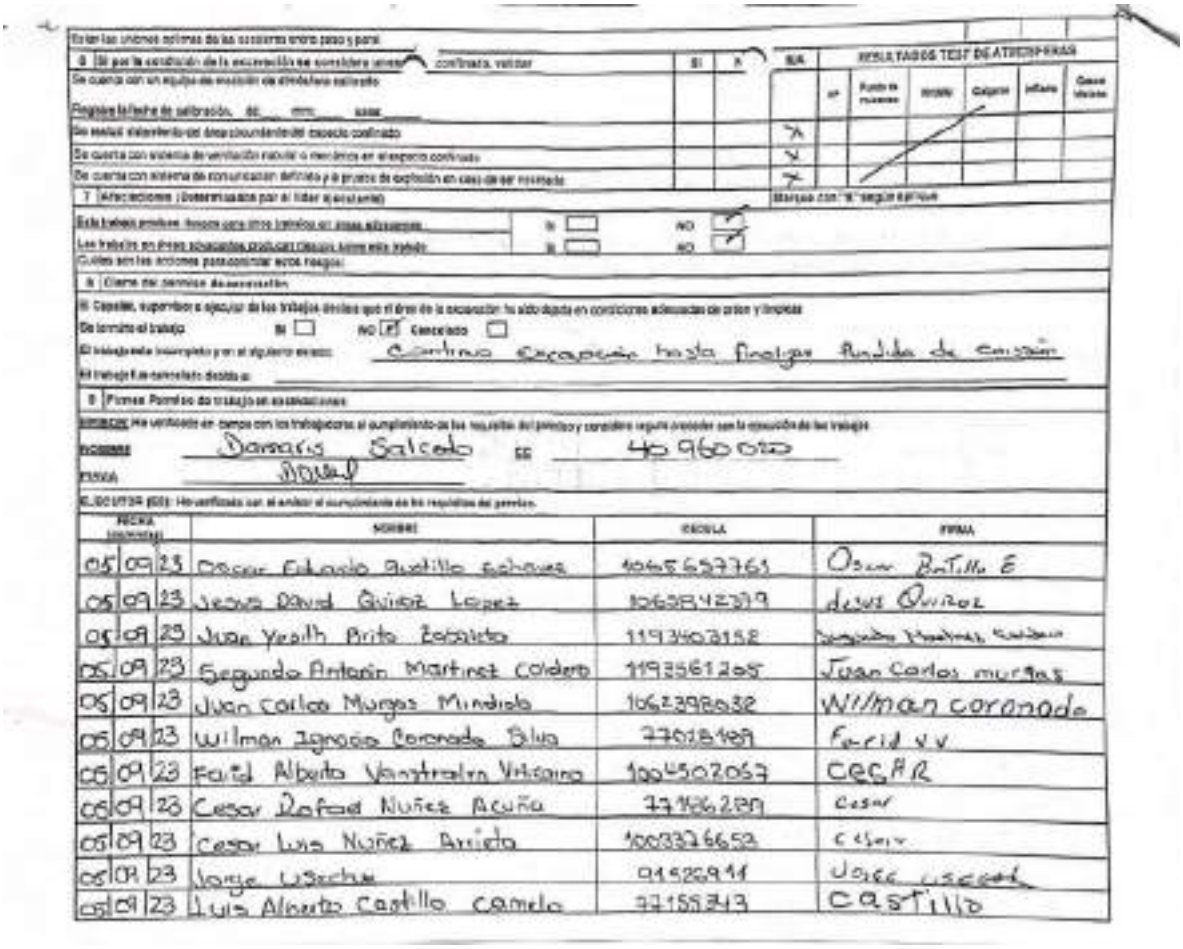


Continuo excavacion hasta finalizar Jornada de Emisión

Damaris Salcedo CC 46960020

| FECHA | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 05/09/23 | Cesar Eduardo Castillo Chaves | 1045657761 | Cesar Castillo E |
| 05/09/23 | Jesus David Olivos Lopez | 1063842319 | Jesus Olivos |
| 05/09/23 | Juan Yeith Brito Zapata | 1193403158 | |
| 05/09/23 | Segundo Antonio Martinez Caldero | 1193561205 | Juan Carlos murgas |
| 05/09/23 | Juan Carlos Murgas Mendoza | 1062398032 | Wilman coronado |
| 05/09/23 | Wilman Ignacio Coronado Silva | 77018109 | Facid V V |
| 05/09/23 | Facid Alberto Valentierra Villalba | 1004502067 | CESAR |
| 05/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77186289 | Cesar |
| 05/09/23 | Cesar Luis Nuñez Arrieta | 1003376653 | Cesar |
| 05/09/23 | Jorge Ustariz | 91526911 | Jorge Ustariz |
| 05/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77155343 | Castillo |

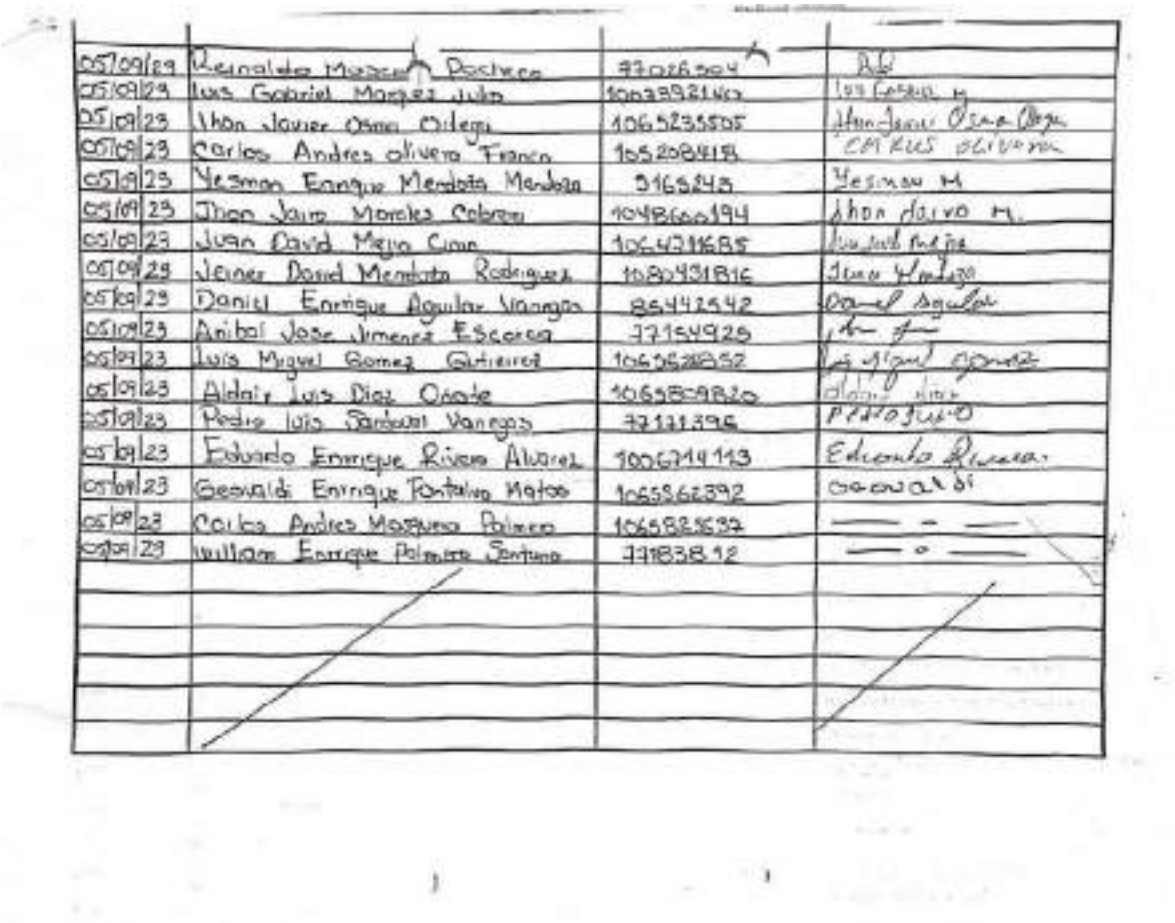

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05/09/23 | Reinaldo Manuel Pacheco | 77026304 | |
| 05/09/23 | Luis Gabriel Marquez Julio | 1063921463 | |
| 05/09/23 | Jhon Javier Osma Ortega | 1065235505 | |
| 05/09/23 | Carlos Andres Olivero Franco | 1052084118 | |
| 05/09/23 | Yesman Enrique Mendoza Mendoza | 9165845 | |
| 05/09/23 | Jhon Jairo Morales Cabrera | 1048660194 | |
| 05/09/23 | Juan David Mejia Cano | 1064311685 | |
| 05/09/23 | Jeiner David Mendoza Rodriguez | 1082931816 | |
| 05/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Vanegas | 85442542 | |
| 05/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 77154925 | |
| 05/09/23 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1065628952 | |
| 05/09/23 | Aldair Luis Diaz Conde | 1065859820 | |
| 05/09/23 | Pedro Luis Sandoval Vanegas | 77111396 | |
| 05/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006719113 | |
| 05/09/23 | Geovanis Enrique Fontalvo Matos | 1065862392 | |
| 05/09/23 | Carlos Andres Marquez Polanco | 1065865639 | |
| 05/09/23 | William Enrique Polanco Santana | 77183812 | |

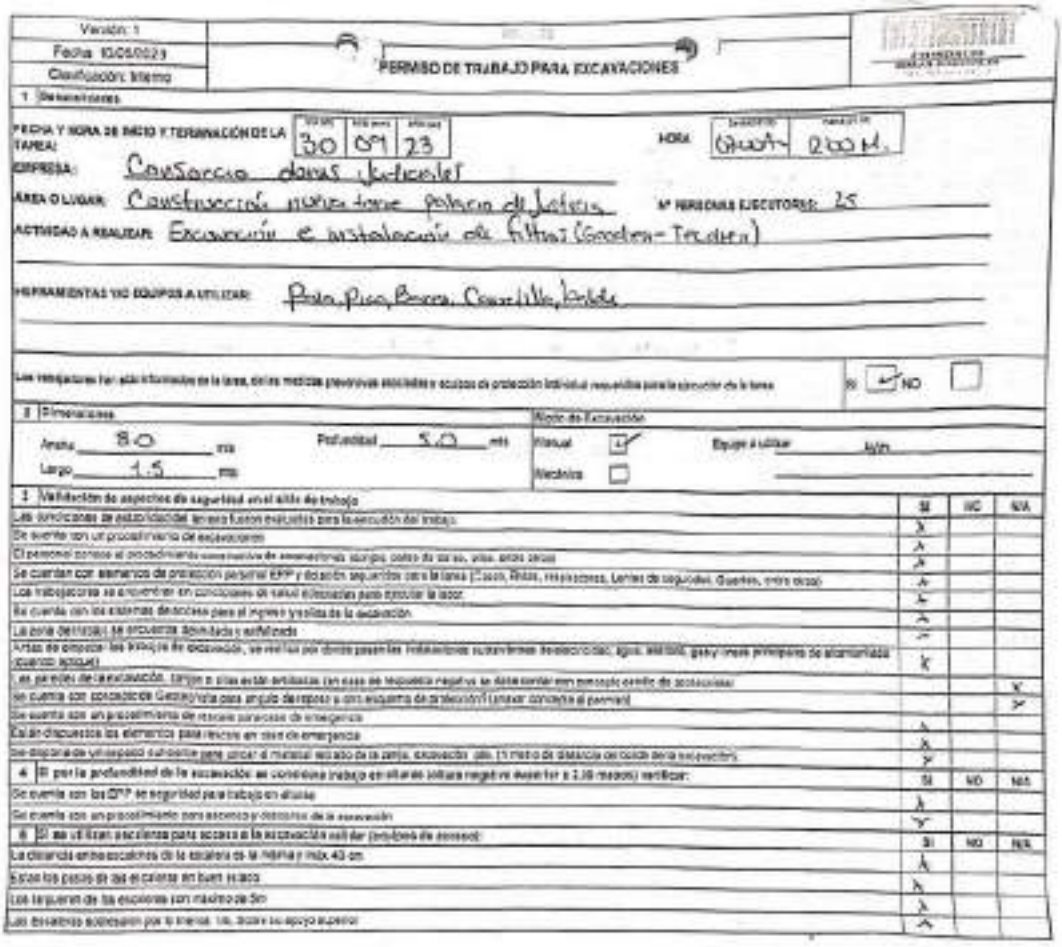

Versión: 1
Fecha: 10/08/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 30 / 09 / 23 HORA: 8 a.m. 2:00 P.M.

EMPRESA: ConSorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción nueva torre palacio de Justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de filtros (Geodren - Tradren)

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Lonilla

Las condiciones han sido informadas de la tarea, con las medidas preventivas necesarias y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea: SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho: 8.0 mts Profundidad: 5.0 mts


Largo: 1.5 mts

Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánico ☐ Equipo a utilizar: N/A


| 3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de estabilidad del área fueron evaluadas para la ejecución del trabajo | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento de excavación | X | | |
| El personal conoce el procedimiento de emergencias ubicación, costo de las vías, vías, entre otros | X | | |
| Se cuentan con elementos de protección personal EPP y de ropa seguridad para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros) | X | | |
| Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor | X | | |
| Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación | X | | |
| La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada | X | | |
| Antes de empezar las labores de excavación, se revisa por donde pasan las instalaciones subterráneas (electricidad, agua, internet, gas) y otros principios de alcantarillado (cuando aplique) | X | | |
| Las paredes de la excavación, taludes o vías están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto emitido de ingeniería) | | | X |
| Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo y con esquema de protección (Entibar concepto al permiso) | | | X |
| Se cuenta con un procedimiento de rescate para casos de emergencia | X | | |
| Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia | X | | |
| Se dispone de un espacio suficiente para apilar el material resultado de la zanja, excavación (al menos 1 metro de distancia del borde de la excavación) | X | | |

| 4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en altura (altura negativa mayor o igual a 2.00 metros) verificar: | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas | X | | |
| Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación | X | | |


| 5 Si se van a usar escaleras para acceso a la excavación valide (entibado de acceso) | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx 40 cm | X | | |
| Están los pasos de las escaleras en buen estado | X | | |
| Los largueros de las escaleras son macizos de 3in | X | | |
| Las deficiencias sobrepasan por lo menos 1m, acude su apoyo superior | X | | |

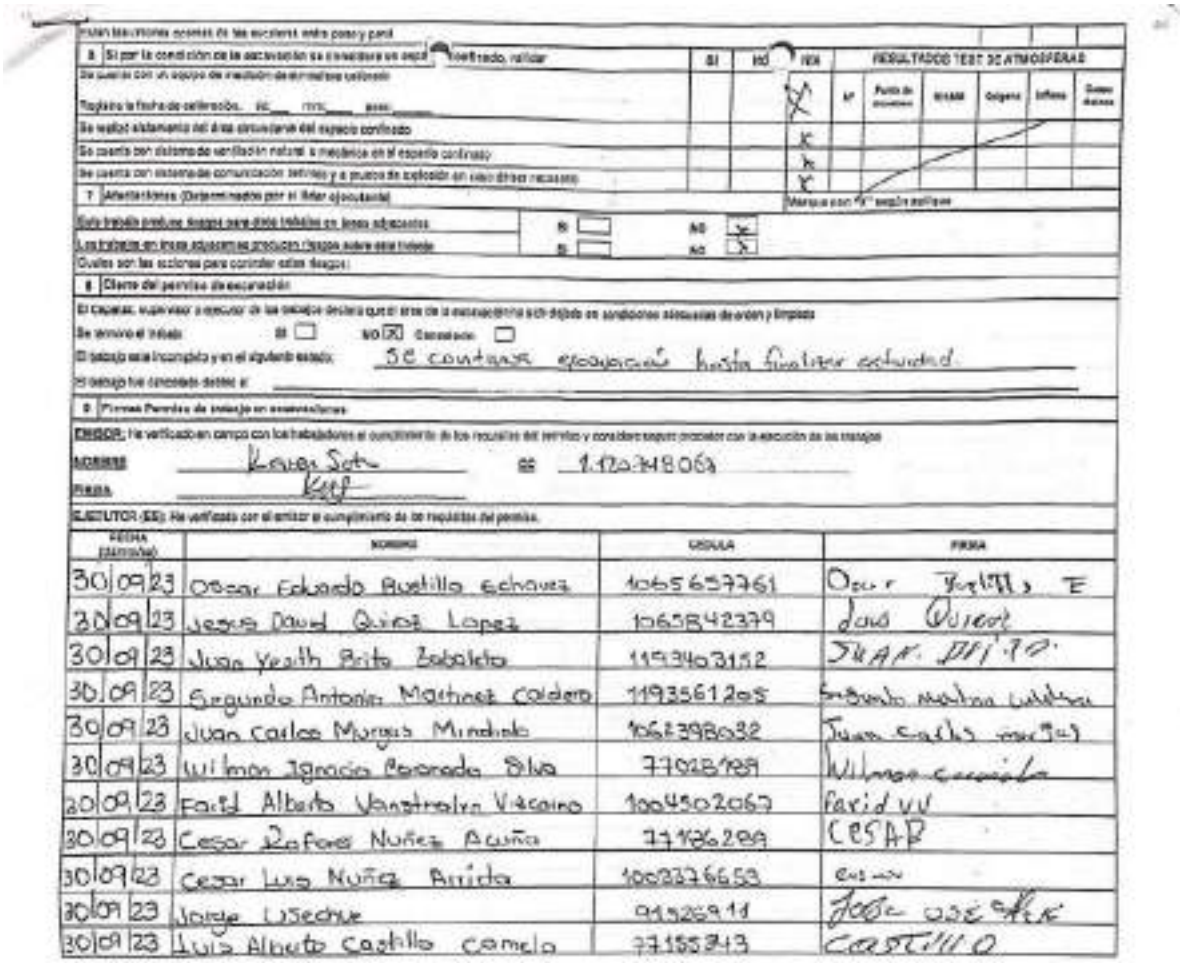



| FECHA (DD/MM/AA) | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 30/09/23 | Cesar Eduardo Bustillo Echavez | 1065657761 | |
| 30/09/23 | Jesus David Quiroz Lopez | 1065842379 | |
| 30/09/23 | Juan Yeath Brito Zabaleta | 1193403152 | |
| 30/09/23 | Segundo Antonio Martinez Caldera | 11935612 08 | |
| 30/09/23 | Juan Carlos Murgas Mendoza | 1063980832 | |
| 30/09/23 | Wilmer Ignacio Coronado Silva | 77028789 | |
| 30/09/23 | Farid Alberto Vanstralen Vizcaino | 1004502067 | |
| 30/09/23 | Cesar Rafael Nuñez Acuña | 77186209 | |
| 30/09/23 | Cesar Luis Nuñez Barrios | 1003276653 | |
| 30/09/23 | Jorge Luis Chiquillo | 91926911 | |
| 30/09/23 | Luis Alberto Castillo Camelo | 77155343 | |

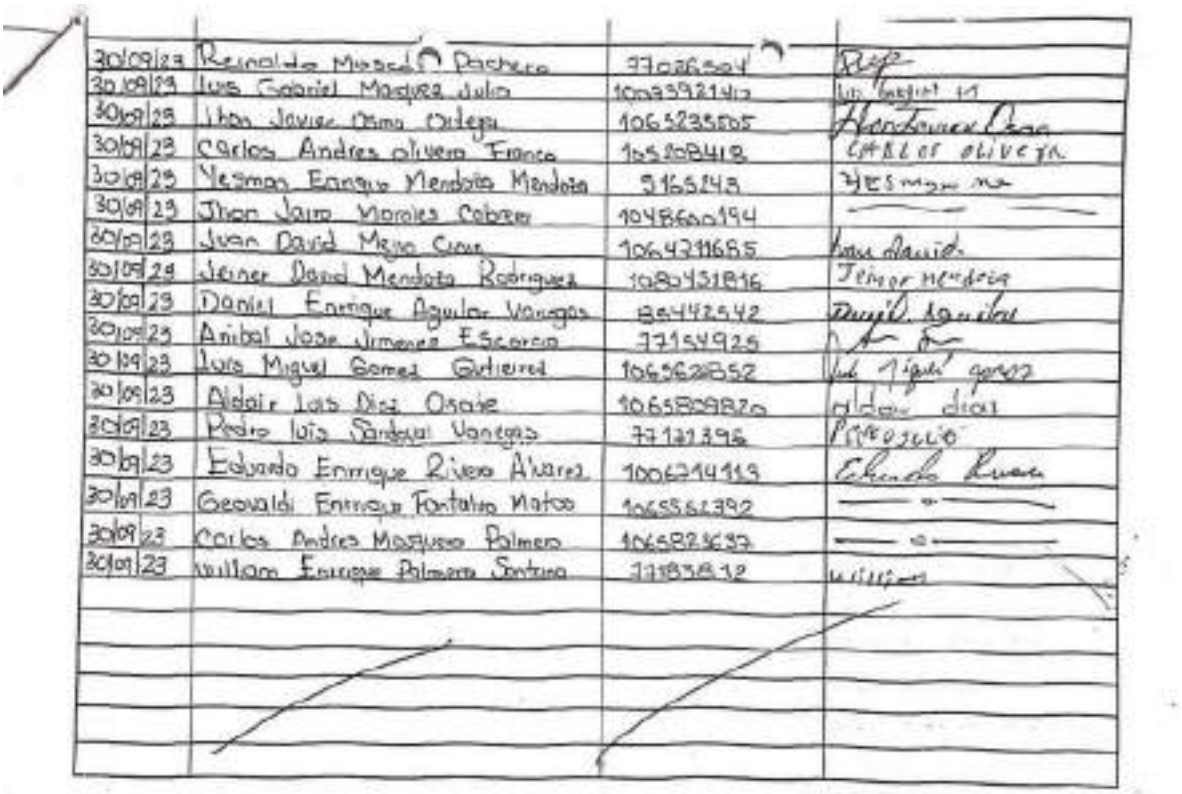



| | | | |
|---|---|---|---|
| 30/09/23 | Reynaldo Manuel Pacheco | 77036504 | |
| 30/09/23 | Luis Gabriel Maquea Julio | 1003932142 | |
| 30/09/23 | Jhon Jairo Osma Ortega | 1065235505 | |
| 30/09/23 | Carlos Andres Oliveros Franco | 1065108418 | |
| 30/09/23 | Yesmar Enrique Mendoza Mendoza | 9165143 | |
| 30/09/23 | Jhon Jairo Montes Cabrera | 1048600194 | |
| 30/09/23 | Juan David Mejia Cuao | 1064211685 | |
| 30/09/23 | Jeiner David Mendoza Rodriguez | 1080431816 | |
| 30/09/23 | Daniel Enrique Aguilar Vanegas | 85442542 | |
| 30/09/23 | Anibal Jose Jimenez Escorcia | 77154925 | |
| 30/09/23 | Luis Miguel Gomez Gutierrez | 1065628852 | |
| 30/09/23 | Aldair Luis Diaz Osorio | 1065809820 | |
| 30/09/23 | Pedro Luis Sandoval Vanegas | 77127396 | |
| 30/09/23 | Eduardo Enrique Rivera Alvarez | 1006214113 | |
| 30/09/23 | Geovaldi Enrique Fontalvo Matos | 1065562392 | |
| 30/09/23 | Carlos Andres Manjarres Palmera | 1065825637 | |
| 30/09/23 | William Enrique Palmera Santana | 1118358112 | |

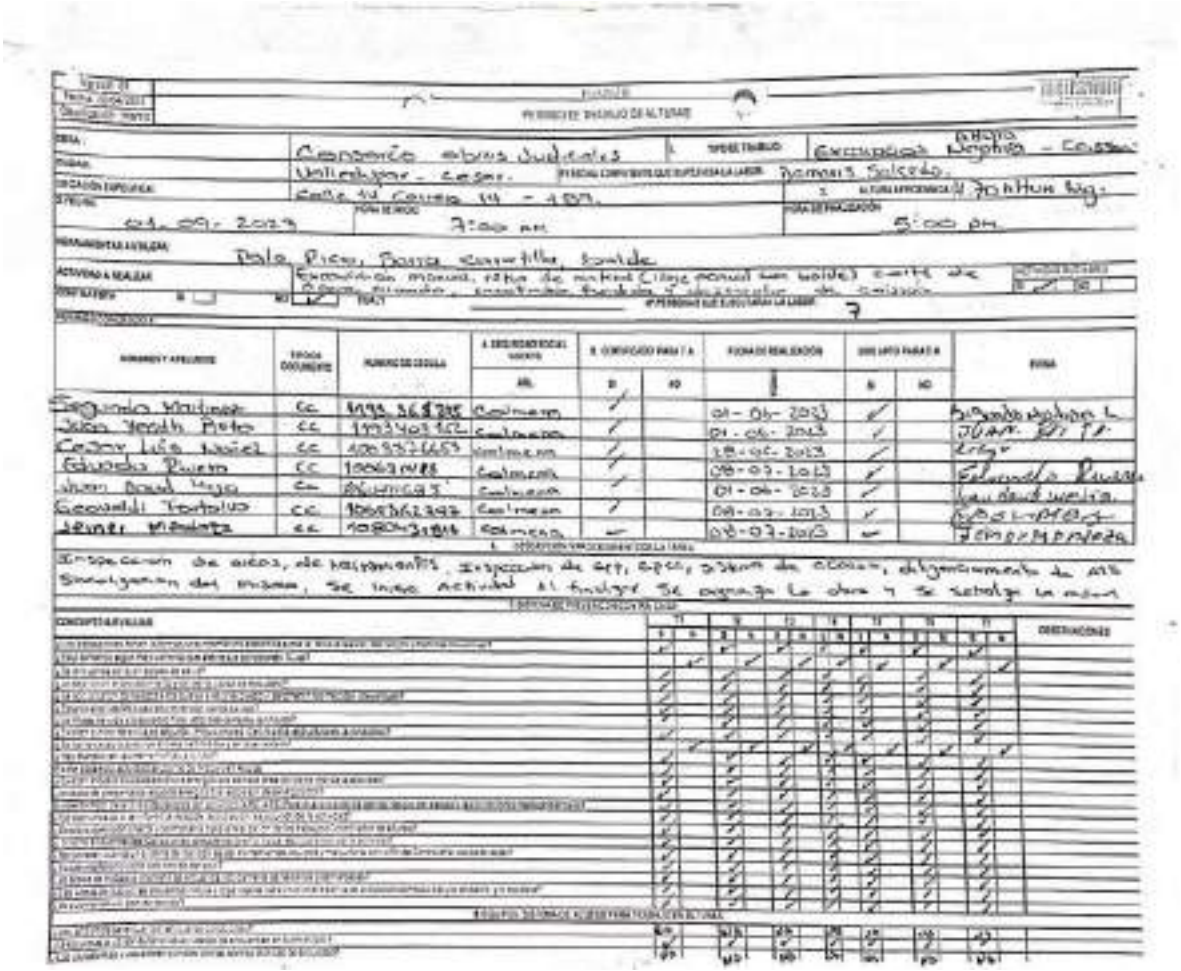


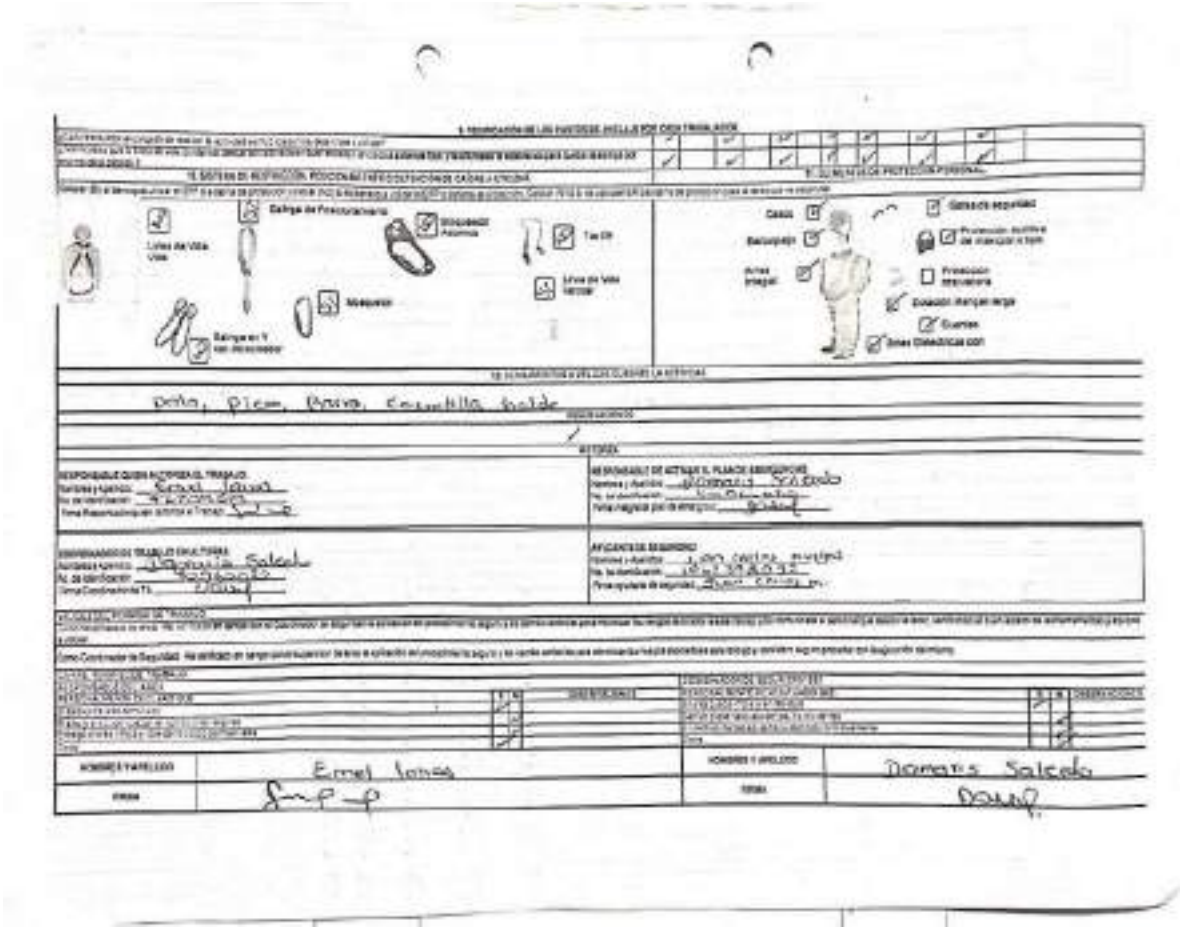


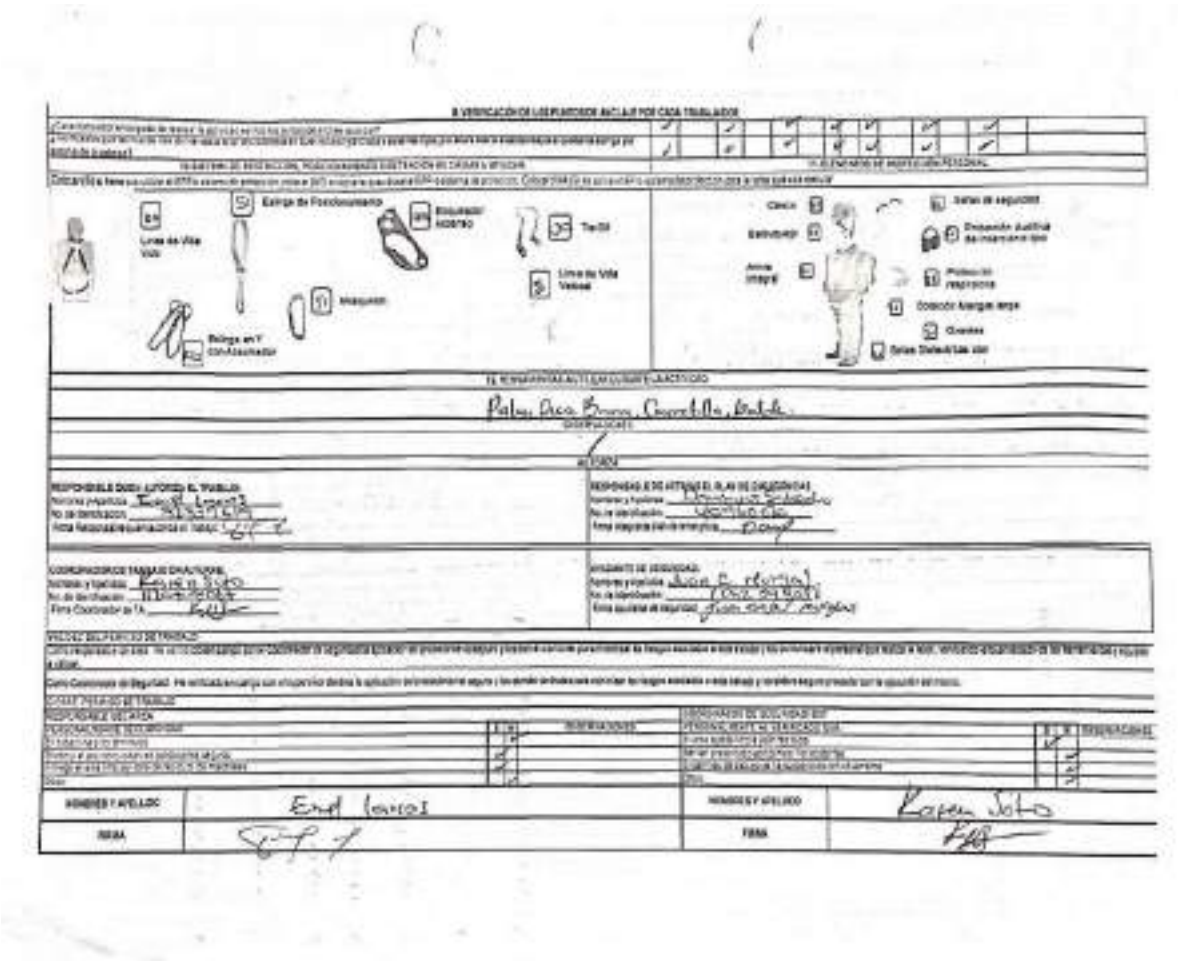


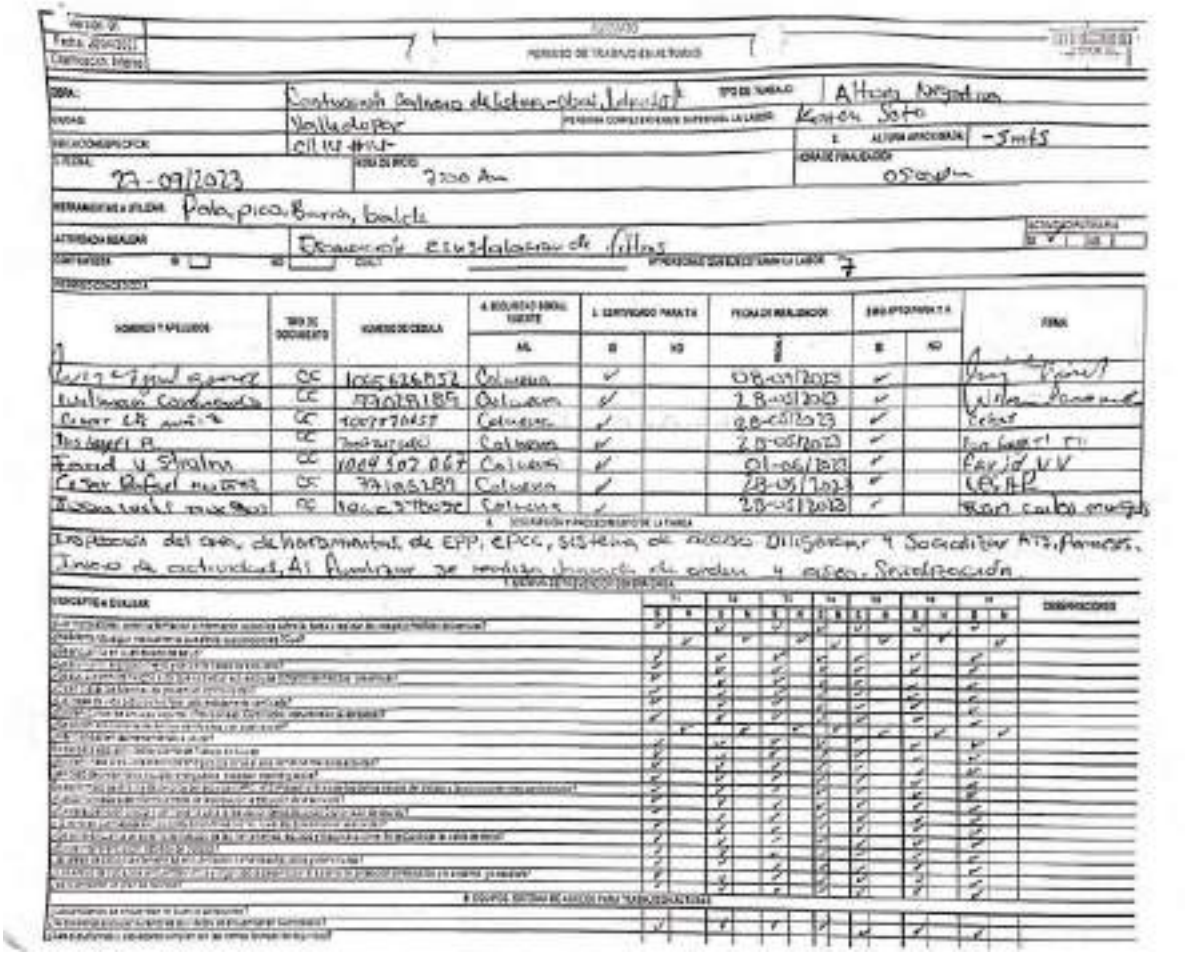

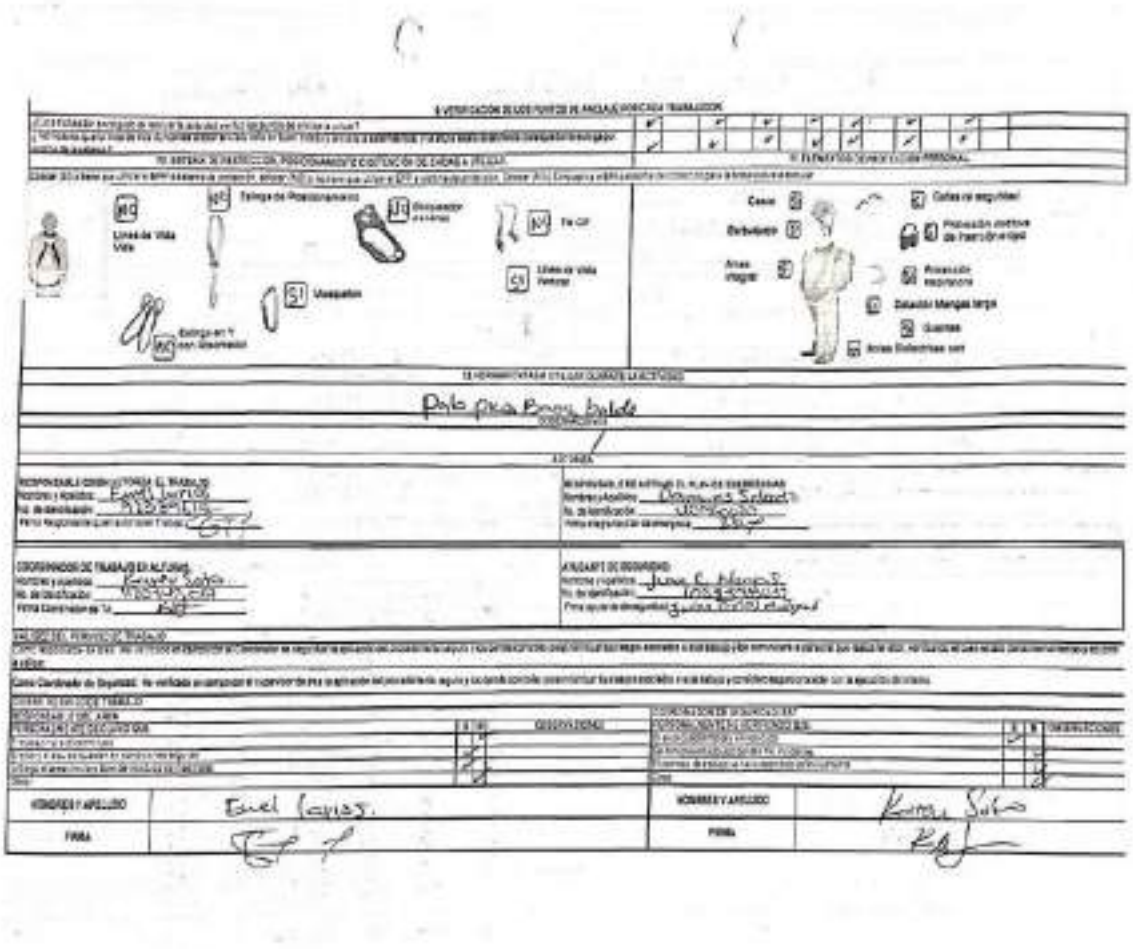

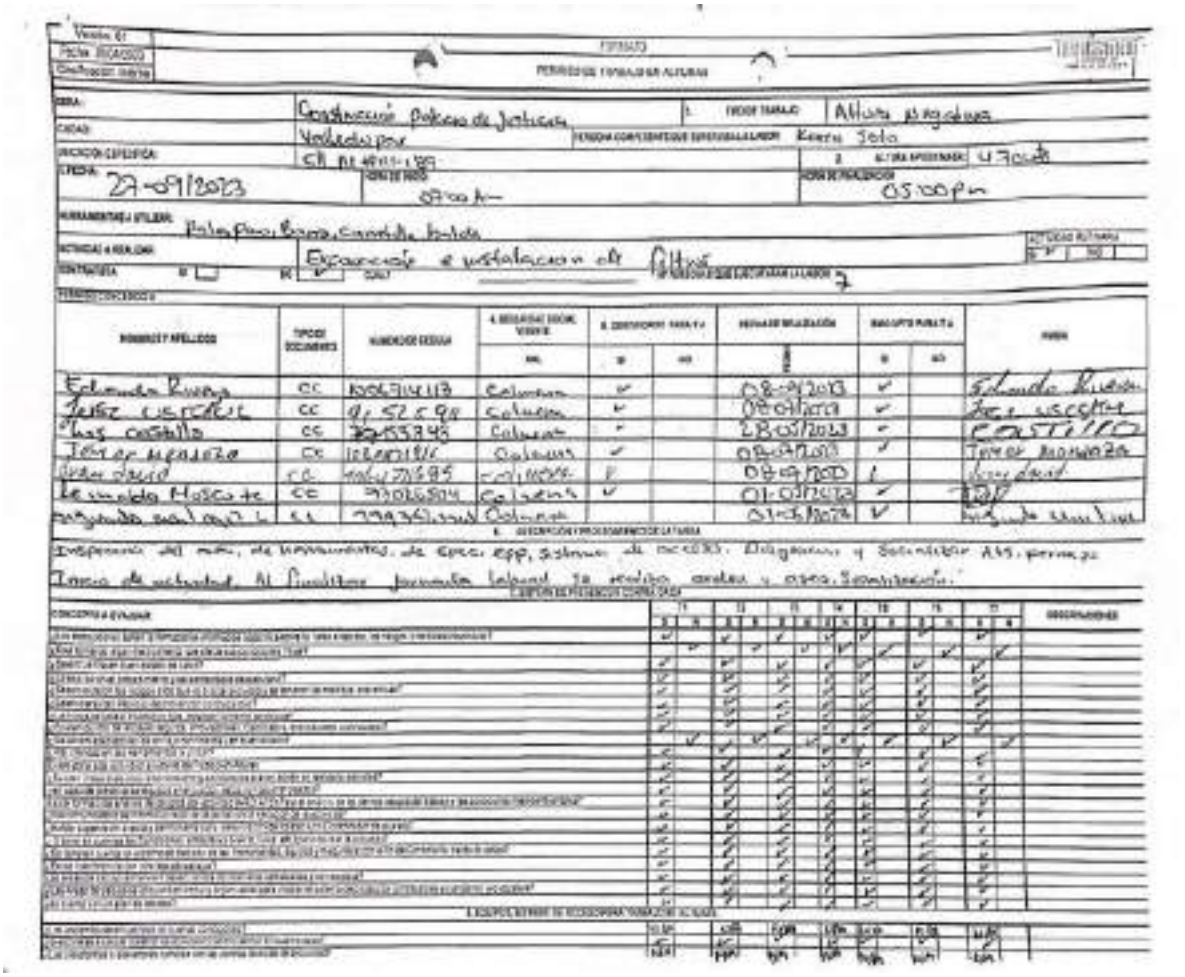

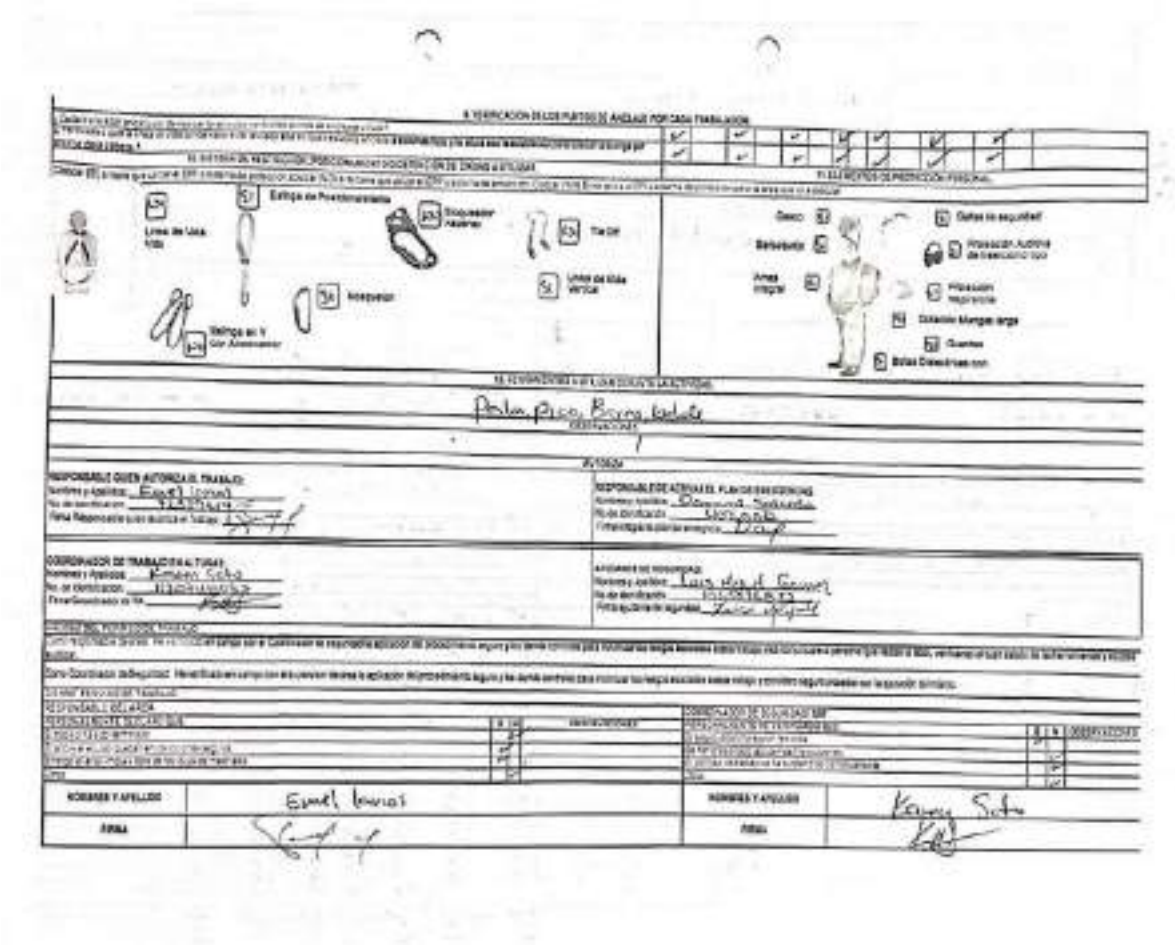


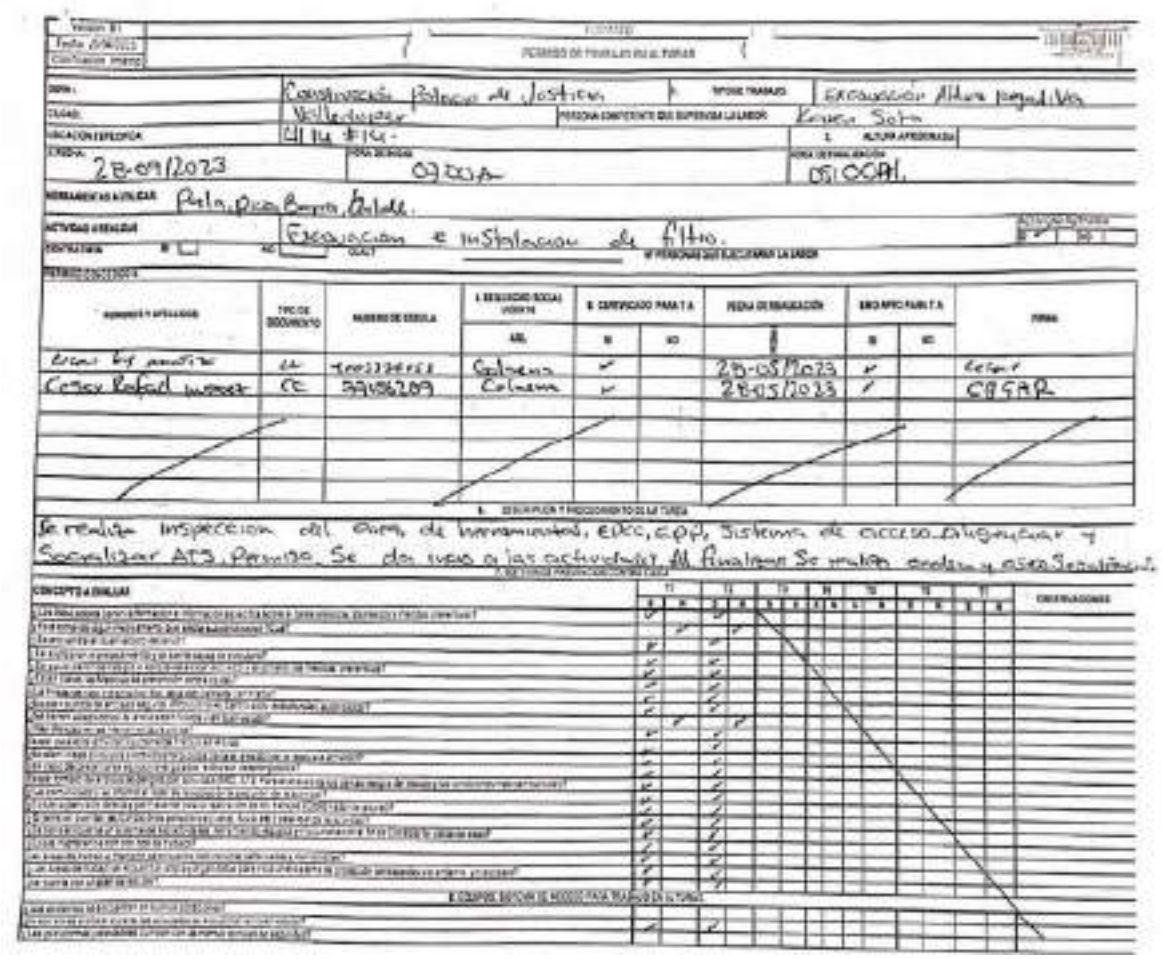



Construcción Palacio de Justicia — Excavación Altura Irregulares
Valledupar — Ernesto Soto
Cll 14 #14-
28/09/2023 — 07:00 A — 05:00 PM
Pala, Pica, Barra, Balde.
Excavacion e instalacion de filtro.


| Nombre y Apellidos | Tipo de Documento | Número de Cédula | EPS | Certificado para T.A. SI | Certificado para T.A. NO | Fecha de Realización | Examen Médico para T.A. SI | Examen Médico para T.A. NO | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Luis Gutierrez | CC | 1003378451 | Salud mia | ✓ | | 28-05/2023 | ✓ | | Oscar |
| Cesar Rafael Mendoza | CC | 77156209 | Salud mia | ✓ | | 28-05/2023 | ✓ | | CESAR |


Se realiza inspeccion del area de herramientas, EPCC, EPP, Sistema de acceso. Diligenciar y Socializar ATS, Permiso. Se dan ideas a las actividades. Al finalizar se realiza orden y aseo Satisfactorio.

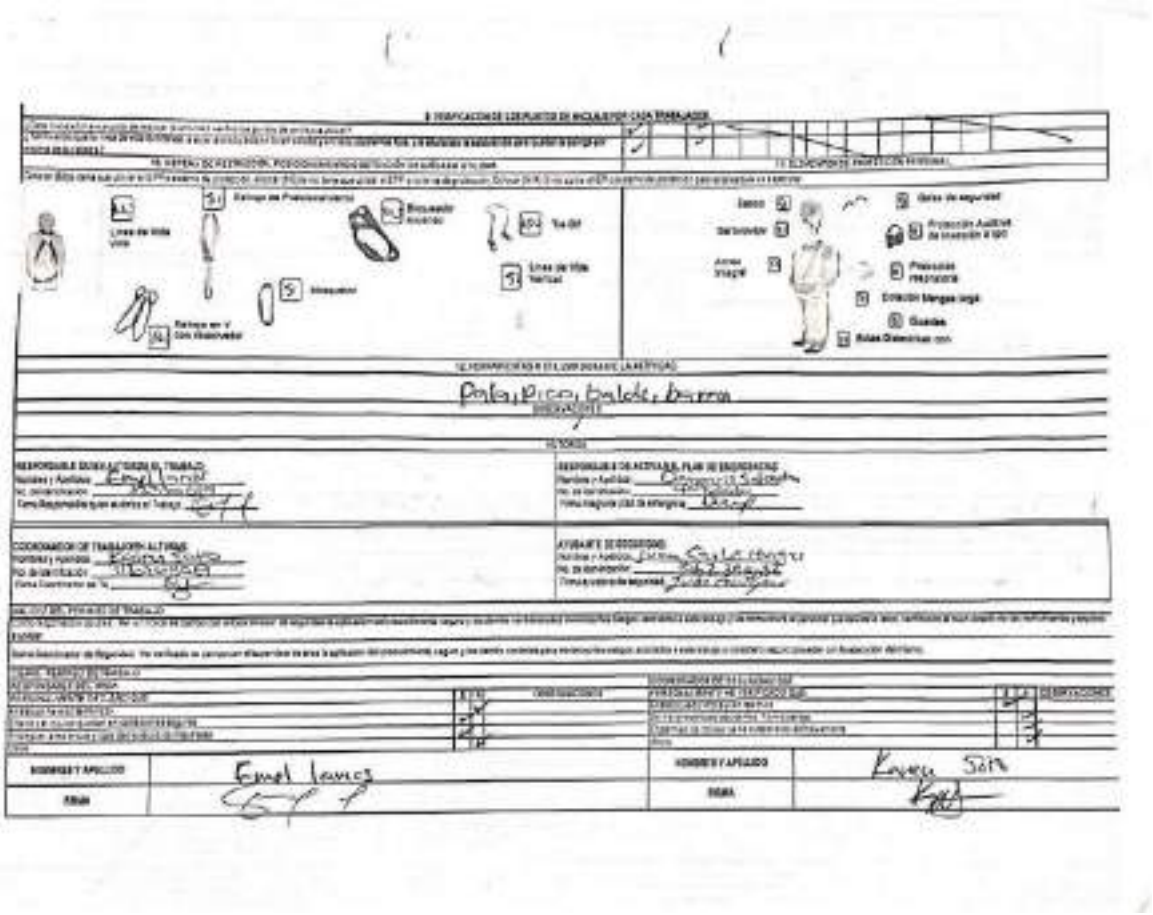
Pala, Pico, balde, barra

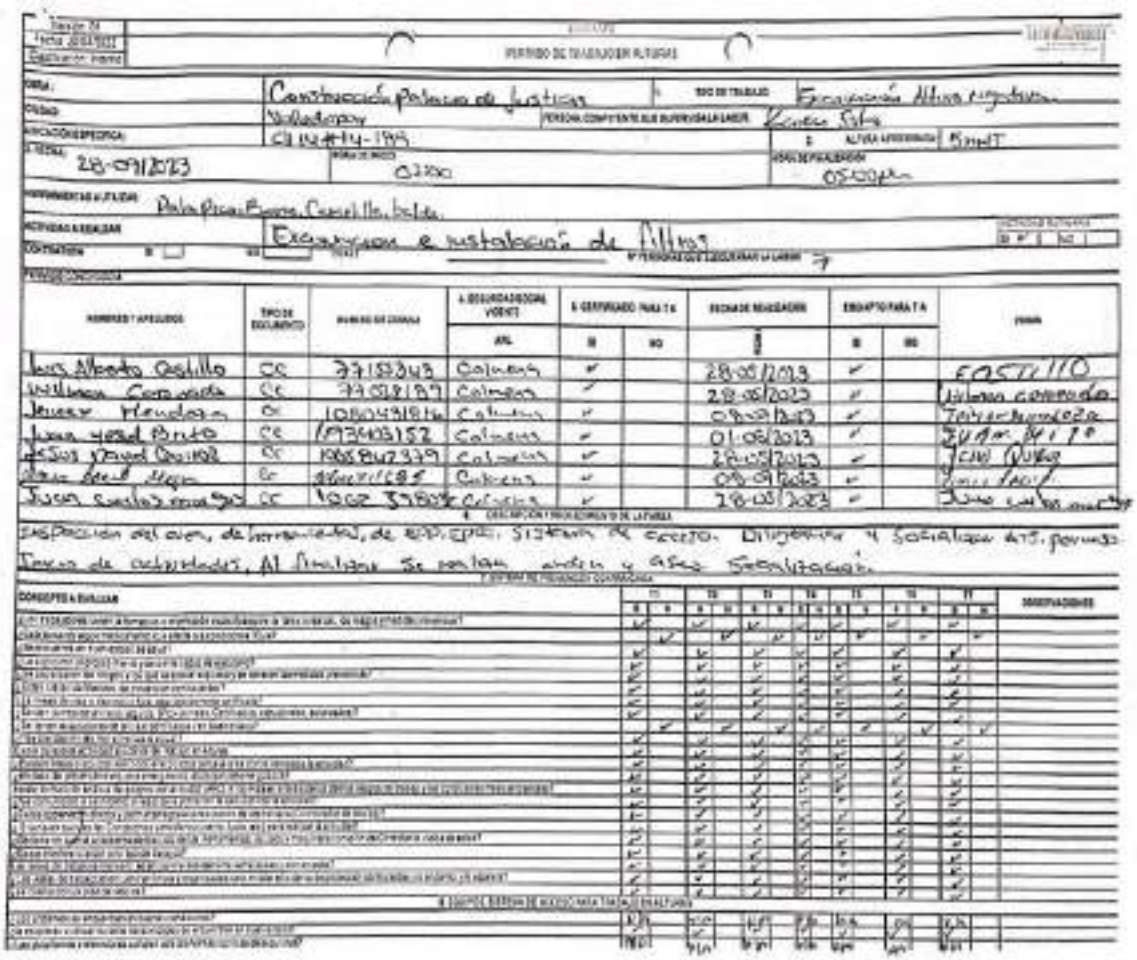

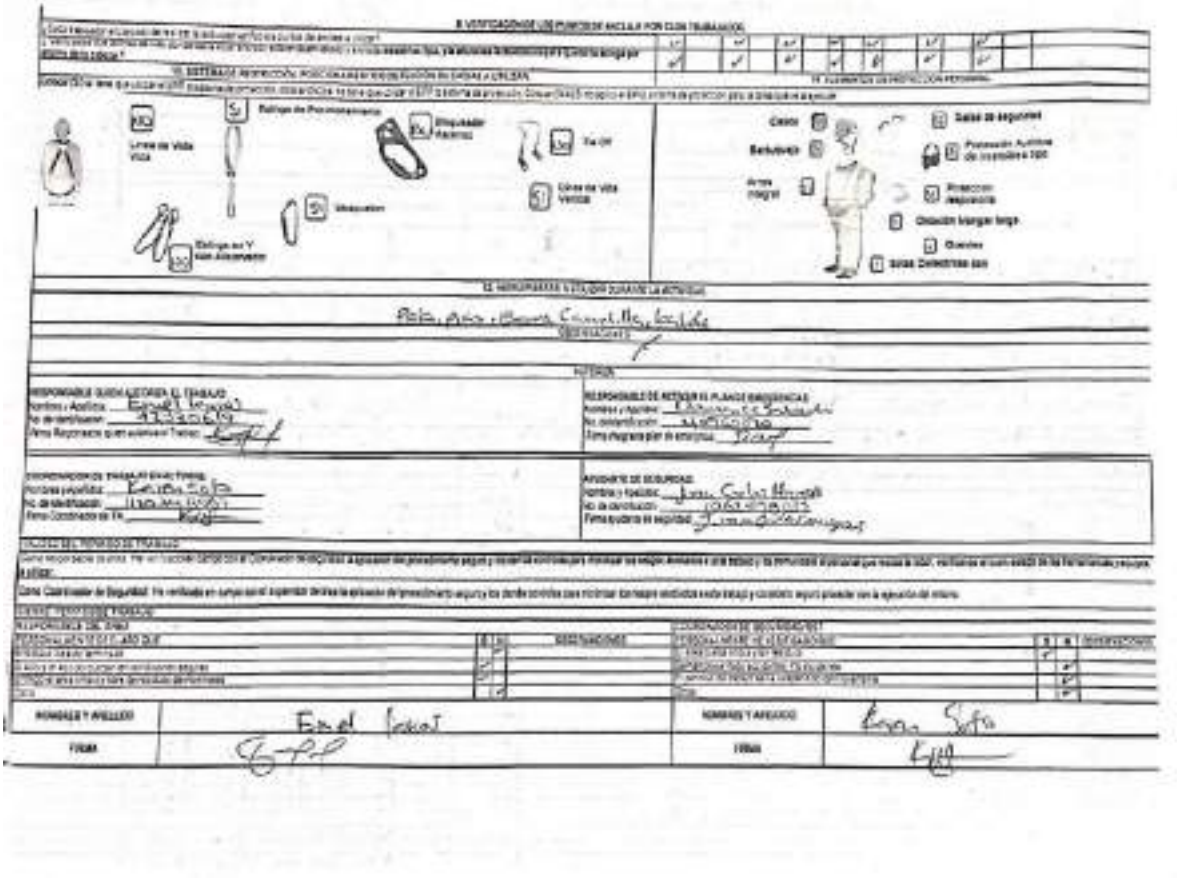

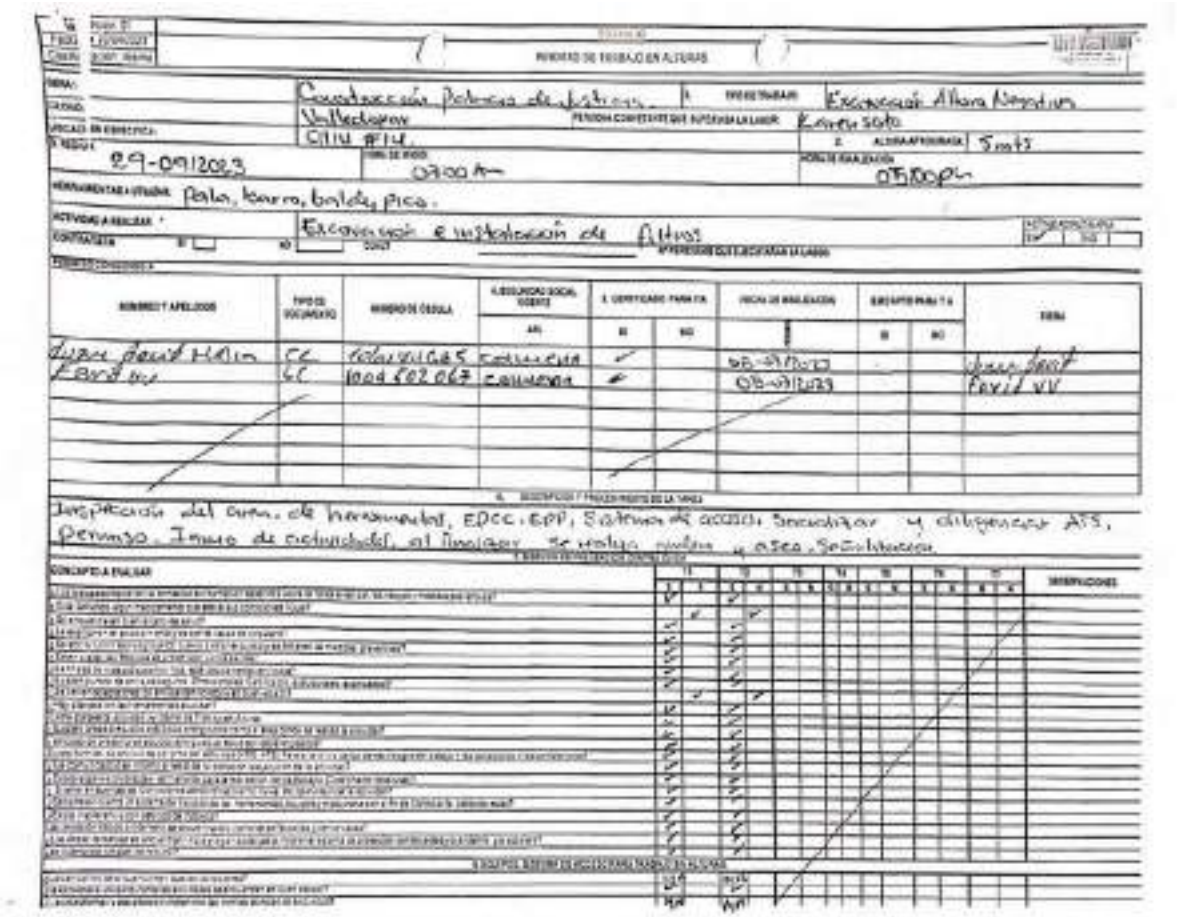

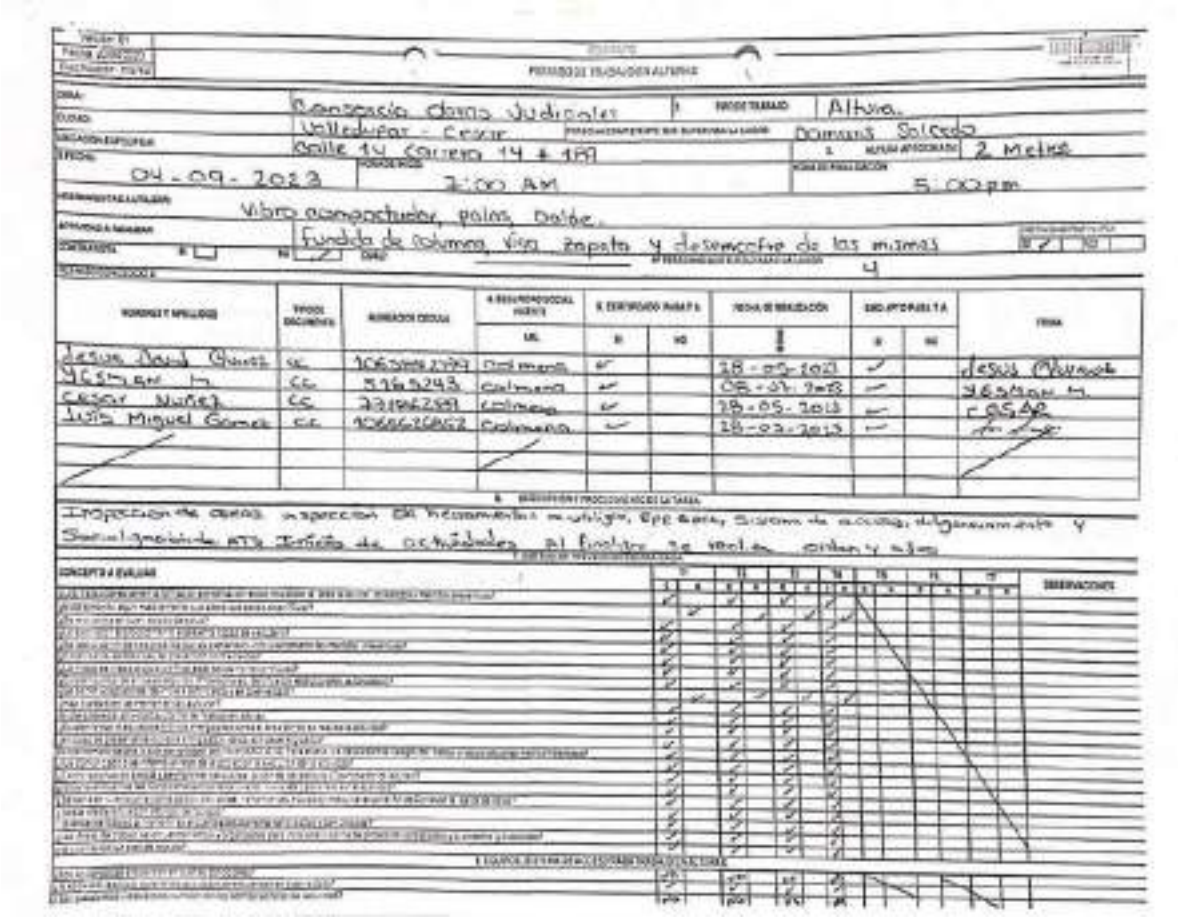



Concesión Obras Judiciales — Altura.
Villavicencio - Cesar — Domus Soledad
Calle 14 Carrera 14 a 19A — 2 Metros
04-09-2018 — 7:00 AM — 5:00pm
Vibro compactador, palas, Pulpo.
Fundida de columna Viga Zapata y desencofre de las mismas — 4


| NOMBRES Y APELLIDOS | TIPO DOCUMENTO | NUMERO CEDULA | A SEGURIDAD SOCIAL ACTIVA EPS | B CERTIFICADO APTITUD SI | B CERTIFICADO APTITUD NO | FECHA DE INDUCCIÓN | ENTREGO EPP SI | ENTREGO EPP NO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Noel Chaves | cc | 1065[illegible]799 | Colmena | ✓ | | 28-05-2018 | ✓ | | Jesus Chaves |
| Yesman M. | cc | 5365243 | Colmena | ✓ | | 05-07-2018 | ✓ | | Yesman M. |
| Cesar Nuñez | cc | 7319662 | Colmena | ✓ | | 28-05-2018 | ✓ | | Cesar |
| Luis Miguel Gomez | cc | 1066620862 | Colmena | ✓ | | 28-05-2018 | ✓ | | |


Inspección de obras, inspección de herramientas manuales, EPP, area, Sistema de acordes, Mejoramiento y Señalización ATS Tarjeta de actividades al finalizar la jornada.


| CONCEPTO A EVALUAR | 10 | | 11 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |

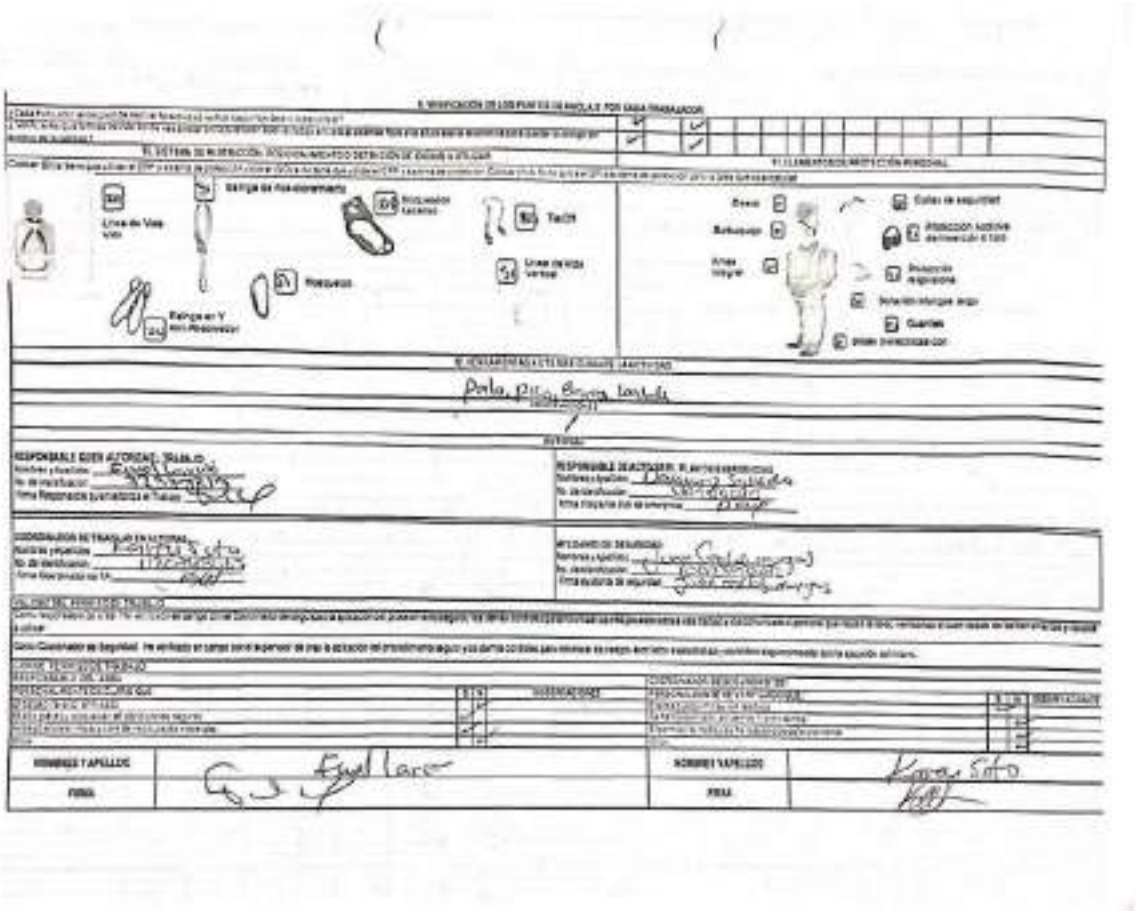


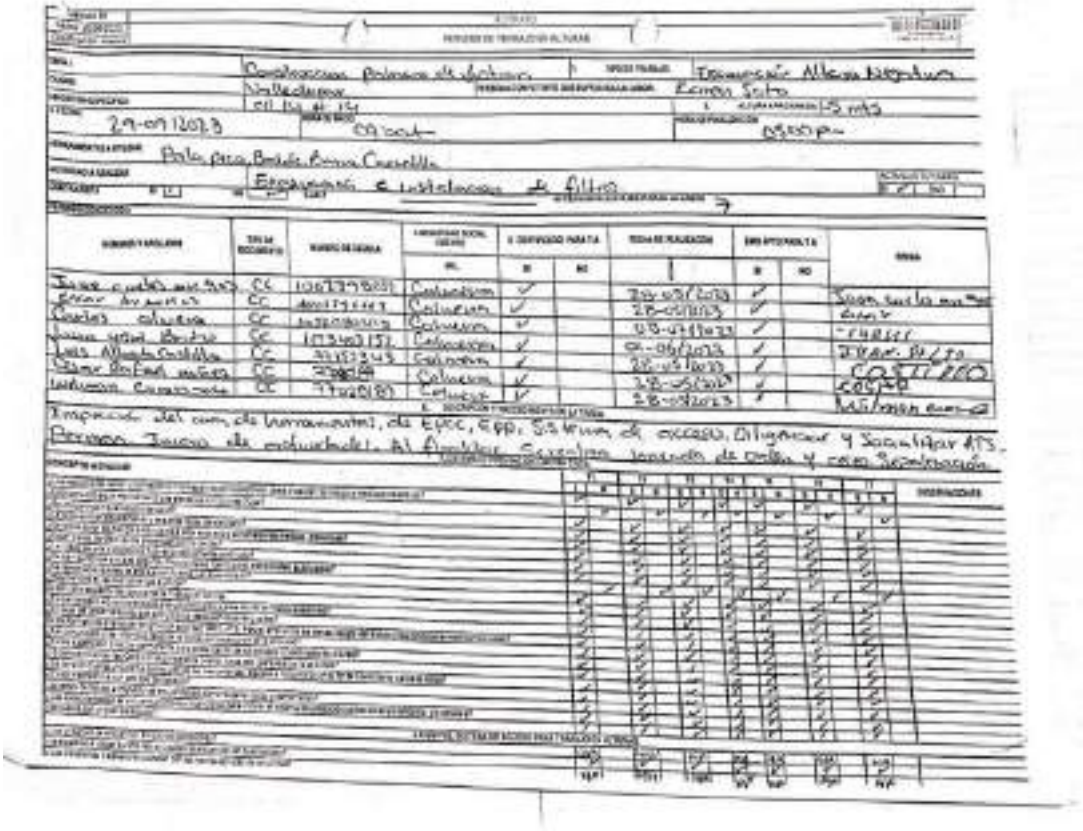


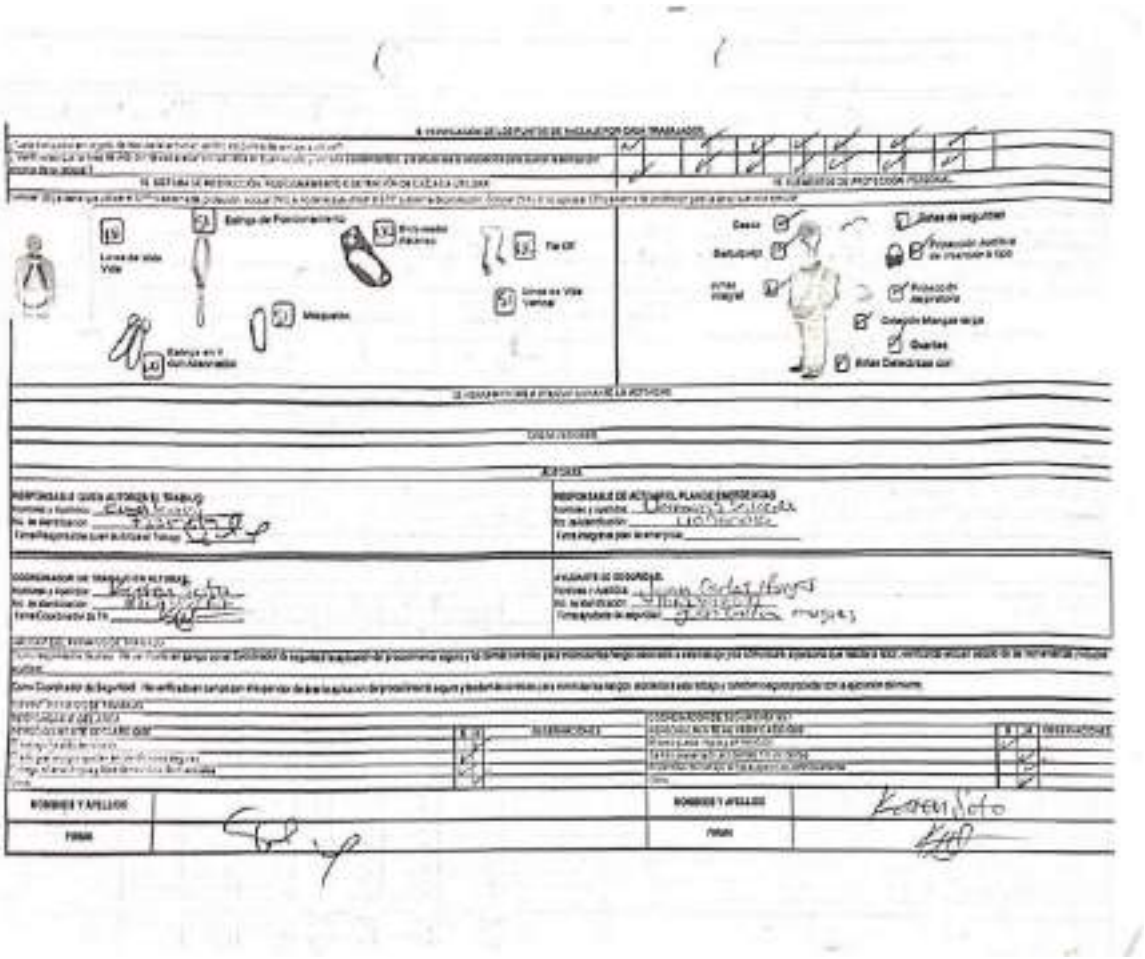


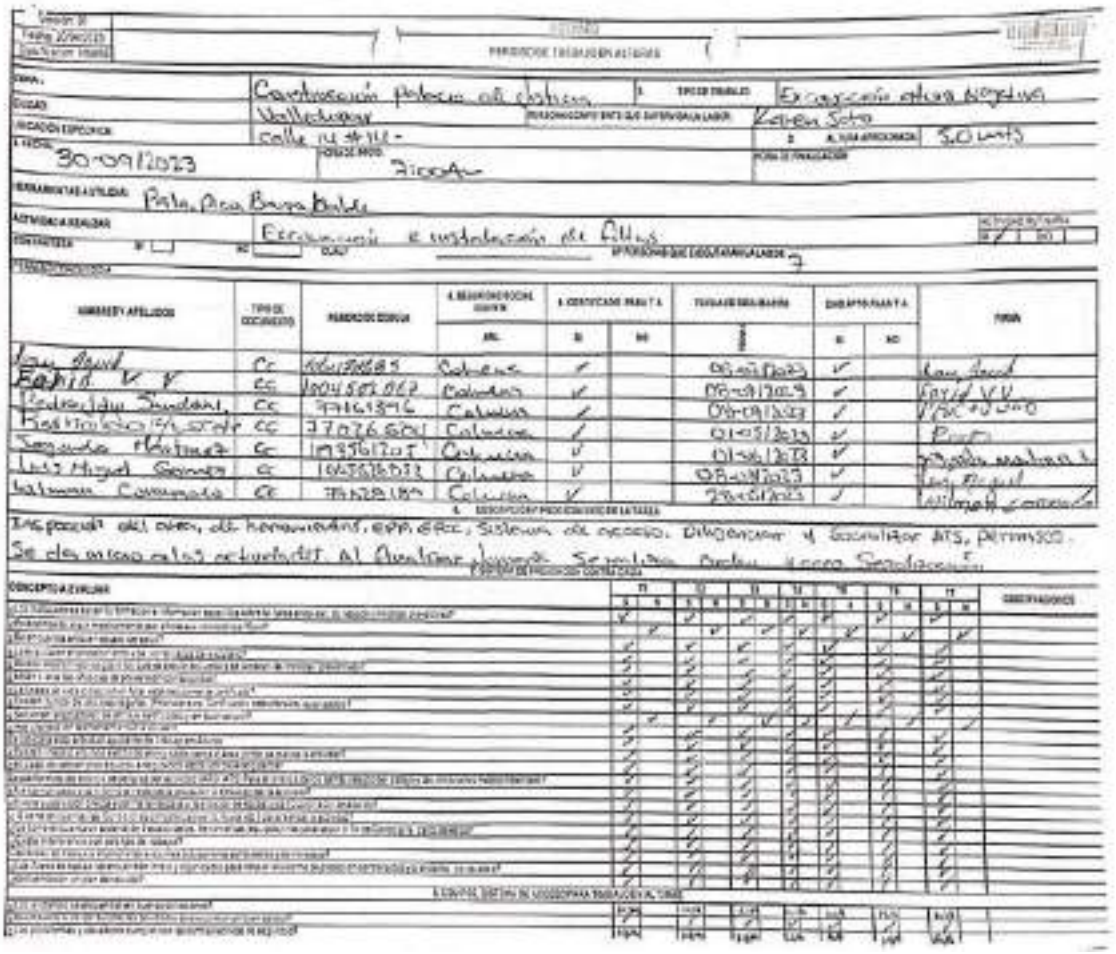


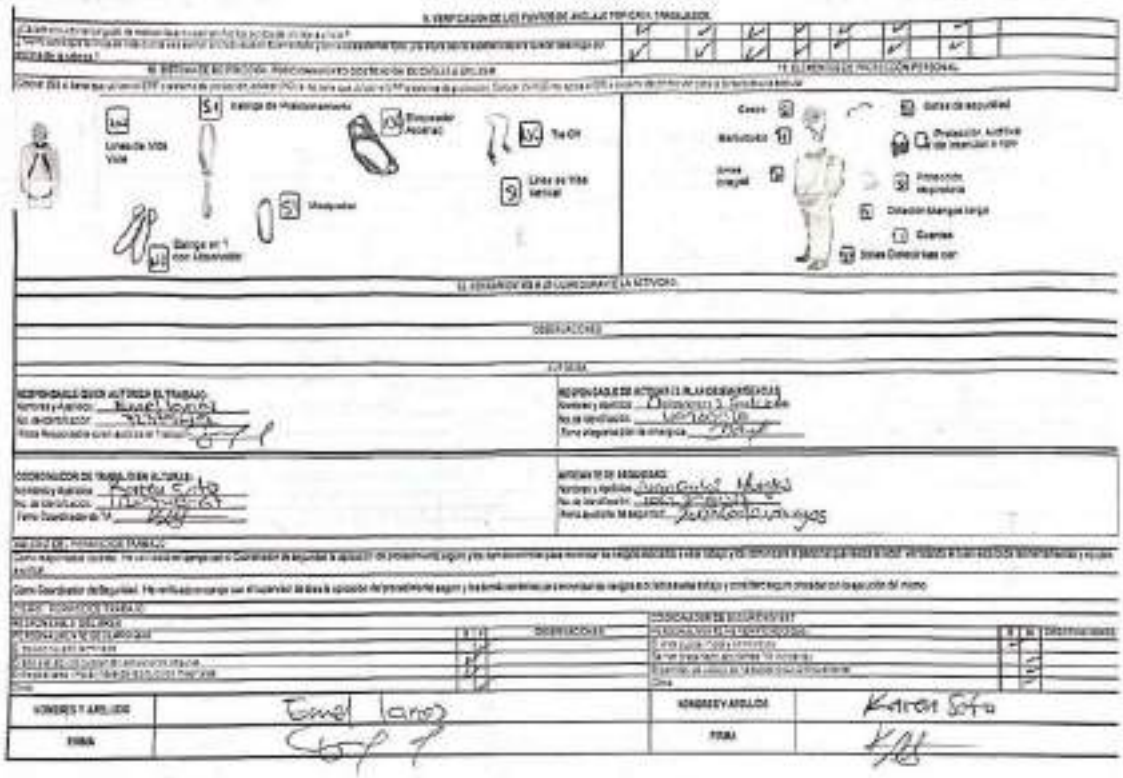


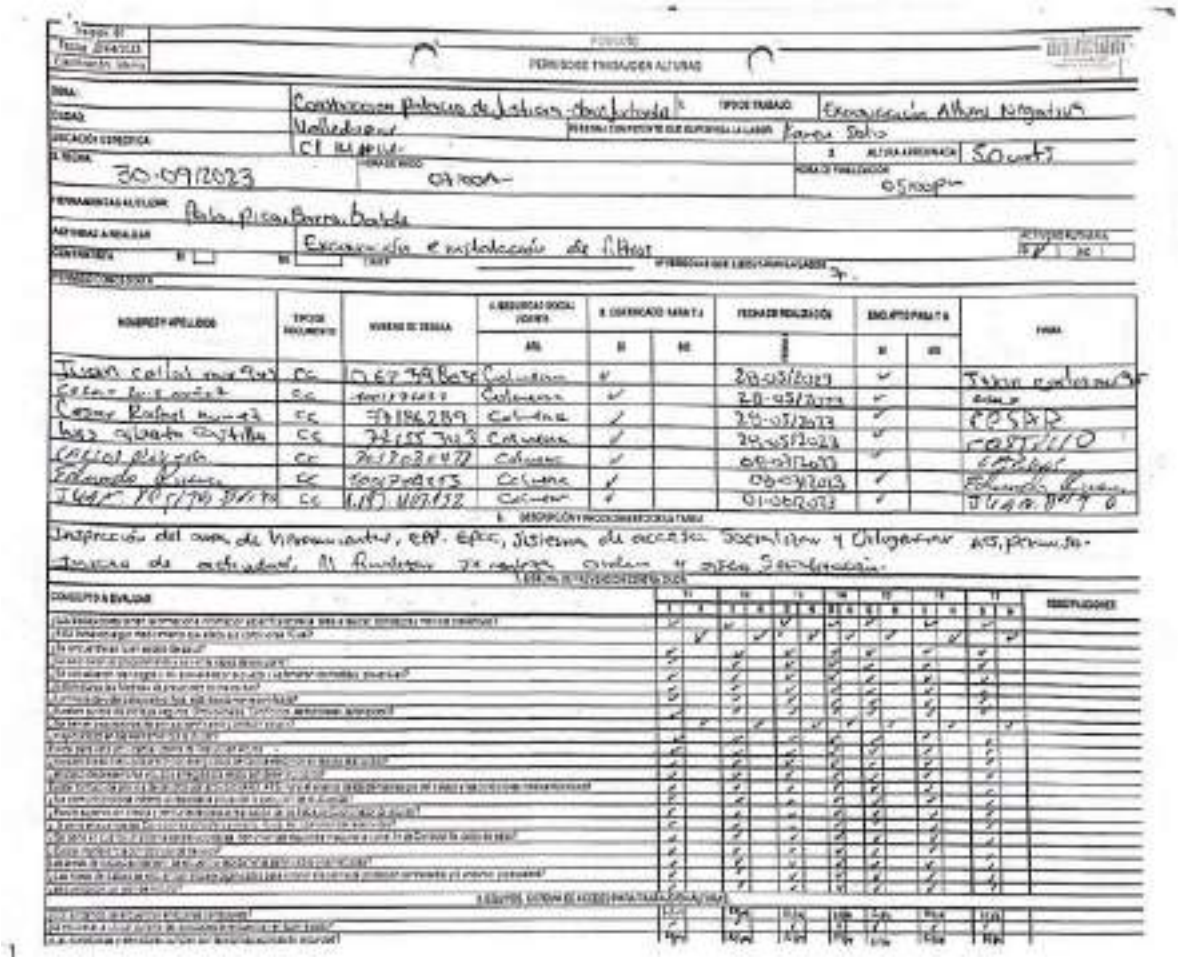


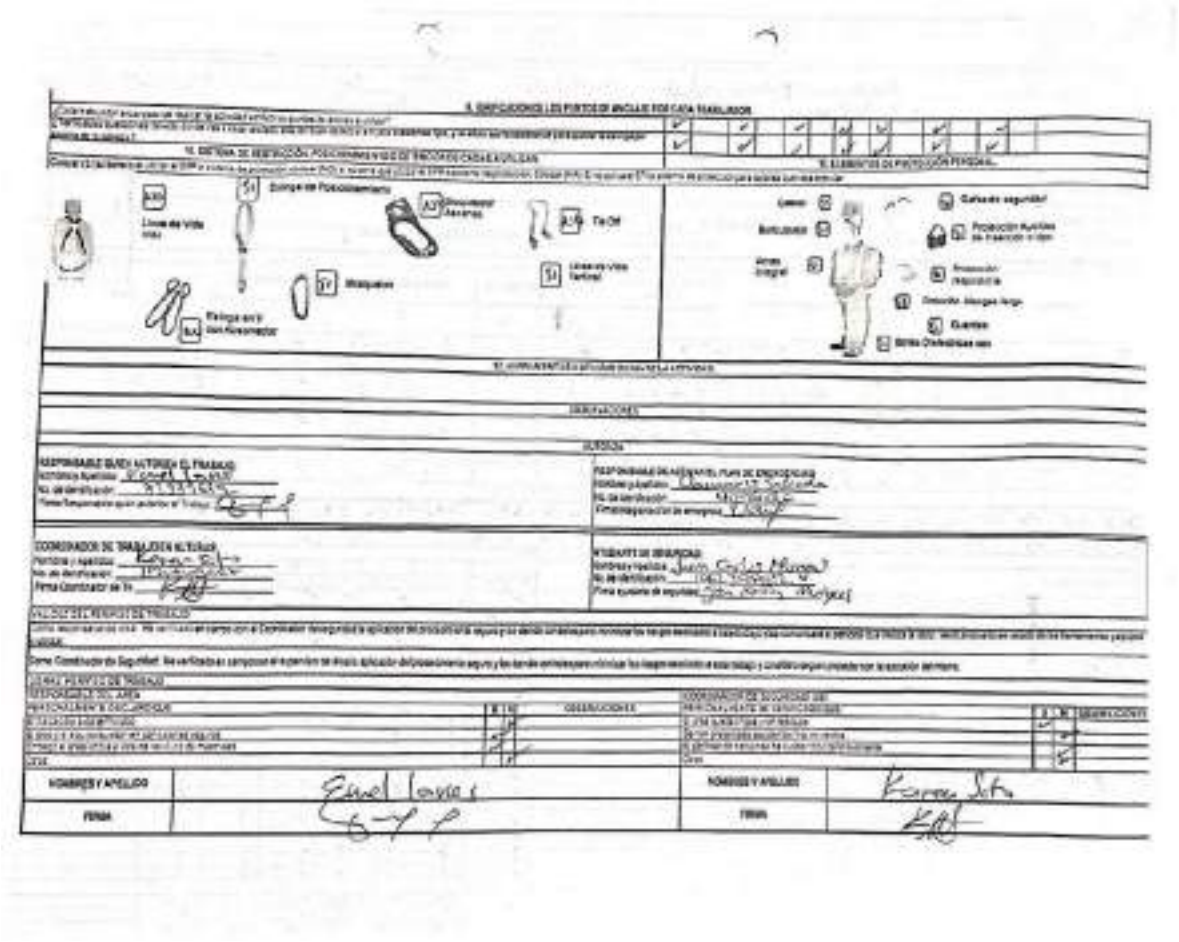


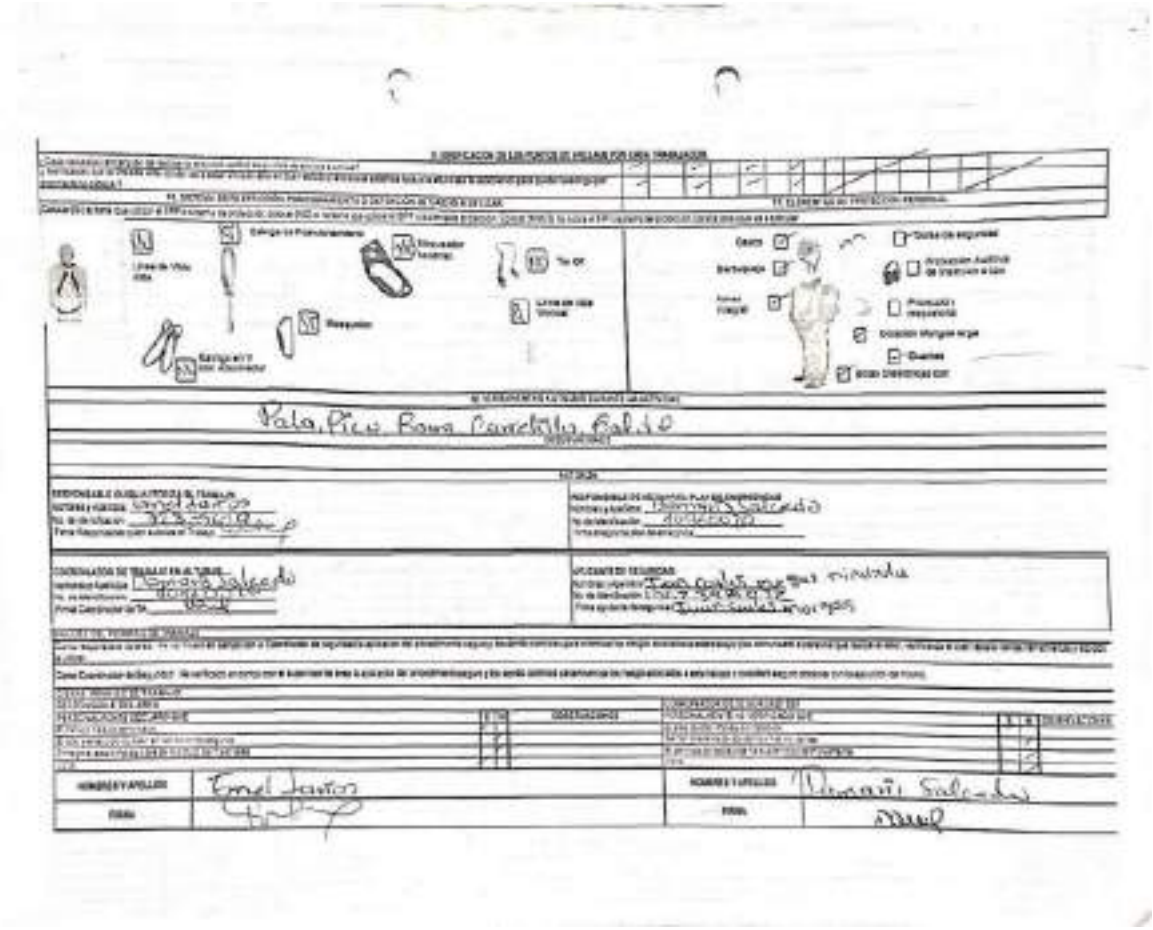


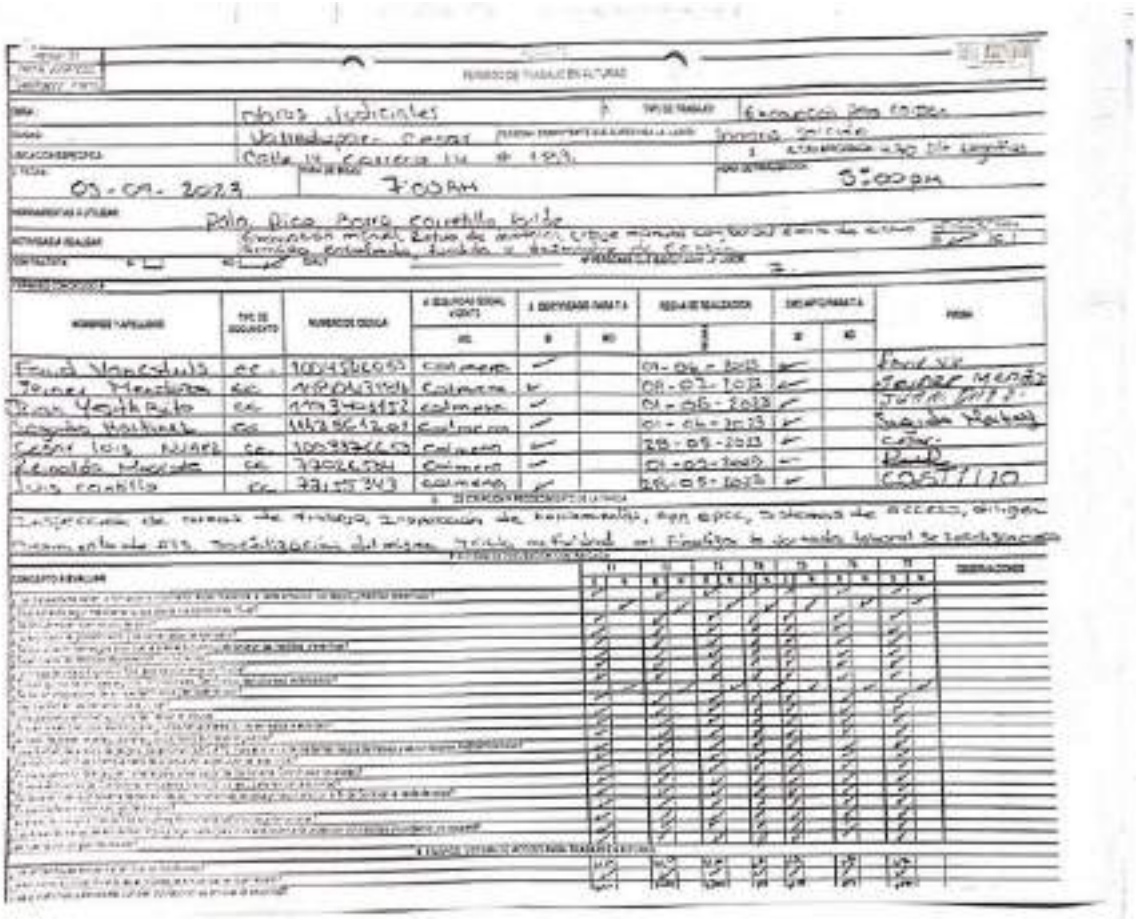
obras judiciales
Valledupar - Cesar
Calle 14 Carrera 14 # 19A
05-09-2023
7:00AM
5:00pm

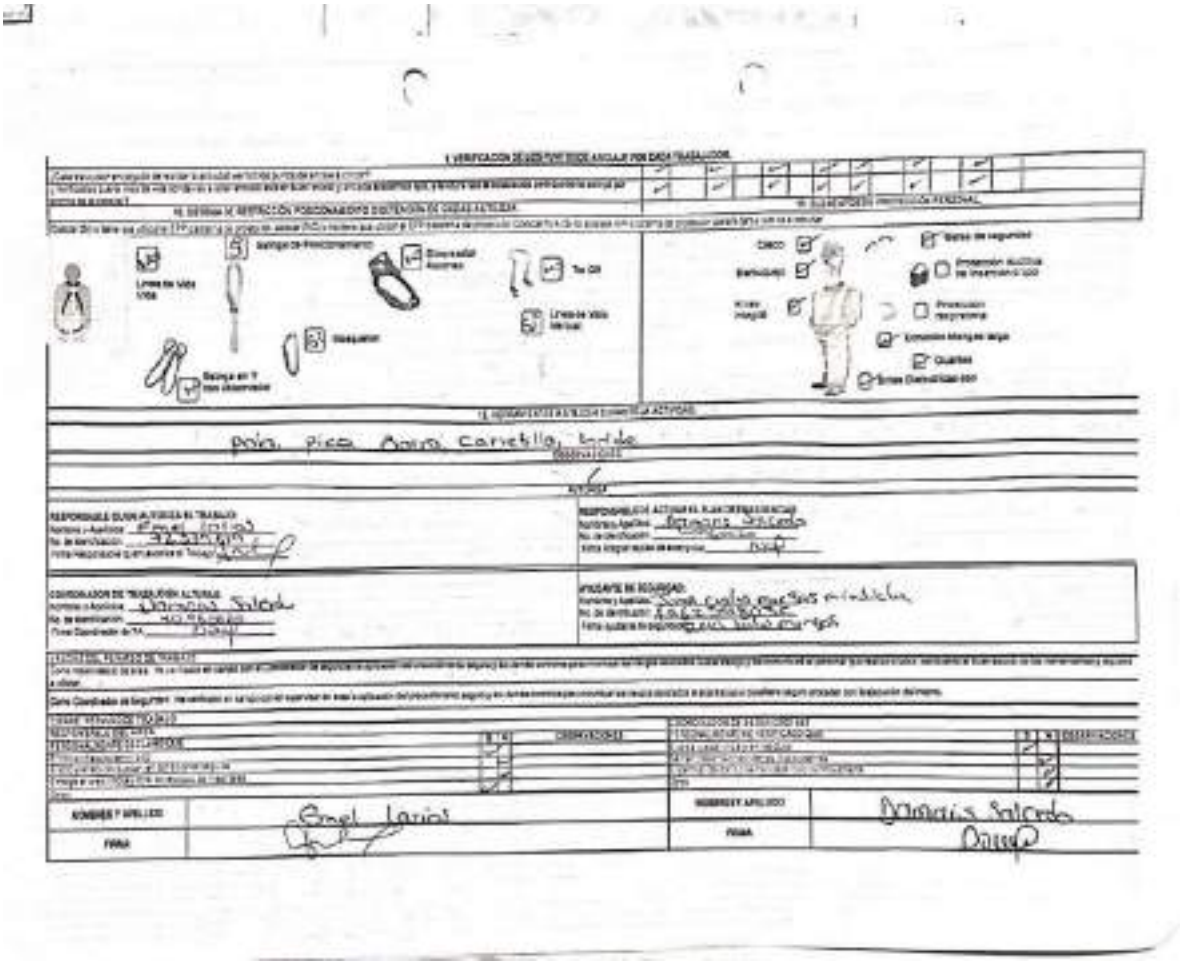

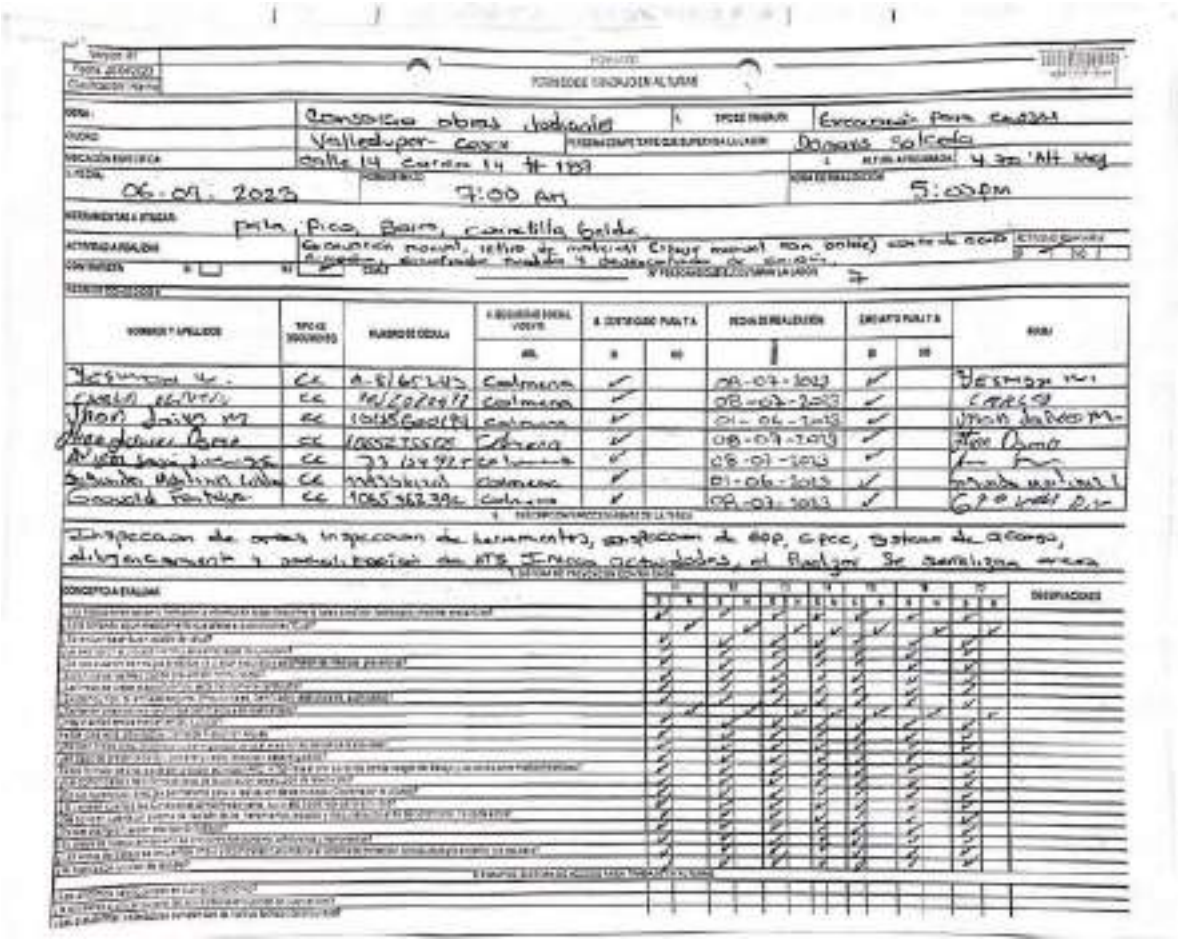

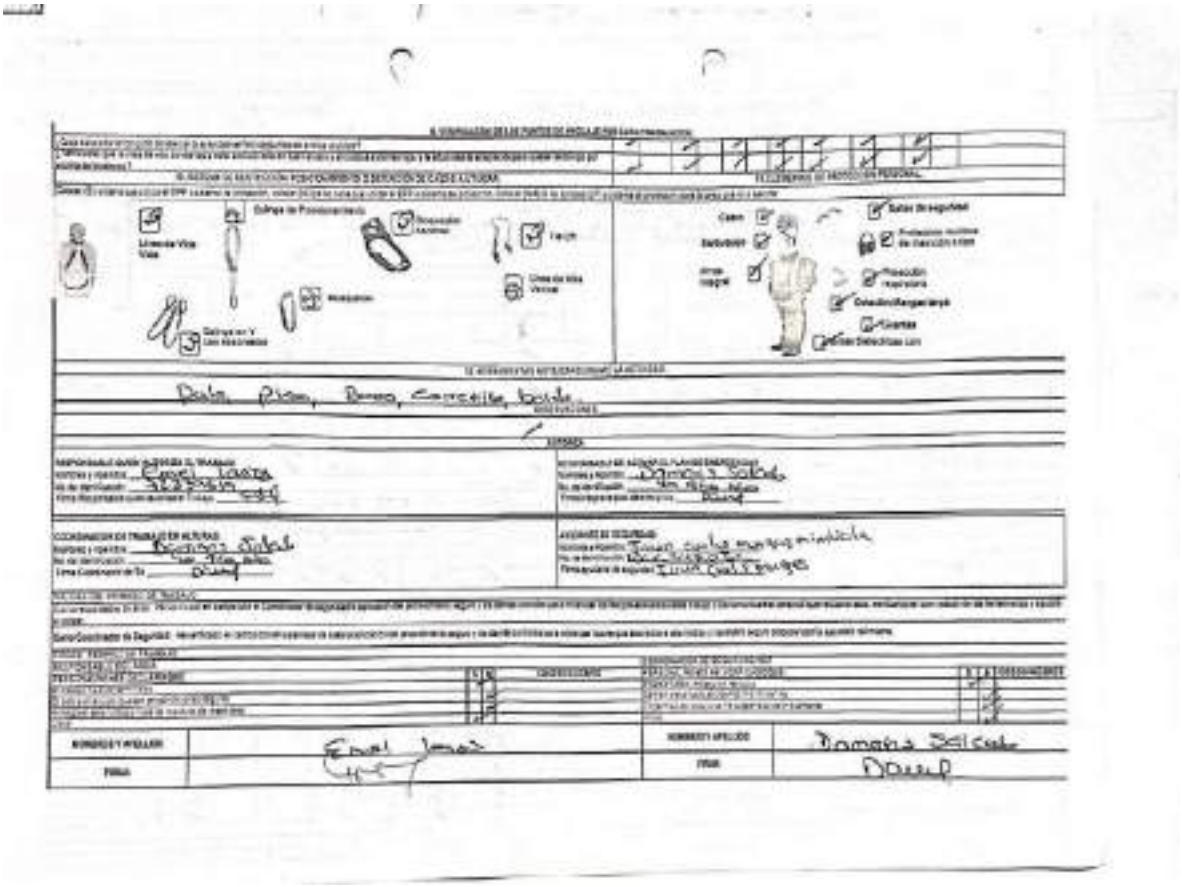


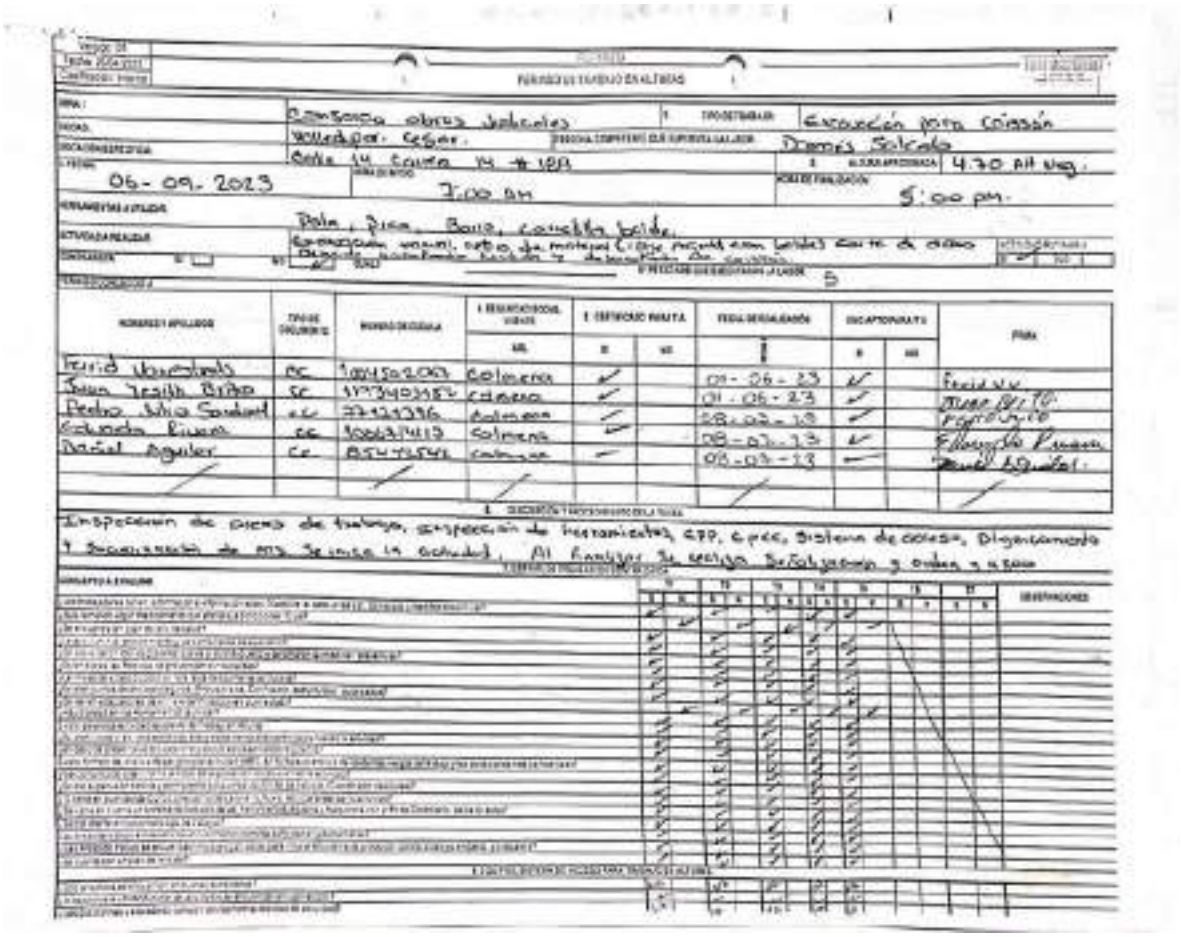



Obra: Construcción obras judiciales — Proyectista: Ejecución obra común
Residente: Valladares Cesar — Persona competente: Damián Salcedo
Fecha: 06-09-2023 — Hora de inicio: 7:00 AM — Hora de finalización: 5:00 pm — Duración: 4.30 Alt Veg.
Herramientas utilizadas: Pala, Pica, Barra, cinchos bolsa.
Actividad realizada: Excavación manual, retiro de material, Cargue manual, Limpieza general de obra.


| Nombres apellidos | Tipo de documento | Número de cédula | EPS | Certificado planta | | Fecha de realización | Capacitación | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | si | no | | si | no | |
| Yuri Valladares | CC | 1004502063 | Colmena | ✓ | | 01-06-23 | ✓ | | Firma N.V. |
| Jhon Jesith Bitar | CC | 1193403458 | Colmena | ✓ | | 01-06-23 | ✓ | | Jhon Bitar |
| Pedro Silva Sandoval | CC | 77029396 | Colmena | ✓ | | 28-02-23 | ✓ | | Pedro Silva |
| Eduardo Pinzon | CC | 9068374113 | Colmena | ✓ | | 08-03-23 | ✓ | | Eduardo Pinzon |
| Daniel Aguilar | CC | 85475541 | Colmena | — | | 08-03-23 | — | | Daniel Aguilar |


Inspeccion de sitio de trabajo, inspección de herramientas, EPP, Charla, Sistema de cosido, Diligenciamiento y socialización de ATS, Señalización y orden y aseo

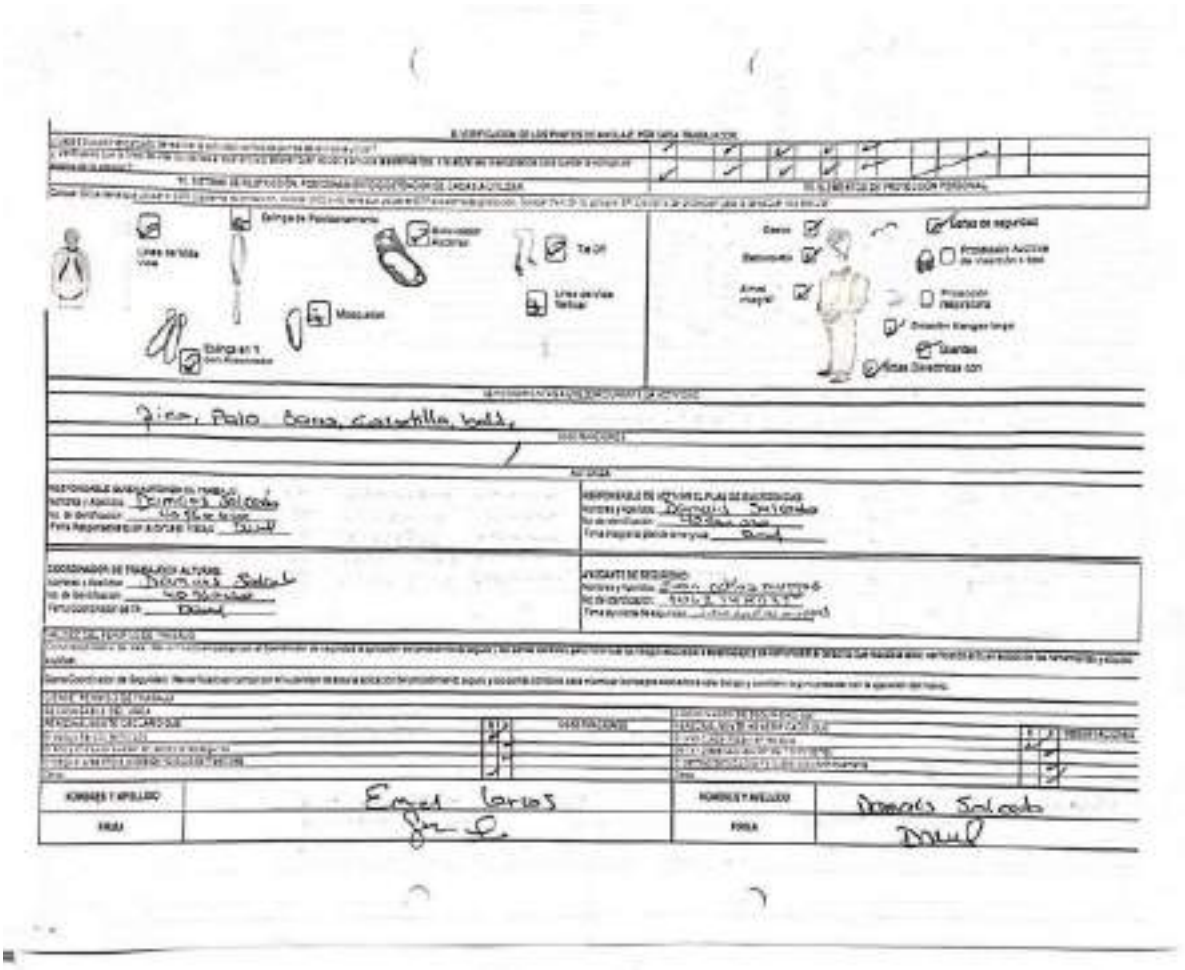


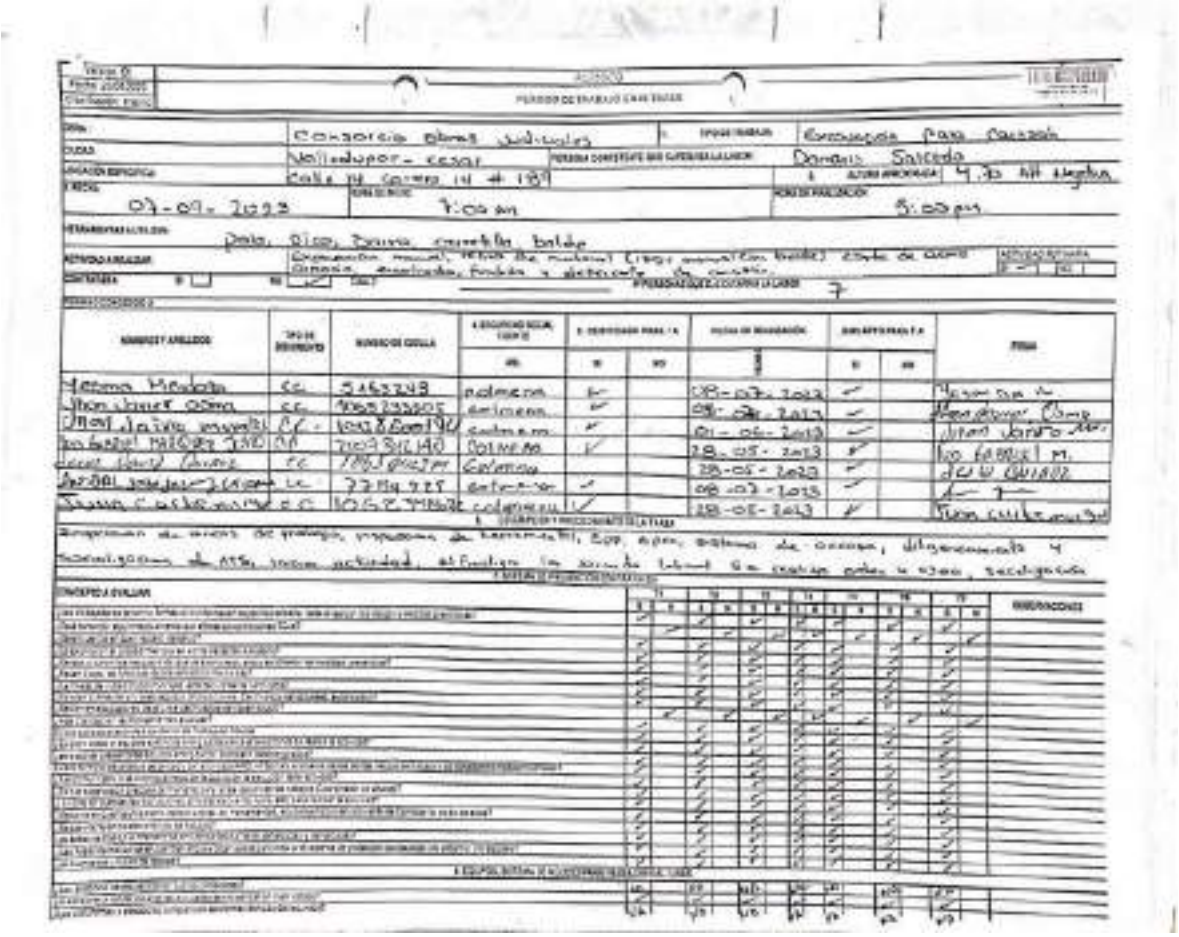


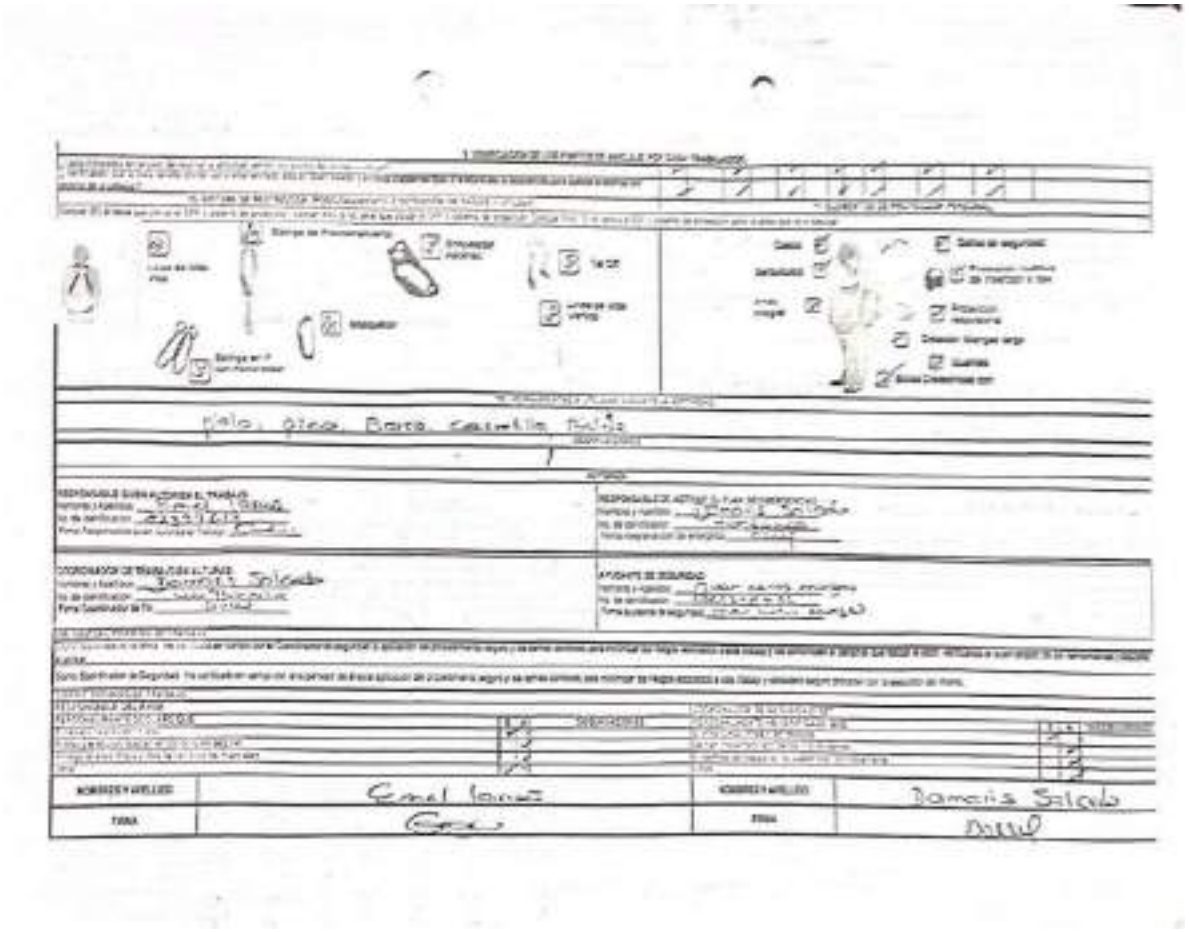


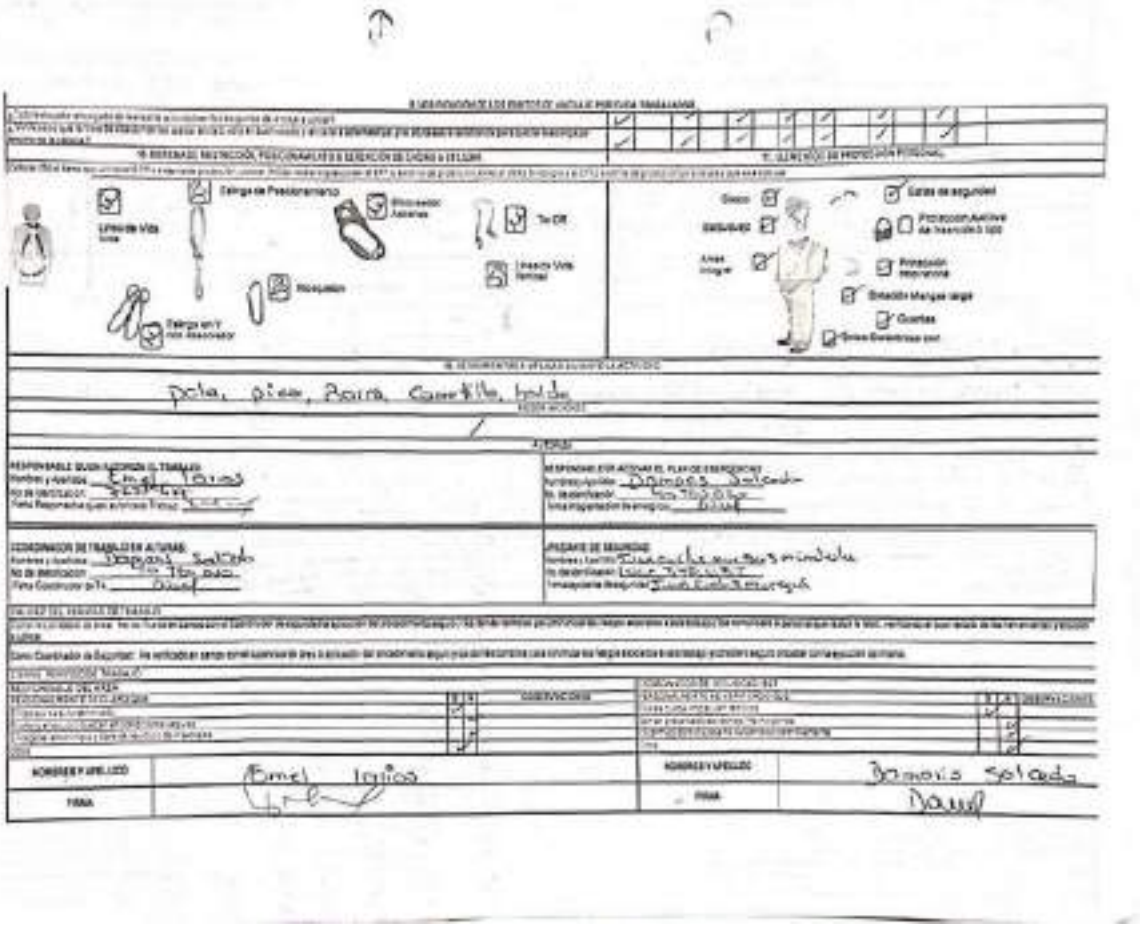


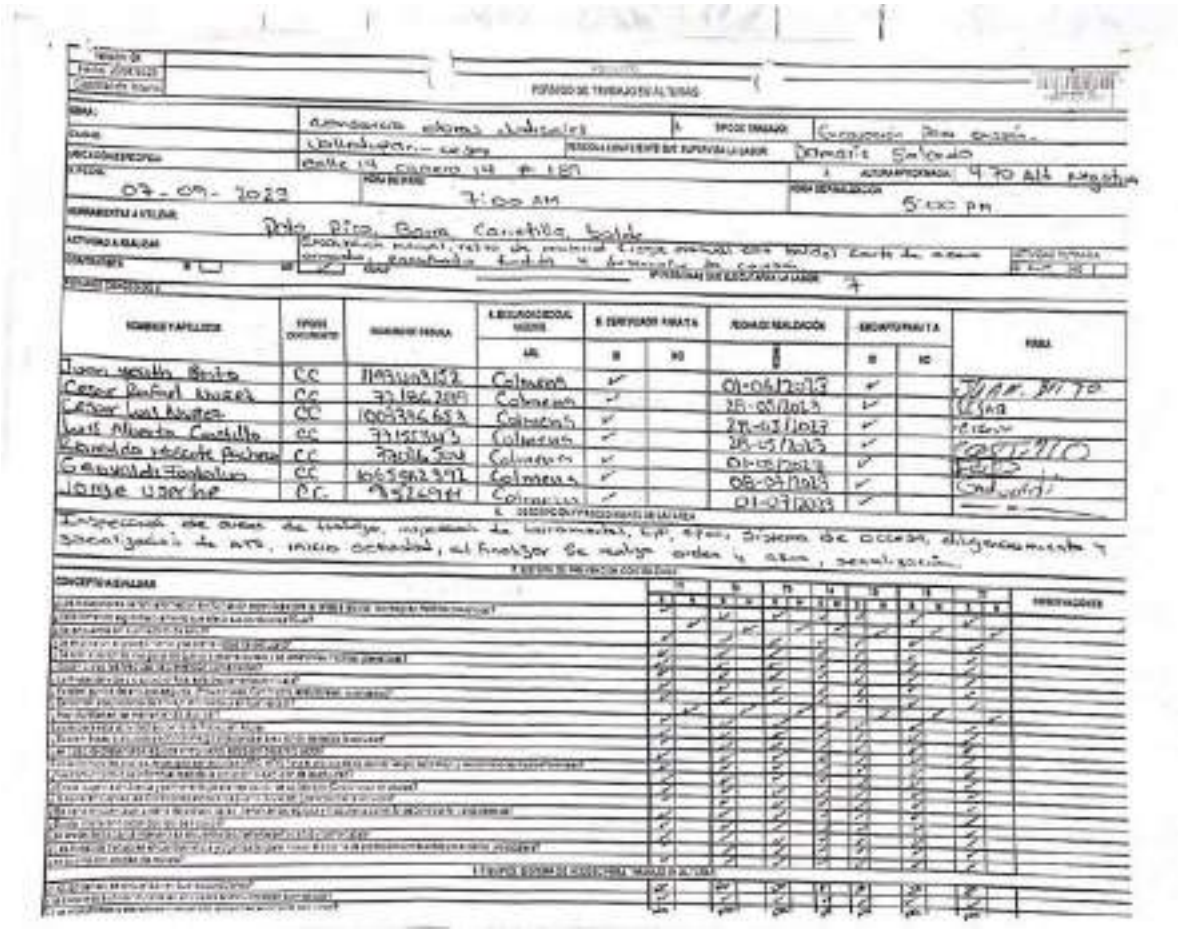


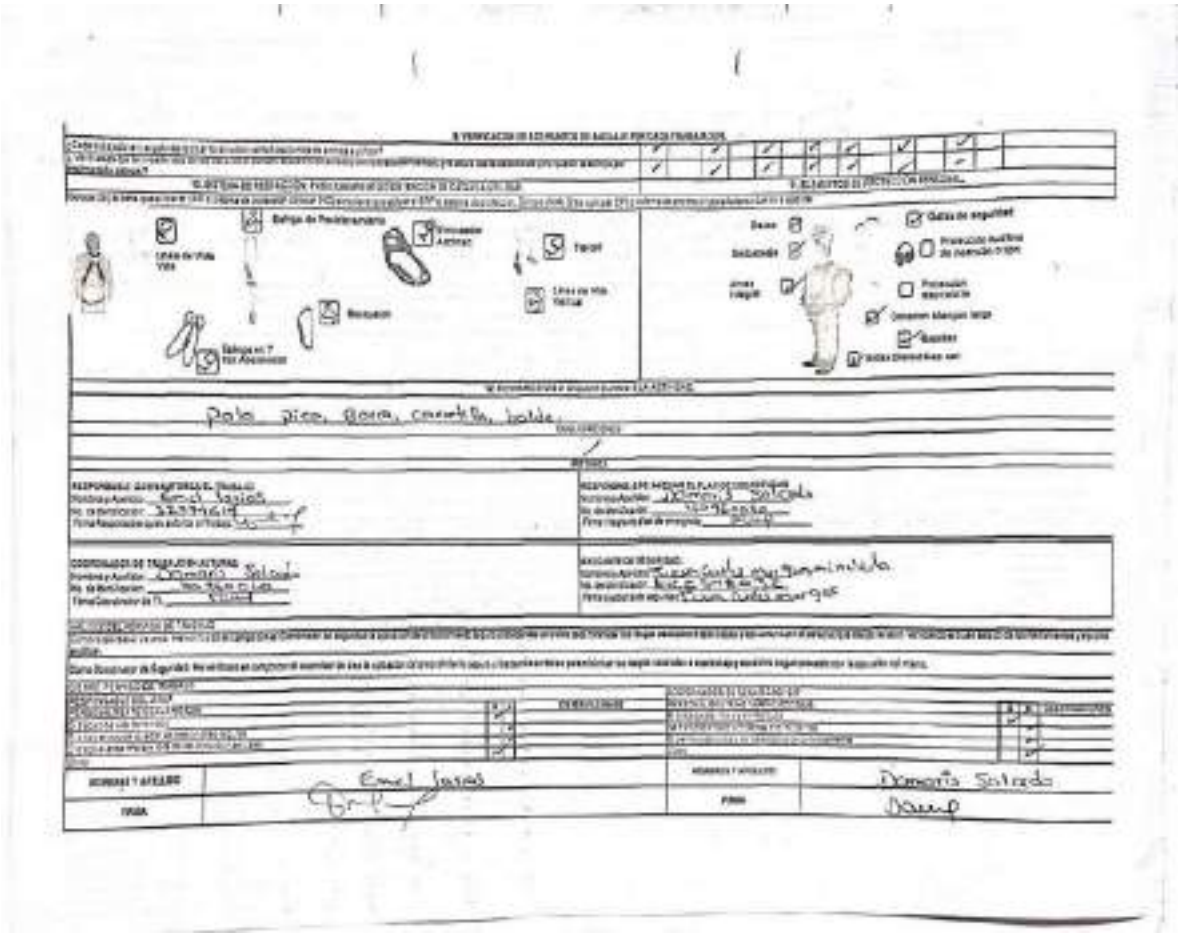


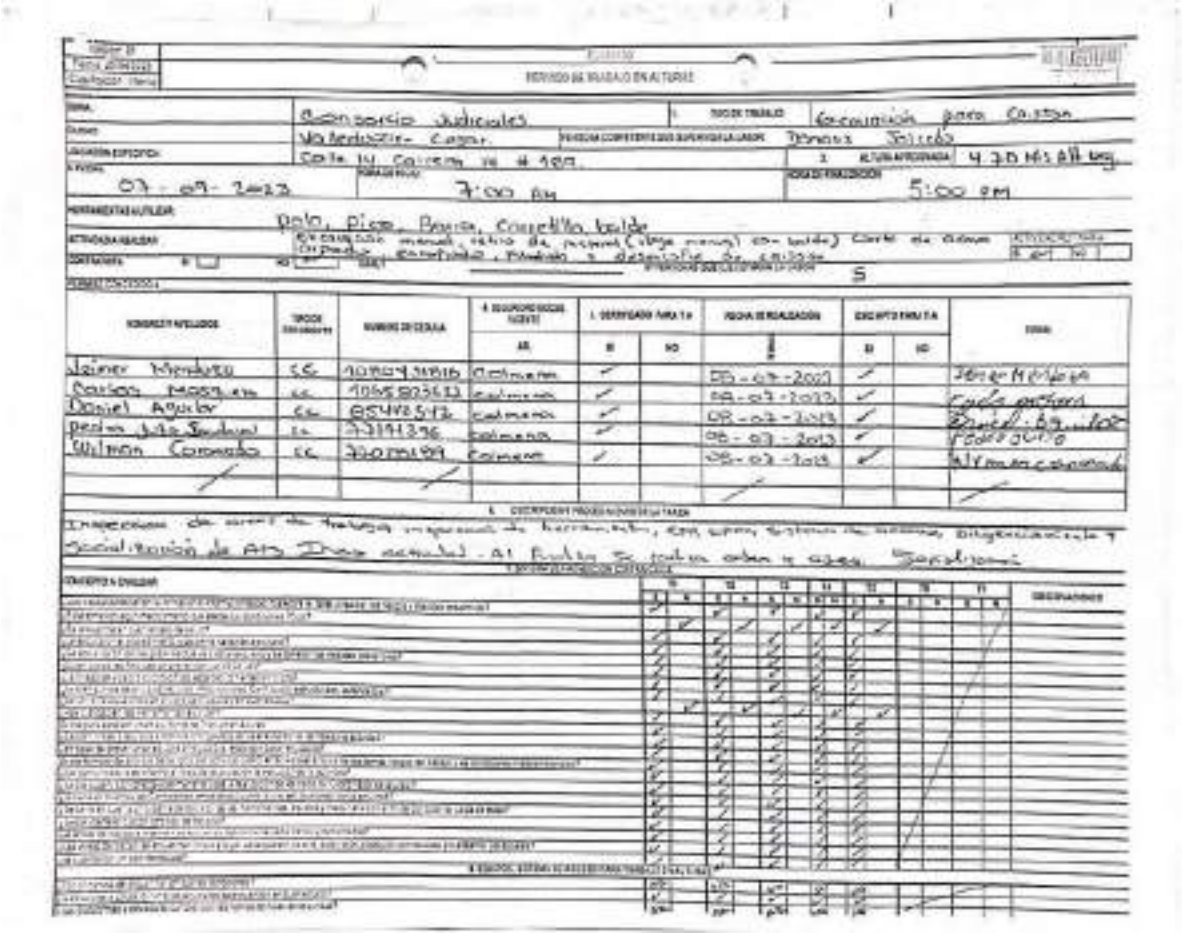


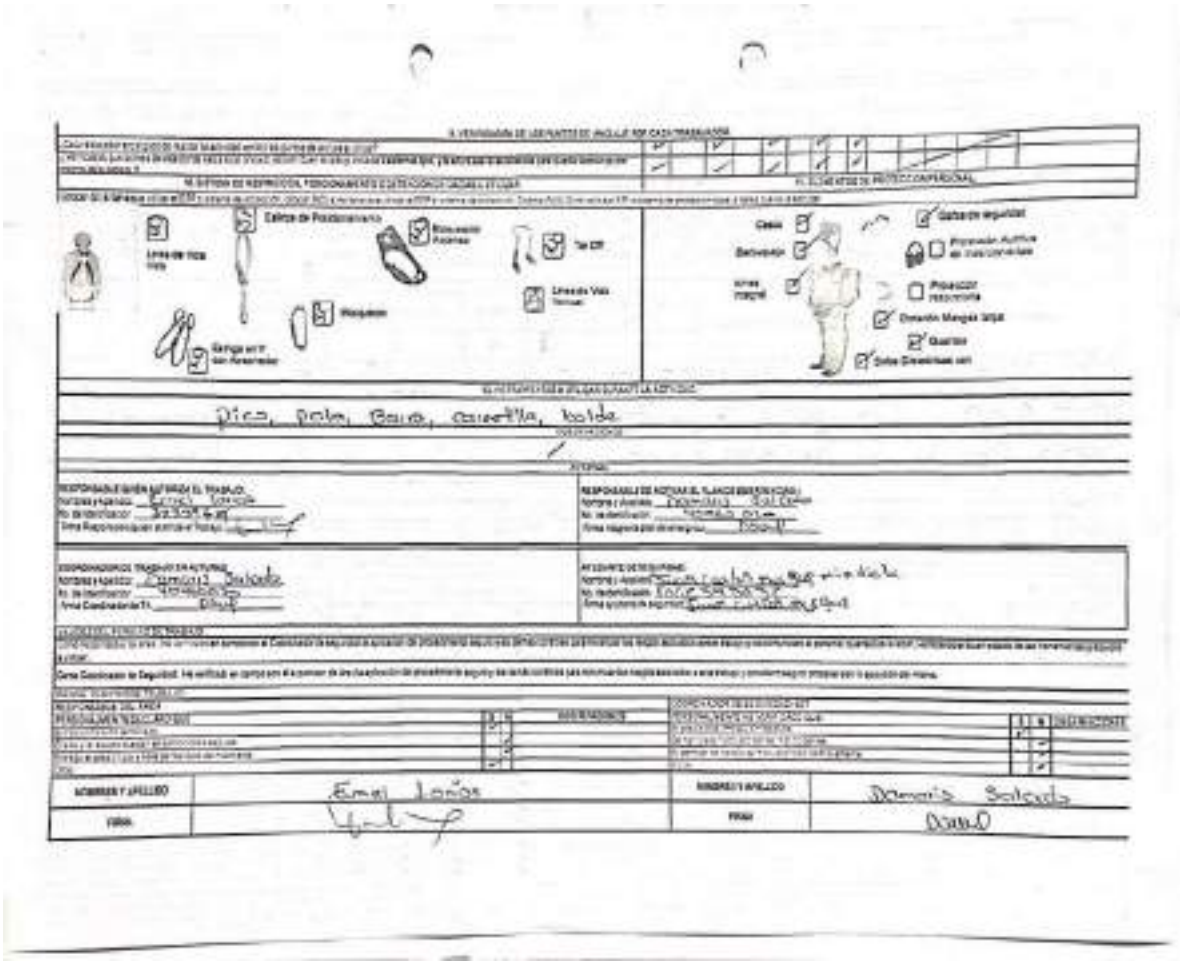


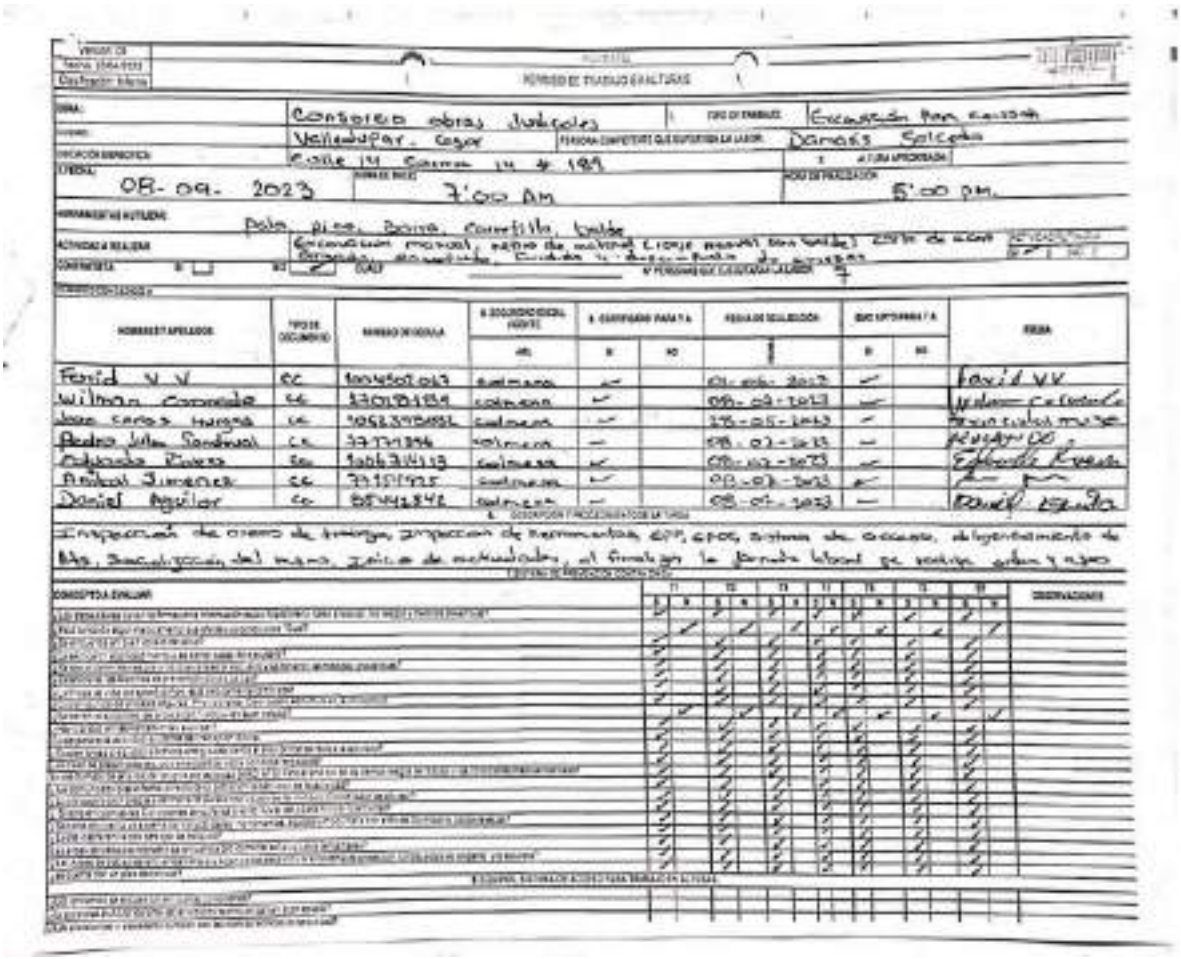


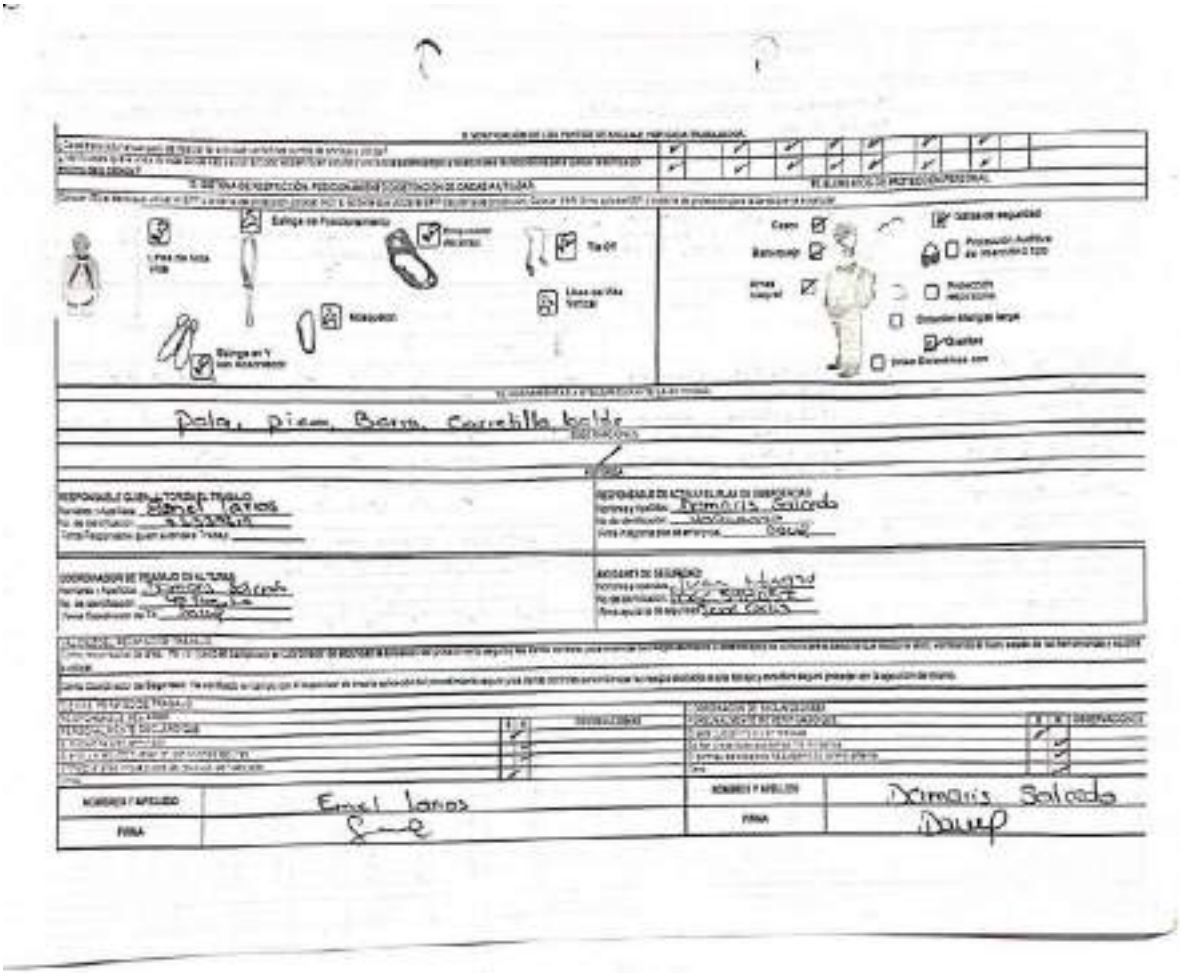

Polea, piem, Barra, Cuerdilla bolde
Daniris Salcedo
Daniris Salcedo

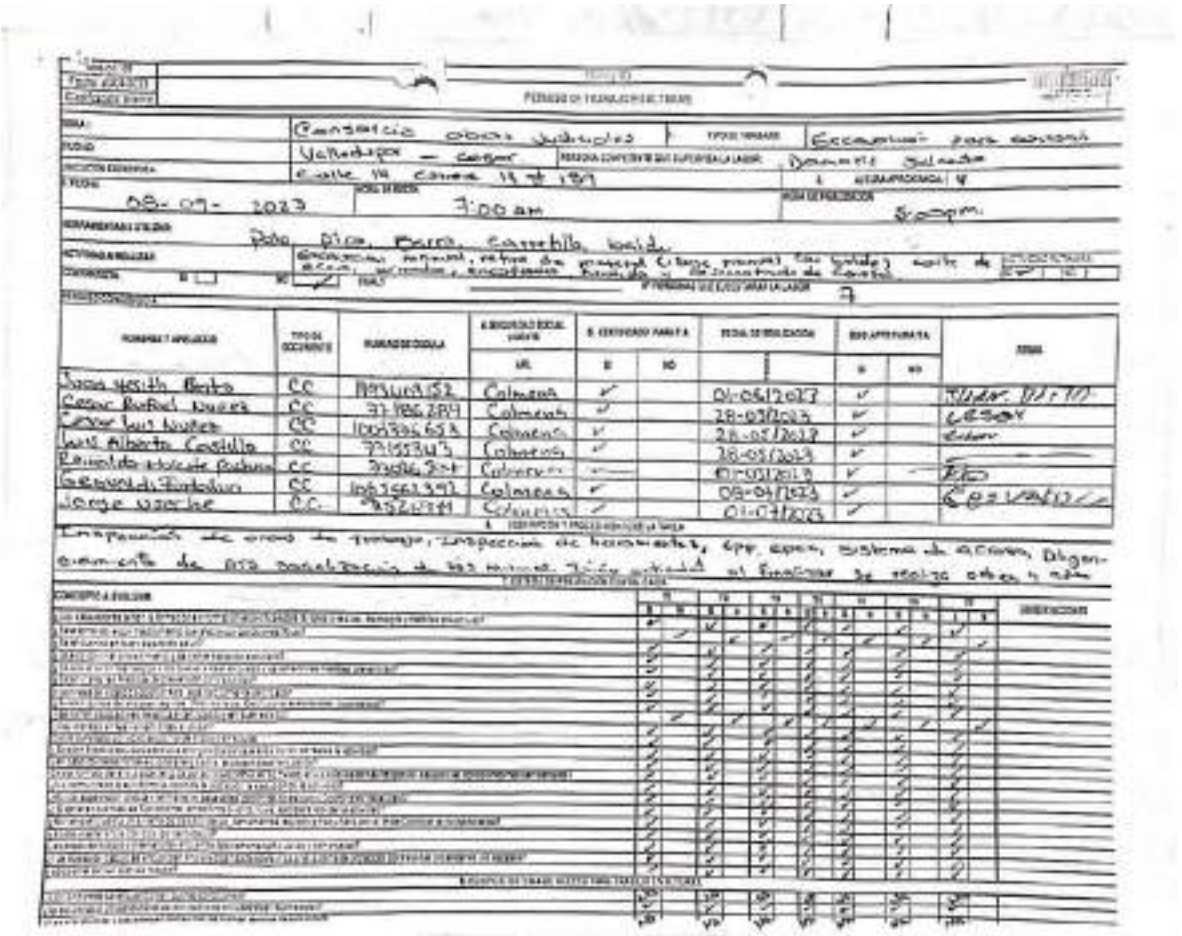


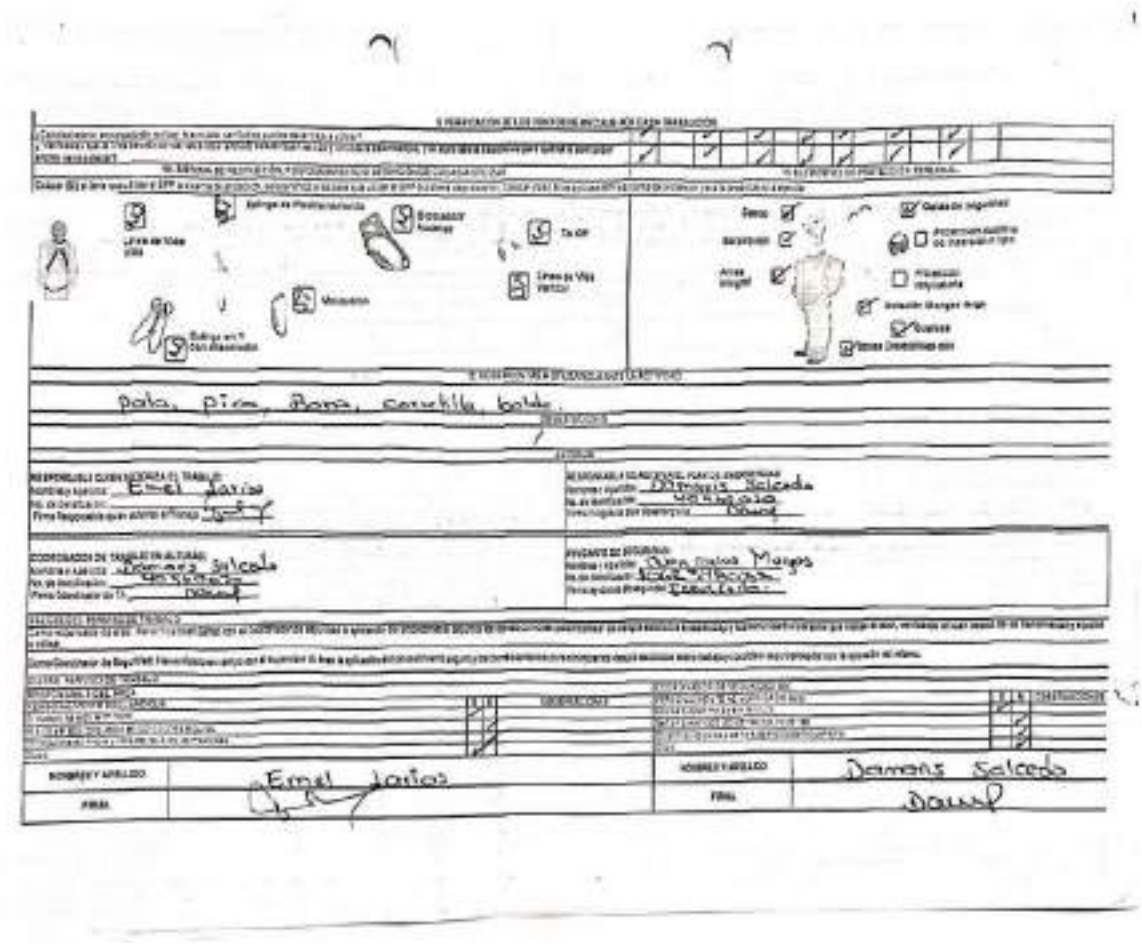

pala, pica, barra, carretilla, balde
Emel Jaramillo
Damaris Salcedo
Emel Jaramillo
Damaris Salcedo

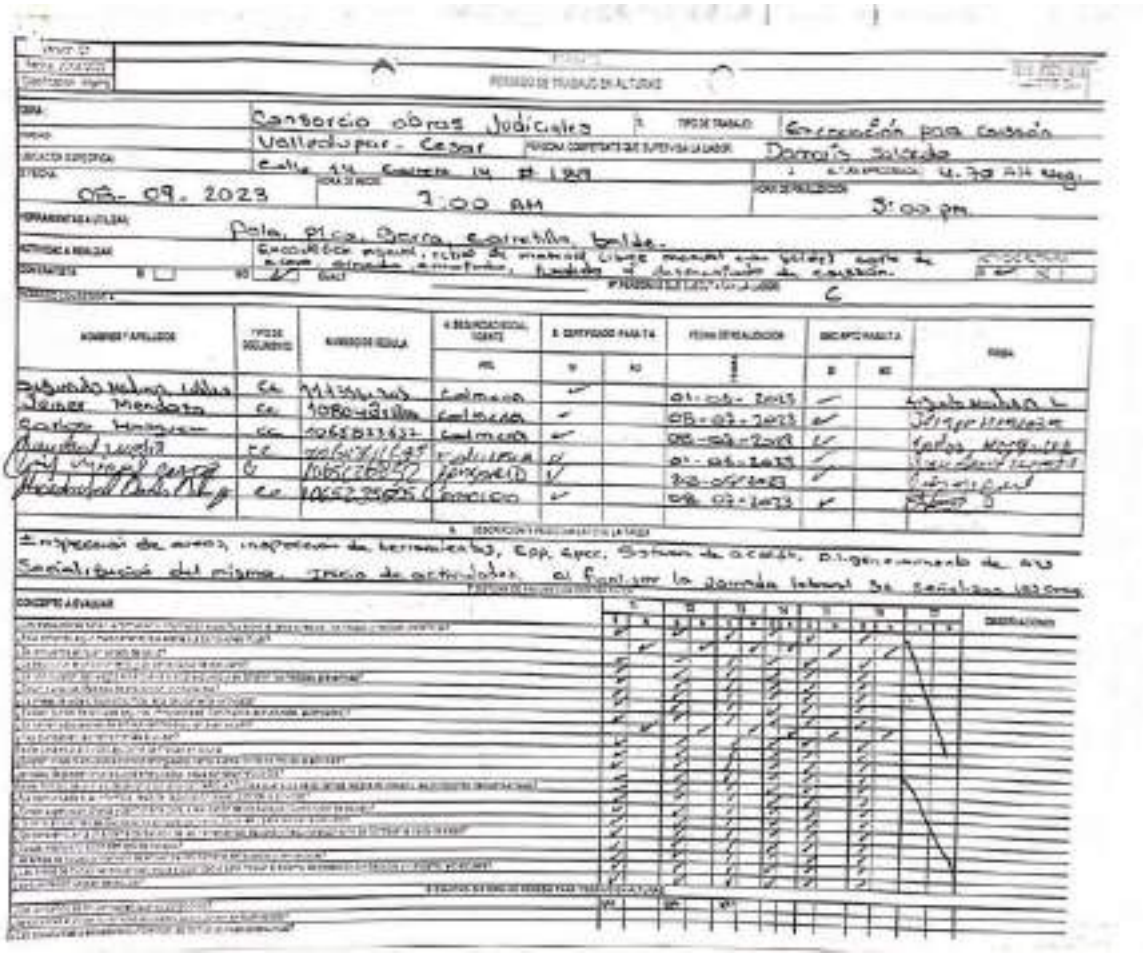

Consorcio Obras Judiciales
Excavación para cimentación
Dorado Soledad
08-09-2023
7:00 AM
3:00 pm
Pala, pica, barra, carretilla, botas.

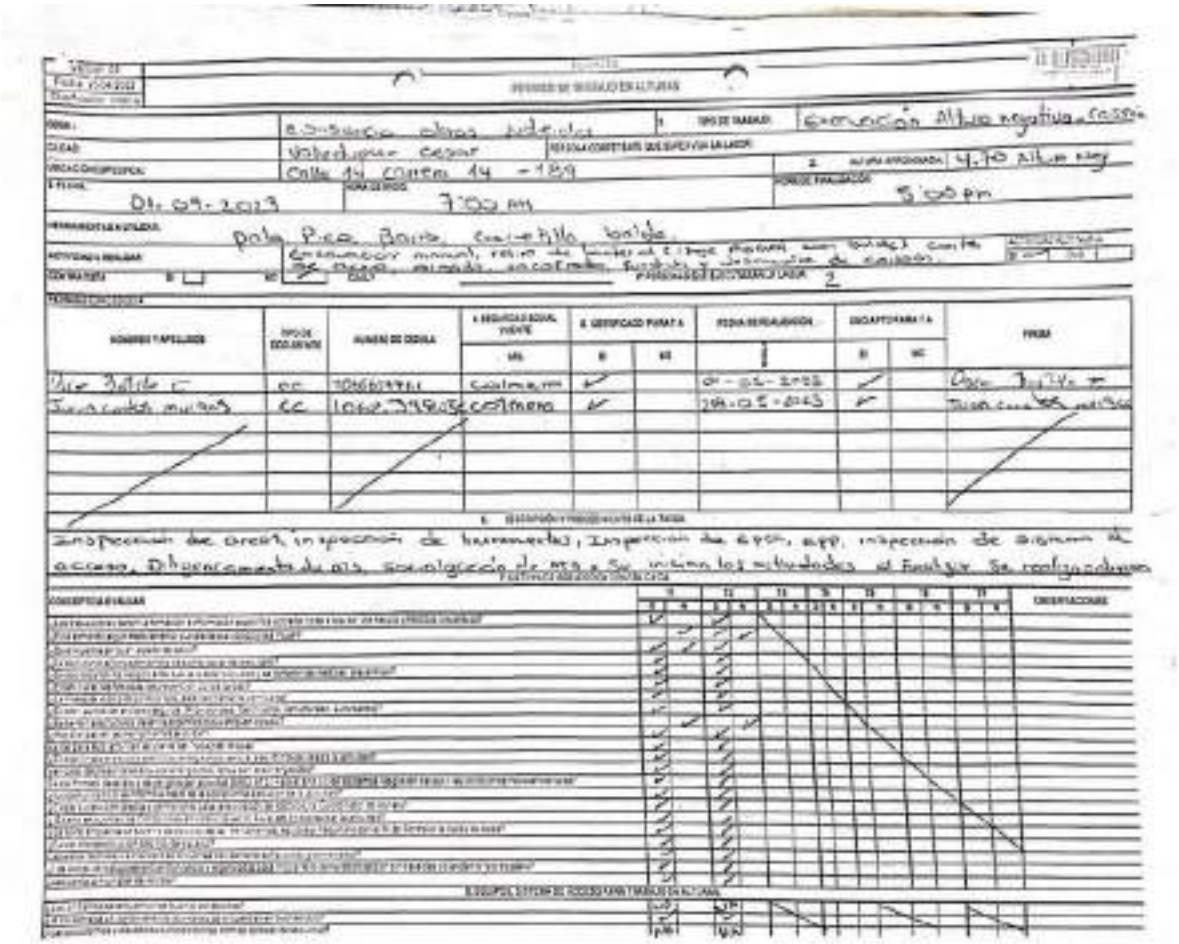


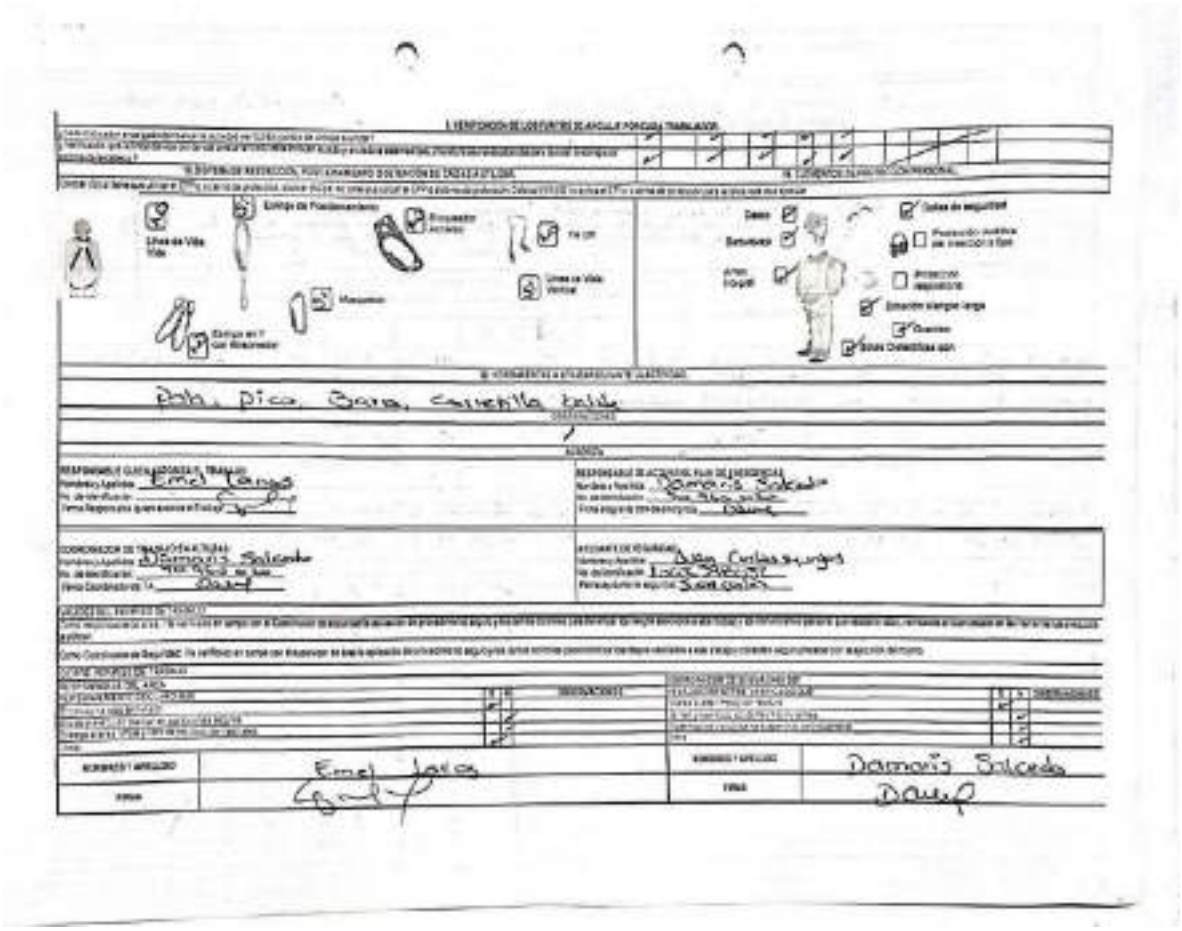


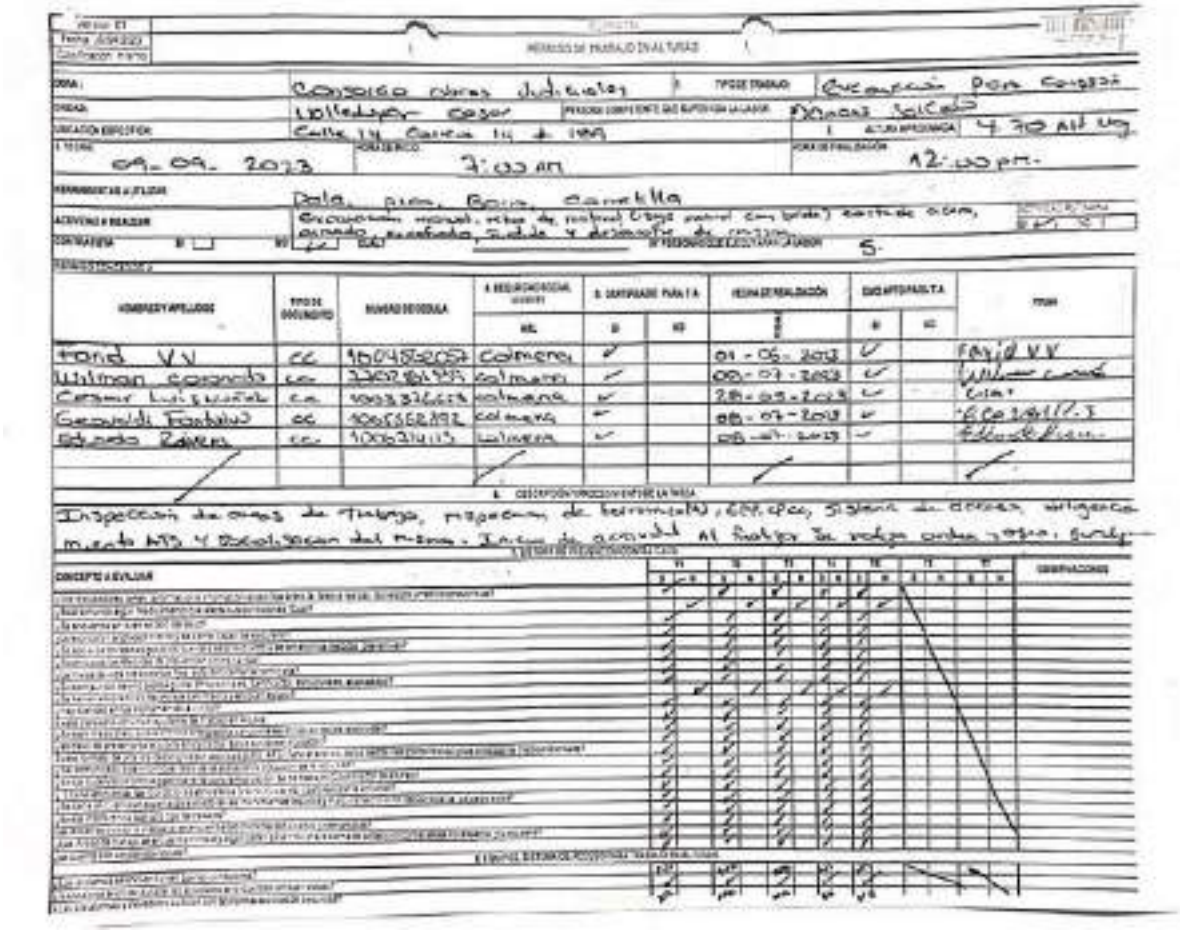


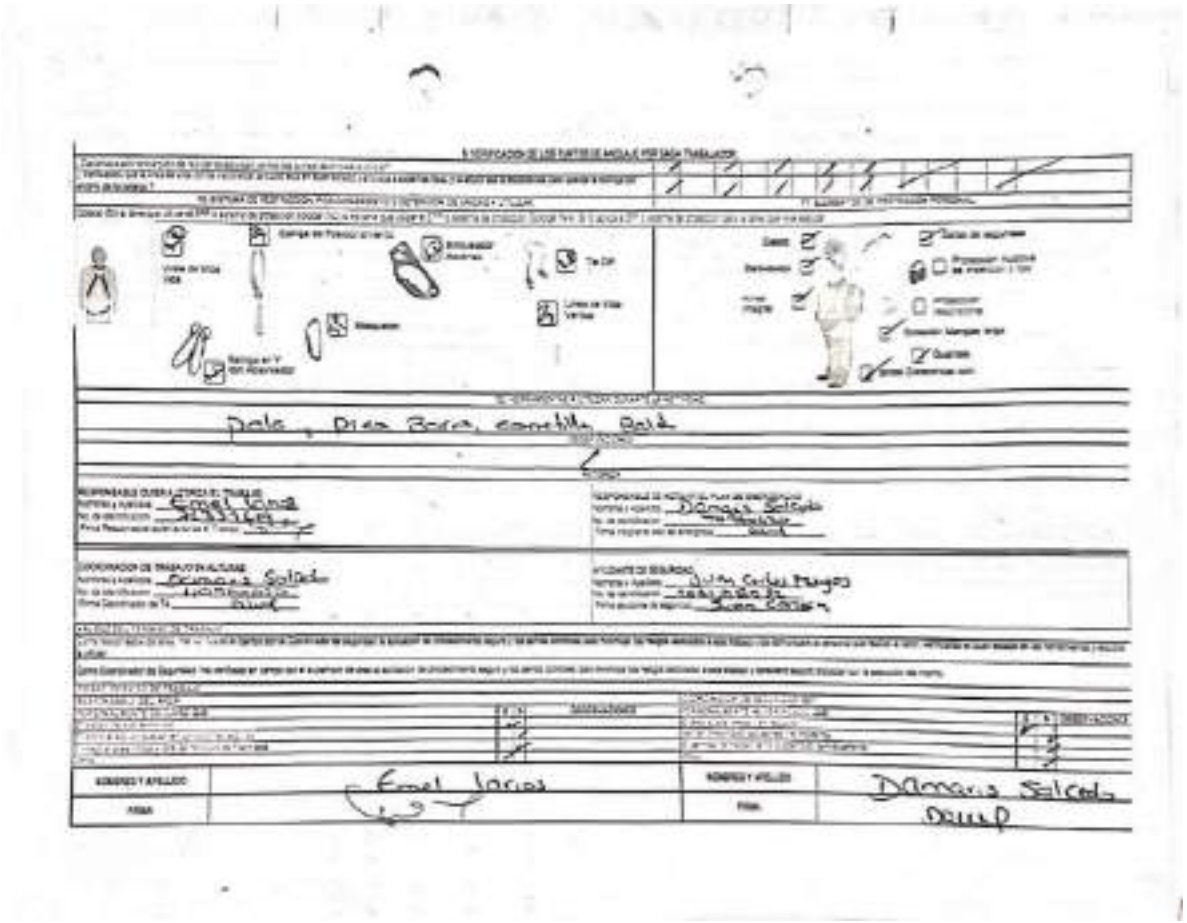


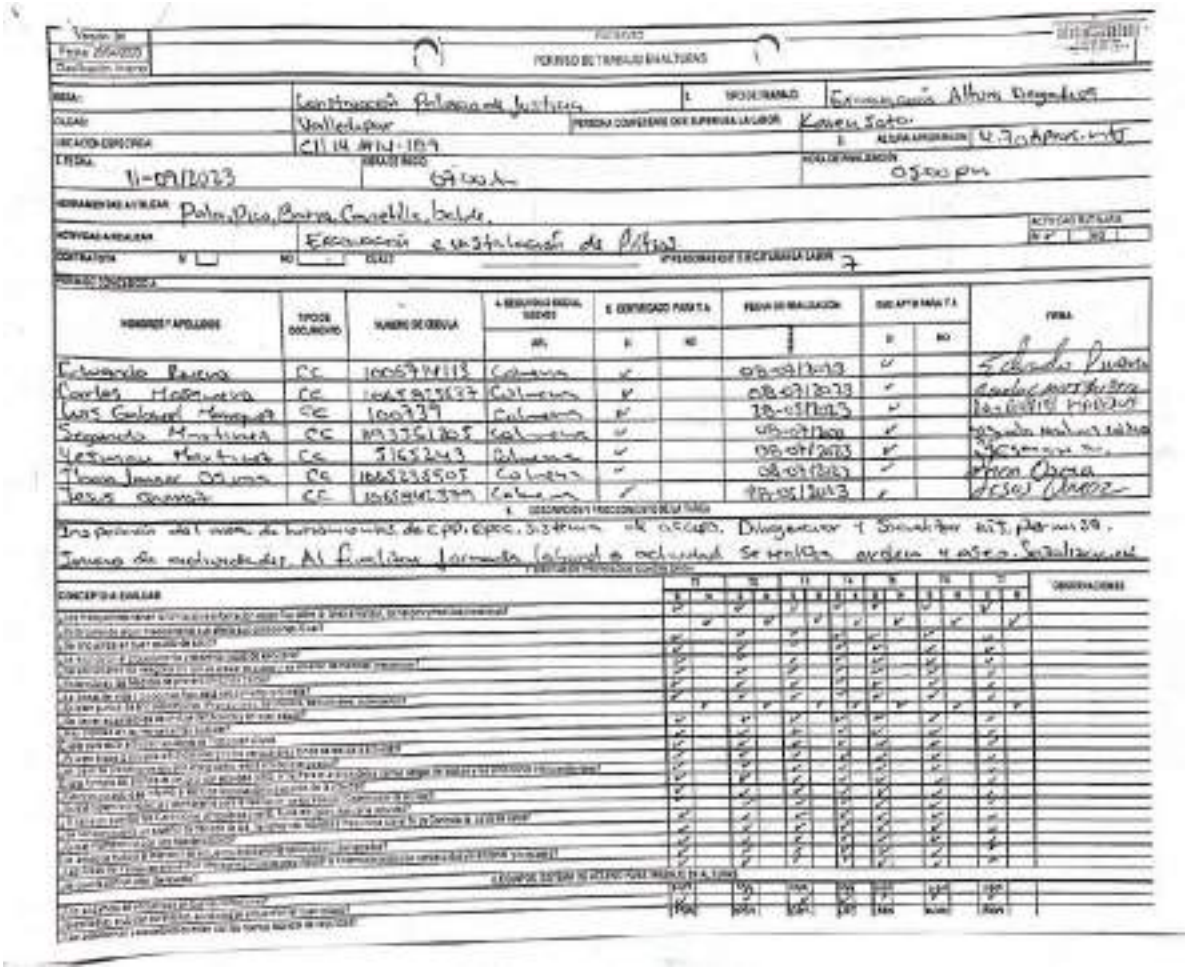

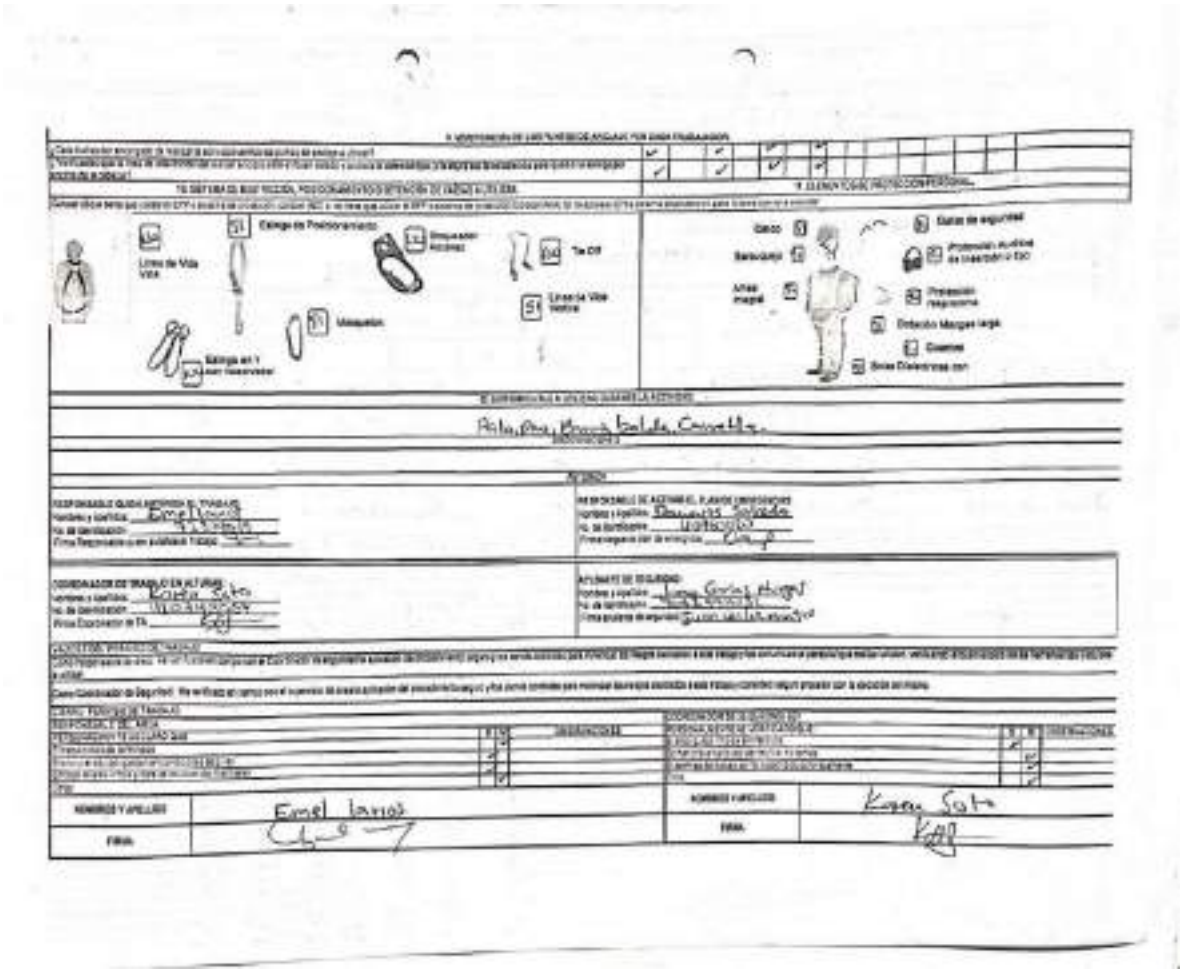

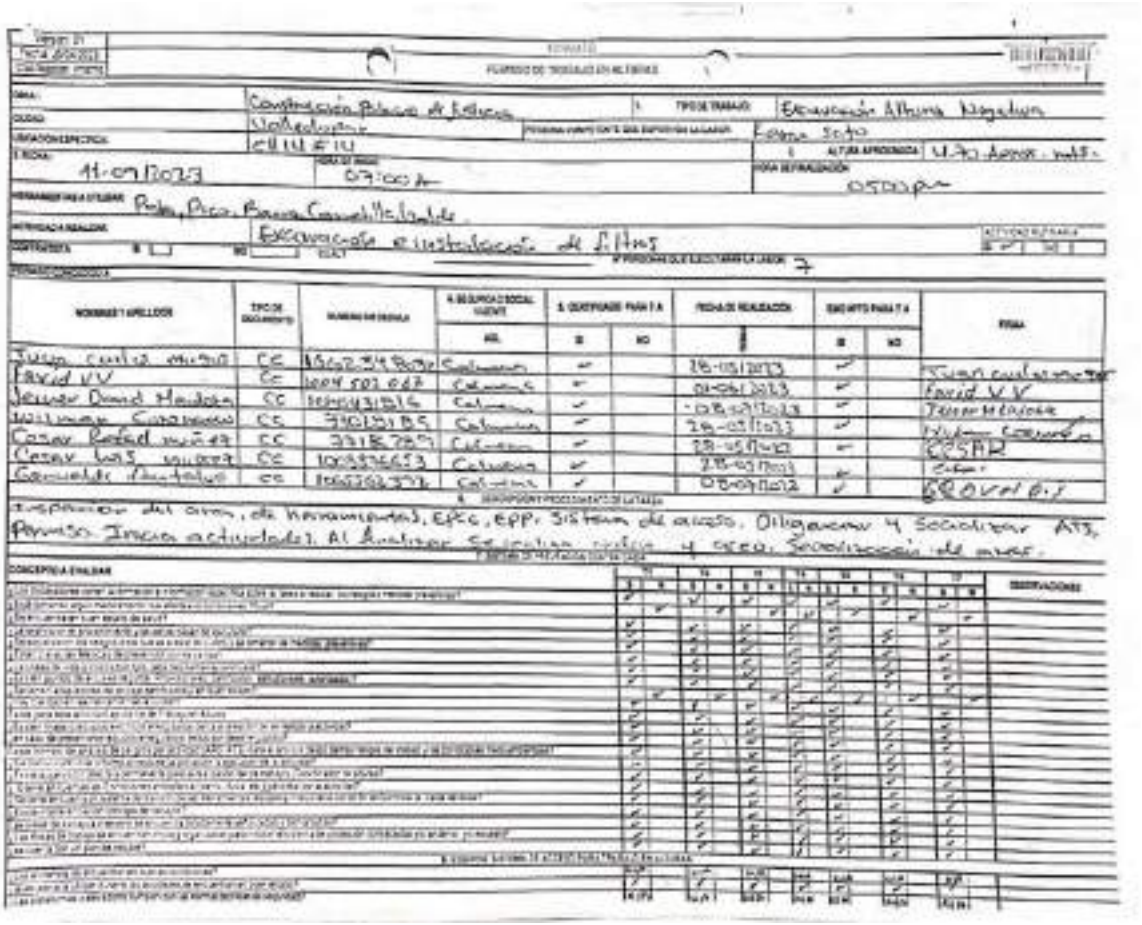

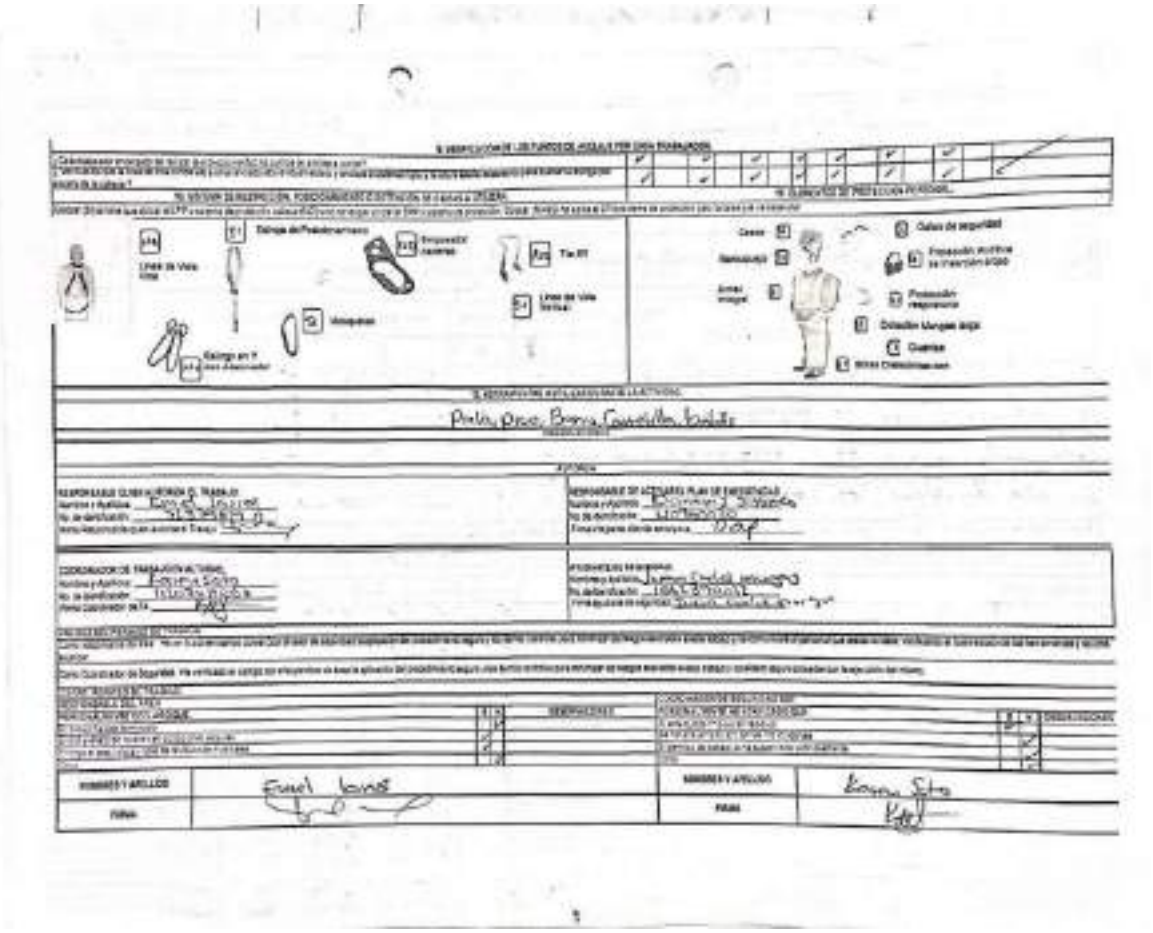

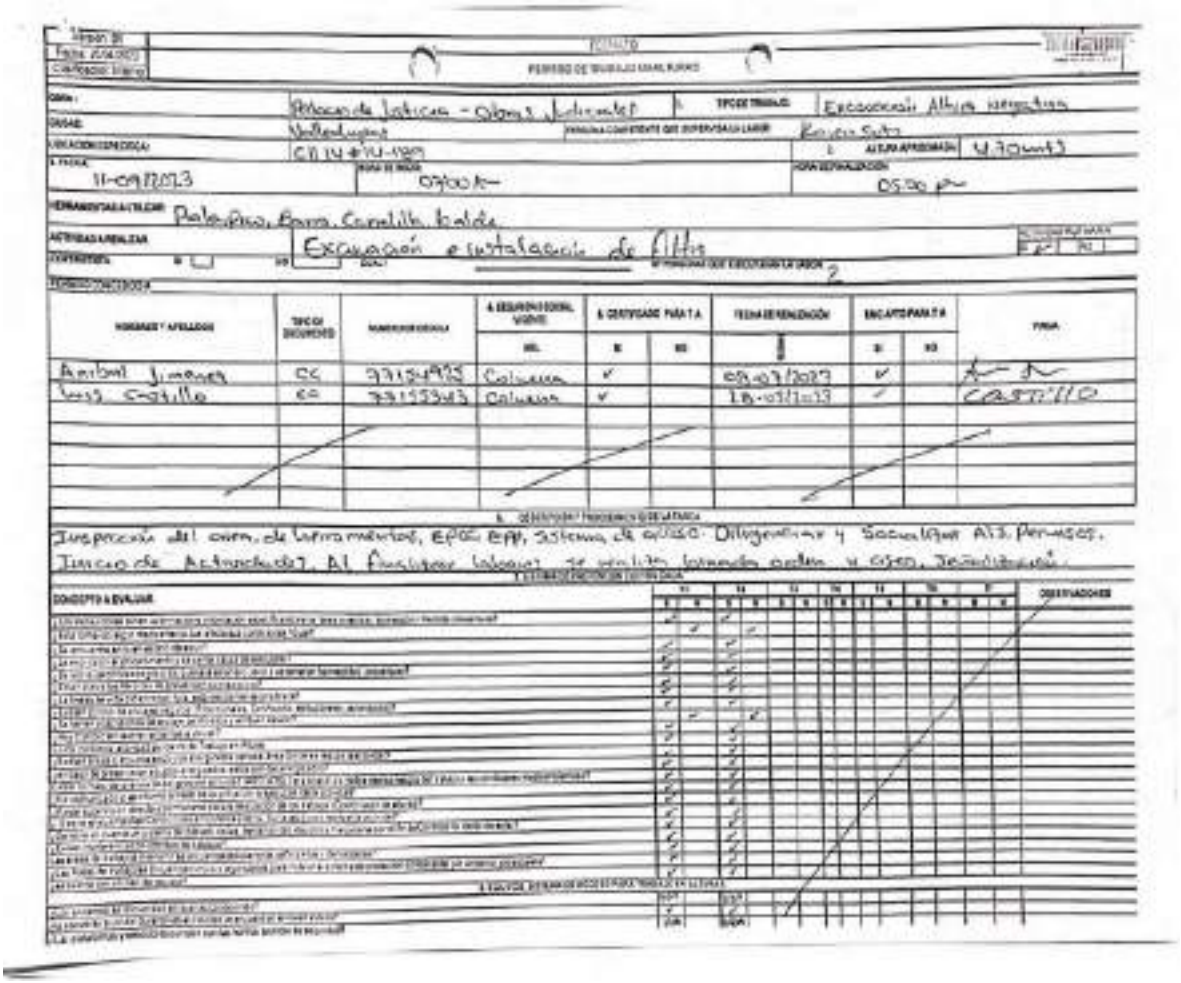



Palacio de Justicia - Obras Judiciales


Excavación Altura negativa


Excavación e instalación de filtro


Inspección del cum. de herramientas, EPP, EPC, Sistema de aviso. Obligatoriedad y Seguridad Alt. Permisos. Inducción de Actividad. Al finalizar labores se realizan labores orden y aseo. Socialización.

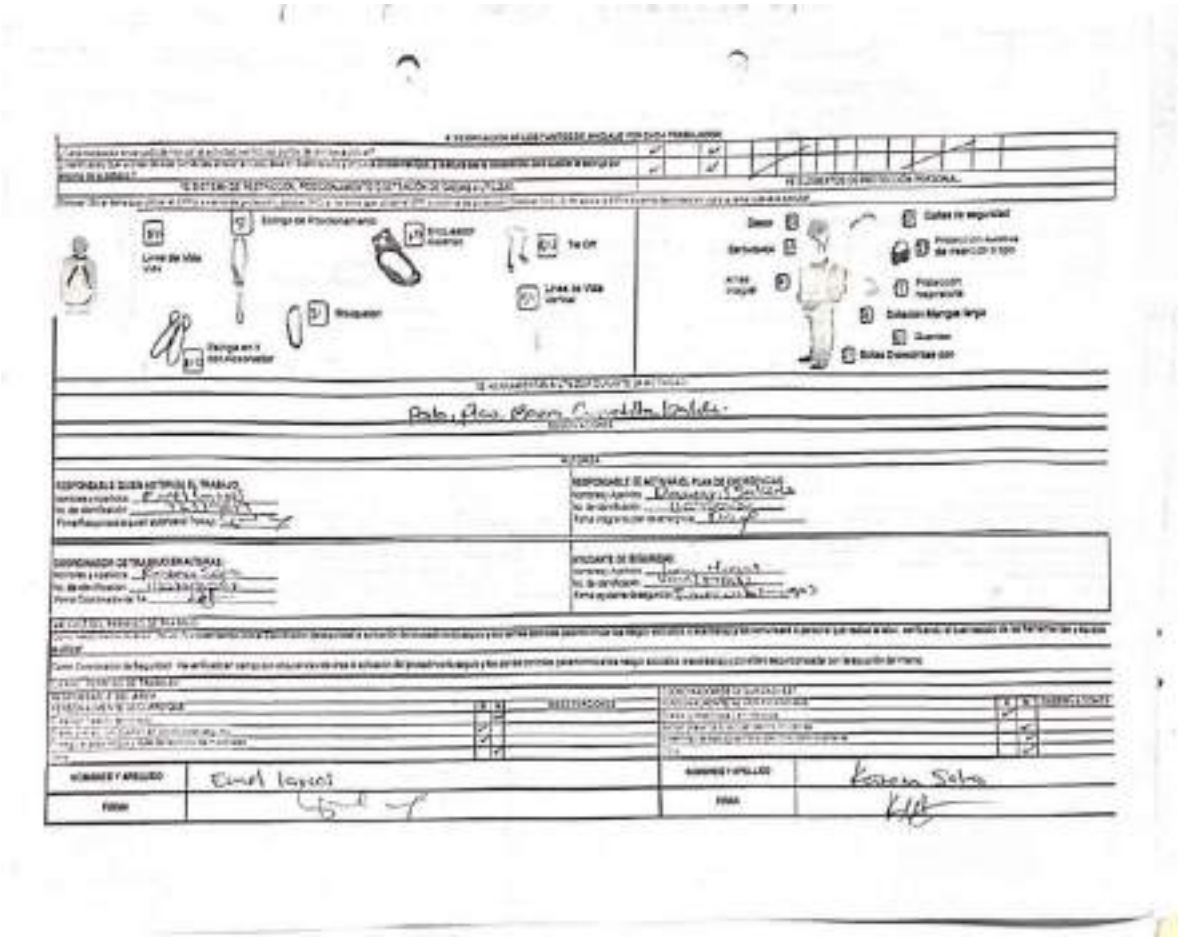


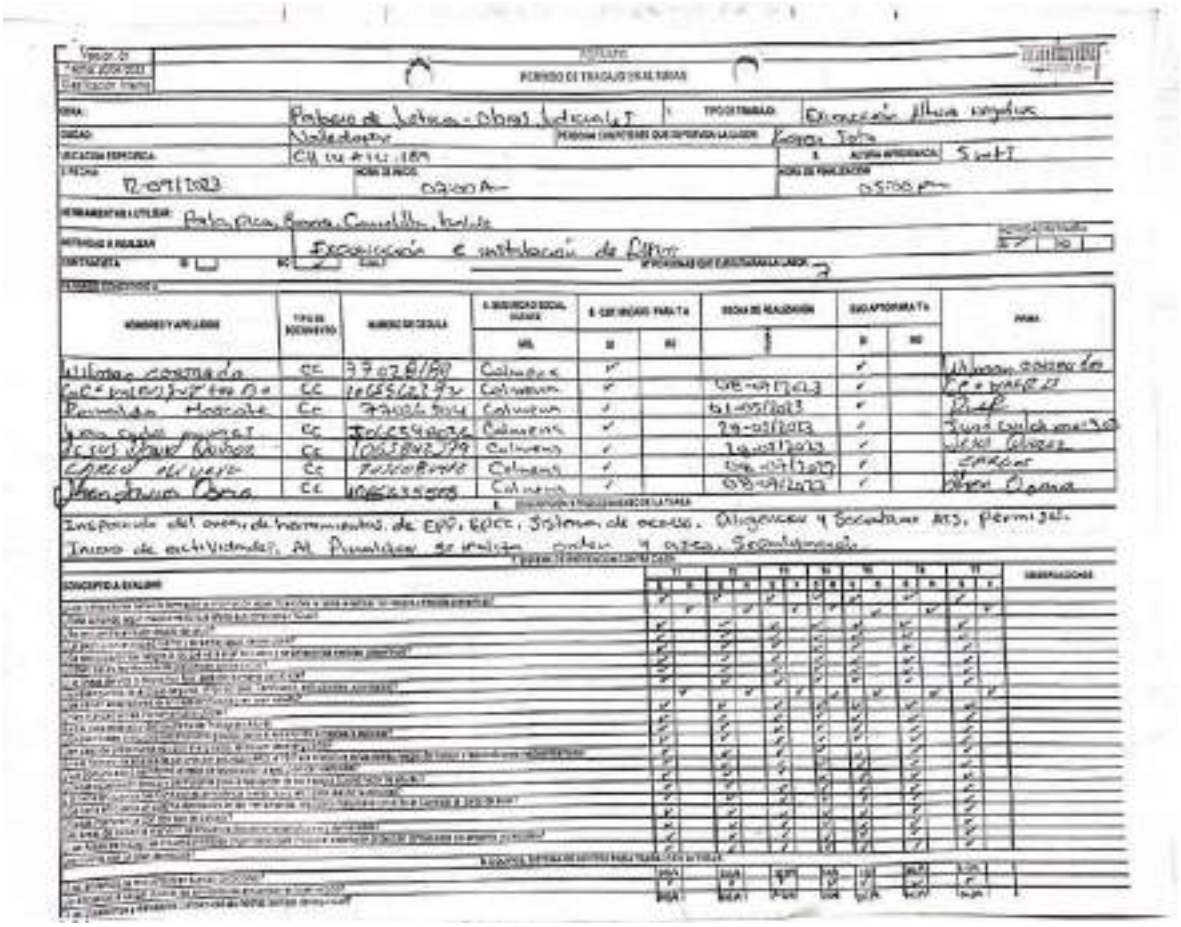


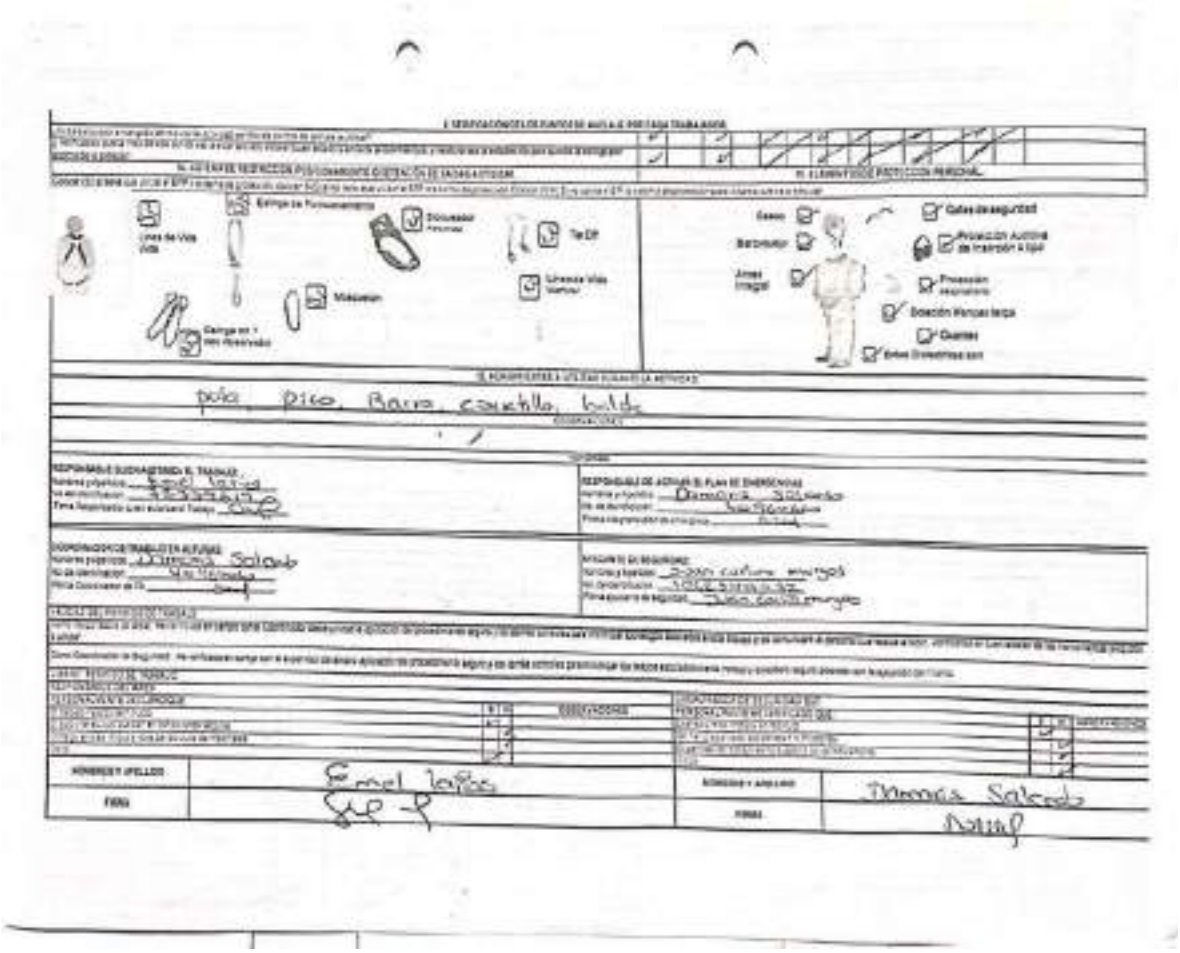

pala, pico, Barra, cuchilla, bolsa
Daniela Salcedo
Daniela Salcedo

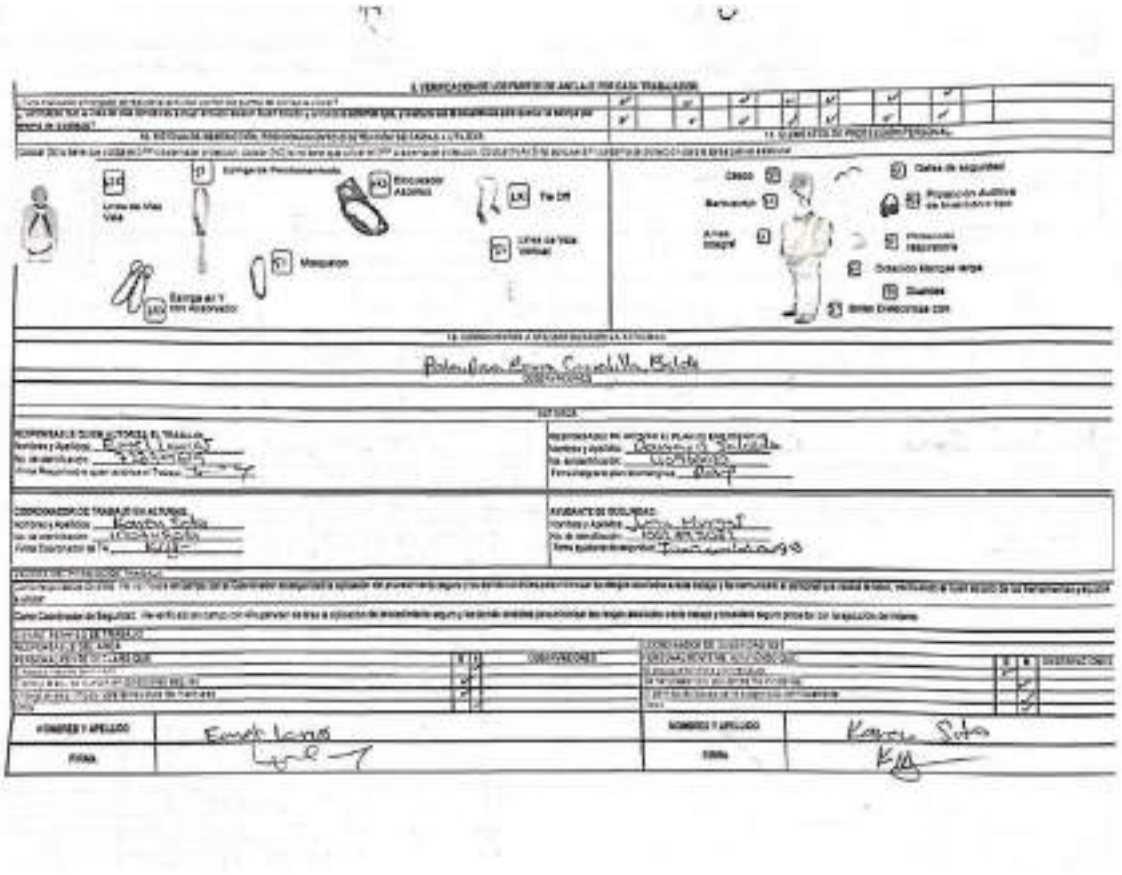


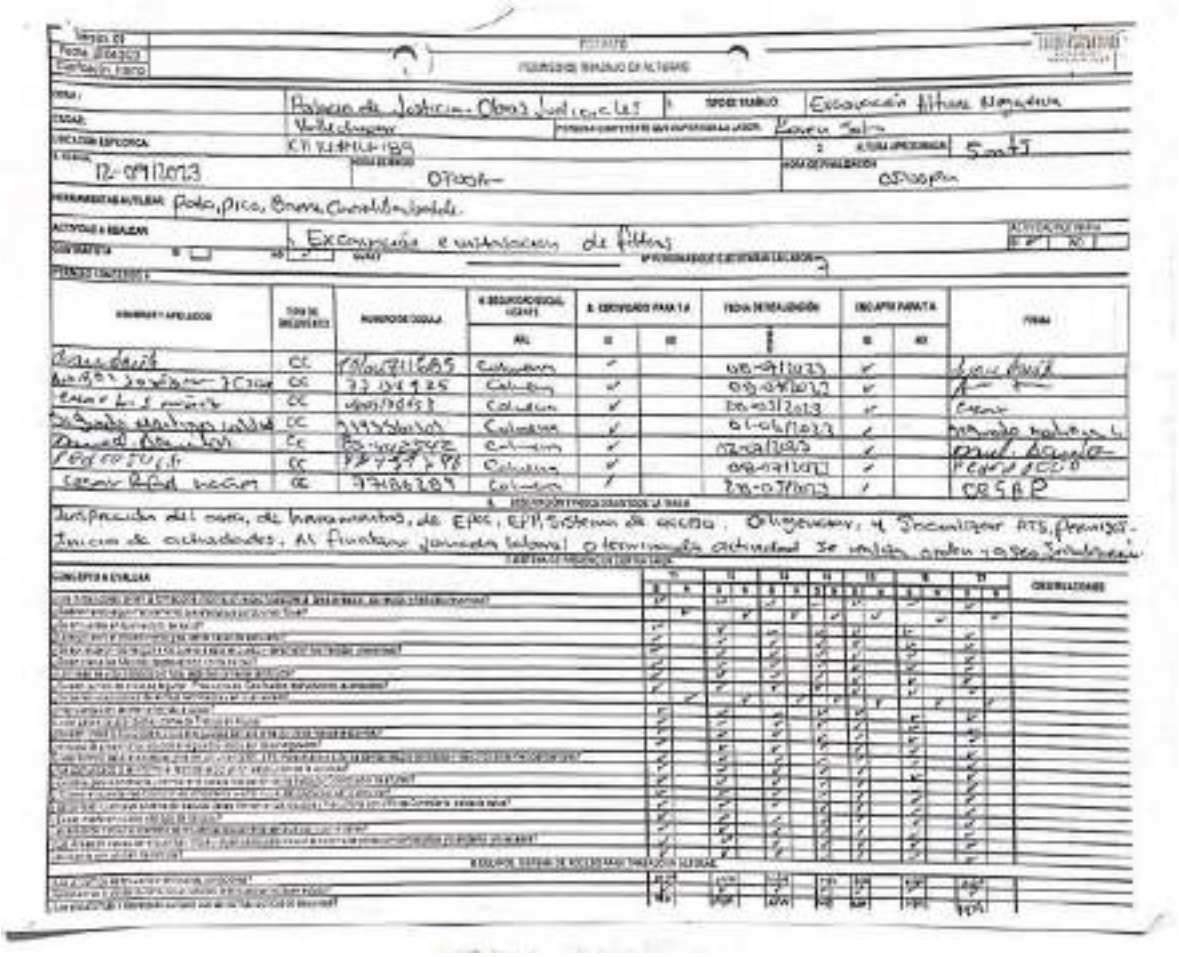


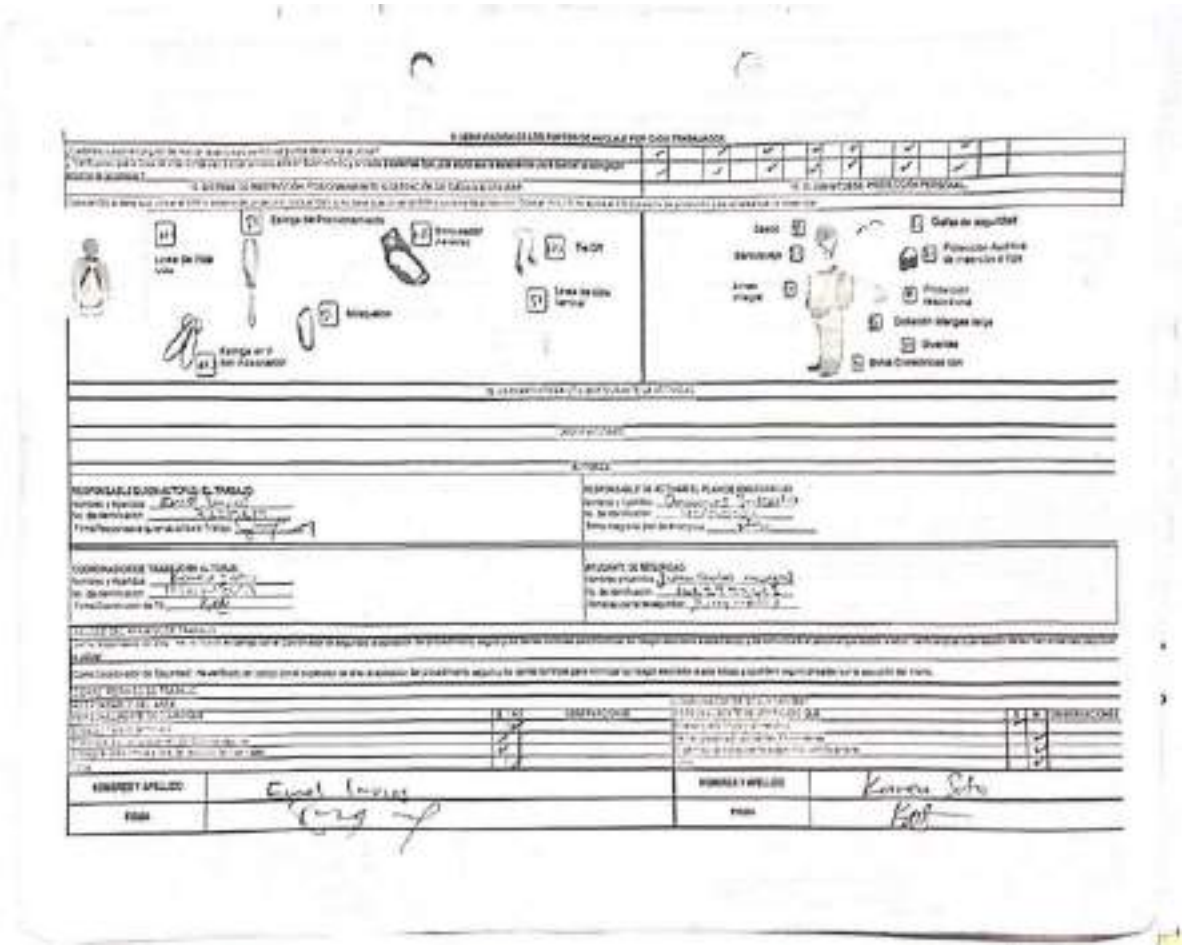


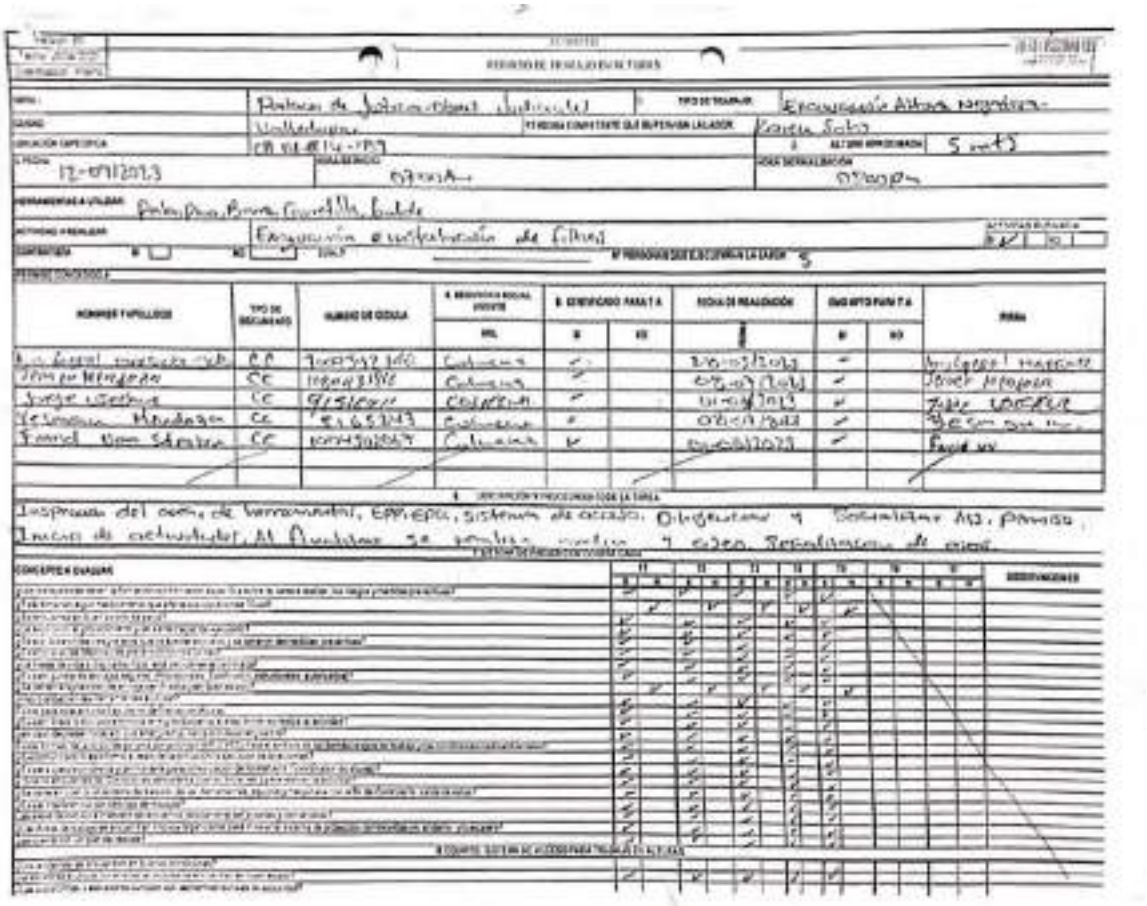


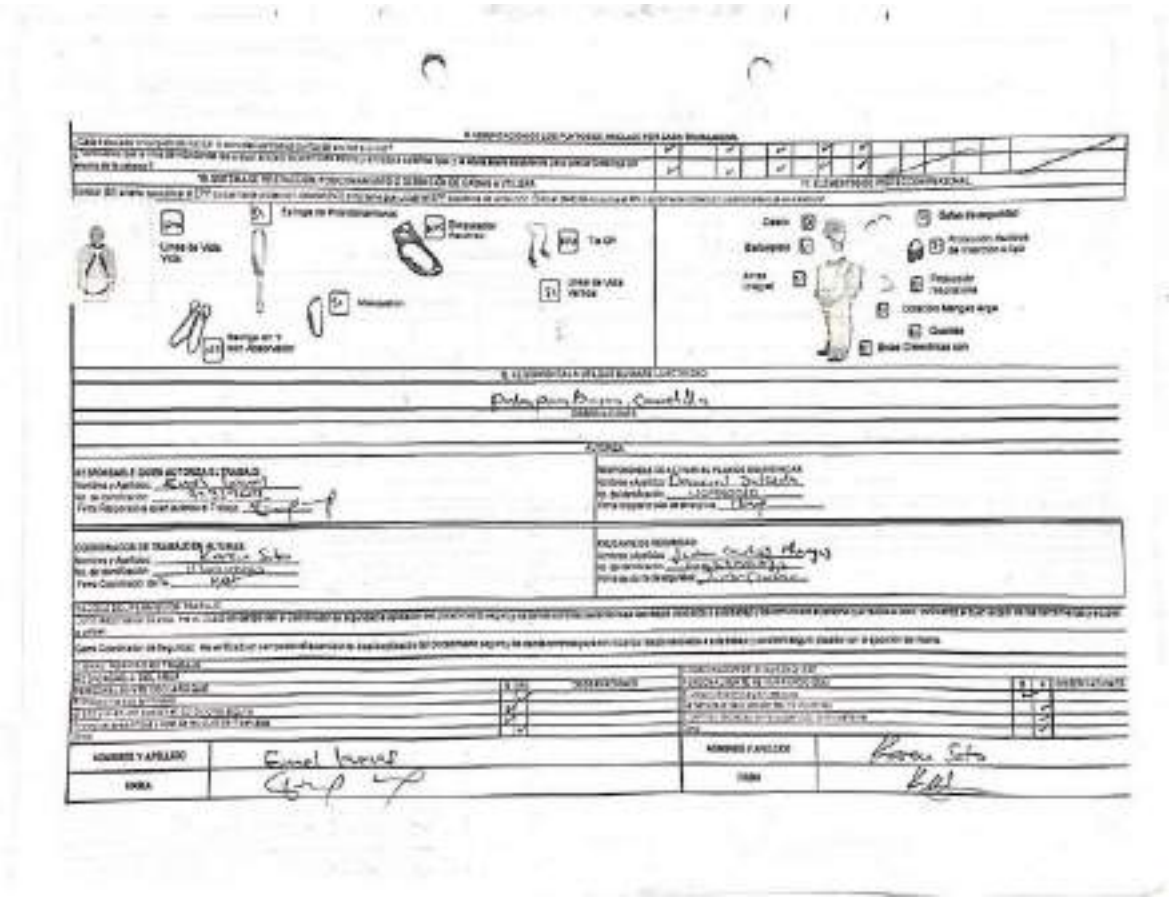


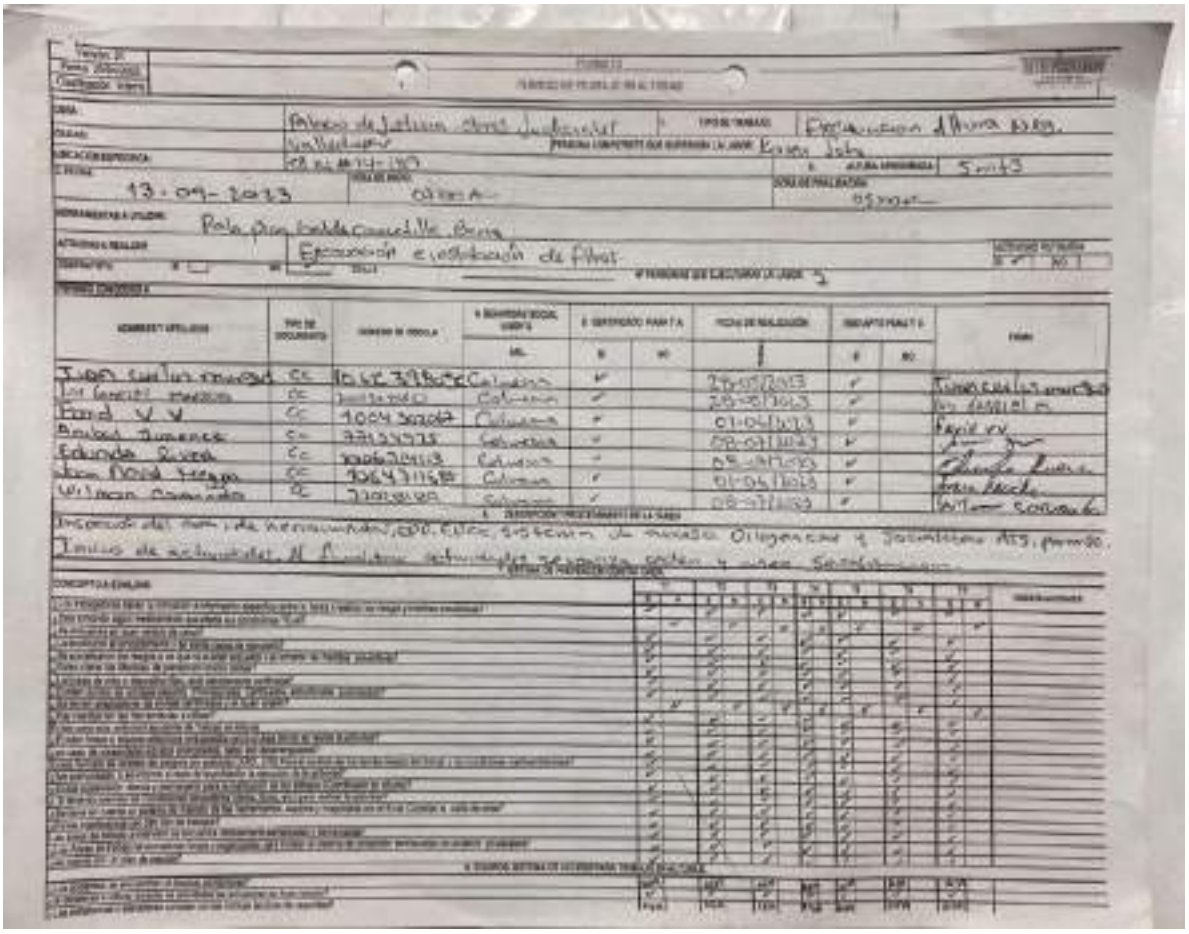


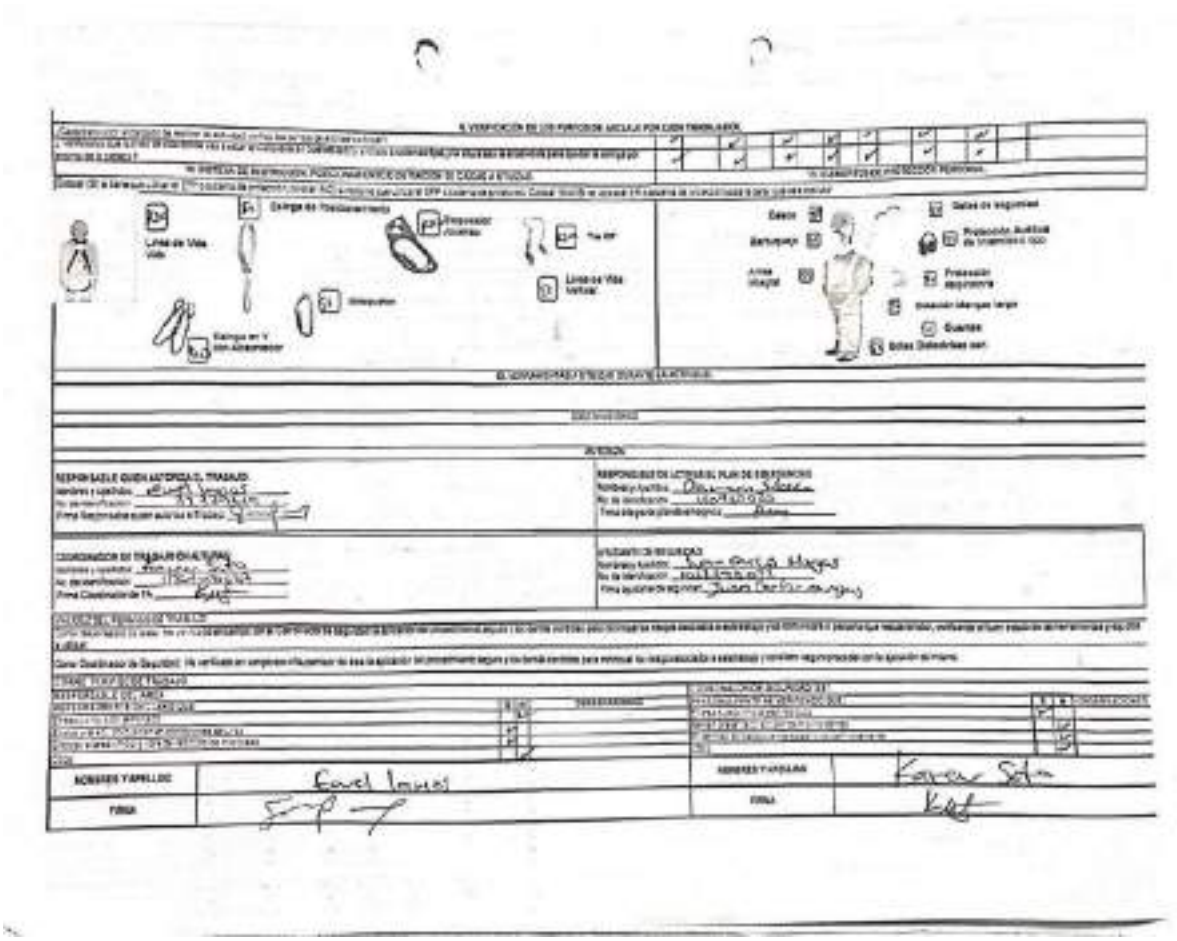


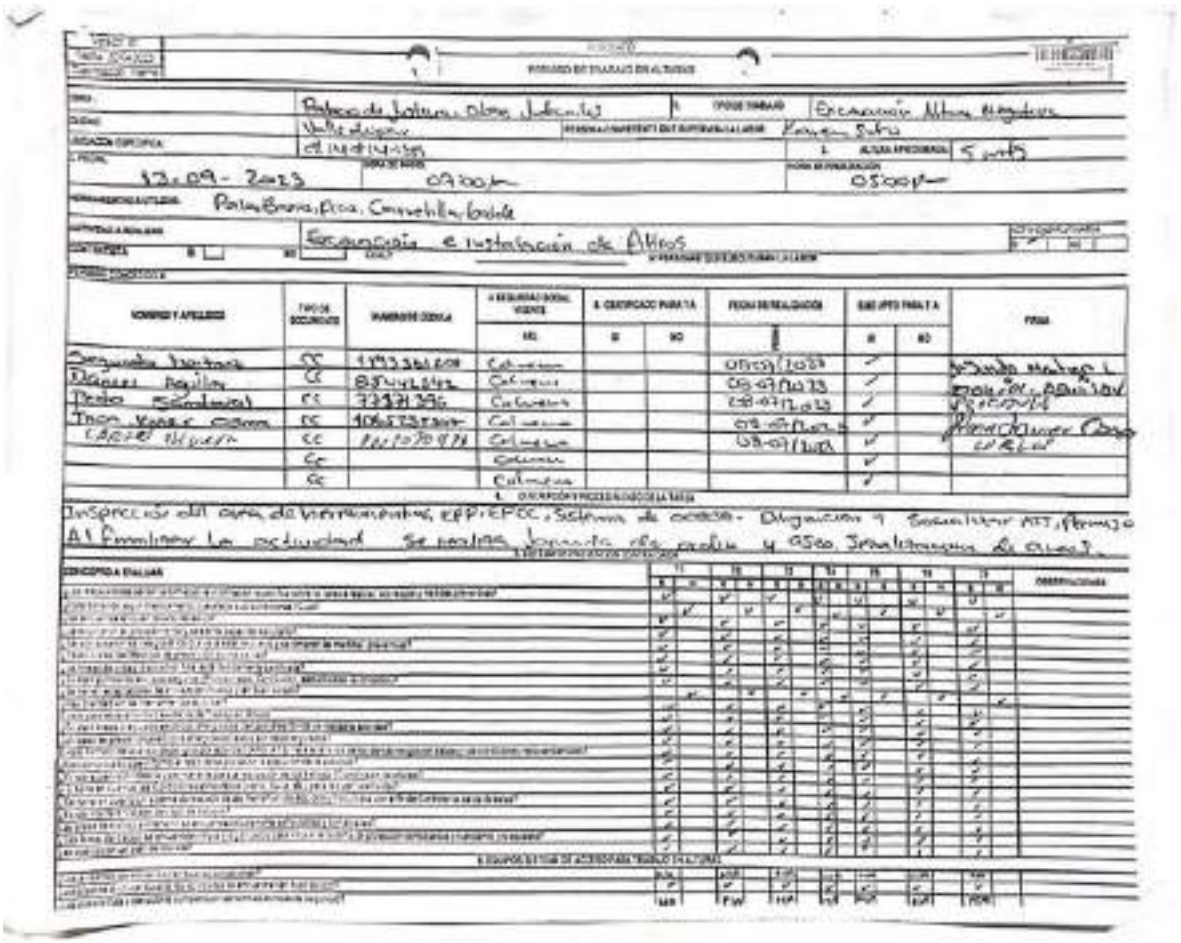


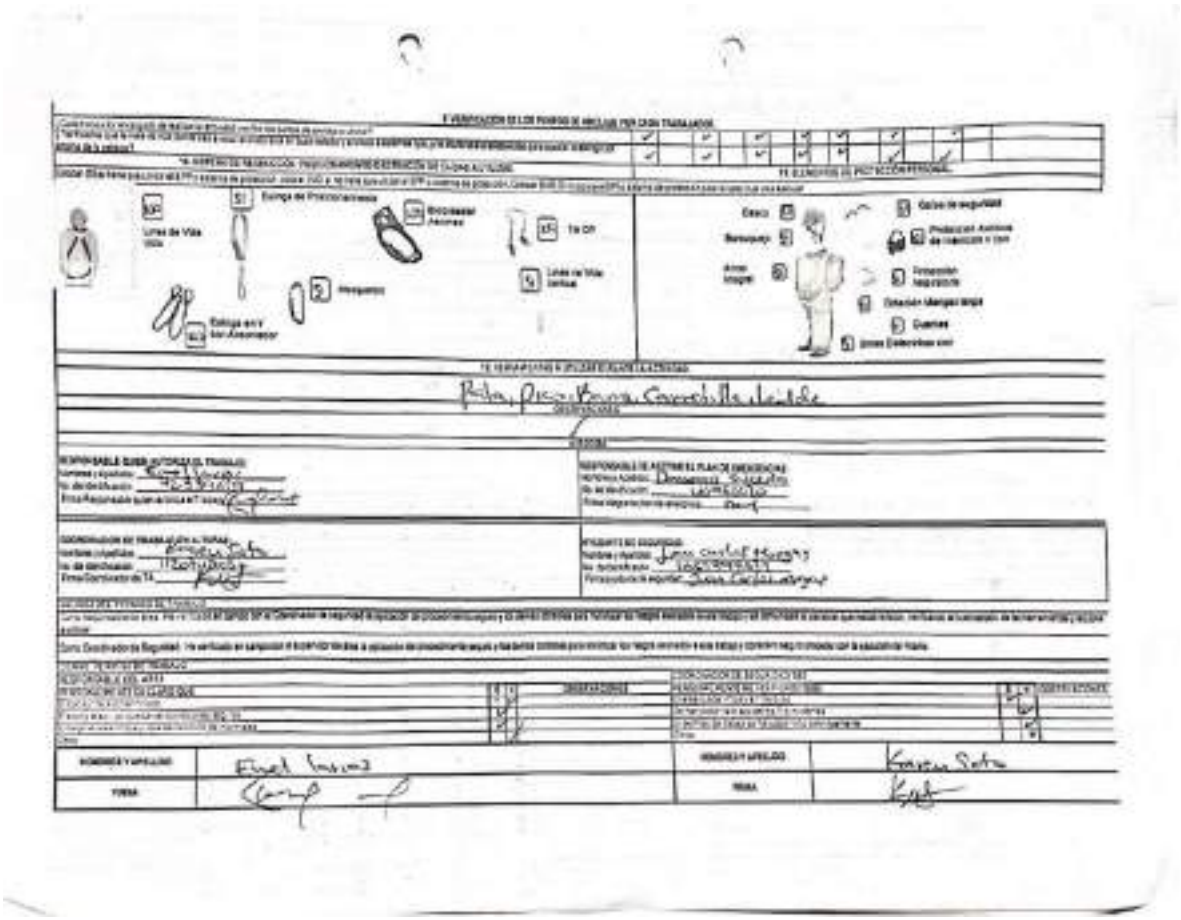


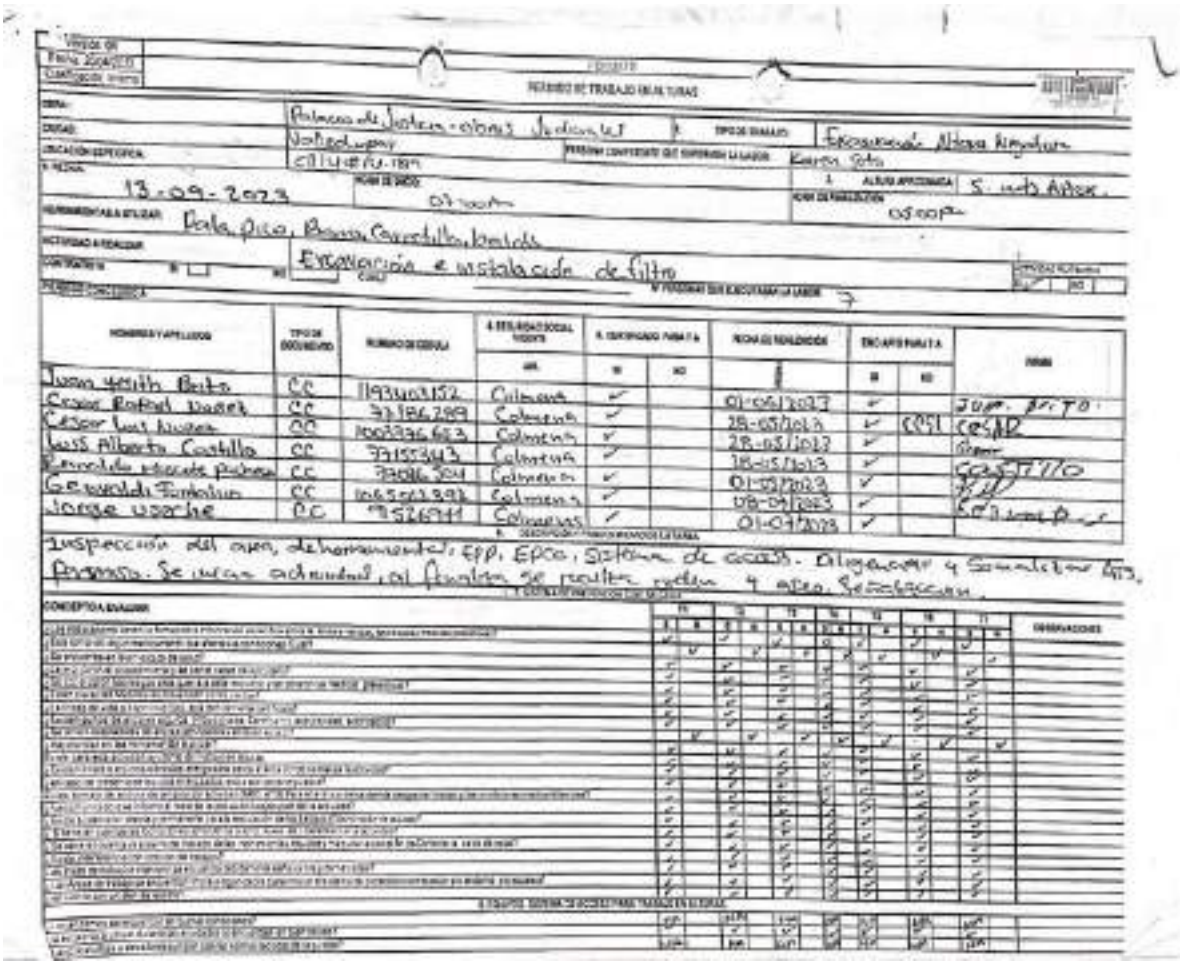


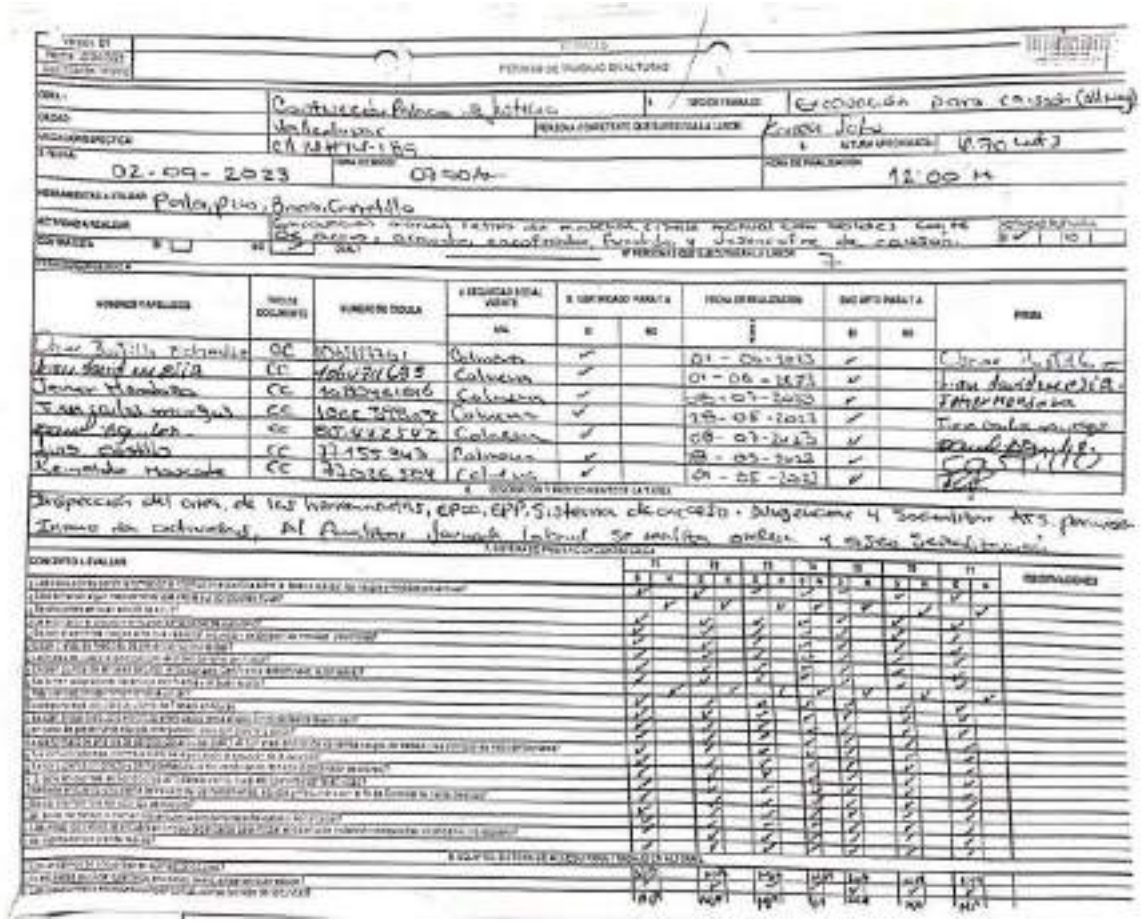


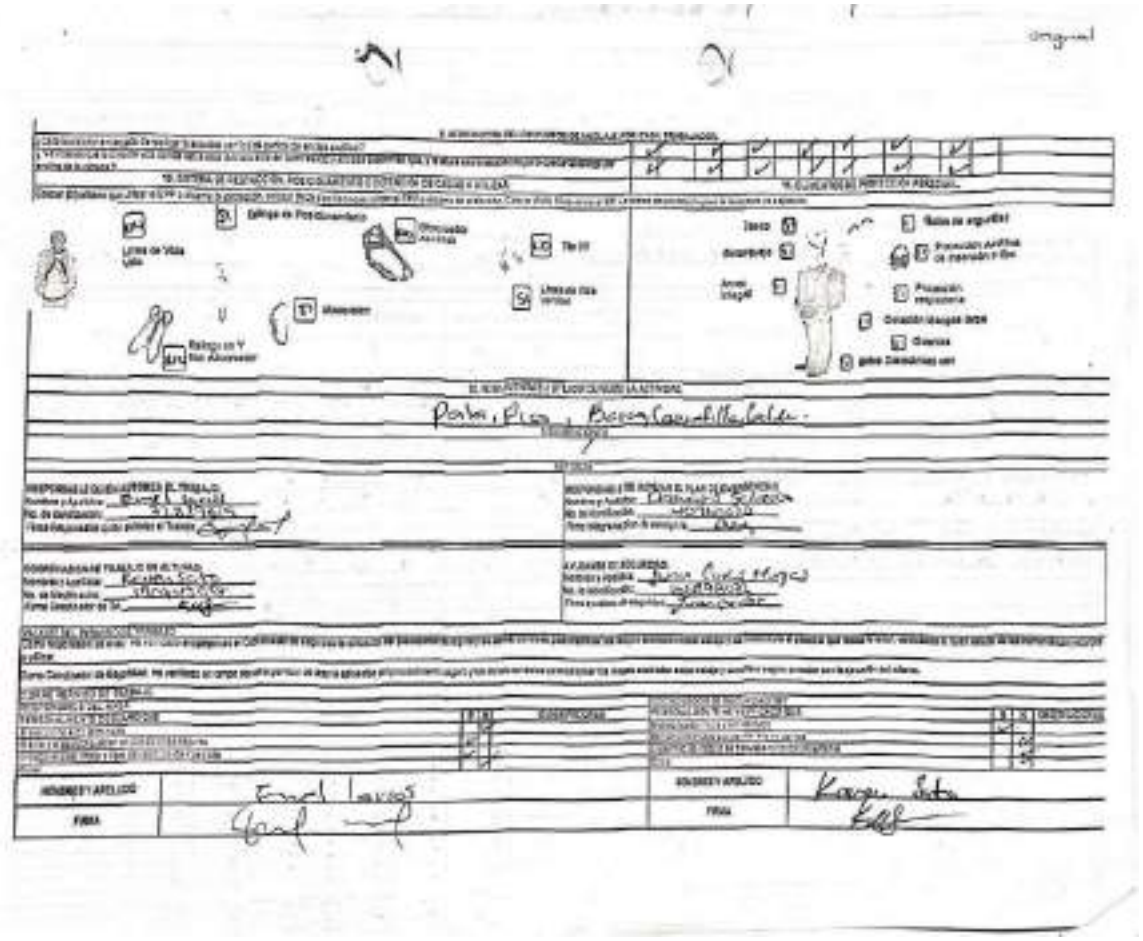


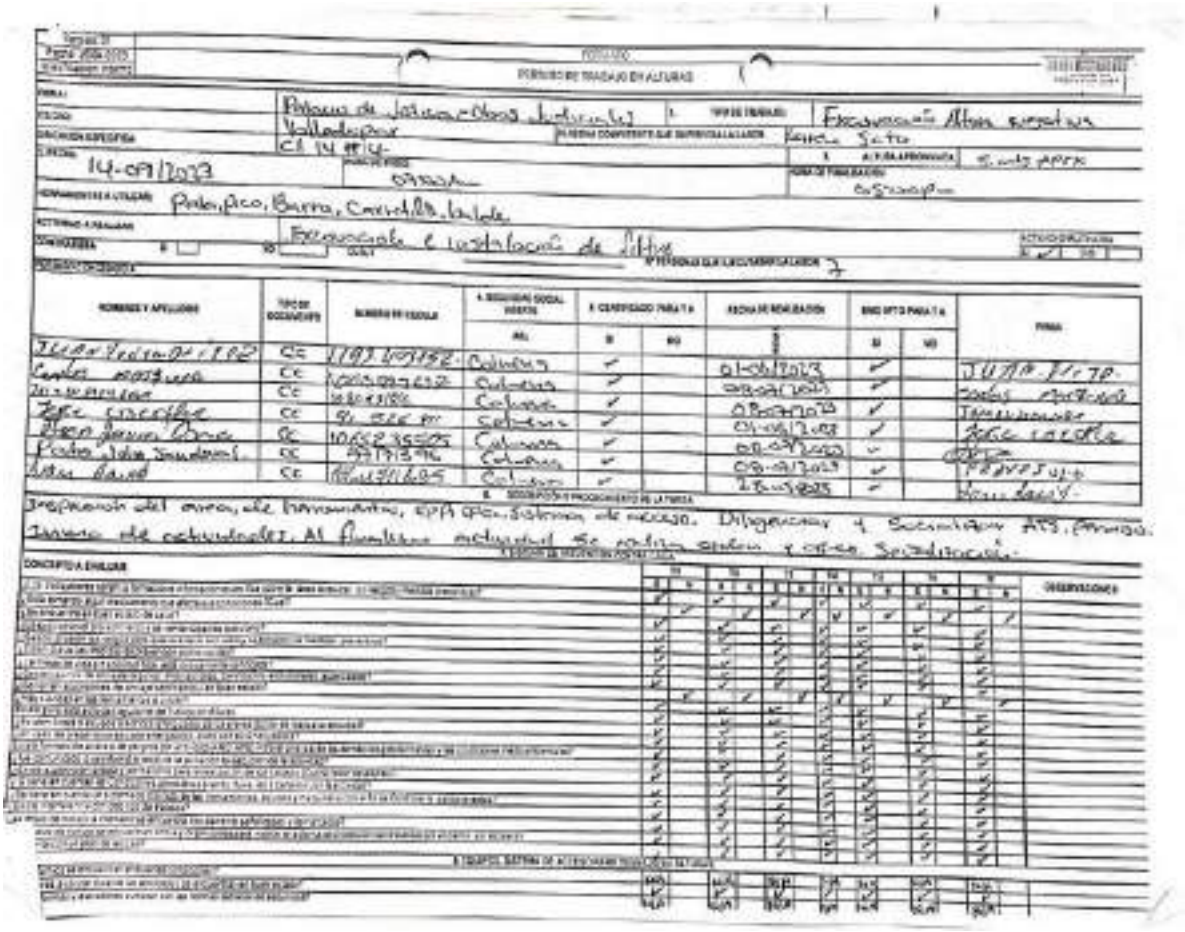

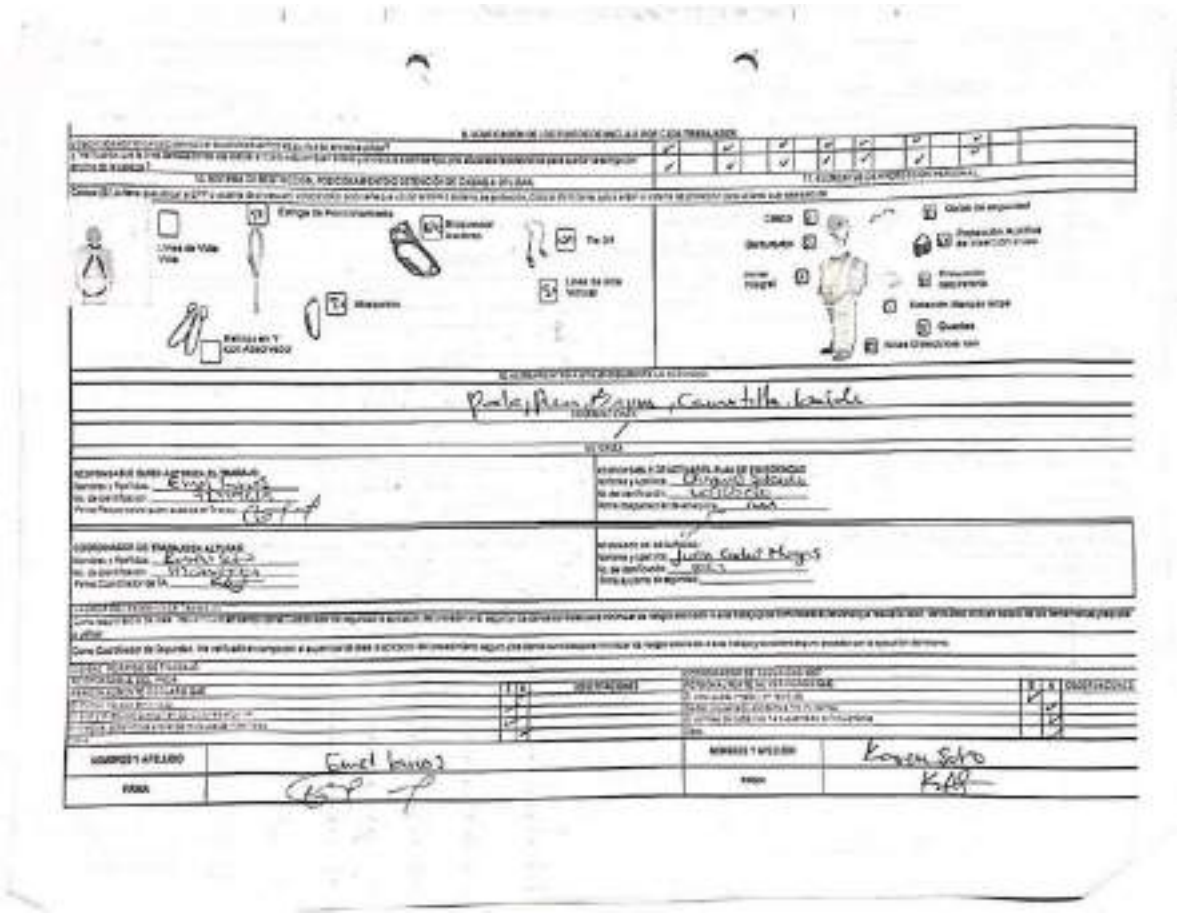

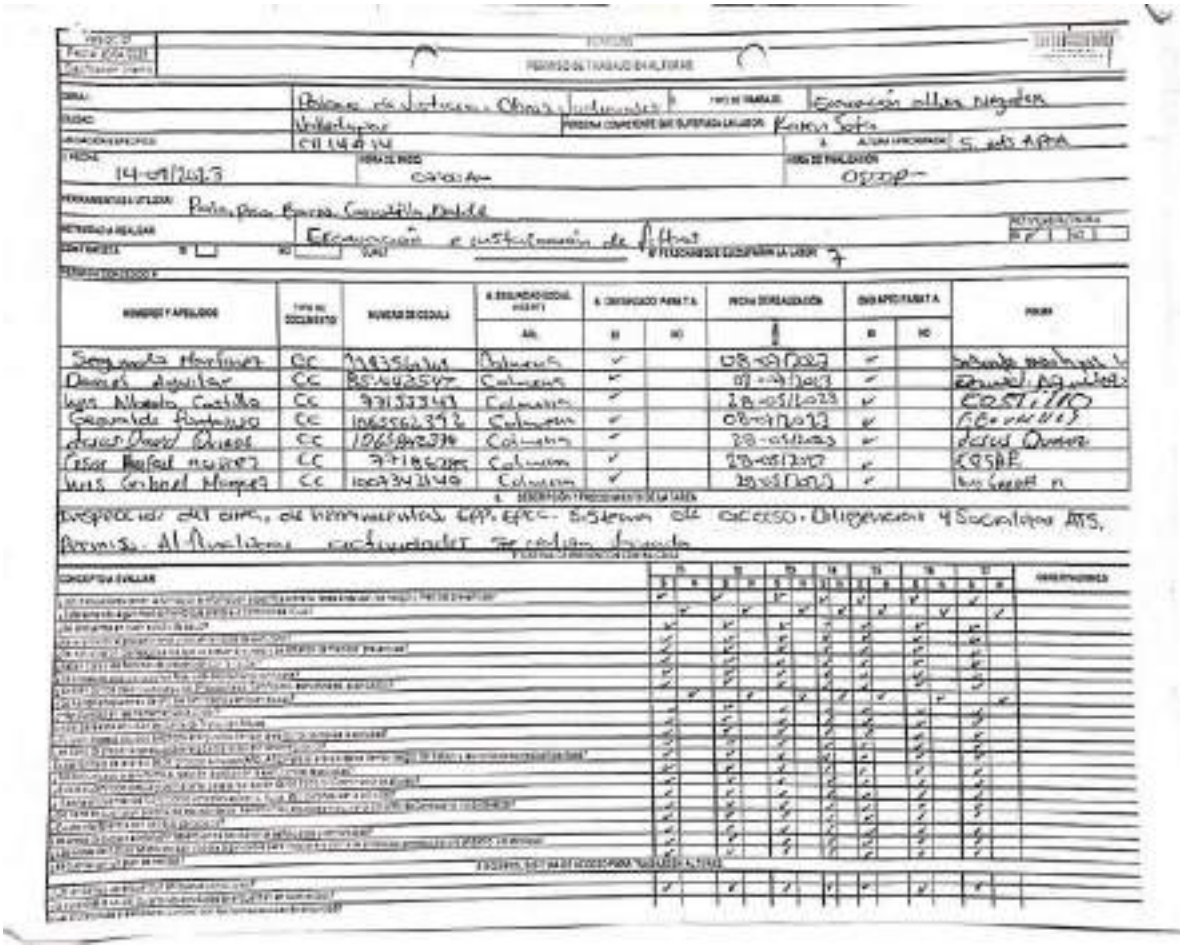

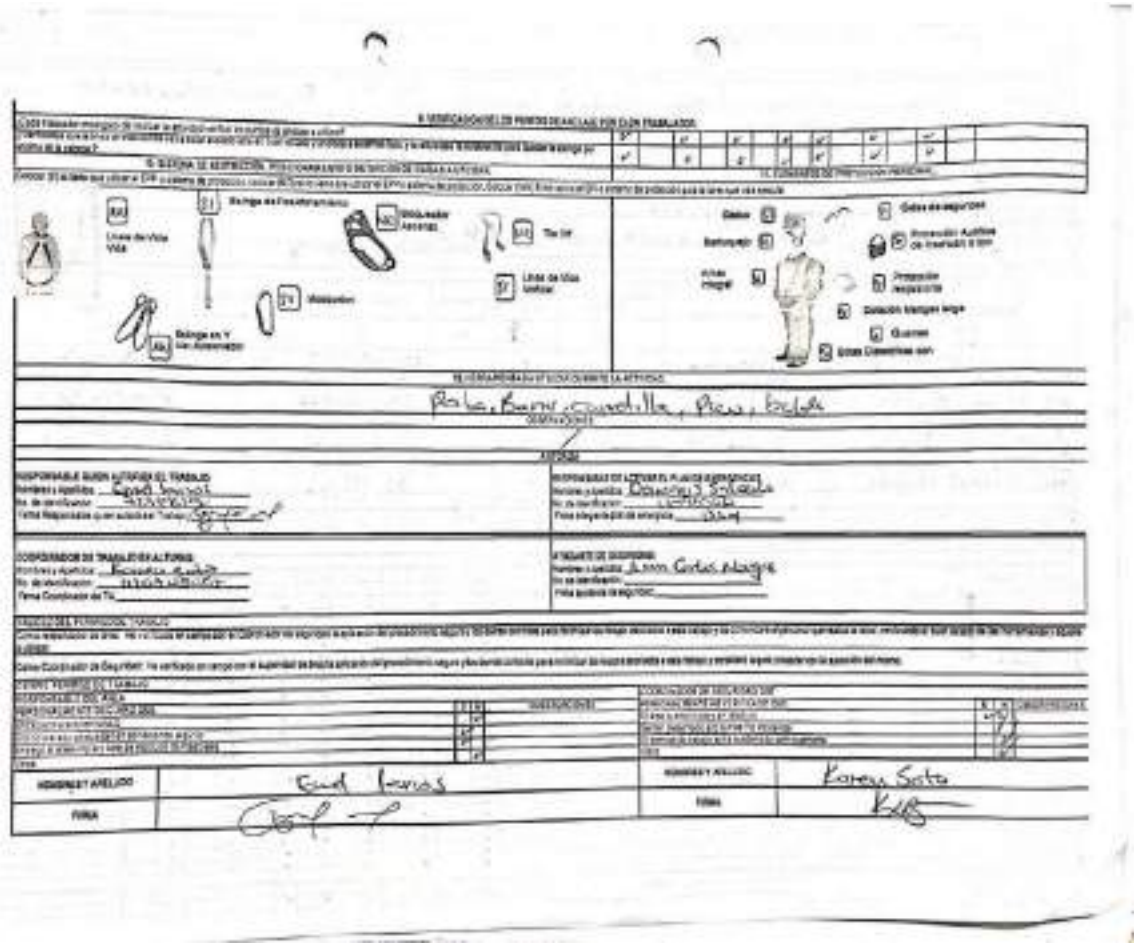

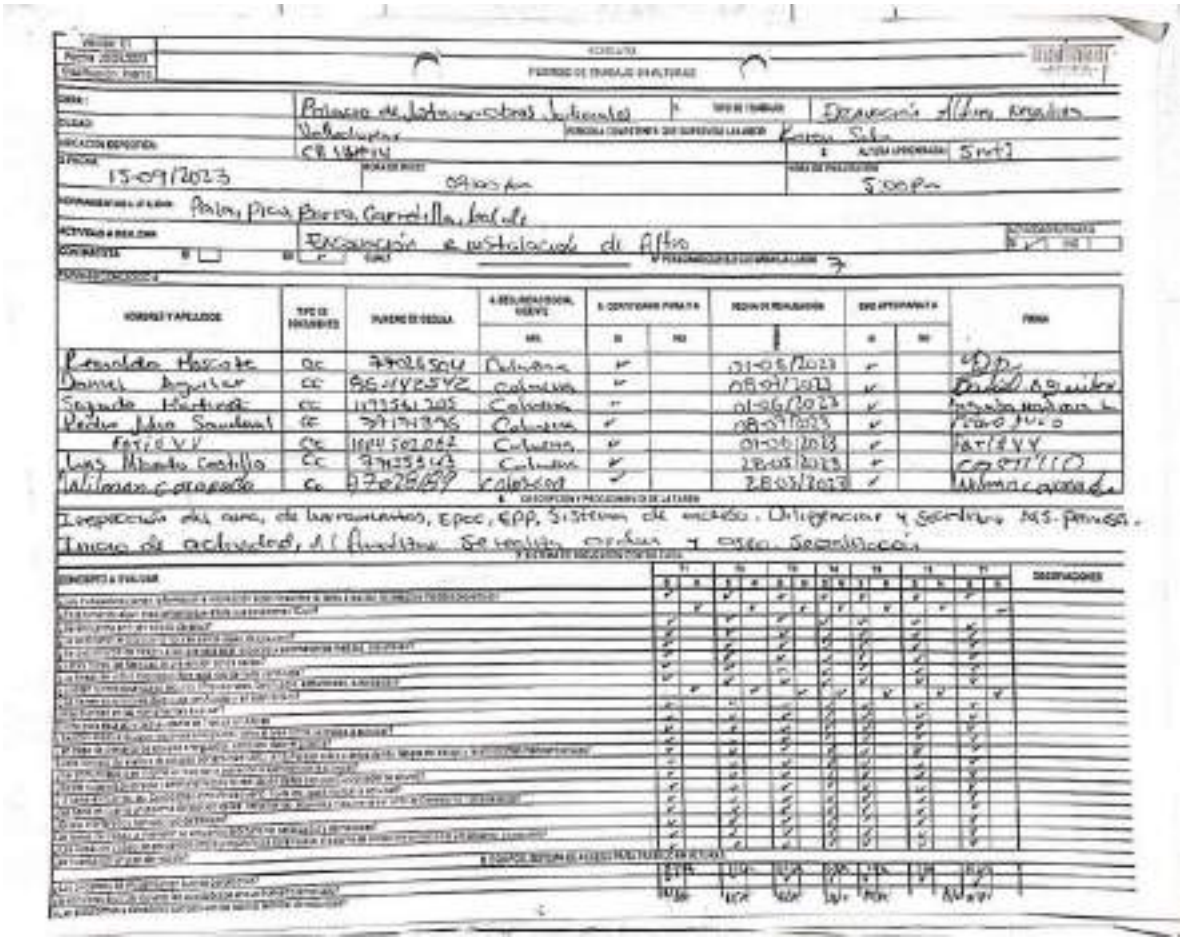

Palacio de Justicia Juan Antonio Morales

15-09/2023

09:00 am


5:00 pm


Pablo, Pica, Barra, Carretilla, Inicial


Excavación e instalación de Aftin


| NOMBRE Y APELLIDOS | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE CEDULA | EPS | CERTIFICADO PARA EL TRABAJO SI | CERTIFICADO PARA EL TRABAJO NO | FECHA DE REALIZACION | ENTREGA EPP SI | ENTREGA EPP NO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinaldo Hoscote | CC | 79028504 | Colsanitas | ✓ | | 01-09/2023 | ✓ | | |
| Daniel Aguilar | CC | 86.019.892 | Colsanitas | ✓ | | 08-09/2023 | ✓ | | |
| Segundo Hurtado | CC | 1193561205 | Colsanitas | ✓ | | 01-09/2023 | ✓ | | |
| Pedro Julio Saulmal | CC | 79179396 | Colsanitas | ✓ | | 08-09/2023 | ✓ | | |
| Patio V.V | CC | 1014502062 | Colsanitas | ✓ | | 01-09/2023 | ✓ | | |
| Luis Miguel Castillo | CC | 97033543 | Colsanitas | ✓ | | 28-08/2023 | ✓ | | |
| Wilmar Coronado | CC | 87028697 | Colsanitas | ✓ | | 28-08/2023 | ✓ | | |


Inspección del area, de herramientas, Epcc, EPP, Sistema de acceso. Diligenciar y socializar MS. Permiso. Tarea de actividad, AT Auditiva Señalizar cintas y conos. Señalización.

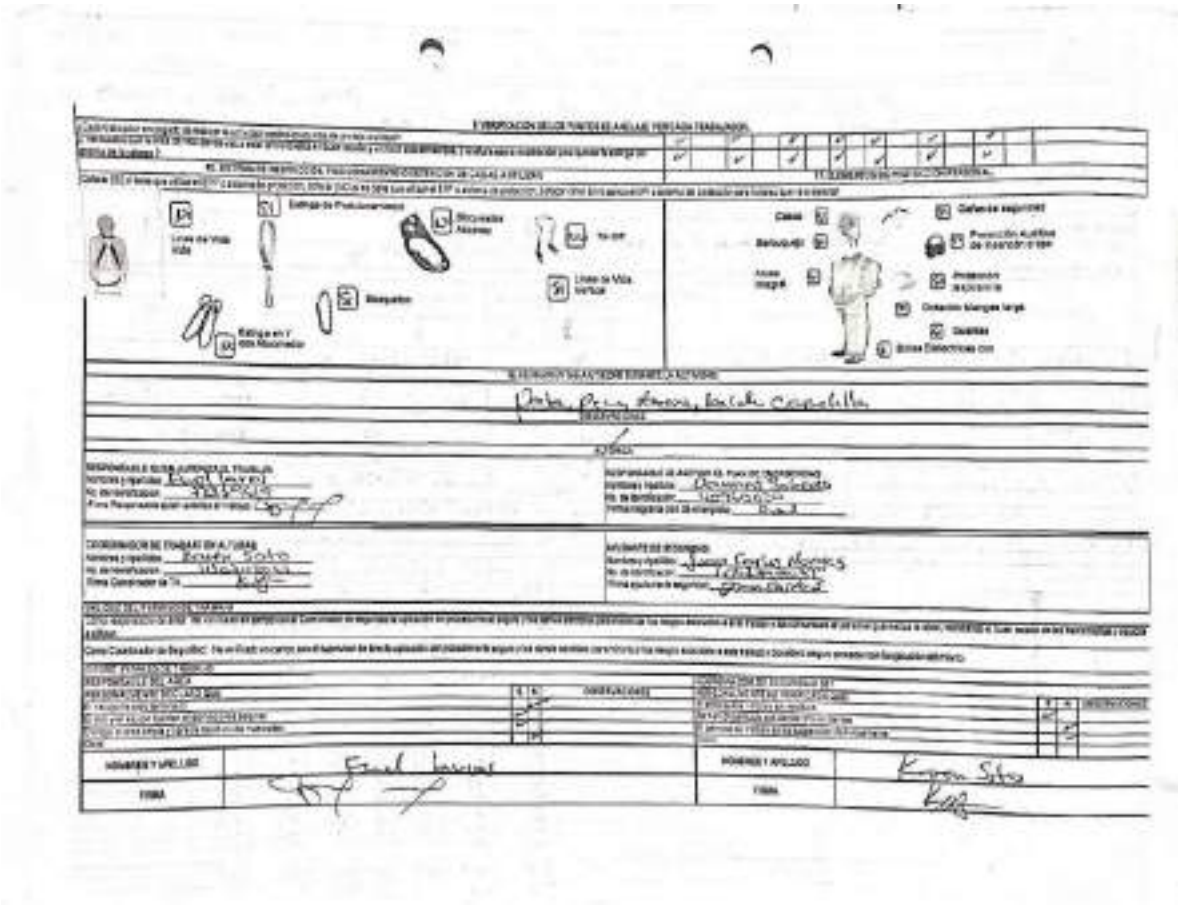


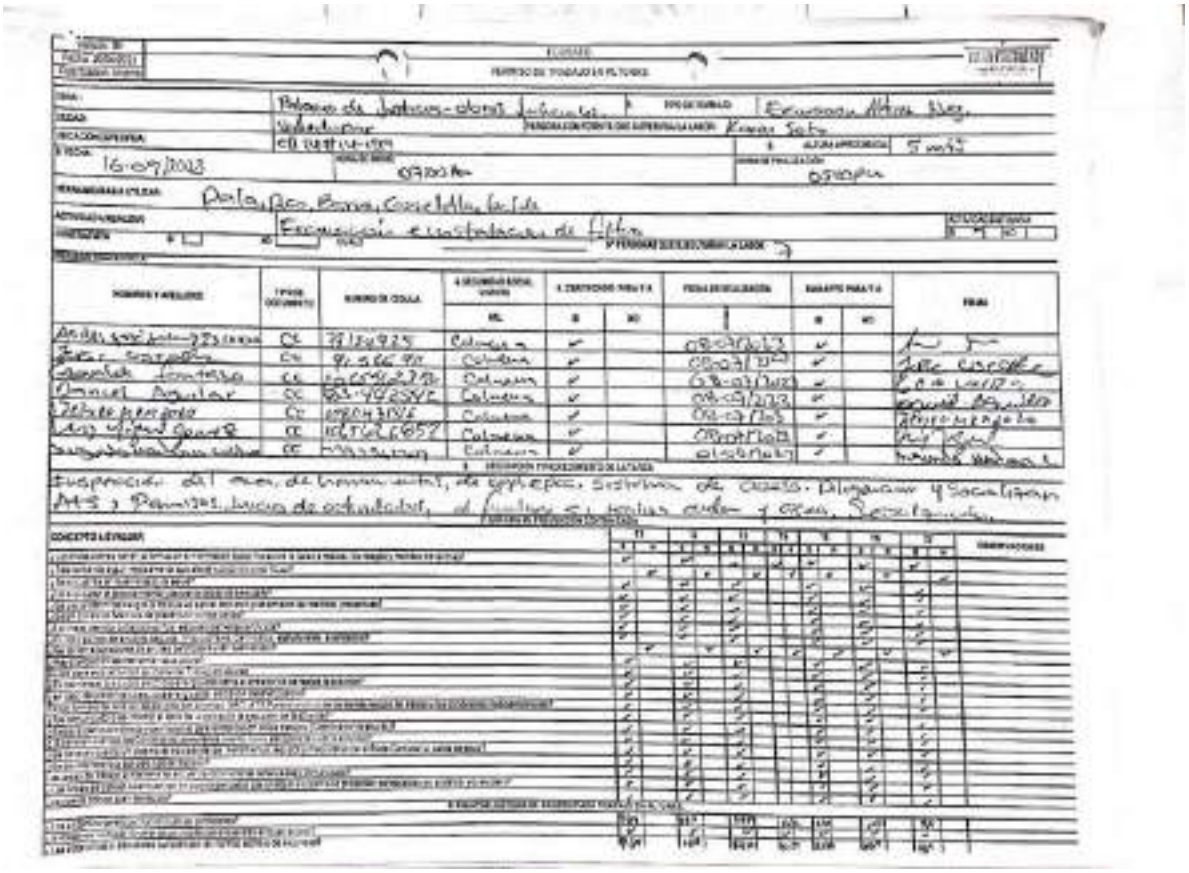


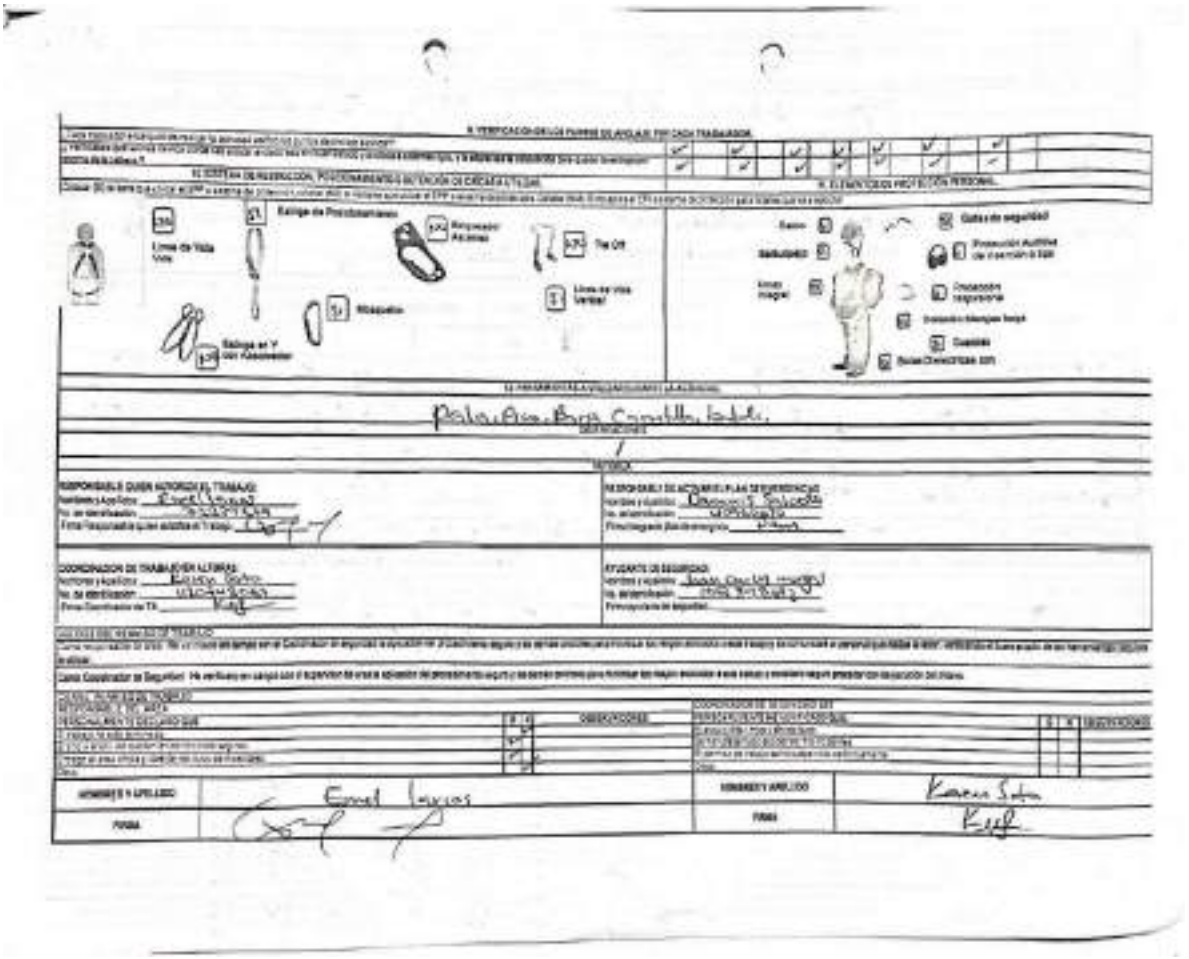


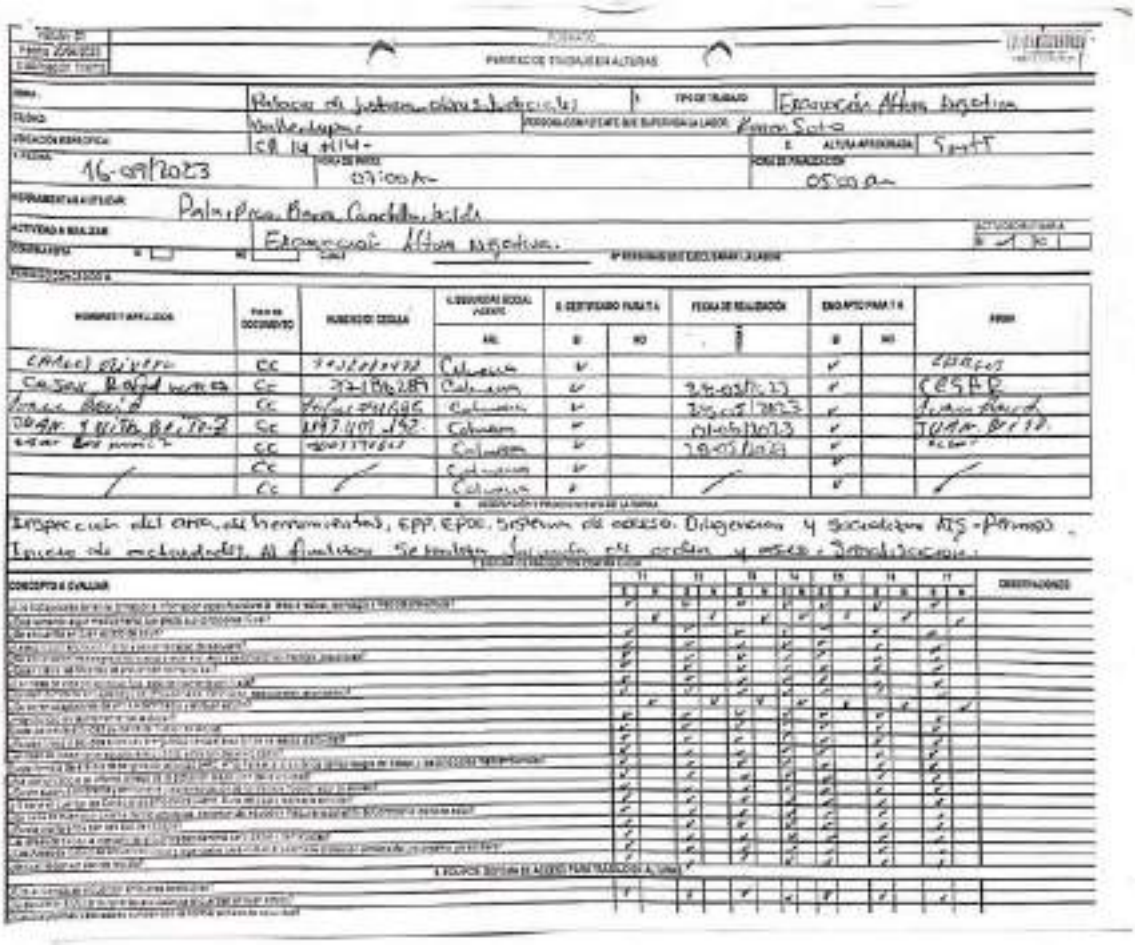


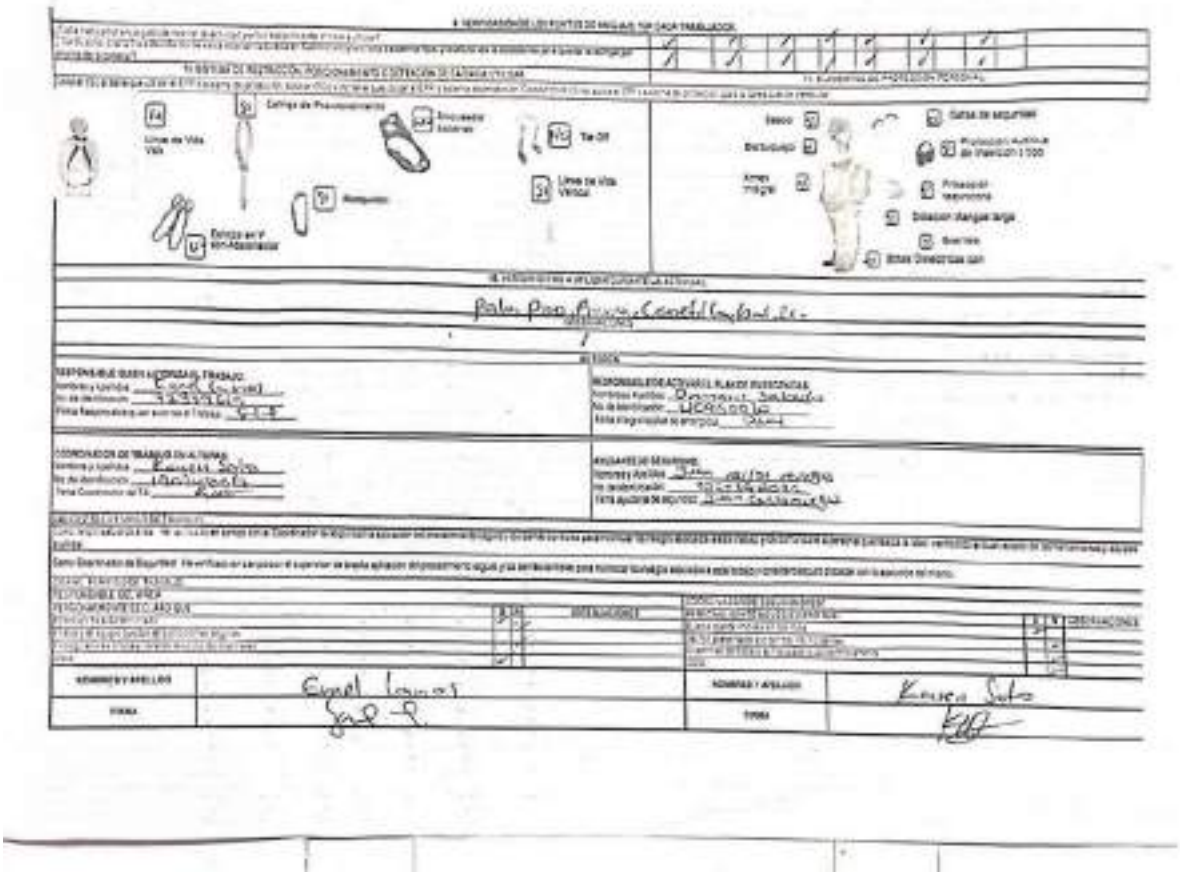


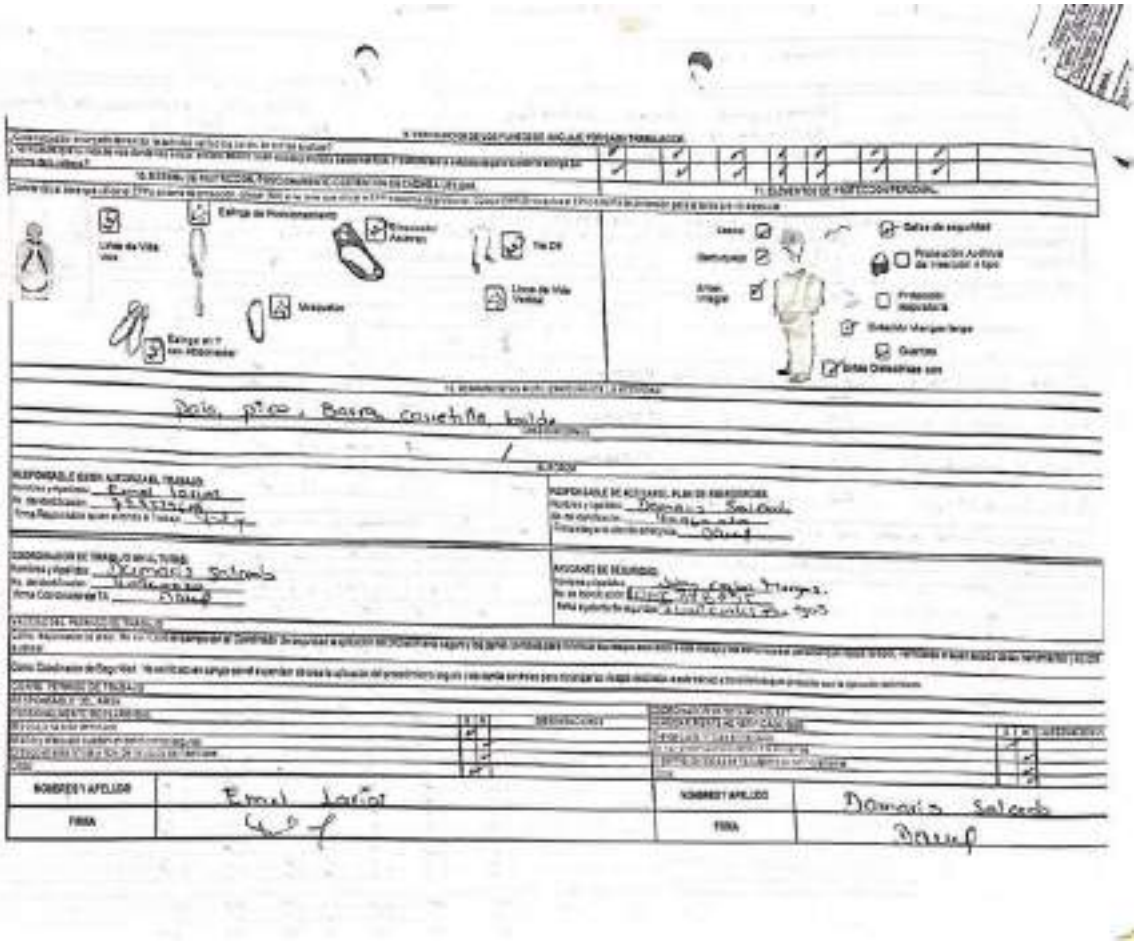

Dolo, plac, Barra cuchilla bolda
Daniela Salcedo
Daniela Salcedo

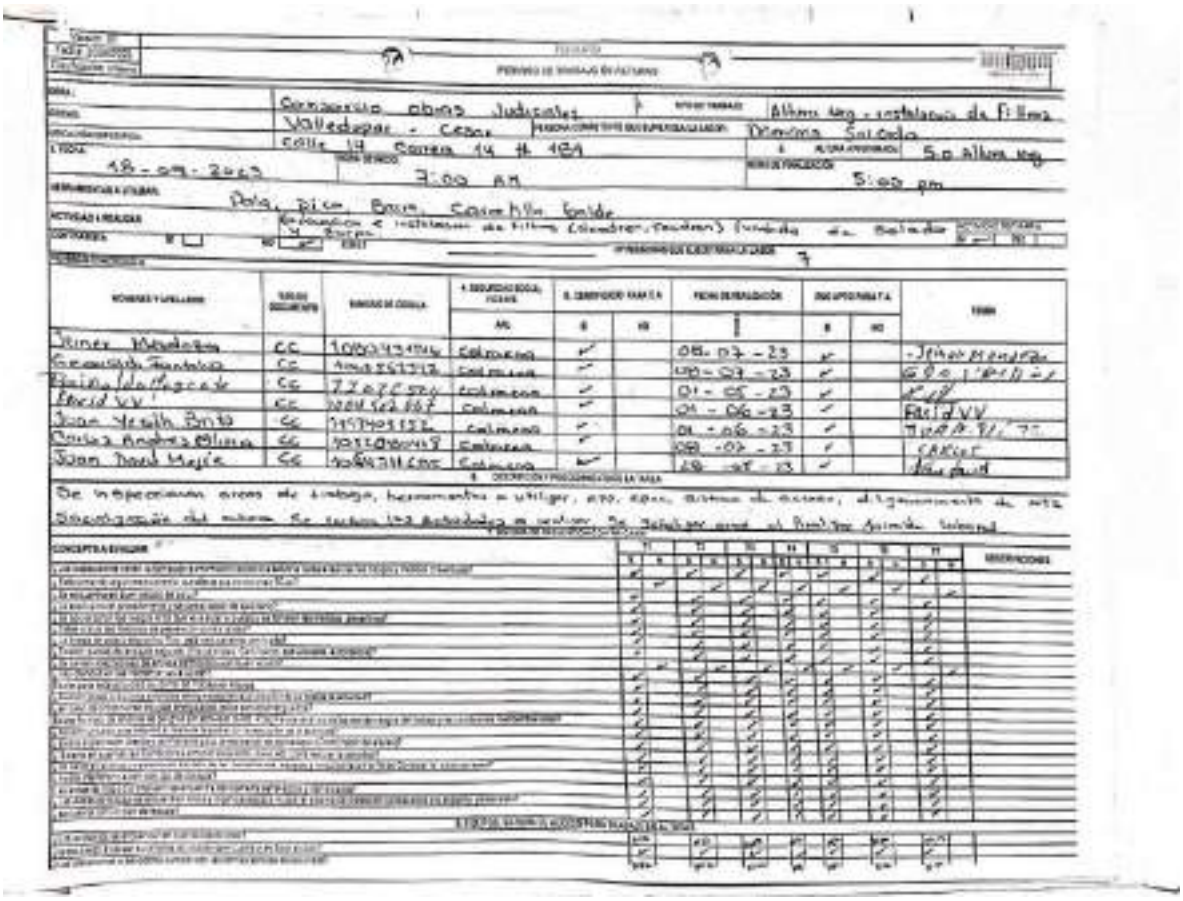


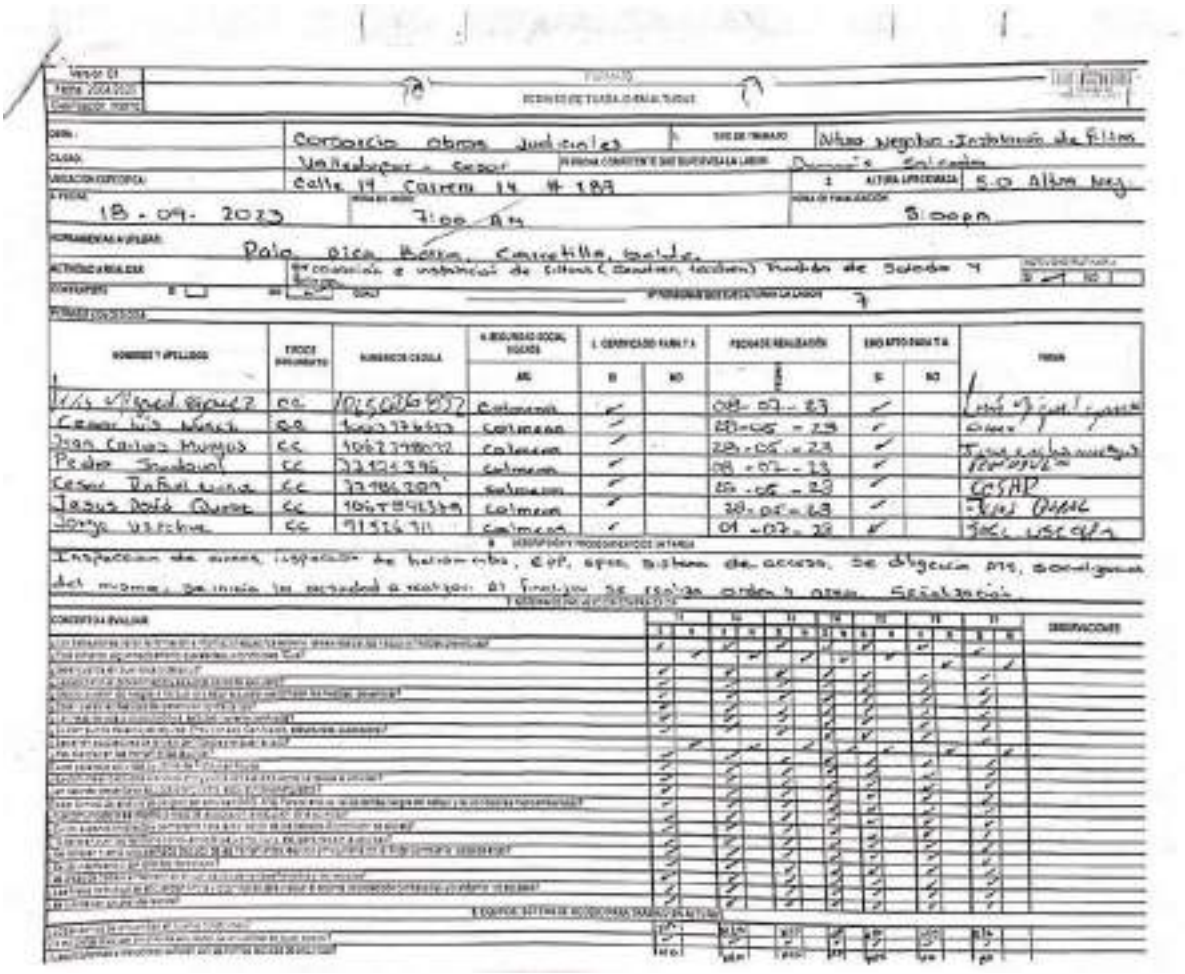


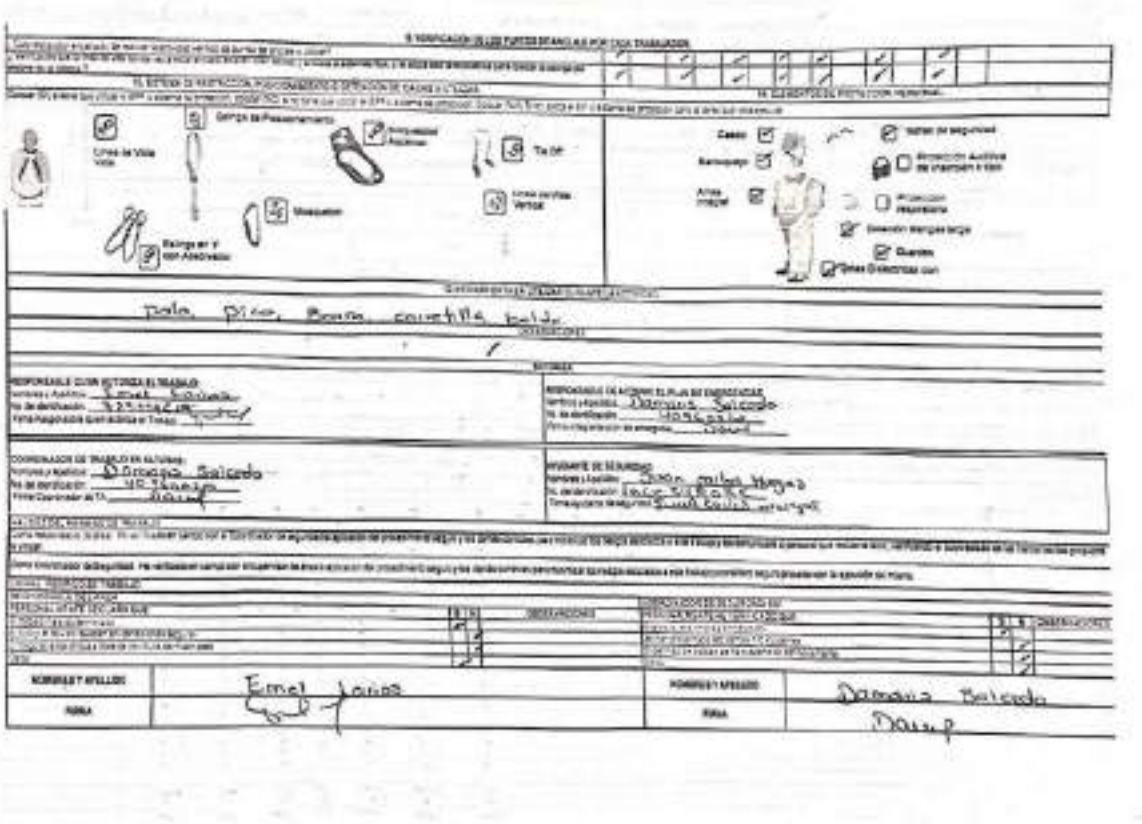


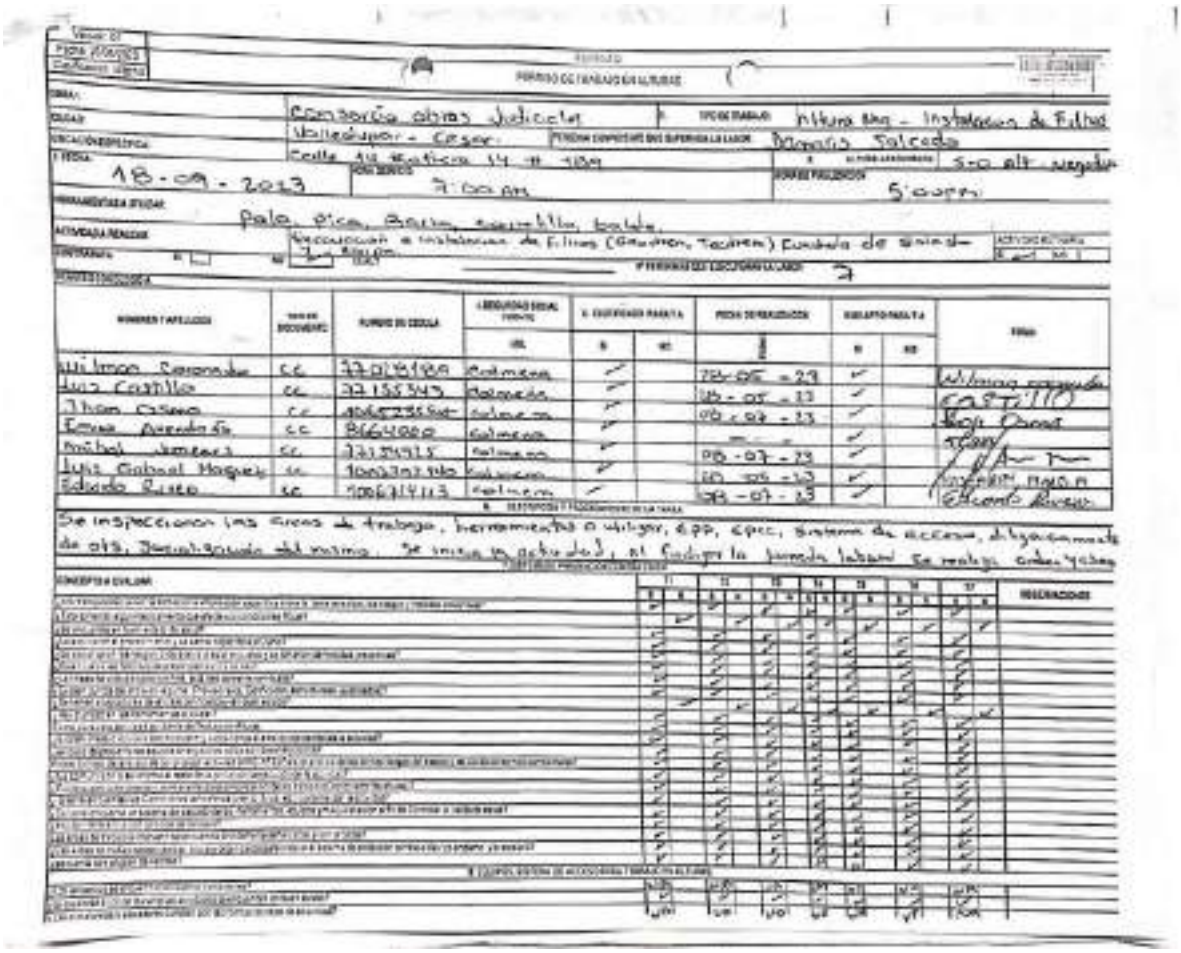


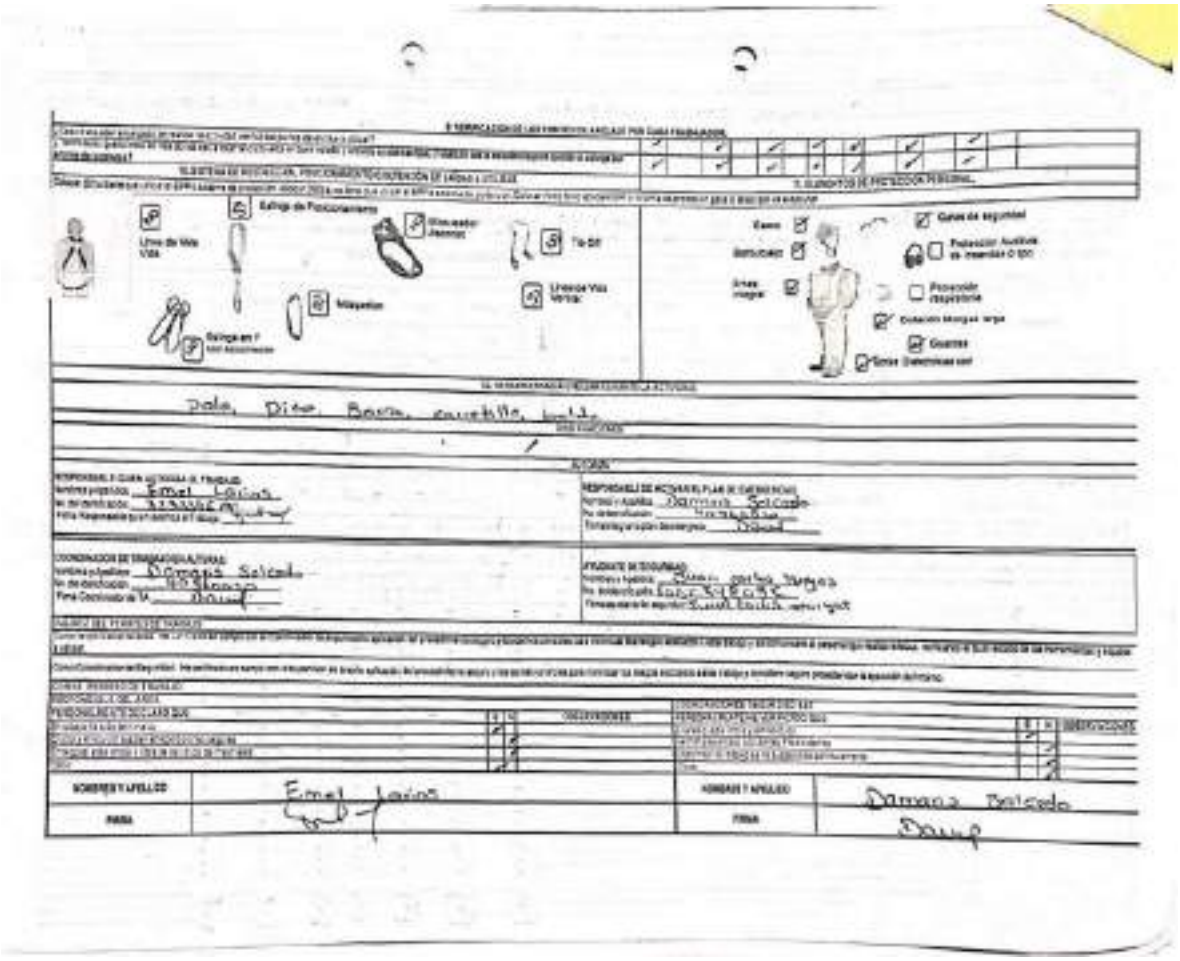

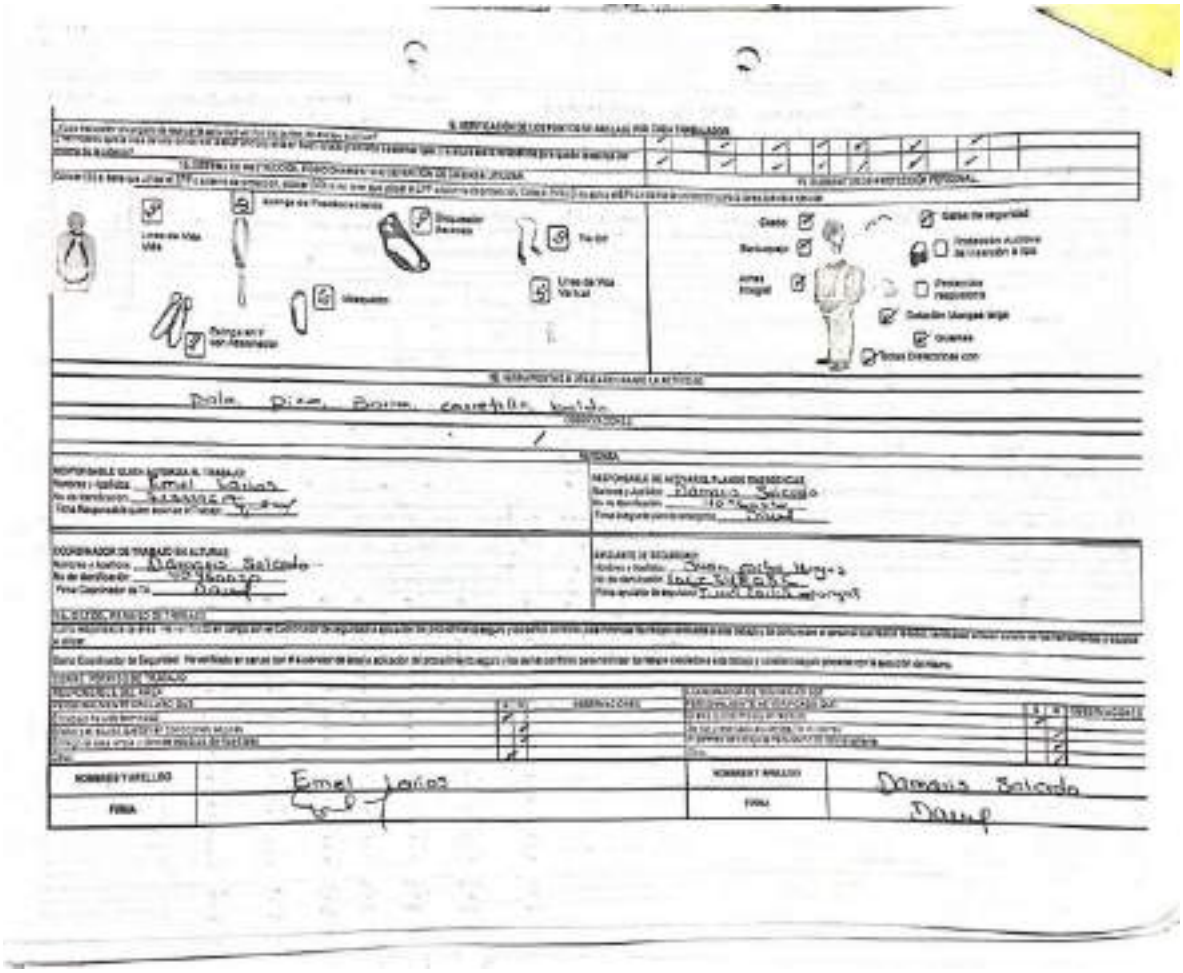

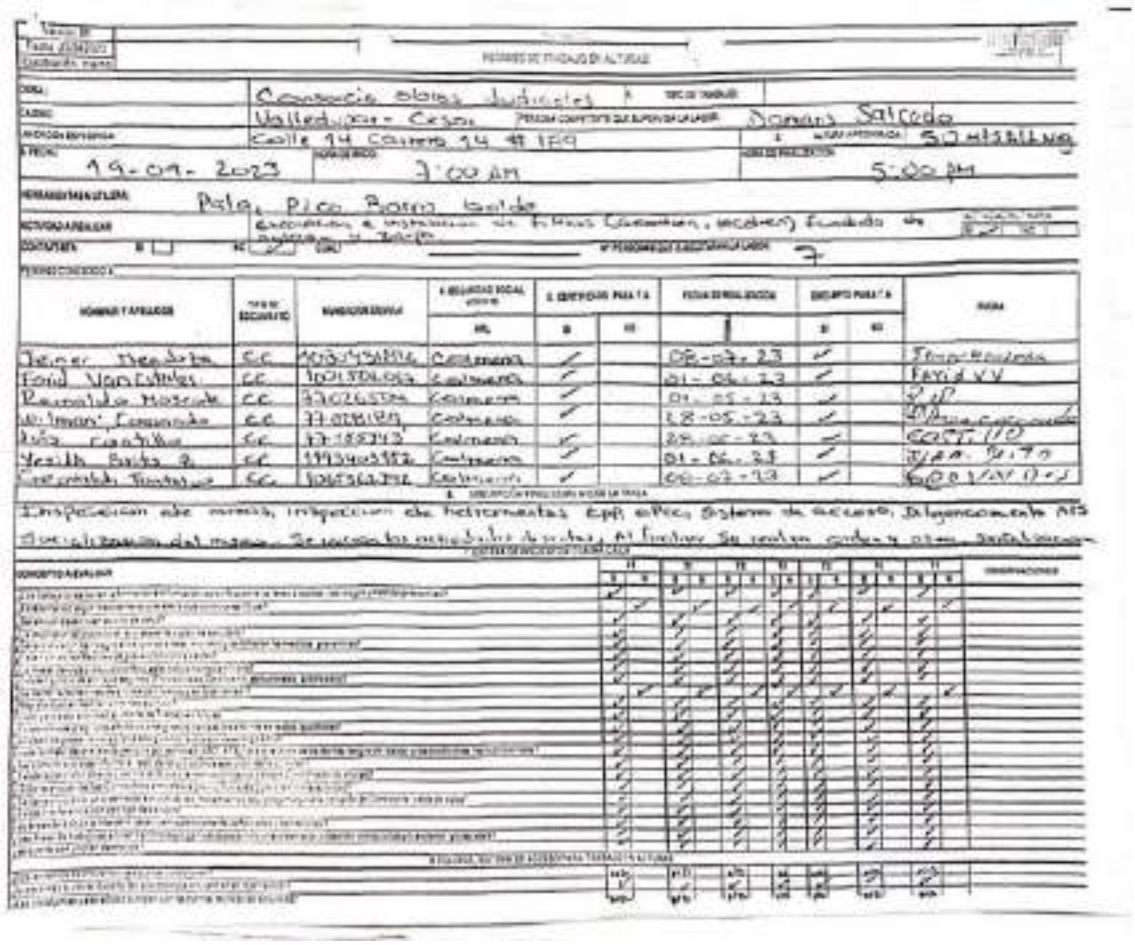

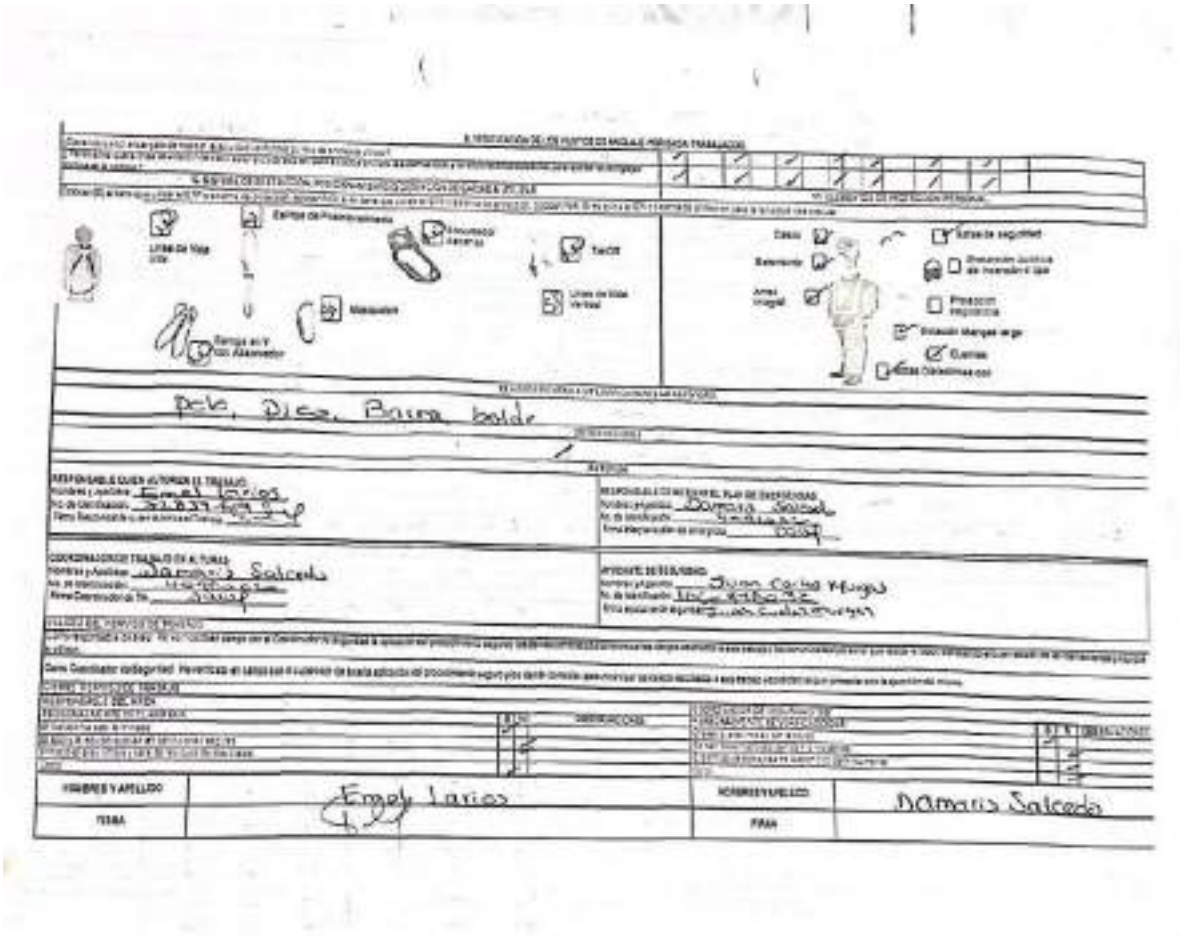

Polo, Pisa, Pinta bolde
Damaris Salcedo
Juan Carlos Mejia

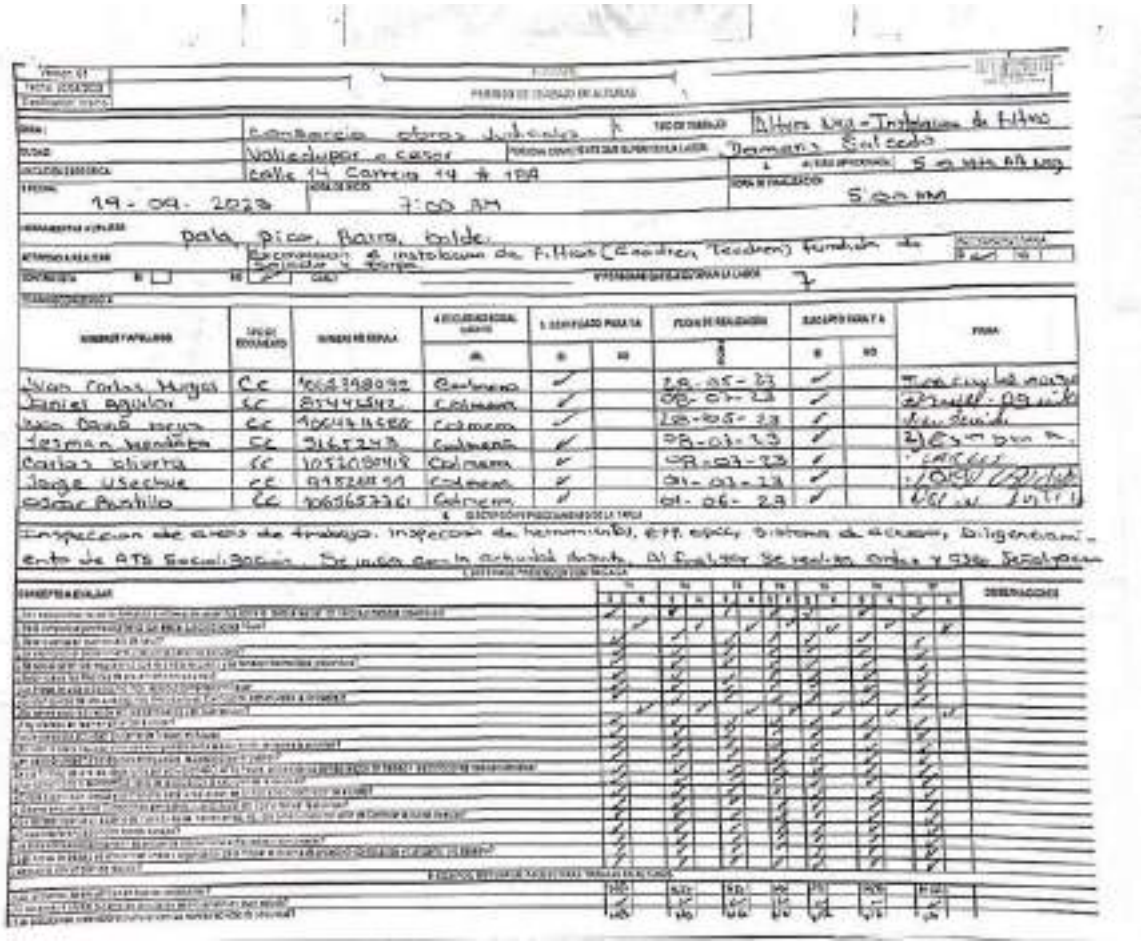



Obra: Remodelacion obras judiciales — Actividad: Mtto Loc - Instalacion de Mamp
Ciudad: Valledupar - cesar — Personal: Permanente Contratado
Dirección: Calle 14 Carrera 14 # 19A — N° de trabajadores: 5 en mtto AA Loc
Fecha: 19-09-2023 — Hora de inicio: 7:00 AM — Hora de finalización: 5:00 PM
Herramientas y/o equipos: pala, pica, Barra, taladro.
Actividad a realizar: Reforzamiento e instalacion de F.Mtto (Cerraduras, Tecnicos) fundición de Soldadura y Corte.
Nivel de riesgo: 1


| NOMBRE Y APELLIDOS | TIPO DOCUMENTO | NUMERO DE CEDULA | A LA SEGURIDAD SOCIAL (SALUD) | EL TRABAJADOR PUEDE TRABAJAR | | FECHA DE REALIZACIÓN | ELEMENTOS PARA EL TRABAJO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | NO | | SI | NO | |
| Juan Carlos Hugas | CC | 1065398092 | Sanitas | ✓ | | 19-09-23 | ✓ | | |
| Daniel Aguilar | CC | 8744544... | Colmena | ✓ | | 08-09-23 | ✓ | | |
| [illegible] | CC | 1065[illegible] | Colmena | ✓ | | 19-09-23 | ✓ | | |
| Jairman [illegible] | CC | 9161243 | Colmena | ✓ | | 08-09-23 | ✓ | | |
| Carlos Oliveta | CC | 1052090419 | Colmena | ✓ | | 08-09-23 | ✓ | | |
| Jorge Useche | CC | 9[illegible] | Colmena | ✓ | | 01-09-23 | ✓ | | |
| Oscar Portillo | CC | 1065657261 | Colmena | ✓ | | 01-09-23 | ✓ | | |


Inspeccion de areas de trabajo. Inspeccion de herramientas, EPP. especi, Sistema de acceso, Diligenciamiento de ATS Socializacion. Se inicia con la actividad diaria, El Trabajador se realizan Pausa y Pico Activas

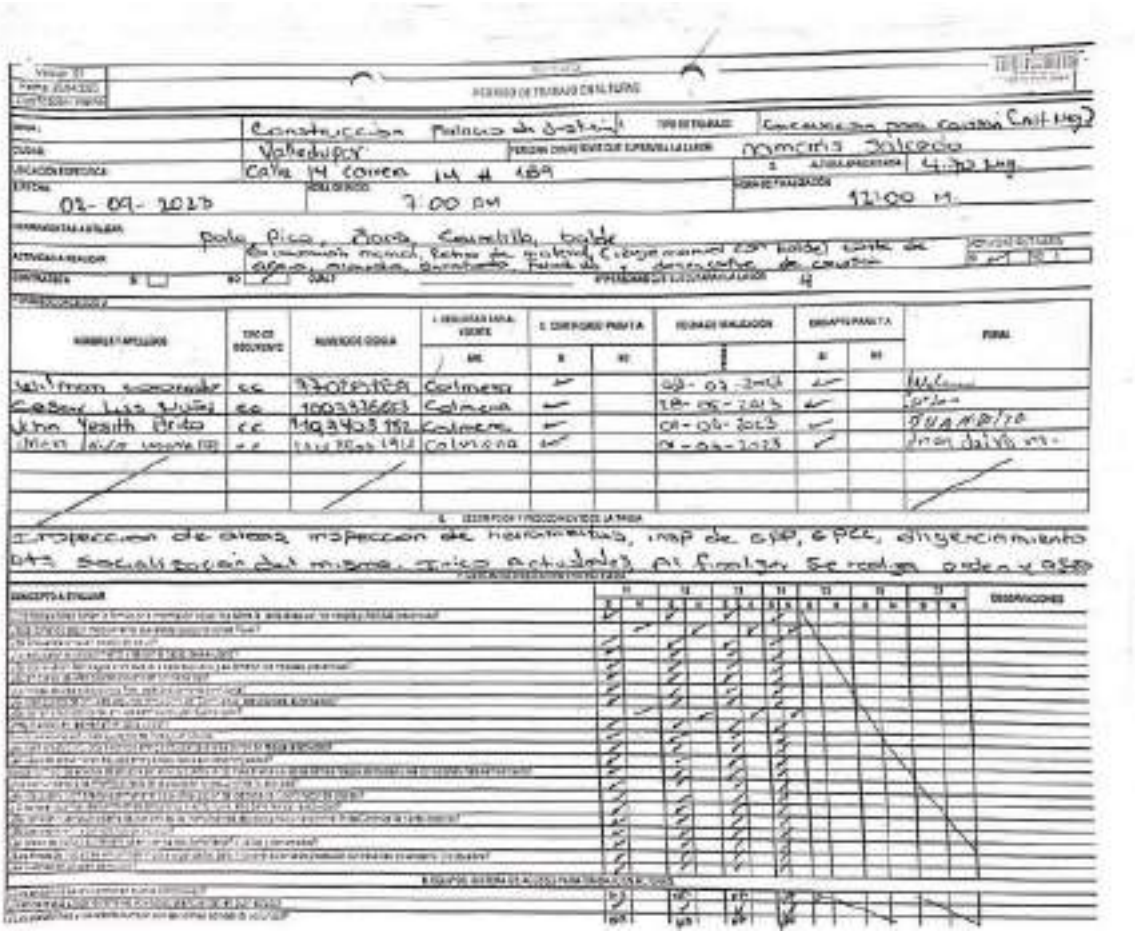
Construcción
Valledupar
Carrera 14 Cancha 14 # 189
02-09-2023
7:00 PM
Camacho Pool Cancha (Cait Hug)
Mercado Soleado
4:30 PM
12:00 M.
Pala, Pica, Barra, Carretilla, Taladro
Inspección de áreas, inspección de herramientas, insp de EPP, EPCC, diligenciamiento ATS, Socialización del mismo, Tarea actividades al finalizar se recoge orden y aseo

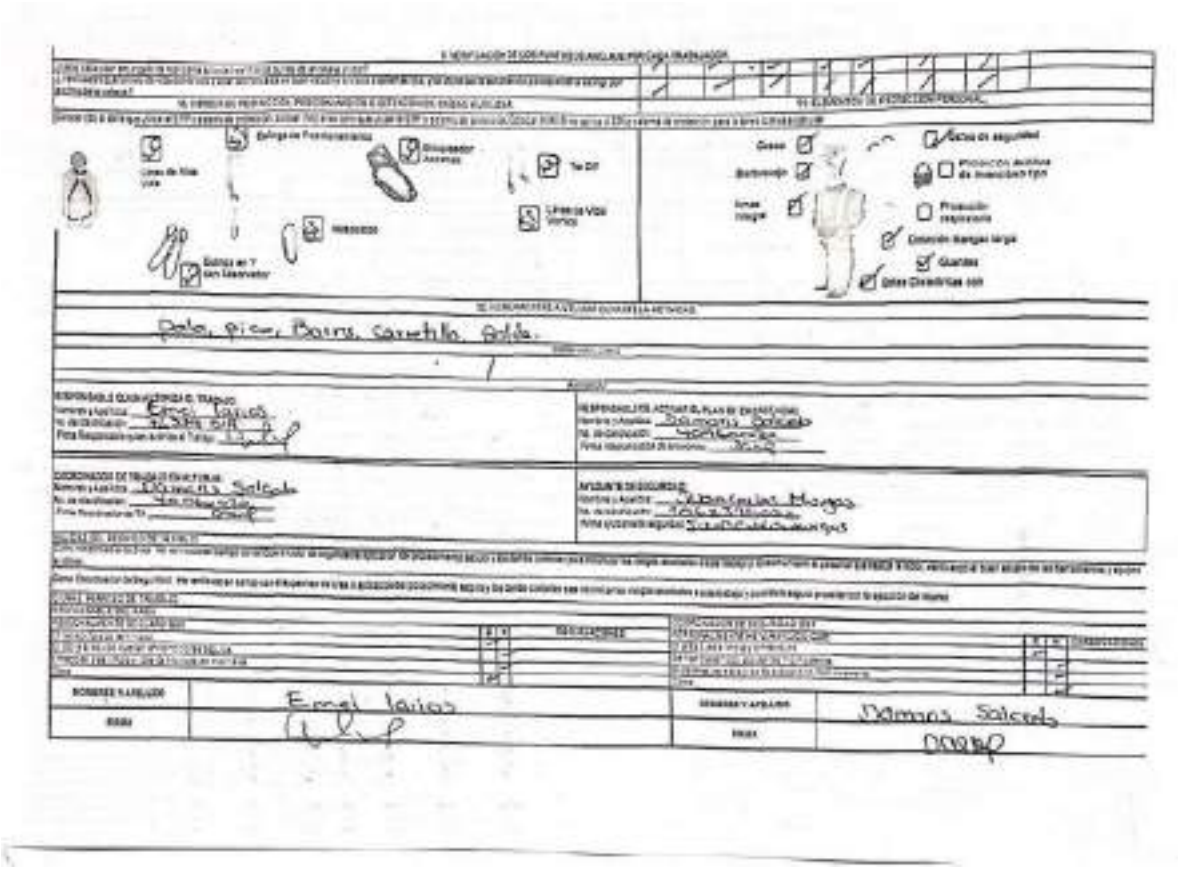

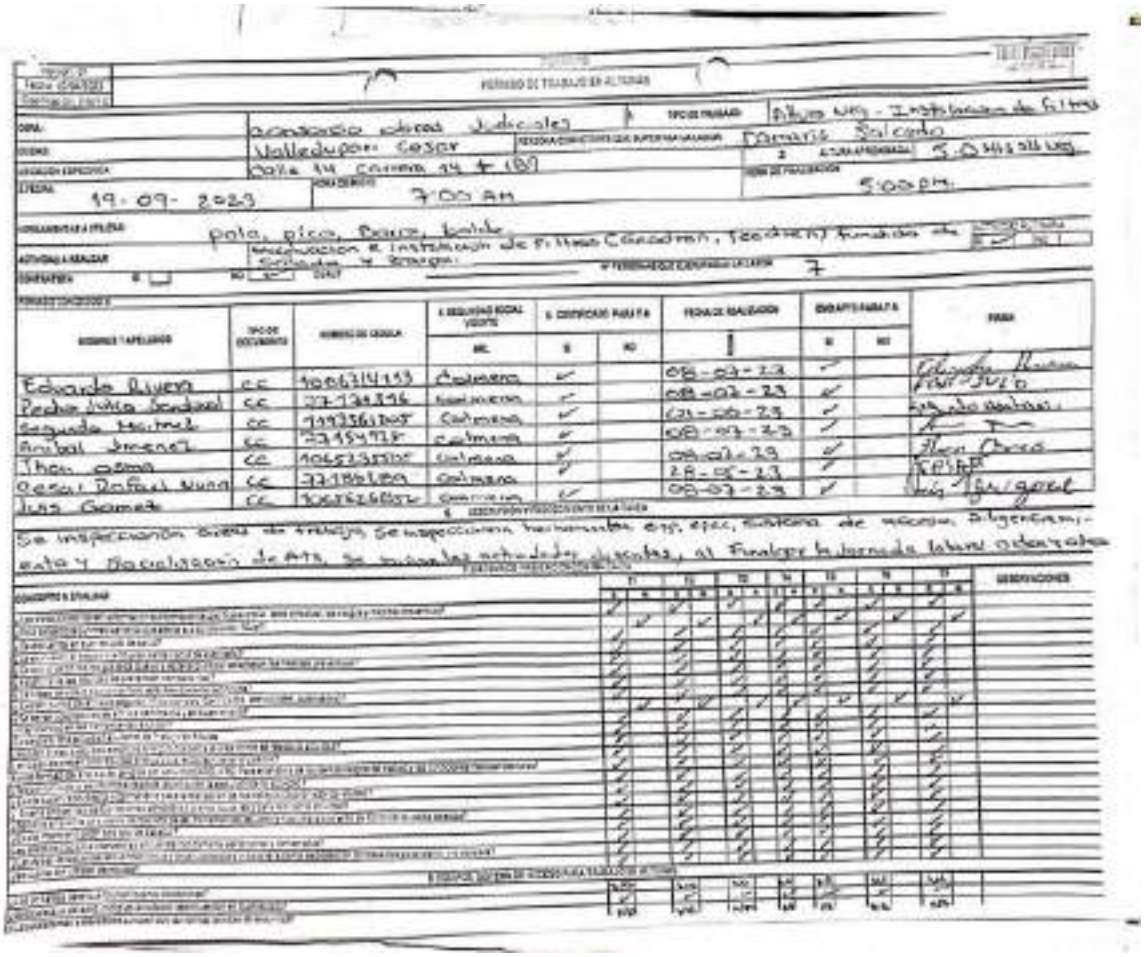

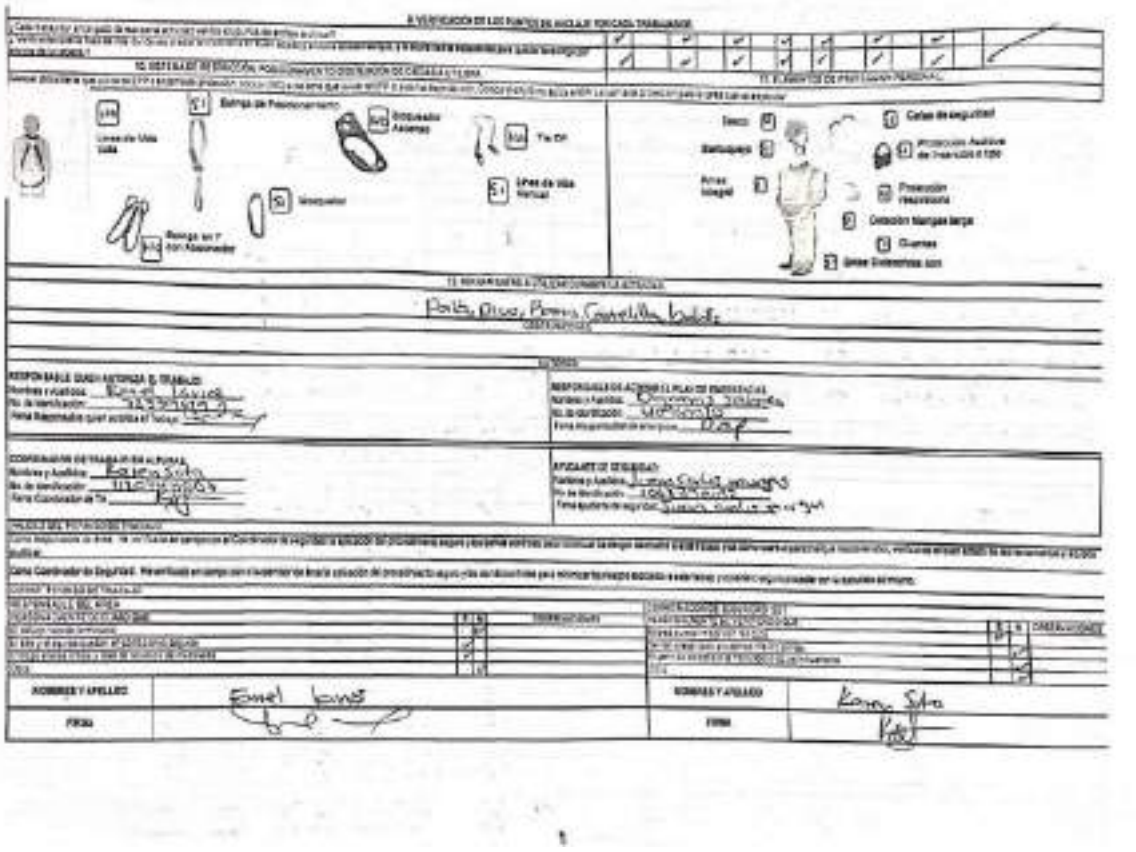


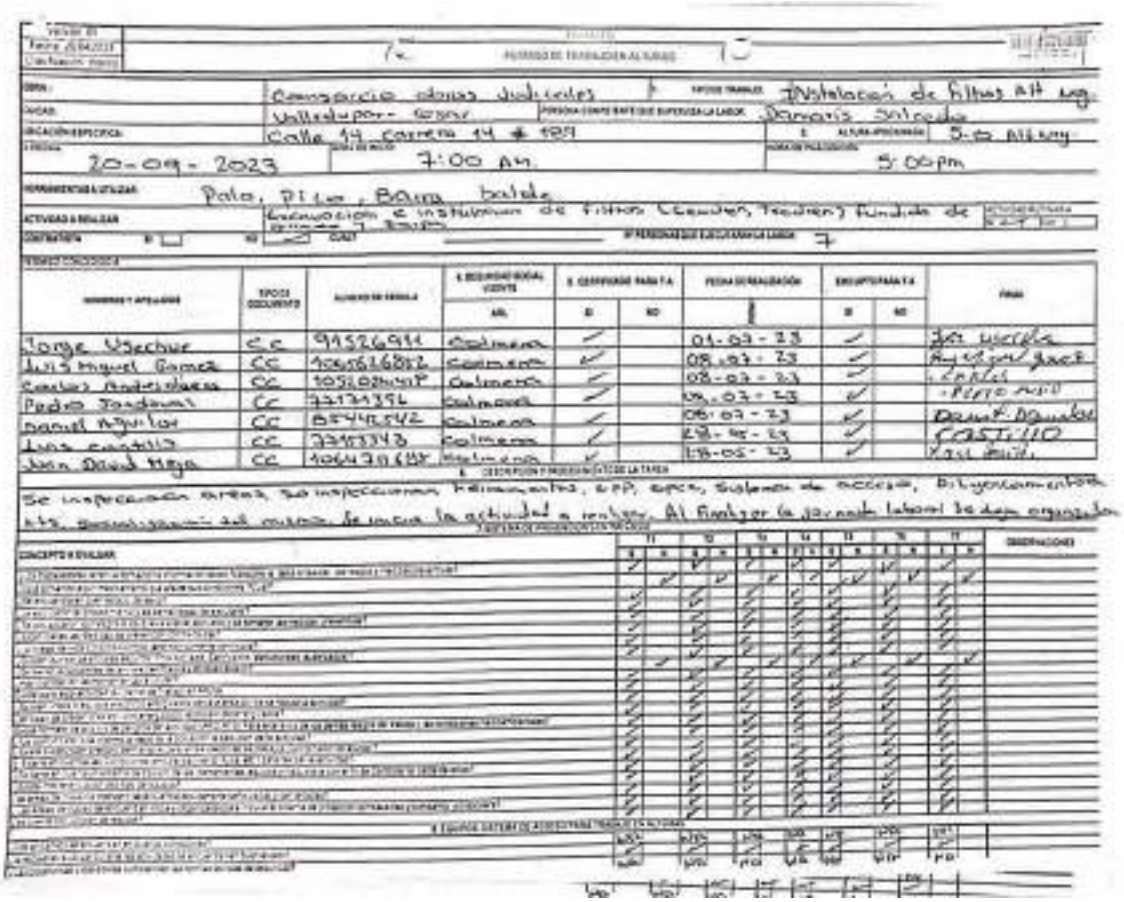



Consorcio obras Judiciales — Instalación de filtros AH mg
Valledupar - Cesar — Daniris Salcedo
Calle 14 carrera 14 # 19A — 5-to Alisay
20-09-2023 — 7:00 AM — 5:00pm
Palo, pica, Barra, balde
Instalación e instalación de filtros (Cloaca, Tecnar) fundida de


| NOMBRES Y APELLIDOS | TIPO DOCUMENTO | NUMERO DE CEDULA | E. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE | E. CAPACITACION PARA TA | | FECHA DE REALIZACION | ENTREGA EPP A TA | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI/NO | SI | NO | | SI | NO | |
| Jorge Vachur | CC | 99526911 | Colmena | ✓ | | 01-03-23 | ✓ | | Jor Vachur |
| Luis Miguel Gomez | CC | 1065616882 | Colmena | ✓ | | 08-03-23 | ✓ | | |
| Carlos Andrishaca | CC | 1052082407 | Colmena | ✓ | | 08-03-23 | ✓ | | |
| Pedro Jaramillo | CC | 73131396 | Colmena | ✓ | | 08-03-23 | ✓ | | |
| Daniel Aguilar | CC | 85448542 | Colmena | ✓ | | 08-03-23 | ✓ | | |
| Luis castillo | CC | 73183343 | Colmena | ✓ | | 28-02-23 | ✓ | | |
| Juan David Mejia | CC | 1064906687 | Colmena | ✓ | | 18-05-23 | ✓ | | |


Se inspeccionan áreas, se inspeccionan herramientas, EPP, equipo, Sistema de acceso, Diligenciamiento ATS, socialización del método de trabajo la actividad a realizar. Al finalizar la jornada laboral se deja organizado

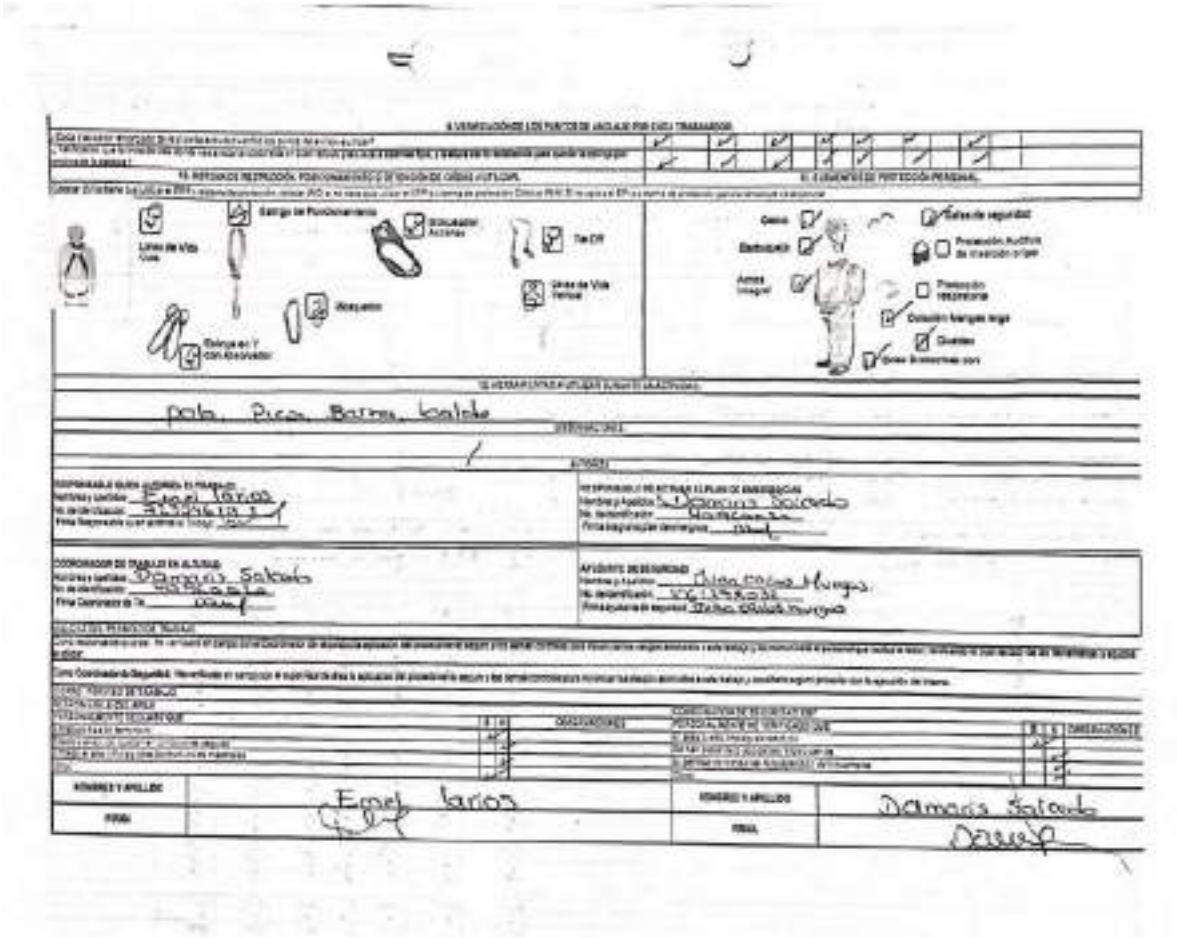


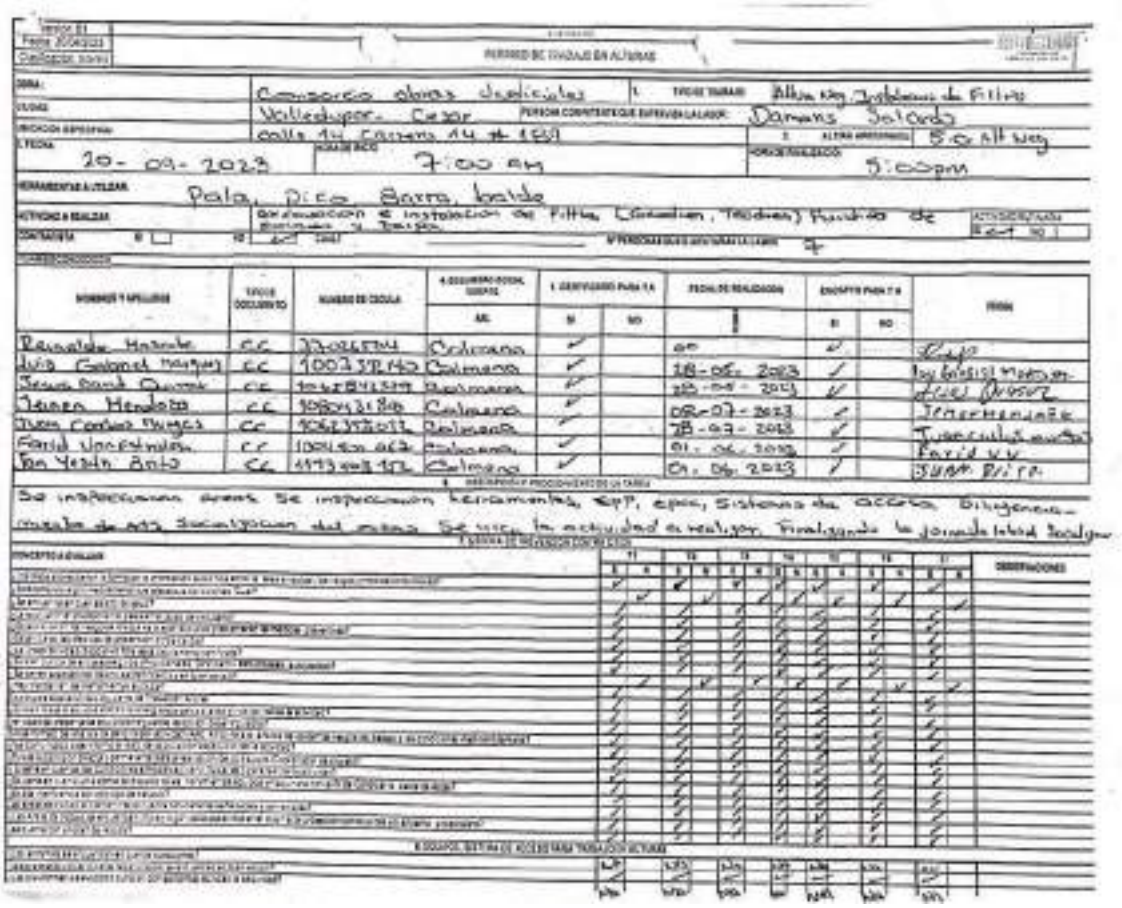

Consorcio obras Judiciales
Villavicencio - Cesar
Damaris Salcedo
Calle 14 Carrera 14 # 1-50
10-09-2023
7:00 am
5:00pm
Pala, Pico, Barra, Lonja
Se inspeccionan áreas se inspeccionan herramientas, EPP, equipos, Sistemas de acceso, Diligencia-
miento de ATS, Socialización del mismo se inicia la actividad a realizar, Finalizando la jornada laboral Realizo

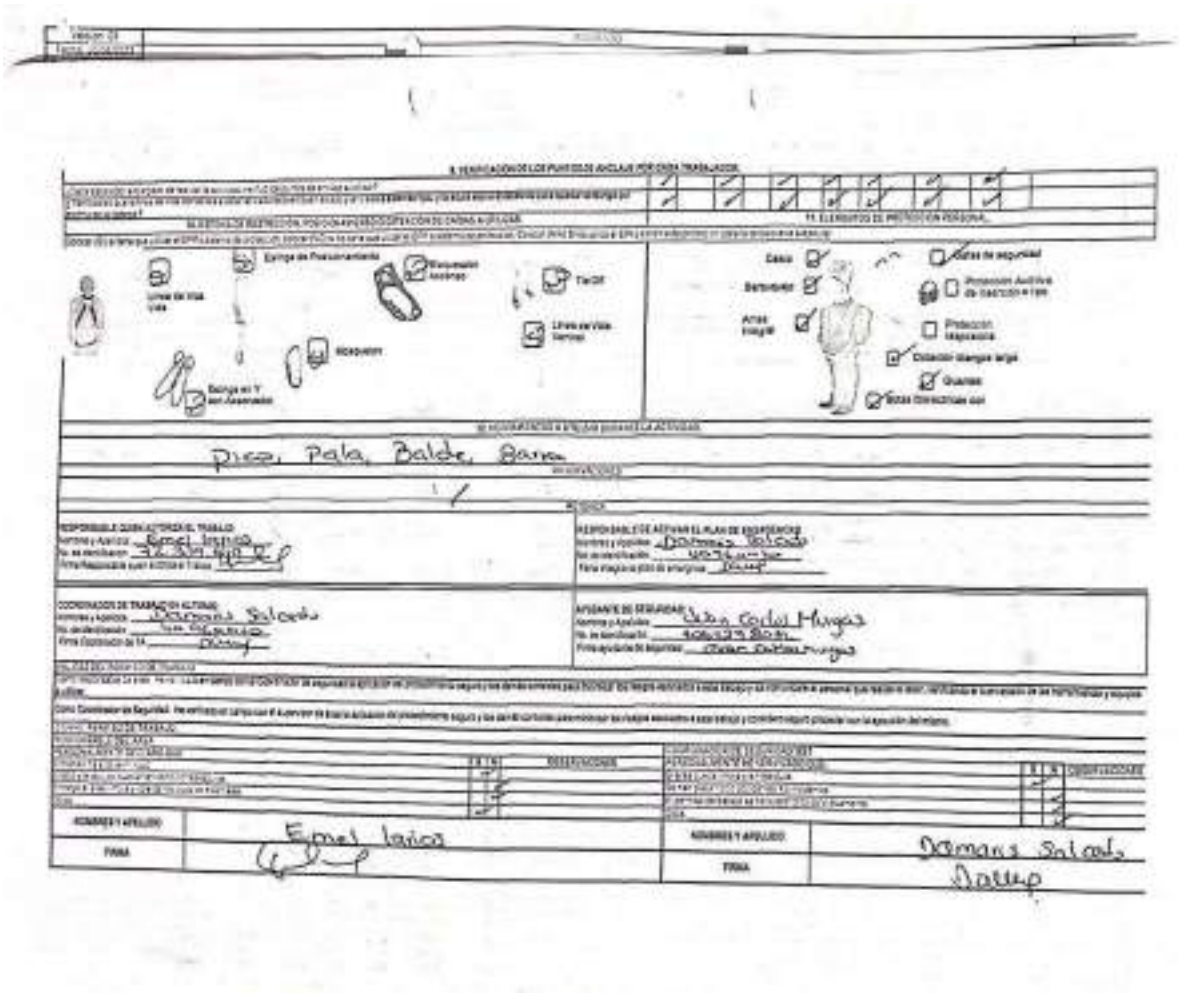

Pica, Pala, Balde, Barra
Damaris Salcedo
Damaris Salcedo

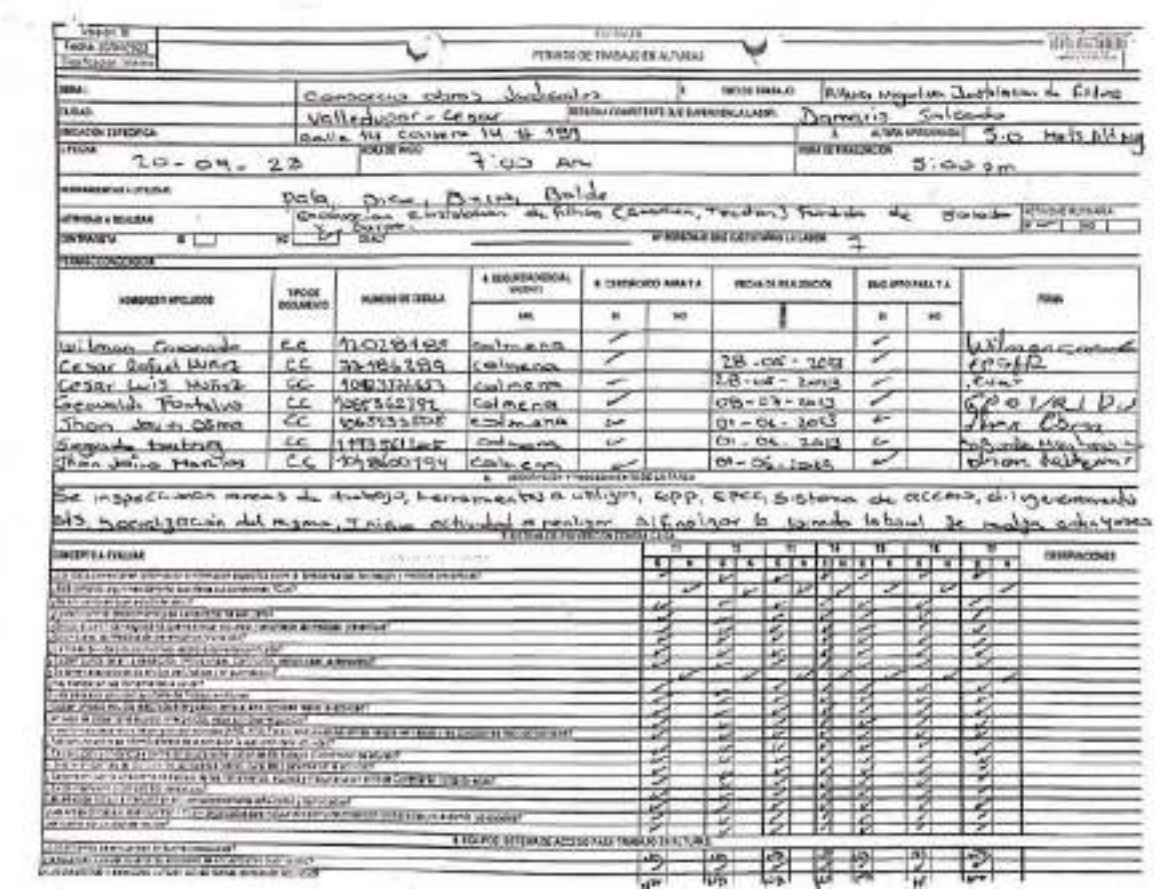


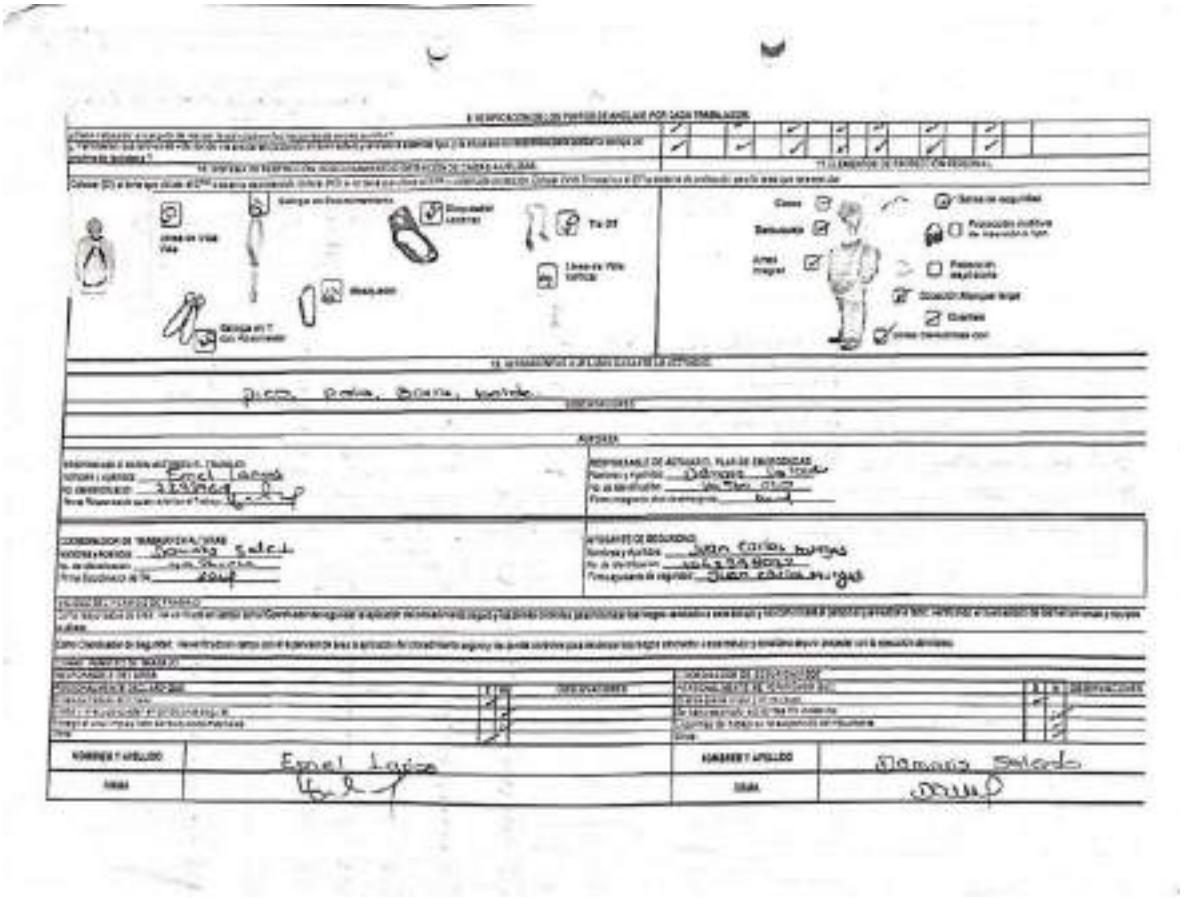


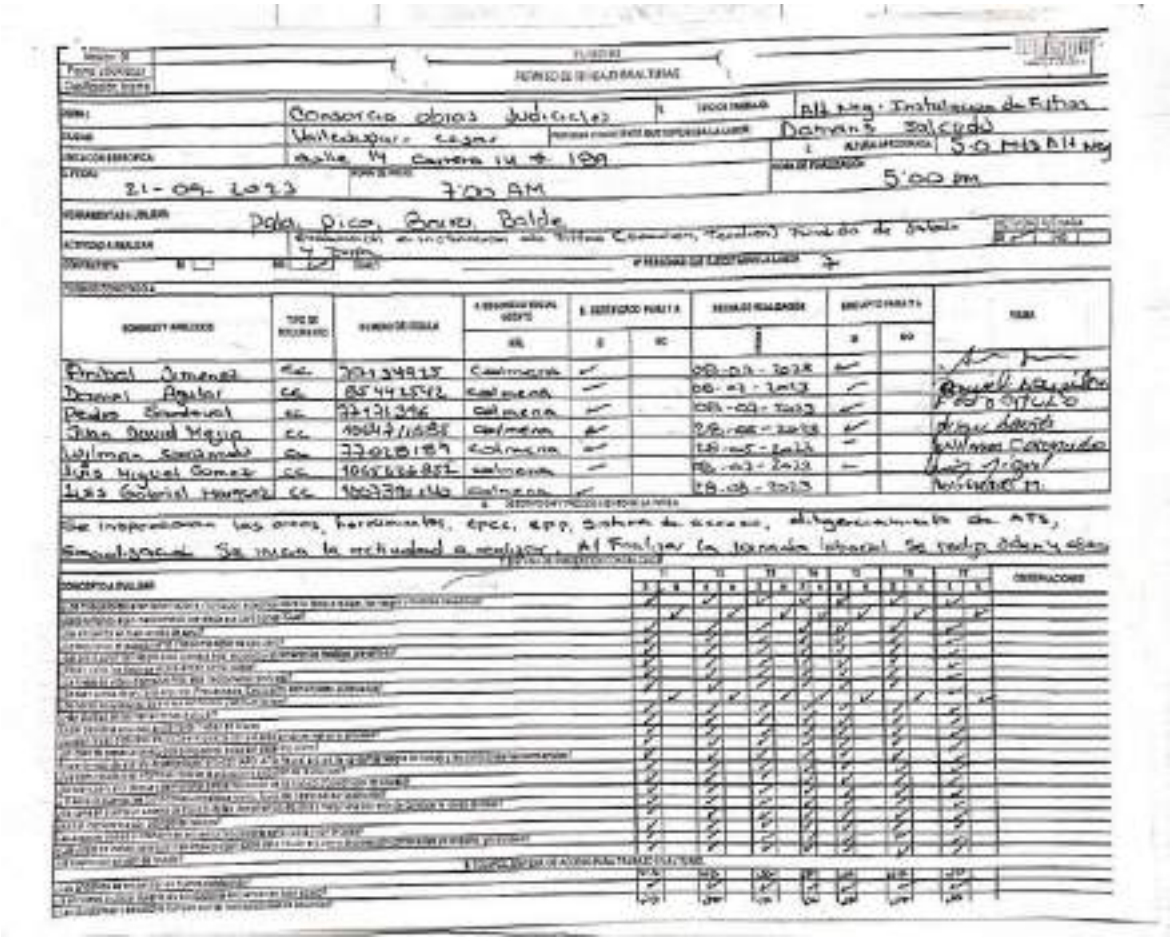


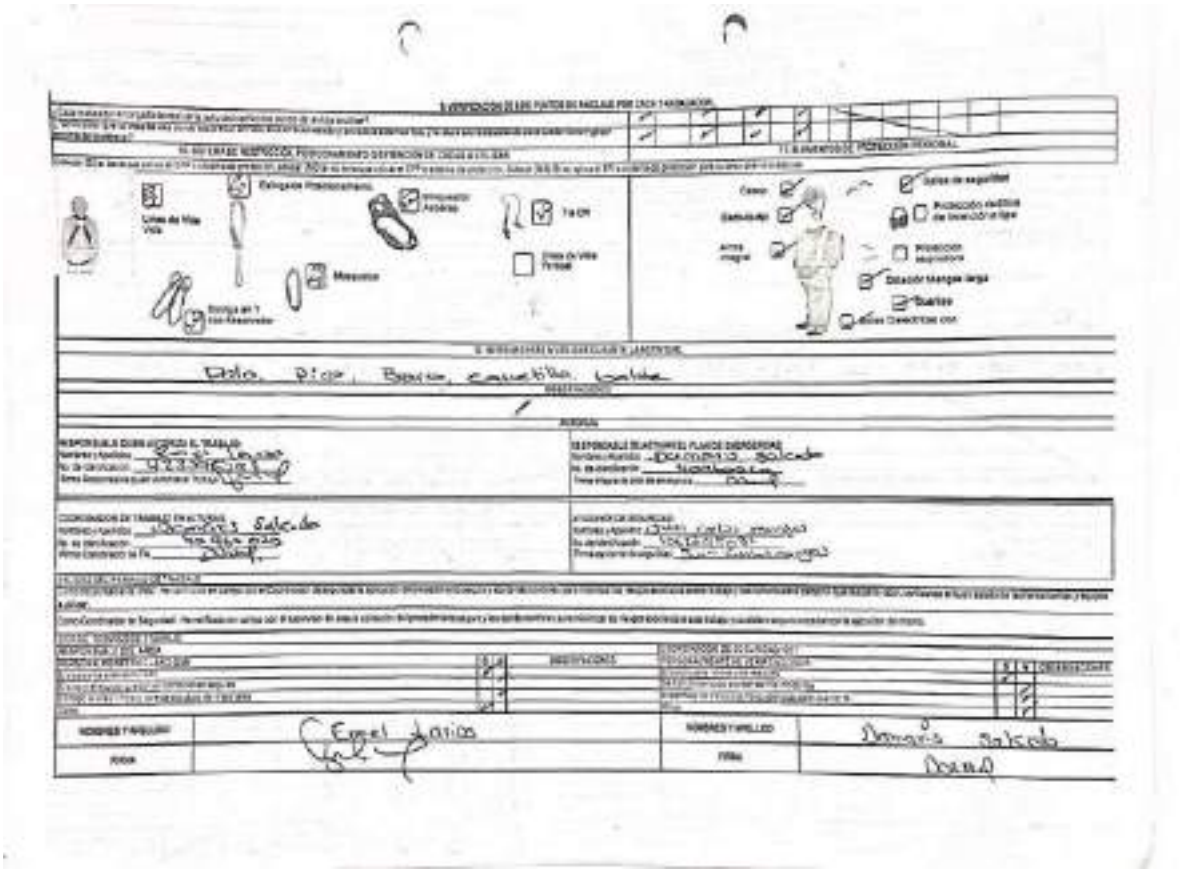


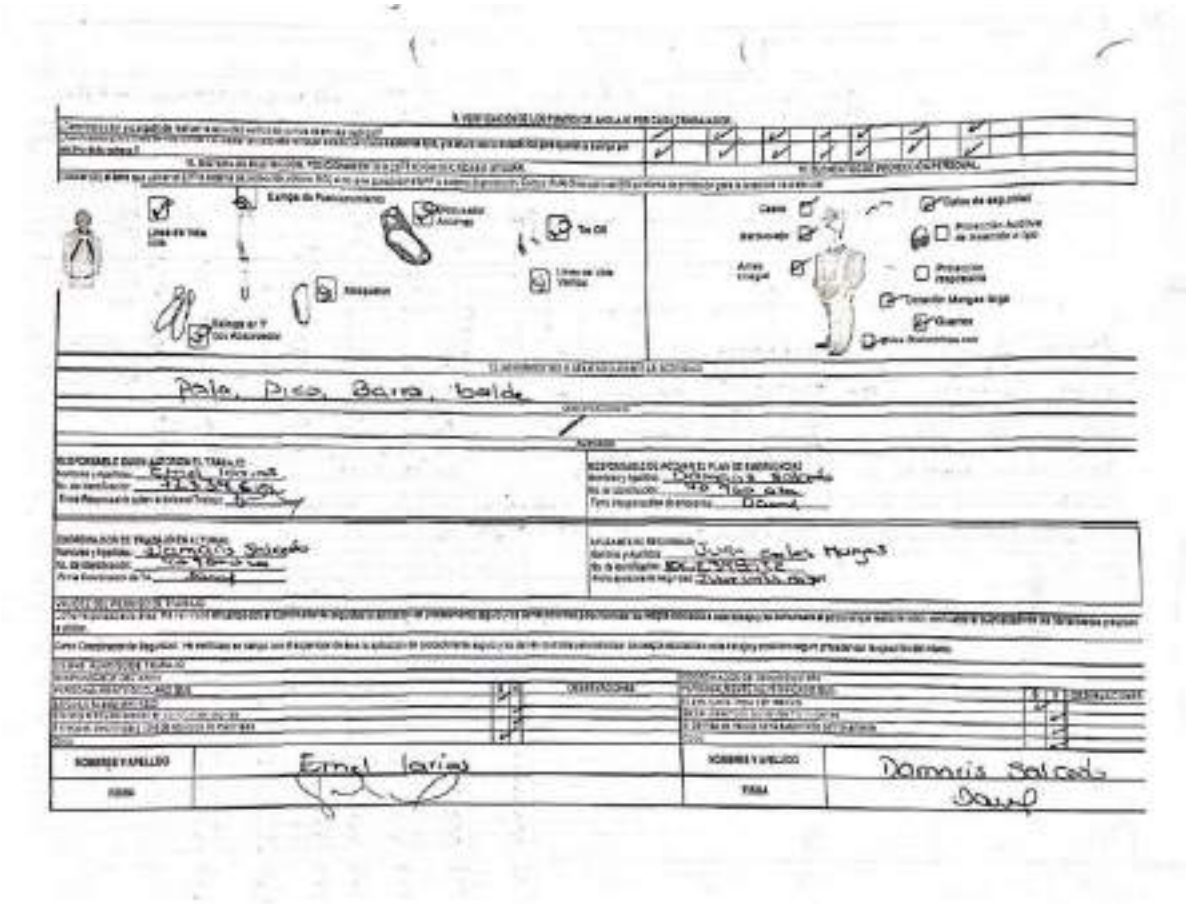

Pala, Pica, Barra, balde
Damaris Salcedo
Damaris Salcedo

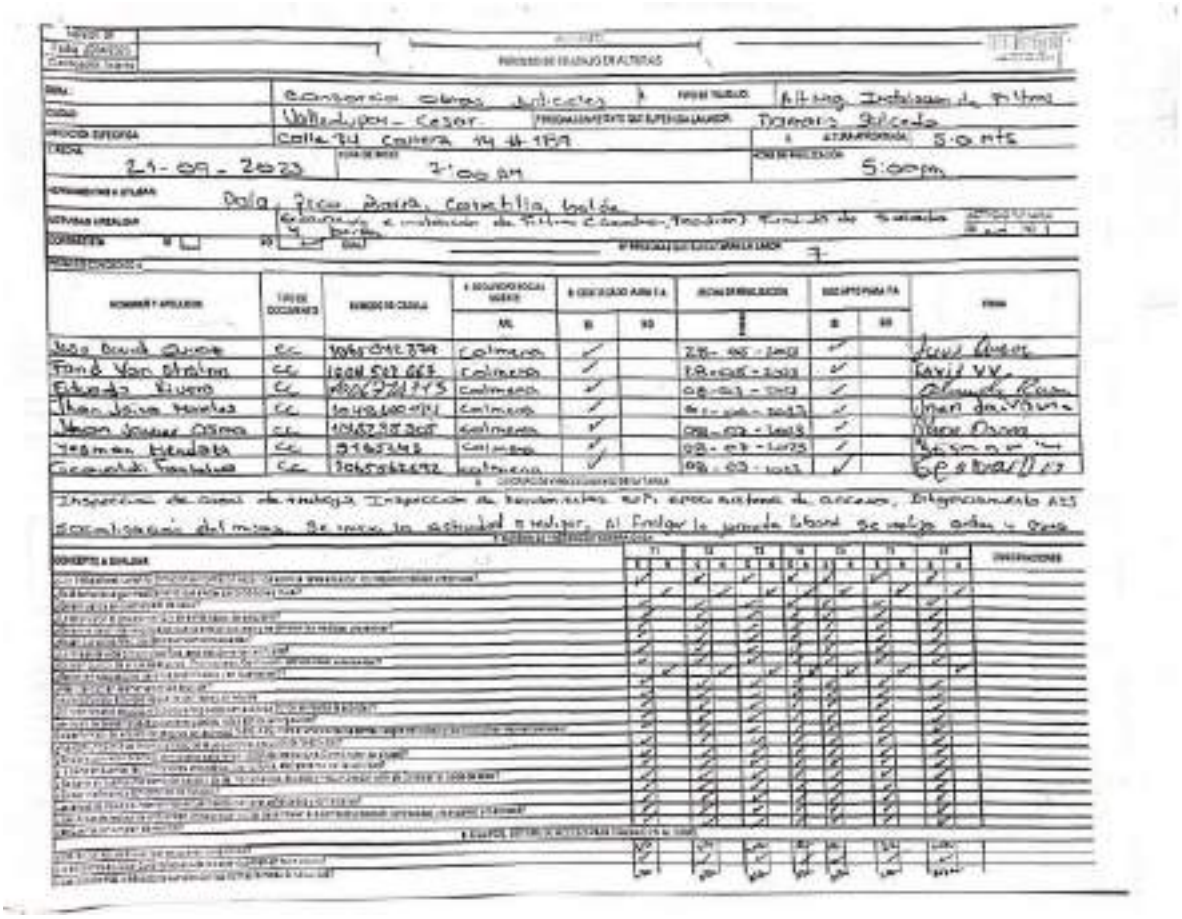


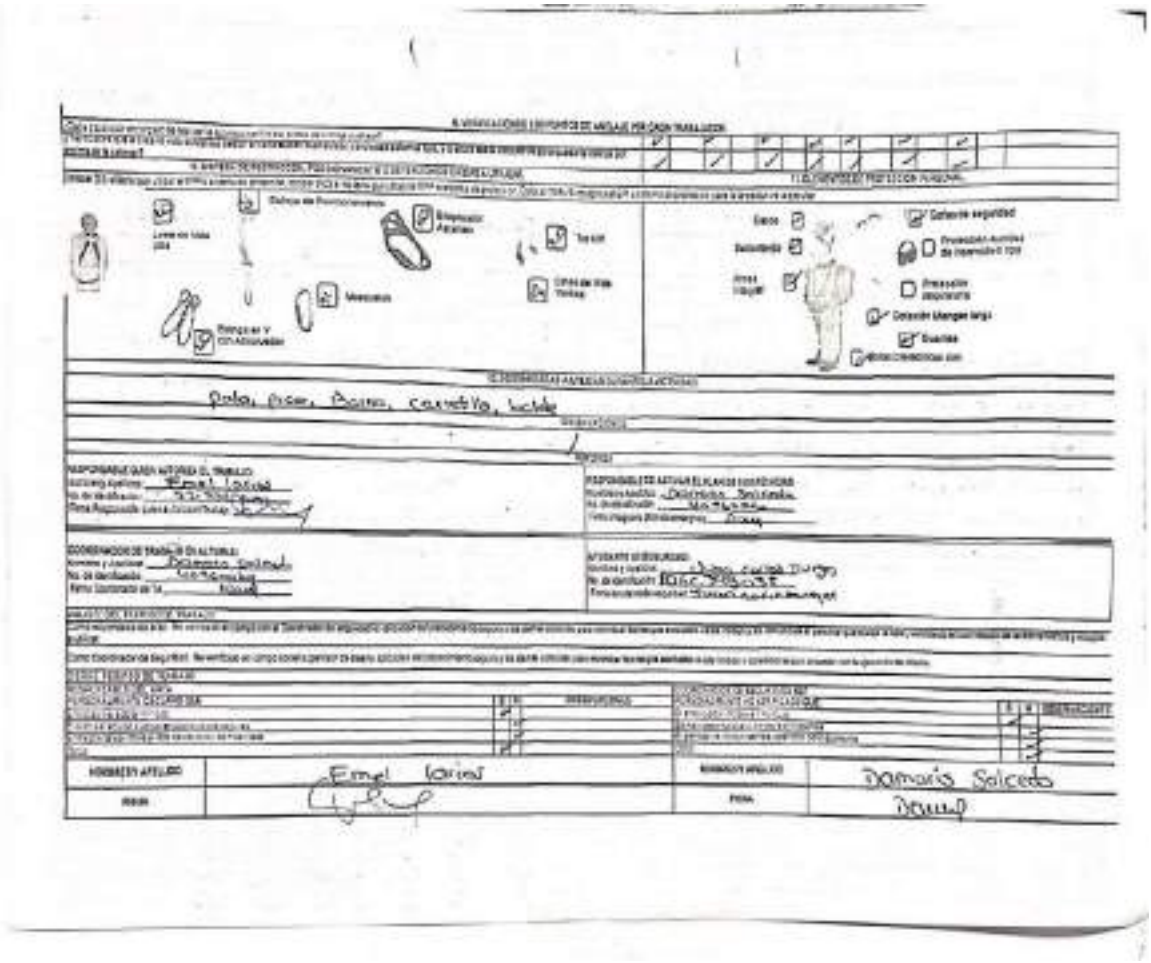


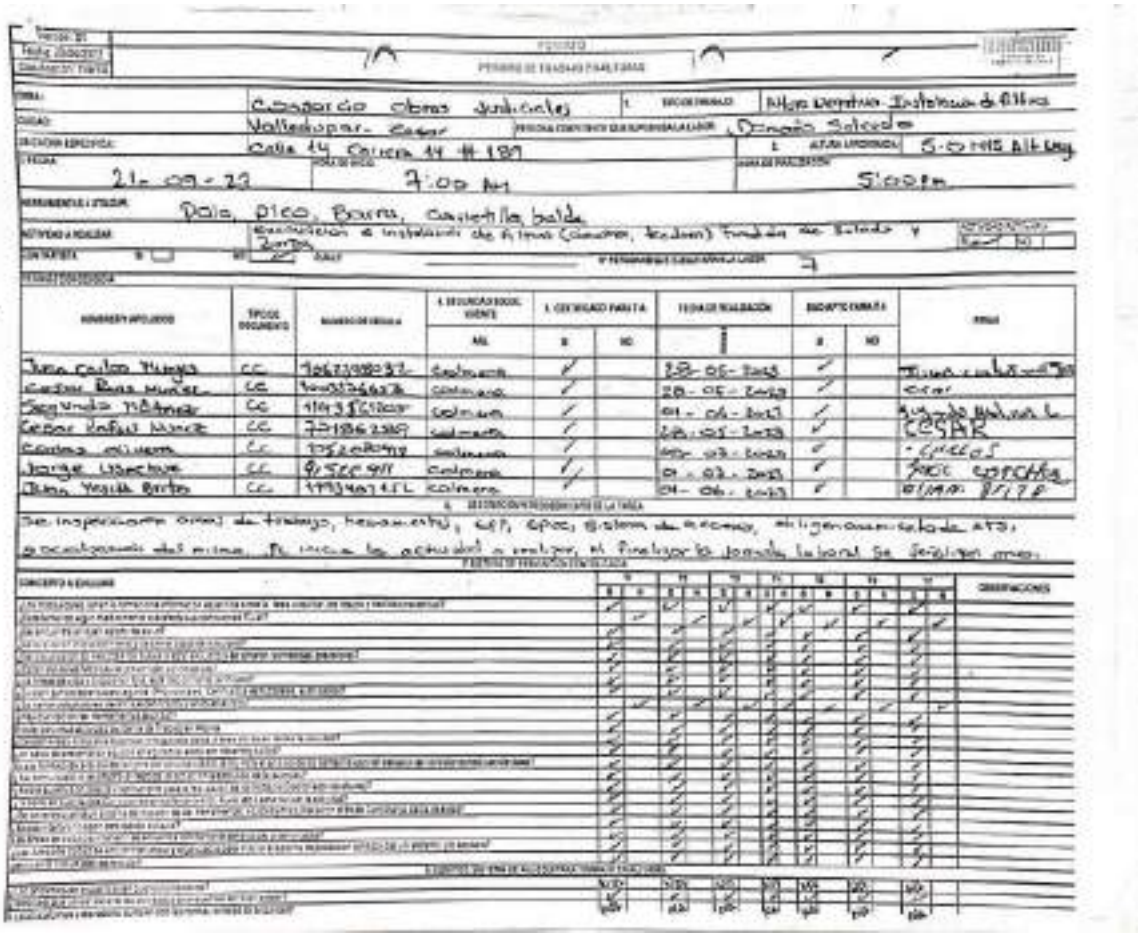


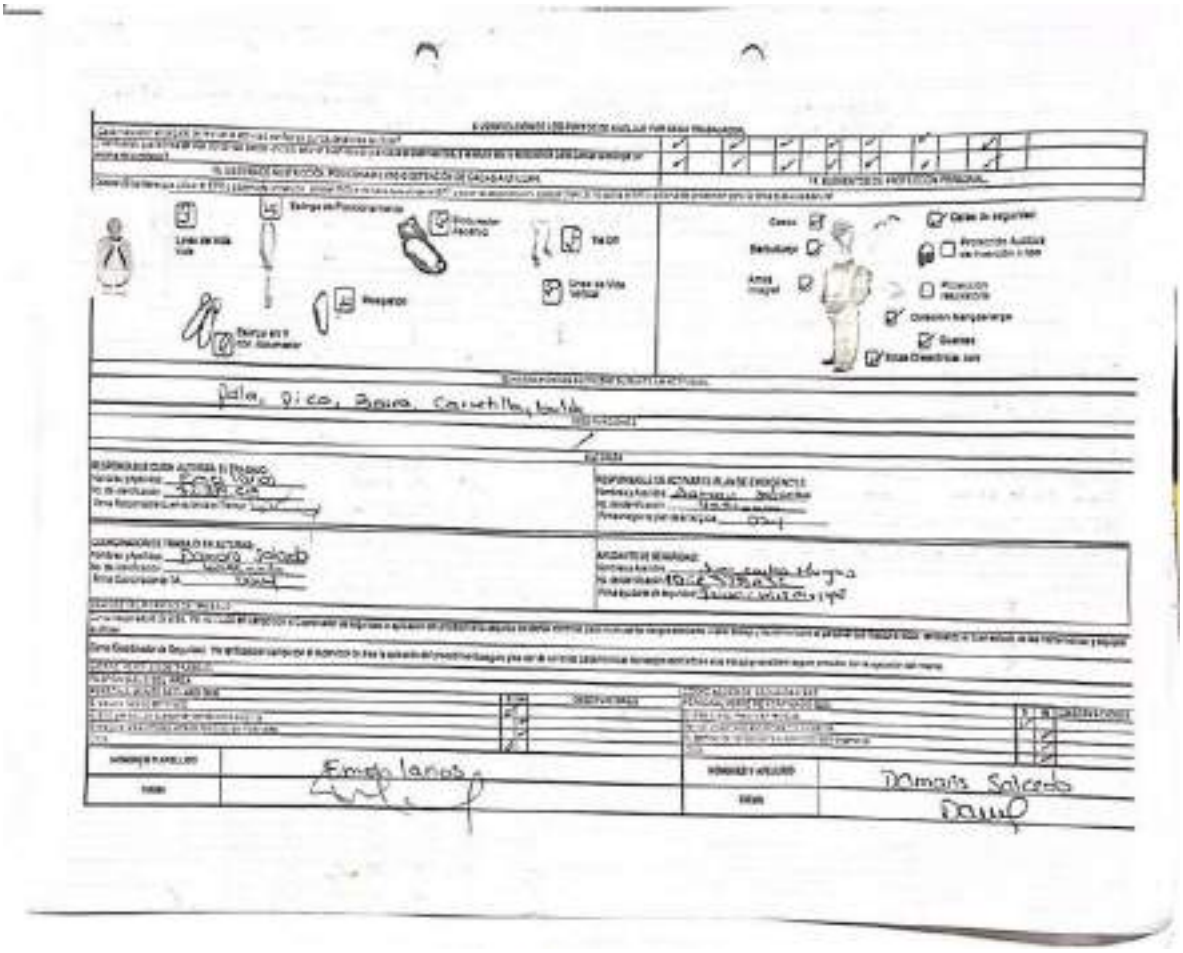


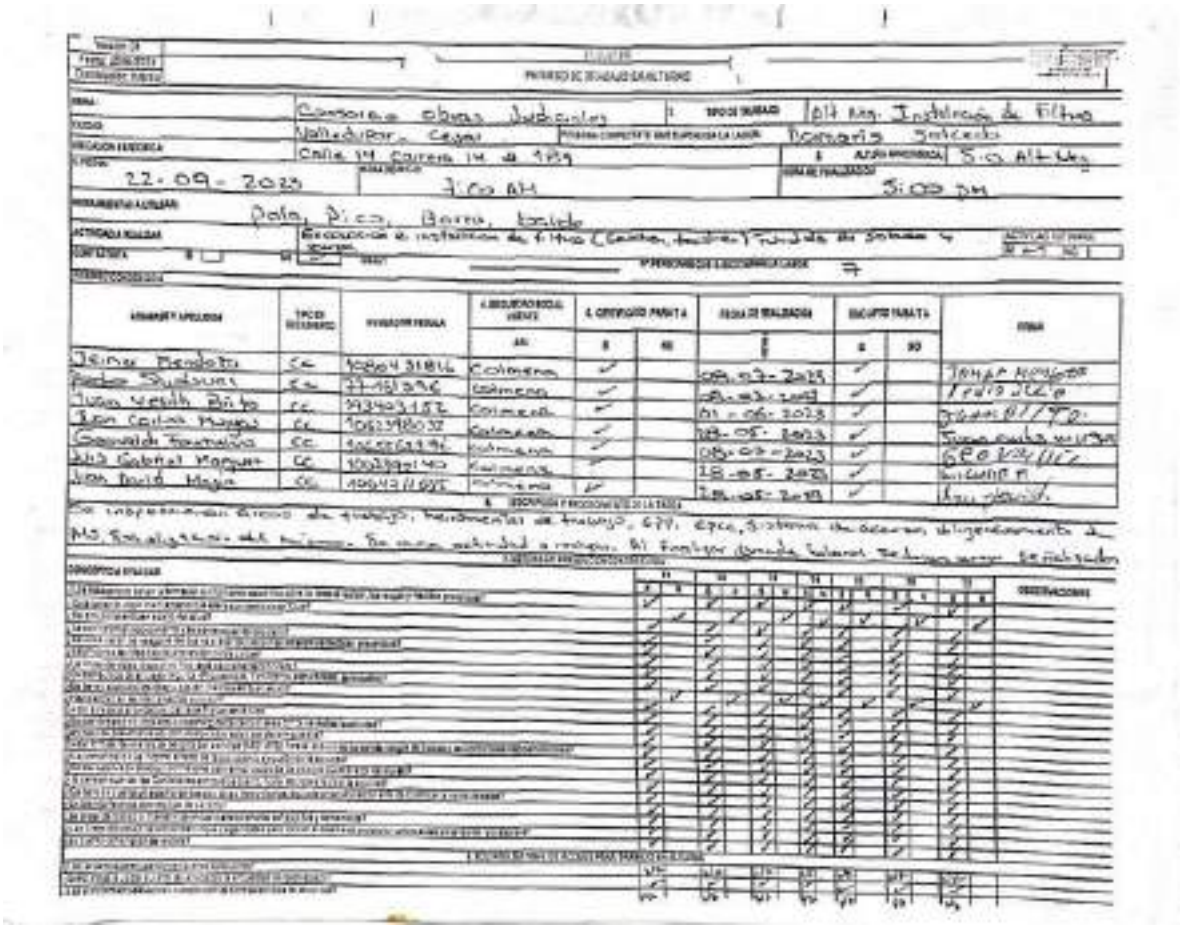


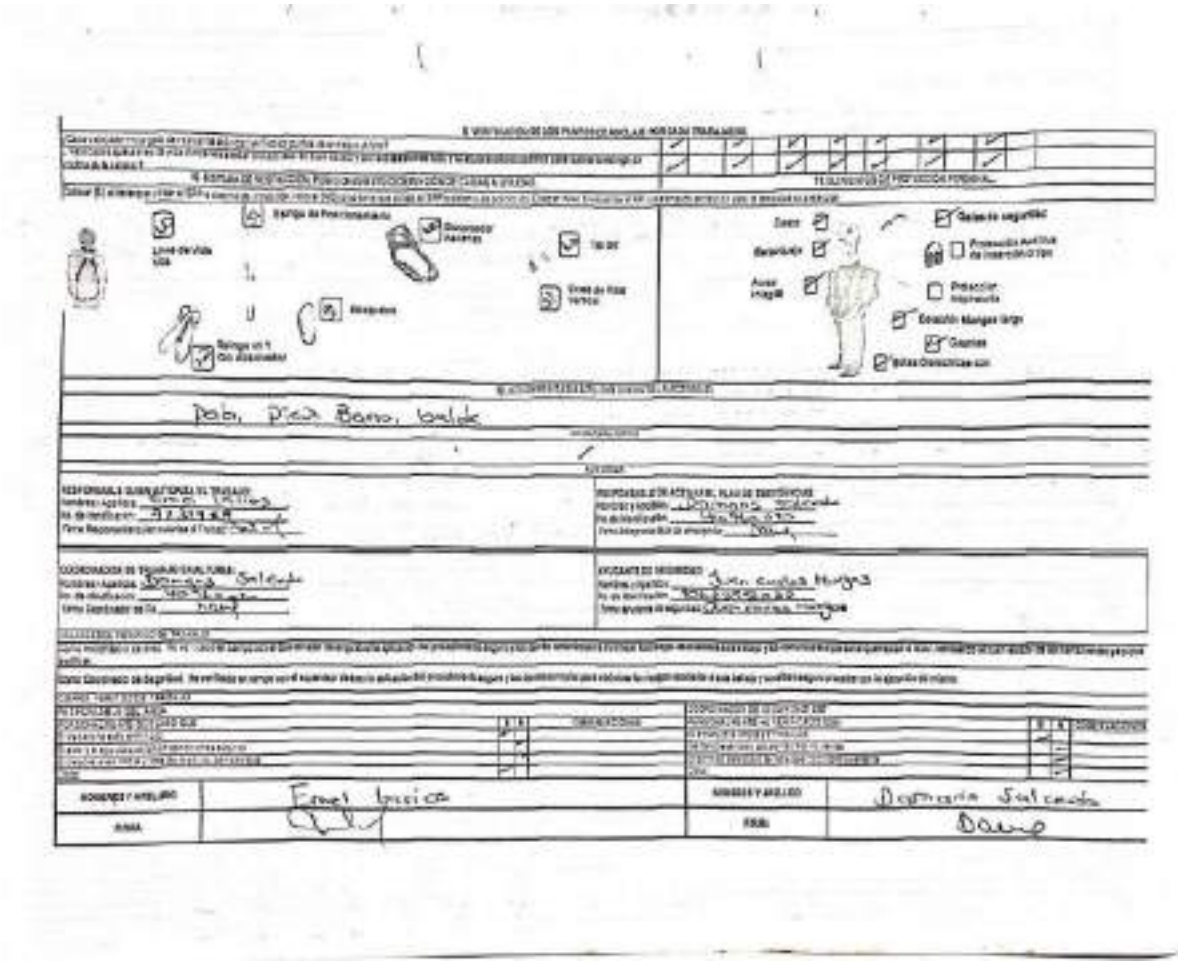


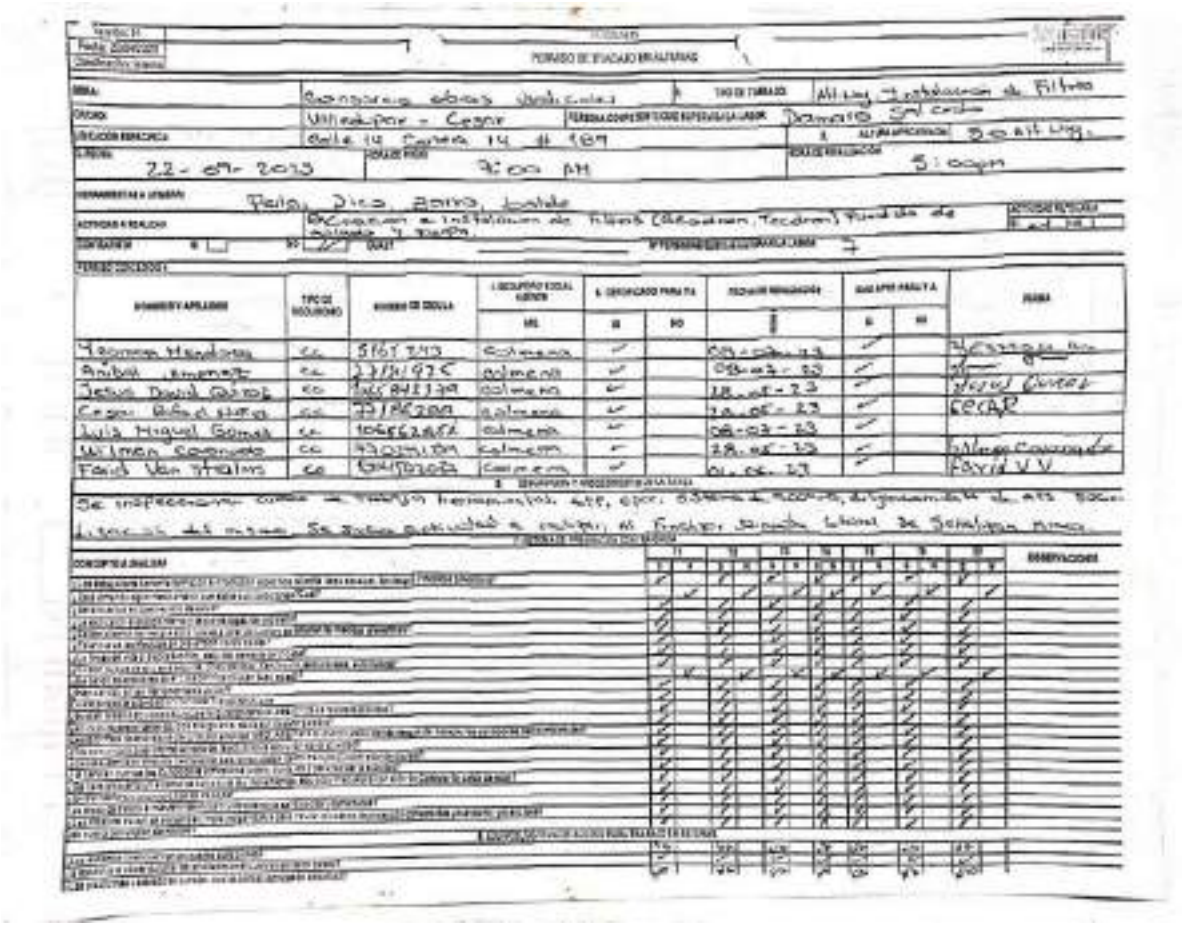


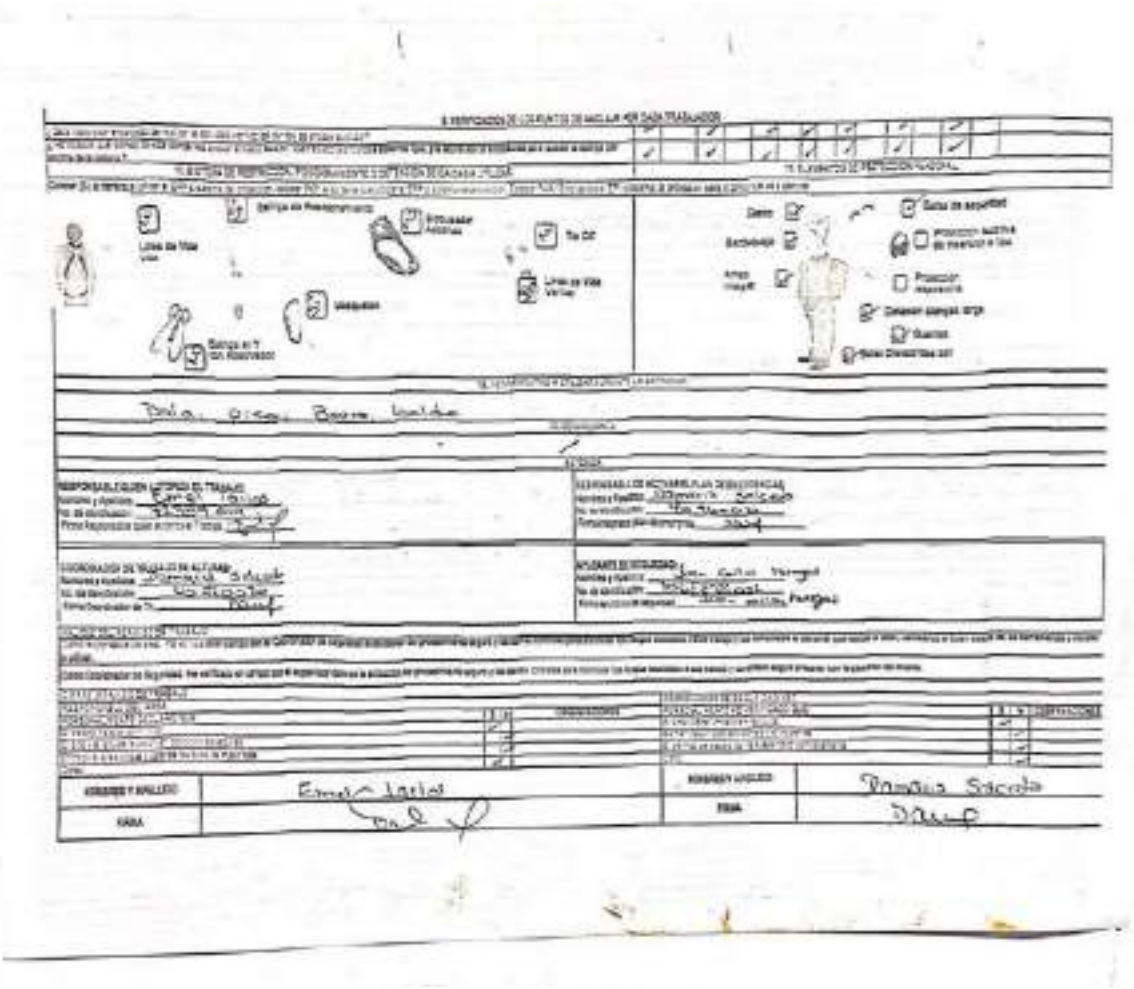


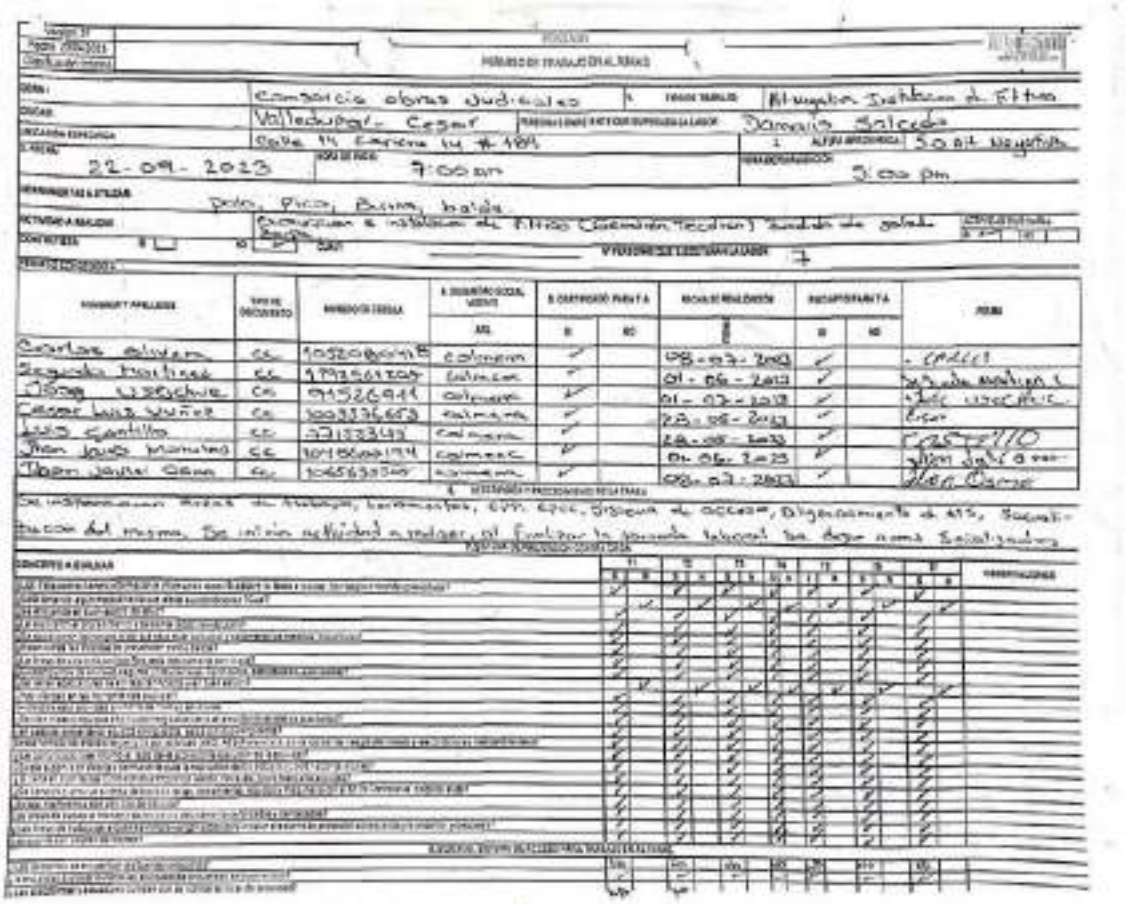


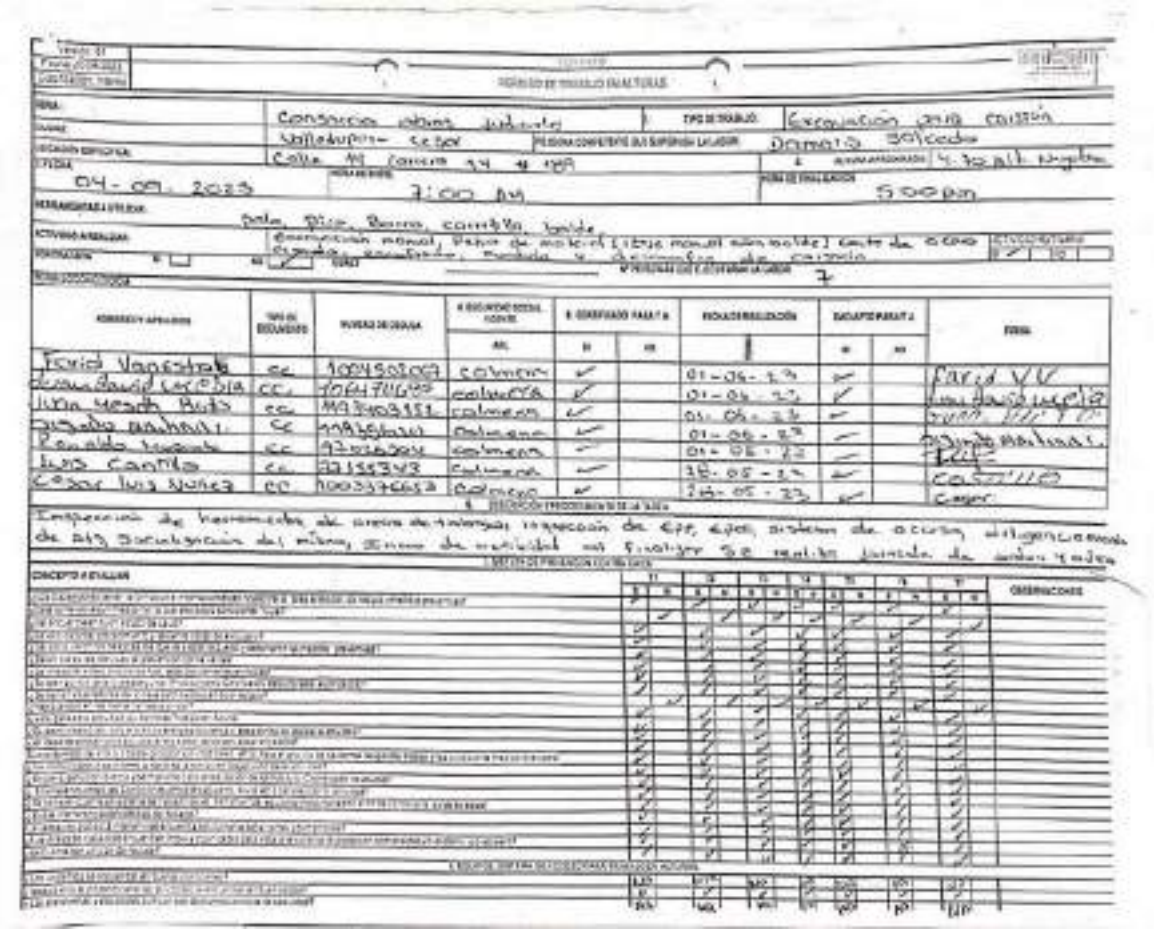


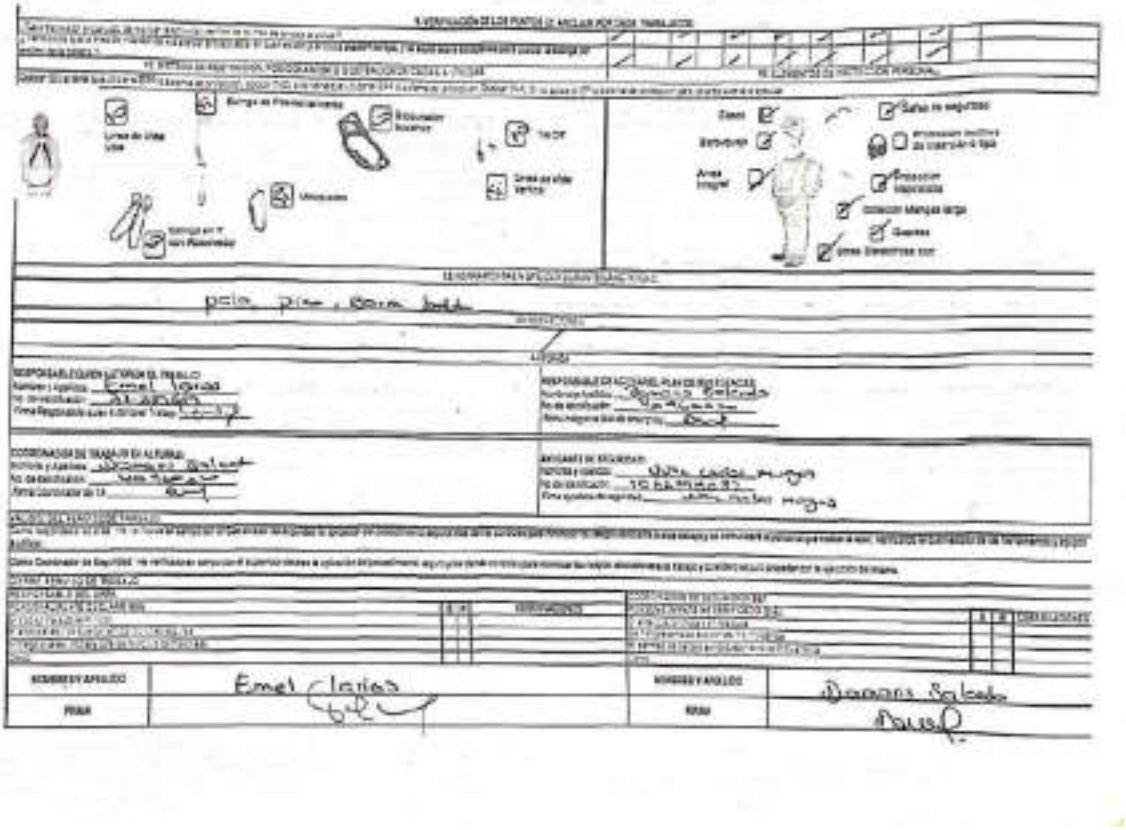


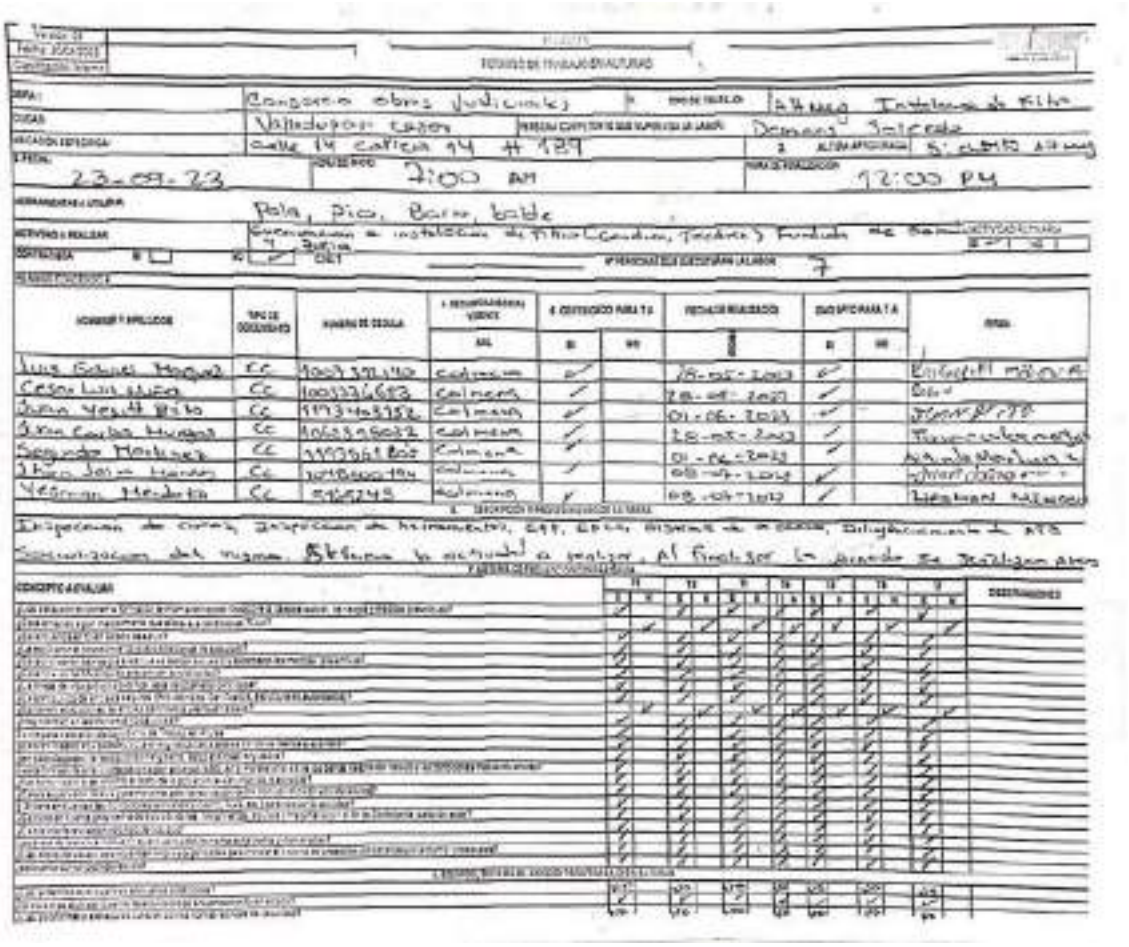


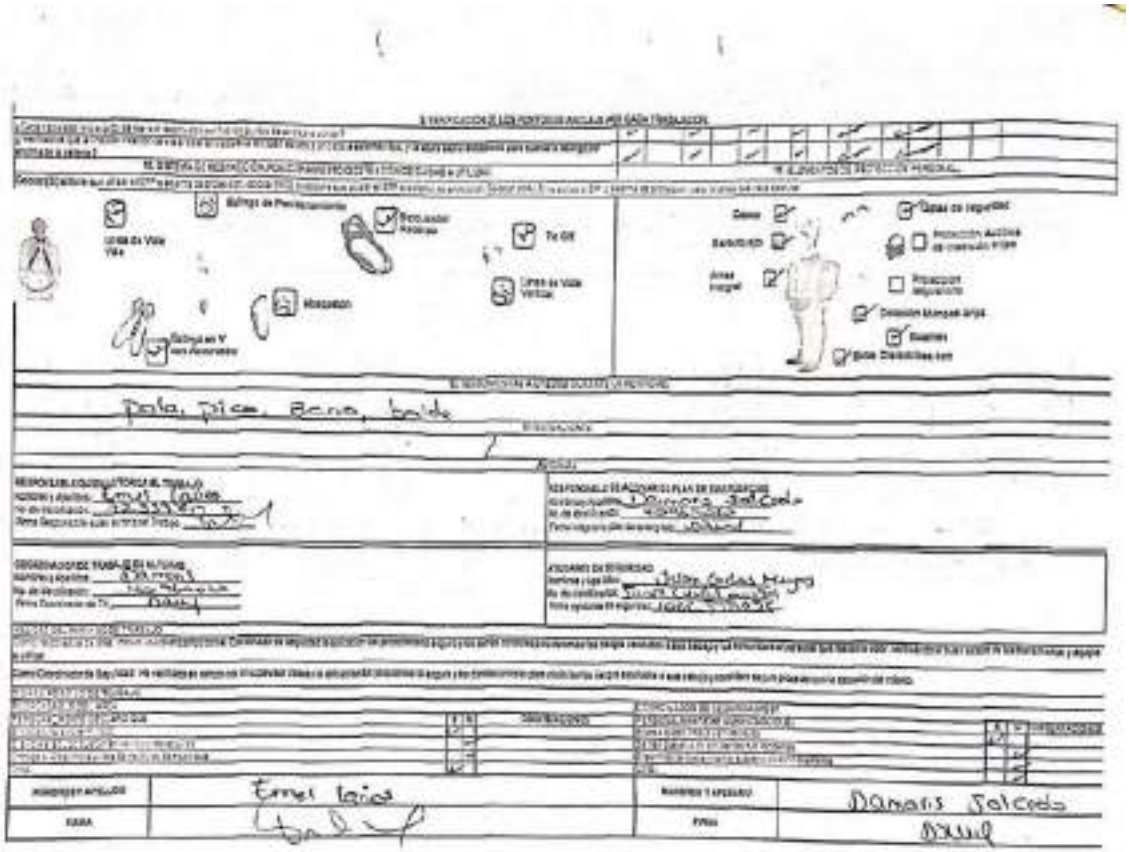


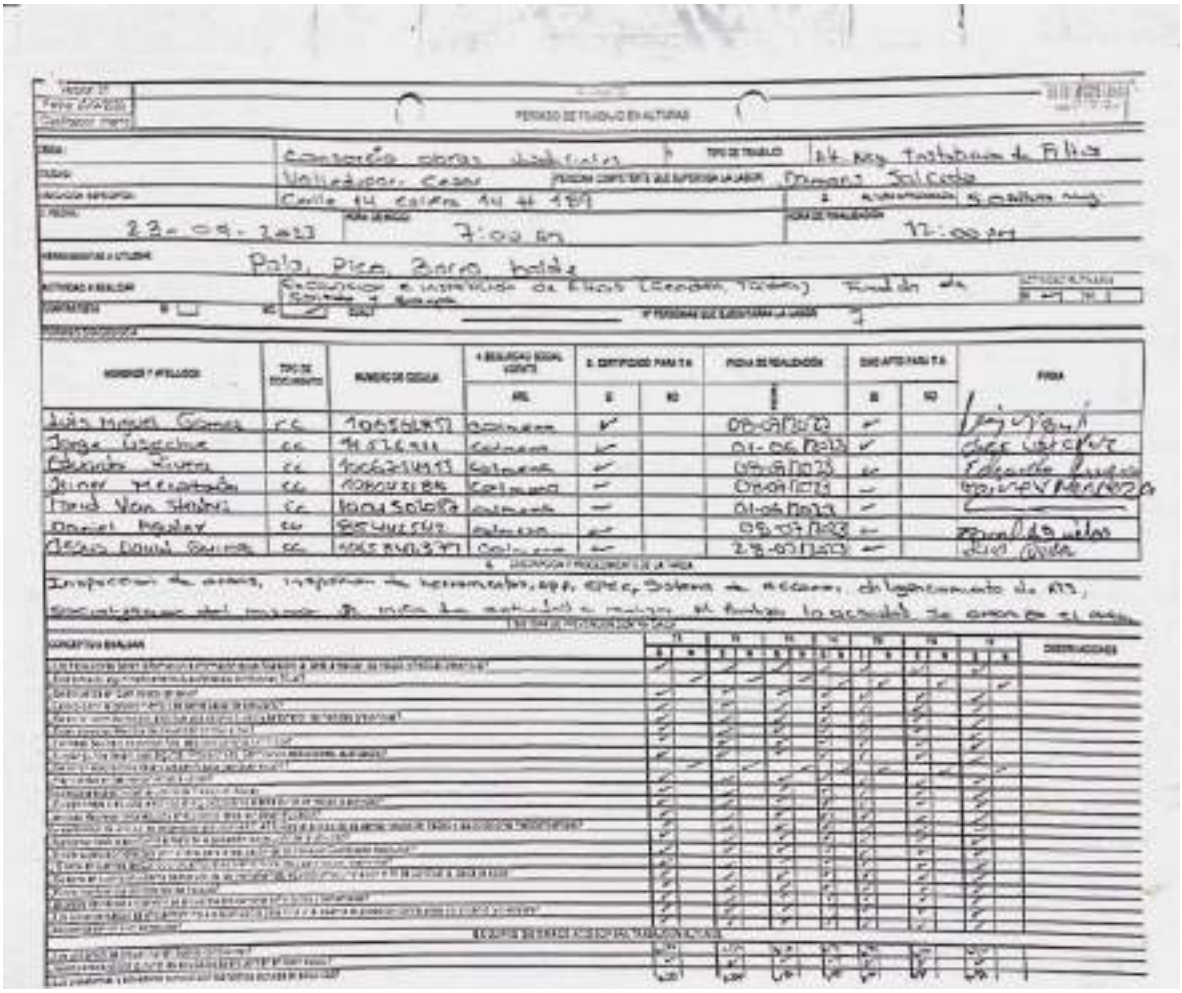


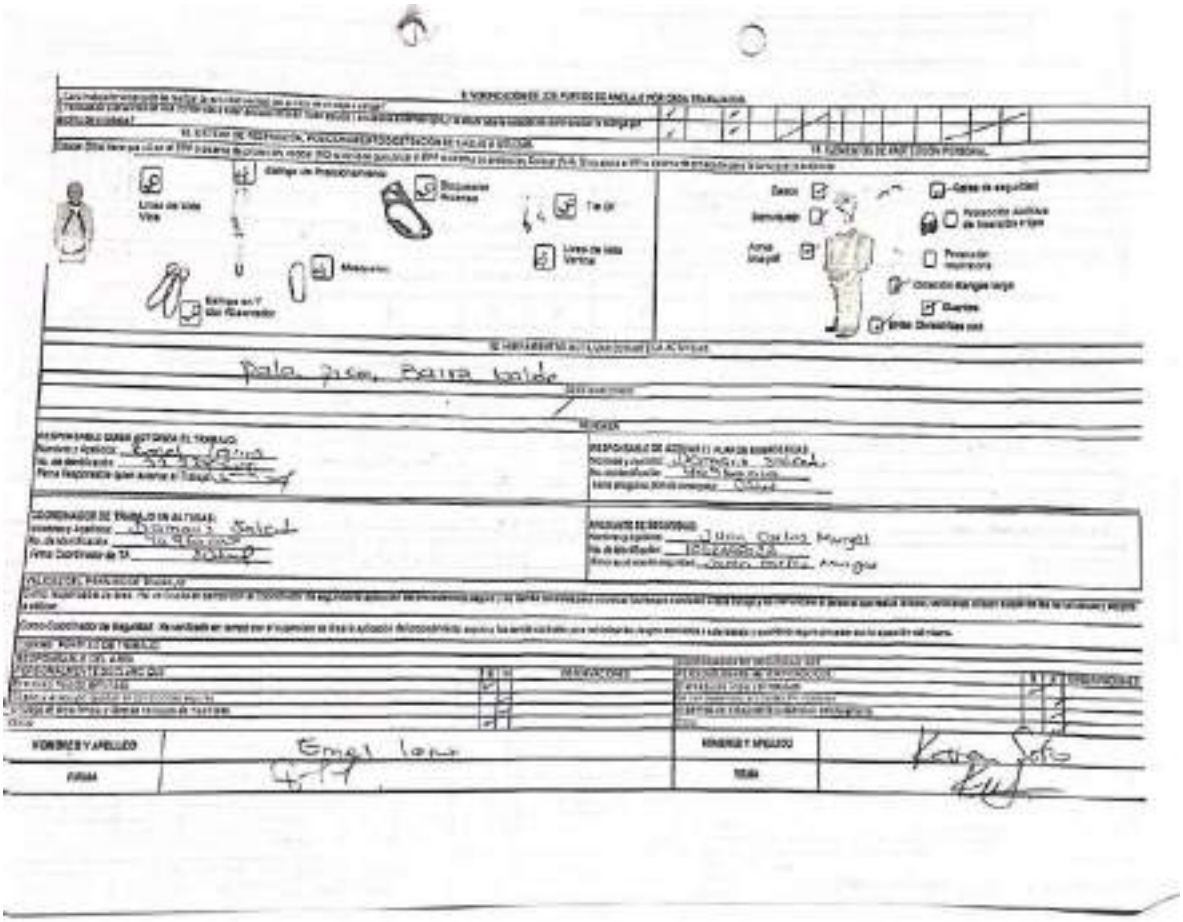


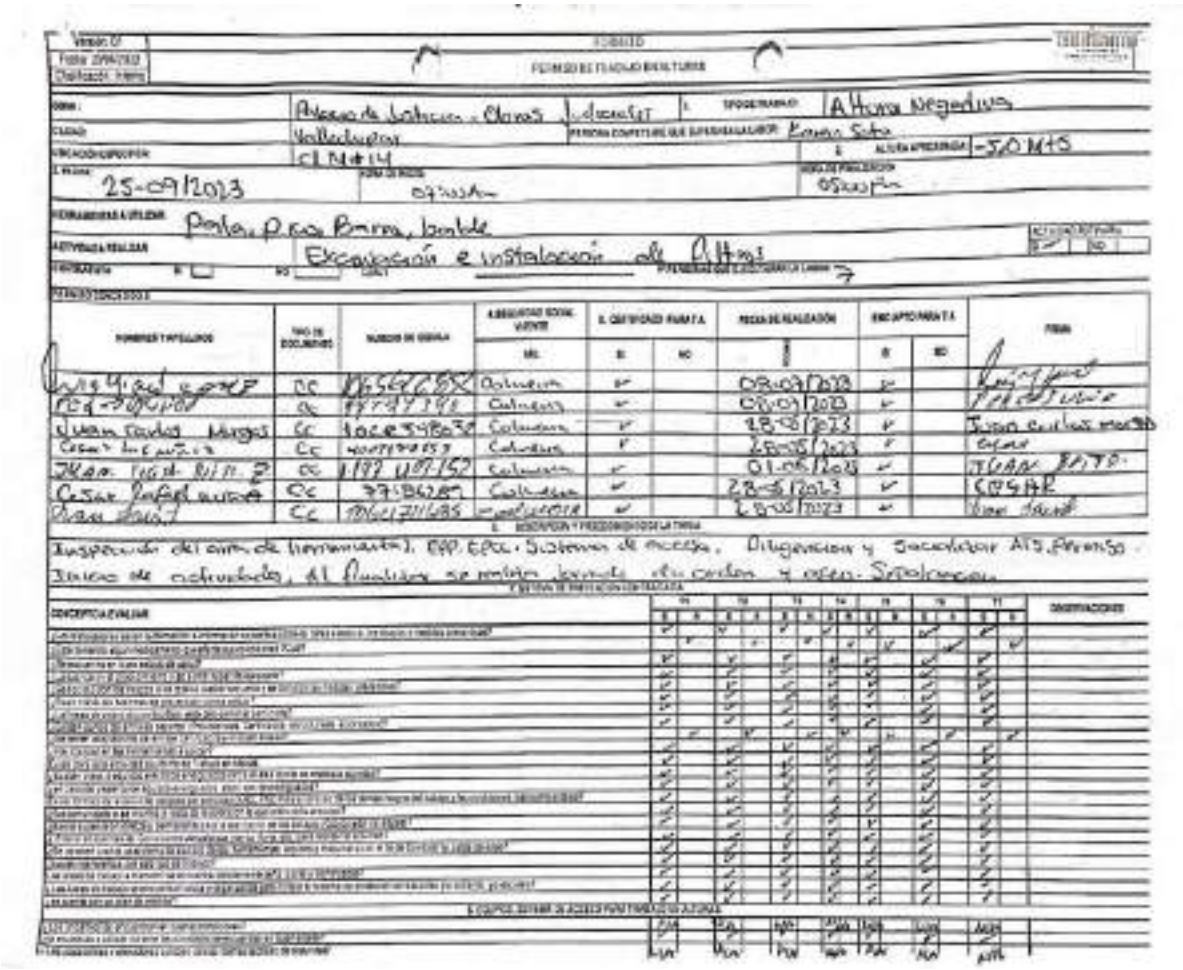

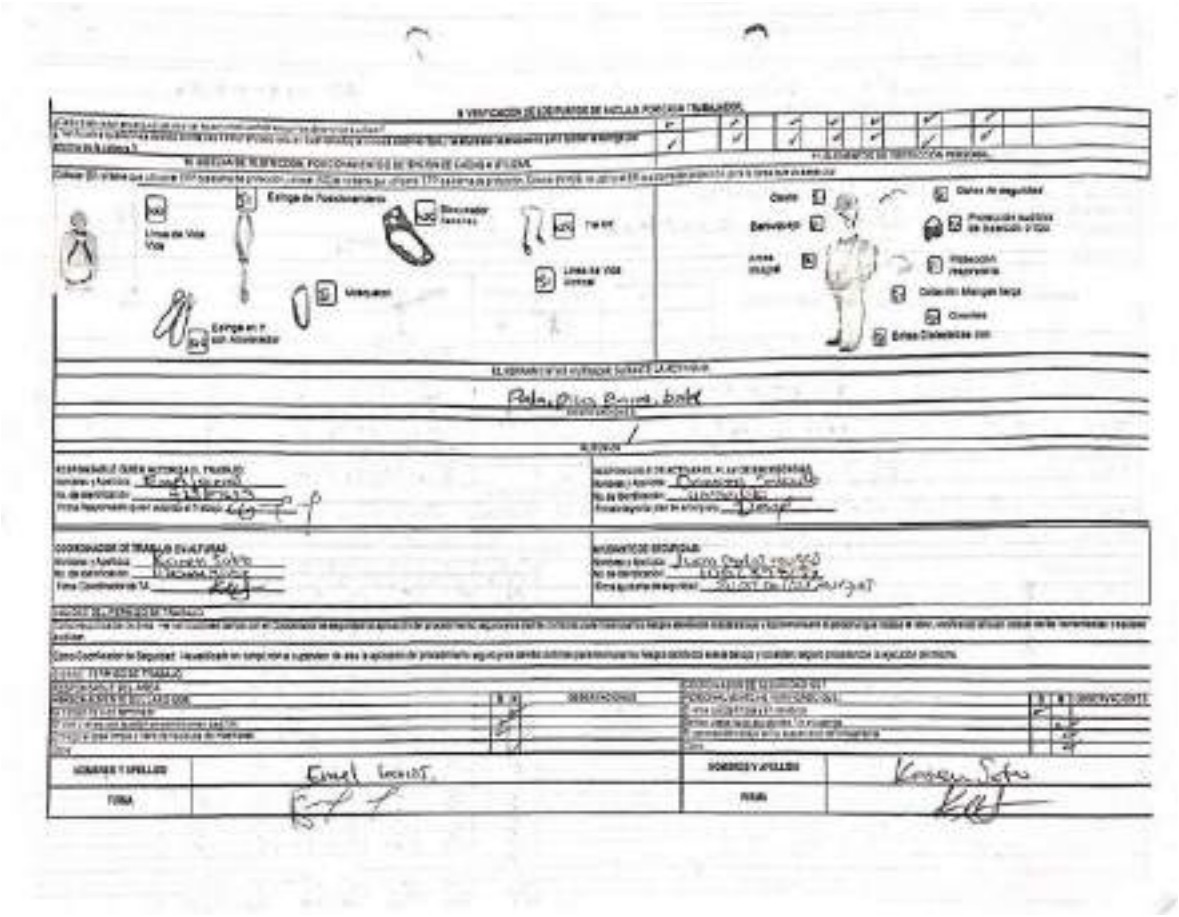

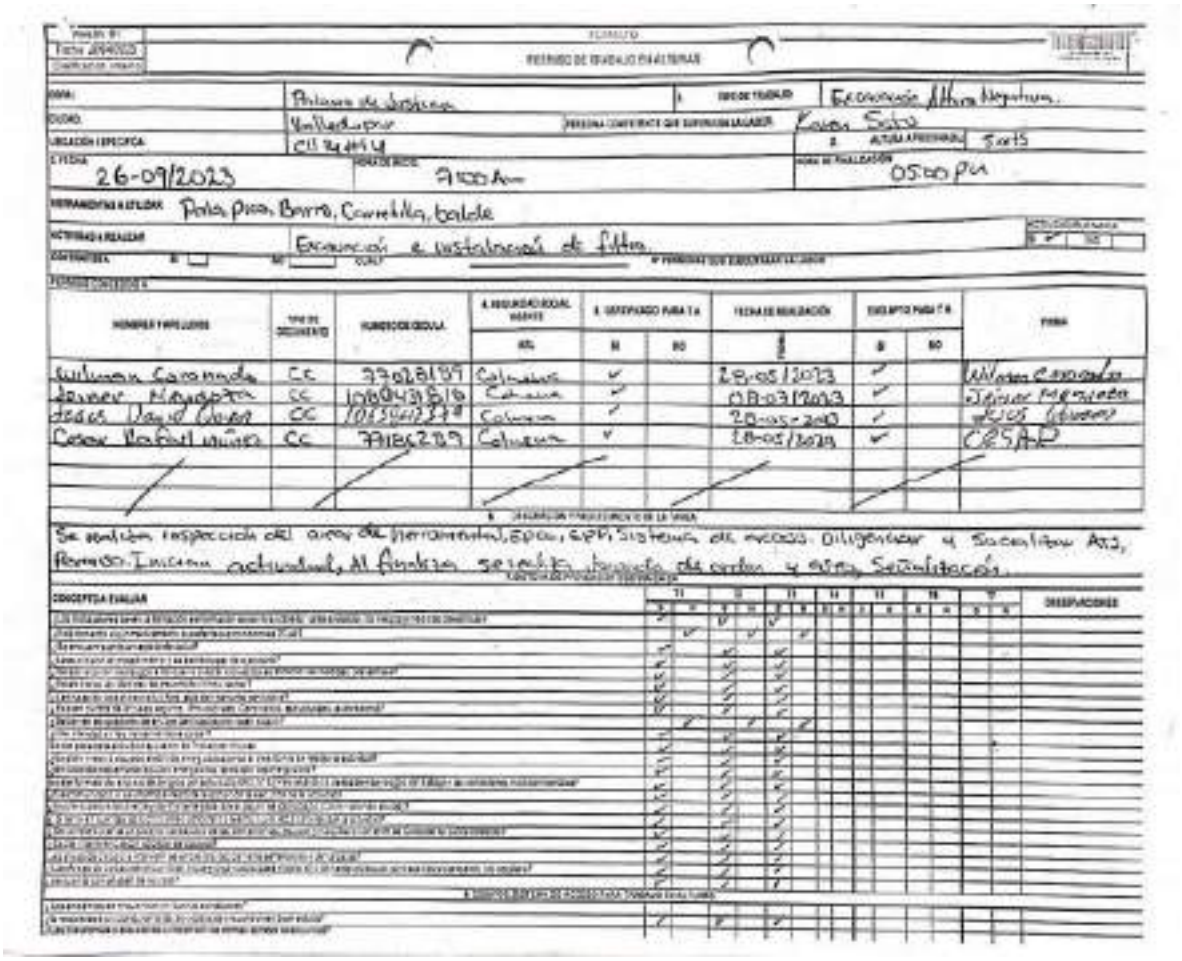

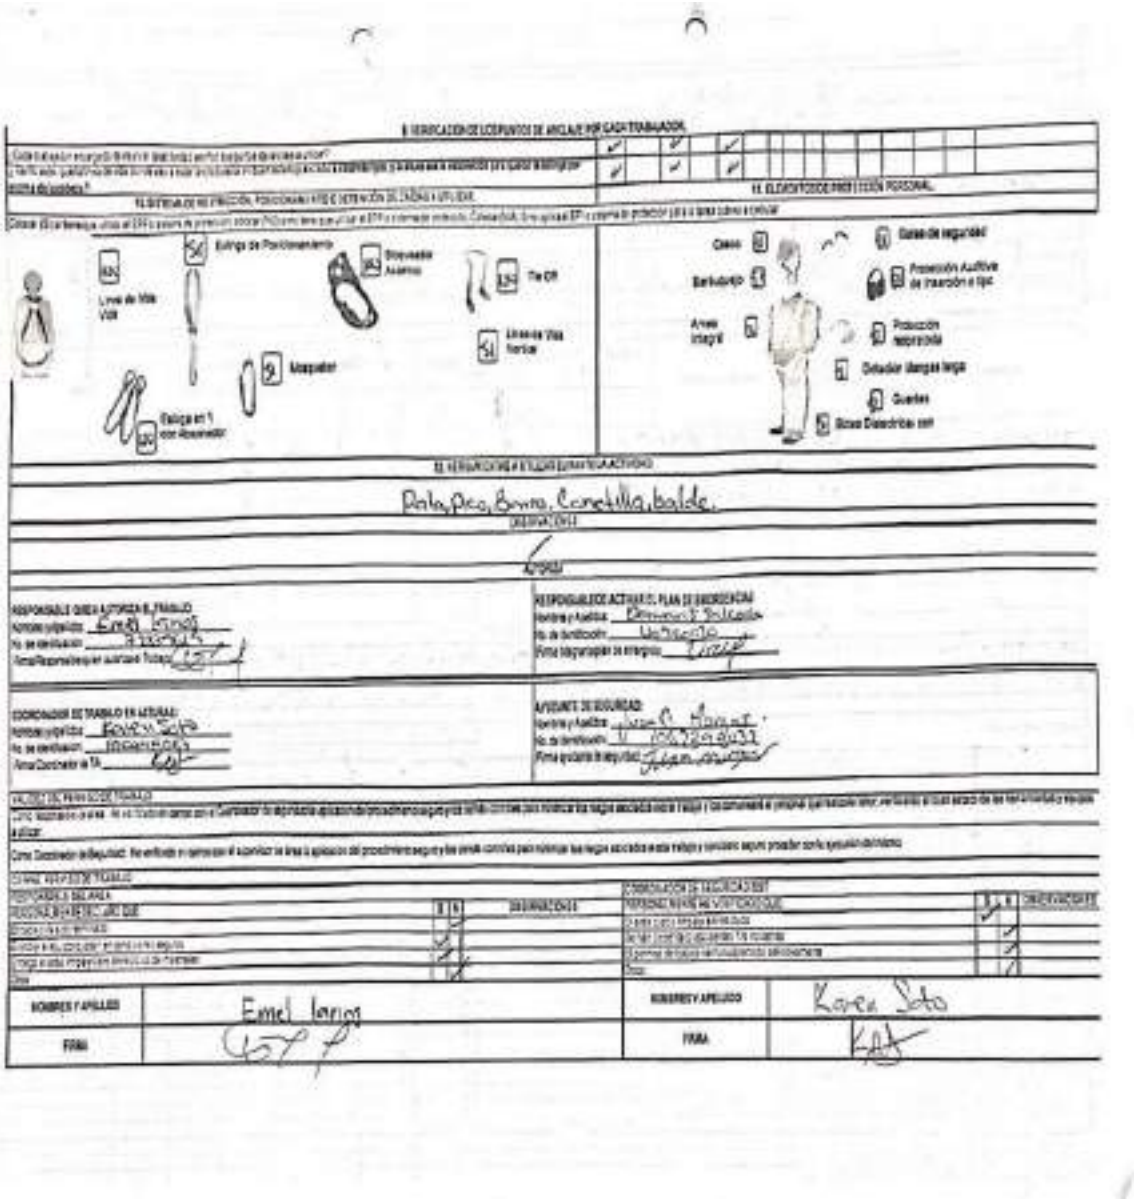
Eslinga de Posicionamiento
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Línea de Vida Vertical
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de inserción o tipo
Protección respiratoria
Guantes
Botas Dieléctricas con
Parla, Pico, Barra, Carretilla, balde.
Emel Iorga
Kara Soto

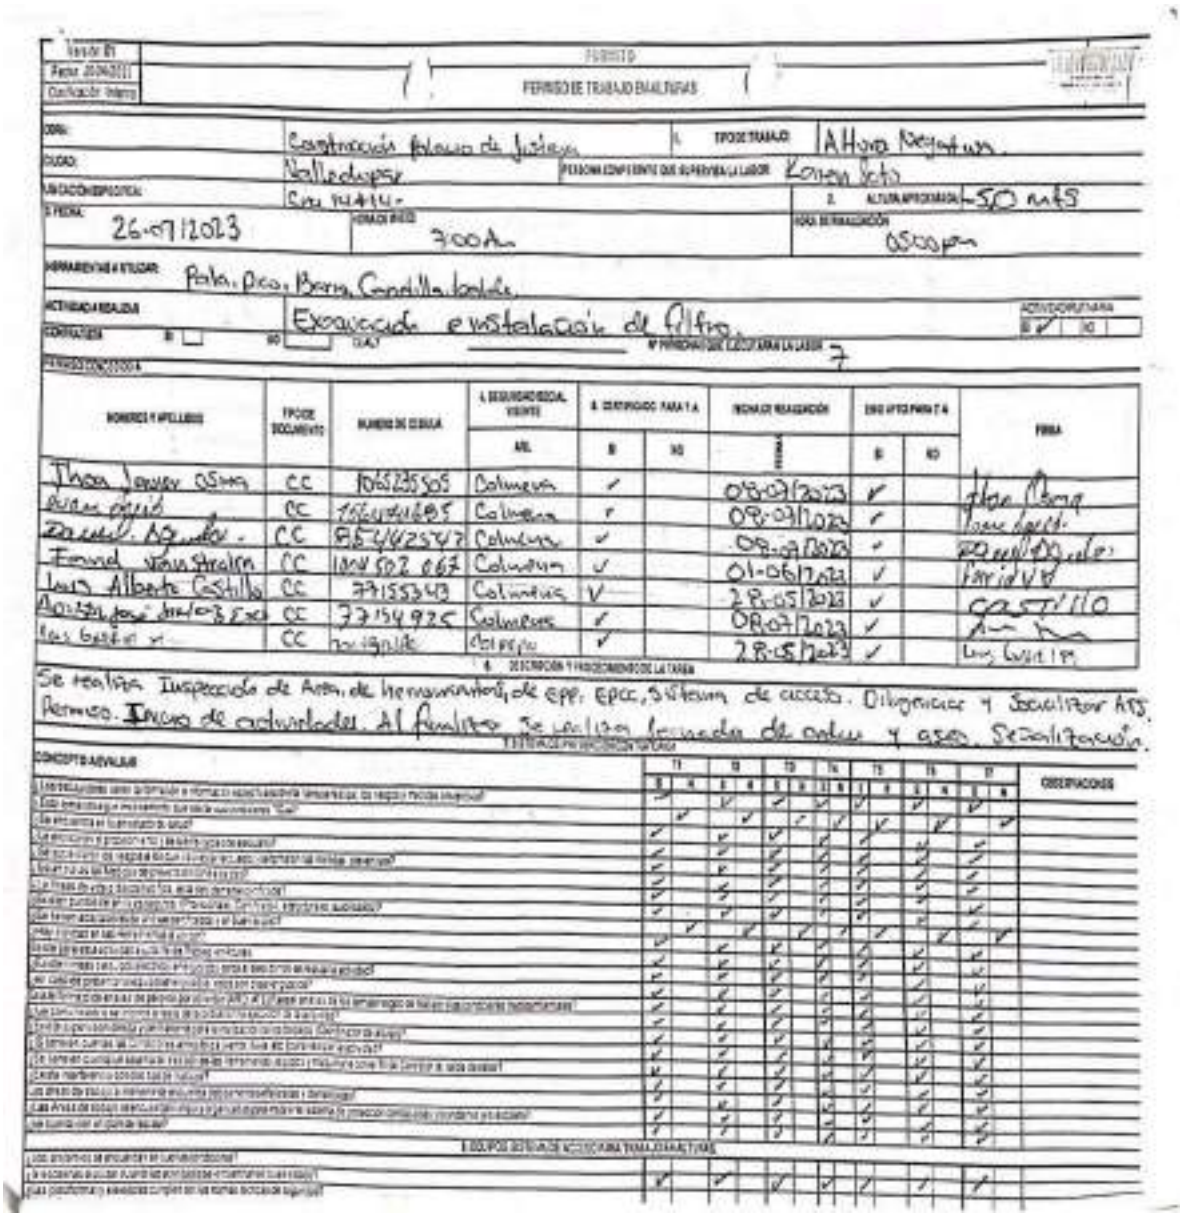

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Construcción Palacio de Justicia — TIPO DE TRABAJO: Altura Negativa

CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Kenyn Soto

DIRECCIÓN ESPECÍFICA: Cra 9#14-

FECHA: 26-07/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 A.m. — ALTURA APROXIMADA: 50 mts — HORA DE TERMINACIÓN: 05:00 p.m.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, taladro

ACTIVIDAD REALIZADA: Excavación e instalación de Alfajía

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☐ CUAL? — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐

N° PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

PERSONAL INVOLUCRADO

| NOMBRES Y APELLIDOS | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE CEDULA | A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL) | B. CERTIFICADO PARA T-A SI | B. CERTIFICADO PARA T-A NO | FECHA DE REALIZACIÓN | EXAMEN PARA T-A SI | EXAMEN PARA T-A NO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thon Javier Osma | CC | 1065235505 | Colmena | ✓ | | 08-07/2023 | ✓ | | |
| Aron David | CC | 1065941695 | Colmena | ✓ | | 09-07/2023 | ✓ | | |
| Daniel Aguilar | CC | 85462547 | Colmena | ✓ | | 09-07/2023 | ✓ | | |
| Fernel Von Strahlen | CC | 1064502 067 | Colmena | ✓ | | 01-06/2023 | ✓ | | |
| Luis Alberto Castillo | CC | 77155343 | Colmena | ✓ | | 28-05/2023 | ✓ | | |
| Agustín José Ariza Ext | CC | 77154925 | Colmena | ✓ | | 08-07/2023 | ✓ | | |
| Luis Guillermo M | CC | no legible | Colmena | ✓ | | 28-05/2023 | ✓ | | |

4. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Se realiza Inspección de Arn, de herramientas, de epp, Epcc, Sistema de acceso. Diligenciar y Socializar ATS Permiso. Inicio de actividades. Al finalizar se realiza jornada de orden y aseo. Socialización.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO EN LA TAREA

| CONCEPTO A EVALUAR | T1 SI | T1 NO | T2 SI | T2 NO | T3 SI | T3 NO | T4 SI | T4 NO | T5 SI | T5 NO | T6 SI | T6 NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ha recibido usted información e instrucción sobre los peligros y riesgos presentes en su trabajo y medidas preventivas? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2. Cree usted que la información e instrucción recibida es suficiente y adecuada para prevenir accidentes y enfermedades? | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 3. Ha recibido usted información sobre los peligros y riesgos de su puesto de trabajo? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4. Cree usted que la información recibida es suficiente y adecuada para prevenir accidentes y enfermedades? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5. Ha recibido usted información sobre los peligros y riesgos de su puesto de trabajo? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6. Cree usted que la información recibida es suficiente y adecuada para prevenir accidentes y enfermedades? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7. Ha recibido usted información sobre los peligros y riesgos de su puesto de trabajo? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8. Cree usted que la información recibida es suficiente y adecuada para prevenir accidentes y enfermedades? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9. Ha recibido usted información sobre los peligros y riesgos de su puesto de trabajo? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10. Cree usted que la información recibida es suficiente y adecuada para prevenir accidentes y enfermedades? | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 11. Ha recibido usted información sobre los peligros y riesgos de su puesto de trabajo? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12. Cree usted que la información recibida es suficiente y adecuada para prevenir accidentes y enfermedades? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13. Ha recibido usted información sobre los peligros y riesgos de su puesto de trabajo? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14. Cree usted que la información recibida es suficiente y adecuada para prevenir accidentes y enfermedades? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15. Ha recibido usted información sobre los peligros y riesgos de su puesto de trabajo? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16. Cree usted que la información recibida es suficiente y adecuada para prevenir accidentes y enfermedades? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17. Ha recibido usted información sobre los peligros y riesgos de su puesto de trabajo? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18. Cree usted que la información recibida es suficiente y adecuada para prevenir accidentes y enfermedades? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 19. Ha recibido usted información sobre los peligros y riesgos de su puesto de trabajo? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 20. Cree usted que la información recibida es suficiente y adecuada para prevenir accidentes y enfermedades? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 21. Ha recibido usted información sobre los peligros y riesgos de su puesto de trabajo? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 22. Cree usted que la información recibida es suficiente y adecuada para prevenir accidentes y enfermedades? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 23. Ha recibido usted información sobre los peligros y riesgos de su puesto de trabajo? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 24. Cree usted que la información recibida es suficiente y adecuada para prevenir accidentes y enfermedades? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 25. Ha recibido usted información sobre los peligros y riesgos de su puesto de trabajo? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 26. Cree usted que la información recibida es suficiente y adecuada para prevenir accidentes y enfermedades? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 27. Ha recibido usted información sobre los peligros y riesgos de su puesto de trabajo? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 28. Cree usted que la información recibida es suficiente y adecuada para prevenir accidentes y enfermedades? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 29. Ha recibido usted información sobre los peligros y riesgos de su puesto de trabajo? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 30. Cree usted que la información recibida es suficiente y adecuada para prevenir accidentes y enfermedades? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

5. EQUIPOS DISPONIBLES NECESARIOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los arneses se encuentran en buen estado? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La cuerda se encuentra en buen estado sin daños visibles? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Los equipos cumplen con las normas técnicas de seguridad? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

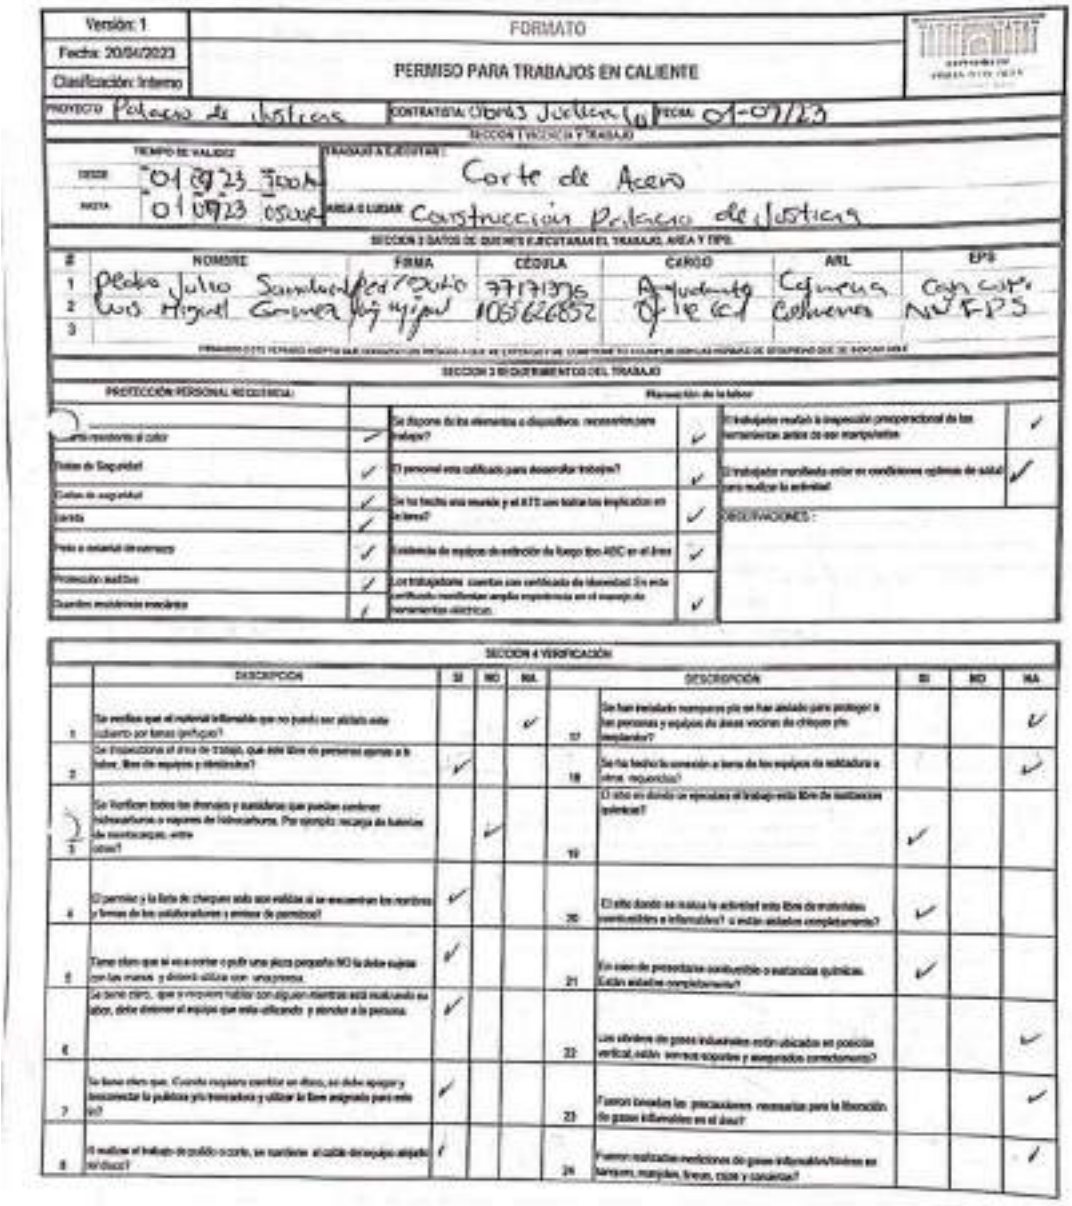

| Versión: 1 | FORMATO |
|---|---|
| Fecha: 20/04/2023 | PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE |
| Clasificación: Interno | |

PROYECTO: Palacio de Justicia — CONTRATISTA: Obras Judiciales — FECHA: 01-07-23

SECCIÓN 1 TRABAJO Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ: DESDE 01/07/23 7:00 a.m. — HASTA 01/07/23 05:00 p.m.

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de Acero

AREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia

SECCIÓN 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.


| # | NOMBRE | FIRMA | CÉDULA | CARGO | ARL | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Julio Sandoval Perdomo | | 77171375 | Ayudante | Colmena | Coomeva |
| 2 | Luis Miguel Gomez Mojica | | 1065626852 | Oficial | Colmena | NUEVA EPS |
| 3 | | | | | | |

SECCIÓN 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

| PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA | | Planeación de la labor | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Careta resistente al calor | ✓ | Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar? | ✓ | El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas | ✓ |
| Botas de Seguridad | ✓ | El personal esta calificado para desarrollar trabajos? | ✓ | El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad | ✓ |
| Gafas de seguridad | ✓ | Se ha hecho una reunión y el ATS con todas las implicaciones en la tarea? | ✓ | OBSERVACIONES: | |
| Careta | ✓ | Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área | ✓ | | |
| Peto o material de carnaza | ✓ | Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas | ✓ | | |
| Protección auditiva | ✓ | | | | |
| Guantes resistentes mecánicos | ✓ | | | | |

SECCIÓN 4 VERIFICACIÓN

| | DESCRIPCIÓN | SI | NO | NA | | DESCRIPCIÓN | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado este cubierto por telas (prfigas)? | | | ✓ | 17 | Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o residuales? | | | ✓ |
| 2 | Se inspecciona el área de trabajo, que este libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos? | ✓ | | | 18 | Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura o oxiac. requeridos? | | | ✓ |
| 3 | Se verifican todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: rejilla de tuberías de alcantarillas, entre otros? | | ✓ | | 19 | El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de materiales químicos? | ✓ | | |
| 4 | El permiso y la lista de chequeo solo son validos si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos? | ✓ | | | 20 | El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o están aislados completamente? | ✓ | | |
| 5 | Tiene claro que si va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y debera utilizar con una prensa | ✓ | | | 21 | En caso de presentarse combustible o materiales químicos. Están aislados completamente? | ✓ | | |
| 6 | Le tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras está realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona | ✓ | | | 22 | Los cilindros de gases inflamables están ubicados en posición vertical, están sentados, sujetos y asegurados correctamente? | | | ✓ |
| 7 | Tiene claro que, Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o trancadora y utilizar la llave asignada para este fin? | ✓ | | | 23 | Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área? | | | ✓ |
| 8 | El realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cable de equipo alejado del disco? | ✓ | | | 24 | Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en lanzaran, manjoles, fosas, cisa y cunetas? | | | ✓ |

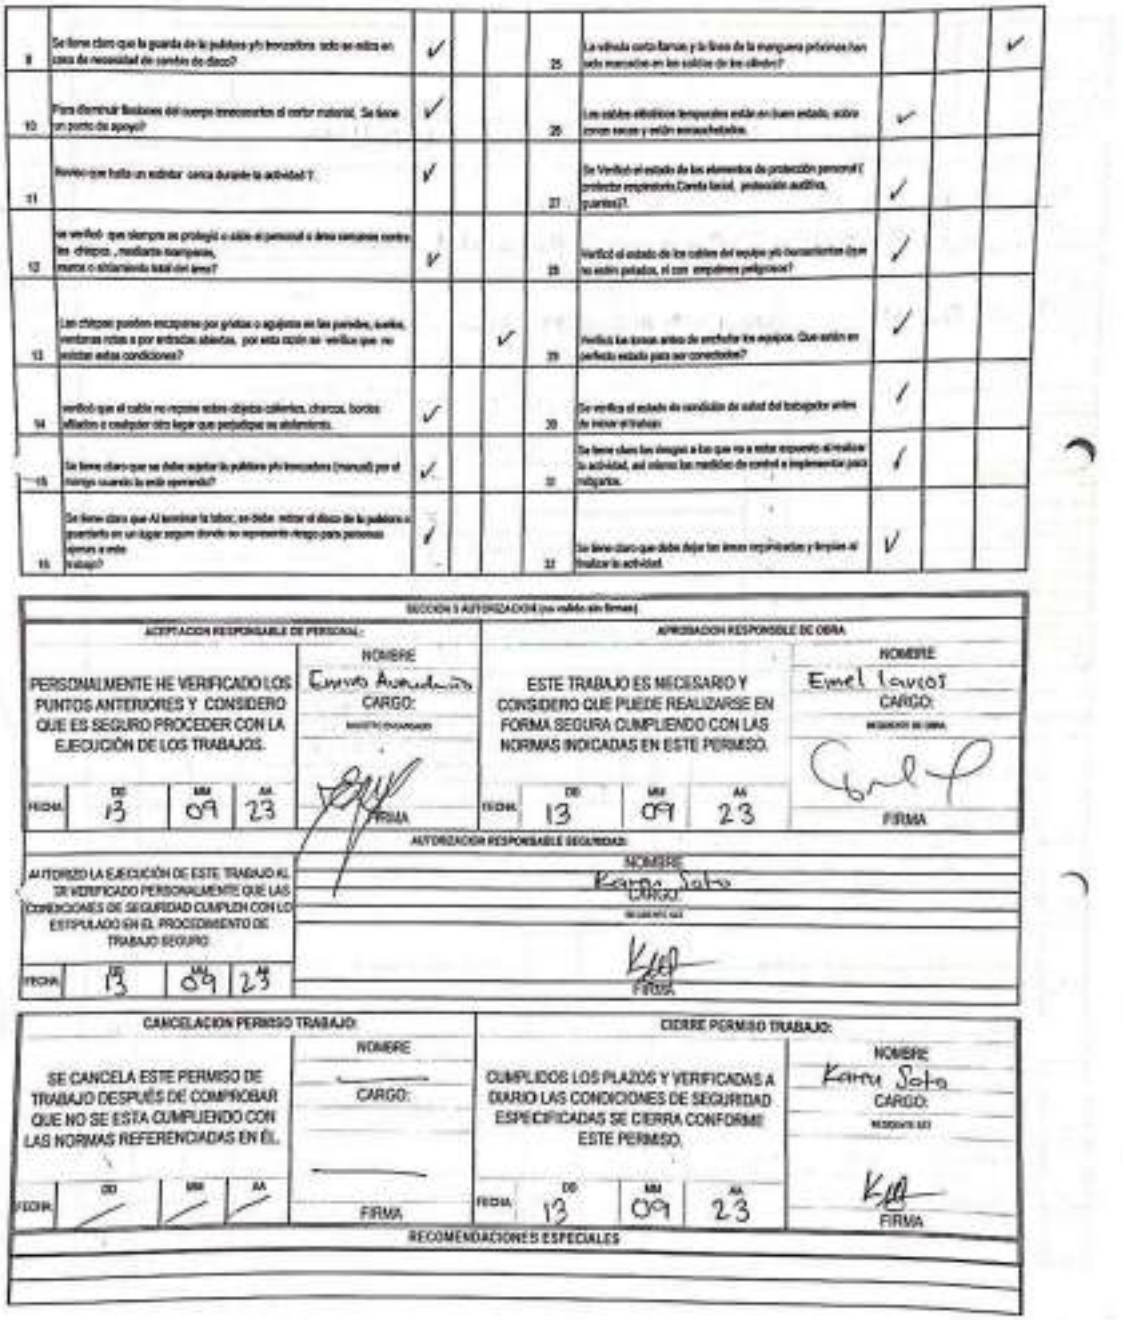

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o trozadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco? | ✓ | | | 25 | La válvula corta llamas y la línea de la manguera presentan has sido marcadas en los colores de los cilindros? | | | | ✓ |
| 10 | Para disminuir fatigas del cuerpo innecesarias el cortar material, Se tiene un punto de apoyo? | ✓ | | | 26 | Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre cercas secas y están señalizados. | ✓ | | | |
| 11 | Revisó que halla un extintor cerca durante la actividad ? | ✓ | | | 27 | Se Verificó el estado de los elementos de protección personal ( protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)? | ✓ | | | |
| 12 | se verificó que siempre se protegió o aisló al personal o área cercanas contra los chispeo , mediante mamparas, muros o cerramiento total del área? | ✓ | | | 28 | Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos? | ✓ | | | |
| 13 | Los chispeo pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas rotas o por entradas abiertas, por esta razón se verifica que no existan estas condiciones? | | | ✓ | 29 | Verificó las tomas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados? | ✓ | | | |
| 14 | verificó que el cable no repose sobre objetos cortantes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento. | ✓ | | | 30 | Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo | ✓ | | | |
| 15 | Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o trozadora (manual) por el mango cuando la está operando? | ✓ | | | 31 | Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos. | ✓ | | | |
| 16 | Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora o guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este trabajo? | ✓ | | | 32 | Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad. | ✓ | | | |


**SECCION 3 AUTORIZACION (no valido sin firmas)**

| ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL: | | APROBACION RESPONSABLE DE OBRA: | |
|---|---|---|---|
| PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | NOMBRE: Carlos Avendaño<br>CARGO:<br>FIRMA | ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO. | NOMBRE: Emel Lavigt<br>CARGO:<br>FIRMA |
| FECHA: DD 13 MM 09 AA 23 | | FECHA: DD 13 MM 09 AA 23 | |

| AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD: | |
|---|---|
| AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL SER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO | NOMBRE: Karen Soto<br>CARGO:<br>FIRMA |
| FECHA: DD 13 MM 09 AA 23 | |

| CANCELACION PERMISO TRABAJO: | | CIERRE PERMISO TRABAJO: | |
|---|---|---|---|
| SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL. | NOMBRE:<br>CARGO:<br>FIRMA | CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO. | NOMBRE: Karen Soto<br>CARGO:<br>FIRMA |
| FECHA: DD MM AA | | FECHA: DD 13 MM 09 AA 23 | |

RECOMENDACIONES ESPECIALES

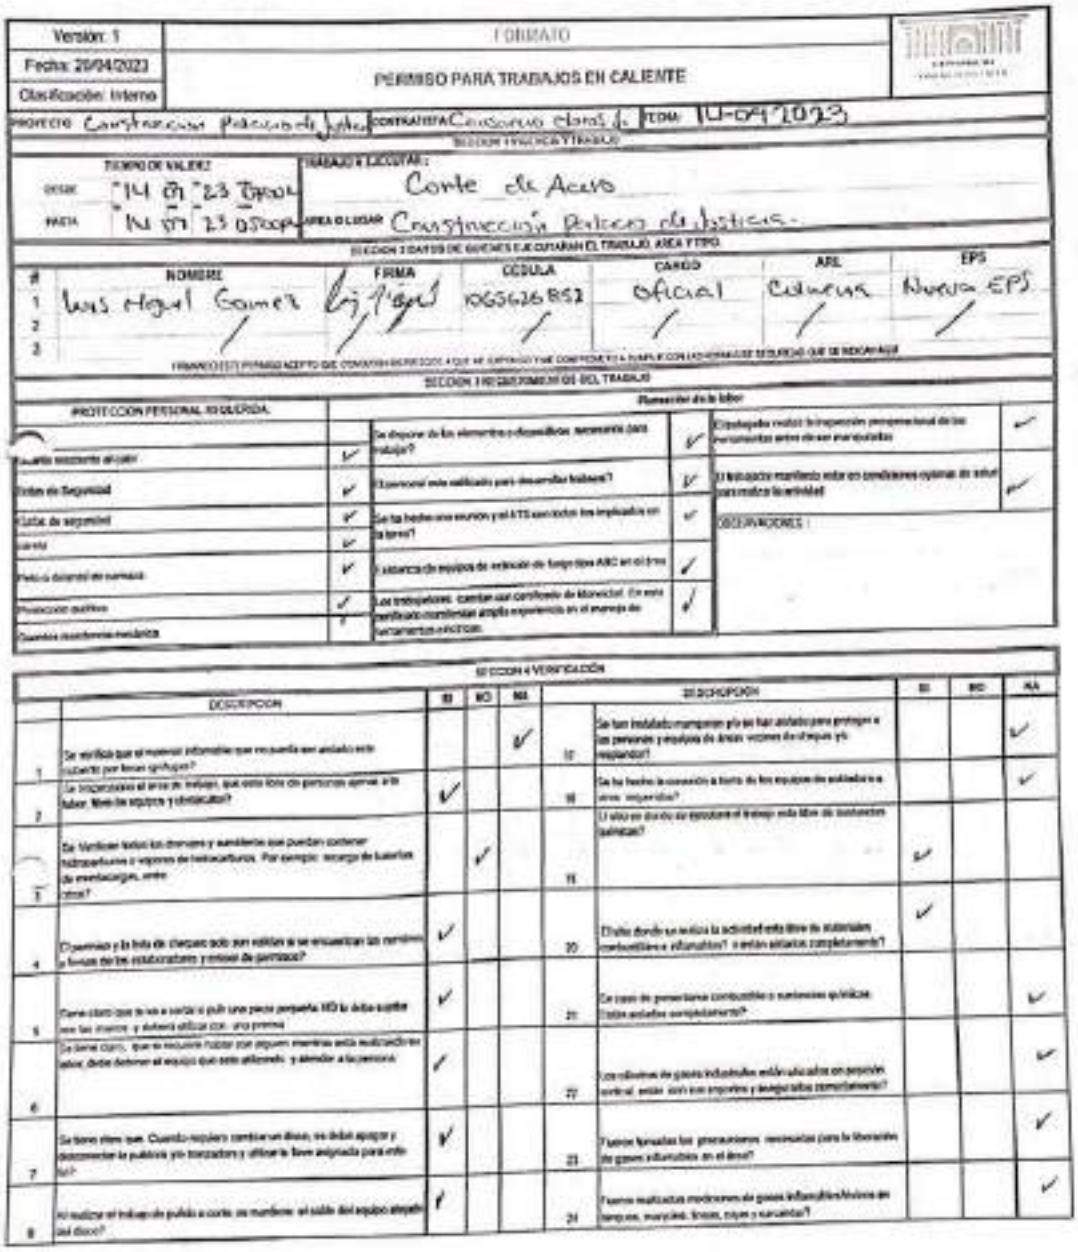

| Versión: 1 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 26/04/2023 | PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE | |
| Clasificación: Interna | | |

PROYECTO: Construccion Palacio de Justicia CONTRATISTA: Consorcio Obras J. FECHA: 14-04-2023

SECCION 1 INFORMACION DEL TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ: DESDE: 14 04 23 7:00 AM HASTA: 14 04 23 05:00 PM

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de Acero

AREA O LUGAR: Construccion Palacio de Justicias.

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO

| # | NOMBRE | FIRMA | CEDULA | CARGO | ARL | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Miguel Gomez | | 1065626852 | Oficial | Colmena | Nueva EPS |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |


FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE INDICAN AQUI

SECCION 3 RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO

| PROTECCION PERSONAL REQUERIDA | | Planeación de la labor | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar? | ✓ | El trabajador realizo la inspección preoperacional de los herramientas antes de ser energizadas | ✓ |
| Gafas de Seguridad | ✓ | El personal esta calificado para desarrollar trabajos? | ✓ | El trabajador mantiene estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad | ✓ |
| Botas de seguridad | ✓ | Se ha hecho una reunion y el ATS con todos los implicados en la tarea? | ✓ | OBSERVACIONES: | |
| Guantes | ✓ | Existencia de equipos de extincion de fuego tipo ABC en el area | ✓ | | |
| Protección auditiva | ✓ | Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. (En este certificado mencionan amplia experiencia en el manejo de herramientas electricas) | ✓ | | |
| Guantes resistencia mecánica | | | | | |

SECCION 4 VERIFICACIÓN

| | DESCRIPCION | SI | NO | NA | | DESCRIPCION | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica que el material inflamable que se vaya a usar este aislado y/o cubierto por telas ignifugas? | | | ✓ | 10 | Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o esquirlas? | | | ✓ |
| 2 | Se inspeccionó el área de trabajo, que esta libre de personas ajenas a la labor. Mas de equipos y elementos? | ✓ | | | 11 | Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura o otros requeridos? | | | ✓ |
| 3 | Se Verificó todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre otros? | | ✓ | | 12 | El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas? | ✓ | | |
| 4 | El permiso y la lista de chequeo solo son validos si se encuentran los nombres y firmas de los estudiantes y profesor de garantías? | ✓ | | | 20 | El lugar donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles o elementos? o estan aislados completamente? | ✓ | | |
| 5 | Se tiene claro que si se va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y debera utilizar con una prensa | ✓ | | | 21 | En caso de generarse combustibles o sustancias químicas estan aislados completamente? | | | ✓ |
| 6 | Se tiene claro, que se requiere hablar con alguien mientras esta realizando esta labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona | ✓ | | | 22 | Los cilindros de gases industriales estan ubicados en posición vertical, estan con sus soportes y asegurados correctamente? | | | ✓ |
| 7 | Se tiene claro que, Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o cortadora y utilizar la llave asignada para esto? | ✓ | | | 23 | Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área? | | | ✓ |
| 8 | Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el lado del equipo alejado del disco? | ✓ | | | 24 | Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/toxicos en tanques, murallas, losas, cajas o cavidades? | | | ✓ |

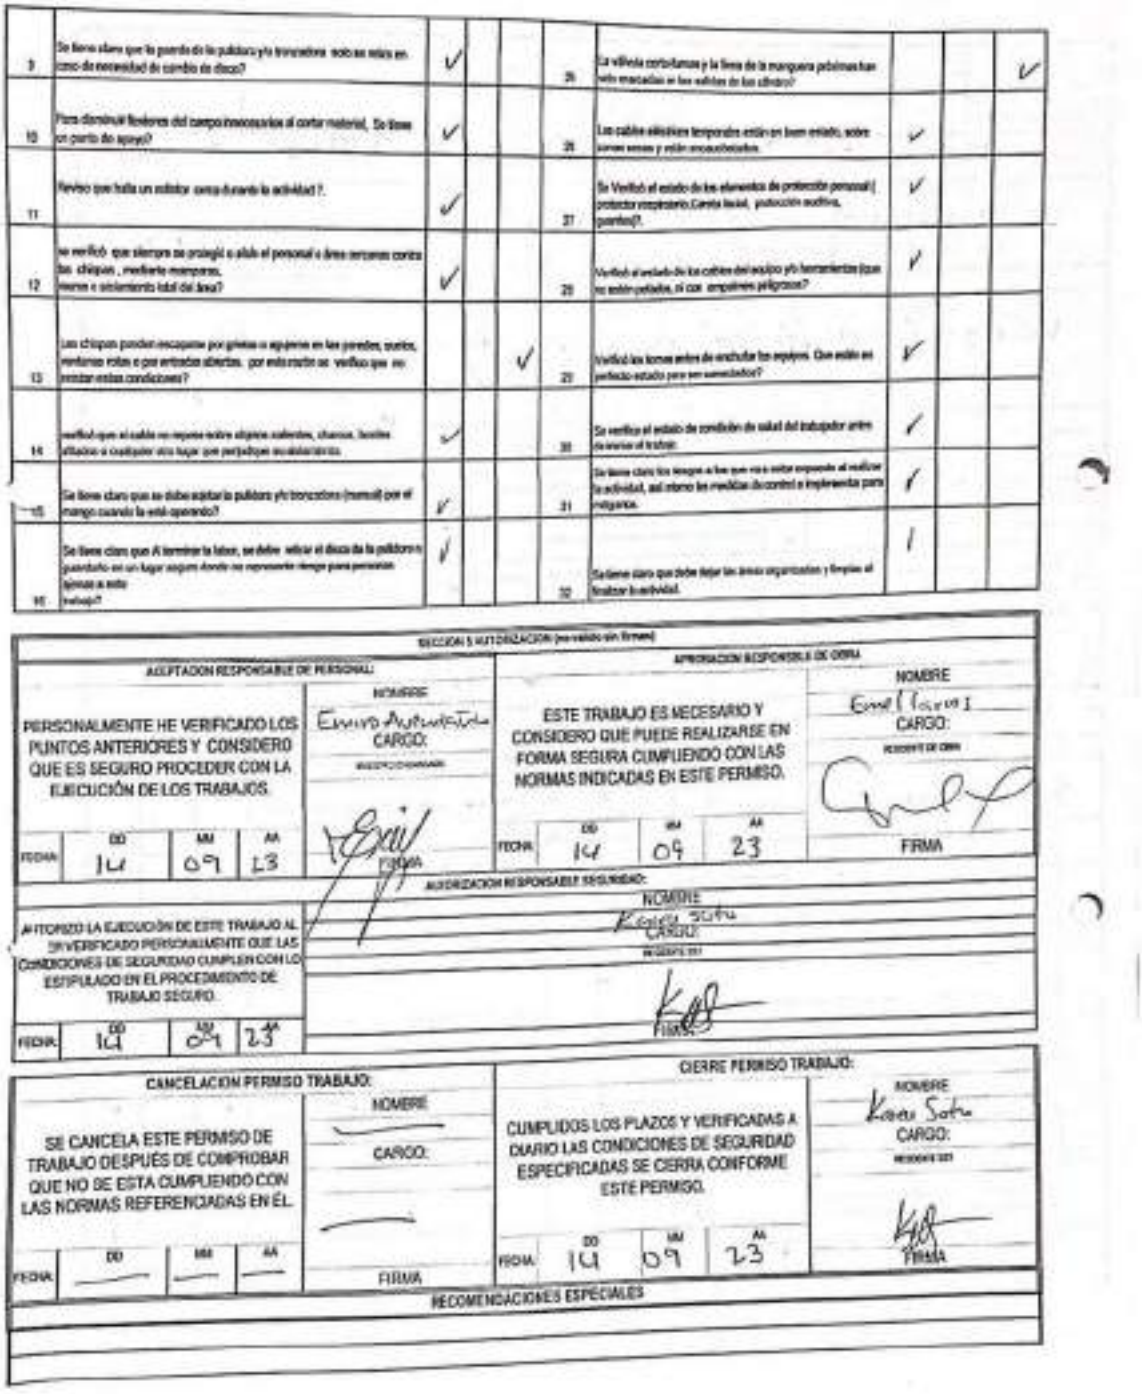

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o troncadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco? | ✓ | | | 26 | La vallesta contra humos y la línea de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los talleres? | | | ✓ |
| 10 | Para disminuir fisuras del cuerpo innecesarios al cortar material, Se tiene un punto de apoyo? | ✓ | | | 28 | Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas y están encauchetados. | ✓ | | |
| 11 | Revisa que haya un extintor cerca durante la actividad ?. | ✓ | | | 27 | Se Verificó el estado de los elementos de protección personal ( protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)?. | ✓ | | |
| 12 | se verificó que siempre se protegió o aisló el personal o áreas cercanas contra las chispas , mediante mamparas, mantas o cerramiento total del área? | ✓ | | | 29 | Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos? | ✓ | | |
| 13 | Las chispas pueden escaparse por grietas o aquieros en las paredes, techos, ventanas rotas o por entradas abiertas. por esta razón se verifico que no existan estas condiciones? | | | ✓ | 23 | Verificó las formas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser suministrados? | ✓ | | |
| 14 | verificó que el cable no repose sobre algunos solventes, charcos, líquidos inflamables o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento. | ✓ | | | 30 | Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo: | ✓ | | |
| 15 | Se tiene claro que se debe apagar la pulidora y/o troncadora (tronzal) por el mango cuando la está operando? | ✓ | | | 31 | Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos. | ✓ | | |
| 16 | Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora y guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a esta trabajo? | ✓ | | | 32 | Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad. | ✓ | | |

**SECCION 5 AUTORIZACION** (no valido sin firmas)

**ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:**

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

NOMBRE: Enrique Avendaño
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 14 MM 09 AA 23

**APROBACION RESPONSABLE DE OBRA**

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

NOMBRE: Enrique Ramirez
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 14 MM 09 AA 23

**AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:**

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL SIN VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

NOMBRE: Karen Soto
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 14 MM 09 AA 23

**CANCELACION PERMISO TRABAJO:**

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.

NOMBRE:
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD MM AA


**CIERRE PERMISO TRABAJO:**

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE: Karen Soto
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 14 MM 09 AA 23

**RECOMENDACIONES ESPECIALES**

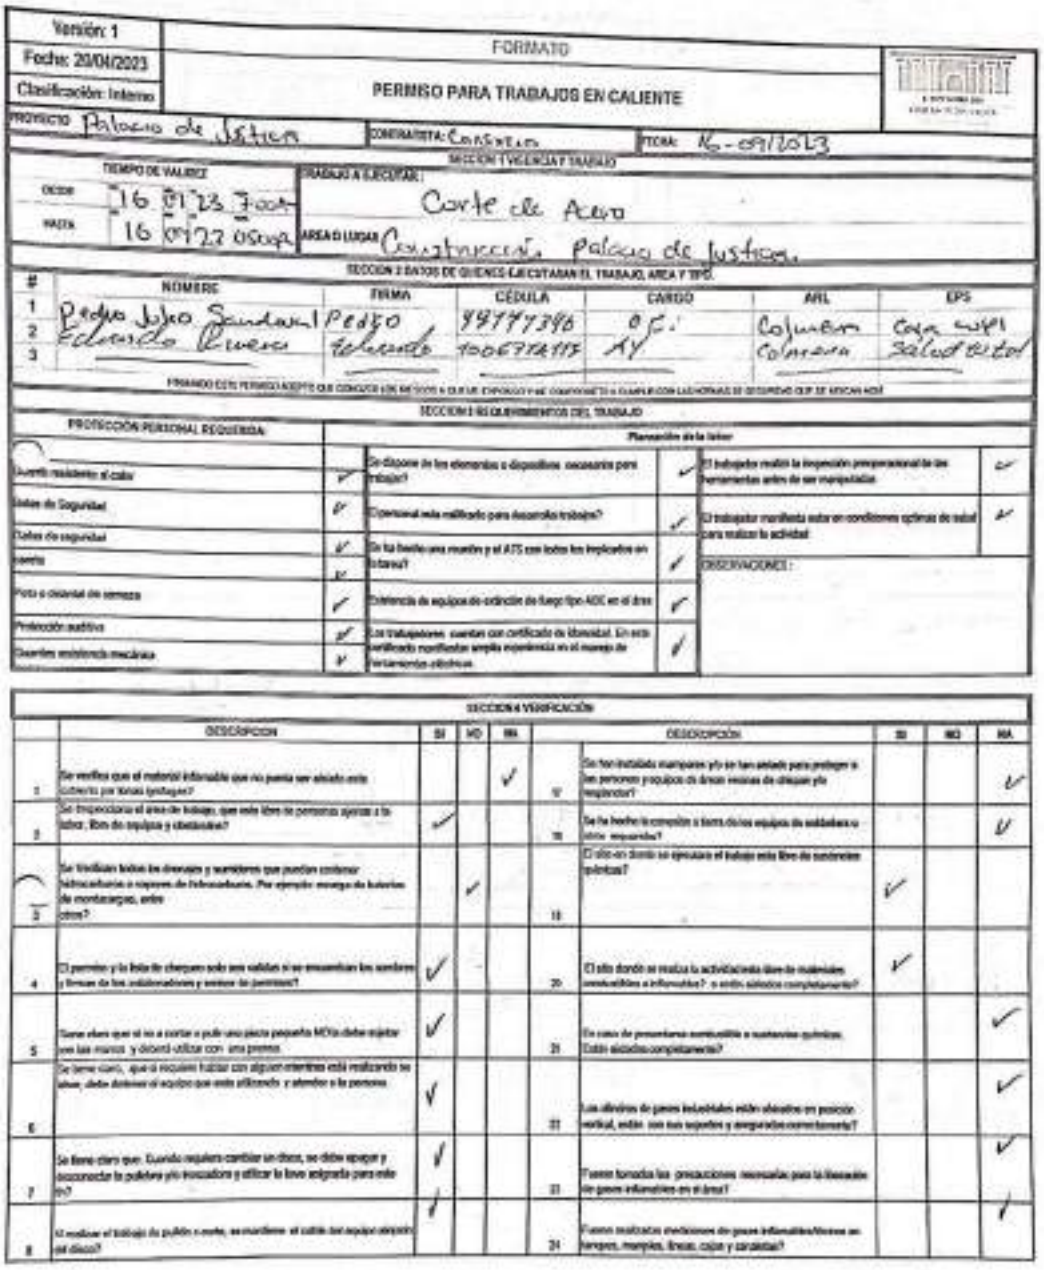

Versión: 1
Fecha: 20/04/2023
Clasificación: Interno

FORMATO

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

PROYECTO: Palacio de Justicia | CONTRATISTA: Consorcio | FICHA: K-09/2023

SECCIÓN 1 VIGENCIA DEL TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ
DESDE: 16 01 23 7:00
HASTA: 16 01 23 05:00

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de Acero

AREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia.

SECCIÓN 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

| # | NOMBRE | FIRMA | CÉDULA | CARGO | ARL | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Julio Sandoval | Pedro | 99777396 | OF. | Colmena | Coomeva |
| 2 | Eduardo Rivera | Eduardo | 1006774117 | AY | Colmena | Salud total |
| 3 | | | | | | |

FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A LOS QUE ESTOY EXPUESTO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE EXIGEN HOY

SECCIÓN 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA

| | | | | Planeación de la labor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guante resistente al calor | | ✓ | Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar? | ✓ | El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas | ✓ |
| Botas de Seguridad | ✓ | | El personal está calificado para desarrollo trabajos? | ✓ | El trabajador manifiesta estar en condiciones óptimas de salud para realizar la actividad | ✓ |
| Gafas de seguridad | ✓ | | Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea? | ✓ | OBSERVACIONES: | |
| Careta | ✓ | | | | | |
| Pinta o casquete de cerraza | ✓ | | Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área | ✓ | | |
| Protección auditiva | ✓ | | Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas | ✓ | | |
| Guantes resistencia mecánica | ✓ | | | | | |

SECCIÓN 4 VERIFICACIÓN

| | DESCRIPCIÓN | SI | NO | NA | | DESCRIPCIÓN | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado esta cubierto por lonas ignifugas? | | | ✓ | 17 | Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o radiación? | | | ✓ |
| 2 | Se inspecciona el área de trabajo, que este libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos? | ✓ | | | 18 | Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura o sitio requerido? | | | ✓ |
| 3 | Se tratan todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: tapando la boletas de montacargas, entre otros? | | ✓ | | 19 | El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas? | ✓ | | |
| 4 | El permiso y la lista de chequeo solo son validos si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y avalan las permisos? | ✓ | | | 20 | El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles o inflamables? o estos estados completamente? | ✓ | | |
| 5 | Tiene claro que si no a cortar o pulir una pieza pequeña MO la debe sujetar con las manos y debera utilizar con una prensa | ✓ | | | 21 | En caso de presentarse combustible o sustancias quimicas. Estan aislados completamente? | | | ✓ |
| 6 | Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien externo está realizando su labor, debe dejarse el equipo que esta utilizando y atender a la persona | ✓ | | | 22 | Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, estan con sus soportes y amarrados correctamente? | | | ✓ |
| 7 | Se tiene claro que: Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o esmeriladora y utilizar la llave asignada para este fin? | ✓ | | | 23 | Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área? | | | ✓ |
| 8 | Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cable del equipo alejado del disco? | ✓ | | | 24 | Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/toxicos en tanques, manjoles, líneas, cajas y canaletas? | | | ✓ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o trincadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco? | ✓ | | | 25 | La señales cinta-barras y la línea de la marquesina próximas han sido marcados en las salidas de los cárcamo? | | | ✓ |
| 10 | Para disminuir fatigas del cuerpo innecesarios al corte material, Se tiene un punto de apoyo? | ✓ | | | 26 | Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas y están encauchetados. | ✓ | | |
| 11 | Revisó que hallo un extintor cerca durante la actividad ? | ✓ | | | 27 | Se Verificó el estado de los elementos de protección personal ( protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)? | ✓ | | |
| 12 | se verificó que siempre se protegió o aisle el personal a área cercanas contra los chispas , mediante mamparas, mallas o cerramiento local del área? | ✓ | | | 28 | Verificó el estado de los cables del equipo, y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos? | ✓ | | |
| 13 | Las chispas pueden escaparse por grietas o aquiero en las paredes, suelos, mamparas estas o por entradas abiertas. por esta razon se verifica que no. existan estas condiciones? | | | ✓ | 29 | Verificó los tomas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados? | ✓ | | |
| 14 | verificó que el cable no reposa sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento. | ✓ | | | 30 | Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo. | ✓ | | |
| 15 | Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o trocadora (manual) por el mango cuando la está operando? | ✓ | | | 31 | Se tiene clara los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos. | ✓ | | |
| 16 | Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora o guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a esta labor? | ✓ | | | 32 | Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad. | ✓ | | |


**DECISIÓN Y AUTORIZACIÓN (no valido sin firmas)**

| ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL: | | APROBACION RESPONSABLE DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | NOMBRE: Erwin Andrés<br>CARGO: OFICIAL EJECUTANTE<br>FIRMA | ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO. | NOMBRE: Ezequiel<br>CARGO: RESIDENTE DE OBRA<br>FIRMA |
| FECHA: DD 16 MM 09 AA 23 | | FECHA: DD 16 MM 09 AA 23 | |

| AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD: | |
|---|---|
| AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL SE VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO. | NOMBRE: Kevin Soto<br>CARGO: RESIDENTE SST<br>FIRMA |
| FECHA: DD 16 MM 09 AA 23 | |

| CANCELACION PERMISO TRABAJO: | | CIERRE PERMISO TRABAJO: | |
|---|---|---|---|
| SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL. | NOMBRE:<br>CARGO:<br>FIRMA | CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO. | NOMBRE: Kevin Soto<br>CARGO: RESIDENTE SST<br>FIRMA |
| FECHA: DD MM AA | | FECHA: DD 16 MM 09 AA 23 | |

RECOMENDACIONES ESPECIALES

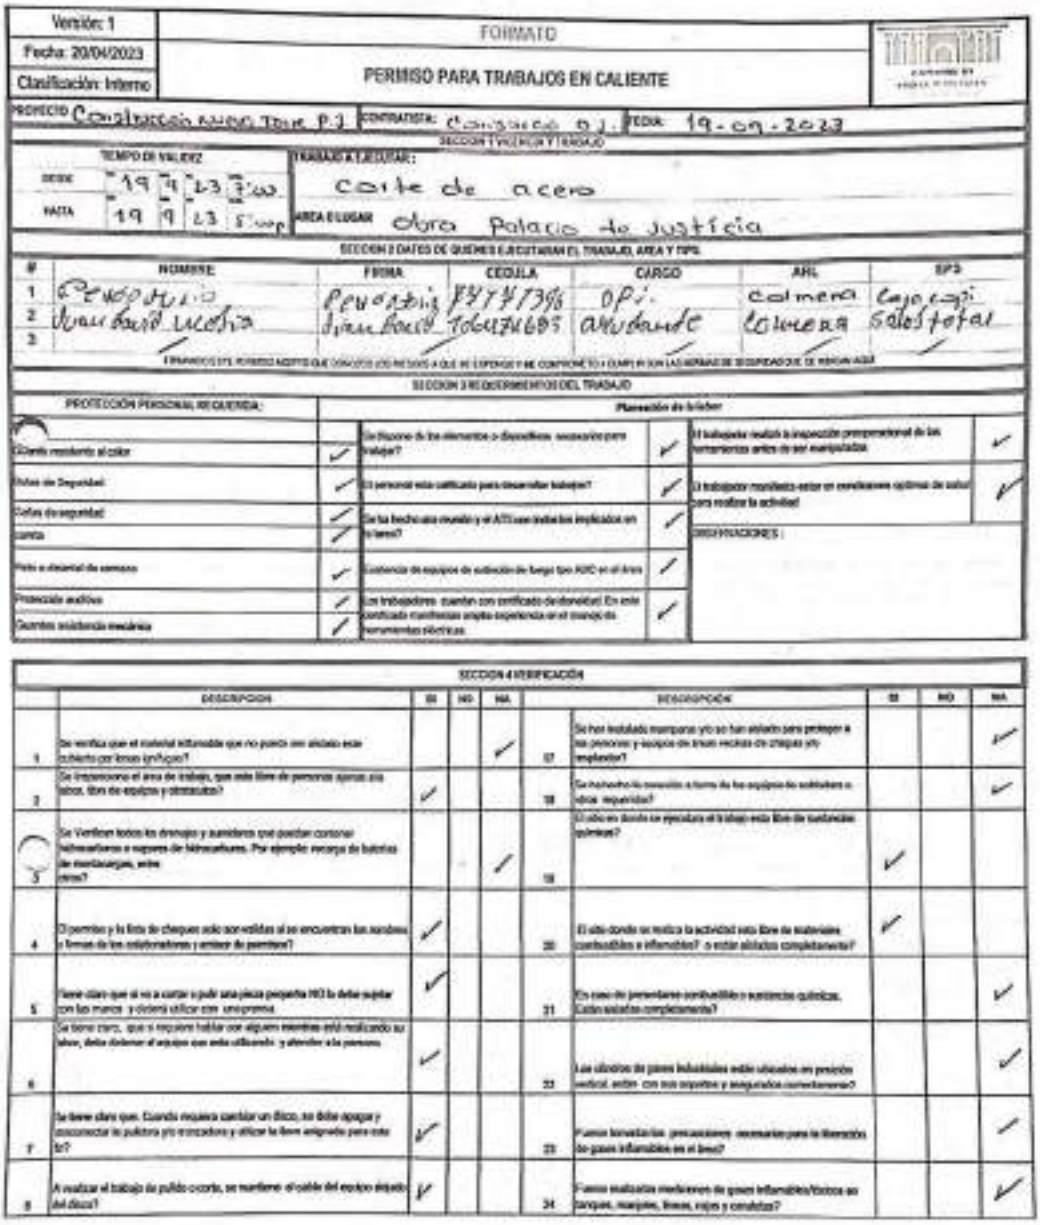

| Versión: 1 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 20/04/2023 | PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE | |
| Clasificación: Interno | | |

PROYECTO: Construcción Nuevo Torre P.J. CONTRATISTA: Consorcio O.J. FECHA: 19-09-2023

SECCION 1 VIGENCIA Y TIEMPO

TIEMPO DE VALIDEZ — DESDE: 19 9 23 7:00 — HASTA: 19 9 23 5:00 pm

TRABAJO A EJECUTAR: corte de acero

AREA O LUGAR: obra Palacio de Justicia

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y EPS

| # | NOMBRE | FIRMA | CEDULA | CARGO | ARL | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando | Fernando | 1977739% | OPI. | colmena | Cajacopi |
| 2 | Juan David Lucena | Juan David | 1061761685 | ayudante | Colmena | Salesfotal |
| 3 | | | | | | |


FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOCEN LOS RIESGOS A QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE OBRA AQUI

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

| PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA: | | Planeación de la labor | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guantes resistentes al calor | ✓ | Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar? | ✓ | El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas | ✓ |
| Botas de Seguridad | ✓ | El personal está calificado para desarrollar trabajos? | ✓ | El trabajador manifiesta estar en condiciones físicas de salud para realizar la actividad | ✓ |
| Gafas de seguridad | ✓ | Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea? | ✓ | OBSERVACIONES: | |
| Careta | ✓ | | | | |
| Peto o chaqueta de cuero | ✓ | Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área | ✓ | | |
| Protección auditiva | ✓ | Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas | ✓ | | |
| Guantes resistencia mecánica | ✓ | | | | |

SECCION 4 VERIFICACIÓN

| | DESCRIPCION | SI | NO | NA | | DESCRIPCION | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado esta cubierto por telas ignífugas? | | | ✓ | 17 | Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de brisas mecánicas de chispas y/o explosivos? | | | ✓ |
| 2 | Se inspecciona el área de trabajo, que esta libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos? | ✓ | | | 18 | Se ha hecho la revisión a fondo de los equipos de soldadura o otros requeridos? | | | ✓ |
| 3 | Se Verifican todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre otros? | | | ✓ | 19 | El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas? | ✓ | | |
| 4 | El permiso y la lista de chequeo solo son validas si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos? | ✓ | | | 20 | El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o estan aislados completamente? | ✓ | | |
| 5 | Tiene claro que si no a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y debera utilizar con una prensa | ✓ | | | 21 | En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Estan aislados completamente? | | | ✓ |
| 6 | Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras está realizando su labor, debe detener el equipo con este utilizando y atender a la persona | ✓ | | | 22 | Los cilindros de gases industriales están situados en posición vertical, estan con sus capuchon y asegurados correctamente? | | | ✓ |
| 7 | Se tiene clara que, Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar de pulidora y/o cortadora y utilizar la llave asignada para esto? | ✓ | | | 23 | Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área? | | | ✓ |
| 8 | Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cable del equipo alejado del disco? | ✓ | | | 24 | Fueron evaluados mediantes de gases inflamables/tóxicos en tanques, maquinas, líneas, vigas y conductos? | | | ✓ |

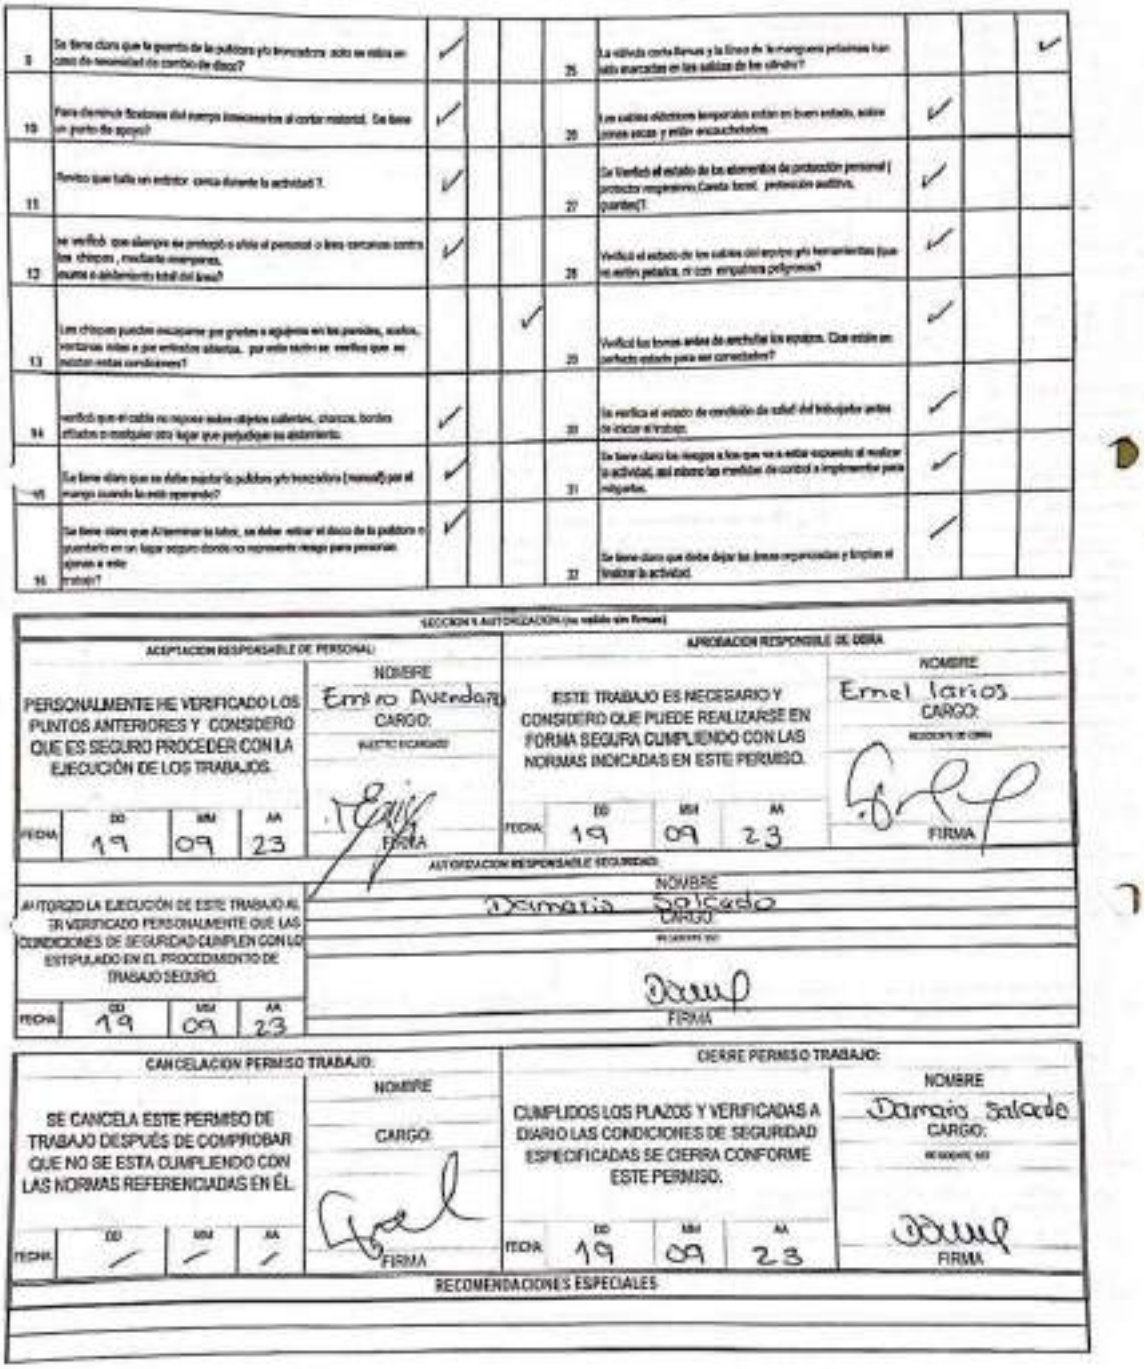

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se tiene claro que la guantes de la pulidora y/o lijadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco? | ✓ | | | 25 | La vidrio corta llamas y la linea de demarcacion peliculas han sido marcadas en las salidas de los vidrios? | | | ✓ |
| 10 | Para disminuir fatigas del manejo inmediatos al cortar material. Se tiene un punto de apoyo? | ✓ | | | 26 | Las cables eléctricos temporales estan en buen estado, sobre zonas secas y estan encauchetados | ✓ | | |
| 11 | Revisa que halla un extintor cerca durante la actividad ? | ✓ | | | 27 | Se Verifico el estado de los elementos de protección personal ( protector respiratorio, Careta facial, protección auditiva, guantes)? | ✓ | | |
| 12 | se verifico que siempre se protegió o aisla el personal o áreas cercanas contra los chispas , mediante mamparas, cinta o aislamiento total del área? | ✓ | | | 28 | Verifico el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos? | ✓ | | |
| 13 | Los chispas pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas cielos o por entornos abiertos, por esto revisa se verifica que no existan estas condiciones? | | ✓ | | 29 | Verifico las bornes antes de anchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados? | ✓ | | |
| 14 | verifico que el cable no repose sobre objetos salientes, clavos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento. | ✓ | | | 30 | Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo. | ✓ | | |
| 15 | Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o lijadora ( manual) por el mango cuando la esta operando? | ✓ | | | 31 | Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos. | ✓ | | |
| 16 | Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora o guantelo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este trabajo? | ✓ | | | 32 | Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad. | ✓ | | |

**SECCION 5 AUTORIZACION (no valido sin firmas)**

**ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL**

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE: Enrico Avendaño
CARGO: AUXILIO ELECTRICISTA

FECHA: DD 19 MM 09 AA 23
FIRMA

**APROBACION RESPONSABLE DE OBRA**

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

NOMBRE: Emel Larios
CARGO: RESIDENTE DE OBRA

FECHA: DD 19 MM 09 AA 23
FIRMA

**AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD**

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL SER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.

NOMBRE: Damaris Salcedo
CARGO: RESIDENTE SST

FECHA: DD 19 MM 09 AA 23
FIRMA

**CANCELACION PERMISO TRABAJO:**

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL

NOMBRE:
CARGO:

FECHA: DD / MM / AA /
FIRMA


**CIERRE PERMISO TRABAJO:**

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE: Damaris Salcedo
CARGO: RESIDENTE SST

FECHA: DD 19 MM 09 AA 23
FIRMA

**RECOMENDACIONES ESPECIALES**

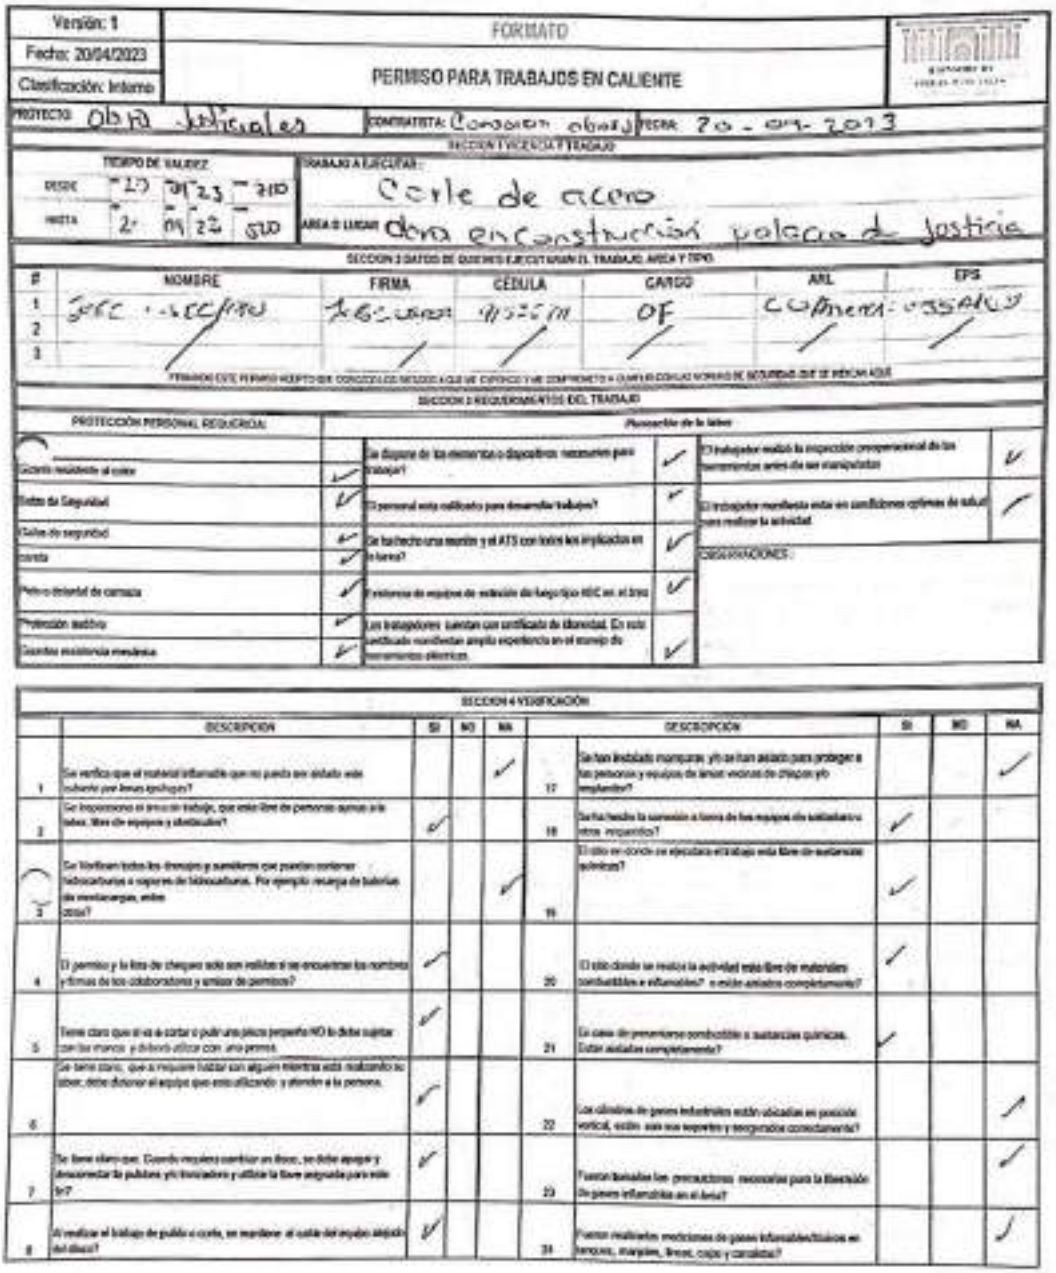

| Versión: 1 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 20/04/2023 | PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE | |
| Clasificación: Interna | | |

PROYECTO: Obra Judiciales — CONTRATISTA: Consorcio obras — FECHA: 20-09-2023

SECCION 1 VIGENCIA TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ: DESDE 20 09 23 7:30 — HASTA 21 09 23 5:00

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de acero

AREA O LUGAR: obra en construcción palacio de justicia

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO

| # | NOMBRE | FIRMA | CEDULA | CARGO | ARL | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | OF | COMPENSAR | COMPENSAR |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |


FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE PRESCRIBEN

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

| PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA | | Descripción de la labor | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Se dispone de las herramientas o dispositivos necesarios para trabajar? | ✓ | El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas | ✓ |
| Botas de Seguridad | ✓ | El personal está calificado para desarrollar trabajos? | ✓ | El trabajador manifiesta estar en condiciones óptimas de salud para realizar la actividad | ✓ |
| Guantes de seguridad | ✓ | Se ha hecho una revisión y el ATS con todos los implicados en la tarea? | ✓ | OBSERVACIONES: | |
| Gafas | ✓ | Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área | ✓ | | |
| Protección auditiva | ✓ | Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas | ✓ | | |
| Guantes resistencia mecánica | ✓ | | | | |

SECCION 4 VERIFICACIÓN

| | DESCRIPCION | SI | NO | NA | | DESCRIPCION | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado este cubierto por lonas ignífugas? | | | ✓ | 17 | Se han ubicado mangueras y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o implantilla? | | | ✓ |
| 2 | Se inspecciona el área de trabajo, que esta libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos? | ✓ | | | 18 | Se ha hecho la extensión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos? | ✓ | | |
| 3 | Se Verifican todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: rejanga de bahorias de montacargas, entre otros? | | | ✓ | 19 | El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas? | ✓ | | |
| 4 | El permiso y la lista de chequeo solo son validos si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y anexar de permisos? | ✓ | | | 20 | El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o estan aislados completamente? | ✓ | | |
| 5 | Tenga claro que si va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y debera utilizar con una pinza. | ✓ | | | 21 | En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Estan aisladas completamente? | ✓ | | |
| 6 | Se tiene claro, que si requiere fijar/ sujetar con alguien mientras esta realizando su labor, debe dotarse el equipo que esta utilizando y atender a la persona. | ✓ | | | 22 | Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y aseguradas correctamente? | | | ✓ |
| 7 | Se tiene claro que: Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora, y/o trituradora y utilizar la llave asignada para este fin? | ✓ | | | 23 | Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área? | | | ✓ |
| 8 | Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cuidado del equipo alejado del disco? | ✓ | | | 24 | Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, marginas, fosas, cajas y canaletas? | | | ✓ |

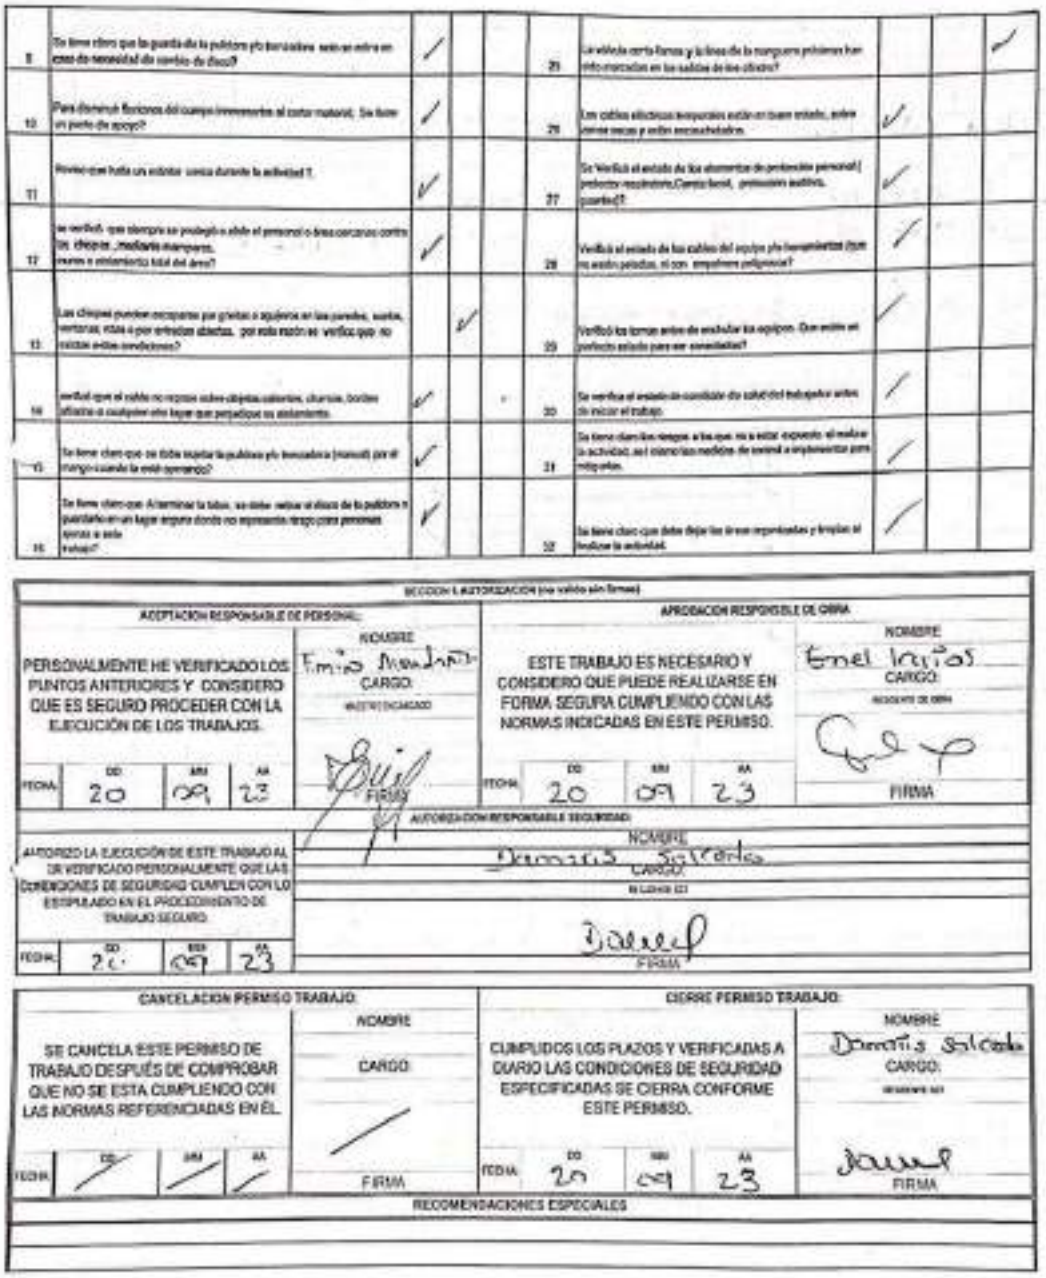

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o lijadora sean se entra en caso de necesidad de cambio de disco? | ✓ | | | 21 | La velocidad correcta (lenta y la línea de la manguera presentan han sido marcadas en las salidas de los cilindros? | | | ✓ |
| 10 | Para disminuir fracciones del cuerpo irrespirables al corte material, Se tiene un punto de apoyo? | ✓ | | | 26 | Las cabinas eléctricas evaporativas están en buen estado, sobre ellenas secas y estén encauchetadas. | ✓ | | |
| 11 | Revisó que hasta un estándar cerca durante la actividad ? | ✓ | | | 27 | Se Verificó el estado de los elementos de protección personal ( protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)? | ✓ | | |
| 12 | se verificó que siempre se protegió a sitio el personal o áreas cercanas contra las chispas mediante mamparas, mantas e aislamiento total del área? | ✓ | | | 28 | Verificó el estado de las salidas del equipo y/o herramientas (que no estén peladas, ni con empalmes peligrosos? | ✓ | | |
| 13 | Las chispas pueden ocasionar por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas, estas o por entradas abiertas, por esto mismo se verifica que no existan estas condiciones? | | ✓ | | 29 | Verificó los torques antes de anclular los equipos. Que estén en perfecto estado para ser energizados? | ✓ | | |
| 14 | verificó que el sitio no reposa sobre objetos cubiertos, chuzos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su alrededor. | ✓ | | | 30 | Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo. | ✓ | | |
| 15 | Se tiene claro que se debe inspeccionar la pulidora y/o lijadora (manual) por el riesgo cuando la está operando? | ✓ | | | 31 | Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así como las medidas de control a implementar para estos? | ✓ | | |
| 16 | Se tiene claro que Al terminar la tarea, se debe retirar el disco de la pulidora y guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a esta tarea? | ✓ | | | 32 | Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad. | ✓ | | |


**SECCION 1 AUTORIZACION (no valido sin firmas)**

| ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL: | | APROBACION RESPONSABLE DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | NOMBRE: Fmio Medina<br>CARGO: MAESTRO ENCARGADO<br>FIRMA | ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO. | NOMBRE: Enel Matos<br>CARGO: RESIDENTE DE OBRA<br>FIRMA |
| FECHA: DD 20 MM 09 AA 23 | | FECHA: DD 20 MM 09 AA 23 | |

| AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD: | |
|---|---|
| AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL SE VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO | NOMBRE: Dennis Salcedo<br>CARGO: SISO<br>FIRMA |
| FECHA: DD 20 MM 09 AA 23 | |

| CANCELACION PERMISO TRABAJO: | | CIERRE PERMISO TRABAJO: | |
|---|---|---|---|
| SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL. | NOMBRE:<br>CARGO:<br>FIRMA | CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO. | NOMBRE: Dennis Salcedo<br>CARGO: RESIDENTE SST<br>FIRMA |
| FECHA: DD / MM / AA / | | FECHA: DD 20 MM 09 AA 23 | |

RECOMENDACIONES ESPECIALES

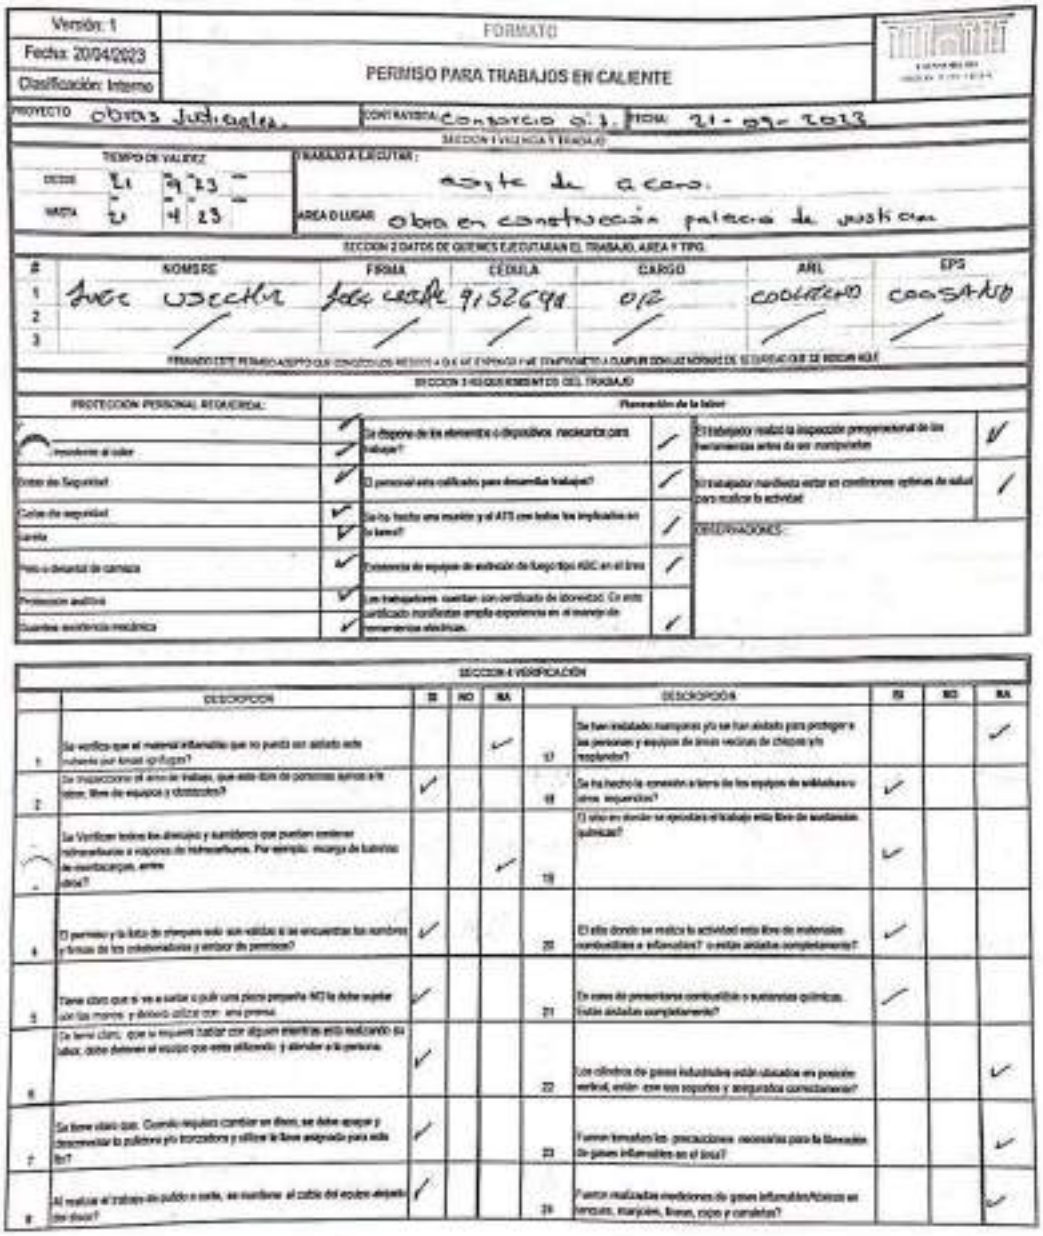

Versión: 1
Fecha: 20/04/2023
Clasificación: Interno

FORMATO

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

PROYECTO obras Judiciales. CONTRATISTA Consorcio O.J. FECHA 21-03-2023

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ
DESDE 21 | 3 | 23
HASTA 21 | 4 | 23

TRABAJO A EJECUTAR: apoyo de acero.

AREA O LUGAR obra en construcción palacio de justicia

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO

| # | NOMBRE | FIRMA | CEDULA | CARGO | ARL | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE UBEDA | | 9152698 | OFI | COOMEVA | COOSALUD |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

PROTECCION PERSONAL REQUERIDA:


| | |
|---|---|
| Casco | ✓ |
| Protector de oidos | ✓ |
| Gafas de seguridad | ✓ |
| Careta | ✓ |
| Peto o delantal de carnaza | ✓ |
| Protección auditiva | ✓ |
| Guantes de carnaza | ✓ |

Planeación de la labor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar? | ✓ | El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas | ✓ |
| El personal esta calificado para desarrollar trabajos? | ✓ | El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad | ✓ |
| Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea? | ✓ | OBSERVACIONES: | |
| Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área | ✓ | | |
| Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas. | ✓ | | |

SECCION 4 VERIFICACIÓN

| | DESCRIPCION | SI | NO | NA | | DESCRIPCIÓN | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado este cubierto por mantas ignífugas? | | | ✓ | 17 | Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor? | | | ✓ |
| 2 | Se inspeccionan el área de trabajo, que esta libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos? | ✓ | | | 18 | Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura o otros equipos? | ✓ | | |
| 3 | Se Verifican todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre otros? | | | ✓ | 19 | El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de materiales químicos? | ✓ | | |
| 4 | El permiso y la lista de chequeo están validos si se encuentran los nombres y firmas de los coordinadores y emisor de permisos? | ✓ | | | 20 | El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o están aislados completamente? | ✓ | | |
| 5 | Tiene claro que si va a soldar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos, y debera utilizar con una prensa. | ✓ | | | 21 | En caso de presentarse combustibles o sustancias químicas están aisladas completamente? | ✓ | | |
| 6 | De tener claro, que si requiere hablar con alguien mientras esta realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y dirigirse a la persona. | ✓ | | | 22 | Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y aseguradas correctamente? | | | ✓ |
| 7 | Se tiene claro que, Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o esmeriladora y utilizar la llave asignada para este fin? | ✓ | | | 23 | Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área? | | | ✓ |
| 8 | Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene al cable del equipo alejado de chispa? | ✓ | | | 24 | Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manjoles, líneas, ciclos y canaletas? | | | ✓ |

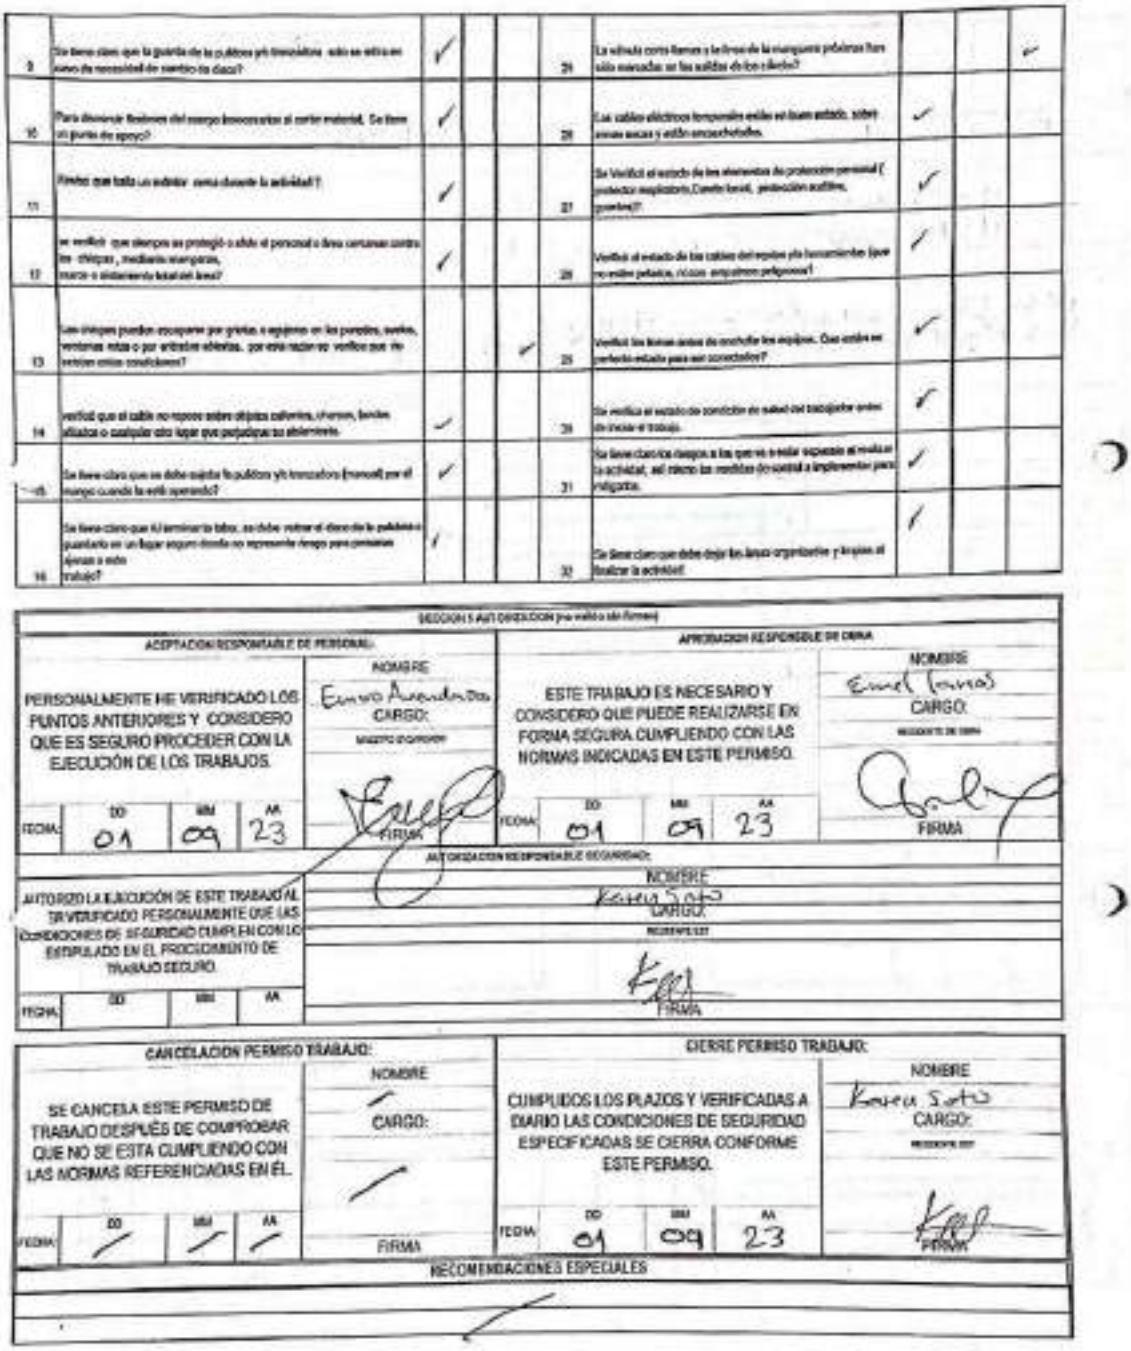

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o trozadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco? | ✓ | | | 29 | La salud corta llamas y la línea de la manguera polimeros han sido evacuadas en las salidas de los talleres? | | | ✓ |
| 10 | Para desmontar fácilmente del mango (evacuación al corte material, Se tiene un punto de apoyo? | ✓ | | | 30 | Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas y están encauchetados. | ✓ | | |
| 11 | Revisa que todo un extintor cerca durante la actividad? | ✓ | | | 27 | Se Verifica el estado de los elementos de protección personal ( protector respiratorio, Casco tenal, protección auditiva, guantes)? | ✓ | | |
| 12 | se verifica que alguna se protegió o aisló el personal o área cercanas contra las chispas, mediante mamparas, mantas o elementos totalmente ignífugos? | ✓ | | | 28 | Verifica el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, rotos, empalmes peligrosos) | ✓ | | |
| 13 | Las chispas pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas, rotas o por entradas abiertas, por esta razón se verifica que no existen estas condiciones? | | ✓ | | 25 | Verifica las tomas antes de conectar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados? | ✓ | | |
| 14 | verifica que el cable no reposa sobre objetos cortantes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento. | ✓ | | | 26 | Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo. | ✓ | | |
| 15 | Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o trozadora (manual) por el mango cuando la está operando? | ✓ | | | 31 | Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos. | ✓ | | |
| 16 | Se tiene claro que al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora o guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a esta trabajo? | ✓ | | | 32 | Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad. | ✓ | | |

**SECCION 5 AUTORIZACION** (no valido sin firmas)

**ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:**

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE: Enrique Avendaño
CARGO: MAESTRO DE OBRA
FIRMA

FECHA: DD 01 MM 09 AA 23

**APROBACION RESPONSABLE DE OBRA**

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

NOMBRE: Ernel Lamas
CARGO: RESIDENTE DE OBRA
FIRMA

FECHA: DD 01 MM 09 AA 23

**AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:**

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL SR/VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.

NOMBRE: Karen Soto
CARGO: RESIDENTE SST
FIRMA

FECHA: DD MM AA

**CANCELACION PERMISO TRABAJO:**

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.

NOMBRE: /
CARGO: /
FIRMA

FECHA: DD / MM / AA /

**CIERRE PERMISO TRABAJO:**


CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE: Karen Soto
CARGO: RESIDENTE SST
FIRMA

FECHA: DD 01 MM 09 AA 23

**RECOMENDACIONES ESPECIALES**

/

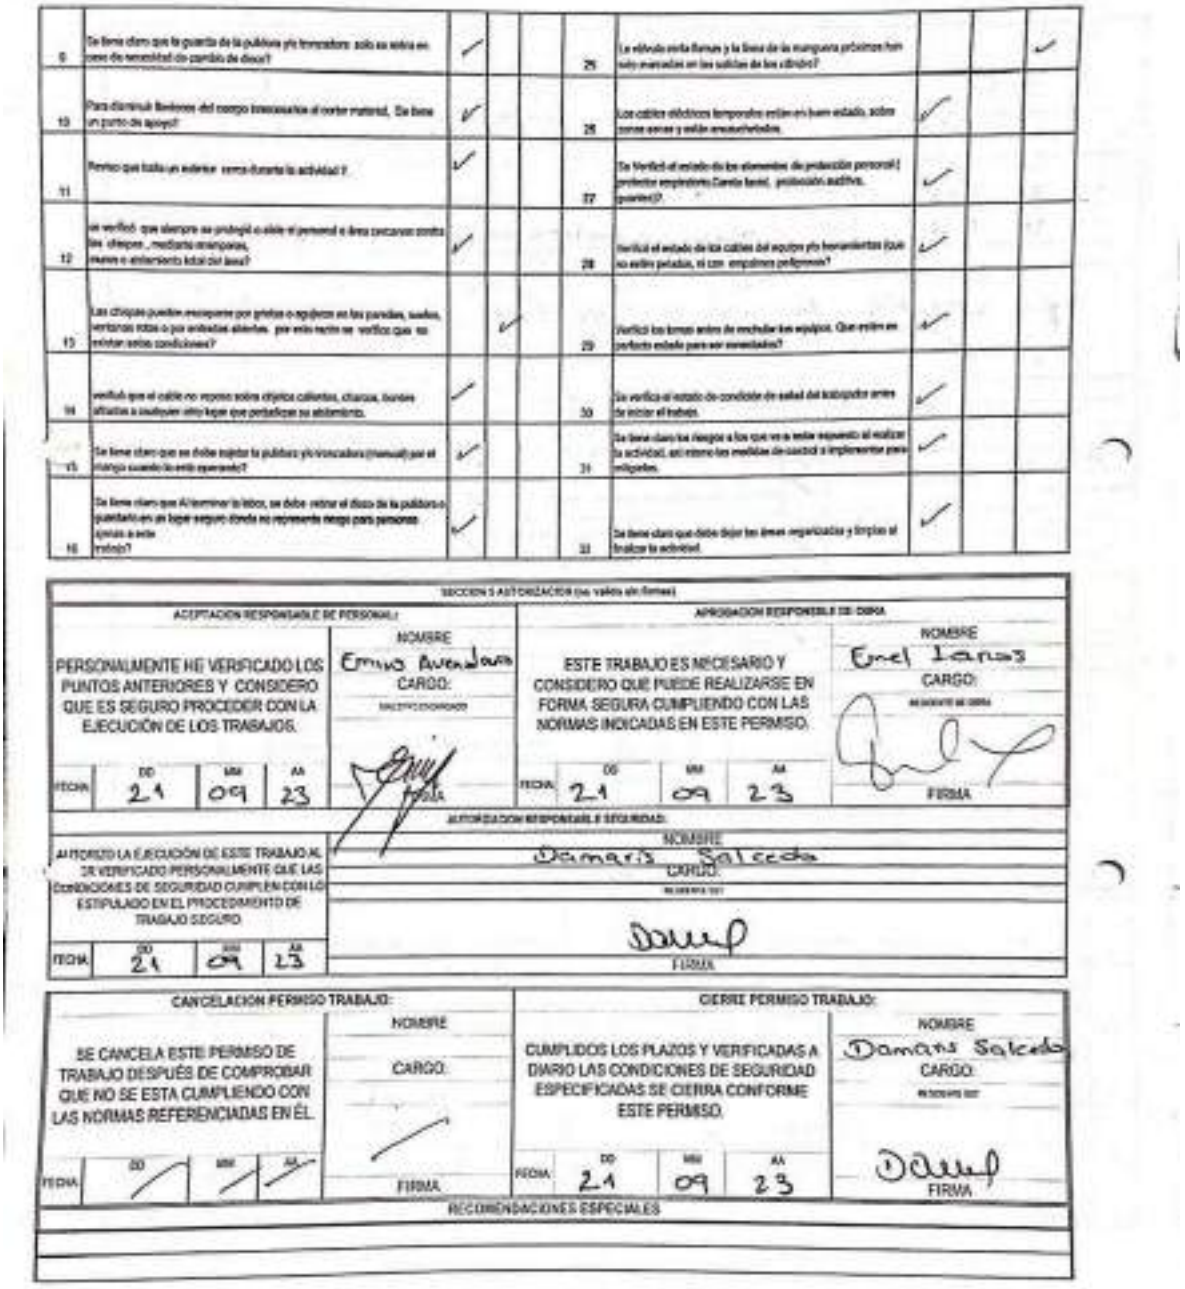

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o trenzadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco? | ✓ | | | 25 | La válvula anti-llamas y la llama de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los cilindros? | | | ✓ |
| 10 | Para disminuir lesiones del cuerpo ocasionadas al corte material, Se tiene un punto de apoyo? | ✓ | | | 26 | Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre conos aéreos y están encauchetados | ✓ | | |
| 11 | Revisó que halla un extintor cerca durante la actividad ? | ✓ | | | 27 | Se Verificó el estado de los elementos de protección personal ( protector respiratorio Careta facial, protección auditiva, guantes)? | ✓ | | |
| 12 | se verificó que siempre se protegió o aisló al personal o área cercanas contra las chispas , mediante cerramientos, mamparas, extintores total del área? | ✓ | | | 28 | Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos? | ✓ | | |
| 13 | Las chispas pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas rotas o por aberturas abiertas por esto revisó se verifica que no existan estas condiciones? | | ✓ | | 29 | Verificó los tomas antes de encender los equipos, Que estén en perfecto estado para ser energizados? | ✓ | | |
| 14 | verificó que el cable no repose sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento. | ✓ | | | 30 | Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo. | ✓ | | |
| 15 | Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o trenzadora (manual) por el mango cuando lo está operando? | ✓ | | | 31 | Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos. | ✓ | | |
| 16 | Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora o guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este trabajo? | ✓ | | | 32 | Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad. | ✓ | | |

**SECCION 3 AUTORIZACIÓN** (no valida sin firmas)

**ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:**

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE: Erwin Avendaño
CARGO: TRABAJADOR
FIRMA

FECHA: DD 21 MM 09 AA 23

**APROBACION RESPONSABLE DE OBRA**

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

NOMBRE: Enel Ianas
CARGO: RESIDENTE DE OBRA
FIRMA

FECHA: DD 21 MM 09 AA 23

**AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:**

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HE VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

NOMBRE: Damaris Salcedo
CARGO: SISO
FIRMA

FECHA: DD 21 MM 09 AA 23

**CANCELACION PERMISO TRABAJO:**

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.

NOMBRE:
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD MM AA


**CIERRE PERMISO TRABAJO:**

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE: Damaris Salcedo
CARGO: RESIDENTE SST
FIRMA

FECHA: DD 21 MM 09 AA 23

**RECOMENDACIONES ESPECIALES**

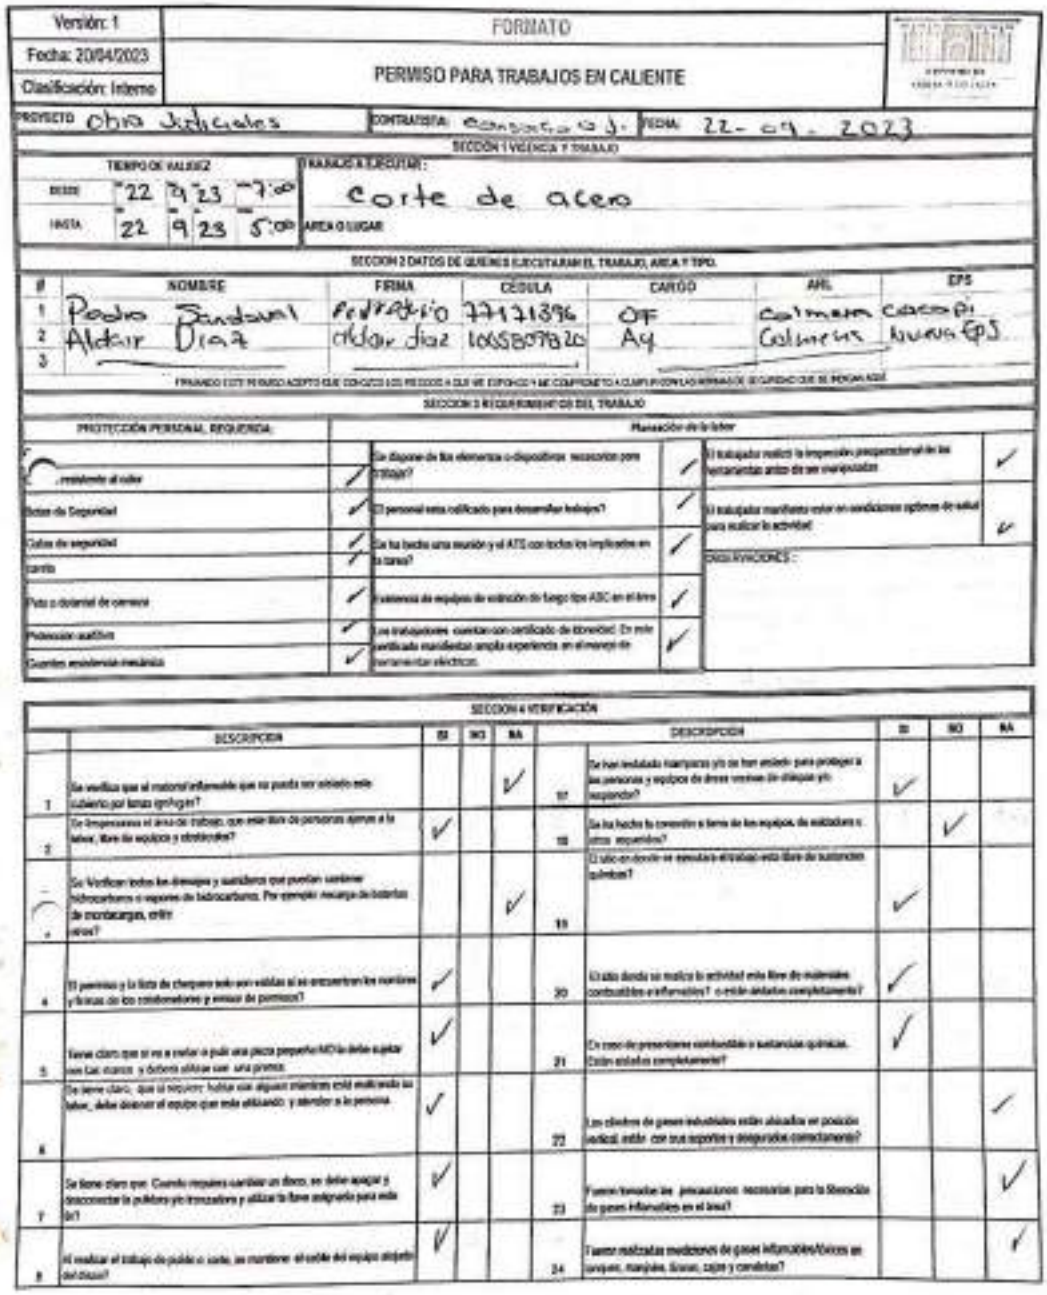

Versión: 1
Fecha: 20/04/2023
Clasificación: Interno

FORMATO

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

PROYECTO: Obra Judiciales | CONTRATISTA: consorcio J. | FECHA: 22-09-2023

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ
DESDE: 22 / 9 / 23 — 7:00
HASTA: 22 / 9 / 23 — 5:00

TRABAJO A EJECUTAR: corte de acero

AREA O LUGAR:

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

| # | NOMBRE | FIRMA | CEDULA | CARGO | ARL | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Bandoval | Pedro | 77171396 | OF | colmena | coosalud |
| 2 | Aldair Diaz | aldair diaz | 1065897820 | AY | Colmena | nueva EPS |
| 3 | | | | | | |


FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A LOS QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE PIDAN AQUI

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

| PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA | | Planeación de la labor | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Se dispone de las herramientas o dispositivos necesarios para el trabajo? | ✓ | El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser energizadas | ✓ |
| Botas de Seguridad | ✓ | El personal esta calificado para desarrollar trabajos? | ✓ | El trabajador mantiene estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad | ✓ |
| Gafas de seguridad | ✓ | Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea? | ✓ | OBSERVACIONES: | |
| Careta | ✓ | Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área | ✓ | | |
| Pata o dotamiel de carnaval | ✓ | Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas | ✓ | | |
| Protección auditiva | ✓ | | | | |
| Guantes anticorte mecánico | ✓ | | | | |

SECCION 4 VERIFICACIÓN

| | DESCRIPCION | SI | NO | NA | | DESCRIPCION | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica que el material inflamable que no pueda ser extinto este cubierto por lonas ignifugas? | | | ✓ | 17 | Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas (in chispas y/o soplando? | ✓ | | |
| 2 | Se Empresarios el área de trabajo, que este libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos? | ✓ | | | 18 | Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos, de soldadura o otros equipos? | | ✓ | |
| 3 | Se Verifican todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: rejillas de bateria de montacargas, entre otros? | | | ✓ | 19 | El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas? | ✓ | | |
| 4 | El permiso y la lista de chequeo solo son validas si se encuentran los nombres y firmas de los coordinadores y emisor de permisos? | ✓ | | | 20 | El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles o inflamables? o están debidos completamente? | ✓ | | |
| 5 | Tiene claro que si no a evitar o pulir una pieza pequeña NO la debe soldar con las manos y debera utilizar una prensa | ✓ | | | 21 | En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Están debidos completamente? | ✓ | | |
| 6 | Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras esta realizando su labor, debe dejar el equipo que esta utilizando y atender a la persona | ✓ | | | 22 | Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, estén con sus soportes y asegurados correctamente? | | | ✓ |
| 7 | Se tiene claro que: Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o trituradora y utilizar la llave asignada para esto? | ✓ | | | 23 | Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área? | | | ✓ |
| 8 | Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el orden del equipo alejado del disco? | ✓ | | | 24 | Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en ambiente, manjoles, tuvos, cajas y cavidades? | | | ✓ |

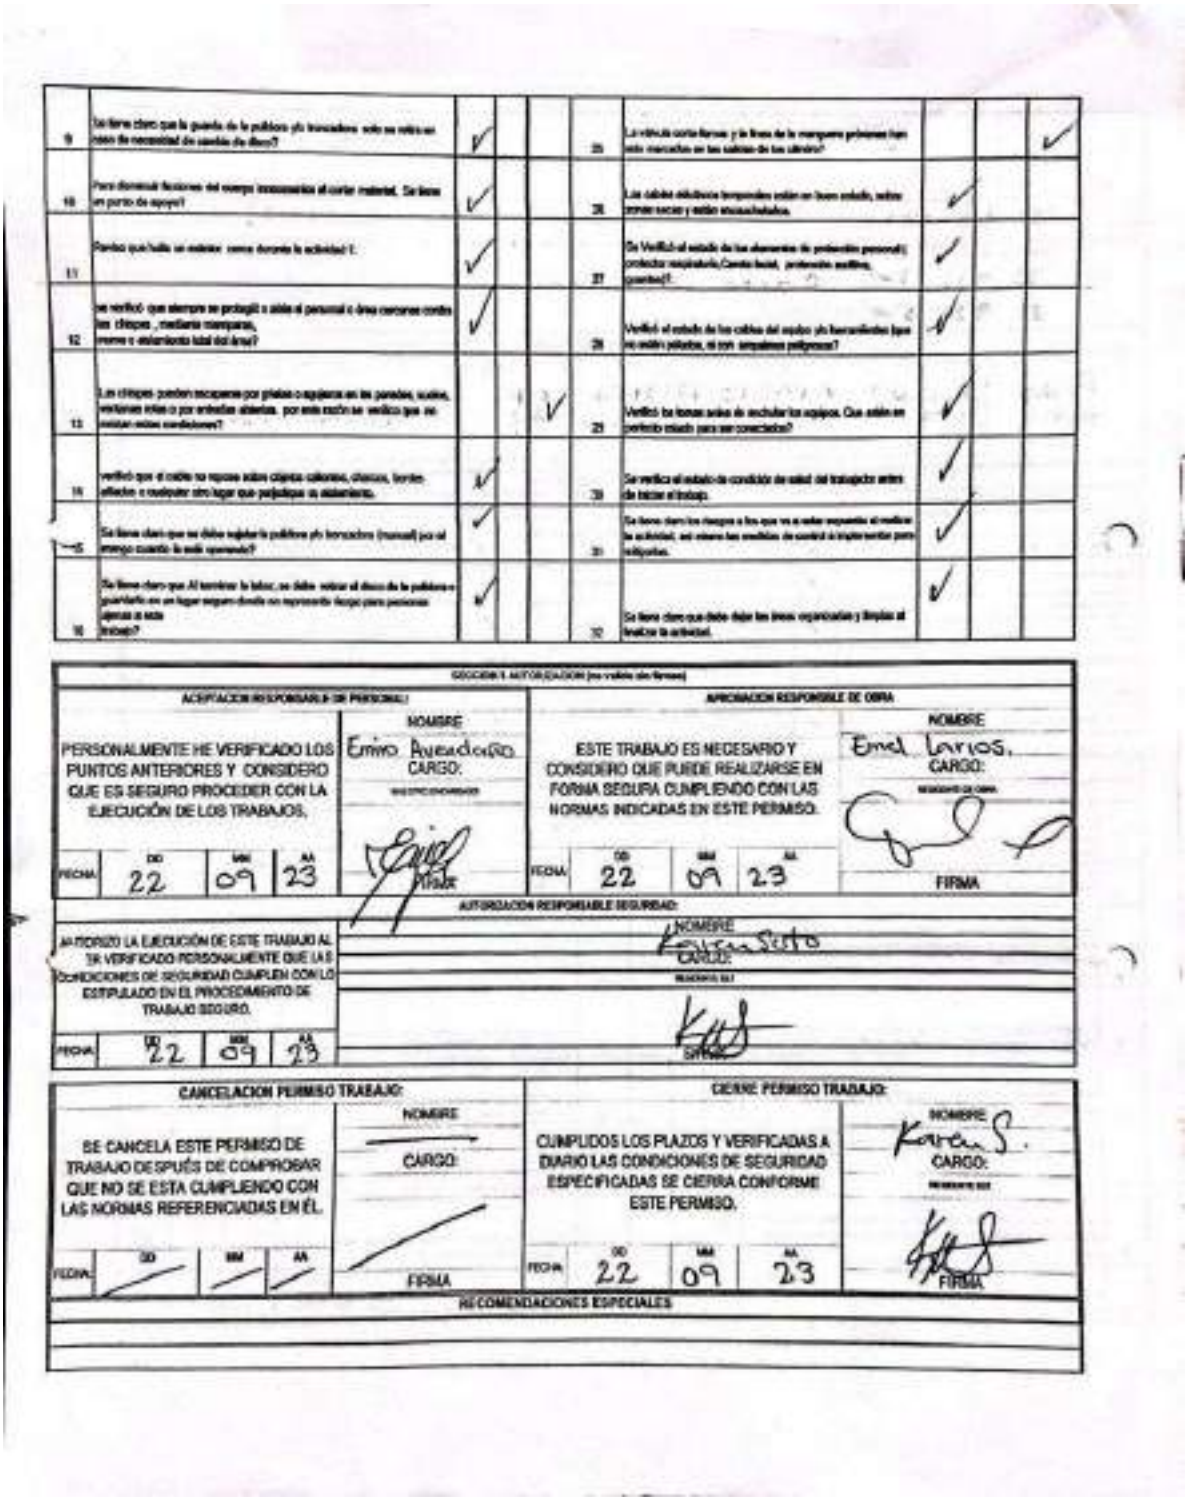

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se tiene claro que la guarda de la pólizas y/o herramientas solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco? | ✓ | | | 25 | La válvula corta llamas y la línea de la manguera presentan fugas solo marcadas en las uniones de los cilindros? | | | ✓ |
| 10 | Para disminuir fluctuaciones del voltaje innecesarios el cortar material. Se tiene un punto de apoyo? | ✓ | | | 26 | Las cabinas estructuras temporales están en buen estado, sobre terreno nivelado y estable encaballadas. | ✓ | | |
| 11 | Revisa que halla un extintor cerca durante la actividad ? | ✓ | | | 27 | Se Verificó el estado de los elementos de protección personal ( protector respiratorio, Careta facial, protección auditiva, guantes)? | ✓ | | |
| 12 | se verificó que siempre se protegió o aisló el personal o áreas cercanas contra las chispas , mediante mamparas, cortina o aislamiento total del área? | ✓ | | | 28 | Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos? | ✓ | | |
| 13 | Las chispas pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas cristales o por orificios abiertos, por esto razón se verifica que no existan estas condiciones? | | | ✓ | 29 | Verificó las tomas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados? | ✓ | | |
| 14 | verificó que el cable no esposas sobre objetos calientes, chispas, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento. | ✓ | | | 30 | Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo. | ✓ | | |
| 15 | Se tiene claro que se debe aislar la pólizas y/o herramientas (manual) por el tiempo cuando la esté operando? | ✓ | | | 31 | Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlas. | ✓ | | |
| 16 | Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pólizas o guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas al sitio trabajo? | ✓ | | | 32 | Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad. | ✓ | | |

**SECCIÓN 3. AUTORIZACIÓN** (no valida sin firmas)

**ACEPTACIÓN RESPONSABLE DE PERSONAL**

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE: Enrique Avendaño
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 22 MM 09 AA 23

**APROBACIÓN RESPONSABLE DE OBRA**

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

NOMBRE: Emel Larios.
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 22 MM 09 AA 23

**AUTORIZACIÓN RESPONSABLE SEGURIDAD:**

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL SR VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.

NOMBRE: Karen Soto
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 22 MM 09 AA 23

**CANCELACION PERMISO TRABAJO:**

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.

NOMBRE:
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD MM AA


**CIERRE PERMISO TRABAJO:**

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE: Karen S.
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 22 MM 09 AA 23

**RECOMENDACIONES ESPECIALES**

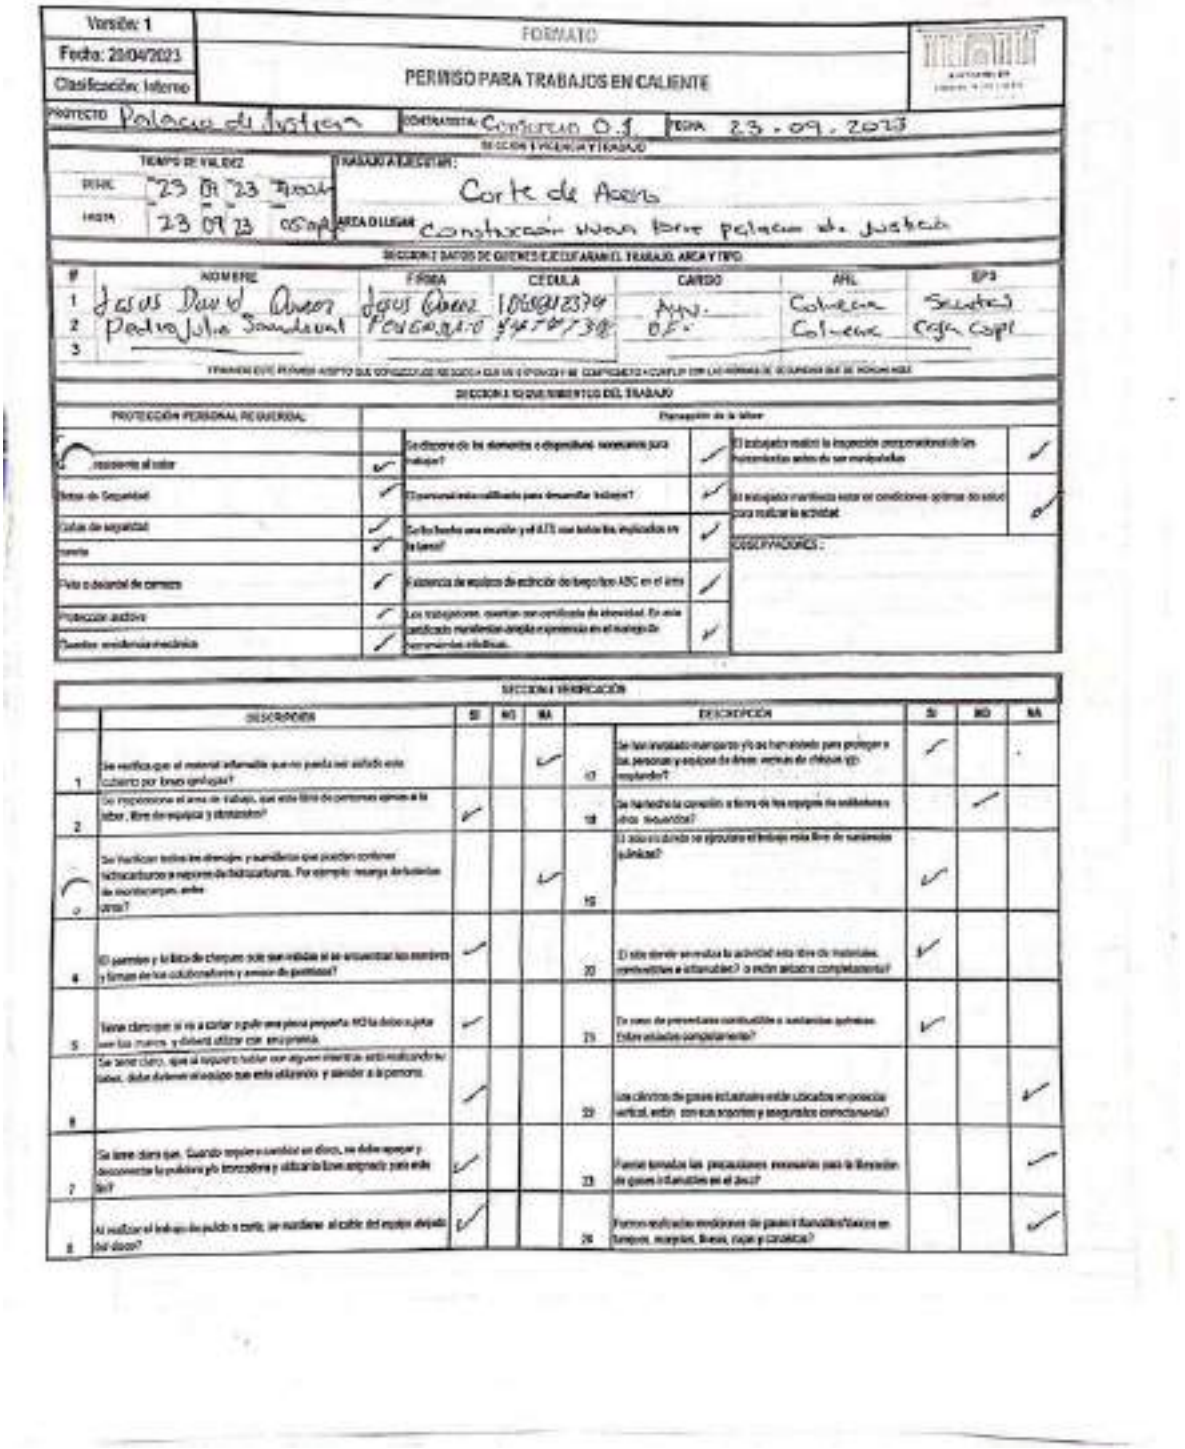

Versión: 1
Fecha: 20/04/2023
Clasificación: Interno

FORMATO

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

PROYECTO: Palacio de Justicia | CONTRATISTA: Consorcio O.J. | FECHA: 23-09-2023

SECCIÓN 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ
DESDE: 23 09 23 7:00 a.m.
HASTA: 23 09 23 05:00 p.m.

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de Acero

AREA O LUGAR: Construcción nuevo Edificio palacio de Justicia

SECCIÓN 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO


| # | NOMBRE | FIRMA | CEDULA | CARGO | ARL | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus David Amor | Jesus Amor | 1065623790 | Ayu. | Colmena | Sanitas |
| 2 | Pedro Julio Sandoval | Pedro Julio | 94507738 | O.F. | Colmena | Coomeva |
| 3 | | | | | | |

SECCIÓN 3 ALISTAMIENTO DEL TRABAJO

| PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA | | Planeación de la labor | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Se dispone de los elementos e dispositivos necesarios para trabajar? | ✓ | El trabajador realizó la inspección preoperacional de los herramientas antes de ser manipuladas | ✓ |
| Botas de Seguridad | ✓ | El personal esta calificado para desarrollar labores? | ✓ | El trabajador mantiene estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad | ✓ |
| Gafas de seguridad | ✓ | Se ha hecho una revisión y el ATS con todos los implicados en la tarea? | ✓ | OBSERVACIONES: - | |
| Careta | ✓ | | | | |
| Peto o delantal de cuero | ✓ | Existencia de equipos de extinción de tipo y los ABC en el área | ✓ | | |
| Protección auditiva | ✓ | Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En caso contrario manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas utilizadas. | ✓ | | |
| Guantes resistencia mecánica | ✓ | | | | |

SECCIÓN 4 VERIFICACIÓN

| | DESCRIPCIÓN | SI | NO | NA | | DESCRIPCIÓN | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado este cubierto por lonas ignifugas? | | | ✓ | 17 | Se han instalado mamparas y/o se han tomado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o escombros? | ✓ | | |
| 2 | Se respetan en el area de trabajo, que solo sitio de personas ajenas a la labor, libre de equipos y elementos? | ✓ | | | 18 | Se han hecho la conexión a tierra de los equipos de soldaduras arco resistencia? | | ✓ | |
| 3 | Se Verifican todos los elementos y auxiliares que puedan contener hidrocarburos a vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: tuberías de recirculación, entre otros? | | | ✓ | 19 | El area en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas? | ✓ | | |
| 4 | El permiso y la lista de chequeo solo son validos si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y anexos de permisos? | ✓ | | | 20 | El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles o inflamables? o están aislados completamente? | ✓ | | |
| 5 | Tiene claro que si va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos, y debera utilizar con una prensa. | ✓ | | | 21 | En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Estan aislados completamente? | ✓ | | |
| 6 | Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras esta realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona. | ✓ | | | 22 | Los cilindros de gases estan/van estar ubicados en posición vertical, estan con sus soportes y seguridad correctamente? | | | ✓ |
| 7 | Se tiene claro que, Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o esmeriladora y utilizar la llave asignada para este fin? | ✓ | | | 23 | Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área? | | | ✓ |
| 8 | Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene al cable del equipo alejado del disco? | ✓ | | | 24 | Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/toxicos en tanques, mangotes, líneas, cajas y canaletas? | | | ✓ |

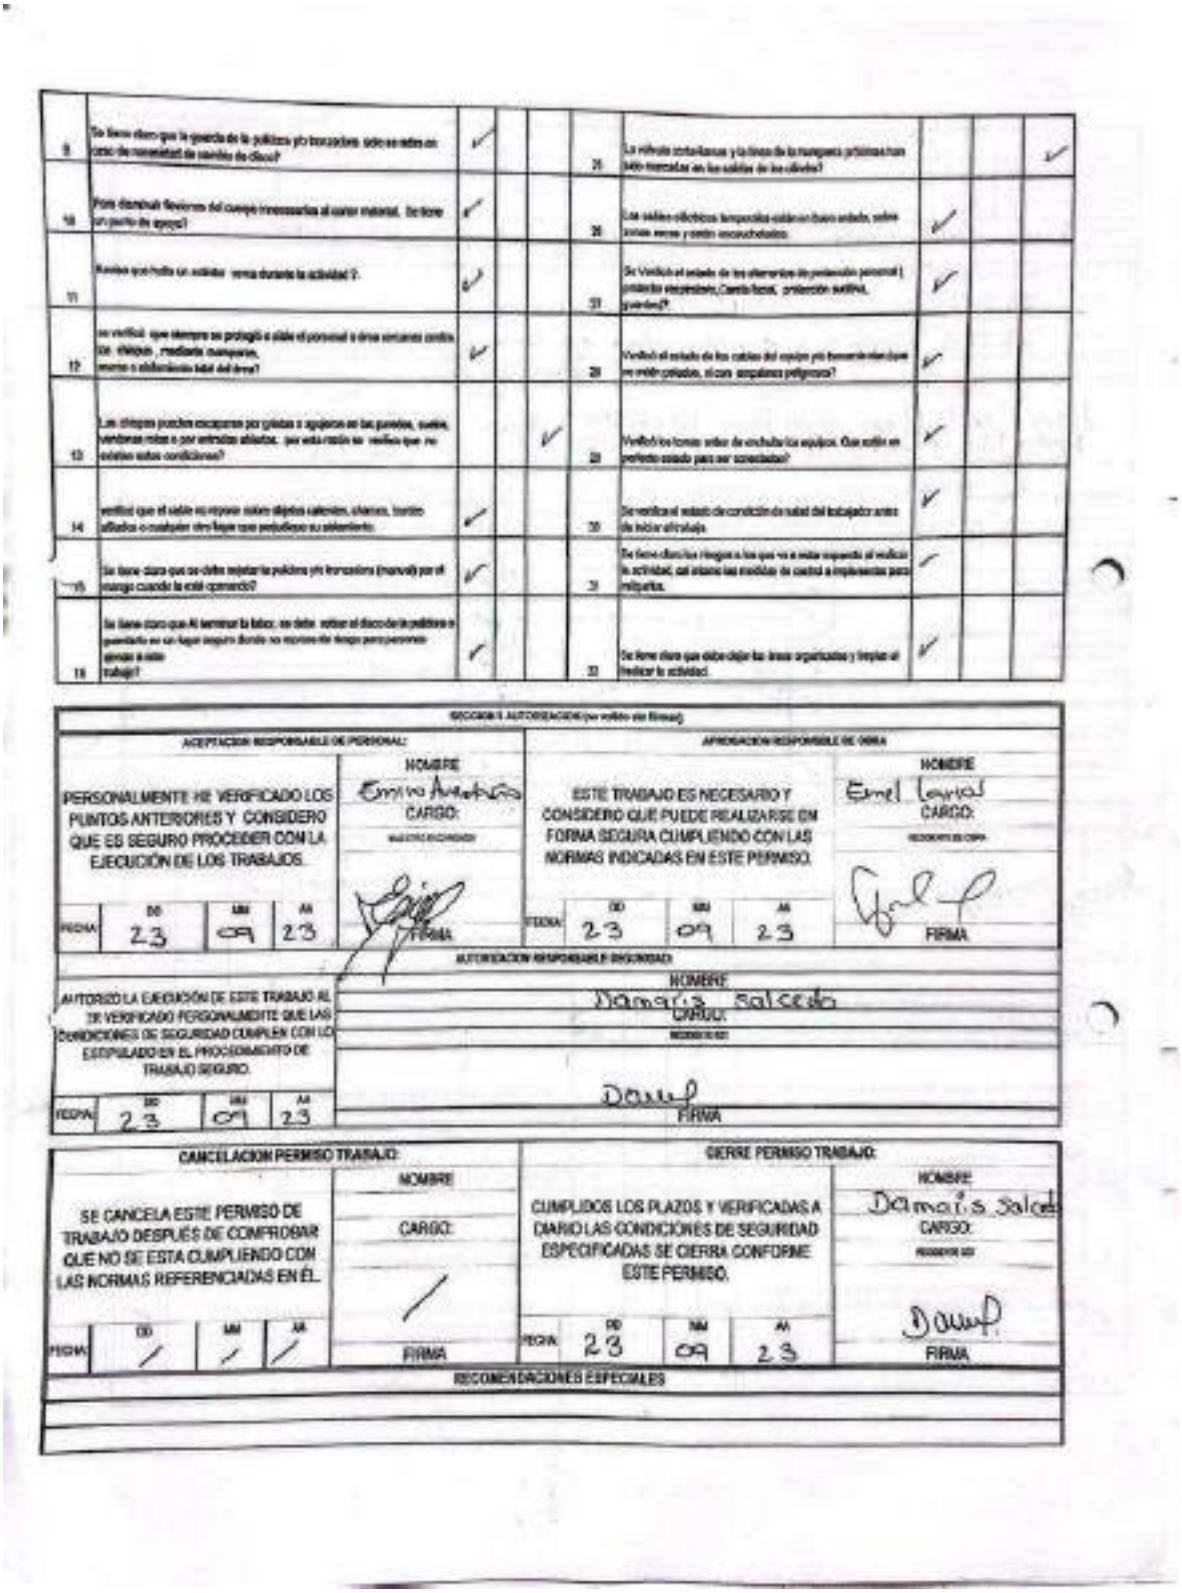

| Versión: 1 | FORMATO |
|---|---|
| Fecha: 20/04/2023 | PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE |
| Clasificación: Interno | |

PROYECTO: Palacio de Justicia — CONTRATISTA: Consorcio O.J. — FECHA: 25-07-2023

SECCIÓN 1 SOLICITA TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ — DESDE: 25 07 23 7:00 AM — HASTA: 25 07 23 5:00 PM

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de Acero

AREA DE LABOR: Construcción Palacio de Justicia

SECCIÓN 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.


| # | NOMBRE | FIRMA | CEDULA | CARGO | ARL | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus David Rivera | Jesus Rivera | 1065805376 | Ayu | Colmena | Sanitas |
| 2 | Jorge Sanchez | Jorge Sanchez | 91526911 | OF1 | Colmena | Coosalud |
| 3 | | | | | | |

SECCIÓN 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

| PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA | | Planeación de la labor | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco, overol, calzado | ✓ | Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar? | ✓ | El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser suministradas | ✓ |
| Gafas de seguridad | ✓ | El personal está calificado para desarrollar trabajos? | ✓ | El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad | ✓ |
| Guantes de seguridad | ✓ | Se ha tenido en cuenta el ATS con todas las implicaciones en la tarea? | ✓ | OBSERVACIONES: | |
| Careta | ✓ | | | | |
| Protección auditiva | ✓ | Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área | ✓ | | |
| Protección respiratoria | ✓ | Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado mencionan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas. | ✓ | | |
| Guantes aislantes dieléctricos | ✓ | | | | |

SECCIÓN 4 VERIFICACIÓN

| | DESCRIPCIÓN | SI | NO | NA | | DESCRIPCIÓN | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica que el material inflamable que se puede ser afectado este retirado por tanto (perfiles)? | | | ✓ | 11 | Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o respiradero? | | | ✓ |
| 2 | Se inspecciona el área de trabajo, que esta libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos? | ✓ | | | 12 | Se ha dotado la cantidad a tiene de los equipos de soldadura a otros siguientes? | | | ✓ |
| 3 | Se Verifican todos los drenajes y sumideros con posibles contenes hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de tuberías de montacargas, entre otros? | | ✓ | | 13 | El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas? | ✓ | | |
| 4 | El permiso y la lista de chequeo solo son validos si se encuentran los nombres y firmas de los solicitantes y emisor de permisos? | ✓ | | | 20 | El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles o inflamables? o estan aislados completamente? | ✓ | | |
| 5 | Tiene claro que sirve a cortar o pule una pieza pequeña NO se debe soldar con las manos y debe ir utilizar con una prensa | ✓ | | | 21 | En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Estan aisladas completamente? | ✓ | | |
| 6 | Se tiene claro, que se requiere hablar con alguien mientras está realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona | ✓ | | | 22 | Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, estan con sus soportes y asegurados correctamente? | | | ✓ |
| 7 | Se tiene claro que, Cuando requiere cambiar un disco, se debe apagar y desenchufar la pulidora y/o trazadora y utilizar la llave asignada para esto? | ✓ | | | 23 | Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el lugar? | | | ✓ |
| 8 | Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cable del equipo alejado del disco? | ✓ | | | 24 | Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manjoles, líneas, cajas y canaletas? | | | ✓ |

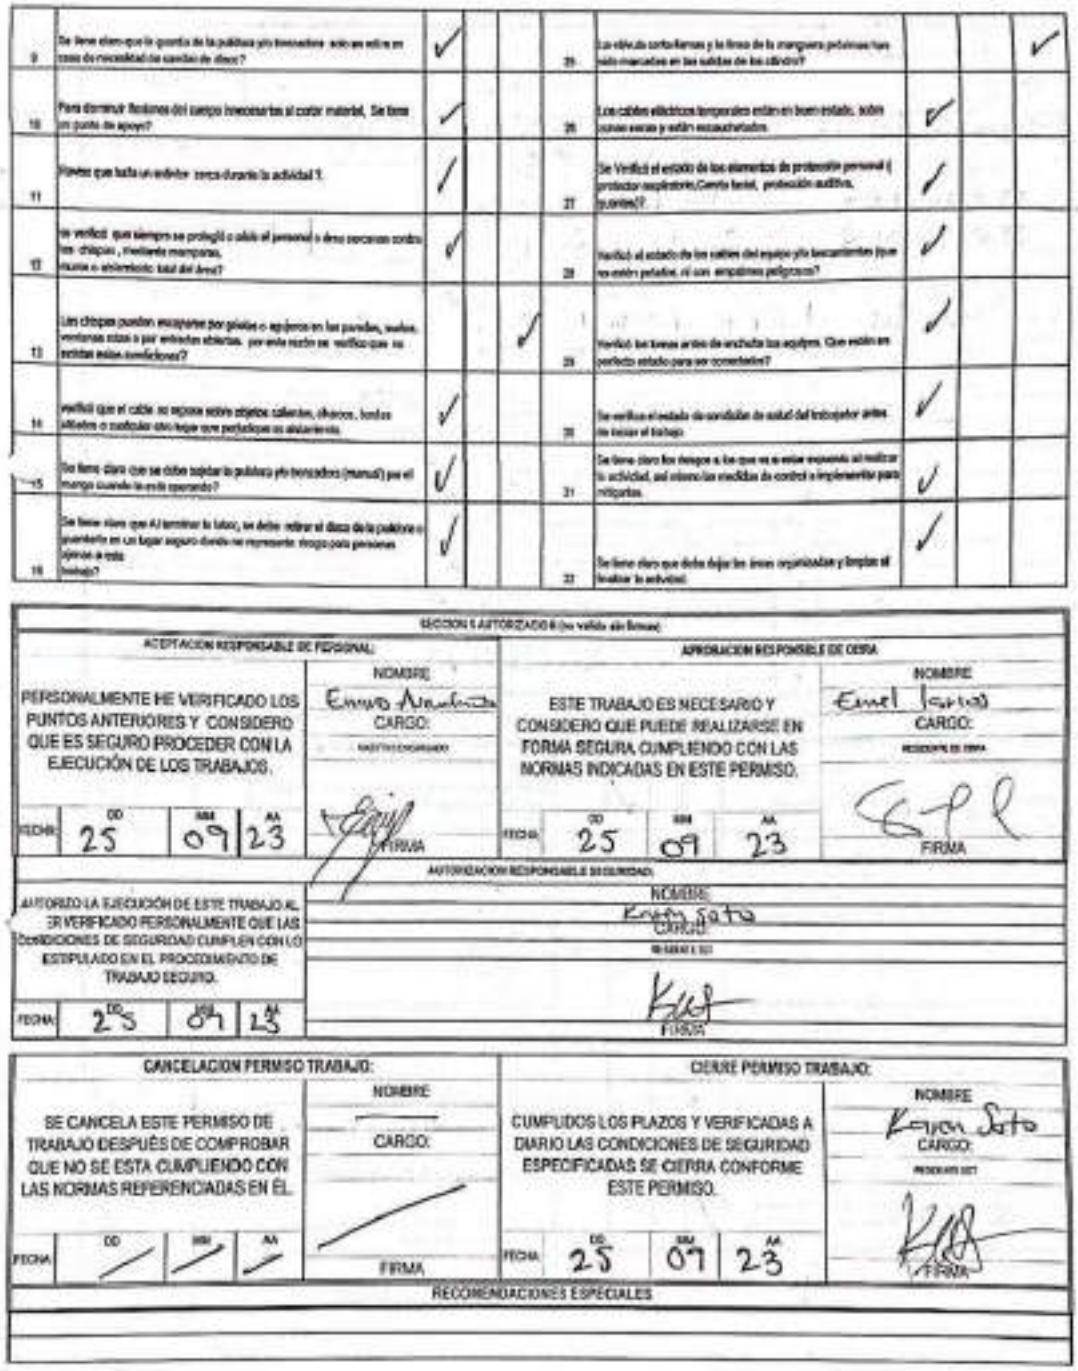

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o herramienta solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco? | ✓ | | | 25 | Los vidrios cortafrios y la línea de la manguera peliminan han sido marcados en las salidas de los cilindros? | | | ✓ |
| 10 | Para disminuir lesiones del cuerpo innecesarias al cortar material, Se tiene un punto de apoyo? | ✓ | | | 26 | Los cables eléctricos temporales están en buen estado, están somas secas y están encauchetados | ✓ | | |
| 11 | Revisa que hasta un radio cerca durante la actividad ? | ✓ | | | 27 | Se Verifica el estado de los elementos de protección personal ( protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)? | ✓ | | |
| 12 | Se verifica que siempre se protegió o aisló al personal o área cercanas contra las chispas , riesgosas manguera, mezcla o ambiental total del área? | ✓ | | | 28 | Verifica el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos? | ✓ | | |
| 13 | Las chispas pueden escapar por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas estas o por aberturas abiertas. por esta razón se verifica que no existan estas condiciones? | | ✓ | | 29 | Verificó las llaves antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados? | ✓ | | |
| 14 | verificó que el cable no reposa sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento. | ✓ | | | 30 | Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo | ✓ | | |
| 15 | Se tiene claro con se debe sujetar la pulidora y/o herramientas (manual) por el mango cuando la está operando? | ✓ | | | 31 | Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlas. | ✓ | | |
| 16 | Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora o guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a esta trabajo? | ✓ | | | 32 | Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad. | ✓ | | |

**SECCION 5 AUTORIZACIÓN (no valido sin firmas)**

**ACEPTACION RESPONSABLE DE REGIONAL:**

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE: Ennio Arrubla
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 25 MM 09 AA 23

**APROBACION RESPONSABLE DE OBRA**

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

NOMBRE: Ennel Jarro
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 25 MM 09 AA 23

**AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:**

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.

NOMBRE: Karen Soto
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 25 MM 09 AA 23

**CANCELACION PERMISO TRABAJO:**

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.

NOMBRE:
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD / MM / AA /

**CIERRE PERMISO TRABAJO:**

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE: Karen Soto
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 25 MM 09 AA 23

**RECOMENDACIONES ESPECIALES**



Versión: 1 | FORMATO

Fecha: 20/04/2023 | PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Clasificación: Interno

PROYECTO: Palacio de Justicia | CONTRATISTA: Consorcio Obras J. | FECHA: 26-07-2023

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ: DESDE 26 07 23 7:30 hrs | HASTA 26 07 23 05 mpl

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de Acero

AREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicias

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO

| # | NOMBRE | FIRMA | CÉDULA | CARGO | ARL | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Rivera | Eduardo R. | 1006774176 | Ayudante | Colmena | Salud total |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |


FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE INDICAN AQUI

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

| PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA | | Planeación de la labor | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnés | ✓ | Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar? | ✓ | El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas | ✓ |
| Botas de Seguridad | ✓ | El personal está calificado para desarrollar trabajos? | ✓ | El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad | ✓ |
| Gafas de seguridad | ✓ | Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea? | ✓ | OBSERVACIONES: | |
| Careta | ✓ | Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área | ✓ | | |
| Peto o delantal de cerraza | ✓ | Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado/verificación amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas | ✓ | | |
| Protección auditiva | ✓ | | | | |
| Guantes resistencia mecánica | ✓ | | | | |

SECCION 4 VERIFICACIÓN

| | DESCRIPCION | SI | NO | NA | | DESCRIPCION | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado esta cubierto por telas ignifugas? | | | ✓ | 17 | Se han instalado mamparas y/o se han alistado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o esplandor? | | | ✓ |
| 2 | Se inspecciona el área de trabajo, que esta libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y elementos? | ✓ | | | 18 | Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos? | | | ✓ |
| 3 | Se Verifican todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: rejillas de fosos de montacargas, entre otros? | | ✓ | | 19 | El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas? | ✓ | | |
| 4 | El permiso y la lista de chequeo solo son validos si se encuentran las nombres y firmas de los autorizadores y emisor del permiso? | ✓ | | | 20 | El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles o inflamables? o están aislados completamente? | ✓ | | |
| 5 | Tiene claro que si va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y debe utilizar con una prensa. | ✓ | | | 21 | En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Están aisladas completamente? | ✓ | | |
| 6 | Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras esta realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona. | ✓ | | | 22 | Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y amarrados correctamente? | | | ✓ |
| 7 | Se tiene claro que: Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o esmeriladora y utilizar la llave asignada para este fin? | ✓ | | | 23 | Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área? | | | ✓ |
| 8 | Al realizar el trabajo de pulido o corte, se asegurara el cable del equipo alejado del disco? | ✓ | | | 24 | Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manjoles, líneas, ruga y conductos? | | | ✓ |

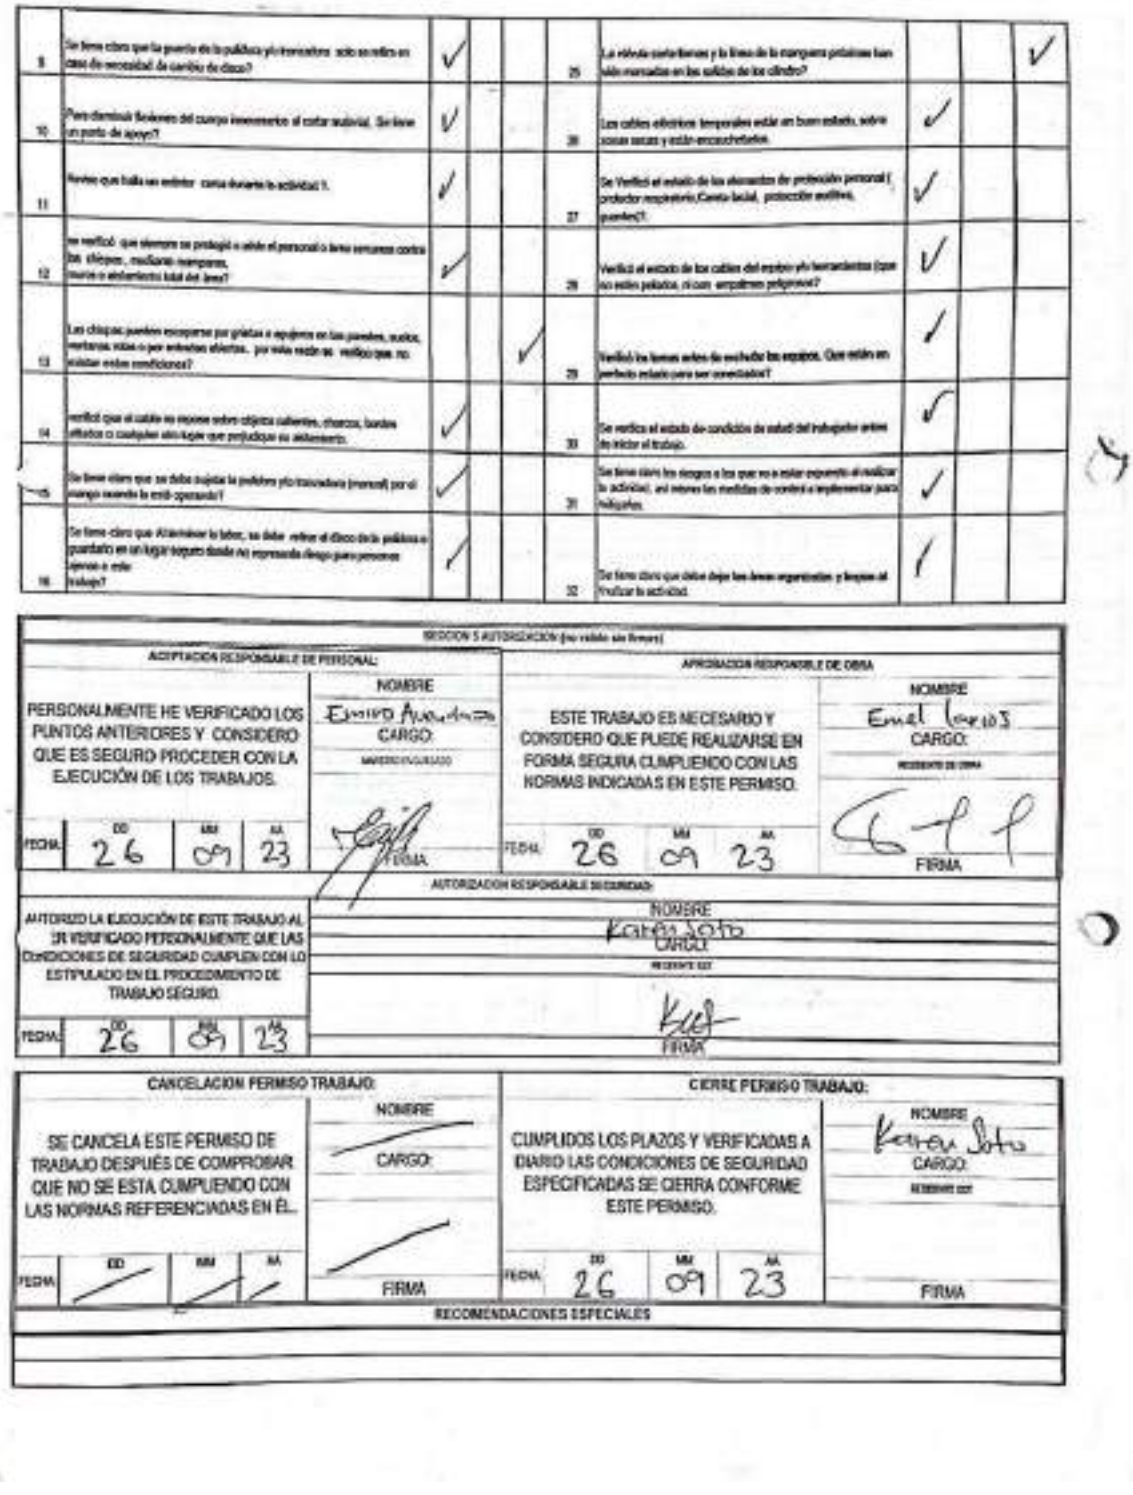

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se tiene claro que la puesta de la publica y/o herramienta solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco? | ✓ | | | 25 | La manguera contra incendios y la linea de la manguera principal se han visto manchas en los sellos de los cilindro? | | | ✓ |
| 10 | Para disminuir fatigas del cuerpo innecesario al cortar material. Se tiene un punto de apoyo? | ✓ | | | 26 | Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre sacas secas y están encauchetados | ✓ | | |
| 11 | Revisa que haya un extintor cerca durante la actividad ?. | ✓ | | | 27 | Se Verificó el estado de los elementos de protección personal ( protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)?. | ✓ | | |
| 12 | se verificó que siempre se protegió o aisló el personal o áreas cercanas contra los chispeo , mediante mamparas, cortina o elementos total del área? | ✓ | | | 28 | Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos? | ✓ | | |
| 13 | Las chispas pueden escaparse por grietas o aquieros en los pisos, suelos, ventanas, rejas o por entradas abiertas , por esto revisó se verificó que no existan estas condiciones? | | ✓ | | 29 | Verificó los llaves antes de encender los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados? | ✓ | | |
| 14 | verificó que el cable no esposee sobre objetos calientes, chorros, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento. | ✓ | | | 30 | Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo. | ✓ | | |
| 15 | Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o trituradora (manual) por el mango mientras la está operando? | ✓ | | | 31 | Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para trabajarlos. | ✓ | | |
| 16 | Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora o guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este trabajo? | ✓ | | | 32 | Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad. | ✓ | | |


**SECCION 5 AUTORIZACION** (no valido sin firmas)

| ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL: | | APROBACION RESPONSABLE DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | NOMBRE: Emiro Avendaño<br>CARGO: MAESTRO DE OBRA | ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO. | NOMBRE: Emel Lorios<br>CARGO: RESIDENTE DE OBRA |
| FECHA: DD 26 MM 09 AA 23 | FIRMA | FECHA: DD 26 MM 09 AA 23 | FIRMA |

| AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD: | |
|---|---|
| AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL SER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO. | NOMBRE: Karen Soto<br>CARGO: RESIDENTE SST |
| FECHA: DD 26 MM 09 AA 23 | FIRMA |

| CANCELACION PERMISO TRABAJO: | | CIERRE PERMISO TRABAJO: | |
|---|---|---|---|
| SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN EL... | NOMBRE:<br>CARGO: | CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO. | NOMBRE: Karen Soto<br>CARGO: RESIDENTE SST |
| FECHA: DD MM AA | FIRMA | FECHA: DD 26 MM 09 AA 23 | FIRMA |

RECOMENDACIONES ESPECIALES

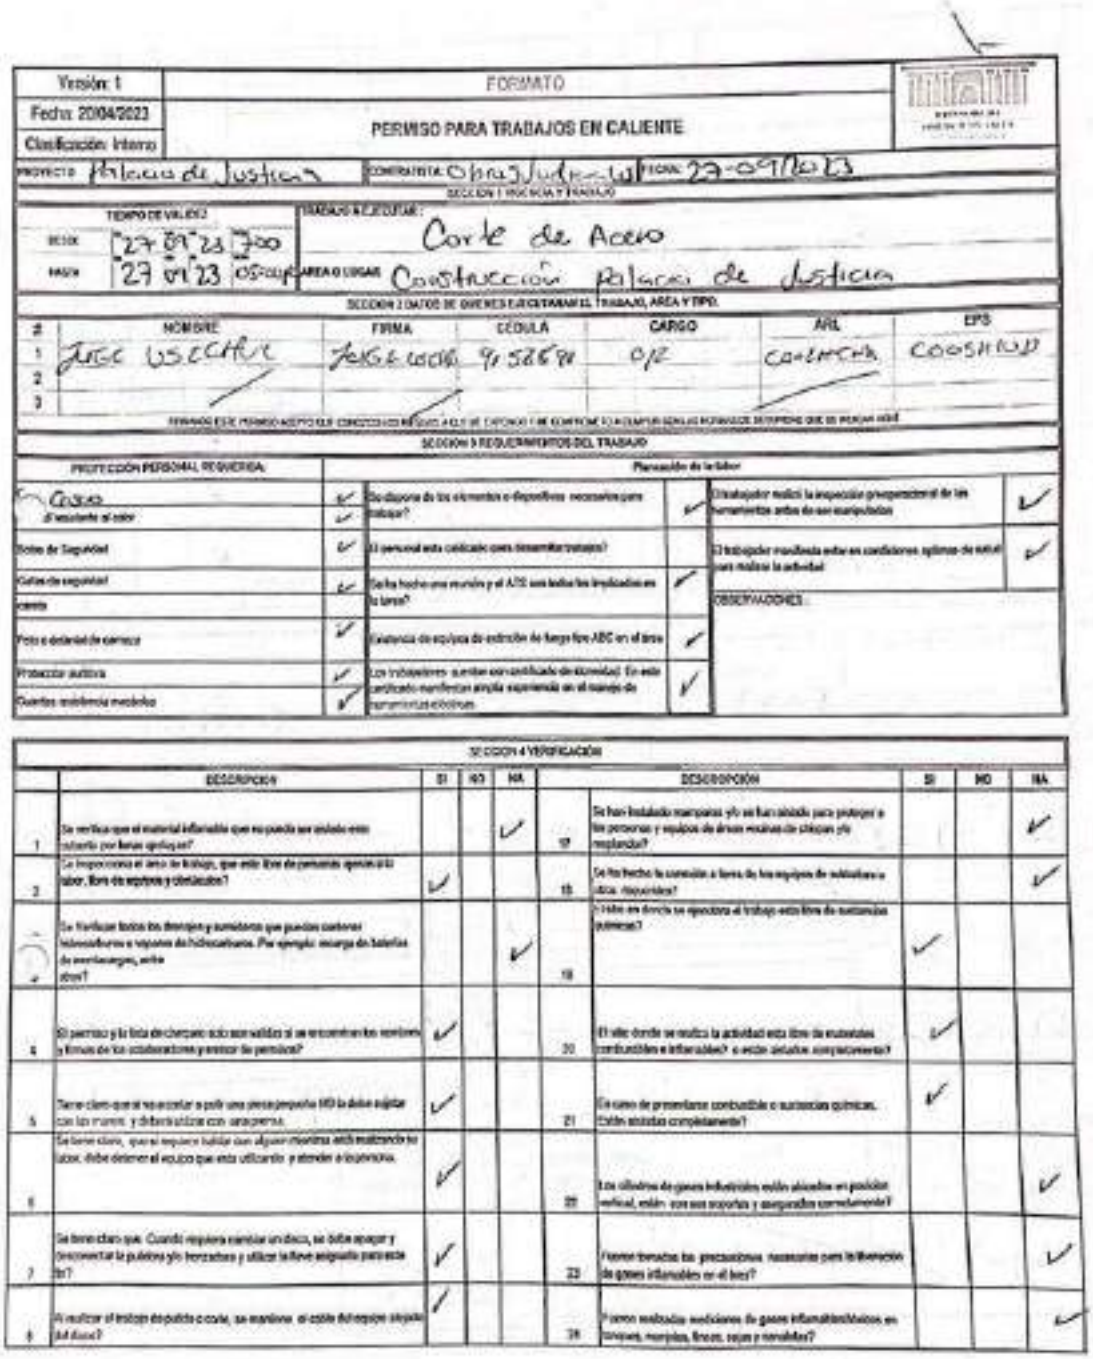

| Versión: 1 | FORMATO |
|---|---|
| Fecha: 20/04/2023 | PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE |
| Clasificación: Interno | |

PROYECTO: Palacio de Justicia — CONTRATISTA: Obra Judicial — FECHA: 29-09-2023

SECCION 1 INDICACIÓN Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ: DESDE 27-09-23 7:00 — HASTA 29-09-23 05:00 pm

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de Acero

AREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

| # | NOMBRE | FIRMA | CÉDULA | CARGO | ARL | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE USECHE | Jorge Useche | 91.586.81 | O/P | COLMENA | COOSALUD |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

| PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA | | Planeación de la labor | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar? | ✓ | El trabajador realizó la inspección pre-operacional de las herramientas antes de ser manipuladas | ✓ |
| Overol de algodón al calor | ✓ | | | | |
| Botas de Seguridad | ✓ | El personal está calificado para desarrollar trabajos? | | El trabajador manifiesta estar en condiciones óptimas de salud para realizar la actividad | ✓ |
| Gafas de seguridad | ✓ | Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea? | ✓ | OBSERVACIONES: | |
| Careta | | | | | |
| Peto o delantal de carnaza | ✓ | Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área | ✓ | | |
| Protector auditivo | ✓ | Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas | ✓ | | |
| Guantes resistencia mecánica | ✓ | | | | |

SECCION 4 VERIFICACIÓN

| | DESCRIPCION | SI | NO | NA | | DESCRIPCION | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica que el material inflamable que se pueda ser afectado este retirado por fuera aislado? | | | ✓ | 17 | Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor? | | | ✓ |
| 2 | La inspección al área de trabajo, que esta libre de personas ajenas al labor, libre de equipos y combustibles? | ✓ | | | 18 | Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura o oxicorte requeridos? | | | ✓ |
| 3 | Se verifican todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre otros? | | | ✓ | 19 | Existe una ducha de emergencia en el trabajo esta libre de sustancias químicas? | ✓ | | |
| 4 | El permiso y la lista de chequeo solo son validos si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y avalan los permisos? | ✓ | | | 20 | El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o estos estarán completamente? | ✓ | | |
| 5 | Tiene claro que al no acatar o pelir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y debera utilizar con anaperma | ✓ | | | 21 | En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Estan aislados completamente? | ✓ | | |
| 6 | Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras está realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona. | ✓ | | | 22 | Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente? | | | ✓ |
| 7 | Se tiene claro que: Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o herramienta y utilizar la llave seguro para este fin? | ✓ | | | 23 | Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el lugar? | | | ✓ |
| 8 | Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene al costado del equipo alejado del disco? | ✓ | | | 24 | Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, recipientes, fosos, cajas y cavidades? | | | ✓ |

| Versión: 1 | FORMATO |
|---|---|
| Fecha: 20/04/2023 | PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE |
| Clasificación: Interno | |

PROYECTO: Palacio de Justicia — CONTRATISTA: Obras Judiciales — FECHA: 02/08/2023

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ: DESDE 02 08 23 7:00 a.m. — HASTA 02 08 23 5:00

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de Acero

AREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.


| # | NOMBRE | FIRMA | CÉDULA | CARGO | ARL | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacho Julio Sanders | Apaborado | 77777776 | Ayudante | Colmena | Coomeva |
| 2 | Edwin de Rivera | Edwin de R | 1006779115 | Ayudante | Colmena | Salud total |
| 3 | | | | | | |

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

| PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA | | Preparación de la labor | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar? | ✓ | El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas | ✓ |
| Botas de Seguridad | ✓ | El personal está calificado para desarrollar trabajos? | ✓ | El trabajador manifiesta estar en condiciones óptimas de salud para realizar la actividad | ✓ |
| Gafas de seguridad | ✓ | Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea? | ✓ | OBSERVACIONES: | |
| Careta | ✓ | | | | |
| Peto o delantal de carnaza | ✓ | Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área | ✓ | | |
| Protección auditiva | ✓ | Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. El o este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas | ✓ | | |
| Guantes resistencia mecánica | ✓ | | | | |

SECCION 4 VERIFICACIÓN

| | DESCRIPCION | SI | NO | NA | | DESCRIPCIÓN | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica que el material inflamable que no pueda ser retirado esta cubierto por lonas ignífugas? | | | ✓ | 11 | Se han tomado todas las precauciones y/o se han tomado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o explosión? | | | ✓ |
| 2 | Se inspecciona el área de trabajo, que este libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos? | ✓ | | | 12 | Se ha retirado la conexión a tierra de los equipos de soldadura a otros dispositivos? | | | ✓ |
| 3 | Se verifican todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre otros? | | ✓ | | 13 | El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de materiales químicos? | ✓ | | |
| 4 | El permiso y la lista de chequeo solo son validos si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos? | ✓ | | | 20 | El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles o inflamables? o estos estarán completamente | ✓ | | |
| 5 | Tiene claro que si no a cortar o pide una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y debe utilizar una prensa | ✓ | | | 21 | En caso de presentarse combustión o explosión las opciones están completamente? | ✓ | | |
| 6 | Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras está realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona | ✓ | | | 22 | Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, estos con sus soportes y amarrados como corresponde? | | | ✓ |
| 7 | Se tiene claro que Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o lavadora y utilizar la llave asignada para este fin? | ✓ | | | 23 | Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área? | | | ✓ |
| 8 | Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el costado derecho alejado del disco? | | | | 24 | Fueron realizadas medidas para de gases inflamables/tóxicos en tanques, recipientes, líneas, cajas y canaletas? | | | ✓ |

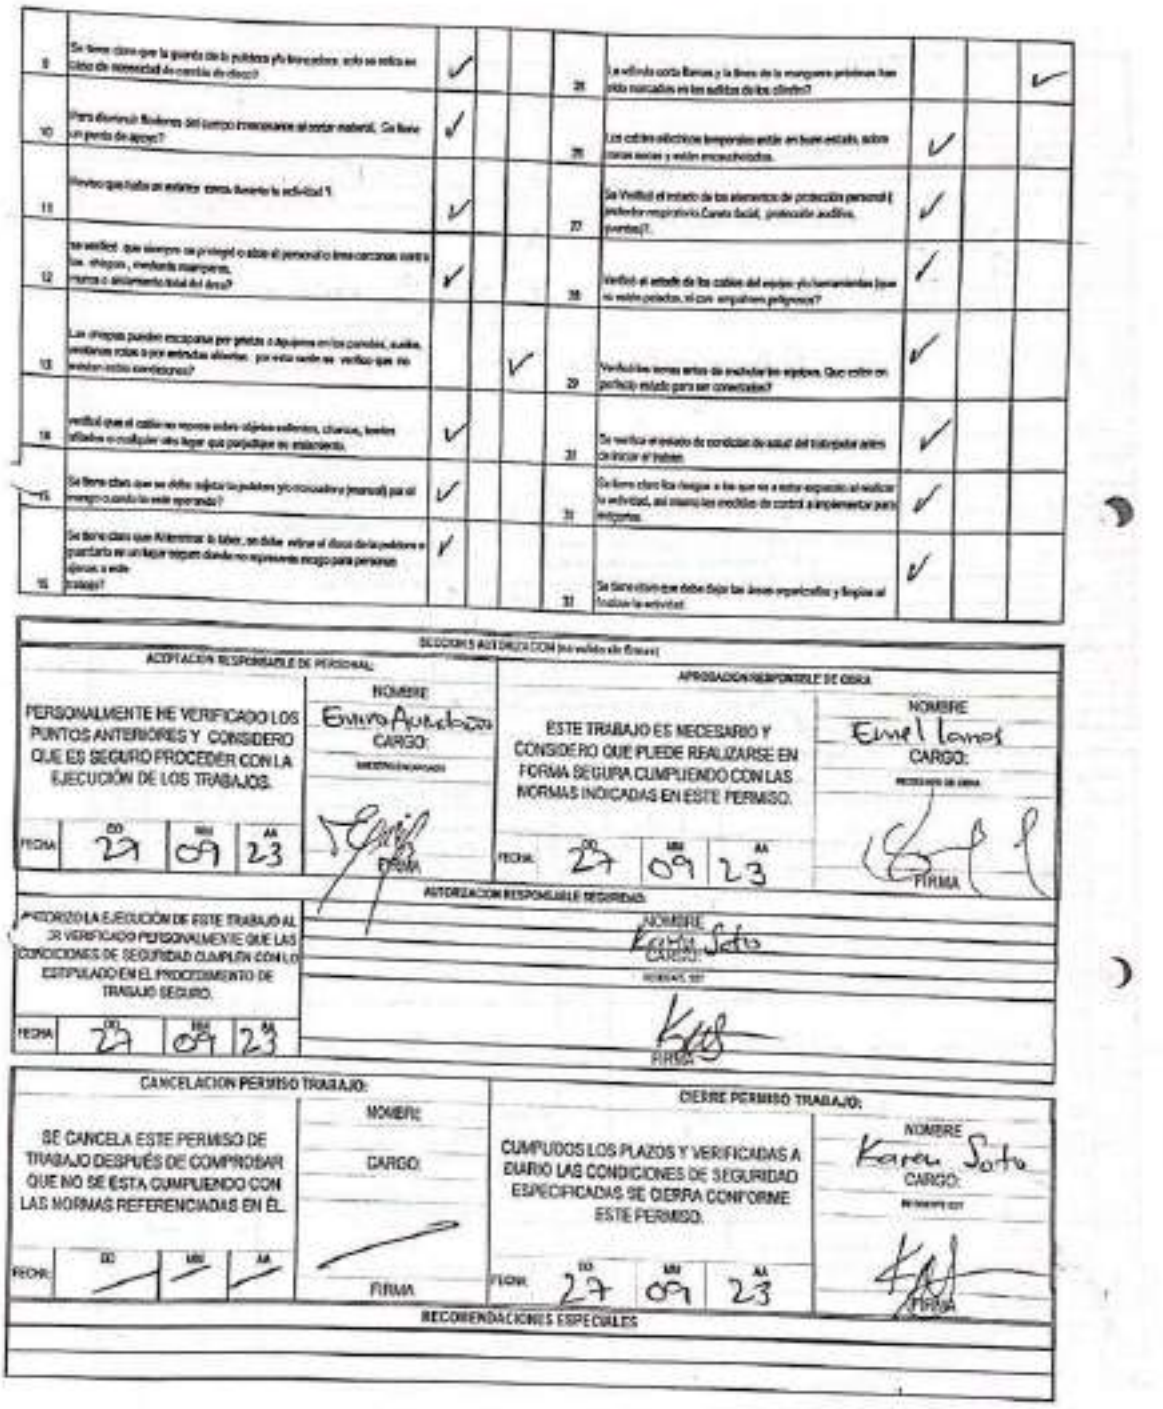

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se tiene claro que la guarda de la palabra y/o herramientas solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco? | ✓ | | | 26 | La señal de cinta Barras y la línea de la manguera peligrosa han sido marcadas en los sitios de los cilindro? | | | ✓ |
| 10 | Para disminuir Riesgos del cuerpo manipulando el cortar material, Se tiene un punto de apoyo? | ✓ | | | 25 | Los cilindros oxicortes temporales están en buen estado, sobre ruedas seguras y están encadenados. | ✓ | | |
| 11 | Revisó que todos los extintores estén dentro la actividad ? | ✓ | | | 27 | Se Verificó el estado de los elementos de protección personal ( protector respiratorio Careta facial, protección auditiva, guantes)? | ✓ | | |
| 12 | se verificó que siempre se proteger o aislar el personal o áreas cercanas contra los chispas , escoria manguera, mientras o alrededor total del área? | ✓ | | | 28 | Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos? | ✓ | | |
| 13 | Las chispas pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas cubos o por entradas abiertas por esto antes se verifico que no existan estas condiciones? | | ✓ | | 29 | Verificó las zonas antes de ingresar los equipos, Que estén en perfecto estado para ser conectados? | ✓ | | |
| 14 | verificó que el cable no esponga sobre objetos calientes, chamas, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento. | ✓ | | | 31 | Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo | ✓ | | |
| 15 | Se tiene claro que se debe inspeccionar los pulidores y/o mascarilla y (manual) por el mango cuando la vida esté agotando? | ✓ | | | 32 | Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos. | ✓ | | |
| 16 | Se tiene claro que Antes de retirar la tuerca, se debe retirar el disco de la pulidora y guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este trabajo? | ✓ | | | 33 | Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad | ✓ | | |

SE DICTAMINA AUTORIZACION (no valido sin firmas)

**ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:**

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE: Enrique Avendaño
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 27 MM 09 AA 23

**APROBACION RESPONSABLE DE OBRA**

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

NOMBRE: Emel Lamos
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 27 MM 09 AA 23

**AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:**

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.

NOMBRE: Karen Soto
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 27 MM 09 AA 23

**CANCELACION PERMISO TRABAJO:**

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN EL.

NOMBRE:
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD / MM / AA


**CIERRE PERMISO TRABAJO:**

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE: Karen Soto
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 27 MM 09 AA 23

**RECOMENDACIONES ESPECIALES**

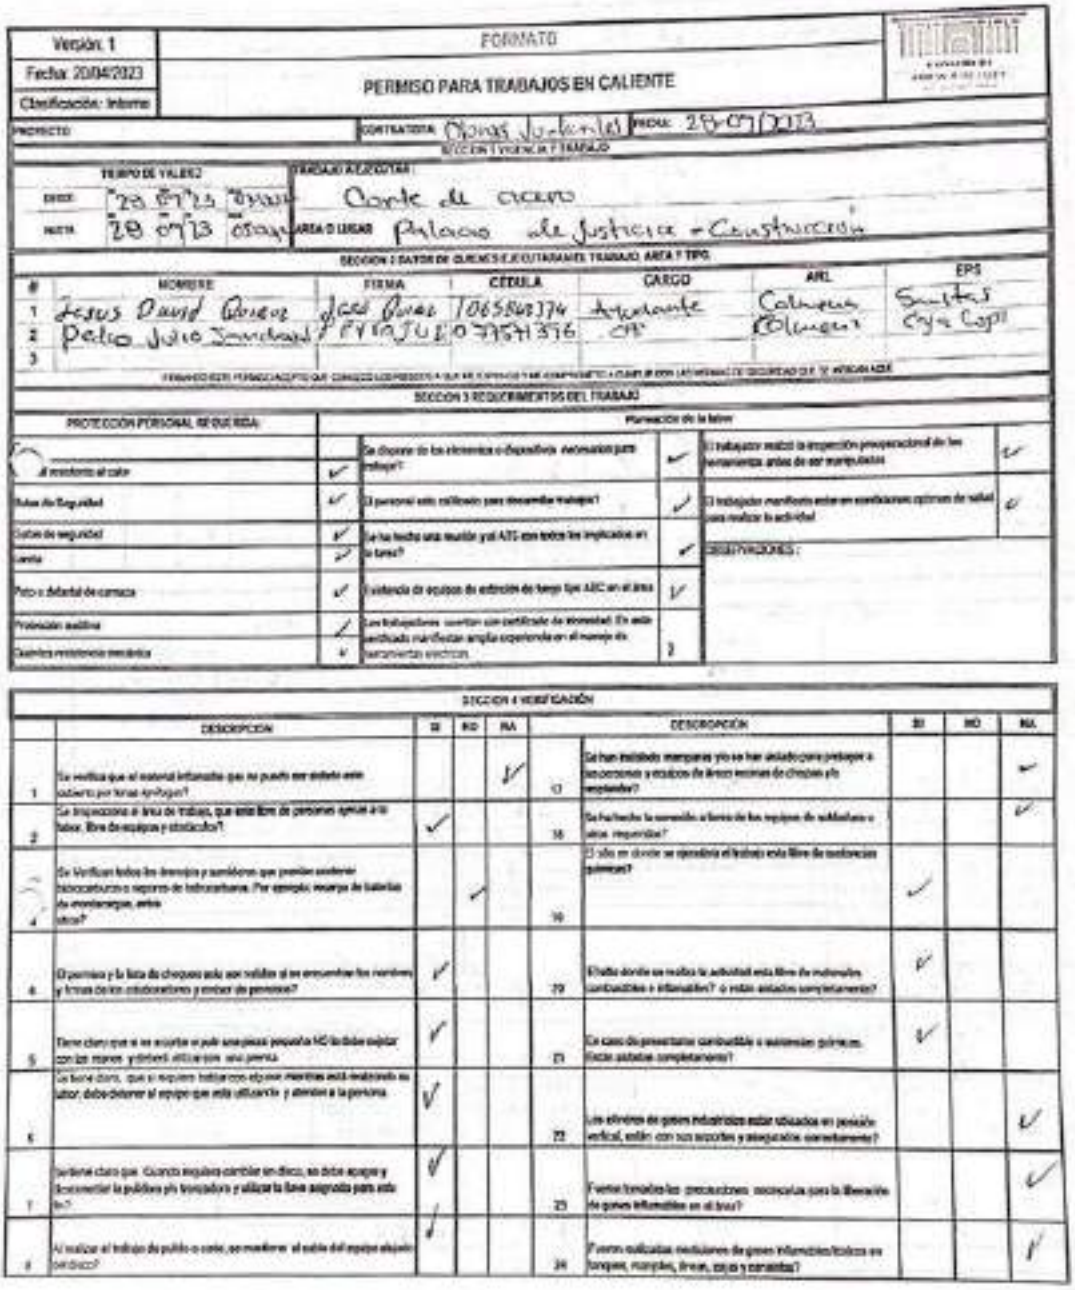

Versión: 1 | FORMATO

Fecha: 20/04/2023 | PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Clasificación: Interna

PROYECTO: | CONTRATISTA: Obras Judiciales | FECHA: 28-07-2023

SECCIÓN 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ

DESDE: 28-07-23 8:00am

HASTA: 28-07-23 05:00pm

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de cable

AREA O LUGAR: Palacio de Justicia - Construcción

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

| # | NOMBRE | FIRMA | CEDULA | CARGO | ARL | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus David Gomez | Jesus Gomez | 1065803174 | Ayudante | Colmena Colmena | Sanitas Coy. Cop. |
| 2 | Pedro Julio Sandoval | PEDRO JULIO | 77571376 | OP | | |
| 3 | | | | | | |


AUTORIZO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS PELIGROS A LOS QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD QUE SE INDICAN AQUÍ.

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

| PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA: | | Planeación de la labor | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al contacto al calor | ✓ | Se dispone de las herramientas o dispositivos necesarios para trabajar? | ✓ | El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas | ✓ |
| Botas de Seguridad | ✓ | El personal está calificado para desarrollar trabajos? | ✓ | El trabajador manifiesta estar en condiciones óptimas de salud para realizar la actividad | ✓ |
| Gafas de seguridad | ✓ | Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea? | ✓ | OBSERVACIONES: | |
| Careta | ✓ | | | | |
| Peto o delantal de carnaza | ✓ | Evidencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área | ✓ | | |
| Protección auditiva | ✓ | Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas | ✓ | | |
| Guantes resistentes mecánicos | ✓ | | | | |

SECCION 4 VERIFICACIÓN

| | DESCRIPCION | SI | NO | NA | | DESCRIPCION | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica que el material inflamable que se pueda ser dañado esté cubierto por telas ignífugas? | | | ✓ | 10 | Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a los operarios y vecinos de áreas externas de chispas y/o salpicaduras? | | | ✓ |
| 2 | Se inspecciona el área de trabajo, que esta libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos? | ✓ | | | 16 | Se ha hecho la extensión o bloqueo de los equipos de soldadura o cortes requeridos? | | | ✓ |
| 4 | Se Verifican todos los elementos y suministros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: mangueras de baterías de montacargas, entre otros? | | ✓ | | 19 | El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas? | ✓ | | |
| 6 | El permiso y la lista de chequeo solo son validos si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y avalan de permisos? | ✓ | | | 22 | El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles o inflamables? o están aislados completamente? | ✓ | | |
| 5 | Tiene claro que si se ausenta o pide una pausa pequeña NO le debe dejar con las manos y/o herramientas en su puesto | ✓ | | | 23 | En caso de presentarse combustible o sustancias químicas fueron aislados completamente? | ✓ | | |
| 8 | Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras está realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona | ✓ | | | 32 | Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y amarrados correctamente? | | | ✓ |
| 7 | Tiene claro que Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o trompadora y utilizar la llave asignada para esto? | ✓ | | | 25 | Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área? | | | ✓ |
| 9 | Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el orden del equipo alejado del disco? | ✓ | | | 34 | Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, recipientes, líneas, cajas y canaletas? | | | ✓ |

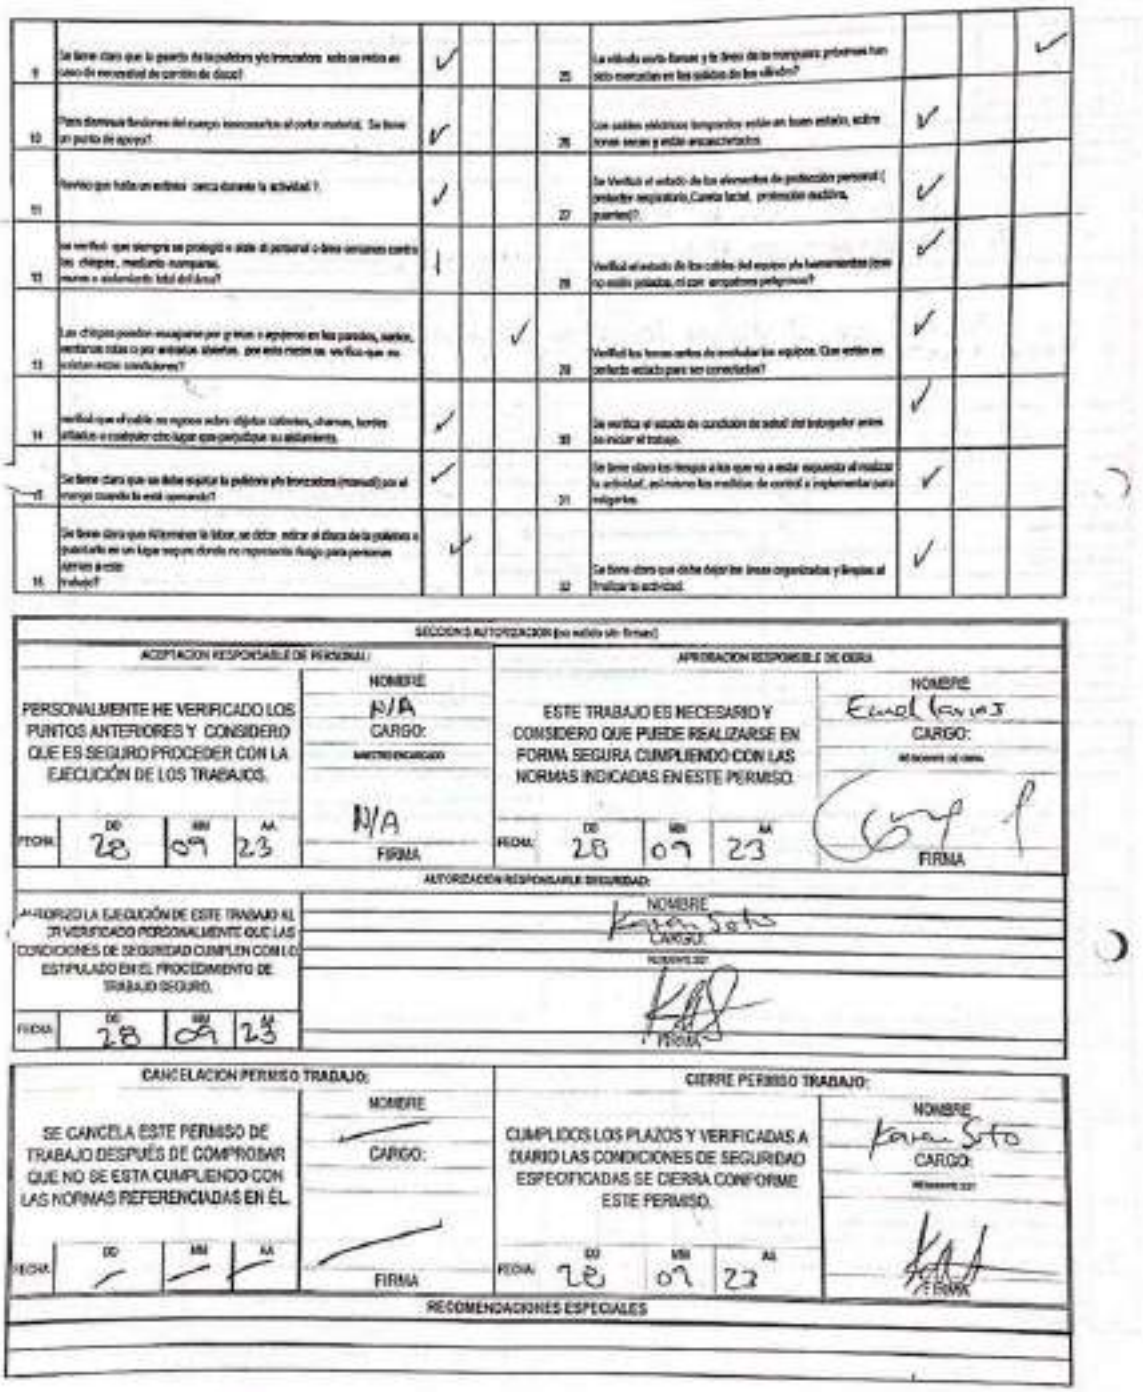

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se tiene claro que la puesta de las poleas y/o trenzados solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco? | ✓ | | | 25 | La vibrada evita flamas y la lesión de las manguera previenen han sido marcadas en los sobres de los vibros? | | | | ✓ |
| 10 | Para disminuir fisuras del cuerpo innecesarios al corte material, Se tiene un punto de apoyo? | ✓ | | | 26 | Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre horas secas y están encauchetados | ✓ | | | |
| 11 | Revisa que haya un extintor cerca durante la actividad ? | ✓ | | | 27 | Se Verifica el estado de los elementos de protección personal ( protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)? | ✓ | | | |
| 12 | se verifica que siempre se protegió o aisle al personal o área cercanos contra los chispas, mediante mamparas, mantas o aislamiento total del área? | | | | 28 | Verificó el estado de los cables del equipo ya herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos? | ✓ | | | |
| 13 | Las chispas pueden ocasionar por grietas o agujeros en las paredes, techos, ventanas cielos o por entradas abiertas, por esto previo se verifica que no existan estos conductores? | | | ✓ | 29 | Verificó los tomas antes de conectar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados? | ✓ | | | |
| 14 | verificó que el cable no repose sobre objetos cortantes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento. | ✓ | | | 30 | Se verifica el estado de condiciones de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo. | ✓ | | | |
| 15 | Se tiene claro que se debe soplar la pólvora y/o trenzados (manual) por el mango cuando la está operando? | ✓ | | | 31 | Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo los medidas de control a implementar para mitigarlos. | ✓ | | | |
| 16 | Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora o trenzadora en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas alrededor del trabajo? | ✓ | | | 32 | Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad. | ✓ | | | |


**SECCION 3: AUTORIZACION** (no exhibir sin firmas)

| ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL: | | APROBACION RESPONSABLE DE OBRA: | |
|---|---|---|---|
| PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | NOMBRE: N/A<br>CARGO: MAESTRO ENCARGADO | ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO. | NOMBRE: Eladio Leon J<br>CARGO: RESIDENTE DE OBRA |
| FECHA: DD 28 MM 09 AA 23 | N/A<br>FIRMA | FECHA: DD 28 MM 09 AA 23 | FIRMA |

| AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD: | | |
|---|---|---|
| AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO. | NOMBRE: Karen Soto<br>CARGO: RESIDENTE SST | |
| FECHA: DD 28 MM 09 AA 23 | | FIRMA |

| CANCELACION PERMISO TRABAJO: | | CIERRE PERMISO TRABAJO: | |
|---|---|---|---|
| SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL. | NOMBRE: —<br>CARGO: | CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO. | NOMBRE: Karen Soto<br>CARGO: RESIDENTE SST |
| FECHA: DD — MM — AA — | FIRMA | FECHA: DD 28 MM 09 AA 23 | FIRMA |

**RECOMENDACIONES ESPECIALES**

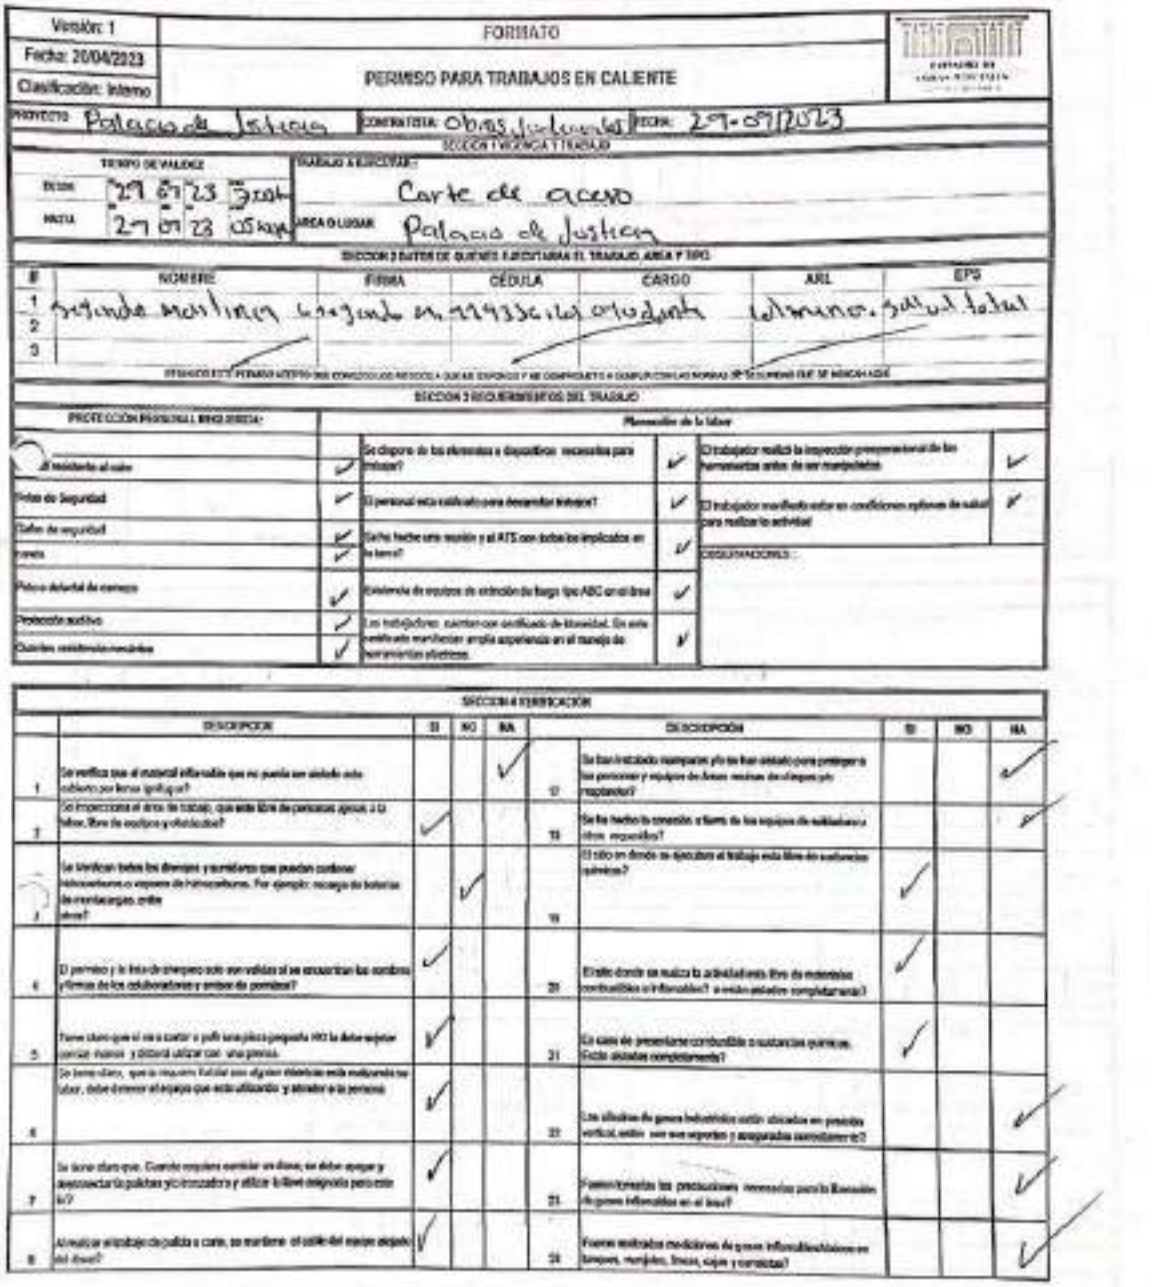

Versión: 1 | FORMATO
Fecha: 20/04/2023 | PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE
Clasificación: Interno

PROYECTO: Palacio de Justicia | CONTRATISTA: Obras Judiciales | FECHA: 29-07-2023

SECCIÓN 1 VIGENCIA TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ
FECHA: 29 07 23 7:00 a.m.
HASTA: 29 07 23 05 p.m.

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de acero
AREA O LUGAR: Palacio de Justicia

SECCIÓN 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y EPC


| # | NOMBRE | FIRMA | CÉDULA | CARGO | ARL | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segundo Martinez | Segundo M. | 9999361161 | oficial | Colmena | Salud Total |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

SECCIÓN 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

| PROTECCIÓN PERSONAL Y RIESGO ASOCIADO | | Planeación de la labor | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al incidente al calor | ✓ | Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar? | ✓ | El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas | ✓ |
| Botas de Seguridad | ✓ | El personal está calificado para desarrollar trabajos? | ✓ | El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad | ✓ |
| Gafas de seguridad | ✓ | Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea? | ✓ | OBSERVACIONES: | |
| Careta | ✓ | | | | |
| Polaina delantal de cuerpo | ✓ | Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área | ✓ | | |
| Protección auditiva | ✓ | Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este caso deben manifestar amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas | ✓ | | |
| Guantes resistentes mecánicos | ✓ | | | | |

SECCIÓN 4 VERIFICACIÓN

| | DESCRIPCIÓN | SI | NO | NA | | DESCRIPCIÓN | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado esta cubierto por lonas ignifugas? | | | ✓ | 17 | Se han instalado mamparas y/o lonas anticalor para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas donde exista gas respirador? | | | ✓ |
| 2 | Se inspecciona el área de trabajo, que este libre de personas ajenas a la labor, libre de escapes y olor alcohol? | ✓ | | | 18 | Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura a otros equipos? | | | ✓ |
| 3 | Se verifican todos los diversos y numerosos que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre otros? | | ✓ | | 19 | El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas? | ✓ | | |
| 4 | El permiso y la lista de chequeo solo son validos si se encuentran las nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permiso? | ✓ | | | 20 | El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles o inflamables? a estos estarán completamente? | ✓ | | |
| 5 | Tiene claro que si va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y debera utilizar con una prensa | ✓ | | | 21 | En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Están aisladas completamente? | ✓ | | |
| 6 | Se tiene claro, que si requiere fundir con algún elemento esta malogrando su calzar, debe cambiar el equipo que esta utilizando y alertar a la persona | ✓ | | | 22 | Los silindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, estos con sus soportes y amarrados correctamente? | | | ✓ |
| 7 | Se tiene claro que, Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o esmeriladora y utilizar la llave adecuada para esto? | ✓ | | | 23 | Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el lugar? | | | ✓ |
| 8 | Al realizar el trabajo de pulida o corte, se mantiene el orden del equipo alejado del disco? | ✓ | | | 24 | Fueron tomadas medidas de gases inflamables/explosivos en tanques, montajes, líneas, cajas y conductos? | | | ✓ |

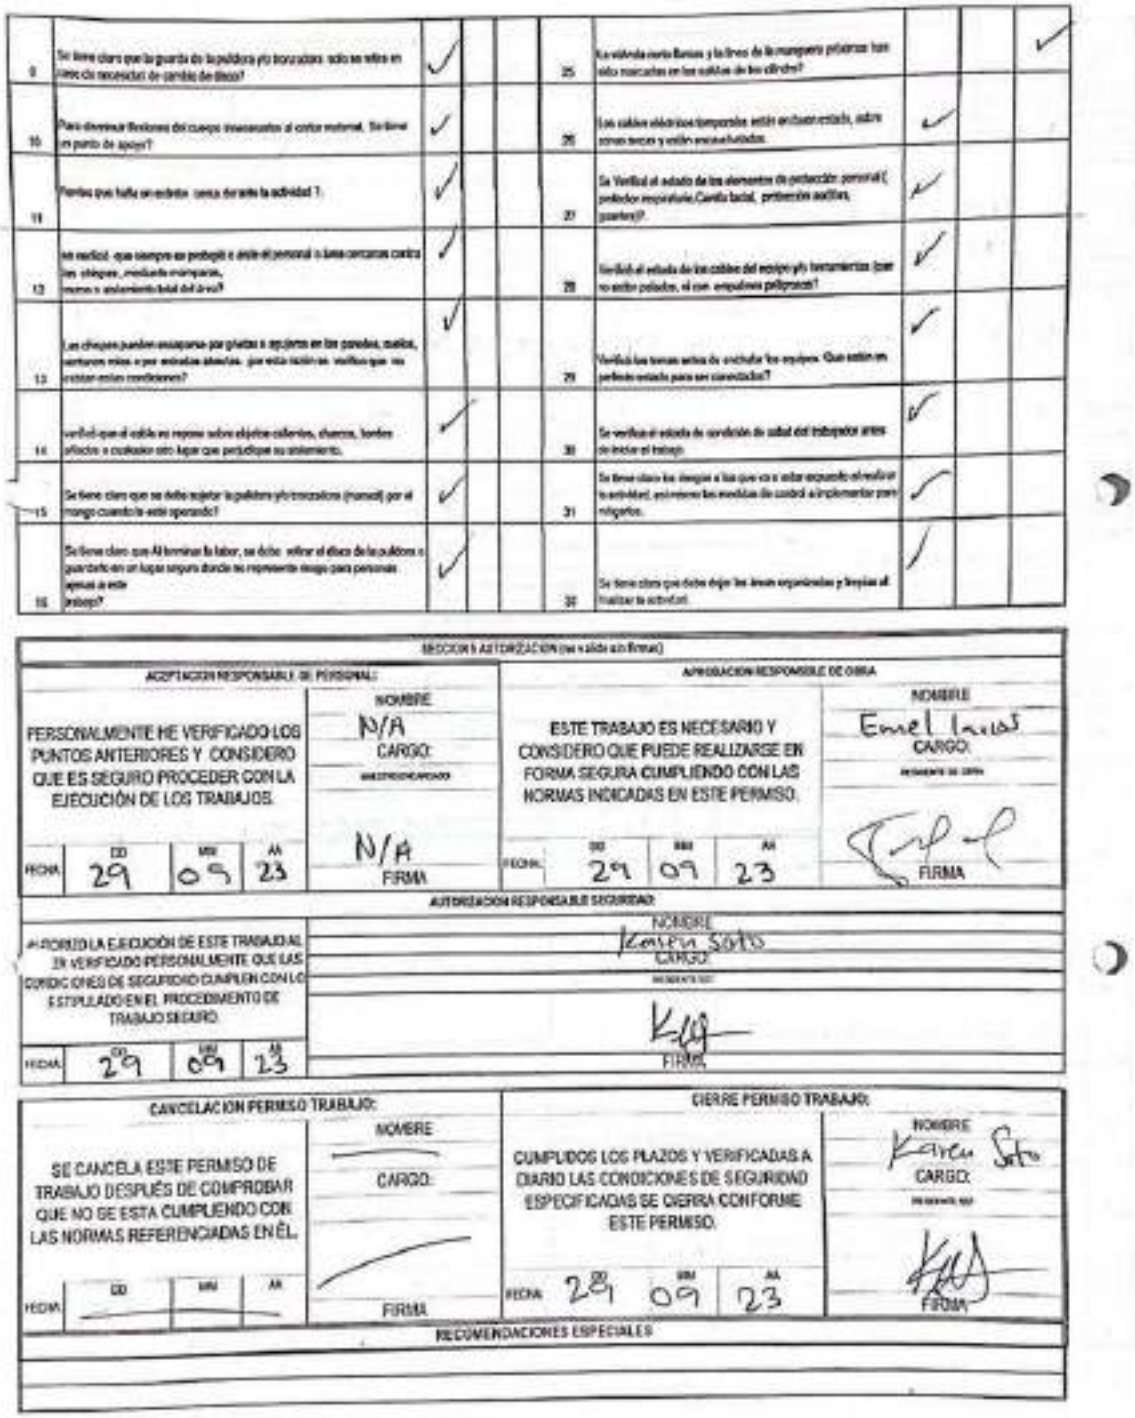

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o trozadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco? | ✓ | | | 25 | La vivienda cuenta Barras y la línea de la manguera polarizada han sido marcadas en los cuadros de los circuitos? | | | ✓ |
| 10 | Para disminuir lesiones del cuerpo ocasionadas al contar material. Se tiene un punto de apoyo? | ✓ | | | 26 | Los cables eléctricos temporales están enclaustrados, sobre zonas secas y están encauchetados. | ✓ | | |
| 11 | Piensa que hallo un accidente cerca durante la actividad ? | ✓ | | | 27 | Se Verifica el estado de los elementos de protección personal ( protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)? | ✓ | | |
| 12 | se realizó que siempre se protegió o aisló el personal o áreas cercanas contra las chispas , mediante mamparas, mantas o aislamiento total del área? | ✓ | | | 28 | Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, si con empalmes peligrosos)? | ✓ | | |
| 13 | Las chispas pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, aberturas mixtas o por entradas abiertas. ¿se evita incluso se verifica que no existan estas condiciones? | ✓ | | | 29 | Verificó las tomas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados? | ✓ | | |
| 14 | verificó que el cable no repose sobre objetos cortantes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento. | ✓ | | | 30 | Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo | ✓ | | |
| 15 | Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o trozadora (manual) por el mango cuando la está operando? | ✓ | | | 31 | Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos. | ✓ | | |
| 16 | Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora o guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este proceso? | ✓ | | | 32 | Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad. | ✓ | | |

**SECCION 5 AUTORIZACION (no valido sin firmas)**

**ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:**

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE: N/A
CARGO:
FIRMA: N/A

FECHA: DD 29 MM 09 AA 23

**APROBACION RESPONSABLE DE OBRA**

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

NOMBRE: Emel Iaciai
CARGO:
FIRMA:

FECHA: DD 29 MM 09 AA 23

**AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:**

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HE VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

NOMBRE: Karen Soto
CARGO:
FIRMA:

FECHA: DD 29 MM 09 AA 23

**CANCELACION PERMISO TRABAJO:**

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.

NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:

FECHA: DD MM AA


**CIERRE PERMISO TRABAJO:**

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE: Karen Soto
CARGO:
FIRMA:

FECHA: DD 29 MM 09 AA 23

**RECOMENDACIONES ESPECIALES**

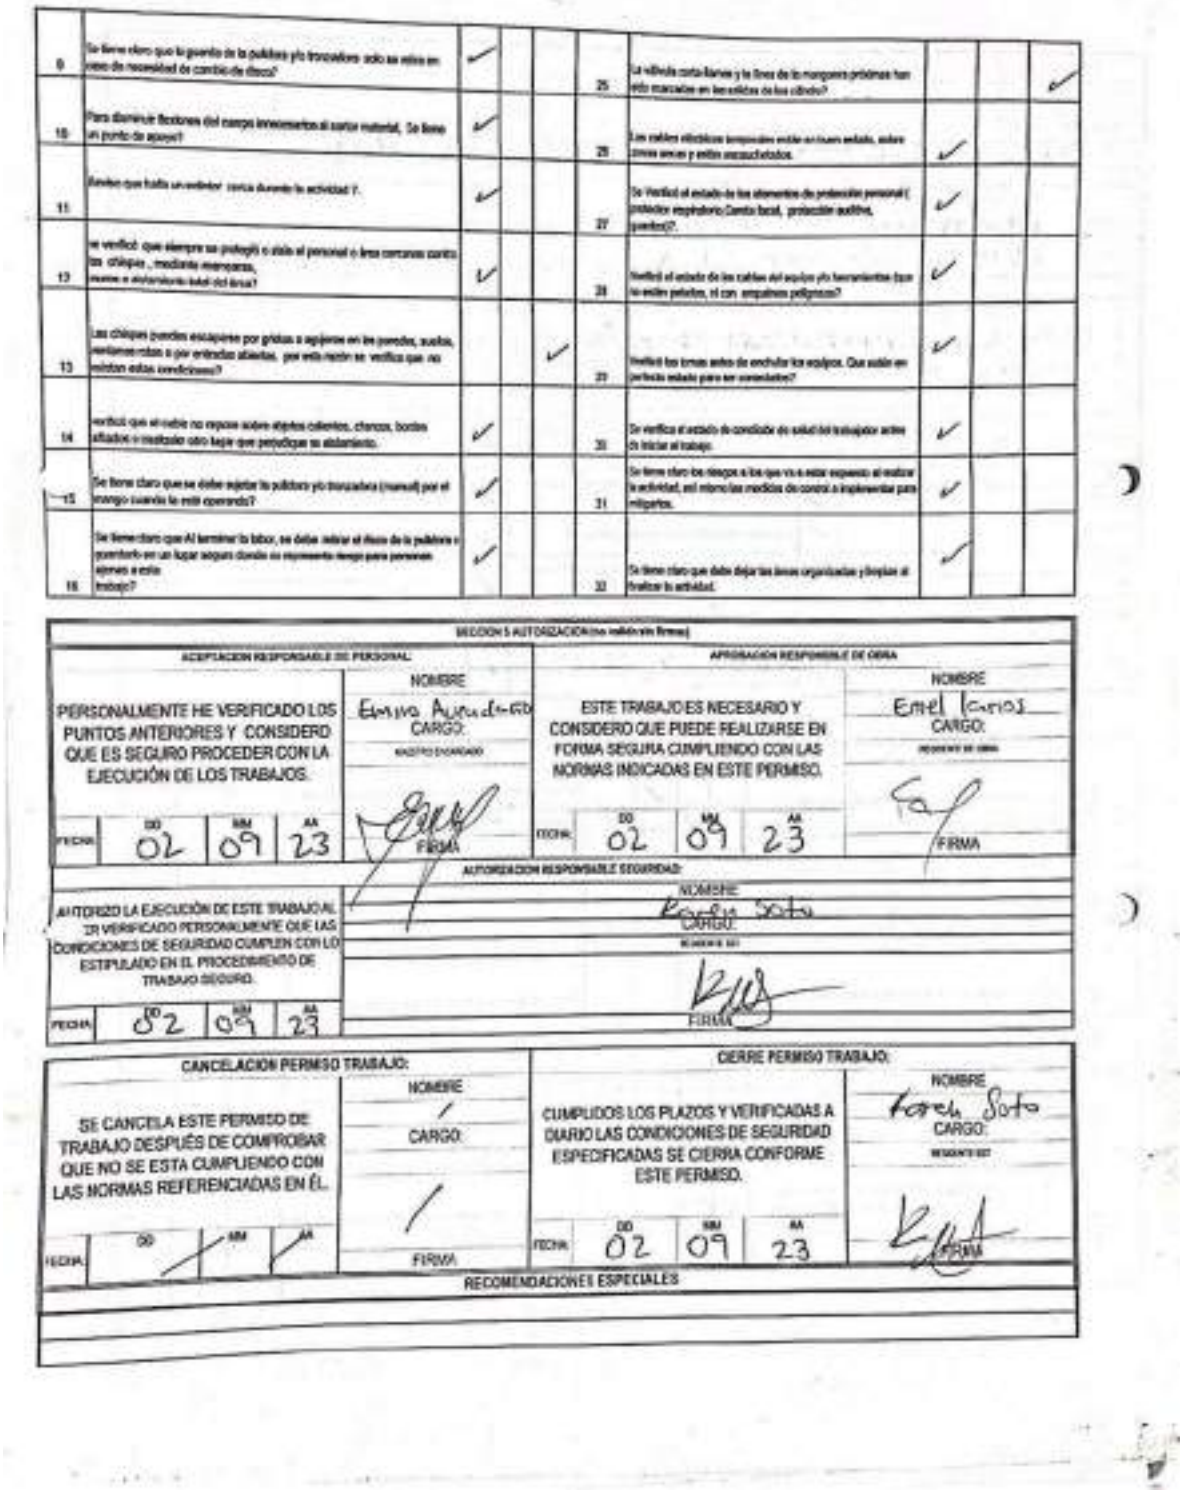

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o troceadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco? | ✓ | | | 25 | La rebaba corta llantas y la línea de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los cilindro? | | | ✓ |
| 10 | Para disminuir flexiones del cuerpo innecesarios al sostar material, Se tiene un punto de apoyo? | ✓ | | | 26 | Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas y están encauchetados. | ✓ | | |
| 11 | Existen que habla un extintor cerca durante la actividad ?. | ✓ | | | 27 | Se Verifica el estado de los elementos de protección personal ( protector respiratorio,Casco facial, protección auditiva, guantes)?. | ✓ | | |
| 12 | se verifica que siempre se protegió o aisló el personal o área cercanas contra las chispas , mediante mamparas, mantas o elementos ignífugos? | ✓ | | | 28 | Verifica el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos? | ✓ | | |
| 13 | Las chispas pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, aberturas rotas o por entradas abiertas, por esta razón se verifica que no existan estas condiciones? | | | ✓ | 29 | Verifica los tomas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser suministrados? | ✓ | | |
| 14 | verifica que el cable no expuse sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o mantener otro tipo que perjudique su aislamiento. | ✓ | | | 30 | Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo. | ✓ | | |
| 15 | Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o troceadora (manual) por el mango cuando la está operando? | ✓ | | | 31 | Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos. | ✓ | | |
| 16 | Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora y guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a esta trabajo? | ✓ | | | 32 | Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad. | ✓ | | |


**SECCION 5 AUTORIZACION** (no validos sin firmas)

| ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL | | APROBACION RESPONSABLE DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | NOMBRE: Elmira Arandeño<br>CARGO: MAESTRO ENCARGADO<br>FIRMA | ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO. | NOMBRE: Ever Garcia<br>CARGO: RESIDENTE DE OBRA<br>FIRMA |
| FECHA: DD 02 MM 09 AA 23 | | FECHA: DD 02 MM 09 AA 23 | |

| AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD: | |
|---|---|
| AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO. | NOMBRE: Karen Soto<br>CARGO: RESIDENTE SST<br>FIRMA |
| FECHA: DD 02 MM 09 AA 23 | |

| CANCELACION PERMISO TRABAJO: | | CIERRE PERMISO TRABAJO: | |
|---|---|---|---|
| SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL. | NOMBRE: /<br>CARGO: /<br>FIRMA | CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO. | NOMBRE: Karen Soto<br>CARGO: RESIDENTE SST<br>FIRMA |
| FECHA: DD / MM / AA | | FECHA: DD 02 MM 09 AA 23 | |

RECOMENDACIONES ESPECIALES

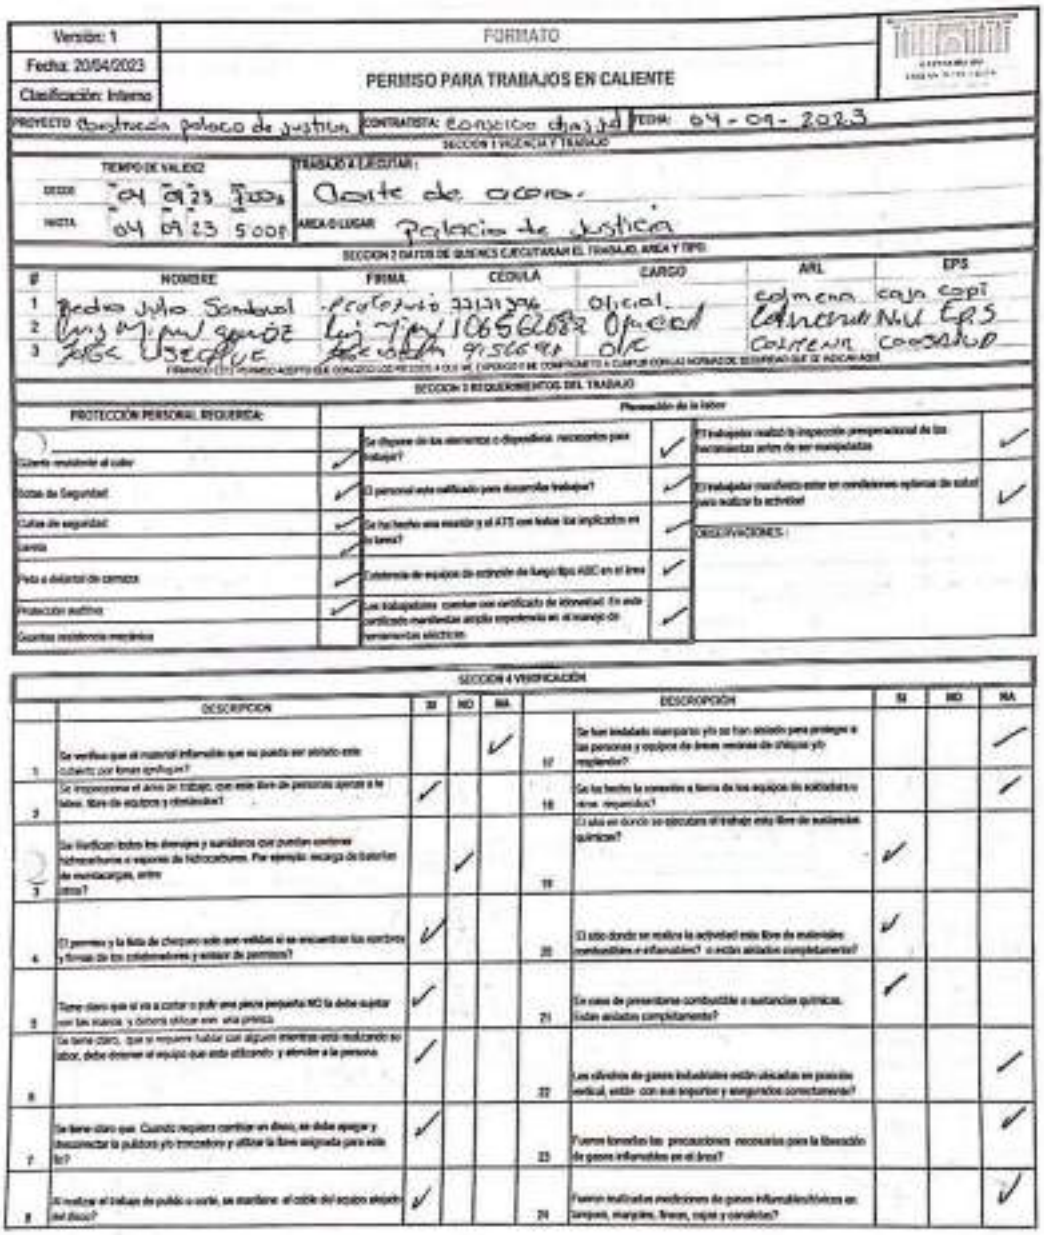

| Versión: 1 | FORMATO |
|---|---|
| Fecha: 20/04/2023 | PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE |
| Clasificación: Interna | |

PROYECTO: Construcción palacio de justicia CONTRATISTA: consorcio obras jud FECHA: 04-09-2023

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ: DESDE 04 09 23 7:00a HASTA 04 09 23 5:00p

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de cable.

AREA O LUGAR: Palacio de Justicia

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO


| # | NOMBRE | FIRMA | CEDULA | CARGO | ARL | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Julio Sandoval | | 32131396 | Oficial | colmena | caja copi |
| 2 | Luis Miguel Ayala | | 1065662082 | Oficial | colmena | NUEVA EPS |
| 3 | Jose Usecche | | 91516491 | OIR | colmena | coosalud |

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

| PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA: | | Planeación de la labor | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco resistente al calor | ✓ | Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar? | ✓ | El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas | ✓ |
| Botas de Seguridad | ✓ | El personal está calificado para desarrollar trabajos? | ✓ | El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad | ✓ |
| Gafas de seguridad | ✓ | Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea? | ✓ | OBSERVACIONES: | |
| Guantes | ✓ | Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área | ✓ | | |
| Peto o delantal de carnaza | ✓ | Los trabajadores cuentan con certificado de alturalidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas | ✓ | | |
| Protección auditiva | ✓ | | | | |
| Guantes resistentes mecánicos | | | | | |

SECCION 4 VERIFICACIÓN

| | DESCRIPCION | SI | NO | NA | | DESCRIPCION | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica que el material inflamable que se pueda ser afectado este cubierto por lonas ignifugas? | | | ✓ | 17 | Se han instalado elementos de protección para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor? | | | ✓ |
| 2 | Se inspecciona el área de trabajo, con este libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y materiales? | ✓ | | | 18 | Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura o corte requerido? | | | ✓ |
| 3 | Se verifican todos los elementos y suministros con puntos externos hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre otros? | | ✓ | | 19 | El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de materiales químicos? | ✓ | | |
| 4 | El permiso y la lista de chequeo solo son validos si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos? | ✓ | | | 20 | El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o están aislados completamente? | ✓ | | |
| 5 | Tiene claro que si va a cortar o pide una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos, y debera utilizar una prensa | ✓ | | | 21 | En caso de presentarse combustible o sustancias químicas, todas aislados completamente? | ✓ | | |
| 6 | Es tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras esta realizando su labor, debe dejarse el equipo que esta utilizando y atender a la persona | ✓ | | | 22 | Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y seguridades correctamente? | | | ✓ |
| 7 | Se tiene claro que Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o rectificadora y utilizar la llave asignada para este fin? | ✓ | | | 23 | Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área? | | | ✓ |
| 8 | Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el costado del equipo alejado del disco? | ✓ | | | 24 | Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en lumpers, manjoles, fosas, cajas y canaletas? | | | ✓ |

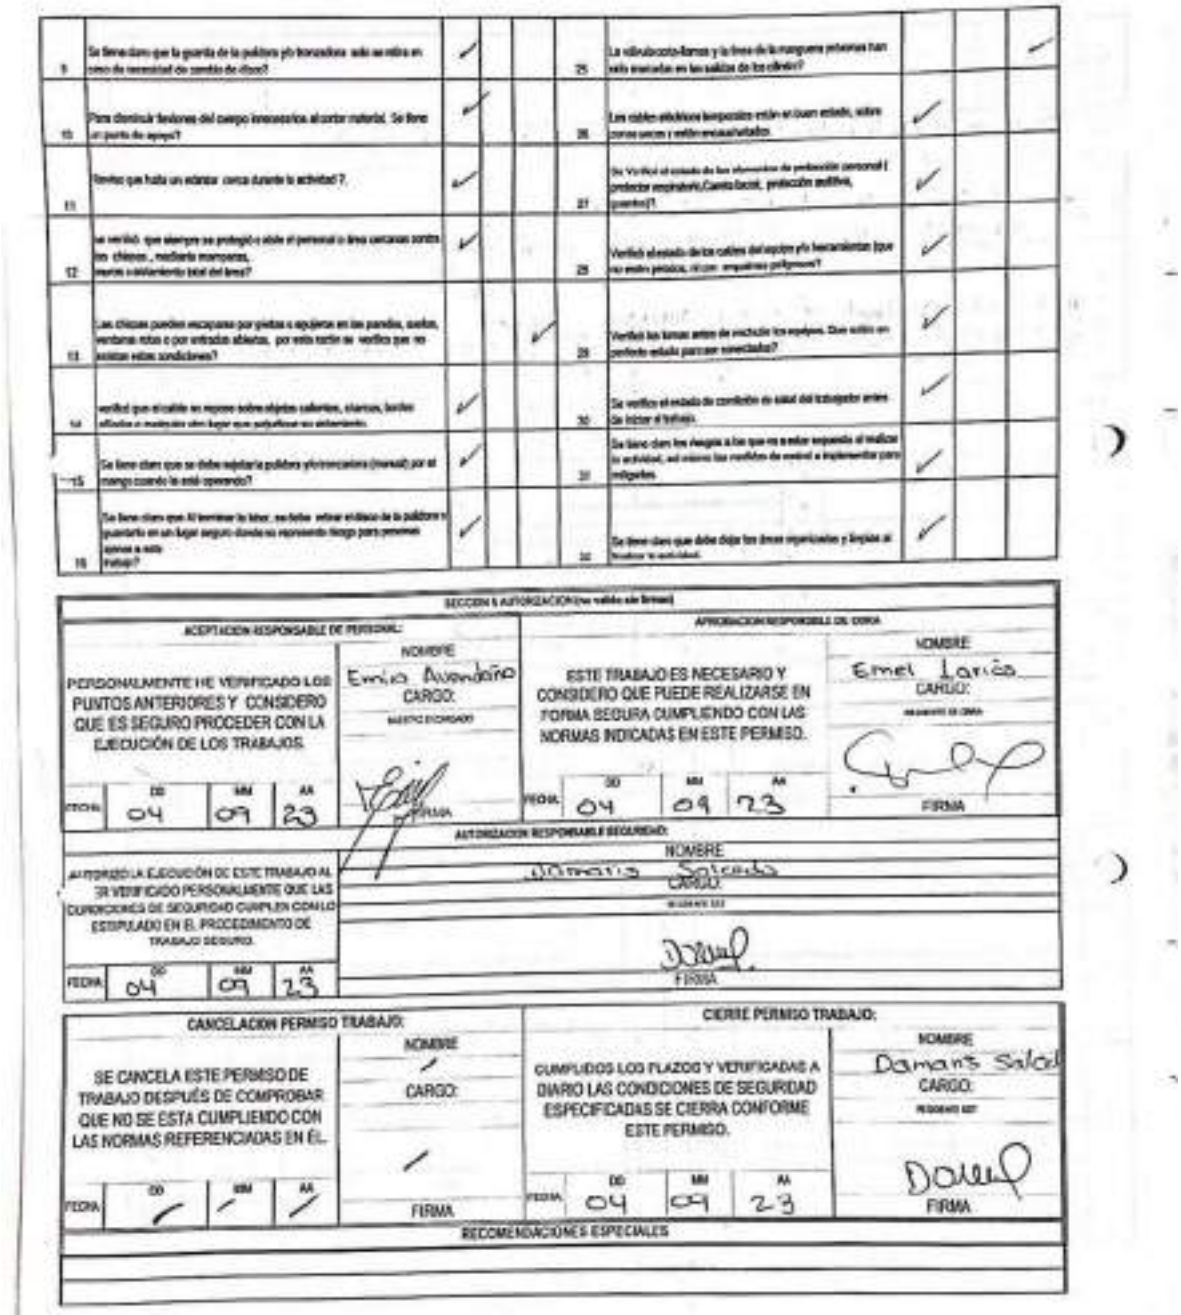

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se tiene claro que la guarda de la polidora y/o herramienta solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco? | ✓ | | | 25 | La viBrakocoto-llamas y la línea de la manguera presentan fugas evacuadas en las salidas de los cilindro? | | | ✓ |
| 10 | Para disminuir lesiones del cuerpo innecesarios al cortar material. Se tiene un punto de apoyo? | ✓ | | | 26 | Los cables eléctricos energizados están en buen estado, sobre cargas secos y están evaluados/validos | ✓ | | |
| 11 | Tenidos que hubo un accidente cerca durante la actividad? | ✓ | | | 27 | Se Verificó el estado de los elementos de protección personal ( protector respiratorio/Careta facial, protección auditiva, guantes)? | ✓ | | |
| 12 | se verificó que siempre se protegió o aisló el personal o área cercanas contra los chispas , mediante mamparas, mantas o aislamiento total del área? | ✓ | | | 28 | Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, rotos empalmes peligrosos)? | ✓ | | |
| 13 | Las chicas pueden escapar por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas rotas o por entradas abiertas, por esto tanto se verifica que no existan estas condiciones? | | | ✓ | 29 | Verifico las tomas antes de conectar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados? | ✓ | | |
| 14 | verifico que el cable no repose sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o materiales con fuego que perjudique su aislamiento. | ✓ | | | 30 | Se verifico el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo. | ✓ | | |
| 15 | Se tiene claro que se debe reportar la polidora y/o herramienta (manual) por el mango cuando la está operando? | ✓ | | | 31 | Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos | ✓ | | |
| 16 | Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la polidora y guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a esta Labor? | ✓ | | | 32 | Se tiene claro que debe dejar los áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad. | ✓ | | |

**SECCION 5 AUTORIZACION** (no validos sin firmas)

**ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:**

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE: Emilio Avendaño
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 04 MM 09 AA 23

**APROBACION RESPONSABLE DE OBRA**

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

NOMBRE: Emel Larios
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 04 MM 09 AA 23

**AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:**

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL SER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.

NOMBRE: Damaris Salcedo
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 04 MM 09 AA 23

**CANCELACION PERMISO TRABAJO:**

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.

NOMBRE: /
CARGO: /
FIRMA

FECHA: DD / MM / AA /


**CIERRE PERMISO TRABAJO:**

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE: Damaris Salcedo
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD 04 MM 09 AA 23

**RECOMENDACIONES ESPECIALES**

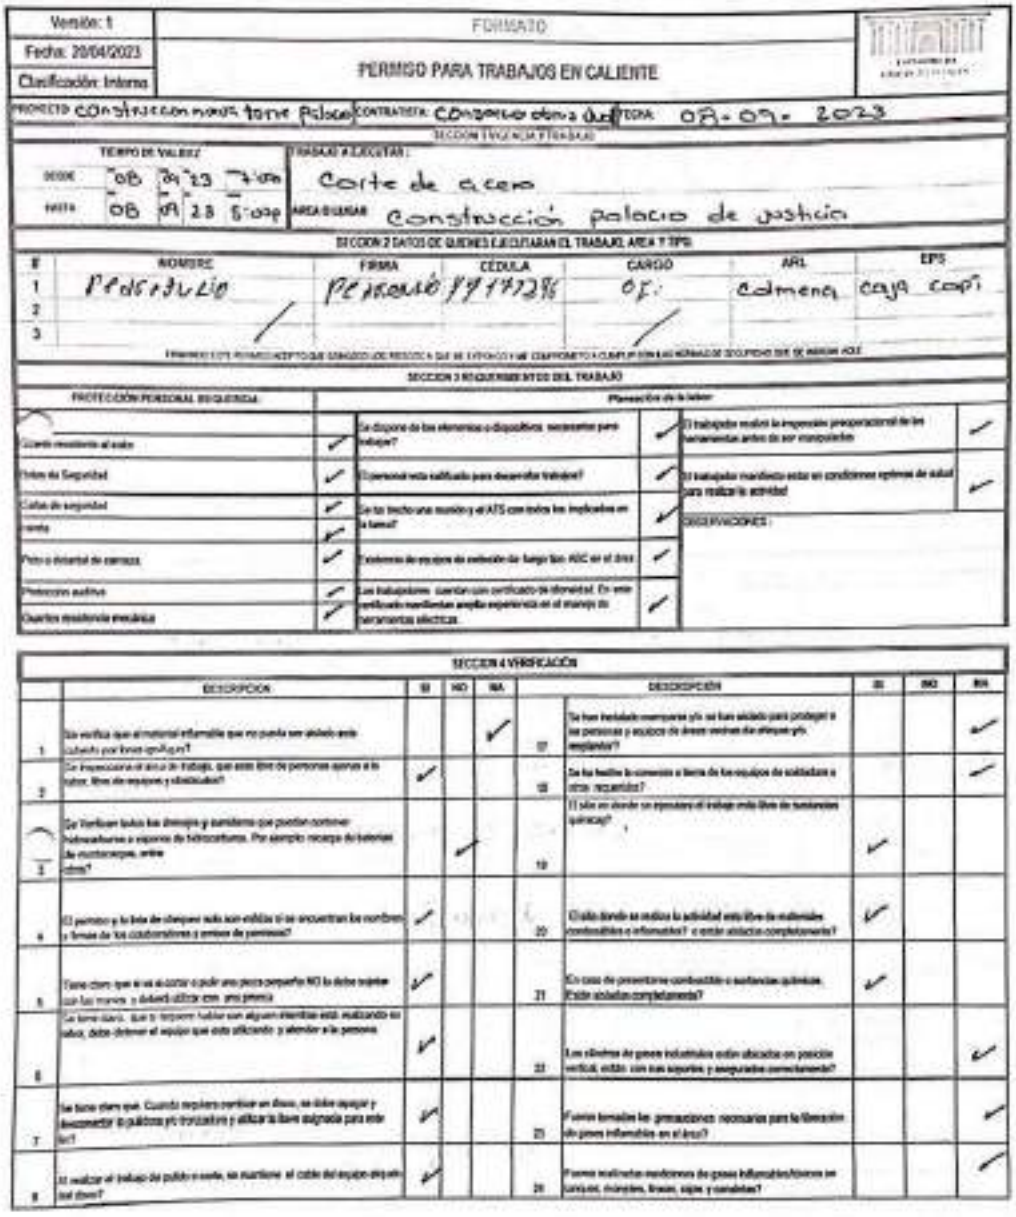

Versión: 1 | FORMATO

Fecha: 20/04/2023 | PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Clasificación: Interna

PROYECTO construccion nuevo torre Palacio CONTRATISTA: Consorcio obras Jud FECHA: 08-07-2023

SECCION 1 VIGENCIA TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ

DESDE 08 04 23 7:00

HASTA 08 04 23 5:00

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de acero

AREA DE LABOR: Construcción palacio de justicia

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO


| # | NOMBRE | FIRMA | CEDULA | CARGO | ARL | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Julio | Pedro Julio | 1111728[illegible] | Of. | colmena | caja cop |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

| PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA | | Planeación de la labor | | |
|---|---|---|---|---|
| Casco resistente al golpe | ✓ | Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar? | ✓ | El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas | ✓ |
| Visor de Seguridad | ✓ | El personal está calificado para desarrollar labores? | ✓ | El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad | ✓ |
| Gafas de seguridad | ✓ | Se ha hecho una revisión y el ATS con todos los implicados en la tarea? | ✓ | OBSERVACIONES: |
| Careta | ✓ | | | |
| Peto o delantal de carnaza | ✓ | Existencia de equipo de extinción de fuego tipo ABC en el área | ✓ | |
| Protectores auditivos | ✓ | Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas | ✓ | |
| Guantes resistencia mecánica | ✓ | | | |

SECCION 4 VERIFICACIÓN

| | DESCRIPCIÓN | SI | NO | NA | | DESCRIPCIÓN | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado esté cubierto por lonas ignífugas? | | | ✓ | 17 | Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o residuos? | | | ✓ |
| 2 | Se inspecciona el área de trabajo, que esta libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos? | ✓ | | | 18 | Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura o otros requeridos? | | | ✓ |
| 3 | Se Verifican todos los riesgos y sistemas que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo recarga de baterías de montacargas, entre otros? | | ✓ | | 19 | El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas? | ✓ | | |
| 4 | El permiso y la lista de chequeo solo son válidos si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos? | ✓ | | | 20 | El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles o inflamables? o estan aislados completamente? | ✓ | | |
| 5 | Tener claro que si va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y debera utilizar con una prensa | ✓ | | | 21 | En caso de presentarse combustión o sustancias químicas. Estan aisladas completamente? | ✓ | | |
| 6 | Se tiene claro, que si alguien hablar con alguien alrededor está realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona | ✓ | | | 22 | Los cilindros de gases industriales estan ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente? | | | ✓ |
| 7 | Se tiene claro que, Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o trituradora y utilizar la llave asignada para este fin? | ✓ | | | 23 | Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área? | | | ✓ |
| 8 | Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cable del equipo alejado del disco? | ✓ | | | 24 | Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/toxicos en sumideros, alcantarillas, fosas, cajas y canaletas? | | | ✓ |

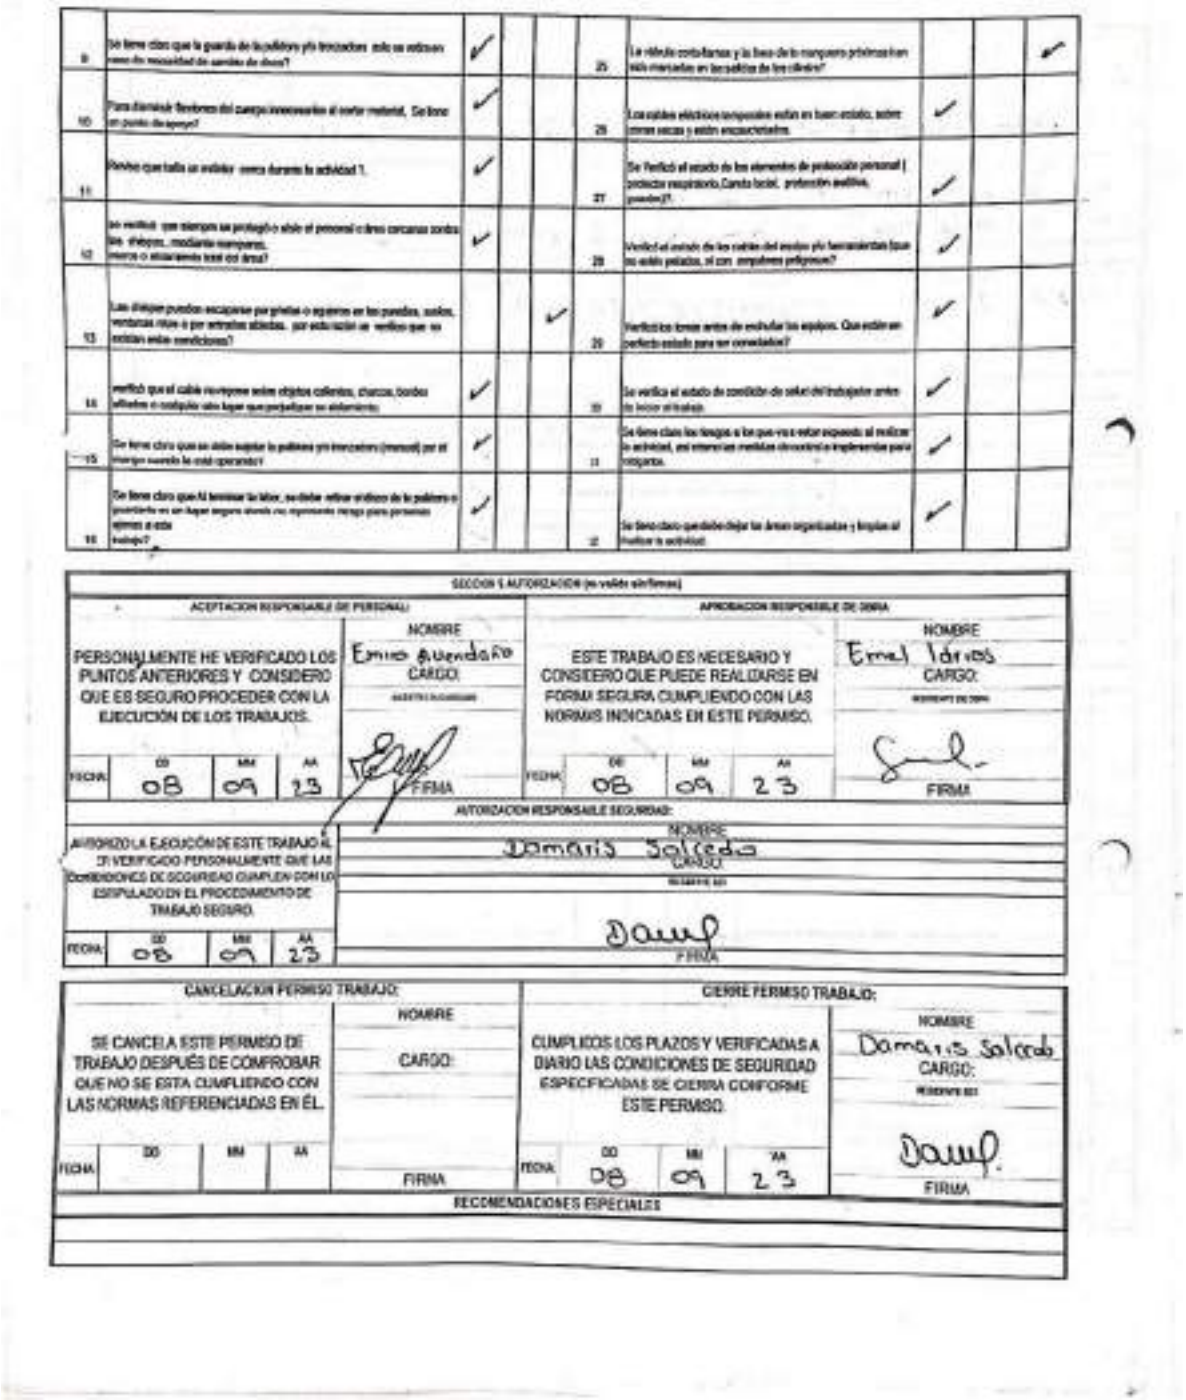

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se tiene claro que la guarda de la palabra y/o trabajadores solo se retirara cuando sea necesidad de cambio de obra? | ✓ | | | 25 | La rótula contraflamas y la base de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los cilindros? | | | ✓ |
| 10 | Para disminuir fatiga en el cuerpo innecesarios al cortar material, Se tiene un punto de apoyo? | ✓ | | | 26 | Los cables eléctricos energizados están en buen estado, sobre cornas secas y están encauchetados. | ✓ | | |
| 11 | Revisa que halla un extintor cerca durante la actividad ?. | ✓ | | | 27 | Se Verificó el estado de los elementos de protección personal ( protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)?. | ✓ | | |
| 12 | se verificó que ninguna se protegió o aisló el personal o áreas cercanas contra los chispas, mediante mamparas, marca o aislamiento total con área? | ✓ | | | 28 | Verificó el estado de las cuchillas del equipo y/o herramientas (que no estén peladas, ni con empalmes peligrosos? | ✓ | | |
| 13 | Las diversos puntos escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas rotas o por entradas abiertas, por esto razón se verifico que no existan estas condiciones? | | | ✓ | 29 | Verificó los tomas antes de evaluar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados? | ✓ | | |
| 14 | verificó que el cable no repose sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento. | ✓ | | | 30 | Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo. | ✓ | | |
| 15 | Se tiene claro que se debe sujetar la palabra y/o trabajadores (manual) por el mango cuando la está operando? | ✓ | | | 31 | Se tiene claro los ángulos a los que vas a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos. | ✓ | | |
| 16 | Se tiene claro que al terminar la labor, se debe retirar el disco de la palabra o pulidora en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a esta labor? | ✓ | | | 32 | Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad. | ✓ | | |


**SECCION 5 AUTORIZACION (no valido sin firmas)**

| ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL | | APROBACION RESPONSABLE DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | NOMBRE: Emiro Quendaño<br>CARGO: | ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO. | NOMBRE: Emel Tarros<br>CARGO: |
| FECHA: DD 08 MM 09 AA 23 | FIRMA | FECHA: DD 08 MM 09 AA 23 | FIRMA |

| AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD: | |
|---|---|
| AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL SI VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO. | NOMBRE: Damaris Salcedo<br>CARGO: |
| FECHA: DD 08 MM 09 AA 23 | FIRMA |

| CANCELACION PERMISO TRABAJO: | | CIERRE PERMISO TRABAJO: | |
|---|---|---|---|
| SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL. | NOMBRE:<br>CARGO: | CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO. | NOMBRE: Damaris Salcedo<br>CARGO: |
| FECHA: DD MM AA | FIRMA | FECHA: DD 08 MM 09 AA 23 | FIRMA |

**RECOMENDACIONES ESPECIALES**

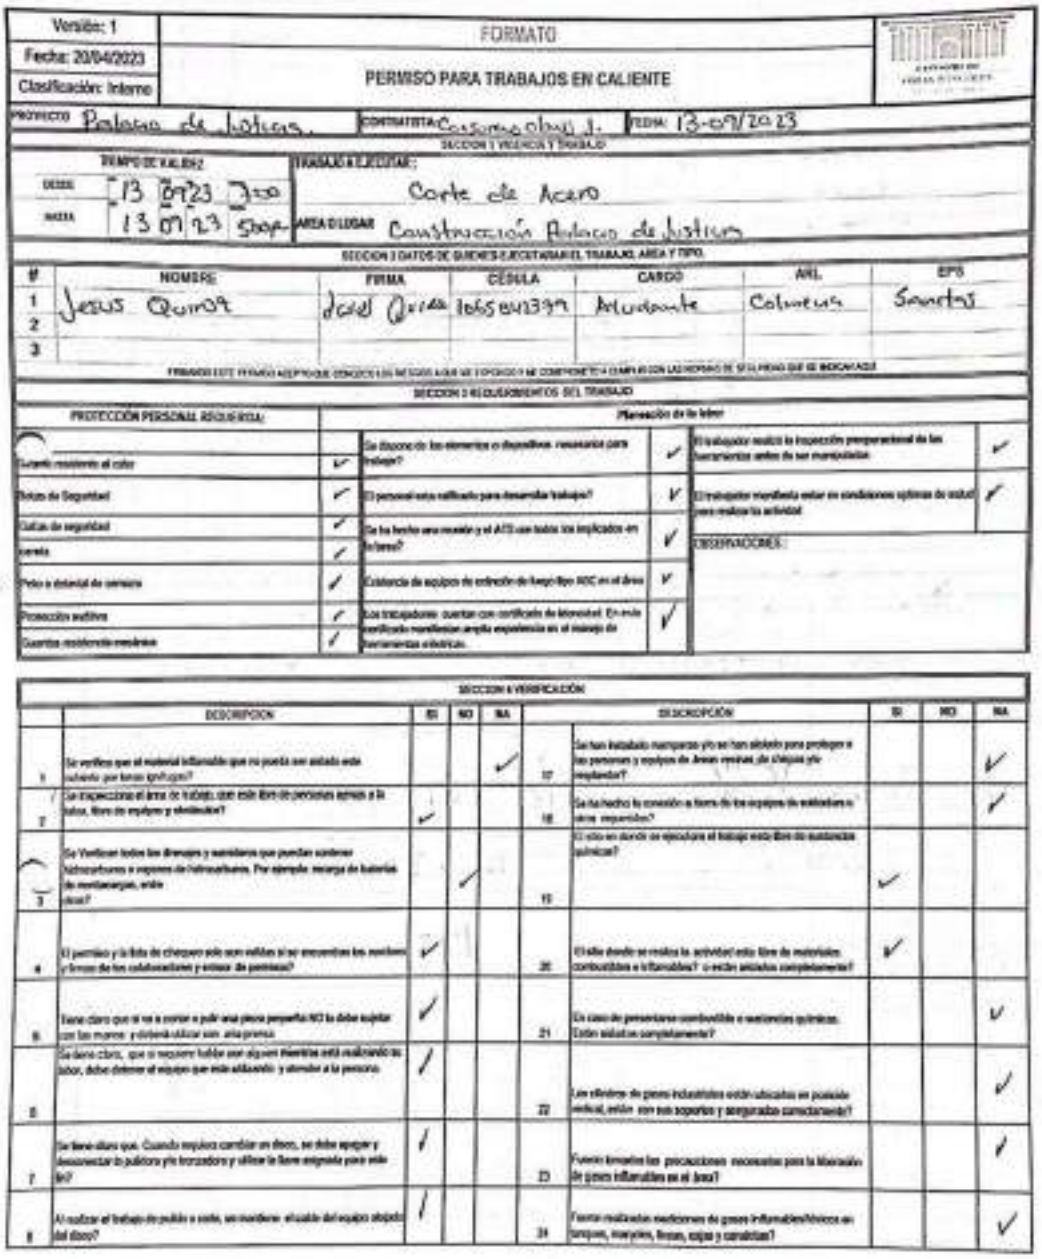

| Versión: 1 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 20/04/2023 | PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE | |
| Clasificación: Interna | | |

PROYECTO: Palacio de Justicia. CONTRATISTA: Consorcio Obras J. FECHA: 13-07/2023

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ: DESDE 13 07 23 7:30 — HASTA 13 07 23 5:00 p.m.

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de Acero

AREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

| # | NOMBRE | FIRMA | CEDULA | CARGO | ARL | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Quiroz | | 1065841399 | Ayudante | Colmena | Sanitas |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

| PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA: | | Planeación de la labor | | |
|---|---|---|---|---|
| Casco resistente al calor | ✓ | Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar? | ✓ | El trabajador realizo la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas | ✓ |
| Botas de Seguridad | ✓ | El personal esta calificado para desarrollar trabajos? | ✓ | El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad | ✓ |
| Gafas de seguridad | ✓ | Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea? | ✓ | OBSERVACIONES: | |
| careta | ✓ | | | | |
| Peto o delantal de cerraje | ✓ | Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área | ✓ | | |
| Protección auditiva | ✓ | Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas. | ✓ | | |
| Guantes resistencia mecánica | ✓ | | | | |

SECCION 4 VERIFICACIÓN

| | DESCRIPCION | SI | NO | NA | | DESCRIPCIÓN | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica que el material inflamable que va puesto con anterior este cubierto por telas ignifugas? | | | ✓ | 17 | Se han instalado mamparas y/o se han alistado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o negligencia? | | | ✓ |
| 2 | Se inspecciona el área de trabajo, que este libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos? | ✓ | | | 18 | Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos? | | | ✓ |
| 3 | Se Verifican todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre otros? | | ✓ | | 19 | El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas? | ✓ | | |
| 4 | El permiso y la lista de chequeo solo son validas si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y estiner de permisos? | ✓ | | | 20 | El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o estan aislados completamente? | ✓ | | |
| 5 | Tiene claro que si se va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y obligatoriamente utilizar una prensa | ✓ | | | 21 | En caso de presentarse combustible o vaporizas químicas. Estan aislados completamente? | | | ✓ |
| 6 | Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras está realizando su labor, debe detener el equipo que este utilizando y atender a la persona. | ✓ | | | 22 | Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, estan con sus soportes y asegurados correctamente? | | | ✓ |
| 7 | Se tiene claro que: Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o trozadora y utilizar la llave asignada para este fin? | ✓ | | | 23 | Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área? | | | ✓ |
| 8 | Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cuidado del equipo objeto del disco? | ✓ | | | 24 | Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, marquies, fosas, cajas y canalizas? | | | ✓ |

| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interno | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción torre Palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Protección facial | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | | DURACIÓN: | 12 Minutos | | |
| FECHA: | 01-09/2023 | | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JULIO | 77177396 | consorcio | Pedro julio |
| 2 | Reinaldo Toscano | 7702650 | CJJ | Rtoll |
| 3 | CARLOS cuetra | 7652020473 | CONSORCIO | CARLOS |
| 4 | JORGE USCATEGUI | 91527094 | CONSORCIO | Jorge uscategui |
| 5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | [illegible] | 1065826852 | Consorcio | [illegible] |
| 7 | [illegible] | 1065774743 | Consorcio | [illegible] |
| 8 | CASTILLO | 77155343 | consorcio | CASTILLO |
| 9 | [illegible] | 1065562392 | [illegible] | [illegible] |
| 10 | [illegible] | 8'664000 | [illegible] | [illegible] |
| 11 | [illegible] | 77186937 | [illegible] | [illegible] |
| 12 | [illegible] | 1065711685 | consorcio | [illegible] |
| 13 | CESAR | 77186289 | | CESAR |
| 14 | [illegible] | 77028189 | consorcio | [illegible] |
| 15 | [illegible] | 22.182.812 | consorcio | [illegible] |
| 16 | [illegible] | 1065815957 | JER | [illegible] |
| 17 | [illegible] | 77154725 | consorcio | [illegible] |
| 18 | [illegible] | 1007392140 | consorcio | [illegible] |
| 19 | [illegible] | 1080431816 | Consorcio | [illegible] |
| 20 | Farid VV | 1004502067 | CONSORCIO | Farid VV |
| 21 | [illegible] | 1065842374 | Consorcio | [illegible] |
| 22 | [illegible] | 1193776657 | consorcio | [illegible] |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | |
| Clasificación: Interna | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | construcción torre palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Riesgo del Ruido | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | | DURACIÓN: | 10 Minutos | |
| FECHA: | 06-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 22 | [illegible] | 1.005 578 807 | SEA | |
| 23 | Juan Carlos [illegible] | 1067 398 032 | Consorcio | Juan Carlos [illegible] |
| 24 | [illegible] | [illegible] | Consorcio | [illegible] |
| 25 | [illegible] | [illegible] | Consorcio | [illegible] |
| 26 | [illegible] | [illegible] | consorcio | [illegible] |
| 27 | [illegible] | 1193-403.152 | consorcio | [illegible] |
| 28 | [illegible] | 1065815752 | CHT | |

OBSERVACIONES

| Versión: 01<br>Fecha: 19/04/2023<br>Clasificación: Interno | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | construcción Torre palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Golpe de calor | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | DURACIÓN: | 10 Minutos | | |
| FECHA: | 07.09.2023 | | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaldo Moscat | 77025504 | Consorcio | |
| 2 | [illegible] | 1065562392 | consorcio | |
| 3 | Jorge [illegible] | 91526911 | consorcio | |
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | [illegible] | 77747396 | Consorcio | [illegible] |
| 6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 8 | [illegible] | 77185343 | consorcio | [illegible] |
| 9 | [illegible] | 1065626852 | Consorcio | [illegible] |
| 10 | Wilmar Coronado | 77028189 | consorcio | [illegible] |
| 11 | Juan Daza M | 1048600194 | consorcio | [illegible] |
| 12 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 13 | Farid VV | 1004502067 | consorcio | Farid VV |
| 14 | [illegible] | 77154925 | [illegible] | [illegible] |
| 15 | [illegible] | 1065639870 | Consorcio | [illegible] |
| 16 | Yesman V. | 5165243 | Consorcio | Yesman V. |
| 17 | Jein Mendoza | 1080421816 | consorcio | Jein Mendoza |
| 18 | Wilian palmera | 77-183-812 | consorcio | wilian |
| 19 | [illegible] | 85.442542 | consorcio | [illegible] |
| 20 | Carlos mosquera | 1065923637 | Consorcio | Carlos mosquera |
| 21 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 22 | [illegible] | 1064716605 | Consorcio | [illegible] |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interna | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Torre Palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Golpe de calor | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | | DURACIÓN: | 10 Minutos | |
| FECHA: | 07-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Jairo David Olivero | 1065841379 | Consorcio | Jairo Olivero |
| 24 | Luis Gabriel Marquez | 1007421140 | consorcio | Luis Gabriel Marquez |
| 25 | Rafael Bracamonte V | 1.065578867 | JER | |
| 26 | Eldar Diaz | 1065809820 | Consorcio | Eldar Diaz |
| 27 | CESAR | 1178RCO | consorcio | CESAR |
| 28 | Manuel Fontalvo | 1065813562 | JER | |
| 29 | Juan Carlos Murgas | 1065398032 | consorcio | Juan Carlos Murgas |
| 30 | JUAN VICENTE DIAZ | 1193403152 | consorcio | JUAN DIAZ |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
|---|---|---|
| Fecha: 19/04/023 | | |
| Clasificación: Interna | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción nueva torre palacio de justicia | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Manejo de los residuos liquidos o vertimentos, permisos y obligaciones al respecto | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo. | | | DURACIÓN: | 12 Minutos |
| FECHA: | 08-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bastilla | 1065657761 | Consorcio | Cesar Bastilla |
| 2 | Reinaldo Vasquez | 92026504 | Consorcio | Reinaldo Vasquez |
| 3 | Carlos Alvarez | 7032020473 | consorcio | Carlos |
| 4 | Eduardo Rivera | 1000774775 | Consorcio | Eduardo Rivera |
| 5 | Leonardo | 1065572392 | Consorcio | Leonardo |
| 6 | Pedrojulio | 77147396 | consorcio | Pedrojulio |
| 7 | Orlando Maldonado | 1193564 | consorcio | Orlando Maldonado |
| 8 | Jose Ustariz | 91526011 | consorcio | Jose Ustariz |
| 9 | Castillo | 77155343 | consorcio | Castillo |
| 10 | Wilman coronado | 77-028189 | consorcio | Wilman coronado |
| 11 | Wilian pomares | 77-183-812 | Consorcio | Wilian |
| 12 | Adalberto Hernandez | 77154925 | consorcio | |
| 13 | Cesar Jose Muñoz | 1065761113 | consorcio | Cesar |
| 14 | Juan David Ulloa | 1064771685 | consorcio | Juan David Ulloa |
| 15 | Jose Luis Campo | 77156837 | Consorcio | Jose Luis Campo |
| 16 | Farid VV | 1004502067 | consorcio | Farid VV |
| 17 | Yesman M. | C165243 | Consorcio | Yesman M. |
| 18 | Luis Miguel Ortiz | 1065826852 | Consorcio | Luis Miguel |
| 19 | Alvaro Javier Cano | 1065235505 | Consorcio | |
| 20 | Daniel Delgado | 85-4472542 | consorcio | Daniel Delgado |
| 21 | Juan Carlos Vargas | 1062398032 | consorcio | Juan Carlos Vargas |
| 22 | Juan Jose VM | 1065800179 | consorcio | Juan Jose |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
|---|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | | |
| Clasificación: Interna | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción nueva Torre palacio de justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Manejo de los residuos liquidos o Vertimientos, Permisos y obligaciones al respecto. | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo. | | | DURACIÓN: | 12 Minutos | | |
| FECHA: | 08-9-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | JOAN. VERGARA | 1.193.103.157 | CONSORCIO | JVM |
| 24 | Carlos mazzuca | 1.045823637 | Consorcio | Carlos mazzuca |
| 25 | aldair diaz | 1065809820 | Consorcio | aldair diaz |
| 26 | LUIS GABRIEL M. | 7007352140 | CONSORCIO | LUIS GABRIEL M. |
| 27 | CESAR | 11186289 | CONSORCIO | CESAR |
| 28 | RAFAEL BALLESTAR | 1.065578862 | JER | |
| 29 | Jesus David Duran | 1065842779 | Consorcio | Jesus Duran |
| 30 | Jemer Mendoza | 1065431816 | consorcio | Jemer Mendoza |
| 31 | Yarlen Palencia | 1065814852 | | |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | | |
|---|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interna | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción nueva Torre Palacio de Justicia | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Manejo integral de residuos solidos, domesticos y Peligrosos. | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | ✓ SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | DURACIÓN: | 10 Minutos |
| FECHA: | 09-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Pinzon | 1065774475 | Consorcio | Eduardo Pinzon |
| 2 | Oscar Jaimes | 1065653236 | Consorcio | Oscar |
| 3 | Geovanny | 1065662392 | Consorcio | Geovanny |
| 4 | Wilman Coronado | 7702B189 | Consorcio | Wilman Coronado |
| 5 | Angel José Jimenez | 77134925 | Consorcio | |
| 6 | Jhon Jairo Chona Lagos | 1065235565 | Consorcio | |
| 7 | CESAR | 77186289 | | CESAR |
| 8 | Farid VV | 1004502067 | consorcio | Farid VV |
| 9 | Juan Gutierrez | 1065776686 | consorcio | Juan Gutierrez |
| 10 | Cesar Luis Muñoz | 1065776657 | Consorcio | Cesar |
| 11 | Daniel Aguilar | 88.442542 | consorcio | Daniel Aguilar |
| 12 | William Palomeque | 77-182-812 | Consorcio | William |
| 13 | Jhon Alexander Rodriguez | 1065X15762 | JR | |
| 14 | Yesmany M. | 5165243 | Consorcio | Yesmany M. |
| 15 | Albeiro Obando | 1065639830 | Consorcio | |
| 16 | Rafael Balcazar V | 1065598867 | JER | |
| 17 | Luis Gabriel M. | 1009342140 | Consorcio | Luis Gabriel |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 19/07/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interna | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Socialización ATS. | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN ✓ |
| CAPACITADOR: | Ruben Soto | | | DURACIÓN: | 10 Minutos |
| FECHA: | 27-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose I Cgundo | 77186837 | Consorcio | Jose Icaza |
| 2 | Reinaldo Yascote | 77026504 | " | Rey |
| 3 | Edwin Alvarado | 1065562392 | Consorcio | Edwin |
| 4 | Carlos Olivera | 7051080412 | Consorcio | Carlos |
| 5 | Pedro Julio | 77747346 | Consorcio | Pedro Julio |
| 6 | Eduardo Rivera | 1065 [illegible] | Consorcio | Eduardo Rivera |
| 7 | [illegible] | [illegible] | Consorcio | [illegible] |
| 8 | Jorge Escobar | 91576411 | Consorcio | Jorge Escobar |
| 9 | Luis Miguel Perez | 1065626857 | Consorcio | Luis Miguel |
| 10 | William Palacios | 77-183-817 | consorcio | William |
| 11 | Wilman Coronado | 77028189 | Consorcio | Wilman Coronado |
| 12 | Farid V V | 1004502067 | Consorcio | Farid V V |
| 13 | Cesar Luis Mora | 1007376153 | Consorcio | Cesar |
| 14 | Anibal Jose [illegible] | 77154925 | Consorcio | [illegible] |
| 15 | Jaimer Mendoza | 10804 1316 | consorcio | Jaimer Mendoza |
| 16 | Juan David Arboleda | 1064716485 | Consorcio | Juan David Arboleda |
| 17 | CESAR | 77186289 | Consorcio | CESAR |
| 18 | CASTILLO | 77 155313 | Consorcio | CASTILLO |
| 19 | Yesmar [illegible] | 1165243 | Consorcio | Yesmar |
| 20 | Daniel Aguilar | 85.442542 | Consorcio | Daniel Aguilar |
| 21 | Carlos Mosquera | 1.065.977437 | Consorcio | Carlos Mosquera |
| 22 | Juan Carlos Murillo | 1062 398032 | Consorcio | Juan Carlos |

OBSERVACIONES

| Versión: 01<br>Fecha: 15/04/2023<br>Clasificación: Interna | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción nueva Torre palacio de Justicia | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Socialización ATS. EXPOSICIÓN y prevención de Riesgo | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | ✓ SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | DURACIÓN: | 10 Minutos | |
| FECHA: | 77-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Miguel Ruiz | 1065[illegible]861 | [illegible] | |
| 24 | LUIS GABRIEL MARQUEZ | 7089397190 | Consorcio | LUIS GABRIEL M |
| 25 | Jesus David Quiroz | 1065842379 | Consorcio | Jesus Quiroz |
| 26 | [illegible] | 1.005578[illegible] | SER | |
| 27 | Oscar Daniel C | 1065[illegible]261 | [illegible] | Oscar D |
| 28 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 29 | Johan Daniel Osma | 1065235505 | Consorcio | |
| 30 | aldair diaz | 1065809820 | consorcio | aldair diaz |
| 31 | Esneider Gutierrez | 77185068 | SEGURITI ELITE | Esneider Gutierrez |
| 32 | William palmera | 77-183-812 | consorcio | william |

OBSERVACIONES



Colmena

**REGISTRÓ DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN**

Cliente: Valledupar
Empresa: Consorcio Obras Judiciales
Contrato:
Nº de Orden de Servicio:

Facilitador: Glendy Jimenez
Teléfono: 3106629679
Tema: Capacitación

Fecha: 11-09-2023
Hora de Inicio: 7
Hora Fin:

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 8 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 9 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

Observaciones:

Glendy Jimenez
NOMBRE DEL FACILITADOR

Glendy Jimenez
FIRMA

Versión 01
Fecha: 19/04/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Funciones y Responsabilidades del COPASST<br>Funciones y Responsabilidades Cocola. | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD: | | CHARLA DE SEGURIDAD | / | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Glendy Jimenez - ARL Colmena. | | | DURACIÓN: | 2 Horas |
| FECHA: | 11/09/2023 | | | LUGAR: | Palacio de Justicia |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismal Jarios Medina | 72.359.619 | Consorcio Obras Judic | |
| 2 | Alexander Ochoa O | 1065.955.805 | Consorcio Judic | |
| 3 | Pedro Julio | 94747396 | consorcio | Pedro Julio |
| 4 | David Aguilar | 85.462.502 | Consorcio | David Aguilar |
| 5 | Carlos Arias | 1052.086.438 | consorcio | Carlos Arias |
| 6 | Arbey Julian Zapata | 77159925 | consorcio | |
| 7 | Glendy Perez Pedo | 1065809341 | COJ | Glendy Perez Pedo |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interno | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Protección facial. | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | DURACIÓN: | 12 Minutos | |
| FECHA: | 07-09-2023 | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Yesman V. | 5/65243 | Consorcio | Yesman V. |
| 24 | JUAN A. YOCA BAITO | 1.193.108.158 | CONSORCIO | JUAN BAITO |
| 25 | Jhon Jairo M. | 1018600194 | consorcio | Jhon Jairo |
| 26 | Juan carlos muñoz | 1062398032 | consorcio | Juan carlos muñoz |
| 27 | Oscar Bustillo | 10656[illegible] | consorcio | Oscar B. |
| 28 | Rafael Balseiro | 1.065[illegible] | HR | [illegible] |
| 29 | Handaniel Osmo | 1065235505 | Consorcio | Osmo |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 15/04/2021 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interno | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | construcción nueva Torre Palacio de Justicia | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Resbalones, Tropezones y caidas. | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | DURACIÓN: | 12 Minutos |
| FECHA: | 12-09-2023 | | LUGAR: | Palácio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carvajal | 1065562372 | Consorcio | |
| 2 | Segunda Martina Valbuena | 1193561701 | Consorcio | |
| 3 | Jose Escalona | 91526911 | Consorcio | |
| 4 | Pedro Ulo | 1077177396 | Consorcio | |
| 5 | Eduardo Rivera | 1065744775 | Consorcio | |
| 6 | Reinaldo Pascote | 77026504 | Consorcio | |
| 7 | Carlos Olivera | 1053820411 | Consorcio | |
| 8 | Wilman Coronado | 97028189 | Consorcio | |
| 9 | Oscar Bolivar | 1065657761 | Consorcio | |
| 10 | William Palmera | 77.182.812 | Consorcio | |
| 11 | Castillo | 72155543 | Consorcio | |
| 12 | Farid vv | 1004502667 | Consorcio | |
| 13 | Cesar Luis muñoz | 1003776153 | Consorcio | |
| 14 | Jeimar Mendoza | 1084431814 | consorcio | |
| 15 | Daniel Bayona | 85442542 | consorcio | |
| 16 | Juan Fernando | 1065EC1885 | consorcio | |
| 17 | Juan Osma | 1065235505 | Consorcio | |
| 18 | [illegible] | 77154925 | Consorcio | |
| 19 | Juan Gabriel M. | 1002747140 | Consorcio | |
| 20 | Jesus David Ovalle | 1065842379 | Consorcio | |
| 21 | Eduardo Valera | 1065809890 | consorcio | |
| 22 | Eduardo Redondo | 1065815867 | | |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interna | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción nueva Torre Palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Resbalones, tropezones y caidas | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | DURACIÓN: | 12 Minutos | | |
| FECHA: | 12-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Juan carlos [illegible] | 1062398037 | consorcio | Juan carlos [illegible] |
| 24 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 25 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 26 | COSHR | 77186289 | | COSHR |
| 27 | Carlos Mosquera | 1.062827637 | Consorcio | Carlos Mosquera |
| 28 | Raipel [illegible] | 1065578867 | JER | [illegible] |
| 29 | Erneider Gutierrez | 77185068 | security elite | [illegible] |
| 30 | Josel Campo | 77186837 | Consorcio | [illegible] |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
|---|---|---|
| Fecha: 10/04/2023 | | |
| Clasificación: Interna | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | construcción nueva torre palacio de justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Pensar Antes de Actuar, Practicando el Autocuidado | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | | | DURACIÓN: | 15 minutos | |
| FECHA: | 13-09-2023 | | LUGAR: | palacio de justicia | | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaldo Mosquera | 72026504 | consorcio | Rmq |
| 2 | Restrepo Ortiz | 94747396 | Consorcio | Restrepo |
| 3 | Carlos Olivera | 1052080477 | consorcio | Carlos |
| 4 | Luis Castillo | 77155343 | Consorcio | Castillo |
| 5 | Jorge Escobar | 91526 911 | Consorcio | Jorge Escobar |
| 6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | [illegible] | 1065652392 | Consorcio | [illegible] |
| 8 | [illegible] | [illegible] | Consorcio | [illegible] |
| 9 | [illegible] | 1080938116 | consorcio | [illegible] |
| 10 | Oscar Bustos | 1065637761 | Consorcio | Oscar B |
| 11 | Cesar [illegible] | 1003376453 | Consorcio | [illegible] |
| 12 | [illegible] | 1065626852 | Consorcio | [illegible] |
| 13 | [illegible] | 1065[illegible]695 | Consorcio | [illegible] |
| 14 | Wilman Caicedo | 72028189 | consorcio | Wilman Caicedo |
| 15 | Wilson Palmera | 72183812 | consorcio | Wilson |
| 16 | Daniel Aguilar | 88.442542 | consorcio | Daniel Aguilar |
| 17 | Farid VV | 1004503067 | consorcio | Farid VV |
| 18 | [illegible] | 77159725 | consorcio | [illegible] |
| 19 | CESAR | 1118[illegible]289 | | CESAR |
| 20 | Yesimara [illegible] | 5165243 | consorcio | Yesimara |
| 21 | [illegible] | 1065235505 | Consorcio | [illegible] |
| 22 | [illegible] | 1.192.1107.152 | consorcio | [illegible] |

OBSERVACIONES

| Versión: 01<br>Fecha: 19/04/2023<br>Clasificación: Interno | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | construcción Una Torre palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Pensar Antes de Actuar, Practicando el Autocuidado. | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | | | DURACIÓN: | 15 Minutos | |
| FECHA: | 13-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Jose Camelo | 77186037 | Consorcio | |
| 24 | Leo Bolivar M | 7009341110 | Consorcio | |
| 25 | Carlos mosquera | 1.063323637 | consorcio | carlos mosquera |
| 26 | Juan carlos [illegible] | 1067348032 | consorcio | Juan carlos murgas |
| 27 | Jesus David Quiroz | 1065823379 | Consorcio | |
| 28 | Oldayr diaz | 1.065809810 | Consorcio | oldayr diaz |
| 29 | [illegible] | 1065859391 | CJ | |
| 30 | [illegible] | 1066639870 | Consorcio | |
| 31 | Esneider Gutierrez | 77185068 | Security Elite | Esneider Gutierrez |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interno | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción nueva torre Palacio de Justicia | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Manejo de materiales sobrantes y materiales de construcción. | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | ✓ SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | DURACIÓN: | 12 Minutos |
| FECHA: | 14-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaldo Mosquera | 87076504 | consorcio | |
| 2 | Pedro Julio | 77171396 | Consorcio | |
| 3 | Jorge Escobar | 91526911 | consorcio | |
| 4 | Carlos Olivera | 7056070478 | consorcio | |
| 5 | [illegible] | 1065862392 | consorcio | |
| 6 | [illegible] | 1193561703 | Consorcio | |
| 7 | [illegible] | 1065626852 | consorcio | |
| 8 | [illegible] | 1065857376 | consorcio | |
| 9 | [illegible] | 1003776613 | consorcio | |
| 10 | Wilmar coronado | 77028189 | Consorcio | |
| 11 | [illegible] | 77124925 | consorcio | |
| 12 | Farid VV | 1004502067 | consorcio | |
| 13 | [illegible] | 1082431816 | consorcio | |
| 14 | [illegible] | 1065[illegible]5 | consorcio | |
| 15 | Alvaro Javier Osorio | 1065235585 | consorcio | |
| 16 | [illegible] | BS-942542 | consorcio | |
| 17 | [illegible] | 77186837 | consorcio | |
| 18 | [illegible] | 1065815867 | consorcio | |
| 19 | Carlos [illegible] | 1.065877637 | consorcio | |
| 20 | [illegible] | 5[illegible]2 | consorcio | |
| 21 | [illegible] | 1007341140 | consorcio | |
| 22 | CESAR | 77186289 | | CESAR |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interna | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | construcción nueva torre palacio de justicia | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Manejo de materiales sobrantes y materiales de construcción | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | ✓ SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | DURACIÓN: | 12 Minutos | |
| FECHA: | 14-09-23 | LUGAR: | palacio de justicia | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Jesus David Ochoa | 1065842379 | Consorcio | Jesus Ochoa |
| 24 | Wilfor Pestrana | 22.183.812 | consorcio | Wilfor |
| 25 | Luis castillo | 22155 343 | consorcio | castillo |
| 26 | Juan carlos rivas | 1062398032 | consorcio | Juan carlos rivas |
| 27 | aldair diaz | 1065[illegible]220 | consorcio | aldair diaz |
| 28 | Juan Yoc Th Pop | 1193.403.452 | consorcio | Juan Yoc Th |
| 29 | Rafael [illegible] | 1.005579861 | JER | |
| 30 | [illegible] | 1065639870 | Consorcio | |
| 31 | Esneider Gutierrez | 77185068 | Security Elite | Esneider Gutierrez |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 15/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interna | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | construccion nueva torre Palacio de Justicia. | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Respetar la Señalizacion en obra | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Karen Soto - Damaris Salcedo | | DURACIÓN: | 10 Minutos | |
| FECHA: | 15-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Julio | 77141390 | consorcio | Pedro Julio |
| 2 | Eduardo Luna | 1006714113 | consorcio | Eduardo Luna |
| 3 | Reinaldo Hoyos | 77026504 | [illegible] | [illegible] |
| 4 | Jorge Gaschez | 91526911 | contratista | [illegible] |
| 5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | CARLOS OLIVERA | 1038090418 | CONSORCIO | CARLOS |
| 7 | [illegible] | 1065567392 | [illegible] | [illegible] |
| 8 | [illegible] | 1065666852 | Consorcio | [illegible] |
| 9 | [illegible] | 1.193.107.157 | consorcio | [illegible] |
| 10 | Wilmon Coronado | 77028189 | consorcio | Wilmon Coronado |
| 11 | [illegible] | 7065657761 | Consorcio | [illegible] |
| 12 | [illegible] | 1065711685 | consorcio | [illegible] |
| 13 | [illegible] | 1003794113 | consorcio | [illegible] |
| 14 | Jhon Jairo Osma | 1065235505 | Consorcio | Osma Jhon |
| 15 | Carlos [illegible] | 1065822177 | CONSORCIO | Carlos [illegible] |
| 16 | Jaiver Mendoza | 1080431816 | consorcio | Jaiver Mendoza |
| 17 | Duvan peralta | 1068837582 | Consorcio | [illegible] |
| 18 | Yesenia [illegible] | 51685243 | [illegible] | Yesenia [illegible] |
| 19 | Daniel Aguilar | 85.442542 | consorcio | Daniel Aguilar |
| 20 | [illegible] | 37154975 | consorcio | [illegible] |
| 21 | Jose Luis Campo | 77186832 | consorcio | Jose Luis Campo |
| 22 | [illegible] | 1065639020 | Consorcio | [illegible] |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interna | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción nueva torre palacio de justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Respetar la señalización en obra | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD: | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo - Karen Soto | | | DURACIÓN: | 10 Minutos | | |
| FECHA: | 15-09-2023 | | | LUGAR: | palacio de justicia | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Jesus David Quiroz | 1065842329 | Consorcio | Jesus Quiroz |
| 24 | CESAR | 77186289 | | CESAR |
| 25 | Juan carlos murgas | 1062398032 | consorcio | Juan carlos murgas |
| 26 | Farid V V | 1004502067 | consorcio | Farid V V |
| 27 | CASTILLO | 72155343 | consorcio | CASTILLO |
| 28 | Wilmer palmera | 72.183-822 | consorcio | wilmer |
| 29 | Alexander Ruiz R | 1065810852 | JER | |
| 30 | Rafael Barcasnegra V | 1.065.578.862 | JER | |
| | Los GABRIEL M. | 7007342140 | consorcio | Los Gabriel |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interna | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción nueva Torre palacio de Justicia | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Responsabilidad social en un adecuado manejo ambiental en obra | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN ✓ | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | DURACIÓN: | 15 Minutos |
| FECHA: | 16-09-2023 | | LUGAR: | palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaldo Moscote | 77 026 504 | Consorcio | |
| 2 | Eduardo Rivera | 1066871775 | Consorcio | Eduardo Rivera |
| 3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | [illegible] | 1066562392 | [illegible] | [illegible] |
| 5 | PEDRO JULIO | 77177396 | consorcio | PEDRO JULIO |
| 6 | [illegible] | 1063657261 | Consorcio | Oscar D. |
| 7 | CARLOS OLIVERA | 7052128473 | consorcio | CARLOS |
| 8 | JUAN C. Ventura Brito | 1.193.403.152 | Consorcio | JUAN BRITO. |
| 9 | Jorge Usecha | 91 526 91 | CONSORCIO | Jorge Usecha |
| 10 | Jairo Mendoza | 1082431816 | consorcio | Jairo Mendoza |
| 11 | [illegible] | 1065626852 | Consorcio | [illegible] |
| 12 | Farid VV | 1004502067 | consorcio | Farid VV |
| 13 | CASTILLO | 77 155 343 | Consorcio | CASTILLO |
| 14 | Wilmer Caicedo | 77028189. | consorcio | Wilmer Caicedo |
| 15 | Daniel Aguilar | 83.442542 | Consorcio | Daniel Aguilar |
| 16 | [illegible] | 1082421685 | Consorcio | [illegible] |
| 17 | William palmera | 92.183-812 | consorcio | William |
| 18 | [illegible] | 77154925 | consorcio | [illegible] |
| 19 | Wenderal Ojeda | 1065235505 | Consorcio | [illegible] |
| 20 | Cesar Luis muñoz | 1007396655 | Consorcio | Cesar |
| 21 | CASAP | 77186289 | consorcio | CASAP. |
| 22 | [illegible] | 1065809812 | consorcio | [illegible] |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | |
| Clasificación: Interno | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Responsabilidad social en un adecuado manejo ambiental en obra. | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | ✓ SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | DURACIÓN: | 15 Minutos |
| FECHA: | 16-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Juan carlos muñoz | 1062.399.037 | consorcio | Juan carlos muñoz |
| 24 | Yesenia V. | 5145243 | — | Yesenia V. |
| 25 | Jesus Daniel Quiroz | 1065812379 | Consorcio | Jesus Quiroz |
| 26 | [illegible] | 1066039830 | Consorcio | [illegible] |
| 27 | [illegible] | 1065814782 | JER | [illegible] |
| 28 | Duvan Perez | 1062821382 | Consorcio | [illegible] |
| 29 | Fabian Bermudez | 1.065536804 | JER | [illegible] |
| 30 | Fabian Cerrato | 1065595701 | consorcio | Fabian Cerrato |
| 31 | Luis Gabriel Marquez | 7029348140 | consorcio | Luis Gabriel |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 |
|---|
| Fecha: 19/04/2023 |
| Clasificación: Interna |

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | construcción Torre palacio de Justicia | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Charla Ambientale: Protección de la flora y de la fauna. | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | DURACIÓN: | 10 Minutos | |
| FECHA: | 02-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaldo Hoscate | 77026504 | Consorcio | |
| 2 | CASTILLO | 72 155 303 | consorcio | CASTILLO |
| 3 | Jorge Usecher | 91 526 911 | CONSORCIO | |
| 4 | Pedrojulio | 94747391 | consorcio | |
| 5 | Eduardo Rueda | 1006714113 | Consorcio | |
| 6 | CARLOS OLIVARES | 1052070412 | CONSORCIO | |
| 7 | | 1193546201 | | |
| 8 | | 1065623792 | | |
| 9 | | 1065626852 | | |
| 10 | | 1064778685 | | |
| 11 | Farid V V | 1004502067 | consorcio | Farid V V |
| 12 | | 1065860194 | | |
| 13 | Daniel Aguilar | 88-442542 | consorcio | |
| 14 | | 1007376553 | | |
| 15 | | 1065617376 | | |
| 16 | CESAR | 77186289 | consorcio | CESAR |
| 17 | | 77028189 | | |
| 18 | | 77186837 | | |
| 19 | | 1065225505 | | |
| 20 | | 77159425 | | |
| 21 | | 51652417 | | |
| 22 | | 1065 | | |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interno | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construccion Nueva torre palacio de Justicia. | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | cambios climaticos | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | ✓ SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | DURACIÓN: | 15 Minutos |
| FECHA: | 18-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaldo Moscote | 77026504 | Consorcio | |
| 2 | [illegible] | 77177396 | Consorcio | |
| 3 | CARLOS [illegible] | 7056029983 | Consorcio | |
| 4 | [illegible] | 1065562392 | Consorcio | |
| 5 | [illegible] | 1065626852 | Consorcio | |
| 6 | [illegible] | 1080031816 | Consorcio | |
| 7 | Eduardo [illegible] | 1006744115 | Consorcio | |
| 8 | [illegible] | 1193501341 | Consorcio | |
| 9 | [illegible] | 1192-1021152 | Consorcio | |
| 10 | CASTILLO | 77155343 | CONSORCIO | CASTILLO |
| 11 | [illegible] | 1065659761 | Consorcio | |
| 12 | Farid VV | 1004 502 067 | CONSORCIO | Farid VV |
| 13 | [illegible] | 1064711683 | Consorcio | |
| 14 | [illegible] | 1003770553 | Consorcio | |
| 15 | [illegible] | 85.042542 | CONSORCIO | |
| 16 | [illegible] | 77154925 | Consorcio | |
| 17 | [illegible] | 77029189 | Consorcio | |
| 18 | [illegible] | 1065629820 | Consorcio | |
| 19 | CESAR | 77186289 | Consorcio | CESAR |
| 20 | [illegible] | 1007345140 | Consorcio | |
| 21 | [illegible] | 1065735505 | Consorcio | |
| 22 | [illegible] | 1065942379 | Consorcio | |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | |
| Clasificación: Interna | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | cambios Climaticos | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | ✓ | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | DURACIÓN: | 8 Minutos | | |
| FECHA: | 18-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Juan Carlos Mendez | 1067398032 | Consorcio | Juan Carlos M |
| 24 | Darwin padilla | 1065877552 | Consorcio | Darwin. |
| 25 | Aldair diaz | 1063509930 | Consorcio | aldair diaz |
| 26 | Wilmer Quiroz Tapia | 1003X09341 | CO | Wilmer Quiroz T. |
| 27 | HERNIS Rocha | 1.003249689 | Consorcio | HERNIS Rocha |
| 28 | DIEGO. TARAT | 7.184270 | Obra | |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | |
| Clasificación: Interno | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Riesgo Biomecanico - Manipulación Manual de Carga | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | | DURACIÓN: | 5 minutos | | |
| FECHA: | 19-09/2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Rivera | 1064974413 | Consorcio | |
| 2 | Reinaldo Pascal | 77026504 | Consorcio | |
| 3 | [illegible] | 1065680478 | Consorcio | |
| 4 | Jose Escoffer | 91 526 911 | Consorcio | |
| 5 | Pedro Ruiz | 9717196 | Consorcio | |
| 6 | Oscar Bolaño | 1065657611 | Consorcio | |
| 7 | Dora Portilla | 1065834552 | Consorcio | |
| 8 | Wilmar Coronado | 77028189 | Consorcio | |
| 9 | Daniel Aguilar | 88.442.542 | Consorcio | |
| 10 | William Pedroza | 77183-817 | Consorcio | |
| 11 | [illegible] | 1193261260 | Consorcio | |
| 12 | Juan David | 1064971685 | Consorcio | |
| 13 | Jhon Alexander | 1193.403.152 | Consorcio | |
| 14 | CESAR | 77186289 | | CESAR |
| 15 | [illegible] | 1065662392 | Consorcio | |
| 16 | Luis CASTILLO | 77 155 343 | Consorcio | CASTILLO |
| 17 | Farid VV | 1004 502 067 | CONSORCIO | Farid VV |
| 18 | [illegible] | 1065626857 | Consorcio | |
| 19 | [illegible] | 5145213 | Consorcio | |
| 20 | Jaime Mendoza | 1082931811 | Consorcio | Jaime Mendoza |
| 21 | Juan Camilo Osorio | 1065235505 | Consorcio | Juan Osorio |
| 22 | [illegible] | 77154925 | Consorcio | |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 15/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interno | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | construcción Nueva Torre palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Riesgo Biomecanico - Manipulación Manual de Cargas | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD: | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | karen soto | | | | DURACIÓN: | 7 Minutos | |
| FECHA: | 19-09/2023 | | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | oldair diaz | 1065809820 | consorcio | oldair diaz |
| 24 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 25 | Juan carlos mayo | 1062 39 808 | consorcio | Juan carlos mayo |
| 26 | [illegible] | 1065809341 | [illegible] | [illegible] |
| 27 | [illegible] | 1065809820 | [illegible] | [illegible] |
| 28 | Jaider Mendoza | 1090431816 | consorcio | Jaider Mendoza |
| 29 | oldair diaz | 1065809820 | consorcio | oldair diaz |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interna | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Reglas basicas de seguridad. | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | DURACIÓN: | 5 Minutos | | |
| FECHA: | 20-09-23 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 1065837356 | Consorcio | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | 1065672552 | CONSORCIO | [illegible] |
| 4 | Oscar Bustillo | 1065633761 | Cons | Oscar B |
| 5 | [illegible] | 1065275505 | Consorcio | [illegible] |
| 6 | [illegible] | 1065[illegible] | Consorcio | [illegible] |
| 7 | [illegible] | 1065639970 | Consorcio | [illegible] |
| 8 | [illegible] | 1065809830 | consorcio | [illegible] |
| 9 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | [illegible] | 1065562392 | [illegible] | [illegible] |
| 11 | [illegible] | 98.442572 | consorcio | [illegible] |
| 12 | [illegible] | 1003776153 | Consorcio | [illegible] |
| 13 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 14 | [illegible] | 77028189 | Consorcio | [illegible] |
| 15 | Faxid VV | 1004502067 | Consorcio | Faxid VV |
| 16 | CESAR | 77186289 | — | CESAR |
| 17 | [illegible] | 1026504 | [illegible] | [illegible] |
| 18 | Juan carlos [illegible] | 1067[illegible]032 | consorcio | [illegible] |
| 19 | [illegible] | 77[illegible]975 | Consorcio | [illegible] |
| 20 | PEDRO JULIO | 94177396 | Cons | PEDRO JULIO |
| 21 | CARLOS [illegible] | 1057080473 | consorcio | CARLOS |
| 22 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 15/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interna | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Reglas Basicas de Seguridad | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | DURACIÓN: | 5 Minutos | | |
| FECHA: | 20 - 09 - 2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | YESMAN V. | 5165245 | Propio | Yesman V. |
| 24 | Dorian Pardo | 1065932502 | consorcio | |
| 25 | Jesus David Quiroz | 1065842379 | Consorcio | Jesus Quiroz |
| 26 | Jorge Usechue | 91 526 041 | consorcio | Jorge Usechue |
| 27 | Jeiver Mendoza | 108-431816 | consorcio | Jeiver Mendoza |
| 28 | Wilmancoronado | 77-028169 | consorcio | Wilman Coronado |
| 29 | Farid VV | 1004502067 | consorcio | Farid VV |
| 30 | CASTILLO | 72155343 | Consorcio | CASTILLO |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 15/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interno | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción nueva torre Palacio de Justicia | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Ahorro de Recursos hídricos | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | ✓ | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | DURACIÓN: | 1 Hora |
| FECHA: | 21-9-23 | | | LUGAR: | Palacio de Justicia |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JULIO | 77177396 | CONSORCIO | PEDRO JULIO |
| 2 | JORGE USECHE | 91 526 911 | CONSORCIO | JORGE USECHE |
| 3 | Reina Idalia Oscete | 27 026 504 | " " " | Reina |
| 4 | Eduardo Rueda | 1065 [illegible] 115 | Consorcio | Eduardo Rueda |
| 5 | Yesenia Maldonado Ardila | 1193 [illegible] 1150 | Consorcio | Yesenia Maldonado |
| 6 | CARLOS OLIVERA | 7052 [illegible] 477 | CONSORCIO | CARLOS |
| 7 | GEOVANNY | 1 065 [illegible] 62 392 | " " " | GEOVANNY |
| 8 | Oscar Bustillo | 1005 [illegible] 761 | Co. | Oscar |
| 9 | CASTILLO | 77 155 343 | CONSORCIO | CASTILLO |
| 10 | Wilmon Coronado | 77028189 | Consorcio | Wilmon Coronado |
| 11 | Daniel. Noguera. | 87.442542. | CONSORCIO. | Daniel. Noguera |
| 12 | JHON. A. VELEZ. ZAPATA | 1193 1109.152. | CONSORCIO | JHON. VELEZ. |
| 13 | William Palmera | 77-183-812 | CONSORCIO | William |
| 14 | Farid VV | 1004 502 067 | CONSORCIO | Farid VV |
| 15 | Luis Miguel Ojeda | 1065626852 | Consorcio | Luis Miguel Ojeda |
| 16 | Jhon Bolaño | [illegible] 85 | Consorcio | Jhon Bolaño |
| 17 | Cesar Luis Muñoz | 1003726653 | Consorcio | Cesar |
| 18 | CESAR | 77196289 | consorcio | CESAR |
| 19 | [illegible] | 77 141 925 | Consorcio | [illegible] |
| 20 | [illegible] | 1017 [illegible] 1961 | CONSORCIO | [illegible] |
| 21 | Jhon Osma | 1065 23505 | Consorcio | Jhon Osma |
| 22 | Jesus David Ovalle | 1065 [illegible] 374 | Consorcio | Jesus David |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interna | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción nueva Torre palacio de Justicia | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Ahorro de Recursos hídricos | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | ✓ CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | DURACIÓN: | 1 Hora |
| FECHA: | 21-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | [illegible] | 1065818807 | CSJ | |
| 24 | [illegible] | 5165243 | consorcio | |
| 25 | [illegible] | 1062598032 | consorcio | |
| 26 | [illegible] | 1080463186 | consorcio | |
| 27 | [illegible] | 1065809820 | Consorcio | |
| 28 | [illegible] | 1065839110 | consorcio | |
| 29 | [illegible] | 1066639870 | Consorcio | |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
|---|---|
| Fecha: 15/04/2023 | |
| Clasificación: Interno | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Cuidado de los equipos de Protección personal | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD: | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | | | DURACIÓN: | 9 minutos | |
| FECHA: | 22-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan David | 1066871605 | colpatria | |
| 2 | Luis Miguel Ramirez | 1065626885 | Consorcio | |
| 3 | Wilman Cordoba | 77028189 | consorcio | |
| 4 | CASTILLO | 77155343 | consorcio | CASTILLO |
| 5 | Daniel Aguilar | 85.472547 | consorcio | Daniel Aguilar |
| 6 | Jesus David Quiroz | 1065842374 | Consorcio | Jesus Quiroz |
| 7 | Reinaldo Boscote | 77026504 | 71 | |
| 8 | Segundo Martinez | 779336 mas | consorcio | Segundo Martinez |
| 9 | Jhonny | 1.193.403.157 | consorcio | Jhon |
| 10 | Cesar | 1065562392 | | Cesar |
| 11 | Farid VV | 1004502067 | consorcio | Farid VV |
| 12 | Juan carlos | 1062398033 | consorcio | Juan carlos |
| 13 | Jose Ussecher | 91 526 911 | consorcio | Jose Ussecher |
| 14 | Jeimer Hernandez | 1084043186 | consorcio | Jeimer Hernandez |
| 15 | Pedro Julio | 14747396 | Consorcio | Pedro Julio |
| 16 | Eduardo Rivera | 1006274745 | Consorcio | Eduardo Rivera |
| 17 | Anibal Jose | 77154925 | consorcio | |
| 18 | Yesman | 5165243 | | Yesman |
| 19 | Oscar Bustillo | 1063657761 | | Oscar B |
| 20 | CESAR | 77186289 | | CESAR |
| 21 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 22 | CARLOS OLIVERA | 1052092473 | CONSORCIO | |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interna | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construccion Nueva Torre Palacio de Justicia | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Cuidado de los Elementos o equipos de proteccion Personal. | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD: | ✓ CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | DURACIÓN: | 9 minutos | |
| FECHA: | 22-09-2023 | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Diana Paola | 1065831582 | Consorcio | |
| 24 | Diana Jaimes C | 1094900141 | consorcio | |
| 25 | Anderson Osma | 1065236506 | Consorcio | |
| 26 | William Palmera | 7.721.83-372 | consorcio | |
| 27 | Luis Gabriel M. Soto | | Consorcio | |
| 28 | Rafael Barranco ✓ | 1065598867 | JER | |
| 29 | Luquelli Portacelli | 1067883767 | JER | |
| 30 | Oscar Diaz | 1065909830 | consorcio | |
| 31 | Oscar Rueda U | 7065609820 | Consorcio | |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
|---|---|
| Fecha: 15/04/2023 | |
| Clasificación: Interno | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Torre Palacio de Justicia | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Charla Ambiental: Protección de la flora y de la fauna | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | DURACIÓN: | 10 Minutos |
| FECHA: | 02-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Wilian Palmera | 22.183.812 | consorcio | wilian |
| 24 | Juan carlos murgas | 1062 348037 | Consorcio | murgas |
| 25 | JUAN YEITO BAITO | 1.192.1107.152 | Consorcio | Juan Baito |
| 26 | Jesus David Quiran | 1065842379 | Consorcio | Jesus Quiran |
| 27 | Carlos mosquera | 1.065.222.627 | Consorcio | carlos mosquera |
| 28 | Jimeymendoza | 1065821816 | consorcio | Jemey mendoza |
| 29 | Brandon Palomino | 1065 815 782 | CP | |
| 30 | Gneider Gutierrez | 77185068 | Seguridad Elite | Gneider Gutierrez |
| 31 | Luis Gabriel M | 7059 342140 | consorcio | Luis M. |
| 32 | Abel Palencia | 1.065.579.881 | JEN | |
| 33 | wilian palmera | 22.183-812 | consorcio | wilian |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interno | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Charla social: Respeto mutuo entre compañeros | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | | DURACIÓN: | 7 Minutos | |
| FECHA: | 23- 09- 2023 | | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Rivera | 1006774115 | Consorcio | Eduardo Rivera |
| 2 | Pedro Julio | 94771596 | Consorcio | Pedro Julio |
| 3 | CARLOS OLIVERA | 7022080978 | CONSORCIO | CARLOS |
| 4 | Segundo Martinez Valdez | 1193536203 | CONSORCIO | Segundo Martinez V. |
| 5 | Geovanis Cruz | 1-68-56239 | Consorcio | Geovanis Cruz |
| 6 | Farid V V | 1004502067 | CONSORCIO | Farid V V |
| 7 | Daniel Aguilar | 8-442542 | Consorcio | Daniel Aguilar |
| 8 | Juan David | 1004711695 | Consorcio | Juan David |
| 9 | CASTILLO | 77155343 | consorcio | CASTILLO |
| 10 | Jhonaira M. | 1004860194 | consorcio | Jhon Jairo M. |
| 11 | Cesar Luis Muñoz | 1003776151 | Consorcio | Cesar |
| 12 | JUAN PABLO RIJOS | 1193-403-152 | CONSORCIO | JUAN PABLO |
| 13 | Dario Cuello | 1-08-857-1502 | Consorcio | |
| 14 | Jeiner Mendoza | 1082943186 | consorcio | Jeiner Mendoza |
| 15 | Jose Useche | 91.526.911 | CONSORCIO | Jose Useche |
| 16 | William Polanco | 22-183-812 | consorcio | William |
| 17 | Manuel Luis | 1064 | JET | |
| 18 | YESMON L. | 5165243 | | YESMON L. |
| 19 | Luis Gabriel M. | 7007392190 | Consorcio | Luis G M |
| 20 | Juan Carlos Muñoz | 10ere5980 3c | Consorcio | Juan Carlos Muñoz |
| 21 | Jesus David Quiroz | 1065842379 | Consorcio | Jesus Quiroz |
| 22 | Johny Balcazar | 1.000.579.931 | JER | |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interna | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Charla Social: Respeto mutuo entre compañeros | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | DURACIÓN: | 7 Minutos | | |
| FECHA: | 23-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Díaz | 1065809820 | Consorcio | Alexander Díaz |
| 24 | Albert Gomez | 1065639872 | Consorcio | |
| 25 | Oscar Bastidas | 1065657761 | C.J. | Oscar |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | | |
|---|---|---|
| Fecha: 15/04/2021 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interna | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre palacio de Justicia. | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Prevención Consumo de Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas. | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | ✓ SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Katai Soto | | | DURACIÓN: | 1 Hora |
| FECHA: | 25-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaldo Moscote | 7702655 | Consorcio | |
| 2 | Pedro Julio | 44141396 | Consorcio | |
| 3 | CASTILLO | 22.155.343 | Consorcio | CASTILLO |
| 4 | Daniel Aguilar | 85.942542 | CONSORCIO | |
| 5 | CARLOS RIVERA | 7052830417 | CONSORCIO | |
| 6 | Luis Miguel Epalza | 1065626852 | Consorcio | |
| 7 | Oscar Bustillo | 1065651701 | Consorcio | |
| 8 | Juan David | 1064711695 | Consorcio | |
| 9 | Wilman cosamudo | 7702889 | Consorcio | |
| 10 | Cesar Valdez | 1065563772 | Consorcio | |
| 11 | Segundo Martinez | 1193261263 | Consorcio | |
| 12 | Farid VV | 1004502067 | Consorcio | Farid VV |
| 13 | Jose Escher | 91526911 | Consorcio | |
| 14 | Devin Pinto | 1063531352 | Consorcio | |
| 15 | CESAR | 71182089 | Consorcio | CESAR |
| 16 | Cesar Luis muñoz | 1002976653 | Consorcio | |
| 17 | Adan Ospino | 1065225505 | Consorcio | |
| 18 | Eduardo Rivera | 1143774115 | Consorcio | |
| 19 | Juan carlos murgas | 1062398052 | Consorcio | Juan carlos murgas |
| 20 | Yesmon M. | 5165263 | — | Yesmon M. |
| 21 | Jaiver Mendoza | 1084431816 | Consorcio | Jaiver Mendoza |
| 22 | Wilmer Quiroz Ayala | 1065855391 | CO | Wilmer Quiroz Ayala |

OBSERVACIONES

| Versión: 01<br>Fecha: 19/04/2023<br>Clasificación: Interna | FORMATO<br>ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia. | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Prevención Consumo de tabaco, Alcohol y Sustancias psicoactivas. | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD: | | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | ✓ SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | DURACIÓN: | 1 Hora | |
| FECHA: | 25-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia. | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | [illegible] | 1.065578667 | ICK | |
| 24 | [illegible] | 1065813762 | ICK | |
| 25 | [illegible] | 1007347190 | Consorcio | |
| 26 | Jesus David Ovalle | 1065842379 | Consorcio | Jesus Ovalle |
| 27 | [illegible] | 1065809820 | Consorcio | [illegible] |
| 28 | [illegible] | 1065603887 | Consorcio | |
| 29 | Yuber Bernal | 79.750.423 | Consorcio | |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 16/04/023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interno | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción nueva torre Palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Inspeccionar las herramientas antes de usar. | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | ✓ | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | | | DURACIÓN: | 10 minutos | |
| FECHA: | 26-09/2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Cuna | 1006914115 | Consorcio | Eduardo Cuna |
| 2 | Segundo Antigua Collaos | 7443361 cas | Consorcio | Segundo Antigua C. |
| 3 | Luis Miguel Gaez | 1065626852 | Consorcio | Luis Miguel |
| 4 | Castillo | 77155343 | Consorcio | Castillo |
| 5 | Oscar Castillo | 1065659361 | Consorcio | Oscar C. |
| 6 | Eiser luis muñoz | 1003376651 | Consorcio | Eiser |
| 7 | Jorge escoffer | 91526 96 | Consorcio | Jorge escoffer |
| 8 | Juan David | 1064741685 | Consorcio | Juan David |
| 9 | David Aguilar | 85442542 | Consorcio | David Aguilar |
| 10 | Wilmar coronado | 77028189 | Consorcio | Wilmar Coronado |
| 11 | William Palomeque | 72-183-812 | Consorcio | William |
| 12 | Adolfo Jose Jaramillo | 77154925 | Consorcio | |
| 13 | Juan Pinto | 1193 403 132 | Consorcio | Juan Pinto |
| 14 | CESAR | 1186289 | | CESAR |
| 15 | Jesus David Quiroz | 1065822 379 | Consorcio | Jesus Quiroz |
| 16 | Farid V V | 1004502067 | Consorcio | Farid V V |
| 17 | Luis Miguel M. | 1065942740 | Consorcio | Luis Miguel M. |
| 18 | Alan Javier Ospino | 1065235505 | Consorcio | |
| 19 | Yesman M. | 5165243 | Consorcio | Yesman M. |
| 20 | Jhon Lastra M. | 1065 [illegible] | Consorcio | Jhon Lastra M. |
| 21 | Ruvan Leiva | 1065867567 | Consorcio | |
| 22 | Maicol Pohl | 1065 [illegible] | Consorcio | |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
|---|---|---|
| Fecha: 14/04/2023 | | |
| Clasificación: Interna | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Inspeccionar las herramientas antes de usar. | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | ✓ | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | | DURACIÓN: | 10 Minutos | |
| FECHA: | 26-09/2023 | | | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Juan Camilo Amaya | 1062348052 | consorcio | Juan Camilo Amaya |
| 24 | Jeiner Mendoza | 1080431814 | consorcio | Jeiner Mendoza |
| 25 | Olguer Diaz | 1065609830 | consorcio | Olguer Diaz |
| 26 | Rafael Bracamonte V. | 1065578867 | JCR | |

OBSERVACIONES

| Versión 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 15/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interna | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva torre Palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | TRABAJO EN EQUIPO | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD: | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | | DURACIÓN: | 12 Minutos | | |
| FECHA: | 27-09-2023 | | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaldo Mosquera | 74026504 | Consorcio | |
| 2 | Luis Miguel garcia | 1065628852 | Consorcio | |
| 3 | Pedro Furio | 94747396 | comercio | |
| 4 | Jose Mosquera | 91 526 911 | consorcio | |
| 5 | Eduardo Rivera | 1065774743 | Consorcio | |
| 6 | CARLOS OLIVEROS | 1032070472 | CONSORCIO | |
| 7 | CASTILLO | 77155343 | Consorcio | |
| 8 | | | | |
| 9 | | 1065659761 | Consorcio | |
| 10 | Oscar Aguilar | 885.442542 | consorcio | |
| 11 | | 1065 582 | | |
| 12 | | 1065600194 | consorcio | |
| 13 | Wilman coronado | 77029189 | consorcio | |
| 14 | | 1065771695 | consorcio | |
| 15 | William palacio | 77-183-212 | consorcio | |
| 16 | Farid V V | 1004502 067 | CONSORCIO | Farid V V |
| 17 | | 77154 975 | Consorcio | |
| 18 | JUAN. DIAZ | 1.193.103.152 | consorcio | |
| 19 | | 1080931816 | consorcio | |
| 20 | | 1065635505 | Consorcio | |
| 21 | | 1003396653 | Consorcio | |
| 22 | | 1062398032 | Consorcio | |

OBSERVACIONES

| Versión: 01<br>Fecha: 10/04/2023<br>Clasificación: Interna | FORMATO<br>ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construccion Nueva Torre Palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Trabajo en equipo | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | | DURACIÓN: | 12 Horas | | |
| FECHA: | 27-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| | Rafael [illegible] | 1.065578862 | JCR | |
| 23 | Yesmin [illegible] | 516[illegible]213 | Consorcio | Yesmin [illegible] |
| 24 | Alban diaz | 1067909920 | consorcio | alban diaz |
| 25 | Luis Gabriel Marquez | 7[illegible]3[illegible]710 | consorcio | luis Gabriel |
| 26 | CESAR | 77186289 | | CESAR |
| 27 | Jesus David Olmos | 1065[illegible]374 | Consorcio | Jesus Olmos |
| 28 | Esneider Gutierrez | 77185069 | Security Force | Esneider Gutie |


OBSERVACIONES

| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 15/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interno | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Orden y aseo | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | DURACIÓN: | 2 Horas | |
| FECHA: | 28-09-23 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaldo Fonseca | 77026504 | Consorcio | |
| 2 | Oscar Rubilla E | 1065657761 | Consorcio | |
| 3 | Eduardo Rivera | 1065744143 | Consorcio | Eduardo Rivera |
| 4 | PEDRO JULIO | 77197396 | CONSORCIO | PEDRO JULIO |
| 5 | CASTILLO | 77155843 | Consorcio | CASTILLO |
| 6 | Jorge Usecha | 91516911 | CONSORCIO | Jorge Usecha |
| 7 | Wilman Corona de | 77028186 | consorcio | Wilman |
| 8 | Luis Miguel Gomez | 1065626852 | Consorcio | Luis Miguel |
| 9 | [illegible] | [illegible] | Consorcio | [illegible] |
| 10 | CARLOS RIVERA | 1051070478 | CONSORCIO | CARLOS |
| 11 | Daniel Aguilar. | 85.442542 | Consorcio. | Daniel Aguilar |
| 12 | Farid VV | 1004502067 | Consorcio | Farid VV |
| 13 | William Palmera | 77-183-817 | Consorcio | William |
| 14 | Juan David | 1065711685 | Consorcio | Juan David |
| 15 | JUAN VELITH. BAITO | 1.193.1103.152. | Consorcio | JUAN BAITO |
| 16 | Deivis Perez | 1065837582 | Consorcio | |
| 17 | CESAR | 1186289 | | CESAR |
| 18 | cesar luis muñoz | 1007776653 | Consorcio | cesar |
| 19 | Adolfo Londoño Fonseca | 77154925 | Consorcio | |
| 20 | YESMON M. | 5161203 | Consorcio | YESMON M. |
| 21 | Luis Gabriel M. | 9007392140 | Consorcio | Luis Gabriel M. |
| 22 | Juan Pedro. | 1065[illegible]14 | Consorcio | Juan P. |

OBSERVACIONES

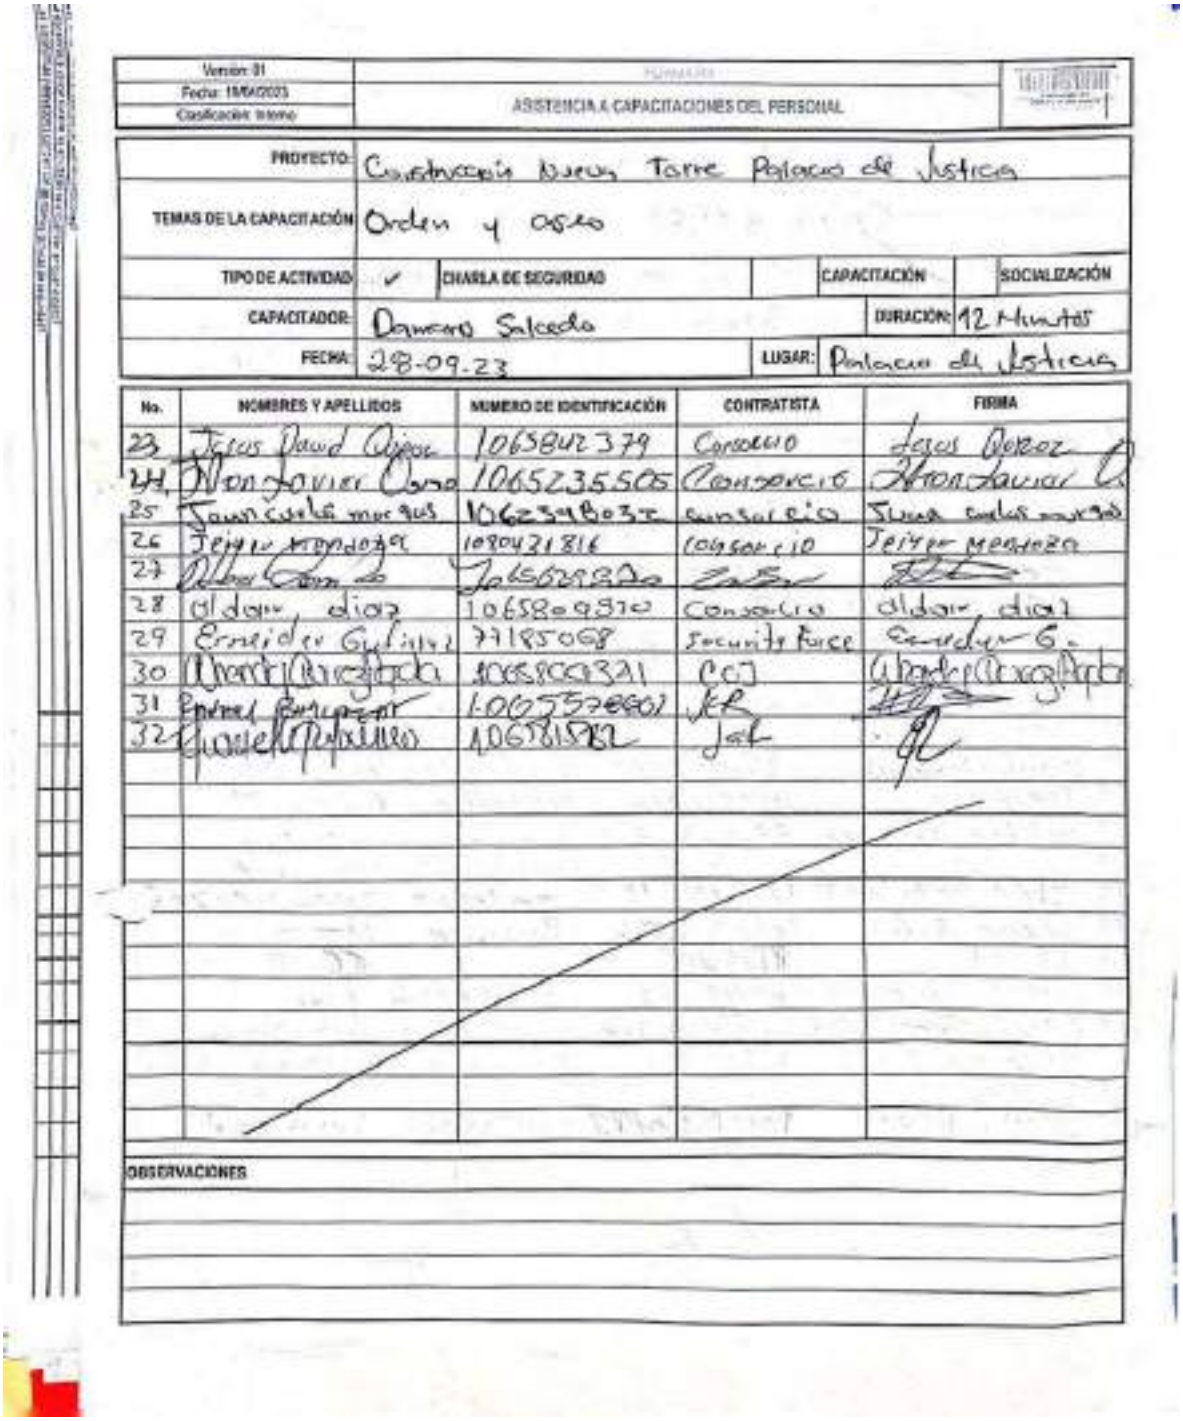

Versión: 01
Fecha: 18/04/2023
Clasificación: Interna

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: Orden y aseo

TIPO DE ACTIVIDAD: ✓ CHARLA DE SEGURIDAD | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN

CAPACITADOR: Dameris Salcedo | DURACIÓN: 12 Minutos

FECHA: 28-09-23 | LUGAR: Palacio de Justicia

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Jesus David Ojeda | 1065842379 | Consorcio | Jesus Ojeda |
| 24 | Wan Javier Ospino | 1065235505 | Consorcio | Wan Javier |
| 25 | Juan Carlos Marquez | 1062398037 | Consorcio | Juan Carlos Marquez |
| 26 | Jeiver Mendoza | 1080431816 | Consorcio | Jeiver Mendoza |
| 27 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 28 | Aldair Diaz | 1065809970 | Consorcio | Aldair Diaz |
| 29 | Ernesto Gutierrez | 77185068 | Security Force | Ernesto G. |
| 30 | [illegible] | 1065809321 | CCJ | [illegible] |
| 31 | [illegible] | 1065572660 | [illegible] | [illegible] |
| 32 | [illegible] | 1065815962 | [illegible] | [illegible] |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 15/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interna | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Consorcio Obras Judiciales | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Seguridad en el uso de eslingas | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | DURACIÓN: | 8 minutos | |
| FECHA: | 04-09-2023 | LUGAR: | Palacio de Justicia | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaldo Moscote | 72026504 | ) \| \| ) | Reinaldo |
| 2 | Daniel Agudelo. | 98.442572. | Consorcio | Daniel Agudelo. |
| 3 | Pedro Ruiz | 77.177396 | Consorcio | Pedro Ruiz |
| 4 | Eduardo Rivera | 1067147473 | Consorcio | Eduardo Rivera |
| 5 | Carlos Olivar | 70202048 | Consorcio | Carlos |
| 6 | Edwin Quintero | 8864000 | Consorcio | Edwin |
| 7 | Eduardo Martinez Valdez | 1193861760 | Consorcio | Eduardo Martinez |
| 8 | Juan Pablo Pinto Z | 1.193.107.162 | Consorcio | Juan Pablo Pinto |
| 9 | Oscar Bustillo. T | 1065657761 | Consorcio | Oscar B. |
| 10 | Wilmon coronado | 77028189 | Consorcio | Wilmon coronado |
| 11 | Yesman M. | 5165243 | Consorcio | Yesman M. |
| 12 | Alexander Arias O | 1065235505 | Consorcio | |
| 13 | Luis Miguel Epinay | 1065626852 | Consorcio | Luis Miguel |
| 14 | David V V | 1004502067 | Consorcio | David V V |
| 15 | Jose Escobar | 91 526 911 | Consorcio | Jose Escobar |
| 16 | aldair diaz | 1065909810 | Consorcio | aldair diaz |
| 17 | wilson palmeca | 22.182.812 | consorcio | wilson |
| 18 | Costilla | 77.155.313 | Consorcio | Costilla |
| 19 | Juan David Urueña | 1064711685 | Consorcio | Juan David Urueña |
| 20 | Jhon Jairo M. | 1064866194 | Consorcio | Jhon Jairo M. |
| 21 | Angel Jaime Escorcia | 77 154 925 | Consorcio | |
| 22 | Jose L Campo | 77186837 | Consorcio | Jose Luis Campo |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interno | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Practica el Autocuidado | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | | DURACIÓN: | 12 Minutos | | |
| FECHA: | 29-09-2023 | | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| | Pedro Julio | 77747396 | consorcio | Pedro Julio |
| | Jose Loaiza | 91 526 401 | CONSORCIO | Jose Loaiza |
| | Oscar Castillo | 1065614761 | Consorcio | Oscar Castillo |
| | Luis Miguel Garcia | 1065676857 | Consorcio | Luis Miguel |
| | Rodolfo Escobar | 77026504 | Consorcio | Rodolfo |
| | Luis Gabriel Mejia | 1007341140 | Consorcio | Luis Gabriel M. |
| | Jesus David Nuñez | 1065842379 | Consorcio | Jesus Nuñez |
| | Eduardo Lima | 1065714215 | Consorcio | Eduardo Lima |
| | Yesmon N. | 91654113 | Consorcio | Yesmon N. |
| | Carlos Olivera | 1065821413 | consorcio | Carlos |
| | Jhon Herrera | 1065866194 | consorcio | Jhon Herrera |
| | Aldair Diaz | 1065809820 | consorcio | Aldair Diaz |
| | Castillo | 77155343 | consorcio | Castillo |
| | Daniel Aguilar | 85.442.542 | consorcio | Daniel Aguilar |
| | Segundo Martinez C. | 1122566265 | Consorcio | Segundo Martinez C. |
| | Juan David | 1065726895 | Consorcio | Juan David |
| | Anibal Fernandez | 77154925 | Consorcio | |
| | Wilman Casanova | 77028189 | consorcio | Wilman Casanova |
| | Cesar Hernandez | 1007396553 | Consorcio | Cesar |
| | Jeiver Mendoza | 1080473816 | consorcio | Jeiver Mendoza |
| | CESAR | 77186289 | - - | CESAR |
| | Farid V V | 1004502067 | CONSORCIO | Farid V V |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 15/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interno | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Palacio de Justicia nueva dorre | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Practica el Autocuidado | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | | | DURACIÓN: | 12 Minutos | |
| FECHA: | 29-09-2023 | | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| | William Palencia | 77.181.812 | consorcio | William |
| | Duvan Peña | 1064237.382 | Consorcio | |
| | Jhon Javier Cano | 1065225505 | Consorcio | |
| | Jhon Yeiro Bautista | 1193.407.152 | Consorcio | Jhon Bautista. |
| | Juan Carlos Moreno | 1062.398.032 | consorcio | Juan Carlos Moreno |
| | Julian Pallares | 1065815782 | JKR | |
| | Rafael Barrientos | 1.065.[illegible] | JKR | |
| | Miguel [illegible] | [illegible] | COJ | Miguel [illegible] |
| | Yuber Brand | 77.750.427 | COJ | |
| | Fermey Peña | 80.058.608 | COJ | |
| | Mabely Toncal Gómez | 52.834.138 | Residente de obra | Mabely Toncal |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 19/04/2021 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interna | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Cuido mis manos | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD: | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | DURACIÓN: | 10 minutos |
| FECHA: | 30-09/2023 | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| | CASTILLO | 77155343 | consorcio | CASTILLO |
| | Yesmyra N. | 51652413 | — | Yesmyra N. |
| | Reinaldo Moscote | 77026011 | — | Reinaldo |
| | Oscar Bolívar | 1061617761 | C.S. | Oscar Bolívar |
| | Pedro Julio | 77177396 | C.S | Pedro Julio |
| | Luis Miguel Gomez | 1065626892 | Consorcio | Luis Miguel |
| | Segundo martinez cuello | 1143356790 | consorcio | Segundo martinez c |
| | David Aguilar | 85.462542 | consorcio | David Aguilar |
| | CARLOS OLIVERA | 7057030478 | consorcio | CARLOS |
| | Eduardo Rivera | 1006914115 | Consorcio | Eduardo Rivera |
| | Juan David | 1064711685 | consorcio | Juan David |
| | Wilmer caraballo | 72028189 | consorcio | Wilmer caraballo |
| | Farid VV | 1004502067 | consorcio | Farid VV |
| | Ruver Rosado | 1062837382 | Consorcio | |
| | Omar Quintero | 1004866194 | consorcio | Omar Quintero |
| | wilian palmera | 72-183-817 | consorcio | wilian |
| | JUAN VELITH. D. | 1.193.1107.152 | consorcio | JUAN VELITH. |
| | CESAR | 77180289 | | CESAR |
| | Cesar luis muñoz | 1002376653 | Consorcio | Cesar |
| | Jeiner Mendoza | 1064731816 | consorcio | Jeiner Mendoza |
| | Juan carlos murgas | 1062348032 | consorcio | Juan carlos murgas |
| | luis gabriel vi | 7027387AD | consorcio | luis gabriel |

OBSERVACIONES

| Versión: 01<br>Fecha: 13/04/2023<br>Clasificación: Interna | FORMATO<br>ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Cuido mis manos. | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD: | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | | | DURACIÓN: | 12 Minutos |
| FECHA: | 30-09/2023 | | | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| | Jesus David Quiroz | 1065842379 | Consorcio | Jesus Quiroz |
| | Aldair Diaz | 1065309926 | Consorcio | aldair diaz |
| | Jhojelle Peñaloza | 1065815787 | JER | |
| | [illegible] | 1.065.594.862 | JER | |
| | [illegible] | 1065639870 | Consorcio | |
| | Jorge Useche | 91 526 91 | Consorcio | Jorge Useche |
| | [illegible] | 77154925 | Consorcio | |
| | Mabely Tenca Gómez | 52831199 | COJ | Mabely Tenca |
| | Fanny Pena | 60058608 | COJ | |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interno | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Consorcio obras Judiciales | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Seguridad en el uso de eslingas | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | | DURACIÓN: | 8 minutos | | |
| FECHA: | 04-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | [illegible] | [illegible] | Consorcio | [illegible] |
| 24 | Carlos Mosquera | 1.066.873.632 | CONSORCIO | Carlos Mosquera |
| 25 | [illegible] | 1062.398.032 | Consorcio | [illegible] |
| 26 | Jesus David Gomez | 1065 842 379 | Consorcio | Jesus Gomez |
| 27 | [illegible] | [illegible] | Consorcio | [illegible] |
| 28 | [illegible] | 1065815582 | JEP | [illegible] |
| 29 | Gutierrez Ernesto | 77185 068 | Securitrelite | [illegible] |
| 30 | [illegible] | 1.065.628.862 | JEP | [illegible] |
| 31 | [illegible] | 1065 900 341 | CDJ | [illegible] |

OBSERVACIONES

140 205

| Versión: 01<br>Fecha: 15/04/2023<br>Clasificación: Interna | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | construcción torre palacio de justicia | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Protección de los recursos hídricos<br>Prohibiciones, Permisos y obligaciones al respecto | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | DURACIÓN: | 12 Minutos | |
| FECHA: | 05-09-2023 | LUGAR: | palacio de Justicia | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Rivera | 1006244445 | Consorcio | Eduardo Rivera |
| 2 | Jorge Vesga | 91526911 | consorcio | Jorge Vesga |
| 3 | Pedro Julio | 77747396 | consorcio | Pedro Julio |
| 4 | Carlos Olivera | 80526977 | Consorcio | Carlos |
| 5 | [illegible] | 1065609220 | Consorcio | [illegible] |
| 6 | [illegible] | 1065626852 | Consorcio | [illegible] |
| 7 | [illegible] | 1065562392 | consorcio | [illegible] |
| 8 | Reinaldo Hoscat | 97026504 | 1111 | [illegible] |
| 9 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | [illegible] | 86-442542 | consorcio | [illegible] |
| 11 | [illegible] | 72 155 343 | consorcio | [illegible] |
| 12 | Wilman [illegible] | 77026189 | consorcio | [illegible] |
| 13 | [illegible] | 5165243 | consorcio | [illegible] |
| 14 | Farid VV | 1004502067 | consorcio | Farid VV |
| 15 | [illegible] | 1065735505 | Consorcio | [illegible] |
| 16 | [illegible] | 77154995 | consorcio | [illegible] |
| 17 | [illegible] | 1065659761 | Consorcio | [illegible] |
| 18 | [illegible] | 77186837 | consorcio | [illegible] |
| 19 | [illegible] | 1007390153 | consorcio | [illegible] |
| 20 | [illegible] | 1067398032 | consorcio | [illegible] |
| 21 | [illegible] | 1090931816 | consorcio | [illegible] |
| 22 | [illegible] | 1065982770 | consorcio | [illegible] |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | |
|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL |
| Clasificación: Interno | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Torre palacio de justicia. | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: | Protección de los recursos hídricos, Prohibiciones al respecto. | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD: | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | DURACIÓN: | 12 Minutos | |
| FECHA: | 05-09-2023 | LUGAR: | Palacio de Justicia | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Luis Gabriel Marquez | 1007342140 | Consorcio | Luis Gabriel M. |
| 24 | Rafael Palomar V | 1.065.578.807 | JER | |
| 25 | Jhon Jairo M | 1045600194 | Consorcio | |
| 26 | Juan Pablo Ruiz | 1.193.403.152 | Consorcio | Juan Pablo R. |
| 27 | Aldair Diaz | 1065809820 | Consorcio | Aldair Diaz |
| 28 | Cesar | 77186299 | | Cesar |
| 29 | Yuliana Polanco F | 1065815852 | JER | |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
|---|---|---|
| Fecha: 15/04/2023 | | |
| Clasificación: Interno | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción torre palacio de Justicia | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Riesgo del Ruido | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | ✓ | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Damaris Salcedo | | DURACIÓN: | 10 minutos | |
| FECHA: | 06-09-2023 | LUGAR: | Palacio de Justicia | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS OLIVERA | 7052020473 | CONSORCIO | CARLOS |
| 2 | Reinaldo Moscote | 77076501 | 11 111 | |
| 3 | Eduardo Rivera | 1066711113 | Consorcio | |
| 4 | Jorge Useche | 91526911 | CONSORCIO | JORGE USECHE |
| 5 | Pedroduio | 77747396 | Consorcio | Pedroduio |
| 6 | Cc o duio | 1065623922 | Consorcio | CCDUIO-7 |
| 7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 8 | Luis Miguel Cortez | 1065626852 | Consorcio | |
| 9 | Jhon David M. | 1048600194 | Consorcio | |
| 10 | Wilman coronado | 77028189 | consorcio | Wilman coronado |
| 11 | Luis castillo | 77155343 | consorcio | CASTILLO |
| 12 | Farid VV | 1004502067 | Consorcio | Farid VV |
| 13 | [illegible] | 1073966553 | Consorcio | |
| 14 | wilfran palmera | 22163612 | Consorcio | wilfran |
| 15 | David Agudelo | 85-442542 | Consorcio | David A. |
| 16 | Yesmon M. | 5161203 | [illegible] | YESMON M. |
| 17 | CESAR | 77186289 | consorcio | CESAR |
| 18 | Cesar Duque | 1065617961 | Consorcio | Cesar D |
| 19 | carlos mosquera | 1065877137 | consorcio | carlos mosq |
| 20 | [illegible] | 77154925 | consorcio | |
| 21 | Alexander Ana O. | 1065235505 | Consorcio | |
| 22 | | | | |

OBSERVACIONES

| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interno | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre palacio de Justicia. | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Prevención Consumo de Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas. | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | ✓ SOCIALIZACIÓN |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | DURACIÓN: | 1 Hora | |
| FECHA: | 25-09-2023 | | LUGAR: | Palacio de Justicia | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaldo Abscate | 7702650 | Consorcio | |
| 2 | Pedro Jucto | 94141396 | Consorcio | |
| 3 | CASTILLO | 37155343 | Consorcio | CASTILLO |
| 4 | Daniel Aguilar | 85-942642 | Consorcio | |
| 5 | Carlos Olivera | 7071080977 | Consorcio | CARLOS |
| 6 | Miguel Gomez | 1065626852 | Consorcio | |
| 7 | Oscar Bustillo | 1065677701 | Consorcio | |
| 8 | Juan David | 1064711695 | Consorcio | |
| 9 | Wilman Coronado | 7702879 | Consorcio | |
| 10 | Cristian | 1065563772 | Consorcio | |
| 11 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 12 | Farid VV | 1009502067 | Consorcio | Farid VV |
| 13 | Jorge Usecha | 91526911 | Consorcio | |
| 14 | Kevin [illegible] | 1065831352 | Consorcio | |
| 15 | CESAR | 7718C289 | Consorcio | CESAR |
| 16 | Oscar Luis Muñoz | 1000376653 | Consorcio | |
| 17 | [illegible] | 1065235505 | Consorcio | |
| 18 | [illegible] | [illegible] | Consorcio | |
| 19 | Juan carlos murgas | 1062398052 | Consorcio | Juan carlos murgas |
| 20 | Yesmon M. | 5105243 | — | Yesmon M. |
| 21 | Jaiver Mendoza | 1080431816 | Consorcio | Jaiver Mendoza |
| 22 | Wilmer [illegible] | 1065800739 | CVO | |

OBSERVACIONES

| Versión: 1.0 | Formato | |
|---|---|---|
| Fecha: 21/04/2023 | EVALUACION DE CAPACITACIÓN | |
| Clasificación: Interna | | |

**EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN PREVENCIÓN CONSUMO DEL TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.**

Nota: 100

Nombres y Apellidos 1. Jesus David Quiroz Lopez Fecha: 25-09-2023

2. Luis Gabriel Marquez Julio

1. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Que son sustancias psicoactivas?**

a) Es todas las acciones que realizamos al estar triste.
b) Toda sustancia química que al introducirse en el organismo ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y que ocasiona cambios específicos en sus funciones.
c) Son sustancias que sirven para sanar enfermedades.

2. **Indique si (F) si es falso o (V) si es verdadero.**

Las principales vías de administración de tabaco alcohol y sustancias psicoactivas son: Oral, Fumada, Esnifada en polvo (se introduce por las fosas nasales, Inyectada. ( V )

El consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ocasionan afectaciones en el entorno familiar y daños a la salud. ( V )

Como medida preventiva durante la jornada laboral está permitido el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ( F )

3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cómo prevenir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas?**

a) Creando conciencia y sensibilización de los daños a la salud que generan el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, por medio de campañas, charlas y capacitaciones.
b) Permitiendo el consumo de sustancias.
c) Promocionando el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.



| Versión: 1.0 | Formato | |
|---|---|---|
| Fecha: 21/04/2023 | EVALUACION DE CAPACITACIÓN | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES |
| Clasificación: Interna | | |

**EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN PREVENCIÓN CONSUMO DEL TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.**

Nota: 90

Nombres y Apellidos 1. Jhon Osmo Fecha: 25-9-23

2. Wilman coronado

1. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Que son sustancias psicoactivas?**

a) Es todas las acciones que realizamos al estar triste.
b) Toda sustancia química que al introducirse en el organismo ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y que ocasiona cambios específicos en sus funciones.
c) Son sustancias que sirven para sanar enfermedades.

2. **Indique si (F) si es falso o (V) si es verdadero.**

Las principales vías de administración de tabaco alcohol y sustancias psicoactivas son: Oral, Fumada, Esnifada en polvo (se introduce por las fosas nasales, Inyectada. ( V )

El consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ocasionan afectaciones en el entorno familiar y daños a la salud. ( V )

Como medida preventiva durante la jornada laboral está permitido el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ( V ) X

3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cómo prevenir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas?**

a) Creando conciencia y sensibilización de los daños a la salud que generan el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, por medio de campañas, charlas y capacitaciones.
b) Permitiendo el consumo de sustancias.
c) Promocionando el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.



| Versión: 1.0 | Formato | |
|---|---|---|
| Fecha: 21/04/2023 | EVALUACION DE CAPACITACIÓN | |
| Clasificación: Interna | | |

**EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN PREVENCIÓN CONSUMO DEL TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.**

Nota: 100

**Nombres y Apellidos** 1. Sagrada Madonna Caldera **Fecha:** 25/07/23

2. _____

1. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Que son sustancias psicoactivas?**

a) Es todas las acciones que realizamos al estar triste.
b) Toda sustancia química que al introducirse en el organismo ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y que ocasiona cambios específicos en sus funciones.
c) Son sustancias que sirven para sanar enfermedades.

2. **Indique si (F) si es falso o (V) si es verdadero.**

Las principales vías de administración de tabaco alcohol y sustancias psicoactivas son: Oral, Fumada, Esnifada en polvo (se introduce por las fosas nasales, Inyectada. ( V )

El consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ocasionan afectaciones en el entorno familiar y daños a la salud. ( V )

Como medida preventiva durante la jornada laboral está permitido el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ( C )

3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cómo prevenir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas?**

a) Creando conciencia y sensibilización de los daños a la salud que generan el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, por medio de campañas, charlas y capacitaciones.
b) Permitiendo el consumo de sustancias.
c) Promocionando el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.



| Versión: 1.0 | Formato | |
|---|---|---|
| Fecha: 21/04/2023 | EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN | |
| Clasificación: Interna | | |

**EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN PREVENCIÓN CONSUMO DEL TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.**

Nota: 95

**Nombres y Apellidos** 1. Oldair Diaz **Fecha:** 25-9-23

2. Carlos Ubeda

1. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Que son sustancias psicoactivas?**

a) Es todas las acciones que realizamos al estar triste.
b) Toda sustancia química que al introducirse en el organismo ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y que ocasiona cambios específicos en sus funciones.
c) Son sustancias que sirven para sanar enfermedades.

2. **Indique si (F) si es falso o (V) si es verdadero.**

Las principales vías de administración de tabaco alcohol y sustancias psicoactivas son: Oral, Fumada, Esnifada en polvo (se introduce por las fosas nasales, Inyectada. ( V )

El consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ocasionan afectaciones en el entorno familiar y daños a la salud. ( V )

Como medida preventiva durante la jornada laboral está permitido el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ( F )

3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cómo prevenir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas?**

a) Creando conciencia y sensibilización de los daños a la salud que generan el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, por medio de campañas, charlas y capacitaciones.
b) Permitiendo el consumo de sustancias.
c) Promocionando el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.



| Versión: 1.0 | Formato | |
|---|---|---|
| Fecha: 21/04/2023 | EVALUACION DE CAPACITACIÓN | |
| Clasificación: Interna | | |

**EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN PREVENCIÓN CONSUMO DEL TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.**

Nota: 100

**Nombres y Apellidos** 1. César Luis Mejía **Fecha:** 27/04/2023

2. César Rafael Ruiz

1. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Que son sustancias psicoactivas?**

a) Es todas las acciones que realizamos al estar triste.
b) Toda sustancia química que al introducirse en el organismo ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y que ocasiona cambios específicos en sus funciones.
c) Son sustancias que sirven para sanar enfermedades.

2. **Indique si (F) si es falso o (V) si es verdadero.**

Las principales vías de administración de tabaco alcohol y sustancias psicoactivas son: Oral, Fumada, Esnifada en polvo (se introduce por las fosas nasales, Inyectada. ( V )

El consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ocasionan afectaciones en el entorno familiar y daños a la salud. ( V )

Como medida preventiva durante la jornada laboral está permitido el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ( F )

3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cómo prevenir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas?**

a) Creando conciencia y sensibilización de los daños a la salud que generan el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, por medio de campañas, charlas y capacitaciones.
b) Permitiendo el consumo de sustancias.
c) Promocionando el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.



| Versión: 1.0 | Formato | |
|---|---|---|
| Fecha: 21/04/2023 | EVALUACION DE CAPACITACION | |
| Clasificación: Interna | | |

**EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN PREVENCIÓN CONSUMO DEL TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.**

Nota: 100

**Nombres y Apellidos** 1. Nicolle Palacios R. **Fecha:** 09-25-23

2. RAFAEL BACAZAR VELOCCIA

1. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Que son sustancias psicoactivas?**

a) Es todas las acciones que realizamos al estar triste.
b) Toda sustancia química que al introducirse en el organismo ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y que ocasiona cambios específicos en sus funciones.
c) Son sustancias que sirven para sanar enfermedades.

2. **Indique si (F) si es falso o (V) si es verdadero.**

Las principales vías de administración de tabaco alcohol y sustancias psicoactivas son: Oral, Fumada, Esnifada en polvo (se introduce por las fosas nasales, Inyectada. ( V )

El consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ocasionan afectaciones en el entorno familiar y daños a la salud. ( V )

Como medida preventiva durante la jornada laboral está permitido el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ( F )

3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cómo prevenir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas?**

a) Creando conciencia y sensibilización de los daños a la salud que generan el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, por medio de campañas, charlas y capacitaciones.
b) Permitiendo el consumo de sustancias.
c) Promocionando el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.



| Versión: 01 | FORMATO | |
|---|---|---|
| Fecha: 19/04/2023 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL | |
| Clasificación: Interna | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia. | | | | | | |
| TEMAS DE LA CAPACITACIÓN | Prevención Consumo de tabaco, Alcohol y Sustancias psicoactivas. | | | | | | |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | CHARLA DE SEGURIDAD | | CAPACITACIÓN | ✓ | SOCIALIZACIÓN | |
| CAPACITADOR: | Karen Soto | | | DURACIÓN: | 1 Hora | | |
| FECHA: | 25-09-2023 | | | LUGAR: | Palacio de Justicia. | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | [illegible] | 1.065578667 | JCR | |
| 24 | [illegible] | 1065813762 | JCR | |
| 25 | Luis Garcia M. | 7609377140 | Consorcio | Luis Garcia M. |
| 26 | Jesus David Ochoa | 1065842379 | Consorcio | Jesus Ochoa |
| 27 | Alvaro Diaz | 1065809920 | Consorcio | Alvaro Diaz |
| 28 | [illegible] | 1065603987 | Consorcio | [illegible] |
| 29 | Yuber Bernal | 79750.423 | Consorcio | [illegible] |

OBSERVACIONES

| Versión: 1.0 | Formato | |
|---|---|---|
| Fecha: 21/04/2023 | EVALUACION DE CAPACITACIÓN | |
| Clasificación: Interna | | |

**EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN PREVENCIÓN CONSUMO DEL TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.**

Nota: 100

**Nombres y Apellidos** 1. Oscar Bustillo **Fecha:** 25-09-23

2. Duvan pinto

1. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Que son sustancias psicoactivas?**

a) Es todas las acciones que realizamos al estar triste.
b) Toda sustancia química que al introducirse en el organismo ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y que ocasiona cambios específicos en sus funciones.
c) Son sustancias que sirven para sanar enfermedades.

2. **Indique si (F) si es falso o (V) si es verdadero.**

Las principales vías de administración de tabaco alcohol y sustancias psicoactivas son: Oral, Fumada, Esnifada en polvo (se introduce por las fosas nasales, Inyectada. ( V )

El consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ocasionan afectaciones en el entorno familiar y daños a la salud. ( V )

Como medida preventiva durante la jornada laboral está permitido el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ( F )

3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cómo prevenir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas?**

a) Creando conciencia y sensibilización de los daños a la salud que generan el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, por medio de campañas, charlas y capacitaciones.
b) Permitiendo el consumo de sustancias.
c) Promocionando el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.



| Versión: 1.0 | Formato | |
|---|---|---|
| Fecha: 21/04/2023 | EVALUACION DE CAPACITACIÓN | |
| Clasificación: Interna | | |

**EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN PREVENCIÓN CONSUMO DEL TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.**

Nota: 95.

Nombres y Apellidos 1. Juan Carlos Fecha: 25/04/2023

2. Jeiner mendoza

1. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Que son sustancias psicoactivas?**

a) Es todas las acciones que realizamos al estar triste.
b) Toda sustancia quimica que al introducirse en el organismo ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y que ocasiona cambios especificos en sus funciones.
c) Son sustancias que sirven para sanar enfermedades.

2. **Indique si (F) si es falso o (V) si es verdadero.**

Las principales vías de administración de tabaco alcohol y sustancias psicoactivas son: Oral, Fumada, Esnifada en polvo (se introduce por las fosas nasales, Inyectada. (V)

El consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ocasionan afectaciones en el entorno familiar y daños a la salud. ( V )

Como medida preventiva durante la jornada laboral está permitido el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ( F )

3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cómo prevenir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas?**

a) Creando conciencia y sensibilización de los daños a la salud que generan el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, por medio de campañas, charlas y capacitaciones.
b) Permitiendo el consumo de sustancias.
c) Promocionando el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.



| Versión: 1.0 | Formato | |
|---|---|---|
| Fecha: 21/04/2023 | EVALUACION DE CAPACITACIÓN | |
| Clasificación: Interna | | |

**EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN PREVENCIÓN CONSUMO DEL TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.**

Nota: 100

**Nombres y Apellidos** 1. Jhon Arias **Fecha:** 25/09/23

2. Fabian VV

1. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Que son sustancias psicoactivas?**

a) Es todas las acciones que realizamos al estar triste.
b) Toda sustancia química que al introducirse en el organismo ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y que ocasiona cambios específicos en sus funciones.
c) Son sustancias que sirven para sanar enfermedades.

2. **Indique si (F) si es falso o (V) si es verdadero.**

Las principales vías de administración de tabaco alcohol y sustancias psicoactivas son: Oral, Fumada, Esnifada en polvo (se introduce por las fosas nasales, Inyectada. ( V )

El consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ocasionan afectaciones en el entorno familiar y daños a la salud. ( V )

Como medida preventiva durante la jornada laboral está permitido el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ( F )

3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cómo prevenir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas?**

a) Creando conciencia y sensibilización de los daños a la salud que generan el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, por medio de campañas, charlas y capacitaciones.
b) Permitiendo el consumo de sustancias.
c) Promocionando el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.



| Versión: 1.0 | Formato | |
|---|---|---|
| Fecha: 21/04/2023 | EVALUACION DE CAPACITACIÓN | |
| Clasificación: Interna | | |

**EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN PREVENCIÓN CONSUMO DEL TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.**

Nota: 100

**Nombres y Apellidos** 1. Yuber Edo. Bernal Fecha: 25-09-2023

2. Oneidy Quiroga Tejada

1. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Que son sustancias psicoactivas?**

a) Es todas las acciones que realizamos al estar triste.
b) Toda sustancia quimica que al introducirse en el organismo ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y que ocasiona cambios especificos en sus funciones.
c) Son sustancias que sirven para sanar enfermedades.

2. **Indique si (F) si es falso o (V) si es verdadero.**

Las principales vias de administración de tabaco alcohol y sustancias psicoactivas son: Oral, Fumada, Esnifada en polvo (se introduce por las fosas nasales, Inyectada. ( V )

El consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ocasionan afectaciones en el entorno familiar y daños a la salud. ( V )

Como medida preventiva durante la jornada laboral está permitido el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ( F )

3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cómo prevenir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas?**

a) Creando conciencia y sensibilización de los daños a la salud que generan el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, por medio de campañas, charlas y capacitaciones.
b) Permitiendo el consumo de sustancias.
c) Promocionando el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.



| Versión: 1.0 | Formato | |
|---|---|---|
| Fecha: 21/04/2023 | EVALUACION DE CAPACITACIÓN | |
| Clasificación: Interna | | |

**EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN PREVENCIÓN CONSUMO DEL TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.**

Nota: 100

Nombres y Apellidos 1. Jose Usecha Fecha: 25/07/23

2. Castillo

1. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Que son sustancias psicoactivas?**

a) Es todas las acciones que realizamos al estar triste.
b) Toda sustancia química que al introducirse en el organismo ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y que ocasiona cambios específicos en sus funciones.
c) Son sustancias que sirven para sanar enfermedades.

2. **Indique si (F) si es falso o (V) si es verdadero.**

Las principales vías de administración de tabaco alcohol y sustancias psicoactivas son: Oral, Fumada, Esnifada en polvo (se introduce por las fosas nasales, Inyectada. ( V )

El consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ocasionan afectaciones en el entorno familiar y daños a la salud. ( V )

Como medida preventiva durante la jornada laboral está permitido el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ( F )

3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cómo prevenir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas?**

a) Creando conciencia y sensibilización de los daños a la salud que generan el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, por medio de campañas, charlas y capacitaciones.
b) Permitiendo el consumo de sustancias.
c) Promocionando el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.



| Versión: 1.0 | Formato | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES NIT. 901.665.448-8 |
|---|---|---|
| Fecha: 21/04/2023 | EVALUACION DE CAPACITACIÓN | |
| Clasificación: Interna | | |

**EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN PREVENCIÓN CONSUMO DEL TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.**

Nota: 100

**Nombres y Apellidos** 1. Luis Miguel Lopez **Fecha:** 25/23

2. Daniel Aguilar

1. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Que son sustancias psicoactivas?**

a) Es todas las acciones que realizamos al estar triste.
X b) Toda sustancia química que al introducirse en el organismo ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y que ocasiona cambios específicos en sus funciones.
c) Son sustancias que sirven para sanar enfermedades.

2. **Indique si (F) si es falso o (V) si es verdadero.**

Las principales vías de administración de tabaco alcohol y sustancias psicoactivas son: Oral, Fumada, Esnifada en polvo (se introduce por las fosas nasales, Inyectada. ( V )

El consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ocasionan afectaciones en el entorno familiar y daños a la salud. ( V )

Como medida preventiva durante la jornada laboral está permitido el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ( F )

3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cómo prevenir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas?**

X a) Creando conciencia y sensibilización de los daños a la salud que generan el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, por medio de campañas, charlas y capacitaciones.
b) Permitiendo el consumo de sustancias.
c) Promocionando el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.



| Versión: 1.0 | Formato | |
|---|---|---|
| Fecha: 21/04/2023 | EVALUACION DE CAPACITACIÓN | |
| Clasificación: Interna | | |

**EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN PREVENCIÓN CONSUMO DEL TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.**

Nota: 100

Nombres y Apellidos 1. Reinaldo Moscote Fecha: 22-9-23

2. Jeiwaldy Fontalvo

1. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Que son sustancias psicoactivas?**

a) Es todas las acciones que realizamos al estar triste.
(b) Toda sustancia química que al introducirse en el organismo ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y que ocasiona cambios específicos en sus funciones.
c) Son sustancias que sirven para sanar enfermedades.

2. **Indique si (F) si es falso o (V) si es verdadero.**

Las principales vías de administración de tabaco alcohol y sustancias psicoactivas son: Oral, Fumada, Esnifada en polvo (se introduce por las fosas nasales, Inyectada. ( V )

El consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ocasionan afectaciones en el entorno familiar y daños a la salud. ( V )

Como medida preventiva durante la jornada laboral está permitido el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ( F )

3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cómo prevenir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas?**

(a) Creando conciencia y sensibilización de los daños a la salud que generan el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, por medio de campañas, charlas y capacitaciones.
b) Permitiendo el consumo de sustancias.
c) Promocionando el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.



| Versión: 01 | ACTA | |
|---|---|---|
| Fecha: 03/04/2023 | REUNIÓN | |
| Clasificación: Interna | | |

Asunto: Reunión Comité Paritario de seguridad y Salud en Trabajo.

Hora de inicio: 09:00 Am

Fecha: 26/09/2023

Hora de finalización: 09:30 Am

| Temas Tratados | |
|---|---|
| N.° | Ítem |
| 1 | Revisar las políticas SST, objetivos, plan anual de trabajo y cronograma de capacitaciones. |
| 2 | Revisar Ausentismo laboral. |

**Desarrollo de la reunión**

Se tomó registro de los asistentes.


El Comité se reúne y se lleva a cabo la revisión del acta anterior, seguimiento de entrega de EPP, Actos y condiciones inseguras.


Se realiza revisión de las políticas SST, Objetivos, plan anual de trabajo y cronograma de capacitaciones. Se verifica la publicación para la divulgación de los antes mencionados.


Se procede a la revisión del ausentismo laboral el cual se refleja dentro de las tablas de horas hombres trabajados. Ausentismo por incapacidades y personal con ausentismo laboral no justificado, del último trimestre en el cual hay un aumento significativo de días perdidos. Usar estrategias de seguimiento y control enfocadas a mejorar la productividad y organización de la empresa.


| Compromisos | | | |
|---|---|---|---|
| N.° | Asunto | Responsable | Fecha de cumplimiento |
| 1 | Seguimiento al tema de ausentismo laboral, enfocado en los indicadores de ausentismo. | Miembros del COPASST Residente SST | 28/10/2023 |
| 2 | Reunión para seguimiento de los temas tratados. | Miembros del COPASST | 26/10/2023 |


| Asistentes | | | |
|---|---|---|---|
| | Nombres y Apellidos | Cargo | Firma |
| 1 | Ismael Arenas Medina | Residente de Obra | |
| 2 | Cheryly Carolina Parra | Residente Administrativa | Cheryly Carolina Parra. |
| 3 | Adriana Jaime Hernandez Escobar | oficial de obra | |
| 4 | Carlos Oliveros | Ayudante | CARLOS |
| 5 | Juan C Velazco V. | Residente Q | |
| 6 | Karen Soto T. | Residente SST | |
| 7 | Damaris Salcedo | Residente SST | |
| 8 | | | |

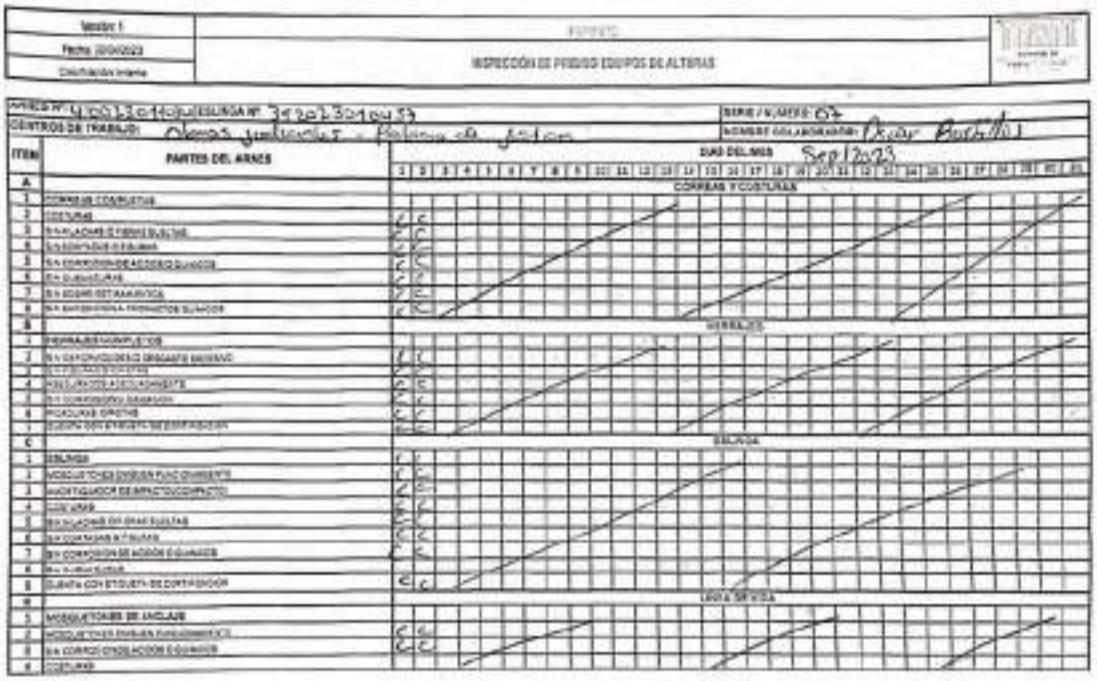

INSPECCIÓN DE PISOS EQUIPOS DE ALTURAS
ITEM
PARTES DEL ARNES
DIAS DEL MES
CORREAS Y COSTURAS
HEBILLAS
ESLINGA
LINEA DE VIDA

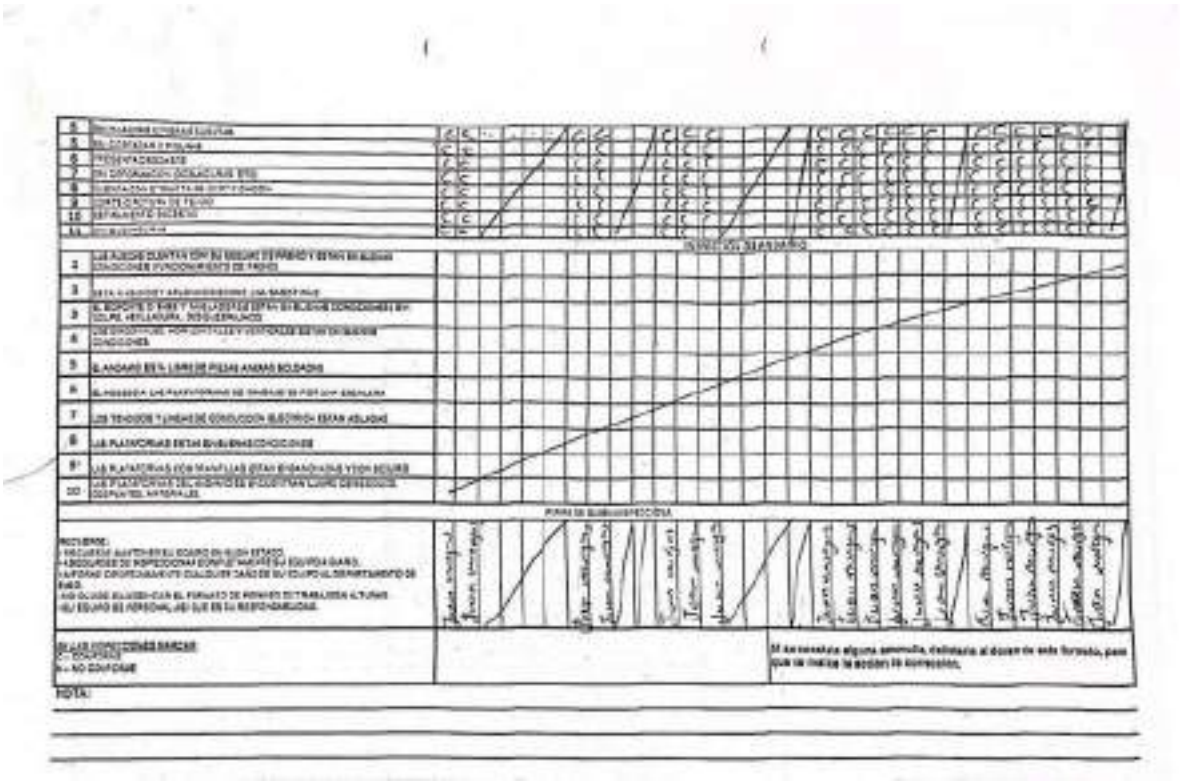


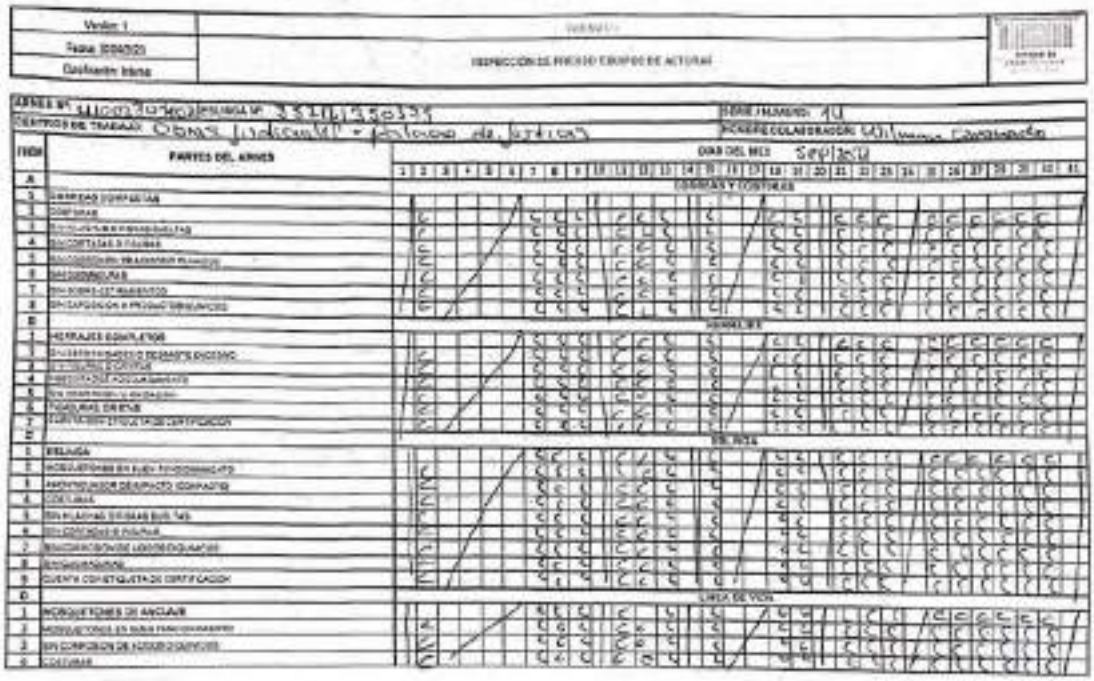


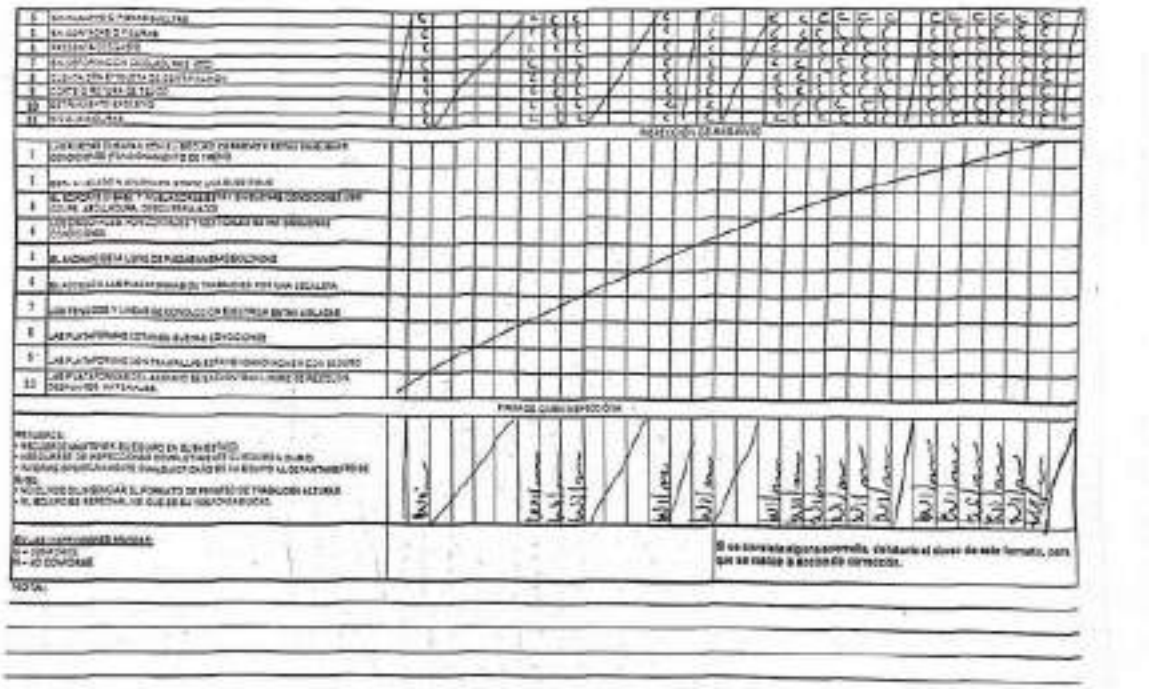


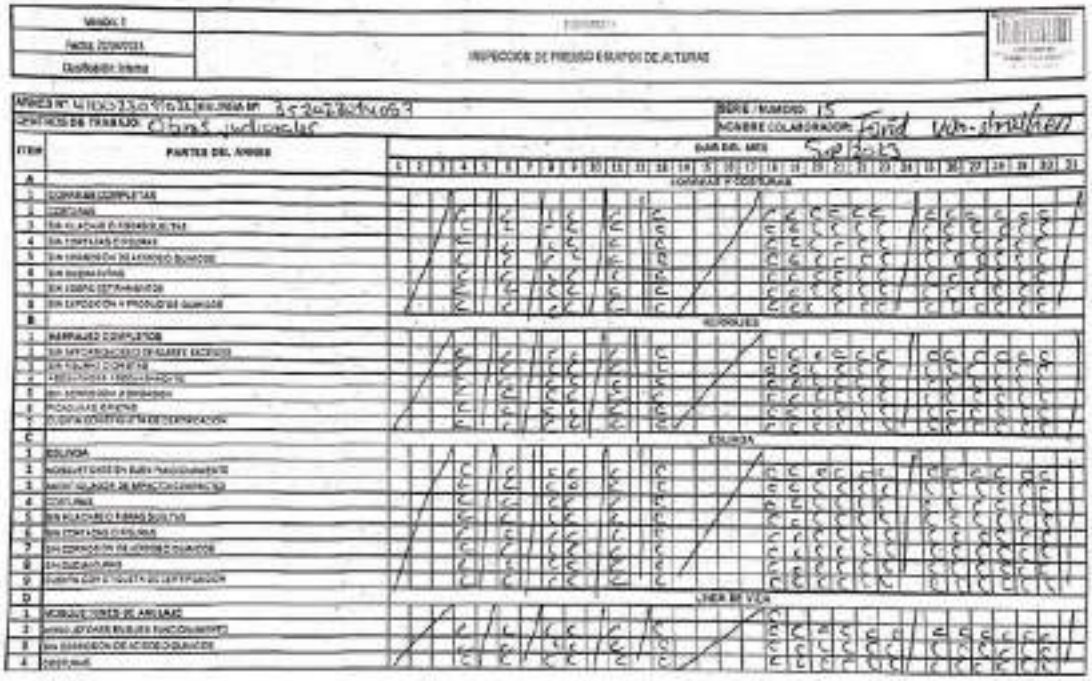


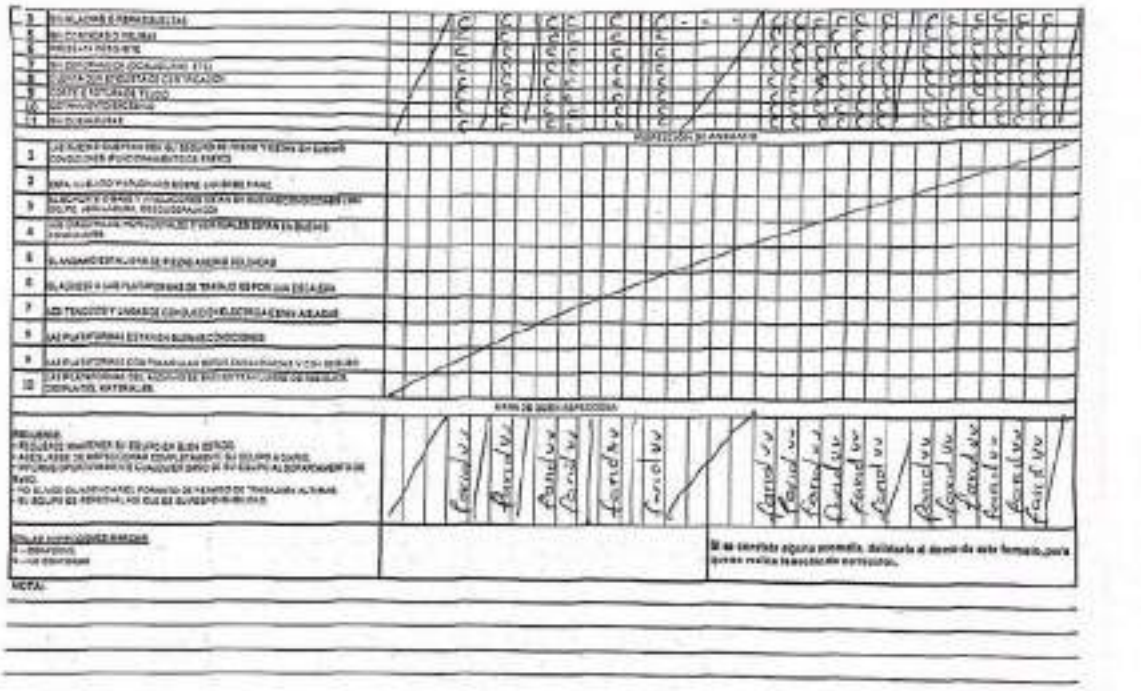


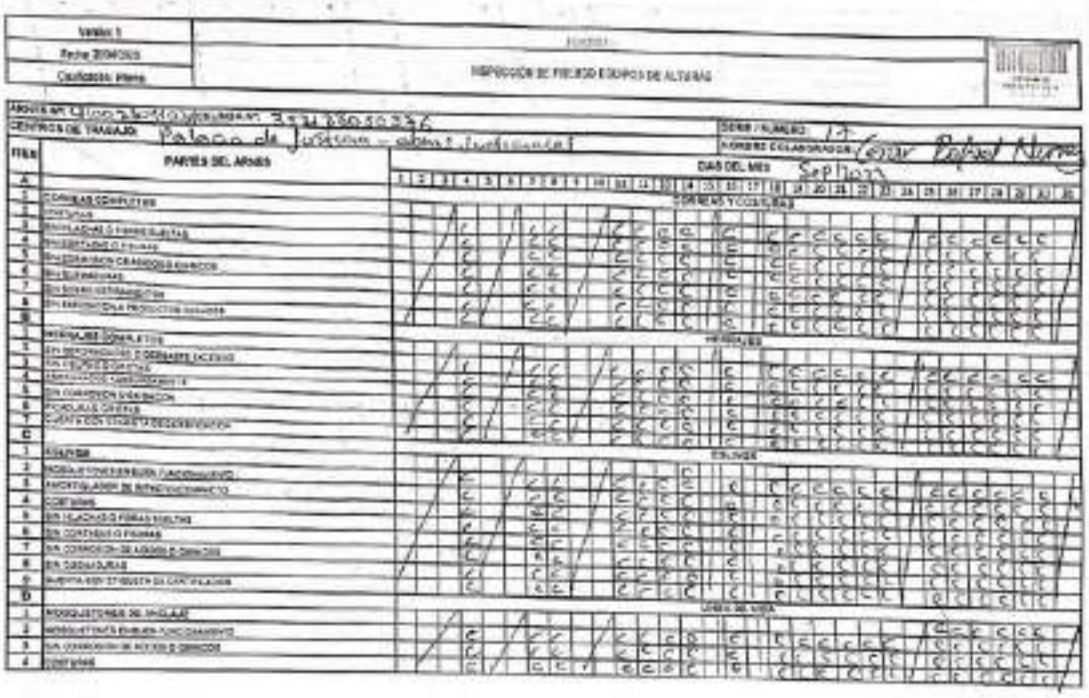


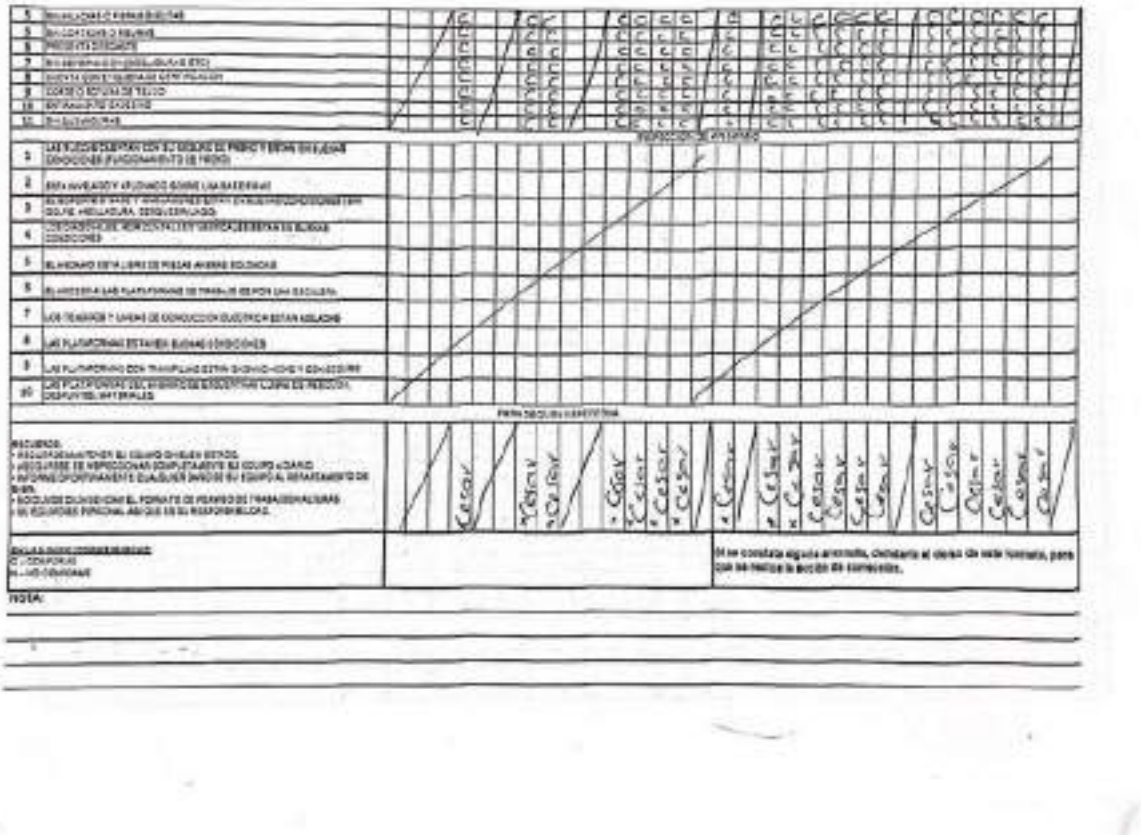


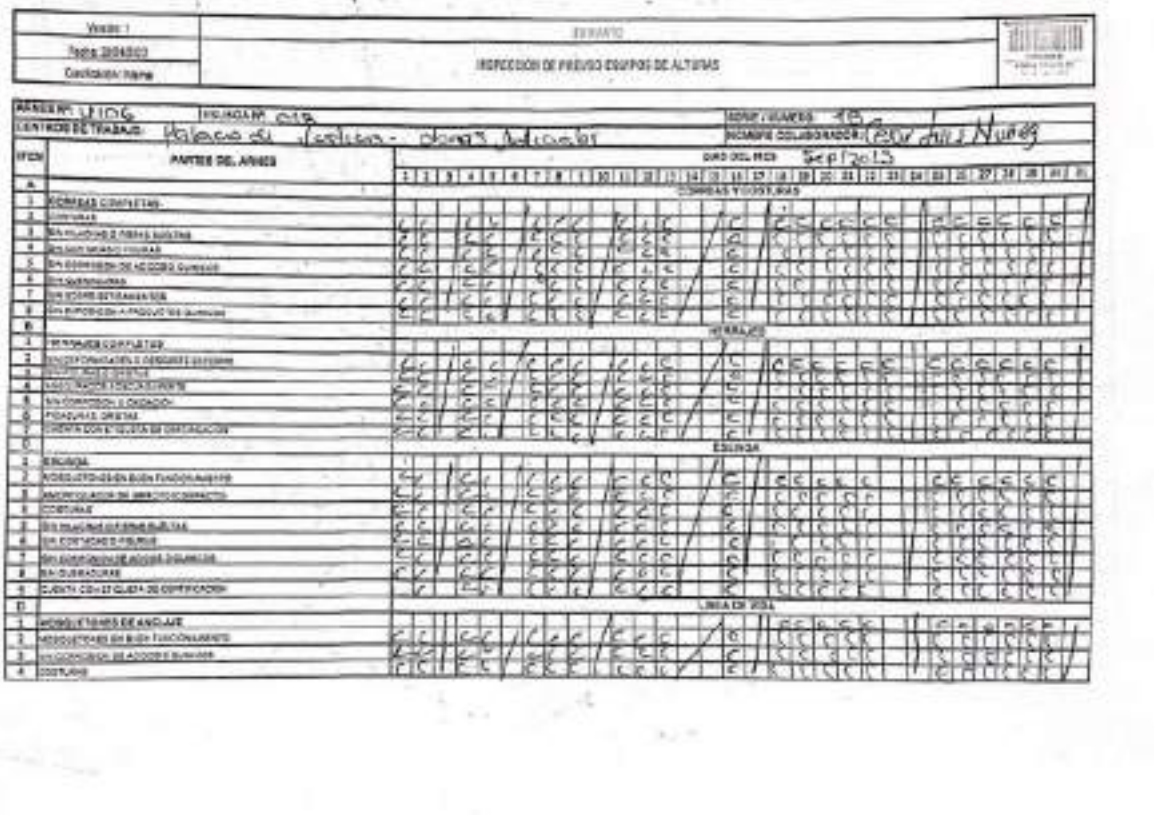


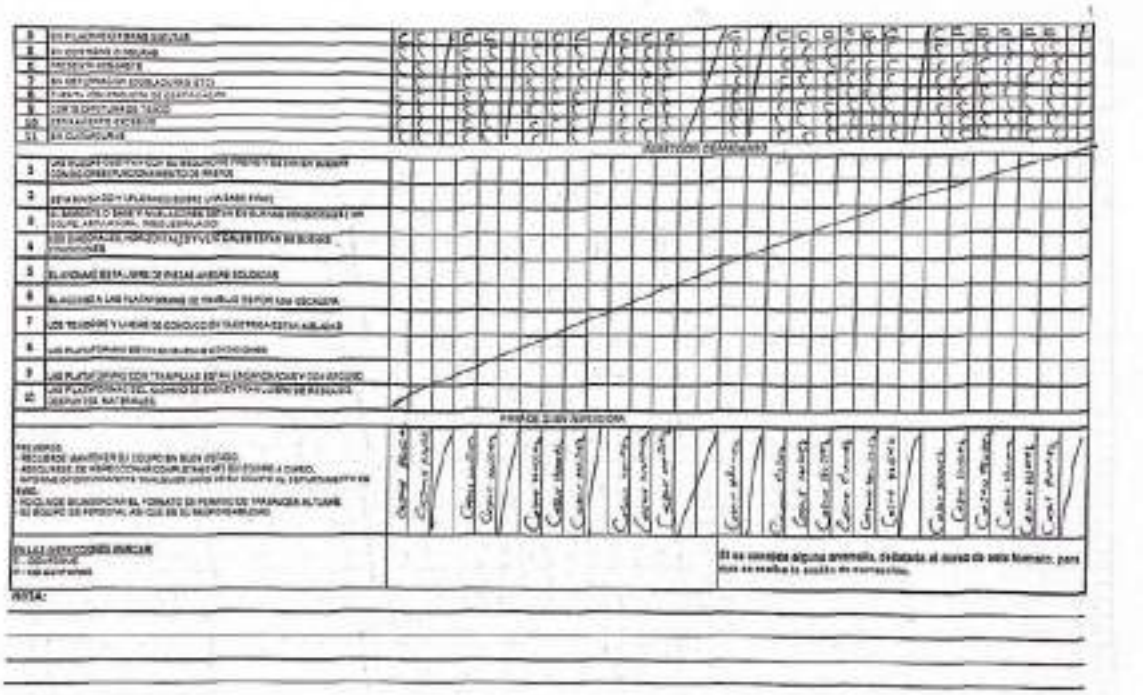


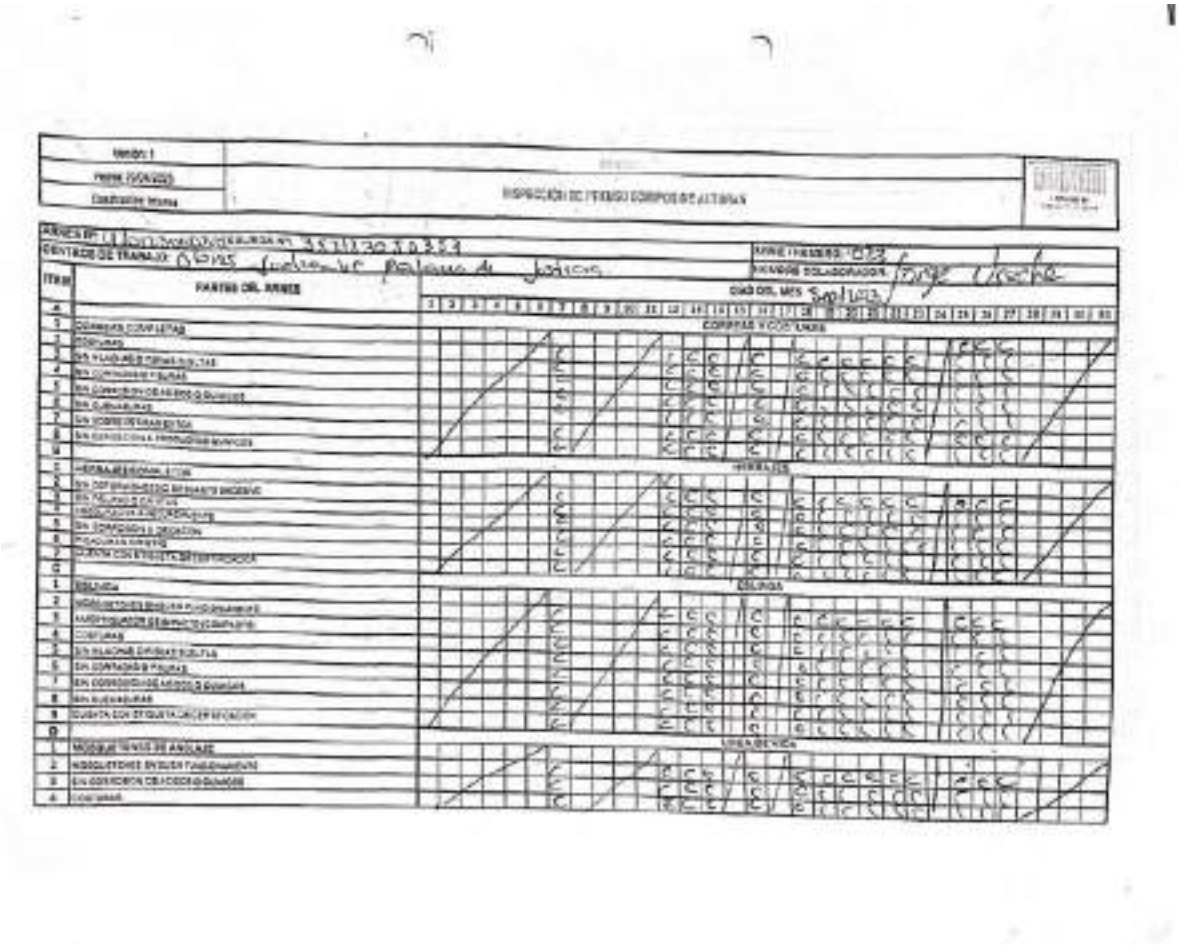


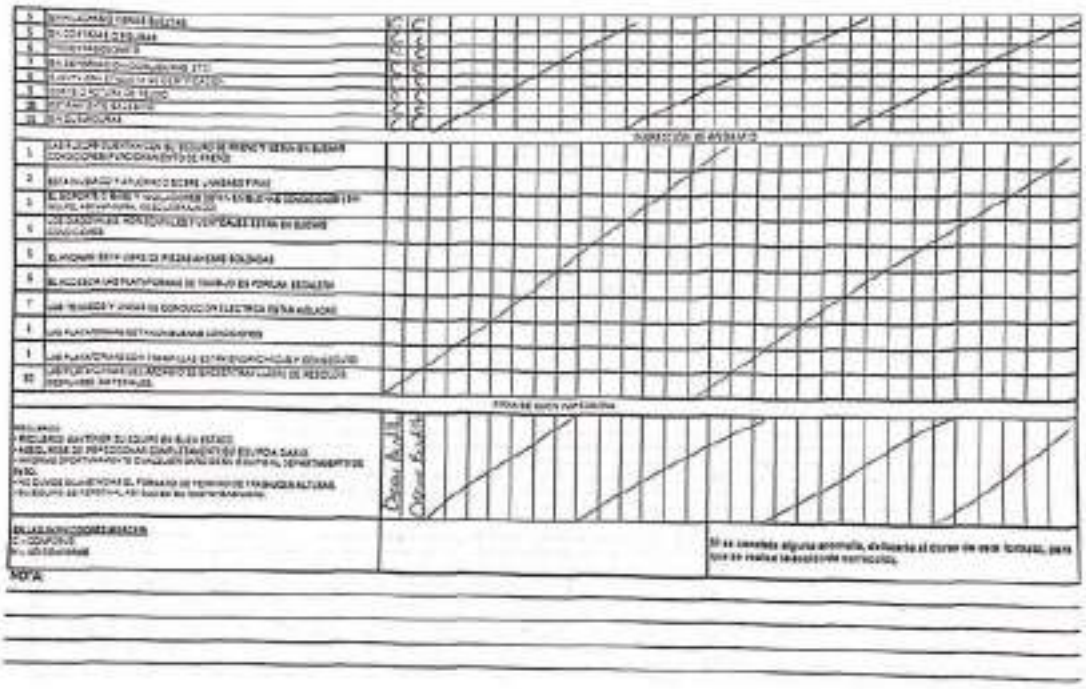


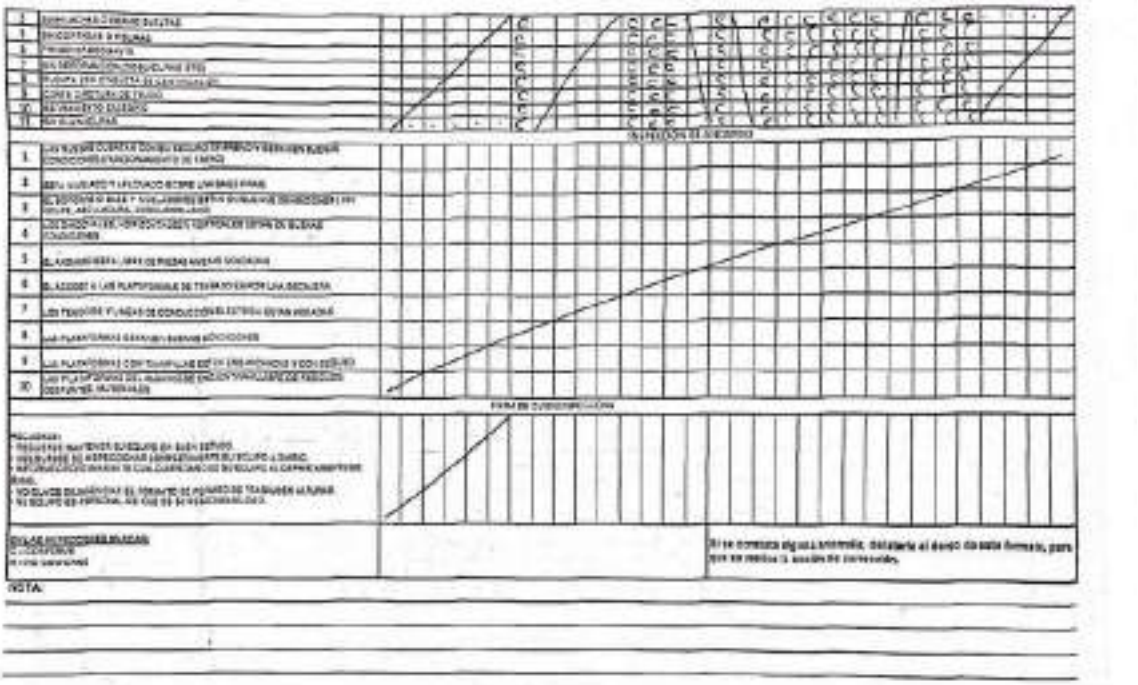


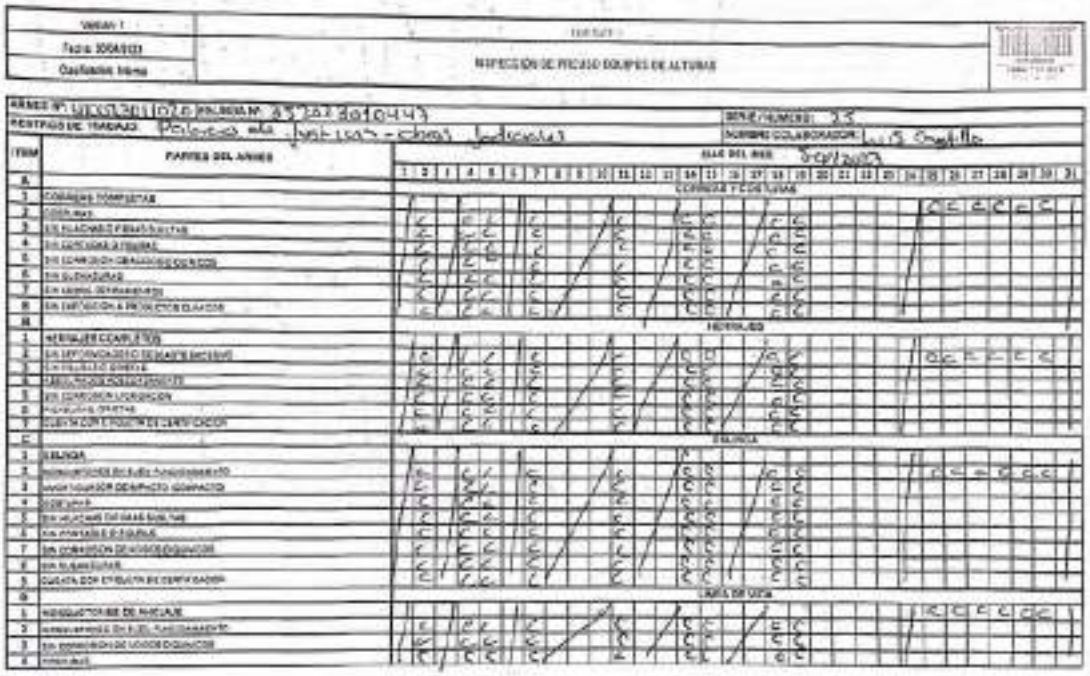


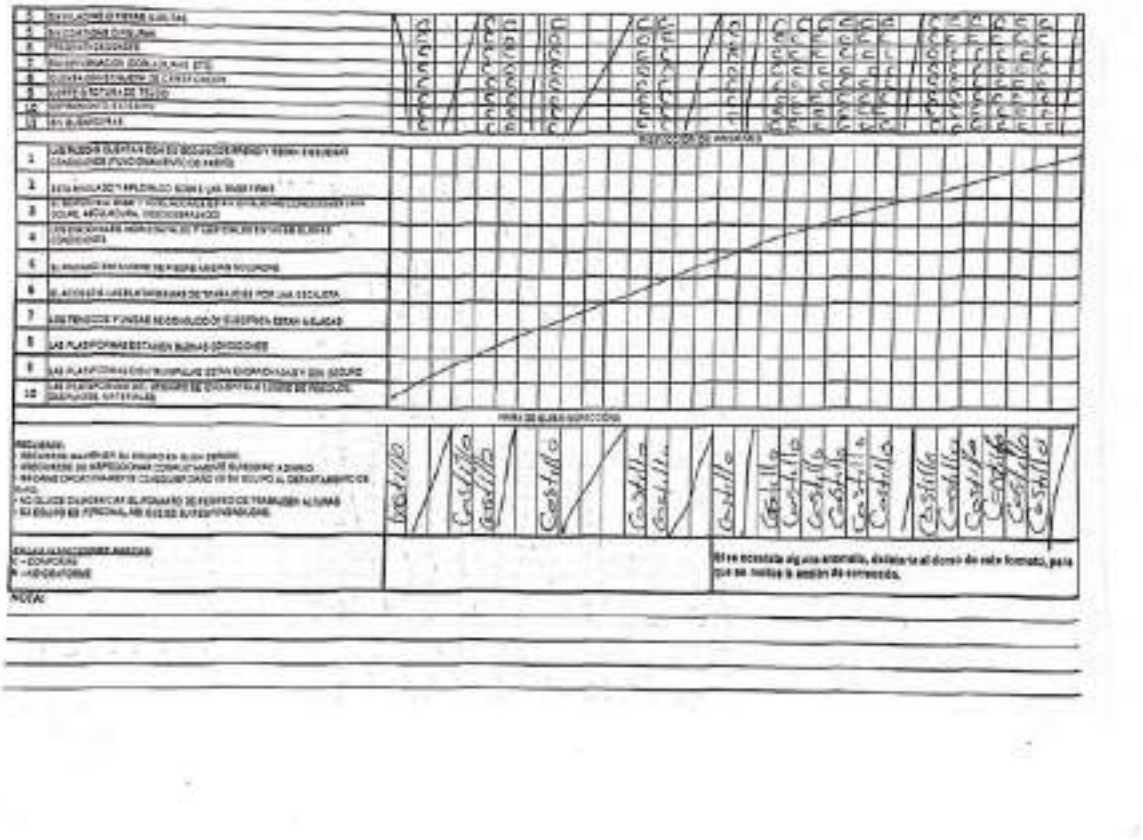


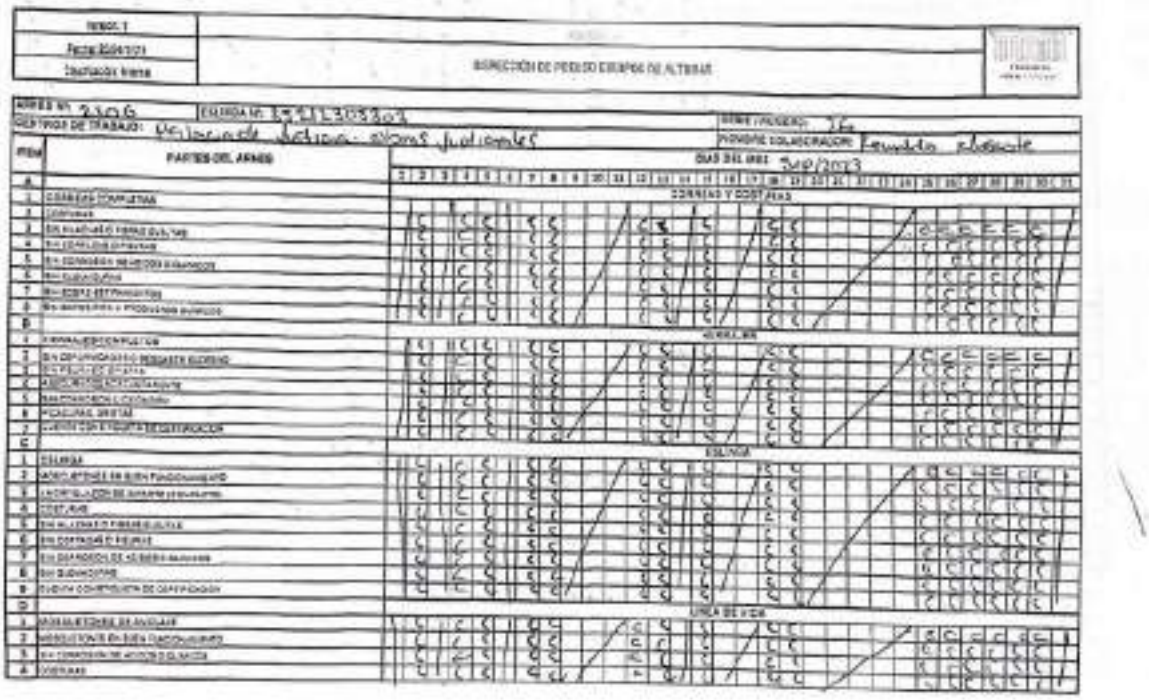


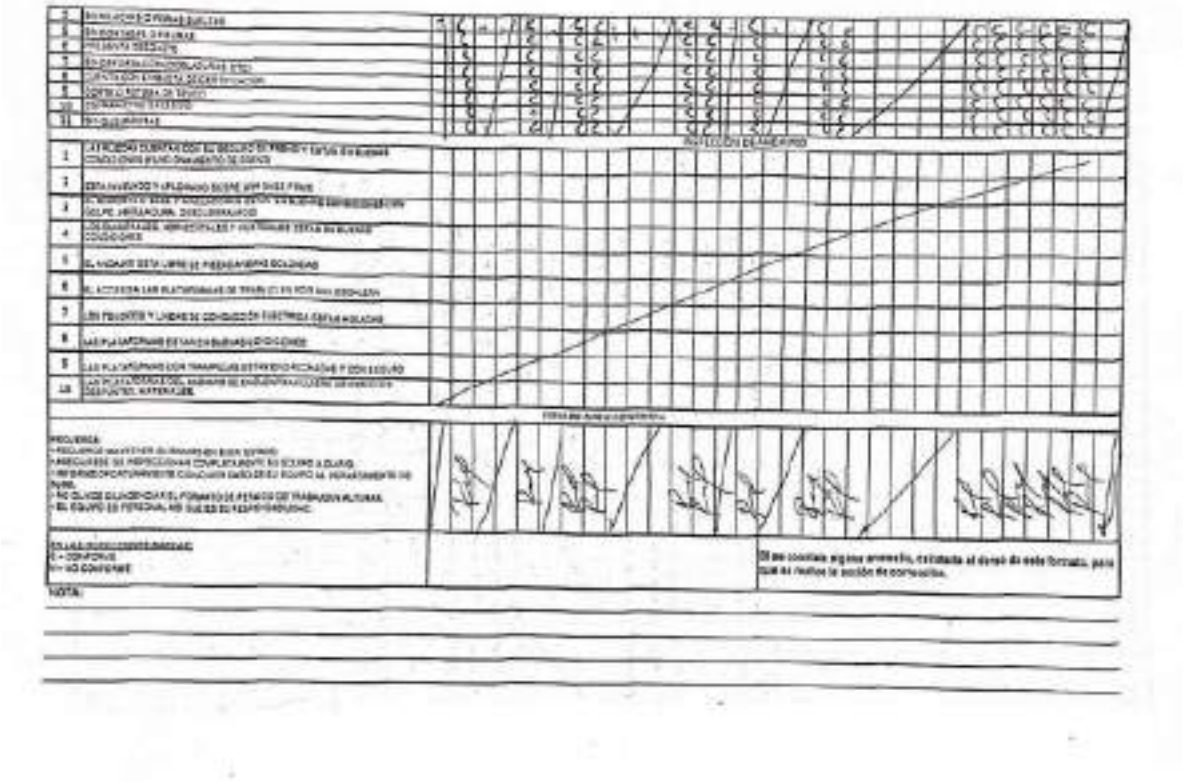


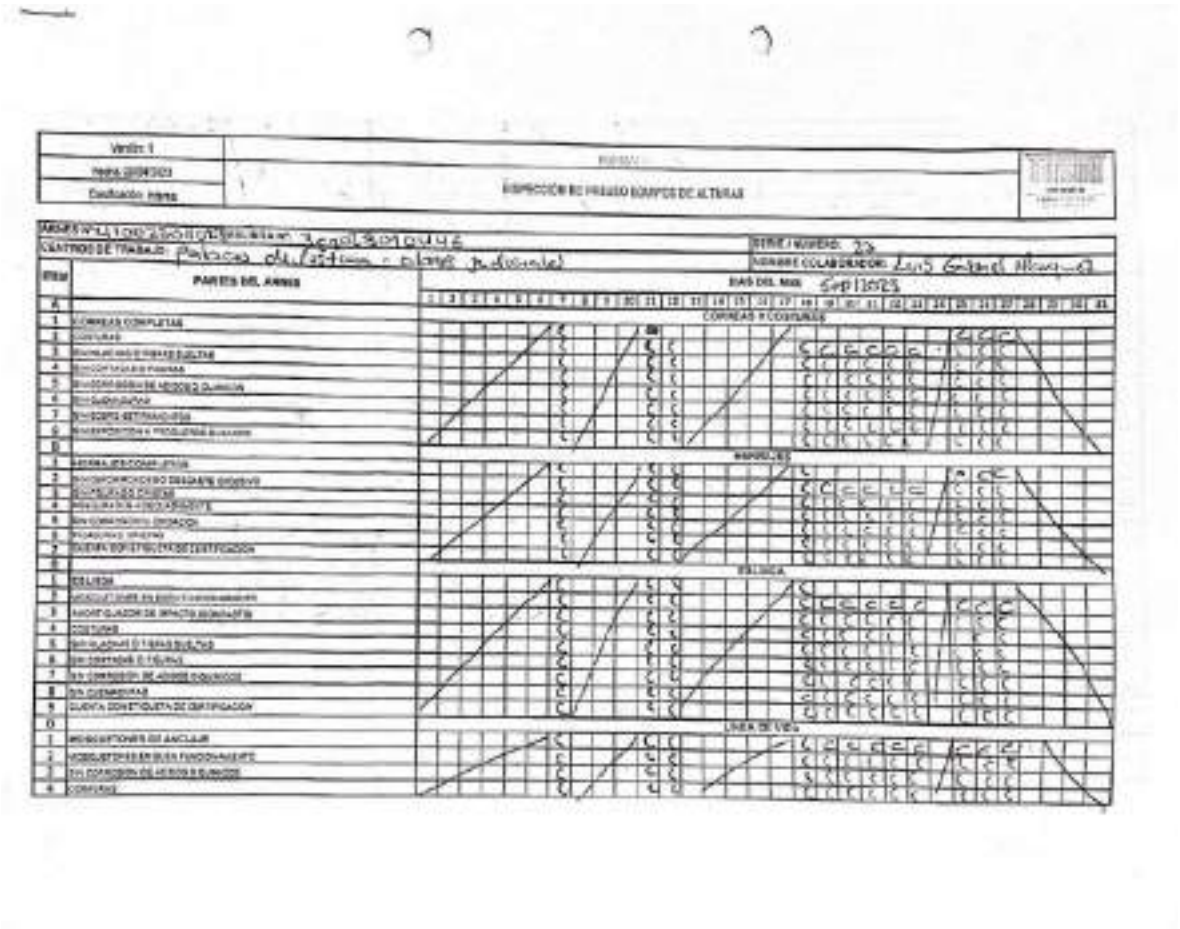


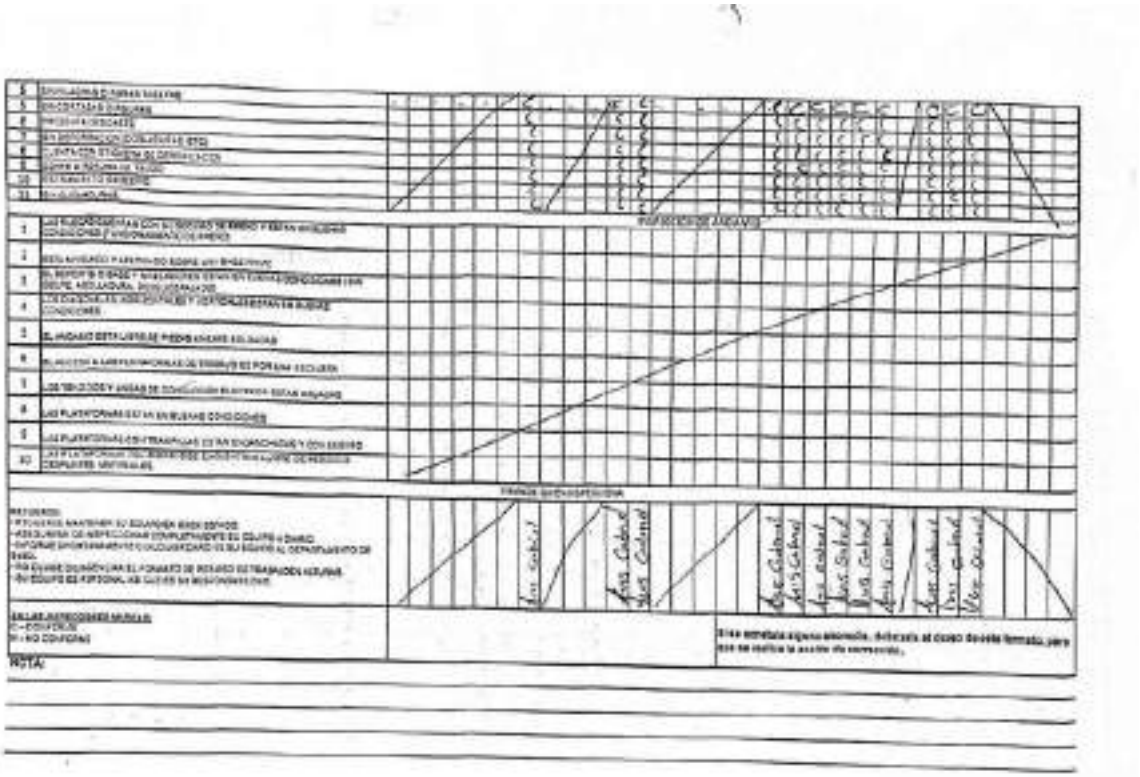


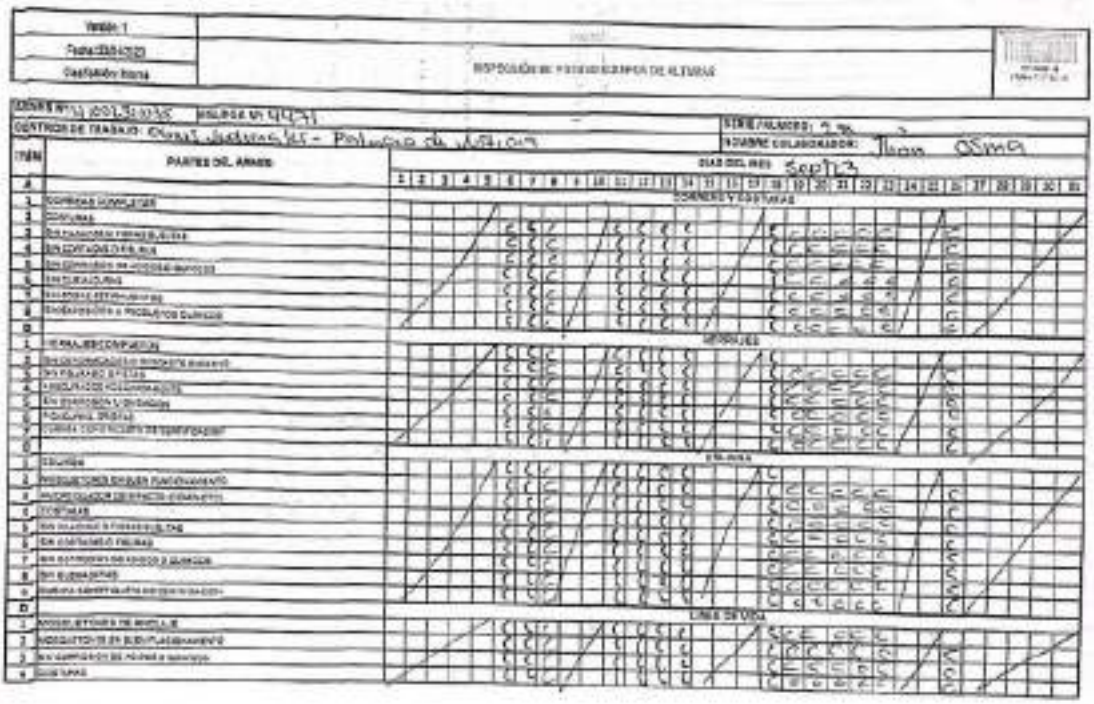


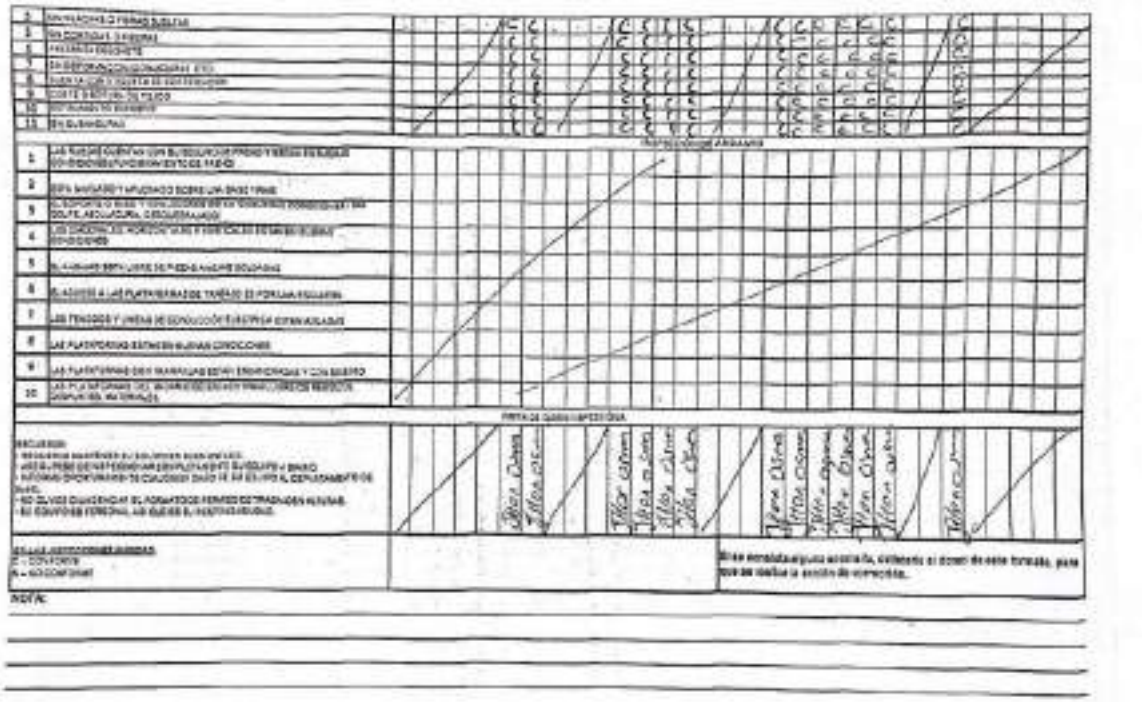


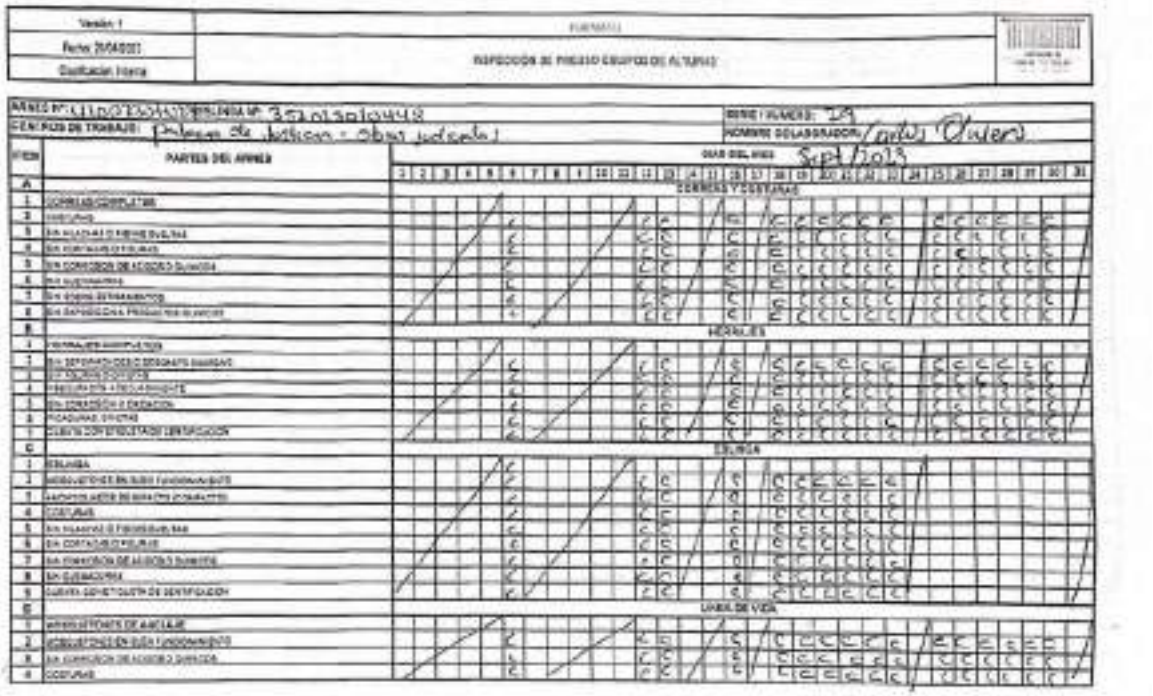


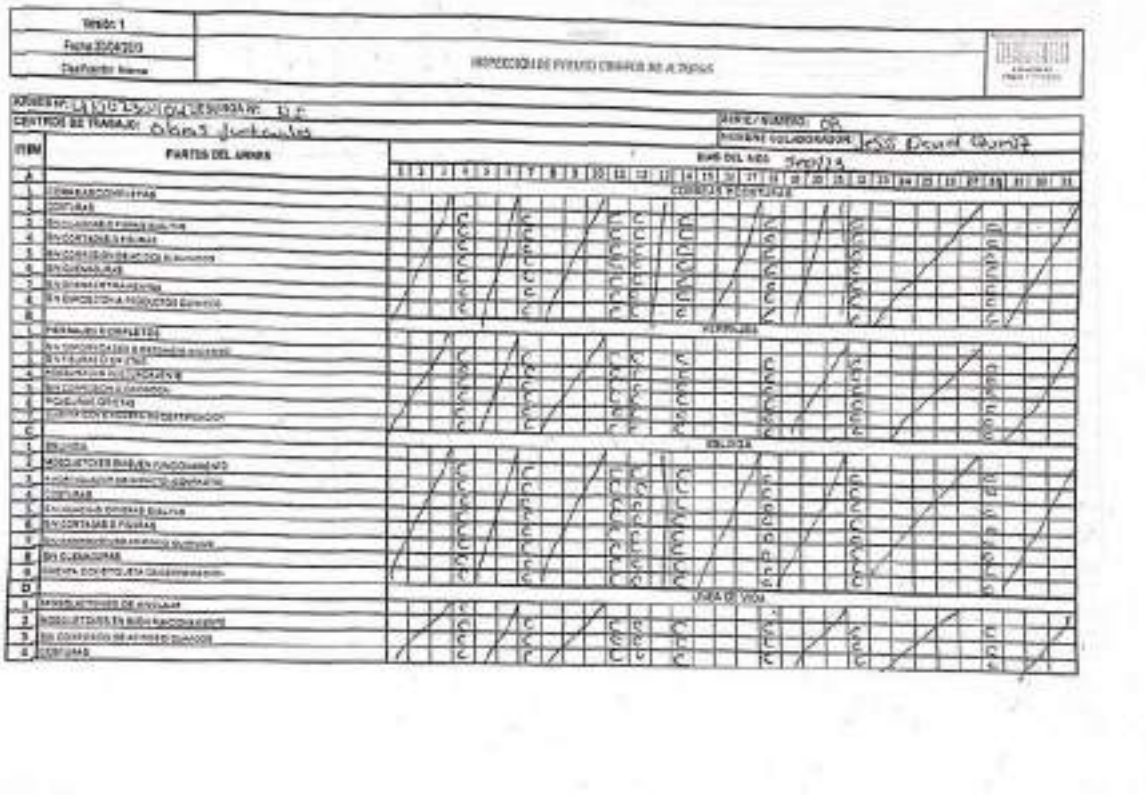


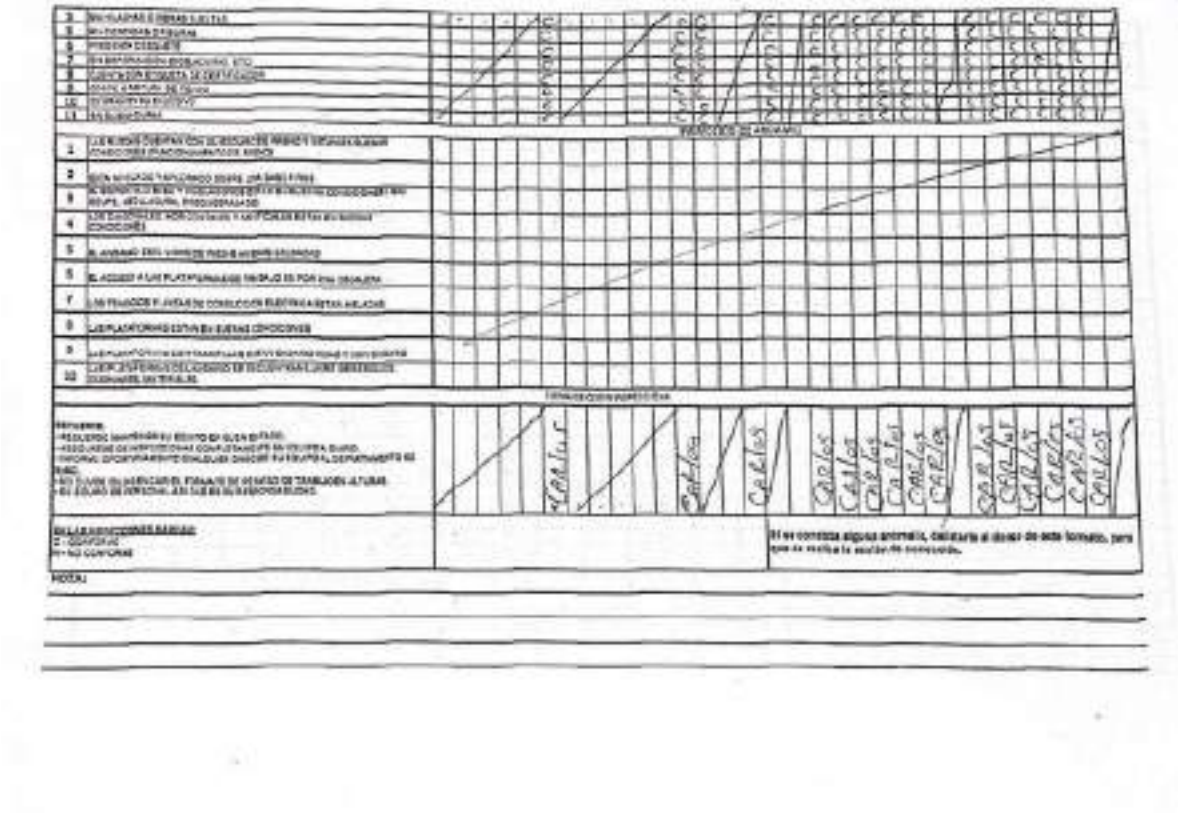


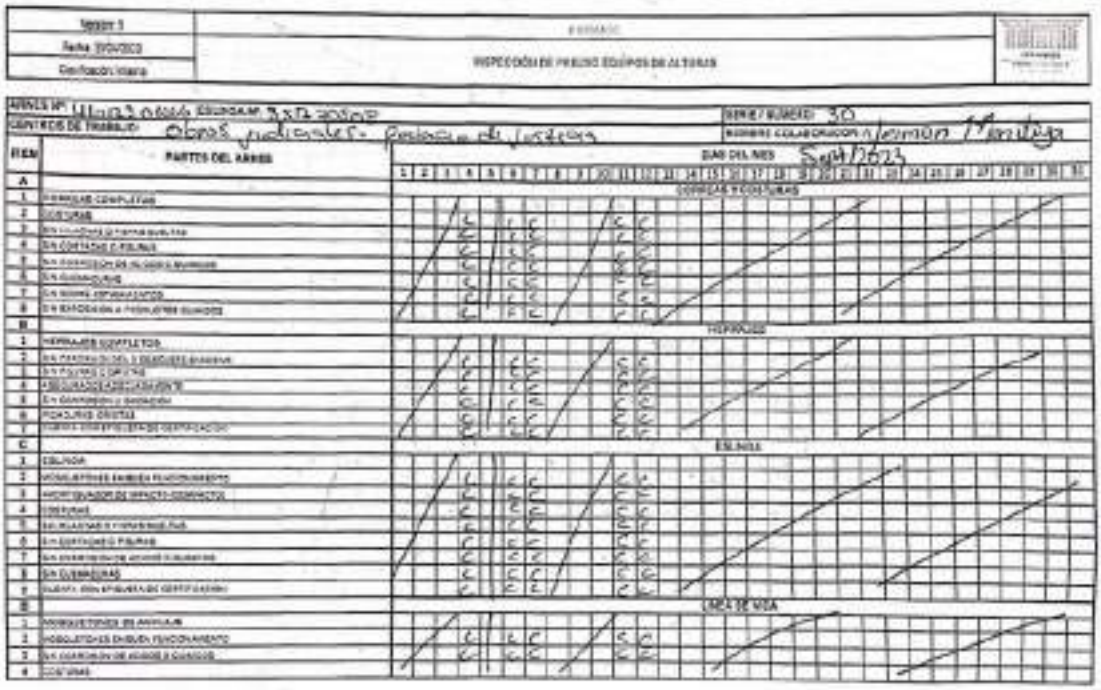


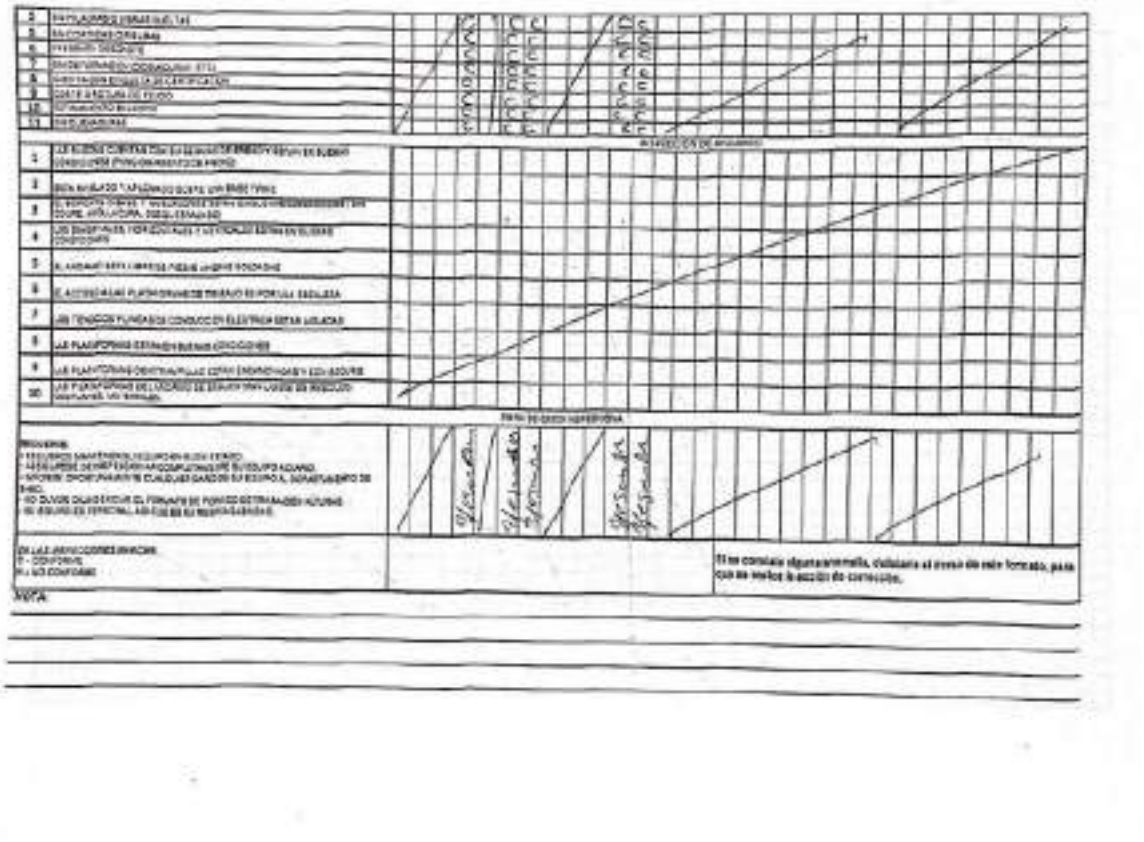


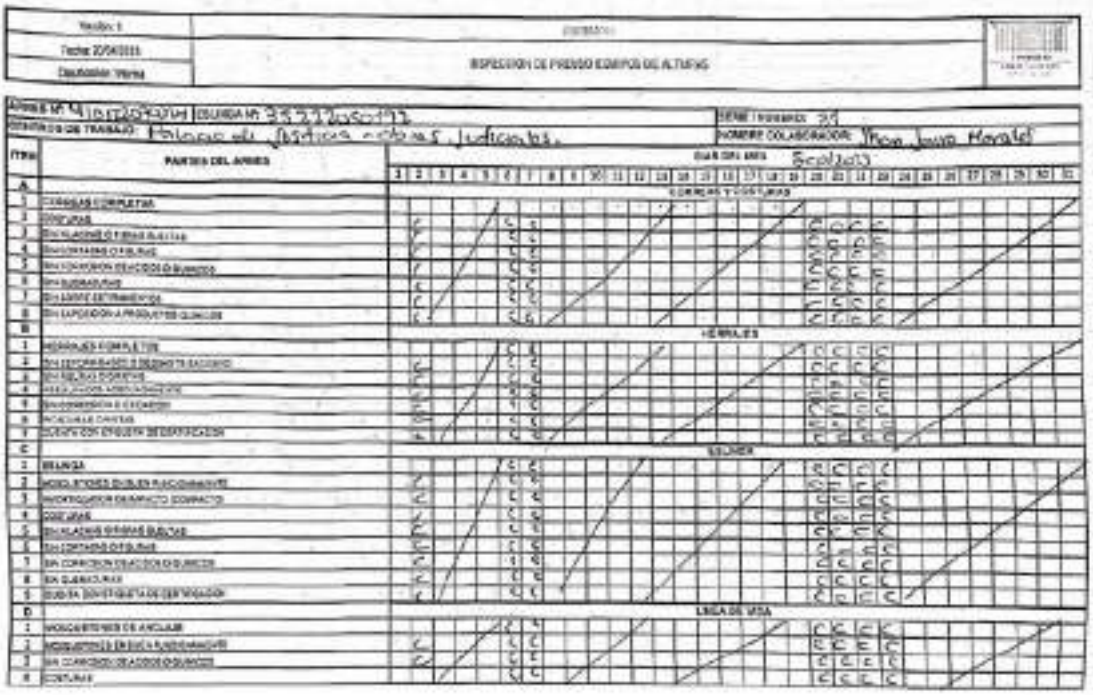


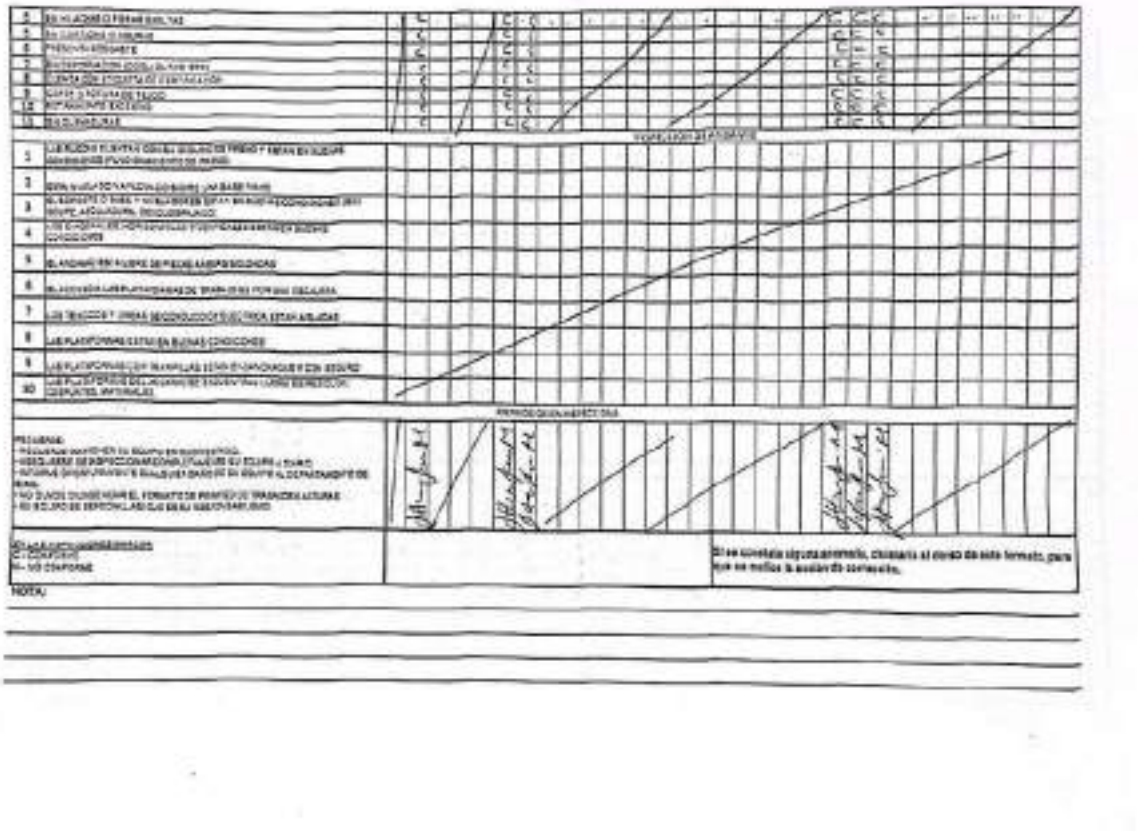


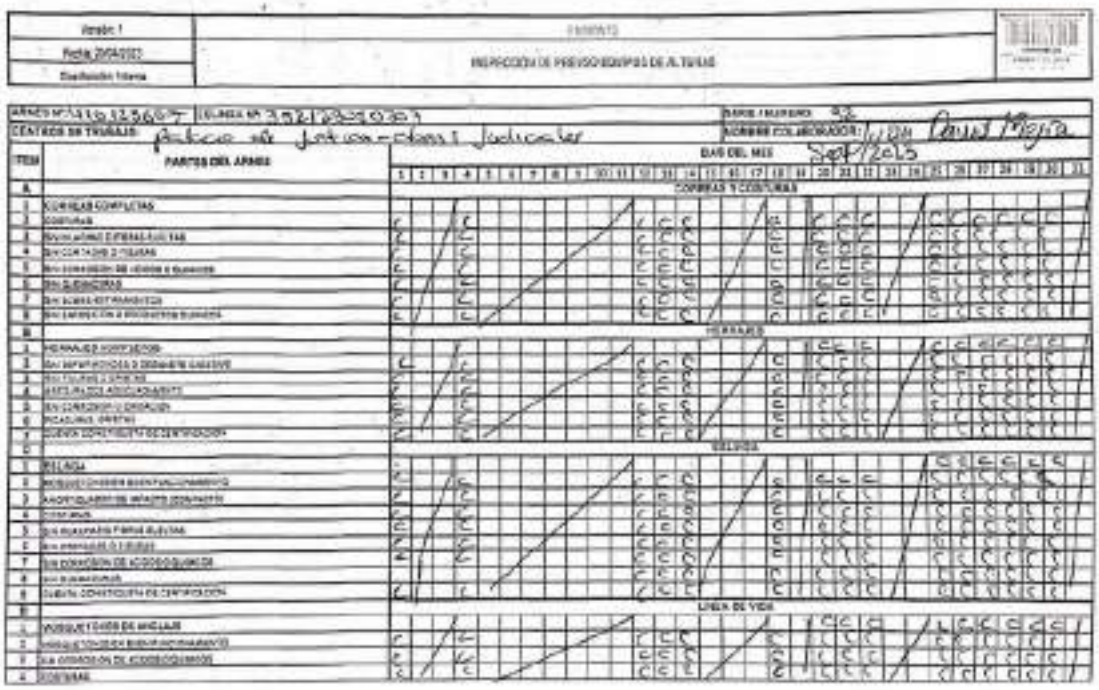


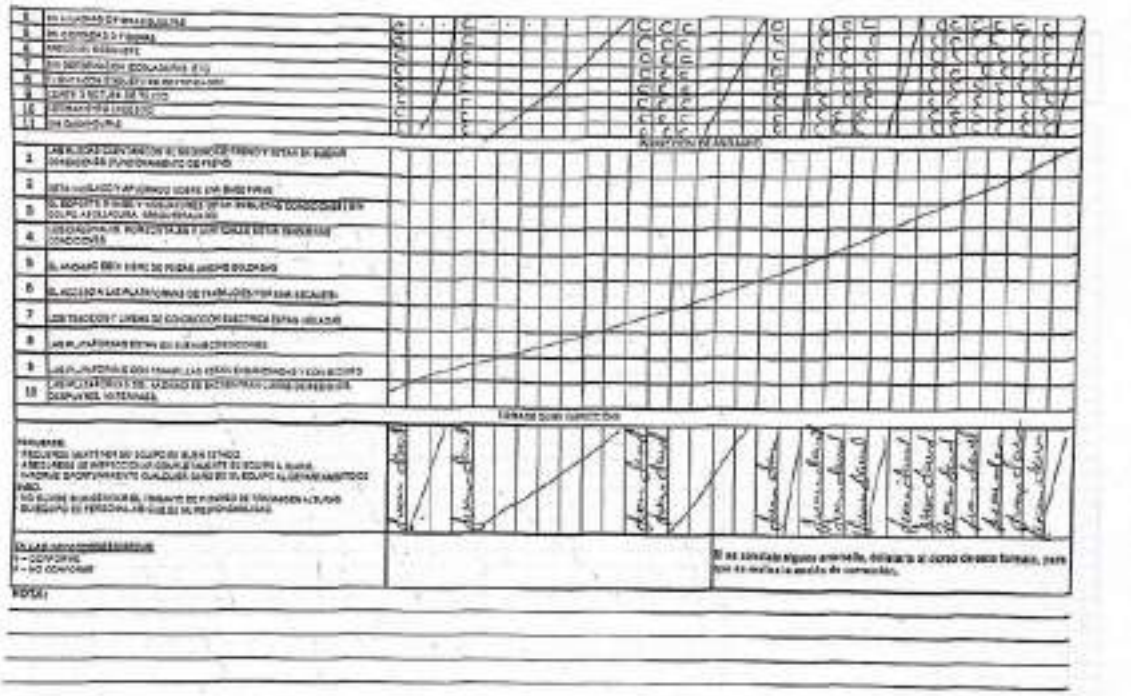


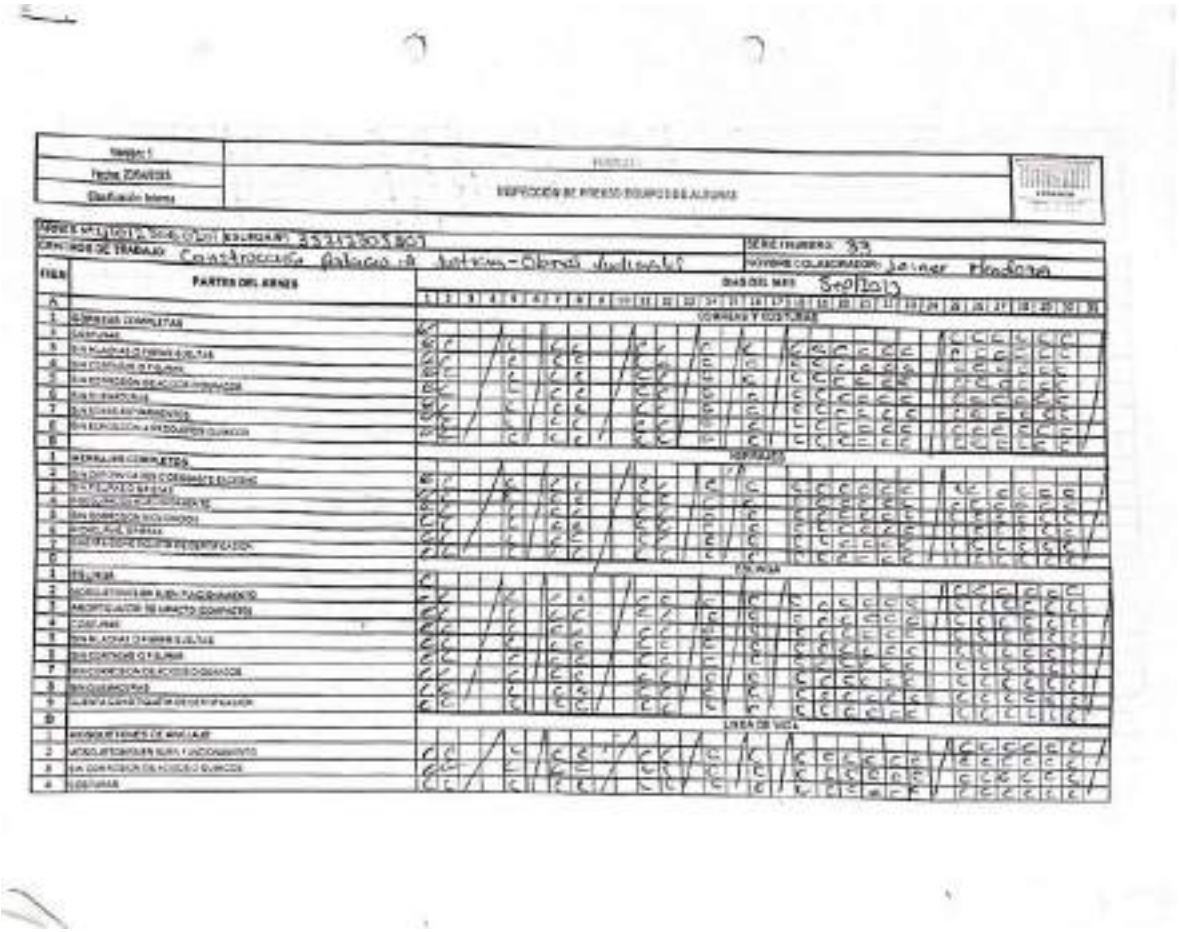


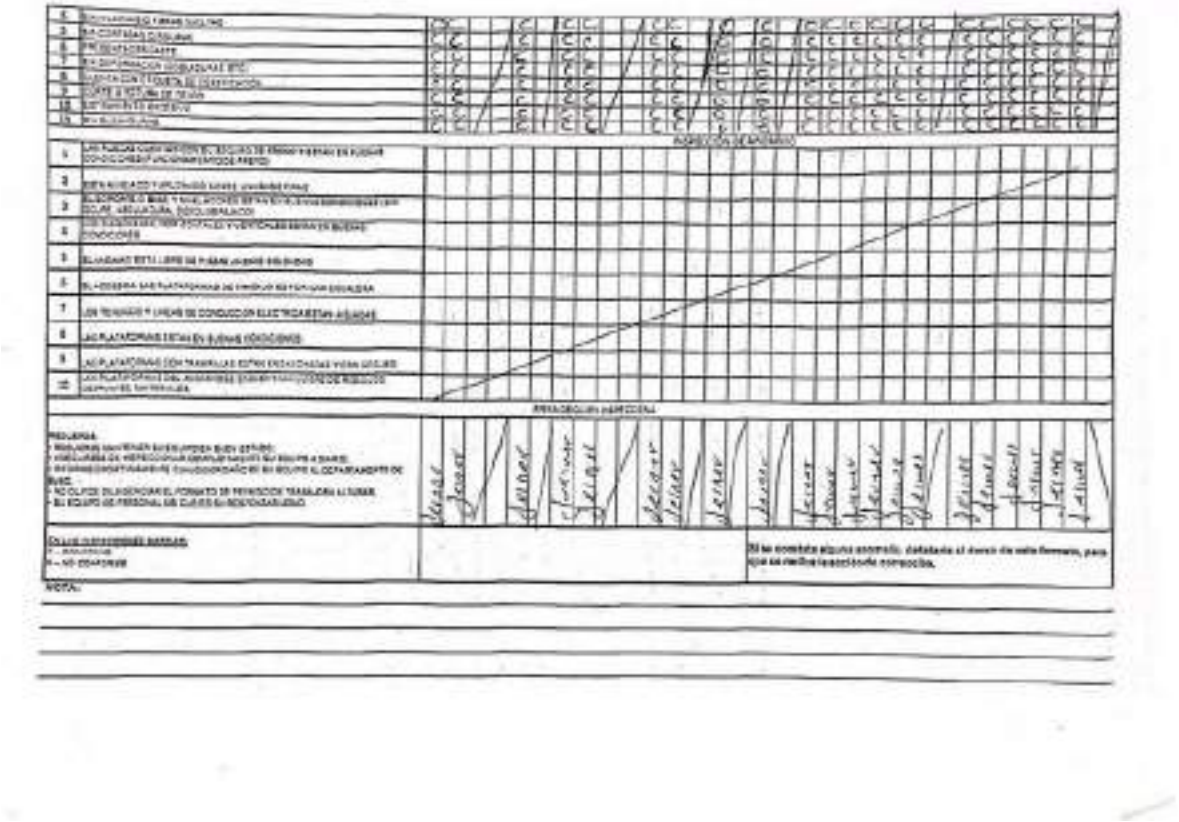


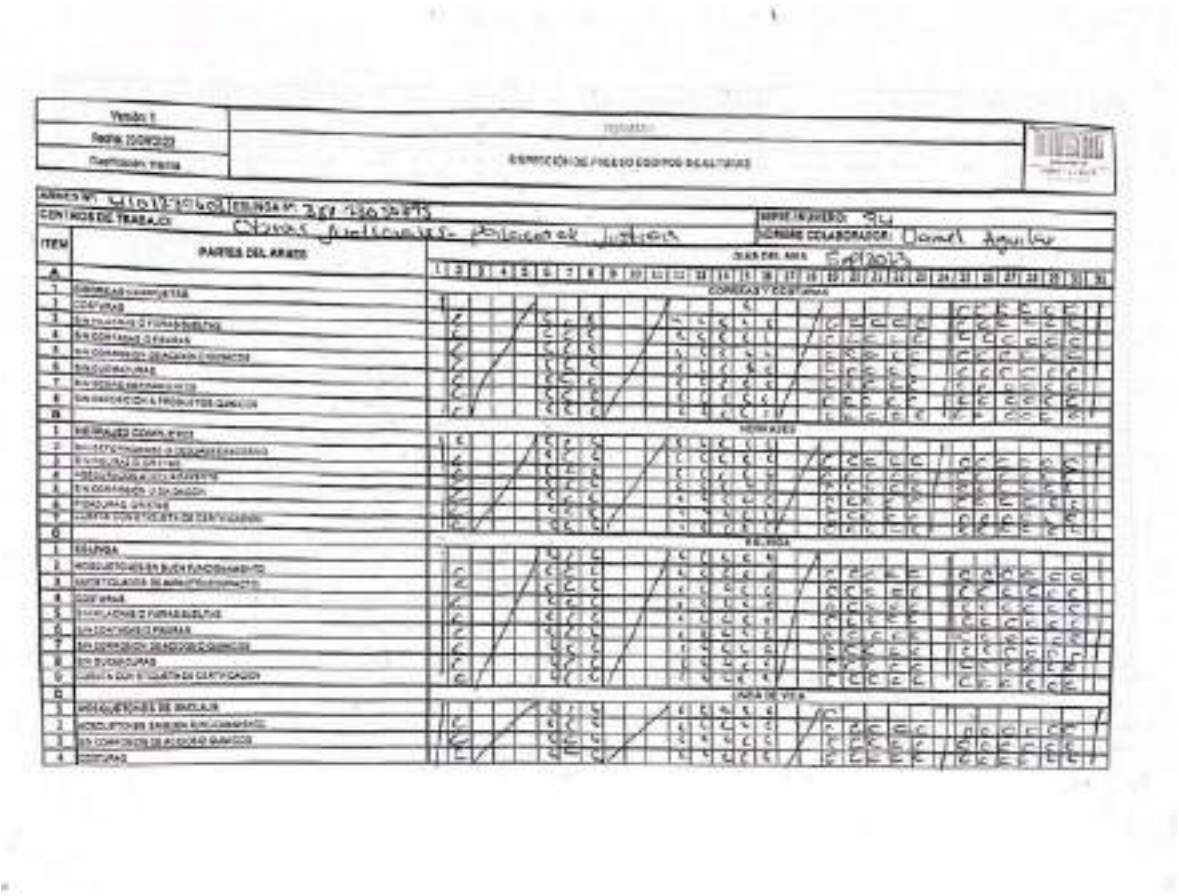


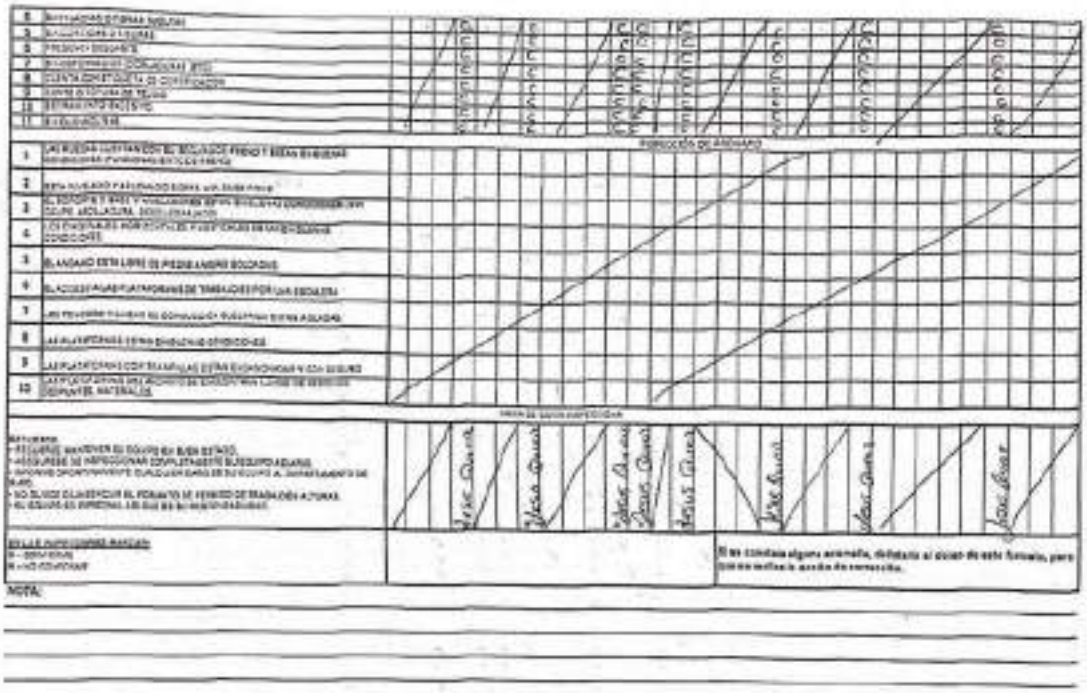


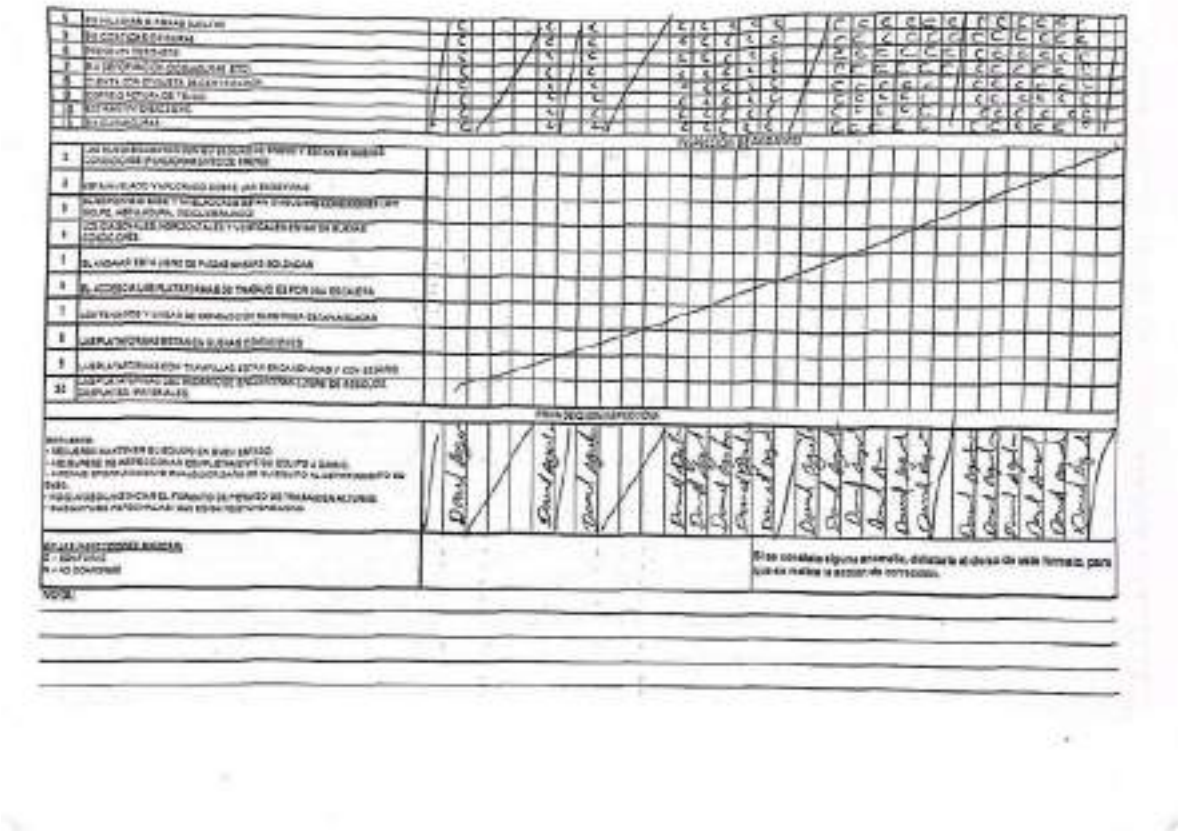


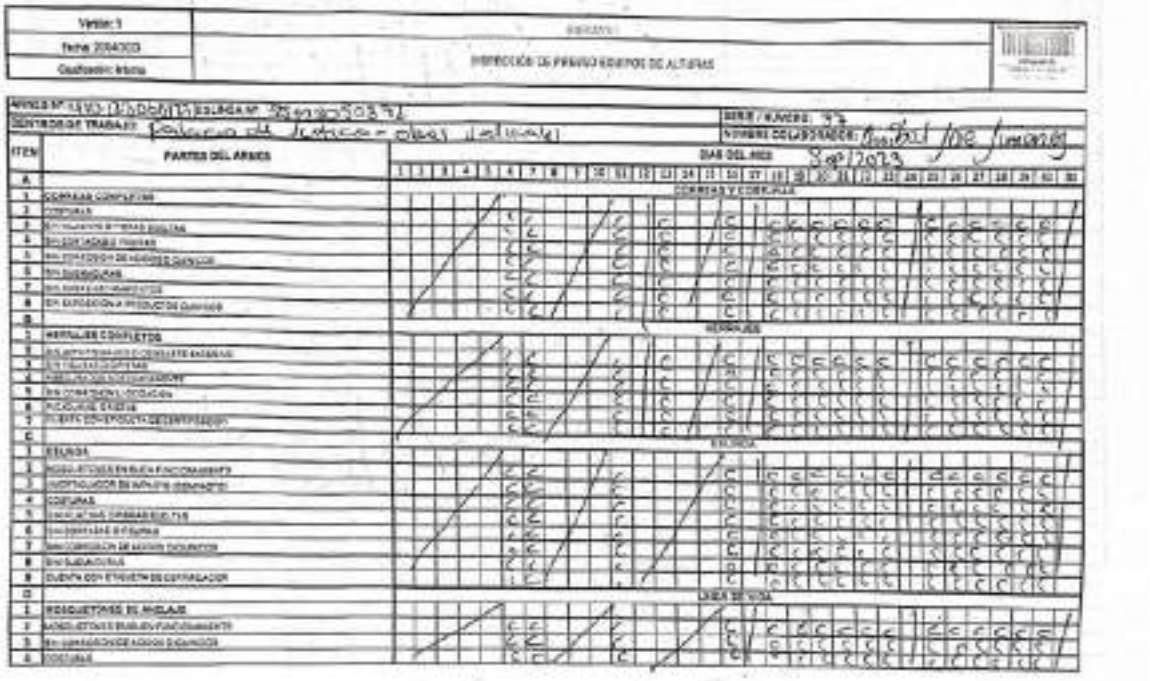


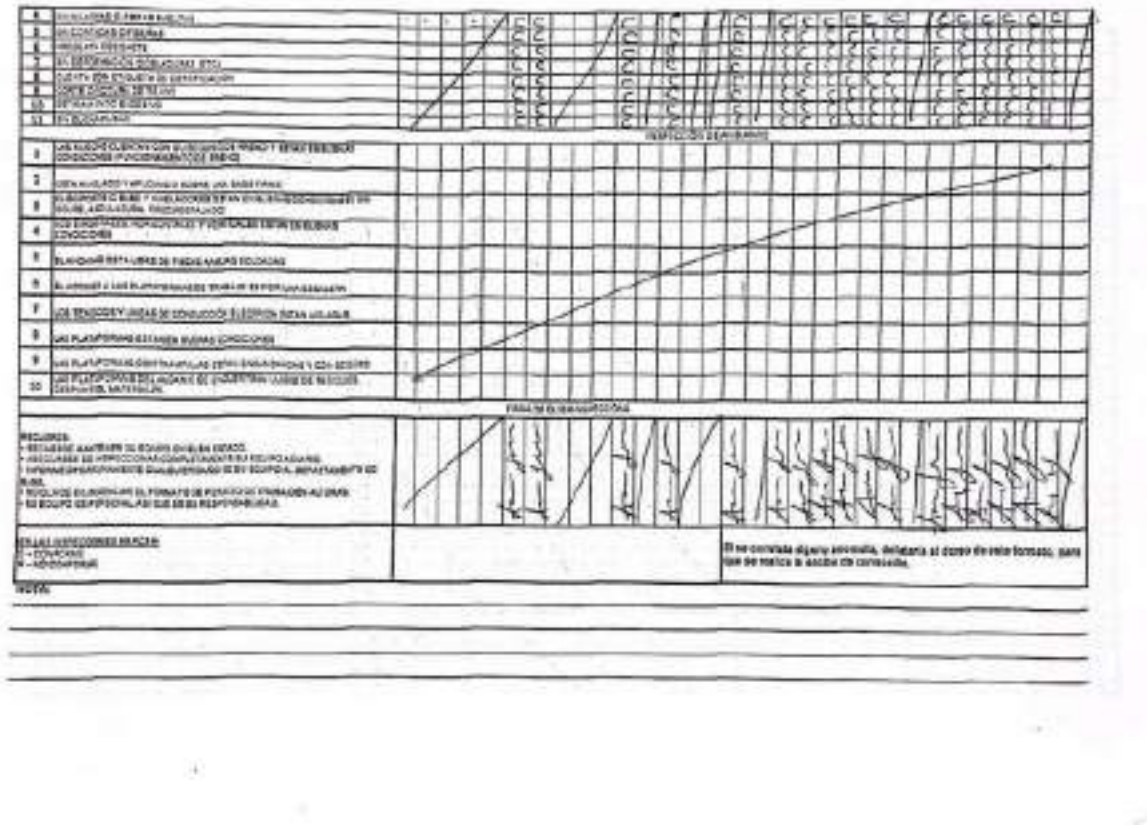


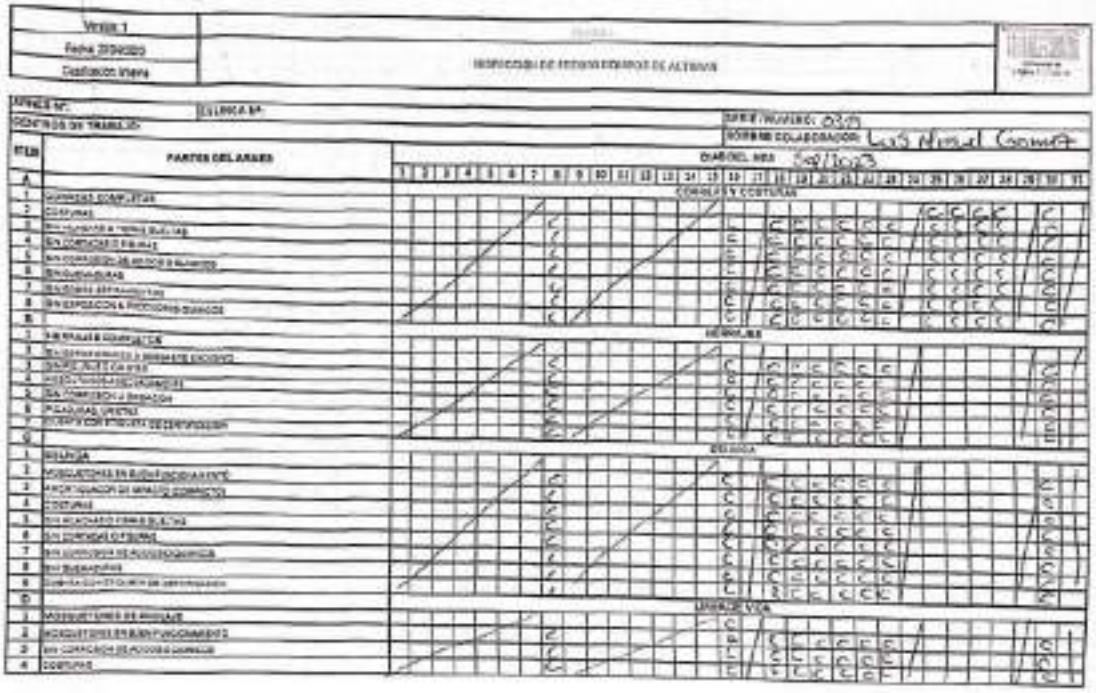


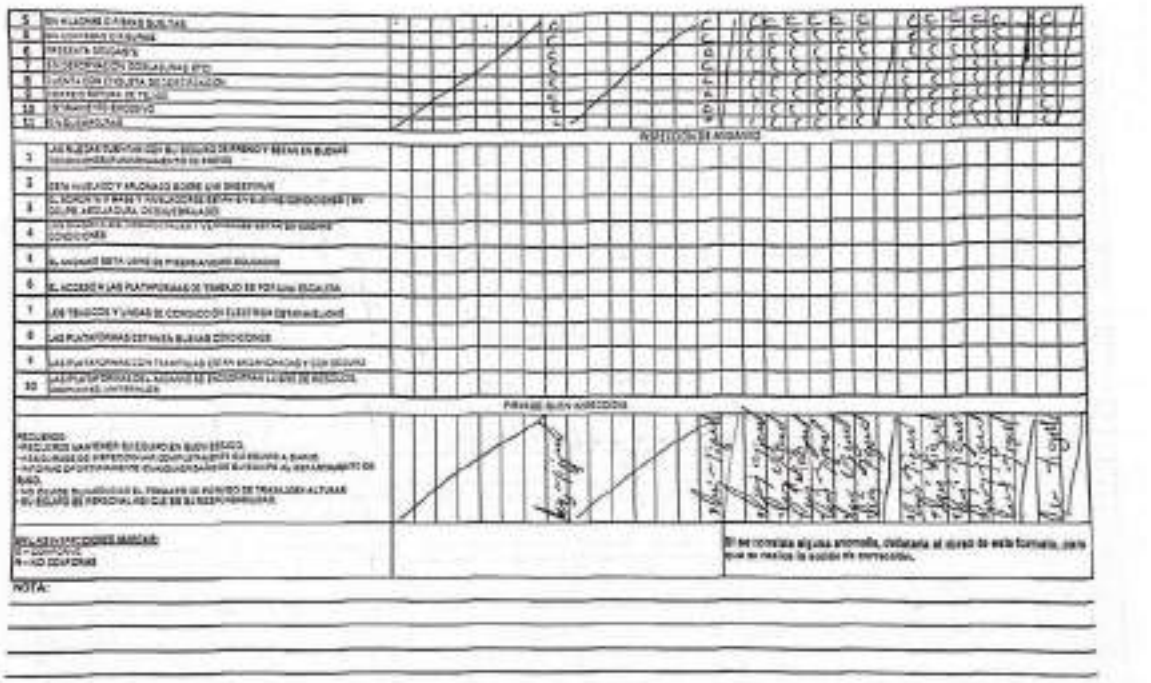


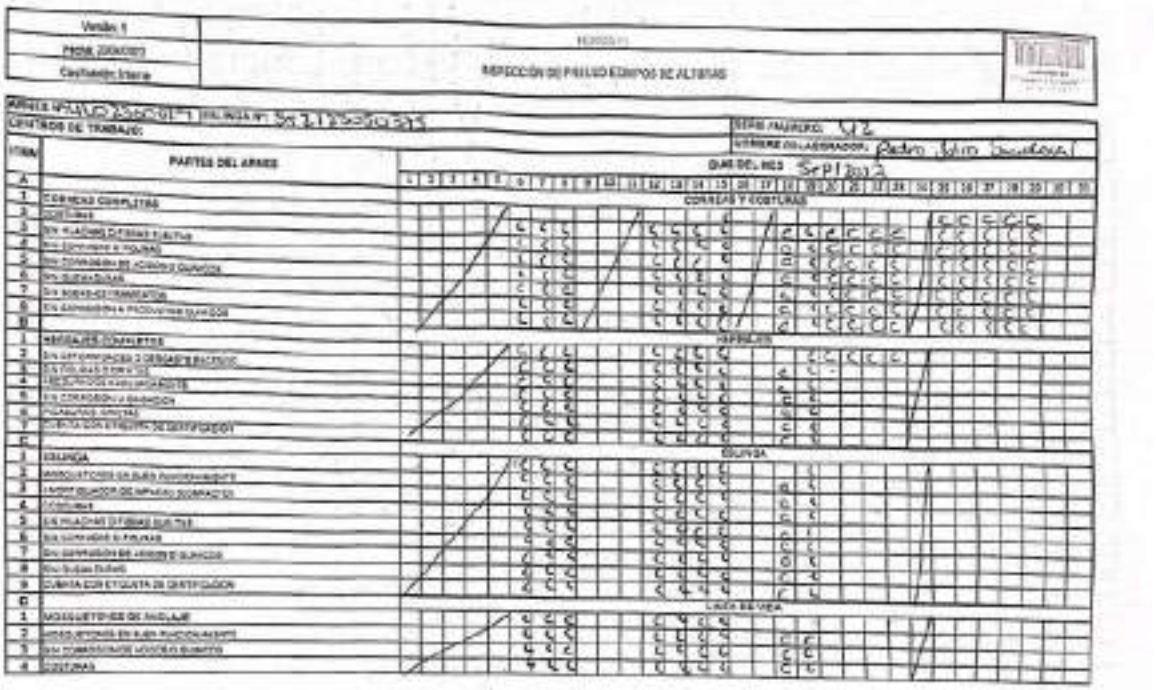

INSPECCIÓN DE PRUEBA EQUIPOS DE ALTURAS
PARTES DEL ARNES
CORREAS Y COSTURAS
HEBILLAS
ESLINGA
LINEA DE VIDA

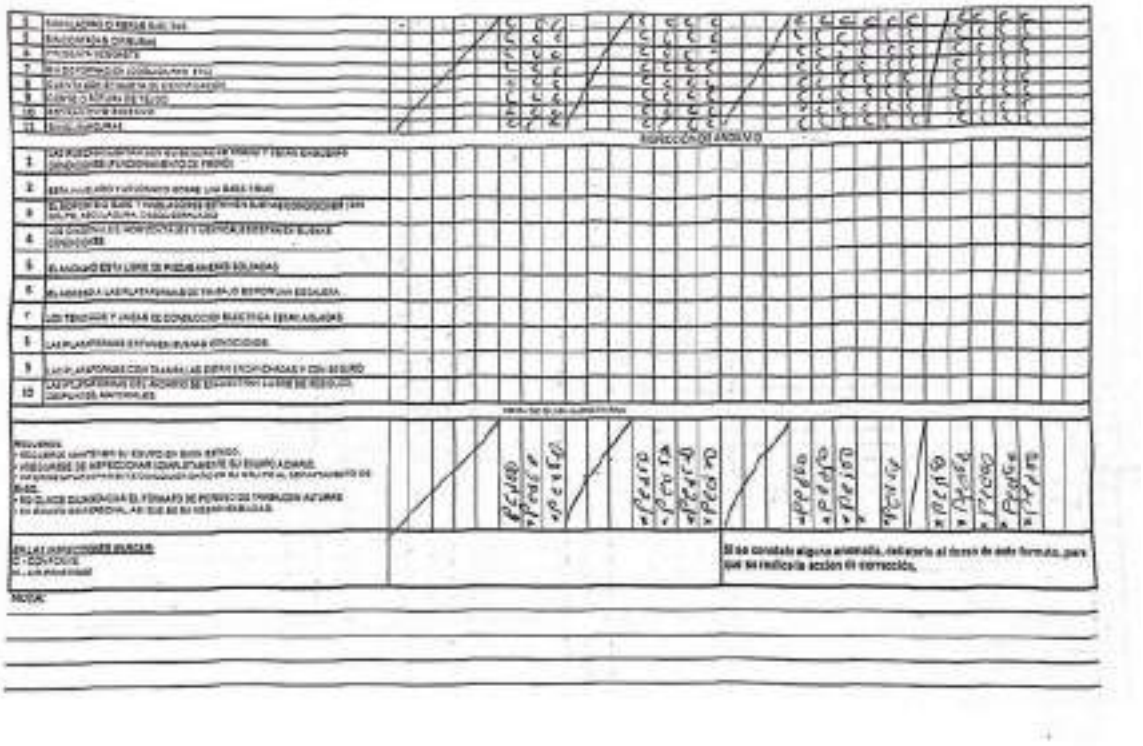


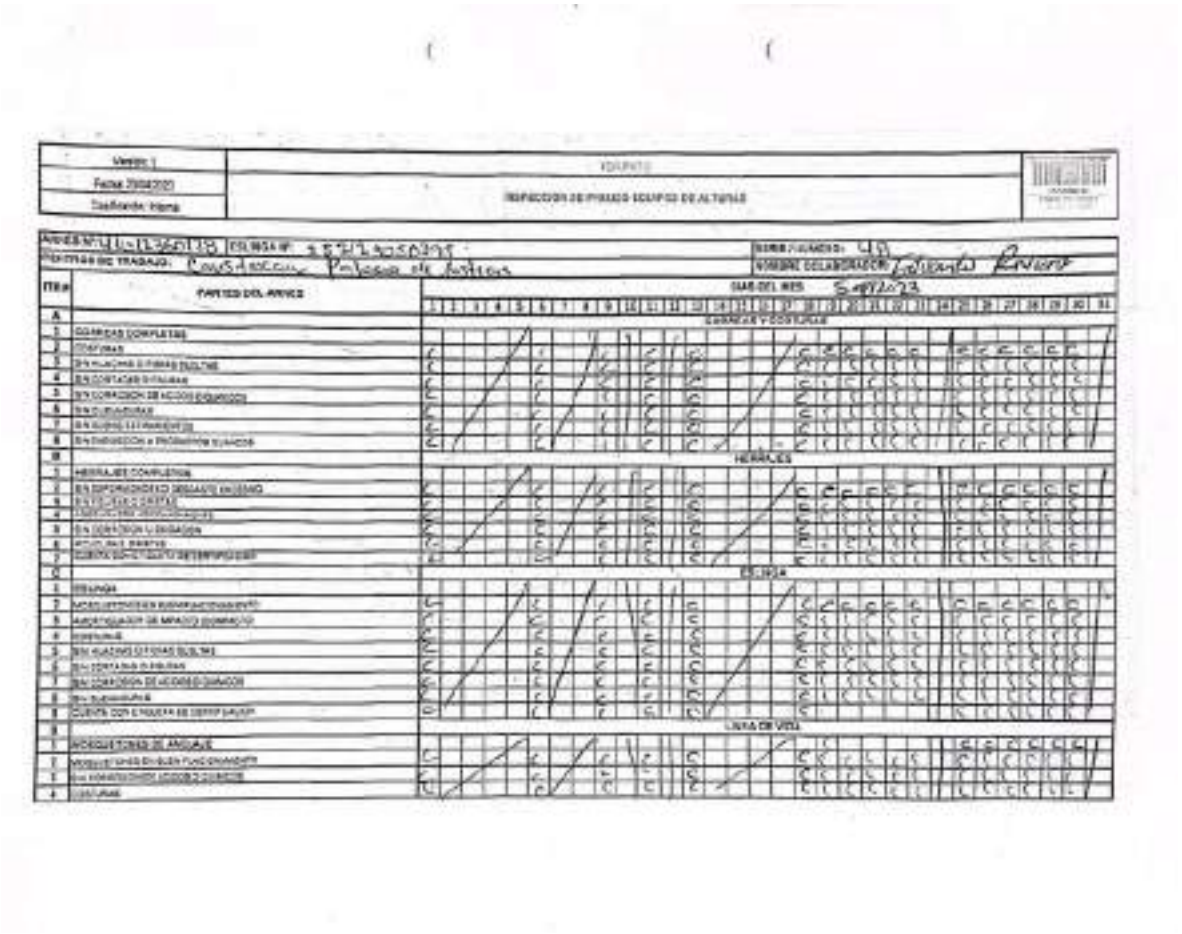


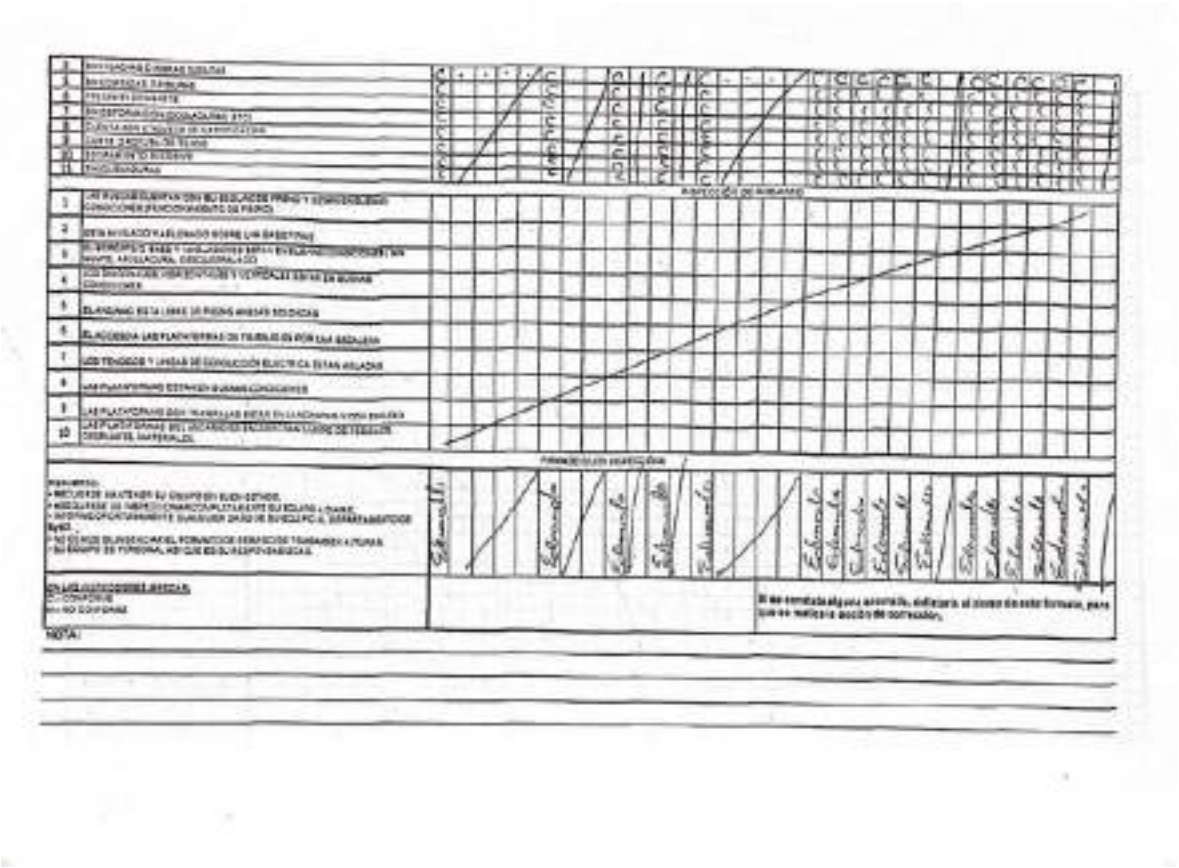


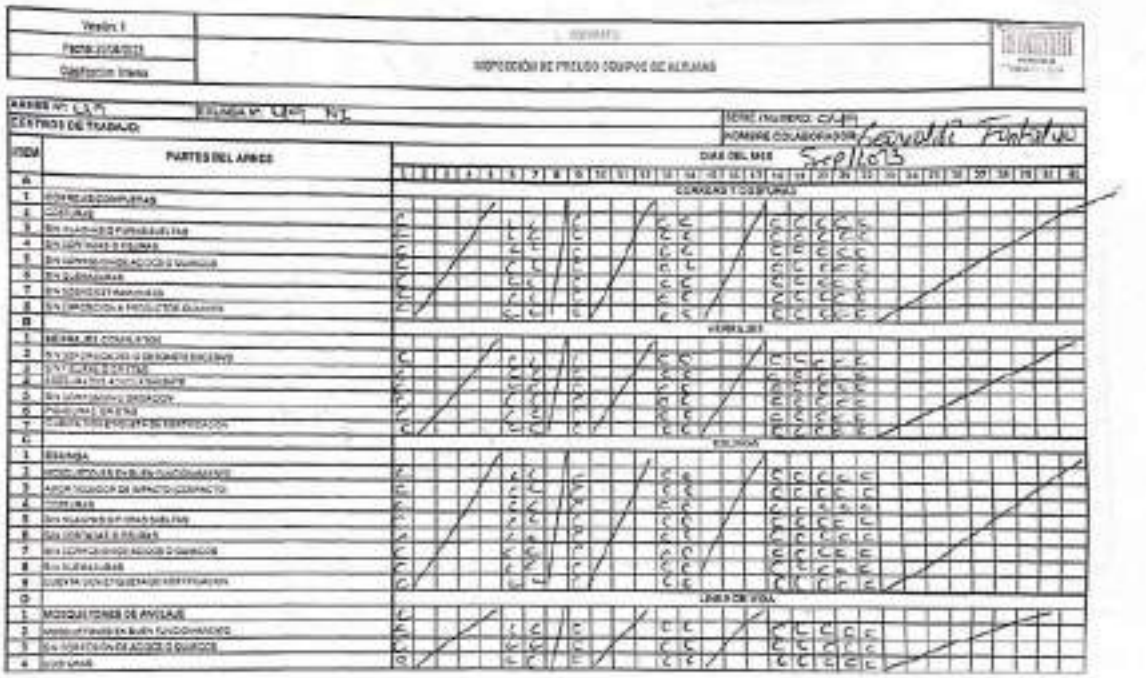


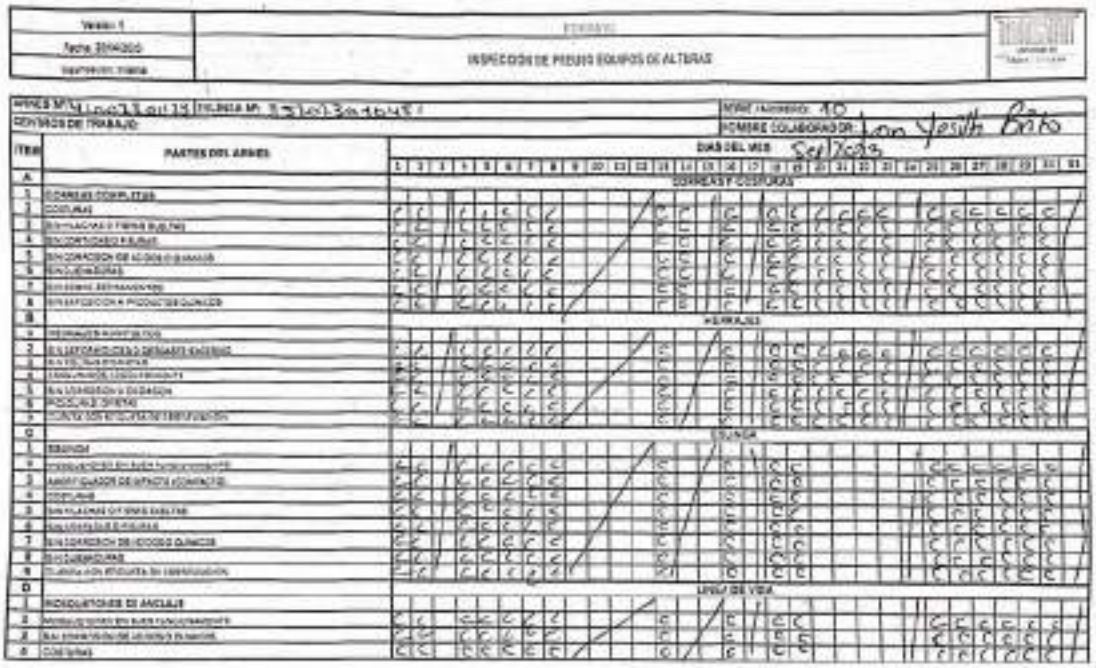

INSPECCIÓN DE PISOS EQUIPOS DE ALTURAS

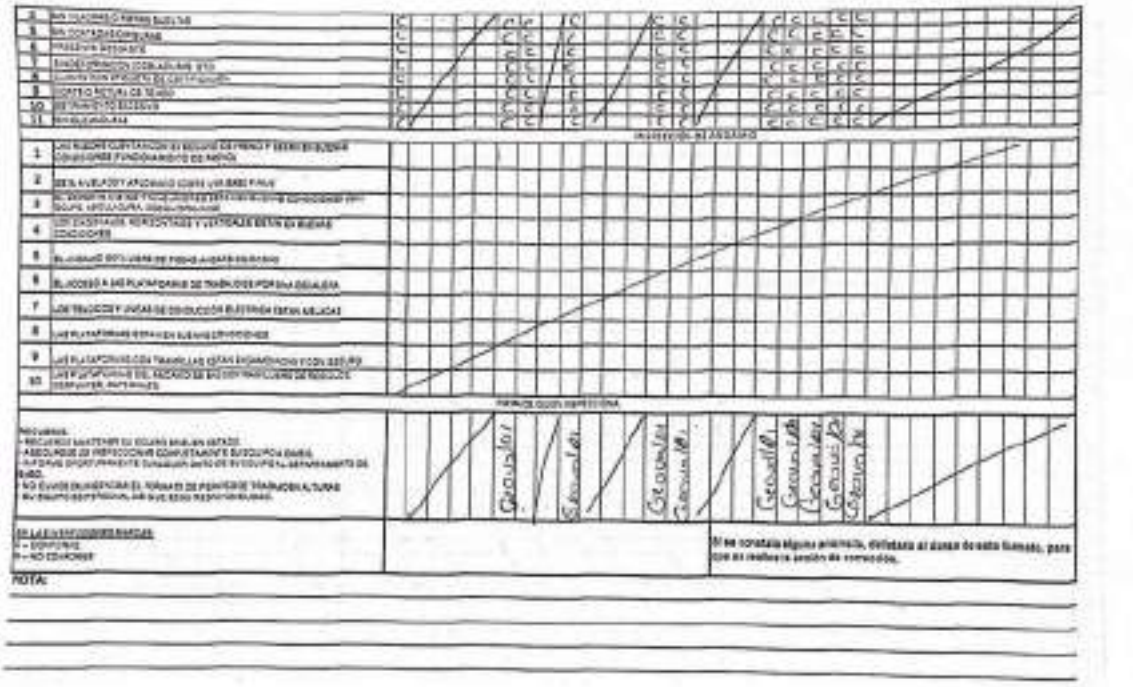


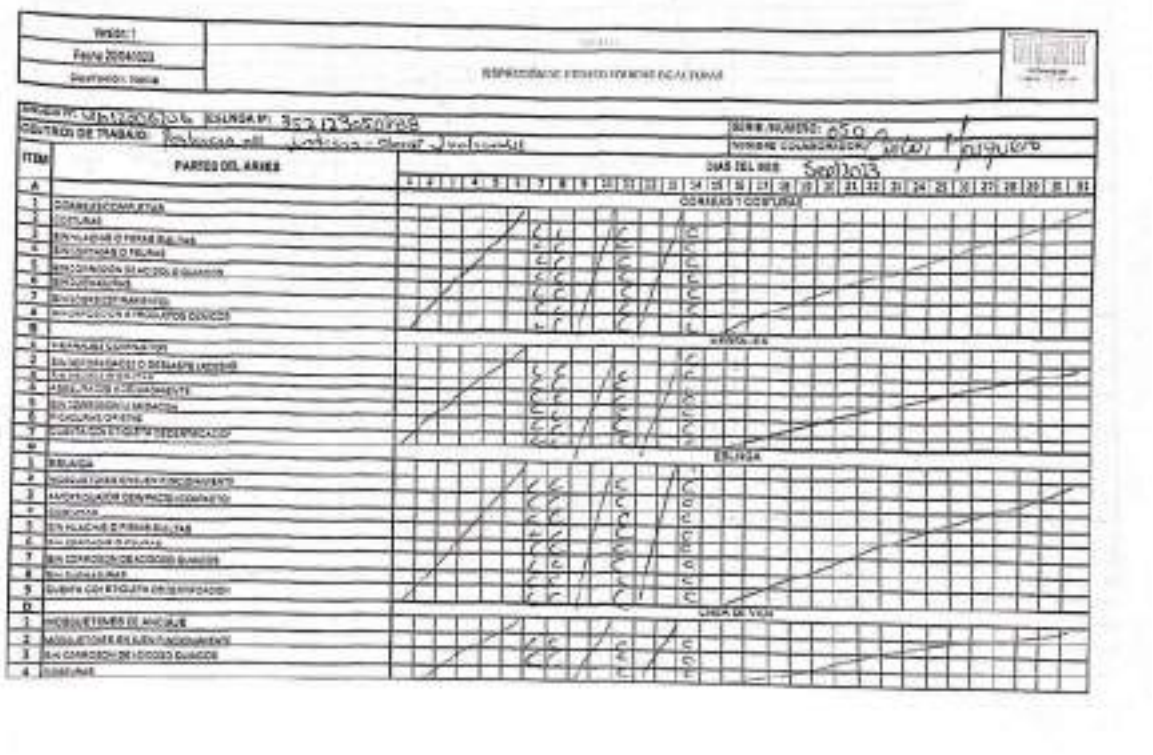


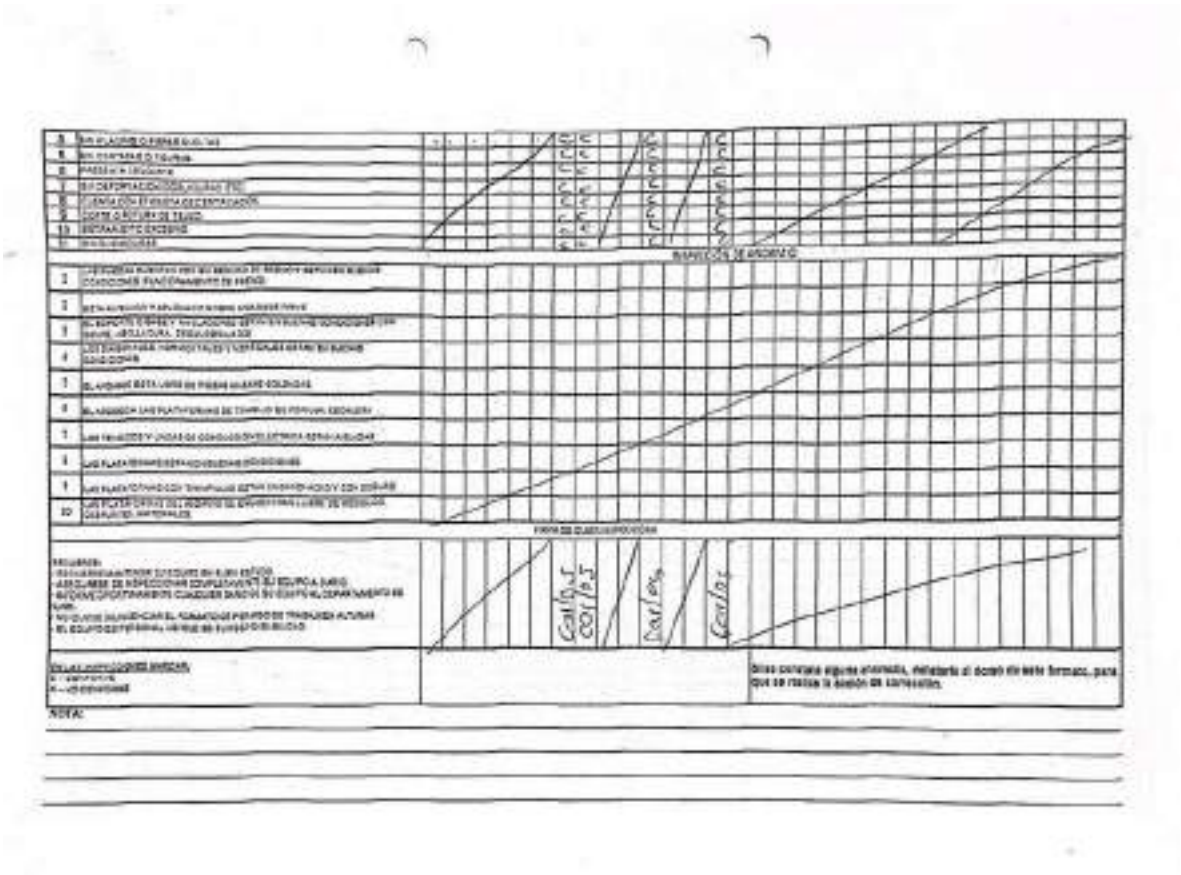

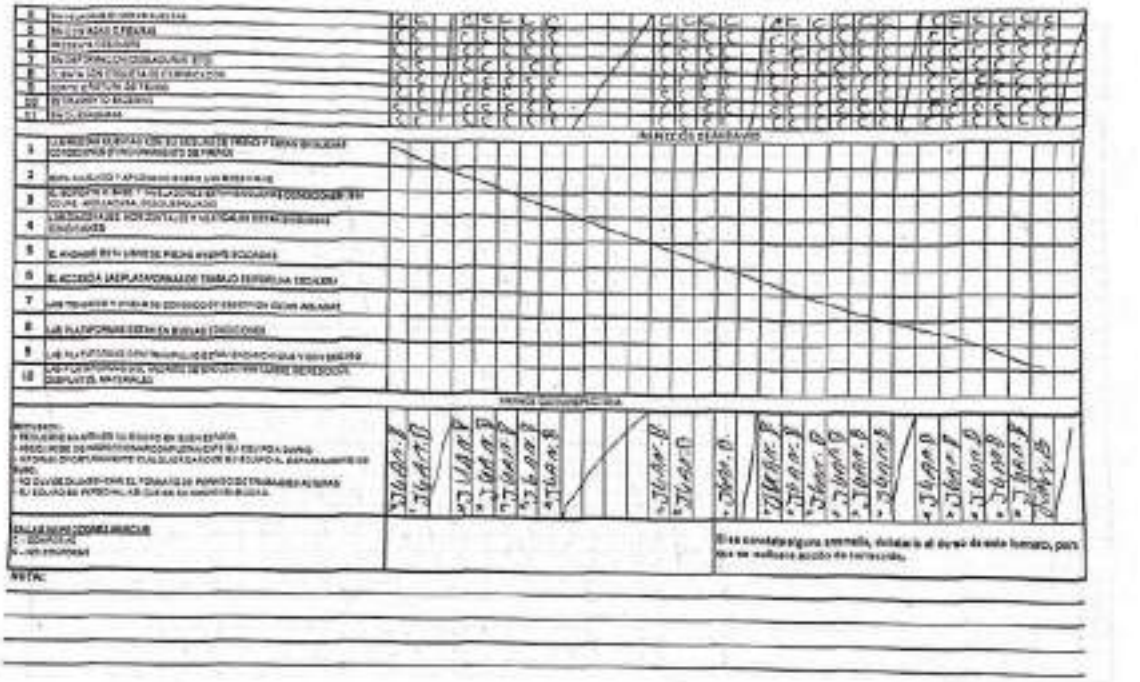

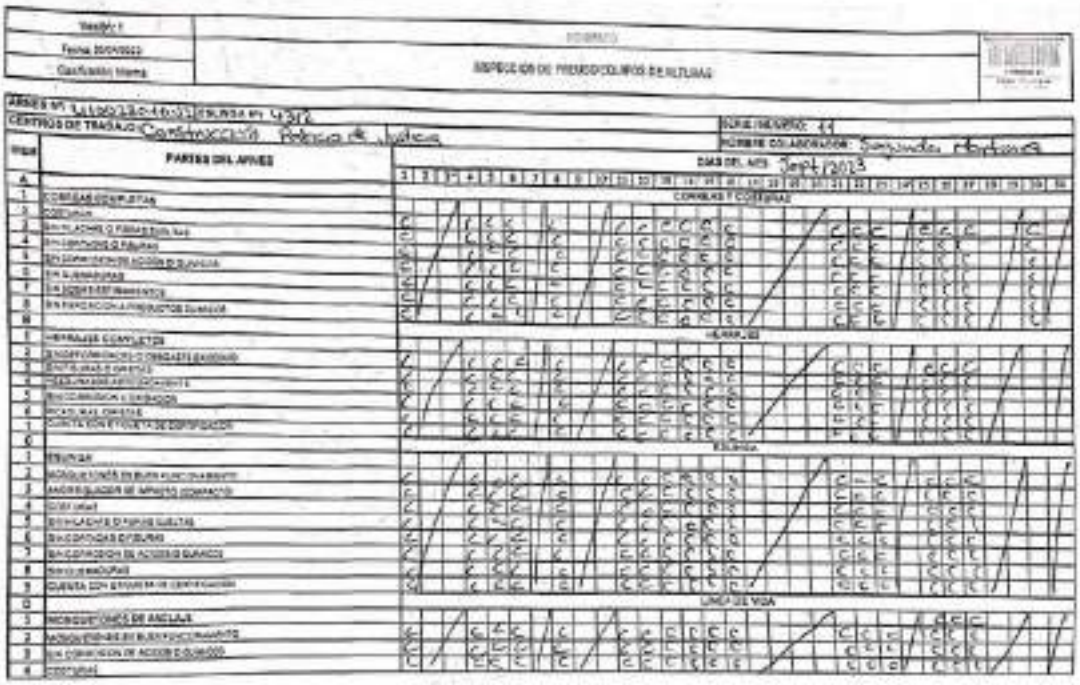

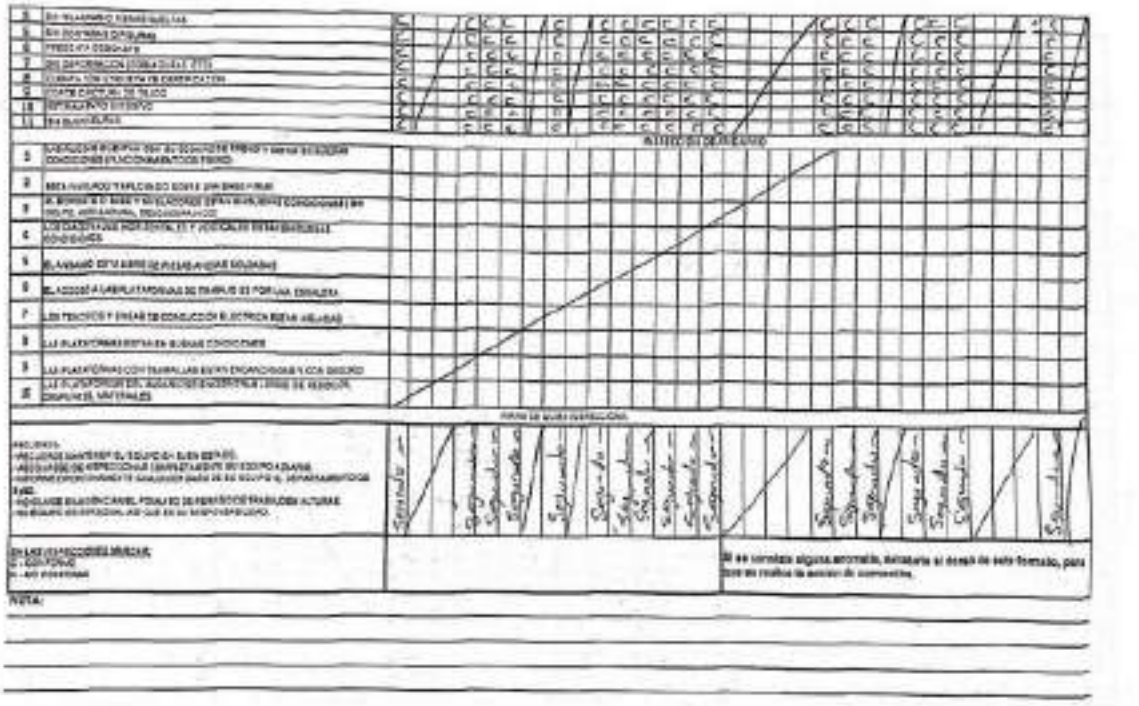

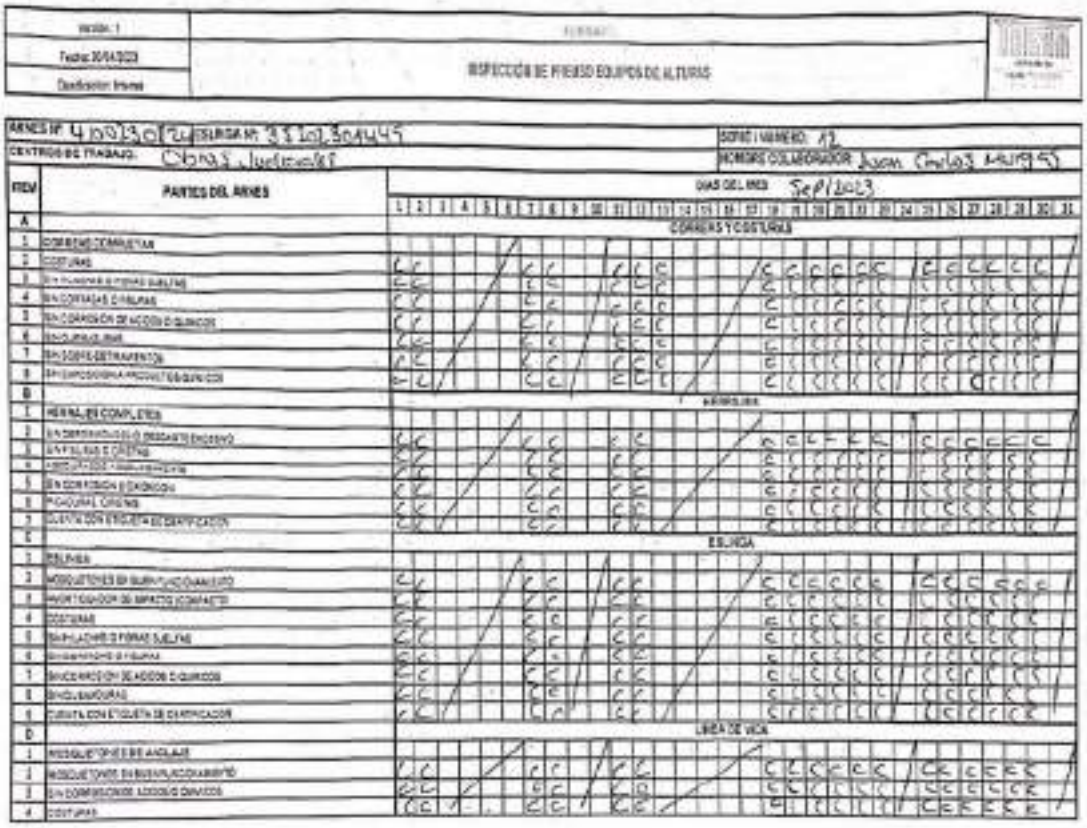


| | | |
|---|---|---|
| Versión: 1 | | |
| Fecha: 30/04/2020 | INSPECCIÓN DE ARNESES Y EQUIPOS DE ALTURAS | |
| Clasificación: Interna | | |


ARNES Nº: 4 10 13 30 72 ESLINGA Nº: 33 10 304445 — SOPID / NUMERO: 12


CENTRO DE TRABAJO: Obras Judiciales — NOMBRE COLABORADOR: Juan Carlos Mejia


DIAS DEL MES: Sept/2023


| ITEM | PARTES DEL ARNES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CORREAS Y COSTURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CORREAS COMPLETAS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 2 | COSTURAS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 3 | SIN CORREAS O FALTAS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 4 | SIN CORREAS O FALTAS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 5 | SIN CORROSIÓN DE ACCESO O QUIMICOS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 6 | SIN QUEMADURAS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 7 | SIN CORTES O DESTRUCCIÓN | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 8 | SIN EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUIMICOS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| B | ARNES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ARNES COMPLETOS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 2 | SIN DESGARROS O DESGASTE EXCESIVO | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 3 | SIN FALLAS EN COSTURAS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 4 | SIN CORROSIÓN O QUEMADURAS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 5 | SIN CORROSIÓN O QUEMADURAS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 6 | HEBILLAS CORTAS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 7 | CUENTA CON ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| C | ESLINGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ESLINGA | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 2 | MOSQUETONES EN BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 3 | ANTI TORSIÓN DE IMPACTO COMPLETO | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 4 | COSTURAS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 5 | SIN LACERACIONES O FIBRAS SUELTAS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 6 | SIN QUEMADURAS O FALLAS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 7 | SIN CORROSIÓN DE ACIDOS O QUIMICOS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 8 | SIN QUEMADURAS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 9 | CUENTA CON ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| D | LINEA DE VIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MOSQUETONES EN BUEN ANCLAJE | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 2 | MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 3 | SIN CORROSIÓN DE ACIDOS O QUIMICOS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |
| 4 | COSTURAS | C | | | | | C | C | | | C | C | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | | |

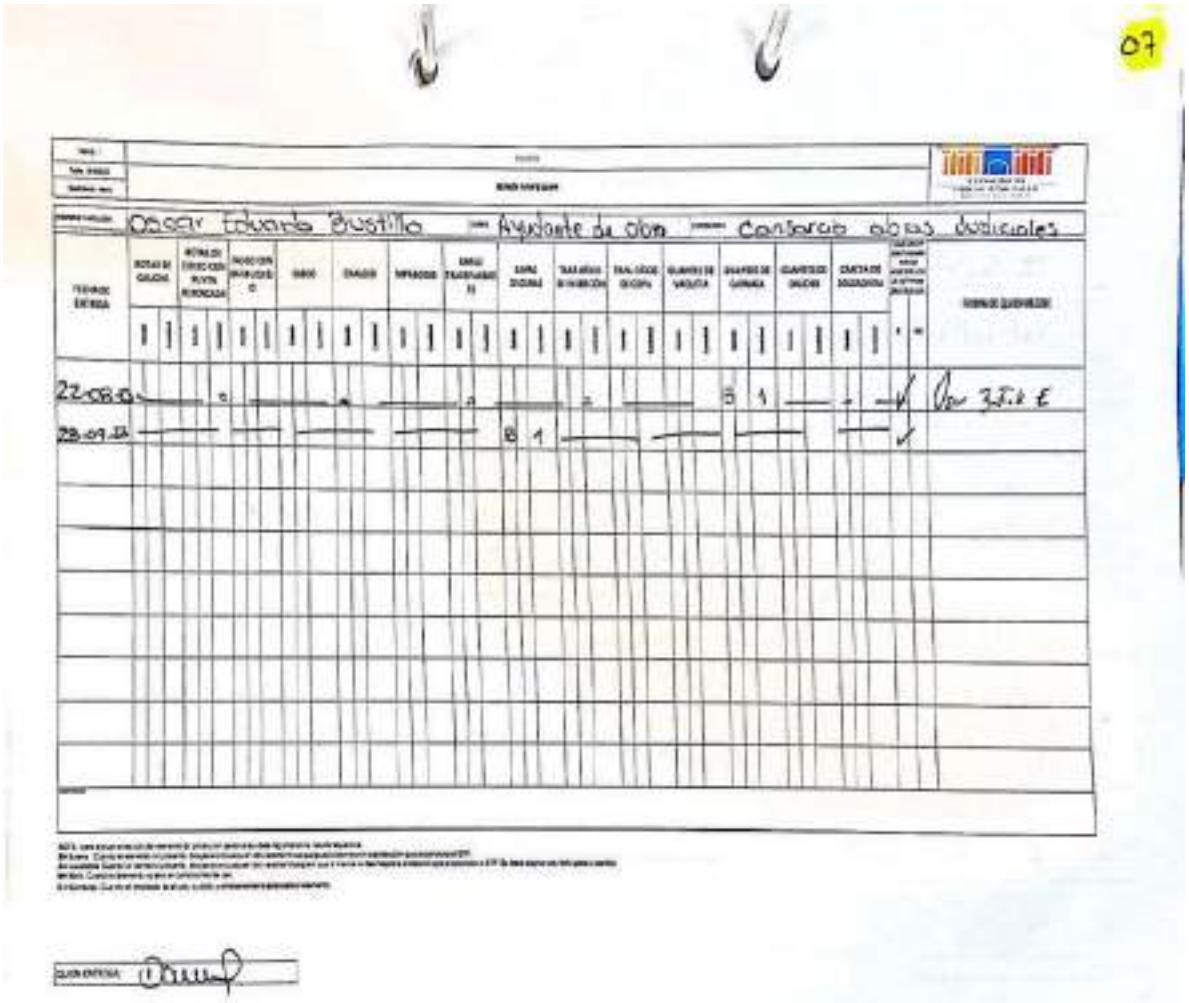

07
Oscar Eduardo Bustillo
Ayudante de obra
Consorcio obras Judiciales
22-08-20
28-09-20

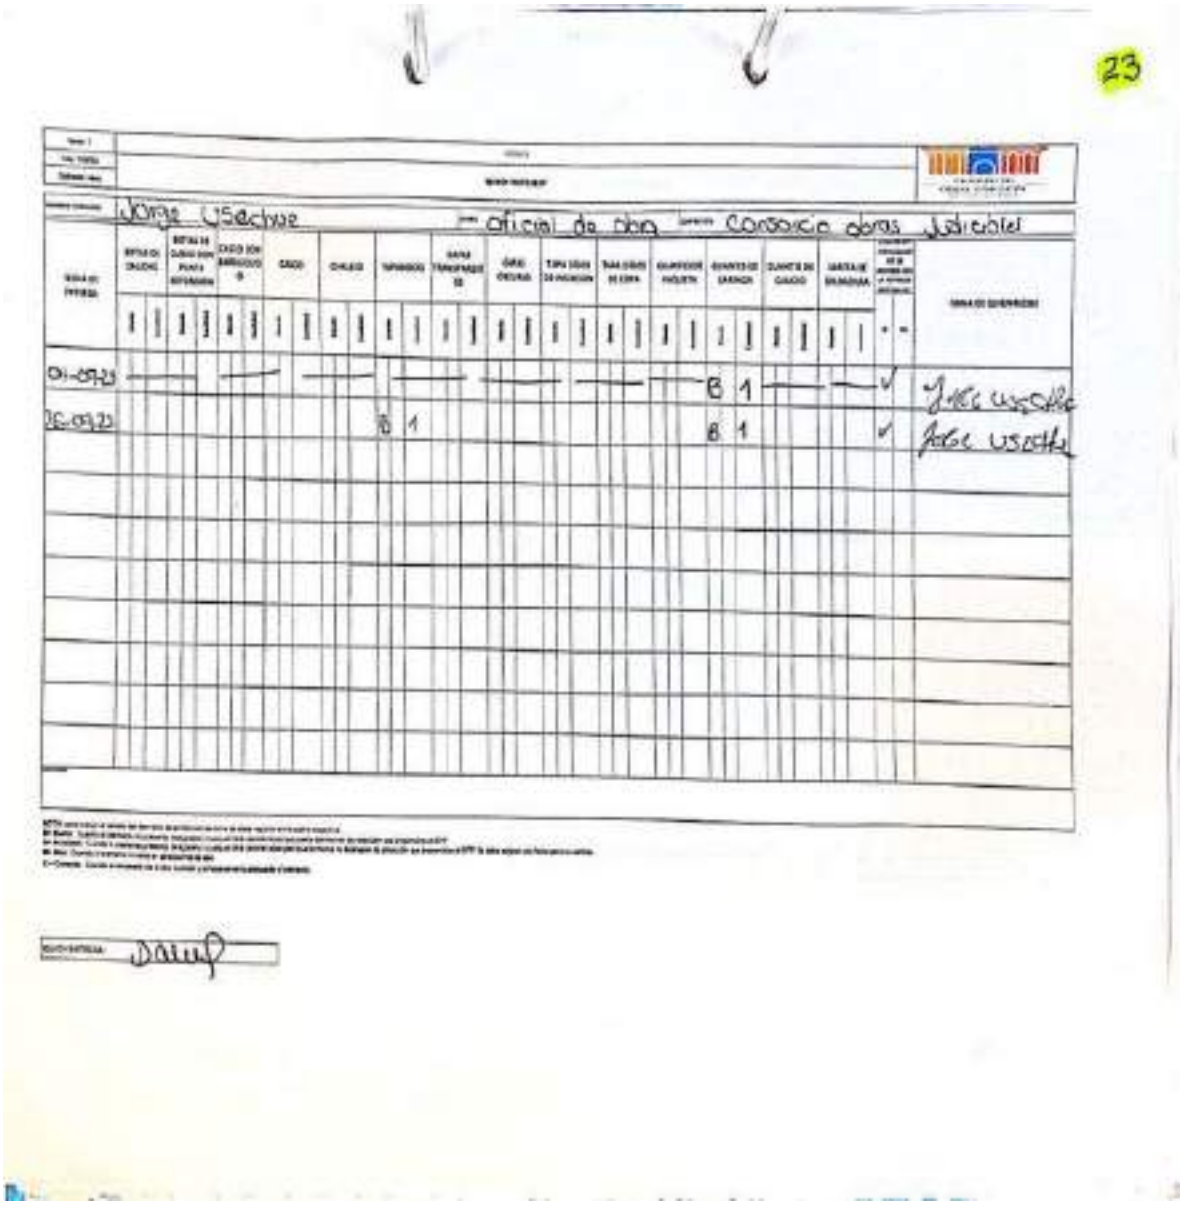

23
Jorge Usechue
Oficial de obra
Consorcio obras Judiciales

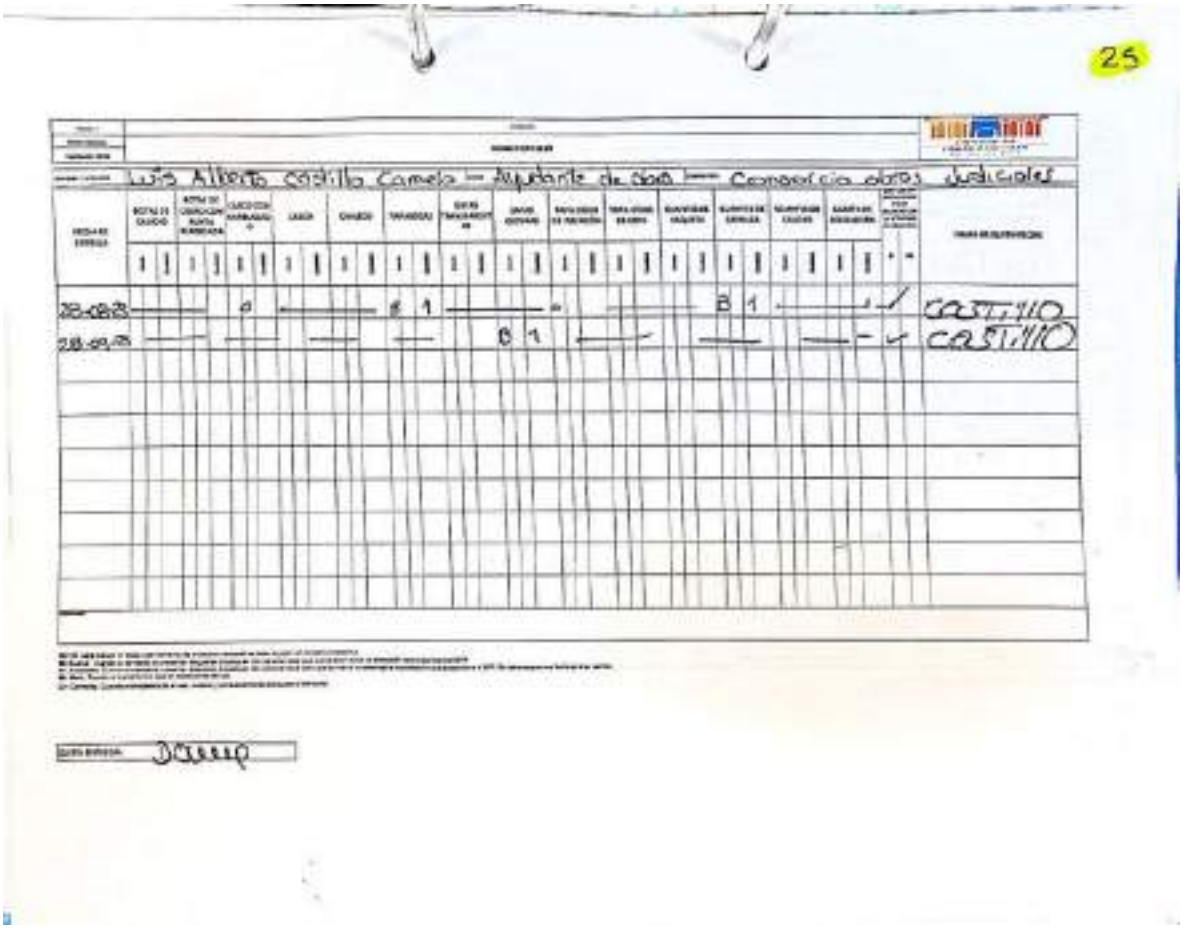

25
Luis Alberto Castillo Camelo
Auxiliar de obra
Consorcio obras judiciales
28-08-20
28-09-20
CASTILLO
CASTILLO

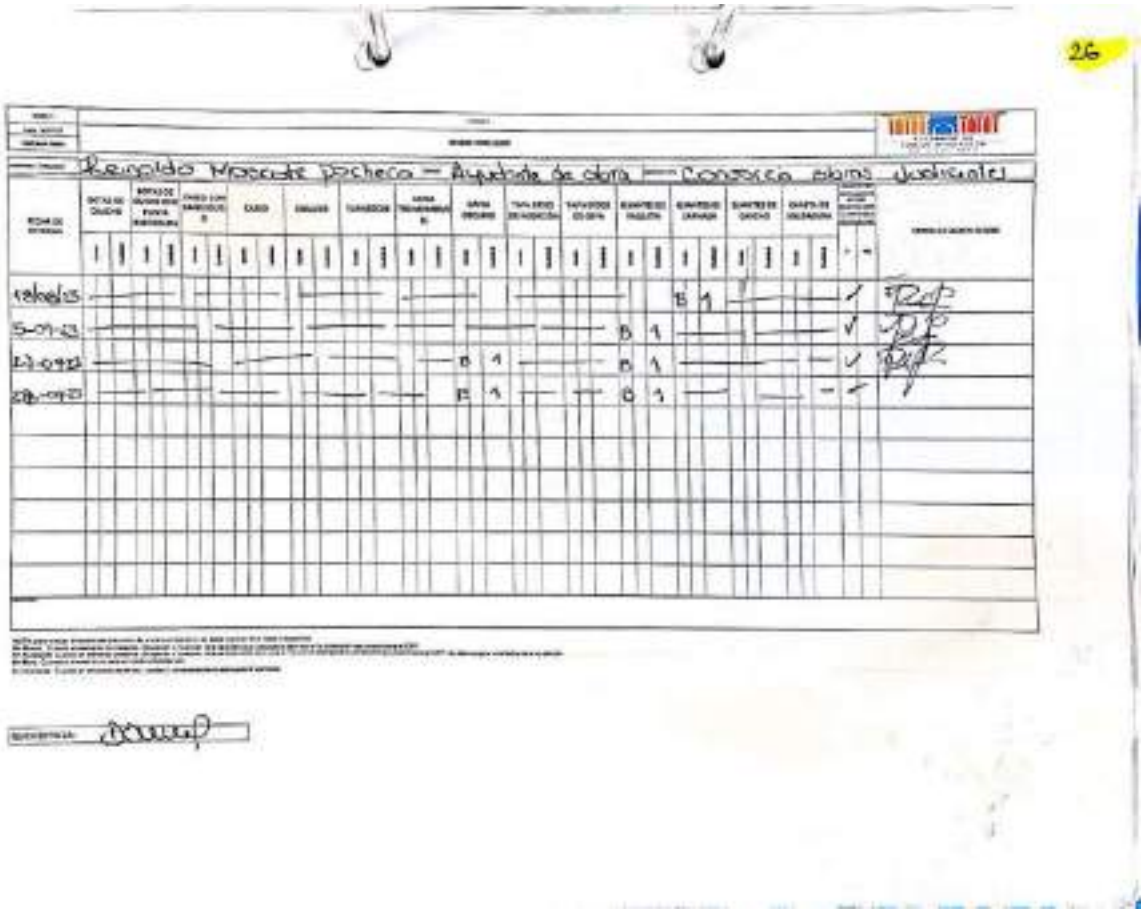

26

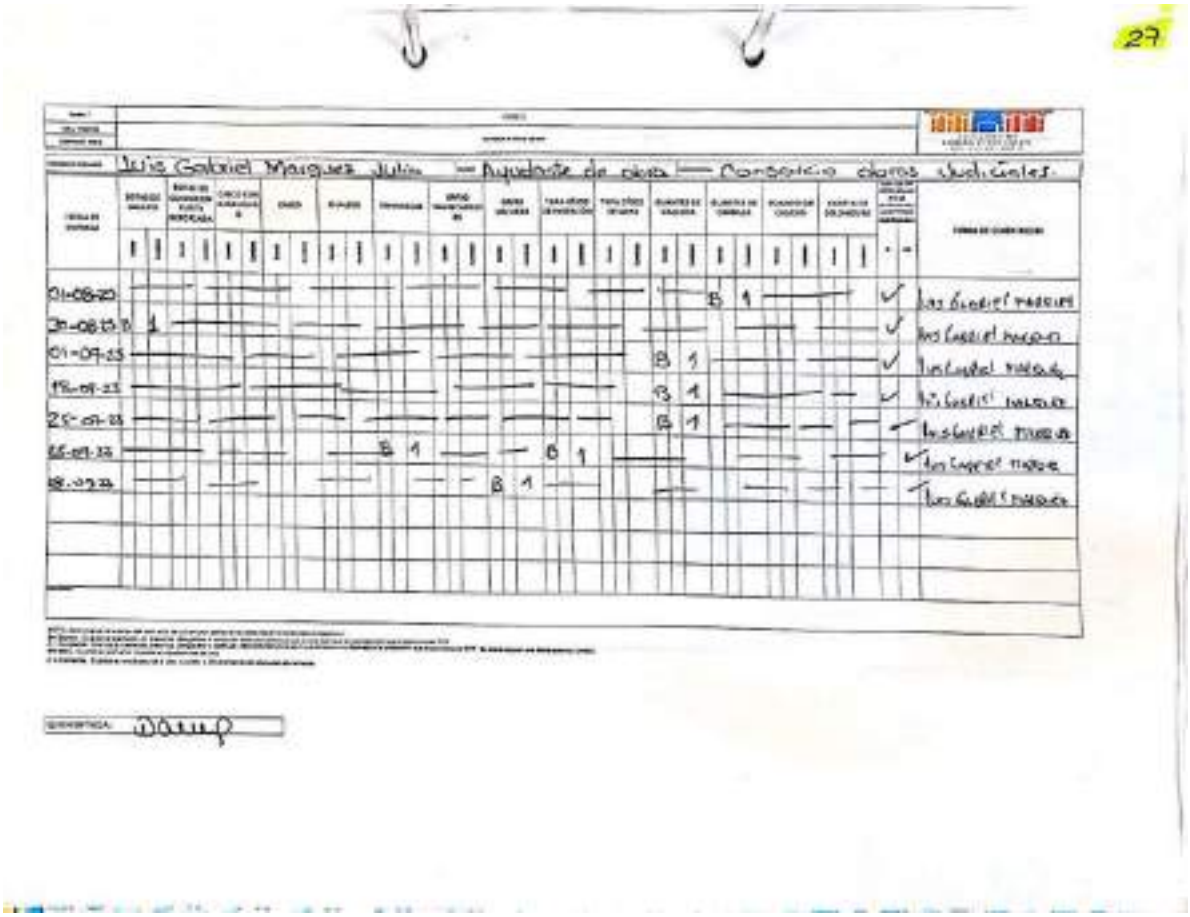

27
Julio Gabriel Marques Julio
Ayudante de obra
Consorcio obras Judiciales

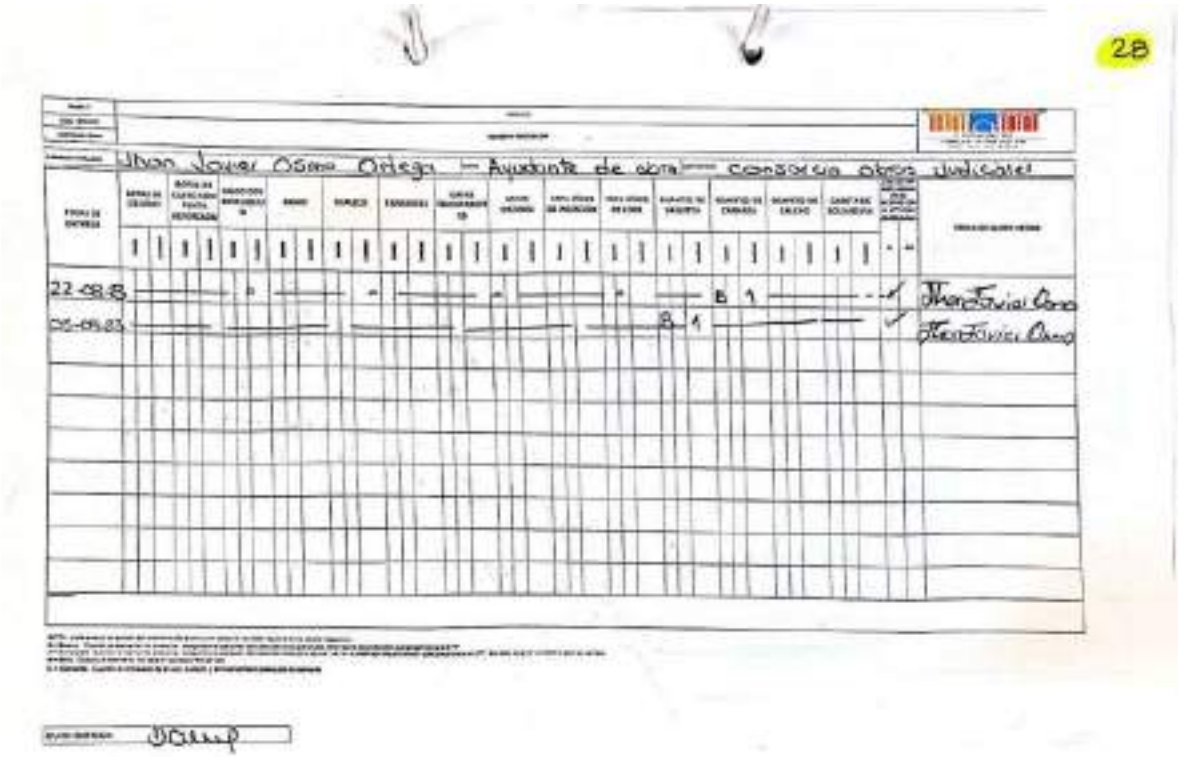
28
Juan Javier Osma Ortega — Ayudante de obra — consorcio obras judiciales
22-08-20
05-08-20

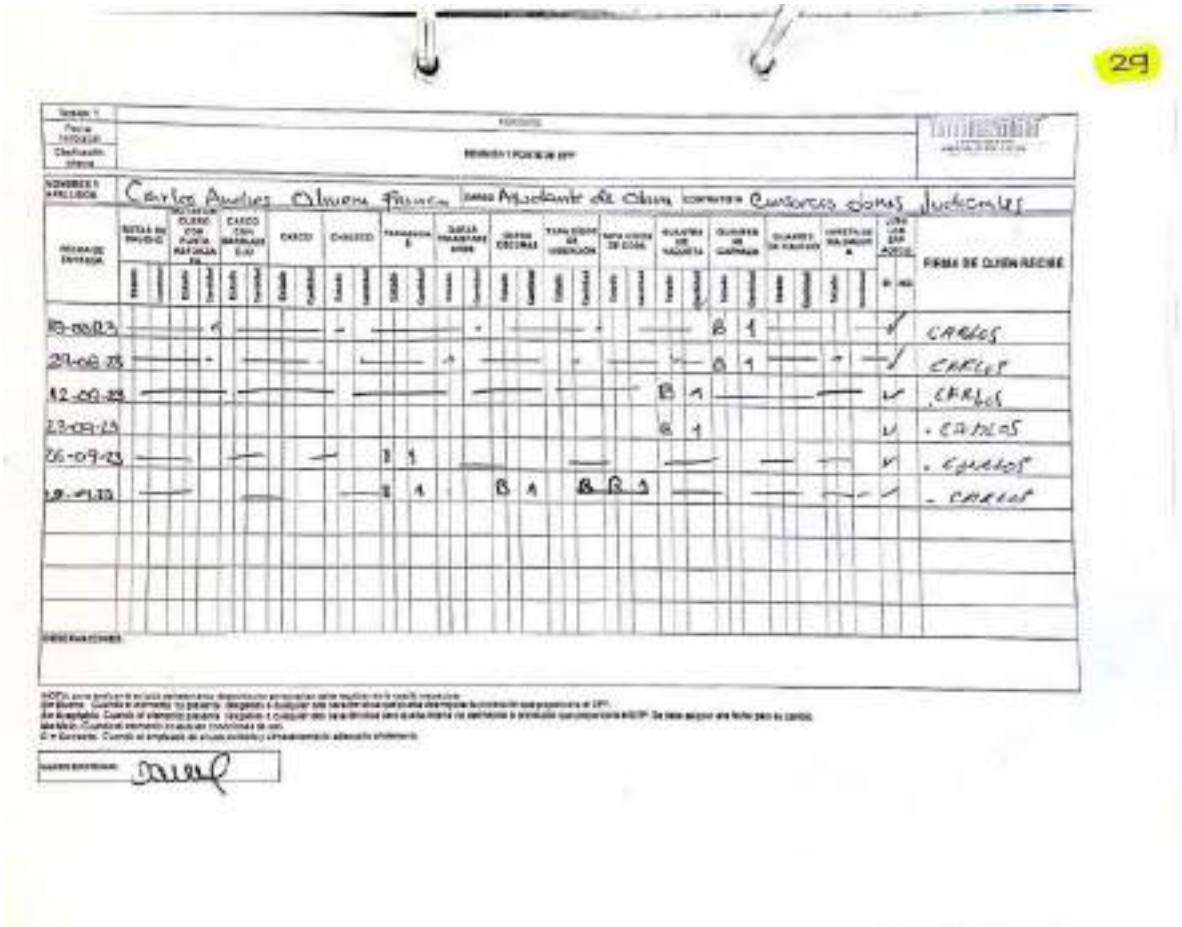

29
Carlos Andres Olivera Franco
Ayudante de obra
Consorcio Obras Judiciales
CARLOS
CARLOS
CARLOS
CARLOS
CARLOS
CARLOS

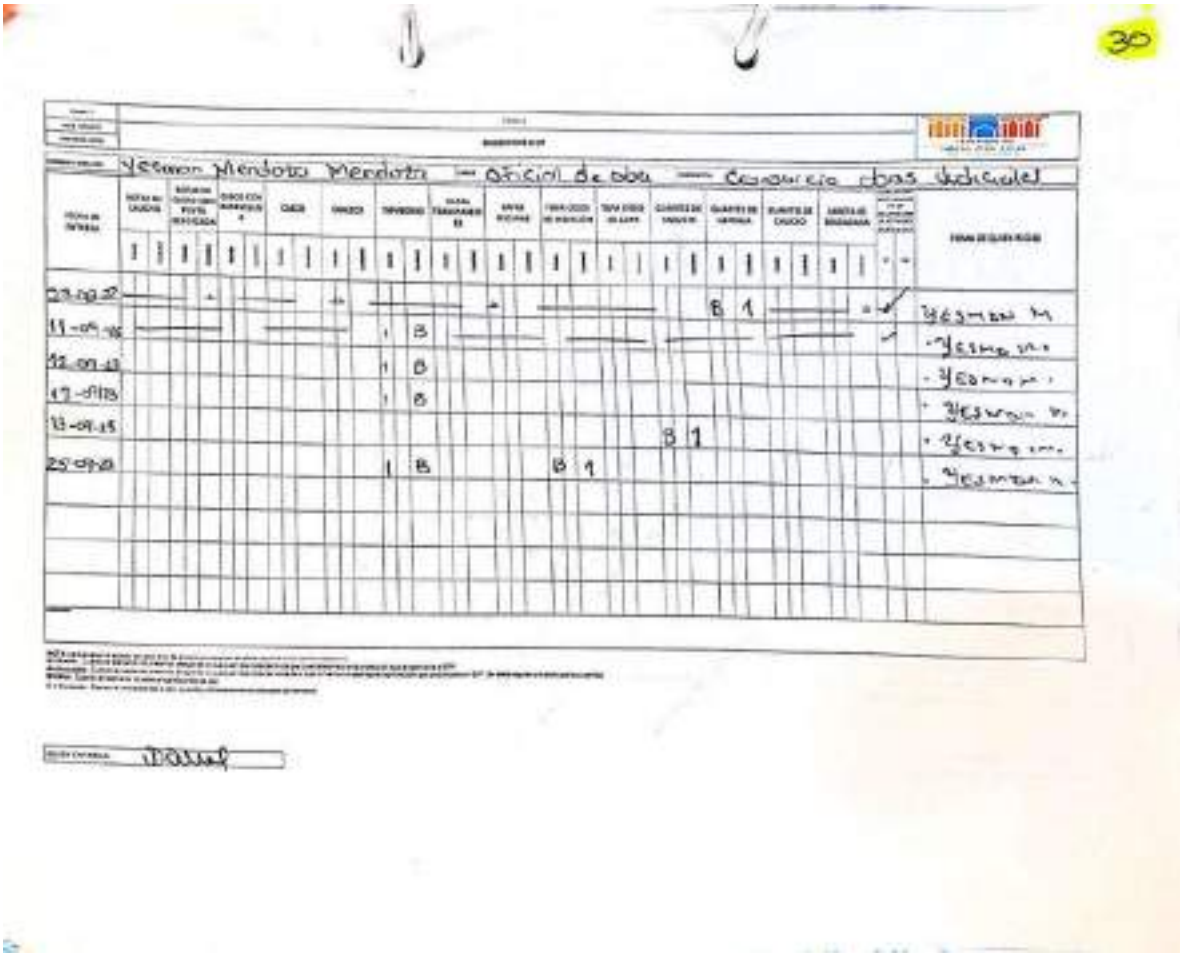
30

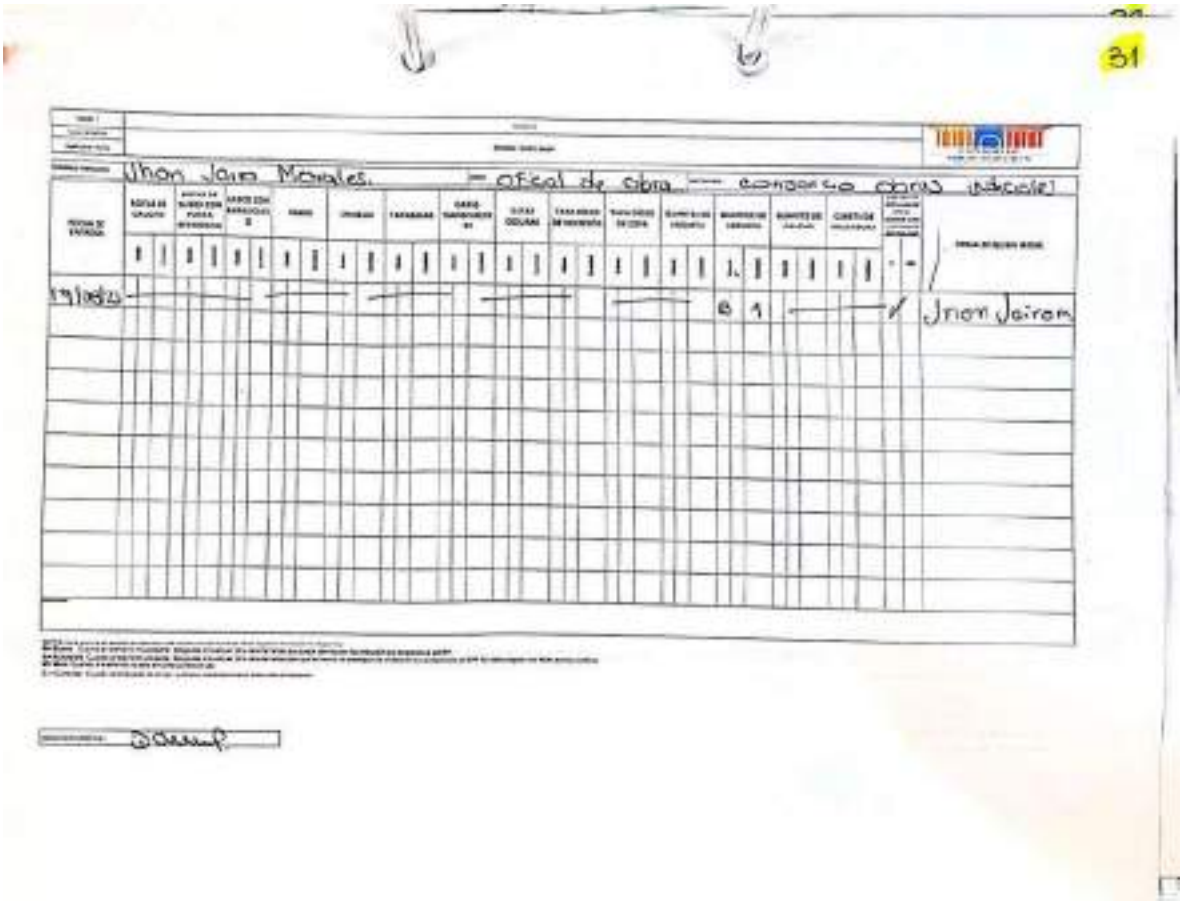

31
Jhon Jairo Morales. Oficial de obra Consorcio Obras Judiciales
Jhon Jairo

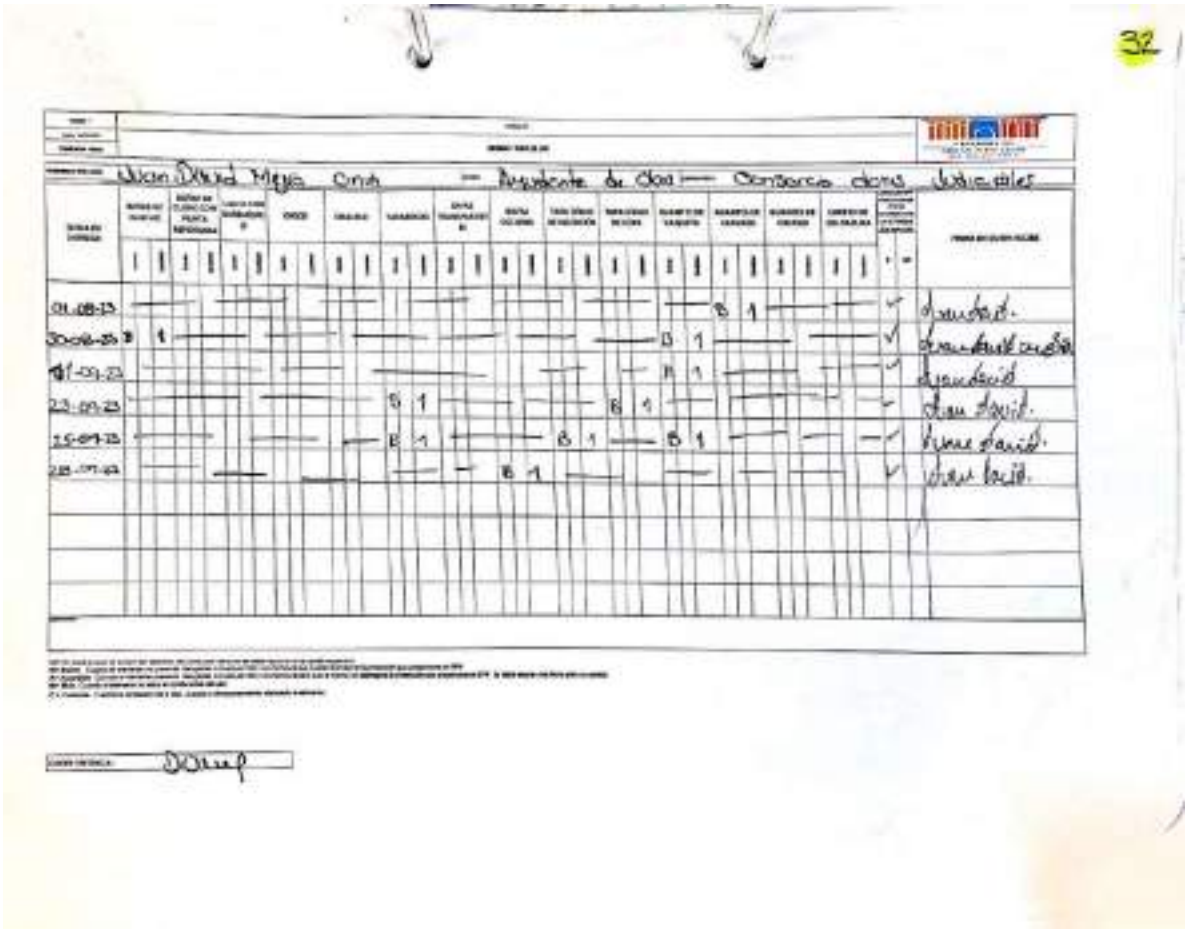




33
Jhnes David Mendoza
OF. Civil de Obra
Consorcio Obras Judiciales

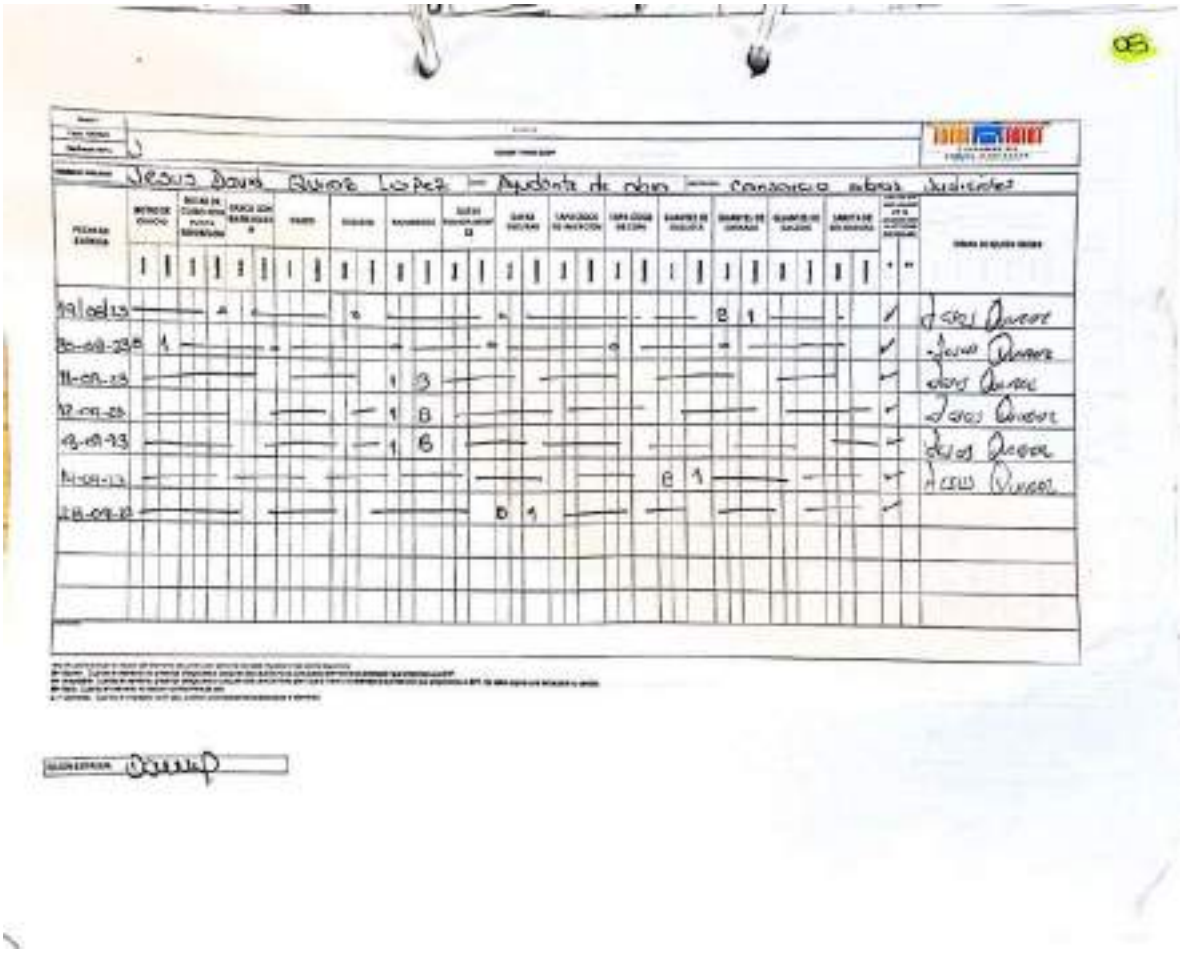




Daniel Aguilar Venegas
oficial de obra
Consorcio obras judiciales

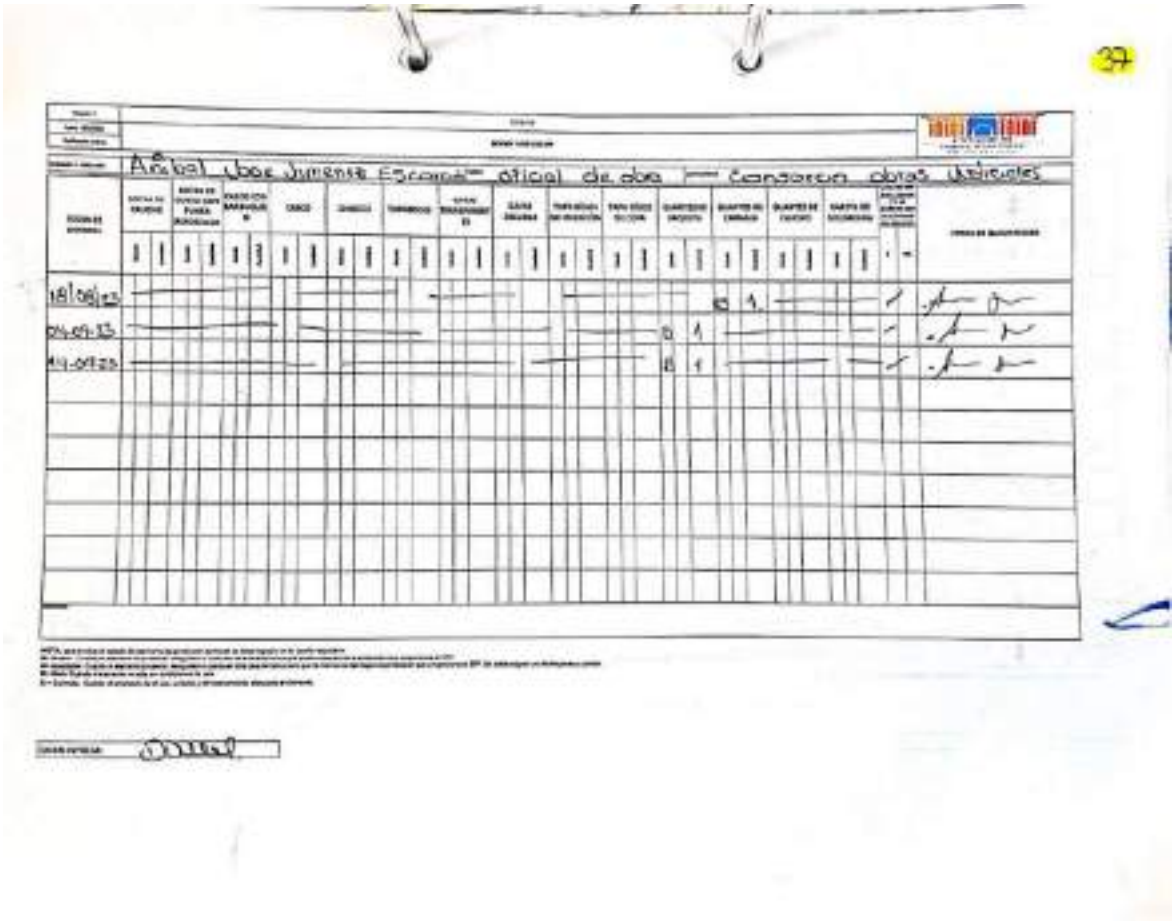


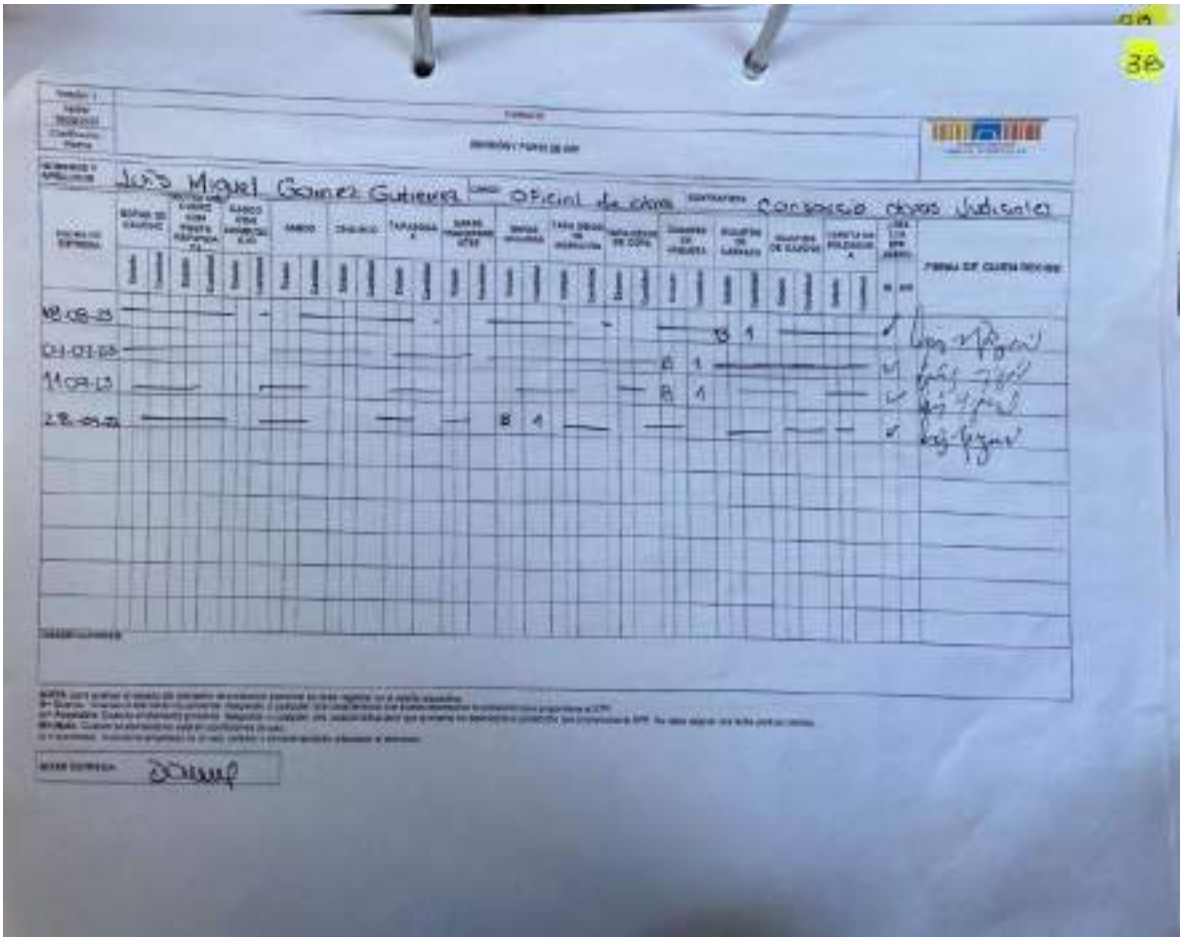

38
Jose Miguel Gomez Gutierrez
Oficial de obra
Consorcio Obras Judiciales

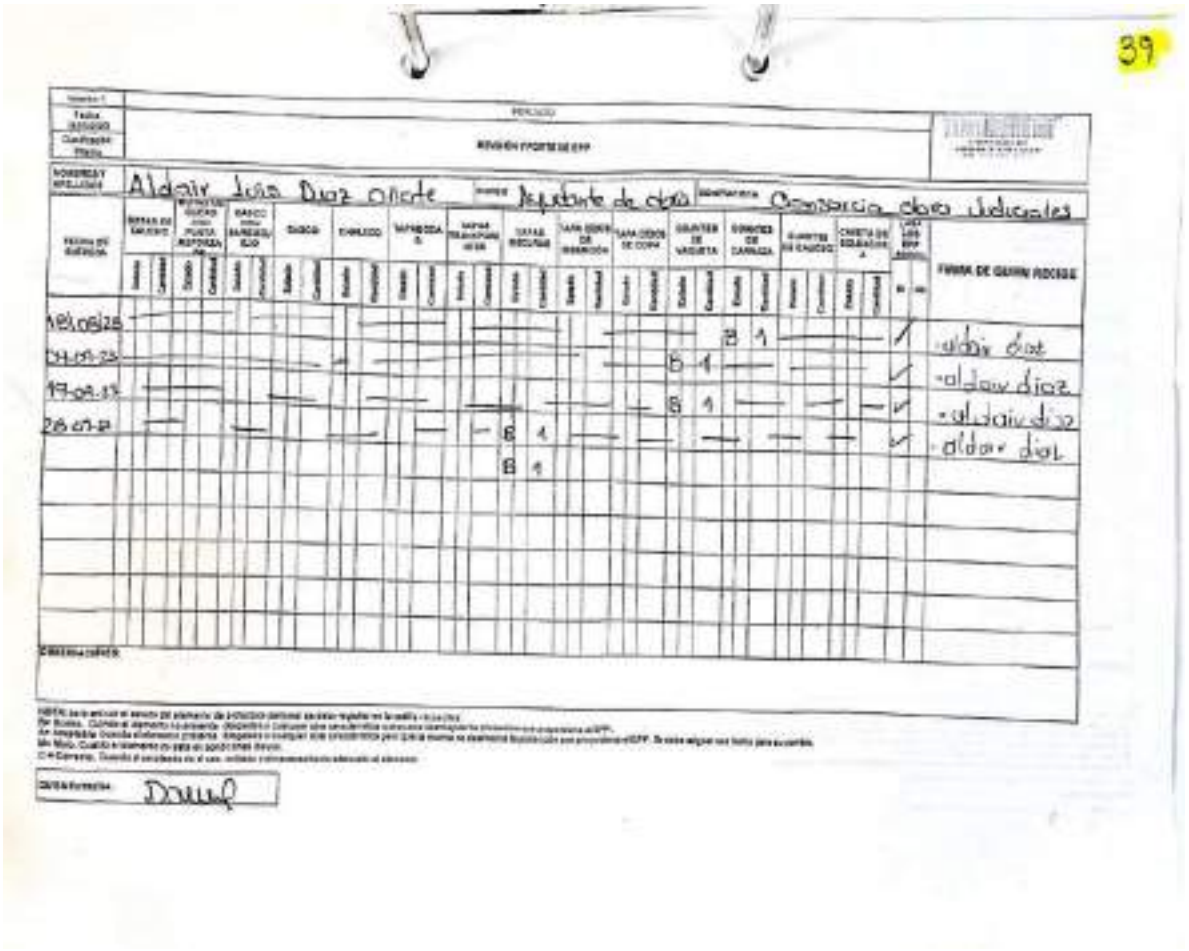

39
Aldair Luis Diaz Olarte
Ayudante de obra
Consorcio Obras Judiciales
aldair diaz
aldair diaz
aldair diaz
aldair diaz

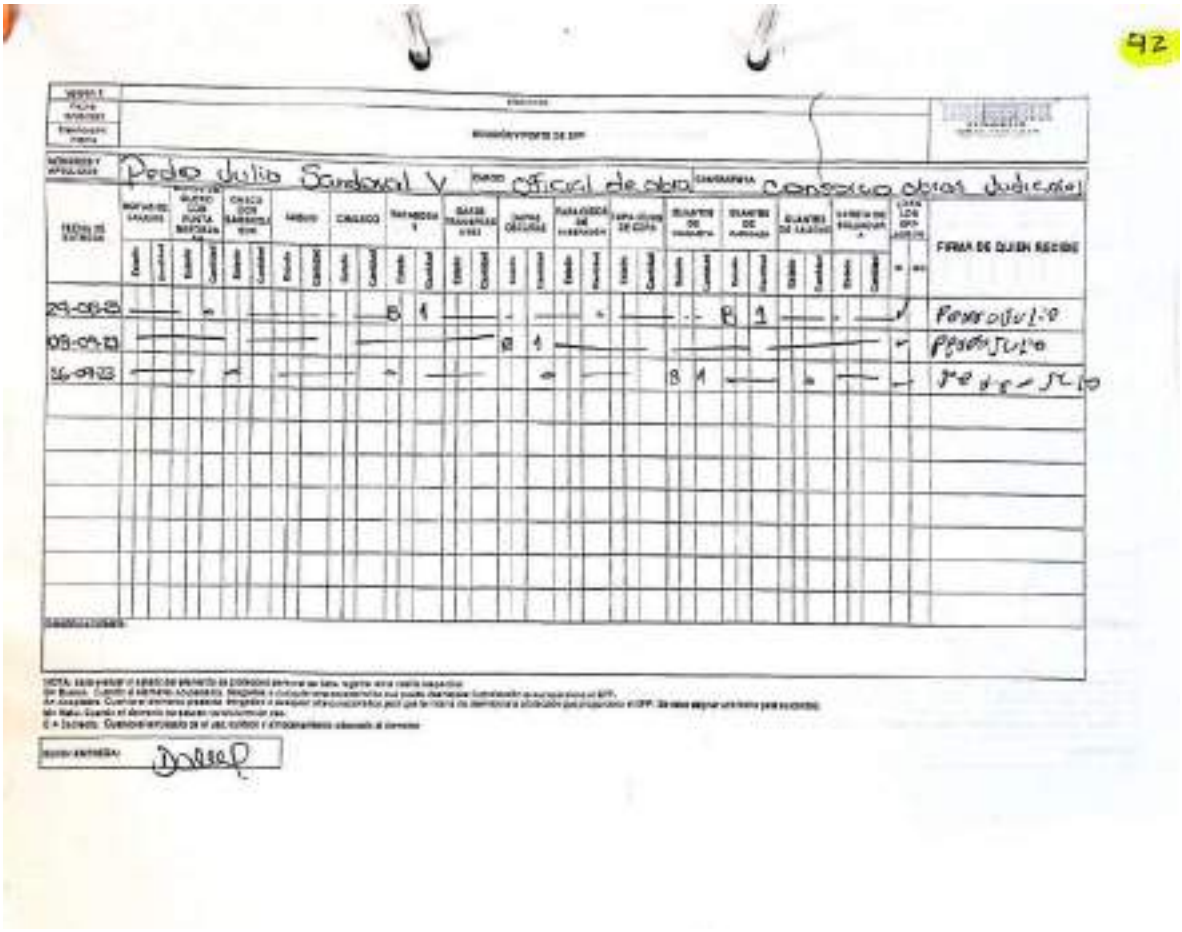
92
Pedro Julio Sandoval V
Consorcio obras Judiciales
FIRMA DE QUIEN RECIBE

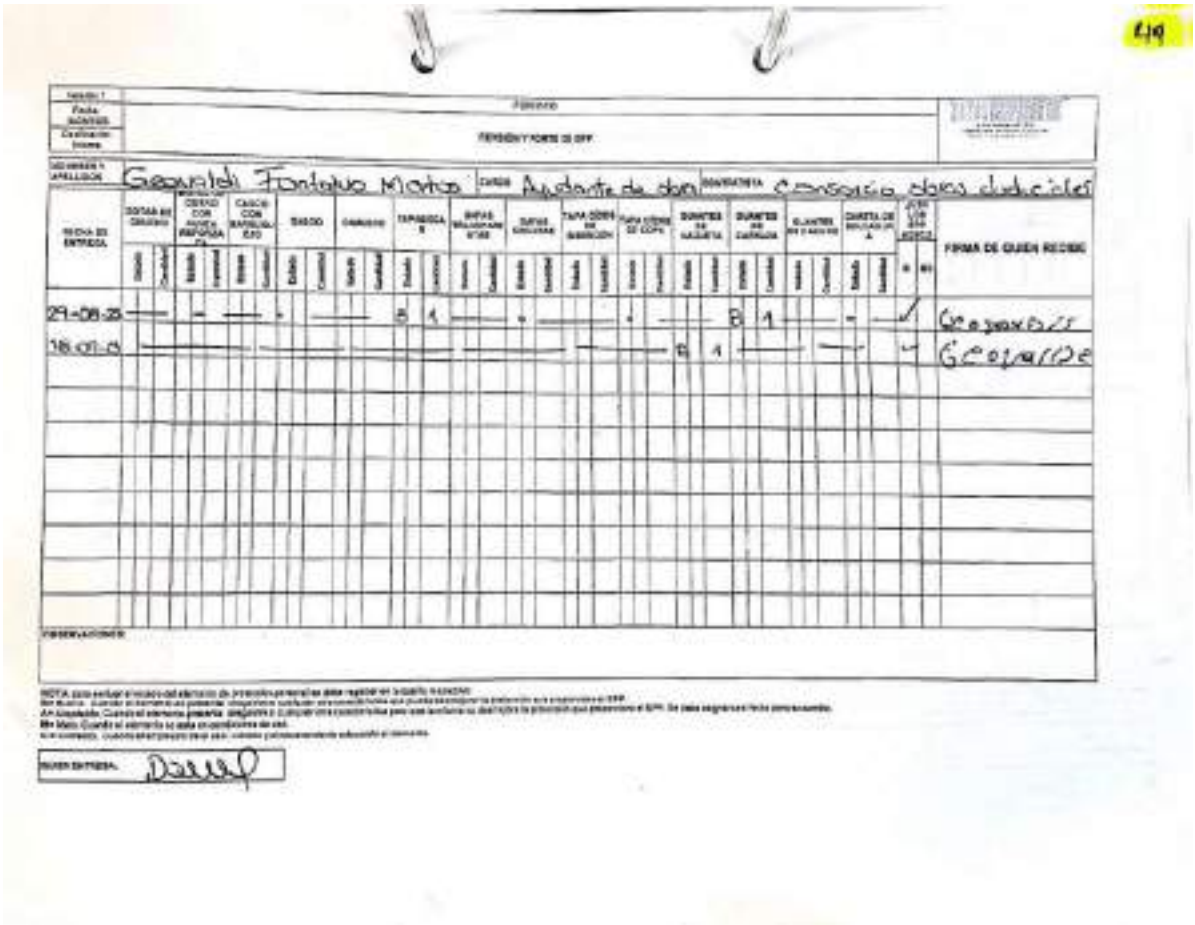

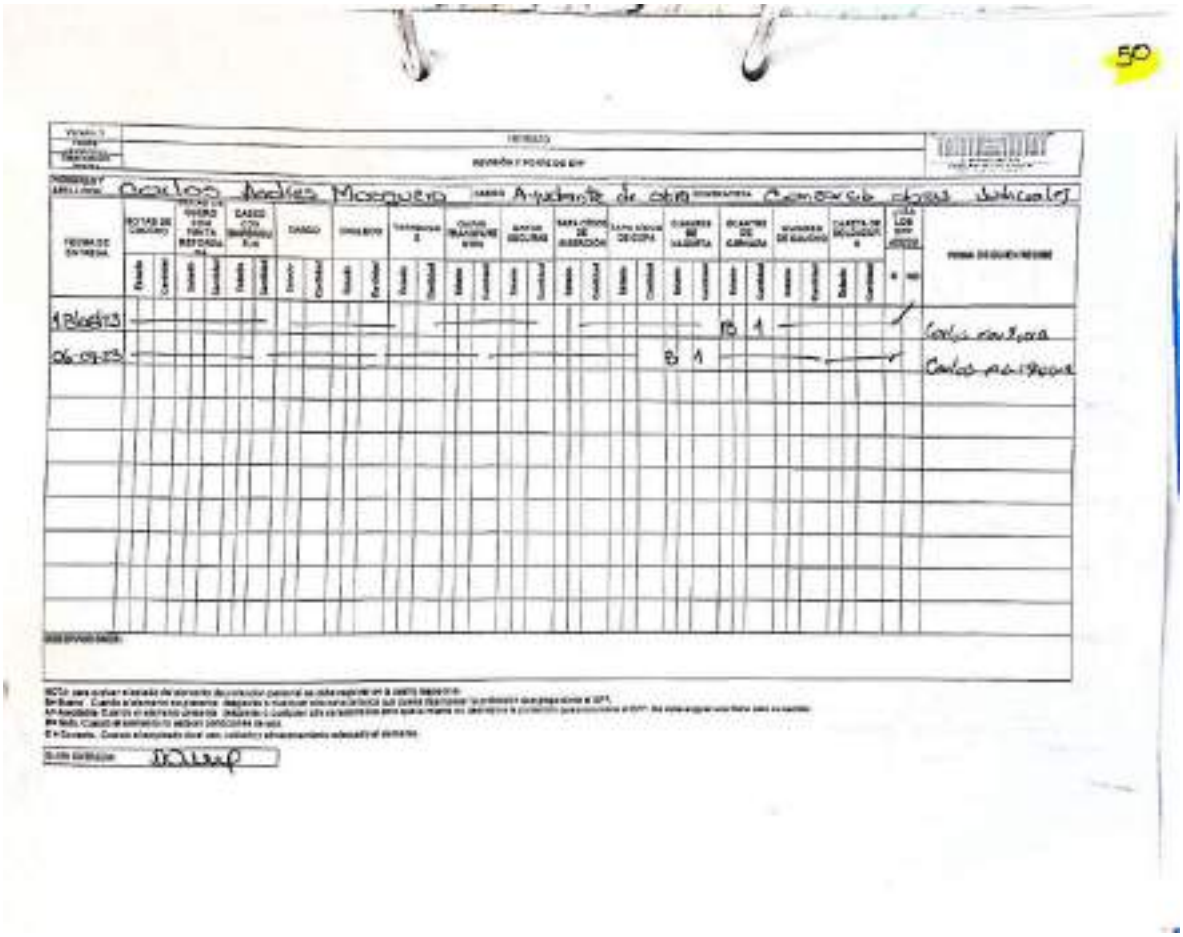

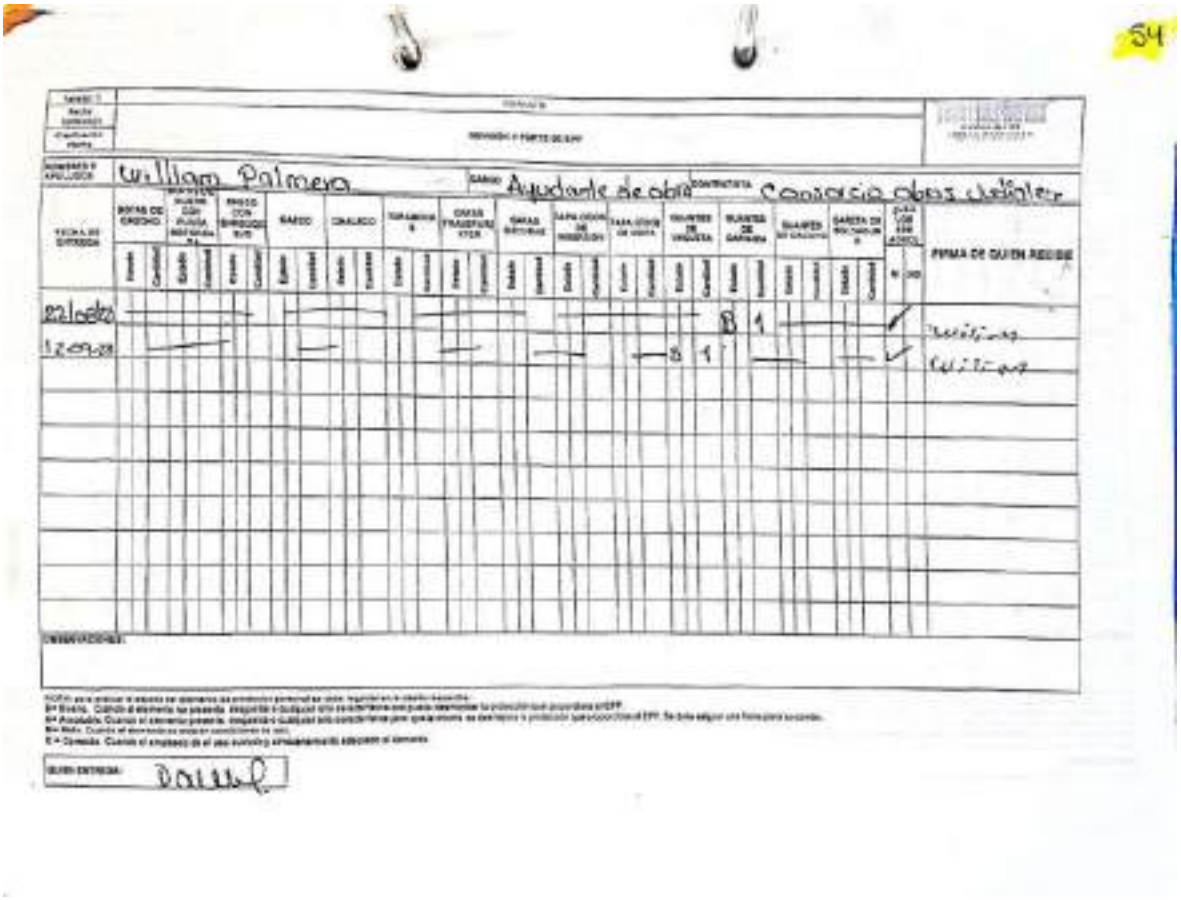
54
William Palmera
Ayudante de obra
Consorcio Obras Judiciales
FIRMA DE QUIEN RECIBE
22/oct/20
12-09-20
B 1
B 1

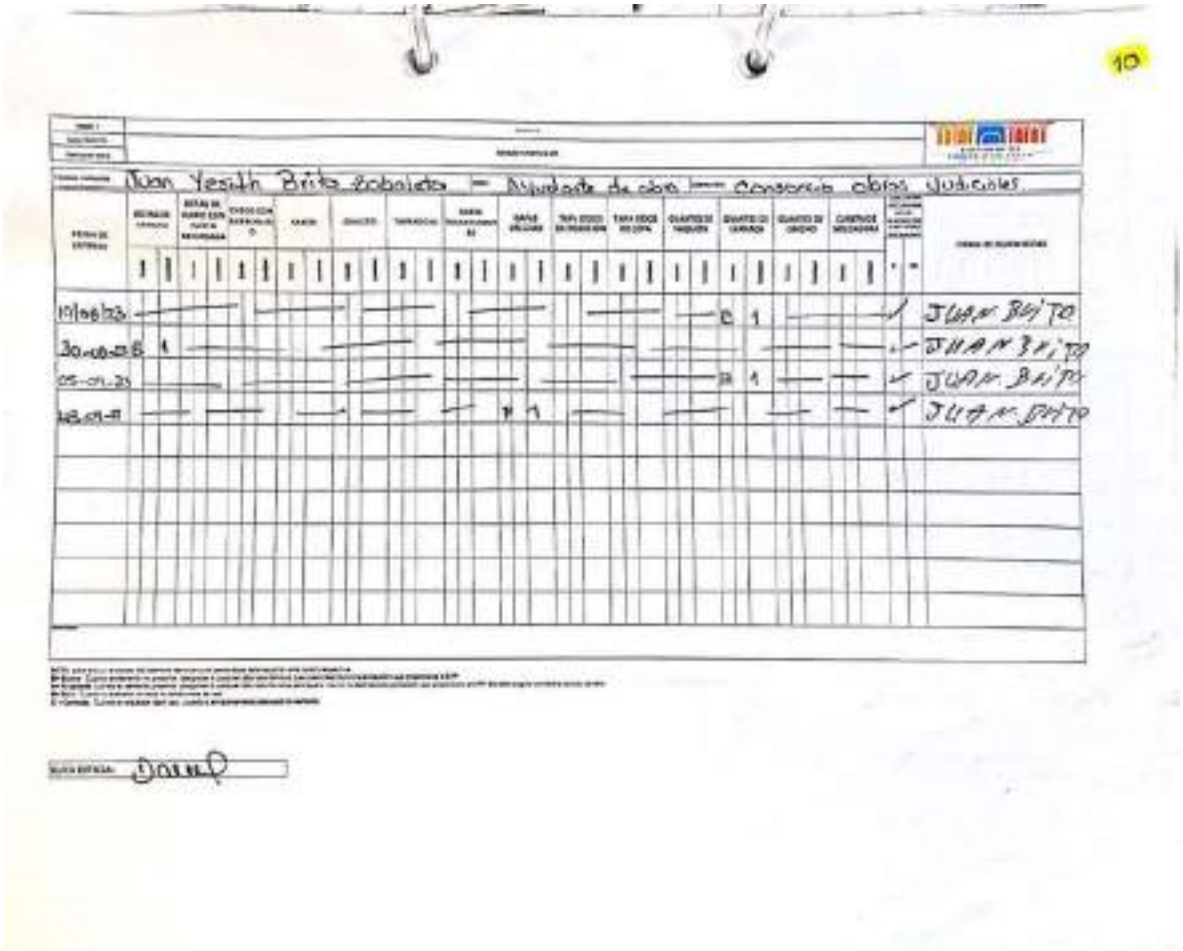

10
Juan Yesith Brito Sabaleta
Consorcio obras judiciales
JUAN BRITO
JUAN BRITO
JUAN BRITO
JUAN BRITO



11
Segundo Martinez Colmenares
Ayudante de Obra
Consorcio obras Judiciales


12
Juan Carlos Muñoz
Ayudante de obra
Consorcio obras Judiciales




15
Farid Alberto Von Strahn – Oficial de Obra – Consorcio Obras Judiciales
01-08-20
30-08-20
01-09-20
12-09-20
Farid VV
Farid VV
Farid VV
Farid VV

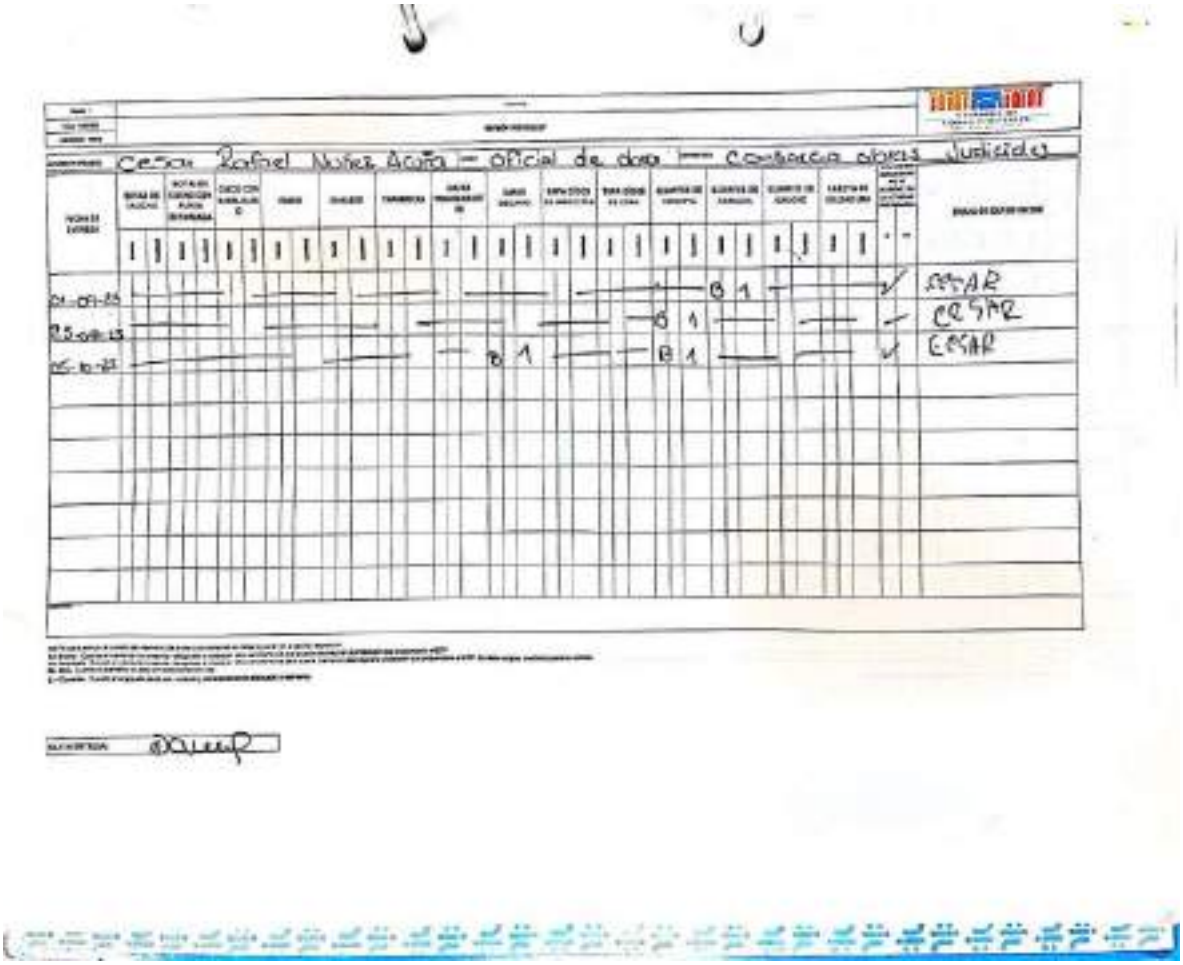
Cesar Rafael Nuñez Acuña — Oficial de obra — Consorcio obras Judiciales
01-09-25
CESAR
CESAR
CESAR

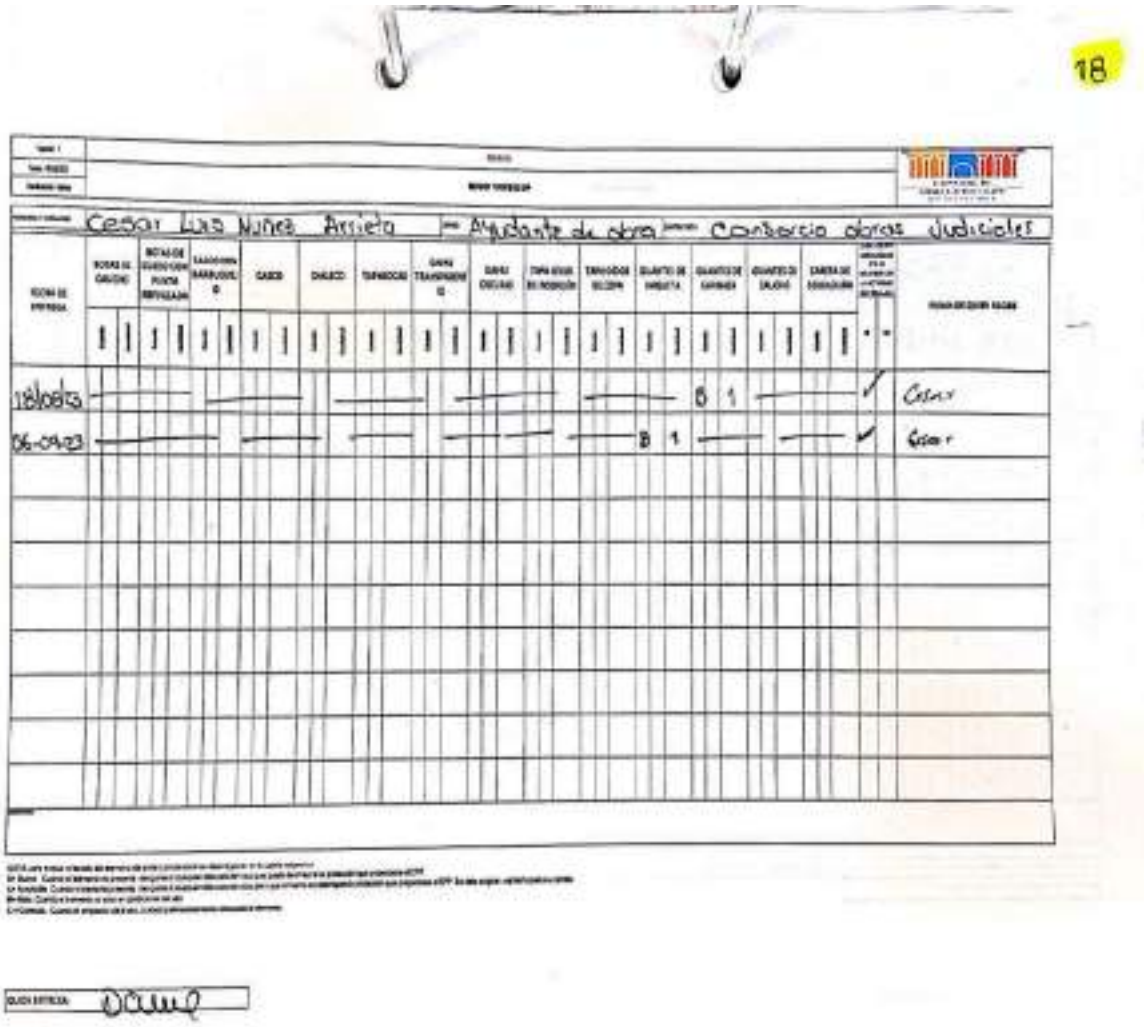
18
Cesar Luis Nuñez Arrieta
Ayudante de obra
Consorcio obras Judiciales
18/08/23
06-09-23
Cesar
Cesar



Orden de Trabajo Nro.: 2431

Vehiculo: MC078654

Datos de la Orden

Datos del Vehiculo

Observaciones generales

Auditoria de creación y cierres

Trabajos

Repuestos


Resumen de Costos



Orden de Trabajo Nro.: 2431

Vehiculo: MC078654

Informe de Seguimiento

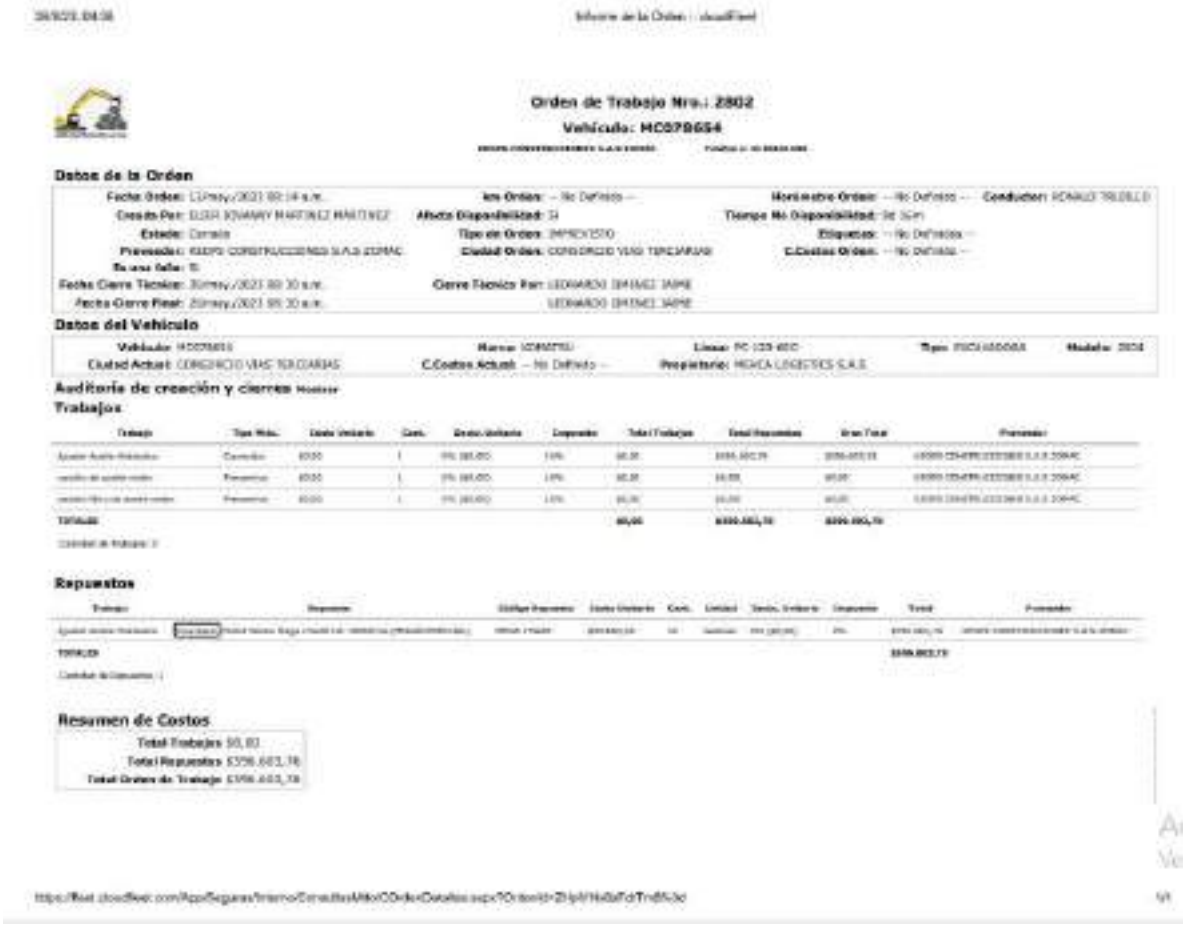

Orden de Trabajo Nro.: 2802

Vehículo: MC079654

Datos de la Orden

Datos del Vehículo

Auditoría de creación y cierre

Trabajos

Repuestos

Resumen de Costos

Total Trabajos $0,00

Total Repuestos $356.603,78

Total Orden de Trabajo $356.603,78

**Orden de Trabajo Nro.: 2575**

**Vehiculo: NC078654**

**Datos de la Orden**

**Fecha Orden:** [illegible] **Km Orden:** -- No Definido -- **Horómetro Orden:** -- No Definido -- **Conductor:** RONALD TRUJILLO
**Creado Por:** [illegible] **Alerta Disponibilidad:** G **Tiempo No Disponibilidad:** --
**Estado:** Abierta **Tipo de Orden:** MANTENIMIENTO **Etiquetas:** -- No Definidas --
**Proveedor:** [illegible] **Ciudad Orden:** CONSORCIO VIAS TERCIARIAS **C.Costos Orden:** -- No Definido --
**Es una falla:** S
**Posible Cierre:** [illegible]

**Datos del Vehiculo**

**Vehiculo:** NC078654 **Marca:** KOMATSU **Linea:** PC-130-8M0 **Tipo:** EXCAVADORA **Modelo:** 2014
**Ciudad Actual:** CONSORCIO VIAS TERCIARIAS **C.Costos Actual:** -- No Definido -- **Propietario:** PRINCA LOGISTICS S.A.S

**Observaciones generales**

soportes de el motor

**Auditoria de creación y cierres** Mostrar

**Trabajos**

| Trabajo | Tipo Mtto. | Costo Unitario | Cant. | Descu. Unitario | Impuesto | Total Trabajos | Total Repuestos | Total Total | Proveedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Correctivo | [illegible] | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | Preventivo | [illegible] | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | Correctivo | [illegible] | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| TOTALES | | | | | | $0,00 | $1.380.701,37 | $1.380.701,37 | |

Cantidad de Trabajos: 3


**Repuestos**

| Trabajo | Repuesto | Costo Unitario | Cant. | Unidad | Descu. Unitario | Impuesto | Total | Proveedor | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Correctivo [illegible] | [illegible] | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | Correctivo [illegible] | [illegible] | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | Correctivo [illegible] | [illegible] | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| TOTALES | | | | | | | $1.380.701,37 | | |

Cantidad de Repuestos: 3

**Resumen de Costes**

**Total Trabajos:** $0,00
**Total Repuestos** $1.380.701,37

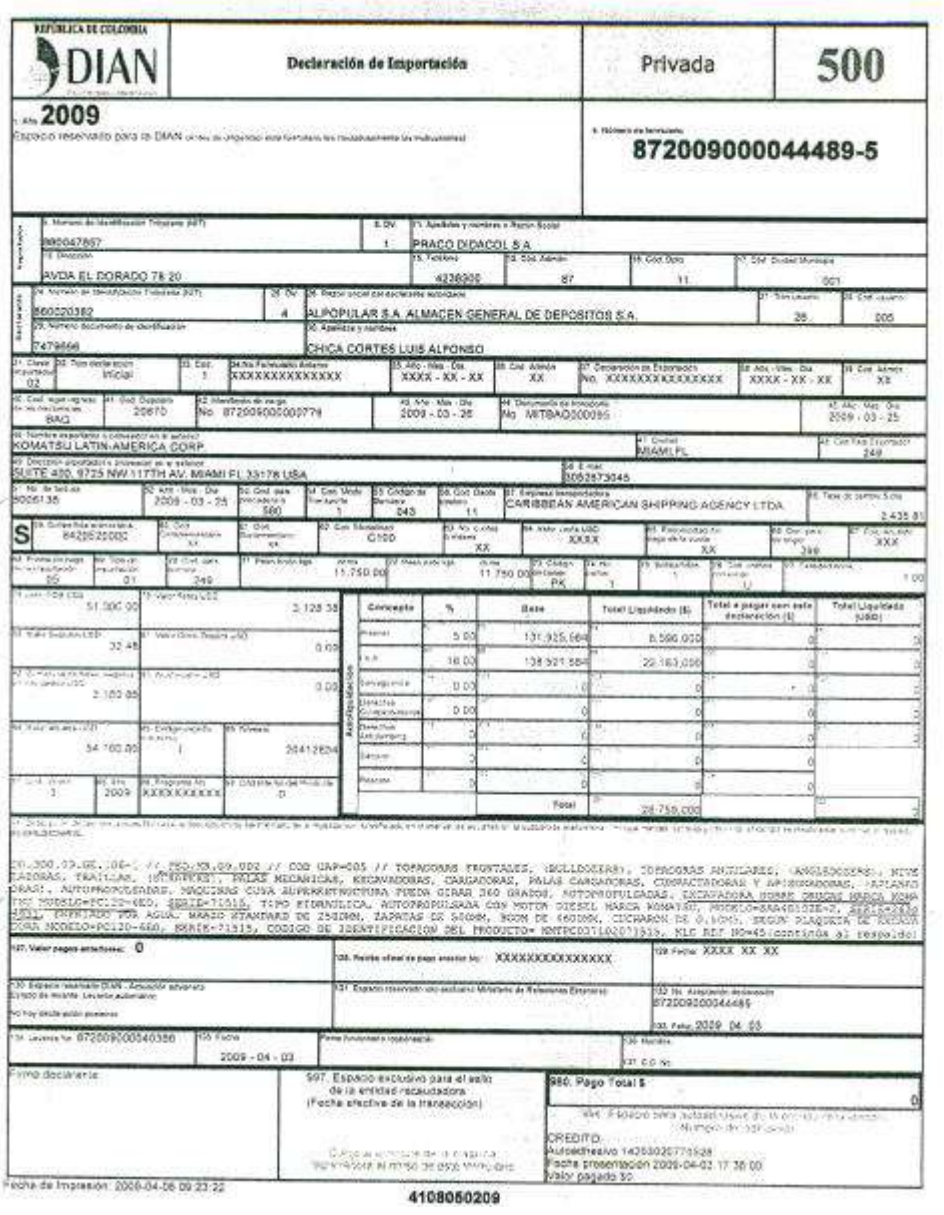

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIAN

**Declaración de Importación** | Privada | **500**

Año **2009**

Espacio reservado para la DIAN

5. Número de formulario: **872009000044489-5**

1. Importador
3. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890047867 | 4. DV: 1 | 5. Apellidos y nombres o Razón Social: PRACO DIDACOL S A
6. Dirección: AVDA EL DORADO 78 20 | 7. Teléfono: 4236300 | 8. Cód. Admón: 87 | 10. Cód. Depto: 11 | 11. Cód. Ciudad Municipio: 001

2. Declarante
12. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860220382 | 13. DV: 4 | 14. Razón social o denominación: ALPOPULAR S.A. ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS S.A. | 37. Cód. Usuario: 26 | 38. Cód. Usuario: 005
39. Número documento de identificación: 7479868 | 40. Apellidos y nombres: CHICA CORTES LUIS ALFONSO

21. Clase importación: 02 | 22. Tipo declaración: Inicial | 23. Cód.: 1 | 24. No. Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXX | 25. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 26. Cód. Aduana: XX | 27. Declaración de Exportación No.: XXXXXXXXXXXXXX | 28. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 29. Cód. Admón: XX
30. Cód. lugar registro: BAQ | 31. Cód. Depósito: 20670 | 32. Identificación de carga: No. 872009005002779 | 33. Año - Mes - Día: 2009 - 03 - 25 | 34. Declaración de Importación: No. MITBAQ500095 | 35. Año - Mes - Día: 2009 - 03 - 25
40. Nombre exportador y consignatario en el exterior: KOMATSU LATIN AMERICA CORP | 41. Ciudad: MIAMI FL | 42. Cód. País Exportador: 249
43. Dirección exportador o consignatario en el exterior: SUITE 430, 9725 NW 117TH AV. MIAMI FL 33178 USA | 44. E-mail: 3052673045
45. No. de Sello: 90056135 | 52. Año - Mes - Día: 2009 - 03 - 25 | 53. Cód. país procedencia: 590 | 54. Cód. Modo Transporte: 1 | 55. Código de Bandera: 043 | 56. Cód. Clase Viajero: 11 | 57. Empresa transportadora: CARIBBEAN AMERICAN SHIPPING AGENCY LTDA | 58. Tasa de cambio $ x 1: 2.435,81

S | 59. Subpartida arancelaria: 8429520002 | 60. Cód. Condicionamiento: XX | 61. Cód. Gravamenes: XX | 62. Cód. Modalidad: C100 | 63. No. Cuotas: XX | 64. Valor Letra USD: XXXX | 65. Periodicidad: XX | 66. Cód. país origen: 249 | 67. Cód. adquisición: XXX
68. Forma de pago: 05 | 69. Tipo de importación: 01 | 70. Cód. país vendedor: 249 | 71. Peso bruto kgs: 11.750,000 | 72. Peso neto kgs: 11.750,000 | 73. Código Valor: P4 | 74. No. Ítems: 1 | 75. Bultos: 1 | 76. Cód. Unidad Comercial: U | 77. Cantidad: 1,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. Valor Aduana COP: 51.300,00 | 79. Valor Aduana USD: 21,06 | | | | | | |
| 80. Valor Seguros USD: 32,48 | 81. Valor Otros Gastos USD: 0,00 | | | | | | |
| 82. Valor Fletes USD: 2.160,00 | 83. Valor Ajustes USD: 0,00 | | | | | | |
| 84. Valor en aduana COP: 54.160,00 | 85. Cantidad Bultos: 1 | 86. Tipo Bultos: 28412604 | | | | | |
| 87. Cuota: 1 | 88. Año: 2009 | 89. Programa No.: XXXXXXXXX | 90. Cuenta No. Cliente: 0 | | | | |

Autoliquidación

| Concepto | % | Base | Total Liquidado ($) | Total a pagar con esta declaración ($) | Total Liquidado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arancel | 5,00 | 131.925,664 | 6.596.000 | 0 | 0 |
| I.V.A. | 16,00 | 138.921,584 | 22.163.000 | 0 | 0 |
| Salvaguardia | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Antidumping | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Compensatorios | | | 0 | 0 | 0 |
| Cargos | | | 0 | 0 | 0 |
| Intereses | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Total | 28.759.000 | | |

CH.300.03.05.06-; // PED:38.09.002 // COD UAP=005 // TOPADORAS FRONTALES, (BULLDOZERS); TOPADORAS ANGULARES; (ANGLEDOZERS); NIVELADORAS; TRAILLAS; (SCRAPERS); PALAS MECANICAS; EXCAVADORAS; CARGADORAS; PALAS CARGADORAS; COMPACTADORAS Y APISONADORAS; (APLANADORAS); AUTOPROPULSADAS; MAQUINAS CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360 GRADOS; AUTOPROPULSADAS; EXCAVADORA SOBRE ORUGAS MARCA KOMATSU MODELO=PC120-6E0; SERIE=71515; TIPO HIDRAULICA; AUTOPROPULSADA CON MOTOR DIESEL MARCA KOMATSU; MODELO=SAA6D102E-2; SERIE=43852 (BOMBA); IMPULSADO POR AGUA; MARCO ESTANDAR DE 2500MM, ZAPATAS DE 560MM, BOOM DE 6600MM, CUCHARON DE 0,92M3, PESO PLAQUETA DE MARCA COMO MODELO=PC130-6E0, SERIE=71515, CODIGO DE IDENTIFICACION DEL PRODUCTO= KMTPC0315L0207515, KLC DEC MO=45;conforme al respaldo!

107. Valor pagos anteriores: 0 | 108. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXX | 109. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación adversa | 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132. No. Aceptación declaración: 872009000044489 | 133. Fecha: 2009 04 03

134. Levante No. 872009000340350 | 135. Fecha: 2009 - 04 - 03 | Firma funcionario responsable | 136. Revisión | 137. C.C. No.

Firma declarante

597. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago Total $: 0

CREDITO
Autoadhesivo 1403020775128
Fecha presentación 2009-04-02 17:38:00
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2009-04-06 09:23:22

4108050209



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA
No. 45849

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE REGISTRO: MC078654 | MARCA: KOMATSU | LINEA: PC120-6EO | AÑO MODELO: 2004 |
| TIPO DE MAQUINARIA: CONSTRUCCION | CLASE: EXCAVADORA | | No. SERIE: KMTPC037L02071515 |
| COLOR(ES): AMARILLO | No. MOTOR: 26348931 | | RODAJE: ORUGAS |

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

| PESO | ALTO | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|---|
| 12030 Kg | 2715 mm | 2460 mm | 7590 mm |

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): INGECONSTRUCTORES S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 900 230 160



LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)
IDENTIFICACIÓN
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR: STRIA TTEYTTO ENVIGADO

| FECHA REGISTRO | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 31-05-2018 | 31-05-2018 | ****** |
| ORIGEN: IMPORTACIÓN | DEC. IMPORTACIÓN: 872009000044489 | FECHA DE LEVANTE: 03/04/2009 |

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
TM03000031794

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

| Versión: | FORMATO | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES |
|---|---|---|
| Fecha: 05/07/2023 | REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGUROS | |
| Clasificación: Interno | | |

**CUIDAD Y FECHA:** 12-09-2023 **PROYECTO:** Consorcio Obras Judiciales

**LUGAR DONDE SE OBSERVÓ LA SITUACIÓN.** Obra área de los Caissón

**REPORTA:** Damaris Salcedo **CARGO:** Residente SST

**SITUACIÓN OBSERVADA**

| CASI ACCIDENTE | | CONDICIÓN INSEGURA | | ACTO INSEGURO | X |
|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN**

Describa detalladamente la situación observada indicando si la persona involucrada es un empleado, un contratista o un visitante.

Los trabajadores Carlos Andrés Mosquera Palmera, Aníbal José Jiménez, Escorcia, Eduardo Enrique Rivera Álvarez, Juan David Mejía Cirin, Aldair Luis Díaz Oñate, Rafael Augusto Balcázar Verdecia. Se encuentran en un Caissón a una altura negativa aproximada de 4.70 metros. Sin la debida protección. Se evidencia un trabajador sin Epcc (equipo de protección contra caída) y los que lo tienen no se encuentran anclados a una línea de vida.
Vale la pena aclarar que este sistema se requiere de uso obligatorio como medida preventiva en caso de presentarse una emergencia (desplome del Caissón) poder identificar al personal que se encuentra expuesto para un posible rescate.

**Evidencio lo antes mencionado**



**ACCIONES REALIZADAS**

Se realiza llamado de atención al personal el cual se evidencia cometiendo el acto inseguro.

**REPORTADO POR**

| Nombres y apellidos | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| aldair diaz | auxiliante | aldair diaz |
| Juan David Mejia | Ayudante | Juan David Mejia |
| Carlos Mosquera | Ayudante | Carlos Mosquera |
| Anibal Jimenez Escorcia | Oficial | |
| Eduardo Rivera | Ayudante | Eduardo Rivera |
| Rafael Balcazar | Topografia | |

| | | |
|---|---|---|
| Versión: | FORMATO | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES NIT. 901.665.448-8 |
| Fecha: 05/07/2023 | REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGUROS | |
| Clasificación: interno | | |

**CUIDAD Y FECHA:** 14/09/2023 **PROYECTO:** Consorcio obras judiciales

**LUGAR DONDE SE OBSERVÓ LA SITUACIÓN:** Área operativa.

**SE REPORTA A:** Karen Soto – Damaris salcedo **CARGO:** Residente SST

**SITUACIÓN OBSERVADA**

| CASI ACCIDENTE | | CONDICIÓN INSEGURA | | ACTO INSEGURO | X |
|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN**

Describa detalladamente la situación observada indicando si la persona involucrada es un empleado, un contratista o un visitante.

Se evidencia al señor Emiro Avendaño Maestro de obra, cometiendo acto inseguro, sentado de una manera no apropiada en el borde de un muro a una altura aproximada de 5 mts, sin EPCC (Elemento de Proteccion Contra Caida) siendo este una medida obligatorio por norma vigente (Resolucion 4272 de 2021) Donde se establecen los requisitos minimos para trabajo en altura despues de 2.0 Mts, como medida preventiva para riesgo de caida.

**ACCIONES REALIZADAS**

Se corrige el acto inseguro realizando llamado de atención y asignando un arnés con eslinga al colaborador.

**REPORTADO POR**

| Nombres y apellidos | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| JEINER MENDOZA RODRIGUEZ | OFICIAL | Jeiner Mendoza |
| JUAN YESID BRITO | AYUDANTE | Juan Brito |

Aplica para situaciones que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador, daños a la obra o al medio ambiente.

| | | |
|---|---|---|
| Versión: | FORMATO | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES NIT. 901.665.448-8 |
| Fecha: 05/07/2023 | REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGUROS | |
| Clasificación: interno | | |

**CUIDAD Y FECHA:** 20/09/2023 **PROYECTO:** Consorcio Obras Judiciales

**LUGAR DONDE SE OBSERVÓ LA SITUACIÓN:** área operativa construcción palacio de justicia

**SE REPORTA A:** KAREN SOTO **CARGO:** Residente SST

**SITUACIÓN OBSERVADA**

| CASI ACCIDENTE | | CONDICIÓN INSEGURA | X | ACTO INSEGURO | |
|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN**

Describa detalladamente la situación observada indicando si la persona involucrada es un empleado, un contratista o un visitante.

Se evidencia sendero peatonal obstruido por material desorganizado.

**ACCIONES REALIZADAS**

Se corrige la condicion insegura organizando nuevamente y señalizando sendero peatonal.

**REPORTADO POR**

| Nombres y apellidos | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| CESAR NUÑEZ ARRIETA | AYUDANTE |  |
| | | |

Aplica para situaciones que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador, daños a la obra o al medio ambiente.

| | | |
|---|---|---|
| Versión: | FORMATO | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES NIT. 901.665.448-8 |
| Fecha: 05/07/2023 | REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGUROS | |
| Clasificación: interno | | |

**CUIDAD Y FECHA:** 22/09/2023 **PROYECTO:** Consorcio Obras Judiciales

**LUGAR DONDE SE OBSERVÓ LA SITUACIÓN:** Area operativa Construcción palacio de justicia.

**SE REPORTA A:** Damaris salcedo – Karen soto **CARGO:** Residente SST

**SITUACIÓN OBSERVADA**

| CASI ACCIDENTE | | CONDICIÓN INSEGURA | X | ACTO INSEGURO | |
|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN**

Describa detalladamente la situación observada indicando si la persona involucrada es un empleado, un contratista o un visitante.

Se evidencia áreas con condiciones inseguras sin señalización, debido a las excavaciones para llevar a cabo las actividades de la máquina.

**ACCIONES REALIZADAS**

Se corrige condicion insegura realizando demarcacion con señalizacion de colombinas con malla, por terrenos con diferencias de nivel.

**REPORTADO POR**

| Nombres y apellidos | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| YESMAN MENDOZA | OFICIAL | YESMAN M. |
| | | |

Aplica para situaciones que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador, daños a la obra o al medio ambiente.

## TABLA DE CONTENIDO


**1. INTRODUCCIÓN ..... 2**

**1.1 LOCALIZACIÓN..... .2**

**1.2 Características Técnicas del proyecto……...…5**

**2. OBJETIVO GENERAL…… 5**

**3. METODOLOGIA ..... 6**

**4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO..... 6**

**5 OBLIGACIONES DE PERMISOS ..... 7**

**5.1. GENERALIDADES..... 7**

**6. DESARROLLO DE LOS PROGRAMA DEL PGAS ..... 7**

**6.1. Programa y Proyecto de PGAS..... 8**

**61.1. Gestión Ambiental del proyecto ..... 8**

**1.1. Grupo de Gestión Ambiental y social……..8**

**1.2. Trámite y Cumplimiento de Requisitos Legales……....8**

**1.3 Capacitación Ambiental y Social**……..……..**8**

**2 Componente Abiótico……...8**

**2.1 Manejo Integral de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipos……...…8**

**2.2 Manejo del Recurso Hídrico……8**

**2.3. Control de las Excavaciones y Demoliciones……8**

**2.4. Residuos Sólidos Generados……..8**

**2.5. Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas……**……**8**

2.6. Instalación, Funcionamiento y Retiro de Campamento……..**8**

**2.7.** Manejo de la Maquinaria y Equipos……..……**8**

2.8. Control de la Calidad del Aire y las Emisiones……**8**

3. Componente Biótico……..…**8**

3.1. 1. Manejo de la Fauna Silvestre……..……..**8**

**63.2.** Manejo de la Vegetación en Obra……..…….……**8**

3.3. Protección vegetal del suelo……..……**8**

**4 Gestión Social**……..……..……..……**8**

**4.1** Atención a la Comunidad y Autoridades…….……**.8**

4.2. Información y Participación de la Comunidad……..……..**8**

4.3. Manejo de Infraestructura Privada, Pública, de Servicios Públicos, Redes y Activos……..…..……**8**

4.4. Gestión de la Mano de Obra……...…**8**

**7. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL...** ¡Error! Marcador no definido.

**8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS..... 9**

**9. MATRIZ DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL .....** ¡Error! Marcador no definido.

**10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....** ¡Error! Marcador no definido.


## 1. INTRODUCCIÓN

Para el mejoramiento continuo de las instalaciones físicas, el Consejo Superior de la Judicatura en cabeza del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura, en el continuo ejercicio de sus funciones, robusteciendo las edificaciones propias, con calidad en la construcción, garantizando la vida útil de los inmuebles y asegurando los niveles de bienestar, calidad de vida, eficiencia, productividad y ante todo la seguridad física de sus ocupantes.

De esta manera, cumpliendo con la anterior directriz, para la ciudad de Valledupar (Cesar) se creará una nueva torre para el Palacio de Justicia, teniendo en cuenta que se tiene un área libre para la implantación de un nuevo edificio que proporcione todas las garantías de seguridad, permanencia y bienestar tanto para funcionarios, empleados y usuarios.

Este nuevo bloque albergará las diferentes corporaciones, tales como: El Tribunal Superior de Valledupar, El Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, El Consejo de la Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, los cuales se encuentran dispersos en diferentes inmuebles de la ciudad, lo cual permitirá reunir estas Corporaciones ofreciéndoles a los usuarios un correcto acceso a la justicia y una óptima prestación del servicio, digno para funcionarios, empleados y habitantes de la ciudad de Valledupar.

## 1.1. LOCALIZACIÓN

La construcción se desarrollará dentro de un predio de propiedad de la Rama Judicial de un área de 4.525,00 m², predio donde actualmente funciona el Palacio de Justicia de la ciudad de Valledupar y que está destinado como área de parqueadero descubierto.

El Palacio de Justicia existente consta de un bloque de 8 pisos y cuenta con las siguientes áreas generales:

- Área bruta total predio: 4.525.00 m²
- Área total edificio ocho pisos: 7.758.21 M²
- Área total neta del uso edificio ocho pisos: 5.386.83 M²
- Ocupación edificio ocho pisos: 1.063,61 m²

El predio se encuentra ubicado geográficamente, dentro de la COMUNA 1, barrio catastral 01-01-0468- denominado “ALFONSO LOPEZ”, cuya ubicación geográfica responde a las siguientes coordenadas:

- 10°28'27.4"N ,73°15'07.6"W.

Los datos del inmueble son los siguientes:

- Nomenclatura: Calle 14 No. 12-189
- Matrícula Inmobiliaria No: 190-33450 predio total
- Código Único Catastral: 01-01-0468-0002-000

- Escritura Pública: No. 2105 del 10 de agosto de 1984



Figura No. 1 Localización del proyecto.
**Fuente:** *Estudios previos del proyecto*

Linderos:

- Norte: 67.50 m
- Este: 84.65m
- Sur: 77 m
- Oeste: 49.45 m



Edificio actual del Palacio de Justicia



Zona en donde se ejecutará el proyecto, parqueadero actual del Palacio de Justicia.

Las principales vías de acceso a los frentes de obra son; Carrera 14 y la calle 14.

Debido al poco espacio en la obra se instalará un campamento, pero la oficina administrativa se ubicará fuera del proyecto, lo más cercano posible al frente de obra.

**Tabla 1. Información del proyecto.**

| INFORMACIÓN DEL PROYECTO | |
|---|---|
| Razón social: | Consorcio Obras Judiciales. |
| Nit: | 901665448-8 |
| Objeto del proyecto | Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar). |
| Ciudad:<br>Dirección: | Bogotá<br>Carrera 61 # 100-68 |
| Celular: | 3004708 / Cel: 3014683375 |
| Representante legal | Víctor Anderson Valbuena Quiroga |
| Duración del Proyecto: | 35 meses |

### 1.2. Características técnicas del proyecto

El proyecto contempla un recorrido vertical en 11 niveles y 2 sótanos. Un acceso de funcionarios y zona de archivo se ubican en el primer piso, en los tres siguientes niveles se localizan servicios netamente públicos con acceso diferenciado. El acceso de usuarios se encuentra en el piso 1 el cual distribuye a los pisos superiores rematando en el piso 10. Es importante resaltar que por funcionamiento de la entidad y su nivel de seguridad se plantean dos puntos fijos diferenciados para la atención del público y otro para el transporte de los funcionarios con circulaciones que no contemplan contacto son los usuarios.



**Plano TOP Valledupar**

## 2. OBJETIVO GENERAL

Establecer el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para la ejecución del proyecto "Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar", en el departamento del Cesar, con el fin de ofrecerle a los usuarios y a los equipos de trabajo un espacio con mejor infraestructura el área de estudio y la zona de influencia, reconocer los posibles impactos ambientales, las medidas y acciones de manejo ambiental que se deben implementar durante la intervención en los frentes de obra.

Objetivos específicos

Recolectar información para establecer la demanda de recursos naturales, al igual que los permisos por su uso y aprovechamiento, que se requieran tramitar ante las autoridades ambientales y que son parte integral de PGAS, es decir, los requerimientos y obligaciones que de ellos se emanen.

Respetar el entorno donde se desarrollarán las obras; la eliminación, el control, la prevención y la compensación ante posibles impactos ambientales y sociales negativos, a través de la implementación del PGAS y cada uno de sus programas y proyectos, que se determinen de acuerdo con el proyecto a ejecutar y el estudio previo según el alcance de la obra proyectada.

Conocer y establecer comunicación con las autoridades ambientales y en general, instituciones, operadores de servicios públicos, comunidad y todas las entidades que puedan estar involucradas en el proceso constructivo, el establecimiento de buenas relaciones, así como también la atención y solución de quejas, peticiones o reclamos que se puedan generar durante la ejecución del proyecto.

- Determinar los indicadores de gestión, según los programas y proyectos identificados, que pueden desarrollarse en cada Contrato para conformar el seguimiento y el nivel de cumplimiento ambiental.

El principal responsable del diseño e implementación y seguimiento del PGAS es el director de proyecto, quien provee los recursos necesarios y suficientes para el desarrollo del PGAS de acuerdo con el análisis de las diferentes actividades de obra y no solo interviene el Residente ambiental.

En pago del PGAS está inmerso en el presupuesto de obra y el pago no se realiza por separado de las actividades ambientales y sociales.

## 3. METODOLOGIA

La metodología para implementar para la realización del Plan de Gestión Ambiental y Social es en primera instancia la Guía PGAS DEAJ, la recolección y análisis de información, los estudios previos, pliego de condiciones, información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, CORPOCESAR, entre otras.

De acuerdo con la información recolectada se elaborará un diagnóstico de la situación actual para el área de influencia directa e indirecta.

## 4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO

| |
|---|
| Excavación mecánica en material común para elemento - incluye la conformación de taludes y trincheras del proceso constructivo. Esta actividad se hará de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en el estudio de suelos, las recomendaciones estructurales y las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. - incluye retiro y disposición final |
| Excavación mecánica en Roca para conformación de huellas de elementos de cimentación. |
| **CAISSON** |
| Excavación manual caissón constructivos.<br>Excavación manual en Roca para conformación de huellas de elementos de cimentación.<br>Perfilado fondo de excavación |
| Suministro e instalación de anillos de caissón en concreto tipo_1 3000 psi incluye posterior demolición - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento) |
| suministro y manejo de acero 60.000 psi/420 mpa. |
| Fundición de solado de limpieza en concreto |
| bases en concreto ciclópeo tipo_1 3000 psi - 60% rajón 40% concreto |
| zapatas en concreto tipo_1 5000 psi<br>Zarpa muro de contención tipo_ 2 4000 psi |
| suministro e instalación de pañete de taludes según estudio de suelos |
| Vigas de cimentación en concreto tipo_1 5000 psi |
| Suministro e instalación de concreto 1 5000 psi (concreto de limpieza)<br>Suministro e instalación de sistema de drenaje con Geodren vial<br>Suministro e instalación de sistema de Tecdren |
| Replanteo de estructura |
| Columnas rectangulares en concreto a la vista tipo _1 de 6000 psi. |

## 5. OBLIGACIONES DE PERMISOS DE TALA

### 5.1. GENEREALIDADES

De acuerdo a las obligaciones dadas por CORPOCESAR se están atendiendo las obligaciones impuestas en la Resolución No. 0017 del 28 de febrero del 2023.

## 6. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL PGAS

A continuación, se describirán todas las actividades, con las respectivas metas de los programas establecidos para la ejecución del proyecto y describir las medidas desarrolladas durante el periodo de este informe.

### 1. Programa y proyecto del PGAS

De acuerdo con lo establecido en el plan de manejo ambiental, el proyecto se desarrollará desde el proceso ambiental de acuerdo a los programas establecidos durante la ejecución del proyecto:

| ítem | Programas | Proyectos | Código |
|---|---|---|---|
| 1 | Gestión Ambiental del Proyecto | 1. Grupo de Gestión Ambiental y Social | 1.1-GAP |
| | | 2. Trámite y Cumplimiento de Requisitos Legales | 1.2-GAP |
| | | 3. Capacitación Ambiental y Social | 1.3-GAP |
| 2 | Componente Abiótico | 1.Manejo Integral de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipos | 2.1-MCA |
| | | 2. Manejo del Recurso Hídrico | 2.2-MCA |
| | | 3. Control de las Excavaciones y Demoliciones | 2.3-MCA |
| | | 4. Residuos Sólidos Generados | 2.4-MCA |
| | | 5. Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas | 2.5-MCA |
| | | 6.Instalación, Funcionamiento y Retiro de Campamento | 2.6-MCA |
| | | 7. Manejo de la Maquinaria y Equipos | 2.7-MCA |
| | | 8. Control de la Calidad del Aire y las Emisiones | 2.8 MCA |
| 3 | Componente Biótico | 1. Manejo de la Fauna Silvestre | 3.1-MCB |
| | | 2. Manejo de la Vegetación en Obra | 3.2-MCB |
| | | 2. Protección vegetal del suelo | No aplica |
| 4 | Gestión Social | 1. Atención a la Comunidad y Autoridades | 4.1-GSP |
| | | 2. Información y Participación de la Comunidad | 4.2-GSP |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 3. Manejo de Infraestructura Privada, Pública, de Servicios Públicos, Redes y Activos | 4.3-GSP |
| | | 4. Gestión de la Mano de Obra | 4.4-GSP |
| | | 5. Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural | No aplica |

## FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar).** | **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** | **CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022** |

| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **IDENTIFICACION** |
|---|---|---|
| Gestión Ambiental del proyecto | 1. Grupo de Gestión Ambiental y Social | 1.1-GAP |

**OBJETIVOS DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| Cumplir, monitorear y vigilar los planes PGAS, SG-SST, socio ambiental, en la fase de construcción. | Garantizar la estructura de profesionales idóneos, con la preparación y experiencia para cumplir con la gestión legal |
| El grupo de gestión ambiental y social debe elaborar todos los estudios previos para la elaboración del PGAS e implementarlo y cumplir con la gestión tanto preventiva, como la de control, mitigación y compensación en los casos que se requiera. | Garantizar el desarrollo de la obra cumpliendo con las medidas de manejo y protección del medio ambiente, aplicando las medidas de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de los habitantes del sector y del personal vinculado a las obras. |

**IMPACTOS POTENCIALES**

| | |
|---|---|
| Alteración de las actividades cotidianas | Contaminación del suelo |
| Quejas y reclamos de la comunidad | Contaminación del aire |
| Vandalismo | Contaminación del agua |

**TIPO DE MEDIDA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Control** | **x** | **Prevención** | **x** | **Mitigación** | **x** | **Compensación** | |

**MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS**

Una de las estrategias para asegurar una correcta implementación del plan de manejo ambiental durante la ejecución del proyecto, es contar con profesionales que conforman el grupo de gestión ambiental, los cuales reportan al director del proyecto las diferentes actividades con el fin de coordinar y alinear el proceso constructivo.

En el mes de septiembre de 2023 continua el grupo ambiental y como evidencia se presenta en el anexo 2.

Dando cumplimiento a la ficha ambiental a continuación se relaciona el personal miembro del grupo ambiental.

| Cargo | Nombre y Apellido | Dedicación | # de contacto |
|---|---|---|---|
| Director de Proyecto | Ferney Peña Rojas | 100% | 3102981094 |
| Ing. Residente de Obra | Emel Larios | 100% | 3014683375 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Residente Ambiental | Mabely Toncel | 50% | 301 4683375 |
| Administrativa | Wendy Quiroz | 100% | 311 8884207 |
| Residente SST | Luz Damaris Salcedo | 100% | 312 4598360 |

- **Reuniones y comités de seguimiento**

En este periodo se continua con los comités internos del proyecto para seguir implementando y monitoreando las diferentes actividades ambientales.

Durante el mes de septiembre se realizaron charlas, socialización y capacitación de temas ambiental con el fin de recordar al personal en obra, las medidas de manejo y protección del medio ambiente. Las actividades mencionadas se evidencian en el siguiente informe.

De igual forma se evidencia reunión realizada con el equipo ambiental donde se trataron temas como:

Sitio asignado para la siembra de los árboles en cumplimiento a lo requerido por la entidad de Corpocesar en compensación por la tala de árbol realizada en el proyecto.

Se solicita nuevamente a la empresa DESCONT (Proveedor gestora de residuos peligros y aprovechables) licencia de funcionamiento con el fin de verificar la acreditación de la entidad, para posteriormente radicar a interventoría para su aprobación.

Se radica ante la entidad de Corpocesar Oficio CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC-381 RADICACIÓN INFORME FORESTAL. Recibido con radicado número 08984. Oficio CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC-388 REITERACIÓN RADICACIÓN PGAS. Recibido con radicado número 09261. CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC-400 RESPUESTA PETICIÓN RADICADO Nos 07908, 07010 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023. Recibido con Radicado numero 09592 CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC-403 RADICACIÓN INFORME TRIMESTRAL. Recibido con radicado número 09739

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No. 1 Acta de Reunión | Fotografía No. 2 Evidencia asistencia reunión |

| FECHA | TEMA | OBJETIVO |
|---|---|---|
| 02/09/2023 | Protección de la flora y de la fauna. | **Charla:** Se realiza charla con el tema mencionado, debido a la necesidad de concienciar al personal sobre la importancia y responsabilidad que témenos con la flora y la fauna. |
| 05/09/2023 | Protección de los recursos hídricos, prohibiciones, permisos y obligaciones al respecto. | **Charla:** Al objetivo de esta charla es busca dar un buen manejo al agua y así ayudar a proteger los recursos hídricos en el proyecto. |
| 08/09/2023 | Manejo de los residuos líquidos o vertimientos, permisos y obligaciones al respecto. | **Charla:** Se realiza charla al Personal con el objetivo de prepararlos para que se maneje con efectividad los residuos líquidos, o vertimientos generados en obra. |
| 09/09/2023 | Manejo integral de residuos sólidos, domésticos y peligrosos | **Socialización:** Con esta socialización se busca lograr un manejo ambientalmente adecuado de los residuos sólidos, domésticos y peligrosos generados en obra. |
| 14/09/2023 | Manejo de materiales sobrantes y materiales de construcción. | **Socialización:** El objetivo de este tema son socializar las medidas a tomar para el manejo y y disposición final de los materiales sobrantes en la contracción. |
| 16/09/2023 | Responsabilidad social en un adecuado manejo ambiental en obra. | **Socialización:** se realiza la socialización con el objetivo de concienciar al personal la responsabilidad que tiene cada uno de ellos con el cuidado y manejo ambiental en obra. |
| 18/09/2023 | Cambios climáticos | **Socialización:** Se tratan temas sobre los cambios de temperatura a los que estamos expuestos. Las causas de estos cambios climáticos y las medidas que debemos tomar para prevenir lesiones por las temperaturas extremas (calor) que se presentando. |

| | | |
|---|---|---|
| 21/09/2023 | Ahorro de recursos hídricos. | **Capacitación:** Sensibilizar al personal Sobre la protección de unos de los recursos naturales más valiosos y a la vez más amenazados del planeta. |
| 23/09/2023 | Respeto mutuo entre compañeros. | **Charla:** Se realiza la charla con el fin concientizar al personal en obra que todos merecen respeto incluyendo las opiniones de los demás sin importar que estemos o no de acuerdo. |



Fotografía No. 3



Fotografía No. 4



Fotografía No. 5



Fotografía No. 6

**INDICADORES DE SEGUIMIENTO**

| Indicador | Medición del Indicador | Periodicidad | Resultado | Análisis |
|---|---|---|---|---|


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Número de profesionales que componen el grupo de gestión ambiental | No. de profesionales contratados / No. profesionales propuestos | Mensual | 5 / 5 | Positivo |



**SOPORTES DE SEGUIMIENTO**


Una de las estrategias para asegurar una correcta implementación del plan de manejo ambiental durante la ejecución del proyecto, es contar con profesionales que conforman el grupo de gestión ambiental, los cuales reportan al director del proyecto las diferentes actividades con el fin de coordinar y alinear el proceso constructivo.



**Anexo 1.**


- Soporte Asistencia a charlas, Socialización y capacitación ambiental realizadas al personal durante el mes de septiembre 2023.
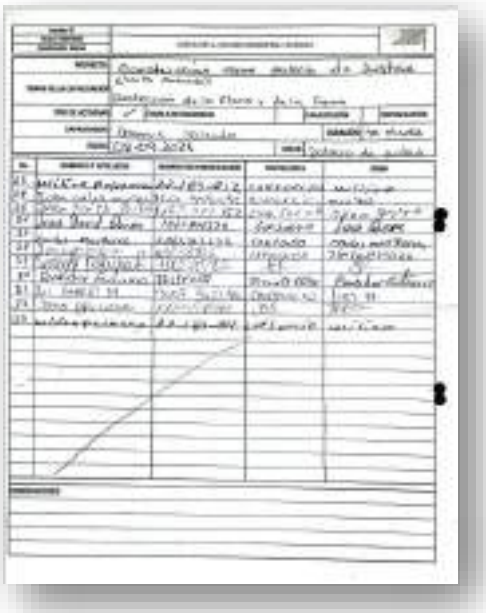
| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No. 7 | Fotografía No. 8 |
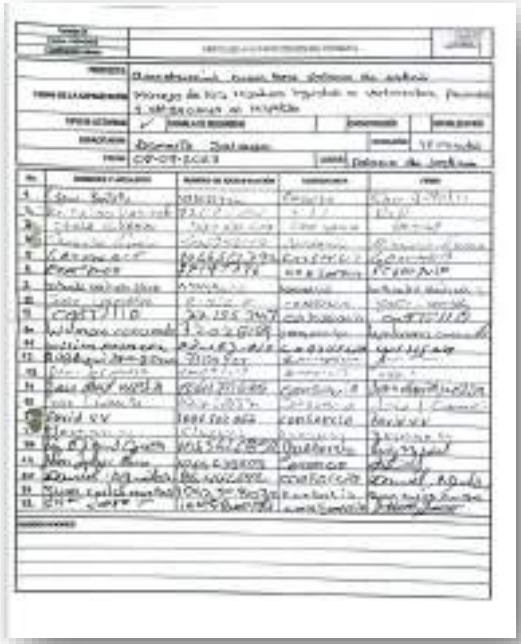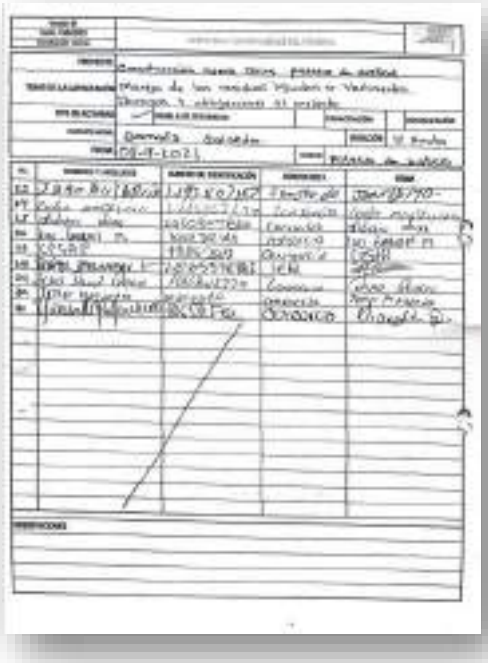
| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No. 9 | Fotografía No. 10 |
|  |  |
| Fotografía No. 11 | Fotografía No. 12 |
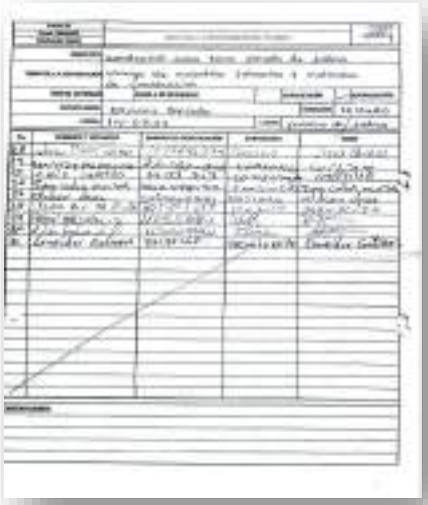
| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No. 13 | Fotografía No. 14 |
|  |  |
| Fotografía No. 15 | Fotografía No. 16 |
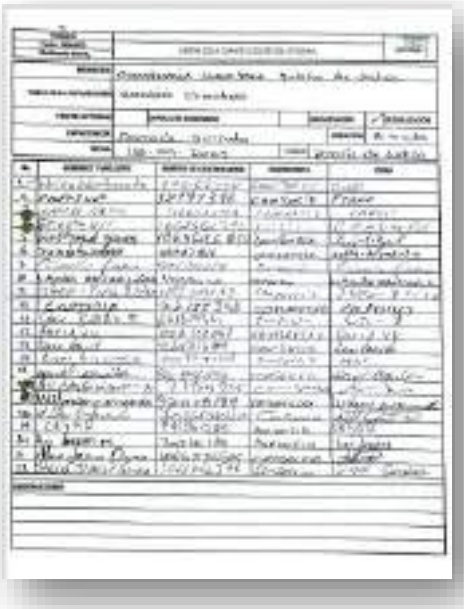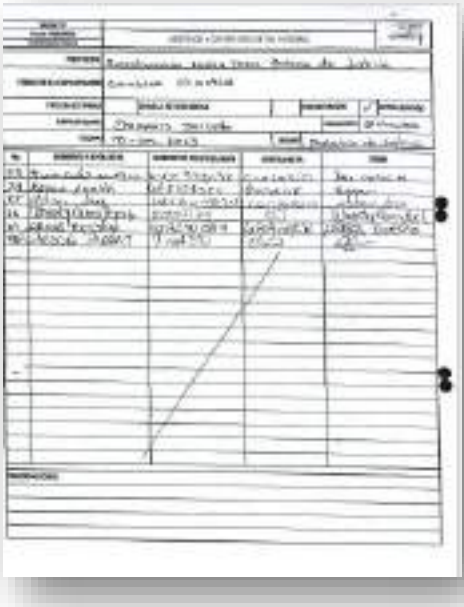
| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No. 17 | Fotografía No. 18 |
|  |  |
| Fotografía No. 19 | Fotografía No. 20 |
| | |

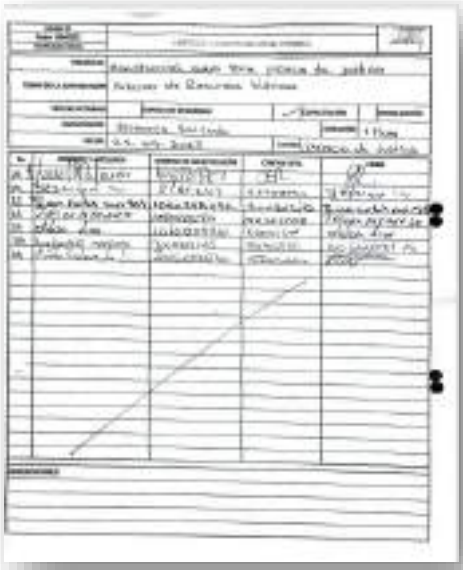

Fotografía No. 21



Fotografía No. 22



Fotografía No. 23

Estas reuniones se desarrollarán mensualmente hasta terminar el contrato.

- **Reuniones y comités de seguimiento**

Se informa en el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2023 la realización de la reunión del grupo ambiental (anexo acta) del proyecto en donde se reitera al equipo el PGAS, al igual que los comités internos del proyecto para implementar y monitorear las diferentes actividades ambientales.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No. 24 Acta de Reunión | Fotografía No. 25 evidencia asistencia reunión |

Por otra parte, se tiene comité con interventoría donde se trataron los siguientes temas ambientales en el periodo comprendido en el informe: Ampliación de la resolución 0017 del 28 de febrero del 2023, solicitud relación de proveedores gestores de residuos peligrosos, residuos aprovechables, sitio asignado por Corpocesar para la siembra de árboles. Radicado informe Forestal, radicación informe trimestral de acuerdo a la resolución 1257 de 2021 Anexo 5.

| FECHA | CONSECUTIVO | ASUNTO | ENVIADA/RECIBIDA | DESTINATARIO |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2023 | 381 | Radicado informe forestal | enviado | Corpocesar |
| 12/09/2023 | | Recibido con radicado numero 08984 | recibido | Corpocesar |
| 15/09/2023 | 388 | Reiteración radicación PGAS | enviado | Corpocesar |
| 18/09/2023 | | Recibido con radicado número 09261. | recibido | Corpocesar |
| 18/09/2023 | 400 | Respuesta petición radicados Nos. 07908, 07010. | enviado | Corpocesar |
| 18/09/2023 | | Recibido con radicado número 09592. | recibido | Corpocesar |
| 18/09/2023 | 403 | Radicación informe trimestral | enviado | Corpocesar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | | Recibido con radicado número 09739. | recibido | Corpocesar |

- **Anexos:**

**Oficios enviados y recibidos sobre temas ambientales**



Fotografía No. 26 Radicación informe Forestal



Fotografía No. 27 Radicación informe Forestal.



Fotografía No. 28 Reiteración radicación PGAS



Fotografía No. 29. Respuesta petición radicados Nos. 07908, 07010.



Fotografía No.30. Respuesta petición radicados Nos. 07908, 07010.



Fotografía No.31. Radicación informe trimestral.

**FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar).** | **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** | **CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022** |

| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **IDENTIFICACION** |
|---|---|---|
| Gestión Ambiental del proyecto | 2. Tramite y cumplimiento de requisitos legales | 1.2.-GAP |

| **OBJETIVOS DEL PROYECTO** | |
|---|---|
| Garantizar el cumplimento de las obligaciones del Consorcio de identificar, tramitar y/u obtener todos los permisos de acuerdo con la legislación colombiana y el cumplimiento de las normas locales de la ciudad de Valledupar | Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y con las obligaciones contractuales entre la Nación |
| Cumplir con los requisitos adquiridos derivados de los permisos que se deban generar para la ejecución del | Revisar el estado, alcance y condiciones específicas de todos los permisos y licencias que debe tener el |

| | |
|---|---|
| proyecto | proyecto. |
| **IMPACTOS POTENCIALES** | |
| Alteración de las actividades cotidianas | Contaminación del suelo |
| Quejas y reclamos de la comunidad | Contaminación del aire |
| Vandalismo | Contaminación del agua |

| **TIPO DE MEDIDA** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Control** | **X** | **Prevención** | **X** | **Mitigación** | **X** | **Compensación** | |

**MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS**

Del proyecto del Consorcio Obras Judiciales seguimos identificando todos los requisitos legales y permisos a tramitar, cambios y novedades normativas.

Los permisos identificados son los siguientes:

- **Seguimiento de la licencia o permisos**

| TIPO DE PERMISO | ENTIDAD | ACTO ADMINISTRATIVO | PLAZO |
|---|---|---|---|
| Tala de arboles | Corpocesar | Resolución No. 0017 del 28 de febrero del 2023 | Seis (6) meses |
| Radicación del PG-RCD | Corpocesar | Fecha de radiado 02/03/2023 | Duración del proyecto |
| solicitud vertimientos de Aguas Residuales | Corpocesar | Abril 27 del 2023 | Duración del proyecto |

- **Permisos ambientales de proveedores**

**Agregados**

| TIPO DE MATERIAL | VOLUMEN $m^3$ | FUENTE | TITULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL | CESIÓN DE DERECHOS | RUCOM |
|---|---|---|---|---|---|
| Arena | 24 $m^3$ | Pavimentos el dorado S.A.S | Resolución 0282 del 06/10/2020 | N° 0167-2-20 | RUCOM-2022080122230 |
| Gravilla | 24 $m^3$ | Pavimentos el dorado S.A.S | Resolución 0282 del 06/10/2020 | N° 0167-2-20 | RUCOM-2022080122230 |

| RELACIÓN INGRESO MATERIALES PETREOS A OBRA. | | |
|---|---|---|
| **MES** | **CANTIDAD GRAVA 3/4** | **CANTIDAD ARENA** |
| ENERO | 0 | 0 |
| FEBRERO | 0 | 0 |
| MARZO | 0 | 0 |
| ABRIL | 16 | 16 |
| MAYO | 32 | 32 |
| JUNIO | 56 | 40 |
| JULIO | 48 | 40 |
| AGOSTO | 48 | 40 |
| SEPTIEMBRE | 24 | 24 |
| **TOTAL** | **224** | **192** |

**Concretos**

| TIPO DE MATERIAL | VOLUMEN m3 | FUENTE | TITULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL | CERTIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL CON LOS DATOS DEL PROYECTO |
|---|---|---|---|---|
| Concretos plástico asent.6"+/-1" 3000 psi 3/4" | 640 | Argos | Se ha desarrollado la construcción de los caissón en concreto de 3000 psi.<br><br>Se realiza fundida de zapata en concreto 5000 psi. | |
| concretos plástico asent.6"+/-1" 4000 psi 3/4 | 5500 | Argos | | |
| concretos plástico asent.6"+/-1" 5000 psi 3/4" | 1540 | Argos | | |
| concretos plástico asent.6"+/-1" 6000 psi 1" | 640 | Argos | | |

**Disposición de RCD pétreos y no pétreos**

| TIPO DE RDC | VOLUMEN PROYECTADO m³ | SITIO DE DISPOSICIÓN | PERMISO AMBIENTAL |
|---|---|---|---|
| RCD | 1.144 m³ | AGREGADOS DEL CESAR. | Auto 432-09-10-2019 RCD |
| Excavación de material común | 0 | | |
| Excavación en roca | 915,2 m³ | | |
| RESPEL | 4 kl. | A la fecha se tienen acopiados en obra a espera de | |

| | | |
|---|---|---|
| | | documentación de funcionamiento de empresa gestora de residuos peligrosos. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No.32. Retiro RCD de obra | Fotografía No.33. Retiro RCD de obra |
|  |  |
| Fotografía No.34. Retiro RCD de obra | Fotografía No.35. Retiro RCD de obra |

| RCD GENERADOS POR MES | |
|---|---|
| **MES** | **CANTIDAD** |
| ENERO | 0 |
| FEBRERO | 0 |
| MARZO | 0 |
| ABRIL | 0 |
| MAYO | 0 |

| | |
|---|---|
| JUNIO | 3005,76 |
| JULIO | 2755,3 |
| AGOSTO | 108,28 |
| SEPTIEMBRE | 1144 |
| **TOTAL** | **7181,34** |

Para los materiales de construcción y sitios de disposición de escombros el Consorcio Obras Judiciales adjuntará en cada informe la certificación del titular del permiso o licencia, manifestando la prestación del servicio o venta de materiales, en donde se indica el objeto del contrato.

En el periodo de este informe no se evidencian hallazgos arqueológicos.

**INDICADORES DE SEGUIMIENTO**

| Indicador | Medición del Indicador | Periodicidad | Resultado | Análisis |
|---|---|---|---|---|
| Obligaciones y requerimientos de las autoridades ambientales | No. de requerimientos de autoridades | Anual | 2 | 50 % (Compra y Siembra de árboles) |
| Permisos, autorizaciones o concesiones | No. Permisos otorgados por la autoridad / No. Permisos identificados en el proyecto | Mensual | 1 | 100% |

**SOPORTES DE SEGUIMIENTO**

Licencias ambientales de las canteras y demás proveedores - resolución de tala (hacer listado y en una sola carpeta)

**FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).** | **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** | **CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022** |

| PROGRAMA | PROYECTO | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| Gestión Ambiental del Proyecto | Capacitación Ambiental y Social | 1.3 - GAP |

**OBJETIVOS DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto, en lo relacionado con los temas de carácter ambiental, social y técnico de la obra | Garantizar el desarrollo de la obra cumpliendo con las medidas de manejo y protección del medio ambiente, aplicando las medidas de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de los habitantes del sector y del personal |

| | |
|---|---|
| | vinculado a las obras. |
| Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y con las obligaciones contractuales entre la Nación | |
| **IMPACTOS POTENCIALES** | |
| Alteración de las actividades cotidianas | Quejas y reclamos de la comunidad |
| Vandalismo | |
| | |

| **TIPO DE MEDIDA** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Control** | **x** | **Prevención** | **x** | **Mitigación** | **x** | **Compensación** | |

**MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS**

El Consorcio Obras Judiciales establece en el anexo 2, el cronograma de charlas, Socialización y capacitación ambiental y social.

| Tema de capacitación | Fecha |
|---|---|
| Protección de la flora y de la fauna. | 02/09/2023 |
| Protección de los recursos hídricos, prohibiciones, permisos y obligaciones al respecto. | 05/09/2023 |
| Manejo de los residuos líquidos o vertimientos, permisos y obligaciones al respecto. | 08/09/2023 |
| Manejo integral de residuos sólidos, domésticos y peligrosos | 09/09/2023 |
| Manejo de materiales sobrantes y materiales de construcción. | 14/09/2023 |
| Responsabilidad social en un adecuado manejo ambiental en obra. | 16/09/2023 |
| Cambios climáticos | 18/09/2023 |
| Ahorro de recursos hídricos. | 21/09/2023 |
| Respeto mutuo entre compañeros. | 23/09/2023 |

Para el cumplimiento de esta ficha ambiental todas las capacitaciones son de carácter obligatorio para los colaboradores del proyecto y el director de obra garantiza y autoriza la ejecución de las mismas.

| Versión: 02 | INFORME | |
|---|---|---|
| Fecha: 25/05/2022 | INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO PGAS | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES NIT. 901.665.448-8 |
| Clasificación: Interno | | |

| INDICADORES DE SEGUIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Medición del Indicador | Periodicidad | Resultado | Análisis |
| Capacitaciones cumplidas | No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas | Mensual | 09 / 09 | 100% |
| Personal Capacitado | No. Personal Capacitado / No. de personal laborando | Mensual | 38 | 100% |
| | | | | |
| **SOPORTES DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| Durante el mes de septiembre se realizaron 3 charlas Ambientales 1 charla social 1 capacitación, 4 socialización al personal en obra con el fin de retroalimentar temas ambientales y social. | | | | |

**FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).** | **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** | **CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022** |

| PROGRAMA | PROYECTO | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| Componente Abiótico | Manejo Integral de materiales de construcción, Mobiliario y Equipos | 2.1 -MCA |

| OBJETIVOS DEL PROYECTO | |
|---|---|
| Establecer las medidas de control, prevención y mitigación de impactos que puedan generar el manejo integral de los materiales de construcción en obra. | Implementar medidas para el manejo de los materiales de construcción, para prevenir y/o mitigar los impactos que se pueden generar por manejos inadecuados de los materiales de construcción y los equipos vinculados. |
| Cumplir con la Legislación Colombiana actual vigente | |

| IMPACTOS POTENCIALES | |
|---|---|
| Contaminación del aire (emisiones de material particulado e incremento en los niveles sonoros) | Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.) |
| Contaminación del suelo | Alteración calidad visual |
| Riesgo de Accidentalidad | Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores. |

| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Control** | **X** | **Prevención** | **X** | **Mitigación** | **X** | **Compensación** | |
| **MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS** | | | | | | | |

**Agregados Pétreos (arenas y triturados frente de obra):**

- el Consorcio Obras Judiciales, está realizando la compra de materiales pétreos solo en canteras que cuentan con permisos ambientales, licencias ambientales y mineros, teniendo especial cuidado en que estén vigentes los permisos y que no se encuentren vencidos, cancelados o suspendidos.

En este periodo ingresaron las siguientes volquetas al proyecto:

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No 36. Suministro de gravilla | Fotografía No 37 Suministro de arena |

En el frente de obra se tienen los siguientes materiales pétreos: Se cuenta con material en obra.

| TIPO DE MATERIAL | VOLUMEN | FUENTE | TITULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL | CERTIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL CON LOS DATOS DEL PROYECTO |
|---|---|---|---|---|
| Arena | 24 M3 | Cantera | Resolución 0282 del 06/10/2020 | SI |
| Gravilla | 24 M3 | Cantera | Resolución 0282 del 06/10/2020 | SI |

| RELACIÓN INGRESO MATERIALES PETREOS A OBRA. | | |
|---|---|---|
| **MES** | **CANTIDAD GRAVA 3/4** | **CANTIDAD ARENA** |
| ENERO | 0 | 0 |
| FEBRERO | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| MARZO | 0 | 0 |
| ABRIL | 16 | 16 |
| MAYO | 32 | 32 |
| JUNIO | 56 | 40 |
| JULIO | 48 | 40 |
| AGOSTO | 48 | 40 |
| SEPTIEMBRE | 24 | 24 |
| **TOTAL** | **224** | **192** |

Anexo No. 01. Resolución Licencia Ambiental

- En caso de lluvias, disturbios o por exigencias legales, el material de construcción que se encuentre en la obra que no se utilice, se acordonará (como mínimo con señalizadores tubulares y cinta de señalización) y protegerá de la acción de las precipitaciones o el viento cubriéndolos con lonas o plástico, delimitándolos con barreras de contención como ladrillos y alejados de los drenajes superficiales de agua, o sumideros.

- En cada frente de obra y según el programa de inspecciones planeadas, se realizarán inspecciones a los acopios temporales de materiales de construcción, identificando condiciones de señalización y cubrimiento del material.

| TIPO DE MATER | FECHA |
|---|---|
| Arena | A la fecha no se tiene material acopiado en obra. |
| Gravilla | A la fecha no se tiene material acopiado en obra. |

| INDICADORES DE SEGUIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Medición del Indicador | Periodicidad | Resultado | Análisis |
| Fuentes de materiales con permisos vigentes | No. Fuentes con permisos vigentes / No. Fuentes de materiales presentadas | Mensual | 1/1 | Cumplido 100 % |
| Volumen de material en obra (por cada tipo de materiales) | Volumen certificado por fuentes autorizadas / Volumen de materiales ingresado a la obra | Mensual | 100 / 100 | Cumplido 100 % |
| **SOPORTES DE SEGUIMIENTO** | | | | |

**Agregados Pétreos (arenas y triturados frente de obra)**

- Arena
- Gravilla ¾”




Fotografía No. 38. Certificado cantidad de material pétreos ingresados a obra – septiembre 23

**Concretos**

- Se ha realizado concretos en obra de 3000 psi para la construcción de anillos para caissón



| |
|---|
| Fotografía No. 39 para el mes de septiembre ingresaron a obra 100 bolsas de cemento marca Argos. |
| **Prefabricados**<br>• Certificados de calidad. |

**FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).** | **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** | **CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022** |

| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **IDENTIFICACION** |
|---|---|---|
| Componente Abiótico | Manejo del Recurso Hídrico | 2.2 -MCA |

| **OBJETIVOS DEL PROYECTO** |
|---|
| Establecer la demanda del recurso hídrico en el proyecto REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR), y determinar las medidas de manejo de acuerdo con la normatividad vigente, estableciendo controles de protección y prevención de impactos. |
| Prevenir, minimizar y controlar los impactos en el recurso hídrico con el fin de llevar a cabo acciones de seguimiento y control para prevenir posibles modificaciones a las características fisicoquímicas e hidrobiológicas de los cuerpos de agua en la zona de influencia del proyecto, por actividades derivadas de la ejecución del contrato. |
| Implementar las acciones para realizar el manejo adecuado de las aguas de escorrentía, los residuos líquidos y sólidos para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua existentes en el área de influencia del proyecto. |
| Minimizar los impactos que se puedan generar a partir de la construcción del proyecto. |

| **IMPACTOS POTENCIALES** | |
|---|---|
| Contaminación por escorrentía superficial | Contaminación del suelo |
| Incremento en la demanda de bienes o servicios | Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores. |

| **TIPO DE MEDIDA** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Control** | | **Prevención** | **X** | **Mitigación** | **X** | **Compensación** | |

| **MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS** |
|---|
| El Consorcio ha identificado que el agua que se utiliza en el proyecto se hará a través de un contador independiente del Palacio de Justicia de Valledupar para el desarrollo del proyecto, que el agua será con acometida la cual se ha solicitado directamente por el proyecto a EMDUPAR con solicitud número: CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-006 y se hará el pago de servicio de manera independiente del Palacio de Justicia.<br><br>Para el mes de septiembre Emdupar hace la entrega de la factura de consumo del agua gastada en obra. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No 40. Consumo de agua a la fecha 30/09/2023 | Fotografía No 41 Pago Factura Consumo de agua a la fecha 30/09/2023 |

**Uso eficiente del recurso agua**

- No se tienen cuerpos de agua cerca al proyecto, los sumideros aledaños al proyecto serán protegido con poli sombra con el fin de evitar el arrastre de material o sedimentos que puedan llegar a obstruir o contaminar los cuerpos de agua.
- No se presenta ni desviación ni canalización de cauces de ríos o cuerpos de agua cercanos al proyecto.
- Se puede reutilizar las aguas lluvias para su reutilización como aguas grises (uso y arrastre en aparatos sanitarios y para riego).

**INDICADORES DE SEGUIMIENTO**

| Indicador | Medición del Indicador | Periodicidad | Resultado | Análisis |
|---|---|---|---|---|
| Control de la calidad del agua | No. parámetros que cumplen norma de referencia / No. parámetros medidos de calidad del agua | No aplica para el proyecto | 0 / 0 | 100% |
| Obras para el control de sedimentos | No. obras de control de sedimentos construidas / No. obras de control de sedimentos planeadas | Mensual | 0 / 0 | No hay fracturado para controlar 100% |
| Consumo de agua en obra | Vol. Agua certificada para consumo en obra / Vol. Agua consumida durante el en obra | Mensual | 000020 | Se evidencia en la factura emitida por Endupar. 100% |

**SOPORTES DE SEGUIMIENTO**

El soporte de seguimiento de esta ficha se realizará a través de:

- Cumplimiento de indicadores formato de la entidad.
- Registro fotográfico.
- F-EVSG-19 Control Consumo Agua formato de la entidad.



Fotografía No 42. Consumo de agua en obra a la fecha. 30//09/2023

**FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).** | **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** | **CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022** |

| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **IDENTIFICACION** |
|---|---|---|
| Componente Abiótico | Control de la excavación y demoliciones | 2.3 -MCA |

| **OBJETIVOS DEL PROYECTO** | |
|---|---|
| Realizar el control de las demoliciones y excavaciones, cumpliendo con la normatividad legal vigente ambiental, Implementando las medidas de control y mitigación en la ejecución de las actividades de obra, transporte y disposición o su reutilización | Efectuar un manejo adecuado de los materiales resultantes de las excavaciones, como de los materiales que se utilizarán en la conformación de rellenos, bases con el objetivo de prevenir los impactos. |
| Disminuir el riesgo de afectación a redes de servicios públicos enterradas.<br><br>Cumplir con la normatividad legal vigente. | Utilización de todo el material de descapote obtenido en las excavaciones, en la conformación de zonas verdes de la obra o para la recuperación de otras zonas ubicadas dentro de la zona de influencia del proyecto |
| Prevenir accidentes que se pueden presentar con el personal de la obra, peatones y vehículos. | Disponer todo el material sobrante de excavación generado, en el sitio autorizado para tal fin |

| IMPACTOS POTENCIALES | |
|---|---|
| Contaminación del aire (emisiones de material particulado e incremento en los niveles sonoros) | Generación y aporte de sólidos por escorrentía en redes de alcantarillado |
| Alteración de la calidad visual | Afectación de la cotidianidad |
| Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.). | Riesgo de Accidentalidad |

| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Control** | **X** | **Prevención** | **X** | **Mitigación** | **X** | **Compensación** | |

**MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS**

En el proyecto no se podrá hacer limpieza manual de la vegetación de la zona de obra ya que en la actualidad se tiene una placa de concreto lo cual impide tener suelo orgánico en caso de que se encuentre solo se extrae el suelo orgánico con un espesor de 0,1 metros a 0,5 metros, según las especificaciones y la interventoría del proyecto se indicará la cantidad de material a utilizar con los equipos apropiados, en donde se pueda prevenir daños a las estructuras aledañas.

El área a excavar no presenta potencial arqueológico, pero en el momento que se presente se tomaran las medidas establecidas en la ficha Protección del patrimonio arqueológico y cultural, la cual será incluida en el presente documento.

**Excavaciones**

A la fecha se han realizado actividades de excavación

| Actividad | Cantidad m³ |
|---|---|
| Excavación | 1.144 m³ |
| Demolición | 0 |
| Excavación en roca | 915,2 |

- Una vez se tengan identificadas las estructuras que deben ser demolidas, los residuos resultantes y que no puedan ser reutilizados serán dispuestos en los siguientes sitios de disposición:

| EXPEDIENTE | SITIO DE DISPOSICIÓN | ACTIVIDAD QUE REALIZA | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|
| Auto No. 432 | Agregados del Cesar E. U | Gestor de RCD de puntos limpios y plantas de aprovechamiento y sitios de disposición final | Sede Operaria: Km 3 Vía a La Mesa – Valledupar – Cesar |

El auto No. 432 del 10 de octubre del 2019 Corpocesar emitió el respectivo permiso de este gestor

**Transporte**

En este periodo ingresaron las siguientes volquetas al proyecto:

Anexo: 2 Soporte Soat, Licencia de conducir, Tecno mecánica.

| PLACA VOLQUETA | SOAT | LICENCIA DE CONDUCIR | TECNOMECANICA VIGENTE |
|---|---|---|---|
| PKB 173 | X | X | X |
| UZA 362 | X | X | X |
| FDJ 465 | X | X | X |

**INDICADORES DE SEGUIMIENTO**

| Indicador | Medición del Indicador | Periodicidad | Resultado | Análisis |
|---|---|---|---|---|
| Sitios de disposición de escombros y excavaciones | No. Sitios de disposición autorizados / No. Sitios de disposición de escombros necesarios | Mensual | 1/1 | Agregados del Cesar E. U 100% |
| Material dispuesto en sitio de disposición autorizado | Volumen de materiales dispuestos en sitio autorizados / Volumen de material para disposición final | Mensual | 1.144 m³ / 1.144 m³ | Agregados del Cesar E. U 100% |
| Material reutilizable | Volumen reutilizado en obra o por terceros / Volumen de material reutilizable. | Mensual | 0 | N/A |
| Reutilización de descapote | Volumen descapote reutilizado en el proyecto/ Volumen descapote obtenido y almacenado | Mensual | 0 | N/A |

**SOPORTES DE SEGUIMIENTO**



Fotografía No 43. Certificado Recepción material RCD

**Excavaciones**

- Registro Fotográfico

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía. No. 44 excavación y fundida de solado, zarpa e instalación de filtro, Geodren, Tecdren. | Fotografía No.45 excavación y fundida de solado, zarpa e instalación de filtro, Geodren, Tecdren. |

**Transporte**

- Registro Fotográfico

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No 46. Transporte de arena de Rio. | Fotografía No 47. Transporte de gravilla |

| Versión: 02 | INFORME | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES NIT. 901.665.448-8 |
|---|---|---|
| Fecha: 25/05/2022 | INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO PGAS | |
| Clasificación: Interno | | |

| | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR). | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 |
|---|---|---|---|

| PROGRAMA | PROYECTO | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| Componente Abiótico | Residuos sólidos generados | 2.4 -MCA |

**OBJETIVOS DEL PROYECTO**

| |
|---|
| Aplicar por parte del Consorcio Obras Judiciales las políticas ambientales en cuanto a la disminución en la generación de residuos sólidos. |
| El Consorcio Obras Judiciales cumple para la ejecución del proyecto las condiciones legales desde la clasificación, almacenamiento, presentación y disposición final de los residuos sólidos con el gestor autorizado. |
| Implementar medidas para el manejo de los residuos sólidos, para prevenir y/o mitigar los impactos que se pueden generar por manejos inadecuados de este tipo de residuos. |
| Cumplir con la Legislación Colombiana actual vigente. |

**IMPACTOS POTENCIALES**

| | |
|---|---|
| Contaminación del suelo | Alteración calidad visual |
| Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores. | Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.) |

**TIPO DE MEDIDA**

| Control | X | Prevención | X | Mitigación | X | Compensación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS**

El Consorcio Obras Judiciales este encargado de gestionar los residuos en la obra, de acuerdo con las normas ambientales en Colombia.

En el proyecto se establece un sitio, el cual tenga sea de fácil acceso, el cual tiene como objeto al destinado al almacenamiento de RCD's, esta zona debe tener la señalización de acuerdo al tipo de residuo que se dispone, y debe estar el residuo confinado y el suelo debe contar con recubrimiento en polietileno de alta densidad, La estructura no debe encontrarse cerca de cuerpos de agua artificiales o naturales, los sumideros del área de influencia del proyecto deben estar cubiertos y realizarse manteniendo frecuente.

| TIPO DE RESIDUO | CANTIDAD | SITIO DE DISPOSICIÓN |
|---|---|---|
| Material vegetal y suelo orgánico | 0 | N/A |
| Chatarra y llantas. | 0 | N/A |
| Empaques, envases y embalajes. | 0 | N/A |
| Papel blanco oficinas. | 15 | Se están reutilizando en oficina. |
| Residuos especiales y/o peligrosos | 4 kilos | Punto de acopio |
| Residuos Orgánicos. | 15 | Vehículo recolector en áreas de influencias del proyecto. |
| Basura | | Vehículo recolector en áreas de influencias |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 | del proyecto. | |

**Ubicación de recipientes de recolección de residuos sólidos / Residuos no aprovechables**

Ubicar de manera estratégica y visible, recipientes adecuados para la separación en la fuente de los residuos.
***Residuos orgánicos:*** serán entregados a las empresas dedicadas al aprovechamiento de este tipo de residuos que se encuentran en el área de influencia del proyecto o a personas que puedan hacer aprovechamiento de estos residuos en actividades agropecuarias.
***Residuos no aprovechables – basuras:*** estos residuos serán almacenados hasta su recolección por las empresas prestadoras de este servicio para su disposición en el relleno sanitario que se encuentre debidamente autorizados para realzar este manejo.

**Caneca color verde:** Se deposita residuos orgánicos aprovechables
**Caneca color blanco**: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel, cartón.
**Caneca color negro:** Para depositar residuos no aprovechables.

Lo anteriormente mencionado es tomado de la resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019, por la cual se modifica la resolución 668 del 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.

**Separación de residuos solidos**

En los campamentos, instalaciones temporales y áreas de trabajo se realizará la separación de residuos en contendores debidamente marcados según tipo de residuo.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No 48. Punto ecológico ubicación ingreso a obra. | Fotografía No 49. Punto ecológico obra área de caissón. |

**Vertimiento de aguas producto de la excavación en obra**

Debido a que el proceso constructivo del proyecto presenta un nivel freático alto, es necesario instalar sedimentadores para reducir la turbulencia, velocidad y decantar las aguas productos de las excavaciones por la

cimentación del proyecto, la baja velocidad del flujo de agua permite que las partículas sedimentables se hundan, mientras los componentes que pesan menos que agua floten hacia la superficie, lo que permite el vertimiento de estos residuos líquidos que no son contaminados ya que no tendrán ningún tipo de sustancia química serán reutilizada para humectación, lavado de baños y lavado de llantas (en caso de requerirse) reincorporando en el proceso constructivo este tipo de residuo.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No 50. Medición nivel freático | Fotografía No 51. Medición nivel freático |

**INDICADORES DE SEGUIMIENTO**

| Indicador | Medición del Indicador | Periodicidad | Resultado | Análisis |
|---|---|---|---|---|
| Residuos sólidos convencionales dispuestos en relleno sanitario | RSI dispuesto en relleno sanitario / RSI generados en la obra | Mensual | 0/0 | No se generó residuos sólidos en obra. 100% |
| Residuos sólidos reutilizados por gestores construidos | RSR +RSO reutilizados por gestores autorizados / RSR + RSO generados en obra | Mensual | 0/0 | No se generan residuos sólidos para ser reutilizados por gestores. 100% |
| Residuos peligrosos manejados por operador autorizado | RSP entregados a gestor autorizado /RSP generados en obra | Mensual | 5 kilos | El único RSP generado en obra son Bolsa de cemento se encuentran almacenadas en punto de acopio en espera de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | aprobación del gestor a quien va hacer entregado |

**SOPORTES DE SEGUIMIENTO**

**Construcción centro de recolección residuos solidos**

- Centro de acopio debidamente señalizado.



Fotografía No. 52. Acopio de Residuos



Fotografía No. 53. Acopio de Residuos

| | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR). | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 |
|---|---|---|---|

| PROGRAMA | PROYECTO | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| Componente Abiótico | Residuos líquidos y sustancias peligrosas | 2.5 -MCA |

**OBJETIVOS DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| El objetivo de esta ficha ambiental es definir las soluciones y herramientas técnicas para el adecuado manejo, control y aplicación de las contingencias, para el manejo de los residuos líquidos y sustancias peligrosas del proyecto. | Implementar las acciones para realizar el manejo adecuado de las aguas de escorrentía, los residuos líquidos y sustancias peligrosas para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua existentes en el área de influencia del proyecto. |
| Minimizar los impactos que se puedan generar a partir de la construcción del proyecto | |

**IMPACTOS POTENCIALES**

| | |
|---|---|
| Contaminación del agua | Contaminación del suelo |

| | |
|---|---|
| Contaminación del aire | Alteración calidad visual |
| Generación de residuos peligrosos producto de filtros y residuos de grasas y aceites | Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores. |

| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Control** | **X** | **Prevención** | **X** | **Mitigación** | **X** | **Compensación** | |

**MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS**

**Manejo de Aguas residuales domesticas**

- La obra tiene cobertura del sistema de alcantarillado, se dispondrá en la obra de baños fijos para los trabajadores los cuales se establece uno para mujeres y tres para hombres, en caso de contingencias, se dispondrán baños portátiles, los cuales contarán con el certificado de manejo adecuado y disposición final de los residuos sólidos y líquidos.

- Los baños cuentan con sanitario y lavamanos, en relación de una unidad sanitaria por cada quince trabajadores, separados por sexo y dotados con jabón desinfectante, papel higiénico, toallas y recipientes para basura.



Fotografía No. 54. Baños



Fotografía No 55. Lavamanos

**Residuos Líquidos Industriales**

- En el proyecto no se tiene permitido lavar vehículos o maquinaria de obra.
- En el proyecto no se establece la necesidad de tener un contenedor de residuos para este tipo de residuos líquidos industriales, en el caso que por las actividades generadas se requiera y este, se colmate se realiza su limpieza y mantenimiento respectivo.
- No se hará, por ningún motivo, disposición de residuos en los cuerpos de agua superficiales ni en la vía pública, con lo cual se asegura que no se verán afectados como consecuencia de las actividades constructivas.

**Residuos de aceite y/o combustibles**

En el proyecto no se ha implementado esta actividad debido a que esta actividad no se realiza en obra.

**Manejo de Sustancias Peligrosas**

- Si se presentan derrames accidentales de aceites, aditivos de concreto, solventes, pinturas no acrílicas, agua-cemento, lubricantes u otras sustancias peligrosas, se debe realizar el procedimiento estipulado en el plan de contingencias y emergencias ambientales y utilizar el kit de derrames del proyecto.

- El almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas, debe ser conforme a las indicaciones de la hoja de seguridad del producto y tener a todo el personal entrenado en su manejo en caso de algún incidente.

- En el lugar de almacenamiento se tiene en cuenta la señalización del sitio.

- Para un apropiado almacenamiento, el Consorcio tiene en cuenta:

a. El volumen máximo de almacenamiento.
b. Volumen máximo de almacenamiento por clase.
c. Secciones de almacenamiento donde están localizadas las distintas clases de sustancias.
d. Cantidad almacenada según sustancias y clases de sustancias.
e. Se tendrá un registro de recepción, despacho e inspección.
f. No se deben mezclar sustancias peligrosas que sean incompatibles para esto se publica la matriz de sustancias químicas.
g. El acopio de recipientes de sustancias combustibles, tóxicas u oxidantes no podrá ser superior a la recomendada según el tipo de recipientes.
h. En el proyecto se implementa un Plan de Contingencias y Emergencias Ambientales por derrame de sustancias peligrosas, socializado a todo el personal que haga parte del proyecto. Este plan se entregará junto con el PGAS
i. En el periodo de realización de este informe no se presentaron derrames o emergencias ambientales
En el proyecto se dispondrá un cuarto de sustancias químicas el cual estará en zona dura y cuenta con un dique de confinamiento en caso de derrames y tendrá una capacidad calculada en 110% del volumen almacenado.

**INDICADORES DE SEGUIMIENTO**

| Indicador | Medición del Indicador | Periodicidad | Resultado | Análisis |
|---|---|---|---|---|
| Permiso de vertimientos | No. permisos de vertimientos obtenidos / No. permisos de vertimientos identificados | Mensual | 0 / 0 | No se tienen baños portátiles en obra 100% |
| Disposición de residuos líquidos | Volumen de residuos líquidos entregados a un gestor autorizado / | Mensual | 0 / 0 | No se generan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Volumen de residuos líquidos generados | | | residuos líquidos. 100% |
| Manejo de sustancias peligrosas | Volumen sustancias químicas almacenadas correctamente / Volumen sustancias químicas almacenadas. | Mensual | 100 /100 (ingresa cemento a obra) | Al ingresar a obra se acopian en el almacén. 100% |
| Atenciones incidentes y accidentes ambientales | No. de emergencias atendidas correctamente / No. de emergencias con sustancias peligrosas | Mensual | 0/0 | No se presentan emergencia con sustancias peligrosas 100% |
| **SOPORTES DE SEGUIMIENTO** | | | | |
| **Residuos líquidos** | | | | |

**FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).** | **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** | **CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022** |

| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **IDENTIFICACION** |
|---|---|---|
| Componente Abiótico | Instalación, Funcionamiento y retiro de campamentos | 2.6 -MCA |

| **OBJETIVOS DEL PROYECTO** | |
|---|---|
| Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento en caso de ser necesario construirlo. | Implementar medidas para el manejo de los materiales de construcción, para prevenir y/o mitigar los impactos que se pueden generar por manejos inadecuados de los materiales de construcción y los equipos vinculados. |
| Restaurar ambientalmente las áreas donde se han llevado a cabo desmantelamientos de instalaciones útiles en el momento de la construcción de obras. | |

| **IMPACTOS POTENCIALES** | |
|---|---|
| Alteración de la calidad paisajística | Alteración de la estabilidad del terreno |
| Alteración de las características del suelo | Alteración de la calidad de agua por arrastre de sedimentos. |

| **TIPO DE MEDIDA** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Control** | **X** | **Prevención** | **X** | **Mitigación** | **X** | **Compensación** | |

## MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

**Instalación**



Fotografía No 56 campamento de obra



Fotografía No 57. Orden y aseo campamento de obra



Fotografía No 58. Dotación campamento de obra

- En el proyecto se cuenta con una franja de aproximadamente cuatro metros, el cual se dispone para campamentos de obra, cuenta con cobertura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

**Funcionamiento del Campamento**

- En el campamento están ubicados los profesionales del pliego de condiciones, el cual están dotado de equipos de cómputo, escritorios y demás insumos necesarios para la ejecución administrativa del proyecto.

- Se tiene asignado un trabajador para orden y aseo de las instalaciones temporales el cual debe cumplir con la establecido en la ficha ambiental 2.5 MCA Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas.
- Se instalará un punto de emergencia que está dotado de extintor, camilla y botiquín.
- La señalización es indispensable, por ende, se cuenta con esta, instalada en todos los sitios de almacenamiento y acopio de material incluyendo las señales informativas y de advertencia de acuerdo con el producto que se tenga.
- Con el propósito de implementar el uso eficiente al agua, se podrán implementar sistemas de recolección de aguas lluvias y recirculación, que pueda emplearse para usos específicos.
- No se instalarán plantas de producción de concreto en obra, el concreto será suministrado por una planta de concretos.

**Desmantelamiento de instalaciones**

- El desmantelamiento de instalaciones se realiza inmediatamente después de terminadas las obras, y así se dará por terminada la obra.
- Este desmantelamiento será de toda la infraestructura que se utilizó para la construcción del proyecto, así como los equipos, la acometida temporal que suministra el agua potable, luz y demás servicios públicos que se utilizaron el a etapa constructivo del proyecto.
- Del área de construcción se retiran todos los escombros y chatarras sobrantes hacia los sitios de disposición final.
- Como parte del cierre ambiental del PGAS, el Consorcio Obras Judiciales entregará una paz y salvo de propietario del predio de las instalaciones temporales, de lo contrario no podrá ser liquidado su contrato.

Esta parte de la ficha se implementa al finalizar el proyecto.

**INDICADORES DE SEGUIMIENTO**

| Indicador | Medición del Indicador | Periodicidad | Resultado | Análisis |
|---|---|---|---|---|
| Medidas de Manejo ambiental en campamentos (se realiza inspección donde se evidencia que se encuentra limpio y ordenado. | Medidas de manejo ambiental aplicadas en el campamento e instalaciones / Medidas de manejo ambiental necesarias | Mensual | N/A | N/A |
| Calidad del aire | No. Quejas atendidas y cerradas de aire o ruido / No. quejas por mala calidad del aire o ruido | Mensual | 100% | No se presentan quejas de la comunidad durante el mes de septiembre. 100 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Calidad del agua | No. Quejas resueltas calidad del agua / No. Quejas por la mala calidad del agua | Mensual | 100 % | No se presentan quejas por la calidad del agua 100% |

**SOPORTES DE SEGUIMIENTO**

Los soportes de seguimiento de esta ficha ambiental se establecen:

- Lista de chequeo de medidas de manejo ambiental en campamentos

**FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).** | **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** | **CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022** |

| PROGRAMA | PROYECTO | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| Componente Abiótico | Manejo de la maquinaria y equipo | 2.6 -MCA |

**OBJETIVOS DEL PROYECTO**

Como objetivo de esta ficha es la prevención de los potenciales impactos negativos que se pueden producir por el uso de maquinaria y equipos en el proyecto.

Establecer los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo para que todos los equipos, vehículos y maquinaria para la ejecución del proyecto, el cual debe permanecer en óptimas condiciones, cumpliendo las normas ambientales y su operación se realice en seguridad y protección del medio ambiente.

**IMPACTOS POTENCIALES**

| | |
|---|---|
| Contaminación del aire (emisiones de material particulado e incremento en los niveles sonoros | Generación de residuos peligrosos producto de filtros y residuos de grasas y aceites |
| Contaminación del suelo | Emisiones de gases de combustión |
| Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores | Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.) |

**TIPO DE MEDIDA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Control** | **X** | **Prevención** | **X** | **Mitigación** | **X** | **Compensación** | |

**MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS**

**Maquinaria y Equipos**

- Para este periodo continua en obras el siguiente equipo.

| EQUIPO O MAQUIRIA | FECHA DE INGRESO |
|---|---|
| TROMPO | 10/06/2023 |

- Anexo a este informe se entrega a la Interventoría los documentos de la maquinaria, equipos y vehículos que estarán al servicio de la obra, en donde se adjuntan:

  a. Registros del último mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos.
  b. Revisión técnico-mecánica (N.A)
  c. Seguridad Social del operador.
  d. Preoperacional.



Foto No 59 Inspección visual 01 al 30 de septiembre de 2023

- En el momento que se requiera programas y ejecutar actividades de obra en horario nocturno, se solicitará el respectivo permiso ante la alcandía si así se requiere.

- Este apartado se entrega en el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo

- El mantenimiento y lavado se realiza en centros especializados y autorizados ambientalmente para tal fin. Y están prohibido este tipo de prácticas en el proyecto.

- En la actualidad se encuentra en el proyecto mezcladoras portátiles, el lavado del trompo de mezcladora de concreto se realiza en un lugar con las medidas de manejo ambiental, que garantizando la protección de los recursos naturales
- El Consorcio no ejecutara mantenimientos preventivos ni correctivos en el proyecto de ninguno de la maquinaria o equipos del proyecto, solo en casos de extrema urgencia y con previa autorización de la interventoría y siguiendo los lineamientos de este documento.
- Para la permanente entrada y salida de vehículos se debe realizar mantenimiento periódico de los sedimentadores presentes en el área de intervención, para evitar su colmatación. El material seco será manejado como material de excavaciones, previo proceso de secado, realizado en lechos de secado por evaporación, tal como se explicó en la ficha ambiental 2.3 MCA CONTROL DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, de este documento.

- Se instalará en la puerta de ingreso un desarenador con su respectiva rejilla para el lavado de llantas de las volquetas, con el objetivo de mantener el espacio público limpio y evitar aumento del material particulado afectando la calidad del aire, aporte de sedimentos al alcantarillado y aumentar el riesgo de accidente en las vías aledañas al proyecto; a la fecha de presentación de este informe aún no se ha instalado este tipo de estructura debido a que no se ha tenido la necesidad de este tipo

- Se restringe la velocidad de acuerdo con el PMT de circulación de los vehículos y maquinaria, dentro y alrededor de la obra. Vale la pena resaltar que este fue aprobado para el mes de mayo.

- El proyecto cuenta con un cerramiento en zinc para evitar cualquier tipo de incidente con la comunidad.
- Los trabajos del proyecto no ocuparán el espacio público, para los cortes de acero o ladrillo se dispondrán de barreras acústicas en icopor. En lo posible se utilizarán martillos de goma y cortadoras con reductores de ruido incorporados; para disminuir la emisión de ruido.

| | |
|---|---|
|   |  |
| Fotografía No 60 Cerramiento de la zona de obra | Fotografía No 61 Cerramiento de la zona de obra |

**MANEJO DEL MATERIAL PARTICULADO**

- El material agregado que se tenga en el proyecto deberá permanecer cubiertos en todo momento con el fin de evitar la fuga de partículas al proyecto.
- Se instala poli sombra para aislar la zona de construcción de la zona del Palacio de Justicia.
- Durante los días más calurosos se hará dispersión o humedecimiento de la zona de trabajo, pero sin formar charcos de agua o humectación excesiva.
- Minimizar el flujo de vehículos dentro y sobre los lugares de acopio del material pétreo.

- Se garantiza el aislamiento del equipo y de los operarios para el uso de cortadoras y pulidoras, con el fin de mitigar el ruido y la generación de material particulado.
- En el momento de barrer zonas de obra se hará humectación del sitio de limpieza para garantizar que el material particulado no este suspendido en el aire.
- Para la cortadora de ladrillo se dispondrá un lugar aislado dentro del proyecto en donde se realiza un cerramiento perimetral, aislado por polisombra e icopor, para minimizar el ruido que genera la operación del equipo.

**INDICADORES DE SEGUIMIENTO**

| Indicador | Medición del Indicador | Periodicidad | Resultado | Análisis |
|---|---|---|---|---|
| vehículos y maquinaria con revisión tecno mecánica | No. Vehículos y maquinaria con revisión tecno mecánica / No. Vehículos y maquinaria en el proyecto | Mensual | 3 / 3 | Todos los documentos al día 100 % |
| Accidentes registrados | No. eventos atendidos correctamente / No. Accidentes ocurridos por manejo de vehículos y maquinaria | Mensual | 0 /0 | No se ha presentado accidente y/o incidentes en obra 100 % |

**SOPORTES DE SEGUIMIENTO**

Los soportes de esta ficha ambiental son:

- Registros del último mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos.
- Seguridad Social del operador
- Revisión Tecno mecánica de vehículos (No aplica)
- Ultimo mantenimiento
- Preoperacionales de maquinaria y equipos

**FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS**

| | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR). | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 |
|---|---|---|---|

| PROGRAMA | PROYECTO | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| Componente Abiótico | Control de la calidad del aire y las emisiones | 2.7 -MCA |

**OBJETIVOS DEL PROYECTO**

Identificar y plantear las medidas que debe realizar el Consorcio Obras Judiciales, con el fin de no alterar la calidad del aire y el ruido ambiental en el entorno donde se desarrolla la obra civil

Mitigar los posibles efectos negativos que se presentan, principalmente sobre el componente atmosférico durante la etapa de construcción y operación del proyecto

| IMPACTOS POTENCIALES | |
|---|---|
| Deterioro de la calidad del aire, por el aumento en las concentraciones de material particulado y gases contaminantes | Deterioro de las zonas verdes y en general del paisaje por acumulación de polvo. |
| Molestias a la comunidad y los trabajadores, por la presencia de polvo, gases y ruido. | |

| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Control** | **X** | **Prevención** | **X** | **Mitigación** | **X** | **Compensación** | |

**MEDIDAS DE MANEJO**

**Calidad del Aire**

- El proyecto tendrá un cerramiento en teja de zinc y si se requiere se protegerá con malla ecológica o polisombra para el control del material particulado.
- El control en la fuente se realiza cubriendo los materiales con plástico negro de construcción para evitar el efecto del viento que dispersa el material fino en el aire.
- Se hace control estricto del PMT del proyecto para evitar posibles accidentes con la comunidad.
- En el proyecto no hay perdida de cobertura en el área de intervención, pero se aplicarán medidas de disminución del material particulado que produce la circulación de maquinaria, vehículos, el personal de obra y la acción del viento.
- Se prohíbe el riego de aceite quemado como medida para este aspecto ambiental y cualquier mantenimiento en la zona del proyecto.
- Se debe cumplir con las medidas de manejo establecidas en la ficha 2.7 MCA MANEJO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS, especialmente en lo relacionado con las emisiones de los vehículos, equipos y maquinaria; además de las establecidas en la legislación colombiana sobre emisiones de ruido, ruido ambiental, emisiones atmosféricas de fuentes móviles y fijas, así como de la calidad del aire.

**MOMENTO DE IMPLEMENTACIÓN EN EL PROYECTO**

Las actividades de esta ficha se están implementando este mes, y así mismo dando cumplimiento al proceso constructivo.

**INDICADORES DE SEGUIMIENTO**

| Indicador | Medición del Indicador | Periodicidad |
|---|---|---|
| N. A | N. A | N. A |

**SOPORTES DE SEGUIMIENTO**

- Revisión tecno mecánica
- Documentos volquetas

**FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).** | **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** | **CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022** |

| PROGRAMA | PROYECTO | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| Componente Biótico | Manejo de la Fauna Silvestre | 3.1-MCB |

**OBJETIVOS DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| Proteger la fauna presente en el área de influencia directa del proyecto. | Capacitar al personal sobre el componente ambiental. |

**IMPACTOS POTENCIALES**

| | |
|---|---|
| Alteración al paisaje. | Minimizar el impacto en la avifauna que pueda estar en el proyecto. |

**TIPO DE MEDIDA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Control** | **X** | **Prevención** | **X** | **Mitigación** | **X** | **Compensación** | |

**MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS**

- Esta ficha ambiental será aplicada en el proyecto en el caso que se detecte fauna en el proyecto o los permisos emitidos por CORPOCESAR lo requieran y se hará de la siguiente manera:
- En el caso de tener fauna en el proyecto se escogerán los lugares de relocalización, contando con el apoyo de las autoridades y entidades ambientales especializadas según las especies, para garantizar su conservación.
- El personal de la obra será capacitado según el cronograma de capacitaciones anexo al PGAS.
- Se informa al personal que está prohibida la caza de cualquier especie de fauna silvestre.
- Cuando se requiera de rescate de fauna, se debe concertar los sitios de captura y de liberación, así como gestionar los permisos para esta actividad.
- Todas las actividades de estudio, rescate y relocalización de la fauna hallada, se cumplirán antes de la intervención a la vegetación del área de influencia directa del proyecto.
- Cuando se encuentren animales heridos o enfermos, deben ser entregados a la autoridad ambiental, elaborar un acta de la entrega, especificando el sitio, la especia, su estado, funcionario y entidad que recibe.
- Se debe llevar un registro fotográfico, georreferenciar todos los procedimientos que se realicen, nombre científico y común de la especie rescatada y liberada.
- En caso de necesitarlo, el Consorcio Obras Judiciales debe llevar un formato de registro de fauna, donde se debe reportar todos los procedimientos realizados. Como mínimo debe contener el nombre científico y común de la especie, sexo, cantidad, ubicación, si está dentro de alguna clasificación de conservación o protección, su estado de salud, el sitio de la liberación y registro fotográfico.

**Rescate de Avifauna**

- En el caso de rescate de nidos con huevos o neonatos se hará a través de un biólogo quien está capacitado para ejercer esta labor.

- Se tendrá especial cuidado en la etapa de tala, con el fin de garantizar que en el momento de la ejecución de esta actividad los individuos no cuenten con nidos activos, para esperar que los huevos o neonatos se desarrollen hasta la formación de plumas.

Para el mes de junio se realizó la tala de un árbol, el cual se verificó con anterioridad que no se viera afectada la avifauna. Para este periodo de agosto no se realiza tala de árboles.

**Rescate de Mamíferos**

- En el caso de tener que realizar el procedimiento para el rescate de mamíferos se hará con un biólogo, quien tendrá en cuenta las características de las jaulas y tener un espacio mínimo dos veces el tamaño del animal, tener ventilación y recubierta con material poroso como la tela.
- Cuando se empleen anestésicos o sedantes, solo se podrá hacer cuando se haga bajo la supervisión de un veterinario experto.

Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

**Rescate de Reptiles**

- Cuando se identifique una de especies en el proyecto se procederá al ahuyenta miento de la misma y su rescate se hará con ayuda de personal especializado para este fin. En el proyecto no se tendrá disponible suero antiofídico.
- El procedimiento de captura se debe realizar preferiblemente en días soleados entre 10:00 y 13:00 horas del día o entre las 17:00 hasta máximo 18:00 horas del día.
- Se deben transportar en bolsas de tela gruesa y cuando sean serpientes venenosas, se tienen que utilizar recipientes rígidos, que la tapa se pueda cerrar de manera segura y que reciba ventilación suficiente.

No se pueden poner especies distintas en un mismo contenedor.
Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

**Rescate, Traslado y Reubicación de Enjambre Silvestre**

- En caso de identificarse este tipo de rescate se tendrá el apoyo de personal especializado ya que en obra no se cuenta con este tipo de expertos y se seguirán los siguientes pasos:

a. Hacer reconocimiento del sitio específico donde está el enjambre, verificar las condiciones del tiempo, para no actuar en condiciones de lluvia ni de extremo calor.
b. Con el equipo de trabajo se planificar esta intervención.
c. La intervención se hará mínimo tres (3) personas.
d. Usar siempre el traje de protección enterizo, guantes y botas.
e. En el área sólo debe permanecer el equipo que hará el procedimiento, instalar señales y personal que controle el paso por el sitio, habrá un responsable de la seguridad.
f. Es importante contar con personal médico dentro del equipo de trabajo.
g. Tener permanente comunicación y contacto visual con sus compañeros.
h. El procedimiento termina cuando la colmena se haya trasladado

Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

**Preparación:** Capacitación en manejo de abejas y primeros auxilios; identificación y compra de equipos de protección, equipos y accesorios; identificar e informar a organismos de respuesta como Bomberos, Defensa Civil y

Cruz Roja.

**Acercamiento al Sitio:** Establecer las condiciones, rutas que se van a manejar, duración del procedimiento y verificar si existen algunas condiciones especiales de las abejas o avispas, agresividad de la colonia, o si hay personas heridas.

**Operación:** Asegurar la zona, colocar una unidad generadora de humo a fin de neutralizar la capacidad de ataque de las abejas y transcurrido un tiempo prudente, retirar las abejas.

**Reporte de la Actividad:** En el mismo formato de rescate de fauna, se hará un reporte de la actividad con todas las características de la especie y el registro fotográfico. Informar a la autoridad ambiental, cuando así lo requiera.

Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

| INDICADORES DE SEGUIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Medición del Indicador | Periodicidad | Resultado | Análisis |
| Protección de la fauna existente | No. Fauna silvestre rescatada y reubicada / No. No. Fauna silvestre encontrada en el AID | Mensual | 0 / 0 | Para este periodo no se realiza tala de Árbol. 100 % |

**SOPORTES DE SEGUIMIENTO**

Para el mes de septiembre 2023, No se realizó tala de árbol.

**FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS**

| | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR). | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 |
|---|---|---|---|

| PROGRAMA | PROYECTO | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| Componente Abiótico | Manejo de la vegetación en obra | 3.2 - MCB |

**OBJETIVOS DEL PROYECTO**

Definir los requisitos para la intervención de la vegetación y las actividades apropiadas en el manejo de la flora, para disminuir y compensar el impacto negativo que genera su afectación, en el proyecto.

Identificar la vegetación que se intervendrá, por la ejecución de las obras dentro del área de influencia directa; los trámites que sean necesarios ante CORPOCESAR y llevar a cabo las actividades como tala, poda radicular, poda aérea, bloqueo y traslado, mantenimiento, establecimiento, fertilización y control sanitario.

**IMPACTOS POTENCIALES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afectación a la capa vegetal | | | | | | Alteración al paisaje. | | |
| Migración de la fauna silvestre | | | | | | Generación de ruido y material particulado | | |
| **TIPO DE MEDIDA** | | | | | | | | |
| **Control** | **X** | **Prevención** | **X** | **Mitigación** | **X** | **Compensación** | **X** | |
| **MEDIDAS DE MANEJO/ACTIVIDADES EJECUTADAS** | | | | | | | | |

**Inventario Forestal y Plan de Manejo Forestal**

- Para este mes de agosto se continua con el riego de los árboles que fueron intervenidos en la raíz y los árboles que se encuentran dentro del proyecto.



Fotografía No 52. Riego de árbol



Fotografía No 53. Riego de Árbol

En pro de mantener los procesos de mejora continua, para la ejecución de dicha poda, se realiza el riego de los árboles intervenidos con el fin de evitar la deshidratación de los mismos.
Vale la pena mencionar que dicho proceso se evidencia en el informe forestal enviado al área de interventoría el día 18 de mayo de 2023 con radicado No. CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC- 210

**Permisos para la Ejecución de la Intervención**

- En el momento que se cuente con el inventario forestal, se inicia el trámite de permisos y autorizaciones por parte de CORPOCESAR, según el caso.
- En la actualidad se cuenta con el permiso ambiental de tala el cual se relaciona a continuación

| TIPO DE PERMISO | ENTIDAD | ACTO ADMINISTRATIVO | PLAZO |
|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Tala de arboles | Corpocesar | Resolución No. 0017 del 28 de febrero del 2023 | Seis (6) meses |

Manejo de la Vegetación: Podas, Talas y Traslados

En este periodo No se realizó tala de árbol.

Se anexa la siguiente documentación al presente informe:

La Interventoría aprobó el documento PGAS, a la fecha se ha venido realizando seguimiento a todos los compromisos y a lo que la ley refiere. el Consorcio entrego a la Interventoría, el acto administrativo mediante el cual se le otorga el permiso para el manejo de la vegetación y deberá cumplir con los requerimientos que establezca la autoridad ambiental,

**Manejo de la Vegetación Para Permanecer:**

| INDICADORES DE SEGUIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Medición del Indicador | Periodicidad | Resultado | Análisis |
| Vegetación con veda nacional o regional | No. individuos con permisos de levantamiento de veda otorgado por autoridad ambiental competente / No. individuos inventariados identificados con veda | N/A | 0/0 | No Se realiza tala de árbol para este mes 100 % |

**SOPORTES DE SEGUIMIENTO**

- Certificados de disposición vegetal
- Permisos ambientales /forestales

**FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).** | **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** | **CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022** |

| PROGRAMA | PROYECTO | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| Gestión Social | Atención a la Comunidad y Autoridades | 4.1 GSP |

**OBJETIVOS DEL PROYECTO**

Este proyecto asume el manejo de las obligaciones ante la comunidad directa de influencia del proyecto la cual son los funcionarios y visitantes al Palacio de Justicia de Valledupar, autoridades municipales, Juntas de Acción Comunal – JAC, líderes, directivas de instituciones, empresas de servicios públicos de la ciudad de Valledupar, los cuales presenten inquietudes, quejas, reclamos y consultas relacionadas con el proyecto.

El proyecto debe implementar mecanismos para recibir, atender y dar respuesta oportuna a todas las PQRS que

las partes interesadas presenten al proyecto.

| IMPACTOS POTENCIALES | |
|---|---|
| Minimizar impactos ambientales que puedan generarse desde el personal del proyecto. | Disminuir el impacto de las comunidades de influencia directa del proyecto. |

| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Control** | **X** | **Prevención** | **X** | **Mitigación** | **X** | **Compensación** | |

**MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS**

**Instalación y Funcionamiento del CAC**

- El Consorcio Obras Judiciales en el ingreso del proyecto instala un espacio de atención a la ciudadanía, la cual tendrá atención a las partes interesadas en la etapa de inicio de las actividades constructivas, y se desarrollan las siguientes actividades:

a. Actas de vecindad: Ya fueron realizadas las de actas de Inicio

b. Gestión de mano de obra local: Se está contratando personal de la localidad

Este espacio estará abierto y disponible durante todo el proyecto, en los horarios 10:00 a.m. a 12:00, los lunes, miércoles y viernes, en dónde se tendrán los documentos técnicos del contrato, estos horarios serán divulgados a la comunicada comunidad en la reunión de inicio, adicional se publicarán los horarios de atención.

- Debe registrarse en el formato, el estado en el que queda la visita del ciudadano:

**Cerrada:** Cuando la manifestación ciudadana ha sido resuelta y las partes interesadas o quien presento la queja este satisfecha con la respuesta o acción desarrollada por parte del Consorcio Obras Judiciales.

**Abierta:** cuando la manifestación ciudadana no ha sido resuelta, está pendiente o en proceso de trámite.

En los informes mensuales del Consorcio Obras Judiciales se presentará al Interventor un consolidado de todas las solicitudes de los ciudadanos, entregando los siguientes valores y porcentajes:

a. Total, de manifestaciones en el periodo y acumuladas.
b. Total, de manifestaciones por tipo en el periodo y acumuladas.
c. Total, de casos cerrados en el periodo y acumulados.
d. Total, de casos abiertos en el periodo y acumulados.
e. Para el cierre ambiental y social del proyecto, el Contratista debe tener paz y salvo de todos los eventos registrados de manifestaciones ciudadanas y actas de vecindad.
   En esta oficina deben permanecer las Actas de Vecindad que se realizaron en el periodo previo a las actividades constructivas y documentos en general que sean de consulta por la comunidad y las autoridades.

En Este periodo no se han presentado quejas y se ha presentado público.

| INDICADORES DE SEGUIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador | Medición del Indicador | Periodicidad | Resultado | Análisis |
| Quejas y reclamos durante el proyecto | No. manifestaciones cerradas / No. manifestaciones de la comunidad | Mensual | 0 / 0 | A la fecha No se presentan quejas por la comunidad 100 % |

**SOPORTES DE SEGUIMIENTO**

- Formato de PQRS
- Reunión de inicio
- Actas de vecindad (del cliente)
- Gestión de mano de obra local

**FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).** | **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** | **CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022** |

| PROGRAMA | PROYECTO | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| Gestión Social | Información y Participación de la Comunidad | 4.2 - GSP |

**OBJETIVOS DEL PROYECTO**

Que el consorcio Obras Judiciales proporcione información que oportuna, suficiente, clara y necesaria para todas las partes interesadas del proyecto.

El Consorcio Obras Judiciales debe darle un buen manejo a la información relativa al proyecto, con las autoridades locales, la comunidad del área de influencia directa

**IMPACTOS POTENCIALES**

Disminuir el impacto de las comunidades de influencia directa del proyecto.

La comunidad aledaña al proyecto puede tener dudas sobre el proyecto las cuales pueden influir en el desarrollo del proyecto

**TIPO DE MEDIDA**

| Control | X | Prevención | X | Mitigación | X | Compensación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS**

**Actividades de Comunicaciones y Publicidad**

Son las actividades para distribuir elementos de comunicación para citar reuniones y divulgar información relevante relacionada con el proyecto.

**Comunicaciones Personalizadas:** Cuando es necesaria la elaboración de una comunicación formal dirigía a una persona, funcionario o entidad en particular, donde se entregue información o invitación a alguna reunión. Deberán estar revisadas por la Interventoría antes de su envío.

**Volantes de Información:** Cuando se distribuya información a través de volantes informativos en el área de influencia del proyecto, se tomará el recibido de los ciudadanos que lo recibieron dentro de un formato con la fecha, identificación completa de la persona que recibió la información y firma o huella.
En caso de que se requiera intervención de redes de servicios públicos que genere su suspensión temporal, la restricción de tráfico y cierre de vías, entre otras, se deberá dar aviso oportuno a la población afectada, mediante volantes y reuniones con la Junta de Acción Comunal, entre otras formas organizativas, con mínimo 5 días de anticipación; también deberá contar con los permisos respectivos para realizar este tipo de cierres y suspensiones.

**Información por Medios Locales:** A través de medios como la televisión local, radio comunitaria o perifoneo autorizado, se podrá hacer divulgación de reuniones programadas para la invitación a la comunidad en general.

**Manejo del Flujo Peatonal**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No. 64. sendero peatonal dentro de obra | Fotografía No. 65. Sendero peatonal provisional fuera de obra. |

- El Plan de Manejo de Tráfico – PMT Con fecha de aprobación 17 de mayo del 2023 y radicado a interventoría el día 18 de mayo de 2023 con oficio CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC-212, debe cumplir el objetivo de mantener o mejorar la velocidad de la circulación vehicular, con el fin de evitar la densificación y/o concentración de las emisiones, como también el malestar a terceros dentro del

área de influencia.

- De igual forma se implementa la señalización de seguridad adecuada. Todos los elementos de señalización permanecerán limpios y debidamente instalados para que cumplan su función.
- Cuando el PMT aprobado por la oficina de tránsito o Alcaldía correspondiente, contemple los controladores viales, se deberá disponer del personal necesario, sin que esto implique costos adicionales a la DEAJ.
- En el caso de requerir senderos externos para uso peatonal con un ancho suficiente, para que el tráfico peatonal normal no sufra congestiones.
- Los senderos peatonales no podrán ser ocupados por la obra, como por equipos, vehículos, ni por el cargue y descargue, ni por el acopio temporal de materiales.
- Las obras en espacio público deben realizar cerramientos, buscando el bienestar y la seguridad de los transeúntes.
- Los accesos y el perímetro de la obra deberán mantenerse bien señalizados, de tal forma que sean claramente visibles, identificables y que permitan una fácil orientación a los peatones.
- Se deben ubicar los factores generadores de ruido alejados del perímetro que limita la obra con el espacio público; aislar las áreas de corte y de otras actividades propias de la obra que generen ruido, mediante la construcción de estructuras temporales que mitiguen estas emisiones

**INDICADORES DE SEGUIMIENTO**

| Indicador | Medición del Indicador | Periodicidad | Resultado | Análisis |
|---|---|---|---|---|
| Reuniones de apertura, seguimiento y cierre | o. de reuniones desarrolladas / No. Reuniones programadas | Mensuales | N/A | N/A |

**SOPORTES DE SEGUIMIENTO**

- Acta de reunión de inicio
- Cronograma de reuniones de avance
- Informe general del avance del proyecto.
- Resultados de la gestión social y ambiental del Contratista.
- Reunión de finalización
- Comunicaciones personalizadas
- Volantes de información
- Plan de Manejo de Tráfico

**FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).** | **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** | **CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022** |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | | **IDENTIFICACION** |

| Gestión Social | Manejo de Infraestructura Privada, Publica, de Servicios Públicos, Redes y Activos. | 4.3 – GSP |
|---|---|---|

**OBJETIVOS DEL PROYECTO**

El objetivo principal de esta ficha es la elaboración del estado físico de la infraestructura pública y privada, así como de las redes de servicios públicos cercanos al área de influencia directa del proyecto, generar espacios y relaciones con propietarios y empresas administradoras u operadores; con el propósito de prevenir conflictos con las comunidades y las entidades correspondientes.

**IMPACTOS POTENCIALES**

Impactos derivados de la construcción del proyecto que puede generar daños a la infraestructura pública al igual que las redes de servicios públicos en el área de influencia del proyecto.

**TIPO DE MEDIDA**

| Control | X | Prevención | X | Mitigación | X | Compensación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS**

Para la atención a los ciudadanos o partes interesadas del proyecto se tiene designado el siguiente horario de atención de la comunidad:

Martes, jueves y sábados desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. lugar donde se decepcionará y aclararán todas las inquietudes presentadas por las partes interesadas o a través del correo electrónico: atencionpqrscoj@hotmail.com



Fotografía No. 56. Sitio de atención a las partes interesadas



Fotografía No 57. Sitio de atención a las partes interesadas

**Actas de Vecindad de Predios**

Corresponde al registro del estado de la construcción y de toda la infraestructura vecina a las actividades de obra y en los sitios que el contratista requiere de manera temporal para el desarrollo de la obra, empleando el Formato del

Acta de Vecindad del Anexo 8.3 de la guía para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social.

Las actas de vecindad se entregaron a los usuarios firmadas y autenticadas el día 12 de mayo de 2023 y radicados a interventorías mediante oficio No. CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC- 190.

- Se registrará el estado físico de las construcciones, viviendas, locales de actividades económicas, casetas, cercas, postes, portillos, árboles, vallas, redes de acueductos, de distribución de energía, redes de tecnología de la información y las comunicaciones o de la industria del petróleo y demás obras que se encuentren a lado y lado de las futuras actividades constructivas.

- Esta será una actividad que debe liderar el profesional social del contratista, con el acompañamiento del Residente de Obra, quien será la persona entendida en los aspectos técnicos del acta de vecindad en el momento de realizarla.

- La Interventoría también debe acompañar las actas de vecindad, con el fin de verificar que se cumpla con el procedimiento y apoyar técnicamente las observaciones.

- Cuando existan posibles interferencias de la obra con redes u infraestructura existente, que no está contemplado en el diseño, el Contratista debe informar formalmente a la Interventoría para que se realicen las gestiones y ajustes oportunos para la buena ejecución de la obra.

- Se debe informar a la comunidad sobre esta actividad en la reunión de inicio, señalando la importancia de la participación del responsable o del propietario del predio.

- Antes de iniciar, el equipo social del Contratista establecerá contacto con el propietario, administrador o directiva de las construcciones. En el caso de infraestructura social (parques, paraderos, bienes de interés religioso o cultural) se debe realizar contacto con el Director del Palacio de Justicia de Valledupar para informarle sobre el levantamiento del Acta de Vecindad en esa área.

- Las actas de vecindad se entregaron a los usuarios firmadas y autenticadas el día 12 de mayo de 2023 y radicados a interventorías mediante oficio No. CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC- 190.

- El Consorcio Obras Judiciales recibe y resolver las quejas y reclamos que la comunidad o entidades puedan presentar por afectación a la infraestructura vecina a la obra.
- El Formato del Acta de Vecindad será el que se encuentra en el Anexo 8.3 de la guía para el Plan de Gestión Ambiental y Social.
- En el proyecto no se tiene proximidad con actividades agrícolas, por eso no se hará registro del estado de cultivos, pasto, cercas, fuentes de agua.
- El Consorcio Obras Judiciales entregara al propietario o responsable del predio, la copia física del Acta de Vecindad, dentro de los 15 días calendario, posterior a la fecha de la diligencia.
- El archivo magnético deberá estar almacenado en la oficina de Centro de Atención Ciudadana CAC, para ser consultado en el momento que sea necesario.
  El Profesional Social al finalizar la obra, se llevarán a cabo las Actas de Vecindad de Cierre en las mismas construcciones y predios donde se levantó el Acta de Vecindad de Inicio; dicha acta consiste en la

verificación final del estado físico en que quedaron, una vez terminadas las actividades constructivas y con la aceptación del dueño o responsable.

**Manejo de las Quejas de Actas de Vecindad**

Cuando en el CAC se reciba alguna queja por daños a la infraestructura, donde se adjudique dicho daño a las actividades constructivas, el Consorcio Obras Judiciales deberá tomar las siguientes acciones para atención a este evento:

- El Profesional Social del Consorcio Obras Judiciales deberá tomar nota en el formato de Atención al Ciudadano, diligenciando toda la información, en este caso de la queja por la posible afectación del predio.

- Se recomienda mantener una relación amable y diligente con el ciudadano que manifiesta una afectación.

- Se debe programar en el formato de Atención al Ciudadano una fecha y hora de visita, en un plazo no mayor a 24 horas, para determinar y cotejar la situación que expone el quejoso, frente a las condiciones en las cuales estaba el bien, previo al inicio de obra.

- Se deberá tener el acompañamiento de un garante como la Personería, lo cual se solicitará con el fin de ofrecer garantías al ciudadano.

- Habrá que establecer la responsabilidad de los daños provocados y el origen de los mismos, a fin de que no continúen tal secuela o en su defecto, aclarar que no corresponden a la ejecución del proyecto.

- Una vez se verifique la responsabilidad de la obra en el daño, se procederá a determinar los recursos y actividades que se requieren para solucionar la manifestación ciudadana presentada.

- En todos los casos de un proceso de restauración de las condiciones del predio deben quedar explícitas en el formato de Atención al Ciudadano, sobre el acuerdo en el cual firmen las partes y como mínimo indicando la siguiente información:

    - Fecha en que se instauró la queja en el CAC
    - Fecha en la que se hizo la diligencia de la visita para verificar el daño y sus causas
    - Registro fotográfico del espacio afectado
    - Concepto técnico del equipo profesional del Contratista
    - Registro fotográfico del archivo del acta de vecindad
    - Descripción del estado inicial, es decir, el que se encuentra en el acta de vecindad
    - Se debe señalar el tipo de arreglo que debe producirse: reparación, reposición o compensación. En cada caso debe explicarse la forma en que se cumplirá la acción.

Tendrá el seguimiento de las actividades programadas para la restauración, incluyendo:

- Registro fotográfico finalizado o cumplido el acuerdo
- Un recibido a satisfacción del ciudadano que formalizó la queja, firmada por el ciudadano

Fecha del cierre de la manifestación ciudadana

- Todo el proceso deberá ser informado a la Interventoría, quien podrá aportar su concepto y recomendaciones en la medida que lo considere pertinente.
- Cuando se presenten discrepancias entre la Interventoría y el Contratista sobre la responsabilidad en los daños presentados, se acudirá al Coordinador asignado por la DEAJUIF del Contrato de Obra o al funcionario que esta designe para dar solución a las diferencias presentadas.
- Si la DEAJ establece que la responsabilidad del daño es del Contratista, este deberá proceder a reparar los daños ocasionados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Las reparaciones por razones imputables al Contratista no serán objeto de pago por el Contrato. En el caso que el contratista no repare los daños dentro del plazo previsto, será considerado como un incumplimiento del contrato

**Medidas de Manejo de Infraestructura de Servicios Públicos**

Se deberán tener en cuenta las siguientes actividades previas y durante las actividades de obra, para evitar la afectación de los servicios públicos:

- Antes de las actividades de descapote y excavaciones se debe comprobar la existencia de redes de servicios públicos en el área a intervenir.
- Se debe establecer comunicación formal con las entidades dueñas de redes y activos, operadores o administradores.
- Las redes deben ser localizadas junto con el operador con un plano de catastro de red actualizado, para determinar su posición y especificaciones.
- Para cuando se deban intervenir redes de servicios públicos. se debe informar oportunamente a las entidades encargadas de la prestación del servicio, de manera que no se presenten improvisaciones y al momento de la instalación no se pueda desarrollar por falta de alguna autorización.
- No se puede iniciar excavaciones para el retiro de redes hasta tanto no se cuente con los permisos respectivos.
- Cuando se esté interviniendo una red subterránea, se recomienda que se efectúe por tramos y sin que permanezca abierta la excavación por un tiempo mayor de 12 horas, por lo que para este tipo de trabajos debe programarse iniciar temprano en la mañana, para tener instalado y cubierto al finalizar la jornada.
- En caso de ser necesario cortes de los servicios públicos, se debe informar anticipadamente a la comunidad cuya cobertura será afectada y adicionalmente tener preparado el Plan de Contingencia, que hará parte del PGAS, en el caso de que por algún motivo no se pueda restablecer el servicio interrumpido.
- En el CAC y en otros puntos del campamento, deberá permanecer publicados todos los números telefónicos de las empresas prestadoras de los servicios públicos, en caso de cualquier emergencia.

**INDICADORES DE SEGUIMIENTO**

| Indicador | Medición del Indicador | Periodicidad | Resultados | Análisis |
|---|---|---|---|---|
| Levantamiento actas de vecindad (predios, redes y activos de servicios públicos, infraestructura | No. de actas de vecindad diligenciadas / No. de actas de vecindad identificadas | Mensual | 6 / 6 | 100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cierre actas de vecindad | No. de actas de vecindad cerradas / de actas de vecindad diligenciadas | Mensual | 6 / 6 | 100% |

**SOPORTES DE SEGUIMIENTO**

- Acta de reunión de inicio
- Actas de vecindad

**FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).** | **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** | **CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022** |

| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **IDENTIFICACION** |
|---|---|---|
| Gestión Social | Gestión de la Mano de Obra | 4.4 - GSP |

**OBJETIVOS DEL PROYECTO**

Realizar el manejo de contratación de mano de obra donde se considera que es trascendental priorizar la mano de obra local e impedir la migración de trabajadores al Área de Influencia Directa – AID del proyecto; toda vez que el incremento de población foránea puede generar escenarios negativos

Generar ingresos en los habitantes y comunidad del AID del proyecto, mejoramiento de su calidad de vida, previniendo la migración de trabajadores foráneos y la gestación de conflictos con la comunidad establecida.

**IMPACTOS POTENCIALES**

| | |
|---|---|
| Desmejoramiento de la calidad de vida de los residentes permanentes o conflictos de aspecto socioeconómico y cultural. | Causar un impacto positivo general en la comunidad de influencia |

**TIPO DE MEDIDA**

| **Control** | **X** | **Prevención** | **X** | **Mitigación** | **X** | **Compensación** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**MEDIDAS DE MANEJO / ACTIVIDADES EJECUTADAS**

**Medidas de manejo**

El Contratista tendrá que contratar un porcentaje de personal no profesional para la obra y dentro de ese total se establece que mínimo el 50% deben pertenecer al AID del proyecto. La Interventoría tendrá la obligación de hacer el seguimiento sobre el cumplimiento de este requisito o el que se establezca en los documentos técnicos del Contrato, cuando así ocurra.

- El equipo mínimo de profesionales del Consorcio Obras Judiciales será personal de su confianza, por lo tanto, este personal podrá ser foráneo en la medida y autonomía administrativa que tiene el Consorcio, sin embargo, preferiblemente podrá optar por personal de la zona donde se realizar la obra.
- Todo el personal deberá ser aprobado por la Interventoría de acuerdo con los documentos técnicos del proyecto.
- Se debe conformar una línea base del componente socioeconómico y cultural, la cual debe indicar la dinámica del empleo en el AID, los perfiles laborales presentes en el área y a fin de conocer la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada. Con esta información, el Contratista establecerá

la mano de obra a contratar para el desarrollo de su obra.

- El Contratista podrá solicitar apoyo de entidades públicas de gestión de empleo como del SENA u otras como, las Cajas de Compensación Familiar de la región y la Unidad de Servicio Público de Empleo: http://serviciodeempleo.gov.co/
- A través de las Alcaldías apoyadas en las Juntas de Acción Comunal – JAC, podrá certificar la residencia en el AID, en algunos lugares conocido como "Certificado de Territorialidad".
- En los informes mensuales del Contratista a la Interventoría, presentará toda la información correspondiente, soportes y los indicadores de la mano de obra contratada.

**INDICADORES DE SEGUIMIENTO**

| Indicador | Medición del Indicador | Periodicidad | Resultado | Análisis |
|---|---|---|---|---|
| Generación de empleado en el área de influencia directa AID | No. personal contratado y vinculado al proyecto No. profesional del AID / No. Personal contratado y vinculado no profesional | Mensual | 32 | 100% |

**SOPORTES DE SEGUIMIENTO**

- Contratación de personal
- Cumplimiento del indicador
- Informe Mensual

## 2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS

El periodo objeto de este informe no se presentaron incidentes que deban ser reportados.
