INFORME No. 7

PERIODO: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 05 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATO N° 0757-23 **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA".**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LEONARDO MANTILLA NOGUERA	

UT. INTERCOMEDOR ITSI

901.683.399-1

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

INFORME No. 7 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N° 0757-23 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA".



SEPTIEMBRE 2023

Carrera 22 No. 52B - 60 EDIFICIO GLAYA APTO 101 Barrio Torcoroma
Celular 314 412 1030, E-mail: fmcconstructoresltda@gmail.com
Barrancabermeja - Santander

INTRODUCCIÓN **5**
OBJETIVOS **6**
1. CAPITULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO **7**
1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
1.2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO 9
1.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 10
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 10
1.5. INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO 11
2. CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA **12**
2.1. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO 12
2.2. ACTAS SUSCRITAS 13
2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS 13
2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 15
2.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS 17
2.6. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 19
2.7. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 19
2.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 20
2.9. CONTROL DE GARANTÍAS 20
2.10. COMITÉ DE OBRA 22
3. CAPITULO III. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA **23**
3.1. ASPECTO LEGAL Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 23
3.2. ACTAS SUSCRITAS 24
3.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS 24
3.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 25
3.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS 28
3.6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (SST) 29
3.7. ACTIVIDADES SOCIO AMBIENTALES 30
3.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 31
3.9. CONTROL DE GARANTIAS 31
3.10. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 32
4. CAPITULO IV. CONCLUSIONES **33**

5. CAPITULO V. ANEXOS **35**

5.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO 35

5.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 36

5.3. BITÁCORA DE OBRA 37

5.4. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA 38

5.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA 39

5.6. CERTIFICADO MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS 40

5.7. CERTIFICADO DE ESCOMBRERA POR DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 41

5.8. ACTAS COMITÉ DE OBRA 42

5.9. INFORME TÉCNICO DE OBRA 43

5.10. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA 44

5.11. INFORME HSE DE OBRA 45

5.12. INFORME SOCIO AMBIENTAL DE OBRA 46

5.13. RESULTADOS DE ENSAYOS A COMPRESIÓN DEL CONCRETO 47

INTRODUCCIÓN

La Institución educativa Instituto Técnico Superior Industrial - ITSI en el Distrito de Barrancabermeja, busca facilitar el desarrollo integral y el mejoramiento del impacto en el sistema educativo para los estudiantes de la sede principal de la institución, mediante la demolición de la actual cafetería y la construcción del área que cumpla las veces de cafetería y comedor escolar, cumpliendo con las condiciones básicas propuestas en la normativa sanitaria vigente: resolución 2674 de 2013, NTC 4595 y 4596, en las cuales se establece los requisitos y parámetros del diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo, analizando los diagnósticos de infraestructura frente a la existencia, calidad y acceso a los servicios públicos y condiciones de dotación de equipos y menaje en el comedor. Todo esto con el fin de dar inclusión a la promoción y ampliación de cobertura de programas de alimentación que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, para mantener sus niveles de atención, aumentar el porcentaje de permanencia escolar, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje.

Por lo anterior, se hace necesario iniciar proceso de selección de contratistas, para llevar a cabo CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

OBJETIVOS

GENERAL

- ✓ Presentar el estado técnico, administrativo, financiero y legal del contrato de obra ejecutado por el contratista WRUSSY INGENIEROS SAS durante el periodo comprendido entre el 6 de septiembre del 2023 y el 05 de octubre del 2023.


ESPECÍFICOS

- ✓ Informar a la entidad contratante el avance físico y financiero de las actividades contractuales ejecutadas.
- ✓ Dar conocimiento de las diferentes actividades que desarrolló el contratista durante el presente periodo de ejecución del proyecto.
- ✓ Presentar informe de las obras ejecutadas durante el periodo.

1. CAPITULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA – SANTANDER

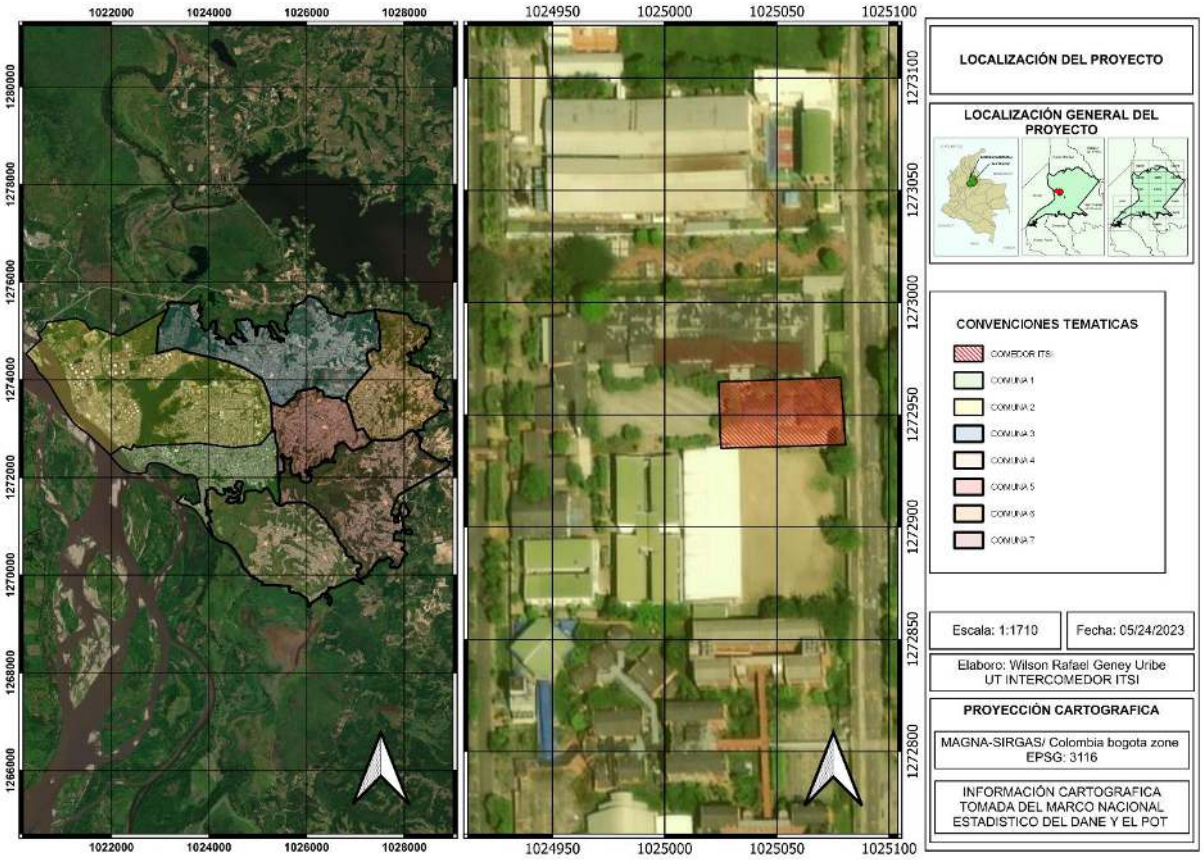


El proyecto de construcción del comedor escolar se encuentra ubicado en la carrera 28 No. 53-08 en el casco urbano del Distrito de Barrancabermeja, Santander, Dentro de las instalaciones del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI

Figura 1. Localización del proyecto.



Fuente: Interventoría

Figura 2. Planta general cafetería.

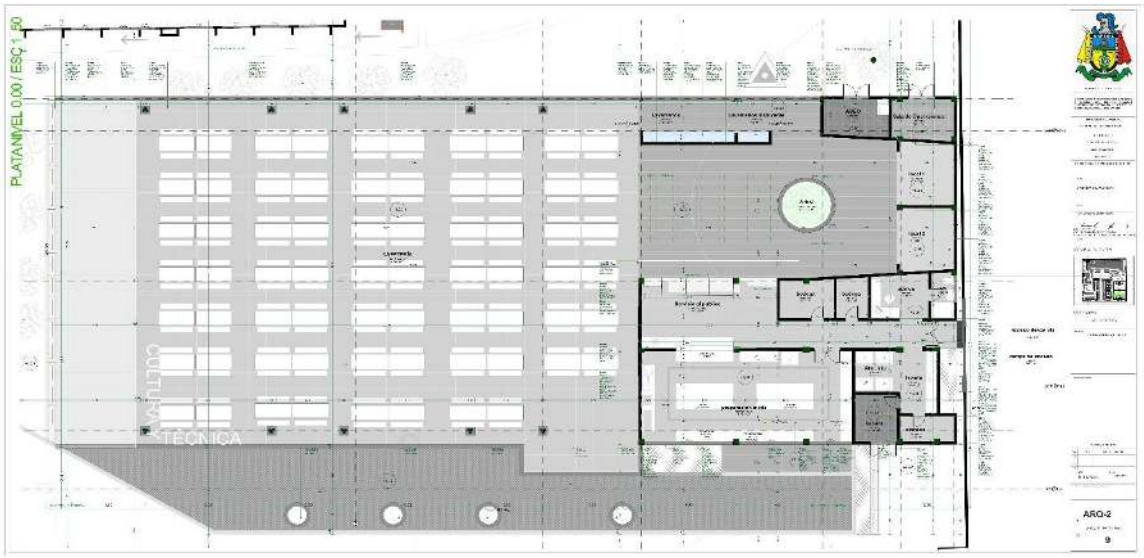

Fuente: secretaria distrital de infraestructura.

1.2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO

En este proyecto se indican de forma general las tareas encaminadas para la construcción del restaurante escolar del Instituto Técnico Superior Industrial, el cual será el comedor más grande de la ciudad, beneficiando cerca de 5000 estudiantes, que pasaran de tener comida industrializada a comida caliente preparada en sitio.

En general, las actividades a realizar serán:

- **ACTIVIDADES PRELIMINARES**, comprenden todas las actividades de localización, cerramiento, desmonte de estructuras, demoliciones y demás actividades necesarias para poder adecuar completamente el área disponible para el proyecto.
- **MOVIMIENTOS DE TIERRA**, comprenden las actividades de excavaciones, rellenos de acuerdo a la ubicación definida en planos y bajo estricto control topográfico y el cargue y retiro del material sobrante y de escombros generados durante el proyecto.
- **ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ACERO ESTRUCTURAL**, corresponde a las actividades de elaboración y vaciados de concretos de sus diferentes resistencias de acuerdo a las especificaciones del elemento, y al suministro de acero estructural para cubiertas, y el suministro y figurado de acero de refuerzo.
- **MAMPOSTERÍA Y FRISOS**, corresponde a la construcción de muros de mampostería y pañete de los mismos.
- **ARQUITECTURA Y ACABADOS**, comprenden actividades de instalación de puertas y ventanas, pasamanos, mesón en granito, acabados de pisos y muros para acabado final. También incluye la cubierta, así como el cielo raso, bajantes y canal metálico, los elementos sanitarios y de cocina y los acabados exteriores finales de la obra.
- **INSTALACIONES HIDRÁULICAS**, comprende actividades de instalación de tuberías de agua fría, cajas de registro, entre otros, para el abastecimiento de agua potable y la construcción del cuarto de bombas para el suministro de agua.

- **INSTALACIONES SANITARIAS**, comprende actividades de instalación de tuberías de desagües, ventilaciones, cajas de registro, entre otros para la eliminación de residuos a través de desagües.
- **ACTIVIDADES DE ALCANTARILLADO**, comprende actividades de instalación de tuberías para la entrega final de aguas lluvias y aguas negras, cajas de inspección y construcción de pozos.
- **INSTALACIONES DE GAS**, comprende actividades de instalación de tubería de gas y conexión para abastecimiento de la infraestructura.
- **INSTALACIONES ELÉCTRICAS**, comprenden todas las actividades de circuitos eléctricos y/o sistemas fotovoltaicos para dotar de energía eléctrica la infraestructura construida.
- **EQUIPOS DE COCINA**, hace referencia a las actividades de suministro e instalación de los equipos y elementos de primera necesidad para la cocina.

1.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las condiciones técnicas del proyecto se encuentran establecidas en los estudios previos y los diseños propuestos (estudios de conveniencia y oportunidad, planos, especificaciones técnicas), por lo tanto, son inmodificables.

El presente contrato de obra pública se realizará de acuerdo al siguiente alcance: **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0756-23 - CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".**

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del proyecto tiene una duración de 12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

1.5. INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO

El proyecto cuenta con el siguiente soporte técnico:

- Estudios Previos.
- Especificaciones Técnicas de construcción.
- Presupuesto Detallado.
- Análisis de Precios Unitarios.
- Planos y diseños.
- Pliegos de Condiciones.
- Propuesta económica de proponente.
- Acta de adjudicación del contrato.
- Minuta de contrato de Obra Pública.
- Aprobación de Póliza de Garantías.

2. CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

2.1. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO

2.1.1 Información General del Contrato

CUADRO GENERAL DE LA INTERVENTORÍA	
CONTRATO N°:	0757-23
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	$ 272.766.458 (DOSIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUANTROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE)
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
INTERVENTOR CONTRATO:	UT INTERCOMEDOR ITSI
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE MARZO DE 2024
MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

2.2. ACTAS SUSCRITAS

A la fecha se han suscrito las siguientes actas por parte de la interventoría. En el periodo de este informe no se suscribió ningún acta.

NOMBRE DEL ACTA	FECHA
Contrato de interventoría 0757-23	22 de febrero de 2023
Acta de Inicio de interventoría	6 de marzo de 2023
Acta de recibo parcial N° 1	8 de septiembre de 2023
Acta aclaratoria N°1 al Acta de recibo parcial N° 1	13 de septiembre de 2023
Acta aclaratoria N°2 al Acta de recibo parcial N° 1	21 de septiembre de 2023

2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS

En el presente periodo se observa el siguiente avance de obra y presupuestal del proyecto. Y se hace un comparativo con el porcentaje proyectado según PDT. Esta gráfica se toma como referencia del informe semanal.

Figura 3. Información general avance de la obra.

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	21,05%	20,79%	0,26%
Durante el periodo	0,99%	0,71%	0,28%
Acumulado Actual	22,04%	21,50%	0,54%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,71%	21,50%
Valor de la Obra Programada	$ 18.647.011,42	$ 564.694.381,83

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,99%	22,04%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 26.000.762,40	$ 578.799.302,27

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

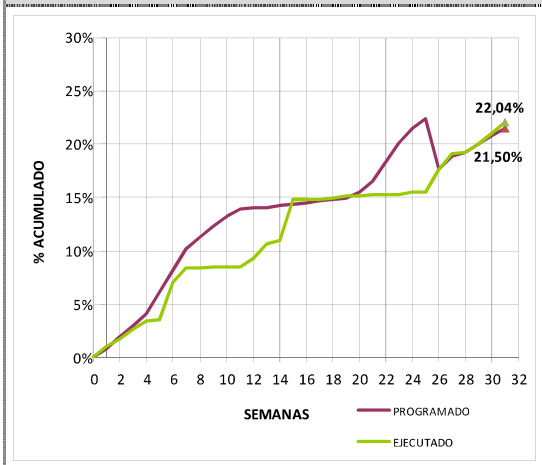

A continuación, se relacionan las actividades de obra ejecutadas en el periodo:

- La interventoría verifica que los equipos y las herramientas usadas para realizar las actividades de obra, se encuentren en buen estado de operación y de seguridad.
- La interventoría realiza recorridos diarios de obra, revisando la correcta ejecución de las actividades, verificando que sean construidos en orden y eficiencia y siguiendo las especificaciones técnicas.
- Por parte de interventoría se verifican que el material de préstamo para el relleno de las excavaciones sea el adecuado y se compacte siguiendo las especificaciones técnicas.
- La interventoría realiza la verificación de los ejes de las columnas, armado de acero de refuerzo, vigas y alineación de formaleta instalada. Dando el respectivo aval para la fundida de concreto.
- Por parte de interventoría se realiza la verificación de estribos, traslapos, distancias y calibre del acero de refuerzo instalado y todo se encuentra según diseños.
- Por parte de interventoría se verifica que el concreto aplicado en obra se ajusta a las especificaciones técnicas del contrato, respaldado por el diseño de mezclas y las pruebas de concreto generadas por laboratorio.
- Por parte de interventoría se verifica la correcta instalación de la formaleta de los pedestales de 0.3m x 0.3m y la instalación de sus platinas, después de la fundida en concreto de 3000Psi.
- La interventoría verifica que las actividades de excavaciones y retiros de material se realicen de manera segura y utilizando los equipos adecuados.
- La interventoría realiza acompañamiento continuo en la instalación de la estructura metálica, verificando distancias, ejes, soldaduras e instalación correcta de la misma.

2.3.1 Seguimiento semanal

Con el fin de llevar un control de la programación para evaluar el avance o atraso del proyecto, se diligencia un formato de informe semanal; esto con el fin de determinar los planes de contingencia necesarios en el caso de presentarse atrasos. **Ver anexo 5.2**

2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La interventoría verifica el cumplimiento del personal mínimo propuesto para la ejecución de las actividades.
- La interventoría cumple y exige al contratista el estricto cumplimiento al desarrollo del objeto contractual establecido en los pliegos de condiciones y las especificaciones técnicas.
- La interventoría realiza la presentación de informes mensuales donde se destaca el avance físico y presupuestal del proyecto, y posteriormente informa del cumplimiento o no de las obligaciones del contratista acorde con la realidad del proyecto.
- La interventoría verifica las afiliaciones al sistema de salud y parafiscales del personal que ingresó durante el periodo. Posteriormente se verifica que los pagos de las planillas se hagan oportunamente y se anexe su comprobante de pago en cada informe.
- La interventoría realiza y lleva el registro fotográfico diario de obra, donde se ilustra el avance de las actividades ejecutadas por el contratista.

2.4.1 Registro Diario de Obra

Durante el periodo de este informe se diligenció por parte de la interventoría, en equipo con el contratista, la bitácora de obra. En este libro se plasman todas las actividades realizadas día a día con sus respectivas cantidades, visitas técnicas, actividades no previstas, toma de decisiones y cualquier tema relevante para la obra. También se

especifica si hay lluvias o climas desfavorables que ameriten suspender labores. **Ver anexo 5.3**

2.4.2 Plan Detallado de Trabajo - PDT

El proyecto cuenta con un Plan de trabajo detallado (PDT) en Project y un control de programación, donde se discrimina el flujo de inversión programado semanalmente en pesos y en porcentaje, esto con el fin de evaluar periódicamente la ejecución del proyecto y determinar avances o atrasos respectivamente.

2.4.3 Personal de interventoría

A continuación, se relaciona el personal de la interventoría que laboró en este periodo Se anexa planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales. **Ver anexo 5.4**

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR
Leonardo Mantilla Noguera	Director de Interventoría
Andrés Camilo Garzón Martínez	Residente de Interventoría
Fernan Gomez Gonzalez	Topógrafo
Daniela Moreno Rincón	Profesional SST
Wilson Rafael Geney	Apoyo SST y Ambiental

2.4.4 Control de equipos de interventoría

A continuación, se presenta la relación de equipos usados por la interventoría durante el periodo de este informe.

EQUIPOS	CANTIDAD
Computador portátil	2
Camioneta	1
Impresora	1

2.4.5 Licencias

Dentro del periodo de este informe, no se solicita al contratista ningún tipo de licencia para los trabajos a realizar.

2.4.6 Correspondencia

A la fecha de este informe por parte de la interventoría se han enviado los siguientes comunicados. **Ver anexo 5.5**

FECHA	OFICIO N°	ASUNTO	ENVÍA	RECÍBE
15/09/2023	013	ACLARACIÓN SOBRE IMPRUDENCIA DE VOLQUETA	UT INTERCOMEDOR ITSI	SUPERVISOR - SEC. DE INFRAESTRUCTURA
2/10/2023	014	RESPUESTA A OFICIO 0036-075 "RADICACIÓN FICHA TECNICA VENTILADOR" INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA"	UT INTERCOMEDOR ITSI	WRUSSY INGENIEROS S.A.S

2.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el periodo se suscribió el acta de recibo parcial N° 1 por un valor de $48.280.621,69 (CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS CON SENSETA Y NUEVE CENTAVOS MCTE).

A continuación, se presenta la forma de pago estipulada por contrato y la disponibilidad presupuestal para la interventoría.

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:

A). Pagos no superiores al 90% del valor del contrato, el cual se pagará mediante la presentación de Actas parciales según el avance de la ejecución del contrato de obra, así:

El pago al interventor se efectuará a la presentación de la factura o documento equivalente y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada

www.barrancabermeja.gov.co
Diagonal 60 Kilómetro 1 vía Corregimiento El Llanito (7) 611 5555 Ext. 1604

Secretaría de Infraestructura
lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

B). Ultimo Pago. Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos:

El supervisor sólo aprobará el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato se pagará, una vez aporte la Liquidación del contrato de obra pública, y Liquidación del contrato de interventoría, siempre y cuando cumpla las aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El pago está supeditado al PAC del Distrito.

En todo caso, dado que la forma de pago es por precios unitarios y que en su ejecución puede suceder que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta, las partes acuerdan que para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos.

Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. En todo caso las partes acuerdan que para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos de acuerdo al avance de la ejecución del contrato de obra objeto de vigilancia.

CLÁUSULA NOVENA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato será cancelado con recursos de la vigencia fiscal 2023, según certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda No. 23-00751 del 03 de Febrero de 2023, con rubro 2.3-2202-0700-051-220057-2.3.2.02.02.008, concepto: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, fuente de financiación: CREDITO INTERNO, por valor de: DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($227.305.400); Certificado de disponibilidad presupuestal No. 23-01133 del 15 de febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-22-2201-0700-051-220057-02-2.3.2.02.02.008, por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, fuente de financiación CREDITO INTERNO, por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($45.461.080), y ACUERDO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS No. 045 de 2022.

2.6. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Por parte de interventoría se realiza el control estricto de los equipos usados en obra, verificando que su documentación este al día y que su funcionamiento y uso sea el correcto.
- La interventoría verifica diariamente la realización de las charlas de SST antes de iniciar las actividades de obra.
- La interventoría lleva control y verificación de orden y aseo de todas las áreas de trabajo diariamente.
- Por parte de interventoría se realizó inspección de las señalizaciones del área y pasos peatonales, encontrando que están en buen estado.
- La interventoría verifica que el contratista realiza recambio continuo de EPP´s que se encuentran en mal estado y no están actos para realizar trabajos. Esto con el fin de proteger la integridad de los trabajadores.
- La interventoría realiza la verificación del certificado de trabajo en altura del personal y a su vez verifica el estado de los equipos y herramientas para realizar dichos trabajos.

2.7. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

2.7.1 Socializaciones y seguimiento al contrato

- La interventoría en compañía con el contratista, el supervisor, el equipo del despacho distrital y representantes del colegio, realizan semanalmente el comité de obra. Donde se revisan temas de avances de obra, actividades realizadas y se despejan dudas surgidas en la semana de ejecución, al igual que surgen compromisos para mejorar el desarrollo de la obra.

2.7.2 Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental

- La interventoría verifica el mantenimiento periódico de las baterías sanitarias suministradas por la empresa contratista y la disposición de los residuos surgidos en la obra. **Ver anexo 5.6**
- La interventoría verifica el manejo y buen estado del punto ecológico para la disposición de basuras generadas por el proyecto.
- La interventoría verifica la correcta disposición final de escombros y residuos orgánicos generados en la obra por medio del certificado de la escombrera. **Ver anexo 5.7**

2.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

2.8.1 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

La interventoría verificó que el contratista a la fecha ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. En lo concerniente al recurso humano se inspeccionó el buen estado de los elementos de protección personal al igual que la dotación suministrada por el contratista. En el periodo transcurrido toda actividad realizada por el contratista ha tenido el aval de la interventoría y se ha realizado de manera segura.

2.8.2 Calidad de Materiales usados en Obra

Durante el periodo de este informe, la interventoría verificó la resistencia del concreto a la compresión con los ensayos realizados en laboratorio, producto de la fundida realizada. En los que se corroboró el cumplimiento de la resistencia indicada en las especificaciones técnicas. Se anexan resultados. **Ver anexo 5.13**

2.9. CONTROL DE GARANTÍAS

La interventoría cuenta actualmente con la póliza N° 400-47-994000090491 Anexo 1 de

la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA para amparar los riesgos de Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios y prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales, para la Legalización del contrato de Obra de interventoría N° 0757-23 por acta de inicio.

POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA		MONTO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	6/03/2023	06/09/2024	$ 54.553.291,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/03/2023	06/03/2027	$ 27.276.645,80
CALIDAD DEL SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/03/2024	06/03/2025	$ 54.553.291,60

2.10. COMITÉ DE OBRA

A la fecha de este informe por parte de la interventoría se han realizado los siguientes comités de obra con la supervisión y el contratista. **Ver anexo 5.8**

FECHA	COMITÉ No	TEMAS	ASISTENTES
07/09/2023	13	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA, PERSONAL DE OBRA, ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA.	ALEJANDRO ENRIQUEZ (SUPERVISOR), WILSON GENEY (AUXILIAR INTERVENTORÍA), CESAR ORLANDO NARVAEZ (RESIDENTE DE OBRA), ANDRÉS CAMILO GARZÓN (INTERVENTORIA), IBETH ILLERAS (AUXILIAR DE DESPACHO).
14/09/2023	14	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA, PERSONAL DE OBRA, IMPREVISTOS	ALEJANDRO ENRIQUEZ (SUPERVISOR), WILSON GENEY (AUXILIAR INTERVENTORÍA), CESAR ORLANDO NARVAEZ (RESIDENTE DE OBRA), ANDRÉS CAMILO GARZÓN (INTERVENTORIA), IBETH ILLERAS (AUXILIAR DE DESPACHO).
21/09/2023	15	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA, PERSONAL DE OBRA,	ALEJANDRO ENRIQUEZ (SUPERVISOR), WILSON GENEY (AUXILIAR INTERVENTORÍA), CESAR ORLANDO NARVAEZ (RESIDENTE DE OBRA), ANDRÉS CAMILO GARZÓN (INTERVENTORIA), IBETH ILLERAS (AUXILIAR DE DESPACHO).
05/10/2023	16	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA, PERSONAL DE OBRA, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA	ALEJANDRO ENRIQUEZ (SUPERVISOR), WILSON GENEY (AUXILIAR INTERVENTORÍA), CESAR ORLANDO NARVAEZ (RESIDENTE DE OBRA), ANDRÉS CAMILO GARZÓN (INTERVENTORIA), IBETH ILLERAS (AUXILIAR DE DESPACHO).

3. CAPITULO III. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

3.1. ASPECTO LEGAL Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

3.1.1 Información General del Contrato

CUADRO GENERAL DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N°:	0756-23
OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	$3.684.062.560,88 (TRES MIL SEISIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE)
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
SUPERVISOR:	ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON
INTERVENTOR CONTRATO:	UT INTERCOMEDOR ITSI
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	05 DE MARZO DE 2024
MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

3.2. ACTAS SUSCRITAS

A la fecha se han suscrito las siguientes actas por parte del contratista.

FECHA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA
23 de febrero de 2023	CONTRATO 0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
06 de febrero de 2023	ACTA DE INICIO	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
28 de Agosto de 2023	ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS #1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
29 de Agosto de 2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS #1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
07 de Septiembre de 2023	ACTA PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
13 de Septiembre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
21 de Septiembre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°2 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S

3.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación, se relaciona un resumen de las actividades ejecutadas en el periodo, y se anexa el informe técnico mensual del contratista para ver a detalle las actividades ejecutadas. **Ver anexo 5.9**

- Se realiza fundida de todos los pedestales (18 und) y se instalan las platinas y pernos para posterior montaje de la estructura metálica de cubierta.
- Retiro de formaleta metálica de los pedestales fundidos.
- Se realiza encofrado y alineación de columnas para posterior fundida.
- Se realiza fundida de 19 columnas.
- Se realiza demolición de muro de cerramiento del colegio para reubicación del acceso a la obra, ya que este obstruye la cimentación del proyecto.

- Se realiza construcción de nuevo muro de cerramiento, con sus respectivas columnetas, viga dintel y reubicación del portón de acceso a la obra.
- Se realiza excavación manual de las 2 zapatas restantes, instalación de acero de refuerzo y fundida de las mismas.
- Armado e instalación de refuerzo de vigas de cimentación restantes, encofrado y fundida de las mismas.
- Se realiza cargue y retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
- Llegada de material de recebo para la actividad de relleno y compactación de la cimentación.
- Llegada de material de recebo para la actividad de relleno y compactación de la cimentación.
- Se realiza montaje de plataforma con formaleta de madera para la instalación de acero de refuerzo de las vigas aéreas.
- Se realiza montaje de plataforma con formaleta de madera para la instalación de acero de refuerzo de las vigas aéreas.
- Se recibe primer despacho de la estructura metálica para la cubierta.
- Se realiza montaje e hincado de la estructura metálica de la cubierta.

3.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.4.1 Personal de obra del contratista

A continuación, se relaciona el personal de obra del contratista que laboró en este periodo. Se anexa planilla de pago de seguridad social y parafiscales. **Ver anexo 5.10**

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR
Wilver Franciny Russy Ladino	Director de Obra
Cesar Orlando Narvaez Quiñonez	Residente de Obra
Carlos Alberto Oviedo Chavarro	Profesional eléctrico
Yesenia Alvarez Acosta	Profesional Social
Sandra Milena Santiago Camacho	Apoyo SST
Alfonso Manuel Vergara Herrera	Maestro de Obra
Sigilfredo Mendez Paredes	Oficial de Obra
Abelino Homero Muñoz Lopez	Oficial de Obra
Antonio Jose Carvallido Carpio	Ayudante de obra
Hector Julio Escobar Saavedra	Ayudante de obra
Alveiro Carpio Peñaloza	Ayudante de obra
Alexander Jimenez Santamaria	Ayudante de obra
Elvis Carpio Peñaloza	Ayudante de obra
Carlos Rodriguez Lopez	Ayudante de obra
Elkin Reyes Serrano	Ayudante de obra
Jair Carpio Peñaloza	Ayudante de obra
Domingo Moreno Carvajalino	Ayudante de obra
Kevin Ortega Camargo	Ayudante de obra
Brayan Andres Cossio Santamaria	Ayudante de obra
Mario Rafael Fontalvo Perez	Ayudante de obra
Deibi Carpio Agudelo	Ayudante de obra
Jose Angel Peñaloza Larios	Ayudante de obra
Juan Perez Ferrer	Ayudante de obra
Manuel Bandera Perez	Ayudante de obra

Durante el periodo de tiempo comprendido en este informe ingresaron los señores Juan Pérez Ferrer y Manuel Bandera Pérez en el cargo de Ayudante de obra. El día 15 de septiembre del 2023, renunció el señor Isnardo De Jesús Moreno Arrieta al cargo de Ayudante de obra y el día 02 de Octubre del 2023 renunció el señor Wilmar Ortiz Mendoza al cargo de Oficial de obra.

PERSONAL MONTAJE ESTRUCTURA METALICA	
NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR
Julian Rojas	Operador grua
Ronny Reyes Cisneros	Soldador
Edilberto Lerma Soto	Armador - Montador
Andres Mateo Aponte Bergaño	Armador - Montador

3.4.2 Control de equipos de obra

A continuación, se presenta la relación de herramientas y equipos usados por el contratista durante el periodo de este informe.

EQUIPO/HERRAMIENTA	CANTIDAD
Herramienta menor	12
Pulidora 7"	2
Martillo demoledor mediano	1
Vibrador de concreto	2
Motobomba	1
Compactador tipo canguro	2
Cortadora de concreto	1
Autobomba de concreto	1
Camión tipo mixer	3
Minicargador	1
Volquetas	5

3.4.3 Correspondencia

En el periodo correspondiente de este informe el contratista envió los siguientes comunicados a la interventoría. **Ver anexo 5.5**

FECHA	OFICIO N°	ASUNTO	ENVÍA	RECÍBE
11/09/2023	0034-0756	RADICACION ACTA DE CORTE 1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	ÁREA JURIDICA ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
3/10/2023	0035-0756	RADICACIÓN INFORME REVISIÓN DISEÑO HIDROSANITARIO	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
3/10/2023	0036-0756	RADICACION FICHA TECNICA VENTILADOR	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI

3.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS

A continuación, se presenta la forma de pago estipulada por contrato y la disponibilidad presupuestal para el contratista.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:

A. Actas de Avance parcial: Se generarán actas de pagos parciales hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, previa presentación de las respectivas actas de avance e informe de ejecución de obra aprobado por la Interventoría y visto bueno de la Supervisión.

B. Acta de Pago Final: El restante diez por ciento (10%) del valor del contrato se pagará una vez realizado el recibo final y la liquidación del contrato, dentro de las cuales se debe incluir por lo menos la aprobación de la garantía de estabilidad de la obra actualizada y los soportes del pago de las obligaciones derivadas del sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales. El pago de las diferentes actas está al sujeto al PAC, a los giros de Nación y su respectivo recaudo, según sea el caso.

En todo caso, dado que la forma de pago es por precios unitarios y que en su ejecución puede suceder que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta, las partes acuerdan que para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no

Código	CCE-EICP-IDI-35	Versión	3



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-IDI-35	Página	9 de 17
Versión No.	3		

sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago respectivo se hará con sujeción a la programación anual de caja PAC de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC).

PARAGRAFO TERCERO: En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. NOTA: EL DISTRITO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

PARÁGRAFO CUARTO: - El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, excepto lo previsto en el análisis de riesgo, la fuerza mayor y el caso fortuito previa deducción del imprevisto.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-00750 del 03 de Febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-2202-0700-051-220057-2.3.2.02.02.005, por concepto de CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION, fuente de financiación CREDITO INTERNO por valor de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.306.985.499); Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-01132 del 15 de febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-22-2201-0700-051-220057-01-2.3.2.02.02.005 por concepto de CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION, fuente de financiación CREDITO INTERNO, por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($589.678.168), Y ACUERDO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS No. 045 de 2022.

3.6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (SST)

A continuación, se relacionan las actividades principales del área SST, ejecutadas por el contratista. Y se incluye el informe HSE para ver a detalle el trabajo realizado por el equipo de trabajo. **Ver anexo 5.11**

- Se realizaron las respectivas charlas diarias de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar la jornada laboral.

- Se realizó constantemente la reposición de EPP's por daños a los trabajadores.
- Con ayuda del formato que se implementó de ENCUESTA DE AUTOCUIDADO se pudo determinar que ningún trabajador presentó sintomatología y/o posible contagio de COVID19.
- Se realizaron inspecciones de herramientas y equipos usados en el periodo.
- Se realizaron inspecciones diarias de áreas verificando el orden y aseo continuo.
- Se realizaron las charlas de seguridad, pausas activas, COPASST, CCL, capacitaciones e inducciones a todo el personal que laboró en el periodo de este informe.
- Se diligenciaron los permisos de trabajo necesarios para las actividades realizadas en el periodo.

3.7. ACTIVIDADES SOCIO AMBIENTALES

A continuación, se relacionan algunas de las actividades principales del área ambiental, ejecutadas por el contratista. Y se incluye el informe Socio Ambiental para ver a detalle el trabajo realizado. **Ver anexo 5.12**

- Atención a PQRS por parte de representantes del colegio ITSI y comunidad en general y se realiza reunión con las directivas del colegio, para presentar el avance y seguimiento actual de obra.
- Se realiza limpieza continua de baños portátiles por la empresa que los suministró, y se aporta el certificado emitido por disposición final de residuos.
- Se realizan las respectivas capacitaciones al personal de obra donde se tratan temas relacionados con la parte ambiental.
- Se realiza retiro de material sobrante hacia disposición final y se soporta con el

certificado de escombrera.

3.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

- A la fecha de este informe, se entregaron a la interventoría los resultados emitidos por el laboratorio, de las pruebas de resistencia del concreto de la tercera y cuarta fundida en los tiempos indicados (7 días, 14 días, 28 días), y a su vez se realizaron nuevas tomas de muestra de las fundidas que se realizaron en este periodo.
- En el periodo de este informe se realizó la instalación de acero de refuerzo en la cimentación, vigas aéreas y columnas del proyecto, el cual fue verificado por interventoría, con su respectivo certificado de calidad.
- Las actividades de obra se han realizado siguiendo y respetando las especificaciones técnicas entregadas por la entidad contratante y con aval de la interventoría.

3.9. CONTROL DE GARANTIAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que ampara el contrato de obra, actualizadas por acta de inicio.

Póliza de cumplimiento	11-44-101198726		
Póliza de Responsabilidad civil Extracontractual	11-40-101051776		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de expedición:	30 de marzo de 2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha inicial	fecha final	
Cumplimiento de Contrato	*06/03/2023*	*06/07/2024*	$736.812.513,00
Salarios y prestaciones sociales	*06/03/2023*	*06/03/2027*	$368.406.257,00
Estabilidad de la obra	*Si ampara 5 años, o meses y 1 días*		$736.812.513,00
Responsabilidad civil extracontractual	*06/03/2023*	*05/03/2024*	$464.000.000,00

3.10. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el quinto mes de obra, se presentó en general un buen estado del clima, lo cual permitió la continuidad a los trabajos de obra. Los recuadros marcados como tiempo lluvioso, por parte de interventoría se tomó la decisión de suspender actividades en esa franja de tiempo.

	SEPTIEMBRE																								OCTUBRE				
HORA DEL DÍA	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
7:00-8:00																														
8:00-9:00																														
9:00-10:00																														
10:00-11:00																														
11:00-12:00																														
DESCANSO																														
13:30:-14:00																														
14:00-15:00																														
15:00-16:00																														
16:00-17:00																														

DOMINICALES - FESTIVOS TIEMPO SECO TIEMPO LLUVIOSO

4. CAPITULO IV. CONCLUSIONES

- En el periodo correspondiente a este informe, el contratista cumplió con las actividades realizadas de manera correcta y segura, siguiendo las especificaciones técnicas y las recomendaciones de la interventoría.
- Por lluvias presentes en este periodo de tiempo (horario nocturno), el área de trabajo se ha encontrado colmatado de agua y los trabajos se han visto afectados ya que ha sido necesario realizar bombeos para evacuar el agua del área de excavaciones.
- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfección de manos, herramientas y áreas, se tuvo control con los empleados en cuanto a la prevención y mitigación del contagio de COVID19.
- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo a las exigencias de la obra en mención.
- Para las fundidas de los elementos estructurales realizadas en el periodo comprendido de este informe, se tomaron las muestras del concreto, las cuales se llevaron al laboratorio para realizar el respectivo ensayo de resistencia a la compresión del concreto. Dichos ensayos se realizaron a los 7, 14 y 28 días después de fabricación de las muestras, concluyendo en los resultados de los ensayos que se cumple con el concreto de diseño de 3000 PSI para dichos elementos.
- Durante el periodo de tiempo comprendido en este informe, se contrató a dos ayudantes de obra, a su vez renunció un oficial de obra y un ayudante de obra.
- Ingresa una parte de la estructura metálica de la cubierta a la obra, y a su vez el personal encargado del montaje e instalación (1 operador de grúa, 1 soldador, 2 armadores-montadores).

- Por parte del contratista y la interventoría se realizó un Acta de Recibo Parcial #1 y dos Actas aclaratorias al acta de Recibo Parcial #1. Se recibió del pago del Acta de Recibo Parcial No.1 el día 03 de octubre del 2023.
- El pago a interventoría del acta de recibo parcial N° 1 fue por un valor de $48.280.621,69 (CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS CON SENSETA Y NUEVE CENTAVOS MCTE).
- El pago al contratista del acta de recibo parcial N° 1 fue por un valor de $652.092.013.92 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRECE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MCTE).
- Este informe de interventoría tiene como objetivo principal, servir de anexo para el acta parcial de obra y de interventoría que se va a presentar.

5. CAPITULO V. ANEXOS

5.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
INTERVENTOR:	UT INTERCOMEDOR ITSI
SUPERVISOR:	ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-09-2023 AL 05-10-2023
DIRECCIÓN Y SECTOR:	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL

FOTOGRAFÍA No 1 – FUNDIDA DE PEDESTALES E INSTALACIÓN DE PLATINAS Y PERNOS.



RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23





RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23





RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23





REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

FOTOGRAFÍA No. 2 – RETIRO DE FORMALETA METÁLICA DE LOS PEDESTALES.





REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

FOTOGRAFÍA No.3 – ENCOFRADO, ALINEACIÓN Y FUNDIDA DE COLUMNAS.





RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23





RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23





RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23





REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

FOTOGRAFÍA No.4 – DEMOLICIÓN MURO DE CERRAMIENTO PARA ACCESO A LA OBRA.





REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

FOTOGRAFÍA No.5 – CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MURO DE CERRAMIENTO Y REUBICACIÓN PORTON E ACCESO A LA OBRA.





RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23





REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

FOTOGRAFÍA No.6 – EXCAVACIÓN MANUAL DE ZAPATAS, INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Y FUNDIDA DE LAS MISMAS.





REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

FOTOGRAFÍA No.7 – ARMADO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, ENCONFRADO Y FUNDIDA DE LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN.





RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23





REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

FOTOGRAFÍA No.8 – CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LAS EXCAVACIONES.





RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23





RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo.
Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23





REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

FOTOGRAFÍA No.9 – RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE RECEBO DE LA CIMENTACIÓN.





RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23





RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23





RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23



FOTOGRAFÍA No.10 – DEMOLICIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN.





REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23





FOTOGRAFÍA No. 11 – MONTAJE PLATAFORMA CON FORMALETA DE MADERA



RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23





REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

FOTOGRAFÍA No.12 – FIGURADO, ARMADO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS AEREAS.





RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo.
Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23







REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

FOTOGRAFÍA No.13 - LLEGADA ESTRUCTURA METALICA PARA LA CUBIERTA





REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

FOTOGRAFÍA No.14 – MONTAJE E HINCADO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA.





RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo.
Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23





RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo.
Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23





RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23





5.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Pág 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	9	2023	2. No. INFORME	27	3. SEMANA No.	27
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	04/09/2023 AL 10/09/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 61.936.457,11	2,36%	100,00%	2,36%	100,00%	2,36%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 146.367.647,15	5,57%	100,00%	5,57%	100,00%	5,57%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 907.316.630,93	34,55%	26,00%	8,98%	26,47%	9,14%	0,47%	0,16%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,70	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 655.506.499,83	24,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,46	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,01	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 37.892.628,70	1,44%	82,00%	1,18%	82,00%	1,18%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,79	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.135.731,10	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 424.437.934,82	16,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 6.226.480,00	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 21.499.495,00	0,82%	100,00%	0,82%	100,00%	0,82%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.626.339.636,19	100,00%		18,92%		19,08%		0,16%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	17,70%	17,70%	0,00%
Durante el periodo	1,38%	1,22%	0,16%
Acumulado Actual	19,08%	18,92%	0,16%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	1,22%	18,92%
Valor de la Obra Programada	$ 32.041.343,56	$ 496.777.878,84

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,38%	19,08%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 36.243.486,98	$ 501.042.267,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

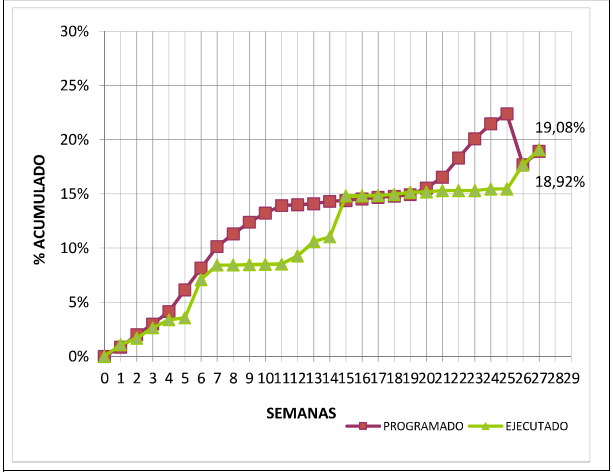

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	15	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	F
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	18	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	1	RETROCARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	S
OFICIAL	3	MOTOBOMBA	1	VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	S
RESIDENTE	1	VOLQUETA	1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Se retira formaleta de pedestales fundidos.
2. Finaliza el armado y figurado del acero de refuerzo para las columnas.
3. Se realiza bombeo de agua, producto de las fuertes lluvias presentadas en horas de la madrugada.
4. Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
5. Se realiza chequeo de niveles de los pedestales y se realiza la instalación de formaleta para los pedestales de 30 X 30.
6. Por parte de interventoría se realiza verificación de la formaleta instalada y se da aval para la fundida.
7. Se realiza fundida en concreto de los pedestales y se procede a instalar las respectivas platinas.
8. Se continúa con los trabajos de excavación manual para las zapatas pendientes.
9. Se inicia con el armado de formaletas y alineación de columnas.
10. Se inician los trabajo de traslado del portón para ingreso a la obra.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Se realiza comité semanal de obra con todo el equipo de trabajo del contratista, interventoría, asesor del despacho y supervisor.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. Durante el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.
4. Se corrige la demarcación con cinta de peligro que se vio afectada por las lluvias presentadas en las madrugadas.
5. El contratista inicia con la vigilancia nocturna para los trabajos de traslado del portón de ingreso a la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista ni a la interventoría.

K. JURIDICA

1. En el período no se presentan modificaciones al contrato de interventoría 0757-23.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e item no previstos N°1 y el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e item no previstos N°1 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	10	9	2023	No. INFORME	27	SEMANA No. 27

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 04 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado y alineado de formaletas para pedestales.



FECHA FOTO: 06 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Fundida de concreto de pedestales.



FECHA FOTO: 06 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Instalación de platinas en pedestales.



FECHA FOTO: 06 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Fundida de concreto de pedestales.



FECHA FOTO: 05 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Orden y aseo general.



FECHA FOTO: 06 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Instalación de platinas en pedestales.

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Pág 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	9	2023	2. No. INFORME	28	3. SEMANA No.	28
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	11/09/2023 AL 17/09/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 61.936.457,11	2,36%	100,00%	2,36%	100,00%	2,36%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 146.367.647,15	5,57%	100,00%	5,57%	100,00%	5,57%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 907.316.630,93	34,55%	27,00%	9,33%	27,03%	9,34%	0,03%	0,01%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,70	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 655.506.499,83	24,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,46	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,01	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 37.892.628,70	1,44%	82,00%	1,18%	82,00%	1,18%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,79	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.135.731,10	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 424.437.934,82	16,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 6.226.480,00	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 21.499.495,00	0,82%	100,00%	0,82%	100,00%	0,82%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.626.339.636,19	100,00%		19,26%		19,27%		0,01%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	19,08%	18,92%	0,16%
Durante el periodo	0,19%	0,34%	-0,15%
Acumulado Actual	19,27%	19,26%	0,01%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,34%	19,26%
Valor de la Obra Programada	$ 8.929.554,76	$ 505.851.045,15

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,19%	19,27%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 4.990.045,31	$ 506.123.240,13

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

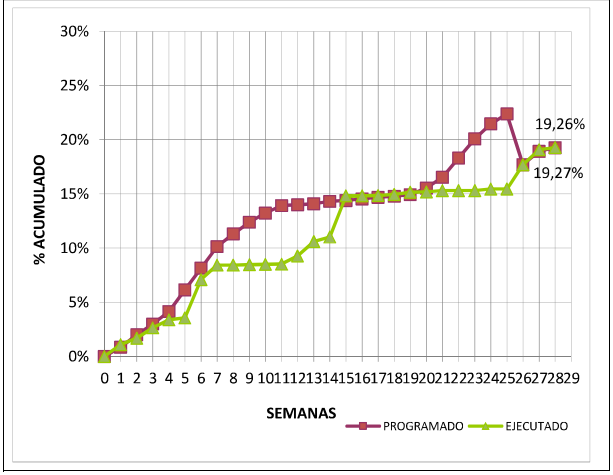

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	15	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	S
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	20	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	1	RETROCARGADOR O BOBCAT	1	JUEVES	L
OFICIAL	3	MOTOBOMBA	1	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	2	SÁBADO	S
RESIDENTE	1	VOLQUETA	4	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Llega minicargador a la obra para apoyar con las actividades de retiro de material sobrante y rellenos con Recebo.
2. Se realiza la actividad de relleno con recebo compactado según especificación ténica.
3. Se realizan retiros de material sobrante proveniente de las excavaciones.
4. Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
5. Se realiza desencofrado de las columnas fundidas y se inicia el armado de formaleta de las columnas faltantes.
6. Por parte de interventoría se realiza verificación de la formaleta instalada y se da aval para la fundida.
7. Se realiza fundida en concreto de 3000 Psi de las columnas armadas.
8. Se continúa con los trabajos de excavación manual para las zapatas pendientes.
9. Se continúa con los trabajos de demolición, armado, y traslado del portón de entrada a la obra.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Se realiza comité semanal de obra con todo el equipo de trabajo del contratista, interventoría, asesor del despacho y supervisor.

F. FINANCIERA

1. Durante el periodo de este informe se radicó el acta parcial de cobro N°1 del contrato de obra 0756-23.
2. Durante el periodo de este informe se radicó el acta parcial de cobro N°1 del contrato de interventoría 0757-23.

G. SOCIAL

1. Durante el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.
4. El contratista continúa con la vigilancia nocturna para los trabajos de traslado del portón de ingreso a la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.
3. Se realizan retiros de material sobrante de las excavaciones y se llevan a disposición final en escombrera certificada.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista ni a la interventoría.

K. JURIDICA

1. En el período no se presentan modificaciones al contrato de interventoría 0757-23.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e item no previstos N°1 y el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e item no previstos N°1 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	17	9	2023	No. INFORME	28	SEMANA No. 28
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA					
CONTRATO OBRA No:	0756-23			CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23			INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI	

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 11 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de material sobrante de forma mecánica.



FECHA FOTO: 11 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado y alineado de formaleta para columnas.



FECHA FOTO: 12 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Fundida en concreto de 3000 Psi para columnas.



FECHA FOTO: 12 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Relleno con recebo y compactación del mismo.



FECHA FOTO: 15 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Aplome y corrección de columna fundida.



FECHA FOTO: 17 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Construcción de muro perimetral.

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	9	2023	2. No. INFORME	29	3. SEMANA No.	29
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	18/09/2023 AL 24/09/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 61.936.457,11	2,36%	100,00%	2,36%	100,00%	2,36%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 146.367.647,15	5,57%	100,00%	5,57%	100,00%	5,57%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 907.316.630,93	34,55%	29,00%	10,02%	29,08%	10,05%	0,08%	0,03%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,70	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 655.506.499,83	24,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,46	0,97%	6,00%	0,06%	0,00%	0,00%	-6,00%	-0,06%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,01	1,35%	3,00%	0,04%	0,00%	0,00%	-3,00%	-0,04%
ALCANTARILLADO	$ 37.892.628,70	1,44%	82,00%	1,18%	82,00%	1,18%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,79	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.135.731,10	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 424.437.934,82	16,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 6.226.480,00	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 21.499.495,00	0,82%	100,00%	0,82%	100,00%	0,82%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.626.339.636,19	100,00%		20,05%		19,98%		-0,07%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	19,27%	19,26%	0,01%
Durante el periodo	0,71%	0,79%	-0,08%
Acumulado Actual	19,98%	20,05%	-0,07%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,79%	20,05%
Valor de la Obra Programada	$ 20.748.083,13	$ 526.580.106,05

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,71%	19,98%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 18.647.011,42	$ 524.723.231,07

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

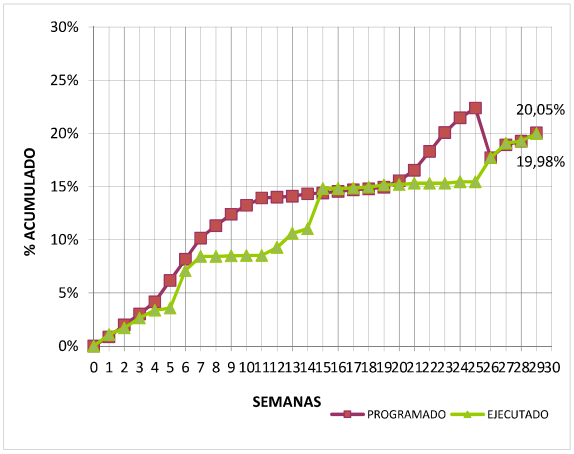

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	16	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	S
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	20	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	1	RETROCARGADOR O BOBCAT	1	JUEVES	S
OFICIAL	3	MOTOBOMBA	1	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	2	SÁBADO	F
RESIDENTE	1	VOLQUETA	2	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Se realiza retiro del minicargador de obra.
2. Se continúa con la actividad de relleno de recebo compactado según especificación ténica.
3. Se realizan retiros de material sobrante proveniente de las excavaciones.
4. Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
5. Se realiza desencofrado de las columnas fundidas.
6. Ingresa material de acero de refuerzo a la obra y se inicia la actividad de figurado y armado de las vigas aereas.
7. Se realiza fundida de las 2 zapatas faltantes en concreto de 3000 Psi.
8. Se realiza la demolición del pozo de inspección para darle paso al armado de la zapata faltante.
9. Se continúa con los trabajos de demolición, armado, y traslado del portón de entrada a la obra.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Se realiza comité semanal de obra con todo el equipo de trabajo del contratista, interventoría, asesor del despacho y supervisor.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. Durante el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.
4. El contratista continúa con la vigilancia nocturna para los trabajos de traslado del portón de ingreso a la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.
3. Se realizan retiros de material sobrante de las excavaciones y se llevan a disposición final en escombrera certificada.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista ni a la interventoría.

K. JURIDICA

1. En el período no se presentan modificaciones al contrato de interventoría 0757-23.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e item no previstos N°1 y el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e item no previstos N°1 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:	24	9	2023	No. INFORME	29	SEMANA No. 29
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA					
CONTRATO OBRA No:	0756-23			CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23			INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI	

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 18 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Desencofre de columnas fundidas.



FECHA FOTO: 18 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Relleno con recebo y compactación del mismo.



FECHA FOTO: 19 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de material sobrante de forma mecánica.



FECHA FOTO: 21 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Construcción de muro y traslado de portón perimetral.



FECHA FOTO: 21 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Relleno con recebo y compactación del mismo.



FECHA FOTO: 21 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Relleno con recebo y compactación del mismo.

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Pág 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	1	10	2023	2. No. INFORME	30	3. SEMANA No.	30
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	25/09/2023 AL 01/10/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 61.936.457,11	2,36%	100,00%	2,36%	100,00%	2,36%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 146.367.647,15	5,57%	100,00%	5,57%	100,00%	5,57%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 907.316.630,93	34,55%	31,00%	10,71%	32,17%	11,11%	1,17%	0,40%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,70	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 655.506.499,83	24,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,46	0,97%	8,00%	0,08%	0,00%	0,00%	-8,00%	-0,08%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,01	1,35%	5,00%	0,07%	0,00%	0,00%	-5,00%	-0,07%
ALCANTARILLADO	$ 37.892.628,70	1,44%	82,00%	1,18%	82,00%	1,18%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,79	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.135.731,10	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 424.437.934,82	16,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 6.226.480,00	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 21.499.495,00	0,82%	100,00%	0,82%	100,00%	0,82%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.626.339.636,19	100,00%		20,79%		21,05%		0,26%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	19,98%	20,05%	-0,07%
Durante el periodo	1,07%	0,74%	0,33%
Acumulado Actual	21,05%	20,79%	0,26%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,74%	20,79%
Valor de la Obra Programada	$ 19.434.913,31	$ 545.940.845,70

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,07%	21,05%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 28.101.834,11	$ 552.759.314,96

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

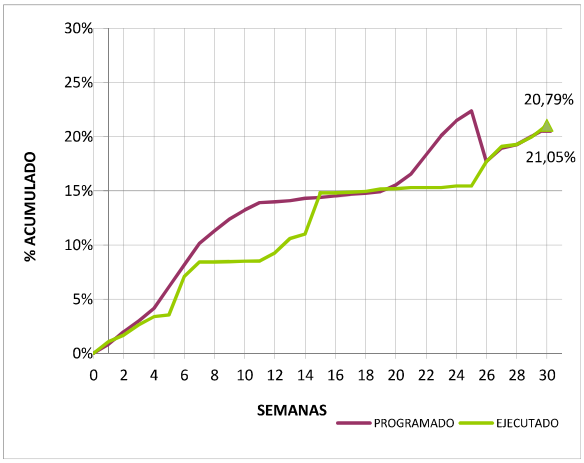

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	16	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	S
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	22	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	L
MAESTRO	1	RETROCARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	S
OFICIAL	3	MOTOBOMBA	1	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	S
RESIDENTE	1	VOLQUETA	0	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Se realiza armado y figurado de las vigas de cimentación faltantes, y se inicia el encofrado de las mismas.
2. Se continúa con el figurado de acero de refuerzo de las vigas aereas.
3. Se realiza fundida de las vigas de cimentación faltantes, con lo cúal se finaliza por completo esta actividad.
4. Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
5. Se realiza desencofrado de las vigas fundidas y se inicia el armado de las columnas faltantes.
6. Ingresa el acero estructural a obra y se inicia el armado de la cubierta.
7. Ingresa a obra camillas de madera, cerchas metálicas y parales, y se inicia el armado de las plataformas para las vigas aereas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. Durante el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista ni a la interventoría.

K. JURIDICA

1. En el período no se presentan modificaciones al contrato de interventoría 0757-23.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e item no previstos N°1 y el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e item no previstos N°1 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	1	10	2023	No. INFORME	30	SEMANA No. 30
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA					
CONTRATO OBRA No:	0756-23			CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23			INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI	

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 25 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Figurado de acero de refuerzo para vigas.



FECHA FOTO: 25 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN:armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación.



FECHA FOTO: 27 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Llegada de acero estructural a obra.



FECHA FOTO: 28 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado y formaleteado de columnas .



FECHA FOTO: 29 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado de plataforma para vigas aereas.



FECHA FOTO: 30 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado e hincado de la estructura metálica.

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Pág 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	8	10	2023	2. No. INFORME	31	3. SEMANA No.	31
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	02/10/2023 AL 08/10/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 61.936.457,11	2,36%	100,00%	2,36%	100,00%	2,36%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 146.367.647,15	5,57%	100,00%	5,57%	100,00%	5,57%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 907.316.630,93	34,55%	33,00%	11,40%	35,04%	12,11%	2,04%	0,70%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,70	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 655.506.499,83	24,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,46	0,97%	9,00%	0,09%	0,00%	0,00%	-9,00%	-0,09%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,01	1,35%	6,00%	0,08%	0,00%	0,00%	-6,00%	-0,08%
ALCANTARILLADO	$ 37.892.628,70	1,44%	82,00%	1,18%	82,00%	1,18%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,79	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.135.731,10	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 424.437.934,82	16,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 6.226.480,00	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 21.499.495,00	0,82%	100,00%	0,82%	100,00%	0,82%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.626.339.636,19	100,00%		21,50%		22,04%		0,54%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	21,05%	20,79%	0,26%
Durante el periodo	0,99%	0,71%	0,28%
Acumulado Actual	22,04%	21,50%	0,54%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,71%	21,50%
Valor de la Obra Programada	$ 18.647.011,42	$ 564.694.381,83

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,99%	22,04%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 26.000.762,40	$ 578.799.302,27

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

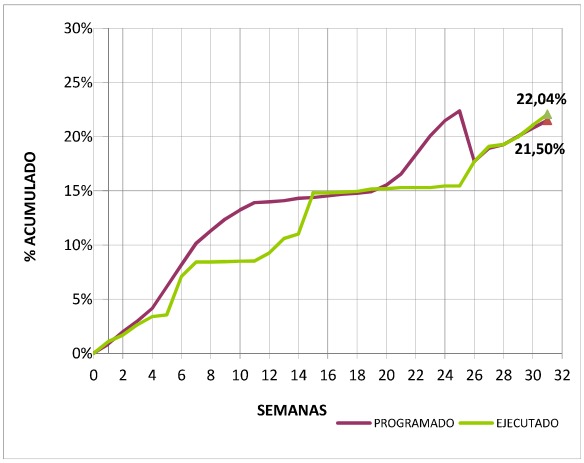

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	16	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	S
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	4	HERRAMIENTA MENOR	20	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	1	RETROCARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	S
OFICIAL	2	MOTOBOMBA	0	VIERNES	L
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	F
RESIDENTE	1	CAMA BAJA - GRÚA	1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Se continúa con el armado de las plataformas para la instalación de las vigas aereas.
2. Se continúa con el armado e instalación de acero de refuerzo de las vigas aereas.
3. Se realizan trabajos de soldadura en la estructura metálica, alineación y ajuste de pernos.
4. Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
5. Se retira de la obra la cama baja con grúa.
6. Se continúa con el hincado y montaje de las cerchas para la cubierta metálica.
7. Ingresa a obra el faltante del acero de refuerzo para la construcción de todas las vigas aereas.
8. Se realiza la instalación de platinas en las vigas aereas, que sirven de soporte para las viguetas metálicas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Se realiza comité semanal de obra con todo el equipo de trabajo del contratista, interventoría, auxiliar del despacho, supervisor.
3. En el periodo de este informe se realiza el retiro de un (1) oficial de obra.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. Se realiza reunión informativa con el consejo directivo del colegio, donde se informan detalles del proyecto y su avance actualmente.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.
4. Se realiza el respectivo proceso de paz y salvo con el trabajador que se retiró.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se realizó el primer pago por acta parcial al contratista.
2. A la fecha de corte del presente informe se realizó el primer pago por acta parcial a la interventoría.

K. JURIDICA

1. En el período no se presentan modificaciones al contrato de interventoría 0757-23.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e item no previstos N°1 y el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e item no previstos N°1 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:	8	10	2023	No. INFORME	31	SEMANA No. 31
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA					
CONTRATO OBRA No:	0756-23			CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23			INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI	

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 02 de octubre de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado de plataforma para la construcción de vigas.



FECHA FOTO: 03 de octubre de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado de acero estructural para cubierta metálica.



FECHA FOTO: 04 de octubre de 2023
DESCRIPCIÓN: Aplicación de soldadura a estructura metálica.



FECHA FOTO: 05 de octubre de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado de vigas aereas.



FECHA FOTO: 07 de octubre de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado de vigas aereas.



FECHA FOTO: 07 de octubre de 2023
DESCRIPCIÓN: Instalación de platinas para las viguetas.

5.3. BITÁCORA DE OBRA

Fecha: 06 de septiembre de 2023 / Miercoles.

- Inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se realiza verificación de la formaleta instalada y el eje de los pedestales.
- Se realiza verificación y armado de platinas con sus respectivos pernos.
- En horas de la mañana se presenta visita por parte del alcalde y su equipo de trabajo en la obra.
- Se realiza fundida en concreto de todos los pedestales y se instala la platina base con sus respectivos pernos.
- Se realiza acompañamiento por parte de interventoría durante toda la jornada.
- El contratista inicia con la vigilancia nocturna con guarda de seguridad, para reubicación del acceso a la obra.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 07 de Septiembre de 2023 / Jueves

- Inician actividades de obra a las 7:00 am con la respectiva charla diaria SST.
- Se retira la formaleta de los pedestales fundidos
- Se realiza recambio continuo de EPP's por parte del profesional HSE del contratista.
- Se inicia el armado de formaletas de las columnas y alineación de las mismas.
- Se realiza comité semanal de obra, donde participa

el contratista, interventoría, supervisor y auxiliar de despacho de la alcaldía. De este comité surge un acta donde se describen los temas tratados, decisiones tomadas y compromisos surgidos durante la reunión.
- Inicia la demolición del muro perimetral del colegio, para el traslado del portón actual.

Residente de interventoría

Residente de obra.

Fecha: 08 de Septiembre de 2023 | Viernes

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Se continúa con el armado y alineado de formaleta para las columnas.
- Continua la excavación manual de las 2 zapatas faltantes.
- Se continúa con la demolición del muro perimetral del colegio para el traslado del portón y la construcción de las zapatas pendientes.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que todas las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 09 de septiembre de 2023 / Sábado

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se continúa con la excavación manual de las 2 zapatas faltantes.
- Se inicia el armado y figurado de acero de refuerzo para la columna que sostiene al portón que se va a trasladar.
- Se realiza jornada de orden y aseo en toda la obra y campamento
- Se continúa con el armado de formaleta para las columnas.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 11 de septiembre de 2023 / Lunes


- Se inician actividades de obra a las 7:00am con la charla diaria SST.
- Llegada de minicargador a la obra, con el cual se inicia la actividad de cargue y retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
- Llegada a obra de Recebo para los rellenos.
- Se continua con el encofrado y alineado del columnas para la respectiva fundida.
- Se continúa con los trabajos del muro perimetral, para el traslado del portón.
- Se realiza jornada de orden y aseo general.

Residente de interventoría


Residente de obra

Fecha: 12 de Septiembre de 2023 / Martes.

- Inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Continúa con la llegada de Recebo a la obra y se realiza el relleno correspondiente y compactado adecuado.
- Se continúa con los respectivos retiros de material sobrante proveniente de excavaciones.
- Se realiza la fundida de 10 columnas en el área del comedor y una columna de muro perimetral que sostiene el portón.
- Se realiza acompañamiento continuo por parte de interventoría.
- Se realiza jornada de orden y aseo



Residente de interventoría



Residente de obra

Fecha: 13 de Septiembre de 2023 / Miercoles

- Inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se continúa con el retiro de material sobrante producto de las excavaciones
- Se continua con la demolición del muro perimetral para el traslado del portón.
- Se realiza desencofrado de columnas y se inicia con la formaleteada de las demás columnas a fundir.
- Se realiza jornada de orden y aseo en obra y campamento.
- Se continúa con los rellenos y compactación

del recebo. en el área de la cimentación.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 14 de septiembre de 2023 / Jueves

- Inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se presentan lluvias fuertes de 7:00 am a 8:30 am por lo que la interventoría toma la decisión de suspender actividades en esa franja horaria.
- Se continúa con los retiros de material sobrante a disposición final.
- Se continúa con la demolición del muro perimetral para el traslado del portón.
- Se continúa con el encofrado de las columnas a fundir.
- Se continúa con los rellenos y compactados de Recebo en el área de la cimentación.
- Se realiza comité semanal de obra, donde participa la interventoría, el contratista, el supervisor y el asesor del despacho de la alcaldía. De este comité surge un acta, donde se describen las temas tratados, decisiones tomadas y compromisos surgidos durante la reunión.
- Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que todas las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.

Residente de interventoría

Residente de obra

092

Fecha: 15 de septiembre de 2023 / Viernes

- Inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se continúa con el retiro de material producto de las excavaciones hacia disposición final.
- Se continúa con la demolición del muro perimetral para el traslado del portón, para el ingreso a la obra.
- Se realiza jornada de orden y aseo general.
- Se continúa con el armado de formaleta para las columnas.
- Se continúa con los rellenos con recebo y compactación del mismo.
- Se presenta llegada constantemente de Volquetas a la obra y por parte de interventoría se verifica que el contratista tenga un auxiliar de tráfico o paletero en cada movimiento.
- Se realiza el retiro de (1) obrero.


Residente de interventoría

Residente de obra


Fecha: 16 de Septiembre de 2023 / Sábado

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se realiza fundida en concreto de 3000 psi para las columnas faltantes.
- Se continúan con los trabajos para el traslado del portón de acceso a la obra.
- El minicargador realiza limpieza y retiro del material sobrante del área de las excavaciones y se dejan acopiadas para el retiro final.

- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Se realiza recambio continuo de EPP's por parte del profesional HSE, a los trabajadores que los tienen deteriorados.



Residente de Interventoría




Residente de obra

Fecha: 17 de septiembre de 2023/ Domingo

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se realizan retiros de material sobrante de excavaciones hacia disposición final
- Se inicia la construcción del muro perimetral en mampostería
- Se realiza el desencofrado de columnas fundidas.
- Se realiza jornada de orden y aseo.



Residente de interventoría



Residente de obra

Fecha: 18 de septiembre de 2023 / Lunes

- Inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Continua la llegada de Recebo a la obra para seguir con el relleno compactado de la cimentación
- Por parte de interventoría se realiza seguimiento diario, verificando que todas las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las

especificaciones técnicas.
- Se realiza jornada de orden y aseo general
- Se continúa con la construcción del muro perimetral del colegio para el traslado del portón.
- Se continúa con el desencofrado de las columnas fundidas.
- Se continúa con los retiros de material sobrante.
- Ingresan + (2) obreros nuevos a obra.

Residente de Interventoría

Residente de obra

Fecha: 19 de septiembre de 2023 / Martes

- Inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria de SST.
- Se continúa con los retiros de material sobrante producto de las excavaciones.
- Se continúa con la construcción del muro de cerramiento perimetral del colegio, para el traslado del portón.
- Se realiza el relleno compactado con recebo en el área de la cimentación.
- Se realiza recambio continuo de EPP's por parte del profesional HSE del contratista.
- Se realiza jornada de orden y aseo.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 20 de septiembre de 2023 / Miercoles

- Inician actividades de obra a las 7.00 am con la respectiva charla SST.
- Se continúa con los retiros de material sobrante de la excavación de forma mecánica.
- Se continúa con los rellenos con recebo compactado para el área de la cimentación.
- Se realiza la demolición del pozo existente para la construcción de las zapatas pendientes.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría.
- se continúa con la construcción del muro perimetral y el traslado del portón.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 21 de septiembre de 2023 / Jueves.

- Inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Finaliza el traslado dol portón y la contrucción del muro perimetral de acceso a la obra.
- Se continúa con el relleno de recebo compactado en el área de la cimentación.
- Se continúa con los retiros de material sobrante producto de las excavaciones.
- Ingresa material de acero para el refuerzo de las vigas áereas y la placa. Se inicia el figurado del mismo.
- Se realiza jornada de orden y aseo.

- Se realiza el respectivo retiro del minicargador en la obra.
- Se realiza el comité semanal de obra, donde participa el contratista, supervisor, auxiliar de despacho e interventoría, de este comité se levanta acta donde quedan plasmados los temas tratados y compromisos surgidos.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 22 de septiembre de 2023 / Viernes

- Inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se continúa con los respectivas rellenos con recebo compactado.
- Se realiza el armado del Acero de refuerzo de las 2 zapatas y columnas pendientes
- Se continúa con el figurado del acero de refuerzo de las vigas aereas.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Finaliza la demolición del pozo de inspección que interfiere con las zapatas.
- Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, donde se verifica que todas las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.

Residente de interventoría

Residente de obra.

Fecha: 23 de septiembre de 2023 / Sábado

- Inician actividades de obra con la charla diaria de SST.
- Se realiza fundida de zapatas, con lo cual se termina esta actividad.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Se continúa con el figurado de acero de refuerzo para las vigas aereas.
- Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 25 de septiembre de 2023 / Lunes.

- Inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se realiza armado y Figurado de las vigas de cimentación pendientes y se realiza el encofrado de los mismas antes de la fundida.
- Se continúa con el Figurado de acero de refuerzo de las vigas aereas.
- Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que todas las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
- Se realiza jornada de orden y aseo.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 26 de septiembre de 2023 / Martes

- Inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se realiza fundida de las vigas de cimentación restantes.
- Se continúa con el figurado de acero de refuerzo para las vigas aereas.
- Se realiza jornada de orden y aseo
- Se realiza recambio continúo de EPP's a los trabajadores por parte del profesional SST del contratista.
- Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que todas las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 27 de septiembre de 2023 / Miercoles

- Inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se presentan fuertes lluvias de 7:00 am a 9:00 am, por lo que se suspenden actividades en esa franja horaria.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Se realiza desencofrado de vigas de cimentación fundidas y se inicia el armado de las columnas pendientes.
- Se continúa con el figurado de acero de refuerzo para las vigas aereas.

- Inicia la llegada a obra de la estructura metálica para la cubierta.
- Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 28 de septiembre de 2023 / Jueves.

- Inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Llegada a obra de camillas de madera, cerchas y parales para el armado de las vigas aereas.
- Se continúa con el figurado de acero de refuerzo para las vigas aereas.
- Se realiza el encofrado de las 2 columnas restantes por fundir.
- Se realiza jornada de orden y aseo general de obra y bodega.
- Inicia el armado de las plataformas para las vigas aereas.
- Se realizan movimientos de descargue de la estructura metálica.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 29 de septiembre de 2023 / Viernes

- Inician actividades de obra a las 7:00 am con

la charla diaria SST.
- Se inicia la instalación e hincado de la estructura metálica de la cubierta.
- El terreno se encuentra colmatado de agua, por las fuertes lluvias presentados en la noche anterior, lo cual dificulta los trabajos.
- Se continúa con el armado de las plataformas para las vigas aereas.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Se realiza continuamente recambio de EPP's a los trabajadores por parte del profesional HSE del Contratista.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 30 de septiembre de 2023/ Sábado

- Inician actividades de obra a las 7:00 am Con la charla diaria SST.
- Se continúa con el armado de la plataforma para las vigas aereas.
- Se continúa con el armado e hincado de la estructura metálica.
- Se realiza jornada de orden y aseo
- Se continúa con el figurado de acero de refuerzo de las vigas aereas
- Se realiza acompañamiento continuo por parte de interventoría.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 02 de Octubre de 2023 / Lunes

- Inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se continúa con el hincado y montaje de las cerchas para la cubierta metálica.
- Se continúa con el armado de la plataforma para la instalación de las vigas aereas.
- Se realiza recambio continuo de EPP's en mal estado, esta actividad la realiza continuamente el profesional HSE del contratista.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Se continúa con el armado e instalación de acero de refuerzo para vigas aereas.
- Se realiza acompañamiento continuo por parte de interventoría, verificando que todas las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
- Se hace el retiro de (1) Oficial de obra.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 03 de Octubre de 2023 / Martes.

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se continúa con la actividad de hincado y montaje de las cerchas para la cubierta metálica.
- Se realiza jornada de orden y aseo en toda el área de trabajo.
- Se continúa con la actividad de armado de la plataforma para la instalación de las vigas aereas.

- Se continúa con el figurado, armado e instalación del acero de refuerzo para vigas aereas.
- Se realizan trabajos de soldadura en la estructura metálica y ajuste de pernos.

Residente de Interventoría

Residente de obra

Fecha: 04 de Octubre de 2023 / Miercoles

- Inician actividades de obra a las 7:00 am con la respectiva charla SST.
- Se retira de obra la camabaja con grúa, la cúal trasladó la estructura metálica e instaló las cerchas en obra. El motivo del retiro es para traer el faltante de la estructura desde la fábrica.
- Se continúa con la instalación, soldadura y ajuste de pernos en la estructura metálica.
- Sigue la instalación y armado de plataformas para la construcción de las vigas aereas.
- Se continúa con el armado y figurado de las vigas aereas.
- Se realiza jornada de orden y aseo general de obra, y por parte de la empresa ASSEAR se realiza la limpieza de baños.
- Se realiza seguimiento diario por parte de interventoría a todas las actividades ejecutadas, y se exige al contratista cumplir con todos los parametros SST para que se realicen de manera segura.

Residente de Interventoría

Residente de obra

Fecha: 05 de octubre de 2023 / Jueves

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se continúa con la Alineación, soldadura y ajuste de pernos de la estructura metálica.
- Se realiza comité semanal de obra, donde participa el equipo de trabajo del contratista, la interventoría, el supervisor y la auxiliar de despacho. De este comité se levanta un acta, donde se especifican los temas tratados y los compromisos surgidos.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Llegada de acero de refuerzo faltante para las vigas aereas.
- Se continúa con el figurado, armado e instalación de acero de refuerzo para vigas aereas.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 06 de Octubre de 2023 / Viernes

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria de SST.
- Se presentan fuertes lluvias desde las 7:00 am hasta las 11:00 am, por lo cúal se suspenden actividades en esa franja horaria.
- Se continúa con el figurado y armado de acero de refuerzo para las vigas aereas
- Se realiza jornada de orden y aseo general en toda el área de trabajo
- Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que todas las actividades

5.4. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901683399	1	UT. INTERCOMEDOR ITSI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CR 22 52 B 60 AP 101	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	226241195	9457468974	E	2023/10/24	2023/10/18	BANCO DE BOGOTA	0	$1,953,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1102370870	GARZON MARTINEZ ANDRES CAMILO																		230301	30	$2,828,000	$452,500	EPS005	30	$2,828,000	$113,200	CCF40	30	$2,828,000	$113,200	14-4	30	$2,828,000	$196,900	30	$0	$0	Si	$875,800
2	CC	1096241286	GENEY URIBE WILSON RAFAEL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	91280656	GOMEZ GONZALEZ FERNAN																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	91258439	MANTILLA NOGUERA LEONARDO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS046	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(4)**																						$6,308,000	$1,009,300			$6,308,000	$252,400			$6,308,000	$252,400			$6,308,000	$439,300		$0	$0		$1,953,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901683399	1	UT. INTERCOMEDOR ITSI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CR 22 52 B 60 AP 101	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	226241195	9457468974	E	2023/10/24	2023/10/18	BANCO DE BOGOTA	0	$1,953,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,009,300	$0	$0	$1,009,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$638,100	$0	$0	$638,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$439,300	$0	$0	$439,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$439,300	$0	$0	$439,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$252,400	$0	$0	$252,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	$252,400	$0	$0	$252,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$252,400	$0	$0	$252,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$113,200	$0	$0	$113,200
TOTAL				4	$1,953,400	$0	$0	$1,953,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568048	6	FMC CONSTRUCTORES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FMC CONSTRUCTORES	CALLE 47 23 36 BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6566600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	209502251	9457477106	E	2023/10/11	2023/10/09	BANCO DE BOGOTA	0	$7,601,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSULTORIA 023 AGUAS BCA (8 Afiliados)																							$23,483,543	$3,830,800			$25,283,543	$1,002,900			$25,845,558	$1,025,300			$25,283,543		$1,742,200		$0	$0		$7,601,200
Centro de Trabajo: CONSULTORIA 023 AGUAS BCA (8 Afiliados)																							$23,483,543	$3,830,800			$25,283,543	$1,002,900			$25,845,558	$1,025,300			$25,283,543		$1,742,200		$0	$0		$7,601,200
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)																							$23,483,543	$3,830,800			$25,283,543	$1,002,900			$25,845,558	$1,025,300			$25,283,543		$1,742,200		$0	$0		$7,601,200
1	CC	1096800274	AMAYA NARVAEZ CAMILA ANDREA																		23020 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF40	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	Si	$526,400
2	CC	1005240083	DEVIA MARTINEZ SANTIAGO ANDRES											X							23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF40	0	$0	$0	14-4	1	$38,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$7,800
3	CC	1005240083	DEVIA MARTINEZ SANTIAGO ANDRES										X								23030 1	1	$53,334	$8,600	EPS037	1	$53,334	$0	CCF40	1	$53,334	$0	14-4	1	$53,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,600
4	CC	1005240083	DEVIA MARTINEZ SANTIAGO ANDRES																		23030 1	28	$1,493,334	$239,000	EPS037	28	$1,493,334	$59,800	CCF40	28	$1,493,334	$59,800	14-4	28	$1,493,334	6.960%	$104,000	28	$0	$0	Si	$462,600
5	CC	13884628	GOMEZ OCHOA JORGE																			0	$0	$0	EPS041	30	$1,800,000	$72,000	CCF40	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$269,300
6	CC	1095807710	MERCADO OTAVO HENRY ANDREY																		23030 1	30	$7,281,710	$1,238,100	EPS037	30	$7,281,710	$291,300	CCF40	30	$7,281,710	$291,300	14-4	30	$7,281,710	6.960%	$506,900	30	$0	$0	Si	$2,327,600
7	CC	1098767102	MORENO RINCON DANIELA																		23030 1	30	$4,427,653	$708,500	EPS005	30	$4,427,653	$177,200	CCF40	30	$4,427,653	$177,200	14-4	30	$4,427,653	6.960%	$308,200	30	$0	$0	Si	$1,371,100
8	CC	1099553662	PINEDA CAMACHO DANIEL ALBERTO																		23030 1	30	$2,738,844	$438,300	EPS041	30	$2,738,844	$109,600	CCF40	30	$2,738,844	$109,600	14-4	30	$2,738,844	6.960%	$190,700	30	$0	$0	Si	$848,200
9	CC	1033774093	VARGAS GUTIERREZ DURLEY										X								23030 1	2	$166,667	$26,700	EPS037	2	$166,667	$0	CCF40	2	$166,667	$0	14-4	2	$166,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$26,700
10	CC	1033774093	VARGAS GUTIERREZ DURLEY		X															X	23030 1	13	$1,083,334	$173,400	EPS037	13	$1,083,334	$43,400	CCF40	13	$1,684,016	$67,400	14-4	13	$1,083,334	6.960%	$75,500	13	$0	$0	Si	$359,700
11	CC	91509837	ZAPATA QUINTANA MAURICIO																		23030 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS002	30	$4,500,000	$180,000	CCF40	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
Total			**Afiliados(8)**																				$23,483,543	$3,830,800			$25,283,543	$1,002,900			$25,845,558	$1,025,300			$25,283,543		$1,742,200		$0	$0		$7,601,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568048	6	FMC CONSTRUCTORES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FMC CONSTRUCTORES	CALLE 47 23 36 BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6566600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	209502251	9457477106	E	2023/10/11	2023/10/09	BANCO DE BOGOTA	0	$7,601,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$3,830,800	$0	$0	$3,830,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,558,800	$0	$0	$3,558,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$272,000	$0	$0	$272,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,742,200	$0	$0	$1,742,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$1,742,200	$0	$0	$1,742,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,025,300	$0	$0	$1,025,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	8	$1,025,300	$0	$0	$1,025,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,002,900	$0	$0	$1,002,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$464,100	$0	$0	$464,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$181,600	$0	$0	$181,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$180,000	$0	$0	$180,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$177,200	$0	$0	$177,200
TOTAL				**8**	**$7,601,200**	**$0**	**$0**	**$7,601,200**

5.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA

UT. INTERCOMEDOR ITSI

Barrancabermeja, 15 de septiembre de 2023 **OFICIO # 0013**

Señores:
SUPERVISOR DEL CONTRATO
ATN. ARQ ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

Ref: Contrato de interventoría N° 0757-23 "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA"

ASUNTO:	**ACLARACIÓN SOBRE IMPRUDENCIA DE VOLQUETA**

En calidad de interventor me permito la presente para aclarar un incidente que tuvo lugar el 13 de septiembre en horas de la mañana, relacionado con una volqueta que transitaba en la vía cercana a la obra del comedor del colegio ITSI. Esta volqueta llega a la entrada de la obra y el operador se da cuenta que no es el lugar de destino a lo que decide ir en reversa por la **carrera 31 entre la calle 55ª y diagonal 49** en medio de la salida y entrada de estudiantes, sin tener precaución.

El incidente en cuestión fue reportado por parte de las autoridades pertinentes y ha generado inquietudes que consideramos necesario abordar de manera oportuna y precisa.

Es importante señalar que la volqueta involucrada en el incidente no forma parte de las actividades de suministro y retiro de material del contratista de la obra. Su punto de origen está vinculado a una obra que se está llevando a cabo en una institución educativa cercana a nuestro sitio de trabajo.

La confusión en torno a la procedencia de la volqueta ha generado malentendidos, y queremos enfatizar que el contratista y la interventoría no tiene ninguna responsabilidad ni relación con las operaciones de dicha volqueta ni de la obra a la que está asociada.


UT. INTERCOMEDOR ITSI

Nuestra prioridad es la seguridad y el cumplimiento de todas las normativas vigentes en la ejecución de nuestra obra. Tomamos todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros trabajadores y del público en general, y lamentamos cualquier inconveniente que este incidente haya podido causar.

Agradecemos su comprensión y quedamos a disposición para cualquier aclaración adicional que pueda ser requerida por las autoridades o las partes involucradas.

Quedamos a su disposición para ampliar esta información si así se requiere. Agradecemos su atención a este asunto y esperamos que esta aclaración contribuya a resolver cualquier malentendido.

Cordialmente,



LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT. INTERCOMEDOR ITSI

Carrera 22 No.52B-60 EDIFICIO GLAYA APTO 101 Barrio Torcoroma
Celular 314 412 1030, E-mail: fmcconstructoresltda@gmail.com
Barrancabermeja - Santander

UT. INTERCOMEDOR ITSI

Barrancabermeja, 06 de octubre de 2023 **OFICIO N° 0014**

Señores:
WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
ATN. ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
REPRESENTANTE LEGAL

Ref: Contrato de interventoría N. 0757-23 "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE **CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA"**

Asunto:	**RESPUESTA A OFICIO NUMERO 0036-0756 "RADICACIÓN FICHA TECNICA VENTILADOR"**

Cordial saludo,

Luego de realizar la revisión completa de la ficha técnica allegada en el oficio relacionado en el asunto del presente documento y compararla con las especificaciones técnicas del **ITEM 12.02 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO (Htb 2500 de 220v/60hz de diámetro 250cm, con cuerpo de acero protegido con pintura epóxica, hélice de aluminio de 8 palas, moto DC Brushless, con 6 velocidades de funcionamiento) "** se verifica que esta cumple con lo estipulado en el contrato, por lo cual se aprueba para su respectivo suministro e instalación.

Cordialmente,

LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT. INTERCOMEDOR ITSI

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

0775-WR-2023

Bogotá,11 de septiembre de 2023

0034-0756-BARRANCA

Señores
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
Área Jurídica

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: RADICACION ACTA DE CORTE 1

De la manera más atenta y dando cumplimiento a las obligaciones del contrato nos permitimos radicar los siguientes documentos:

- Factura de venta
- Acta parcial #1
- Informe mensual de interventoría No.6

Quedamos atentos a la respuesta.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

0834-WR-2023

Bogotá,03 de octubre de 2023

0035-0756-BARRANCA

Señores
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
Área Jurídica

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: RADICACION INFORME REVISION DISEÑO HIDROSANITARIO

De la manera más atenta y dando cumplimiento a las obligaciones del contrato nos permitimos radicar los siguientes documentos:

- Informe revisión diseño hidrosanitario

NOTA: dado el resultado del informe no se cuentan con las condiciones técnicas mínimas para la ejecución de estos elementos , por lo que el contratista pasara una cotización para el ajuste al diseño hidráulico para su verificación.

Quedamos atentos a la respuesta.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

0836-WR-2023

Bogotá, 3 de octubre de 2023

0036-0756-BARRANCA

Señores
Alcaldía de Barrancabermeja
Área jurídica

Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: RADICACIÓN FICHA TÉCNICA VENTILADOR

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos radicar fichas técnicas para su revisión y aprobación, relacionadas a continuación:

Anexo:

- VENTILADOR DE TECHO SERIE HTB-2500/3000 Un (1) folio(s)

Quedamos atentos a la respuesta.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

5.6. CERTIFICADO MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS

ASEOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA ASSEAR S.A.S
NIT. 900.346.265-5

CERTIFICA

Que prestamos el servicio de aseo y mantenimiento de baños portátiles a la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificada con el NIT **901109885-1**, según el siguiente detalle:

Periodo de Servicio	Detalle	Cantidad de USP's	Litros vertidos
AGOSTO 2023	**BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y ZONAS ALEDAÑAS**	**2**	**320**

Las aguas residuales fueron el resultado del mantenimiento a **2** unidad(es) sanitaria(s) portátil(es) (USP) ubicada(s) en **COLEGIO INDUSTRIAL**, a la(s) que se le realizaron **16** aseos durante el periodo informado, los residuos obtenidos fueron vertidos y tratados en la planta de tratamiento de la empresa **PURIFICACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES SAS PURIFIC**, quienes cuentan con autorización de la CAS según Resolución DGL No. 000799 del 17 de octubre de 2018. Adjunto encontraran el certificado de tratamiento de residuos, la cantidad vertida corresponde a la certificación emitida por **PURIFIC SAS**.

Dada en Barrancabermeja a los 10 días del mes de septiembre de 2023.

DIANA CAROLINA CAMACHO GUZMÁN
Coordinador de Operaciones
ASSEAR S.A.S

La información consignada en el presente documento puede ser confirmada al teléfono 3138849291 – 3017870248 o al correo electrónico: operaciones@assear.com

OFICINA BARRANCABERMEJA
Km 1. 8 Vía Retén - Aereopuerto Yariguies
Tel: 607 6 02 04 20 - 313 884 92 91

GC.511 GA.487 GS.1228

CERTIFICADO No

2138

DEL 07/09/2023

PURIFIC S.A.S
NIT. 900.380.440-1

A Través del Permiso de vertimiento para el tratamiento de aguas Residuales, otorgado por la CAS, según Resolución DGL No 000799 del 17 de octubre de 2018.

CERTIFICA QUE PRESTÓ EL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y VERTIMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA A:

ASEOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA ASSEAR SAS
NIT: 900.346.265-5

SEGÚN RELACIÓN
MES: AGOSTO DE 2023

ITEM	UBICACIÓN	VERTIMIENTO (LITRO)
1	BARRANCABERMEJA, PUERTO WILCHES, SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SABANA DE TORRES, PUERTO PARRA, RIONEGRO,BUCARAMANGA, GIRON (SANTADER), YONDÓ	156000

Daiver Baldovino Núñez.
Gerente

Oficina Barrancabermeja:
Lote 30 Vereda Campo Gala
Móvil: (+57) 320 2347971 - 312 4790920
Email: daiverb@purific.co ; gerentegeneral@purific.co ; administracion@purific.co
Barrancabermeja – Santander - Colombia. https://www.purific.co/

5.7. CERTIFICADO DE ESCOMBRERA POR DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA



ESCOMBRERA SANTA LUCIA

Resolución N° SPDT 001 DEL 13 ENERO 2021

Yondó Antioquia, 10/ 10/ 2023

CERTIFICACIÓN

La empresa WRUSSY INGENIEROS S.A.S Identificada con NIT: 901109885-1 realizó disposición en la escombrera SANTA LUCIA, de 1582 metros cúbicos correspondientes al material de residuos de construcción y demolición provenientes del proyecto CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER, durante el periodo comprendido entre el 06 de septiembre al 05 de octubre de 2023.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado.

Atentamente

GUSTAVO SOLANO
Propietario Escombrera santa lucia

5.8. ACTAS COMITÉ DE OBRA

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 07-09-2023 **HORA:** **LUGAR: I.T.S. I** **ACTA NO.**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Secretaria de Infraestructura del Contrato 056-23
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Reunión seguimiento
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja
ORGANIZADOR	Alejandro Enriquez
APUNTADOR	Yesenia Alvarez Morales
ASISTENTES	Ibeth Illeras, Cesar Narvaez, Andres Garzón, Wilson Geney, Alejandro Enriquez, Wilver Russy

TEMAS DE DISCUSIÓN

Avance en obra.

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

Personal en Obra:

Ing. Residente: 1
Insp. SST : 1
Trabajo Social : 1
[illegible] : 1
[illegible] : 3
Ayudantes : 15

Avance de obra: 17,70%.

Powered by CamScanner

Actividades realizadas.
Retiro y Fundición de columnas
Día sabado se tendrian Fundidas 10 columnas
Aclarar sobre los acabados de la cocina.
Se debe realizar una cotización para ajustar precios a la APU.

Verificar:
- Especificaciones técnicas de la pintura que no esta incluida en los Items del proyecto.
- Soportar con cotizaciones
- Comparar con los Proyectos que se estan realizando el tema de las Pinturas.
- No se ha definido los ajustes de los Kilos de la estructura.

-Contractualmente eran 24.000 kilos.
-24000 kilos se encuentran en fabricación

- Se definio que el tanque se dejara por Fuera, el tamaño seria de 2mts o 6 mst cubicos de capacidad.

Area de cocina:
Se definen las tabletas, Pisos. Se sugiere cambiar las tabletas de gress por baldosas de granito pulido.
Se define en el plano el cambio de las baldosas en las zonas.

Se recuperan 10 arboles nativos.

Powered by CamScanner

Actividades realizadas.
Retiro y Fundición de columnas
Día sabado se tendrian Fundidas 10 columnas
Aclarar sobre los acabados de la cocina.
Se debe realizar una cotización para ajustar precios a la APU.

Verificar:
- Especificaciones técnicas de la pintura que no esta incluida en los Items del proyecto.
- Soportar con cotizaciones
- Comparar con los proyectos que se estan realizando el tema de las Pinturas.
- No se ha definido los ajustes de los Kilos de la estructura.

-Contractualmente eran 24.000 Kilos.
-24.000 kilos se encuentran en fabricación

- Se definio que el tanque se dejara por fuera, el tamaño seño de 2mts o 6 mst cubicos de capacidad.

Area de cocina:
Se definen las tabletas, Pisos. Se sugiere cambiar las tabletas de gress por baldosas de granito pulido.
Se define en el plano el cambio de las baldosas en las zonas.

Se recuperan 10 arboles nativos.

Powered by CamScanner

Zonas donde se realizara Cambio de piso:

Servicio al publico, bodegas, administración, Preparación mixta, lavado, alacena y cuarto Fno.

Se define el acabado de estas áreas en baldosa de granito de mármol blanco huila 30x30, con brecha color blanco, guardaescoba media caña en granito in sí.

Se llega a mutuo por los Firmantes. en el plano.

- Se llega acuerdo que la contratista se encargue de contratar una persona que realice los diseños de la parte electrica.

Se contempla que la energia del comedor se tomara del transformador que se encuentra en la cancha del I.T.S.I, pero no cuenta con la capacidad requerida para el comedor.

- El contratista afirma que su intención es terminar en Diciembre el proyecto

- Se sugiere a la contratista analizar cuanto sera el adicional

Compromisos.

- Diseño del tanque.
- Revisión de la pintura no contemplada en el Proyecto

Powered by CamScanner

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Alejandro Enriquez	Supervisor	
César Orlando Narváez C.	Ing. Residente ROSSY	
Ibeth. T. Illeras Rincón	Apoyo Seguimiento	
Andrés Garzón M.	Interventoría	
Wilson Leonel Gomez C.	Interventoria	
Yulieth Zuñiga	Dr	
Yesenia Alcaraz	Profesional social	

Powered by CamScanner



Zona: Servicio al público, bodegas, admon, preparación mixta, lavado, alacena y cuarto Frio.

Se define el acabado de estas áreas en baldosa de granito de marmol blanco huila 30 x 30, con brecha color blanco, guardaescoba media caña en granito in situ.

Fecha: 07 de septiembre de 2023

- Se llega a mutuo acuerdo por los firmantes:

VOBO

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 14-09-2023 **HORA:** 10:00 AM **LUGAR:** I.T.S. I **ACTA NO.**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Secretaria de Infraestructura del Contrato 0756-23
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Reunión seguimiento
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja
ORGANIZADOR	Alejandro Enriquez
APUNTADOR	Yesenia Alvarez Morales.
ASISTENTES	Alejandro Enriquez, Ibeth Illeras Andres Garzon, Cesar Narvaez, Yesena Alvarez

TEMAS DE DISCUSIÓN
Avance de Obras, Imprevistos

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

Programado: 18,92%
Ejecutado: 19,08%

Personal en obra
Ing Residente. 1
SST Insp: 1
Profesional social: 1
Maestro: 1
Ayudantes. 15
Oficiales: 3

Powered by CamScanner

Actividades Realizadas:

- Demolición de muro, cuenta con servicio de vigilancia privada en horario nocturno
- encofrado de columnas.
- Retiro de escombros
- Fundición de 10 columnas de 22.
- Proxima fundida sabado 16 de septiembre 2023. de 9 columnas restantes.

Actividades Pendientes

- Figurado de Acero de refuerzo y armado
- Desencofrado de columnas
- Retiros de Escombro
- Terminación del muro de cerramiento

Compromisos por Parte de la contratista.

Contratar una Persona que se encargue de revisar la carga electrica y de realizar el diseño electrico.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CODIGO DE FOR-41 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ibeth T. Illeras R.	Seguimiento Despacho	
Andrés Camilo Garzón	Interventoría	
César Orlando Narváez	Ing. Residente RUSSY	
ALEJANDRO ENRIQUEZ	SUPERVISOR	
Yesenia Alvarez	Profesional Social	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 21-09-2023 **HORA: 10:00 AM** **LUGAR: I.T.S. I** **ACTA NO.**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Secretaría de infraestructura al contrato 0756-23
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Reunión seguimiento
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja
ORGANIZADOR	Supervisor del contrato
APUNTADOR	Yesenia Alvarez
ASISTENTES	Cesar Narváez, Andrés Camilo Garzón, Wilson Geney, Alejandro Enríquez, Ibeth Illeras

TEMAS DE DISCUSIÓN
Avance de Obra
Imprevistos

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

Porcentaje Programado: 19.26%.

Ejecutado: 19,27%.

Personal en obra.

Ing. Residente: 1

Insp SST.: 1

Trabajo Social: 1

Maestro: 1

Ayudantes: 16

Oficiales: 3

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Actividades ejecutadas.

Relleno y compatación de cimentación.

- fundición de placa de 185 mts² se realizara la Proxima semana.
- Esta semana la contratista realiza el envio del diseño del tanque para proceder a su elaboración.

- Montaje de estructuras
- La Fabricación de la estructura se realizo en la ciudad de Bogotá y el Personal encargado del montaje Provienen de la ciudad de Bogotà.
- La estructura empieza allegar a Partir del dia 22 septiembre 2023.

- Por parte de Interventoria y supervisión se autoriza la reubicación del Porton de acceso al nuevo comedor.

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Enrique Mora	Supervisor	
Ibeth T. Illeras Rincón	Apoyo a seguimiento	
Andrés Garzón	Interventoría	
Wilson Cruz Uribe	Interventoría	
Cesar Narvaez Q.	Ing-Residente WRUSSY.	
Yesenia Alvarez V.	Profesional social	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 05-10-2023 **HORA:** 11:00 **LUGAR:** I.T.S. I **ACTA NO.**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Secretaria de Infraestructura al contrato 0756-23
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Reunión seguimiento
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja
ORGANIZADOR	Supervisor del Contrato
APUNTADOR	Yesenia Alvarez
ASISTENTES	Alejandro Enriquez, Ibeth Illeras, Andres Garzon, Cesar Narvaez, Wilson Geney

TEMAS DE DISCUSIÓN
Avance de obra

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

Avance programado: 20.79%.
Ejecutado: 21,05%.

Personal en Obra.
Ayudantes: 16 Ayudantes
Oficiales: 2
Maestro: 1.
Ins. HSST: 1
Pro fe. Social: 1
Ing. Residente: 1

Personal encargado de estructura.
1 Soldador
3 Armadores / montadores

Powered by CamScanner

Supervisión sugiere qe se tenga en cuenta personal local para la instalación de la estructura.

Actividades
Instalación de Platinas
Figurado de Acero de refuerzo para vigas aereas
- Montaje de estructura: Soldadura y Ajuste de Pernos, resoldando base.

Actividades por realizar.
-fundición de vigas de 25 x 35

La parte electrica el profesional realizara revisión de la capacidad del transformador entre el 15 a 20 de octubre. Por parte de Geotecnicas.

Estructura.
La semana del 25 al 30 llego una parte de la estructura y el proximo llegara el dia
- 6 de Octubre de 2023 Para continuar con el montaje.

Actividades Por realizar.

Encofrado de vigas
Fundida de las 2 columnas restantes
La mitad de las vigas aereas
Continuacion del armado de vigas.

Powered by CamScanner

Pendiente el diseño del Tanque
Se envio la especificación técnica de los Ventiladores.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CODIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diefonoro Enriquez Mora	Supervisor	
Ibeth Tatiana Illeras R.	Ing. civil de seguimiento	
Wilson Rafael Gamez C	Aux. interventoría	
Andrés Camilo Garzón	Interventoría	
Cesar Narvaez O.	Ing. Residente WRUSSY	
Yesenia Alvarez M.	Profesional social	

Powered by CamScanner

5.9. INFORME TÉCNICO DE OBRA

INFORME DE OBRA No .7

"CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA."



INGENIERIA

CONTRATO DE OBRA No. 0756-23

INFORME DE OBRA Nro.6

PERIODO DE EJECUCIÓN

06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – 05 DE OCTUBRE DE 2023

VERSIÓN 1

VOLUMEN 1-1

ORIGINAL

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. INFORMACION DEL PROYECTO. 4
2.1. Localización del proyecto. 4
2.2. Características técnicas del proyecto y alcance. 5
2.3. CONTRATO SUSCRITO 6
2.3.1. Contrato de Obra No. 0756-23 6
2.3.2. Objeto del Contrato 6
2.3.3. Contratista 6
2.4. Plazo del Contrato 6
2.5 Valor de la inversión 6
3. CONTROL DE POLIZAS 7
3.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS 7
4. CONTROL DE RECUSOS 7
4.1. Personal involucrado en el proyecto 7
4.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 8
5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA 9
5.1. Actividades realizadas en el periodo descrito: 9
6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO 9
6.1. Contrato o modificaciones Suscritas. 10
6.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 11
6.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 11
6.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO. 11
6.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA. 11
6.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO 11
7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 12

1. INTRODUCCIÓN.

La Institución educativa Instituto Técnico Superior Industrial - ITSI en el Distrito de Barrancabermeja, busca facilitar el desarrollo integral y el mejoramiento del impacto en el sistema educativo para los estudiantes de la sede principal de la institución, mediante la demolición de la actual cafetería y la construcción del área que cumpla las veces de cafetería y comedor escolar, cumpliendo con las condiciones básicas propuestas en la normativa sanitaria vigente: resolución 2674 de 2013, NTC 4595 y 4596, en las cuales se establece los requisitos y parámetros del diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo, analizando los diagnósticos de infraestructura frente a la existencia, calidad y acceso a los servicios públicos y condiciones de dotación de equipos y menaje en el comedor. Todo esto con el fin de dar inclusión a la promoción y ampliación de cobertura de programas de alimentación que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, para mantener sus niveles de atención, aumentar el porcentaje de permanencia escolar, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje.

Por lo anterior, se hace necesario iniciar proceso de selección de contratistas, para llevar a cabo la CONTRUCCION Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Es por eso por lo que se decide abrir el proceso de contratación Licitación pública LPO-015-2022, para la construcción anteriormente mencionada

De esta rigurosa selección de proponentes, se adjudicó el contrato; a la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificado con **NIT:901.109.885-1,** para celebrar el contrato el día 23 de febrero de 2023.


Así las cosas; y siguiendo con las exigencias de la interventoría del contrato, presentamos el informe de obra Nro.7 correspondiente con fecha desde el 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – 5 DE OCTUBRE DE 2023, el presente informe contiene el resumen de las actividades realizadas para el desarrollo de la obra de “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.", cuya oferta comercial es por valor de $3.684.062.560,88 y su culminación está prevista para el 5 de marzo de 2024

2. INFORMACION DEL PROYECTO.


2.1. Localización del proyecto.

El proyecto se encuentra ubicado en la Carrera 28 # 55-10, Barrancabermeja, Santander, en el INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL (ITSI)

MICROLOCALIZACIÓN

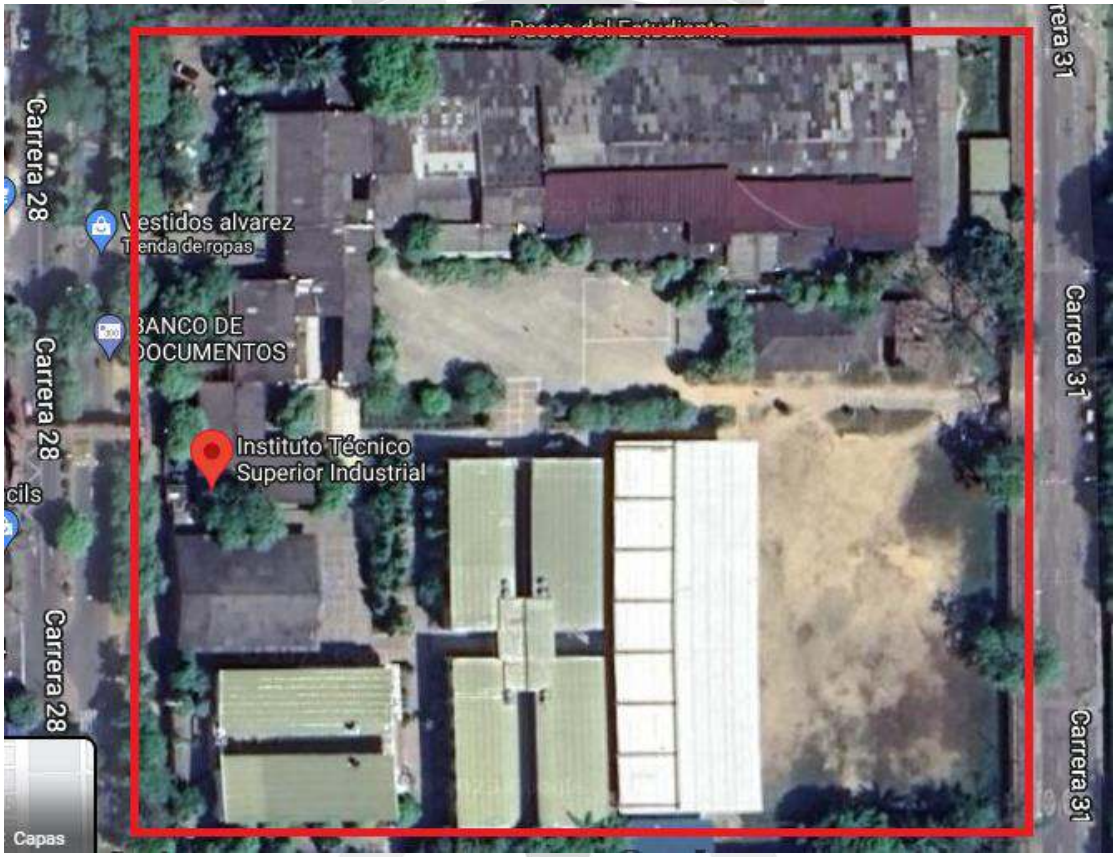

MACROLOCALIZACIÓN.

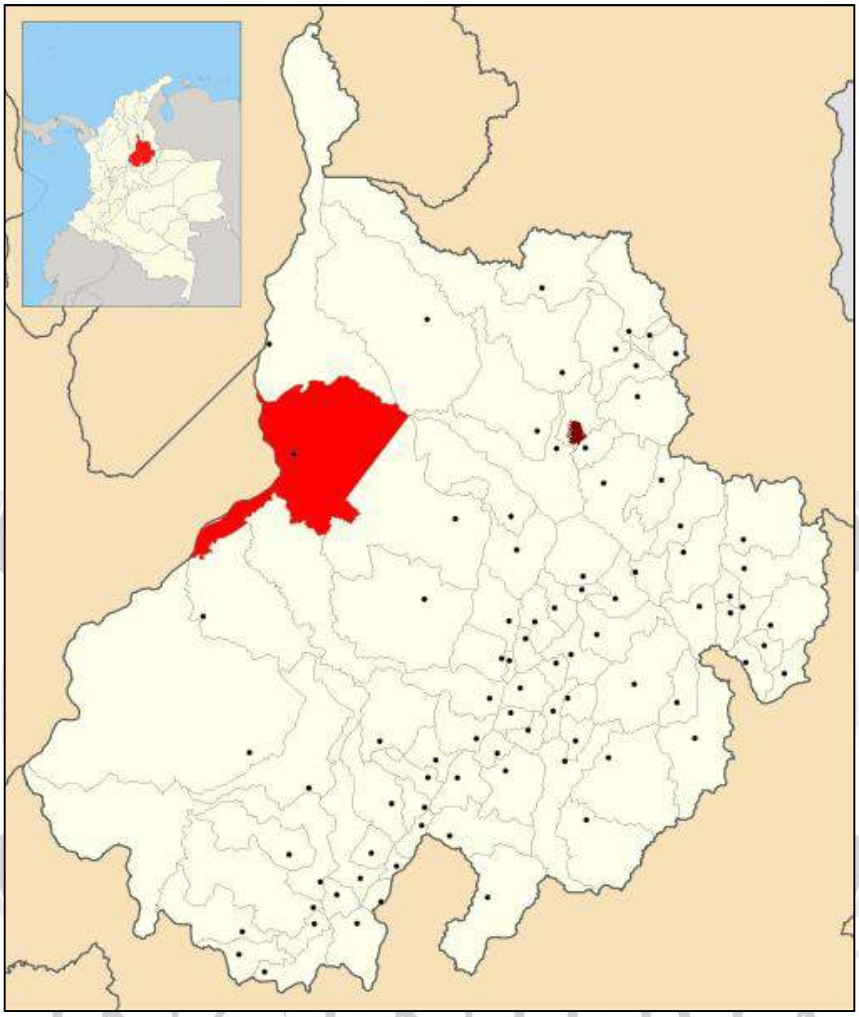

2.2. Características técnicas del proyecto y alcance.

Para la ejecución del contrato 0756-23, cuyo objeto es "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"se contempló construir un comedor escolar que garantice la promoción y ampliación de la cobertura de programas de alimentación escolar que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la sede principal del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI, para que, por medio del suministro de un complemento alimentario diario puedan mantener sus niveles de atención, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje. Fomentando así el derecho a la educación y asegurando las

condiciones necesarias para su acceso, permanencia y culminación del proceso educativo construir un comedor escolar que garantice la promoción y ampliación de la cobertura de programas de alimentación escolar que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la sede principal del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI para que, por medio del suministro de un complemento alimentario diario puedan mantener sus niveles de atención, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje. Fomentando así el derecho a la educación y asegurando las condiciones necesarias para su acceso, permanencia y culminación del proceso educativo.

2.3. CONTRATO SUSCRITO

2.3.1. Contrato de Obra No. 0756-23

2.3.2. Objeto del Contrato

El objeto del Contrato de Obra es: "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA."

2.3.3. Contratista

El contratista es WURSSY INGENIEROS S.A.S. NIT: 901.109.885-1

2.4. Plazo del Contrato

El plazo inicial para la realización del objeto del Contrato de Obra es de doce (12) meses, teniendo una fecha de inicio de 6 de marzo de 2023 y una fecha de finalización de 5 de marzo de 2024

2.5 Valor de la inversión

El valor para invertir es de: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE **($ 3.684.062.560,88)**

3. CONTROL DE POLIZAS

3.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato

CONTRATO 0756-23

TABLA No.1. POLIZAS SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA

Póliza de cumplimiento	11-44-101198726		
Póliza de Responsabilidad civil Extracontractual	11-40-101051776		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de expedición:	30 de marzo de 2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha inicial	fecha final	
Cumplimiento de Contrato	*06/03/2023*	*06/07/2024*	$736.812.513,00
Salarios y prestaciones sociales	*06/03/2023*	*06/03/2027*	$368.406.257,00
Estabilidad de la obra	*Si ampara 5 años, o meses y 1 días*		$736.812.513,00
Responsabilidad civil extracontractual	*06/03/2023*	*05/03/2024*	$464.000.000,00

4. CONTROL DE RECUSOS

4.1. Personal involucrado en el proyecto

Para el desarrollo del compromiso contractual, la empresa WRUSSY INGENIEROS SAS cuenta con el siguiente personal de apoyo profesional y operativo de obra:

TABLA No.2. PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL Y OPERATIVO

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR
Wilver Franciny Russy Ladino	Director de Obra
Cesar Orlando Narvaez Quiñonez	Residente de Obra
Carlos Alberto Oviedo Chavarro	Profesional eléctrico
Yesenia Alvarez Acosta	Profesional Social
Sandra Milena Santiago Camacho	Apoyo SST
Alfonso Manuel Vergara Herrera	Maestro de Obra
Sigilfredo Mendez Paredes	Oficial de Obra
Abelino Homero Muñoz Lopez	Oficial de Obra
Antonio Jose Carvallido Carpio	Ayudante de obra
Hector Julio Escobar Saavedra	Ayudante de obra
Alveiro Carpio Peñaloza	Ayudante de obra
Alexander Jimenez Santamaria	Ayudante de obra
Elvis Carpio Peñaloza	Ayudante de obra
Carlos Rodriguez Lopez	Ayudante de obra
Elkin Reyes Serrano	Ayudante de obra
Jair Carpio Peñaloza	Ayudante de obra
Domingo Moreno Carvajalino	Ayudante de obra
Kevin Ortega Camargo	Ayudante de obra
Brayan Andres Cossio Santamaria	Ayudante de obra
Mario Rafael Fontalvo Perez	Ayudante de obra
Deibi Carpio Agudelo	Ayudante de obra
Jose Angel Peñaloza Larios	Ayudante de obra
Juan Perez Ferrer	Ayudante de obra
Manuel Bandera Perez	Ayudante de obra

Durante el periodo de tiempo comprendido en este informe ingresaron los señores Juan Pérez Ferrer y Manuel Bandera Pérez en el cargo de Ayudante de obra. El día 15 de septiembre del 2023, renunció el señor Isnardo De Jesús Moreno Arrieta al cargo de Ayudante de obra y el día 02 de Octubre del 2023 renunció el señor Wilmar Ortiz Mendoza al cargo de Oficial de obra.

PERSONAL MONTAJE ESTRUCTURA METALICA	
NOMBRE DEL TRABAJADOR	**CARGO DEL TRABAJADOR**
Julian Rojas	Operador grua
Ronny Reyes Cisneros	Soldador
Edilberto Lerma Soto	Armador - Montador
Andres Mateo Aponte Bergaño	Armador - Montador

El personal relacionado en el cuadro anterior ingreso a la obra el día 27 de septiembre del 2023.

4.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Para el desarrollo del compromiso contractual, se cuenta con la siguiente maquinaria y/o equipos:

TABLA No.3. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

EQUIPO/HERRAMIENTA	CANTIDAD
Herramienta menor	12
Pulidora 7"	2
Martillo demoledor mediano	1
Vibrador de concreto	2
Motobomba	1
Compactador tipo canguro	2
Cortadora de concreto	1
Autobomba de concreto	1
Camión tipo mixer	3
Minicargador	1
Volquetas	5

5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA

5.1. Actividades realizadas en el periodo descrito:

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo:

- Se realiza fundida de todos los pedestales (18 und) y se instalan las platinas y pernos para posterior montaje de la estructura metálica de cubierta.
- Retiro de formaleta metálica de los pedestales fundidos.
- Se realiza encofrado y alineación de columnas para posterior fundida.
- Se realiza fundida de 19 columnas.
- Se realiza demolición de muro de cerramiento del colegio para reubicación del acceso a la obra, ya que este obstruye la cimentación del proyecto.
- Se realiza construcción de nuevo muro de cerramiento, con sus respectivas columnetas, viga dintel y reubicación del portón de acceso a la obra.
- Se realiza excavación manual de las 2 zapatas restantes, instalación de acero de refuerzo y fundida de las mismas

- Armado e instalación de refuerzo de vigas de cimentación restantes, encofrado y fundida de las mismas.
- Se realiza cargue y retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
- Llegada de material de recebo para la actividad de relleno y compactación de la cimentación.
- Se realiza relleno y compactación con material de recebo de las zanjas de la cimentación.
- Se realiza demolición de pozo de concreto reforzado existente.
- Se realiza montaje de plataforma con formaleta de madera para la instalación de acero de refuerzo de las vigas aéreas.
- Se realizada figurado, armado e instalación de acero de refuerzo de vigas aéreas.
- Se recibe primer despacho de la estructura metálica para la cubierta.
- Se realiza montaje e hincado de la estructura metálica de la cubierta.

6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO

6.1. Contrato o modificaciones Suscritas.

CONTRATOS Y/O MODIFICACIONES

FECHA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA
23 de febrero de 2023	CONTRATO 0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
06 de febrero de 2023	ACTA DE INICIO	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
28 de Agosto de 2023	ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS #1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
29 de Agosto de 2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS #1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
11 de Septiembre de 2023	ACTA PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
13 de Septiembre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
21 de Septiembre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°2 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S

6.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

6.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

A la fecha del presente informe se tramitó el Acta de Recibo Parcial No.1 el día 11 de septiembre del 2023.

Se recibió del pago del Acta de Recibo Parcial No.1 el día 03 de octubre del 2023.

6.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO.

6.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.

En el periodo de tiempo que comprende este informe, no se ha suscrito ningún acta de modificación de cantidades de obra.

6.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO

En el periodo de tiempo que comprende este informe, no se han realizado actividades de orden jurídico.

INGENIERIA

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Para el periodo comprendido en este informe se realizó la fundida de pedestales, columnas, zapatas y vigas de cimentación restantes
- Por lluvias presentes en este periodo de tiempo, el área de trabajo se ha encontrado colmatado de agua y los trabajos se han visto afectados.
- Para las fundidas de los elementos estructurales realizadas en el periodo comprendido de este informe, se tomaron las muestras del concreto, las cuales se llevaron al laboratorio para realizar el respectivo ensayo de resistencia a la compresión del concreto. Dichos ensayos se realizaron a los 7, 14 y 28 días después de fabricación de las muestras, concluyendo en los resultados de los ensayos que se cumple con el concreto de diseño de 3000 PSI para dichos elementos.
- Durante el periodo de tiempo comprendido en este informe, se contrató a dos ayudantes de obra, a su vez renunció un oficial de obra y un ayudante de obra.
- Ingresa una parte de la estructura metálica de la cubierta a la obra, y a su vez el personal encargado del montaje e instalación (1 operador de grúa, 1 soldador, 2 armadores-montadores).
- Se realizo un Acta de Recibo Parcial #1 y dos Actas de modificación al acta de Recibo Parcial #1.

ING.WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
WRUSSY INGENIEROS SAS
NIT:901.109.885-1

5.10. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL :	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
IDENTIFICACION:	CC-80212380
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-19
FECHA DE PAGO:	2023-09-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27482788
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27482788
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.000	$ 610.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/11/2023

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS	CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	19/10/2023	71318975	$2.742.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.800	0		0		0	0	0	0	52.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	301.600	0		0		0	0	0	0	301.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	556.800	0	0	0	0	0	0		556.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	860.600	0	0	0	0	0	0		860.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	616.700				616.700	0	0	616.700			6.167	616.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	354.400	0	0	354.400	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	354.400	354.400
Pensión	2	1.417.400	1.417.400
Riesgos Laborales	1	616.700	616.700
CCF	1	354.400	354.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.742.900	2.742.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	19/10/2023	71318975	$2.742.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013639694	DEJOY FELICIANO JEFERSON ANDRES	1	0			S																	230201	3.480.000	556.800	0	0	0	0	EPS005	3.480.000	139.200	14-11	3.480.000	5	242.300	CCF24	3.480.000	139.200	0	0	0	0	0
2	CC	1057588784	SALAMANCA ROJAS KAREN LISSETH	1	0			S																	230301	4.060.000	649.600	0	0	0	0	EPS005	4.060.000	162.400	14-11	4.060.000	5	282.600	CCF24	4.060.000	162.400	0	0	0	0	0
3	CC	79431607	PARDO LEON DUVAN ALBERTO	1	0			S	X																230301	1.318.667	211.000	0	0	0	0	EPS002	1.318.667	52.800	14-11	1.318.667	5	91.800	CCF24	1.318.667	52.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS	CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	19/10/2023	71320316	$1.931.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	123.200	0		0		0	0	0	0	123.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	492.500	0	0	0	0	0	0		492.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	505.600	0	0	0	0	0	0		505.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	434.300				434.300	0	0	434.300			4.343	434.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	249.600	0	0	249.600	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	249.600	249.600
Pensión	2	998.100	998.100
Riesgos Laborales	1	434.300	434.300
CCF	1	249.600	249.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.931.600	1.931.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	19/10/2023	71320316	$1.931.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096226349	ALVAREZ MORALES YESENIA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF38	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1098754093	NARVAEZ QUIÑONEZ CESAR ORLANDO	1	0			S								X									230201	3.078.125	492.500	0	0	0	0	EPS010	3.078.125	123.200	14-11	3.078.125	5	214.300	CCF38	3.078.125	123.200	0	0	0	0	0
3	CC	37712004	SANTIAGO CAMACHO SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF38	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): ALFONSO MANUEL VERGARA HERRERA
No. Identificación: CC78323568
Dirección: CR 15 22 A 33 BRR LA INDEPENDENCIA
Telefono: 4111513
Correo: hseqwrussy@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8371359767

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ALFONSO MANUEL VERGARA HERRERA
Tipo y número de identificación	CC78323568
Número de planilla	8371359767
Fecha pago	2023-10-10
Número de autorización pago	58367305
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Pensión	septiembre de 2023
Número de Administradoras	2
Total Pagado	330600
Total Intereses de Mora	0

PAGADA
8371359767

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	185600	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	145000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 78323568
APELLIDOS Y NOMBRES: ALFONSO MANUEL VERGARA HERRERA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	230201	1160000	1160000	0	0	145000	0	185600	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	18/10/2023	71491101	$6.954.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	142.200	0		0		0	0	0	0	142.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	49.900	0		0		0	0	0	0	49.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	298.800	0		0		0	0	0	0	298.800	7
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	46.900	0		0		0	0	0	0	46.900	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	199.700	0		0		0	0	0	0	199.700	4
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	46.900	0		0		0	0	0	0	46.900	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	111.700	0		0		0	0	0	0	111.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	762.700	0	0	0	0	0	0		762.700	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.853.600	0	0	0	0	0	0		1.853.600	11
231001	Colfondos	800227940-6	573.600	0	0	0	0	0	0		573.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	404.300	0	0	0	0	0	0		404.300	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.558.700				1.558.700	0	0	1.558.700			15.587	1.558.700	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	905.500	0	0	905.500	20

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	18/10/2023	71491101	$6.954.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	896.100	896.100
Pensión	4	3.594.200	3.594.200
Riesgos Laborales	1	1.558.700	1.558.700
CCF	1	905.500	905.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	6.954.500	6.954.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	18/10/2023	71491101	$6.954.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1042211689	CARPIO PEÑALOZA ALVEIRO	1	0			S							X									231001	1.172.083	187.600	0	0	0	0	EPS037	1.172.083	46.900	14-11	1.172.083	5	81.600	CCF38	1.172.083	46.900	0	0	0	0	0
2	CC	1096242479	CARVALLIDO CARPIO ANTONIO JOSE	1	0			S							X									230301	1.172.082	187.600	0	0	0	0	EPS037	1.172.082	46.900	14-11	1.172.082	5	81.600	CCF38	1.172.082	46.900	0	0	0	0	0
3	CC	91425553	ESCOBAR SAAVEDRA HECTOR JULIO	1	0			S							X									25-14	1.212.562	194.100	0	0	0	0	EPS041	1.212.562	48.600	14-11	1.212.562	5	84.400	CCF38	1.212.562	48.600	0	0	0	0	0
4	CC	1096212001	CARPIO PEÑALOZA ELVIS	1	0			S							X									230301	1.172.083	187.600	0	0	0	0	EPS037	1.172.083	46.900	14-11	1.172.083	5	81.600	CCF38	1.172.083	46.900	0	0	0	0	0
5	CC	13565252	JIMENEZ SANTAMARIA ALEXANDER	1	0			S							X									230201	1.214.375	194.300	0	0	0	0	EPS041	1.214.375	48.600	14-11	1.214.375	5	84.600	CCF38	1.214.375	48.600	0	0	0	0	0
6	CC	1096204338	RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS EDUARDO	1	0			S							X									230301	1.214.375	194.300	0	0	0	0	EPS037	1.214.375	48.600	14-11	1.214.375	5	84.600	CCF38	1.214.375	48.600	0	0	0	0	0
7	CC	1096248874	MORENO ARRIETA ISNARDO DE JESUS	1	0			S		X															230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS037	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	5	75.400	CCF38	1.245.389	49.900	0	0	0	0	0
8	CC	1096248874	MORENO ARRIETA ISNARDO DE JESUS	1	0			S								X								230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS037	77.334	0	14-11	77.334	5	0	CCF38	77.334	0	0	0	0	0	0
9	CC	1096253724	CARPIO PEÑALOZA JAIR	1	0			S							X									230301	1.172.083	187.600	0	0	0	0	EPS040	1.172.083	46.900	14-11	1.172.083	5	81.600	CCF38	1.172.083	46.900	0	0	0	0	0
10	CC	1050918199	PEÑALOZA LARIOS JOSE ANGEL	1	0			S							X									230301	1.172.083	187.600	0	0	0	0	ESSC07	1.172.083	46.900	14-11	1.172.083	5	81.600	CCF38	1.172.083	46.900	0	0	0	0	0
11	CC	79392925	ORTIZ MENDOZA WILMAR	1	0			S		X					X									231001	1.245.791	199.400	0	0	0	0	EPS008	1.245.791	49.900	14-11	1.245.791	5	86.800	CCF38	1.318.291	52.800	0	0	0	0	0
12	CC	1096218748	REYES SERRANO ELKIN FERNANDO	1	0			S							X									230201	1.214.375	194.300	0	0	0	0	EPS005	1.214.375	48.600	14-11	1.214.375	5	84.600	CCF38	1.214.375	48.600	0	0	0	0	0
13	CC	13569557	MENDEZ PAREDES SIGILFREDO	1	0			S							X									25-14	1.313.541	210.200	0	0	0	0	EPS041	1.313.541	52.600	14-11	1.313.541	5	91.500	CCF38	1.313.541	52.600	0	0	0	0	0
14	CC	1007775962	ORTEGA CAMARGO KEVIN LEONARDO	1	0			S							X									231001	1.166.041	166.600	0	0	0	0	EPS005	1.166.041	46.700	14-11	1.166.041	5	81.200	CCF38	1.166.041	46.700	0	0	0	0	0
15	CC	1042214936	COSSIO SANTAMARIA BRAYAN ANDRES	1	0			S							X									230301	1.172.083	187.600	0	0	0	0	EPS005	1.172.083	46.900	14-11	1.172.083	5	81.600	CCF38	1.172.083	46.900	0	0	0	0	0
16	CC	12400740	BANDERA PAEZ MANUEL ARTURO	1	0			S	X						X									230301	470.041	75.300	0	0	0	0	EPS037	470.041	18.900	14-11	470.041	5	32.800	CCF38	470.041	18.900	0	0	0	0	0
17	CC	8572227	PEREZ FERRER JUAN MIGUEL	1	0			S	X						X									230301	470.042	75.300	0	0	0	0	ESSC24	470.042	18.900	14-11	470.042	5	32.800	CCF38	470.042	18.900	0	0	0	0	0
18	CC	13568501	MORA CARVAJALINO DOMINGO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF38	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
19	CC	94265684	MUÑOZ LOPEZ ABELINO HOMERO	1	0			S							X									230201	1.178.125	188.500	0	0	0	0	EPS037	1.178.125	47.200	14-11	1.178.125	5	82.000	CCF38	1.178.125	47.200	0	0	0	0	0
20	CC	8572679	FONTALVO PEREZ MARIO RAFAEL	1	0			S							X									230301	1.245.791	199.400	0	0	0	0	EPS041	1.245.791	49.900	14-11	1.245.791	5	86.800	CCF38	1.245.791	49.900	0	0	0	0	0
21	CC	1001814868	CARPIO AGUDELO DEIBY	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF38	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79650148
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO OVIEDO CHAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 8F #79-94	TELÉFONO:	4111513
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7895284132**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	215228006

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 185.600	$ 200	$ 185.800
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 200**	**$ 185.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 145.000	$ 200	$ 0	$ 145.200
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 145.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES										
																												PENSIÓN									SALUD							ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79650148	OVIEDO CHAVARRO CARLOS ALBERTO	INDEPEND		$ 1.160.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 331.000

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

5.11. INFORME HSE DE OBRA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**


INFORME SST 7

PERIODO: 06 SEPTIEMBRE - 05 OCTUBRE 2023

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

Elaboró:



KAREN SALAMANCA ROJAS
WRUSSY INGENIEROS SAS

Revisó y Aprobó:



WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS SAS

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 4

1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 4

2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS. 4

2.1. PROGRAMA D1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 4

2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 5

2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7

2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 12

2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO 12

2.2.2. INSPECCIONES 12

2.2.3. ACCIDENTALIDAD 13

2.2.4. BRIGADAS DE EMERGENCIAS 13

2.2.5. INDICADORES 13

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19 19

4. CONCLUSIONES 20

LISTA DE ILUSTRACIONES

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps. 4

LISTADO DE TABLAS


Tabla 1. Personal 5
Tabla 2. Programación capacitaciones 8
Tabla 3. Asistencia a capacitaciones. 8
Tabla 4. Programación Charlas 9
Tabla 5. Programación Pausas activas 10
Tabla 6. COPASST 11
Tabla 7. CCL 11
Tabla 8. Permisos de trabajo 12
Tabla 9. Programación inspecciones 12
Tabla 10. Brigada de emergencias 13

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Barrancabermeja en la dirección Cra. 28 # 55-10, como se evidencia en la ilustración N 1.

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps.

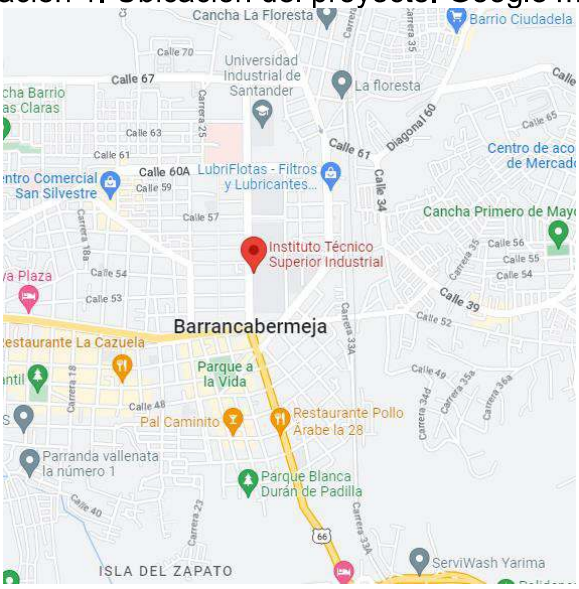

Fuente: https://www.google.com/maps/

1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@wrussyingenieros.com
OFICINA: DIRECCIÓN: Calle 8f # 79- 94 Bogotá D.C.
Contrato de Obra No. 0756-23
Objeto: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS.

2.1. PROGRAMA D1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Este capitulo, está enmarcado al contexto del contrato **No. 0756-23** evidenciando las actividades ejecutadas de Seguridad y Salud en el Trabajo, derivados del desarrollo de los trabajos en obra, de igual forma, dando cumplimiento a los parametros de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el contrato.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** realizó todas las actividades que se establecieron en el cronograma en el periodo comprendido del **06 de septiembre al 05 de octubre de 2023**, entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes: (identificación de riesgos en el centro de trabajo mediante la matriz de identificación de peligros, inspecciones de seguridad, inspección de orden y aseo, entrega de elementos de protección personal, charlas, pausas activas, capacitaciones, entre otras).

Dando cumplimiento al contrato en mención a continuación se relacionan todas las actividades que se han realizado en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.1.1.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL PERSONAL MÍNIMO

Personal para la ejecución del contrato No. 0756-23

En la tabla 1, se relaciona el personal que ejecutó actividades durante el periodo **06 de septiembre al 05 de octubre de 2023,** del cual hicieron parte: técnicos, profesionales, tecnólogos, ayudantes que realizaron labores dentro del contrato No. 0756-23.

Tabla 1. Personal

DATOS PERSONALES					
NOMBRE Y APELLIDOS	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EGRESO**	**ESTADO**
WILVER RUSSY LADINO	80.212.380	DIRECTOR DE OBRA	6/03/2023		**ACTIVO**
KAREN SALAMANCA ROJAS	1.057.588.784	RESIDENTE HSEQ	06/03/2023		**ACTIVO**
CESAR ORLANDO NARVAEZ QUIÑONEZ	1,098,754,093	RESIDENTE DE OBRA	9/03/2023		**ACTIVO**
SANDRA MILENA SANTIAGO CAMACHO	37,712,004	INSPECTOR HSE	15/03/2023		**ACTIVO**
YESENIA ALVAREZ MORALES	1,096,226,349	PROFESIONAL SOCIAL	9/03/2023		**ACTIVO**
FRANCINY RUSSI NAVARRETE	19,445,221	LOGISTICO	1/01/2023		**ACTIVO**

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

INFORME MENSUAL

ANTONIO JOSE CARVALLIDO CARPIO	1,096,242,479	AYUDANTE DE OBRA	6/03/2023		**ACTIVO**
HECTOR JULIO ESCOBAR SAAVEDRA	91,425,553	AYUDANTE DE OBRA	6/03/2023		**ACTIVO**
ALVEIRO CARPIO PEÑALOZA	1,042,211,689	AYUDANTE DE OBRA	6/03/2023		**ACTIVO**
ELVIS CARPIO PEÑALOZA	1,096,212,001	AYUDANTE DE OBRA	7/03/2023		**ACTIVO**
ALEXANDER JIMENEZ SANTAMARIA	13,565,252	AYUDANTE DE OBRA	7/03/2023		**ACTIVO**
ALFONSO VERGARA	78.323.568	MAESTRO DE OBRA	23/05/2023		**ACTIVO**
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023		**ACTIVO**
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.204.338	AYUDANTE DE OBRA	26/05/2023		**ACTIVO**
DOMINGO MORA	13.568.501	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023		**ACTIVO**
ELKIN REYES	1.096.218.748	AYUDANTE DE OBRA	26/05/2023		**ACTIVO**
GUSTAVO BUITRAGO	1.005.179.912	AYUDANTE DE OBRA	26/05/2023	01/07/2023	**INACTIVO**
ISNARDO DE JESUS MORENO	1.096.248.874	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	15/09/2023	**INACTIVO**
JAIR CARPIO	1.096.253.724	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023		**ACTIVO**
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023		**ACTIVO**
SIGILFREDO MENDEZ	13.569.557	OFICIAL DE OBRA	26/05/2023		**ACTIVO**
ABELINO HOMERO MUÑOZ LOPEZ	94.265.684	OFICIAL DE OBRA	27/06/2023		**ACTIVO**
MARIO FONTALVO PEREZ	8.572.679	AYUDANTE DE OBRA	05/07/2023		**ACTIVO**
DEIBY CARPIO AGUDELO	1.001.814.868	AYUDANTE DE OBRA	16/08/2023		**ACTIVO**
JOSE ANGEL PEÑALOZA LARIOS	1.050.918.199	AYUDANTE DE OBRA	16/08/2023		**ACTIVO**
WILMAR ORTIZ MENDOZA	79.392.925	OFICIAL DE OBRA	16/08/2023	30/09/2023	**INACTIVO**
MANUEL ARTURO BANDERA	12.400.740	AYUDANTE DE OBRA	19/09/2023		**ACTIVO**

JUAN MIGUEL PEREZ FERRER	8.572.227	AYUDANTE DE OBRA	19/09/2023		**ACTIVO**
ANDRES APONTE BERGAÑO	1.016.093.871	INSTALADOR	26/09/2023		**ACTIVO**
EDILBERTO LERMA SOTO	1.014.265.807	INSTALADOR	26/09/2023		**ACTIVO**
RONNY REYES CISNEROS	1.235.891	INSTALADOR	26/09/2023		**ACTIVO**

2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, presentamos la gestión de seguridad y salud en el trabajo que se llevó a cabo en la ejecución del contrato entre el periodo del 06 de septiembre al 05 de octubre de 2023.

2.1.2.1. INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó inducción de seguridad y salud en el trabajo donde se explicó al personal los siguientes temas:

- ✓ Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
- ✓ Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
- ✓ AFP-EPS-ARL-CCF
- ✓ Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)
- ✓ Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
- ✓ Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
- ✓ Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
- ✓ Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Riesgo mecánico: peligro de lzaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
- ✓ Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
- ✓ Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
- ✓ RIT (Reglamento Interno de Trabajo)
  - Son obligaciones especiales del trabajador
  - Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
  - Prohibiciones de los trabajadores
- ✓ Política de Seguridad y salud en el trabajo y reglamento de higiene y seguridad industrial.
- ✓ PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
- ✓ Que es el comité de convivencia laboral
- ✓ Que el COPASST

Para constancia de la inducción se anexan los siguientes registros:

ANEXO 1: Inducción SGSST
ANEXO 2: Entrega individual EPP

2.1.2.2. DOCUMENTACION Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

La documentación del personal que ejecuto actividades dentro del 06 de septiembre al 05 de octubre de 2023 y las planillas de seguridad social se encuentran en el **ANEXO 3 y 4.**

2.1.2.3. CAPACITACIONES

En el periodo del 06 de septiembre al 05 de octubre de 2023 se programaron una capacitación, cumpliendo con un porcentaje de ejecución del 100%.

Tabla 2. Programación capacitaciones

PROGRAMACIÓN					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No cumple**	**Programadas**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
02/10/2023	02/10/2023	CUMPLE	1	1	100%
			1	1	**100%**

Nota 2: A continuación, se relaciona el personal que asistió a la capacitación dada en el periodo del 06 de septiembre al 05 de octubre de 2023.

Tabla 3. Asistencia a capacitaciones.

CAPACITACION	NOMBRE DE TRABAJADOR	CARGO
IDENTIFICACION DE RIESGOS	ELVIS CARPIO	AYUDANTE
	ABELINO MUÑOZ	OFICIAL
	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE
	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE
	SIGILFREDO MENDEZ	OFICIAL
	MARIO FONTALVO	AYUDANTE
	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE
	JAIR CARPIO	AYUDANTE
	BRAYAN COSSIO	AYUDANTE
	DEIBI CARPIO	AYUDANTE
	KEVIN ORTEGA	AYUDANTE
	CARLOS RODRIGUEZ	AYUDANTE
	DOMINGO MORA	AYUDANTE

	WILMAR ORTIZ	OFICIAL
	ELKIN REYES	AYUDANTE
	ALEXANDER JIMENEZ	AYUDANTE
	MANUEL BANDERA	AYUDANTE
	JOSE ANGEL	AYUDANTE
	JUAN PEREZ	AYUDANTE

ANEXO 5. Capacitaciones

2.1.2.4. CHARLAS DE SEGURIDAD

Las charlas de 5 minutos se realizaron antes de iniciar la jornada laboral, estas se realizan el objetivo de informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud en las actividades que ejecutan diariamente. En el periodo del 06 de septiembre al 05 de octubre de 2023 se programaron 26 charlas y se ejecutaron 26, cumpliendo con un porcentaje del **100 %.**

Tabla 4. Programación Charlas

PROGRAMACIÓN CHARLAS DE SEGURIDAD					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No cumple**	**TEMA**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
06/09/2023	06/09/2023	CUMPLE	Reporte de accidentes	1	100%
07/09/2023	07/09/2023	CUMPLE	Tipos de contaminación	1	100%
08/09/2023	08/09/2023	CUMPLE	Qué es un ATS y para qué sirve	1	100%
09/09/2023	09/09/2023	CUMPLE	Divulgación de incidentes	1	100%
11/09/2023	11/09/2023	CUMPLE	Cuidado personal	1	100%
12/09/2023	12/09/2023	CUMPLE	Trabajo en alturas	1	100%
13/09/2023	13/09/2023	CUMPLE	Qué es un arnés y para qué sirve	1	100%
14/09/2023	14/09/2023	CUMPLE	Calidad del aire	1	100%
15/09/2023	15/09/2023	CUMPLE	Gestión de residuos industriales	1	100%
16/09/2023	16/09/2023	CUMPLE	Qué son factores de riesgo físico	1	100%
18/09/2023	18/09/2023	CUMPLE	El autocuidado va más allá de nosotros mismos	1	100%
19/09/2023	19/09/2023	CUMPLE	Reporte de accidentes	1	100%
20/09/2023	20/09/2023	CUMPLE	Elementos de protección personal	1	100%
21/09/2023	21/09/2023	CUMPLE	Qué es un llamado de atención	1	100%
22/09/2023	22/09/2023	CUMPLE	Uso de EPP	1	100%
23/09/2023	23/09/2023	CUMPLE	Orden y aseo en sitio	1	100%

25/09/2023	25/09/2023	CUMPLE	Qué son EPI	1	100%
26/09/2023	26/09/2023	CUMPLE	Qué es un punto ecológico	1	100%
27/09/2023	27/09/2023	CUMPLE	Manejo de extintores	1	100%
28/09/2023	28/09/2023	CUMPLE	Montaje de cubierta	1	100%
29/09/2023	29/09/2023	CUMPLE	Orden y aseo en sitio	1	100%
30/09/2023	30/09/2023	CUMPLE	Protección de manos y brazos	1	100%
02/10/2023	02/10/2023	CUMPLE	Plan de manejo ambiental	1	100%
03/10/2023	03/10/2023	CUMPLE	Trabajo en condiciones de salud	1	100%
04/10/2023	04/10/2023	CUMPLE	Cuidemos nuestra salud, tengamos un buen estado saludable	1	100%
05/10/2023	05/10/2023	CUMPLE	Protección de los pies	1	100%
				26	**100 %**

ANEXO 6: Asistencia charlas de seguridad

2.1.2.5. PAUSAS ACTIVAS

Se realizaron las pausas activas durante la jornada laboral con el fin de revitalizar la energía corporal y refrescar la mente de los trabajadores. De acuerdo con el plan de trabajo se tiene programado que las pausas activas se deben realizar todos los días laborales, donde en periodo se ejecutaron 26 pausas activas teniendo un porcentaje de cumplimiento del **100%.**

Tabla 5. Programación Pausas activas

PROGRAMACIÓN CHARLAS DE SEGURIDAD					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No cumple**	**Programadas**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
06/09/2023	06/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
07/09/2023	07/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
08/09/2023	08/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
09/09/2023	09/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
11/09/2023	11/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
12/09/2023	12/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
13/09/2023	13/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
14/09/2023	14/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
15/09/2023	15/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
16/09/2023	16/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
18/09/2023	18/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
19/09/2023	19/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
20/09/2023	20/09/2023	CUMPLE	1	1	100%

21/09/2023	21/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
22/09/2023	22/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
23/09/2023	23/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
25/09/2023	25/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
26/09/2023	26/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
27/09/2023	27/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
28/09/2023	28/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
29/09/2023	29/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
30/09/2023	30/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
02/10/2023	02/10/2023	CUMPLE	1	1	100%
03/10/2023	03/10/2023	CUMPLE	1	1	100%
04/10/2023	04/10/2023	CUMPLE	1	1	100%
05/10/2023	05/10/2023	CUMPLE	1	1	100%
			26	26	**100%**

ANEXO 7: Asistencia Pausas Activas

2.1.2.6. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, se adjunta acta de reunión del vigía de seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 6. COPASST

FECHA	TEMAS TRATADOS
04/10/2023	1. Seguimiento de avance en la implementación del SG-SST

ANEXO 8: Acta de reunión Vigía seguridad y salud en el trabajo

2.1.2.7. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Se realizó la reunión del comité de convivencia laboral, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, se adjunta acta de reunión del comité de convivencia laboral.

Tabla 7. CCL

FECHA	TEMAS TRATADOS
12/09/2022	1. Acoso laboral

ANEXO 9: Acta de reunión Comité de convivencia Laboral.

2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO

El análisis seguro de trabajo (AST), es un proceso por el cual se identifican incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea y se elaboran procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de este. El Análisis de Seguridad en la Tarea (AST) tiene como finalidad realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas dentro de la empresa.

Tabla 8. Permisos de trabajo

DOCUMENTO	CANTIDAD
Analisis de trabajo	4
Permiso de trabajo alturas	6
Permiso en caliente	6

ANEXO 10 ATS-Permisos de trabajo.

2.2.2. INSPECCIONES

Las inspecciones de seguridad son una técnica analítica de seguridad que consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en las áreas de trabajo. Para el periodo de **06 de septiembre al 05 de octubre de 2023**, teniendo en cuenta las actividades ejecutadas en el mes.

Tabla 9. Programación inspecciones

INSPECCIÓN REALIZADA	CANTIDAD
Inspección andamio estructural	4
Inspección botiquín	5
Inspección elementos de protección personal alturas	8
Inspección pulidora	3
Inspección extintor	1
Inspección herramientas manuales	2
Inspección andamio	1
Inspección compactador tipo canguro	7

ANEXO 11: Inspecciones

2.2.3. ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo del 06 de septiembre al 05 de octubre de 2023, no se presentaron accidentes laborales.

ANEXO 12: HSE-FOR-65 Accidentalidad.

2.2.4. BRIGADAS DE EMERGENCIAS

Se realiza reunión de la brigada de emergencias del proyecto.

Tabla 10. Brigada de emergencias

FECHA	TEMAS TRATADOS
21/09/2023	• Capacitación brigadas de emergencia

ANEXO 13: Reunión Brigada de Emergencias

2.2.5. INDICADORES

Se establecen los indicadores para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de seguridad y salud en el trabajo.

- **FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD**

$$\mathrm{R} = \frac{\mathrm{No}\ Accidentes\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}{\mathrm{No}\ \ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} * 100$$

$$\mathrm{R} = \frac{0}{22} = 0\ \%$$

- **ÍNDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ dias\ incapacidad\ AT\ mes + \#\ días\ cargados\ en\ el\ mes}}{\mathbf{\#\ trabajadores\ en\ el\ mes}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{22}} = \mathbf{0}\ \%$$

En el periodo de **06 de septiembre al 05 de octubre de 2023** no se tuvo accidentes laborales.

- **ÍNDICE DE PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ ATmortalesen\ el\ año}}{\mathbf{\#\ AT\ en\ el\ año}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} = \mathbf{0}\ \%$$

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún accidente mortal.

- **INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ de\ casos\ nuevos\ de\ EL}}{\mathbf{Promedio\ de\ trabajadores}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} = \mathbf{0}\ \%$$

Durante la ejecución del proyecto no se ha presentado enfermedades laborales en los trabajadores.

- **ÍNDICE FRECUENCIA AUSENTISMO**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No\ días\ ausencia\ por\ incapacidad\ laboral}}{\mathbf{No\ días\ programados\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}} * \mathbf{100}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{30}} = \mathbf{0}\ \%$$

En el periodo de 06 de septiembre al 05 de octubre de 2023 no se presentó ausentismo laboral, debido a incapacidades medicas por accidente de trabajo.

- **CAPACITACIONES**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No\ capacitaciones\ programadas}}{\mathbf{No\ \ Capacitaciones\ Ejecutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

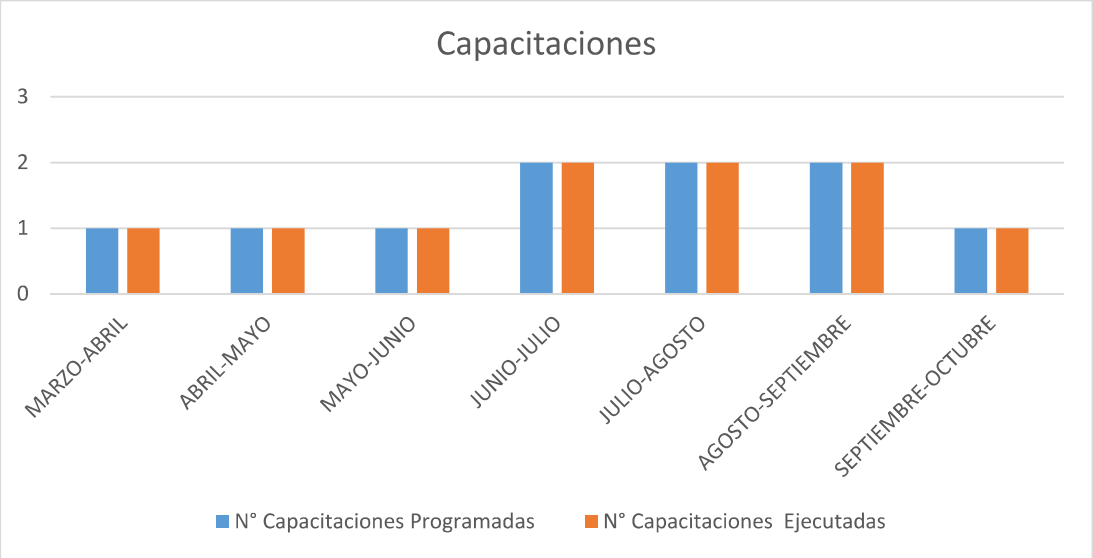


Se cumplió con el 100% de las capacitaciones programadas para el periodo 06 de septiembre al 05 de octubre de 2023.

- **PAUSAS ACTIVAS**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{pausas\ activas\ Ejecutadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{pausas\ activas\ \ programadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{26}}{\mathbf{26}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

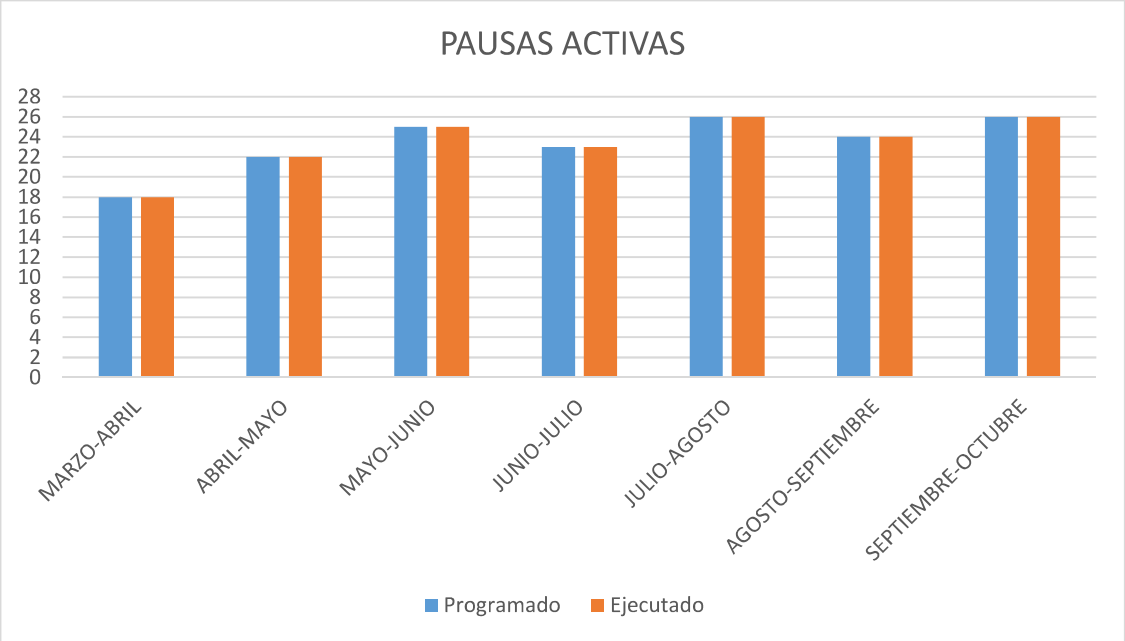


Se cumplió con el 100 % de las Pausas Activas Programadas para el periodo del 06 de septiembre al 05 de octubre de 2023.

- **CHARLAS DE SEGURIDAD.**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No\ \ Charlas\ de\ seguridad\ \ \ programadas}}{\mathbf{No\ \ Charlas\ de\ seguridad\ \ \ Ejecutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{26}}{\mathbf{26}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

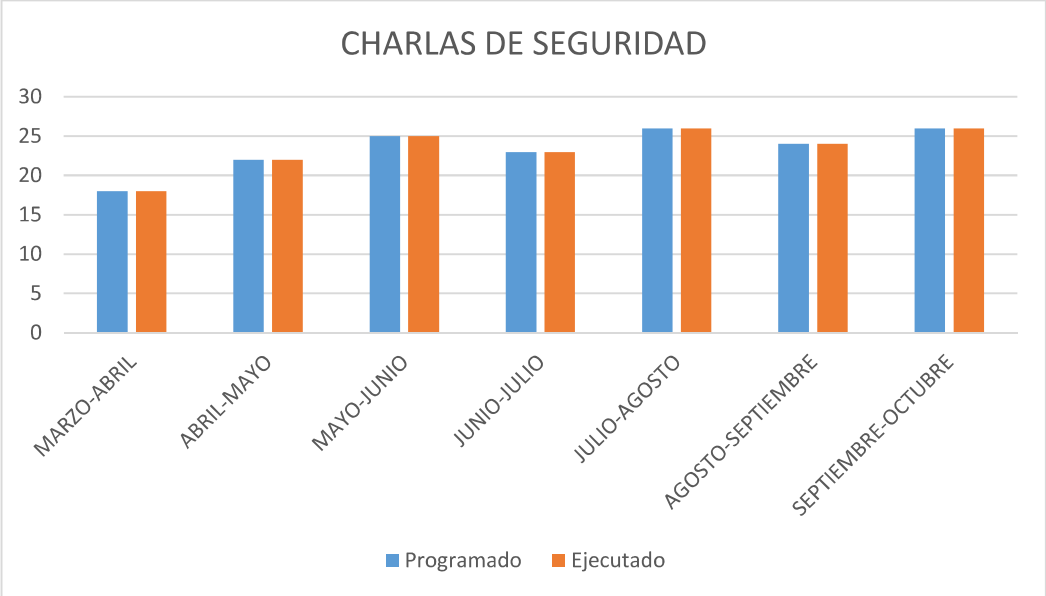


Se cumplió con el 100% de las Charlas de seguridad programadas para el periodo del 06 de septiembre al 05 de octubre de 2023.

- **CCL.**

$$\mathbf{CCL} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ \ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ \ ejeutadas}}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

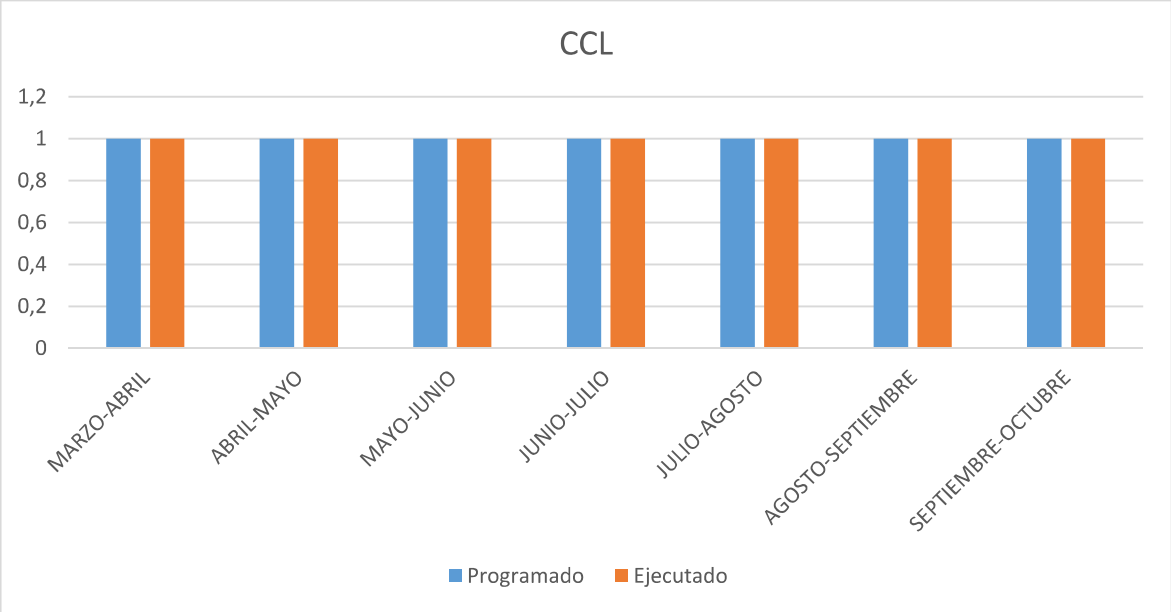

- **REUNIONES COPASST**

$$\textbf{COPASST} = \frac{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ programadas}}{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ ejeutadas}}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

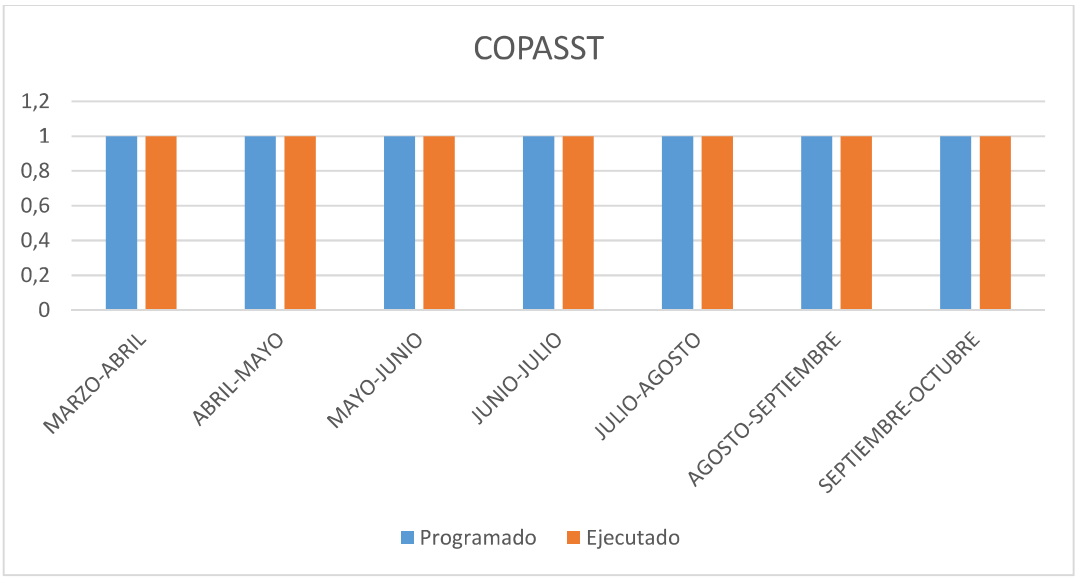

- **REUNIONES COE**

$$\mathbf{COE} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ ejeutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

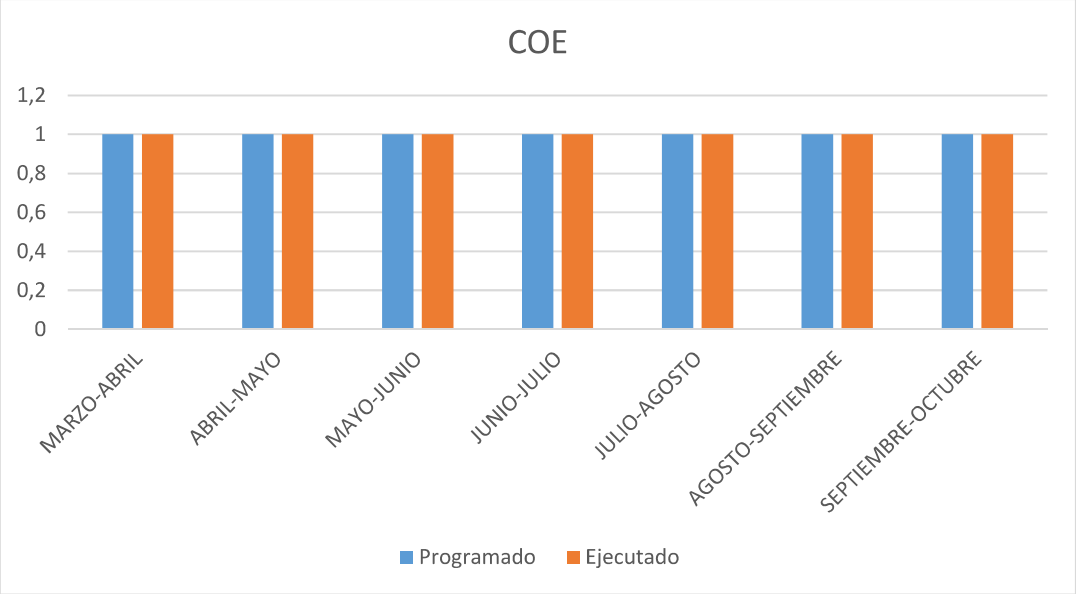

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19

Debido a la pandemia que se presenta actualmente por el coronavirus COVID-19 y en cumplimiento a la circular conjunta 001 del 11 de mayo de 2020 expedida por Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio De Salud y Protección Social Y Ministerio Del Trabajo; a la circular conjunta 0000003 del 8 de mayo de 2020 expedida por el Ministerio De Salud y Protección Social, Ministerio De Trabajo y Ministerio De Transporte, al decreto 593 de 24 mayo de 2020, a la resolucion 666 de 24 de mayo de 2020, al decreto 121 de 2020, a la Resolucion 223 de 2021 y a la resolucion 777 de 2021, entre otros, diariamente se realiza control a los trabajadores de su estado de salud mediante una encuesta para autorizar su ingreso a las instalaciones y se implementa el protocolo de bioseguridad a los trabajadores. En el **ANEXO 14** se encuentra los registros de la implementación del protocolo de bioseguridad PAPSO.

4. CONCLUSIONES

- Durante el periodo de **06 de septiembre al 05 de octubre de 2023** se realizo la reunion de comité de Convivencia laboral.

- Durante el periodo de **06 de septiembre al 05 de octubre de 2023** no se presentaron accidentes laborales.

- Se cumplió con los compromisos contractuales del contrato en el periodo del **06 de septiembre al 05 de octubre de 2023.**

- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo a las exigencias de la obra en mención.

- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfeccion de manos, herramientas y áreas, se tuvo control con los empleados en cuanto a la prevncion y mitigacion del contagio de COVID19.

ANEXO 1. INDUCCIÓN SIG

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

REGISTRO INDUCCIÓN Y RE- INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO DE OBRA CIVIL		
NOMBRE: Andres Oporte	CEDULA: 1'016,095,811	FECHA: 26-09-23
ÁREA/SECCIÓN: Colegio I.T.S.I.	CARGO: Maintador	

Objetivo general: Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra empresa las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

1. Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
2. Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
   AFP-EPS-ARL-CCF
   Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)
3. Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
   - Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
   - Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
   - Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
   - Riesgo mecánico: peligro de izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
4. Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
5. Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
6. RIT (Reglamento Interno de Trabajo)

   Son obligaciones especiales del trabajador
   Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
   Prohibiciones de los trabajadores
7. Política de Seguridad y salud en el trabajo y REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
8. PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
9. Que es el comité de convivencia laboral
10. Que el COPASST

Yo como trabajador de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** estoy comprometido con la normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labo Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, los procedimientos generale de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** me comprometo cumplirlas e informar de inmediato a mi jefe directo, jefe de área o encargado de Seguridad y Sal en el Trabajo, cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

escripción: Notificación de peligros a los cuales va a estar expuesto; las medidas de control a tener en cuenta y los elementos de protección ersonal a usar durante la permanencia en sus actividades constructivas.

lementos de protección personal (EPP) del cargo: Botas caucho o de material con puntera de acero, guantes de carnaza o de caucho, casco de guridad, protección auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad, overol o chaleco. Para trabajos especiales como en altura, ldadura o en espacios confinados se entregarán los EPPS y equipos contra caídas requeridos según procedimiento seguro.

PELIGROS EXISTENTES (Diligencie SI / NO según la exposición a los peligros)

I / NO	Descripción del peligro	SI / NO	Descripción del peligro
SI	Físicos: Ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones (Radiaciones ionizantes y no ionizantes)	SI	**Mecánicos:** Elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.
SI	**Químicos:** Humos no metálicos, humos metálicos, polvos inorgánicos, vapores, gases, material particulado.	SI	**Eléctricos:** Baja tensión, conexiones eléctricas defectuosas, extensiones en mal estado falta de tableros de control.
SI	**Biológicos:** Bacterias, hongos, virus, parásitos, picaduras, mordedura, fluidos o excrementos.	SI	**Locativos:** Almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto).
I	**Psicosociales:** Contenido de la tarea (trabajo repetitivo, monotonía), estrés laboral, cansancio físico. Relaciones laborales – jerárquicas, convivencia laboral.	SI	**Seguridad vial:** Accidentes de tránsito; exceso de confianza en cruzar las vías, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra y en la vía, exceso de confianza en la conducción.
NO	**Naturales:** Movimientos sísmicos, terremoto, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones, precipitaciones (lluvia, granizadas, heladas)	SI	**Biomecánicos:** Postura (prologada mantenida, forzada, anti gravitacionales), Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas.
NO	**Tecnológicos:** Explosión, fuga, derrame, incendio.	SI	**Comportamentales:** Incumplimiento por parte del trabajador en las normas de seguridad: actos inseguros, no uso de EPP, entre otros.
SI	**Públicos:** Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.	SI	**Trabajo en Alturas**
	Espacios Confinados.		Otros:

didas de control:

1. Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis en sistema musculo esquelético, audiometria y espirometria.
2. Cumplir y promocionar las políticas del ***WRUSSY INGENIEROS SAS.***
3. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes.
4. No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que el paso de energía eléctrica este detenido.
5. Por su seguridad nunca retire los elementos de protección personal en obra.
6. No olvide las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias.
7. Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas).
8. Inspecciones los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
9. Todo personal que realice trabajos en alturas debe estar certificado y utilizar los equipos de protección contra caídas requeridas para la actividad.
10. Asegúrese de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante la labor (energía, gas, acueducto, etc.).
11. No fume dentro de la obra y/o en las áreas de trabajo.
12. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
13. Evite dejar herramientas botadas, ubíquela en el lugar correspondiente.
14. No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
15. Reporte oportunamente todo accidente o incidente de trabajo el mismo día de ocurrido el evento.

dula: 1'016.093.871,	**Cedula:** 37712004,
mbre del trabajador: Andres Mateo aponte.	**Nombre inducción:** SST
cha: 26-08-23	**Fecha:** 26-08-23
ma del trabajador:	**Firma responsable socialización:**

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Nombre: Andres Fonte	Fecha: 26-09-23	Cargo: Ubicador	Nota:

1. **¿Qué es un accidente de Trabajo?**
   a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica. una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
   b. Aquel que se produce cuando el trabajador se traslada del trabajo a su vivienda en transporte público.
   c. Aquel que se produce en cumplimiento de las tareas asignadas por mis amigos del trabajo.
   d. Todas las anteriores

2. **Complete el nombre de cada una de las canecas para recolección de residuos**





Peligroso	Organico	Reciclable

3. **Cuál es el significado de punto ecológico**
   a. Es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores.
   b. es un sitio que tiene la empresa para disponer de los residuos
   c. es un sitio de recolección de basuras.

4. **Seleccione con una X las condiciones inseguras, con un círculo los actos inseguros.**






5. **Que es el comité de convivencia laboral**

   a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

6. **Que es el COPASST**

   a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. Elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

7. **¿Cuál es el procedimiento que debo seguir en caso de accidente de trabajo?**

   a. Conservar la calma.
   b. Informar de manera inmediata al supervisor, jefe inmediato o encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa usuaria.
   c. Recibir los primeros auxilios, según se requiera.
   d. La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS**, de acuerdo con el evento, llamará a la línea de atención ARL SURA, con el fin de direccionar al accidentado al centro de atención médica en convenio con ARL SURA; usted deberá dirigirse al centro de atención designado por la línea de atención ARL SURA, en caso de requerirse.

8. Mencione un compromiso de la política integrada del sistema:

Powered by CamScanner


9. Mencione el objetivo de la política de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción

10. Identifique los residuos y una con una flecha de acuerdo a la caneca que corresponda.

Barridos de piso



Cartón



Servilletas









Vasos de plásticos



Comida



Botellas Plástico



Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

REGISTRO INDUCCIÓN Y RE- INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO DE OBRA CIVIL

NOMBRE: Edilberto lerma Soto.	CEDULA: 1'014.265.807	FECHA:
ÁREA/SECCIÓN: Colegio I.T.S.I.	CARGO: Montador	26-09-23

Objetivo general: Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra empresa las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

1. Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
2. Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
   AFP-EPS-ARL-CCF
   Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)

3. Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
   - Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
   - Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
   - Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
   - Riesgo mecánico: peligro de izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
4. Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
5. Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
6. RIT (Reglamento Interno de Trabajo)

   Son obligaciones especiales del trabajador
   Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
   Prohibiciones de los trabajadores
7. Política de Seguridad y salud en el trabajo y REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
8. PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
9. Que es el comité de convivencia laboral
10. Que el COPASST

o como trabajador de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** estoy comprometido con las ormas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor. eclaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, los procedimientos generales Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** me comprometo a mplirlas e informar de inmediato a mi jefe directo, jefe de área o encargado de Seguridad y Salud el Trabajo, cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Descripción: Notificación de peligros a los cuales va a estar expuesto; las medidas de control a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar durante la permanencia en sus actividades constructivas.

Elementos de protección personal (EPP) del cargo: Botas caucho o de material con puntera de acero, guantes de carnaza o de caucho, casco de seguridad, protección auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad, overol o chaleco. Para trabajos especiales como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregarán los EPPS y equipos contra caídas requeridos según procedimiento seguro.

PELIGROS EXISTENTES (Diligencie SI / NO según la exposición a los peligros)

SI / NO	Descripción del peligro	SI / NO	Descripción del peligro
SI	Físicos: Ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones (Radiaciones ionizantes y no ionizantes)	SI	**Mecánicos:** Elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.
SI	**Químicos:** Humos no metálicos, humos metálicos, polvos inorgánicos, vapores, gases, material particulado.	SI	**Eléctricos:** Baja tensión, conexiones eléctricas defectuosas, extensiones en mal estado falta de tableros de control.
SI	**Biológicos:** Bacterias, hongos, virus, parásitos, picaduras, mordedura, fluidos o excrementos.	SI	**Locativos:** Almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto).
SI	**Psicosociales:** Contenido de la tarea (trabajo repetitivo, monotonía), estrés laboral, cansancio físico. Relaciones laborales – jerárquicas, convivencia laboral.	SI	**Seguridad vial:** Accidentes de tránsito; exceso de confianza en cruzar las vías, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra y en la vía, exceso de confianza en la conducción.
NO	**Naturales:** Movimientos sísmicos, terremoto, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones, precipitaciones (lluvia, granizadas, heladas)	SI	**Biomecánicos:** Postura (prologada mantenida, forzada, anti gravitacionales), Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas.
NO	**Tecnológicos:** Explosión, fuga, derrame, incendio.	SI	**Comportamentales:** Incumplimiento por parte del trabajador en las normas de seguridad: actos inseguros, no uso de EPP, entre otros.
SI	**Públicos:** Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.	SI	**Trabajo en Alturas**
	Espacios Confinados.		Otros:

Medidas de control:

1. Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis en sistema musculo esquelético, audiometria y espirometria.
2. Cumplir y promocionar las políticas del ***WRUSSY INGENIEROS SAS.***
3. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes.
4. No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que el paso de energía eléctrica este detenido.
5. Por su seguridad nunca retire los elementos de protección personal en obra.
6. No olvide las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias.
7. Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas).
8. Inspecciones los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
9. Todo personal que realice trabajos en alturas debe estar certificado y utilizar los equipos de protección contra caídas requeridas para la actividad.
10. Asegúrese de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante la labor (energía, gas, acueducto, etc.).
11. No fume dentro de la obra y/o en las áreas de trabajo.
12. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
13. Evite dejar herramientas botadas, ubíquela en el lugar correspondiente.
14. No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
15. Reporte oportunamente todo accidente o incidente de trabajo el mismo día de ocurrido el evento.

Cedula: 1'014.265.807.	**Cedula:** 37712004
Nombre del trabajador: Edilberto Lema Soto.	**Nombre inducción:** SST
Fecha: 26-08-23.	**Fecha:** 26-08-23
Firma del trabajador:	**Firma responsable socialización:**

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Nombre: EDILBERTO LEEHA	Fecha: 26-09-2023	Cargo: Montador	Nota: 9.0

1. **¿Qué es un accidente de Trabajo?**
   a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
   b. Aquel que se produce cuando el trabajador se traslada del trabajo a su vivienda en transporte público.
   c. Aquel que se produce en cumplimiento de las tareas asignadas por mis amigos del trabajo.
   d. Todas las anteriores

2. **Complete el nombre de cada una de las canecas para recolección de residuos**

		
Contaminados	Organicos.	Reciclables.

3. **Cuál es el significado de punto ecológico**
   a. Es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores.
   b. es un sitio que tiene la empresa para disponer de los residuos
   c. es un sitio de recolección de basuras.

4. **Seleccione con una X las condiciones inseguras, con un circulo los actos inseguros.**



[X]


[X]





[O]

[O]



Powered by CamScanner

5. **Que es el comité de convivencia laboral**

   a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

6. **Que es el COPASST**

   a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. Elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

7. **¿Cuál es el procedimiento que debo seguir en caso de accidente de trabajo?**

   a. Conservar la calma.
   b. Informar de manera inmediata al supervisor, jefe inmediato o encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa usuaria.
   c. Recibir los primeros auxilios, según se requiera.
   d. La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS**, de acuerdo con el evento, llamará a la línea de atención ARL SURA, con el fin de direccionar al accidentado al centro de atención médica en convenio con ARL SURA; usted deberá dirigirse al centro de atención designado por la línea de atención ARL SURA, en caso de requerirse.

8. Mencione un compromiso de la política integrada del sistema:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

9. Mencione el objetivo de la política de alcoholismo. tabaquismo y drogadicción

No ingresar al trabajo con efectos de sustancias alucinogenas

10. Identifique los residuos y una con una flecha de acuerdo a la caneca que corresponda.

Barridos de piso




Vasos de plásticos





Canón



Comida





Servilletas

Botellas Plástico





Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

REGISTRO INDUCCIÓN Y RE- INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO DE OBRA CIVIL		
NOMBRE: Juan M Perez	CEDULA: 85[illegible]227	FECHA:
ÁREA/SECCIÓN: I.T.S.I. Bca-6ta	CARGO: Ayudante	18.09.2023

Objetivo general: Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra empresa las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

1. Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
2. Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
   AFP-EPS-ARL-CCF
   Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)

3. Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
   - Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
   - Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
   - Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
   - Riesgo mecánico: peligro de izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
4. Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
5. Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
6. RIT (Reglamento Interno de Trabajo)

   Son obligaciones especiales del trabajador
   Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
   Prohibiciones de los trabajadores
7. Política de Seguridad y salud en el trabajo y REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
8. PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
9. Que es el comité de convivencia laboral
10. Que el COPASST

Yo como trabajador de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor. Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, los procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato a mi jefe directo, jefe de área o encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Descripción: Notificación de peligros a los cuales va a estar expuesto; las medidas de control a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar durante la permanencia en sus actividades constructivas.

Elementos de protección personal (EPP) del cargo: Botas caucho o de material con puntera de acero, guantes de carnaza o de caucho, casco de seguridad, protección auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad, overol o chaleco. Para trabajos especiales como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregarán los EPPS y equipos contra caídas requeridos según procedimiento seguro.

PELIGROS EXISTENTES (Diligencie SI / NO según la exposición a los peligros)

SI / NO	Descripción del peligro	SI / NO	Descripción del peligro
S'	**Físicos:** Ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones (Radiaciones Ionizantes y no Ionizantes)	Sí	**Mecánicos:** Elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.
S!	**Químicos:** Humos no metálicos, humos metálicos, polvos inorgánicos, vapores, gases, material particulado.	S'	**Eléctricos:** Baja tensión, conexiones eléctricas defectuosas, extensiones en mal estado falta de tableros de control.
S'	**Biológicos:** Bacterias, hongos, virus, parásitos, picaduras, mordedura, fluidos o excrementos.	S'	**Locativos:** Almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto).
SI	**Psicosociales:** Contenido de la tarea (trabajo repetitivo, monotonía), estrés laboral, cansancio físico. Relaciones laborales – jerárquicas, convivencia laboral.	Sí	**Seguridad vial:** Accidentes de tránsito; exceso de confianza en cruzar las vías, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra y en la vía, exceso de confianza en la conducción.
NO	**Naturales:** Movimientos sísmicos, terremoto, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones, precipitaciones (lluvia, granizadas, heladas)	Sí	**Biomecánicos:** Postura (prologada mantenida, forzada, anti gravitacionales), Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas.
NO	**Tecnológicos:** Explosión, fuga, derrame, incendio.	Sí	**Comportamentales:** Incumplimiento por parte del trabajador en las normas de seguridad: actos inseguros, no uso de EPP, entre otros.
SI	**Públicos:** Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.	SI	**Trabajo en Alturas**
	Espacios Confinados.		**Otros:**

Medidas de control:

1. Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis en sistema musculo esquelético, audiometría y espirometría.
2. Cumplir y promocionar las políticas del ***WRUSSY INGENIEROS SAS.***
3. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes.
4. No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que el paso de energía eléctrica este detenido.
5. Por su seguridad nunca retire los elementos de protección personal en obra.
6. No olvide las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias.
7. Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas).
8. Inspecciones los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
9. Todo personal que realice trabajos en alturas debe estar certificado y utilizar los equipos de protección contra caídas requeridas para la actividad.
10. Asegúrese de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante la labor (energía, gas, acueducto, etc.).
11. No fume dentro de la obra y/o en las áreas de trabajo.
12. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
13. Evite dejar herramientas botadas, ubíquela en el lugar correspondiente.
14. No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
15. Reporte oportunamente todo accidente o incidente de trabajo el mismo día de ocurrido el evento.

Cedula: 8.572.227	**Cedula:** 37712004.
Nombre del trabajador: Juan Perez	**Nombre inducción:** Politica, procedimientos y normas.
Fecha: 08-04-2023	**Fecha:** 18-09-2023
Firma del trabajador:	**Firma responsable socialización:**



Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CODIGO HSE Y SST
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Nombre: Juan Perez	Fecha: 18-09-2023	Cargo: Ayudante	Nota: 4,0

1. **¿Qué es un accidente de Trabajo?**
   - X **a.** Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
   - **b.** Aquel que se produce cuando el trabajador se traslada del trabajo a su vivienda en transporte público.
   - **c.** Aquel que se produce en cumplimiento de las tareas asignadas por mis amigos del trabajo.
   - **d.** Todas las anteriores.

2. **Complete el nombre de cada una de las canecas para recolección de residuos**

		
Contaminante	Organicos	Aprobechable

3. **Cuál es el significado de punto ecológico**
   - X **a.** Es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores.
   - **b.** es un sitio que tiene la empresa para disponer de los residuos
   - **c.** es un sitio de recolección de basuras.

4. **Seleccione con una X las condiciones inseguras, con un círculo los actos inseguros.**



[X]

[O]





[X]

[O]



Powered by CamScanner

5. Que es el comité de convivencia laboral

a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
c. elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

6. Que es el COPASST

a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
c. Elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

7. ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir en caso de accidente de trabajo?

a. Conservar la calma.
b. Informar de manera inmediata al supervisor, jefe inmediato o encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa usuaria.
c. Recibir los primeros auxilios, según se requiera.
d. La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS**, de acuerdo con el evento, llamará a la línea de atención ARL SURA, con el fin de direccionar al accidentado al centro de atención médica en convenio con ARL SURA; usted deberá dirigirse al centro de atención designado por la línea de atención ARL SURA, en caso de requerirse.

8. Mencione un compromiso de la política integrada del sistema:


Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION DE INDUCCION Y RE.INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

9. Mencione el objetivo de la política de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción

no ingresar al Trabajo en condiciones de embriagues o condrogas

10. Identifique los residuos y una con una flecha de acuerdo a la caneca que corresponda.

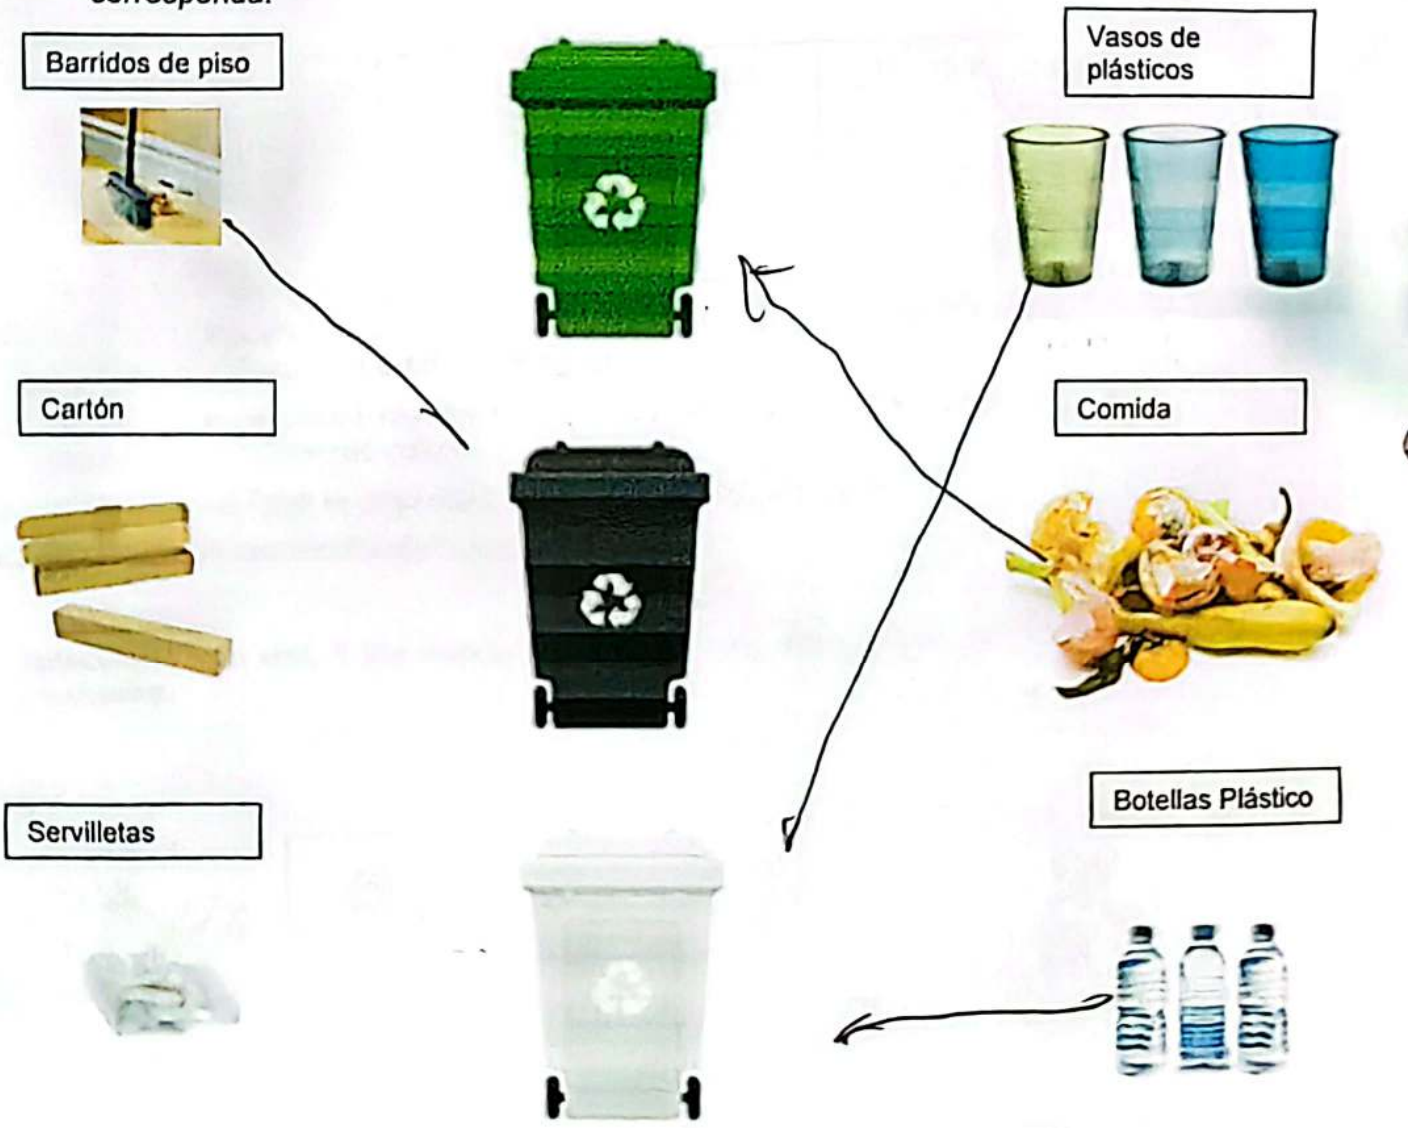

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

REGISTRO INDUCCIÓN Y RE- INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO DE OBRA CIVIL		
NOMBRE: Manuel Bandera P	CEDULA: 12400747	FECHA:
ÁREA/SECCIÓN:	CARGO: auxiliar	10 Sep 2021
Objetivo general: Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra empresa las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:		

1. Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
2. Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
   AFP-EPS-ARL-CCF
   Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)

3. Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
   - Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
   - Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
   - Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
   - Riesgo mecánico: peligro de izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
4. Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
5. Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
6. RIT (Reglamento Interno de Trabajo)

   Son obligaciones especiales del trabajador
   Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
   Prohibiciones de los trabajadores
7. Política de Seguridad y salud en el trabajo y REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
8. PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
9. Que es el comité de convivencia laboral
10. Que el COPASST

Yo como trabajador de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor. Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, los procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato a mi jefe directo, jefe de área o encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Descripción: Notificación de peligros a los cuales va a estar expuesto; las medidas de control a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar durante la permanencia en sus actividades constructivas.

Elementos de protección personal (EPP) del cargo: Botas caucho o de material con puntera de acero, guantes de carnaza o de caucho, casco de seguridad, protección auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad, overol o chaleco. Para trabajos especiales como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregarán los EPPS y equipos contra caídas requeridos según procedimiento seguro.

PELIGROS EXISTENTES (Diligencie SI / NO según la exposición a los peligros)

SI / NO	Descripción del peligro	SI / NO	Descripción del peligro
X S:	**Físicos**: Ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones (Radiaciones ionizantes y no ionizantes)	X S:	**Mecánicos:** Elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.
X S:	**Químicos:** Humos no metálicos, humos metálicos, polvos inorgánicos, vapores, gases, material particulado.	X S:	**Eléctricos:** Baja tensión, conexiones eléctricas defectuosas, extensiones en mal estado falta de tableros de control.
X S:	**Biológicos:** Bacterias, hongos, virus, parásitos, picaduras, mordedura, fluidos o excrementos.	NO	**Locativos:** Almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto).
X S:	**Psicosociales:** Contenido de la tarea (trabajo repetitivo, monotonía), estrés laboral, cansancio físico. Relaciones laborales – jerárquicas, convivencia laboral.	X S:	**Seguridad vial:** Accidentes de tránsito; exceso de confianza en cruzar las vías, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra y en la vía, exceso de confianza en la conducción.
X S:	**Naturales:** Movimientos sísmicos, terremoto, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones, precipitaciones (lluvia, granizadas, heladas)	X S:	**Biomecánicos:** Postura (prologada mantenida, forzada, anti gravitacionales), Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas.
S: X	**Tecnológicos:** Explosión, fuga, derrame, incendio.	S:	**Comportamentales:** Incumplimiento por parte del trabajador en las normas de seguridad: actos inseguros, no uso de EPP, entre otros.
X S:	**Públicos:** Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.	S:	**Trabajo en Alturas**
S: X	**Espacios Confinados.**		**Otros:**

Medidas de control:

1. Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis en sistema musculo esquelético, audiometría y espirómetria.
2. Cumplir y promocionar las políticas del ***WRUSSY INGENIEROS SAS.***
3. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes.
4. No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que el paso de energía eléctrica este detenido.
5. Por su seguridad nunca retire los elementos de protección personal en obra.
6. No olvide las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias.
7. Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas).
8. Inspecciones los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
9. Todo personal que realice trabajos en alturas debe estar certificado y utilizar los equipos de protección contra caídas requeridas para la actividad.
10. Asegúrese de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante la labor (energía, gas, acueducto, etc.).
11. No fume dentro de la obra y/o en las áreas de trabajo.
12. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
13. Evite dejar herramientas botadas, ubíquela en el lugar correspondiente.
14. No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
15. Reporte oportunamente todo accidente o incidente de trabajo el mismo día de ocurrido el evento.

Cedula: 12400740	**Cedula:** 37712004
Nombre del trabajador: Manuel Bendeck P	**Nombre inducción:** politica, procedmiento, normas
Fecha: 18 septiembre 2023	**Fecha:** 18-9-2023
Firma del trabajador: Manuel Bendeck	**Firma responsable socialización:**

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Nombre: Manuel Bandera	Fecha: 18 Sep 2023	Cargo: Auxiliar	Nota: 5.0

1. **¿Qué es un accidente de Trabajo?**
   a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
   b. Aquel que se produce cuando el trabajador se traslada del trabajo a su vivienda en transporte público.
   c. Aquel que se produce en cumplimiento de las tareas asignadas por mis amigos del trabajo.
   d. Todas las anteriores.

2. **Complete el nombre de cada una de las canecas para recolección de residuos**


		
Contaminante	Organicos	Aprovechables

3. **Cuál es el significado de punto ecológico**
   a. Es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores.
   b. es un sitio que tiene la empresa para disponer de los residuos
   c. es un sitio de recolección de basuras.

4. **Seleccione con una X las condiciones inseguras, con un círculo los actos inseguros.**











X





Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

4.10

5. **Que es el comité de convivencia laboral**

(a) Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.

b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.

c. elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

6. **Que es el COPASST**

(a) Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.

b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.

c. Elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

7. **¿Cuál es el procedimiento que debo seguir en caso de accidente de trabajo?**

a. Conservar la calma.

b. Informar de manera inmediata al supervisor, jefe inmediato o encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa usuaria.

c. Recibir los primeros auxilios, según se requiera.

(d) La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS**, de acuerdo con el evento, llamará a la línea de atención ARL SURA, con el fin de direccionar al accidentado al centro de atención médica en convenio con ARL SURA; usted deberá dirigirse al centro de atención designado por la línea de atención ARL SURA, en caso de requerirse.

8. Mencione un compromiso de la política integrada del sistema:

Prestacion de bienes o servicio
Mitigacion de los impactos ambientales
Compromiso de mejora continuamente

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO REG-FOR-38 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:MAR/2018

9. Mencione el objetivo de la política de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción

el No ingreso del area de trabajo en condiciones de uso alcohol para evitar un accidente

10. Identifique los residuos y una con una flecha de acuerdo a la canneca que corresponda.



Powered by CamScanner
