RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Golpes, hundimientos				
	Abren y cierran Correctamente.				
	Otros				
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas				
	Desgastadas				
	Torsión				
	Rupturas				
	Otros				

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Sigilfredo Mendez P	Oficial	Sigilfredo M

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	CODIGO: HSE-FOR-113-43
		VERSION:1
		FECHA DE APROBACION: 21/04/2022

OBJETO	Construcción de comedor y cocina del colegio I.T.S.I.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wessy. Ingenieros. S.A.S.	NIT	901109885-1.

CANGURO N°_____ MARCA: _____

SEMANA: DEL 12 Sep. AL 19- Sep. DEL AÑO_____

NOMBRE DEL OPERADOR			Kevin Ortega		Kevin Ortega.		Brayan Cossio								
ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Estado del motor			✓		✓		✓							
	Estado del Tanque de combustble			✓		✓		✓							
	Nivel del aceite			✓		✓		✓							
	Soportes motor			✓		✓		✓							
	Estado del resorte vibrador			✓		✓		✓							
	Estado de las guardas			✓		✓		✓							
	Estado del exhosto			✓		✓		✓							
	Estado de las agarraderas			✓		✓		✓							✓
	Estado de extensiònes elèctricas			✓		✓		✓							
	Estado del yoyo			✓		✓		✓							
	Estado del acople rotador			✓		✓		✓							
	Estado del switche de encendido			✓		✓		✓							
	estado del acelerador vibro			✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓							
	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal			✓		✓		✓							
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)			Kevin Santos	Kevin Ortega	Kevin Ortega		Brayan Cossio							
	FIRMA SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	CODIGO: HSE-FOR-113-43
		VERSION:1
		FECHA DE APROBACION: 21/04/2022

OBJETO	Construcción y dotación del comedor y cocina del colegio instituto tecnico superior o Industrial		
N° CONTRATO	0756-22		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	W.Russy. Ingenieros S.A.S.	NIT	901.109.885-1

CANGURO N°_____ MARCA: _____

SEMANA: DEL 12 Sep. AL 19. Sep. DEL AÑO 2023

NOMBRE DEL OPERADOR			Elkin Reyes.		Elkin Reyes		Elkin Reyes		Elkin Reyes							
ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom		
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
ESTADO GENERAL	Estado del motor			✓		✓		✓		✓						
	Estado del Tanque de combustble			✓		✓		✓		✓						
	Nivel del aceite			✓		✓		✓		✓						
	Soportes motor			✓		✓		✓		✓						
	Estado del resorte vibrador			✓		✓		—		✓						
	Estado de las guardas			✓		✓		✓		✓						
	Estado del exhosto			✓		✓		✓		✓						
	Estado de las agarraderas			✓		✓		✓		✓						
	Estado de extensiònes elèctricas			✓		✓		✓		✓						
	Estado del yoyo			✓		✓		✓		✓						
	Estado del acople rotador			✓		✓		✓		✓						
	Estado del switche de encendido			✓		✓		✓		✓						
	estado del acelerador vibro			✓		✓		✓		✓						
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓						
	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal			✓		✓		✓		✓						
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)															
	FIRMA SST															

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	CODIGO: HSE-FOR-113-43
		VERSION:1
		FECHA DE APROBACION: 21/04/2022

OBJETO	Construcción de comedor y cocina del colegio I.T.S.I.		
Nº CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy-Ingenieros S.A.S.	NIT	901109885-1

CANGURO Nº_____ MARCA: _____

SEMANA: DEL 12 Sep. AL 19-Sep. DEL AÑO_____

NOMBRE DEL OPERADOR			Kevin Ortega		Kevin Ortega.		Brayan Cossio		Brayan Cossio						
ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Estado del motor			✓		✓		✓		✓					
	Estado del Tanque de combustble			✓		✓		✓		✓					
	Nivel del aceite			✓		✓		✓		✓					
	Soportes motor			✓		✓		✓		✓					
	Estado del resorte vibrador			✓		✓		✓		✓					
	Estado de las guardas			✓		✓		✓		✓					
	Estado del exhosto			✓		✓		✓		✓					
	Estado de las agarraderas			✓		✓		✓		✓					✓
	Estado de extensiònes elèctricas			✓		✓		✓		✓					
	Estado del yoyo			✓		✓		✓		✓					
	Estado del acople rotador			✓		✓		✓		✓					
	Estado del switche de encendido			✓		✓		✓		✓					
	estado del acelerador vibro			✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓					
	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal			✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)			Kevin Santos	Kevin Cossio	Kevin Ortega		Brayan Cossio		Brayan Cossio					
	FIRMA SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	CODIGO: HSE-FOR-113-43
		VERSION:1
		FECHA DE APROBACION: 21/04/2022

OBJETO	Construcción de comedor y cocina del colegio I.T.S.I.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wessy. Ingenieros. S.A.S.	NIT	901109885-1

CANGURO N°_____ MARCA: _____

SEMANA: DEL 12 Sep. AL 19-Sep. DEL AÑO_____

NOMBRE DEL OPERADOR			Kevin ortega		Kevin Ortega.		Brayan cossio		Brayan cossio							
ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom		
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
ESTADO GENERAL	Estado del motor			✓		✓		✓		✓						
	Estado del Tanque de combustble			✓		✓		✓		✓						
	Nivel del aceite			✓		✓		✓		✓						
	Soportes motor			✓		✓		✓		✓						
	Estado del resorte vibrador			✓		✓		✓		✓						
	Estado de las guardas			✓		✓		✓		✓						
	Estado del exhosto			✓		✓		✓		✓						
	Estado de las agarraderas			✓		✓		✓		✓						
	Estado de extensiònes elèctricas			✓		✓		✓		✓						
	Estado del yoyo			✓		✓		✓		✓						
	Estado del acople rotador			✓		✓		✓		✓						
	Estado del switche de encendido			✓		✓		✓		✓						
	estado del acelerador vibro			✓		✓		✓		✓						
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓						
	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal			✓		✓		✓		✓						
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)			Kevin Santos	Kevin Ortega	Kevin Ortega		Brayan Cossio		Brayan Cossio						
	FIRMA SST			✓		✓		✓		✓						

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	CODIGO: HSE-FOR-113-43
		VERSION:1
		FECHA DE APROBACION: 21/04/2022

OBJETO	Construcción y dotación del comedor y cocina del colegio Instituto técnico superior o Industrial		
N° CONTRATO	0756-22		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy. Ingenieros S.A.S.	NIT	901.109.885-1

CANGURO N°_____ MARCA: _____

SEMANA: DEL 12 Sep. AL 19. Sep. DEL AÑO 2023

NOMBRE DEL OPERADOR				Elkin Reyes.		Elkin Reyes										
ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue°		Vier		Sáb		Dom		
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
ESTADO GENERAL	Estado del motor			✓		✓										
	Estado del Tanque de combustble			✓		✓										
	Nivel del aceite			✓		✓										
	Soportes motor			✓		✓										
	Estado del resorte vibrador			✓		✓										
	Estado de las guardas			✓		✓										
	Estado del exhosto			✓		✓										
	Estado de las agarraderas			✓		✓										
	Estado de extensiònes elèctricas			✓		✓										
	Estado del yoyo			✓		✓										
	Estado del acople rotador			✓		✓										
	Estado del switche de encendido			✓		✓										
	estado del acelerador vibro			✓		✓										
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓										
	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal			✓		✓										
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)			Elkin Reyes		Elkin Reyes										
	FIRMA SST															

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD					
OBJETO: Construcción y dotacion de cocina y comedor del colegio I.T.S.I.					
N° CONTRATO: 0276-23.					
ENTIDAD CONTRATANTE: Alcaldia					
NIT:					
EMPRESA CONTRATISTA: Wessy ingenieros S.A.S.					
NIT: 901109855-1					
FECHA DE LA INSPECCION: 03-10-2023.					
AREA/ DEPENDENCIA: I.T.S.I.					
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA: Sandra Santoya					
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ARNÉS DE SEGURIDAD					
MARCA DEL EQUIPO	EPI				
SERIE DEL EQUIPO	4435110				
INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad	X			
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.	X			
	Sustancias químicas		X		
	Otros				
COSTURAS	Completas	X			
	Reventadas		X		
	otros				
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO	EPI.				
SERIE DEL EQUIPO	4435110				
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad				
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa	X			
	Otros				
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión				
	Rupturas		X		
	Otros				
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO	EPI				
SERIE DEL EQUIPO	4320574				
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro	X			
	Tiene fisuras		X		
	Corrosión y óxido		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Golpes, hundimientos		X		
	Abren y cierran Correctamente.	Y			
	Otros				
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros				

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elkin Ruiz	Aprendiz	Elkin Ruiz

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD	
OBJETO:	Construcción y dotacion de cocina y comedor del colegio I.T.S.I.
N° CONTRATO:	0156-23
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldia.
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	W Russy Ingenieros S.A.S.
NIT:	901109885-1
FECHA DE LA INSPECCION:	03-10-2023
AREA/ DEPENDENCIA:	I.T.S.I.
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santiago
INFORMACION DEL EQUIPO	
ARNÉS DE SEGURIDAD	
MARCA DEL EQUIPO	SAFETY
SERIE DEL EQUIPO	0098981310 49

INFORMACION DE LA INSPECCIÓN

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACION DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad		X		
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X		
	Sustancias químicas		X		
	Otros				
COSTURAS	Completas	X			
	Reventadas		X		
	otros				
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR.
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACI 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO	50529A				
SERIE DEL EQUIPO	50283				
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad				
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros				
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros				
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro				
	Tiene fisuras				
	Corrosión y óxido				

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION 08/01/2019

	Golpes, hundimientos		X		
	Abren y cierran Correctamente.	X			
	Otros				
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros				

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Abelino muñoz	oficial	Abelino muñoz
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO	ANSI Z 359				
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad		X		
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros		X		
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros		X		
PARTES METALICAS	Completas		X		
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO	ANSI Z 359				
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro		X		
	Tiene fisuras		X		
	Corrosión y óxido		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Golpes, hundimientos		X			
	Abren y cierran Correctamente.	X				
	Otros		X			
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X			
	Desgastadas		X			
	Torsión		X			
	Rupturas		X			
	Otros		X			

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Juan Perez	Ayudante	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**FIRMA**

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD	
OBJETO:	Construcción y dotación de cocina y Comedor del colegio I.T.S.I.
N° CONTRATO:	0756-23
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldía.
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	Wrussy. Ingeniería S.A.S.
NIT:	901169395-1
FECHA DE LA INSPECCION:	03-10-2023
AREA/ DEPENDENCIA:	I.T.S.I
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santoyo

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
ARNÉS DE SEGURIDAD	
MARCA DEL EQUIPO	EPI
SERIE DEL EQUIPO	

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad	X			
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.	X			
	Sustancias químicas		X		
	Otros		X		
COSTURAS	Completas	X			
	Reventadas		X		
	otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD	
OBJETO:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del colegio I.T.S.I
N° CONTRATO:	0756-23
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldia.
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	Wcussy. Ingenieros. S.A.S.
NIT:	900109895-1.
FECHA DE LA INSPECCION:	03-10-2023
AREA/ DEPENDENCIA:	I.T.S.I.
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santrayo.
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
ARNÉS DE SEGURIDAD	
MARCA DEL EQUIPO	EPI
SERIE DEL EQUIPO	4835155

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad		X		
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X		
	Sustancias químicas		X		
	Otros		X		
COSTURAS	Completas				
	Reventadas		X		
	otros		X		
PARTES METALICAS	Completas				
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO FECHA
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBA 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad		X		
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros		X		
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Descostadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros		X		
PARTES METALICAS	Completas				
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros		X		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro	X			
	Tiene fisuras		X		
	Corrosión y óxido		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIERIA S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-10 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

	Cadenas, hundimientos		A		
	Abren y cierran Correctamente	V			
	Otros				
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		A		
	Desgastadas		A		
	Tensión		A		
	Roturas		A		
	Otros				

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
	Asistente	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD	
OBJETO:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del colegio I.T.S.I.
N° CONTRATO:	0756-17
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldia.
NIT:	-
EMPRESA CONTRATISTA:	W/W RUSSY
NIT:	901109885-1
FECHA DE LA INSPECCION:	12/3/05
AREA/ DEPENDENCIA:	I.T.S.I.
RESPONSABLE DEL AREA DEPENDENCIA:	Sandra Santiago.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO ARNÉS DE SEGURIDAD	
MARCA DEL EQUIPO	
SERIE DEL EQUIPO	

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad				
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X		
	Sustancias químicas		X		
	Otros				
COSTURAS	Completas	X			
	Reventadas		X		
	otros				
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO FI VERSIÓ FECHA DE APRO 08/01/201

	Otros				

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"

MARCA DEL EQUIPO	
SERIE DEL EQUIPO	

INFORMACIÓN DE LA INSPECCION

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas				
	Deterioro				
	Suciedad		X		
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo				
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros				
CINTAS/CORREAS	Desflecadas				
	Desgastadas		X		
	Torsión				
	Rupturas		X		
	Otros				
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido				
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros				

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

MARCA DEL EQUIPO	
SERIE DEL EQUIPO	

INFORMACIÓN DE LA INSPECCION

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro	X			
	Tiene fisuras		X		
	Corrosión y óxido		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION 08/01/2019

	Golpes, hundimientos		X		
	Abren y cierran Correctamente.				
	Otros				
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas				
	Desgastadas				
	Torsión				
	Rupturas				
	Otros				

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
MARIO FONTALVO	AYUDANTE	MARIO FONTALVO

MARIO FONTALVO

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	**INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS**	**CÓDIGO HSE-FOR-16** **VERSIÓN 1** **FECHA DE APROBACION: 08/01/2019**

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD	
OBJETO:	Construcción de comedor y cocina de I.T.S.I
N° CONTRATO:	0756-23
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldía
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	RUSSY Ingenieros S.A.S
NIT:	901709885-1
FECHA DE LA INSPECCION:	30-09-23
AREA/ DEPENDENCIA:	I.T.S.I
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santiago
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
ARNÉS DE SEGURIDAD	
MARCA DEL EQUIPO	LINK TECH
SERIE DEL EQUIPO	4701201160

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas	X			
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad	X			
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.	X	X		
	Sustancias químicas		X		
	Otros			X	
COSTURAS	Completas	X			
	Reventadas		X		
	otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido	X			
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACI 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO	SOSEGA				
SERIE DEL EQUIPO	T. 273				
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres			X	
	Costuras sueltas			X	
	Deterioro			X	
	Suciedad			X	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo			X	
	Salpicadura de pintura o grasa			X	
	Otros			X	
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas	X			
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros		X		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro				
	Tiene fisuras				
	Corrosión y óxido				

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION 08/01/2019

	Golpes, hundimientos					
	Abren y cierran Correctamente.					
	Otros					
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas					
	Desgastadas					
	Torsión					
	Rupturas					
	Otros					

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION		
Antonio. Carvallido	Obrero	Antonio-C
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-04
		VERSION:1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construcción de cocina y comedor del colegio I.T.S.I. de Bca – b/a.		
N° contrato	0756-23		
Entidad Contratante:	Alcaldía.	NIT:	
Empresa Contratista:	Russy Ingenieros S.A.S.	NIT:	109.107.885.1
Responsable	Sandra Santiago	SEDE:	
Cargo:	Insp. SST.	FECHA:	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	ABC.	cocina	20l.		B	B		B	B	B	B	B	B	B	.
2	ABC	cocina	20l		B	B		B	B	B	B	B	B	B	
3	ABC	cocina	20l.		B	B		B	B	B	B	B	B	B	.
4	ABC	cocina	20l		B	B		B	B	B	B	B	B	B	
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Firma del Responsable:	CEDULA: 37712004.
Firma del COPASST. Antonio. B	CEDULA: 1096242479.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotación de comedor y cocina del colegio I.T.S.I. de Bca-Sa.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros S.A.S.	NIT	901109885-1

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Kevin Ortega.

MES Sep. 01-2023 al 30 Sep. 2023 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	KEVIN		KEVIN		KEVIN		KEVIN	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST	Antonio C		Antonio C		Antonio.		Antonio	
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotación de comedor y cocina del colegio I.T.S.I. de Bca-Sa.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros S.A.S.	NIT	901109885-1

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Kevin Ortega.

MES Sep. 01-2023 al 30 Sep. 2023 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	KEVIN		KEVIN		KEVIN		KEVIN	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST	Antonio C		Antonio C		Antonio.		Antonio.	
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotación de cocina y comedor del colegio I.T.S.I. Sca-Slo.		
N° CONTRATO	0756-23.		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros S.A.S.	NIT	901109835-1

PULIDORA No. OPERADOR

MES Sep. 01-2023 al Sep 30-2023 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion de comedor y cocina del colegio I.T.S.I. Bca-bja.		
N° CONTRATO	0956-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wessy Ingenieros S.A.S	NIT	901109885-1

PULIDORA No. 1 OPERADOR Alexander. J.

MES Oct 02-2023 al 31-Oct-2023 TAMAÑO: G [ ] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Alex		Alex		Elkin		Elkin	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST	Antonio		Antonio		Antonio		Antonio	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
	Se hace Cambio de Disco	Cambiar Disco.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion de comedor y cocina del colegio I.T.S.T. Bca-bia		
N° CONTRATO	0956-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wessy Ingenieros S.A.S	NIT	901109885-1

PULIDORA No. 1 OPERADOR Alexander. J.

MES Oct 02-2023 al 31-Oct-2023 TAMAÑO: G [ ] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Alex		Alex		Elkin		Elkin	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST	Antonio		Antonio		Antonio		Antonio	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
	Se hace Cambio de Disco	Cambiar Disco.

Powered by CamScanner

ANEXO 12. ACCIDENTALIDAD

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACCIDENTALIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-65
		VERIÓN: 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA 06 de septiembre al 05 de octubre del 2023

UBICACIÓN: COLEGIO INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA

OBSERVACIÓN: En el mes del 06 de septiembre al 05 de octubre del 2023 no se presentaron accidentes laborales

EMPRESA	IDENTIFICACION	Accidentes personales según gravedad				Nº de accidentes personales	Lista de accidentes con daños personales a trabajadores directos	Nº de accidentes con daño material	Lista de accidentes con daño material	Nº de accidentes con daño ambiental	Lista de accidentes con daño ambiental	Enfermedad a laborales según gravedad				Nº de accidentes a terceros	Lista de accidentes con daños personales a terceros	Días perdidos todos en el mes	Horas hombre trabajadas	Monto gastado o perdido por accidentes	Indices normativos colombianos			Indices normativos colombianos	
		Leve	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)							Leve	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)						Indice de Frecuencia	Indice de Severidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Severidad
RUSSY INGENIEROS SAS	901.106.865-1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ninguno	0	0	$ 0,00	0	0	0	0,0	0,0
		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ninguno	0	0	$ 0,00	0	0	0	0,0	0,0
		0	0	0	0	0																		0,0	0,0


Comodidad Mensual	EMPRESA	Nº de colaboradores	Tipo de accidentes			Total de accidentes personales
			Leve (L)	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)
EMPRESAS	RRUSSY INGENIEROS SAS	22	0	0	0	0
Total		22	0	0	0	0


Total de accidentes con daño material
0
0

Nº de accidentes con daño ambiental	Total de accidentes con daño ambiental	Tipo de accidentes			
		Leve (L)	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0

Total de días perdidos	Total de horas hombre trabajadas	Monto gastado o perdido por accidentes	Normas colombianas		
			Indices de Frecuencia	Indice de Severidad	Indice de Accidentabilidad
0	0	$ 0,00	0,0	0	0
0	0	0	0	0	0

Normas colombianas	
Indice de Accidentabilidad	Indice de Severidad
0,0	0,0
0,0	0,0



























Fecha Elaboro:	Revisa y Aprobo:	Vobo:
Karen Lisseth Salamanca Rojas	Karen Lisseth Salamanca Rojas	Wilmer Fransisco Russy Ladino
1.097.589.764	1.097.589.764	88.212.380
Residente HSEQ	Directora HSEQ	Gerente General

ANEXO 13. COE

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 21/09/2023 **HORA:** 9:00 AM **LUGAR:** I.T.S.I BARRANCABERMEJA **ACTA NO.** 07

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 7- GESTIÓN HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Capacitación a brigadas de emergencia.
2. Temas para capacitación de brigadas de emergencia.
3. Clases de brigadas de emergencia.

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Los brigadistas deben ser capacitados de acuerdo con el tipo de amenazas que deben enfrentar, su capacitación debe ser permanente con practicas continuas para afianzar las técnicas vistas en las capacitaciones.

2. Temas de capacitación

   - Teoría de incendios
   - Agentes extintores
   - Equipo extinción
   - Mangueras e implementos
   - Suministro de agua
   - Sistemas de alarma
   - Sustancias peligrosas
   - Sistemas automáticos
   - Técnicas de inspección
   - Prevención de incendios
   - Primeros auxilios médicos
   - Simulacros de evacuación

Powered by CamScanner

3. Clases de brigadas
   - Brigadas incipientes
   - Brigada estructural
   - Brigada mixta

CONCLUSIONES

- Es importante conocer todo lo referente sobre las capacitaciones a brigadistas de emergencia, porque no se sabe el día que tengamos que utilizar esos conocimientos para con una persona o familiar.

COMPROMISOS

- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen charlas sobre qué capacitaciones se pueden desarrollar con los brigadistas de emergencia.

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Antonio Carvallido.	Ayudante.	Antonio C
Elvis Carpio	Ayudante.	Elvis C

Powered by CamScanner

ANEXO 14. COVID

COMPROMISO 1 CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19

Lugar y fecha: 26-09-2023 Bta-Sja.

Señores

Asunto: COMPROMISO CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID -19

Yo Edilberto lerma soto. - identificado (a) con C.C. No. 1104.265.807 de Bogota., Me comprometo a dar cumplimiento al protocolo entregado por el **WRUSSY INGENIEROS SAS,** sobre las medidas de prevención frente a la emergencia sanitaria que se está presentando a nivel nacional, A continuación, se relacionan las responsabilidades de los trabajadores, las cuales me comprometo a dar el debido cumplimiento.

1. Dar cumplimiento a las medidas de prevención dadas por la empresa para la ejecución de las actividades.
2. Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
3. Los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar de sí mismos (autocuidado), además de suministrar información clara y veraz de su actual estado de salud.

Todos los trabajadores deberán acatar las medidas para evitar multas o sanciones provenientes al incumplimiento de este protocolo.

Cordialmente,

Edilberto lerma soto.

Nombre

c.c 1104.265.807

Powered by CamScanner

COMPROMISO 1 CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19

Lugar y fecha: 26-09-2023. Bta-bjo.

Señores

Asunto: COMPROMISO CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID -19

Yo Andres Mateo aponte. - identificado (a) con C.C. No. 1'016.093.871 de B, Me comprometo a dar cumplimiento al protocolo entregado por el **WRUSSY INGENIEROS SAS,** sobre las medidas de prevención frente a la emergencia sanitaria que se está presentando a nivel nacional, A continuación, se relacionan las responsabilidades de los trabajadores, las cuales me comprometo a dar el debido cumplimiento.

1. Dar cumplimiento a las medidas de prevención dadas por la empresa para la ejecución de las actividades.
2. Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
3. Los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar de sí mismos (autocuidado), además de suministrar información clara y veraz de su actual estado de salud.

Todos los trabajadores deberán acatar las medidas para evitar multas o sanciones provenientes al incumplimiento de este protocolo.

Cordialmente,

Andres A.

Nombre

c.c 1'016.093.871.

Powered by CamScanner

COMPROMISO 1 CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19

Lugar y fecha: 26-09-2023. Bucaramanga

Señores

Asunto: COMPROMISO CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID -19

Yo Ronny Reyes Cisneros. - identificado (a) con C.C. No. PPT. 123.5891. de Venezuela, Me comprometo a dar cumplimiento al protocolo entregado por el **WRUSSY INGENIEROS SAS,** sobre las medidas de prevención frente a la emergencia sanitaria que se está presentando a nivel nacional, A continuación, se relacionan las responsabilidades de los trabajadores, las cuales me comprometo a dar el debido cumplimiento.

1. Dar cumplimiento a las medidas de prevención dadas por la empresa para la ejecución de las actividades.
2. Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
3. Los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar de sí mismos (autocuidado), además de suministrar información clara y veraz de su actual estado de salud.

Todos los trabajadores deberán acatar las medidas para evitar multas o sanciones provenientes al incumplimiento de este protocolo.

Cordialmente,

Ronny Reyes.

Nombre

c.c 123.5891 PPT.

Powered by CamScanner

ANEXO 15. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Actividades de fundida de columnas
Fecha	06 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de fundida de columnas
Fecha	06 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de fundida de columnas
Fecha	06 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de fundida de columnas
Fecha	06 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de fundida de columnas
Fecha	06 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de fundida de columnas
Fecha	06 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de fundida de columnas
Fecha	06 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de fundida de columnas
Fecha	06 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Actividad de Amarre de Acero
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Actividad de Amarre de Acero
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Actividad de Amarre de Acero
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Actividad de Amarre de Acero
Fecha	08 de septiembre de 2023



Descripción	Actividad de Amarre de Acero
Fecha	08 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de retiro de escombros
Fecha	08 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	08 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	08 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Corte con Pulidora
Fecha	08 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Herramientas Manuales
Fecha	08 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Corte con Pulidora
Fecha	08 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero Figurado
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero Figurado
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero Figurado
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Ingreso de Maquinaria a la Obra
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Herramientas Tronzadora
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Extintor
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Herramientas Manuales
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Herramientas Pulidora
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Herramientas Pulidora
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero Figurado
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Actividas de Fundida de Columnas
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Ingreso de Materiales
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades Excavaciones Manuales
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividas de Fundida de Columnas
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividas de Fundida de Columnas
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividas de Fundida de Columnas
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividas de Fundida de Columnas
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de acero
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Maquinaria Compactador Tipo Canguro
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Maquinaria Compactador Tipo Canguro
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Maquinaria Compactador Tipo Canguro
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Maquinaria Compactador Tipo Canguro
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	13 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	13 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	13 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Excavaciones
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amardo de Acero
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amardo de Acero
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amardo de Acero
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Excavaciones Manuales
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Acopio de Escombros
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Charlas de Seguridad
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Retiro de Escombros
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Excavaciones
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Charlas de Seguridad
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Amarre de Acero Figurado
Fecha	15 de septiembre de 2023



Descripción	Amarre de Acero Figurado
Fecha	15 de septiembre de 2023



Descripción	Amarre de Acero Figurado
Fecha	15 de septiembre de 2023



Descripción	Limitacion de la Obra
Fecha	15 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	15 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	15 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	15 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	15 de septiembre de 2023



Descripción	Acopio de Escombros
Fecha	16 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Fundida
Fecha	16 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Construccion de Muro
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Construccion de Muro
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Amarre de Acero Figurado
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Excavaciones Manuales
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Excavaciones Manuales
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	19 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	19 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	19 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	19 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Construccion de Muro
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Sistemas de Acceso
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Sistemas de Acceso
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Sistemas de Acceso
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion de personal
Fecha	22 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion de personal
Fecha	22 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	22 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	22 de septiembre de 2023



Descripción	Ingreso de Maquinaria
Fecha	22 de septiembre de 2023



Descripción	Ingreso de Materiales
Fecha	22 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	23 de septiembre de 2023



Descripción	Pausas Activas
Fecha	25 de septiembre de 2023



Descripción	Pausas Activas
Fecha	25 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	25 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	25 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	25 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	25 de septiembre de 2023



Descripción	Estructura Metalica
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Estructura Metalica
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de amarre de acero
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades excavaciones manuales
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de amarre de acero
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de compactacion de suelo
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Excavaciones Manuales
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Mezclado
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Corte de Acero Figurado
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Fundida
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Fundida
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Señalizacion de Areas
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Señalizacion de Areas
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Señalizacion de Areas
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Ingreso de Estructura Metalica
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amardo de columnas
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades Amarre de Acero
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Ingreso de Estructura Metalica
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	28 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	28 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	28 de septiembre de 2023



Descripción	Ingreso de materiales
Fecha	28 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	28 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	28 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	28 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	28 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Verificacion Tablero Electrico
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Armado de columnas
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion personal
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion personal
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de demolicion
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Ingreso de Materiales
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Armado de columnas
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Corte de Acero
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Armado de columnas
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Armado de columnas
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Armado de columnas
Fecha	05 de octubre de 2023

ANEXO 16. ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

NOMBRE COMPLETO	Andres Mateo Aponte.
CARGO	Montador
FECHA	26-09-2023.
LUGARA DE RESIDENCIA	Bogotá D.C.
INGRESOS	
ESTRATO	3
JORNADA LABORAL	Mañana

Señor trabajador responda marcando con una (x), se le recuerda que solo debe marcar una vez, no tachones, no enmendaduras.

1. EDAD
a. Menor de 18 años
X. 18 – 27 años
c. 28 – 37 años
d. 38 _ 47 años
e. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
X Soltero (a)
b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
X Hombre
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
X Ninguna
b. 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
X Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista/ Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
X Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

Powered by CamScanner

7. USO DEL TIEMPO LIBRE

a. Labores domésticas
X. Recreación y deporte
c. Estudio
e. Ninguno
f. Otro _____

8. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

a. De 3 a 5 años
X. De 3 a 6 meses
c. De 6 meses a 1 año
d. De 1 a 3 años

9. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
X. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. TIENE VEHÍCULO PROPIO

a. Si
b. No cuál es su medio de transporte
_____

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. Contrato a Término indefinido
b. Contrato a Término Fijo
c. Contrato por obra / labor

12. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

a. Vacunación
b. Salud Oral
X. Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

13. CUÁNTO TIEMPO ESTIMADO DE SU CASA AL TRABAJO.

a. Media hora
X. Una hora
c. Hora y media
d. Dos horas
e. Otro _____



Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

En los s últimos seis (6) meses

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza		X	
Dolor de cuello, espalda y cintura		X	
Dolores musculares		X	
Dificultad para algún movimiento		X	
Tos frecuente		X	
Dificultad respiratoria		X	
Gastritis, ulcera		X	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		X	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		X	
Dificultad para concentrarse		X	
Mal genio		X	
Nerviosismo		X	
Cansancio mental		X	
Palpitaciones		X	
Dolor en el pecho (angina)		X	
Cambios visuales		X	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfort visual		X	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		X	
Dificultad para oír		X	
Sensación permanente de cansancio		X	
Alteraciones en la piel		X	
Otras alteraciones no anotadas		X	

Powered by CamScanner

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones: Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	X		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	X		
Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	X		
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		X	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?		X	
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?	X		
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?	X		
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?		X	
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	X		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?	X		
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, naturales y/o riesgos públicos por desplazamiento?	X		

Powered by CamScanner

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones: Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	X		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	X		
Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	X		
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		X	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?		X	
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?	X		
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?	X		
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?		X	
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	X		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?	X		
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, naturales y/o riesgos públicos por desplazamiento?	X		

Powered by CamScanner

Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?	X		
En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección personal?	X		
Existen baños suficientes en número y se les realiza un adecuado mantenimiento, dotación y aseo?	X		
Cuenta con cocina, cafetería, comedor o sitio de descanso adecuadamente mantenidos, dotados y aseados?		X	
La empresa cuenta con agua potable?	X		
Existe buen manejo de basuras y desechos?	X		

19. Escriba a continuación los temas prioritarios de capacitación que podrían contribuir en e mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salud:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

NOMBRE COMPLETO	Ronny Reyes Cisneros
CARGO	SOLDADOR
FECHA	26-09-2023
LUGARA DE RESIDENCIA	BOGOTA
INGRESOS	
ESTRATO	2
JORNADA LABORAL	LUNES A VIERNES 7:00AM - 5:00PM SABADO 7:00AM 10:00 AM

Señor trabajador responda marcando con una (x), se le recuerda que solo debe marcar una vez, no tachones, no enmendaduras.

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 – 27 años
c. 28 – 37 años
d. 38 _ 47 años
X 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
X Soltero (a)
b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
X Hombre
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
X 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
X Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista/ Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

Powered by CamScanner

FOR-88

RUSSY INGENIERIA S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-36 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

7. USO DEL TIEMPO LIBRE

X a. Labores domésticas
b. Recreación y deporte
c. Estudio
e. Ninguno
f. Otro _____

8. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

a. De 3 a 5 años
b. De 3 a 6 meses
X De 6 meses a 1 año
d. De 1 a 3 años

9. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
X Más de 15 años

10. TIENE VEHÍCULO PROPIO

a. Si
b. No cuál es su medio de transporte
PUBLICO

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

X a. Contrato a Término Indefinido
b. Contrato a Término Fijo
c. Contrato por obra / labor

12. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

a. Vacunación
b. Salud Oral
c. Exámenes de laboratorio y otros
X Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

13. CUÁNTO TIEMPO ESTIMADO DE SU CASA AL TRABAJO.

X a. Media hora
b. Una hora
c. Hora y media
d. Dos horas
e. Otro _____

Powered by CamScanner

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones: Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	✓		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	✓		
Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	✓		
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		✓	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?	✓		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	✓		
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?		✓	
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	✓		
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?		✓	
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?		✓	
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?		✓	
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?		✓	
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	✓		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?		✓	
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, naturales y/o riesgos públicos por desplazamiento?	✓		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

En los s últimos seis (6) meses

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza		✓	
Dolor de cuello, espalda y cintura		✓	
Dolores musculares		✓	
Dificultad para algún movimiento		✓	
Tos frecuente		✓	
Dificultad respiratoria		✓	
Gastritis, ulcera		✓	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		✓	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		✓	
Dificultad para concentrarse		✓	
Mal genio		✓	
Nerviosismo		✓	
Cansancio mental		✓	
Palpitaciones		✓	
Dolor en el pecho (angina)		✓	
Cambios visuales		✓	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfort visual		✓	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		✓	
Dificultad para oír		✓	
Sensación permanente de cansancio		✓	
Alteraciones en la piel		✓	
Otras alteraciones no anotadas		✓	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 60% de la jornada de trabajo?	✓		
La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, la silla y la labor que realiza?	✓		
Tiene espacio suficiente para variar la posición de las piernas y rodillas?	✓		
La silla es cómoda y permite ajustarlo a su medida?			N/A
En general dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo con holgura?	✓		
Su trabajo le exige mantenerse frente a la pantalla del computador más del 50% de la jornada?			N/A
Cree que la ubicación de su pantalla evita la presencia de reflejos?			N/A
El computador está dotado de filtro que favorezca el manejo de los contrastes, disminuyendo la fatiga visual?			N/A
Cuenta con atril para ubicar los documentos que manipula mientras trabaja en el computador?			N/A
Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que se siente podría calificarse de "normal"?	✓		
Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?	✓		
Considera que el tiempo asignado a la tarea que realiza es adecuado?	✓		
Puede abandonar el trabajo por unos minutos sin necesidad que lo sustituyan?		✓	
Puede variar el ritmo de trabajo sin perturbar la producción a lo largo de la jornada	✓		
Las tareas que realiza le producen "sensación de peligrosidad"?	✓		
El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y conocimientos?	✓		
Considera que su trabajo es variado?	✓		

Powered by CamScanner

Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?	✓		
En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección personal?	✓		
Existen baños suficientes en número y se les realiza un adecuado mantenimiento, dotación y aseo?	✓		
Cuenta con cocina, cafetería, comedor o sitio de descanso adecuadamente mantenidos, dotados y aseados?		✓	
La empresa cuenta con agua potable?	✓		
Existe buen manejo de basuras y desechos?	✓		

19. Escriba a continuación los temas prioritarios de capacitación que podrían contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salud:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

NOMBRE COMPLETO	Edilberto lerma soto.
CARGO	montacarga.
FECHA	26-09-2023.
LUGARA DE RESIDENCIA	Bogota D C
INGRESOS	minimo
ESTRATO	TERMINO FIJO
JORNADA LABORAL	Diurna

Señor trabajador responda marcando con una (x), se le recuerda que solo debe marcar una vez, no tachones, no enmendaduras.

1. EDAD
a. Menor de 18 años
X 18 – 27 años
c. 28 – 37 años
d. 38 _ 47 años
e. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
X. Soltero (a)
b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
X Hombre
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
X 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
X Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista/ Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
X Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

Powered by CamScanner

7. USO DEL TIEMPO LIBRE

a. Labores domésticas
b. Recreación y deporte
c. Estudio
x. Ninguno
f. Otro _____

8. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

a. De 3 a 5 años
x. De 3 a 6 meses
c. De 6 meses a 1 año
d. De 1 a 3 años

9. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

x Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. TIENE VEHÍCULO PROPIO

x. Si
b. No cuál es su medio de transporte
_____

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. Contrato a Término indefinido
x. Contrato a Término Fijo
c. Contrato por obra / labor

12. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

a. Vacunación
b. Salud Oral
c. Exámenes de laboratorio y otros
x Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

13. CUÁNTO TIEMPO ESTIMADO DE SU CASA AL TRABAJO.

x Media hora
b. Una hora
c. Hora y media
d. Dos horas
e. Otro _____

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

En los s últimos seis (6) meses

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza		✓	
Dolor de cuello, espalda y cintura		✓	
Dolores musculares		✓	
Dificultad para algún movimiento		✓	
Tos frecuente		✓	
Dificultad respiratoria		✓	
Gastritis, ulcera		✓	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		✓	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		✓	
Dificultad para concentrarse		✓	
Mal genio		✓	
Nerviosismo		✓	
Cansancio mental		✓	
Palpitaciones		✓	
Dolor en el pecho (angina)		✓	
Cambios visuales		✓	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfort visual		✓	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		✓	
Dificultad para oír		✓	
Sensación permanente de cansancio		✓	
Alteraciones en la piel		✓	
Otras alteraciones no anotadas		✓	

Powered by CamScanner

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones: Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	✓		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	✓		
Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	✓		
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		✓	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?		✓	
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?		✓	
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?		✓	
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?		✓	
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?		✓	
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?		✓	
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?		✓	
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?		✓	
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	✓		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?	✓		
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, naturales y/o riesgos públicos por desplazamiento?		✓	

Powered by CamScanner

Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?	✓		
En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección personal?	✓		
Existen baños suficientes en número y se les realiza un adecuado mantenimiento, dotación y aseo?	✓		
Cuenta con cocina, cafetería, comedor o sitio de descanso adecuadamente mantenidos, dotados y aseados?		✓	
La empresa cuenta con agua potable?	✓		
Existe buen manejo de basuras y desechos?	✓		

19. Escriba a continuación los temas prioritarios de capacitación que podrían contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salud:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

NOMBRE COMPLETO	Jhon Miguel perez
CARGO	Ayudante
FECHA	18-09-2023
LUGARA DE RESIDENCIA	
INGRESOS	
ESTRATO	3
JORNADA LABORAL	diurna

Señor trabajador responda marcando con una (x), se le recuerda que solo debe marcar una vez, no tachones, no enmendaduras.

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 – 27 años
c. 28 – 37 años
X d. 38 _ 47 años
e. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
X a. Soltero (a)
b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
X a. Hombre
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
X a. Ninguna
b. 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
X a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista/ Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
X b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR- VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

7. USO DEL TIEMPO LIBRE

a. Labores domésticas
b. Recreación y deporte
c. Estudio
e. Ninguno
f. Otro _____

8. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

a. De 3 a 5 años
b. De 3 a 6 meses
c. De 6 meses a 1 año
d. De 1 a 3 años

9. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. TIENE VEHÍCULO PROPIO

a. Si
b. No cuál es su medio de transporte

_____

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. Contrato a Término indefinido
b. Contrato a Término Fijo
c. Contrato por obra / labor

12. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

a. Vacunación
b. Salud Oral
c. Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

13. CUÁNTO TIEMPO ESTIMADO DE SU CASA AL TRABAJO.

a. Media hora
b. Una hora
c. Hora y media
d. Dos horas
e. Otro _____

Powered by CamScanner

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones: Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	X		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?			
Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	✓		
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		X	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?	Y		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?			
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?		Y	
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?			
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?			
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?			
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen espacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	X		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?	Y		
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, robos) o riesgos públicos por desplazamiento?	Y		

Powered by CamScanner

Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 60% de la jornada de trabajo?		1	
La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, la silla y la labor que realiza?		1	
Tiene espacio suficiente para variar la posición de las piernas y rodillas?		1	
La silla es cómoda y permite ajustarlo a su medida?		1	
En general dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo con holgura?		1	
Su trabajo le exige mantenerse frente a la pantalla del computador más del 50% de la jornada?		1	
Cree que la ubicación de su pantalla evita la presencia de reflejos?		1	
El computador está dotado de filtro que favorezca el manejo de los contrastes, disminuyendo la fatiga visual?		1	
Cuenta con atril para ubicar los documentos que manipula mientras trabaja en el computador?		0	
Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que se siente podría calificarse de "normal"?		1	
Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?		1	
Considera que el tiempo asignado a la tarea que realiza es adecuado?		1	
Puede abandonar el trabajo por unos minutos sin necesidad que lo sustituyan?		1	
Puede variar el ritmo de trabajo sin perturbar la producción a lo largo de la jornada		1	
Las tareas que realiza le producen "sensación de peligrosidad"?		1	
El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y conocimientos?		1	
Considera que su trabajo es variado?		1	

Powered by CamScanner

Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?			
En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección personal?	X		
Existen baños suficientes en número y se les realiza un adecuado mantenimiento, dotación y aseo?	X		
Cuenta con cocina, cafetería, comedor o sitio de descanso adecuadamente mantenidos, dotados y aseados?			
La empresa cuenta con agua potable?	X		
Existe buen manejo de basuras y desechos?	X		

19. Escriba a continuación los temas prioritarios de capacitación que podrían contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salud:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

NOMBRE COMPLETO	Manuel Bandera Perez
CARGO	Auxiliar
FECHA	18 Septiembre 2023
LUGARA DE RESIDENCIA	
INGRESOS	
ESTRATO	3
JORNADA LABORAL	Diurna

Señor trabajador responda marcando con una (x), se le recuerda que solo debe marcar una vez, no tachones, no enmendaduras.

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 – 27 años
c. 28 – 37 años
d. 38 _ 47 años X
e. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a) X
b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
a. Hombre X
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
b. 1 – 3 personas X
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria X
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista/ Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada X
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Labores domésticas
b. Recreación y deporte X
c. Estudio
e. Ninguno
f. Otro _____

8. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
a. De 3 a 5 años
b. De 3 a 6 meses
c. De 6 meses a 1 año
d. De 1 a 3 años X

9. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años X
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. TIENE VEHÍCULO PROPIO
a. Si
b. No cuál es su medio de transporte
_____

11. TIPO DE CONTRATACIÓN
a. Contrato a Término indefinido
b. Contrato a Término Fijo X
c. Contrato por obra / labor

12. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
a. Vacunación
b. Salud Oral
c. Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna X

13. CUÁNTO TIEMPO ESTIMADO DE SU CASA AL TRABAJO.
a. Media hora X
b. Una hora
c. Hora y media
d. Dos horas
e. Otro _____

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones: Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	X		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	X		
Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	X		
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		X	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?		X	
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?		X	
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?		X	
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?		X	
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	X		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?	X		
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, naturales y/o riesgos públicos por desplazamiento?	X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

En los s últimos seis (6) meses

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza		X	
Dolor de cuello, espalda y cintura		X	
Dolores musculares		X	
Dificultad para algún movimiento		X	
Tos frecuente		X	
Dificultad respiratoria		X	
Gastritis, ulcera		X	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo	X		
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		X	
Dificultad para concentrarse		X	
Mal genio		X	
Nerviosismo		X	
Cansancio mental		X	
Palpitaciones		X	
Dolor en el pecho (angina)		X	
Cambios visuales		X	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfort visual		X	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		X	
Dificultad para oír		X	
Sensación permanente de cansancio		X	
Alteraciones en la piel		X	
Otras alteraciones no anotadas		X	

Powered by CamScanner

RUSSY	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 50% de la jornada de trabajo?	X		
La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, la silla y la labor que realiza?	X		
Tiene espacio suficiente para variar la posición de las piernas y rodillas?	X		
La silla es cómoda y permite ajustarlo a su medida?			
En general dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo con holgura?		X	
Su trabajo le exige mantenerse frente a la pantalla del computador más del 50% de la jornada?		X	
Cree que la ubicación de su pantalla evita la presencia de reflejos?		X	
El computador está dotado de filtro que favorezca el manejo de los contrastes, disminuyendo la fatiga visual?		X	
Cuenta con atril para ubicar los documentos que manipula mientras trabaja en el computador?		X	
Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que se siente podría calificarse de "normal"?		X	
Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?		X	
Considera que el tiempo asignado a la tarea que realiza es adecuado?		X	
Puede abandonar el trabajo por unos minutos sin necesidad que lo sustituyan?		X	
Puede variar el ritmo de trabajo sin perturbar la producción a lo largo de la jornada		X	
Las tareas que realiza le producen "sensación de peligrosidad"?		X	
El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y conocimientos?		X	
Considera que su trabajo es variado?		X	

Powered by CamScanner

Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?	X		
En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección personal?	X		
Existen baños suficientes en número y se les realiza un adecuado mantenimiento, dotación y aseo?	X		
Cuenta con cocina, cafetería, comedor o sitio de descanso adecuadamente mantenidos, dotados y aseados?	X		
La empresa cuenta con agua potable?	X		
Existe buen manejo de basuras y desechos?	X		

19. Escriba a continuación los temas prioritarios de capacitación que podrían contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salud:

Powered by CamScanner

ANEXO 17. PAZ Y SALVO

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

15 de Septiembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con **NIT 80.212.380-5,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr **ISNARDO DE JESUS MORENO ARRIETA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.096.248.874 de Barrancabermeja.** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de Construcción y dotación del comedor y cocina del instituto técnico superior industrial en el distrito de Barrancabermeja, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los 15 días del mes de septiembre del 2023.

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

ISNARDO DE JESUS MORENO ARRIETA
CC. 1.096.248.874 de Barrancabermeja.

CLL BF No. 79-94/ Oficina 411 15 13 Móvil 313 860 0819 / e-mail: contacto@wrussyingenieros.com

Powered by CamScanner

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT 80.212.380-5

30 de Septiembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadania como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con **NIT 80.212.380-5,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr **WILMAR ORTIZ MENDOZA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 79.392.925 de Bogotá D.C.** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de Construcción y dotación del comedor y cocina del instituto técnico superior industrial en el distrito de Barrancabermeja, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los 30 días del mes de septiembre del 2023.

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

WILMAR ORTIZ MENDOZA
CC. 79.392.925 de Bogotá D.C.

CLL 8F No. 79-94/ Oficina 411 15 13 Móvil 313 860 0819 / e-mail: contacto@wrussyingenieros.com

Powered by CamScanner

ANEXO 18. EXAMEN DE EGRESO

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT 80.212.380-5

Bogotá D.C., 15 de Septiembre de 2023

Señor:
ISNARDO DE JESUS MORENO ARRIETA
CC. 1.096.248.874 de Barrancabermeja.

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a)

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la **MILENH IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** calle 49 # 21-58 barrio Colombia de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**.

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

ISNARDO DE JESUS MORENO ARRIETA
CC. 1.096.248.874 de Barrancabermeja.

C.C. – ARCHIVO

Powered by CamScanner

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
MAT. 80.212.380 B
INGENIERIA

Bogotá D.C., 30 de Septiembre de 2023

Señor:
WILMAR ORTIZ MENDOZA
CC. 79.392.925 de Bogotá D.C.

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a)

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la **MILENH IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** calle 49 # 21-58 barrio Colombia de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**.

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

WILMAR ORTIZ MENDOZA
CC. 79.392.925 de Bogotá D.C.

C.C. – ARCHIVO

Cll 8F No. 79 - 94 / Oficina 411 1513 Movil 313 860 0819 / e-mail: ingwilver@hotmail.com

Powered by CamScanner

5.12. INFORME SOCIO AMBIENTAL DE OBRA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**


INFORME AMBIENTAL 7

PERIODO: 06 SEPTIEMBRE - 05 OCTUBRE 2023

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

Elaboró:



KAREN SALAMANCA ROJAS
WRUSSY INGENIEROS SAS

Revisó y Aprobó:



WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS SAS

CONTENIDO

INTRODUCCION 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5
2.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 5
3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS APLICABLES 5
4. COMPONENTE AMBIENTAL 6
4.1. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 6
4.2. TRATAMIENTO Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL 11
4.3. DESCAPOTE Y REMOCIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA 11
4.4. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 11
4.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 11
4.6. TRANSPORTE DE MATERIALES Y ESCOMBROS 12
4.7. MANEJO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 13
4.8. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS 13
4.9. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONVENCIONALES 13
4.10. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 13
4.11. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 13
4.12. CAPACITACIONES 13
4.13. REGISTRO DE MATERIALES PETREOS 14
5. COMPONENTE SOCIAL 15
5.1. ACTAS DE REUNIÓN 15
5.2. INFORME SOCIAL 15
6. CONCLUSIONES 15

LISTA DE ILUSTRACIONES

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps. 5

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Registro fotográfico Señalización y cerramiento 6
Tabla 2. Acumulado de volúmenes de RCD 12
Tabla 3. Programación capacitaciones 14
Tabla 4. Asistencia a capacitaciones. 14

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**


INTRODUCCION

El diseño de las estrategias y medidas de prevención, mitigación y control de los impactos ambientales identificados en los proyectos de tipo constructivo están enmarcadas en la legislación ambiental colombiana de orden local, regional y nacional; donde se orienta la prospectiva ambiental nacional para la conservación del ambiente y los recursos naturales. De igual manera la protección del trabajador, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son reglamentadas a través de los requisitos dispuestos en la normatividad del país.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Barrancabermeja en la dirección Cra. 28 # 55-10, como se evidencia en la ilustración N 1.

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps.

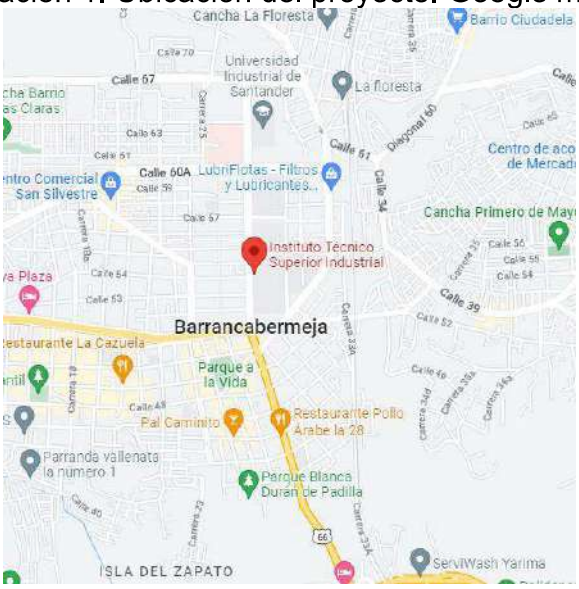

Fuente: https://www.google.com/maps/

2.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@wrussyingenieros.com
OFICINA: DIRECCIÓN: Calle 8f # 79- 94 Bogotá D.C.
Contrato de Obra No. 0756-23
Objeto: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS APLICABLES

Durante el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023 se ejecutaron actividades que requerian permisos y/o licencias ambientales.

4. COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación se describen las actividades de implementación del PMA en el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023; para la interpretación de los programas que demuestran la ejecución de las medidas de manejo y sus anexos.

4.1. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

Se realizó señalizacion preventiva e informativa, ademas se realiza cerramiento de las áreas de intervención.

Tabla 1. Registro fotográfico Señalización y cerramiento

Señalización de escombros	Punto ecológico
	
Punto ecologico	Recoleccion de residuos
	
Armado de columnas	Acopio de herramientas

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

	
Retiro de escombros	Retiro de escombros
	
Armado de columnas	Descargue arena
	
Limpieza de baños	Fundida

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

INFORME MENSUAL

	
Extintor	Señalización
	
Señalización	Inspección
	
Inspección	Armado de columnas

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

	
Protección material petreo	Cerramiento
	
Armado de muro	Armado de muro
	
Retiro de escombros	Armado de muro

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

	
Señalización ingreso a obra	Ingreso de materiales
	
Señalización ingreso a obra	Ingreso de materiales
	
Señalización ingreso de obra	Instalación de estructura





4.2. TRATAMIENTO Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

Durante el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023, no se realizaron actividades con referencia a este programa.

4.3. DESCAPOTE Y REMOCIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA

Durante el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023, no se realizaron actividades con referencia a este programa.

4.4. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Durante periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023, no se realizaron actividades con referencia a este programa.


4.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

Durante periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023, se realizaron actividades con retiros de residuos de construcción y demolición, los soportes se encuentran en el **ANEXO 1.**

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$\%\ Disposición\ escombros = \frac{Vol.\ escombros\ dispuestos\ en\ escombrera\ m3}{Vol.\ escombros\ generados\ m3}(mes) * 100$
$\%\ Disposición\ escombros = \frac{416}{416} * 100 = 100\%$

Tabla 2. Acumulado de volúmenes de RCD

Mes	Material de excavación (m^3)	Demolición (m^3)	Cantidad Total (m^3)
MARZO-ABRIL	0	68	68
ABRIL-MAYO	0	224	224
MAYO-JUNIO	0	248	248
JUNIO-JULIO	0	64	64
JULIO-AGOSTO	0	56	56
AGOSTO-SEPTIEMBRE	0	16	16
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	0	1582	1582
TOTAL	**0**	**2258**	**2258**

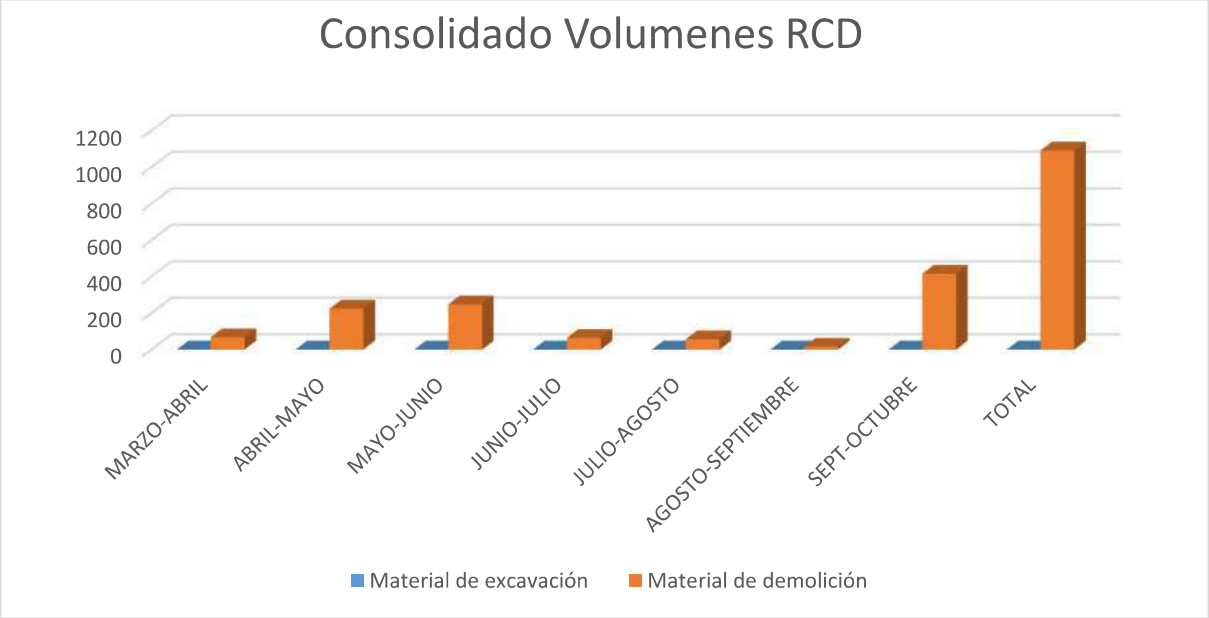

4.6. TRANSPORTE DE MATERIALES Y ESCOMBROS

Durante del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023, varios vehiculos prestaron sus servicios para la empresa, los documentos de los vehiculos se encuentran en el **ANEXO 2** de este informe.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$\text{Mtto automotores} = \frac{\text{No. revisiones tecnicomecánicas vigentes}}{\text{No. automotores}} (\text{mes}) * 100$

$Mtto\ automotores = \frac{2}{2}(mes) * 100 = 100\%$

4.7. MANEJO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS

En el **ANEXO 2** se encuentran los documentos de los vehiculos que prestaron sus servicios para WRUSSY INGENIEROS SAS.

4.8. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Durante el periodo comprendido del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023 no se presentaron quejas por ruido de las actividades que se ejecutaron.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$Quejas\ de\ ruido = No.quejas\ por\ ruido\ en\ el\ mes$
$Quejas\ de\ ruido = 0$

4.9. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONVENCIONALES

Para el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023, se generaron residuos solidos, los cuales fueron dispuestos en los puntos ecologicos presentes en el frente de obra, y posterior a ello la recoleccion la realizó la empresa de servicios publicos de aseo de Barrancabermeja, VEOLIA S.A ESP.

4.10. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Durante el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023 no se realizaron actividades con referencia a este programa. Se adjunta el certificado del manejo de los residuos liquidos de los baños **ANEXO 3.**

4.11. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Durante el periodo comprendido del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023 se utilizaron varias sustancias quimicas de las cuales se anexa la ficha tecnica en el **ANEXO 4.**

4.12. CAPACITACIONES

En el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023 se programaron una capacitación, cumpliendo con un porcentaje de ejecución del 100%.

Tabla 3. Programación capacitaciones

PROGRAMACIÓN					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No cumple**	**Programadas**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
29/09/2023	29/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
			1	1	**100%**

Nota 2: A continuación, se relaciona el personal que asistió a la capacitación dada en el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023**.**

Tabla 4**.** Asistencia a capacitaciones**.**

CAPACITACION	NOMBRE DE TRABAJADOR	CARGO
RESPEL Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS	WILMAR ORTIZ	OFICIAL
	ELVIS CARPIO	AYUDANTE
	ALEXANDER JIMENEZ	AYUDANTE
	ELKIN REYES	AYUDANTE
	ABELINO MUÑOZ	OFICIAL
	YESENIA ALVAREZ	PROF SOCIAL
	DOMINGO MORA	AYUDANTE
	SIGILFREDO MENDEZ	OFICIAL
	JAIR CARPIO	AYUDANTE
	BRAYAN COSSIO	AYUDANTE
	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE
	CARLOS RODRIGUEZ	AYUDANTE
	MANUEL BANDERA	AYUDANTE
	JUAN PEREZ	AYUDANTE
	JOSE ANGEL P	AYUDANTE
	DEIBI CARPIO	AYUDANTE
	MARIO FONTALVO	AYUDANTE
	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE
	KEVIN ORTEGA	AYUDANTE

ANEXO 6. Capacitaciones

4.13. REGISTRO DE MATERIALES PETREOS

Durante el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023, se realizaron actividades con referencia a este programa. **ANEXO 6.**

5. COMPONENTE SOCIAL

A continuación se describen las actividades de la gestion social que se realizó en el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023.

5.1. ACTAS DE REUNIÓN

Durante el periodo comprendido del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023, se realizaron reuniones de socializacion con la comunidad sobre el inicio del proyecto la cual se encuentra la evidencia en el **ANEXO 7**.

5.2. INFORME SOCIAL

Se realiza informe mensual social, el cual se encuentra en el **ANEXO 8**.

6. CONCLUSIONES

- Se cumplió con los compromisos contractuales del contrato en el periodo del **06 de septiembre al 05 octubre de de 2023.**
- Se realizaron actividades de supervisión de los trabajos desarrollados con apoyo del residente e inspector HSE, de esta manera se garantizó el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente en el contrato y en la normatividad legal vigente colombiana.
- Todas las áreas intervenida se dejaron con su respectivo orden y aseo.
- Se realizo retiro de material de excavacion y se dispuso con gestor autorizado por la entidad ambiental competente.

ANEXO 1. DISPOSICIÓN RCD



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 5819

Fecha: 13 SEP 2023.

Material: RETIRO CON MAQUINA.

Cubicación: 8M3.

Placa: IDE 318

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL.

Total Viajes: 2 (DOS)

EDUARDO GONZALES.
CONDUCTOR

CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 5810

Fecha: 11 SEP 2023.

Material: RETIRO CON MAQUINA

Cubicación: 8m³. Placa: EJK 785

Hora Cargue: COLEGIO Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL. Total Viajes: 4 (CUATRO)

LEONARDO MACHADO.
CONDUCTOR

CESAR ONO
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 5824

Fecha: 15 SEP 2023.

Material: RETIRO A MAQUINA

Cubicación: 8m3.

Placa: XWJ 307

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL.

Total Viajes: 1 (UNO)

JAVIER GONZALES.
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005828

Fecha: 15 SEP 2023.

Material: RETIRO A MAQUINA

Cubicación: 8m3- Placa: UAD 483

Hora Cargue: COLEGIO Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL. Total Viajes: 1 (UNO)

LUIS Palomino.
CONDUCTOR

CESAR ON
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 5811

Fecha: 11 SEP 2023.

Material: RETIRO CON MAQUINA

Cubicación: 8m³.

Placa: IDE 318

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL.

Total Viajes: 4 (CUATRO)

EDUARDO GONZALES.
CONDUCTOR

CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005818

Fecha: 13 SEP 2023.

Material: RETIRO CON MAQUINA.

Cubicación: 8 m³. Placa: UAD 483.

Hora Cargue: COLEGIO Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL. Total Viajes: 5 (CINCO)

Luis Palomino.
CONDUCTOR

CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 5834

Fecha: 17 SEP 2023.

Material: RETIRO A MAQUINA.

Cubicación: 8m3.

Placa: IDE 318

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL

Total Viajes: 6 (SEIS).

EDUARDO -6
CONDUCTOR

PEGARON
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO

5815

Fecha: 12 SEP 2023.

Material: RETIRO A MAQUINA

Cubicación: 8m³. Placa: VAD 483.

Hora Cargue: COLEGIO Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL. Total Viajes: 1 (UNO)

Luis Palomino
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 5817

Fecha: 13 SEP 2023.

Material: RETIRO CON MAQUINA

Cubicación: 8m3. Placa: EJK 785.

Hora Cargue: COLEGIO Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL Total Viajes: 5 (CINCO)

LEONARDO.M
CONDUCTOR

CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 5827

Fecha: 15 SEP 2023.

Material: RETIRO A MAQUINA

Cubicación: 8 m3.

Placa: WHE 012

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL.

Total Viajes: 1 (UNO)

JONIER GONZALES.
CONDUCTOR

CESARONO
CONTROL



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 5829

Fecha: 15 SEP 2023.

Material: RETIRO A MAQUINA

Cubicación: 8 m3.

Placa: IDE 318

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL.

Total Viajes: 1 (UNO)

EDUARDO GONZALES.
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO
N° 5832

Fecha: 17 SEP 2023.

Material: RETIRO A MAQUINA

Cubicación: 8 m³.

Placa: VAD 483

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL

Total Viajes: 6 (SEIS)

Luis Palomino
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005833

Fecha: 17 SEP 2023.

Material: RETIRO A MAQUINA

Cubicación: 8 m3. Placa: EJT 785

Hora Cargue: COLEGIO Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL Total Viajes: 6 (SEIS)

LEONARDO.M
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005835

Fecha: 17 SEP 2023.

Material: RETIRO A MAQUINA

Cubicación: 8m3. Placa: WHE 012

Hora Cargue: COLEGIO Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL Total Viajes: 2 (DOS)

JAIRO GONZALES
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005838

Fecha: 18 SEP 2023

Material: RETIRO A MAQUINA.

Cubicación: 8m3-

Placa: UAD 483

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL

Total Viajes: 2 (dos)

Luis Palomino
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

© 321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005844

Fecha: 19 SEP 2023.

Material: RETIRO A PARA

Cubicación: 8m³

Placa: EJH 785.

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL.

Total Viajes: 1 (UNO)

LEONARDO. M
CONDUCTOR

3771204
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005845

Fecha:	19 SEP 2023.		
Material:	RETIRO A MAQUINA		
Cubicación:	8m³.	**Placa:**	UAD 483
Hora Cargue:	COLEGIO	**Hora Recibido:**	
Kilometraje:	INDUSTRIAL	**Total Viajes:**	1 (UNO)

Luis Palomino.
CONDUCTOR

37712004
CONTROL

321 382 06 64

CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja



RECIBO 005843

Fecha: 19 SEP 2023.

Material: RETIRO A MAQUINA

Cubicación: 8m3. Placa: IDF 318

Hora Cargue: COLEGIO Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL Total Viajes: 1 (UNO)

EDUARDO GONZALES
CONDUCTOR

1037712004
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005849

Fecha: 21 SEP 2023.

Material: RETIRO A MAQUINA

Cubicación: 8m3. Placa: UAD 483.

Hora Cargue: COLEGIO Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL Total Viajes: 2 (DOS)

Luis Palomino
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bucaramanga	DIA 19	MES 09	AÑO 2022	N° 5845
PIN DE OBRA				
PLACA IDE 378.		PROPIETARIO Eduardo Gonzalez.		
CONCEPTO Retiro escombro				
METROS DE ESCOMBROS 8mts				
PERSONA QUE ENTREGA: Eduardo Gonzalez		PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA: 91.422.58		CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bucaramanga	DIA 21	MES 09	AÑO 2022	N° 5849.
PIN DE OBRA				
PLACA UAO 487		PROPIETARIO Luis palomino		
CONCEPTO Retiro escombro				
METROS DE ESCOMBROS 8mts				
PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino		PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA: 88268669		CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bucaramanga	DIA 21	MES 09	AÑO 2022	N° 5847
PIN DE OBRA				
PLACA UAO 487		PROPIETARIO Luis palomino		
CONCEPTO Retiro Escombro				
METROS DE ESCOMBROS 8mts				
PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino		PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA: 88.263.669		CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD	DIA	MES	AÑO	N°
PIN DE OBRA				
PLACA		PROPIETARIO		
CONCEPTO				
METROS DE ESCOMBROS				
PERSONA QUE ENTREGA:		PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA:		CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Gy	DIA 15	MES 09.	AÑO 2023	N° 5828

PIN DE OBRA

PLACA UNO 487	PROPIETARIO Luis palomino

CONCEPTO Retiro escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88268669	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Gy	DIA 15	MES 09	AÑO 2023	N° 5829

PIN DE OBRA

PLACA IDE 318.	PROPIETARIO Eduardo Gonzalez

CONCEPTO Retiro escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Eduardo Gonz	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 91432585	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Gy	DIA 17	MES 09-	AÑO 2023	N° 5834

PIN DE OBRA

PLACA IDE 318	PROPIETARIO Eduardo G.

CONCEPTO Retiro escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Eduardo Gonz.	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 91432585	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Gy	DIA 17	MES 09.	AÑO 2023	N° 5835

PIN DE OBRA

PLACA IDE 318.	PROPIETARIO Eduardo G.

CONCEPTO Retiro escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Eduardo Gonz.	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 91432585	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga	DIA 15.	MES 09-	AÑO 2023.	Nº 5834

PIN DE OBRA

PLACA IDE 318	PROPIETARIO Eduardo G.

CONCEPTO Retiro Escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Eduardo Gomez.	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 91 432585.	CEDULA:
FIRMA: Edug gomez.	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Sp	DIA 15	MES 09	AÑO 2023	Nº 5834

PIN DE OBRA

PLACA IDE 318	PROPIETARIO Eduardo G

CONCEPTO Retiro escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Eduardo Gomez.	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 91 432585	CEDULA:
FIRMA: Eduardo Gomez.	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Sp.	DIA 18	MES 09.	AÑO 2023	Nº 5834

PIN DE OBRA

PLACA IDE 318	PROPIETARIO Eduardo G

CONCEPTO Retiro escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Eduardo Gomez.	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 91 432585	CEDULA:
FIRMA: Edug gomez.	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Sp	DIA 15	MES 09	AÑO 2023	Nº 5834

PIN DE OBRA

PLACA IDE 318	PROPIETARIO Eduardo G.

CONCEPTO Retiro escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Eduardo Gomez	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 91 432.535	CEDULA:
FIRMA: Eduardo gomez	FIRMA:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bjo.	DIA 17.	MES 09	AÑO 2023	Nº 5835
PIN DE OBRA				
PLACA WHE 012		PROPIETARIO	Javier Gonzalez	
CONCEPTO	Retiro escombro			
METROS DE ESCOMBROS	8mt3			
PERSONA QUE ENTREGA:	Javier Gonzalez.	PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA:		CEDULA:		
FIRMA:	Javier G.	FIRMA:		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bjo	DIA 17	MES 09	AÑO 2023	Nº 5835
PIN DE OBRA				
PLACA WHE 012		PROPIETARIO	Javier Gonzalez	
CONCEPTO	Retiro escombro			
METROS DE ESCOMBROS	8mt3			
PERSONA QUE ENTREGA:	Javier Gonzalez	PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA:		CEDULA:		
FIRMA:	Javier G.	FIRMA:		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bjo.	DIA 17	MES 09.	AÑO 2023	Nº 5832
PIN DE OBRA				
PLACA UAO 432		PROPIETARIO	Luis palomino.	
CONCEPTO	Retiro escombro			
METROS DE ESCOMBROS	8mt3.			
PERSONA QUE ENTREGA:	Luis palomino.	PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA:	88.268.669.	CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bjo	DIA 17	MES 09	AÑO 2023	Nº 5832
PIN DE OBRA				
PLACA UAO 432		PROPIETARIO	Luis palomino	
CONCEPTO	Retiro escombro			
METROS DE ESCOMBROS	8mt3			
PERSONA QUE ENTREGA:	Luis palomino	PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA:	88.268.669.	CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bca-bq	DIA 17	MES 09	AÑO 2023	N° 5832

PIN DE OBRA

PLACA UAO 487	PROPIETARIO Luis palomino

CONCEPTO Retiro escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88.268 669.	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bca-bq	DIA 17	MES 09	AÑO 2023	N° 5832

PIN DE OBRA

PLACA UAO 487	PROPIETARIO Luis palomino

CONCEPTO Retiro escombro.

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88263669.	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bca-bq	DIA 17	MES 09	AÑO 2023	N° 5832.

PIN DE OBRA

PLACA UAO 487	PROPIETARIO Luis palomino.

CONCEPTO Retiro escombro.

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88268.669.	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bca-bq.	DIA 17	MES	AÑO	N° 5832

PIN DE OBRA

PLACA UAO 487	PROPIETARIO Luis palomino

CONCEPTO Retiro escombro.

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino.	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88268.669	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga 6/a	DIA 17	MES 09	AÑO 2023	N° 5872

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785	PROPIETARIO Leonardo M.

CONCEPTO Retiro escombros

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo M.	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA : 13 854 719	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-6/a	DIA 17	MES 09	AÑO 2023	N° 5873

PIN DE OBRA

PLACA EJK785	PROPIETARIO

CONCEPTO Retiro escombros

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo M.	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA : 13854719	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD	DIA	MES	AÑO	N°

PIN DE OBRA

PLACA	PROPIETARIO

CONCEPTO

METROS DE ESCOMBROS

PERSONA QUE ENTREGA:	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA :	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD	DIA	MES	AÑO	N°

PIN DE OBRA

PLACA	PROPIETARIO

CONCEPTO

METROS DE ESCOMBROS

PERSONA QUE ENTREGA:	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA :	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Barbja	DIA 18	MES 09	AÑO 2023	N° 5838.

PIN DE OBRA

PLACA UAD 432	PROPIETARIO Luis palomino

CONCEPTO Retiro Escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88.268 669.	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Barbja	DIA 8.	MES 09	AÑO 2023	N° 5828

PIN DE OBRA

PLACA UAD 485	PROPIETARIO Luis palomino

CONCEPTO Retro Escombro.

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88268669	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD	DIA 19.	MES 09	AÑO 2023	N° 5845

PIN DE OBRA

PLACA UAO 485	PROPIETARIO Luis palomino

CONCEPTO Retiro escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88268669	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Barbja	DIA 19	MES 09	AÑO 2023	N° 5844.

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785	PROPIETARIO

CONCEPTO Retro Escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo M.	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 13 854 717.	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bq.	DIA 17	MES Sep	AÑO 2022	N° 5833

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785	PROPIETARIO Leonardo Machado.

CONCEPTO Retiro escombro.

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo M.	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 13854719.	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bq	DIA 17.	MES Sep.	AÑO 2022	N° 5833

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785	PROPIETARIO Leonardo M.

CONCEPTO Retiro escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mts.

PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo M.	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 13854719	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bq	DIA 17.	MES 09	AÑO 2022	N° 5833

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785	PROPIETARIO

CONCEPTO Retiro Escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo M.	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 13854719	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bq	DIA 17.	MES 09	AÑO 2022	N° 5833

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785	PROPIETARIO

CONCEPTO Retiro Escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo M.	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 13854719.	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-90	DIA 13	MES 09	AÑO 2023	N° 5818

PIN DE OBRA

PLACA UAO 483.	PROPIETARIO Luis palomino

CONCEPTO Retiro escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88.268.669.	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-90	DIA 13	MES 09.	AÑO 2023.	N° 5819

PIN DE OBRA

PLACA UAO 483	PROPIETARIO Luis palomino

CONCEPTO Retro escombro.

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88268.669.	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga.	DIA 13	MES 09.	AÑO 2023	N° 5820

PIN DE OBRA

PLACA UAO 483	PROPIETARIO Luis palomino

CONCEPTO Retro escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88268669	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-90.	DIA 13	MES 09.	AÑO 2023	N° 5819

PIN DE OBRA

PLACA IDE 348.	PROPIETARIO Eduardo gonzales

CONCEPTO Retiro escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Eduardo Gonzales.	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 91432585	CEDULA:
FIRMA: Eduard G.	FIRMA:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga.	DIA 17	MES Sep	AÑO 2022	Nº 5933
PIN DE OBRA				
PLACA EJK 785		PROPIETARIO Leonardo Machado		
CONCEPTO Retiro escombro.				
METROS DE ESCOMBROS 8mt3				
PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo M.		PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA: 13854719.		CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga	DIA 17.	MES Sep.	AÑO 2022	Nº 5933
PIN DE OBRA				
PLACA EJK 785		PROPIETARIO Leonardo M.		
CONCEPTO Retiro escombro				
METROS DE ESCOMBROS 8mt3.				
PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo M.		PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA: 13854719		CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga	DIA 17.	MES 09	AÑO 2022	Nº 5933
PIN DE OBRA				
PLACA EJK 785		PROPIETARIO		
CONCEPTO Retiro Escombro				
METROS DE ESCOMBROS 8mt3				
PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo M.		PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA: 13854719		CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga	DIA 17.	MES 09	AÑO 2022	Nº 5933
PIN DE OBRA				
PLACA EJK 785		PROPIETARIO		
CONCEPTO Retiro Escombro				
METROS DE ESCOMBROS 8mt3				
PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo M.		PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA: 13854919.		CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bog-bta	DIA 11-09-2023	MES 09.	AÑO 2023	N° 5810

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785.	PROPIETARIO Leonardo Machado.

CONCEPTO 8m³ Material de escombros.

METROS DE ESCOMBROS 8m³.

PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo Machad	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 1038547919.	CEDULA:
FIRMA: LEONARDO MACHADO.	FIRMA: CESAR

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bog-bta	DIA 11	MES 09	AÑO 2023	N° 5810.

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785	PROPIETARIO

CONCEPTO Retro Material de escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt³

PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo Machado	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 1038547919.	CEDULA:
FIRMA: LEONARDO MACHADO.	FIRMA: CESAR

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bog-bta	DIA 11	MES 09	AÑO 2023	N° 5810.

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785.	PROPIETARIO Leonardo M.

CONCEPTO Retiro Material de escombo

METROS DE ESCOMBROS 8mt³

PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo Machado	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 1038547919.	CEDULA:
FIRMA: LEONARDO MACHADO	FIRMA: CESAR

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bog-bta	DIA 11	MES 09	AÑO 2023	N° 5810

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785	PROPIETARIO Leonardo M.

CONCEPTO Retiro Material de escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt³

PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo Machado	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 1038547919.	CEDULA:
FIRMA: LEONARDO MACHADO	FIRMA: CESAR

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Rio-bo. DIA 11 MES 09 AÑO 2023 Nº 5811
PIN DE OBRA
PLACA IDE 318. PROPIETARIO Eduardo gonzalez.
CONCEPTO 8m Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8m3
PERSONA QUE ENTREGA: Eduardo Gonzalez. PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: CEDULA:
FIRMA: Eduardo Gonzalez. FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Rio. DIA 11 MES 09 AÑO 2023 Nº 5811.
PIN DE OBRA
PLACA IDE 318 PROPIETARIO Eduardo Gonzalez.
CONCEPTO Retiro de Escombro.
METROS DE ESCOMBROS 8m3
PERSONA QUE ENTREGA: PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: CEDULA:
FIRMA: Eduardo Gonzalez. FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Rio-bo. DIA 11 MES 09 AÑO 2023 Nº 5811
PIN DE OBRA
PLACA IDE 318 PROPIETARIO Eduardo Gonzalez.
CONCEPTO Retiro escombro
METROS DE ESCOMBROS 8m3
PERSONA QUE ENTREGA: PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: CEDULA:
FIRMA: Eduardo Gonzalez. FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Rio-bo. DIA M MES 09 AÑO 2023 Nº 5811
PIN DE OBRA
PLACA IDE 318. PROPIETARIO Eduardo Gonzalez.
CONCEPTO Retiro Escombro.
METROS DE ESCOMBROS 8m3
PERSONA QUE ENTREGA: PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: CEDULA:
FIRMA: Eduardo Gonzalez. FIRMA:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS		CÓDIGO HSE-FOR-25 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACION: 08/01/2019
CIUDAD Bca-bq	DIA 12	MES 09.	AÑO 2023 N° 5815.
PIN DE OBRA			
PLACA UAO 483		PROPIETARIO Luis palomino.	
CONCEPTO Retiro de escombro.			
METROS DE ESCOMBROS 8m3			
PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino		PERSONA QUE RECIBE:	
CEDULA: 88.268669.		CEDULA:	
FIRMA:		FIRMA:	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS		CÓDIGO HSE-FOR-25 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACION: 08/01/2019
CIUDAD Bca-bq.	DIA 13	MES 09	AÑO 2023. N° 5817.
PIN DE OBRA			
PLACA UAO 483		PROPIETARIO Luis palomino	
CONCEPTO Retiro escombro			
METROS DE ESCOMBROS 8m3			
PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino		PERSONA QUE RECIBE:	
CEDULA: 88268.669.		CEDULA:	
FIRMA:		FIRMA:	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS		CÓDIGO HSE-FOR-25 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACION: 08/01/2019
CIUDAD Bca-bq.	DIA 13	MES 09	AÑO 2023 N° 5812
PIN DE OBRA			
PLACA UAO 483		PROPIETARIO Luis palomino	
CONCEPTO Retiro de escombro			
METROS DE ESCOMBROS 8m3			
PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino.		PERSONA QUE RECIBE:	
CEDULA: 88268.669		CEDULA:	
FIRMA:		FIRMA:	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS		CÓDIGO HSE-FOR-25 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACION: 08/01/2019
CIUDAD Bca.	DIA 13	MES 09.	AÑO 2023 N° 5818.
PIN DE OBRA			
PLACA UAO 483		PROPIETARIO Luis palomino	
CONCEPTO Retiro de escombro			
METROS DE ESCOMBROS 8m3			
PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino		PERSONA QUE RECIBE:	
CEDULA: 88268669.		CEDULA:	
FIRMA:		FIRMA:	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga b/a	DIA 12	MES 09	AÑO 2023	N° 5819.

PIN DE OBRA

PLACA IDE 318.	PROPIETARIO Eduardo gonzales

CONCEPTO Retiro escombro ✓

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Eduardo Gomez	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 91 432 545	CEDULA:
FIRMA: Eduardo Gomez	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga b/a	DIA 12	MES 09.	AÑO 2023	N° 5817

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785	PROPIETARIO Leonardo M.

CONCEPTO Retiro escombro ✓

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo M.	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 13 854 719.	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga b/a	DIA 12	MES 09.	AÑO 2023	N° 5817

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785	PROPIETARIO Leonardo M.

CONCEPTO Retiro escombro ✓

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo M.	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 13 854 719.	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga b/a	DIA 12	MES 09.	AÑO 2023	N° 5817

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785	PROPIETARIO Leonardo M.

CONCEPTO Retiro Escombro ✓

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo M.	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 13 854 719.	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga 5/9 | DIA 13 | MES 09 | AÑO 2023 | N° 5817

PIN DE OBRA

PLACA ESK 785 | PROPIETARIO Leonardo H.

CONCEPTO Retiro escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo H. | PERSONA QUE RECIBE:

CEDULA: 13 854 719 | CEDULA:

FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga b/g | DIA 13 | MES 09 | AÑO 2023 | N° 5817

PIN DE OBRA

PLACA ESK 785 | PROPIETARIO Leonardo H.

CONCEPTO Retiro escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo H. | PERSONA QUE RECIBE:

CEDULA: 13 854 719. | CEDULA:

FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga b/g | DIA 15 | MES 09 | AÑO 2023 | N° 5827

PIN DE OBRA

PLACA WHE 012 | PROPIETARIO Javier Gonzales.

CONCEPTO Retiro escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Javier Gonzales | PERSONA QUE RECIBE:

CEDULA: | CEDULA:

FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga b/g | DIA 15 | MES 09 | AÑO 2023 | N° 5824

PIN DE OBRA

PLACA XWJ 307 | PROPIETARIO Javier Gonzales.

CONCEPTO Retiro escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA: Javier Gonzales | PERSONA QUE RECIBE:

CEDULA: | CEDULA:

FIRMA: Javier Gonzales | FIRMA:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE DISPOSICION DE ESCOMBROS	CODIGO: HSE-FOR-29 VERSION 1 FECHA APROBACION : 08/01/2019

FECHA	PLACA DE LA VOLQUETA	Nº DE VALE	Nº PIN DE OBRA	LUGAR	VOLUMEN TRANSPORTADO M3	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	FIRMA DEL RESPONSABLE DE OBRA
11-09-23	EJK 785	5810	—	ITSI	32 m3	Leonardo Machado	CESAR ONO
11-09-23	IDE 318	5811	—	ITSI	32 m3	Eduardo Gonzalez	CESAR ONO
12-09-23	UAD 483	5815	—	ITSI	8 m3	Luis Palomino	CESAR ONO
13-09-23	UAD 483	5818	—	ITSI	40m3	Luis Palomino	CESAR ONO
13-09-23	IDE 318	5819	—	ITSI	16m3	Eduardo Gonzalez	CESAR ONO
13-09-23	EJK 785	5817	—	ITSI	40m3	Leonardo Machado	CESAR ONO
15-09-23	WHE 012	5827	—	ITSI	8m3	Javier Gonzalez	CESAR ONO
15-09-23	XWJ 307	5824	—	ITSI	8m3	Javier Gonzalez	CESAR ONO
15-09-23	UAD 483	5828	—	ITSI	8m3	Luis Palomino	CESAR ONO
15-09-23	IDE 318	5829	—	ITSI	8m3	Eduardo Gonzalez	CESAR ONO
17-09-23	EJK 785	5833	—	ITSI	48m3	Leonardo Machado	CESAR ONO
17-09-23	IDE 318	5834	—	ITSI	48m3	Eduardo Gonzalez	CESAR ONO
17-09-23	WHE012	5835	—	ITSI	16m3	Javier Gonzalez	CESAR ONO
17-09-23	UAD483	5832	—	ITSI	48m3	Luis Palomino	CESAR ONO
18-09-23	UAD483	5838	—	ITSI	16m3	Luis Palomino	CESAR ONO
19-09-23	UAD483	5845	—	ITSI	8m3	Luis Palomino	CESAR ONO
19-09-23	EJK785	5844	—	ITSI	8m3	Leonardo Machado	CESAR ONO
19-09-23	IDE318	5843	—	ITSI	8m3	Eduardo Gonzalez	CESAR ONO
21-09-23	UAD483	5849	—	ITSI	16m3	Luis Palomino	CESAR ONO

Firma Residente HSEQ

Firma Residente de obra

Powered by CamScanner

ANEXO 2. DOCUMENTOS VEHICULOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 74124

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC138700	CATERPILLAR	236D3	2020

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINICARGADOR	CAT0236DHF9C00673

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	8KY0687	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2952 Kg	2080 mm	1670 mm	3680 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
H.G. CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S

IDENTIFICACIÓN
NIT 846.000.560

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
PRENDA-GFCM COMERCIAL MEXICO, S.A DE C.V. , SOFOM, E.N.R SUCURSAL COLOMBIA

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
13-10-2020	19-10-2020	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482020000391802	10/08/2020



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003845

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario: **482020000391802-9**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860002576	1	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
AV AMERICAS 42 A 21	4055554	48	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
802000764	8	AGENCIA DE ADUANAS LOPEZ HERMANOS S.A. NIVEL 1	26	0210

29. Numero documento de identificacion	30. Apellidos y nombres
7921548	UTRIA MARTELO LUIS FERNANDO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	13911	No. 918491918	2020 - 08 - 10	No. 595906899	2020 - 03 - 27

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
CATERPILLAR INC	PEORIA-ILL.	249

49. Direccion exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
100 NE ADAMS ST PEORIA IL 61629-0001	rojas_steve@cat.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ pvs.
01G 135191	2020 - 03 - 24	918	1	434	25	MAERSK COLOMBIA S.A	3,775.95

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429510000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importacion	69. Tipo de importacion	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.dcms.	72. Peso neto kgs.dcms.	73. Codigo embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	2,952.50	2,952.50	PK	1	1	U	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
34,866.50	293.75

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
7.67	96.25

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
397.67	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
35,264.17	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	133,155,743	0	0	0
I.V.A.	5.00	133,155,743	6,658,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sancion	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	6,658,000		0

91. Descripción de las mercancías;(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria. Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al reverso de este formulario)

001 595906899 007 ZFEQ 001/001 NOS ACOGEMOS AL DTO. 925 DE 9 MAYO/2013. Nos acogemos al Dto. 723 de abril 10 d e 2014. MERCANCIA NUEVA. PRODUCTO: MINICARGADOR. MARCA: CATERPILLAR. MODELO: 236D3. USO O DESTINO: CONSTRUCCION Y MINERIA. REFERE NCIA: 512-4236. SERIAL PRINCIPAL: CAT0236DHF9C00673. SERIAL MOTOR: 9KY0687. MODELO MOTOR: C2.3B. MANIFIESTO DE CARGA NUMERO: 1165 75010903984 DE FECHA: 2020-04-02. FORMULARIO DE INGRESO A ZONA FRANCA: 918474534 DE FECHA: 2020-04-14. ORDEN NUMERO: BS000692. NA CIONALIZACION PARCIAL BL NUMERO: 595906899. CANTIDAD: (00001) Or: US XXXXXXXXXXXXXX

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA

VERSION CLAUSULADO 12-03-2021-1317-P-12-PPSUS14R00000005-D00I

No. PÓLIZA	B-400002026	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	22180912	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2022	24:00 Horas Del	12/09/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

MARCA : .
MODELO :
PLACA : .
LINEA : .
COLOR : .
MOTOR : .
SERIE : .
UBICACION : PUTUMAYO MOCOA TODO EL TERRITORIO NACIONAL

AMPARO	SUMA ASEGURADA	MONEDA
AMPARO BASICO - DAÑOS MATERIALES MAQUINARIA Y/O EQUIPO	4,625,477,660.00	$
TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO, ERUPCIÓN VOLCANICA, TSUNAMI	4,625,477,660.00	$
INUNDACIÓN, CICLÓN, HURACÁN, TEMPESTAD, VIENTOS, DESBORDAMIE	4,625,477,660.00	$
HMACCP - AMIT	4,625,477,660.00	$
HURTO Y HURTO CALIFICADO	4,625,477,660.00	$
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	5,000,000,000.00	$

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE SEGUN CIRCULAR 034 DE AGOSTO 27 DE 2004 DE LA SUPERBANCARIA.

Los valores asegurados establecidos como limites para los amparos adicionales otorgados en la presente póliza (si los hubiere) forman parte del valor asegurado total establecido para el amparo básico que se considera el límite máximo de responsabilidad de la aseguradora y por lo tanto no se consideran valores asegurados adicionales.

TIPO: SEGURO TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA INCLUYENDO HUELGA, MOTÍN, ASONADA, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR, AMIT, SABOTAJE Y TERRORISMO.

ASEGURADO: HG CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS y/o entidades afiliadas y/o subsidiarias y/o asociados y/o como estén constituidas actualmente y/o como puedan llegar a ser constituidas a futuro y/o como sus respectivos derechos e intereses aparezcan.

PERÍODO: 12 de septiembre de 2022 hasta el 12 de septiembre de 2023.

INTERES ASEGURADO:
Se ampara la Maquinaria y Equipo de propiedad de los asegurados, incluyendo aquellas sobre las cuales tenga algún interés asegurable (Propiedad de terceros o empresas consorciadas) y cuyo valor se encuentre incluido en el valor asegurable expresamente mediante la relación de equipos suministrada a la aseguradora.
Nota: Se acepta asegurar la maquinaria en dólares, siempre y cuando el valor asegurado se establezca igualmente en esta moneda. La indemnización se hará con TRM de la fecha de ocurrencia del siniestro.

VALOR ASEGURADO: COP4.625.477.660 según relación adjunta

BASE DE VALORIZACION: Valor Reposición

AMBITO TERRITORIAL: Republica de Colombia

CONDICIONES
ORIGINALES:
" Equipo y Maquinaria según clausulado: Munich Re
" Responsabilidad Civil Extracontractual
" Cláusula de exclusión de contaminación radioactiva, química, biológica, bioquímica y armas electromagnéticas del instituto CL 370.
" Cláusula de exclusión de ataque cibernético del instituto CL 380.
" Cláusula de limitación de sanción y exclusión LMA 3100
" Excluyendo pérdida y/o daño al equipo mientras está desatendido a menos que esté protegido y almacenado en un recinto seguro.
" Excluyendo pérdida y/o daño al equipo mientras está operando bajo tierra a menos que sea traído a la superficie por el asegurado bajo su propio costo, después del agotamiento de cualquier cobertura pre acordada según lo dispuesto en el presente documento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA

VERSION CLAUSULADO 12-03-2021-1317-P-12-PPSUS14R00000005-D00I

No. PÓLIZA	B-400002026	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	22180912	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2022	24:00 Horas Del	12/09/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEDUCIBLES: (TODA Y CADA PERDIDA)

" Huelga, Motín, Asonada, Conmoción Civil o Popular: 10% del valor de la pérdida, mínimo USD$2.500 toda y cada perdida
" Hurto y Hurto Calificado: 10% del valor de la pérdida, mínimo USD$2.500 toda y cada perdida.
" Riesgos catastróficos y eventos de la naturaleza, terremoto, temblor, erupción volcánica:10% del valor de la pérdida, mínimo USD$2.500 toda y cada perdida
" Rotura de Maquinaria: 10% del valor de la pérdida, mínimo USD$5.000 toda y cada perdida
" Otros eventos amparados: 10% del valor de la pérdida, mínimo USD$2.500
" Responsabilidad Civil Extracontractual: 10% de la pérdida, mínimo USD$1.500 toda y cada pérdida.
" ICOW (Incremento En Costos de Operación) 5 días
" Equipos y operaciones bajo tierra: 15% de la perdida minimo USD$15.000
" AMIT, Sabotaje y Terrorismo: 10% de la perdida minimo USD$5.000
" Equipos con valor menor a USD$100.000: 10% de la perdida minimo USD$1.500 toda y cada perdida.

CONDICIONES
ADICIONALES:
1. Básico de todo riesgo por daño material físico proveniente de cualquier causa accidental externa, incluyendo, pero no limitada a Incendio y/o Rayo, Explosión, caída de aeronaves, hundimiento del terreno, deslizamiento de tierras, derrumbes, caída de rocas, volcamiento, choque, colisión, impericia, negligencia, montaje, desmontaje (estos dos últimos que estén trabajando sobre tierra) entre otros
2. Hurto y Hurto calificado.
3. Huelga, motín, asonada, conmoción civil o popular al 100%
4. Actos mal intencionados de terceros (AMIT), sabotaje y terrorismo al 100%
5. Terremoto, temblor y/o erupción volcánica y otra convulsión de la naturaleza tales como Tifón, ciclón, huracán, maremoto, tsunami, tornado, fuego subterráneo entre otros.
6. Daños por agua, anegación, avalancha e inundación.

7. Responsabilidad Civil Extracontractual como consecuencia de daños causados a terceros por la maquinaria asegurada bajo la presente póliza limitada a COP$5.000.000.000 por evento y en el agregado anual.
8. Daños ocasionados a Maquinaria y Equipo Asegurados causados por vehículos con licencia de tránsito.
9. Gastos de traslado del equipo siniestrado a su sitio de reparación hasta COP50.000.000 por evento y COP100.000.000 vigencia, incluyendo los gastos de protección, conservación, vigilancia y salva guardia del equipo siniestrado. Estos gastos deben ser consultados previamente a la compañía de seguros para su aprobación y autorización. Esta cobertura será adicional al costo total de la reparación y aplica solo para pérdidas parciales.
10. Cobertura para Equipos utilizados bajo tierra y/o para todas las obras y proyectos que realice el asegurado y/o sus empresas consorciadas.
11. Se incluye la cobertura de pérdida de contenidos para y de los bienes asegurados como tanques y otros medios de almacenamiento, hasta un límite de COP40.000.000 por evento y vigencia.
12. Tándem Lifting (levantamiento de carga compartida).
13. Cobertura de daños para bienes izados
14. Actividades bajo tierra USD$1.000.000 por evento y en el agregado.
15. Cobertura para equipos trabajando sobre planchón o en ríos o depósitos de aguas; (Aumento del 25% en la tasa para equipos con operaciones sobre el agua durante el período que duren los trabajos. O desde inicio de vigencia, para los equipos que trabajen en equipo flotante en todo momento.
Adicionalmente, aumentaría los deducibles 10% con un mínimo USD 5.000 toda y cada una de las pérdidas
Las condiciones operacionales son que no debe haber ningún equipo desatendido en ningún momento.
Asimismo, deben existir procedimientos de evacuación establecidos para prever el retorno inmediato y rápido del equipo a la orilla o muelle en caso de vientos fuertes o condiciones climáticas extremas.)
16. Descuento del 50% en la tarifa para equipos inactivos, con inactividad mínima de 30 días y reporte trimestral para el ajuste
17. Gastos de búsqueda y recuperación de la maquinaria sublímite USD$75.000 por evento y USD$250.000 en el agregado.
18. Cláusula de devolución del 4% de las primas para la realización del avalúo por parte de la firma especializada Incoajustes de Colombia que pertenece a la Sociedad Colombiana de Avaluadores.
19. Aceptación de diferencia del 155 entre el valor asegurado y el valor del avalúo
20. Plazo para el avalúo 90 días.
21. En caso de incremento durante la vigencia de la suma asegurada el máximo límite de responsabilidad por el asegurador para AMIT, Sabotaje y terrorismo es USD1.500.000 por evento y USD3.000.000 en el agregado.

Amparos Adicionales:
Amparo automático de nuevos equipos hasta: COP 2.000.000.000 y 30 días para el aviso
Gastos adicionales por flete aéreo: COP 600.000.000 Evento y Vigencia
Remoción de escombros COP1.500.000.000 evento y vigencia
Traslado Temporal de bienes hasta COP 600.000.000 y plazo 30 días

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA

VERSION CLAUSULADO 12-03-2021-1317-P-12-PPSUS14R00000005-D00I

No. PÓLIZA	B-400002026	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	22180912	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2022	24:00 Horas Del	12/09/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

Gastos adicionales por horas extras, trabajos nocturnos o en días festivos
y flete expreso COP 600.000.000 evento y vigencia
Honorarios profesionales COP 500.000.000 evento, agregado anual
Gastos de extinción COP 350.000.000 evento, agregado anual
Cobertura de tránsito o movilizaciones a nivel nacional con 20 minutos de descanso de confort cada 150km (sin previo aviso) para maquinaria solamente en camabaja (o en camión si se trata de maquinaria liviana) en todo el territorio nacional con un límite de COP 2.000.000.000 por camión o en caso de caravanas. Entendiéndose por caravanas convoy de dos o más vehículos despachados por el asegurado y que se movilizan uno detrás de otro. Este límite no aplica cuando el equipo sea transportado como equipo sobredimensionado y se cumpla con toda la normatividad vigente al respecto en cuyo caso, no habrá necesidad de reportar la movilización ni solicitar previamente la autorización a la aseguradora.

Por sus propios medios se acepta la movilización de maquinaria en un radio no superior a 100 km del lugar donde esté operando la maquinaria y/o por fuera del perímetro de la obra o proyecto donde se encuentre.

Nota: Queda claro y convenido que la presente póliza se extiende a amparar todas las movilizaciones de la maquinaria asegurada a partir del momento en que los equipos se encuentren en las instalaciones del asegurado, puertos y aeropuertos, en instalaciones de terceros, sitios donde el asegurado los tenga almacenados y/o parqueaderos o desde y hasta las obras donde trabajarán tales equipos. Es decir, desde el mismo momento que los equipos se encuentren por cuenta y riesgo del tomador de la póliza.

Para el caso de los puertos y aeropuertos, la cobertura opera y se inicia desde el mismo momento en que los bienes queden por cuenta y riesgo del tomador y/o de los asegurados según los términos Incoterm de compra - venta y siempre que tales bienes o equipos no estén amparados en otra póliza / cobertura (transporte - permanencia, etc.) por parte del proveedor, del leasing o de los mismos asegurados Gastos para la preservación de los bienes.

CLAUSULAS
ADICIONALES:
1. Revocación de la póliza a 60 días, excepto AMIT, HMACC 10 días.
2. Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro con cobro de prima, excepto para AMIT, HMACC y Responsabilidad civil.
3. Ampliación del aviso de siniestro a 10 días, excepto AMIT, HMACC a 3 días.
4. Primer derecho sobre el salvamento para el asegurado.
5. Designación de bienes.
6. Anticipos de Indemnización del 50%, una vez haya sido demostrada la ocurrencia y la cuantía de la pérdida y esta haya sido declarada y aceptada por el asegurador.
7. Arbitramento.
8. Cláusula de exclusión de datos electrónicos (CYBER CLAUSE EXCLUSION). Según CL 380
9. No aplicación de infraseguro para las maquinas que cuentan con avalúo, para las maquinas incluidas dentro de la vigencia y que por ende no cuentan con avalúo se renunciará al infraseguro solamente si se recibe factura de compra (cuyo valor debe ser el mismo del valor asegurado reportado en la póliza) y/o avalúo realizado por Leasing (cuyo valor debe ser el mismo del valor asegurado reportado en la póliza).
10. Cláusula de Rotura Interna. Según Munich Re endoso.
11. Cobertura para actos de Autoridad
12. Labores y Materiales
13. Conocimiento del riesgo
14. Las cláusulas de garantía y exclusiones que figuren en la póliza, sólo serán aplicables en aquellos siniestros que tengan una relación directa de causalidad con el evento a reclamar.
15. Se amparan las pérdidas o daños materiales que sufran las calderas u otros aparatos generadores de vapor que hagan parte de los equipos asegurados como consecuencia de falta de agua, implosión, explosión química de gases impropiamente quemados en la cámara de combustión de calderas, explosión física siempre y cuando se origine en la máquina misma. Queda expresamente declarado y convenido que la cobertura otorgada por estos equipos se realiza en virtud de la garantía dada por el Asegurado que, durante su vigencia, cumplirá las siguientes obligaciones, así mismo quedan amparados los daños que se causen a los demás equipos y bienes asegurados, que se originen en o por los daños en las calderas u otros aparatos generadores de vapor:

a. Revisar y en caso necesario reacondicionar completamente tanto las partes mecánicas como las eléctricas que formen parte de las calderas o aparatos generadores de vapor.

Esta revisión se llevará a cabo en estado totalmente descubierto de la máquina y tendrá lugar por lo menos una vez al año.

Dicha revisión deberá ser interna y externa y para demostrar la revisión bastará con la firma de un ingeniero calificado para tal efecto, en la planilla de mantenimiento.

Si se requiere un período mayor de un año entre una revisión y otra, el Asegurado debe solicitarlo por escrito a la Compañía, en cuyo caso ésta comunicará por escrito al Asegurado la autorización correspondiente o su decisión de dar por terminado el amparo.

b. Informar a la Compañía con diez (10) días hábiles de anticipación, la fecha en que se inicie la revisión, para que ésta pueda

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

No. PÓLIZA	B-400002026	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	22180912	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2022	24:00 Horas Del	12/09/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

enviar un representante; los gastos ocasionados por el representante de la Compañía serán a cargo de la misma.

NOTA: El incumplimiento a este(os) compromiso(s) o garantía(s) dará lugar a las Sanciones que establece el Artículo 1.061 del Código de Comercio

16. Cobertura para Obligaciones Financieras

Cuando un bien asegurado bajo la presente póliza tenga contrato de Leasing o crédito Financiero y sufra daños y/o pérdidas materiales por un evento amparado y contratado en esta póliza, la Aseguradora indemnizará al asegurado por el canon del Leasing o cuota Financiero(a) sobre el bien asegurado en virtud de cualquier contrato de leasing o crédito financiero, así:

Para efectos de esta cláusula la suma máxima que la Aseguradora indemnizará por este amparo adicional nunca será superior al 3% del valor asegurado del bien afectado por el siniestro o el 100% del valor del canon o cuota mensual, el que resulte menor, con un máximo de COP 80.000.000, durante la vigencia para toda la póliza. Solo se reconocerán dos (2) canon o cuotas por evento.

" La suma a indemnizar por este amparo adicional se basa en el valor de la cuota mensual (canon de arrendamiento) de acuerdo con el valor del contrato de leasing o del crédito financiero.
" Será indemnizable solo una vez por vigencia y por equipo y hasta el límite máximo por póliza de COP50.000.000 por Equipo y hasta $100.000.000 por vigencia.
" La entidad financiera (leasing) deberá certificar el valor de la cuota mensual del activo que se vio afectado por el siniestro.
" El límite máximo de indemnización para esta cobertura es de $100.000.000 durante la vigencia para toda la póliza de Maquinaria y Equipo del asegurado.

17. Con el fin de disminuir el impacto de los siniestros y de las pérdidas, se conviene en autorizar al asegurado a negociar directamente con los proveedores autorizados de los repuestos, los costos de los mismos, bajo los convenios y/o acuerdos que tengan establecidos con estos y siempre y cuando, resulten inferiores a los otorgados directamente a la Compañía. En todo caso, la aseguradora realizará el pago directamente a quien suministre los repuestos.

Igualmente, y con el ánimo de minimizar los costos de reparación de Mano de Obra y de traslado de los equipos, se conviene en autorizar al asegurado a realizar las reparaciones de los vehículos asegurados, siempre y cuando cuente con los recursos e infraestructura para garantizar una adecuada reparación y un buen estado final del vehículo siniestrado. El costo de la MO, la compañía se lo indemnizará directamente al asegurado, siempre y cuando este resulte igual o inferior al costo promedio cobrado por los talleres autorizados por la Aseguradora.

18. Cláusula de Rotura de Maquinaria: Se amparan, sujetos a los términos, cláusulas y condiciones de la presente póliza, la maquinaria especificada contra alguno de los daños materiales y directos causados por:

Daños directos de energía eléctrica como cortocircuito, arcos voltaicos y otros efectos similares, causados por la caída de un rayo.
Fallo en los dispositivos de regulación
Daños consecuenciales.

Elementos no asegurados:

" Correas
" Bandas de toda clase
" Cables
" Neumáticos
" Matrices
" Troqueles
" Rodillos
" Objeto de vidrio
" Esmaltes
" Filtros
" Coladores
" Cimentadores
" Refractarios
" Quemadores
" Rodamientos
" Amortiguadores

" Se excluyen los siguientes eventos:

" Falta de mantenimiento de los equipos
" Defectos o vicios existentes al contratar el seguro
" Mantenimiento en servicio de un objeto asegurado

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA

VERSION CLAUSULADO 12-03-2021-1317-P-12-PPSUS14R00000005-D00I

No. PÓLIZA	B-400002026	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	22180912	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2022	24:00 Horas Del	12/09/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

" Pérdidas indirectas de cualquier clase, como falta de alquiler o uso, suspensión o paralización del trabajo, incumplimiento o recesión de contratos, multas contractuales, y en general cualquier perjuicio.
" Experimentos, ensayos o pruebas
" Errores de diseño y fabricación
" Prototipos

Para esta cobertura se otorga un sublímite de 15% del valor del bien afectado, hasta USD 200.0000 Evento / USD 500.000 agregado anual.

La Indemnización a valor de reposición o reemplazo para pérdidas totales que afecten la cobertura de rotura de maquinaria para equipos con edad inferior a tres (3) años de uso al momento del reemplazo, hasta el 30% del valor del bien afectado.

19. Incremento en costos de operación hasta USD 50.000 por evento y USD 500.000 por vigencia en caso de una pérdida cubierta bajo la presente póliza.

20. Cobertura de AMIT y Terrorismo

21. CLÁUSULA DE AMPARO AUTOMÁTICO PARA EQUIPOS EN ALQUILER Y DE PROPIEDAD DE TERCEROS (MAQUINARIA Y EQUIPO):

¢ La presente póliza amparará de forma automática todos aquellos equipos livianos y pesados (Maquinaria Amarilla y Estática), que sean de propiedad de terceros en general, y por lo cuales sea legal o comercialmente responsable el asegurado, que le hubieren sido entregados en carácter de alquiler, préstamo, demostración, comodato. Límite US$1.000.000

El presente amparo automático se otorga por un periodo de dos (2) meses, a partir del momento (fecha) en que el asegurado hubiere recibido o debido recibir el equipo del tercero propietario, y se rige bajo las siguientes condiciones y consideraciones:

a. Para los equipos de propiedad de terceros, la póliza aplica y opera en igualdad de condiciones y términos que para los equipos propios.
b. La presente cobertura se otorga independientemente a que el equipo fuere operado y/o manejado por un funcionario del asegurado o del tercero propietario.
c. El asegurado se obliga a reportar a la Compañía cada dos meses, mediante una planilla, la información de los equipos que recibió y utilizó bajo cualquiera de las mencionadas figuras, durante los dos meses anteriores a la fecha del reporte, informando: Datos completos del Equipo - Valor Comercial - Propietario - Fecha de Recibo - Fecha de Entrega - Prima a Prorrata de acuerdo al tiempo de utilización del equipo.
d. La Compañía realizará solo un documento de cobro o anexo para cada planilla de reporte bimensual.
e. Queda claro y convenido que en caso de que el tercero propietario tenga contratado un seguro para el equipo afectado, este no anulará la presente cobertura, ni se aplicará la coexistencia de seguros y en tal sentido, el siniestro y la reclamación podrá ser atendida, bien de forma directa por el propietario del equipo, o bien, vía subrogación del otro asegurador.

22. Otras Condiciones particulares:
" La cobertura de movilización y/o transporte de los equipos y bienes asegurados en la presente póliza, opera de forma automática y no tendrá que darse aviso previo a la compañía.
" Se establece Bogotá como la ciudad donde tendrá lugar y aplicabilidad la cláusula de Arbitramiento.
" La póliza se extiende a amparar e incluye las siguientes coberturas adicionales:
" Gastos de Defensa sublímite de COP 50.000.000 evento / vigencia
" Gastos de Viaje y estadía sublímite de COP 50.000.000 evento / vigencia
" Gastos agilización trámites y documentos sublímite de COP 50.000.000 evento / vigencia
" Costo de recuperación de equipos con Daños sublímite de USD 500.000 evento / vigencia
" Costo de recuperación de equipos sin Daños sublímite de USD 500.000 evento / vigencia
" Se incrementa el límite asegurado para Remoción de Escombros a USD1.000.000.

23. Cláusula para Combustibles: Por medio de esta se amparan los daños y/o pérdidas sufridas por el asegurado a consecuencia de alguno de los eventos amparados en la póliza para combustibles contenidos en los equipos amparados y/o tanques en predios del asegurado.
Los líquidos y/o combustibles objeto de esta cláusula son:
Líquidos hidráulicos.
Refrigerantes.
Líquidos de frenos.
Combustibles.
Esta cobertura tiene un límite de COP 5.000.000 evento / COP 10.000.000 Agregado anual.
Deducible: 8% del valor de la pérdida.

Para base de valoración a Reposición, las indemnizaciones son calculadas a valor reposición - tabla de demérito.

Edad en Años % De Demérito
(depreciación)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA

VERSION CLAUSULADO 12-03-2021-1317-P-12-PPSUS14R00000005-D00I

No. PÓLIZA	B-400002026	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	22180912	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2022	24:00 Horas Del	12/09/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

De 0 a 2 0%
De 2 a 5 10%
De 5 a 8 15%
De 8 a 10 25%
De 10 a 20 35%
Mas de 20 50%

EXCLUSIONES:
o Lucro cesante.
o Rc Profesional.
o Perdida financiera pura.
o Asbestos

COBERTURA ESPECIAL PARA EQUIPOS BAJO TIERRA:

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidas en la póliza o en ella endosados, la presente póliza indemnizará al asegurado toda pérdida de o daños a los bienes (según relación que se adjunta) debido a avenidas, inundaciones, corrimiento de tierra o caída de rocas, hundimiento o asentamiento, hundimiento de minas, galerías, túneles y similares.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA, QUIMICA, BIOLOGICA, BIOQUIMICA Y ARMAS ELECTROMAGNETICAS DEL INSTITUTO
(Traducción libre, siempre prevalecerá el texto original en inglés)

Esta cláusula prevalecerá y estará por encima de cualquier cosa contenida en este seguro

1. En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto, directa o indirectamente causado por, o contribuido por, o a consecuencia de

I. radiaciones iónicas de o contaminación por radioactividad de cualquier combustible nuclear o por cualquier desperdicio o por la combustión de combustible nuclear

II. la radioactividad, toxicidad, explosión u otras propiedades azarosas o contaminantes de cualquier instalación o reactor nuclear, u otro montaje o componente nuclear de esto.

III. cualquier arma o aparato que emplee fisión y/o fusión atómica o nuclear u otra reacción similar o fuerza o contenido radioactivo.

IV. la radioactividad, toxicidad, explosividad u otras propiedades azarosas o contaminantes de cualquier contenido radioactivo. La exclusión en esta sub-cláusula no se extiende a isótopos radioactivos, diferentes a combustible nuclear, cuando dichos isótopos estén siendo preparados, transportados, almacenados, o usados para propósitos comerciales, agrícolas, médicos, científicos u otros propósitos pacíficos.

V. cualquier arma química, biológica, bioquímica o electromagnética.

CL 370
10/11/2003.

GARANTIA DE PAGO
DE PRIMA: 30 días a partir del inicio de vigencia.

TASA
BRUTA (100%): 6.92%o por mil sobre el valor total asegurado

ACTIVIDAD: Obras civiles, vías y locaciones
.
SINIESTRALIDAD: CERO últimos 5 años según reportado por el asegurado, incluyendo la vigencia que expira 2021-2022 también de CERO.

La Cotización está sujeta a la siguiente información que se debe proporcionar dentro de los 30 días posteriores de la fecha de inicio.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA

VERSION CLAUSULADO 12-03-2021-1317-P-12-PPSUS14R00000005-D00I

No. PÓLIZA	B-400002026	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	22180912	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2022	24:00 Horas Del	12/09/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

Si la información solicitada no es proporcionada o no es satisfactoria, resultara en la cancelación por parte de los aseguradores de acuerdo con la cláusula de cancelación incluida en el contrato de seguro.

a) Detalles completos de las medidas de seguridad del sitio y su comportamiento, Esto hace referencia a los sitios actuales en los cuales se encuentran operando los equipos.
b) Sistemas de extinción de incendios, Como extintores y/o protecciones de incendio.
c) Detalles completos de la capacitación del operador y la evaluación continua. Se debe informar la capacitación que se da usualmente a los operarios para poder operar los equipos y si se les hace una evaluación continuada sobre su desempeño.
d) Programa general de aptitud física para el trabajo, que incluye pruebas de detección de drogas y alcohol y manejo de la fatiga.
e) Confirmación de que, con respecto a cualquier operación de izado o perforación, se debe realizar una evaluación de riesgos por escrito completa antes del comienzo de la operación.
f) Con respecto a las exposiciones mineras, se proporcionarán detalles completos de los sistemas de gestión del tráfico, incluido el ancho de las vías de arrastre, el mantenimiento realizado en las estructuras civiles, incluido el control del movimiento del terreno.

Términos Generales y Condiciones

Cláusula de cancelación de seguro: como original más 30 días, sin exceder 60 en total. Si no se emite una cláusula de cancelación dentro del original, 30 días para presentar la solicitud.
Cláusula de control de reclamos como se adjunta.

Las siguientes garantías aplican:

1) Toda la maquinaria y equipo es operada y se le efectúa mantenimiento de acuerdo con los requerimientos del fabricante.
2) Todas las grúas deben contar con alarmas operacionales de sobrepeso e indicadores de velocidad de vientos. Si los equipos no cuentan con estos dispositivos se deben hacer las mediciones en forma manual con los instrumentos que cuente el asegurado para hacer estas mediciones.
3) Todos los operarios de la maquinaria asegurada deben tener licencias para operar estas máquinas de acuerdo con los requerimientos estatutarios locales
4) En áreas donde no haya requerimientos estatutarios locales, el operario deberá haber terminado todos los cursos de entrenamiento del asegurado y en todos los casos tendrá suficiente practica y experiencia
5) Con relación a compañías de alquiler o Leasing, el robo por el arrendador o inquilino está excluido
6) Se señala y se acuerda que es una condición precedente a la responsabilidad de que los asegurados, sus representantes, sus empleados permanentes, temporales o contratados o cualquier persona o personas que actúen en una capacidad que pueda permitirles ser considerados, como tales, deben cumplir sin excepción lo siguiente:
Todas las normas, reglamentos, recomendaciones, salvaguardias, criterios de adhesión medidas, y/o precauciones de seguridad relativas a la capacitación y a al operación, la puesta en marcha y/o el desmantelamiento, el tránsito y/o el movimiento en el lugar que hayan sido emitidos, impresos o comunicados en cualquier formato, pertenecientes a cualquier planta, equipo y/o grúa, propiedad, arrendada, contratada o usada y asegurada bajo esta póliza, de cualquiera de los siguientes organismos:-
Los mismos se aseguró
Criterios de membresía de la asociación profesional
El ejecutivo de salud y seguridad
Autoridades locales o nacionales
El fabricante (s) de plantas, equipos o grúas y/o el distribuidor (es) de la ley local
Códigos de práctica de la industria
7) Condición de equipos con edad superior a 25 años no se otorga cobertura, dentro del listado actualizado existe un equipo año 1990.

Exclusiones:
7) Renovación tacita o disposiciones para la asignación de esta.
8) Abandono absolutamente como ocurra o donde ocurra
11) NMA 2802 Clausula de Reconocimiento de fecha electrónica
12) NMA464 Exclusión de Guerra y Guerra Civil
13) NMA 1975(a) Cláusula de exclusión Nuclear
14) NMA 1685 C Cláusula de exclusión filtración y Polución
15) NMA 1270 Clausula de Contaminación radioactiva
16)JC2010/014 Cláusula de exclusión por limitación y sanción
17) CL380 Cláusula de exclusión de ataque cibernético
18) Cláusula de Exclusión de Enfermedades Transmisibles LMA 5393
Rotura de maquinaria

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA

VERSION CLAUSULADO 12-03-2021-1317-P-12-PPSUS14R00000005-D00I

No. PÓLIZA	B-400002026	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	22180912	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2022	24:00 Horas Del	12/09/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

Rotura de maquinaria significará:
pérdida o daño físico repentino e imprevisto que cause la ruptura o la quema de cualquier parte de un artículo asegurado que requiera reparación o reemplazo antes de que el trabajo normal pueda reanudarse, incluido, entre otros, el daño resultante de
(a) defectos en el diseño del material, construcción, montaje o ensamble
(b) Accidentes de trabajo fortuitos como vibraciones, desajuste, el aflojamiento de partes moleculares, fatiga, fuerza centrífuga, tensiones anormales, falta de lubricación o golpe de ariete sobrecalentamiento local, defectos eléctricos o mecánicos electrónicos o falla de los dispositivos de protección
(c) la presión eléctrica excesiva por cualquier causa de falla de cortocircuitos de aislamiento abierto circuitos o arcos o los efectos de la electricidad estática
(d) destrucción o daño causado por la explosión debido a la fuerza del vapor interno o la presión del fluido,
en cualquier caso, causando el paro repentino de la maquinaria asegurada.

El asegurador no será responsable de:
1. El costo de hacer buen desgaste y deterioro gradual, oxidación, moho, erosión, corrosión u oxidación, podredumbre húmeda o seca, contracción, evaporación, pérdida de peso, humedad, sequedad, desgaste, arañazos, insectos o parásitos a menos que sea causado por daños que de otra manera están asegurados por esta Póliza.
2. Pérdida o daño a las cimentaciones chimeneas de ladrillo y mampostería intercambiables o piezas de repuesto o accesorios como unidades flexibles o herramientas utilizadas para cortar la perforación pulir esmerilar o propósitos similares patrones de moldes pulverizando y triturando mallas en superficies y tamices cilindros grabados refractarios revestimientos cuerdas cinturones cadenas elevador y cintas transportadoras baterías neumáticos que conectan alambres y cables flexibles de unión y material de embalaje y todas las demás partes no metálicas (excepto el aislamiento de conductores eléctricos) filtros de combustible rellenos medios refrigerantes lubricantes catalizadores químicos u otros medios operativos, pero esta exclusión no se aplicará a cualquier pérdida o daño que resulte de una pérdida asegurada
3. pérdida o daño a la planta como resultado de experimentos o sobrecarga o pruebas similares que requieran la imposición de condiciones anormales (distintas de la sobrecarga o pruebas similares llevadas a cabo con la aprobación del fabricante o por las reglas normales de buenas prácticas operacionales), pero esta exclusión no se aplicará a ninguna pérdida, destrucción o daño resultante de una causa subsiguiente que no esté excluida de otra manera.
La verificación del correcto funcionamiento de la planta no se considerará como prueba o experimentación,
4. pérdida o daño de cualquier elemento de la planta, el equipo o la maquinaria causado por o derivado de modificaciones a ese artículo más allá de las especificaciones establecidas por su fabricante
5. Pérdida o daño por los cuales un proveedor, fabricante, contratista o reparador es responsable en la medida en que el Asegurado pueda recuperar dicha parte por ley o bajo contrato.
6. (a) trabajos de mantenimiento o servicio en general
a. mano de obra defectuosa o mala que ocurra durante la ejecución de las reparaciones
b. pérdida o daño directamente debido a cualquier falla o defecto en la maquinaria conocida por el asegurado antes del inicio y no divulgado a los aseguradores
C. pérdida o daño causado por o proveniente de la aplicación directa de herramientas durante el trabajo de reparación o mantenimiento o la acción de fluidos líquidos o gaseosos que se escapen de la maquinaria
7. Pérdida o daño causado por o que surja del incumplimiento por parte del Asegurado de una retirada de fábrica, equipo o maquinaria por parte de su fabricante o proveedor o los requisitos de mantenimiento especificados por el fabricante o proveedor para ese artículo.
8. Menor rendimiento o eficiencia de la maquinaria asegurada
9. Pérdida o daño causado o derivado de una falla de cualquier sistema de telecomunicaciones directa o indirectamente debido a:
a) un acto deliberado por parte del Asegurado de su poder para retener o restringir el funcionamiento del sistema
b) la incapacidad del asegurado para operar o mantener el sistema debido a la acción

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de seguridad: vJ5kSO/hwghDe4FRaJ3pUg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: (601)2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA

VERSIÓN CLAUSULADO 12-03-2021-1317-P-12-PPSUS14R00000005-D001

No. PÓLIZA	B-400002026	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	22180916	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2022	24:00 Horas Del	12/09/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	HG CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	No. DOC. IDENTIDAD	846.000.560-2
DIRECCIÓN	CR 8 CL 1 41 BRR SIMON BOLIVAR	TELÉFONO	4290170
ASEGURADO	HG CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	No. DOC. IDENTIDAD	846.000.560-2
DIRECCIÓN	CARRERA 8 A 1 - 41	TELÉFONO	4290170
BENEFICIARIO	HG CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	No. DOC. IDENTIDAD	846.000.560-2
DIRECCIÓN	CARRERA 8 A 1 - 41	TELÉFONO	4290170

OBJETO DE CONTRATO

MODALIDAD DE ASEGURAMIENTO : VALOR REPOSICION

Riesgo : 1

VIGENCIA (DESDE) VIGENCIA (HASTA)

12/09/2022 12/09/2023

ACTIVIDAD: OBRAS CIVILES
TIPO MAQUINARIA : SEGUN RELACION

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LARIETH SALAZAR CORONADO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/09/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **(601) 327 4712 - (601) 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA

VERSION CLAUSULADO 12-03-2021-1317-P-12-PPSUS14R00000005-D00I

No. PÓLIZA	B-400002026	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	22180916	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2022	24:00 Horas Del	12/09/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

MARCA : .
MODELO :
PLACA : .
LINEA : .
COLOR : .
MOTOR : .
SERIE : .
UBICACION : PUTUMAYO MOCOA TODO EL TERRITORIO NACIONAL

AMPARO	SUMA ASEGURADA	MONEDA
AMPARO BASICO - DAÑOS MATERIALES MAQUINARIA Y/O EQUIPO	4,625,477,660.00	$
TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO, ERUPCIÓN VOLCANICA, TSUNAMI	4,625,477,660.00	$
INUNDACIÓN, CICLÓN, HURACÁN, TEMPESTAD, VIENTOS, DESBORDAMIE	4,625,477,660.00	$
HMACCP - AMIT	4,625,477,660.00	$
HURTO Y HURTO CALIFICADO	4,625,477,660.00	$
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	5,000,000,000.00	$

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE SEGUN CIRCULAR 034 DE AGOSTO 27 DE 2004 DE LA SUPERBANCARIA.

Los valores asegurados establecidos como limites para los amparos adicionales otorgados en la presente póliza (si los hubiere) forman parte del valor asegurado total establecido para el amparo básico que se considera el límite máximo de responsabilidad de la aseguradora y por lo tanto no se consideran valores asegurados adicionales.

CONTINUACION DE TEXTO

CLAUSULA MUNICH RE 332
AJUSTE DE DEPRECIACIÓN PARA REPARACIONES DE MOTORES DE COMBUSTION
Se acuerda y entiende que, de lo contrario, sujeto a los términos, exclusiones, disposiciones y condiciones que figuran en la Política o respaldados al respecto, se aplicará lo siguiente a este seguro:
En caso de daños en los revestimientos de los cilindros, culatas incluyendo accesorios y pistones, el importe indemnizable por los artículos afectados se depreciará a una tasa anual que se determinará en el momento de la pérdida, esta tasa no será inferior a 10 % por año, pero no más de 60% en total.

Garantía de las disposiciones de elevación en tándem
Por la presente, el Asegurado garantiza que siempre que se realicen operaciones de elevación o descenso en las que se comparta una sola carga entre cualquier grúa y otra grúa o dispositivo de elevación, el Asegurado deberá:
(a) Asegurar que la operación se planifique y supervise completamente.
(b) Asegurarse que las grúas involucradas en la operación tengan idéntica velocidad de elevación y giro;
(c) Asegurar que la carga se comparta equitativamente entre las grúas;
(d) A los efectos de la operación, reducir la capacidad de las grúas en un 25% en toda su gama completa de cargas.
Sujeto de otra manera a los términos, excepciones, condiciones y limitaciones de la Póliza.

RELACION DETALLADA DE LA MAQUINARIA
MAQUINA MARCA REFERENCIA MODELO VR. A REPOSICIÓN S/N
BRAZO HIDRAULICO GRUA CHASIS SXC473 PALFINGER PK54000E 2006 $ 200.000.000 H0546364
BRAZO HIDRAULICO GRUA CHASIS TFX197 PALFINGER PK33000EH 2017 $ 312.000.000 100407792
GRUA HIDRAULICA TELESCOPICA TEREX T775 2007 $ 1.400.000.000 1T91418787W778046
PLATAFORMA ELEVADORA MANLIFT JLG 450 AJ 2012 $ 200.000.000 0300161695
PLATAFORMA ELEVADORA MANLIFT JLG 600AJ 2012 $ 340.000.000 0300161425
RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J 2012 $ 225.000.000 1T0310JXLBD215479
EXCAVADORA CATERPILLAR 313D 2017 $ 455.000.000 CAT0313DVRDE10063
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2011 $ 400.000.000 CAT0120KCSZN00745
VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CS433E 2015 $ 300.000.000 CATCS433TMC200107
VIBROCOMPACTADOR LIUJONG CLG612H 2008 $ 220.000.000 Y044274
MINICARGADOR CATERPILLAR 236D3 2020 $ 151.492.950 F9C00673

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA

VERSION CLAUSULADO 12-03-2021-1317-P-12-PPSUS14R00000005-D00I

No. PÓLIZA	B-400002026	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	22180916	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2022	24:00 Horas Del	12/09/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BRAZO DE EXCAVACION CATERPILLAR BH150 2020 $ 91.334.880 KEP02205
MARTILLO HIDRAULICO CATERPILLAR B6 2020 $ 43.911.000 HA604246
MINICARGADOR CATERPILLAR 236D3 2020 $ 151.492.950 F9C00616
BRAZO DE EXCAVACION CATERPILLAR BH150 2020 $ 91.334.880 KEP02200
MARTILLO HIDRAULICO CATERPILLAR B6 2020 $ 43.911.000 HA0604196
$ 4.625.477.660

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

SITECH Soluciones Avanzadas S.A.S.
NIT. 900.438.551.-2

Avenida de las Americas 42-66 P2
Bogotá, Colombia
Tel: (57).1.344.0109

www.SITECH.com.co

Bogotá, 17/02/2023

Señores

Gecolsa

Bogotá

Referencia: Certificado No. 200F9C06474820150149

Sitech como proveedor autorizado de monitoreo GPS, y para dar cumplimiento del decreto 723, certifica que las siguientes maquinas cuentan con las unidades Satelitales relacionadas a continuación:

Serial Máquina : CAT0236DHF9C00673
Serial GPS : 0-2694748
Marca : CATERPILLAR
Modelo : 236D3

Cordialmente,

Isabel Vásquez.

Isabel Vasquez
Analista de tecnología
SITECH Soluciones Avanzadas S.A.S.

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.019.055.220**

ROJAS OCAMPO

APELLIDOS

JULIÁN ALBERTO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **22-DIC-1990**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-DIC-2008 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

A-1500150-01271176-M-1018056220-20211204 0077196413A 2 9817769153

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1019055220



NOMBRE

JULIAN ALBERTO ROJAS OCAMPO

FECHA DE NACIMIENTO
22-12-1990

SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
01-06-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	01-02-2026	PARTICULAR
B3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO.	01-06-2033	PARTICULAR
C3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO.	01-06-2026	PUBLICO





ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

HOGIER GARTNER 220630/1222

LC02005710333

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL				HASTA LAS 23:59 HORAS DEL			
AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA	
2022	10	24		2022	10	25		2023	10	24	

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
5131100286601	LLP519	TRACTOCAMION	PÚBLICO	8866	2023

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
3	HINO	7 - SRS
	LÍNEA VEHÍCULO: SG1AF7B	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A09CUP20828	9F3SG1AF7PXX10669	9F3SG1AF7PXX10669	36

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BANCOLOMBIA S.A.	3187981728	NT	890903938	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
36547	5131	36547	5131100286601	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$878,400.00	$456,700.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$1,337,200.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

CONSTANCIA DE AFILIACIÓN TRABAJADOR

Colmena Seguros se permite dar constancia que el(la) trabajador(a) mencionado(a) a continuación se encuentra afiliado(a) a esta administradora, bajo los siguientes datos:

NOMBRE:	ROJAS OCAMPO JULIAN ALBERTO
IDENTIFICACIÓN:	CC 1019055220
INICIO VIGENCIA:	03/10/2022
TIPO DE TRABAJADOR:	Dependiente
CARGO:	CONDUCTOR
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE
CLASE:	5
TASA:	6,96


DATOS COTIZANTE

RAZON SOCIAL:	INGETECHO Y CONSTRUCCIONES S A S
CC /NIT:	NI 900586210
CONTRATO:	1068525
SEDE:	OPERATIVO BOGOTA
CENTRO DE TRABAJO:	OPERATIVO BOGOTA
INICIO VIGENCIA:	01/08/2014
ESTADO ACTUAL:	ACTIVO

La presente se expide a los 11 días del mes de octubre del año 2023.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667 gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente.



Gerente de Servicio
Colmena Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Colmena Seguros de Vida S.A. | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 11/10/2023 8:28:28. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

FORMATO		FOS-LYT-003
HOJA DE VIDA - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	ingeductos Marca Registrada	VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 20-ABR-2015

PROYECTO:		UBICACIÓN:	T. NACIONAL
RESPONSABLE DEL EQUIPO:		CARGO:	CONDUCTOR TRACTOCAMIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO O MAQUINARIA:	MULA HINO 500								AÑO DE ADQUISICIÓN		11	2022	
DESCRIPCIÓN:	CABEZOTE HINO PARA ARRASTRAR CAMA BAJA												
CÓDIGO:	CO SG1A0001	PLACA No.	LLP519	SEGURO OBLIGATORIO	No.	5131100286601			LICENCIA DE TRANSITO	No.			
VOLTAJE:	24 v	MARCA:	HINO		VENCE	2023	10	24		De	COTA		
REFERENCIA:	SG1A	MODELO:	2023	CERTIFICADO REVISIÓN TECNICOMECANICA	No.	NA			CERTIFICADO DE CIRCULACION	No.			
TIPO DE CARROCERIA:	SRS	N° DE SERIE:	******		VENCE					VENCE	DD	MM	AA
CAPACIDAD MAXIMA:		POTENCIA:	345 HP	DIMENSIONES					PESO				

CUENTA CON MANUAL:	SI	X	NO		UBICACIÓN DEL MANUAL:	OFICINA INGEDUCTOS FUNZA

FICHA TECNICA



PESOS Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular combinado C2 S1*	27.000 Kg
Peso bruto vehicular combinado C2 S2*	32.000 Kg
Peso bruto vehicular combinado C2 S3*	36.000 Kg
Peso chasis	6.175 Kg
Tanque de combustible	330 Lts
Tanque de AD BLUE	59 Lts
Capacidad del carter (qt)	30
Radio de giro de llanta	6.400 mm

*qt: cuartos, la capacidad del carter incluido filtro.

*Peso bruto vehicular combinado depende del número de ejes del remolque.

CHASIS

Dirección	Hidráulica
Eje delantero	
Tipo de suspensión	Ballestas semielípticas
Amortiguadores	Hidráulicos de doble acción, telescópicos
Eje trasero	
Tipo de suspensión	Ballestas semielípticas
Amortiguadores	Hidráulicos de doble acción, telescópicos

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	24 V
Capacidad del alternador	60 A
Número de baterías	2
Capacidad de las baterías	60 Ah

DIMENSIONES

Longitud total (OL)	5.995 mm
Ancho total (OW)	2.490 mm
Alto total (OH)	2.880 mm

SISTEMA DE FRENOS

Tipo	Aire con ABS

EQUIPAMIENTO

MOTOR

Radio	SI
Kit de herramienta	SI
Llanta de repuesto	SI
Sillas abatibles	SI
Aire acondicionado	SI
Alarma de reversa	SI
Quinta rueda	SI
Dirección	Ajustable a la altura del conductor
Display	SI
Temperatura del refrigerante	SI
Nivel de combustible	SI
Nivel de AD BLUE	SI


Marca	Hino
Tipo	A09C-UP
Desplazamiento	8.866 c.c
Número de cilindros	Seis (6) en línea
Potencia (HP @rpm)	345 @ 1.800
Torque (Kgm @ RPM)	145 @ 1.100
Sistema de Alimentación	Turbo
Sistema de Inyección	Common rail
Norma Ambiental	Euro IV - SCR'
Combustible	Diésel


Tamaño de las ruedas	295/80 R 22,5

Garantía: dos años o 250.000 Kms lo primero que ocurra.


TRANSMISIÓN

Referencia		M009OD
Número de marchas		9
Tipo		Manual
Relaciones	1°	10.178
	2°	6.986
	3°	5.063
	4°	3.636
	5°	2.633
	6°	1.921
	7°	1.392
	8°	1.000
	9°	0.724
Reversa		9.874
Relación final del eje		5.285
Tracción		4x2

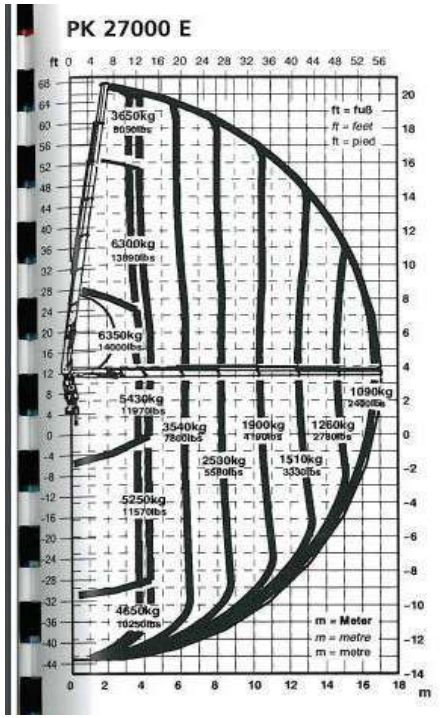

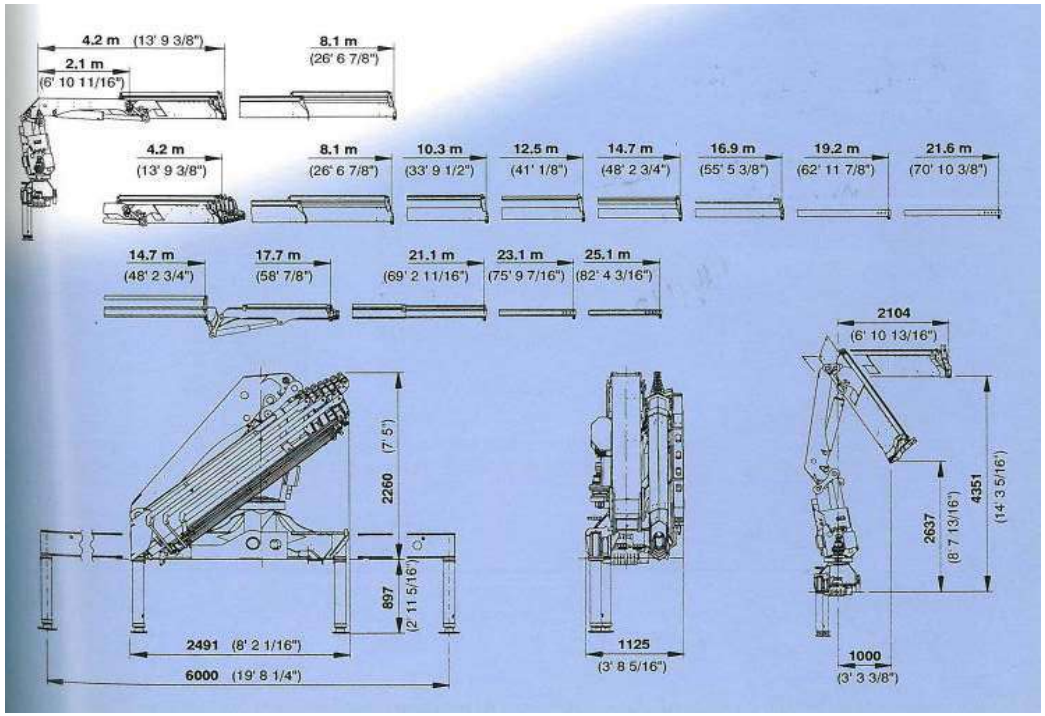

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO

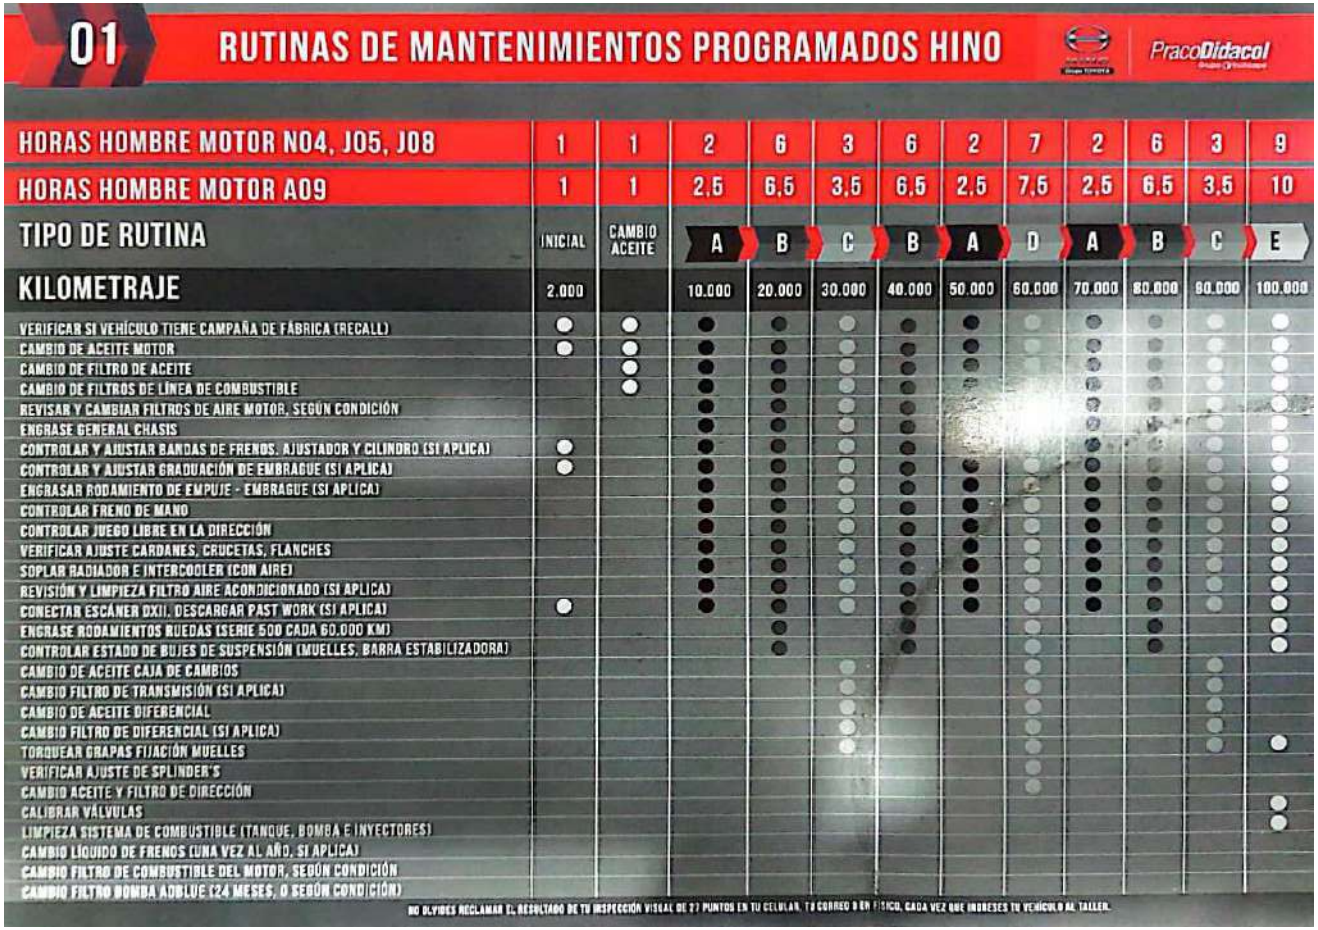

FECHA	HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS			
DD / MM / AA	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
16/02/2023	PENDIENTE ENTREGA TRAILER DIAGNOSTICO PARA SUJETAR LA LINEA HUMEDA			
16/02/2023	REVISION MATRICULA PARA TECNOMECANICA A 2 AÑOS			
16/02/2023	PENDIETE GRUMACOL - ENTREGA BATERIA DE CONTROL BRAZO ARTICULADO			
16/02/2023	PENDIENTE MANIFIESTO IMP. BRAZO			
17/05/2023	COMPRA DE AVISO CARGA LARGA YANCHA		LETRERO $ 95,000	
25/07/2023	SERVICIO DE GRUA DESDE CELTA A DHINO PUENTE GUADA	CARRO BLOQUEADO		YAIR AUGUSTO RAMIREZ VALENCIA
22/08/2023	SERVICIO DE GRUA DESDE EL PEAJE DE LA LINEA TOLIMA A CALLE 80	CARRO BLOQUEADO		)ORA DEL CARRO GRUAS Y TRANSPORT
28/08/2023	FILTROS DE COMBUSTIBLE	CAMBIO DE FILTROS DE PETROLEOS INSUMOS LAVADO PUNTO DE ENGRASE		PRACOLDIDACOL

3/10/2023	UREA AUTOMOTRIZ	APLICACIÓN DE UREA		
6/10/2023	ENTREGA DE KIT DE ASEO	ATIZANTE, RENOVSDOR DE LLANTA ,S ILICONA 1 TOALLA ,ANTIEMPAÑANTE Y BOLS		
CAMABAJA PLACA S64775				
23/09/2022	COMPRA Y FABRICACION SEMIRREMOLQUE	SEMIREMOLQUE TIPO CAMABAJA3 EJES	SEMIREMOLQUE TIPO CAMABAJA3 EJES	INDUSTRIAS MAHERCA SAS
11/04/2023	COMPRA DE LLANTAS PARA EL REMOLQUE	DE 12 LLANTAS PARA EL TRAILER		REINDUSTRIAS SAS
4/09/2023	COMPRA DE UNA LLANTA Y UN RIN PARA EL TRAILER	COMPRA DE LLANTA Y RIN PERDIA EN EL VIAJE DE CALI	COMPRA DE UNA LLANTA Y UN RIN	REINDUSTRIAS SAS
6/09/2023	ESPARRAGO PARA EL TRAILER	COMPRA 1 ESPARRAGO Y MANO DE OBRA	ESPARRAGO	INDUSTRIAS MAHERCA SAS

FECHA DD / MM / AA	OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.

GRUMAS® Grúas & Maniobras Seguras Ltda.

ONAC ACREDITADO

ISO IEC 17020:2012
13-OIN-031

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN
INSPECTION CERTIFICATE

EQUIPO:	TIPO B - GRÚAS DE PLUMA ARTICULADA	**EMPRESA CONTRATANTE:** INGEDUCTOS INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S.
TIPO:	MONTADA SOBRE CAMIÓN COMERCIAL CON CONTROL REMOTO	
MARCA:	PALFINGER	
MODELO:	PK27000	**DIRECCION:**
SERIE:	0812039	CALLE 83 # 16 A - 44
CAPACIDAD MÁXIMA:	12070 kg A 2.2 m DE RADIO	**CIUDAD:** BOGOTA
AÑO DE FABRICACIÓN:	2002	**TELÉFONO:** 7021044 - 3204523926
LOCALIZACIÓN EQUIPO:	Tenjo - Cundinamarca	**CERTIFICADO Nº GR-22378-22**

GRUMAS LTDA certifica que el equipo descrito anteriormente fue inspeccionado y cumplió con los requisitos de inspección, de acuerdo al documento que se menciona a continuación:

Documento sobre el cual se realiza la inspección.

ASME B30.22 – 2016 ARTICULATING BOOM CRANES 22-1.2.1 (b); 22-1.2.2 (c); 22-1.2.3 (b)(2c), (b)(4), (c), 22-1.3.1; 22-1.3.2, 22-1.5.3 (c), 22-1.5.4(a), 22-1.5.6; 22-1.6.1(a), (b), 22-1.6.3, 22-1.7.2, 22-1.8.2.3; 22-1.8.5 (a), (c), 22-1.8.7 (b), 22-2.1.3 (a-d),(g,h), (k,l); 22-2.1.4 (a-d), (f-j), (k,l), (m)(2, 3, 4), (n) (1, 2, 3, 4, 5), (o), (q), 22-2.4.2

Los registros de esta inspección son los informes de referencia **GOPIFO79 , GOPIFO12 [VERIFICACIÓN OPERACIONAL] , GOPIFO71 , OT-39164** de fecha del **2022/12/10** anexos del presente certificado.

Se recomienda inspeccionar antes de **2023/12/09**

Bogotá D.C., Colombia
2022/12/30

Ing. José Narciso Castellanos
Gerente General

- Los resultados/datos y demás información contenida en este certificado y anexos, se refieren al momento y condiciones en que se realizo la inspección, **GRUMAS LTDA** no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo.
- Este registro de aceptación no exime de responsabilidad al propietario / usuario del equipo, de cumplir con los programas de mantenimiento previstos por el fabricante y de reparar cualquier falla o defecto del equipo posterior a este proceso de aceptación.
- Si posterior a este proceso de aceptación el equipo sufre una falla o modificación sustancial que requiera una reparación mayor, el certificado pierde su validez; para recuperar la vigencia, GRUMAS LTDA debe hacer nuevamente el proceso de inspección y pruebas.
- No realizar ninguna alteración al certificado, No utilizar la certificación de manera que pueda dañar la reputación del Organismo de Inspección de Equipos, se pueda considerar engañosa o en forma no autorizada.

Información: certificacion@grumas.com • **Teléfono:** (57+1) 4383425 • **Celular:** 3175739130 • 3112122147
Dirección: Transv. 70 H # 77 a 52 - Bogotá D.C. Colombia





Certificado digital

Valídelo ingresando a www.grumas.com

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) JULIAN ALBERTO ROJAS OCAMPO identificado(a) con CC 1019055220 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	01/08/2018
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	UNION TEMPORAL VIVA BOGOTA - VIVA 1A IPS KENEDY
Categoría:	A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 18 días del mes de septiembre del año 2023.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

ANEXO 3. CERTIFICADO MANEJO DE VERTIMIENTOS

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

CERTIFICACION DE VISITA
(2023/10/04) - Fecha Servidor: (2023/10/04)

Contrato

Contrato: 3086_1
Cliente: WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial
Barrio: GALAN

Activo

Sticker: 085.255
Nombre Activo: USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		**Auxiliar 1**	
Jhonatan Ricardo Fontecha Villarreal		Melvin Mantilla Roa	
1096212725		1096196276	

Resumen

Hora: 08:05:33

Encuesta

CERTIFICACION

FOTO CERTIFICACION VISITA



NOMBRE QUIEN RECIBE
Sandra Santiago

CARGO QUIEN RECIBE
hse

FIRMA CLIENTE



UBICACIÓN



7.06407862, -73.85059106

CERTIFICACION DE VISITA

Ok Equipo funcionando

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

CERTIFICACION DE VISITA
(2023/09/26) - Fecha Servidor: (2023/09/26)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 085.255 **Nombre Activo:** USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehiculo

CAMION FRR TAR396	TAR396

Operadores

Conductor		**Auxiliar 1**	
Jhon Jairo Moya Suarez		Yolby Alexander Tellez Rincón	
91446417		1096210869	

Resumen

Hora: 14:23:21

Encuesta

CERTIFICACION

FOTO CERTIFICACION VISITA



NOMBRE QUIEN RECIBE

Sandra Santiago

CARGO QUIEN RECIBE
Hse

FIRMA CLIENTE



UBICACIÓN
No hay datos gps para mostrar información de ubicación

CERTIFICACION DE VISITA

Ok Equipo funcionando

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

CERTIFICACION DE VISITA
(2023/09/08) - Fecha Servidor: (2023/09/08)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehiculo

CAMION NPR TAR684	TAR684

Operadores

Conductor	
Jhon Jairo Arango Matta	
91445133	

Resumen

Hora: 14:28:51

Encuesta

CERTIFICACION

FOTO CERTIFICACION VISITA



NOMBRE QUIEN RECIBE
César Narváez

CARGO QUIEN RECIBE
ingeniero recidente

FIRMA CLIENTE



UBICACIÓN



7.06410281, -73.85064895

CERTIFICACION DE VISITA

Ok Equipo funcionando

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

CERTIFICACION DE VISITA
(2023/09/12) - Fecha Servidor: (2023/09/12)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMION FRR TAR396	TAR396

Operadores

Conductor		Auxiliar 1		Auxiliar 2	
Jhon Jairo Moya Suarez		Danilo Rodelo Ricardo		Yolby Alexander Tellez Rincón	
91446417		9043781		1096210869	

Resumen

Hora: 13:55:05

Encuesta

CERTIFICACION

FOTO CERTIFICACION VISITA



NOMBRE QUIEN RECIBE

Sandra Santiago

CARGO QUIEN RECIBE
Hse

FIRMA CLIENTE



UBICACIÓN
No hay datos gps para mostrar información de ubicación

CERTIFICACION DE VISITA

Ok Equipo funcionando

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

CERTIFICACION DE VISITA
(2023/09/14) - Fecha Servidor: (2023/09/14)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		**Auxiliar 1**	
Jhonatan Ricardo Fontecha Villarreal		Melvin Mantilla Roa	
1096212725		1096196276	

Resumen

Hora: 11:19:21

Encuesta

CERTIFICACION

FOTO CERTIFICACION VISITA



NOMBRE QUIEN RECIBE
Santiago Sandra

CARGO QUIEN RECIBE
hse

FIRMA CLIENTE



UBICACIÓN



7.06409587, -73.85066199

CERTIFICACION DE VISITA

Ok Equipo funcionando

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

CERTIFICACION DE VISITA
(2023/09/19) - Fecha Servidor: (2023/09/19)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 085.255 **Nombre Activo:** USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehículo

CAMION FRR TAR396	TAR396

Operadores

Conductor		**Auxiliar 1**	
Jhon Jairo Moya Suarez		Danilo Rodelo Ricardo	
91446417		9043781	

Resumen

Hora: 13:32:20

Encuesta

CERTIFICACION

FOTO CERTIFICACION VISITA



NOMBRE QUIEN RECIBE

Abelino Muñoz

CARGO QUIEN RECIBE
Oficial

FIRMA CLIENTE



UBICACIÓN
No hay datos gps para mostrar información de ubicación

CERTIFICACION DE VISITA

Ok Equipo funcionando

clickidea

ASEOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA ASSEAR S.A.S
NIT. 900.346.265-5

CERTIFICA

Que prestamos el servicio de aseo y mantenimiento de baños portátiles a la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificada con el NIT **901109885-1**, según el siguiente detalle:

Periodo de Servicio	Detalle	Cantidad de USP's	Litros vertidos
AGOSTO 2023	**BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y ZONAS ALEDAÑAS**	**2**	**320**

Las aguas residuales fueron el resultado del mantenimiento a **2** unidad(es) sanitaria(s) portátil(es) (USP) ubicada(s) en **COLEGIO INDUSTRIAL**, a la(s) que se le realizaron **16** aseos durante el periodo informado, los residuos obtenidos fueron vertidos y tratados en la planta de tratamiento de la empresa **PURIFICACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES SAS PURIFIC**, quienes cuentan con autorización de la CAS según Resolución DGL No. 000799 del 17 de octubre de 2018. Adjunto encontraran el certificado de tratamiento de residuos, la cantidad vertida corresponde a la certificación emitida por **PURIFIC SAS**.

Dada en Barrancabermeja a los 10 días del mes de septiembre de 2023.

DIANA CAROLINA CAMACHO GUZMÁN
Coordinador de Operaciones
ASSEAR S.A.S

La información consignada en el presente documento puede ser confirmada al teléfono 3138849291 – 3017870248 o al correo electrónico: operaciones@assear.com

OFICINA BARRANCABERMEJA
Km 1.8 Vía Retén - Aereopuerto Yariguies
Tel: 607 6 02 04 20 - 313 884 92 91

GC.511 GA.487 GS.1228

CERTIFICADO No

2138

DEL 07/09/2023

PURIFIC S.A.S
NIT. 900.380.440-1

A Través del Permiso de vertimiento para el tratamiento de aguas Residuales, otorgado por la CAS, según Resolución DGL No 000799 del 17 de octubre de 2018.

CERTIFICA QUE PRESTÓ EL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y VERTIMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA A:

ASEOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA ASSEAR SAS
NIT: 900.346.265-5

SEGÚN RELACIÓN
MES: AGOSTO DE 2023

ITEM	UBICACIÓN	VERTIMIENTO (LITRO)
1	BARRANCABERMEJA, PUERTO WILCHES, SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SABANA DE TORRES, PUERTO PARRA, RIONEGRO,BUCARAMANGA, GIRON (SANTADER), YONDÓ	156000

Daiver Baldovino Núñez.
Gerente

Oficina Barrancabermeja:
Lote 30 Vereda Campo Gala
Móvil: (+57) 320 2347971 - 312 4790920
Email: daiverb@purific.co ; gerentegeneral@purific.co ; administracion@purific.co
Barrancabermeja – Santander - Colombia. https://www.purific.co/

ANEXO 4. SUSTANCIAS QUIMICAS

Emergencias: tel 018000 51 1414 (todo el país). Servicio 24 horas

Centro de Informacion de Sustancias Quimicas, Emergencias y Medio Ambiente

HOJA DE SEGURIDAD

ACPM



1202

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO

Sinónimos: Combustible Diesel; Diesel fueloil; aceite combustible N°2; destilado medio; aceite de calefacción doméstica; aceite combustible para motores Diesel.
Líquido aceitoso incoloro o amarillo claro con olor característico a petróleo.
Puede estar coloreado para identificación.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Líquido inflamable, peligro moderado de incendio o explosión del líquido o el vapor en presencia de calor, chispas o llamas. La inhalación de vapor a altas concentraciones puede causar mareos y adormecimiento. El líquido puede producir irritación de la piel y los ojos. Puede absorberse por la piel. Peligro de aspiración si es ingerido. Posibles efectos retardados. Algunos de sus componentes pueden causar cáncer según ensayos en animales.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Mezcla compleja de hidrocarburos entre C9 y C20, principalmente alifáticos y en menor proporción olefínicos, nafténicos y aromáticos.
CAS [68476-30-2, 68476-34-6, 68334-30-5, 68474-34-6]

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Retire la víctima de la fuente de exposición y llévela al aire fresco. Si no respira, despeje las vías respiratorias; provea resucitación cardiopulmonar si está capacitado para hacerlo. Evite el contacto directo boca a boca. Si la víctima respira con dificultad, personal capacitado debe administrar oxígeno con monitoreo posterior del afectado en forma continua. Obtenga atención médica de inmediato.
Contacto con la piel: Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo el área contaminada con abundante agua y jabón durante por lo menos 15 minutos. Debajo de la corriente de agua retire la ropa, zapatos y artículos de cuero que estén contaminados. No intente neutralizar con agentes químicos. Obtenga atención médica si persiste irritación.
Ingestión: Si la víctima está consciente, no convulsiona y puede ingerir líquido, dele a beber dos vasos de agua. NO INDUZCA AL VÓMITO. Si ocurre el vómito, mantenga la víctima inclinada para reducir el riesgo de aspiración, repita la administración de agua y observe si se presenta dificultad para respirar. Obtenga ayuda médica de inmediato.
Contacto con los ojos: Lave de inmediato con abundante agua a baja presión y tibia preferiblemente, durante por lo menos 15 minutos. Durante el lavado separe los párpados para facilitar la penetración del agua. No intente neutralizar con agentes químicos o gotas sin la orden de un médico. Obtenga atención médica rápidamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Consideraciones especiales: Líquido combustible. Puede formar mezclas explosivas a temperaturas iguales o superiores a su punto de inflamación. El líquido puede acumular cargas estáticas por transvase o agitación. Los vapores pueden desplazarse a nivel del suelo hasta una fuente de ignición y devolverse ardiendo hasta su lugar de origen. El líquido puede flotar sobre el agua hasta una fuente de ignición y regresar en llamas. El vertimiento del producto a desagües puede causar peligro de fuego o explosión. Produce gases tóxicos por combustión.
Procedimiento: Evacue el área del incendio en 25 a 50 metros en todas direcciones. Si hay un contenedor o carrotanque involucrado, evacue en 800 metros. Si hay fuga del producto, deténgala antes de intentar apagar el fuego, si puede hacerlo en forma segura. Enfríe los contenedores con agua en forma de rocío, y retírelos del fuego si puede hacerlo sin peligro. No introduzca agua a los contenedores. El agua puede ser inefectiva para extinguir el fuego, dado que el producto es insoluble. Aproxímese al fuego en la misma dirección del viento. Para incendios masivos utilice boquillas con soportes. Aléjese de los extremos de los contenedores.
Utilice equipo de respiración autocontenido. La ropa normal de bomberos proporciona protección limitada para este producto y sólo se recomienda para operaciones rápidas de entrada-salida en casos especiales.
Medios de extinción apropiados: Fuegos pequeños: dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma regular.
Fuegos grandes: espuma, agua en forma de rocío o niebla. No use agua en forma de chorro.
NFPA: Salud **1**; Inflamabilidad **2**; Inestabilidad **0** (clasificación oficial según la NFPA).

SECCIÓN 6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL

Ubíquese en la dirección del viento. Evite zonas bajas. Elimine toda fuente de ignición como llamas o chispas. Detenga o controle la fuga, si puede hacerlo sin peligro. Ventile la zona del derrame. No use palas metálicas.
Derrames Pequeños: Evacúe y aísle de 25 a 50 metros. Contenga el derrame con diques de poliuretano o calcetines especiales para aceites y absorba con absorbentes inertes como calcetines, almohadillas o tapetes para hidrocarburos, chemizorb o vermiculita.
NO USE TIERRA, ARENA NI ASERRÍN. Deposite los residuos en contenedores cerrados y marcados. Lave el área con agua y jabón.
Derrames Grandes: Evacúe y aísle el área 300 metros en todas direcciones. Utilice agua en forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores y proteger al personal. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Para ello disponga de diques prefabricados. Active su plan de emergencias.
Vertimiento en agua: Utilice absorbentes especiales tipo espagueti para retirar el hidrocarburo de la superficie. Consulte con las autoridades ambientales sobre la posibilidad de utilizar agentes dispersantes o de hundimiento.
Absorbentes Recomendados: Calcetines, Almohadas y Tapetes.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Evite toda fuente de ignición (chispas, llamas, calor, cigarrillos encendidos). Conecte a tierra contenedores y tuberías. Use sistemas a prueba de chispas y de explosión. Evite generar vapores o neblinas. Nunca realice operaciones de sifón con la boca. Nunca use este producto para lavarse manos o brazos. Lávese muy bien las manos después de su manipulación. Evite contacto con ojos, piel y ropa.
Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y calor, a temperatura ambiente (entre 15 y 25 °C).
El almacenamiento interno debe hacerse en recinto estándar para líquidos inflamables. Señalice adecuadamente las áreas de almacenamiento y los contenedores.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL

TWA: 100 mg/m^3, fracción inhalable y vapor (ACGIH). **IDLH:** 1300 ppm

Elementos de protección personal sugeridos:

>8hr: Caucho de nitrilo, viton.

>8hr: Caucho de nitrilo

Si la protección respiratoria no incluye pieza facial completa, gafas de seguridad para químicos a prueba de salpicaduras, o monogafas

De 50 a 1000 mg/m^3: respirador purificador de aire con media máscara y cartucho para vapores orgánicos.
1000 mg/m^3: respirador con línea de aire (SAR) en flujo continuo.
Mayores que 1000 mg/m^3 o desconocidas: Equipo de respiración autocontenido.

Para evitar contacto prolongado o repetido: **>8hr:** Viton.
Riesgo leve o moderado de salpicaduras: traje en Tychem o equivalentes;
Emergencias: Tyvek-SL, CPF 3 ó 4, Responder, Reflector o equivalentes.


Ducha


Lavaojos

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Intervalo de ebullición: Oscila entre 215 y 380 ℃ dependiendo del fabrican te.
Gravedad específica: 0,83-0,88 a 15℃ (agua=1) Menos pesado que el agua . **Temperatura de autoignición:** 230 ℃.
Velocidad de evaporación: Baja. < 0,1 (Acetato de butilo=1) **Valor de pH:** Neutro. Puede contener aditivos que afecten este valor.
Temperatura de inflamación: 54 ℃. **Densidad del vapor:** 3 a 4 (aire=1). Más pesado que el aire
Límites de explosividad: Inferior: 1,3 %. Superior: 6% **Umbral de olor:** 0,1 ppm.
Solubilidad: Solubilidad en agua despreciable (<0.1%). Soluble en éter, cloroformo y solventes derivados del petróleo.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable en condiciones normales de manejo y almacenamiento.
Incompatibilidades: Incompatible con oxidantes fuertes (como ácido nítrico, hipoclorito de sodio). No corrosivo a los metales.
Condiciones a evitar: Fuentes de ignición como chispas, llamas abiertas y calor intenso. Acumulación de cargas electrostáticas.
Productos de descomposición térmica: monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos reactivos.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Inhalación: Bajo peligro a temperaturas normales (hasta 38℃). Concentraciones altas del vapor producen Irritación de ojos, nariz, garganta y pulmones. Puede afectar al sistema nervioso central ocasionando síntomas como excitación, euforia, dolor de cabeza, mareos, adormecimiento, visión borrosa, fatiga, temblor, convulsiones, pérdida de la conciencia, coma, fallo respiratorio y muerte.
Contacto con la piel: NO lo use para lavarse. Al principio pueden no aparecer síntomas; después de algunas horas se presenta inflamación del tejido, decoloración y dolor agudo. Contacto extenso o prolongado puede ocasionar absorción, con síntomas similares a los de inhalación.
Contacto con los ojos: Exposición a vapores o neblinas produce irritación leve, pero no daños a los tejidos del ojo.
Ingestión: Baja toxicidad. Puede causar disturbios gastrointestinales, con síntomas como irritación, náusea, vómito y diarrea. Puede afectar el sistema nervioso central, presentándose los síntomas descritos en inhalación. Riesgo de aspiración a los pulmones durante la ingestión o el vómito, lo cual puede producir efectos severos como neumonitis, edema pulmonar o bronconeumonía.
Efectos crónicos: Piel: efecto desengrasante, enrojecimiento, comezón, inflamación, resquebrajamiento y posible infección secundaria. Reacciones alérgicas en algunos individuos. **Carcinogenicidad:** Materiales parecidos han producido cáncer en piel de animales experimentales. La IARC clasifica como posible carcinógeno humano al diesel arrojado por el exhosto de los automotores. La ACGIH clasifica como carcinógeno comprobado para los humanos (**clase A1**) a las nieblas de aceite mineral medianamente refinado.

SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA

Tóxico para la vida acuática. No permita su entrada a desagües, ríos y otras fuentes de agua. Flota e impide la oxigenación de cuerpos de agua.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Recupérelo y reutilícelo o envíelo a incineración en un horno adecuado, que tenga Licencia Ambiental.

SECCION 14. INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

La etiqueta del vehículo debe medir por lo menos 25 cm de lado. Los colores deben ser vivos y la letra contrastante y fácil de leer.
Etiquete adecuadamente los contenedores o carrotanques y manténgalos cerrados. No lo transporte junto con productos explosivos (clase 1), gases (clase 2), oxidantes (clase 5.1), ni con tóxicos (clase 6.1). Puede transportarse con sustancias de la clase 9, solo si están separados de tal manera que no se mezclen en caso de derrame. Apague el motor cuando cargue y descargue (aún si no requiere poner a funcionar la bomba de carga). No fume en el vehículo ni a menos de 7,5 metros. Conecte a tierra el carrotanque antes de transferir el producto a o desde el contenedor. Cierre y asegure manholes y válvulas, y verifique que éstas no tengan fugas.
Clasificación de peligro según el Libro Naranja de la ONU: 3 - Líquido inflamable. (Ver reglamentación legal vigente)

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Etiquetado según directivas de la UE:
F - Inflamable
Xn - Nocivo





Sistema Globalmente Armonizado:



Atención
Líquido y vapor inflamables

Atención
Nocivo por ingestión, contacto e inhalación

Líquido y vapor combustibles. Peligro de incendio o explosión
Frases R: 40, 51/53, 65, 66 - Posibles efectos cancerígenos, tóxico para organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático, nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar, la exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Frases S: 2, 29, 36/37, 61, 62 - Manténgase fuera del alcance de los niños, no tire los residuos por el desagüe, use indumentaria y guantes de protección adecuados. Evite su liberación al medio ambiente, recábense instrucciones especiales de la hoja de seguridad. En caso de ingestión no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

SECCION 16. INFORMACION ADICIONAL

BIBLIOGRAFIA:

1. NFPA, Fire protection guide to Hazardous Materials, 13a. Edición, 2002.
2. Forsberg, K., et al. Quick selection guide to chemical protective clothing. 3a edición. Van Nostrand Reinhold, 1997. p. 67
3. Naciones Unidas. Recomendaciones para Transporte de Mercancías Peligrosas. 15 edición. USA. 2007.
4. CCOHS. Base de datos MSDS (08-4) en CD-ROM. Canadá. Noviembre de 2008. Registros 1201117, 542527, 503831, 421419.
5. ACGIH. Threshlold Limit Values for Chemical Substances (TLVs). USA. 2008.
6. Ministerio de Transporte. Decreto 1609 de 2002. Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. Bogotá. MinTransporte. 2002.

FECHA DE EMISIÓN: Enero de 2009 **ACPM**

Los datos suministrados en esta ficha se basan en nuestro conocimiento actual. No representan una garantía sobre las propiedades de este producto. ARP SURA no se hace responsable por el uso o interpretación particular que se dé a esta información.

ANEXO 5. CAPACITACIONES

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE: W O	CARGO: Oficial	FECHA: 29-09-23

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:



auxiliar ofic M.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.865-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE: Elvis Lara	CARGO: Ayudante	FECHA: 29-09-23

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:

5.0



Elvis Lara.
FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE: Alex Jimenez	CARGO Estudiante	FECHA: 29-07-23

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:

5.0



ALEX
FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE: Ellen G Ruiz	CARGO: Ayudante.	FECHA: 29-09-23

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:

5.0



Ellen Ruiz

FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE: Alex Jimenez	CARGO: Estudiante	FECHA: 29-09-23

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:

5.0



Alex
FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE: Abelino Muñoz	CARGO: Oficial	FECHA: 29-09-23

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:




FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE: Yesenia Alvarez M.	CARGO: Profesional social	FECHA: 5/10

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:

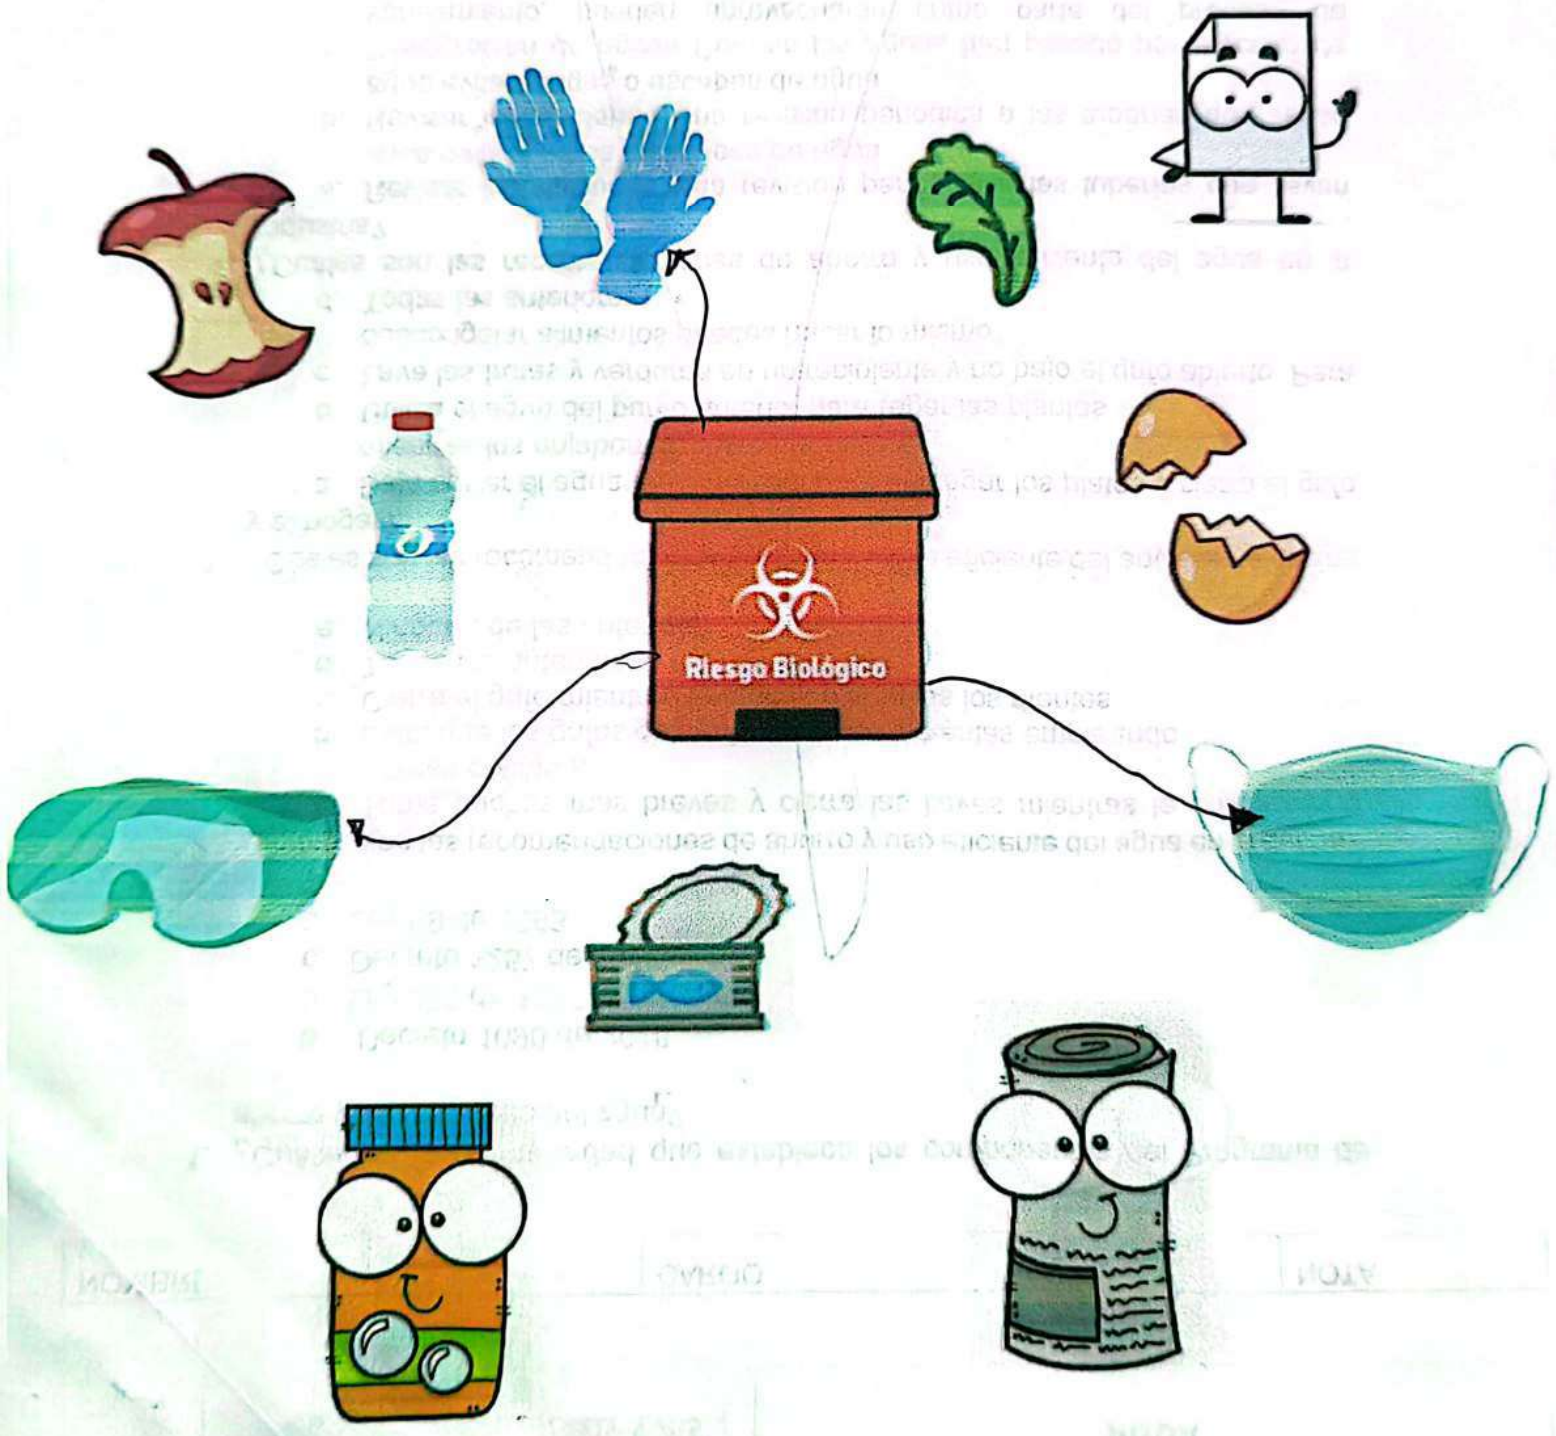

FIRMA


Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS


NOMBRE: Daniela Mena	CARGO: Ayudante	FECHA: 29-09-23


1. Identifique que elementos van en la caneca roja: 5.0













FIRMA

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1


EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE: Sujeto 11	CARGO: Oficial	FECHA: 29-09-23

5.0

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:










Sujeto 11
FIRMA


Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE:	CARGO:	FECHA:
[illegible]	Aux dsnfe	29-09-23

5.0

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:

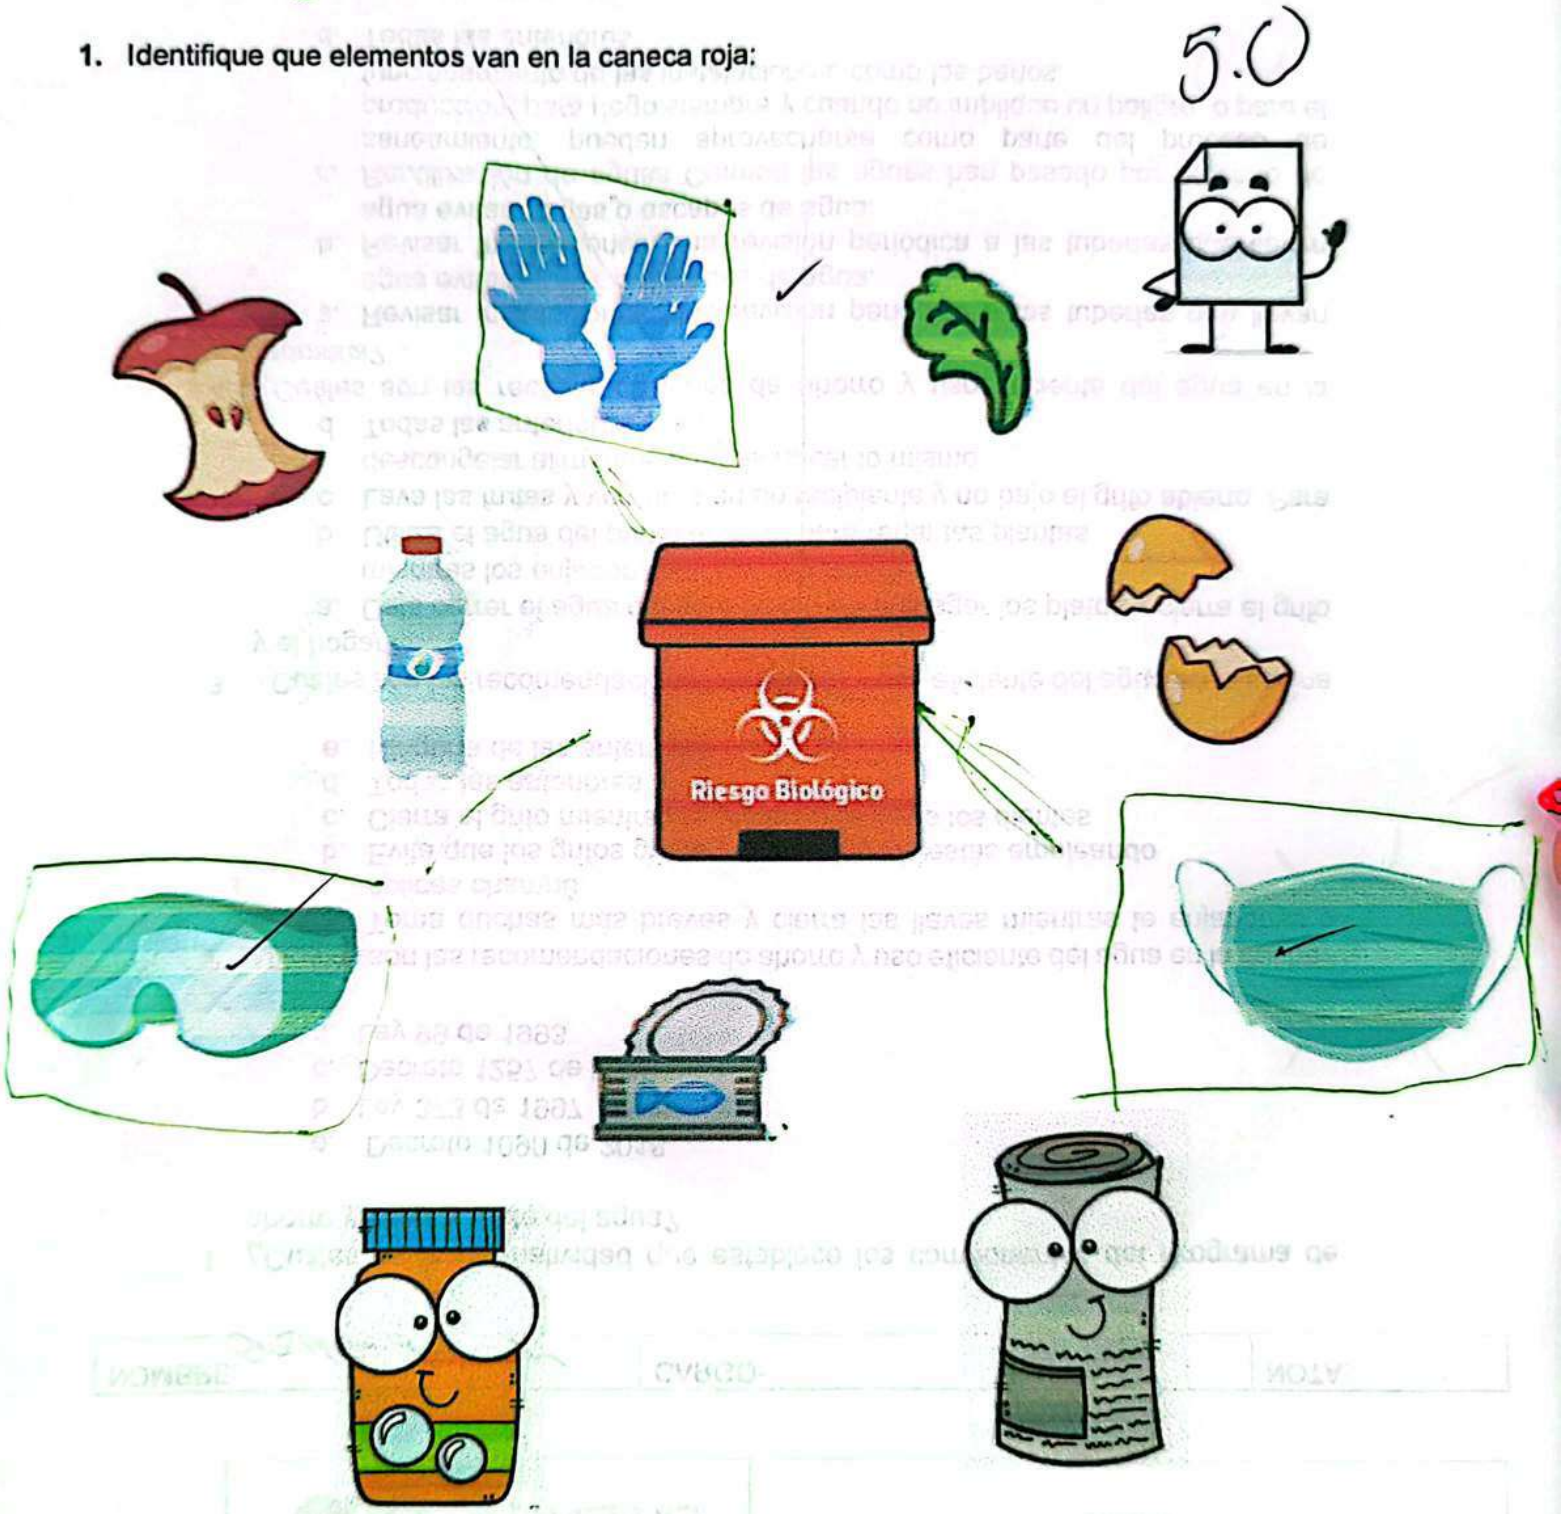

FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE: Brayan Cossio.	CARGO: Ayudante	FECHA: 29-09-23

5.0

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:



FIRMA


Brayan Cossio.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE: Julio G	CARGO: Ayudante	FECHA: 29-09-23

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:

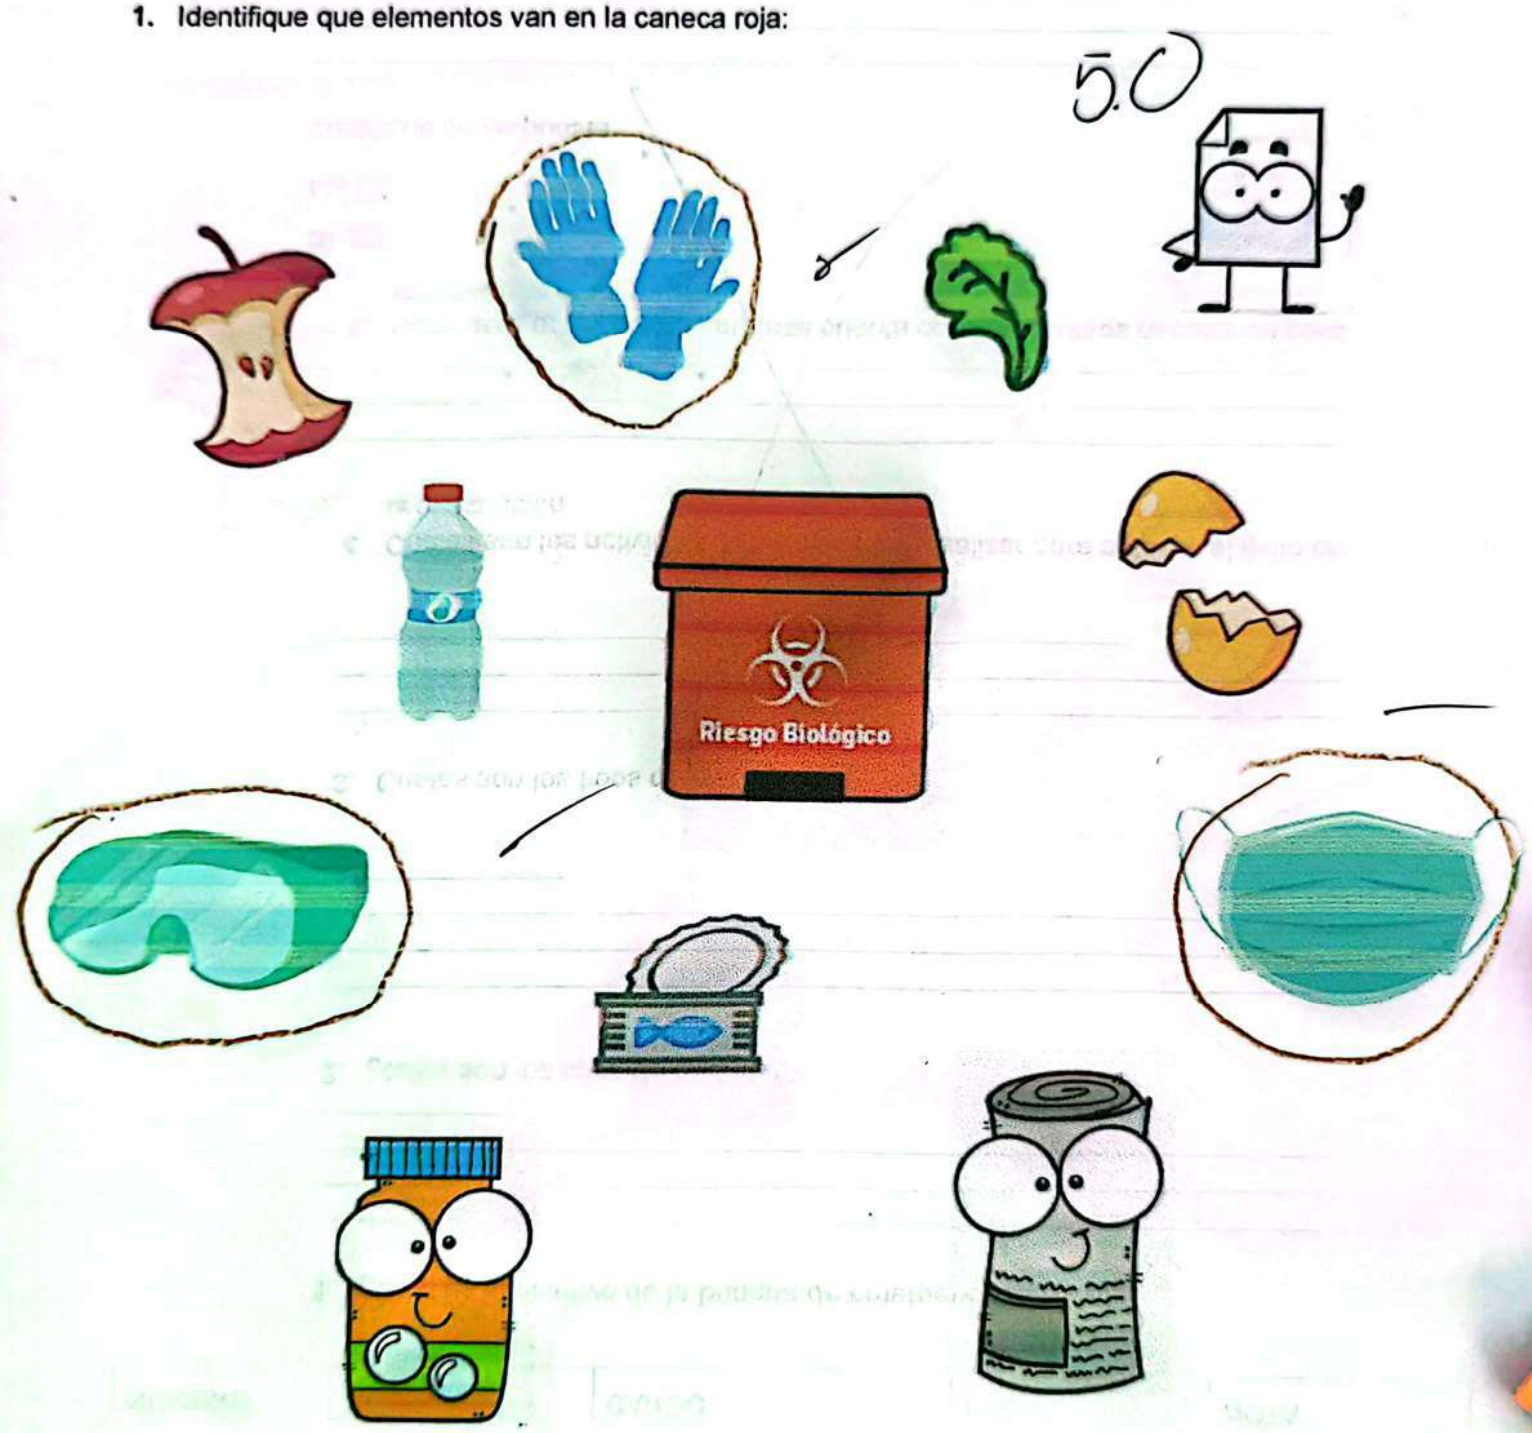


FIRMA Julio

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE:	CARGO: ayudante.	FECHA: 29-09-23

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:

5.0

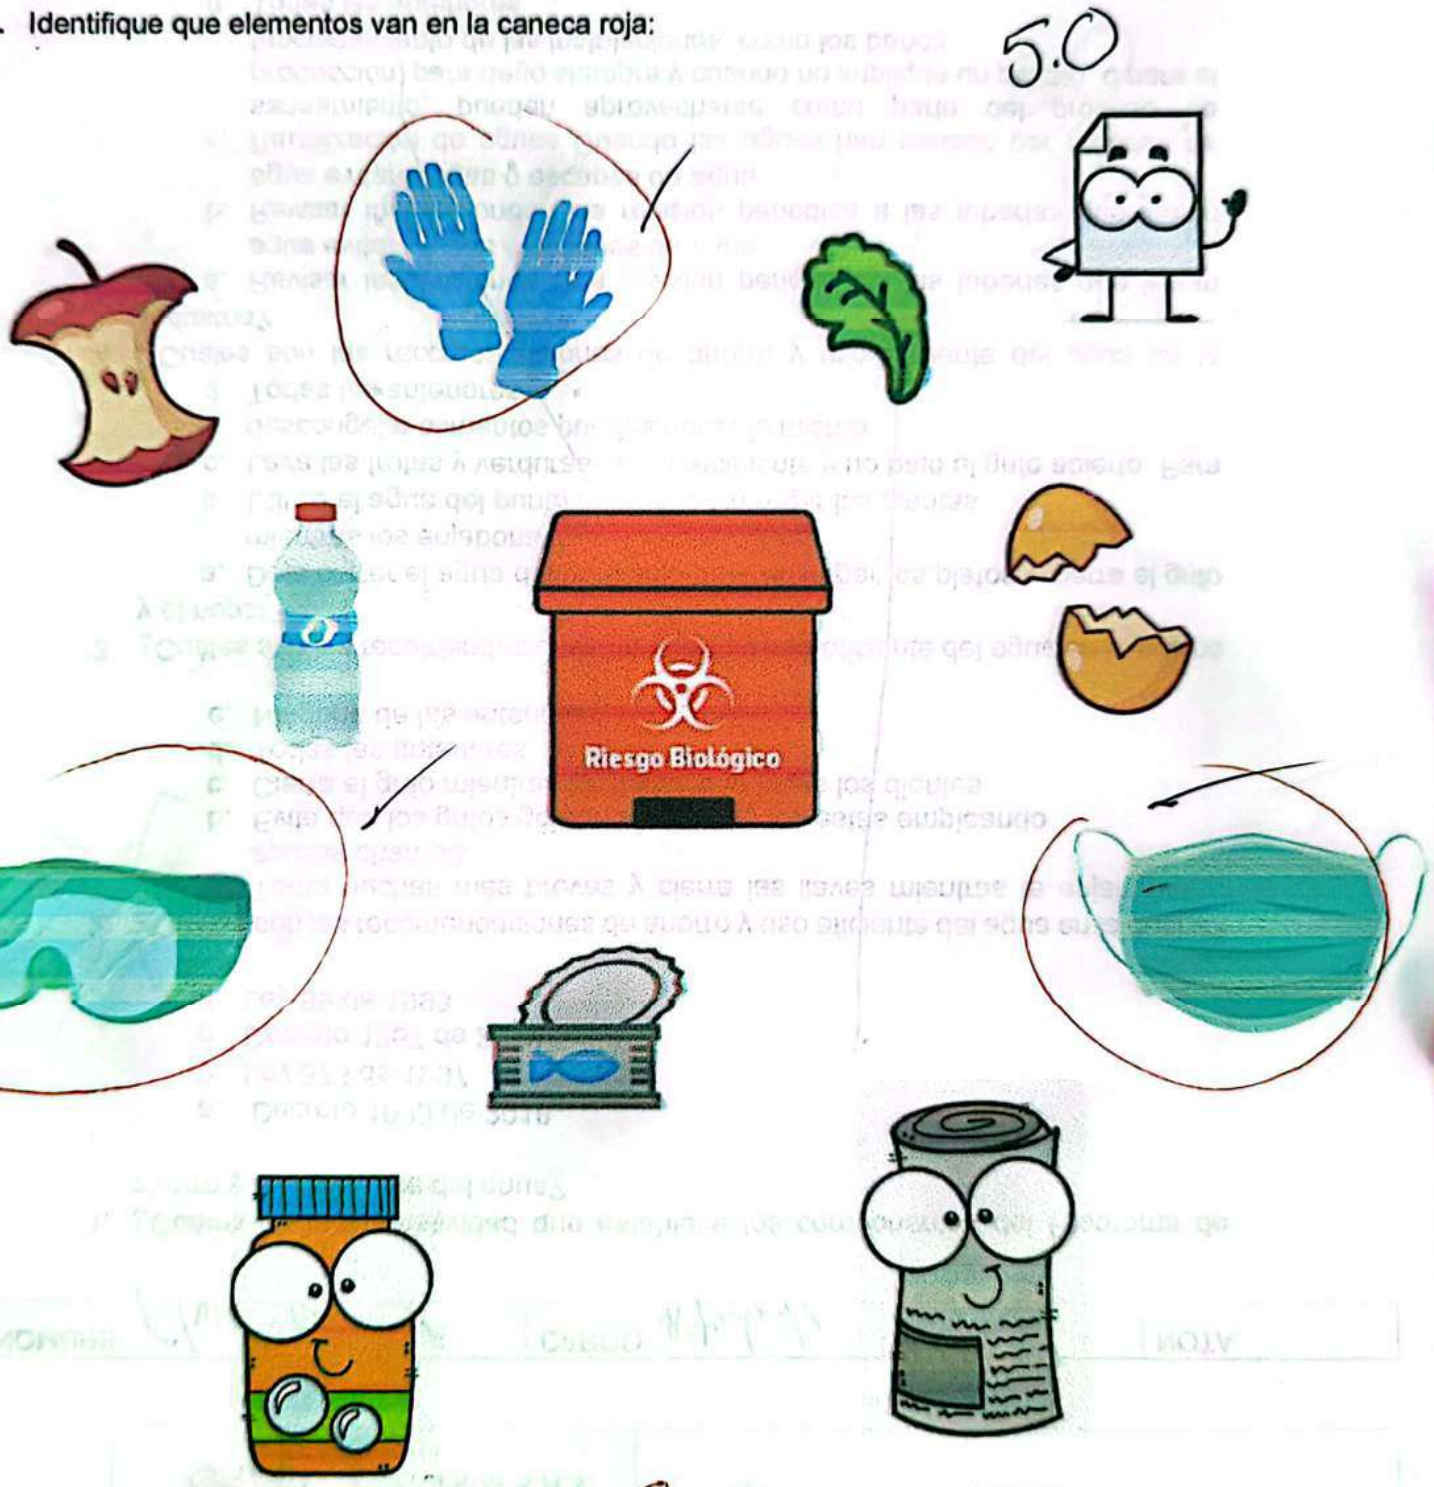

FIRMA


Powered by CamScanner

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.

EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE	CARGO	FECHA
Manuel Dandeles	Auxiliar	21-07-15

1. Identifique que elementos hay en la cerca roja

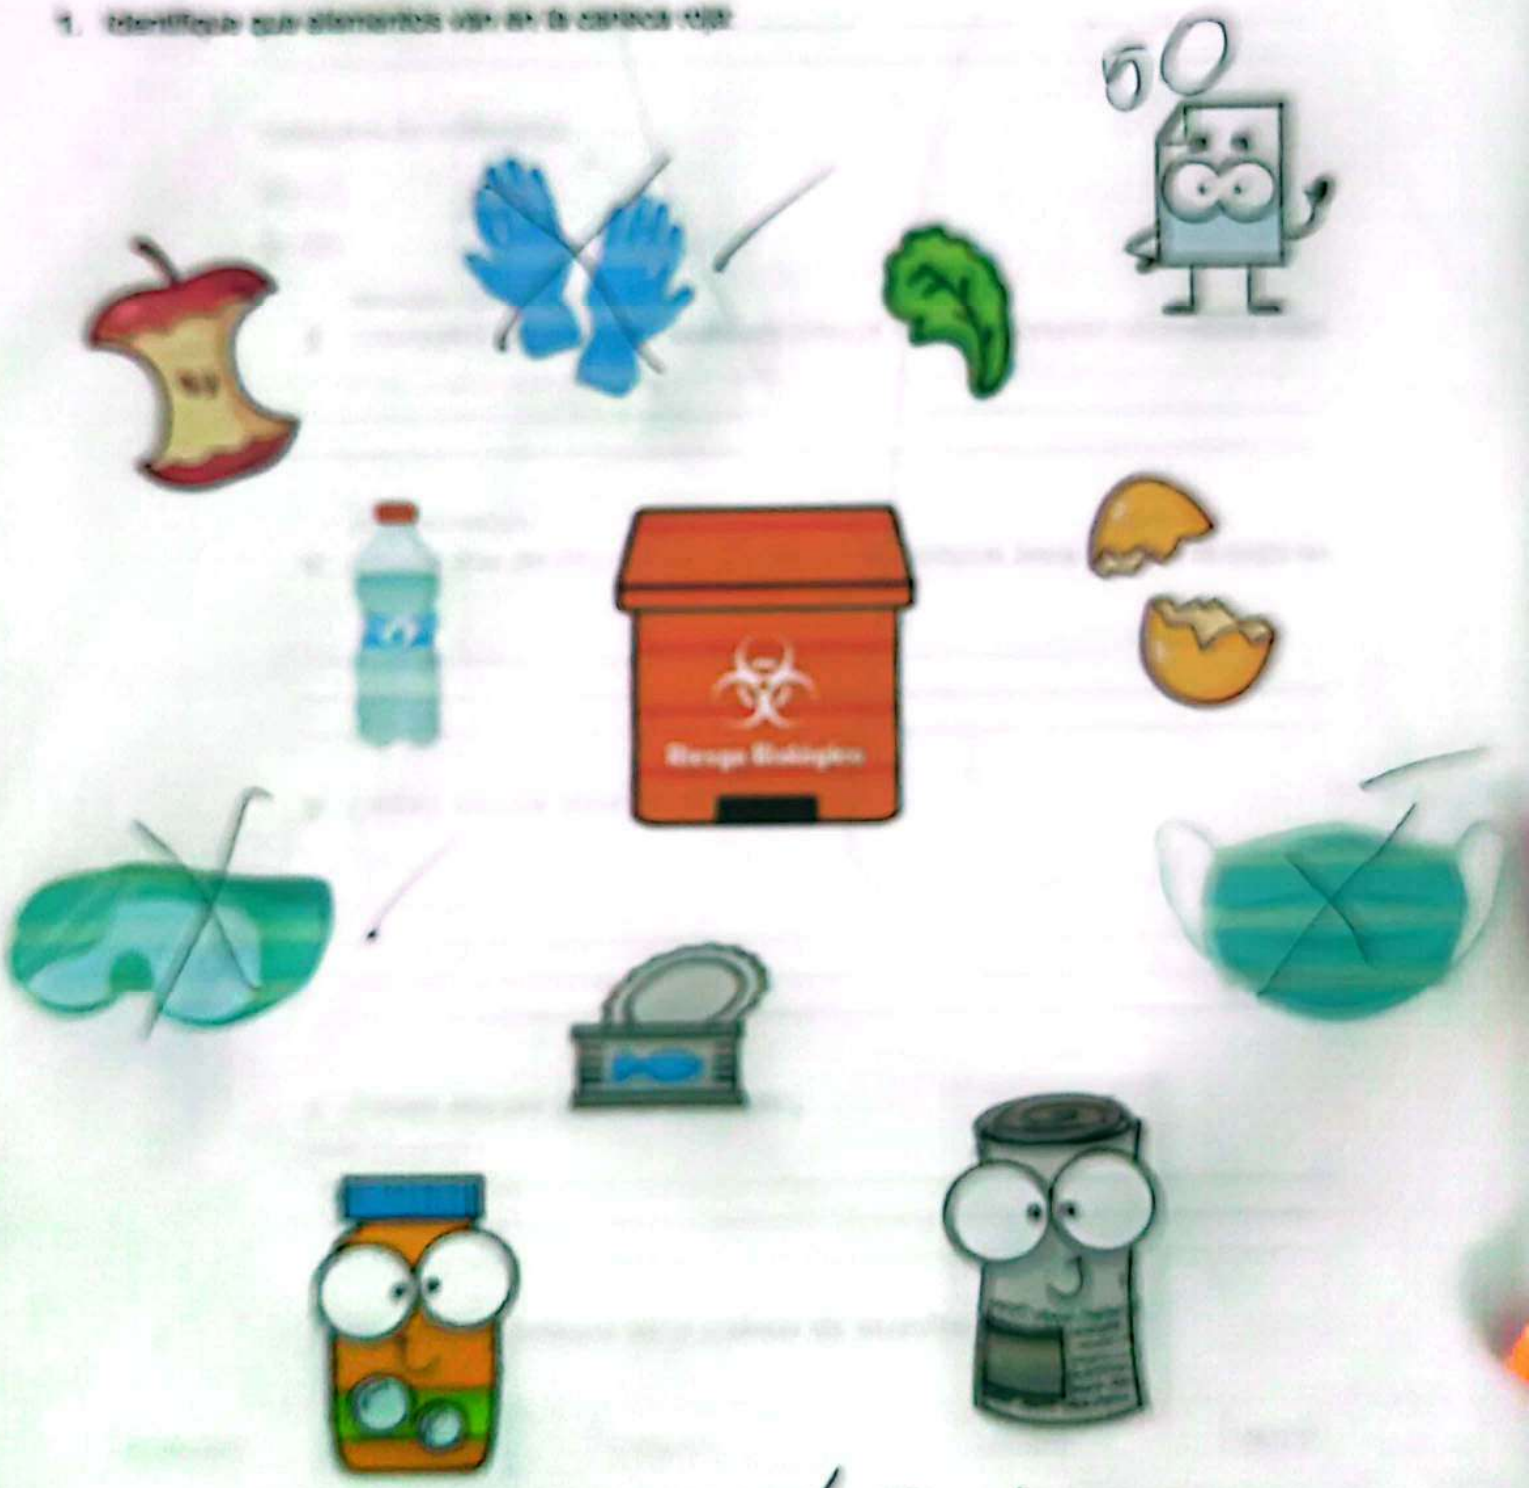

Manuel Dandeles

FIRMA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE: Juan Perez	CARGO: Estudiante	FECHA: 29-09-23

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:



FIRMA


Juan Perez

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE:	CARGO:	FECHA:
Jose Angel Penaloza	Obrero	29-09-23

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:

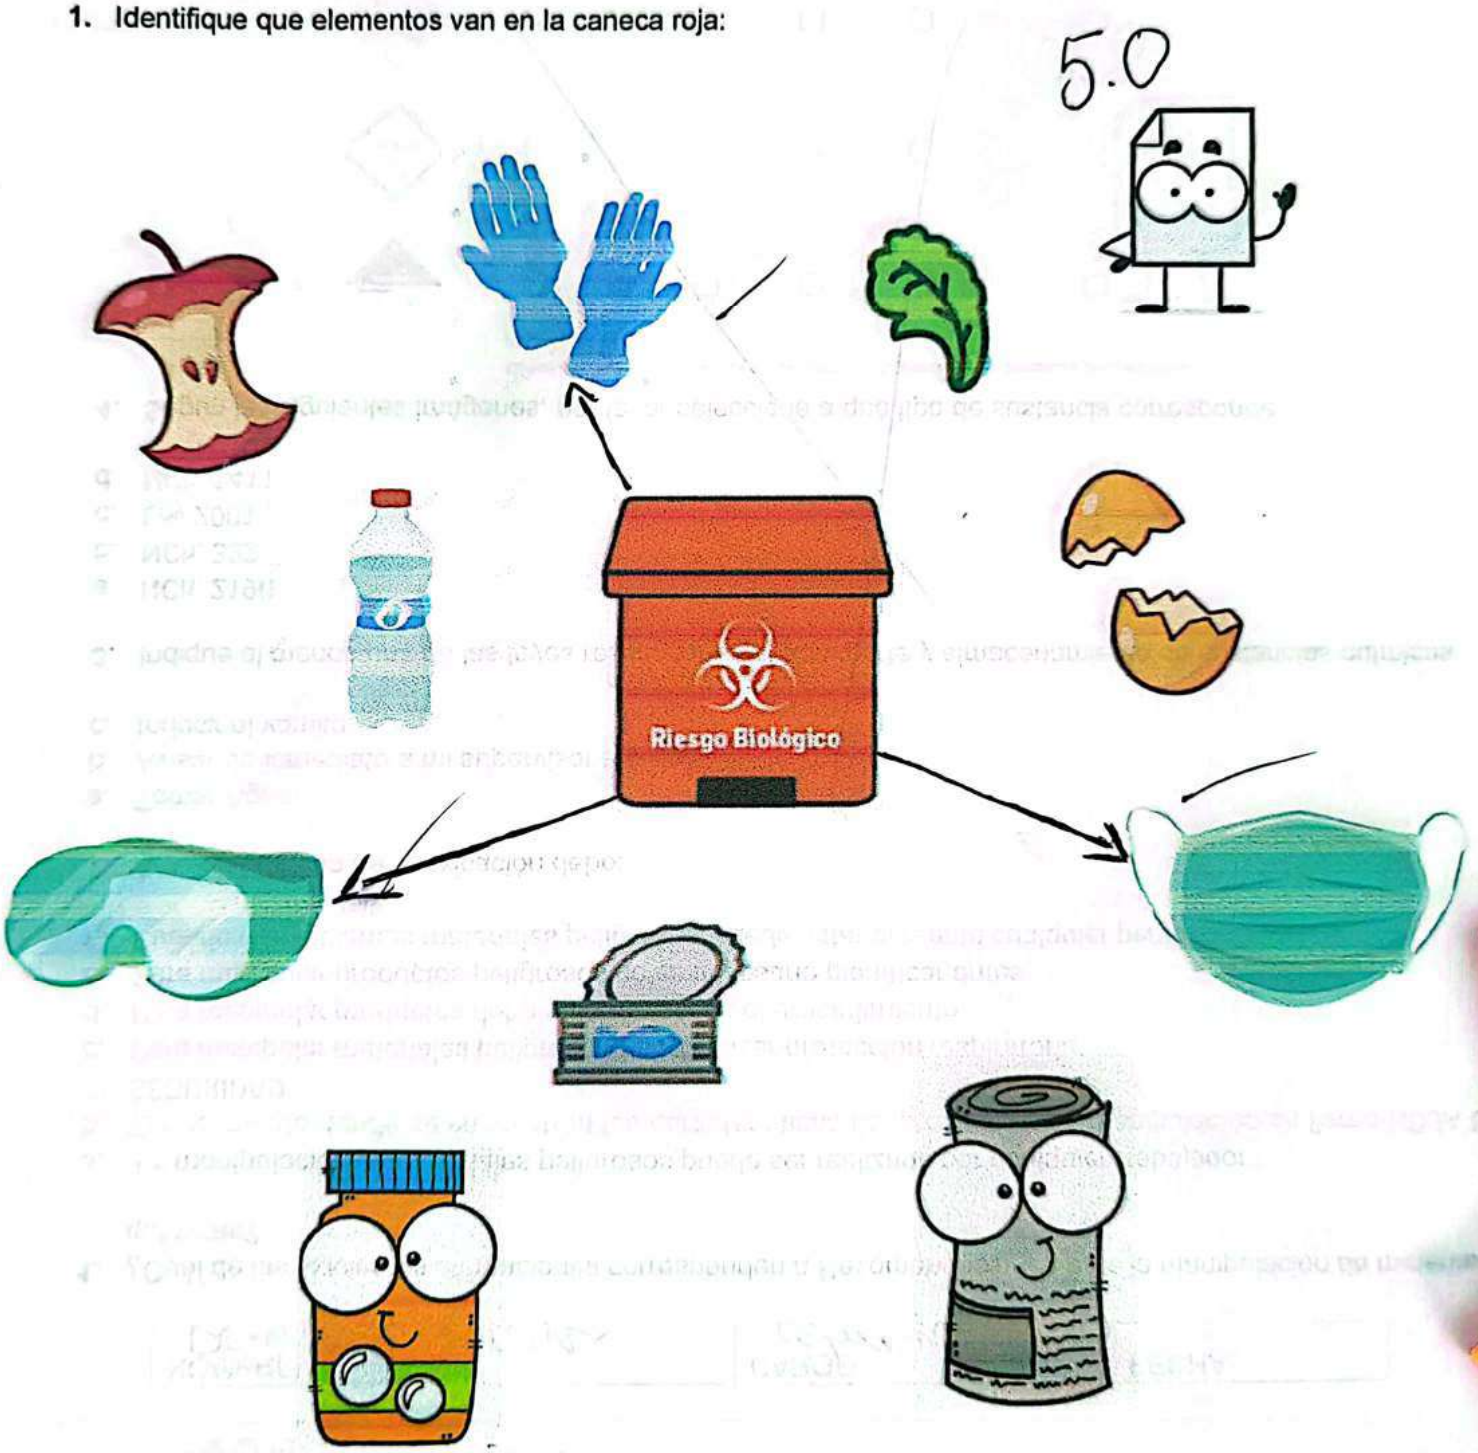

FIRMA


Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE: Deibi Campo	CARGO: Obrero	FECHA: 29-09-23

5.0

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:

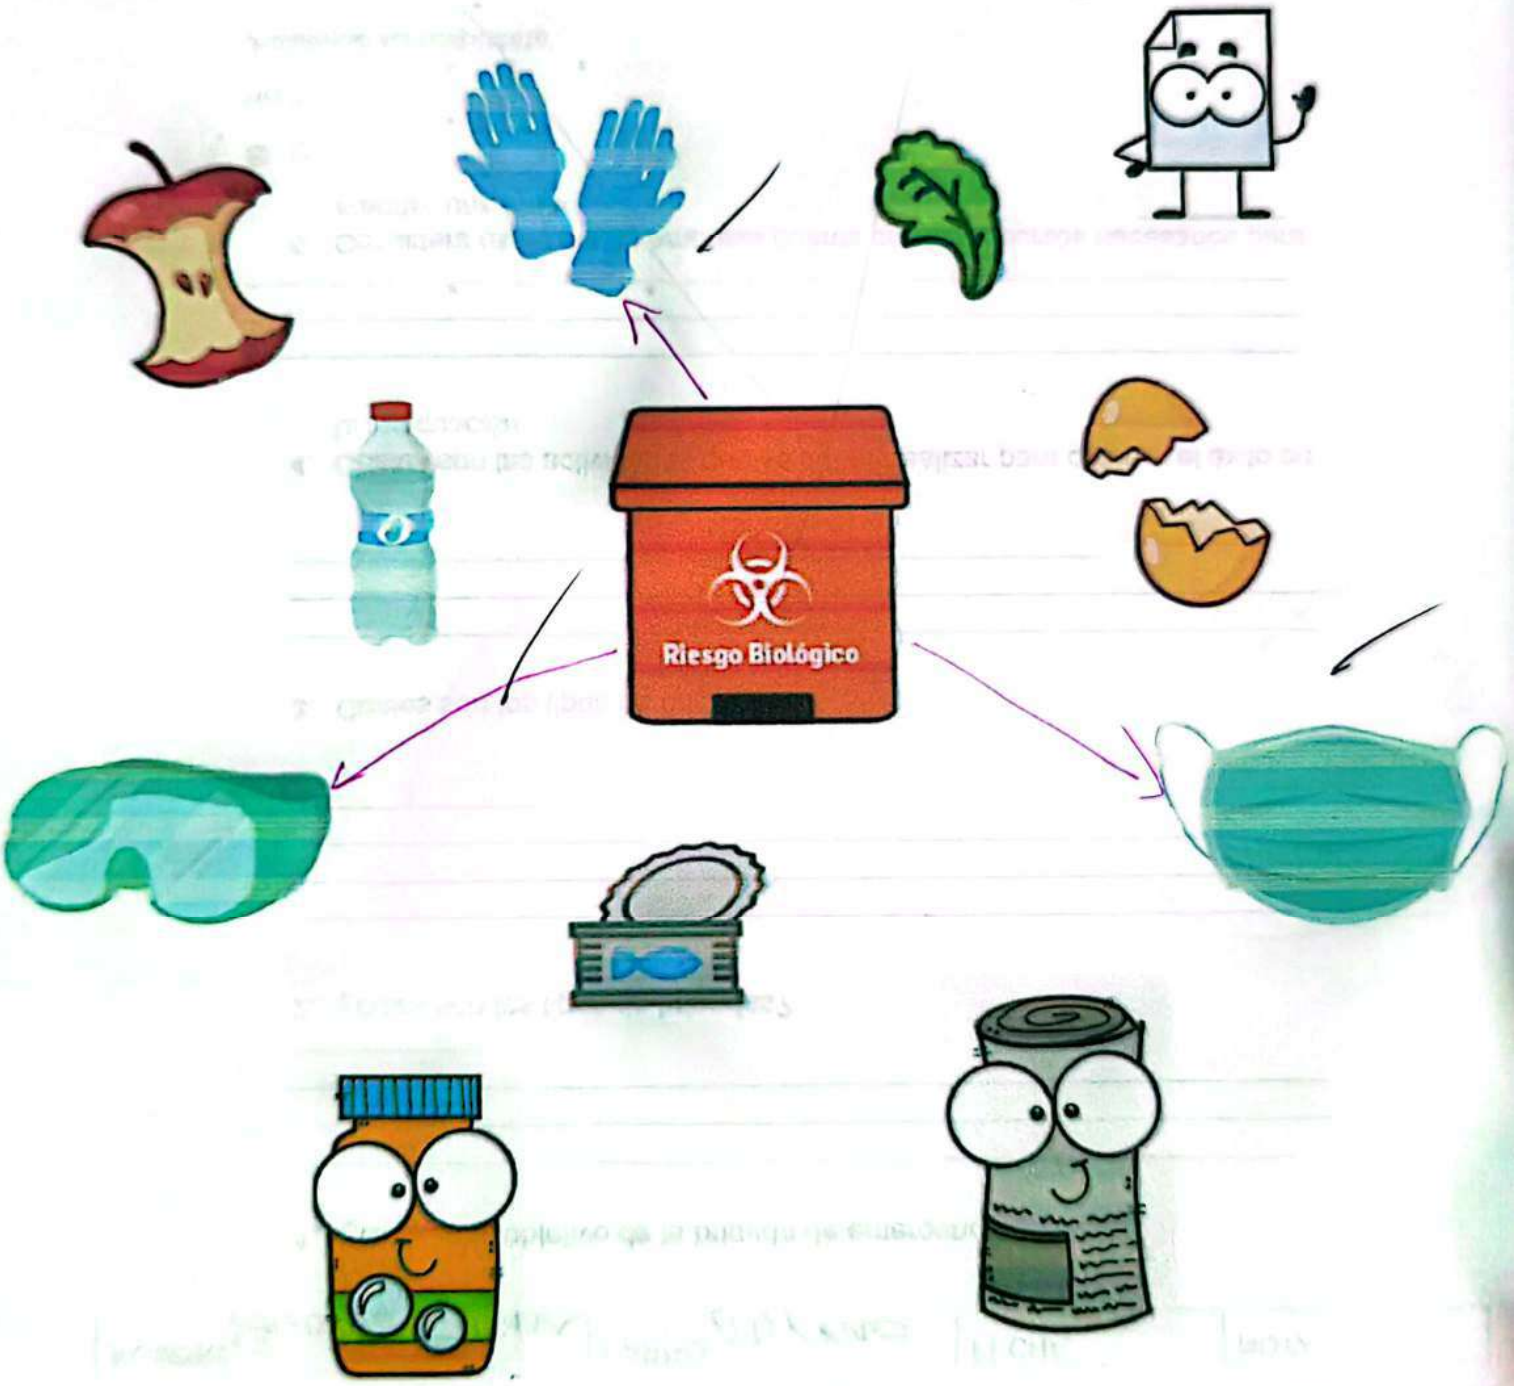

FIRMA

Deibi Campo


Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE: MARIO FONTALVO	CARGO: Ayudante	FECHA: 29-09-23

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:

5.0

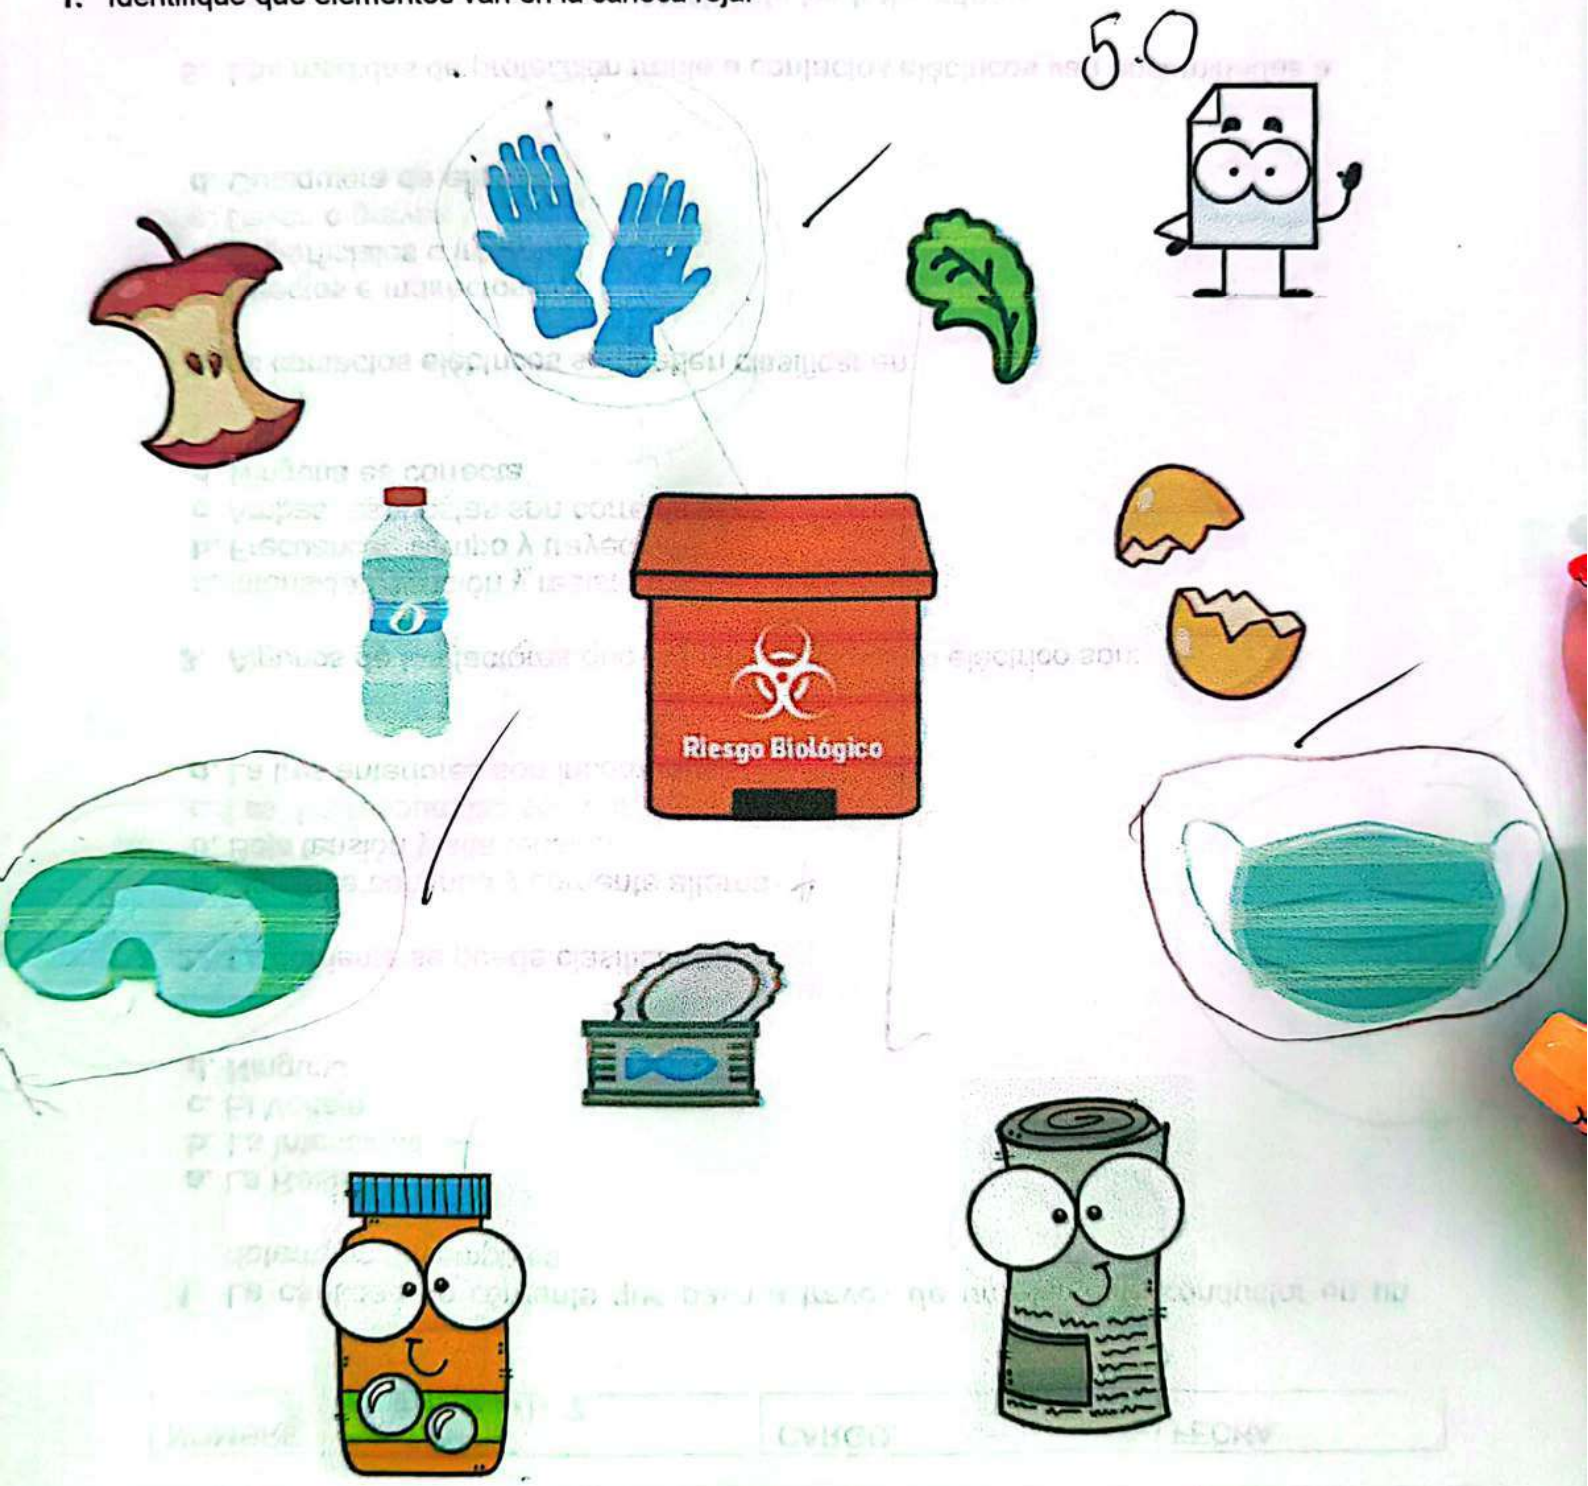

MARIO FONTALVO

FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE: MARIO FONTAIN	CARGO: Ayudante	FECHA: 29-09-23

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:

5.0



MARIO FONTAIN


FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE: Antonio. Carvalido	CARGO: Obrero	FECHA: 29-09-23

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:

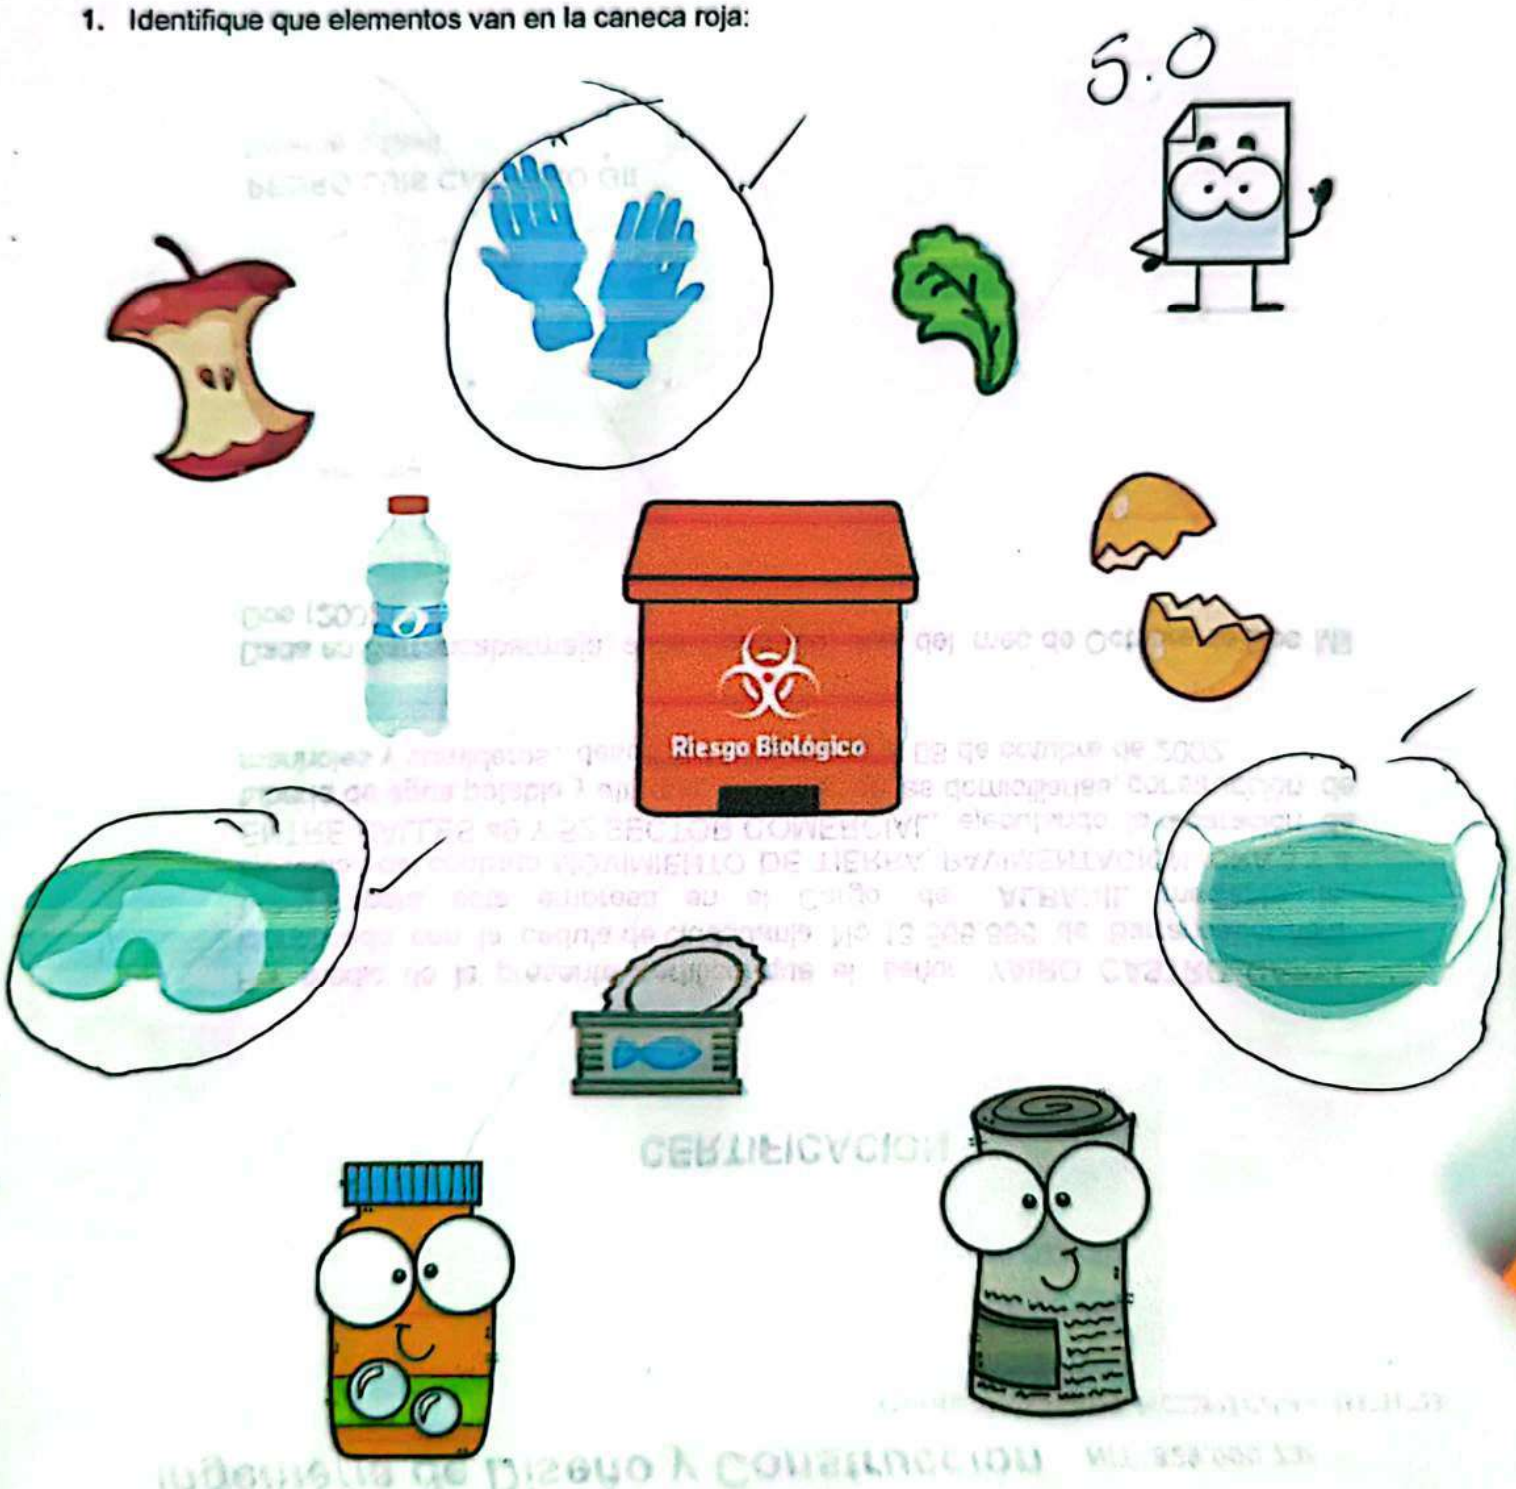


Antonio. C
FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACIÓN DE DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

NOMBRE: [illegible]	CARGO: [illegible]	FECHA: 29-09-23

1. Identifique que elementos van en la caneca roja:

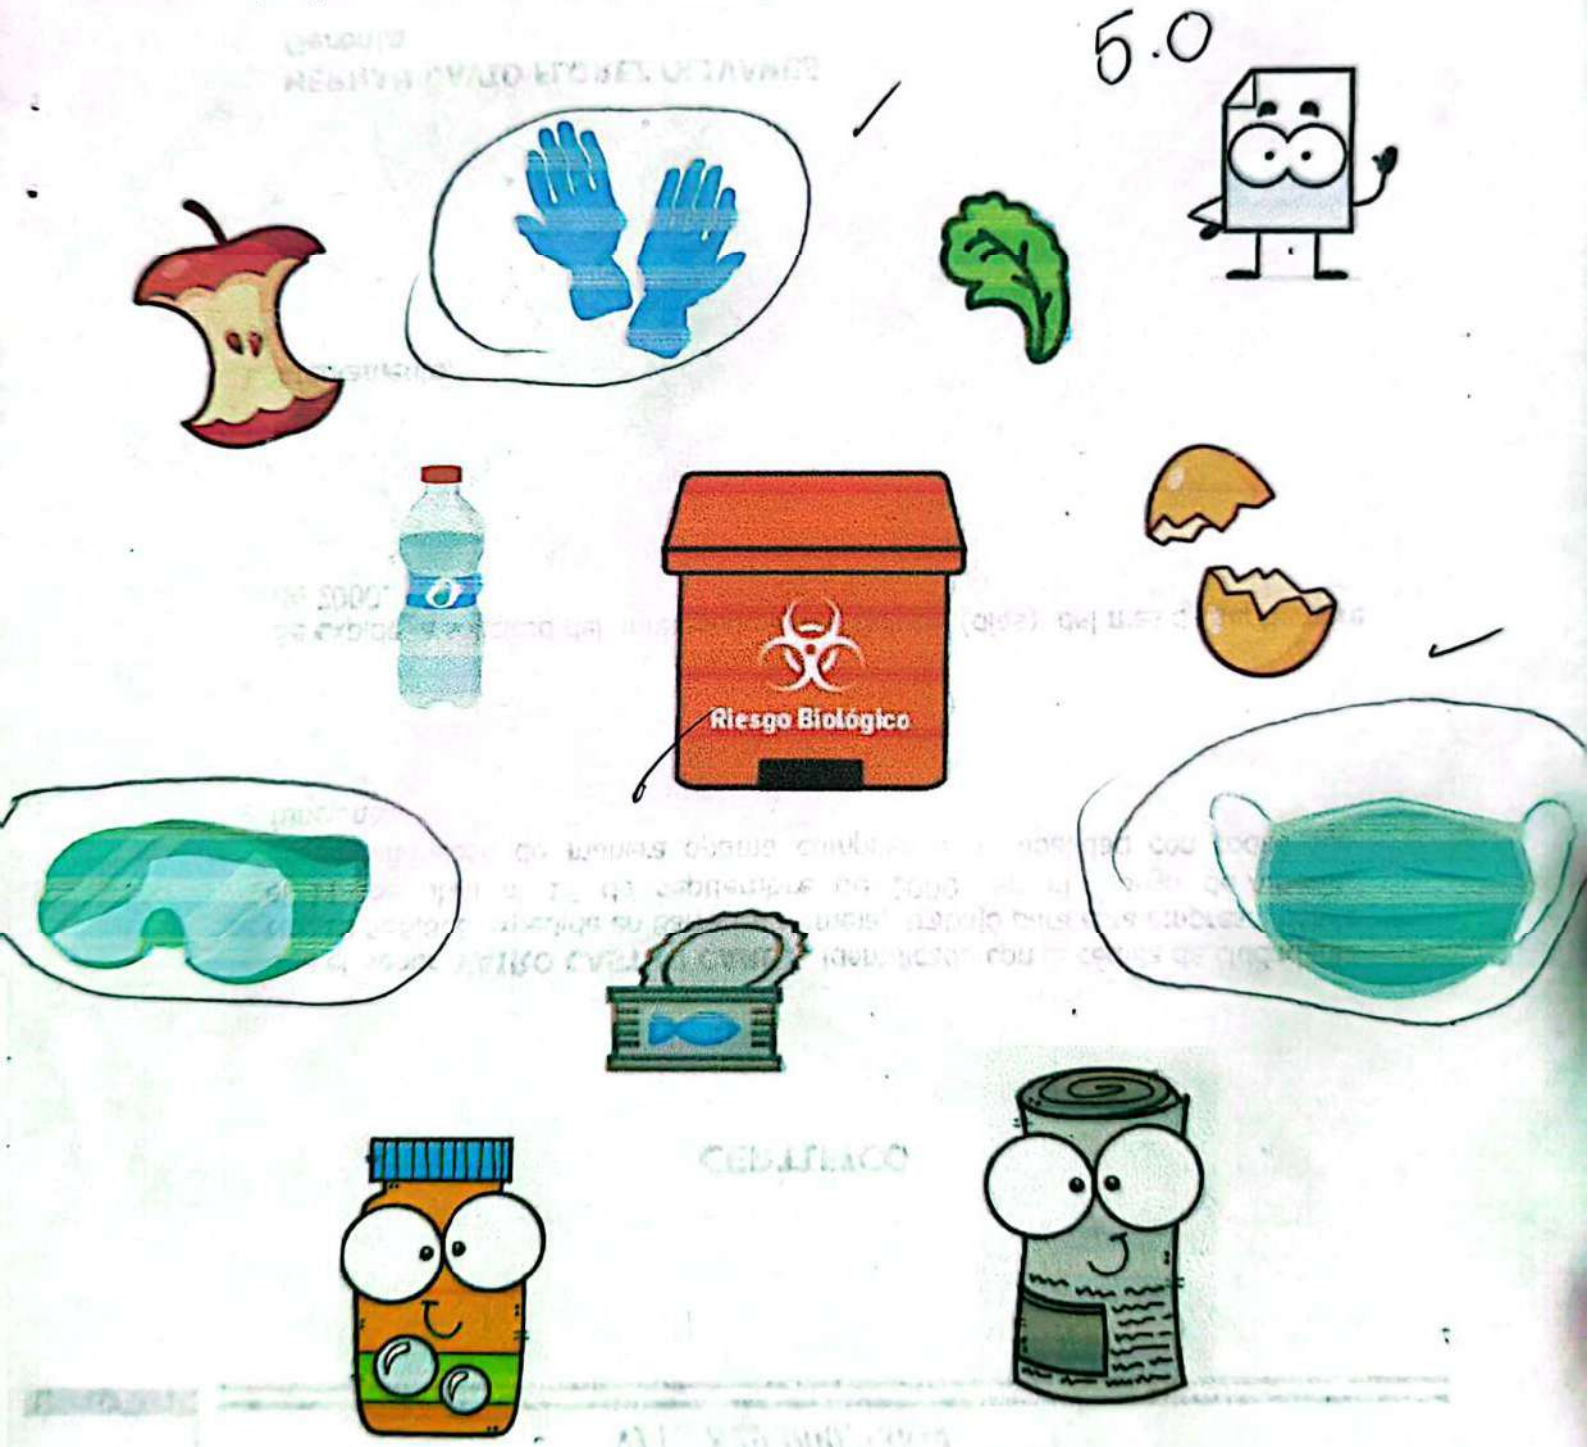

FIRMA

ANEXO 6. REGISTRO DE MATERIALES



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 05837

Fecha: 18 SEP 2023.

Material: ARENA

Cubicación: 7m³.

Placa: UAO 483

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL

Total Viajes: 1 (UNO)

Luis Palomino

CONDUCTOR

CESAR

CONTROL

321 382 06 64

Powered by CamScanner



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO N° 5836

Fecha: 18 SEP 2023

Material: RECEBO

Cubicación: 8m3.

Placa: UAD 483

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL.

Total Viajes: 3 (TRES)

Luis Palomino
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64

Powered by CamScanner



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005850

Fecha: 21 SEP 2023	
Material: RECEBO	
Cubicación: 8m³.	**Placa:** VAD 483
Hora Cargue: COLEGIO	**Hora Recibido:**
Kilometraje: INDUSTRIAL	**Total Viajes:** 4 (CUATRO)

Luis Palomino
CONDUCTOR

CESAR LOND
CONTROL

321 382 06 64

Powered by CamScanner



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005805

Fecha:	21 SEP 2023		
Material:	RECEBO		
Cubicación:	8 M³.	**Placa:**	EJK 785
Hora Cargue:	COLEGIO	**Hora Recibido:**	
Kilometraje:	INDUSTRIAL	**Total Viajes:**	2 (DOS)

LEONARDO M.
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64

Powered by CamScanner



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005823

Fecha: 15 SEP 2023.

Material: RECEBO

Cubicación: 8m³.

Placa: XWJ 307

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL.

Total Viajes: 5 (CINCO)

JAVIER GONZALES
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64

Powered by CamScanner



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO N° 5809

Fecha: 11 SEP 2023.

Material: RECEBO

Cubicación: 8m3.

Placa: UAD 483.

Hora Cargue: ODEGRO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL.

Total Viajes: 7 (SIETE).

Luis Palomino.
CONDUCTOR

CESAR.
CONTROL

321 382 06 64

426 2.8

Powered by CamScanner



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005842

Fecha: 19 SEP 2023.

Material: RECEBO

Cubicación: 8m3.

Placa: EJF 179

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL

Total Viajes: 2 (Dos)

LEONARDO. M
CONDUCTOR

3-7-2004
CONTROL

321 382 06 64

Powered by CamScanner



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005814

Fecha: 12 SEP 2023.

Material: RECEBO.

Cubicación: 8m3.

Placa: UAD 483

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL.

Total Viajes: 2 (DOS)

Luis Palomino
CONDUCTOR

CONTROL

321 382 06 64

Powered by CamScanner



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 05825

Fecha: 15 SEP 2023.

Material: RECEBO

Cubicación: 8m³.

Placa: UAD 483.

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL.

Total Viajes: 3 (tres)

Wis Palomino.
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64

Powered by CamScanner



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005826

Fecha: 15 SEP 2023.

Material: RECEBO

Cubicación: 8m3.

Placa: IDF 318

Hora Cargue: 0CCE610

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL.

Total Viajes: 5 (CINCO).

EDUARDO GONZALES
CONDUCTOR

CONTROL

321 382 06 64

Powered by CamScanner



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 05850

Fecha: 21 SET 2023.	
Material: RECEBO	
Cubicación: 8 m3.	**Placa:** VAD 483
Hora Cargue: COLEGIO	**Hora Recibido:**
Kilometraje: INDUSTRIAL	**Total Viajes:** 4 (CUATRO)

Luis Palomino
CONDUCTOR

CESAR LOND
CONTROL

© 321 382 06 64

Powered by CamScanner



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 5831

Fecha: 17 SEP 2023

Material: RECEBO

Cubicación: 8m³

Placa: UAD 483

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL

Total Viajes: 1 UNO

Luis Palomino
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64

Powered by CamScanner



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005841

Fecha: 19 SEP 2023.

Material: RECEBO

Cubicación: 8m3.

Placa: IDE 318

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL

Total Viajes: 3 (tres)

Eduardo Gonzalez
CONDUCTOR

3-7-2023
CONTROL

321 382 06 64

Powered by CamScanner



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005840

Fecha: 19 SEP 2023.

Material: RECEBO — MAQUINA

Cubicación: 8m³.

Placa: UAD 483.

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL.

Total Viajes: 6 (SEIS)

Luis Palomino
CONDUCTOR

5-7-12024
CONTROL

321 382 06 64

Powered by CamScanner



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005854

Fecha: 22 SEP 2023.

Material: RECEBO

Cubicación: 8 cm^3.

Placa: UAD 483

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: INDUSTRIAL

Total Viajes: 1 (UNO)

Luis Palomino
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64

Powered by CamScanner



FERMÍN GARCÉS NÚÑEZ
VENTA DE MATERIAL DE RECEBO, ARCILLA
TITULO MINERO 0343-68
LICENCIA AMBIENTAL 00315

Barrancabermeja, 11 Septiembre del 2023

CERTIFICADO SUMINISTRO

Con el presente documento, certifica el suministrado de material de Construcción (Recebo) a la empresa WRUSSY INGENIEROS S.A.S Nit 901109885-1, la cantidad suministrada fue de 50M3 en el mes de Agosto a Septiembre del presente año, encontrándose a Paz y salvo.

Cordialmente;

FERMIN GARCES N
Representante Legal

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE MATERIALES	CODIGO: HSE-FOR-94
		VERSIÓN: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FECHA	PLACA DE LA VOLQUETA	MATERIAL	VOLUMEN TRANSPORTADO M3	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	DOCUMENTACION DEL VEHICULO	FIRMA DEL RESPONSABLE DE OBRA
28-08-23	EJK-783	Recebo	8m3	Luis Palomino	Si	CESARON
24-08-23	CWF240	Madera	12 Tablas	Rios Lozano	Si	CESARON
29-08-23	UAD 483	Recebo	8m3	Luis Palomino	Si	CESARON
12-09-23	UAD 483	Recebo	16m3	Luis Palomino	Si	CESARON
15-09-23	XWJ309	Recebo	40m3	Luis Palomino	Si	CESARON
11-09-23	UAD483	Recebo	56m3	Luis Palomino	Si	CESARON
15-09-23	JDE318	Recebo	40m3	Eduardo Gonzalez	Si	CESARON
15-09-23	UAD483	Recebo	24 m3	Luis Palomino	Si	CESARON
17-09-23	UAD 483	Recebo	8m3	Luis Palomino	Si	CESARON
18-09-23	UAD483	Recebo	24m3	Luis Palomino	Si	CESARON
18-09-23	UAD483	Arena	7m3	Luis Palomino	Si	CESARON
19-09-23	JDE318	Recebo	24m3	Eduardo Gonzalez	Si	CESARON
19-09-23	EJK 785	Recebo	16m3	Leonardo Machado	Si	CESARON
19-09-23	UAD 483	Recebo	48m3	Luis Palomino	Si	CESARON
21-09-23	EJK-785	Recebo	16m3	Leonardo Machado	Si	CESARON
21-09-23	UAD483	Recebo	32m3	Luis Palomino	Si	CESARON
22-09-23	UAD483	Recebo	8m3	Luis Palomino	Si	CESARON

Firma Inspector HSEQ

Firma Residente de obra

Powered by CamScanner

ANEXO 7. ACTAS DE SOCIALIZACIÓN

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNION	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 05-10-23 HORA: 3:00 LUGAR: I.T.S.I ACTA NO.

REUNIÓN CONVOCADA POR	Contratista
TIPO DE REUNIÓN	Reunion de seguimiento
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y Dotación del Comedor y cocina del I.T.S.I. del Distrito Especial Bilbeimar
ORGANIZADOR	Yesenia Alvarez.
APUNTADOR	Yesenia Alvarez
ASISTENTES	Consejo Directivo I.T.S.I, Cesar Narvaez, Yesenia Alvarez

TEMAS DE DISCUSIÓN
Avance de obra
Imprevistos

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

Se realizo reunion de seguimiento con el Comite del colegio I.T.S.I., se da a conocer el avance en obra hasta la Fecha.

Avance Proyecto: Programado 20.79%.
Ejecutado 21,05%.

Powered by CamScanner

Estructura en obra 28 Kilos.

El Comite recomienda al 29 de octubre del 2023 tratar de tener la estructurada montada Para evitar conflicto con el cambio de mandatario

Imprevistos Presentados:

- Tala de arboles
- Traslado de Porton.
- Diseño de la cimentación.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNION	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

COMPROMISOS

- Reunión con el concejo de padres. Para Mostrarles avance hasta la fecha. Jueves 26 de Octubre a las 3 PM.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

CONSEJO DIRECTIVO INDUSTRIAL
5- OCTUBRE-2023

FIRMA ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo	Firma
CésarO. Narváez	Ing. Residente Obra Russy	
Jose A. Zuñiga M.	Rep. Padres Familia	
Adriana Cortes V.	Rep Padres Familia	
Stella Londoño Cortes	Rep. Padres familia.	
Hector Alvarino Mesa	Repte Docentes	
ARIEL GONZALEZ POLANCO	RECTOR	
Martha Liliana Noriega C.	Repres. Docente Primaria	
Greisy Meneses G.	Contralora 2023	
Anderson Baldovino	Personero 2023	
Yesenia Alvarez M.	Profesional social	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 05-10-2023 **HORA:** 11:00 **LUGAR:** I.T.S. I **ACTA NO.**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Secretaria de Infraestructura al contrato 0756-23
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Reunión seguimiento
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja
ORGANIZADOR	Supervisor del Contrato
APUNTADOR	Yesenia Alvarez
ASISTENTES	Alejandro Enriquez, Ibeth Illeras, Andres Garzon, Cesar Narvaez, Wilson Geney

TEMAS DE DISCUSIÓN
Avance de obra

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

Avance programado: 20.79%.
Ejecutado: 21,05%.

Personal en Obra.
Ayudantes: 16 Ayudantes
Oficiales: 2
Maestro: 1.
Ins. HSST: 1
Pro fe. Social: 1
Ing. Residente: 1

Personal encargado de estructura.
1 Soldador
3 Armadores / montadores

Powered by CamScanner

Supervisión sugiere qe se tenga en cuenta personal local para la instalación de la estructura.

Actividades
Instalación de Platinas
Figurado de Acero de refuerzo para vigas aereas
- Montaje de estructura: Soldadura y Ajuste de Pernos, resoldando base.

Actividades por realizar.
-fundición de vigas de 25 x 35

La parte electrica el profesional realizara revisión de la capacidad del transformador entre el 15 a 20 de octubre. Por parte de Geotecnicas.

Estructura.
La semana del 25 al 30 llego una parte de la estructura y el proximo llegara el dia
- 6 de octubre de 2023 Para continuar con el montaje.

Actividades Por realizar.

Encofrado de vigas
Fundida de las 2 columnas restantes
La mitad de las vigas aereas
Continuacion del armado de vigas.

Powered by CamScanner

Pendiente el diseño del Tanque
Se envio la especificación técnica de los Ventiladores.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CODIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diefonoro Enriquez Mora	Supervisor	
Ibeth Tatiana Illeras R.	Ing. civil de seguimiento	
Wilson Rafael Gamez C	Asesor interventoría	
Andrés Camilo Garzón	Interventoría	
Cesar Narvaez O.	Ing. Residente WRUSSY	
Yesenia Alvarez M.	Profesional social	

Powered by CamScanner

ANEXO 8. INFORME SOCIAL

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INFORME SOCIAL

Objeto: Construcción y Dotación del comedor y cocina del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito de Barrancabermeja.	
Actividades ejecutadas en el periodo: 06 de septiembre de 2023 a 05 de octubre de 2023	No. Contrato: 0756-23

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA.

Actas de entorno y de vecindad:

Actividad realizada durante el primer mes de ejecución del proyecto.

Accesibilidad a viviendas y establecimientos

La zona por intervenir en un diámetro de 30 metros no contempla alrededor con casas y/o establecimientos que puedan ser afectados por la obra.

PQRS

- Se recibe las peticiones de manera verbal por parte de la comunidad del I.T.S.I y Supervisión que se incluya mano de obra local en el montaje de la estructura metálica, puesto que el personal encargado de este, es personal que viene de la ciudad de Bogotá.

Reuniones durante la obra.

- Se realizan comités de seguimiento semanales con supervisión del contrato donde se les da a conocer los avances e imprevistos presentados.
- Se realizó reunión de seguimiento con el Consejo Directivo del Colegio Industrial donde se les da a conocer el avance presentado a la fecha, imprevistos. Se reciben las siguientes recomendaciones por parte de los asistentes:
  - El cambio de gobierno puede afectar al proyecto, sugieren tener la estructura montada al 29 de octubre de 2023 para evitar imprevistos con el cambio de gobierno.

Punto de atención a la comunidad.

El punto de atención se encuentra ubicado en las adecuaciones de la obra.

REGISTROS FOTOGRAFICOS.

	
Fecha: 05-10-2023 **Actividad: reunion de seguimiento**	**Fecha: 05-10-2023** **Actividad: reunion de seguimiento**
	
Fecha: 21-09-2023 **Actividad: Comité**	**Fecha: 14-09-2023** **Actividad: Comite**

ANEXO 9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción	Desinfeccion Areas Sanitarias
Fecha	07 de Septiembre de 2023



Descripción	Señalizacion Punto de Acopio Escombros
Fecha	07 de Septiembre de 2023



Descripción	Señalizacion Punto de Acopio Escombros
Fecha	07 de Septiembre de 2023



Descripción	Desinfeccion Areas Sanitarias
Fecha	07 de Septiembre de 2023



Descripción	Señalizacion Punto de Acopio Escombros
Fecha	07 de Septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Orden y Aseo
Fecha	07 de Septiembre de 2023



Descripción	Clasificacion de Residuos Solidos
Fecha	07 de Septiembre de 2023



Descripción	Clasificacion de Residuos Solidos
Fecha	07 de Septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Orden y Aseo
Fecha	07 de Septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Orden y Aseo
Fecha	07 de Septiembre de 2023



Descripción	Retiro de Escombros
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Retiro de Escombros
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Retiro de Escombros
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Retiro de Escombros
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Retiro de Escombros
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Acopio de Escombros
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Retiro de Escombros
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Retiro de Escombros
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Retiro de Escombros
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Retiro de Escombros
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Retiro de Escombros
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Retiro de Escombros
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Retiro de Escombros
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Desinfeccion Areas Sanitarias
Fecha	04 de Octubre de 2023

5.13. RESULTADOS DE ENSAYOS A COMPRESIÓN DEL CONCRETO

SECOIN	**PROCEDIMIENTO P-PS-12** **RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MUESTRAS DE CONCRETO** **NTC - 673**	**CÓDIGO: F-PS-34** **VERSIÓN: 1** **PÁGINA 1 DE 1**

CLIENTE: WRUSSY INGENIEROS S.A.S

CONTRATO: CONTRATO No. 0756-23 "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

PERIODO: AGOSTO 2023

ORDEN DE TRABAJO: 003

LUGAR DE TOMA: OBRA

ID MUESTRA	ESTRUCTURA O ELEMENTO	DIAMETRO PROBETA	ASENTAMIENTO PULG	TEMPERATURA °C	FECHA FUNDIDA	FECHA ENSAYO	EDAD MUESTRA Días	RESISTENCIA ULTIMA kN	ESFUERZO ULTIMO Kgf/cm²	ESFUERZO ULTIMO P.S.I.	% EVOLUCIÓN f´c CONCRETO	RESISTENCIA A LOS 28 DÍAS DISEÑO P.S.I.	ESFUERZO ULTIMO PROMEDIO P.S.I	TIPO DE FALLA
003	VIGAS DE CIMENTACIÓN.	6	1/2	N/A	25-ago-23	1-sep-23	7	305,2	**176**	**2505**	**83**	**3000**	**2311**	**3**
003		6	1/2	N/A		1-sep-23	7	258,0	**149**	**2118**	**71**	**3000**		**3**
003		6	1/2	N/A		8-sep-23	14	474,6	**274**	**3895**	**130**	**3000**	**3630**	**5**
003		6	1/2	N/A		8-sep-23	14	409,9	**237**	**3364**	**112**	**3000**		**5**
003		6	1/2	N/A		22-sep-23	28	503,6	**291**	**4133**	**138**	**3000**	**4233**	**5**
003		6	1/2	N/A		22-sep-23	28	527,9	**305**	**4333**	**144**	**3000**		**5**

INFORMACIÓN ENSAYO:

FORMA DE PROBETA : CILÍNDRICA NORMAL 4"	10,20 cm	ÁREA	**81,713**	cm2
FORMA DE PROBETA : CILÍNDRICA NORMAL 6"	15,00 cm	ÁREA	**176,715**	cm2


VELOCIDAD DE CARGA: 35 psi/s + Ó - 7 psi/s

EQUIPO: INGETEST IT-2001 S/N 20010714

OBSERVACIONES: MIXER PREMEZCLADO

TIPOS DE FALLA DE LOS CILINDROS DE CONCRETO

CONO | CONO Y ROTURA VERTICAL | COLUMNAR | CORTE | FRACTURA



Ensayo	Revisó	Recibió
JORGE PEÑA Laboratorista	Ing. Luis Deivis Rincón Triana REPRESENTANTE LEGAL SECOIN SAS	QA/QC

SECOIN	**PROCEDIMIENTO P-PS-12** **RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MUESTRAS DE CONCRETO** **NTC - 673**	**CÓDIGO: F-PS-34** **VERSIÓN: 1** **PÁGINA 1 DE 1**

CLIENTE: WRUSSY INGENIEROS S.A.S

CONTRATO: CONTRATO No. 0756-23 "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

ORDEN DE TRABAJO: 004

LUGAR DE TOMA: OBRA

ID MUESTRA	ESTRUCTURA O ELEMENTO	DIAMETRO PROBETA	ASENTAMIENTO PULG	TEMPERATURA °C	FECHA FUNDIDA	FECHA ENSAYO	EDAD MUESTRA Días	RESISTENCIA ULTIMA kN	ESFUERZO ULTIMO Kgf/cm²	ESFUERZO ULTIMO P.S.I.	% EVOLUCIÓN f´c CONCRETO	RESISTENCIA A LOS 28 DÍAS DISEÑO P.S.I.	ESFUERZO ULTIMO PROMEDIO P.S.I	TIPO DE FALLA
004	PEDESTALES.	6	1/2	N/A	6-sep-23	13-sep-23	7	473,0	**273**	**3882**	**129**	**3000**	**4009**	**5**
004		6	1/2	N/A		13-sep-23	7	503,8	**291**	**4135**	**138**	**3000**		**5**
004		6	1/2	N/A		20-sep-23	14	523,5	**302**	**4297**	**143**	**3000**	**4464**	**5**
004		6	1/2	N/A		20-sep-23	14	564,3	**326**	**4631**	**154**	**3000**		**5**
004		6	1/2	N/A		4-oct-23	28	620,7	**358**	**5094**	**170**	**3000**	**5432**	**5**
004		6	1/2	N/A		4-oct-23	28	702,9	**406**	**5769**	**192**	**3000**		**5**

INFORMACIÓN ENSAYO:

FORMA DE PROBETA : CILÍNDRICA NORMAL 4"	10,20 cm	ÁREA	**81,713**	cm2
FORMA DE PROBETA : CILÍNDRICA NORMAL 6"	15,00 cm	ÁREA	**176,715**	cm2


VELOCIDAD DE CARGA: 35 psi/s + Ó - 7 psi/s

EQUIPO: INGETEST IT-2001 S/N 20010714

OBSERVACIONES: MIXER PREMEZCLADO

TIPOS DE FALLA DE LOS CILINDROS DE CONCRETO

CONO | CONO Y ROTURA VERTICAL | COLUMNAR | CORTE | FRACTURA



Ensayo
JORGE PEÑA
Laboratorista

Revisó
Ing. Luis Deivis Rincón Triana
REPRESENTANTE LEGAL SECOIN SAS

Recibió
QA/QC
