1. FECHA ELABORACIÓN:	15	10	2023	2. No. INFORME	32	3. SEMANA No.	32
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	09/10/2023 AL 15/10/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 61.936.457,11	2,36%	100,00%	2,36%	100,00%	2,36%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 146.367.647,15	5,57%	100,00%	5,57%	100,00%	5,57%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 907.316.630,93	34,55%	35,00%	12,09%	39,71%	13,72%	4,71%	1,63%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,70	2,55%	3,00%	0,08%	0,00%	0,00%	-3,00%	-0,08%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 655.506.499,83	24,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,46	0,97%	10,00%	0,10%	0,00%	0,00%	-10,00%	-0,10%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,01	1,35%	7,00%	0,09%	0,00%	0,00%	-7,00%	-0,09%
ALCANTARILLADO	$ 37.892.628,70	1,44%	82,00%	1,18%	82,00%	1,18%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,79	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.135.731,10	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 424.437.934,82	16,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 6.226.480,00	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 21.499.495,00	0,82%	100,00%	0,82%	100,00%	0,82%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.626.339.636,19	100,00%		22,29%		23,65%		1,36%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	22,04%	21,50%	0,54%
Durante el periodo	1,61%	0,79%	0,82%
Acumulado Actual	23,65%	22,29%	1,36%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,79%	22,29%
Valor de la Obra Programada	$ 20.748.083,13	$ 585.459.249,30

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,61%	23,65%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 42.284.068,14	$ 621.170.988,94

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

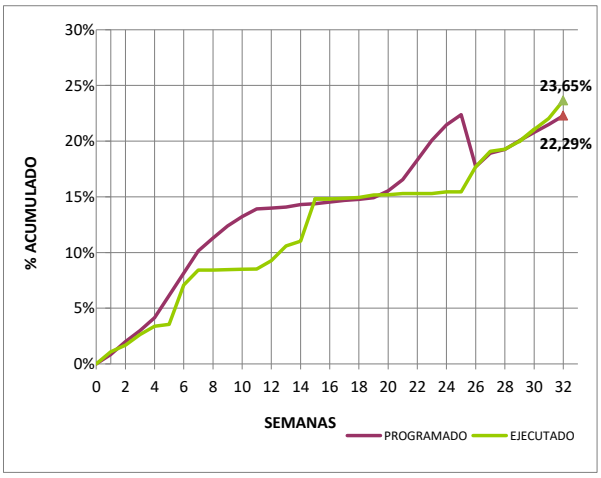

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	16	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	S
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	4	HERRAMIENTA MENOR	20	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	1	RETROCARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	S
OFICIAL	2	MOTOBOMBA	0	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	F
RESIDENTE	1	CAMA BAJA - GRÚA	1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Llegada de formaleta metálica e inicio de encofrado de vigas aereas.
2. Se continúa con el armado e instalación de acero de refuerzo de las vigas aereas.
3. Se continúan los trabajos de soldadura en la estructura metálica, alineación y ajuste de pernos.
4. Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
5. Ingresa a obra la cama baja con grúa, con parte de la estructura metálica y laminas de la placa de entrepiso.
6. Se continúa con el hincado y montaje de columnas y cerchas para la cubierta metálica.
7. Se realiza fundida de concreto de 3000Psi de las vigas aereas armadas en la zona de bodegas y cocina, y fundida de dos columnas restantes.
8. Se continúa con la instalación de platinas en las vigas aereas, que sirven de soporte para las viguetas metálicas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial a la interventoría.

K. JURIDICA

1. En el período de este informe no se presentan modificaciones al contrato de interventoría 0757-23.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e item no previstos N°1 y el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e item no previstos N°1 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:	15 10 2023	No. INFORME	32	SEMANA No.	32
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA				
CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 09 de octubre de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado de formaleta para las vigas aereas.



FECHA FOTO: 10 de octubre de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado de formaleta para las vigas aereas.



FECHA FOTO: 11 de octubre de 2023
DESCRIPCIÓN: Ajuste de pernos y soldadura para la estructura metálica.



FECHA FOTO: 12 de octubre de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado de formaleta para las vigas aereas.



FECHA FOTO: 13 de octubre de 2023
DESCRIPCIÓN: Fundida en concreto de 3000Psi para vigas aereas.



FECHA FOTO: 14 de octubre de 2023
DESCRIPCIÓN: Instalación de columnas de la estructura metálica.
