180.187

Popayán, 25 SEP 2023

INFORME DE COMISIÓN
LEGALIZACIÓN No. Orden de Avance No: 13656 de 2023-09-18

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Realizar visita de supervisión y seguimiento al avance de ejecución de los proyectos y obras referentes al mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en el Municipio de Inzá, Resguardo de Calderas, desde el municipio de POPAYAN (CAUCA) al municipio de INZA.

FECHA Y LUGAR: 21 y 22 de septiembre de 2023 – Municipio de Inzá. Corregimiento de Calderas - Cauca

PARTICIPANTES:

- Ing. Olga Lucia David Hernández. Contratista.
- Ing. Mauricio Gómez. Apoyo a la Supervisión.
- P.E. Juan Carlos Amezquita Londoño. Supervisor

1. DESARROLLO DE LA COMISION

Se viajo hasta el resguardo de Calderas, con el fin de realizar un reconocimiento de los avances en la ejecución del contrato 494 de 2022, correspondiente al Parque Principal.

ACCIONES REALIZADAS.

Inicialmente, nos presentamos con el Gobernador del Cabildo de Calderas Julio Cesar Piñacue Achicue, quien nos recibió de manera cordial y nos informa que, de parte de la comunidad, las obras van muy bien y que todo ha venido desarrollándose de manera normal, nos dió la bienvenida a los funcionarios de la CRC y continuamos con la programación de la visita. Con la Ing Olga Lucia se acordó visitas a los sitios de avance de las obras, por lo cual realizamos visita en 5 puntos o sitios del Parque Principal, con el apoyo del Ing. Mauricio Gómez de lo cual a continuación se relaciona:


Sitio 1. Rampa que da a la Calle y Huellas en concreto.

Se realiza la inspección del sitio constatando las labores de excavaciones, rellenos y retiro en el sitio, se hace la medición de las losas y piso en concreto se encuentran inicialmente 7 losas, una rampa de 4.92 x 1.25 en seguida 4 losas y una loseta de 1,20 x

1,60 luego 10 losas y enseguida una loseta de 1,20 x 1,60 11 losas más y una loseta que remata de 1,60 x 1.05.

Nota. Cada losa y losetas han sido medidas. Se anexa grafico a la presente.

Sitio 2. Trinchos. Trinchos de 12,50 construidos + faltantes 10,20, cuneta medida de 21 por hacer, tubo de salida desagüe instalado de 1,10 mts realizado.

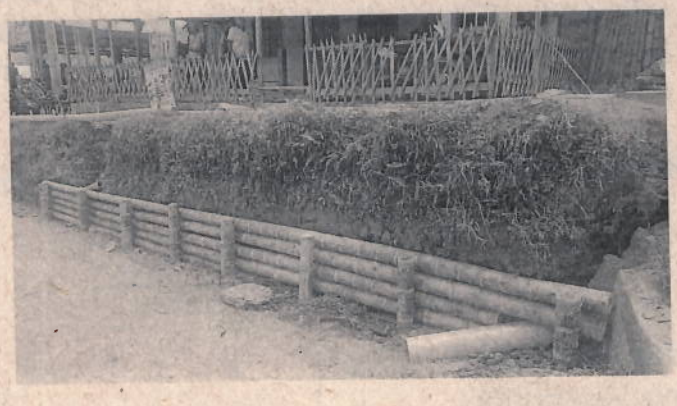


Trinchos, tubos de desagües

Sitio 3. Huellas en concreto. Sendero. Se ha realizado excavaciones, rellenos y retiro, se cuenta el trazado con una medida de 33, 44 x 1,30 de ancho.

Sitio 4. Rasqueteo, resane y pintura para el enlucimiento de sardineles-materas. Se hizo la inspección de los sardineles y materas en la zona periférica del parque, (parte alta del parque y laterales realizando las medidas Así: en la parte alta 32.84, parte lateral con muro 24 metros y luego del muro 41,8 mts hasta el final.

Sitio 5. Gradas en la parte Alta Norte del Parque. En este sitio se encuentran gradas cortas y gradas largas con pintura verde, se toman medidas en las caras pintadas de las gradas y se obtiene un promedio de todas las caras pintadas, así: 5 Gradas cortas (2 L x 0,17 x 5 gradas) y 6 Gradas Largas (2* 0,15 + 9,36 *0,34)

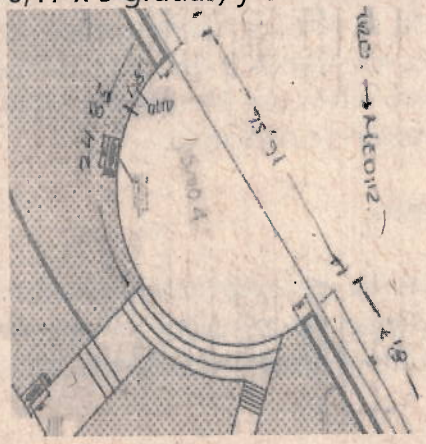

CONCLUSIONES DE LA VISITA

1. La ejecución del contrato viene desarrollándose en condiciones normales, a pesar de que el contrato se reinició el 1 de agosto de 2023 con un plazo final de 44 dias para realizar todas las actividades y con algunas dificultades relacionadas específicamente por las posiciones de la autoridad indígena del Resguardo de Calderas, para dejar trabajar a la contratista, referentes a poner condiciones económicas en la contratación de personal y en oponerse en la ubicación de los juegos infantiles previamente acordadas, fue necesario darle trámite a la respuesta de la Corporación, negando algunas pretensiones, sin embargo, el tiempo de ejecución del contrato se acortó.

2. Finamente se hace reconocimiento de los sitios donde serán instalados los juegos, puntos ecológicos y bancas, La contratista Olga Lucia David Hernández, se comprometió en terminar las labores si la situación de orden público permite la llegada de los elementos.

3. El apoyo del Ingeniero civil Mauricio Gómez en la visita, fue muy importante para realizar las labores de supervisión, traslado la inquietud del ingeniero, a su jefatura, por cuanto el me consulta, si él, va a continuar apoyando esta supervisión y si estará en la liquidación del Contrato, por cuanto esto facilitaría, todas las acciones de supervisión y liquidación. EL Ing. Mauricio G. quedó encargado de elaborar un balance general y avance del contrato, basado en lo visto y medido en la visita realizada.

Anexo cumplido de comisión y registro fotográfico.

Institucionalmente,

JUAN CARLOS AMEZQUITA LONDOÑO
Profesional Especializado Subdirección de Patrimonio Ambiental

Vo. Bo.
CELIO URRESTY MESA
Subdirector de Patrimonio Ambiental
