INFORME FINAL ENTREGA DE OBRA

Barranquilla, octubre 24 de 2023

Señores,
INFIMANIZALES
Arq. Patricia Paola Cubillos López
Asesora de Proyectos
Sra. Luz Adriana Fernández Fernández
Técnico administrativo en gestión documental
Supervisores.

INFORMACIÓN GENERAL

No. CONTRATO:	2023-09-130
OBJETO:	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA LA CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE INFIMANIZALES
VALOR:	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L. ($10.279.884,oo)
CONTRATISTA:	PI DELTA PHI INGENIERIA S.A.S
NIT:	900.351.380-4
REPRESENTANTE LEGAL:	Ing. JULAINE AVILEZ DE LA HOZ C.C. No. 1.045.716.604
CONTRATANTE:	INFIMANIZALES
NIT:	890.801.059-0
REPRESENRTANTE LEGAL:	Dr. ALEJANDRO ARANGO CASTRO C.C. No. 16.073.165
FECHA DE INICIO:	03-10-2023
SUPERVISOR:	Patricia Paola Cubillos López Asesora de Proyectos Luz Adriana Fernández Fernández Técnico administrativo en gestión documental

TABLA DE PORCENTAJE REPRESENTATIVO DE CADA ACTIVIDAD CONTRATADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PORCENTAJE REPRESENTATIVO DE LA ACTIVIDAD
1	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	2,4	0,58%
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA CORTAFUEGO	UND	1	56,03%

3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO IGNIFUGAS O RETARDANTE AL FUEGO, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	100	22,41%
4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN SUPERBOARD DE 10 MM, DOS CARAS	M2	2,5	2,83%
5	REPARACION LOSA (INCLUYE RESANE)	M2	35,7	1,50%
6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	1	7,00%
7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL REDONDO	UND	10	6,06%
8	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES	UND	4	0,93%
9	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS	M2	36	2,65%
			TOTAL:	100,00%

ESTADO ACTUAL - DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE REPRESENTATIVO DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE DESARROLLO ACTUAL	DESCRIPCION
1	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	0,58%	0,58%	EJECUTADO
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA CORTAFUEGO	56,03%	56,03%	EJECUTADO
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO IGNIFUGAS O RETARDANTE AL FUEGO, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	22,41%	22,41%	EJECUTADO
4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN SUPERBOARD DE 10 MM, DOS CARAS	2,83%	2,83%	EJECUTADO
5	REPARACION LOSA (INCLUYE RESANE)	1,50%	1,50%	EJECUTADO
6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	7,00%	7,00%	EJECUTADO
7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL REDONDO	6,06%	6,06%	EJECUTADO
8	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES	0,93%	0,93%	EJECUTADO

9	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS	2,65%	2,65%	EJECUTADO
		AVANCE TOTAL:	100,00%	EJECUTADO EN SU TOTALIDAD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha Inicio:	2/10/2023															
Fecha Final:	24/10/2023															
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	**SEMANA:**	**1**					**2**					**3**				
	EJECUTADA	**2-oct**	**3-oct**	**4-oct**	**5-oct**	**6-oct**	**9-oct**	**10-oct**	**11-oct**	**12-oct**	**13-oct**	**16-oct**	**17-oct**	**18-oct**	**19-oct**	**20-oct**
Capacitación e inducción virtual, Seguridad Operacional, Ambiental, SST y Gestión Social	SI															
Localización y trazado - toma de medidas	SI															
Traslado de material, herramientas y equipos -Asignación de tareas	SI															
DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE (2,4 m2)	SI															
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA CORTAFUEGO (1 und)	SI															
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO IGNIFUGAS O RETARDANTE AL FUEGO, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 (100 m2)	SI															
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN SUPERBOARD DE 10 MM, DOS CARAS (2,5 m2)	SI															
REPARACION LOSA (INCLUYE RESANE) (35,7 m2)	SI															
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG (1 und)	SI															
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL REDONDO (10 und)	SI															
DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES (4 und)	SI															
SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS (36 m2)	SI															

Verificación de Actividades realizadas - Ingeniería de detalle	SI															
Retiro equipos y herramientas	SI															
Limpieza general orden y aseo, retiro de suciedad	SI															

AVANCE DE OBRA

Avance ejecutado acumulado a octubre 24 de 2023: 100%

RESUMEN DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Se efectuó visita física para reconocimiento del lugar y así evaluar las condiciones iniciales y prospectar el cronograma de actividades a seguir, así mismo se realizó verificación de medidas en las unidades presentadas en el pliego de condiciones del proceso.

1. Demolición de muro mampostería: Se inicia la obra con la demolición de muro mampostería en bloque en donde se construye el buque donde posteriormente se instalará puerta cortafuego esto según plano aportado y respetando las medidas que permitan el respectivo vaciado de las carpetas del marco superior y laterales (jambas y dintel).
2. Instalación de puerta cortafuego: se realiza la instalación de la puerta cortafuego con las siguientes características:
   Puerta cortafuego EI2 60C5 resistencia a fuego 60 min
   Marco MC3 REVER conformado en acero de alta resistencia de 1.2 mm = calibre 18 con alejamiento para junta control de humo.
   Hoja 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado 0.7 mm tipo skinpass núcleo ignifugo relleno de lana de roca de densidad 180 kg/m3.
   Pintura electrostática acabado color gris classic RAL7035 resistencia a corrosión 240h en cámara de niebla salina
   Accesorios:
   - Cerradura homologada CE
   - Bisagra homologada CE
   - Manilla M1 para puerta cortafuego ISEO norma DIN en poliamida ignifuga de color negro con alma de acero
   - Juntas adhesivas intumescente perimetral entre marco y hoja de 20 x 2 mm, barra antipánico ISEO rojo – negro tipo toallero categoría C5 durabilidad ≥ 200.000 ciclos de cierre completo en el marco y enganche al dispositivo de cierre en cumplimiento de la norma UEN 1634-2.
   - Brazo hidráulico cierra puerta ISEO blindado resistente a altas temperaturas

Certificaciones:

- UNE (Norma Española)
- NF (Norme Francais)
- IMC (Instituto di Certificazione Industriale per la Meccanica)
- UL (Underwriters Laboratories): safety for fire doors
- CE (Conformité Européenne)

3. Desmonte de lámparas existentes: se procede al desmonte de lámparas existentes, 4 unidades: 2 tipo balastro y 2 directas, cada una con 4 tubos fluorescentes las cuales fueron entregadas a la persona encargada según acta de entrega anexa.
4. Instalación de paneles redondos 18w: se instalan los paneles redondos LED 22.5 x 22.5 de 18w según configuración y especificaciones del plano aportado por la supervisión, se realizó acometida eléctrica extendiendo cableado en alambre AWG 12 y tubería Conduit galvanizada EMT ¾ y soportes en caja de acero galvanizado tipo RADWELL referencia 2400. En total 9 puntos distribuidos en 3 líneas de luminarias cada una de 3 paneles LED instalada a distancia de 1,20 m entre ellas para obtener mejor distribución de la iluminación. Cada panel redondo LED 22.5 x 22.5 de 18w genera 100 lúmenes por lo que cada línea genera 300 lúmenes cumpliendo así con la normativa para la conservación de documentos evitando generar deterioro por exceso de rayos UV e infrarrojos.
5. Instalación de punto eléctrico: Se realizó punto eléctrico ubicado según plano en el sitio donde será instalado el humidificador. Se empleo cableado AWG 12, tubería Conduit galvanizada EMT ¾ a tres líneas, neutro, fase y tierra, caja de acero galvanizado tipo RADWELL ALUMINIO 5800 - RECTANGULAR 2 S y tomacorriente sencillo.
6. Reparación losa cielo raso: encontramos la losa del cielo raso en muy malas condiciones con múltiples fisuras, grietas y desprendimientos de material, los cuales fueron reparados empleando técnica de rayado y apertura de grietas existentes esto con el propósitos de conseguir profundidad para la aplicación de producto a base de resina acrílica y agua y aplicación de lechada cemento, mortero 1:3, para luego nivelar la superficie con Sika Wall – estuco 2, posteriormente se procede a enlucir con la aplicación de estuco acrílico Sika Estuca Acrílico, finalmente se procese al lijado para la homogenización de la superficie y crear porosidad para contribuir a la adherencia de la pintura.
7. Aplicación estucado y pintura ignifuga: se procede al resane de la superficie nivelándola con con Sika Wall – estuco 2, luego se aplico estuco acrílico para proceder con el lijado de las paredes para corregir relieves y generar adherencia a la pintura. Después del lijado se aplica 1 mano de pintura base agua tipo 2 para generar mayor cubrimiento en disolución de 1l de agua x 20l de pintura. Luego de pintada se detallaron los cortes y zonas de difícil acceso para finalmente esperar e secado de la pintura tipo 2 y proceder con la aplicación de 2 manos de pintura tipo 1 base agua no inflamable (ignifuga). La pintura utilizada Sika vinilo T1 y Sika vinilo T2 cumple con la norma NTC1335 pinturas al agua tipo emulsión no inflamables.

8. Construcción de muro en superboard 10 mm 2 caras: Construcción de muro tabique en seco para cierre de vano existente empleando perfiles 120PGU-PGC esto por el ancho del muro existente, se instalan los perfiles proceso constructivo Steel Frame, una vez armado los perfiles estructurales (esqueleto) se procede a la fijación de las láminas superboard 10 mm.
9. Hidro-lavado de pisos: se procede al hidro-lavado baja presión y limpieza con cepillo y detergente neutro obteniendo excelentes condiciones de aseo y limpieza de la superficie.
10. Disposición final: se disponen los residuos generados en sacos de 25kg.

NOVEDADES PRESENTADAS

- Ninguna.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ITEM	OBLIGACION	ESTADO			OBSERVACIONES
		FINALIZADA	EN EJECUCION	NO INICIADA	
1	Efectuar visita física para reconocimiento del lugar y de las actividades propuestas.	X			SE REALIZO PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS
2	Ceñirse a las necesidades expuestas por el instituto.	X			SE DESARROLLARON LAS ACTIVADES CONTRATADAS
3	Los materiales que se vayan a utilizar sean los mismos que se encuentran presentes en las instalaciones de INFIMANIZALES y de la misma calidad.	X			SE CUMPLIO CON LA CALIDAD EXIGIDA DE MATERIALES Y PRODUCTOS
4	Cumplir a cabalidad con la ejecución de las actividades descritas conforme a lo señalado en el presupuesto oficial y el anexo técnico.	X			VER ARCHIVO FOTOGRAFICO
5	Entregar de forma oportuna y funcional la adecuación locativa, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	X			SE ENTREGO LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA
6	Dotación de elementos para la adecuación de acuerdo con lo solicitado por la entidad.	X			SE ENTREGO PUERTA CORTAFUEGOS CON LAS ESPECIFICACIONES EXIGIDAS, VER ARCHIVO FOTOGRAFICO
7	Contar con el personal idóneo y calificado para adelantar todas las actividades necesarias para desarrollar el objeto contractual.	X			SE CONTO CON EL PERSONAL IDONEO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
8	Informar oportunamente al supervisor sobre las dificultades que se presenten en el proceso de ejecución del contrato, con el fin de tomar medidas que permitan remediar la situación.	X			NO SE PRESENTARON
9	Constituir las garantías de cumplimiento con los amparos correspondientes.	X			VER POLIZAS ANEXAS

10	Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales.	X			VER CERTIFICADO ANEXO
11	Atender los requerimientos que sean realizados por el supervisor del contrato en conveniencia de la satisfactoria ejecución contractual.	X			ATENDIDOS EN OBRA
12	Entregar un informe final, en forma impresa y digital, que contenga la información completa de las actividades realizadas.	X			VER INFORME FINAL (ESTE DOCUMENTO)


Se suscribe,


Ing. Julaine Avilez De la hoz
Gerente general
PI DELTA PHI INGENIERIA S.A.S

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

DEMOLICION DE MURO



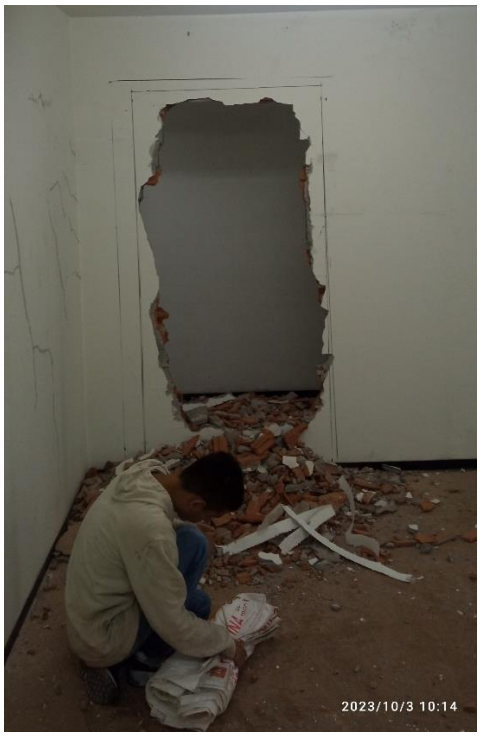

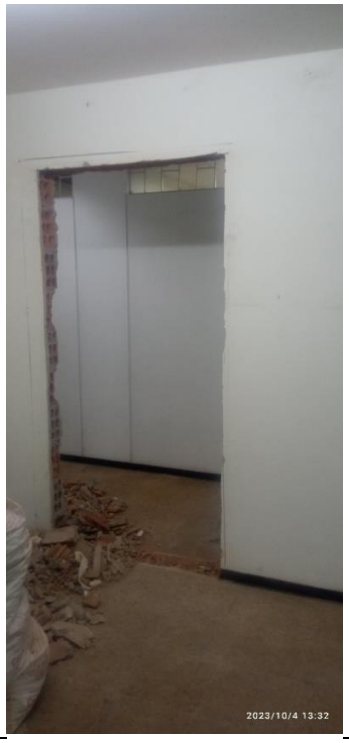



INSTALACION DE PUERTA CORTAFUEGOS













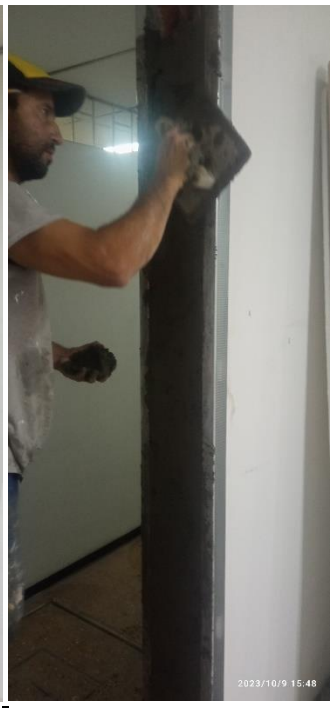


Leonardo m
11 de octubre de 2023 12:00 p. m.

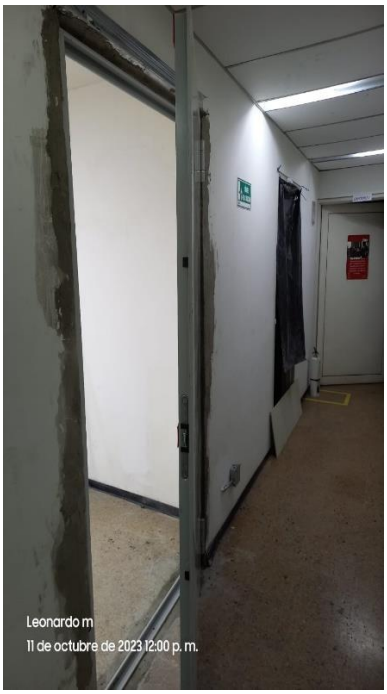
Leonardo m
11 de octubre de 2023 12:00 p. m.



Leonardo m
11 de octubre de 2023 12:00 p. m.


Leonardo m
14 de octubre de 2023 12:56 p. m.



Leonardo m
17 de octubre de 2023 4:14 p. m.

INSTALACION DE MURO SUPERBOARD



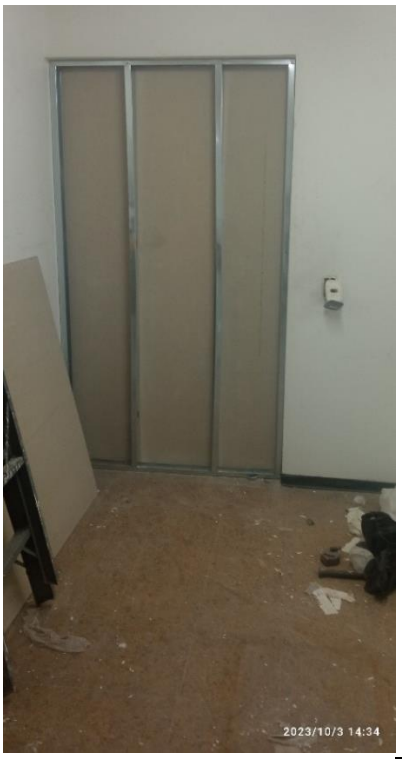



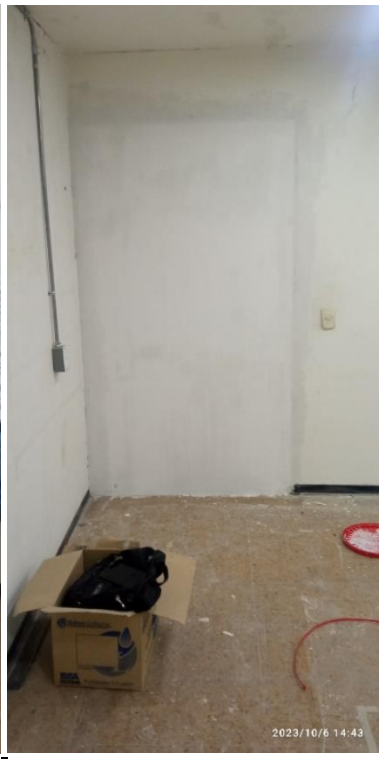

DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES





INSTALACION SALIDA TOMA CORRIENTE



INSTALACION DE PANELES REDONDOS DE 18W






2023/10/5 16:39


Leonardo m
13 de octubre de 2023 3:36 p. m.

REPARACION DE LOSA











Leonardo m
21 de octubre de 2023 10:15 a. m.


Leonardo m
21 de octubre de 2023 10:15 a. m.

ESTUCADO Y PINTURA





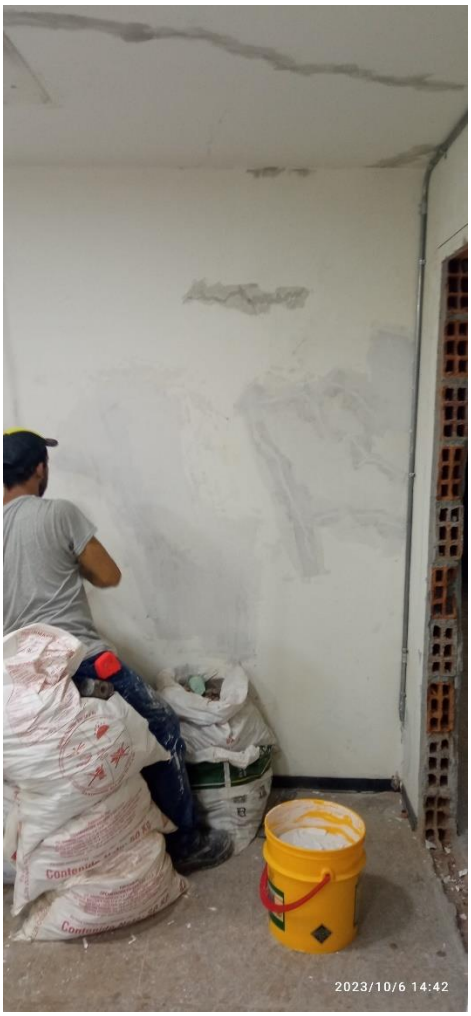


Leonardo m
17 de octubre de 2023 10:29 a. m.


Leonardo m
17 de octubre de 2023 10:29 a. m.


Leonardo m
17 de octubre de 2023 11:57 a. m.


Leonardo m
17 de octubre de 2023 11:57 a. m.


Leonardo m
17 de octubre de 2023 4:18 p. m.


Leonardo m
17 de octubre de 2023 4:17 p. m.

HIDROLAVADO DE PISO





DISPOSICION FINAL





RESULTADOS




Leonardo m
21 de octubre de 2023 12:21 p. m.


Leonardo m
21 de octubre de 2023 12:21 p. m.

Pi Delta Phi
INGENIERÍA
NIT. 900.351.380-4

PI DELTA PHI INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.351.380-4

ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS

Manizales, octubre 6 de 2023

Señores,
INFI-MANIZALES
Ciudad.


REFERENCIA: CONTRATO No. 2023-09-130


OBJETO: "ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA LA CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE INFIMANIZALES".

Respetados señores,

En cumplimiento de las actividades contradas, ítem 8: desmonte de lámparas existentes 4 und, hacemos entrega de lo siguiente:

- 2 lámparas con balastro
- 2 lámparas directas
- 8 tubos fluorescentes

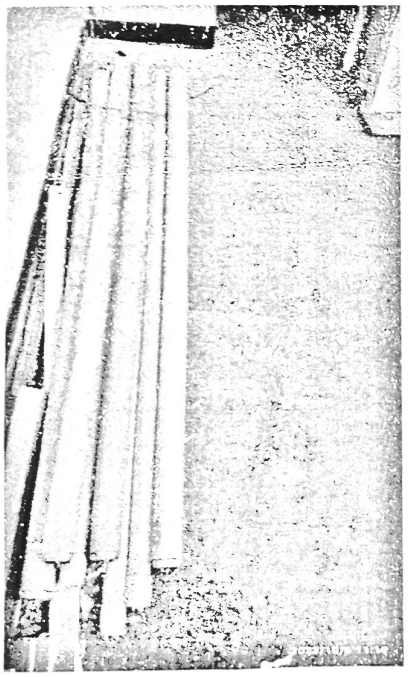

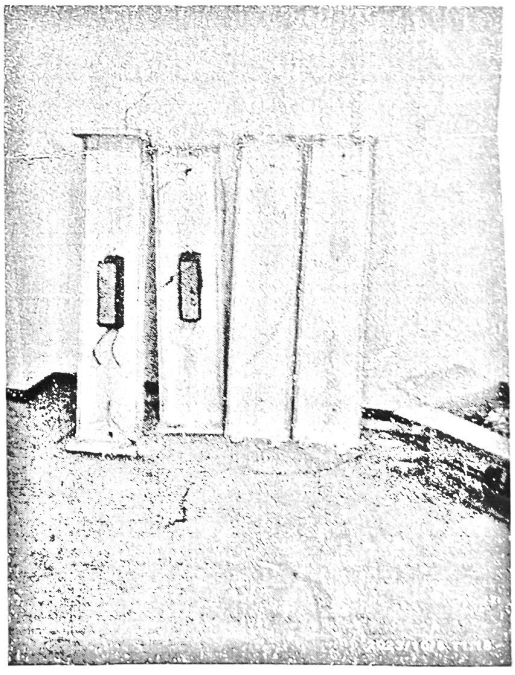

Quien entrega:

Ramiro Velasquéz Franco
Coordinador de obra
PI DELTA PHI INGENIERIA S.A.S

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: inz3ZgNXTILsbXVFu2bnfA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100075381	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	28349422	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/09/2023	24:00 Horas Del	15/10/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	PI DELTA PHI INGENIERIA SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.351.380-4
DIRECCIÓN	KM 13 VIA PUERTO LA YE POSTE 195	**TELÉFONO**	3205790093
ASEGURADO	INFIMANIZALES	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.801.059-0
DIRECCIÓN	CARRERA 22 NO. 18-09 PISO 2	**TELÉFONO**	8737733
BENEFICIARIO	INFIMANIZALES	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.801.059-0
DIRECCIÓN	CARRERA 22 NO. 18-09 PISO 2	**TELÉFONO**	8737733

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.2023-09-130 , CUYO OBJETO ES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO HISTORICO DEL INSTITUTO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 25/09/2023	24:00 Horas Del 15/04/2024	2.055.976,80	6.666,67
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 25/09/2023	24:00 Horas Del 15/10/2026	1.027.988,40	6.666,67
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 15/10/2023	24:00 Horas Del 15/10/2026	2.055.976,80	6.666,67
		TOTAL ASEGURADO	$ 5.139.942,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MAD SEGUROS ASESORES EN RIESGOS E INVERSIO	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	20.000,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	20.000,01
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	4.750,00
TOTAL A PAGAR	$	29.750,01

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de representante legal certifico que la empresa PI DELTA PHI INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 900.351.380-4 ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

En constancia de lo anterior se firma a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2023.

Cordialmente,

JULAINE ANDREA AVILEZ DE LA HOZ
C.C. No. 1.045.716.604
Representante Legal
