	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: BASE AEREA COFAC – ESCUADRON DE INSTALACIONES

FECHA INFORME: Día: 9 Mes: 10 Año: 2023

CONTRATO N°. 031-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: MAURICIO RAVE CUBILLOS

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($112.000.000,00)

FORMA DE PAGO:

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
31 MAYO 2023	PAC JULIO 2023	PRIMER PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE MAYO DE 2023
31 AGOSTO 2023	PAC OCTUBRE 2023	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
31 OCTUBRE 2023	PAC DICIEMBRE 2023	PAGO FINAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE OCTUBRE 2023, POR EL VALOR DEL SALDO DEL CONTRATO.

FECHA FIRMA: Día 13. Mes Abril. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE CORTINAS PARA LAS DEPENDENCIAS EXTERNAS Y ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA."

CONTRATO MODIFICATORIO No.: 1

FECHA DE FIRMA14 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ADICION AL VALOR DEL CONTRATO EN EL RECURSO 10 POR UN VALOR UN VALOR DE $11.000.000

VALOR FINAL DEL CONTRATO CIENTO VEINTE Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($123.000.000,00)

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 25 de abril de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023

Porcentaje Avance en tiempo: 81,48%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 52.99%

VIGENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CORTES EJECUTADOS	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL
VIGENCIA 2023	$ 112.000.000,00	$ 13.810.902,10	$ 59.349.467,78	52,99%
		$ 43.903.799,86		
		$ 1.634.765,83		

RECURS0	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
10	$ 25.000.000,00	$ 8.699.390,28	$ 16.300.609,72
16	$ 87.000.000,00	$ 50.650.077,50	$ 36.349.922,50

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 12.33%

Se realizo el primer PAC JULIO correspondiente al primer corte del 30 de mayo de 2023 por un valor de $13.810.902,10

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 87.67%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MAURICIO RAVE CUBILLOS	19.284.945	CONTRATISTA
ESEDOBER PEÑA	13.616.750	TECNICO INSTALADOR

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí ___X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

El contratista suministro e instalo cortinas, tipo blackout y sheer elegance en el siguiente alojamiento militar:

ITEM	LUGAR Y APTO	DESCRIPCION	TIPO DE CORTINA	DIMENSIONES		AREA M2
				L	A	
15	MIRAGE 401	ALCOBA No.1	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,8	1,8	3,24
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,8	1,8	3,24
		ALCOBA No. 2	CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,8	1,8	3,24
		ALCOBA No. 3	CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	2,5	1,8	4,50

Así mismo, se dio tramite ante el Departamento de Compras de la BACOF.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Está pendiente seguir definiendo la instalación de cortinas para los alojamientos militares y dependencias externas.
Está pendiente por parte del DEPAP realizar los trámites administrativos del segundo corte con PAC OCTUBRE.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. MANUEL FERNADO GONZALEZ DIAZ
FIRMA:	
C.C. No.	80911857
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**02**
		VIGENCIA:	**27/09/2022**

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:


- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.


ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			NO APLICA
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de	**X**		


ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			NO APLICA
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		Se publica el informe de supervisión en el SECOP II
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			NO APLICA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			El contrato está en ejecución y su plazo de ejecución es el 31 de octubre de 2023.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**02**
		VIGENCIA:	**27/09/2022**

REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTON NORTE MIRAGE 402

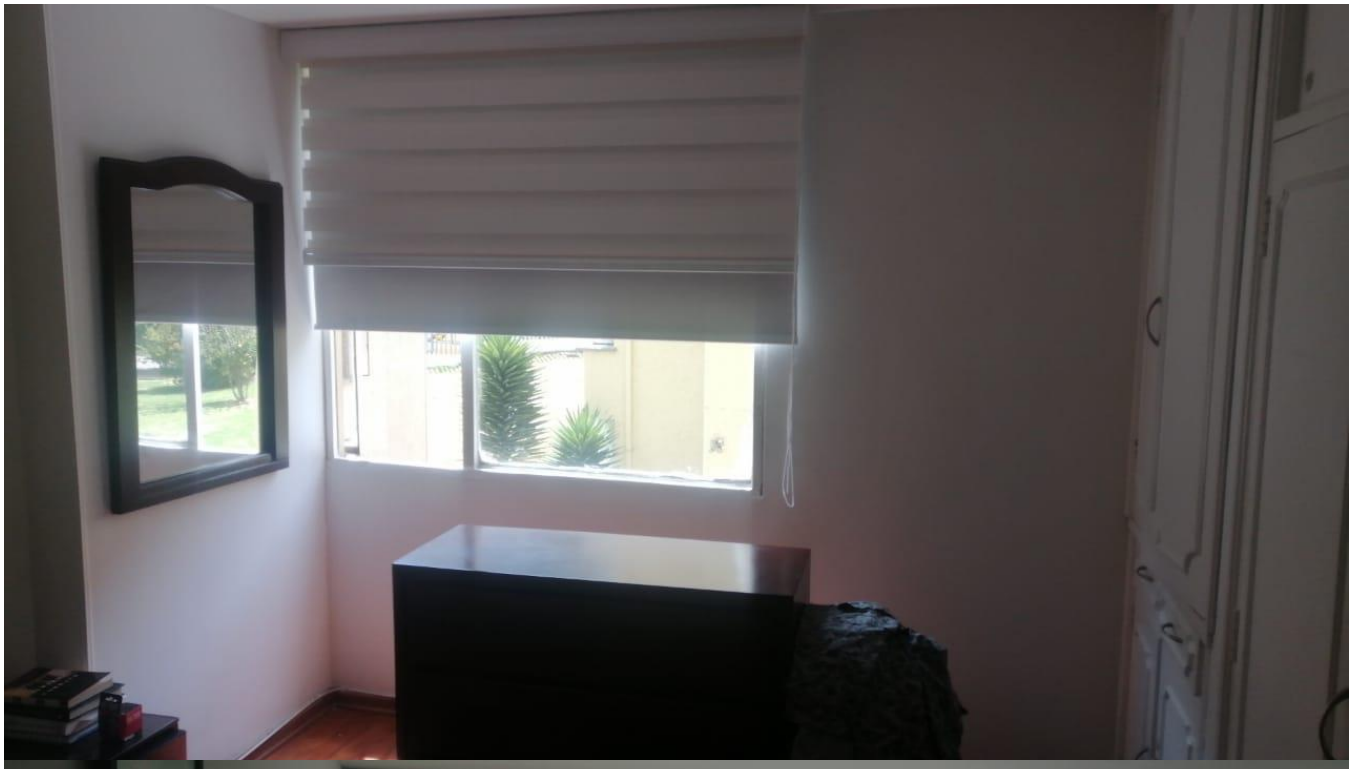

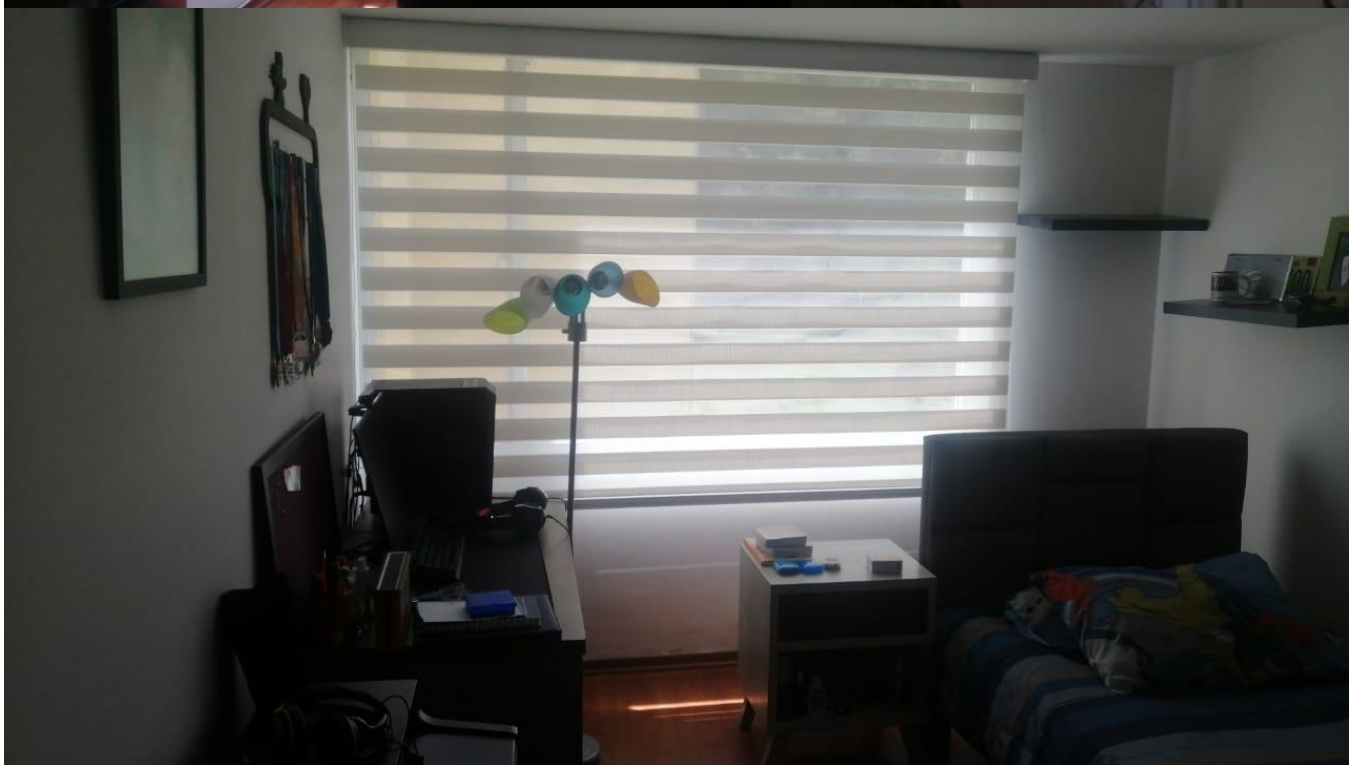

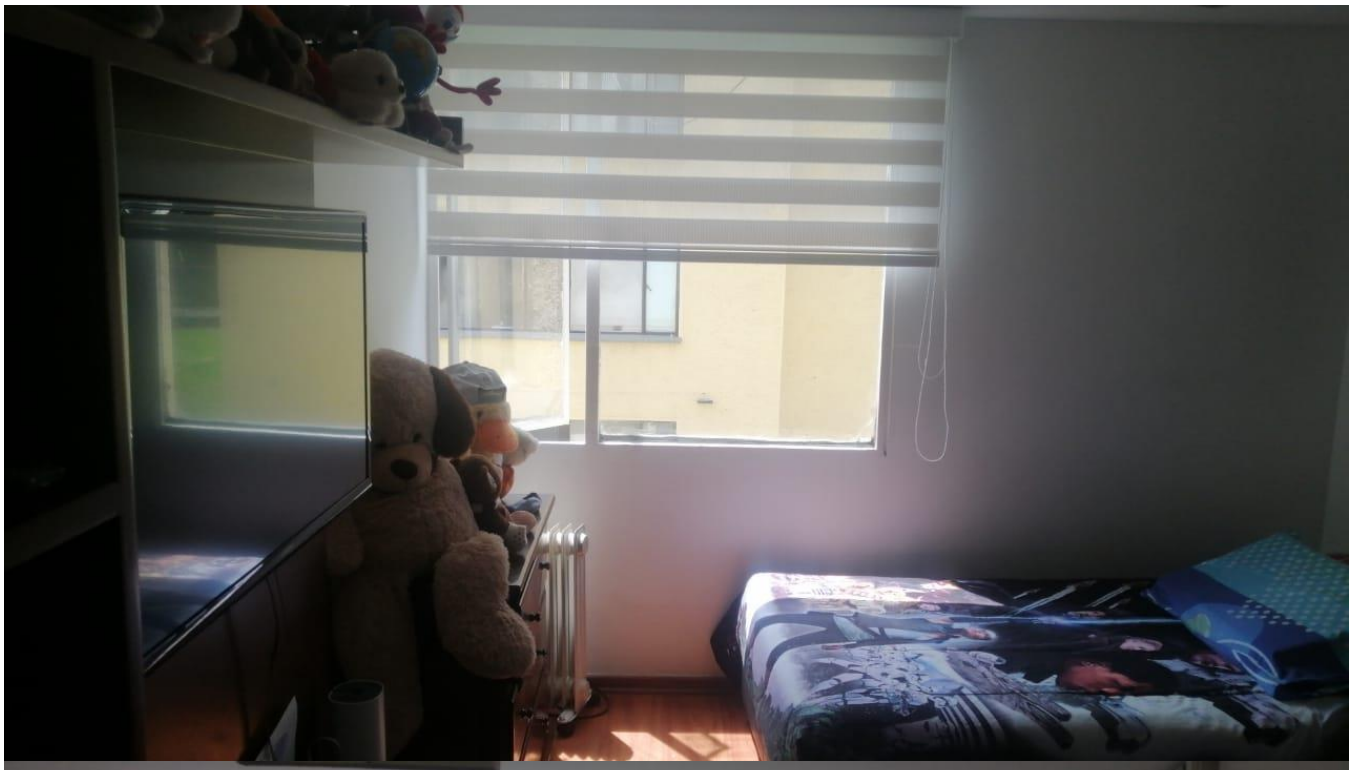



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO

PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: [21] DIA [IX] MES [21] AÑO

DEPENDENCIA (CLIENTE): CORONEL GALINDO

JEFE DE LA DEPENDENCIA (CARGO)

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESMS

SERVICIO: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: GT. GG. B. COFAC BACOF 2023

FECHA INICIO DEL SERVICIO: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

FECHA FIN DEL SERVICIO: DIA [21] MES [IX] AÑO [23]

HORAS HOMBRE [ ]

SE CUMPLIO: SI [ ] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

[1] [2] MALO [3] [4] [5] REGULAR [6] [7] BUENO [8] [9] MUY BUENO [10] EXCELENTE

OBSERVACIONES

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA BLACK OUT [X]
SHEER ELEGANCE [X]
PANEL JAPONES [ ]
SCREEN 5% [ ]
SCREEN COUPAGE [ ]
OTRO [ ]

X

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)
CARGO

Powered by CamScanner

Mauricio Rave Cubillos

NIT. 19.284.945-2

Bogotá D.C, octubre 2 de 2023



Vertical

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ATN: T2 MANUEL F. GANZALEZ DIAZ
Ciudad

Referencia: Contrato 031-00-B-COFAC-BACOF-2023



Romana

Muy cordialmente confirmo medidas tomadas en Edificio Estivez, apartamento 502

EDIFICIO ESTIVEZ APTO 502			
UBICACIÓN	**MEDIDAS**		**CORTINA**
	ANCHO /ALTO		
ALCOBA PRINCIPAL	1,7	1,9	BLACK OUT
	1,7	1,9	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	1,7	1,9	BLACK OUT
	1,7	1,9	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	1,7	1,9	BLACK OUT
	1,7	1,9	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 3	1,4	2,1	BLACK OUT
	1,4	2,1	SHEER ELEGANCE
SALA	2,7	2,2	PANEL JAPONES




Minipersiana

Atentamente,



MAURICIO RAVE CUBILLOS



Pisos

Mauricio Rave Cubillos

NIT. 19.284.945-2

Bogotá D.C, octubre 24 de 2023



Vertical

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ATN: T2 MANUEL F. GANZALEZ DIAZ
Ciudad

Referencia: Contrato 031-00-B-COFAC-BACOF-2023



Romana

Muy cordialmente confirmo medidas tomadas en Kennedy A apartamento 504

KENEDY A-504

UBICACIÓN	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA	3	2,15	PANEL JAPONES
	1	2,15	
ALCOBA PRINCIPAL	2,6	1,6	BLACK OUT
	2,6	1,6	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	2,5	1,6	BLACK OUT
	2,5	1,6	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	2,5	1,6	BLACK OUT
	2,5	1,6	SHEER ELEGANCE




Minipersiana

Atentamente,



MAURICIO RAVE CUBILLOS



Pisos

Mauricio Rave Cubillos

NIT. 19.284.945-2

Bogotá D.C, octubre 24 de 2023



Vertical

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ATN: T2 MANUEL F. GANZALEZ DIAZ
Ciudad

Referencia: Contrato 031-00-B-COFAC-BACOF-2023



Romana

Muy cordialmente confirmo medidas tomadas en los siguientes sitios,

LABRADOR 9 – 303


UBICACIÓN	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA	3	2,27	PANEL JAPONES
ALCOBA PRINCIPAL	2,1	2,1	BLACK OUT
	2,1	2,1	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	1,2	2,1	BLACK OUT
	1,2	2,1	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	2,1	2,1	BLACK OUT
	2,1	2,1	SHEER ELEGANCE



Minipersiana

SAUSALITO BLOQUE 15 – 502

UBICACIÓN	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA	3	2,2	PANEL JAPONES
ALCOBA PRINCIPAL	1,5	1,7	BLACK OUT
	1,5	1,7	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	1,5	1,7	BLACK OUT



Pisos

Mauricio Rave Cubillos

NIT. 19.284.945-2

	1,5	1,7	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	1,5	1,7	BLACK OUT
	1,5	1,7	SHEER ELEGANCE

FORTALEZA

UBICACIÓN	CD	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
FORTALEZA	6	**1,3**	**2,9**	Cortina enrollable Screen7% Coupage Grey



Vertical

UBICACIÓN	CD	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
DIFRA	10	**1**	**2,4**	Cortina enrollable en Black Out



Romana


Atentamente,



MAURICIO RAVE CUBILLOS



Minipersiana



Pisos

Mauricio Rave Cubillos

NIT. 19.284.945-2

Bogotá D.C, octubre 24 de 2023



Vertical

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ATN: T2 MANUEL F. GANZALEZ DIAZ
Ciudad

Referencia: Contrato 031-00-B-COFAC-BACOF-2023



Romana

Muy cordialmente confirmo medidas tomadas en los siguientes sitios,

RISARALDA 13-438


UBICACIÓN	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA	2,84	2,2	**PANEL JAPONES**
ALCOBA PRINCIPAL	1,2	1,7	BLACK OUT
	1,2	1,7	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	1,35	1,7	BLACK OUT
	1,35	1,7	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	1,35	1,7	BLACK OUT
	1,35	1,7	SHEER ELEGANCE



Minipersiana

RISARALDA 13-439

UBICACIÓN	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA	2,84	2,2	**PANEL JAPONES**
ALCOBA PRINCIPAL	1,2	1,7	BLACK OUT
	1,2	1,7	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	1,35	1,7	BLACK OUT
	1,35	1,7	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	1,35	1,7	BLACK OUT
	1,35	1,7	SHEER ELEGANCE



Pisos

Mauricio Rave Cubillos

NIT. 19.284.945-2




Vertical



Romana



Minipersiana



Pisos

RISARALDA 13-137

UBICACIÓN	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA	2,84	2,2	**PANEL JAPONES**
ALCOBA PRINCIPAL	1,2	1,7	BLACK OUT
	1,2	1,7	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	1,35	1,7	BLACK OUT
	1,35	1,7	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	1,35	1,7	BLACK OUT
	1,35	1,7	SHEER ELEGANCE

CAPELLANIA BLOQUE V- 106

UBICACIÓN	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA	3,5	2,25	**PANEL JAPONES**
ALCOBA PRINCIPAL	1,65	1,8	BLACK OUT
	1,65	1,8	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	1,65	1,8	BLACK OUT
	1,65	1,8	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	1,65	1,8	BLACK OUT
	1,65	1,8	SHEER ELEGANCE

CAPELLANIA BLOQUE V-305

UBICACIÓN	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA	3,5	2,25	**PANEL JAPONES**
ALCOBA PRINCIPAL	1,65	1,8	BLACK OUT
	1,65	1,8	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	1,65	1,8	BLACK OUT
	1,65	1,8	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	1,65	1,8	BLACK OUT
	1,65	1,8	SHEER ELEGANCE

Atentamente,



MAURICIO RAVE CUBILLOS

Mauricio Rave Cubillos

NIT. 19.284.945-2

Bogotá D.C, octubre 31 de 2023



Vertical

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ATN: T2 MANUEL F. GANZALEZ DIAZ
Ciudad

Referencia: Contrato 031-00-B-COFAC-BACOF-2023

Muy cordialmente confirmo medidas tomadas en los siguientes sitios:



Romana

ANDES TORRE 4-103

UBICACIÓN	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA	1,7	2,24	
	3,2	2,24	PANEL JAPONES
ALCOBA PRINCIPAL	2,36	1,65	BLACK OUT
	2,36	1,65	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	2,36	1,65	BLACK OUT
	2,36	1,65	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	2,36	1,65	BLACK OUT
	2,36	1,65	SHEER ELEGANCE




Minipersiana

FORTALEZA

UBICACIÓN	CD	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
FORTALEZA	6	1,3	2,9	Cortina enrollable Screen7% Coupage Grey

UBICACIÓN	CD	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
IFRA	10	1	2,4	Cortina enrollable en Black Out



Pisos

Mauricio Rave Cubillos

NIT. 19.284.945-2

SANIDAD MILITAR

UBICACIÓN	CANTIDAD	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA DE JUNTAS	6	1	1,6	SHEER ELEGANCE
OFICINA DIRECTOR	5	1	1,6	
	2	2	1,8	
	1	2,5	1,8	
	1	1	1,8	
PERSONAL ADMINISTRAT	17	1	1,6	
CORONEL GONZALEZ	2	1,96	2,4	
DRA. AMANDA	2	1,8	2,15	
CORONEL ZAMUDIO	3	2,05	1,97	
	1	1,2	1,2	
	1	2,03	2,2	
PERSONAL ADMINISTRATIVO P2	1	1,3	1,6	
	1	1	1,6	




Vertical



Romana



Minipersiana



Pisos

Atentamente,

MAURICIO RAVE CUBILLOS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 31 (DIA) 10 (MES) 2023 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): Edificio Mirage Apto 402

JEFE DE LA DEPENDENCIA: (CARGO)

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESINS

SERVICIO: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: 031-00-B-COFAC-BACOF-2023

(CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 31 (DIA) 10 (MES) 2023 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 31 (DIA) 10 (MES) 2023 (AÑO)

HORAS HOMBRE: 3

SE CUMPLIO: [X] SI [ ] NO [ ] PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3	4 5 6	7	8 9	10
MALO	REGULAR	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS:

BLACK OUT	[X]
SHEER ELEGANCE	[X]
PANEL JAPONES	[X]
SCREEN 5%	[X]
SCREEN COUPAGE	[ ]
OTRO	[ ]

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: FECHA DE LA SOLICITUD

PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ] DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

DEPENDENCIA (CLIENTE): T. DHTSNCJ PENA

JEFE DE LA DEPENDENCIA: CAPELLANIA V-305
(CARGO)

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESINS

SERVICIO: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: 031-00-B-COFAC-BACOF-2023
(CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

FECHA FIN DEL SERVICIO: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

HORAS HOMBRE: [ ]

SE CUMPLIO: SI [ ] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3	4 5 6	7	8 9	10
MALO	REGULAR	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA: BLACK OUT
SHEER ELEGANCE
PANEL JAPONES
SCREEN 5%
SCREEN COUPAGE
OTRO

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)
CARGO

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: FECHA DE LA SOLICITUD

PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ] DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

DEPENDENCIA (CLIENTE): TEC CAMPO MARTE

JEFE DE LA DEPENDENCIA: CAPELLANIA V-106 (CARGO)

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESINS

SERVICIO: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: 031-00-B-COFAC-BACOF-2023 (CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

FECHA FIN DEL SERVICIO: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

HORAS HOMBRE: [ ]

SE CUMPLIO: SI [ ] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3	4 5 6	7	8 9	10
MALO	REGULAR	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS:

- BLACK OUT [X]
- SHEER ELEGANCE [X]
- PANEL JAPONES [X]
- SCREEN 5% [ ]
- SCREEN COUPAGE [ ]
- OTRO [ ]

X

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO 1121837193.

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD

DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

DEPENDENCIA (CLIENTE): T-2 ALDANA

JEFE DE LA DEPENDENCIA: RISARALDA (CARGO) 438

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESINS

SERVICIO: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: 031-00-B-COFAC-BACOF-2023

(CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO:

DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

FECHA FIN DEL SERVICIO:

DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

HORAS HOMBRE: [ ]

SE CUMPLIO: SI [ ] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3	4 5 6	7	8 9	10
MALO	REGULAR	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS:

- BLACK OUT
- SHEER ELEGANCE
- PANEL JAPONES
- SCREEN 5%
- SCREEN COUPAGE
- OTRO

Jonathan Aldana.

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD [ ] DIA [ ] MES [ ] AÑO

DEPENDENCIA (CLIENTE): T-2 PACHECO

JEFE DE LA DEPENDENCIA: RISARALDA 439
(CARGO)

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESINS

SERVICIO: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: 031-00-B-COFAC-BACOF-2023
(CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: [ ] DIA [ ] MES [ ] AÑO

FECHA FIN DEL SERVICIO: [ ] DIA [ ] MES [ ] AÑO

HORAS HOMBRE: [ ]

SE CUMPLIO: [SI] [NO] [PARCIAL]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3	4 5 6	7	8 9	10
MALO	REGULAR	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS:

BLACK OUT	☑
SHEER ELEGANCE	☑
PANEL JAPONES	☑
SCREEN 5%	☐
SCREEN COUPAGE	☐
OTRO	☐

Yina Marquez
GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)
CARGO

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: FECHA DE LA SOLICITUD

PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ] DIA [7] MES [X] AÑO [23]

DEPENDENCIA (CLIENTE): CAP DIEGO CORTES

JEFE DE LA DEPENDENCIA: SARGENTO - LS-502
(CARGO)

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESINS

SERVICIO: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: 031-00-B-COFAC-BACOF-2023
(CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

FECHA FIN DEL SERVICIO: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

HORAS HOMBRE: [ ]

SE CUMPLIO: SI [ ] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3	4 5 6	7	8 9	10
MALO	REGULAR	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA:
- BLACK OUT
- SHEER ELEGANCE
- PANEL JAPONES
- SCREEN 5%
- SCREEN COUPAGE
- OTRO [X]

X

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)
CARGO

Powered by CamScanner
