
INFORME DE OBRA FINAL (DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

CONTRATO DE OBRA No. 020 DEL AÑO 2022. **"CONSTRUCCION TRAMO DE RED FLUVIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"**



ELABORADO POR:

CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS.

Contratista

C.C. 6.805.417 de Florencia

INTRODUCCION

En el presente trabajo se plantea una propuesta para la construcción de tramo de la red fluvial. dirigido a la Institución educativa la esperanza, para generar un espacio óptimos que integre las diferentes disciplinas académicas, se hace necesario adecuar y mejorar la infraestructura física con la construcción de una red fluvial nueva para lograr tal fin, razón por la cual mediante el contrato de obra No. 020 de 2022, que tiene por objeto **"CONSTRUCCION TRAMO DE RED FLUVIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"** se realizara la construcción de un tramo de red fluvial, ubicado en la institución educativa la esperanza en el municipio de Florencia/Caquetá.

En el presente informe de obra se presenta una descripción detallada de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, exactamente desde el 28 octubre de 2022 al 30 de noviembre de 2022, en este documento se contempla información general del proyecto; de igual forma se relaciona el personal empleado en las diferentes actividades realizadas.

“CONSTRUCCION TRAMO DE RED FLUVIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Realizar un estudio de pre factibilidad para la construcción del tramo de red fluvial para la población estudiantil de la institución educativa La esperanza, que permita mejorar las condiciones de salubridad, calidad de vida de sus estudiantes, y disminuir así las problemáticas ambientales.

1.2 ALCANCE DEL TECNICO.

El proyecto se basa en la construcción de redes hidráulicas, compuesta por un área de 126 ml de tubería en PVC CORRUGADA conectado a 2 patios internos. Y lo cual se debe cumplir con las especificaciones técnicas. Para garantizar la calidad del proyecto.

1.3 LOCALIZACION GENERAL.

Florencia es un municipio colombiano, capital del departamento de Caquetá. Es el municipio más poblado del suroriente del país por su número de habitantes. Es conocido como La Puerta de Oro de la Amazonía Colombiana.

La cabecera municipal homónima es una ciudad joven, punto de convergencia de los municipios del norte y del sur del Caquetá. Está ubicada en la zona de piedemonte entre la Cordillera Oriental y la Amazonia, en la margen derecha del río Hacha, lo cual le da una posición privilegiada ambientalmente al ser el enlace entre la Región Andina y la Región Amazónica. Dista 519 km de la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia. Cuenta con 163 323 habitantes de acuerdo con la proyección del DANE para 2012.2 Su extensión territorial es de 2292 km², su altitud media es de 242 msnm, su precipitación media anual es de 3840 mm y su temperatura promedio es de 25° C. Está constituida por cuatro comunas en su área urbana y siete corregimientos en su área rural.




Imagen 1: ubicación Municipio de Florencia

1.4 LOCALIZACION ESPECIFICA.

A continuación, se evidencia la ubicación de la Institución educativa la esperanza, ubicado en el municipio de Florencia, Caquetá.



Imagen 2: Foto tomada de zona de las baterías sanitarias.

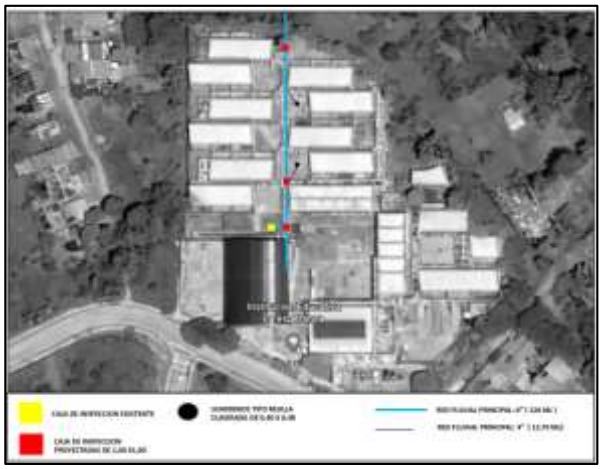

Carrera 4ª No. 14ª – 75 Barrio Porvenir
Teléfono: 436-1287 Celular: 313-4193851
Email: ingcivilcarlos84@hotmail.com
Florencia - Caquetá

2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA.

2.1 TABLA No. 1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 020 - 2022
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS
NIT	6.805.417
OBJETO	**"CONSTRUCCION TRAMO DE RED FLUVIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"**
VALOR:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 34.456.985) MCTE.
FORMA DE PAGO:	LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA PAGARA CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO U ORDEN DE SUMINISTROS EN DOS PAGOS, UNO CORRESPONDIENTES A UN ANTICIPO DEL 40% EQUIVALENTE A LA SUMA DE TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 13.782.794,00) EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA. B. EL SALDO POR EL VALOR DE VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 20.674.191,00) AL FINALIZAR LA OBRA A SATISFACCION, SEGÚN LAS CONDICIONES SUMINISTRADA Y FACTURADA.
DURACIÓN	DOS (2) MESES
FINALIZACION DE LA OBRA INICIAL	28 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	FLORENCIA, CAQUETA

- SUSPENDIDA ( )
- EN EJECUCIÓN ( )
- **TERMINADA** **(X)**

2.2 INFORME DE ACTIVIDADES.

Durante el tiempo de ejecución transcurridos desde el **28 de OCTUBRE 2022 hasta el 01 de DICIEMBRE 2022**, se realizaron actividades de obra como (Preliminares, excavaciones y rellenos, instalaciones redes aguas lluvias y acabados de pisos).

El día 28 de octubre del 2022 se da inicio con las actividades preliminares, se inicia la intervención el tramo de red fluvial de 126 ml de tubería de PVC Corrugada de 6” y 12,70 ml de tubería PVC Corrugada de 4”.

Se da inicio con la localización y replanteo del área intervenir, y se da inicio a la demolición de placa de contrapiso existente. se marca las áreas a intervenir por tramos, se hace la señalización de la obra respectiva cumpliendo con la norma de seguridad y salud en el trabajo.

Teniendo toda la placa de piso en un 100% se da inicio la excavación de las áreas, se inicia con un nivel de 0,80 mts en la caja de inspección inicial, al terminar con la red principal instalada en su totalidad se generar una caja de inspección final al interior de la institución estaca caja termino con la excavación de 1.45 mt de profundidad.

Al tener un 100% de tubería instalada en el tramo del interior de la institución se inicia con la instalación de red al exterior de la institución se conduce a la fuente hídrica más cercana.

Al tener la red fluvial principal instalada en su totalidad, se da inicio al fundimiento en concreto de las cajas de inspección 2, y en el lugar de intervención se va generar 2 cajas que van a recibir el agua lluvia del bajante del polideportivo existente.

Se continua con la reparación de placa de contrapiso en las áreas que se intervinieron, y también la reparación del piso de los pasillos en loseta de arcilla y acabado en granito.

El día 30 de Noviembre 2022 se le hace entrega a la entidad contratante de todas las actividades e ítems contratados, entregados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato.

2.3 VIGENCIAS DEL CONTRATO

FECHA INICIAL DE LA OBRA: 28/10/2022	
PLAZO INICIAL:	Dos (02) mes
SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	28 octubre 2022
FINALIZACION INICIAL:	28 diciembre 2022
FINALIZACION FINAL:	30 noviembre 2022
PLAZO TOTAL:	Dos (02) meses

2.6 CUADRO DE BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA	
Valor inicial del contrato	**$ 34.456.985**
Anticipo del 40%	**($ 13.782.794)**
Valores Adicionales	($ 0)
Valor Total de la Obra	**$ 34.456.985**
Valor Obra Suprimida	($ 0)

PAGOS PARCIALES	
Pago Acta de recibo final de Obra a la terminación total de las actividades del contrato.	**($ 20.674.191)**
NOTA: A la fecha del presente informe no se ha presentado pagos parciales	

RESULTADOS	
Total, ejecutado por el contratista de obra hasta la fecha	**$ 34.456.985**
Saldo restante por ejecutar al contratista del contrato de obra hasta la fecha	**$ 0**
Porcentaje de obra ejecutada hasta la fecha según avance físico verificado	**100%**
NOTA: SE HA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD LA OBRA.	

Carrera 4ª No. 14ª – 75 Barrio Porvenir
Teléfono: 436-1287 Celular: 313-4193851
Email: ingcivilcarlos84@hotmail.com
Florencia - Caquetá



CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS
INGENIERO CIVIL

Carrera 4ª No. 14ª – 75 Barrio Porvenir
Teléfono: 436-1287 Celular: 313-4193851
Email: ingcivilcarlos84@hotmail.com
Florencia - Caquetá

3. CONDICIONES CLIMATICAS

El clima nos ha generado mucha resistencia en el cumplimiento de la programación de obra, debido a que las lluvias entre moderadas e intensas se han presentado ocupando un 5%, 40%, 43% y 50% en los meses evaluados respectivamente, lo cual se puede visualizar en los formatos de estado del tiempo.

3.1 CALIDAD DE OBRA

Se cumple con todos los requisitos de calidad de materiales y de obra solicitados por cada uno de sus ítems, para una mejor durabilidad y mejor acabado.

3. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA.

1. PRELIMINARES

REGISTRO 01	REGISTRO 02
Localización y replanteo (Sin equipo topográfico)	
	

Carrera 4ª No. 14ª – 75 Barrio Porvenir
Teléfono: 436-1287 Celular: 313-4193851
Email: ingcivilcarlos84@hotmail.com
Florencia - Caquetá

REGISTRO 03	REGISTRO 04
Demolición placa piso (Incluye Ret. De escombros)	
	

2. EXCAVACIONES Y RELLENO

REGISTRO 03	REGISTRO 04
Excav. Manual (Mat. Com y cong. Inc. Ret. De escombros)	
	

REGISTRO 03	REGISTRO 04
Relleno manual con material selec. De excav (Inc. Compactación equipo rana)	
	

3. INSTALACIONES REDES AGUAS LLUVIAS

REGISTRO 03	REGISTRO 04
Sum. E inst. tubería de PVC tipo corrugado D=6", pagado ml	
	

Carrera 4ª No. 14ª – 75 Barrio Porvenir
Teléfono: 436-1287 Celular: 313-4193851
Email: ingcivilcarlos84@hotmail.com
Florencia - Caquetá

REGISTRO 03	REGISTRO 04
Sum. E inst. tubería de PVC tipo corrugado D=4", pagado ml	
	

REGISTRO 03	REGISTRO 04
Cajas de inspección de 1,00x1,00 pagado en un	
	

Carrera 4ª No. 14ª – 75 Barrio Porvenir
Teléfono: 436-1287 Celular: 313-4193851
Email: ingcivilcarlos84@hotmail.com
Florencia - Caquetá

REGISTRO 03	REGISTRO 04
Sumidero de cortina de 0,40 x 0,40. Incluye rejilla cuadrada metalica	
	

4. ACABADOS DE PISO

REGISTRO 03	REGISTRO 04
Placa contrapiso en cto. de 2500 P.S.I e=0,10m	
	

REGISTRO 03	REGISTRO 04

Reparación de piso peatonal existente.	
	


4. CONCLUSIONES.

De acuerdo con el anterior informe se concluye que:

- ✓ El clima ha afectado directamente el desarrollo de las actividades.
- ✓ Se dispuso por parte del contratista de obra, las herramientas generales y equipos de obra requeridos para el desarrollo de los trabajos, al igual que los materiales y personal de obra necesarios.
- ✓ Se ha realizado el proceso controlado de almacenamiento de basuras.
- ✓ El personal de obra cuenta con los elementos de protección personal EPP como lo son: botas, casco, guantes, tapabocas, gafas.
- ✓ Se le manifiesta a la supervisión del contrato, que se es necesario para futuros proyectos, intervenir los 3 patios internos que no se pudieron intervenir, generando una solución del 100% a los problemas de inundación de los patios internos.

- ✓ Se realizó la toma de muestras de concreto para la verificación de la resistencia del concreto de placa de contrapiso.

Atentamente;



Carlos Andrés Salazar Rojas

C.C. 6.805.417 de Florencia

Contratista

Carrera 4ª No. 14ª – 75 Barrio Porvenir
Teléfono: 436-1287 Celular: 313-4193851
Email: ingcivilcarlos84@hotmail.com
Florencia - Caquetá



CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS
NIT: 6805417-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 4 A 14 A 75 BRR PORVENIR, Florencia, Caquetá, Colombia
Tel. 312 4790865
Email. ingcivilcarlos84@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764031600377 válida desde 2022-07-25 hasta 2023-01-25 rango desde FE1-23 hasta FE1-50.

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
NIT: 901149191-8
Dirección: HACIENDA EL PUERTO URBANIZACION LA GLOR, Florencia, Caquetá, Colombia
Teléfono: 3138468020
Email: laesperanza@florencia.edu.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE1 - 28**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**13:11:48**
FECHA FIRMADO:	**30/11/2022 13:11:50**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	11	2022	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1004	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$28.714.154,00		0,00	$28.714.154,00
2	1001	ADMINISTRACIÓN	WSD	1,00	$3.732.840,00		0,00	$3.732.840,00
3	1002	IMPREVISTOS	WSD	1,00	$574.283,00		0,00	$574.283,00
4	1003	UTILIDAD	WSD	1,00	$1.435.708,00		0,00	$1.435.708,00

Notas:
PAGO ACTA DE RECIBO FINAL - CTO No 020 DEL 2022 CONSTRUCCION TRAMO DE RED FLUVIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA L ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

SON: (treinta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta y cinco pesos)
CUFE: c44103e787432b85f40b34b47951a488b953e4320700ca4b1db3e45bb765df621f3ae4cfc663872dc4e529c7e729495b

Subtotal:	$34.456.985,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$34.456.985,00

Firma Digital: QYceMZTgJrcRV+G29oXsRDfhJVAjptSwdvzdf0ppe6dtyseLO2lKouh4kOD6MrCl d0TdzFZIO/HRLRy56MxnQF49t7NSapC5hijV4AYtV046+QpFarth13UJv5RpuRj2 4NLTaZSL+lGRoq6ZpEbRCWTRUlVofcMovwdbB/k/8u/PMOZmdZ/5cJe9E/fQhRBs cgvajhivzJIB3zZoFrwtq7/quUQM4knjJaf MFFoZ6K+cKP7q0eEK4lti50dCp4MF 7gFAgaG4ds6wbK0riRC6VCCZPRApk4MWgfvOZoRnC3uz2sSShX53hkceCvylrlrr IhtzQEgA252CkfaoHUDf ZQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE FLORENCIA
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Creada mediante Decreto No. 0063 del 18/01/2016
Actualizada mediante Decreto No. 000315 del 20/09/2019
NIT: 901.149.191-8 DANE: 118001004191

INFORME DE SUPERVISION No. 2 Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 020-2022 DEL 28/10/2022 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA y CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: **30/11/2022**	Nombre del Contratista: **CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS**	No. Contrato: **020-2022 del 28 de octubre de 2022**
Objeto del contrato: **CONSTRUCCION TRAMO RED FLUVIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA – CAQUETÁ.**		
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA		
Nit ó C.C. número	C. C. No 6.805.417	
Dirección	CARRERA 4 No. 14-75 B/ PORVENIR	
Teléfono	3134193851	
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de Ahorros No. 0560078160000200	Banco: Davivienda
Fecha de suscripción	28/10/2022	
Fecha de Iniciación	27/12/2022	
Fecha de Terminación	27/12/2022	
Plazo	dos (02) meses	
Valor Inicial	$ 34.456.985	
Suspensiones: (fecha)		En días y/o Meses:
Terminación Anticipada:		
Reanudaciones: (fecha)		
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	$ 34.456.985
	Tiempo de Ejecución:	31/10/2023 hasta el 30/11/2022
	Porcentaje Inicial	100%
ESTADO FINANCIERO		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE FLORENCIA
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Creada mediante Decreto No. 0063 del 18/01/2016
Actualizada mediante Decreto No. 000315 del 20/09/2019
NIT: 901.149.191-8 DANE: 118001004191

	Valor Total del contrato:	$34.456.985
	Valor a pagar	$20.674.191
	Saldo del contrato	0
	Anticipo	$ 13.782.794
VALOR DEL PAGO SOLICITADO **(aplica para responsables IVA)**	Factura No. **FE1-28**	**FE1-28**
	Fecha de la factura	30-11-2022
	Periodo facturado	-
	Valor antes de IVA	$34.456.985
	IVA	$ 0,00
	Valor a pagar	$34.456.985
	No. C.D.P.: **081-2022**	Fecha: 10/10/2022
	No. R.P.: **090-2022**	Fecha: 28/10/2022
	Aportes de Seguridad Social	
	No de Planilla ASOPAGOS: **24479868**	Entidad: AFP - COLPENSIONES EPS - NUEVA EPS ARL - POSITIVA 27-10-2022 Valor: $290.000
	No. de Planilla de ASOPAGOS: 24668403	Entidad: AFP - COLPENSIONES EPS - NUEVA EPS ARL - POSITIVA 24-11-2022 Valor: $290.000
	No. de Planilla de ASOPAGOS: **8622256916**	24-11-2022 Valor: $619.200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE FLORENCIA
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Creada mediante Decreto No. 0063 del 18/01/2016
Actualizada mediante Decreto No. 000315 del 20/09/2019
NIT: 901.149.191-8 DANE: 118001004191

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago.
DOCUMENTO SOPORTES	**1.Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales)** **2. Informe de ejecución en medio físico.**

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Supervisor: **ELIANA VERONICA CORTES BOCANEGRA**	
Nombre del funcionario responsable: **ELIANA VERONICA CORTES BOCANEGRA**	
Cargo o contrato: **Rectora**	Firma

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Creada mediante Decreto No. 0063 del 18/01/2016
Actualizada mediante Decreto No. 000315 del 20/09/2019
NIT: 901.149.191-8 DANE 118001004191

ORDEN DE PAGO RP N°. 18 **VIGENCIA FISCAL: 2022**

FECHA: **31/10/2022**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS**
C.C. Y/O NIT : **6.805.417**
DIRECCION : **CRA 4 No. 14A-75**

CONCEPTO					VALOR
PAGO ANTICIPO DEL 40% CONTRATO No. 020-2022 CONSTRUCCION RED FLUVIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA					$ 13.782.794,00
IMPUTACIÓN CONTABLE			VALOR DE LA CUENTA		
DESCRIPCION	*VALOR*		MAS IVA		
Gasto	$ 13.782.794		**VALOR TOTAL**		**$ 13.782.794,00**
Inversión			RETENCIÓN EN LA FUENTE	0,2%	$ 0,00
Retenciones		$ -	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3,5%	
BANCOS		$ 13.782.794	RETEIVA	15%	
ANTICIPO			ICA	0,4%	$ 0,00
			ANTICIPO		$ 0,00
TOTALES	$ 13.782.794,00	$ 13.782.794,00	**NETO A PAGAR**		**$ 13.782.794,00**

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MDA

V° B° ORDENADOR DEL GASTO	RECIBÍ EL VALOR DE LA PRESENTE CUENTA	C.D.P. N° 081-2022 REG. PRES. N°. 090-2022 Forma de pago TRANSFERENCIA CTA. CTE. N°. 220-620-45417-3 BANCO: POPULAR
RECTORA	C.C. 6'805.417	TESORERA

banco popular

Fecha Actual: 2022/10/31 | Hora Ingreso: 14:52 IP: 186.179.100.169

ADRIANA GARZON ORTIZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/10/31 11:33
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	PLANO AGUAS	PJ5001NWCJ	2022/10/31	$13,782,794.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Enviado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220620454181	2022/10/31	$13,782,794.00	6805417	CARLOS ANDRES SALAZAR	Banco Davivienda	0560078160000200	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	6805417	**No. Producto Destino**	0560078160000200
Valor Transacción	$13,782,794.00	**No. Identificación Originador**	000000901149191
Nombre Receptor	CARLOS ANDRES SALAZAR	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Banco Davivienda	**Referencia de Pago**	000000000000000000000000 000000000000000000000000
No. Dígito Chequeo	1	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente	**Respuesta**	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Institución Educativa La Esperanza
Creada mediante Decreto No. 0063 del 18/01/2016
Actualizada mediante Decreto No. 000315 del 20/09/2019
NIT: 901.149.191-8 DANE:118001004191

ORDEN DE PAGO SGP N°. 121 **VIGENCIA FISCAL: 2022**

FECHA: **2/12/2022**

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA DEBE A:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS**
C.C. Y/O NIT : **6.805.417-5**
DIRECCION : **CRA 4A No. 14A-75**
TELEFONO : **312 4790865**

CONCEPTO	VALOR
PAGO CONTRATO No. 020-2022 CONSTRUCCION DE TRAMO DE RED FLUVIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA	$ 34.456.985,00

IMPUTACIÓN CONTABLE			VALOR DE LA CUENTA		$ 34.456.985,00
DESCRIPCION	*VALOR*		MAS IVA		$ 0,00
Gasto	$ 34.456.985,00		**VALOR TOTAL**		**$ 34.456.985,00**
Inversión			RETENCIÓN EN LA FUENTE	6%	
Retenciones		$ 826.968	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2,0%	$ 689.140,00
Bancos		$ 19.847.223,00	RETEIVA	15%	
PAGO ANTICIPADO		$ 13.782.794	RETEICA	0,4%	$ 137.828,00
			CXP		$ 13.782.794,00
TOTALES	$ 34.456.985,00	$ 34.456.985,00	**NETO A PAGAR**		**$ 19.847.223,00**

SON: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MDA CTE

V° B° ORDENADOR DEL GASTO	ACREEDOR RECIBÍ EL VALOR DE LA PRESENTE CUENTA	C.D.P. N° **2022-091** REG. PRES. N°. **2022-091** Forma de pago **TRANSFERENCIA** CTA. AHO. N°. **220-620-45417-3** BANCO: POPULAR
RECTORA	C.C. 6.805.417	TESORERA

banco popular

Fecha Actual: 2022/12/02 | Hora Ingreso: 10:13 IP: 186.179.100.169

ADRIANA GARZON ORTIZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/11/30 12:28
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo
Pagos	PAGO ARQUITECTO	PLB001JODI	2022/12/02	$19,847,223.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Enviado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220620454173	2022/12/02	$19,847,223.00	6805417	CARLOS ANDRES SALAZAR	Banco Davivienda	0560078160000200	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	6805417	**No. Producto Destino**	0560078160000200
Valor Transacción	$19,847,223.00	**No. Identificación Originador**	000000901149191
Nombre Receptor	CARLOS ANDRES SALAZAR	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Banco Davivienda	**Referencia de Pago**	000000000000000000000000 000000000000000000000000
No. Dígito Chequeo	1	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente	**Respuesta**	
