CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

SALIDA
Fecha: 07/01/2023
Consecutivo: SED-4077646-2022-032
General

Señores
CONSORCIO INTERCEL
Ant CARLOS ENRIQUE ESCOBAR LEGUIZAMO
Representante legal
Interventoría
gerencia@intersaingenieria.com, gerencia@celqo.com, tecnica@intersaingenieria.com
consorciointercel@gmail.com

Referencia: SED-NO.COI.PCCNTR.4077646-2022 cuyo objeto es OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10.

Asunto: **REMISION DE PROGRAMACION GENERAL V01 Y FLUJO DE INVERSION V01**

Respetado Arquitecto,


Con el fin de dar cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales remitimos en adjunto en editable y pdf los archivos correspondientes a la Programación General y Flujo de inversión del proyecto V01, ajustado con la fecha de inicio de acuerdo con el acta de inicio aprobada y suscrita, para su revisión y seguimiento. Solicitamos su aprobación a fin de quemar la línea base 1 para su respectivo seguimiento.

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada y quedamos pendientes de sus comentarios.

Cordialmente,

CAROLINA ROA DIAZ
DIRECTORA DE OBRA
CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
Proyecto: Carlos Botia Calderon – Profesional Programación y Presupuestos
Anexos: PROGRAMACION GENERAL V01 Y FLUJO DE INVERSION V01

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec
1		**OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SED - GRUPO 10**	**340,94 días**	**vie 07/10/22**	**sáb 02/12/23**	
2		**INICIO PROYECTO**	**72,94 días**	**vie 07/10/22**	**mar 03/01/23**	
3		LEGALIZACION DEL CONTRATO	20 días	vie 07/10/22	lun 31/10/22	
4		ACTA DE INICIO	0 días	mar 03/01/23	mar 03/01/23	3
5		VISITA PARQUES RED PROXIMIDAD	30 días	lun 31/10/22	mar 06/12/22	3
6		**INICIO OBRAS**	**268 días**	**mié 04/01/23**	**sáb 02/12/23**	
7		905 - COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO - SEDE B LA CABAÑA	253 días	lun 23/01/23	sáb 02/12/23	5;4
8		920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C SAN VICENTE	72 días	mié 04/01/23	vie 31/03/23	5;4
9		916 - COLEGIO ATAHUALPA - SEDE A	72 días	lun 06/02/23	vie 05/05/23	5;4
10		917 - COLEGIO PABLO NERUDA - SEDE B ANTONIO NARIÑO	120 días	mié 04/01/23	jue 01/06/23	5;4
11		925 - COLEGIO LA FELICIDAD	35 días	lun 15/05/23	mar 27/06/23	5;4
12		921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA	79 días	lun 06/02/23	lun 15/05/23	5;4
13		914 - COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A SIMON BOLIVAR	120 días	mié 04/01/23	jue 01/06/23	5;4
14		DILE FONTIBON	45 días	mar 08/08/23	sáb 30/09/23	5;4
15		BODEGA FONTIBON	30 días	mar 08/08/23	mié 13/09/23	5;4
16		FABRICA DE TIZA FONTIBON	30 días	mié 13/09/23	jue 19/10/23	5;4;1
17		867 - COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA - SEDE A CASTILLA	93 días	lun 08/05/23	vie 01/09/23	5;4;1
18		844. COLEGIO SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA	80 días	mié 04/01/23	jue 13/04/23	5;4
19		856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A	96 días	mar 21/03/23	mié 19/07/23	5;4
20		832 - COLEGIO KENNEDY - SEDE C LOS HEROES	186 días	mié 04/01/23	jue 24/08/23	5;4
21		863 - COLEGIO KENNEDY - SEDE D ROSA MARIA GORDILLO	79 días	jue 24/08/23	mié 29/11/23	5;4;2
22		890 - COLEGIO NELSON MANDELA - SEDE A	79 días	lun 27/03/23	mié 05/07/23	5;4
23		826 - COLEGIO JACKELINE - SEDE A	96 días	jue 01/06/23	jue 28/09/23	5;4;1
24		825 - COLEGIO ISABEL II - SEDE A	100 días	lun 15/05/23	sáb 16/09/23	5;4;1
25		839 - COLEGIO CLASS - SEDE C ROMULO GALLEGOS	72 días	mar 04/07/23	vie 29/09/23	5;4
26		821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO	253 días	lun 23/01/23	sáb 02/12/23	5;4
27		912 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE A VAN UDEN TORRE NORTE	60 días	lun 29/05/23	vie 11/08/23	5;4
28		904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN	72 días	mié 04/01/23	vie 31/03/23	5;4
29		ATENCION EMERGENCIAS	268 días	mié 04/01/23	sáb 02/12/23	5;4
30		**FIN DEL PROYECTO**	**0 días**	**sáb 02/12/23**	**sáb 02/12/23**	**7;8;9;**

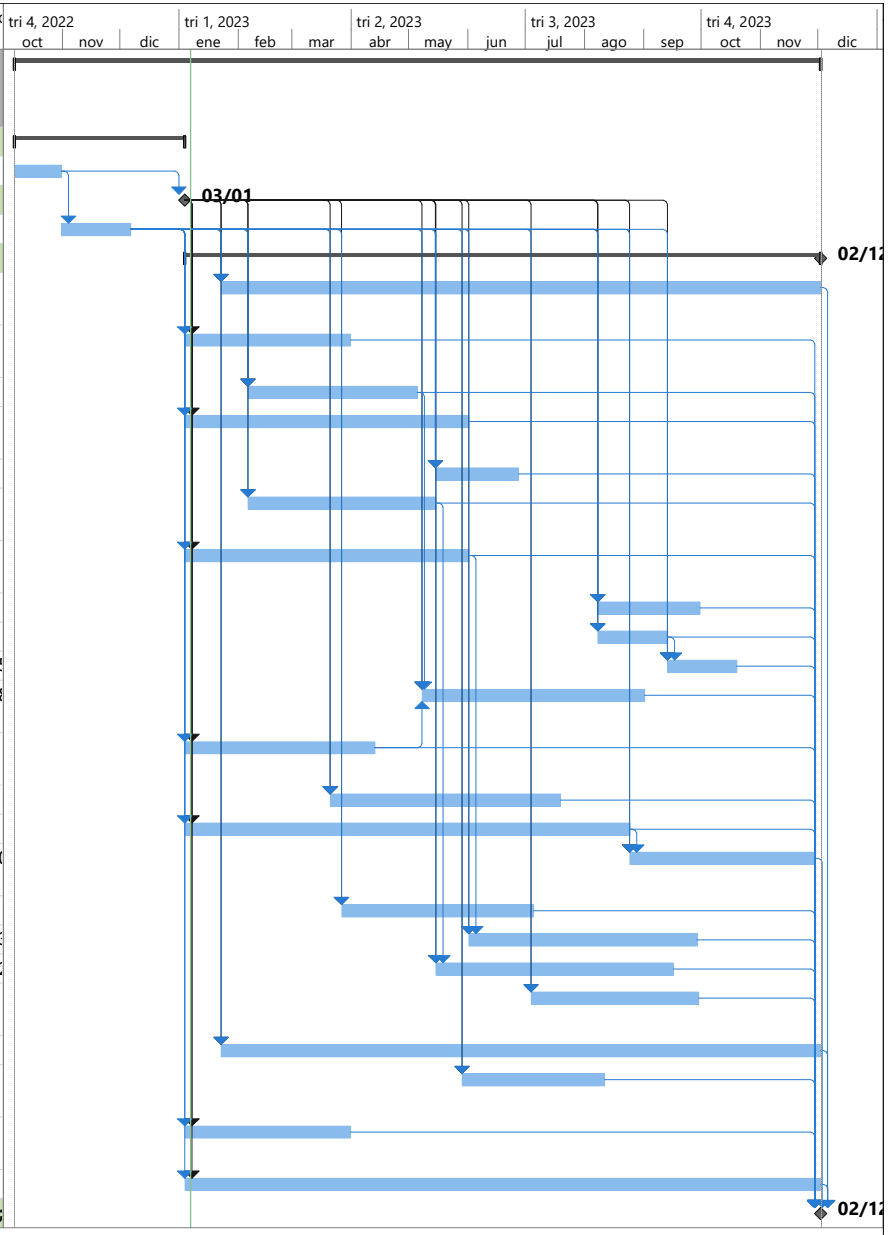

Proyecto: SED GRUPO 10 V01 2
Fecha: sáb 07/01/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

PGC - V01.00	FT-009 V01
NO CONTRATO	SED C01.PCCNTR.4077646
FECHA	ene-23

FLUJO DE INVERSION DEL PROYECTO

PROYECCION SEMANAL V01 -00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA

INICIO	FIN	SEMANA	VR ACUMULADO - MILLONES
		SEM 0	
03/01/2023	09/01/2023	SEM 1	41,36
10/01/2023	16/01/2023	SEM 2	86,99
17/01/2023	23/01/2023	SEM 3	162,61
24/01/2023	30/01/2023	SEM 4	218,18
31/01/2023	06/02/2023	SEM 5	273,75
07/02/2023	13/02/2023	SEM 6	367,73
14/02/2023	20/02/2023	SEM 7	461,71
21/02/2023	27/02/2023	SEM 8	555,69
28/02/2023	06/03/2023	SEM 9	649,67
07/03/2023	13/03/2023	SEM 10	770,35
14/03/2023	20/03/2023	SEM 11	891,02
21/03/2023	27/03/2023	SEM 12	1.011,69
28/03/2023	03/04/2023	SEM 13	1.132,36
04/04/2023	10/04/2023	SEM 14	1.253,04
11/04/2023	17/04/2023	SEM 15	1.373,71
11/04/2023	17/04/2023	SEM 16	1.494,38
18/04/2023	24/04/2023	SEM 17	1.615,06
18/04/2023	24/04/2023	SEM 18	1.735,73
25/04/2023	01/05/2023	SEM 19	1.856,40
25/04/2023	01/05/2023	SEM 20	1.977,07
02/05/2023	08/05/2023	SEM 21	2.097,75
02/05/2023	08/05/2023	SEM 22	2.219,51
09/05/2023	15/05/2023	SEM 23	2.341,27
09/05/2023	15/05/2023	SEM 24	2.405,85
16/05/2023	22/05/2023	SEM 25	2.570,43
16/05/2023	22/05/2023	SEM 26	2.664,22
23/05/2023	29/05/2023	SEM 27	2.758,00
23/05/2023	29/05/2023	SEM 28	2.900,74
30/05/2023	05/06/2023	SEM 29	3.043,48
30/05/2023	05/06/2023	SEM 30	3.282,21
06/06/2023	12/06/2023	SEM 31	3.420,94
06/06/2023	12/06/2023	SEM 32	3.559,68
13/06/2023	19/06/2023	SEM 33	3.698,41
13/06/2023	19/06/2023	SEM 34	3.810,51
20/06/2023	26/06/2023	SEM 35	3.922,62
20/06/2023	26/06/2023	SEM 36	4.068,36
27/06/2023	03/07/2023	SEM 37	4.214,11
27/06/2023	03/07/2023	SEM 38	4.381,03
04/07/2023	10/07/2023	SEM 39	4.547,96
04/07/2023	10/07/2023	SEM 40	4.685,01
11/07/2023	17/07/2023	SEM 41	4.822,05
11/07/2023	17/07/2023	SEM 42	5.026,14
18/07/2023	24/07/2023	SEM 43	5.230,23
18/07/2023	24/07/2023	SEM 44	5.434,70
25/07/2023	31/07/2023	SEM 45	5.639,17
25/07/2023	31/07/2023	SEM 46	5.807,05
01/08/2023	07/08/2023	SEM 47	5.974,94
01/08/2023	07/08/2023	SEM 48	6.179,41
08/08/2023	14/08/2023	SEM 49	6.383,88
08/08/2023	14/08/2023	SEM 50	6.572,14
15/08/2023	21/08/2023	SEM 51	6.760,39
15/08/2023	21/08/2023	SEM 52	6.912,59
22/08/2023	28/08/2023	SEM 53	7.064,78
22/08/2023	28/08/2023	SEM 54	7.245,34
29/08/2023	04/09/2023	SEM 55	7.425,89
29/08/2023	04/09/2023	SEM 56	7.563,09
05/09/2023	11/09/2023	SEM 57	7.700,28
05/09/2023	11/09/2023	SEM 58	7.853,21
12/09/2023	18/09/2023	SEM 59	8.006,13
12/09/2023	18/09/2023	SEM 60	8.159,06
19/09/2023	25/09/2023	SEM 61	8.311,98
19/09/2023	25/09/2023	SEM 62	8.437,48
26/09/2023	02/10/2023	SEM 63	8.662,98
26/09/2023	02/10/2023	SEM 64	8.746,93
03/10/2023	09/10/2023	SEM 65	8.810,87
03/10/2023	09/10/2023	SEM 66	8.921,33
10/10/2023	16/10/2023	SEM 67	9.127,79
10/10/2023	16/10/2023	SEM 68	9.304,50
17/10/2023	23/10/2023	SEM 69	9.554,03
17/10/2023	23/10/2023	SEM 70	9.800,93
24/10/2023	30/10/2023	SEM 71	10.019,67
24/10/2023	30/10/2023	SEM 72	10.224,96
31/10/2023	06/11/2023	SEM 73	10.371,06
31/10/2023	06/11/2023	SEM 74	10.517,16
07/11/2023	13/11/2023	SEM 75	10.636,74
07/11/2023	13/11/2023	SEM 76	10.791,79
14/11/2023	20/11/2023	SEM 77	10.976,85
14/11/2023	20/11/2023	SEM 78	11.215,95
21/11/2023	27/11/2023	SEM 79	11.265,04
21/11/2023	27/11/2023	SEM 80	11.390,10
28/11/2023	04/12/2023	SEM 81	11.419,92

