CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	38	**DEL**	domingo, 24 de septiembre de 2023	**AL**	sábado, 30 de septiembre de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	262	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	Safrid Ingeniería SAS	**Interventor**	Consorcio Inter colegios 2022
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022
Fecha de suscripción del contrato	jueves, 6 de octubre de 2022	**Fecha de suscripción del contrato**	jueves, 24 de noviembre de 2022
Valor Inicial	$13.954.280.882,00	**Valor Inicial**	$ 951.138.738,00
Plazo Inicial	12 meses	**Plazo Inicial**	13 meses
Plazo Actualizado	12 meses	**Plazo Actualizado**	13 meses
Fecha de Iniciación	miércoles, 11 de enero de 2023	**Fecha de Iniciación**	jueves, 22 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación*	miércoles, 10 de enero de 2024	**Fecha de Terminación**	domingo, 21 de enero de 2024
Prórroga No.1	Tres (03) meses, quince (15) días.	**Prórroga No.1**	Tres (03) meses, veinte (20) días
Adición No.1	$5.370.000.000,00	**Adición No.1**	$ 310.122.937,00
Fecha Actualizada de Terminación	jueves, 25 de abril de 2024	**Fecha Actualizada de Terminación**	sábado, 11 de mayo de 2024
Valor Contrato Actualizado	$19.324.280.882,00	**Valor Contrato Actualizado**	$ 1.261.261.675,00
No póliza contrato de obra	14-44-101164899	**No póliza contrato de interventoría**	NB-100235369
Fecha aprobación	jueves, 20 de abril de 2023	**Fecha aprobación**	martes, 27 de diciembre de 2022

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
Cumplimiento del contrato	11/01/2023 - 27/10/2024	$ 3.864.856.176,40	Cumplimiento	22/12/2022 - 22/07/2024	$ 190.227.747,60
Estabilidad y Calidad de la obra	11/01/2024 - 11/01/2026	$ 3.864.856.176,40	Pago salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	22/12/2022 - 21/01/2027	$ 47.556.936,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/01/2023 - 26/04/2027	$ 1.932.428.088,00	Calidad del servicio	21/01/2024 - 21/01/2029	$ 190.227.747,60
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	11/01/2023 - 26/04/2024	$ 966.214.044,10			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A	25/01/2023	31/10/2023	$ 1.499.994.323,00	84,41%	$ 1.312.428.064,55	87,50%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** -3,09%
1	Preliminares	8/02/2023	23/10/2023	$ 210.516.379,19	14,03%	$ 109.540.456,37	7,30%	Cerramiento en lona y replanteo, localización y replanteo, demolición de estructuras en concreto, demolición de placa maciza, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería, demolición de pañete y enchape de muros, demolición de pavimento asfáltico, demolición de encorozado, desmonte de puertas y ventanas, desmonte y desconexión de aparatos sanitarios, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de baranda metálica, desmonte de salidas eléctricas, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, desmonte de cancha múltiple, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, corte en concreto con pulidora, picado de muros de mampostería, limpieza de canales y bajantes.
2	Estructura	8/05/2023	17/10/2023	$ 215.483.957,14	14,37%	$ 231.169.903,87	15,41%	Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400, concreto corriente grava común 3000 PSI, zapata en concreto 3000 PSI, suministro e instalación de viga cinta de confinamiento 12 x 20 cm, columnetas y viguetas en concreto de 20 x 15 cm, placa de contrapiso de 10cm, pedestales en concreto 3000 PSI, construcción de cárcamo en concreto de 20 a 30 cm, cuneta trapezoidal, suministro e instalación de acero de refuerzo, malla electro soldada y estructura metálica.
3	Mampostería	1/06/2023	9/06/2023	$ 4.024.578,00	0,27%	$ 4.639.698,57	0,31%	Muro divisorio en bloque No. 4 y No. 5, anclajes de varilas 3/8", anclaje para sujeción de elementos 1/2"
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	5/07/2023	3/10/2023	$ 15.859.672,21	1,06%	$ 13.309.892,72	0,89%	Suministro e instalación de tubería PVCS 2", 3" y 4", PVCP RDE 11 de 3/4", PVCP RDE 9 de 1/2", suministro e instalación de punto de agua fría sanitario tanque 1/2", punto de agua frío lavamanos 1/2" y suministro e instalación de geotextil tejido T1700.
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	19/09/2023	31/10/2023	$ 64.149.888,59	4,28%	$ 69.910.979,00	4,66%	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, Suministro e instalación de interruptor doble tipo institucional, Salida para tomacorriente doble normal tipo institucional, Suministro e instalación de tablero principal de distribución 12 circuitos, Suministro e instalación de interruptor termomagnético, suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre aislado, suministro e instalación de panel LED 120 x 30 cm.
7	Pisos	22/07/2023	29/09/2023	$ 94.867.793,00	6,32%	$ 54.577.978,63	3,64%	Alistado de pisos en mortero, alistado de paso para escalera en mortero, suministro e instalaciónde entre piss en super board, junta de dilatación inducida piso en concreto, suministro e instalación guarda escoba en media caña granito pulido, paso para escalera en gravilla lavada mona, piso cerámica antideslizante tipo Mikonos, win de aluminio, suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato.
8	Mampostería seca	14/08/2023	24/08/2023	$ 5.322.663,00	0,35%	$ 3.159.832,05	0,21%	Muro en Superboard de 8 mm, suministro e instalación de muro en dry wall de 12 mm.
9	Carpintería metálica	14/08/2023	13/10/2023	$ 150.583.791,25	10,04%	$ 153.665.951,79	10,24%	Suministro e instalación de hoja para puerta metálica sin marco en lámina coldrolled lisa, marco de puertas, suministro e instalación de ventana en aluminio con rejiilla superior
11	Aparatos sanitarios y accesorios	26/08/2023	30/08/2023	$ 13.049.258,00	0,87%	$ 6.248.064,00	0,42%	Suministro e instalación de sanitario, suministro e instalación orinal línea adulto color blanco
12	Aparatos y equipos especiales	29/08/2023	20/09/2023	$ 36.906.408,00	2,46%	$ 29.286.797,40	1,95%	Suministro e instalación división puertas y paneles en acero calibre 20, suministro e instalación división de baño en acero inoxidable para orinal
13	Pañete y pintura	29/06/2023	2/10/2023	$ 140.101.889,00	9,34%	$ 103.187.717,47	6,88%	Pañete muro incluye filos, pañete liso sobre muro, pañete muro impermeabilizado, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete, vinilo tipo 1 a tres manos, pintura vinilo sobre muros interiores, pintura tipo korasa para fachada, esmalte sobre cerchas puente y estructura metalica de cubierta.
14	Cielos rasos	9/08/2023	28/08/2023	$ 21.369.983,00	1,42%	$ 18.648.621,93	1,24%	Cielo raso blanco PVC color blanco, suministro e instalación cielo raso en lámina de yeso de 1/2"
16	Obras exteriores	29/09/2023	5/10/223	$ 1.691.627,33	0,11%	$ -	0,00%	

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	38	**DEL**	domingo, 24 de septiembre de 2023	**AL**	sábado, 30 de septiembre de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	262	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

17	Cubiertas e impermeabilizaciones	7/09/2023	28/09/2023	$ 28.963.885,26	1,93%	$ 14.500.780,40	0,97%	Flanche en lámina galvanizada calibre 20 desarrollo 0,25, canal de alta capacidad, suministro e instalación masilla elástica sellante y adhesiva, suministro e instalación de caballete para teja tipo Ecoroof, SEI de viga canal galvanizada
20	Aseo y disposición final	14/04/2023	31/10/2023	$ 54.406.415,64	3,63%	$ 39.935.477,90	2,66%	Embalaje y disposición final de teja de asbesto cemento, protección provisional de elementos y superficies
NP	Actividades No previstas	22/07/2023	23/10/2023	$ 208.807.849,50	13,92%	$ 460.645.912,45	30,71%	Suministro e instalación de teja 2,5mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato, suministro e instalación de placa en concreto de 3500 con fibra, desmonte de flanche

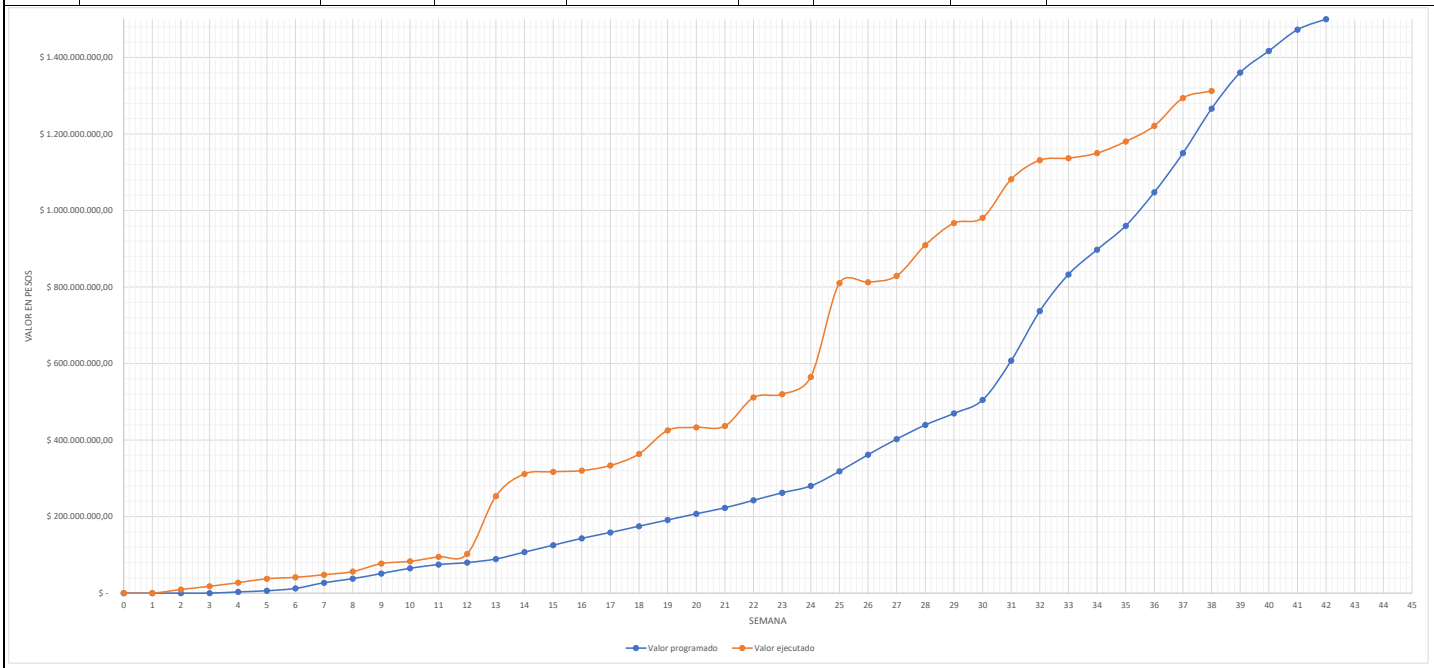


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
IT Francisco José de Caldas, Sede A		25/01/2023	31/10/2023	$ 1.970.424.049,36	98,62%	$ 1.136.238.824,71	57,66%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 40,96%
1	Preliminares	8/02/2023	30/08/2023	$ 229.444.092,09	11,64%	$ 150.983.818,93	7,66%	Replanteo, cerramiento en lona, demolición placa maciza, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería, demolición de pañete de muros, demolición de enchape de muro y pega, demolición de encorozado de cubierta, desmonte de puertas y ventanas, desmonte y desconexión de aparatos sanitarios, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de división sencilla o doble, desmonte de salidas eléctricas, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, retiro de manto de aluminio, mantenimiento tapas y marcos, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, corte regatas en concreto, corte en concreto con pulidora, picado de muros de mampostería y limpieza de canales y bajantes.
2	Estructura	4/03/2023	23/09/2023	$ 72.457.577,00	3,68%	$ 234.429.460,53	11,90%	Excavación manual en material común y recebo compactado, relleno con material seleccionado, relleno en recebo común compactado, suministro e instalación de subbase B-400, placa de contrapiso de 10 cm y 15 cm, recalce de escaleras, suministro e instalación de estructura metálica, acero de refuerzo, malla electro soldada.
3	Mampostería	23/03/2023	29/07/2023	$ 89.205.948,00	4,53%	$ 4.211.272,67	0,21%	Muro divisorio bloque estriado No. 4, resane de fisuras en muros, anclajes varilla 3/8".
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	20/09/2023	$ 4.133.606,00	0,21%	$ 12.994.000,81	0,66%	Tubería PVC U.M Ext corrugado/int liso, suministro e instalación de tubería PVCS 4", tubería PVCS 2", sifón de piso 2", tubería PVCP RDE 9 de 1/2" suministro e instalación punto agua fría sanitario tanque 1/2", punto agua fría lavamanos 1/2", punto sanitario 4", punto sanitario 2", suministro e instalación registro valvula de bola 1/2", caja de inspección 1.00x1.00, limpieza de cajas de inspección, renivelación de cajas de inspeción, suministro e instalación de geotextil tejido 1700 y sondeo y revisión de desagües.
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/05/2023	28/10/2023	$ 15.747.800,60	0,80%	$ 109.024.826,00	5,53%	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, salida para toma corriente doble normal, tipo institucional, suministro e instalación de tablero principal de distribución tipo panel de 36 circuitos, suministro e instalación de caja de paso metálica 30x30x15cm, suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de ¾", suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN, suministro e instalación de salida para luminaria con cable de cobre aislado, suministro e instalación de panel LED circular de 18W 8", suministro e instalación lámpara tipo LED 2x18W – hermética, suministro e instalación de borna terminal de compresión bimetálica.
7	Pisos	27/02/2023	28/10/2023	$ 346.120.559,63	17,57%	$ 73.720.901,81	3,74%	Alistado de pisos en mortero, alistado de paso para escalera en mortero, suministro e instalación de piso cerámica antideslizante tipo mikonos, suministro y aplicación de sellador elástico, win de aluminio, suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato.
9	Carpintería metálica	14/03/2023	17/08/2023	$ 382.122.950,00	19,39%	$ 143.914.594,52	7,30%	Suministro e instalación de ventana metálica en lámina coldrolled calibre 18, suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior, suministro e instalación de hoja para puerta metálica sin marco, marco de puertas.
13	Pañete y pintura	22/03/2023	20/09/2023	$ 244.306.810,00	12,40%	$ 132.181.818,50	6,71%	Pañete muro 1:4 incluye filos, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete, vinilo tipo 1 a tres manos, pintura vinilo sobre muros interiores 3 manos.
16	Obras exteriores	1/09/2023	31/10/2023	$ 5.074.882,00	0,26%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	13/03/2023	26/09/2023	$ 531.442.043,00	26,97%	$ 10.374.106,65	0,53%	Suministro e instalación de teja traslucida, suministro e instalación de caballete para teja, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio.
20	Aseo y disposición final	20/04/2023	31/10/2023	$ 19.018.094,92	0,97%	$ 34.480.092,81	1,75%	Aseo general, disposición y embalaje de teja en asbesto cemento y protección provisional de elementos y superficies
NP	Actividades No previstas	13/03/2023	2/09/2023	$ 4.191.108,54	0,21%	$ 229.923.931,48	11,67%	Suministro e instalación de teja 2.5mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	38	**DEL**	domingo, 24 de septiembre de 2023	**AL**	sábado, 30 de septiembre de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	262	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

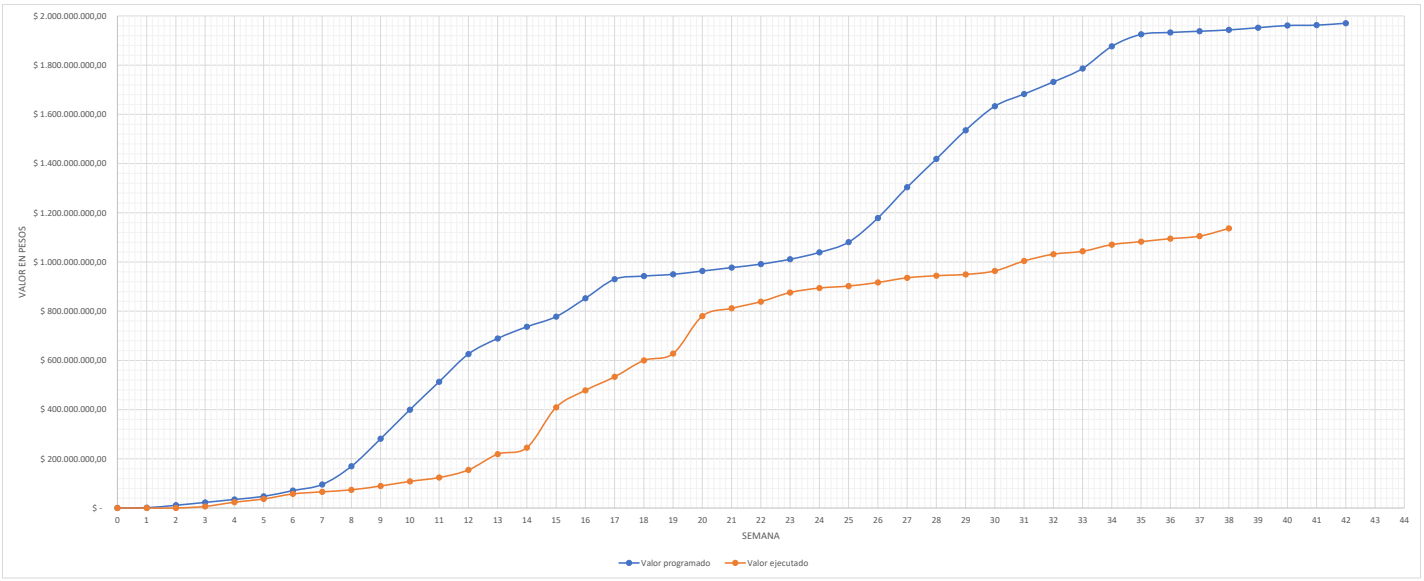

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
IED Garcés Navas		1/02/2023	21/09/2023	$ 708.046.099,00	100,00%	$ 644.705.615,69	91,05%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 8,95%
1	Preliminares	18/02/2023	26/04/2023	$ 155.896.084,01	22,02%	$ 125.373.347,25	17,71%	Cerramiento en lona con parales, cerramiento en teja de zinc, demolición de muro en mamportería con acabados, demolición de encorozado de cubierta, desmonte de todo tipo de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, retiro de manto de aluminio sobre cubiertas, mantenimiento de ventanería y rejas, corte, mantenimiento y pintura de puertas metálicas, limpieza de canales y bajantes.
2	Estructura	13/04/2023	6/07/2023	$ 156.600.675,00	22,12%	$ 155.128.869,51	21,91%	Suministro e instalación de viga cinta de confinamiento, viga de amarre en concreto de 3000PSI, suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro e instalación de estructura metálica,.
3	Mampostería	9/03/2023	22/03/2023	$ 4.357.296,00	0,62%	$ 4.357.527,00	0,62%	Muro en ladrillo prensado macizo
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	7/09/2023	30/09/2023	$ 79.904.340,00	11,29%	$ 61.189.982,95	8,64%	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo instituional, salida para toma corriente doble normal tipo institucional, suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre aislado, suministro e instalación de luminaria hermética 2x32 W, suministro e instalación de panel LED 120 x 30 cm.
11	Aparatos sanitarios y accesorios	19/09/2023	19/09/2023	$ 894.746,00	0,13%	$ 87.446,00	0,01%	Suministr e instalación de rejilla con sosco de 5" a 4"
14	Cielos rasos	30/08/2023	31/08/2023	$ 598.670,00	0,08%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	7/07/2023	24/08/2023	$ 28.679.833,00	4,05%	$ 27.286.926,76	3,85%	Flanche en lámina galvanizada calibre 20 desarrollo 0.25, suministro e instalación de caballete para teja tipo Ecoroof, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio, suministro e instalación de masilla elástica sellante y adhesiva a base de poliuretano.
20	Aseo y disposición final	4/03/2023	21/09/2023	$ 100.137.383,00	14,14%	$ 94.284.983,56	13,32%	Aseo general final y limpieza, disposición final teja en asbesto cemento, embalaje de teja en asbesto cemento, protección provisional de elementos superficiales
NP	Actividades no previstas	10/07/2023	12/08/2023	$ 180.977.072,00	25,56%	$ 176.996.532,66	25,00%	Suministro e instalación de teja Ecoroof 2,5 mm.

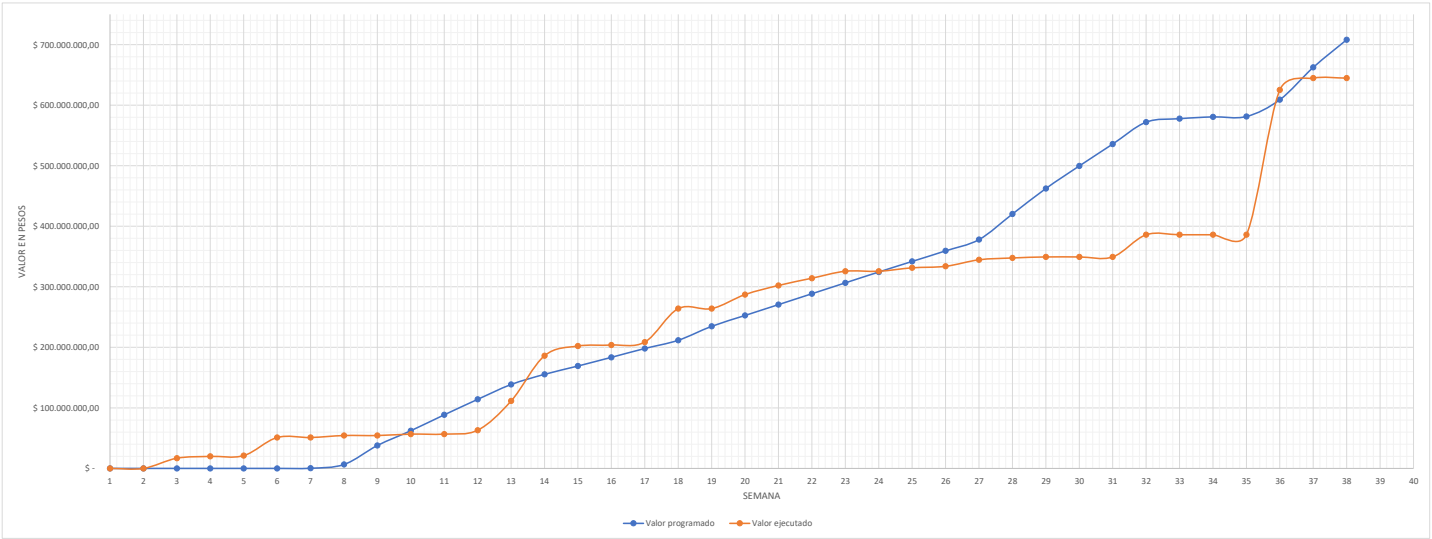


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	38	**DEL**	domingo, 24 de septiembre de 2023	**AL**	sábado, 30 de septiembre de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	262	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Floridablanca, sede A		6/02/2023	31/10/2023	$ 762.719.542,50	75,77%	$ 514.203.560,47	67,42%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	8,35%
1	Preliminares	6/02/2023	17/07/2023	$ 99.522.412,31	13,05%	$ 76.529.617,43	10,03%	Localización y replanteo, cerramiento en lona, demolición de estructuras en concreto, demolición de placa maciza, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería con acabados, desmonte de puertas y ventanas demolición de pavimento asfáltico, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, desmonte de todo tipo de cubierta existente, desmonte de canecas de basura, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, desmonte y reinstalación de tubería de red eléctrica, mantenimiento tapas y marcos para cajas de inspección, limpieza y mantenimiento a cárcamo y limpieza de canales y bajantes.	
2	Estructura	6/03/2023	13/05/2023	$ 126.308.688,00	16,56%	$ 168.646.610,20	22,11%	Excavación manual en material común y recebo compactado, excavación mecánica, relleno subbase granular B-200, base granular clase C (BG_C), concreto corriente en grava común 3000 PSI, suministro e instalación de viga cinta de confinamiento 12 x 20 cm, placa contrapiso de 10 cm, cinta de confinamiento en concreto de 3000 PSI de 10 x 12 cm, suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro e instalación de malla electro soldada, suministro e instalación de estructura metálica.	
3	Mampostería	8/05/2023	31/10/2023	$ 55.301.289,13	7,25%	$ 11.609.202,95	1,52%	Muro ladrillo prensado macizo, lavado y preparaciόon de superficies a la vista, anclajes varilla 3/8'' L=0.25m.	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	15/04/2023	8/05/2023	$ 195.726,00	0,03%	$ 20.145.119,01	2,64%	Tubería PVC U.M. Ext. Corrugado/int liso D=160 mm, suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 4" y 6", limpieza de cajas de inspección, re nivelación de cajas de inspección, suministro e instalación geotextil tejido 2400, sondeo y revisión de desagües.	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	8/05/2023	8/09/2023	$ 41.422.404,00	5,43%	$ 2.618.291,00	0,34%	Suministro e instalación de tubería PVC conduit 3"	
7	Pisos	6/09/2023	30/10/2023	$ 97.555.822,64	12,79%	$ 27.236.412,78	3,57%	Alistado de pisos en mortero, concreto de limpieza, junta de dilatación inducida piso en concreto allanado, suministro e instalación de bordillo prefabricado A-80, suministro e instalación de bocapuerta en granito pulido, suministro e instalación de pintura para revestimiento cancha múltiple, suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato.	
9	Carpintería metálica	6/09/2023	30/10/2023	$ 2.781.865,83	0,36%	$ 5.571.155,60	0,73%	Cerramiento contra impacto H=5,00m	
13	Pañete y pintura	19/05/2023	14/08/2023	$ 46.300.382,00	6,07%	$ 8.695.832,80	1,14%	Pañete liso sobre muro, pintura vinilo sobre muros interiores	
16	Obras exteriores	6/03/2023	29/06/2023	$ 10.149.764,00	1,33%	$ 4.059.905,60	0,53%	Cancha múltiple baloncesto - micofútbol, voleibol.	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	18/07/2023	22/09/2023	$ 64.168.896,41	8,41%	$ 809.095,08	0,11%	Emulsión asfáltica impermeabilizante, suministro e insalación de caballete para teja	
20	Aseo y disposición final	13/05/2023	31/10/2023	$ 7.162.030,80	0,94%	$ 16.454.319,30	2,16%	Aseo general final y limpieza, embalaje y dispocisión final de teja en asbesto cemento con vinipel.	
NP	Actividades no previstas	18/07/2023	24/10/2023	$ 27.034.443,48	3,54%	$ 171.827.998,72	22,53%	Suministro e instalación de teja Ecoroof 2,5 mm, mejoramiento material granular existente con adición de cemento, suministro e instalación de placa en concreto de 3500 con fibra.	

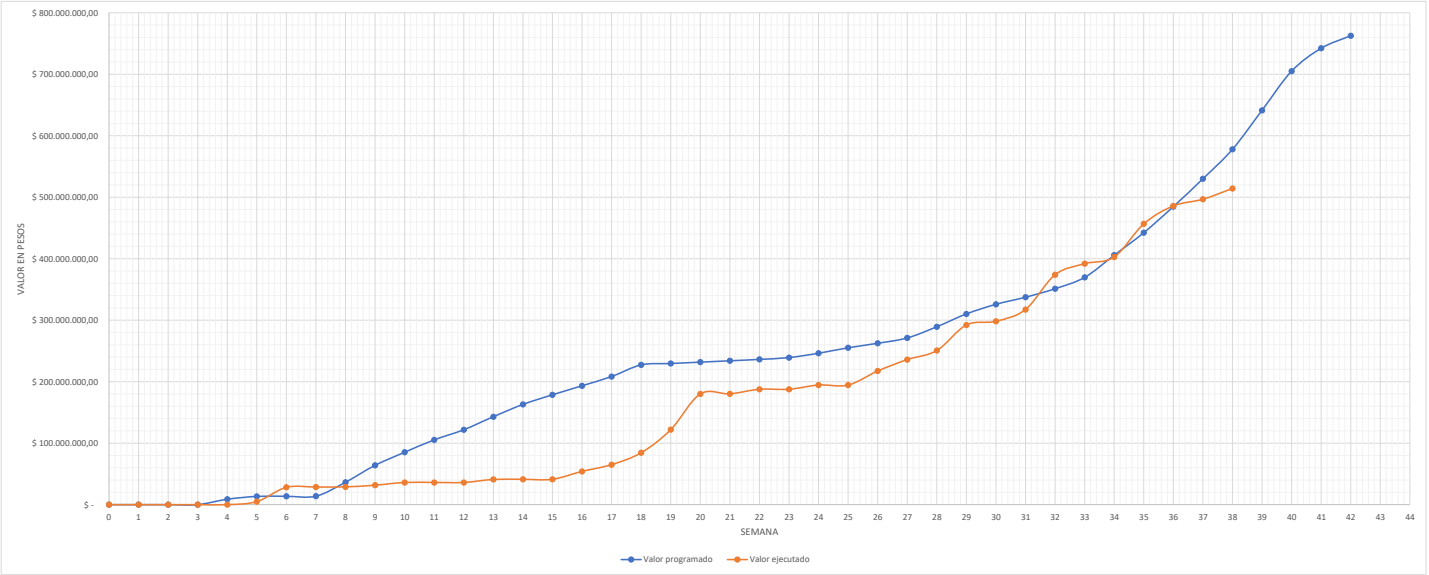


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Miguel Antonio Caro		7/02/2023	15/07/2023	$ 100.231.178,62	100,00%	$ 100.231.178,62	100,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
1	Preliminares	7/02/2023	2/05/2023	$ 30.168.483,73	30,10%	$ 30.168.483,73	30,10%	Cerramiento en lona, demolición placa maciza, demolición de alistado de piso, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cubierta, desmonte de canaleta metálica, diagnostico y mantenimiento de cubierta existente, limpieza de canales y bajantes.	
2	Estructura	11/04/2023	15/07/2023	$ 22.957.821,67	22,90%	$ 22.957.821,67	22,90%	Excavación manual, relleno en recebo, concreto corriente, placa de contrapiso de 10 cm, instalación malla electro soldada, cuneta trapezoidal 3000 PSI	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	16/05/2023	19/06/2023	$ 9.089.058,90	9,07%	$ 9.089.058,90	9,07%	Instalación de tubería PVC alcantarillado 4", caja de inspección 80x80, suministro y aplicación de pintura para tubería, sondeo y revisión de desagües	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	24/04/2023	8/06/2023	$ 4.616.550,32	4,61%	$ 4.616.550,32	4,61%	Suministro e instalación de bala led de 18W, suministro e instalación de tubería EMT conduit 2", suministro e instalación de cableado 1#6 + 1#8 + 1*10T.	
7	Pisos	27/04/2023	12/05/2023	$ 4.568.148,99	4,56%	$ 4.568.148,99	4,56%	Concreto de limpieza para caja de inspección, instalación de bordillo prefabricado, media caña en mortero, afinado de piso en mortero impermeabillizado.	
16	Obras exteriores	11/04/2023	9/05/2023	$ 1.382.430,89	1,38%	$ 1.382.430,89	1,38%	Reparación y adecuación de cunetas existentes	

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	38	**DEL**	domingo, 24 de septiembre de 2023	**AL**	sábado, 30 de septiembre de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	262	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

17	Cubiertas e impermeabilizaciones	20/03/2023	12/06/2023	$ 19.578.768,35	19,53%	$ 19.578.768,35	19,53%	Flanche en lámina galvanizada, suministro e instalación de teja termo acústica UPVC 2mm, teja en fibrocemento, canal galvanizada.
20	Aseo y disposición final	7/03/2023	12/07/2023	$ 7.869.915,77	7,85%	$ 7.869.915,77	7,85%	Aseo general final y limpieza, embalaje de teja de asbesto cemento

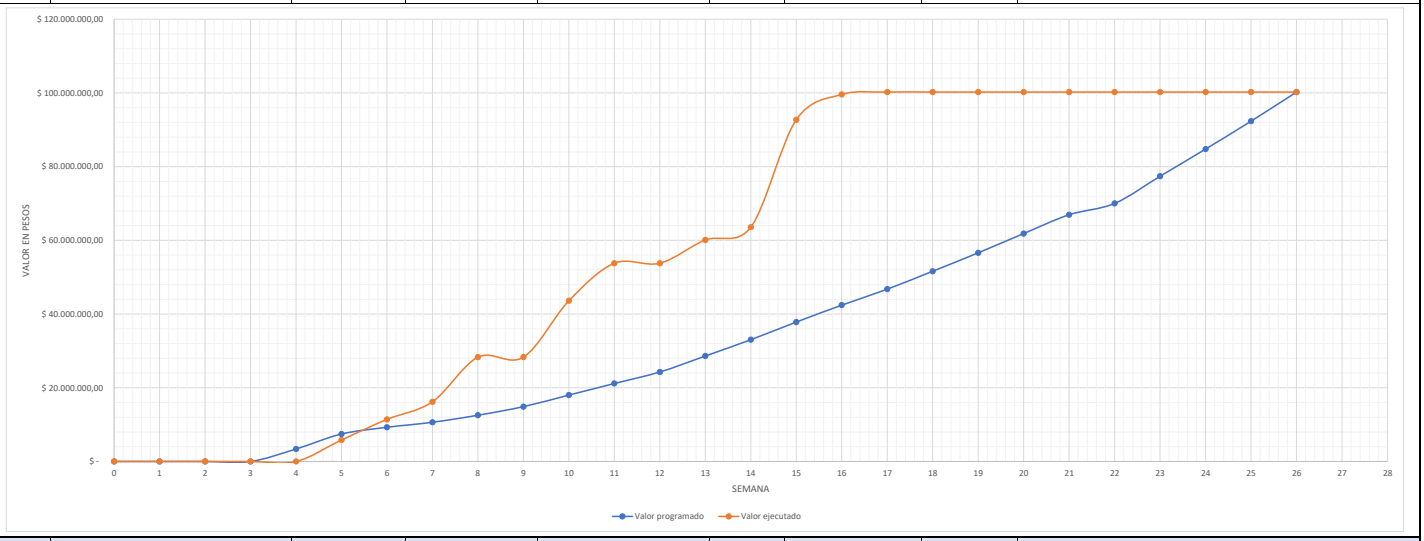

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
IED Justo Víctor Charry		13/02/2023	15/07/2023	$ 357.799.761,73	100,00%	$ 272.250.695,72	76,09%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 23,91%
1	Preliminares	13/02/2023	8/04/2023	$ 7.652.898,97	2,14%	$ 19.194.299,15	5,36%	Replanteo, cerramiento en lona, demolición de placa maciza h=0.10m, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería, demolición de enchape de muros y pega, demolición de lavamanos, desmonte de puertas, desconexión de aparatos sanitarios, retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, desmonte de división sencilla o doble, desmonte de baranda metálica, desmonte de lámparas, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso.
3	Mampostería	31/03/2023	8/04/2023	$ 21.960.041,00	6,14%	$ 71.147,20	0,02%	Muro divisorio blooque estriado No 4
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	27/06/2023	10/07/2023	$ 27.365.680,00	7,65%	$ 1.985.671,00	0,55%	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, salida para tomacorriente doble normal GFCI tipo institucional, suministro e instalación de lampara tipo LED hermética.
7	Pisos	27/04/2023	1/05/2023	$ 5.437.009,00	1,52%	$ 6.512.890,00	1,82%	Mediacaña en granito, suministro e instalación de baldosa en granito pulido, destronque y pulida de granito existente, win de aluminio
8	Mampostería seca	4/04/2023	26/04/2023	$ 27.180.454,00	7,60%	$ -	0,00%	
9	Carpintería metálica	27/04/2023	14/06/2023	$ 74.221.914,88	20,74%	$ -	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	27/04/2023	25/05/2023	$ 65.354.718,00	18,27%	$ 50.015.208,60	13,98%	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar, Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, Suministro e instalación de sanitario línea infantil y orinal línea adulto, suministro e instalación lavamanos corrido en policuarzo con subdivisión por módulo de servicio, Suministro e instalación de grifería de lavamanos, Suministro e instalación de tapa registro de 20x20 plástica.
12	Aparatos y equipos especiales	20/05/2023	23/06/2023	$ 56.080.542,00	15,67%	$ 102.325.641,60	28,60%	Suministro e instalación división puertas y panneles en acero calibre 20, suministro e instalación división de baño en acero inoxidable para orinal.
13	Pañete y pintura	17/05/2023	26/06/2023	$ 63.134.850,88	17,65%	$ 22.024.933,64	6,16%	Pañete muro incluye filos, estuco sobre pañete, pintura epóxica a 3 manos, esmalte sobre puertas y marcos metálicas.
15	Cerraduras, vidrios y espejos	27/06/2023	1/07/2023	$ 8.049.599,00	2,25%	$ -	0,00%	
20	Aseo y disposición final	10/04/2023	15/07/2023	$ 1.362.054,00	0,38%	$ 480.017,33	0,13%	Aseo general
NP	Actividades no previstas			$ -	0,00%	$ 69.640.887,20	19,46%	Suminsitro e instalación de cerámica gran formato, suministro e instalación sanitario adulto línea institucional color blanco.

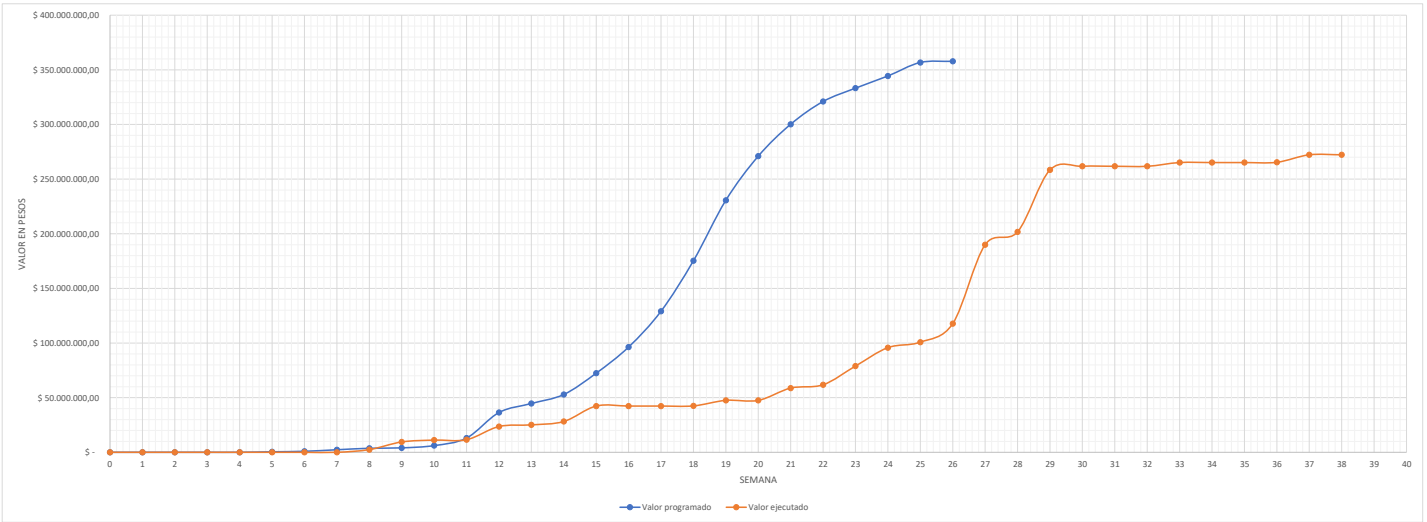


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	38	**DEL**	domingo, 24 de septiembre de 2023	**AL**	sábado, 30 de septiembre de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	262	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	IED Rafael Bernal Jiménez, sede A	7/02/2023	27/09/2023	$ 677.034.595,00	100,00%	$ 527.548.148,64	77,92%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	22,08%
1	Preliminares	7/02/2023	17/05/2023	$ 74.036.872,00	10,94%	$ 60.187.409,22	8,89%	Replanteo, cerramiento en lona con parales, cerramiento en teja de zinc, demolición placa maciza h=0.10m, demolición de alistado de piso, demolición de acabado de piso, desmonte de puertas, ventanas, desmonte de todo tipo de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de lámparas, corte en concreto con pulidora y limpieza de canales.	
2	Estructura	23/02/2023	5/05/2023	$ 13.713.785,00	2,03%	$ 93.738.224,45	13,85%	Excavación manual en material común y recebo compactado, relleno en material seleccionado, suministro e instalación de subbase B-400, placa de contrapiso de 10 cm, instalación de malla electro soldada, suministro e instalación de estructura metálica.	
3	Mampostería	1/05/2023	17/05/2023	$ 4.596.240,00	0,68%	$ 477.150,00	0,07%	Muro traba normal en ladrillo prensado liviano, anclajes varilla 3/8" L=0.25m.	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	9/03/2023	11/03/2023	$ 196.992,00	0,03%	$ 926.428,48	0,14%	Suministro e instalación de tubería PVCS 2", suministro e instalación de sifón piso 2" y tubería PVCP RDE 9 de 1/2"	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	10/07/2023	29/07/2023	$ 12.830.036,00	1,90%	$ 1.643.766,00	0,24%	Suministr e instalación interruptor doble conmutable, tablero principal de distribucion tipo panel de 12 circuitos, interruptor termomagnético, tubería PVC conduit 1".	
7	Pisos	18/05/2023	26/07/2023	$ 162.787.062,00	24,04%	$ 29.371.535,48	4,34%	Alistado de piso en mortero, suministro y aplicación de sellador elástico, para sello de juntas a nivel de piso, suministro e instalación de guardaescobas en porcelanato.	
8	Mampostería seca	12/07/2023	20/07/2023	$ 3.865.792,00	0,57%	$ 5.479.565,00	0,81%	Muro en superboard de 8 mm, incluye estructura metálica	
9	Carpintería metálica	6/05/2023	21/06/2023	$ 90.524.521,00	13,37%	$ -	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	4/07/2023	8/07/2023	$ 3.371.592,00	0,50%	$ -	0,00%		
13	Pañete y pintura	1/04/2023	25/07/2023	$ 66.213.581,00	9,78%	$ 27.071.083,38	4,00%	Esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica de cubierta	
16	Obras exteriores	4/03/2023	8/03/2023	$ 450.384,00	0,07%	$ -	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	27/03/2023	8/07/2023	$ 225.429.225,00	33,30%	$ 71.376.551,60	10,54%	Instalación de lámina de policarbonato, lámina galvanizada, caballete para teja, sei de vig	
20	Aseo y disposición final	5/04/2023	29/07/2023	$ 19.018.513,00	2,81%	$ 35.307.823,50	5,22%	Aseo general y limpieza, disposición final teja en asbesto cemento.	
NP	Actividades no previstas			$ -	0,00%	$ 201.968.611,53	29,83%	Suministro e instalación de teja 2,5mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de ceramica gran formato.	

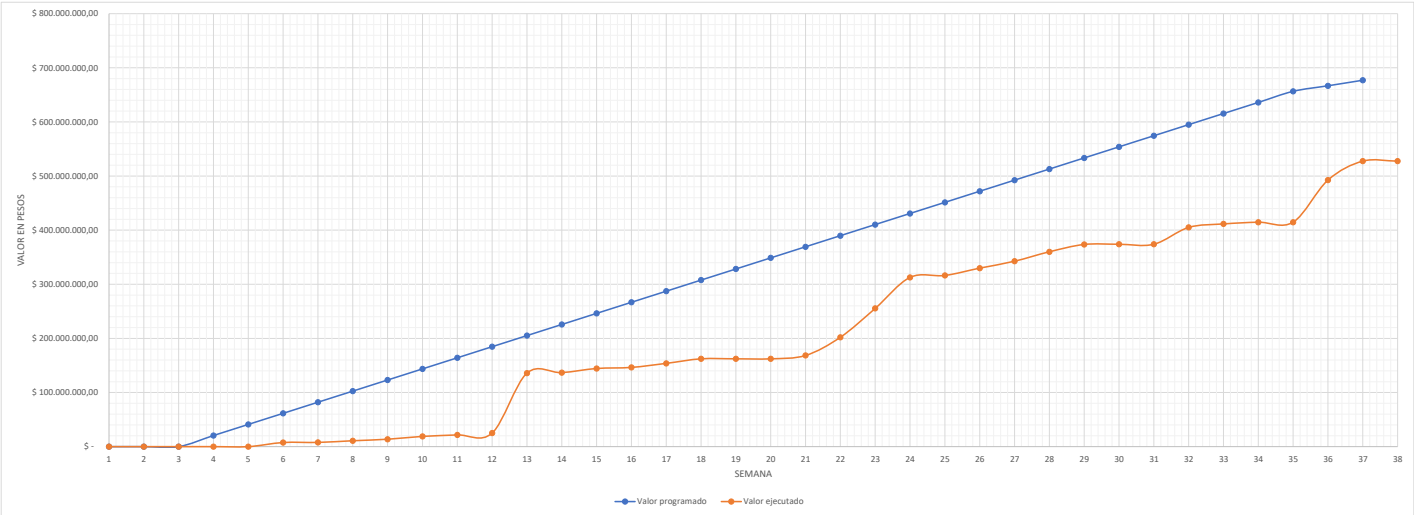


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Instituto técnico Juan del Corral	15/02/2023	12/09/2023	$ 431.248.519,00	100,00%	$ 275.202.790,01	63,82%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	36,18%
1	Preliminares	15/02/2023	23/02/2023	$ 25.873.557,67	6,00%	$ 33.516.999,87	7,77%	Replanteo, cerramiento en lona con parales, demolición de alistado y acabado de piso, desmonte retiro de tuberías, desmonte de todo tipo de cielo raso, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, desmonte y reinstalación de tuberia de red eléctrica EMT, retiro de manto de aluminio, mantenimiento de cubierta termo acústica, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, trasiego carretilla.	
3	Mampostería	3/07/2023	31/07/2023	$ 32.889.441,67	7,63%	$ 32.991.801,39	7,65%	Muro divisorio en bloque No. 4, tratamiento de fachadas en ladrillo a la vista, anclajes varillas 3/8".	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	4/05/2023	$ 2.886.660,00	0,67%	$ 3.854.052,55	0,89%	Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 4", suministro e instalación de accesorios PCV-S 4", suministro e instalacion de tubería PVCS 3" y 2", suministro, transporte e instalación de soporte tipo pera 4".	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	17/05/2023	13/06/2023	$ 23.886.908,00	5,54%	$ 1.437.518,00	0,33%	Suministro e instalación de tubos LED T8, suministro e instalación de kit de guayas para panel LED, reinstalación de lamparas existentes.	
7	Pisos	19/06/2023	17/07/2023	$ 33.142.155,67	7,69%	$ 26.652.175,31	6,18%	Alistado de pisos en mortero, mediacaña en mortero	
8	Mampostería seca	17/05/2023	2/06/2023	$ 3.169.590,00	0,73%	$ 242.209,50	0,06%	Suministro e instalación de muro en Dry wall de 12 mm.	
13	Pañete y pintura	14/07/2023	14/08/2023	$ 28.071.970,00	6,51%	$ 33.476.928,23	7,76%	Pañete muro 1:4, incluye filos, vinilo tipo 1 a tres manos, pintura vinilo sobre muros interiores 3 manos., pintura tipo korasa a 2 manos, emalte sobre cerchas, puente y estructura metálica.	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/04/2023	17/08/2023	$ 276.270.175,00	64,06%	$ 15.925.534,57	3,69%	Flanche en lámina galvanizada, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio, suministro e instalación de remates laterales para cubierta UPVC, en lámina galvanizada cal 18.	
20	Aseo y disposición final	27/02/2023	8/08/2023	$ 5.058.061,00	1,17%	$ 9.882.058,19	2,29%	Proteción provisional de elementos y superficies existentes.	
NP	Actividades no previstas			$ -	0,00%	$ 117.223.512,40	27,18%	Desmonte de flanche, suministro e instalación de membrana impermeabilizante poliurea	


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	38	**DEL**	domingo, 24 de septiembre de 2023	**AL**	sábado, 30 de septiembre de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	262	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

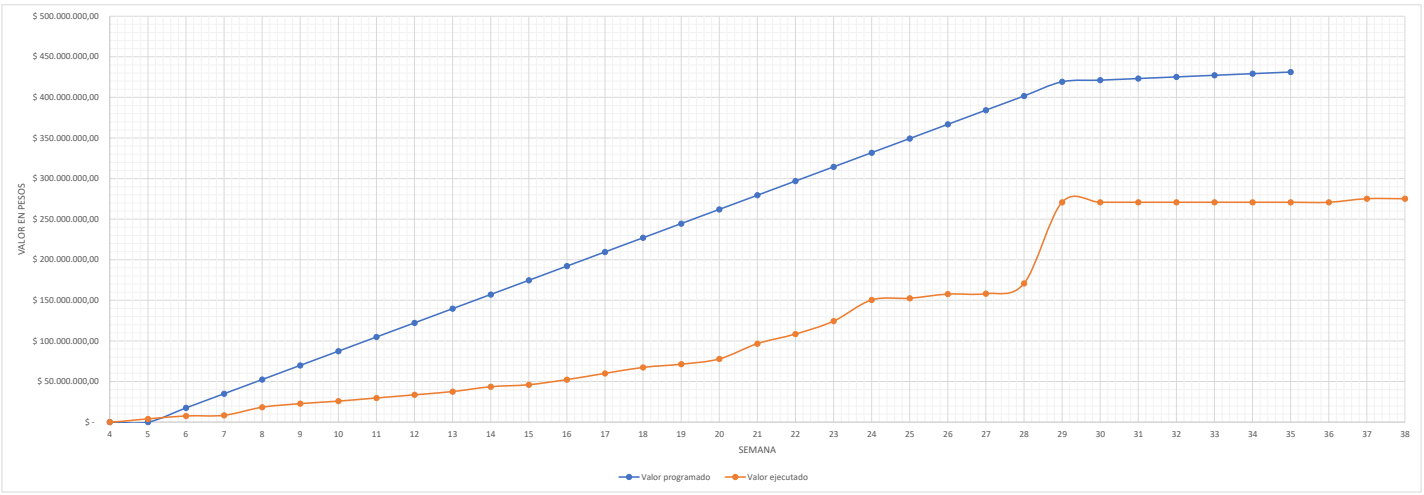

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
IED San José Norte		10/05/2023	30/11/2023	$ 2.929.420.309,00	36,91%	$ 788.809.506,15	46,32%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** -9,40%
1	Preliminares	7/06/2023	30/11/2023	$ 161.490.340,94	5,51%	$ 129.484.097,46	4,42%	Cerramiento en lona, demolición de estructuras en concreto, demolición de columna existente en concreto, demolición de placa maciza h=010m, demolición placa maciza h=0.15m, demolición placa contra piso h=0.15m, demolición acabado y alistado de piso E=0.08 a 0.12 cm, demolición muro en mampostería, demolición enchape de muros y pega, desmonte de puertas y ventanas, desconexión de aparatos sanitarios, retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, desmonte de salidas eléctricas, desmonte de canaleta metálica troquelada, desmonte de red eléctrica, desmonte de muebles existentes, corte y regatas en concreto para instalación de tubería, picado de muros de mampostería.
2	Estructura	15/07/2023	9/10/2023	$ 93.569.354,26	3,19%	$ 130.545.174,97	4,46%	Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400, zapata en concreto de 3000 PSI, columneetas de confinamiento, placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 PSI, pedestales en concreto 3000 PSI, suministro e instalación de acero de refuerzo, suministro e instalación malla electro soldada 6mm, suministro e instalación estructura metálica.
3	Mampostería	23/11/2023	28/11/2023	$ -	0,00%	$ 5.275.407,75	0,18%	Muro divisorio bloque estriado No. 4 y 5, anclajes varilla 3/8" L=0.25m, suministro e instalación anclaje epóxico 3/8"
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	22/09/2023	4/12/2023	$ 1.210.829,97	0,04%	$ 10.946.787,51	0,37%	Suministro e instalación de tubería PVCS 2", suministro e instalación de sifón de piso 2", suministro e instalación de tubería PVCP RDE 9 de 1/2", punto sanitario 4", punto sanitario 2", suministro e instalación de registro valvula de bola 1/2", limpieza de cajas de inspección, suministro e instalación geotextil tejido T1700
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	9/11/2023	28/11/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
7	Pisos	4/10/2023	28/10/2023	$ -	0,00%	$ 22.815.469,15	0,78%	Alistado de pisos en mortero 1:3 E=0.04, suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato
8	Mampostería seca	30/10/2023	31/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
9	Carpintería metálica	27/10/2023	13/11/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	14/11/2023	18/11/2023	$ -	0,00%	$ 3.443.460,00	0,12%	Suministro e instalación de orinal tipo institucional
12	Aparatos y equipos especiales	14/11/2023	23/11/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	16/10/2023	16/11/2023	$ -	0,00%	$ 39.777.497,44	1,36%	Pañete muro inclue filos, pañete liso sobre muro, pañete liso bajo placa 1:4, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete, pintura vinilo sobre muros interiores
15	Cerraduras, vidrios y espejos	25/10/2023	25/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
16	Obras exteriores	11/08/2023	28/12/2023	$ 585.527.501,17	19,99%	$ 398.049.328,00	13,59%	suministro e instalación de módulo aula escolar tipo.
20	Aseo y disposición final	21/06/2023	28/12/2023	$ 22.440.879,54	0,77%	$ 48.472.283,87	1,65%	Embalaje de teja de asbesto cemento, protección provisional de elementos y superficies existentes con cartón, plástico o similar
NP	No Previstos	19/08/2023	28/12/2023	$ 217.123.882,51	7,41%	$ 567.968.984,19	19,39%	Suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de teja Ecoroof, suministro e instalación de cerámica gran formato

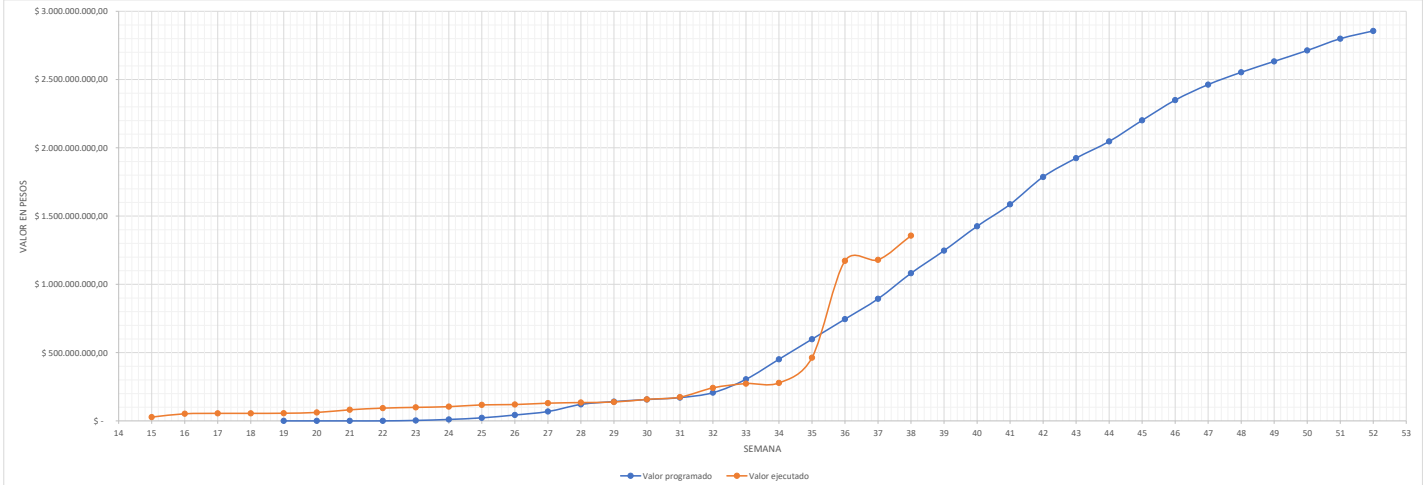


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	38	**DEL**	domingo, 24 de septiembre de 2023	**AL**	sábado, 30 de septiembre de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	262	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Rafael Bernal Jiménez, sede B		17/07/2023	25/04/2024	$ 150.000.000,00	24,37%	$ 44.916.803,89	29,94%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-5,57%
1	Preliminares			$ 36.562.281,00	24,37%	$ 13.966.409,10	9,31%	Cerramiento en lona con parales de madera anclados al piso., demolición de placa maciza H=0.10, demolición de alistado de piso E=0.04 a 0.06 m, desmonte de juego infantil indiferente al material	
2	Estructura			$ -	0,00%	$ 21.937.877,10	14,63%	Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400, zapara en concreto 3000 PSI, viga 30x40 en concreto 3000 PSI, suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro e instalación de malla electro soldada 5 mm.	
3	Mampostería			$ -	0,00%	$ 5.197.435,73	3,46%	Muro divisorio bloque estriado No. 5, muro ladrillo estructural portante 30 x 12 cm.	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio			$ -	0,00%	$ 630.880,80	0,42%	Suministro e instalación de tubería PVCL 3", suministro e instalación tubería PVCP RDE 9 de 1/2"	
7	Pisos			$ -	0,00%		0,00%		
13	Pañete y pintura			$ -	0,00%	$ 3.184.201,16	2,12%	Pañete muro, incluye filos y dilataciones, pintura Korasa o similar para fachada.	
16	Obras exteriores			$ -	0,00%		0,00%		
20	Aseo y disposición final			$ -	0,00%		0,00%		

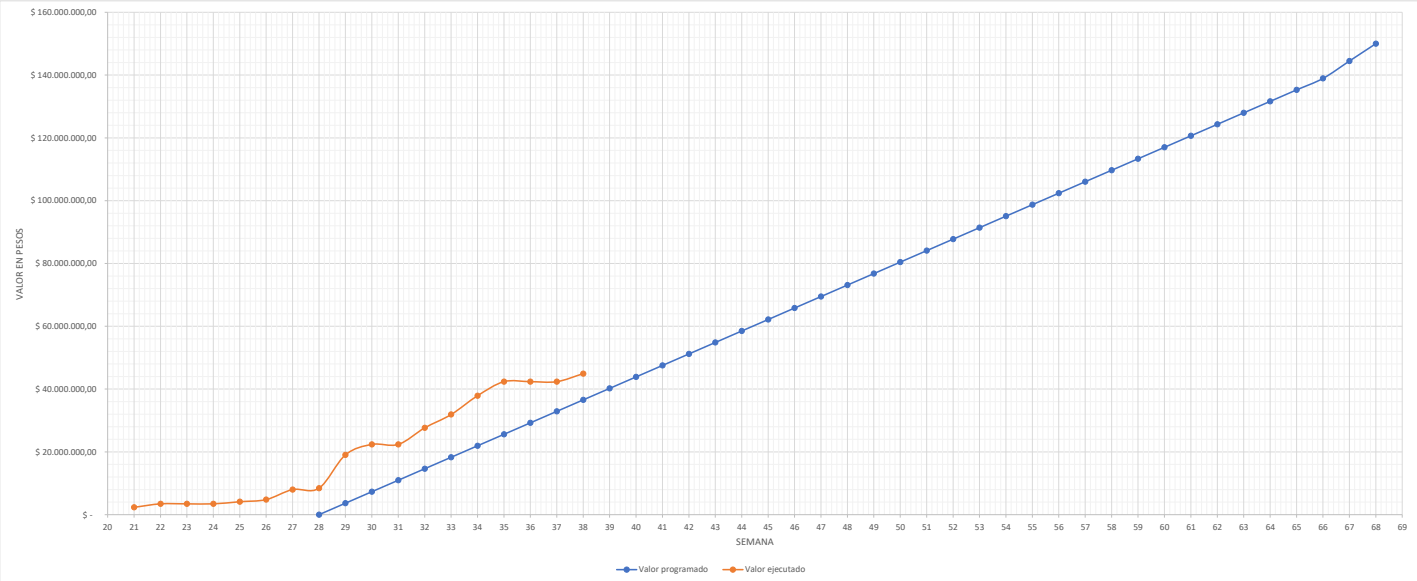


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED República de Panamá		17/07/2023	6/01/2024	$ 444.525.633,00	1,42%	$ 43.596.466,32	10,42%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-9,00%
1	Preliminares	21/08/2023	12/10/2023	$ 2.485.398,53	0,56%	$ 14.381.706,40	3,24%	Cerramiento en lona con parales de mader anclados al piso, demolición de estructuras en concreto, demolición de viga en concreto, demolición de alistado de piso E=0.04 a E=0.06 m, demolición de muro en mampostería con acabados E=0.15 m, demolición de enchape de muros y pega, desmonte de puertas y ventanas todo tamaño, desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos, desmonte de todo tipo de cubierta, desmonte de división sencilla o doble indiferente al material, desmonte de lámparas, corte en concreto con pulidora.	
2	Estructura	17/07/2023	16/11/2023	$ 3.832.624,47	0,86%	$ 1.782.577,29	0,40%	Excavación manual en recebo, excavaciones en zanjas para instalación de tuberías, concreto corriente grava común 3000 PSI mezclado en sitio, suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI.	
3	Mampostería	30/09/2023	2/10/2023	$ -	0,00%	$ 2.742.271,31	0,62%	Muro divisorio bloque estriado No. 4, muro bloque hueco No. 4, muro traba petaca en ladrillo prensado liviano.	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	17/11/2023	19/12/2023	$ -	0,00%		0,00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	11/12/2023	16/12/2023	$ -	0,00%		0,00%		
6	Sistema de detección de incendio y red contra incendio	14/12/223	15/12/2023	$ -	0,00%		0,00%		
7	Pisos	25/09/2023	24/10/2023	$ -	0,00%	$ 891.009,34	0,20%	Alistado de pisos en mortero, suministro e instalación baldosa granito pulido 33 x 33, suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior	
8	Mampostería seca	25/10/2023	30/12/2023	$ -	0,00%		0,00%		
9	Carpintería metálica	25/10/2023	30/12/2023	$ -	0,00%	$ 7.647.194,10	1,72%	Suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior, terminada, incluye vidrio de 4 mm incoloro con película de seguridad y herrajes.	
10	Carpintería madera	3/01/2024	4/01/2024	$ -	0,00%		0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	25/10/2023	31/10/2023	$ -	0,00%		0,00%		
12	Aparatos y equipos especiales	31/10/2023	2/11/2023	$ -	0,00%		0,00%		
13	Pañete y pintura	3/10/2023	30/10/2023	$ -	0,00%	$ 12.908.521,88	2,90%	Pañete muro 1:4, incluye filos y dilataciones, pañete liso sobre muro, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete, vinilo tipo 1 a tres manos.	
15	Cerraduras, vidrios y espejos	31/10/2023	8/11/2023	$ -	0,00%		0,00%		

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	38	**DEL**	domingo, 24 de septiembre de 2023	**AL**	sábado, 30 de septiembre de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	262	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

17	Cubiertas e impermeabilizaciones	17/11/2023	21/12/2023	$ -	0,00%		0,00%	
20	Aseo y disposición final	13/10/2023	6/01/2024	$ -	0,00%	$ 3.243.186,00	0,73%	Disposición final y embalaje de teja en asbesto cemento
NP	No Previstos			$ -	0,00%	$ 2.713.250,00	0,61%	Suministro e instalación de cerámica gran formato

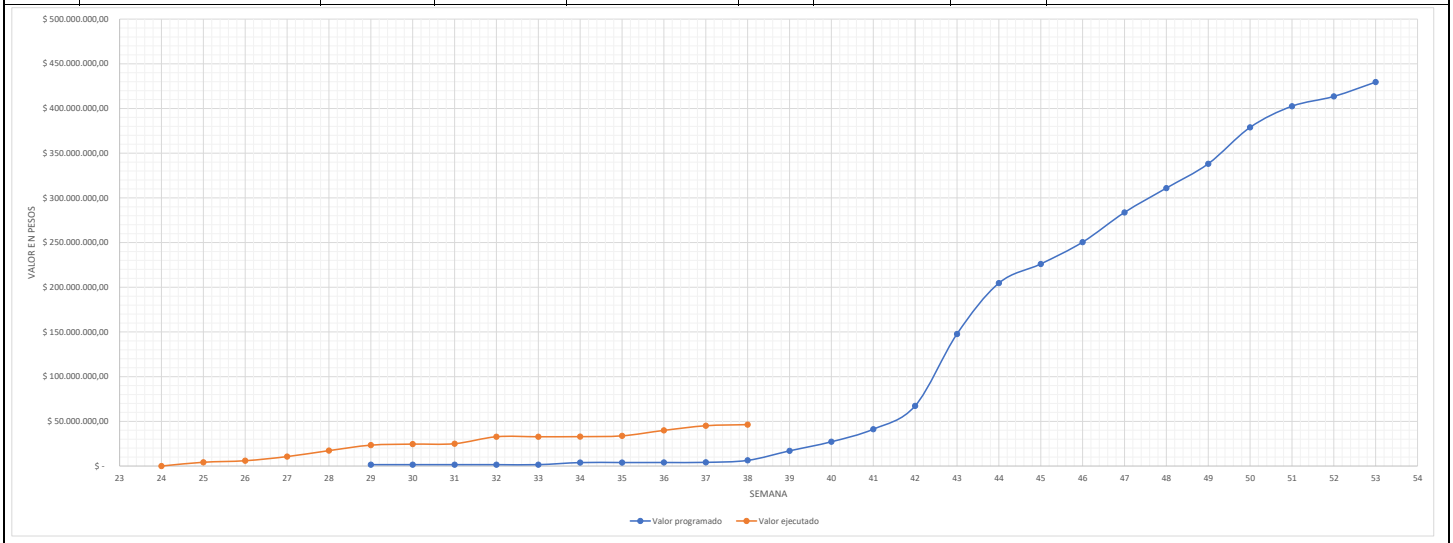

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	IED Simón Bolívar	13/09/2023	25/04/2024	$ 730.663.855,40	8,82%	$ 108.124.327,94	20,18%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** -11,36%
1	Preliminares			$ 31.935.884,14	4,37%	$ 43.055.415,85	5,89%	Cerramiento en lona con parales de madera anclados al piso, demolición de placa maciza H=0.10, demolición de acabado y alistado de piso E=0.04 a 0.06 cm, desmonte de todo tipo de cieloraso existente, desmonte de lámparas.
2	Estructura			$ 32.534.456,05	4,45%	$ 65.068.912,09	8,91%	Excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de estructura metálica
3	Mampostería			$ -	0,00%	$ -	0,00%	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio			$ -	0,00%	$ -	0,00%	
7	Pisos			$ -	0,00%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura			$ -	0,00%	$ -	0,00%	
16	Obras exteriores			$ -	0,00%	$ -	0,00%	
20	Aseo y disposición final			$ -	0,00%	$ -	0,00%	
NP	No Previstos			$ -	0,00%	$ 39.332.085,87	5,38%	Suministro e instalación de teja Ecoroof 2,5 mm.

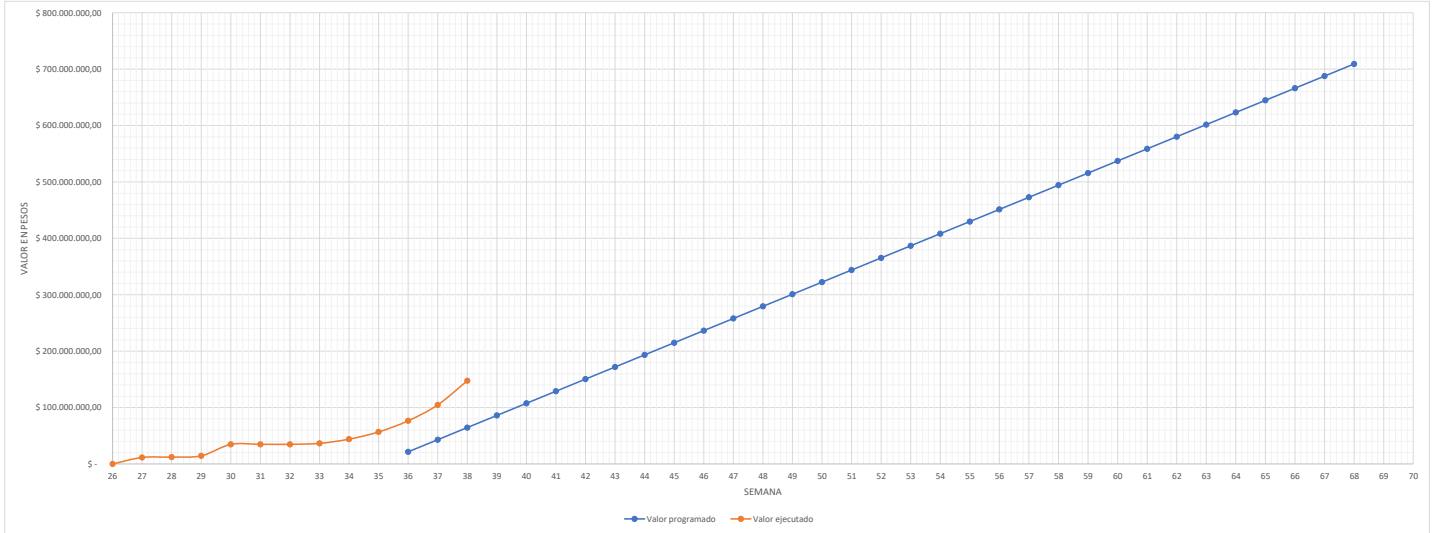


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	38	**DEL**	domingo, 24 de septiembre de 2023	**AL**	sábado, 30 de septiembre de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	262	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Francisco José de Caldas, sede A, Bachillerato Internacional		5/09/2023	30/11/2024	$ 994.311.425,00	10,87%	$ 117.396.643,98	11,81%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-0,94%
1	Preliminares			$ 29.544.381,31	2,97%	$ 24.620.317,76	2,48%	Replanteo, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de pañete de muros, desmonte de lámparas, retiro de manto de aluminio, desmonte y reinstalación de tubería electrica, corte en concreto con pulidora, limpieza de canales y bajantes	
2	Estructura			$ 27.943.888,13	2,81%	$ 27.943.888,13	2,81%	Excavación manual en recebo compactado, placa contrapiso de 10 cm, suministro e instalación de malla electro soldada de 6 mm, suministro e instalación de estructura metálica	
3	Mampostería			$ 3.005.861,22	0,30%	$ 2.147.043,73	0,22%	Resane de fisuras en muros	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio			$ -	0,00%	$ -	0,00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones			$ -	0,00%	$ 6.746.649,00	0,68%	Suministro e instalación de interruptor sencillo, salida para toma corriente doble normal, salida para luminaria, suministro e instalación de panel LED 120x30, suministro e installación de kit de guayas	
7	Pisos			$ -	0,00%	$ 1.403.295,60	0,14%	Suministro y aplicación de sellador elástico,	
9	Carpintería metálica			$ -	0,00%	$ -	0,00%		
13	Pañete y pintura			$ 23.663.781,01	2,38%	$ 16.902.700,72	1,70%	Pañete muro 1:4, pañete liso sobre muro, pintura en esmalte	
16	Obras exteriores			$ -	0,00%	$ -	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones			$ 8.676.245,79	0,87%	$ 7.230.204,83	0,73%	Suminsitro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio	
20	Aseo y disposición final			$ 1.890.260,62	0,19%	$ 3.780.521,24	0,38%	Orden y aseo general	
NP	Actividades No previstas			$ 13.311.011,49	1,34%	$ 26.622.022,98	2,68%	Suministro e instalación de teja	

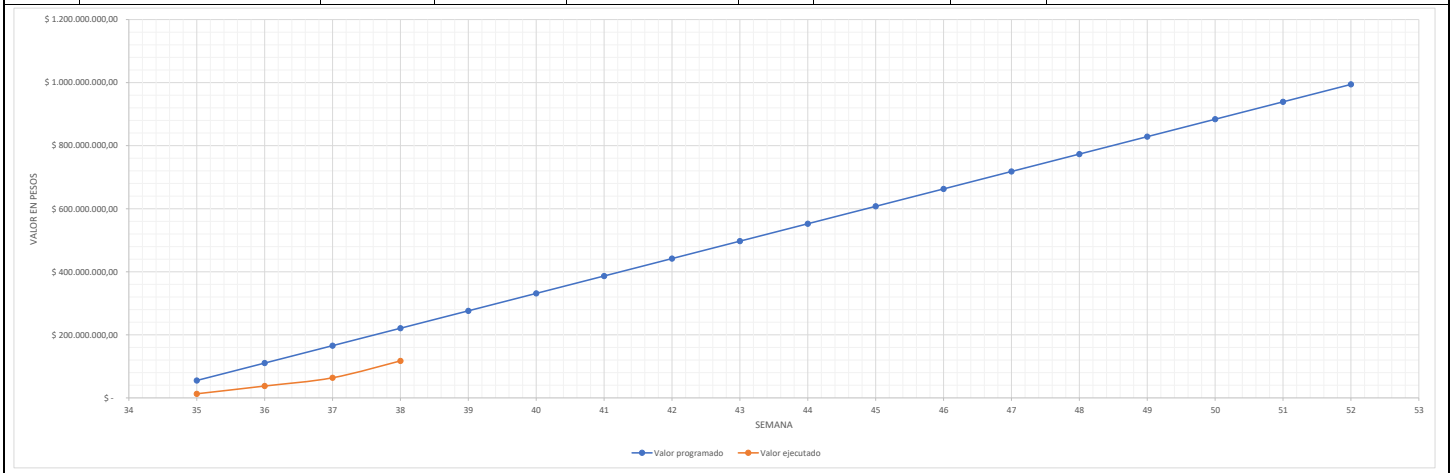

Atención de IED


Institución	Fecha inicio	Fecha terminación	Valor programado	Avance programado	Valor ejecutado	Avance ejecutado	Observaciones	Diferencia
IED Francisco Primero	22/09/2023	25/04/2024	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED José Asunción Silva	28/09/2023	25/04/2024	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED Manuela Ayala de Gaitán	1/11/2023	25/04/2024	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED República de Colombia	1/11/2023	25/04/2024	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED Nidia Quintero de Turbay	1/11/2023	25/04/2024	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED República de Guatemala	4/12/2023	25/04/2024	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED Tomás Carrasquilla	4/12/2023	25/04/2024	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED Francisco José de Caldas, Sede B	4/12/2023	25/04/2024	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
IED Robert F Kennedy	4/12/2023	25/04/2024	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Atención de emergencias								
Colegio Morisco IED	13/01/2023	21/01/2023						
IED Tomas Cipriano de Mosquera	1/02/2023	-						
IED Rafael Bernal Jiménez, sede B	28/01/2023	23/02/2023						
IED Nidia Quintero de Turbay, sede A	14/02/2023	6/03/2023						
IED República de Panamá	22/02/2023	27/03/2023						
Dirección Local de Engativá	8/02/2023	-						
IT Francisco José de Caldas, sede A	30/03/2023	7/04/2023						
IED Domingo Faustino Sarmiento, sede D	8/03/2023	27/03/2023						
IT Juan del Corral, sede A	2/06/2023	3/06/2023						
IED Thomas Carrasquilla, sede A	1/02/2023	16/06/2023						
IED Francisco Berbeo	8/05/2023	-						
IED Naciones Unidas, sede A	21/04/2023	7/06/2023						
IED Antonio Nariño, sede A	21/04/2023	-						
IED Bolívia, sede B	21/04/2023	-						
IED Rafael Bernal Jiménez, sede A	31/05/2023	2/06/2023						
IED Heladia Mejía, sede B	26/05/2023	-						

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	38	**DEL**	domingo, 24 de septiembre de 2023	**AL**	sábado, 30 de septiembre de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	262	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

PROGRAMADO					EJECUTADO				
No.	VALOR PROGRAMADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%	No.	VALOR EJECUTADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%
1	$ -	0,00%	$ -	0,00%	1	$ -	0,00%	$ -	0,00%
2	$ 1.270.756,93	0,01%	$ 1.270.756,93	0,01%	2	$ 9.458.499,71	0,07%	$ 9.458.499,71	0,07%
3	$ 13.068.280,75	0,07%	$ 14.339.037,68	0,07%	3	$ 31.826.160,08	0,23%	$ 41.284.659,79	0,30%
4	$ 14.674.069,90	0,08%	$ 29.013.107,58	0,15%	4	$ 29.459.587,55	0,21%	$ 70.744.247,34	0,51%
5	$ 50.850.634,04	0,26%	$ 79.863.741,62	0,41%	5	$ 33.581.581,31	0,24%	$ 104.325.828,65	0,75%
6	$ 57.017.900,95	0,30%	$ 136.881.642,57	0,71%	6	$ 94.518.500,86	0,68%	$ 198.844.329,51	1,42%
7	$ 74.539.715,37	0,39%	$ 211.421.357,93	1,09%	7	$ 22.218.182,48	0,16%	$ 221.062.512,00	1,58%
8	$ 79.410.432,68	0,41%	$ 290.831.790,61	1,51%	8	$ 40.324.809,10	0,29%	$ 261.387.321,10	1,87%
9	$ 157.795.051,73	0,82%	$ 448.626.842,33	2,32%	9	$ 65.485.536,40	0,47%	$ 326.872.857,50	2,34%
10	$ 221.339.464,29	1,15%	$ 669.966.306,62	3,47%	10	$ 41.427.564,22	0,30%	$ 368.300.421,72	2,64%
11	$ 212.062.992,24	1,10%	$ 882.029.298,85	4,56%	11	$ 49.569.565,98	0,36%	$ 417.869.987,70	2,99%
12	$ 217.257.237,09	1,12%	$ 1.099.286.535,94	5,69%	12	$ 74.571.439,34	0,53%	$ 492.441.427,04	3,53%
13	$ 237.082.024,07	1,23%	$ 1.336.368.560,00	6,92%	13	$ 384.555.815,94	2,76%	$ 876.997.242,98	6,28%
14	$ 290.812.179,31	1,50%	$ 1.627.180.739,31	8,42%	14	$ 175.842.367,10	1,26%	$ 1.052.839.610,08	7,54%
15	$ 266.153.597,13	1,38%	$ 1.893.334.336,44	9,80%	15	$ 240.754.691,04	1,73%	$ 1.293.594.301,11	9,27%
16	$ 261.193.236,22	1,35%	$ 2.154.527.572,66	11,15%	16	$ 148.581.092,20	1,06%	$ 1.442.175.393,31	10,34%
17	$ 299.358.691,03	1,55%	$ 2.453.886.263,69	12,70%	17	$ 109.142.302,12	0,78%	$ 1.551.317.695,43	11,12%
18	$ 311.607.365,22	1,61%	$ 2.765.493.628,91	14,31%	18	$ 187.805.414,35	1,35%	$ 1.739.123.109,78	12,46%
19	$ 349.165.182,38	1,81%	$ 3.114.658.811,30	16,12%	19	$ 137.179.908,07	0,98%	$ 1.876.303.017,85	13,45%
20	$ 344.673.554,63	1,78%	$ 3.459.332.365,93	17,90%	20	$ 253.932.296,56	1,82%	$ 2.130.235.314,41	15,27%
21	$ 335.490.505,50	1,74%	$ 3.794.822.871,43	19,64%	21	$ 108.086.167,12	0,77%	$ 2.238.321.481,53	16,04%
22	$ 324.539.684,07	1,68%	$ 4.119.362.555,50	21,32%	22	$ 183.153.768,22	1,31%	$ 2.421.475.249,75	17,35%
23	$ 312.641.480,84	1,62%	$ 4.432.004.036,34	22,93%	23	$ 149.085.076,18	1,07%	$ 2.570.560.325,93	18,42%
24	$ 332.262.357,17	1,72%	$ 4.764.266.393,51	24,65%	24	$ 175.332.541,60	1,26%	$ 2.745.892.867,52	19,68%
25	$ 352.410.544,81	1,82%	$ 5.116.676.938,32	26,48%	25	$ 287.822.376,00	2,06%	$ 3.033.715.243,52	21,74%
26	$ 371.148.361,72	1,92%	$ 5.487.825.300,05	28,40%	26	$ 82.724.526,61	0,59%	$ 3.116.439.770,14	22,33%
27	$ 425.864.713,96	2,20%	$ 5.913.690.014,00	30,60%	27	$ 179.887.815,96	1,29%	$ 3.296.327.586,10	23,62%
28	$ 444.425.719,08	2,30%	$ 6.358.115.733,08	32,90%	28	$ 160.476.515,98	1,15%	$ 3.456.804.102,08	24,77%
29	$ 499.339.704,40	2,58%	$ 6.857.455.437,49	35,49%	29	$ 299.025.099,04	2,14%	$ 3.755.829.201,11	26,92%
30	$ 544.857.876,09	2,82%	$ 7.402.313.313,58	38,31%	30	$ 82.370.134,81	0,59%	$ 3.838.199.335,92	27,51%
31	$ 519.733.992,11	2,69%	$ 7.922.047.305,69	41,00%	31	$ 176.956.676,14	1,27%	$ 4.015.156.012,06	28,77%
32	$ 431.876.619,29	2,23%	$ 8.353.923.924,99	43,23%	32	$ 282.909.064,40	2,03%	$ 4.298.065.076,46	30,80%
33	$ 424.680.951,49	2,20%	$ 8.778.604.876,48	45,43%	33	$ 82.126.489,23	0,59%	$ 4.380.191.565,69	31,39%
34	$ 463.803.569,28	2,40%	$ 9.242.408.445,77	47,83%	34	$ 72.725.839,02	0,52%	$ 4.452.917.404,71	31,91%
35	$ 590.881.792,61	3,06%	$ 9.833.290.238,38	50,89%	35	$ 312.767.775,18	2,24%	$ 4.765.685.179,89	34,15%
36	$ 614.896.350,25	3,18%	$ 10.448.186.588,63	54,07%	36	$ 1.096.559.333,75	7,86%	$ 5.862.244.513,64	42,01%
37	$ 630.569.648,28	3,26%	$ 11.078.756.236,90	57,33%	37	$ 226.484.981,94	1,62%	$ 6.088.729.495,58	43,63%
38	$ 635.582.918,90	3,29%	$ 11.714.339.155,80	60,62%	38	$ 344.658.576,35	2,47%	$ 6.433.388.071,93	46,10%
39	$ 634.491.088,70	3,28%	$ 12.348.830.244,49	63,90%	39	$ -	0,00%	$ 6.433.388.071,93	46,10%
40	$ 583.220.137,81	3,02%	$ 12.932.050.382,30	66,92%	40	$ -	0,00%	$ 6.433.388.071,93	46,10%
41	$ 567.385.585,92	2,94%	$ 13.499.435.968,23	69,86%	41	$ -	0,00%	$ 6.433.388.071,93	46,10%
42	$ 492.136.485,26	2,55%	$ 13.991.572.453,48	72,40%	42	$ -	0,00%	$ 6.433.388.071,93	46,10%
43	$ 448.881.482,43	2,32%	$ 14.440.453.935,91	74,73%	43	$ -	0,00%	$ 6.433.388.071,93	46,10%
44	$ 298.733.291,08	1,55%	$ 14.739.187.226,98	76,27%	44	$ -	0,00%	$ 6.433.388.071,93	46,10%
45	$ 4.585.093.655,02	23,73%	$ 19.324.280.882,00	100,00%	45	$ -	0,00%	$ 6.433.388.071,93	46,10%

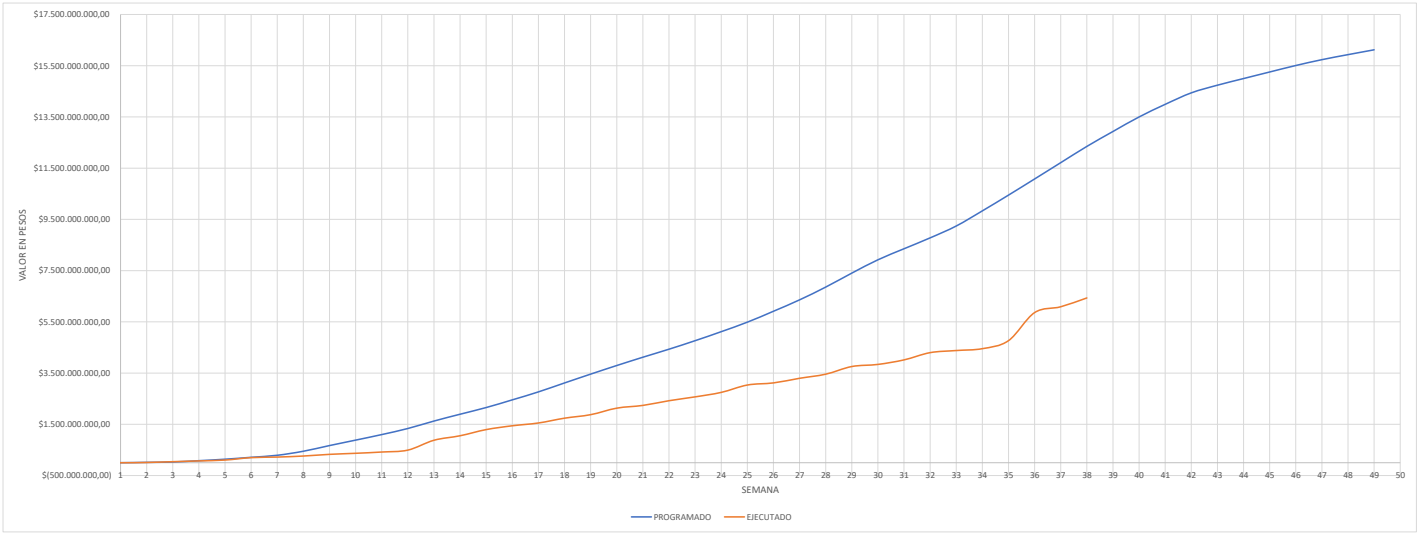

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	38	**DEL**	domingo, 24 de septiembre de 2023	**AL**	sábado, 30 de septiembre de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	262	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

Seguimiento Ruta Critica

No.	Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Fecha Finalización	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
1	Jorge Eliecer Gaitán	25/01/2023	19/01/2023	31/10/2023	6	285	-279	
2	Francisco José de Caldas, Sede A	25/01/2023	23/01/2023	31/10/2023	2	281	-279	
3	Garcés Navas	25/01/2023	23/01/2023	21/09/2023	2	241	-239	
4	Florida Blanca	6/02/2023	2/02/2023	31/10/2023	4	271	-267	
5	Miguel Antonio Caro	7/02/2023	7/02/2023	15/07/2023	0	158	-158	
6	Justo Víctor Charry	13/02/2023	13/02/2023	15/07/2023	0	152	-152	
7	Rafael Bernal Jiménez	25/01/2023	8/02/2023	27/09/2023	-14	231	-245	
8	Juan del Corral	15/02/2023	8/02/2023	12/09/2023	7	216	-209	
9	Francisco Primero	24/03/2023	24/03/2023	25/04/2024	0	398	-398	
10	José Asunción Silva	24/03/2023	24/03/2023	25/04/2024	0	398	-398	
11	Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	24/03/2023	25/04/2024	0	398	-398	
12	República de Colombia	24/03/2023	24/03/2023	25/04/2024	0	398	-398	
13	Simón Bolívar	24/03/2023	24/03/2023	25/04/2024	0	398	-398	
14	Nidia Quintero de Turbay	10/05/2023	10/05/2023	25/04/2024	0	351	-351	
15	República de Guatemala	10/05/2023	10/05/2023	25/04/2024	0	351	-351	
16	República de Panamá	10/05/2023	10/05/2023	6/01/2024	0	241	-241	
17	Tomás Carrasquilla	10/05/2023	10/05/2023	25/04/2024	0	351	-351	
18	Francisco José de Caldas, Sede B	10/05/2023	10/05/2023	25/04/2024	0	351	-351	
19	Robert F Kennedy	10/05/2023	10/05/2023	25/04/2024	0	351	-351	

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

En Bogotá, a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se firma acta de inicio entre Jorge Gómez Falla, en calidad de Representante de Consorcio Intercolegios 2022, como Interventor, y Miguel Alexander Cerón Molina, en calidad de representante legal de Safrid Ingeniería S.A.S como Contratista.

El día 05 de abril de 2023 se realizó aprobación de Modificatorio No.1 Adición y Prórroga de Contrato de Obra CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

Aspecto Financiero

A la fecha del presente informe se han tramitado actas de pago No. 1, 2, 3, 4, 5 ,6 y 7 de contrato de obra e interventoría acorde a los avances realizados.

Aspecto Técnico

En el periodo comprendido del presente informe el contratista realizó las siguientes actividades:

IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A



Aplicación de pintura Koraza en fachada



Aplicación de pintura Koraza en fachada cabaña



Instalación de tubería y cableado eléctrico en aulas

IT Francisco José de Caldas, Sede A



Excavación manual en aulas de primer piso



Filos en ventanas de aulas de segundo piso.



Filos en ventanas de aulas de segundo piso.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	38	**DEL**	domingo, 24 de septiembre de 2023	**AL**	sábado, 30 de septiembre de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	262	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

IED Garcés Navas



Pañete sobre muro de baño de profesores



Remates en vigas



Remates en vigas

IED Floridablanca, sede A



Instalación de granito pulido en corredor lado almacén.



Preparación de superficie de canchas para aplicación de pintura



Instalación de perfiles en almacén

IED Rafael Bernal Jiménez, sede A



Instalación de puntos para luminarias



Emboquillado enchape tarima



Arreglo enchape aula múltiple

IED Rafael Bernal Jiménez, sede B



Instalación de flanche en muro zona de juegos



Armado de juegos infantiles



Instalación tapete en piso juegos

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	38	**DEL**	domingo, 24 de septiembre de 2023	**AL**	sábado, 30 de septiembre de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	262	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

IED Justo Victor Charry



Lavamanos pedestal baño discapacitados baño niñas preescolar



Luminarias instaladas baño niñas bachiller



Instalación tapas interruptor y toma corriente baño niñas preescolar

IED San José Norte, sede A



Instalación de estructura vertical y horizontal en modulares etapa nº 1 y 2.



Aplicación de pintura exterior baterias sanitarias



Levante de muros en modulares etapa nº 1.

IED República de Panamá



Excavación para tubería sanitaria y cajas de inspección en cocina.



Excavación para tubería sanitaria y cajas de inspección en cocina.



Fundida de cajas de inspección

IED Simón Bolívar



Instalación de teja en cubierta biblioteca



Instalación de teja en cubierta biblioteca



Instalación de teja en cubierta biblioteca

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	38	**DEL**	domingo, 24 de septiembre de 2023	**AL**	sábado, 30 de septiembre de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	262	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

IT Francisco José de Caldas, sede A, Bachillerato Internacional



Desmonte, aplicación de anticorrosivo, pintura, emulsión asfáltica, soldadura y alineación de canaleta metálica exterior taller Mecánica automotriz 1



Instalación de malla electro soldada y fundida de placas de contra piso en taller Mecánica Automotriz 2



instalación de manto asfáltico en viga canal Biblioteca

En cumplimiento de sus funciones esta interventoría realiza:
•Control y seguimiento a los procesos constructivos realizados en los frentes de obra, así mismo, verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas del caso.
•Requerimiento a contratista de obra de documentos, conceptos, fichas de calidad, manual de garantías y demás material que permita verificar los trabajos ejecutados en aras de cumplir con objeto contractual.
•Visitas técnicas en atención a emergencias presentadas en la localidad de Engativá y Barrios Unidos informadas por la Secretaría de Educación Distrital.
•Verificación de cumplimiento de todas la obligaciones contenidas dentro del contrato de obra.

Aspecto SST-Ambiental

•Se realiza control y seguimiento sobres los aspectos e impactos ambientales a fin de establecer las acciones pertinentes para reducir, mitigar y corregir dichos impactos.
•Se verifica en obra las actividades, aspectos y controles en materia de Seguridad y salud en el trabajo, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir riesgos existentes.

Aspecto Social

Se realiza comité semanal de obra el día 27 de septiembre de 2023 en instalaciones de IED San José Norte

Aspecto PMT


N/A

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
25/09/2023	7:00 am 5:00 pm	0
26/09/2023	7:00 am 5:00 pm	0
27/09/2023	7:00 am 5:00 pm	3
28/09/2023	7:00 am 5:00 pm	3
29/09/2023	7:00 am 5:00 pm	0
30/09/2023	7:00 am 12:00 pm	0



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Colegio Jorge Eliecer Gaitán: construcción de cárcamo en concreto de 3000 PSI de 20 a 30 cm de profundidad con rejilla plástica, cuneta trapezoidal 3000 PSI, caja de inspección 1x1, tubería metálica galvanizada, salida para luminaria con cable aislado, panel LED 120 x 30, construcción e instalación de baranda en acero de protección de altura de 1,20m, suministro e instalación de hoja para puerta metálica, marco de puertas, cancha múltiple, sei de viga canal galvanizada, suministro e instalacion de porcelanato de alto trafico.
• Colegio Francisco José de Caldas: Bloque II: concreto corriente grava común 3000 PSI, suministro e instalación de piso laminado 8 mm, aseo general final y limpieza.
• Colegio Floridablanca: tratamiento de fachadas en ladrillo a la vista, alistado de pisos en mortero, piso en concreto a la vista endurecido y afinado con helicóptero,bordillo prefabricado, pintura para canchas, demarcación con pintura tráfico vehicular, enchape de piso tablon en gress, aseo general final y limpieza.
• Colegio San José Norte: Suministro e instalación de subbase granular, placa contra piso de 15 cm,suministro e instalación de malla electro soldada, alistado de pisos en mortero, mediacaña en mortero, media caña en granito, anden en concreto 2500 PSI, reparación y adecuación de cunetas existentes, suministro e instalación de mortero impermeabilizado, suministro e instalación de modulo aula escolar tipo, aseo general final y limpieza, suministro e instalación de teja Ecorof.
• Colegio República de Panamá: Desmonte de cubierta, suministro e instalación de acero de refuerzo, muro divisorio bloque estriado No. 4, alistado de pisos en mortero, media caña en granito, suministro e instalación baldosa en granito pulido, suministro e instalación de piso cerámica antideslizante.

VI. RESUMEN GENERAL DE ESTADO DE CONTRATO

• De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de 46,10%, con base en la programación presentada un avance general programado de 60,62%, teniendo una diferencia de 14,52% en atraso, respecto de la semana anterior el atraso aumento en 2,09%.
• En atención a emergencias se realiza intervención en IED Abel Rodríguez con remate de pintura epoxica bajo placa en el cuarto de basuras y construcción del recolector de aguas negras del baño de niñas, sondeo de tubería hidrosanitaria y demolición de enchape de piso en baños y pasillo en IED República de China, sede B.
• En consideración al oficio No. 361_GP2_SED_2022, donde se aclara por parte de contratista de obra la reprogramación de los colegios , teniendo en cuenta la mesa de trabajo para revisión de balance presupuestal actualizado y cronograma de actividades a fecha 07 de septiembre de 2023, los frentes de obra presentan modificación en su valor programado, por lo tanto, se actualiza el porcentaje programado y los avances reales de los frentes de obra a la fecha. De acuerdo a lo anterior, por parte de interventoría se realiza el control y seguimiento con base a la información suministrada.
• Con base en la relación establecida entre programación y ejecución en los frentes de obra activos, a la fecha se evidencia atraso las instituciones por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.
• Con base en el atraso evidenciado se solicita implementar plan de contingencia a fin de mejorar el desarrollo de las actividades de obra que a la fecha se encuentran con atrasos y aquellas pendientes por realizar, esto en aras de mitigar y evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
• De acuerdo con el avance evidenciado en las Instituciones Educativas activas, a la fecha se establece un avance físico de la siguiente manera: IED Jorge Eliecer Gaitán 98,00%. IED Francisco José de Caldas 67,00% . IED Garcés Navas 94,70%. IED Floridablanca 85,00%. IED Justo Víctor Charry 75,00%. IED Rafael Bernal Jiménez sede A 91,80%. IED Juan del Corral 99,50%. IED San José Norte 49,30%. IED Rafael Bernal Jiménez, sede B 86,30%. IED República de Panamá 53,00%. IED IED Simón Bolívar 15,80%. • Teniendo en cuenta las directrices estipuladas y manifestadas por la Secretaria de Educación del Distrito, se insta a contratista de obra efectuar las actividades acorde a lo requerido por la entidad, así mismo, considerar el balance presupuestal actualizado para evitar afectaciones al contrato. • Se verifica en obra que el personal cumpla con los requisitos mínimos establecidos, del mismo modo, se inspecciona acerca del adecuado uso del equipo de protección personal pertinente en todo el personal, esto en aras de evitar accidentes laborales. •Se notifica a contratista de obra que la entrega de la información es indispensable para la validación y aprobación de los conceptos por parte de la interventoría, por tal razón, los tiempos de demora en la entrega de la documentación solicitada, son imputables al contratista de obra. •Se solicita a contratista de obra, ejecutar las acciones pertinentes para cumplir con el alcance del contrato para las Instituciones Educativas.	**FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR**

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada	Fanny Almanzar/ Mileth Escalante	Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.
