ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Tipo de Contrato:	
OBRA [X]	INTERVENTORÍA [ ]
Informe Número: 6	Periodo comprendido entre el (09/10/2023) hasta el (03/11/2023)

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4151.010.26.1.1404 DE 2022	
Nombre Completo del Contratista: ELEAZAR GIRALDO FAJURI	
Documento de identificación del contratista: 10.547.375	
Nombre (s) del Supervisor (es): LEOPOLDO DIAZ GARCIA	
Organismo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 18%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 77%
Objeto del contrato: REHABILITACION VIAL EN LOS BARRIOS REPUBLICA DE ISRAEL Y UNION DE VIVIENDA POPULAR DE LA COMUNA 16 DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI -FICHAEBI BP-26004239	

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
30 de septiembre de 2022	30 de Noviembre de 2023
Modificación del contrato:	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Modificación No. 1: de fecha 04 de noviembre de 2022 – Adición del contrato Modificación No. 2: de fecha 26 de diciembre de 2022 – Suspensión del contrato Modificación No. 3: de fecha 25 de enero de 2023 – Prorrogar la suspensión del contrato Modificación No. 4: de fecha 24 de marzo de 2023 – Prorrogar la suspensión del contrato Modificación No. 5: de fecha 24 de mayo de 2023 – Reanudación del contrato Modificación No. 6: de fecha 4 de julio de 2023 – Prorrogar el contrato
Suspensión: Suspensión No 1: por ochenta y un (81) días calendario, desde el nueve (9) de noviembre de 2022, hasta el veinticinco (25) de enero de 2023 Prorroga a la Suspensión No 1: por sesenta (60) días calendario, desde el veintiséis (26) de enero de 2023 hasta el veintiséis (26) de marzo de 2023 Prorroga a la Suspensión No 1: por sesenta (60) días calendario, desde el veintisiete (27) de marzo de 2023 hasta el veinticuatro (24) de mayo de 2023
Reanudación: Reanudación No 1: Reanudar el contrato a partir del 25 de mayo de 2023
Cesión: N/A
Terminación anticipada: : N/A
Acta de recibo final de obra: : N/A
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de SISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($629.339. 331.oo)
Adición: Modificación No. 1: Por la suma de CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 121.507. 536.oo)
Prórroga:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 750.846.867, oo	$ 132.038.808, oo	$443.919.525,oo	$ 174.888.536, oo

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN:
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley. De fecha 9 de Octubre de 2023

PERSONA NATURAL N/A

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de pago:

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

I. CARRERA 43B ENTRE CALLES 43 Y 48 - BARRIO: REPUBLICA DE ISRAEL- COMUNA: 16.
Avance del Frente: 0%

II. CARRERA 42A1 ENTRE CALLES 42 Y 45 - BARRIO: UNION DE VIVIENDA POPULAR- COMUNA: 16.
Avance del Frente: 95.9 %

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Foto No. 1	Descripción: Imprimación

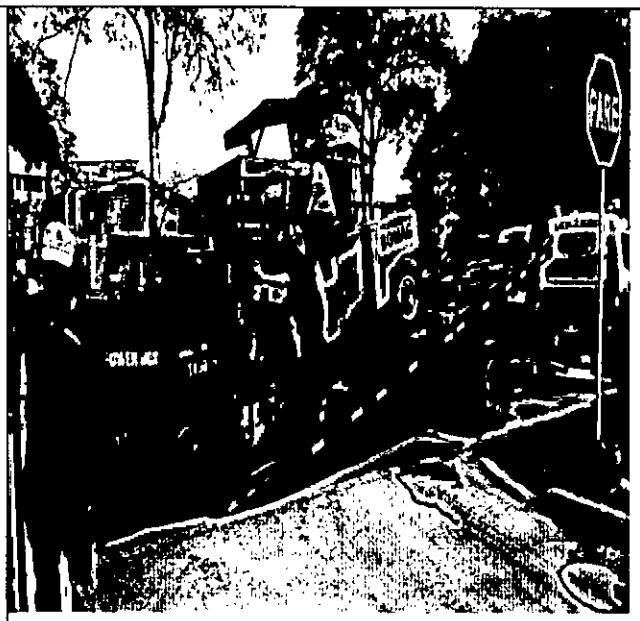


Foto No. 2	Descripción: Llegada de mezcla

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

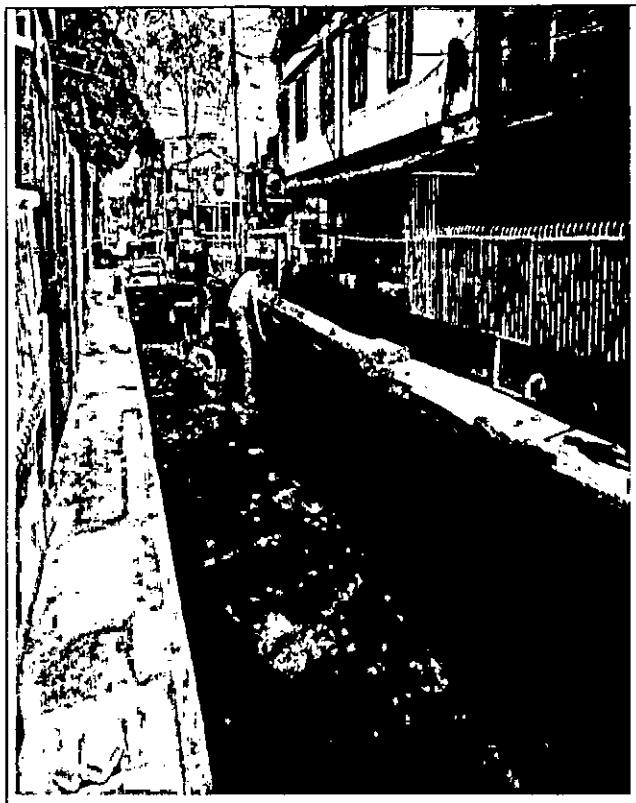




Foto No. 3	Descripción: Instalación de mezcla	Foto No. 4	Descripción: Construccion de sumideros

RECIBO A SATISFACCIÓN:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, las obras o interventoría con base en las condiciones establecidas en el Contrato o Aceptación de Oferta No._____ y que a continuación se describen:

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

I. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

II.FIRMAS RESPONSABLES

Nombre y firma del Supervisor
LEOPOLDO DIAZ GARCIA

Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 09 de octubre de 2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
