CONTRATO DE OBRA No 22 de 2023

"ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1"

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA

PERIODO DEL 01/09/2023 al 30/09/2023

Presentado por:

CONSORCIO SANTANDER

BUCARAMANGA
COLOMBIA
2023

TABLA DE CONTENIDO.

Descripción del Proyecto..... 3

Diagnóstico de la situación actual según lo establecido en el Plan de Gerencia ....

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GERENCIA. .....

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL ALCANCE.
..... 3

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE REQUISITOS.
..... 7

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL TIEMPO. .....
8

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COSTOS. .....
13

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. .....
13

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
..... 14

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.
..... 14

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGO. .....
17

INFORME No. 5 – SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA CONTRATO DE OBRA No. 22 de 2023.

Descripción del Proyecto

El objetivo de este PLAN DE GERENCIA DE OBRA es determinar los lineamientos para establecer e implementar la política integral del CONSORCIO SANTANDER y su organización; y establecer las acciones integrales a ser adoptadas para cumplir con esta política en la ejecución del Contrato de obra "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1". El plan de gerencia esbozado en este seguimiento cumple con los lineamientos básicos del PMBOK y los requisitos del proceso de contratación del mismo.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL ALCANCE.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión del alcance se abordan las siguientes definiciones con los formatos a los que haya lugar.

- Roles y Responsabilidades

Se presenta como anexo al presente informe el "FORMATO 1.1. - DEFINICIÓN ROLES Y RESPONSABILIDADES" del Plan de Gerencia.

PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1"			
GESTIÓN DEL ALCANCE			
FORMATO 1.1. - DEFINICIÓN ROLES Y RESPONSABILIDADES			
NOMBRE	PAPEL	CORREO	RESPONSABILIDADES
Juan Carlos Jaimes	Director de obra	consorciosantander2023@gmail.com	Realizar gestión y control sobre el avance y desarrollo del proyecto.
Yeison Andrés Garcés Ortega	Gerente de Proyectos	consorciosantander2023@gmail.com	Realizar la implementación y el seguimiento al Plan de Gerencia del Proyecto.
Layde Iliana Velandia Torres	Residente de obra	residenteobracs@gmail.com	Realizar la gestión en campo del desarrollo del proyecto.
Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Profesional social	consorciosantanderbga@gmail.com	Realizar la gestión social del proyecto con la comunidad beneficiada e interesado del área de insidencia.
Bernardo Suarez Carreño	Profesional HSEQ	inspectorhseqcs@gmail.com	Realizar la gestión de la salud, seguridad, medio ambiente y calidad en el desarrollo del proyecto.
Omar Blanco	Inspector de Obra	inspector1obracs@gmail.com	Realizar el control del cumplimiento al alcance y requisitos de actividades en campo del proyecto.

Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de Obra	inspector3obracs@gamil.com	Realizar la supervisión al cumplimiento de las responsabilidades del interventor y el ejecutor.
Marlon Castillo	Inspector de Obra	inspector2obracs@gmail.com	Representar al propietario del proyecto y sus intereses ante el ejecutor, la interventoría e interesados.
Comunidad el barrio Buena Vista	Beneficiarios del proyecto - Veedores del proyecto		Velar por el adecuado cumplimiento del alcance del proyecto.

- ## Definición alcance

El alcance principal es dar feliz término y cumplimiento al contrato de obra No. 022 de 2023 cuyo objeto es: “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1”.

Este proyecto pretende realizar intervenciones de adecuación de espacio público, mediante la demolición de andenes y escaleras existentes que se encuentran en mal estado, que ya terminaron su vida útil o que no cumplen las especificaciones actuales requeridas para ese tipo de estructuras, las cuales serán adecuadas conforme lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Manual de Espacio Público de Bucaramanga y las normas técnicas vigentes, por lo tanto, se pretende conformar adecuadamente las franjas de circulación peatonal en función del perfil vial establecido para cada sitio, posteriormente se realizarán las estructuras de soporte (subrasante, sub bases granulares), acabados (concretos in situ y prefabricados) verificando la calidad de materiales, y por último, se instalará carpintería metálica mediante la construcción de barandas de protección, a modo de amueblamiento de seguridad para peatones en los sitios que por sus características lo requieran.

A continuación, se presentan las zonas donde se realizarán las intervenciones del proyecto:

COMUNA	BARRIO	DIRECCIÓN
1 NORTE	ROSAL	Costado Occidental de la Cra 20 desde la Cll 54N hasta la Cll 56N
		Costado Oriente de la Cra 20 desde la Cll 56N hasta la Cll 58N
		Costado Oriente Cll 58N desde la Cra 20 hasta volver a encontrar la interseccioón con la Cra 20
	CAMPO MADRID	Cra 10 frente al parqueadero de las torres de campo madrid
2 NORORIENTAL	LA INDEPENDENCIA	Cra 25 entre Clle 3 y 5
		Cra 19 entre 3 y 4
		Cra 21B con Cra 3
		Cra 24A entre Cll 3A, 3B y 4
		Cra 24B entre Cll 3B y 4
	LA JUVENTUD	Cll 1N entre Cra 21BB hasta la Cra 20A
		Cra 20 A entre Cll 1 y 1N
		Cra 20 C entre Cll 1AN y 2N
		Cll 3N entre Cra 21 y 21A
		Cll 7N entre Cra 20 y 19
		Cll 5N entre Cra 18 y 19
	TRANSICION V	Cra 23A # 2-22
3 SAN FRANCICO	CHAPINERO	Costado sur de la calle 4 entre cra 16 y 17
		Costado occidental de la cra 17 entre cll 4 y 5
		Costado norte cll 5 entre cra 17 y 16
	LA UNIVERSIDAD	Costado oriental Cra 29 entre cll 10 y 11
		Cll 9A entre Cra 24 y 25
13 ORIENTAL	SAN ALONSO	Cll 20 entre Cra 29 y 30 costado norte
		Cll 20 entre Cra 29 y 30 costado sur

		Costado occidental de la cra 33A entre calles 17 y 18
		Costado occidental de la cra 33A entre calles 18 y 19
	LOS PINOS	Cra 34 entre cll 12 y 13 costado oriental
		Cra 34 entre cll 13 y 14 costado oriental
	LA AURORA	Cll 31 con cra 29 hasta cra 28
14 MORRORICO	LA VEGA	Calle 10 vegas de morrorico
	LIMONCITO	Vía Bucaramanga - Cúcuta margen derecho desde casa N. 50-702 hasta casa N.14-04
	ALBANIA	Cra 51 desde casa N. 18-61 hasta la casa N. 20-67

Información general del contrato de Obra

CONTRATO No:	22 DE 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 1.
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONCURSO DE MERITOS:	SI-SI-LP-014-2022
VALOR DEL CONTRATO:	MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.961.400.000,00)
VALOR ADICIONADO	QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($558.603.751,00)
VALOR DEL ANTICIPO:	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($ 569.832.522,00)
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER
NIT:	901677862-6
REPRESENTANTE LEGAL:	ERNESTO MONTAÑEZ MORA
INTERVENTOR:	JESAK S.A.S.
FIRMA CONTRATO:	MARZO DE 2023
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	16 MARZO DE 2023
FECHA DE LA SUSPENSIÓN	13 JULIO DE 2023
FECHA DEL REINICIO	24 JULIO DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONADO:	TRES (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIIAL:	15 DE JULIO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	25 DE NOVIEMBRE DE 2023

- Estructura del desglose del trabajo

Se presenta como anexo al presente informe el “FORMATO 1.2. - DICCIONARIO DE LA EDT” del Plan de Gerencia.

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3

Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de “Descripción”, “Porcentaje” de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO I

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				PRELIMINARES				
1	1.1		1.1	Localización y replanteo manual	m2	6.676,80	$ 2.300,00	$ 15.356.640,00
Subtotal								$ 15.356.640,00
				DEMOLICIONES				
2	2.1	INVIAS-201-13	2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1.299,00	$ 207.900,00	$ 270.062.100,00
Subtotal								$ 270.062.100,00
				EXCAVACIONES Y RELLENOS				
3	3.1	INVIAS-600-13	3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	895,60	$ 76.800,00	$ 68.782.080,00
4	3.2	INVIAS-32013	3.2	Relleno compactado con material de sub-base granular	m3	1.021,80	$ 210.900,00	$ 215.497.620,00
Subtotal								$ 284.279.700,00
				ESPACIO PUBLICO				
5	4.1		4.1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	m2	1.154,60	$ 138.200,00	$ 159.565.720,00
6	4.2	INVIAS-672-13	4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.309,80	$ 84.700,00	$ 195.640.060,00
7	4.3		4.3	Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	141,80	$ 375.400,00	$ 53.231.720,00
8	4.4		4.4	Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	120,40	$ 265.700,00	$ 31.990.280,00
9	4.5		4.5	Franja de ajuste al predio	m	2.014,20	$ 14.400,00	$ 29.004.480,00
10	4.6	2013-INV-630.1	4.6	Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	114,40	$ 981.500,00	$ 112.283.600,00
11	4.7	2013-INV-630.1	4.7	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UCA30 sobre mortero y malla gallinero.	m2	2.049,20	$ 157.000,00	$ 321.724.400,00
12	4.8	2013-INV-630.1	4.8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	283,00	$ 815.300,00	$ 230.729.900,00

Subtotal								$ 1.134.170.160,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
13	5.1		5.1	Realce cajas de servicios publicos	UND	205,00	$ 144.200,00	$ 29.561.000,00
14	5.2		5.2	Realce pozos EMPAS	UND	47,40	$ 244.500,00	$ 11.589.300,00
15	5.3		5.3	Traslado Señales de Tránsito	UND	44,20	$ 137.000,00	$ 6.055.400,00
Subtotal								$ 47.205.700,00
CARPINTERIA METÁLICA								
16	6.1		6.1	Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	m	148,60	$ 991.705,00	$ 97.423.223,00
Subtotal								$ 57.423.223,00
ASEO Y LIMPIEZA								
17	7.1		7.1	Aseo y limpieza general	m2	4.755,40	$ 2.800,00	$ 19.070.520,00
Subtotal								$ 19.070.520,00
PLAN DE MANEJO								
18	8.1		8.1	Plan de Manejo Ambiental	un	1,00	$ 10.404.000,00	$ 10.404.000,00
19	8.2		8.2	Plan de Manejo de Tránsito	un	1,00	$ 62.379.700,00	$ 62.379.700,00
Subtotal								$ 72.873.700,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 1.330.441.740,00

FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS		$ 61.358.260,00
INTERVENTORIA		
	VALOR TOTAL OBRA	$ 1.391.800.000,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		
VALOR TOTAL		

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	10%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)	IMPREVISTO	I=	5%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	17%

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.679 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO SANTANDER

- Verificación del Alcance

Se realizaron las verificaciones del alcance de obra semanal y mensual, mediante la entrega de informes y la socialización en los comités de obra.

- Control del Alcance

Se actualizo el alcance del contrato con la firma del adicional del presente contrato de obra dada las condiciones encontradas en la ejecución de las obras desarrolladas.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE REQUISITOS.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de requisitos se abordan las definiciones de enfoque de gestión, configuración, priorización y medidas lo cual se plasma y refleja en el "FORMATO 2.1. – MATRIZ DE TRAZABILIDAD A REQUISITOS" del plan de gerencia anexa al presente informe.

PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1"					
GESTIÓN DE REQUISITOS					
FORMATO 2.1. - MATRIZ DE TRAZABILIDAD A REQUISITOS					
Fecha de Implementación:		PERIODO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023			
Requisito #	Requisito Descripción	Diseño Documento de Referencia	Caso de prueba de referencia	Validación de aceptación del usuario	Comentarios
1	Cortes semanales	Informe cortes semanales	Reporte del avance en actividades según mediciones de campo	Presentación de avance acordado entre ejecutor e interventoría	Ejecutado
2	Reporte mensual sobre el avance del proyecto	Informe mensual de avance	Situación detallada del avance del proyecto.	Presentación del informe ante interventoría y municipio	Se presentaron demoras en su cumplimiento

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL TIEMPO.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión del tiempo se presenta el cronograma y programación de la obra en el programa Project, aprobado por interventoría, que hace parte del plan de gerencia y se anexa al presente informe.

Con base en la programación presentada, y a los hitos definidos para la gestión del tiempo en el Plan de Gerencia, se presenta la siguiente table sobre el alcance y cumplimiento de los mismos:

	HITOS DE CONTROL DE AVANCE	DURACIÓN (DÍAS)	INICIO	Fin	ESTADO	CUMPLIMIENTO
1.	CRA 34 CLL 13 Y 14 FANJAR ORIENTAL LOS PINOS	50 días	10/04/2023	29/05/2023	TERMINADO	ENTREGADO
2.	CRA 34 CLL 12 Y 13 FRANJA ORIENTAL LOS PINOS	50 días	10/04/2023	29/05/2023	TERMINADO	ENTREGADO

3.	ENTRADA LA VEGA MORRORICO	49 días	10/04/2023	29/05/2023	TERMINADO	ENTREGADO
4.	17 COMUNA 13 SAN ALONSO	125 días	10/04/2023	12/08/2023	INICIADO	ENTREGADO
5.	CRA 29 ENTRE CLL 10 Y 11 LA UNIVERSIDAD	23 días	29/05/2023	20/06/2023	TERMINADO	ENTREGADO
6.	CLL 9A ENTRE 24 Y 25 SECTOR IMPAR BARRIO UNIVERSIDAD	72 días	29/05/2023	8/08/2023	INICIADO	ENTREGADO
7.	CRA 17, 16 Y 15 CON CALLE 4 Y 5 CHAPINERO	103 días	6/06/2023	16/09/2023	INICIADO	ADELANTADO
8.	CLL 31 CON CRA 28 LA AURORA	70 días	10/06/2023	18/08/2023	INICIADO	ENTREGADO
9.	CAMPO MADRID	68 días	25/07/2023	30/09/2023	INICIADO	ADELANTADO
10.	CLL 20 CRA 29 Y 30 FRANJA SUR SAN ALONSO	24 días	9/08/2023	1/09/2023	INICIADO	ENTREGADO
11.	CLL 20 CRA 29 Y 30 FRANJA NORTE SAN ALONSO	19 días	14/08/2023	1/09/2023	INICIADO	ADELANTADO
12.	18 COMUNA 14 LIMONCITO	89 días	28/08/2023	24/11/2023	NO INICIADO	POR INICIAR
13.	1 COMUNA 1 EL ROSAL	85 días	1/09/2023	24/11/2023	INICIADO	ADELANTADO
14.	4 COMUNA 2 LA JUVENTUD	84 días	2/09/2023	24/11/2023	INICIADO	ADELANTADO
15.	3 COMUNA 2 LA INDEPENDENCIA	75 días	11/09/2023	24/11/2023	INICIADO	ADELANTADO
16.	CRA 25 CLL 3 Y 5 LA INDEPENDENCIA	75 días	11/09/2023	24/11/2023	INICIADO	ADELANTADO
17.	TRANSICION V	54 días	2/10/2023	24/11/2023	NO INICIADO	POR INICIAR
18.	ALBANIA COMUNA 14	33 días	23/10/2023	24/11/2023	INICIADO	ADELANTADO


Línea Base Control del Tiempo

Según el cronograma y programación presentados y aprobados para la moderatoria del contrato se actualizo el programa de trabajo. Se presenta la siguiente curva S o línea base del proyecto para con ella realizar el seguimiento a la gestión del tiempo del proyecto:

SEM	FECHA INICIAL	FECHA TERMINACION	VALOR PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO
1	16/03/2023	19/03/2023	$ 12.348.018,00	$ 12.348.018,00	0,49%	0,49%
2	20/03/2023	26/03/2023	$ 25.452.038,00	$ 37.800.056,00	1,01%	1,50%
3	27/03/2023	2/04/2023	$ 17.640.026,00	$ 55.440.082,00	0,70%	2,20%
4	3/04/2023	9/04/2023	$ 22.680.034,00	$ 78.120.116,00	0,90%	3,10%
5	10/04/2023	16/04/2023	$ 55.440.083,00	$ 133.560.199,00	2,20%	5,30%
6	17/04/2023	23/04/2023	$ 30.240.045,00	$ 163.800.244,00	1,20%	6,50%
7	24/04/2023	30/04/2023	$ 5.460.008,00	$ 169.260.252,00	0,22%	6,72%

8	1/05/2023	7/05/2023	$ 20.160.030,00	$ 189.420.282,00	0,80%	7,52%
9	8/05/2023	14/05/2023	$ 37.800.056,00	$ 227.220.338,00	1,50%	9,02%
10	15/05/2023	21/05/2023	$ 70.560.105,00	$ 297.780.443,00	2,80%	11,82%
11	22/05/2023	28/05/2023	$ 38.052.057,00	$ 335.832.500,00	1,51%	13,33%
12	29/05/2023	4/06/2023	$ 30.744.046,00	$ 366.576.546,00	1,22%	14,55%
13	5/06/2023	11/06/2023	$ 45.612.068,00	$ 412.188.614,00	1,81%	16,36%
14	12/06/2023	18/06/2023	$ 29.484.044,00	$ 441.672.658,00	1,17%	17,53%
15	19/06/2023	25/06/2023	$ 48.132.072,00	$ 489.804.730,00	1,91%	19,44%
16	26/06/2023	2/07/2023	$ 57.052.885,00	$ 546.857.615,00	2,26%	21,70%
17	3/07/2023	9/07/2023	$ 30.744.046,00	$ 577.601.661,00	1,22%	22,92%
18	10/07/2023	12/07/2023	$ 39.060.058,00	$ 616.661.719,00	1,55%	24,47%
19	24/07/2023	30/07/2023	$ 103.068.153,00	$ 719.729.872,00	4,09%	28,56%
20	31/07/2023	6/08/2023	$ 80.892.120,00	$ 800.621.992,00	3,21%	31,77%
21	7/08/2023	13/08/2023	$ 93.240.139,00	$ 893.862.131,00	3,70%	35,47%
22	14/08/2023	20/08/2023	$ 83.160.124,00	$ 977.022.255,00	3,30%	38,77%
23	21/08/2023	27/08/2023	$ 74.340.111,00	$ 1.051.362.366,00	2,95%	41,72%
24	28/08/2023	3/09/2023	$ 98.028.146,00	$ 1.149.390.512,00	3,89%	45,61%
25	4/09/2023	10/09/2023	$ 100.044.149,00	$ 1.249.434.661,00	3,97%	49,58%
26	11/09/2023	17/09/2023	$ 105.840.158,00	$ 1.355.274.819,00	4,20%	53,78%
27	18/09/2023	24/09/2023	$ 106.092.158,00	$ 1.461.366.977,00	4,21%	57,99%
28	25/09/2023	1/10/2023	$ 150.948.225,00	$ 1.612.315.202,00	5,99%	63,98%
29	2/10/2023	8/10/2023	$ 142.128.212,00	$ 1.754.443.414,00	5,64%	69,62%
30	9/10/2023	15/10/2023	$ 170.856.254,00	$ 1.925.299.668,00	6,78%	76,40%
31	16/10/2023	22/10/2023	$ 82.152.122,00	$ 2.007.451.790,00	3,26%	79,66%
32	23/10/2023	29/10/2023	$ 102.312.152,00	$ 2.109.763.942,00	4,06%	83,72%
33	30/10/2023	5/11/2023	$ 143.388.213,00	$ 2.253.152.155,00	5,69%	89,41%
34	6/11/2023	12/11/2023	$ 86.940.129,00	$ 2.340.092.284,00	3,45%	92,86%
35	13/11/2023	19/11/2023	$ 112.140.167,00	$ 2.452.232.451,00	4,45%	97,31%
36	20/11/2023	24/11/2023	$ 67.771.300,00	$ 2.520.003.750,00	2,69%	100,00%

Se tiene un cronograma d trabajo proyectado a 36 semanas de trabajo, desde la firma del acta de inicio de fecha 16 de marzo de 2023 hasta el 25 de noviembre del 2023, teniendo en cuenta que se presentó una suspensión de obra el día 14 de julio y un reinicio el 24 de julio del año en curso.

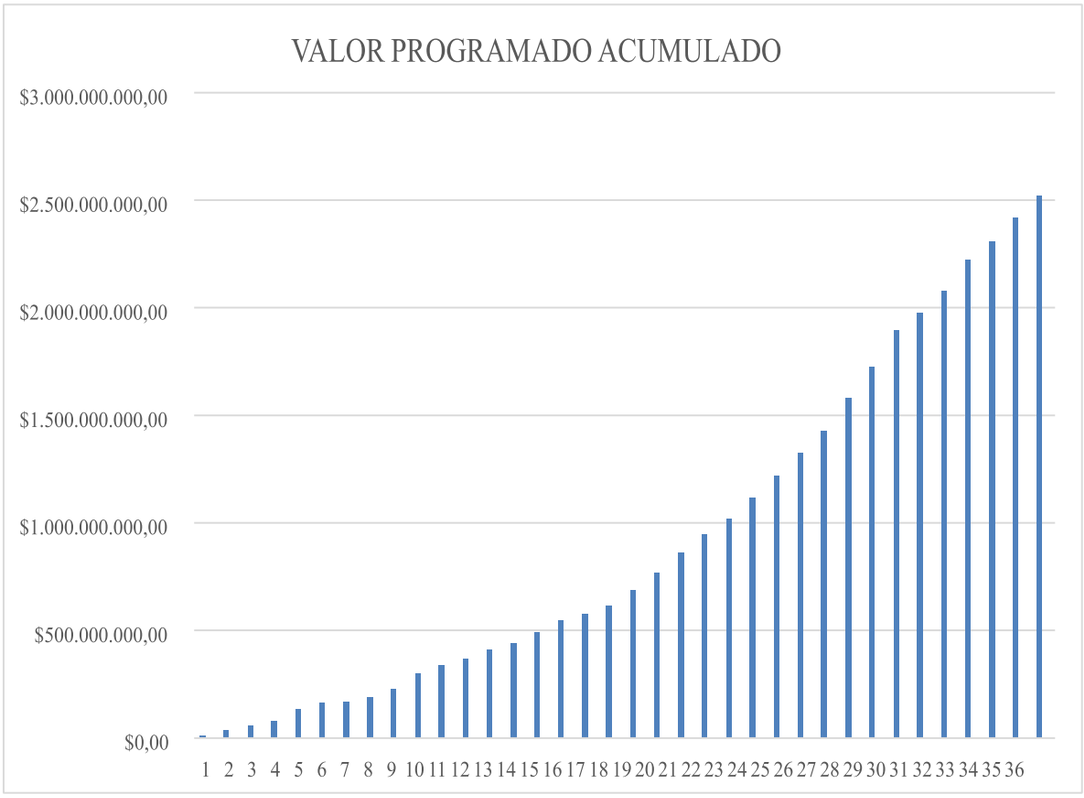


Se presenta el resumen de los valores reportados y ejecutados hasta la semana No. 28 que corresponde a la fecha de corte del 30 de Septiembre de 2023.

SEMANA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
1	16/03/2023	19/03/2023	$ 12.348.018,38	$ 12.348.018,38	0,49%	0,49%
2	20/03/2023	26/03/2023	$ 25.452.037,89	$ 37.800.056,27	1,01%	1,50%
3	27/03/2023	2/04/2023	$ 17.640.026,26	$ 55.440.082,52	0,70%	2,20%
4	3/04/2023	9/04/2023	$ 22.680.033,76	$ 78.120.116,28	0,90%	3,10%
5	10/04/2023	16/04/2023	$ 55.440.082,52	$ 133.560.198,80	2,20%	5,30%
6	17/04/2023	23/04/2023	$ 30.240.045,01	$ 163.800.243,82	1,20%	6,50%
7	24/04/2023	30/04/2023	$ 5.544.008,25	$ 169.344.252,07	0,22%	6,72%
8	1/05/2023	7/05/2023	$ 20.160.030,01	$ 189.504.282,08	0,80%	7,52%
9	8/05/2023	14/05/2023	$ 37.800.056,27	$ 227.304.338,34	1,50%	9,02%
10	15/05/2023	21/05/2023	$ 70.560.105,03	$ 297.864.443,37	2,80%	11,82%
11	22/05/2023	28/05/2023	$ 38.052.056,64	$ 335.916.500,01	1,51%	13,33%
12	29/05/2023	4/06/2023	$ 30.744.045,76	$ 366.660.545,77	1,22%	14,55%
13	5/06/2023	11/06/2023	$ 45.612.067,89	$ 412.272.613,66	1,81%	16,36%

14	12/06/2023	18/06/2023	$ 29.484.043,89	$ 441.756.657,55	1,17%	17,53%
15	19/06/2023	25/06/2023	$ 48.132.071,64	$ 489.888.729,19	1,91%	19,44%
16	26/06/2023	2/07/2023	$ 56.952.084,77	$ 546.840.813,97	2,26%	21,70%
17	3/07/2023	9/07/2023	$ 30.744.045,76	$ 577.584.859,73	1,22%	22,92%
18	10/07/2023	12/07/2023	$ 39.060.058,14	$ 616.644.917,87	1,55%	24,47%
19	24/07/2023	30/07/2023	$ 103.068.153,42	$ 719.713.071,29	4,09%	28,56%
20	30/07/2023	6/08/2023	$ 281.484.418,99	$ 1.001.197.490,27	11,17%	39,73%
21	6/08/2023	13/08/2023	$ 20.916.031,13	$ 1.022.113.521,41	0,83%	40,56%
22	13/08/2023	20/08/2023	$ 20.916.031,13	$ 1.043.029.552,54	0,83%	41,39%
23	20/08/2023	27/08/2023	$ 20.664.030,76	$ 1.063.693.583,30	0,82%	42,21%
24	27/08/2023	3/09/2023	$ 20.844.666,86	$ 1.084.538.250,16	0,83%	43,04%
25	4/09/2023	10/09/2023	$ 100.044.149,00	$ 1.249.434.661,00	3,97%	49,58%
26	11/09/2023	17/09/2023	$ 105.840.158,00	$ 1.355.274.819,00	4,20%	53,78%
27	18/09/2023	24/09/2023	$ 106.092.158,00	$ 1.461.366.977,00	4,21%	57,99%

Se tiene un avance de obra ejecutado del 62% y financieramente del 50% .



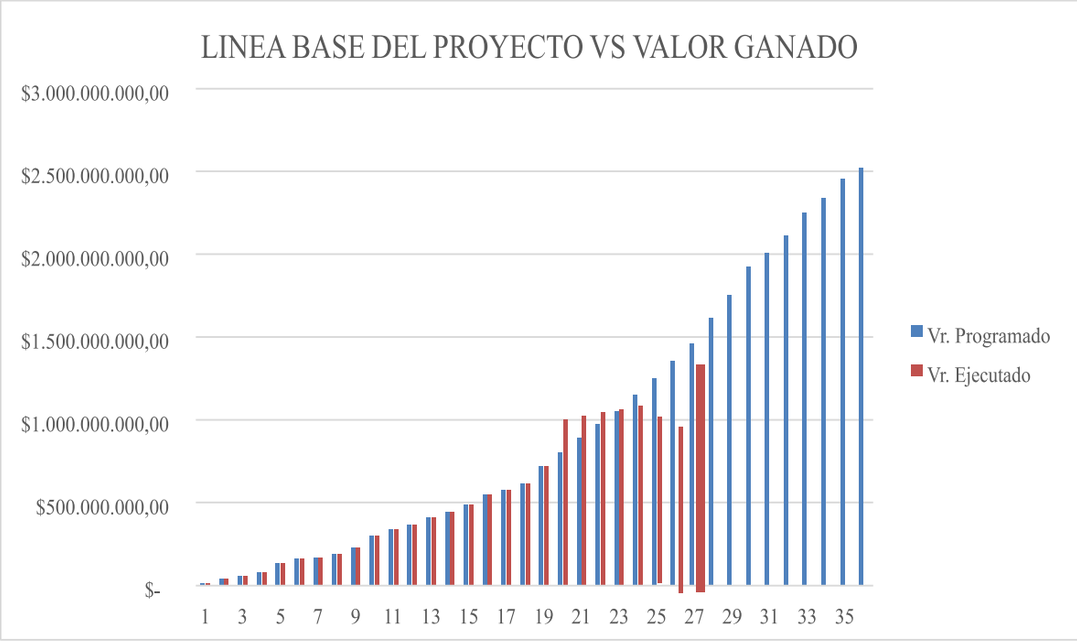

Medición Línea Base

SPI - Schedule Performance Index

$$SPI = EV/PV$$


EV = Valor ganado (ejecución real)
PV = Valor planeado (según programación)

Según lo estimado en campo y en los cortes semanales de medición del alcance nuestro EV será 62%, y según la programación presentada para la presente fecha de corte nuestro PV será 64.3%.

$$SPI = 62/64{,}3$$

$$SPI = 0{,}964$$

Al obtener un resultado del SPI menor a uno, se puede decir que a la fecha de corte la ejecución física presenta atraso con respecto a la ejecución planeada. El atraso es del 2.3%. Una vez se modificó el contrato y se actualizo el programa de obra, se ajusta la planificación de los trabajos de acuerdo a la ejecución real y la programación de las obras por ejecutar.

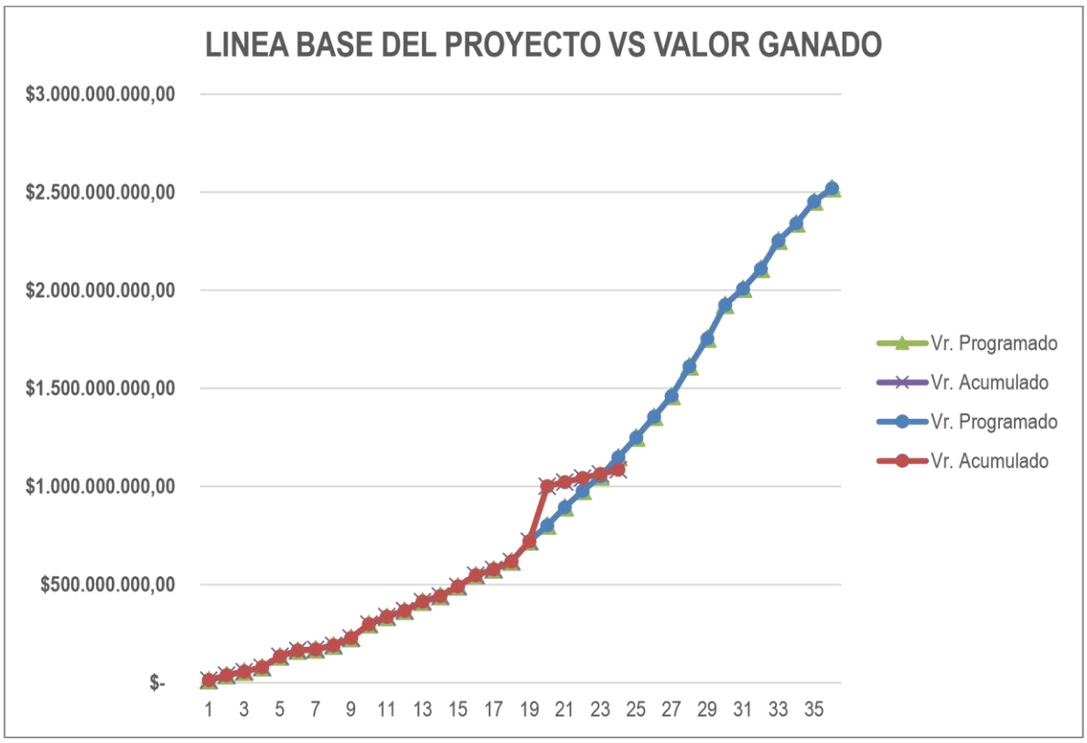

De igual manera, y según lo programada se presenta la curva S o línea base comparada con el EV obtenido en el periodo de presentación de este seguimiento, de forma que se pueda apreciar el estado de avance o atraso que se presenta en el proyecto.

Al momento no se presentan cambios al cronograma inicial ni variación al tiempo definido para el proyecto, se está trabajando en un plan de contingencia para presentar a la interventoría para contrarrestar los atrasos presentados.

Si se identificó la necesidad de aumentar los frentes de obra para nivelar el atraso evidenciado en la EDT, el cual no afectaría el tiempo inicial definido para el proyecto.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COSTOS.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de costos se presenta el presupuesto general de obra junto con sus documentos anexos que hacen parte formal del contrato de obra No. 022 de 2023; donde se estipula el tipo y método de estimación de los costos del proyecto y su unidad de medida.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de la calidad se presenta el Plan de Gestión de la Calidad que presentó, adoptó y fue aprobado para el ejecutor del proyecto;

donde se les da alcance a los propósitos de la gestión de la calidad estipulados en el Plan de Gerencia:

- Está previsto Asegurar la calidad

Se cuenta con la póliza de Estabilidad y calidad de la obra, emitida por SEGUROS DEL ESTADO.

AMPARO	NUMERO DE PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA FIN	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO			
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/10/2023	$ 588.420.000,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 196.140.000,00
Predios Labores y Operaciones.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/10/2023	$ 392.280.000,00
Estabilidad Y Calidad De La Obra.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 392.280.000,00
Contratistas y Subcontratistas.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Responsabilidad Civil Patronal.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Vehículos Propios y no Propios.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Daño Emergente y Lucro Cesante.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Prejuicios Extrapatrimoniales.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00

- Definir cómo se gestionará la calidad

  Se gestionará llevando el control de las actividades mediante las especificaciones técnicas de cada ítem, así como la calidad de los insumos a usar. Se deberá entregar por parte del equipo técnico la certificación de los insumos a usar.

Se garantiza la adopción e implementación de este plan por parte del profesional encargado del área HSEQ, y como soporte de esto se presenta de la misma manera en que se presenta el presente informe, un informe de seguimiento mensual del área HSEQ, en el cual se encuentra desarrollado de aseguramiento de la calidad.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de recursos humanos se toma como referencia el informe mensual presentado por el área HSEQ, donde se incluye un

componente completo sobre la gestión del personal con todos los requerimientos exigidos para tal fin.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de las comunicaciones se abordan las siguientes definiciones con los formatos a los que haya lugar.

- ### Enfoque de la gestión de las comunicaciones

Se define que la gestión de la comunicación velará porque toda información relevante del proyecto sea transmitida de manera ágil y óptima, manejando una cadena de circulación de la información para que cada interesado reciba la información que requiere oportunamente.

El enfoque de la gestión de las comunicaciones será formulado por el profesional para la gerencia del proyecto, e implementado y gestionado por el director de obra el cual velará por que cada rol para la gestión de las comunicaciones entienda su labor dentro de la cadena de circulación de la información.

- ### Restricciones de la gestión de las comunicaciones

El profesional para la gerencia del proyecto define las restricciones para la gestión de las comunicaciones, y el director de obra las comunica, gestiona e implementa.

Las restricciones definidas para las comunicaciones se resumen básicamente en que cualquier miembro del equipo del proyecto notifica al director de obra. El director de obra se encargará de direccionar a cada interesado que el considere dentro del equipo del proyecto.

Si la comunicación tiene alcance fuera del equipo del proyecto, el director deberá notificar única y exclusivamente a la interventoría. Desde allí la interventoría se encargará de distribuir a los interesados del proyecto de la manera que ella considere.

- ### Roles

Se presenta como anexo al presente informe el “FORMATO 4.1. – ROLES EN LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES” del Plan de Gerencia.

PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1"				
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES				
FORMATO 4.1. - ROLES EN LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES				
Papel	Nombre	Cargo	Organización / Departamento	Email
Director de Obra	Juan Carlos Jaimes	Director de obra	CONSORCIO SANTANDER	consorciosantander2023@gmail.com

Gerente de Proyectos	Yeison Andrés Garcés Ortega	Gerente de Proyectos	CONSORCIO SANTANDER	consorciosantander2023@gmail.com
Residente de Obra	Layde Iliana Velandia Torres	Residente de obra	CONSORCIO SANTANDER	residenteobracs@gmail.com
Profesional Social	Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Profesional social	CONSORCIO SANTANDER	consorciosantanderbga@gmail.com
Inspector HSEQ	Bernardo Suarez Carreño	Profesional HSEQ	CONSORCIO SANTANDER	inspectorhseqcs@gmail.com
Inspector de Obra	Omar Blanco	Inspector de Obra	CONSORCIO SANTANDER	inspector1obracs@gmail.com
Inspector de Obra	Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de Obra	CONSORCIO SANTANDER	inspector3obracs@gamil.com
Inspector de Obra	Marlon Castillo	Inspector de Obra	CONSORCIO SANTANDER	inspector2obracs@gmail.com

- ## Métodos de comunicación

Las comunicaciones internas dentro del equipo del proyecto se manejaran por un grupo en la aplicación WhatsApp, y cuando se requiere comunicación privada entre dos miembros se hará mediante llamada telefónica al número móvil registrado para cada miembro del equipo.

En el correo electrónico destinado para el ejecutor del proyecto se recibirán las comunicaciones que provengan de fuera del equipo del proyecto y serán gestionadas por el director de obra y el residente.

- ## Matriz de las comunicaciones

Se presenta como anexo al presente informe el “FORMATO 4.2. – MATRIZ DE LAS COMUNICACIONES” del Plan de Gerencia.

PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1"				
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES				
FORMATO 4.2. – MATRIZ DE LAS COMUNICACIONES				
Tipo de comunicación	Objetivo de la Comunicación	Medio	Frecuencia	Formato
Directa entre miembros del equipo del proyecto	Temas que requieren atención inmediata	Número móvil registrado de cada mienbro del equipo	Cada vez que se requiera	N.A
Virtual abierta entre mienbros del equipo del proyecto	Temas que requieren atención inmediata	App móvil - Whatsapp	Cada vez que se requiera	Grupo creado en Whatsapp
Reuniones técnico - diseño	Comités de obra para aspectos técnicos del proyecto	Presencial	Semanal	Acta de comité de obra
Reunión interna del equipo técnico del ejecutor del proyecto	Comités internos del ejecutor para evaluar y programar avance	Presencial	Semanal	Acta de comité interno
Bitácora de obra	Plasmar nformación importante y relevante de la ejecución diaria del proyecto	Escrito	Diario	De forma escrita en Bitácora de obra

Informes técnicos mensuales de avance	Reportar formalmente y dejar evidencia física del avance mensual del proyecto.	Escrito	Mensual	Informe presentado por el ejecutor

- Proceso de escalonamiento de las comunicaciones

Se presenta como anexo al presente informe el "FORMATO 4.3. – ESCALONAMIENTO Y PRIORIDAD DE LAS COMUNICACIONES" del Plan de Gerencia.

PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1"			
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES			
FORMATO 4.3. – ESCALONAMIENTO Y PRIORIDAD DE LAS COMUNICACIONES			
Prioridad	Definición	Decisión del Órgano de	Plazo para la Resolución
Prioridad 1	El mayor impacto de las operaciones del proyecto o negocio. Si no se resuelve rápidamente, habrá un impacto adverso significativo a los ingresos y / o horario.	Representante legal y socios del Consorcio	El plazo de un día hábil
Prioridad 2	Impacto medio para las operaciones del proyecto o negocio que puede resultar en un impacto adverso a los ingresos y / o horario.	Patrocinador del Proyecto	El plazo de tres días hábil
Prioridad 3	Impacto leve que puede causar algunas dificultades de programación menores con el proyecto, pero no de impacto para las operaciones de negocios o ingresos.	Gerente de Proyectos	Dentro de los cinco días hábiles
Prioridad 4	Impacto insignificante de los proyectos, pero puede haber una solución mejor.	Gerente de Proyectos	El trabajo continúa y se presentan las medidas a corregir

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGO.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de riesgos, una vez estudiada y revisada, se implementa la matriz de riesgo definida en el proceso de contratación, donde se incluyen todos los componentes necesarios para la gestión del riesgo y se cumple con los requerimientos exigidos para tal fin.

Dicha matriz es anexo formal del presente informe con el fin de marcar la identificación y el seguimiento a los riesgos definidos en la misma.

Para el presente periodo no se presentaron la identificación de otros riesgos diferentes a los registrados.

YEISON ANDRES GARCES ORTEGA
PROFESIONAL GERENCIA DE PROYECTOS

Consorcio Santander / ALCALDÍA DE BUCARAMANGA Municipio de Bucaramanga	SEGUIMIENTO MENSUAL AL PLAN DE GERENCIA	Código: Versión: 01 Fecha:02/07/2023

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 7
PERIODO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CONTRATO DE OBRA No. 022 DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER




Firma		
Nombre	LAYDE ILIANA VELANDIA TORRES	JUAN CARLOS JAIMES NIÑO
Cargo	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR DE OBRA**
	ELABORÓ	APROBÓ

TABLA DE CONTENIDO

1.GENERALIDADES 4

1.1INTRODUCCIÓN..... 4

1.2 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 5

1.3DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7

1.4 ANTECEDENTES 8

1.5 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 9

1.6 DIRECTORIO ACTUALIZADO PERSONAL PROFESIONAL 10

1.7 ACTA DE INICIO 11

1.8 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 13

1.9 REACTIVACIÓN DEL CONTRATO 16

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA 18

2.1 GARANTIAS Y VIGENCIAS DE LAS MISMAS 18

3. ESTADO Y AVANCE FÍSICO 19

3.1 AVANCE DE PROGRAMACIÓN FISICA 19

4. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL 20

4.1 PRESUPUESTO 20

4.2 PRESUPUESTO ACTUALIZADO 22

4.3 AVANCE PRESUPUESTAL 23

5. INFORMACION Y ASPECTOS TÉCNICOS 24

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

5.1.1 ITEM 1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 24

5.1.2 ITEM 2.1 DEMOLICIÓN DE VARIAS EN CONCRETO 27

5.1.3 ITEM 3.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 29

5.1.4 ITEM 4.3 CONSTRUCCION DE VADOS Y/O RAMPAS PEATONALES 30

5.1.5 ITEM 4.4 CONSTRUCCION DE VADOS Y/O RAMPAS VEHICULARES 31

5.1.6 ITEM 4.5 FRANJA DE AJUSTE AL PREDIO 33

5.1.7 ITEM 4.7 PISO ADOQUIN PEATONAL RECTANGULAR 34

5.1.8 ITEM 5.1 REALCE DE CAJAS DE SERVICIOS PUBLICOS 35

5.2 ACTIVIDADES NO PREVISTAS

5.2.1 NP-1 CORTE DE PAVIMENTO 44

5.2.2 NP-2 RESANE EN CONCRETO 3000 PSI ZANJA EN CALZADA 45

5.2.4 NP-5 DESMONTE DE BOLARDO EXISTENTE 46

5.2.6 NP-6 DESCAPOTE 47

5.2.6 NP-10 REPARACION DE ACOMETIDA ACUEDUCTO 48

5.2.7 NP-12 BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO 0,3X0,10 49

5.2.8 NP-13 MALLA ELECTROSOLDADA 7MM 50

5.2.10 NP-15 RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN 51

5.3 RELACIÓN DE LLUVIA 52

5.4 ENSAYOS DENSIDADES 53

6. ANEXOS 56

1. GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Bucaramanga, la Alcaldía de Bucaramanga – secretaria de Infraestructura mediante contrato suscrito el: 22-2023 del 10 de febrero de 2023 con la firma **CONSORCIO SANTANDER**; cuyo objeto establece **LA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DEBUCARMANGA, SANTANDER – GRUPO 1,** para las comunas**:** NORTE, NORORIENTAL, SAN FRANCISCO, ORIENTAL Y MORRORICO.

Como propósito el presente informe permite consignar las diferentes actividades de orden técnico, administrativo y financiero, desarrolladas por el consorcio, iniciadas a partir de la firma de Acta de Inicio, con las actividades contractuales para el buen desarrollo del proyecto, cuyo periodo está comprendido entre el 16 de marzo y 31 de marzo de 2023.

Finalmente, se presentan las conclusiones con las acciones llevadas a cabo para la optimización de los recursos asignados al proyecto, buscando el cumplimiento del objeto de los contratos y las metas físicas propuestas al inicio del mismo.

1.2 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Los sectores a intervenir se encuentran en el área urbana del Municipio de Bucaramanga, en el Departamento de Santander.




Ubicación del departamento de Santander en Colombia



Ubicación de Bucaramanga en el departamento de Santander

Fuente Google

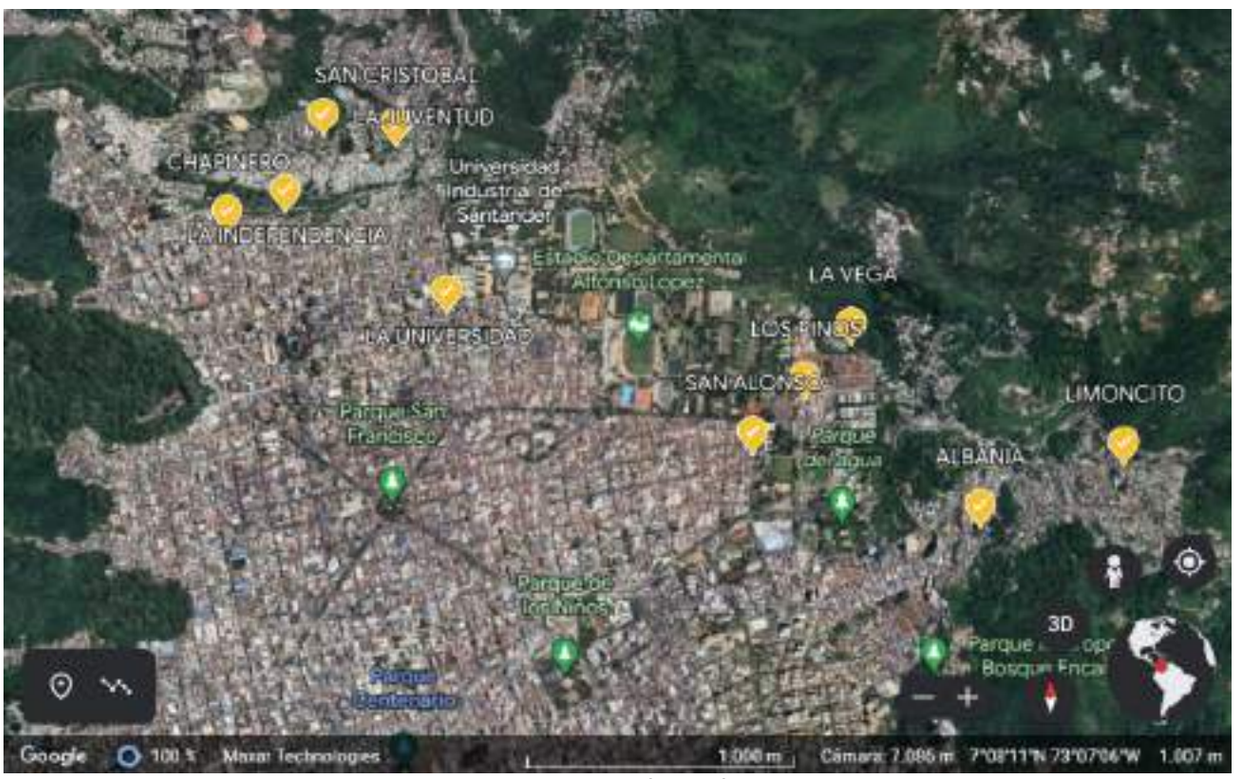

Fuente Google Earth

Puntos a intervenir.

COMUNA	BARRIO	DIRECCIÓN
1 NORTE	ROSAL	Costado Occidental de la Cra 20 desde la Cll 54N hasta la Cll 56N
		Costado Oriente de la Cra 20 desde la Cll 56N hasta la Cll 58N
		Costado Oriente Cll 58N desde la Cra 20 hasta volver a encontrar la interseccioón con la Cra 20
	CAMPO MADRID	Cra 10 frente al parqueadero de las torres de campo madrid
2 NORORIENTAL	LA INDEPENDENCIA	Cra 25 entre Clle 3 y 5
		Cra 19 entre 3 y 4
		Cra 21B con Cra 3
		Cra 24A entre Cll 3A, 3B y 4
		Cra 24B entre Cll 3B y 4
	LA JUVENTUD	Cll 1N entre Cra 21BB hasta la Cra 20A
		Cra 20 A entre Cll 1 y 1N
		Cra 20 C entre Cll 1AN y 2N
		Cll 3N entre Cra 21 y 21A
		Cll 7N entre Cra 20 y 19
		Cll 5N entre Cra 18 y 19
	SAN CRISTOBAL	Cra 23A # 2-22
3 SAN FRANCICO	CHAPINERO	Costado sur de la calle 4 entre cra 16 y 17
		Costado occidental de la cra 17 entre cll 4 y 5
		Costado norte cll 5 entre cra 17 y 16
	LA UNIVERSIDAD	Costado oriental Cra 29 entre cll 10 y 11
		Cll 9A entre Cra 24 y 25
13 ORIENTAL	SAN ALONSO	Cll 20 entre Cra 29 y 30 costado norte
		Cll 20 entre Cra 29 y 30 costado sur
		Costado occidental de la cra 33A entre calles 17 y 18
		Costado occidental de la cra 33A entre calles 18 y 19
	LOS PINOS	Cra 34 entre cll 12 y 13 costado oriental
		Cra 34 entre cll 13 y 14 costado oriental
	LA AURORA	Cll 31 con cra 29 hasta cra 28
14 MORRORICO	LA VEGA	Calle 10 vegas de morrorico
	LIMONCITO	Vía Bucaramanga - Cúcuta margen derecho desde casa N. 50-702 hasta casa N.14-04
	ALBANIA	Cra 51 desde casa N. 18-61 hasta la casa N. 20-67

Fuente propia

Cambio de Chapinero, aclaración

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

La Secretaria de Infraestructura mediante proyecto cuyo objeto es la “ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” como resultado de la utilización de recursos propios y de la implementación de la estrategia general de los Presupuestos Participativos, soportada por el artículo 40 de la Ley 1551 de 2012 así como los artículos 90, 91, 92, 93 y 100 de la Ley 1757 de 2015 y reglamentada para el Municipio de Bucaramanga por el Acuerdo 036 de 2012 y el Decreto Municipal 0159 de 2021 trazando lineamientos de planeación, Implementación, Convocatoria, Selección y Ejecución de los proyectos que la comunidad viabilizó, resultado de la ejecución exitosa de la estrategia previamente citada.

Este proyecto pretende realizar intervenciones de adecuación de espacio público, mediante la demolición de andenes y escaleras existentes que se encuentran en mal estado, que ya terminaron su vida útil o que no cumplen las especificaciones actuales requeridas para ese tipo de estructuras, las cuales serán adecuadas conforme lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Manual de Espacio Público de Bucaramanga y las normas técnicas vigentes, por lo tanto, se pretende conformar adecuadamente las franjas de circulación peatonal en función del perfil vial establecido para cada sitio, posteriormente se realizarán las estructuras de soporte (subrasante, sub bases granulares), acabados (concretos in situ y prefabricados) verificando la calidad de materiales, y por último, se instalará carpintería metálica mediante la construcción de barandas de protección, a modo de amueblamiento de seguridad para peatones en los sitios que por sus características lo requieran.

1.4 ANTECEDENTES

Para la recuperación del espacio público, la Secretaría de Infraestructura determino realizar intervención para la adecuación de los espacios públicos que se encuentran en mal estado, que ya terminaron su vida útil o que por la actualización de la norma no cumplen con las especificaciones actuales requeridas para ese tipo de estructuras, conforme lo establecido en el POT, el MEPB y Normas Técnicas vigentes.

Por lo anterior se fue asignado a este grupo realizar la intervención para la recuperación del espacio público mediante contrato, cuyo alcance de éste proyecta inicialmente realizar recuperación de 4.645 metros cuadrados (m²) de espacio público, distribuido en cinco (5) comunas y trece (13) barrios.

1	1.NORTE	2 Barrios
2	2.NOR-ORIENTAL	3 Barrios
3	3.SAN FRANCISCO	2 Barrios
4	12. ORIENTAL	3 Barrios
5	14. MORRORICO	3 Barrios

1.5 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	**22 DE 2023**
OBJETO:	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 1.
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONCURSO DE MERITOS:	SI-SI-LP-014-2022
VALOR DEL CONTRATO:	MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.961.400.000,00)
VALOR DEL ANTICIPO:	QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($588.420.000,00)
VALOR ADICIÓN:	SEISCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS, ONCE PESOS M/CTE. ($ 620.562.011,00)
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER
NIT:	901677862
REPRESENTANTE LEGAL:	ERNESTO MONTAÑEZ MORA
INTERVENTOR:	JESAK S.A.S.
FIRMA CONTRATO:	MARZO DE 2023
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	16 MARZO DE 2023
FECHA AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN	13 JULIO 2023
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONADO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE JULIO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	25 DE NOVIEMBRE DE 2023

1.6 DIRECTORIO ACTUALIZADO PERSONAL PROFESIONAL

NOMBRE	CARGO	CORREO
Juan Carlos Jaimes Niño	Director de Obra	consorciosantander2023@gmail.com
Yeison Andrés Garcés Ortega	Gerente de Proyectos	consorciosantander2023@gmail.com
Layde Iliana Velandia Torres	Residente de Obra	residenteobracs@gmail.com
Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Profesional Social	consorciosantanderbga@gmail.com
Bernardo Suarez Carreño	Inspector HSEQ	inspectorhseqcs@gmail.com
Kevin Farid Rodríguez Sarmiento	Inspector de Obra	inspector1obracs@gmail.com
Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de Obra	inspector3obracs@gamil.com
Omar Alexis Blanco Bayona	Inspector de Obra	inspector2obracs@gmail.com

1.7 ACTA DE INICIO

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238.37-081 Versión: 0.0 Fecha: NOVIEMBRE-19-2019 Página: 1 de 2

DATOS DE CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No Y FECHA	22 - 24/02/2023	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER. GRUPO 1	
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO SANTANDER
	C.C./NIT	901677862
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ERNESTO MONTAÑEZ MORA
	C.C	79330879
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91378629
INTERVENTOR	NOMBRE:	JESAK SAS
	C.C./NIT	901320986
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.961.400.000,00	
ANTICIPO 30,00 %	$ 588.420.000,00	
CDP	NUMERO:	2736
	FECHA:	21/02/2023
RP	NÚMERO	3010
	FECHA	27/02/2023
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	16/03/2023
	FECHA FIN:	15/07/2023
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron VLADIMIR POLO PAZ en representación de JESAK SAS, en calidad de Interventor y por la otra ERNESTO MONTAÑEZ MORAen representación de CONSORCIO SANTANDER, con el fin de dar inicio al CONTRATO DE OBRAPÚBLICA en los siguientes términos:

- Que el día 10 de Marzo de 2023 se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato como requisito para su ejecución.

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21-44-101407185-0	24/02/2023	28/10/2023	$ 588.420.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101407185-0	24/02/2023	24/06/2026	$ 196.140.000,00
	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	21-45-101206856-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.800.000,00
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	21-44-101407185-0	24/02/2023	24/10/2023	$ 392.280.000,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101407185-0	24/08/2023	24/06/2028	$ 392.280.000,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21-45-101206856-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.800.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	21-45-101206856-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.800.000,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	21-45-101206856-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.800.000,00

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: P-GJ-1140-238,21-081 Versión: 0.0 Fecha: NOVIEMBRE-19-2019 Página: 2 de 2

	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00

- Que el Contratista acreditó que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social.

- Que el Contrato N° 22 de fecha 24/02/2023, se encuentra totalmente perfeccionado y legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 16 de Marzo de 2023.

Interventor

VLADIMIR POLO PAZ
JESAK SAS

Contratista

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
CONSORCIO SANTANDER

Elaboró: MARIA VALENCIA PINZ
Revisó: ABG. CARLOS M. MACHU

1.8 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-087
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura		
ACTA No.	1		
FECHA DEL ACTA	14/07/2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	No 22 del 2023 del 24 de febrero de 2023		
TIPO DE CONTRATO	Obra Pública		
CONTRANTE	Municipio de Bucaramanga		
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 1		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO SANTANDER	
	C.C/ NIT	901677862_6	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ERNESTO MONTAÑEZ MORA	
	C.C	79.330.879	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	Secretario de Infraestructura	
	C.C	91278629	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA	NOMBRE	EDGAR BAYONA FLÓREZ	
	C.C/ NIT	91243324	
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.941.640.000,00	APORTE MUNICIPIO	*N.A*
		APORTE CONVENIDO	*N.A*
VALOR ADICIONADO	N.A.	APORTE MUNICIPIO	*N.A*
		APORTE CONVENIDO	*N.A*
ANTICIPO (30%)	$ 569.832.522,00		
CDP	NÚMERO:	6583	
	FECHA:	28/09/2022	
RP	NÚMERO:	3010	
	FECHA:	27/02/2023	
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	16 de marzo de 2023	
	FECHA DE FIN ANTERIOR:	15 DE JULIO DE 2023	
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE JULIO DE 2023	
	DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	N.A.			
Prórrogas	N.A.			

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	N.A.			

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N.A.		

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-087
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 2 de 3

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	1.961.480.000,00
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
GARANTIA No:	21-44-101407105-3
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	392.296.000,00	16/03/2023	15/11/2023
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	588.420.000,00	16/03/2023	15/11/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	196.140.000,00	16/03/2023	15/07/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	392.296.000,00	15/07/2023	15/01/2026

CONTRATISTA(S): CONSORCIO SANTANDER

OBJETO: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PARAMENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER. GRUPO 1

VALOR DEL CONTRATO:	1.961.480.000,00
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
GARANTIA No:	21-10-101204884-3
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	740.000.000,00	16/03/2023	15/07/2023

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	27/04/2023

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

1. Que en la ejecución de las actividades del contrato de obra se han presentado situaciones que ameritan modificación en las cantidades contractuales y pactación de ítems no previstos, que requieren de mayor tiempo para su desarrollo, sumado a los inconvenientes derivados de la oposición o inconformidades y tramites de peticiones de la comunidad, respecto la intervención de los espacios públicos, manifestándose reiteradamente descontento con temas como árboles, acceso a Parqueaderos, así como requerimientos adicionales después de socializadas las actividades. Situaciones que originaron y fundamentaron la necesidad de tramitar oportunamente por parte de los contratista de obra la prórroga y adición del contrato mediante oficio CS 2023 COM – 060 adiado 03 de junio de 2023, remitida oportunamente a la entidad con oficio de interventoría JSK-MB-429-240 del 5 de junio de 2023 para los fines contractuales pertinentes, hallándose está en trámite aún a la fecha para su estudio, verificación y aprobación, resultando imperativa la suspensión del contrato en virtud de la proximidad de la fecha de terminación.
2. Que existen razones contractuales constitutivas de Fuerza Mayor, no imputables al CONTRATISTA, requeridas para preservar el vínculo contractual y la primacía del interés público, que motivan la necesidad de suspender el plazo de ejecución del contrato.
3. Para el cumplimiento del objeto contractual y los fines de la contratación pública, es necesario culminar los trámites de solicitud de adición y prorroga en curso, para la aprobación respectiva.

ACUERDAN

De conformidad con lo anterior, las partes acuerdan suspender la ejecución del contrato así:

PRIMERO: Suspender el plazo de ejecución del contrato de obra No. 22 de 2023 del 24 de febrero de 2023, a partir de la fecha y hasta cuando se den las condiciones para su reinicio, o sea una vez se cuente con el certificado de disponibilidad presupuestal que soporte el compromiso del valor adicional requerido, y con la elaboración y aprobación de la justificación del mismo, necesario para elaborar la respectiva minuta del adicional N° 1 en valor y plazo, con la cual una vez aprobada, se solicita el certificado de registro presupuestal..

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución del mismo, el Supervisor y el Contratista suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

TERCERO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas y allegarlas

Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO**	Código: F-GJ-1140-238,37-087 Versión: 2.0 Fecha aprobación: Septiembre-06-2022 Página 3 de 3

QUINTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 14 de JULIO de 2023.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
R.L. Consorcio Santander - Contratista

VLADIMIR POLO PAZ
R.L. Jesak SAS - interventor

EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Interventoría

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal

Elaboró: Ing. EDGAR BAYONA FLÓREZ

1.9 REACTIVACION DEL CONTRATO

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Mayo-15-2020
		Página **1** de **2**

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura		
ACTA No.	1		
FECHA DEL ACTA	24/07/2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	No 22 del 2023 del 24 de febrero de 2023		
TIPO DE CONTRATO	Obra Pública		
CONTRANTE	Municipio de Bucaramanga		
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 1		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO SANTANDER	
	C.C/ NIT	901677862_6	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ERNESTO MONTAÑEZ MORA	
	C.C	79.330.879	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	Secretario de Infraestructura	
	C.C	91278629	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA	NOMBRE	EDGAR BAYONA FLÓREZ	
	C.C/ NIT	91243324	
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.941.640.000,00	APORTE MUNICIPIO	*N.A*
		APORTE CONVENIDO	*N.A*
VALOR ADICIONADO	N.A.	APORTE MUNICIPIO	*N.A*
		APORTE CONVENIDO	*N.A*
ANTICIPO (30%)	$ 569.832.522,00		
CDP	NÚMERO:	6583	
	FECHA:	28/09/2022	
RP	NÚMERO:	3010	
	FECHA:	27/02/2023	
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	16 de marzo de 2023	
	FECHA DE FIN ANTERIOR:	15 DE JULIO DE 2023	
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE JULIO DE 2023	
	DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	10 Días	14/jul/2023	23/jul/2023
Prórrogas	N.A.			

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	N.A.			

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N.A.		

CONSIDERACIONES

1. El Contrato estuvo identificado estuvo suspendido temporalmente durante el tiempo Comprendido entre el

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Mayo-15-2020
		Página **2** de **2**

partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato Nº 22 suscrito el 24 de febrero de 2023, a partir del día 24 de julio de 2023 y en consecuencia la terminación del mismo se surtirá el día 25 de julio 2023.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a trasladar las vigencias y coberturas de las pólizas constituidas inicialmente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, por el tiempo que duró la suspensión del Contrato y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 24 de Julio de 2023.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
R.L. Consorcio Santander - Contratista

VLADIMIR POLO PAZ
R.L. Jesak SAS - interventor

EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Interventoría

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal.

Elaboró: Ing. EDGAR BAYONA FLÓREZ

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

2.1 GARANTIAS Y VIGENCIAS DE LAS MISMAS

AMPAR0	NUMERO DE PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA FIN	NUMERO DE PÓLIZA
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO			
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/10/2023	$ 588.420.000,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 196.140.000,00
Predios Labores y Operaciones.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/10/2023	$ 392.280.000,00
Estabilidad Y Calidad De La Obra.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 392.280.000,00
Contratistas y Subcontratistas.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Responsabilidad Civil Patronal.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Vehículos Propios y no Propios.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Daño Emergente y Lucro Cesante.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Prejuicios Extrapatrimoniales.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00

3. ESTADO Y AVANCE FÍSICO

3.1 AVANCE DE PROGRAMACIÓN FÍSICA

	HITOS DE CONTROL DE AVANCE	DURACIÓN (DÍAS)	INICIO	FIN	ESTADO	CUMPLIMIENTO
1	CRA 34 CLL 12 Y 13 FRANJA ORIENTAL LOS PINOS	50	10/04/2023	29/05/2023	INICIADO	TERMINADO
2	CRA 34 CLL 13 Y 14 FANJAR ORIENTAL LOS PINOS	50	10/04/2023	29/05/2023	INICIADO	TERMINADO
3	ENTRADA LA VEGA MORRORICO	49	10/04/2023	28/05/2023	INICIADO	TERMINADO
4	17 COMUNA 13 SAN ALONSO	125	10/04/2023	12/08/2023	INICIADO	TERMINADO
5	CRA 29 ENTRE CLL 10 Y 11 LA UNIVERSIDAD	23	29/05/2023	20/06/2023	INICIADO	TERMINADO
6	CLL 9A ENTRE 24 Y 25 SECTOR IMPAR BARRIO UNIVERSIDAD	72	29/05/2023	8/08/2023	INICIADO	TERMINADO
7	CLL 31 CON CRA 28 LA AURORA	59	21/06/2023	18/08/2023	INICIADO	TERMINADO
8	CRA 17, 16 Y 15 CON CALLE 4 Y 5 CHAPINERO	73	6/07/2023	16/09/2023	INICIADO	ADELANTADO
9	CAMPO MADRID	68	25/07/2023	30/09/2023	INICIADO	ADELANTADO
10	CLL 20 CRA 29 Y 30 FRANJA SUR SAN ALONSO	31	9/08/2023	8/09/2023	INICIADO	TERMINADO
11	CLL 20 CRA 29 Y 30 FRANJA NORTE SAN ALONSO	31	14/08/2023	13/09/2023	INICIADO	TERMINADO
12	18 COMUNA 14 LIMONCITO	89	28/08/2023	24/11/2023	NO INICIADO	
13	1 COMUNA 1 EL ROSAL	85	1/09/2023	24/11/2023	INICIADO	ADELANTADO
14	4 COMUNA 2 LA JUVENTUD	84	2/09/2023	24/11/2023	INICIADO	ADELANTADO
15	3 COMUNA 2 LA INDEPENDENCIA	75	11/09/2023	24/11/2023	INICIADO	ADELANTADO
16	CRA 25 CLL 3 Y 5 LA INDEPENDENCIA	75	11/09/2023	24/11/2023	NO INICIADO	
17	TRANSICIÓN V CRA 23A #2-22	54	2/10/2023	24/11/2023	NO INICIADO	
18	ALBANIA COMUNA 14	33	23/10/2023	24/11/2023	INICIADO	ADELANTADO

4. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL

4.1 PRESUPUESTO

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3

Código CCE-EICP-FM-14 **Versión** 3

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO I

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				PRELIMINARES				
1	1.1		1.1	Localización y replanteo manual	m2	6.676,80	$ 2.300,00	$ 15.356.640,00
Subtotal								**$ 15.356.640,00**
				DEMOLICIONES				
2	2.1	INVIAS-201-13	2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1.299,00	$ 207.900,00	$ 270.062.100,00
Subtotal								**$ 270.062.100,00**
				EXCAVACIONES Y RELLENOS				
3	3.1	INVIAS-600-13	3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	895,60	$ 76.800,00	$ 68.782.080,00
4	3.2	INVIAS-320-13	3.2	Relleno compactado con material de sub-base granular	m3	1.021,80	$ 210.900,00	$ 215.497.620,00
Subtotal								**$ 284.279.700,00**
				ESPACIO PUBLICO				
5	4.1		4.1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	m2	1.154,60	$ 138.200,00	$ 159.565.720,00
6	4.2	INVIAS-672-13	4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.309,80	$ 84.700,00	$ 195.640.060,00
7	4.3		4.3	Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	141,80	$ 375.400,00	$ 53.231.720,00
8	4.4		4.4	Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	120,40	$ 265.700,00	$ 31.990.280,00
9	4.5		4.5	Franja de ajuste al predio	m	2.014,20	$ 14.400,00	$ 29.004.480,00
10	4.6	2013-INV-630.1	4.6	Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	114,40	$ 981.500,00	$ 112.283.600,00
11	4.7	2013-INV-630.1	4.7	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	m2	2.049,20	$ 157.000,00	$ 321.724.400,00
12	4.8	2013-INV-630.1	4.8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	283,00	$ 815.300,00	$ 230.729.900,00
Subtotal								**$ 1.134.170.160,00**
				OBRAS COMPLEMENTARIAS				
13	5.1		5.1	Realce cajas de servicios publicos	UND	205,00	$ 144.200,00	$ 29.561.000,00
14	5.2		5.2	Realce pozos EMPAS	UND	47,40	$ 244.500,00	$ 11.589.300,00
15	5.3		5.3	Traslado Señales de Tránsito	UND	44,20	$ 137.000,00	$ 6.055.400,00
Subtotal								**$ 47.205.700,00**

				CARPINTERIA METÁLICA				
16	6.1		6.1	Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	m	146,60	$ 391.700,00	$ 57.423.220,00
Subtotal								**$ 57.423.220,00**
				ASEO Y LIMPIEZA				
17	7.1		7.1	Aseo y limpieza general	m2	4.755,40	$ 3.800,00	$ 18.070.520,00
Subtotal								**$ 18.070.520,00**
				PLAN DE MANEJO				
18	8.1		8.1	Plan de Manejo Ambiental	un	1,00	$ 10.494.000,00	$ 10.494.000,00
19	8.2		8.2	Plan de Manejo de Tránsito	un	1,00	$ 62.379.700,00	$ 62.379.700,00
Subtotal								**$ 72.873.700,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.899.441.740,00**

FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS			$ 61.958.260,00
INTERVENTORIA			
		VALOR TOTAL OBRA	**$ 1.961.400.000,00**
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)			
VALOR TOTAL			

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	32%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	0%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	37%

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO SANTANDER

4.2 PRESUPUESTO ACTUALIZADO

BALANCE SOLICITUD DE ADICION No 1 - ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO I												
PRESUPUESTO CONTRACTUAL								REVISIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE A+U)	VALOR TOTAL	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR									
				PRELIMINARES								
1	1.1		1.1	Localización y replanteo manual	m2	6.676,80	$ 2.300,00	$ 15.356.640,00			6.676,80	$ 15.356.640,00
				DEMOLICIONES								
2	2.1	INVIAS-201-13	2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1.299,00	$ 207.900,00	$ 270.062.100,00		159,83	1.139,17	$ 236.833.443,00
				EXCAVACIONES Y RELLENOS								
3	3.1	INVIAS-600-13	3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	895,60	$ 76.800,00	$ 68.782.080,00		72,11	823,49	$ 63.244.032,00
4	3.2	INVIAS-320-13	3.2	Relleno compactado con material de sub-base granular	m3	1.021,80	$ 210.900,00	$ 215.497.620,00		52,52	969,28	$ 204.421.152,00
				ESPACIO PUBLICO								
5	4.1		4.1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	m2	1.154,60	$ 138.200,00	$ 159.565.720,00		160,3	994,30	$ 137.412.260,00
6	4.2	INVIAS-672-13	4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.309,80	$ 84.700,00	$ 195.640.060,00		130,77	2.179,03	$ 184.563.841,00
7	4.3		4.3	Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	141,80	$ 375.400,00	$ 53.231.720,00		9,84	131,96	$ 49.537.784,00
8	4.4		4.4	Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	120,40	$ 265.700,00	$ 31.990.280,00		13,9	106,50	$ 28.297.050,00
9	4.5		4.5	Franja de ajuste al predio	m	2.014,20	$ 14.400,00	$ 29.004.480,00			2.014,20	$ 29.004.480,00
10	4.6	2013-INV-630.1	4.6	Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	114,40	$ 981.500,00	$ 112.283.600,00		11,29	103,11	$ 101.202.465,00
11	4.7	2013-INV-630.1	4.7	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	m2	2.049,20	$ 157.000,00	$ 321.724.400,00		275,99	1.773,21	$ 278.393.329,52
12	4.8	2013-INV-630.1	4.8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	283,00	$ 815.300,00	$ 230.729.900,00		27,17	255,83	$ 208.578.199,00
				OBRAS COMPLEMENTARIAS								
13	5.1		5.1	Realce cajas de servicios publicos	UND	205,00	$ 144.200,00	$ 29.561.000,00		32,33	172,67	$ 24.899.014,00
14	5.2		5.2	Realce pozos EMPAS	UND	47,40	$ 244.500,00	$ 11.589.300,00			47,40	$ 11.589.300,00
15	5.3		5.3	Traslado Señales de Tránsito	UND	44,20	$ 137.000,00	$ 6.055.400,00			44,20	$ 6.055.400,00
				CARPINTERIA METÁLICA								
16	6.1		6.1	Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	m	146,60	$ 391.700,00	$ 57.423.220,00		14,14	132,46	$ 51.884.582,00
				ASEO Y LIMPIEZA								
17	7.1		7.1	Aseo y limpieza general	m2	4.755,40	$ 3.800,00	$ 18.070.520,00			4.755,40	$ 18.070.520,00
				PLAN DE MANEJO								
18	8.1		8.1	Plan de Manejo Ambiental	un	1,00	$ 10.494.000,00	$ 10.494.000,00			1,00	$ 10.494.000,00
19	8.2		8.2	Plan de Manejo de Tránsito	un	1,00	$ 62.379.700,00	$ 62.379.700,00			1,00	$ 62.379.700,00
								$ 1.899.440.740,00				$ 1.722.217.191,52
				NO PREVISTOS								
20	NP1		9.1	Corte de pavimento hasta 3 cm	M	2.434,00	$ 14.306,30		2.434,00		2.434,00	$ 34.821.534,20
21	NP2		9.2	Resane en concreto de 3000 psi zanja en calzada vehicular ancho entre 3 y 5 cm, espesor 30 cm.	M	2.434,00	$ 11.609,62		2.434,00		2.434,00	$ 28.257.815,08
22	NP3		9.3	Reposición tramo bajante de aguas lluvias, Tubería PVC hasta 3"	M	60,00	$ 25.174,42		60,00		60,00	$ 1.510.465,20
24	NP5		9.4	Poda radicular	UND	20,00	$ 324.920,49		20,00		20,00	$ 6.498.409,80
25	NP6		9.5	Desmonte bolardo existente	UND	30,00	$ 13.314,49		30,00		30,00	$ 399.434,70
26	NP7		9.6	Descapote	M2	150,00	$ 47.612,35		150,00		150,00	$ 7.141.852,50
28	NP9		9.7	Losa en concreto 4000 psi.	M3	10,00	$ 849.309,68		10,00		10,00	$ 8.493.096,80
30	NP11		9.8	Transplante de árboles altura 2m	UND	10,00	$ 456.705,86		10,00		10,00	$ 4.567.058,60
31	NP12		9.9	Sardinel prefabricado S10 L= 0,2 m norma MEPB	M	200,00	$ 134.973,74		200,00		200,00	$ 26.994.748,00
32	NP13		9.10	Reparación acometida acueducto.	UND	150,00	$ 33.302,97		150,00		150,00	$ 4.995.445,50
33	NP14		9.11	Siembra de árboles Pomarroso Brasileño H Prom = 1.5 m	UND	5,00	$ 212.033,11		5,00		5,00	$ 1.060.165,55
34	NP15		9.12	Bordillo en concreto reforzado de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.	M	250,00	$ 54.836,97		250,00		250,00	$ 13.709.242,50
35	NP16		9.13	Malla electrosoldada 7 mm hueco de 15 *15 cm	Kg	320,00	$ 9.512,58		320,00		320,00	$ 3.044.025,60
36	NP17		9.14	Muro y zarpa en concreto de 3000 Psi	M3	15,00	$ 902.802,26		15,00		15,00	$ 13.542.033,90
37	NP18		9.15	Relleno manual compactado con material de excavación	M3	150,00	$ 40.679,91		150,00		150,00	$ 6.101.986,50
38	NP19		9.16	Desponte y reinstalación de paradero metálico e incluye el mupi.	Glo	1,00	$ 2.410.066,05		1,00		1,00	$ 2.410.066,05
			9.17	Bordillo en concreto simple de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.	M	250,00	$ 33.619,20		250,00		250,00	$ 8.404.800,00
39	NP20		9.18	Refuerzo PDR 60	Kg	600,00	$ 8.787,28		600,00		600,00	$ 5.272.368,00
								SUBTOTAL SUBCONTRATO OBRAS				$ 177.224.548,48
								$ 1.899.441.740,00				$ 1.899.441.740,00

SOLICITUD DE ADICIÓN		$ 540.958.132,00
TOTAL		$ 2.440.399.872,00
FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS	$ 61.958.260,00	$ 79.603.879,00
VALOR TOTAL OBRA	$ 1.961.400.000,00	$ 2.520.003.751,00

4.3 AVANCE PRESUPUESTAL

FLUJO DE CAJA CON VALOR ADICIONAL								
SEMANA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR PROGRAMADO	% PROGRAMADO	VALOR ACUMULADO PROGRAMADO	% programado acumulado	% Acumulado Ejecutado	% ATRASO
1	jueves, 16 de marzo de 2023	domingo, 19 de marzo de 2023	$ 12.348.018	0,49%	$ 12.348.018	0,49%	0,49%	0,00%
2	lunes, 20 de marzo de 2023	domingo, 26 de marzo de 2023	$ 25.452.038	1,01%	$ 37.800.056	1,50%	1,50%	0,00%
3	lunes, 27 de marzo de 2023	domingo, 2 de abril de 2023	$ 17.640.026	0,70%	$ 55.440.083	2,20%	2,20%	0,00%
4	lunes, 3 de abril de 2023	domingo, 9 de abril de 2023	$ 22.680.034	0,90%	$ 78.120.116	3,10%	3,10%	0,00%
5	lunes, 10 de abril de 2023	domingo, 16 de abril de 2023	$ 55.440.083	2,20%	$ 133.560.199	5,30%	5,30%	0,00%
6	lunes, 17 de abril de 2023	domingo, 23 de abril de 2023	$ 30.240.045	1,20%	$ 163.800.244	6,50%	6,50%	0,00%
7	lunes, 24 de abril de 2023	domingo, 30 de abril de 2023	$ 5.460.008	0,22%	$ 169.260.252	6,72%	6,72%	0,00%
8	lunes, 1 de mayo de 2023	domingo, 7 de mayo de 2023	$ 20.160.030	0,80%	$ 189.420.282	7,52%	7,52%	0,00%
9	lunes, 8 de mayo de 2023	domingo, 14 de mayo de 2023	$ 37.800.056	1,50%	$ 227.220.338	9,02%	9,02%	0,00%
10	lunes, 15 de mayo de 2023	domingo, 21 de mayo de 2023	$ 70.560.105	2,80%	$ 297.780.443	11,82%	11,82%	0,00%
11	lunes, 22 de mayo de 2023	domingo, 28 de mayo de 2023	$ 38.052.057	1,51%	$ 335.832.500	13,33%	13,33%	0,00%
12	lunes, 29 de mayo de 2023	domingo, 4 de junio de 2023	$ 30.744.046	1,22%	$ 366.576.546	14,55%	14,55%	0,00%
13	lunes, 5 de junio de 2023	domingo, 11 de junio de 2023	$ 45.612.068	1,81%	$ 412.188.614	16,36%	16,36%	0,00%
14	lunes, 12 de junio de 2023	domingo, 18 de junio de 2023	$ 29.484.044	1,17%	$ 441.672.657	17,53%	17,53%	0,00%
15	lunes, 19 de junio de 2023	domingo, 25 de junio de 2023	$ 48.132.072	1,91%	$ 489.804.729	19,44%	19,44%	0,00%
16	lunes, 26 de junio de 2023	domingo, 2 de julio de 2023	$ 57.052.885	2,26%	$ 546.857.614	21,70%	21,70%	0,00%
17	lunes, 3 de julio de 2023	domingo, 9 de julio de 2023	$ 30.744.046	1,22%	$ 577.601.660	22,92%	22,92%	0,00%
18	lunes, 10 de julio de 2023	miércoles, 12 de julio de 2023	$ 39.060.058	1,55%	$ 616.661.718	24,47%	24,47%	0,00%
19	lunes, 24 de julio de 2023	domingo, 30 de julio de 2023	$ 103.068.153	4,09%	$ 719.729.871	28,56%	28,56%	0,00%
20	lunes, 31 de julio de 2023	domingo, 6 de agosto de 2023	$ 80.892.120	3,21%	$ 800.621.992	31,77%	39,73%	7,96%
21	lunes, 7 de agosto de 2023	domingo, 13 de agosto de 2023	$ 93.240.139	3,70%	$ 464.392.787	35,47%	40,56%	5,09%
22	lunes, 14 de agosto de 2023	domingo, 20 de agosto de 2023	$ 83.160.124	3,30%	$ 977.022.254	38,77%	41,39%	3%
23	lunes, 21 de agosto de 2023	domingo, 27 de agosto de 2023	$ 74.340.111	2,95%	$ 1.051.362.365	41,72%	42,21%	0,49%
24	lunes, 28 de agosto de 2023	domingo, 3 de septiembre de 2023	$ 98.028.146	3,89%	$ 1.149.390.511	45,61%	47,43%	1,82%
25	lunes, 4 de septiembre de 2023	domingo, 10 de septiembre de 2023	$ 100.044.149	3,97%	$ 1.249.434.660	49,58%	47,44%	-2,14%
26	lunes, 11 de septiembre de 2023	domingo, 17 de septiembre de 2023	$ 105.840.158	4,20%	$ 1.355.274.817	53,78%	49,13%	-4,65%
27	lunes, 18 de septiembre de 2023	domingo, 24 de septiembre de 2023	$ 106.092.158	4,21%	$ 1.461.366.975	57,99%	50,82%	-7,17%
28	lunes, 25 de septiembre de 2023	domingo, 1 de octubre de 2023	$ 150.948.225	5,99%	$ 1.612.315.200	63,98%	56,56%	-7,42%

Total, ejecutado a la fecha $1425.318.543,50

Porcentaje ejecutado: 56,56%

Porcentaje de atraso: 7,42%

5. INFORMACION Y ASPECTOS TÉCNICOS

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

5.1.1 **ACTIVIDAD ITEM 1.1. Localización y replanteo manual**.

Este ítem hace referencia a los replanteos manuales que se realizaran para obras de adecuaciones. Se debe determinar como referencia lo existente en las zonas a intervenir. Se deben verificar los linderos y alcance de la obra.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
1.1	Localización y replanteo manual	M2	6676,80	344,40

COMUNA 2 NORORIENTAL		
INDEPENDENCIA		143,80 m²









COMUNA 13. ORIENTAL		
AURORA	Cll 31 Con Cra 28 ESAP	96 m²






COMUNA 2. NORORIENTAL		
JUVENTUD		104,60 m²









5.1.2 ACTIVIDAD ITEM 2.1 Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final.

Este ítem se refiere a la demolición de los pisos en general y sardinel existente que deberá ser retirado para ejecución de la obra. La demolición se plantea realizarla con martillo hidráulico y herramienta menor de acuerdo a las especificaciones de demoliciones. Los materiales resultantes se apilarán en el lugar de acopio de los escombros, serán cargados y retirados de la obra.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final.	M³	1288	64,17

COMUNA 2. NORORIENTAL		
INDEPENDENCIA		28,76 m³









COMUNA 13. ORIENTAL		
AURORA	Cll 31 Con Cra 28 ESAP	96 m3






COMUNA 2. NORORIENTAL		
JUVENTUD		10,77 m3






COMUNA 2. NORORIENTAL		
ROSAL		9,54 m3






COMUNA 14. MORRORICO		
ALBANIA		13,50 m3






5.1.3 ACTIVIDAD ITEM 3.1 Excavación manual en material común y/o conglomerado incluye cargue, retiro y disposición final.

Esta actividad se refiere a la excavación manual sin entibado de material común necesaria para bordillos, para cajas que requieran ser llevadas a niveles de construcción y para la adecuación de la aplicación de sub base granular para cumplimiento de niveles, incluye retiro y disposición final del material sobrante.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado incluye cargue, retiro y disposición final.	M³	695,6	93,69

COMUNA 2. NORORIENTAL		
INDEPENDECIA		11,504 m³





COMUNA 13. ORIENTAL		
AURORA	Cll 31 Con Cra 28 ESAP	9,6 m3






COMUNA 2. NORORIENTAL		
JUVENTUD		11,96 m3






COMUNA 2. NORORIENTAL		
ROSAL		37,09m3






COMUNA 14. MORRORICO		
ALBANIA	Cra 51	24,3 m3






5.1.4 **ACTIVIDAD ITEM 3.2 Relleno compactado con material de Sub – Base granular.**

Esta actividad comprente la instalación de sub base granular compactada, con espesores de 0,10 m para andenes y 0,15 m para rampas vehiculares, equipo utilizado para actividad un compactador manual tipo rana.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
3.2	Relleno compactado con material de sub – base granular	M³	1021,8	33,51

COMUNA 13. ORIENTAL		
AURORA	Cll 31 Con Cra 28 ESAP	8,074 m3






COMUNA 2. NORORIENTAL		
ROSAL		25,434 m3






5.1.5 ACTIVIDAD ITEM 4.1 Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)

Actividad que corresponde con la instalación losetas de (40 cm x 40 cm x 6cm) lisas, guía y toperol, instalación de loseta de (40cm x 20 cm x 6 cm) visual amarilla según el manual de espacio publico de Bucaramanga, sobre mortero 1:4 con un espesor de 5cm para asentamiento de la loseta.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.1	Construcción de espacio público según MEPB	M²	2.309,8	598,02

COMUNA 13. ORIENTAL		
AURORA	Cll 31 Con Cra 28 ESAP	52,80 m2






COMUNA 2. NORORIENTAL		
JUVENTUD		192,42 m3






COMUNA 2. NORORIENTAL		
ROSAL		228 m2






COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
CHAPINERO	Clle 4 entre Cra 16 y 17	124,80 m2






5.1.6 **ACTIVIDAD ITEM 4.2 Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10**

Actividad que corresponde con la instalación de sardinel recto prefabricado UC-S10 de 0,80 m, sobre mortero 1:4 a una profundida de 0,40 m, dejando expuesto lo indicado por el MEPB de 0,20 m.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	MI	2.309,8	251,2

COMUNA 13. ORIENTAL		
AURORA	Cll 31 Con Cra 28 ESAP	19,2 m






COMUNA 2. NORORIENTAL		
ROSAL		190 m






COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
CHAPINERO	Clle 4 entre Cra 16 y 17	42 m






5.1.7 **ACTIVIDAD ITEM 4.3 Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB.**

Actividad que comprende la construcción de rampas peatonales de acuerdo a lo descrito en el MEPB, concreto 3000 Psi, bordeadas con loseta visual (de color amarilla), con pendientes que pueden ir de 12% a 20% según lo del ancho transversal del anden y garantizando el paso peatonal en la franja de circulación.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.3	Construcción de rampas peatonales	UND	205	2

COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
Chapinero	Clle 4 entre Cra 16 y 17	2 Und









5.1.8 **ACTIVIDAD ITEM 4.4 Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB.**

Actividad que comprende la construcción de rampas vehiculares para acceso a garajes o parqueaderos ocupando un espacio de 0,40 m de la servidumbre de vía máximo.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.4	Construcción de rampas vehiculares	UND	205	5

COMUNA 13. ORIENTAL		
AURORA	Cll 31 Con Cra 28 ESAP	1 Und






COMUNA 1. NORTE		
ROSAL		2 Und









COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
Chapinero	Cll 4 entre Cra 16 y 17	2 Und









5.1.9 **ACTIVIDAD ITEM 4.5 Franja de ajuste al predio.**

Es la franja funcional localizada contra la línea de paramento ya sea del lote o edificiación que sirve para absorber las diferencias en las medidas del anden con relación las dimensiones típicas de las franjas que lo componen, este es construido en concreto fundido en sitio no superando un ancho de 0,20 m.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.5	Franja de ajuste al predio	m	2014,2	544,4

COMUNA 13. ORIENTAL		
AURORA	Cll 31 Con Cra 28 ESAP	52 m






COMUNA 2. NORORIENTAL		
JUVENTUD		332,4 m






COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
Chapinero	Cll 4 entre Cra 16 y 17	160 m









5.1.10 **ACTIVIDAD ITEM 4.6 Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto de 3000 Psi mezclado en sitio. Acabado en llana de madera.**

Actividad que comprende la construcción de escalera en concreto, según ancho y topografía del terreno, para garantizar la movilidad de los peatones, con una huella promedio de 30 cm y una contra hulla de 20cm máximo.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.6	Escalera en concreto de 3000 psi	m^3	103,67	40,46

COMUNA 2 NORORIENTAL		
INDEPENDENCIA		28,76 m^3









COMUNA 2. NORORIENTAL		
JUVENTUD		11,70 m^3






5.1.11 ACTIVIDAD ITEM 4.7 Piso adoquin peatonal rectangular 10x20x6 cm en concreto tipo UC-A30.

Actividad que comprende la instalación de adoquín para dar acabado de franjas ambientales, tratada como zona verde donde requiere permitir el paso peatonal y vehicular, permitiendo un adecuado drenaje.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.7	Piso adoquin peatonal rectangular	m²	2049,2	137,84

COMUNA 13. ORIENTAL		
Aurora	Calle 31 con Cra 28 ESAP	7,20 m²







COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
Chapinero	Cll 4 entre Cra 16 y 17	130,64 m²









5.1.12 **ACTIVIDAD ITEM 4.8 Rampa en concreto**

Actividad que comprende realizar rampas en concreto de 3000 Psi, según lo requiera la obra, estas son realizadas en su mayoría para rematar las terminaciones o empalmes del espacio público nuevo con el viejo. Acabado con llana en madera.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.8	Rampa en concreto de 3000 Psi	m^3	143,7	3,143

COMUNA 13. ORIENTAL		
SAN ALONSO	Cll 20 entre Cra 29 y 30 costado Norte	3,143 m^3







5.1.13 **ACTIVIDAD ITEM 5.1 Realce de cajas de servicios públicos.**

Actividad que comprende nivelar las cajas de servicios públicos de las viviendas a los niveles de diseño del anden a construir. Realce se realiza con concreto 3000 psi garantizando la protección de los medidores.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
5.1	Realce de cajas de servicios públicos.	UND	205	32

COMUNA 13. ORIENTAL		
Aurora	Calle 31 con Cra 28 ESAP	13 Und







COMUNA 2. NORORIENTAL		
JUVENTUD	Cll 4 entre Cra 16 y 17	12 Und









COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
CHAPINERO	Cll 4 entre Cra 16 y 17	7 Und









5.1.14 **ACTIVIDAD ITEM 5.2 Realce de cajas de EMPAS.**

Actividad que comprende nivelar las cajas del EMPAS que se encuentren en los andenes a construir o vías según lo requiera el proyecto. Realce se realiza con concreto 3000 psi garantizando su funcionalidad.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
5.2	Realce de cajas del EMPAS	UND	54,4	6

COMUNA 2. NORORIENTAL		
JUVENTUD	Cll 4 entre Cra 16 y 17	12 Und






5.1.15 **ACTIVIDAD ITEM 6.1 Baranda metálica.**

Actividad que comprende la fabricación de baranda Metálica de 4 tubos de 2” horizontales y un tubo de 2” vertical cada 2m de separación, anclada al piso con platinas y 4 pernos, acabado en pintura amarilla.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
6.1	Baranda Metálica	m	202,46	297

COMUNA 1. NORTE		
CAMPO NADRID	Parqueaderos de torres de Campo Madrid Cra 10	297 m









5.2 ACTIVIDADES NO PREVISTAS

En el desarrollo de la obra se presentaron actividades que no se tenían contempladas en los ítems contractuales, por lo tanto, se solicitó a interventoría integrar al contrato de obra 022 de 2023, dieciocho (18) actividades denominadas NO PREVISTOS según un acta de pactación de precios unitarios.

	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-040 Versión: 1.0 Página 1 de 5

NÚMERO DEL CONTRATO DE OBRA:	22 del 24 de febrero de 2023
OBJETO:	Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander. Grupo 1
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER
CÉDULA O NIT:	901.677.862-6
INTERVENTOR:	JESAK SAS
VALOR FISCAL:	$1.961.400.000,00 (Mil novecientos sesenta y un millones cuatrocientos mil pesos) (M.L). incluido AU del 37,00%.
VALOR ADICIONAL:	N.A.
PLAZO ACTUAL:	Cuatro (4) meses.
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	16 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio de 2023.
GARANTÍAS	Póliza cumplimiento No. 21-44-101407105 Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA
PRESUPUESTO:	RP 3010 DEL 27/02/2023

ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS #1

En Bucaramanga, a los ocho (8) días del mes de junio de dos mil veinte tres (2023), se reunieron, **IVAN JOSÉ VARGAS CARDENAS**, Secretario de Infraestructura, **VLADIMIR POLO PAZ** en representación de JESAK SAS como interventor, **ERNESTO MONTAÑEZ MORA** como representante legal de CONSORCIO SANTANDER como contratista de obra, con el fin de firmar la presente Acta.

CONSIDERANDO

- Que entre el MUNICIPIO y CONSORCIO SANTANDER se suscribió el veinte siete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023) el contrato de obra No. 22-2023 con el siguiente objeto: "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER", grupo 1, por valor

	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-6000-238,37-040
		Versión: 1.0
		Página 2 de 5

inicial de $1.961.400.000,00 (Mil novecientos sesenta y un millones cuatrocientos mil pesos) (M.L). incluido AIU del 37,00%. y un plazo de ejecución inicial de cuatro (4) meses.

- Que el contrato de obra No 22 de 2023, inicio actividades constructivas el dia diez y seis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023), programando la terminación el dia quince (15) de julio de dos mil veintitrés (2023).

- Que durante los recorridos, valoración preliminar de los tramos y una vez iniciada la ejecución de las se puede apreciar que existen actividades que no están incluidas dentro del presupuesto contractual y son necesarias para el normal desarrollo de las obras.

- Que los items no previstos presentados obedecen a necesidades definidas en campo directamente con interventoria y socializadas con la supervisión en comités y visitas de obra.

- Que los apu's no previstos realizados por el contratista fueron revisados previamente por interventoria y su aprobación queda definida en este documento.

- Que cada actividad no prevista, cuenta con cotizaciones de sus insumos y materiales discriminados en los análisis de precios unitarios, que no existian en la propuesta inicial y sus especificaciones técnicas particulares.

- NP-1 CORTE DE PAVIMENTO: Esta actividad fue considerada su ejecución para dar lineamiento en la instalación del sardinel prefabricado, garantizando uniformidad en la franja de ajuste del pavimento con el sardinel instalado.

- NP-2 RESANE EN CONCRETO DE 3000 PSI, ZANJA EN CALZADA VEHICULAR ANCHO ENTRE 3CM Y 5 CM, ESPESOR 30 CM: Actividad requerida para dar sello y ajuste del sardinel con la via.

- NP-3 REPOSICIÓN TRAMO BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TUBERIA PVC HASTA 3": Se vio la necesidad de esta actividad no contemplada de los bajantes de agua lluvia provenientes de las viviendas en las zonas a intervenir, con el fin de darle la continuidad del flujo de agua lluvia hacia la via.

- NP-4 PODA RADICULAR: Debido a la directriz de ampliación de un andén se vio la necesidad de tratar unos árboles que requerían tratamiento de poda radicular y aérea para garantizas su supervivencia.

	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-040
		Versión: 1.0
		Página 3 de 5

- NP-5 DESMONTE DE BOLARDO EXISTENTE: En la localización del proyecto se evidencio la existencia de bolardos en tubo de perforación que no fue contemplada su actividad de desmonte y los cuales impiden el libre desarrollo de la ejecución de actividades.

- NP-6 DESCAPOTE: Se pudo evidenciar en varios sectores la necesidad de realizar descapote debido a la presencia de alto volumen de capa vegetal que no permiten desarrollar las actividades contractuales y no fue contemplada.

- NP-7 LOSA EN CONCRETO DE 4000 PSI: De acuerdo a la directriz de ampliación de anden en un sector, se dio la necesidad de recuperar vía vehicular, por lo tanto, es requerida la actividad para dar cumplimiento a lo establecido por supervisión del contrato.

- NP-8 TRANSPLANTE DE ARBOLES ALTURA 2M: Se crea la necesidad de la actividad ya que para dar cumplimiento con los perfiles viales de un sector se debe recuperar área y es necesario realizar el trasplante de unas especies especificas, cumpliendo con el proceso requerido y garantizando su supervivencia.

- NP-9 SARDINEL PREFABRICADO S10 L=0.2M; NORMA MEPB: En el desarrollo de las actividades se vio la necesidad de realizar las curvas de las esquinas en sardinel prefabricado de 0,2m para dar cumplimiento con el radio de giro y garantizar la estética de la curva.

- NP-10 REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO: Esta actividad corresponde a las adecuaciones que deben realizarse al momento de realzar las cajas de servicios públicos, giros y/o ampliaciones de los accesorios de PVC para que la caja quede en el nivel requerido del sector a intervenir.

- NP-11 SIEMBRA DE ARBOLES POMARROSO BRASILEÑO H PROM= 1,5M: Actividad que corresponde a la compensación o reemplazo de árboles que no cumplen con las condiciones mínimas requeridas para un traslado.

- NP-12 BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 0,1M*0,3M, FUNDIDO EN SITIO: Esta actividad resulta de la necesidad de dar confinamiento de la loseta en zonas que no presenta las condiciones requeridas y que no se ajusta a lo habitual del desarrollo de la actividad de Construcción de Espacio Público.

- NP-13 MALLA ELECTROSOLDADA 7MM, HUECO DE 15*15CM: Actividad que es requerida como complemento del ítem Construcción de rampas vehiculares, ya que esta actividad no contempla la instalación de malla electrosoldada como refuerzo de las rampas en concreto.

	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-6000-238,37-040
		Versión: 1.0
		Página 4 de 5

- NP-14 MURO Y ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI: De acuerdo a las directrices dadas y en cumplimiento de lo requerido se vio la necesidad de construir una viga con muro de contención para confinar un talud y permitir darle continuidad a la obra y garantizar que el peatón tenga mayor tramo de circulación y de manera segura.

- NP-15 RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL EXCAVACIÓN: Para las actividades de demolición de bordillo existente, es requerida una excavación para retirar el material que está enterrado, por lo tanto, esta excavación debe ser nuevamente rellenada para dar con los niveles requeridos, igualmente otra necesidad de rellenos manuales se presenta cuando los niveles no cumplen con lo requerido y debemos rellenar para llegar a dichos niveles mínimos requeridos.
- NP-16 DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PARADERO METÁLICO E INCLUYE EL MUPI: Actividad puntual presentada en el sector de San Alonso, donde una parada de Metrolinea debe ser retirada y nuevamente instalada para que quede a los niveles de diseño en cumplimiento de MEPB y garantizando esta también cumpla con las alturas de diseño normativo establecidas.

- NP-17 BORDILLO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO DE 0,1M*0,3M: se requiere para el confinamiento de raíces y arboles existentes en dónde se deba ejecutar el contrato, en las franjas ambientales con el fin de proteger tanto al ser vivo como el trabajo a realizar.

- NP-18 ACERO REFUERZO PDR 60: Se requiere para adicionarle a los elementos en concreto en los cuales se debe garantizar su durabilidad y resistencia

ACUERDAN:

Aprobar las siguientes actividades no previstas, con sus respectivos análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas particulares.

No. ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO (sin incluir AU)
NP-1	CORTE DE PAVIMENTO HASTA 3 CM	ML	$14.306,30
NP-2	RESANE EN CONCRETO DE 3000 PSI, ZANJA EN CALZADA VEHICULAR ANCHO ENTRE 3CM Y 5 CM, ESPESOR 30 CM	ML	$11.609,62
NP-3	REPOSICIÓN TRAMO BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TUBERIA PVC HASTA 3"	ML	$25.174,42
NP-4	PODA RADICULAR	UND	$324.920,49
NP-5	DESMONTE DE BOLARDO EXISTENTE	UND	$13.314,49

	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238.37-040
		Versión: 1.0
		Página 5 de 5

No. ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO (sin incluir AU)
NP-6	DESCAPOTE	M2	$47.612,35
NP-7	LOSA EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	$849.309,68
NP-8	TRANSPLANTE DE ARBOLES ALTURA 2M	UND	$456.705,86
NP-9	SARDINEL PREFABRICADO S10 L=0.2M, NORMA MEPR	ML	$134.973,74
NP-10	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO	UND	$33.302,97
NP-11	SIEMBRA DE ARBOLES POMARROSO BRASILEÑO H PROM= 1,5M	UND	$212.033,11
NP-12	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 0,1M*0,3M, FUNDIDO EN SITIO	ML	$54.836,97
NP-13	MALLA ELECTROSOLDADA 7MM, HUECO DE 15*15CM	KG	$9.512,58
NP-14	MURO Y ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$902.802,26
NP-15	RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL EXCAVACIÓN	M3	$40.679,91
NP-16	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PARADERO METÁLICO E INCLUYE EL MUPI	GLB	$2.410.066,05
NP-17	BORDILLO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO DE 0,1M*0,3M	ML	$33.619,20
NP-18	REFUERZO PDR 60	KG	$8.787,28

Para constancia y prueba se firma por los que en ella intervinieron, con destino a la Entidad contratante y una copia, para el contratista.

Vladimir Polo Paz
R.L. JESAK S.A.S
Interventor

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
Consorcio Santander
Contratista de Obra

IVAN JOSÉ VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura
Alcaldía de Bucaramanga

Por lo anterior se relacionan las actividades no previstas desarrolladas desde el inicio de la obra.

5.2.2 NP-2 RESANE EN CONCRETO DE 3000 PSI, ZANJA EN CALZADA VEHICULAR ANCHO ENTRE 3 Y 5CM, ESPESOR 30CM.

FRENTE DE TRABAJO	M
Aurora Calle 31 con Cra 28 ESAP	24
Rosal Cra 20 entre Clle 54 y 56	95
Chapinero Clle 4 entre Cra 16 y 17	90
TOTAL =	209





5.2.3 NP-4 PODA RADICULAR

FRENTE DE TRABAJO	Und
San Alonso Calle 20 entre Cra 29 y 30 Costado Norte	8
Rosal Cra 20 entre Clle 54 y 56	17
Chapinero Cll 4 entre Cra 16 y17	6
TOTAL =	31





5.2.4 NP-6 DESCAPOTE

FRENTE DE TRABAJO	M²
Rosal Cra 20 entre Clle 54 y 56	29,10
TOTAL =	29,10





5.2.5 NP-8 SARDINEL DE 0,2 M

FRENTE DE TRABAJO	Punto
Chapinero Clle 4 entre Cra 16 y 17	8,8
TOTAL =	8,8





5.2.6 NP-12 BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE O.1X0.3 M FUNDIDO EN SITIO.

FRENTE DE TRABAJO	M
Juventud	36
Chapinero Clle 4 entre Cra 16 y 17	12
Albania Calle 51	35
TOTAL =	83





5.2.7 NP-13 MALLA ELECTROSOLDADA 7MM HUECO 15X15 CM.

FRENTE DE TRABAJO	Kg
Independencia	300,62
Juventud	8,76
Chapinero Clle 4 entre Cra 16 y 17	14,03
TOTAL =	323,41





5.2.8 NP-15 RELLENO MANUALCOMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION.

FRENTE DE TRABAJO	M³
Aurora Calle 31 con Cra 28 ESAP	1,44
Rosal Cra 20 entre Cll 54 y 56	12,66
Chapinero Clle 4 entre Cra 16 y 17	5,40
TOTAL =	19,50





5.3 RELACION DE LLUVIAS

CS Consorcio Santander	**REPORTE DEL CLIMA**	**Codigo**	CS-FO-OBR-002
		Fecha	22/03/2023
		Versión	0
		Pagina	1 de 1

MES: SEPTIEMBRE **DIRECCIÓN:** REPORTE GENERAL DE LOS 2 FRENTES **AÑO: 2023**

B LLUVIAS DE BAJA INTENSIDAD **F** LLUVIAS FUERTES **S** SOLEADO **N** NEBLINA

HORA / DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1:00 -2:00																															
2:00 -3:00																															
3:00 -4:00																															
4:00 -5:00																															
5:00 -6:00																															
6:00 -7:00																															
7:00 -8:00	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	
8:00 -9:00	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	
9:00 -10:00	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	
10:00 -11:00	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	
11:00 -12:00	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	S		
12:00 -13:00	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	B	S		
13:00 -14:00	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	B	S		
14:00 -15:00	S			S	S	S	S	S			F	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	B	S		
15:00 -16:00	S			S	S	S	S	S			F	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	S		
16:00 -17:00	S			S	S	S	S	S			F	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	S		
17:00 -18:00																															
18:00 -19:00																															
19:00 -20:00																															
20:00 -21:00																															
21:00 -22:00																															
22:00 -23:00																															
23:00 -24:00																															
24:00 -1:00																															

5.4 ENSAYOS DENSIDAD FRENTES ACTIVOS

JUVENTUD

ALDIG INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

NORMA INVIAS E - 161 -13

PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6			**FECHA:**	29-09-2023
LOCALIZACION:	CARRERA 20C CON CALLE 1 AN Y 2N TRAMO 2 BUCARAMANGA			**TRAMO**	2
RESULTADO DE PROCTOR:	2,07	gr/cm3	**TIPO DE SUELO**	SUB BASE	

ENSAYO No.	**1**	**2**	
ABSCISA	PARTE INICIAL	PARTE INTERMEDIA	
W. CONO ANTES	5.097	4.996	
W. CONO DESPUES	2.370	2.415	
W. ARENA CONO	2727,0	2.581	
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD+PLATON	1.874	1.687	
W. PLATON	112	112	
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD	1.762	1.575	
CONSTANTE DEL CONO	1.452	1.452	
W.ARENA EN EL HUECO	1.275	1.129	
DENSIDAD DE LA ARENA gr/Cm3	1,55	1,55	
VOLUMEN DEL HUECO	823	728	

HUMEDAD DE LA MUESTRA OBTENIDA POR HUMEDOMETRO

HUMEDAD DE LA MUESTRA %	6,5	6,6	

MUESTRA TOTAL SECA	1.654	1.477	
DENSIDAD SECA DE LA MUESTRA	2,01	2,03	
% DE COMPACTACION	97,16%	97,99%	

OBSERVACIONES:

ELABORADOR POR: SERGIO A. JIMENEZ
CARGO:LABORATORISTA

REVISADO POR: ING. CAMILO A. DIAZ GUZMAN
CARGO: COORDINADOR LABORATORIO

ALDIG INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

NORMA INVIAS E - 161 -13

PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6			**FECHA:**	29-09-2023
LOCALIZACION:	CALLE 3N ENTRE CARRERA 21 y 21B TRAMO 4 BUCARAMANGA			**TRAMO**	4
RESULTADO DE PROCTOR:	2,07 gr/cm3		**TIPO DE SUELO**	SUB BASE	

ENSAYO No.	**1**		
ABSCISA	PARTE INICIAL		
W. CONO ANTES	4.862		
W. CONO DESPUES	2.231		
W. ARENA CONO	2631,0		
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD+PLATON	1.786		
W. PLATON	112		
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD	1.674		
CONSTANTE DEL CONO	1.452		
W.ARENA EN EL HUECO	1.179		
DENSIDAD DE LA ARENA gr/Cm3	1,55		
VOLUMEN DEL HUECO	761		

HUMEDAD DE LA MUESTRA OBTENIDA POR HUMEDOMETRO

HUMEDAD DE LA MUESTRA %	6,4		

MUESTRA TOTAL SECA	1.573		
DENSIDAD SECA DE LA MUESTRA	2,07		
% DE COMPACTACION	99,92%		

OBSERVACIONES:

ELABORADOR POR: SERGIO A. JIMENEZ
CARGO:LABORATORISTA

REVISADO POR: ING. CAMILO A. DIAZ GUZMAN
CARGO: COORDINADOR LABORATORIO

ALDIG INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

NORMA INVIAS E - 161 -13

PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6			**FECHA:**	29-09-2023
LOCALIZACION:	CALLE 3N ENTRE CARRERA 21 Y 21A TRAMO 3 BUCARAMANGA			**TRAMO**	3
RESULTADO DE PROCTOR:	2,07	gr/cm3	**TIPO DE SUELO**	SUB BASE	

ENSAYO No.	**1**	**2**	
ABSCISA	PARTE INICIAL	PARTE INTERMEDIA	
W. CONO ANTES	4.873	4.870	
W. CONO DESPUES	2.270	2.144	
W. ARENA CONO	2603,0	2.726	
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD+PLATON	1.701	1.860	
W. PLATON	112	112	
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD	1.589	1.748	
CONSTANTE DEL CONO	1.452	1.452	
W.ARENA EN EL HUECO	1.151	1.274	
DENSIDAD DE LA ARENA gr/Cm3	1,55	1,55	
VOLUMEN DEL HUECO	743	822	

HUMEDAD DE LA MUESTRA OBTENIDA POR HUMEDOMETRO

HUMEDAD DE LA MUESTRA %	7,0	6,9	

MUESTRA TOTAL SECA	1.485	1.635	
DENSIDAD SECA DE LA MUESTRA	2,00	1,99	
% DE COMPACTACION	96,61%	96,11%	

OBSERVACIONES:

ELABORADOR POR: SERGIO A. JIMENEZ
CARGO:LABORATORISTA

REVISADO POR: ING. CAMILO A. DIAZ GUZMAN
CARGO: COORDINADOR LABORATORIO

ALDIG INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

NORMA INVIAS E - 161 -13

PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6			**FECHA:**	29-09-2023
LOCALIZACION:	CALLE 3N ENTRE 20A Y 20 - CALLE 2N CON 20B T1 BUCARAMANGA			**TRAMO**	1
RESULTADO DE PROCTOR:	2,07	gr/cm3	**TIPO DE SUELO**	SUB BASE	

ENSAYO No.	**1**	**2**	
ABSCISA	PARTE INICIAL	PARTE INTERMEDIA	
W. CONO ANTES	5.175	5.038	
W. CONO DESPUES	2.546	2.621	
W. ARENA CONO	2629,0	2.417	
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD+PLATON	1.730	1.455	
W. PLATON	112	112	
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD	1.618	1.343	
CONSTANTE DEL CONO	1.452	1.452	
W.ARENA EN EL HUECO	1.177	965	
DENSIDAD DE LA ARENA gr/Cm3	1,55	1,55	
VOLUMEN DEL HUECO	759	623	

HUMEDAD DE LA MUESTRA OBTENIDA POR HUMEDOMETRO

HUMEDAD DE LA MUESTRA %	6,7	6,5	

MUESTRA TOTAL SECA	1.516	1.261	
DENSIDAD SECA DE LA MUESTRA	2,00	2,03	
% DE COMPACTACION	96,47%	97,85%	

OBSERVACIONES:

ELABORADOR POR: SERGIO A. JIMENEZ
CARGO:LABORATORISTA

REVISADO POR: ING. CAMILO A. DIAZ GUZMAN
CARGO: COORDINADOR LABORATORIO

ALDIG INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

NORMA INVIAS E - 161 -13

PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6			**FECHA:**	10-10-2023
LOCALIZACION:	CALLE 1 N CON CARRERA 20C BUCARAMANGA			**TRAMO**	2
RESULTADO DE PROCTOR:	2,07	gr/cm3	**TIPO DE SUELO**	SUB BASE	

ENSAYO No.	**1**	**2**	
ABSCISA	PARTE INICIAL	PARTE INTERMEDIA	
W. CONO ANTES	4.590	4.563	
W. CONO DESPUES	1.508	1.840	
W. ARENA CONO	3082,0	2.723	
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD+PLATON	2.545	2.072	
W. PLATON	112	112	
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD	2.433	1.960	
CONSTANTE DEL CONO	1.424	1.424	
W.ARENA EN EL HUECO	1.658	1.299	
DENSIDAD DE LA ARENA gr/Cm3	1,46	1,46	
VOLUMEN DEL HUECO	1.136	890	

HUMEDAD DE LA MUESTRA OBTENIDA POR HUMEDOMETRO

HUMEDAD DE LA MUESTRA %	7,0	7,3	

MUESTRA TOTAL SECA	2.274	1.827	
DENSIDAD SECA DE LA MUESTRA	2,00	2,05	
% DE COMPACTACION	96,73%	99,18%	

OBSERVACIONES:

ELABORADOR POR: SERGIO A. JIMENEZ
CARGO:LABORATORISTA

REVISADO POR: ING. CAMILO A. DIAZ GUZMAN
CARGO: COORDINADOR LABORATORIO

CHAPINERO Calle 4 entre Cra 16 y 17

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

NORMA INVIAS E - 161 -13

PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6			**FECHA:**	09-10-2023
LOCALIZACION:	CALLE 5 CON CARRERA 16 Y 17 BUCARAMANGA			**TRAMO**	1
RESULTADO DE PROCTOR:	2,07	gr/cm3	**TIPO DE SUELO**	SUB BASE	

ENSAYO No.	**1**	**2**	
ABSCISA	PARTE INICIAL	PARTE INTERMEDIA	
W. CONO ANTES	4.604	4.615	
W. CONO DESPUES	2.078	1.900	
W. ARENA CONO	2526,0	2.715	
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD+PLATON	1.704	2.014	
W. PLATON	112	112	
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD	1.592	1.902	
CONSTANTE DEL CONO	1.424	1.424	
W.ARENA EN EL HUECO	1.102	1.291	
DENSIDAD DE LA ARENA gr/Cm3	1,46	1,46	
VOLUMEN DEL HUECO	755	884	

HUMEDAD DE LA MUESTRA OBTENIDA POR HUMEDOMETRO

HUMEDAD DE LA MUESTRA %	6,5	6,9	

MUESTRA TOTAL SECA	1.495	1.779	
DENSIDAD SECA DE LA MUESTRA	1,98	2,01	
% DE COMPACTACION	95,67%	97,21%	

OBSERVACIONES: _____

ELABORADOR POR: SERGIO A. JIMENEZ
CARGO:LABORATORISTA

REVISADO POR: ING. CAMILO A. DIAZ GUZMAN
CARGO: COORDINADOR LABORATORIO

AURORA Calle 31 con Cra 28 ESAP

ALDIG INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

NORMA INVIAS E - 161 -13

PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6			**FECHA:**	11-10-2023
LOCALIZACION:	CALLE 31 # 28 - 24 BARRIO LA AURORA BUCARAMANGA			**TRAMO**	1
RESULTADO DE PROCTOR:	2,07	gr/cm3	**TIPO DE SUELO**	SUB BASE	

ENSAYO No.	**1**	**2**	**3**
ABSCISA	PARTE INICIAL	PARTE INTERMEDIA	PARTE INTERMEDIA
W. CONO ANTES	5.096	5.082	5.071
W. CONO DESPUES	2.202	2.156	2.155
W. ARENA CONO	2894,0	2.926	2.916
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD+PLATON	2.116	2.188	2.189
W. PLATON	112	112	112
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD	2.004	2.076	2.077
CONSTANTE DEL CONO	1.452	1.452	1.452
W.ARENA EN EL HUECO	1.442	1.474	1.464
DENSIDAD DE LA ARENA gr/Cm3	1,55	1,55	1,55
VOLUMEN DEL HUECO	930	951	944,5

HUMEDAD DE LA MUESTRA OBTENIDA POR HUMEDOMETRO

HUMEDAD DE LA MUESTRA %	7,4	7,4	7,10

MUESTRA TOTAL SECA	1.866	1.933	1.939
DENSIDAD SECA DE LA MUESTRA	2,01	2,03	2,05
% DE COMPACTACION	96,89%	98,19%	99,19%

OBSERVACIONES:

ELABORADOR POR: SERGIO A. JIMENEZ
CARGO:LABORATORISTA

REVISADO POR: ING. CAMILO A. DIAZ GUZMAN
CARGO: COORDINADOR LABORATORIO

6. ANEXOS

ACTAS DE COMITÉ

FLUJO DE CAJA

BÍTACORA DE OBRA

PROGRAMA DE OBRA

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

INFORME MENSUAL HSEQ No. 7
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CONTRATO DE OBRA No. 022 DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER

Firma		
Nombre	**BERNARDO SUAREZ CARREÑO**	**JUAN CARLOS JAIMES NIÑO**
Cargo	**INSPECTOR HSEQ**	**DIRECTOR DE OBRA**
	ELABORÓ	**APROBÓ**

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES 6
1.1 Periodo reportado. 6
1.2 Resumen de actividades técnicas 6
1.3 Organigrama del proyecto 6
1.4 Cronograma A&SST 7
2. BITÁCORA A&SST 9
3. GESTIÓN DE ACTIVIDADES - CONSORCIO SANTANDER 10
3.1 Recurso Humano. 10
3.2 Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 13
3.2.1 Seguridad Social. 14
3.2.2 Capacitación y Sensibilización del Personal. 14
3.2.3 Exámenes Médicos. 15
3.2.4 Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales. 16
3.2.5 Puntos de hidratación. 17
3.2.6 Gestión de Tareas. 17
3.2.7 Inspecciones y Preoperacionales. 22
3.2.8 Elementos de Protección Personal EPP. 22
3.2.9 Cerramiento, Señalización y Demarcación de Áreas de Trabajo. 24
3.2.10 Indicadores Seguimiento al Plan SST. 27
3.2.11 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). 28
3.2.12 Comité de Convivencia Laboral (COCOLA). 28
3.3 Plan de Calidad. 28
3.4 Manejo Ambiental en la Obra. 30
3.4.1 Fuentes de Materiales y Proveedores. 30
3.4.2 Manejo de campamentos fijos y/o temporales. 30
3.4.3 Manejo de materiales de construcción. 32
3.4.4 Manejo Integral de Residuos Sólidos. 33
3.4.5 Manejo Residuos de Construcción (RCD). 35
3.4.6 Control de Emisiones Atmosféricas. 36
3.4.7 Manejo de Maquinaria y Vehículos. 37
3.4.8 Uso Eficiente de los Recursos. 37
3.4.9 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros. 39
3.4.10 Manejo de la Vegetación y Paisajismo. 41
3.4.11 Orden y Aseo. 44
3.4.12 Indicadores seguimiento al Plan de Manejo Ambiental. 45

3.5 Plan de Prevención, Preparación y Atención de Emergencias. 46
3.6 Plan de Manejo de Tráfico - PMT. 48
3.7 Protocolo de Bioseguridad COVID-19. 48
4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 50
5. ANEXOS 51

LISTADO DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Cronograma de actividades A&SST. 7
Tabla 2. Personal - mano de obra calificada & no calificada. 10
Tabla 3. Novedades del personal. 13
Tabla 4. Registro de Inducción, Charlas y Capacitaciones. 14
Tabla 5. Exámenes Médicos Ocupacionales. 15
Tabla 6. Seguimiento al reporte de remisiones de accidentalidad y enfermedad. 16
Tabla 7. Gestión de Tareas (ATS, Permisos) 17
Tabla 8. Inspecciones y Preoperacionales 22
Tabla 9. Seguimiento EPP 22
Tabla 10. Indicadores cumplimiento al plan SST. 27
Tabla 11. Equipo y herramientas mínimas del proyecto. 29
Tabla 12. Material adquirido. 32
Tabla 13. Cantidad de Residuos Ordinarios Generados en Obra. 33
Tabla 14. Gestión de los residuos 34
Tabla 15. Consolidado de material dispuestos Botadero El Parque. 35
Tabla 16. Listado de Vehículos y Maquinaria usada en obra. 37
Tabla 17. Listado de sumideros en frentes de obra. 39
Tabla 18. Listado de vegetación en frentes de obra. 41
Tabla 19. Indicadores cumplimiento Plan de Manejo Ambiental. 45
Tabla 20. Verificación de elementos de emergencia frentes de obra. 46
Tabla 21. Atención de emergencias. 47
Tabla 22. Comité de tráfico. 48
Tabla 23. Casos COVID-19 Acumulados en el periodo. 49

LISTADO DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Organigrama – CONSORCIO SANTANDER. 6
Figura 2. Gráfica Novedades del Personal de Obra. 13
Figura 3. Gráfica Exámenes Médicos. 16
Figura 4. Gráfica Seguimiento a Reporte de Accidentalidad y Enfermedad. 17
Figura 5. Clasificación de Residuos. 33
Figura 6. Gráfica Residuos Sólidos Generados. 34
Figura 7. Gráfica Residuos de Construcción Generados. 35

LISTADO DE IMAGENES

Pág.

Imagen 1. Capacitación y Sensibilización del Personal. 15
Imagen 2. Trabajos de demolición, excavación y compactación en los frentes. 20
Imagen 3. Equipo de Protección contra caídas. 22
Imagen 4. Entrega y uso de EPP. 24
Imagen 5. Cerramientos y señalización PMT. 27

Imagen 6. Equipos y herramientas.....30
Imagen 7. Campamentos y unidades sanitarias en los frentes. 32
Imagen 8. Transporte de RCD. 36
Imagen 9. Cubrimiento de material. 37
Imagen 10. Firma de convenio uso de los recursos. 39
Imagen 11. Cubrimiento de sumideros. 41
Imagen 12. Trabajo de poda aérea y radicular, traslado y reposición de especies vegetales. 44
Imagen 13. Orden y aseo en los frentes. 45
Imagen 14. Comité de Tráfico.....48

1. GENERALIDADES

1.1 Periodo reportado.

El informe mensual HSEQ No. 7 comprende las actividades realizadas en el periodo: del 01 al 30 de septiembre del 2023.

1.2 Resumen de actividades técnicas

Dentro del periodo comprendido para este informe se realizaron las siguientes actividades propuestas dentro del plan A&SST:

- ✓ Realización de contratos al personal de obra.
- ✓ Afiliaciones al sistema general de seguridad social (EPS, ARL, AFP y CCF).
- ✓ Pago al sistema general de seguridad social correspondiente al mes de junio.
- ✓ Aplicación de formatos para el control y evidencia de las actividades desarrolladas.
- ✓ Inducción, capacitación y charlas sobre temas A&SST.
- ✓ Entrega de dotación y EPPs.
- ✓ Realización de exámenes médicos de ingreso y egreso del personal contratado.
- ✓ Inspecciones a los seis frentes activos.
- ✓ Preoperacionales y ATS.
- ✓ Actividades varias en los frentes Chapinero y San Alonso, en individuos vegetales presentes en el área de intervención.

1.3 Organigrama del proyecto

Se establece el organigrama general del proyecto que contiene las líneas de mando y coordinación, los niveles de decisión, profesionales y demás recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos a realizar en la adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander (Grupo No. 1).



Figura 1. Organigrama – CONSORCIO SANTANDER.

1.4 Cronograma A&SST

Este cronograma se ajustará de acuerdo con las necesidades de capacitación identificadas según riesgos a los que están expuestos los trabajadores, duración de la obra y actividades que se ejecutan. Las actividades programadas y del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se realizarán para contratistas y proveedores.

Tabla 1. Cronograma de actividades A&SST.

ACTIVIDADES	PROGRAMADO	EJECUTADO	%CUMPLIMIENTO
ELEMENTOS BÁSICOS LEGALES			
Publicación y socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	19	19	100%
Inducción al personal: en riesgos, en COPASST, que hacer en caso de AT, Sistema general de riesgos laborales	19	19	100%
Divulgación y publicación de la política de seguridad y salud en el trabajo	19	19	100%
Divulgación y publicación de la política de control de consumo de cigarrillo, alcohol y drogas	19	19	100%
Revisión de afiliaciones y pagos al sistema general de seguridad social	7	7	100%
Subtotal cumplimiento	83	83	100%
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA			
Realización de exámenes de ingreso (cada vez que ingresa personal a la obra)	17	17	100%
Capacitación en autocuidado	6	6	100%
Prevención de enfermedades gastrointestinales	2	2	100%
Capacitación sobre estilos de vida saludable	3	3	100%
Capacitación sobre prevención alcoholismo, drogadicción y farmacodependencia	6	6	100%
Capacitación sobre hipertensión arterial	2	2	100%
Realización de exámenes de egreso	12	12	100%
Subtotal cumplimiento	48	48	100%
SUBPROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO			
Inspección de campamento y frentes de obra	20	20	100%
Inspección a Botiquines	6	6	100%
Elaboración de estadísticas de ausentismo	6	6	100%
Subtotal cumplimiento	32	32	100%
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL			
Capacitación sobre uso y cuidado de elementos de protección personal	6	6	100%
Subtotal cumplimiento	6	6	100%

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
Inspección de equipos y herramientas	19	19	100%
Estadísticas de accidentalidad	8	8	100%
Subtotal cumplimiento	27	27	100%

PLAN DE EMERGENCIAS			
Capacitación en identificación y notificación de situaciones de riesgo	20	20	100%
Subtotal cumplimiento	20	20	100%
TOTAL			**100%**

Anexo 1. Cronograma de actividades A&SST.

2. BITÁCORA A&SST

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2023, **CONSORCIO SANTANDER** realizó actividades de capacitación, verificación, acompañamiento e implementación del **PLAN SST** con el fin de dar cumplimiento a las condiciones contractuales, de tal manera que se garantice el buen desarrollo de la obra.

Dentro de los anexos, se encuentra un resumen puntual y preciso de cada una de las actividades realizadas durante el presente periodo y de los planes establecidos para el manejo de la Gestión de Calidad, Manejo Ambiental y la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo el cumplimiento de la normatividad legal vigente. Esta información quedo registrada en la bitácora A&SST.

Anexo 2. Bitácora A&SST.

3. GESTIÓN DE ACTIVIDADES - CONSORCIO SANTANDER

3.1 Recurso Humano.

Consorcio Santander cuenta con un equipo interdisciplinario que reúne las habilidades y conocimientos necesarios en cada una de las áreas específicas para el desarrollo del proyecto. Dicho equipo se encuentra integrado por:

Tabla 2. Personal - mano de obra calificada & no calificada.

#	ÁREA	CÉDULA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	ESTADO
1	Administrativo	1.098.663.816	Yeison Andrés Garces Ortega	Gerente de Proyectos	**ACTIVO**
2	Administrativo	91.249.578	Juan Carlos Jaimes Niño	Director de obra	**ACTIVO**
3	Administrativo	1.090.363.692	Layde Iliana Velandia Torres	Residente de obra	**ACTIVO**
4	Administrativo	1.095.953.039	Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Profesional social	**ACTIVO**
5	Administrativo	1.098.620.599	Bernardo Suarez Carreño	Inspector HSEQ	**ACTIVO**
6	Operativo	1.007.193.091	Omar Alexis Blanco Bayona	Inspector de obra	**ACTIVO**
7	Operativo	1.098.794.707	Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de obra	**ACTIVO**
8	Operativo	91.263.099	Amaury Mendoza Guerrero	Inspector Auxiliar	**ACTIVO**
9	Operativo	91.519.899	Cesar Antonio Gomez Delgado	Oficial de Obra	**ACTIVO**
10	Operativo	1.232.890.403	Yeison Duvan Higuera Esteban	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
11	Operativo	1.052.963.666	Luis Miguel Naranjo Velilla	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
12	Operativo	91.477.841	Oscar Javier Alarcon Afanador	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
13	Operativo	1.096.242.788	Cristian Fernando Amariz Perez	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
14	Operativo	91.519.124	Nicolas Alarcón Afanador	Oficial de Obra	**ACTIVO**
15	Operativo	1.091.135.202	Jaime Muñoz Ortega	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
16	Operativo	1.232.890.758	Armando Mendoza Florez	Ayudante de Obra (BOAL)	**ACTIVO**
17	Operativo	13.275.949	Ever Antonio Carrascal Duran	Oficial de Obra	**ACTIVO**
18	Operativo	1.007.712.253	Jose Armando Laguna Gomez	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
19	Operativo	18.918.792	Omar Alfonso Quintero Quintero	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
20	Operativo	1.098.786.346	Brayan Smith Rey Noriega	Oficial de Obra	**ACTIVO**
21	Operativo	1.065.590.063	Luis Alberto Florian Chamorro	Oficial de Obra	**ACTIVO**
22	Operativo	5.685.373	Jose Roman Espinoza Bautista	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
23	Operativo	1.005.325.662	Jerson David Ospino Gomez	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
24	Operativo	91.489.177	Edgar Martinez Quintero	Oficial de Obra	**ACTIVO**
25	Operativo	1.095.800.217	Ricardo Hernandez Aguillon	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
26	Operativo	91.255.617	Henry Mantilla Parra	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
27	Operativo	1.234.339.539	Diego Andres Berbesi Merchan	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
28	Operativo	1.098.712.615	Edinson Prado Paterina	Oficial de Obra	**ACTIVO**
29	Operativo	1.098.686.573	Jose Rios León	Oficial de Obra	**ACTIVO**
30	Operativo	91.449.914	Jhon Jaime Gutierrez Silva	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
31	Operativo	1.102.348.837	Jhonattan Perez Arango	Oficial de Obra	**ACTIVO**
32	Operativo	91.515.736	Ronal Anderson Vargas Motta	Ayudante de Obra	**ACTIVO**

33	Operativo	13.860.582	Jose Luis Sierra Anaya	Oficial de Obra	**ACTIVO**
34	Operativo	1.098.697.529	Cesar Rodriguez De Los Santos	Oficial de Obra	**ACTIVO**
35	Operativo	13.860.582	Cristian Humberto Tellez Figueroa	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
36	Operativo	1.098.633.343	Edwin Ernesto Rodriguez Galeano	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
37	Operativo	37.511.566	Maria Eugenia Manrique Rueda	Controladora de Tráfico	**ACTIVO**
38	Operativo	1.098.632.250	Flor Norayma Quintero Orduz	Controladora de Tráfico	**ACTIVO**
39	Operativo	1.005.157.888	Edwin Orlando Rodriguez Guerrero	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
40	Operativo	1.097.490.744	Jose Luis Moncada Guerrero	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
41	Operativo	6.509.541	Jose Giovanny Mendoza Rodriguez	Oficial de Obra	**ACTIVO**
42	Operativo	1.095.924.401	Anderson Chayan Sanchez Reyes	Oficial de Obra	**ACTIVO**
43	Operativo	8.784.375	Wilson Antonio Rivero Toloza	Oficial de Obra	**ACTIVO**
44	Operativo	91.535.019	Cristian Humberto Tellez Figueroa	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
45	Operativo	91.495.273	German Diaz Moyano	Oficial de Obra	**RETIRADO**
46	Operativo	91.494.372	Miguel Angel Caceres Carrillo	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
47	Operativo	1.092.343.342	Heider Alexis Villamizar Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
48	Operativo	1.095.804.014	Omar Larrota Garcia	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
49	Operativo	91.229.173	David Garcia Hernandez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
50	Operativo	1.265.732	Simon Gregorio Peña Peña	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
51	0perativo	91.295.674	Luis Eduardo Mejia Cristancho	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
52	Operativo	1.047.341.782	Dainer Makeimis Naranjo Grajales	Oficial de Obra	**RETIRADO**
53	Administrativo	1.100.963.525	Angie Lorena Monsalve Ordoñez	Director de obra	**RETIRADO**
54	Administrativo	79.330.879	Ernesto Montañez Mora	Director de obra	**RETIRADO**
55	Operativo	1.098.790.946	Lina María Cristancho Cristancho	Inspector de obra	**RETIRADO**
56	Operativo	1.103.471.378	Kevin Farid Rodriguez Sarmiento	Inspector de obra	**RETIRADO**
57	Operativo	1.098.765.333	Yuli Melisa Suarez Taborda	Inspector de obra	**RETIRADO**
58	Operativo	1.095.940.612	Alonso Mancilla Estupiñan	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
59	Operativo	1.098.743.152	Anderson Yesid Villamizar Candela	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
60	Operativo	1.095.907.356	Breiner Yulian Valderrama Silva	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
61	Operativo	91.284.103	Eduardo Maldonado Estupiñan	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
62	Operativo	1.007.451.028	Jeison Alexis Valderrama Silva	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
63	Operativo	1.098.741.465	Leonardo Mejia Quintero	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
64	Operativo	63.523.934	Sandra Patricia Medina Carreño	Paletera	**RETIRADO**
65	Operativo	13.873.837	Alexis Valderrama Rodriguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
66	Operativo	13.514.146	Carlos Eduardo Pereira Calderon	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
67	Operativo	5.645.538	Jose Reyes Oviedo Araque	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
68	Operativo	1.097.305.502	Juan Gabriel Mendoza Gonzalez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
69	Operativo	91.265.913	Oswal Reyes Ruiz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
70	Operativo	91.203.639	Luis Norberto Nuñez Florez	Maestro de Obra	**RETIRADO**
71	Operativo	91.541.667	Jairo Andres Ojeda	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
72	Operativo	73.020.875	Jose Luis Garzon Campo	Oficial de Obra	**RETIRADO**
73	Operativo	91.297.983	Ludwing Javier Velazquez Nieto	Oficial de Obra	**RETIRADO**
74	Operativo	91.283.192	Orlando Leon Gutierrez	Oficial de Obra	**RETIRADO**

75	Operativo	1.098.697.028	Riqui León Santos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
76	Operativo	91.521.793	Nelson Enrique Ortiz Arias	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
77	Operativo	91.540.153	Gregorio Lopez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
78	Operativo	1.193.585.571	Wilmer Alberto Torres Ochoa	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
79	Operativo	1.007.400.028	Nelson Fabian Velasquez Rodriguez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
80	Operativo	63.368.739	Omaira Isabel Fernandez Perez	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
81	Operativo	5.746.735	Orlando Alfonso Rueda	Oficial de Obra	**RETIRADO**
82	Operativo	5.956.989	Armando Jose Guarache Vargas	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
83	Operativo	1.098.686.926	Sergio Andres Rueda Ayala	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
84	Operativo	1.102.362.216	Jesus Antonio Briglia Martinez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
85	Operativo	91.185.606	Giovany Valderrama Rodriguez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
86	Operativo	1.046.268.409	Wilson Enrique Mejia Vega	Oficial de Obra	**RETIRADO**
87	Operativo	1.046.396.314	Gabriel Caliz Marin	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
88	Operativo	91.448.171	Jose Raul Sanchez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
89	Operativo	3.916.616	Yanetsy Carolina Solorzano Mejia	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
90	Operativo	37.334.498	Jicela Jacome Rincon	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
91	Operativo	6.167.313	Santi Jose Gonzalez Marquez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
92	Operativo	1.095.815.007	Isidro Pinzón Rodriguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
93	Operativo	13.748.195	Samuel David Avendaño Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
94	Operativo	1.098.714.150	Yonatan Ariel Avendaño Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
95	Operativo	91.208.815	Carlos Arturo Reyes Quijano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
96	Operativo	85.477.952	Jose Alfredo Vergel Perez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
97	Operativo	88.200.718	Elkin Eduardo Matinez Vera	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
98	Operativo	91.182.107	Samuel Ernesto Rovira Lizcano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
99	Operativo	1.098.792.295	Juan Sebastian Gonzalez Montero	Maestro de Obra	**RETIRADO**
100	Operativo	1.096.183.417	Deivy Celis Castillo	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
101	Operativo	1.102.378.340	Cristiam Giovanny Forero Leal	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
102	Operativo	1.002.494.980	Emilecto De Jesus Vides Morales	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
103	Operativo	5.677.471	Elias Rondon Almeida	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
104	Operativo	1.005.235.751	Luis Antonio Gil Gomez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
105	Operativo	1.095.790.257	Rafael Garcia Cobos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
106	Operativo	88.285.407	Daniel Jesus Pacheco Carrillo	Maestro de Obra	**RETIRADO**
107	Operativo	1.007.406.151	Carlos Andres Pallares Ascanio	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
108	Operativo	1.091.133.380	Erleider Collantes Paez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
109	Operativo	1.096.254.152	Cristian David Urieta Ramos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
110	Operativo	1.007.218.221	Eliecer Dario Benavides Miranda	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
111	Operativo	1.098.678.191	Mauricio Castro Araque	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
112	Operativo	17.575.151	Raul Clavino Castro Torres	Oficial de Obra	**RETIRADO**
113	Operativo	7.120.330	Yackson Aristides Caceres Castro	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
114	Operativo	1.026.559.257	Alexander Tarazona Zambrano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
115	Operativo	1.098.711.570	Tatiana Geraldine Mantilla Supelado	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
116	Operativo	1.098.720.790	Kelly Johana Serrano Varon	Controladora de Trafico	**RETIRADO**

Se realiza seguimiento y control del personal contratado durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023.

Tabla 3. Novedades del personal.

NOVEDADES DE PERSONAL CONSORCIO SANTANDER		
DESCRIPCIÓN	**CONSORCIO**	**TOTAL, DEL PROYECTO**
Número de Trabajadores Activos en el periodo anterior	37	37
No. de Ingresos en el Periodo	16	16
No. de Egresos en el Periodo	9	9
Número de Trabajadores Activos en el periodo actual	**44**	**44**

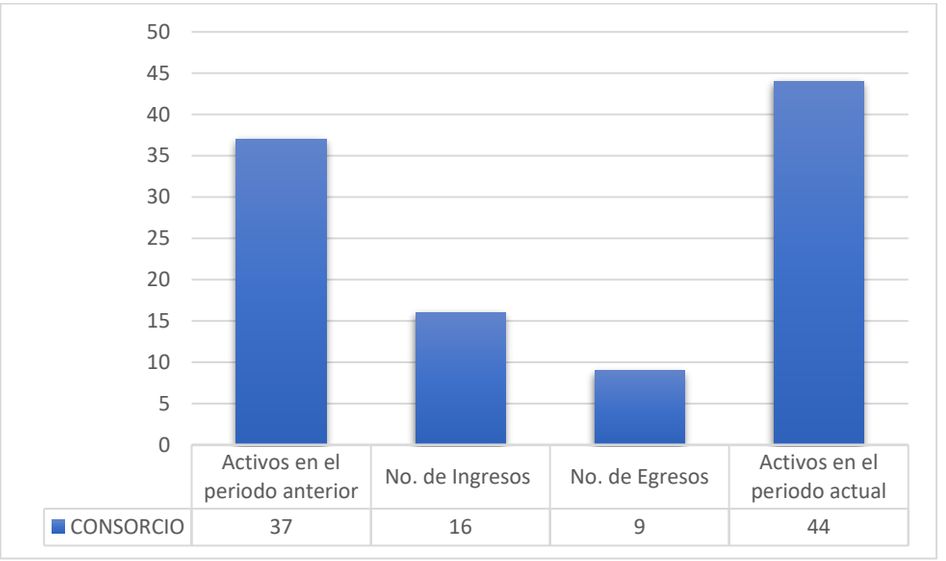


Figura 2. Gráfica Novedades del Personal de Obra.

3.2 Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

La empresa CONSORCIO SANTANDER., tiene diseñado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de continuar con el cumplimiento de las actividades HSEQ y lo reglamentado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, bajo los programas de Higiene y Seguridad industrial, Medicina preventiva y del trabajo, realizó durante el periodo comprendido del presente informe, las siguientes actividades:

- ✓ Exámenes médicos de ingreso y egreso del personal contratado.
- ✓ Afiliaciones al sistema general de seguridad social (EPS, ARL, FP y CCF) conforme a lo estipulado en la normatividad legal vigente.
- ✓ Pago al sistema general de seguridad social correspondiente al mes de mayo.
- ✓ Proceso de Inducción & Capacitación.

- ✓ Entrega de EPPs al personal, incluyendo protección para el manejo de equipos y herramientas.

Anexo 3. Afiliaciones y retiros del personal - mano de obra calificada & no calificada.
Anexo 4. Planilla de seguridad social – Agosto.
Anexo 5. Comprobante de pago de nómina – Agosto.
Anexo 6. Cuadro de control de pagos de seguridad social del personal contratado.

3.2.1 Seguridad Social. Consorcio Santander realiza el pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral de todo el personal de obra, incluyendo personal técnico, administrativo y operativo. Dicho documento se adjunta en este informe. De igual forma se verificó el personal que ingreso nuevo a los distintos frentes que se manejan en el proyecto, revisando que el personal cuente con documentación en regla.

3.2.2 Capacitación y Sensibilización del Personal. Durante el presente periodo, se realizaron charlas de 5 a 10 minutos en temas HSEQ a todos los trabajadores en los diferentes frentes activos y ejecución del proceso de inducción a todos los trabajadores que ingresan al proyecto. Adicionalmente al personal nuevo se les realiza inducción, notificación de riesgo y evaluación SST con una duración aproximada de 50 minutos.

Anexo 7. Registro de charlas y capacitaciones.
Anexo 8. Inducciones y notificación de riesgos.

Tabla 4. Registro de Inducción, Charlas y Capacitaciones.

FECHA	TEMA	No. ASISTENTES	DURACIÓN
1/09/2023	LA IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL	37	5 – 10 min
2/09/2023	AHORRO DE AGUA	37	5 – 10 min
3/09/2023	DOMINGO		
4/09/2023	SEÑALES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	37	5 – 10 min
5/09/2023	REPORTE DE ACCIDENTES	36	5 – 10 min
6/09/2023	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON PRODUCTOS QUÍMICOS	35	5 – 10 min
7/09/2023	EQUIPOS DE PROTECCION PARA OJOS Y CARA	35	5 – 10 min
8/09/2023	PROTECCIÓN AUDITIVA	35	5 – 10 min
9/09/2023	ALCOHOLISMO	35	5 – 10 min
10/09/2023	DOMINGO		
11/09/2023	ASEO EN EL TRABAJO	35	5 – 10 min
12/09/2023	INDUCCIÓN / ERGONOMÍA	35	50 min
13/09/2023	SEGURIDAD CON LA ELECTRICIDAD EN EL TRABAJO	35	5 – 10 min
14/09/2023	PROTECCIÓN DE MAQUINARIA	34	5 – 10 min
15/09/2023	ANALISIS DE RIESGO LABORAL	34	5 – 10 min
16/09/2023	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS - GENERAL	34	5 – 10 min
17/09/2023	DOMINGO		
18/09/2023	MANEJO MANUAL DE MATERIAL	34	5 – 10 min
19/09/2023	LEVANTAMIENTO - LESIONES DE ESPALDA	34	5 – 10 min
20/09/2023	INDUCCIÓN / CO2- EFECTOS EN LA SALUD	36	50 min
21/09/2023	MANEJO DE DESECHOS	36	5 – 10 min
22/09/2023	INDUCCIÓN / RECICLAJE	38	50 min
23/09/2023	CONSERVACIÓN DEL AGUA	38	5 – 10 min

24/09/2023	DOMINGO		
25/09/2023	USO INTELIGENTE DE LA LUZ	38	5 – 10 min
26/09/2023	INDUCCIÓN / CUIDADO DE PLANTAS	41	50 min
27/09/2023	INDUCCIÓN / CUIDADO VISUAL - USO EPP	44	50 min
28/09/2023	INDUCCIÓN / MANEJO DE ESTRES	49	50 min
29/09/2023	HIDRATACIÓN - IMPORTANCIA	49	5 – 10 min
30/09/2023	TRABAJO EN EQUIPO	44	5 – 10 min



Imagen 1. Capacitación y Sensibilización del Personal.

3.2.3 Exámenes Médicos. A continuación, se presenta el de número de exámenes realizados en el periodo, dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007. Los exámenes médicos de ingreso se realizan a cada uno de los trabajadores vinculados al proyecto.

Tabla 5. Exámenes Médicos Ocupacionales.

TIPO DE EXÁMEN	CONSORCIO SANTANDER			
	Ingreso	Reingreso	Periódico	Retiro
Examen Médico	16	0	0	9
Otros: Énfasis en Alturas	0	0	0	0
TOTAL	**16**	**0**	**0**	**9**

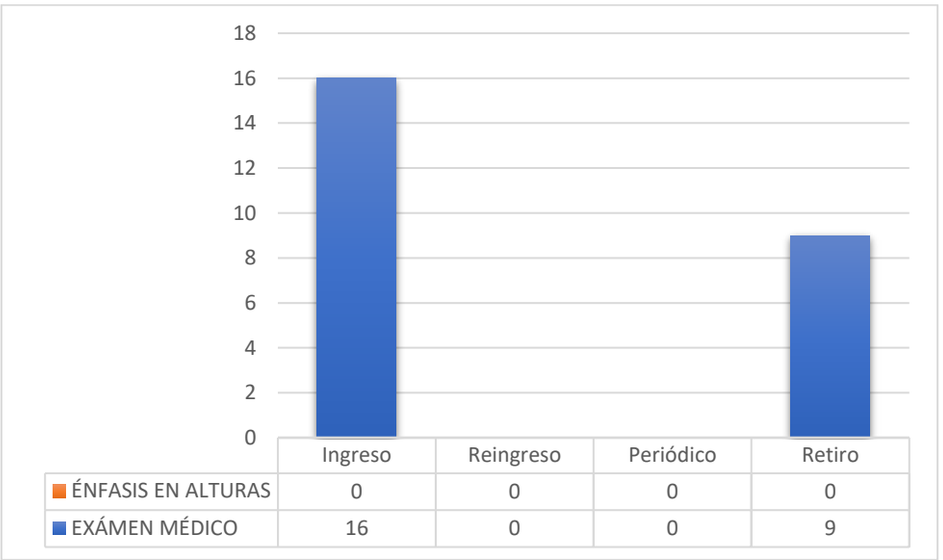


Figura 3. Gráfica Exámenes Médicos.

Anexo 9. Exámenes médicos de ingreso, reingreso y retiro.

3.2.4 Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales. Consorcio Santander realiza seguimiento a los indicadores en cuando a la accidentalidad y casos de ausentismo, acorde con el personal administrativo y operativo del consorcio.

Tabla 6. Seguimiento al reporte de remisiones de accidentalidad y enfermedad.

TIPO DE ATENCIÓN	CONSORCIO	TOTAL
Atención por primeros auxilios	0	0
Traslados en ambulancia (cuando aplique)	0	0
Remisión EPS por enfermedad de origen común	0	0
Remisión ARL	0	0
TOTAL	**0**	**0**

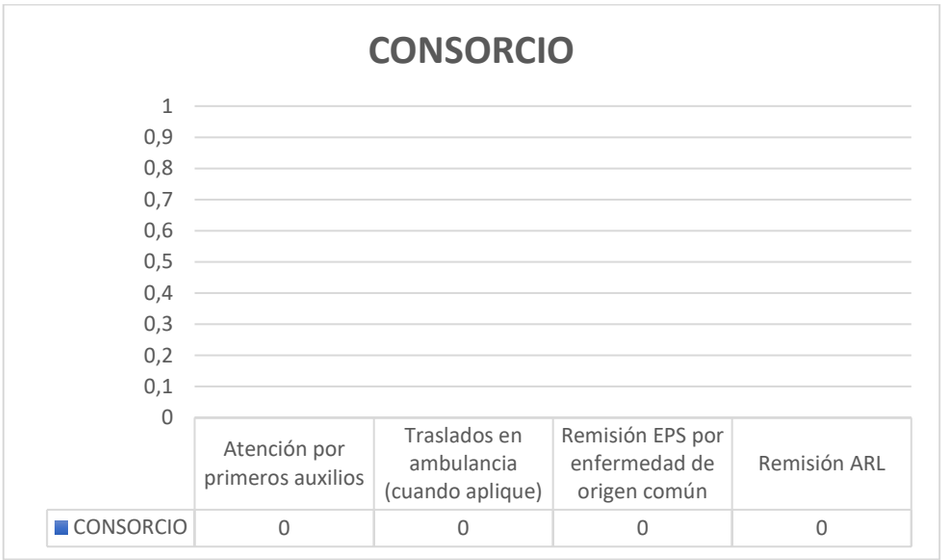


Figura 4. Gráfica Seguimiento a Reporte de Accidentalidad y Enfermedad.

Anexo 10. Certificado de accidentalidad - ARL

3.2.5 Puntos de hidratación. Se mantienen los puntos de hidratación en los frentes de obra activos, los cuales se encuentran ubicados en las áreas de trabajo del personal operativo; se dejan botellones de agua a los cuales se les realiza limpieza y llenado de los mismos.

3.2.6 Gestión de Tareas. A continuación, se describen las actividades realizadas en el presente periodo:

- **Demolición, excavación y compactación:** durante el periodo comprendido de este informe, se realiza el diligenciamiento de permisos de trabajo, ATS e inspecciones de los equipos usados en el desarrollo de las actividades de

Tabla 7. Gestión de Tareas (ATS, Permisos)

Tipo de Trabajo	Descripción	No. Permisos o ATS	Observaciones
Demolición, Excavación y Compactación	**ATS**	16	Actividades de demolición, excavación e instalación de sardinel
Trabajo en alturas	**ATS**	2	Actividades de poda aérea en individuos vegetales con una altura superior a dos metros


CS
Consorcio Santander
1/09/2023 10:26:58 a.m.
7°7'48"N -73°7'2"W
Bucaramanga
frente San Alonso calle 20 entre carreras 29 y 30


CS
Consorcio Santander


CS
Consorcio Santander


CS
Consorcio Santander


CS
Consorcio Santander
12/09/2023 1:44:26 p. m.
7°7'48"N 73°7'4"W
Bucaramanga
Alonso calle 20 entre carreras 29 y 30
CS
Consorcio Santander
12/09/2023 1:44:41 p. m.
7°7'48"N 73°7'4"W
Bucaramanga
Alonso calle 20 entre carreras 29 y 30



Imagen 2. Trabajos de demolición, excavación y compactación en los frentes.

Anexo 11. Formato de ATS.

- **Trabajo Seguro en Alturas:** en el presente periodo se realizaron actividades de alto riesgo como trabajo en alturas; sin embargo, la persona que realizó la actividad cuenta con los EPP necesarios para el desarrollo de esta y adicional con los siguientes equipos de protección contra caídas.

Tabla 8. Equipos de Protección contra caídas.

Tipo	Serie	Lote	Fecha de Fabricación	Estado	Observaciones
Arnés	410121120544	2112	Diciembre 2021	Bueno	N/A
Eslinga de posicionamiento en cuerda	N/A	N/A	N/A	Bueno	Costuras en buen estado, etiquetas deterioradas

Anexo 12. Ficha técnica y certificado del arnés.


CS
Consorcio Santander
25/09/2023 2:26:12 p. m.
7°7'48"N -73°7'4"W
Bucaramanga
CHAPINERO



Imagen 3. Equipo de Protección contra caídas.

3.2.7 Inspecciones y Preoperacionales. Durante el periodo comprendido en el presente informe se realizaron inspecciones correspondientes al plan SST y preoperacionales a las máquinas y herramientas usadas en las labores diarias para las tareas de demolición.

Tabla 9. Inspecciones y Preoperacionales

Frente /Sección / Área	Tipo de Inspección							
	Máquinas y Equipos	Vehículos	Maquinaria	Herramientas	EPP	Áreas de Trabajo	Sustancias Químicas	Orden y Aseo
Operativa Frentes de Obra San Alonso, La Universidad, La Aurora y Chapinero.	X	X	X	X	X	X	X	X

Anexo 13. Formatos preoperacionales a máquinas y/o herramientas.
Anexo 14. Inspecciones de seguridad.

3.2.8 Elementos de Protección Personal EPP. Durante el periodo relacionado se realiza la entrega de dotación y EPPs por parte del consorcio a todos los trabajadores que ingresan al proyecto.

Tabla 10. Seguimiento EPP

ESPECIFICACIONES	ELEMENTO	MOTIVO
 Protección Cabeza	Casco	Ingreso Personal
 Protección Facial	Gafas claras y/o oscuras y careta (manejo pulidora)	Ingreso Personal / Manejo de herramientas

ESPECIFICACIONES	ELEMENTO	MOTIVO
 Protección respiratoria – COVID-19	Mascarilla o tapabocas y tapabocas con filtro material particulado (manejo pulidora)	Ingreso Personal / Manejo de herramientas
 Protección auditiva	Tapa oído de inserción y tapa oído de copa (manejo pulidora y martillo demoledor)	Ingreso Personal / Manejo de herramientas
 Protección Corporal	Camisa manga larga y delantal de cuero (manejo pulidora)	Ingreso personal / Manejo de herramientas
 Protección Miembros inferiores	Botas de cuero con puntera de acero	Ingreso Personal

Anexo 15. Entrega de elementos de protección personal y dotación.





Imagen 4. Entrega y uso de EPP.

3.2.9 Cerramiento, Señalización y Demarcación de Áreas de Trabajo. Instalación de cerramiento perimetral como medida preventiva para el aislamiento de las zonas de obra y evitar el paso de personal no autorizado a las mismas, esto mediante tela de polipropileno de color verde, malla de color azul, con una altura de 2 metros y parales de madera rolliza colocados cada 3 metros en los frentes de obra de San Alonso Cll. 20, Chapinero, Juventud, El Rosal, Albania y La Independencia.

Consorcio Santander instala en los diferentes frentes de trabajo señalización preventiva como acción para minimizar la ocurrencia de accidentes laborales. De igual manera se realiza instalación de señalización informativa y advertencias pertinentes como SENDEROS PEATONALES, REDUCCIÓN DE CARRIL, INICIO Y FIN DE OBRA, etc.

Durante la actividad de excavaciones se realiza la señalización y demarcación de las áreas de trabajo con delineadores tubulares, y cinta de peligro. De igual manera se realiza instalación de la señalización informativa (uso obligatorio de EPP), emergencias (ruta de emergencia, punto de encuentro), prohibición (prohibido el ingreso de personal) mostrando la información y advertencias pertinentes de acuerdo con la normatividad.






Red:5/09/2023, 8:19:08 a.m. COT
Local:5/09/2023, 8:19:08 a.m. COT
234° SW
Observación: SAN ALONSO CLL 20











Imagen 5. Cerramientos y señalización PMT.

3.2.10 Indicadores Seguimiento al Plan SST. Durante el periodo se realizó el seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando entre otras las siguientes actividades:

Tabla 11. Indicadores cumplimiento al plan SST.

#	INDICADOR CUMPLIMIENTO	CIFRAS
Registros de afiliación a EPS y ARL	Cumple 100 % No cumple: Entre 0 % y 99 %	**100 %**
Implementación del SGSST	ISGSST = % de Implementación de actividades propuesta para el mes de acuerdo con el SG-SST.	ISGSST **= 100 %**
Entrega de EPP	$\% \, CEPP = \frac{\# \, EPP \, ENTREGADO}{\# \, EPP \, REQUERIDO} * 100$	$\%CEPP = \frac{112}{112} * 100 = \mathbf{100}\%$
Uso de EPP	$\text{IUEPP} = 100 \text{ X } \frac{(\text{\# Trabajadores usan correctamente los EPP })}{(\text{\# Total Trabajadores})}$	$\text{IUEPP} = 100 \text{ X } \frac{(44)}{(44)}$ **= 100 %**
Inducción, charlas diarias y capacitaciones.	$CI = \frac{\# \, PERSONAS \, ASISTEN}{\# \, PERSONAS \, INGRESAN} * 100$	$CI = \frac{44}{44} * 100 = \mathbf{100}\%$
Reporte de los Accidentes y enfermedades laborales.	Reporte ALEL Cumple: 100% No cumple: Entre 0% y 99%	**100 %**

Capacitaciones SST	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ Capacitaciones realizadas})}{(\#\text{ Capacitaciones programadas})}$	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(26)}{(26)}$ **= 100 %**
Señalización y aislamiento	$\text{ISA} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ Frentes de Trabajo y áreas señalizadas})}{(\#\text{ Frentes de Trabajo y áreas que deben señalizarse})}$	$\text{ISA} = 100 \text{ X } \frac{(6)}{(6)}$ **= 100 %**
Inspecciones y Preoperacionales	$\text{IIP} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ Inspección de Equipos y Preoperacionales})}{(\#\text{ Equipos, vehículos y maquinaria en obra})}$	$\text{IIP} = 100 \text{ X } \frac{(64)}{(64)}$ **= 100 %**
ATS	$\text{ATS} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ ATS realizadas})}{(\#\text{ ATS por actividades semanales y frentes})}$	$\text{IIP} = 100 \text{ X } \frac{(17)}{(17)} = \mathbf{100}\ \%$

3.2.11 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). Durante el presente periodo Consorcio Santander realizó la primera reunión del COPASST el día 16 de junio de 2023, según lo establecido en la Resolución 2013 de 1986, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015.

De 10 a 49 Trabajadores: Un (1) representante por cada una de las partes.
De 50 a 499 Trabajadores: Dos (2) representantes por cada una de las partes.
De 500 a 999 Trabajadores: Tres (3) representantes por cada una de las partes.
De 1000 a más trabajadores: Cuatro (4) representantes por cada una de las partes.

Actividad	Fecha	Observaciones
Elección y Conformación del COPASST	11/05/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 1	16/06/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 2	24/07/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 3	24/08/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 4	22/09/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 5	27/10/2023	Actividad Programada

3.2.12 Comité de Convivencia Laboral (COCOLA). Se realizó la primera reunión del comité de convivencia laboral el día 11 de mayo de 2023, este quedó compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, según lo establecido en la Resolución 1356 de 2021 Art. 1. Las reuniones se programarán para realizarse cada tres (3) meses, la primera reunión se realizó el día 16 de agosto del año en curso.

Actividad	Fecha	Observaciones
Elección y Conformación del COCOLA	11/05/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 1	16/08/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 2	16/11/2023	Actividad Programada

3.3 Plan de Calidad.

Consorcio Santander realiza revisión del Plan de Calidad y los certificados de los equipos y demás herramientas para la ejecución del proyecto. A continuación, se hace referencia a las herramientas y el equipo aprobados para obra durante el desarrollo del proyecto:

Tabla 12. Equipo y herramientas mínimas del proyecto.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MÍNIMOS PARA OBRA CIVIL	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**
Volquetas	3
Mezcladora Concreto	3
Vibrador de Concreto	3
Compactador Manual tipo rana	3
Martillo demoledor	3
Pulidora	6

Fuente. Anexo Técnico.



Imagen 6. Equipos y herramientas.

3.4 Manejo Ambiental en la Obra.

CONSORCIO SANTANDER, tiene como compromiso implementar las acciones necesarias para prevenir, mitigar, corregir y controlar, los efectos e impactos ambientales negativos que se causarán con el desarrollo de las actividades de obra. Para esto fue radicado en la Alcaldía de Bucaramanga Plan de Manejo Ambiental en la Obra (MAO).

3.4.1 Fuentes de Materiales y Proveedores. Se entregan los certificados de extracción de materiales pétreos y certificado de RUCOM, expedidos por la Agencia Nacional Minera, provenientes de la ARENERA LOS PINOS LTDA identificada con Nit 900.309.138, propiedad del señor Ángel Miguel Niño Prieto identificado con CC 91.101.017, ubicada en la VEREDA SAN PEDRO FINCA LOS POTRERITOS 2 KILOMETRO ARRIBA DEL PUENTE DE PESCADERO VÍA BUCARAMANGA – SAN GIL.

3.4.2 Manejo de campamentos fijos y/o temporales. Actualmente contamos con oficina administrativa ubicada en la Carrera 22 No. 11 – 12 Barrio San Francisco. Para el mes de septiembre continúan actividades en San Alonso Calle 20, Chapinero, Juventud, El Rosal, Albania y La Independencia. Para este mes se negoció la prestación de los servicios de agua y energía en las siguientes ubicaciones: para el barrio la juventud se prestarán los servicios de la casa ubicada en la Calle 20c No. 1n – 30 y una parte de la misma se usa también para bodega y con servicio de baño incluido; en Albania se toma en arriendo el predio ubicado en la Cra. 51 No. 19b – 37 para ser usado como bodega, tomar de este mismo los servicios de agua y energía, adicionalmente en el mismo sector debido a lo largo del tramo se llegó a un acuerdo con el mismo propietario para suministrar energía desde el predio ubicado en la Cra. 51 No. 27 – 31; respecto al frente ubicado en el barrio el Rosal, en el parqueadero que lleva el mismo nombre del barrio se contrató el servicio de bodegaje, baño, energía y agua con el propietario de este predio; en el frente del barrio la Independencia se contó con el apoyo del presidente de la juna de acción comunal, para la prestación de los servicios de bodegaje, baño, energía y agua del salón comunal del sector; y finalmente para la intervención del último tramo del barrio Chapinero se cuenta con la prestación del servicio de agua y energía del predio ubicado en la Cll. 4 No. 16 – 24. Para los frentes San Alonso Calle 20 y Chapinero se dispone de un baño portátil flusing con lavamanos, dando cumplimiento de protocolo de bioseguridad y normatividad legal.


SALON COMUNAL

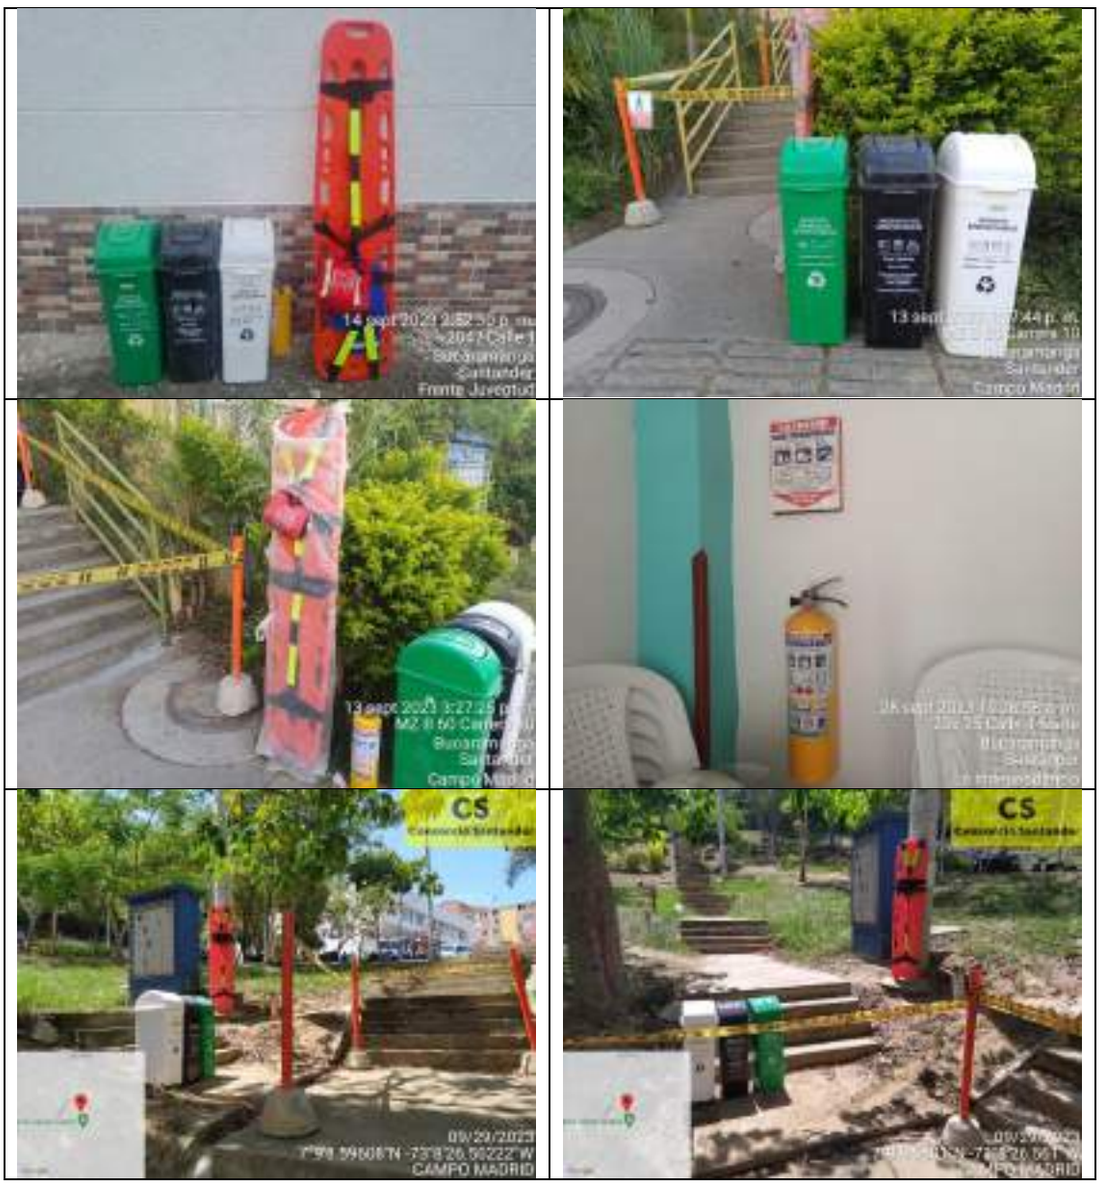


Imagen 7. Campamentos y unidades sanitarias en los frentes.

Anexo 16. Certificados de limpieza de unidades sanitarias.

3.4.3 Manejo de materiales de construcción. Durante el periodo comprendido en el presente informe, se adquiere el siguiente material:

Tabla 13. Material adquirido.

Material	Volumen / Unidad
Arena	64 m^3
Triturado ¾	6 m^3
Sub Base ¾	48 m^3
Cemento Gris	400 Und.
Loseta Toperol de 40x40x6	90 Und.
Loseta Guía de 40x40x6	640 Und.
Loseta Lisa de 40x40x6	2000 Und.

Material	Volumen / Unidad
Arena	64 m^3
Loseta visual o amarilla de 40x40x6	700 Und.
Sardinel 0,80x0,50x0,20	125 Und.
Sardinel 0,20x0,50x0,20	80 Und.
Sardinel rampabaja 0,80x0,35x0,20	98 Und.
Transición derecha 0,60x0,50x0,20	21 Und.
Transición izquierda 0,60x0,50x0,20	21 Und.
Adoquín gris 20x10x6	9.100 Und.
Malla electrosoldada	15 m
Malla gallinero	15 rollos

3.4.4 Manejo Integral de Residuos Sólidos. Para el manejo de los residuos sólidos generados en las diferentes actividades de obra, el consorcio instaló un punto ecológico en cada uno de los frentes, los cuales están protegidos contra la acción de las precipitaciones y consta de tres (3) recipientes con sus respectivas bolsas plásticas, para una correcta clasificación de los residuos sólidos de acuerdo a sus características, bajo los lineamientos de la normatividad legal vigente (Resolución 2184 de 2019) donde se estable un nuevo código de colores unificado para la separación de los residuos en la fuente, a nivel nacional a partir de enero de 2021.



Figura 5. Clasificación de Residuos.
Fuente. Resolución 2184 de 2019.

- ✓ **Blanca (Residuos Aprovechables):** depósito de residuos aprovechables como plástico, vidrio, papel, metales y cartón.
- ✓ **Negro (Residuos No Aprovechables):** depósito de residuos no aprovechables como papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados, entre otros.
- ✓ **Verde (Residuos Orgánicos Aprovechables):** depósito de residuos orgánicos aprovechables como restos de comida, desechos agrícolas, etc.

Las empresas encargadas de hacer la recolección de estos residuos sólidos son la EMAB (Empresa de aseo de Bucaramanga) y Limpieza Urbana, quienes prestan el servicio de recolección y disposición final tres veces por semana y sean llevadas al relleno sanitario el carrasco.

Tabla 14. Cantidad de Residuos Ordinarios Generados en Obra.

CANTIDADES DE RESIDUOS ORDINARIOS, RECICLABLES Y PELIGROSOS GENERADOS EN OBRA			
ORDINARIOS	**RECICLAJE**	**PELIGROSOS**	**PERIODO**
6 kg	2 kg	0 kg	Del 16 al 31 de marzo de 2023
7 kg	3 kg	0 kg	Del 01 al 30 de abril de 2023
9 kg	5 kg	0 kg	Del 01 al 31 de mayo de 2023
8 kg	4 kg	0 kg	Del 01 al 30 de junio de 2023
10 kg	6 kg	0 kg	Del 01 al 13 de 24 al 31 de julio de 2023
8 kg	5 kg	0 kg	Del 01 al 31 de agosto de 2023
9 kg	7 kg	0 kg	Del 01 al 30 de septiembre de 2023

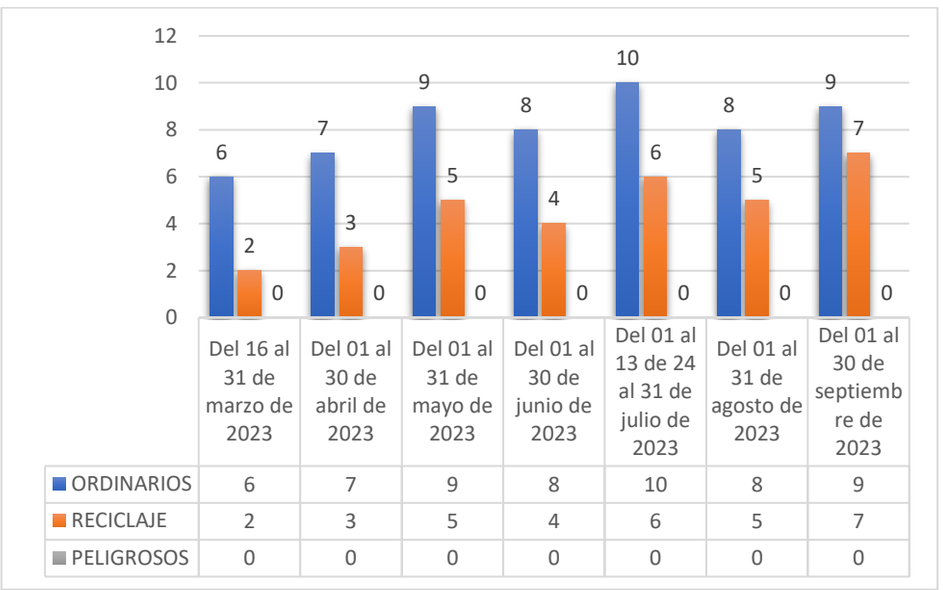


Figura 6. Gráfica Residuos Sólidos Generados.

Tabla 15. Gestión de los residuos

TIPO DE RESIDUO	DESCRIPCIÓN (Especificar características de los residuos)	EMPRESA QUE REALIZA DISPOSICION FINAL	PERIODICIDAD
PELIGROSO	Envases contaminados químicos	Acopio temporal En la obra	Cuando se tenga la cantidad mínima para su entrega
ORDINARIO	Empaques de comida, Residuos de alimento. Desechables, toallas de papel, tapabocas o mascarillas.	Acopio temporal EMAB (Contenedores)	3 veces por semana
		Acopio temporal Limpieza Urbana (Contenedores)	
RECICLABLE	Papel, cartón, plásticos limpios y secos, envases de vidrio, metales	Acopio temporal EMAB	2 veces por semana
		Acopio temporal Limpieza Urbana (Contenedores)	

3.4.5 Manejo Residuos de Construcción (RCD). Durante el periodo del presente informe, se realizaron labores de demolición en todos los frentes. Consorcio Santander cuenta con el equipo necesario para la recolección oportuna, el retiro, transporte y disposición final de residuos de construcción (escombros) y se tramitaron los permisos necesarios con la escombrera Botadero El Parque para la disposición final del RCD. Lo anterior garantizando que las zonas permanezcan libres de material sobrante que pueda obstaculizar el transito seguro a peatones, trabajadores y vehículos.

A continuación, se muestra el total de residuos generados en los frentes de obra, los cuales fueron dispuestos:

Tabla 16. Consolidado de material dispuestos Botadero El Parque.

CONSOLIDADO DE ESCOMBROS DISPUESTOS BOTADERO EL PARQUE			
Cantidad Total	**Unidad**	**Periodo**	**Cantidad Certificada**
0 m^3	METRO CUBICO	Del 16 al 31 de marzo de 2023	**0 m^3**
96 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 30 de abril de 2023	**96 m^3**
32 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 31 de mayo de 2023	**32 m^3**
104 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 30 de junio de 2023	**104 m^3**
144 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 13 y del 24 al 31 de julio de 2023	**144 m^3**
168 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 31 de agosto de 2023	**168 m3**
208 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 30 de septiembre de 2023	**208 m3**

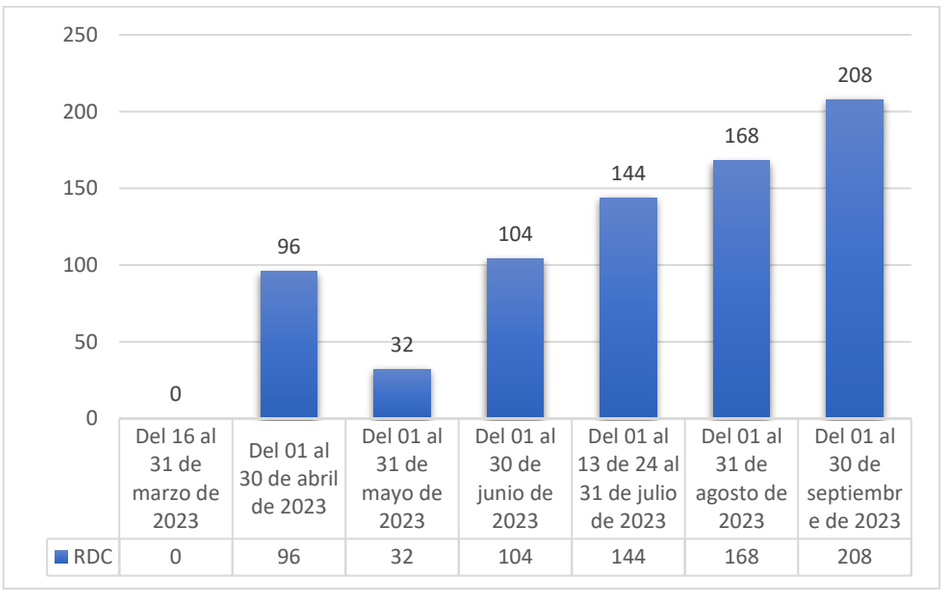


Figura 7. Gráfica Residuos de Construcción Generados.

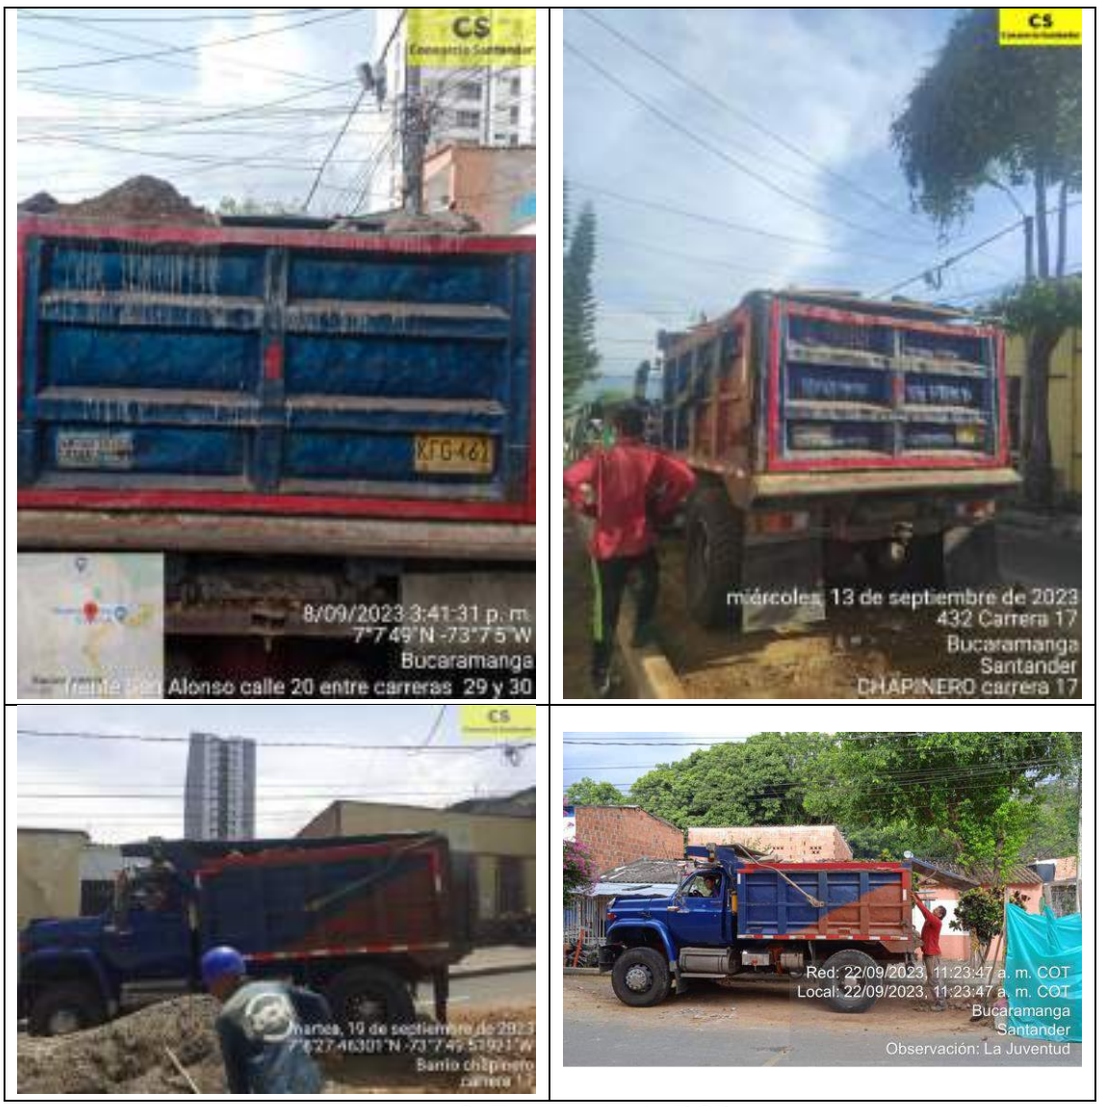


Imagen 8. Transporte de RCD.

Anexo 17. Comprobante de ingreso de RCD a escombrera.

3.4.6 Control de Emisiones Atmosféricas. Durante el periodo reportado, se realizó el cubrimiento con plástico negro el material granulado que se encuentra en los puntos de acopio temporales. También para la actividad de barrido de las zonas, se hizo humectación de estas como medida de mitigación para evitar la propagación de material particulado en los frentes de trabajo.



Imagen 9. Cubrimiento de material.

3.4.7 Manejo de Maquinaria y Vehículos. Se realiza seguimiento a la maquinaria y Vehículos utilizados para actividades de transporte de materiales, evacuación de residuos.

Tabla 17. Listado de Vehículos y Maquinaria usada en obra.

No.	MARCA	VEHÍCULO O MAQUINA			ESTADO EN OBRA	
		PLACA	MODELO	TIPO	ACT	NO ACT
001	CHEVROLET	KFG461	1988	VOLQUETA SENCILLA	X	
002	DODGE	RDC740	1978	VOLQUETA SENCILLA	X	
003	CHEVROLET	ICF925	1982	VOLQUETA SENCILLA	X	

Se realiza el llenado de combustible de las volquetas en las estaciones de servicio, teniendo en cuenta las medidas de seguridad.

3.4.8 Uso Eficiente de los Recursos. De acuerdo con los permisos de servicios necesarios para el desarrollo de la obra como agua y energía en los puntos de cada frente de obra se realizó el siguiente convenio:

- Frente Chapinero Cll 5 se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos son prestados por parte de la Sra. María Alexandra Lozano en el predio ubicado en la Calle 5 # 16 – 25.

- Frente Chapinero Cra 17 se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos son prestados por parte de la Sr. Jaime Carreño en el predio ubicado en la Cra 17 # 4 – 60.

- Frente San Alonso Cll 20 se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos son prestados por parte de la Sr. Gilberto Roa en el predio ubicado en la Calle 20 # 29 – 14.

- Frente La Juventud se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos son prestados por parte del Sr. Victor Manuel Cabrera en el predio ubicado en la Cra 20c # 1n – 30.

- Frente Albania se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos son prestados por parte de la Sra. Mireya en el predio ubicado en la Calle 51 # 19b – 37, y en a la Sra. Irene Tarazona en el predio de la Cra 51 No. 27 – 31.

- Frente El Rosal se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos son prestados por parte del Sr. Reinaldo Laiton en el predio denominado Parqueadero el Rosal.

- Frente La Independencia se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos son prestados por parte del Sr. Manuel Meléndez en el salón social del barrio.

- Frente Chapinero Cll 4 se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos son prestados por parte del Sr. Wilmer Torres Caicedo en el predio ubicado en la Calle 4 # 16 – 24.

Anexo 18. Constancia de convenio uso de los recursos.





Imagen 10. Firma de convenio uso de los recursos.

3.4.9 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros. Actualmente se cuenta con un inventario de sumideros, pozos y/o cuerpos de agua (numeración, localización, dirección, tipo de sumidero, estado hidráulico y físico, registro fotográfico y plano de ubicación) según corresponda. Se realizo para los frentes activos y se ira actualizando a medida que se habiliten más zonas a intervenir.

Tabla 18. Listado de sumideros en frentes de obra.

N° DE SUMIDERO	FRENTE	MEDIDA	ESTADO DEL SUMIDERO
1	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
2	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
3	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
4	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
5	LA UNIVERSIDAD	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
6	LA UNIVERSIDAD	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
7	SAN ALONSO	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
8	LA AURORA	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
9	LA AURORA	210 X 70	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza

10	CHAPINERO	210 X 70	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
11	SAN ALONSO CLL 20 CRA 29 ESQ SUR	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
12	SAN ALONSO CLL 20 CRA 29 ESQ NORTE	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
13	SAN ALONSO CRA 29 CLL 20 ESQ	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
14	JUVENTUD	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
15	JUVENTUD	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza





Imagen 11. Cubrimiento de sumideros.

3.4.10 Manejo de la Vegetación y Paisajismo. En el presente se ejecutaron actividades de conformación de tierra negra en alcorque en los frentes Chapinero.

Tabla 19. Listado de vegetación en frentes de obra.

NOMBRE COMÚN	TIPO DE INTERVENCIÓN (PODA, TALA, TRASLADO, CONSERVACIÓN)	FRENTE	OBSERVACIÓN
PALMA	TRASLADO	VEGA	TRASLADO EL DÍA 10/05/2023
PALMA	TRASLADO	VEGA	TRASLADO EL DÍA 10/05/2023
PALMA	TRASLADO	VEGA	TRASLADO EL DÍA 10/05/2023
PALMA	TALA Y REPOSICIÓN	VEGA	TALA EL DÍA 04/05/2023
PALMA	TALA Y REPOSICIÓN	VEGA	TALA EL DÍA 04/05/2023
POMARROSO BRASILERO	REPOSICIÓN	VEGA	SIEMBRA EL DÍA 10/05/2023 EN REPOSICIÓN DE PALMA TALADA
POMARROSO BRASILERO	REPOSICIÓN	VEGA	SIEMBRA EL DÍA 10/05/2023 EN REPOSICIÓN DE PALMA TALADA
TULIPÁN AFRICANO	PODA	VEGA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 10/05/2023
TULIPÁN AFRICANO	PODA	VEGA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 10/05/2023
OITÍ	PODA	VEGA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 10/05/2023
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA UNIVERSIDAD	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA UNIVERSIDAD	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA UNIVERSIDAD	N/A

OITÍ	CONSERVACIÓN	LA UNIVERSIDAD	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
ÁRBOL PENITENTE	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
PINO SAN ALBERTO	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
YUCA PIE DE ELEFANTE	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
ALMENDRO	CONSERVACIÓN	CHAPINERO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 18/09/2023
PINO ARAUCARIA	CONSERVACIÓN	CHAPINERO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 18/09/2023
PINO ARAUCARIA	TALA	CHAPINERO	TALA EL DÍA 18/09/2023
AGUACATE PAPELILLO	CONSERVACIÓN	CHAPINERO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 18/09/2023
PINO PATULA	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 25/09/2023
PINO PATULA	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 25/09/2023
PINO PATULA	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 25/09/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 25/09/2023





Imagen 12. Trabajo de poda aérea y radicular, traslado y reposición de especies vegetales.

3.4.11 Orden y Aseo. Para esta actividad, el Consorcio dispuso de un trabajador quien es el encargado del orden y aseo dentro de los frentes activos. Se realizan actividades de barrido con previo humedecimiento de la zona para generar el levantamiento de polvo.



Imagen 13. Orden y aseo en los frentes.

3.4.12 Indicadores seguimiento al Plan de Manejo Ambiental. A continuación, se presenta los indicadores de cumplimiento de acuerdo con las actividades ejecutadas y el seguimiento que se realizó en el periodo del presente informe.

Tabla 20. Indicadores cumplimiento Plan de Manejo Ambiental.

#	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	CIFRAS
Capacitaciones Ambientales	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ Capacitaciones realizadas})}{(\#\text{ Capacitaciones programadas})}$	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(6)}{(6)}$ **= 100 %**
Manejo de Residuos sólidos	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(\text{Vol. Residuos Reciclados})}{(\text{Vol. Residuos Generados})}$	$\text{IRS} = 100 \text{ X } \frac{(7)}{(16)}$ **= 38.4 %**
Disposición de Escombros	$\text{IEV} = 100 \text{ X } \frac{(\text{Vol. Residuos con recibo})}{(\text{Vol. Residuos Generados})}$	$\text{IDE} = 100 \text{ X } \frac{(208)}{(208)}$ **= 100%**
Vehículos Certificados	$\text{IEV} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{Vehículos que cumplen})}{(\#\text{ Total de Vehículos})}$	$\text{IEV} = 100 \text{ X } \frac{(3)}{(3)}$

#	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	CIFRAS
		= 100%
Permiso de Aprovechamiento Forestal	$\text{IPAF} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{Árboles Talados})}{(\#\text{ Árboles Autorizados para tala})}$	**No aplica para el periodo**
Compensación de árboles	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{Árboles Sembrados})}{(\#\text{ Árboles requeridos para siembra})}$	**No Aplica para el periodo**
Limpieza de obra	0 % si no realiza limpieza de obra. 50 % si la limpieza es deficiente. 100 % si la limpieza es adecuada.	**100 %**
Cumplimiento Actividades Ambientales	$\text{ICAA} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{Actividades implementadas})}{(\#\text{ Actividades programadas})}$	**No Aplica para el periodo**
Áreas controladas (Emisión de polvo)	$\text{IAC} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ Actividades ejecutadas})}{(\#\text{ Actividad programada para el control})}$	$\text{IAC} = 100 \text{ X } \frac{(6)}{(6)}$ **= 100 %**
Baterías Sanitarias requeridas	$\text{UBS} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ Actividades ejecutadas})}{(\#\text{ Actividad programada para el control})}$	$\text{IAC} = 100 \text{ X } \frac{(6)}{(6)}$ **= 100 %**
Manejo de campamento e instalaciones provisionales	0 % deficiente 50 % regular 100 % adecuado.	**100 %**
Área de almacenamiento de materiales	Las áreas de almacenamiento de materiales se observan adecuadas conforme a lo estipulado en el programa: Si cumple (100%) Parcialmente (50%) No cumple (0%).	**100 %**

3.5 Plan de Prevención, Preparación y Atención de Emergencias.

Dentro de las medidas planteadas en el Plan de Prevención de Emergencias diseñado por el consorcio, dispone para el componente de atención a emergencias: botiquín de emergencias, camilla, extintor multipropósito con recarga vigente durante la ejecución del proyecto en los frentes de obra activos (San Alonso, La Universidad, La Aurora y Chapinero).

Tabla 21. Verificación de elementos de emergencia frentes de obra.

UBICACIÓN	ELEMENTO DE EMERGENCIA	CANT.	FECHA INSPECCIÓN	NOVEDAD
Campamento de Obra Frente San Alonso	Botiquín	1	28-09-2023	Buen Estado
	Camilla	1	28-09-2023	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 1 - 10 lb	1	28-09-2023	Buen Estado Vencimiento Abril 2024
Campamento de Obra Chapinero	Botiquín	1	28-09-2023	Buen Estado
	Camilla	1	28-09-2023	Buen Estado

UBICACIÓN	ELEMENTO DE EMERGENCIA	CANT.	FECHA INSPECCIÓN	NOVEDAD
	Extintor Multipropósito ABC # 2 - 10 lb	1	28-09-2023	Buena Estado Vencimiento Abril 2024
Campamento de Obra Juventud	Botiquín	1	28-09-2023	Buen Estado
	Camilla	1	28-09-2023	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 3 - 10 lb	1	28-09-2023	Buena Estado Vencimiento Abril 2024
Campamento de Obra Rosal	Botiquín	1	28-09-2023	Buen Estado
	Camilla	1	28-09-2023	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 3 - 10 lb	1	28-09-2023	Buena Estado Vencimiento Abril 2024
Campamento de Obra Albania	Botiquín	1	28-09-2023	Buen Estado
	Camilla	1	28-09-2023	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 3 - 10 lb	1	28-09-2023	Buena Estado Vencimiento Abril 2024
Campamento de Obra Independencia	Botiquín	1	28-09-2023	Buen Estado
	Camilla	1	28-09-2023	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 3 - 10 lb	1	28-09-2023	Buena Estado Vencimiento Abril 2024

Anexo 19. Inspecciones de elementos de emergencia.

Tabla 22. Atención de emergencias.

Periodo	Actividad	Fecha	Trabajadores involucrados	Observaciones
Del 16 al 31 de marzo de 2023	Emergencias reportadas	-	-	Al cierre del mes no se presentan emergencias en ningún frente
Del 01 al 30 de abril de 2023	Emergencias reportadas	-	-	Al cierre del mes no se presentan emergencias en ningún frente
Del 01 al 31 de mayo de 2023	Emergencias reportadas	-	-	Al cierre del mes no se presentan emergencias en ningún frente
Del 01 al 30 de junio de 2023	Emergencias reportadas	03/06/2023	1	Accidente del Sr. Ever Carrascal
Del 01 al 13 de 24 al 31 de julio de 2023	Emergencias reportadas	-	-	Al cierre del mes no se presentan emergencias en ningún frente
Del 01 al 31 de agosto de 2023	Emergencias reportadas	-	-	Al cierre del mes no se presentan emergencias en ningún frente
Del 01 al 30 de septiembre de 2023	Reintegro de trabajador	06/09/2023	1	Se realiza reintegro laboral del Sr. Ever Carrascal. Se tienen en cuenta las restricciones dadas por el médico

				laboral de la ARL. Pendiente visita de acompañamiento de la ARL para el reintegro del trabajador.

Se mantiene el equipo de emergencias confirmado por los inspectores en cada uno de los frentes.

3.6 Plan de Manejo de Tráfico - PMT.

Dentro de las medidas planteadas en el Plan de Manejo de Tráfico diseñado por el consorcio, se establece que se realizara comité mensual de tráfico con un representante por parte del contratista, interventoría y de la dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga. El día 22 de septiembre se realiza el cuarto comité, se visitan los frentes activos y se valida que se está aplicando el PMT de acuerdo con el documento aprobado por parte de DTB.

Tabla 23. Comité de tráfico.

Actividad	Fecha	Observaciones
Reunión 1	22/06/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 2	31/07/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 3	29/08/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 4	22/09/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 5	11/10/2023	Actividad Programada

Anexo 20. Acta No3. Comité de Tráfico.



Imagen 14. Comité de Tráfico

3.7 Protocolo de Bioseguridad COVID-19.

Consorcio Santander con el ánimo de cumplir con la Resolución 1238 de 2022 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre las medidas para la prevención, promoción y conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas

las originadas por la COVID-19, elaboró un protocolo de bioseguridad que se presentó a la aseguradora de riesgos laborales y está pendiente la respectiva aprobación por parte de ellos.

Durante la ejecución del periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2023, el CONSORCIO SANTANDER no reporto casos positivos de COVID-19 en su personal directo y subcontratista.

Tabla 24. Casos COVID-19 Acumulados en el periodo.

CASOS COVID-19 ACUMULADOS EN EL PERIODO	
SOSPECHOSOS	0
CONFIRMADOS	0
CON CERCO EPIDEMIOLÒGICO	0
DESCARTADOS	0
CASOS POR AUSENTISMO TOTALES	0

4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Durante este periodo, CONSORCIO SANTANDER ha velado porque la gestión HSEQ, se desarrolle bajo el cumplimiento de todos los requisitos de la normatividad legal vigente, los planes diseñados y lo establecido en el Apéndice I - Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- CONSORCIO SANTANDER cuenta con la certificación expedida por la escombrera donde se realizará la disposición final del material RCD para ser presentada en este corte.

- Se continua con la implementación de los planes para mantener la adecuación de las zonas peatonales, el orden y aseo en la obra, señalización y delimitación de los frentes de trabajo y el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar emergencias.

- CONSORCIO SANTANDER cuenta con las Brigadas de Emergencia en los diferentes frentes de trabajo, con personal capacitado para la atención de las situaciones que se presenten.

- Se realiza carta para informar al personal retirado del Consorcio, que cuentan con 5 días hábiles para realizar los exámenes de retiro y que pasado este tiempo se da por entendido que desistió de la realización de estos.

- Durante el periodo en curso, se mantienen actualizadas las carpetas compartidas con la información correspondiente al **CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS EN OBRA.**

- Se mantiene actualizada y con todo la información necesaria la bitácora de A&SST con la información de las actividades desarrolladas en cada uno de los diferentes frentes activos y los que ya se culminaron actividades.

5. ANEXOS

Anexo 1. Cronograma de actividades A&SST.
Anexo 2. Bitácora A&SST.
Anexo 3. Afiliaciones y retiros del personal - mano de obra calificada & no calificada.
Anexo 4. Planilla de seguridad social – Agosto.
Anexo 5. Comprobante de pago de nómina – Agosto.
Anexo 6. Cuadro de control de pagos de seguridad social del personal contratado.
Anexo 7. Registro de charlas y capacitaciones.
Anexo 8. Inducciones y notificación de riesgos.
Anexo 9. Exámenes médicos de ingreso, reingreso y retiro.
Anexo 10. Certificado de accidentalidad - ARL
Anexo 11. Formato de ATS.
Anexo 12. Ficha técnica y certificado del arnés.
Anexo 13. Formatos preoperacionales a máquinas y/o herramientas.
Anexo 14. Inspecciones de seguridad.
Anexo 15. Entrega de elementos de protección personal y dotación.
Anexo 16. Certificados de limpieza de unidades sanitarias.
Anexo 17. Comprobante de ingreso de RCD a escombrera.
Anexo 18. Constancia de convenio uso de los recursos.
Anexo 19. Inspecciones de elementos de emergencia.
Anexo 20. Acta No3. Comité de Tráfico.

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander · Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 14/sep/2023 HORA INICIO: 9:00Am ACTA N°: _____

LUGAR: Cra 20c # 1n-30 HORA FIN: _____

1. TEMAS A TRATAR

- Suministro de luz y agua

2. AVANCES Y ACUERDOS

La profesional social del contratista y el profesional HSEQ se reunen con el propietario de la vivienda ubicada en la cra 20c #1n-30, el Señor victor manuel calorera I.D. C.C. 91249626, con el fin de llegar a un acuerdo para el Suministro de luz y agua, dicho acuerdo con el propietario se determina que al finalizar la obra se llegara a un acuerdo de pago de acuerdo a los deuda de los Recibos.

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2



3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Andrea Arala	Profesional Social	
Bernardo Suarez	HSEQ	
Victor Cabrera	Propietario	

Powered by CamScanner

ACTA REUNION SERVICIOS PUBLICOS





Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 19/sep/2023 HORA INICIO: 10:00AM ACTA N°: _____

LUGAR: cra 20c # 1n-30 HORA FIN: _____

1. TEMAS A TRATAR

- Arriendo Campamento de obra


2. AVANCES Y ACUERDOS

el dia 19 de septiembre se reunen la profesional social del contratista Andrea Ayala y el propietario de la vivienda el Señor victor manuel cabrera. I.D. C.C. 91249626, con el fin de llegar a un acuerdo de servicio de arriendo de bodega y alquiler de baño por el valor de $300000 desde el dia 13 de Septiembre.

Se le hace entrega del dinero y se firma el acta

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2

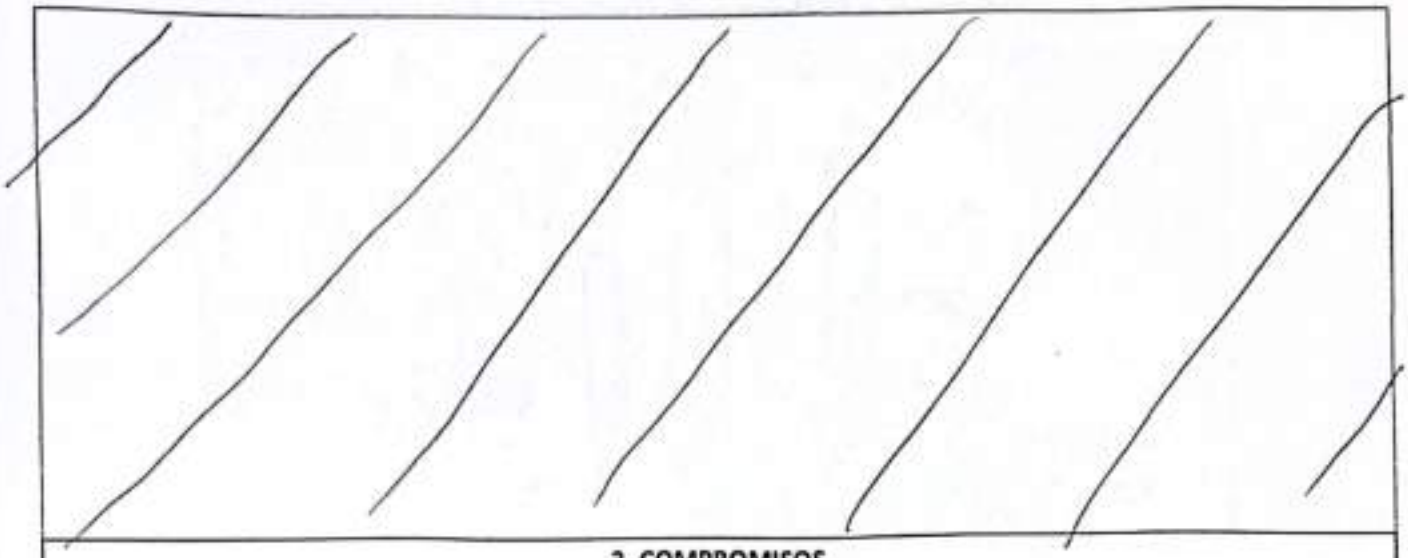

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
• Mantener el baño aseado	propietario	septiembre
• Mantener orden baño	- HSEQ +mano de obra no calificad	Septiembre
• Pago mesual del arriendo y pago de servicio de baño	Profesional social contratista	septiembre - octubre

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Bernardo Suarez	HSEQ	Bernardo Suárez
Andrea Ayala	Profesional Social	
Victor Cabrera	propietario	

Powered by CamScanner

ACTA REUNION SERVICIOS PUBLICOS



Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 26/sep/2023 HORA INICIO: 9:00Am ACTA N°: _____

LUGAR: Bodega Alboria HORA FIN: 9:30Am

1. TEMAS A TRATAR


- Servicio de alquiler bodega barrio albania
- Servicio de luz

2. AVANCES Y ACUERDOS

Siendo las 9:00Am de la mañana se reunieron los profesionales HSEQ y Profesional social para realizar el pago y Recibir de parte de la señora mireya el sitio que sera utilizado como campamento de obra. Dicho pago se realiza por medio de una consignación por nequi:

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2

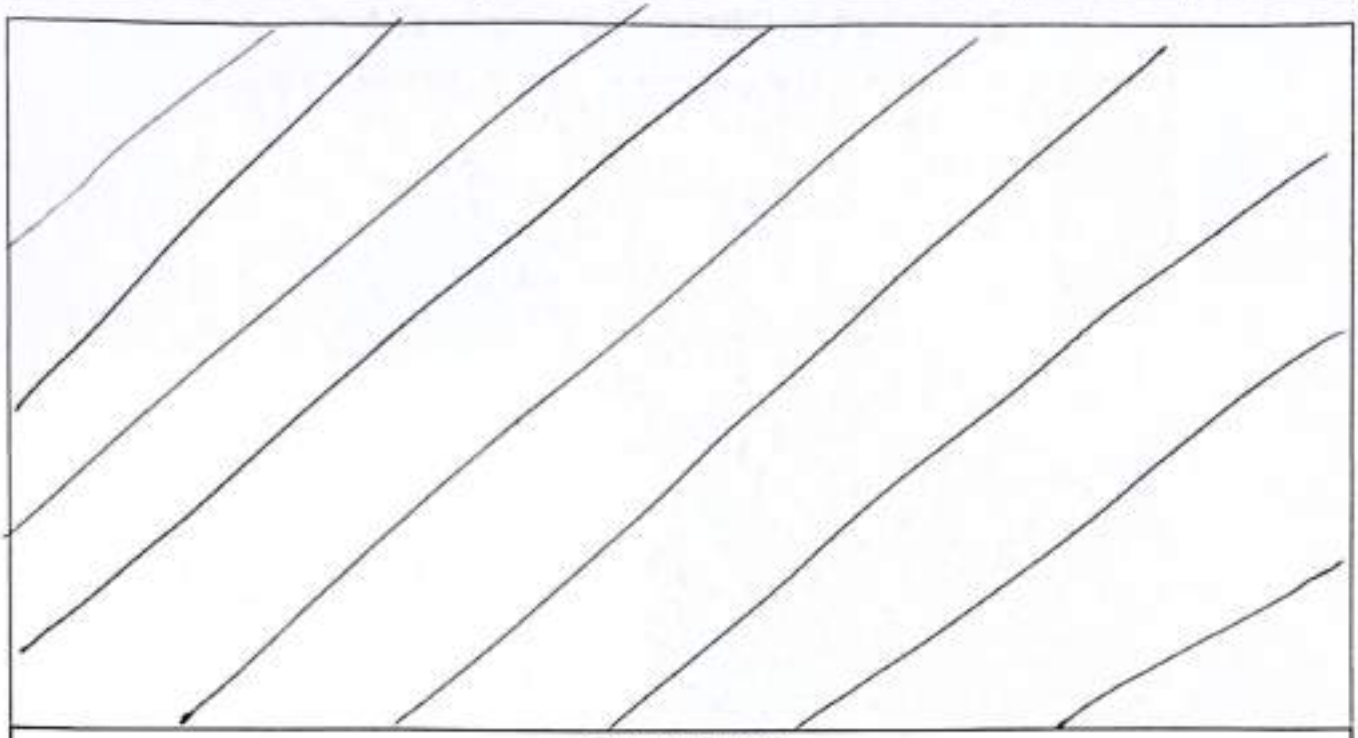

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Andrea Ayala	Profesional Social	
Irene Tarazona	Propietaria	Irene Tarazona.
Bernardo Suarez	HSEQ	

Powered by CamScanner

ACTA REUNION SERVICIOS PUBLICOS





Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 27/Sep/2023 HORA INICIO: 9:00AM ACTA N°: _____

LUGAR: Parqueadero el Poxal HORA FIN: 9:30AM

1. TEMAS A TRATAR

- Servicio de bodega
- Servicio de baño (incluye aseo)
- Servicio de luz y agua


2. AVANCES Y ACUERDOS

Siendo las 9:00AM se reunen el profesional social y profesional HSEQ con el propietario del parqueadero el Señor Reinaldo Leiton c.c. 13.543.309 se negocia la prestación de servicios publicos, alquiler de baño (con pago de aseo) y bodega para acopio de materiales.

Alquiler bodega: $300.000 (26 Sep) ya se pago
Alquiler baño: $150.000 Incluye aseo
Servicios de luz y agua: $150.000.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2

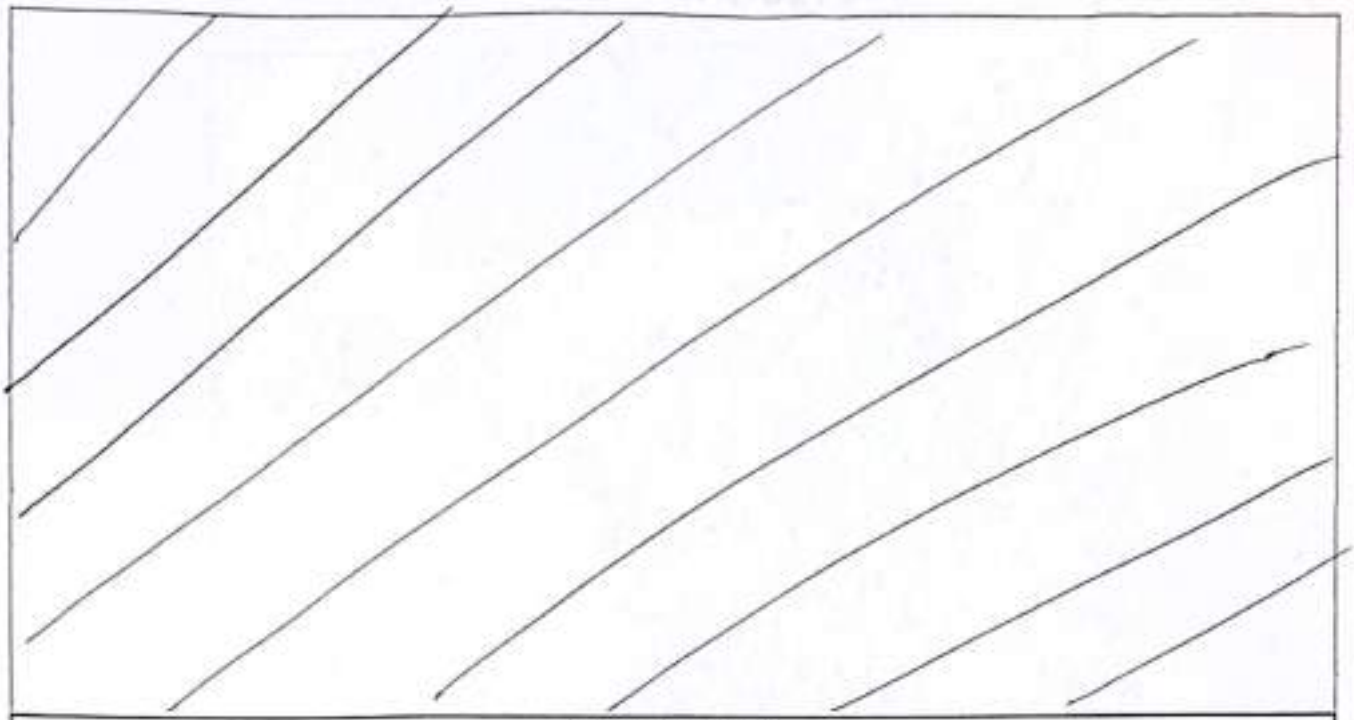

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Ronaldo Lautan	Ingeniero	
Nidia Atala	Profesional Social	
Bernardo Sierra C.	HSEQ	

Powered by CamScanner

ACTA REUNION SERVICIOS PUBLICOS





Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 28/Sep/2023 HORA INICIO: 1:30pm ACTA N°: 1

LUGAR: Salón Social HORA FIN:

1. TEMAS A TRATAR

- Servicio de bodega
- Servicio de luz y agua
- Servicio de baño


2. AVANCES Y ACUERDOS

El dia 28 de Septiembre se Reunen los Profesionales HSEQ y Social con el presidente de Junta el Señor Manuel Melendez Identificado con numero de cedula 91.278224 para el suministro de los servicios de luz y agua, arriendo de bodega, servicio de baño y aseo

-Bodega: $350.000
- Servicio de baño con aseo $700.000
- Servicio de luz y agua de acuerdo a desvio

Nequi: 3042715992

Powered by CamScanner

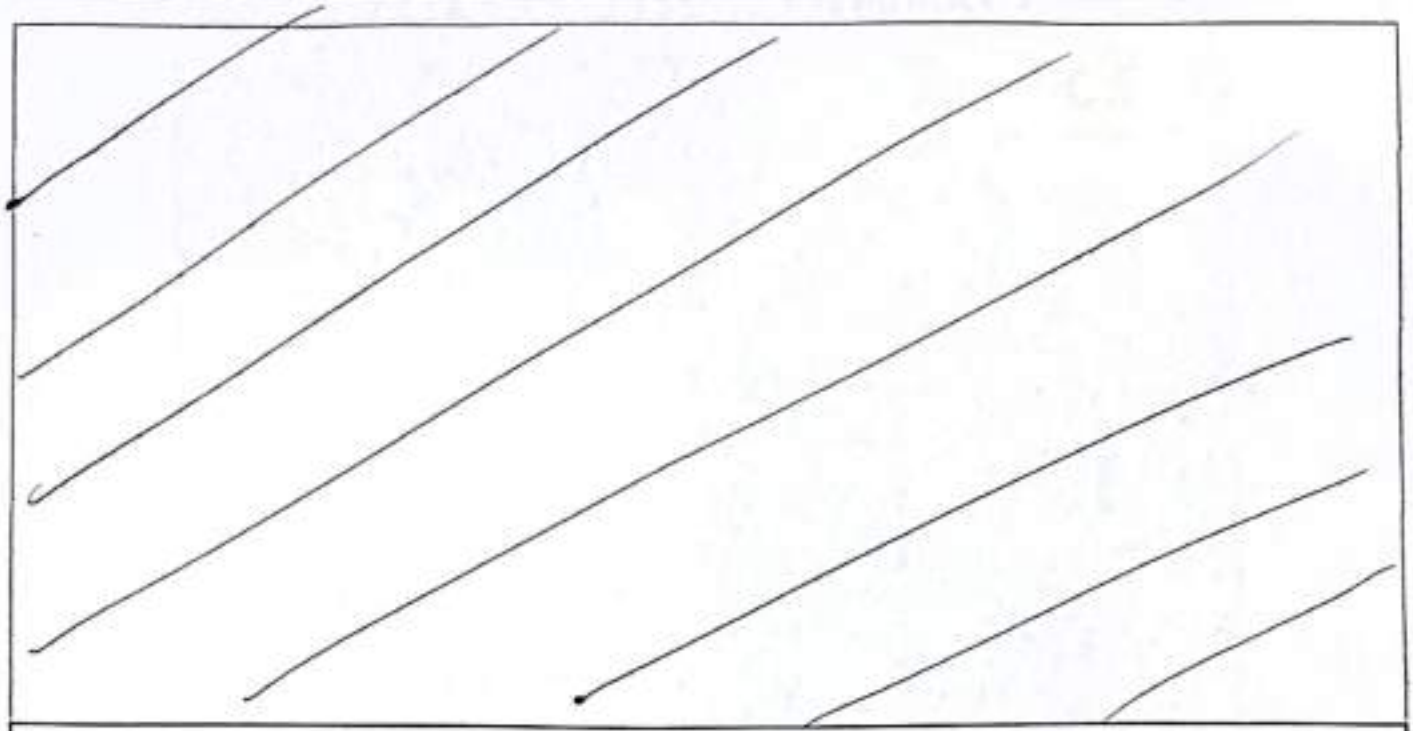

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Andrea Arala	Practicant Social	
Bernardo Suarez	HSEQ	
Manuel Melendez	Presidente de Junta	

Powered by CamScanner

ACTA REUNION SERVICIOS PUBLICOS





Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 29/ Sep / 2023 HORA INICIO: 10:00 AM ACTA N°: 3

LUGAR: Cra 51 # 27-31 HORA FIN: 10:30 AM

1. TEMAS A TRATAR


- Servicio de luz

2. AVANCES Y ACUERDOS

Siendo las 10 AM de la mañana se reune la profesional Social y el HSEQ contratista con el fin de solicitar amablemente el Suministro de luz en el predio cra 51 n 27-31 en el cual la señora Nilere Tarazona da una respuesta positiva, se llega a un acuerdo de pago entre los dias que se utilice este Servicio, pagando el desfase al finalizar la ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2

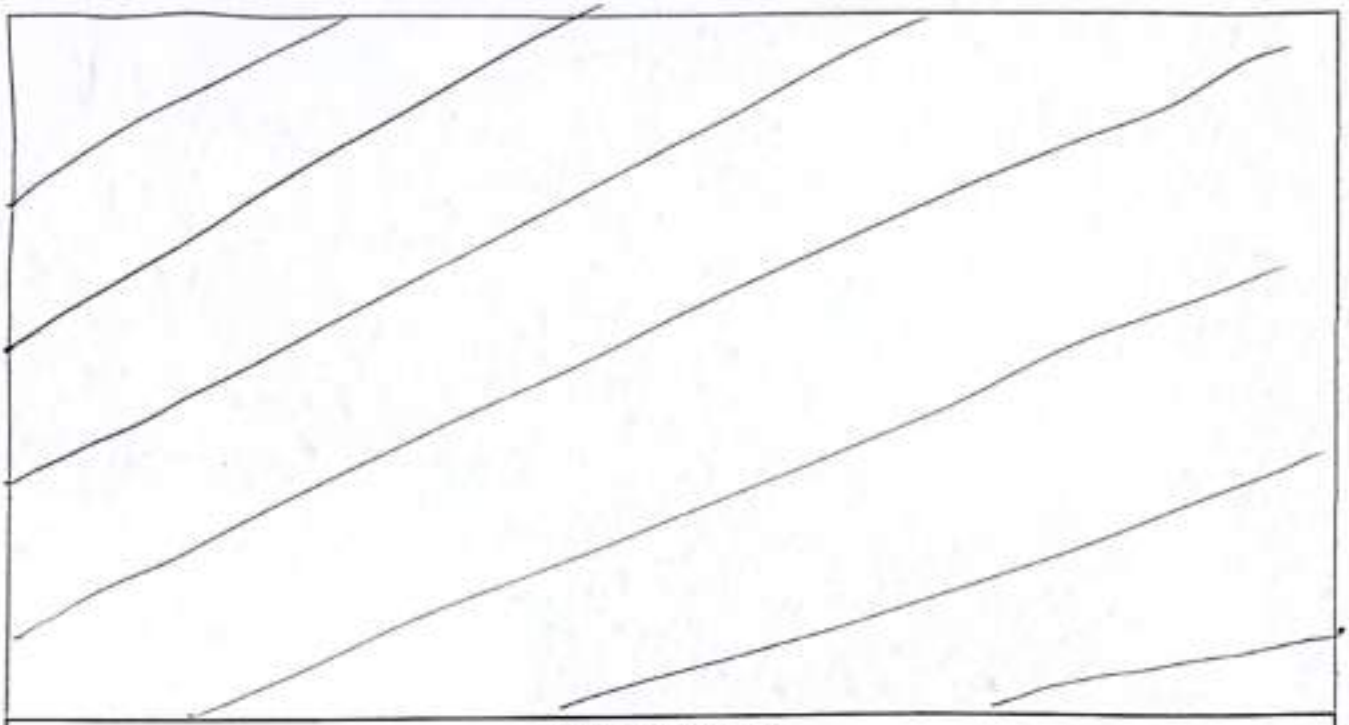

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Irene tarazona	Propietaria	Irene Tarazona
Andrea Ayala	Profesional Social	
Bernardo Suarez	HSEQ	Bernardo Sám. Suárez

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 29/Sep/2023 HORA INICIO: 7:00Am ACTA N°: 2

LUGAR: Calle 4 #16-24 HORA FIN: 7:30Am

1. TEMAS A TRATAR

- Suministro Servicios de luz y agua

2. AVANCES Y ACUERDOS

Siendo las 7:00Am se Reunen la profesional Social y el profesional HSEQ con el señor wilmer tarazona Caicedo en el barrio Chapinero con el fin de llegar a un acuerdo para el suministro de luz y agua, dicho acuerdo con el propietario se determina que al finalizar la obra se llegara a un acuerdo de pago.

Powered by CamScanner

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Wilmer Tares	propietario	
Andrea Ayala S.	Profesional Social	
Bernado Suarez	HSEQ	

Powered by CamScanner

ACTA REUNION SERVICIOS PUBLICOS





Powered by CamScanner

CS Consorcio Santander	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS	Código	CS-FO-HSEQ-006
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será únicamente para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se realizará previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

FECHA	14/09/2023
ACTIVIDAD	Obra & administrativo
CARGO	Director obra

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS Virus	X	BIOMECÁNICOS	X
FÍSICOS Ruido	X	DE SEGURIDAD: MECANICOS	X
FÍSICOS temp ext.	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
QUÍMICOS Vapores	X	DE SEG. LOCATIVO	X
QUÍMICOS Mat. part.	X	DE SEG. TECNOLÓGICO	X
PSICOSOCIAL	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
FENÓMENOS NATURALES Sismo	X	DE SEG. PÚBLICO	X
FEN. NAT.		DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	
FEN. NAT.		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Juan Carlos Jaimes N.	91249578	

CS Consorcio Santander	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS	Código	CS-FO-HSEQ-006
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será únicamente para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se realizará previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

FECHA	20/09/2023
ACTIVIDAD	Obra
CARGO	Ayudante

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS: virus	X	BIOMECÁNICOS	X
FÍSICOS: ruido	X	DE SEGURIDAD: MECANICOS	X
FÍSICOS: temp. ext.	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
QUÍMICOS: vapores	X	DE SEG. LOCATIVO	X
QUÍMICOS: mat. part.	X	DE SEG. TECNOLÓGICO	X
PSICOSOCIAL	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
FENÓMENOS NATURALES: Sismo	X	DE SEG. PÚBLICO	X
FEN. NAT.		DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	
FEN. NAT.		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Jhon Jaime Galviz	91449 914	

CS Consorcio Santander	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS	Código	CS-FO-HSEQ-006
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será únicamente para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se realizará previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

FECHA	20/09/2023
ACTIVIDAD	Obra
CARGO	Inspector de obra

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS Virus	X	BIOMECÁNICOS	X
FÍSICOS ruido	X	DE SEGURIDAD: MECANICOS	X
FÍSICOS temp ext.	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
QUÍMICOS vapores	X	DE SEG. LOCATIVO	X
QUÍMICOS mat. pet.	X	DE SEG. TECNOLÓGICO	X
PSICOSOCIAL	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
FENÓMENOS NATURALES Sismo	X	DE SEG. PÚBLICO	X
FEN. NAT.		DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	
FEN. NAT.		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Oscar Mauricio Blanco Bayona	1.007.193.091	

CS Consorcio Santander	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS	Código	CS-FO-HSEQ-006
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será únicamente para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se realizara previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

FECHA	22/09/2023
ACTIVIDAD	Obra
CARGO	Oficial & Ayudante

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS: virus	X	BIOMECÁNICOS	X
FÍSICOS: ruido	X	DE SEGURIDAD: MECANICOS	X
FÍSICOS: temp. ext.	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
QUÍMICOS: vapores	X	DE SEG. LOCATIVO	X
QUÍMICOS: mat. part.	X	DE SEG. TECNOLÓGICO	X
PSICOSOCIAL	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
FENÓMENOS NATURALES: Sismo	X	DE SEG. PÚBLICO	X
FEN. NAT.: —		DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	
FEN. NAT.: —		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
JONATHAN PEREZ	1102378834	JONATHAN PEREZ
Ronal Anderson Motta	91515736	Ronal Motta

CS Consorcio Santander	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS	Código	CS-FO-HSEQ-006
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será únicamente para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se realizará previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

FECHA	28/09/2023
ACTIVIDAD	Oficial
CARGO	Ayudante & oficial.

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS virus	X	BIOMECÁNICOS	X
FÍSICOS ruido	X	DE SEGURIDAD: MECANICOS	X
FÍSICOS temp ext.	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
QUÍMICOS vapores	X	DE SEG. LOCATIVO	X
QUÍMICOS mat. part.	X	DE SEG. TECNOLÓGICO	X
PSICOSOCIAL	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
FENÓMENOS NATURALES sismo	X	DE SEG. PÚBLICO	X
FEN. NAT.		DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	
FEN. NAT.		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Cesar Rodriguez	1098697529	
Andres Cedeño	1098748507	
Jose Luis Sierra	13860582	
Cristian Tellez	91535019	
Edwin. Rodriguez	1.098 633343	

CS Consorcio Santander	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS	Código	CS-FO-HSEQ-006
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será únicamente para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se realizará previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

FECHA	28/09/2023
ACTIVIDAD	Obra
CARGO	Controladora de tráfico

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS Virus	X	BIOMECÁNICOS	X
FÍSICOS Ruido	X	DE SEGURIDAD: MECANICOS	X
FÍSICOS temp. ext.	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
QUÍMICOS vapores	X	DE SEG. LOCATIVO	X
QUÍMICOS mat. part.	X	DE SEG. TECNOLÓGICO	X
PSICOSOCIAL	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
FENÓMENOS NATURALES sismo	X	DE SEG. PÚBLICO	X
FEN. NAT.		DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	
FEN. NAT.		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
FIOR NORAYMA QUINTERO O.	1098632250	NORAYMA QUINTERO O.
Maid Eugenia Manrique R	37511566	

CS Consorcio Santander	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS	Código	CS-FO-HSEQ-006
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será únicamente para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se realizará previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

FECHA	28/09/2023
ACTIVIDAD	Obra
CARGO	Oficial & Ayudante

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS: virus	X	BIOMECÁNICOS	X
FÍSICOS: ruido	X	DE SEGURIDAD: MECANICOS	X
FÍSICOS: temp. ext.	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
QUÍMICOS: vapores	X	DE SEG. LOCATIVO	X
QUÍMICOS: met. part.	X	DE SEG. TECNOLÓGICO	X
PSICOSOCIAL	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
FENÓMENOS NATURALES: sismo	X	DE SEG. PÚBLICO	X
FEN. NAT.:		DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	
FEN. NAT.:		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Anderson Chaparro Sanchez Rpe	1095924401	Anderson Sanchez
Jose Luis Mancilla Guerrero	1097490744	Jose Luis
Edwin orlando Rodriguez Guerrero	1005757888	
Jose Giovanny Montero R	1159717	
Wilson Rivero	3784375	

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 14 - Sept. de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - X a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - X b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - X d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - X e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - X a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - X b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - X c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - X d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - X a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - X a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - X b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 20 Sept. de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - X CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - X CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - X TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - X A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - X CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - X CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - X COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - X ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - X RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 4.6

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 20/Sept. de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 22/Sept. de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - X CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - X CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - X TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - X A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - X CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - X REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - X CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - X CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - X COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - X ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - X RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

JONATHAN PEREZ

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 22/Sept de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

Ronal Mota

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 28/Sept de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 28/Sept de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 28/Sept de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

Cristina Téllez

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 28/Sept. de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

Edwin Rodriguez.

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 28/Sept de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   a. CONSTRUCCIÓN
   b. EDIFICACIÓN
   c. REMODELACIÓN
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   a. ADECUACIÓN
   b. CONSTRUCCIÓN
   c. DEMOLICIÓN
   d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   a. NO FUMAR
   b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   d. A y C
   e. A y B
   f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   a. COPAST – COCOLA
   b. COCOLA – CONVIVE
   c. SST – COPAST
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   a. ARL – EPS – CCF - AFP
   b. ARP – EPS – CTV - AFP
   c. ARL – CCF - AFP
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 4.4

Flor Norayma Quintero Orozco

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 28/Sept. de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 4.6

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 28/Sept. de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

Anderson Sanchez

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 28/Sept de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

Jose Luis Mercada
FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 28/Sept de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 28/Sept de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   a. CONSTRUCCIÓN
   b. EDIFICACIÓN
   c. REMODELACIÓN
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   a. ADECUACIÓN
   b. CONSTRUCCIÓN
   c. DEMOLICIÓN
   d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   a. NO FUMAR
   b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   d. A y C
   e. A y B
   f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   a. COPAST – COCOLA
   b. COCOLA – CONVIVE
   c. SST – COPAST
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   a. ARL – EPS – CCF - AFP
   b. ARP – EPS – CTV - AFP
   c. ARL – CCF - AFP
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

José Giovanny Mendoza
FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, _____ de 202__

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 3.8

Wilson Rivero

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: San Alonso Cll 20

Semana: Del 28 al 02 Septiembre

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 A.M. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 P.M.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jaime Muñoz 1091135202	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Electricos	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticos		
Hidráulicos		
Mecánicos		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaodios de copa
¿Cuantos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vobradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda lo siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: San Alonso cll 20

Semana: Del 4 al 9 Sept.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 A.M. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 P.M.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jaime Muñoz 1091135202	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Electricos	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticos		
Hidráulicos		
Mecánicos		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaodios de copa
¿Cuantos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vobradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Asesore con el supervisor encargado el paso a paso, revises controles y responda la siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: San Alonso Cll 20

Semana: Del 11 al 16 Sept.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 A.M. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 P.M.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jaime Muñoz 1091135202	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Electricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaodios de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vobradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda lo siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	18/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: San Alonso Cll 20

Semana: Del 18 al 23 Sept.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 A.M. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 P.M.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jaime Muñoz 1091135202	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar:
Manuales		
Electricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumaticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaodios de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vobradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: San Alonso Cll 20

Semana: Del 25 al 30 Sept.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 A.M. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 P.M.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jaime Muñoz 1091135202	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaodios de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vobradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Chapinero

Semana: Del 28 al 2 Sept.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 A.M. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 P.M.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Ricardo Hernandez 1095800277	R.H.A.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricos	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticos		
Hidráulicos		
Mecánicos		
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaodios de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vobradora
¿Existen bayos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revises controles y responda lo siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Chapinero

Semana: Del 4 al 9 Sept.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 A.M. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 P.M.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Ricardo Hernandez 1095800877	R.H.A.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		
Electricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaodios de copa
¿Cuantos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vobradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros asociados y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Chapinero

Semana: Del 11 al 16 Sept.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 A.M. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 P.M.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Ricardo Hernandez 1095800077	R.H.A.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaodios de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vobradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y se procede con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revises controles y responda la siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Chapinero

Semana: Del 18 al 23 Sept.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 A.M. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 P.M.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Ricardo Herrenda 1098800277	R.H.A.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Electricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaodios de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vobradora
¿Existen huyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, procede con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Enlace)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Chepinero

Semana: Del 25 al 30

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 A.M. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 P.M.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con nana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Ricardo Herranda 1095800277	R.H.A.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricos	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicos		
Mecánicos		
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaodios de copa
¿Cuantos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vobradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Joventud.

Semana: Del 11 al 16 Sept.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 A.M. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 P.M.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Deiner Naranjo. 1047341782	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaodios de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vobradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbalatica, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda lo siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Juventud

Semana: Del 18 al 23 Sept.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 A.M. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 P.M.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Daiver Naranjo 1047341782	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaodios de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vobradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros asociados y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revises controles y responda la siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Juventud

Semana: Del 25 al 30 Sept.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 A.M. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 P.M.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Daiver Naranjo 1047341782	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaodios de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vobradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispes, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Rosal

Semana: Del 25 al 30 Sept.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 A.M. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 P.M.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jose Luis Sierra 1366582	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaodios de copa
¿Cuantos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vobradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Nhora

Semana: Del 25 al 30 Sept.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 A.M. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 P.M.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jose Segura 1007712253	Jose Segura

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Electricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumaticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaodios de copa
¿Cuantos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vobradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Independencia

Semana: Del 25 al 30 Sept.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 A.M. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 P.M.

Descripción de la tarea a realizar:

- **Corte con pulidora**
- **Demolición con taladro**
- **Compactación con rana**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO. CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Anderson Sanchez 1095924401	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaodios de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vobradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Cual otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revises controles y responda la siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, procede con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE ORDEN Y ASEO	Código	CS-FO-HSEQ-018
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha de realización de la inspección	28/09/2023
Lugar de la inspección:	San Alonso Calle 20

* **SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE **PARCIAL:** CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.	X				
Las materias primas están bien apiladas y en forma ordenada.	X				
Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.	X				
Los sitios para el almacenamiento de basura están ordenados.	X				
Se cuenta con canecas para depositar la basura.	X				
Los extintores están señalizados, demarcados, de fácil acceso y vigentes.	X				
La iluminación, ventilación general del área de trabajo es suficiente.	X				
Existe señalización informativa, preventiva visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	X				
Los recipientes donde se deposita la basura son adecuados en tamaño y número.	X				
Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.	X				
Los baños están debidamente dotados y está en condiciones de uso.	X				
Las herramientas y equipos están debidamente protegidos.	X				
Se cuenta con un espacio especifico para el almacenamiento de herramientas y equipos. Este espacio de almacenamiento está señalizado y demarcado.	X				
El personal utiliza los EPP (Elementos de Protección Personal) y están en buen estado.	X				
Se cuenta con un espacio para guardar la ropa y Elementos de Protección Personal.	X				
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	X				
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	X				
El personal recibio capacitación en manejo de sustancias quimicas?	X				
Se cuenta con buen suministro de energía.	X				
Se cuenta con buen suministro de agua.	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar registrelas a continuación					

Existe Afectación en la productividad

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "***INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES***" PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE: Bernardo Suárez Carreño	FIRMA: Bernardo Suárez Carreño
CARGO: HSEQ	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE ORDEN Y ASEO	Código	CS-FO-HSEQ-018
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha de realización de la inspección	28/09/2023
Lugar de la inspección:	Chepinero

* **SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE **PARCIAL:** CUMPLE EN PARTE. (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.	X				
Las materias primas están bien apiladas y en forma ordenada.	X				
Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.	X				
Los sitios para el almacenamiento de basura están ordenados.	X				
Se cuenta con canecas para depositar la basura.	X				
Los extintores están señalizados, demarcados, de fácil acceso y vigentes.	X				
La iluminación, ventilación general del área de trabajo es suficiente.	X				
Existe señalización informativa, preventiva visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	X				
Los recipientes donde se deposita la basura son adecuados en tamaño y número.	X				
Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.	X				
Los baños están debidamente dotados y está en condiciones de uso.	X				
Las herramientas y equipos están debidamente protegidos.	X				
Se cuenta con un espacio especifico para el almacenamiento de herramientas y equipos. Este espacio de almacenamiento esta señalizado y demarcado.	X				
El personal utiliza los EPP (Elementos de Protección Personal) y están en buen estado.	X				
Se cuenta con un espacio para guardar la ropa y Elementos de Protección Personal.	X				
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	X				
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	X				
El personal recibio capacitación en manejo de sustancias químicas?	X				
Se cuenta con buen suministro de energía.	X				
Se cuenta con buen suministro de agua.	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar registrelas a continuación					

Existe Afectación en la productividad

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "***INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES***" PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE: Bernardo Suárez Carreño	FIRMA:
CARGO: HSEQ	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE ORDEN Y ASEO	Código	CS-FO-HSEQ-018
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha de realización de la inspección	28/09/2023
Lugar de la inspección:	Juventud

*** SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE **PARCIAL:** CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.	X				
Las materias primas están bien apiadas y en forma ordenada.	X				
Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.	X				
Los sitios para el almacenamiento de basura están ordenados.	X				
Se cuenta con canecas para depositar la basura.	X				
Los extintores están señalizados, demarcados, de fácil acceso y vigentes.	X				
La iluminación, ventilación general del área de trabajo es suficiente.	X				
Existe señalización informativa, preventiva visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	X				
Los recipientes donde se deposita la basura son adecuados en tamaño y número.	X				
Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.	X				
Los baños están debidamente dotados y está en condiciones de uso.	X				
Las herramientas y equipos están debidamente protegidos.	X				
Se cuenta con un espacio especifico para el almacenamiento de herramientas y equipos. Este espacio de almacenamiento está señalizado y demarcado.	X				
El personal utiliza los EPP (Elementos de Protección Personal) y están en buen estado.	X				
Se cuenta con un espacio para guardar la ropa y Elementos de Protección Personal.	X				
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	X				
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	X				
El personal recibio capacitación en manejo de sustancias químicas?	X				
Se cuenta con buen suministro de energía	X				
Se cuenta con buen suministro de agua	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar registrelas a continuación					

Existe Afectación en la productividad

NOTA: LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO ***"INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES"*** PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE: Bernardo Suárez Carreño	FIRMA:
CARGO: HSEQ	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE ORDEN Y ASEO	Código	CS-FO-HSEQ-018
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha de realización de la inspección	28/09/2023
Lugar de la inspección:	Resal

* **SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE **PARCIAL:** CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.	X				
Las materias primas están bien apiladas y en forma ordenada.	X				
Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.	X				
Los sitios para el almacenamiento de basura están ordenados.	X				
Se cuenta con canecas para depositar la basura.	X				
Los extintores están señalizados, demarcados, de fácil acceso y vigentes.	X				
La iluminación, ventilación general del área de trabajo es suficiente.	X				
Existe señalización informativa, preventiva visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	X				
Los recipientes donde se deposita la basura son adecuados en tamaño y número.	X				
Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.	X				
Los baños están debidamente dotados y está en condiciones de uso.	X				
Las herramientas y equipos están debidamente protegidos.	X				
Se cuenta con un espacio específico para el almacenamiento de herramientas y equipos. Este espacio de almacenamiento está señalizado y demarcado.	X				
El personal utiliza los EPP (Elementos de Protección Personal) y están en buen estado.	X				
Se cuenta con un espacio para guardar la ropa y Elementos de Protección Personal.	X				
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	X				
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	X				
El personal recibio capacitación en manejo de sustancias químicas?	X				
Se cuenta con buen suministro de energía.	X				
Se cuenta con buen suministro de agua.	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar registrelas a continuación					

Existe Afectación en la productividad

NOTA: LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO ***"INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES"*** PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE: Bernardo Suárez Carreño	FIRMA: Bernardo Suárez Carreño
CARGO: HSEQ	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE ORDEN Y ASEO	Código	CS-FO-HSEQ-018
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha de realización de la inspección	28/09/2023
Lugar de la inspección:	Albania

* **SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE **PARCIAL:** CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.	X				
Las materias primas están bien apiladas y en forma ordenada.	X				
Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.	X				
Los sitios para el almacenamiento de basura están ordenados.	X				
Se cuenta con canecas para depositar la basura.	X				
Los extintores están señalizados, demarcados, de fácil acceso y vigentes.	X				
La iluminación, ventilación general del área de trabajo es suficiente.	X				
Existe señalización informativa, preventiva visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	X				
Los recipientes donde se deposita la basura son adecuados en tamaño y número.	X				
Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.	X				
Los baños están debidamente dotados y está en condiciones de uso.	X				
Las herramientas y equipos están debidamente protegidos.	X				
Se cuenta con un espacio especifico para el almacenamiento de herramientas y equipos Este espacio de almacenamiento está señalizado y demarcado.	X				
El personal utiliza los EPP (Elementos de Protección Personal) y están en buen estado.	X				
Se cuenta con un espacio para guardar la ropa y Elementos de Protección Personal.	X				
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	X				
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	X				
El personal recibio capacitación en manejo de sustancias químicas?	X				
Se cuenta con buen suministro de energía.	X				
Se cuenta con buen suministro de agua.	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar registrelas a continuación					

Existe Afectación en la productividad

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO ***"INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES"*** PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE: Bernardo Suárez Carreño	FIRMA:
CARGO: HSEQ	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE ORDEN Y ASEO	Código	CS-FO-HSEQ-018
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha de realización de la inspección	28/09/2023
Lugar de la inspección:	Independencia.

*** SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE **PARCIAL:** CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.	X				
Las materias primas están bien apiladas y en forma ordenada.	X				
Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.	X				
Los sitios para el almacenamiento de basura están ordenados.	X				
Se cuenta con canecas para depositar la basura.	X				
Los extintores están señalizados, demarcados, de fácil acceso y vigentes.	X				
La iluminación, ventilación general del área de trabajo es suficiente.	X				
Existe señalización informativa, preventiva visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	X				
Los recipientes donde se deposita la basura son adecuados en tamaño y número.	X				
Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.	X				
Los baños están debidamente dotados y está en condiciones de uso.	X				
Las herramientas y equipos están debidamente protegidos.	X				
Se cuenta con un espacio especifico para el almacenamiento de herramientas y equipos. Este espacio de almacenamiento está señalizado y demarcado.	X				
El personal utiliza los EPP (Elementos de Protección Personal) y están en buen estado.	X				
Se cuenta con un espacio para guardar la ropa y Elementos de Protección Personal.	X				
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	X				
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	X				
El personal recibio capacitación en manejo de sustancias quimicas?	X				
Se cuenta con buen suministro de energía	X				
Se cuenta con buen suministro de agua	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar registrelas a continuación					

Existe Afectación en la productividad

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO ***"INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES"*** PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE: Bernardo Suárez Carreño	FIRMA: Bernardo Suárez Carreño
CARGO: HSEQ	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

Inspección realizada por: Bernardo Sierra Gamero	Nombre responsable frente: Amary Mendoza
Fecha de inspección: 28/09/2023	Frente: San Alonso Cll 20

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	PELIGROS FÍSICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado	X			
1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrios esta en buen estado.		X		
1.4	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.5	El área esta expuesta a ruido	X			
1.6	El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frio)	X			
1.7	La unidad esta expuesta a vibración cuerpo entero, segmentaria	X			
2	PELIGROS QUÍMICO				
2.1	La unidad está expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado	X			
2.2	El área cuenta con las tarjetas de emergencia impresas a color	X			
2.3	El área cuenta con las Hojas de seguridad MSDS impresas a color	X			
2.4	Las sustancias químicas se encuentren debidamente etiquetadas	X			
2.5	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
2.6	Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas	X			
3	PELIGROS BIOLÓGICOS				
3.1	En el área de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, ricketsias, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos	X			
3.2	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
3.3	Se encuentra identificada la ruta sanitaria de disposición de residuos	X			
3.4	El cuarto de residuos se encuentra debidamente señalizado		X		
4	PELIGROS BIOMECÁNICOS				
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	X			
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	X			
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	X			
4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, forzada y anti gravitacional)	X			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD				
5	PELIGRO MECÁNICO				
5.1	Equipos y herramientas en buen estado	X			
5.2	Se esta expuesto a materiales proyectados, sólidos y fluidos	X			
5.3	Archivo rodante en buen estado		X		
5.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados		X		
5.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes		X		
6	PELIGROS ELÉCTRICOS				
6.1	Cables eléctricos en buen estado y debidamente entubados. (sin adiciones y cintas)	X			
6.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado.	X			
6.3	Tomas e interruptores en buen estado, debidamente anclados y señalizados	X			
6.4	Se observa cajas de breakers sin sobrecarga y señalizadas		X		
6.5	Los tableros y cajas de breakers están libres de obstáculos.		X		

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/09/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

7	PELIGROS LOCATIVOS				
7.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	✓			
7.2	Escaleras en buen estado (paso manos, cintas antideslizantes y fotoluminiscentes).		✓		
7.3	Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles		✓		
7.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas, sin vidrios fisturados).		✓		
7.5	Techos en buen estado (tejas sin fisuras o rotas, sin goteras).	✓			
7.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacén, etc.).	✓			
7.7	La sillas se encuentran en buen estado		✓		
7.8	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones. (anclados y ajustados)		✓		
8	PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES				
8.1	La unidad cuenta con plan de emergencia y contingencia	✓			
8.2	La Unidad cuenta con Planes Operativos Normalizados en caso Sismo, Terremoto, vendaval, Inundación, derrumbe y Precipitaciones (lluvias, granizadas,	✓			
8.3	La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos	✓			
8.4	Las salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas y señalizadas	✓			
8.5	La lista de teléfonos de emergencia publicada y socializada	✓			
8.6	La brigada se encuentra identificada	✓			
9	ORDEN Y ASEO				
9.1	Las áreas de la unidad se encuentra organizada.	✓			
9.2	La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos	✓			
9.3	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	✓			
9.4	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado		✓		
10	SANEAMIENTO BÁSICO				
10.1	La unidad cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable		✓		
10.2	La unidad cuenta con servicio sanitario en optimas condiciones	✓			
10.3	Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa	✓			
10.4	La unidad tiene control de vectores y podas en áreas verdes (si aplica)		✓		
10.5	Se han realizado lavado de tanques en los últimos seis meses		✓		
11	PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
11.1	Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	✓			
11.2	Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos.	✓			
11.3	Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	✓			
11.4	Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia	✓			
11.5	Los Servidores y contratistas conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	✓			
11.6	Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro	✓			
11.7	Los servidores y contratistas conocen a los brigadistas de la unidad	✓			

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

Inspección realizada por: Reinaldo Suárez Cabezón	Nombre responsable frente: Kevin Rodriguez
Fecha de inspección: 28/09/2023	Frente: Chapinero

LISTA DE CHEQUEO					
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	PELIGROS FÍSICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado	X			
1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrios esta en buen estado		X		
1.4	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.5	El área esta expuesta a ruido	X			
1.6	El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frío)	X			
1.7	La unidad esta expuesta a vibración cuerpo entero, segmentaria	X			
2	PELIGROS QUÍMICO				
2.1	La unidad está expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado	X			
2.2	El área cuenta con las tarjetas de emergencia impresas a color	X			
2.3	El área cuenta con las Hojas de seguridad MSDS impresas a color	X			
2.4	Las sustancias químicas se encuentran debidamente etiquetadas	X			
2.5	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
2.6	Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas	X			
3	PELIGROS BIOLÓGICOS				
3.1	En el área de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, ricketsias, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos	X			
3.2	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
3.3	Se encuentra identificada la ruta sanitaria de disposición de residuos	X			
3.4	El cuarto de residuos se encuentra debidamente señalizado		X		
4	PELIGROS BIOMECÁNICOS				
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	X			
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	X			
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	X			
4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, forzada y anti gravitacional)	X			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD				
5	PELIGRO MECÁNICO				
5.1	Equipos y herramientas en buen estado	X			
5.2	Se esta expuesto a materiales proyectados, sólidos y fluidos	X			
5.3	Archivo rodante en buen estado		X		
5.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados		X		
5.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes		X		
6	PELIGROS ELÉCTRICOS				
6.1	Cables eléctricos en buen estado y debidamente entubados. (sin adiciones y cintas)	X			
6.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado	X			
6.3	Tomas e interruptores en buen estado, debidamente anclados y señalizados	X			
6.4	Se observa cajas de breakers sin sobrecarga y señalizadas		X		
6.5	Los tableros y cajas de breakers están libres de obstáculos.		X		

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

7	PELIGROS LOCATIVOS				
7.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	X			
7.2	Escaleras en buen estado (pasa manos, cintas antideslizantes y fotoluminiscentes)		X		
7.3	Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles		X		
7.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas, sin vidrios fracturados).		X		
7.5	Techos en buen estado (tejas sin fisuras o rotas, sin goteras).	X			
7.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de tránsito en almacén, etc.).	X			
7.7	La sillas se encuentran en buen estado		X		
7.8	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones. (anclados y ajustados)		X		
8	PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES				
8.1	La unidad cuenta con plan de emergencia y contingencia	X			
8.2	La Unidad cuenta con Planes Operativos Normalizados en caso Sismo, Terremoto, vendaval, Inundación, derrumbe y Precipitaciones (lluvias, granizadas,	X			
8.3	La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos	X			
8.4	Las salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas y señalizadas	X			
8.5	La lista de teléfonos de emergencia publicada y socializada	X			
8.6	La brigada se encuentra identificada	X			
9	ORDEN Y ASEO				
9.1	Las áreas de la unidad se encuentra organizada.	X			
9.2	La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos	X			
9.3	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
9.4	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado		X		
10	SANEAMIENTO BÁSICO				
10.1	La unidad cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable		X		
10.2	La unidad cuenta con servicio sanitario en optimas condiciones	X			
10.3	Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	X			
10.4	La unidad tiene control de vectores y podas en áreas verdes (si aplica)		X		
10.5	Se han realizado lavado de tanques en los últimos seis meses		X		
11	PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
11.1	Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X			
11.2	Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
11.3	Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X			
11.4	Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia	X			
11.5	Los Servidores y contratistas conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			
11.6	Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro	X			
11.7	Los servidores y contratistas conocen a los brigadistas de la unidad	X			

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

Inspección realizada por: Bernardo Suárez C.	Nombre responsable frente: Omar Blanco
Fecha de inspección: 28/09/2023	Frente: Juventud

LISTA DE CHEQUEO					
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	PELIGROS FISICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	X			
1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrios esta en buen estado.		X		
1.4	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.5	El área esta expuesta a ruido	X			
1.6	El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frio)	X			
1.7	La unidad esta expuesta a vibración cuerpo entero, segmentaria	X			
2	PELIGROS QUÍMICO				
2.1	La unidad está expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado	X			
2.2	El área cuenta con las tarjetas de emergencia impresas a color	X			
2.3	El área cuenta con las Hojas de seguridad MSDS impresas a color	X			
2.4	Las sustancias químicas se encuentran debidamente etiquetadas	X			
2.5	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
2.6	Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas	X			
3	PELIGROS BIOLÓGICOS				
3.1	En el área de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos	X			
3.2	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
3.3	Se encuentra identificada la ruta sanitaria de disposición de residuos	X			
3.4	El cuarto de residuos se encuentra debidamente señalizado		✓		
4	PELIGROS BIOMECÁNICOS				
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	X			
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	X			
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	X			
4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, forzada y anti gravitacional)	X			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD				
5	PELIGRO MECÁNICO				
5.1	Equipos y herramientas en buen estado	✓			
5.2	Se esta expuesto a materiales proyectados, solidos y fluidos	X			
5.3	Archivo rodante en buen estado		X		
5.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados		X		
5.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes		X		
6	PELIGROS ELÉCTRICOS				
6.1	Cables eléctricos en buen estado y debidamente entubados. (sin adiciones y cintas)	X			
6.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado.	X			
6.3	Tomas e interruptores en buen estado, debidamente anclados y señalizados	X			
6.4	Se observa cajas de breakers sin sobrecarga y señalizadas		✓		
6.5	Los tableros y cajas de breakers están libres de obstáculos		X		

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

7	PELIGROS LOCATIVOS				
7.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	X			
7.2	Escaleras en buen estado (pasa manos, cintas antideslizantes y fotoluminiscentes).		X		
7.3	Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles		X		
7.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas, sin vidrios fracturados)		X		
7.5	Techos en buen estado (tejas sin fisuras o rotas, sin goteras)	X			
7.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacén, etc.).	X			
7.7	Las sillas se encuentran en buen estado		X		
7.8	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones. (anclados y ajustados)		X		
8	PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES				
8.1	La unidad cuenta con plan de emergencia y contingencia	X			
8.2	La Unidad cuenta con Planes Operativos Normalizados en caso Sismo, Terremoto, vendaval, Inundación, derrumba y Precipitaciones (lluvias, granizadas,	X			
8.3	La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos	X			
8.4	Las salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas y señalizadas	X			
8.5	La lista de teléfonos de emergencia publicada y socializada	X			
8.6	La brigada se encuentra identificada	X			
9	ORDEN Y ASEO				
9.1	Las áreas de la unidad se encuentra organizada	X			
9.2	La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos	X			
9.3	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
9.4	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado		X		
10	SANEAMIENTO BÁSICO				
10.1	La unidad cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable		X		
10.2	La unidad cuenta con servicio sanitario en optimas condiciones	X			
10.3	Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	X			
10.4	La unidad tiene control de vectores y podas en áreas verdes (si aplica)		X		
10.5	Se han realizado lavado de tanques en los últimos seis meses		X		
11	PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
11.1	Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X			
11.2	Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
11.3	Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral	X			
11.4	Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia	X			
11.5	Los Servidores y contratistas conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			
11.6	Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro	X			
11.7	Los servidores y contratistas conocen a los brigadistas de la unidad	X			

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 2

Inspección realizada por: Reinaldo Suárez Gonzalez	Nombre responsable frente: Omar Blanco
Fecha de inspección: 28/09/2023	Frente: Rasal

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	PELIGROS FÍSICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado	X			
1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrios esta en buen estado.		X		
1.4	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.5	El área esta expuesta a ruido	X			
1.6	El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frio)	X			
1.7	La unidad esta expuesta a vibración cuerpo entero, segmentaria	X			
2	PELIGROS QUÍMICO				
2.1	La unidad esta expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado	X			
2.2	El área cuenta con las tarjetas de emergencia impresas a color	X			
2.3	El área cuenta con las Hojas de seguridad MSDS impresas a color	X			
2.4	Las sustancias químicas se encuentran debidamente etiquetadas	X			
2.5	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP	X			
2.6	Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas	X			
3	PELIGROS BIOLÓGICOS				
3.1	En el área de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos	X			
3.2	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP	X			
3.3	Se encuentra identificada la ruta sanitaria de disposición de residuos	X			
3.4	El cuarto de residuos se encuentra debidamente señalizado		X		
4	PELIGROS BIOMECÁNICOS				
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	X			
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	X			
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	X			
4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, forzada y anti gravitacional)	X			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD				
5	PELIGRO MECANICO				
5.1	Equipos y herramientas en buen estado	X			
5.2	Se esta expuesto a materiales proyectados, solidos y fluidos	X			
5.3	Archivo rodante en buen estado		X		
5.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados		X		
5.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes		X		
6	PELIGROS ELÉCTRICOS				
6.1	Cables eléctricos en buen estado y debidamente entubados. (sin adiciones y cintas)	X			
6.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado	X			
6.3	Tomas e interruptores en buen estado, debidamente anclados y señalizados	X			
6.4	Se observa cajas de breakers sin sobrecarga y señalizadas		X		
6.5	Los tableros y cajas de breakers están libres de obstáculos.		X		

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

7	PELIGROS LOCATIVOS				
7.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	X			
7.2	Escaleras en buen estado (paso manos, cintas antideslizantes y fotoluminiscentes).		X		
7.3	Piso en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles		X		
7.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas, sin vidrios fracturados)		X		
7.5	Techos en buen estado (tejas sin fisuras o rotas, sin goteras)	X			
7.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de tránsito sin almacén, etc.).	X			
7.7	La sillas se encuentran en buen estado		X		
7.8	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones, (anclados y ajustados)		X		
8	PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES				
8.1	La unidad cuenta con plan de emergencia y contingencia	X			
8.2	La Unidad cuenta con Planes Operativos Normalizados en caso Sismo, Terremoto, vendaval, Inundación, derrumbe y Precipitaciones (lluvias, granizadas,	X			
8.3	La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos	X			
8.4	Las salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas y señalizadas	X			
8.5	La lista de teléfonos de emergencia publicada y socializada	X			
8.6	La brigada se encuentra identificada	X			
9	ORDEN Y ASEO				
9.1	Las áreas de la unidad se encuentra organizada	X			
9.2	La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos	X			
9.3	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
9.4	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado		X		
10	SANEAMIENTO BÁSICO				
10.1	La unidad cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable		X		
10.2	La unidad cuenta con servicio sanitario en optimas condiciones	X			
10.3	Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa	X			
10.4	La unidad tiene control de vectores y podas en áreas verdes (si aplica)		X		
10.5	Se han realizado lavado de tanques en los últimos seis meses		X		
11	PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
11.1	Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X			
11.2	Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
11.3	Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral	X			
11.4	Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia	X			
11.5	Los Servidores y contratistas conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
11.6	Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro	X			
11.7	Los servidores y contratistas conocen a los brigadistas de la unidad	X			

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	18/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

Inspección realizada por: Bernardo Sierra Carreño	Nombre responsable frente: Amory Mendoza
Fecha de inspección: 29/09/2023	Frente: Albania

LISTA DE CHEQUEO					
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	PELIGROS FÍSICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	X			
1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrios está en buen estado.		X		
1.4	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.5	El área esta expuesta a ruido	X			
1.6	El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frio)	X			
1.7	La unidad esta expuesta a vibración cuerpo entero, segmentaria	X			
2	PELIGROS QUÍMICO				
2.1	La unidad está expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado	X			
2.2	El área cuenta con las tarjetas de emergencia impresas a color	X			
2.3	El área cuenta con las Hojas de seguridad MSDS impresas a color	X			
2.4	Las sustancias químicas se encuentran debidamente etiquetadas	X			
2.5	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP	X			
2.6	Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas	X			
3	PELIGROS BIOLÓGICOS				
3.1	En el área de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos	X			
3.2	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
3.3	Se encuentra identificada la ruta sanitaria de disposición de residuos	X			
3.4	El cuarto de residuos se encuentra debidamente señalizado		X		
4	PELIGROS BIOMECÁNICOS				
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	X			
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	X			
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	X			
4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, forzada y anti gravitacional)	X			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD				
5	PELIGRO MECÁNICO				
5.1	Equipos y herramientas en buen estado	X			
5.2	Se esta expuesto a materiales proyectados, solidos y fluidos	X			
5.3	Archivo rodante en buen estado		X		
5.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados		X		
5.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes		X		
6	PELIGROS ELÉCTRICOS				
6.1	Cables eléctricos en buen estado y debidamente entubados. (sin adiciones y cintas)	X			
6.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado.	X			
6.3	Tomas e interruptores en buen estado, debidamente anclados y señalizados	X			
6.4	Se observa cajas de breakers sin sobrecarga y señalizadas		X		
6.5	Los tableros y cajas de breakers están libres de obstáculos.		X		

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

7	PELIGROS LOCATIVOS				
7.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	X			
7.2	Escaleras en buen estado (paso manos, cintas antideslizantes y fotoluminiscentes).		X		
7.3	Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles		X		
7.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas, sin vidrios fracturados).		X		
7.5	Techos en buen estado (tejas sin fisuras o rotas, sin goteras).	X			
7.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de tránsito en almacén, etc.).	X			
7.7	La sillas se encuentran en buen estado		X		
7.8	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones. (anclados y ajustados)		X		
8	PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES				
8.1	La unidad cuenta con plan de emergencia y contingencia	X			
8.2	La Unidad cuenta con Planes Operativos Normalizados en caso Sismo, Terremoto, vendaval, Inundación, derrumbe y Precipitaciones (lluvias, granizadas,	X			
8.3	La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos	X			
8.4	Las salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas y señalizadas	X			
8.5	La lista de teléfonos de emergencia publicada y socializada	X			
8.6	La brigada se encuentra identificada	X			
9	ORDEN Y ASEO				
9.1	Las áreas de la unidad se encuentra organizada.	X			
9.2	La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos	X			
9.3	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
9.4	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado		X		
10	SANEAMIENTO BÁSICO				
10.1	La unidad cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable		X		
10.2	La unidad cuenta con servicio sanitario en optimas condiciones	X			
10.3	Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	X			
10.4	La unidad tiene control de vectores y podas en áreas verdes (si aplica)		X		
10.5	Se han realizado lavado de tanques en los últimos seis meses		X		
11	PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
11.1	Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X			
11.2	Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
11.3	Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X			
11.4	Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia	X			
11.5	Los Servidores y contratistas conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
11.6	Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro.	X			
11.7	Los servidores y contratistas conocen a los brigadistas de la unidad	X			

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

Inspección realizada por: Bernardo Suárez Gómez	Nombre responsable frente: Kevin Rodriguez
Fecha de inspección: 28/09/2023	Frente: Independencia

LISTA DE CHEQUEO					
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	PELIGROS FÍSICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	X			
1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrios esta en buen estado.		X		
1.4	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.5	El área esta expuesta a ruido	X			
1.6	El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frío)	X			
1.7	La unidad esta expuesta a vibración cuerpo entero, segmentaria	X			
2	PELIGROS QUÍMICO				
2.1	La unidad está expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado	X			
2.2	El área cuenta con las tarjetas de emergencia impresas a color	X			
2.3	El área cuenta con las Hojas de seguridad MSDS impresas a color	X			
2.4	Las sustancias químicas se encuentran debidamente etiquetadas	X			
2.5	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
2.6	Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas	X			
3	PELIGROS BIOLÓGICOS				
3.1	En el área de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos	X			
3.2	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
3.3	Se encuentra identificada la ruta sanitaria de disposición de residuos	X			
3.4	El cuarto de residuos se encuentra debidamente señalizado		X		
4	PELIGROS BIOMECÁNICOS				
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	X			
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	X			
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	X			
4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, forzada y anti gravitacional)	X			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD				
5	PELIGRO MECÁNICO				
5.1	Equipos y herramientas en buen estado	X			
5.2	Se está expuesto a materiales proyectados, solidos y fluidos	X			
5.3	Archivo rodante en buen estado		X		
5.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados		X		
5.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes		X		
6	PELIGROS ELÉCTRICOS				
6.1	Cables eléctricos en buen estado y debidamente entubados. (sin adiciones y cintas)	X			
6.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado.	X			
6.3	Tomas e interruptores en buen estado, debidamente anclados y señalizados	X			
6.4	Se observa cajas de breakers sin sobrecargo y señalizadas		X		
6.5	Los tableros y cajas de breakers están libres de obstáculos.		X		

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

7	PELIGROS LOCATIVOS				
7.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	X			
7.2	Escaleras en buen estado (paso manos, cintas antideslizantes y fotoluminiscentes).		X		
7.3	Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles		X		
7.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas, sin vidrios fracturados)		X		
7.5	Techos en buen estado (tejas sin fisuras o rotas, sin goteras).	X			
7.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de tránsito en almacén, etc.).	X			
7.7	La sillas se encuentran en buen estado		X		
7.8	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones. (anclados y ajustados)		X		
8	PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES				
8.1	La unidad cuenta con plan de emergencia y contingencia	X			
8.2	La Unidad cuenta con Planes Operativos Normalizados en caso Sismo, Terremoto, vendaval, Inundación, derrumbe y Precipitaciones (lluvias, granizadas,	X			
8.3	La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos	X			
8.4	Las salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas y señalizadas	X			
8.5	La lista de teléfonos de emergencia publicada y socializada	X			
8.6	La brigada se encuentra identificada	X			
9	ORDEN Y ASEO				
9.1	Las áreas de la unidad se encuentra organizada	X			
9.2	La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos	X			
9.3	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
9.4	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado		X		
10	SANEAMIENTO BÁSICO				
10.1	La unidad cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable		X		
10.2	La unidad cuenta con servicio sanitario en optimas condiciones	X			
10.3	Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	X			
10.4	La unidad tiene control de vectores y podas en áreas verdes (si aplica)		X		
10.5	Se han realizado lavado de tanques en los últimos seis meses		X		
11	PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
11.1	Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X			
11.2	Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
11.3	Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral	X			
11.4	Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia	X			
11.5	Los Servidores y contratistas conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			
11.6	Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro	X			
11.7	Los servidores y contratistas conocen a los brigadistas de la unidad	X			

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

CS Consorcio Santander	LISTA DE CHEQUEO PARA EPP	Código	CS-FO-HSEQ-018
		Fecha	19/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Fecha: 28/09/2023
Realizado por: Bernardo Suárez Carreño
Frente: San Alonso Cll 20

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		TAPABOCAS		PROTECTOR AUDITIVO		BOTAS SRS		CASCO DE SEGURIDAD		CAMISA MANGA LARGA		PANTALON		CARETA						OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Bryan Rey	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
2	Luis Florian	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
3	Nicolas Abreon	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
4	Omar Quintero	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
5	Ever Carrascal	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
6	Cesar Gomez	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
7	Jerson Ospino	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
8	Wilson Rivero	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
9	Jose Espinoza	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									

FIRMA-CEDULA	INSPECTOR HSEQ
NOMBRE	BERNARDO SUAREZ CARREÑO
CARGO	HSEQ

CS
Consorcio Santander

LISTA DE CHEQUEO PARA EPP

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-HSEQ-068
Fecha	16/3/2022
Versión	2
Página	1 de 1

Fecha: 22/09/23
Realizado por: Bernardo Suarez Carreño
Frente: Chapinero

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		TAPABOCAS		PROTECTOR AUDITIVO		BOTAS SEG		CASCO DE SEGURIDAD		CAMISA MANGA LARGA		PANTALÓN		CASEETA						OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Edgar Martinez	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
2	Ricardo Hernandez	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
3	Henry Mantilla	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
4	Diego Barbosa	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
5	Edison Prado	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
6	Jose Rios	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
7	Jhon Gutierrez	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									

FIRMA-CEDULA	INSPECTOR HSEQ
NOMBRE	BERNARDO SUAREZ CARREÑO
CARGO	HSEQ

CS
Consorcio Santander

LISTA DE CHEQUEO PARA EPP

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-HSEQ-016
Fecha	09/03/2022
Versión	2
Página	1 de 1

Fecha: 28/09/23
Realizado por: Bernardo Suárez Carreño
Frente: Juventud

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		TAPABOCAS		PROTECTOR AUDITIVO		BOTAS SEG		CASCO DE SEGURIDAD		CAMISA MANGA LARGA		PANTALÓN		CARETA						OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Daiver Naranjo	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
2	Jaime Murcia	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
3	Simon Peña	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
4	Luis Mejia	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
5	David Garcia	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
6	Yeison Higera	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
7	Luis Naranjo	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									

FIRMA-CEDULA	INSPECTOR HSEQ
NOMBRE	BERNARDO SUAREZ CARREÑO
CARGO	HSEQ

CS
Consorcio Santander

LISTA DE CHEQUEO PARA EPP

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-HSEQ-016
Fecha	19/03/2022
Versión	2
Página	1 de 1

Fecha: 28/09/23
Realizado por: Bernardo Suárez Carreño
Frente: Albania

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		TAPABOCAS		PROTECTOR AUDITIVO		BOTAS SEG		CASCO DE SEGURIDAD		CAMISA MANGA LARGA		PANTALON		CARETA						OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Jose laguna	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
2	Oscar Alerson	Aydante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
3	Cristian Amariz	Aydante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									

FIRMA-CEDULA	INSPECTOR HSEQ
NOMBRE	BERNARDO SUAREZ CARREÑO
CARGO	HSEQ

CS Consorcio Santander	LISTA DE CHEQUEO PARA EPP	Código	CS-FO-HSEQ-06
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Fecha: 28/09/23
Realizado por: Bernardo Suárez Carreño
Fuente: Rosel

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		TAPABOCAS		PROTECTOR AUDITIVO		BOTAS SEG		CASCO DE SEGURIDAD		CAMISA MANGA LARGA		PANTALON		CABEZA						OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Jose Sierra	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
2	Cesar Rodriguez	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
3	Cristian Tellez	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
4	Edwin Rodriguez	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
5	Flor Quintero	Cont. Traf.	X		—		X		X		X		X		X		X		—						
6	Maria Manrique	Cont. Traf.	X		—		X		X		X		X		X		X		—						
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									

FIRMA-CEDULA	INSPECTOR HSEQ
NOMBRE	BERNARDO SUAREZ CARREÑO
CARGO	HSEQ

CS
Consorcio Santander

LISTA DE CHEQUEO PARA EPP

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-HSEQ-016
Fecha	9/03/2022
Versión	2
Página	1 de 1

Fecha: 28/09/23
Realizado por: Bernardo Suárez Carreño
Frente:

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		TAPABOCAS		PROTECTOR AUDITIVO		BOTAS SEG		CASCO DE SEGURIDAD		CABEZA BANDA LARGA		PANTALON		CARETA						OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Jose Mendoza	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
2	Anderson Sanchez	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
3	Edwin Rodriguez	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
4	Jose Mancera	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									

FIRMA-CEDULA	INSPECTOR HSEQ
NOMBRE	BERNARDO SUAREZ CARREÑO
CARGO	HSEQ

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Juan Carlos Jaimes Nieto **FECHA:** 14/04/23

CÉDULA: 91.249.578 **CARGO:** Director Obra

CONTRATO: 011 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	3	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	—	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—	—	—
GAFAS DE SEGURIDAD	1	—	—
GUANTES DE ____	—	—	—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda.

** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición

***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Jhon Jaime Gutierrez Silva **FECHA:** 20/09/23

CÉDULA: 91.449.914 **CARGO:** Ayudante

CONTRATO: OU de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE Carnaza	1		—

* Se entregará si el certificado de aptitud asi lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Omar Alexis Blanco **FECHA:** 20/04/23

CÉDULA: 1.007.193.091 **CARGO:** Inspector

CONTRATO: VII de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	3	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	—	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—	—	—
GAFAS DE SEGURIDAD	1	—	—
GUANTES DE —	—	—	—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Omar A. Blanco.

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Jhonattan Perez **FECHA:** 22/09/23

CÉDULA: 1.102.348.837 **CARGO:** Oficial

CONTRATO: 022 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—	———	—
GAFAS DE SEGURIDAD	1	———	—
GUANTES DE carnaza	1	———	—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

JONATHAN PEREZ

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Ronal Vargas Motta **FECHA:** 22/09/23

CÉDULA: 91.515.736 **CARGO:** Ayudante

CONTRATO: 02 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—	———	—
GAFAS DE SEGURIDAD	1	———	—
GUANTES DE Caucho	1	———	—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición *** Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Ronal motta

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Jose Luis Serna Araya **FECHA:** 26/04/23

CÉDULA: 13.860.582 **CARGO:** Oficial

CONTRATO: 012 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—	—	—
GAFAS DE SEGURIDAD	1	—	—
GUANTES DE Carnaza	1	—	—

* Se entregará si el certificado de aptitud asi lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Cesar Rodriguez **FECHA:** 26/09/23

CÉDULA: 1.098.697.529 **CARGO:** Oficial

CONTRATO: 022 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—	———	—
GAFAS DE SEGURIDAD	1	———	—
GUANTES DE Carnaza	1	———	—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda.

** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición

***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Cristian Tellez Figueroa **FECHA:** 20/09/23

CÉDULA: 91.535.019. **CARGO:** Ayudante

CONTRATO: 012 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—	———	—
GAFAS DE SEGURIDAD	1	———	—
GUANTES DE carnaza	1	———	—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Cristian Tellez
FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Flor Quintero Ordut **FECHA:** 27/09/23

CÉDULA: 1.098.632.250 **CARGO:** Controladora tráfico

CONTRATO: 022 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—	———	—
GAFAS DE SEGURIDAD	1	———	—
GUANTES DE Carnaza	—	———	—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

FLOR NORAIMA QUINTERO O.
FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: María Eugenia Monrique Rueda **FECHA:** 28/09/23

CÉDULA: 37.511.566 **CARGO:** Controladora Tráfico

CONTRATO: 022 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—	—	—
GAFAS DE SEGURIDAD	1	—	—
GUANTES DE —	—	—	—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Edwin Rodriguez Galeano **FECHA:** 27/04/23

CÉDULA: 1.098.633.343 **CARGO:** Ayudante

CONTRATO: OC de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE Carnaza	1		—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Edwin Rodriguez
FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Wilson Rivero Tolota **FECHA:** 27/04/23

CÉDULA: 8.784.375 **CARGO:** Oficial

CONTRATO: 02 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—	———	—
GAFAS DE SEGURIDAD	1	———	—
GUANTES DE Carnaza	1	———	—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Wilson Rivero

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Edwin Orlando Rodriguez Guerrero **FECHA:** 28/09/23

CÉDULA: 1.005.157.888 **CARGO:** Ayudante

CONTRATO: 021 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—	———	—
GAFAS DE SEGURIDAD	1	———	—
GUANTES DE carnaza	1	———	—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Jose Luis Moncada Guerrero **FECHA:** 28/09/23

CÉDULA: 1.097.490.744 **CARGO:** Ayudante

CONTRATO: 022 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—	———	—
GAFAS DE SEGURIDAD	1	———	—
GUANTES DE Carnaza	1	———	—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Jose Luis Moncada.
FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Jose Giovanny Mendoza Rodriguez **FECHA:** 28/09/2023

CÉDULA: 6.509.541 **CARGO:** Oficial

CONTRATO: 001 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—	———	—
GAFAS DE SEGURIDAD	1	———	—
GUANTES DE Carnaza	1	———	—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda.

** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición

***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Jose Giovanny Mendoza

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Anderson Sanchez Reyes **FECHA:** 28/09/23

CÉDULA: 1.095.924.401 **CARGO:** Oficial

CONTRATO: 022 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE Carnaza	1		—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

MASSI
MASSI SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE
9791

Cliente: Cons Santander
Ubicación: CR 17 C11 5ta Campo: Espuma
Hora de Inicio: 8:05 Hora Final: 8:15
Fecha: 2-SEPT-23

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: Firma:
C.C.

MASSI
MASSI SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE
9661

Cliente: Consorcio Santander
Ubicación: Calle 20 cra Campo: 29
Hora de Inicio: Hora Final:
Fecha: 5 de Sep 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Bernardo Suarez Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: Firma:
C.C.

MASSI
MASSI SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE
9670

Cliente: Consorcio Santander
Ubicación: Calle 5 con 1 Campo:
Hora de Inicio: Hora Final:
Fecha: 6 de Sept 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: Firma:
C.C.

MASSI
MASSI SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE
9694

Cliente: Consorcio Santander
Ubicación: Calle 20 c Campo: 29
Hora de Inicio: Hora Final:
Fecha: 8 de Sep 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: Firma:
C.C.

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE
9564

Cliente: Consorcio Santander
Ubicación: Calle 5 cra Campo: 16
Hora de Inicio: Hora Final:
Fecha: 13 de Sep 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: Freddy Sierra Firma:
C.C.

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 N° 11-05 Bog 01 Girón
F019 - V01

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE
9639

Cliente: Consorcio Santander
Ubicación: Calle 20 Campo: 29 San Alonso
Hora de Inicio: 4:00 am Hora Final:
Fecha: 15 Sep 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8		

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: Firma:
C.C.

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 N° 11-05 Bog 01 Girón
F019 - V01

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE
9506

Cliente: Consorcio Santander
Ubicación: Calle 5 Campo:
Hora de Inicio: Hora Final:
Fecha: 16 Sep 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8		

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: Firma:
C.C.

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 N° 11-05 Bog 01 Girón
F019 - V01

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE
9041

Cliente: Cons Santander
Ubicación: Clle 20 Campo: Cra 29 esquina
Hora de Inicio: 8:00 Hora Final: 8:10
Fecha: 29 - SEP1 - 23

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: Firma:
C.C. FREDDY SIERRA

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 N° 11-05 Bog 01 Girón
F019 - V01

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	91249578
Nombre:	JUAN CARLOS JAIMES NIÑO
Fecha Ingreso:	14/09/2023
Salario básico:	3,800,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	13/09/2023 08:21:17 p.m.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 18/09/2023, el empleador CONSORCIO SANTANDER identificado con NIT número 901677862 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6184594	18/09/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	91249578	JUANCARLOS JAIMES NIÑO	3800000	INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS	2023-09-18

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 18 días del mes de Septiembre del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUAN CARLOS JAIMES NIÑO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **91.249.578**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Octubre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

cajasan
NIT 890.200.106.1

Afiliación y Novedades de Trabajador y Grupo Familiar

RADICADO 2023CE1538380 **FECHA** 02/10/2023

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES Y/O PERSONAS A CARGO

Número personas a cargo 0

I. DATOS DEL EMPLEADOR

Cód GM-SUB-F005 Versión 12

NUMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL
901677862	NI	CONSORCIO SANTANDER

II. DATOS DEL TRABAJADOR

NÚMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
91249578	CC	JAIMES	NIÑO	JUAN	CARLOS

ORIENTACION SEXUAL	SEXO	RESIDE EN EL EXTERIOR: NO / PAIS: Colombia	DIRECCION RESIDENCIA	BARRIO	MUNICIPIO RESIDENCIA	MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA NACIMIENTO
Heterosexual	M		CALLE 33a #24-67 APTO 301		BUCARAMANGA - SANTANDER	BUCARAMANGA - SANTANDER	09/02/1967

CORREO ELECTRONICO PERSONAL	CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO	TELEFONO RESIDENCIA
inspectorhseqcs@gmail.com	inspectorhseqcs@gmail.com	

FACTOR DE VULNERABILIDAD	PERTENENCIA ÉTNICA
No aplica	No se autoreconoce en ninguno de los anteriores

CARGO-OCUPACION	PROFESION U OFICIO	SUELDO BASICO	CELULAR 1	CELULAR 2	FECHA INGRESO EMPRESA
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	3800000	3188708252		14/09/2023

NIVEL ESTUDIO	ESTADO CIVIL	TIPO VIVIENDA	TENENCIA VIVIENDA
Universitaria	Unión libre	Casa	Otros

III. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	MUNICIPIO RESIDENCIA

FECHA NACIMIENTO	SEXO	EMPRESA DONDE TRABAJA	NIT	RECIBE CUOTA MONETARIA CAJA?	SUELDO BÁSICO	CELULAR

IV. DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (Padres, Hijos, Hermanos, Hijastros)

No Documento	Tipo documento	Sexo	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Fecha nacimiento	Parentesco	Municipio residencia	Condición Discapacidad	Grado escolaridad

Con mi firma que aparece dentro del presente documento, de manera previa, expresa e inequívoca autorizo a CAJASAN el tratamiento de mis datos personales (o el tratamiento de los datos personales del menor de edad o persona en condición de discapacidad que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados y puestos en circulación o suprimidos, conforme a la Política de Tratamiento de la Información que la Corporación ha adoptado y que se encuentra publicada en la página web www.cajasan.com que declaro conocer y por ello estar informado de la finalidad de dicho tratamiento, por estar en ella consignado. También declaro que he sido informado que, para el ejercicio de mis derechos, podré dirigirme ante la Corporación a través del correo electrónico protección.datos@cajasan.com, las líneas telefónicas 018000972021 o 6434444 Ext.4328, a través de la página web www.cajasan.com vínculo Contáctenos o mediante comunicación escrita remitida a la oficina de atención al usuario, Carrera 27 No. 61-78, Sede Administrativa en Bucaramanga -Primer Piso.

Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como datos de salud, biométricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

Firma del Trabajador – C.C. No

Firma y Sello de la Empresa

CAJASAN le hará entrega a través de su empresa LA TARJETA MULTISERVICIOS, la cual le permite identificarse y acceder a la Cuota Monetaria y todos los servicios.
La tarjeta permanece vigente incluso si cambia de empleador.

VIGILADO SuperSubsidio

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	91449914
Nombre:	JHON JAIME GUTIERREZ SILVA
Fecha Ingreso:	20/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	19/09/2023 09:32:11 p.m.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 20/09/2023, el empleador CONSORCIO SANTANDER identificado con NIT número 901677862 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6191536	20/09/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	91449914	JHONJAIME GUTIERREZ SILVA	1160000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2023-09-20

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de Septiembre del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JHON JAIME GUTIERREZ SILVA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **91.449.914**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

cajasan
NIT 890.200.106.1

Afiliación y Novedades de Trabajador y Grupo Familiar

RADICADO 2023CE1534855 **FECHA** 27/09/2023

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES Y/O PERSONAS A CARGO

Número personas a cargo 0

I. DATOS DEL EMPLEADOR

Cód GM-SUB-F005 Versión 12

NUMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL
901677862	NI	CONSORCIO SANTANDER

II. DATOS DEL TRABAJADOR

NÚMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
91449914	CC	GUTIERREZ	SILVA	JHON	JAIME

ORIENTACION SEXUAL	SEXO	RESIDE EN EL EXTERIOR: NO / PAIS: Colombia	DIRECCION RESIDENCIA	BARRIO	MUNICIPIO RESIDENCIA	MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA NACIMIENTO
Heterosexual	M		Calle 146 # 44 – 16 Prados del sur - Giron		BUCARAMANGA - SANTANDER	BUCARAMANGA - SANTANDER	06/11/1978

CORREO ELECTRONICO PERSONAL	CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO	TELEFONO RESIDENCIA
inspectorhseqcs@gmail.com	inspectorhseqcs@gmail.com	

FACTOR DE VULNERABILIDAD	PERTENENCIA ÉTNICA
No aplica	No se autoreconoce en ninguno de los anteriores

CARGO-OCUPACION	PROFESION U OFICIO	SUELDO BASICO	CELULAR 1	CELULAR 2	FECHA INGRESO EMPRESA
Ayudante	Ayudante	1160000	3144240685		20/09/2023

NIVEL ESTUDIO	ESTADO CIVIL	TIPO VIVIENDA	TENENCIA VIVIENDA
Técnica	Unión libre	Casa	Otros

III. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	MUNICIPIO RESIDENCIA

FECHA NACIMIENTO	SEXO	EMPRESA DONDE TRABAJA	NIT	RECIBE CUOTA MONETARIA CAJA?	SUELDO BASICO	CELULAR

IV. DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (Padres, Hijos, Hermanos, Hijastros)

No Documento	Tipo docu mento	Sexo	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Fecha nacimiento	Parentesco	Municipio residencia	Condición Discapacidad	Grado escolaridad

Con mi firma que aparece dentro del presente documento, de manera previa, expresa e inequívoca autorizo a CAJASAN el tratamiento de mis datos personales (o el tratamiento de los datos personales del menor de edad o persona en condición de discapacidad que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados y puestos en circulación o suprimidos, conforme a la Política de Tratamiento de la Información que la Corporación ha adoptado y que se encuentra publicada en la página web www.cajasan.com que declaro conocer y por ello estar informado de la finalidad de dicho tratamiento, por estar en ella consignado. También declaro que he sido informado que, para el ejercicio de mis derechos, podré dirigirme ante la Corporación a través del correo electrónico protección.datos@cajasan.com, las líneas telefónicas 018000972021 o 6434444 Ext.4328, a través de la página web www.cajasan.com vínculo Contáctenos o mediante comunicación escrita remitida a la oficina de atención al usuario, Carrera 27 No. 61-78, Sede Administrativa en Bucaramanga -Primer Piso.

Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como datos de salud, biométricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

Firma del Trabajador – C.C. No

Firma y Sello de la Empresa

CAJASAN le hará entrega a través de su empresa LA TARJETA MULTISERVICIOS, la cual le permite identificarse y acceder a la Cuota Monetaria y todos los servicios.
La tarjeta permanece vigente incluso si cambia de empleador.

VIGILADO SuperSubsidio

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1007193091
Nombre:	OMAR ALEXIS BLANCO BAYONA
Fecha Ingreso:	20/09/2023
Salario básico:	2,000,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	19/09/2023 09:26:38 p.m.

Fundación SaludMía

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No. de Radicación	Fecha de Radicación
	2 1 0 9 2 0 2 3

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia	3. Régimen
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	B. Colectivo [X] C. Institucional D. De Oficio	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado	5. Tipo de Cotizante	Código a Registrar por la EPS
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	1

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (DEL COTIZANTE O CABEZA DE FAMILIA)

A. AFILIACIÓN

6. Apellidos y Nombres			
BLANCO	BAYONA	OMAR	ALEXIS
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

7. Tipo de Documento de Identidad	8. Número de Documento de Identidad	9. Sexo	10. Fecha de Nacimiento
CC	1.007.103.091	Femenino [ ] Masculino [X]	1 5 0 9 1 9 9 5

Datos Personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de Población Especial
	? F N M Condición T P		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de pensiones.	17. Ingreso Base de Cotización IBC
AXA COLPATRIA	PORVENIR	2,000,000

18. Dirección			
Diagonal 21 b #17-101 manzana M casa 001		322 7374983	INGENIERO.OMARBLANCO@GMAIL.COM
Residencia	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
GIRON	Zona Urbana [X] Rural [ ]	RINCON DE GIRON	STDER
Municipio / Distrito		Localidad / Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o Compañero(a) Permanente Cotizante

19. Apellidos y Nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de Documento de Identidad	21. Número de Documento de Identidad	22. Sexo	23. Fecha de Nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	

Datos Básicos de Identificación de los Beneficiarios y de los Afiliados Adicionales

	24. Apellidos y Nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de Documento de Identidad	26. Número de Documento de Identidad	27. Sexo: Femenino	27. Sexo: Masculino	28. Fecha de Nacimiento

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo P	Tipo N	Condición T	Condición P
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

	32. Datos de Residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del Afiliado Adicional (A Registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A Registrar por la EPS)
C	IMAP GIRON	
B		
B		
B		

35. Nombre o Razón Social		37. Número de documento de identificación	38. Tipo de Aportante o pagador Pensiones (A registrar por la EPS)
CONSORCIO SANTANDER	NIT	901.677.862	

39. Ubicación

Dirección	Teléfono	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedades

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [X] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de Fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de calidad de Pre – pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos Básicos de Identificación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de Documento de Identidad	Número del Documento de Identidad	Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	Fecha de Nacimiento	42. Fecha
				2 0 0 9 2 0 2 3

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
		COMFENALCO

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiario y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de la existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [X] 49. Declaración de no intervención del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución prestadora de servicios de salud.
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copias de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas por sus funciones lo requieran.
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como un mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cónyuge, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio
Omar alexis blanco	

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del Documento de Identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total:
Cantidad:									

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o [illegible] marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración escrita por el cotizante sobre la ausencia de los de[illegible]
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificado de vinculación a una entidad para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o en ambos la afiliación de oficio.

Fundación SaludMia eps

Nombre: LEIDY QUINTERO

CC: 1038659063

Radicado para estudio EPS

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial	67. Datos del SISBEN	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
Código de Municipio:	Tomo de Acta: Folio: Nivel:		

70. Datos del Funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de Documento de Identidad	Número del Documento de Identidad	71. Firma del Funcionario

LEIQUI01
RADICADO: LEIDY QUINTERO
21/09/2023

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

OMAR ALEXIS BLANCO BAYONA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.007.193.091**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

cajasan
NIT 890.200.106.1

Afiliación y Novedades de Trabajador y Grupo Familiar

RADICADO 2023CE1534856 **FECHA** 27/09/2023

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES Y/O PERSONAS A CARGO

Número personas a cargo 0

I. DATOS DEL EMPLEADOR

Cód GM-SUB-F005 Versión 12

NUMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL
901677862	NI	CONSORCIO SANTANDER

II. DATOS DEL TRABAJADOR

NÚMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
1007193091	CC	BLANCO	BAYONA	OMAR	ALEXIS

ORIENTACION SEXUAL	SEXO	RESIDE EN EL EXTERIOR: NO / PAIS: Colombia	DIRECCION RESIDENCIA	BARRIO	MUNICIPIO RESIDENCIA	MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA NACIMIENTO
Heterosexual	M		Diagonal 21 b #17-101 manzana M casa 001 - Girón		BUCARAMANGA - SANTANDER	BUCARAMANGA - SANTANDER	15/09/1995

CORREO ELECTRONICO PERSONAL	CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO	TELEFONO RESIDENCIA
inspectorhseqcs@gmail.com	inspectorhseqcs@gmail.com	

FACTOR DE VULNERABILIDAD	PERTENENCIA ÉTNICA
No aplica	No se autoreconoce en ninguno de los anteriores

CARGO-OCUPACION	PROFESION U OFICIO	SUELDO BASICO	CELULAR 1	CELULAR 2	FECHA INGRESO EMPRESA
Inspector de Obra	Inspector de Obra	2000000	3227374983		20/09/2023

NIVEL ESTUDIO	ESTADO CIVIL	TIPO VIVIENDA	TENENCIA VIVIENDA
Universitaria	Unión libre	Casa	Otros

III. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	MUNICIPIO RESIDENCIA

FECHA NACIMIENTO	SEXO	EMPRESA DONDE TRABAJA	NIT	RECIBE CUOTA MONETARIA CAJA?	SUELDO BASICO	CELULAR

IV. DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (Padres, Hijos, Hermanos, Hijastros)

No Documento	Tipo docu mento	Sexo	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Fecha nacimiento	Parentesco	Municipio residencia	Condición Discapacidad	Grado escolaridad

Con mi firma que aparece dentro del presente documento, de manera previa, expresa e inequívoca autorizo a CAJASAN el tratamiento de mis datos personales (o el tratamiento de los datos personales del menor de edad o persona en condición de discapacidad que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados y puestos en circulación o suprimidos, conforme a la Política de Tratamiento de la Información que la Corporación ha adoptado y que se encuentra publicada en la página web www.cajasan.com que declaro conocer y por ello estar informado de la finalidad de dicho tratamiento, por estar en ella consignado. También declaro que he sido informado que, para el ejercicio de mis derechos, podré dirigirme ante la Corporación a través del correo electrónico protección.datos@cajasan.com, las líneas telefónicas 018000972021 o 6434444 Ext.4328, a través de la página web www.cajasan.com vínculo Contáctenos o mediante comunicación escrita remitida a la oficina de atención al usuario, Carrera 27 No. 61-78, Sede Administrativa en Bucaramanga -Primer Piso.

Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como datos de salud, biométricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

Firma del Trabajador – C.C. No

Firma y Sello de la Empresa

CAJASAN le hará entrega a través de su empresa LA TARJETA MULTISERVICIOS, la cual le permite identificarse y acceder a la Cuota Monetaria y todos los servicios.
La tarjeta permanece vigente incluso si cambia de empleador.

VIGILADO SuperSubsidio

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1102348837
Nombre:	JHONATTAN PEREZ ARANGO
Fecha Ingreso:	22/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	21/9/2023 7:55:11 PM

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 02/10/2023, el empleador CONSORCIO SANTANDER identificado con NIT número 901677862 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6232887	02/10/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1102348837	JHONATTAN PEREZ ARANGO	1160000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2023-09-22

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 2 días del mes de Octubre del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS


CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) JHONATTAN PEREZ ARANGO identificado(a) con C.C No.1102348837, se Encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 29 de Septiembre del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.



Carolina Galvis Castellanos
Gerente de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantias

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	91515736
Nombre:	RONAL ANDERSON VARGAS MOTTA
Fecha Ingreso:	22/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	21/9/2023 7:48:36 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4011067800	0|3|1|0|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE **(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)**

1.tipo de tramite — **A.** Afiliación ☐ **B.**Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion — **B.** Colectiva ☐ — **A.** Individual: **B.** Institucional ☐ — -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ **B.** De oficio ☐

3.Regimen — **A.**Contributivo ☒ **B.**Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado — **A.** Cotizante ☒ **B.** Cabeza de Familia ☐ **C.** Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante — **A.** Dependiente ☒ **B.** Independiente ☐ **C.** Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
VARGAS Primer apellido	MOTTA Segundo apellido	RONAL Primer nombre	ANDERSON Segundo nombre

7.Tipo documento de Identidad	8.Número del documento de Identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
CC	91515736	Femenino ☐ Masculino ☒	0|5|1|1|1|9|8|2

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M — Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	PORVENIR FPC	1160000

18.Residencia

CR 11 103 8 **Dirección**	**Telefono fijo**	3015075054 **Telefono celular**	RONALVARGAS12@HOTMAIL.COM **Correo electronico**

BUCARAMANGA **Municipio/Distrito**	**zona** Urbana ☒ Rural ☐	**Localidad / comuna**	SANTANDER **Departamento**

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número documento identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo Femenino	27.Sexo Masculino	28.Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		CNTRO INTEGRAL SERVICIOS DE SALUD-CISS - ALIANZA DIAGNOSTICA CABECERA CP	CENTROCISS - ALIANZACAB
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CONSORCIO SANTANDER	NIT	901677862	01

39.Ubicación

CL 49 21 46 Dirección	6756798 Teleéfono	LULU8902@HOTMAIL.COM Correo electrónico	BARRANCABERMEJA Municipio/distrito	SANTANDER Departamento

No de Radicacion
4011067800

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ **6.** Reinscripción en la EPS
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **12.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **14.** Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **15.** Reporte de fallecimiento
- ☐ **16.** Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **17.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **18.** Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		2|2|0|9|2|0|2|3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- **46.** ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- **47.** ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- **48.** ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- **49.** ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- **50.** ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- **51.** ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- **52.** ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- **53.** ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX. ANEXOS

☐ **56.** Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0

- ☐ **57.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **58.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **59.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **60.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **61.** Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **62.** Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **63.** Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **64.** Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **65.** Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **VARGAS MOTTA RONAL ANDERSON** identificado(a) con **CC** número **91.515.736** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 12 de abril de 2021 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 02 de octubre de 2023.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2023100215424

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	13860582
Nombre:	JOSE LUIS SIERRA ANAYA
Fecha Ingreso:	26/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	25/9/2023 9:13:57 PM

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 26/09/2023, el empleador CONSORCIO SANTANDER identificado con NIT número 901677862 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6211168	26/09/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	13860582	JOSELUIS SIERRA ANAYA	1160000	MAESTRO CONSTRUCTOR	2023-09-26

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 26 días del mes de Septiembre del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JOSE LUIS SIERRA ANAYA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **13.860.582**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 26 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1098697529
Nombre:	CESAR RODRIGUEZ DE LOS SANTOS
Fecha Ingreso:	26/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	25/9/2023 9:10:07 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4011057733	3|0|0|9|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.Tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen
A. Afiliacion ☐ B.Reporte de Novedades ☒	A. Individual -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
RODRIGUEZ (Primer apellido)	DE LOS SANTOS (Segundo apellido)	CESAR (Primer nombre)	(Segundo nombre)

7.Tipo documento de Identidad	8.Número del documento de Identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
CC	1098697528	Femenino ☐ Masculino ☒	01/01/1999

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad		13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo FNH	Condicion TP		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PORVENIR PRC	1160000

18.Residencia			
CL 22 8 10 Dirección	Telefono fijo	3034834083 Telefono celular	CESARRODRIGUEZ32@HOTMAIL.COM Correo electronico
BUCARAMANGA Municipio/Distrito	zona Urbana ☒ Rural ☐	Localidad / comuna	SANTANDER Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número documento identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y/o los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad			Condición	
			Tipo F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS (a registrar por la EPS)
C		ALIANZA UAB CABECERA - ALIANZA DIAGNOSTICA CABECERA CP	ALIUABCABE - ALIANZACAB
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de documento de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CONSORCIO SANTANDER	NIT	901677862	01

39.Ubicación				
CL 40 21 46 Dirección	6754346 Telefono	LULI8902@HOTMAIL.COM Correo electrónico	BARRANCABERMEJA Municipio/distrito	SANTANDER Departamento

No de Radicacion
4011057733

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS
  Codigo: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la Identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		(DD/MM/AAAA)

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo,Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no información del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- 53. ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Cesar Rodriguez de los Santos	

IX. ANEXOS

- 56. ☐ Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
  Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Total: 0
- 57. ☐ Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- 58. ☐ Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- 59. ☐ Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- 60. ☐ Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- 61. ☐ Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- 62. ☐ Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- 63. ☐ Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- 64. ☐ Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- 65. ☐ Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos funcionario que realiza la validación			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.170.043-7

CERTIFICA QUE:

CESAR RODRIGUEZ DE LOS SANTOS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.098.697.529**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR**.

La presente certificación se expide el 26 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	91535019
Nombre:	CRISTIAN HUMBERTO TELLEZ FIGUEROA
Fecha Ingreso:	26/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	25/9/2023 9:16:44 PM

Famisanar

NIT 830.003.564-7

FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

9010492449

9010492449

No. de radicado: 26929635

Fecha de radicación: 14 10 2023

I. DATOS DEL TRAMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo.

1. Tipo de cotizante: A. Afiliado X / B. Reporte de novedades
2. Tipo de afiliación: A. Individual, + Cónyuge o compañero permanente, + Beneficiario o afiliado adicional X / B. Colectivo / C. Independiente / D. Su cliente
3. Régimen: A. Contributivo X / B. Subsidiado
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante X / B. Cabeza de familia / C. Beneficiario
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente X / B. Independiente / C. Pensionado
Código (a registrar por la EPS)

II. AFILIACION Y DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
TELLEZ	FIGUEROA	CRISTIAN	HUMBERTO

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo: Femenino / Masculino X	10. Fecha de nacimiento: Día	Mes	Año
CC	91535019		10	10	1984

11. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos parametrizados)

12. Raza	13. Nacionalidad	14. Puntaje SISBEN	15. Grupo de población especial	16. Nivel educativo (Ver tabla referencia de riesgos laborales - ARL)	17. Ocupación	18. Antecedentes de pensiones
				KIN-21-00		

19. Dirección de residencia		20. Teléfono	21. Departamento
$1,160,000 CARRERA 11 59N 83 BARRIO EL PABLON		3185514724	
BUCARAMANGA	Zona: Urbana / Rural		SANTANDER

III. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR (Datos externos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

22. Apellidos y nombres			

23. Tipo de documento de identidad	24. Número del documento de identidad	25. Sexo: Femenino / Masculino	26. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

27. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
01			
02			
03			
04			
05			

28. Tipo de documento de identidad	29. Número del documento de identidad	30. Sexo: Femenino / Masculino	31. Fecha de nacimiento	Datos complementarios: 32. Parentesco	33. Zona
01					
02					
03					
04					
05					

34. Discapacidad	35. Datos de residencia: Tipo (Vía, Transversal, Diagonal, Circular)	Número / Detalle	Zona: Urbana / Rural	Departamento	Municipio (ciudad o pueblo)	36. Tipo de la UPC del afiliado adicional (a registrar por EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

Relación de la IPS Primaria

37. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
1	
2	
3	
4	
5	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES (SOLO LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA INSTITUCIONAL O DE OFICIO)

38. Nombre o razón social	39. Tipo de documento de identificación	40. Número de identificación	41. Dígito de verificación DV	42. Tipo de cotizante a registrar por la EPS	43. Tipo de aportante a registrar por la EPS
CONSORCIO SANTANDER	NT	901577862			

44. Dirección	45. Teléfono	46. Departamento	47. Municipio
CLL 49 21 46	3118721869	BUCARAMANGA	SANTANDER

V. REPORTE DE NOVEDADES

48. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación ( ) 2. Corrección de datos básicos de identificación ( ) 3. Inactivación de un cotizante (retiro) ( ) 4. Reactivación y corrección de datos básicos de afiliación ( ) 5. Terminación de la inactivación de la EPS ( ) Código: ( ) 6. Reingreso por la EPS ( ) 7. Traslado de beneficiarios o de afiliados adicionales ( ) 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ( ) 9. Inicio de suspensión temporal de afiliación por: ( ) Fin de suspensión temporal de afiliación por: ( ) 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando ( ) 11. Novedad de una entidad adaptada, para realizar afiliaciones colectivas ( ) 12. Determinación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ( ) 13. Movilidad 14. Régimen Contributivo ( ) 15. Régimen Subsidiado ( ) 16. Traslado A Mismo Régimen ( ) 17. Traslado De Mismo Régimen ( ) 18. Reporte de Cambio de Información ( ) 19. Reporte de Inconsistencias ( ) 20. Reporte de Cambio de Categoría ( ) 21. Reporte de la cartilla de Prestadores ( ) 22. Reporte de la cartilla de Prestadores ( )

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

49. Datos básicos de identificación					
Tipo de documento de identidad: 23. DPS anterior	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino / Masculino	Fecha de nacimiento: Día	Mes	Año
		50. Motivo de traslado: Código:	51. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones		

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

52. Declaración de independencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales	X
53. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo (Cotizante o del Consorcio)	
54. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios	
55. Declaración de no afiliación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud	
56. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales	X
57. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación a las bases de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran	X
58. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013	X
59. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular suyos suministrados en línea	X

VIII. FIRMAS

Cristian Tellez

IX. ANEXOS

60. Fotocopia del documento de identidad: CC / TI / RC / CE / PA / CD / SC / PE / Número:	Total:
61. Copia del libreta militar (si es varón)	
62. Copia del registro civil de nacimiento y de la escritura pública, auto de consolidación o sentencia judicial que declare la unión marital	
63. Copia del acta de conciliación judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital	
64. Copia del certificado de supervivencia o acta de entrega del cónyuge	
65. Copia de la orden judicial o de otra autoridad competente	
66. Copia del documento en el que conste la petición de la unión conyugal o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el solicitante sobre la ausencia de los dos padres	
67. Copia de la autorización de labores por parte de la Superintendencia Nacional de Salud	
68. Certificación de convivencia o una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas	
69. Copia del acta administrativa o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio	

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

70. Identificación de la Unidad Territorial: Código del Municipio	Código del Departamento	71. Datos del SISBEN: Número de la ficha	Puntaje	Rural	72. Fecha de radicación	73. Fecha de validación

74. Datos del funcionario que realiza la validación

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES
		CARGO: OBRERO DE CONSTRUCCION

75. Firma del funcionario

Declaro que la Fecha de formulario, el afiliar, residencia, ocupación de la información registrada y de las aclaraciones anotadas en el capítulo VI de instrucciones.

INTERNET

Por Complementario

Famisanar

NIT 830.003.564-7

9010492449

9010492449

CUESTIONARIO ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO

	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	X	
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	X	
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?	X	
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	X	
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado oportunamente por la EPS?	X	
¿Autoriza a EPS Famisanar S.A.S el envío de la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño al correo electrónico?		X

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES

En mi calidad de cotizante, manifiesto de manera clara, expresa, libre, inequívoca y espontánea que le otorgo a la EPS FAMISANAR S.A.S en su calidad de RESPONSABLE del tratamiento de mis datos personales, el consentimiento previo para recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, objetar y en general para tratar los DATOS PERSONALES, DATOS PERSONALES SENSIBLES y demás información susceptible de tratamiento, registrada a mi nombre y/o de mis beneficiarios de mi grupo familiar en sus Bases de Datos, con la finalidad de realizar las actividades propias del aseguramiento en salud y en las forma prevista en su POLITICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACION y AVISO DE PRIVACIDAD disponibles en www.famisanar.com.co, todo lo cual conforme lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás normas que la sustituyan, adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen.

Así mismo manifiesto que mis derechos como titular de los datos son los consagrados en la Constitución Nacional y la Ley especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y, a suprimir mi información personal y revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales cuando ello fuera procedente (artículo 8° Decreto 1377 de 2013).

"Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido pueda generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos." (Numeral 3° artículo 3° Decreto 1377 de 2013).

Firma del afiliado: Cristian Tellez.

Nombres y Apellidos: CRISTIAN HUMBERTO TELLEZ FIGUEROA

Identificación: CC 91535019

AUTORIZACIÓN DONACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS - LEY 1805 DE 2016

De acuerdo a lo definido en el artículo 4° de la Ley 1805, manifiesto a continuación que mi voluntad de ser donante de órganos y tejidos es:

SI ☐ NO X

Firma del afiliado:

Nombres y Apellidos: CRISTIAN HUMBERTO TELLEZ FIGUEROA

Identificación: CC 91535019

"ARTICULO 17. Los menores de edad podrán ser donantes de órganos y tejidos, siempre y cuando sus representantes legales expresen su consentimiento informado para la donación de órganos y/o tejidos dentro de las (6) horas siguientes a la concurrencia de la madre cadavér. El medico responsable deberá informarles sus derechos y los beneficios de la donación.

FIRMA A RUEGO

A ruego del señor (a): _____ identificado (a) con el documento No. _____ quien manifiesta no poder o no saber firmar, lo hace en su nombre el (la) señor(a) _____ quien es mayor de edad y sin ningún inconveniente para dar fe de la información que está recibiendo.

Como testigo, da fe de todo lo anterior y certifica que la huella aquí impresa pertenece al señor (a): _____

Firmante a Ruego:

Nombres y Apellidos: _____

Identificación: _____

Edad: _____

Dirección de Domicilio: _____

Nombres y Apellidos de quien no sabe o no puede firmar: _____

Huella

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CRISTIAN HUMBERTO TELLEZ FIGUEROA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **91.535.019**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 26 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1098632250
Nombre:	FLOR NORAYMA QUIINTERO ORDUZ
Fecha Ingreso:	27/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	26/9/2023 9:38:34 PM

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud 6I_2065006

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	NI 901677862 CONSORCIO SANTANDER
Afiliado	CC 1098632250 FLOR NORAYMA QUINTERO ORDUZ
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	$ 1,160,000
Cargo	OTRO
Sucursal	BARRANCABERMEJA CLL 49# 21 46
Fecha de ingreso	27/09/2023
Fecha de radicación	17/10/2023 02:54:30 p.m.
Código de Transacción	166211603
Resultado delReingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 10/2023

Fecha de generación 17/10/2023

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **QUINTERO ORDUZ FLOR NORAYMA** identificado(a) con **CC** número **1.098.632.250** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 28 de marzo de 2007 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 02 de octubre de 2023.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2023100216342

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1098633343
Nombre:	EDWIN ERNESTO RODRIGUEZ GALEANO
Fecha Ingreso:	27/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	26/9/2023 9:30:40 PM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

"Código Único para Aseguradores y Afiliaciones al Régimen Subsidiado"

01 B 16093598

1100387 68

Los enfermeros las instituciones antes de diligenciar este formulario

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [X] B. REPORTE DE NOVEDADES [ ]
2. TIPO DE AFILIADO: A. Individual [ ] B. Cotizante o cabeza de familia [X] C. Beneficiario a afiliado adicional [ ] B. Colectivo [ ] C. Institucional [ ] D. Re afiliado [ ]
3. RÉGIMEN: C. Contributivo [X] S. Subsidiado [ ]
4. TIPO DE AFILIADO: CO Cotizante [X] CF Cabeza de Familia [ ] BE Beneficiario [ ]
5. TIPO DE COTIZANTE: A Dependiente [X] B Independiente [ ] C Pensionado [ ] E Independiente por Previsión de Servicios [ ]
CÓDIGO
FECHA DE LA SOLICITUD: 17 10 2023

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO: Rodriguez | SEGUNDO APELLIDO: Galeano | PRIMER NOMBRE: Edwin | SEGUNDO NOMBRE: Ernesto
7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: X | 8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1098633343 | 9. SEXO: X | 10. FECHA NACIMIENTO: 10 03 1987

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. GRUPO ÉTNICO: Cultura | 12. DISCAPACIDAD: Tipo | Condición | 13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN | 14. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL | 15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES | 17. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC: 1.160.000 | 18. DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Calle 54N No 20-14 Cabecitas | LOCALIDAD / COMUNA | BARRIO
CIUDAD / MUNICIPIO: Bucaramanga | DEPARTAMENTO: Sder | ZONA: X | TELÉFONO FIJO
TELÉFONO MÓVIL: 3186760810 | CORREO ELECTRÓNICO: eernestorg87@gmail.com | CÓDIGO: 10693

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos de identificación del [illegible])

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE
20. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 21. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 22. SEXO | 23. FECHA NACIMIENTO | CÓDIGO EPS

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	26. NÚMERO DE IDENTIDAD	27. FECHA DE NACIMIENTO	28. PARENTESCO	29. ESTADO	30. DISCAPACIDAD Tipo	30. DISCAPACIDAD Condición
1								
2								
3								
4								

	31. DATOS DE RESIDENCIA: Ciudad / Mpio.	Departamento	Zona	Institución Educativa	Sede Educativa	32. VALOR IBC AFILIADO ADICIONAL (cotizante cero)	33. Número y código de la UPC	EXCEPCIÓN DEL TRABAJADO: Cotizante exonerado	Cotizante dependiente	Cotizante Independiente	Cotizante Pensionado	NIVEL DE SISBEN	ORDEN PERSONAL
1														
2														
3														
4														

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O DESEMPEÑADOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

34. Nombre o Razón Social: Consorcio Santander | 35. Tipo documento de identidad: X | 36. Número documento de identidad: 901677862 | DV | 37. Tipo de aportante o pagador de pensiones
38. Dirección de Notificación: Calle 49 No 21-46 | Bga | Sder 3118721869 | consorciosas@hotmail.com
FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL: 28 09 2023 | CARGO: Ayudante obra | SALARIO: 1.160 000

B. REPORTE DE NOVEDADES

41. TIPO DE NOVEDAD
1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD [ ]
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS [ ]
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EPS Código [ ]
6. REINSCRIPCIÓN EN LA EPS [X]
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [ ]
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO [ ]
11. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
12. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
13. REVISIÓN: a) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO [ ] b) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO [ ]
14. TRASLADO: a) DESDE OTRA EPS [ ] b) DESDE LA EPS [ ]
15. RETIRO DE FALLECIDOS [ ]
16. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE [ ]
17. REPORTE DE LA CALIDAD DE VINCULADO [ ]
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

42. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | SEXO | FECHA NACIMIENTO
43. FECHA (a partir de) | 44. EPS ANTERIOR Código | 45. EXCEPCIÓN DEL TRABAJADO: Cotizante exonerado | Afiliado Entidad Salud | Cotizante Pensionado | Nivel Sisbén | 46. SALM DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

[illegible]

VIII. FIRMAS

*EDWIN E RODRIGUEZ

54. Firma del cotizante, cabeza de familia o beneficiario | [illegible] y/o de la entidad, agotado el debido proceso de afiliación contra institucional o de oficio y/o entregados los productos de servicio

IX. ANEXOS

[illegible]

nueva eps
RADICADO PARA ESTUDIO EPS
ASESOR COMERCIAL
17 [illegible]
DIEGO FERNANDO ARIAS DUEÑAS
C 1904

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

60. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio | Código del departamento
61. Datos del Solicitante: Número de Ficha | Puntaje | Nivel
66. Fecha de validación
70. Datos del funcionario que realiza la validación
Tipo documento de identidad | Número del documento de identidad
71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES: "Peregroso, Nuevo - Conectado - Aplicado Sin metodología de Sisben IV"

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

- ORIGINAL: E.P.S. -

Powered by CamScanner

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva eps
gente cuidando gente

NIT. 900.156.264-2

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo, Edwin Ernesto Rodriguez Galeano identificado (a) con T.I. [ ] C.C. [X] Otro: _____ número 1098633343 de Bucaramanga, certifico que:

1	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SI [X] NO [ ]
2	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	SI [X] NO [ ]
3	¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SI [X] NO [ ]
4	¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS?	SI [X] NO [ ]
5	¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, fue asesorado adecuadamente por la EPS?	SI [X] NO [ ]

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para dar envío información al teléfono celular No. 3186160810 y/o correo electrónico: _____

SI [X] NO [ ]

Autorizo la entrega de la carta de Derechos y Deberes del Afiliado y carta de Desempeño, en formato electrónico. SI [X] NO [ ]

Cordialmente,

Firma: X EDWIN E RODRIGUEZ
Tipo ID: CC No. ID: 1098633343
Fecha de Solicitud: 17/10/2023
Dirección: Calle SHN No 20-14
Tel: 3186160810 Municipio Bucaramanga
Departamento: Sder

Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:

Firma: _____
Tipo ID: _____ No. ID: _____
Fecha (dd/mm/aaaa): _____
Dirección: _____
Tel: _____ Municipio _____
Departamento: _____

Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hara NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A. consultada al reverso de este documento.

Información de NUEVA EPS
Asesor: Diego Arias Arenas
Código: C1904 Oficina: Girón

Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1999, a NUEVA EPS S.A. Para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service - , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.

Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

- Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
- Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
- Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúa como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
- Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.
- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.A., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.com.co
Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Línea Gratuita: 01 8000 954400
Línea de atención en Bogotá: 307 7022
Conmutador: (57 + 1) 4139000
Dirección Administrativa: Carrera 65A No. 46A – 66 Piso 2

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud del Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 "Habeas Data", dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Terminos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	POSEE VIVIENDA PROPIA	PROYECTO APROPIADO
			$	SI / NO	SI / NO

Nivel de Escolaridad: Ninguno / Primaria / Básica Primaria / Secundaria / Básica Secundaria / Media Académica o Clásica (Bachillerato) / Media Técnica / Normalista / Tecnológica / Profesional / Especialización / Maestría / Doctorado / Ultimo Grado / Ocupación

Posición Ocupacional: Patrón/Empleador / Contratista / Trabajador por su Cuenta

Inicio Contrato / Fin Contrato

SEÑOR USUARIO: [illegible]

SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE Nombre del Tercero / Tipo de Identificación: NIT / CC / CE / Identificación del Tercero que realiza el Aporte / DV

RECIBIDO ESTE PAGO POR TERCERO

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

Nombre del GESTOR o PROMOTOR: C1904 | CÓDIGO DE TOTAL PORTAFOLIO | Nombre DIRECTOR COMERCIAL | CÓDIGO DIRECTOR | Causal Inconsistencia(s) y/o Observaciones

Powered by CamScanner

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **RODRIGUEZ GALEANO EDWIN ERNESTO** identificado(a) con **CC** número **1.098.633.343** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 19 de abril de 2007 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 12 de octubre de 2023.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2023101223364

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	8784375
Nombre:	WILSON ANTONIO RIVERO TOLOZA
Fecha Ingreso:	27/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	26/9/2023 9:48:18 PM

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 29/09/2023, el empleador CONSORCIO SANTANDER identificado con NIT número 901677862 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6223259	29/09/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	8784375	WILSONANTONIO RIVERO TOLOZA	1160000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2023-09-27

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 29 días del mes de Septiembre del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **WILSON ANTONIO RIVERO TOLOZA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **8784375,** se encuentra afiliado/a desde **06/04/2001** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 29 de septiembre de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	37511566
Nombre:	MARIA EUGENIA MANRIQUE RUEDA
Fecha Ingreso:	28/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	27/9/2023 7:45:02 AM

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 29/09/2023, el empleador CONSORCIO SANTANDER identificado con NIT número 901677862 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6223256	29/09/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	37511566	MARIAEUGENIA MANRIQUE RUEDA	1160000	CONTRALOR DE TRAFICO, METRO	2023-09-27

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 29 días del mes de Septiembre del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MARIA EUGENIA MANRIQUE RUEDA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **37.511.566**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 29 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1005157888
Nombre:	EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ GUERRERO
Fecha Ingreso:	28/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	27/9/2023 9:48:05 PM

FORMULARIO UNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar

NIT 830.003.564-7

9010492456

9010492456

No. de Radicación: 26929644

Fecha de Radicación: 14 10 2023

Código de registro por la EPS:

DATOS DEL TRAMITE

1. Tipo de Usuario: A. Afiliado; B. Aspirante a Beneficiario: X
2. Tipo de Afiliado: A. Cotizante: X; B. Cónyuge; C. Compañero(a) permanente; D. Jefe de hogar; E. Hijo(a); F. Padre o madre; G. Otro familiar
3. Régimen: A. Contributivo; B. Excepción: X
4. Tipo de afiliado: A. Dependiente: X; B. Independiente; C. Beneficiario; D. Pensionado
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente: X; B. Independiente; C. Pensionado

4. AFILIACIÓN 5. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
RODRIGUEZ	GUERRERO	EDWIN	ORLANDO

7. Tipo de documento de identidad: CC
8. Número del documento de identidad: 1005157888
9. Sexo: Femenino; Masculino: X
10. Fecha de nacimiento: 09 09 2003
11. Edad
12. Parentesco
13. Puntaje SISBEN
14. Grupo de población especial
15. Nacionalidad (si es Negro, afrocolombiano, NARP, Raizal o Palenquero): NINGUNA
16. Autoreconocimiento de orientación sexual e identidad de género
17. Ingresos (en pesos): $1.160.000
18. Residencia: Zona: Urbana; Rural

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente solicitante)

19. Apellidos y nombres
20. Tipo de documento de identidad
21. Número del documento de identidad
22. Sexo: Femenino; Masculino
23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino; Masculino	28. Fecha de nacimiento	Datos complementarios: 29. Parentesco	30. Edad
01						
02						
03						
04						
05						

31. Discapacidad: Tipo (F, M, S, V); Complejo
32. Datos de residencia: Municipio / Distrito; Zona: Urbana, Rural; Departamento; Teléfono fijo con indicativo
33. Folio de la UAF del afiliado adicional a registrar por la EPS

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS
Código de la IPS a registrar por la EPS:

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social: CONSORCIO SANTANDER
36. Tipo de documento de identificación: NT
37. Número del documento de identificación: 901677862
38. Tipo de aportante a pagador de pensiones (no marcar en la EPS):
39. Número: CLL 49 21 46
40. Código: NT
41. Municipio: BUCARAMANGA
42. Departamento: SANTANDER

VI. REPORTE DE NOVEDADES

43. Tipo de Novedad
1. Identificación de nuevo tipo(s) de identificación(es)
2. Corrección de datos básicos de identificación
3. Actualización del documento de identificación
4. Actualización y corrección de datos complementarios
5. Terminación de la vinculación con la EPS
6. Cambio de régimen
7. Actualización de la información de los afiliados adicionales
8. Cambio de beneficiario a cotizante de afiliados adicionales
9. Error en traslado: retiro y reingreso
10. Terminación de la relación laboral o cambio de las condiciones para seguir cotizando
11. Incapacidad a una EPS suscitada (con retiro efectivo en esa EPS)
12. Diferenciación de una entidad existente para nuevos afiliados (colectivos)
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo: X; B. Régimen Subsidiado; C. Cambio a Régimen Especial; D. Cambio a Régimen Ordinario
14. Reporte de materia de protección al cesante
15. Reporte de la calidad de Pensionado
16. Reporte de la calidad de Pensionado

VII. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

44. Datos básicos de identificación
Tipo de documento de identidad
Número del documento de identidad
Sexo: Femenino; Masculino
Fecha de nacimiento
45. Fecha de novedad: 28 09 2023
46. EPS anterior
47. Número de planilla: Código
48. Código de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VIII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

49. Autorización de tratamiento de información de conformidad con la ley aplicable
50. Autorización de la información para el Registro Contributivo, Subsidiado y de Excepción
51. Declaración de no encontrarse afiliado en otra EPS del Régimen Contributivo o Subsidiado
52. Declaración de no encontrarse afiliado en otra EPS del Régimen Contributivo o Subsidiado
53. Autorización para que la EPS realice el descuento sobre el salario del cotizante y/o de la mesada pensional correspondiente
54. Autorización para que la EPS reporte la información a la ADRES sobre el ingreso de novedades y el retiro de afiliados adicionales
55. Autorización para que la EPS reporte la información a la ADRES sobre la vinculación y/o retiro de los beneficiarios y/o de los cotizantes adicionales, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1797 de 2016 y el Decreto 1077 de 2015
56. Autorización para que la EPS efectúe el descuento correspondiente al cambio de régimen de la novedad

IX. FIRMAS

Edwin Olando Rodriguez

X. ANEXOS

57. Copia del documento de identidad del cotizante
58. Copia del registro civil de nacimiento o documento de identidad de los beneficiarios
59. Copia de la prueba sumaria que acredite la calidad de hijastro, hijo adoptivo, hijo de crianza o hermano huérfano de padre y madre
60. Copia del certificado de afiliación o carné de la entidad de origen del menor
61. Copia de la orden judicial o decisión administrativa de custodia
62. Copia del documento en que conste la unión de la pareja y el certificado de declaración de convivencia
63. Copia de la autorización de traslado del cónyuge de la Fuerza Pública
64. Certificación de convivencia o vínculo familiar expedido por la unidad administrativa competente
65. Copia del acta de nombramiento, o constancia de los documentos completos en el que conste el cargo de cotizante del beneficiario o de quien lo afiliará en dicho cargo

XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial: Código del departamento; Código del municipio
67. Datos del RADICA: Número de la letra; Puntos; Nivel
68. Fecha de radicación
69. Fecha de validación
70. Datos del funcionario que realiza la validación
Tipo de documento de identidad
Número del documento de identidad
Nombres y apellidos
CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION
71. Firma del funcionario

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de los documentos entregados en el ejercicio de sus funciones.

Cambio Empleo

INTERNET

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ GUERRERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.005.157.888**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Octubre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1097490744
Nombre:	JOSE LUIS MONCADA GUERRERO
Fecha Ingreso:	28/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	27/9/2023 9:52:03 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas
Operación Sanitas Internacional
NIT. 800.251.440-6
CÓDIGO 031, Resolución de Habilitación – SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Fecha de Radicación: 04 | 06 | 2025

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se entregan con el formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual – Cotizante o Cabeza de Familia [ ] – Beneficiario o Afiliado adicional [ ]; B. Colectivo [ ]; C. Institucional [ ]; D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (A registrar por la EPS): [ ][ ]

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Moncada	Guevero	Jose	Luis
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
7. Tipo de documento de identidad: CC	8. Número del documento de identidad: 1.097.490.744	9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	10. Fecha de nacimiento: 18 / 04 / 2005

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo [ ] Condición [ ]	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
Colpatria	Proveer	1.160.000

18. Residencia – Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
Valle de los Caballeros			luisguevero@hotmail.com
Municipio / Distrito	**Zona: Urbana [X] Rural [ ]**	**Localidad / Corregimiento**	**Departamento**
			Santander

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo: F	N	M	Condición: T	P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	32. Datos de residencia – Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C		
B		
R		
D		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
Consorcio Santander	NIT	901677862	

39. Ubicación – Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
Calle 49 # 21-46			Bucaramanga	Santander

V. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad
  - [ ] A. Régimen Contributivo
  - [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado
  - [ ] A. Mismo Régimen
  - [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino / Masculino	Fecha de Radicación	42. Fecha
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]		[ ] / [ ]		28/09/2023

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado: Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de NO información del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [ ] 50. Autorización para que la E.PS. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [ ] 51. Autorización para que la E.PS. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran
- [ ] 52. Autorización para que la E.PS. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la E.PS. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Jose Luis Hernandez.	

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad

	CN	RC	TI	CC	CE	PA	CD	SC	Total
Cantidad									

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio / Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de Ficha / Puntaje / Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
[ ][ ] / [ ][ ]		D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario
[ ][ ][ ][ ][ ]		

Observaciones:

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Sticker procesamiento
C.C. No.		

Recuerda que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Fondo de Pensiones Obligatorias
Solicitud de Vinculación o Traslado

porvenir

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Nit. 800 144 331-3

Nº 23343488

23343488

44010426 | Ciudad: Bucaramanga | Fecha de Solicitud de Afiliación: 2023 09 28

1. Tipo de Vinculación

Vinculación Inicial
Marque con X, si el solicitante va a cotizar por primera vez y no ha estado afiliado nunca a una AFP, Colpensiones o Caja y desea vincularse a Porvenir
Pensiones Obligatorias: X

Traslado de AFP
Pensiones Obligatorias (Permanencia mínima de 6 meses en otra AFP)
Entidad Origen Traslado | Pensión Familiar
Entidad Destino

Traslado de Régimen
(Marque con X si el solicitante ha estado vinculado al régimen de prima media en alguna entidad oficial, en Colpensiones o cajas durante más de 5 años y desea vincularse a Porvenir)
Entidad Origen Traslado | Pensión Familiar
Entidad Destino

2. Datos Básicos

Tipo de Documento	Nº de Documento de Identidad	Fecha de Expedición del Documento de Identidad	Lugar de Expedición	Género	Es Pensionado (Jubilado)
CC TI CE PAS RC CD	1097490744	20230627	Giron	M F	SI NO

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres
Moncada	Guerrero	Jose	Luis

Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento	Nacionalidad
2005 04 18	Bucaramanga (Santander)	Colombiana / Otra ¿Cuál?

3. Datos de Localización

Dirección de Residencia	Barrio	Ciudad/Municipio
Mz 9 Ca 3	Villas de los Caballeros	

Departamento	Nº. de Teléfono Fijo	Nº. de Teléfono celular	Autorización de envío de información a través de medios electrónicos. Autorizo a Porvenir S.A. para enviar notificaciones, extractos y cualquier información de interés a mi correo electrónico y/o a mi teléfono celular. SI / NO
Santander		3188845361	

Dirección de Correo Electrónico (e-mail):

Dirección Laboral	Ciudad	Departamento	Nº. de Teléfono
Cra 17 H 15 37	Bucaramanga	Santander	3204251375

4. Datos Empleador e Información del Vínculo Laboral

Tipo de Documento	Nº de Documento de Identidad	Nombre y/o Razón Social
NIT CC CE PAS TI	901677862	Consorcio Santander

Ciudad	Dirección Empleador	Departamento	Teléfono(s)
Bucaramanga	Cra 17 H 15 37	Santander	3204251375

Ocupación o Cargo Actual	Salario o Ingreso Mensual	Salario Integral
Ayudante	$ 1160000	y/o $

Envío de Notificación	Sucursal Principal	Sucursal Ciudad	Tipo de Trabajador	Independiente Contratista	Dependiente	Independiente Voluntario
		X			X	

5. Datos Beneficiarios

Nombre y Apellido	Género	Tipo de Documento	Nº de Documento de Identidad	Fecha de Nacimiento	Código Parentesco
	M F				
	M F				
	M F				
	M F				

"Códigos parentesco: 01 Cónyuge 02 Compañero permanente 03 Padres 04 Hijo 05 Hijo inválido 06 Hermano inválido" "Los beneficiarios relacionados serán verdaderos de acuerdo con las normas legales vigentes."

6. Derecho a Bono Pensional

Tengo derecho al Bono Pensional porque antes de mi vinculación a Porvenir S.A. Estuve afiliado a Colpensiones, a una Caja o Fondo Prestacional y cotice 150 semanas
Entidad en la cual se realizó la cotización:
Tengo Derecho al Bono Pensional: SI NO X

7. Régimen de Transición e Información del Producto

Importante: Manifiesto que luego de haber recibido asesoría amplia y suficiente sobre el producto ofrecido, conozco y entiendo las implicaciones legales que tiene mi decisión de traslado al régimen de ahorro individual por medio de la Vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias de Porvenir S.A. particularmente en lo que tiene que ver con el régimen de transición establecido en la ley.

- Anexo la fotocopia de su documento de identidad ampliada al 150% en blanco y negro.

8. Término de Retracto

Recuerda que a partir del momento en que el fondo de pensiones te notifique sobre la validez de la afiliación o del traslado, cuentas con un término de cinco (5) días hábiles para ejercer tu facultad de retracto. (Decreto 1813 de 2020)

9. Voluntad de Selección y Afiliación

"Declaro bajo juramento que los antecedentes del trabajador incluidos en el presente contrato corresponden a la información que me ha sido suministrada"

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMPLEADOR

Hago constar que la selección del Régimen de Pens fue efectuada en forma libre y espontánea y sin presiones. Manifiesto que he elegido a Porvenir otra que administre mis aportes personales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos.

Jose Luis M.

FIRMA Y HUELLA DEL SOLICITANTE

10. Espacio para la Administradora

Nombre del Promotor:	Claudia Jamely Nuñez B.
No. de Identificación del promotor:	63544961 de Bga
Firma del promotor:	

Firma Autorizada del Representante Legal

DIC-21 F-01-AF-CR-01 V4.0

-Porvenir - Pensiones Obligatorias-

Nº 23343488

Powered by CamScanner

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA EXTRANJERÍA
Número de Documento	6509541
Nombre:	JOSE GIOVANNY MENDOZA RODRIGUEZ
Fecha Ingreso:	28/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	27/9/2023 10:01:04 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD
Es Por Ti la Diferencia

No. De Radicación	Fecha de Radicación
	29 09 20 23

I. DATOS DEL TRAMITE — Lea las instrucciones que se encuentran al reverso del formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [X] B. Registro de Novedades [ ]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual [ ] (Cotizante o Cabeza de Familia [ ], Beneficiario o Grupo adicional [ ]) B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (lo registra por la EPS)

II. AFILIACIÓN

III. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Mendoza (Primer apellido)	Rodriguez (Segundo apellido)	Jose (Primer Nombre)	Giovanny (Segundo Nombre)
7. Tipo de documento de identidad: PT	8. Número del documento de identidad: 6509541	9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]	10. Fecha de nacimiento: 27 09 1971

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Ocupación: Tipo	Condición	13. Parentesco	14. Grupo de población

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Fondo de Pensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC
Sura.	Porvenir.	1.160.000.

18. Residencia: Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono celular	Correo electrónico
Manzana O Casa 13 Altos 6			lulu6902@hotmail.com

Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento
Giron.	X		Santander

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente adicional

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	23. Fecha de nacimiento

Otros básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
02					
03					
04					
05					

Otros complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo I	Tipo II	Tipo III	Condición V	Condición VI
02							
03							
04							
05							

	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC adicional (lo registra por la EPS)
02						
03						
04						
05						

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (lo registra por la EPS)
C		
B		
D		
I		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador pensiones (lo registra por la EPS)
Consorcio Santander	NIT	901 677 862	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono	Municipio/Distrito	Departamento
Au Suba 106A # 28 91 82	mymenga@hotmail	Bogotá	

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
  Código: [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculaciones de una entidad autorizada afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad:
  - [ ] A. Régimen Contributivo
  - [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado:
  - [ ] A. Mismo Régimen
  - [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	28/09/2023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no intervención del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genera en la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio
Jose mendoza	

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
  Cantidad: [ ] Total: [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado (ver parte de la Superintendencia Nacional de Salud).
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación D D M M A A A A	69. Fecha de validación D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario
[ ]		

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

porvenir

Fondo de Pensiones Obligatorias
Solicitud de Vinculación o Traslado

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Nit. 800.144.331-3

Nº 23343511

23343511

4401042GA | Ciudad: Bucaramanga | Fecha de Solicitud de Afiliación: 2023 09 28

1. Tipo de Vinculación

Vinculación Inicial
Marque con X, si el solicitante va a cotizar por primera vez y no ha estado afiliado nunca a una AFP, Colpensiones o Caja y desea vincularse a Porvenir:
Pensiones Obligatorias: X

Traslado de AFP (Permanencia mínima de 6 meses en otra AFP)
Pensiones Obligatorias
Entidad Origen Traslado
Pensión Familiar
Entidad Destino

Traslado de Régimen
(Marque con X si el solicitante ha estado vinculado al régimen de prima media en alguna entidad oficial, en Colpensiones o cajas durante más de 5 años y desea vincularse a Porvenir)
Entidad Origen Traslado
Pensión Familiar
Entidad Destino

2. Datos Básicos

Tipo de Documento: CC TI CE PAS RC CD: CC
Nº de Documento de Identidad: PT 6509541
Fecha de Expedición del Documento de Identidad: 2022 0330
Lugar de Expedición: Bogota D.C
Género: M X F
Es Pensionado (Jubilado): SI NO X
Primer Apellido: Mendoza
Segundo Apellido: Rodriguez
Primer Nombre: Jose
Otros Nombres: Giovanny
Fecha de Nacimiento: 1971 06 27
Lugar de Nacimiento:
Nacionalidad: Colombiana X Otra ¿Cuál?: Venezolana

3. Datos de Localización

Dirección de Residencia: Mz O Ca 13 Apto 402
Barrio: Mirador San Juan
Ciudad/Municipio: Giron
Departamento: Santander
Nº. de Teléfono Fijo:
Nº. de Teléfono celular: 3177462270
Autorización de envío de información a través de medios electrónicos. Autorizo a Porvenir S.A. para enviar notificaciones, extractos y cualquier información de interés a mi correo electrónico y/o a mi teléfono celular. SI X NO
Dirección de Correo Electrónico (e-mail):

Dirección Laboral: Cra 17H 15 37
Ciudad: Bucaramanga
Departamento: Santander
Nº. de Teléfono: 3204251794

4. Datos Empleador e Información del Vínculo Laboral

Tipo de Documento: NIT X CC CE PAS TI
Nº de Documento de Identidad: 901677862
Nombre y/o Razón Social: Gregorio Santander
Ciudad: Bucaramanga
Dirección Empleador: Cra 19 14 15 37
Departamento: Santander
Teléfono(s): 3204251394
Ocupación o Cargo Actual: Ayudante
Salario o Ingreso Mensual: $ 1160000
y/o $
Salario Integral
Envío de Notificación
Sucursal Principal
Sucursal Ciudad: X
Tipo de Trabajador
Independiente Contratista
Dependiente: X
Independiente Voluntario

5. Datos Beneficiarios

Nombre y Apellido	Género	Tipo de Documento	Nº de Documento de Identidad	Fecha de Nacimiento	Código Parentesco
	M F				
	M F				
	M F				
	M F				

"Códigos parentesco: 01 Cónyuge 02 Compañero permanente 03 Padres 04 Hijo 05 Hijo inválido 06 Hermano inválido" "Los beneficiarios relacionados serán verdaderos de acuerdo con las normas legales vigentes."

6. Derecho a Bono Pensional

Tengo derecho al Bono Pensional porque antes de mi vinculación a Porvenir S.A. Estuve afiliado a Colpensiones, a una Caja o Fondo Prestacional y cotizé 150 semanas
Tengo Derecho al Bono Pensional SI NO X
Entidad en la cual se realizó la cotización:

7. Régimen de Transición e Información del Producto

Importante: Manifiesto que luego de haber recibido asesoría amplia y suficiente sobre el producto ofrecido, conozco y entiendo las implicaciones legales que tiene mi decisión de traslado al régimen de ahorro individual por medio de la Vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias de Porvenir S.A. particularmente en lo que tiene que ver con el régimen de transición establecido en la ley.

- Anexo la fotocopia de su documento de identidad ampliada al 150% en blanco y negro.

8. Término de Retracto

Recuerda que a partir del momento en que el fondo de pensiones le notifique sobre la validez de la afiliación o del traslado, cuentas con un término de cinco (5) días hábiles para ejercer tu facultad de retracto. (Decreto 1813 de 2020)

9. Voluntad de Selección y Afiliación

"Declaro bajo juramento que los antecedentes del trabajador incluidos en el presente contrato corresponden a la información que me ha sido suministrada"

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMPLEADOR

Hago constar que la selección del régimen de Ahorro Individual la he efectuado en forma libre y espontánea y sin presiones. Manifiesto que he elegido a Porvenir para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos.

FIRMA Y HUELLA DEL SOLICITANTE

10. Espacio para la Administradora

Nombre del Promotor: Claudia Janeth Niño D
No. de identificación del promotor: 63544961 de Alys
Firma del promotor:

Firma Autorizada del Representante Legal

DIC-21 F-01-AF-CR-01 V4.0

-Porvenir - Pensiones Obligatorias-

Nº 23343511

Powered by CamScanner

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1095924401
Nombre:	ANDERSON CHAYAN SANCHEZ REYES
Fecha Ingreso:	28/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	27/9/2023 9:55:47 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4011057764	3|0|0|9|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Las las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	A. Individual -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	(a registrar por la EPS): 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
SANCHEZ (Primer apellido)	REYES (Segundo apellido)	ANDERSON (Primer nombre)	CHAYAN (Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1065924401	Femenino ☐ Masculino ☒	1|0|0|1|1|0|0|0

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo [ ] Condición [ ]		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PORVENIR FPC	1160000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CL 14 C 15 39		3214675528	ANDERSONSANCHEZ78@HOTMAIL.COM

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
GIRON	Urbana ☒ Rural ☐		SANTANDER

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y/o los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de Identidad	26. Número de Identidad	27.Sexo Femenino	27.Sexo Masculino	28.Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo M	Tipo O	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	ALIANZA DIAGNOSTICA GIRON - ALIANZA DGG GIRON CF	ALIANGIRON - ALIANZAGPI
S	-	-
S	-	-
S	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de documento de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CONSORCIO SANTANDER	NIT	901677862	01

39.Ubicación

Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
CL 48 27 46	6700666	LULI3892@HOTMAIL.COM	BARRANCABERMEJA	SANTANDER

No de Radicacion
4011057704

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 8. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 9. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		28/08/2023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo,Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no información del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 53. ☐ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Anderson Sanchez	

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
  Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia ratificada de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que consta la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consista la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones

Recuerda que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **SANCHEZ REYES ANDERSON CHAYAN** identificado(a) con **CC** número **1.095.924.401** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 24 de noviembre de 2015 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 02 de octubre de 2023.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2023100216500

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	1092343342
Nombre:	HEIDER ALEXIS VILLAMIZAR DIAZ
Fecha Retiro:	04/09/2023
Fecha hora transacción:	28/10/2023 04:41:07 p.m.
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	91495273
Nombre:	GERMAN DIAZ MOYANO
Fecha Retiro:	05/09/2023
Fecha hora transacción:	28/10/2023 12:11:19 p.m.
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	1100963525
Nombre:	ANGIE LORENA MONSALVE ORDOÑEZ
Fecha Retiro:	14/09/2023
Fecha hora transacción:	28/10/2023 12:12:33 p.m.
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	91494372
Nombre:	MIGUEL ANGEL CACERES CARRILLO
Fecha Retiro:	13/09/2023
Fecha hora transacción:	28/10/2023 12:13:25 p.m.
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	1103471378
Nombre:	KEVIN FARID RODRIGUEZ SARMIENTO
Fecha Retiro:	30/09/2023
Fecha hora transacción:	28/10/2023 12:14:29 p.m.
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	1047341782
Nombre:	DAINER MAKEIMIS NARANJO GRAJALES
Fecha Retiro:	30/09/2023
Fecha hora transacción:	28/10/2023 12:16:16 p.m.
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	1265732
Nombre:	SIMON GREGORIO PEÑA PEÑA
Fecha Retiro:	30/09/2023
Fecha hora transacción:	28/10/2023 12:18:54 p.m.
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	91295674
Nombre:	LUIS EDUARDO MEJIA CRISTANCHO
Fecha Retiro:	30/09/2023
Fecha hora transacción:	28/10/2023 12:19:50 p.m.
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	91229173
Nombre:	DAVID GARCIA HERNANDEZ
Fecha Retiro:	30/09/2023
Fecha hora transacción:	28/10/2023 12:20:53 p.m.
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Mantener cerramientos, orden y aseo	Bodl & HSEQ	Diariomente
Señales del PMT en los frentes	HSEQ	Diricmente.
—	—	—

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Jorge Camilo	Agente de transito	
Bernardo Suciet Correño	HSEQ	
Vera Andrea Avila	Profesional Social	
Edward R Vera	Residente interventoria	Edward V.

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 22/09/2023 HORA INICIO: 9:00 a.m. ACTA N°: 004

LUGAR: Frentes de trabajo. HORA FIN: 10:00 a.m.

1. TEMAS A TRATAR

- Recorrido por los frentes de trabajo para revisar y dar seguimiento a las observaciones consignadas en el acta anterior. Revisar implementación del PMT.

2. AVANCES Y ACUERDOS

- Se realiza recorrido por el frente San Alonso Calle 20, se mantienen cerramientos para las etapas constructivas que se estan desarrollando en el frente. Tela verde para contener materiales petreos, tela doble para demolición, material señalizado con cinta peligro.
- Chapinero: se recomienda realizar aseo y lavado de la vía para evitar accidentes por deslizamiento de motos. Se mantiene señalización en el frente.
- Juventud: se recomienda mejorar señalización del PMT, cerramiento del material RCD. Se evidencia material petreo delimitado y señalizado.

FECHA	TEMA	No. ASISTENTES	DURACIÓN
1/09/2023	LA IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL	37	5 – 10 min
2/09/2023	AHORRO DE AGUA	37	5 – 10 min
3/09/2023	DOMINGO		
4/09/2023	SEÑALES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	37	5 – 10 min
5/09/2023	REPORTE DE ACCIDENTES	36	5 – 10 min
6/09/2023	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON PRODUCTOS QUÍMICOS	35	5 – 10 min
7/09/2023	EQUIPOS DE PROTECCION PARA OJOS Y CARA	35	5 – 10 min
8/09/2023	PROTECCIÓN AUDITIVA	35	5 – 10 min
9/09/2023	ALCOHOLISMO	35	5 – 10 min
10/09/2023	DOMINGO		
11/09/2023	ASEO EN EL TRABAJO	35	5 – 10 min
12/09/2023	INDUCCIÓN / ERGONOMÍA	35	50 min
13/09/2023	SEGURIDAD CON LA ELECTRICIDAD EN EL TRABAJO	35	5 – 10 min
14/09/2023	PROTECCIÓN DE MAQUINARIA	34	5 – 10 min
15/09/2023	ANALISIS DE RIESGO LABORAL	34	5 – 10 min
16/09/2023	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS - GENERAL	34	5 – 10 min
17/09/2023	DOMINGO		
18/09/2023	MANEJO MANUAL DE MATERIAL	34	5 – 10 min
19/09/2023	LEVANTAMIENTO - LESIONES DE ESPALDA	34	5 – 10 min
20/09/2023	INDUCCIÓN / CO2- EFECTOS EN LA SALUD	36	50 min
21/09/2023	MANEJO DE DESECHOS	36	5 – 10 min
22/09/2023	INDUCCIÓN / RECICLAJE	38	50 min
23/09/2023	CONSERVACIÓN DEL AGUA	38	5 – 10 min
24/09/2023	DOMINGO		
25/09/2023	USO INTELIGENTE DE LA LUZ	38	5 – 10 min
26/09/2023	INDUCCIÓN / CUIDADO DE PLANTAS	41	50 min
27/09/2023	INDUCCIÓN / CUIDADO VISUAL - USO EPP	44	50 min
28/09/2023	INDUCCIÓN / MANEJO DE ESTRES	49	50 min
29/09/2023	HIDRATACIÓN - IMPORTANCIA	49	5 – 10 min
30/09/2023	TRABAJO EN EQUIPO	44	5 – 10 min

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL — AL 12 DE Septiembre	Lugar: Oficina	Duración: 30 min
Tema: —	Tema: Inducción	
Tema: —	Tema: —	
Tema: —	Tema: —	

INDUCCIÓN	X	BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Cantón	1098620599	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	John Carlos Jaimes N	91249578	Director Obra
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 28 AL 02 DE Agosto-Sept.	Lugar: San Alonso Cll 20	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sierra Gomez	1098620599	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Dainer Naranjo	1047341782	Oficial
2	Luis Mejia	91295614	Ayudante
3	Jaime Muñoz	1091135201	Oficial
4	Simon Peña	1265732	Ayudante
5	David Ecrdo.	91729173	Ayudante
6	Luis Florian	1065590063	Oficial
7	Jose Espinosa	5685373	Ayudante
8	Brayan Norena	1098786346	Oficial
9	Omar Larota	1095804014	Ayudante
10	Yerson Ospino	1005325662	Ayudante

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	Dainer	Dainer	Dainer	Dainer	Dainer	Dainer
2	Luis Mejia	Luis mejia	Luis Mejia	Luis mejia	Luis mejia	Luis mejia
3						
4						
5	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH
6	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian
7	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose
8	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan
9	Omar L	Omar L	Omar L	Omar L	Omar L	Omar L
10						

Acepto la política de privalidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	
		(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 4 AL 9 DE Septiembre	Lugar: San Alonso Cll 20	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sierra Gomez	1098620599	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Dainer Naranjo	1047341782	Oficial
2	Luis Mejia	91295674	Ayudante
3	Jaime Muñoz	1091135201	Oficial
4	Simon Pena	1265732	Ayudante
5	David Erazo	91729173	Ayudante
6	Luis Florian	1065590063	Oficial
7	Jose Espinosa	5685373	Ayudante
8	Brayan Noriega	1068786346	Oficial
9	Omar Larrota	1095804014	Ayudante
10	Yerson Ospino	1005325662	Ayudante

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	Dainer	Dainer	Dainer	Dainer	Dainer	Dainer
2	Luis Mejia	Luis mejia	Luis mejia	Luis mejia	Luis mejia	Luis mejia
3						
4						
5	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH
6	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian
7						
8	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan
9	Omar L	Omar L	Omar L	Omar L	Omar L	Omar L
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 11 AL 16 DE Septiembre	Lugar: San Alonso Cll 20	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sicinia Gomez	1098620599	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Dainer Naranjo	1047341782	Oficial
2	Luis Mejia	91295614	Ayudante
3	Jaime Muñoz	1091135201	Oficial
4	Simon Peña	1265732	Ayudante
5	David Erazo	91129173	Ayudante
6	Luis Florian	1065590063	Oficial
7	Jose Espinosa	5685373	Ayudante
8	Brayan Noriega	1098786346	Oficial
9	Omar Lavota	1095804014	Ayudante
10	Yerson Ospino	1005325662	Ayudante

No.	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1						
2	Luis Mejia	Luis mejia	Luis mejia	Luis mejia	Luis mejia	Luis mejia
3						
4						
5	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH
6	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian
7						
8	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan
9	Omar L	Omar L	Omar L	Omar L	Omar L	Omar L
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 18 AL 23 DE Septiembre	Lugar: San Alonso Cll 20	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Gomez	1098620599	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Dainer Naranjo	1047341782	Oficial
2	Luis Mejia	91295614	Ayudante
3	Jaime Muñoz	1091135201	Oficial
4	Simon Peña	1265732	Ayudante
5	David Ecrde.	91729173	Ayudante
6	Luis Florian	1065590063	Oficial
7	Jose Espinosa	5685373	Ayudante
8	Brayan Noriega	1098786346	Oficial
9	Omar Larota	1095804014	Ayudante
10	Yerson Ospino	1005325662	Ayudante

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1						
2						
3						
4						
5	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 25 AL 30 DE Septiembre	Lugar: San Alonso Cll 20	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Simon Gomez	1098620599	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Dainer Naranjo	1047341782	Oficial
2	Luis Mejia	91295614	Ayudante
3	Jaime Muñoz	1091135201	Oficial
4	Simon Peña	1265732	Ayudante
5	David Ecarte	91129173	Ayudante
6	Luis Florian	1065590063	Oficial
7	Jose Espinosa	5685373	Ayudante
8	Brayan Noriega	1098786346	Oficial
9	Omar Larota	1095804014	Ayudante
10	Yerson Ospino	1005325662	Ayudante

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1						
2	Luis Mejia	Luis mejia	Luis Mejia	Luis mejia	Luis mejia	Luis mejia
3						
4						
5	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH
6	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian
7						
8	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan
9	Omar L	Omar L	Omar L	Omar L	Omar L	Omar L
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 28 AL 2 DE Agosto - Sept	Lugar: Chapinero	Duración: 3- 10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Gomez	1098[illegible]36	HSEQ	Bernardo Suárez Gomez

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Miguel Gomez	91464372	Ayudante
2	Henry Montilla	91235617	Ayudante
3	Jose Rios	1098654573	Oficial
4	Carmen Diaz	91493273	Oficial
5	Edison Prado	1098712615	Oficial
6	Diego Beltesi	1234 39539	Ayudante
7	Edgar Martinez	91487777	Oficial
8	Ricardo Arenales	1095[illegible]217	Ayudante
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel
2	Henry	Henry	Henry	Henry	Henry	Henry
3	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose
4	Carmen	Carmen	Carmen	Carmen	Carmen	Carmen
5	Edison	Edison	Edison	Edison	Edison	Edison
6	Diego B	Diego B	Diego B	Diego B	Diego B	Diego B
7	Edgar	Edgar	Edgar	Edgar	Edgar	Edgar
8	RHA	RHA	RHA	RHA	RHA	RHA
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 4 AL 9 DE Septiembre	Lugar: Chapinero	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Correa	1098620594	HSEQ	Bernardo Suárez Correa

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Kevin Eduardo Rodriguez S	1136911578	Inspector
2	Jhon Jaime Gutierrez	91449 914	Ayudante.
3	Henry Montilla	91211617	Ayudante
4	Diego Andres Beltrosi	Merchan CC 1149539539	Ayudante.
5			
6			
7			
8			
9			
10			

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Kevin Eduardo	Kevin Eduardo	Kevin Eduardo	Kevin Eduardo	Kevin Eduardo	Kevin Eduardo
Jhon Jaime					
Henry	Henry	Henry	Henry	Henry	Henry
Diego Beltrosi	Diego Beltrosi	Diego Beltrosi	Diego Beltrosi	Diego Beltrosi	Diego Beltrosi

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 11 AL 16 DE Septiembre	Lugar: Chapinero	Duración: 1-5 días
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Cortés	1098660559	HSEQ	Bernardo Suárez Cortés

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Kevin Fernando Rodriguez S	1136911578	Inspector
2	Jhon Jaime Gutierrez	91449 914	Ayudante
3	Henry Montilla	91211617	Ayudante
4	Diego Andres Barbosa	Marchan cc 1098533539	Ayudante
5			
6			
7			
8			
9			
10			

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Kevin Rodriguez	Kevin Rodriguez	Kevin Rodriguez	Kevin Rodriguez	Kevin Rodriguez	Kevin Rodriguez
Jhon Gutierrez		Jhon Gutierrez	Jhon Gutierrez	Jhon Gutierrez	Jhon Gutierrez
Henry Montilla	Henry Montilla	Henry Montilla	Henry Montilla	Henry Montilla	Henry Montilla
Diego Barbosa	Diego Barbosa	Diego Barbosa	Diego Barbosa	Diego Barbosa	Diego Barbosa

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 18 AL 23 DE Septiembre	Lugar: Chapinero	Duración:
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Carrillo	1098605492	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Kevin Fabian Rodriguez	1107422328	Inspector
2	Jhon Jaime Gutierrez	91449141	Ayudante
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 25 AL 30 DE Septiembre	Lugar: Chapinero	Duración: 1-5 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	x	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	x	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Carrero	1098610579	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Kevin Floyd Rodriguez S	1103491378	Inspector
2	Ihon Jaime Gutierrez	91444 914	Ayudante
3	Henry Montilla	91211617	Ayudante
4	Diego Andres Beibesi	Merchan CC 1234539534	Ayudante.
5			
6			
7			
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	Kevin Rodriguez	Kevin Rodriguez	Kevin Rodriguez	Kevin Rodriguez	Kevin Rodriguez	Kevin Rodriguez
2						
3						
4	Diego Beibesi	Diego Beibesi	Diego Beibesi	Diego Beibesi	Diego Beibesi	Diego Beibesi
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 11 AL 16 DE Septiembre	Lugar: Juventud	Duración: 5- 10 MIN
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sierra Cortes	1098620594	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Duvan Noriega	1047341732	aprendiz
2	Jaime Muñoz Ortega	1091773202	aprendiz
3	Luis Eduardo Mejia Contreras	91.295.679	Ayudante
4	Simón Gregorio Peña Peña	12 65.732	Ayudante
5	David Garcia Hernandez	91.229.173	Ayudante
6			
7			
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1						
2						
3						
4						
5	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 18 AL 23 DE Septiembre	Lugar: Juventud	Duración: 50 Min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN	X	BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Cortés	1.098620599	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Duvan Noriega	1047341782	oficial
2	Jaime Muñoz Ortega	1091773207	Oficial
3	Luis Eduardo Mejia Castancho	91.295.694	Ayudante
4	Simón Gregorio Peña Peña	1.2 65.732	Ayudante
5	David Garcia Hernandez	91.229.173	Ayudante
6	Omar Alexis Blanco	1007193091	Inspector de obra

No.	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1						
2						
3						
4						
5	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH
6			O. B.	O. B.	O. B.	O. B.
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 25 AL 30 DE Septiembre	Lugar: Juventud	Duración: 5-10min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sierra Carrero	1098610591	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Daimer Naranjo	1.097.341.782	Oficial
2	Jaime Muñoz Ortega	1.091.135.202	Oficial
3	Luis Eduardo Mejia	91.295.679	Ayudante
4	Simón Gregorio Peña	1.265.732	Ayudante
5	David Garcia Hernandez	91.229.178	Ayudante
6	Omar Alexis Blanco	1.007.193.091	Inspector
7	Yelson Duran Higuera	1.232.890.403	Ayudante
8	Luis Miguel Naranjo	1.052.963.666	Ayudante
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	Daimer	Daimer	Daimer	Daimer	Daimer	Daimer
2						
3						
4						
5	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH
6						
7				YELSON	YELSON	YELSON
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

AXA COLPATRIA

Certificado de accidentalidad

ARL AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A
NIT. 860.002.183

CERTIFICA

Que la empresa CONSORCIO SANTANDER identificada con NIT 901677862 con contrato de afiliación No. 9016441 afiliada a ARL AXA COLPATRIA desde el 22-03-2023 cotizando con nivel de riesgo 5 presenta las siguientes estadísticas respecto a accidentes de trabajo:

DATOS DEL CERTIFICADO

Datos	2023
Número de Trabajadores:	64
Horas hombre trabajadas teóricas:	134,782
Accidentes Laborales:	2
Enfermedad Laboral:	0
Incapacidad permanente parcial (IPP):	0
Número de casos de invalidez:	0
Número de casos fatales:	0
Total días perdidos y cargados:	86
Total días por incapacidad temporal:	86
Días cargados por IPP:	0
Dias cargados por invalidez:	0
Dias cargados por fatales:	0

INDICES DEL CERTIFICADO

Datos	2023
Tasa de accidentalidad:	3.12
Indice de frecuencia:	3.56
Indice de severidad:	153.14
Indice lesion incapacitante:	0.55

"El presente documento fué obtenido por la empresa CONSORCIO SANTANDER del portal transaccional de AXA COLPATRIA Seguros de Vida S.A. Administradora de Riesgos Laborales, usando las claves asignadas para dicha entidad. Su contenido refleja los reportes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y demás información suministrada por la empresa a la Administradora de Riesgos Laborales"

La presente solicitud se expide a los (29-10-2023)

Código de verificación

d5484044-7c16-402d-bc23-b1bb051f0b50

INFORME MENSUAL SOCIAL N. 7

LINEAMIENTOS PARA EL COMPONENTE DE GESTION SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 022 DE 2023

"ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER GRUPO N. 1

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER

FRENTES DE TRABAJO:
Barrios: El rosal, Campo Madrid, La independencia, la Juvetud, Chapinero, San alonso, La aurora, Albania, Transicion V, La universidad.

PERIODO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INFORME PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
PROFESIONAL SOCIAL	**INGENIERA RESIDENTE**	**DIRECTOR DE OBRA**
Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Layde iliana velandia torres	Juan Carlos Jaimes Niño
 Elaboró	 Revisó	 Aprobó

Bucaramanga- Santander

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN **5**
2. OBJETIVOS 6
2.1 Objetivos generales 6
2.2 Objetivos específicos 6
3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO **7**
3.1 Localización **7**
4. ETAPA DE PRELIMINARES **9**
4.1 Metodologia y cronograma del plan de dialogo ciudadano y comunicaciones estratetigas **9**
4.2 Actividades **9**
4.3 Informe de la etapa de preliminares 9
5. LINEAS ESTRATEGICAS DEL PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA **11**
5.1 Línea Estratégica del Dialogo Ciudadano 11
5.1.1 Programa de servicio a la ciudadania **11**
5.1.2 Punto de atención al ciudadano (PQRSD) 11
5.1.3 Gestionar y tramitar solicitudes peticones, quejas y reclamos de la ciudadanía de manera eficaz y oportuna **11**
5.1.4 Recorridos Urbanos **15**
5.1.5 Conformacion de comité de veeduría **30**
6. PROGRAMA DE DIALOGO Y PARTICIPACION CIUDADANA **31**
6.1 Reunion de inicio **31**
6.2 Reunion de avance de obra Veeduria Ciudanana **31**
6.3 Reunion de cierre de obra **33**
6.4 Programa de acompañamiento a actividades técnicas **33**
6.4.1 Actas de vecindad y/o entorno **33**
6.4.2 Otras actividades **37**
7. PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD **39**
7.1 Gestion y articulación institucional **39**
7.2 Mano de Obra no Calificada **39**
8. LINEA ENTRATEGICA – COMUNICACIÓN ESTRATEGICA **43**
8.1 Programa de información para el desarrollo del proyecto articulación contratista, interventoria y Municipio de Bucaramanga **43**
8.2 Volante de información **45**
8.2.1 Tecnologias de la información y comunicación **46**
9. DIVULGACION DE PIEZAS INFORMATIVAS AL CIUDADANO **47**
9.1 Valla informativa **47**

9.2 Divulgacion del plan de manejo de Transito - PMT **47**

9.2.1 Cintas de seguridad **48**

9.2.2 Controlador de trafico **48**

10. INFORME MENSUAL **49**

11. BITACORA SOCIAL **50**

8 **12. CONCLUSIONES** **51**

13. ANEXOS.....**52**

LISTADO DE FIGURAS

Pag.

Figura 1. Soportes de implementación **9**

LISTADO DE TABLAS

Pag.

Tabla 1. Barrios itervenidos hasta el mes de Septiembre **7**

Tabla 2. Direcciones de barrios intervenidos en contratación hasta el mes de septiembre **8**

Tabla 3. Punto de atención al ciudadano **11**

Tabla 4. PQRS **15**

Tabla 5. Sectores recorridos urbanos..... **30**

Tabla 6. Recorrido veeduría San Alonso..... **32**

Tabla 7. Recorrido veeduría Campo Madrid **33**

Tabla 8. Acta de vecindad inicio Barrio Albania Madrid..... **34**

Tabla 9. Acta de vecindad inicio Barrio la Juventud..... **35**

Tabla 10. Actas de vecindad en general **36**

Tabla 11. Fechas de realización actas de vecindad inicio **36**

Tabla 12. Direcciones actas de servicios publicos y arriendo de campamento **37**

Tabla 13. Personal ingreso en el mes de septiembre **42**

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe relaciona las actividades realizadas por el Consorcio Santander desde el área social en el periodo comprendido desde el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023.

La Alcaldía de Bucaramanga y la secretaria de Infraestructura mediante contrato suscrito 022-2023 del 10 de febrero de 2023 con la firma **CONSORCIO SANTANDER**; cuyo objeto establece **LA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA, SANTANDER – GRUPO 1**.

El Componente Dialogo Ciudadano y Comunicación Estrategica dará alcance a los lineamientos definidos en el Anexo Técnico para la Gestión Social y para ello debe existir una comunicación constante y directa con el equipo social de la secretaria de Infraestructura, los lineamientos permiten orientar la gestión del Consorcio Santander en el desarrollo de las obras; para que a partir de éste y con el liderazgo del equipo social se puedan realizar procesos tendientes a lograr la participación activa de la comunidad para la apropiación y cuidado de las obras de infraestructura, que contiene Linea estratégica de diaologo ciudadano, programa de servicio a la ciudadanía, programa de dialogo y participación ciudadana, programa acompañamiento actividades técnicas, programa de gobernanza para la movilidad.

Como propósito el presente informe permite consignar las diferentes actividades de orden social, desarrolladas por el Consorcio Santander, iniciadas a partir de la firma de Acta de Inicio, con las actividades contractuales para el buen desarrollo del proyecto, cuyo periodo esta comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023.

El Consorio Santander certifica que el presente documento es veraz, legal y está vigente a la fecha de entrega del Informe Mensual del área Social correspondiente al Informe No 07. La información consolidada es producto de los registros consignados en el informe mensual, los datos se consideran válidos partiendo del principio constitucional de la “buena fe”.

Finalmente, se presentan las conclusiones con las acciones llevadas a cabo para la optimización de los recursos asignados al proyecto, buscando el cumplimiento del objeto de los contratos y las metas físicas propuestas al inicio de este.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El consorcio Santander implemento la gestión social en las obras las cuales se adelantaran en el marco de los proyectos de infraestructura urbana en el municipio de Bucaramanga-Santander mediante procedimientos sociales adecuados, que contribuyan a reducir y mitigar los impactos de las obras en sus áreas de influencia, a través de los contratistas, trabajares y demás personas que participan en la ejecución del contrato de obra 022- del 2023 **"ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"** mediante procedimientos de acompañamiento a la comunidad y de herramientas sociales adecuadas.

2.2 Objetivos Especificos

Informar

- Se dio a conocer a la comunidad en general el estado de la infraestructura existente de andenes, pasamanos, escaleras entre otros y las actividades que ejecutara el consorcio Santander a través de los diferentes contratos suscritos por la entidad.
- Se implemento campañas informativas de la obra, para los diferentes tipos de población del sector.
- Generar contenidos de valor acerca de los beneficios que tiene para la ciudadanía con la construcción y las acciones de dialogo, formación y participación ciudadana.

Mitigar

- Implementar las acciones necesarias para mitigar los impactos ocasionados por la ejecución de la obra andenes, pasamanos y escaleras en el municipio de Bucaramanga.
- Se dio respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad y propender por el bienestar de la comunidad, de los trabajadores y contratistas respetando y protegiendo el entorno natural y urbano.

Articular

- Mediante el consocio Santander se consolidará y dinamizará estrategias de gobernanza para la coordinación y el trabajo colaborativo interinstitucional para el avance y ejecución del proyecto que potencien la transformación y integral del municipio de Bucaramanga.

Apropiar y sostener

- Se formulo y ejecuto el lineamiento para el componente de gestión social por parte del Consorcio Santander a la comunidad en general, así como las actividades que se desarrollaran en las etapas de pre-contruccion de la obra, etapa de construcción y etapa de habilitación de espacios del proyecto, con el fin de cumplir los objetivos y la sostenibilidad social.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El municipio de Bucaramanga, a través de la secretaria de Infraestructura tiene a cargo la ejecución, dirección, planeación, formulación, control de los planes, proyectos y programas de la administración municipal en materia de inversión en infraestructura de acuerdo con el plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. Para el cumplimiento de esta función, se requiere adelantar actuaciones vitales para la ciudad, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, consolidando espacios necesarios para el desarrollo humano integral, la convivencia, la paz y la salud. Con ello se quiere garantizar un adecuado acceso a sus comunidades, logrando la accesibilidad e inclusión. Para lo anterior la secretaria de infraestructura ejecuto el presente proyecto cuyo objeto es "**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER".**

3.1 Localización

El grupo 1 del consorcio Santander expone los barrios asignados con sus respectivas direcciones.

- La población objeto del cuarto informe de gestión social corresponde a los siguientes once (11) frentes:

GRUPO	COMUNA	BARRIO
Grupo 1	**1 Norte**	El rosal
		Campo Madrid
	2 Nor- oriental	La independencia
		La juvetud
		Transicion V
	3 San francisco	Chapinero
		La universidad
	13 Oriental	San Alonso
		La aurora
	14 Morrorico	Albania

Tabla 1: Barrios intervenidos hasta el mes de septiembre.

- En resumen, los sitios a intervenir son los siguientes por grupo:

GRUPO 1
Costado occidente de la cra 20 desde la calle 54n hasta la calle 56n (El rosal)
Costado oriente de la cra 20 desde la calle 56n hasta la calle 58n (El rosal)
Costado oriente cll 58n desde la cra 20 hasta volver a encontrarse con la intersección con la cra 20 (El rosal)
Cra 10 frente al parqueadero de las torres de campo Madrid (Campo madrid)
Cra 23ª entre calle 2- 22 (Transicion V)
Cra 25 entre calles 3 y 5 (Independencia)
Cra 19 entre 3 y 4 (Independencia)
Cra 21b con cra 3 (Independencia)
Cra 24ª entre calles 3ª - 3b y 4 (Independencia)
Cra 24b entre calles 3b y 4 (Independencia)
Calle 1n entre cra 21bb hasta la cra 20ª (La juventud)
Cra 20ª entre calle 1 calle 1n (La juventud)

Cra 20c entre calle 1an y calle 2n (La juventud)
Calle 3n entre cra 21 y cra 21ª (La juventud)
Calle 7n entre cra 20 y 19 (La juventud)
Calle 5n entre cra 18 y 19 (La juventud)
Costado sur de la calle 4 entre cra 16 y 17 (Chapinero)
Costado occidental de la cra 17 entre calles 4 y 5 (Chapinero)
Costado norte calle 5 entre carrera 17 y 16 (Chapinero)
Costado oriental cra 29 entre calle 10 y 11 (La universidad)
Calle 9ª entre carreras 24 y 25 costado norte (La universidad)
Calle 20 entre carreras 29 y 30 costado sur (San alonso)
Calle 29 entre carreras 29 y 30 costado norte (San alonso)
Costado occidental de la cra 33ª entre calles 17 y 19 (San Alonso)
Calle 31 con cra 29 hasta cra 28 (La aurora)
Cra 51 desde la casa n° 18-61 hasta la casa n° 20-67 (Albania)

Tabla 2. Direcciones de barrios intervenidos en contratación hasta el mes de septiembre.

4. ETAPA DE PRELIMINARES

4.1 Metodologia y cronograma del plan de dialogo ciudadano y comunicaciones estratetigas:

El consorcio Santander realizo una revisión de la información correspondiente al contrato 022-2023 del Municipio de Bucaramanga relacionados con el proyecto, con el animo de hacer entrega de los siguientes documentos conforme a los lineamientos establecidos por el Municipio, a través de la secretaria de Infraestructura:

4.2 Actividades:

- Se realizo una Actualizacion del directorio de instituciones, equipamientos y actores sociales, con la finalidad que el Consorcio Santander identificará a todas las organizaciones, lideres, instituciones y demás actores funcionales para el proyecto a ejecutar.
- Se elaboro del Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación estrategia, dentro del tiempo estipulado por interventoria después de la firma del acta de inicio del contrato.
- El Consorcio Santander implemento metodologías para la elaboración de las actas necesarias, especificas en el programa de acompañamiento a Actividades Técnicas.
- Se relizaron las mesas de trabajo necesarias, con el consorcio, interventoría e Municipio de Bucaramanga, a través de la secretaria de infraestructura, donde se establecieron los lineamientos para la elaboración de los documentos, a fin de desarrollar las acciones de dialogo ciudadano y comunicación estratégica, de acuerdo a los tiempos del contrato.

4.3 Informe de la etapa de preliminares

- Se entrego el Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica el cual fue aprobado satisfactoriamente por interventoria.
- Se realizaron las Actividades y soportes de la ejecución del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica en la etapa de preliminares adecuadamente.
- Se continua con la implementación de la línea telefónica y correo electrónico corporativo.




Figura 1. Soportes de implementación

- Soportes de la gestión de las piezas de comunicación necesarias para el desarrollo

de la de etapa preliminares, de acuerdo con el Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica aprobado por la interventoría.

- Descripción de las actas de vecindad debidamente suscritas por el contratista, interventoría y comunidad, con el listado maestro de estas.
- Demás soportes de las gestiones y/o actividades realizadas durante la etapa.
- El informe será un anexo del informe de preliminares de la interventoría.

5. LINEAS ESTRATEGICAS DEL PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

5.1 Línea Estratégica del Dialogo Ciudadano

5.1.1 Programa de Servicio a la Ciudadania:

Este ítem esta enfocado en generar e incentivar ciudadanías corresponsables con lo público para la construcción conjunta del hábitat y el adecuado desarrollo del proyecto.

5.1.2 Punto de Atención al Ciudadano (PQRSD):

Desde el área social y con apoyo de la comunidad beneficiaria se crean puntos de atención al ciudadano con el fin de atender, gestionar y tramitar las diferentes PQRSD de manera oportuna y promover un dialogo directo con la comunidad en relación con la ejecución del proyecto.

Con el ánimo de mantener una comunicación constante con la comunidad, junta de acción comunal y ediles de cada uno de los residentes del área de influencia directa del contrato de obra en mención, se establece un punto de atención en cada uno de los frentes de obra y se tiene en cuenta que el horario para atención por barrio es el siguiente:

ATENCION AL CIUDADANO				
BARRIO	**HORARIO**	**UBICACIÓN:**	**LINEA TELEFONICA**	**CORREO**
Albania	Lunes 9:00am – 12:00p	Cra 51 desde la casa n° 18-61.	317-769-7670	Consorciosantanderbga@gmail.com
Rosal	Martes 9:00am – 12:00p	Cancha de tierra el rosal.	317-769-7670	Consorciosantanderbga@gmail.com
San alonso	Miércoles 9:00am – 12:00p	Calle 20 #29-69	317-769-7670	Consorciosantanderbga@gmail.com
La Juventud	Jueves 9:00am – 12:00p	Calle 1n entre cra 21 y cra 21ª	317-769-7670	Consorciosantanderbga@gmail.com
Chapinero	Viernes 9:00am – 12:00p	Calle 4 entre cra 16 y 17	317-769-7670	Consorciosantanderbga@gmail.com

Tabla 3: Punto de atención al ciudadano

Ademas se muestra evidencia fotografica de cada punto PAC en los diferentes frentes activos.

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 - 2023	FECHA:	Septiembre
OBJETO:	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER** **Grupo 1**		
			
Punto PAC SAN ALONSO	Punto PAC CHAPINERO	Punto PAC JUVENTUD	Punto PAC ROSAL

5.1.3 Gestionar y Tramitar Solicitudes Peticiones, Quejas y Reclamos de la Ciudadanía de manera Eficaz y Oportuna

Se creó un formato de PQRS en el cual se registran los diferentes requerimientos de la comunidad aferente al proyecto, documento que se encuentra en el Punto de Atención al Ciudadano PAC, teniendo en cuenta los horarios establecidos, además se les compartió el número de contacto de la profesional social y el correo electrónico con los cuales se pueden comunicar.

Mensualmente se realizá un consolidado de las manifestaciones ciudadanas que se presentan durante el período reportado, informando los tramites y las respuestas a cada una de ellas.

En este informe de ejecución se recibieron ocho (8) PQRS, las cuales se les dio tramite y su respectiva respuesta a la comunidad. *(Anexo 1 Pqrs).*

PQRS		
Fecha	**Sector**	**Entidad que da respuesta**
29/ Agosto/ 2023	En el barrio San Alonso el señor Alfonso Niño Perez, solicita la intervención completa del anden en frente de la propiedad ubicada en la calle 21 No. 29-54, ya que el alcance del contrato para la zona determinada como calle 20 entre cra 29 y 30 costado sur solo llega hasta la construccion de una rampa peatonal que no excede mas de 3 metros lineales del paramento del predio, dando	Contratista Profesional social contratista Pqrs cerrada

	respuesta no favorable a dicha solicitud, se le informa al propietario que no se ejecutara mas actividades para construcción de espacio publico en la zona solicitada, debido a que se realizo un balance presupuestal y no se cuenta con el recurso necesario para la ejecución del área solicitada.	
05/ Septiembre / 2023	En el barrio Chapinero la señora Lisbeth Medina solicita acceso a rampa para discapacitados en la vivienda ubicada en la Cra 17 No. 43 barrio chapinero, se le comunica que no se dejara rampa de acceso peatonal al predio, ya que de acuerdo a revisión por parte de interventoria dan una desaprobacion; esto obedece a que en el manual de espacio publico las rampas peatonales deben ir exclusivamente en las esquinas o intersecciones viales, el peticionario puede hacer uso de las rampas vehiculares mas cercanas a la propiedad para hacer los desplazamientos de la persona con limitación de movilidad.	Parte técnica contratista Residente de interventoria JESAK SAS Pqrs cerrada
11 / Septiembre / 2023	En el barrio San Alonso en el edificio Habitar de Florenza ubicado en la Calle 20 No. 29-18 solicitan arreglar y/o corregir la entrada del edificio, ya que residentes han observado que el anden quedo mas alto que el área de la entrada al edificio lo cual podría generar un empozamiento de agua por fuertes lluvias, por tal se le pide al contratista dejar un nivel adecuado para asi evitar empozamientos a futuro.	Residente de interventoria JESAK SAS Pqrs cerrada Parte técnica contratista
11 / Septiembre /2023	En el barrio San Alonso en el edificio Habitar de Florenza ubicado en la Calle 20 No. 29-18 solicitan corregir la rampa de acceso vehicular ya que manifiestan que se están viendo afectados al hacer el radio de giro para tomar la via ya que la llanta del carro alcanza a coger y golpear el sardinel, a su vez manifiestan que la via es de alto trafico, lo cual impide avanzar la calzada de forma recta. En respuesta a la solicitud se les manifiesta que en visita con interventoria se hizo la respectiva revisión de la contruccion de la	Profesional residente de interventoría JESAK SAS Profesional social contratista. Pqrs cerrada

	rampa vehicular a lo cual manifestamos que, de acuerdo al manual de espacio publico de Bucaramanga, la rampa vehicular del predio cumple con los diseños y especificaciones técnicas correspondientes a la rampa construida dejando los radios de giro adecuados para maniobra de los conductores.	
14/ Septiembre / 2023	En relación a la petición de la propiedad ubicada en la Cra 29 No.19 -67 ubicado en el barrio San Alonso, en la cual se solicita la intervención del área completa de vegetación tupida que se encuentra enseguida del edificio con nomenclatura Cra No. 19-67 ya que el estado de la franja ambiental es muy alta y tupida, lo cual está generando inseguridad del área y la zona para los residentes del sector. Dando respuesta a lo anterior el contratista notifica que su petición fue positiva, ya que se aprueba por parte de interventoría este sendero ejecutando aproximadamente 45 metros cuadrados, ya que se realiza un balance presupuestal y se cuenta con el recurso necesario para la ejecución de la obra	Profesional residente de interventoría JESAK SAS Profesional social contratista Parte técnica contratista Pqrs cerrada.
14 / Septiembre / 2023	En relación a la petición en la cual se solicita acceso a parqueadero en la calle 20 #29-31 Barrio San Alonso, el consorcio Santander permite comunicar que se dejara rampa de acceso vehicular al predio, de acuerdo a revisión por parte de interventoría de los registros fotográficos anexados a la petición, dando aprobación el supervisor del contrato Edgar Bayona.	Profesional residente de interventoría JESAK SAS Profesional social contratista. Pqrs cerrada
20 / Septiembre / 2023	En relación a la petición en la cual se solicita que al frente del predio ubicado en la Calle 4 #16-60 Barrio Chapinero no se hagan unas gradas si no rampas con el fin de evitar el consumo de sustancias ilícitas, ya que es un barrio el cual se encuentra ubicado en medio de varias “ollas” y es muy inseguro. Dando respuesta a su solicitud en visita con la interventoría y personal	Profesional residente de interventoría JESAK SAS Profesional social contratista Parte técnica contratista Pqrs cerrada.

	contratista se mira que opción hay de no dejar dichas gradas, se le pide al propietario del predio el señor Yorguin que estuviera presente para que se llegara a un mutuo acuerdo, por tal teniendo en cuenta las indicaciones técnicas y los desniveles que habían en la parte externa de la vivienda se toma la decisión de dejar unas gradas sobre el anden para dar la pendiente que se necesita en dicho espacio lo cual el propietario estuvo de acuerdo.	
21 / Septiembre / 2023	En relación a la petición en la cual se solicita la ejecución de la peatonal completa ubicada en la Cra 23ª #2-22 Barrio Transicion V, de acuerdo con la visita realizada el día 21 de septiembre en compañía del personal contratista, se le informa al peticionario que se dará traslado por competencia a interventoría y secretaria de infraestructura para el estudio de su solicitud. Cuando se cuente con una respuesta formal por parte de los entes citados anteriormente se le dará copia de dicha solicitud.	Profesional residente de interventoría JESAK SAS Profesional social contratista. Pqrs en proceso de respuesta

Tabla 4: PQRS

5.1.4 Recorridos Urbanos

La profesional social realizo reconocimiento y acompañamiento a los siguientes sectores en el mes de septiembre, además se menciona en otros ítems del presente informe diferentes actividades que se llevaron a cabo en cada barrio:

BARRIOS	ACTIVIDADES REALIZADA
SAN ALONSO	El dia 05 de septiembre en horas de la mañana la profesional social contratista le pide a la parte técnica y de interventoria que se realizara una prueba de agua en la entrada del edificio habitar de florenza ya que la administradora manifiesta que cuando llueve se empoza el agua, dicha prueba evidencia un leve empozamiento por tal se decide hacer un corte en la loseta para que el agua tuviera un mejor flujo y no se emposara mas, a su vez se da respuesta por medio de un oficio del arreglo que se realizo.

	
▪ **ALBANIA**	El dia 07 de septiembre en horas de la mañana se realizan actas de vecindad y de entorno en el barrio Albania, en compañía de la parte técnica del contratista e interventoria. 
▪ **JUVENTUD**	El dia 11 de septiembre, en horas de la mañana se realizan acatas de vecindad y de entorno en el barrio la juventud en compañía de la junta de acción comunal, parte técnica de interventoria y contratista, con la finalidad de determinar el estado actual de los predios antes de iniciar la obra de adecuación de senderos peatonales. 
▪ **SAN ALONSO**	El dia 12 de septiembre, en horas de la mañana se reúne la profesional social del contratista y el propietario del inmueble ubicado en la calle 20 No. 29-60, de acuerdo al derecho de petición emitido el 07 de septiembre a la secretaria de

	infraestructura y secretaria de planeación de la alcaldía de Bucaramanga donde el propietario solicita arreglo pronto de la acometida eléctrica que fue afectado durante la ejecución de la obra en la actividad de demolición, ya que dicha acometida se encontraba muy superficial, no cumpliendo con lo establecido en la norma de frofundidad entre 30 y 40 centimetros. En el avance de la obra el contratista realiza su respectivo arreglo de la acometida, el cual estaba el tubo galvanizado en estado avanzado de deterioro motivo por el cual al momento de la demolición del mismo se afecta de manera inmediata, causando un costo en la misma zona del impacto sin afcetar aparatos eléctricos del inmueble. El dia 09 de septiembre personal idóneo hace cambio del tubo, instalación del cableado nuevo y deja en optimas condiciones las instalaciones eléctricas. *(Anexo 2 Acta de reunión)* 
➢ **LA JUVENTUD – CAMPO MADRID**	El dia 13 de septiembre en el barrio la Juventud se realiza un volanteo para avisar y conunicarle a la comunidad del inicio de obra de los senderos peatonales, a su vez se le recomienda a la comunidad tener especial cuidado a las personas que transitan por el sector. 



En el frente de la juventud en compañía del profesional HSEQ se realiza una charla a la mano de obra no calificada sobre seguridad en el cual se abordaron temas como:

- Protección respiratoria, protección de la cabeza, la importancia que es permanecer en obra con el casco puesto.
- Proteccion de las manos con el fin de evitar lesiones en las manos por los trabajos.
- Proteccion de los pies, con el fin de proteger los pies de riesgos físicos como la caída de objetos y se finaliza la charla con la protección facial, el usar las gafas para la protección ocular y facial.





	En horas de la tarde se realiza una visita al barrio campo Madrid con el fin de comunicarle a la comunidad del inicio de instalación de barandales en el sector a su vez se les recomienda a las personas tener cuidado cuando los ornamentadores esten instalando.  
➢ **ALBANIA**	El dia 15 de septiembre en el barrio Albania se realiza el segundo tramo de actas de vecindad con el fin de determinar el estado actual de las viviendas para poder dar inicio al proceso constructivo. 

- **CHAPINERO JUVENTUD**	El dia 19 de septiembre se realizo entrega al propietario de la vivienda ubicada en la cra 17 No. 4 de un pino que no cumplía con las especificaciones ya que obstruia el paso para las peatonales. Se hizo un acta en el cual el propietario firma a conformidad el retiro de este individuo vegetal. *(Anexo 3 Acta entrega individuo vegetal)*





Siendo las 9:00am se establa una conversación con la coordinadora del CDI ubicado en la calle 4 con el fin de comunicarle la ejecución de la obra, el respectivo cuidado que deben tener al entrar y salir de la institución adicional el contratista toma las precauciones necesarias para evitar algún accidente o problema.





En el barrio la juventud en compañía del HSEQ se realizo una socialización a las personas del sector de la juventud con el fin de perdirles una colaboración para poder descargar material en frente de una vivienda ya que los senderos peatonales en donde esta ejecutando las obras no es posible hacer este descargue. Los residentes aceptaron con la condicion que se le dejara la zona limpia después de la ejecución de la obra.





JUVENTUD	El dia 20 de septiembre se realiza una charla a los trabajadores sobre estres laboral, como controlar la frustacion, como tener

	una comunicación asertiva entre los compañeros de trabajo por medio de la actividad el teléfono roto.  
TRANSICION V	El dia 21 de septiembre en horas de la tarde se realizo una visita al barrio transición V para hcer las actas de vecindad del sector en compañía del presidente de junta el señor Jhon Fredy Correa, en el cual durante el recorrido manifiesta que no esta de acuerdo con el tramo que se va a intervenir ya que la peatonal debería hacerse completa, por tal el emite una pqrs la cual fue enviada al profesional residente de interventoria para dar una pronta solución a dicha situación. 

CHAPINERO	El dia 22 de septiembre en horas en la mañana se reúne la profesional social contratista, residente contratista y residente de interventoria Jesak SAS, ya que en la vivienda ubicada en la cra 17 No. 04-04, se presenta una queja por el propietario el cual manifiesta que el proceso contructivo actual de adecuación de andenes le estaba afectando la entrada a su propiedad, ya que al dejar unas escaleras en la entrada de la vivienda la señora no iba a poder sacar la silla de ruedas que utiliza para transladar a su padre ya que no daban los espacios, el residente Edward Vera de interventoria les da unas indicaciones al contratista para evitar que se le presentara este tipo de inconveniente, haciendo una adecuación hacia el árbol que esta al frente de la vivienda y hacer una rampa, esto con el fin de no hacer escaleras que interrumpieran la salida de la vivienda sin tener ningún obstáculo.
JUVENTUD	El dia 25 de septiembre en el barrio la juventud al frente de trabajo mano de obra no calificada sobre trabajo en equipo, como tener comunicación asertiva estas charlas, se realizan con el fin de encaminar todos los actos al logro de lo que se espera en el proyecto, actuando con compromiso y sentido de pertenencia por la empresa.  

- **ALBANIA-CHAPINERO-EL ROSAL**

El dia 26 de septiembre en horas de la mañana se realizan actas de servicios públicos de luz, agua y campamento de obra, en compañía del HSEQ contratista se toma registro fotográfico de la bodega, se hace las respectivas actas de servicios, se llega a un acuerdo de pago, finalmente se firma y se cierra el acta.



La profesional social contratista y la profesional social de interventoria realizan una visita al predio ubicado en la cra 17 No. 04-04 con el fin de hablar con los propietarios si están conformes con la ejecución de la obra y los arreglos que le hicieron de acuerdo a las indicaciones que había dado el residente de interventoria Edward vera el dia 22 de septiembre, el cual los residentes manifiestan que están contentos y satisfechos con el arreglo que les hicieron.





	Siendo las 11 de la mañana se realiza un recorrido en el barrio el Rosal en compañía de la profesional social de interventoria, ya que los propietarios de la calle 54n hasta la calle 56n no estaban de acuerdo con la ejecución de la obra ya que manifiestan que ellos tienen andenes en concreto en excelente estado y el hecho que el contartista ponga loseta prefabricada iba a generar problemas de humedad en los sotanos de las viviendas, el residente de interventoria les explica les explica como es el proceso constructivo según el manual de espacio publico, se tomaron decisiones en campo desde la parte técnica con el fin de mitigar cualquier tipo de situación que se pueda presentar por la obra. 
➢ **EL ROSAL**	El dia 27 de septiembre en horas de la mañana en compañía del profesional HSEQ se realiza un acta de servicios públicos, servicio de baño y campamento de obra en el barrio el rosal, se llega a un acuerdo de pago con el propietario, se realiza el acta y se firma en mutuo acuerdo con lo pactado.  En el barrio Albania la profesional social realiza un puerta a puerta entregando un oficio con el fin de informarles a los residentes del sector el cierre de la via con el fin de evitar atrados en la obra por los vehículos que circular por el sector

	y asi poder hacer todo el proceso constructivo de andenes en concreto en el menor tiempo posible. *(Anexo 4 Oficio informativo Barrio Albania)*      
▪ **ALBANIA – LA INDEPENDENCIA**	El dia 28 de septiembre en horas de la mañana se hace un recorrido con los ediles del barrio Albania con el fin de informar de la amplitud que se hizo en el frente a ejecutar, ya que en visita con el supervisor del contrato Edgar bayona toma la decisión de ampliar un poco mas la obra ya que había un tramo en muy mal estado y se decide agregar ese tramo.

	 Se reúnen la profesional social contratista, el HSEQ y el presidente de la junta de acción comunal del barrio la Independencia para llegar a un acuerdo monetario del alquiler del salón comunal, servicio de baño y servicio de luz y agua, se hace un acta en el cual las dos partes firman a conformidad y mutio acuerdo.  
ALBANIA -CHAPINERO	El dia 29 de septiembre en el barrio Albania en compañía del profesional HSEQ se realiza una pausa activa a la mano de obra no caliciada, en el cual se realizaron ejercicios de estiramiento muscular, ejercicios de respiración, con el fin de reducir los niveles de estrés y cansancio acomulado que

tengan los trabajadores por las cargar y las funciones que ejercen.



En el barrio Chapinero en la propiedad ubicada en la calle 4 No. 16-24 se reúnen la profesional social y el HSEQ contratista para llegar a un acuerdo para el suministro de luz y agua, dicho acuerdo con el propietario se determina que al finalizar la obra se llegara a un acuerdo de pago.



Se realiza un recorrido de obra en el barrio el rosal y chapinero con el contratista y profesional residente y social de interventoria, con el fin de mitigar con la comunidad si han tenido algún inconveniente con la ejecución de la obra de adeacuacion de andenes.



	
EL ROSAL	El dia 29 de septiembre en horas del medio dia se realiza una charla en compañía del HSEQ a la controladora de trafico sobre como tener adecuadas posturas y como trabajar bajo presión, debido a las funciones que estas personas ejercen todo el dia de pie y en contacto directo con la comunidad, dichas charlas se llevan a cabo con el fin mitigar episodios de estrés y presión laboral.  Se realiza recorrido de obra con la veeduría ciudadana del barrio Campo Madrid y San Alonso, dicho recorrido se hace con el fin de mostrale a la comunidad el avance que ha tenido el contratista hasta la fecha del proceso constructivo del contrato 022-2023 “Adecuacion de andenes, escaleras y pasamanos” . 

Tabla 5: Sectores recorridos urbanos

De la fecha del 01 al 30 septiembre, se realizaron recorridos de obra todos los días, con la finalidad de identificar y mitigar impactos de situaciones que se presentaron con los trabajadores y comunidad aledaña.

5.1.5 Conformación de Comité de Veeduría

En el mes de septiembre no se conformaron nuevos grupos de comités de veeduría ciudadana ya que en los 33 frentes de trabajo ya se conformaron estos grupos en los meses anteriores.

6. PROGRAMA DE DIALOGO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Con este ítem se quiere generar espacios de encuentro, diálogo y atención a la ciudadanía para promover el conocimiento, la apropiación y corresponsabilidad con el desarrollo del proyecto **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER**. Además, buscamos minimizar los efectos y externalidades negativas del mismo, contemplando factores sociales, económicos, ambientales y las problemáticas inherentes a la implantación de proyectos urbanos en espacios consolidados

6.1 Reunión de Inicio

Hasta la fecha del presente informe el Consorcio Santander lleva un total de catorce (14) Reuniones de Socialización de Inicio que permite al componente de Gestión Social dar a conocer el contrato en cada una de las comunas que se va a intervenir.

Durante el desarrollo de la reunión se dieron a conocer los siguientes contenidos:

- Presentación del personal contratista del consorcio Santander, de la interventora Jesak SAS y sus respectivos equipos de trabajo, y la alcaldía de Bucaramanga
- La profesional encargada del área social expone los alcances y las características del contrato, además las especificaciones técnicas sobre el funcionamiento de la obra a construir.
- Presentación del plan de gestión social y sus componentes.
- Se dieron respuestas a preguntas, dudas e inquietudes a la comunidad.

6.2 Reunión de Avance de Obra Veeduria ciudadana

Se le da cumplimiento cuando se ejecuta el 50% del contrato, con fin dar a conocer a los asistentes lo que se ha realizado hasta el momento y brindarles información acerca de las actividades faltantes a la fecha del septimo informe. *(Anexo 5 actas de reunión veeduría)*

VEEDURIA BARRIO SAN ALONSO
En el barrio San alonso el dia 29 de septiembre se realiza recorrido con la veeduría ciudadana, en el cual se trataron temas como explicación de la obra, procesos constructivos y avances, contratista responde preguntas, dudas e inquietudes.
AVANCES Y ACUERDOS
Siendo las 7:30am se da inicio a la socialización de avance de obra, con el acompañamiento de la residente de obra Iliana Velandia, la profesional social de Interventoria Eslendy Corzo, el profesional HSEQ Bernardo Suarez, se le agradece por el tiempo prestado a las personas que asistieron, se da inicio al recorrido por la obra de la calle 20 entre cra 29 y 30 costado sur y norte, se le explica al grupo de veeduría el atraso y los inconvenientes que se han presentado en obra, entre ellos las podas aéreas y radiculares que se tuvieron que hacer, el arreglo de las rampas de acceso vehicular

que quedaron con pendientes muy pronunciadas, se les mostro el tramo que se intervino adicional de la Cra 29 No. 19-67, se tomaron en cuenta las observaciones de parte de la comunidad para mantener el espacio publico y preservar la seguridad de los peatones.

Se le informa a la veeduría ciudadana el avance que se ha tenido hasta la fecha y esta pendiente finalizar las actividades para programar la reunión de cierre y la entrega final de la misma.



Tabla 6. Recorrido veeduria San Alonso

VEEDURIA BARRIO CAMPO MADRID
En el barrio Campo Madrid el dia 29 de septiembre se realiza recorrido con la veeduría ciudadana del barrio campo Madrid, se explica el proceso contructivo de los barandales y los avances que se han tenido hasta la fecha, se responden preguntas dudas e inquietudes.
AVANCES Y ACUERDOS
Siendo las 7:30am se da inicio a la socialización de avance de obra con la veeduría del barrio campo Madrid, para informarle a la comunidad y evidencien los avances que ha realizado hasta la fecha el contratista, se conto con el acompañamiento de la residente de obra Iliana Velandia, Residente de interventoria Edward Vera, profesional social contratista, profesional social de interventoria Eslendy Corzo, profesional HSEQ Bernardo Suarez. Desde la parte técnica informan que hasta la fecha se han instalado 89 metros lineales de barandales, el presidente de junta y la veeduría ciudadana le hace énfasis al contratista de priorizar la instalación de barandas en las zonas de discapacidad del barrio, ya que en el recorrido de inicio de obra y socialización de esta la señora Isidora Galvis y la junta de acción comunal mencionan que el proyecto se paso especialmente para priorizar y ayudar a las personas con limitaciones físicas.





Tabla 7. Recorrido veeduria Campo Madrid

6.3 Reunión de cierre de obra

En el mes de septiembre no se realizó ninguna reunión de cierre de obra, quedan pendiente para el mes de octubre dar cierre a los barrios de Aurora, la Universidad, San Alonso y Chapinero. A su vez se realizaron hasta la fecha dos (2) socializaciones de cierre entregando la obra a satisfaccion de la comunidad.

6.4 Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas

6.4.1 Actas de Vecindad y/o Entorno:

Este Items tiene como objetivo establecer previo a la intervención, las condiciones físicas originales de cada uno de los predios ubicados en el área del proyecto, como base para determinar las variaciones que se den en el tiempo por efectos del proceso constructivo.

El área de gestión social realizo acompañamiento al área técnica para el levantamiento de actas de vecindad de inicio a cargo del contratista y con el acompañamiento de la interventoría;

para la toma de fotografías; con el fin de registrar el estado actual de las zonas circundantes frente a la obra; para el levantamiento de esta información, se tiene en cuenta el criterio técnico como prioridad de las zonas que posiblemente pueden verse afectadas con los trabajos a realizar, áreas susceptibles con la construcción, ademas si se evidencian rampas de acceso vehicular también se realizara el acta correspondiente como soporte del estado en el que se encuentran para el desarrollo del contrato **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS**.

Tabla 8: Acta de vecindad Inicio Barrio Albania

FRENTE	ACTAS	DIRECCIÓN	FECHA
ALBANIA	Acta de vecindad	Calle 51 No. 20-61	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-81	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-84	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 20-67	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Calle 32 No. 50-180	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Bodega gris	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Calle 28 No.51-06	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Calle 20 No. 51-07	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Calle 51 No. 19b-47	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-87	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 19b-37	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No.19b-33	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-68	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-69	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-71	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-65	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 28-72	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 28-54	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Calle 51 No. 28-58	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Calle 51 No. 28-24	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 28-18	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 28ª-07	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-104	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-96	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-90	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-88	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-67-86	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-80	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-70	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-66e	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-66	07 / 09/ 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-08	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-49	15 / 09 / 2023

ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 19-47	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-61	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 18-61	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51ª No. 18-58	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 27-39	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. Casa Frisada	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Fachada gris con blanco	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 19-20	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 19-11	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Cra 51 No. 19ª-33	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de vecindad	Caseta lote	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de entorno	Lote final	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de entorno	Lote pájaro	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de entorno	Lote 1 costado derecho	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de entorno	Lote 2 costado izquierdo	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de entorno	Lote 2 costado derecho	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de entorno	Inicio obra tienda tatis	15 / 09 / 2023
ALBANIA	Acta de entorno	Lote 1	15 / 09 / 2023

Tabla 9: Acta de vecindad de inicio barrio La Juventud

FRENTE	ACTAS	DIRECCIÓN	FECHA
LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Calle 1 casa arboles	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Calle 5 No. 18B esquina	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Calle 6 No. 18ª-08	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Cra 19 No. 7-08	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Cra 19 No. 7-16	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Cra 19 No. 7-24	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Calle 7n No. 19-32	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Cra 20b No. 13n-06	08 / 09 / 2023

LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Cra 20c No. 3n-05	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Cra 20c No. 2n -21	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Cra 21 No. 3n- 1-62	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Cra 21 No. 3n 61	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Cra 21n No. 20ª-48	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Calle 1 No. 20ª- 40	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Cra 20c No.1n -22	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Cra 20c No.1n-30	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Calle 1 No. 20n-03	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Actas de vecindad	Calle 1 No, 20ª -08	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Acta de entorno	Lote 1 Cra 20	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Acta de entorno	Lote 2 tortuga	08 / 09 / 2023
LA JUVENTUD	Acta de entorno	Lote 3	08 / 09 / 2023

Tabla 10. Actas de vecindad en general

CONSOLIDADO DE LAS ACTAS DE VECINDAD Y ACTAS DE RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR				
Barrio / Sector	**Actas de entorno**	**Actas de vecindad**	**Actas de vecindad por terminar**	**Actas de rampa de acceso vehicular**
Albania	**7**	**45**	**0**	**0**
Juventud	**3**	**18**	**0**	**0**

Tabla 11. Fechas de realización actas de vecindad inicio

ACTAS DE VECINDAD			
FECHA	**Barrio**	**HORA**	**SECTOR**
05 / 09 / 2023	Albania	8:00 am	Comuna 14
08 / 09 / 2023	La Juventud	8:00am	Comuna 2 Nor-oriental

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022- 2023	FECHA:	Septiembre
OBJETO:	**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- Grupo 1**		

			
OBSERVACIONES:	Actas de vecindad Albania	OBSERVACIONES:	Actas de vecindad Albania
			
OBSERVACIONES:	Actas de vecindad la Juventud	OBSERVACIONES:	Actas de vecindad la Juventud

6.4.2 OTRAS ACTIVIDADES

La profesional social hace apoyo al contratista como intermediaria con la comunidad, para buscar los servicios de luz y agua y el campamento para los frentes activos de trabajo. (*Anexo 6 actas de servicios públicos y arriendo de campamentos)*

ACTAS DE SERVICIOS PUBLICOS ACTAS ARRIENDO CAMPAMENTO		
FECHA	**DIRECCION**	**BARRIO**
19 / 09 / 2023	Cra 20c 1n- 30	Juventud
19 / 09 / 2023	Cra 20c 1n- 30	Juventud
26 / 09 / 2023	Bodega Albania	Albania
27 / 09 / 2023	Parqueadero el Rosal	El Rosal
28 / 09 / 2023	Salon social	Independencia
29 / 09 / 2023	Cra 51 No. 27-31	Albania
29 / 09 / 2023	Calle 4 No. 16-24	Chapinero

Tabla 12. Direcciones Actas de servicios públicos y arriendo de campamento

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 - 2023	FECHA:	Septiembre
OBJETO:	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER** **Grupo 1**		

			
OBSERVACIONES:	Actas servicios públicos	OBSERVACIONES:	Actas servicios públicos

7. PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD

7.1 Gestión y Articulación Institucional

Con este programa se quiere garantizar las acciones necesarias para la coordinación y el trabajo de articulación interinstitucional antes, durante y después de la ejecución del proyecto.

A la fecha se realizo actividades de gestión y articulación institucional con el fin de tener en cuenta aquellas instituciones que hacen parte del sector salud, educativo y de desarrollo económico durante la ejecución del proyecto para crear soluciones a los percanses que se presenten en el transcurso de la realización de la obra.





7.2 Mano de Obra No calificada

El consorcio Santander hasta la fecha de 30 de septiembre, realizo convocatoria por medio de los presidentes de Junta de Acción Comunal JAC y en las reuniones de socialización de inicio de los sectores a intervenir para que la comunidad en general tenga conocimiento de las ofertas y oportunidades laborales que hay para el personal del área metropolitana de Bucaramanga.

Para este informe se sigue dando cumplimiento al apéndice J, donde hace referencia en la importancia que tiene la contratación de mano de obra femenina. Por medio del correo

electrónico corporativo y en los Puntos de Atención al Ciudadano PAC , se recibieron las hojas de vida de manera digital de las personas interesadas.

#	ÁREA	CÉDULA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	ESTADO
1	Administrativo	1.098.663.816	Yeison Andrés Garces Ortega	Gerente de Proyectos	ACTIVO
2	Administrativo	91.249.578	Juan Carlos Jaimes Niño	Director de obra	ACTIVO
3	Administrativo	1.090.363.692	Layde Iliana Velandia Torres	Residente de obra	ACTIVO
4	Administrativo	1.095.953.039	Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Profesional social	ACTIVO
5	Administrativo	1.098.620.599	Bernardo Suarez Carreño	Inspector HSEQ	ACTIVO
6	Operativo	1.007.193.091	Omar Alexis Blanco Bayona	Inspector de obra	ACTIVO
7	Operativo	1.098.794.707	Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de obra	ACTIVO
8	Operativo	91.263.099	Amaury Mendoza Guerrero	Inspector Auxiliar	ACTIVO
9	Operativo	91.519.899	Cesar Antonio Gomez Delgado	Oficial de Obra	ACTIVO
10	Operativo	1.232.890.403	Yeison Duvan Higuera Esteban	Ayudante de Obra	ACTIVO
11	Operativo	1.052.963.666	Luis Miguel Naranjo Velilla	Ayudante de Obra	ACTIVO
12	Operativo	91.477.841	Oscar Javier Alarcon Afanador	Ayudante de Obra	ACTIVO
13	Operativo	1.096.242.788	Cristian Fernando Amariz Perez	Ayudante de Obra	ACTIVO
14	Operativo	91.519.124	Nicolas Alarcón Afanador	Oficial de Obra	ACTIVO
15	Operativo	1.091.135.202	Jaime Muñoz Ortega	Ayudante de Obra	ACTIVO
16	Operativo	1.232.890.758	Armando Mendoza Florez	Ayudante de Obra (BOAL)	ACTIVO
17	Operativo	13.275.949	Ever Antonio Carrascal Duran	Oficial de Obra	ACTIVO
18	Operativo	1.007.712.253	Jose Armando Laguna Gomez	Ayudante de Obra	ACTIVO
19	Operativo	18.918.792	Omar Alfonso Quintero Quintero	Ayudante de Obra	ACTIVO
20	Operativo	1.098.786.346	Brayan Smith Rey Noriega	Oficial de Obra	ACTIVO
21	Operativo	1.065.590.063	Luis Alberto Florian Chamorro	Oficial de Obra	ACTIVO
22	Operativo	5.685.373	Jose Roman Espinoza Bautista	Ayudante de Obra	ACTIVO
23	Operativo	1.005.325.662	Jerson David Ospino Gomez	Ayudante de Obra	ACTIVO
24	Operativo	91.489.177	Edgar Martinez Quintero	Oficial de Obra	ACTIVO
25	Operativo	1.095.800.217	Ricardo Hernandez Aguillon	Ayudante de Obra	ACTIVO
26	Operativo	91.255.617	Henry Mantilla Parra	Ayudante de Obra	ACTIVO
27	Operativo	1.234.339.539	Diego Andres Berbesi Merchan	Ayudante de Obra	ACTIVO
28	Operativo	1.098.712.615	Edinson Prado Paterina	Oficial de Obra	ACTIVO
29	Operativo	1.098.686.573	Jose Rios León	Oficial de Obra	ACTIVO
30	Operativo	91.449.914	Jhon Jaime Gutierrez Silva	Ayudante de Obra	ACTIVO
31	Operativo	1.102.348.837	Jhonattan Perez Arango	Oficial de Obra	ACTIVO
32	Operativo	91.515.736	Ronal Anderson Vargas Motta	Ayudante de Obra	ACTIVO
33	Operativo	13.860.582	Jose Luis Sierra Anaya	Oficial de Obra	ACTIVO
34	Operativo	1.098.697.529	Cesar Rodriguez De Los Santos	Oficial de Obra	ACTIVO
35	Operativo	13.860.582	Cristian Humberto Tellez Figueroa	Ayudante de Obra	ACTIVO
36	Operativo	1.098.633.343	Edwin Ernesto Rodriguez Galeano	Ayudante de Obra	ACTIVO
37	Operativo	37.511.566	Maria Eugenia Manrique Rueda	Controladora de Tráfico	ACTIVO
38	Operativo	1.098.632.250	Flor Norayma Quintero Orduz	Controladora de Tráfico	ACTIVO
39	Operativo	1.005.157.888	Edwin Orlando Rodriguez Guerrero	Ayudante de Obra	ACTIVO
40	Operativo	1.097.490.744	Jose Luis Moncada Guerrero	Ayudante de Obra	ACTIVO
41	Operativo	6.509.541	Jose Giovanny Mendoza Rodriguez	Oficial de Obra	ACTIVO
42	Operativo	1.095.924.401	}	Oficial de Obra	ACTIVO
43	Operativo	8.784.375	Wilson Antonio Rivero Toloza	Oficial de Obra	ACTIVO
44	Operativo	91.495.273	German Diaz Moyano	Oficial de Obra	RETIRADO
45	Operativo	91.494.372	Miguel Angel Caceres Carrillo	Ayudante de Obra	RETIRADO
46	Operativo	1.092.343.342	Heider Alexis Villamizar Diaz	Ayudante de Obra	RETIRADO
47	Operativo	1.095.804.014	Omar Larrota Garcia	Ayudante de Obra	RETIRADO
48	Operativo	91.229.173	David Garcia Hernandez	Ayudante de Obra	RETIRADO
49	Operativo	1.265.732	Simon Gregorio Peña Peña	Ayudante de Obra	RETIRADO
50	0perativo	91.295.674	Luis Eduardo Mejia Cristancho	Ayudante de Obra	RETIRADO

51	Operativo	1.047.341.782	Dainer Makeimis Naranjo Grajales	Oficial de Obra	**RETIRADO**
52	Administrativo	1.100.963.525	Angie Lorena Monsalve Ordoñez	Director de obra	**RETIRADO**
53	Administrativo	79.330.879	Ernesto Montañez Mora	Director de obra	**RETIRADO**
54	Operativo	1.098.790.946	Lina María Cristancho Cristancho	Inspector de obra	**RETIRADO**
55	Operativo	1.103.471.378	Kevin Farid Rodriguez Sarmiento	Inspector de obra	**RETIRADO**
56	Operativo	1.098.765.333	Yuli Melisa Suarez Taborda	Inspector de obra	**RETIRADO**
57	Operativo	1.095.940.612	Alonso Mancilla Estupiñan	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
58	Operativo	1.098.743.152	Anderson Yesid Villamizar Candela	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
59	Operativo	1.095.907.356	Breiner Yulian Valderrama Silva	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
60	Operativo	91.284.103	Eduardo Maldonado Estupiñan	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
61	Operativo	1.007.451.028	Jeison Alexis Valderrama Silva	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
62	Operativo	1.098.741.465	Leonardo Mejia Quintero	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
63	Operativo	63.523.934	Sandra Patricia Medina Carreño	Paletera	**RETIRADO**
64	Operativo	13.873.837	Alexis Valderrama Rodriguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
65	Operativo	13.514.146	Carlos Eduardo Pereira Calderon	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
66	Operativo	5.645.538	Jose Reyes Oviedo Araque	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
67	Operativo	1.097.305.502	Juan Gabriel Mendoza Gonzalez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
68	Operativo	91.265.913	Oswal Reyes Ruiz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
69	Operativo	91.203.639	Luis Norberto Nuñez Florez	Maestro de Obra	**RETIRADO**
70	Operativo	91.541.667	Jairo Andres Ojeda	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
71	Operativo	73.020.875	Jose Luis Garzon Campo	Oficial de Obra	**RETIRADO**
72	Operativo	91.297.983	Ludwing Javier Velazquez Nieto	Oficial de Obra	**RETIRADO**
73	Operativo	91.283.192	Orlando Leon Gutierrez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
74	Operativo	1.098.697.028	Riqui León Santos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
75	Operativo	91.521.793	Nelson Enrique Ortiz Arias	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
76	Operativo	91.540.153	Gregorio Lopez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
77	Operativo	1.193.585.571	Wilmer Alberto Torres Ochoa	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
78	Operativo	1.007.400.028	Nelson Fabian Velasquez Rodriguez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
79	Operativo	63.368.739	Omaira Isabel Fernandez Perez	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
80	Operativo	5.746.735	Orlando Alfonso Rueda	Oficial de Obra	**RETIRADO**
81	Operativo	5.956.989	Armando Jose Guarache Vargas	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
82	Operativo	1.098.686.926	Sergio Andres Rueda Ayala	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
83	Operativo	1.102.362.216	Jesus Antonio Briglia Martinez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
84	Operativo	91.185.606	Giovany Valderrama Rodriguez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
85	Operativo	1.046.268.409	Wilson Enrique Mejia Vega	Oficial de Obra	**RETIRADO**
86	Operativo	1.046.396.314	Gabriel Caliz Marin	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
87	Operativo	91.448.171	Jose Raul Sanchez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
88	Operativo	3.916.616	Yanetsy Carolina Solorzano Mejia	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
89	Operativo	37.334.498	Jicela Jacome Rincon	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
90	Operativo	6.167.313	Santi Jose Gonzalez Marquez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
91	Operativo	1.095.815.007	Isidro Pinzón Rodriguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
92	Operativo	13.748.195	Samuel David Avendaño Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
93	Operativo	1.098.714.150	Yonatan Ariel Avendaño Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
94	Operativo	91.208.815	Carlos Arturo Reyes Quijano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
95	Operativo	85.477.952	Jose Alfredo Vergel Perez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
96	Operativo	88.200.718	Elkin Eduardo Matinez Vera	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
97	Operativo	91.182.107	Samuel Ernesto Rovira Lizcano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
98	Operativo	1.098.792.295	Juan Sebastian Gonzalez Montero	Maestro de Obra	**RETIRADO**
99	Operativo	1.096.183.417	Deivy Celis Castillo	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
100	Operativo	1.102.378.340	Cristiam Giovanny Forero Leal	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
101	Operativo	1.002.494.980	Emilecto De Jesus Vides Morales	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
102	Operativo	5.677.471	Elias Rondon Almeida	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
103	Operativo	1.005.235.751	Luis Antonio Gil Gomez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
104	Operativo	1.095.790.257	Rafael Garcia Cobos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
105	Operativo	88.285.407	Daniel Jesus Pacheco Carrillo	Maestro de Obra	**RETIRADO**

106	Operativo	1.007.406.151	Carlos Andres Pallares Ascanio	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
107	Operativo	1.091.133.380	Erleider Collantes Paez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
108	Operativo	1.096.254.152	Cristian David Urieta Ramos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
109	Operativo	1.007.218.221	Eliecer Dario Benavides Miranda	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
110	Operativo	1.098.678.191	Mauricio Castro Araque	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
111	Operativo	17.575.151	Raul Clavino Castro Torres	Oficial de Obra	**RETIRADO**
112	Operativo	7.120.330	Yackson Aristides Caceres Castro	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
113	Operativo	1.026.559.257	Alexander Tarazona Zambrano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
114	Operativo	1.098.711.570	Tatiana Geraldine Mantilla Supelado	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
115	Operativo	1.098.720.790	Kelly Johana Serrano Varon	Controladora de Trafico	**RETIRADO**

Tabla 13. Personal ingreso en el mes de septiembre

En el periodo del presente informe se realizaron charlas a los trabajadores, tratándose temas tales como:

- Proteccion respiratoria
- Protección de manos
- Proteccion de pies
- Estrés laboral
- Trabajo en equipo
- Comunicación acertiva
- Estiramiento muscular
- Ejercicios de respiración.

(Anexo 7 Listado charlas informativas a mano de obra no calificada).

8. LINEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

El consorcio Santander por medio de los canales comunicacionales y piezas de divulgación incluidas en el apéndice J, de manera eficiente, organizada, tuvo en cuenta la segunda fase de inicio de obra con el propósito de informar, sensibilizar, movilizar y transformar imaginarios negativos sobre el desarrollo del proyecto, implementó una comunicación incluyente, que tiene en cuenta la población con discapacidad y de esta manera darle uso a las nuevas tecnologías, para masificar los mensajes e impactar toda la zona de influencia.

8.1 Programa de Información para el desarrollo del Proyecto Articulación Contratista, Interventoría y Municipio de Bucaramanga

El Consorcio Santander asistio a las reuniones de articulación solicitadas por el Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Infraestructura, para definir y determinar lineamientos del séptimo corte, se expusieron las dificultades y problemas que se han presentado en los diferentes frentes de trabajo, se crearon estrategias y soluciones.

El día 13 de septiembre 2023 se llevo a cabo comité de obra, una reunión con la interventoría JESAK SAS y Consorcio Santander que hacen parte del contrato 429 Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga, hicieron presencia los profesionales del área técnica, hseq y social para revisar diferentes temas como los atrasos que se presentan en obra y la importancia de agilizar en las actividades teniendo en cuenta dos meses restantes que quedan para culminar el contrato, desde cada área se manifestó que actividades se han ejecutado hasta la fecha, que programaciones habían pendientes y los inconvenientes que se han presentando durante el mes de septiembre.

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 - 2023	FECHA:	Septiembre
OBJETO	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER Grupo 1**		

	
OBSERVACIONES:	Comité de obra Septiembre

En el mes de septiembre igualmente la profesional social de la interventoría Jesak SAS hizo acompañamiento a la profesional social de la empresa contratista Consorcio Santander en actividades como actas de vecindad y su respectiva revisión para firmas y socializaciones de inicio.

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022- 2023	FECHA:	Septiembre
OBJETO:	**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- Grupo 1**		
			
OBSERVACIONES:	Encuentros sociales.		

El dia 27 de septiembre en la alcaldía de Bucaramanga se lleva a cabo una reunión desde el componente de Gestión Social con participación de los 3 grupos del contratista y la interventoría del contrato Adecuación de Andenes, Escaleras y Pasamanos, dirigida por la coordinadora Laura Ojeda de la Secretaría de Infraestuctura, quien indaga a cada una de las profesionales sociales sobre todos los avances, percances o dificultades que se han presentando durante a la ejecución del contrato, planteando posible soluciones, además se mencionan las pqrs instauradas y sus respuestas, Al finalizar se firma el acta de la reunión. *(Anexo 8 acta seguimiento social andenes).*

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022- 2023	FECHA:	Septiembre
OBJETO:	**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- Grupo 1**		
			
OBSERVACIONES:	Encuentro con la profesional social de infraestructura Laura Ojea		

8.2 Volante de información:

Estos fueron utilizados para informar sobre temas relacionados con el Proyecto y ejecución de la obra.

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 – 2023	FECHA:	Septiembre
OBJETO:	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER Grupo 1**		
			

8.2.1 Tecnologias de la información y comunicación:

Por medio de este ítem se tomo en cuenta la importancia de tener recursos, herramientas, equipos, aplicaciones, redes y medios, los cuales permitieran la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmision de la infromacion por medio de:

a) *Por medio de texto (Whatsapp Bussines) – (Correo electrónico corporativo)*
b) *Por medio de imágenes, folletos, avisos o pancartas (Whatsapp Bussines)*

9. DIVULGACIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS AL CIUDADANO.

Se han generado canales de información claros veraces y oportunos entre la comunidad, las autoridades municipales y el proyecto. Con el fin de informar a la comunidad del área de influencia, las características de la obra, etapas de construcción, cierres parciales o totales, entre otros aspectos.

9.1 Valla Informativa:

El Consorcio Santander Instalo una (1) valla informativa móvil del proyecto de acuerdo con las condiciones para su ubicación, cuyo diseño fue solicitado a la Oficina Asesora de Comunicaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido. Esta valla se instalo en cada frente de trabajo.

CS Consorcio Santander	REGISTRO FOTOGRAFICO		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022- 2023	FECHA:	Septiembre
OBJETO:	**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- Grupo 1**		



Valla Informativa aprobada por Prensa Bucaramanga

9.2 Divulgacion del Plan de Manejo de Transito- PMT:

Se han implementado señales informativas en cada frente de trabajo, con el fin de evitar índices de accidentalidad en las zonas donde se esta ejecutando la obra, generando adecuadas condiciones habituales de movilización y desplazamientos de los peatones, vehículos, ciclistas.





9.2.1 Cintas de seguridad:

Las cintas retrorreflectivas ayudan a prevenir el riesgo de accidentes de transito al advertir a las personas que transitan en las vías de otros vehículos, de cerramientos o señalamientos. Los frentes activos en obra cumplen con la norma vial con sus respectivas cintas de seguridad.





9.2.2 Controlador de Trafico:

En el mes de septiembre se continúa implementado esta medida, con la finalidad de organizar y controlar actividades de la zona relacionadas con el trafico y transporte terrestre. Se tiene en cuenta para la contratación la importancia de generar empleo a mujeres y apoyar a amas de casa del sector que se esta interviniendo.

CS Consorcio Santander	REGISTRO FOTOGRAFICO		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022- 2023	FECHA:	Septiembre
OBJETO:	**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- Grupo 1**		



Valla Informativa aprobada por Prensa Bucaramanga

10. INFORME MENSUAL

El Consorcio Santander entregará un séptimo informe mensual de actividades en medio físico y magnético a la Interventoría para su revisión y aprobación, con los respectivos soportes, teniendo en cuenta las fechas de corte establecidas previamente.

11. BITACORA SOCIAL

El consorcio Santander adjunta anexos de una bitácora social de obra en la cual se registró actividades y novedades del desarrollo del plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica del mes que comprende Septiembre *(Anexo 9 bitacora mes de septiembre)*

12. CONCLUSIONES

Informe social mensual #7 (Grupo 1), se describieron y se adjuntaron cada una de las actividades contempladas dentro del componente del Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica desde la fecha del 01 al 30 de septiembre del 2023. De igual manera se entregará como anexo del presente documento, las evidencias de las actividades que se ejecutaron por el profesional social en el quinto periodo.

Todo el trabajo que se esta realizando nos ayuda a mitigar en su mayoría los impactos sociales que se puedan presentar en el transcurso de la ejecución de la obra en los diferentes frentes y sectores del municipio de Bucaramanga.

ANEXOS

Anexo 1 Formatos PQRS Y respuestas del contratista

Anexo 2 Acta de reunión

Anexo 3 Acta entrega individuo vegetal

Anexo 4 Oficio Informativo

Anexo 5 Actas de reunión veeduría ciudadana

Anexo 6 Actas de servicios públicos y arriendo de campamentos

Anexo 7 Listado de charlas mano de obra no calificada

Anexo 8 Acta de seguimiento social andenes

Anexo 9 Bitacora mes de septiembre

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	22/01/2021
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

Fecha: 29-VIII-23

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	Queja	Reclamo	Sugerencia	Denuncia
X				

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Alfonso Niño Perez
Número del documento de Identidad	13.802.446
Dirección	Clle 21 # 29-54 Apto 502 B. San Alfonso
Número(s) de teléfono(s)	318-8256457 - 3188556457
Correo electrónico	alfonsoninoperez@gmail.com

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

Estan cambiando los andenes en la calle 20 entre cra 29 y 30 San Alfonso. Mi apto esta ubicado en la calle 20 con cra 30 y solamente van a cambiar los andenes de la calle 20, no van a cambiar los de la 30, eso significa que mi apto solo le cambian el anden de la 20 faltando el anden de la 30, por lo como señalo el apto queda en toda la esquina.
por tal motivo solicito respetuosamente que sea cambiado todo el anden, pues, en la acción popular que adelantamos con la junta de la Acción comunal eso era la petición. Cordialmente

Firma del peticionario:

CS Escaneado con CamScanner

CS Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 124

Bogotá D C. 15 de septiembre 2023

Señores
ALFONSO NIÑO PEREZ
13.802.446
Veedor ciudadano
Propietario calle 21 #29 54

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1"**

Asunto: Respuesta de PQRS barrio la San Francisco emitida el 24 de agosto

Cordial saludo.

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio la Aurora acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición de la propiedad ubicada en la calle 21 #29-54, en la cual se solicita la intervención completa del anden en frente de esta, ya que el alcance del contrato para la zona determinada como calle 20 entre Cra 29 y 30 costado sur, solo llega hasta la construcción de una rampa peatonal que no excede mas de 3 metros lineales del paramento del predio, dando respuesta no favorable a su solicitud, se informa que no se ejecutara más actividades para construcción de espacio publico en la zona solicitada, debido a que se realizó un balance presupuestal y no se cuenta con el recurso necesario para la ejecución del área solicitada.

Recordamos a la comunidad que Consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.

Cordialmente,



JUAN CARLOS JAIMES NIÑO
C.C. No. 91.249.578 de Bucaramanga
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

C.C: Oficina
Elaboró: PS. Leidy Andrea Ayala Sanmiguel- Profesional del área social
Aprobó: GAP

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD" ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

Fecha: 05 / sep / 2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	X	Queja		Reclamo		Sugerencia		Denuncia	


2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Lisbeth medina
Número del documento de identidad	
Dirección	cra 17 # 4- 348 Campiñero
Número(s) de teléfono(s)	
Correo electrónico	

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

Firma del peticionario:

CS Escaneado con CamScanner

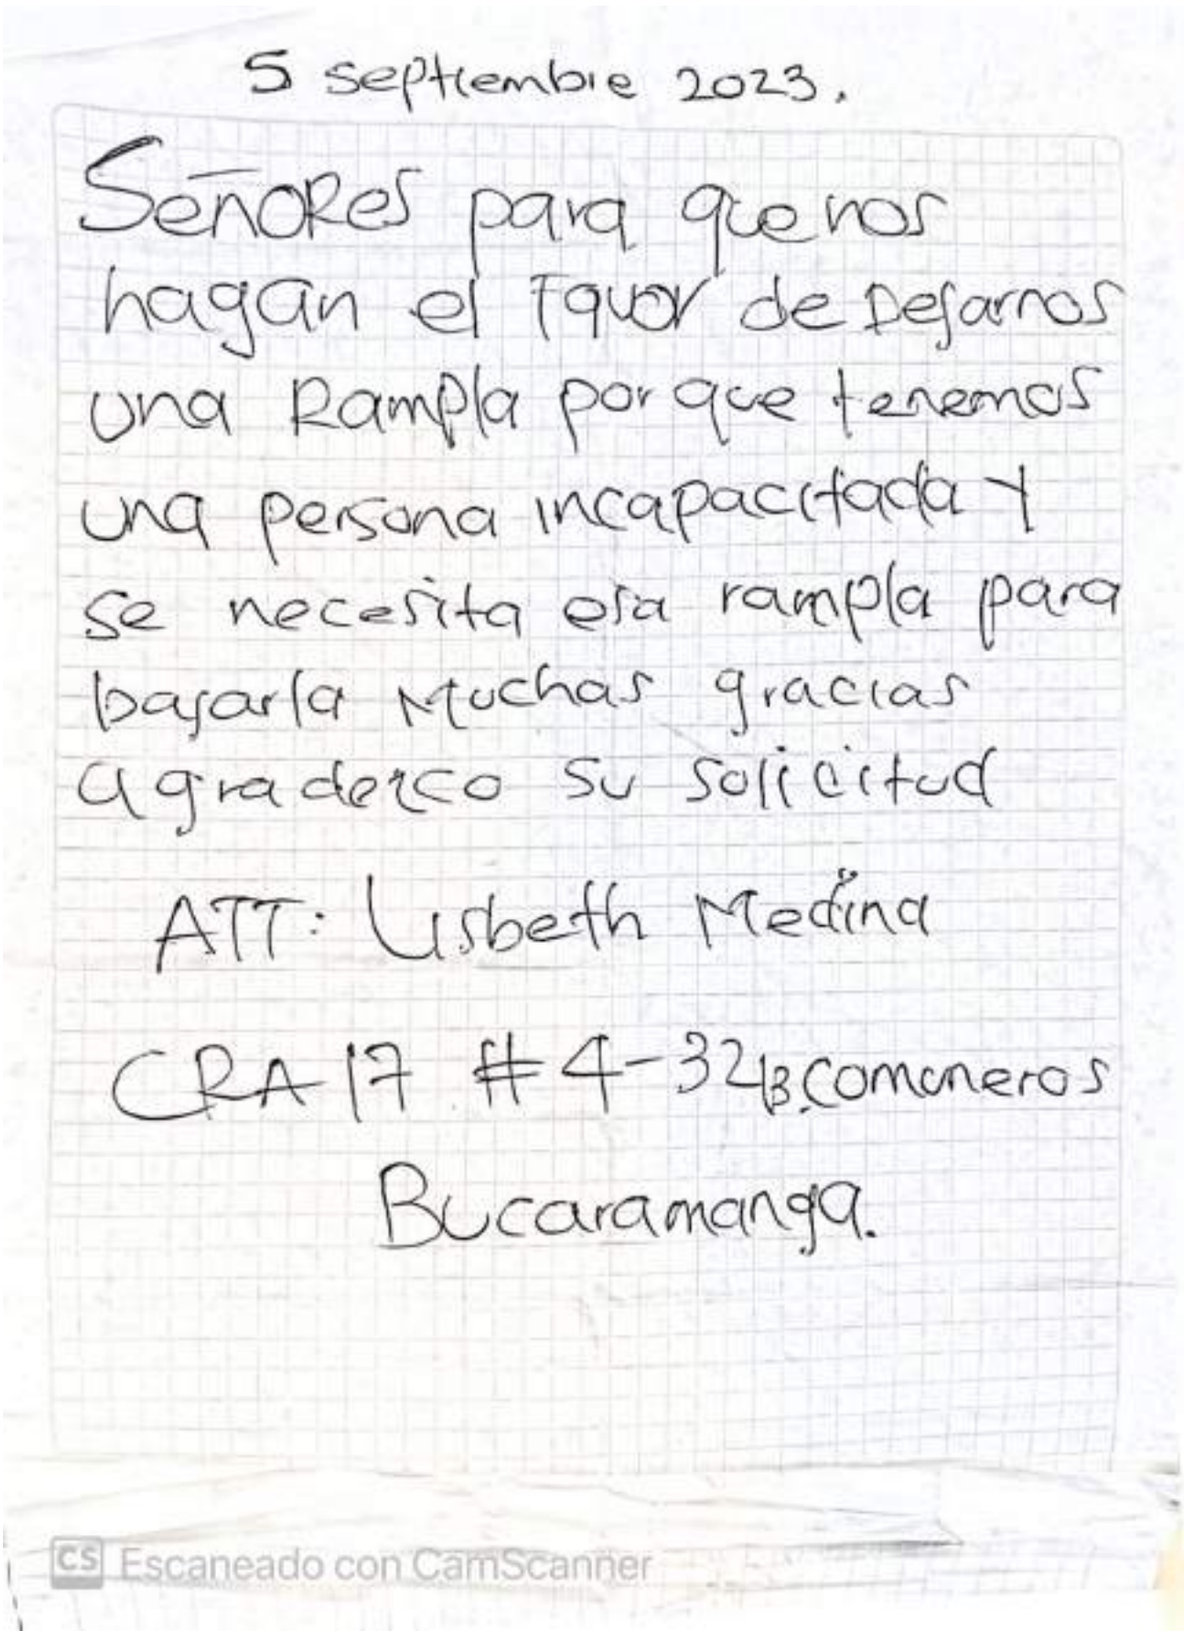

5 septiembre 2023.

Señores para que nos hagan el favor de dejarnos una Rampla porque tenemos una persona incapacitada y se necesita esa rampla para bajarla Muchas gracias agradezco su solicitud

ATT: Lisbeth Medina

CRA 17 #4-32 B. Comuneros

Bucaramanga.

CS Escaneado con CamScanner

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 123

Bogotá D C. 15 de septiembre 2023

Señor
Lisbeth Medina
Propietario de la vivienda ubicada en la Cra 17 No.4 -34

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1"**

Asunto: Respuesta de PQRS barrio chapinero emitida el 05 de septiembre

Cordial saludo.

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio Chapinero acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición en la cual se solicita acceso a rampa para discapacitados en la vivienda ubicada en la Cra 17 No. 4-34 barrio Chapinero, el Consorcio Santander permite comunicar que no se dejara rampa de acceso peatonal al predio, de acuerdo a revisión por parte de interventoría de los registros fotográficos anexados a la petición, dando desaprobación el supervisor del contrato Edgar Bayona. Esto obedece a que en el manual de espacio publico las rampas peatonales deben ir exclusivamente en las esquinas o intersecciones viales.

El peticionario puede hacer uso de las rampas vehiculares mas cercanas a la propiedad para hacer los desplazamientos de la persona con limitación de movilidad.

La petición también tiene otra limitante ya que el sardinel existente en la Cra 17 entre la calle 4 y 5 fue ejecutado hace menos de un (1) año por el municipio de Bucaramanga y este Consorcio no conto con el aval de reformarlo o intervenirlo, por tal motivo se dejarán las rampas existentes sin modificación alguna o construcción de nuevas.

Recordamos a la comunidad que consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.

Recibido: Ruth Correa
Fecha: 19/sep/2023
Hora: 9:00 Am

Cordialmente,

JUAN CARLOS JAIMES NIÑO
C.C. No. 91.249.578 de Bucaramanga
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

C.C. Oficina
Elaboró: PS. Leidy Andrea Ayala Sanmiguel- Profesional del área social
Aprobó: DAP

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	Página 1 de 1

Fecha: Septiembre 11/2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	Queja	Reclamo	Sugerencia	Denuncia
X				

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Edificio Habitat de Florencia
Número del documento de Identidad	900489974-2
Dirección	Cll 20 Nº 29-18 -79-24-29-26.
Número(s) de teléfono(s)	3125863602
Correo electrónico	habflorencia@gmail.com.

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

Teniendo en cuenta que el Andén quedó más alto que el área de entrada al edificio observamos que en el evento de una lluvia intensa, el agua se va a empozar. Solicito que revisen y corrijan, no con rampas, sino dando un nivel adecuado para evitar empozamientos, ya que hoy en día el nivel de precipitaciones ha aumentado considerablemente.

Firma del peticionario:
Rudd Hernandez - Admin

Profesional Social

Escaneado con CamScanner

CS Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 132

Bogotá D C. 20 de septiembre de 2023

Señora
EDIFICIO HABITAR DE FLORENZA
900.489.974
Administrador edificio Calle 20 No. 29-18

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1**"

Asunto: Respuesta de PQRS barrio San Alonso emitida el 11 de septiembre de 2023

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio San alonso acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición del edificio Habitar de Florenza, en la cual solicitan amablemente arreglar y /o corregir la entrada del edificio ubicado en la calle 20 No. 29-18, ya que residentes han observado que el andén quedo más alto que el área de la entrada al edificio lo cual podría generar un empozamiento de agua por fuertes lluvias, por tal se le pide al contratista dejar un nivel adecuado para así evitar empozamientos.

De acuerdo a pqrs, se solicita la visita del residente de obra de interventoria, se hace la respectiva prueba de agua para verificar los desniveles de la entrada del edificio, evidenciándose un pequeño empozamiento de agua que fue subsanado por el contratista en ese momento. Después de esta intervención se procede a repetir la prueba en donde se observa que el empozamiento que queda, corresponde a una depresión en el suelo ya existente, lo cual no corresponde al objeto contractual del Consorcio. Se adjunta evidencia fotográfica del proceso de prueba.

Recordamos a la comunidad que Consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.

Cordialmente,

Recibido Diana Parra R.
Fecha 21/09/2023
Hora: 9:00AM

JUAN CARLOS JAIMES NIÑO
C.C. No. 91.249.576 de Bucaramanga
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS Escaneado con CamScanner

C.C: Digital
Elaboró: PS. Leidy Andrea Ayala Sanmiguel- Profesional del area social
Aprobó: OAP

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD" ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

Fecha: 4/09/2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	Queja	Reclamo	Sugerencia	Denuncia
X				

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Edificio Habitar de Florencia
Número del documento de Identidad	900. 489. 974 -
Dirección	Calle 20 Nº 29-18. 29-24 - 29-26.
Número(s) de teléfono(s)	312 586 3602
Correo electrónico	habfiorenzia@gmail.com.

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

Solicito que corrijan el bordillo a sardinel porque del parqueadero de sótano, nos vemos afectados al hacer el giro para tomar la vía, ya que la llanta del carro alcanza a coger el bordillo.
Tengan en cuenta que la vía es de alto tráfico, lo que impide avanzar la calzada en forma recta.

Firma del peticionario:
Ayda Heredes. R - Administradora.

Profesional Social

Escaneado con CamScanner

CS Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 131

Bogotá D C. 20 de septiembre de 2023

Señora
EDIFICIO HABITAR DE FLORENZA
900.489.974
Administrador edificio Calle 20 No. 29-18

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1**"

Asunto: Respuesta de PQRS barrio San Alonso emitida el 11 de septiembre de 2023

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio San alonso acerca del frente de trabajo de adecuación de anderes en el sector.

En relación a la petición del edificio Habitar de Florenza, en la cual se solicita amablemente corregir la rampa de acceso vehicular ya que manifiestan varios propietarios que se están viendo afectados al hacer el radio de giro para tomar la vía, ya que la llanta del carro alcanza a coger y golpear el sardinel, a su vez manifiestan que la vía es de alto tráfico, lo cual impide avanzar la calzada de forma recta.

En respuesta a su solicitud nos permitimos manifestar que en visita con interventoría se hizo la respectiva revisión de la construcción de la rampa vehicular a lo cual manifestamos que, de acuerdo al manual del espacio público de Bucaramanga, la rampa vehicular ubicada en el predio de la calle 20 No. 29-18, cumple con los diseños y especificaciones técnicas correspondientes a la rampa construida, dejando los radios de giro adecuados para maniobra de los conductores.

Recordamos a la comunidad que Consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.

Cordialmente,

JUAN CARLOS JAIMES NIÑO
C.C. No. 91.249.578 de Bucaramanga
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

Recibido Deisy Para R.
Fecha 21/09/2023
Hora 9:00 am

C.C. Oficina
Elaboró: Ps. Leidy Andrea Ayala Santigudo Profesional del área social
Aprobó: OAP

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER — CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

Fecha: 14/sep/2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	Queja	Reclamo	Sugerencia	Denuncia
☐	☐	☐	☐	☐

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	GILBERTO DIAZ Y OTROS VECINOS
Número del documento de Identidad	13830531 Y OTROS
Dirección	CRA 29 N° 19-67 APTO 501 Y OTROS
Número(s) de teléfono(s)	3183778992 Y OTROS
Correo electrónico	Gilbert1383@hotmail.com

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

Muy respetuosamente los firmantes de la presente solicitud requerimos se estudie la posibilidad de intervenir el área completa de vegetación tupida ya que encuentra seguidamente al edificio con nomenclatura CRA 29 N° 19-67 y ya que el estado de vegetal alto y tupido además de oscuro pues no hay luz cerca, hace del área y zona peligrosa para los residentes del sector.

Altamente agradecidos por su amable atención a la presente que redunda en la SEGURIDAD de los residentes y visitantes del Sector.

Firma del peticionario: 3183778992

Escaneado con CamScanner

NOMBRE	CEDULA	DIRECCION	TELEFONO
- Jaime Sua Hurtado	19.128768	Carrera 29 #19-62	3105520268.
- [illegible]	23792151	Cra 29 No 1962	3135816414
- [illegible]	1098767259	cra 29 #19.74	3104111883
Ligia [illegible]	63307151	cra 29 #1974	3125759803
[illegible]	91 100306	cra 29 #1974	3175030322
[illegible]	60254493	cll 20#29.19	3227744351
[illegible]	37815218	calle 20#29-14	3172305955
Nubia Vásquez Aldila	37.943.097.	Cra 29 N· 19-67	apto 201
Nubia Restrepo Tarazona	28161328	calle 20 29-28	
Myriam Rocio Jácome Hernández	37752747.		
Luis Alfredo Vanegas Lozano	79709670		
Aloiso Jácome Gamboa	13344839		
Myriam Rosanja Hernández	28131019.		
Yolima Guerrero González	37549448.		
Delfina González	37824391.		

Escaneado con CamScanner

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 127

Bogotá D C. 18 de septiembre 2023

Señores
GILBERTO DIAS Y OTROS VECINOS
Veedores ciudadanos Cra 29 No. 19-67 apto 501
Barrio San Alonso

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1"**

Asunto: Respuesta de PQRS barrio San Alonso emitida el 14 de septiembre 2023

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio San Alonso acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición de la propiedad ubicada en la Cra 29 No.19 -67, en la cual se solicita la intervención del área completa de vegetación tupida que se encuentra enseguida del edificio con nomenclatura Cra No. 19-67 ya que el estado de la franja ambiental es muy alta y tupida, lo cual está generando inseguridad del área y la zona para los residentes del sector. Dando respuesta a lo anterior el contratista notifica que su petición fue positiva, ya que se aprueba por parte de interventoría este sendero ejecutando aproximadamente 45 metros cuadrados, ya que se realiza un balance presupuestal y se cuenta con el recurso necesario para la ejecución de la obra.

Recordamos a la comunidad que Consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.

Recibido:
Fecha: 21/09/2023
Hora: 9:00am

Cordialmente,

JUAN CARLOS AYALA NIÑO
C.C. No. 91.249.578 de Bucaramanga
Director de Obra

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD" ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

Fecha: 14/09/2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	X	Queja		Reclamo		Sugerencia		Denuncia	

2. DATOS PETICIONARIO:


Nombres y apellidos	Isabel Cardenas
Número del documento de Identidad	27.450.579
Dirección	Calle 20 # 29-31
Número(s) de teléfono(s)	
Correo electrónico	

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

Se Anexa par enviada pa la propietaria

Firma del peticionario:

Escaneado con CamScanner

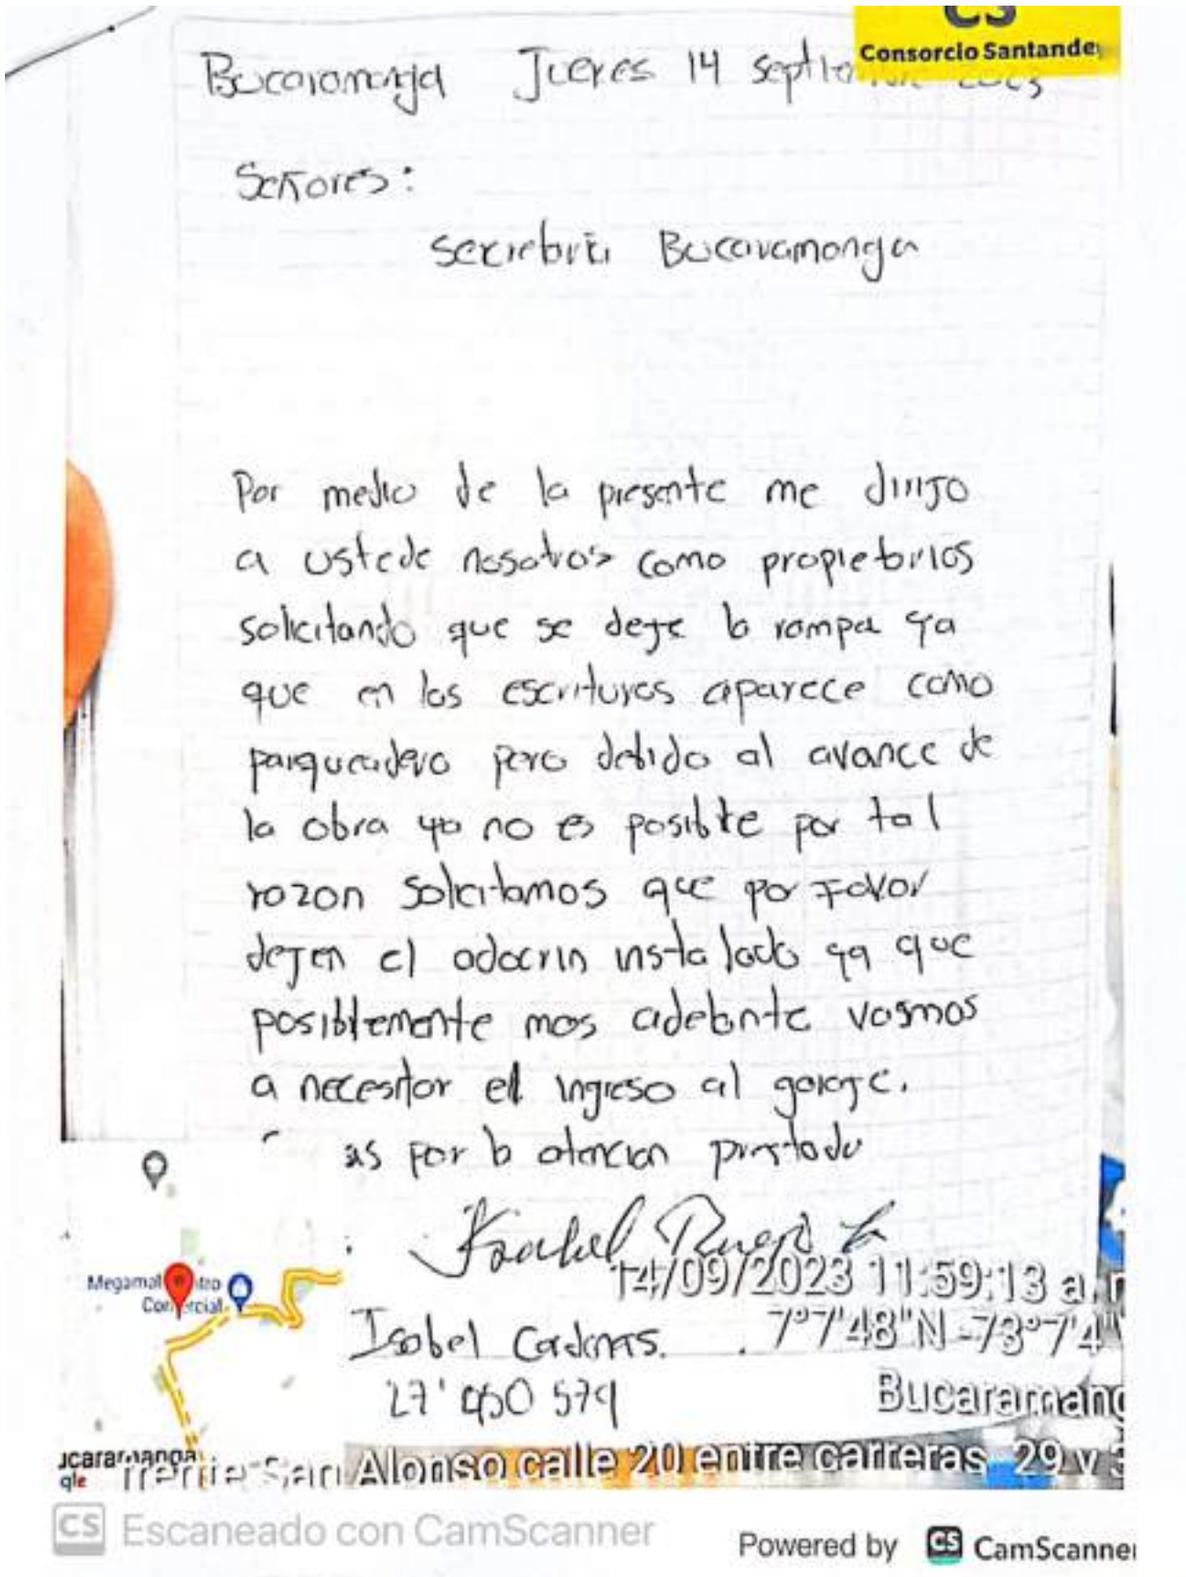

Bucaramanga Jueves 14 septiembre 2023

Señores:

Secretaría Bucaramanga

Por medio de la presente me dirijo a ustedes nosotros como propietarios solicitando que se deje la rampa ya que en los escrituras aparece como parqueadero pero debido al avance de la obra ya no es posible por tal razon solicitamos que por favor dejen el adarin instalado ya que posiblemente mas adelante vamos a necesitar el ingreso al garaje.

Gracias por la atencion prestada

Rachel Rueda

14/09/2023 11:59:13 a.

Isabel Cadenas. 7°7'48"N 73°7'4

27'450 579 Bucaramang

Megamall Centro Comercial

Alonso calle 20 entre carreras 29 y

Escaneado con CamScanner Powered by CamScanner


14/09/2023 11:58:16 a.
7°7'48"N -73°7'3
Powered by CamScanner

CS Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 130

Bogotá D C. 20 de septiembre 2023

Señora
ISABEL CARDENAS
27.450.579
Propietario de la vivienda Calle 20 #29-31 veedor comunitario

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1"**

Asunto: Respuesta de PQRS barrio San Alonso emitida el 14 de septiembre de 2023

Cordial saludo.

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio San Alonso acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición en la cual se solicita acceso a parqueadero en la calle 20 #29-31, el consorcio Santander permite comunicar que se dejara rampa de acceso vehicular al predio, de acuerdo a revisión por parte de interventoria de los registros fotográficos anexados a la petición, dando aprobación el supervisor del contrato Edgar Bayona.

Recordamos a la comunidad que consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.

Recibida: Rafael Rivera C
Fecha: 21/09/2023
Hora: 9:00 AM

Cordialmente,

JUAN CARLOS JAIMES NIÑO
C.C. No. 91.249.578 de Bucaramanga
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS Escaneado con CamScanner

C.C.
Elaboró: PS. Lcda. Andrea Ayala Santiguel. Profesional del área social
Aprobó: DAP

GOBERNAR ES HACER	CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD" ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-008
			Fecha	22/03/2021
			Versión	1
			Pagina	Página 1 de 1

Fecha: 20/09/2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	Queja	Reclamo	Sugerencia	Denuncia
X				

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	G YORGUIN Reyes
Número del documento de Identidad	91240 205
Dirección	clle 4 #16-60
Número(s) de teléfono(s)	317 227 8818
Correo electrónico	Yorgui reyes6 @gmail.com

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

Como Propietario de la tienda Fuente Soda Verito ubicada en la calle 4 #16-60 esquina Solicito que al Frente de mi Predio no hagan gradas sino ramplas para evitar el consumo (de Jovenes) drogas. le agradezco su atencion y colaboracion muchas gracias por su comprencion.

Radicado: 4:20 pm 20 SEP 2023.

Firma del peticionario:

Yorgui Reyes
91240205

Escaneado con CamScanner

CS Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 144

Bogotá D C. 30 de septiembre 2023

Señor
YORGUIN REYES
Propietario de la vivienda ubicada en la Calle 4 No. 16-60

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1"**

Asunto: Respuesta de PQRS barrio chapinero emitida el 20 de septiembre

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio Chapinero acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición en la cual se solicita que al frente del predio ubicado en la Calle 4 #16-60 no se hagan unas gradas si no rampas con el fin de evitar el consumo de sustancias ilícitas, ya que es un barrio el cual se encuentra ubicado en medio de varias "ollas" y es muy inseguro. Dando respuesta a su solicitud en visita con la interventoría y personal contratista se mira que opción hay de no dejar dichas gradas, se le pide al propietario del predio el señor Yorguin que estuviera presente para que se llegara a un mutuo acuerdo, por tal teniendo en cuenta las indicaciones técnicas y los desniveles que habían en la parte externa de la vivienda se toma la decisión de dejar unas gradas sobre el anden para dar la pendiente que se necesita en dicho espacio lo cual el propietario estuvo de acuerdo.

Recordamos a la comunidad que consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo las estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.

Recibido Yorbu Reyes.
Hora 9:00AM
Fecha: 30/sep/2023

Cordialmente,

JUAN CARLOS JAIMES NIÑO
C.C. No. 91.249.578 de Bucaramanga
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

C.C: Oficina
Elaboró: PS. Leidy Andrea Ayala Sanmiguel- Profesional del área social
Aprobó: DAP

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

Fecha: 21/09/2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	Queja	Reclamo	Sugerencia	Denuncia
X				

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	JOHN FREDDY CORREA PARDO
Número del documento de Identidad	1133525407 3 B/MANGA
Dirección	CRA 23 A # 2-10 TRANSICION
Número(s) de teléfono(s)	3175746437
Correo electrónico	Jhon.correa30@OUTLOOK.es

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

YO COMO PRESIDENTE DEL BARRIO EN LA VISITA SE DIO A CONOCER QUE NO SE PUEDE ARREGLAR MEDIA PEATONAL Y DEJAR EL RESTO EN MAL ESTADO YA QUE SE REQUIERE VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y NECESITAMOS UNA PEATONAL EN EXCELENTE ESTADO YA QUE SE HAN PRESENTADO ACCIDENTES CONTINUOS.

Firma del peticionario:
JHON FREDDY CTT

Escaneado con CamScanner

CS Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 140

Bogotá D C. 29 de septiembre 2023

Señor
JHON FREDY CORREA PABON
C.c 1135254073
Presidente de junta de acción comunal Barrio Transición V

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1**"

Asunto: Respuesta de PQRS barrio Transición V emitida el 21 de septiembre de 2023

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio Transición V acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición en la cual se solicita la ejecución de la peatonal completa ubicada en la Cra 23ª #2-22 de acuerdo con la visita realizada el día 21 de septiembre en compañía del personal contratista, se le informa al peticionario que se dará traslado por competencia a interventoría y secretaria de infraestructura para el estudio de su solicitud.

Cuando se cuente con una respuesta formal por parte de los entes citados anteriormente se le dará copia de dicha solicitud.

Recordamos a la comunidad que consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.

Cordialmente,

Se envio eta por medio magnetico "whatsapp"

JUAN CARLOS JAIMES NIÑO
C.C. No. 91.249.578 de Bucaramanga
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

C.C: Oficina
Elaboró: Pa Leidy Andrea Ayala Zarmiguen Profesional de Gestión social
Aprobó: DAP

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/01/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 12/09/2023 **HORA INICIO:** 9:00Am **ACTA N°:** 1

LUGAR: Calle 20 # 29-60 **HORA FIN:** 9:30Am

1. TEMAS A TRATAR

- Arreglo acometida electrica punto poste a caja de registro.

2. AVANCES Y ACUERDOS

El dia 12 de septiembre siendo las 9:00Am, se reunen la profesional social del contratista y el señor propietario del inmueble ubicado en la calle 20 # 29-60.

De acuerdo al derecho de peticion emitido el 07 de septiembre a la secretaria de infraestructura y secretaria de planeacion de la alcaldia de Bucaramanga donde el propietario solicita arreglo pronto de la acometida electrica que fue afectada durante la ejecución de la obra en la actividad de demolición, ya que dicha acometida se encontraba muy superficial, no cumpliendo con lo establecido en la norma de profundidad entre 30 y 40 centimetros.

En el avance de la obra el contratista realiza su respectivo arreglo de la acometida, el cual estaba el tubo galvanizado en estado avanzado de deterioro. motivo por el cual al momento de la demolición el mismo se afecta de manera inmediata, causando un corto en la misma zona del impacto sin afectar aparatos electricos del inmueble.

El dia 09 de septiembre personal idoneo hace cambio del tubo, instalación del cableado nuevo y deja en optimas condiciones las instalaciones electricas.

La presente acta es firmada a conformidad por los asistentes.

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER – Alcaldía de Bucaramanga – CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Lindy Andrea Ayala Sarmiento	Profesional Social	
Yaneiram ortega acosta	propietario del inmueble	
Edward L Vera R	Residente Interventoria	

Escaneado con CamScanner


7.1301N-73.1172W
San Alonso calle 20
CS
Consorcio Santander
CS
Consorcio Santander

—

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 19/sep/2023 HORA INICIO: 8:00AM ACTA N°: _____

LUGAR: cra 17-4-16 HORA FIN: _____

1. TEMAS A TRATAR

- Socialnacion Remoción de individuo vegetal

2. AVANCES Y ACUERDOS

El dia 19 de septiembre se reunen la profesional social contratista y el HSEQ Bernardo Suarez y el propietario de la vivienda el señor Mario Hernandez camargo I.D. cedula 91.295.605, para informarle que el pino Araucaria que se encontraba situado enfrente de su domicilio (No cuenta con numeración, el individuo vegetal) Tuvo que ser talado debido que a futuro la raiz generara daños no solo al espacio publico construido, sino tambien a las fachadas del inmueble.

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
retiro del individuo vegetal	HSEQ	19/sep/2023

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Leidy Andrea Ayala S.	Profesional Social	
Mario Hernandez	Profesional	C.C. 91295604
Bernardo Suarez	HSEQ	Bernardo Suárez Gómez

Escaneado con CamScanner

ENTREGA INDIVIDUO VEGETAL CHAPINERO





Escaneado con CamScanner

CS Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 134

Bogotá D C, 25 de septiembre de 2023

Señores
COMUNIDAD ALBANIA- JUNTA DE ACCION COMUNAL- EDILES- VEEDURIA CIUDADANA
COMUNA 14

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1**"

Asunto: Comunicado de inicio de obra y visitas actas de vecindad

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado se entrega oficio dejando como evidencia que no fue posible contactar a varios de los propietarios del barrio Albania, ya que en repetidas ocasiones el contratista visita las viviendas con la finalidad de hacer el levantamiento de las actas de vecindad y no se logra ningún contacto con las personas responsables de la unidad residencial, por lo tanto no se pudo ingresar a la vivienda, pero se hizo registro fotográfico y fílmico desde la parte externa de esta, cuya finalidad es amparar cualquier daño o deterioro que se cause en el inmueble antes mencionado, además determinar el estado actual en que se encuentra la residencia y en el estado final en que queden cuando se culmine el proyecto, comprometiéndose el Consorcio Santander a reparar cualquier daño que se ocasione en dichas inmuebles con ocasión de los trabajos de excavación y/o construcción que se ejecuten en él.

Además, se informa que desde el día **26 de septiembre** se iniciaran labores de construcción, siendo necesario el cierre de la vía para mayor rendimiento de la obra, el paso de los vehículos que transitan por el sector desde la calle 51 N° 18-61 hasta la casa N° 20-67 estará restringido mientras se esté ejecutando la obra de andenes en concreto; agradecemos a la comunidad su comprensión y colaboración ante las molestias que se puedan generar, se recomienda tener especial cuidado a las personas que transitan por el sector, respetar la implementación del PMT, acatando las instrucciones dadas por el personal contratista.



JUAN CARLOS JAIMES NIÑO
C.C. No. 91.249.578 de Bucaramanga
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

C.C: Oficina
Elaboró: PS. Leidy Andrea Ayala Sanmiguel- Profesional del área social
Aprobó: DAF

Avenida Suba No. 106A-28 Oficina 202 Bogotá, D.C.
Teléfonos: 601 5339575 - 601 9370295
lmzen@mymingenieros.com

CS Escaneado con CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 29/09/2023 HORA INICIO: 7:30AM ACTA N°: _____

LUGAR: Calle 20 San alonso HORA FIN: _____

1. TEMAS A TRATAR

- Recorrido veeduria ciudadana
- Explicacion de la obra, procesos constructivos y avances
- contratista Responde preguntas, dudas e inquietudes.

2. AVANCES Y ACUERDOS

Siendo las 7:30am se da inicio a la socializacion de avance de obra, con el acompañamiento de la Residente de obra Liliana velandia, la profesional Social de interventoria Esterdy Corzo, el profesional HSEQ Bernardo soler, se le agradece por el tiempo prestado a las personas que asistieron, se inicia recorrido por la obra de la calle 20 entre cra 29 y 30 costado sur y costado norte, se le explica al grupo de veedores el atraso y los inconvenientes que se han presentado en obra, entre ellos las podas aereas y radiculares que se tuvieron que hacer, el arreglo de las Rampas de acceso vehicular que quedaron con pendientes, se les mostro el tramo que se intervino adicional de la cra 29 # 19-69, Se tomaron en cuenta las observaciones de parte de la comunidad para mantener el espacio Publico y Preservar la seguridad de los peatones.

Se le informa a la veeduria el avance que se ha tenido hasta lo fecha y está pendiente la fecha para el cierre y entrega de la misma.

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
entrega final obra	contratista	Sin definir

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Leidy Andrea Ayala J.	Profesional Social	
Sandra Liliana Gómez H.	Jefe Sin Alcalde Presidente	
Estudy Celta Aguilo.	Prof Social Interventoria	
Leyde Valentina Torres	Residente Obra	
Bernardo Sierra C.	HSEQ	

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO ES HACER	CS Consorcio Santander	ASISTENCIA COMITÉ VEEDOR ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-004
			Fecha	21/3/2021
			Versión	1
			Página	1 de 1

FECHA: 29/09/2023

TEMA: Recorrido Veederia San alonso

Por medio de la presente, se deja constancia de las personas que conforman en comité veedor del frente de obra en ejecución.

PARTICIPANTES DEL COMITÉ VEEDOR SANTANDER		
NOMBRE	CARGO / ROL	FIRMA
Leidy Andrea Ayala J.	Profesional Social	
Sandra Johana Gomez	Tec Jay Alunio Practicante	
Layda Yolanda Torres	Residente de obra	
Estefany Cortes Aguilar	Prof Social Interventoria	
Bernardo Sierra Camacho	HSEQ	

Se deja constancia, que cada _____ dias estas personas se reunirán en pro de conocer los avances constructivos que se han desarrollado en el frente de obra anteriormente relacionado.

LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL
Profesional Social - Contratista
CONSORCIO SANTANDER

CS Escaneado con CamScanner

RECORRIDO VEEDURIA SAN ALONSO



Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 29/Sep/2023 HORA INICIO: 9:30AM ACTA N°: _____

LUGAR: CDI campo madrid HORA FIN: _____

1. TEMAS A TRATAR

- Recorrido veeduria ciudadana Barrio campo madrid

2. AVANCES Y ACUERDOS

Se realiza acta de reunion de avance con la veeduria del barrio campo madrid para informarle a la comunidad y evidencien los avances que ha realizado hasta la fecha el contratista, Se canto con el acompañamiento de la residente de obra liliana velandia, residente de interventoria Edward vera, profesional social de interventoria Estefdy cano y profesional HSEQ Bernardo suerez.

Desde la parte tecnica informan que hasta la fecha se han instalado 89 metros lineales de barandas.

El presidente de junta y la veedora ciudadana le hace enfasis al contratista de priorizar la instalación de barandas en las zonas de discapacidad del barrio ya que en el recorrido de inicio de obra y socialización de esta la señora Edil Isidora Galvis y la junta de acción comunal mencionan que el proyecto se paso especialmente para priorizar y ayudar a los residentes con discapacidad.

GOBERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	ASISTENCIA COMITÉ VEEDOR ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-006
		Fecha	22/3/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 1

FECHA: 29/09/2023

TEMA: Reunión veeduría barrio campo hermoso

Por medio de la presente, se deja constancia de las personas que conforman en comité veedor del frente de obra en ejecución.

PARTICIPANTES DEL COMITÉ VEEDOR SANTANDER		
NOMBRE	CARGO / ROL	FIRMA
Sandra Milena Cadenas A.	Líder	
GRIEL GODOY	Fiscal	
Yisley José Osorio	Vicepresidente	
Edward R Vera R	Presidente Interventoría	
Edery Cardo Aguilar	Pop Social Intent	
Leyde Iliana Velandia Torres	Residente de Obra	

* Se deja constancia, que cada _____ días estas personas se reunirán en pro de conocer los avances constructivos que se han desarrollado en el frente de obra anteriormente relacionado.

LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL
Profesional Social - Contratista
CONSORCIO SANTANDER

CS Escaneado con CamScanner

RECORRIDO VEEDURIA CAMPO MADRID





Escaneado con CamScanner

—

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 14/sep/2023 HORA INICIO: 9:00Am ACTA N°: _____

LUGAR: Cra 20c # 1n-30 HORA FIN: _____


1. TEMAS A TRATAR

- Suministro de luz y agua

2. AVANCES Y ACUERDOS

La profesional Social del contratista y el profesional HSEQ se reunen con el propietario de la vivienda ubicada en la cra 20c # 1n-30, el Señor victor manuel calorera I.D. C.C. 91249626, con el fin de llegar a un acuerdo para el Suministro de luz y agua, dicho acuerdo con el propietario se determina que al finalizar la obra se llegara a un acuerdo de pago de acuerdo a los deuci de los Recibos.

CS Escaneado con CamScanner

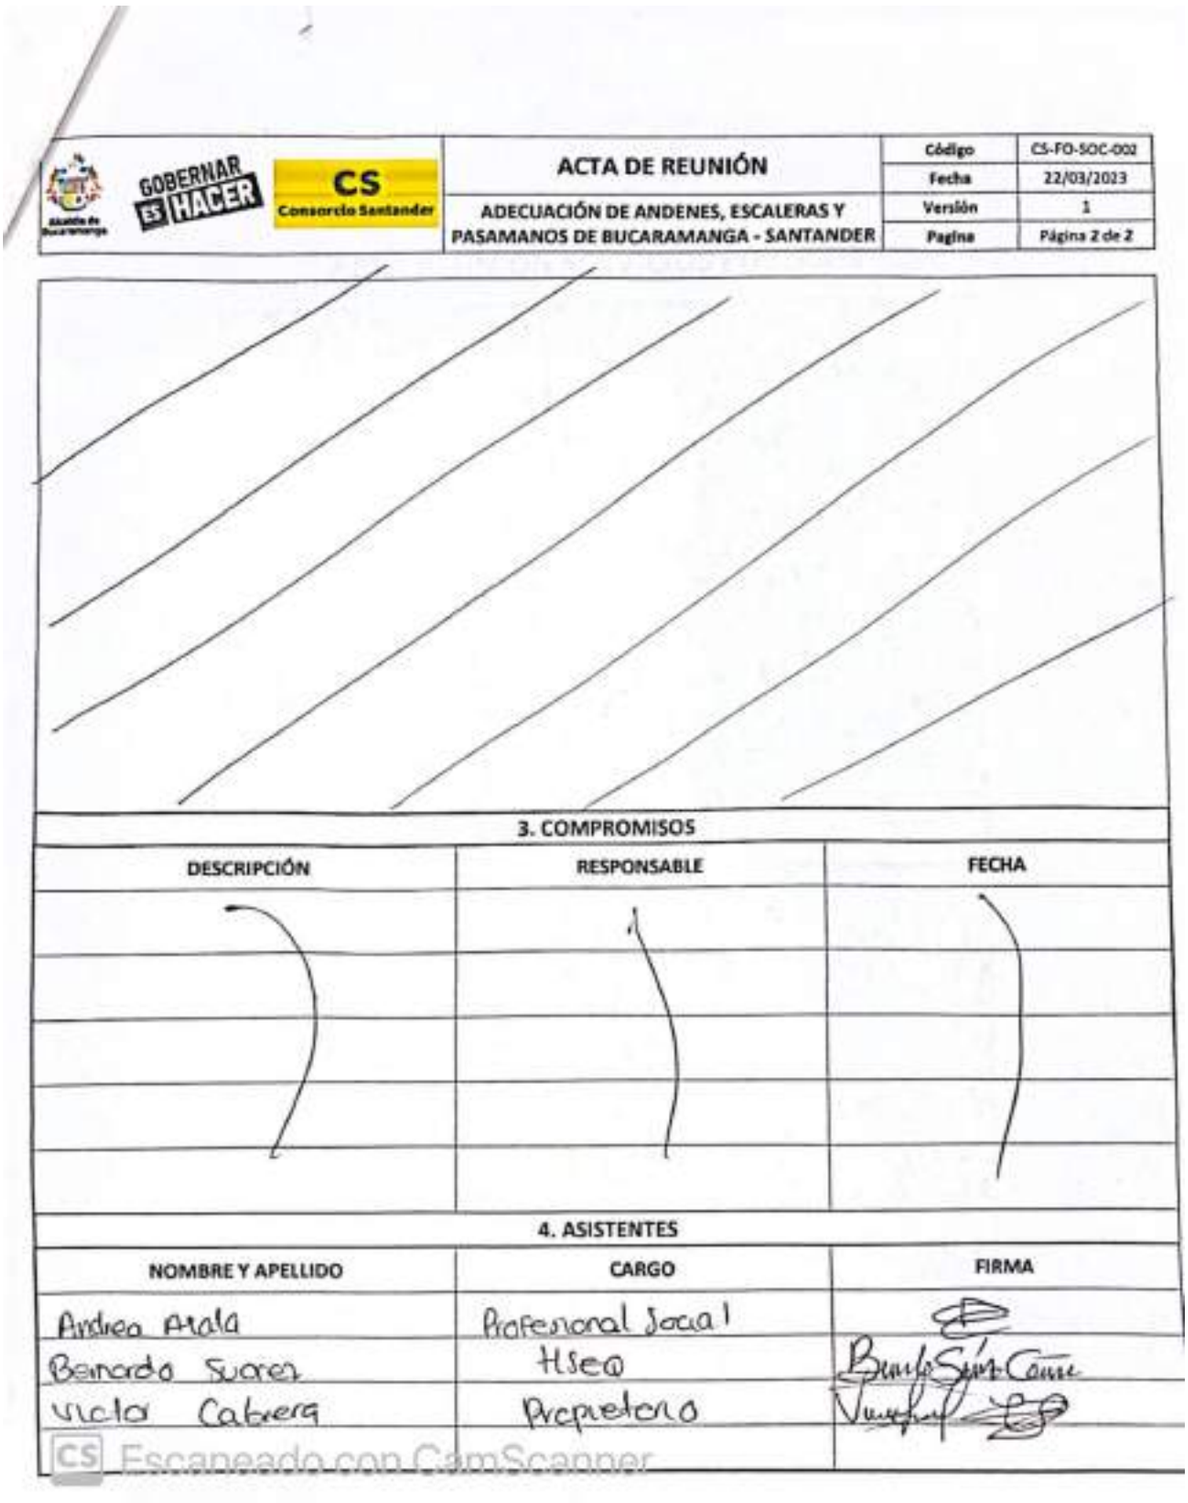

GOBERNAR ES HACER — CS Consorcio Santander

ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
	Fecha	22/03/2023
ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
	Pagina	Página 2 de 2

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Andrea Arata	Profesional Social	
Bernardo Suarez	HSEQ	
Victor Cabrera	Propietario	

CS Escaneado con CamScanner


ACTA REUNION SERVICIOS PUBLICOS
19 sept 2023 10:15:20 a. m.
2047 Calle 1
Bucaramanga
Santander
La Juventud
9 sept 2023 10:15:05 a. m.
2047 Calle 1
Bucaramanga
Santander
La Juventud

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 19/sep/2023 HORA INICIO: 10:00AM ACTA N°: _____

LUGAR: cra 20c # 1n-30 HORA FIN: _____

1. TEMAS A TRATAR

* Arriendo campamento de obra

2. AVANCES Y ACUERDOS

el dia 19 de septiembre se reunen la profesional social del contratista Andrea Ayala y el propietario de la vivienda el Señor victor manuel cabrera. I.D. CC.91249626, con el fin de llegar a un acuerdo de servicio de arriendo de bodega y alquiler de baño por el valor de $300000 desde el dia 13 de septiembre.

Se le hace entrega del dinero y se firma el acta

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
• mantener el baño aseado	propietario	septiembre
• mantener orden baño	- HSEQ - mano de obra no calificad	septiembre
• Pago mensual del arriendo y pago de servicio de baño	Profesional social contratista	septiembre - octubre

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Bernardo Suarez	HSEQ	Bernardo Suárez
Andrea Tejada	Profesional Social	
Victor Cabrera	Propietario	

Escaneado con CamScanner

ACTA REUNION SERVICIOS PUBLICOS



Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 26/sep/2023 HORA INICIO: 9:00Am ACTA N°: _____

LUGAR: Bodega Albania HORA FIN: 9:30Am

1. TEMAS A TRATAR

- Servicio de alquiler bodega barrio albania
- Servicio de luz

2. AVANCES Y ACUERDOS

Siendo las 9:00Am de la mañana se reunieron los profesionales HSEQ y Profesional Social para realizar el pago y Reabir de parte de la señora mireya el sitio que sera utilizado como campamento de obra. Dicho pago se realiza por medio de una consignación por negú:

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2


3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Andrea Ayala	Profesional Social	
Irene tarazona	Propietaria	Irene Tarazona
Bernardo Suarez	HSEQ	

Escaneado con CamScanner

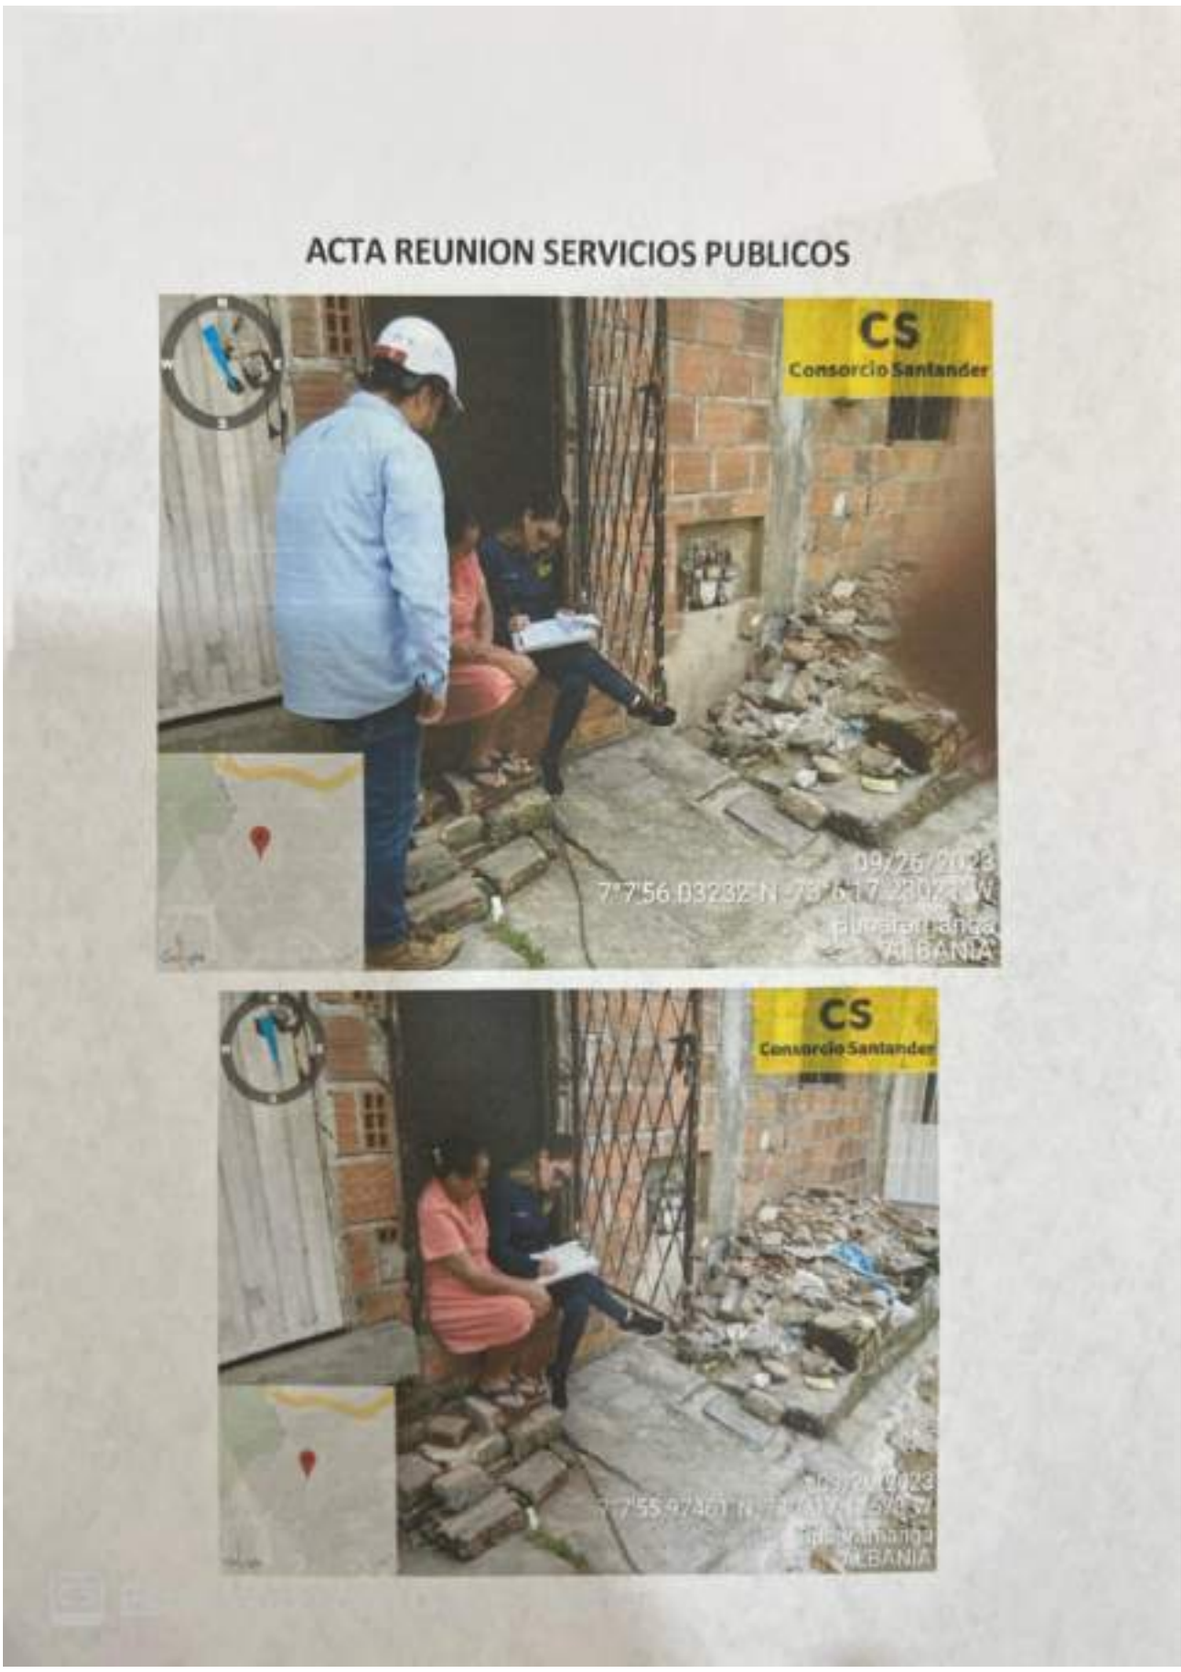
ACTA REUNION SERVICIOS PUBLICOS
CS
Consorcio Santander
CS
Consorcio Santander

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 27/Sep/2023 HORA INICIO: 9:00AM ACTA N°: _____

LUGAR: Parqueadero el Poxil HORA FIN: 9:30AM

1. TEMAS A TRATAR

- Servicio de bodega
- Servicio de baño (incluye aseo)
- Servicio de luz y agua

2. AVANCES Y ACUERDOS

Siendo las 9:00AM se reunen el profesional social y profesional HSEQ con el propietario del parqueadero el Señor Reinaldo Lozano c.c. 13.943.309 se negocia la prestación de servicios publicos, alquiler de baño (con pago de aseo) y bodega para acopio de materiales.

Alquiler bodega: $300.000 (26 Sep) ya se pago
Alquiler baño: $150.000 incluye aseo
Servicio de luz y agua: $150.000.

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER — CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Reinaldo Layton	Residente	
Andrea Ayala	Profesional Social	
Bernardo Sierra C.	HSEQ	

Escaneado con CamScanner

ACTA REUNION SERVICIOS PUBLICOS





Escaneado con CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 28/Sep/2023 HORA INICIO: 1:30pm ACTA N°: 1

LUGAR: Salón Social HORA FIN:

1. TEMAS A TRATAR

- Servicio de bodega
- Servicio de luz y agua
- Servicio de baño

2. AVANCES Y ACUERDOS

El dia 28 de Septiembre se Reunen los Profesionales HSEQ y Social con el presidente de Junta el Señor Manuel Melendez Identificado con numero de cedula 91.278.224 para el suministro de los Servicios de luz y agua, arriendo de bodega, Servicio de baño y aseo

-Bodega: $350.000
- Servicio de baño con aseo $100.000
- Servicio de luz y agua de acuerdo a desvio

Nequi: 3042715992

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Andrea Arala	Profesional Social	
Reinaldo Suarez	HSEQ	
Manuel Melendez	Residente de Junta	

CS Escaneado con CamScanner

ACTA REUNION SERVICIOS PUBLICOS





CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 29/ Sep/2023 HORA INICIO: 10:00AM ACTA N°: 3

LUGAR: Cra 51 # 27-31 HORA FIN: 10:30am

1. TEMAS A TRATAR

- Servicio de luz

2. AVANCES Y ACUERDOS

Siendo las 10am de la mañana se hace la profesional Social y el HSEQ contratista con el fin de solicitar amablemente el suministro de luz en el predio cra 51n 27-31 en el cual la señora Hilere Tarazona da una respuesta positiva, se llega a un acuerdo de pago entre los días que se utilice este servicio, pagando el desfase al finalizar la ejecución de la obra.

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Irene Tarazona	Propietaria	Irene Tarazona
Andrea Ayala	Profesional Social	
Bernardo Suarez	HSEQ	

CS Escaneado con CamScanner

—

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 29/Sep/2023 HORA INICIO: 7:00AM ACTA N°: 2

LUGAR: Calle 4 #16-24 HORA FIN: 7:30AM

1. TEMAS A TRATAR


- Suministro Servicios de luz y agua

2. AVANCES Y ACUERDOS

Siendo las 7:00AM se Reunen la profesional Social y el profesional HSEQ con el Señor wilmer torres Caicedo en el barrio Chapinero con el fin de llegar a un acuerdo para el suministro de luz y agua, dicho acuerdo con el propietario se determina que al finalizar la obra se llegara a un acuerdo de pago.

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER — CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2

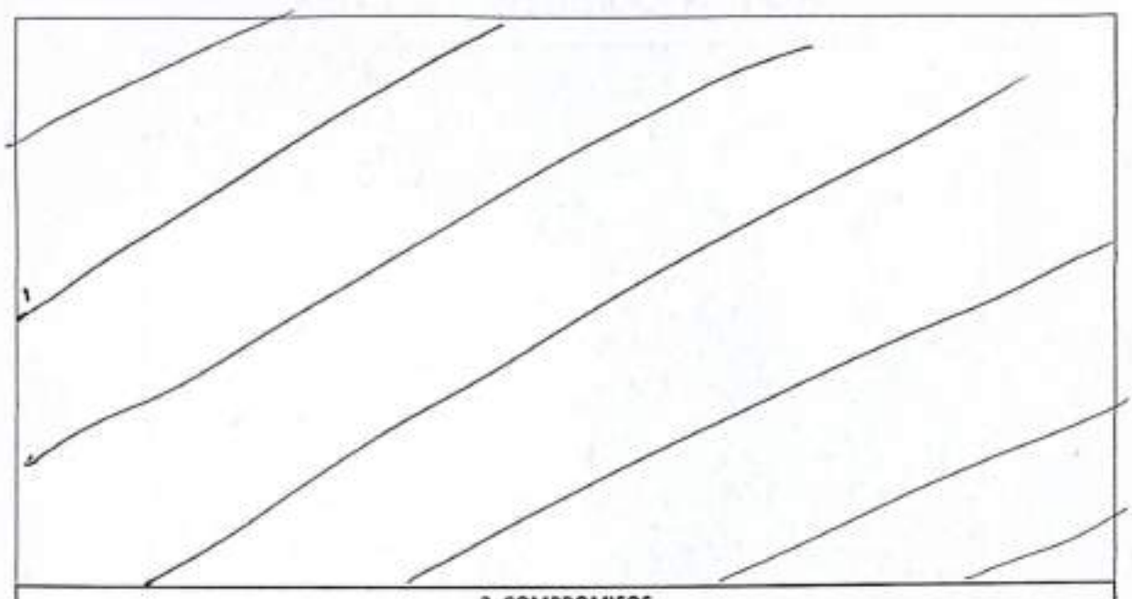

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Wilmer Tarazona	propietario	
Andrea Ayala S.	Profesional Social	
Bernardo Suarez	HSEQ	

CS Escaneado con CamScanner

ACTA REUNION SERVICIOS PUBLICOS





Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	LISTADO DE ASISTENCIA	Código	CS-PO-SISC-001
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	23/01/2023
		Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA: 13/sep/2023

TEMA DE REUNIÓN:

charla Proteccion Reparatoria, manos, pies

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Luis Alberto Florian Chamorro	1.065.590.063	3209341186	Luis Florian
Jaime Muñoz Ortega	1.091.185.202	3213825289	Jaime Muñoz
Luis Miguel Naranjo	1.012.963.666	3243784190	
Cristian Fernando Amaris Diaz	1.096.242.788	3228262889	Cristian
Cesar Antonio Gomez Delgado	91.519.899	301.419.7138	Cesar Gomez

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	LISTADO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-SOC-001
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/09/2023
		Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA: 20/Sep/2023

TEMA DE REUNIÓN:

Capacitar la Fruitación, Concientización acerca de

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Luis Alberto Florian Chamorro	1.065.590.063	320.934.1586	Luis Florian
Jaime Muñoz Ortega	1.091.135.202	321 382 5289	Jaime Muñoz
Luis Miguel Naranjo	1.052.963.666	3243784190	
Cristian Fernando Amaris Ariz	1.096.742.788	322 8262889	Cristian
Cesar Antonio Gomez Delgado	91.519.899	3019597238	Cesar Gomez

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

Escaneado con CamScanner

GOBIERNA BUCARAMANGA	CS Consorcio Santander	LISTADO DE ASISTENCIA	Código	CS-PO-SGC-003
		ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	12/7/2023
			Versión	3
			Página	1 de 1

FECHA: 25/sept/2023

TEMA DE REUNIÓN:

Trabajo en equipo, comunicación asertiva

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	
Jose luis Barragan	13860582	3233255791	
Edwin Ernesto rodriguez	1098633393	3186760810	
Cristian Humberto Tellez Figueroa	91535019	3157726477	Cristian Tellez
Cesar Rodriguez de los santos	1098697529		
Andres Fabian Cadiz Gomez	1098798509	3161637903	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	LISTADO DE ASISTENCIA	Código	CS-PO-SOC-001
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	24/01/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

FECHA: 29/Sep/2023

TEMA DE REUNIÓN:

Adecuadas parteras, trabajo bajo Resion, Controlado o y Hefico

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Maria eugenia Manrique tuta	37511566	3177125333	
Norayma Quintero Ordoz	1098632250	3014597238	Norayma Quintero O.

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

CS Escaneado con CamScanner

GOBIERNO QUE HACE! CS Consorcio Santander	LISTADO DE ASISTENCIA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código Fecha Versión Página

FECHA: 29/sep/2023

TEMA DE REUNIÓN:

Estiramiento musculos ejercicio de respiracion

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Oscar Javier Sierra	91499841	3143432968	
Jose Luis Laguna	1007711253	3227128895	
Jerson David Ospina	1098375661	3138906833	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2013 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

CS Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: F-MC-1000-238,37-005
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Mayo-10-2019
		Página 1 de 2

HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:	FECHA:
10:00 Am	11:00 Am	Medellín B&A	27-Sep-2023

PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA
Jairo Ojeda Ariza	T.S Sa Infraestructura.
Eckardy Garzo	Interventoria
Lasso, Yaleth Parra.	Contratista
Natalia Lopez.	Contratista
Andres Ayala	Contratista.

OBJETIVO

Seguimiento a socides de Contrato de mantenimiento y mejoramiento de andenes.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

*) Grupo 1: se inicio hace un mes en e Sector del Norte Con Campo Madrid, Actualmente se estan interviniendo: El Rosal, Juventud, Campo Madrid, Independencia, Esta Pendiente iniciar transición etapa 5.
Actualmente se encuentra ejecutando en albania, aun esta en espera de inicio Limoncito. También Se encuentra en ejecución la Universidad y se dara inicio a un tramo de la Aurora.
Pqrs: se encuentra abiertos dos Pqrs Pendientes por Tramite.

*) Grupo2: Se esta ejecutando Bolivar Calle 37, El Prado, La Aurora y Alvaro Salamanca, se tiene pendiente inicio de la Feria mejoras Publicas, Se incluyo un nuevo Punto en Cabecera Por una Accion Popular. (Pendientes Actas de Vecindad de este Ultimo punto).
- se ha venido adelantando actas de cierre en Quinta estrella y Bolivar Pendiente el acta de cierre de interventoria para hacer reunión de entrega.
Pqrs: No se encuentra a la fecha Pqrs Abiertas.

*) Grupo 3: Se encuentra abierto frentes en el Motor, Suecos, Real de minas, Villa Alicia, Diamante II, La libertad, la victoria, Ruedas del Sol, Provenza (se incluyo el ultimo por fallo de Acción judicial).

Escaneado con CamScanner
Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: F-MC-1000-238,37-005
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Mayo-10-2010
		Página 2 de 2

CONCLUSIONES

PQRS: Mabi, Pacovar, Solicitan mejoramiento de la intervención peatonal, durante la presente semana se va a realizar el ajuste.

* San Pedro y Metropolis, solicitan reunión de la intervención porque argumentan que se les va a empozar el agua desde la parte técnica se les ha explicado a la comunidad, desde la parte técnica y se les dara respuesta
- Metropolis Solicita arreglo de daños en zona donde se tenia el material
* Slonqueo: Zona de Gas con Vanty, no se ha podido cerrar esa frente de obra
Pendientes Por Intervenir: Diamante I y la Pedregosa, Cordoncillos, Ecuador.

COMPROMISOS


ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Siendo las 11:00 se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los (27) días del mes de Sept de 2023 y en constancia firman los que en ella intervinieron.

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
Yerly Andrea Ariza S.	
Natalia López R.	
Jenny Perez Villalba	
Laura Ojeda Patiño	
Esteidy Goyo Agudo	

El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento, y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dejar registro de la reunión realizada al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información Personal a través de nuestra página web www.bucaramanga.gov.co

Escaneado con CamScanner
Powered by CamScanner

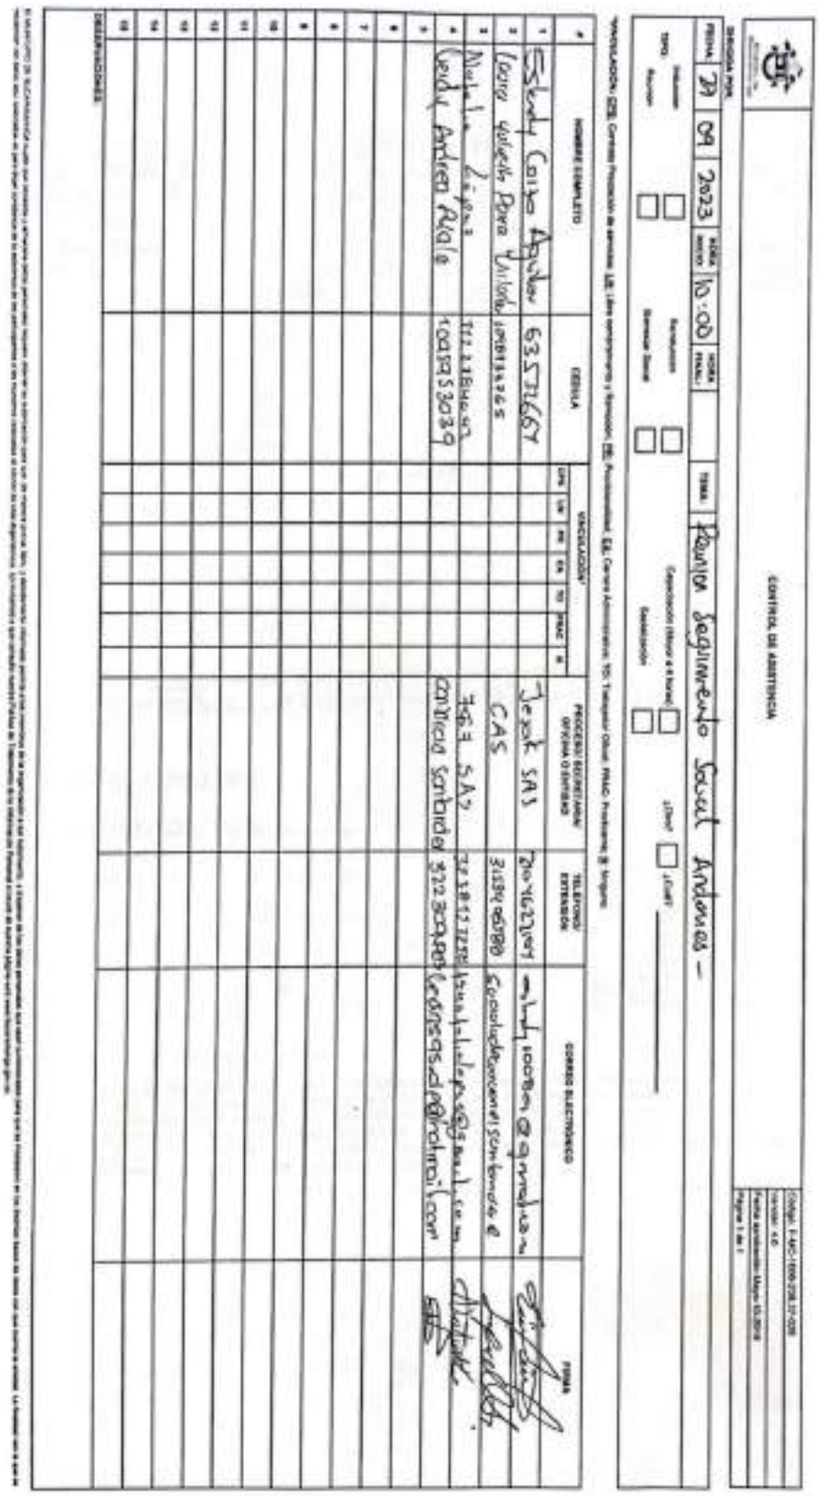

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: F-MC-1000-258-17-028
Versión: 4.0
Fecha aprobación: Mayo 15-2018
Página 1 de 1

DIRIGIDA POR:
FECHA: 29 / 09 / 2023 HORA INICIO: 10:00 HORA FINAL:
TEMA: Rueda seguimiento Social Andamios -
TIPO: Inducción / Reinducción / Charla Diaria / Capacitación (Menor a 4 horas) / Capacitación / Entrenamiento / Otro? ¿Cuál? _____

#	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	VACUNACIÓN* (COVID: 1D, 2D, REF, UNI)	PROCESO/ SECRETARÍA/ OFICINA O ENTIDAD	TELÉFONO/ EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Eleudy Conde Aguilar	63531667		Jepek SAS	3046762167	eleudy1008@gmail.com	
2	Jairo Yulieth Pava Urrego	1088134765		CAS	3158960880	Especialistaambiental.sst@gmail.com	
3	Michelle Vargas	TI: 1218446167		Jepek SAS	3183172218	Michellevargas@gmail.com	
4	Leudy Andres Ayala	1005932039		Conviva Santander	322 3009881	leudysas.ds@hotmail.com	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

05/sep/2023
En horas de la mañana la profesional Social pide a la parte técnica del contratista y interventoría, se realizara una prueba de agua en la entrada del edificio habitat de Plazma ya que la administradora manifiesta que cuando llueve se empoza el agua, dicha prueba evidencia un leve empozamiento por lal se decide hacer una corte en la loseta para que el agua tuviera un mejor flujo y no se empozara mas, a la vez se da respuesta por medio de un oficio del arreglo que se realizo.
Leidy Andrea Ayala
Profesional Social

Prof Social Interventoría

06/sep/2023
El dia 05 de Septiembre se realiza un recorrido en todas las frentes actuas, Sandalio y Chaparro con el fin de verificar con la comunidad que la obra se esta ejecutando adecuadamente, y si no han presentado inconvenientes.
Leidy Andrea Ayala
Profesional social

Prof Social Interventoría

Escaneado con CamScanner

035

07/sept/2023
El día 07 de septiembre en horas de la mañana se realizan actas de vecindad y de entorno en el barrio Albania, en compañía de la parte técnica del contratista, interventoría y ediles de la comuna 4.
Lady Andrea Ayala
Profesional social.

prof social interventoría

08/sept/2023
En horas de la mañana se realizan actas de vecindad y de entorno en el barrio La Juventud en compañía de la Junta de acción comunal, parte técnica de interventoría y contratista con la finalidad de mirar el estado de los predios antes de iniciar la obra de adecuación de senderos peatonales.
Lady Andrea Ayala
Profesional Social

prof Social Interventoría

11/Sept/2023
En horas de la mañana se realiza un recorrido en el frente de San Alonso en la calle 20 entre cra 29 y 30, varias personas de la comunidad se acercan y piden respetuosamente que se verifique las pendientes de las rampas de acceso vehicular ya que refieren que los carros se pegan pa debajo al ingresar o salir de las propiedades, se pasa dicha solicitud a interventoría para su respectiva revisión.
Lady Andrea Ayala
Profesional Social

12/ Sept/2023
En horas de la mañana se reune la profesional social y el propietario del inmueble ubicado en la calle 20 # 29-60, de acuerdo al derecho de petición emitido el 07 de sept a la secretaria de infraestructura y secretaria

Escaneado con CamScanner

036

de planeación de la alcaldía de Bimanga donde el propietario solicita arreglo pronto de la acometida eléctrica que le afectado durante la ejecución de la obra en la actividad de demolición, ya que dicha acometida se encontraba muy superficial, no cumpliendo con lo establecido en la norma de profundidad entre 30 y 40 centímetros.

En el avance de la obra el contratista realiza su respectivo arreglo de la acometida, el cual estaba el tubo galvanizado en estado avanzado de deterioro motivo por el cual al momento de la demolición del mismo se afecto de manera inmediata, causando un corto en el mismo tiro del impacto sin afectar aparatos eléctricos del inmueble. El día 09 de septiembre personal idóneo hace cambio del tubo instalación del cableado nuevo y deja en optimas condiciones las instalaciones eléctricas. Se realiza dicha acta y es firmada a conformidad por los asistentes.

Leidy Andrea Ayala
Profesional Social

13/ sept/ 2023

En el barrio la juventud se realiza inducción para ayudar y comunicarle a la comunidad del inicio de obra de los senderos peatonales se le recomienda a la comunidad tener especial cuidado a las personas que transitan por el sector.

Leidy Andrea Ayala
Profesional Social

En el frente de la juventud en compañía del profesional HSEQ se realiza charla a los maestros de obra no calificados sobre seguridad en el cual se abordaron temas como:

CS Escaneado con CamScanner

- Alteración respiratoria, protección de la cabeza la importancia que es permanecer en obra con el casco puesto, protección de las manos en el fin de evitar lesiones en las manos en los trabajos, protección de los pies con el fin de proteger los pies de riesgos físicos como lo caída de objetos, y se finaliza la charla con la protección facial, el usar las gafas para la protección ocular y facial.

Lady Andrea Ayala
Profesional Social

En horas de la mañana se realiza comité de obra en compañía de la alcaldía interventoría Jesgk y contratista, con el fin de informar los avances que ha tenido la obra cada componente el Social el civil y HSEQ expone las actividades realizadas hasta la fecha.

Lady Andrea Ayala
Profesional Social

En horas de la tarde se hace una visita a campo madrid para comunicarle a la comunidad del inicio de instalación de bajantes en el sector a su vez se le recomienda a las personas tener cuidado cuando los ornamentadores estén instalando

Lady Andrea Ayala
Profesional Social

15/Sep/2023
En horas de la mañana en el barrio albania se realiza el segundo frente de actas de vecindad con el fin de determinar el estado actual de las viviendas para poder dar inicio al proceso constructivo. Culminando [illegible] satisfactoriamente

Lady Andrea Ayala.

CS Escaneado con CamScanner

038

18/sep/2023
En horas de la mañana en el barrio la universidad en la calle 99 y en el barrio la aurora calle 36 donde ya se finalizó actividades de obra de adecuación de andenes, se realizan actos de seguridad de cierre y actos de entorno de cierre.
Leidy Andrea Ayala
Profesional social

prop social la fortuna

19/Sep/2023
En el barrio chapinero en horas de la mañana se realiza entrega a un propietario ubicado en la cra 19 # 9 de un pino que no cumple con las especificaciones ya que obstruye el paso para los peatones. Se hace un acta en el cual el propietario firma a conformidad el retiro de este individuo vegetal
Leidy Andrea Ayala
Profesional Social

prop social la fortuna

Siendo las 9:00AM se entabla una conversación con la coordinadora del CDI ubicado en calle 4 con el fin de comunicarle la ejecución de la obra, el respectivo cuidado que deben tener al entrar y salir de la instalación adicional el contratista toma las precauciones necesarias para evitar algún accidente o problema.
Leidy Andrea Ayala
Profesional Social

En el barrio la juventud en compañía del HSEQ se realiza una socialización a las personas del sector de la juventud con el fin de pedirles una colaboración para poder descargar material en frente de una vivienda ya que la señora peatonal en donde se están ejecutando las obras, no es posible hacer esta descarga las personas aceptaron con la condición de le dejáramos la zona limpia

CS Escaneado con CamScanner

039

Despues de la ejecución de la obra.
Lady Andrea Ayala
Profesional Social

En compañía del profesional social y residente se hizo un acta de arriendo de campamento de obra en el barrio la juventud, se hace acta de Reunion en el cual el contratista y propietario firman en comun acuerdo, se da un adelanto del arriendo por mes. se toma registro fotografico de la bodega.
Lady Andrea Ayala
profesional social

20/sept/2023
Se Realiza una charla a los trabajadores sobre el tipo laboral, como controlar la frustración, como tener una comun acuerdo entre los compañeros de trabajo por medio de la actividad telefono roto.
Lady Andrea Ayala
profesional Social

21/Sept/2023
En horas de la tarde se realiza una visita al barrio Transicion y para hacer las actas de vecindad del sector en compañia del presidente de junta el señor Jhon, en el cual durante el recorrido manifiesta que no esta de acuerdo con el diseño que se va a intervenir ya que la peatonal debera hacerle completa, por tal el Emite una Pqrs la cual fue enviada al profesional residente de interventoria para dar una pronta Solucion a dicha Solicitud
Lady Andrea Ayala
Profesional Social.

Escaneado con CamScanner

040

22/sep/2023
En horas de la mañana se reune la profesional Social contratista, Residente contratista y Residente de interventoria Jesus sasi ya que en la vivienda ubicada en la cra 14 No. 04-04 Se presenta una queja por el propietario el cual manifiesta que el proceso constructivo actual de adecuacion de andenes le estaba afectando la entrada a su propiedad, ya que al dejar unas escaleras en la entrada de la vivienda la señora no iba a poder sacar la silla de Ruedas que utiliza para trasbordar a su padre ya que no cabian los espacios, el Residente Eduard cera residente de interventoria les da unas indicaciones al contratista para evitar que se le presentara este tipo de inconveniente, haciendo una adecuacion hacia el arbol que esta al frente de la vivienda y hacer una Rampa, esto con el fin de no hacer escaleras que interrumpieran la salida de la vivienda sin tener ningun obstaculo.
Ced. Andrea Ayala
Profesional

Por Soal Interventoria

25/sep/2023
En el barrio la juventud al frente de trabajo mano de obra no calificada Sobre trabajo en equipo, como tener comunicacion asertiva estas charlas Se realizan con el fin de encaminar todos los actos al logro de lo que se espera en el proyecto, actuando con compromiso y Sentido de pertenencia por la empresa.
Ced. Andrea Ayala
Profesional Soaal

26/sep/2023
En horas de la mañana se realizan actos de servicios publicos de servicios de luz, agua y Componente

CS Escaneado con CamScanner

041

de obra, en compañía del Hseq contratista se toma registro de la bodega se hace los respectivos actas de servicios, se llega a un acuerdo de pago, finalmente se firma y se cierra el acta.
Leidy Andrea Ayala
Profesional Social.

La profesional Social Contratista y la profesional Social de interventoria realizan una visita al predio ubicado en la cra 17 no. 4-04 con el fin de hablar con los propietarios si estaban conformes con la ejecucion de la obra y los arreglos que le hicieron de acuerdo a las indicaciones que habia dejado el Residente de interventoria Edward vera el dia 22 de septiembre, el cual los residentes manifestaron que estan contentos y satisfechos con el arreglo que les hicieron.
Leidy Andrea Ayala
Profesional Social.

Profesional Social
interventoria

Siendo las 11 de la mañana se realiza un recorrido en el barrio el Rosal en compañía de la profesional social contratista, interventoria residentes ya que los propietarios de la calle 5W hasta la calle 6W no estaban de acuerdo con la ejecucion de la obra ya que manifiestan que ellos tienen ordenes en concreto en excedente estado y al echo que el Contratista ponga baldosa prefabricada iba generar problemas de humedad en los sotanos de las viviendas, el Residente de interventoria les explica como es el proceso constructivo segun el manual de espacio publicos, se tomaron decisiones en campo desde la parte tecnica con el fin de mitigar cualquier tipo de situacion que se pueda presentar en la obra.

CS Escaneado con CamScanner

Leidy Andrea Ayala
Profesional Social.

Prof. Social Interventoria

042

27/Sep/2023
En horas de la mañana en compañía del Profesional HSEQ se realiza acta de Servicios públicos, Servicio de baño y campamento de obra, se llega a un acuerdo de pago con el propietario se realiza el acta y se firma en mutuo acuerdo con el propietario del predio.
Lady Andrea Ayala.
Profesional Social. Prof Social Interventoría

Siendo las 10:00 de la mañana se lleva a cabo reunión social con los profesionales sociales del contratista y social de la alcaldía de Bucaramanga. Dicha reunión tiene como objetivo el seguimiento a los predios del contrato 042-2023 adecuación de cerramientos, escaleras y pavimentos.
Lady Andrea Ayala
Profesional Social

En el barrio alborada la profesional social realiza en puerta a puerta entregando un oficio con el fin de informales a los residentes del sector el cierre de la vía con el fin de evitar atrasos en la obra por los vehículos que circulan y así poder hacer todo el proceso constructivo de cerramientos en concreto.
Lady Andrea Ayala
Profesional Social. Lady Ayala Prof Social

28/Sep/2023
En horas de la mañana se hace un recorrido con la veeduría del barrio alborada con el fin de informar de la ampliación que se hizo en el frente a ejecutar ya que en visita con el supervisor del contrato este toma la decisión de ampliar un poco más la obra ya que había

043

En tramo en muy mal estado,
Leidy Andra Ayala
Profesional social

Prof Social/Interventoría

28/sep/2023
En horas de la mañana se reunen la profesional Social contratista, el HSEQ y el presidente de junta de acción comunal del barrio la Independencia para llegar a un acuerdo monetario del alquiler del salon comunal, servicio de baño y servicio de luz y agua, se hace un acta en el cual las dos partes firman a conformidad y mutuo acuerdo.
Leidy Andrea Ayala
Profesional Social

Prof Social/Interventoría

29/sep/2023
En el barrio alborada en compañía del profesional HSEQ se realiza una pausa activa a la mano de obra no calificada, en el cual se realizaron ejercicios de estiramiento muscular, ejercicios de respiracion, con el fin de Reducir los niveles de estres y cansancio acumulado que tenian los trabajadores.
Leidy Andrea Ayala
Profesional Social

Prof Social/Interventoría

En el barrio chapinero en la propiedad ubicada en la calle 4d 16-24 se Reunen la profesional Social y el HSEQ contratista para llegar a un acuerdo para el suministro de luz y agua, dicho acuerdo ~~fue~~ con el propietario se determina que al finalizar la obra se llegara a un acuerdo de pago
Leidy Andrea Ayala
Profesional Social

Prof Social/Interventoría

Escaneado con CamScanner

044

29/sep/2023
Se realiza un recorrido de obra con la parte contratista con el fin de indagar con la comunidad si han tenido algun inconveniente con la ejecución de la obra.
Leidy Andrea Ayala-profesional Social

En horas del medio dia Se realiza una charla en compañia de HSEQ a la controladora de trafico sobre como tener adecuadas posturas y trabajo bajo presión, debido a la personas que esta ejerce de estar todo el dia de pie al-sol y en contacto con la comunidad con el fin de mitigar episodios de estres y presion laboral
Leidy Andrea Ayala Prof Social Interventoria
Profesional Social.

En horas de la mañana Se realiza recorrido de obra con la veedora ciudadana del barrio San alonso y campo (madrid), dicho recorrido se realiza con el fin de mostrale a la comunidad el avance que ha tenido el contratista hasta la fecha del proceso constructivo.
Leidy Andra Ayala Prof Social Interventoria
Profesional Social.

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-007
		Fecha	23/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 28 MES 09 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: Maria Herrera

Cédula de Ciudadanía: 37660230

Dirección: Calle 1 # 20A - 08

Teléfono: 6401209 No. de pisos: 2

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: La Juventud

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Bacio	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐		
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

11. Mixto ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observa.	Fisuras y Pintado Pinos Fisuras y Pintados Con moho (humedad)	Cuenta con Agua No se Cuenta con Alcantarillado Natural	No se observa	No se observa	Fisuras y Pintado Afectado por el Tiempo	Inservible	Cuenta con No tiene regular	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

Se realizó Visita a la Propiedad, Se encuentra No se observa Propietarios, No cuenta con Ningun registro Fotografico externo

FIRMAS

Responsable Unidad Social — Nombre: _____ C.C. O NIT: _____

Residente de Obra - Contratista — Nombre: LIANA VELANDIA C.C. O NIT: 1090301680

Profesional Social - Contratista — Nombre: ANDREA AYALA C.C. O 1095845138

Residente de Obra - Interventoría — Nombre: EDWARD VERA C.C. O NIT: 1098697564

Profesional Social - Interventoría — Nombre: ESLENDY CORZO C.C. O NIT: 1095...

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	23/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y NO FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento gfo cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: DE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventor, Coordinación de Gestión Ambiental y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER

CS Consorcio Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	GS-FO-SOC-003
Fecha	22/03/2023
Versión	2
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 428

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 08 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Persona de Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___
Nombre del Propietario:
Cédula de Ciudadanía:
Dirección: calle 1 + casa pintada arbole
Teléfono: No. de piezas:
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: La juventud

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional y del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Uso del garaje
11. Mixto ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas colindantes y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observa	Bordillo a la vista → Escombros	Bordillo a la vista y Reja de Acero	Placa	No se observa	Pañetada y Pintada	Ceramica	Concreto y Ceramica	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita y no se encuentran Propietarios, por tal se hace registro fotografico desde la parte externa de la vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Residente Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: LIANA VILLAMIZAR	Nombre: ANDREA AVILA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: EDUARDO OVIEDO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090403992	C.C. O NIT 1090501038	C.C. O NIT 1090501564	C.C. O NIT 1090501564

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	GI-FO-SOC-033
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 3

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD. Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copias: Contratista, Interventoría, Coordinación de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER — CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 28 MES 09 AA 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___
Nombre del Propietario: Maria de los angeles acero
Cédula de Ciudadanía: 28366611
Dirección: calle 5 # 18B 15 esquina
Teléfono: ___ No. de pisos: ___
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: la juventud

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO	Sin edificar ☐	Obra Gris ☐	Terminado ☒	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI ☐	NO ☐		
PENDIENTE DEL TERRENO	Ondulado ☐	Escarpado ☒	Plano ☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Uso del garaje
11. Minero ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: tanques y fuentes)
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observan	Pañetado a la vista en mitad	Rejas en acero	Teja de zinc	no se observan	Estilla en ladrillo y rejas en acero	Concreto	Concreto	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: La Señora manifiesta que no sabe firmar, Pa-tal firma el ruego de la señora

FIRMAS

*Maria de los Angeles			
Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: JUANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: EDILENDY COMEZ
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363682	C.C. O 1090693038	C.C. O NIT 1090917904	C.C. O NIT 1151

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

X Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 08 | MES | AA

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor X

Nombre del Propietario: Rosalba Bonilla

Cédula de Ciudadanía: 28.212.669

Dirección: Calle 6 #16a-08

Teléfono: 3166016099 No. de pisos: 1

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: La Juventud

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	
4. Teléfonos	☐	X	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	☐	X	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	X OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	X OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	X OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	X	☐	☐	☐	X	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	X	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observa	Ladrillo fresado	No tiene	Teja Eternit	No se observa	Fresada y Pintada	Concreto	Concreto	

NOTA: SI DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Rosalba Bonilla

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: JUANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: EDLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1095383682	C.C. O 1095853139	C.C. O NIT 1098607984	C.C. O NIT 63513664

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	23/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER — CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Codigo	CS-FO-SOC-023
		Fecha	22/03/2023
		Version	2
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 428

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 08 MES 09 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____
Nombre del Propietario:
Cédula de Ciudadanía:
Dirección: cra 19 # 7-08
Teléfono: No. de piso:
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: la Juventud

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: En edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industria	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional (del Estado)	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Uso del garaje
11. Mixto ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, cajuelería metálica y de madera, en fincas: cafetales y bambú)
2.HUMEDADES	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observa	Fisurados	Mitad y mitad	Teja Eternit	No se observa	fisuras Pintada	Concreto	Concreto	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se hace visita a la vivienda y no se encuentra el propietario, por tal se toma registro fotografico y filmico desde la parte externa de la vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: JUAN VILLAMIZAR	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: EDUARDO CORDO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1098143992	C.C. O 1098853038	C.C. O NIT 1098661764	C.C. O NIT 91513964

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/07/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADOS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventoría, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-007
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DIA 08 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____
Nombre del Propietario:
Cédula de Ciudadanía:
Dirección: Cra 19 # 09-18
Teléfono: No. de piso:
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: La Juventud

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: En edificación [ ] Obra Gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional		ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial		7. Salud		Garaje Uso del garaje	SI [ ] NO [X]
3. Industrial		8. Asistencial			
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)		11. Mixto	
5. Agropecuario		10. Mixto		12. Otro	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	(Vestigios roturas de aguas flentes y residuales, carpintería metálica y de madera, en techos, cancelería y hundimi)
2. HUNDIMIENTO	[ ]	[X]	[X]	[ ]	[ ]	[X]	[ ]	[ ]	
3. DESPLAZAMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
4. OTROS	[ ]	[ ]	[ ]	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
COMENTARIOS	No se observa	Muro tarrado a mitad	Mala unión Tapa de agua	Teja Eternit	No se observa	Fracturas visibles	No se observa	Concreto	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita y no se encuentra el propietario en la vivienda. se toma registro fotografico y filmico desde la parte externa de la vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: ELVIRA VELANDIA	Nombre: ANDREA AVILA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ERLENDY GORDO
C.C. O NIT:	C.C. O NIT: 1090403692	C.C. O 1090361038	C.C. O NIT:	C.C. O NIT:

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA.

PISOS	
ANTES	DESPUES

PAREDES	
ANTES	DESPUES

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁ SER REPARADO POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER / CS Comercio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	23/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS UC BUCARAMANGA - SANTANDER

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 05 MES 09 AÑO 2025

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____
Nombre del Propietario
Cedula de Ciudadanía
Dirección: cra 19 # 09 - 24
Teléfono: No. de pisos
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: la ventad

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☑

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escalonado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Bodega	☐
3. Industrial	☐	8. Dotacional	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Uso de garaje

11. Minero ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	ORIENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	
2. HUMEDADES	☐	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☑	
3. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, condiciones eléctrica y de madera, en bloque, tuberías y fuentes)
COMENTARIOS	No se observa	Ladrillo fracturado	Cercas en Acero	Teja Eternit	No se observa	Fisuras y Pintada	Fisuras y Pintada	Concreto	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita al predio encontrandose vacio. Se toma registro fotografico desde la parte externa vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: JUANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: EDILENNY CUADRO
C.C. O NIT:	C.C. O NIT: 1090XXXXXX	C.C. O NIT: 1090XXXXXX	C.C. O NIT: 1090XXXXXX	C.C. O NIT: 1090XXXXXX

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-021
		Fecha	22/07/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES

PAREDES	
ANTES	DESPUES

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS A CAUSA O A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista.
Copias: Contratista, Interventoría, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
CS Consorcio Santander	**ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Fecha	23/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 02 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☒ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: Pedro vargas

Cédula de Ciudadanía: 1098752115

Dirección: Cale 7A # 19-32

Teléfono: 3214899254 No. de piso:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: La juventud

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escalonado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Salud	☐		
3. Industria	☐	8. Seguridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Culto (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	
2. HUNDIMIENTO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
3. AGRIETAMIENTO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
4. DESPLAZAMIENTO	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observa	Estrella en la vista	No tiene	Teja Eternit	Viguetas en Concreto	Estrella en la vista	Tablete de gres	Concreto	

ACTA DE IDEA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional [illegible] - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional [illegible] de Interventoría
Nombre:	Nombre: EMMA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VEGA	Nombre: EDENZY GOMEZ
C.C. O NIT:	C.C. O NIT:	C.C. O:	C.C. O NIT:	C.C. O NIT:

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código: CS-FO-SOC-003
		Fecha: 23/01/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión: 2
		Página: 2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SIN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 08 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario: Yomaira aguilar

Cédula de Ciudadanía: 63516512

Dirección: Cra 20B # 131-06 esquina (cambio)

Teléfono: 3108167152 No. de pisos: ____ Barrio: la Juventud

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: En edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: Si ☐ No ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial	☐	7. Salud	☐	Garaje: SI ☐ NO ☒	
3. Industria	☐	8. Seguridad	☐	Uso del garaje:	
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Mixto	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	Andenes rampa sin agua lluvias y residuales, cargapeso vertical y de medios, en buen, necesitamos y bueno)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observa	Ladrillo	Tubo redondo de Acero	Teja termoacustica	No se observa	Pintado a la vista	Concreto	Concreto	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social: Yomaira Aguilar — Cédula 63516512

Revisado por Obra - Contratista: Nombre SUANA VELANDIA — C.C. O NIT

Profesional Social - Contratista: Nombre ANDREA AYALA — C.C. O

Residente de Obra - Interventoría: Nombre EDWARD VERA — C.C. O NIT

Profesional Interventoría: Nombre EUGENIO CORTES — C.C. O NIT

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Comercio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Coordinación de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/01/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA DD: 08 MES: 09 AA: 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____
Nombre del Propietario:
Cédula de Ciudadanía:
Dirección: Cra 20 o #3n -05
Teléfono: No. de piezas:
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Juventud

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfono		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: En edificación [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escalonado [ ] Plano [X]

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional		ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial		7. Salud		Garaje: SI [ ] NO [X]	
3. Industria		8. Seguridad		Uso del garaje:	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)		11. Mixto	
5. Agropecuario		10. Mixto		12. Otro	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	
2. HUNDIMIENTO	[ ]	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[X]	
3. DESPLAZAMIENTO	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[X]	
4. OTROS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[X]	
COMENTARIOS	No se observa	Fisuras Pintadas	Rejas de acero	Placa	No se observa	Fisuras Pintadas	Ceramica	concreto	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita y no se encuentra propietario(a) por tal se toma registro fotografico y filmico desde la parte externa de la vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social
Nombre:
C.C. O NIT:

Residente de Obra - Contratista
Nombre: JUANA VELANDIA
C.C. O NIT: 1098636062

Profesional Social - Contratista
Nombre: ANDREA AYALA
C.C. O NIT: 1098651036

Residente de Obra - Interventoria
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT: 1098651564

Profesional de Interventoria
Nombre: SILENDY OCAMPO
C.C. O NIT:

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	GS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: DE SEGUN CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCERTIDUMBRE QUE SURJA A LOS VECINOS A LA COMUNIDAD A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERA SER RESPONDIDO POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copia: Contratista Interventor - Coordinación de Medio Ambiente y Gestion Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	23/03/2023
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 08 MES 09 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Posesión X

Nombre del Propietario: Victor Manuel Cabrera

Cédula de Ciudadanía: 91.249.626

Dirección: Cra 20 # 3-21

Teléfono: 3153993989 No. de piso: 1

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: La Joyerita

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Salud	☐		
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso de garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
COMENTARIOS	No se observa	Muros en mitad Pintado	Muro en regular estado	Teja de Eternit	No se observa	Fachada	Concreto	Concreto	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria
Nombre: Victor M. Cabrera	Nombre: ILIANA VELANDIA	Nombre: ANERDA AYALA	Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT: 91.249.626	C.C. O NIT:	C.C. O NIT:	C.C. O NIT:

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/11/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: DE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventoría, Administración de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	23/01/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 08 | MES 09 | AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___
Nombre del Propietario:
Cedula de Ciudadanía:
Dirección: Cra 21 # 31 - 162
Teléfono: No. de pisos:
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: La Juventud

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

OBSERVACIONES: Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin Iniciar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Bares	
3. Industria		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]
Uso del garaje
11. Minero [ ]
12. Otro [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. OBRITAS Y PINTURAS	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	
2. HUMEDADES	[ ]	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	[X]	[ ]	[ ]	
3. HUNDIMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
4. DESPLAZAMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
5. OTROS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, cajas/tapa metálica y de madera, en ligeras inexistentes y fuentes)
COMENTARIOS	No se observa	Ladrillo a la vista Pintados	Muro Pintado	Teja Eternit	No se observa	Pintada y Pintada	No se observa	Tierra y Concreto	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita al predio No NO se encuentra el propietario. se toma registro fotografico y Filmico de la Pate externa de la vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social
Nombre:
C.C. O NIT

Residente de Obra - Contratista
Nombre: JUANA VELANDIA
C.C. O NIT 1006363997

Profesional Social - Consorcio
Nombre: ANDREA AYALA
C.C. O

Residente de Obra - Interventoría
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT

Profesional Social - Interventoría
Nombre: EDILENEY CORZO
C.C. O NIT

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-001
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento gfo cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventoría, Fiscalización de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 3

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 08 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___
Nombre del Propietario: Janet Florez
Cédula de Ciudadanía: 63503215
Dirección: Cra 21 # Calle 1 20A 48
Teléfono: 3172645176 No. de pisos: 2
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: la juventud

SERVICIOS PÚBLICOS

	Si	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Descapote ☐ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X
Uso del garaje
11. Mixto ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en bloque, tuberías y tuberías)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS									

ESTA DE DE LA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Yanneth Florez.
Responsable Unidad Social
Nombre: C3503215B
C.C. O NIT

Residente de Obra - Contratista
Nombre: JUANA VELANDIA
C.C. O NIT

Profesional Social - Contratista
Nombre: ANDREA AYALA
C.C. O NIT

Residente de Obra - Interventoría
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT

Profesional Social - Interventoría
Nombre: ESLENDY GOMEZ
C.C. O NIT

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	23/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y NO FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERA SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventoría, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	23/03/2023
		Versión	1
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 08 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social

Tenencia: Propietario [X] Arrendatario [ ] Poseedor [ ]

Nombre del Propietario: Andres Dario Peña

Cédula de Ciudadanía: 18913889

Dirección: cra 21 # 30-61

Teléfono: 3015834979 No. de pisos: 1

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: La juventud

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [X] Plano [ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional		ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial		7. Salud		Garaje	SI [ ] NO [X]
3. Industrial		8. Seguridad		Uso del garaje	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educativo, culto religioso)		11. Mixto	
5. Agropecuario		10. Mixto		12. Otro	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. OBSOLETO Y PELIGRO	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	
2. INMEDIATO	[ ]	[X]	[X]	[ ]	[ ]	[X]	[ ]	[X]	(Instalar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en ferreteria, cerraderos y bombeo)
3. MANTENIMIENTO	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[X]	
4. DESPLAZAMIENTO	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
5. OTROS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
COMENTARIOS	No se observa	Pero tiene humedad	Hierro oxidado y regas en piso	Teja Eternit	No se observa	Fisuras y Grietas	Concreto	Concreto	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: JUANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: EDUENDY CORZO
C.C. O NIT:	C.C. O NIT: 1095824662	C.C. O NIT: 1095819138	C.C. O NIT: 1098787564	C.C. O NIT: 63512644

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	GS-FO-SOC-03
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: DE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista Interventoría - Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	23/03/2023
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 08 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario: Arrendatario: Poseedor:

Nombre del Propietario: Yaqueline Millas

Cédula de Ciudadanía: 1104902274

Dirección: Calle 1 # 20A - 40

Teléfono: 3004102620 No. de pisos: 2

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: La Juventud

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [ ]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escalonado [ ] Plano [X]

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Salud	
3. Industria		8. Bienestar social	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]

Uso de parqueadero

11. Mixto [ ]

12. Otro [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	(Mallas rompe de aguas flechas y resbalones, carpintería metálica y de madera, en fascias, cenefaras y tuberías)
2.HUNDIMIENTO	[ ]	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	[X]	[X]	[X]	
3.ASENTAMIENTO	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[X]	[X]	[X]	
4.DESPLAZAMIENTO	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[X]	
5.OTROS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
COMENTARIOS	No se observa.	Entrello frisado	Rejas en Acero	Placa	No se Observa	Fraguada y Pintada	Ceramica de Concreto Gres		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social / Contratista	Residente de Obra / Contratista	Profesional Social / Contratista	Residente de Obra / Interventoria	Profesional Social / Interventoria
Nombre:	Nombre: JUANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ERLENDY GORDO
C.C. O NIT:	C.C. O NIT: 1098638392	C.C. O: 1098855738	C.C. O NIT: 1098857924	C.C. O NIT: 1095

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-021
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento ylo cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA DE ESTA CONDICIONES QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestion Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☐ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 20 | MES 3 | AA 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor
Nombre del Propietario: Miryelo Muñoz
Cédula de Ciudadanía: 63537778
Dirección: CRA 20C # 10 - 22
Teléfono: 3052816878 No. de pisos: 1
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: La Juventud

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	7. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	8. Bodega	☐
3. Industrial	☐	9. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	10. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	11. Mixto	☐
		11. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X
No. de garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	X OBSERVACIONES	X OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Modificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas vecindarios y barrios)
2.HUMEDADES	☐	X	X	☐	☐	X	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	X	☐	☐	X	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observa.	Ladrillo fresado	Malla - ritel Reja en Hierro	Teja Eternit	No se observa	Fresada a la vista	Cerámica de Gres.	Concreto	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social: Miryelo Muñoz
Nombre: C.C. O NIT 63537778

Residente de Obra - Constructora: JUAN VILLAMIZAR
Nombre: C.C. O NIT

Profesional Social - Consultoría: ANDREA AYALA
Nombre: C.C. O

Residente de Obra - Interventoría: EDWARD VERA
Nombre: C.C. O NIT

Profesional Social - Interventoría: EILENDY CORZO
Nombre: C.C. O NIT

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	23/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventoría, Supervisión de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 08 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___
Nombre del Propietario: Victor Manuel Velasco
Cédula de Ciudadanía: 91249626
Dirección: Cra 20C # 1A-30
Teléfono: 3152993989 No. de pisos:
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA
Barrio: Ciudad Bolivariana

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salubre	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Uso del garaje
11. Minero ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, canaletería metálica y de madera, en filtros, rasederos y fuentes)
COMENTARIOS	No se observa	Fisurado y grietado	Mala ubicación y colgados en aire	Tapa de zinc	No se observa	Fisurada y Pintada	Concreto	Concreto	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES

FIRMAS

Responsable Unidad Social Nombre: C.C. O NIT 91.249.626	Residente de Obra - Contratista Nombre: JUANA VELANDIA C.C. O NIT 1060563492	Profesional Social - Contratista Nombre: ANDREA AYALA C.C. O 1095953038	Residente Interventoría - Interventoría Nombre: EDWARD VERA C.C. O NIT 1098697604
			Profesional Social - Interventoría Nombre: ESLENDY CORZO C.C. O NIT 63513804

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Version	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista

Copias: Contratista, Interventoría, Supervisión de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	23/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 622-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 08 MES 09 AA 2025

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor
Nombre del Propietario: Johan Sneider matiño
Cédula de Ciudadanía: 1232894206
Dirección: calle 47a 20-03
Teléfono: 3145633545 No. de piso: 1
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: La Juventud

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO	En edificar ☐	Obra Gris ☐	Terminado ☒	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION	SI ☐	NO ☐		
PENDIENTE DEL TERRENO	Ondulado ☐	Escarpado ☐	Plano ☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Parqueadero	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Uso del garaje
11. Mixto ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.HUNDIMIENTO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.AGRIETAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observa	Muros externos con estado general regular, muro pintado en deficiente estado.	Muro bajo, con rejas en regular estado	Placa, No es visible Verificar estado	No se encuentra a la Vista, se Considera en regular estado Aparente buen estado	Pintura y enchape en buen estado Sale Afectado por el tiempo	Ceramica de la entrada Externa en estado regular, Algunas baldosas rajadas, Fisuras y hundimientos		(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, cargabilidad estructural y de muebles, en fincas raizambres y fundiciones)

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza Visita al Predio, Sin embargo No se encontró al Propietario, Se anexa Registro Fotografico Externo del Muro, Con registro Fotografico de Fachada.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: JUANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: EILEEN D. CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT	C.C. O	C.C. O NIT	C.C. O NIT

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERA SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA DD 09 MES 03 AÑO 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario:

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: calle 51 Nº 20-61 casa verde

Teléfono: No. de piece:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escalonado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Salud	☐		
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐		
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

11. Mixtos ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS 2.HUMEDADES 3.HUNDIMIENTOS 4.DESPLAZAMIENTOS 5.OTROS	☐ OBSERVACIONES ☐ ☐ ☐ ☐	☐ OBSERVACIONES ☐ ☐ ☐ ☐	☐ OBSERVACIONES ☐ ☐ ☐ ☐	☐ OBSERVACIONES ☐ ☐ ☐ ☐	☐ OBSERVACIONES ☐ ☐ ☐ ☐	☐ OBSERVACIONES ☐ ☐ ☐ ☐	☐ OBSERVACIONES ☐ ☐ ☐ ☐	☐ OBSERVACIONES ☐ ☐ ☐ ☐	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, canaletería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
COMENTARIOS	Cimentación de Mampostería Estamos a la Vista.	No se Pueden Verificar los Muros internos.	Muros Frontal y Posterior, algunos rotos.	Cubierta, Liviana en teja de Zinc.	No se observan Fisuras en columnas de estructuras	Se observan rejas de seguridad en la Fachada	No es Posible Verificar estado	Andenes en estado General Bueno.	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: se realiza visita y no se encuentra nadie, se toma registro fotografico y tomico del estado actual

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: LIANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: EDLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363892	C.C. O 1095813038	C.C. O NIT 1094911924	C.C. O NIT 63513664

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

☐ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD | MES | AÑ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___

Nombre del Propietario: Fraine Ordino

Cédula de Ciudadanía: 2260435?

Dirección: Cra 15 # 27-81 casa amarilla

Teléfono: 3044805118 No. de pisos ___

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: ___

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Bodega	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2. HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS									

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Consultoría	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: LIANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1006736563	C.C. O 1005053038	C.C. O NIT 1095817804	C.C. O NIT 63512804

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga GOBERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-060
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD. Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventoría, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 07 MES Sep AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario [X] Arrendatario [ ] Poseedor [ ]

Nombre del Propietario: Paula Caceres

Cédula de Ciudadanía: 1360895

Dirección: Cra 51 # 20-67

Teléfono: 3169345335 No. de pisos: _____

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[ ]	[X]	
6. Televisión cable	[ ]	[X]	
7. Otros	[ ]	[ ]	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [X] Terminada [ ]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
4. Institucional o del Estado	[ ]	9. Cultural (Educación, culto religioso)	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	10. Mixto	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Cargue Si [ ] NO [X]

Uso del predio

11. Minero [ ]

12. Otro [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: rascaderos y fuentes)
2.HUMEDADES	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
3.HUNDIMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
4.DESPLAZAMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
5.OTROS	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	[X]	[X]	[ ]	[ ]	
COMENTARIOS	No es visible	Presenta humedad por filtraciones, fisuras a la vista sin tratamiento	Estado regular, presenta daños a la vista Mezcla de Materiales	Elementos irregulares en estado regular a inseguro	Se observan daños por movimientos en placa, vigas Presenta fisuras en columnas	Humedad en uso de la vivienda, irregularidades en la vivienda, Pisos Fisurados	No es posible determinar el estado de los pisos	Estado regular, Sobre los andenes hay elementos y Pisos de tanga	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: En visita Visita al Campo del Predio en Mención, Sin embargo no se encontró el Propietario y por tanto se Procede a Tomar Imágenes externas Con el respectivo registro Fotográfico.

FIRMAS

Responsable Unidad Social — Nombre: _____ C.C. O NIT: _____

Residente de Obra - Contratista — Nombre: JUANA VELANDIA C.C. O NIT: 1096040892

Profesional Social - Contratista — Nombre: ANDREA AYALA C.C. O: 1005853038

Residente de Obra - Interventoria — Nombre: EDWARD VERA C.C. O NIT: 1098697964

Profesional Social - Interventoria — Nombre: EBLENDY CORZO C.C. O NIT: 1005179944

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE (I SAÑO) OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratin
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Comercio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

[x] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 07 MES 09 AA 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: Angie Lozano

Cedula de Ciudadanía: 1232289615

Dirección: Calle 32 N 50-180

Teléfono: 3158859565 No. de pisos: 5 pisos

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Alboni Ot

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[ ]	[ ]	
6. Televisión cable	[ ]	[ ]	
7. Otros	[ ]	[ ]	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [x]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [x]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	[x]	6. Recreacional	[ ]		
2. Comercial	[ ]	7. Baldío	[ ]		
3. Industrial	[ ]	8. Salubridad	[ ]		
4. Institucional o del Estado	[ ]	9. Cultural (Educación, culto religioso)	[ ]	11. Minero	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	10. Mixto	[ ]	12. Otro	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [x] NO [ ]

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	(Identificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: mayordomo y fuentes)
2.HUMEDADES	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
3.HUNDIMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
4.DESPLAZAMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
5.OTROS	[x]	[x]	[ ]	[x]	[x]	[x]	[x]	[x]	
COMENTARIOS	No se observa	Presenta pintura en algunos muros fisurados y humedecidos, requiere tratado por el tiempo restante especificado	No cuenta con cubierta en general presenta algunas placas de entrepiso	se halla la estructura en concreto reforzado en general presenta	Fachada en acabado superior (Ladrillo a la vista Rústico) Piso Exterior	No se Puede ver Firme el Estado de los Pisos.	Se Andenes Presentan fisuras en Algunos Tramos en general Fisurados	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

Se realiza la inspección externa de la Vivienda por no encontrarse el Propietario.

FIRMAS

Angie Lozano C.

Responsable Unidad Social — Nombre: ___ C.C. O NIT ___

Residente de Obra - Contratista — Nombre: LAURA VELANDIA — C.C. O NIT 1090161662

Profesional Social - Contratista — Nombre: ANDREA AYALA — C.C. O 1095953038

Residente de Obra - Interventoria — Nombre: EDWARD VERA — C.C. O NIT 1098817404

Profesional Social - Interventoria — Nombre: YOLENDY CORZO — C.C. O NIT 63512664

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 3

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventoría, Coordinación de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 07 MES 09 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario:

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: Bodega gms

Teléfono: No. de plano: 1

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES

Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salubre	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en llaves, mezcleros y lavabos)
2.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.OTROS	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se Puede observar la estructura.	No es Posible Verificar el estado de los Muros.	estructura metalica en regular. pintada y Funcional	Cubiertas livianas a intemperie en Buen y Positivo	No es Posible Verificar el estado de la estructura.	el Cerramiento se encuentra en la totalidad de la Fachada.	No es Posible Verificar el estado de los Pisos.	Andenes en estado regular. Funcional	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita al predio y no se encuentra propietario se toma registro fotografico y fotmico pate externa inmueble.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: JUANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: EDLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O 1094963039	C.C. O NIT 1094897564	C.C. O NIT 63513464

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestion del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Coordinación de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER

CS Consorcio Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-SOC-003
Fecha	22/03/2023
Versión	2
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 07 | MES 09 | AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario:

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: Calle 28 # 51-06

Teléfono: No. de pisos:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Alborada

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escalonado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS 2.HUMEDADES 3.HUNDIMIENTOS 4.DESPLAZAMIENTOS 5.OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
COMENTARIOS	No se pudo ingresar	Muros Repellados y Pintados, estado general bueno	Muros Pintados y enchapados, viga de Amarre en deterioro.	Cubierta irregular, Limpia y Buena Iluminación	estructura liviana en Perfiles metálicos con Seguridad estructural	Buen estado de Fachada a la vista, Sin Grietas, Fisuras, Pintura en buen estado	Pisos enchapados en Cerámica	Andenes en estado regular, Con leves deterioros.	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita y no se encuentra propietario, se toma registro fotografico y fotografico de la parte externa vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: JUANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: EBLENDY CORDO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363662	C.C. O 1095953039	C.C. O NIT 1064957884	C.C. O NIT 63533644

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventor, Coordinación de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 07 MES 09 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social

Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor

Nombre del Propietario: Martha Janeth Sepulveda

Cédula de Ciudadanía: 63351571

Dirección: Calle 207 51-09

Teléfono: 3157965296 No. de predio

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Alabama

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Salud	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas, residencia y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se pudo observar	Muros internos en ladrillo a la vista	Muros en Mampostería Reforzada Juntas Construcción Fundición en Sitio, Alas In- Concreto y Pintado, Frisado Seguro Protección	Estructura Portante Viga de la Viga Sin Visible Columnas y Tipo de Columnas Columnetas, Placa	Placa Concreto Reforzado, No de Pisos Verificar en Metodo General			Fisuras y daños en general,	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social — Nombre: — C.C. O NIT:

Residente de Obra - Contratista — Nombre: LIANA VELANDIA — C.C. O NIT: 1098383992

Profesional Social - Contratista — Nombre: ANDREA AYALA — C.C. O: 1098653038

Residente de Obra - Interventoría — Nombre: EDWARD VERA — C.C. O NIT: 1098691864

Profesional Social Interventoría — Nombre: ESLENDY CORZO — C.C. O NIT: 63512684

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER | CS Comercio Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-SOC-003
Fecha	22/03/2023
Versión	2
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 04 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: Ana Isabel Conde

Cédula de Ciudadanía: 37.729.656

Dirección: Cra 51 # 19B - 47

Teléfono: 3108730796 No. de pisos ___

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[ ]	[ ]	
6. Televisión cable	[ ]	[ ]	
7. Otros	[ ]	[ ]	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
4. Institucional o del Estado	[ ]	9. Cultural (Educación, culto religioso)	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	10. Mixto	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]
Uso del garaje
11. Minero [ ]
12. Otro [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
3.HUNDIMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
4.DESPLAZAMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
5.OTROS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
COMENTARIOS	No se observa Cimentación a la Vista.	Pinto interior, sobre dos y Pañetados	Pino exterior en Mampostería a la Vista	Cubierta liviana en Lamina de Zinc.	Se observan Columnas en Fachada Pisos Fundidos Vch	Mampostería a la Vista Sin Columnas	No se Pinto exterior bien el estado del Pi-	en Concreto Pa- Paso del tiempo	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

Se realiza Visita al Predio, se realiza Socialización e Inspección externa del Predio.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Consultoría	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: JUANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT: 37729656	C.C. O NIT: 1090361992	C.C. O 1095813038	C.C. O NIT: 1090501904	C.C. O NIT: 1095811904

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Codigo	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE EXIJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	GS-FO-SOC-003
GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander · Alcaldía de Bucaramanga	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 03 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: Luz Andrea

Cédula de Ciudadanía: 2014608

Dirección: CR 5 # 27-87

Teléfono: 3246608054 No. de pisos: 3

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Alboria

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en bloque, cerramiento y fuentes)
COMENTARIOS	No se observa Humedad a la Vista	Muros Internos No se pueden ver	Cerramiento en Malla Metalica en estado regular	Placa Aligerada, usada Con Sistema de cubierta	Estructura de Fachada Visible Sin Controversia.	Fachada a la Vista, sin Columnas	No se puede Evaluar Con el estado de las Placas	Andenes Laterales existentes Afectados por el uso.	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se lleva a Cabo la Visita al Predio, Sin embargo No Fue Posible Contactar Con el Propietario, Se Hace Inspección exter...

FIRMAS

Responsable Unidad Social — Nombre: — C.C. O NIT:

Residente de Obra - Contratista — Nombre: LIANA VELANDIA — C.C. O NIT: 1090503092

Profesional Social - Contratista — Nombre: ANDREA AYALA — C.C. O: 1095805539

Residente de Obra - Interventoría — Nombre: EDWARD VERA — C.C. O NIT: 1098657864

Profesional Apoyo - Interventoría — Nombre: ENLENDY GOMEZ — C.C. O NIT: 1095

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-022
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

MURO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventoría, Supervisión de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER | CS Consorcio Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-SOC-003
Fecha	22/03/2023
Versión	1
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 07 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario:

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: CRA 51 # 19B - 37

Teléfono: No. de piso:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[ ]	[ ]	
6. Televisión cable	[ ]	[ ]	
7. Otros	[ ]	[ ]	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [X] Terminada [ ]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	5. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Salón	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
4. Institucional o del Estado	[ ]	9. Cultural (Educación, culto religioso)	[ ]
6. Agropecuario	[ ]	10. Mixto	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [ ]

Uso del garaje

11. Mixto [ ]

12. Otro [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS 2.HUMEDADES 3.HUNDIMIENTOS 4.DESPLAZAMIENTOS 5.OTROS	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: cascaderos y fuentes)
COMENTARIOS	No se muestra en la Visita.	No presenta Hundimientos Fisuras estado de Muro Internos	Presenta Metalicos en buen estado.	Cubierta Liviana regular en 2da.	Columna Portica en la Vista, Concreto Fisuras bajo.	Muros de Mampostería en la Vista Sin Fisuras.	No se Puede Ver estado de los Pisos	Andenes en piso estado Por el paso de Tiempo	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita y no se encuentra el propietario del predio se toma registro fotografico y fulmico desde la parte externa de la vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: LIANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: EDILENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090343082	C.C. O 1095953018	C.C. O NIT 1094957914	C.C. O NIT

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SGC-003
Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Concreto Santander	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Comercio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 09 MES 09 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propetario: Octavio Vargas

Cédula de Ciudadanía: 91240854

Dirección: 99 61 # 19B-03

Teléfono: 3176880618 No. de pisos: 3

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en bloque: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se Pueden Verificar estado.	No se Pueden Verificar estado	Hay que Mantener en optimo regular por el tiempo	Colocarlos Metal-Teja	Falta de Continuidad en algunos estructuras	Muro en Mampostería no a la Vista Sin Colocación	No se Pueden Verificar el estado de la Pica	Hacer Fisuras por el paso del tiempo	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: El propietario recibe la visita y se niega a firmarla.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: LILIANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ERLENDY GORDO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090063662	C.C. O 1066953038	C.C. O NIT 1098601564	C.C. O NIT 8351364

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código: CS-FO-SOC-003 Fecha: 22/03/2023 Versión: 2 Página: 2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventoría, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-023
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 09 MES 08 AA 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario:

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: Cra 51 # 27-68

Teléfono: No. de pisos:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Alban a

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escalonado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del parque

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: mangueras y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No es Posible Verificar.	No es Posible Ver Fisur.	Cerramiento de Muro Pintado y en Buen Estado	Obsérvan Deterioro evidente estado	No Se observan fisuras ni Problemas	Muro Pintado y en buen estado de Conservación Calidad	No Se Puede Verificar	Andenes Pavimentados Fisurados	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita al predio y no se encuentra propietario de la vivienda se toma registro fotografico desde la parte externa de la vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: LIANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ERLENDY CORZO
C.C. O NIT:	C.C. O NIT: 1090436993	C.C. O: 1095813339	C.C. O NIT: 1098651984	C.C. O NIT: 63513964

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD. Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 3

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

☐ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD | MES | AA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario _____ Arrendatario _____ Poseedor _____

Nombre del Propietario: Ca*

Cédula de Ciudadanía: _____

Dirección: casa amarilla 4 PISOS Cra 51 # 27-69

Teléfono: _____ No. de pisos: _____

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Alboania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Salud	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: naranjeros y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observa Cimentación a la Vista.	No es Posible Observar desde la Parte Interna	Muro Con Acabado irregular, Afectado por el Paso del tiempo.	Cubierta Inclinada en Zinc.	Visibles bahareque y techo aparente Con Cubierta de Asbesto	Muro Con Acabado irregulares enteros	No se Puede Verificar (Andenes)	Andenes en mal estado	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se toma registro fotografico y Acta desde la parte externa de la vivienda, ya que no se encuentran propietarios.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: LIANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ERLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090383682	C.C. O: 1090853038	C.C. O NIT 1098607964	C.C. O NIT 63513864

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER RESPONDIDOS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventoría, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 07 MES 09 AA 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ☑ Arrendatario ☐ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: Deisy Jaime

Cédula de Ciudadanía: 1005325301

Dirección: Cra 51 # 27-41

Teléfono: 3208060890 No. de pisos: 2

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Salubre	☐		
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observa Grietas Estado	No se Pudo Inspeccionar Necesita Interna	Muro entregado no se totalidad	Estructura en buen estado Cubierta en buen Estado	No se observa Deformaciones en la estructura	Muro entregado Pleno todo y estucado	No se Pudo Inspeccionar Cerrado	Andenes y Vias en buen estado	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza Visita al Predio, Se Hace la Socialización y Se hace Inspección externa.

FIRMAS

Deisy Jaimes
Responsable Unidad Social
Nombre:
C.C. O NIT:

Residente de Obra - Contratista
Nombre: JUANA VELANDIA
C.C. O NIT:

Profesional Social - Contratista
Nombre: ANDREA AYALA
C.C. O NIT:

Residente de Obra - Interventoria
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT:

Profesional Social - Interventoria
Nombre: EVELENDY CORDERO
C.C. O NIT:

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD. Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA, DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventoría, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 07 MES 09 AA 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre de Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: Nancy Rosa Gamboa

Cédula de Ciudadanía: 1098723719

Dirección: cra 51 # 27-65

Teléfono: 3197094198 No. de pisos:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	CUAL?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS 2.HUMEDADES 3.HUNDIMIENTOS 4.DESPLAZAMIENTOS 5.OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y bambú.
COMENTARIOS	No se observan Condiciones Contrarias a la Vista	No se observan Fisuras Humedades	El Cerramiento se encuentra en Malas condiciones Fisuras	Cubierta buenas condiciones Zinc.	La estructura Metálica se encuentra en Aparente buen estado	Buen estado en Pintura y Mantenimiento	No se Presentan daños en Pisos internos	Andenes Principales Para Fachadas	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

Se observan las Condiciones Generales externas de la Vivienda, Se realizo registro Fotografico

FIRMAS

Nancy Gamboa
Responsable Unidad Social
Nombre
C.C. O NIT 1098723719

Residente de Obra - Contratista
Nombre: LIANA VELANDIA
C.C. O NIT

Profesional SISO - Contratista
Nombre: ANDREA AYALA
C.C. O

Residente de Obra - Interventoria
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT

Profesional SISO - Interventoria
Nombre: EDILBERT CORZO
C.C. O NIT

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SGC-003
		Fecha	23/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestion del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 09 | MES 09 | AA 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: Jenifer ortiz

Cédula de Ciudadanía: 1098626168

Dirección: Cra 51 # 28 72

Teléfono: _____ No. de placa: _____

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐	Garaje SI ☐ NO ☐	
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐	Uso del garaje	
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observa Cimentación tiene a la Vista.	Con la Vivienda aparentemente no tiene Humedades.	Cuenta Con Cerramiento En Malla Eslabonada	Cuenta Con Cubierta En Laminas Metalicas	No se observa estructura Aparente.	La Fachada Cuenta Con Pintura de Laminas de Zinc.	Piso Acabado en Concreto.	Andenes Regulares en Concreto en regular estado.	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se recibe la visita pero la Propietaria se niega a firmarla.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: EJANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AVILA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: EBLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090383892	C.C. O 1099830039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63570864

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTÁNCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 07 MES 09 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___

Nombre del Propietario: Genaitin Ramajo

Cédula de Ciudadanía: 1193600S

Dirección: Cra 5 # 28-54

Teléfono: 3173019852 No. de pisos: 2

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefónica	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐		
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: cocederos y bandas)
2.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observa Grietas - Fisuras a la Vista.	No se Observa Asentamiento	Carpintería Metálica en buen estado y Pintada.	Cubierta Inclinada Metálica.	No se Observa daños a la Viga de Amarre, Viga de Cimentación Estructural	Pisos y Escaleras en buen estado, Muros Limpios En Frisados y Pintados	No se Observa Inspección en los Pisos	Andenes Demolidos	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

Se hace Visita al Predio, se Socializa al Propietario y se lleva a Cabo la Inspección de elementos externos.

FIRMAS

Responsable Unidad Social Nombre: C.C. O NIT	Residente de Obra - Contratista Nombre: JUANA VELANDIA C.C. O NIT 1094918982	Profesional Social - Contratista Nombre: ANDREA AYALA C.C. O 1095053738	Residente de Obra - Interventoria Nombre: EDWARD VERA C.C. O NIT 1098691804	Profesional Social - Interventoria Nombre: ERLENDY CORZO C.C. O NIT 60313364

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☐ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD | MES | AA

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___

Nombre del Propietario: Olga Lobo V.

Cédula de Ciudadanía: 37900765

Dirección: Calle 51 # 28-58

Teléfono: ___ No. de pisos: 3

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Reforestación	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Minero	☐
		11. Mixto	☐
		12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	X OBSERVACIONES	X OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	X	X	☐	☐	☐	X	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: escaleras y fuentes)
COMENTARIOS	No se observa la Condición	No es Posible realizar Mirar Interior.	Presentan en Pintura, requiere de retiro.	Cubierta tipo en teja en termino de 2mts.	No se observa Fisuras Componentes Estructurales.	Humedades exposición Sin Frisar.	Pisos Cerámicos, Enchapados en la entrada	Andenes Pintura Frisados Fisurados	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

Se lleva a Cabo Visita al Predio, Se lleva a Cabo la respectiva Inspección

FIRMAS

Responsable Unidad Social Nombre: ___ C.C. O NIT: ___	Residente de Obra - Contratista Nombre: LIANA VELANDIA C.C. O NIT: 1060083882	Profesional Social - Contratista Nombre: ANDREA AYALA C.C. O 1005053058	Residente de Obra - Interventoria Nombre: EDWARD VERA C.C. O NIT: 1094931564	Profesional Social - Interventoria Nombre: EDILENEY GORZO C.C. O NIT: 63572064

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre	

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 07 MES 09 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario: _____

Cédula de Ciudadanía: _____

Dirección: Cra 51 # 28-24

Teléfono: _____ No. de pisos: _____

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[ ]	[ ]	
6. Televisión cable	[ ]	[ ]	
7. Otros			Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Recreacional	[ ]		
2. Comercial	[ ]	7. Salón	[ ]		
3. Industrial	[ ]	8. Salubridad	[ ]		
4. Institucional o del Estado	[ ]	9. Cultural (Educacion, culto religioso)	[ ]	11. Minero	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	10. Mixto	[ ]	12. Otro	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS 2.HUMEDADES 3.HUNDIMIENTOS 4. DESPLAZAMIENTOS 5.OTROS	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: cauderos y fuentes)
COMENTARIOS	No Se observa la Cimentación	No Se Pueden Observar, estado de Muros Interna	Poseen rejas en toda, reducen	El techo hace filtraciones	No se observa Ninguna de Fisuras	Pintura Agrietado Por el Paso del Tiempo	No Se observan las Placas	Fisuras, Pisos un tanto Fisurados	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita pero no se encuentra al propietario se toma registro fotografico de la parte externa de la vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: JUANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY COMZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363092	C.C. O 1095953038	C.C. O NIT 1098001804	C.C. O NIT 1091

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER — CS Consorcio Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-SOC-003
Fecha	22/03/2023
Versión	2
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No: 022-2023 — CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 425

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 09 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: Gerson ariel silva

Cédula de Ciudadanía: 1005336805

Dirección: cra 51 # 28-18

Teléfono: 3123613579 No de pisos: 1

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Salubridad	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	ORIENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: naranderos y fuentes)
2.HUMEDADES	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
3.HUNDIMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
4.DESPLAZAMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
5.OTROS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
COMENTARIOS	No se observa la Orientación	Muro Interiores en Pintura y Pintados	Muro exterior en Pintura, en Parte Explotado.	Cubierta Inclinada en Laminado Zinc	No se observan Fisuras ni daños	Buen estado general	Terminado en buen estado General	Andén de Acera Fundido, Con Desgaste	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

Se realizo visita al Predio, se Socializó el Proyecto y se hizo Cabo la Inspección externa y Parte de la entrada.

FIRMAS

Gerson Silva
Responsable Unidad Social
Nombre: ___
C.C. O NIT ___

Residente de Obra - Contratista
Nombre: JUANA VELANDIA
C.C. O NIT 1090343692

Profesional Social - Contratista
Nombre: ANDREA AYALA
C.C. O 1090603008

Residente de Obra - Interventoria
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT 1098657464

Profesional Social - Interventoria
Nombre: EBLENDY CORZO
C.C. O NIT 1007170964

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copia: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 822-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 07 MES 03 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___

Nombre del Propietario: Ramon Sarcher

Cédula de Ciudadanía: 1098765471

Dirección: CRA 51 # 28A 04

Teléfono: 3194243161 No. de pisos: 1

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Alboniar

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Bandio	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS 2.HUMEDADES 3.HUNDIMIENTOS 4.DESPLAZAMIENTOS 5.OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: rancheres y fuentes)
COMENTARIOS	No se detallan Grietas a la Vista. No se Inspeccionan las Nuevas Interiores.	Muros externos en Mampostería expuesta Mal Estado General	Cubierta en Mal estado General, Humedad, Mal estado	No se observa Inspección de elementos Estructurales	Fachada en mal estado general.	No se Inspeccionan los Pisos	Andenes Rampas y escaleras en mal estado, estan rayados	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

Se llama a Cabo la Visita al predio de Escaleras el Propósito y se le da Prioridad a la Inspección externa debido a su estado.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: LIANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090053032	C.C. O 1090053039	C.C. O NIT 1098687864	C.C. O NIT 63512664

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA SERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No: 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 03 MES 09 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario:

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: Cra 51 # 27 - 104

Teléfono: ____ No. de placa: ____

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS 2.HUMEDADES 3.HUNDIMIENTOS 4.DESPLAZAMIENTOS 5.OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: cauderos y fuentes)
COMENTARIOS	No es posible realizar inspección.	No se pueden observar fisuras internas.	Cerramiento en Bloque Estructural pintado bueno en general.	Cubierta inclinada en teja de Plástico.	No se observan Fisuras ni Corrosión en la estructura.	Pintura deteriorada, algunas partes manchadas. Pero buena Apariencia General.	No fue posible ingresar a los pisos.	Andenes deteriorados, Escaleras, Inexistente Adecuados para el uso.	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita al predio y no se encuentra al propietario, por tal se toma registro fotografico desde la parte externa de la vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: LIANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLEHDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1098336332	C.C. O 1095853230	C.C. O NIT 1098697884	C.C. O NIT 63532684

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-ROC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES

PAREDES	
ANTES	DESPUES

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: CD 07 | MES 03 | AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___
Nombre del Propietario: Alba maria orozco
Cédula de Ciudadanía: 28110822
Dirección: cra 51 27-96
Teléfono: 3182822329 No. de pisos: 2
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Alboria

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad			
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS 2.HUMEDADES 3.HUNDIMIENTOS 4.DESPLAZAMIENTOS 5.OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: cauaderos y fuentes)
COMENTARIOS	No se Inspecciono la Cimentación	No se Inspecciono Muros Internos	Muros externos y expuestos Presentan Problemas de Pintura	Cubierta en Mala Estado	Humedad de Sitio Pero se observa la Falta de Contracho	Muros Pintados, Con Acabado Variado, Estado General Bueno	Presentan los pisos de Ingreso en estado Bueno	Andenes Presentados en estado Bueno Pero.	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:
Se Hace el Cabo la Visita a Obra Alboria Para Socializar el Proyecto Donde Se realiza Inspección al Predio en Cuestión.

FIRMAS

Alba Maria Orozco			
Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria
Nombre 28110822	Nombre LIANA VELANDIA	Nombre ANDREA AYALA	Nombre EDWARD VERA
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363693	C.C. O 1098653239	C.C. O NIT 1098997994

Profesional Social - Interventoria
Nombre EBLENDY CORZO
C.C. O NIT 63512964

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga GOBERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES

PAREDES	
ANTES	DESPUES

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No: 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 429

☐ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD | MES | AA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___

Nombre del Propietario: Yedy Ayader

Cédula de Ciudadanía: 37520719

Dirección: Cra 51 # 21-90

Teléfono: 3152818709 No. de piso: 3 Barrio: Alboania

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS 2.HUMEDADES 3.HUNDIMIENTOS 4.DESPLAZAMIENTOS 5.OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
COMENTARIOS	No se Hace Inspección de Cimentación	No se Inspecciona los Muros de Fachada	Conservado Por Muros estructura en estado General	Cubierta Inclinada en estructura Metalica.	No se observa Ningun problema estructural.	Pintura y algo de Enchape retirado, Sobre 3er piso.	Acceso en buen estado, Piso Ceramica y Granito.	Andenes Principales en estado General bueno	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

Se realiza Inspección al Inmueble, Prestando Atención a Zonas externas y Vias de Acceso

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: JUANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: EBLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1098383892	C.C. O 1095953038	C.C. O NIT 1098987984	C.C. O NIT 63531864

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD. Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER | CS Consorcio Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-SOC-003
Fecha	22/03/2023
Versión	2
Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 07 | MES 09 | AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____
Nombre del Propietario
Cédula de Ciudadanía
Dirección: CLO 51 # 27-83
Teléfono: No. de pisos: 2
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Alboral

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonía	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☒
Uso del garaje
11. Mirador ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observa Contaminación a la Vista	No se hace lectura visual de muros internos	No almacena Fisuras y rajas Notables en sus Fachadas	Capta humedad en estructura metalica.	Se observan Columnas con rastros de Fachada Sucia de Buena Apariencia.	Se encuentra expuesta, Sin Friso en los 2 Pisos.	Acceso Aparentemente en Concreto, acabados en Aparente buen Estado.	Andenes Aparentemente en Aparente buen Estado.	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: cascaderos y fuentes)

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza Visita al predio y no se encuentran los propietarios, se toma registro fotografico y Palmico desde la parte externa de la vivienda.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: JUANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: EBLENDY CORZO
C.C. O NIT 63329326	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O 1095553039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63533664

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD. Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Asesor de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 01 MES 09 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: Perry Pico

Cédula de Ciudadanía: 6386273 EA-86

Dirección: Cra 51 #27

Teléfono: 3004019282 No. de pisos: 2

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonía	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS 2.HUMEDADES 3.HUNDIMIENTOS 4.DESPLAZAMIENTOS 5.OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: rascaderos y fuentes)
COMENTARIOS	No se observan Comentarios a la Visita.	Muros Interiores en buen estado Pintados y Acabados.	Encontrado, Por Zonas Externas	Cubierta en buen estado.	No se observan Fisuras, ni detalles que Afecten la Vivienda	Fachada en buen estado.	Entrega Andenes en estado regular Vía Acceso.	Andenes Peatonales en estado General bueno y Funcional.	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realizó la Inspección en el Predio de las Manos, Andenes y Pisos en Zonas Externas de Acceso.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: LIANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORTES
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1098365892	C.C. O 1095803039	C.C. O NIT 1098697884	C.C. O NIT 1095825954

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 04 MES 09 AA 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____
Nombre del Propietario:
Cédula de Ciudadanía:
Dirección: Cra 51 # 27-80
Teléfono: No. de piso: 3
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias o residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observa la Cimentación	No se toma Acceso a Muro Interno	Muro en Ladrillo Cerámica en Fachada y Reja Estructura en Buen estado	Cubierta en Estructura Metálica	No se observa Fisuras Sin embargo Existen Filtración Sin Cubrimiento	Muro Pintado y Revestimiento Cerámico	No se toma acceso a los Pisos de la Vivienda.	Andenes Pavimentados en buen estado Sin Fisuras	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita al predio y no se encuentra propietario, por tal se toma registro fotografico unico desde la parte externa de la vivienda.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Ambiental - Interventoría
Nombre:	Nombre: LIANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT:	C.C. O NIT: 1090263692	C.C. O 1095853238	C.C. O NIT: 1098667864	C.C. O NIT: 63513664

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA OBSERVACIÓN SERÁ REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
GOBERNAR ES HACER — CS Consorcio Santander — Alcaldía de Bucaramanga	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 — CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 03 MES 02 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: Viola Rivera Rivera

Cédula de Ciudadanía: 63.312302

Dirección: CRA 51 #27-90

Teléfono: 6326822 — No. de placa:

Departamento: SANTANDER — Municipio: BUCARAMANGA — Barrio: Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Minero	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS 2.HUMEDADES 3.HUNDIMIENTOS 4.DESPLAZAMIENTOS 5.OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en líneas; cuarderon y fuentes)
COMENTARIOS	No Se observa la Cimentación	Muros Internos Pintados en Buen estado en General.	Antepecho y dilatación elaborado en buen estado General	Cubierta en estructura Metalica	No se observan Fisuras en los Elementos	La Fachada de la Casa Corresponde al Consecutivo	Cuentan en Mayor Parte en Baldosa en buen estado tanto Externos Como en interior regular	Andenes Pocos en mal estado regular	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se Hace A Cabo la Inspección de Muros exteriores, Cerramiento, Pisos y Vias de Acceso.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: JUANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090340692	C.C. O 1095853338	C.C. O NIT 1098887864	C.C. O NIT 63533864

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

☐ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD | MES | AA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___
Nombre del Propietario: Esmeralda Sanchez
Cédula de Ciudadanía: 63557264
Dirección: Cra 51 #21-66
Teléfono: 3133683510 No. de pisos: 2
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Alborada

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: rasaderos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observan Comentarios	No se tiene Acceso a Muros	Reja Estampada Que Cumplen la Misma Funcion	Material en Lamina Metalica	No se observan Fisuras Que generen Inseguridad.	Fachada Principal Terminada Segundo Piso Sin Frisar	Pisos en Zapatas Acceso en buen estado.	Andenes Peatonales en buen estado General.	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:
Se realiza visita al predio, Inspección de los Elementos Externos y Vias de Acceso

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Esmeralda	Nombre: LIANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1098363692	C.C. O 1095953039	C.C. O NIT 1098687864	C.C. O NIT 63532864

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copias: Contratista, Interventor, Supervisión de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 15 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario [ ] Arrendatario [ ] Poseedor [ ]
Nombre del Propietario: Sergio Andres Gonzalez
Cédula de Ciudadanía: 1098769477
Dirección: cra 5 # 19-47
Teléfono: 3502894028 No. de pisos: 2
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plana [ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional		ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial		7. Salud		Garaje	SI [ ] NO [ ]
3. Industria		8. Seguridad		Uso del garaje	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)		11. Mixto	
5. Agropecuario		10. Mixto		12. Otro	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	(Mal flujo manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en líneas necesarias y fuentes)
2. HUMEDADES	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
3. HUNDIMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
4. DESPLAZAMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
5. OTROS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
COMENTARIOS	Se observan fisuras y grietas de Fundación en la Casa.	No se Puede Inspeccionar debido a que la Casa Colinda con Fincas en un estado regular	Presenta Corrosión en algunos sectores	Estructura Vieja con Presencia de Filtración, Afectado por el Paso del tiempo.	Mampostería agrietada, Sin Friso, Inacabada y Sin Columnas.	No se Identificó	Andenes en mal estado, Fisurados y levantados.	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se Hace Visita al Predio en Cortés. Se realiza Inspección Externa.

FIRMAS

Responsable Unidad Social: Sergio Gonzalez — Nombre: — C.C. O NIT: 1098769477

Residente de Obra - Contratista — Nombre: ILIANA VELANDIA — C.C. O NIT:

Profesional Social - Contratista — Nombre: ANDREA AYALA — C.C. O

Residente de Obra - Interventoría — Nombre: EDWARD VERA — C.C. O NIT:

Profesional — Nombre: — C.C. O NIT:

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código: CS-FO-SOC-003
		Fecha: 23/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión: 2
		Página: 2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO NO ATRIBUIDO A LAS VIVIENDAS ALEGADAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁ SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER

CS Consorcio Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-SOC-003
Fecha	23/03/2023
Versión	2
Página	1 de 3

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario: ☒ Arrendatario: ☐ Poseedor: ☐
Nombre del Propietario: Miguel angel Peña
Cédula de Ciudadanía: 91.295.842
Dirección: cra 31 # 29-08
Teléfono: No. de piso:
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Alboria

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros			Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Inclinado ☐ Escalonado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Salud	☐		
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Mixto	☐
5. Agropecuario	☐	10. Vacío	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☒
Uso del garaje:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Análisis trabajo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en bloque, cerramiento y fundido)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se Visible la Cimentación	Muros Internos Pintados.	Cerramiento y los Muros estan en Obra Gris, Pintados.	Cubierta Pintada de Material Ver...	No se observa cuadro de Columnas en Mal Vigas	Las Muros Pintados estan en regular estado y Deteriorados Con Humedad	Piso en Concreto En Mal estado.	Andenes Fracturados y En Mal estado de Humedad	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:
Se lleva a Cabo Inspección de elementos Externos en la Mayoría y de la entrada de la Casa.

FIRMAS

Miguel Peña
Responsable Unidad Social
Nombre: 91.295.842
C.C. O NIT

Residente de Obra - Contratista
Nombre: JUANA VELANDIA
C.C. O NIT

Profesional Social - Contratista
Nombre: ANDREA AYALA
C.C. O NIT

Residente de Obra - Interventoría
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT

Profesional Social - Interventoría
Nombre: SOLANGEL CORZO
C.C. O NIT

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-xxx
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 3

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICOS

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: DE JEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista

Copias: Contratista, Interventoría, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: Yesenia Vargas

Cédula de Ciudadanía: 1098[illegible]4488

Dirección: Casa ladrillo blanco, cra 51 # 27-49 sotano

Teléfono: ___ No. de predio: ___

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escalonado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Salud	☐	**ACCESOS VEHICULARES**	
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐	Garaje SI ☐ NO ☒	
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	Uso del garaje	
5. Agropecuario	☐	10. Vivienda	☐	11. Mixto	☐
				12. Otro	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en lavar, escaleras y barandas)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observa la Cimentación	No se observan Fisuras Internas	Buena a la Vista, Pintados Apropiado por el Paso del tiempo	Cubierta inclinada en Zinc	Se observa el ampliación o Columnas y Cubiertas.	Mezcla de Mampostería a la Vista, Confinada	No se observan Fisuras Internas	Andenes en estado bastante regular.	

ACTA DE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se lleva a Cabo la Visita al Predio, Sin embargo no se pudo Ingresar, se realiza Inspección Externa.

FIRMAS

Yesenia Vargas			
Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Constructor	Profesional Social - Consultoría	Residente de Obra - Interventoría
Nombre 1098[illegible]4488	Nombre JUAN VILLAMIZAR	Nombre ANDREA AYALA	Nombre EDWARD VERA
C.C. O NIT	C.C. O NIT	C.C. O NIT	C.C. O NIT

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Coordinación, Interventoría, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA DD 15 MES 09 AA 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario:

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: Cra 51 No 29 - 61 parte otras

Teléfono: No. de pisos:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	Se observa humedad Fuertes de la Pared con humedad	No se observan fisuras o grietas (Los muros internos)	Cerramiento esta cubierta y seguro no es mal estado con presencia de Humedad	Cubierta en madera y metal oxidado	No se observa fisuras o deterioro solo Parte de la Cimen	Fachada irregular con materiales variados oxidados por el clima	No se observan fisuras internas	Andenes presentan en mal estado o no existentes	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se toma registro fotografico y filmico de la vivienda de la parte externa y detalles del predio

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: LIANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090359692	C.C. O 1090963038	C.C. O NIT 1094927864	C.C. O NIT 63533684

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Codigo	CS-FO-SOC-003
GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD. Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Codigo	CS-FO-SOC-003
GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/3/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022- 2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA DD 15 MES 09 AÑO 2023



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____
Nombre del Propietario:
Cédula de Ciudadanía:
Dirección: caseta lote
Teléfono: No. de pisos:
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Alborna

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [X] Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS 2.HUMEDADES 3.HUNDIMIENTOS 4.DESPLAZAMIENTOS 5.OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, canalización eléctrica y de redders, en fincas, nacederos y fuentes)
COMENTARIOS	No Se observa Cim.	No Posee Muro Interno	Parcialmente en Bloq y Lata.	Cubierta Liviana en Fibrocemento	Carece de Estructura Segura	Fachada Construida Por Completo	No tiene	Andén Perimetral Fisurado y Humedo	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:
No se autoriza responsable del sitio. Se embargo se realiza inspección y registro Fotográfico.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre:
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363932	C.C. O 1095853039	C.C. O NIT 1094967964	C.C. O NIT

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Supervisión de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/3/2023
		Versión	1
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022- 2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 15 | MES 03 | AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario [X] Arrendatario [ ] Poseedor [ ]

Nombre del Propietario: Duglas Fernando

Cédula de Ciudadanía: 1098736794

Dirección: Cra 5F # 19-17

Teléfono: 6325723 | No. de pisos: _____

Departamento: SANTANDER | Municipio: BUCARAMANGA | Barrio: Alboria

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[ ]	[X]	
6. Televisión cable	[ ]	[X]	
7. Otros	[ ]	[X]	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Recreacional	[ ]		
2. Comercial	[ ]	7. Baldío	[ ]		
3. Industrial	[ ]	8. Salubridad	[ ]		
4. Institucional o del Estado	[ ]	9. Cultural (Educación culto religioso)	[ ]		
5. Agropecuario	[ ]	10. Mixto	[ ]		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [ ] NO [X] | Uso del garaje: _____

11. Minero [ ]

12. Otro [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS 2.HUMEDADES 3.HUNDIMIENTOS 4.DESPLAZAMIENTOS 5.OTROS	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	
COMENTARIOS	No presenta Cimentación a la Vista.	Muros exteriores Pintados, Presenta Fisuras por Humedad.	Muros y rejas en un estado regular.	Cubierta teja en Zinc.	La estructura Esta en buen estado y Viga en Todo el Perimetro en buen estado.	Fachada Afectada por tiempo y Humedad.	Pisos Cerámica en Mala estado.	Andenes Agrietados y Mal estado y Con Humedad	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, cercanía medidor y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza la Visita, Inspeccionando la Zona exterior y entorno del Predio.

FIRMAS

Duglas Fernando

Responsable Unidad Social — Nombre: _____ — C.C. O NIT: _____

Residente de Obra - Contratista — Nombre: LAYDE VELANDIA — C.C. O NIT: 1090363922

Profesional Social - Contratista — Nombre: ANDREA AYALA — C.C. O 1090515016

Residente de Obra - Interventoría — Nombre: EDWARD VERA — C.C. O NIT: 1098657864

Profesional Social - Interventoría — Nombre: ESLENDY COBETO — C.C. O NIT: 63533654

1098736794

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 822- 2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 15 MES 09 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____
Nombre del Propietario:
Cedula de Ciudadanía:
Dirección: CR 19-20
Teléfono: No. de pisos: 1
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[ ]	[ ]	
6. Televisión cable	[ ]	[ ]	
7. Otros	[ ]	[ ]	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [X] Terminada [ ]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Recreacional	[ ]	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial	[ ]	7. Salud	[ ]	Garaje SI [ ] NO [ ]	
3. Industrial	[ ]	8. Seguridad	[ ]	Uso del garaje	
4. Institucional o del Estado	[ ]	9. Cultural (Educación, culto religioso)	[ ]	11. Minero	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	10. Mixto	[ ]	12. Otro	[ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y humedal)
2.HUMEDADES	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[X]	
3.HUNDIMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
4.DESPLAZAMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
5.OTROS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
COMENTARIOS	No se observa daños en Cimentación.	No se observa fisuras, Humedades e Hundimientos.	Muro estructural Fachada, sin Problema de Humedad	Cubierta en buen estado de teja de fibrocemento.	No se observa estructura a la Vista	Pintura en Mampostería con Fisuras y Manchas Fachada sin Humedad	No se identifican los Pisos Interiores	Andenes en Mal estado con Alto Humedad	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se toma registro fotografico y fotmico de la parte externa de la vivienda, no se encuentra propietario en el predio.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: FRELENDY COBOS
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1098783622	C.C. O 1095923039	C.C. O NIT 1098657864	C.C. O NIT 63530664

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Codigo	CS-FO-SOC-003
GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/3/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 822- 2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA

Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario:

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: Fachada gris con ventana

Teléfono: No. de pisos:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☒

Uso del garaje:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: escaleras y barandas)
COMENTARIOS	No Se observan las Condiciones	No Se Impresiona Mucha Intervención	Muy estropeado y Pintado	Cubierta inclinada en zinc - No se observan estructuras a la vista	No se observa un Piso Sanitario en Fachada, no tiene Piso	No se identifican Piso	Andenes en Mal estado Fisuras y Humedad		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita al predio y no se encuentra propietario, se hace visita de la parte externa de la vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: OMAIRO VERA	Nombre:
C.C. O NIT:	C.C. O NIT: 1090369892	C.C. O: 1091663339	C.C. O NIT: 1094957584	C.C. O NIT:

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 622- 2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 425

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA DD 15 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario

Cédula de Ciudadanía

Dirección cra 51 # casa ensacada 6ta 2

Teléfono No. de pisos

Departamento SANTANDER Municipio BUCARAMANGA Barrio Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐	Uso de garaje	
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Mixto	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observan ningún tipo de Anomalías en el estado...	No se observan las Mismas Internas	La Propiedad de andenes Carecen de Pasamanos Friados	Cubierta Inclinada en Zinc	No se observan daños en Fisuras o la Vista	Mural Friado Completamente	No se Observan daños en los Pisos	Andenes Peatonales Fracturados y Con Falta de Humedad	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas, nacederos y fuentes)

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CORROBORADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita y no se encuentra propietario en la vivienda si se toma registro fotografico de la Parte externa de la vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre:
C.C O NIT	C.C O NIT 1090383662	C.C O 1095953039	C.C O NIT 1098607958	C.C O NIT

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-PO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022- 2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA

FECHA: DD 12 | MES 09 | AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: Nancy Diaz Calvo

Cédula de Ciudadanía: 37320994

Dirección: Cra 51 # 27-39

Teléfono: 3153430451 No. de pisos: 2

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: cacaoteros y huertas)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se inspecciono Por Consigna de los Vecinos.	No se inspecciono Mala Intencion.	Buen estado y Pintados, algunas rejillas	Cubierta lividera e Inclinada en Buen	No se observo la estructura a los Vecinos	Buen Estado y Pintado	No se inspecciono Por Consigna de los Vecinos	Andenes Peatonales en estado regular	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

Se Hace a Cabo la Inspección externa y de entrada en el Inmueble Verificando las Condiciones de los Días de encuentro.

FIRMAS

Nancy Diaz
Responsable Unidad Social
Nombre: 37320994
C.C. O NIT

Residente de Obra - Contratista
Nombre: LAYDE VELANDIA
C.C. O NIT

Profesional Social - Contratista
Nombre: ANDREA AYALA
C.C. O NIT

Residente de Obra - Interventoria
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT

Profesional Social - Interventoria
Nombre:
C.C. O NIT

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA — SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	23/3/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 622- 2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 | MES 09 | AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario: Alba Gomez

Cédula de Ciudadanía: 63339408

Dirección: Cra 51 # 18-58

Teléfono: 3166105101 No. de pisos: 2 Barrio: Alberia

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Religioso	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒ Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: escaleras y fachadas)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observa Conexión a Planta Viv.	No se Impermeabiliza Muros Internos.	Rejas Pintadas y Pilastras en Buen estado	Cubierta Inclinada Fibrocemento	Se observan Columnas en Fachada	Mampostería expuesta Pintado y Sin Columnetas	No se observan Pisos Interno	Anden Inexistente Frente a Casa	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita y no se encuentra propietario. Se toma registro fotografico de la parte externa de la vivienda.

FIRMAS

ALBA LUZ GÓMEZ

Responsable Unidad Social — Nombre 63364908 — C.C. O NIT

Residente de Obra - Contratista — Nombre LAYDE VELANDIA — C.C. O NIT 1090263692

Profesional Social - Contratista — Nombre ANDREA AYALA — C.C. O 1090953039

Residente de Obra - Interventoria — Nombre EDWARD VERA — C.C. O NIT 1098687364

Profesional SISO Interventoria — Nombre [illegible] — C.C. O NIT 63533864

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁ SER REPARADA POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 428

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 09 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: Jose Rosario Diaz

Cédula de Ciudadanía: 13.585.385

Dirección: Kra 5ª # 18-61

Teléfono: 6325754 No. de pisos: 2

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Uso del garaje SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS 2.HUMEDADES 3.HUNDIMIENTOS 4.DESPLAZAMIENTOS 5.OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
COMENTARIOS	No se observa fisuras en la estructura	Muros internos en buen estado. Fachada y Antejardin	Muro colindante en buen estado	Cubierta inclinada	No se observan daños en Alrededores	Muy aseada y Pintadas en buen estado.	Pisos Ceramicos en estado regular para ser tratado. Con Filtración	Andenes externos en regular estado. Con Filtración	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se Hace la Visita al Predio, en Compañía del Equipo, y se Inspeccionan Exteriores y Parte de la entrada.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: J. P. Rosario Diaz	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: VICENTE CORTES
C.C. O NIT: 13.585.385	C.C. O NIT: 1090383997	C.C. O 1095951018	C.C. O NIT: 1098687866	C.C. O NIT: 6303964

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Constructor Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER | CS Consorcio Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Codigo	CS-FO-SOC-003
Fecha	22/3/2023
Versión	1
Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022- 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 13 MES 09 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario

Cedula de Ciudadanía

Dirección: cra 51 # 190 - 33

Teléfono: No. de pisos:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Albania

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto		☐	
2. Alcantarillado		☐	
3. Energía		☐	
4. Teléfonos		☐	
5. Gas		☐	
6. Televisión cable		☐	
7. Otros		☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	ORIENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2. HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	Se aprecian Vigas de Muros.	No se Pueden Apreciar Muros Internos.	Muros externos sin Friso para Confinada.	Cubierta ligera en buen estado de Zinc.	Estructura en Lu. Vistas Columnas Portico y M. Confi.	Muros en ladrillo sin Friso. Se observan fisuras.	No se Pueden Ver Pisos la Casa	Andenes Rampas y Escaleras en Mal estado y Hierros.	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita al predio y no se encuentra propietario se toma registro fotografico y Alinco de la parte exterior de la vivienda.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre:
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1082363993	C.C. O 1005953038	C.C. O NIT 1094967964	C.C. O NIT 63533664

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escriba lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Administración de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner
