CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022



"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022

INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORÍA No. 008

PERIODO DE EJECUCIÓN:
11 DE AGOSTO DE 2023 A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VERSIÓN 0
ORIGINAL

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El ORIGINAL del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación:

DEPENDENCIA	No DE COPIAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO a través del supervisor Arq. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA – Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED.	Original
Biblioteca del Proyecto	1

Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas para proceder a realizar sus modificaciones pertinentes.

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Índice Revisión	Capítulo Modificado	Fecha de Modificación	Observaciones
0	N/A	N/A	VERSIÓN ORIGINAL

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN



Titulo Documento		INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORÍA No.07		
Revisión		0	1	2
Responsable elaboración	Nombre	Ing. Camilo Antonio Samacá Pesca		
	Firma			
	Fecha	11 de septiembre de 2023		
Responsable revisión	Nombre	Ing. Manuel Antonio González Romero		
	Firma			
	Fecha	12 de septiembre de 2023		
Responsable aprobación	Nombre	Arq. Fredy Giovanni Rodríguez Salazar		
	Firma			
	Fecha	12 de septiembre de 2023		

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 2
ÍNDICE DE MODIFICACIONES 2
ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 2
1. INTRODUCCIÓN 12
1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 16
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 16
1.3. ANTECEDENTES 16
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 18
1.5. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 18
1.5.1. LOCALIZACIÓN PARTICULAR 19
1.5.1.1. Colegio República de Guatemala, sede A 19
1.5.1.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia 19
1.5.1.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana 20
1.5.1.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A 20
1.5.1.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda 21
1.5.1.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada 21
1.5.1.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A 22
1.5.1.8. Colegio Francisco Primero, sede A 22
1.5.1.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A 23
1.5.1.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A 23
1.5.1.11. Colegio Florida Blanca, sede A 24
1.5.1.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A 24
1.5.1.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto 25
1.5.1.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A 25
1.5.1.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A 26
1.5.1.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A 26
1.5.1.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, Sede A 27
1.5.1.18. Colegio Garcés Navas, sede A 27
1.5.1.19. Colegio República de Panamá, sede A 28
1.5.1.20. Colegio Juan del Corral, sede B 28
1.5.1.21. Colegio San José Norte 29
1.5.1.22. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C 29
1.5.1.23. Colegio Villa Amalia 30
1.5.1.24. Colegio Francisco Primero, sede B 30
1.5.1.25. Colegio Torquigua, sede A 31
1.5.1.26. Colegio Laureano Gómez, sede A 31
1.5.1.27. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B 32
1.6. ACTIVIDADES DE OBRA 32
1.6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 32
1.6.2. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 34
1.6.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A 34
1.6.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia 34
1.6.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana 34
1.6.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A 35
1.6.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda 35
1.6.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada 35
1.6.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A, ... 36
1.6.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A 36
1.6.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A 36
1.6.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A 37
1.6.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A 37
1.6.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A 37
1.6.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto 38

1.6.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A 38
1.6.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas 39
1.6.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A 39
1.6.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A 39
1.6.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A 39
1.6.2.19. Colegio República de Panamá, sede A 40
1.6.2.20. Colegio Juan del Corral, sede B 40
1.6.2.21. Colegio San José Norte 40
1.6.2.22. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C 40
1.6.2.23. Colegio Villa Amalia, sede A 40
1.6.2.24. Colegio Francisco Primero, sede B 41
1.6.2.25. Colegio Torquigua, sede A 41
1.6.2.26. Colegio Laureano Gómez, sede A 41
1.6.2.27. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B 41

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 41

2.1. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 - 2022 41
2.1.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA 41
2.1.2. CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA 42

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022 43
2.2.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 43
2.2.2. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 44

2.3. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 45
2.3.1. PERSONAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 45
2.3.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA. 45
2.3.2.1. PERSONAL CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA 45
2.3.2.2. PERSONAL ADICIONAL CONTRATISTA DE OBRA 46
2.3.3. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA. 46
2.3.3.1. PERSONAL CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA 46
2.3.3.2. PERSONAL ADICIONAL DE LA INTERVENTORÍA 47

2.4. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 47
2.4.1. RECURSOS DEL CONTRATISTA. 47
2.4.2. RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA. 48

3. INFORMACIÓN DEL ESTADO LEGAL, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO. 48

3.1. INFORMACIÓN LEGAL DEL PROYECTO. 48
3.1.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 48
3.1.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022. 48

3.2. MODIFICACIONES LEGALES REALIZADAS EN EL PERIODO. 48
3.2.1. MODIFICACIONES LEGALES AL CONTRATO DE OBRA 49
3.2.2. MODIFICACIONES LEGALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 49

3.3. INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE AVANCE DEL PROYECTO. 50
3.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. 50
3.3.1.1. PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 50
3.3.1.2. PRESUPUESTO POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022 51
3.3.1.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A 52
3.3.1.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia 52
3.3.1.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana 52
3.3.1.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A 52
3.3.1.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda 54
3.3.1.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada 54
3.3.1.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A 55
3.3.1.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A 57
3.3.1.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A 57
3.3.1.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A 57
3.3.1.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A 59
3.3.1.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A 62

3.3.1.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto 66
3.3.1.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A 66
3.3.1.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas 70
3.3.1.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A 71
3.3.1.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A 72
3.3.1.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A 72
3.3.1.2.19. Colegio República de Panamá, sede A 74
3.3.1.2.20. Colegio Juan del Corral, sede B 74
3.3.1.2.21. Colegio San José Norte, sede A 74
3.3.1.2.22. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C 74
3.3.1.2.23. Colegio Villa Amalia, sede A 74
3.3.1.2.24. Colegio Francisco Primero, sede B 74
3.3.1.2.25. Colegio Torquigua, sede A 75
3.3.1.2.26. Colegio Laureano Gómez, sede A 75
3.3.1.2.27. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B 75
3.3.1.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 75
3.3.1.4. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 76
3.3.1.5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 77
3.3.2. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022. 79
3.3.2.1. VALORES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022. 79
3.3.2.2. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022. 79

3.4. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO: **80**
3.4.1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 81
3.4.2. CORRESPONDENCIA 81

3.5. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO **106**
3.5.1. ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA. 106
3.5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 106
3.5.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A 106
3.5.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia 106
3.5.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana 106
3.5.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A 106
3.5.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda 108
3.5.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada 108
3.5.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A 108
3.5.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A 111
3.5.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A 111
3.5.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A 111
3.5.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A 115
3.5.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A 117
3.5.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto 121
3.5.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A 121
3.5.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A 123
3.5.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A 125
3.5.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A 125
3.5.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A 127
3.5.2.19. Colegio República de Panamá, sede A 128
3.5.2.20. Colegio Juan del Corral, sede B 130
3.5.2.21. Colegio San José Norte, sede A 131
3.5.2.22. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C 133
3.5.2.23. Colegio Villa Amalia 133
3.5.2.24. Colegio Francisco Primero, sede B 133
3.5.3. ATENCIÓN EMERGENCIAS EDUCATIVAS 136
3.5.3.1. IED Morisco 136
3.5.3.2. IED Rafael Bernal Jiménez, sede B 138
3.5.3.3. IED Nydia Quintero de Turbay Sede A 139
3.5.3.4. IED República de Panamá 140
3.5.3.5. Dirección Local de Engativá 141
3.5.3.6. IED Laureano Gómez 141
3.5.3.7. IED Thomas Carrasquilla sede A 141
3.5.3.8. IED Tomas Cipriano de Mosquera 141
3.5.3.9. Colegio Distrital Juan Francisco Berbeo 142
3.5.3.10. IED Domingo Faustino Sarmiento, sede D 142
3.5.4. AVANCE GENERAL DE CONTRATO 147

3.5.5. PROBLEMAS Y SOLUCIONES PRESENTADOS 149
3.5.6. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 149
3.5.7. CONTROL DE CALIDAD 150
3.5.8. REUNIONES EFECTUADAS 150
3.5.8.1. REUNIONES DE COMITÉ 150
3.5.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO. 158
3.5.10. ANÁLISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 158

3.6. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 158

3.7. ACTIVIDADES DE ORDEN SOCIAL. 159

4. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 159

4.1. OBSERVACIONES 159

4.2. CONCLUSIONES 160

4.3. RECOMENDACIONES 160

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEDE A. 34
TABLA 2. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIDIA QUINTERO DE TURBAY, SEDE B, FLORENCIA 34
TABLA 3. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMÁS CARRASQUILLA IED, SEDE B, PANAMERICANA....35
TABLA 4. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO IED, SEDE A. 35
TABLA 5. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE B, CIUDAD DE HONDA....35
TABLA 6. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SEDE C, NUEVA ESTRADA 36
TABLA 7. ALCANCE INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL, SEDE A....36
TABLA 8. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO PRIMERO, SEDE A....36
TABLA 9. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA AYALA DE GAITÁN, SEDE A 37
TABLA 10. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A 37
TABLA 11. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLORIDA BLANCA, SEDE A 37
TABLA 12. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE A 38
TABLA 13. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ASUNCIÓN SILVA, SEDE B, SIDAUTO 38
TABLA 14. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A 39
TABLA 15. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUSTO VÍCTOR CHARRY, SEDE A, GARCES NAVAS 39
TABLA 16. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERT F KENNEDY 39
TABLA 17. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SIMÓN BOLÍVAR, SEDE A 39
TABLA 18. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA GARCÉS NAVAS, SEDE A 39
TABLA 19. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEDE A 40
TABLA 20. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DEL CORRAL, SEDE B. 40
TABLA 21. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ NORTE. 40
TABLA 22. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE C 40
TABLA 23. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA AMALIA, SEDE A 40
TABLA 24. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO PRIMERO, SEDE B 41
TABLA 25. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TORQUIGUA, SEDE A 41
TABLA 26. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAUREANO GÓMEZ, SEDE A 41
TABLA 27. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE B 41
TABLA 28. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA. 42
TABLA 29. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA. 43
TABLA 30. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 44
TABLA 31. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 44
TABLA 32. PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. 45
TABLA 33. PERSONAL MÍNIMO DE SAFRID INGENIERÍA S.A.S. 46
TABLA 34. PERSONAL ADICIONAL SAFRID INGENIERÍA S.A.S. 46
TABLA 35. PERSONAL MÍNIMO DE CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022. 47
TABLA 36. PERSONAL ADICIONAL CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 47
TABLA 37. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A DISPONIBILIDAD DEL CONTRATISTA. 47
TABLA 38. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A DISPONIBILIDAD DE LA INTERVENTORÍA. 48
TABLA 39. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA 48
TABLA 40. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 48
TABLA 41. PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 50

TABLA 42. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEDE A.....52
TABLA 43. PRESUPUESTO ASIGNADO EDUCATIVA NIDIA QUINTERO DE TURBAY, SEDE B, FLORENCIA. 52
TABLA 44. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMÁS CARRASQUILLA IED – SEDE B, PANAMERICANA. 52
TABLA 45. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO IED, SEDE A.....52
TABLA 46. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO IED, SEDE A. 54
TABLA 47.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE B, CIUDAD DE HONDA 54
TABLA 48. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SEDE C, NUEVA ESTRADA.....55
TABLA 49. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL, SEDE A 55
TABLA 50. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL, SEDE A. 57
TABLA 51.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO PRIMERO, SEDE A 57
TABLA 52. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA AYALA DE GAITÁN, SEDE A 57
TABLA 53. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A.....57
TABLA 54. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A. 59
TABLA 55.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLORIDA BLANCA, SEDE A.....59
TABLA 56. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLORIDA BLANCA, SEDE A. 62
TABLA 57.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE A.....62
TABLA 58. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE A. 66
TABLA 59. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ASUNCIÓN SILVA, SEDE B, SIDAUTO.....66
TABLA 60.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A.....67
TABLA 61. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A. 70
TABLA 62.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUSTO VÍCTOR CHARRY, SEDE A. 70
TABLA 63. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUSTO VÍCTOR CHARRY, SEDE A. 71
TABLA 64. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERT F KENNEDY, SEDE A.....72
TABLA 65. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SIMÓN BOLÍVAR, SEDE A. 72
TABLA 66. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GARCÉS NAVAS, SEDE A. 72
TABLA 67. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA GARCÉS NAVAS, SEDE A. 74
TABLA 68. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEDE A 74
TABLA 69. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DEL CORRAL, SEDE B.....74
TABLA 70. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ NORTE. 74
TABLA 71. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE C. 74
TABLA 72. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA AMALIA, SEDE A. 74
TABLA 73. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO PRIMERO, SEDE B.....74

TABLA 74. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TORQUIGUA, SEDE A. 75
TABLA 75. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAUREANO GÓMEZ, SEDE A. 75
TABLA 76. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE B. 75
TABLA 77. VALORES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA. 75
TABLA 78. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE OBRA. 76
TABLA 79. TABLA DE VALORES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS DEL CONTRATO DE OBRA. 78
TABLA 80. VALORES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 79
TABLA 81. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 80
TABLA 82. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA. 81
TABLA 83. CONTROL CORRESPONDENCIA. 105
TABLA 84. AVANCE DE OBRA MIGUEL ANTONIO CARO. 107
TABLA 85. AVANCE DE OBRA INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL 110
TABLA 86. AVANCE DE OBRA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A 114
TABLA 87. AVANCE DE OBRA COLEGIO FLORIDABLANCA 117
TABLA 88. AVANCE DE OBRA COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN 120
TABLA 89. AVANCE DE OBRA COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A. 122
TABLA 90. AVANCE DE OBRA COLEGIO JUSTO VÍCTOR CHARRY 125
TABLA 91 AVANCE DE OBRA COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR 126
TABLA 92. AVANCE DE OBRA COLEGIO GARCÉS NAVAS 128
TABLA 93. AVANCE DE OBRA COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ 130
TABLA 94. AVANCE DE OBRA SAN JOSÉ NORTE. 132
TABLA 95. AVANCE DE OBRA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE B. 135
TABLA 96. AVANCE DE OBRA IT FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, BACHILLERATO INTERNACIONAL. 136
TABLA 97. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED MORISCO 138
TABLA 98. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED BERNAL JIMÉNEZ, SEDE B 139
TABLA 99. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED NYDIA QUINTERO DE TURBAY. 139
TABLA 100. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED REPÚBLICA DE PANAMÁ. 141
TABLA 101. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA. 141
TABLA 102. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED JUAN FRANCISCO BERBEO. 142
TABLA 103. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO. 144
TABLA 104. PRESUPUESTO EMERGENCIA IT FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 145
TABLA 105. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED JUAN DEL CORRAL 145
TABLA 106. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A 146
TABLA 107. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED NACIONES UNIDAS, SEDE B. 146
TABLA 108. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED ANTONIO NARIÑO, SEDE A 146
TABLA 109. PRESUPUESTO EMERGENCIA IED BOLIVIA, SEDE B 147
TABLA 110. AVANCE GENERAL DE OBRA 149
TABLA 111. RELACIÓN DE REUNIONES Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS. 158
TABLA 112. ANÁLISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO. 158

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO....18
FIGURA 2. COLEGIO REPÚBLICA DE GUATEMALA (IED) – SEDE – REPÚBLICA DE GUATEMALA. 19
FIGURA 3. COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED) – SEDE B – FLORENCIA. 19
FIGURA 4. COLEGIO TOMÁS CARRASQUILLA (IED) – SEDE B – PANAMERICANA. 20
FIGURA 5. COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED). 20
FIGURA 6. COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (IED) – SEDE B – CIUDAD DE HONDA. 21
FIGURA 7. COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA (IED) – SEDE C. 21
FIGURA 8. INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL (IED) – SEDE –JUAN DEL CORRAL. 22
FIGURA 9. COLEGIO FRANCISCO PRIMERO (IED) – SEDE A – ALEMANIA. 22
FIGURA 10. COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITÁN (IED) – SEDE MANUELA AYALA DE GAITÁN. 23
FIGURA 11. COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (IED) – SEDE A – I.T FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS....23
FIGURA 12. COLEGIO FLORIDA BLANCA (IED) – SEDE – FLORIDA BLANCA. 24
FIGURA 13. COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN (IED) – SEDE A....24
FIGURA 14. COLEGIO JOSÉ ASUNCIÓN SILVA (IED) – SEDE – SIDAUTO....25
FIGURA 15. COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ (IED) –SEDE A – RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ. 25
FIGURA 16. COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY (IED) – SEDE A – GARCÉS NAVAS – ZONA ESCOLAR NO. 4.....26
FIGURA 17. COLEGIO ROBERT F KENNEDY (IED) – SEDE ROBERT F. KENNEDY 26
FIGURA 18. COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR (IED) – SEDE A 27
FIGURA 19. COLEGIO GARCÉS NAVAS (IED) - SEDE A....27
FIGURA 20. COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ (IED) – SEDE A. 28
FIGURA 21. COLEGIO JUAN DEL CORRAL (IED) – SEDE B. 28
FIGURA 22. COLEGIO SAN JOSÉ NORTE (IED). 29
FIGURA 23. COLEGIO SAN JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE C (IED). 29
FIGURA 24. COLEGIO VILLA AMALIA (IED). 30
FIGURA 25. COLEGIO FRANCISCO PRIMERO (IED)- SEDE B. 30
FIGURA 26. COLEGIO TORQUIGUA (IED)- SEDE A. 31
FIGURA 27. COLEGIO LAUREANO GÓMEZ (IED)- SEDE A. 31
FIGURA 28. COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ (IED)- SEDE B. 32

ÍNDICE DE GRÁFICAS

GRÁFICA 1. VALORES ASIGNADOS POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 51
GRÁFICA 2. VALORES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 76
GRÁFICA 3. ACTAS PARCIALES DE OBRA. 76
GRÁFICA 4. VALORES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 78
GRÁFICA 5. VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 79
GRÁFICA 6. ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA. 80
GRÁFICA 7. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO MIGUEL ANTONIO CARO. 108
GRÁFICA 8. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO JUAN DEL CORRAL. 110
GRÁFICA 9. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A. 114
GRÁFICA 10. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO FLORIDABLANCA. 117
GRÁFICA 11. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO JORGE ELIECER GAITÁN. 120
GRÁFICA 12. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A. 123
GRÁFICA 13. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO JUSTO VÍCTOR CHARRY. 125
GRÁFICA 14. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO SIMÓN BOLÍVAR 126
GRÁFICA 15. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO GARCÉS NAVAS. 128
GRÁFICA 16. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO REPÚBLICA DE PANAMÁ. 130
GRÁFICA 17. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO SAN JOSÉ NORTE. 133
GRÁFICA 18. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE B. 135
GRÁFICA 19. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO IT FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, BACHILLERATO INTERNACIONAL. 136

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED, puso a disposición de los interesados el Proceso de Contratación No. SED-LPDCCEE-039-2022 para la selección del Contratista encargado de ejecutar el Contrato de obra pública para "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.", la cual fue adjudicada a la firma SAFRID INGENIERÍA SAS con NIT. No.900.520.848-4, representado legalmente por MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA identificado con cédula de ciudadanía No.1.081.774.968, dando origen al Contrato No CO1.PCCNTR.4077642 de 06 de octubre de 2022, el cual fue firmado el día 06 de diciembre de 2022; con un valor de **TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 13.954.280.882)** incluido A.I.U. El plazo total previsto para la ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, la cual se firmó el día 11 de enero de 2022.

El día 05 de abril de 2023 se realizó otrosí modificatorio No.1 adición y prórroga No.1 de contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022, conforme a las nuevas intervenciones de los Colegios adicionales consideran viable adicionar, ocho (8) sedes de colegios más, a las diecinueve (19) iniciales contempladas generando un nuevo universo de veintisiete (27) sedes a intervenir en el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022 que se relacionan a continuación:

- IED San José Norte, Sede A

En el momento, esta institución educativa fue viabilizada por la Dirección de Evaluación de la Educación como uno de los diez (10) establecimientos aptos para implementar el programa educativo de Bachillerato Internacional, por lo tanto y para cumplir con los espacios educativos y estándares de calidad espacial que exige este proyecto educativo, se deben realizar obras de mejoramiento consistentes en cambios de cubiertas en general, adecuaciones en baterías de baños, readecuación de bloques de aulas costado sur de la sede y adecuaciones en la zona; esto con el motivo de ser certificado por la organización internacional competente.

- IED Villa Amalia, Sede única

El bloque ubicado en el costado occidental de la planta física de esta sede, es el único que cuenta aún con una cubierta en canaleta de asbesto cemento (90) en alto estado de deterioro, para lo cual se propone su cambio por una cubierta liviana y que brinde

protección al clima y mejores condiciones acústicas, climáticas e higiénico-sanitarias. Con las últimas temporadas invernales las tejas han empeorado su condición crítica para recambio. Adicionalmente, se pretende mejorar los espacios que ocupan actualmente tres aulas prefabricadas, con aulas modulares con mejores condiciones de iluminación ventilación, y por último el mejoramiento del drenaje de una parte del área recreativa principal.

- IED Juan del Corral, Sede B

Esta sede educativa cuenta con una pequeña zona recreativa central con falencias en el acabado de la superficie, al igual que una zona de juegos infantiles en el costado occidental, por lo tanto, se plantean obras de mejoramiento encaminadas en el mejoramiento físico y estético de estas áreas recreativas.

- IED Francisco Primero, Sede B

La institución educativa ha venido reportando fallas por sobrecarga en el servicio eléctrico general, además de filtraciones en la placa de cubierta del tanque de almacenamiento subterráneo de agua potable, por lo tanto, se proyecta la revisión de todos los circuitos eléctricos y la impermeabilización de un área libre con acabado en adoquín que cubre el tanque en mención.

- IED Rafael Bernal Jiménez, Sede B

Esta sede educativa presenta un problema de humedades en muro de cerramiento contra predios vecino y un empozamiento de aguas lluvias en un área libre recreativa, por consiguiente, se harán obras de mejoramiento correctivo en muro y adecuaciones de arcamos para el manejo de aguas lluvias.

- IED Laureano Gómez, Sede única

Este colegio cuenta con falencias de drenaje de aguas lluvias en algunas zonas verdes interiores que se traducen en empozamientos, que no permiten su uso cuando se presentan altas precipitaciones, adicional a esto falta implementar una malla contra impacto en el costado occidental de una de las canchas múltiples con las que cuenta, por lo tanto, se harán sistemas de drenaje como cárcamos con rejillas, sifones además de una malla contra impacto de 2,50m de altura.

- IED Toquigua

En el momento, esta sede educativa, no cuenta con una cocina ni con un comedor escolar para proveer de comida caliente a la población estudiantil, sin embargo, dentro del proyecto de habilitación de nuevos comedores y cocinas para las instituciones educativas del Distrito Capital se incluye a el Colegio Torquigua, cuyo desarrollo es mediante el suministro de estructuras móviles modulares “in situ” a diferencia de la

generalidad de las instituciones. Este tipo de construcción requiere adicionalmente el montaje de las redes y la provisión del equipamiento indispensable para su puesta en funcionamiento.

- IED Jorge Eliecer Gaitán, Sede C

En la zona de acceso principal de colegio se cuenta con un área de juegos infantiles inhabilitada que se ha venido agrietando y se ha afectado el acabado del piso, por lo que se debe hacer la reparación de las fisuras y grietas y nuevamente colocar un acabado amigable que permita nuevamente la utilización de esta zona, además del arreglo de los domos en marquesina de vidrio en los halles interiores.

Por lo anterior el valor total del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022, incluida la presente adición, corresponderá a DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($19.324.280.882) incluido AIU y conforme a lo establecido, el plazo para la ejecución inicial del objeto contractual es de doce (12) MESES, con lo cual el plazo total de ejecución sumados los 3 meses y 15 días de la prórroga No. 1 necesarios para la correcta terminación de los frentes de trabajo, se determina en quince (15) meses y quince días (15) a partir de la firma del acta de inicio.

Para la Interventoría del Contrato de Obra la Secretaría de Educación Distrital abrió el CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022, que tiene por objeto: " INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO”." Este Contrato fue adjudicado al CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 con número de Nit. 901.649.961-8 representada legalmente por JORGE GÓMEZ FALLA identificado con cedula de ciudadanía No 72.007.216 de Barranquilla que a su vez está constituido por las empresas GNG PROYECTOS S.A.S BIC (50%) con número de Nit.901.477.828-7. representada legalmente por GUILLERMO EMILIO NARVÁEZ VÉLEZ identificado con cedula de ciudadanía No 72.201.382 de Barranquilla y GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. (50%) con número de Nit.901.383.717-3 representada legalmente por JORGE GÓMEZ FALLA identificado con cedula de ciudadanía No 72.007.216 de Barranquilla, dando origen al Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 del 24 noviembre de 2022; con un valor de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 951.138.738)**, y un plazo total para la ejecución del contrato de Trece (13) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la etapa correspondiente, la cual se firmó el día 22 de diciembre de 2022.

Por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, mediante modificatorio No.1 de 11 de mayo de 2023 se consideró viable adicionar recursos y prorrogar en tiempo el contrato de interventoría, para hacer el control técnico, ambiental, SST, jurídico y financiero de las ocho (8) sedes de colegios adicionadas al contrato de obra, que sumadas a las diecinueve (19) iniciales, generan un nuevo universo de veintitrés (23) sedes a intervenir en el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022, sedes descritas anteriormente.

Por lo tanto, se adiciona el valor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022, por valor de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($310.122.937,00) incluido IVA.

Por lo anterior el valor total del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022, incluida la presente adición, corresponderá a MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.261.261.675) incluido IVA.

De conformidad a lo establecido en el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022, cuyo plazo de ejecución corresponde a (13) MESES, será prorrogado por tres (3) meses y veinte (20) días, más, para un total de dieciséis (16) meses y veinte (20) Días a partir de la firma del acta de inicio, es decir hasta el día 11 de mayo de 2024.

El presente documento constituye el Informe mensual de Interventoría, en el cual se detallan las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 11 de agosto de 2023 a 10 de septiembre de 2023, por parte del Contratista SAFRID INGENIERÍA SAS; así mismo, se describen las actividades realizadas por el Interventor, CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022, dentro del mismo período, en el desarrollo de sus respectivos contratos.

El capítulo primero contiene la información general del proyecto, justificación, antecedentes, localización general y particular y las características técnicas del proyecto haciendo énfasis en el alcance establecido para cada una de las instituciones educativas.

El segundo capítulo corresponde a la información general del contrato de obra e interventoría en sus condiciones iniciales y actualizadas; así mismo, se relaciona el personal y los recursos involucrados en los contratos en mención.

El capítulo tercero corresponde a la información legal, financiera, administrativa, y técnica del proyecto, así como las actividades desarrolladas tanto por el contratista de obra como por la interventoría en los componentes de orden técnico, social y de seguridad y salud en el trabajo.

En el capítulo cuarto la interventoría realiza las observaciones, conclusiones y recomendaciones concernientes al desarrollo del contrato.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ejecución de reparaciones locativas correspondientes a: saneamiento básico, reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos y de trabajo, e igualmente en la atención de obras de que por necesidad o por circunstancias sobrevinientes, causados por fenómenos naturales, accidentes, situaciones antrópicas imprevisibles, y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales las cuales deben ser atendidas de forma prioritaria; de allí se desarrolla la planificación para efectuar las intervenciones que sean necesarias a juicio de la supervisión de la Secretaría Distrital de Educación e interventoría, con ello, realizar sobre los planos existentes de cada Colegio los detalles constructivos, cálculos y presupuestos que estén dentro del alcance del objeto: “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." – En las Localidades de Engativá y Barrios Unidos.

Por parte de la Secretaría de Educación Distrital se hizo entrega de los planos existentes de cada institución, dentro de los cuales se mencionan los siguientes:

- Planos Arquitectónicos.
- Planos Estructurales.
- Planos Eléctricos.
- Planos Hidrosanitarios.

1.3. ANTECEDENTES

En virtud a los lineamientos generales de la política educativa con respecto a la materialización del derecho a la educación: La política educativa de Bogotá se fundamenta en los principios constitucionales que definen la educación como un derecho fundamental, inalienable, esencial e inherente a la dignidad humana; un derecho indispensable para la formación integral del individuo, el acceso al conocimiento, la preservación y desarrollo de la cultura, la convivencia ciudadana y la integración social.

La materialización del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en la escuela depende de un espacio escolar digno, placentero y seguro. Las áreas dedicadas a aulas, sanitarios, recreación, laboratorios, auditorios y otros espacios especializados que proporcionen condiciones especiales que favorecen el aprendizaje e inciden en los resultados de calidad del sistema educativo. Además, el espacio y la dotación escolar potencian o debilitan el ambiente pedagógico e inciden en el comportamiento de los individuos. El establecimiento educativo y su infraestructura crean un espacio donde es posible la socialización, el conocimiento y la recreación. En este sentido, una institución escolar más que una obra arquitectónica, es un espacio al servicio de los procesos educativos, conformado por un conjunto de ambientes pedagógicos creados con finalidades culturales, sociales, académicas, creativas, intelectuales, éticas y recreativas.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 310 del 2022 la Secretaría de Educación del Distrito tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral.

De igual forma como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, la promoción de la calidad educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena presentación de las plantas físicas educativas y administrativas, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, adelantó la priorización de obras menores y de mejoramiento con características de reparaciones locativas en las diferentes localidades de Bogotá, intervenciones que contribuyen a mejorar la infraestructura educativa en temas tales como, la atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de Secretaria Distrital de Salud, obras menores de mitigación ante posibles riesgos y el mantenimientos correctivo, entre otros aspectos relacionados, obteniendo como resultado para el presente proceso, de selección de un total de doscientas veintitrés (223) plantas físicas, determinando 198 sedes educativas y 25 sedes administrativas, las cuales se encuentran ubicadas en las veinte (20) localidades de Bogotá D.C.

En el marco de las metas definidas en el Plan de Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C”, Programa Línea Estratégica: 4 -Inclusión Educativa para la Equidad, Proyecto Estratégico: Ambientes de Aprendizaje para la Vida, se incluyó oportunamente la intervención de obras menores y adecuaciones del cien por ciento de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos, buscando conservar y mejorar los espacios de los colegios ofreciendo espacios dignos de convivencia y que ofrezca las mejores condiciones para una verdadera educación de calidad, para las cuales también se hace necesario contratar el seguimiento, vigilancia y control de las actividades de obra por parte, de un tercero con las calidades técnicas, jurídicas y financieras del caso.

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación del Distrito cuenta con algunas infraestructuras con una antigüedad de más de cuarenta (40) años, es conveniente y necesario realizar inversiones en el mejoramiento y mantenimiento continuo de la infraestructura escolar y administrativa actual, con el fin de propiciar espacios adecuados para la construcción de saberes de los niños y niñas del Distrito, garantizando a su vez el correcto seguimiento a dichas actividades.

La población beneficiada del proyecto incluye niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Bogotá y ofrece cobertura en toda la ciudad. Igualmente, en la institución educativa trabajan un equipo de docentes, directivos docentes y administrativos de la SED, los cuales también se verían beneficiados al contar con nuevos espacios para impartir clase y áreas administrativas de atención a la comunidad, adicionalmente la comunidad educativa conformada por padres de familia y los habitantes de la zona de influencia de cada uno de los colegios.

Con estas doscientas veintitrés (223) intervenciones se beneficiará una población aproximada de ochenta mil (80.000) estudiantes para todas las localidades de la ciudad de Bogotá D.C, en entornos urbanos y rurales, involucrando en su desarrollo estrategias de empleabilidad a jóvenes, mujeres, en empleos directos e indirectos.

1.5. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado al noroccidente de la ciudad de Bogotá, más precisamente en la localidad de Engativá y Barrios Unidos.

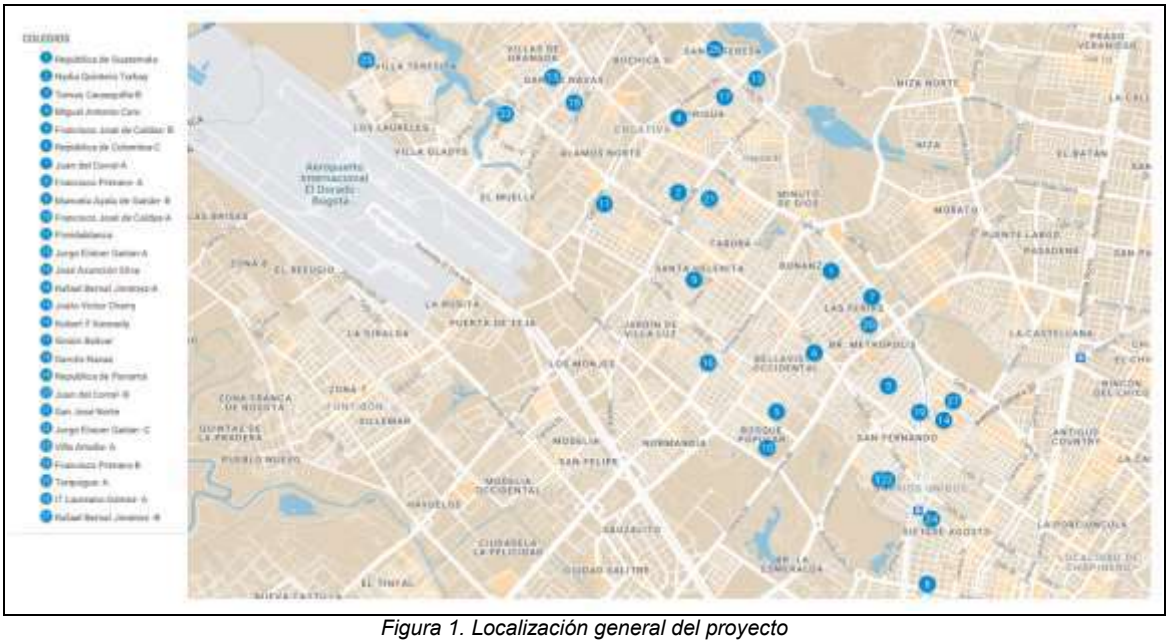


Figura 1. Localización general del proyecto
Fuente://www.google.com.co/maps/.

1.5.1. LOCALIZACIÓN PARTICULAR

1.5.1.1. Colegio República de Guatemala, sede A

El colegio República de Guatemala se encuentra localizado en la Calle 78 Bis #68a – 45, localidad de Engativá.



Figura 2. Colegio República de Guatemala (IED) – Sede – República de Guatemala.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia

El colegio Nidia Quintero de Turbay se encuentra localizado en Dg. 74b #87-40, localidad de Engativá.



Figura 3. Colegio Nidia Quintero de Turbay (IED) – Sede B – Florencia.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana

El colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, se encuentra localizado en Cl. 75A #63-55, localidad de Barrios Unidos.



Figura 4. Colegio Tomás Carrasquilla (IED) – Sede B – Panamericana.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A

El colegio Miguel Antonio Caro IED, se encuentra localizado en Tv. 94 # 81A-29, localidad de Engativá.

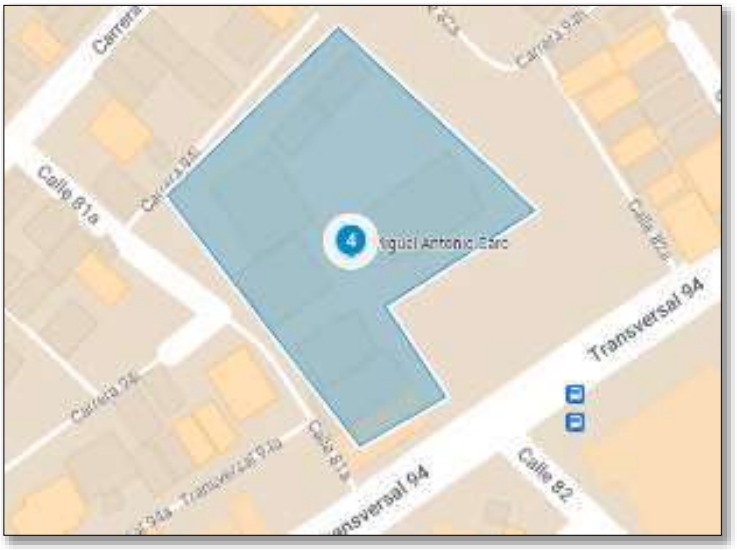


Figura 5. Colegio Miguel Antonio Caro (IED).
Fuente: Google Eath.

1.5.1.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda

El colegio Francisco José de Caldas, Sede B, se encuentra localizado en Cl. 64f Bis #68g -54, localidad de Engativá.



Figura 6. Colegio Francisco José de Caldas (IED) – Sede B – Ciudad de Honda.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada

El colegio República de Colombia, Sede C, se encuentra localizado en Cra. 68h #71A-01, localidad de Engativá.



Figura 7. Colegio República de Colombia (IED) – Sede C.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A

El Instituto técnico Juan del Corral, se encuentra localizado en Cra. 69b #79A-42, localidad de Engativá.

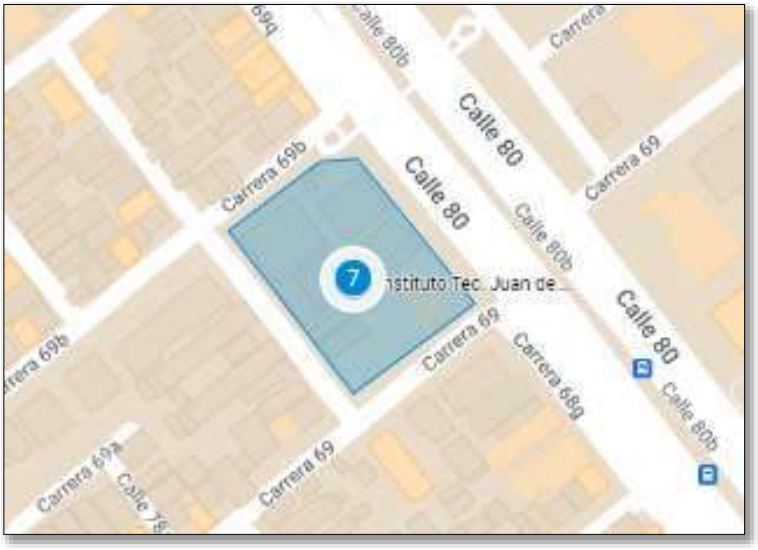


Figura 8. Instituto Técnico Juan del Corral (IED) – Sede –Juan del Corral.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.8. Colegio Francisco Primero, sede A

El Colegio Francisco Primero, Sede A, se encuentra localizado en Cra. 28 #63-64, localidad de Barrios Unidos.



Figura 9. Colegio Francisco Primero (IED) – Sede A – Alemania.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A

El Colegio Manuela Ayala de Gaitán, se encuentra localizado en Cra. 78 #69 A -11, localidad de Engativá.



Figura 10. Colegio Manuela Ayala de Gaitán (IED) – Sede Manuela Ayala de Gaitán.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A

El Colegio Francisco José de Caldas se encuentra localizado en Cra. 68f #63B-02, localidad de Engativá.



Figura 11. Colegio Francisco José de Caldas (IED) – Sede A – I.T Francisco José de Caldas.
Fuente: Google Eath.

1.5.1.11. Colegio Florida Blanca, sede A

El Colegio Florida Blanca, se encuentra localizado en Cra. 70A #94-38, localidad de Engativá.



Figura 12. Colegio Florida Blanca (IED) – Sede – Florida Blanca.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A

El Colegio Jorge Eliecer Gaitán, se encuentra localizado en Cra. 66A #56- 35, localidad de Barrios Unidos.

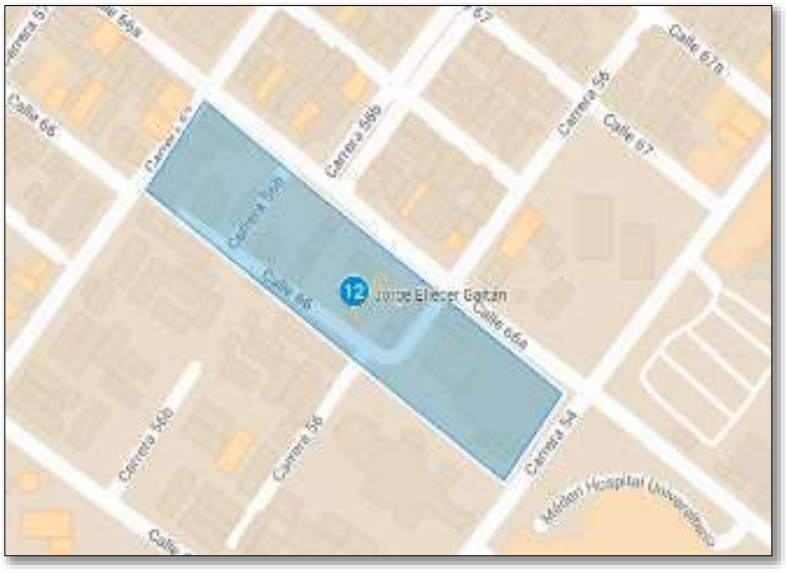


Figura 13. Colegio Jorge Eliecer Gaitán (IED) – Sede A.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto

El Colegio José Asunción Silva se encuentra localizado en Cl. 91 #16A - 82, localidad de Engativá.



Figura 14. Colegio José Asunción Silva (IED) – Sede – Sidauto.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A

El Colegio Rafael Bernal Jiménez, Sede A, se encuentra localizado en Cr 53 #75-17, localidad de Barrios Unidos.



Figura 15. Colegio Rafael Bernal Jiménez (IED) –Sede A – Rafael Bernal Jiménez.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A

El Colegio Justo Víctor Charry, Sede A, se encuentra localizado en Cra. 108 #21, localidad de Engativá.



Figura 16. Colegio Justo Victor Charry (IED) – Sede A – Garcés Navas – Zona Escolar No. 4.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A

El Colegio Robert F Kennedy, se encuentra localizado en Av. Boyacá #64h - 39, localidad de Engativá.



Figura 17. Colegio Robert F Kennedy (IED) – Sede Robert F. Kennedy
Fuente: Google Earth.

1.5.1.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, Sede A

El Colegio Distrital Simón Bolívar, Sede A, se encuentra localizado en Cra. 92 #86 - 18, localidad de Engativá.



Figura 18. Colegio Simón Bolívar (IED) – Sede A
Fuente: Google Earth.

1.5.1.18. Colegio Garcés Navas, sede A

El Colegio Garcés Navas, se encuentra localizado en Cl. 104A #76B-9, localidad de Engativá.



Figura 19. Colegio Garcés Navas (IED) - Sede A
Fuente: Google Earth.

1.5.1.19. Colegio República de Panamá, sede A

El Colegio República de Panamá, se encuentra localizado en Cra. 57A #74A- 32, localidad de Barrios Unidos.



Figura 20. Colegio República de Panamá (IED) – Sede A.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.20. Colegio Juan del Corral, sede B

El Colegio Juan del Corral, sede B, se encuentra localizado en Cra. 68G#78-20, Bogotá, localidad de Engativá.

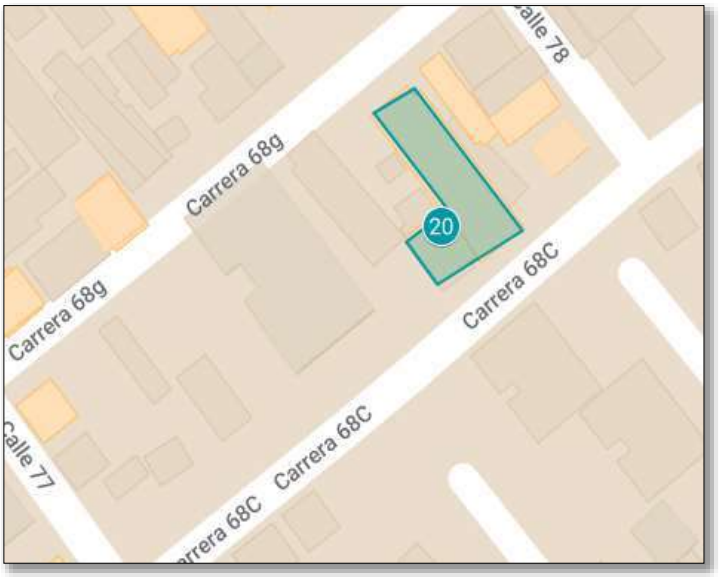


Figura 21. Colegio Juan del Corral (IED) – Sede B.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.21. Colegio San José Norte

El Colegio San José Norte, se encuentra localizado en Cra. 84 #75a-09, Bogotá, localidad de Engativá.

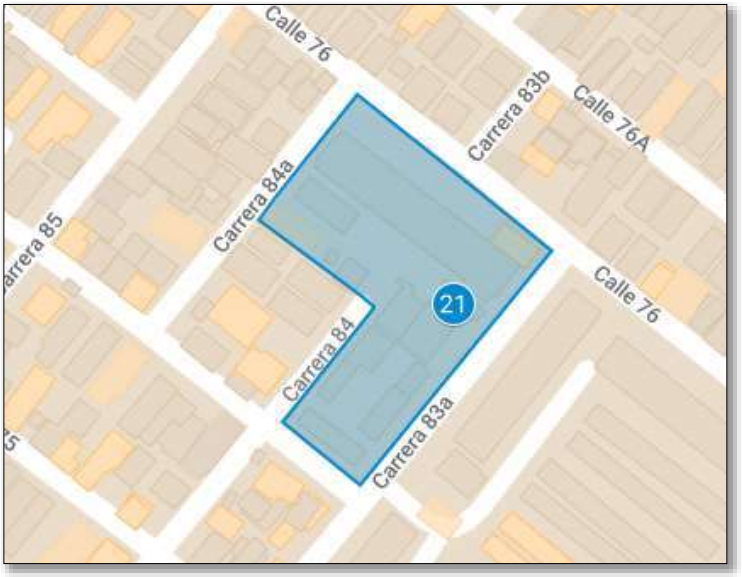


Figura 22. Colegio San José Norte (IED).
Fuente: Google Earth.

1.5.1.22. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C

El Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C, se encuentra localizado en Cl. 66a #54-40, Bogotá, localidad de Barrios Unidos.



Figura 23. Colegio San Jorge Eliecer Gaitán, sede C (IED).
Fuente: Google Earth.

1.5.1.23. Colegio Villa Amalia

El Colegio Villa Amalia, se encuentra localizado en Cra. 110 #71a-10, Bogotá, localidad de Engativá.



Figura 24. Colegio Villa Amalia (IED).
Fuente: Google Earth.

1.5.1.24. Colegio Francisco Primero, sede B

El Colegio Francisco Primero, sede B, se encuentra localizado en Cra. 28b #65-80, Bogotá, localidad de Barrios Unidos.



Figura 25. Colegio Francisco Primero (IED)- Sede B.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.25. Colegio Torquigua, sede A

El Colegio Torquigua, sede A, se encuentra localizado en Cl 64 #128-50, Bogotá, localidad de Engativá.



Figura 26. Colegio Torquigua (IED)- Sede A.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.26. Colegio Laureano Gómez, sede A

El Colegio Laureano Gómez, sede A, se encuentra localizado en Cl 90 A # 95A-56, Bogotá, localidad de Engativá.



Figura 27. Colegio Laureano Gómez (IED)- Sede A.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.27. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B

El Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B, se encuentra localizado en Cra 54 #78-21, Bogotá, localidad de Engativá.

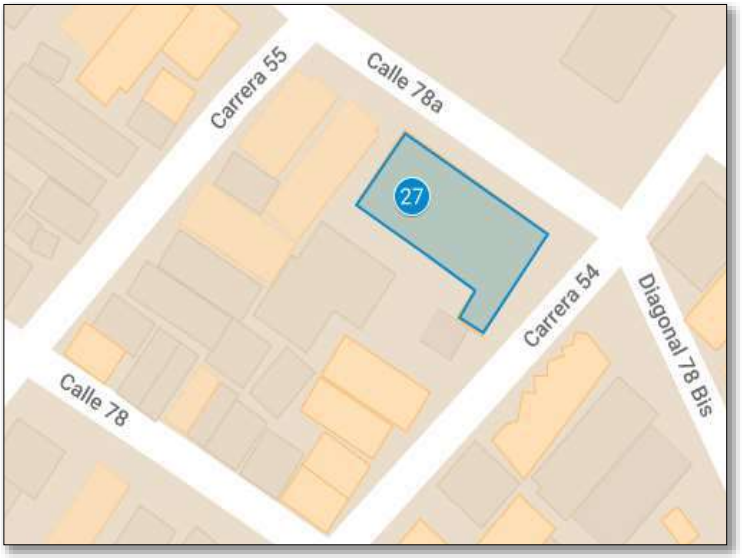


Figura 28. Colegio Rafael Bernal Jiménez (IED)- Sede B.
Fuente: Google Earth.

1.6. ACTIVIDADES DE OBRA

1.6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para la ejecución del proyecto se establecen los diagnósticos técnicos de las Instituciones Educativas a fin de brindar solución a las necesidades de cada una, de esta manera, se realiza la priorización de obras menores y de mejoramiento con características de reparaciones locativas en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, con ello, se efectuarán intervenciones que mejoran la infraestructura educativa en situaciones de atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de la entidad contratante, obras menores de mitigación de posibles riesgos y mantenimientos correctivos, acorde con los requerimientos institucionales y de estudiantes que harán uso de estos espacios.

En atención a lo manifestado en visitas, reuniones previas al inicio de las obras, comités efectuados conjuntamente entre Supervisor de Contrato (SED), apoyo a la supervisión Contrato (SED), Contratista de obra (SAFRID INGENIERÍA S.A.S.) e Interventoría (CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022), y con base en los diagnósticos realizados, se identificó las insuficiencias y las soluciones a implementar para brindar seguridad, comodidad y estética a las instituciones a intervenir, de manera que, se presentaron las alternativas de mantenimiento y presupuestos ajustados acorde a cada necesidad y a la CARTILLA ILUSTRATIVA DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED).

De este modo, de manera general las actividades a realizar en las instituciones educativas corresponden a:

- **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO**: Se refiere a todas las actividades necesarias de topografía y localización del área a ser intervenida.

- **CERRAMIENTO**: Obras necesarias de aislamiento contra personas ajenas para evitar el tránsito y riesgo de accidentes.

- **DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO:** Actividad necesaria para la adecuación del área donde se realizarán las intervenciones.

- **DESMONTE:** Retiro de mobiliarios como puertas, ventanas, carpintería metálica, así como redes eléctricas, cielos rasos y cubiertas, entre otros.

- **EXCAVACIONES MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS:** Obras para la construcción de la cimentación y adecuación de las áreas aledañas al sitio de obra.

- **ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO:** Actividades de construcción de soporte del edificio.
- **MAMPOSTERÍA:** Se refiere a las actividades de cerramiento de los pórticos y muros.

- **INSTALACIONES ELÉCTRICAS:** Actividades que tienen como objetivo dotar de energía eléctrica a las edificaciones e infraestructuras.

- **INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS:** Sistema de elementos (tuberías, bombas, válvulas, tanques, etc.) que se conectan entre sí para transportar determinadas cantidades de agua.

- **ENCHAPES, PINTURA, PAÑETE Y APARATOS SANITARIOS:** Obras necesarias para la entrega de las obras con las especificaciones necesarias para el buen uso de estas áreas.

- **CUBIERTA - CIELO RASO:** Adecuación de techos con las especificaciones técnicas establecidas.

- **CARPINTERÍA METÁLICA DE MADERA Y VIDRIOS:** Elementos que se instalan en los vanos dejados en la mampostería y para control en los accesos.

- **OBRAS EXTERIORES:** Todas las actividades necesarias de conectividad y urbanismo necesarias para acceder al edificio.

- **OTRAS OBRAS**: Se contemplan algunas obras complementarias como reparación de senderos, traslado de acometidas y aseo y disposición final.

1.6.2. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

A continuación, se relacionan las actividades priorizadas en cada una de las instituciones educativas de acuerdo a lo expresado por la Supervisión de la secretaria de Educación de Bogotá.

1.6.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Calle 78 Bis #68a - 45	Mejoramiento de Canchas.	N/A	NO CUMPLE
	Baterías Sanitarias.	Intervención completa	CUMPLE
	Cambio de Cubierta.	Bloque C	CUMPLE
		Retirar antepecho	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Instalación de Baranda	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Patio.	N/A	NO CUMPLE

Tabla 1. Alcance Institución Educativa República de Guatemala, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Dg. 74b #87-40	Mejoramiento de cubierta	2 bloques / Intervención integral de cubierta. Revisar necesidad de estructura - Ventilación de aulas.	CUMPLE
	Patio.	Demolición de Tarima	CUMPLE
	Desagües.		NO CUMPLE
		Mejoramiento de baterías sanitarias	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Shut de Basuras	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Cuarto de refrigerios.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Ventanería.	Pintura en carpintería metálica	CUMPLE

Tabla 2. Alcance Institución Educativa Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 75A #63-55	Baterías Sanitarias (Incluye Cubiertas).	Rehabilitación de baterías sanitarias - 2 bloques.	CUMPLE

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
	Mejoramiento de Patio y materas.	Remodelación patio y materas (Contenedores).	CUMPLE

Tabla 3. Alcance Institución Educativa Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Tv. 94 # 81A-29	Se realizará valoración de los especialistas de la DCCEE a la estructura de los bloques existentes con el propósito de establecer situación actual y posibles intervenciones mientras se realizan nuevos estudios y obtención de licencia de construcción. Se evidencia alto deterioro en cubiertas de asbesto cemento y en piso de patio y canchas (requerimiento secretaria de Salud)	Reconocimiento de cubierta con dron. Ajuste de cubierta, canales, piezas necesarias y bajantes (impermeabilización).	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

Tabla 4. Alcance Institución Educativa Miguel Antonio Caro IED, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 64f Bis #68g -54	Mejoramiento de Batería Sanitaria.	Baño y lavamanos	CUMPLE
	Staff room, salón de educación física	Demolición de divisiones Cambio de cubierta. Tanque. Mejoramiento integral.	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Adecuar Shut de basuras	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Mejoramiento de Patio.	Limpieza de zonas húmedas, Rehabilitación de cancha, demolición de placas, instalación de asfalto. (Conceptos técnicos).	CUMPLE

Tabla 5. Alcance Institución Educativa Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 68h #71A-01	Mejoramiento de Desagües.	Impermeabilización de techo y bajantes. Caja más profunda. Revisar viga canal y bajantes de cubierta.	CUMPLE
	Mejoramiento Equipo de Bombeo.	Revisar estado de bombas	CUMPLE
	Cancha deportiva.	Sellos de fisura y demarcación. Cambio de tableros de canchas.	CUMPLE

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
		Instalación de Cubierta en pasillo Cancha.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Tratamiento de filtraciones de Cubierta.	Impermeabilización de Cubierta.	CUMPLE
		Cuarto de Servicio	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Ajustar cuarto de seguridad a Vestier.	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Revisar filtraciones, humedades	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Reforzamiento de ventanas.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Mejoramiento de Cuarto de Refrigerios.	Cubierta de cuarto de refrigerios y cocina, reubicación de los mismos.	CUMPLE

Tabla 6. Alcance Institución Educativa República de Colombia, sede C, Nueva Estrada
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A,

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 69b #79A-42	Impermeabilización de Cubiertas Planas	Pasillos, escalera, biblioteca acceso. Mortero y manto de impermeabilización, sifón. Impermeabilización de puente (alternativas para evitar mantenimientos continuos). Flanches en cubierta.	CUMPLE
	Sistemas de desagües en sótano.	Redistribución de tubería - Anclajes.	CUMPLE

Tabla 7. Alcance Instituto Técnico Juan del Corral, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 28 #63-64	Mejoramiento de Cubiertas	AULAS 16,17, 18, 19. Bloque sur calle 63. Pintura.	CUMPLE
	Ventanería.	Casona Norte, Bloque sur Calle 63	CUMPLE
	Batería sanitaria.		NO CUMPLE
		Pintura y pisos.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Zonas exteriores	Shut de basuras.	CUMPLE

Tabla 8. Alcance Institución educativa Francisco Primero, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 78 #69 A -11	Áreas exteriores	Organizar Cancha (Cambio de sentido), malla de cerramiento, mejoramiento de capa de asfalto, zona de volley ball demolición de baldosa, Demolición de muros en espacio público.	CUMPLE
	Cubierta bloque antiguo.	Bloque antiguo.	CUMPLE

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
	Pisos.	Demolición de baldos y ajuste.	CUMPLE
	Shut de basuras.	Shut de basuras.	CUMPLE
		Salón de educación física	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Mejoramiento de tanque de reserva agua.		NO CUMPLE
	Sistema hidroneumático.	EAAB	CUMPLE

Tabla 9. Alcance Institución educativa Manuela Ayala de Gaitán, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 68f #63B-02	Cambio de Cubierta.	Cambio de cubierta Coliseo. Cubierta entre coliseo y bloque de salones.	CUMPLE
	Baterías sanitarias.		NO CUMPLE
	Pisos.	Sendero con cubierta. Coliseo - Bloque bachillerato.	CUMPLE
	Iluminación.	Iluminación Coliseo - Bloque bachillerato.	CUMPLE
		Ventanería coliseo y Bloque bachillerato.	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Pintura coliseo y Bloque bachillerato.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Ventilación Cruzada.		NO CUMPLE

Tabla 10. Alcance Institución educativa Francisco José de Caldas, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 70A #94-38	Cubierta.	Mantenimiento general bloque SENA (Pendiente por definir).	NO CUMPLE
	Pisos.	Pisos.	CUMPLE
	Ventanería.	Ventanería.	CUMPLE
	Adecuación área de servicios generales.	Adecuación área de servicios generales.	CUMPLE
	Piso Parqueadero y canchas.	Priorizar mejoramiento de canchas y parqueadero.	CUMPLE

Tabla 11. Alcance Institución educativa Florida Blanca, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 66ª #56-35	Mejoramiento de Cubiertas en Bloque de aulas y coliseo.	Bloque occidental sede A.	CUMPLE

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
	Recuperación de Instalaciones - recolección de aguas lluvia.		NO CUMPLE
		Ventanería	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Sistema de iluminación general	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Mejoramiento de baterías sanitarias	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Mejoramiento de cancha occidental y pisos de patios.		CUMPLE

Tabla 12. Alcance Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 91 #16A - 82	Áreas exteriores.	Mejoramiento de pasillo en L.	CUMPLE
	Cubiertas.	Cambio de Cubierta salones y área administrativa.	CUMPLE
	Pisos.	Salones	CUMPLE
		Shut de Basuras	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Adecuación Cuarto de Servicio generales y Refrigerio	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Pintura	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Iluminación	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Ventanería.	Ventanería salones y área administrativa	CUMPLE
	Muros	Shut basuras	CUMPLE

Tabla 13. Alcance Institución educativa José Asunción Silva, sede B, Sidauto
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cr 53 #75-17	Mejoramiento cubierta aula múltiple y policarbonato en marquesina.	Cambio de cubierta aula múltiple y comedor. Cambio de cubierta de policarbonato de aula principal.	CUMPLE
		Pintura general interior - exterior. / murales.	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Shut de Basura	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Instalación de césped	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Carpintería metálica	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Pisos.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Cerramiento.		NO CUMPLE
	Canales.		NO CUMPLE
	Bajantes.		NO CUMPLE

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
	Rejilla de Cárcamo.		NO CUMPLE

Tabla 14. Alcance Institución educativa Rafael Bernal Jiménez, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 108 #21	Mantenimiento de acabados de baños.	Baterías sanitarias. Soportes en fachada y acceso a cubierta.	CUMPLE

Tabla 15. Alcance Institución educativa Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Av. Boyacá #64h - 39	Mejoramiento de cubiertas.	Cambio de cubierta Administrativo, Enfermería, depósito y aulas. Revisión y ajuste de desagües.	CUMPLE
	Mejoramiento de Canchas.	Demoler y construcción de cancha.	CUMPLE

Tabla 16. Alcance Institución educativa Robert F Kennedy
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 92 #86 - 18	Mejoramiento de cubiertas bloque de aulas y auditorio, incluye instalaciones eléctricas y ventilación.	Mejoramiento integral de bloque costado sur - oriental cubierta incluye cubierta, pisos, pintura, ventanería, sistema de iluminación. Demolición de mesones laboratorio. Reforzamiento de estructuras de cubierta. Ajuste de canales, mejoramiento de paredes fisuradas.	CUMPLE

Tabla 17. Alcance Institución educativa Distrital Simón Bolívar, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 104ª #76B-9	Mejoramiento de cubiertas.	Mejoramiento integral de bloque con teja de fibrocemento prexistente incluye Pintura general, iluminación, ventanería, pisos, cambio de cubierta.	CUMPLE
	Baterías sanitarias		NO CUMPLE
	Cafetería	Demolición y construcción de salón polivalente en estructura metálica (opcional).	CUMPLE

Tabla 18. Alcance Institución educativa Garcés Navas, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.19. Colegio República de Panamá, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 57ª #74ª-32	Mejoramiento de Áreas de Comedor.	Demolición de tarima, construcción de muros divisorios, instalación de enchape, cambio de cubierta, construcción de comedor, instalación de mesones en acero inoxidable, cuartos fríos acorde a especificaciones SED.	CUMPLE

Tabla 19. Alcance Institución educativa República de Panamá, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.20. Colegio Juan del Corral, sede B

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 68G#78-20, Bogotá	Mejoramiento Piso de Cancha y demarcación	Mejoramiento Piso de Cancha y demarcación.	CUMPLE

Tabla 20. Alcance Institución educativa Juan del Corral, sede B.
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.21. Colegio San José Norte

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 84 #75a-09, Bogotá	Adecuaciones generales para Bachillerato Internacional	Impermeabilización placa auditorio, cubiertas, pintura en área administrativa, carpintería metálica, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, instalación de gas, baterías sanitarias, estructura metálica y aulas modulares.	CUMPLE

Tabla 21. Alcance Institución educativa San José Norte.
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.22. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 66a #54-40, Bogotá	Mejoramiento acabado piso zona infantil y mejoramiento domos en vidrio	Mejoramiento acabado piso zona infantil y mejoramiento domos en vidrio.	CUMPLE

Tabla 22. Alcance Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede C
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.23. Colegio Villa Amalia, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 110 #71a-10, Bogotá	Cambio de cubiertas faltantes y Aulas modulares	Mejoramiento de cubierta bloque de aulas, instalación de aulas modulares, mejoramiento de cárcamo.	CUMPLE

Tabla 23. Alcance Institución educativa Villa Amalia, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.24. Colegio Francisco Primero, sede B

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 28b #65-80, Bogotá	Sistema eléctrico general e impermeabilización placa tanque.	Sistema eléctrico general e impermeabilización placa tanque.	CUMPLE

Tabla 24. Alcance Institución educativa Francisco Primero, sede B
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.25. Colegio Torquigua, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 64 #128-50, Bogotá	Adecuación cocina móvil y comedor escolar	Adecuación cocina móvil y comedor escolar.	CUMPLE

Tabla 25. Alcance Institución educativa Torquigua, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.26. Colegio Laureano Gómez, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl 90A # 95A-56, Bogotá	Filtros en zonas verdes y tramo de cerramiento contra impacto	Filtros en zonas verdes y tramo de cerramiento contra impacto.	CUMPLE

Tabla 26. Alcance Institución educativa Laureano Gómez, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.27. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 54 #78-85	Impermeabilización Muro de Cerramiento y adecuación desagües en patio	Impermeabilización Muro de Cerramiento y adecuación desagües en patio.	CUMPLE

Tabla 27. Alcance Institución educativa Rafael Bernal Jiménez, sede B
Fuente: Elaboración Propia

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

2.1. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 - 2022

2.1.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona la información inicial del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
No. Contrato	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.
Contratista	SAFRID INGENIERÍA SAS
NIT.	900.520.848-4
Representante legal	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
Plazo inicial	12 MESES
Fecha de inicio	11 DE ENERO DE 2023
Fecha de finalización	10 DE ENERO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	
Sub - total	$ 10,949,686,818.90
Administración obra 20,94%	$ 2,292,864,419.88
Imprevistos 1.50%	$ 164,245,302.28
Utilidad 5%	$ 547,484,340.94
IVA sobre utilidad 19%	$ 104,022,024.78
Valor total inversión	$ 13,954,280,882.00

Tabla 28. Condiciones iniciales del contrato de obra.

2.1.2. CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
No. Contrato	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.
Contratista	SAFRID INGENIERÍA SAS
NIT.	900.520.848-4
Representante legal	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
Plazo inicial	12 MESES

CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	
Fecha de inicio	11 DE ENERO DE 2023
Fecha de finalización	10 DE ENERO DE 2024
Modificatorio No.1 – Adición y prórroga No.1	05 DE ABRIL DE 2023
Prórroga No.1	3 MESES Y 15 DÍAS
Plazo actualizado:	15 MESES Y 15 DÍAS
Terminación en virtud de la prórroga No.1	25 DE ABRIL DE 2024
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	
Sub - total	$ 10,949,686,818.90
Administración obra 20,94%	$ 2,292,864,419.88
Imprevistos 1.50%	$ 164,245,302.28
Utilidad 5%	$ 547,484,340.94
IVA sobre utilidad 19%	$ 104,022,024.78
Valor total inversión inicial	$ 13,954,280,882.00
Adición No.1 – Incluido AIU	$ 5,370,000,000.00
Valor total de Contrato de obra Actualizado	$ 19,324,280,882.00

Tabla 29. Condiciones actualizadas del contrato de obra.

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022

2.2.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona la información inicial del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022	
Objeto	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
No. Contrato	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022
Contratista	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
Nit.	901.649.961-8
Representante legal	JORGE GÓMEZ FALLA
Plazo	13 MESES

Fecha de inicio	22 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de finalización	21 DE ENERO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022	
Costo básico	$ 770,422,377.78
IVA 19%	$ 180,716,360.22
Total	$ 951,138,738.00

Tabla 30. Condiciones iniciales del contrato de interventoría.

2.2.2. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona la información actualizada del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022

CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.	
Objeto	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
No. Contrato	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022
Contratista	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
NIT.	901.649.961-8
Representante legal	JORGE GÓMEZ FALLA
Plazo inicial	13 MESES
Fecha de inicio	22 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de finalización	21 DE ENERO DE 2024
Modificatorio No.1 – Adición y prórroga No.1	13 DE ABRIL DE 2023
Prórroga No.1	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
Plazo actualizado:	DIECISÉIS (16) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
Terminación en virtud de la prórroga No.1	11 DE MAYO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022	
Valor total inversión inicial	$ 951,138,738.00
Adición No.1	$310.122.937,00
Valor total de Contrato de interventoría actualizado	$1.261.261.675

Tabla 31. Condiciones actualizadas del contrato de interventoría.

2.3. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Durante el desarrollo de los contratos de Obra e Interventoría, cada una de las partes cuenta con el talento humano que se relaciona a continuación:

2.3.1. PERSONAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

La Secretaría de educación distrital cuenta con el siguiente personal:

Cargo	Nombre
Supervisor de interventoría	Arq. Luis Antonio Pinzón Parra
Líder Territorial Zona Norte	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez
Apoyo a la supervisión	Arq. Juan Carlos Valencia Gamba

Tabla 32. Personal de la secretaria de educación distrital.

2.3.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA.

2.3.2.1. PERSONAL CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA

El contratista SAFRID INGENIERÍA SAS, cuenta con el siguiente personal para el desarrollo o ejecución de su compromiso contractual.

Cargo	Cant.	Nombre
Representante Legal	1	Miguel Alexander Cerón Molina
Director de Obra	1	Luis Eduardo Montes Álvarez
Residente de obra No.1	1	Gonzalo Enrique Sarmiento
Residente de obra No.2	1	Adriana Paola Méndez Navarro
Asesor Estructural	1	Ancizar Pérez Cervera
Asesor Ambiental	1	Natalia Carranza Cepeda
Asesor en redes eléctricas	1	Juan Fredy Montañez Muñoz
Asesor en redes hidrosanitarias, gas y red contraincendios	1	Omar Archila Mendoza
Profesional de Costos, presupuestos y programación.	1	Alba Rocio Ramírez
Técnico SST No.1	1	Sandra Milena Huertas Barbosa
Técnico SST No.2	1	Carlos Andrés Galindo Rojas
Técnico SST No.3	1	Leda Luz Lambis Castro
Técnico SST No.4	1	Claudia Mahecha

Cargo	Cant.	Nombre
Inspector de obra No. 1	1	José David Acuña Carvajal
Inspector de obra No. 2	1	Henry Ortigoza Montealegre
Inspector de obra No. 3	1	Miller Alberto Castañeda
Inspector de obra No. 4	1	Camilo Andrés Cárdenas
Maestro de obra	1	Manuel Guillermo Marulanda

Tabla 33. Personal mínimo de Safrid Ingeniería S.A.S.

2.3.2.2. PERSONAL ADICIONAL CONTRATISTA DE OBRA

Para el desarrollo del compromiso contractual e integral, CONSORCIO INTER COLEGIOS, conto con el siguiente personal adicional:

Personal Adicional		
Asesor en Geotecnia	1	Danilo Montaña Sanabria
Asesor Hidrosanitario	1	Omar Archila Mendoza
Inspector de obra	1	Jaime Alejandro Moreno Méndez
Inspector de obra	1	Juan Diego Candela
Inspector de obra	1	Andrea Camila Dussan
Inspector de obra	1	Gibson González

Tabla 34. Personal adicional Safrid Ingeniería S.A.S.

2.3.3. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA.

2.3.3.1. PERSONAL CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el desarrollo del compromiso contractual, **CONSORCIO INTER COLEGIOS**, cuenta con el siguiente personal:

Cargo	Cant.	Nombre
Representante Legal Suplente	1	Antonio Rafael González Fandiño
Director de Interventoría	1	Fredy Giovanni Rodríguez Salazar
Residente de interventoría No. 1	1	Camilo Antonio Samacá Pesca
Residente de interventoría No. 2	1	Rodolfo Castro Ortegón
Asesor estructural	1	Jairo Andrés Meza Rosas
Asesor ambiental	1	Mónica Marcela de los Ángeles Gómez

Cargo	Cant.	Nombre
Asesor eléctrico	1	Hernando Gómez Casas
Asesor hidráulico	1	Guillermo Emilio Narváez Vélez
Asesor de costos y presupuestos	1	Enrique Luis Monroy Maldonado
Abogado	1	Milena Mercedes Albornoz Villota
Inspector de interventoría No. 1	1	Edwin Núñez Amaya
Inspector de interventoría No. 2	1	Natalia Vanessa Calderón Acevedo
Maestro de obra	1	Edison Calderón Castañeda
Inspector SST No. 1	1	Yanin Nathalia Huertas Medina
Inspector SST No. 2	1	Geraldine Daniela Quevedo Garay

Tabla 35. Personal mínimo de Consorcio Intercolegios 2022.

2.3.3.2. PERSONAL ADICIONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el desarrollo del compromiso contractual e integral, CONSORCIO INTER COLEGIOS, conto con el siguiente personal adicional:

Cargo	Cant.	Nombre
Coordinador de proyectos	1	Manuel Antonio González Romero
Auxiliar de Ingeniería	1	Luis Felipe Lavado Alfonso

Tabla 36. Personal adicional Consorcio Intercolegios 2022

2.4. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

2.4.1. RECURSOS DEL CONTRATISTA.

SAFRID INGENIERÍA S.A.S., en su compromiso contractual debe suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra de cada sede a intervenir, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de las obras; además contará con la siguiente maquinaria y/o equipos:

Cantidad	Equipo
1	Oficina
5	Equipo de oficina (Computadores, celulares)
1	Impresora y fotocopiadora

Tabla 37. Maquinaria y/o equipos a disponibilidad del contratista.

2.4.2. RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA.

Para el desarrollo del compromiso contractual, **CONSORCIO INTER COLEGIOS**, cuenta con la siguiente maquinaria y/o equipos:

Cantidad	Equipo
1	Oficina
4	Equipo de oficina (Computadores, celulares)
1	Impresora y fotocopiadora

Tabla 38. Maquinaria y/o equipos a disponibilidad de la interventoría.

3. INFORMACIÓN DEL ESTADO LEGAL, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO.

3.1. INFORMACIÓN LEGAL DEL PROYECTO.

3.1.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha aprobación	14-10-2022		
Número	14-44-101164899		
Amparo	**Valor ($)**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 3,864,856,176.40	11-01-2023	27-10-2024
Estabilidad y Calidad de la obra	$ 3,864,856,176.40	11-01-2024	11-01-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 1.395.458.088,20	11-01-2023	26-04-2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	$966,214,044.10	11-01-2023	26-04-2024

Tabla 39. Pólizas actualizadas del contrato de obra

3.1.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL		
Fecha aprobación	29/11/2022		
Número	NB-100235369		
Amparo	**Valor ($)**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**
Cumplimiento	$ 252.252.335,00	22/12/2022	12/11/2024
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	$ 63.063.083,75	22/12/2022	11/05/2027
Calidad del servicio	$ 252.252.335,00	21/01/2024	21/01/2029

Tabla 40. Pólizas actualizadas del contrato de interventoría

3.2. MODIFICACIONES LEGALES REALIZADAS EN EL PERIODO.

A continuación, se detallan las modificaciones legales del contrato de obra e interventoría.

3.2.1. MODIFICACIONES LEGALES AL CONTRATO DE OBRA

A la fecha se realizó otrosí modificatorio No.1 adición y prórroga No.1 de contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022, conforme con lo expuesto por parte del contratista de obra y de acuerdo con las directrices dadas por la entidad contratante en reunión efectuada el 15 de febrero de 2023, en la cual manifestó: (i) la necesidad intervenir la infraestructura de nuevos colegios, con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes y el talento humano y (ii) adicionar recursos que permitan el cumplimiento del objeto del contrato.

3.2.2. MODIFICACIONES LEGALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, mediante modificatorio No.1 de 11 de mayo de 2023 se consideró viable adicionar recursos y prorrogar en tiempo el contrato de interventoría, para hacer el control técnico, ambiental, SST, jurídico y financiero de las ocho (8) sedes de colegios adicionadas al contrato de obra, que sumadas a las diecinueve (19) iniciales, generan un nuevo universo de veintitrés (23) sedes a intervenir en el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022, sedes descritas anteriormente.

Por lo tanto, se adiciona el valor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022, por valor de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($310.122.937,00) incluido IVA.

Por lo anterior el valor total del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022, incluida la presente adición, corresponderá a MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.261.261.675) incluido IVA.

De conformidad a lo establecido en el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022, cuyo plazo de ejecución corresponde a (13) MESES, será prorrogado por tres (3) meses y veinte (20) días, más, para un total de dieciséis (16) meses y veinte (20) Días a partir de la firma del acta de inicio, es decir hasta el día 11 de mayo de 2024.

El presente documento constituye el Informe mensual de Interventoría, en el cual se detallan las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 11 de agosto de 2023 a 10 de septiembre de 2023, por parte del Contratista SAFRID INGENIERÍA SAS; así mismo, se describen las actividades realizadas por el Interventor, CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022, dentro del mismo período, en el desarrollo de sus respectivos contratos.

3.3. INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE AVANCE DEL PROYECTO.

3.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.

3.3.1.1. PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.


A continuación, se presenta el presupuesto general del contrato de obra.

No.	Institución Educativa	Sede	Presupuesto SED	% Respecto al Presupuesto SED	Valor Actualizado Contrato de Obra - SAFRIDINGENIERIA SAS	% Respecto al Presupuesto Actualizado	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	REPUBLICA DE GUATEMALA	A	$ 461.642.257	2,39%	$ 445.496.942	2,31%	4/12/2023	25/04/2024
2	NIDIA QUINTERO	B	$ 467.530.342	2,42%	$ 451.179.099	2,33%	1/11/2023	25/04/2024
3	TOMAS CARRASQUILLA	B	$ 376.268.773	1,95%	$ 363.109.280	1,88%	4/12/2023	25/04/2024
4	MIGUEL ANTONIO CARO	A	$ 258.278.742	1,34%	$ 249.245.791	1,29%	7/02/2023	15/07/2023
5	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	B	$ 369.762.456	1,91%	$ 356.830.513	1,85%	4/12/2023	25/04/2024
6	REPUBLICA DE COLOMBIA	C	$ 742.966.924	3,84%	$ 716.982.658	3,71%	1/11/2023	25/04/2024
7	JUAN DEL CORRAL	A	$ 527.199.087	2,73%	$ 508.761.010	2,63%	15/02/2023	12/09/2023
8	FRANCISCO I	A	$ 1.042.342.005	5,39%	$ 1.005.887.499	5,21%	22/09/2023	25/04/2024
9	MANUELA AYALA DE GAITAN	A	$ 543.797.779	2,81%	$ 524.779.185	2,72%	1/11/2023	25/04/2024
10	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	A	$ 1.899.219.347	9,83%	$ 1.832.796.711	9,48%	25/01/2023	31/10/2023
11	FRANCISCO JOSE DE CALDAS- BACHILLERATO INTERNACIONAL	A	$ 0	-	$ 0	-	5/09/2023	30/11/2023
11	FLORIDABLANCA	A	$ 774.817.748	4,01%	$ 747.719.542	3,87%	6/02/2023	31/10/2023
12	JORGE ELIECER GAITAN	A	$ 1.889.077.759	9,78%	$ 1.823.009.812	9,43%	25/01/2023	31/10/2023
13	JOSE ASUNCION SILVA	B	$ 856.851.911	4,43%	$ 826.884.671	4,28%	28/09/2023	25/04/2024
14	RAFAEL BERNAL JIMENEZ	A	$ 651.384.823	3,37%	$ 628.603.517	3,25%	7/02/2023	27/09/2023
15	JUSTO VICTOR CHARRY	A	$ 366.048.052	1,89%	$ 353.246.015	1,83%	13/02/2023	30/09/2023
16	ROBERT F KENNEDY	A	$ 376.475.297	1,95%	$ 363.308.581	1,88%	4/12/2023	25/04/2024
17	SIMON BOLIVAR SEDE A	A	$ 749.402.904	3,88%	$ 723.193.548	3,74%	13/09/2023	25/04/2024

No.	Institución Educativa	Sede	Presupuesto SED	% Respecto al Presupuesto SED	Valor Actualizado Contrato de Obra - SAFRIDINGENIERIA SAS	% Respecto al Presupuesto Actualizado	Fecha Inicio	Fecha Fin
18	GARCES NAVAS SEDE A	A	$ 677.885.856	3,51%	$ 654.177.712	3,39%	1/02/2023	21/09/2023
19	REPUBLICA DE PANAMA SEDE A	A	$ 440.541.748	2,28%	$ 425.134.395	2,20%	17/07/2023	6/01/2024
20	RAFAEL BERNAL JIMENEZ	B	$ 150.000.000	0,78%	$ 150.000.000	0,78%	17/07/2023	25/04/2024
	JUAN DEL CORRAL SEDE B	B	$ 150.000.000	0,78%	$ 150.000.000	0,78%	4/12/2023	25/04/2024
22	SAN JOSÉ NORTE	A	$ 2.929.420.309	15,16%	$ 2.929.420.309	15,16%	12/04/2023	30/11/2023
23	JORGE ELIÉCER GAITÁN	C	$ 120.000.000	0,62%	$ 120.000.000	0,62%	1/11/2023	25/04/2024
24	VILLA AMALIA	A	$ 1.048.536.844	5,43%	$ 1.048.536.844	5,43%	3/01/2024	25/04/2024
25	FRANCISCO I	B	$ 53.283.043	0,28%	$ 53.283.043	0,28%	3/01/2024	25/04/2024
26	TORQUIGUA	A	$ 718.759.804	3,72%	$ 718.759.804	3,72%	3/01/2024	25/04/2024
27	INSTITUTO TÉCNICO LAUREANO GÓMEZ	A	$ 200.000.000	1,03%	$ 200.000.000	1,03%	3/01/2024	25/04/2024
28	EMERGENCIAS		$ 482.787.071	2,50%	$ 953.934.400	4,94%	25/01/2023	25/04/2024

Tabla 41. Presupuesto Del Contrato De Obra No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

3.3.1.2. PRESUPUESTO POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022

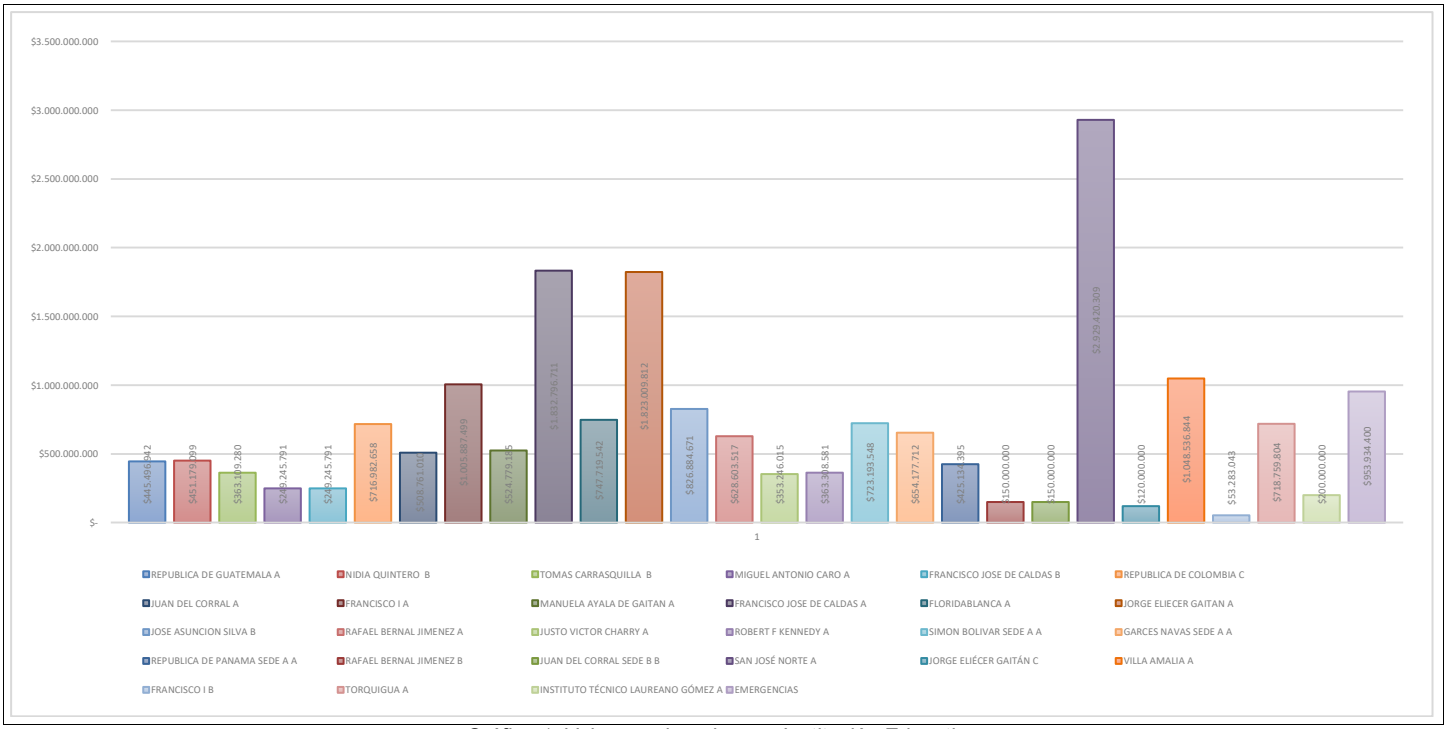

Gráfica 1. Valores asignados por Institución Educativa.

3.3.1.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
1	REP. DE GUATEMALA	A	REP. DE GUATEMALA	Calle 78 Bis #68a - 45	$ 461,642,257.00

Tabla 42. Presupuesto asignado Institución Educativa República de Guatemala, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
2	NIDIA QUINTERO B	B	FLORENCIA	Dg. 74b #87-40	$ 467,530,342.00

Tabla 43. Presupuesto asignado Educativa Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
3	TOMAS CARRASQUILLA B	B	PANAMERICANA	Cl. 75A #63-55	$ 376,628,772.00

Tabla 44. Presupuesto asignado Institución Educativa Tomás Carrasquilla IED – Sede B, Panamericana.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
4	MIGUEL ANTONIO CARO A	A	MIGUEL ANTONIO CARO	Tv. 94 # 81A-29	$ 258,278,741.00

Tabla 45. Presupuesto asignado Institución Educativa Miguel Antonio Caro IED, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1558,21	$ 5.217	$ 8.129.182
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	142,00	$ 35.333	$ 5.017.286
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,56	$ 66.499	$ 2.165.207
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	123,64	$ 16.774	$ 2.073.937
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILARÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	30,00	$ 29.021	$ 870.630
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	30,03	$ 8.863	$ 266.156

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.2	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN DE AMARRES, FIJACIÓN DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS). NO INCLUYE CAMBIO DE TEJAS	M2	489,21	$ 13.243	$ 6.478.608
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	45,36	$ 4.165	$ 188.924
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 25.189.930,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1,15	$ 74.796	$ 86.015
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	105,82	$ 45.116	$ 4.774.175
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	52,91	$ 95.319	$ 5.043.328
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN	M2	24,42	$ 88.225	$ 2.154.455
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.3.11	CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - b:20 (INC. BASE EN RECEBO)	M	27,95	$ 113.346	$ 3.168.021
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	66,92	$ 8.654	$ 579.093
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 15.805.087**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.1	**REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	57,65	$ 73.003	$ 4.208.623
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	$ 700.069	$ 700.069
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.908.692**
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	10,00	$ 114.403	$ 1.144.030
5.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT CONDUIT 2" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	27,50	$ 74.888	$ 2.059.420
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	27,50	$ 38.953	$ 1.071.208

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.274.658**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2	1,00	$ 29.328	$ 29.328
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	53,45	$ 15.577	$ 832.591
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 861.919**
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.12	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	M	20,00	$ 60.265	$ 1.205.300
SUBTOTAL	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 1.205.300**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA UPVC 1.0 MM - TRASLUCIDA	M2	30,00	$ 89.966	$ 2.698.980
17.1.46	INSTALACIÓN DE CANAL EXISTENTE, INCLUYEN SOPORTES METÁLICOS, ANCLAJES Y DEMÁS TEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	10,03	$ 64.233	$ 644.257
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	123,64	$ 63.242	$ 7.819.241
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 11.162.478**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1558,21	$ 7.657	$ 11.931.196
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 11.931.196**
VALOR TOTAL					**$ 75.339.260,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 75.339.260,00**

Tabla 46. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución Educativa Miguel Antonio Caro IED, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
5	FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS B	B	CIUDAD DE HONDA	Cl. 64f Bis #68g -54	$ 369,762,456.00

Tabla 47.Presupuesto asignado Institución Educativa Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
6	REPUBLICA DE COLOMBIA	C	NUEVA ESTRADA	Cra. 68h #71A-01	$ 742,966,924.00

Tabla 48. Presupuesto asignado Institución Educativa República de Colombia, sede C, Nueva Estrada
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
7	JUAN DEL CORRAL A	A	JUAN DEL CORRAL	Cra 69B #79ª - 42	$ 527,199,087.00

Tabla 49. Presupuesto asignado Instituto Técnico Juan del Corral, sede A
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUAN DEL CORRAL					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	934,48	$ 5.217	$ 4.875.169
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDA ESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	74,40	$ 30.460	$ 2.266.224
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	35,00	$ 16.774	$ 587.090
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILARÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	771,78	$ 29.021	$ 22.397.711
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,50	$ 22.614	$ 440.973
1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26,23	$ 18.855	$ 494.567
1.2.44	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	60,00	$ 5.029	$ 301.740
1.2.45	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	578,12	$ 7.165	$ 4.142.230
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	472,15	$ 21.075	$ 9.950.561
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	527,52	$ 20.851	$ 10.999.361
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.8	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	12,00	$ 7.945	$ 95.340
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	60,00	$ 4.165	$ 249.900
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 56.800.866**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA	M2	2250,00	$ 28.363	$ 63.816.750

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUAN DEL CORRAL					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
	RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)				
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 63.816.750**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.1	**REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	35,00	$ 82.476	$ 2.886.660
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 2.886.660,00**
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES	UN	60,00	$ 22.790	$ 1.367.400
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	578,12	$ 38.953	$ 22.519.508
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 23.886.908**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	929,06	$ 65.499,00	$ 60.852.658,00
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	206,51	$ 15.577,00	$ 3.216.806,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 64.069.464,00**
8	**MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1	**MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1.5	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10 CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	25,90	$ 122.378,00	$ 3.169.590,00
SUBTOTAL	**8. MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.169.590,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	426,18	$ 10.805,00	$ 4.604.875,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	426,18	$ 17.655,00	$ 7.524.208,00
13.2.6	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	243,89	$ 18.514,00	$ 4.515.379,00
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	750,00	$ 12.576,00	$ 9.432.000,00
13.2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	243,89	$ 8.182,00	$ 1.995.508,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 28.071.970,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	166,24	$ 46.399,00	$ 7.713.370,00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	977,85	$ 57.806,00	$ 56.525.389,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUAN DEL CORRAL					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	771,78	$ 180.356,00	$ 139.194.432,00
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	49,60	$ 95.654,00	$ 4.744.438,00
17.1.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	347,20	$ 96.953,00	$ 33.662.082,00
17.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATES LATERALES PARA CUBIERTA UPVC, EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 - DS= 1,00 - INCLUYEN PINTURAS	M	49,60	$ 146.822,00	$ 7.282.371,00
17.1.42	LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)	M	792,09	$ 34.274,00	$ 27.148.093,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 276.270.175,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	660,58	$ 7.657,00	$ 5.058.061,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 5.058.061,00**
21	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
SUBTOTAL	**21. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 0,00**
VALOR TOTAL					**$ 524.030.444,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 524.030.444,00**

Tabla 50. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Instituto Técnico Juan del Corral, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
8	FRANCISCO I A	A	FRANCISCO I	Cra. 28 #63-64	$ 1,042,342,004.00

Tabla 51.Presupuesto asignado Institución educativa Francisco Primero, Sede A
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
9	MANUELA AYALA DE GAITÁN A	A	MANUELA AYALA DE GAITÁN	Cra. 78 #69 A -11	$ 543,797,778.00

Tabla 52. Presupuesto asignado Institución educativa Manuela Ayala de Gaitán, sede A
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
10	FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS A	A	FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Cra. 68f #63B-02	$ 1,899,219,346.00

Tabla 53. Presupuesto asignado Institución educativa Francisco José de Caldas, Sede A
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	3829,12	$ 4.978,00	$ 19.061.354,00
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	8,70	$ 286.562,00	$ 2.492.115,00
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	114,58	$ 66.499,00	$ 7.619.189,00
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	416,77	$ 55.496,00	$ 23.128.978,00
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1642,96	$ 30.460,00	$ 50.044.537,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	93,67	$ 26.177,00	$ 2.451.869,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	493,07	$ 13.915,00	$ 6.861.063,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2313,37	$ 29.021,00	$ 67.136.189,00
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	139,00	$ 22.614,00	$ 3.143.346,00
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	66,00	$ 74.796,00	$ 4.936.536,00
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	66,00	$ 95.319,00	$ 6.291.054,00
2.2.2	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	83,35	$ 531.091,00	$ 44.268.386,00
2.2.18	ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI. ACABADO A LA VISTA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	8,70	$ 1.232.133,00	$ 10.715.368,00
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	790,66	$ 7.900,00	$ 6.246.233,00
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	9178,51	$ 9.719,00	$ 89.205.948,00
4.8.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	4,00	$ 882.241,00	$ 3.528.964,00
4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	159,41	$ 3.793,00	$ 604.642,00
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	70,00	$ 193.703,00	$ 13.559.210,00
5.1.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA COLGANTE EN POLICARBONATO TIPO CAMPANA CON TAPA INFERIOR. INCLUYE BOMBILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	18,00	$ 294.411,00	$ 5.299.398,00
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	70,00	$ 51.975,00	$ 3.638.250,00
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	3117,04	$ 43.727,00	$ 136.298.956,00
7.2.49	GUARDA ESCOBA CERAMICO H= 7. 5CM	M	2297,47	$ 14.628,00	$ 33.607.411,00
7.2.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO 51 X 51 CM	M2	2395,85	$ 71.855,00	$ 172.153.874,00
7.2.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO 8 MM COLOR A ELECCION	M2	364,00	$ 133.849,00	$ 48.721.036,00
9.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTIMACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE	M2	93,67	$ 820.064,00	$ 76.811.295,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
	SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.				
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	493,07	$ 619.206,00	$ 305.311.655,00
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	179,00	$ 26.095,00	$ 4.671.005,00
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	9178,51	$ 20.030,00	$ 183.845.575,00
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	650,00	$ 12.000,00	$ 7.800.000,00
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2022,60	$ 23.727,00	$ 47.990.230,00
16.1.18	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 10.149.764,00	$ 10.149.764,00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	71,94	$ 57.806,00	$ 4.158.275,00
17.1.8	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	275,00	$ 135.267,00	$ 37.198.425,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	2313,37	$ 180.356,00	$ 417.229.402,00
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	107,77	$ 91.273,00	$ 9.836.491,00
17.1.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	650,00	$ 96.953,00	$ 63.019.450,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	3829,12	$ 7.657,00	$ 29.319.563,00
NP2	DESMONTE DE CABALLETE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	ML	107,77	$ 14.526,13	$ 1.565.481,03
NP1	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CANALES, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	71,94	$ 36.500,00	$ 2.625.627,50
VALOR TOTAL					**$ 1.962.546.144,53**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 1.962.546.144,53**

Tabla 54. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Francisco José de Caldas, Sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
11	FLORIDABLANCA A	A	FLORIDABLANCA	Cra. 68f #63B-02	$ 774,817,748.00

Tabla 55.Presupuesto asignado Institución educativa Florida Blanca, sede A
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO FLORIDA BLANCA					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.354,00	$ 0,00
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1108,851	$ 5.217,00	$ 5.784.876,00

1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	211,65	$ 35.333,00	$ 7.478.229,00
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	453,56	$ 35.555,00	$ 16.126.482,00
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	412,62	$ 30.460,00	$ 12.568.417,00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,25	$ 24.626,00	$ 153.913,00
1.2.22	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	116,13	$ 218.577,00	$ 25.383.445,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,10	$ 13.915,00	$ 126.627,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	289,33	$ 29.021,00	$ 8.396.646,00
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN	1,00	$ 146.581,00	$ 146.581,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	11,00	$ 5.029,00	$ 55.319,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	433,68	$ 7.165,00	$ 3.107.317,00
1.2.50	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 253.728,00	$ 507.456,00
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.8	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	74,75	$ 7.945,00	$ 593.889,00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 80.429.197,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	485,77	$ 108.346,00	$ 52.631.334,00
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	485,77	$ 95.319,00	$ 46.303.196,00
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2	200,05	$ 122.556,00	$ 24.517.867,00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	330,05	$ 8.654,00	$ 2.856.291,00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 126.308.688,00**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.17	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1819,98	$ 6.662,00	$ 12.124.707,00
3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	1819,98	$ 28.363,00	$ 51.620.093,00
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	589,01	$ 9.719,00	$ 5.724.588,00
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 69.469.388,00**

4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	6,00	$ 32.621,00	$ 195.726,00
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 195.726,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 521.131,00	$ 521.131,00
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	433,68	$ 42.185,00	$ 18.294.791,00
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	33,00	$ 165.535,00	$ 5.462.655,00
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UN	11,00	$ 22.790,00	$ 250.690,00
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	433,68	$ 38.953,00	$ 16.893.137,00
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 41.422.404,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	412,62	$ 43.727,00	$ 18.042.652,00
7.1.11	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO. (INVLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E = 10 CM	M2	719,59	$ 177.121,00	$ 127.454.678,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	M	152,64	$ 52.995,00	$ 8.089.157,00
7.2.41	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	719,59	$ 52.022,00	$ 37.434.563,00
7.2.54	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	157,60	$ 5.595,00	$ 881.772,00
7.2.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO EN TABLON TRADICION EN GRESS	M2	200,05	$ 82.537,00	$ 16.511.890,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 208.414.712,00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES.	M2	12,50	$ 354.225,00	$ 4.427.813,00
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MAXIMO 1.00 X 1.00 EN LAMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	UN	6,00	$ 252.544,00	$ 1.515.264,00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 5.943.077,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	589,01	$ 10.805,00	$ 6.364.253,00

13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	589,01	$ 20.030,00	$ 11.797.870,00
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	345,12	$ 30.300,00	$ 10.457.136,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	745,19	$ 23.727,00	$ 17.681.123,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 46.300.382,00**
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.18	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 10.149.764,00	$ 10.149.764,00
SUBTOTAL	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 10.149.764,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	289,33	$ 180.356,00	$ 52.182.401,00
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	28,80	$ 95.654,00	$ 2.754.835,00
17.1.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	84,00	$ 96.953,00	$ 8.144.052,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 63.081.288,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1108,85	$ 7.657,00	$ 8.490.472,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 8.490.472,00**
NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO 51 X 51 CM	M2	412,62	$ 85.420,00	$ 35.246.034,57
NP6	DESMONTE TUBERÍA PVC	ML	433,68	$ 8.536,00	$ 3.701.892,48
VALOR TOTAL					**$ 699.153.025,05**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 699.153.025,05**

Tabla 56. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Florida Blanca, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
12	JORGE ELIECER GAITÁN A	A	JORGE ELIECER GAITÁN	Cra. 54 #65- 85	$ 1,889,077,759.00

Tabla 57.Presupuesto asignado Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede A
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1924,15	$ 5.217,00	$ 10.038.282,00
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M	M	200,00	$ 124.946,00	$ 24.989.200,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBO METÁLICO REDONDO 1-1/2" H=2.2 M, (NO INCLUYE CONCRETO NI ACERO DE REFUERZO)	M	100,00	$ 194.702,00	$ 19.470.200,00
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1745,53	$ 66.499,00	$ 116.075.780,00
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,34	$ 58.160,00	$ 542.982,00
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	147,72	$ 8.856,00	$ 1.308.217,00
1.2.22	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	114,63	$ 218.577,00	$ 25.054.826,00
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11,00	$ 13.915,00	$ 153.065,00
1.2.24	DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACION Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA; (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	94,19	$ 75.460,00	$ 7.107.608,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	93,10	$ 26.177,00	$ 2.437.097,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	289,46	$ 13.915,00	$ 4.027.786,00
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	18,00	$ 14.791,00	$ 266.238,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	750,93	$ 29.021,00	$ 21.792.687,00
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	459,76	$ 22.614,00	$ 10.397.026,00
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	68,00	$ 8.576,00	$ 583.168,00
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	178,00	$ 8.863,00	$ 1.577.614,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	1513,12	$ 7.165,00	$ 10.841.505,00
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1259,00	$ 21.075,00	$ 26.533.425,00
1.2.50	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 253.728,00	$ 507.456,00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.6	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5146,15	$ 10.552,00	$ 54.302.175,00
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	128,12	$ 4.165,00	$ 533.628,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 338.539.965,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	201,10	$ 74.796,00	$ 15.041.176,00
2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	100,55	$ 166.156,00	$ 16.706.653,00
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	100,55	$ 181.505,00	$ 18.249.965,00
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.3	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3500 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	106,24	$ 601.926,00	$ 63.948.341,00
2.2.8	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	29,40	$ 202.929,00	$ 5.966.113,00
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.3.9	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	48,00	$ 471.301,00	$ 22.622.448,00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	405,90	$ 7.900,00	$ 3.206.610,00
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	580,43	$ 8.654,00	$ 5.023.015,00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 150.764.321,00**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.6	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	31,82	$ 115.309,00	$ 3.669.132,00
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.669.132,00**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	12,00	$ 123.235,00	$ 1.478.820,00
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	27,00	$ 68.341,00	$ 1.845.207,00
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	31,00	$ 36.827,00	$ 1.141.637,00
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.6	CAJA DE INSPECCIÓN 1 M X 1 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1,50 M. DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E = 0.20 M (INCLUYE ACERO)	UN	5,00	$ 1.153.783,00	$ 5.768.915,00
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 10.234.579,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	68,00	$ 193.703,00	$ 13.171.804,00
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED STREET PARA ALUMBRADO RECREATIVO DE CANCHA DEPORTIVA TIPO EXTERIOR DE 60W, 100V A 277V. INCLUYE ESTRUCTURA TIPO POSTE METÁLICO, ESTRUCTURA CIVIL, CABLE DE PUESTA A TIERRA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	6,00	$ 5.799.668,00	$ 34.798.008,00
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	68,00	$ 51.975,00	$ 3.534.300,00
5.1.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	178,00	$ 27.103,00	$ 4.824.334,00
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	1513,12	$ 38.953,00	$ 58.940.563,00
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 115.269.009,00**

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	502,74	$ 43.727,00	$ 21.983.312,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO 51 X 51 CM	M2	1688,51	$ 75.304,00	$ 127.151.911,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 149.135.223,00**
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2	147,72	$ 69.612,00	$ 10.283.154,00
SUBTOTAL	**8. MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 10.283.154,00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	289,46	$ 619.206,00	$ 179.233.140,00
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS (2) HOJAS Y DOS (2) CUERPOS FIJOS, MARCO EN PEINAZO CAL. 18 - HORIZONTALES EN TUBO CUADRADO DE 40 MM x 20 MM CAL.18, TABLERO TIPO PANEL, INCLUYE CERRADURA, PASADORES, FALLEBAS, PINTURA ANTICORROSIVO EN CROMATO DE ZINC Y ESMALTE TIPO ACABADO DE EXCELENTE CALIDAD.	M2	10,90	$ 574.844,00	$ 6.265.800,00
9.3.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON AISLANTE ACUSTICO	M2	82,20	$ 1.044.918,00	$ 85.892.991,00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 271.391.931,00**
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	14,00	$ 872.835,00	$ 12.219.690,00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00	$ 688.692,00	$ 1.377.384,00
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA ((INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1,00	$ 2.105.916,00	$ 2.105.916,00
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	10,14	$ 892.636,00	$ 9.051.329,00
SUBTOTAL	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 24.754.319,00**
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	55,80	$ 1.066.170,00	$ 59.495.271,00
SUBTOTAL	**12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 59.495.271,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.6	PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5146,15	$ 49.149,00	$ 252.928.126,00
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	5146,15	$ 10.805,00	$ 55.604.151,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	7536,12	$ 20.030,00	$ 150.948.484,00
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	232,50	$ 30.300,00	$ 7.044.750,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	5921,06	$ 23.727,00	$ 140.488.991,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 607.014.502,00**
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	139,50	$ 93.091,00	$ 12.986.195,00
16.1.8	MINI CANCHA MÚLTIPLE DE 15 X 9 M PAVIMENTO ASFALTICO MD 10 60-70 EN OBRA	M2	39,22	$ 168.035,00	$ 6.589.661,00
16.1.18	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 10.149.764,00	$ 10.149.764,00
SUBTOTAL	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 29.725.620,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	750,93	$ 180.356,00	$ 135.434.406,00
17.1.44	SEI DE VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). Ds = 100 CM - CAL 20	M	15,32	$ 116.327,00	$ 1.782.130,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 137.216.536,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1924,15	$ 7.657,00	$ 14.733.204,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 14.733.204,00**
VALOR TOTAL					**$ 1.922.226.766,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					
VALOR TOTAL					**$ 1.922.226.766,00**

Tabla 58. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
13	JOSÉ ASUNCIÓN SILVA B	B	SIDAUTO	Cl. 91 #16A - 82	$ 856,851,911.00

Tabla 59. Presupuesto asignado Institución educativa José Asunción Silva, sede B, Sidauto
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
14	RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ A	A	RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ	Cr 53 #75-17	$ 651,384,822.00

Tabla 60.Presupuesto asignado Institución educativa Rafael Bernal Jiménez, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO BERNAL JIMÉNEZ					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1834,63	$ 5.217,00	$ 9.571.265,00
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M	M	85,00	$ 124.946,00	$ 10.620.410,00
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,00	$ 35.555,00	$ 568.880,00
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67,07	$ 20.949,00	$ 1.405.049,00
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	539,66	$ 30.460,00	$ 16.438.044,00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12,09	$ 24.626,00	$ 297.728,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,77	$ 26.177,00	$ 360.457,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	99,48	$ 13.915,00	$ 1.384.264,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1121,29	$ 29.021,00	$ 32.540.957,00
1.2.36	DESMONTE DE BARANDA METALICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	6,80	$ 15.191,00	$ 103.299,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	35,00	$ 5.029,00	$ 176.015,00
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN	4,00	$ 142.626,00	$ 570.504,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 74.036.872,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	4,80	$ 108.346,00	$ 520.061,00
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.3	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3500 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	1,08	$ 601.926,00	$ 650.080,00
2.2.8	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	18,00	$ 202.929,00	$ 3.652.722,00
2.2.12	VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M	12,00	$ 87.417,00	$ 1.049.004,00
2.2.25	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	56,87	$ 106.387,00	$ 6.050.229,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO BERNAL JIMÉNEZ					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2	9,00	$ 122.556,00	$ 1.103.004,00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	79,58	$ 8.654,00	$ 688.685,00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 13.713.785,00**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE LIVIANO RUGOSO	M2	40,00	$ 114.906,00	$ 4.596.240,00
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.596.240,00**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	2,00	$ 98.496,00	$ 196.992,00
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 196.992,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X32 W FLUORESCENTE TIPO T8. INCLUYE TUBOS FLUORESCENTES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3,00	$ 70.647,00	$ 211.941,00
5.1.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA COLGANTE EN POLICARBONATO TIPO CAMPANA CON TAPA INFERIOR. INCLUYE BOMBILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	35,00	$ 308.542,00	$ 10.798.970,00
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	35,00	$ 51.975,00	$ 1.819.125,00
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 12.830.036,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	822,02	$ 43.727,00	$ 35.944.469,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2	642,75	$ 150.374,00	$ 96.652.889,00
7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	34,00	$ 73.121,00	$ 2.486.114,00
7.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M2	1,12	$ 105.976,00	$ 118.693,00
7.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO TIPO TARALAY O SIMILAR ALTO TRÁFICO	M2	112,20	$ 180.761,00	$ 20.281.384,00
7.2.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	56,87	$ 116.961,00	$ 6.651.572,00
7.2.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	33,60	$ 19.403,00	$ 651.941,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 162.787.062,00**
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2	25,20	$ 69.612,00	$ 1.754.222,00
8.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRY WALL DE 12 MM VISTO UNA CARA.	M2	34,00	$ 62.105,00	$ 2.111.570,00
SUBTOTAL	**8. MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.865.792,00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO BERNAL JIMÉNEZ					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	13,77	$ 559.540,00	$ 7.704.866,00
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	6,60	$ 631.610,00	$ 4.168.626,00
9.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACION, Y ESCALERILLA VERTICAL EN TUBERIA DE 3/4" CON SEPARACION CADA 9CM PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS	M	6,80	$ 928.733,00	$ 6.315.384,00
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	116,82	$ 619.206,00	$ 72.335.645,00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 90.524.521,00**
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1.52	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE PARA CARCAMO ANCHO 20 CM	M	12,00	$ 280.966,00	$ 3.371.592,00
SUBTOTAL	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.371.592,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.3	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	32,22	$ 44.672,00	$ 1.439.332,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	545,29	$ 17.655,00	$ 9.627.095,00
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	10,80	$ 26.095,00	$ 281.826,00
13.2.6	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	539,44	$ 18.514,00	$ 9.987.192,00
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	822,00	$ 12.576,00	$ 10.337.472,00
13.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	10,20	$ 30.830,00	$ 314.466,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1442,50	$ 23.727,00	$ 34.226.198,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 66.213.581,00**
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.13	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO B600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	3,20	$ 140.745,00	$ 450.384,00
SUBTOTAL	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 450.384,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	49,64	$ 48.641,00	$ 2.414.539,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO BERNAL JIMÉNEZ					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	77,04	$ 68.682,00	$ 5.291.261,00
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	66,00	$ 63.242,00	$ 4.173.972,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	776,05	$ 180.356,00	$ 139.965.274,00
17.1.24	LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	283,50	$ 197.406,00	$ 55.964.601,00
17.1.42	LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)	M	514,08	$ 34.274,00	$ 17.619.578,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 225.429.225,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1016,78	$ 7.657,00	$ 7.785.484,00
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	1783,87	$ 6.297,00	$ 11.233.029,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 19.018.513,00**
VALOR TOTAL					**$ 677.034.595,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 677.034.595,00**

Tabla 61. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Rafael Bernal Jiménez, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
15	JUSTO VICTOR CHARRY A	A	GARCÉS NAVAS	Cra. 108 #21	$ 366,048,051.00

Tabla 62.Presupuesto asignado Institución educativa Justo Víctor Charry, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	177,88	$ 5.217,00	$ 928.018,00
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,20	$ 41.408,00	$ 795.096,00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,28	$ 24.626,00	$ 130.025,00
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	390,46	$ 8.856,00	$ 3.457.882,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	42,00	$ 26.177,00	$ 1.099.434,00
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	84,00	$ 14.791,00	$ 1.242.444,00
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	2259,50	$ 9.719,00	$ 21.960.041,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	60,00	$ 193.703,00	$ 11.622.180,00
5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	100,00	$ 114.403,00	$ 11.440.300,00
5.1.86	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS LED T8, INCLUYE SOQUETS. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	120,00	$ 35.860,00	$ 4.303.200,00
7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2	177,88	$ 30.565,00	$ 5.437.009,00
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2	390,46	$ 69.612,00	$ 27.180.454,00
9.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTA FUEGO FABRICADAS EN LAMINA COLLED ROLLED CAL 18 CON MONTAJE FIJO Y MARCO TIPO ZAPATO DE 12CM DE ANCHO (NO INCLUYE BARRAS ANTIPANICO Y CIERRAPUERTAS)	M2	57,08	$ 825.461,00	$ 47.117.314,00
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	23,90	$ 619.206,00	$ 14.801.500,00
9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACRILICO RECUPERADO DE 10 MM DISEÑO DE ANIMALES, MODULOS DE 60 X 90 X 1 CM, INCLUYE SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" ANCLADO AL PISO	UN	4,00	$ 1.198.611,00	$ 4.794.444,00
9.3.22	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 MM	M2	20,06	$ 664.220,00	$ 13.320.932,00
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	32,00	$ 872.835,00	$ 27.930.720,00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	10,00	$ 688.692,00	$ 6.886.920,00
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	34,21	$ 892.636,00	$ 30.537.078,00
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	52,60	$ 1.066.170,00	$ 56.080.542,00
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	2259,50	$ 10.805,00	$ 24.413.854,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	2259,50	$ 17.655,00	$ 39.891.402,00
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	177,88	$ 26.095,00	$ 4.641.870,00
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	41,05	$ 161.138,00	$ 6.615.037,00
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	41,05	$ 34.945,00	$ 1.434.562,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	177,88	$ 7.657,00	$ 1.362.054,00
VALOR TOTAL					**$ 369.424.312,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 369.424.312,00**

Tabla 63. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Justo Víctor Charry, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado

16	ROBERT F KENNEDY A	A	ROBERT F KENNEDY	Av. Boyacá #64h - 39	$ 376,475,297.00

Tabla 64. Presupuesto asignado Institución educativa Robert F Kennedy, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
17	SIMÓN BOLÍVAR SEDE A	A	SIMÓN BOLÍVAR	Cra. 92 #86 - 18	$ 749,402,904.00

Tabla 65. Presupuesto asignado Institución educativa Distrital Simón Bolívar, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
18	GARCÉS NAVAS SEDE A	A	GARCÉS NAVAS	Cl. 78 #104a-2	$ 677,885,855.00

Tabla 66. Presupuesto asignado Institución educativa Garcés Navas, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO GARCÉS NAVAS					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1868,14	$ 5.217,00	$ 9.746.105,00
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	60,00	$ 35.333,00	$ 2.119.980,00
1.2.26	DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	97,13	$ 18.057,00	$ 1.753.876,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,06	$ 26.177,00	$ 184.705,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,59	$ 13.915,00	$ 453.534,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1868,14	$ 29.021,00	$ 54.215.393,00
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1115,43	$ 22.614,00	$ 25.224.357,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	84,00	$ 5.029,00	$ 422.436,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	850,00	$ 7.165,00	$ 6.090.250,00
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	850,00	$ 21.075,00	$ 17.913.750,00
1.3.4	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	239,56	$ 119.052,00	$ 28.519.990,00
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN	63,66	$ 142.626,00	$ 9.080.270,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO GARCÉS NAVAS					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
1.3.9	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CIRCUITOS EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA DE TABLERO, ORGANIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, CAMBIO DE APARATOS.	UN	1,00	$ 384.601,00	$ 384.601,00
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	450,12	$ 13.278,00	$ 5.976.693,00
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	143,55	$ 4.165,00	$ 597.886,00
2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	100,00	$ 96.086,00	$ 9.608.600,00
3.1.10	MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M2	35,00	$ 130.394,00	$ 4.563.790,00
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	375,00	$ 9.719,00	$ 3.644.625,00
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	84,00	$ 51.975,00	$ 4.365.900,00
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UN	84,00	$ 22.790,00	$ 1.914.360,00
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	850,00	$ 38.953,00	$ 33.110.050,00
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	7,06	$ 687.543,00	$ 4.851.303,00
11.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	UN	17,00	$ 38.902,00	$ 661.334,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	375,00	$ 17.655,00	$ 6.620.625,00
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2110,260	$ 23.727,00	$ 50.070.139,00
16.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA METALICA PARA CERCHA METALICA	M	390,00	$ 29.446,00	$ 11.483.940,00
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	97,13	$ 46.399,00	$ 4.506.735,00
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	70,00	$ 63.242,00	$ 4.426.940,00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	219,15	$ 57.806,00	$ 12.667.896,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1868,14	$ 180.356,00	$ 336.930.889,00
17.1.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	1055,13	$ 96.953,00	$ 102.298.019,00
17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	13,00	$ 103.890,00	$ 1.350.570,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1868,14	$ 7.657,00	$ 14.304.375,00
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	1868,14	$ 6.297,00	$ 11.763.700,00
NP1	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE VIGA CANAL, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	219,15	$ 36.500,00	$ 7.998.792,50
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 5 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	32,59	$ 850.000,00	$ 27.704.220,00
VALOR TOTAL					**$ 817.530.628,50**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO GARCÉS NAVAS					
No.	Descripción	Und	Cantidad	V. Unit	V.Total
VALOR TOTAL					$ 817.530.628,50

Tabla 67. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Garcés Navas, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.19. Colegio República de Panamá, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
19	REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE A	A	REPÚBLICA DE PANAMÁ	Cl. 75 #55a-29	$ 440,541,748.00

Tabla 68. Presupuesto asignado Institución educativa República de Panamá, sede A
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.20. Colegio Juan del Corral, sede B

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
20	JUAN DEL CORRAL	B	JUAN DEL CORRAL	Cra. 68C#77-73, Bogotá	$

Tabla 69. Presupuesto asignado Institución educativa Juan del Corral, sede B
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.21. Colegio San José Norte, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
21	SAN JOSÉ NORTE	A	SAN JOSÉ NORTE	Cra. 84 #75a-09, Bogotá	$

Tabla 70. Presupuesto asignado Institución educativa San José Norte.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.22. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
22	JORGE ELIECER GAITÁN	C	JORGE ELIECER GAITÁN	Cl. 66a #54-40, Bogotá	$

Tabla 71. Presupuesto asignado Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede C.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.23. Colegio Villa Amalia, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
23	VILLA AMALIA	A	VILLA AMALIA	Cra. 110 #71a-10, Bogotá	$

Tabla 72. Presupuesto asignado Institución educativa Villa Amalia, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.24. Colegio Francisco Primero, sede B

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
24	FRANCISCO PRIMERO	B	FRANCISCO PRIMERO	Cra. 28b #65-80, Bogotá	$

Tabla 73. Presupuesto asignado Institución educativa Francisco Primero, sede B.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.25. Colegio Torquigua, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
25	TORQUIGUA	A	TORQUIGUA	Cl. 64 #128-50, Bogotá	$

Tabla 74. Presupuesto asignado Institución educativa Torquigua, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.26. Colegio Laureano Gómez, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
26	LAUREANO GÓMEZ	A	LAUREANO GÓMEZ	Cl 90A # 95A-56, Bogotá	$

Tabla 75. Presupuesto asignado Institución educativa Laureano Gómez, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.27. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
27	RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ	B	RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ	Cra. 54 #78-85	$


Tabla 76. Presupuesto asignado Institución educativa Rafael Bernal Jiménez, sede B.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

A continuación, se relaciona el control financiero del contrato de obra.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.		
Sub - total		$ 10.949.686.818,90
Administración obra	20,94%	$ 2.292.864.419,88
Imprevistos	1,50%	$ 164.245.302,28
Utilidad	5,00%	$ 547.484.340,95
IVA sobre utilidad	19,00%	$ 104.022.024,78
Valor total inversión		**$ 13.954.280.882,00**
Valor Adición No.1		**$ 5.370.000.000**
Valor Total de Contrato		**$ 19.324.280.882,00**

Tabla 77. Valores generales del contrato de obra.

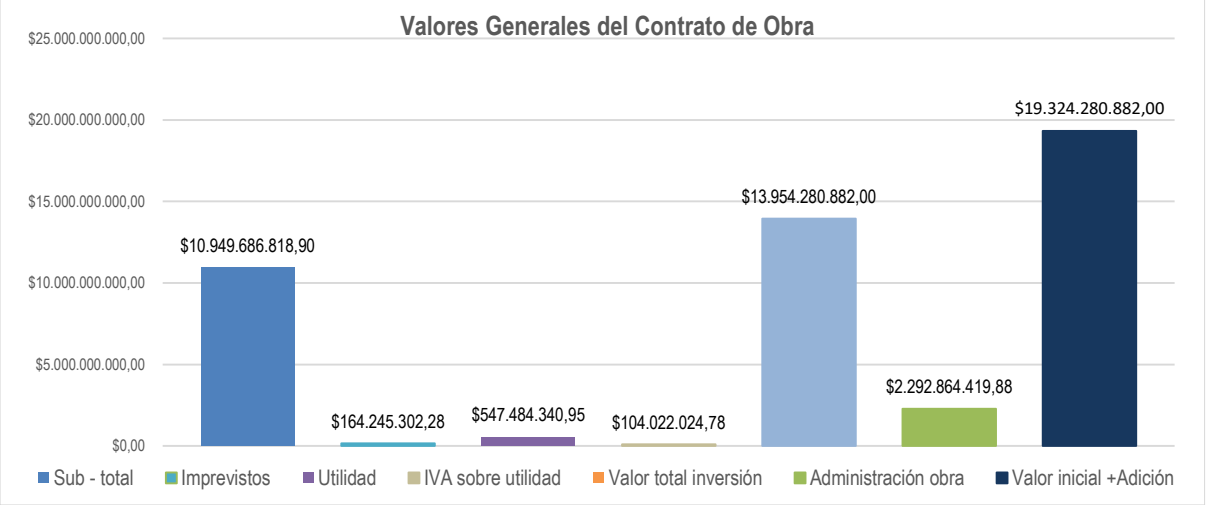


Gráfica 2. Valores generales del contrato de obra.

3.3.1.4. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

A la fecha de cierre del presente informe se tramitó el acta de recibo parcial de obra No.1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Descripción	Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	%	Valor con AIU
Acta parcial de obra No.1	2232	47437	0.84	$ 163,188,031.00
Acta parcial de obra No.2	2232	47437	1.14	$ 220,392,311.41
Acta parcial de obra No.3	2232	47437	2.74	$ 529.663.359,00
Acta parcial de obra No.4	2232	47437	2.61	$505.076.302,00
Acta parcial de obra No. 5	2232	47437	2,47	$477.830.100,00
Acta parcial de obra No. 6	2232	47437	10,62	$2.070.659.376,00
Valor Total			20,53	$3.966.809.478,70

Tabla 78. Actas de recibo parcial de contrato de obra.

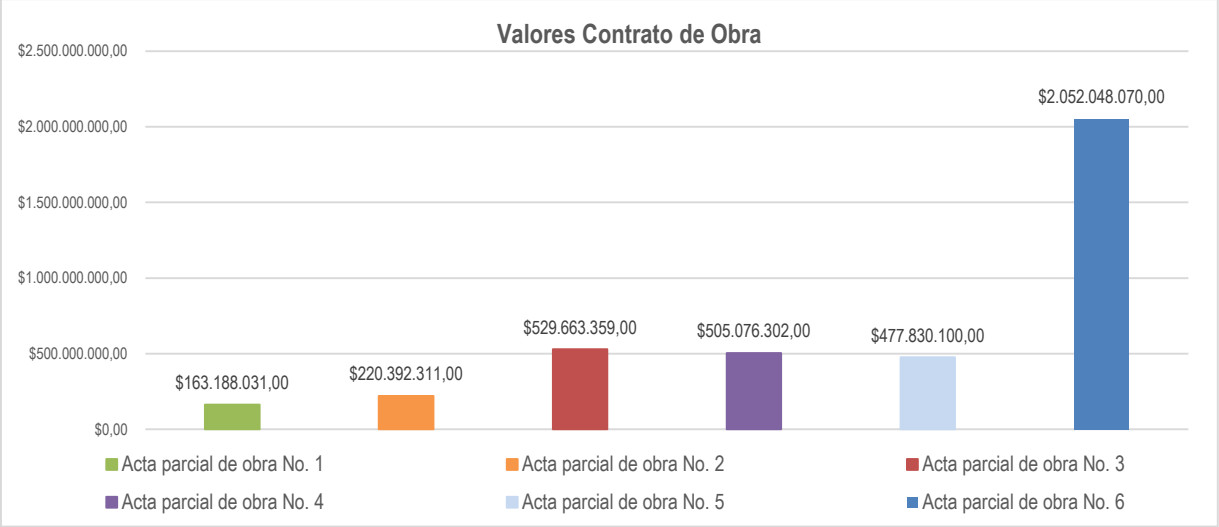

Gráfica 3. Actas parciales de obra.


3.3.1.5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

De acuerdo con la programación adoptada por SAFRID INGENIERÍA S.A.S., la interventoría realiza seguimiento de acuerdo a las actividades ejecutadas.

Periodo	Del	Al	% Programado	% Ejecutado
Semana 1	11 de enero de 2023	17 de enero de 2023	0,00%	0,00%
Semana 2	18 de enero de 2023	24 de enero de 2023	0,01%	0,07%
Semana 3	25 de enero de 2023	31 de enero de 2023	0,07%	0,30%
Semana 4	1 de febrero de 2023	7 de febrero de 2023	0,15%	0,51%
Semana 5	8 de febrero de 2023	14 de febrero de 2023	0,41%	0,75%
Semana 6	15 de febrero de 2023	21 de febrero de 2023	0,71%	1,42%
Semana 7	22 de febrero de 2023	28 de febrero de 2023	1,09%	1,58%
Semana 8	1 de marzo de 2023	7 de marzo de 2023	1,51%	1,87%
Semana 9	8 de marzo de 2023	14 de marzo de 2023	2,32%	2,34%
Semana 10	15 de marzo de 2023	21 de marzo de 2023	3,47%	2,64%
Semana 11	22 de marzo de 2023	28 de marzo de 2023	4,56%	2,99%
Semana 12	29 de marzo de 2023	4 de abril de 2023	5,69%	3,53%
Semana 13	5 de abril de 2023	11 de abril de 2023	6,92%	6,28%
Semana 14	12 de abril de 2023	18 de abril de 2023	8,42%	7,54%
Semana 15	19 de abril de 2023	25 de abril de 2023	9,80%	9,27%
Semana 16	26 de abril de 2023	2 de mayo de 2023	11,15%	10,34%
Semana 17	3 de mayo de 2023	9 de mayo de 2023	12,70%	11,12%
Semana 18	10 de mayo de 2023	16 de mayo de 2023	14,31%	12,46%
Semana 19	17 de mayo de 2023	23 de mayo de 2023	16,12%	13,45%
Semana 20	24 de mayo de 2023	30 de mayo de 2023	17,90%	15,27%
Semana 21	31 de mayo de 2023	6 de junio de 2023	19,64%	16,04%
Semana 22	7 de junio de 2023	13 de junio de 2023	21,32%	17,35%
Semana 23	14 de junio de 2023	20 de junio de 2023	22,93%	18,42%

Periodo	Del	Al	% Programado	% Ejecutado
Semana 24	21 de junio de 2023	27 de junio de 2023	24,65%	19,68%
Semana 25	28 de junio de 2023	04 de julio de 2023	26,48%	21,74%
Semana 26	05 de julio de 2023	11 de julio de 2023	28,40%	22,33%
Semana 27	12 de julio de 2023	18 de julio de 2023	30,60%	23,62%
Semana 28	19 de julio de 2023	25 de julio de 2023	32,90%	24,77%
Semana 29	26 de julio de 2023	01 de agosto de 2023	35,49%	26,92%
Semana 30	02 de agosto de 2023	08 de agosto de 2023	38,31%	27,51%
Semana 31	09 de agosto de 2023	15 de agosto de 2023	41,00%	28,77%
Semana 32	16 de agosto de 2023	22 de agosto de 2023	43,23%	30,80%
Semana 33	23 de agosto de 2023	29 de agosto de 2023	45,43%	31,39%
Semana 34	30 de agosto de 2023	05 de septiembre de 2023	47,83%	31,91%
Semana 35	06 de septiembre de 2023	12 de septiembre de 2023	50,89%	34,15%

Tabla 79. Tabla de valores programados y ejecutados del contrato de obra.

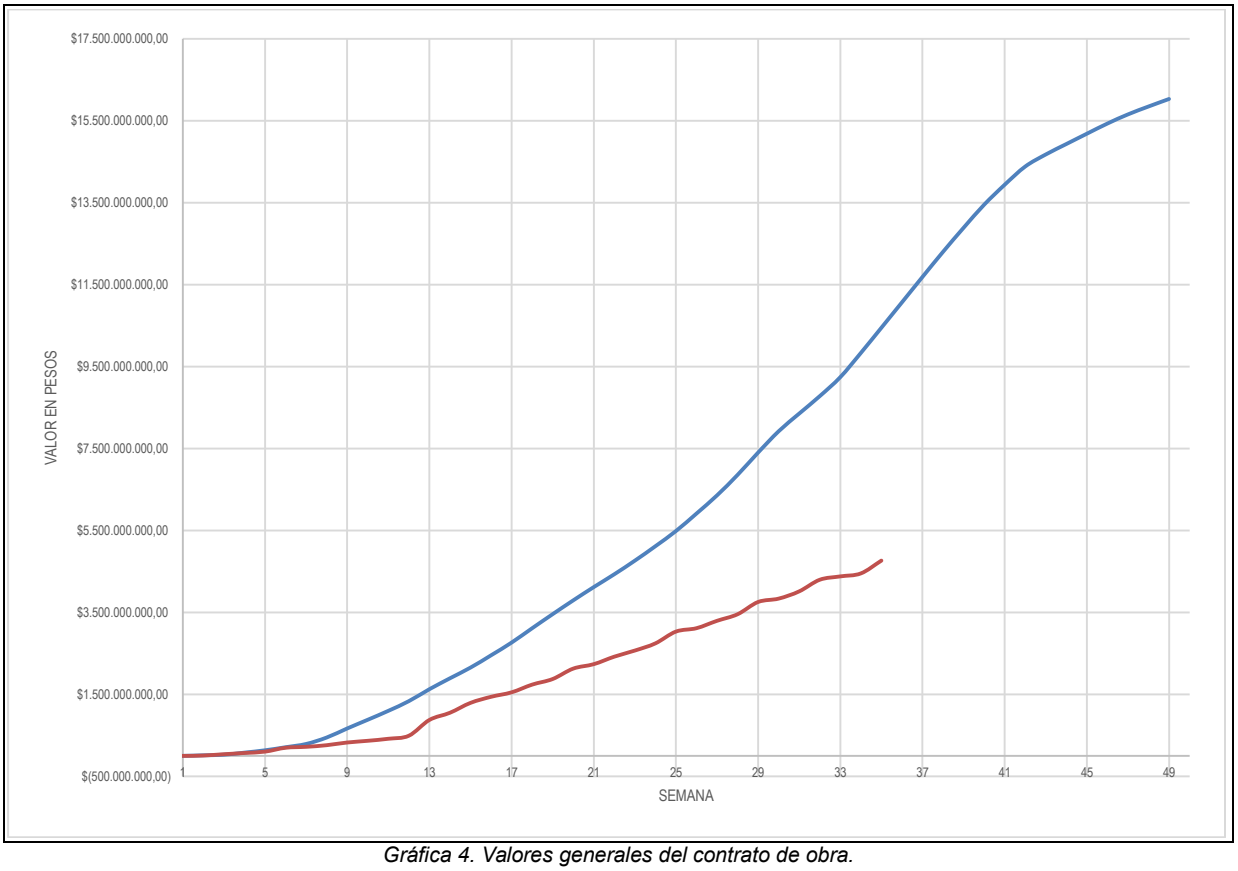

Gráfica 4. Valores generales del contrato de obra.


3.3.2. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

A continuación, se relaciona el control financiero del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

3.3.2.1. VALORES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

Descripción	Valor Inicial
Costo directo	$ 799.276.737,00
I.V.A. (19%)	$ 151.862.580,00
Valor inicial total inversión	**$ 951.139.317,00**
Valor adición No. 1	**$310.122.937,00**
Valor total contrato (incluye IVA)	**$1.261.261.675**

Tabla 80. Valores del contrato de interventoría.

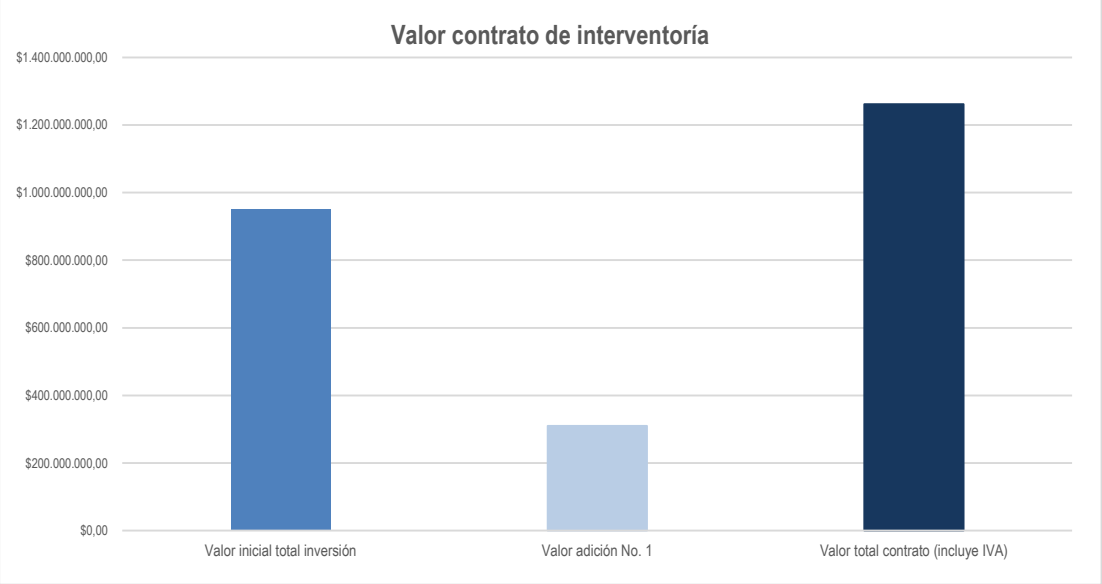

Gráfica 5. Valor del contrato de interventoría.


3.3.2.2. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

A la fecha de cierre del presente informe se tramito el acta de recibo parcial de obra No.1, 2, 3,4, 5 y 6.

Descripción	Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	% Avance	Valor con AIU

Acta parcial de interventoría No.1	2409	5440	0.88	$ 11.128.323,00
Acta parcial de interventoría No.2	2409	5440	1.19	$ 15.027.992,00
Acta parcial de interventoría No.3	2409	5440	2.07	$ 26.061.201,00
Acta parcial de interventoría No.4	2409	5440	2.61	$ 44.418.179,00
Acta parcial de interventoría No.5	2409	5440	2.19	$ 27.631.954,00
Acta parcial de interventoría No.6	2409	5440	10.86	$136.973.018,00
Valor Total			20.71	$ 261.240.667,00

Tabla 81. Actas de recibo parcial de contrato de interventoría.

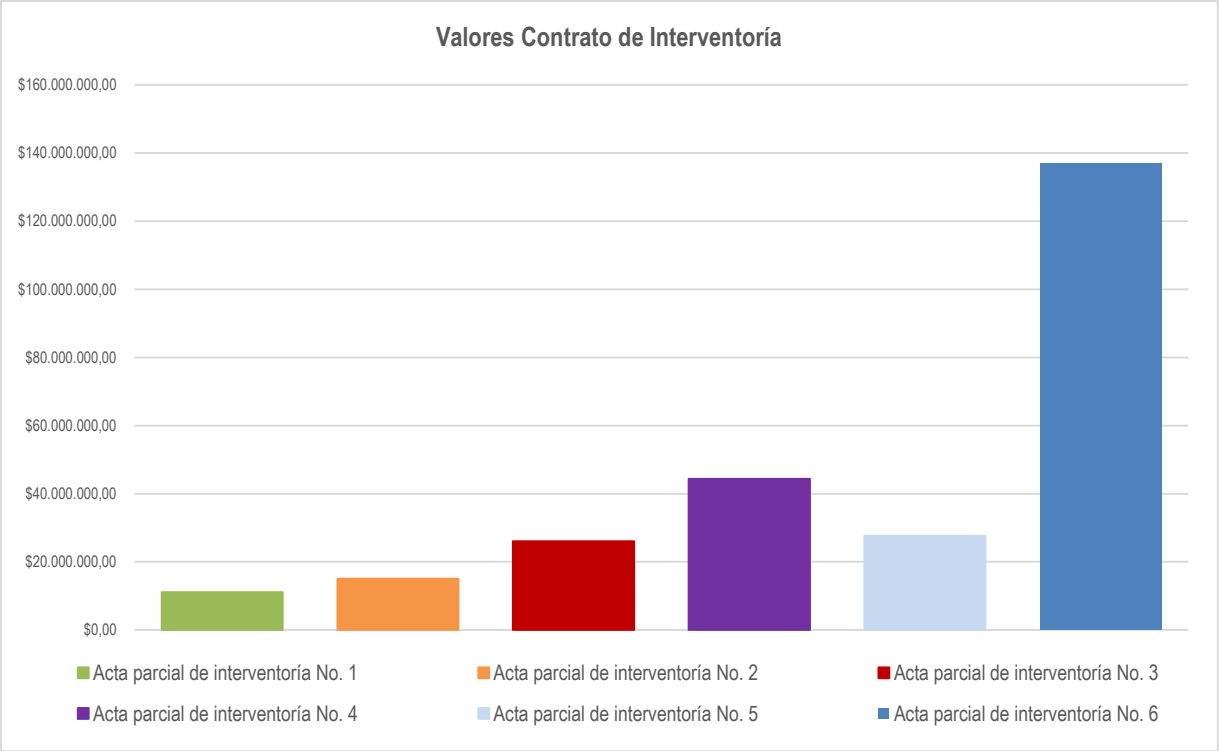

Gráfica 6. Actas parciales de interventoría.

3.4. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

En Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2022, se firma acta de inicio entre Arq. Luis Antonio Pinzón Parra, director de construcción y conservación de Establecimientos educativos en calidad de Supervisor y Jorge Gómez Falla en calidad de representante legal del Consorcio Inter Colegios 2022.

En Bogotá, a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se firma acta de inicio entre Jorge Gómez Falla, en calidad de Representante de Consorcio Intercolegios 2022, como Interventor, y Miguel Alexander Cerón Molina, en calidad de representante legal de Safrid Ingeniería S.A.S., como Contratista, para suscribir el acta de inicio del contrato de obra.

3.4.1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

Obligaciones	Cumplimiento
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	
1. Obligaciones previas para la suscripción del contrato	Cumplido.
2. Obligaciones relacionadas con medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio generada por enfermedades contagiosas reguladas por emergencias sanitarias.	En proceso.
3. Obligaciones conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 332 de 2020	En proceso.
4. Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental	En proceso.
5. Obligaciones administrativas	En proceso.
6. Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra.	En proceso.
7. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción.	En proceso.
8. Obligaciones relacionadas con la demolición de elementos no estructurales. (Cuando a ello hubiere lugar)	En proceso.
9. Obligaciones relacionadas con la ejecución de obras y protocolo de atención de emergencias.	En proceso.
10. Obligaciones en Materia de Servicios Públicos.	En proceso.
11. Obligaciones de información.	En proceso.
12. Obligaciones en materia de documentos para la terminación y liquidación del contrato.	En proceso.
13. Obligaciones especiales.	En proceso.
14. Obligaciones en materia de participación comunitaria y divulgación.	En proceso.
15. Obligaciones de trámites y permisos	En proceso.
16. Obligaciones posteriores a la entrega de la obra y liquidación del contrato.	En proceso.
17. Obligaciones en Materia de Infraestructura del Contratista	En proceso.

Tabla 82. Control de cumplimiento del contrato de obra.

3.4.2. CORRESPONDENCIA

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_039	24 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES CRONOGRAMA, PRESUPUESTO E INFORMES DE DIAGNÓSTICO.
CIC_BTA_SED_050_2022_040	24 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
CIC_BTA_SED_050_2022_041	24 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 023-GP2-SED-2022 "REMISION DE DOCUMENTOS PERSONAL OPERATIVO SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS"
CIC_BTA_SED_050_2022_043	25 de enero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	REMISIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO INTEGRAL No. 1 Y 2
CIC_BTA_SED_050_2022_044	26 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACION DE LIBRO DE BITÁCORA DE OBRA

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_045	31 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL
CIC_BTA_SED_050_2022_046	31 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APROBACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN RCD
CIC_BTA_SED_050_2022_047	31 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN SOLICITUD ADICACIÓN DE COMUNICADOS EN FÍSICO Y LINEAMIENTOS GENERALES.
CIC_BTA_SED_050_2022_048	31 de enero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD APERTURA PIN AMBIENTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_049	01 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ALCANCE COMUNICADO CIC_BTA_SED_050_2022_048 SOLICITUD APERTURA PIN AMBIENTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_050	01 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 034-GP2-SED-2022 "REMISIÓN DE DOCUMENTOS PERSONAL OPERATIVO SEDE JORGE ELIECER GAITAN"
CIC_BTA_SED_050_2022_051	01 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 032-GP2-SED-2022 "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE COLEGIO NYDIA QUINTERO"
CIC_BTA_SED_050_2022_052	2 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 035-GP2-SED-2022 "REMISIÓN DE DOCUMENTOS PERSONAL OPERATIVO SEDE JORGE ELIECER Y FLORIDABLANCA "
CIC_BTA_SED_050_2022_053	3 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	REMISIÓN ACTA PARCIAL DE ENTREGA FISICA DE OBRA COLEGIO MORISCO IED.
CIC_BTA_SED_050_2022_054	3 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA A COMUNICADOS No. 031-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – CUARTO BOMBAS COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA SEDE A" Y No. 033-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – PROPUESTA ESCALERA DE GATO COLEGIO NYDIA QUINTERO."
CIC_BTA_SED_050_2022_055	6 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD REMISIÓN FORMATO AUTORIZACIÓN DE CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES POR DELISTOS SEXUALES LEY 1918 DEL 2018.
CIC_BTA_SED_050_2022_056	6 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORÍA.
CIC_BTA_SED_050_2022_057	6 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APERTURA DE PIN AMBIENTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_058	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 039-GP2-SED-2022 Y OFICIO No. 042-GP2-SED-2022 INGRESOS DE PERSONAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_059	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	LINEAMINETOS PARA EL RECIBO COMUNICADOS REMITIDOS A CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_060	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REUNIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE SAFRID INGENIERA SAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_061	8 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DOCUMENTOS EJECUCIÓN DE OBRA

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_062	8 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD CUMPLIMIENTO ENTREGA DOCUMENTACION DE INGRESO Y PARAFISCALES PERSONAL NUEVO – ENTREGA DE DOTACIÓN PERSONAL OPERATIVO.
CIC_BTA_SED_050_2022_063	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO DE LISTADO DE PERSONAL AUTORIZADO CONTRATISTA DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_064	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA AL COMUNICADO No. 049-GP2-SED-2022 - OBSERVACIONES A LOS INFORMES DIAGNÓSTICOS
CIC_BTA_SED_050_2022_065	13 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO COMUNICADOS No. 044-GP2-SED-2022 055-GP2-SED-2022 SOLICITUD PLANOS ARQUITECTONICOS COLEGIOS Y AULAS MODULARES.
CIC_BTA_SED_050_2022_066	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 051-GP2-SED-2022 REUNIÓN ESPECIALISTAS ESTRUCTURALES
CIC_BTA_SED_050_2022_067	14 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 1.
CIC_BTA_SED_050_2022_068	14 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 048-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES.
CIC_BTA_SED_050_2022_069	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 047-GP2-SED-2022 APROBACIÓN BOBCAT Y OPERARIO.
CIC_BTA_SED_050_2022_070	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 052-GP2-SED-2022 RADICACIÓN CONCEPTO ESTRUCTURALES.
CIC_BTA_SED_050_2022_071	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 059-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES
CIC_BTA_SED_050_2022_072	17 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 060-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR
CIC_BTA_SED_050_2022_073	17 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 053-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL E INFORME MENSUAL SST
CIC_BTA_SED_050_2022_074	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No.017-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENVÍO ACTAS DE VECINDAD"
CIC_BTA_SED_050_2022_075	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADOS No. 063-GP2-SED-2022, No. 055-GP2-SED-2022 y No. 054-GP2-SED-2022, DISEÑOS AULAS MODULARES Y PLANOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_076	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN COMUNICADO CIC_BTA_SED_050_2022_076 ENTREGA DE INFORME MENSUAL 1.
CIC_BTA_SED_050_2022_077	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 064-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRABAJO NOCTURNO GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_078	21 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO OFICIO No. 049-GP2-SED-2022 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_079	21 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA DE INFORME DIAGNÓSTICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_080	21 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No.001 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_051	01 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 032-GP2-SED-2022 "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE COLEGIO NYDIA QUINTERO"
CIC_BTA_SED_050_2022_052	2 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 035-GP2-SED-2022 "REMISIÓN DE DOCUMENTOS PERSONAL OPERATIVO SEDE JORGE ELIECER Y FLORIDABLANCA "
CIC_BTA_SED_050_2022_053	3 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	REMISIÓN ACTA PARCIAL DE ENTREGA FISICA DE OBRA COLEGIO MORISCO IED.
CIC_BTA_SED_050_2022_054	3 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA A COMUNICADOS No. 031-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – CUARTO BOMBAS COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA SEDE A" Y No. 033-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – PROPUESTA ESCALERA DE GATO COLEGIO NYDIA QUINTERO."
CIC_BTA_SED_050_2022_055	6 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. C.	SOLICITUD REMISIÓN FORMATO AUTORIZACIÓN DE CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES POR DELISTOS SEXUALES LEY 1918 DEL 2018.
CIC_BTA_SED_050_2022_056	6 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORÍA.
CIC_BTA_SED_050_2022_057	6 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APERTURA DE PIN AMBIENTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_058	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 039-GP2-SED-2022 Y OFICIO No. 042-GP2-SED-2022 INGRESOS DE PERSONAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_059	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	LINEAMINETOS PARA EL RECIBO COMUNICADOS REMITIDOS A CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_060	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REUNIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE SAFRID INGENIERA SAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_061	8 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DOCUMENTOS EJECUCIÓN DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_062	8 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD CUMPLIMIENTO ENTREGA DOCUMENTACION DE INGRESO Y PARAFISCALES PERSONAL NUEVO – ENTREGA DE DOTACIÓN PERSONAL OPERATIVO.
CIC_BTA_SED_050_2022_063	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO DE LISTADO DE PERSONAL AUTORIZADO CONTRATISTA DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_064	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA AL COMUNICADO No. 049-GP2-SED-2022 - OBSERVACIONES A LOS INFORMES DIAGNÓSTICOS
CIC_BTA_SED_050_2022_065	13 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO COMUNICADOS No. 044-GP2-SED-2022 055-GP2-SED-2022 SOLICITUD PLANOS ARQUITECTONICOS COLEGIOS Y AULAS MODULARES.
CIC_BTA_SED_050_2022_066	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 051-GP2-SED-2022 REUNIÓN ESPECIALISTAS ESTRUCTURALES
CIC_BTA_SED_050_2022_067	14 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 1.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_068	14 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 048-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES.
CIC_BTA_SED_050_2022_069	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 047-GP2-SED-2022 APROBACIÓN BOBCAT Y OPERARIO.
CIC_BTA_SED_050_2022_070	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 052-GP2-SED-2022 RADICACIÓN CONCEPTO ESTRUCTURALES.
CIC_BTA_SED_050_2022_071	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 059-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES
CIC_BTA_SED_050_2022_072	17 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 060-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR
CIC_BTA_SED_050_2022_073	17 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 053-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL E INFORME MENSUAL SST
CIC_BTA_SED_050_2022_074	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No.017-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENVÍO ACTAS DE VECINDAD"
CIC_BTA_SED_050_2022_075	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADOS No. 063-GP2-SED-2022, No. 055-GP2-SED-2022 y No. 054-GP2-SED-2022, DISEÑOS AULAS MODULARES Y PLANOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_076	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN COMUNICADO CIC_BTA_SED_050_2022_076 ENTREGA DE INFORME MENSUAL 1.
CIC_BTA_SED_050_2022_077	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 064-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRABAJO NOCTURNO GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_078	21 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO OFICIO No. 049-GP2-SED-2022 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_079	21 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	ENTREGA DE INFORME DIAGNÓSTICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_080	21 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No.001 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_081	22 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD DE VISITA DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_082	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 067-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR
CIC_BTA_SED_050_2022_083	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACORDE A DIRECTIRCES DETERMINADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
CIC_BTA_SED_050_2022_084	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL DE OBRA.
CIC_BTA_SED_050_2022_085	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	TRASLADO MEMORANDO FECHAS DE RADICACION Y PROGRAMACION PAC 2023 CUENTAS DCCEE.
CIC_BTA_SED_050_2022_086	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 066-GP2-SED-2022 - ENTREGA INFORME RECOMENDACIONES JORGE ELIECER GAITAN SEDE A

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_087	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO OFICIO No. 069-GP2-SED-2022 - CITACIÓN MESA DE TRABAJO.
CIC_BTA_SED_050_2022_088	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO INTEGRAL No.6
CIC_BTA_SED_050_2022_089	23 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 070-GP2-SED-2022 - TRABAJO NOCTURNO GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_090	23 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 071-GP2-SED-2022 - APROBACIÓN DE PERSONAL IED VICTOR CHARRY, BERNAL JIMENEZ Y JUAN DEL CORRAL
CIC_BTA_SED_050_2022_091	23 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 072-GP2-SED-2022 - PERSONAL CONTRATISTA COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ
CIC_BTA_SED_050_2022_092	23 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN DE ENTREGA DE DESGLOSE AIU Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES
CIC_BTA_SED_050_2022_093	24 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO ACTUALIZACIÓN BALANCE PRESUPUESTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_094	24 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 075-GP2-SED-2022 - APROBACIÓN ANDAMIO ESCALERA PARA ACCESO IED JUAN DEL CORRAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_095	24 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 076-GP2-SED-2022 - APROBACIÓN PERSONAL
CIC_BTA_SED_050_2022_096	24 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 077-GP2-SED-2022 - APROBACIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL
CIC_BTA_SED_050_2022_097	24 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORMES SEMANALES
CIC_BTA_SED_050_2022_098	27 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 065-GP2-SED-2022 - RADICADO – DIAGNOSTICOS ESTRUCTURALES, PLAN LOCAL, ESPECIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y MEMORIAS DE LAS CORREAS
CIC_BTA_SED_050_2022_099	27 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 078-GP2-SED-2022 - NO AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES FINES DE SEMANA
CIC_BTA_SED_050_2022_100	27 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES
CIC_BTA_SED_050_2022_101	28 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APROBACIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL PARA IED RAFAEL BERNAL Y MIGUEL ANTONIO CARO
CIC_BTA_SED_050_2022_102	01 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD PENDIENTES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_103	01 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES
CIC_BTA_SED_050_2022_104	01 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN INFORME SEMANAL No.7
CIC_BTA_SED_050_2022_105	01 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APROBACIÓN INFORME NO. 1 DE SST Y AMBIENTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_106	2 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 082-GP2-SED-2022 RADICADO CÁLCULO DE PLACAS FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS SEDE A

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_107	2 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO COMUNICADO No. 085-GP2-SED-2022 - SOLICITUD AUTORIZACION APLICACIÓN DE COLOR AMARILLO REAL ESTRUCTURA CUBIERTA
CIC_BTA_SED_050_2022_108	3 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 087-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR IED JUAN DEL CORRAL
CIC_BTA_SED_050_2022_109	3 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DIRECTOR DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_110	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 093-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES
CIC_BTA_SED_050_2022_111	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 080-GP2-SED-2022 ELEMENTOS QUE FUERON DADOS DE BAJA
CIC_BTA_SED_050_2022_112	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. OFICIO No. 090-GP2-SED-2022 CONCEPTOS GEOTÉCNICOS FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, JORGE ELIECER GAITÁN Y FLORIDA BLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_113	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN COMUNICADO CIC_BTA_SED_050_2022_078 OBSERVACIONES PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_114	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 083-GP2-SED-2022 - ENTREGA CORTE DE OBRA No. 001 CON SUS CORRESPONDIENTES CORRECCIONES
CIC_BTA_SED_050_2022_115	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	ENTREGA Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS DESMONTADOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_116	8 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 097-GP2-SED-2022 NO AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE OPERADOR Y RETROEXCAVADORA SEDE FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_117	9 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.1
CIC_BTA_SED_050_2022_118	9 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 094-GP2-SED-2022 - RADICADO CONCEPTOS ESTRUCTURALES #2
CIC_BTA_SED_050_2022_119	9 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 095-GP2-SED-2022 RADICADO DIAGNOSTICOS Y RECOMENDACIONES COLEGIOS FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, JORGE ELIECER GAITÁN Y FLORIDA BLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_120	9 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.8
CIC_BTA_SED_050_2022_121	9 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD DE ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_122	9 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD DE ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_123	10 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S	RESPUESTA COMUNICADO No. 102-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED MIGUEL ANTONIO CARO, GARCES NAVAS Y SIMÓN BOLIVAR SEDE A.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_124	13 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 104-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED SAN JOSE NORTE
CIC_BTA_SED_050_2022_125	13 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 105-GP2-SED-2022 NO AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE EXCAVADORA Y OPERARIO IED FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_126	13 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES INGRESO DE PERSONAL
CIC_BTA_SED_050_2022_127	14 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 88-GP2-SED-2022 DISCRIMINACIÓN AIU.
CIC_BTA_SED_050_2022_128	15 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 89-GP2-SED-2022 AJUSTE A CALCULOS ESTRUCTURALES FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_129	15 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 088-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES DISCRIMINACIÓN A.I.U.
CIC_BTA_SED_050_2022_130	15 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 106-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST 2
CIC_BTA_SED_050_2022_131	16 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 113-114-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INGRESO PERSONAL Y MAQUINARIA
CIC_BTA_SED_050_2022_132	16 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 110-GP2-SED-2022 RADICADO CONCEPTO ESTRUCTURAL COLEGIO SAN JOSÉ NORTE.
CIC_BTA_SED_050_2022_133	16 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 100-GP2-SED-2022 RADICADO ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ.
CIC_BTA_SED_050_2022_134	17 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 107-GP2-SED-2022 RADICADO FICHA TÉCNICA DE TEJA Y PERFILERÍA.
CIC_BTA_SED_050_2022_135	17 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 099-116-GP2-SED-2022 DOCUMENTACIÓN TALA ÁRBOLES COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CIC_BTA_SED_050_2022_136	17 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 118-GP2-SED-2022 OPERARIO EXCAVADORA FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_137	17 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN HOJA DE VIDA CAMBIO ASESOR AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_138	21 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL 2
CIC_BTA_SED_050_2022_139	21 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	BALANCE GENERAL DE CONTRATO, CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE FORMA DE PAGO.
CIC_BTA_SED_050_2022_140	21 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 115-GP2-SED-2022 RADICADO DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_141	22 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REPROGRAMACIÓN REUNIÓN COMPONENTE ELÉCTRICO SOLICITADO POR SAFRID INGENIERÍA SAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_142	22 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 122-GP2-SED-2022 AUTORIZACIÓN TRABAJO NOCTURNO GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_143	23 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	DATOS DE INGRESO AL "WEBFILE SDA" CARGUE DE RCD DE OBRA

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_144	23 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 125-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR A LA IED GARCES NAVAS Y IED SIMON BOLIVAR.
CIC_BTA_SED_050_2022_145	23 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_146	23 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 120-GP2-SED-2022 RESPUESTA A OFICIO CIC_BTA_SED_050_2022_128 CÁLCULOS
CIC_BTA_SED_050_2022_147	24 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	APROBACIÓN ÍTEM NO PREVISTOS EMERGENCIAS EDUCATIVAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_148	24 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO ENTREGA DE ACTA PARCIAL No. 1
CIC_BTA_SED_050_2022_149	24 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.10
CIC_BTA_SED_050_2022_150	27 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_151	28 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APROBACIÓN INFORME NO. 2 DE SST
CIC_BTA_SED_050_2022_152	28 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S..	RESPUESTA COMUNICADO No. 128-GP2-SED-2022 APROBACIÓN TRABAJO NOCTURNO
CIC_BTA_SED_050_2022_153	28 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 131-GP2-SED-2022 APROBACIÓN TRABAJADOR IED GARCÉS NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_154	28 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 2 CONTRATO DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_155	28 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_156	29 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO DE PENDIENTES
CIC_BTA_SED_050_2022_157	29 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.11
CIC_BTA_SED_050_2022_158	30 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 132 Y 133-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES IED GARCES NAVAS Y FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CIC_BTA_SED_050_2022_159	31 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	CRONOGRAMA REVISIÓN BALANCE PRESUPUESTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_160	03 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APREMIO INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO No.11
CIC_BTA_SED_050_2022_161	04 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 136-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES IED FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y JORGE ELIECER

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_162	05 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD Y REITERACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No.1 Y NO. 2 CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_163	05 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME MENSUAL No.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_164	05 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.12
CIC_BTA_SED_050_2022_165	10 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 142-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES IED FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_166	05 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No.1 CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_167	11 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 144-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INFORME 2 AMBIENTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_168	11 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	NO CONFORMIDADES EN EJECUCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_169	12 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 146-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INFORME SST Y AMBIENTAL NO. 3
CIC_BTA_SED_050_2022_170	13 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 147-148-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES IED FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y JUAN DEL CORRAL
CIC_BTA_SED_050_2022_171	14 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	TRASLADO OBSERVACIONES ACTA PARCIAL 1 CO 4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_172	14 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	INFORME SEMANAL 13
CIC_BTA_SED_050_2022_173	18 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	NO CONFORMIDADES EN EJECUCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_174	19 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 154-155-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES
CIC_BTA_SED_050_2022_175	19 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES INFORME 3 SSTA
CIC_BTA_SED_050_2022_176	20 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO DE SOLICITUD: RETIRO DE EQUIPOS ESPECIALES.
CIC_BTA_SED_050_2022_177	20 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	TRASLADO DE SOLICITUD: RETIRO DE EQUIPOS ESPECIALES.
CIC_BTA_SED_050_2022_178	20 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO DE DISEÑO DE VENTANERÍA EN PERFILERÍA METÁLICA EN ALUMINIO DEL COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN
CIC_BTA_SED_050_2022_179	20 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES Y/O APROBACIÓN HOJAS DE VIDA.
CIC_BTA_SED_050_2022_180	21 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD INVESTIGACIÓN TRABAJADOR DE LA I.E.D. GARCÉS NAVAS POR PRESUNTO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_181	21 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No.2 CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_182	23 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	CAMBIO HOJA DE VIDA TECNÓLOGO SST 2
CIC_BTA_SED_050_2022_183	24 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 160-161-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES
CIC_BTA_SED_050_2022_184	24 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.14
CIC_BTA_SED_050_2022_185	26 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 162-GP2-SED "RESPUESTA OFICIO CIC_BTA_SED_050_2022_179 SUBSANE DOCUMENTACIÓN."
CIC_BTA_SED_050_2022_186	26 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	CAMBIO HOJA DE VIDA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL CONTRATISTA DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_187	27 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 170-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES
CIC_BTA_SED_050_2022_188	28 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 172-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES
CIC_BTA_SED_050_2022_189	28 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL NO.3
CIC_BTA_SED_050_2022_190	28 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 3 CONTRATO DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_191	28 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_192	02 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 176-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR
CIC_BTA_SED_050_2022_193	02 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES MANEJO DE RCD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_194	02 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.15
CIC_BTA_SED_050_2022_195	03 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.16
CIC_BTA_SED_050_2022_196	04 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	INFORME AFECTACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_197	5 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 169-GP2-SED-2022"RADICADO CONCEPTO AULA MULTIPLE Y LABORATORIOS (COLEGIO SAN JOSE NORTE)"
CIC_BTA_SED_050_2022_198	5 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD DE CAMBIO DE FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_199	9 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 183-GP2-SED-2022 NO APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_200	9 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES MANEJO DE RCD
CIC_BTA_SED_050_2022_201	9 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS SST
CIC_BTA_SED_050_2022_202	9 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 182-GP2-SED-2022 AUTORIZACIÓN DE LA REINSTALACIÓN ENCERRAMIENTO DE POLISOMBRA PARA LOS SIGUIENTES FRENTES DE OBRA MIGUEL ANTONIO CARO, FRANCISCO JOSE DE CALDAS, FLORIDABLANCA SEDE B.
CIC_BTA_SED_050_2022_205	10 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	RESPUESTA A SOLICITUD ESTADO DE CERRAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES COLEGIO GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_206	10 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	APROBACIÓN ÍTEM NO PREVISTOS EMERGENCIAS EDUCATIVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_207	11 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES OBRAS REALIZADAS IED MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A.
CIC_BTA_SED_050_2022_208	11 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	RESPUESTA COMUNICADO No. 191-GP2-SED-2022 "RADICADO DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS"
CIC_BTA_SED_050_2022_209	11 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 156-GP2-SED-2022 "RADICADO CONCEPTO AULA MÚLTIPLE (COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ)".
CIC_BTA_SED_050_2022_210	11 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 169-GP2-SED-2022 "RADICADO CONCEPTO AULA MÚLTIPLE Y LABORATORIOS (COLEGIO SAN JOSÉ NORTE)".
CIC_BTA_SED_050_2022_211	11 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 168-GP2-SED-2022 "RADICADO DISEÑO COLUMNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN".
CIC_BTA_SED_050_2022_212	11 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 178-GP2-SED-2022 "NIVELES AULA MÚLTIPLE COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ".
CIC_BTA_SED_050_2022_213	12 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 192-GP2-SED-2022 AUTORIZACIÓN DE TRABAJADORES PARA ACTIVIDADES EN ALTURAS EN LA IED FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CIC_BTA_SED_050_2022_214	12 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME MENSUAL No.3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_215	12 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S..	REQUERIMIENTO DE APUNTALAMIENTO DE COLUMNAS IED SAN JOSÉ NORTE SEDE A.
CIC_BTA_SED_050_2022_216	15 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 193-194-196 OBSERVACIONES INGRESO DE PERSONAL GARCÉS NAVAS Y RAFAEL BERNAL
CIC_BTA_SED_050_2022_217	15 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 181-195 AUTORIZACIÓN DE INFORME SSTA NO. 3
CIC_BTA_SED_050_2022_218	16 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 199 AUTORIZACIÓN INGRESO DE PERSONAL

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_219	17 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 201- 202 AUTORIZACIÓN INGRESO DE PERSONAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, GARCÉS NAVAS Y JORGE ELIECER GAITÁN
CIC_BTA_SED_050_2022_220	17 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	ENTREGA INFORME MENSUAL SSTA No.4
CIC_BTA_SED_050_2022_221	17 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES MANEJO DE RCD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN JOSÉ NORTE Y JORGE ELIECER GAITÁN
CIC_BTA_SED_050_2022_222	17 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 204-GP2-SED-2022 APROBACIÓN MINI CARGADOR BOBCAT Y OPERADOR.
CIC_BTA_SED_050_2022_223	18 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	ENTREGA CORTE PARCIAL DE OBRA No.4
CIC_BTA_SED_050_2022_224	19 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 206-207-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL RAFAEL BERNAL SEDE B Y JORGE ELIECER GAITAN
CIC_BTA_SED_050_2022_225	23 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 205-208-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INFORME SSTA 4
CIC_BTA_SED_050_2022_226	23 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 200-GP2-SED-2022 - RADICADO DISEÑO COLUMNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN.
CIC_BTA_SED_050_2022_227	23 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 165-GP2-SED-2022 VALIDACIÓN DESAGÜES DE AGUAS LLUVIAS COLEGIOS JORGE ELIECER GAITÁN Y GARCÉS NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_228	25 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR SAFRID INGENIERÍA S.A.S.
CIC_BTA_SED_050_2022_229	31 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 200-GP2-SED-2022 - RADICADO DISEÑO COLUMNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN.
CIC_BTA_SED_050_2022_230	30 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 216-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL SAN JOSÉ NORTE
CIC_BTA_SED_050_2022_231	30 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES INFORME 4 SSTA
CIC_BTA_SED_050_2022_232	31 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 219-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED RAFAEL BERNAL
CIC_BTA_SED_050_2022_233	31 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.17
CIC_BTA_SED_050_2022_234	31 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.18
CIC_BTA_SED_050_2022_235	31 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.19
CIC_BTA_SED_050_2022_236	31 de mayo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.20

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_237	31 de mayo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 215-GP2-SED-2022 - RADICADO DISEÑO COLUMNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN.
CIC_BTA_SED_050_2022_238	01 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 222-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CIC_BTA_SED_050_2022_239	01 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 170-GP2-SED-2022 RADICADO MEJORAMIENTO PROYECTO ELÉCTRICO COLEGIOS FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, FRANCISCO PRIMERO.
CIC_BTA_SED_050_2022_240	05 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 224-225-226-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ
CIC_BTA_SED_050_2022_241	05 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 228-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL DE EMERGENCIA IED BOLIVIA SEDE B, IED MORISCO, IED ANTONIO NARIÑO E IED NACIONES UNIDAS
CIC_BTA_SED_050_2022_242	06 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME 4 SST
CIC_BTA_SED_050_2022_243	07 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN AJUSTE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No.1 A No.19 CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_244	07 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 230-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED JUAN DEL CORRAL
CIC_BTA_SED_050_2022_245	07 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 218-GP2-SED-2022 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS ASBESTO – FIBRO CEMENTO, MANTO ASFÁLTICO Y DRYWALL
CIC_BTA_SED_050_2022_246	08 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD ACLARACIÓN POR QUEJA EN EL GARCÉS NAVAS Y MEDIDAS A IMPLEMENTAR.
CIC_BTA_SED_050_2022_247	08 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 232-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED JUAN DEL CORRAL
CIC_BTA_SED_050_2022_248	08 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 233-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED JORGE ELIECER GAITÁN
CIC_BTA_SED_050_2022_249	13 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 213-GP2-SED-2022 CONCEPTO AULA MÚLTIPLE (COLEGIOS RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ)
CIC_BTA_SED_050_2022_250	13 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 214-GP2-SED-2022 "DISEÑO ESTRUCTURAL MUROS CERRAMIENTO COLEGIO BERNAL SEDE B"
CIC_BTA_SED_050_2022_251	11 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 240-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ SEDE A

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_252	13 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO SOLICITUD ACOPIO DE ESCOMBRO PROVENIENTE DE ÁREAS EXTERNAS AL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.4077642.
CIC_BTA_SED_050_2022_253	16 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 242-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_254	15 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 243-GP2-SED-2022 Y 246-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A Y JUSTO VICTOR CHARRY
CIC_BTA_SED_050_2022_255	15 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	ESTADO DE FRENTES DE OBRA CONFORME A PROGRAMACIÓN APROBADA - SOLICITUD AVANCE DE OBRA.
CIC_BTA_SED_050_2022_256	15 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 247-GP2-SED-2022 Y 248-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED SAN JOSÉ NORTE Y JUSTO VICTOR CHARRY
CIC_BTA_SED_050_2022_257	15 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS REDES DE CONEXIÓN
CIC_BTA_SED_050_2022_258	15 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADOS No. 179-GP2-SED-2022, No. 186-GP2-SED-2022, No. 197-GP2-SED-2022 y No. 221-GP2-SED-2022, DEFINICIÓN DE ALCANCES Y SOLICITUDES DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES
CIC_BTA_SED_050_2022_259	15 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADOS No. 187-GP2-SED-2022, No. 236-GP2-SED-2022 Y No. 238-GP2-SED-2022, ENTREGA DE ESPACIOS
CIC_BTA_SED_050_2022_260	16 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S..	ENTREGA INFORME SEMANAL No.21
CIC_BTA_SED_050_2022_261	16 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	ENTREGA INFORME SEMANAL No.22
CIC_BTA_SED_050_2022_262	16 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 229-GP2-SED-2022 - OBSERVACIONES PLAN DE CONTINGENCIA.
CIC_BTA_SED_050_2022_263	7 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTROL DE CALIDAD DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUBSANACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
CIC_BTA_SED_050_2022_264	16 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	REITERACIÓN COMUNICADO CIC-BTA-SED-050-2022-198 SOLICITUD DE CAMBIO DE FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_265	7 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS
CIC_BTA_SED_050_2022_266	16 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 241-GP2-SED-2022 SOLICITUD CAMBIO HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_267	16 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO COMUNICADO No. 185-GP2-SED-2022, No. 209-GP2-SED-2022 Y No. 220-GP2-SED-2022 EMITIDOS POR CONTRATISTA DE OBRA.
CIC_BTA_SED_050_2022_268	16 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	TRASLADO COMUNICADO No. 185-GP2-SED-2022 APROBACIÓN Y AVAL DE LA PERFILERÍA METÁLICA EN ALUMINIO DEL COLEGIO SAN JOSÉ NORTE SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_269	20 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD SUBSANACIÓN OBSERVACIONES INFORMES SST Y AMBIENTAL No. 4. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077642.
CIC_BTA_SED_050_2022_270	21 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PROCEDIMIENTO SEGURO PARA MANIPULACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES.
CIC_BTA_SED_050_2022_271	22 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 251-GP2-SED-2022 Y 255 -GP2-SED-2022 Y 254 -GP2-SED-2022 -APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A Y JUAN DEL CORRAL Y REPUBLICA DE PANAMÁ
CIC_BTA_SED_050_2022_272	22 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA CORTE PARCIAL DE OBRA No.5
CIC_BTA_SED_050_2022_273	23 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME SST NUMERO 5.
CIC_BTA_SED_050_2022_274	23 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL NUMERO 5.
CIC_BTA_SED_050_2022_275	23 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 258-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CIC_BTA_SED_050_2022_276	23 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD SUBSANACIÓN HV PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO SEGÚN ANEXO TÉCNICO.
CIC_BTA_SED_050_2022_277	23 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	LLAMADO DE ATENCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_278	26 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 260-261-GP2-SED-2022.
CIC_BTA_SED_050_2022_279	26 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 262-GP2-SED-2022.
CIC_BTA_SED_050_2022_280	27 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 266-GP2-SED-2022
CIC_BTA_SED_050_2022_281	27 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 252-GP2-SED-2022 CONCEPTO AULA MÚLTIPLE, LABORATORIOS Y CUBIERTA DE AULAS COLEGIO SAN JOSÉ NORTE
CIC_BTA_SED_050_2022_282	27 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	ALCANCE COMUNICADO CIC_BTA_SED_050_2022_257 Y TRASLADO CORREO REMITIDO POR SED (PROTECCIÓN OTIC)
CIC_BTA_SED_050_2022_283	27 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA DE APU´S CONTRACTUALES NO OFERTADOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_284	27 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO COMUNICADO No. 241-GP2-SED-2022 CAMBIO DE PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_285	27 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_286	28 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	ENTREGA INFORME SEMANAL No.23
CIC_BTA_SED_050_2022_287	28 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 253-GP2-SED-2022. INFORME 3A - RECOMENDACIONES PISO CANCHA COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_288	28 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 244-GP2-SED-2022. INFORME 1ª- RECOMENDACIONES CAPACIDAD PORTANTE COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN – SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_289	28 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 232-GP2-SED-2022. INFORME 1 A- RECOMENDACIONES PAVIMENTO PARQUEADEROS COLEGIO FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_290	28 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 5 CONTRATO DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_291	28 de junio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_292	28 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 268-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA INGRESO DE OPERADORES Y VOLQUETAS PARA IED FLORIDABLANCA SEDE A.
CIC_BTA_SED_050_2022_293	29 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 277-GP2-SED-2022 - RESPUESTA A OFICIO CIC_BTA_SED_050_2022_278.
CIC_BTA_SED_050_2022_294	29 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 280-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE CURSOS DE ALTURAS PARA EL PERSONAL DEL IED SAN JOSÉ NORTE.
CIC_BTA_SED_050_2022_295	29 de junio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORMES AMBIENTALES NÚMEROS 2 AL 5.
CIC_BTA_SED_050_2022_296	04 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 280-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE DOCUMENTOS PERSONAL IED BERNAL JIMÉNEZ.
CIC_BTA_SED_050_2022_297	04 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 264 -GP2-SED-2022 APROBACIÓN DISEÑO ESTRUCTURAL MUROS CERRAMIENTO COLEGIO BERNAL SEDE B
CIC_BTA_SED_050_2022_298	04 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.23
CIC_BTA_SED_050_2022_299	04 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 284-GP2-SED-2022 - DISPOSICIÓN FINAL RCD.
CIC_BTA_SED_050_2022_300	5 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 263 -GP2-SED-2022 REFERENCIA: INFORME PROYECTO ELÉCTRICO BLOQUE COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CIC_BTA_SED_050_2022_301	5 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 286-GP2-SED-2022 REFERENCIA: SOLICITUD TRABAJOS NOCTURNOS EMERGENCIA HELADIA MEJÍA.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_302	5 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENVÍO PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022.
CIC_BTA_SED_050_2022_303	5 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	CAMBIO DE PROFESIONALES Y REMISIÓN CAMBIO HOJA DE VIDA TECNÓLOGO SST 1 E INSPECTOR 1, DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_304	6 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 287-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE DOCUMENTOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_305	6 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 259-GP2-SED-2022 - RESPUESTA AL OFICIO CIC_BTA_SED_050_2022_183
CIC_BTA_SED_050_2022_306	7 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 289-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA INGRESO DE PERSONAL Y MINI CARGADOR DEL IED FLORIDABLANCA SEDE A..
CIC_BTA_SED_050_2022_307	7 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	TRASLADO COMUNICADOS No. 281-GP2-SED-2022 - No. 282-GP2-SED-2022 ENTREGA DE ESPACIOS IE FLORIDA BLANCA E IE SIMÓN BOLIVAR
CIC_BTA_SED_050_2022_308	7 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 267-GP2-SED-2022 – SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS REDES DE CONEXIÓN OTIC.
CIC_BTA_SED_050_2022_309	7 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 250 -GP2-SED-2022 - PROGRAMACIÓN DE OBRA COLEGIO SAN JOSÉ NORTE SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_310	7 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 288 -GP2-SED-2022 - SOLICITUD CAMBIO HOJA DE VIDA INSPECTORES DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_311	7 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642.
CIC_BTA_SED_050_2022_312	10 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SUSPENSIÓN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO I.E.D. RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ SEDE A.
CIC_BTA_SED_050_2022_313	10 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 293-GP2-SED-2022.
CIC_BTA_SED_050_2022_314	10 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONFORME A APROBACIÓN DE CONCEPTOS ESTRUCTURALES IED FLORIDABLANCA.
CIC_BTA_SED_050_2022_315	11 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 295-GP2-SED-2022 - CONCEPTO REVISIÓN CUBIERTA AULAS Y ZONA DE COCINA COLEGIO FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_316	12 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 296-GP2-SED-2022 - REMISION DE DOCUMENTOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_317	12 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 298-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA INGRESO PERSONAL, VALIDACIÓN CERTIFICACIONES DE ALTURAS Y SOLDADOR I.E. BERNAL JIMÉNEZ SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_318	14 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 299-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA INGRESO DE PERSONAL Y MAQUINARIA DEL IED FLORIDABLANCA SEDE A.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_319	14 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 297-GP2-SED-2022 CONCEPTO AULA MÚLTIPLE (COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ)
CIC_BTA_SED_050_2022_320	14 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 270-GP2-SED-2022 - ASUNTO: ENVIÓ LINK DRIVE DE DISEÑOS ELÉCTRICOS DE COLEGIOS JORGE ELIECER GAITÁN, GARCÉS NAVAS, FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, FLORIDA BLANCA Y RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ
CIC_BTA_SED_050_2022_321	14 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.4077642 - AVANCE DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_322	14 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SUSPENSIÓN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO I.E.D. FLORIDABLANCA SEDE A.
CIC_BTA_SED_050_2022_323	14 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	MESA DE TRABAJO REVISIÓN FALENCIAS EN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_324	14 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	AJUSTE ACTA PARCIAL No. 5 CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.4077642
CIC_BTA_SED_050_2022_325	15 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	INFORME SEMANAL 25 Y 26
CIC_BTA_SED_050_2022_326	17 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 303-GP2-SED-2022 Y 304-GP2-SED-2022.
CIC_BTA_SED_050_2022_327	17 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIOS No. 305-GP2-SED-2022 Y 306-GP2-SED-2022.
CIC_BTA_SED_050_2022_328	17 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 307-GP2-SED-2022.
CIC_BTA_SED_050_2022_329	17 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN ENVÍO PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_330	17 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SUBSANACIÓN OBSERVACIONES INFORMES AMBIENTALES NÚMERO 4 Y 5.
CIC_BTA_SED_050_2022_331	18 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	LLAMADO DE ATENCIÓN COMPONENTE SST.
CIC_BTA_SED_050_2022_332	19 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 285-GP2-SED-2022 CONCEPTO REVISIÓN AULAS (COLEGIO DISTRITAL SIMON BOLÍVAR)
CIC_BTA_SED_050_2022_333	19 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 308-GP2-SED-2022. DISEÑO AULAS MODULARES COLEGIO SAN JOSÉ NORTE
CIC_BTA_SED_050_2022_334	19 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 310-GP2-SED-2022. DOCUMENTACIÓN PERSONAL DE INGRESO I.E.D. SAN JOSÉ NORTE.
CIC_BTA_SED_050_2022_335	19 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 312-GP2-SED-2022. DOCUMENTACIÓN PERSONAL DE INGRESO I.E.D. FLORIDABLANCA SEDE A Y JUAN DEL CORRAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_336	21 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 313-GP2-SED-2022-REMISION DE DOCUMENTOS PARA INGRESO A IED SAN JOSE NORTE.
CIC_BTA_SED_050_2022_337	21 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SUBSANACION OBSERVACIONES INFORME SST NUMERO 5.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_338	25 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 314-GP2-SED-2022 - OBSERVACIONES INFORMES AMBIENTALES NUMEROS 2 AL 5
CIC_BTA_SED_050_2022_339	25 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD REUNIÓN CON PROFESIONAL AMBIENTAL DE LA SED PARA CARGUE DE INFORMES RCD.
CIC_BTA_SED_050_2022_340	25 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES - AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_341	26 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO I.E.D. RAFAEL JIMÉNEZ SEDE B.
CIC_BTA_SED_050_2022_342	27 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME MENSUAL No.6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_343	27 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No. 27 Y 28
CIC_BTA_SED_050_2022_344	27 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 6 CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.4077642
CIC_BTA_SED_050_2022_345	27 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No.6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_346	01 de agosto de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No. 29
CIC_BTA_SED_050_2022_347	27 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 320-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL DE LOS IED SAN JOSE NORTE, IED JUSTO VICTOR CHARRY PERSONAL ROTATIVO EN EL IED RAFAEL BERNAL JIMENEZ SEDE B.
CIC_BTA_SED_050_2022_348	31 de julio de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD SUBSANACIÓN DOCUMENTOS PERSONAL DE INGRESO
CIC_BTA_SED_050_2022_349	31 de julio de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	REMISIÓN ACTAS DE COMITÉ SE SEGUIMIENTO DE OBRA.
CIC_BTA_SED_050_2022_350	01 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN SUBSANACIÓN OBSERVACIONES Y ENTREGA INFORMES AMBIENTALES NUMERO 4 Y 5.
CIC_BTA_SED_050_2022_351	01 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN SUBSANACIÓN OBSERVACIONES Y ENTREGA INFORME SST NUMERO 5.
CIC_BTA_SED_050_2022_352	01 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME SST NUMERO 6.
CIC_BTA_SED_050_2022_353	01 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL NUMERO 6.
CIC_BTA_SED_050_2022_354	01 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA A COMUNICADO No, 323-GP2-SED-2023 CON ASUNTO "SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y TRÁNSITO VEHICULAR POR ÁREA DE ESPACIO PÚBLICO, PARA LA SALIDA DE MATERIAL RCD Y

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
			RESIDUOS DE ESCOMBRO DE LA INTERVENCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO DISTRITAL SIMON BOLÍVAR SEDE A".
CIC_BTA_SED_050_2022_355	05 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No 321--GP2-SED-2023, CON ASUNTO " NOTIFICACIÓN DE OCUPACIÓN DE ÁREA DE SALÓN INTERVENIDO EN LA EMERGENCIA DEL I.E.D. HELADIA MEJIA.
CIC_BTA_SED_050_2022_356	08 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE OBRA FRENTES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642
CIC_BTA_SED_050_2022_357	09 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN SOLICITUD SUBSANACIÓN DOCUMENTOS PERSONAL DE INGRESO.
CIC_BTA_SED_050_2022_358	09 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO 329-GP2-SED-2022 - CONCEPTO CUBIERTA AULA Y ZONA DE COCINA COLEGIO FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_359	09 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO 332-GP2-SED-2022 - DOCUMENTACIÓN DE INGRESO PERSONAL IED GARCÉS NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_360	09 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD INFORME DE INVESTIGACIÓN ACCIDENTE ESTUDIANTE I.E.D. RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_361	10 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO 325-GP2-SED-2022 - CAMBIO DE COORDINADOR COMPONENTE SST
CIC_BTA_SED_050_2022_362	10 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO 326-GP2-SED-2022 - CONTESTACIÓN OFICIO CIC_BTA_SED_050_2022_341
CIC_BTA_SED_050_2022_363	10 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO 327-GP2-SED-2022 - CONTESTACIÓN OFICIO CIC_BTA_SED_050_2022_340
CIC_BTA_SED_050_2022_364	10 de agosto de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	TRASLADO SOLICITUD DE DISEÑO DEL ÁREA DE COCINA Y COMEDOR DE LA I.E.D REPÚBLICA DE PANAMÁ
CIC_BTA_SED_050_2022_365	10 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES PROGRAMACIONES DE OBRA COLEGIOS CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642
CIC_BTA_SED_050_2022_366	11 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ALTO RIESGO.
CIC_BTA_SED_050_2022_367	11 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 337-GP2-SED-2022 - DOCUMENTACIÓN PERSONAL IED JORGE ELIECER GAITÁN, RAFAEL BERNAL SEDE A Y FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_368	11 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD SUSPENSIÓN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO EN HORARIO NOCTURNO I.E.D. RAFAEL JIMÉNEZ BERNAL SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_369	14 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN SUBSANACIÓN OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES NUMERO 5 Y 6 COMPONENTE SST.
CIC_BTA_SED_050_2022_370	14 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN SUBSANACIÓN OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES NUMERO 4, 5 Y 6 COMPONENTE AMBIENTAL.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_371	14 de agosto de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO OFICIOS No. 331-GP2-SED-2022 Y No. 332-GP2-SED-2022 - AFECTACIONES POR COMUNIDAD ESTUDIANTIL
CIC_BTA_SED_050_2022_372	15 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 344-GP2-SED-2022 - DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL PARA INGRESO EN EL IED SAN JOSÉ NORTE.
CIC_BTA_SED_050_2022_373	15 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 324-GP2-SED-2022 - CONTESTACIÓN OFICIO CIC_BTA_SED_050_2022_305 – ACLARACIÓN PERSONAL CONTRACTUALES
CIC_BTA_SED_050_2022_374	15 de agosto de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	RESPUESTA SOLICITUD CONTRALORÍA - SAN JOSÉ NORTE
CIC_BTA_SED_050_2022_375	15 de agosto de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	RESPUESTA CORREO ACUERDO PAGOS OBREROS COLEGIO SAN JOSÉ NORTE
CIC_BTA_SED_050_2022_376	17 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERIODO LIQUIDADO JULIO DE 2023.
CIC_BTA_SED_050_2022_377	17 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 342-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE INFORME SST N 7 CORRESPONDIENTE A PERIODO DE JULIO.
CIC_BTA_SED_050_2022_378	17 de agosto de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 6 CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.4077642 – SUBSANE DE OBSERVACIONES.
CIC_BTA_SED_050_2022_379	17 de agosto de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No.6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – AJUSTE DE OBSERVACIONES
CIC_BTA_SED_050_2022_380	23 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	LLAMADO DE ATENCIÓN COMPONENTE SST.
CIC_BTA_SED_050_2022_381	24 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	CRONOGRAMA REVISIÓN BALANCE PRESUPUESTAL - ESTRUCTURAL
CIC_BTA_SED_050_2022_382	24 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD REMISIÓN DOCUMENTACIÓN DE SUBCONTRATISTAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_383	25 de agosto de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_384	25 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES INSTITUCIÓN SAN JOSÉ NORTE SEDE A.
CIC_BTA_SED_050_2022_385	25 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADOS No. 354-GP2-SED-2022 Y 356-GP2-SED-2022.
CIC_BTA_SED_050_2022_386	28 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 357-GP2-SED-2022.
CIC_BTA_SED_050_2022_387	28 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA CORTE PARCIAL DE OBRA No.7
CIC_BTA_SED_050_2022_388	31 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 338-GP2-SED-2022 RADICACIÓN NO PREVISTOS 15, 18 Y DEL 20 AL 26

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_389	28 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 336-GP2-SED-2022 - CONCEPTO ESTRUCTURAL MURO ZONA DE COCINA COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ
CIC_BTA_SED_050_2022_390	28 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 355-GP2-SED-2022 - ACLARACIÓN LLAMADO DE ATENCIÓN Y MESA DE TRABAJO.
CIC_BTA_SED_050_2022_391	28 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN FECHAS DE CORTE PARA ENTREGA DE INFORMES MENSUALES COMPONENTE SSTA
CIC_BTA_SED_050_2022_392	28 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	LLAMADO DE ATENCIÓN POR INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO POR PARTE DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_393	28 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO OFICIO No. 316-GP2-SED-2022 COMPONENTE ELÉCTRICO
CIC_BTA_SED_050_2022_394	28 de agosto de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN COLEGIO ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES.
CIC_BTA_SED_050_2022_395	01 de septiembre de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME MENSUAL No.7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_396	28 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE POLICUARSO Y REMISIONES DE CONCRETO DE PLANTA
CIC_BTA_SED_050_2022_397	28 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REINTEGRACIÓN COMUNICADOS CIC_BTA_SED_050_2022_305 – CIC_BTA_SED_050_2022_373 ACLARACIÓN PERSONAL CONTRACTUAL CONTRATISTA DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_398	30 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADOS No. No. 362-GP2-SED-2022 Y 363-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL PARA INGRESO DE PERSONAL
CIC_BTA_SED_050_2022_399	30 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	LLAMADO DE ATENCIÓN POR INADECUADO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN I.E.D. SAN JOSE NORTE
CIC_BTA_SED_050_2022_400	30 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 359-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "RADICACIÓN ACTA DE CORTE 007" - OBSERVACIONES
CIC_BTA_SED_050_2022_401	31 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 345-GP2-SED-2022 - PLAN DE CONTINGENCIA
CIC_BTA_SED_050_2022_402	31 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.3 Y No.4
CIC_BTA_SED_050_2022_403	31 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	ENTREGA INFORME SEMANAL No. 30, 31, 32 Y 33
CIC_BTA_SED_050_2022_404	31 de agosto de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADOS No. No. 349-GP2-SED-2022 - RADICACIÓN HOJA DE VISA SST CONTRACTUAL
CIC_BTA_SED_050_2022_405	01 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADOS No. No. 360-GP2-SED-2022 Y 372-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL
CIC_BTA_SED_050_2022_406	01 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN POR INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO POR PARTE DE INTERVENTORÍA

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_407	01 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA INFORMES MENSUALES COMPONENTE TÉCNICO Y SSTA
CIC_BTA_SED_050_2022_408	01 de septiembre de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO OFICIO No. 351-GP2-SED-2022 SOLICITUD ACLARACIÓN ALCANCE INTERVENCIÓN DEL COMPONENTE Y ACTIVIDADES ELÉCTRICAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_409	01 de septiembre de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	RESPUESTA INDIVIDUO ARBÓREO SIMÓN BOLÍVAR
CIC_BTA_SED_050_2022_410	01 de septiembre de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO OFICIO No. 365 -GP2-SED-2022 ALCANCE COMPONENTE ELÉCTRICO I.E.D. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CIC_BTA_SED_050_2022_411	04 de septiembre de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO OFICIO No. 366 -GP2-SED-2022 ALCANCE AULAS MODULARES I.E.D. SAN JOSÉ NORTE SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_412	04 de septiembre de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO OFICIO No. 367 -GP2-SED-2022 SOLICITUD DE DISEÑOS DE FRENTES A APERTURAR Y EN EJECUCIÓN
CIC_BTA_SED_050_2022_413	02 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD CORRECCIÓN INSTALACIÓN DE TAPAS PARA SIFONES EN CÁRCAMO COLEGIO ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES
CIC_BTA_SED_050_2022_414	02 de septiembre de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO COMUNICADO No. 350-GP2-SED-202 - AFECTACIONES POR VANDALISMO POR PARTE DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA I.E. JUSTO VICTOR CHARRY
CIC_BTA_SED_050_2022_415	4 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 267-GP2-SED-2022 - SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS REDES DE CONEXIÓN OTIC.
CIC_BTA_SED_050_2022_416	4 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 357-GP2-SED-2022 RADICACIÓN CONCEPTO Y DIAGNÓSTICO DE LA RCI DEL I.E JUAN DEL CORRAL / ENGATIVÁ.
CIC_BTA_SED_050_2022_417	4 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	CONCEPTO PISOS AULAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR
CIC_BTA_SED_050_2022_418	4 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	CONCEPTO PISOS AULAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ NORTE
CIC_BTA_SED_050_2022_419	4 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	CONCEPTO PISOS AULAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_420	4 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN COMUNICADO CIC_BTA-SED-050-2022-396 SOLICITUD ENTREGA REMISIONES CONCRETO DE PLANTA Y FICHA TÉCNICA POLICUARZO.
CIC_BTA_SED_050_2022_421	4 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN COMUNICADO CIC_BTA-SED-050-2022-396 SUBSANACIÓN PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_422	4 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN COMUNICADO CIC_BTA-SED-050-2022-397 SOLICITUD ENTREGA DE TRAZABILIDAD PERSONAL CONTRACTUAL Y ADICIONAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_423	4 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADOS No. 377-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL IED FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y SIMÓN BOLIVAR

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_424	4 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 374-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME SST N4, INFORME SST N5, INFORME SST N6.
CIC_BTA_SED_050_2022_425	4 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA APU´S CONTRACTUALES DESGLOSADOS
CIC_BTA_SED_050_2022_426	4 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADOS No. 370-GP2-SED-2022, 375-GP2-SED-2022 Y 380-GP2-SED-2022- RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORMES AMBIENTALES DEL 2 AL 5.
CIC_BTA_SED_050_2022_427	4 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 368-GP2-SED-2022 - SOLICITUD ENTREGA DE ESPACIOS COLEGIOS DE INTERVENCIÓN SEGUNDA ETAPA
CIC_BTA_SED_050_2022_428	4 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 369-GP2-SED-2022 - SOLICITUD DEFINICIÓN DE ALCANCES COLEGIOS A APERTURAR EN SEGUNDA ETAPA
CIC_BTA_SED_050_2022_429	4 de septiembre de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	RESPUESTA REQUERIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO No. S-2023-272286.
CIC_BTA_SED_050_2022_430	4 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES PRESUPUESTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL IT FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A.
CIC_BTA_SED_050_2022_431	4 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADOS No. 376-GP2-SED-2022.
CIC_BTA_SED_050_2022_432	4 de septiembre de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	INFORME SEMANAL No 34
CIC_BTA_SED_050_2022_433	4 de septiembre de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN POR INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO A I.E.D. RAFAEL BERNAL SEDE B
CIC_BTA_SED_050_2022_434	6 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 371-GP2-SED-2022 - REMISIÓN CURSOS DE ALTURAS IED SIMÓN BOLÍVAR.
CIC_BTA_SED_050_2022_435	6 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 384-GP2-SED-2022 - CONTESTACIÓN OFICO 398 DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL
CIC_BTA_SED_050_2022_436	5 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN COMUNICADO CIC-BTA-SED-050-2022-388 “OBSERVACIONES ANÁLISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS NP-15, NP-18, NP-20, NP-21, NP-22, NP-23, NP-24, NP-25, NP-26, NP-27, NP-28, NP-29, NP-30, NP-31, NP-32, Y NP-33.” Del 30 de agosto de 2023.
CIC_BTA_SED_050_2022_437	6 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIOS No. 378-GP2-SED-2022 Y 385-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL PARA INGRESO EN EL IED SAN JOSÉ NORTE, IED FLORIDABLANCA SEDE A, IED SIMÓN BOLÍVAR Y IED FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_438	6 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD COMPROMISOS DE OBRA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_439	8 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN OBSERVACIONES ACTAS DE ENTREGA FINAL FÍSICA DE EMERGENCIAS
CIC_BTA_SED_050_2022_440	8 de septiembre de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REPROGRAMACIÓN MESA DE TRABAJO 2DA REVISIÓN PRECIOS NO PREVISTOS

Tabla 83. Control correspondencia.

3.5. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO

3.5.1. ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.

Las actividades adelantadas por parte de Contratista de obra en el periodo de 11 de agosto a 10 de septiembre de 2023, se enfocaron en labores de orden administrativo y técnico como se presenta a continuación:

3.5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

3.5.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 4 de diciembre de 2023)

3.5.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 01 de noviembre de 2023)

3.5.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 04 de diciembre de 2023)


3.5.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona.
- Demoliciones, desmontes y retiro: Demolición de placa maciza, demolición de alistado de piso, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cubierta existente, desmonte de canaleta metálica troquelada, diagnóstico y mantenimiento menor de cubierta, limpieza de canales y bajantes.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común, relleno en recebo común compactado.
- Concretos: Placa de contrapiso de 10 cm – concreto de 3000 PSI.
- Elementos en concreto: Cuneta trapezoidal 3000 PSI.
- Refuerzos: Suministro e instalación de malla electro soldada 6 mm.
- Redes de alcantarillado: suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 4".
- Cajas y pozos de inspección: Caja de inspección 80 x 80.

- Otras instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio: Suministro y aplicación de pintura para tubería Red AN – ALL – re ventilación 3” a 6”, sondeo y revisión de desagües.
- Instalaciones eléctricas y de comunicaciones: Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada, suministro e instalación de bala led de 18 W, suministro e instalación de cableado 1#6 + 1#8 + 1#10T.
- Alistado de piso: Concreto de limpieza, mediacaña en mortero.
- Acabado de piso: Suministro e instalación de bordillo prefabricado, afinado de piso en mortero impermeabilizado.
- Obras exteriores: reparación y adecuación de cunetas existentes.
- Cubiertas e impermeabilizaciones: Flanche en lámina galvanizada, suministro e instalación de teja en fibrocemento, suministro e instalación de teja termo acústica, sei de viga canal galvanizada.
- Aseo y disposición final: Aseo general final y limpieza, embalaje de teja en asbesto cemento.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Miguel Antonio Caro		07/02/2023	15/07/2023	100,00%	100,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
1	Preliminares	07/02/2023	02/05/2023	30,10%	30,10%	Cerramiento en lona, demolición placa maciza, demolición de alistado de piso, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cubierta, desmonte de canaleta metálica, diagnóstico y mantenimiento de cubierta existente, limpieza de canales y bajantes.	
2	Estructura	11/04/2023	15/07/2023	22,90%	22,90%	Excavación manual, relleno en recebo, concreto corriente, placa de contrapiso de 10 cm, instalación malla electro soldada, cuneta trapezoidal 3000 PSI	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	16/05/2023	19/06/2023	9,07%	9,07%	Instalación de tubería PVC alcantarillado 4", caja de inspección 80x80, suministro y aplicación de pintura para tubería, sondeo y revisión de desagües	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	24/04/2023	08/06/2023	4,61%	4,61%	Suministro e instalación de bala led de 18W, suministro e instalación de tubería EMT conduit 2", suministro e instalación de cableado 1#6 + 1#8 + 1*10T.	
7	Pisos	27/04/2023	12/05/2023	4,56%	4,56%	Concreto de limpieza para caja de inspección, instalación de bordillo prefabricado, media caña en mortero, afinado de piso en mortero impermeabilizado.	
16	Obras exteriores	11/04/2023	09/05/2023	1,38%	1,38%	Reparación y adecuación de cunetas existentes	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	20/03/2023	12/06/2023	19,53%	19,53%	Flanche en lámina galvanizada, suministro e instalación de teja termo acústica UPVC 2mm, teja en fibrocemento, canal galvanizada.	
20	Aseo y disposición final	07/03/2023	12/07/2023	7,85%	7,85%	Aseo general final y limpieza, embalaje de teja de asbesto cemento	

Tabla 84. Avance de obra Miguel Antonio Caro.

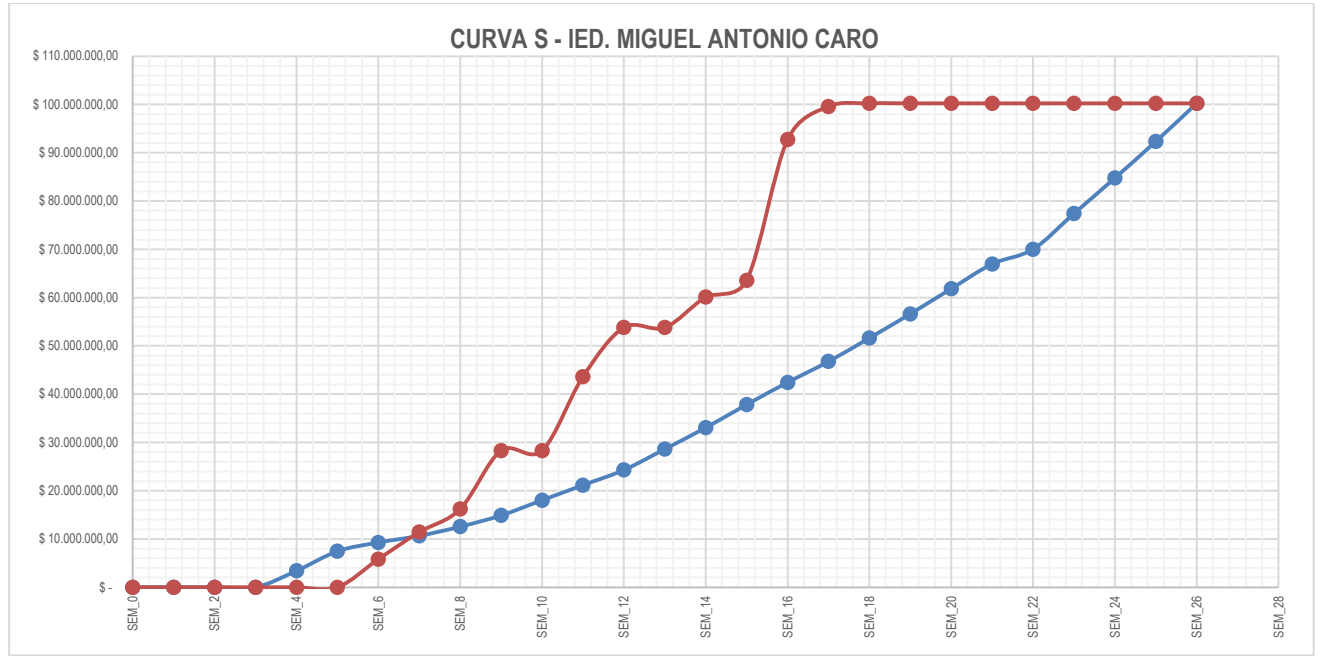

Gráfica 7. Curva programado vs ejecutado Miguel Antonio Caro.

3.5.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 03 de enero de 2023)

3.5.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 01 de noviembre de 2023)

3.5.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A


- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona.
- Demoliciones, desmontes y retiros: Demolición de alistado de piso, desmonte de ventanas, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cielo raso, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, desmonte y reinstalación de red eléctrica, desmonte de alambrón 8 mm, retiro de manto de aluminio sobre cubiertas, mantenimiento de cubierta termo acústica o tipo sándwich.
- Varios: Perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, corte en concreto con pulidora, trasiego carretilla para proyectos especiales, limpieza de canales y bajantes.

- Estructura: Concreto corriente grava común 3000 PSI mezclado en sitio, escalera maciza en concreto 3000 PSI.
- Refuerzos: Suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 PSI.
- Mampostería: Muro divisorio bloque estriado No. 4, mampostería estructural E=0.12 M, tratamiento de fachadas en ladrillo a la vista.
- Elementos estructurales: Anclajes de varillas 3/8".
- Instalaciones sanitarias: Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado de 4", PVCS 4", PVCS 3", PVCS 2".
- Otras: Suministro, transporte e instalación de soporte tipo pera 4".
- Instalaciones eléctricas y de comunicaciones: Suministro e instalación de salida para luminaria de emergencia LED, suministro e instalación de tubos LED T8, suministro e instalación de Kit de guayas para panel LED, reinstalación de lámparas existentes.
- Sistema de detección de incendio y red contra incendio: suministro e instalación de soporte abrazadera de 1 a 1 – ½" S/placa.
- Alistado de pisos: Alistado de pisos en mortero impermeabilizado, mediacaña en mortero.
- Mampostería seca: suministro e instalación de muro en Dry Wall de 12 mm.
- Aparato sanitarios y accesorios: Sum e insta de rejilla con sosco de 4" a 3".
- Pañete y estuco en muros: Pañete muro 1:4, incluye filos y dilataciones, pañete liso sobre muro, estuco sobre pañete.
- Pintura sobre muros y placas: Vinilo tipo 1 a tres manos, pintura vinilo sobre muros interiores 3 manos, pintura tipo Korasa o similar para fachada, pintura en esmalte.
- Pintura sobre metal: Esmalte sobre puertas y marcos metálicos, esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica de cubierta.
- Cubiertas e impermeabilizaciones: Flanche en lámina galvanizada calibre 20 desarrollo 0.25, flanche lámina galvanizada calibre 20 desarrollo 80 cm, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio, suministro e instalación de remates laterales para cubierta UPVC, en lámina galvanizada cal 18.
- Aseo y disposición final: Protección provisional de elementos y superficies existentes, disposición final de teja en asbesto.
- No previstos: Desmonte de flanche, suministro e instalación de membrana impermeabilizante Poliurea de alto desempeño E=2mm.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Instituto técnico Juan del Corral		15/02/2023	12/09/2023	100%	62,08%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	37,20%
1	Preliminares	15/02/2023	23/02/2023	6,00%	7,44%	Replanteo, cerramiento en lona con parales, demolición de alistado y acabado de piso, desmonte retiro de tuberías, desmonte de todo tipo de cielo raso, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, desmonte y reinstalación de tubería de red eléctrica EMT, retiro de manto de aluminio, mantenimiento de	

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
						cubierta termo acústica, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, trasiego carretilla.
3	Mampostería	03/07/2023	31/07/2023	7,63%	7,65%	Muro divisorio en bloque No. 4, tratamiento de fachadas en ladrillo a la vista, anclajes varillas 3/8".
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	04/05/2023	0,67%	0,89%	Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 4", suministro e instalación de accesorios PCV-S 4", suministro e instalación de tubería PVCS 3" y 2", suministro, transporte e instalación de soporte tipo pera 4".
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	17/05/2023	13/06/2023	5,54%	0,33	Suministro e instalación de tubos LED T8, suministro e instalación de kit de guayas para panel LED, reinstalación de lámparas existentes.
7	Pisos	19/06/2023	17/07/2023	7,69%	6,18%	Alistado de pisos en mortero, mediacaña en mortero
8	Mampostería seca	17/05/2023	02/06/2023	0,73%	0,06%	Suministro e instalación de muro en Dry wall de 12 mm.
13	Pañete y pintura	14/07/2023	14/08/2023	6,51%	7,76%	Pañete muro 1:4, incluye filos, vinilo tipo 1 a tres manos, pintura vinilo sobre muros interiores 3 manos., pintura tipo korasa a 2 manos, esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica.
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/04/2023	17/08/2023	64,04%	3,69%	Flanche en lámina galvanizada, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio, suministro e instalación de remates laterales para cubierta UPVC, en lámina galvanizada cal 18.
20	Aseo y disposición final	27/02/2023	08/08/2023	1,17%	2,22%	Protección provisional de elementos y superficies existentes.
NP	Actividades no previstas			0,00%	26,58%	Desmonte de flanche, suministro e instalación de membrana impermeabilizante poliurea.

Tabla 85. Avance de obra Instituto técnico Juan del Corral

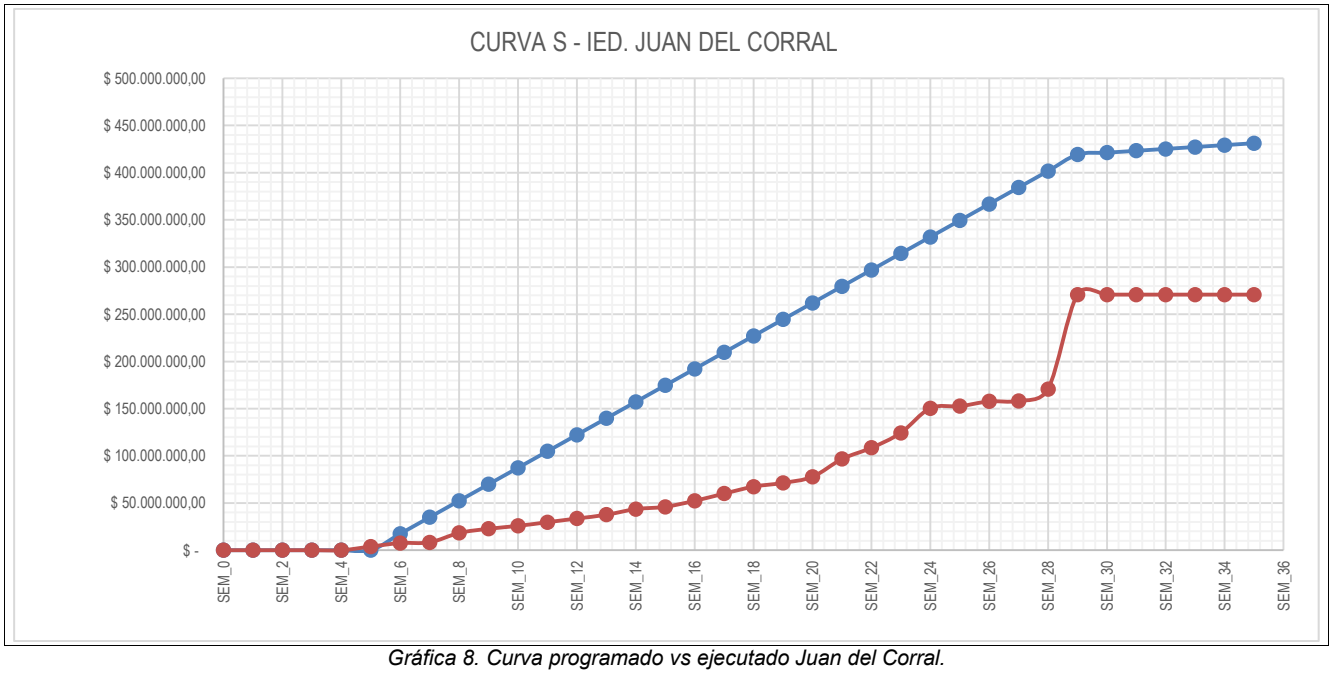

Gráfica 8. Curva programado vs ejecutado Juan del Corral.

3.5.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 22 de septiembre de 2023)

3.5.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 01 de noviembre de 2023)

3.5.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuestos.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona y replanteo.
- Demoliciones, desmontes y retiros: demolición placa maciza, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería, demolición de pañete de muros, demolición de enchape de muro y pega, demolición de encorozado de cubierta, desmonte de puertas y ventanas, desmonte y desconexión de aparatos sanitarios, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de división sencilla o doble, desmonte de salidas eléctricas, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, retiro de manto de aluminio, mantenimiento tapas y marcos, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, corte regatas en concreto, corte en concreto con pulidora, picado de muros de mampostería y limpieza de canales y bajantes.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común y recebo compactado, relleno con material seleccionado y recebo común compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400.
- Concretos: Suministro e instalación de viga cinta de confinamiento 12x 20 cm en concreto de 3000 PSI, placa contrapiso de 10 cm, recalce de escaleras espesor promedio 0.07 m, concreto 3500 PSI.
- Refuerzos: Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro de malla electro soldada 6mm.
- Estructura metálica: Suministro e instalación de estructura metálica.
- Mampostería: Muro divisorio bloque estriado No. 4, resane de fisuras en muros.
- Elementos estructurales: Anclajes varilla 3/8”.
- Redes de alcantarillado: Suministro e instalación de tubería Novafort de 8”
- Red sanitaria: Suministro e instalación de tubería PVC-S 2”, suministro e instalación de tubería PVC-S 4”.
- Puntos sanitarios de agua frio y agua caliente: Suministro e instalación punto de agua fria lavamanos ½”, suministro e instalación punto sanitario 2” y 4”.


- Registros, cheques y válvulas: Suministro e instalación registro válvula de bola ½".
- Cajas y pozos de inspección: Caja de inspección de 1.00 x 1.00, limpieza de cajas de inspección, re nivelación de cajas de inspección.
- Redes de drenaje aguas de infiltración: Suministro e instalación de geotextil tejido T1700, sondeo y revisión de desagües.
- Alistado de pisos: Alistado de pisos en mortero, alistado para escalera en mortero.
- Instalaciones eléctricas: suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, salida para toma corriente doble normal, tipo institucional, suministro e instalación de tablero principal de distribución tipo panel de 36 circuitos, suministro e instalación de caja de paso metálica 30x30x15cm, suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de ¾", suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN, suministro e instalación de salida para luminaria con cable de cobre aislado, suministro e instalación de panel LED circular de 18W 8", suministro e instalación lámpara tipo LED 2x18W – hermética, suministro e instalación de borna terminal de compresión bimetálica.
- Acabados de pisos: Alistado de pisos en mortero, alistado de paso para escalera en mortero, suministro e instalación piso cerámica antideslizante, tipo Mikonos o similares formato 33 x 33, suministro y aplicación de sellador elástico, para sello de juntas a nivel de piso, win de aluminio, suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato de 8 a 10 cm de alto.
- Mampostería seca: Suministro e instalación de muro en Dry Wall de 12 mm visto una cara.
- Carpintería metálica en Coll Rolled: suministro e instalación de hoja para puerta metálica sin marco en lámina calibre 18 entamborada con refuerzo interno, marco de puertas.
- Carpintería metálica en aluminio: suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior, incluye vidrio 4mm incoloro, suministro e instalación de ventanas en aluminio tipo persiana.
- Aparatos sanitarios y accesorios: Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco, suministro e instalación de sanitario línea adulto, suministro e instalación juegos de incrustaciones accesorios en porcelana.
- Pañete y pintura: Pañete muro 1:4 incluye filos y dilataciones, estuco sobre pañete.
- Pintura sobre muros y placa: Vinilo tipo 1 a tres manos.
- Cielos rasos: Suministro e instalación cielo raso en lámina de yeso de ½" ST.
- Cubierta e impermeabilizaciones: Suministro e instalación de cubierta en teja traslucida opal PC 37, suministro e instalación de caballete para teja, suministro e instalación de manto asfaltico con foil de aluminio.
- Aseo y disposición final: Aseo general final y limpieza, embalaje de teja de asbesto cemento con vinipel, disposición final de teja de asbesto.

- No previstos: Suministro e instalación de teja Ecoroof 2,5mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IT Francisco José de Caldas, Sede A		25/01/2023	31/10/2023	97,70%	54,95%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	42,75%
1	Preliminares	08/02/2023	30/08/2023	17,16%	6,65%	Replanteo, cerramiento en lona, demolición de placa maciza, demolición de alistado y acabado de pisos, demolición de muro en mampostería, demolición de pañete de muros, demolición de enchape de muros, demolición de encorozado de cubierta, desmonte de puertas, desmonte de ventanas, desconexión de aparatos sanitarios, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, desmonte de todo tipo de cubierta, desmonte de todo tipo de cielo raso, desmonte de división sencilla o doble indiferente al material, desmonte de salidas eléctricas, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, retiro de manto de aluminio sobre cubiertas, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, corte y regatas en concreto, corte en concreto con pulidora, limpieza de canales y bajantes.	
2	Estructura	04/03/2023	23/09/2023	3,36%	11,49%	Excavación manual en material común y recebo compactado, relleno con material seleccionado, relleno en recebo común compactado, suministro e instalación de subbase B-400, placa de contrapiso de 10 cm y 15 cm, recalce de escaleras, suministro e instalación de estructura metálica, acero de refuerzo, malla electro soldada.	
3	Mampostería	23/03/2023	29/07/2023	4,53%	0,15%	Muro divisorio bloque estriado No. 4, resane de fisuras en muros, anclajes varilla 3/8".	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	20/09/2023	0,18%	0,66%	Tubería PVC U.M Ext corrugado/int liso, suministro e instalación de tubería PVCS 4", tubería PVCS 2", sifón de piso 2", tubería PVCP RDE 9 de 1/2" suministro e instalación punto agua fría sanitario tanque 1/2", punto agua fría lavamanos 1/2", punto sanitario 4", punto sanitario 2", suministro e instalación registro válvula de bola 1/2", caja de inspección 1.00x1.00, limpieza de cajas de inspección, re nivelación de cajas de inspección, suministro e instalación de geotextil tejido 1700 y sondeo y revisión de desagües.	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/05/2023	28/10/2023	0,57%	5,38%	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, salida para toma corriente doble normal tipo institucional, suministro e instalación de tablero principal de distribución tipo panel de 36 circuitos, suministro e instalación de caja de paso metálica 30x30x15CM, suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de 3/4", suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN, suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre aislado, suministro e instalación panel LED circular de 18 W 8", suministro e instalación de borna terminal de compresión.	

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
7	Pisos	27/02/2023	28/10/2023	15,87%	3,74%	Alistado de pisos en mortero, alistado de paso para escalera en mortero, suministro e instalación de piso cerámica antideslizante tipo mikonos, suministro y aplicación de sellador elástico, win de aluminio, suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato.
9	Carpintería metálica	14/03/2023	17/08/2023	19,39%	7,39%	Suministro e instalación de ventana metálica en lámina coldrolled calibre 18, suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior, suministro e instalación de hoja para puerta metálica sin marco, marco de puertas.
13	Pañete y pintura	22/03/2023	20/09/2023	11,33%	5,56%	Pañete muro 1:4 incluye filos, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete, vinilo tipo 1 a tres manos.
16	Obras exteriores	01/09/2023	31/10/2023	0,12%	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	13/03/2023	26/09/2023	24,27%	0,53%	Suministro e instalación de teja traslucida, suministro e instalación de caballete para teja, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio.
20	Aseo y disposición final	20/04/2023	31/10/2023	0,70%	1,73%	Aseo general, disposición y embalaje de teja en asbesto cemento
NP	Actividades No previstas	13/03/2023	02/09/2023	0,21%	11,67%	Suministro e instalación de teja 2,5mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato

Tabla 86. Avance de obra Francisco José de Caldas, Sede A

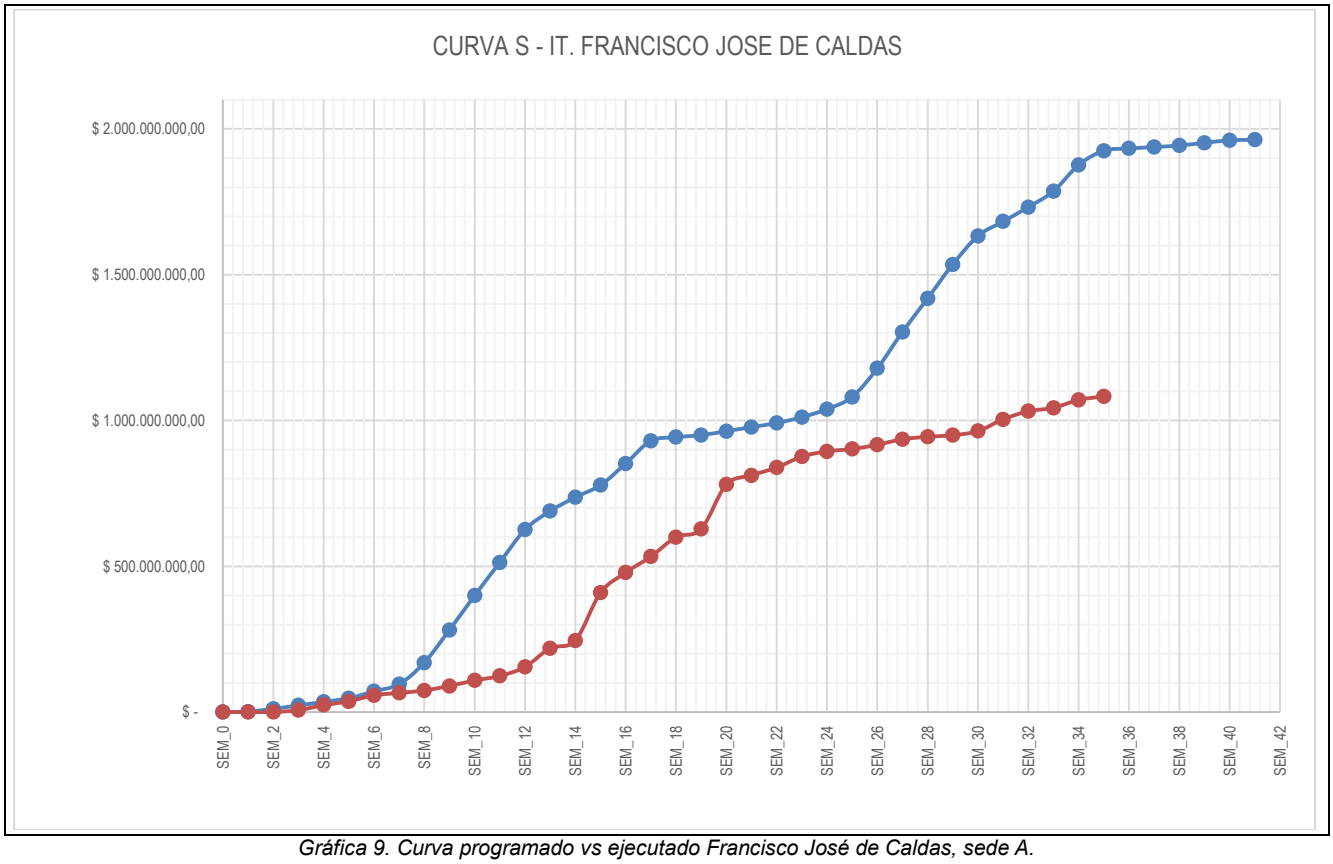

Gráfica 9. Curva programado vs ejecutado Francisco José de Caldas, sede A.

3.5.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A


- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuestos.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona y localización y replanteo.
- Demoliciones, desmontes y retiros: Demolición de estructuras en concreto, demolición de placa maciza, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería con acabados, demolición de pavimento asfáltico, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarías existentes, desmonte de todo tipo de cubierta existente, desmonte de canecas de basura, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, desmonte y reinstalación de tubería de red eléctrica, mantenimiento tapas y marcos para cajas de inspección, limpieza y mantenimiento a cárcamo y limpieza de canales y bajantes.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común y recebo compactado, excavación mecánica, relleno subbase granular B-200, base granular clase C (BG_C).
- Concretos: Concreto corriente en grava común 3000 PSI, suministro e instalación de viga cinta de confinamiento 12 x 20 cm, placa contrapiso de 10 cm.
- Elementos en concreto: Cinta de confinamiento en concreto de 3000 PSI de 10 x 12 cm.
- Refuerzo: Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro e instalación de malla electro soldada.
- Estructura metálica: Suministro e instalación de estructura metálica.
- Mampostería: Muro ladrillo prensado macizo.
- Redes de alcantarillado: Tubería PVC U.M. Ext. Corrugado/int liso D=160 mm, suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 4” y 6”.
- Cajas y pozos de inspección: Limpieza de cajas de inspección, re nivelación de cajas de inspección.
- Redes de drenaje aguas de infiltración: Suministro e instalación geotextil tejido 2400.
- Otros: Sondeo y revisión de desagües.
- Instalaciones eléctricas y de comunicaciones: Suministro e instalación de tubería PVC Conduit 3”.
- Alistado de pisos: Alistado de pisos en mortero, concreto de limpieza de 2000 PSI, junta de dilatación inducida piso en concreto allanado.
- Acabado de pisos: Suministro e instalación de bordillo prefabricado A-80.
- Carpintería metálica: Cerramiento contra impacto H=5,00 m.
- Pañete y pintura: Pañete liso sobre muro.
- Cubiertas e impermeabilizaciones: Emulsión asfáltica impermeabilizante.
- Aseo y disposición final: Aseo general final y limpieza, disposición final teja en asbesto, embalaje de teja de asbesto.

- No previstos: Suministro e instalación de teja Ecoroof 2,5 mm, mejoramiento material granular existente con adición de cemento, suministro e instalación de placa en concreto de 3500 con fibra.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Floridablanca, sede A		06/02/2023	31/10/2023	57,99%	59,88%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-1,89%
1	Preliminares	06/02/2023	17/07/2023	10,89%	12,50%	Localización y replanteo, cerramiento en lona, demolición de estructuras en concreto, demolición de placa maciza, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería con acabados, demolición de pavimento asfáltico, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarías existentes, desmonte de todo tipo de cubierta existente, desmonte de canecas de basura, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, desmonte y reinstalación de tubería de red eléctrica, mantenimiento tapas y marcos para cajas de inspección, limpieza y mantenimiento a cárcamo y limpieza de canales y bajantes.	
2	Estructura	06/03/2023	13/05/2023	16,56%	17,66%	Excavación manual en material común y recebo compactado, excavación mecánica, relleno subbase granular B-200, base granular clase C (BG_C), concreto corriente en grava común 3000 PSI, suministro e instalación de viga cinta de confinamiento 12 x 20 cm, placa contrapiso de 10 cm, cinta de confinamiento en concreto de 3000 PSI de 10 x 12 cm, suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro e instalación de malla electro soldada, suministro e instalación de estructura metálica.	
3	Mampostería	08/05/2023	31/10/2023	6,17%	0,28%	Muro ladrillo prensado macizo	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	15/04/2023	08/05/2023	0,03%	2,58%	Tubería PVC U.M. Ext. Corrugado/int liso D=160 mm, suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 4" y 6", limpieza de cajas de inspección, re nivelación de cajas de inspección, suministro e instalación geotextil tejido 2400, sondeo y revisión de desagües.	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	08/05/2023	08/09/2023	5,43%	0,34%	Suministro e instalación de tubería PVC conduit 3"	
7	Pisos	06/09/2023	30/10/2023	2,33%	2,02%	Alistado de pisos en mortero, concreto de limpieza, junta de dilatación inducida piso en concreto allanado, suministro e instalación de bordillo prefabricado A-80.	
9	Carpintería metálica	06/09/2023	30/10/2023	0,07%	0,73%	Cerramiento contra impacto H=5,00m	
13	Pañete y pintura	19/05/2023	14/08/2023	6,07%	0,03%	Pañete liso sobre muro	
16	Obras exteriores	06/03/2023	29/06/2023	1,33%	0,53%	Cancha múltiple baloncesto - micofútbol, voleibol.	

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	18/07/2023	22/09/2023	5,85%	0,04%	Emulsión asfáltica impermeabilizante
20	Aseo y disposición final	13/05/2023	31/10/2023	0,80%	2,16%	Aseo general final y limpieza, embalaje y disposición final de teja en asbesto cemento con vinipel.
NP	Actividades no previstas	18/07/2023	24/10/2023	2,46%	21,01%	Suministro e instalación de teja Ecoroof 2,5 mm, mejoramiento material granular existente con adición de cemento, suministro e instalación de placa en concreto de 3500 con fibra.

Tabla 87. Avance de obra Colegio Floridablanca

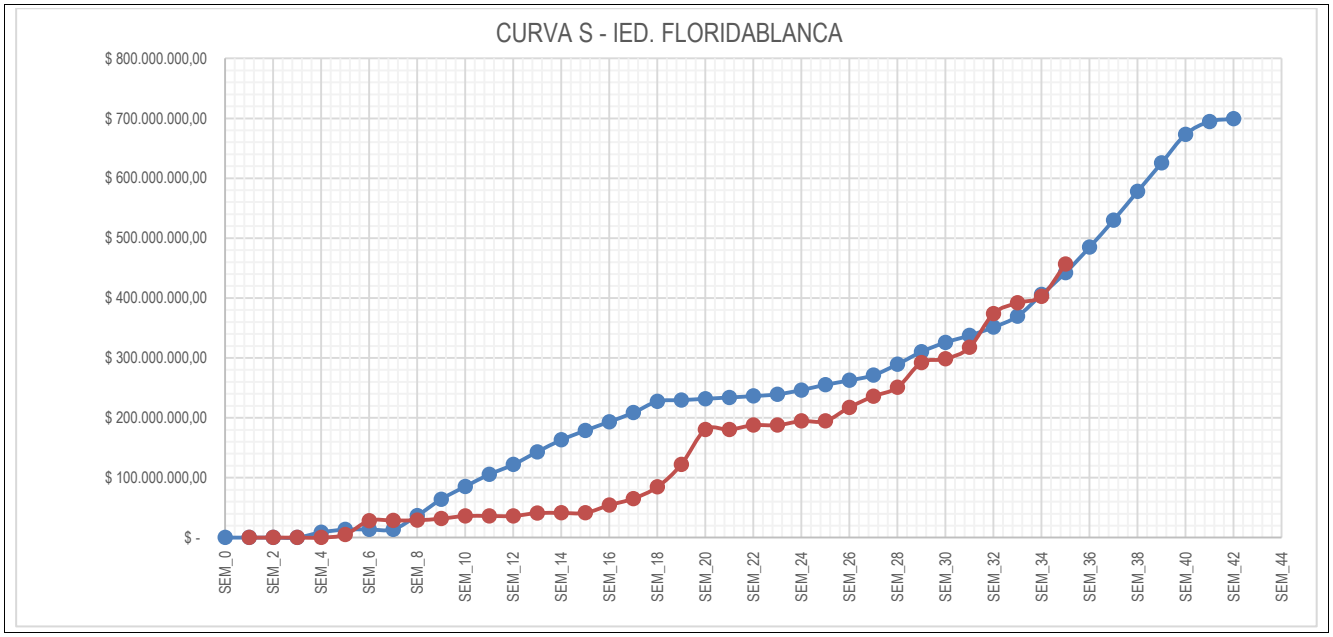

Gráfica 10. Curva programado vs ejecutado Floridablanca.

3.5.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona y replanteo, localización y replanteo.
- Demoliciones, desmontes y retiros: demolición de estructuras en concreto, demolición de placa maciza, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería, demolición de pañete y enchape de muros, demolición de pavimento asfáltico, demolición de encorozado, desmonte de puertas y ventanas, desmonte y desconexión de aparatos sanitarios, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de baranda metálica, desmonte de salidas eléctricas, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, desmonte de cancha múltiple, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, corte en concreto con pulidora, picado de muros de mampostería, limpieza de canales y bajantes.


- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común, suministro e instalación de subbase granular B-400.
- Concretos: Concreto corriente grava común 3000 PSI, zapata en concreto, sum e inst de viga cinta de confinamiento 12 x 20 cm, columnetas y viguetas en concreto de 3000 PSI, placa de contrapiso de 10 cm, pedestales en concreto, cuneta trapezoidal.
- Elementos en concreto: Construcción de cárcamo en concreto de 3000 PSI de 20 a 30 cm, cuneta trapezoidal 3000 PSI.
- Refuerzos: Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro e instalación de malla electro soldada 6mm.
- Estructura metálica: Suministro e instalación de estructura metálica.
- Mampostería: Muro divisorio en bloque No. 4 y No. 5.
- Elementos estructurales y no estructurales: Anclajes para varilla 3/8” L=0.25m, anclaje para sujeción de elementos en concreto y epóxico para ½” – 10 cm.
- Red sanitaria: Suministro e instalación de tubería PVCS 1-1/2”.
- Red de agua fría: Suministro e instalación de tubería PVCS 1-1/2”, Suministro e instalación de tubería PCVP RDE 9 de ½”.
- Puntos sanitarios de agua fría y agua caliente: Punto de agua fría sanitario lavamanos ½”.
- Redes de drenaje de aguas de infiltración: Suministro e instalación de geotextil tejido T1700.
- Instalaciones eléctricas y de comunicaciones: Salida para tomacorriente doble normal tipo institucional, suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre aislado, suministro e instalación de panel LED 120 x 30 cm.
- Alistado de pisos: Alistado de pisos en mortero, alistado de paso para escalera, media aña en granito, junta de dilatación inducida piso en concreto allanado.
- Acabados de pisos: Suministro e instalación de guarda escoba en media caña granito pulido, suministro e instalación de paso para escalera en gravilla lavada mona, piso en cerámica antideslizante tipo Mikonos, win de aluminio, suministro e instalación de guarda escobas en porcelanato.
- Carpintería metálica: Suministro e instalación de ventanas en aluminio tipo persiana.
- Aparatos sanitarios: Suministro e instalación de sanitario.
- Pañete y pintura: Pañete en muro 1:4 incluye filos y dilataciones, pañete liso sobre muro, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete.
- Pintura sobre muros y placa: Vinito tipo 1 a tres manos, pintura vinilo sobre muros interiores, pintura tipo Korasa o similar para fachada.
- Cielos rasos: cielo raso blanco PVC sistema 200GS.
- Cubiertas e impermeabilizaciones: flanche en lámina galvanizada calibre 20, canal de alta capacidad, suministro e instalación de caballete para teja tipo Ecoroof, sei de viga canal galvanizada.
- Aseo y disposición final: Embalaje y disposición final de teja en asbesto cemento.

- No previstos: Suministro e instalación de teja Ecoroof 2,5 mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato, suministro e instalación de placa en concreto de 3500 con fibra, desmonte de flanche.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A		25/01/2023	31/10/2023	64,00%	78,69%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-14,69%
1	Preliminares	08/02/2023	23/10/2023	8,81%	6,77%	Cerramiento en lona y replanteo, localización y replanteo, demolición de estructuras en concreto, demolición de placa maciza, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería, demolición de pañete y enchape de muros, demolición de pavimento asfáltico, demolición de encorozado, desmonte de puertas y ventanas, desmonte y desconexión de aparatos sanitarios, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de baranda metálica, desmonte de salidas eléctricas, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, desmonte de cancha múltiple, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, corte en concreto con pulidora, picado de muros de mampostería, limpieza de canales y bajantes.	
2	Estructura	08/05/2023	17/10/2023	6,15%	15,76%	Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400, concreto corriente grava común 3000 PSI, zapata en concreto 3000 PSI, suministro e instalación de viga cinta de confinamiento 12 x 20 cm, columnetas y viguetas en concreto de 20 x 15 cm, placa de contrapiso de 10cm, pedestales en concreto 3000 PSI, construcción de cárcamo en concreto de 20 a 30 cm, cuneta trapezoidal, suministro e instalación de acero de refuerzo, malla electro soldada y estructura metálica.	
3	Mampostería	01/06/2023	09/06/2023	0,27%	0,28%	Muro divisorio en bloque No. 4 y No. 5, anclajes de varilas 3/8", anclaje para sujeción de elementos 1/2"	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	05/07/2023	03/10/2023	0,79%	0,81%	Suministro e instalación de tubería PVCS 2", PVCP RDE 11 de 3/4", PVCP RDE 9 de 1/2", suministro e instalación de punto de agua fría sanitario tanque 1/2", punto de agua frio lavamanos 1/2" y suministro e instalación de geotextil tejido T1700.	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	19/09/2023	31/10/2023	0,00%	1,41%	Salida para tomacorriente doble normal tipo institucional, suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre aislado, suministro e instalación de panel LED 120 x 30 cm.	
7	Pisos	22/07/2023	29/09/2023	4,43%	3,14%	Alistado de pisos en mortero, alistado de paso para escalera en mortero, mediacaña en granito H=0.10m, suministro e instalación guarda escoba en media caña granito pulido, paso para escalera	

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
						en gravilla lavada mona, piso cerámica antideslizante tipo Mikonos, win de aluminio, suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato.
8	Mampostería seca	14/08/2023	24/08/2023	0,35%	0,00%	
9	Carpintería metálica	14/08/2023	13/10/2023	28,16%	9,21%	Suministro e instalación de ventana en aluminio con rejiilla superior, terminada, inclue vidrio de 4mm con película de seguridad
11	Aparatos sanitarios y accesorios	26/08/2023	30/08/2023	0,87%	0,32%	Suministro e instalación de sanitario
12	Aparatos y equipos especiales	29/08/2023	20/09/2023	1,23%	0,00%	
13	Pañete y pintura	29/06/2023	02/10/2023	2,35%	6,84%	Pañete muro incluye filos, pañete liso sobre muro, pañete muro impermeabilizado, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete, vinilo tipo 1 a tres manos, pintura vinilo sobre muros interiores, pintura tipo korasa para fachada.
14	Cielos rasos	09/08/2023	28/08/2023	2,26%	0,72%	Cielo raso blanco PVC color blanco
16	Obras exteriores	29/09/2023	5/10/223	0,00%	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	07/09/2023	28/09/2023	0,28%	0,97%	Flanche en lámina galvanizada calibre 20 desarrollo 0,25, canal de alta capacidad, suministro e instalación de caballete para teja tipo Ecoroof, SEI de viga canal galvanizada
20	Aseo y disposición final	14/04/2023	31/10/2023	3,18%	2,47%	Embalaje y disposición final de teja de asbesto cemento
NP	Actividades No previstas	22/07/2023	23/10/2023	4,87%	29,98%	Suministro e instalación de teja 2,5mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato, suministro e instalación de placa en concreto de 3500 con fibra, desmonte de flanche

Tabla 88. Avance de obra Colegio Jorge Eliecer Gaitán

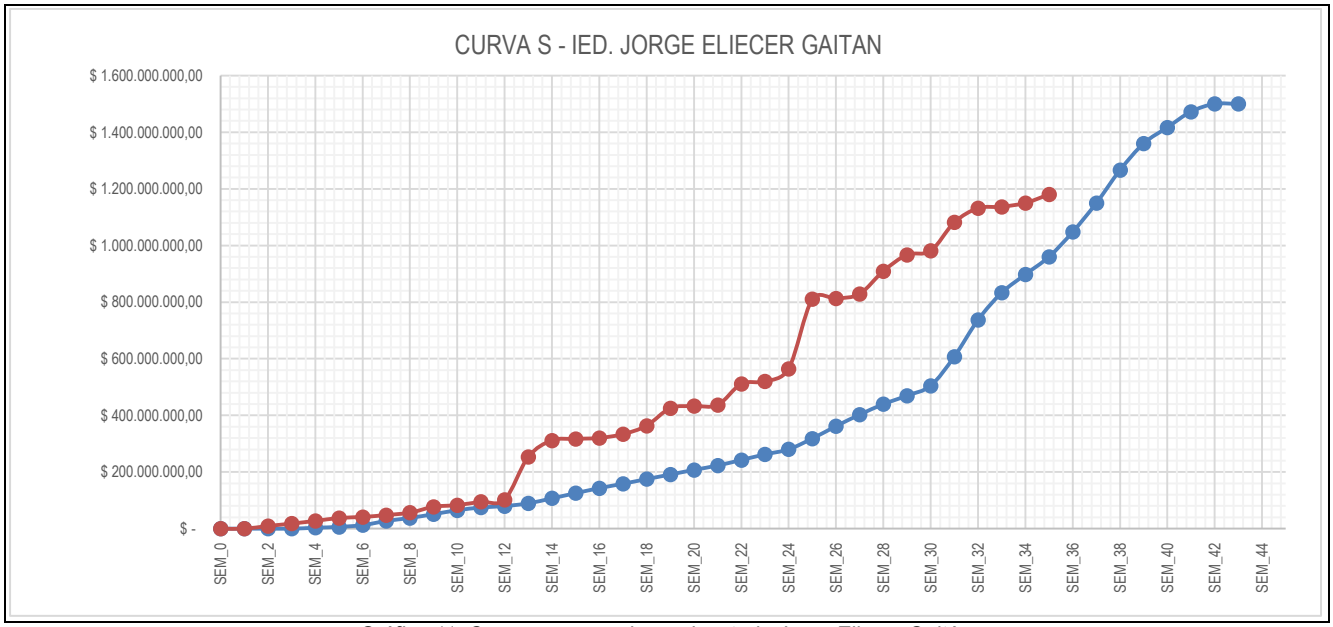

Gráfica 11. Curva programado vs ejecutado Jorge Eliecer Gaitán.

3.5.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto


- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 28 de septiembre de 2023).

3.5.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en teja de zinc, cerramiento en lona con parales.
- Demoliciones, desmontes y retiro: Demolición de placa maciza, demolición de acabado y alistado de piso, desmonte de puertas y ventanas, desmonte de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de lámparas, corte en concreto con pulidora espesor de 3mm, limpieza de canales y bajantes.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, relleno con material seleccionado, suministro e instalación de subbase granular B-400.
- Concretos: Concreto corriente grava común 3000 PSI, placa contra piso 10 cm.
- Refuerzos: Suministro e instalación de malla electro soldada 6mm.
- Estructura metálica: Suministro e instalación de estructura metálica.
- Mampostería: Muro traba normal en ladrillo prensado liviano 24 x 12 x 6 acabado a la vista.
- Elementos estructurales: Anclajes varilla 3/8” L=0.25 m, dovelas mampostería estructural.
- Redes hidrosanitarias: Suministro e instalación de tubería PVCS 2”, suministro e instalación de sifón de piso 2”, suministro e instalación de tubería PVCP RDE 9 de ½”.
- Alistado de pisos: Alistado de pisos en mortero.
- Acabados de pisos: Suministro y aplicación de sellador elástico, para sello de juntas a nivel de piso.
- Mampostería seca: Muro en superboard de 8mm, incluye estructura metálica.
- Pintura: Esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica de cubierta.
- Cubiertas e impermeabilizaciones: Instalación de lámina de policarbonato.
- Orden y aseo: Aseo general y limpieza, embalaje y disposición final de teja en asbesto.
- No previstos: Suministro e instalación de teja Ecoroof 2,5 mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de cerámica gran formato.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Rafael Bernal Jiménez, sede A		07/02/2023	27/09/2023	96,97%	61,26%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	35,71%
1	Preliminares	07/02/2023	17/05/2023	7,91%	8,21%	Replanteo, cerramiento en lona con parales, cerramiento en teja de zinc, demolición placa maciza h=0.10m, demolición de alistado de piso, demolición de acabado de piso, desmonte de puertas, ventanas, desmonte de todo tipo de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de lámparas, corte en concreto con pulidora y limpieza de canales.	
2	Estructura	23/02/2023	05/05/2023	2,03%	12,80%	Excavación manual en material común y recebo compactado, relleno en material seleccionado, suministro e instalación de subbase B-400, placa de contrapiso de 10 cm, instalación de malla electro soldada, suministro e instalación de estructura metálica.	
3	Mampostería	01/05/2023	17/05/2023	0,68%	0,07%	Muro traba normal en ladrillo prensado liviano, anclajes varilla 3/8" L=0.25m.	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	09/03/2023	11/03/2023	0,03%	0,14%	Suministro e instalación de tubería PVCS 2", suministro e instalación de sifón piso 2" y tubería PVCP RDE 9 de 1/2"	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	10/07/2023	29/07/2023	1,90%	0,00%		
7	Pisos	18/05/2023	26/07/2023	24,04%	3,38%	Alistado de piso en mortero, suministro y aplicación de sellador elástico, para sello de juntas a nivel de piso.	
8	Mampostería seca	12/07/2023	20/07/2023	0,57%	0,81%	Muro en superboard de 8 mm, incluye estructura metálica	
9	Carpintería metálica	06/05/2023	21/06/2023	13,37%	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	04/07/2023	08/07/2023	0,50%	0,00%		
13	Pañete y pintura	01/04/2023	25/07/2023	9,78%	4,00%	Esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica de cubierta	
16	Obras exteriores	04/03/2023	08/03/2023	0,07%	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	27/03/2023	08/07/2023	33,30%	9,63%	Instalación de lámina de policarbonato	
20	Aseo y disposición final	05/04/2023	29/07/2023	2,81%	5,22%	Aseo general y limpieza, disposición final teja en asbesto cemento.	
NP	Actividades no previstas			0,00%	17,02%	Suministro e instalación de teja 2,5mm, suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de ceramica gran formato.	

Tabla 89. Avance de obra Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A.

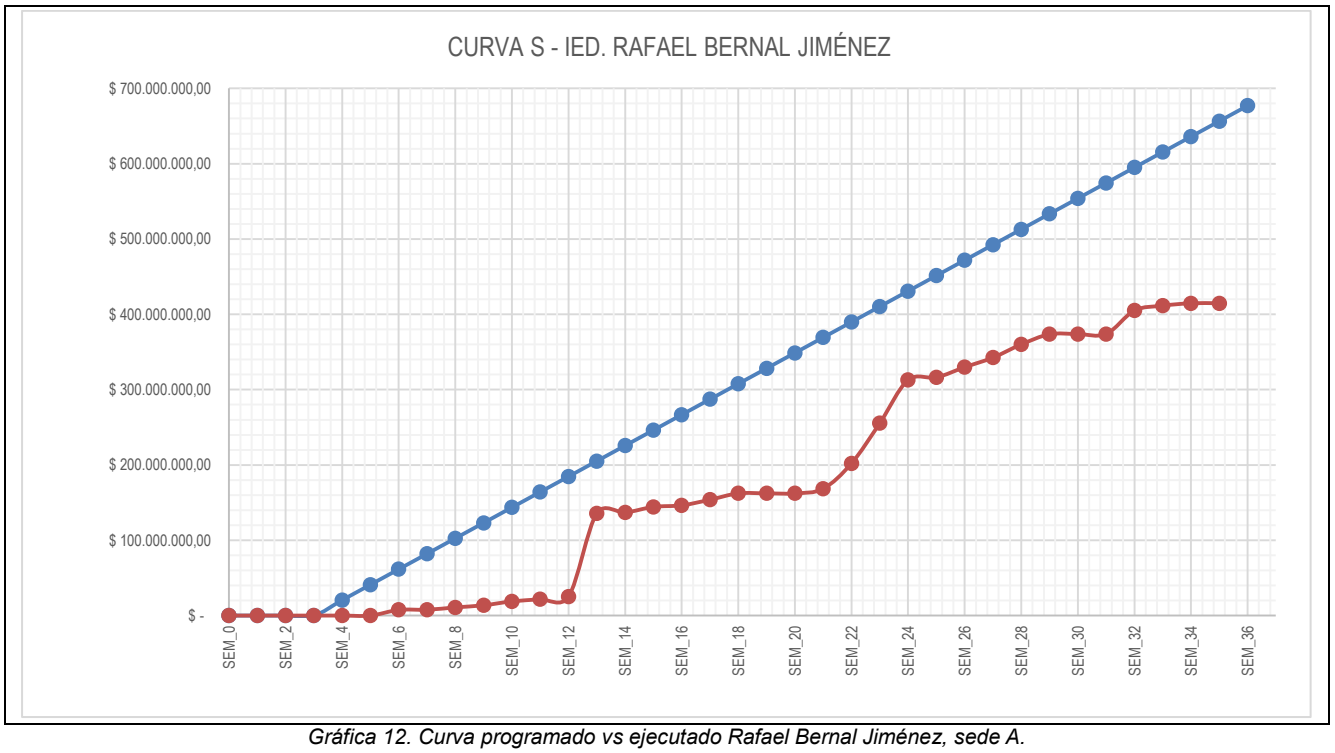

Gráfica 12. Curva programado vs ejecutado Rafael Bernal Jiménez, sede A.

3.5.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A


- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuestos.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona.
- Demoliciones, desmontes y retiros: Demolición de placa maciza, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería, demolición de enchape de muros, demolición de lavamanos, desmonte de puertas, desmonte y desconexión de aparatos sanitarios, desmonte de baranda metálica, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, desmonte de división sencilla, desmonte de baranda metálica, desmonte de lámparas, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso.
- Mampostería: Muro divisorio bloque estriado No. 4.
- Red sanitaria: Suministro e instalación de tubería PVC-S 4”, suministro e instalación de tubería PVC-S 2”.
- Red de agua fría: Suministro e instalación de tubería PVCP RDE 21 de 2”, suministro e instalación de tubería PVCP RDE 21 de 1-1/2”, suministro e instalación de tubería PVCP RDE 11 de 3/4”, suministro e instalación de tubería PVCP RDE 9 de ½.
- Puntos sanitarios de agua fría y agua caliente: Suministro e instalación punto agua fría sanitario ½”, suministro e instalación punto agua fría lavamanos ½”, suministro e instalación punto sanitario 4”, suministro e instalación punto sanitario 2”.

- Registros, cheques y válvulas: Suministro e instalación registro válvula de bola ½".
- Otros: Sondeo y revisión de desagües, suministro e instalación de válvula de bola 2".
- Instalaciones eléctricas y de comunicaciones: suministro e instalación de lámpara tipo LED 2x18W hermética.
- Pisos: Media caña en granito.
- Acabados de pisos: Suministro e instalación de baldosa en granito pulido, destronque y pulida de granito existente, win de aluminio.
- Aparatos sanitarios y accesorios: Suministro e instalación lavamanos de incrustar, suministro e instalación sanitario línea infantil, suministro e instalación orinal línea adulto, suministro e instalación lavamanos corrido en policuarzo, suministro e instalación de grifería de lavamanos, suministro e instalación de tapa registro de 20 x 20 plástica.
- Aparatos y equipos especiales: Suministro e instalación división puertas y paneles en acero calibre 20, suministro e instalación división de baño en acero inoxidable calibre 20.
- Pañete y pintura: Pañete muro, estuco sobre pañete.
- Pintura sobre muros y placas: Pintura epoxica a 3 manos.
- Aseo y disposición final: Aseo general y limpieza.
- No previstos: Suministro e instalación de cerámica gran formato, suministro e instalación sanitario adulto línea institucional.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Justo Víctor Charry		13/02/2023	15/07/2023	100,00%	74,11%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	25,89%
1	Preliminares	13/02/2023	08/04/2023	2,07%	5,25%	Replanteo, cerramiento en lona, demolición de placa maciza h=0.10m, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería, demolición de enchape de muros y pega, demolición de lavamanos, desmonte de puertas, desconexión de aparatos sanitarios, retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, desmonte de división sencilla o doble, desmonte de baranda metálica, desmonte de lámparas, perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso.	
3	Mampostería	31/03/2023	08/04/2023	5,94%	0,02%	Muro divisorio bloque estriado No 4	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	27/06/2023	10/07/2023	7,41%	0,55%	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, salida para tomacorriente doble normal GFCI tipo institucional, suministro e instalación de lámpara tipo LED hermética.	
7	Pisos	27/04/2023	01/05/2023	1,47%	1,59%	Mediacaña en granito, suministro e instalación de baldosa en granito pulido, destronque y pulida de granito existente, win de aluminio	
8	Mampostería seca	04/04/2023	26/04/2023	7,36%	0,00%		
9	Carpintería metálica	27/04/2023	14/06/2023	21,66%	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	27/04/2023	25/05/2023	17,69%	12,40%	Suministro de lavamanos de incrustar, sanitario línea infantil y orinal línea adulto, suministro e	

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
						instalación lavamanos corrido en policuarzo con subdivisión por módulo de servicio.
12	Aparatos y equipos especiales	20/05/2023	23/06/2023	15,18%	28,60%	Suministro e instalación división puertas y paneles en acero calibre 20, suministro e instalación división de baño en acero inoxidable para orinal.
13	Pañete y pintura	17/05/2023	26/06/2023	18,66%	6,10%	Pañete muro incluye filos, estuco sobre pañete, pintura epóxica a 3 manos
15	Cerraduras, vidrios y espejos	27/06/2023	01/07/2023	2,18%	0,00%	
20	Aseo y disposición final	10/04/2023	15/07/2023	0,37%	0,13%	Aseo general
NP	Actividades no previstas			0,00%	19,46%	Suministro e instalación de cerámica gran formato, suministro e instalación sanitario adulto línea institucional color blanco.

Tabla 90. Avance de obra Colegio Justo Víctor Charry

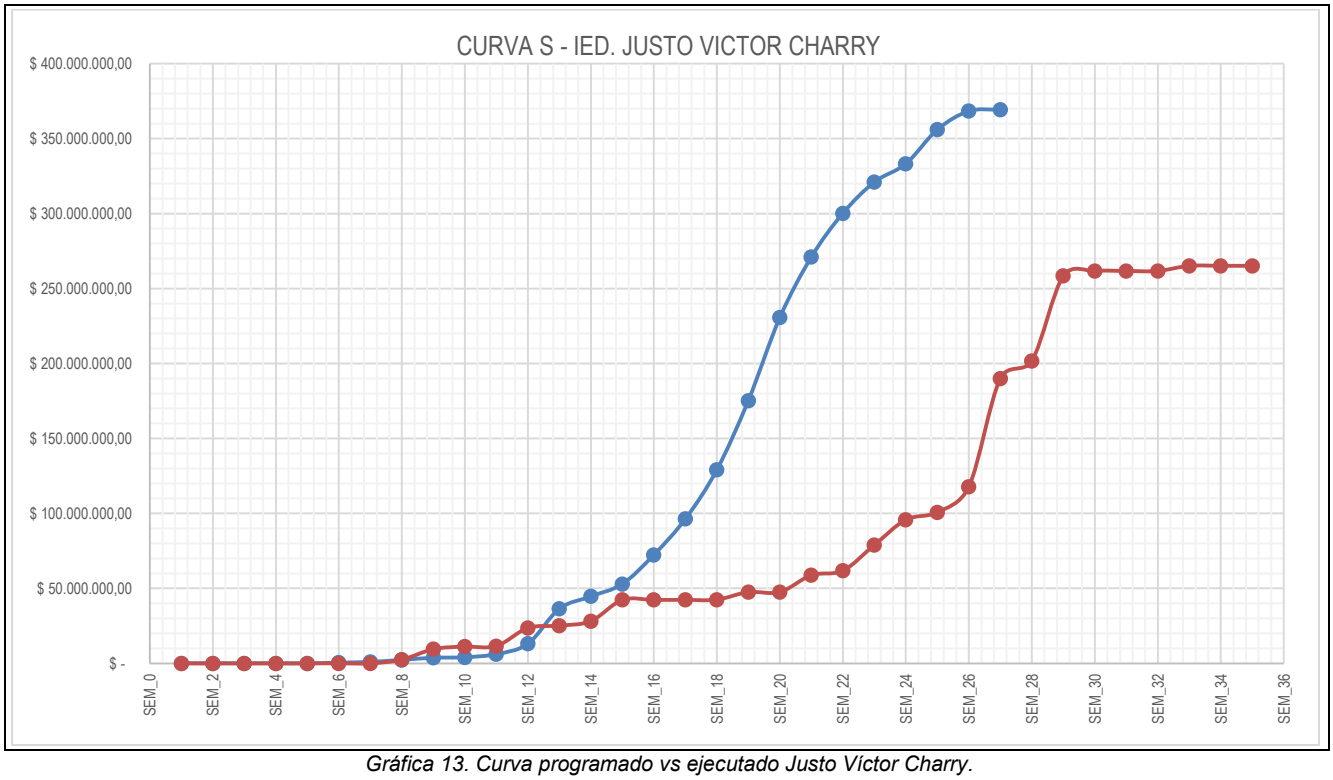

Gráfica 13. Curva programado vs ejecutado Justo Víctor Charry.

3.5.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 04 de diciembre de 2023).


3.5.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.

- Obras preliminares: Cerramiento en lona.
- Demoliciones, desmontes y retiro: Demolición de placa maciza H=0.10, demolición de acabado y alistado de piso E=0.08 a 0.12 cm, desmonte de todo tipo de cubierta y cielo raso existente, desmonte de lámparas.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en recebo compactado.
- Estructura: Suministro e instalación de estructura metálica.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Simón Bolívar		13/09/2023	25/04/2023	0,00%	7,77%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	40,24%
1	Preliminares			0,00%	4,34%	Cerramiento en lona con parales de madera anclados al piso, demolición de placa maciza H=0.10, demolición de acabado y alistado de piso E=0.08a 0.12 cm, desmonte de todo tipo de cielo raso existente, desmonte de lámparas.	
2	Estructura			0,00%	3,43%	Excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de estructura metálica	
3	Mampostería			0,00%	0,00%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio			0,00%	0,00%		
7	Pisos			0,00%	0,00%		
13	Pañete y pintura			0,00%	0,00%		
16	Obras exteriores			0,00%	0,00%		
20	Aseo y disposición final			0,00%	0,00%		

Tabla 91 Avance de obra Colegio Simón Bolívar

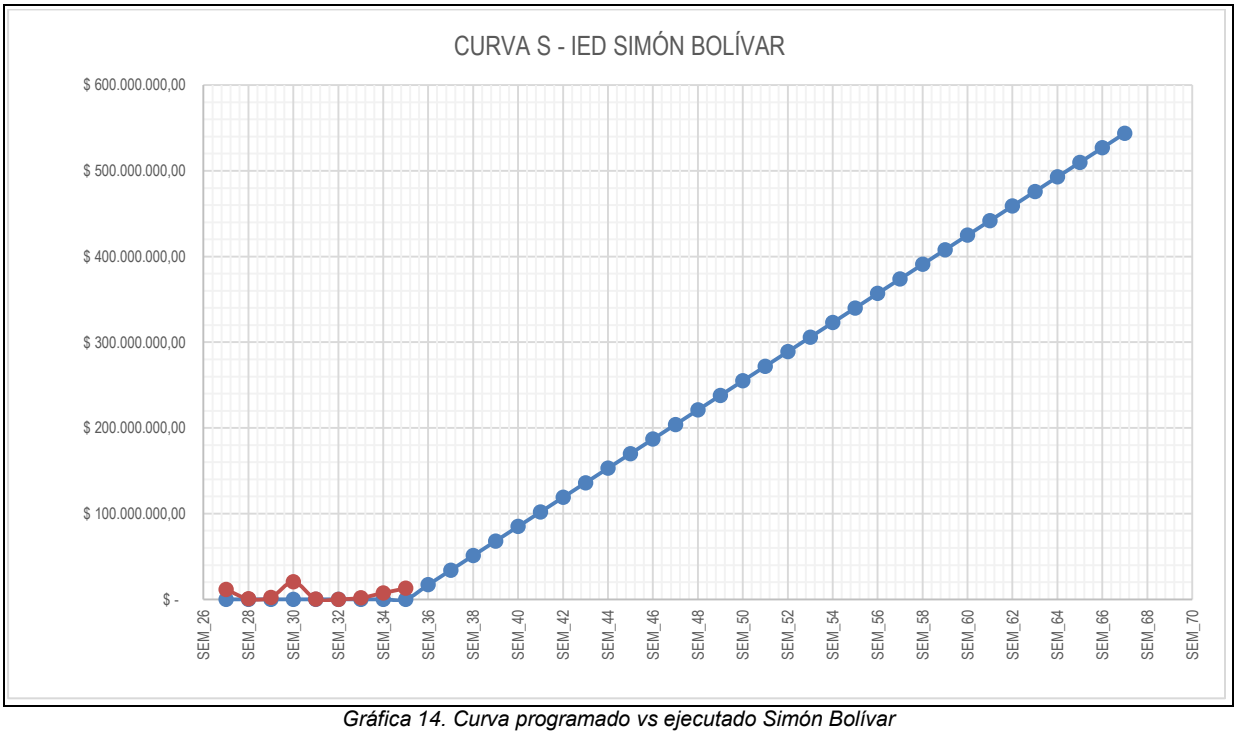

Gráfica 14. Curva programado vs ejecutado Simón Bolívar


3.5.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en teja de zinc, cerramiento en lona con parales.
- Demoliciones, desmontes y retiro: Demolición de muro en mampostería, demolición de encorozado de cubierta, desmonte de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, retiro de manto de aluminio sobre cubiertas, mantenimiento de ventanería y rejas, corte, mantenimiento y pintura de puertas metálicas, limpieza de canales y bajantes.
- Estructura: Suministro e instalación de viga cinta de confinamiento 12 x 20 cm, viga de amarre en concreto 3000 PSI.
- Refuerzo: Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60.000PSI.
- Estructura metálica: Suministro e instalación de estructura metálica.
- Mampostería: Muro en ladrillo prensado macizo.
- Instalaciones eléctricas y de comunicaciones: suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, salida para tomacorriente doble normal tipo institucional, suministro e instalación de salida para luminaria.
- Cubiertas e impermeabilizaciones: flanche en lámina galvanizada calibre 20, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio.
- Aseo y disposición final: Embalaje y disposición final de teja de asbesto cemento.
- No previstos: Suministro e instalación de teja Ecoroof 2,5mm.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
IED Garcés Navas		01/02/2023	21/09/2023	82,09%	81,55%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 0,54%
1	Preliminares	18/02/2023	26/04/2023	10,78%	14,00%	Cerramiento en lona con parales, cerramiento en teja de zinc, demolición de muro en mampostería con acabados, demolición de encorozado de cubierta, desmonte de todo tipo de cubierta, desmonte de cielo raso, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, retiro de manto de aluminio sobre cubiertas, mantenimiento de ventanería y rejas, corte, mantenimiento y pintura de puertas metálicas, limpieza de canales y bajantes.
2	Estructura	13/04/2023	06/07/2023	22,12%	22,31%	Suministro e instalación de viga cinta de confinamiento, viga de amarre en concreto de 3000PSI, suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro e instalación de estructura metálica.
3	Mampostería	09/03/2023	22/03/2023	0,62%	0,62%	Muro en ladrillo prensado macizo

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	07/09/2023	30/09/2023	5,56%	3,36%	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, salida para toma corriente doble normal tipo institucional, suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre aislado.
11	Aparatos sanitarios y accesorios	19/09/2023	19/09/2023	0,00%	0,00%	
14	Cielos rasos	30/08/2023	31/08/2023	0,08%	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	07/07/2023	24/08/2023	4,05%	3,75%	Flanche en lámina galvanizada calibre 20 desarrollo 0.25, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio.
20	Aseo y disposición final	04/03/2023	21/09/2023	13,33%	12,59%	Embalaje y disposición final de teja de asbesto cemento
NP	Actividades no previstas	10/07/2023	12/08/2023	25,56%	25,00%	Suministro e instalación de cubierta en teja termo acústica UPVC

Tabla 92. Avance de obra Colegio Garcés Navas

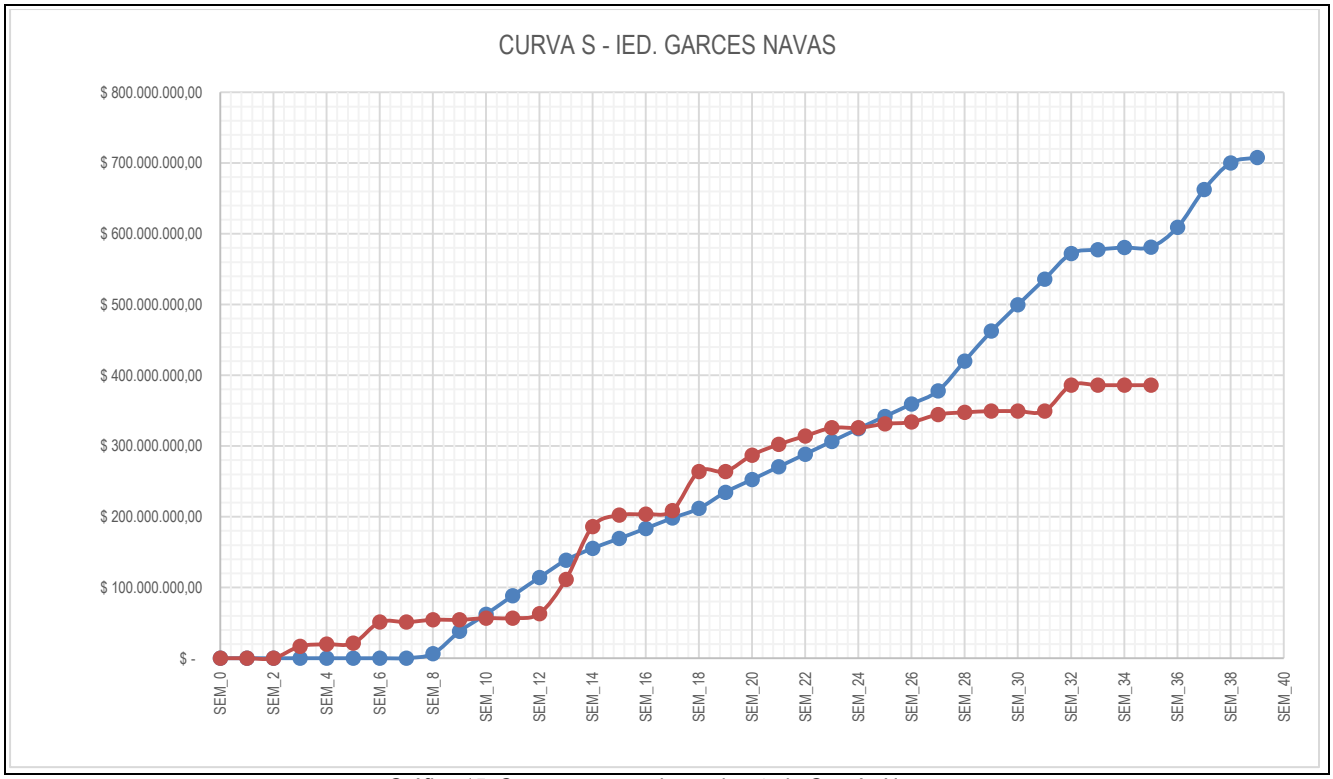

Gráfica 15. Curva programado vs ejecutado Garcés Navas.

3.5.2.19. Colegio República de Panamá, sede A


- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona con parales de madera.

- Demoliciones, desmontes y retiro: Demolición de estructuras en concreto, demolición de viga en concreto, demolición de alistado de piso E=0.04 a 0.06 M, demolición muro en mampostería, demolición de enchape de muros y pega, desmonte de puertas y ventanas, desmonte y desconexión de aparatos sanitarios, desmonte de cubierta existente, desmonte de división sencilla o doble indiferente al material, desmonte de lámparas, corte en concreto con pulidora.
- Concretos: Concreto corriente grava común 3000 PSI mezclado en sitio.
- Refuerzos: Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI.
- Mampostería: Muro divisorio bloque estriado No. 4, muro bloque hueco No. 4, muro traba petaca en ladrillo prensado liviano.
- Carpintería metálica: Suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior.
- Pañete y estuco de muros: Pañete muro 1:4, incluye filos y dilataciones, pañete liso sobre muro 1:4, estuco filos sobre pañete.
- Pintura: Vinilo tipo 1 a tres manos.
- Aseo y disposición final: Disposición final de teja en asbesto y embalaje de teja en asbesto cemento.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED República de Panamá		17/07/2023	06/01/2024	0,88%	7,60%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-6,72%
1	Preliminares	21/08/2023	12/10/2023	0,00%	2,44%	Cerramiento en lona con parales de madera anclados al piso, demolición de estructuras en concreto, demolición de viga en concreto, demolición de alistado de piso E=0.04 a E=0.06 m, demolición de muro en mampostería con acabados E=0.15 m, demolición de enchape de muros y pega, desmonte de puertas y ventanas todo tamaño, desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos, desmonte de todo tipo de cubierta, desmonte de división sencilla o doble indiferente al material, desmonte de lámparas, corte en concreto con pulidora.	
2	Estructura	17/07/2023	16/11/2023	0,88%	0,16%	Concreto corriente grava común 3000 PSI mezclado en sitio, suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI.	
3	Mampostería	30/09/2023	02/10/2023	0,00%	0,45%	Muro divisorio bloque estriado No. 4, muro bloque hueco No. 4, muro traba petaca en ladrillo prensado liviano.	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	17/11/2023	19/12/2023	0,00%	0,00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	11/12/2023	16/12/2023	0,00%	0,00%		
6	Sistema de detección de incendio y red contra incendio	14/12/223	15/12/2023	0,00%	0,00%		
7	Pisos	25/09/2023	24/10/2023	0,00%	0,00%		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
8	Mampostería seca	25/10/2023	30/12/2023	0,00%	0,00%	
9	Carpintería metálica	25/10/2023	30/12/2023	0,00%	1,72%	Suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior, terminada, incluye vidrio de 4 mm incoloro con película de seguridad y herrajes.
10	Carpintería madera	03/01/2024	04/01/2024	0,00%	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	25/10/2023	31/10/2023	0,00%	0,00%	
12	Aparatos y equipos especiales	31/10/2023	02/11/2023	0,00%	0,00%	
13	Pañete y pintura	03/10/2023	30/10/2023	0,00%	2,10%	Pañete muro 1:4, incluye filos y dilataciones, pañete liso sobre muro, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete, vinilo tipo 1 a tres manos.
15	Cerraduras, vidrios y espejos	31/10/2023	08/11/2023	0,00%	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	17/11/2023	21/12/2023	0,00%	0,00%	
20	Aseo y disposición final	13/10/2023	06/01/2024	0,00%	0,73%	Disposición final y embalaje de teja en asbesto cemento

Tabla 93. Avance de obra Colegio República de Panamá

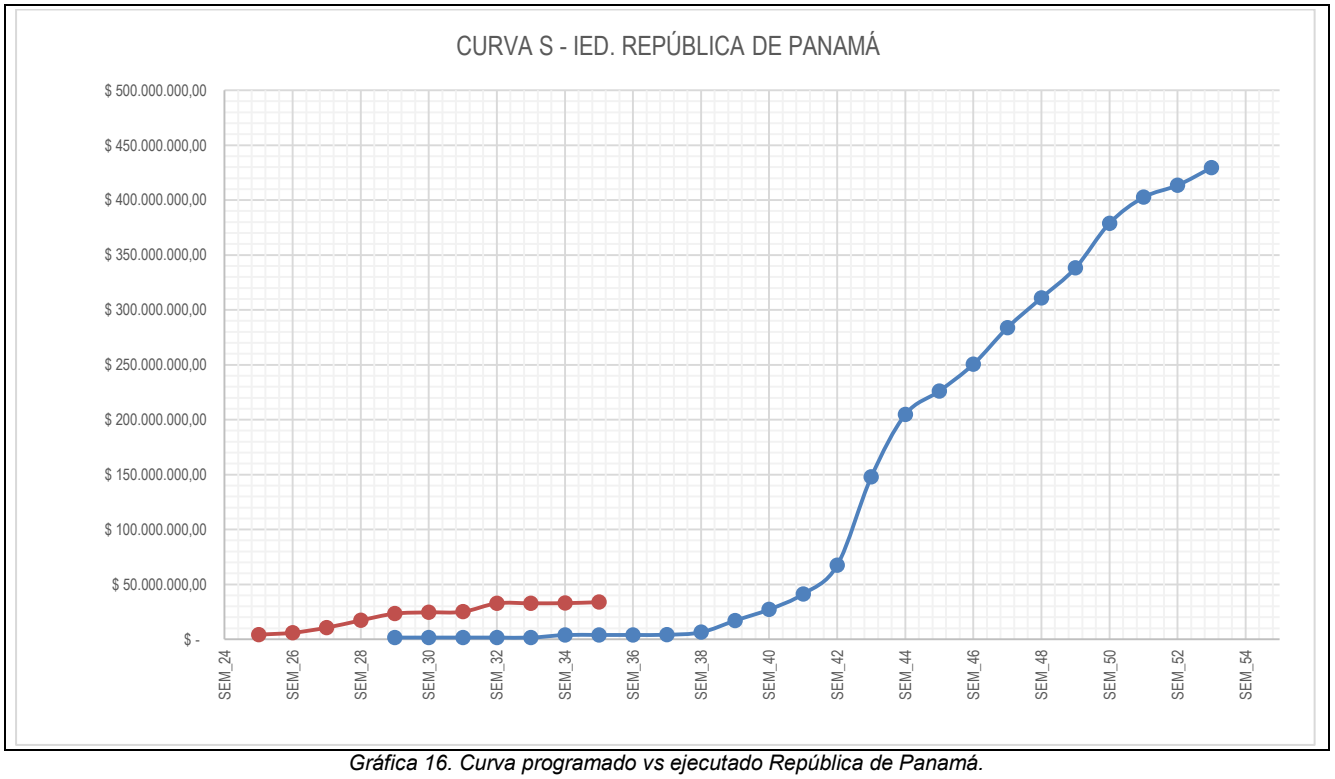

Gráfica 16. Curva programado vs ejecutado República de Panamá.

3.5.2.20. Colegio Juan del Corral, sede B

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 04 de diciembre de 2023).


3.5.2.21. Colegio San José Norte, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona.
- Demoliciones, desmontes y retiro: Demolición de estructuras en concreto, demolición columna existente en concreto, demolición placa maciza H=0.10, H=0,15M, demolición de placa contrapiso 0.15M, demolición alfajía en concreto E=0.15M, demolición de alistado de piso E=0.08 a 0.12 CM, demolición de muro en mampostería, demolición de enchape, desmonte de puertas y ventanas, desmonte desconexión de aparatos sanitarios, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de tanque elevado, desmonte de todo tipo de cubierta existente, desmonte de división sencilla, desmonte de salidas eléctricas, desmonte de canaleta metálica, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica, desmonte de muebles existentes altos y bajos, corte en concreto con pulidora, picado de muros de mampostería.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400.
- Concreto: Viga de cimentación en concreto 3000 PSI de 20 x 15 cm, placa contra piso de 10 cm – concreto 3000 PSI.
- Refuerzo: Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI y malla electro soldada 6mm.
- Estructura metálica: Suministro e instalación de estructura metálica.
- Mampostería: Muro divisorio bloque estriado No. 5.
- Elementos estructurales: anclajes varilla 3/8” L=0,25m, suministro e instalación anclaje epoxico 3/8”.
- Red sanitaria: Suministro e instalación tubería PVCS 2”, sifón de piso 2”.
- Red de agua fría: Suministro e instalación de tubería PVCP RDE 9 de ½”, suministro e instalación de punto sanitario 4” y 2”.
- Registros, cheques y válvulas: Suministro e instalación registro válvula de bola ½”.
- Cajas y pozos de inspección: Limpieza de cajas de inspección.
- Redes de drenaje aguas de infiltración: Suministro e instalación geotextil tejido T1700.
- Pisos: Alistado de pisos en mortero 1:3 E=0.04
- Acabados de pisos: Suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato.
- Pañete y pintura: Pañete muro 1:4, incluye filos y dilataciones, pañete liso sobre muro, pañete liso bajo placa 1:4, estuco sobre pañete.
- Aseo y disposición final: protección provisional de elementos y superficies existentes.

- No previstos: suministro e instalación de teja Ecoroof 2,5 mm, suministro e instalación de cerámica gran formato.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED San José Norte		10/05/2023	30/11/2023	20,43%	15,81%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	4,62%
1	Preliminares	07/06/2023	30/11/2023	1,80%	3,89%	Cerramiento en lona, demolición de estructuras en concreto, demolición de columna existente en concreto, demolición de placa maciza h=010m, demolición placa maciza h=0.15m, demolición placa contra piso h=0.15m, demolición acabado y alistado de piso E=0.08 a 0.12 cm, demolición muro en mampostería, demolición enchape de muros y pega, desmonte de puertas y ventanas, desconexión de aparatos sanitarios, retiro de tuberías hidrosanitarias existentes, desmonte de salidas eléctricas, desmonte de canaleta metálica troquelada, desmonte de red eléctrica, desmonte de muebles existentes, corte y regatas en concreto para instalación de tubería.	
2	Estructura	15/07/2023	09/10/2023	2,41%	2,78%	Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400, placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 PSI, suministro e instalación malla electro soldada 6mm.	
3	Mampostería	23/11/2023	28/11/2023	0,00%	0,14%	Muro divisorio bloque estriado No. 5, anclajes varilla 3/8" L=0.25m	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	22/09/2023	04/12/2023	0,00%	0,28%	Suministro e instalación de tubería PVCS 2", suministro e instalación de sifón de piso 2", suministro e instalación de tubería PVCP RDE 9 de 1/2", punto sanitario 4", punto sanitario 2", suministro e instalación de registro valvula de bola 1/2", limpieza de cajas de inspección, suministro e instalación geotextil tejido T1700	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	09/11/2023	28/11/2023	0,00%	0,00%		
7	Pisos	04/10/2023	28/10/2023	0,00%	0,36%	Alistado de pisos en mortero 1:3 E=0.04, suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato	
8	Mampostería seca	30/10/2023	31/10/2023	0,00%	0,00%		
9	Carpintería metálica	27/10/2023	13/11/2023	0,00%	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	14/11/2023	18/11/2023	0,00%	0,00%		
12	Aparatos y equipos especiales	14/11/2023	23/11/2023	0,00%	0,00%		
13	Pañete y pintura	16/10/2023	16/11/2023	0,00%	0,99%	Pañete muro incluye filos, pañete liso sobre muro, pañete liso bajo placa 1:4, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete	
15	Cerraduras, vidrios y espejos	25/10/2023	25/10/2023	0,00%	0,00%		
16	Obras exteriores	11/08/2023	28/12/2023	11,81%	0,00%		
20	Aseo y disposición final	21/06/2023	28/12/2023	0,60%	0,11%	Protección provisional de elementos y superficies existentes con cartón, plástico o similar	
NP	No Previstos	19/08/2023	28/12/2023	3,81%	7,25%	Suministro e instalación de porcelanato de alto tráfico, suministro e instalación de teja Ecoroof, suministro e instalación de cerámica gran formato	

Tabla 94. Avance de obra San José Norte.

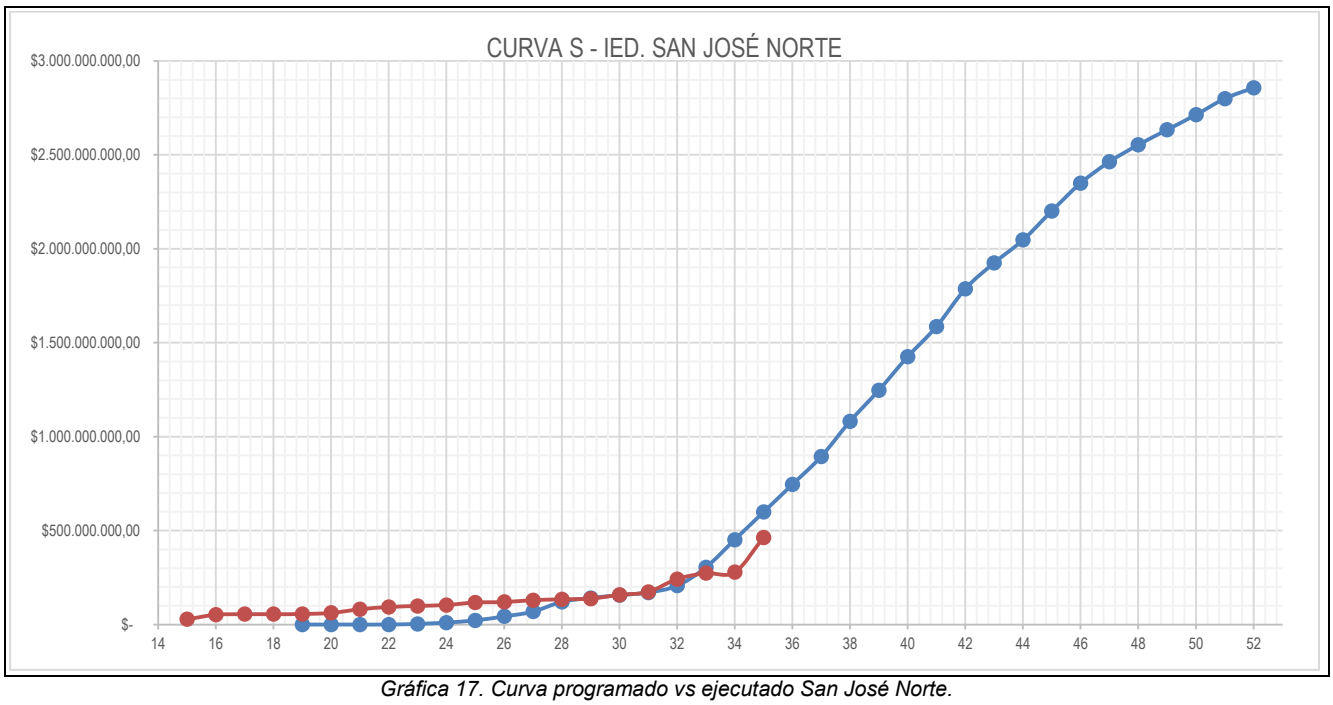

Gráfica 17. Curva programado vs ejecutado San José Norte.

3.5.2.22. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede C

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 01 de noviembre de 2023).

3.5.2.23. Colegio Villa Amalia

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 03 de enero de 2024).

3.5.2.24. Colegio Francisco Primero, sede B

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 03 de enero de 2024).

3.5.2.25. Colegio Torquigua, sede A

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 03 de enero de 2024).

3.5.2.26. Colegio Laureano Gómez, sede A

- Frente de obra pendiente de inicio. (Fecha programada de inicio: 03 de enero de 2024).


3.5.2.27. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona con parales.
- Demoliciones, desmontes y retiro: Demolición de placa maciza H=0.10 m, demolición de alistado de piso E=0.04 a 0.06 M, desmonte de juego infantil indiferente al material.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400.
- Concretos: Concreto corriente grava común 3000 PSI, zapata en concreto, viga 30x40 en concreto, suministro e instalación de columna confinamiento 20 x 15 cm, placa contrapiso de 10 cm.
- Refuerzo: Suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro e instalación malla electro soldada 5mm.
- Mampostería: Muro divisorio bloque No. 5, muro ladrillo estructural portante 30 x 12 cm.
- Red sanitaria: Suministro e instalación tubería PVCL 3”, suministro e instalación tubería PVCP RDE 9 de ½”.
- Mampostería seca: uro en superboard de 8 mm.
- Pañete y pintura: pañete muro, pintura tipo korasa sobre fachada.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
IED Rafael Bernal Jiménez, sede B		17/07/2023	25/04/2024	17,06%	28,24%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** -11,18%
1	Preliminares			17,06%	7,61%	Cerramiento en lona con parales de madera anclados al piso., demolición de placa maciza H=0.10, demolición de alistado de piso E=0.04 a 0.06 m, desmonte de juego infantil indiferente al material
2	Estructura			0,00%	14,63%	Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400, zapara en concreto 3000 PSI, viga 30x40 en concreto 3000 PSI, suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro e instalación de malla electro soldada 5 mm.
3	Mampostería			0,00%	3,46%	Muro divisorio bloque estriado No. 5, muro ladrillo estructural portante 30 x 12 cm.
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio			0,00%	0,42%	Suministro e instalación de tubería PVCL 3", suministro e instalación tubería PVCP RDE 9 de 1/2"
7	Pisos			0,00%	0,00%	

13	Pañete y pintura			0,00%	2,12%	Pañete muro, incluye filos y dilataciones, pintura Korasa o similar para fachada.
16	Obras exteriores			0,00%	0,00%	
20	Aseo y disposición final			0,00%	0,00%	

Tabla 95. Avance de obra Rafael Bernal Jiménez, sede B.

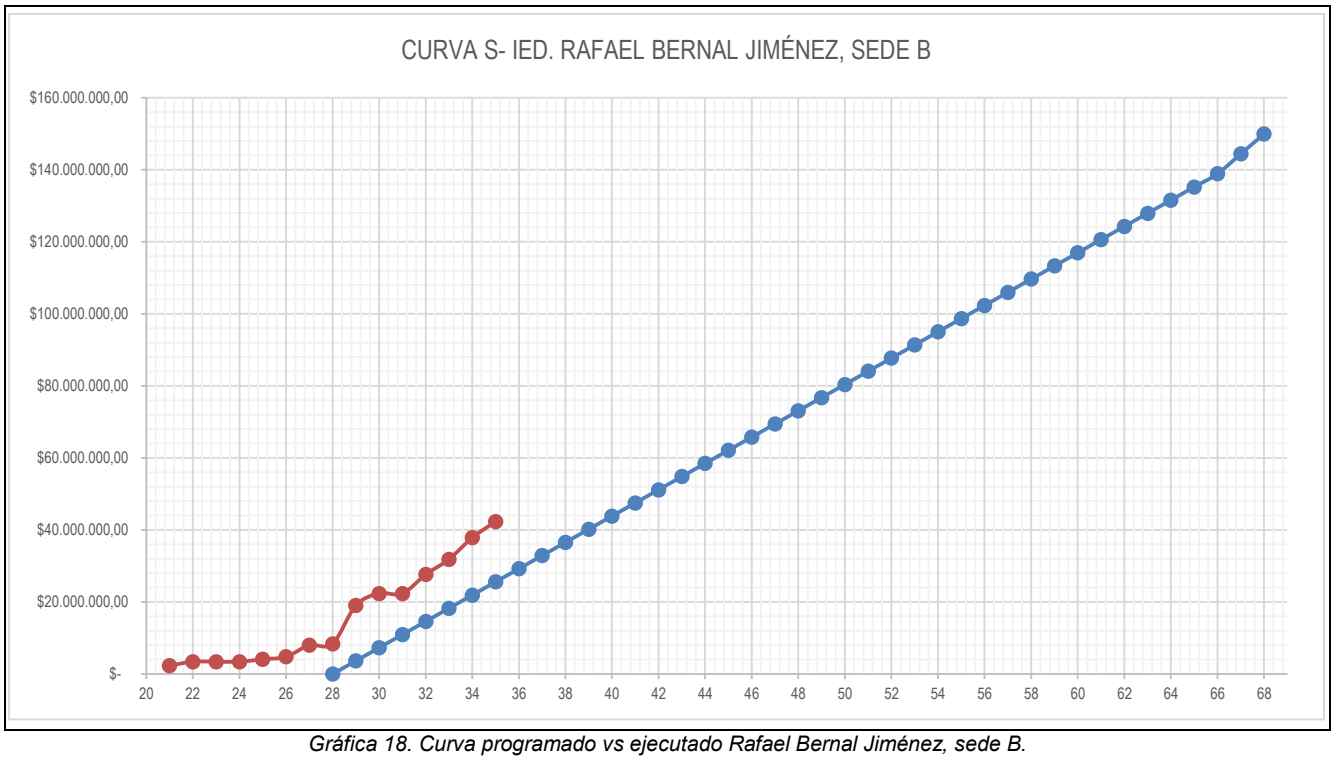

Gráfica 18. Curva programado vs ejecutado Rafael Bernal Jiménez, sede B.


3.5.2.28. IT Francisco José de Caldas, Bachillerato Internacional

- Ejecución de presupuesto.
- Obras preliminares: Replanteo.
- Demoliciones, desmontes y retiro: demolición de alistado de piso, demolición de pañete, limpieza de viga canal, corte con pulidora, resane de fisuras en muros.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en recebo compactado.
- Concretos: Placa contrapiso de 10 cm.
- Refuerzo: Suministro e instalación malla electro soldada 6mm.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
IED Francisco José de Caldas, sede A, Bachillerato Internacional		05/09/2023	30/11/2024	0,00%	1,31%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-1,31%
1	Preliminares			0,00%	1,31%	Replanteo, demolición de acabado de piso, demolición de pañete, corte con pulidora, limpieza de viga canal, resane fisuras en muros.	
2	Estructura			0,00%	0,00%	Excavación manual en recebo compactado, placa contra piso de 10 cm, malla electro soldada 6 mm.	

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
3	Mampostería			0,00%	0,00%	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio			0,00%	0,00%	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones			0,00%	0,00%	
7	Pisos			0,00%	0,00%	
9	Carpintería metálica			0,00%	0,00%	
13	Pañete y pintura			0,00%	0,00%	
16	Obras exteriores			0,00%	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones			0,00%	0,00%	
20	Aseo y disposición final			0,00%	0,00%	
NP	Actividades No previstas			0,00%	0,00%	

Tabla 96. Avance de obra IT Francisco José de Caldas, Bachillerato Internacional.

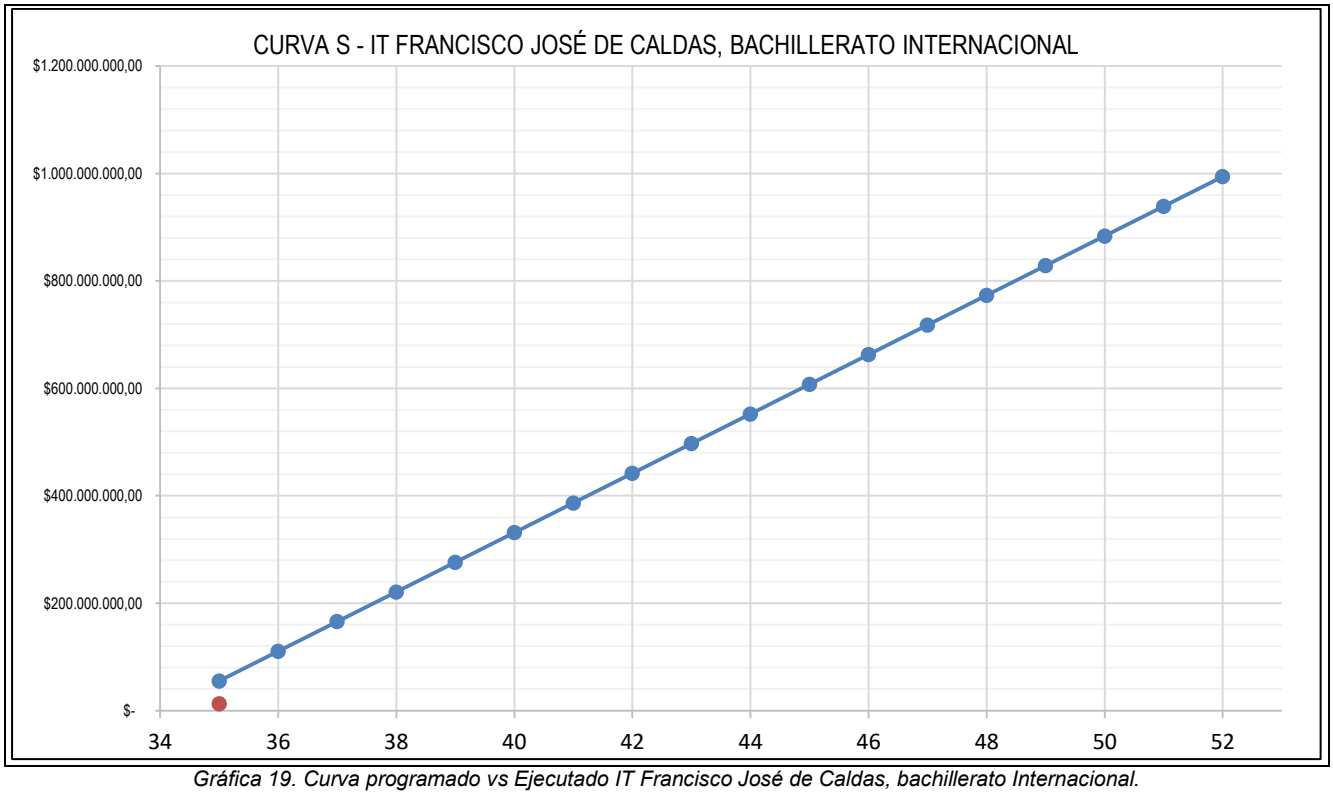

Gráfica 19. Curva programado vs Ejecutado IT Francisco José de Caldas, bachillerato Internacional.

3.5.3. ATENCIÓN EMERGENCIAS EDUCATIVAS

3.5.3.1. IED Morisco

En atención a emergencias se interviene red hidrosanitaria del colegio mediante sondeo de tuberías, limpieza de sifones, mantenimiento y limpieza de cajas, demolición de enchape de piso, pañete y afinado de caja de paso exterior, alistamiento para enchape, instalación de enchape de piso y elaboración de tapas de cajas de Inspección; dejando en funcionamiento la batería sanitaria afectada.

IED MORISCO					
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDA ESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,72	$ 30.460,00	$ 204.691,20
	SUBTOTAL				$ 204.691,20
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	4,00	$ 45.116,00	$ 180.464,00
	SUBTOTAL				$ 180.464,00
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	6,00	$ 32.621,00	$ 195.726,00
4.11	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.11.20	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	5,00	$ 144.310,00	$ 721.550,00
	SUBTOTAL				$ 917.276,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	6,72	$ 43.727,00	$ 293.845,44
7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	65,71	$ 21.334,00	$ 1.401.857,14
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDA ESCOBA BISELADO	M2	7,39	$ 150.374,00	$ 1.111.263,86
7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2	39,68	$ 30.565,00	$ 1.212.819,20
7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	3,50	$ 73.121,00	$ 255.923,50
	SUBTOTAL				$ 4.275.709,14
8	**MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1	**MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE FORMATO 20.5 X 20.5 CM COLOR BLANCO	M2	1,00	$ 58.002,00	$ 58.002,00
	SUBTOTAL				$ 58.002,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	63,68	$ 7.657,00	$ 487.597,76
	SUBTOTAL				$ 487.597,76
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				

NP 13	TAPAS DE INSPECCIÓN SELLADAS EN CONCRETO 0.80*0.80 (INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO)	UND	2,00	$438.531,00	$877.062,00
NP 14	TAPAS DE INSPECCIÓN SELLADAS, EN CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO 1.00*1.00MTS	UND	2,00	$470.656,00	$941.312,00
NP 15	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE REJILLAS DE CÁRCAMO EXISTENTE (LA ENTIDAD LAS SUMINISTRA)	ML	46,00	$14.452,00	$664.792,00
	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA	M	3,50	$ 38.400,00	$ 134.400,00
	SONDEO TUBERÍA SANITARÍA	M	46,00	$ 27.300,00	$ 1.255.800,00
SUBTOTAL					$ 3.873.366,00
TOTAL					**$ 9.997.106,10**

Tabla 97. Presupuesto emergencia IED Morisco

Posterior a intervención realizada en batería sanitaria, se interviene emergencia con tala de dos individuos arbóreos y se brinda tratamiento a otras dos especies.

Se realiza intervención en aula de bachillerato internacional con instalación de muro en Dry Wall doble cara, instalación de luminaria y aplicación de estuco y pintura sobre muro.

3.5.3.2. IED Rafael Bernal Jiménez, sede B

En atención a emergencias se realiza intervención en IED Rafael Bernal Jiménez, sede B en zonas afectadas; se realiza prueba de geofonía para encontrar fugas de agua, reparaciones en concreto, instalación de una universal y se retiran dos uniones de reparación.

IED BERNAL JIMÉNEZ, SEDE B					
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,50	$ 30.460,00	$ 15.230,00
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 14.791,00	$ 31.002,00
SUBTOTAL					$ 44.812,00
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.3	**RED DE AGUA FRÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**				
4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	3,00	$ 16.443,00	$ 49.329,00
4.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	7,00	$ 7.440,00	$ 52.080,00
SUBTOTAL					$ 101.409,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	0,50	$ 43.727,00	$ 21.864,00
7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	3,00	$ 21.334,00	$ 64.002,00
SUBTOTAL					$ 85.866,00

7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDA ESCOBA BISELADO	M2	0,50	$ 150.374,00	$ 75.187,00
7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2	0,50	$ 30.565,00	$ 15.283,00
7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	3,00	$ 73.121,00	$ 219.363,00
	SUBTOTAL				$ 309.833,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	12,00	$ 7.657,00	$ 91.884,00
	SUBTOTAL				$ 91.884,00
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				
NP 11	PRUEBA DE GEÓFONO	UND	1,00	$684.990,00	$684.990,00
NP	DEMOLICIÓN MEDIA CAÑA	ML	1,00	$38.400,00	$38.400,00
NP	REPARACIÓN DE PLACA	UND	4,00	$68.634,50	$274.538,00
	SUBTOTAL				$ 997.928,00
	TOTAL				**$ 1.631.732,00**

Tabla 98. Presupuesto emergencia IED Bernal Jiménez, sede B

3.5.3.3. IED Nydia Quintero de Turbay Sede A

En atención a emergencias se efectúa intervención de tanque de almacenamiento de la institución educativa con la impermeabilización del mismo con geomembrana e instalación escalera para acceso.

IED NYDIA QUINTERO DE TURBAY					
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	70,91	$ 20.851,00	$ 1.478.544,00
	SUBTOTAL				$ 1.478.544,00
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.18	LAVADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES A LA VISTA	M2	183,89	$ 12.685,00	$ 2.332.645,00
	SUBTOTAL				$ 2.332.645,00
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE TIPO TEXSA O SIMILAR COMPUESTA DE POLYOLEFINAS TERMOPLÁSTICAS Y MALLA DE POLYESTER DE ALTA CAPACIDAD COMO REFUERZO CENTRAL E= 1,2MM	M2	141,82	$ 240.705,00	$ 34.136.783,00
	SUBTOTAL				$ 34.136.783,00
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				
NP 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO DE 2.5 MTS X 0.50 MTS. EN TUBO REDONDO DE 1 ¼" CALIBRE 18" INOXIDABLE 304, CON ANCLAJE EN CHAZOS EXPANSIVOS DE ⅜" X 2 ½" EN INOXIDABLE Y SELLADO CON RESINA EPOXICA.	UND	1,00	$6.004.663,00	$6.004.663,00
	SUBTOTAL				$ 6.004.663,00
	TOTAL				**$ 43.952.635,00**

Tabla 99. Presupuesto emergencia IED Nydia Quintero de Turbay.

3.5.3.4. IED República de Panamá

De acuerdo a la situación reportada en la ficha técnica enviada por la entidad de la institución educativa, se realizó la instalación de tubería, moto bomba, tanque hidroacumulador, tableros eléctricos y de control en cuarto de máquinas. Pendiente entrega.

IED REPÚBLICA DE PANAMÁ					
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO	UN	1,00	$ 146.581,00	$ 146.581,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	$ 7.165,00	$ 143.300,00
	SUBTOTAL				$ 289.881,00
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.3	**RED DE AGUA FRÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**				
4.3.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 1-1/2"	M	5,00	$ 86.519,00	$ 432.595,00
4.3.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO GALVANIZADO 1-1/2"	UN	4,00	$ 30.588,00	$ 122.352,00
4.7	**REGISTROS, CHEQUES Y VÁLVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 2"	UN	5,00	$ 321.953,00	$ 1.609.765,00
4.7.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 1-1/2"	UN	3,00	$ 294.954,00	$ 884.862,00
4.11	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR ELÉCTRICO	UN	1,00	$ 95.439,00	$ 95.439,00
	SUBTOTAL				$ 3.145.013,00
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	4,00	$ 51.932,00	$ 207.728,00
5.1.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M	8,00	$ 74.454,00	$ 595.632,00
	SUBTOTAL				$ 803.360,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	12,00	$ 7.657,00	$ 91.884,00
	SUBTOTAL				$ 91.884,00
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				
NP 01	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO VERTICAL CON MEMBRANA DE 500 LTS	UND	1,00	$7.326.959,00	$7.326.959,00
NP 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESOSTATO 50/70 PSI	UND	2,00	$95.602,00	$191.204,00
NP 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLAUTA DE DISTRIBUCIÓN DE 3" SALIDA EN ACERO INOXIDABLE, CON INTERCONEXION DE TUBERÍAS GALVANIZADAS EN SUCCIÓN Y DESCARGA DE 1 1/2" PARA ELECTROBOMBAS, INCLUYE ACCESORIOS HIDRÁULICOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$4.074.575,00	$4.074.575,00

NP 04	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 1-1/2" DE SUCCIÓN POR 1-1/2" DE DESCARGA, MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 7.0 HP	UND	2,00	$9.953.287,00	$19.906.574,00
SUBTOTAL					$ 31.499.312,00
TOTAL					**$ 35.829.450,00**

Tabla 100. Presupuesto emergencia IED República de Panamá.

3.5.3.5. Dirección Local de Engativá

Se realiza visita de inspección de emergencia, evidenciando en tanques de agua, fuga en el sello del acople, déficit en presión de agua, deterioro de pintura por posibles filtraciones de agua y daño en manto asfáltico en placa de tanques (pendiente).

3.5.3.6. IED Laureano Gómez

Se encuentra en proceso de revisión para efectuar la insonorización de aula (pendiente).

3.5.3.7. IED Thomas Carrasquilla sede A

En atención a emergencias se realiza revisión de equipos de presión de agua potable en cuarto de bombas, identificando que el tanque hidro acumulador expulsa agua por su válvula de aire y presenta signos de corrosión generalizada; se encuentran dos motobombas trabajando correctamente, sin embargo, sus conexiones eléctricas no tienen los terminales adecuados evidenciando cableado expuesto; las tuberías galvanizadas presentan corrosión externa e interna y filtraciones considerables.

3.5.3.8. IED Tomas Cipriano de Mosquera

En atención a emergencias se realiza revisión de fallos en circuitos eléctricos y aplicación de estuco y pintura en zona afectada.

IED TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA					
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	6,50	$ 10.805,00	$ 70.232,50
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	6,50	$ 30.300,00	$ 196.950,00
SUBTOTAL					$ 267.182,50
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	7,00	$ 7.657,00	$ 53.599,00
SUBTOTAL					$ 53.599,00
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				
	PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA APLICACIÓN DE PINTURA	M2	6,50	$ 18.605,62	$ 120.936,52
SUBTOTAL					$ 120.936,52
TOTAL					**$ 441.718,02**

Tabla 101. Presupuesto emergencia IED Tomas Cipriano de Mosquera.

3.5.3.9. Colegio Distrital Juan Francisco Berbeo

En atención a emergencias se realiza intervención con instalación de estructura y membrana en tanque subterráneo de agua potable.

IED FRANCISCO BERBEO					
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECÁNICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE	UN	2,00	$ 206.244,00	$ 412.488,00
	SUBTOTAL				$ 412.488,00
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.18	LAVADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES A LA VISTA	M2	218,07	$ 12.685,00	$ 2.766.217,95
	SUBTOTAL				$ 2.766.217,95
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.3	**RED DE AGUA FRÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**				
4.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 4"	M	4,00	$ 211.297,00	$ 845.188,00
4.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO GALVANIZADO 4"	UN	6,00	$ 94.498,00	$ 566.988,00
	SUBTOTAL				$ 1.412.176,00
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE TIPO TEXSA O SIMILAR COMPUESTA DE POLYOLEFINAS TERMOPLASTICAS Y MALLA DE POLYESTER DE ALTA CAPACIDAD COMO REFUERZO CENTRAL E= 1,2MM	M2	204,06	$ 240.705,00	$ 49.118.262,30
	SUBTOTAL				$ 49.118.262,30
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				
NP 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO DE 2.5 MTS X 0.50 MTS. EN TUBO REDONDO DE 1 ¼" CALIBRE 18" INOXIDABLE 304, CON ANCLAJE EN CHAZOS EXPANSIVOS DE ⅜" X 2 ½" EN INOXIDABLE Y SELLADO CON RESINA EPOXICA.	UND	1	$6.004.663,00	$6.004.663,00
NP	CORTE DE PELDAÑOS	UND	1		$0,00
NP	PERFORACIÓN 30 CM	UND	3	$5.800,00	$17.400,00
	SUBTOTAL				$ 6.022.063,00
	TOTAL				**$ 59.731.207,25**

Tabla 102. Presupuesto emergencia IED Juan Francisco Berbeo.

3.5.3.10. IED Domingo Faustino Sarmiento, sede D

En atención a emergencias se realiza visita técnica el día 08 de marzo de 2023 a IED Domingo Fausto Sarmiento, sede D en aras de identificar las posibles causas de las fallas presentadas en la infraestructura de la institución educativa y tomar las medidas sanitarias correspondientes; durante la inspección se observa lámina de agua en pasillo y acceso a aula 101D, levantamiento de acabado de piso, taponamiento y desbordamiento de canales existentes, filtración de agua lluvia en unión de placa

tanque – cubierta, falta de guarda escobas en aulas ocasionando falta de continuidad y protección de muros y falla en la impermeabilización de placa en tanque, se realiza limpieza e impermeabilizado de canales, instalación de malla y desmonte y cambio de tanque en zona de cubierta, además de aplicación de alistado en aula, enchape y emboquillado de pisos de aula afectada.

IED DOMINGO FAUSTINO, SEDE D					
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			$ 20.949,00	$ 1.158.270,21
1.2.32	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	105.209,00	$ 210.418,00
1.3.1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	34,00	49.593,00	$ 1.686.162,00
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORÍA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	10,08	23.968,00	$ 241.597,44
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	63,80	4.165,00	$ 265.727,00
	SUBTOTAL				$ 3.562.174,65
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.22	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUÍN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	3,00	17.028,00	$ 51.084,00
	SUBTOTAL				$ 4.120.583,09
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.11	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	1,00	1.230.488,00	$ 1.230.488,00
4.11.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 500 LTS, INCLUYE FLOTADOR	UN	1,00	947.779,00	$ 947.779,00
	SUBTOTAL				$ 2.178.267,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	55,29	34.766,00	$ 1.922.212,14
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO EN TABLÓN TRADICIÓN EN GRESS	M2	55,29	82.537,00	$ 4.563.470,73
	SUBTOTAL				$ 6.485.682,87
9	**CARPINTERÍA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	11,60	47.112,00	$ 546.499,00
	SUBTOTAL				$ 546.499,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	3,00	30.300,00	$ 90.900,00
SUBTOTAL					$ 90.900,00
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	2,00	46.399,00	$ 92.798,00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	2,80	57.806,00	$ 161.856,80
SUBTOTAL					$ 254.654,80
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	145,08	7.657,00	$ 1.110.877,56
SUBTOTAL					$ 1.110.877,56
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				
NP1	SONDEO DE TUBERÍAS SANITARIAS CON SONDA ELÉCTRICA.	M	40,50	27.300,00	$ 1.105.650,00
NP2	PINTURA TIPO PARAGUAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES H=3,5MTS	M	63,80	19.377,60	$ 1.236.290,88
SUBTOTAL					$ 2.341.940,88
TOTAL					**$ 20.691.579,85**

Tabla 103. Presupuesto emergencia IED Domingo Faustino Sarmiento.

3.5.3.11. IT Francisco José de Caldas, sede A

En atención a emergencias se realiza intervención en cerramiento de institución con la instalación y aplicación de pintura de dos módulos de rejas de seguridad; así mismo, se realiza intervención con tala de árboles en peligro de volcamiento en zona verde de Institución y poda en un individuo arbóreo.

IT FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORÍA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	60,00	$ 23.968,00	$ 1.438.080,00
SUBTOTAL					$ 1.438.080,00
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1.28	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA PRE ONDULADA CALIBRE 10 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8".	M2	9,65	$ 360.604,00	$ 3.480.910,41
SUBTOTAL					$ 3.480.910,41
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	9,65	$ 21.897,00	$ 211.306,05
SUBTOTAL					$ 211.306,05
21	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN	4,00	$ 892.759,00	$ 3.571.036,00
21.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN	3,00	$ 892.759,00	$ 2.678.277,00

21.1.5	PODA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UN	1,00	$ 393.263,00	$ 393.263,00
SUBTOTAL					$ 6.642.576,00
TOTAL					**$ 11.772.872,46**

Tabla 104. Presupuesto emergencia IT Francisco José de Caldas.

3.5.3.12. IT Juan del Corral, sede A

En atención a emergencias se realiza limpieza y lavado de tanques de almacenamiento y cambio de tres bombas sumergibles.

IED JUAN DEL CORRAL, SEDE A					
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE 21 DE 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	42,00	$ 86.974,00	$ 3.652.908,00
4.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA 3"	UN	3,00	$ 875.124,00	$ 2.625.372,00
4.7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 3"	UN	3,00	$ 715.350,00	$ 2.146.050,00
SUBTOTAL					$ 8.424.330,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	56,00	$ 7.657,00	$ 428.792,00
SUBTOTAL					$ 428.792,00
NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EYECTORA BARNES IC0024 VOLTAJE 220 TRIFASICA (364 GPM DESCARGA 3" , 2HP)	UN	1,00	$ 5.204.000,00	$ 5.204.000,00
NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EYECTORA BARNES IC0020 VOLTAJE 220 TRIFASICA (135 GPM DESCARGA 3" , 2HP)	UN	1,00	$ 2.075.000,00	$ 2.075.000,00
SUBTOTAL					$ 7.279.000,00
TOTAL					**$ 16.132.122,00**

Tabla 105. Presupuesto emergencia IED Juan del Corral

3.5.3.13. IED Rafael Bernal Jiménez, sede A

En atención a emergencias se realiza instalación de ventanería en vanos de bloque de aulas a fin de evitar ingreso de aves a la misma.

IED BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A					
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M2	8,60	35.333,00	$ 303.863,80
SUBTOTAL					$ 303.863,80
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.18	LAVADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES A LA VISTA	M2	144,00	12.685,00	$ 1.826.640,00
SUBTOTAL					$ 1.826.640,00
9	**CARPINTERÍA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2	**CARPINTERÍA METÁLICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	52,74	619.206,00	$ 32.656.924,44
SUBTOTAL					$ 32.656.924,44

20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	72,00	7.657,00	$ 551.304,00
	SUBTOTAL				$ 551.304,00
	TOTAL				**$ 35.338.732,24**

Tabla 106. Presupuesto emergencia IED Rafael Bernal Jiménez, sede A

3.5.3.14. IED Naciones Unidas, sede B

En atención a emergencias se realiza intervención en un individuo arbóreo para tala y un individuo arbóreo para poda.

IED NACIONES UNIDAS, SEDE B					
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	56,00	$ 7.657,00	$ 428.792,00
	SUBTOTAL				$ 428.792,00
21	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN	1,00	$ 892.759,00	$ 892.759,00
21.1.5	PODA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UN	1,00	$ 393.263,00	$ 393.263,00
	SUBTOTAL				$ 1.286.022,00
	TOTAL				**$ 1.714.814,00**

Tabla 107. Presupuesto emergencia IED Naciones Unidas, sede B.

3.5.3.15. IED Antonio Nariño, sede A

En atención a emergencias se realiza intervención en un individuo arbóreo para tala.

IED ANTONIO NARIÑO, SEDE A					
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	56,00	7.657,00	$ 428.792,00
	SUBTOTAL				$ 428.792,00
21	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN	1,00	892.759,00	$ 892.759,00
	SUBTOTAL				$ 892.759,00
	TOTAL				**$ 1.321.551,00**

Tabla 108. Presupuesto emergencia IED Antonio Nariño, sede A

3.5.3.16. IED Bolivia, sede B

En atención a emergencias se realiza intervención en un individuo arbóreo para tala.

IED BOLIVIA, SEDE B					
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	56,00	$ 7.657,00	$ 428.792,00
	SUBTOTAL				$ 428.792,00
21	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

21.1	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN	1,00	$ 892.759,00	$ 892.759,00
SUBTOTAL					$ 892.759,00
TOTAL					**$ 1.321.551,00**

Tabla 109. Presupuesto emergencia IED Bolivia, sede B

3.5.3.17. IED Heladia Mejía, sede B

En atención a emergencias se realiza en aula de preescolar demolición de enchape existente, instalación de enchape en porcelanato y arreglo de humedad en pared afectada (resane y aplicación de pintura).

3.5.3.18. IED Abel Rodríguez

En atención a emergencias se realiza intervención en IED Abel Rodríguez con instalación de rejillas en cárcamos en zona de cocina, aplicación de pintura epoxica en placa cuarto de basura e instalación de tapas en sifones de cárcamos.

3.5.4. AVANCE GENERAL DE CONTRATO

PROGRAMADO					EJECUTADO				
No.	**VALOR PROGRAMADO SEMANAL**	**%**	**ACUMULADO**	**%**	**No.**	**VALOR EJECUTADO SEMANAL**	**%**	**ACUMULADO**	**%**
1	-	0,00%	-	0,00%	1	-	0,00%	-	0,00%
1	-	0,00%	-	0,00%	1	-	0,00%	-	0,00%
2	1.270.756,93	0,01%	1.270.756,93	0,01%	2	9.458.499,71	0,07%	9.458.499,71	0,07%
3	13.068.280,75	0,07%	14.339.037,68	0,07%	3	31.826.160,08	0,23%	41.284.659,79	0,30%
4	14.674.069,90	0,08%	29.013.107,58	0,15%	4	29.459.587,55	0,21%	70.744.247,34	0,51%
5	50.850.634,04	0,26%	79.863.741,62	0,41%	5	33.581.581,31	0,24%	104.325.828,65	0,75%
6	57.017.900,95	0,30%	136.881.642,57	0,71%	6	94.518.500,86	0,68%	198.844.329,51	1,42%
7	74.539.715,37	0,39%	211.421.357,93	1,09%	7	22.218.182,48	0,16%	221.062.512,00	1,58%
8	79.410.432,68	0,41%	290.831.790,61	1,51%	8	40.324.809,10	0,29%	261.387.321,10	1,87%
9	157.795.051,73	0,82%	448.626.842,33	2,32%	9	65.485.536,40	0,47%	326.872.857,50	2,34%
10	221.339.464,29	1,15%	669.966.306,62	3,47%	10	41.427.564,22	0,30%	368.300.421,72	2,64%
11	212.062.992,24	1,10%	882.029.298,85	4,56%	11	49.569.565,98	0,36%	417.869.987,70	2,99%
12	217.257.237,09	1,12%	1.099.286.535,94	5,69%	12	74.571.439,34	0,53%	492.441.427,04	3,53%
13	237.082.024,07	1,23%	1.336.368.560,00	6,92%	13	384.555.815,94	2,76%	876.997.242,98	6,28%
14	290.812.179,31	1,50%	1.627.180.739,31	8,42%	14	175.842.367,10	1,26%	1.052.839.610,08	7,54%

PROGRAMADO					EJECUTADO				
No.	VALOR PROGRAMADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%	No.	VALOR EJECUTADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%
15	266.153.597,13	1,38%	1.893.334.336,44	9,80%	15	240.754.691,04	1,73%	1.293.594.301,11	9,27%
16	261.193.236,22	1,35%	2.154.527.572,66	11,15%	16	148.581.092,20	1,06%	1.442.175.393,31	10,34%
17	299.358.691,03	1,55%	2.453.886.263,69	12,70%	17	109.142.302,12	0,78%	1.551.317.695,43	11,12%
18	311.607.365,22	1,61%	2.765.493.628,91	14,31%	18	187.805.414,35	1,35%	1.739.123.109,78	12,46%
19	349.165.182,38	1,81%	3.114.658.811,30	16,12%	19	137.179.908,07	0,98%	1.876.303.017,85	13,45%
20	344.673.554,63	1,78%	3.459.332.365,93	17,90%	20	253.932.296,56	1,82%	2.130.235.314,41	15,27%
21	335.490.505,50	1,74%	3.794.822.871,43	19,64%	21	108.086.167,12	0,77%	2.238.321.481,53	16,04%
22	324.539.684,07	1,68%	4.119.362.555,50	21,32%	22	183.153.768,22	1,31%	2.421.475.249,75	17,35%
23	312.641.480,84	1,62%	4.432.004.036,34	22,93%	23	149.085.076,18	1,07%	2.570.560.325,93	18,42%
24	332.262.357,17	1,72%	4.764.266.393,51	24,65%	24	175.332.541,60	1,26%	2.745.892.867,52	19,68%
25	352.410.544,81	1,82%	5.116.676.938,32	26,48%	25	287.822.376,00	2,06%	3.033.715.243,52	21,74%
26	371.148.361,72	1,92%	5.487.825.300,05	28,40%	26	82.724.526,61	0,59%	3.116.439.770,14	22,33%
27	425.864.713,96	2,20%	5.913.690.014,00	30,60%	27	179.887.815,96	1,29%	3.296.327.586,10	23,62%
28	444.425.719,08	2,30%	6.358.115.733,08	32,90%	28	160.476.515,98	1,15%	3.456.804.102,08	24,77%
29	499.339.704,40	2,58%	6.857.455.437,49	35,49%	29	299.025.099,04	2,14%	3.755.829.201,11	26,92%
30	544.857.876,09	2,82%	7.402.313.313,58	38,31%	30	82.370.134,81	0,59%	3.838.199.335,92	27,51%
31	519.733.992,11	2,69%	7.922.047.305,69	41,00%	31	176.956.676,14	1,27%	4.015.156.012,06	28,77%
32	431.876.619,29	2,23%	8.353.923.924,99	43,23%	32	282.909.064,40	2,03%	4.298.065.076,46	30,80%
33	424.680.951,49	2,20%	8.778.604.876,48	45,43%	33	82.126.489,23	0,59%	4.380.191.565,69	31,39%
34	463.803.569,28	2,40%	9.242.408.445,77	47,83%	34	72.725.839,02	0,52%	4.452.917.404,71	31,91%
35	590.881.792,61	3,06%	9.833.290.238,38	50,89%	35	312.767.775,18	2,24%	4.765.685.179,89	34,15%
36	614.896.350,25	3,18%	10.448.186.588,63	54,07%	36	-	0,00%	4.765.685.179,89	34,15%
37	619.337.634,81	3,20%	11.067.524.223,43	57,27%	37	-	0,00%	4.765.685.179,89	34,15%
38	620.828.386,17	3,21%	11.688.352.609,60	60,49%	38	-	0,00%	4.765.685.179,89	34,15%
39	611.951.897,40	3,17%	12.300.304.506,99	63,65%	39	-	0,00%	4.765.685.179,89	34,15%
40	586.508.363,58	3,04%	12.886.812.870,57	66,69%	40	-	0,00%	4.765.685.179,89	34,15%
41	562.889.153,12	2,91%	13.449.702.023,69	69,60%	41	-	0,00%	4.765.685.179,89	34,15%
42	487.640.052,45	2,52%	13.937.342.076,14	72,12%	42	-	0,00%	4.765.685.179,89	34,15%
43	444.385.049,62	2,30%	14.381.727.125,76	74,42%	43	-	0,00%	4.765.685.179,89	34,15%

PROGRAMADO					EJECUTADO				
No.	VALOR PROGRAMADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%	No.	VALOR EJECUTADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%
44	294.236.858,27	1,52%	14.675.963.984,03	75,95%	44	-	0,00%	4.765.685.179,89	34,15%
45	4.648.316.897,98	24,05%	19.324.280.882,00	100 %	45	-	0,00%	4.765.685.179,89	34,15%

Tabla 110. Avance General de Obra

3.5.5. PROBLEMAS Y SOLUCIONES PRESENTADOS

Durante el periodo del presente informe se presentó las siguientes contingencias y su respectiva alternativa de subsanación:

Modificación de presupuestos iniciales de instituciones educativas. Safrid ingeniería SAS, adelanta la actualización de balance presupuestal en aras de evitar afectaciones al alcance planificado por la secretaría de Educación del Distrito.

Se encuentran actividades a desarrollar que no están dentro del presupuesto oficial ofertado. Ante la situación, se proyecta por parte de contratista de obra la elaboración de análisis de precios unitarios no previstos, con ello, atender las necesidades que surgen durante el proceso constructivo.

Cumplimiento de línea base de programación de actividades contrato de obra. Contratista de obra presenta plan de contingencia para mitigar los impactos por demoras en la ejecución de actividades.

Demoras en presentación de conceptos de especialistas en el desarrollo de las actividades en las instituciones educativas. Se efectúan mesas de trabajo entre pares de especialistas, con el fin, de efectuar definiciones con celeridad cumpliendo con los parámetros y normas vigentes.

Acopio de cantidades superiores a las permitidas de materiales de escombro en frentes de obra. Se realiza la disposición final de escombros a sitio autorizado conforme a las normas ambientales vigentes.

Afectación de cerramiento en lona para aislamiento de obras. Se realiza inspecciones por parte de los profesionales SSTA a cargo, con ello, mitigar los impactos a la comunidad estudiantil circundante.

3.5.6. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

Las actividades llevadas a cabo durante el periodo del presente informe corresponden a:

- Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el Contrato de obra, así como en los documentos previos que hacen parte integral del mismo.

- Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra.

- Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.

- Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.

- Emitir y exigir el cumplimiento de todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras en cuanto a calidad, presupuesto y programación durante todo el contrato de obra.

- Garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas de la obra.

- Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, haciendo seguimiento a la toma de pruebas, ensayos, controles y resultados.

3.5.7. CONTROL DE CALIDAD

De acuerdo con las actividades que se han realizado en el transcurso de la ejecución de las obras la Interventoría ha verificado, el estado de los equipos e insumos.

3.5.8. REUNIONES EFECTUADAS

3.5.8.1. REUNIONES DE COMITÉ

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha Propuesta cumplimiento	Fecha real de cumplimiento
2	24/01/2023	Programación de obra ajustada	Contratista de obra	27/01/2023	Pendiente
		Presupuestos y flujo de inversión	Contratista de obra	27/01/2023	Pendiente
		Informes diagnósticos colegios	Contratista de obra	27/01/23	Pendiente
3	31/01/2023	Presupuestos colegios priorizados	Contratista de obra	02/02/2023	Pendiente
		Diagnósticos subsanados	Contratista de obra	02/02/2023	Pendiente
		APU´s contractuales y NP's	Contratista de obra	31/01/2023	Pendiente
		Programación ajustada	Contratista de obra	02/02/2023	Pendiente
4	07/02/2023	Diagnósticos	Contratista de obra	02/02/2023	Pendiente
		APU's contractuales	Contratista de obra	01/02/2023	Pendiente
		Presupuestos ajustados	Contratista de obra	02/02/2023	03/02/2023
		APU' NP	Contratista de obra	31/01/2023	31/01/2023

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha Propuesta cumplimiento	Fecha real de cumplimiento
5	14/02/2023	Presupuestos y flujo de inversión	Contratista de obra	18/02/2023	Pendiente
		Subsane de observaciones de diagnósticos	Contratista de obra	15/02/2023	Pendiente
		APU´s contractuales	Contratista de obra	21/02/2023	Pendiente
		Documentación autorización de ingreso de personal	Contratista de obra	14/02/2023	16/02/2023
		Actas de vecindad Jorge Eliecer Gaitán	Contratista de obra	16/02/2023	Pendiente
		Balance actualizado de frentes de obra iniciales	Contratista de obra	21/02/2023	Pendiente
6	21/02/2023	Concepto geotécnista Floridablanca	Contratista de obra	24/02/2023	Pendiente
		Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	24/02/2023	Pendiente
		Concepto especialista eléctrico Floridablanca	Contratista de obra	27/02/2023	Pendiente
		APU´s contractuales	Contratista de obra	24/02/2023	Pendiente
		Concepto estructural Instituciones educativas	Contratista de obra	24/02/2023	24/02/2023
		Subsane diagnósticos	Contratista de obra	21/02/2023	21/02/2023
		Informe técnico mensual	Contratista de obra	22/02/2023	Pendiente
		Visita de personal social SED	Secretaría de Educación	01/03/2023	01/03/2023
		Visita especialistas estructurales	Contratista de obra	28/02/2023	28/02/2023
		Inicio actividades Justo Victor Charry	Contratista de obra	23/02/2023	27/02/2023
		Instalación bombas República de Panamá	Contratista de obra	23/02/2023	22/02/2023
		Entrega concepto Juan del Corral	Contratista de obra	24/02/2023	24/02/2023
		Instalación de programación en frentes de obra	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
7	28/02/2023	Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	06/03/2023	Pendiente
		Subsane diagnósticos	Contratista de obra	03/03/2023	Pendiente
		Informe mensual No. 1	Contratista de obra	17/03/2023	02/03/2023
		Concepto estructural Instituciones educativas	Contratista de obra	03/03/2023	03/03/2023
		Entrega emergencia República de Panamá	Contratista de obra	02/03/2023	Pendiente
		Concepto especialista eléctrico	Contratista de obra	21/02/2023	Pendiente
		Motivación adición de obra	Secretaría de Educación	03/03/2023	Pendiente
		Radicación informe semanal No. 7	Interventoría	03/03/2023	01/03/2023
		Toma de densidades	Contratista de obra	28/02/2023	02/03/2023
		Entrega caracterización de granulares	Contratista de obra	03/03/2023	Pendiente
8	07/03/2023	Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	15/03/2023	Pendiente
		Concepto especialista eléctrico	Contratista de obra	14/03/2023	Pendiente
		Balance presupuestal actualizado	Contratista de obra	107/03/2023	Pendiente
		Entrega emergencia República de Panamá	Contratista de obra	08/03/2023	Pendiente
		Entrega caracterización materiales cantera	Contratista de obra	10/03/2023	Pendiente
		Concepto geotecnia instituciones	Contratista de obra	08/03/2023	02/03/23
		Visita emergencia IED Francisco José de Caldas	Contratista, interventoría, SED	09/03/2023	Pendiente
		Radicación informe semanal No. 9	Interventoría	15/03/2023	15/03/2023

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha Propuesta cumplimiento	Fecha real de cumplimiento
9	15/03/2023	Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	17/03/2023	Pendiente
		Visita especialistas eléctricos	Contratista de obra	17/03/2023	Pendiente
		Concepto estructural Instituciones educativas	Interventoría	15/03/2023	15/03/2023
		Mesa de trabajo / revisión presupuestos	Contratista de obra	16/03/2023	17/03/2023
		Caracterización granulares	Contratista de obra	23/03/2023	21/03/2023
		Ficha técnica emergencia Juan del Corral	Secretaría de Educación	23/03/2023	Pendiente
		Radicación informe semanal No. 7	Interventoría	03/03/2023	01/03/2023
		Toma de densidades	Contratista de obra	28/02/2023	02/03/2023
		Acta de entrega de emergencia (República de Panamá, Bernal Jiménez)	Contratista de obra	23/03/2023	08/03/2023
10	23/03/2023	Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	21/03/2023	Pendiente
		Concepto especialista eléctrico Floridablanca	Contratista de obra	217/03/2023	Pendiente
		Entrega de emergencia República de Panamá y Domingo Faustino	Contratista de obra, interventoría	15/03/2023	15/03/2023
		Entrega informe semanal No. 10	Interventoría	21/03/2023	217/03/2023
		Fichas técnicas emergencias	Secretaría de Educación	21/03/2023	Pendiente
11	28/03/2023	Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	30/03/2023	03/04/23
		Concepto estructural Rafael Bernal/ salón de Judo	Contratista de obra	04/03/2023	Pendiente
		Concepto eléctrico Instituciones educativas	Contratista de obra	28/03/2023	Pendiente
		Plan de contingencia por cada institución	Contratista de obra	31/03/2023	037/04/2023
		Fichas técnicas de emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	28/03/2023	Pendiente
		Especificación técnica teja - APU	Contratista de obra	31/03/2023	037/04/2023
12	04/04/2023	Concepto estructural Rafael Bernal/ salón de Judo	Contratista de obra	05/04/2023	Pendiente
		Concepto eléctrico Instituciones educativas	Contratista de obra	057/04/2023	Pendiente
		Concepto estructural – cimentación y cubierta de Jorge Eliecer Gaitán.	Interventoría	07/04/2023	15/03/2023
13	28/03/2023	Concepto estructural Rafael Bernal/ salón de Judo, tarima, aula múltiple y cubierta	Contratista de obra	13/04/2023	Pendiente
		Concepto estructural y geotecnia cimentación Jorge Eliecer Gaitán	Contratista de obra	17/04//2023	Pendiente
		Concepto estructural vigas de confinamiento Francisco José de Caldas, Garcés Navas, Jorge Eliecer Gaitán.	Contratista de obra	14/04/2023	Pendiente
		Concepto capacidad hidráulica canchas Floridablanca	Contratista de obra	17/042023	17/04/2023
		Concepto capacidad hidráulica canales cubierta Jorge Eliecer Gaitán	Contratista de obra	18/04/2023	Pendiente
		Concepto eléctrico Francisco José de Caldas, Garcés Navas, Jorge Eliecer Gaitán, Floridablanca, Bernal Jiménez	Contratista de obra	19/04/2023	Pendiente
		Dossier estructura metálica Jorge Eliecer Gaitán, Francisco José de Caldas	Contratista de obra	18/04/2023	Pendiente

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha Propuesta cumplimiento	Fecha real de cumplimiento
14	19/04/2023	Concepto estructural Rafael Bernal/ salón de Judo, tarima, aula múltiple y cubierta	Contratista de obra	19/04/2023	19/04/2023
		Concepto capacidad hidráulica Floridablanca	Contratista de obra	26/04/2023	Pendiente
		Concepto eléctrico Francisco José de Caldas, Garcés Navas, Jorge Eliecer Gaitán, Floridablanca, Bernal Jiménez	Contratista de obra	19/04/2023	Pendiente
		Concepto estructural y geotecnia lima hoya Jorge Eliecer Gaitán	Contratista de obra	21/04/2023	Pendiente
		Revisión NP's	Contratista de obra	25/04/2023	Pendiente
		Balance presupuestal contrato de obra	Contratista de obra	21/04//2023	Pendiente
		Informe mensual No. 3 contrato de obra	Contratista de obra	21/04//2023	Pendiente
15	25/04/2023	Informe mensual No. 3 contrato de obra	Contratista de obra	25/04/2023	02/05/2023
		Reprogramación de contrato de obra	Contratista de obra	28/04/2023	28/04/2023
		Revisión de NP's	Contratista de obra	28/04/2023	Pendiente
		Balance presupuestal contrato de obra	Contratista de obra	28/04/2023	Pendiente
		Concepto estructural y geotecnia lima hoya Jorge Eliecer Gaitán	Contratista de obra	25/04/2023	25/04/2023
16	03/05/2023	Concepto capacidad hidráulica Floridablanca	Contratista de obra	04/05/2023	08/05/2023
		Revisión de NP's	Contratista de obra	05//05/2023	08/05/2023
		Concepto eléctrico Garcés Navas, Jorge Eliecer Gaitán, Floridablanca	Contratista de obra	09/05/2023	Pendiente
		Balance presupuestal contrato de obra	Contratista de obra	09/05/2023	Pendiente
		Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	09/05/2023	Pendiente
		Programación, flujo de inversión semanal San José Norte	Contratista de obra	05/05/2023	Pendiente
		Diseño de ventanería San José Norte	Contratista de obra	05/05/2023	08/05/2023
		Concepto hidráulico zona canchas Floridablanca	Contratista de obra	09/05/2023	08/05/2023
17	09/05/2023	Concepto eléctrico Garcés Navas, Jorge Eliecer Gaitán, Floridablanca	Contratista de obra	13/05/2023	Pendiente
		Balance presupuestal actualizado contrato de obra	Contratista de obra	15//05/2023	15/05/2023
		Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	15/05/2023	Pendiente
		Programación, flujo de inversión semanal San José Norte	Contratista de obra	15/05/2023	Pendiente
18	16/05/2023	Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	18/05/2023	Pendiente
		Programación, flujo de inversión semanal San José Norte	Contratista de obra	18//05/2023	Pendiente
		Manual de mantenimiento y conservación Miguel Antonio Caro	Contratista de obra	18/05/2023	Pendiente
		Mesa de trabajo SED, contratista de obra e interventoría.	SED, Contratista de obra e interventoría	18/05/2023	18/05/2023
		Justificación cerramiento	Contratista de obra	23/05/2023	Pendiente
19	23/05/2023	Concepto especialista estructural San José Norte	Contratista de obra	26/05/2023	Pendiente

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha Propuesta cumplimiento	Fecha real de cumplimiento
		Concepto piso aula múltiple Rafael Bernal Jiménez	Contratista de obra	26//05/2023	29/05/2023
		Acta de entrega Miguel Antonio Caro	Contratista de obra	23/05/2023	Pendiente
		Manual de mantenimiento Miguel Antonio Caro	Contratista de obra	23/05/2023	Pendiente
		Entrega acta parcial No. 4	Contratista de obra	25/05/2023	25/05/2023
		Plan de contingencia	Contratista de obra	25/05/2023	Pendiente
		Presentación de alternativa de mantenimiento cubierta Juan del Corral	Contratista de obra	29/05/2023	Pendiente
		Programación y flujo de inversión semanal actualizado San José Norte	Contratista de obra	25/05/2023	Pendiente
		Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	30/05/2023	Pendiente
		Balance presupuestal actualizado general / frentes de obra	Contratista de obra	25//05/2023	Pendiente
		Conceptos eléctricos Garcés Navas, Jorge Eliecer Gaitán, San José Norte.	Contratista de obra	25/05/2023	Pendiente
20	30/05/2023	Acta de entrega Miguel Antonio Caro	Contratista de obra	30/05/2023	Pendiente
		Manual de mantenimiento Miguel Antonio Caro	Contratista de obra	30/05/2023	05/06/2023
		Concepto especialista estructural San José Norte	Contratista de obra	06/06/2023	Pendiente
		Acta de entrega NP	Contratista de obra	06/06/2023	06/06/2023
		Plan de contingencia	Contratista de obra	02/06/2023	05/06/2023
		Programación, flujo de inversión semanal San José Norte	Contratista de obra	31/05/2023	Pendiente
		Balance presupuestal actualizado general / frentes de obra	Contratista de obra	31/05/2023	Pendiente
		Conceptos eléctricos Garcés Navas, Jorge Eliecer Gaitán, San José Norte.	Contratista de obra	01/06/2023	Pendiente
		Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	05/06/2023	Pendiente
		Atención a emergencias Rafael Bernal Jiménez	Contratista de obra	01//06/2023	Pendiente
21	06/06/2023	Concepto estructural San José Norte	Contratista de obra	09/06/2023	Pendiente
		Concepto estructural Simón Bolívar	Contratista de obra	09//06/2023	Pendiente
		Plan de contingencia (Revisión)	Interventoría	08/06/2023	Pendiente
		Alternativa intervención cubierta Juan del Corral – Mesa de trabajo	Contratista de obra e interventoría	08/06/2023	Pendiente
		Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	13/06/2023	Pendiente
		Balance presupuestal actualizado general / frentes de obra	Contratista de obra	08/06/2023	Pendiente
		Conceptos eléctricos Garcés Navas, Jorge Eliecer Gaitán, San José Norte.	Contratista de obra	09/06/2023	Pendiente
		Informes mensuales No. 3 y 4.	Contratista de obra	09/06/2023	Pendiente
22	14/06/2023	Concepto estructural San José Norte – (cubierta auto portante, placa aula múltiple)	Contratista de obra	21/06/2023	Pendiente
		Programación y flujo de inversión semanal actualizado San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B	Contratista de obra	15//06/2023	20/06/23

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha Propuesta cumplimiento	Fecha real de cumplimiento
		Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	21/06/2023	20/06/23
		Mesa de trabajo revisión presupuesto San José Norte y Bernal Jiménez	Contratista de obra e interventoría	15/06/2023	Pendiente
		Visita especialista estructural Simón Bolívar	Contratista de obra e interventoría	21/06/2023	16/06/23
		Concepto estructural Jorge Eliecer Gaitán	Contratista de obra	21/06/2023	Pendiente
		Programación general actualizada	Contratista de obra	21/06/2023	20/06/23
23	20/06/2023	Concepto estructural San José Norte – (cubierta auto portante, placa aula múltiple)	Contratista de obra	21/06/2023	21/06/2023
		Ajuste plan de contingencia	Contratista de obra	23//06/2023	Pendiente
		Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	27/06/2023	Pendiente
		Mesa de trabajo revisión presupuesto San José Norte y Bernal Jiménez	Contratista de obra e interventoría	21/06/2023	Pendiente
		Mesa de trabajo – conceptos eléctricos.	Contratista de obra e interventoría	23/06/2023	Pendiente
		Concepto estructural Jorge Eliecer Gaitán – área de biblioteca, cubierta.	Contratista de obra	23/06/2023	Pendiente
24	29/06/2023	Concepto estructural Simón Bolívar	Contratista de obra	30/06/2023	Pendiente
		Fichas técnicas atención a emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	05//07/2023	Pendiente
		Mesa de trabajo revisión presupuesto actualizado	Contratista de obra	04/07/2023	Pendiente
		Visita colegio Juan del Corral	SED, contratista de obra e interventoría	30/06/2023	Pendiente
		Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares San José Norte	Contratista de obra	04/07/2023	Pendiente
		Cronograma general actualizado	Contratista de obra	29/06/2023	Pendiente
		Retiro y disposición de escombros a sitio autorizado – teja asbesto.	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
25	07/07/2023	Mesa de trabajo revisión presupuesto San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B	Contratista de obra	10/07/2023	Pendiente
		Ajuste plan de contingencia general	Contratista de obra	10/07/2023	Pendiente
		Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares San José Norte	Contratista de obra	11/07/2023	Pendiente
		Cuadro comparativo – balance presupuestal cubierta auto portante San José Norte	Contratista de obra	11/07/2023	Pendiente
		Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Contratista de obra	11/07/2023	Pendiente
		Entrega de certificaciones – soportes de personal idóneo para trabajo en alturas	Contratista de obra	Inmediato	10/07/23
		Bitácora IED. Rafael Bernal Jiménez, sede B y IED República de Panamá	Contratista de obra	Inmediato	10/07/23

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha Propuesta cumplimiento	Fecha real de cumplimiento
26	11/07/2023	Mesa de trabajo revisión presupuesto San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B	Contratista de obra e interventoría	14/07/2023	Pendiente
		Ajuste plan de contingencia general	Contratista de obra	14/07/2023	Pendiente
		Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares San José Norte	Contratista de obra	12/07/2023	Pendiente
		Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Contratista de obra	18/07/2023	Pendiente
		Bitácora IED. Rafael Bernal Jiménez, sede B y IED República de Panamá	Contratista de obra	14/07/2023	Pendiente
		Discriminación responsable inspector SST por colegios asignados.	Contratista de obra	18/07/2023	Pendiente
		Permisos para ejecución de actividades de alto riesgo SSTA	Contratista de obra	18/07/2023	18/07/2023
27	18/07/2023	Ajuste plan de contingencia general	Contratista de obra	21/07/2023	Pendiente
		Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares San José Norte	Contratista de obra	21/07/2023	Pendiente
		Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Contratista de obra	21/07/2023	Pendiente
		Subsane mensuales No. 3, 4 y 5	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
		Comunicado situación de vandalismo baterías sanitarias Justo Victor Charry	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
		Mesa de trabajo revisión presupuesto San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B	Contratista de obra e interventoría	24/07/2023	Pendiente
28	25/07/2023	Ajuste plan de contingencia general	Contratista de obra	26/07/2023	Pendiente
		Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares San José Norte	Contratista de obra	26/07/2023	Pendiente
		Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Contratista de obra	27/07/2023	Pendiente
		Subsane mensuales No. 3, 4 y 5	Contratista de obra	27/07/2023	Pendiente
		Comunicado situación de vandalismo baterías sanitarias Justo Victor Charry	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
		Mesa de trabajo revisión presupuesto San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B	Contratista de obra e interventoría	27/07/2023	Pendiente
29	02/08/2023	Ajuste plan de contingencia general	Contratista de obra	03/08/2023	Pendiente
		Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares San José Norte	Contratista de obra	08/08/2023	Pendiente
		Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Contratista de obra	08/08/2023	Pendiente
		Subsane mensuales No. 3, 4 y 5	Contratista de obra	04/08/2023	Pendiente
		Comunicado situación de vandalismo baterías sanitarias Justo Victor Charry	Contratista de obra	02/08/2023	Pendiente
		Mesa de trabajo revisión presupuesto San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B	Contratista de obra e interventoría	03/08/2023	Pendiente
30	09/08/2023	Ajuste plan de contingencia general	Contratista de obra	10/08//2023	16/08/2023

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha Propuesta cumplimiento	Fecha real de cumplimiento
		Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares San José Norte	Contratista de obra	10/08/2023	Pendiente
		Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Contratista de obra	10/08//2023	12/08/2023
		Subsane mensuales No. 3, 4 y 5	Contratista de obra	11/08/2023	16/08/2023 – pendiente informe No. 5
		Revisión presupuestos frentes de obra	Contratista de obra e interventoría	14/08/2023	14/08/2023
		Mesa de trabajo revisión presupuesto San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B	Contratista de obra e interventoría	09/08/2023	14/08/2023
31	16/08/2023	Ajuste a programación de todos los frentes de obra, presupuestos de obra y flujos de inversión semanal por frente	Contratista de obra	18/08/2023	Pendiente
		Presupuesto de baños Justo Victor Charry	Contratista de obra	18/08/2023	18/08/2023
		Diseños cocina y comedor República de Panamá	SED	23/08/2023	Pendiente
		Entrega informes mensuales No. 6 y 7	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
		Fichas de emergencia	SED	23/08/2023	Pendiente
32	23/08/2023	Ajuste a programación de todos los frentes de obra, presupuestos de obra y flujos de inversión semanal por frente	Contratista de obra	25/08/2023	Pendiente
		Diseños cocina y comedor República de Panamá	SED	28/08/2023	Pendiente
		Subsane informe mensual No. 5	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
		Entrega informes mensuales No. 6 y 7	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
		Fichas de emergencia	SED	29/08/2023	Pendiente
		Acta de comité de obra	Interventoría	23/08/2023	28/08/2023
		Mesa de trabajo virtual revisión de presupuesto IED Jorge Eliecer Gaitán y Garcés Navas	Contratista de obra e interventoría	24/08/2023	24/08/2023
		Mesa de trabajo virtual revisión de presupuesto IED Floridablanca y Justo Victor Charry	Contratista de obra e interventoría	25/08/2023	25/08/2023
		Mesa de trabajo virtual revisión de presupuesto IED Rafael Bernal Jiménez, A y IT Juan del Corral, A	Contratista de obra e interventoría	28/08/2023	28/08/2023
		Mesa de trabajo virtual revisión de presupuesto IED Rafael Bernal Jiménez, B y IT Francisco José de Caldas, A	Contratista de obra e interventoría	29/08/2023	29/08/2023
		Mesa de trabajo virtual revisión de presupuesto IED Simón Bolívar, A y San José Norte A	Contratista de obra e interventoría	30/08/2023	30/08/2023
		Revisión de cimentación aulas modulares San José Norte	Contratista de obra e interventoría	26/08/2023	26/08/2023
33	30/08/2023	Entrega de subsanes informe SSTA	Contratista de obra	01/09/2023	04/09/2023
		Visita a Justo Victor Charry y Francisco José de Caldas – socialización colegios	SED	04/09/2023	Pendiente
		Inicio obra bachillerato internacional Automotriz 1 y automotriz 2	Contratista de obra	04/09/2023	05/09/2023
		Inicio de obra bachillerato internacional biblioteca	Contratista de obra	05/09/2023	Pendiente

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha Propuesta cumplimiento	Fecha real de cumplimiento
		Entrega de presupuesto de talleres y laboratorios bachillerato internacional	Contratista de obra	01/09/2023	01/09/2023
		Diseños cocina y comedor República de Panamá	SED	24/07/2023	Pendiente
34	06/09/2023	Alternativa de diseño de pintura de canchas Floridablanca	Contratista de obra	13/09/2023	Pendiente
		Mesa de trabajo balance presupuestal contrato de obra	Contratista de obra	06/09/2023	Pendiente
		Revisión avance de contrato de obra e interventoría	Contratista de obra	07/09//2023	Pendiente
		Mesa de trabajo subsane observaciones NP's	Contratista de obra	08/09/2023	Pendiente
		Reiteración entrega informes mensuales No. 6 y 7	Contratista de obra	08/09/2023	Pendiente
		Entrega programación de obra – flujo de inversión semanal IED Bachillerato Internacional	Contratista de obra e interventoría	08/09//2023	Pendiente
		Entrega de presupuestos emergencias educativas; IED Antonio Nariño, sede A; Abel Rodríguez; Tomas Carrasquilla; Dile Engativá	Contratista de obra	11/09/2023	Pendiente
		Reprogramación y flujo de inversión semanal IED designados por la SED – frentes activos y pendientes por inicio	Contratista de obra	11/09/2023	Pendiente

Tabla 111. Relación de reuniones y seguimiento de compromisos.

3.5.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

En el anexo registro fotográfico se presentan los avances de obra de las actividades realizadas en el periodo del presente informe en todos los frentes de obra y emergencias.

3.5.10. ANÁLISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo del presente informe se realizan los siguientes ensayos de laboratorio:

Fecha	Localización	Material	Ensayo
12/08/2023	Jorge Eliecer Gaitán - Cancha	Concreto	Resistencia a la compresión
25/08/2023	Rafael Bernal Jiménez, sede B – Placa contra piso zona de juegos	Concreto	Resistencia a la compresión
01/09/2023	Floridablanca – Placa parqueadero	Concreto	Resistencia a la compresión
04/09/2023	Floridablanca – Placa parqueadero	Concreto	Resistencia a la compresión
09/09/2023	San José Norte – Placa de contra piso modulares etapa No. 2	Concreto	Resistencia a la compresión

Tabla 112. Análisis de ensayos de laboratorio.

3.6. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las gestiones realizadas en seguridad y salud en el trabajo se presentan en anexo 7 – Informe SSTA

3.7. ACTIVIDADES DE ORDEN SOCIAL.

Se realiza acompañamiento a estas actividades ya que en la propuesta no se establece por parte de la SED, este profesional.

4. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1. OBSERVACIONES

En consideración al oficio No. 361_GP2_SED_2022 en donde se aclara por parte de contratista de obra la reprogramación de los colegios en ejecución así como los pendientes por iniciar y de acuerdo a la mesa de trabajo para revisión de balance presupuestal actualizado a fecha 07 de septiembre de 2023, los frentes de obra presentan modificación en su valor programado, por lo tanto, se actualizan para el presente informe el porcentaje programado de los mismos y los avances reales a la fecha.

En cumplimiento de las obligaciones como interventoría se ha requerido en varias ocasiones informes mensuales No. 6 y 7 a contratista de obra SAFRID ingeniería S.A.S, teniendo en cuenta las fechas establecidas para la entrega de los mismos, sin embargo este no ha sido remitido por parte del mismo al cierre del presente informe.

A la fecha del presente informe se encuentra en trámite acta de recibo parcial No. 7 del contrato de obra e interventoría.

De acuerdo con acta modificatoria No. 1 de adición y prorroga al contrato de obra con fecha 05 de abril de 2023, se adicionan ocho (8) instituciones educativas para adecuación y mantenimiento; de acuerdo a esto, a la fecha se encuentran activos dos (2) de los ocho (8) colegios de adición (IED San José Norte, sede A e IED Rafael Bernal Jiménez, sede B)

En vista del convenio denominado “Bachillerato Internacional” para IT Francisco José de Caldas, sede A y IED San José Norte, se solicita por parte de la Secretaria de Educación realizar intervenciones en las instituciones mencionadas de acuerdo al alcance establecido para los mismos.

A la fecha del presente informe se encuentran activos los frentes de obra en IED Garcés Navas, IT. Francisco José de Caldas, sede A, IED Floridablanca, IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A, IED Justo Víctor Charry, IED Bernal Jiménez, sede A, IED Juan del Corral, sede A, IED San José Norte, IED Rafael Bernal Jiménez, sede B, IED República de Panamá e IED Simón Bolívar.

De acuerdo con el avance evidenciado en las Instituciones Educativas activas, a la fecha se establece un avance físico de 97,00% para IED Jorge Eliecer Gaitán; 72,00% para IED Francisco José de Caldas; 92,70% para IED Garcés Navas; 85,00% para IED

Floridablanca; 76,00% para Justo Víctor Charry; 50,30% para Rafael Bernal Jiménez, sede A, 98,30% para Juan del Corral, 22,60% para San José Norte, 85,30% para Rafael Bernal Jiménez, sede B, 45,00% para República de Panamá; 6,94% para IED Simón Bolívar.

Con base en el atraso evidenciado, se requirió por parte de interventoría la implementación por parte de Safrid Ingeniería SAS plan de contingencia en los frentes de obra, esto en aras de mitigar y evitar incurrir en atrasos considerables que conlleven a posibles incumplimientos.

De acuerdo con el atraso evidenciado en el contrato, se encuentra en ajuste de programaciones de los frentes de obra en ejecución, esto a fin de cumplir con los compromisos en las fechas establecidas.

4.2. CONCLUSIONES

De acuerdo con la revisión de actividades ejecutadas por parte del contratista de obra, al cierre del presente informe se presenta un avance general ejecutado de **34,15%,** con base en la programación presentada un avance general programado de **50,89%,** teniendo una diferencia de **16,73%** en atraso.

Se requiere a contratista de obra la entrega de conceptos pendientes para la validación y/o aprobación por parte de la interventoría, con ello evitar afectaciones en el buen desarrollo del contrato de obra. En consideración a lo expuesto, los atrasos que puedan presentarse en los procesos constructivos, serán imputables al contratista de obra.

Por parte de esta interventoría, a la fecha se ha efectuado el oportuno proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables por parte del contratista de obra.

En cumplimiento de sus funciones esta interventoría ha emitido y exigido el cumplimiento de todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras en cuanto a calidad, presupuesto y programación.

En aras de establecer un mejor control y seguimiento al contrato y dar cumplimiento a los procesos técnicos y administrativos en el menor tiempo posible, se realiza semanalmente mesas de trabajo y reuniones de los diferentes componentes en conjunto con contratista de obra e interventoría.

4.3. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Secretaria de Educación del Distrito de sus buenas gestiones para adelantar las visitas a las instituciones educativas que se encuentran pendientes por iniciar, en aras de efectuar, las actas de recibo de espacios para desarrollar la intervenciones.

Se sugiere a la entidad contratante la entrega de los planos existentes de las instituciones educativas, con el fin de identificar los elementos estructurales, eléctricos, Arquitectónicos, hidrosanitarios y demás que hacen parte de los colegios contractuales.

Se recomienda a contratista de obra que la entrega de la información para la validación y aprobación de los conceptos por parte de la interventoría, por tal razón, los tiempos de demora en la entrega de la documentación solicitada, son imputables al contratista de obra.

Se instó a Safrid Ingeniería S.A.S., la implementación y cumplimiento riguroso del plan de contingencia presentado, de manera que se tomen las acciones pertinentes para alcanzar las metas propuestas durante los plazos establecidos, en aras de no incurrir en presuntos incumplimientos.

ANEXOS

ANEXO 1. ACTAS DE COMITÉ

ANEXO 2. BITÁCORA DE OBRA

ANEXO 3. INFORME SSTA

ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO 5. PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA

Anexo 1. ACTAS DE COMITÉ

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
26	11/07/2023	9:00 am	12:00 pm	IED REPUBLICA DE PANAMA
Objeto de la reunión:	Comité de seguimiento técnico integral de obra			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Mesa de trabajo revisión presupuesto (San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B)	Contratista de obra e interventoría	10 de julio de 2023	Pendiente
2	Ajuste plan de contingencia general	Contratista de obra	10 de julio de 2023	Pendiente
3	Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares de San José Norte.	Contratista de obra	11 de julio de 2023	Pendiente
4	Cuadro comparativo – balance presupuestal cubierta auto portante San José Norte	Contratista de obra	11 de julio de 2023	Pendiente
5	Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente.	Contratista de obra	11 de julio de 2023	Pendiente
6	Entrega de certificaciones – soportes de personal idóneo para trabajo en alturas	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente
7	Bitácora IED Rafael Bernal Jiménez, sede B e IED República de Paanamá - suministro	Contratista de obra	Inmediato	10 de julio de 2023
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

TEMAS ADMINISTRATIVOS

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales ha realizado los requerimientos para conminar al contratista a desempeñar sus funciones conforme los anexos técnicos, estudios previos y pliegos de condiciones del proceso de licitación pública No. SED-LP-DCCEE-039-2022.

- Por parte de interventoría se solicita a contratista de obra efectuar las actividades acorde a directrices determinadas por la Secretaria de Educación del Distrito, dando alcance al objeto contractual.

- Con el fin de realizar el control, seguimiento y cumplimiento de los procesos técnicos – administrativos con celeridad, se realiza semanalmente mesas de trabajo y reuniones de los diferentes componentes en conjunto con contratista de obra e interventoría, en aras de alcanzar con las metas trazadas.

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 requiere de las buenas gestiones por parte de SAFRID INGENIERIA SAS para ejecutar las actividades conforme a lo planificado, en aras de evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos.

- Se notifica a contratista de obra que es indispensable realizar diligentemente la ejecución de las actividades aprobadas por parte de la interventoría, toda vez que los atrasos que se presenten en la ejecución de las mismas serán responsabilidad del mismo.

- Se insta a SAFRID INGENIERÍA SAS implementar y cumplir de manera rigurosa el plan de contingencia presentado, de manera, que se mitiguen los atrasos presentados a la fecha.

- Se solicita a contratista de obra subsanar las observaciones y requerimientos establecidos por interventoría de manera diligente, con ello avanzar en las labores estipuladas para cada una de las sedes en ejecución.

- Se requiere a contratista de obra la entrega de conceptos pendientes para la validación y/o aprobación por parte de la interventoría, con ello evitar afectaciones en el buen desarrollo del contrato de obra. En consideración a lo expuesto, los atrasos que puedan presentarse en los procesos constructivos, serán imputables al contratista de obra.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A

Durante la presente semana se realizó:

- Instalación de media caña en granito para baño
- Instalación de enchape en biblioteca
- Instalación de ventanas / Desmonte de ventanas en fachada principal
- Desmonte de cubierta tipo sándwich en aula de dibujo
- Soldadura e instalación de perfiles en C (305 x 80) en área de dibujo
- Instalación de guarda escoba en gravilla mona en escaleras
- Aplicación de estuco en aula 201- 2ª y biblioteca
- Aplicación de pintura en fachada
- Demolición de placas de cancha, asfalto y concreto.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **74,30%**, avance ejecutado de **40,14%**, avance programado de **48,78%**, teniendo una diferencia de **8,64%** en atraso corte a 08 de julio de 2023.

IT Francisco José de Caldas, sede A

Durante la semana se realizó:

- Instalación de enchape en baños.
- Aplicación de boquilla en aulas, pasillos y baños.

- Instalación de enchape, guarda escobas y gravilla en escaleras.
- Remates en ventanas y techos de aulas.
- Aplicación de pintura en pasillos.
- Aplicación de pañete e instalación de tapas en caja de inspección.
- Cerramiento en lona en área de escaleras.

Pendientes:

- Programación actualizada.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **58,50%**, avance ejecutado de **53,13%**, avance programado de **60,06%**, teniendo una diferencia de **6,93%** en atraso con corte a 08 de julio de 2023.

Garcés Navas IED

Durante la semana se realizó:

- Desmonte de cubierta en salón de profesores y aula múltiple.
- Instalación de perfiles en C (305 x 80).
- Instalación de teja Ecoroof en salón de profesores, biblioteca y aula múltiple.
- Instalación de manto en viga canal de aula múltiple y bloque A.
- Aplicación de pintura en salones de bloque B.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **70,00%**, avance ejecutado de **53,20%**, avance programado de **94,50%,** teniendo una diferencia de **41,30%** en atraso a corte a 08 de julio de 2023.

IED Floridablanca, sede A

Durante la semana se realizó:

- Demolición de concreto en parqueadero.
- Trasiego de material de demolición.
- Desmonte de lámparas en aulas y pasillo de segundo piso, bloque SENA.
- Protección de armarios, canaletas y tableros de aulas.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **55,00%**, avance ejecutado de **40,89%** avance programado de **37,53%**, teniendo una diferencia de -**3,36%** en avance a corte a 08 de julio de 2023.

IED Justo Victor Charry

Durante la semana se realizó:

- Instalación de enchape de muros en baño niñas bachiller.
- Aplicación de pintura epóxica y remates en baño de niños bachiller.
- Muro en bloque en división de baño niñas preescolar.
- Instalación de divisiones en acero en baño de niños bachiller y preescolar.
- Instalación de lámparas baño de niños bachiller y preescolar.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico **55,00%**, avance ejecutado de **31,88%**, avance programado de **99,72%**, teniendo una diferencia de **67,84%** en atraso a corte de 08 de julio de 2023.

IED Rafael Bernal Jiménez, sede A

Durante la semana se realizó:

- Soldadura y aplicación de pintura en perfiles en C (150x50x2.5) para cubierta de aula múltiple
- Instalación de enchape en muros y piso en shut de basura
- Instalación de malla de gallinero en muros de shut de basuras

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **60,30%,** avance de ejecutado de **48,71%**, avance programado de **88,92%**, teniendo una diferencia de **40,21%** en atraso a corte de 08 de julio de 2023.

IT Juan del Corral, sede A

Durante la semana se realizó:

- Aplicación de pintura en columnas y vigas de puente peatonal
- Aplicación de silicona en flanches
- Lavado e impermeabilizado muros
- Brechado en muros internos comedor

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **85,30%,** avance ejecutado de **30,09%**, avance programado de **41,91%**, teniendo una diferencia de **11,81%** en atraso a corte de 08 de julio de 2023.

IED San José Norte

Durante la semana se realizó:

- Aplicación de pañete en muros de aula múltiple.
- Demolición de placa en laboratorio.
- Relleno en subbase en cocina.
- Demolición de muro en cocina.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **45,00%**, avance ejecutado de **4,76%,** avance programado de **1,28%**, teniendo una diferencia de **-3,48%** en avance a corte de 08 de julio de 2023.

Pendiente:

- Concepto estructural (placa aula múltiple, cubierta auto portante)
- Ajuste programación de obra.

IED Rafael Bernal Jiménez, sede B

Durante la semana se realizó:

- Excavación manual para zapatas de muro en zona de juegos.
- Demolición de concreto en zona de juegos.
- Instalación de hierros y fundida de concreto para viga de cimentación.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **20,00%**

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- Presupuesto Actualizado.

IED República de Panamá

Durante la semana se realizó:

- Aplicación de pañete en muros de cocina
- Demolición de pisos en comedor y patio.
- Encofrado de viga

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **23,00%.**

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- Presupuesto Actualizado.

IED Simón Bolívar

Durante la semana se realizó:

- Cerramiento con cinta de peligro y conos.
- Demolición de enchape y alistado en piso del aula múltiple.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **2,00%.**

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- Presupuesto Actualizado.

Aspectos Generales

De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de **24,46%**, con base en la programación presentada un avance general programado de **38,09%**, teniendo una diferencia de **13,63%** en el contrato.

Acorde al avance general del contrato se abre frente de obra en IED Simón Bolívar el día 05 de julio de 2023.

Con base en la relación establecida entre programación y ejecución definida para el presente contrato, a la fecha se evidencian 11 frentes de obra activos de los cuales 7 instituciones se encuentran en atraso por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.

Es pertinente que contratista de obra acate las instrucciones y directrices presentadas por la interventoría en aras de evitar afectaciones a las edificaciones existentes de las instituciones educativas. Aunado a lo anterior, se solicita presentar los conceptos con anticipación para ser revisados por parte de especialistas de cada una de las áreas.

Se requiere realizar los subsanes correspondientes a informes de componente técnico y SSTA en los términos establecidos.

En atención a emergencias se realiza en **IED Heladia Mejía, sede B**:

- Instalación de enchape y resane de pared en aula de preescolar.

IED JORGE ELIECER GAITAN: Se revisará concepto de estructura de cuneta, para definir la reutilización de materiales de RCD. para efectuar aprovechamiento de este tipo de residuos, en aras de realizar una estabilización del terreno.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

FRANCISCO JOSE DE CALDAS IED: Se realizó recorrido en compañía de especialista eléctrico de EED, de manera que se identifique los puntos de acceso a Eléctricos, se dejan consideraciones para realizar en el frente de obra y se consignan en la bitácora de obra. Es pertinente, cumplir con las directrices impartidas por la Secretaría de Educación del Distrito. Se solicita mantener el total de lámparas (9) por cada aula, en aras de brindar áreas con excelente luminosidad. Se requiere presentar balance presupuestal actualizado. Se requiere tomar acciones para mitigar atrasos

GABRIEL NAVAS IED: Es pertinente revisar los atrasos presentados y tomar las medidas correspondientes, en aras de alcanzar la metas propuestas

IED FLORIDABLANCA: Se solicita agilizar la entrega de conceptos en aras de evitar daños en la infraestructura existente. Se solicita proteger las zonas en las cuales se desmonte cubierta; así mismo, las áreas de parqueadero que se vienen desarrollando se debe proteger la subrasante para evitar cambios volumétricos de la misma. Cualquier afectación en la excavación ante la omisión de lo descrito, será asumido por SAFRID INGENIERIA SAS.

IED JUSTO VICTOR CHARRY: Se realizó el suministro de acero inoxidable. Divisiones de baño para continuar con las actividades en baterías sanitarias. Es pertinente que se mitiguen los atrasos presentados

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED RAFAEL BERNAL JIMENEZ, SEDE A: Se solicita desarrollar las actividades de trabajo en altura conforme a las directrices entregadas por el componente y profesionales SST aplicando la normatividad vigente. Se solicita revisar el balance presupuestal de la sede teniendo en cuenta el alcance de la institución. Se requiere revisar cubierta de dicho tercer piso de bloque de aula, debido a que se presenta salpicadura de agua hacia el interior del mismo. Se solicita tomar acciones para mitigar atrasos.

IED JUAN DEL CORRAL: Se realizará el día 11 de julio de 2023 visita por parte de especialistas a bombas de RCI en aras de efectuar el diagnóstico de los mismas.

IED. SAN JOSE NORTE: Se presenta cuadro comparativo de cubiertas con estructura metálica y autoportante, pendiente la revisión de especialistas estructurales. Se solicita. realizar las dilataciones en placa para evitar afectaciones en las mismas.

IED RAFAEL BERNAL JIMENEZ, SEDE B: Se solicita presentar ajuste de concepto estructural de viga de cimentación; por otra parte entregar programación y flujo de inversión semanal actualizado.

IED. REPÚBLICA DE PANAMÁ: Se requiere la entrega de programación, bitácora de obra, planes cumplidos y demás documentos para la intervención de la obra, con el fin de realizar el control y seguimiento pertinente.

TEMAS COMPONENTE SST - MA

Se permite solicitar el estricto cumplimiento en la entrega de documentación para ingreso de personal operativo previa al inicio de ejecución de actividades, así mismo, contar con el equipo de protección personal tanto en personal operativo como administrativo para la ejecución de las obras.

Se evidencia en recorrido de campo en las zonas de acopio de escombros materiales que superan las cantidades máximas admisibles. Se requiere de manera urgente, efectuar el retiro de los mismos según corresponda.

Adicionalmente, se evidencia en campo que previo a la ejecución de actividades de trabajos en alturas no se están diligenciado los permisos respectivos. No obstante, a la fecha de realización del comité de obra no se han entregado las correspondientes planillas de seguridad social asociados al periodo de junio de 2023, de todo el personal vinculado al contrato de obra.

No se ha recibido la subsanación de los informes 3,4 y 5; si bien se realizó una aprobación parcial por la interventoría se está a la espera de que el contratista allegue los soportes requeridos para el cierre de dichas observaciones.

Asimismo, se solicita el cargue de la gestión realizada de los residuos RCD generados en los frentes de obra; se reitera la subsanación a esta observación, pues se hace necesario la disposición de los residuos especiales.

Finalmente, se solicita la supervisión de los profesionales SST respecto a las actividades de Alto riesgo (Trabajo en alturas) de manera prioritaria.

TEMAS SOCIAL

TEMAS VARIOS

Se solicita al contratista de obra realizar las gestiones y acciones pertinentes para la entrega de balances presupuestales actualizados, con el fin de, definir el horizonte del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022 y cumplir con el objeto contractual.

Se informa que cualquier cambio que proponga el contratista, deberá ser consultado por escrito a la interventoría y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación de ésta; en caso contrario, cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del contratista.

Se solicita a SAFRID INGENIERIA SAS suministrar a la interventoría, con la debida anticipación los resultados de los especímenes tomados en obra, en aras de evidencias la calidad de los materiales utilizados conforme a las especificaciones técnicas de la entidad contratante.

Los ensayos de los materiales de las actividades que se vienen desarrollando en cada uno de los frentes, se rigen por la normatividad vigente, a su vez por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones, anexos técnicos y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS VARIOS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

COMPROMISOS

1	Mesa de trabajo revisión Presupuesto San José Norte y Rafael Bernal Jimenez, sede B.	Responsable:	Contratista de obra Interventoría
		Fecha:	
2	Ajuste plan de Contingencia General	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	14/07/2023
3	Caracterización de duelo de fundación de aulas modulares de San Jose Norte	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	12/07/2023
4	Cronograma General actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	18/07/2023
5	Bitacora de obra IED Rafael Bernal Jimenez sede B e IED. Rep. Panamá	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	14/07/2023
6	Discriminación de Responsable - Inspector SST por Colegios Asignados.	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	18/07/2023
7	Permisos para ejecución de Alto Riesgo SSTA	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	18/07/2023
8		Responsable:	
		Fecha:	
9		Responsable:	
		Fecha:	
10		Responsable:	
		Fecha:	
11		Responsable:	
		Fecha:	
12		Responsable:	
		Fecha:	
13		Responsable:	
		Fecha:	
14		Responsable:	
		Fecha:	
15		Responsable:	
		Fecha:	
16		Responsable:	
		Fecha:	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

17		Responsable: Fecha:
18		Responsable: Fecha:
19		Responsable: Fecha:
20		Responsable: Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá DC a los 11 días del mes de julio del 2023.

CONTRATISTA

Luis Eduardo Montes Álvarez
Director de obra

Residente de obra

INTERVENTORIA

Fredy Giovanni Rodríguez Salazar
Director de interventoría

Residente de interventoría

SUPERVISOR

Edwin Alexander Santana Rodríguez
Supervisor Secretaria de Educación del Distrito Capital

Juan Carlos Valencia Gamba
Apoyo Supervisión Secretaria de Educación del Distrito Capital

Nota:

1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

Fecha:	11 de julio de 2023	Lugar:	República de Panamá.	Acta de seguimiento No:	26
Contrato de obra:	CO1.PCCNTR.4077642	Contrato de interventoría:	CO1.PCCNTR.4146207		

Nombre	Cargo	Empresa	Correo	Teléfono	Firma
Freddy G. Rodríguez S.	Director Interventoría	Consorcio Inter Colegios 2022	freddy.rodriguez.grng@gmail.com	6015202359	
Mónica Gómez R.	Asesor Ambiental	Consorcio Inter Colegios 2022.	ssta4.grng@gmail.com.	3012599742	
Camilo Antonio Jamacá Pesca	Residente Interventoría	Consorcio Inter Colegios 2022	residente1.cic2022@gmail.com	3163340746	
LUIS EDUARDO MONTE	Director OBRA	SAFRID	Proyectosedgrupo2@gmail.com.	3006613168	
Jaime Alejandro Hoyos H.	Inspector de Obra	SAFRID	proyectosedgrupo2@gmail.com	3138706334	
Jerson Higuita R.	Residente de Obra	Safrid.	" "	3134491838	
Juan Carlos Valencia	Supervisión DCCBE - SED	SED		3147125636	
SANDRA HUGUETAS	INSP SST.	SAFRID.	PROYECTOSEDGRUPO2@. Gmail.com.	3164985903	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
27	18/07/2023	8:30 am		SAN JOSE NORTE SEDE A
Objeto de la reunión:	Comité de seguimiento técnico integral de obra			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Mesa de trabajo revisión presupuesto (San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B)	Contratista de obra e interventoría	14 de julio de 2023	Pendiente
2	Ajuste plan de contingencia general	Contratista de obra	14 de julio de 2023	Pendiente
3	Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares de San José Norte.	Contratista de obra	12 de julio de 2023	Pendiente
4	Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente.	Contratista de obra	18 de julio de 2023	Pendiente
5	Bitácora IED Rafael Bernal Jiménez, sede B e IED República de Panamá	Contratista de obra	14 de julio de 2023	Pendiente
6	Discriminación de responsable – inspector SST por colegio asignado	Contratista de obra	18 de julio de 2023	Pendiente
7	Permiso para ejecución de actividades de alto riesgo SSTA.	Contratista de obra	18 de julio de 2023	14 de julio de 2023
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

TEMAS ADMINISTRATIVOS

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales ha realizado los requerimientos para conminar al contratista a desempeñar sus funciones conforme los anexos técnicos, estudios previos y pliegos de condiciones del proceso de licitación pública No. SED-LP-DCCEE-039-2022.

- Por parte de interventoría se solicita a contratista de obra efectuar las actividades acorde a directrices determinadas por la Secretaria de Educación del Distrito, dando alcance al objeto contractual.

- Con el fin de realizar el control, seguimiento y cumplimiento de los procesos técnicos – administrativos con celeridad, se realiza semanalmente mesas de trabajo y reuniones de los diferentes componentes en conjunto con contratista de obra e interventoría, en aras de alcanzar con las metas trazadas.

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 requiere de las buenas gestiones por parte de SAFRID INGENIERIA SAS para ejecutar las actividades conforme a lo planificado, en aras de evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos.

- Se notifica a contratista de obra que es indispensable realizar diligentemente la ejecución de las actividades aprobadas por parte de la interventoría, toda vez que los atrasos que se presenten en la ejecución de las mismas serán responsabilidad del mismo.

- Se insta a SAFRID INGENIERÍA SAS implementar y cumplir de manera rigurosa el plan de contingencia presentado, de manera, que se mitiguen los atrasos presentados a la fecha.

- Se solicita a contratista de obra subsanar las observaciones y requerimientos establecidos por interventoría de manera diligente, con ello avanzar en las labores estipuladas para cada una de las sedes en ejecución.

- Se requiere a contratista de obra la entrega de conceptos pendientes para la validación y/o aprobación por parte de la interventoría, con ello evitar afectaciones en el buen desarrollo del contrato de obra. En consideración a lo expuesto, los atrasos que puedan presentarse en los procesos constructivos, serán imputables al contratista de obra.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A

Durante la semana se realizó:

- Demolición de cárcamo en patio principal
- Instalación de teja Ecoroof en cubierta de aula dibujo
- Picado y aplicación de pañete en muros de fachada principal de biblioteca y frente cancha.
- Demolición y excavación en cancha
- Instalación de enchape en aula de dibujo
- Instalación de ventanería
- Aplicación de estuco en aula 3 de segundo piso.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **79,30%**, avance ejecutado de **40,97%**, avance programado de **55,04%**, teniendo una diferencia de **14,07%** en atraso.

Pendientes:

- Programación actualizada.

IT Francisco José de Caldas, sede A

Durante la semana se realizó:

- Aplicación de pintura en aulas de segundo piso.

- Aplicación de boquilla en aulas y pasillo de segundo piso.
- Resanes en fachada de bloque L.
- Instalación de granito lavado en boca puertas de baños y entradas principales.
- Rayado de muros y aplicación de estuco en área de escaleras.
- Toma de densidades en andén lateral bloque L.
- Instalación de malla electro soldada y fundida de anden parte posterior y lateral bloque L.
- Instalación de puertas en oficinas y baños.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **59,00%**, avance ejecutado de **57,96%**, avance programado de **66,43%**, teniendo una diferencia de **8,46%** en atraso.

Pendientes:
Programación actualizada.

Garcés Navas IED

Durante la semana se realizó:

- Instalación de teja Ecoroof en biblioteca y aula múltiple.
- Instalación de manto asfaltico en viga canal de Bloque A.
- Remates en pintura en salones de bloque B.
- Instalación de flanches en bloque B.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **73,00%**, avance ejecutado de **55,94%**, avance programado de **96,83%,** teniendo una diferencia de **40,89%**.

Pendientes:

- Programación actualizada.

IED Floridablanca, sede A

Durante la semana se realizó:

- Retiro de material de demolición de parqueadero.
- Desmonte de cubierta aula de edu. Física, cómputo y música.
- Demolición de piso en corredor de aula de música.
- Armado y figurado de acero de refuerzo para vigas de confinamiento.
- Armado de formaletas para vigas de confinamiento
- Excavación mecánica en parqueadero.
- Retiro de material de excavación.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **60,00%**, avance ejecutado de **43,55%** avance programado de **38,78%**, teniendo una diferencia de **4,77%** en avance.

Pendientes:

- Programación actualizada.

IED Justo Victor Charry

Durante la semana se realizó:

- Entrega parcial de baño de niños bachiller y preescolar a institución.
- Aplicación de pañete, instalación de enchape e instalación de push para sanitarios en baño niñas bachiller.
- Instalación de lámparas herméticas LED, toma corriente e interruptor en baño de niños preescolar.
- Trasiego de escombros a punto de acopio.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico **58,00%**, avance ejecutado de **70,96%**, avance programado de **100%**, teniendo una diferencia de **29,04%** en atraso.

Pendientes:

- Programación actualizada.

IED Rafael Bernal Jiménez, sede A

Durante la semana se realizó:

- Soldadura y aplicación de pintura e instalación de perfiles en C (150x50x2.5) para cubierta de aula múltiple
- Instalación de enchape en muros y piso en shut de basura
- Instalación de malla de gallinero en muros de shut de basuras

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **65,30%,** avance de ejecutado de **50,60%**, avance programado de **96,34%**, teniendo una diferencia de **45,74%** en atraso.

Pendientes:

- Programación actualizada.

IT Juan del Corral, sede A

Durante la semana se realizó:

- Instalación de flanche en fachada lateral del coliseo
- Limpieza de muros.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **90,30%,** avance ejecutado de **30,19%**, avance programado de **50,34%**, teniendo una diferencia de **20,15%** en atraso.

Pendientes:

- Programación actualizada.

IED San José Norte

Durante la semana se realizó:

- Aplicación de pañete en muros de aula múltiple.
- Relleno en subbase en cocina.
- Corte y dilatación de placa en aula múltiple.
- Desmonte de ventaneria en aula múltiple.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **47,00%**, avance ejecutado de **5,44%,** avance programado de **1,40%**, teniendo una diferencia de **4,04%** en avance.

Pendiente:

- Concepto estructural (placa aula múltiple, cubierta auto portante)

- Ajuste programación de obra.

IED Rafael Bernal Jiménez, sede B

Durante la semana se realiza:

- Excavación manual para zapatas de muro en zona de juegos.
- Demolición de concreto en zona de juegos.
- Instalación de hierros y fundida de concreto para viga de cimentación.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **30,00%**

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- Presupuesto Actualizado.

IED República de Panamá

Durante la semana se realizó:

- Aplicación de estuco en muros de cocina
- Instalación de cerramiento en lona
- Demolición muro, vigas y placa tarima
- Aplicación de pañete en columnas

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **35,00%**

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- Presupuesto Actualizado.

IED Simón Bolívar

Durante la semana se realizó:

- Cerramiento en aula múltiple.
- Demolición de enchape y alistado en piso del aula múltiple.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **4,00%**

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- Presupuesto Actualizado.

Aspectos Generales

De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de **26,97%,** con base en la programación presentada un avance general programado de **41,18%,** teniendo una diferencia de **14,20%** en el contrato.

Con base en el atraso evidenciado se solicita implementar plan de contingencia a fin de mejorar el desarrollo de las actividades de obra que a la fecha se encuentran con atrasos y aquellas pendientes por realizar.

Con base en la relación establecida entre programación y ejecución definida para el presente contrato, a la fecha se evidencian 11 frentes de obra activos de los cuales 7 instituciones se encuentran en atraso por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

Es pertinente que contratista de obra acate las instrucciones y directrices presentadas por la interventoría en aras de evitar afectaciones a las edificaciones existentes de las instituciones educativas. Aunado a lo anterior, se solicita presentar los conceptos con anticipación para ser revisados por parte de especialistas de cada una de las áreas.

Se requiere realizar los subsanes correspondientes a informes de componente técnico y SSTA en los términos establecidos.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

De acuerdo a compromiso Nº6 del comité de Seguimiento técnico #26, el cual, dedine los residente e inspectores a cargo de cada sede. - Rafael Bernal Jimenez (A), Francisco Jose de Caldas, Jorge Eliecer Gaitan, Jed Pumarà, Rafael Bernal Jimenez (B), Fito Victor Chary, Garcia Navas, Juan del Coral, San José Norte, Floridablanca, Simon Bolivar: la antena, se remite en la presente reunión mediante tabla

IED JORGE ELIECER GAITAN: Se solicita ajustar programación y balance presupuestal conforme a mesa de trabajo y conversaciones sostenidas entre Secretaria de Educación del Distrito, Contratista de Obra e Interventoría. Es importante: validar los materiales a utilizar y actividades que se tienen para alcanzar ela meta propuesta.

IED. FRANCISCO JOSE DE CALDAS: Se requiere presentar programación y balance presupuesto Actualizado conforme a las directrices entregados por la IED, e Interventoría. Se Validará nuevamente las cantidades y actividades reprogramar. Se requiere prestar atención a los atrasos que se vienen presentando

IED GARCES NAVAS: Se solicita tomar las acciones a que haya lugar para nuestro los atrasos que se vienen presentando pendiente de entrega presupuesto y cronograma actualizado.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED FLORIDABLANCA: Es pertinente agilizar la entrega de presupuesto y cronograma actualizado. Se requiere tomar las acciones a que haya lugar para mitigar los atrasos que se vienen presentando. Por otra parte, es necesario validar los plazos y/o términos de las actividades que se programen.

JUSTO VICTOR CHARRY: Se informa por parte de contratista las situaciones de vandalismo causadas por los estudiantes a las zonas donde se instalaron baños; se solicita remitir comunicado a SED para efectos los trámites pertinentes ante las directivas de la institución. Se requiere tomar acciones para mitigar los atrasos y efectuar la entrega de las obras conforme a la programación

IED RAFAEL BERNAL JIMENEZ, SEDE A: Se requiere implementar plan de acción para mitigar los atrasos. Se solicita presentar presupuesto y cronograma actualizado, con ara, de realizar el control y seguimiento pertinente.

IT JUAN DEL CORRAL: Implementar plan de Contingencia inmediato para cumplir con el alcance designado y los plazos establecidos.

IED SAN JOSE NORTE: Se solicita ajustar programación de institución educativa, amado presentar el presupuesto actualizado.

IED RAFAEL BERNAL JIMENEZ SEDE B); IED REPUBLICA DE PANAMÁ, IED SIMÓN BOLIVAR: A la fecha no se cuenta con programación, flujo de inversión semanal y presupuesto actualizado. Se solicita agilizar la entrega de lo listado en el presente acta. Es pertinente

TEMAS COMPONENTE SST - MA

Se permite solicitar el estricto cumplimiento en la entrega de documentación para ingreso de personal operativo previa al inicio de ejecución de actividades, así mismo, contar con el equipo de protección personal tanto en personal operativo como administrativo para la ejecución de las obras.

Se evidencia en recorrido de campo en las zonas de acopio de escombros materiales que superan las cantidades máximas admisibles. Se requiere de manera urgente, efectuar el retiro de los mismos según corresponda.

Se solicita la supervisión de los profesionales SST respecto a las actividades de alto riesgo (trabajo en alturas) de manera prioritaria.

TEMAS SOCIAL

TEMAS VARIOS

Se solicita al contratista de obra realizar las gestiones y acciones pertinentes para la entrega de balances presupuestales actualizados, con el fin de, definir el horizonte del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022 y cumplir con el objeto contractual.

Se informa que cualquier cambio que proponga el contratista, deberá ser consultado por escrito a la interventoría y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación de ésta; en caso contrario, cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del contratista.

Se solicita a SAFRID INGENIERIA SAS suministrar a la interventoría, con la debida anticipación los resultados de los especímenes tomados en obra, en aras de evidencias la calidad de los materiales utilizados conforme a las especificaciones técnicas de la entidad contratante.


Los ensayos de los materiales de las actividades que se vienen desarrollando en cada uno de los frentes, se rigen por la normatividad vigente, a su vez por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones, anexos técnicos y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

EMERGENCIAS EDUCATIVAS.

- Heladia Mejía IED: Se solicita realizar el sobrante de las observaciones realizadas en frente de obra: Embaquillado, ajuste de baldosas y guardaescoba., Remate de Bocapuerta
- Se solicita efectuar la entrega de presupuestos de las emergencias ejecutadas y pendientes por realizar actualizados

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS VARIOS

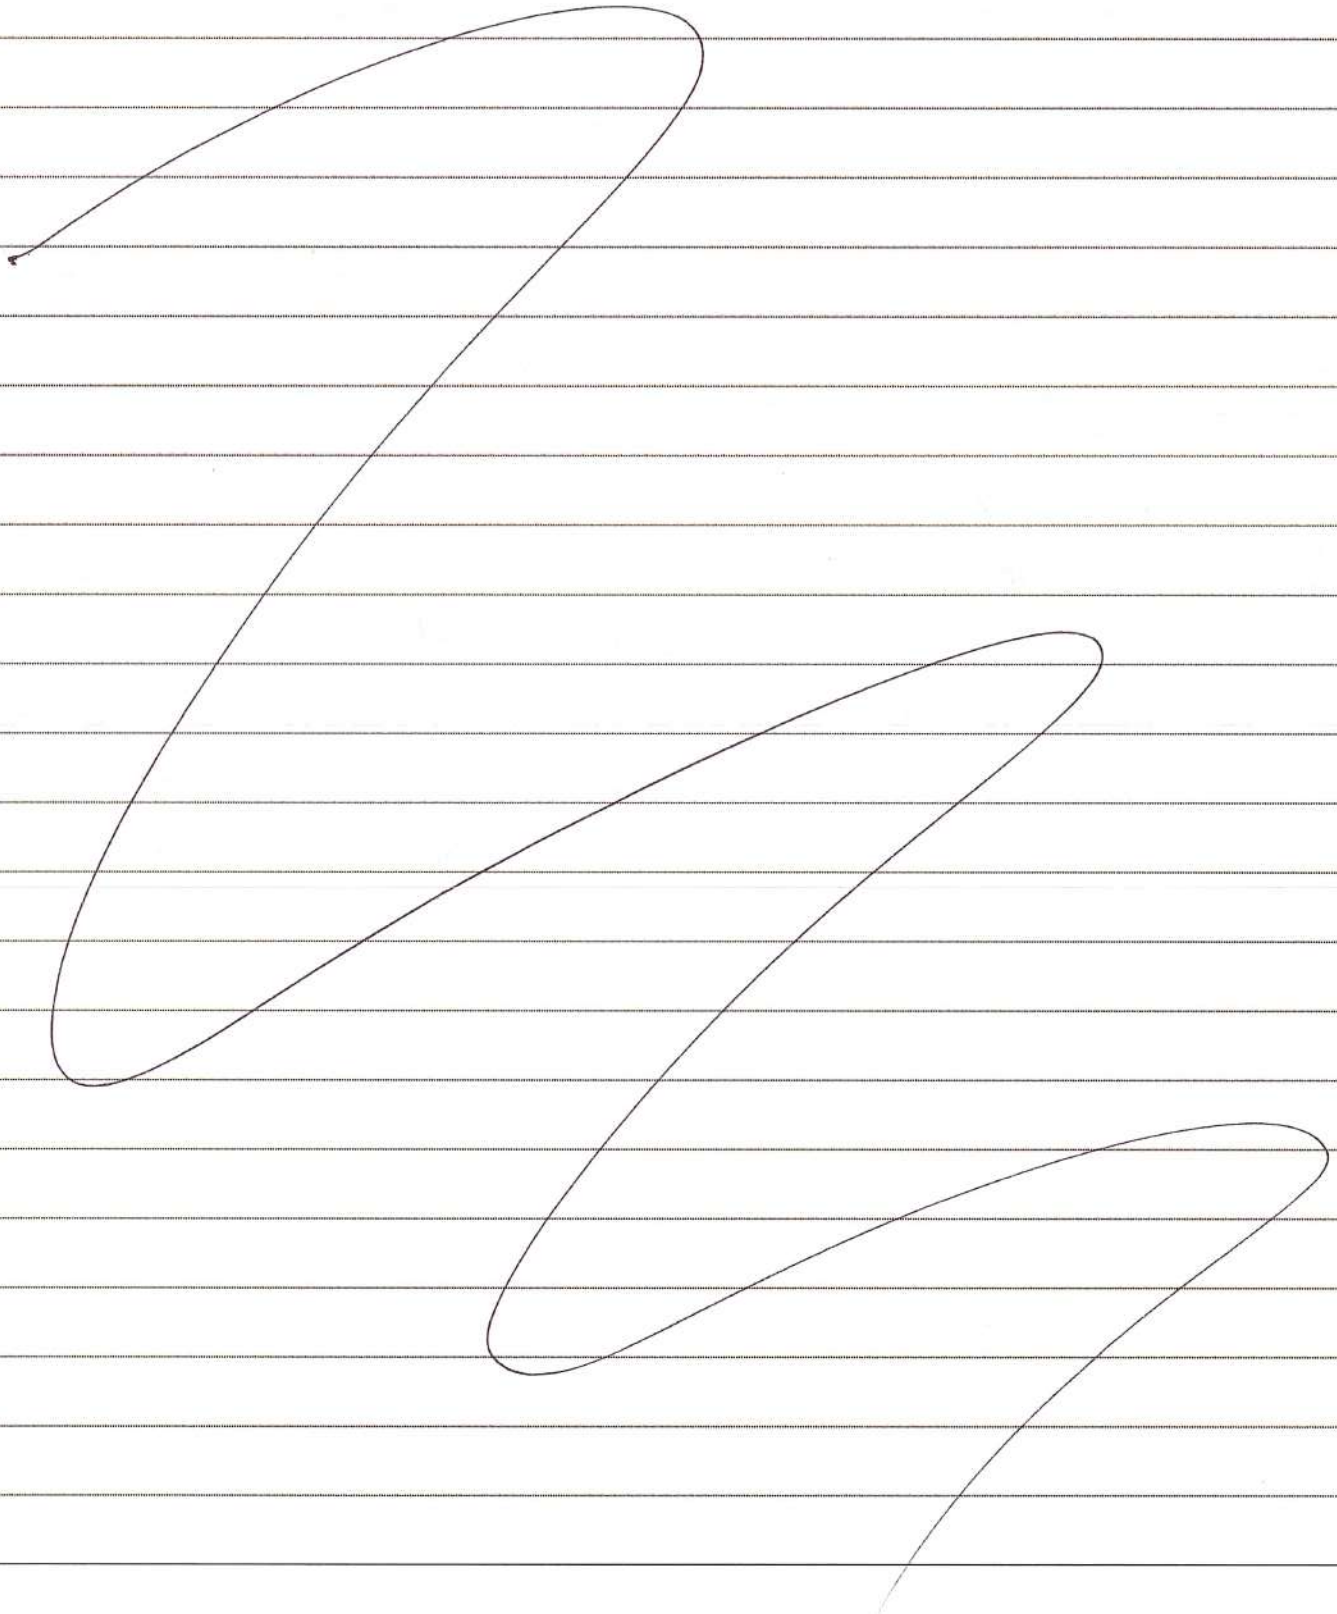

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

COMPROMISOS

1	Ajuste Plan de Contingencia General	Responsable: Contratista Fecha: 21/07/2023
2	Caracterización de Suelo de fundación de aulas modulares IED San José Norte	Responsable: Contratista Fecha: 21/07/2023
3	Cronograma General Actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Responsable: Contratista Fecha: 21/07/2023
4	Subsanar Informes Mensuales No. 3, 4, 5	Responsable: Contratista de Obra Fecha: Inmediato.
5	Comunicado Sustracción de Vandalismo baterías Sanitarias Justo Victor Charry	Responsable: Contratista de Obra Fecha: Inmediato
6	Mesa de trabajo revisión presupuesto. San José Norte, R. Bernal Jimenez, sede B	Responsable: Contratista de obra Fecha: 24/07/23.
7		Responsable: Fecha:
8		Responsable: Fecha:
9		Responsable: Fecha:
10		Responsable: Fecha:
11		Responsable: Fecha:
12		Responsable: Fecha:
13		Responsable: Fecha:
14		Responsable: Fecha:
15		Responsable: Fecha:
16		Responsable: Fecha:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

17		Responsable: Fecha:
18		Responsable: Fecha:
19		Responsable: Fecha:
20		Responsable: Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá DC a los 19 días del mes de julio del 2023.

CONTRATISTA

Luis Eduardo Montes Álvarez
Director de obra

Residente de obra

INTERVENTORIA

Fredy Giovanni Rodriguez Salazar
Director de interventoría

CAMILO ANTONIO SAMACÁ PESCA
Residente de interventoría

SUPERVISOR

Edwin Alexander Santana Rodríguez
Supervisor Secretaria de Educación del Distrito Capital

Juan Carlos Valencia Gamba
Apoyo Supervisión Secretaria de Educación del Distrito Capital

Nota:

1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

Fecha:	19/ julio / 2023	Lugar:	IED SAN JOSE NORTE JEDEA	Acta de seguimiento No:	27
Contrato de obra:	CO1.PCCNTR.4077642	Contrato de interventoría:	CO1.PCCNTR.4146207		

Nombre	Cargo	Empresa	Correo	Teléfono	Firma
Jaime Alejandro Moreno	Inspector de obra	SAFRID SAS	proyectosdelgrupo2@gmail.com	3138706334	
Juan Carlos Valencia	Apoyo Supervision	DCEE - SED		3147125836	
Adriana Mendez	Residente obra	Safrid.	proyectosdelgrupo2@gmail.com.	3153950 14	
LUIS EDUARDO MONTES	DIRECTOR OBRA	SAFRID.	"	3006613168	
Fredy G. Rodriguez	Director Interventoria	Consorcio Inter Colegios 2022	fredy.rodriguez.gry@gmail.com	6015202359	
Camilo Antonio Sanmiguel P.	Residente Interventoría	Consorcio Intercolegios 2022	residente1.cic2022@gmail.com	3163340746	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
28	25/07/2023	10:00 am	1:00 pm	IED SAN JOSE NORTE

Objeto de la reunión:	Comité de seguimiento técnico integral de obra		
INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Mesa de trabajo revisión presupuesto (San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B)	Contratista de obra e interventoría	24 de julio de 2023	Pendiente
2	Ajuste plan de contingencia general	Contratista de obra	21 de julio de 2023	Pendiente
3	Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares de San José Norte.	Contratista de obra	21 de julio de 2023	Pendiente
4	Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente.	Contratista de obra	21 de julio de 2023	Pendiente
5	Subsane de informes mensuales No. 3, 4 y 5.	Contratista de Obra	Inmediato	Pendiente
6	Comunicado situación de Vandalismo baterías sanitarias Justo Víctor Charry	Contratista de Obra	Inmediato	Pendiente
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

TEMAS ADMINISTRATIVOS

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales ha realizado los requerimientos para conminar al contratista a desempeñar sus funciones conforme los anexos técnicos, estudios previos y pliegos de condiciones del proceso de licitación pública No. SED-LP-DCCEE-039-2022.

- Por parte de interventoría se solicita a contratista de obra efectuar las actividades acorde a directrices determinadas por la Secretaria de Educación del Distrito, dando alcance al objeto contractual.

- Con el fin de realizar el control, seguimiento y cumplimiento de los procesos técnicos – administrativos con celeridad, se realiza semanalmente mesas de trabajo y reuniones de los diferentes componentes en conjunto con contratista de obra e interventoría, en aras de alcanzar con las metas trazadas.

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 requiere de las buenas gestiones por parte de SAFRID INGENIERIA SAS para ejecutar las actividades conforme a lo planificado, en aras de evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos.

- Se notifica a contratista de obra que es indispensable realizar diligentemente la ejecución de las actividades aprobadas por parte de la interventoría, toda vez que los atrasos que se presenten en la ejecución de las mismas serán responsabilidad del mismo.

- Se insta a SAFRID INGENIERÍA SAS implementar y cumplir de manera rigurosa el plan de contingencia presentado, de manera, que se mitiguen los atrasos presentados a la fecha.

- Se solicita a contratista de obra subsanar las observaciones y requerimientos establecidos por interventoría de manera diligente, con ello avanzar en las labores estipuladas para cada una de las sedes en ejecución.

- Se requiere a contratista de obra la entrega de conceptos pendientes para la validación y/o aprobación por parte de la interventoría, con ello evitar afectaciones en el buen desarrollo del contrato de obra. En consideración a lo expuesto, los atrasos que puedan presentarse en los procesos constructivos, serán imputables al contratista de obra.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A

Durante la semana se realizó:

- Instalación de enchape de piso en aula de dibujo
- Aplicación de pañete en fachada principal y biblioteca
- Aplicación de estuco en aula 3 de 2° piso
- Instalación de geotextil en cancha
- Instalación, conformación y compactación de subbase B-400 en cancha
- Fabricación de ventanas

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **82,30%**, avance ejecutado de **44,93%**, avance programado de **58,64%**, teniendo una diferencia de **13,71%** en atraso.

Pendientes:

- Programación actualizada.
- Presupuesto actualizado.

IT Francisco José de Caldas, sede A

Durante la semana se realizó:

- Instalación de malla electro soldada de 6 mm y fundida de anden lateral bloque L.

nates en marcos instalados.
Resanes en fachada bloque L lado occidental.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **60,00%**, avance ejecutado de **58,40%**, avance programado de **72,29%**, teniendo una diferencia de **13,90%** en atraso

Pendientes:

- Programación actualizada.
- Subsane concepto eléctrico.

Garcés Navas IED

Durante la semana se realizó:

- Instalación de teja Ecoroof en biblioteca y aula múltiple.
- Instalación de manto asfaltico en viga canal de Bloque A.
- Remates en pintura en salones de bloque B.
- Instalación de flanches en bloque B.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **75,00%**, avance ejecutado de **56,32%**, avance programado de **98,98%,** teniendo una diferencia de **42,66%**.

Pendientes:

- Programación actualizada.
- Presupuesto actualizado.

IED Floridablanca, sede A

Durante la semana se realizó:

- Demolición de estructuras en concreto en parqueadero.
- Demolición de piso y excavación manual en aula de música.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **62,00%**, avance ejecutado de **41,38%** avance programado de **45,64%**, teniendo una diferencia de **4,26%** en avance.

Pendientes:

- Programación actualizada.
- Presupuesto actualizado.

IED Justo Victor Charry

Durante la semana se realizó:

- Instalación de mesón en policuarzo en baño de niñas bachiller y baño niñas preescolar.
- Instalación de enchape en piso y muros y aplicación de pintura epoxica en techos de baño de niñas bachiller.
- Trasiego de escombros a punto de acopio.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico **75,00%**, avance ejecutado de **74,15%**, avance programado de **100%**, teniendo una diferencia de **25,85%** en atraso.

Pendientes:

- Presupuesto actualizado.
- Plan de contingencia.

IED Rafael Bernal Jiménez, sede A

Durante la semana se realizó:

- Soldadura y aplicación de pintura e instalación de perfiles en C (150x50x2.5) para cubierta de aula múltiple
- Instalación sikaflex en dilataciones piso aula múltiple

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **68,30%,** avance de ejecutado de **59,63%**, avance programado de **100%**, teniendo una diferencia de **40,37%** en atraso.

Pendientes:

- Programación actualizada.
- Presupuesto actualizado.

IT Juan del Corral, sede A

Durante la semana se realizó:

- Demolición concreto en sótano para bomba de achique
- Orden y aseo general

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **92,30%,** avance ejecutado de **32,59%**, avance programado de **58,59%**, teniendo una diferencia de **26,00%** en atraso.

Pendientes:

- Programación actualizada.
- Presupuesto actualizado.

IED San José Norte

Durante la semana se realizó:

- Aplicación de pañete en muros de aula múltiple y cuarto de entre paños.
- Demolición de aulas modulares costado sur - cancha.
- Demolición de manto de la placa exterior del aula múltiple
- Levante de muro en el aula múltiple.
- Demolición de aulas en paneles metálicos y en superboard.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **40,00%**, avance ejecutado de **5,75%,** avance programado de **1,52%**, teniendo una diferencia de **4,24%** en avance.

Pendiente:

- Ajuste programación de obra.
- Presupuesto actualizado.

IED Rafael Bernal Jiménez, sede B

Durante la semana se realiza:

- Instalación de estribos en columnas

- Excavación para tubería sanitaria para shut de basuras

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **35,00%**

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- Presupuesto Actualizado.

IED República de Panamá

Durante la semana se realizó:

- Aplicación de estuco en muros de cocina
- Demolición muro y placa tarima
- Aplicación de pintura en muros y placa
- Replanteo base para modulares

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **35,00%**

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- Presupuesto Actualizado.

IED Simón Bolívar

Durante la semana se realizó:

- Demolición de enchape y alistado en piso del aula de danzas y cuartos de profesores.
- Acopio de escombro de la zona del patio con el cerramiento.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **5,00%**

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- Presupuesto Actualizado.

Aspectos Generales

De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de **28,42%**, con base en la programación presentada un avance general programado de **40,93%,** teniendo una diferencia de **12,51%** en el contrato.

Con base en el atraso evidenciado se solicita implementar plan de contingencia a fin de mejorar el desarrollo de las actividades de obra que a la fecha se encuentran con atrasos y aquellas pendientes por realizar.

Con base en la relación establecida entre programación y ejecución definida para el presente contrato, a la fecha se evidencian 11 frentes de obra activos de los cuales 7 instituciones se encuentran en atraso por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.

Es pertinente que contratista de obra acate las instrucciones y directrices presentadas por la interventoría en aras de evitar afectaciones a las edificaciones existentes de las instituciones educativas. Aunado a lo anterior, se solicita presentar los conceptos con anticipación para ser revisados por parte de especialistas de cada una de las áreas.

Se requiere realizar los subsanes correspondientes a informes de componente técnico y SSTA en los términos establecidos.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED. JORGE ELIECER GAITAN (A): Se requiere la entrega inmediata del balance presupuestal actualizado, en aras, de establecer el horizonte de las actividades a desarrollar en la institución educativa. Es pertinente prestar atención a los atrasos presentados y realizar una implementación más estricta a plan de contingencia presentado. Por otra parte, Supervisor SED en visita a institución educativa evidenció en piso de Hall 2do piso y Aula adyacente afectaciones, por lo tanto, realiza la recomendación de 2 alternativas de intervención: 1. Retirar lamina de piso e instalar una lámina con un espesor mayor para mejorar las condiciones. 2. Instalar una lámina sobre la existente; la anterior sugerencia esta supeditada a los análisis de los especialistas estructurales.

IED FRANCISCO JOSE DE CALDAS (A): A la fecha se presenta atrasos considerables que no permite alcanzar las metas trazadas, por lo que se requiere de manera diligente poner en marcha un plan de contingencia que ayude a mitigar la situación; ~~,~~ Así mismo, se solicita efectuar subsane de concepto eléctrico para avanzar en la actividades programadas.

IED GABRIELA MANTILLA: Los atrasos del frente de obra a la fecha son superiores y vienen incrementandose con el paso de las semanas de manera progresiva, por lo tanto, se insta a contratista de Obra tomar acciones correctivas en aras de mitigar los impactos generados por la situación. Se solicita a contratista presentar el balance presupuestal actualizado y la reprogramación del frente, teniendo en cuenta los plazos establecidos por la SED.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED FLORIDABLANCA: Debido a la intervención de parqueadero se ha realizado por parte de contratista la revisión de las redes de alcantarillado y pluvial para la entrega de aguas provenientes de la edificación adyacente y parqueadero. Se solicita validar la redes hidrosanitarias existentes con el fin de evitar afectaciones a la institución educativa. Se requiere la entrega de balance presupuestal actualizado y programación de frente de Obra, además de implementar un plan de acción para mitigar atrasos.

IED JUSTO VICTOR CHARRY: A la fecha el frente de obra cuenta con un programado de 100%, teniendo un atraso de 25,85%, de manera que se solicita a contratista tomar acciones y realizar todo lo que sea posible para la entrega de las áreas intervenidas a la institución educativa. Se requiere entrega balance y programación actualizada.

IED RAFAEL BERNAL JIMENEZ (AS): Es pertinente tomar acciones de mitigación de atrasos, con ello, cumplir las metas trazadas en los plazos establecidos.

IED. JUAN DEL CORRAL: Se encuentra pendiente la entrega de las áreas que están parcialmente remediadas. Se requiere enviar balance y presupuesto actualizado.

IED. SAN JOSE NORTE (AS): Se requiere a Contratista presentar las alternativas y cuadro comparativo de las mismas a nivel financiero, con ello, evaluarlas. En relación a las aulas modulares se solicita a contratista agilizar la entrega de conceptos de especialistas estructural y de geotecnia para establecer la cimentación de las mismas.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED RAFAEL BERNAL JIMENEZ, IED. REPUBLICA DE PANAMÁ, IED SIMÓN BOLIVAR: las instituciones mencionadas no cuentan con programación y flujo de inversión semanal para efectuar el control y seguimiento de actividades. Se requiere entregar de manera inmediata balance presupuestal actualizado y programacion (flujo de inversión semanal).

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

TEMAS COMPONENTE SST - MA

Se permite solicitar el estricto cumplimiento en la entrega de documentación para ingreso de personal operativo previa al inicio de ejecución de actividades, así mismo, contar con el equipo de protección personal tanto en personal operativo como administrativo para la ejecución de las obras.

Se evidencia en recorrido de campo en las zonas de acopio de escombros materiales que superan las cantidades máximas admisibles. Se requiere de manera urgente, efectuar el retiro de los mismos según corresponda.

Se solicita la supervisión de los profesionales SST respecto a las actividades de alto riesgo (trabajo en alturas) de manera prioritaria.

TEMAS SOCIAL

TEMAS VARIOS

Se solicita al contratista de obra realizar las gestiones y acciones pertinentes para la entrega de balances presupuestales actualizados, con el fin de, definir el horizonte del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022 y cumplir con el objeto contractual.

Se informa que cualquier cambio que proponga el contratista, deberá ser consultado por escrito a la interventoría y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación de ésta; en caso contrario, cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del contratista.

Se solicita a SAFRID INGENIERIA SAS suministrar a la interventoría, con la debida anticipación los resultados de los especímenes tomados en obra, en aras de evidencias la calidad de los materiales utilizados conforme a las especificaciones técnicas de la entidad contratante.

Los ensayos de los materiales de las actividades que se vienen desarrollando en cada uno de los frentes, se rigen por la normatividad vigente, a su vez por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones, anexos técnicos y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

TEMAS VARIOS

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	N° REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

COMPROMISOS

1	Mesa de trabajo revisión presupuesto (San José Norte y Rafael Bernal. Juvenes (B)	Responsable: Contratista de Obra Fecha: 27/07/2023
2	Ajuste plan de Contingencia General	Responsable: Contratista de Obra Fecha: 26/07/2023
3	Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares de San José Norte - Concepto especialista	Responsable: Contratista de Obra Fecha: 26/07/2023
4	Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Responsable: Contratista de Obra Fecha: 27/07/2023
5	Subsane informes mensuales N° 3, 4, 5	Responsable: Contratista de Obra Fecha: 27/07/2023 - Inmediato
6	Comunicado Situación de Urbalarma Bateria Santander José Victor Chary	Responsable: Contratista de Obra Fecha: Inmediato.
7		Responsable: Fecha:
8		Responsable: Fecha:
9		Responsable: Fecha:
10		Responsable: Fecha:
11		Responsable: Fecha:
12		Responsable: Fecha:
13		Responsable: Fecha:
14		Responsable: Fecha:
15		Responsable: Fecha:
16		Responsable: Fecha:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
29	02/08/2023	2:15 p.m		IED SAN JOSE NORTE
Objeto de la reunión:	Comité de seguimiento técnico integral de obra			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Mesa de trabajo revisión presupuesto (San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B)	Contratista de obra e interventoría	27 de julio de 2023	Pendiente
2	Ajuste plan de contingencia general	Contratista de obra	26 de julio de 2023	Pendiente
3	Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares de San José Norte./ Concepto de cimentación	Contratista de obra	26 de julio de 2023	Pendiente
4	Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente.	Contratista de obra	27 de julio de 2023	Pendiente
5	Subsane de informes mensuales No. 3, 4 y 5.	Contratista de Obra	Inmediato	Pendiente
6	Comunicado situación de Vandalismo baterías sanitarias Justo Víctor Charry	Contratista de Obra	Inmediato	Pendiente
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

TEMAS ADMINISTRATIVOS

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales ha realizado los requerimientos para conminar al contratista a desempeñar sus funciones conforme los anexos técnicos, estudios previos y pliegos de condiciones del proceso de licitación pública No. SED-LP-DCCEE-039-2022.

- Por parte de interventoría se solicita a contratista de obra efectuar las actividades acorde a directrices determinadas por la Secretaria de Educación del Distrito, dando alcance al objeto contractual.

- Con el fin de realizar el control, seguimiento y cumplimiento de los procesos técnicos – administrativos con celeridad, se realiza semanalmente mesas de trabajo y reuniones de los diferentes componentes en conjunto con contratista de obra e interventoría, en aras de alcanzar con las metas trazadas.

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 requiere de las buenas gestiones por parte de SAFRID INGENIERIA SAS para ejecutar las actividades conforme a lo planificado, en aras de evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos.

- Se notifica a contratista de obra que es indispensable realizar diligentemente la ejecución de las actividades aprobadas por parte de la interventoría, toda vez que los atrasos que se presenten en la ejecución de las mismas serán responsabilidad del mismo.

- Se insta a SAFRID INGENIERÍA SAS implementar y cumplir de manera rigurosa el plan de contingencia presentado, de manera, que se mitiguen los atrasos presentados a la fecha.

- Se solicita a contratista de obra subsanar las observaciones y requerimientos establecidos por interventoría de manera diligente, con ello avanzar en las labores estipuladas para cada una de las sedes en ejecución.

- Se requiere a contratista de obra la entrega de conceptos pendientes para la validación y/o aprobación por parte de la interventoría, con ello evitar afectaciones en el buen desarrollo del contrato de obra. En consideración a lo expuesto, los atrasos que puedan presentarse en los procesos constructivos, serán imputables al contratista de obra.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A

Durante la semana se realizó:

- Instalación, conformación y compactación de subbase B-400 en cancha.
- Instalación de estructura de cielo raso en aula de informática, cooperativa, refrigerios y hall de primer piso.
- Picado de muros y aplicación de pañete en fachada frente a cancha.
- Instalación de enchape en pasillo de disfraces.
- Toma de densidades en área de cancha.
- Aplicación de pintura en hall de 2do piso.
- Orden y aseo general.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **85,30%**, avance ejecutado de **47,77%**, avance programado de **61,76%**, teniendo una diferencia de **13,99%** en atraso.

Pendientes:

- Programación actualizada.
- Presupuesto actualizado.

IT Francisco José de Caldas, sede A

Durante la semana se realizó:

- Fundida de andén lateral y canaleta posterior bloque L.

- Instalación de sanitarios, policuarzo y lavamanos en baño de niñas preescolar.
- Trasiego de escombros a punto de acopio.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico **70,00%**, avance ejecutado de **69,95%**, avance programado de **100%**, teniendo una diferencia de **30,05%** en atraso.

Pendientes:

- Presupuesto actualizado.
- Plan de contingencia.

IED Rafael Bernal Jiménez, sede A

Durante la semana se realizó:

- Soldadura y aplicación de pintura e instalación de perfiles en C (150x50x2.5) para cubierta de aula múltiple
- Instalación de enchape de piso en aula de karate.
- Desmonte de cerchas en cubierta de aula múltiple.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **71,30%,** avance de ejecutado de **55,17%**, avance programado de **100%**, teniendo una diferencia de **44,83%** en atraso.

Pendientes:

- Programación actualizada.
- Presupuesto actualizado.

IT Juan del Corral, sede A

Durante la semana se realizó:

- Aplicación de imprimante para poliurea en terrazas.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **94,30%,** avance ejecutado de **51,68%**, avance programado de **69,43%**, teniendo una diferencia de **17,75%** en atraso.

Pendientes:

- Programación actualizada.
- Presupuesto actualizado.

IED San José Norte

Durante la semana se realizó:

- Aplicación de pañete bajo placa y muros de aula múltiple.
- Demolición de manto asfaltico en terraza del aula múltiple y baños.
- Levante de muro en aula de laboratorio No. 1 y baños.
- Fundida de placa de contrapiso en aula de laboratorio No. 2.
- Armado de acero de refuerzo para vigueta de confinamiento de laboratorio.
- Excavación manual en baños.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **8,80%**, avance ejecutado de **4,71%,** avance programado de **1,64%**, teniendo una diferencia de **3,08%** en avance.

- Fundida de andén lateral y canaleta posterior bloque L.
- Corte en concreto en placa vehicular lateral bloque L.
- Instalación de puntos, tubería y cableado eléctrico en oficinas y pasillo de primer piso.
- Resanes y aplicación de pintura en aulas de segundo piso.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **60,00%**, avance ejecutado de **48,37%**, avance programado de **78,23%**, teniendo una diferencia de **29,86%** en atraso.

Pendientes:

- Programación actualizada.
- Subsane concepto eléctrico.

Garcés Navas IED

Durante la semana se realizó:

- Remate de pintura sobre perfileria metálica en el aula múltiple.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **75,00%**, avance ejecutado de **44,38%**, avance programado de **100%,** teniendo una diferencia de **55,62%**.

Pendientes:

- Programación actualizada.
- Presupuesto actualizado.

IED Floridablanca, sede A

Durante la semana se realizó:

- Instalación de geotextil tejido 2400 en área de parqueadero.
- Instalación y compactación de afirmado y subbase granular en área de parqueadero.
- Corte y figurado de acero de refuerzo y fundida de vigas de confinamiento aula de cómputo y Edu. Física.
- Excavación manual en aula música.
- Arreglo de arco en cancha No. 1.
- Limpieza de viga canal bloque SENA.
- Toma de densidades en área de parqueadero.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **65,00%**, avance ejecutado de **41,80%** avance programado de **44,36%**, teniendo una diferencia de **2,57%** en atraso.
Pendientes:

- Programación actualizada.
- Presupuesto actualizado.

IED Justo Victor Charry

Durante la semana se realizó:

- Instalación de enchape de piso y muros en baño de niñas preescolar.
- Instalación de divisiones en baño de niñas bachiller.
- Aplicación de pintura epóxica en techos y muros de baño de niñas bachiller y preescolar.
- Instalación de sanitarios en baño de niñas bachiller.

Pendiente:

- Ajuste programación de obra.
- Presupuesto actualizado.

IED Rafael Bernal Jiménez, sede B

Durante la semana se realiza:

- Instalación de estribos en columnas en zona de juegos.
- Instalación de bloque para muro en zona de juegos.
- Excavación para tubería sanitaria para shut de basuras.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **40,00%**

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- Presupuesto Actualizado.

IED República de Panamá

Durante la semana se realizó:

- Aplicación de pintura en muros y placa
- Replanteo base para modulares y excavaciones.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **40,00%**

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- Presupuesto Actualizado.

IED Simón Bolívar

Durante la semana se realizó:

- Demolición de acabado y alistado de piso en aula de músca y danzas.
- Trasiego de material de demolición a punto de acopio.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **4,60%**

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- Presupuesto Actualizado.

Aspectos Generales

De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de **26,94%**, con base en la programación presentada un avance general programado de **43,69%**, teniendo una diferencia de **16,75%** en el contrato.

En atención a emergencias se realiza en IED Morisco intervención en aula de bachillerato internacional con instalación de muro en Dry Wall doble cara, instalación de luminaria y aplicación de estuco y pintura sobre muro.

Conforme con el seguimiento realizado a emergencias a la fecha se encuentra pendiente subsane de observaciones realizadas por interventoría en cuanto a acabados realizados en aula de preescolar y disposición final de residuos de construcción y demolición en IED Heladia Mejia, sede B.

Con base en el atraso evidenciado se solicita implementar plan de contingencia a fin de mejorar el desarrollo de las actividades de obra que a la fecha se encuentran con atrasos y aquellas pendientes por realizar.

Con base en la relación establecida entre programación y ejecución definida para el presente contrato, a la fecha se evidencian 11 frentes de obra activos de los cuales 7 instituciones se encuentran en atraso por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.

Es pertinente que contratista de obra acate las instrucciones y directrices presentadas por la interventoría en aras de evitar afectaciones a las edificaciones existentes de las instituciones educativas. Aunado a lo anterior, se solicita presentar los conceptos con anticipación para ser revisados por parte de especialistas de cada una de las áreas.

Se requiere realizar los subsanes correspondientes a informes de componente técnico y SSTA en los términos establecidos.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

Se da inicio a comité de seguimiento técnico con la presentación de los participantes por parte de Secretaría de Educación, Contratista de Obra e Interventoría (ver hoja de firmas seguimiento de contrato).

IED JORGE ELIECER GAITAN SEDE A: Se requiere efectuar una implementación más agresiva de plan de contingencia para mitigar los impactos generados por los atrasos. Se solicita realizar Mesa de trabajo para finiquitar el balance presupuestal actualizado, así mismo, la programación con flujo de inversión semanal.

IED. FRANCISCO JOSE DE CALDAS; SEDE A": Es pertinente realizar la visita el día 04 de agosto de 2023 desde el componente eléctrico para identificar la situación en la institución educativa, por lo tanto se pueda establecer el alcance de la intervención. Se requiere entregar programación actualizada con su respectivo flujo de inversión semanal. Se solicita tomar acciones para mitigar los atrasos presentados.

IED GABRIEL NAVAS: Se solicita de manera diligente im-

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

presenten plan de contingencia para mitigar atrasos. Se requiere la remisión de presupuesto y flujo de inversión actualizado.

IED. FLORIDABLANCA: Se manifiesta por parte de contratista la situación respecto a redes hidrosanitarias y pluvial para entrega de aguas de parqueadero y cocina de la sede. Se solicita realizar la validación de redes para identificar la entrega de las aguas vertidas. Se requiere dar celeridad a la entrega de documentos (Programación actualizada - Presupuesto)

IED JUSTO VICTOR CHARRY: Se solicita tomar las acciones pertinentes para mitigar atrasos; es importante aclarar que a la fecha debió ser entregado el frente de obra. Se evidenció acabados de pobrevero que deben ser ajustados para la entrega a la entidad. Se menciona por parte de contratista la situación de vandalismo a las baterías ~~acabadas~~ entregados parcialmente a ~~contra~~ Colegio.

IED. RAFAEL BERNAL JIMENEZ, SEDE A; Se solicita avanzar en los labores de la restitución para alcanzar las metas propuestas. Entrega de Sede 15 de agosto de 2023. (Posible)

IED. JUAN DEL CORRAL: Se estan realizando ajustes en canaleta de recolección en junta de bloque de biblioteca con Coliseo. para evitar afectaciones en la estructura. Se encuentra pendiente instalación de pobrea. la entrega de la sede para el día 11 de agosto de 2023

IED SAN JOSE NORTE: Se establece realizar mesa de trabajo para definir análisis de precios unitarios para cubierta oportunidad.

TEMAS COMPONENTE SST - MA

Se permite solicitar el estricto cumplimiento en la entrega de documentación para ingreso de personal operativo previa al inicio de ejecución de actividades, así mismo, contar con el equipo de protección personal tanto en personal operativo como administrativo para la ejecución de las obras.

Se evidencia en recorrido de campo en las zonas de acopio de escombros materiales que superan las cantidades máximas admisibles. Se requiere de manera urgente, efectuar el retiro de los mismos según corresponda.

Se solicita la supervisión de los profesionales SST respecto a las actividades de alto riesgo (trabajo en alturas) de manera prioritaria.

TEMAS SOCIAL

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

por lo tanto, se evaluará la posibilidad de desarrollar reunión con profesionales IED - presupuestos en aras de agilizar los trámites correspondientes de aprobación de actividad. Respecto a las aulas modulares se requiere presentar concepto del área de geotecnia para establecer las alternativas de amarración de las mismas, lo anterior, para identificar y validar presupuesto conforme a las estructuras a implementar.

IED RAFAEL BERNAL, SEDE B: Se requiere la entrega inmediata de programaciones y flujos de inversión semanal, Presupuesto

IED. REPUBLICA DE PANAMÁ: Se requiere definir la tipología de la intervención de Cocina, en donde se evidencia modificación en las características de construcción, debido a que no se cuenta con las debidas especificaciones. Por lo tanto se remitirá comunicado presentando comparativo los pro y contra de l Cambio de construcción. Se realizo inspección de redes para determinar la entrega de aguas provenientes de la construcción de cocina

IED. SIMON BOLIVAR: Se debe realizar análisis de estructura de cimentación por afectación de árboles. Se requiere tomar acciones para evitar/mitigar la situación

TEMAS VARIOS

Se solicita al contratista de obra realizar las gestiones y acciones pertinentes para la entrega de balances presupuestales actualizados, con el fin de, definir el horizonte del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022 y cumplir con el objeto contractual.

Se informa que cualquier cambio que proponga el contratista, deberá ser consultado por escrito a la interventoría y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación de ésta; en caso contrario, cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del contratista.

Se solicita a SAFRID INGENIERIA SAS suministrar a la interventoría, con la debida anticipación los resultados de los especímenes tomados en obra, en aras de evidencias la calidad de los materiales utilizados conforme a las especificaciones técnicas de la entidad contratante.

Los ensayos de los materiales de las actividades que se vienen desarrollando en cada uno de los frentes, se rigen por la normatividad vigente, a su vez por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones, anexos técnicos y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

TEMAS VARIOS

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

COMPROMISOS

1	Mesa de trabajo revisión presupuestos San José Norte y E. Bernal Jiménez, sede B	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	03/Agosto/2023.
2	Ajuste plan de Contingencia general.	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	03/Agosto/2023
3	Caracterización Suelo de Simulacros de autos modulares de San José Norte / Concepto Cimentaciones	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	08/Agosto/2023
4	Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	
5	Subsanar Informes mensuales Nº 3, 4, 5.	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	04/Agosto/2023
6	Comunicado Situación de Vandalismo baterías sanitarias Justo Victor Charry	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	02/Agosto/2023
7	Revisión Presupuesto	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	04/Agosto/2023
8		Responsable:	
		Fecha:	
9		Responsable:	
		Fecha:	
10		Responsable:	
		Fecha:	
11		Responsable:	
		Fecha:	
12		Responsable:	
		Fecha:	
13		Responsable:	
		Fecha:	
14		Responsable:	
		Fecha:	
15		Responsable:	
		Fecha:	
16		Responsable:	
		Fecha:	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

17		Responsable: Fecha:
18		Responsable: Fecha:
19		Responsable: Fecha:
20		Responsable: Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá DC a los 02 días del mes de agosto del 2023.

CONTRATISTA

Luis Eduardo Montes Álvarez
Director de obra

Adriana Rodriguez
Residente de obra

INTERVENTORIA

Fredy Giovanni Rodriguez Salazar
Director de interventoría

CAMILO ANTONIO SANAGÁ PESCA
Residente de interventoría

SUPERVISOR

Edwin Alexander Santana Rodríguez
Supervisor Secretaria de Educación del Distrito Capital

Isabel Rico Quiceno
Apoyo Supervisión Secretaria de Educación del Distrito Capital

Nota:
1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

Fecha:	02/08/2023	Lugar:	IED SAN JOSE NORTE	Acta de seguimiento No:	29
Contrato de obra:	CO1.PCCNTR.4077642	Contrato de interventoría:	CO1.PCCNTR.4146207		

Nombre	Cargo	Empresa	Correo	Teléfono	Firma
Mónica Gómez R.	Asesor SSTA	Consorcio Intercolegios	ssta.4@cgrg.com.co	3012599742.	
Adriana Mondol	Residente obra	Safrid.		3153950 11	
ISABEL RICO Q.	Supervi. SED.	S.E.D.	inspe@educacionbog ofe.gov.co	3157363121	
Gibson Andrey Gonzalez	Inspector de obra	Safrid	gib-son_@hotmail.com	3177162736	
Gonzalo Sarmiento Ro	Residente Obra	Safrid	Mikeangel2669@gmail.com	3143202962	
Jose David Acuña	Inspector Obra	Safrid	Jodavidac_@hotmail.com	3116486236	
Jaime Alejandro Moreno M	Insp. de Obra	SAFRID SAS	proyectosedgrupo2@gmail.com	3138706334	
LUIS EDUARDO MONTES	Director Obras Safrid.	Safrid.	proyectosedgrupo2@gmail.com	3006613168	
SANDRA HUERTAS	INSP. SST	SAFRID	" " " "	3164985903	
Claudia Patricia Pinchecha G	Coord. SSI	Safrid	" " —	3203252976	
Adrian Martinez Vasquez	Insp. SST	Safrid	" " "	320857 7806	
YADIN NATHALIA HUERTAS M	INTERVENTORIA SST	CONSORCIO INTERCOLEG	Inspector3.cic2022@gmail.com	3102571691	
EDWIN NUÑEZ AMAYA	Insp, Interventoria	Consorcio Intercolegios		3176387568	
Fredy G. Rodriguez S.	Director Interventoria	Consorcio Intercolegios 2022	fredy.rodriguez.grg@gmail.com	3015202359	
Camilo A. Sanmarco Pesca	Residente Interventoría	Consorcio Intercolegios 2022	residente1.cic2022@gmail.com	3163340746	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
30	09/08/2023	10:00 am	12:00 am	IED FRANCISCO JOSE DE CALDAS, SEDE A
Objeto de la reunión:	Comité de seguimiento técnico integral de obra			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Mesa de trabajo revisión presupuesto (San José Norte y Rafael Bernal Jiménez, sede B)	Contratista de obra e interventoría	03 de agosto de 2023	Pendiente
2	Ajuste plan de contingencia general	Contratista de obra	03 de agosto de 2023	Pendiente
3	Caracterización de suelo de fundación de aulas modulares de San José Norte / concepto cimentaciones.	Contratista de obra	08 de agosto de 2023	Pendiente
4	Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente.	Contratista de obra	08 de agosto de 2023	Pendiente
5	Subsane de informes mensuales No. 3, 4 y 5.	Contratista de Obra	04 de agosto de 2023	Pendiente
6	Comunicado situación de Vandalismo baterías sanitarias Justo Víctor Charry	Contratista de Obra	02 de agosto de 2023	Pendiente
7	Revisión presupuestos frentes de obra	Contratista de Obra	04 de agosto de 2023	Pendiente
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

TEMAS ADMINISTRATIVOS

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales ha realizado los requerimientos para conminar al contratista a desempeñar sus funciones conforme los anexos técnicos, estudios previos y pliegos de condiciones del proceso de licitación pública No. SED-LP-DCCEE-039-2022.

- Por parte de interventoría se solicita a contratista de obra efectuar las actividades acorde a directrices determinadas por la Secretaria de Educación del Distrito, dando alcance al objeto contractual.

- Con el fin de realizar el control, seguimiento y cumplimiento de los procesos técnicos – administrativos con celeridad, se realiza semanalmente mesas de trabajo y reuniones de los diferentes componentes en conjunto con contratista de obra e interventoría, en aras de alcanzar con las metas trazadas.

- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 requiere de las buenas gestiones por parte de SAFRID INGENIERIA SAS para ejecutar las actividades conforme a lo planificado, en aras de evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos.

- Se notifica a contratista de obra que es indispensable realizar diligentemente la ejecución de las actividades aprobadas por parte de la interventoría, toda vez que los atrasos que se presenten en la ejecución de las mismas serán responsabilidad del mismo.

- Se insta a SAFRID INGENIERÍA SAS implementar y cumplir de manera rigurosa el plan de contingencia presentado, de manera, que se mitiguen los atrasos presentados a la fecha.

- Se solicita a contratista de obra subsanar las observaciones y requerimientos establecidos por interventoría de manera diligente, con ello avanzar en las labores estipuladas para cada una de las sedes en ejecución.

- Se requiere a contratista de obra la entrega de conceptos pendientes para la validación y/o aprobación por parte de la interventoría, con ello evitar afectaciones en el buen desarrollo del contrato de obra. En consideración a lo expuesto, los atrasos que puedan presentarse en los procesos constructivos, serán imputables al contratista de obra.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED Jorge Eliecer Gaitán, sede A

Durante la semana se realizó:

- Instalación de cielo raso en refrigerios y hall de primer piso.
- Picado de muros y aplicación de pañete en fachada frente a cancha y fachada palomera
- Aplicación de pintura en hall de 2do piso.
- Pulida de media caña en granito en baño de 2° piso
- Instalación de canal en cubierta bloque aula de Inglés, disfraces y biblioteca
- Demolición de piso en cárcamo patio central
- Instalación tubería MT y cableado eléctrico en aula Informática, cooperativa, refrigerio y Hall 1er piso
- Instalación de cuneta prefabricada área cancha

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **87,30%**, avance ejecutado de **67,41%**, avance programado de **48,46%**, teniendo una diferencia de **18,95%** en atraso.

Pendientes:

- Programación actualizada.
- Presupuesto actualizado.

IT Francisco José de Caldas, sede A

Durante la semana se realizó:

- Fundida de canaleta lateral bloque L.
- Instalación de puntos, tubería y cableado eléctrico en oficinas y pasillo de segundo piso.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **62,00%**, avance ejecutado de **49,10%,** avance programado de **83,21%**, teniendo una diferencia de **34,11%** en atraso.

Pendientes:

- Programación actualizada.
- Subsane concepto eléctrico.

Garcés Navas IED

Durante la semana se realizó:

- Aplicación de pintura sobre carpintería metálica en sala de profesores.
- Orden y aseo en coordinación.
- Aplicación de masilla sobre perfileria metálica en el pasillo del segundo piso.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **90,50%**, avance ejecutado de **44,38%**, avance programado de **100%,** teniendo una diferencia de **55,62%** en atraso.

Pendientes:

- Programación actualizada.
- Presupuesto actualizado.

IED Floridablanca, sede A

Durante la semana se realizó:

- Fundida de vigas de confinamiento en aula de música.
- Excavación manual e instalación de geotextil tejido en aula de música.
- Fundida de cintas de confinamiento en andén lado canchas.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **65,00%**, avance ejecutado de **42,66%** avance programado de **46,60%**, teniendo una diferencia de**3,94%** en atraso.

Pendientes:

- Programación actualizada.
- Presupuesto actualizado.

IED Justo Victor Charry

Durante la semana se realizó:

- Demolición de enchape en zona lava traperos preescolar.
- Pañete en zona lava traperos bachiller.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico **75,00%**, avance ejecutado de **70,85%**, avance programado de **100%**, teniendo una diferencia de **29,15%** en atraso.

Pendientes:

- Presupuesto actualizado.
- Plan de contingencia.

IED Rafael Bernal Jiménez, sede A

Durante la semana se realizó:

- Modulación e instalación de enchape en aula karate
- Instalación de estructura metálica y teja en aula múltiple

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **72,30%,** avance de ejecutado de **55,23%**, avance programado de **100%**, teniendo una diferencia de **44,77%** en atraso.

Pendientes:

- Reprogramación actualizada.
- Presupuesto actualizado.

IT Juan del Corral, sede A

Durante la semana se realizó:

- Aplicación de poliurea en terrazas.
- Adecuación y resanes en terraza biblioteca.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **94,30%,** avance ejecutado de **51,68%**, avance programado de **79,57%**, teniendo una diferencia de **27,89%** en atraso.

Pendientes:

- Programación actualizada.
- Presupuesto actualizado.

IED San José Norte

Durante la semana se realizó:

- Aplicación de pañete sobre muro en laboratorio y bajo placa en el aula múltiple.
- Demolición de manto asfaltico en terraza del aula múltiple
- Instalación de puntos y tubería hidrosanitaria en baños.
- Alistado de piso en aula múltiple

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **8,95%**, avance ejecutado de **5,38%,** avance programado de **1,75%**, teniendo una diferencia de **3,63%** en avance.
Pendiente:

- Ajuste programación de obra.
- Presupuesto actualizado.

IED Rafael Bernal Jiménez, sede B

Durante la semana se realiza:

- Traslado de material de escombro y material B-400

IED Rafael Bernal Jiménez, sede B

Durante la semana se realiza:

- Traslado de material de escombro y material B-400

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **40,00%**, avance ejecutado de **15,30%,** avance programado de **0,00%**, teniendo una diferencia de **15,30%** en avance.

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- Presupuesto Actualizado.

IED República de Panamá

Durante la semana se realizó:

- Aplicación de pañete en muro perimetral

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **40,00%**, avance ejecutado de **5,56%,** avance programado de **54,17%**, teniendo una diferencia de **48,61%** en atraso.

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- Presupuesto Actualizado.

IED Simón Bolívar

Durante la semana se realizó:

- Demolición de acabado y alistado de piso en aula de músca y danzas.
- Desmonte de cielo raso en madera en aula de música y danzas.

Con base a lo presentado, se evidencia un avance físico de **4,70%**, avance ejecutado de **6,41%,** avance programado de **60,00%**, teniendo una diferencia de **53,59%** en atraso

Pendiente:

- Programación y flujo de inversión semanal actualizado.
- Presupuesto Actualizado.

Aspectos Generales

De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de **27,53%**, con base en la programación presentada un avance general programado de **46,31%,** teniendo una diferencia de **18,78%** en el contrato.

Conforme con el seguimiento realizado a emergencias a la fecha se encuentra pendiente subsane de observaciones realizadas por interventoría en cuanto a acabados realizados en aula de preescolar y disposición final de residuos de construcción y demolición en IED Heladia Mejia, sede B.

Con base en el atraso evidenciado se solicita implementar plan de contingencia a fin de mejorar el desarrollo de las actividades de obra que a la fecha se encuentran con atrasos y aquellas pendientes por realizar.

Con base en la relación establecida entre programación y ejecución definida para el presente contrato, a la fecha se evidencian 11 frentes de obra activos de los cuales 9 instituciones se encuentran en atraso por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.

Es pertinente que contratista de obra acate las instrucciones y directrices presentadas por la interventoría en aras de evitar afectaciones a las edificaciones existentes de las instituciones educativas. Aunado a lo anterior, se solicita presentar los conceptos con anticipación para ser revisados por parte de especialistas de cada una de las áreas.

Se requiere realizar los subsanes correspondientes a informes de componente técnico y SSTA en los términos establecidos.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

IED. JORGE ELIECER GAITAN: Se revisa las actividades desarrolladas durante la semana, es pertinente que se realice los planes de acciones correspondientes para mitigar los atrasos presentados a la fecha. Se solicita la entrega de plano de modulación de cancha. Se solicita realizar las actividad conforme especificaciones

IED. FRANCISCO JOSE DE CALDAS, SEDE A: Se manifiesta por contratista de obra que el tablero de distribución existente (caja de paso) no cuenta con las dimensiones adecuadas para realizar la acometida al tablero eléctrico, por lo tanto, se retirará dentro de las actividades contractuales. para definir, las actividades a realizar en la zona.

IED GABRIEL NAVAS: Se solicita implementar de manera inmediata plan de contingencia para mitigar los atrasos presentados. Se solicita realizar entrega de balance presupuestal actualizado

IED FLORIDABLANCA: Se solicita adelantar actividades para evitar avanzar incrementos en los atrasos. Se solicita entregar los pendientes para finiquitar la intervención. en temas administrativos

IED. JULIO VICTOR CHARRY: Se solicita presenta presupuesto de diseño de baños de profesores para establecer las dimensiones y caracteristicas del mismo adicional de revisar si esta dentro del valor asignado Es pertinente tomar las acciones a que haya lugar para mitigar atrasos.

IED. JUAN DEL CORRAL: Debido a las lluvias presentadas se encuentra pendiente realizar la entrega del Colegio con las observaciones

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

realizadas.

IED SAN JOSE NORTE SEDE A; Se encuentra pendiente la entrega de concepto de cimentación de aulas modulares, para efectuar la evaluación de costos de la intervención. Se requiere la entrega de balance presupuestal y programación actualizado.

IED. RAFAEL BERNAL JIMENEZ SEDE B: Se requiere la entrega de presupuesto y programación actualizado, de manera que pueda finiquitarse y definir el alcance de la intervención en el frente de obra.

IED REPUBLICA DE PANAMÁ: Se solicita tomar acciones a que haya lugar para mitigar los impactos generados por los atrasos. Así mismo, se solicita entregar balance presupuestal y programación actualizada, en aras de establecer el panorama final de la ejecución del contrato.

IED SIMON BOLIVAR: A la fecha se presentan atrasos considerables, de manera, que es importante actualizar balance presupuestal y cronograma, con ello, definir el alcance de la ejecución de las actividades.

TEMAS COMPONENTE SST - MA

Se permite solicitar el estricto cumplimiento en la entrega de documentación para ingreso de personal operativo previa al inicio de ejecución de actividades, así mismo, contar con el equipo de protección personal tanto en personal operativo como administrativo para la ejecución de las obras.

Se evidencia en recorrido de campo en las zonas de acopio de escombros materiales que superan las cantidades máximas admisibles. Se requiere de manera urgente, efectuar el retiro de los mismos según corresponda.

Se solicita la supervisión de los profesionales SST respecto a las actividades de alto riesgo (trabajo en alturas) de manera prioritaria.

TEMAS SOCIAL

TEMAS VARIOS

Se solicita al contratista de obra realizar las gestiones y acciones pertinentes para la entrega de balances presupuestales actualizados, con el fin de, definir el horizonte del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022 y cumplir con el objeto contractual.

Se informa que cualquier cambio que proponga el contratista, deberá ser consultado por escrito a la interventoría y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación de ésta; en caso contrario, cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del contratista.

Se solicita a SAFRID INGENIERIA SAS suministrar a la interventoría, con la debida anticipación los resultados de los especímenes tomados en obra, en aras de evidencias la calidad de los materiales utilizados conforme a las especificaciones técnicas de la entidad contratante.

Los ensayos de los materiales de las actividades que se vienen desarrollando en cada uno de los frentes, se rigen por la normatividad vigente, a su vez por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones, anexos técnicos y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

TEMAS VARIOS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

COMPROMISOS

1	Mesa de trabajo revisión presupuesto San Jose Norte y Rafael Bernal Jiménez B.	Responsable:	Contratista de Obra - Interv.
		Fecha:	09-08-2023
2	Ajuste plan de Contingencia General.	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	10-08-2023
3	Caracterización de Suelo de Fundación de aulas modulares de San José Norte / Concepto de Cimentaciones.	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	10-08/2023.
4	Cronograma general actualizado con flujo de inversión semanal por frente	Responsable:	10-08-2023 / Contratista
		Fecha:	10-08-2023
5	Subsane de informes mensuales Nº3, Nº4 y Nº5	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	11-08-2023
6	Revisión presupuestos frentes de Obra	Responsable:	Contratista de Obra
		Fecha:	14-08-2023
7		Responsable:	
		Fecha:	
8		Responsable:	
		Fecha:	
9		Responsable:	
		Fecha:	
10		Responsable:	
		Fecha:	
11		Responsable:	
		Fecha:	
12		Responsable:	
		Fecha:	
13		Responsable:	
		Fecha:	
14		Responsable:	
		Fecha:	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

15		Responsable: Fecha:
16		Responsable: Fecha:
17		Responsable: Fecha:
18		Responsable: Fecha:
19		Responsable: Fecha:
20		Responsable: Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá DC a los 09 días del mes de agosto del 2023.

CONTRATISTA

Luis Eduardo Montes Álvarez
Director de obra

Residente de obra

INTERVENTORIA

Fredy Giovanni Rodríguez Salazar
Director de interventoría

CAMILO ANTONIO SAMACÁ PESCA
Residente de interventoría

SUPERVISOR

Edwin Alexander Santana Rodríguez
Supervisor Secretaria de Educación del Distrito Capital

Isabel Rico Quiceno
Apoyo Supervisión Secretaria de Educación del Distrito Capital

Nota:
1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

Anexo 2. BITÁCORA DE OBRA

IED. JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE A

11-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lluvias (9.45 a 10:30) am
Tarde: Nublado con lluvias.
Personal obra: Maestro
oficiales (5)
Ayudantes (3)
tecnico electricista (2)
Jefe (1)
Personal interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: pulidora
Andamio certificado
Andamio tubulares
Herramienta menor
Actividades: Picado de muros fachada patio interno
Modelación moda electrosoldada corona.
Demolición piso corona patio, instalación contra-
Instalación de tubería y cableado electrico salas de
duchas y closets.
Nota: se insta al contratista realizar ensayo de pintura
en estructura metalica

Inspector tutor. Inspector

12-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector tecnico
Inspector SST.
Residente.
Maestro.
tecnico electricista (2)
oficiales (3)
Ayudantes (3)
operador helicoptero (1)
Personal interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: vibrador electrico
helicoptero aprobado pista
Andamio tubulares
Herramienta menor.
Actividades: Fundida concreto corona y acabado

Instalación de tubería mt y cableado eléctrico
aula de inglés
Toma de muestra Concreto.

14-08-2023 Estado del clima: Mañana soleado
Tarde: Nublado

Personal obra: Inspector técnico, y sso
Maestro
Técnico electricista (2)
Oficial (5)
Ayudantes (3)

Personal interventoría: Inspector técnico

Equipos y herramientas: Polidora. taladro.
Cortadora Concreto
Andamio tubular
Andamio certificado
Herramienta menor.

Actividades: Instalación de poliducto anclado a muro principal y pintura.
Instalación de tubería mt y cableado aula fotografía.
Instalación de malla electrosoldada concreto.
desencofrado de columnas muestras concreto.
Corte pintura de delineación placa contra.
Nota: En recorrido por la institución se evidencian algunos empozamientos en la cancha, se le recomienda al contratista hacer un chaque en estos sitios y realizar las actividades a que haya a lugar.

15-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado

Personal obra: Inspector técnico
Maestro
Técnico elect. (2)
Oficiales (5), Ventaneros (2)
Ayudantes (3)
Aseo (1)

Personal intervenido: inspector técnico
Equipos y herramientas: taladro, Tiza roja.
Andamio tubular
Andamio certificado
Herramienta menor
Actividades: picado de muro fachada patio ala sur.
Refuerzo y excavación cimiento
Instalación de tubería mt y cableado eléctrico
Estuco y pintura fachada patio.
Desmonte de ventanas e instalación cubo metálico

16-05-2023 Estado del obra: bueno: soleado
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector técnico
Albañil
Técnico electricista (2)
Operador (5)
Ayudantes (3)
Personal intervenido: Inspector técnico
Equipos y herramientas: Pulidora
Taladro
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Instalación de tubería mt y cableado eléctrico en sala fotografía
Picado muro e instalación de pañete fachada patio principal, fundido piso cimiento patio.
Orden y aseo
Pintura muros fachadas patio.
Nota: se hace la observación al contratista el cumplir con las especificaciones técnicas con respecto a los materiales y concreto que se están instalando en obra

Inspector Interventor
Firma obra

17-08-2023 Inspección interventoría asistió los siguientes trabajos
Tales como: Tuberías, Cableados, y cumplieron con un
compromiso a más tardar la otra semana cuando
yo este de vuelta compromiso, Mejoren en el diligenciamiento
de los formatos (preferiblemente los claros).
Firma interventoría SST
Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector técnico
Maestro
Técnico electricista (2)
Oficiales (2)
Ayudantes (3)
Aseo general (1)
Persona interventoría: inspector técnico.
Inspector SST
Equipos y herramientas: pulidora
Taladro
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Instalación de tubería mt y cableado
eléctrico en vela fotografía y vela multiple
Picado de muros e instalación de poliducto fachada patio
interior.
fundida de concreto
Pintura muros fachada patio principal
Orden y aseo.

Inspect. interv. Inspector tec

18-08-2023 Estado del clima: Mañana
Tarde:
Personal obra: Inspector técnico
Maestro
Técnico electricista
Oficial (3)
Ayudante (3)

Norma

Powered by CamScanner

Personal interviniente: 1 supervisor técnico
Equipos y herramientas: tablero, plomada.
Transporte:
Materiales empleados
Residuos generados
Herramientas usadas
Actividades: finalización de columnas parte principal
paños de muros parte principal planta.
Estado y pintura aula informática, oficina y aula 3 piso.

Inspector de obra

11-05-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Personal obra: Inspector técnico
Maestro
Oficial (3)
Ayudantes (2)
Peón (1)
Equipos y herramientas: Tablero, plomada.
Transportes
Materiales certificados y facturas.
Herramientas menor
Actividades: Estado y pintura aulas de informática
oficina y aula 3 piso

Inspector de obra

22-05-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector técnico
Maestro
Técnico electricista (1)
oficiales (5)
Ayudantes (3)
Peón general (1)
Personal interviniente: Inspector técnico
Equipos y herramientas: plomada, tablero
Materiales certificados y facturas.
Herramienta menor.

Actividades: Instalación de tubería sanit. y cableado
eléctrico en cuarto multiple

Se tiene avance parcial en la parte principal
del cuarto de control desde 8° piso
Se tiene en cuarto de instrumentación, cuarto de almacen, baños
y cuarto de 8° piso
cuarto y cuarto

Nota: Se inicia el cuadro de cableado con los interruptores
de las alimentaciones hacia cada respectivo de los
equipos mencionados anteriormente en el area de la cuarto
y cuarto

23-08-23 Estado del clima: Soleado
personal de obra: inspector tecnico
encuadro
tecnico electricista
oficiales (4)
ayudantes (3)
area general C17
Personal interviniente: inspector tecnico
Equipos y herramientas: Andamio certificado y tubular
herramienta menor

Se realiza recorrido con la Secretaria interviniente
y ejecutor donde se dejan pendientes a tomar
en cuenta como la puertas de las escaleras
de la recepcion donde solicitan que se pinte la
cantera (pared) con pintura que ayuda trafico pesado
y los barandales que son de un gris semejante
mas claro que el del piso. Adicional se comenta
por parte de la Sec que dejar el descanso de
escalera de recepcion para dar un ambiente mas
amplio, pero como se solicito por parte de la
secretaria todo nuevo en piso, se estara a la espera
de tener comunicacion con ella para ver si sigue
en pie las solicitud de cielo raso

24-08-23 INSPECCION INTERVENTORIA SE FOTOGRAFIA DIFERENTES TRABAJOS SE EJECUTAN CON MAS DE 2 SECCIONES NO HAY DE USAR ARSEN DEVINE CON TORNILLOS DE UNO DE ORO, PENDIENTE SOBRE BARANDAS Y ESCALERAS. SE FOTOGRAFIA COMPLETO LOS FORMATOS Y EPP COMPLETOS. EN RECORRIDO.

JAVIER MARTIN

INTERVENTORIA SST.

Estado del clima: Mañana- Nublado

Tarde: soleado

Personal obra: Inspector tecnico

Maestro

Tecnico electricista (2)

Oficial (5)

Ayudantes (3)

Aseo General (4)

Personal interventado: inspector tecnico

Equipos y herramientas: pulidora, taladro

Andamio certificado y tubular

Herramienta menor

Actividades: pintura muro fachada patio principal

Estuco en cielo informatica, diseño e ingles

Pintura muros fachada baños.

orden y aseo

25-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado

Tarde: soleado

Personal obra: inspector tecnico.

inspector SST.

Maestro (1)

Tecnico electricista (2)

oficiales (5)

Ayudantes (3)

Aseo general (4)

Equipos y herramientas: pulidora, taladro

Andamio tubular

Andamio certificado
Herramienta menor
Actividades: Continuación concreto.
pintura en muros fachada principal patio
pañete fachada lado frente cancha
Instalación de cajas puntos eléctricos.
Aseo general

Inspector obra

26-05-2023 Estado del clima: soleado.
Personal obra: Maestro
Técnico electricista.
oficiales: (5)
Ayudantes (3)
Aseo general (1)
Personal interventoría: Inspector técnico.
Equipos y herramientas. soldador
pulidora
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: pañete en fachada frente cancha
Armado marcos tapas cajas eléctricas y
caja de inspección aguas blancas
Instalación de cajas eléctricas en acera peatonal.

Inspector obra

28-05-2023 Estado del clima: soleado: soleado
Tarde: soleado
Personal obra: Inspector técnico
Maestro
Técnicos electricistas
Oficiales (5)
Ayudantes (3)
Equipos y herramientas: soldador, pulidora
Taladro
Andamio certificado y tubular

Norma

Powered by CamScanner

Herramienta menor:

Actividades: soldadura perfiles cubierta recepción
fundida concreto columna.

estuco y pintura cielos disfraces y fotografía.

Demolición piso cabaña.

Demolición pre tubería contra incendio.

Ing. Residente

Ing. Supervisor

30-04-2023 Estado del clima: Mañana: soleado

Tarde: soleado

Personal obra: Ingeniero residente.

Maestro

Técnico electricista (2)

oficiales (3)

Ayudantes (3)

Personal interventoría: Ingeniero residente

Equipos y herramientas: soldadora, pulidora

Retromartillo

Andamio certificado y taladro

Herramienta menor

Actividades: fundida concreto paredes columna

soldadura perfiles cubierta recepción

Estuco pared de disfraces

Demolición piso 1er piso cabaña

Demonte cielo raso 2° piso

Desmonte lámpara 1er y 2° piso

Desmonte de sanitario y aparatos baño cabaña

Instalación cajas paralumenes, tomacorriente e interruptores

Ing. Residente

Ing. Supervisor

30-05-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado

Tarde: soleado.

Personal obra: Ingeniero residente, inspector SST.

Maestro

Técnico electricista (2)

oficiales (5)

Ayudantes (3)

Oficios y varios (1)

Equipos y herramientas: soldadora.
pulidora, taladro
Andamio certificado y tubular
Herramienta menor.
Actividades: Estuco y pintura aulas despachos y fotog-
fundida concreto caracol patio.
Desmonte de cubierta recepción.
soldadora perfiles para cubierta recepción
fundida piso para shut. de bomberos.
Instalación de tub. sanitaria 3" e hidraulica
Demolición alistado piso 2. [signature] [signature]

31-08-2023 - Estado del clima: soleado
Tarde: soleado
Personal obra: Inspector tecnico, inspector sst.
albañil
Tecnico electricista (2)
Oficial (5)
Ayudantes (3)
Personal intervención: inspector tecnico.
Equipos y herramientas: soldadora, pulidora.
taladro
Andamio certificado y tubular
Herramienta menor
Actividades: Estuco y pintura en aulas de despacho
y fotografia.
Desmonte de cubierta recepción.
Instalación de perfileria 30cm. en cubierta recepción
Demolición alistado piso 2 casetta.
Instalación de alistado piso 2° piso caseta.

[signature] [signature]

01-09-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado
Personal obra: Inspector tecnico

Norma

Powered by CamScanner

Inspector SST.
Maestro
Tecnico electricista: (2)
oficiales (5)
Ayudantes (3)
Cadeo y axeo (1)
Personal interventoria: Inspector SST.
Equipos y herramientas: soldador, pulidora.
taladro
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: instalacion y soldadura de perfiles en cubierta recepción
Instalación de teja cubierta recepción
Instalación de alistado piso 2 cabaña
Instalacion de tubería mt y cableado electrico.

Estado del clima: Mañana: soleado.
Personal obra: Maestro
Tecnico electricista (2)
oficiales (5)
Ayudantes (3)
cadeo y axeo (1)
Personal interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: pulidora, taladro.
Andamio certificado.
Herramienta menor.
Actividades: instalación de bloque fachada recepción
Numeración e instalación de empradizado en
Mal terreno y cerca con
Instalación de bajantes
Instalación de cable electrico

04-09-2023 Estado del clima: Mañana: soleado.
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector técnico
Inspector sst
Maestro
oficial (5)
Técnico electricista (2)
Ayudantes (3)
Aseo general (1)
Equipos y herramientas: Pulidora, taladro
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Instalación de superboard shaft de basuras
Instalación piso laminado hall 2° piso y aula 201-21
Instalación de lamparas aula de dibujo
Demonte de cubierta asbesto.
Aplicación de pintura en estructura aulas.

Inspector

05-09-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado con lluvias esporadicas.
Personal obra: Maestro
Técnico electricista (2)
Oficial (5)
Ayudante (3)
Aseo general (1)
Inspector sst.
Personal interventoria: Inspector técnico
Equipos y herramientas: Pulidora, taladro
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Instalación de piso laminado hall 2° piso
y aula 201-21

Powered by CamScanner

Instalación de lamparas en aula de dibujo
Aplicación de pintura en estructura aulas bloque 2º piso
Aplicación de pintura koraza en fachada principal
fundida a listado piso 1º piso cabaña
Pintura en muros aula psicomotriz
Aseo general
Nota: se le recuerda al contratista seguir tener en cuenta el concepto emitido por el especialista en estructura de obra y aprobado por interventoría para el desarrollo de la misma, de manera que se requiere realizar las labores de instalación de estructura metalica conforme a los documentos aprobados es pertinente que las actividades de este tipo de elementos se realice con base a lo presentado en los conceptos, esto debido a lo observado necesariamente en cubierta de recepción
se le recuerda al contratista realizar el ensayo de pintura en la estructura metalica instalada.

06-09-2023 INSPECCION INTERVENTORIA SST SE EVIDENCIA QUE NO TODOS CONDICIONES DE SEGURIDAD EPP GAFAS USAN EN ACTIVIDADES DE PARTICULAS, REFORZAR EL TEMA, DE LAS GAFAS. RETIRAR OBSTACULOS DE LOS SENDEROS PEATONALES. DEJAR SENDEROS DESPEJADOS.
JAIRO HERRERA INTERVENTORIA SST.

06-09-2023 LOS SENDEROS PEATONALES EN GENERAL ESTAN DESPEJADOS, SE REALIZA ENTREGA DE GAFAS AL COLABORADOR QUE NO LAS PORTABA, EN EL MISMO MOMENTO DEL HALLAZGO.

Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado
Personal obra: Inspector tecnico
Maestro
Tecnico electricista (2)
Oficial (2)
Ayudantes (3)
personal interventoría: Inspector tecnico

Equipos y herramientos: pulidora, soldador
Andamio certificado
Herramienta menor
Actividades: Aplicación de pintura tanara fachada principal
instalación enchape piso cabaña
media caña cancamo patio principal
instalación de lamparas cuarto dedicado y displacos
pintura en color 116-2A e informatico

Inspector

07-09-2023 Estado del clima: soleado
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector tecnico
Inspector sst
Maestro
Tecnico electricista (1)
Oficial (6)
Ayudantes (2)
Persona (interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientos: soldador
Compresor
pulidora, taladro
Andamio certificado
Herramienta menor
Actividades: instalación enchape piso cabaña
Instalacion de lamparas cuarto dedingles
Aplicacion pintura en vinilo cuarto de piso
Aplicación de pintura tanara en fachada
soldadura perfiles e instalación cubierta recepción
e instalacion de teja etcetera
pintura en muro shut basuras
media caña en cancamo

Inspector

Norma

Powered by CamScanner

08-09-23 Dia soleado
Personal obra : inspector (1)
Maestro (1)
tecnico electricista (2)
oficial (5)
ayudante (2)
Personal interventoria : inspector (1)
Equipo y herramienta : Maquina de soldadura
Compresor
Herramienta menor
Actividades : levantamiento de poceta Shut bacwura, instalacion de porcelanato en cubierta, desmonte de cubierta sobre cuarto prefevered te instalacion de perfiles sobre la misma zona y pintura de la perfileria. instalacion luminaria soldar recepcion

Inspector obra

09-09-23 Dia soleado
personal obra : inspector (1)
Maestro (1)
Electricista (1)
oficial (5)
ayudante (2)
Personal interventoria inspector (1)
Equipo y herramienta : Maquina Soldar
herramienta menor
Andamio certificado
Actividades : Instalacion teja ecofar sala maestras, instalacion salida de luminarias del muro cuarto, pintura Koria fachada instalacion enchape baño cubierta, instalacion de cielo raso, pintura remates salon 3 piso 2, terminacion instalacion piso steboard 12mm.

Inspector obra

25-09-23 Dia Soleado

Personal obra : inspector (1)
maestro (1)
Electricista (2)
oficial (5)
ayudante (2)

Personal laboratorio : oficial (1)

Herramientas y equipo : herramental menor
cortadora de asfalto

Actividades : aplicacion de estuco Sala de profesores
adecuacion de tablero de cuarto de
disfraz, Fquedo como observacion mira
ubicacion de lamparas de (disfraz) y
fotografia, ingles, desmonte de vestuario
segundo piso cubaca. instalacion
guarda escoba cabaca, instalacion
muro etorboard salon 3 piso 2 vestuario

inspector

IT. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A

Actividades: Se continúa con instalación de cableado, tubería y puntos eléctricos y resanes en marcos, muros, ventanas y techos de bloque intervenido, así mismo se continúa con instalación de puertas en aulas.

Residente obra | Supervisión Inspección Interventoría

11/08/23 Viernes.

Clima: mañana: nublada con lluvias tarde: nublada

Personal obra:
1 Residente.
1 Maestro
3 Eléctricos
2 Oficiales
1 Ayudante

Personal Interventoría:
1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor, pulidora, taladro.

Actividades: Se realiza instalación de estructura y drywall en baños, instalación de lámparas en baños, instalación de puertas, aplicación de pintura en muros de segundo piso y remates en marcos de puertas.

Residente obra | Supervisión Inspección Interventoría

12/08/23 Sábado.

Clima: mañana: soleado.

Personal obra
1 Residente
1 Maestro 2 Oficiales
3 Eléctricos 1 Ayudante

Personal Interventoría.
1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor, pulidora.

Actividades: Se continúa con remates en marcos de puertas, instalación de cableado eléctrico hacia cajas de paso y tableros eléctricos en primer y segundo piso

Residente obra | Supervisión Inspección Interventoría

Escaneado con CamScanner

14/08/23 Lunes

Clima: mañana: nublado. tarde: nublado

Personal obra: Personal Interv.

1 Residente 1 Maestro. 1 Inspector.

1 Oficial 2 Ayudantes

3 Eléctricos

Equipo: H. menor.

Actividades: Instalación de cableado de puntos a tableros eléctricos en primer y segundo piso, limpieza de canaletas metálicas, aplicación de pintura vinilo en pasillo de segundo piso y orden y aseo general.

Residente obra — Catalina C. Insp Interv.

15/08/23 Martes

Clima: mañana: soleado tarde: nublado.

Personal obra Personal Interv.

1 Residente 1 Maestro 1 Inspector

2 Ayudantes 1 Oficial.

3 Eléctricos.

Equipo: H. menor.

Actividades: Se continúa con conexión de acometidas eléctricas en primer y segundo piso, y aplicación de pintura en oficinas.

Residente obra — Catalina C. Insp Interv.

16/08/23 Miércoles

Clima: mañana: Nublado tarde: Nublado.

Personal obra Personal Interv.

1 Residente 1 Maestro 1 Inspector.

2 Oficiales 2 Ayudantes

1 Eléctrico.

Equipo: H. menor.

Actividades: Se realiza aplicación de boquilla en enchape de piso, instalación de cableado a tableros eléctricos y primer y segundo piso, orden y aseo general y remates en marcos de baños y oficinas.

Residente obra — Catalina C. - Insp Interv.

Escaneado con CamScanner

17/08/23 Jueves

Clima: mañana: soleado tarde: Nublado (lluvia 3:30 a 4pm)

Personal obra Personal Inter

1 Residente 1 Maestro

2 Oficiales 2 Ayudantes

1 Eléctrico

Equipo: H menor

Actividades: Se realizo instalación de cerraduras en puertas, instalación de cableado y tubería a tableros eléctricos, remates en marcos de aulas y orden y aseo general.

Residente obra Supervisor Inspector

18/08/23 Viernes

Clima: mañana: soleado tarde: Nublado (lluvia 3:00 pm a 4:00 pm)

Personal obra: Personal Interv:

1 Residente. 1 Inspector

1 Maestro 2 Oficiales. 1 Residente.

2 Ayudantes. 1 Eléctrico

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realizo instalación de cerraduras en puertas, instalación de cableado y tubería a tableros eléctricos en primer y segundo piso, aplicación de pintura en entrepaños de aulas y orden y aseo general.

Residente obra Supervisor Inspector.

NOTA: SE RECIBE VISITA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA SEO A FIN DE VERIFICAR PRE-FACTIBILIDAD ESTABLECIDA Y EJECUTADA PARA BACHILLERATO INTERNACIONAL

19/08/23 Sábado

Clima: mañana: nublado

Personal Obra: Personal Interv

1 Residente. 1 Inspector.

1 Maestro. 2 Oficiales

2 Ayudantes. 1 eléctrico.

Equipo: Herramienta menor.

Escaneado con CamScanner

Actividades: Se continúa con instalación de accesorios eléctrica, y aplicación de pintura en pasillos y oficinas de primer piso.

Residente obra — Catalina Inspinteu.

22/08/23 Martes.

Clima: mañana: soleado — tarde: soleado

Personal Obra: — Personal Inteu.

1 Residente. — 1 Inspector.

1 Maestro — 2 oficiales

2 Ayudantes — 1 Eléctrico.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realizan remates generales, limpieza canaletas metálicas, orden y aseo general, se inicia con instalación de lámparas en primer piso y se continúa con aplicación de pintura en viniló.

Residente obra — Catalina Inspinteu.

23/08/23. Miércoles.

Clima: mañana: Soleado — tarde: Soleado.

Personal Obra: — Personal Inteu.

1 Residente. — 1 Inspector

1 Maestro — 2 oficiales

2 Ayudantes — 3 Eléctricos.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realza instalación de puertas en aulas y oficinas, instalación de lámparas en aulas de primer piso, orden y aseo general, aplicación de pintura en entrepaños aulas y remates en marcos de puertas

Residente obra — Catalina Inspinteu.

24/08/23 Jueves.

Clima: mañana: soleado — tarde: Soleado.

Personal Obra: — Personal Inteu:

Escaneado con CamScanner

1 Maestro 2 Oficiales
3 Eléctricos 2 Ayudantes
Equipo: Herramienta menor
Actividades: Se realizo instalación de lámparas en cubos de escaleras, orden y aseo general, aplicación de pintura general en estanques de aulas y rayados en marco de puertas

Residente obra

Eléctricos
Instalores

25/08/23 Viernes
Clima: mañana: soleado
Personal obra:
1 Maestro , 1 Residente
2 Oficiales , 2 Ayudantes
2 Eléctricos
Equipo: Herramienta menor,
Actividades: Se continúa con instalación de lámparas en cubos de escaleras piso, orden y aseo general y aplicación de pinturas en pasillos y rayados finales en marcos de puertas.

tarde: soleado,
Personal Interno:
1 Inspector

Residente obra

Eléctricos
Insp Interno.

26/08/23 Sábado
Clima: mañana: soleado
Personal obra
1 Residente ; 1 Maestro
2 Oficiales ; 2 Ayudantes ; 2 Eléctricos
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: se continúa con orden y aseo general, instalación de lámparas, aplicación de pinturas y rayados finales.

Personal Interno:
1 Inspector

Residente obra

Eléctricos
Instalores.

28/08/23 Lunes
Clima: mañana: soleado
Personal obra:
1 Residente.

tarde soleado
Personal Interno:
1 Inspector.

Escaneado con CamScanner

1 Albañil ; 3 ayudantes
3 Ayudantes ; 3 albañiles
Equipo: Herramienta menor
Actividades: Se continúa con instalación de luminarias en oficinas de segundo piso, orden y aseo general, aplicación de pintura en antepechos de aulas e instalación de puerta en entrada principal

Residente obra — Maestro de obra

29/08/23 Martes

Mañana: soleado — Tarde: soleado
Personal obra: — Personal interno:
1 Residente — 1 Inspector
1 Maestro ; 3 oficiales
3 Ayudantes ; 3 albañiles
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: Se inicia con instalación de luminarias en aulas de segundo piso con pruebas, instalación de cerámica sanitarios en baños y kit de accesorios, se continúa con orden en pintura y orden y aseo general.

Residente obra — Maestro de obra.

30/08/23 Miércoles

Clima: mañana: soleado — tarde: soleado
Personal obra: — Personal interno:
1 Residente — 1 Inspector.
1 Maestro ; 3 oficiales — 1 Director
3 Ayudantes ; 3 albañiles — 1 Residente.
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: Se continúa con instalación de luminarias en segundo piso, orden y aseo general, aplicación de pintura en antepechos de aulas de segundo piso, resanes en marcos de puertas e instalación de sanitarios y accesorios en baños de segundo piso.
NOTA: SE REALIZA REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA SEC, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA, A FIN DE VERIFICAR TEMAS COMPETENTES A BACHILLERATO INTERNACIONAL EN TALLERES Y PRACTICAS Y LAS CANTIDADES ESPECIFICADOS

Escaneado con CamScanner

CON ANTERIORIDAD EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Residente obra — Natalia Insp Interv.

31/08/23 Jueves

Clima: mañana: soleado — tarde: soleado

Personal obra: — Personal Interv.

1 Residente ; 1 Maestro — 1 Inspector

3 Oficiales ; 3 Ayudantes

2 Eléctricos

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continúa con remates finales ala 1 bloque L, orden y aseo, aplicación de pintura, instalación de lámparas en segundo piso y orden y aseo general

Residente obra — Natalia Inspector Interv.

01/09/23 Viernes

Clima: mañana: soleado — tarde: Soleado

Personal Obra: — Personal Interv.

1 Residente ; 1 Maestro

3 Oficiales ; 3 Ayudantes.

2 Eléctricos

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: se continúa con instalación de lámparas en pasillos y oficinas de segundo piso, instalación de película de seguridad en ventanería, orden y aseo general y remates finales en ala 1.

NOTA = SE REALIZA ENTREGA PARCIAL ALA 1, BLOQUE L A RECTOR DE INSTITUCIÓN Y SE INICIA CON INGRESO DE ESTANTERÍA A OFICINAS.

Residente obra — Natalia Inspector Interv.

02/09/23 Sábado

Clima: mañana: soleado.

Personal obra: — Personal Interv:

1 Residente , 1 Maestro — 1 Inspector.

3 Oficiales ; 3 Ayudantes

2 Eléctricos.

Escaneado con CamScanner

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se finaliza instalación de lámparas en oficinas y pasillo de segundo piso y con aplicación última mano de pintura, se continúa con orden y aseo general final

Residente obra | Inspector Interventoría

04/09/23 Lunes

Clima: mañana: nublado | tarde: soleado

Personal obra: | Personal Interventoría:

1 Residente ; 1 Maestro | 1 Inspector

3 Oficiales ; 3 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se recibe ala 2, bloque L para su intervención, se inicia con instalación de cerramiento en lona para bloque y puntos de acopio, acto seguido se inicia con desmonte de puertas y ventanas.

Residente obra | Inspector Interventoría

05/09/23 Martes

Clima: mañana: soleado | tarde: nublado

Personal obra: | Personal Interv:

1 Residente ; 1 Maestro | 1 Inspector

3 Oficiales ; 5 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con desmonte de puertas y ventanas y entrepaños aulas en primer y segundo piso ala 2 y trasiego de material de demolición a punto de acopio.

Residente obra | Inspector Interventoría

06/09/23 Miércoles

Clima: mañana: soleado | tarde: soleado

Personal obra: | Personal Interv:

1 Residente ; 1 SST | 1 Inspector

1 Maestro ; 4 Oficiales | 1 SST

3 Ayudantes

Escaneado con CamScanner

	Equipo: Herramienta menor Actividades: Se continúa con demolición y desmonte de ventanas en aulas de primer y segundo piso y traslego de escombro a punto de acopio. NOTA SST INTERVENTORIA- DURANTE RECORRIDO REALIZADO POR FRENTE DE OBRA SE EVIDENCIA ESCALERAS DE PASO EN MAL ESTADO (PELDAÑOS EN CONDICIONES INSEGURAS), PERSONAL SIN EL ADECUADO USO DE E.P.P (CASCO Y GAFAS) DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES; DE ACUERDO A ESTO SE DEJAN HALLAZGOS PARA REFORZAR, CORDIALMENTE, YANIN HUERTAS Residente obra — Ingeniero Inter. Inspector Inter.
07/09/23	Jueves Clima: mañana: soleado — tarde: Personal obra: — Personal Interv: 1 Inspector. 1 Residente ; 1 Maestro 4 Oficiales ; 3 Ayudantes Equipo: Herramienta menor, rotomartillo Actividades: Se realiza desmonte de ventanas, demolición de entrepaños aulas y se inicia con desmonte de cielorraso existente segundo piso, se realiza demolición de enchape de piso en aulas de primer piso y traslego de escombro a punto de acopio Residente obra — Ingeniero Inter. Inspector Inter.
08/09/23	Viernes. Clima: mañana: soleada — tarde: nublado Personal Obra: — Personal Interventoría: 1 Residente; 1 Maestro — 1 Inspector 3 Oficiales ; 3 Ayudantes. Equipo: Herramienta menor, rotomartillo Actividades: Se continúa con demolición de acabado de piso en primer piso aulas, desmonte de cielorraso segundo piso, demolición de entrepaños y desmonte de ventanas pasillos. Residente obra — Ingeniero Inter. Inspector Inter.

Escaneado con CamScanner

09/09/23 Sábado

Clima: mañana: soleada

Personal Obra: Personal Interventoría

1 Residente ; 1 Maestro 1 Inspector

3 Oficiales ; 3 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor, rotomartillo

Actividades: Se continúa con desmonte de cielo raso en segundo piso, demolición de entrepaños aulas, acabado de piso y trasiego de material de demolición a punto de acopio.

Residente obra Insp Interv

11/09/23 Lunes

Clima: mañana: soleado tarde: soleado

Personal Obra: Personal Interventoría:

1 Residente ; 1 Maestro 1 Inspector

3 Oficiales ; 3 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor, rotomartillo

Actividades: Se continúa con demolición de piso aulas, se inicia con demolición de guarda escobas, cerca muro tableros aulas y aplicación de pañete / filos ventanas.

Residente obra Insp Interv.

12/09/23 Martes

Clima: mañana: soleada tarde: soleado

Personal Obra: Personal Interventoría:

1 Residente ; 1 Maestro 1 Inspector.

3 Oficiales ; 3 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor, rotomartillo

Actividades: Se continúa con demolición de acabado de piso y filos en ventanas, pañete en guarda escobas, se inicia excavación manual en material común y recebo compactado en aulas de primer piso.

NOTA: SE REQUIERE A CONTRATISTA DE OBRA TOMAR LA RESPECTIVA NIVELACIÓN DE PRIMER PISO A FIN DE EVITAR SOBRE EXCAVACIONES QUE NO SERÁN OBJETO DE PAGO, ASÍ MISMO TENER EN CUENTA CONCEPTO DE ESPECIALISTA GEOTÉCNISTA PARA ESTRUCTURA A

Escaneado con CamScanner

GARCÉS NAVAS IED., SEDE A

EDWIN NUÑEZ
INSP. INT.

11-04-25 INSPECCION INTERCAMBIADOR CALOR Y MICO, FIRMAS DE LOS REPARTOS DE LOS TRABAJOS NO ESTABAN, CON EL RECARGO CON LA SEÑORA CONSEJO DESA. DICHO LO CUAL DEBEN RETIRARSE SE DESA DICHO AL CONTRATISTA LOS HALLAZGOS PARA SUBSA.
FIRMA INSPECCION [illegible] INSPECTOR SST.

15/08/22 Continúa instalación electrica en sala de cuidados intermedios y tramite de entrega en el aula multiple.
Personal operativo: 2 tecnicos electricos

Equipo: Herramienta menor.
Nota: Los SSD: solicita al contratista cumplir obligatoriamente con todas las normas de seguridad de las zonas de intervención. # Instalar cue en baños de profesores y niños # Limpiar alrededores donde ingresan colocar # Acomodar tuberias de los camiones

EDWIN NUÑEZ
INSP. INT.

11-07-25 INSPECCION INTERCAMBIADOR CALOR Y MICO, FIRMAS DE LOS REPARTOS DE LOS TRABAJOS NO ESTABAN, CON EL RECARGO CON LA SEÑORA CONSEJO DESA. DICHO LO CUAL DEBEN RETIRARSE SE DESA DICHO AL CONTRATISTA LOS HALLAZGOS PARA SUBSA.
FIRMA INSPECCION [illegible] INSPECTOR SST.

18/08/23 Tiempo = mañana y tarde = nublados.
Personal operativo: Ayudantes = 2.

Herramientas y equipo = Herramientas menor. # Andamio certificados.
Actividades = Preparación de superficie entre metal de chapa en la estructura metálica del cuarto eléctrico.

EDWIN NUÑEZ
Insp. Int.

19/08/23 Tiempo = mañana = nublados.
Personal operativo = Ayudantes = 4 oficiales = 2 eléctricos = 2
Herramientas: Herramientas menor. # Andamio certificados. compuesto por 60 L.
Actividades: # Pintura sobre estructura metálica en el cuarto multiple. # Retoque de instalación de ladrillo en los visto en muro de cuarto de paneles. # Limpieza de pintura en ventanas; cuarto de cintas y empaques; cuarto de las instalaciones de tuberías en salas de preparados. # Instalación de tempes en baño de preparados.

EDWIN NUÑEZ
Insp. Int.

24/08/23 Tiempo = mañana y tarde = nublada.
Personal operativo = 0
Nota = No se realizó actividades de obra: el día de hoy; no ingreso personal operativo para continuar el avance de la obra.

EDWIN NUÑEZ
Insp. Int.

24-08-23 Se realizo recorrido y se observo ubicacion de personal y se veia trabajo por un frente personal de servicio en alturas y los permisos de trabajo si estan la firma del supervisor de obra, se encontro obrero y aseo realizando sus labores, personal dotado para ingresar en las zonas y con la toma de cualquier novedad el obrero esta ileso de cuerpo y con un casco, se encontro personal ingresando de nuevo personal sin los elementos de proteccion contra caidas con condiciones inseguras para realizar su trabajo, cuando se retiraron y encontro nuevamente trabajo sin cascos no estan usando los plataleros utilizando solo el cinturon, no se cumplio en todos los aspectos de la normatividad personal en desarrollo de actividades. Sin mas, se deja constancia de lo encontrado en el momento

Visita obreros Inspector SST

28/08/23 Clima = mañana y tarde = nublado

Personal operativo = 2 ayudantes

Equipo = Herramientas menores.

Actividades = limpieza sobre rodamientos de cintura color naranja al lado de la estructura de la cubierta ubicados en el costado del tercer piso frente del aula multiple

Nota = Se solicita el reportamiento de personal operativo para acelerar la entrega de la obra a la institucion educativa Cse debe finalizar la instalacion de aisladores electricos en general y remates de cintura de la estructura metalica. Nota: se evidencia demoras en el remate de la cintura sobre la estructura metalica.

EDWIN NUÑEZ

Inge. Int.

1

23/08/23	Tiempo = Mañana y tarde = Soleado.
	Personal operativo = 2 electricos.
	Herramientas y Equipo = Herramienta menor.
	Actividades = # Instalacion del calleado electrico y empotrar electricos en el pasillo frente a los salones Nº B201 a y baños.
	Notas = Se solicita agilizar con el remate de la pintura sobre la estructura metalica en general, igualmente revisar ubicacion y distribucion del distanciamiento entre de las luminarias en general. # Igualmente se solicita el retiro urgente o proteccion con cerramiento de los elementos que se encuentran desprotegidos en la zona de recreacion.
	
	EDWIN NUÑEZ
	INSP. INT.

05-/09-/23	SE EVIDENCIA EN EL PRESENTE QUE AL SE HA TERMINADO EL CALLADO DE LUMINARIAS SOBRANTES DE OTRAS ETAPAS, Y QUEDA EN BUEN PUNTO CHEQUEO DE LOS MUROS. AGRADEZCO LA CONDICION. SIN MAS PARTICULAR SE DESPIDE EDWIN NUÑEZ INSP. INT.
06/09/23	Limpieza del calicanto de pintura en el pasillo. # Instalacion de calleado electrico en biblioteca y pasillo frente a biblioteca. Personal Operativo = electrico 3, ayudantes = 2. Herramientas menor. EDWIN NUÑEZ INSP. INT.

Powered by CamScanner

8-09-23 Se hace inspección de sitios de trabajos y se coordinan las condiciones de las mismas mantenciones programadas y se solicita limpieza con bombillas en el hall de patios de los niños, se mantiene sobre presión de extinguidores y se deja para retiro de eso el día de hoy y faltan evidencias. El uso de los EPP para proceder [illegible] fotografías [illegible] fotografías ser

EDWIN NUÑEZ
INSP. Int.

12/09/23 Personal operativo =
oficiales = 1. Ayudantes = 3, electricos = 1
Herramienta y Equipos = # Pulidora y Herramienta menor.
Actividades = # Pintura blanca sobre viga de cemento en coordinación, Sector audiovisuales, Sector emisores.
# Instalación electrica de instalación de luminarias frente a biblioteca, sector audiovisuales.
Notas = Falta remate de pintura en general

EDWIN NUÑEZ
INSP. Int.

IED. FLORIDABLANCA, SEDE A

Contratante
Jurisdiccional

Fiscalizador.
Insp. Interno.

11/08/23 Viernes

Clima: mañana: nublado con llovizna.
tarde: nublado.

Personal obra:
1 Inspector.
1 Maestro
2 Oficiales.
4 Ayudantes
1 Soldador.

Personal Interv:
1 Inspector

Equipo: Andamios, herramienta menor, vibro compactador de rana.

Actividades: Se continúa con instalación/soldadura de estructura metálica en aula Edu Física, instalación de bordillo prefabricado en zona de parqueaderos y nivelación de subbase en aula de música.

Fiscalizador.
Insp. Interno.

12/08/23 Sábado

clima: mañana: nublado.

Personal obra:
1 Inspector.
1 Maestro
2 Oficiales
1 Soldador
4 Ayudantes.

Personal Interv:
1 Inspector

Equipo: Andamios, herramienta menor, compactador rana, compresor pintura.

Actividades: Se realiza nivelación de subbase en aula de musica, embalaje de teja es asbesto, aplicación de pintura y soldadura en estructura metálica bloque VEDA.

NOTA = SE RECUERDA A CONTRATISTA REALIZAR DESDE Y ASEO GENERAL EN EL FRENTE Y TOMA DE NIVELES EN ÁREA DE PARQUEADEROS

Fiscalizador.
Insp. Interno.

14/08/23 Lunes

Clima: mañana: nublado tarde: nublado

Personal obra:
1 Inspector
1 Maestro 1 soldador.
0 Oficiales 4 Ayudantes.

Personal Interv:
1 Inspector

Equipo: Andamios, Herramienta menor, compresor de pintura, equipo soldadura
Actividades: Se continua con aplicación de pintura, soldadura e instalación de estructura metálica en bloque seña, se inicia con instalación de platinas en aula de música e instalación de teja Ecoroof en bula Ecológica / pasillo, se realiza demolición y excavación en contorno lado exterior e instalación de bordillo en la zona.

Ing. Cesar
Inv Obra

Estadística
Insp. Interv.

15/08/23 Martes
Clima: mañana: nublado tarde:
Personal obra:
1 Inspector.
1 Maestro 1 Soldador
2 Oficiales 4 Ayudantes.

Personal Interv:
1 Inspector.

Equipo: Andamios, herramienta menor; equipo soldadura, compresor de Pintura.
Actividades: Se realiza excavación manual en lado bloque seña, aplicación de pintura y soldadura en perfilería metálica e instalación de teja, instalación de platinas en aula de música, excavación para cajas en zona de parqueaderos e instalación de bordillo prefabricado en parqueaderos.
Nota: Se realiza toma de densidades en aula de música.

Ing. Cesar
Inv Obra

Estadística
Insp Interv.

16/08/23 Miércoles.
Clima: mañana : nublado tarde: nublado.
Personal obra:
1 Inspector
1 Maestro 1 Soldador
2 Oficiales 4 Ayudantes

Personal Interv:
1 Inspector.

Equipo: Andamios, herramienta menor, equipo soldadura, compresor de pintura

Actividades: Se realiza instalación de perfilería / soldadura en aula de música, instalación de adoquines en anden lado canchas, excavación para tubería en zona de parqueadero, armado de formaletas para cajas de inspección. Nota: se realiza sondeo de tubería de caja cancha encontrando taponamientos y mal estado de la misma.

Jose Acuña
FISI Obra

a/catalina
Insp Interv.

17/08/23 Jueves

Clima: mañana: soleado tarde: Nublado (lluvias de 3:30 a 4pm).

Personal obra: Personal Interventoría:

1 Inspector 1 Inspector.

1 Maestro 4 Ayudantes

2 Oficiales 1 Soldador

Equipo: Herramienta menor, andamio, equipo soldadura, compresor pintura

Actividades: se realiza instalación, soldadura y aplicación de pintura en perfiles de aula de música, instalación de formaletas para cajas en parqueadero, excavación para tubería en zona de parqueadero e instalación de adoquín en anden lado canchas.

Jose Acuña
Fisi Obra

a/catalina.
Insp Interv.

18/08/23 Viernes

Clima: mañana: soleado tarde: Nublado. (Fuertes lluvias de 3:00 a 4:00 pm)

Personal obra: Personal Interventoría

1 Inspector 1 Inspector.

1 Maestro 1 Ayudantes

2 Oficiales 1 Soldador

Equipo: Herramienta menor, andamio, equipo soldadura

Actividades: Se realiza instalación de malla y fundida de cajas de inspección en parqueadero, instalación de tubería aguas lluvias, se continúa con instalación de perfilería en aula de música y retiro de material en zona cocina.

Jose Acuña
Fisi Obra

a/catalina
Insp Inter.

19/08/23 Sábado

Clima: mañana: nublado

Personal obra:
1 Inspector.
1 Maestro 4 Ayudantes.
2 oficiales. 1 soldador.

Personal Interventoría:
1 Inspector

Equipo: Herramienta menor,

Actividades: Se realiza fundida de placa de contra piso en aula de música / instalación de malla electro soldada. y se inica con excavación para tubería zona cocina. y sus respectivas cajas de inspección.

Ing. Atenea
Ing. Obra

Natalia.
Insp Inter.

02/08/23 Martes

Clima: mañana: soleado tarde: soleado.

Personal obra:
1 Inspector.
1 Maestro 4 Ayudantes
2 Oficiales. 1 soldador

Personal Interventoría:
1 Inspector
1 SST.

Equipo: Herramienta menor, andamios, compresor pintura.

HORA INTERVENTORIA SST. SE EVIDENCIA SE NUEVO PERSONAL SIN CASCO SIN USO DE GAFAS ESCOMBRO POR TODOS LADOS, ENCERRAMIENTO CAIDO Y EN MAL ESTADO, ORDEN Y ASEO FALTA MEJORARLO NO SE EVIDENCIA SIEREE DE LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN SEMANAS ATRAS, SE DEJA DE NUEVO RECOMENDACIONES AL PERSONAL COMPETENTE SST. CONTRATISTA.

Yanin Cifuentes

Actividades: Se realiza aplicación de pintura en perfiles aula de música, excavación para tubería y cajas en zona parqueadero, instalación adoquín lado andén, instalación geotextil tejido lado bloque SENA.

NOTA= SE SOLICITA A CONTRATISTA REALIZAR LOS TRABAJOS CON GEOTEXTIL INSTALADO CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADEMÁS DE LA TOMA DE

NIVELES EN ÁREA DE PARQUEADERO A FIN DE EVITAR SOBREEXCAVACIONES

José Acuña
Inst Obra

Natalia
Insp Interv

23/08/23 Miércoles

Clima: mañana: soleado tarde: soleado

Personal obra:
1 Inspector
1 Maestro 4 Ayudantes
2 Oficiales 1 Soldador.

Personal Interv:
1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor, vibro compactador.

Actividades: Se realiza excavación de caja cuna a caja lado muro cerramiento Parqueadero para tubería, se continúa con instalación de adoquín lado canchas, lleno en subbase y compactación del mismo material.

José Acuña
Inst Obra

Natalia
Insp Interv.

24/08/23 Jueves

Clima: mañana: soleado. tarde: soleado.

Personal obra:
1 Inspector
1 Maestro 4 Ayudantes
2 Oficiales

Personal Interventoría:
1 Inspector

Equipo: Herramienta menor, vibro compactador.

Actividades: se continúa con instalación de adoquín en orden lado canchas, compactación de subbase en Parqueadero, excavación para tubería de caja cuna o caja lado muro cerramiento parqueadero.

Se realiza retiro de material de excavación de punto de acopio.

José Acuña
Inst Obra

Natalia
Insp Interv.

25-08-23 SE CUIDADA EN ACTIVIDADES DE RECORRIDO LO SIGUIENTE, SE CUIDA EN CHARLA CONCIENTIZACIÓN CONTRATISTAS, PERSONAL EN EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS Y ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN, CONFINAMIENTO CAJAS, SE CUIDA HUECOS SIN DESCUBRIR.

Conocimiento para mejorar el estado de los pasillos, personal no uso de las casas, generando sin compliere Normas y Reglas Determinado en carreras sin fin de Avance, se Concreta el señor Felipe García cc 80068467 por cita en Frentes de Avance de la Documentación Intelectual de cita, se Concreta en Horas de Capacidad no Cumplimiento de Operación de SST. Contratista.

Yanio Herrera SST Interventoría

26-08-23 Soleado

Clima: mañana. Soleado — tarde: Soleado

Personal Obra — personal Interventoría

1 Inspector — 1 Inspector

1 Maestro — U: Cleyduto

2. Oficiales

Equipo: Herramienta menor. Rum Compactadora

Actividades: Fundición de cuna de Inspección, Excavación para Instalación de tubería para descarga de pavimento Instalación de Cabezote con malla y orden y aseo

Jos. Chacón — Natalia

Ing Obra — Inop Inten.

28/08/23 Lunes

Clima: mañana: soleado — tarde: soleado.

Personal obra: — Personal Interventoría:

1 Inspector — 1 Inspector.

1 Maestro ; 2 oficiales.

4 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor; vibro compactador.

Actividades: se realiza instalación de tubería de aguas lluvias de caja lado bloque SENA a caja existente, lo anterior realizando el correspondiente desmonte de adoquín y excavación manual, se realiza igualmente

Instalación de formaleta para caja de parqueadero y lleno y compactación de subbase en área de parqueaderos. (se realizó reunión con rector, apoyo seg, contratista de obra e interventoría).

Xatalina
Insp Interv.

29/08/23 Martes

Clima: mañana: soleada tarde: soleada

Personal obra — Personal Interv.

1 Inspector — 1 Inspector.

1 Maestro 2 oficiales

4 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor, vibrocompactador.

Actividades: se realizó lleno de material en excavación para tubería aguas lluvias, se continúa con compactación de subbase en área de parqueaderos. se realizó fundida de caja lado bloque seña, corte de placa en zona de escalera y demolición de la misma, se realizó orden y aseo general en aulas edo física y completo.

Xatalina.
Insp Interv.

30/08/23 Miércoles.

Clima: mañana: soleada tarde: soleada

Personal obra — Personal Interv.

1 Inspector — 1 Inspector.

1 Maestro 2 oficiales

4 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor, vibro compactador.

Actividades: Se realiza instalación de bordillo en zona shut de basuras, lado cocina, se continúa con relleno y compactación de subbase en parqueadero y lado bloque seña, fabricación de marcos para cajas en parqueaderos.

NOTA = SE SOLICITA A CONTRATISTA REALIZAR TOMA DE NIVELES EN PARQUEADEROS A FIN DE DEJAR DESAGÜE ADECUADO SEGÚN CONCEPTO EMITIDO Y NIVELACIÓN DE CAJAS REALIZADAS

Xatalina
Insp Interv.

31/08/23 Jueves

Clima: mañana: soleado. tarde: soleado.

Personal obra: Personal Interventoría

1 Inspector 1 Inspector.

1 maestro. ; 2 oficiales.

4 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor, vibro compactador.

Actividades: se continúa con llenos y compactación de sobre en parqueadero, excavación manual en zona cocina, fabricación de muros de cajas y corte de varillas para armado de acero en parqueadero.

NOTA: SE REITERA A CONTRATISTA DE OBRA LA IMPORTANCIA DE GARANTIZAR EL ADECUADO DRENAJE DEL PARQUEADERO, CON EL FIN DE EVITAR FENÓMENOS DE BOMBEO ENTRE LAS LOSAS Y EL ESCALONAMIENTO ENTRE LAS MISMAS, ASÍ MISMO QUE LA MODULACIÓN DE LAS LOSAS DEBE SER RESPETADA PARA PREVENIR FISURAS POR CONTRACCIÓN

Jes. Chaves Natalia C.

Ins/Obra Insp. Interv.

01/09/23 Viernes

Clima: mañana: soleado. tarde: soleado.

Personal obra: Personal Interventoría:

1 Maestro ; 3 oficiales. ; 1 Inspector 1 Inspector.

4 Ayudantes. ; 1 SST ; 1 Residente 1 SST.

Equipo: Herramienta menor, vibrador de concreto, mixer.

Actividades: se realiza fundida de anden sub bloque sena, shut de basuras, y parte de losa de parqueadeo. (se realiza toma de muestras de concreto para ensayos de laboratorio).

NOTA: SE REQUIERE A CONTRATISTA REALIZAR DILATACIONES EN PLACAS DE ACUERDO CON MODULACIONES PLANTEADAS EN CONCEPTO TÉCNICO PARQUEADERO, Y ASÍ MISMO REALIZAR LOS ACABADOS CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES.

Jose Chaves Natalia C.

Ins/Obra Insp Interv.

02/09/23 Sábado.

Clima: mañana: soleado.

Personal Interventoria
1 Inspector
1 SST

Personal Obra
1 Maestro ; 1 Inspector.
3 Oficiales ; 2 Ayudante.
1 Inspector ; 1 SST.

Equipo: Vibrador concreto, herramienta menor, Mixer E
Actividades: Se realizan dilataciones en placa, descencofre de rieles en placa parqueadero.

Jose Cleves
Fisi Obra

Statistical
Insp Interv.

04/09/23 Lunes
Clima: mañana: soleado tarde: nublado.

Personal obra:
1 Inspector ; 1 SST.
1 Maestro ; 4 Oficiales
5 Ayudantes.

Personal Interv:
1 Inspector.
1 SST.

Equipo: Vibrador concreto, Mixer, Herramienta menor.
Actividades: Se realiza fundida de placa de parqueadero.
NOTA SST INTERVENTORIA = DURANTE RECORRIDO REALIZADO POR FRENTE DE OBRA SE EVIDENCIA PERSONAL REALIZANDO ACTIVIDADES DE FUNDIDA SIN EL USO DE GAFAS, SE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA REFORZAR EL USO DE LAS MISMAS Y DE LOS EPP EN GENERAL DURANTE ACTIVIDADES QUE INTERVENGAN PARTICULAS. CORDIALMENTE. YANIN HUERTAS / SST INTERVENTORIA

Jose Cleves
Fisi Obra

Statistical
Insp Interv.

05/09/23 Martes,
Clima: mañana: soleado tarde: soleado.

Personal obra:
1 Inspector ; 1 Maestro
3 Oficiales ; 2 Ayudantes

Personal Interv:
1 Inspector.

Equipo: Pulidora, Herramienta menor
Actividades: Se realizan dilataciones en placa parqueadero, se inicia con instalación de bordillo lado cocina, instalación geotextil y mejorado, Se realiza demolición de corredor lado almacen

Jose Cleves
Fisi Obra

Statistical
Insp Interv.

06/09/23 Miércoles.

Clima: mañana: soleado tarde: nublado

Personal obra: Personal Interventoría

1 Inspector, 1 Maestro 1 Inspector.

3 Oficiales ; 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con demolición de acabado de piso en corredor lado almacén, demolición de granito pulido lado bordillo y trasiego de escombros a punto de acopio.

Jose Acevedo Natalia C
Insp Obra Insp Interv

07/09/23 Jueves.

Clima: mañana: soleado tarde: soleado.

Personal obra: Personal Interv:

1 Inspector ; 1 Maestro. 1 Inspector.

3 Oficiales ; 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realiza alistado en aula de música y modulación para enchape en porcelanato; se realiza alistado en comedor lado almacén y se inicia a desocupar almacén para intervención en cubierta (se realiza anotación a almacenista de institución sobre estado de muebles en el sitio) NOTA= DURANTE RECORRIDO POR PARTE DE INTERVENTORIA SE EVIDENCIAN EMPOZAMIENTOS EN PLACA DE PARQUEADERO POR LO QUE SE INSTA A CONTRATISTA REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA AJUSTAR DESAGÜE DE PLACA DE CONFORMIDAD CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES Y CONCEPTO TÉCNICO / RECOMENDACIONES REALIZADAS POR PARTE DE ESTA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO CLC_BTA_SED_050_2022_289.

Jose Acevedo Natalia C
Insp Obra Insp Interv.

08/09/23 Viernes.

Clima: mañana: soleado tarde: soleado.

Personal obra: Personal Interv:

1 Inspector 1 Inspector

1 Oficial ; 1 Ayudantes. 1 SST.

Equipo: Herramienta menor.
Actividades: Se realiza fundida de alistado en comedor lado almacén y aula de música. NOTA: SE REMITE A CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR LOS SUBSANES NECESARIOS EN PLACA DE PARQUEADERO.

Jose Alcivar
Insp Obra

Estadística
Insp Inten.

09/09/23 Sábado
Clima: mañana: soleado

Personal Obra:
1 Inspector
1 Oficial ; 4 Ayudantes

Personal Inter:
1 Inspector

Equipo: Herramienta menor
Actividades: Se realiza desmonte de rejas en aula de música, resane de cajas de inspección para instalación de marcos y contactos en las mismas.

Jose Alcivar
Insp Obra

Estadística:
Insp Inten.

IED. RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A

Herramienta menor.
Actividades: Soldadura apoyos pernos estructura
Cubierta aula multiple
Instalación de andamio piso aula taller.

Inspector Interv.

10-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado.
Tarde: Nublado.
Personal obra: Inspector Técnico
Soldador
oficial
Ayudante (3)
Equipos y herramientas: soldadora
Compresor
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: soldadura apoyos y pernos estructura
Cubierta aula multiple
Instalación de andamio piso aula taller.
Nota: No hay actividad en el turno de tarde)

11-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde:
Personal obra: Inspector técnico
Soldador
oficial (4)
Ayudantes (3)
Personal Interventoría: Inspector técnico.
Equipos y herramienta: soldadora
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor

Powered by CamScanner

Actividades: instalación de entrepiso
de la de Kanata.
instalación de estructura para apoyo en
área de la kanata
soldadura apoyos y perfiles estructura cubierta
Nota: En recorrido por la institución se cuidadoso
que no se este realizando actividad en el
shut. de basuras
se insta al contratista continuar con las actividades
relacionadas al shut. de basuras y a realizar las
sesiones relacionadas en días anteriores

Inspector Técnico.

Alejandro Ramos
Insp. de Obra
SAFRIO

09-2023. Estado del clima: Mañana:
Tarde:
Personal obra: Inspector técnico
soldador
oficial (2)
Ayudantes (2)
Equipos y herramientas: Andamio Certificado
pulidora.
Herramienta menor
Actividades: Desmonte de cubierta
Desmonte de cerca

21-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector técnico
pintura en p. (1)
oficial (1)
Ayudante (2)
Equipos y herramientas: pulidora
Andamio Certificado
Herramienta menor

NKA

Powered by CamScanner

Actividades: orden y aseo
pulidora sobre perfiles estructura

Alejandro Flores
Insp. de Obra
SAPRID

15-08-2023 Estado del clima: clima: nublado
Toda: Nublado
Personal obra: Inspector técnico
oficiales (3)
Ayudantes (3)
Personal intervención: Inspector técnico
Equipos y herramientas: pulidora.
Andamio certificado
Herramienta menor
Actividades: Armado estructura para muros
en zona norte
Instalación de teja típica.
Nota: En recorrido para instalación se evidencia.
la no actividad laboral en el área de techos
se le sugiere al contratista contratar personal para
la actividad en mención para terminar los muros
norte de obra

Alejandro Flores
Insp. de Obra
SAPRID

16-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Toda: Nublado
Personal obra: Inspector obra.
soldado.
oficial (2)
Ayudantes (2)
Personal intervención: inspector técnico
Equipos y herramientas: soldadora, pulidora
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: soldadura apoyos y perfiles e.

instalación en cubierta nave multiple.

Supervisor. Maestro Hop. Obra SMAEQ

Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector técnico
soldador (2)
oficial (1)
Ayudantes (2)
Personal intermediario: Inspector técnico
Equipos y herramientas: soldador, soldadora
Andamio certificado
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: soldadura apoyos y perfiles
estructura cubierta nave multiple
instalación.
Nota: se hace la observación al contratista
realizar los anclajes mencionados
anteriormente en muro de ladrillo shot.
de concreto: así mismo se hace la observación
en la parte estructural de la cubierta con respecto
a los alineamientos de los perfiles
También se requiere del contratista el empate
de pintura en la parte de perfiles

Supervisor.

Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado con lluvia
Personal obra: Inspector técnico
soldador
oficial
Ayudante (2)
Equipos y herramientas: soldador
Andamio certificado

Powered by CamScanner

Herramienta menor.
Actividades: Instalación de anclaje piso soldadura apoyos y perfiles estructura cubierta aula multiple.
Nota: se realizo visita de intervento-inf. SST- Alejandro Hoyos Ing. de obra SAFRIO se revisan actividades por [illegible]

19-08-2023 Estado del clima: clarinza - Nublado
Personal obra: soldador (E)
oficial (E)
Ayudante (E)
Personal interventoria: ingeta tecnica
Equipos y herramientas: soldador
Andamio certificado
Actividades: Instalación anclaje piso aula multiple.
soldadura apoyos y perfiles cubierta aula multiple
Nota: se hace la observación al contratista tener en cuenta los alineamientos en la instalación de los perfiles asi mismo realizar el cubrimiento del muro detras del shut.

23-8-2023 INSPECCION INTERVENTORIA SST SE EVIDENCIA EN HOJAS DE LUMINARIA SIN PERSONAL LUEGO SE EVIDENCIA PERMISOS DE TRABAJO SIN DILIGENCIAR FIRMAS EN BLANCO DESDE EL DIA DE AYER 1/8 LUEGO LOS MISMOS COLABORADORES TRABAJARON ESE DIA PERO NO FIRMARON - SE PARA ACTIVIDADES HASTA NO COMPLETAR PERMISOS Y INSTALAR L.V PARA DAR INICIO A EJECUCION SE DEJA HALLAZGOS EVIDENCIADOS DE ORDEN Y ASEO EN LOS LUGARES A INTERVENIR, CAMBIO

O actualización de la charla, Inducción de personal con fecha, de los elementos, y Hacer acompañamiento de SST. A inicio de actividades para mejorar condiciones de seguridad con los colaboradores.

Cuenta, cuenta

Supervisor SST:

Se inician actividades, con los permisos correspondientes, se entrega guantes y guantes, se organiza todo lo de trabajo seguro en alturas inicio de vida de inspección de equipos arnes y eslingas Sandra Huertas.

Estado del clima: Mañana: soleado

Tarde: soleado

Personal obra: Inspector tecnico.

Inspector SST.

soldador (2)

oficial (1)

Ayudantes (2)

Personal intervenido: Inspector SST

Equipo y herramientas: soldadora, pantalla.

Andamio certificado.

Herramienta menor

Actividades: soldadura apoyo y pertiles y se instalación

instalación anclaje piso cada multiple

Alejando Alonso
Insp. de Obra
SAFRO

Estado del clima: Mañana: Nublado

Tarde:

Personal intervenido: inspector SST

inspector tecnico

soldador (1)

oficial (1)

Ayudantes (2)

Personal intervinientes: Inspector técnico
Equipos y herramientas: soldador, pulidora
Andamio certificado
Herramienta menor
Actividades: soldadura apoyos y perfiles - instalación en cubierta nave multiple.
Nota: En recorrido por la instalación se observa que no están realizando actividades en altura de barandas, se le recomienda al contratista cuando el personal de obra con ellas de avanzar en todos los frente de obra.

Inspector técnico

25-08-2023 Estado del obra: Mañana: soleado
Tarde: soleado.
Personal obra: Inspector técnico
soldador (3)
operal (1)
Ayudantes (2)
Equipos y herramientas: soldador
pulidora y taladro
Andamio certificado
Herramienta menor
Actividades: soldadura apoyos y perfiles estructura
cubierta nave multiple.
Instalación de entrepe piso nave multiple.

Inspector técnico

Alejandro Hernández
Ingeniero de Obras
SAPRIO

16-08-2023 Estado del obra: Mañana: soleado
Personal obra: Inspector técnico
Soldador (2)
operal (1)
Ayudante (2)
Equipos y herramientas: soldador
pulidora, taladro

Powered by CamScanner

Andamio certificado
Herramienta menor
Actividades: Instalaciones de anclaje piso cubierta sala multiple
soldadora apoyos y perfiles cubierta sala multiple.

Inspector técnico.

-01-2023 Estado del clima: soleado
Tarde.
Personal obra: Inspector técnico
soldador (1)
oficial (1)
Ayudantes (2)
Personal interventoria: Inspector técnico
Equipos y herramientas: soldadora,
polidora, taladro
Andamio certificado.
Herramienta menor.
Actividades: soldadora apoyos y perfiles estructura
cubierta sala multiple.
Nota: Nuevamente se le reitera al contratista.
desarrollar actividad en el chut de basuras.
para que asi mismo se vea el avance de obra
ejecutada
se le informa al contratista que se debe realizar
el corte de pintura aplicada en la estructura. (oxidos)
no se evidencia actividad normal. Falta de materiales

Inspector interv.

-01-2023 Estado del clima: soleado:
Tarde:
Personal obra: Inspector técnico
soldador (1)
oficial (1)
Ayudantes (2)
Equipos y herramientas: soldadora

Powered by CamScanner

pulidora, taladro
Andamio certificado
Herramienta menor
Actividades: soldadora apoyos y perfiles estructura-
cubierta cuela multiple
Instalación extractor pixo cuela multiple

Alejandro Moreno
Insp. de Obra
SAPRID

30-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde:
personal obra: inspector técnico.
soldador (1)
Personal intervención: Inspector técnico.
Actividades: perforación tuvos en laminas apoyos
para estructura cubierta cuela multiple.
Nota: es recomendado por la institución se evidencia
1 sola persona laborando (soldador.)
se le recomienda al contratista avanzar en la
terminación de las actividades en el shut de
bomberos.
No se labora con rendimiento debido a que
no hay materiales

Alejandro Moreno
Insp de Obra
SAPRID

31-08-2023 SE REALIZA RECORRIDO EN HORAS DE LAS
9AM. NO SE EVIDENCIA PERSONAL EN
MEMORANDOS SE REALIZA RECORRIDO DE
OBRA Y SE DEJA NUEVAMENTE EL
ORDEN Y ASEO REALIZO DE ANDAMIO
TUBULAR LA CUAL SOLO SE DEBE TENER
2 SECCIONES EN REPETIDAS VECES E MANIFES-
TADO EL NO USO SINO DE 2. Y ESTE ANDAMIO
LLEVA VARIAS SEMANAS ARMADO CON 3. SECCIONES SE
DEJA HALLAZGO, Y VERIFICAR POR PERSONAL

SST. /IA) CONDICIONES PERMANENTES EN LOS SITIOS DE TRABAJO.

YANIN HORTA
INTERVENTORIA SST.

Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado

Personal obra: Inspector tecnico
Soldador (1)
Oficial (1)
Ayudantes (2)

Personal de interventoria: Inspector sst

Equipos y herramientas: Soldador
pulidora
Retomaquito
Andamio rectificado
Herramienta menor

Actividades: soldadura, apoyos y perfiles estructura cubierta aula multiple

Instalación de entrepiso aula multiple

Nota: El personal entro tarde a labores

Alejandro Moran
Inspector interv.

Alejandro Moran
Insp. de Obra
SAFRIO

09-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde:

Personal obra: Inspector tecnico
soldador (1)
Oficial (1)
Ayudante (2)

Actividades: soldadura apoyos y perfiles estructura cubierta aula multiple

Instalación de entrepiso aula multiple

Nota: se insta al contratista suministrar el alineamiento de los perfiles en cubierta aula multiple

se le refiere al contratista avanzar en las actividades del shed de baterias

NKB

Powered by CamScanner

04-09-23 SE EMITE SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS ENCONTRADOS SE SIGUE EVIDENCIANDO LA MISMA CONDICION EN DIFERENTE TUBO ESTA ADOSADO EL ANDAMIO TUBULAR SIN PLANCHONES ANCLANDOS Y EL REMATADO DE LA PARTE POR ENCIMA COMO BENTEO, MEJORAR ENCERRAMIENTO Y LA DEMARCACION, EXISTE LAS CONDICIONES DE MEJORA PARA CUANDO REMIN ANDAMIO Y EN LA PARTE EXTERIOR PARA CORTE DE TEJA E INSTALACION DE LA CANAL, MEJORAR EL ORDEN Y ASEO. SIGUEN HALLAZGOS SIN INTERVENCION.

Estado del clima: Mañana soleado

Tarde: Nublado.

Personal obra: Inspector obra
soldador
oficial
Ayudante (2)

Personal interventoria: Inspector SSE

Equipos y herramientas: soldadora, compresor
Andamio certificado
pulidora
Herramienta menor

Actividades: soldadura apoyos y perfiles estructura cubierta cada multiple

Instalación de teja cubierta cada multiple

Alejandro Flórez
Insp. de obra
SAFDIO

05-09-2023 Estado del clima: Mañana: soleado.

Tarde:

Personal obra: Inspector interventoria.
Inspector obra.
soldador (1)
oficial (1)
Ayudante (2)

Equipos y herramientas: soldadora

Cargamos
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: soldadura en apoyos y perfiles estructura
Cubierta aula multiple
Instalación de entrepiso piso aula multiple.

Estado del clima: algunos soleado
Tarde: soleado
Personal obra: Inspector técnico
oficiales (2)
Ayudantes (3)
Equipos y herramientas: soldador, compresor
oficina / Andamio tubular
Taladro
Herramienta menor
Actividades: soldadura apoyos y perfiles estructura
Cubierta aula multiple.
Instalación de entrepiso piso aula multiple.

Alejandro Moran
Insp. de Obra
SAFRID

Estado del clima: algunos: soleado
Tarde:
Personal obra: Inspector técnico
Inspector SST.
oficiales (2)
Ayudantes (3)
Personal inventario: inspector técnico
Herramientas y equipos: Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: instalación de entrepiso piso aula
multiple,
limpieza de bordes entrepiso-

NKA

Powered by CamScanner

Nota: Interventoría en recorrido de obra se hace inspección de anclaje encontrando que algunos se encuentran sueltos o caídos se les insta al contratista hacer el subsane de este anclaje. Así mismo se le exige tener en cuenta el alineamiento de los perfiles instalados en cubierta sobre malla

09-09-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado
Personal obra: Inspector técnico
oficiales (4)
Ayudantes (4)
Equipos y herramientas: soldador, pulidor
taladro
Andamio tubular
Actividades: soldadura en apoyos y perfiles
estructura cubierta sobre malla
Instalación anclaje piso sobre malla

09-09-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Personal obra: Inspector técnico
oficiales. (4)
Ayudantes (4)
Equipos y herramientas: pulidora, t
taladro
Herramienta menor
Actividades: Instalación de teja etanol. cubierta
sobre malla.
Instalación de anclaje piso sobre malla

Alejandro Moreno
Ingº de Obra
SAPPLO

11-09-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde
Personal obra: Inspector técnico

Powered by CamScanner

IED. JUAN DEL CORRAL, SEDE A

-09-2023 Estado del clima: Mañana soleado
Tarde: Nublado.
Personal obra: Instaladores poliurea (2).
Equipos y herramientas: Compresor
Reactor
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: No se realiza ninguna actividad
por parte del contratista.
Nota: No les ha llegado material para la instalación
de poliurea

-09-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado (lluvias 10 a 10:45am)
Tarde: Nublado
Personal obra: Instalador poliurea (2)
Equipos y herramientas: Compresor
Reactor
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividad. No se realizo ninguna actividad.
Nota: No hubo actividad laboral por falta de
material

-09-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lluvias (10:00am a 10:45am)
Tarde: Nublado.
Personal obra: Inspector obra
Instaladores poliurea (2)
Equipos y herramientas: Compresor
Reactor
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: No se realizo ninguna actividad laboral
Nota: No hubo actividad laboral por falta de material

14-08-2023 Estado del clima: Mañana: Soleado-
Tarde: Nublado-
Personal obra: Instaladores polivrea (2)
Equipos y herramientas: Compresor
Reactor
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: No se realizo actividad laboral
No ha llegado material

15-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado-
Tarde: Nublado-
Personal obra: Instaladores polivrea (2)
Equipos y herramientas: Reactor
Compresor
Andamio tubular
Actividades: No se realizo ninguna actividad
laboral-

16-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado
Personal obra: Instaladores polivrea-(2)
Actividades: No se realizo ninguna actividad por
falta de material

17-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado
Personal obra: Instaladores polivrea (2)
Actividades: No se realizo ninguna actividad
laboral por materiales

18-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado- Nublado Horas (3.00 a 3.30pm)

Powered by CamScanner

Personal obra: instaladores poliurea. 2)
Equipos y herramientas: Reactor
Compresor
Andamio tubular.
Actividades: Aplicacion de imprimante terraza.
Comedor y biblioteca.

[illegible] Estado del clima: Mañana: soleado.
Tarde: soleado.
Personal obra: Instaladores poliurea (2)
Equipos y herramientas: Reactor
Compresor
Andamio tubular
Herramienta menor.
Actividades: Aplicacion de imprimante en terraza
Comedor y biblioteca. y aplicacion de
poliurea.

12.06.2023. Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado.
Personal obra: Instaladores poliurea.
Equipos y herramientas: Compresor
Reactor
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Aseo y orden en terrazas.

13.06.2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado
Personal obra: Instaladores poliurea.
Equipos y herramientas: Compresor
Reactor.
Andamio tubular
Herramienta menor

70

Actividades: No se realizo ninguna actividad.

24-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado.
Tarde: soleado
Personal obra: instaladores de poliurea (2)
Equipos y herramientas: Reactor
Compresor
Andamio tubular
Actividades: No se realizo ninguna actividad.

25-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado.
Personal obra: instaladores poliurea (2)
Equipos y herramientas: Compresor
Reactor
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Aplicación de imprimante terraplenes bloques puentes peatonal

26-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Personal obra: instaladores poliurea (2)
Equipos y herramientas: Reactor
Compresor
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividad: instalacion de poliurea en terraza puente entre bloques

28-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector tecnico

Powered by CamScanner

Instalador: poliurea (2)
Jefe de / interventor: Inspector técnico
Equipos y herramientas: Reactor
Compresor
Andamio tubular
Herramienta menor
Actividad: No hay actividad laboral
Nota: se retiran equipos y herramientas de inst.
de poliurea.
se insta al contratista terminar las obras faltantes
y las subsanes de patología que puedan quedar
en las áreas intervenidas

08-2023 Estado del clima: Mañana soleado.
Tarde: soleado.
Personal obra: ninguno.
Nota: En recorrido por la institución se observa
la terminación de la aplicación de poliurea.
así mismo se observa que no se ha terminado
los trabajo en el sotano, se requiere del contratista
realizar estas actividades y las subsanes para
así hacer entrega a satisfacción de la institución

OCT 2023 Estado del clima: Mañana: Nublado.
Tarde: soleado.
Nota: No hay personal laborando

09-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado
Nota: No se realiza actividad laboral.

01-09-2023 Estado del clima: Mañana: soleado

Tarde: soleado.

Nota: No se esta laborando por parte del

Contratista:

02-09-2023 Estado del clima: Mañana: soleado

Tarde:

Nota: No hay actividad laboral de parte.

del contratista.

04-09-2023 Estado del clima: Mañana: soleado.

Tarde: Nublado

Personal obra: Inspector tecnico

personal interventoria: Inspector tecnico

Actividades: Ninguna

Nota: se insta al contratista realizar las adecuaciones

de filtraciones de aguas lluvias en los techos

del la biblioteca y el comedor

Así mismo se le hace la observación de terminar

la actividades faltantes para la entrega de obra

a la institución.

05-09-2023 No hay actividad laboral por parte del contratista

06-09-2023 No hubo actividad laboral por parte del contratista

07-09-2023 No hubo actividad laboral por parte del contratista

08-09-2023 Estado del clima: Mañana: soleado

Tarde: soleado.

Personal obra: Inspector tecnico

Personal Interventoria: Inspector tecnico

Actividades: Se realiza reunión por la institución junto

con el contratista, la rectoria e interventoria

para hacer entrega parcial de obra, donde se evidencian

Powered by CamScanner

algunos detalles que se deben subsanar por parte del contratista antes de la entrega total.

9-09-2023 Estado del clima: Mañana: soleado.

Personal obra: Maestro

Ayudante (2)

Equipos y herramientas: Taladro

Herramienta menor

Actividades: limpieza fachada entrada principal

instalación de reja de cerco exterior

pintura puerta baño

IED. JUSTO VICTOR CHARRY, SEDE A

NOTA = DURANTE RECORRIDO REALIZADO EN EL FRENTE NO SE EVIDENCIA PERSONAL LABORANDO POR PARTE DE CONTRATISTA, ASI MISMO SE REITERA SUBSANAR OBSERVACIONES DE ACABADOS INCONCLUSOS, LOS CUALES NO SERÁN RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR PARTE DE ESTA INTERVENTORIA.

Residente obra — Natalia Insp. Interv.

12/08/23 Sábado
Clima: mañana: nublado
Nota: No se realizan actividades en el frente de obra.

Residente obra — Natalia Insp. Interv.

14/08/23 Lunes
Clima: mañana: nublado tarde: nublado
Nota: No se realizan actividades en el frente de obra

Residente obra — Natalia Insp Interv.

15/08/23 Martes.
Clima: mañana: nublado tarde: nublado
Personal obra
1 Residente
2 Maestros
Equipo: Herramienta menor.
Personal
1 Inspector
Nota: Se realizo ingreso de personal nuevo, se realizan remates en areas de intervención.

Residente obra

17-8-23. JUEVES.
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL OBRA : 5
NOTA: NO TENIAN PERMISOS FIRMADOS, Y NO CITARON AL (DIA). SEGUN TRABAJADORES NO LES DIJERON

SI SE LOS HABIAN DEJADO LA PERSONA SST. CONTRATISTA.
SE DEJA RECOMENDACION HASTA ULTIMO DIA DE OBRA
SE DEBEN MANTENER PERMISOS AL DIA.
YANIN (ILEGIBLE)
(ILEGIBLE) INTERVENTORIA SST — NOTA NO CORRESPONDE.

16-08-23. Miércoles.
Clima: mañana: nublado tarde: nublado.
Personal obra: Personal Interv:
1 Residente. 1 Inspector
1 Oficial 1 SST.
1 Ayudante
Equipo: herramienta menor
Actividades: se realiza emboquillado de enchape de muro, demolición de enchape, orden y aseo general.
NOTA: SE EVIDENCIO PERSONAL EN CAMPO SIN LOS EPP ADECUADOS, NO TENIAN PERMISOS PARA FIRMAR, CARGO PENDIENTE REORGANIZAR CRONOGRAMA, Y ORDEN Y ASEO EN INSTALACIONES DE ACOPIOS.
YANIN (ILEGIBLE)
INTERVENTORIA SST — Catalina. Inspinterv. — Residente obra

17-08-23 Jueves.
Clima: mañana: soleado tarde: Nublado (lluvia de 3:30 a 4pm)
Personal obra: Personal Interv:
1 Residente. 1 Inspector
1 Oficial
1 Ayudante.
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: Se realiza aplicación de boquilla, instalación de enchape y remates en baño niñas preescolar.
Residente obra — Catalina. Inspinterv.

18-08-23 Viernes
Clima: mañana: soleado
tarde: nublado (lluvias de 3:00 a 4:00 pm).

Personal obra:
1 Residente
1 Oficial
1 Ayudante

Personal Interv:
1 Inspector

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continúa con instalación de enchape, aplicación de boquilla e instalación de win en baño niñas preescolar, se realiza aplicación de pañete en cuarto de aseo (lava traperos) y demolición de poceta existente.

Residente obra Supervisor Interv.

19-08-23 Sábado

Clima: mañana: nublado.

Personal obra:
1 Residente
1 Oficial
1 Ayudante.

Personal Interv:
1 Inspector

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se inicia con instalación de enchape en cuarto de aseo, desmonte de puerta existente en esta zona y ampliación con bloque de poceta lava traperos zona de preescolar.

Residente obra Supervisor Interv.

22-08-23 Martes

Clima: mañana: soleado tarde: soleado

Personal obra:
1 Residente
1 Oficial ; 1 Ayudante.

Personal Interv:
1 Inspector

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se realiza aplicación de pañete en marco de puerta principal, e instalación de sanitarios área infantil en baño niñas preescolar,

Residente obra Supervisor Interv.

23-08-23 Miércoles.

Clima: mañana: soleado tarde: soleado

Personal obra:
1 Residente
1 Oficial ; 1 Ayudante.

Personal Interventoría:
1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continúa con aplicación de boquilla en baño niñas preescolar, se realiza adecuación de punto acopio materiales y escombro y orden y aseo general.

Residente obra

Inspector Interventoría

24-08-23 Jueves

Clima: mañana: soleada tarde: soleado.

Personal obra:
1 Residente
1 Oficial ; 1 Ayudante.

Personal Interv:
1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con aplicación de boquilla en muros enchape tanto baño niñas preescolar como bachiller, se realiza desmonte de tubería eléctrica para aplicación de pintura epoxica en techos y remates en pintura zona ventanas en baño preescolar.

NOTA = SE REQUIERE A CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES EN LAS INTERVENCIONES REALIZADAS, LO ANTERIOR REFERENTE A REENGRUESE DE POLICUARZO INSTALADO; EN BAÑO NIÑAS PREESCOLAR AJUSTAR POLICUARZO SOBRE MESÓN EXISTENTE SIN DEJAR ESPACIOS VACIOS QUE PUEDAN PRESTARSE PARA DAÑOS EN ESTOS PUNTOS, ASI MISMO, REALIZAR LIMPIEZA DE SALPICADURAS DE PINTURA EN TUBERIA EXISTENTE ENCHAPE DE PISOS Y MUROS Y MUROS EN MAMPOSTERIA A LA VISTA, REALIZAR REMATES EN FILOS EN ESTUCO Y PINTURA Y SE REITERA SUBSANAR ACABADOS EN POLICUARZO, IGUALMENTE SE REQUIERE REALIZAR AJUSTES EN ENCHAPE DE PISO DESPORTILLADOS Y EN MAL ESTADO LO ANTERIOR DE PENDIENTE ENTREGA DE LOS MISMOS A SATISFACCIÓN CUMPLIENDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES.

Residente obra

Insp Interv.

25-8-23 Viernes.

Clima: mañana: soleada tarde: soleada

Personal obra: Personal Interventoría
1 Residente. 1 Inspector.
1 Oficial ; 1 Ayudante.
Equipo: Herramienta menor
Actividades: Se realiza instalación de enchape en muro baño traperos precolar, aplicación de pintura epóxica como remates y limpieza de pintura en tubería eléctrica.

Residente obra Ing Interv.

26/08/23 Sábado.
Clima: mañana: soleado tarde: soleado
Personal obra Personal Interv.
1 Residente. 1 Inspector
1 Oficial ; 1 Ayudante.
Equipo: H menor.
Actividades: Se continua con instalación de enchape y aplicación de boquilla en cuarto de aseo preescolar y remates en pintura epóxica.

Residente obra Ing Interv.

28/08/23 Lunes
Clima: mañana: soleada tarde: soleada.
Personal obra: Personal Interv.
1 Residente. 1 Inspector
1 Oficial ; 1 Ayudante.
Equipo: H. menor.
Actividades: Se continúa con remates en pintura en techos y muros, se realiza conexión de accesorios para lavamanos en baño de discapacitados se limpia tubería eléctrica y se inicia con instalación de lámparas en baños niños

Residente obra Ing Interv.

29/08/23 Martes
Clima: mañana: soleada tarde: soleada.

Personal obra: | Personal Interv:
1 Residente | 1 Inspector
1 Oficial ; 1 Ayudante
Equipo: H. menor
Actividades: Se realizan filos en marcos de puertas, remates de pintura en ventanas, techos y muros. y adecuación de sitios en lavamanos instalados. NOTA = SE REQUIERE A CONTRATISTA DE OBRA VERIFICAR ESTADO DE FUNCIONAMIENTO INSTALADOS, ENTREGAR Y REALIZAR ACABADOS CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES.

Residente obra | Catalina Inspinterv.

30/08/23 Miércoles
Clima: mañana: soleado | tarde: soleado.
Personal obra: | Personal Interv:
1 Residente | 1 Inspector.
1 Oficial ; 1 Ayudante.
Equipo: H. menor.
Actividades: Se realiza limpieza de salpicaduras de pintura en enchape, remates en pintura.

Residente obra | Catalina Inspinterv.

31/08/23 Jueves.
Clima: mañana: soleado | tarde: soleado
Personal obra | Personal Interv:
1 Residente | 1 Inspector
1 Oficial ; 1 Ayudante.
Equipo: H. menor
Actividades: Se realizan remates de boquilla y pintura en baño niñas bachiller.

Residente obra | Catalina Inspinterv.

01/09/23 Viernes
Clima: mañana: soleado | tarde: soleado
Personal obra | Personal Interv.
1 Residente; 1 oficial ; 1 Ayudante | 1 Inspector

Equipo: H menor
Actividades: Se realiza orden y aseo general, trasiego de material a punto de acopio.

Residente obra Supervisor Interventoría

02/09/23 Sábado
Clima: mañana: soleado
Personal obra. Personal Interv.
1 Residente.; 1 Oficial; 1 Ayudante 1 Inspector
Equipo: Herramienta menor
Actividades: Remates en filos, techos y muros en baño niñas bachiller.
NOTA = SE REQUIERE A CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES EN LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN CUANTO A LIMPIEZA DE SALPICADURAS DE PINTURA EN ENCHAPE, TUBERÍA ELÉCTRICA Y MUROS EN MAMPOSTERÍA Y ACABADOS GENERALES.

Residente obra Supervisor Interventoría

04/09/23 Lunes.
Clima: mañana: soleado tarde: nublado.
Personal Obra: Personal Interv:
1 Residente; 1 Oficial; 1 Maestro 1 Inspector
Equipo: H. menor
Actividades: Se continúan con remates en pintura, se realiza instalación de griferia para lavamanos baño niñas preescolar y un mesón de bachiller. NOTA = SE REITERA A CONTRATISTA REALIZAR REFORZAMIENTO Y ACABADOS DE MESÓN DE POLICUARTO CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES DE ACTIVIDAD Y MATERIAL.

Residente obra Supervisor Interventoría

05/09/23 Martes
Clima: mañana: soleado tarde: soleado
Personal obra Personal Interv
1 Residente 1 Inspector
1 Oficial; 1 Ayudantes. 1 SST.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realizo pulida de pisos, instalación de sanitarios y remates / acabados en estuco.

NOTA SST INTERVENTORÍA: DURANTE RECORRIDO POR FRENTE SE EVIDENCIA FALTA DE BOTIQUÍN, EXTINTOR, ROTULO Y ETIQUETADO DE QUÍMICOS. CORDIALMENTE YANIN HUERTAS SST INTERVENTORÍA.

Residente obra — Natalia Insp Interv.

06/09/23 Miércoles.

Clima: mañana: soleado — tarde: soleado.

Personal obra: 1 Residente. 1 Oficial, 1 Ayudantes

Personal Interv.: 1 Inspector.

Equipo: H. menor.

Actividades: Se continúa con destronque de pisos, remates en estuco y boquilla.

Residente obra — Natalia Insp Interv.

07/09/23 Jueves

Clima: mañana: soleado — tarde: soleado.

Personal obra: 1 Residente; 1 Oficial; 1 Ayudante.

Personal Interv.: 1 Inspector

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realiza instalación de divisiones en acero en baño niños preescolar. y se continúa con remates generales en pintura

Residente obr — Natalia Insp Interv.

08/09/23 Viernes.

Clima: mañana: soleada — tarde: nublada.

Personal obra: 1 Residente; 1 Oficial; 1 Ayudante.

Personal Interv.: 1 Inspector

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se realiza orden y aseo general, remates generales de pintura y estuco. NOTA= SE REITERA A CONTRATISTA DE OBRA

QUE PARA LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LAS ZONAS INTERVENIDAS SE REQUIERE REALIZAR LIMPIEZA DE SALPICADURAS DE PINTURA EN MUROS, EN MAMPOSTERÍA A LA VISTA, ENCHAPE Y TUBERÍA ELÉCTRICA.) ASÍ MISMO REALIZAR LOS CORRESPONDIENTES ACABADOS AL ELEMENTO INSTALADO.

Residente obra — Catalina Inspinten.

09/08/23 Sábado.
Clima: mañana: nublado
Personal obra: — Personal Interventoría
1 Residente; 1 oficial, 1 Ayudante — 1 Inspector.
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: Se realizan remates en pisos, filos, muros de ventanas y orden y aseo general de espacios.

Residente obra — Catalina Insp Inten.

11/08/23 Lunes
Clima: mañana: soleado — tarde: soleado.
Personal Obra: — Personal Inten:
1 Residente; 1 oficial; 1 Ayudante — 1 Inspector.
Equipo: Herramienta menor.
Actividadess: Se realiza destronque de piso en granito pulido baños preescolar y bachiller y remates en baño niñas bachiller en techos y muros

Residente obra — Catalina Insp Inten.

12/08/23 Martes
Clima: mañana: soleado — tarde: nublado
Personal obra: — Persona Inten
1 Residente; 1 oficial; 1 Ayudante. — 1 Inspector
Equipo: Herramienta menor.
Actividade: Se continúa con remates en baño niñas bachiller y instalación de accesorios (griferia en lavamanos

Residente obra — Catalina Insp Inten.

IED. SAN JOSÉ NORTE

10-08-2023 INSPECCIONES DE INSTALACIONES, FALTA DE CAPAS, USO DE INDUCCIÓN, OBRA Y HSEQ SE RECOMIENDA JORNADA DE OBRA Y HSEQ PARA REFORZAR LAS CONDICIONES Y ACTIVIDADES CONSTRUCCIONES LOS SIGUIENTES: PARED DE MUROS ESTRUCTURA, TECHOS VIGAS Y PISOS EN CUSTIERRAS PERSONAL EN OBRA 10 PERSONAS

CONTRATISTA

JAVIER CHAVEZ

20/08/23 Tiempo = Mañana y tarde = nublado

Personal operativo = Oficiales = 5 Ayudantes = 4

Herramientas = Maquinaria eléctrica de 7/2 bulto Herramienta y Herramientas menor.

Actividades = Vaciado de solidado de piso sin latex en la terraza de bajar.

* Levante de muros en Q1 (mampostería) en el aulas multiple.

* Friso de sobre muros en el aulas multiple.

* Aplicación de estuco en muros del aulas multiple.

Notas = se recomendo asegurar el suficiente declival del pendiente de la terraza, su correcta dosificación (2-3) y su correcto curados.

EDWIN NUÑEZ

Ing. Int.

21/08/23 Tiempo = mañana y tarde = nublado

Personal operativo = Oficiales = 5 Ayudantes = 3

Herramientas = maquinaria eléctrica pequeña y herram. menor

Actividades = * Levante de muros en mampostería

* Enchape de piso en el aulas multiple. * Friso de sobre columnas del aulas multiple.

* vaciado de solidado (terminado) en las terrazas del aulas multiple.

Recomendaciones = * Se solicita asegurar las dosificaciones (1:3) del solidado de la terraza del aulas multiple: adicionalmente del correcto curado para evitar futuras fisuras o filtros sobre el mismo

Nota 7: Se realiza acta de recibimiento de espacio en las aulas de bachillerato iniciando desde el aula nº 1 hasta el aula nº 10
Faltando por definir los espacios de aula de: Himno y salón de profesores para el día lunes 21/08/23. Se solicita tomar las medidas pertinentes para resguardar los elementos y accesorios cuando se desmonte la cubierta

EDWIN NUÑEZ
INSP. Int.

12/08/23 Tiempo: Mañana y tarde = nublado.
Personal operativo: oficiales: 5 Ayudantes 3
Herramientas: Mezcladoras de 1/2 bulto. y herramienta menor
Actividades: * Enchape de piso en el aula multiple.
* Vaciado de alistado de terraza del aula multiple.
* Pañete en el laboratorio.
* Armado de hierro para viga de confinamiento en cafetería
Nota: se recomienda realizarle ganchos de mínimo = 0.20 m para traslapar las 2 secciones de los muros donde se encuentra los 2 armados del refuerzo de cada muro.
* Se solicita tener el cuidado de guardar la alineación del enchape de piso del aula multiple; al igual que asegurar la adherencia de cada pieza de enchape de piso pegada en el aula multiple para evitar piezas "sacas"
* Se solicita hidratar el alistado de piso del aula multiple y de la terraza del aula multiple para evitar mayores fisuras o grietas

EDWIN NUÑEZ
INSP. Int.

14/08/23 Tiempo = mañana y tarde = nublados.
Personal operativo = Oficiales = 8 Ayudantes = 7
Herramienta = Andamios certificados.
Herramienta menor.
Actividades = * Pañete sobre muros en cafetería.
* Levante de muros en bloques.
* Enchape de piso en el aula multiple y estuco sobre muro

* Demolición de divisiones en las aulas en corredor de la etapa N° 2.
* Armado de andamio para el inicio del desmonte de la cubierta del circular del bloque de bachillerato

Nota = Se solicita continuar con el vaciado del alistado de las terrazas del aula multiple con una mezcladora de mayor capacidad para realizar un vaciado monolítico de mayor calidad; debido a que se evidencia el comportamiento del alistado de piso vaciado en varias fracciones con las mezcladoras pequeñas de 1/2 bulto se evidencian con fisuras por lo cual se solicita su correcto curado.

Adicionalmente se solicita asegurar que el anclaje de cielo instalado en el aula multiple guarde la alineación y una correcta adherencia del peyneer.

Además se solicita realizar los pañetes sobre muro de plomo y escuadra y teniendo en cuenta el levante correcto de las muros.

NOTA SE EVIDENCIA PERSONAL EN OBRA SIN USO DE LOS EPP SUMINISTRADOS SEGÚN CORRESPONDENTE AL MES PERO LA DOTACIÓN NO HA SIDO ENTREGADA A OBRA CONTRATISTA Y CORRESPONDE QUE LA EMPRESA A LOS TRABAJADORES EN OBRA DE LA MISMA PARA SU RESPECTIVA VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN. SE EXHORTA A LA EMPRESA TOMAR CORRECTIVOS EN ESTOS, Y USO DE EPP A PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO AL CAMPO DE PRACTICAS.

Cordialmente

Edwin Nuñez
Interventoría SST.

EDWIN NUÑEZ
I.S.E., Int.

15/08/23 Tiempo = mañana: nublado.

Personal operativo = oficiales: 8 Ayudantes: 7

Herramientas: andamio certificado y herramientas menor

Actividades: * Pañete en laboratorio y cafetería.
* Enchape de piso en el aula multiple. * Pañete en cuarto de sonido. * Estuco en el aula multiple. * Demolición de división sencilla en mediatejer de la etapa N° 2.
* Desmonte de cubierta de las aulas de bachillerato.

Nota: Debido al derelamo de los muros existentes el paquete queda de aproximadamente 0.04 m; lo cual debere verificarse porque no se instalo malla con vecos y el riesgo que este paquete pueda sufrir desprendimiento.

EDWIN NUÑEZ
INSP. INT.
16/08/23 Tiempo = Mañana y tarde = soleado.
Personal operativo: Oficiales: 6 y Ayudantes: 8
Herramientas = Herramientas menor. * Mezcladora de 1 bulto.
Actividades:
Enchape de piso en el aula multiple. * Desmonte de cubierta en las aulas de bachillerato. * Vaciado de alistado de piso (pendiente) en la terraza del aula multiple.
Nota: Se recomiendo el correcto vaciado y curado del alistado en la terraza del aula multiple; para evitar fisuras y grietas.

EDWIN NUÑEZ
INSP, INT.
22/08/23 tiempo = mañana y tarde = nublado.
Personal operativo: oficiales = 5 Ayudantes = 8 Instaladores: 4
Herramientas = Maquina elaboracion de cubierta.
Andamio certificado. Herramienta menor

Actividades: Instalacion de cubierta en las aulas de bachillerato * Continua instalación de enchape de piso en el aula multiple. * Paqete sobre muros en cafeteria.
* Demolición de enchape de enchape de piso en modulares de la etapa n° 2.

Observación = se evidencia que debido a las lluvias hubo afectación bajo cielo raso y bajo placa de entrepiso de las aulas: desde la n° 1 (9°1) hasta el aula n° 10 (11°1)

incluyendo el pasillo principal; estas afectaciones retrasa acumbo durante el proceso de instalación de la cubierta en las aulas de bachillerato; por la cual el costo de las reparación deberá ser asumida por el contratista de obra. # Se realizo poda de arboles para la instalación de cubierta en aulas de bachillerato.

EDWIN NUÑEZ
Insp. Int.

23/08/23 Tiempo = Mañana y tarde = soleada
Personal operativo = oficiales = 5 Ayudantes = 8 Instaladores = 4
Herramientas = Maquinas elaboración de techos. # Herramientas menor. # Andamios certificados.

Actividades = # Instalación de cubierta en aulas de bachillerato # Continúa instalación de encuentro de piso en el aula multiple. # levantado de muro en baños.

EDWIN NUÑEZ
Insp. Int.

25/08/23 Tiempo = Mañana y tarde = nublado.
Personal operativo = oficiales = 5, Ayudantes = 8, Instaladores = 8.
Herramienta = Maquinas elaboracion de techos. # Herramienta menor. # Andamio certificados.

Actividades: # Instalación de cubierta en aulas de bachillerato. # Continúa instalación de encuentro de piso en el aula multiple. # Pacete sobre muros en baños. # Picado de muro en muros de baños.
Nota = Se solicitó al contratista mejorar la logística de materiales y reforzar el personal operativo, asignando otra cuadrilla al area de cafeteria y biblioteca. # Retirar los techos desinstalados. # Mantener orden y aseo en la obra.

EDWIN NUÑEZ

Inf. Int.

[illegible] DE INTERVENTORIA, SE EVIDENCIA EN RECORRIDO EN OBRA DE LA MAÑANA PERSONAL EN OBRA VARIOS PERSONAS LA CUAL UNA DE ELLAS NO TIENE DOTACIÓN ENTREGADA A INTERVENTORIA, SE LE PREGUNTA A LA PERSONA DESDE HACE CUANTO ESTABA TRABAJANDO Y CONTESTA HACE DIAS. SE REVISA PERMISOS Y NO ESTAN COMPLETOS LOS FIRMAS DEL PERSONAL SEGUN CONTRATO VIGENTE, SE EVIDENCIA ENCERRAMIENTOS CAIDOS, SE EVIDENCIA RECORTES SOBRANTES DE MATERIALES EN DIFERENTES SECTORES DE LA OBRA SE EVIDENCIA RECORTES DE MADERA, RECORTES DE ANDAMIOS, RECORTES DE TELA VERDE, CANECAS, PCO, PERSONAL TRABAJANDO SIN CASCO REALIZANDO LA PREGUNTA POR QUE NO LO USAN Y CONTESTAN QUE HACE DIAS NO LES ENTREGAN. PERSONAL CON MAL Y SEÑALES ESTAN Y NO TIENEN NI UNA SEÑALIZACIÓN. SE RECOMIENDA HACER INSPECCIONES DIARIAS CON LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS Y SUS RESPECTIVOS CIERRES. YAMIN HERRERA SST. INTERVENTORIA.

28-08-23 INTERVENTORIA SST. SE REALIZA INSPECCIONES DE HALLAZGOS ENCONTRADOS EL DIA 25 LA CUAL NO SE EVIDENCIAN CIERRES EN OBRA. SE VERIFICA FORMATOS LA CUAL ESTAMOS COMPLETOS LAS FIRMAS DE TODOS LOS RESPONSABLES DEL PERMISO, CUENTA DE NUEVO ABIERTO HALLAZGOS ANTERIORES Y FALTA VARIOS OPERADORES CON TENER LA PLANILLA EN OBRA. SE RETIRAN 2. PERSONAS POR NO TENER DOCUMENTACIÓN COMPLETA A INTERVENTORIA. GUILLERMO VOLCANSIO CC 79896393 WILLIAM MARTINEZ 80330889. YAMIN HUERTAS.

28/08/23 (Mañana) * Tiempo = mañana y tarde = nublado

Personal operativo: Oficiales: 3 Ayudantes = 7

Inspectores = 3

Herramientas y Equipos = Herramientas menor.

Actividades:

* Pedestales sobre muros en bases. * Dados sobre muros en bibliotecas. * Estribos bajo placas y guardavía escalera nube multiple. * Remates de cubiertas en accesos de bachillerato.

2.


EDWIN NUÑEZ
INSP. INT.


30/08/2023

Observaciones

2 *Se aprueba diseño presentado, (concepto), por el contratista el cual contempla una excavación con desplante a 50 cm de profundidad zapatas de dimensiones 0,50 x 0,80 m y pedestal de 0,35 x 0,35 m, anclado a la excavación, se realiza placa de contrapiso de espesor 12 cm con refuerzo en malla electrosoldada. A continuación, se presenta esquema de lo mencionado.



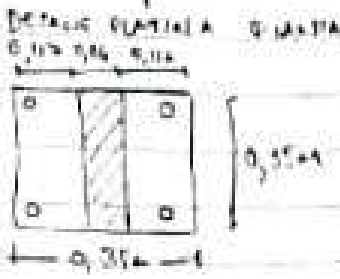

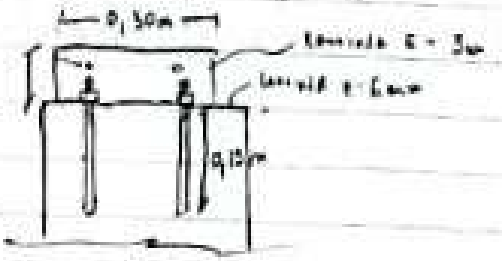

NOTA CONCRETOS PARA ESTRUCTURAS 210 KG/CM²
Y CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI

- El área de circulación de las aulas modulares (exteriores) debe quedar al nivel de las zonas internas.
- Las áreas de laboratorio deben quedar contiguas - Química y Biología para realizar conexiones hidrosanitarias, de gas Natural Constante.

En consideración a lo expuesto, se da cumplimiento a las especificaciones y directrices requeridas por la entidad cumpliendo con los criterios de los conceptos estructurales y geotécnicos de los especialistas; de entidad contratante, contratista de obra e interventoría; por lo tanto, se cumple con los parámetros para la implantación de aulas modulares.



Se realiza visita y recorrido al frente de obra por el componente SSTA de la interventoría, se evidencia inadecuada manipulación de los Residuos especiales y peligrosos (Tejas de asbesto), puesto que el personal para embalarlas las hace al piso de manera que puede quebrarlas para almacenarlas en bolsa. Al respecto se solicita en campo, detener la actividad de ruptura y establecer una alternativa por parte del Contratista, ya que, el área no se tiene acordonada a

: aislado del entorno y también porque al quebrarse se dispersa material particulado (polvo de asbesto). Por tanto, se hace necesario mejorar el proceso para embalar este tipo de residuo No obstante, se solicita la disposición de estos residuos peligrosos. Asimismo, se solicita gestionar el cronograma de los residuos RCD generados, ya que estos se disponen con el gestor autorizado Ulaterba

Nota adicional por parte de interventoría: se solicita realizar el embalaje de acuerdo a la especificación técnica de toda la cubierta (tejas en eternit - asbesto cemento) desmontadas en el corpo de dicha actividad. (Adicionalmente se deberán cumplir la norma ambiental para manipulación de dichas tejas.

2.

EDWIN NUÑEZ
INSP. INT.

30/08/23 Tiempo = mañana = nublada y tarde = soleada.
Personal operativo = oficiales = 5, Ayudantes = 9, Instaladores = 4.
Herramientas y equipo = Herramienta menor.
Actividades = * Pañete sobre muros en cafeteria.
* Resane y pintura en aulas afectadas en el bloque de bachillerato (capacitación bajo placa por aguas lluvias filtradas) esta actividad se desarrolla en el pasillo y aulas.
* Estuco bajo placa en el aula multiple. * Instalación de media caña en la terraza del aula multiple.

2

Nota = se recomendo aplicar agua en el lugar donde se instalo la media caña en la terraza del aula multiple : para evitar deshidratación de la misma

EDWIN NUÑEZ
INSP. INT.

01/09/23 Tiempo = mañana y tarde = nublada.
Personal operativo = maestro = 1, oficiales = 4. Ayudante: 1
Herramientas = equipo de soldadura. * Herramienta menor
Actividades = Excavación manual sobre talud común en modulares etapa 2. * Demolición placa de entrepiso en modulares etapa 2

* Instalación de enchape de muro en el baño de niñas.

Nota = Se recomendo (Ilse) Se solicita completar los subrasante del suelo de textura negra en los modulares etapas N° 2.

EDWIN NUÑEZ
INSP, INT.

05/09/23 clima = mañana nublada y tarde = nublado
Personal Operativo = oficiales = 6, Ayudantes = 6 Maestro = 1
Instaladores = 4.
Herramientas y Equipo = Rotomartillo y Herramientas menor
Actividades =
* Pared sobre muro en biblioteca
* Instalación de media caña en terraza del aula multiple.
* Enchape de muro en baños.
* Estuco en aula multiple.
* Demolición de alistado de piso y armado de hierro para los dados en modulares etapas N° 2.

EDWIN NUÑEZ
INSP, INT.

06/09/23 Clima = Mañana = nublada y tarde = nublado
Personal operativo = Maestro = 1, oficiales = 6, Ayudantes = 7
Instaladores = 4.

Herramientas y Equipo = Mezcladoras pequeñas y herramienta menor.
Actividades =
* Instalación de media caña en alrededor del aula multiple.
* Enchape de muros en baños.
* Estuco en el aula multiple.
* vaciado de primera capa de concreto pobre en el area externa del suelo de textura negra en modulares etapa no 2.

Powered by CamScanner

EDWIN NUÑEZ
INSP, INT.

08/09/23 clima: mañana: nublado. y tarde: soleado.
Personal operativo: Maestro: 1, oficiales: 6.
Ayudantes: 3, soldadores: 3.
Herramienta y Equipo: Mezcladora pequeña y herramienta menor.
Actividades:
* Enchape de muros en baños.
* Estuco en el aula multiple
* Excavación manual en cimentación de los modulares etapa nº 2.
* Armado de hierro para la nueva placa, en modulares etapa 2.
* Instalación de estructura metalica en laboratorios.
Nota: De acuerdo a la programación del vaciado del concreto de la placa de contrapiso, zapatas y pedestales de cimentación de los modulares etapa N° 2; se observa que los elementos mencionados anteriormente serán fundidos monoliticamente; lo cual no cumple lo pactado en bitacora con presencia delos SED, interventoria y contratista. el dia 30/08/23 en la pagina nº 96 desde los renglones nº 75 hasta la pagina nº 97 con renglon nº 27; por lo cual se le solicita urgentemente el nuevo concepto al contratista: para revisión y posteriormente aprobación; para la fundida de dicha placa, zapata, pedestal; dadas las condiciones contratistas de llegar a vaciar dicha placa de contrapiso, zapatas y pedestales; monoliticamente; sera responsable del comportamiento de la misma. Se le informo a recordo a contratista que dicho concreto entre pedestal y placa de contrapiso deberá quedar dilatado.

EDWIN NUÑEZ
INSP, INT

09:09/23 Clima: mañana = nublado y Tarde = nublado.
Personal Operativo: Pintor = 1, oficiales = 7.
Ayudantes = 5, Maestro = 1. Tecnico contratista = 0
Herramiental y Equipo
Mixeres, Vibrador, Herramientas menores
Equipo de acabado Chelicoptero!

Actividades! =
* Encofre de muros en basar.
* Pañete sobre fachada del aula multiple.
* Pintura sobre estructura metalica en laboratorio.
* Vaciado de concreto monolitico; en la placa de contrapiso, zapatas y pedestales de los modulares etapa N°2.

Nota = Se evidencia que se realiza el vaciado de la placa de contrapiso, zapatas de cimentacion y pedestales monolitticamente, dicho vaciado de este concreto se realiza con vehiculos (mixes), se utilito vibrador y el'cepteto para mejorar el acabado final de la placa. Se solicita la correcta finalizacion del acabado de la placa de contrapiso, los correctos cortes de contraccion puntualmente despues de 24 horas, el correcto curado para evitar posibles: Fisuras o grietas futuras.

Concreto Premezclado de: 3500 (PSI) Acelerado a 7 dias
Asentamiento: 6" (+-1)
Concreteras: concremovil. Inicio fundida: a 6:30 A.M.
Fin fundida: 11:15. A.M.

EDWIN NUÑEZ
Ensp, Int.

11/09/23 Clima: mañana: soleada y tarde: nublado
Personal operativo: oficiales = 6 ayudantes = 8.
instaladores de cubierta = 4

Herramienta y equipo =

REPÚBLICA DE PANAMÁ

Personal de obra: Inspector tecnico.
1 Oficial
Residente de obra
Director de obra.
Inspector interventoria.
Supervicion.

Equipo y herramienta: Herramento de caja menor.

Actividades: Se continuan actividades de pañete de muro divisorio.

Nota: Se recibio visita del ara. Juan Alejandro Carlos. Por parte de la SED. Para definir y ultimar detalles del cambio del diseño de cocina modular donde se encuentra dentro de esos cambios la modificacion de la ventana de aluminio nuevo recien instalada se hará el cambio por puerta y se hará el desmonte de la misma para ser entregada directamente a ellos y les sea de utilidad en otro colegio, adicional se hara demolicion de baldosa en granito del area de cocina para instalaciones sanitarias, y Contramarcos de Placa en area de cocina y Comedor.

11-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lluvias 10 a 10:30 a.m. y llovizna

Tarde: Nublado

Personal obra: oficial (2)

Personal interventoria: Inspector tecnico

Equipos y herramientas: Andamio tubular

Herramienta menor

Actividades: instalacion de enchape pañete muro construccion existente.

12-08-2023 Estado del clima: Mañana:

Tarde:

Personal obra: Inspector tecnico

oficial (2)

Equipos y herramientas: Andamio tubular

Herramienta menor

Actividades: fundida columneta muro separacion baño pañete en muro

14-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado
Personal Obra: Inspector tecnico
Oficial (1)
Personal interventoria: inspector tecnico
Equipos y herramientas: Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Instalacion de ladrillo de muro perimetral
Nota: se evidencia poco personal en obra

Inspector interventoria:

15/08/2023 Estado del clima: Mañana: Soleado
Tarde: Nublado.
Personal de obra: inspector tecnico.
1 Oficial
2 Ayudantes.
Equipos y herramientas: Andamio tubular.
Retomartillo.
Herramienta menor.
Actividades: Corte de muro cocina para vano de puerta de ingreso, demolicion de enchape de piso area cocina e instalacion de muro ladrillo en muro perimetral exterior.

Inspector. Inspector.

16-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado.
Tarde: Nublado.
Personal Obra: Inspector técnico
Oficial (2)
Equipos y herramientas: Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Demolicion piso cocina.
Corte apoyo entrada cocina

Maestro. Inspector interventoria

17-08-2023 Estado del clima: Mañana: soleado

Tarde: soleado.
Personal obra: oficial (2)
Personal interventoria: inspector tecnico
Equipos y herramientas: Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Instalación muro en bloque en ventana existente.
Instalación de pañete viga
Nota: se sintio fuerte temblor a las 12:09pm y 12:12 pm.

Inspector tecnico. Interventora.

8/08/2023 Estado del clima: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Personal de obra: inspector tecnico
Oficial (2)
Equipos y herramientas: Andamio tubular
Herramienta menor.
Actividades: terminacion muro en bloque e inicio de pañete de muro, Pañete de viga lado exterior cocina y alistado de piso area almacenamiento de deportes.

Interventora. Inspector tecnico.

9/08/2023. Estado del Clima: Mañana: soleado
Tarde: Soleado.
Personal de obra: inspector tecnico.
Oficial (2).
Equipos y herramientas: Andamio tubular
Herramienta menor.
Actividades: Afinado de pañete muro fachada, terminacion pañete viga muro exterior cocina.

Interventora. Inspector tecnico.

10-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado.
Personal obra: Inspector tecnico
oficial
Personal interventoria: inspector tecnico
Equipos y herramientas: Andamio tubular

Actividad: Armado pañete muro perimetral.

23-08-23 SE ENCONTRO EN EXCELENTE ESTADO EL BAÑO Y PERSONAL SOLO EJECUTANDO ACTIVIDADES HAY ESCOMBRO POCO POCO ESTA PRESENTE COMPLETAR CON OTROS COLEGIOS QUE TIENEN POCO, LOS PERMISOS NO ESTAN DILIGENCIADOS Y NO SE ENCONTRO PERSONAL SST. QUE PASARON A REALIZAR SOCIALIZACIÓN EL DIA DE MAÑANA.

Estado del clima: Mañana: soleado

Tarde: soleado.

Personal obra: Inspector técnico.

Oficial: (1)

Personal interventoria: Inspector sst

Equipos y herramientas: Andamio tubular.

Herramienta menor

Actividades: pañete en columna y armado pañete muro perimetral.

24-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado

Tarde: soleado.

Personal obra: oficial (1)

Personal interventoria: Inspector tecnico

Equipos y herramientas: Andamio tubular.

Herramienta menor

Actividad: pañete muro perimetral.

25-08-2023. Estado del clima: Mañana: Soleado

Tarde: Nublado.

Personal en obra: Oficial 1

Inspector tecnico.

Equipos y herramientas: Andamio tubular

Herramient menor

Actividades: Afinado Pañete Perimetral
26/08/2023. Estado del clima: Mañana: soleado.
Tarde: soleado.
Personal en obra: Oficial 1
Inspector de obra Tecnico.
Herramientas y equipos: Andamio tubular
Herramienta menor.
Actividades: Finalizacion Pañete Perimetral

28.08.2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado
Personal obra: oficial (1)
Personal interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: Andamio tubular
Herramienta menor.
Actividad: No se evidencia novedad ocurrida.

29-08-2023 Estado del clima: Mañana Soleado.
Tarde: Nublado.
Personal de obra: Oficial (2)
Inspector tecnico.
Equipos y herramientas: Andamio tubular
Herramienta menor.
Actividades: inicio de actividades de enchape de Piso ganto en area de almacenamiento de deportes e inicio de estuco en almacenamiento de deportes.

30-08-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: soleado
Personal obra: oficial (2)
Personal interventoria: Inspector tecnico
Equipos y herramientas: Andamio tubular
Herramienta menor
Actividades: Estuco en muro oficinas

Instalación de bloque muros para baño.

31-08-23 SE REALIZA INSPECCION DE INTERVENTORIA SE EVIDENCIA FORMATOS CON NOMBRE EN ASISTENCIA A CAPACITA CON EL NOMBRE DE COLEGIO QUE NO ES EL ACTUAL REALIZAR DOCUMENTACION BIEN PODER DEJAR LOS CONTRATADORES, NO SE EVIDENCIA SEGUIMIENTO EN HORAS DE LA MAÑANA DE PERSONAL SST. YANNIN HERRERA

Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado.

Personal de obra: 1 oficial
1 inspector tecnico.

Personal de service omega: 2 oficiales.

Equipos y herramentas: Andamio tubular.
Polidora
Herramienta menor.

Actividades: levantamiento de muros en mampostería bloque No 4. en area de cocina, se continua con actividades de estuco y Pintura area de almacenamiento de deportes, y se continua actividades de instalacion de red de gas area cocina.

1-09-2023 Estado del clima: Mañana: soleado.
Tarde:

Personal de obra: 1 oficial
1 inspector tecnico.

Equipos y herramentas: Andamio tubular.
Polidora.
Herramienta menor.

Actividades: Enchape de piso granito en area de almacenamiento de deportes, se continua actividades de levantamiento de muros en area de cocina.

Interventoria: se realiza visita y recorrido obra se evidencia la actividad de estuco y pintura en mal diseño

2/09/2023 Estado del clima: Mañana: Nublado.
Tarde: Soleado.
Personal de obra: 1 oficial
1 inspector tecnico.
Personal de omega service: 2 oficiales.
Equipo y herramientas: Andamio tubular.
Polidora.
Herramienta menor.
Actividades: Se continua actividad de levantamiento de muros en area de cocina y se termino actividad de estuco y Pintura en area de almacenamiento de depositos. Se continua actividad de instalacion de red de gas. cocina.

1/09/2023 Estado del clima: Mañana: Soleado
Tarde: Nublado.
Personal de obra: 1 oficial
1 inspector tecnico.
Personal de omega service: 2 oficiales.
Equipos y herramientas: Andamio tubular.
Polidora.
Tajarca.
Herramienta menor.
Actividades: Se continua actividad de levantamiento de muros en area de cocina. y se continua actividad de instalacion de red de gas en area cocina.

5/09/2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado.
Personal de obra: 1 oficial
1 inspector tecnico
Personal de omega service: 2 oficiales
Equipos y herramientas: Andamio tubular.
Polidora
Herramienta menor.
Actividades: se continua actividad de levantamiento de muros en bloque area cocina. y red de gas

06-09-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado
Personal obra: Director
Residente
Inspector tecnico
Oficial (1)
Personal intervertoria: Director
Coordinador
Residente
Inspector tecnico
Equipo y herramienta: Herramienta menor
Actividades: Instalación de bloque muro
baño y cocina.
Nota: se realiza comite de obra nº 34 con la participación del personal de la SED, contratista e interventoria en el mismo se hace recorrido por la obra

07/09/2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado.
Personal de obra: Oficial (2)
Inspector tecnico.
Personal omega service: (2) Oficiales.
Equipos y herramientas: Andamio tabular
Polidora
Herramienta menor.
Actividades: demolicion de muro divisorio para vano de puerta de acceso a Almacenamiento de secos por cambio de diseño por parte de la SED. Se continua actividades de levantamiento de muro en bloque arco cocina. Inspector.

08/09/2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: soleado.
Personal de obra: Oficial (2)
Inspector tecnico.
Equipos y herramientas: Andamio tabular
Herramienta menor

Actividades: Levantamiento de muro en bloque para dividir area de almacenamiento de cerveza y almacenamiento de secos. Se inicia actividades de pañete en muro de cocina.

30/08/2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado.
Personal de obra: Oficial (1).
Inspector tecnico.
Equipo y herramientas: Andamio tubular.
Herramienta menor.
Actividades: Se continua con actividades de pañete de muro en area de cocina.

31/08/2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado.
Personal de obra: Oficial (2).
Inspector de obra
Equipo y herramientas: Andamio tubular.
Herramienta menor.
Actividades: Se continua actividades de pañete en area de cocina y se realiza replanteo de cimentaciones para area de cocina modular y comedor.

Interventoria: se realiza recorrido por obra evidenciando actividad de pañete en muros

Norma

Powered by CamScanner

IED SIMÓN BOLÍVAR

23/08/23 Estado del tiempo = mañana y tarde = soleada
Personal de obra = 1 oficial y ayudante
Equipo = Herramienta menor.
Actividades = Secuencia de demolición de alistado, encofrado y placa de contrapiso en el aula de matemáticas y ciencias

EDWIN NUÑEZ
Insp. Int.

24/08/23 Personal operativo = Ayudantes=2 1 Residente de obra.
Equipo = Herramienta menor.
Actividades
Continúa demolición de alistado, encofrado y placa de contrapiso en el aula de música y danza.

EDWIN NUÑEZ
Insp. Int.

29/08/23 Tiempo = mañana = nublado y tarde = nublado.
Personal de obra = oficiales = 1 ayudantes = 1

Equipos =
Equipo de soldadura y herramienta menor.
Actividades
* Pintura sobre estructura metálica de la cubierta.
* Aplicación de soldadura sobre la estructura metálica de la cubierta.

EDWIN NUÑEZ
Insp. Int.

31/08/23 Tiempo = mañana y tarde = nublado.
Personal operativo = oficiales = 1 ayudantes = 3
Equipos = Herramienta menor.
Actividades = * Excavación manual en el aula de Biblioteca
* Retiro de escombro del aula de música y danza
Nota: Implementación SST. Faltó capacitación, EPP apropiado de acuerdo Botas, Guantes, Gasco, y recalcamos de botar escombro.

EDWIN NUÑEZ — Supervisor — Firma
Insp. Int — Fiscalizador SSE.

14/08/23 Tiempo = mañana y tarde = nublado.
Personal operativo = Oficiales = 2. Ayudantes = 2.

Equipos:
Herramientas menor.
Actividades = Excavación manual en el patio de bibliotecas e ingreso de la cubierta

EDWIN NUÑEZ
Insp. Int.

15/16/08/23 Tiempo: Mañana Soleado Tarde: Soleado

Personal en Obra
* 1 oficial
* 3 ayudantes
* 1 Residente de obra

Equipo
- Herramienta Menor
* Se Continua Excavacion de Area de Biblioteca Almacen y Deposito a 0.80 cm
Se Continua Trabajo de Dia a 8am de ocupio

Residente de obra

16-08-23 Inspeccion de fiscalizadora SSE. se evidencia de nuevo continua colocando la cual se dejo un compromiso de mantener cercado segun volantes y ya estan de nuevo colocando los 2 trabajadores nocturnos continuando casos, y botas para la seguridad.

Con [illegible] Edificando, Actividades Observaciones
Sobre Excavación AUS.
Coordinador
Yovin Nuñez
Interventoria.

13/08/23 Tiempo: Mañana y tarde: soleado.
Personal operativo: 2 Ayudantes
Equipo: herramienta menor.
Actividades: Excavación manual en el cuadro de biblioteca.
Area de Almacen y Deposito a 0.20m Ancho Recho completado
EDWIN NUÑEZ
EASE, Int.

21-08-23 Inspección de Interventoria SST se Evaluan Actividades de Excavación, Socavación, En Horizontal y Vertical Firmes Charla del Tema del día Recomendaciones y Equipos Seguimiento del uso de los E.P.P. Incumplimiento Quimicos Pendientes. y Tener Hojas de Seguridad. Cantidad de Personal (3) Hay 2 of.
Yovin Nuñez
Interventoria.

23/08/23 Estado del tiempo: Mañana: Soleado tarde: Soleado
Personal en obra * Personal Interventoria:
- Oficial 1
- Ayudante 1
- Maestro 1
- Residente 1
- Veterinario Yovin Nuñez: Solicita Peticion
* Se Continua Excavación Manual de Ancho de Recho Completado de 0.20m
* Solicitan en Estructura para Area de Biblioteca Almacen y Deposito Piden la Estructura para Colocar
* Retiro de Escombros 3 Viajes.
* Edwin Nuñez, Ease. Int.

Residente obra

EDWIN NUÑEZ
Inge. Int.

24/08/23 Estado del tiempo: Mañana Soleado
Tarde: Soleado

* Oficial 1 * Personal Intervenido
* Ayudante 1
* Residente 1

- Herramienta menor Maquinaria: Soldadora, Retroexcavadora
- Se Continua Excavación en área de Zapatas de 0.20 m

- Se realiza chuzeado de cobertura en Area de almacen y Deposito y se Inicia Colocación de la Estructura. Nueva para Cobertura.

- Se Inicia Demolición de tejas de asbesto cemento y Ruptura de columnas para disposición final.

Residente de obra

28/08/23 Estado del tiempo Mañana Soleado
Tarde: Soleado

* Oficial 1
* Ayudante 1
* Residente 1

- Herramienta Menor Maquinaria: Soldadora, Retroexcavadora
- Se Continua Excavación en Area de Zapatas

- Se Continua demolición de Cobertura Existente de asbesto Cemento.

Powered by CamScanner

* Se Continua Colocacion de Estructura metálica en Area de Almacen

* Llegada de Cubierta Metalica para Area de Almacen, Deposito, Duchas, Biblioteca

Residente de Obra

26/08/2023 Estado del Tiempo: Mañana Soleado
Turno: Noche

Herramienta Menor: Maquinaria Soldadora 2

* Oficial 1 Personal de Instalaciones
* Ayudante 1
* Residente 1

* Se Continua con Excavacion de Estructura existente y Colocacion de la nueva Estructura para Cubierta

Residente de Obra

28/08/2023 Estado del Tiempo: Mañana: Soleado
Turno:

Herramienta Menor: Maquinaria y equipos: Soldadora y Pulidora

* Oficial 1 Personal de Instalaciones
* Ayudante 2
* Residente de Obra 1

* Se Continua Armado de Cubierta existente en Area de Biblioteca y Armado de Estructura Electrica

- Se retira, coloca con y solda... de estan... area Biblioteca.

NTA INSPECCION DE ALTURA SST SE EVIDENCIA PERSONAL EN EJECUCION DE DESMONTE DE TEJADO SIN FIRMAR PERMISO/ IN CUMPLIENDO EL SUPERVISOR SST CONTRATISTA KS HALL A HALLAZGO AL CONTRATISTA Y LO PONE AL DIA, SE VERIFICA DOCUMENTACION DEL PERSONAL ACTUAL Y NO SE EVIDENCIA DOCUMENTACION DEL SEÑOR OSMAR STEVEN SERRANO CASTILLO CC 1168596868 Y SOLICITO AL SSOCIAL CAUSAS PENDIENTE PARAS SIGUEF DE MEJORAR HALLAZGOS CUMPLIDOS SIN FORMULADO. Y ORDEN Y ASEO.

YANNIS MARTINEZ
INSPECCION SST

28/08/23 Estado del tiempo = mañana = y tarde = nublado.
Personal operativo = Ayudantes = 3.

Herramientas y equipo = Herramienta menor
Actividades: * Desmonte de cubierta en la biblioteca.
* Desmonte de parte electrica. * Instalacion de estructura metalica en la cubierta de biblioteca.

EDWIN NUÑEZ
INSP. INT.

29/08/23 Tiempo = mañana = nublada y tarde = nublada
Personal operativo = 3 ayudantes.
Herramientas y equipo = Herramientas menor.
Actividades:
A
* Desmonte de cielo raso en madera en el aula de danza.
* Empalcamiento de la cubierta fracturada (laminas o pedazos de laminas fracturadas se empacan en costales.)
Nota: = Se recomienda el uso de tapabocas para el empacamiento de los pedazos de laminas fracturadas de la cubierta; debido a que pueden causar enfermedad peligrosa

EDWIN NUÑEZ
Inc p. Int.

31/08/23 Tiempo = mañana y tarde = nublado.
Personal operativo = oficiales = 1 Ayudante = 3
Herramienta y equipo = Pulidora, Equipo de soldadura y
Equipo de soldadura.
Actividades =
Ejecución manual en aulas de docencia # Instalación de la
estructura metalica de la cubierta en área de biblioteca.

EDWIN NUÑEZ
Insp, Int.

02/09/23 Tiempo = Mañana = soleado.
Personal operativo = Oficiales = 1 Ayudantes = 3
Herramientas y equipo = Herramienta menor.
Actividades =
Ejecución manual sobre techo en el aulas de docencia.
Orden y aseo en el aulas de biblioteca.

EDWIN NUÑEZ
Insp, Int.

04/09/23 Tiempo = mañana y tarde = Nublado.
Personal Operativo = Oficiales = 1. Ayudantes = 3
Herramientas y equipo = Equipo de soldadura y Herramienta
menor.
Actividades =
Instalación de estructura metalicas en biblioteca
Notas = se solicita el uso de cinturon de seguridad para los trabaja-
dores en altura.

EDWIN NUÑEZ
INSP, Int.

Powered by CamScanner

05/09/23 Tiempo: Mañana: Jubilo Turno: Nocturno

Personal operativo: Personal de Intervención

Oficiales: 1
Ayudante: 1
Residente: 1

Actividades:
Instalación de estructura Arco Biblioteca y Plantas en L mismo

Notas: Se solicitó proteger la pintura de Simon Bolivar en el muro ubicado occidental de biblioteca, al igual que reforzar el personal operativo.

EDWIN NUÑEZ
INSP. INT.

07-09-2023 El efectivo recibido del personal entrante SGT. SE PRESENTA (NOMBRES) TRABAJOS (CON 3 SECCIONES MAYORES CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EN LA PUBLICACIÓN DE LA CIRCULAR DE SSF PARA GENERANTE LA POLITICA DE NO TRABAJO DE PUBLICACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN COLEGIO RECORDAR EL USO DE LOS EPP COMPLETOS EN TODO Y EL ORDEN Y ASEO EN HORAS DE TRABAJO Y COMPARTIMIENTO) SIN NOVEDAD

09/09/2023 Tiempo: Mañana: Soleado

Personal operativo: Personal de Intervención

Oficiales: 2
Ayudante: 2
Residente: 1

Actividades
Se continua en Instalacion de estructura de
soleras para Closet en area de Biblioteca

- Se Realiza aseo de areas completas tipo
Biblioteca como area de Pinturas
Continua instalacion de estructuras metalicas en techos en cubierta de
biblioteca y aseo y limpieza
2 oficiales y 2 ayudantes

EDWIN NUÑEZ
INF. INT.

08/09/23 Tiempo = mañana y tarde = nublado.
Personal operativo = 1 oficial y 3 ayudantes
Herramiental y equipo = Equipo de soldadura, Pulidoras
y Herramienta menor. Compresor de Aire
Actividades =
Instalacion de estructuras metalicas en bibliotecas.
y Remate de pintura estructura por soldadura y
Pulido.

EDWIN NUÑEZ
INF. INT.

12/09/23 Tiempo = mañana = Soleado y tarde = soleado.
Personal operativo = 1 oficial y 2 ayudantes
Herramientas y equipo = Herramienta menor.
Actividades
Pintura sobre estructuras metalicas en bibliotecas.
Notas = Se solicita reportar el personal operativo para
poder aumentar el avance de obra.

EDWIN NUÑEZ
INF. INT.

Powered by CamScanner

Anexo 3. INFORME SSTA

GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 901.383.717-3

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JORGE GOMEZ FALLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.007.216 de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal de **GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT. 901.383.717-3, certifico que durante los últimos seis (06) meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los quince (15) día del mes de septiembre de 2023

JORGE GOMEZ FALLA
C.C. 72.007.216

Yo, **EDISON ALEJANDRO CARDONA RODRIGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.073.323.194 de Puerto Salgar, Cundinamarca, y con Tarjeta Profesional No. 229728-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT. 901.383.717-3, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las NIAS: Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, certifico que durante los últimos seis (06) meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2 002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los quince (15) día del mes de septiembre de 2023

EDISON ALEJANDRO CARDONA RODRIGUEZ
Cc.1.073.323.194
T.P. 229728-T

GNG PROYECTOS SAS BIC
NIT. 901477828-7

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JORGE GOMEZ FALLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.007.216 de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal Suplente de **GNG PROYECTOS S.A.S. B.I.C** identificada con Nit. 901477828-7, certifico que durante los últimos seis (06) meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de septiembre de 2023.

FIRMA_____
JORGE GOMEZ FALLA
C.C. 72.007.216

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ANTONIO RAFAEL GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 72227511de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 identificado con NIT No.901649961-8, certifico que durante los últimos seis (06) meses correspondientes la empresa ha realizado los pagos correspondientes a las obligaciones laborales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscal exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2023.

_____

Firma del Representante Legal.
ANTONIO RAFAEL GONZALEZ
C.C. 72227511 de Barranquilla
Representante legal

Bogotá, 15 de agosto de 2023

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 CERTIFICA QUE:

Para El Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077642 De 2022, “Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo”, se evidencia la correcta implementación de medidas para la protección de los sumideros.

En constancia, se firma por solicitud del interesado, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2023.

FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR
Director de Interventoría

Elaboro: MMGR
Reviso: MAGR - FGRS
Aprobó: ARGF - FGRS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE MUJERES VINCULADAS DECRETO DISTRITAL 332 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020.

Yo, **ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 72227511 de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 identificado con NIT No.901649961-8, certifico bajo gravedad de juramento que durante los últimos ocho (8) meses, se ha dado cumplimiento al porcentaje de mujeres vinculadas de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Distrito, mediante el cual se promueve la participación de las mujeres.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre de 2020 y de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2023.



Firma del Representante Legal.
ANTONIO RAFAEL GONZALEZ
C.C. 72227511 de Barranquilla
Representante legal



Firma del Revisor fiscal.
EDISON ALEJANDRO CARDONA RODRIGUEZ
C.C. 1.073.328.194 de Puerta Salgar, Cundinamarca
IT 229728-t

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022



"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022

INFORME MENSUAL SSTA DE INTERVENTORÍA No. 08

PERIODO DE EJECUCIÓN:
11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VERSIÓN 0
ORIGINAL

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El ORIGINAL del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación:

DEPENDENCIA	No DE COPIAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO a través del supervisor Arq. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA – Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED.	Original
Biblioteca del Proyecto	1

Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas para proceder a realizar sus modificaciones pertinentes.

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Índice Revisión	Capítulo Modificado	Fecha de Modificación	Observaciones
0	N/A	N/A	VERSIÓN ORIGINAL

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN




Titulo Documento		**INFORME MENSUAL SSTA DE INTERVENTORÍA No. 08**		
Revisión		**0**	**1**	**2**
Responsable elaboración	Nombre	Ing. Mónica Marcela de los Ángeles Gómez Rodríguez		
	Firma			
	Fecha	11 de septiembre de 2023		
Responsable revisión	Nombre	Ing. Manuel Antonio González Romero		
	Firma			
	Fecha	11 de septiembre de 2023		
Responsable aprobación	Nombre	Arq. Fredy Giovanni Rodríguez Salazar		
	Firma			
	Fecha	12 de septiembre de 2023		

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 2
ÍNDICE DE MODIFICACIONES 2
ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 2
1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS. 5
3. GESTIÓN DOCUMENTAL 5
4. COMPONENTE AMBIENTAL 8
4.1. MANEJO DE CAMPAMENTO 8
4.2. MANEJO DE RESIDUOS 9
4.3. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 10
4.4. MANEJO DE AGUA 11
4.5. MANEJO DE PAISAJE, FLORA Y FAUNA 12
4.6. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 13
4.7. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 14
4.8. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 15
4.9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 18
4.10. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA 18
4.11. CAPACITACIONES AMBIENTALES 19
4.12. INSPECCIONES AMBIENTALES 19
4.13. CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA 19
5. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 21
5.1. AFILIACIONES Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 21
5.2. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 21
5.3. INDUCCIONES 22
5.4. MEDICINA PREVENTIVA Y LABORAL 22
5.5. HIGIENE INDUSTRIAL 22
5.6. ACTIVIDADES EN EL TRABAJO 23
5.6.1. Actividades realizadas en el transcurso del periodo 23
5.6.2. Brigada de emergencias 24

5.6.3. Accidentes de trabajo 24
5.6.4. Capacitaciones SST 24
5.6.5. Inspección SST 27
5.7. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 32
5.8. PERSONAL INTERVENTORÍA 33
6. CONCLUSIONES 35
7. ANEXOS 36

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED, puso a disposición de los interesados el Proceso de Contratación No. SED-LPDCCEE-039-2022 para la selección del Contratista encargado de ejecutar el Contrato de obra pública para "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.", la cual fue adjudicada a la firma SAFRID INGENIERÍA SAS con NIT. No.900.520.848-4, representado legalmente por MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA identificado con cédula de ciudadanía No.1.081.774.968, dando origen al Contrato No CO1.PCCNTR.4077642 de 06 de octubre de 2022, el cual fue firmado el día 06 de diciembre de 2022; con un valor de **TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 13.954.280.882)** incluido AIU. El plazo total previsto para la ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, la cual se firmó el día 11 de enero de 2022.

Por tanto, el informe mensual de interventoría No. 8 presenta un resumen de las actividades realizadas por el contratista y la interventoría, correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de agosto al 10 de septiembre de 2023.

2. OBJETIVOS.

- ✓ Informar las actividades del contratista SAFRID INGENIERÍA SAS desde el componente SSTA.
- ✓ Presentar las acciones de gestión realizadas por la interventoría de Inter Colegios 2022 desde el componente SSTA.

3. GESTIÓN DOCUMENTAL

En el periodo se presentó la siguiente trazabilidad documental:

Oficio	Consecutivo Oficio	Fecha	Dirigido A	Asunto
1	CIC_BTA_SED_050_2022_366	11/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal Tv. 21 Bis N° 59-57, Bogotá D.C.	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ALTO RIESGO.

Oficio	Consecutivo Oficio	Fecha	Dirigido A	Asunto
2	CIC_BTA_SED_050_2022_367	11/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	RESPUESTA OFICIO No. 337-GP2-SED-2022 - DOCUMENTACIÓN PERSONAL IED JORGE ELIECER GAITAN, RAFAEL BERNAL SEDE A Y FRANCISCO JOSE DE CALDAS.
3	CIC_BTA_SED_050_2022_368	11/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	SOLICITUD SUSPENSIÓN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO EN HORARIO NOCTURNO I.E.D. RAFAEL JIMENEZ BERNAL SEDE A
4	CIC_BTA_SED_050_2022_369	14/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	REITERACIÓN SUBSANACIÓN OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES NUMERO 5 Y 6 COMPONENTE SST.
5	CIC_BTA_SED_050_2022_370	14/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal	REITERACIÓN SUBSANACIÓN OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES NUMERO 4, 5 Y 6 COMPONENTE AMBIENTAL.
6	CIC_BTA_SED_050_2022_372	15/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	RESPUESTA OFICIO No. 344-GP2-SED-2022 - DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL PARA INGRESO EN EL IED SAN JOSE NORTE.
7	CIC_BTA_SED_050_2022_376	7/09/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	SOLICITUD ENTREGA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERIODO LIQUIDADO JULIO DE 2023.
8	CIC_BTA_SED_050_2022_377	7/09/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	RESPUESTA OFICIO No. 342-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE INFORME SST N 7 CORRESPONDIENTE A PERIODO DE JULIO.
9	CIC_BTA_SED_050_2022_380	23/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	LLAMADO DE ATENCIÓN COMPONENTE SST.
10	CIC_BTA_SED_050_2022_385	25/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	RESPUESTA COMUNICADOS No. 354-GP2-SED-2022 Y 356-GP2-SED-2022.
11	CIC_BTA_SED_050_2022_386	25/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	RESPUESTA COMUNICADO No. 357-GP2-SED-2022.
12	CIC_BTA_SED_050_2022_390	28/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	RESPUESTA OFICIO No. 355-GP2-SED-2022 - ACLARACIÓN LLAMADO DE ATENCIÓN Y MESA DE TRABAJO.

Oficio	Consecutivo Oficio	Fecha	Dirigido A	Asunto
13	CIC_BTA_SED_050_2022_391	28/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	REITERACIÓN FECHAS DE CORTE PARA ENTREGA DE INFORMES MENSUALES COMPONENTE SSTA
14	CIC_BTA_SED_050_2022_392	28/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	LLAMADO DE ATENCIÓN POR INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO POR PARTE DE INTERVENTORÍA
15	CIC_BTA_SED_050_2022_398	31/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	RESPUESTA COMUNICADOS No. No. 362-GP2-SED-2022 Y 363-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL PARA INGRESO DE PERSONAL
16	CIC_BTA_SED_050_2022_399	30/08/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	LLAMADO DE ATENCIÓN POR INADECUADO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN I.E.D. SAN JOSE NORTE
17	CIC_BTA_SED_050_2022_405	01/09/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	RESPUESTA COMUNICADOS No. No. 360-GP2-SED-2022 Y 372-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL
18	CIC_BTA_SED_050_2022_406	01/09/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN POR INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO POR PARTE DE INTERVENTORÍA
19	CIC_BTA_SED_050_2022_423	04/09/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	RESPUESTA COMUNICADOS No. 377-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL IED FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y SIMON BOLIVAR
20	CIC_BTA_SED_050_2022_424	04/09/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	RESPUESTA COMUNICADO No. 374-GP2-SED-2022 - REMISIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME SST N4, INFORME SST N5, INFORME SST N6.
21	CIC_BTA_SED_050_2022_426	07/09/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	RESPUESTA COMUNICADOS No. 370-GP2-SED-2022, 375-GP2-SED-2022 Y 380-GP2-SED-2022- RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORMES AMBIENTALES DEL 2 AL 5.
22	CIC_BTA_SED_050_2022_431	04/09/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 376-GP2-SED-2022.

Oficio	Consecutivo Oficio	Fecha	Dirigido A	Asunto
			MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	
23	CIC_BTA_SED_050_2022_433	07/09/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN POR INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO A I.E.D. RAFAEL BERNAL SEDE B
24	CIC_BTA_SED_050_2022_434	07/09/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	RESPUESTA OFICIO No. 371-GP2-SED-2022 - REMISIÓN CURSOS DE ALTURAS IED SIMON BOLIVAR.
25	CIC_BTA_SED_050_2022_435	07/09/2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA Representante Legal.	RESPUESTA OFICIO No. 384-GP2-SED-2022 - CONTESTACION OFICO 398 DOCUMENTACION DEL PERSONAL

A la fecha de emisión del presente informe no se encuentran aprobados los Informes Mensuales por componente así: SST 5, 6 y 7; Ambiental 4, 5, 6 y 7 del Contratista de Obra, teniendo en cuenta que no han sido subsanadas las observaciones realizadas por esta interventoría. Adicionalmente, el informe mensual ambiental número 8 no fue remitido para revisión y aprobación por esta interventoría. En cuanto al informe SST No. 8 se encuentra en revisión, dado que el contratista no lo allegó dentro de los tiempos establecidos.

4. COMPONENTE AMBIENTAL

4.1. MANEJO DE CAMPAMENTO

El contratista cuenta hasta el momento con los siguientes campamentos (Francisco José de Caldas, Garces Navas y Jorge Eliecer Gaitán Sede A) para aspectos administrativos y para uso del personal. Sin embargo, en los siguientes colegios no fueron asignadas aulas para el desarrollo de las actividades, por tanto, se dieron algunos espacios dentro del colegio en la IED Rafael Bernal Sedes A y B, Juan del Corral, Floridablanca, Justo Víctor Charry y San José Norte.

Francisco José de Caldas	Garces Navas	Jorge Eliecer Gaitán
		

República de Panamá	San José Norte
	

Rafael Bernal Jiménez Sede B	Rafael Bernal Jiménez Sede A
	

4.2. MANEJO DE RESIDUOS

- ✓ Se realiza disposición final de residuos ordinarios por la empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.
- ✓ En los colegios Juan del Corral, Francisco José de Caldas y Garces Navas, Jorge Eliecer, Justo Víctor Charry, Floridablanca, San José Norte se cuenta con la autorización respecto al préstamo de un punto ecológico, sin embargo, en el Colegio Rafael Bernal la solicitud no fue aprobada, por tanto, se les indico realizar

la adquisición de este, con el fin de garantizar la disposición adecuada de los residuos aprovechables.

<table>
<tr><th colspan="3">PUNTOS ECOLÓGICOS</th></tr>
<tr><td>Garcés Navas</td><td colspan="2">Simón Bolívar</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Jorge Eliecer Gaitán</td><td>República de Panamá</td><td>Floridablanca</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

4.3. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

- ✓ Si bien se realizó retiro de RCD durante el periodo del informe a la fecha el Contratista de obra no radicó la información del componente ambiental, por tanto, se desconocen las cantidades de residuos dispuestos, así como la cantidad de material ingresado a obra.
- ✓ Para la prevención de emisiones atmosféricas provocadas por la dispersión de material particulado procedente de las actividades de cada frente de obra, se mantiene el cerramiento con poli sombra.
- ✓ Se garantiza que los vehículos que ingresan a los frentes de obra mantienen una velocidad máxima de 20km/h, con esto se evitan accidentes y el arrastre de material particulado.

- ✓ Se realiza control en la salida de los vehículos mediante, pues deben salir totalmente carpados de manera que cubran los materiales RCD a fin de evitar dispersiones y emisiones al ambiente.

I.E.D Simón Bolívar	I.E.D Florida Blanca	I.E.D Justo Víctor Charry
		
I.E.D. Garces Navas	I.E.D. Francisco José de Caldas	San José Norte
		
I.E.D. Rafael Bernal Sede B	I.E.D. República de Panamá	I.E.D. Garcés Navas
		

4.4. MANEJO DE AGUA

El contratista está haciendo uso de los baños fijos de las instalaciones de los colegios y adicionalmente cuenta con unidades sanitarias portátiles a las cuales se les realiza

mantenimiento semanal a través de un proveedor autorizado. Dado que a la fecha de emisión del presente el informe el Contratista de Obra no entregó el informe respectivo.

COLEGIOS CON UNIDADES SANITARIAS	
San José Norte	Simón Bolívar
	
Rafael Bernal sede A	Floridablanca
	

4.5. MANEJO DE PAISAJE, FLORA Y FAUNA

Durante el periodo de ejecución del presente informe 11 de agostos al 10 de septiembre de 2023 no se llevaron a cabo intervenciones a individuos arbóreos. Sin embargo, se ha verificado por esta interventoría se garantice el cerramiento en el centro de acopio de residuos localizado en el Colegio Francisco José de Caldas, a fin de evitar afectación a los individuos arbóreos allí localizados.

Imagen 1. Protección especies arbóreas IED Francisco José de Caldas



4.6. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Para el periodo de reporte, aunque se evidenció el ingreso de material en las diferentes instituciones no fue posible validar las cantidades toda vez, que se no se presentó el informe junto con los vales y/o certificaciones de origen emitidas por las canteras. Por ende, no es posible determinar las cantidades de material empleado en obra y simultáneamente determinar sí su extracción es lícita, aunque se han realizado mesas de trabajo en conjunto con el Contratista no ha sido posible subsanar las observaciones identificadas en informes previos.

IED San José Norte	IED Floridablanca
	
IED Rafael Bernal Jiménez sede A	**IED Rafael Bernal Jiménez sede B**
	

IED Francisco José de Caldas	IED Rafael Bernal Jiménez Sede B
	

4.7. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Mediante el oficio CIC_BTA_SED_050_2022_057, se le notificó al contratista la apertura del pin ambiental con el No. 22524 el día 06 de febrero. Sin embargo, con relación a las cantidades justificadas de residuos dispuestos con los gestores aprobados por esta interventoría debido a la no entrega del informe mensual del componente ambiental número 8 del Contratista de obra, no ha sido posible determinar las cantidades de RCD dispuestos durante el periodo del informe.

- ✓ Residuos peligrosos

Dentro de las actividades contractuales se encuentra el desmonte y reemplazo de tejas de asbesto cemento (se relaciona evidencia fotográfica). Es importante señalar que, dadas las características de peligrosidad que contiene este tipo de residuo se ha evidenciado inadecuada manipulación por parte del Contratista; se han realizado los respectivos llamados de atención, teniendo en cuenta que lo dispuestos por la normatividad vigente y los diferentes protocolos de manejo de este residuo. De manera que, los residuos generados son dispuestos con el siguiente gestor:

Gestor de residuos	Nombre sitio de disposición	Resolución vigente
G&L Soluciones Empresariales SAS / TRACOL SAS ESP	VALCO CONSTRUCTORES LTDA – Vereda Balsillas – Mosquera	Resolución No 0989 26/05/2015

Dado que el Contratista de obra no entregó el informe mensual del componente ambiental respecto al periodo del 11 de agosto al 10 de septiembre de 2023, no fue posible establecer las cantidades de residuos dispuestos con los gestores autorizados para tal fin. Sin embargo, del seguimiento realizado por esta interventoría se evidencia la gestión y traslado de los residuos especiales con el gestor autorizado, así como los respectivos llamados de atención frente a la gestión interna de los mismos en cada uno de los frentes de trabajo.

Traslado de residuos RCD		
I.E.D. Simón Bolívar	I.E.D. Víctor Charry	I.E.D. Rafael Jiménez Sede A
		
I.E.D. Rafael Jiménez Sede B	I.E.D. San José Norte	
		

4.8. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

En el periodo no se presentó el ingreso de volquetas, sin embargo, a continuación, se presenta el registro fotográfico de la maquinaria y vehículos autorizados.

IED Floridablanca		
		

IED República de Panamá





IED Jorge Eliecer Gaitán



IED San José Norte







IED Simón Bolívar





IED Francisco José de Caldas
 

Se cuenta con la aprobación del minicargador BOBCAT con No. de serie 512259677

- ✓ Equipos

Descripción	Identificación
Arnés de seguridad Safety Systems	Serial 16-21-41-71
Eslinga De Seguridad Safety Systems	Serial 29-55-83-59
Taladro Percutor Makita Azul	Serial N 1
BOBCAT 767	Serial 512259277
Cilindro Vibro Compactador (Equipo Nuevo)	Serial 375811122974
Arnés De Seguridad SOEFEC	Serie 00071
Eslinga SOEFEC	Serie 00042
Arnés De Seguridad SOEFEC	Serie 00190
Eslinga SOEFEC	Serie 00102
Línea De Vida Ep Nueva	Serial 29384
Arnés De Seguridad #1	Serial 410022020085
Eslinga #1	Serial Aa500842 - Pveeo
Arnés De Seguridad #2	Serial7795
Eslinga De Seguridad #2	Serial Aa102882/398
Arnés #3	Serial 7654
Eslinga#3	Serial 1244412
Línea De Vida Nueva	13mm
Equipo De Soldadura	Nom-003-Scfi
Careta Electrónica Automática	Falcom Fw 44

4.9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Para el presente periodo, no se validan los siguientes indicadores de seguimiento, toda vez que el Contratista de obra no presentó el informe mensual del componente ambiental correspondiente al periodo del 11 de agosto al 10 de septiembre de 2023.

4.10. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA

El mantiene inventario de los sumideros aledaños al área de influencia en los Colegios Floridablanca y Juan del Corral, los cuales están siendo protegidos, para obstrucción por arrastre de material debido al tránsito de volquetas y vehículos empleados por el Contratista para el cumplimiento de sus actividades.

Ubicación Geográfica De Sumideros Pluviales Colegio Floridablanca







Ubicación Geográfica De Sumideros Pluviales Colegio Juan Del Corral







4.11. CAPACITACIONES AMBIENTALES

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental por el Contratista, durante el periodo se realizaron capacitaciones, sin embargo, no se presentó el informe mensual del componente ambiental para revisión y verificación de las actividades ejecutadas frente a este ítem.

4.12. INSPECCIONES AMBIENTALES

Se realizaron recorridos en conjunto con el contratista e interventoría, donde se identificó un almacenamiento inadecuado de los residuos sólidos, de construcción y demolición. Lo anterior, se puede verificar mediante los llamados de atención realizados al Contratista durante el periodo del informe.

4.13. CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

Obligaciones	Cumple		
	SI	NO	No Aplica
Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental			
Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SED mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato con la SED. Como soporte de cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la socialización de los lineamientos ambientales de la SED.		X	
Realizar, en caso de requerirse, el trámite de manejo silvicultural para el arbolado presente en el predio, hasta la obtención del permiso requerido (poda, tala, traslado y/o demás) y la compensación requerida por la Secretaría Distrital de Ambiente.			X
Implementar jardines verticales u horizontales ofrecidos si es el caso, para lo que, de manera previa, el contratista deberá presentar los diseños a la Entidad contratante, para su respectiva aprobación.			X
Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación del PIGA de la SED en la ejecución del contrato.		X	
Gestión Integral de Residuos			
Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos.	X		
Tendrá sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y de prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje.		X	
Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos.	X		

Las unidades de almacenamiento deberán disponer de espacio suficiente para realizar el almacenamiento de los materiales, evitando su deterioro.	X		
Debe ser de accesibilidad y facilidad para el manejo y la recolección de los residuos sólidos por parte del prestador.	X		
El cuarto de almacenamiento debe ser acorde con la proyección de generación de residuos, siendo este un espacio de uso independiente para la Entidad en el cual se pueda controlar la entrada y salida del personal de aseo y/o recuperador de oficio de la SDIS.	X		
Verificar la ruta de movilización de los residuos sólidos al interior de la infraestructura garantizando su fácil movilización.		X	
Fijar los espacios para el uso de las canecas en cumplimiento del Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS)	X		
Residuos de construcción y demolición RCD			
Garantizar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1115 de 2012, Resolución 932 de 2015 de la SDA y demás que modifique o adicione y a los lineamientos internos de la SED.		X	
Deberá revisar y dar aval al PGRCD, formatos RCD, informe de No cumplimiento de aprovechamiento RCD y garantizar el adecuado cargue mensual en aplicativo web de la SDA de los reportes RCD; desde la apertura hasta el cierre del PIN de obra que sea asignado.		X	
Uso Eficiente del Agua			
Garantizar la implementación al 100% sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los puntos hidráulicos (excepto en pocetas, lavaderos y lava traperos), dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.	X		
Garantizar la implementación de un sistema de recolección, almacenamiento y/o aprovechamiento de aguas lluvias, con el fin de reutilizarlas en cisternas, riego de jardines, zonas verdes y/o limpieza de exteriores.			X
Garantizar la implementación al 100% sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.	X		
Uso Eficiente de la Energía			
Garantizar que los muros internos y techos sean de colores claros preferiblemente blancos, con el fin de generar un mejor aprovechamiento de la luz natural. Así mismo, se debe verificar que la infraestructura permita el máximo aprovechamiento de la luz natural.	X		
Garantizar la implementación al 100% bombillos ahorradores y luminarias con tecnología LED, dando cumplimiento al Decreto 177 de 2016 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Resolución 180606 de 2008 del Ministerio de Minas y Energía.		X	
Garantizar la implementación de un sistema de energía solar fotovoltaico (o similar), como método alterno de suministro de energía que sea eficiente y amigable con el medio ambiente; el cual deberá incorporarse a ciertas áreas de la infraestructura eléctrica proyectada en la edificación en donde se pueda evidenciar el uso de energías alternas sostenible.			X

5. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.1. AFILIACIONES Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En cuanto al componente SST el Contratista radicó el informe mensual número 8, sin embargo, se encuentra en revisión, dado que no se radicó dentro de los tiempos establecidos. En cuanto a los ingresos aprobados por esta interventoría, a continuación, se presenta el personal presente en obra:

Contratista

Teniendo en cuenta que el Contratista remitió fuera de tiempo el informe SST No. 8, no es posible relacionar la información registrada en el mismo en cuanto al personal ingresado, sin embargo, durante el periodo del informe se aprobó el ingreso de personal. Lo anterior, se puede confirmar en la gestión documental indicada en el numeral 3 del presente informe.

Interventoría

Se dio cumplimiento con los pagos de seguridad del personal.

- ✓ No. de trabajadores nuevos: 0
- ✓ No. de trabajadores antiguos: 10
- ✓ No. de trabajadores retirados: 0

Le fue requerido al Contratista de obra la entrega de los soportes de los pagos realizados respecto a la seguridad social del personal mediante los comunicados CIC_BTA_SED_050_2022_376 del 7 de agosto de 2023 y CIC_BTA_SED_050_2022_377 del 7 de agosto de 2023, sin que a la fecha se obtenga respuesta por parte del Contratista de obra. No obstante, no fue presentado el informe 8 correspondiente al periodo del 11 de agosto al 10 de septiembre de 2023.

5.2. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

- ✓ Previamente el contratista había remito actas de conformación tanto del COPASST como del CCL, sin embargo, no se allegan los soportes de los comités celebrados en el periodo del 11 de agosto al 10 de septiembre de 2023.
- ✓ Con relación al COPASST de la Interventoría se remite soporte de reunión realizada en el mes de agosto (ver Anexo I).
- ✓ En cuanto al comité de convivencia laboral de la interventoría recientemente se realizó elección de los integrantes.

5.3. INDUCCIONES

- ✓ Dado que el informe del periodo de ejecutado (11 de agosto al 10 de septiembre) se radicó extemporáneo a la interventoría, por tanto, se procederá con su revisión.

5.4. MEDICINA PREVENTIVA Y LABORAL

- ✓ Del personal aprobado se cuenta con exámenes ocupacionales; estos documentos fueron aprobados por interventoría.

5.5. HIGIENE INDUSTRIAL

- ✓ El contratista hace uso de los baños fijos que fueron previamente aprobados por los rectores de las siguientes instituciones: IED Juan del Corral, Francisco José de Caldas, Garces Navas, Jorge Eliecer Gaitán y Justo Víctor Charry; no obstante, se está llevando a cabo un control de orden y aseo.
- ✓ Por otro lado, la empresa Saniport realiza la limpieza y mantenimiento de los baños portátiles dos veces a la semana en las Instituciones Educativas Rafael Bernal Sede A, Floridablanca, Simón Bolívar y San José Norte.

En cuanto a la interventoría se indica que se disponen de unidades sanitarias en las instalaciones de la oficina principal, para que los colaboradores efectúen una adecuada higiene de manos y uso de los sanitarios.

Imagen 2. Higiene de manos oficina principal Interventoría





Sin embargo, con ocasión a la finalización de la emergencia sanitaria el Gobierno Nacional ha determinado lo siguiente:

- Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del virus SARS-CoV-2 o COVID-19, medida prorrogada hasta 30 de junio de 2022 de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1 de la Resolución 666 de 2022.

- El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 1238 del 21 de julio de 2022, estableció nuevas medidas para prevención, promoción y conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la COVID-19, entre las que se destacan: medidas de autocuidado, lavado e higiene de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas, adecuada ventilación, medidas de ingreso por vía área para el transporte de pasajeros y marítima a través de cruceros.

- Que posteriormente el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 555 del 5 de abril de 2023, mediante la cual establece la obligatoriedad en cuanto al uso de tapabocas para el ingreso a instituciones prestadoras de servicios de salud y hogares geriátricos, y mantener las medidas de autocuidado.

- Que la Organización Mundial de la Salud – OMS el 5 de mayo de 2023 acogió la recomendación del Comité de Emergencia de declarar el fin de la emergencia de salud pública de emergencia internacional por la COVID-19. Dicha declaración implica que es el momento que los países pasen del modo de emergencia al manejo y control de la COVID-19 con otras enfermedades infecciosas. La COVID-19 no ha terminado. El riesgo continúa. Por esa razón, los países, ni sus sistemas de salud, al igual que sus poblaciones, pueden bajar la guardia.

Dicho lo anterior, la obligatoriedad frente a la implementación del PAPSO tuvo vigencia mientras se mantuvo la emergencia sanitaria en Colombia.

5.6. ACTIVIDADES EN EL TRABAJO

5.6.1. Actividades realizadas en el transcurso del periodo

Dentro de las actividades realizadas por el Contratista de obra se mencionan las siguientes: demoliciones, desmontes y retiro de placa maciza, demolición de alistado de piso, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cubierta existente, desmonte de canaleta metálica troquelada, diagnóstico y mantenimiento menor de cubierta, limpieza de canales y bajante. Excavaciones y rellenos, concretos: Placa de contrapiso de 10 cm – concreto de 3000 PSI, suministro e instalación de malla electro soldada 6 mm, redes de alcantarillado: suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 4", cajas y pozos de inspección, otras instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio, suministro e instalación de tubería metálica galvanizada, suministro e instalación de bala led de 18 W, suministro e instalación de cableado 1#6 + 1#8 + 1#10T, concreto de limpieza, mediacaña en mortero, suministro e instalación de bordillo prefabricado, afinado de piso en mortero impermeabilizado, reparación y adecuación de cunetas existentes, cubiertas e

impermeabilizaciones: Flanche en lámina galvanizada, suministro e instalación de teja en fibrocemento, suministro e instalación de teja termo acústica, sei de viga canal galvanizada. Aseo y disposición final: Aseo general final y limpieza, embalaje de teja en asbesto cemento; entre otros.

5.6.2. Brigada de emergencias

El contratista de obra tiene conformada la brigada de emergencias desde el pasado 06 de marzo de 2023, en el informe mensual SST número 3 del Contratista se presentó el respectivo soporte de la reunión y de la capacitación realizada. Sin embargo, debido a la rotación de personal, llevó a cabo una actualización de los brigadistas por frente de trabajo, no se tiene soporte de la actividad realizada, toda vez que, el informe mensual fue radicado extemporáneo, por tanto, se encuentra revisión por esta interventoría.

5.6.3. Accidentes de trabajo

Durante el periodo de ejecución del objeto contractual, se presentó un accidente con un tercero, quien es estudiante de la Institución Rafael Bernal Jiménez Sede A. Al respecto esta interventoría solicitó al Contratista la investigación pertinente del evento mediante la entrega de un informe detallando el modo, tiempo y lugar del suceso.

5.6.4. Capacitaciones SST

Para este periodo el contratista registra en el informe las charlas realizadas:

- ✓ Manejo seguro de sustancias químicas utilizadas en la operación
- ✓ Pausas activas para el personal operativo y administrativo
- ✓ Izaje seguro de cargas manuales y mecánicas.
- ✓ Seguimiento a casos con sintomatología presuntiva de LOM
- ✓ Campañas de orden y aseo

Por otro lado, se verifica la instalación de la cartelera informativa en las instituciones educativas que actualmente se encuentran en intervención.

Francisco José de Caldas	Jorge Eliecer Gaitán
	
Rafael Jiménez Sede B	**República de Panamá**
	
Simón Bolívar	**Justo Víctor Charry**
	

Por parte de esta interventoría se llevaron a cabo las siguientes charlas:

- ✓ Mediante charla se recuerda a los colaboradores acerca de las normas de seguridad de acuerdo con las actividades que a diario ejecutan.
- ✓ Se realiza charla con relación a las actividades críticas e importancia del buen uso de los elementos de protección contra caídas y sus anclajes; así como acerca de la importancia en buenas prácticas de orden, aseo y limpieza.
- ✓ Se acompañan charlas de seguridad realizadas por los profesionales SST del Contratista, sin embargo, no siempre es posible realizar el acompañamiento de los profesionales de la interventoría, ya que, no se cumple con la entrega de la programación por semana para este componente.
- ✓ Retroalimentación de riesgos a personal en el Colegio San José Norte debido al no uso de EPP.
- ✓ Retroalimentación frente al diligenciamiento de permisos previo a la ejecución de actividades.
- ✓ Importancia del reporte de un accidente de trabajo.

Verificar soportes de las actividades realizadas por esta interventoría en el Anexo II. Asimismo, se adjuntan el cronograma de capacitaciones y soportes realizadas al personal de la interventoría para el mes de agosto de 2023 (ver Anexo III).

Simón Bolívar	Garcés Navas	San José Norte
		
Rafael Bernal Jimenez Sede A		República de Panamá
 		

5.6.5. Inspección SST

- **Elementos de atención de emergencia:** El contratista menciona que está en el proceso de compra de los elementos como el botiquín, extintor y camilla.

Colegio Rafael Bernal Jiménez Sede B	República de Panamá
	
Colegio Floridablanca	San José Norte
	
Colegio Jorge Eliecer Gaitán	Colegio Rafael Bernal Jiménez Sede A

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Colegio República de Panamá</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td></tr>
</table>

- **Dotación y EPP:** Se evidencia uso de dotación y elementos de protección personal del personal, durante este periodo, se realizó entrega de elementos de protección personal correspondientes para el personal nuevo y también se evidenció la y reposición de los EPP a personal antiguo. Mediante los comunicados se le ha solicitado al contratista que todo el personal operativo cuente con elementos de protección individuales (EPI) acorde a las actividades a desarrollar por los colaboradores, y asimismo, se resalta el cumplimiento a lo indicado en el MANUAL DE USO DE MARCA ALCALDÍA DE BOGOTÁ, páginas 169, 170 y 171 “Indumentaria personal de obra y operarios”.

- **Señalización:**

Se llevó a cabo en el periodo por el Contratista de obra el mantenimiento al cerramiento y reposición de la señalización, como medida para el control de peligros y riesgos.

Rafel Jiménez Sede A	República de Panamá
	
Francisco José de Caldas	Jorge Eliecer Gaitán
	
Floridablanca	San José Norte
	
Rafel Jiménez Sede B	José Víctor Charry

- Maquinaria y/o equipos

I.E.D. Jorge Eliecer Gaitán	I.E.D. San José Norte
	
I.E.D. República de Panamá	**Floridablanca**
	

- **Puntos de acopio de materiales y de RCD**

I.E.D. Jorge Eliecer Gaitán	I.E.D. Simón Bolívar

	
I.E.D. Garces Navas	I.E.D. Francisco José De Caldas
	
I.E.D. Floridablanca	I.E.D. República de Panamá
	
I.E.D. Rafael Jiménez Sede A	I.E.D. San José Norte





Esta interventoría ha realizado los respectivos llamados de atención al Contratista de obra, por la no disposición de residuos RCD, puesto que no están siendo acopiados de acuerdo con sus características. Los soportes que confirman lo mencionado, se encuentran en la gestión documental presentada al inicio del presente informe.

Interventoría

Se realizo inspección de EPP de los profesionales contractuales y se verifica que los elementos se encuentran en buen estado (ver Anexo IV).

5.7. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Contratista

Debido a la entrega extemporánea del informe mensual número 8, no es posible relacionar el cumplimiento de los indicadores y estadísticas de seguimiento, de acuerdo a las actividades realizadas durante el periodo por el Contratista de obra.

Interventoría




En cuanto a los indicadores de interventoría a continuación se presentan lo siguiente:


Nombre del Indicador	Formula	Indicador	Interpretación
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	$\frac{0}{10} * 100 = 0\%$	Por cada 100 trabajadores que laboraron durante el periodo (10 agosto al 11 de septiembre) se presentaron cero (0) accidentes de trabajo.
Severidad de accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	$\frac{0}{10} * 100 = 0\%$	Por cada 100 trabajadores que laboraron durante el periodo (10 agosto al 11 de septiembre) se perdieron cero (0) días por accidentes de trabajo.
Proporción de accidentes de trabajo mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	$\frac{0}{0} * 100 = 0\%$	En 2023, el 0% de accidentes de trabajo fueron mortales.
Prevalencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	$\frac{0}{10} * 100.000 = 0\%$	Por cada 100.000 trabajadores existen cero (0) casos de enfermedad laboral durante el periodo (10 agosto al 11 de septiembre).
Incidencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	$\frac{0}{10} * 100.000 = 0\%$	Por cada 100.000 trabajadores existen cero (0) casos nuevos de enfermedad laboral durante el periodo (10 agosto al 11 de septiembre).
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	$\frac{0}{25} * 100 = 0\%$	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica.

5.8. PERSONAL INTERVENTORÍA

✓ A continuación, se presenta relación de personal de interventoría:

Tabla de control de personal para el periodo entre el 10 agosto al 11 de septiembre de 2023

PERSONAL CONTRACTUAL					
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	**Salario**	**Vínculo Laboral**	**Firma**
Fredy Giovanni Rodríguez Salazar	80.539.072	Director de Interventoría	$6.500.000	Fijo	
Camilo Antonio Samacá Pesca	1.051.474.958	Residente de Interventoría 1	$4.954.666	Fijo	
Rodolfo Castro Ortegón	1.015.410.729	Residente de Interventoría 2	$4.000.000	Fijo	
Jairo Andrés Meza Rosas	13.874.430	Asesor Estructural	1.160.000	Fijo	
Mónica Marcela de los Ángeles Gómez Rodríguez	1.069.099.276	Asesor Ambiental y de Seguridad Industrial	$4.020.000	Fijo	
Hernando Gómez Casas	17.069.465	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas Voz y Datos	$1.160.000	Fijo	
Guillermo Emilio Narváez Vélez	72.201.382	Asesor en Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas	$26.789.981	Fijo	
Enrique Luis Monroy Maldonado	1.026.264.858	Asesor de Costos, Presupuestos y Programación de Obras	$6.862.320	Fijo	
Milena Mercedes Albornoz Villota	1.085.250.609	Asesoría Jurídica	8.750.000	Fijo	
Edwin Yesith Nuñez Amaya	1.122.402.572	Inspector de Interventoría	$1.825.000	Fijo	
Edison Calderón Castañeda	79.403.208	Maestro De Obra	$2.173.333	Fijo	

PERSONAL CONTRACTUAL					
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	**Salario**	**Vínculo Laboral**	**Firma**
Yanin Nathalia Huertas Medina	21.047.776	Tecnólogo SST 1	$2.173.333	Fijo	
Daniela Quevedo Garay	1.073.527.297	Tecnólogo SST 2	$2.173.333	Fijo	
Natalia Vanessa Calderón Acevedo	1.015.474.687	Inspector De Interventoría	$ 1.825.000	Fijo	

PERSONAL DE APOYO					
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	**Salario**	**Vínculo Laboral**	**Firma**
Manuel Antonio González Romero	1.152.447.887	Coordinador	$3.800.000	Fijo	
Luis Felipe Lavado Alfonso	1.014.264.625	Auxiliar de interventoría	$1.800.000	Fijo	

6. CONCLUSIONES

- ✓ Se continúa solicitando el uso de señalización, reposición de EPP y dotación en obra.
- ✓ Teniendo en cuenta la importancia que representa el cumplimiento del marco normativo para las respectivas licencias ambientales que requieren el abastecimiento de materiales pétreos y la disposición final de RCD en sitios de debidamente autorizados, se realiza la validación de la documentación aportada ante cada entidad y/o autoridad ambiental competente, a fin de verificar la vigencia y veracidad de dicha documentación, así como los registros y/o certificaciones presentadas por los proveedores que prestan los servicios de suministro de materiales pétreos y el transporte y disposición de residuos de demolición y escombro. Al respecto aún no ha sido posible emitir la aprobación de los informes presentados por el componente ambiental, dado que, el contratista no remite las certificaciones de origen de los materiales pétreos empleados en las diferentes actividades constructivas.
- ✓ El contratista de obra no presentó las certificaciones de disposición de residuos vegetales producto del tratamiento silvicultural de las especies arbóreas

localizados en las instituciones educativas: Francisco José de Caldas, Antonio Nariño, Bolivia Sede B, Morisco, Naciones Unidas.

- ✓ No se aportan los certificados de disposición de residuos RCD dado que no fue entregado el informe ambiental correspondiente al periodo.
- ✓ No se incluyen los indicadores ambientales del Contratista de obra, ya que, no se presentó el correspondiente informe para revisión de la interventoría.
- ✓ Se evidenció por el Contratista de obra la gestión y disposición de residuos peligrosos (tejas de asbesto cemento) con gestor idóneo en el manejo de este tipo de residuos, sin embargo, no es posible verificar las cantidades dispuestas, puesto que, no se radicó el informe ambiental de obra para revisión.
- ✓ No se tiene aprobación de los informes SSTA del contratista así: SST No. 5, 6 y 7; Ambiental 4, 5, 6, 7 y 8 puesto que, a la fecha de emisión del presente documento no han sido subsanadas las observaciones realizadas por esta interventoría respecto a cada uno.

7. ANEXOS

A continuación, se presenta relación de anexos:

Anexo I. Soportes actas de reunión COPASST y CCL.
Anexo II. Registros de charlas dictadas por la interventoría.
Anexo III. Ejecución cronograma de capacitaciones en SST
Anexo IV. Soporte inspecciones EPP personal interventoría.
Anexo V. Soportes pagos de seguridad social interventoría correspondiente al período del informe.

ANEXOS

ANEXO I. ACTAS COPASST Y CCL

GNG Ingeniería S.A.S.	ACTA DE REUNION	CODIGO	FR-TTH-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		1	2/08/2017	

1. TEMA DE LA REUNIÓN			DURACIÓN	Acta No.	
REUNION MENSUAL COPASST			1 HORA	70	
AREA	**LUGAR**	**RESPONSABLE REUNIÓN**	**FECHA**	**HORA INICIO**	**HORA FIN**
COPASST	VIRTUAL	MARLY CABALLERO	28/07/2023	9:05 AM	9:45 AM

2. LECTURA DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si aplica)

ITEM	No. CONSEC. ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	FECHA REAL DE CUMP.
1	69	entrega de copasst	COPASST	30/06/2023	30/06/2023
2	69	Formatos y drive al dia	MARLY CABALLERO	30/06/2023	30/06/2023
3	69	verificacion cumplimiento de copasst con hallazgos e inspecciones	MARLY CABALLERO	30/06/2023	30/06/2023
4	69	plan de accion actualizado a la fecha 30/07/2023 solo quedan 3 hallazgos abiertos de entrega de dotacion	MARLY CABALLERO	30/06/2023	30/06/2023
5	69	entrega de carpeta copasst DRIVE con listados, actas, llamados de atencion, inspeccion anual, plan de accion y seguimiento de inspecciones	copasst	30/06/2023	30/06/2023

3. DESARROLLO DE LA REUNION

Se pregunta a los vigias si se tienen dudas de la interpretación del programa de inspecciones, dado que se siguen diligenciando inspecciones que no corresponden al mes

Se recuerda a los vigias que si en alguna inspección manifiestan que no se cuenta con algo o se encuentra algo en mal estado, realizar la requisición correspondiente al área administrativa y realizar el soporte a la carpeta del COPASST.

Se verifica las inspeciones del mes de JULIO en el Drive.

Por tema de pandemia se hace la aprobacion del acta # 70 por medio de pantallazo de asistencia

Se firma el acta Número 70 Presidente y Secretaria de COPASST Presencial la demas asistencia se hace por diligenciamiento de formato de asistencia y pantallazo de asistencia

se informa que este mes no se presentaron condiciones incidentes o accidentes de trabajo de tipo ambiental

Se les explica a los vigias que en el DRIVE no hay que cargar informacion que no corresponda a la actividad de inspecciones COPASST

Se les explica a los vigias como deben ir nombradas las carpetas del DRIVE

Se entrega de una carpeta DRIVE con la informacion de actas de reuiion mensual, llamados atencion, hallazgos, informe de gestion 1 semestre y programa de inspeccion.

En la carpeta de CTO FINALIZADO se entregan 6 contratos finalizados con su carta de terminacion

Se entrega carpeta con 21 contratos los cuales se encuentran en la carpeta de CTO VIGENTES

En la carta de DOCUMENTOS SEGUIMIENTO se hace publico la hoja en excel donde se lleva la informacion del cronograma anual del COPASST, tambien entrego la base en excel del seguimiento de inspeccion del COPASST la cual hay que irla alimentado mensualmente.

Se entrega la carpeta de Actas de Reunion mensual del COPASST del periodo de enero a junio del 2023 se entrega con 6 ACTAS GESTIONADAS

El vigia del proyecto GUADUAS hace compromiso de entrega para el dia 30 de junio de inspecciones de los mes de MAYO Y JUNIO

Se informa que en el proyecto de INTERALCALDIAS , ya tiene vigia confirmar nombres y correo para ingresarla en el grupo de copasst

4. NUEVOS COMPROMISOS

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA
1	diligenciar los cuadros de seguimiento del copasst para el mes de julio	COPASST	15/08/2023
2	pendiente de incliuir el cuadro de plan de accion el hallazgos de la puerta de la oficiana principal (sala de juntas 3 piso)	COPASST	15/08/2023
3	pendiente de verificar e incluir los correos de los nuevos miembros del copasst asi como verificar los contratos que ya finalizaron para sacarlos del listado	COPASST	15/08/2023
4	se programa reunion para realizar entrega de COPASST a los nuevos miembros	COPASST	15/08/2023

5. ASISTENCIA A LA REUNIÓN

NOMBRE	FIRMA	CARGO	EMPRESA
ADRIANA JIMENEZ	Adriana Jimenez	PRESIDENTE	GNG INGENIERIA
MARLY CABALLERO	Marly Caballero	SECRATARIA COPASST	INTERMOVILIDAD
LUZ ESCOBAR	Virtual	VIGIA / MIEMBRO COPASST	ERU KENNEDY
NATALIA QUEVEDO	Virtual	VIGIA / MIEMBRO COPASST	Inter Avenidas
ALEXANDER ACOSTA	Virtual	VIGIA	INTER INFRAESTRUCTURA 2019-2021
ANA MARROQUIN	Virtual	VIGIA	INTER INFRAESTRUCTURA 2019-2021
ALEXANDER CASAS	Virtual	VIGIA	ERU KENNEDY
CRISTIAN SALGADO	Virtual	VIGIA	AMARILO
DIEGO OSORIO	Virtual	VIGIA	INTER INFRAESTRUCTURA 2019-2021
EDGAR LOBO	Virtual	VIGIA	INTER INFRAESTRUCTURA 2019-2021
ERNESTO RAMOS	Virtual	VIGIA	INTER INFRAESTRUCTURA 2019-2021
HAROLD PEREZ	Virtual	VIGIA	INTER INFRAESTRUCTURA 2019-2021
HUGO MARTIN	Virtual	VIGIA	INTER INFRAESTRUCTURA 2019-2021
JAIRO ARANGO	Virtual	VIGIA	INTER INFRAESTRUCTURA 2019-2021
LUISA PERDOMO	Virtual	VIGIA	RICAURTE
MONICA PEÑA	Virtual	VIGIA	ERU KENNEDY
NIDIA VALENCIA	Virtual	VIGIA	INTERMOVILIDAD
ROBINSON NAVARRO	Virtual	VIGIA	INTER INFRAESTRUCTURA 2019-2021
YEISON VEGA	Virtual	VIGIA	Guaduas

ACTA DILIGENCIADA POR: MARLY CABALLERO **FECHA DE PROXIMA REUNION: 25 DE AGOSTO**

Nota: en caso de requerirse anexar mas casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Claudia Garcia	Andrés Flechas	Lina Díaz
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: PROFESIONAL RUC Y CALIDAD	CARGO: COORDINADOR SSTAC













Gmail **Betiana Bello Brochero <auxiliarsst.gng@gmail.com>**

Conformación Comités COPASST y CCL 2023 - 2025

2 mensajes

Betiana Bello Brochero <auxiliarsst.gng@gmail.com> 14 de julio de 2023, 12:25
Para: Proyectos Bogotá <proyectosbta@gng.com.co>, Administrativos Bogotá <admbta@gng.com.co>, proyectosbqa@gng.com.co, admbqa@gng.com.co

Cordial saludo,

Desde el proceso SSTAC se informa cómo quedaron conformados los comités de COPASST y CCL por empresa para el periodo mencionado en el asunto, teniendo en cuenta, que la elección de los trabajadores fue realizada por votación y los representantes de gerencia fueron elegidos por el empleador.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

- **GNG INGENIERIA S.A.S**

GNG INGENIERIA SAS	
CCL	
TRABAJADORES	
PRINCIPAL	**SUPLENTE**
MILENA ALBORNOZ	GUILLERMO NARVAEZ
NUBIA APONTE	JORGE GÓMEZ
GERENCIA	
PRINCIPAL	**SUPLENTE**
JANELLY FADUL	GUILLERMO NARVAEZ
FREDY RODRIGUEZ	JORGE GÓMEZ
COPASST	
TRABAJADORES	
PRINCIPAL	**SUPLENTE**
JULIANA QUINTERO	LAURA CANTOR
GERENCIA	
PRINCIPAL	**SUPLENTE**
MARELYS MARIA CASTRO ORTIZ	JULIAN POSADA

- **GNG INGENIERÍA SERVICIOS**

GNG INGENIERIA SERVICIOS	
CCL	
TRABAJADORES	
PRINCIPAL	**SUPLENTE**
KAREN RUIZ	LUIS FERNANDO JULIO
DANIELA CORENA	ALEJANDRA ALZATE
GERENCIA	
PRINCIPAL	**SUPLENTE**
KAREN FORERO	RUBEN PEÑA

JULIETH PORRAS	SERGIO SÁNCHEZ
COPASST	
TRABAJADORES	
PRINCIPAL	**SUPLENTE**
JESÚS GONZÁLEZ	LAURA ARGUELLO
HERNÁN THEVENING	NICOLAS PRADA
GERENCIA	
PRINCIPAL	**SUPLENTE**
MELISSA CHAVARRO	LINA QUINTERO
MANUEL GONZALEZ	GINA GUTIERREZ

- **GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA**

GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA	
CCL	
TRABAJADORES	
PRINCIPAL	**SUPLENTE**
DIMAS DAVID REDONDO	MILDRED MARCELA FONSECA
JULIANA MUÑOZ	CAROLINA ECHEVERRY
GERENCIA	
PRINCIPAL	**SUPLENTE**
MABEL ACUÑA	RODOLFO CASTRO
NANCY IPUZ	RAFAEL VERGEL
COPASST	
TRABAJADORES	
PRINCIPAL	**SUPLENTE**
MÓNICA PEÑA	HARRY MENA
FELIPE GOMEZ	WILMAN MARTINEZ
GERENCIA	
PRINCIPAL	**SUPLENTE**
JUAN JOSÉ CORENA	ALEX CASAS
FELIPE GRASS	MAX MONTAÑO

--


Cordialmente,


Betiana Bello Brochero
Auxiliar SSTA
Teléfonos: 60 (1) 712 26 85 - 520 2359
Dirección: Carrera 49 No. 104B - 49, Bogotá D.C.
Email: auxiliarsst.gng@gmail.com - www.gng.com.co

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente / Avoid printing, think about your responsibility with the Environment.
La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo por error, está prohibido su uso, divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación de **GNG INGENIERIA S.A.S.** El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo.

Betiana Bello Brochero <auxiliarsst.gng@gmail.com> 16 de agosto de 2023, 10:42
Para: Nubia <nubia.aponte@gng.com.co>

[Texto citado oculto]

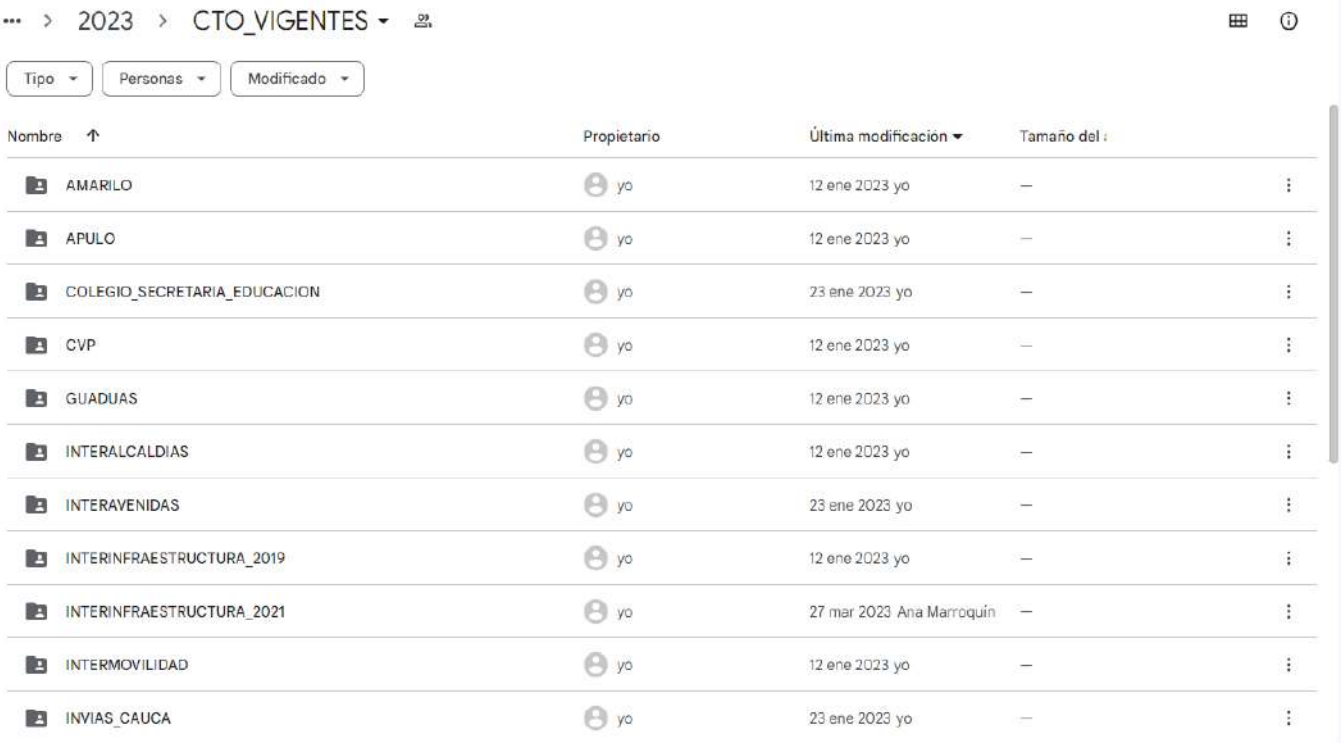
2023 > CTO_VIGENTES
Tipo
Personas
Modificado
Nombre
Propietario
Última modificación
Tamaño del
AMARILO yo 12 ene 2023 yo —
APULO yo 12 ene 2023 yo —
COLEGIO_SECRETARIA_EDUCACION yo 23 ene 2023 yo —
CVP yo 12 ene 2023 yo —
GUADUAS yo 12 ene 2023 yo —
INTERALCALDIAS yo 12 ene 2023 yo —
INTERAVENIDAS yo 23 ene 2023 yo —
INTERINFRAESTRUCTURA_2019 yo 12 ene 2023 yo —
INTERINFRAESTRUCTURA_2021 yo 27 mar 2023 Ana Marroquín —
INTERMOVILIDAD yo 12 ene 2023 yo —
INVIAS_CAUCA yo 23 ene 2023 yo —

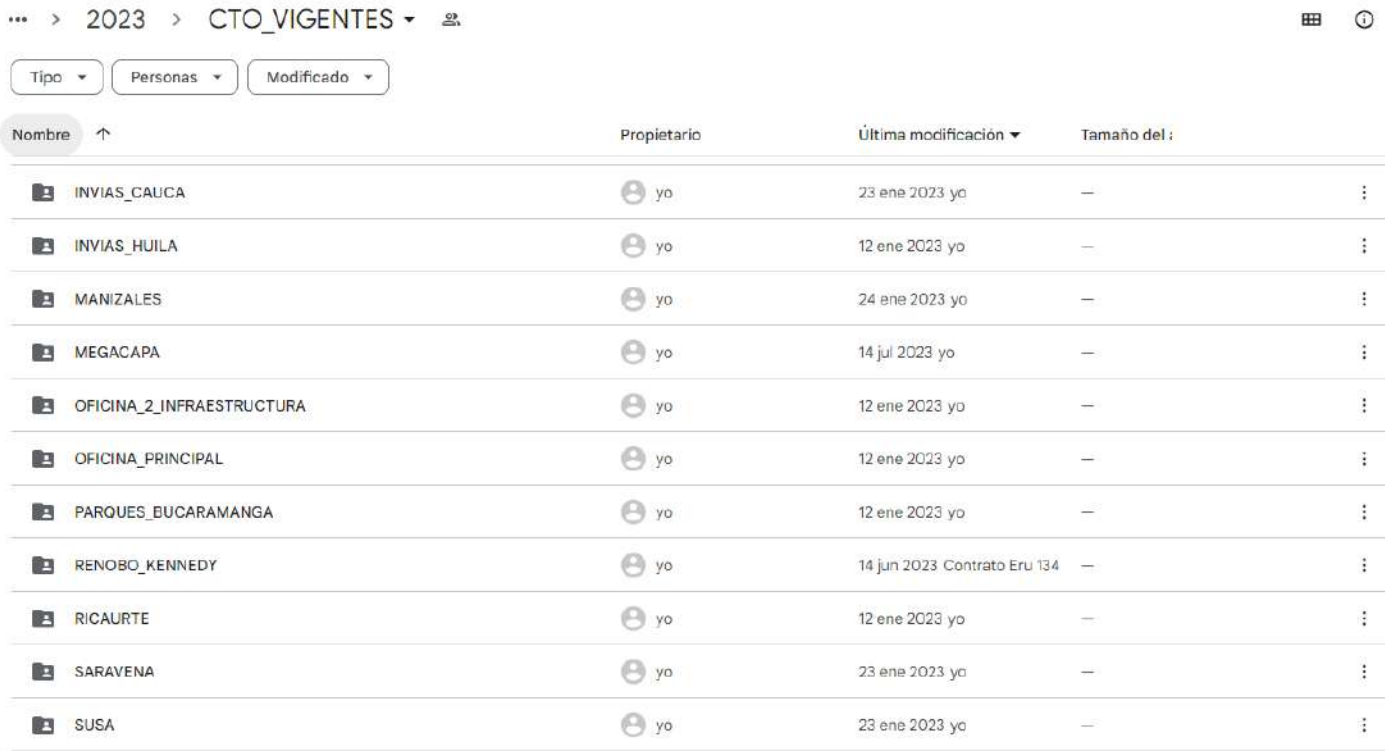
2023 > CTO_VIGENTES
Tipo
Personas
Modificado
Nombre
Propietario
Última modificación
Tamaño del
INVIAS_CAUCA yo 23 ene 2023 yo —
INVIAS_HUILA yo 12 ene 2023 yo —
MANIZALES yo 24 ene 2023 yo —
MEGACAPA yo 14 jul 2023 yo —
OFICINA_2_INFRAESTRUCTURA yo 12 ene 2023 yo —
OFICINA_PRINCIPAL yo 12 ene 2023 yo —
PARQUES_BUCARAMANGA yo 12 ene 2023 yo —
RENOBO_KENNEDY yo 14 jun 2023 Contrato Eru 134 —
RICAURTE yo 12 ene 2023 yo —
SARAVENA yo 23 ene 2023 yo —
SUSA yo 23 ene 2023 yo —

ANEXO II. CHARLAS SST INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	LISTADO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TTH-009	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		02	02/08/2017	14/03/2023

TEMA:	E.P.P DOTACION IMPORTANCIA.	RESPONSABLE:	YANIN HUERTAS.
FECHA:	SEMANA 27.	TIEMPO DE DURACIÓN:	5 MINUTOS

CHARLA:		CAPACITACIÓN:		INDUCCIÓN:		REINDUCCIÓN:		OTRO, ¿CUÁL?:	RETROALIMENTACIÓN

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	SEDE	EMPRESA	FIRMA
1	Jadixon Paredes	99774524011796	Ayudante	Juan del Corral	SAFRID	
2	Luis Alejandro Z	79770115	Ayudante	Juan del	Safrid	
3	Ruben Garrido	1018943498	Oficial	Juan del Corral	Safrid	Ruben. O.G
4	Jannet Martinez	1022526289	Oficial	San Jose	Safrid	
5	Leonardo Rojas	79886668	Encargado San Jose N.	Encargado	Safrid	
6	Ricardo Moro S.	79466919	Maestro	San Jose N.	Safrid.	
7	Campo Leon	6033580	Ayudante San Jose N.	San Jose		Campo Leon
8	Omar Andres	7769369	Oficial	Batallon B.	Safrid	Omar Andres
9	Jesus A Alvarado M	1097391613	Oficial	Batallon B.	Safrid.	Andres Alvarado M
10	Alexander SILVA	1207456	OFICIAL	Guaymaral	SAFRID	
11	Mauricio Sanchez	1.105.306.574	Oficial	Guaymaral	Safrid	Mauricio Sanchez.
12	Brayan Borcio	1023963466	Oficio	Guaymaral	Safrid	Brayan Borcio
13	Heli Ramirez Peralta	79734766	Ayudante	J. Gaitan	Safrid	Heli Ramirez
14	Luis Tellez	316626	OF	J Gaitan	safrid	
15	Fabian Geraldo O.	1006108290	Ayudante	J. Gaitan	Safrid	
16	Oscar Bejarano C.	1031138124	oficial	J. Gaitan	Safrid	

NOTA:
* En caso de requerirse anexar mas casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
* Para las actividades ejecutadas de manera virtual, se tomará el registro del formulario como firma.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
CARGO: Auxiliar SST-A	CARGO: Prof. Gestion Integral - Coord. SST-A	CARGO: Coordinadora(e) Talento Humano

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	LISTADO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TTH-009	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		02	02/08/2017	14/03/2023

TEMA:	Uso de Horas Extras	RESPONSABLE:	Marlon Ramirez				
FECHA:	Horas Completo 2 Semana 33	TIEMPO DE DURACIÓN:	15 minutos				
CHARLA:	—	CAPACITACIÓN:	X	INDUCCIÓN:	—	REINDUCCIÓN:	/	OTRO, ¿CUÁL?:	—

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	SEDE	EMPRESA	FIRMA*
1	Ana Rocio Carta Munar	1073698723	Aseo	Francisco	AHME	Ana Carta
2	Yeison Espejo G.	1033732481	Oficial	Fransisco	AHME	Yeison Espejo G
3	Ramiro Sanchez	1030570941	Oficial	RAFAEL A	Safrid	
4	Victor Martinez	5004385	Ayudante	RAFAEL A	SAFRID	Victor
5	Leonardo Sanchez	1030609700	Soldador	RAFAEL A.	SAFRID	
6	Daniel Campos	1022932446	Oficial	GAITAN	SAFRID	
7	Brandon Rodriguez	1000122194	Oficial	Gaitan	Safrid	
8	Jeimer Cortes Blanco	1233240128	OFICIAL	Gaitan	SAFRID	
9	Sayi Silgado	54847/14	Oficial	Gaitan	Safrin	
10	Heli Ramirez	79734766	Ayudante	Gaitan	Safrin	Heli R
11	Luis Tellez	3166236	OF	Gaitan	Safrid	
12	Ernesto Ruiz	31594599	Ayudante	Happy		Ernesto
13	Ruben Garrido	1048943498	Oficial	Happy	Safrid	Ruben O. G
14						
15						
16						

NOTA:
* En caso de requerirse anexar mas casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
* Para las actividades ejecutadas de manera virtual, se tomará el registro del formulario como firma.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Cargo: Apoyo SST	Cargo: Coordinador(a) Gestión Integral SST	Cargo: Coordinador(a) Talento Humano

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	LISTADO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TTH-009	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		02	02/08/2017	14/03/2023

TEMA:	ATUBAS - EPCC	RESPONSABLE:	YAVIN HURTADO
FECHA:	SEMANA 28.	TIEMPO DE DURACIÓN:	15 MINUTOS.

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X	INDUCCIÓN:		REINDUCCIÓN:		OTRO, ¿CUÁL?:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	SEDE	EMPRESA	FIRMA*
1	Gregorio Paz	28451969	Ayudante	J. Gaitan	Safrid	Amilkar
2	Wilfredo Torres F.	18 524899	oficial	J. GAITAN	Sofrid	Wilfredo Torres F
3	Saul Silgado	5484714	Oficial	J Gaitan	safrid	
4	Jose Reyes	5467695	oficial	J. Gaitan	Safrid	Jose Reyes
5	Luis Mendoza	17971346	Oficial	J GAITAN	Safrid	
6	Yordi Gonzalez	7033752988	maestro	J Gaitan	Safrid.	
7	Brayan Rodriguez	1013541983	operador	J Gaitan	Safrid	
8	RUBEN GARRIDO	1048943498	OFICIAL	RAFAEL JIMENEZ	SAFRID	Ruben. O.G TSA
9	LUIS ALEJANDRO Z	7979015	ayudante	Rafael Gimenez	SAFRID	
10	SANTIAGO ORTIZ A.	1023965465	OFICIAL	RAFAEL GIMENEZ	SAFRID	A - TSA.
11	VICTOR MARTINEZ	5004385	AYUDANTE	GIMENEZ	SAFRID	
12	Victor Navares	1022989126	oficial	Rafael Bernal Jimenez	Safrid	
13	Victor Hugo Rodriguez	1012317460	Soldador	Rafael Bernal Jimenez	Safrid	TSA.
14	SANCHEZ PUENTES Cristian	1030609700	OFICIAL MANTENIMIENTO	RAFAEL JIMENEZ	SAFRID	TSA
15						
16						

NOTA:
* En caso de requerirse anexar mas casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
* Para las actividades ejecutadas de manera virtual, se tomará el registro del formulario como firma.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
[illegible]	[illegible]	[illegible]
CARGO: Auxiliar SSTA	CARGO: Prof. [illegible] Integral / Coord. SSTA	CARGO: Coordinadora(s) Talento Humano

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	LISTADO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TTH-009	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		02	02/08/2017	14/03/2023

TEMA:	SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS.	RESPONSABLE:	YAVIN HUERTAS
FECHA:	SEMANA 32	TIEMPO DE DURACIÓN:	20 MINUTOS

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X	INDUCCIÓN:		REINDUCCIÓN:		OTRO, ¿CUÁL?:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	SEDE	EMPRESA	FIRMA*
1	Juan Ricardo Olivares B	93207442	Ayudante	SAN JOSE NORTE	SAFRID	Ricardo Olivares
2	Narcitho Palencia	1052974447	instalador	SAN JOSE NORTE	Safrid	Narcitho Palencia
3	Thay chitiva	80091276	Ayudante	S. Jose Norte	Safrid	Thay Ch.
4	Oscar Juan Caita cerca	80815114	instalador Ayuda	San jose norte	safrid	Oscar Caita N.
5	Javier Alberto Bolaños	93154237	Ayudante	San jose norte	safrid	
6	Fabian Zambrano	1022376863	Ayudante	SAN JOSE NORTE	SAFRID	
7	William Caseres	80130525	Ayudante.	San Jose	Techos y cubiertas	
8	CARLOS CARRILLO	1019009930	INSTALADOR	SAN JOSE	TECHOS	
9	Ramiro A Martinez	1002758242	Ayudante	Simon Bolivar	Safriol	Ramiro A
10	Henry Jose Rodriguez	1050462255	Ayudante	Simon Bolivar	safrid	Henry Jose
11	Alexander SILVA	1207456	OFICIAL	Garces	Safrid	
12	Gustavo Vizcaya	6426629	Oficial	Garces	safrid	Gustavo Vizcaya
13	Manuel Alis Ortiz	1007570493	Tecnico	Garces	safrid	
14	Alberto Guerrero	5496449	Maestro	Francisco	Atme	
15	Nicolas Guerrero	1025242316	ayudante	Francisco	Atme	
16	Cristian Camilo Rivera	1072364886	Tecnico	Francisco	Safrid	Cristian Riveros

NOTA:
* En caso de requerirse anexar mas casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
* Para las actividades ejecutadas de manera virtual, se tomará el registro del formulario como firma.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	LISTADO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TTH-009	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		02	02/08/2017	14/03/2023

TEMA:	ORDEN Y ASEO	RESPONSABLE:	YADIN MORENO
FECHA:	SEMANA 29.	TIEMPO DE DURACIÓN:	10 MINUTOS X GRUPOS

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X	INDUCCIÓN:		REINDUCCIÓN:		OTRO, ¿CUÁL?:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	SEDE	EMPRESA	FIRMA
1	Arlen Mendez	17953417	Oficial	S Norte	SAFRID	
2	Odelson Narvaez	1023723488	ayudante	S Norte	Safrid	
3	Lilibeth Baski Meza	1051421003	ayudante	S norte	SOFRID	Lilibeth Baski
4	Alberto Narvaez	1004094263	Oficial	S Norte	Safrid.	
5	Yeison Espejo G.	1033732481	oficial	S. Norte	Safrid	Yeison Espejo.
6	Jesús Gonzalez	6686448	Ayudante	Floridad Blanca	Safrid	
7	Antonio Leon	6195402	Ayudante	Floridad Blanca	Safrid	Antonio
8	Abel de Jesus	8011223	Oficial	Floridablanca	Safrid	
9	Jose Gil	5900517	Oficial	Florida	Sofrid	
10	Juan Sandoval Caballero	7239531	Ayudante	Floridablanca	Safrid	Juan
11	Edwin Vera Rodriguez Vera R.	1120573844	Ayudante	Rafael.	Safrid	
12	Jesús A Alvarado	1097391613	Oficial	Rafael B.	Safrid.	Andres Alvarado M
13	Omar Rivera	79769369	Oficial	Rafael B	Safrid	Omar Rivera
14	Dylan Hortua	1073093278	ayudante	Rafael B	Safrid	Dylan Hortua
15	Alberto Reina	79961620	Oficial	Rafael B.	Safrid.	
16						

NOTA:
En caso de requerirse anexar mas casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
Para las actividades ejecutadas de manera virtual, se tomará el registro del formulario como firma.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
[illegible]	[illegible]	[illegible]
CARGO: Apoyo SGSTA	CARGO: Prof. Gestión Integral Calidad SGSTA	CARGO: Coordinador(a) Talento Humano

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	LISTADO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	FR-TTH-009	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		02	02/08/2017	14/03/2023

TEMA:	5 REGLAS DE ORO	RESPONSABLE:	YAVIN H. MEDINA.
FECHA:	SEMANA 30	TIEMPO DE DURACIÓN:	20 MINUTOS. CADA

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X	INDUCCIÓN:		REINDUCCIÓN:		OTRO, ¿CUÁL?:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	SEDE	EMPRESA	FIRMA*
1	Heli Ramirez	74774766	Ayudante	GAITAN	SAFRID	Heli Ramirez
2	Gregorio Paz	28451869	Ayudante	Gaitan	SAFRID	
3	Saul Sisgado	5484714	Oficial	GAITAN	SAFRID	
4	Luis Telles	7166234	OF	GAITAN	SAFRID	
5	Yoydi Giraldo	1033752487	maestro	GAITAN	SAFRID	
6	Jose Miguel Alonso	1033720983	Maestro	GAITAN	SAFRID	Jose Miguel
7	Adrianny Parra	5906311	Ayudante	GAITAN	SAFRID	
8	Luis Mendoza	17971346	Oficial	GAITAN	SAFRID	
9	Jean carlos Blanco	1235241286	OFICIAL	GAITAN	SAFRID	Jean carlos Blanco
10	Fabian Giraldo	1002868880	Ayudante	GAITAN	SAFRID	
11	Jose Reyes	5467675	Oficial	Gaitan	Safrid	
12	Manuel Marquez	1022932496	Oficial	Gaitan	Sastoque	
13	Brayan Rodriguez	1000122194	Oficial	Gaitan	Sastoque	
14	Cristian Camilo Pinzon	1022369886	Tecnico	(ALBA)	SAFRID	Cristian Pinzon
15	Elio Niño	4255302	Tecnico	(ALBA)	SAFRID	Elio Niño
16	David Niño	1024698582	tecnico	Galdas	safrid	

NOTA:
* En caso de requerirse anexar mas casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
* Para las actividades ejecutadas de manera virtual, se tomará el registro del formulario como firma.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
CARGO: Auxiliar SST	CARGO: Prof. Gestión Integral / Coord. SST	CARGO: Coordinador(a) Talento Humano

ANEXO III. EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN INTERVENTORÍA

GNG Grupo Empresarial	**PROGRAMA DE CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTO, INDUCCIONES Y REINDUCCIONES**	**CÓDIGO**	**FR-TTH-013**	
		N. VER	**F.APROB**	**F. REV**
		6	**1/02/2018**	**17/02/2023**

OBJETIVO: Desarrollar habilidades y competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, generando oportunidades de formación que promuevan el desarrollo personal, profesional, la sana convivencia y el mejoramiento de las condiciones de seguridad, salud en el trabajo, ambiente, pesv y calidad.


META: Cumplir con el 90% de las capacitaciones programadas para GNG INGENIERIA SAS en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente, pesv y Calidad; logrando una cobertura del 75% de los colaboradores y una meta de eficacia de 3 puntos y de esta manera fortalecer sus competencias.


ALCANCE: El presente Programa de capacitación, inducción y reinducción es de aplicación para todo el personal que trabaja en la empresa GNG Ingenieria S.A.S, GNG Ingenieria Servicios S.A.S y sus Consorcios.

FECHA ELABORACIÓN: 19/01/2023 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18/09/2023**

TEMA	TIPO DE FORMACIÓN	PROCESO RESPONSABLE	CAPACITADOR	PERSONAL CAPACITADO	PROGRAMACIÓN	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
						COB	CUM	COB	CUM	COB	CUM	COB	CUM	COB	CUM	COB	CUM	COB	CUM	COB	CUM	COM	CUM	COB	CUM	COB	CUM	COB	CUM
Inducción: Políticas, Objetivos, Misión, Visión, Alcance, organigrama, Roles y Responsabilidades dentro del SIG, Procedimiento de control de documentos y registro, Procedimiento de no conformes y Procedimiento de acciones correctivas y de mejoras y Divulgación de la Documentación de los procesos - Seguimiento	INDUCCION	Coordinación Gestion Integral, SST, Ambiental, Administrativa, Talento Humano, Sistemas, Proyectos, Contabilidad, Licitaciones, Jurídico		NUEVOS INGRESOS PERSONAL CON NOVEDADES DE VINCULACIÓN Y/O FRENTES DE TRABAJO	Programado	26	1	24	1	15	1	6	1	6	1	5	1		1		1		1		1		1		1
					ejecutado	26	1	23	1	15	1	6	1	6	1	5	1		1		1								
					Promedio evaluación																								
Reinducción: Políticas, Objetivos, Misión, Visión, Alcance, organigrama, y Roles y Responsabilidades dentro del SIG, Procedimiento de control de documentos y registro, Procedimiento de no conformes y Procedimiento de acciones correctivas y de mejoras y Divulgación de la Documentación de los procesos	REINDUCCION	Coordinación Gestion Integral, SST, Ambiental, Administrativa, Talento Humano, Sistemas, Proyectos, Contabilidad, Licitaciones, Jurídico	DIRECTORES Y COORDINADORES AREA	TODO EL PERSONAL	Programado					240	1																		
					ejecutado					240	1																		
					Promedio evaluación					4																			
FINANZAS PERSONALES	CAPACITACIÓN	PROVEEDOR EXTERNO		TODO EL PERSONAL	Programado																				1				
					ejecutado																								
					Promedio evaluación																								
BRIGADA DE EMERGENCIA	CAPACITACIÓN	SSTAC	SOFIA BARRERA	BRIGADISTAS	Programado			14	1			20	1			14	1				1				1				
					ejecutado			10	1			25	1			8	1				1								
					Promedio evaluación			4				5				4													
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	CAPACITACIÓN	SSTAC	DINDY QUINTERO	TODO EL PERSONAL	Programado			226	1																				
					ejecutado			171	1																				
					Promedio evaluación			4																					
SEGURIDAD VIAL	CAPACITACIÓN	SSTAC	HEVER ACEVEDO	TODO EL PERSONAL	Programado											175	1										1		
					ejecutado											136	1												
					Promedio evaluación											4													
ATENCIÓN EMERGENCIAS	CAPACITACIÓN	SSTAC	SOFIA BARRERA	TODO EL PERSONAL	Programado							212	1								1								
					ejecutado							177	1								1								
					Promedio evaluación							4																	
AMBIENTAL	CAPACITACIÓN	SSTAC	Carlos Calvete	TODO EL PERSONAL	Programado									237	1								1						
					ejecutado									160	1														
					Promedio evaluación									3															
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CAPACITACIÓN	SSTACC		TODO EL PERSONAL	Programado										1												1		
					ejecutado										0														
					Promedio evaluación																								
DME, PAUSAS ACTIVA, E HIGIENE POSTURAL	CAPACITACIÓN	SSTAC		TODO EL PERSONAL	Programado														1										
					ejecutado														1										
					Promedio evaluación																								
RIESGO PSICOSOCIAL	CAPACITACIÓN	SSTAC	KELLYN REAL	TODO EL PERSONAL	Programado							212	1								1								
					ejecutado							174	1							117	1								
					Promedio evaluación							4																	
COPASST	CAPACITACIÓN	SSTAC		COPASST	Programado																1								
					ejecutado																1								
					Promedio evaluación																								
CCL	CAPACITACIÓN	SSTAC		CCL	Programado																1								
					ejecutado																1								
					Promedio evaluación																								
CONTRATACION LABORAL	CAPACITACIÓN	RRHH		COORDINADORES AREA, PROYECTOS (Directores, Coordinadores)	Programado																		1						
					ejecutado																								
					Promedio evaluación																								
USO Y MANTENIMIENTO DE EPI´S	CAPACITACIÓN	SSTAC		PROYECTOS SISTEMAS PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO ARCHIVO	Programado														1										
					ejecutado														1										
					Promedio evaluación																								
CURSOS LIBRES	ENTRENAMIENTO	SSTAC Y RRHH		PERSONAL INTERESADO	Programado																								
					ejecutado																								
					Promedio evaluación																								
PROGRAMA SIIGO PYME Y NUBE	ENTRENAMIENTO	RRHH	ALEJANDRO OVALLE	PERSONAL RRHH Y CONTABILIDAD	Programado					13	1																		
					ejecutado					5	1																		
					Promedio evaluación																								
ENTRENAMIENTO PROEYCTOS	ENTRENAMIENTO	RRHH		PESONAL DE PROYECTOS	Programado																								1
					ejecutado																								
					Promedio evaluación																								
ENTRENAMIENTO PROCESO LICITACIONES	ENTRENAMIENTO	RRHH Y GERENCIA		PERSONAL LICITACIONES	Programado																								1
					ejecutado																								
					Promedio evaluación																								
ENTRENAMIENTO PROCESO CONTABLE	ENTRENAMIENTO	RRHH		CONTABILIDAD	Programado																								
					ejecutado																								
					Promedio evaluación																								
ENTREMIENTO PROCESO SSTAC	ENTRENAMIENTO	SSTAC	SECRETARIA DE AMBIENTE	PERSONAL SSTAC	Programado											19	1												
					ejecutado											14	1												
					Promedio evaluación											4													
Reporte de No Conformidades y Acciones correctivas, preventivas y de mejora: Análisis de causas	CAPACITACIÓN	GESTION INTEGRAL	HUGO GALVIS	TODO EL PERSONAL	Programado					221	0																		
					ejecutado					173	1																		
					Promedio evaluación					4																			
ACPM_FR-SSTAC-044_ACAUSAS	CAPACITACIÓN	GESTION INTEGRAL	HUGO GALVIS	TODO EL PERSONAL	Programado							212																	
					ejecutado							159	1																

| | | |

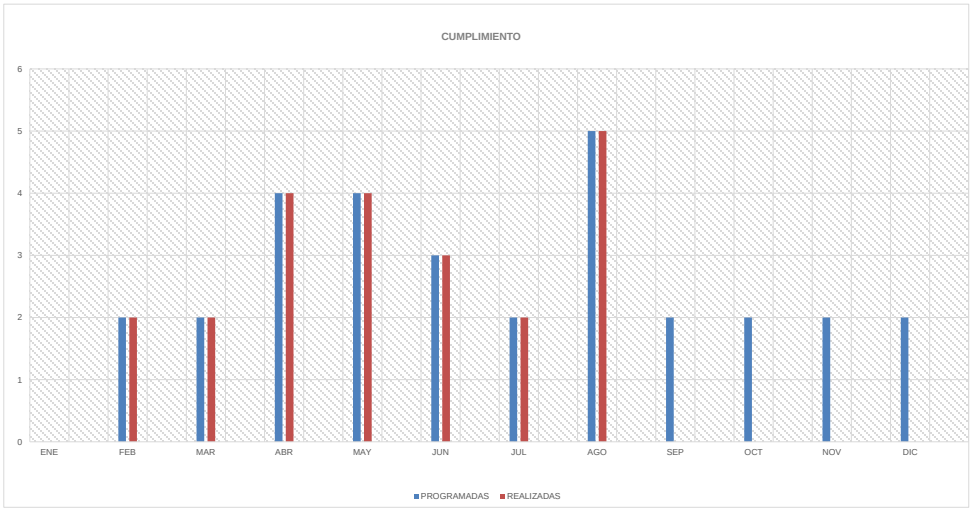

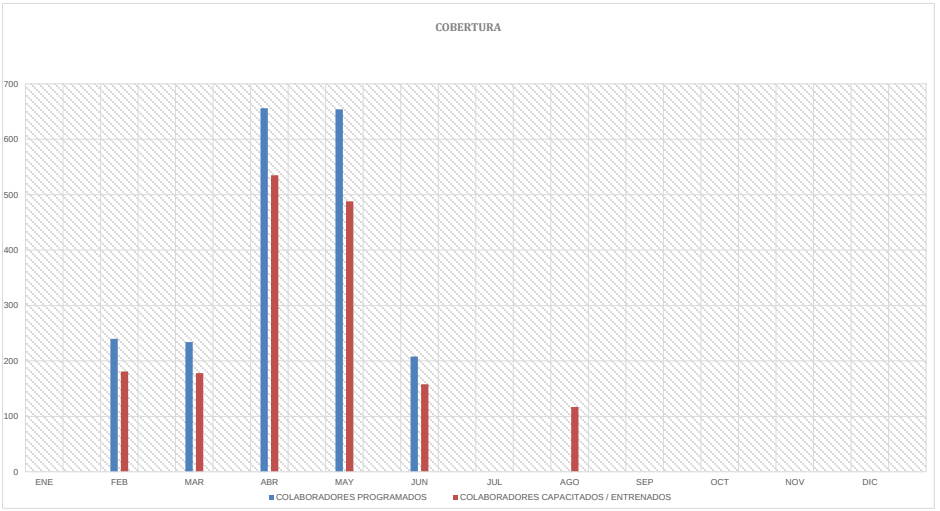

Realizado Por:	Vo Bo. COPASST	Vo Bo. COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL	Aprobado Por:
REALIZADO POR	REVISADO POR		APROBADO POR
Johanna Arciniegas / Melissa Chavarro	Julieth Porras / Fanny Almanzar Bonilla		Mileth Escalante
CARGO: Coordinador Talento Humano / Coordinador Talento Humano Junior	Coordinador Coordinador SSTAC / Profesional Gestión Integral		CARGO: Coordinador Gestión Integral
VoBo.	VoBo.		VoBo.

Marca temporal	Puntuación	Nombre del Trabajador	Correo Electrónico	Numero de Identificaci	Cargo (Trabajador)	Nombre Expositor (Indi
8/10/2023 16:50:21	15 / 25	MANUEL ANTONIO G	DIRECTOR1.GNG@G	1152447887	COORDINADOR DE P	PAOLA ANDREA RAM
8/10/2023 17:07:48	20 / 25	Rodolfo castro Ortegón	rodolfo.castro.gng@gr	1015410729	Residente Técnico	Paola Andrea Ramírez
8/11/2023 8:28:32	15 / 25	Luis Felipe Lavado Alfo	auxiliar9.gng@gmail.co	1014264625	aux Ingeniería	Paola Andrea Ramírez
8/11/2023 8:53:04	15 / 25	Natalia Caderón Aceve	inspector2.cic2022@gr	1015474687	Inspector interventoria	Paola Andrea Ramírez
8/11/2023 12:26:19	15 / 25	Monica Gómez Rodrígu	ssta4.gng@gmail.com	1069099276	Profesional SSTA	Paola Ramírez
8/15/2023 9:46:39	15 / 25	Geraldine Daniela Que	inspectorssta.gng@gm	1073527297	trabajador	Paola Andrea Ramirez
8/16/2023 12:03:48	20 / 25	CAMILO ANTONIO SA	Residente14@gng.com	1051474958	Residente Tecnico	PAOLA ANDREA RAM
8/16/2023 12:03:48	20 / 25	NATALIA VANESSA C	inspectorccr@gng.com	1015474687	Inspector	PAOLA ANDREA RAM
8/16/2023 12:03:48	20 / 25	EDISON CALDERON C	inspectorccr@gng.com	79403208	Inspector	PAOLA ANDREA RAM
8/16/2023 12:03:48	20 / 25	YANIN NATHALIA HUE	inspectorssta@gng.cor	21047776	Inspector SSTA	PAOLA ANDREA RAM
8/16/2023 12:03:48	20 / 25	FREDY GIOVANNI RO	fredy.rodriguez@gng.c	80539072	Director de Proyectos	PAOLA ANDREA RAM
8/16/2023 12:03:48	20 / 25	LUIS FELIPE LAVADO	felipe.lavado@gng.com	1014264625	AUXILIAR DE INGENE	PAOLA ANDREA RAM

Tipo de Actividad	Fecha	Tema	Duración	Sede	EMPRESA:(Seleccione	**1. Los tipos de hemor**
Capacitacion	10/08/2023	ATENCIÓN EMERGEN	1 HORA Y 15 MINUTO	BOGOTA	Gng Ingeneria Servicio	C. Arterial, venosa y ca
Capacitacion	10/08/2023	Atención Emergencias	1 h	Bogotá	Gng Servicios de Inger	C. Arterial, venosa y ca
Capacitacion	11/08/2023	Atención Emergencias	1 hora	Oficina principal	Gng Ingeneria Servicio	C. Arterial, venosa y ca
Capacitacion	10/08/2023	Atención Emergencias	1h	Bogotá	Consorcio Inter colegio	C. Arterial, venosa y ca
Capacitacion	10/08/2023	Emergencias	1 hora	Bogotá	Gng Servicios de Inger	C. Arterial, venosa y ca
Capacitacion	11/08/2023	Atencion emegencias	1 hota	Bogotá	Gng Servicios de Inger	C. Arterial, venosa y ca
Capacitacion	10/08/2023	ATENCIÓN EMERGEN	1 HORA	Bogota	Consorcio Inter colegio	C. Arterial, venosa y ca
Capacitacion	10/08/2023	ATENCIÓN EMERGEN	1 HORA	Bogota	Consorcio Inter colegio	C. Arterial, venosa y ca
Capacitacion	10/08/2023	ATENCIÓN EMERGEN	1 HORA	Bogota	Consorcio Inter colegio	C. Arterial, venosa y ca
Capacitacion	10/08/2023	ATENCIÓN EMERGEN	1 HORA	Bogota	Consorcio Inter colegio	C. Arterial, venosa y ca
Capacitacion	10/08/2023	ATENCIÓN EMERGEN	1 HORA	Bogota	Consorcio Inter colegio	C. Arterial, venosa y ca
Capacitacion	10/08/2023	ATENCIÓN EMERGEN	1 HORA	Bogota	GNG INGENERIA SER	C. Arterial, venosa y ca

2. Son tipos de herida	3. Las quemaduras pc	4. Las quemaduras sc	5. Tipos de piel que se ven afectadas en una quemadura.
A. Abierta y cerrada	B. Falso	A. Primer, segundo y te	B. Epidermis, dermis, hipodermis
B. Contusión y abrasión	B. Falso	C. Graves y leves	B. Epidermis, dermis, hipodermis
A. Abierta y cerrada	B. Falso	A. Primer, segundo y te	B. Epidermis, dermis, hipodermis
B. Contusión y abrasión	A. Verdadero	A. Primer, segundo y te	B. Epidermis, dermis, hipodermis
B. Contusión y abrasión	A. Verdadero	A. Primer, segundo y te	B. Epidermis, dermis, hipodermis
A. Abierta y cerrada	B. Falso	A. Primer, segundo y te	B. Epidermis, dermis, hipodermis
B. Contusión y abrasión	B. Falso	A. Primer, segundo y te	B. Epidermis, dermis, hipodermis
B. Contusión y abrasión	B. Falso	A. Primer, segundo y te	B. Epidermis, dermis, hipodermis
B. Contusión y abrasión	B. Falso	A. Primer, segundo y te	B. Epidermis, dermis, hipodermis
B. Contusión y abrasión	B. Falso	A. Primer, segundo y te	B. Epidermis, dermis, hipodermis
B. Contusión y abrasión	B. Falso	A. Primer, segundo y te	B. Epidermis, dermis, hipodermis
B. Contusión y abrasión	B. Falso	A. Primer, segundo y te	B. Epidermis, dermis, hipodermis

Marca temporal	Puntuación		Nombre del Trabajador	Correo Electrónico
8/24/2023 17:35:57		25 / 25	Rodolfo castro Ortegón	Rodolfo.castro.gng@gr
8/25/2023 7:50:15		25 / 25	Geraldine Daniela Que	Inspectorssta.gng@gm
8/25/2023 9:10:59		10 / 25	Natalia Calderon	inspector2.cic2022@gr
8/25/2023 10:17:47		25 / 25	Fredy Giovanni Rodrigu	fredy.rodriguez.gng@g
8/25/2023 17:09:51		25 / 25	MONICA GOMEZ ROD	ssta4.gng@gmail.com
8/30/2023 18:22:43		25 / 25	MANUEL ANTONIO G	manuel.gonzalez@gng
8/30/2023 13:22:43		25 / 25	luis felipe lavado alfons	felipe.lavado@gng.com
8/30/2023 13:22:43		25 / 25	Yanin Nathalia Huertas	inspectorssta@gng.cor
8/30/2023 13:22:44		25 / 25	camilo antonio samaca	residente_12@gng.con
8/30/2023 13:22:43		25 / 25	natalia vanessa calderc	inspector12@gng.com.
8/30/2023 13:22:43		25 / 25	edison calderon castañ	inspector14@gng.com.

Numero de Identificaci	Cargo (Trabajador)	Nombre Expositor (Lin	Tipo de Actividad
1015410729	Residente Técnico	Lina Casanova	Capacitación
1073527297	Trabajador	Lina casanova	Capacitación
1015474687	Inspector de intervento	Lina Casanova	Capacitación
80539072	Director	Lina CAsanova	Capacitación
1069099276	Profesional SSTA	Lina Casanova	Capacitación
1152447887	COOORDINADOR DE	LINA CASANOVA	Capacitación
1026264858	auxiliar de ingeneria	LINA CASANOVA	Capacitación
21047776	inspector ssta	LINA CASANOVA	Capacitación
1051474958	Residente Tecnico	LINA CASANOVA	Capacitación
1015474687	inspector tecncio	LINA CASANOVA	Capacitación
79403208	inspector tecncio	LINA CASANOVA	Capacitación

Fecha	Tema	Duración	Sede
24/08/2023	Capacitación Riesgo P	1 H	Bogotá
24/08/2023	Capacitacion riesgo psi	1 hor	Bogotá
24/08/2023	Riesgo Psicosocial	1h	Bogotá
24/08/2023	Riesgo Psicosocial	1 hora	Bogota
24/08/2023	Riesgo psicosocial	1 hora	Bogota
24/08/2023	RIESGO PSICOSOCIA	1 HORA	BOGOTA
24/08/2023	RIESGO PSICOSOCIA	1 HORA	Bogota
24/08/2023	RIESGO PSICOSOCIA	1 HORA	Bogota
24/08/2023	RIESGO PSICOSOCIA	1 HORA	Bogota
24/08/2023	RIESGO PSICOSOCIA	1 HORA	Bogota
24/08/2023	RIESGO PSICOSOCIA	1 HORA	Bogota

EMPRESA:(Seleccione	1. ¿Qué es la tolerancia	2. Seleccionar las actitu	3. Los siguientes son m
Gng Servicios de Ingen	B. Hace referencia a cc	A. Agresividad, Desorg	E. B Y C Son Correcta
Gng Servicios de Ingen	B. Hace referencia a cc	A. Agresividad, Desorg	E. B Y C Son Correcta
Consorcio inter colegio	B. Hace referencia a cc	B. Adaptación a la frust	C. Ansiedad, Racionali
Gng Ingeniera S.A.S	B. Hace referencia a cc	A. Agresividad, Desorg	E. B Y C Son Correcta
Gng Servicios de Ingen	B. Hace referencia a cc	A. Agresividad, Desorg	E. B Y C Son Correcta
GNG INGENERIA SER	B. Hace referencia a cc	E. A y D son correctas.	E. B Y C Son Correcta
gng ingeneria servicios	B. Hace referencia a cc	E. A y D son correctas.	E. B Y C Son Correcta
Consorcio inter colegio	B. Hace referencia a cc	E. A y D son correctas.	E. B Y C Son Correcta
Consorcio inter colegio	B. Hace referencia a cc	E. A y D son correctas.	E. B Y C Son Correcta
Consorcio inter colegio	B. Hace referencia a cc	E. A y D son correctas.	E. B Y C Son Correcta
Consorcio inter colegio	B. Hace referencia a cc	E. A y D son correctas.	E. B Y C Son Correcta

4. La siguiente se cons 5. ¿Qué debe tener el árbol de la vida?, ¿Cuál es el orden correcto?
H. Todas las Opciones B. Logros, Objetivos, Herramientas, Bases
H. Todas las Opciones B. Logros, Objetivos, Herramientas, Bases
H. Todas las Opciones A. Principios y valores, Logros, bases y herramientas.
H. Todas las Opciones B. Logros, Objetivos, Herramientas, Bases
H. Todas las Opciones B. Logros, Objetivos, Herramientas, Bases
B. Cambiar la actitud ŀ A. Principios y valores, Logros, bases y herramientas.
B. Cambiar la actitud ŀ A. Principios y valores, Logros, bases y herramientas.
B. Cambiar la actitud ŀ A. Principios y valores, Logros, bases y herramientas.
B. Cambiar la actitud ŀ A. Principios y valores, Logros, bases y herramientas.
B. Cambiar la actitud ŀ A. Principios y valores, Logros, bases y herramientas.
B. Cambiar la actitud ŀ A. Principios y valores, Logros, bases y herramientas.

ANEXO IV. SOPORTE INSPECCIÓN EPP AGOSTO

GNG Ingeniería S.A.S.	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO	FR-SSTAC-013	
		N° VER	F. APROB	F. REV.
		2	6/09/2017	7/02/2022

UBICACIÓN:	Colegio Floridablanca	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN:	Verificación avance de obra en: Instalación de mampostería, instalación de bordrillos, soldadura de perfilería.

Por favor coloque las siguientes letras en los elementos acorde a la inspección realizada:

B= BUENO: E.P.P EN OPTIMAS CONDICIONES
R= REGULAR: E.P.P ALGO DETERIODADO
M= MALO: E.P.P. DAÑADO (PARA DESECHAR)
N/A= NO APLICA

FECHA			NOMBRE	CEDULA	CARGO	Ojos	Oídos		Cara		Cabeza		Manos				Brazos	Pies				Piernas	Cuerpo					Trabajo en Alturas				OBSERVACIÓN
							Protector Auditivo						Guantes					Botas														
						Gafas de seguridad	Inserción	Tipo copa	Mascarilla N95	Protector nasobucal	Casco de seguridad	Casco de moto	Industriales C35 de caucho	De moto	Poliuretano o poliuretano	Nitrilo o latex	Coderas	Seguridad	Pantaneras de seguridad	Zapatos antideslizantes	De moto	Rodilleras	Impermeable	Chaleco con protector de espalda	Camisa	Pantalón	Chaleco o chaqueta	Arnés	Eslinga	Línea de vida	Casco de seguridad con barbiquejo	
10	8	23	Fredy Rodríguez	80539072	Director de interventoría	x	x				x							x									x					Epp en óptimas condiciones
10	8	23	Camilo Samacá	1051474958	Residente de interventoría	x	x				x							x									x					Epp en óptimas condiciones
10	8	23	Yanin Huertas	21047776	Inspector SST	x	x				x							x									x					Epp en óptimas condiciones
10	8	23	Natalia Calderon	1015474687	Inspector de interventoría	x	x				x							x									x					Epp en óptimas condiciones
10	8	23	Rodolfo Castro	1015410729	Residente de interventoría	x	x				x							x									x					Epp en óptimas condiciones
10	8	23	Edison Calderón	79403208	Inspector de interventoría	x	x				x							x									x					Epp en óptimas condiciones
10	8	23	Edwin Nuñez A.	1122402572	Inspector de interventoría	x	x				x							x									x					Epp en óptimas condiciones

INPECCION REALIZADA POR:	Yanin Huertas	CARGO:	Inspector SST	FIRMA:	

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Julieth Porras	Mileth Escalante/Karen Barbosa	Julieth Porras / Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR SSTA	CARGO: COORDINADORA GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: COORDINADOR SSTA / GERENTE
VoBo.	VoBo.	VoBo.

ANEXO V. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PAGADAS.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901649961-8	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	CRA49 104B-49	7122685	RHUMANOS@GNG.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	16/08/2023	69640411	$4.094.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	34.100	0		0		0	1	100	0	34.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	73.000	0		0		0	1	100	0	73.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	127.000	0		0		0	1	200	0	127.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	285.200	0		0		0	1	400	0	285.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.076.600	0	0	24.800	24.800	1	2.400	200	2.128.800	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	903.500				903.500	1	1.100	904.600			9.035	904.600	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	540.600	1	700	541.300	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	519.300	520.100
Pensión	1	2.126.200	2.128.800
Riesgos Laborales	1	903.500	904.600
CCF	1	540.600	541.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.089.600	4.094.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901649961-8	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022		CRA49 104B-49	7122685	RHUMANOS@GNG.COM.CO
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	16/08/2023	69640411	$4.094.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015474687	CALDERON ACEVEDO NATALIA VANESSA	1	0			S																	230301	1.825.000	292.000	0	0	0	0	EPS008	1.825.000	73.000	14-25	1.825.000	5	127.100	CCF24	1.825.000	73.000	0	0	0	0	0
2	CC	1051474958	SAMACA PESCA CAMILO ANTONIO	1	0			S																	230301	4.954.666	792.800	0	0	24.800	24.800	EPS037	4.954.666	198.200	14-25	4.954.666	5	344.900	CCF24	4.954.666	198.200	0	0	0	0	0
3	CC	1075627522	FANDIÑO HERNANDEZ CAMILO	1	0			S	X																230301	1.216.667	194.700	0	0	0	0	EPS017	1.216.667	48.700	14-25	1.216.667	5	84.700	CCF24	1.748.959	70.000	0	0	0	0	0
4	CC	1122402572	NUÑEZ AMAYA EDWIN YESITH	1	0			S	X																230301	851.667	136.300	0	0	0	0	EPS002	851.667	34.100	14-25	851.667	5	59.300	CCF24	851.667	34.100	0	0	0	0	0
5	CC	21047776	HUERTAS MEDINA YANIN NATHALIA	1	0			S	X																230301	1.956.000	313.000	0	0	0	0	EPS017	1.956.000	78.300	14-25	1.956.000	5	136.200	CCF24	1.956.000	78.300	0	0	0	0	0
6	CC	79403208	CALDERON CASTAÑEDA EDISON	1	0			S																	230301	2.173.333	347.800	0	0	0	0	EPS037	2.173.333	87.000	14-25	2.173.333	5	151.300	CCF24	2.173.333	87.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	CAJA V	003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	16/08/2023	69910590	$5.004.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	160.800	0		0		0	12	2.200	0	163.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	322.000	0		0		0	12	4.400	0	326.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	206.800	0		0		0	12	2.800	0	209.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	643.200	0	0	0	0	12	8.700	0	651.900	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.115.200	0	0	0	0	12	28.600	0	2.143.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	920.200				920.200	12	12.500	932.700			9.202	932.700	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	569.800	12	7.700	577.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	689.600	699.000
Pensión	2	2.758.400	2.795.700
Riesgos Laborales	1	920.200	932.700
CCF	1	569.800	577.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.938.000	5.004.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	CAJA V	003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	16/08/2023	69910590	$5.004.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1069099276	GOMEZ RODRIGUEZ MONICA MARCELA DE LOS ANGELES	1	0			S																	230201	4.020.000	643.200	0	0	0	0	EPS008	4.020.000	160.800	14-25	4.020.000	5	279.800	CCF24	4.020.000	160.800	0	0	0	0	0
2	CC	1109491513	CANDIA MARIN LINER FABIAN	1	0			S		X															230301	1.150.000	184.000	0	0	0	0	EPS017	1.150.000	46.000	14-25	1.150.000	5	80.100	CCF24	2.173.000	87.000	0	0	0	0	0
3	CC	52774285	IPUZ FORERO NANCY CONSTANZA	1	0			S																	230301	4.020.000	643.200	0	0	0	0	EPS005	4.020.000	160.800	14-25	4.020.000	5	279.800	CCF24	4.020.000	160.800	0	0	0	0	0
4	CC	1018402224	CARDENAS LORA VANESSA PAOLA	1	0			S												X					230301	4.020.000	643.200	0	0	0	0	EPS017	4.020.000	160.800	14-25	4.020.000	5	0	CCF24	4.020.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	92188831	BENITEZ ARCOS JADER WADITH	1	0			S																	230301	4.030.000	644.800	0	0	0	0	EPS008	4.030.000	161.200	14-25	4.030.000	5	280.500	CCF24	4.030.000	161.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS	CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG104	GNG104	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	27/07/2023	69611738	$2.077.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	260.000	0		0		0	0	0	0	260.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.040.000	0	0	32.500	32.500	0	0		1.105.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	452.400				452.400	0	0	452.400			4.524	452.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	260.000	0	0	260.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	260.000	260.000
Pensión	1	1.105.000	1.105.000
Riesgos Laborales	1	452.400	452.400
CCF	1	260.000	260.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	2.077.400	2.077.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG104	GNG104	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	27/07/2023	69611738	$2.077.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80539072	RODRIGUEZ SALAZAR FREDY GIOVANNI	1	0			S																	25-14	6.500.000	1.040.000	0	0	32.500	32.500	EPS017	6.500.000	260.000	14-25	6.500.000	5	452.400	CCF24	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0	

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 24 BTA	1	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	16/08/2023	69614036	$1.255.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	160.000	0		0		0	12	2.200	0	162.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	640.000	0	0	0	0	12	8.700	0	648.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	278.400				278.400	12	3.800	282.200			2.784	282.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	160.000	12	2.200	162.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	160.000	162.200
Pensión	1	640.000	648.700
Riesgos Laborales	1	278.400	282.200
CCF	1	160.000	162.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.238.400	1.255.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 24 BTA	1	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	16/08/2023	69614036	$1.255.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015410729	CASTRO ORTEGON RODOLFO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS017	4.000.000	160.000	14-25	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS	CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG 02	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	15/08/2023	69555985	$3.753.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	101.200	0		0		0	11	1.300	0	102.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	350.000	0		0		0	11	4.400	0	354.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	118.400	0		0		0	11	1.500	0	119.900	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	145.000	0		0		0	11	1.800	0	146.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	692.500	0	0	0	0	11	8.600	0	701.100	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.585.600	0	0	43.800	43.800	11	19.700	1.200	1.694.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	72.500				72.500	11	900	73.400			725	73.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	554.600	11	6.900	561.500	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	714.600	723.600
Pensión	2	2.365.700	2.395.200
Riesgos Laborales	1	72.500	73.400
CCF	1	554.600	561.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.707.400	3.753.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG 02	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	15/08/2023	69555985	$3.753.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010037763	CANTOR FRANCO LAURA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS008	1.680.000	67.200	14-25	1.680.000	1	8.800	CCF24	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
2	CC	1010037763	CANTOR FRANCO LAURA ALEJANDRA	1	0			S										X							230301	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS008	120.000	4.800	14-25	120.000	1	0	CCF24	120.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	1075211095	MURCIA CORTES MARTHA MARIA	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1085250609	ALBORNOZ VILLOTA MILENA MERCEDES	1	0			S																	25-14	8.750.000	1.400.000	0	0	43.800	43.800	EPS005	8.750.000	350.000	14-25	8.750.000	1	45.700	CCF24	8.750.000	350.000	0	0	0	0	0
5	CC	24218926	APONTE PAEZ NUBIA INES	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	36312425	SANDINO PUENTES LILIANA	1	0			S																	230301	2.274.480	364.000	0	0	0	0	EPS002	2.274.480	91.000	14-25	2.274.480	1	11.900	CCF24	2.274.480	91.000	0	0	0	0	0
7	CC	36312425	SANDINO PUENTES LILIANA	1	0			S										X							230301	252.720	40.500	0	0	0	0	EPS002	252.720	10.200	14-25	252.720	1	0	CCF24	252.720	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG 37	PRIN	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	15/08/2023	69555967	$7.280.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	300.000	0		0		0	11	3.800	0	303.800	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	600.000	0		0		0	11	7.500	0	607.500	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.200.000	0	0	37.500	37.500	11	14.900	1.000	1.290.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.400.000	0	0	75.000	75.000	11	29.700	2.000	2.581.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.566.000				1.566.000	11	19.400	1.585.400			15.660	1.585.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	300.000	11	3.800	303.800	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	600.000	11	7.500	607.500	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	900.000	911.300
Pensión	2	3.825.000	3.872.600
Riesgos Laborales	1	1.566.000	1.585.400
CCF	2	900.000	911.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	7.191.000	7.280.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG 37	PRIN	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	15/08/2023	69555967	$7.280.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	72007216	GOMEZ FALLA JORGE	1	0			S																	25-14	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS010	7.500.000	300.000	14-25	7.500.000	5	522.000	CCF24	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0
2	CC	72201382	NARVAEZ VELEZ GUILLERMO EMILIO	1	0			S																	230301	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS010	7.500.000	300.000	14-25	7.500.000	5	522.000	CCF06	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0
3	CC	72227511	GONZALEZ FANDIÑO ANTONIO RAFAEL	1	0			S																	25-14	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS005	7.500.000	300.000	14-25	7.500.000	5	522.000	CCF24	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900283268-5	RETIN INGENIERIA SAS		CLL118 #60-51	6404348	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	14/08/2023	69599832	$3.353.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	303.200	0		0		0	0	0	0	303.200	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.027.200	0	0	0	0	0	0		1.027.200	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	905.600	0	0	0	0	0	0		905.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	462.600				462.600	0	0	462.600			4.626	462.600	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	475.200	0	0	475.200	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	483.200	483.200
Pensión	2	1.932.800	1.932.800
Riesgos Laborales	1	462.600	462.600
CCF	1	475.200	475.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.353.800	3.353.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900283268-5	RETIN INGENIERIA SAS		CLL118 #60-51	6404348	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	14/08/2023	69599832	$3.353.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016103945	ACUÑA ARIAS CESAR DAVID	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-7	2.800.000	5	194.900	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
2	CC	1016103945	ACUÑA ARIAS CESAR DAVID	1	0			S										X							230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS008	200.000	8.000	14-7	200.000	5	0	CCF24	200.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	1018437469	VILLALOBOS MEJIA CINDY PAOLA	1	0			S																	25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-7	4.500.000	1	23.500	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
4	CC	1026264858	MONROY MALDONADO ENRIQUE LUIS	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
5	CC	1057606856	AFRICANO BARRERA MARIA ALEJANDRA	1	0			S	X																230301	420.000	67.200	0	0	0	0	EPS008	420.000	16.800	14-7	420.000	5	29.300	CCF24	420.000	16.800	0	0	0	0	0
6	CC	24218926	APONTE PAEZ NUBIA INES	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-7	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	ERU	31	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	09/08/2023	69614017	$3.674.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	68.000	0		0		0	5	400	0	68.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	280.000	0		0		0	5	1.600	0	281.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	64.000	0		0		0	5	400	0	64.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	60.000	0		0		0	5	400	0	60.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	768.000	0	0	0	0	5	4.400	0	772.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.120.000	0	0	0	0	5	6.300	0	1.126.300	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	821.400				821.400	5	4.700	826.100			8.214	826.100	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	472.000	5	2.700	474.700	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	472.000	474.800
Pensión	2	1.888.000	1.898.700
Riesgos Laborales	1	821.400	826.100
CCF	1	472.000	474.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.653.400	3.674.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	ERU	31	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	09/08/2023	69614017	$3.674.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014290968	MUÑOZ GARCIA LADY JULIANA	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-25	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
2	CC	1019092980	FONSECA SUPELANO MILDRED MARCELA	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-25	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
3	CC	1073527297	QUEVEDO GARAY GERALDINE DANIELA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
4	CC	52216119	PEÑA ANDRADE MONICA EUGENIA	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-25	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
5	CC	7314136	CASAS SOLANO ALEX VLADIMIR	1	0			S																	25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-25	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTES	025	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	Y	12/09/2023	70433522	$162.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	161.600				161.600	6	1.100	162.700			1.616	162.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	161.600	162.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	161.600	162.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTES	025	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	Y	12/09/2023	70433522	$162.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13874430	MEZA ROSAS JAIRO ANDRES	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-25	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	17069465	GOMEZ CASAS HERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-25	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S		CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 60	3	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	16/08/2023	69652772	$952.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	72.000	0		0		0	2	200	0	72.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	64.000	0		0		0	2	200	0	64.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	288.000	0	0	0	0	2	700	0	288.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	256.000	0	0	0	0	2	600	0	256.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	133.700				133.700	2	400	134.100			1.337	134.100	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	136.000	2	400	136.400	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	136.000	136.400
Pensión	2	544.000	545.300
Riesgos Laborales	1	133.700	134.100
CCF	1	136.000	136.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	949.700	952.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S		CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 60	3	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	16/08/2023	69652772	$952.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014264625	LAVADO ALFONSO LUIS FELIPE	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-25	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030653585	ALZATE QUEZADA VIVIANA ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-25	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S	CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 16 / 1	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	16/08/2023	69652768	$2.225.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	134.800	0		0		0	2	400	0	135.200	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	152.000	0		0		0	2	400	0	152.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.147.200	0	0	0	0	2	2.600	0	1.149.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	499.100				499.100	2	1.200	500.300			4.991	500.300	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	286.800	2	700	287.500	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	286.800	287.600
Pensión	1	1.147.200	1.149.800
Riesgos Laborales	1	499.100	500.300
CCF	1	286.800	287.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	2.219.900	2.225.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S		CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 16	1	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	16/08/2023	69652768	$2.225.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1152447887	GONZALEZ ROMERO MANUEL ANTONIO	1	0			S																	230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS010	3.800.000	152.000	14-25	3.800.000	5	264.500	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
2	CC	52073626	BELLO MACCHI MARTHA PATRICIA	1	0			S																	230301	3.369.600	539.200	0	0	0	0	EPS005	3.369.600	134.800	14-25	3.369.600	5	234.600	CCF24	3.369.600	134.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Anexo 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (1)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Aplicación de pintura en segundo piso

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (2)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Remates de pintura en estructura metálica.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (3)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Aplicación de estuco en aulas

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (4)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Pulida de media caña en baño de segundo piso.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (5)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Fundida de cárcamo en patio central

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (6)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Instalación de sanitarios en bateria sanitaria

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (7)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Aplicación de pañete en fachada principal

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (8)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Instalación de estructura para cielo raso en recepción.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (9)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Instalación de acometida a tablero eléctrico

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (10)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Aplicación de pintura en aulas.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (11)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Instalación de lámparas en aulas.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (12)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Orden y aseo general.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (13)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Aplicación de pintura en pasillo de aulas.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (14)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Instalación de aparatos sanitarios y accesorios en baños de oficinas.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (155)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Demolición de acabado de piso y desmonte de ventanas.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (16)



Descripción:
IED Garcés Navas – Limpieza de ventanería en sala de profesores.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (167)



Descripción:
IED Garcés Navas – Instalación lámparas en aulas.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (18)



Descripción:
IED Garcés Navas – Instalación de cableado eléctrico.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (19)



Descripción:
IED Garcés Navas – Instalación de cableado eléctrico en biblioteca.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (170)



Descripción:
IED Floridablanca – Excavación manual corredor lado bloque SENA

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (21)



Descripción:
IED Floridablanca – Instalación de teja en aula de música

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (22)



Descripción:
IED Floridablanca – Instalación de tubería en parqueadero.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (23)



Descripción:
IED Floridablanca – Fundida placa anden lado bloque SENA

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (24)



Descripción:
IED Floridablanca – Fundida placa parqueadero.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (2518)



Descripción:
IED Floridablanca – Fundida en placa de parqueadero.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (26)



Descripción:
IED Floridablanca – Placa parqueadero.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (27)



Descripción:
IED Floridablanca – Alistado en corredor lado almacén.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (2819)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede A – Instalación de perfilería en cubierta de aula múltiple.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (29)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede A – Instalación de enchape en aula múltiple.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (30)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede A – Instalación de teja en aula múltiple.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (31)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede A – Instalación de enchape en aula múltiple.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (32)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede A – Instalación de teja en aula múltiple.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (20)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede B – Encofrado y fundida de columnetas y viga aérea para muro en zona de juegos.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (34)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede B – Aplicación de pañete en muro perimetral zona de juegos.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (215)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede B – Fundida de placa de entrepiso en zona de juegos

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (3622)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede B – Fundida de placa de shut de basuras.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (37)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede B – Instalación de estructura para shut de basuras.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (23)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede B - Aplicación de pintura korasa en muro perimetral zona de juegos.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (3924)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez, sede B - Estructura shut de basuras

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (250)



Descripción:
IED Justo Victor Charry – Instalación de enchape en baño de niñas preescolar.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (41)



Descripción:
IED Justo Victor Charry – Instalación de sanitarios línea infantil en baño de niñas preescolar.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (42)



Descripción:
IED Justo Victor Charry – Instalación de enchape en cuarto de aseo preescolar.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (263)



Descripción:
IED Justo Victor Charry – Filos en muros baño niñas bachiller

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (27)



Descripción:
IED Justo Victor Charry – Remates en pintura en techos

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (45)



Descripción:
IED Justo Victor Charry – Instalación de divisiones en baño niñas preescolar

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (46)



Descripción:
IED Justo Victor Charry – Instalación de grifería para lavamanos en baño niñas bachiller

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (47)



Descripción:
IED San José Norte – Desmonte de tejas.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (4828)



Descripción:
IED San José Norte – Desmonte de divisiones sencillas en modulares

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (49)



Descripción:
IED San José Norte – Pendientado placa aula múltiple

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (50)



Descripción:
IED San José Norte – Instalación de enchape en aula múltiple.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (291)



Descripción:
IED San José Norte – Instalación de teja

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (302)



Descripción:
IED San José Norte – Instalación de estructura metálica en laboratorio.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (53)



Descripción:
IED San José Norte – Fundida de placa de contrapiso, zapatas y pedestales de cimentación

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (54)



Descripción:
IED San José Norte - Placa de contrapiso aulas modulares

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (55)



Descripción:
IED República de Panamá - Aplicación de pañete en muro perimetral

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (56)



Descripción:
IED República de Panamá - Aplicación de pañete en viga existente

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (57)



Descripción:
IED República de Panamá - Aplicación de pañete en muro perimetral

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (58)



Descripción:
IED República de Panamá - Aplicación de estuco en muros cocina

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (59)



Descripción:
IED República de Panamá - Instalación de mampostería

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (310)



Descripción:
IED República de Panamá - Instalación de mampostería en cocina.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (61)



Descripción:
IED República de Panamá - Aplicación de pañete sobre mampostería

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (62)



Descripción:
IED Simón Bolívar- Excavación manual en biblioteca.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (63)



Descripción:
IED Simón Bolívar - Aplicación de pintura en perfilería

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (64)



Descripción:
IED Simón Bolívar – Desmonte de cubierta en biblioteca.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (65)



Descripción:
IED Simón Bolívar – Excavación manual en biblioteca y aula de danzas.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (66)



Descripción:
IED Simón Bolívar – Instalación de estructura metálica en cubierta de biblioteca.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (67)



Descripción:
IED Simón Bolívar – Instalación de estructura metálica en cubierta de biblioteca.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (68)



Descripción:
Emergencia – IED Abel Rodríguez – Instalación rejillas en cárcamos.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de agosto a 10 de septiembre - 2023

FOTOGRAFÍA (69)



Descripción:
Emergencia – IED Abel Rodríguez – Remates en pintura en placa cuarto de basuras.

Anexo 5. PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 6M1MYBOUp26AqHt7/7p1/A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100235369	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71646877	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/06/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/12/2022	24:00 Horas Del	21/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.649.961-8
DIRECCIÓN	CR 49 104 B 49	**TELÉFONO**	7122685
ASEGURADO	BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO NO. 66 63	**TELÉFONO**	3241000
BENEFICIARIO	BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO NO. 66 63	**TELÉFONO**	3241000

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION NO. 01 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022 SE MODIFICAN LAS VIGENICIAS Y VALORES ASEGURADOS DE LA PRESENTE POLIZA.

.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.4146207 , CUYO OBJETO ES
INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 22/12/2022	24:00 Horas Del 12/11/2024	252.252.335,00	317.366,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 22/12/2022	24:00 Horas Del 11/05/2027	63.063.083,75	123.520,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 21/01/2024	24:00 Horas Del 21/01/2029	252.252.335,00	558.833,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 567.567.753,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	999.719,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	999.719,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	189.947,00
TOTAL A PAGAR	$	1.189.666,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/12/2028

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100235369	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71646877	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/06/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/12/2022	24:00 Horas Del	21/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.

GRUPO 2
.
TOMADOR DE LA POLIZA CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 CONFORMADO POR
GNG PROYECTOS SAS BIC NIT 901477828-7 (50%) Y GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS NIT 901383717-3 (50%)
-
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UN VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011. (DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100235369** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022** Asegurado o Beneficiario: **BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION / BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION** , expedida por la Compañía en **15/06/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **15** días del mes **JUNIO** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	71646877

Fecha de Facturación	15/06/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	NB–100235369
Periodo Facturado	22/12/2022 — 21/01/2029

Fecha Límite de Pago	15/07/2023
Prima (incluye gastos de expedición)	999.719,00
IVA	189.947,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.189.666,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
CR 49 104 B 49	901649961
Intermediario	MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **15/07/2023** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71646877

Fecha de Facturación	15/06/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	NB–100235369
Periodo Facturado	22/12/2022 — 21/01/2029

Fecha Límite de Pago	15/07/2023
Prima (incluye gastos de expedición)	999.719,00
IVA	189.947,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.189.666,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
CR 49 104 B 49	901649961
Intermediario	MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000071646877(3900)000001189666(96)20230715

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900716468773(900)000001189666(96)20230715

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre
