INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 35**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	11/09/2023 **AL**	17/09/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**			ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	$ 13.074.041.772,00	$ 6.317.500.000,00	$ 19.391.541.772,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	$ 951.700.910,00	$ 372.223.480,00	$ 1.323.924.390,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se programa realizar el comité de obra N°33 el 21/09/2023; se realizará en modalidad virtual por ser día sin carro a nivel distrital en Bogotá.

Se realizan ajustes de presupuestos y tiempos en cada uno de los colegios de a cuerdo a lo comentado en el comité No. 32 y a la mesas de trabajo de presupuestos de 31 de agosto y 01 de septiembre.

COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:

La interventoria solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz).

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO
57,60%	54,44%	1,87%	34,62%


ESTADO DE AVANCE

COLEGIOS EN INTERVENCIÓN	16	**Actas de vecindad**
COLEGIOS POR INTERVENIR	7	10
COLEGIOS TERMINADOS	5	
TOTAL	28	


DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	364	248	117
		68,1%	32,1%

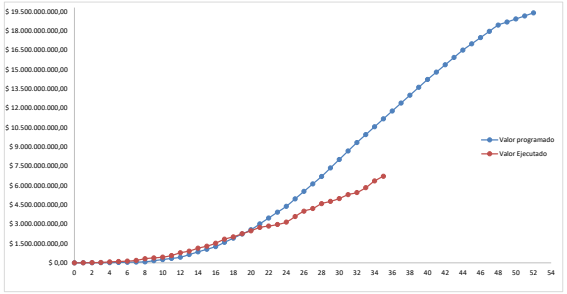

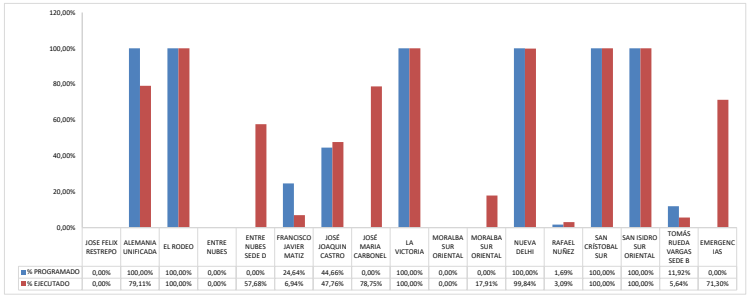

	JOSE FELIX RESTREPO	ALEMANIA UNIFICADA	EL RODEO	ENTRE NUBES	ENTRE NUBES SEDE D	FRANCISCO JAVIER MATIZ	JOSÉ JOAQUIN CASTRO	JOSÉ MARIA CARBONEL	LA VICTORIA	MORALBA SUR ORIENTAL	MORALBA SUR ORIENTAL	NUEVA DELHI	RAFAEL NUÑEZ	SAN CRISTOBAL SUR	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	TOMÁS RUEDA VARGAS SEDE B	EMERGENCIAS
% PROGRAMADO	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	24,64%	44,66%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1,69%	100,00%	100,00%	11,92%	0,00%
% EJECUTADO	0,00%	79,11%	100,00%	0,00%	57,68%	6,94%	47,76%	78,75%	100,00%	0,00%	17,91%	99,84%	3,09%	100,00%	100,00%	5,64%	71,30%



	ALTAMIRA B	ENTRE NUBES A	TOMAS RUEDA A	JOSÉ FELIX RESTREPO	JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ	LOS ALPES C	SAN CRISTOBAL B	PANTALEON GAITAN PEREZ
% PROGRAMDO	100,00%	100,00%	100,00%	72,72%	100,00%	100,00%	68,53%	28,99%
% EJECUTADO	85,72%	56,72%	89,16%	40,55%	29,07%	100,00%	62,25%	13,85%

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta los inicios de los frentes de obra y el atraso presentado se realizaron reprogramaciones en los frentes de obra que tenian un atraso significativo o su valor inicial vario, por tal motivo la programación general se afectada, lo que justifica el porcentaje de avance reportado el presente periodo
Se ajusto al porcentaje ejecutado y programado segun valores de adición No.1 al contrato de obra
Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se encuentra en trámite el modificatorio para la adición para los contratos de obra e interventoría.
Se continua con la atención de emergencias según el reporte por parte de la SED.
Se realiza adición al contrato de obra por un porcentaje del 48,32 del valor inicial del contrato
Se realiza adición al contrato de interventoria por un porcentaje del 39,11 del valor inicial del contrato

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A**	**SEMANA**	**No. 35**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de septiembre de 2023		**DEL**	11/09/2023	**AL**	17/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 11/09/2023 Continúa la instalación de la estructura metálica para cubierta en el bloque 4

El día 11/09/2023 Continúa la instalación del bordillo de confinamiento del andén de protección perimetral del bloque 2

El día 12/09/2023 Continúa la actividad de aplicación de pintura tipo koraza en la fachada posterior del bloque 2

El día 12/09/2023 Continúa la instalación de la estructura metálica para cubierta en el bloque 4

El día 13/09/2023 Se realiza el vaciado del concreto en el anden de protección perimetral del bloque 2

El día 13/09/2023 Continúa la instalación de la estructura metálica para cubierta en el bloque 4

El día 14/09/2023 Continúa la ejecución de mampostería en los antepechos de las ventanas del almacen del bloque 4

El día 14/09/2023 Inicia la aplicación de pintura tipo esmalte sobre la estructura metálica de cubierta en el bloque 4

El día 15/09/2023 Inicia la instalación de la primera capa de la teja tipo standing en el área de la emisora del bloque 4

El día 15/09/2023 Continúa la actividad de pañetes en muros del área del almacen en el bloque 4

COMPONENTE AMBIENTAL:

*Se solicita que el contratista subsane las observaciones levantadas en el acta de seguimiento ambiental elaborada por la Ing. Erika Pastor en la semana del 04 de Septiembre; siguen presentándose situaciones de almacenamiento no óptimo de RCD's en obra.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	1,81%	79,11%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	261	248	13
		95,0%	5,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OFICIALES DE OBRA	3	SIGMA
AYUDANTE DE OBRA	7	SIGMA
INSTALADORES ELÉCTRICOS	2	SIGMA
ORNAMENTADOR	1	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	X		JAJ 907		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se disminuye el atraso acumulado del 25,68% al 20,89%, ya que se realizó el ajuste del presupuesto con base al presentado en la reunión mensual del día 05 de Septiembre por un valor de $1,445,618,469,22; de acuerdo a lo anterior, el atraso que se ve reflejado aún es por las actividades de finalización del bloque 4 que aún se encuentran en ejecución; en el comité de gerencia celebrado el dia Viernes 01 de Septiembre, se estipula la fecha de finalización de las actividades del bloque 4 para el día 30 de Septiembre. Se solicita que el contratista envíe la programación con el flujo de caja actualizado para realizar el seguimiento más minuscioso del avance del colegio.

*Se realizó el vaciado de concreto en el andén perimetral de protección del bloque #2 que estaba pendiente por ejecutar; igualmente, se culminan las actividades de instalación de tableta 0,30mx0,30m en el área del bloque 5.

*Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal y conductores de los vehiculos; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo; se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor); es necesario conservar el cerramiento provisional de obra en el frente de trabajo en buen estado en el espacio de los baños del piso 1; se solicita mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 35		
DEL	11/09/2023	AL	17/09/2023



FOTO 1: Continúa la instalación de la estructura metálica para cubierta en el bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 2: Continúa la instalación del bordillo de confinamiento del andén de protección perimetral del bloque 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 3: Continúa la actividad de aplicación de pintura tipo koraza en la fachada posterior del bloque 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 4: Continúa la instalación de la estructura metálica para cubierta en el bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 5: Se realiza el vaciado del concreto en el andén de protección perimetral del bloque 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 6: Continúa la instalación de la estructura metálica para cubierta en el bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 7. Continúa la ejecución de mampostería en los antepechos de las ventanas del almacén del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 8. Inicia la aplicación de pintura tipo esmalte sobre la estructura metálica de cubierta en el bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 9. Inicia la instalación de la primera capa de la teja tipo standing en el área de la cimbra del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 10. Continúa la actividad de pañetes en muros del área del almacén en el bloque 4 - Colegio Alemania Unificada

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A**	**SEMANA**	**No. 35**		
FECHA INICIO OBRA:	6 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	7 de noviembre de 2023		**DEL**	11/09/2023	**AL**	17/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 11/09/2023 Continúa la fundida de las columnas para los módulos de la malla contra impacto del costado sur de la cancha múltiple en la sede de primaria

El día 11/09/2023 Avanza la instalación de las columnas metalicas exteriores de soporte de la cubierta en el salón de danzas

El día 12/09/2023 Avanzan los trabajos de pintura sobre la estructura metálica de cubierta del aula 4 en el bloque 3

El día 12/09/2023 Inicia la elaboración de las cajas de inspección para el filtro perimetral de las aulas preformadas de la sede de primaria

El día 13/09/2023 Se realiza la aplicación de pintura tipo esmalte sobre la estructura metálica de cubierta en aula 4 del bloque 3

El día 13/09/2023 Se realizan las pruebas de tintas y revisión de cordones de soldadura en la estructura metálica de cubierta del aula 4 y el salon de danzas en el bloque 3

El día 14/09/2023 Continúan las actividades de construcción de cajas de inspeccion para recolección de aguas lluvias del filtro

El día 14/09/2023 Se realiza la aplicación de estuco impermablizado en los muros interiores del aula 4 en el bloque 3

El día 15/09/2023 Inicia la instalación de la teja tipo standing del aula 4 en el bloque 3

El día 15/09/2023 Continúa la instalación de ángulos y correas metálicas de la cubierta del salón de danzas

COMPONENTE AMBIENTAL:

*Se realiza jornada de retiro de residuos RCD's el día viernes 08 de Septiembre.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
44,66%	76,93%	3,80%	47,76%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	274	223	51
		81,4%	18,6%

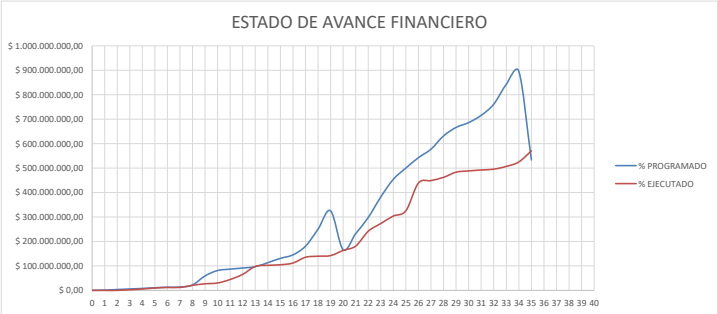

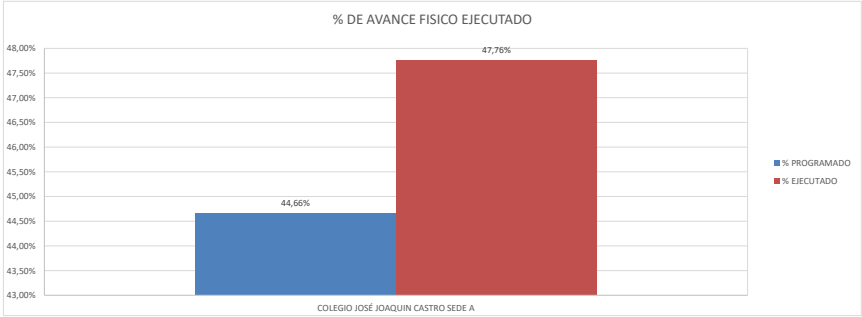

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
OFICIAL	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	X		EQR 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se disminuye el atraso acumulado del 31,82% y se genera un adelanto del 3,10%, ya que se realizó el ajuste del presupuesto con base al presentado en la reunión mensual del día 30 de Agosto por un valor de $1,194.848.678. Se aclara que no se pueden ejecutar en simultáneo las obras del bloque 2 con las del bloque 3 dado que el colegio no tiene más espacios para re-ubicar a los estudiantes mientras se realiza la intervención.
*La interventoría sugiere nuevamente ingresar mayor cantidad de personal operativo para ejecutar las actividades que faltan en el frente de las aulas pre-formadas dado que no hay algún impedimento para realizarlas en simultáneo con las obras del bloque 2.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal y conductores de los vehículos; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo; se solicita mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 35		
DEL	11/09/2023	AL	17/09/2023



FOTO 1: Continúa la fundida de las columnas para los módulos de la malla contra impacto del costado sur de la cancha múltiple en la sede de primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Avanza la instalación de las columnas metalicas exteriores de soporte de la cubierta en el salón de danzas - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Avanzan los trabajos de pintura sobre la estructura metálica de cubierta del aula 4 en el bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Inicia la elaboración de las cajas de inspección para el filtro perimetral de las aulas preformadas de la sede de primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5: Se realiza la aplicación de pintura tipo esmalte sobre la estructura metálica de cubierta en aula 4 del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Se realizan las pruebas de tintas y revisión de cordones de soldadura en la estructura metálica de cubierta del aula 4 y el salon de danzas en el bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Continúan las actividades de construcción de cajas de inspeccion para recolección de aguas lluvias del filtro - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 8: Se realiza la aplicación de estuco impermablizado en los muros interiores del aula 4 en el bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 9: Inicia la instalación de la teja tipo standing del aula 4 en el bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 10: Continúa la instalación de ángulos y correas metálicas de la cubierta del salón de danzas - Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO RAFAEL NUÑEZ SEDE B**	**SEMANA**	**No. 05**		
FECHA INICIO OBRA:	14 de agosto de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	1 de marzo de 2024		**DEL**	11/09/2023	**AL**	17/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 11/09/2023 Inicia la actividad de pañete de los muros del hall de ingreso al bloque alianza

El día 11/09/2023 Continúa la actividad de desmonte y retiro de la ventanas de la fachada norte del bloque alianza

El día 11/09/2023 Se inicia el desmonte de la cubierta en fibrocemento existente en el bloque alianza costado norte

El día 11/09/2023 Continúan las actividades de demolición de los sobrepisos existentes en las baterías de los baños

El día 13/09/2023 Se realiza el desmonte y acopio de los arcos de la cancha de microfútbol del costado oriental existente

El día 13/09/2023 Inicia el desmonte de la cubierta en fibrocemento existente en las aulas del costado sur del bloque alianza

El día 14/09/2023 Inicia el desmonte de la estructura metálica existente de la cubierta de las aulas del bloque alianza

El día 14/09/2023 Se realiza jornada de trasiego de residuos RCD al punto de acopio interno de la obra

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.
- Se realiza la adecuación del espacio de almacenamiento de residuos RCD en el costado occidental de la cancha múltiple del colegio con polisombra y varas rollizas. Este espacio fue aprobado por la inspectora SST de la interventoría.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
1,69%	0,16%	0,84%	3,09%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	200	34	166
		17,0%	83,0%

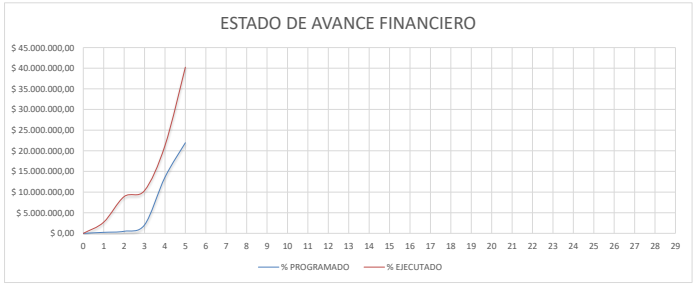

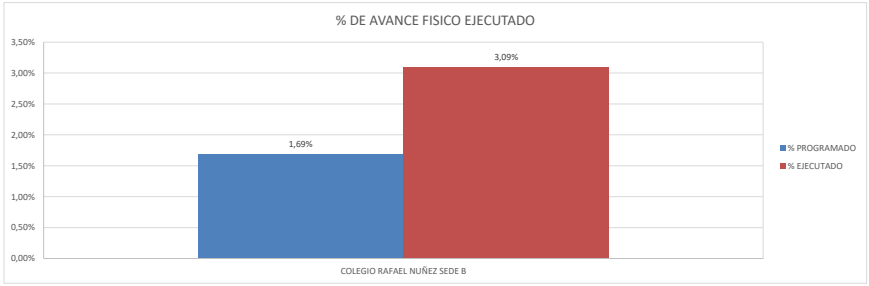

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	1	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
AYUDANTES	7	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	x		GMJ618		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos y senderos peatonales	NO
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se realiza recorrido y comité de obra en las instalaciones del colegio el día Viernes 15 de Septiembre en horas de la mañana. Se evidencia el avance generado durante la semana en las actividades de demolición y desmonte de cubierta, el alistado de piso y el pañete de muros interiores del pasillo del bloque alianza.
*De acuerdo al porcentaje de avance programado semanal, se tiene un 1,69% programado y un 3,09% ejecutado lo que muestra un adelanto oportuno. Se recomienda seguir con este ritmo de trabajo para no generar atrasos durante la ejecución del proyecto.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 05**		
DEL	11/09/2023	**AL**	17/09/2023



FOTO 1: Inicia la actividad de pañete de los muros del hall de ingreso al bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 2: Continúa la actividad de desmonte y retiro de la ventanas de la fachada norte del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 3: Se inicia el desmonte de la cubierta en fibrocemento existente en el bloque alianza costado norte - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 4: Continúan las actividades de demolición de los sobrepisos existentes en las baterías de los baños - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 5: Se realiza el desmonte y acopio de los arcos de la cancha de microfútbol del costado oriental existente - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 6: Inicia el desmonte de la cubierta en fibrocemento existente en las aulas del costado sur del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 7: Inicia el desmonte de la estructura metálica existente de la cubierta de las aulas del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 8: Se realiza jornada de trasiego de residuos RCD al punto de acopio interno de la obra - Colegio Rafael Nuñez Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE A**	**SEMANA**	**No. 21**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023		**DEL**	11/09/2023	**AL**	17/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 11/09/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 12/09/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 13/08/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 14/08/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 15/09/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 16/09/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de separaración adecuada de los RCD's generados durante la semana.
- Se mantiene la identificación de los puntos de acopio de RCD's y materiales de construcción.
- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	0,00%	89,16%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	146	-20
		115,9%	-15,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

En Mesa de trabajo realizada el dia 31 de agosto de 2023, se ajusto el presupuesto del colegio de acuerdo a las actividades que se deben realizar para cumplir con el alcance de intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $ 431.422.080; por lo anterior, el porcentaje ejecutado es mayor al porcentaje programado de la semana. Esta variación la causa el cambio de presupuesto.
*Se solicita culminar a la mayor brevedad las actividades contractuales para entregar el colegio en la fecha de finalización propuesta que es el 30 de agosto.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal y conductores de los vehiculos; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo.

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoria

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoria

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 21**		
DEL	11/09/2023	**AL**	17/09/2023



FOTO 1: No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista. - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A

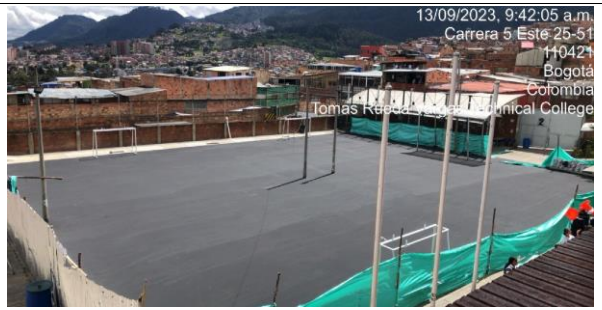


FOTO 2: No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista. - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A



FOTO 3: No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista. - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A

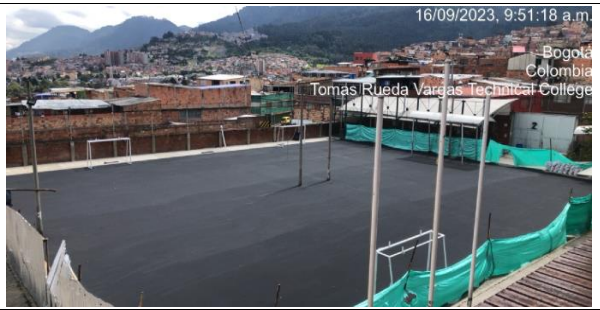


FOTO 4: No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista. - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A

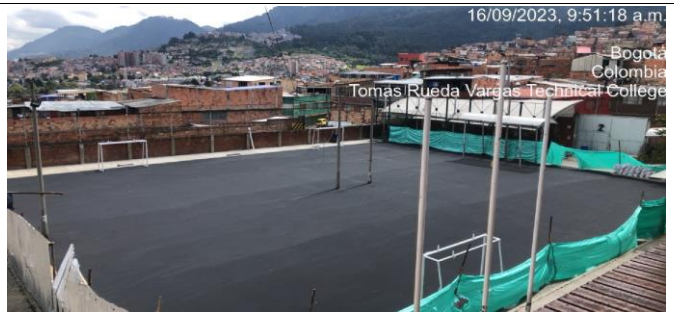


FOTO 5: No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista. - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A

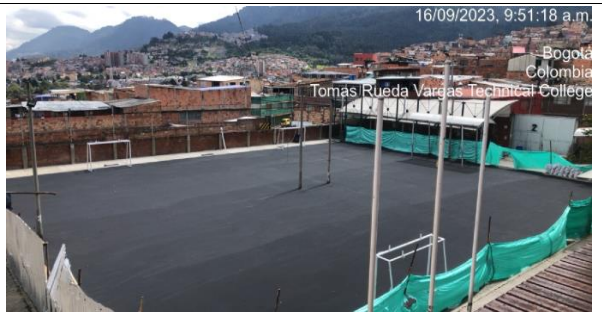


FOTO 6: No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista. - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE B**	**SEMANA**	**No. 08**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	11/09/2023	**AL**	17/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 11/09/2023 Inicia la mampostería de muros internos y divisorios de los baños del costado de la cancha

El día 12/09/2023 Inicia el proceso de estabilización del material granular de relleno tipo B200 para compactación de los baños del costado de la portería

El día 13/09/2023 Inicia el pañete de los muros divisiorios internos en los baños del costado de la cancha

El día 14/09/2023 Se realiza el vaciado de concreto del sobrepiso de los baños del costado de la portería

El día 15/09/2023 Finaliza el proceso de pañete de muros de los baños del costado de la cancha

El día 16/09/2023 Continúa el corte en piso de la estructura metálica de cubierta para el bloque 2

COMPONENTE SST:

*Se acopian en obra en los espacios de punto de acopio los residuos de construcción y demolición que se generaron durante el proceso de demoliciones de la semana en curso.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Elaboración de ATS, pausas activas, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área SST del contratista y de la interventoría.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
11,92%	10,01%	0,89%	5,64%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	171	55	116
		32,2%	67,8%

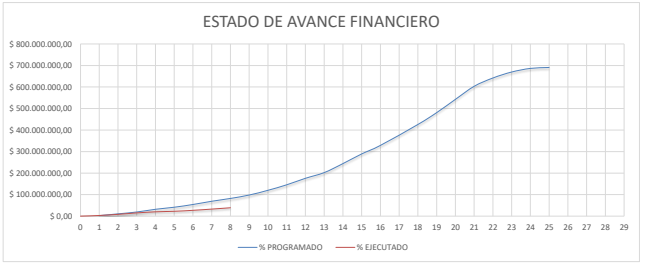

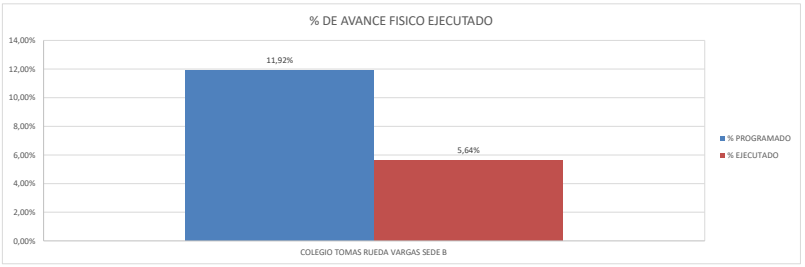

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**	**CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.	OFICIAL	2	EULISES GÓMEZ / D&J SERVICIOS
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra	AYUDANTE	2	EULISES GÓMEZ / D&J SERVICIOS
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra			
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector			
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector			
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector			
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST			
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST			
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST			
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	X		EQR 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	**SI**
Rutas de evacuación	**SI**
Manejo de Residuos (RCD's)	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se tiene un porcentaje programado para la semana en curso del 11,91% y se tiene un ejecutado del 5,64% lo que refleja un atraso del 6,27%. Se sugiere acelarar las actividades de instalación de la estructura metálica de cubiertas en las aulas 6 a 12 aprobadas para recuperar el avance perdido durante el periodo.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 08**		
DEL	11/09/2023	**AL**	17/09/2023



FOTO 1: Inicia la mampostería de muros internos y divisorios de los baños del costado de la cancha - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 2: Inicia el proceso de estabilización del material granular de relleno tipo B200 para compactación de los baños del costado de la portería - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B

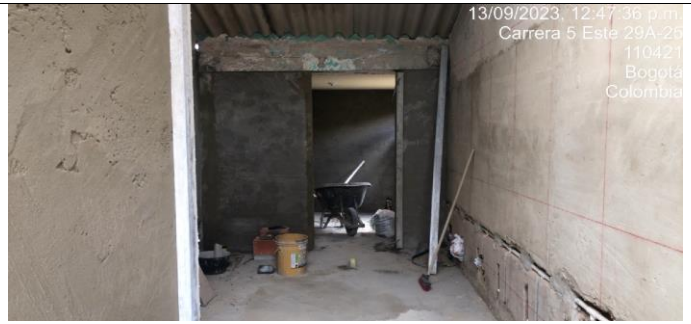


FOTO 3: Inicia el pañete de los muros divisiorios internos en los baños del costado de la cancha - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 4: Se realiza el vaciado de concreto del sobrepiso de los baños del costado de la portería - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 5: Finaliza el proceso de pañete de muros de los baños del costado de la cancha - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 6: Continúa el corte en piso de la estructura metálica de cubierta para el bloque 2 - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA**	20 de enero de 2024	**COLEGIO NUEVA DELHI SEDE A**	**SEMANA**	**No. 35**		
FECHA INICIO OBRA:	22 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	25 de julio de 2023		**DEL**	11/09/2023	**AL**	17/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4146220		

COMPONENTE TÉCNICO:

El 11/09/23 No se realizaron actividades.

El 12/09/23 No se realizaron actividades.

El 13/09/23 No se realizaron actividades.

El 14/09/23 No se realizaron actividades.

El 15/09/23 No se realizaron actividades.

El 16/09/23 Regata y excavación de piso para canalizar bajantes, desmonte de puertas para pintura, instalación de pasadores en puertas, pintura en fachada junto a pergola.

COMPONENTE SST: Verificación de condiciones de seguridad para trabajo en alturas, verificación personal autorizado para trabajo en alturas, verificación personal aprobado ingreso a obra, acompañamiento y recorrido, Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS, Inspección uso de EPP Verificación punto de acopio material RCD.

COMPONENTE AMBIENTAL: Orden de zonas de intervención.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	3,47%	99,15%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	153	207	-54
		135,3%	-35,3%

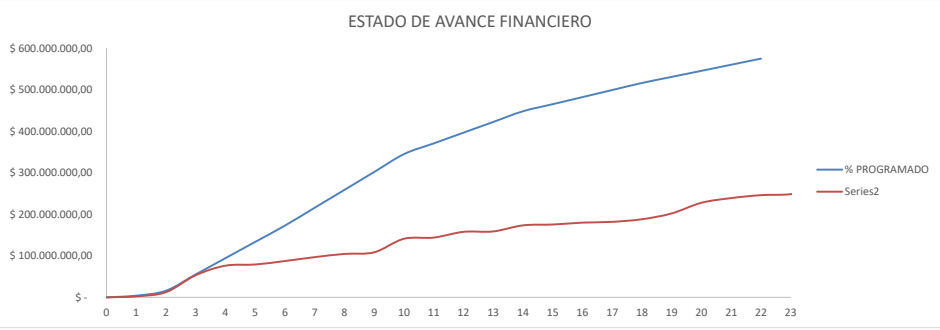

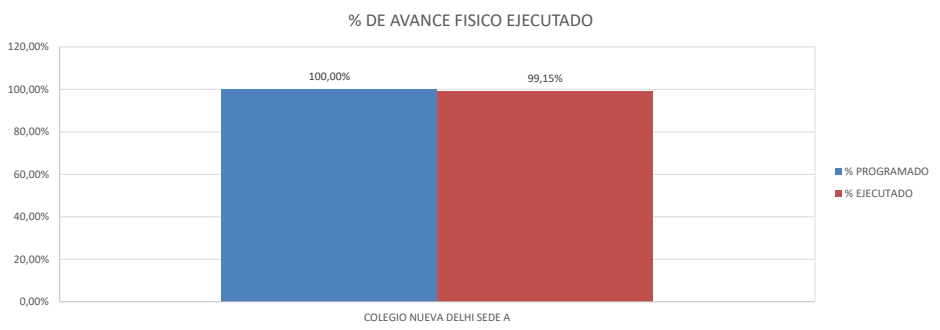

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	1	SIGMA
OFICIAL DE OBRA	1	DYJ
AYUDANTE	3	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se cumple el tiempo de ejecución de la obra según cronograma, se le recuerda al contratista las actividades pendientes, además de recordar el realizar un plan de contingencia para este frente. No se cumple plan de contingencia contratista se compromete a entregar el frente de obra el día 18 de septiembre del año en curso.
Se realizo recorrido entre residnete de interventoría y contratista, mostrando de manera detallada y mediante un check list los pendientes faltantes.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 35		
DEL	11/09/2023	AL	17/09/2023

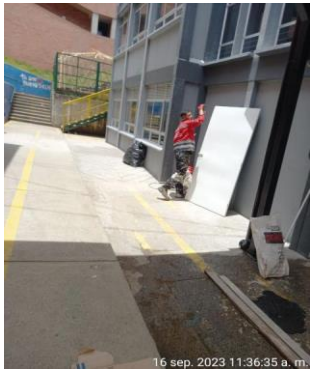


FOTO 1: Retoque de puertas , pintura y masilla - Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: Regata y excavación de piso para canalizar bajantes - Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: Cambio de enchape afectado por instalación de puerta en baño de discapacitados - Colegio Nueva Delhi



FOTO 4: Retoque de pintura en muros en área de pergola - Colegio Nueva Delhi

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL SEDE B**		**SEMANA**	**No. 35**	
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023			**DEL**	11/09/2023 **AL**	17/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 11/09/23 Continúan con pintura y soldadura en estructura metálica

El 12/09/23 Continúan con pintura y soldadura metálica, terminan instalación de bajantes faltantes, inician con desmonte de campamento de poli sombra

El 13/09/23 Continúan con pintura y soldadura en estructura metálica, terminan con desmonte de campamento

El 14/09/23 Continúan con pintura y soldadura en estructura metálica, realizan reparaciones en segunda viga según observaciones de interventoría

El 15/09/23 Continúan con pintura y soldadura en estructura metálica, realizan reparaciones en segunda viga según observaciones de interventoría

El 16/09/23 Se realizan pruebas de tinta en soldadura de estructura metalica

COMPONENTE SST: Acompañamiento y recorrido para verificación de condiciones de seguridad ,verificación de personal aprobado para ingreso a obra, validación de documentos SST permisos de trabajo caliente y alturas., inspecciones ATS, Inspección uso de EPP,verificación punto de acopio material RCD, recomendaciones y observación en recorrido a obra.

COMPONENTE AMBIENTAL: Orden de zonas de intervención.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	6,97%	85,72%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	144	-18
		114,3%	-14,3%

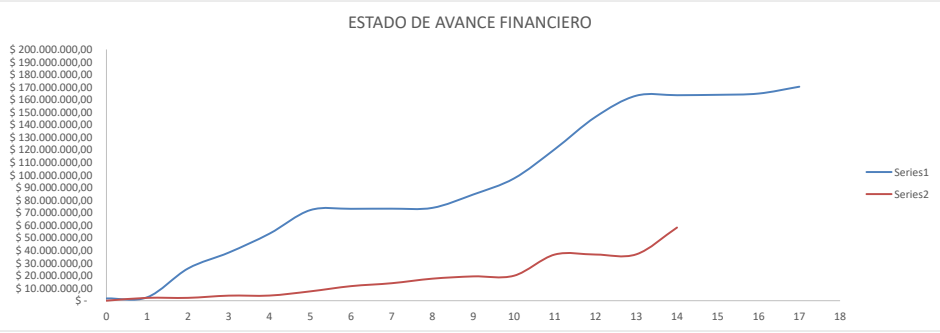

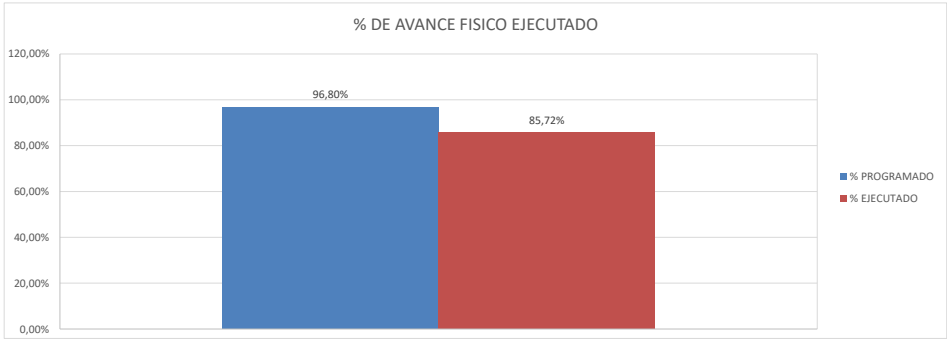

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	5	DYJ
OFICIAL DE OBRA	2	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta para retiro de material	x		EQR - 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se cumple el 100% de programación de este frente,.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 35		
DEL	11/09/2023	AL	17/09/2023



FOTO 1: Continuan con construcción de cubierta de zona de juegos y/o parte baja - Colegio Altamira Sede B



FOTO 2 : Pintura de cubierta de zona de juegos y/o parte baja - Colegio Altamira Sede B



FOTO 3: Prueba de tintas de cubierta de zona de juegos y/o parte baja - Colegio Altamira Sede B



FOTO 2: Prueba de tintas de cubierta de zona de juegos y/o parte baja - Colegio Altamira Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A**	**SEMANA**	**No. 35**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	5 de agosto de 2023		**DEL**	11/09/2023	**AL**	17/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 11/09/23 Nivelación e instalación de cañuela

El 12/09/23 Reinstalacion de rejas existentes sobre muro

El 13/09/23 Reinstalacion de rejas existentes sobre muro

El 14/09/23 Sin actividades

El 15/09/23 Instalación de cañuela

El 16/09/23 Continuan con instalación de cañuela

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	2,00%	56,72%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	103	144	-41
		139,8%	-39,8%

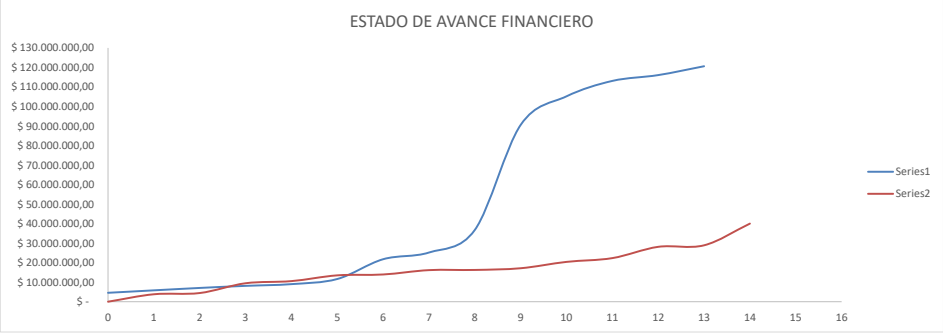

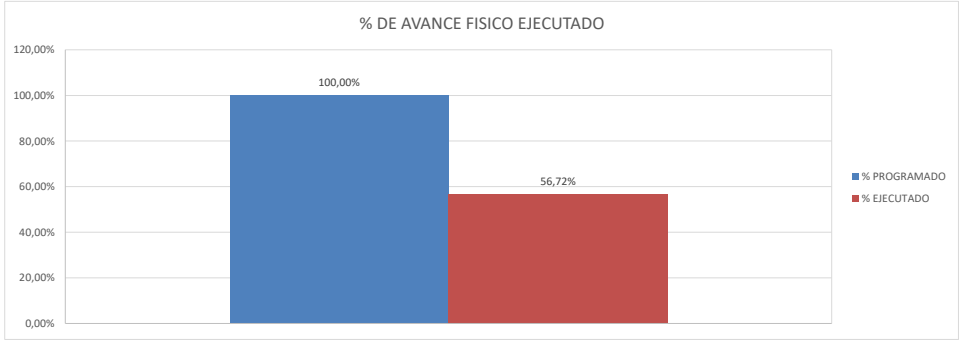

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	Onepro servise S.AS
OFICIAL DE OBRA	1	Onepro servise S.AS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se recordo a contratista la importancia de avanzar en la ejecución de actividades de manera más productiva, debido a la diferencia que hay entre programación y ejecución.
Se recuerda que ya se cumplio el 100 % del tiempo de ejecución.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA No. 35

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DEL	11/09/2023	AL	17/09/2023



FOTO 1: Reinstalación de reja sobre muro - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 2: Reinstalación de reja sobre muro - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 3: Instalación de cuneta - Colegio Entre Nubes Sede A Sede A



FOTO 4: Instalación de cuneta Colegio Entre Nubes sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO SEDE C**		**SEMANA**	**No. 35**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de mayo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de diciembre de 2023			**DEL**	11/09/2023 **AL**	17/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 11/09/23 Instalación de estructura para muros en drywall, instalación de ventanas tipo rejilla

El 12/09/23 Instalación de ventanas tipo rejilla

El 13/09/23 Instalación de divisiones de baño en acero inoxidable, instalación de tubería emt para red eléctrica, instalación de laminas para muro en drywall

El 14/09/23 Instalación de divisiones para baño en acero inoxidable, instalación de laminas para muro en drywall.

El 15/09/23 Desmonte de divisiones y puertas de baño metálica, instalaciones de laminas para muro en drywall

El 16/09/23 Instalación de divisiónes.en acero inoxidable, instalación de laminas para muro en drywall

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda acopio provisional de material RCD y material de obra sobrante.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
72,72%	69,01%	6,23%	40,55%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	242	136	106
		56,2%	43,8%

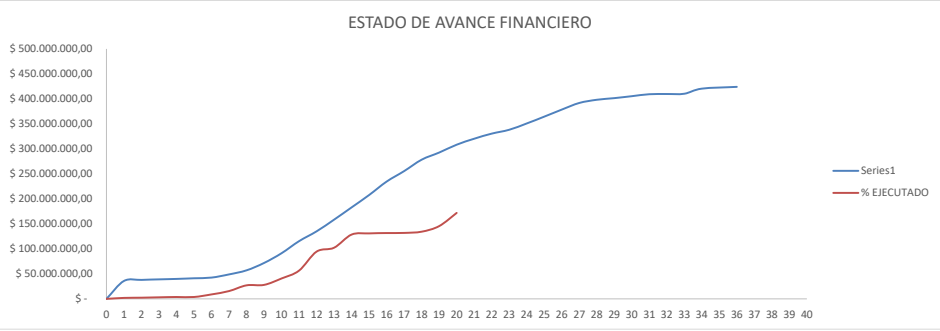

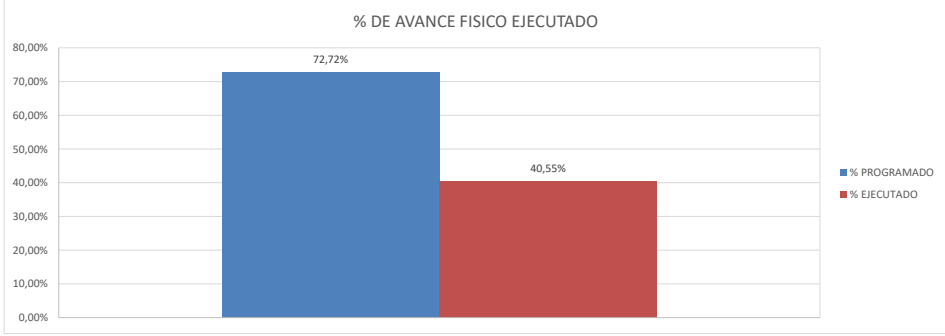

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	CARLOS JULIO GUTIERREZ
OFICIAL DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 35		
DEL	11/09/2023	AL	17/09/2023



FOTO 1: Instalaciones de ventanas tipo persiana - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 2: - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 3: Instalaciones de ventanas tipo persiana - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 4: Instalación de divisones en acero inoxidable para baño - Colegio José Felix Restrepo Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B**		**SEMANA**	**No. 35**	
FECHA INICIO OBRA:	10 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	9 de septiembre de 2023			**DEL**	11/09/2023	**AL** 17/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 11/09/23 No se realizaron actividades.

El 12/09/23 No se realizaron actividades.

El 13/09/23 No se realizaron actividades.

El 14/09/23 No se realizaron actividades.

El 15/09/23 No se realizaron actividades.

El 16/09/23 Corrección de fondo de cajas de inspección.

COMPONENTE SST: Revisión y aprobación documental de ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección preoperacionales, verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra

COMPONENTE AMBIENTAL: Se reitera observación sobre retirar material que se encuentra en anden público.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	0,00%	29,07%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	91	97	-6
		106,6%	-6,6%

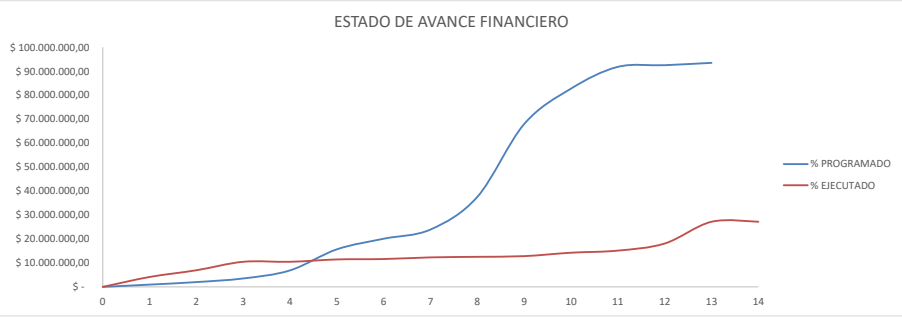

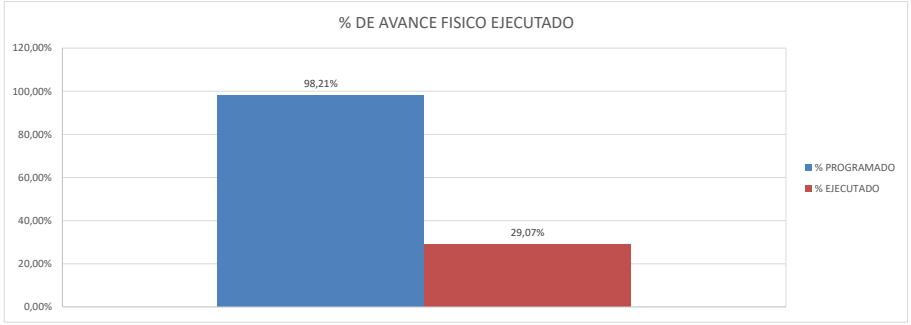

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	INERCIA INGENIERIA
OFICIAL DE OBRA	1	INERCIA INGENIERIA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se cumple el 100% de programación.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 35		
DEL	11/09/2023	AL	17/09/2023



FOTO 1: Se reitera a contratista el retirar de manera urgente material que se encuentra en anden público - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 2: No se realizaron actividades - Colegio José Acevedo y Gomez sede B

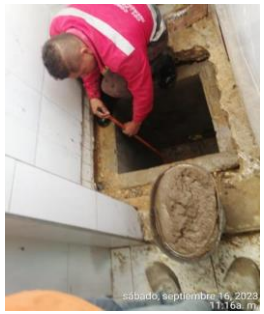


FOTO 3: Corrección de fondo de cajas de inspección - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 4: No se realizaron actividades - Colegio José Acevedo y Gomez sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A**	**SEMANA**	**No. 35**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	11/09/2023	**AL**	17/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 11/09/23 Aplicación de esmalte a estructura metálica, instalación de estructura para muros en drywall, levanté de muro en maposteria en zona de tanque elevado

El 12/09/23 Instalación de estructura para muros en drywall, pañetando de muro en zona de tanque elevado

El 13/09/23 Instalación de malla electrosoldada, fundición de placa en concreto en zona de comedor, instalación de estructura metálica para muro en drywall, retiro de escombros en volqueta

El 14/09/23 Instalación de estructura para muros en drywall, corte de juntas en placa de concreto en zona de comedor

El 15/09/23 Continuan con instalación de estructura para muros en drywall

El 16/09/23 Continuan con instalación de estructura para muros en drywall

COMPONENTE SST: Verificación ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección ATS, permisos de trabajo, preoperacionales. Verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra,Validacion de retiro material RCD (Teja de asbesto), validación punto de acopio, verificación actividades de trabajo en alturas, Inspección armado de andamio.

COMPONENTE AMBIENTAL: Retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
24,64%	17,18%	0,35%	6,94%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	171	55	116
		32,2%	67,8%

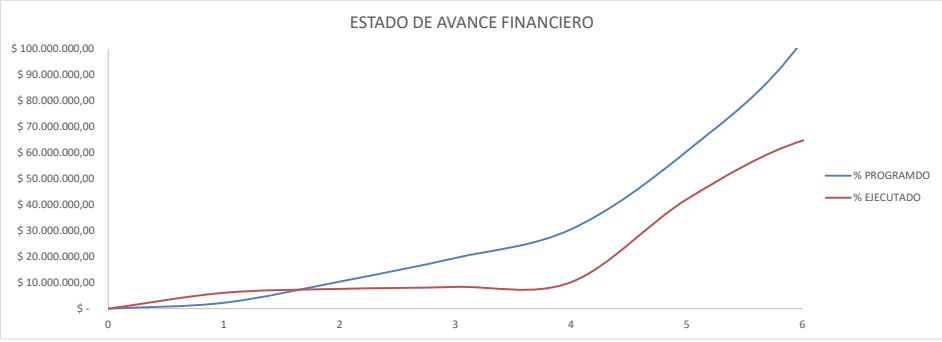

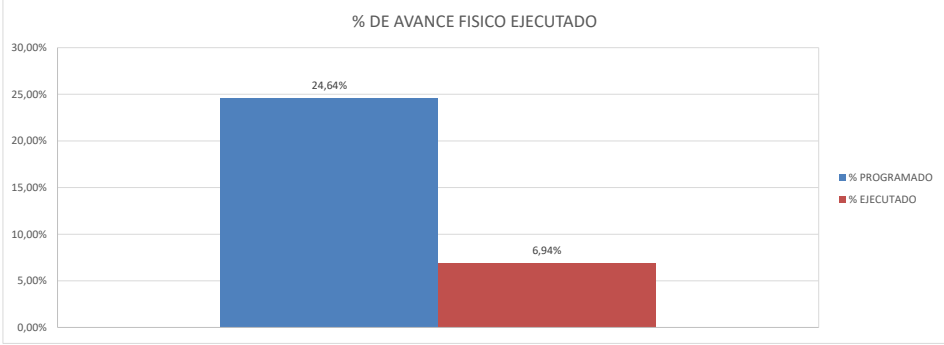

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	HOME SERVICE
OFICIAL DE OBRA	2	HOME SERVICE
OFICIAL DE OBRA	1	Onepro servise S.AS
AYUDANTE DE OBRA	2	Onepro servise S.AS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 35		
DEL	11/09/2023	AL	17/09/2023



FOTO 1: Aplicación de pintura de estructura metálica de cubierta - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 2: Aplicación de pintura de estructura metálica de cubierta - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 3: Construcción de estructura de muro en dry wall para zonas entre muros y estructura metálica de cubierta - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 4: Fundida de concreto de placa de contrapiso de comedor de zona exterior - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**	**SEMANA**	**No. 35**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL**	11/09/2023	**AL**	17/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 11/09/23 Se realiza pitnura de puerta de aulas, pañete corredor externo, pintura de estructura metalica aulas, gravilla lavada corredor, destronque de piso aula 6, fundida de escalones de escalera de accesor de fachada, instalación de cielo raso aula 2.

El 12/09/23 Se realiza pañete de corredor interno, pañete de corredor externo, pitnura de estructura metalica de aulas, gravilla lavada corredor, destronque de piso aula 6, recebo area de tanques, fundida de viga de carcamo longitudinal, instalación de cielo raso aula 2, desmonte de cubierta zona de rampa, remates muros y escalones, remates de carcamo.

El 13/09/23 Se realiza pañete de corredor interno, detronque de piso aula 6, remates de escalera, instalación de cielo raso aula 2, remates de carcamo.

El 14/09/23 Se realiza pañete de corredor interno, detronque de piso aula 6, remates de escalera, instalación de cielo raso aula 2, remates de carcamo.

El 15/09/23 Se realiza pañete de corredor interno, destronque de piso aula 6 y coordinación, llenos de areas de tanques, remates de escalera, cielo raso aula 2.

El 16/09/23 Se realiza pañete de corredor interno, destronque de piso aula 6 y coordinación, llenos de area de tanque y compactación, remates escalera, cielo raso aula 2.

COMPONENTE SST: Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, revisión y probacion documental ingreso de personal, verificación uso adecuado de EPP, Inspección y aprobación de usos de sistemas de acceso (Andamio)

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
58,67%	99,82%	1,90%	57,68%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	291	248	43
		85,2%	14,8%

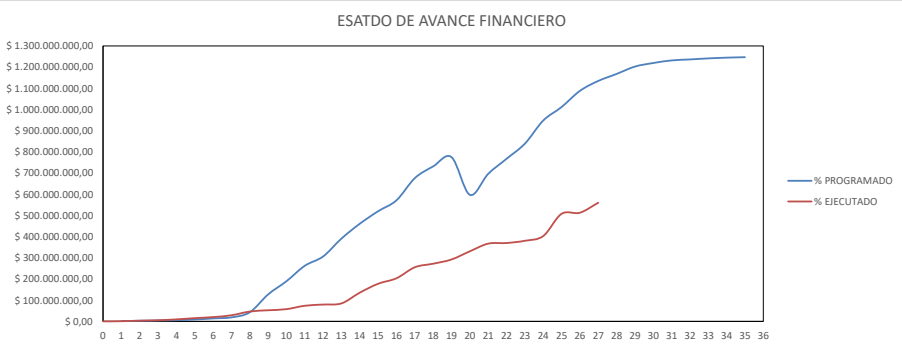

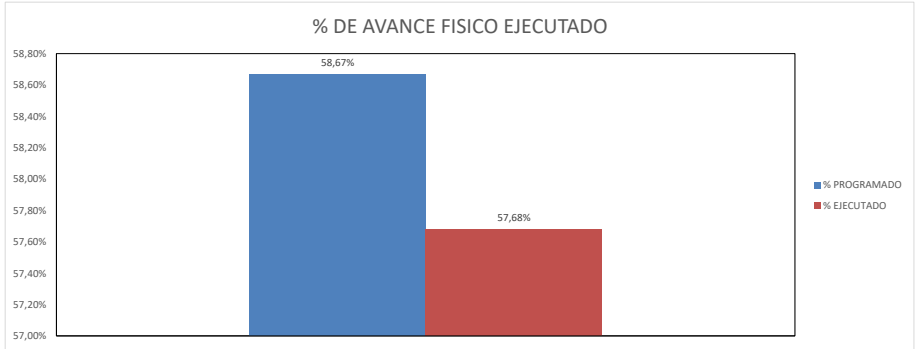

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.	AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra	ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra	OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector	AYUDANTE DE OBRA	3	HOME SERVICE
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector			
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector			
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST			
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST			
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST			
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental			
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra			

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO
SEÑALIZACIÓN	
Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACION	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	SI

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.246.912.368 y nueva fecha de terminación el 30/10/23.
-Se realizan pruebas de densidades en campo para la zona de juegos obteniendo un porcentaje de compactación mayor al 90% del proctor del material.
-Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 35		
DEL	11/09/2023	AL	17/09/2023



FOTO 1: Pañete de filos de placa de segundo piso - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 2: Excavación y recebo B200 placa de tanques - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 3: Instalación de cielo raso en aula 2 primer piso - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 4: Desmonte de cubierta y mantenimiento de pergola - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 5: Destronque de pisos aulas segundo piso - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 6: Carcamo frente a salones primer piso - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL SEDE A**	**SEMANA**	**No. 35**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	31 de octubre de 2023		**DEL**	11/09/2023	**AL**	17/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 11/09/23 Se realiza instalación de ventaneria.

El 12/09/23 Se realiza pintura primer piso fachada, filo en puertas, alistado piso en escaleras, granito enm boca puertas, picado muro en pasillo segundo piso.

El 13/09/23 Se realiza pintura primer piso y facahda, filos en puertas, alistado de piso en escaleras de primer piso,granito en boca puertas, picado muro en pasillo segundo piso, soldadura estructura para cerramiento, instalación de puertas tercer piso, remates de cubierta primaria.

El 14/09/23 Se realiza pintura vinilo salones primer piso, filos en puertas, alistado piso en escaleras, granito en boca puertas y escaleras, picado de jmuro en pasillo de segundo piso, soldadura estructura para cerramiento tipos S.E.D, fabircación de rejilla para carcamo.

El 15/09/23 Se realiza pintura vinilo salones primer piso, filos en puertas, alistado piso en escaleras, granito en boca puertas y escaleras, picado de jmuro en pasillo de segundo piso, soldadura estructura para cerramiento tipos S.E.D

El 16/09/23 Se realiza pintura de vinilo primer piso, fabricación de rejilla de carcamo, instalaciónde modulos de cerramiento tipo S.E.D

COMPONENTE SST: Verificar documentación SST: permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales, Inspección de orden y aseo en frentes de trabajo, Verificación de uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación documental ingreso de personal a obra, inspección y aprobación de uso de sistema de acceso(Andamio), Inspección actividades de trabajo en altururas

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
74,39%	96,11%	0,38%	78,75%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	292	248	44
		84,9%	15,1%

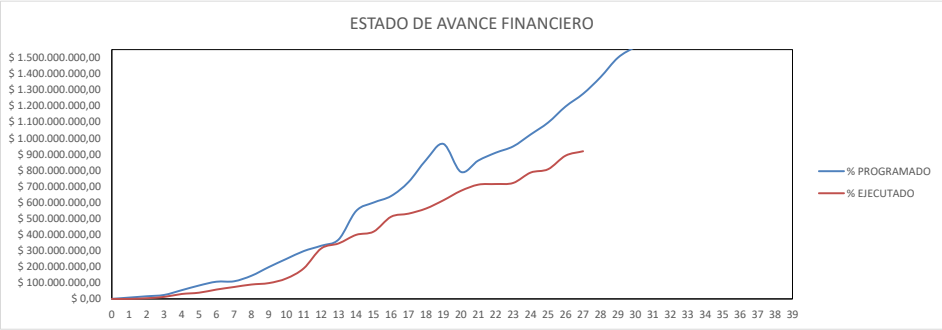

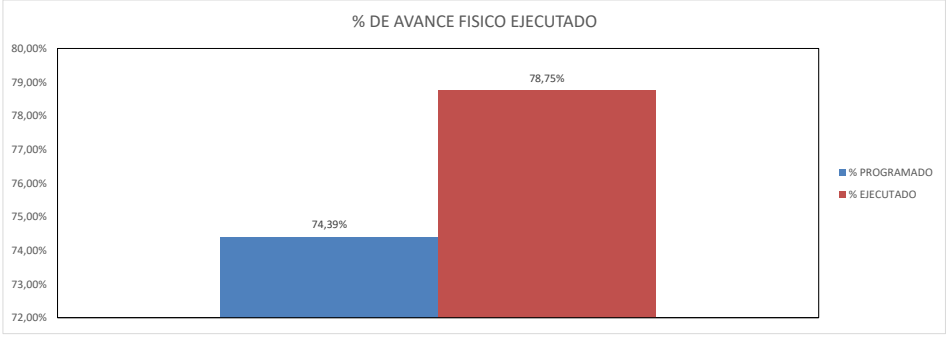

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	9	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL	1	JLIO GUTIERREZ MUÑOZ
INSTALADOR DE DIVISIONES DE ACERO INOXIDABLE	2	ARQUITECTURA DISEÑO Y MODULAR

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.793.050.180 y nueva fecha de terminación el 31/10/23.
-Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 35		
DEL	11/09/2023	AL	17/09/2023





FOTO 1: Pintura de pasillos primer piso - Colegio José Maria Carbonell

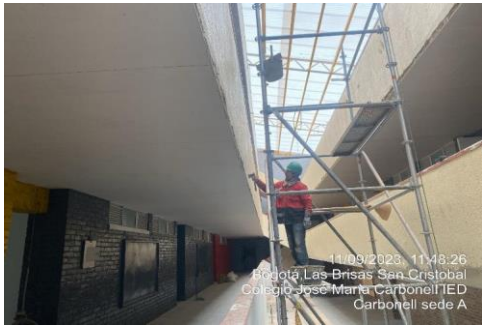


FOTO 2: Picado de muros en pasilllos - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 3: Pintura de cerramiento contra impacto - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 4: Fabricación de rejillas de carcamo - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 5: Instalación de puertas tercer piso - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 6: Alistado de escaleras primer piso - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 7: Instalación de ventanas - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 8: Remates de culatas en bloque primaria- Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL SEDE C**		**SEMANA**	**No. 35**	
FECHA INICIO OBRA:	3 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	11/09/2023 **AL**	17/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 11/09/23 Se realiza demolición de vigas de cubierta, bloque de aulas, instalación de estructura metalica de baños, muro de cerramiento.

El 12/09/23 Se realiza instalación de estrcutura metalica baños, muro de cerramiento.

El 13/09/23 Se realiza instalación de estrcutura metalica de baños, muro de cerramiento.

El 14/09/23 Se realiza instalación de estructura metalica de baños, muro de cerramiento, punto provisional electrico 220v para equipos.

El 15/09/23 Se realiza instalación de estructura metalica de baños, muro de cerramiento.

El 16/09/23 Se realiza fundida de dovelas con grouting en muro de cerramiento.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Validación evacuación material RCD.(Madera)
Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
19,87%	90,92%	0,96%	17,91%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	283	165	118
		58,3%	41,7%

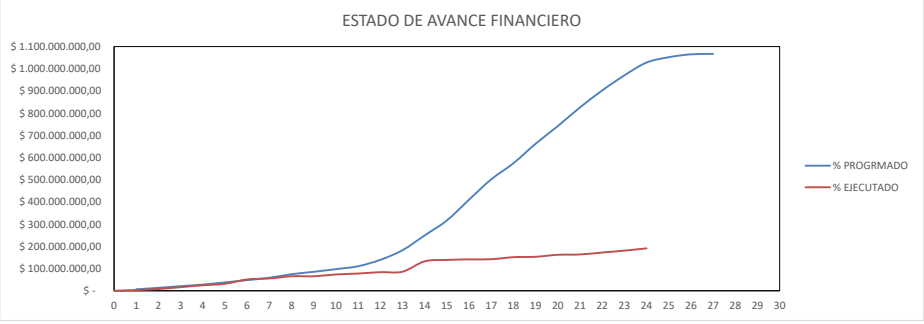

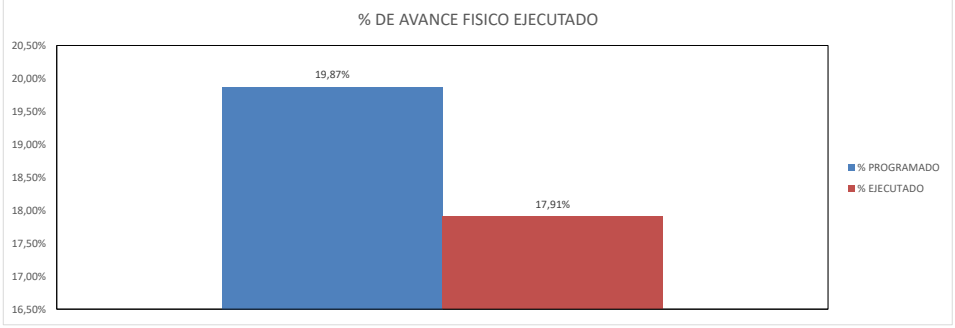

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AXN
OFICIAL	2	AXN
MAESTRO	1	AXN

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.067.082.680 y nueva fecha de terminación el 11/01/24.
* Por las fuertes lluvias presentadas en la semana no se ha podido realizar la demolición de placa cubierta de manera continua.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 35		
DEL	11/09/2023	AL	17/09/2023



FOTO 1: Grouting en muro de cerramiento - Colegio Moralba Sede C



FOTO 2: Instalación de estrcutura de cubierta de baños - Colegio Moralba Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CIRSTOBAL SUR SEDE B**		**SEMANA**	**No. 35**	
FECHA INICIO OBRA:	20 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023			**DEL**	11/09/2023 **AL**	17/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 11/09/23 Se realiza excavación de filtro.

El 12/09/23 Se continua con la excaviciónd efiltro y filos en ventanas de segundo piso.

El 13/09/23 No se realizaron actividades

El 14/09/23 Se realiza maestras pasillo primer piso.

El 15/09/23 Se realiza listado de pasillo de primer piso.

El 16/09/23 Se realiza listado de pasillo de primer piso.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
68,53%	65,06%	4,98%	62,25%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	132	87	45
		65,9%	34,1%

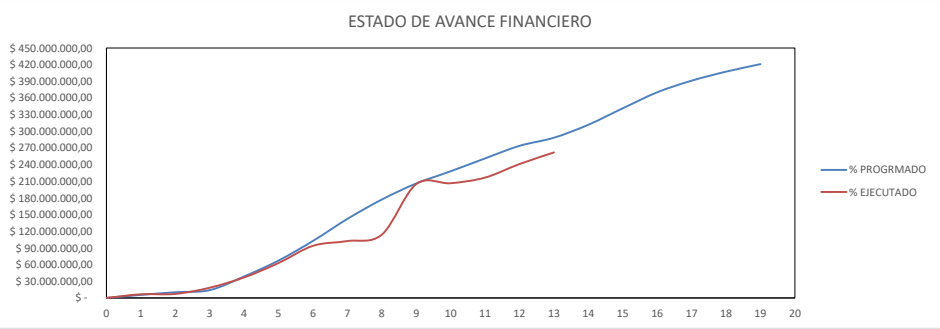

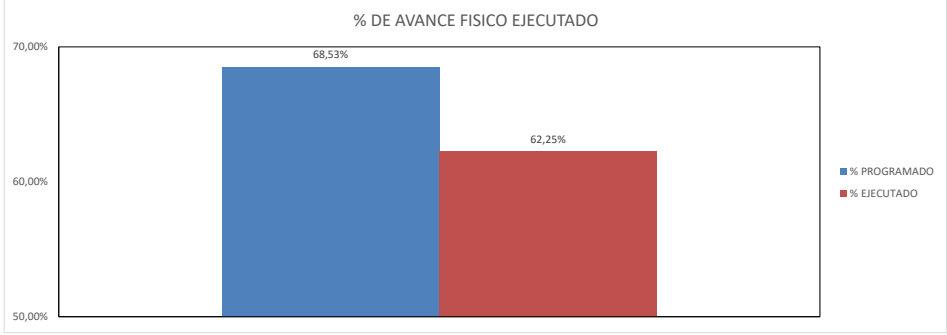

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIALES	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $420.914.867

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 35		
DEL	11/09/2023	AL	17/09/2023




FOTO 1: Excavación para filtro - Colegio San Cristobal Sede B




FOTO 2: Alistado de piso de primer piso - Colegio San Cristobal Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ SEDE A**	**SEMANA**	**No. 35**		
FECHA INICIO OBRA:	4 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	11/09/2023	**AL**	17/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 11/09/23 Se realiza pañete de muros de baños, alistado de piso en salon de prescolar.

El 12/09/23 Se realiza pañete de muros de baños, alistado de piso en aula prescolar, picado de muros en salones, desmonte de cubierta ala occidental.

El 13/09/23 Se realiza pañete de muros de baños, alistado de piso en aula prescolar, picado de muros en salones, desmonte de cubierta ala occidental.

El 14/09/23 Se realiza pañete de muros de baños, alistado de piso en aula prescolar, picado de muros en salones, desmonte de cubierta ala occidental.

El 15/09/23 Se realiza pañete de muros de baños, alostado de piso aula prescolar, desmonte de cubierta ala occidental y pasillo.

El 16/09/23 Se realiza pañete de muros de baños, alistado de piso aula prescolar, desmonte de cubierta de pasillo.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
28,99%	20,04%	9,41%	13,85%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	191	73	118
		38,2%	61,8%

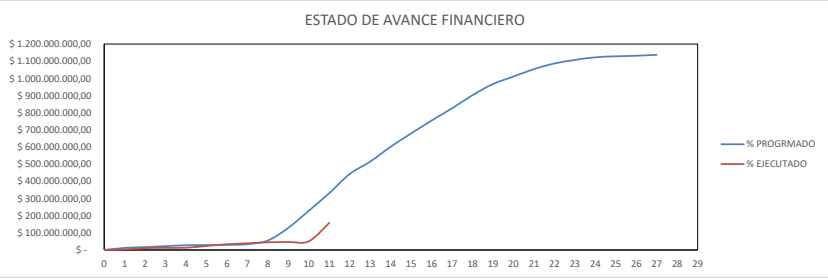

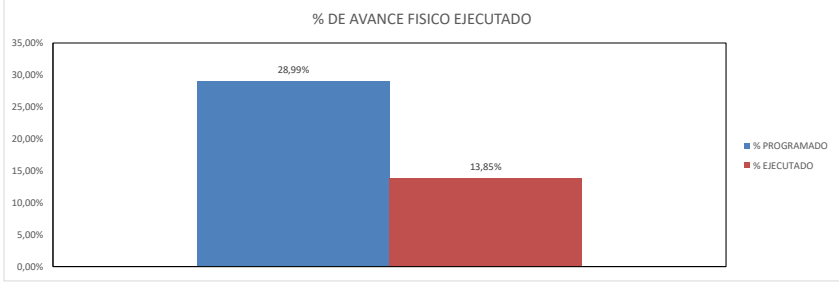

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	4	STOR CONSTRUCCIONES SAS
OFICIAL	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.142.104.067

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA	No. 35		
DEL	11/09/2023	AL	17/09/2023





FOTO 1: Fdesmonte de cubierta ala oocidental y zona de juegos - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A



FOTO 2: Pañete de murosde baños- Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A





FOTO 3: Alistado de piso de salones prescolar - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A



FOTO 4: Demolición de muros - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 35**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	11/09/2023	**AL**	17/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio Florentino Gonzalez. Se suscribe acta de entrega por impermeabilización de tanque de almacenamiento.

Colegio Gloria Valencia de Castaño. Se realiza instalación de acometida eléctrica en cocina.

Colegio Los Alpes - Sede A. Se realiza trasiego, retiro y disposición final de material vegetal.

Colegio Manuelita Saenz. Se suscribe acta de entrega por tala y poda de árboles.

Colegio Veinte de Julio - Sede A. Se realiza pintura tipo vinilo y koraza en muro de cerramiento.

Colegio El Rodeo - Sede A. Se realiza impermeabilizado (primera capa) al interior de tanque de almacenamiento de agua.

Colegio José Joaquín Castro - Sede B. Se realiza instalación de vigas y pintura de estructura metálica para cubierta.

Colegio Juan Rey - Sede A. Se realiza desmonte de sistema de equipos de bombeo y mantenimiento de bombas en taller.

Colegio La Victoria - Sede B. Se realiza visita de atención y apertura de registro en sistema de bombeo de agua potable.


Colegio Juana Escobar - Sede A. Se realiza instalación de acometida eléctrica desde tablero de distribución principal a tablero de cocina.

COMPONENTE SST: Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio La Belleza- sede A, Moralba Sede A

COMPONENTE AMBIENTAL: **Se realizo acompañamiento a la actividad de tala de arboles del colegio Manuelita Saenz, se realizco solicitud de retiro de RCD de colegio Juan Rey Sede A y Jose Joaquin Sede b**

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			**ESTADO DE AVANCE**			
% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO**	**NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER**	**3**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	*** Colegio El Rodeo - Sede A. (Sum e Inst sistema de bombeo)** *** Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst equipos de bombeo)** *** Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, construcción de escalon)** *** Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación plazoleta principal)** *** Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto electrico)** *** Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de Tanques de agua potable)** *** Colegio Jose Joaquin Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas)** *** Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas)** *** Colegio Manuelita Saenz. (Ruptura de tuberia de agua potable 2" en acero galvanizado)** *** Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refirgeradores de comedor escolar)** *** Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores)** *** Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tubería desague tienda escolar)** *** Colegio San José Sur Oriental (Cambio cubierta aula rectoria)** *** Colegio Los Alpes - Sede C. (Suspensión punto hidráulico sanitario)** *** Colegio Florentino Gonzalez. (Tratmiento fisuras en muros, pintura e impermeabilización viga canal)** *** Colegio Gloria Valencia de Castaño. (Poda de cesped y fumigación)**
60,34%	7,63%	71,30%	**EMERGENCIAS EN EJECUCION**	**6**		
			EMERGENCIAS ATENDIDAS	**36**		
			REPORTADAS -TOTAL	**45**		

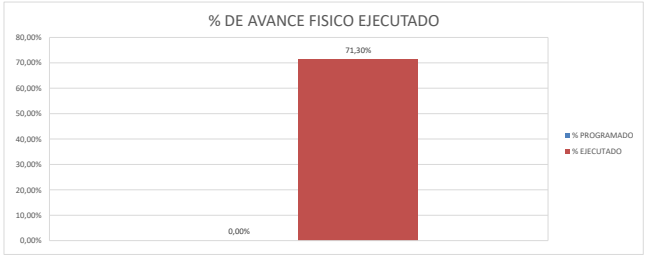

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

Nº	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**	
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	**TERMINADO**	
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	**TERMINADO**	
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**	
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PLAZOLETA	**TERMINADO**	
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	BARANDA	**TERMINADO**	
7	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	**TERMINADO**	
8	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	**TERMINADO**	
9	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**	
10	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	GRIETAS Y PINTURA MUROS, IMPERM VIGACANAL	**TERMINADO**	
12	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE	**TERMINADO**	
13	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	**TERMINADO**	
14	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**	
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	**TERMINADO**	
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**	
17	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	**TERMINADO**	
18	VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES- PODA	**TERMINADO**	
19	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**	
20	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**	
21	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**	
22	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**	
23	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ARBOLES	REPORTADA	
24	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	**TERMINADO**	
25	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**	
26	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	**TERMINADO**	
27	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y PODA	**TERMINADO**	
28	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA	
29	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**	
30	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	**TERMINADO**	
31	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	REPORTADA	
32	EL RODEO - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE ALMACENAMIENTO	EN EJECUCIÓN	
33	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	**TERMINADO**	
34	SAN CRISTOBAL - SEDE A	FLANCHE MURO COLINDANTE	**TERMINADO**	
35	GRAN COLOMBIA	MANTENIMIENTO CUBIERTA	**TERMINADO**	
36	JOSE JOAQUIN CASTRO - SEDE B	CAMBIO CUBIERTA	EN EJECUCIÓN	
37	LOS ALPES - SEDE A	TALA DE ÁRBOL	**TERMINADO**	
38	LOS ALPES - SEDE A	CONSTRUCCIÓN AULAS PREFABRICADAS	EN EJECUCIÓN	
39	JUAN REY - SEDE A	MANTENIMIENTO BOMBAS	EN EJECUCIÓN	
40	VITELMA	PINTURA BAÑO PREESCOLAR, FUMIGACIÓN, CINTA FLANCHE, ARBOL SANITARIOS	**TERMINADO**	
41	MANUELITA SAENZ	PODA Y TALA DE ÁRBOLES	**TERMINADO**	
42	JUANA ESCOBAR - SEDE A	FALLA ELECTRICA - COCINA	EN EJECUCIÓN	
43	MANUELITA SAENZ	DESMONTE DE VENTANA	EN EJECUCIÓN	
44	VEINTE DE JULIO	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN MURO	**TERMINADO**	
45	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FALLA ELECTRICA - COCINA	**TERMINADO**	
46	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	ADECUCIÓN SHUT BASURAS	REPORTADA / RETIRADA	
47	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA / RETIRADA	
48	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA / RETIRADA	

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*** Se realiza juste de valores de emergencias aprobadas teniendo como nuevo valor la suma de $977.372.348, valor con el cual se estan reportando el avance ejecutado.**

Elaborado Por:
Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:
Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 35		
DEL	11/09/2023	AL	17/09/2023





FOTO 1: Suscripción de acta de entrega por impermeabilización de tanque de almacenamiento. Colegio Florentino Gonzalez






FOTO 2: Instalación de acometida eléctrica en cocina. Colegio Gloria Valencia de Castaño





FOTO 3: Trasiego, retiro y disposición final de material vegetal. Colegio Los Alpes - Sede A





FOTO 4: Suscripción acta de entrega por tala y poda de árboles. Colegio Manuelita Saenz.





FOTO 5: Pintura tipo vinilo y koraza en muro de cerramiento. Colegio Veinte de Julio - Sede A.





FOTO 6: Impermeabilizado (primera capa) al interior de tanque de almacenamiento de agua. Colegio El Rodeo - Sede A.





FOTO 7: Instalación de vigas y pintura de estructura metálica para cubierta. Colegio José Joaquín Castro - Sede B





FOTO 8: Desmonte de sistema de equipos de bombeo y mantenimiento de bombas en taller. Colegio Juan Rey - Sede A.





FOTO 9: Visita de atención y apertura de registro en sistema de bombeo de agua potable. Colegio La Victoria - Sede B.



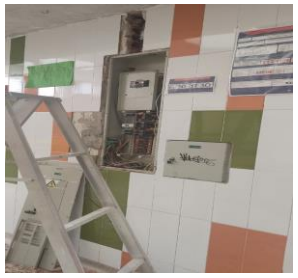


FOTO 10: Instalación de acometida eléctrica desde tablero de distribución principal a cocina. Colegio Juana Escobar - Sede A.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 36**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	18/09/2023 **AL**	24/09/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**			ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	$ 13.074.041.772,00	$ 6.317.500.000,00	$ 19.391.541.772,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	$ 951.700.910,00	$ 372.223.480,00	$ 1.323.924.390,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se programa realizar el comité de obra N°34 el 29/09/2023; está pendiente por definir el lugar.

Se realizan ajustes de presupuestos y tiempos en cada uno de los colegios de a cuerdo a lo comentado en el comité No. 32 y a la mesas de trabajo de presupuestos de 31 de agosto y 01 de septiembre.

Se realiza ajuste de porcentaje de avance programado, de acuerdo al flujo de caja V5.

COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:

La interventoria solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz).

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO
39,04%	57,60%	1,74%	36,37%


ESTADO DE AVANCE


COLEGIOS EN INTERVENCIÓN	16	**Actas de vecindad**
COLEGIOS POR INTERVENIR	7	10
COLEGIOS TERMINADOS	5	
TOTAL	28	

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
TIEMPO EJECUCIÓN	364	255	110
		70,1%	30,2%

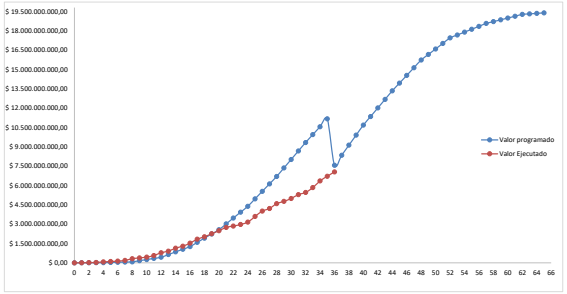

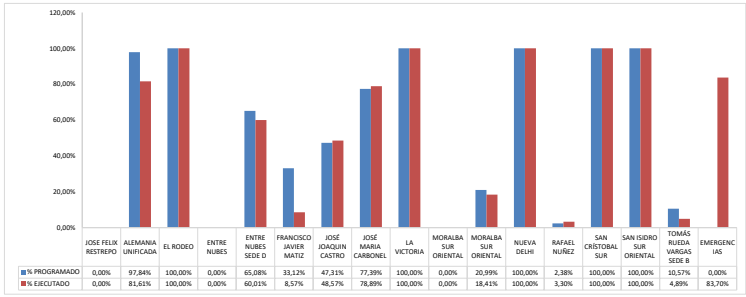



OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta los inicios de los frentes de obra y el atraso presentado se realizaron reprogramaciones en los frentes de obra que tenian un atraso significativo o su valor inicial vario, por tal motivo la programación general se afectada, lo que justifica el porcentaje de avance reportado el presente periodo
Se ajusto al porcentaje ejecutado y programado segun valores de adición No.1 al contrato de obra
Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se encuentra en trámite el modificatorio para la adición para los contratos de obra e interventoría.
Se continua con la atención de emergencias según el reporte por parte de la SED.
Se realiza adición al contrato de obra por un porcentaje del 48,32 del valor inicial del contrato
Se realiza adición al contrato de interventoria por un porcentaje del 39,11 del valor inicial del contrato

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A**	**SEMANA**	**No. 36**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	4 de octubre de 2023		**DEL**	18/09/2023	**AL**	24/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 18/09/2023 Inicia la instalación de la primera capa de teja tipo sandwich en el aula 22 del bloque 4

El día 18/09/2023 Continúa la demolición del muro divisorio de espacios para ampliacion del almacen del bloque 4

El día 20/09/2023 Continúan los resanes, la ejecución de filos de vigas y columnas en los espacios del bloque 4

El día 20/09/2023 Inicia la aplicación de pintura tipo esmalte en la estructura metálica de la cubierta del bloque 4

El día 20/09/2023 Continúan los resanes con estuco sobre muros del aula 22

El día 20/09/2023 Continúa la mampostería de la división de espacios del laboratorio y el almacén del bloque 4

El día 21/09/2023 Continúa la instalación de la teja de cubierta en el laboratorio del bloque 4

El día 21/09/2023 Continúan los resenes con estuco en los muros interiores de las aulas 22 y espejos del bloque 4

El día 22/09/2023 Se realiza el vaciado del alistado de piso en el área del almacen en el bloque 4

El día 22/09/2023 Inicia la aplicación de vinilo sobre muros en el aula 22 y el aula de espejos del bloque 4

COMPONENTE AMBIENTAL:

*Se solicita que el contratista subsane las observaciones levantadas en el acta de seguimiento ambiental elaborada por la Ing. Erika Pastor en la semana del 04 de Septiembre; siguen presentándose situaciones de almacenamiento no óptimo de RCD's en obra.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
97,84%	94,98%	2,51%	81,61%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	265	255	10
		96,2%	3,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OFICIALES DE OBRA	3	SIGMA
AYUDANTE DE OBRA	7	SIGMA
INSTALADORES ELÉCTRICOS	2	SIGMA
ORNAMENTADOR	1	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	X		JAJ 907		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se disminuye el atraso acumulado del 20,89% al 16,23%, ya que se realizó el ajuste del presupuesto con base en el presentado en la reunión mensual del día 05 de Septiembre por un valor de $1,445.618.469,22 y el contratista presentó la actualización de la programación con el respectivo flujo de caja; de acuerdo a lo anterior, el atraso que se ve reflejado aún es por las actividades de finalización del bloque 4 que aún se encuentran en ejecución. La fecha de finalización propuesta en la nueva programación es el 04 de Octubre de 2023.
*Se realizó la instalación de toda la estructura metálica de cubierta del bloque 4 y se inicia la instalación de teja tipo sandwich en el espacio de la emisora, la pagaduría, el aula de espejos y el aula 22.
*Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal y conductores de los vehiculos; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo; se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor); es necesario conservar el cerramiento provisional de obra en el frente de trabajo en buen estado en el espacio de los baños del piso 1; se solicita mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 36		
DEL	18/09/2023	AL	24/09/2023



FOTO 1: Inicia la instalación de la primera capa de teja tipo sandwich en el aula 22 del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 2: Continúa la demolición del muro divisorio de espacios para ampliación del almacen del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 3: Continúan los resanes, la ejecución de filos de vigas y columnas en los espacios del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 4: Inicia la aplicación de pintura tipo esmalte en la estructura metálica de la cubierta del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 5: Continúan los resanes con estuco sobre muros del aula 22 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 6: Continúa la mampostería de la división de espacios del laboratorio y el almacen del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO [illegible] ificada



FOTO 8: Continú [illegible] Alemania Unificada



FOTO [illegible] nificada



FOTO 10: Ini [illegible] mania Unificada

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A**	**SEMANA**	**No. 36**		
FECHA INICIO OBRA:	6 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	7 de noviembre de 2023		**DEL**	18/09/2023	**AL**	24/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 18/09/2023 Continúa la instalación de las correas metálicas de cubierta en el aula de danzas del bloque 3

El día 18/09/2023 Se realiza la instalación de la segunda capa de teja tipo sandwich en el aula 4 del bloque 3

El día 19/09/2023 Continúa la instalación de la estructura metálica de cubierta en el aula de danzas

El día 19/09/2023 Continúa la aplicación de pintura sobre los muros interiores del aula 4 en el bloque 3

El día 20/09/2023 Continúa la ejecución de soldadura de la estructura metálica de cubierta del salon de danzas en el bloque 3

El día 20/09/2023 Continúa la aplicación de pintura tipo esmalte sobre la estructura metálica del aula de danzas en el bloque 3

El día 21/09/2023 Continúa la aplicación de pintura tipo esmalte sobre la estructura metálica del aula de danzas en el bloque 3

El día 21/09/2023 Se realiza instalación de columnas 100mmx100mm en el pasillo del aula de danzas del bloque 3

El día 22/09/2023 Inicia la instalación de la tuberia EMT 3/4" para iluminación del aula 4 en el bloque 3

El día 22/09/2023 Continúa la instalación de tapaluces en superboard bajo cubierta del aula 4 en el bloque 3

COMPONENTE AMBIENTAL:

*Se realiza jornada de retiro de residuos RCD's el día viernes 08 de Septiembre.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
47,31%	44,66%	0,81%	48,56%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	274	230	44
		83,9%	16,1%

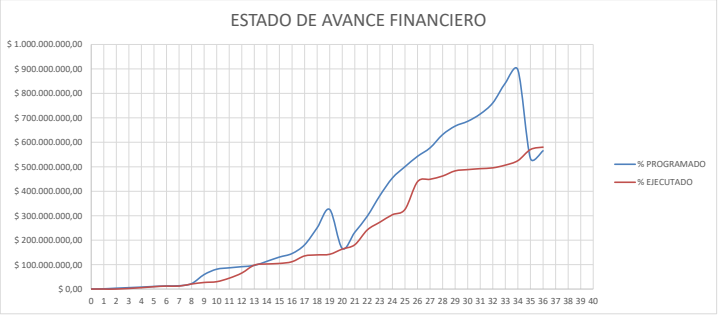

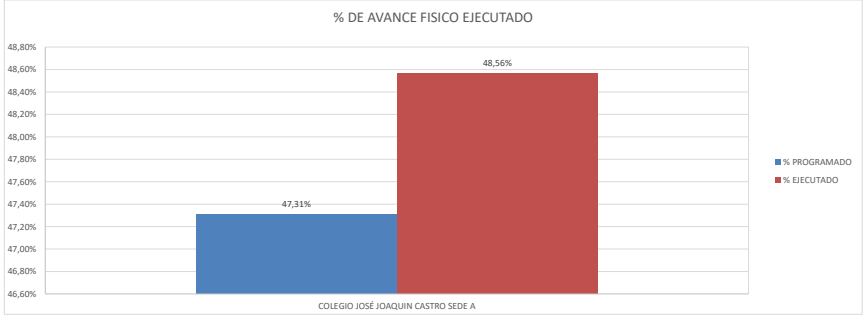

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	3	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se sigue conservando un adelanto del 1,25%, ya que se realizó el ajuste del presupuesto con base en el presentado en la reunión mensual del día 30 de Agosto por un valor de $1,194.848.678 y también se actualiza la programación del colegio con su respectivo flujo de caja. Se aclara que no se pueden ejecutar en simultáneo las obras del bloque 2 con las del bloque 3 dado que el colegio no tiene más espacios para re-ubicar a los estudiantes mientras se realiza la intervención.
*La interventoría sugiere nuevamente ingresar mayor cantidad de personal operativo para ejecutar las actividades que faltan en el frente de las aulas pre-formadas dado que no hay algún impedimento para realizarlas en simultáneo con las obras del bloque 2.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal y conductores de los vehiculos; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo; se solicita mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 36		
DEL	18/09/2023	AL	24/09/2023



FOTO 1: Continúa la instalación de las correas metálicas de cubierta en el aula de danzas del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Se realiza la instalación de la segunda capa de teja tipo sandwich en el aula 4 del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Continúa la instalación de la estructura metálica de cubierta en el aula de danzas - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Continúa la aplicación de pintura sobre los muros interiores del aula 4 en el bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5: Continúa la ejecución de soldadura de la estructura metálica de cubierta del salon de danzas en el bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Continúa la aplicación de pintura tipo esmalte sobre la estructura metálica del aula de danzas en el bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Continúa la aplicación de pintura tipo esmalte sobre la estructura metálica del aula de danzas en el bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 8: Se realiza instalación de columnas 100mmx100mm en el pasillo del aula de danzas del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 9: Inicia la instalación de la tuberia EMT 3/4" para iluminación del aula 4 en el bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 10: Continúa la instalación de tapaluces en superboard bajo cubierta del aula 4 en el bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO RAFAEL NUÑEZ SEDE B**	**SEMANA**	**No. 06**		
FECHA INICIO OBRA:	14 de agosto de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de marzo de 2024		**DEL**	18/09/2023	**AL**	24/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 19/09/2023 Inicia la instalación de los pedestales de la estructura metálica de la cubierta del bloque de preescolar

El día 19/09/2023 Finaliza el desmonte de la cubierta y estructura metálica existente del bloque alianza

El día 20/09/2023 Inicia la aplicación de anticorrosivo sobre la estructura metálica de cubierta previo al montaje

El día 20/09/2023 Continúa la instalación de la estructura metálica de cubierta de las aulas de preescolar

El día 21/09/2023 Continúa la aplicación de anticorrosivo sobre la estructura metálica de cubierta previo al montaje

El día 21/09/2023 Continúa la instalación de la estructura metálica de cubierta de las aulas de preescolar

El día 22/09/2023 Se realiza el desmonte de la cubierta existente de las aulas de preescolar

El día 22/09/2023 Continúa la instalación de la estructura metálica de cubierta de las aulas de preescolar

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.
- Se realiza la adecuación del espacio de almacenamiento de residuos RCD en el costado occidental de la cancha múltiple del colegio con polisombra y varas rollizas. Este espacio fue aprobado por la inspectora SST de la interventoría.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
2,38%	1,69%	0,21%	3,30%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	229	41	188
		17,9%	82,1%

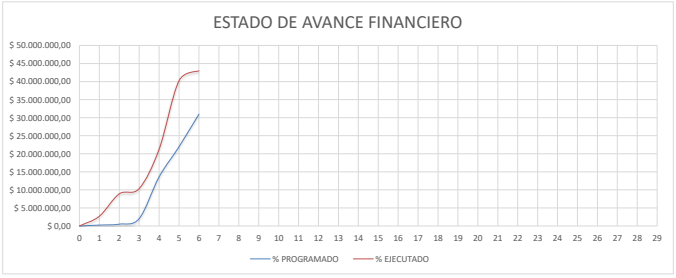

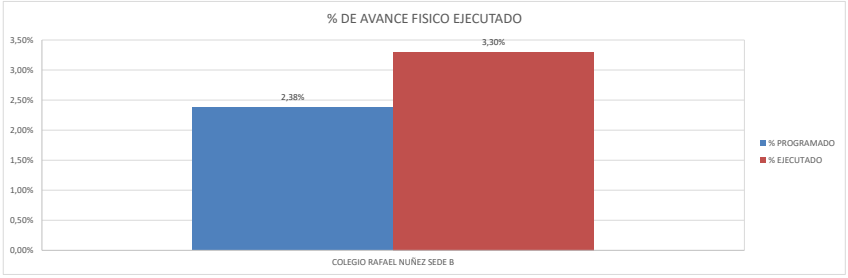

CONSORCIO INTERVENTORY COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA				**REGISTRO DEL PERSONAL**		
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**	**CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.	OFICIAL	1	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra	AYUDANTES	3	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra			
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector			
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector			
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector			
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST			
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST			
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST			
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	x		GMJ618		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
Pasos y senderos peatonales	**NO**
Rutas de evacuación	**SI**
Manejo de Residuos (RCD's)	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**NO**

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se inicia la instalación de la estructura metálica de cubierta de las aulas de preescolar; en el bloque alianza no se generó un avance considerable dado que el personal de obra civil estuvo en otros frentes de trabajo del contrato. Fueron retirados durante la semana.
*De acuerdo al porcentaje de avance programado semanal, se tiene un 2,38% programado y un 3,30% ejecutado lo que muestra un leve adelanto. Se recomienda seguir con este ritmo de trabajo para no generar atrasos durante la ejecución del proyecto.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 06**		
DEL	18/09/2023	**AL**	24/09/2023



FOTO 1: Inicia la instalación de los pedestales de la estructura metálica de la cubierta del bloque de preescolar - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 2: Finaliza el desmonte de la cubierta y estructura metálica existente del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 3: Inicia la aplicación de anticorrosivo sobre la estructura metálica de cubierta previo al montaje - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 4: Continúa la instalación de la estructura metálica de cubierta de las aulas de preescolar - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 5: Continúa la aplicación de anticorrosivo sobre la estructura metálica de cubierta previo al montaje - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 6: Continúa la instalación de la estructura metálica de cubierta de las aulas de preescolar - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 7: Se realiza el desmonte de la cubierta existente de las aulas de preescolar - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 8: Continúa la instalación de la estructura metálica de cubierta de las aulas de preescolar - Colegio Rafael Nuñez Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE A**	**SEMANA**	**No. 22**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023		**DEL**	18/09/2023	**AL**	24/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 18/09/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 19/09/2023 Continúa la aplicación de pintura y la demarcación de las canchas múltiples

El día 20/08/2023 Continúa la aplicación de pintura y la demarcación de las canchas múltiples

El día 21/08/2023 Continúa la aplicación de pintura y la demarcación de las canchas múltiples

El día 22/09/2023 Se realiza la instalación de la malla tipo angeo en las puertas del shut de basuras

El día 23/09/2023 Se realiza la reparación con soldadura del domo de acceso de la puerta 2

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de separaración adecuada de los RCD's generados durante la semana.
- Se mantiene la identificación de los puntos de acopio de RCD's y materiales de construcción.
- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	10,63%	99,79%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	153	-27
		121,4%	-21,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE	3	CARLOS GUTIERREZ / DFL S.A.S.
OFICIAL	1	DFL S.A.S.

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*En Mesa de trabajo realizada el dia 31 de agosto de 2023, se ajusto el presupuesto del colegio de acuerdo a las actividades que se deben realizar para cumplir con el alcance de intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $ 431.422.080.
*Se terminan todas las actividades contractuales durante la semana quedando pendiente la instalación de las rejillas de los sumideros laterales de la cancha múltiple por un valor de $1.035.000; estas rejillas se instalarán el día martes 26 de septiembre.
*Se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo con el fin de realizar el retiro de todos los materiales sobrantes de las actividades de construcción del colegio dado que se tiene como fecha de entrega el día martes 26 de septiembre en compañía de la Ing. Julieta Mercado las canchas múltiples intervenidas y el shut de basuras construído.

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoria

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoria

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 22**		
DEL	18/09/2023	**AL**	24/09/2023



FOTO 1: No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista. - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A



FOTO 2: Continúa la aplicación de pintura y la demarcación de las canchas múltiples - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A



FOTO 3: Continúa la aplicación de pintura y la demarcación de las canchas múltiples - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A



FOTO 4: Continúa la aplicación de pintura y la demarcación de las canchas múltiples - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A



FOTO 5: Se realiza la instalación de la malla tipo angeo en las puertas del shut de basuras - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A



FOTO 6: Se realiza la reparación con soldadura del domo de acceso de la puerta 2 - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE B**	**SEMANA**	**No. 09**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	18/09/2023	**AL**	24/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 18/09/2023 Inicia la demolición de cubierta en asbesto existente de las aulas del bloque 2

El día 19/09/2023 Inicia la mampostería divisoria de espacios de los baños del costado de la portería

El día 20/09/2023 Inicia el pañete de los muros de la poceta de lavado en los baños del costado de la cancha

El día 21/09/2023 Se realiza el perfilamiento de la caja de aguas servidas de los baños del costado de la portería

El día 22/09/2023 Finaliza el desmonte de cubierta existente en el aula 7 del bloque 2

El día 23/09/2023 Continúa el desmonte de cubierta existente en el aula 8 del bloque 2

COMPONENTE SST:

*Se acopian en obra en los espacios de punto de acopio los residuos de construcción y demolición que se generaron durante el proceso de desmonte de cubiertas existentes en asbesto de la semana en curso.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Elaboración de ATS, pausas activas, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área SST del contratista y de la interventoría.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
10,57%	8,99%	0,64%	4,89%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	171	62	109
		36,3%	63,7%

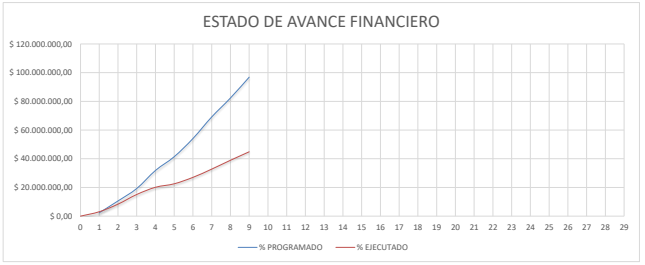

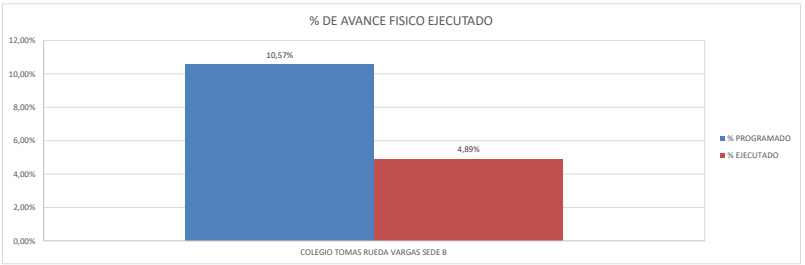

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	3	EULISES GÓMEZ / D&J SERVICIOS
AYUDANTE	5	EULISES GÓMEZ / D&J SERVICIOS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	X		EQR 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	**SI**
Rutas de evacuación	**SI**
Manejo de Residuos (RCD's)	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se tiene un porcentaje programado para la semana en curso del 10,57% y se tiene un ejecutado del 4,89% lo que refleja un atraso del 5,68%. Se sugiere acelarar las actividades de instalación de la estructura metálica de cubiertas en las aulas 6 a 12 aprobadas para recuperar el avance perdido durante el periodo.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 09**		
DEL	18/09/2023	**AL**	24/09/2023



FOTO 1: Inicia la demolición de cubierta en asbesto existente de las aulas del bloque 2 - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 2: Inicia la mampostería divisoria de espacios de los baños del costado de la portería - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 3: Inicia el pañete de los muros de la poceta de lavado en los baños del costado de la cancha - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 4: Se realiza el perfilamiento de la caja de aguas servidas de los baños del costado de la portería - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 5: Finaliza el desmonte de cubierta existente en el aula 7 del bloque 2 - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 6: Continúa el desmonte de cubierta existente en el aula 8 del bloque 2 - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA**	20 de enero de 2024	**COLEGIO NUEVA DELHI SEDE A**	**SEMANA**	**No. 36**		
FECHA INICIO OBRA:	22 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	25 de julio de 2023		**DEL**	18/09/2023	**AL**	24/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4146220		

COMPONENTE TÉCNICO:

El 18/09/23 Realizan observaciones realizadas como remates de vanos de puertas, pintura en puertas, aseo general

El 19/09/23 Continúan con remates en puertas vanos, limpieza de sifón en bloque de bachillerato, retoques de pintura general

El 20/09/23 Sin actividades.

El 21/09/23 Continúan con remates generales de pintura, en muros, limpieza de baños, pintura de bajantes, limpieza de ventanas.

El 22/09/23 Sin actividades.

El 23/09/23 Sin actividades.

COMPONENTE SST: Verificación de condiciones de seguridad para trabajo en alturas, verificación personal autorizado para trabajo en alturas, verificación personal aprobado ingreso a obra, acompañamiento y recorrido, Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS, Inspección uso de EPP Verificación punto de acopio material RCD.


COMPONENTE AMBIENTAL: Orden de zonas de intervención.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	0,09%	100,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	153	214	-61
		139,9%	-39,9%

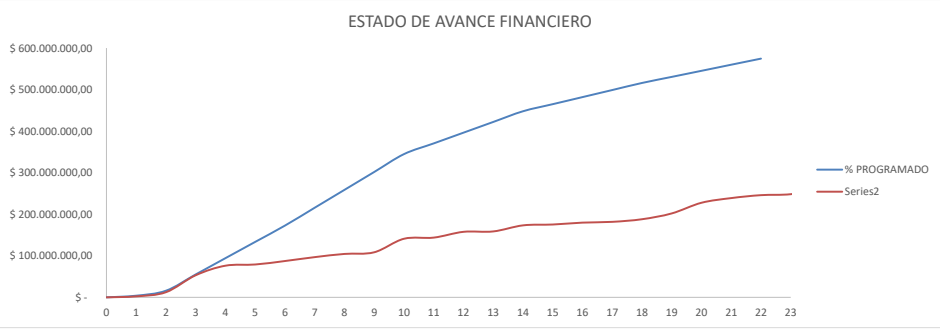

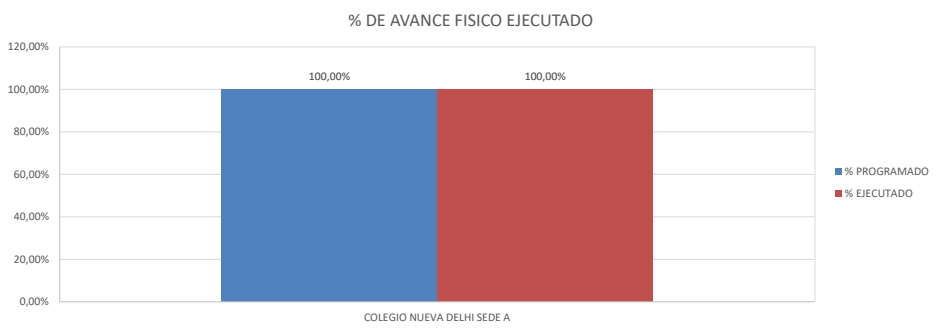

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	1	SIGMA
OFICIAL DE OBRA	1	DYJ
AYUDANTE	3	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se cumple el tiempo de ejecución de la obra según cronograma, se le recuerda al contratista las actividades pendientes, además de recordar el realizar un plan de contingencia para este frente. No se cumple plan de contingencia contratista se compromete a entregar el frente de obra el día 18 de septiembre del año en curso, no se cumple de nuevo la fecha, quedadnod pendiente retoque de puerta de almacén.
De nuevo se realizo recorrido entre residente de interventoría y contratista, mostrando de manera detallada y mediante un check list los pendientes faltantes. Se realiza compromiso de realizar entrega el día 26 de septiembre del año en curso.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 36		
DEL	18/09/2023	AL	24/09/2023



FOTO 1: Aseo general y limpieza en baños - Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: Retoques de pintura en muros de escalera - Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: Remate de filos de marcos de puertas - Colegio Nueva Delhi



FOTO 4: Retoque de pintura en puertas nuevas y existentes - Colegio Nueva Delhi

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL SEDE B**		**SEMANA**	**No. 36**	
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023			**DEL**	18/09/2023 **AL**	24/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 18/09/23 Realizan instalación de teja ecoroof de cubierta de zona de juego.

El 19/09/23 Sin actividades.

El 20/09/23 Realizan fundida de concreto en zona de platinas de cubierta de zona de juego.

El 21/09/23 Realizan instalación de soscos en canales de cubierta de zona de juego.

El 22/09/23 Realizan retiro de escombros aseo y limpieza general.

El 23/09/23 Continúan realizando aseo y limpieza general también se encuentran realizando remates y detalles de pintura en estructura metálica.

COMPONENTE SST: Acompañamiento y recorrido para verificación de condiciones de seguridad ,verificación de personal aprobado para ingreso a obra, validación de documentos SST permisos de trabajo caliente y alturas., inspecciones ATS, Inspección uso de EPP,verificación punto de acopio material RCD, recomendaciones y observación en recorrido a obra.

COMPONENTE AMBIENTAL: Orden de zonas de intervención.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	7,23%	100,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	151	-25
		119,8%	-19,8%

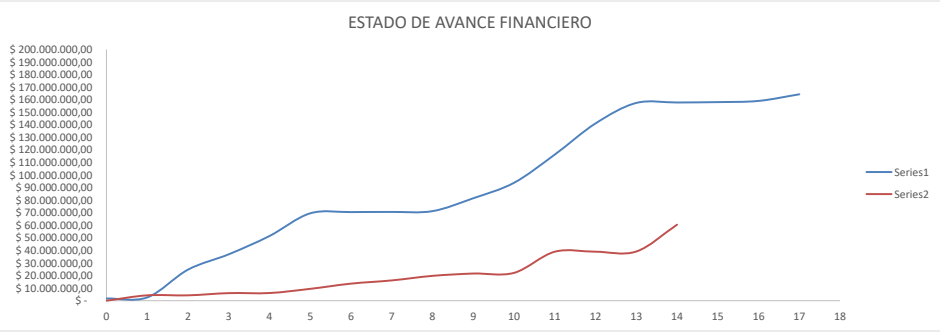

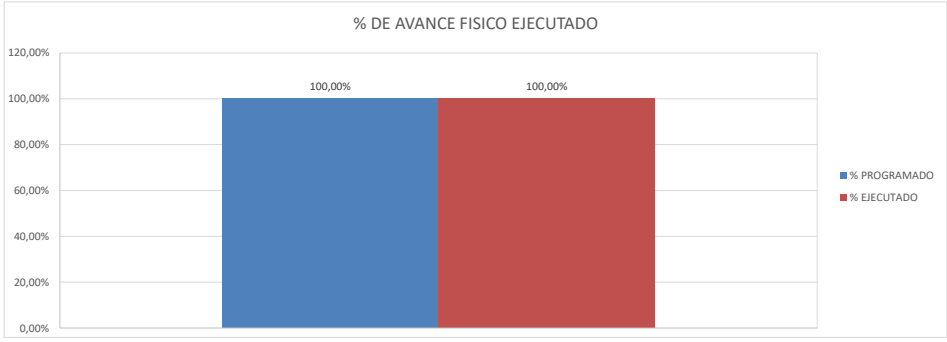

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	5	DYJ
OFICIAL DE OBRA	2	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta para retiro de material	x		EQR - 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se cumple el 100% de programación de este frente,.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 36		
DEL	18/09/2023	AL	24/09/2023



FOTO 1: Retiro de material sobrante - Colegio Altamira Sede B



FOTO 2 : fundición de concreto para parte superior de zapatas de estructura de cubierta de zona de juegos- Colegio Altamira Sede B



FOTO 3: Instalación de teja Ecoroof de cubierta de acceso principal de nivel inferior - Colegio Altamira Sede B



FOTO 2: Instalación de teja Ecoroof de cubierta de zona de juego - Colegio Altamira Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A**	**SEMANA**	**No. 36**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	5 de agosto de 2023		**DEL**	18/09/2023	**AL**	24/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 19/09/23 Sin actividades

El 20/09/23 Realizan aseo y limpieza general

El 21/09/23 Continúan dos ayudantes realizando aseo y limpieza

El 22/09/23 Sin actividades

El 23/09/23 Inician con la construcción de muro en mampostería en zona de borde desp+ues de cerramiento contra impacto.

El 24/09/23 Continuan con la construcción de muro en mampostería en zona de borde desp+ues de cerramiento contra impacto.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	10,09%	68,25%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	103	151	-48
		146,6%	-46,6%

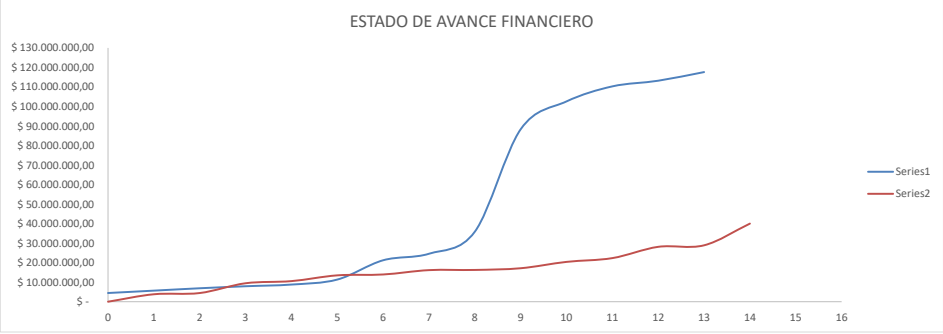

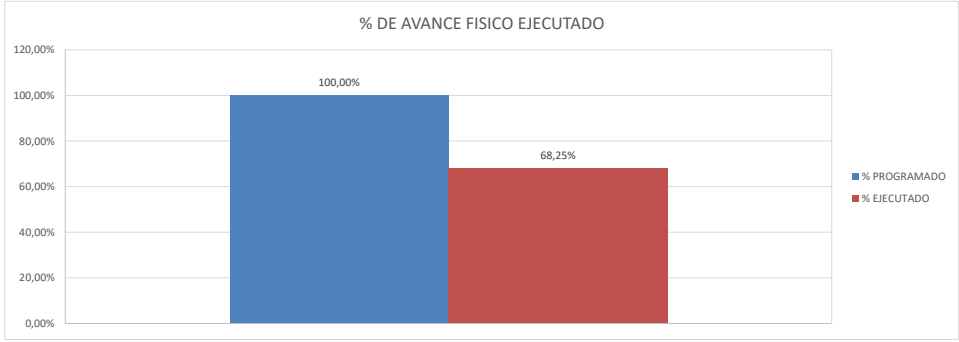

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	Onepro servise S.AS
OFICIAL DE OBRA	1	Onepro servise S.AS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se recordo a contratista la importancia de avanzar en la ejecución de actividades de manera más productiva, debido a la diferencia que hay entre programación y ejecución.
Se recuerda que ya se cumplio el 100 % del tiempo de ejecución.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA No. 36

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DEL	18/09/2023	AL	24/09/2023



FOTO 1: Aseo y limpieza general - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 2: construcción de muro en mampostería en zona de borde desp+ues de cerramiento contra impacto - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 3: Sin actividades - Colegio Entre Nubes Sede A Sede A



FOTO 4 : Sin actividades - Colegio Entre Nubes sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO SEDE C**		**SEMANA**	**No. 36**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de mayo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de diciembre de 2023			**DEL**	18/09/2023 **AL**	24/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 18/09/23 Desmonte de divisiones y puertas metálicas en baños existentes, instalación de divisiones de baño en acero inoxidable, instalación de puerta tipo reja en baños, instalación de sanitarios

El 19/09/23 Instalación tubería emt 1" para red eléctrica, instalación de sanitarios, instalación de divisiones en acero inoxidable de baños existentes y baño con nueva distribución

El 20/09/23 Aplicación de masilla a muros en drywall que se hicieron en zonas entre viga de ammarre en concreto existente de muros y estructura de cubierta nueva

El 21/09/23 No se realizaron actividades

El 22/09/23 Continuan con aplicación de masilla a muros en drywall que se hicieron en zonas entre viga de ammarre en concreto existente de muros y estructura de cubierta nueva

El 23/09/23 Continuan con aplicación de masilla a muros en drywall que se hicieron en zonas entre viga de ammarre en concreto existente de muros y estructura de cubierta nueva

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda acopio provisional de material RCD y material de obra sobrante.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
75,54%	72,72%	3,70%	44,24%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	242	143	99
		59,1%	40,9%

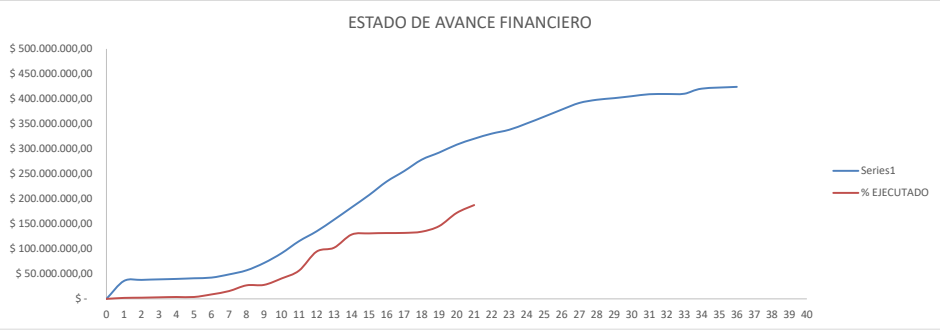

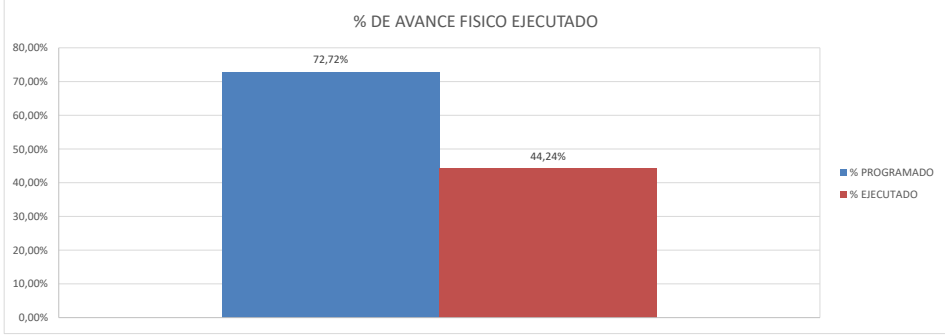

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	CARLOS JULIO GUTIERREZ
OFICIAL DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 36		
DEL	18/09/2023	AL	24/09/2023



FOTO 1: Desmonte de divisiones de baños existentes - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 2: Instalación de divisiones de acero inoxidable de baño - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 3: Instalaciones eléctricas de aulas - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 4: Instalaciones eléctricas de aulas - Colegio José Felix Restrepo Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B**		**SEMANA**	**No. 36**	
FECHA INICIO OBRA:	10 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	9 de septiembre de 2023			**DEL**	18/09/2023 **AL**	24/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 19/09/23 Alistado de pisos (zona de poseta), instalación de marco para tapa de caja de inspección, instalación de enchape de piso

El 20/09/23 Descargue de ladrillos para muro en mampostería, instalación de enchape de piso, aplicación de boquilla a enchape de piso

El 21/09/23 Instalación de enchape de piso, aplicación de boquilla a enchape de piso, instalación de tapa para caja de inspección, demolición de acabados de muros y pisos (área poseta) regata para tuberia sanitaria 2" (sifón poseta)

El 22/09/23 Instalación tubería 2" (sifón poseta) reinstalacion de aparatos sanitarios previamente desinstalados, instalación de enchape en pisos, construcción de muro en mampostería (muro de poseta)

El 23/09/23 Reinstalación de aparatos sanitarios previamente desinstalados, instalación de enchape de muros (área de poseta)

El 24/09/23 Continuan con instalación de enchape en muros de baño que estaban en mal estado, construcción de muro en mampostería en patio de juegos

COMPONENTE SST: Revisión y aprobación documental de ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección preoperacionales, verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra

COMPONENTE AMBIENTAL: Se reitera observación sobre retirar material que se encuentra en anden público.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
54,24%	43,82%	3,66%	30,05%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	91	104	-13
		114,3%	-14,3%

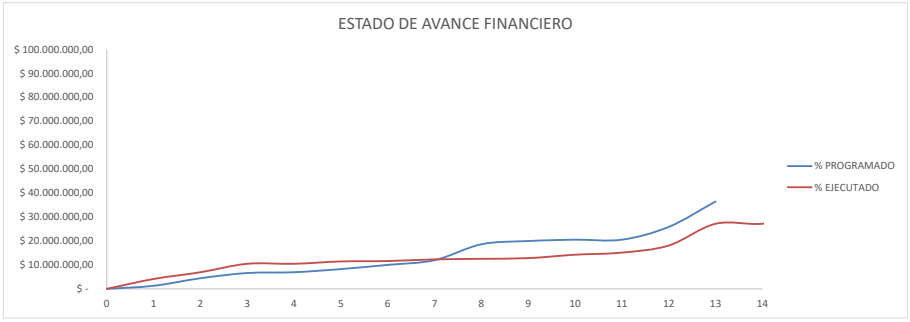

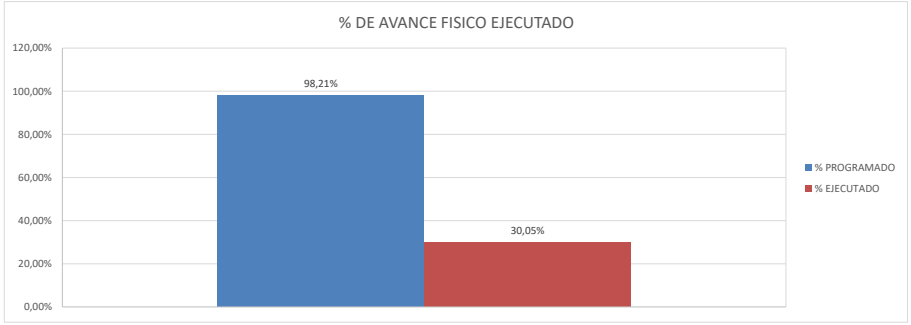

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	INERCIA INGENIERIA
OFICIAL DE OBRA	1	INERCIA INGENIERIA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se actualiza la programación y el valor total del frente de obra.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 36		
DEL	18/09/2023	AL	24/09/2023



FOTO 1: Enchape de pisos de baños - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 2: Fundición de tapa de caja de inspección de baño - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 3: Instalación de tuberia de sifón - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 4: Construcción de muro de mamposteria - Colegio José Acevedo y Gomez sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A**	**SEMANA**	**No. 36**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	18/09/2023	**AL**	24/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 19/09/23 Aplicación de soldadura en intersecciones de estructura metálica, aplicación de anticorrosivo, descargue de teja para cubierta.

El 20/09/23 Instalación de estructura metálica (zona comedor), raspado de pintura de muros, pañetado de filos

El 21/09/23 Desmonte de cubierta, raspado de pintura de muros, pañete de filos de muros en su parte superior

El 22/09/23 Aplicación de esmalte a estructura metálica, instalación de laminas para muro en drywall, pañetado de filos

El 23/09/23 Picado de acabado de pintura de muros existentes donde esta en mal estado, aplicación de pintura en esmalte a estructura metálica, instalación de laminas para muro en drywall que se hicieron en zonas entre viga de ammarre en concreto existente de muros y estructura de cubierta nueva

El 24/09/23 Aplicación de pintura en esmalte a estructura metálica, instalación de laminas para muro en drywall, raspado de pintura en muro, pañetado de filos

COMPONENTE SST: Verificación ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección ATS, permisos de trabajo, preoperacionales. Verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra,Validacion de retiro material RCD (Teja de asbesto), validación punto de acopio, verificación actividades de trabajo en alturas, Inspección armado de andamio.

COMPONENTE AMBIENTAL: Retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
33,12%	24,64%	1,63%	8,57%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	171	62	109
		36,3%	63,7%

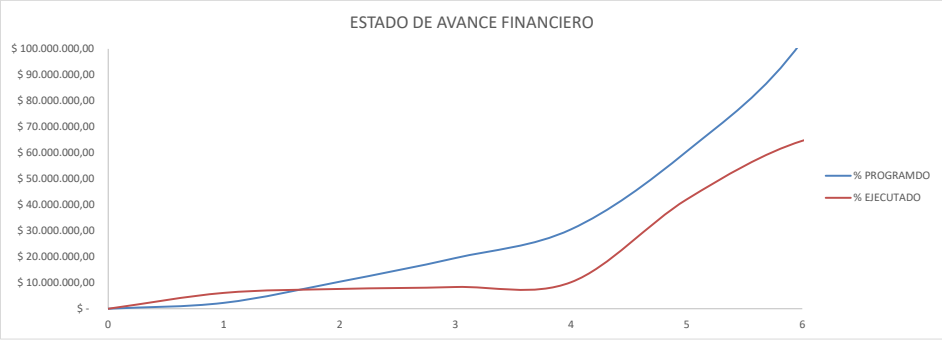

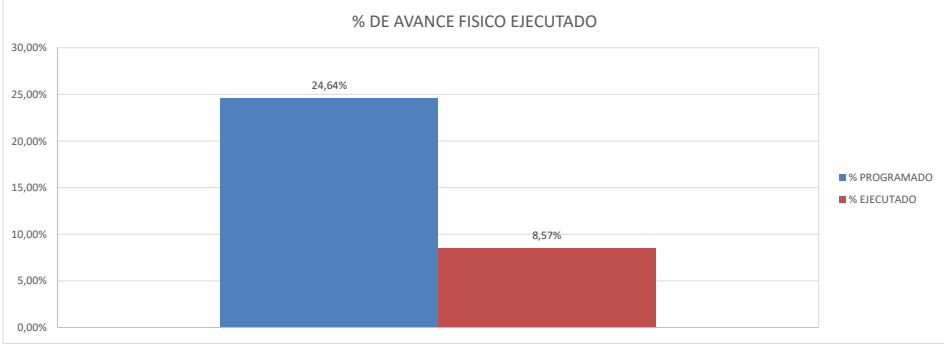

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	HOME SERVICE
OFICIAL DE OBRA	2	HOME SERVICE
OFICIAL DE OBRA	1	Onepro servise S.AS
AYUDANTE DE OBRA	2	Onepro servise S.AS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 36		
DEL	18/09/2023	AL	24/09/2023



FOTO 1: Desmonte de cubierta de patio central - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 2: Instalación de lamina de fibrocemento de muros- Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 3: picado de muros en ma estado - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 4: Resanes de muros en mal estado - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**	**SEMANA**	**No. 36**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL**	18/09/2023	**AL**	24/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 18/09/23 Se realiza cielo raso en aula 2, fundida de placa de contra piso de zona de juegos y area de tanque.

El 19/09/23 Se realiza cielo raso aula 2, instalación de etrboard para muros en culatas aulas 5-7, filos de pañetes para muros internos aulas 5-7.

El 20/09/23 Se realiza cielo raso aula 2, instalación de eterboard para muros en culatas aulas 5-7, filos de pañetes para muros internos aulas 5-7, cortes placa area juegos.

El 21/09/23 Se realiza instalación de tuberia electrica aulas, instalación de eterboard para muros en culatas aulas 5-7, filos de pañetes para muros internos aulas 5-7. destronque piso aula 5,

El 22/09/23 Se realiza instalación de tuberia emt en bloque adminstrativo, instalación de eterboard para muros en culatas aulas 5-7, filos de pañetes para muros internos aulas 5-7, destronque de piso aula 5,

El 23/09/23 Se realiza instalación de tuberia emt bloque administrativo, gravilla lavada en escaleras externas, instalación de eterboard para muros en culatas aulas 5-7, filos de pañetes para muros internos aulas 5-7, destronque de piso aula 5,

COMPONENTE SST: Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, revisión y probacion documental ingreso de personal, verificación uso adecuado de EPP, Inspección y aprobación de usos de sistemas de acceso (Andamio)

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
65,08%	58,67%	2,33%	60,01%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
	291	255	36
		87,6%	12,4%

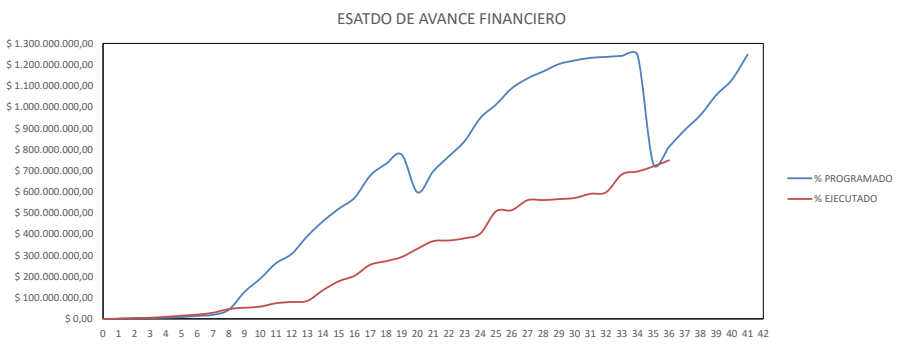

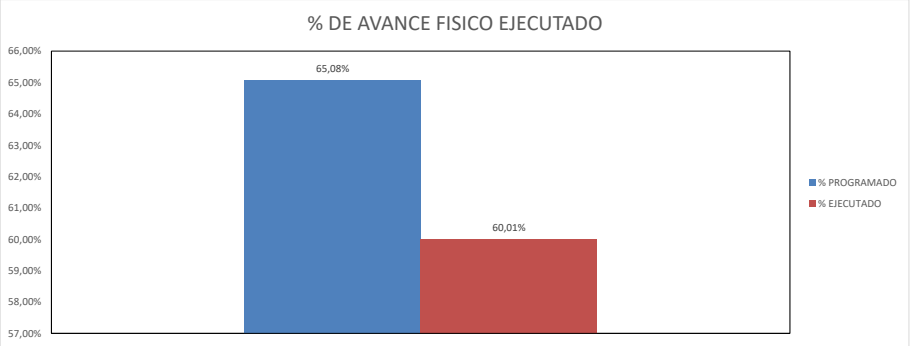

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
AYUDANTE DE OBRA	3	HOME SERVICE

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**SI**

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.246.912.368 y nueva fecha de terminación el 30/10/23.
-Se realizan pruebas de densidades en campo para la zona de juegos obteniendo un porcentaje de compactación mayor al 90% del proctor del material.
-Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 36		
DEL	18/09/2023	AL	24/09/2023



FOTO 1: Fundida de placa de zona de juegos - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 2: Tapa culatas de aulas segundo piso - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



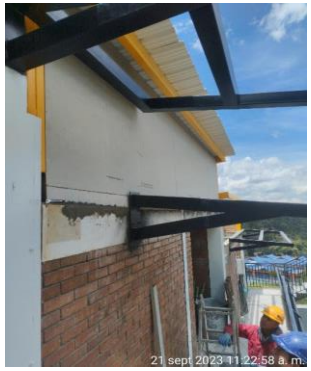


FOTO 3: Tapa culatas aulas segundo piso- Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 4: Tuberia emt bloque administrativo - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 5: Corte de placa de zona de juegos - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 6: Destronque de piso de aula 5 - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL SEDE A**	**SEMANA**	**No. 36**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	31 de octubre de 2023		**DEL**	18/09/2023	**AL**	24/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 18/09/23 Se realiza pintura de vinilo salones primer piso, filos en puertas, alistado piso en escaleras, granito en boca puertas y escaleras, picado de muro en pasillo segundo piso, soldadura estructura para cerramiento y puertas

El 19/09/23 Se realiza pintura de vinilo salones primer piso, filos en puertas, alistado piso en escaleras, granito en boca puertas y escaleras, picado de muro en pasillo segundo piso, soldadura estructura para cerramiento y puertas

El 20/09/23 Se realiza pintura de vinilo salones primer piso, dilos en puertas, alistado de piso en escaleras, granito bocapuertas y escalera, picado muro en pasillo segundo piso, soldadura estructura de cerramiento re emboquillado de fachada, reinstalación de luminaria bloque primaria.

El 21/09/23 Se realiza pintura vinilo en salones primer piso, filos en puertas, alistado de piso en escaleras, granito en boca puertas y escaleras, picado de muro de pasillo segundo piso, soldadura estructura metalica cerramiento, reemboquillado de fachada, estuco en cielo razo de pasillos.

El 22/09/23 Se realiza pintura vinilo en salones primer piso, filos en puertas, alistado de piso en escaleras, granito en boca puertas y escaleras, picado de muro de pasillo segundo piso, soldadura estructura metalica cerramiento, reemboquillado de fachada, estuco en cielo razo de pasillos, soldadura de rejilla de carcamo.

El 23/09/23 Se realiza pintura vinilo en salones primer piso, filos en puertas, alistado de piso en escaleras, granito en boca puertas y escaleras, picado de muro de pasillo segundo piso, reemboquillado de fachada, estuco en cielo razo de pasillos, soldadura de rejilla de carcamo.

COMPONENTE SST: Verificar documentación SST: permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales, Inspección de orden y aseo en frentes de trabajo, Verificación de uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación documental ingreso de personal a obra, inspección y aprobación de uso de sistema de acceso(Andamio), Inspección actividades de trabajo en altururas

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
77,39%	74,39%	0,14%	78,89%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	292	255	37
		87,3%	12,7%

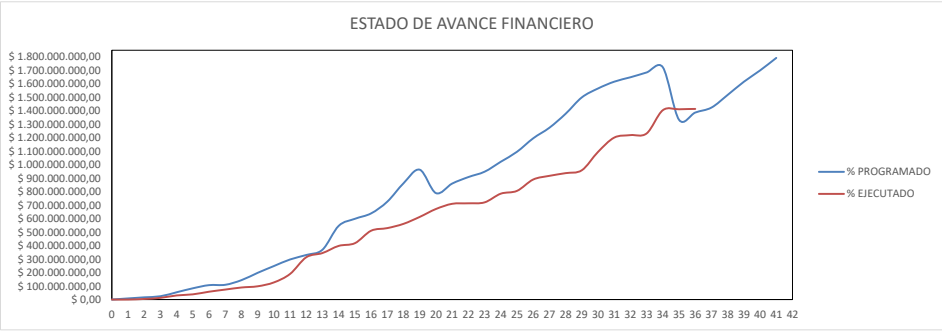

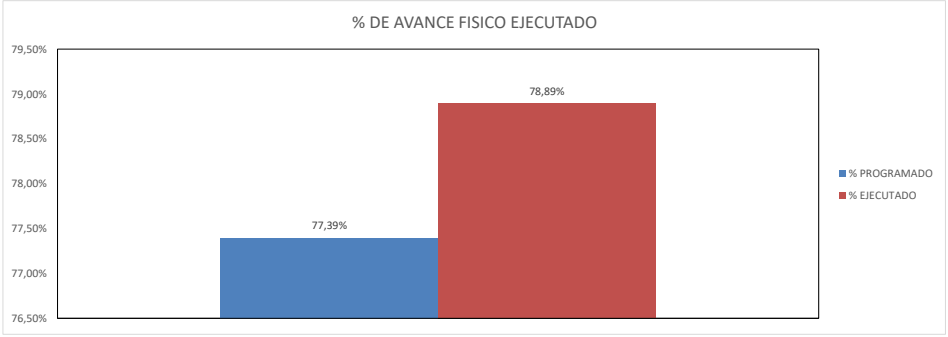

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	9	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL	1	JLIO GUTIERREZ MUÑOZ
INSTALADOR DE DIVISIONES DE ACERO INOXIDABLE	2	ARQUITECTURA DISEÑO Y MODULAR

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.793.050.180 y nueva fecha de terminación el 31/10/23.
-Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 36		
DEL	18/09/2023	AL	24/09/2023





FOTO 1: Alistado y gravilla de escaleras - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 2: Reemboquillado de ladrillo de facahda - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 3: Pintura de bloque de primaria - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 4: Pintura de salones de primer piso bloque bachillerato - Colegio José Maria Carbonell

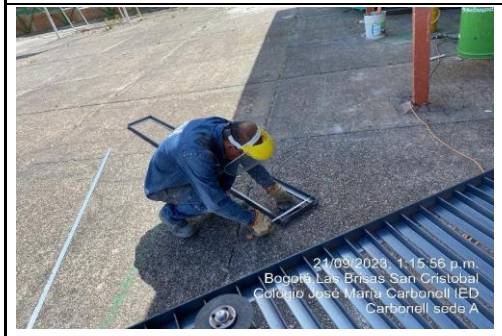




FOTO 5: Instalación de marco de rejilla de carcamo y trabjos de ornamentación - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 6: pintura de cerramiento tipo S.E.D - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL SEDE C**		**SEMANA**	**No. 36**	
FECHA INICIO OBRA:	3 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	18/09/2023 **AL**	24/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 18/09/23 Se realiza amarra de acero para viga de muro de cerramiento.

El 19/09/23 Instalación de formaleta para fundida de columnas muro de cerramiento, lijado y pulido de soldadura de estructura metalica de baños.

El 20/09/23 Fundida de columnas de muro de cerramiento, lijado y pulida de soldadura de estructura metalica de baños.

El 21/09/23 Fundida de viga de muros de cerramiento.

El 22/09/23 Apliación de anticorrosivo estructura metalica de baños, mamposteria muro de cerramiento.

El 23/09/23 Aplicación de anticorrosivo estructura metalica de baños, mamposteria muro de cerramiento.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Validación evacuación material RCD.(Madera)
Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
20,99%	19,87%	0,50%	18,41%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	283	172	111
		60,8%	39,2%

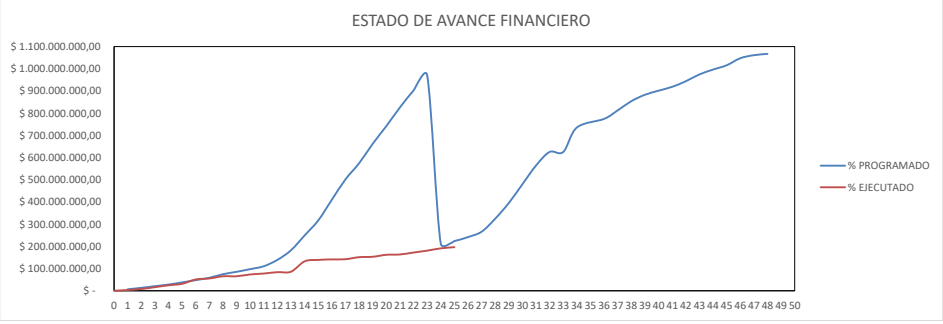

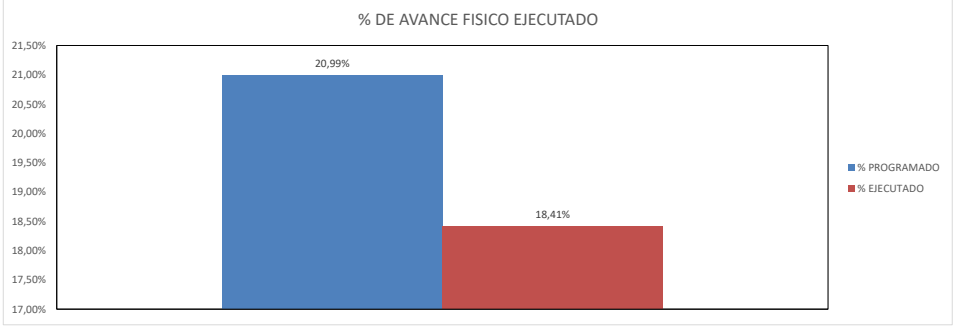

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AXN
OFICIAL	2	AXN
MAESTRO	1	AXN

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.067.082.680 y nueva fecha de terminación el 11/01/24.
* Por las fuertes lluvias presentadas en la semana no se ha podido realizar la demolición de placa cubierta de manera continua.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 36		
DEL	18/09/2023	AL	24/09/2023







FOTO 1: Formaleta y fundida de columnas - Colegio Moralba Sede C





FOTO 2: formaleta y fundida de viga de muro - Colegio Moralba Sede C





FOTO 3: Pulida de soldadura y anticorrosivo - Colegio Moralba Sede C

FOTO 4: - Colegio Moralba Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CIRSTOBAL SUR SEDE B**	**SEMANA**	**No. 36**		
FECHA INICIO OBRA:	20 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL**	18/09/2023	**AL**	24/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 18/09/23 Se realiza enchape pasillo primer piso.

El 19/09/23 Se realiza enchape pasillo primer y segundo piso, demolición de mamposteria para cuarto de aseo.

El 20/09/23 Se realiza enchape de salones de segundo piso.

El 21/09/23 Se realiza enchape de salones de segundo piso,remates de filos para cuarto de aseo.

El 22/09/23 Se realiza alistado de escalera, filos de ventanas segundo piso, pintura de salones.

El 23/09/23 Se realiza alistado de escalera, filos de ventanas segundo piso, pintura de salones.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
74,08%	68,53%	1,21%	63,46%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	132	94	38
		71,2%	28,8%

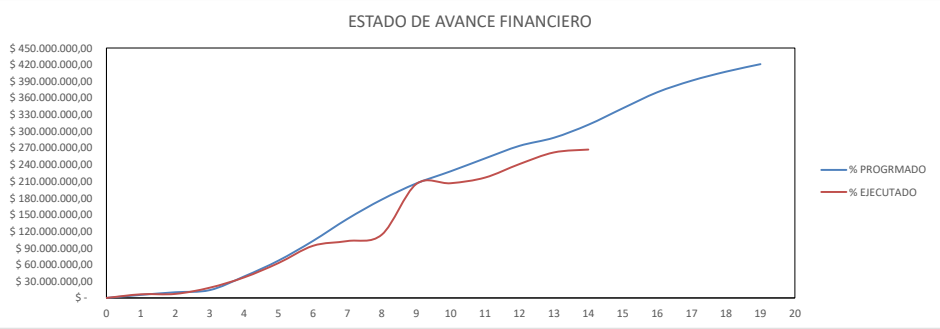

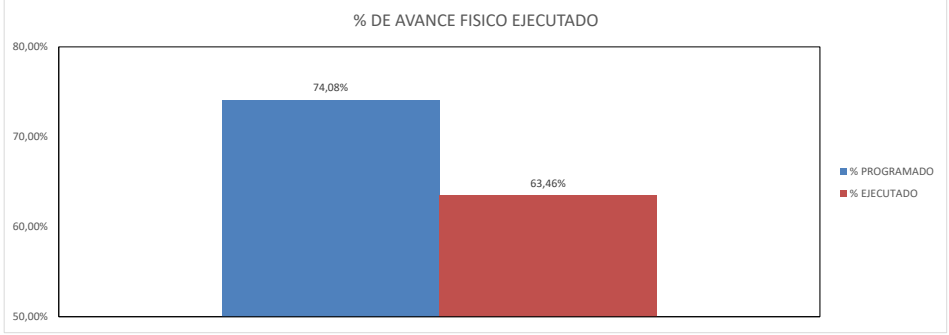

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIALES	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $420.914.867

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 36		
DEL	18/09/2023	AL	24/09/2023





FOTO 1: Instalación de porcelanato en pasillos - Colegio San Cristobal Sede B





FOTO 2: Alistado de escalera primer piso - Colegio San Cristobal Sede B



FOTO 3: Demolición de mamposteria para puerta de cuarto de aseo - Colegio San Cristobal Sede B





FOTO 4: Pintura de salones primer piso - Colegio San Cristobal Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ SEDE A**	**SEMANA**	**No. 36**		
FECHA INICIO OBRA:	4 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	18/09/2023	**AL**	24/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 18/09/23 Pañete de muros de baños y muro en pasillo parque, picado de muro salon oficinas.

El 19/09/23 Pañete de muros de pasillos y oficinas.

El 20/09/23 Pañete de muros de pasillos y salones.

El 21/09/23 Pañete de muros de pasillos y filos de vanatanas aulas preescolar.

El 22/09/23 Pañete de muros de pasillos y filos de vanatanas aulas preescolar.

El 23/09/23 Pañete de muros de pasillos y filos de vanatanas aulas preescolar.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
38,81%	28,99%	0,09%	13,94%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	191	80	111
		41,9%	58,1%

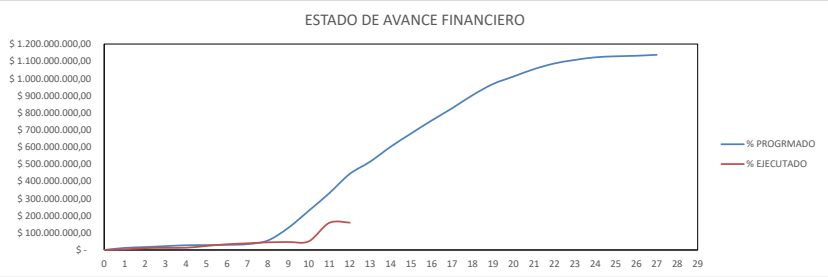

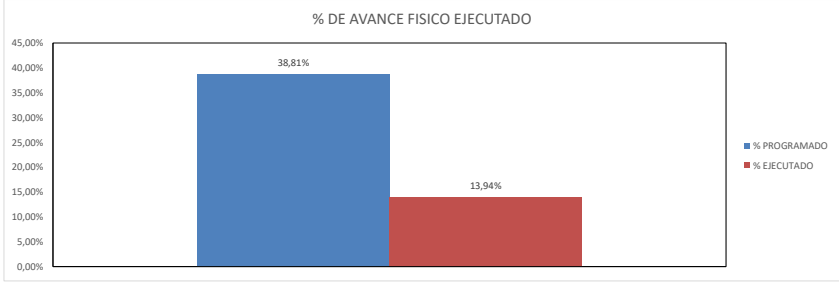

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	4	STOR CONSTRUCCIONES SAS
OFICIAL	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.142.104.067

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA	No. 36		
DEL	18/09/2023	AL	24/09/2023





FOTO 1: Pañete de muros de salones y zona de juegos - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A





FOTO 2: Filos de ventanas y puertas- Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 36**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	18/09/2023 **AL**	24/09/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio Juan Rey - Sede A. Se realiza instalación de sistema de equipos de bombeo reparados.

Colegio Juana Escobar - Sede A. Se suscribe acta de entrega por instalación de acometida eléctrica desde tablero de distribución principal a tablero de cocina.

Colegio Gloria Valencia de Castaño. Se suscribe acta de entrega por instalación de acometida eléctrica en cocina.

Colegio Manuelita Saenz. Se realiza instalación de ventana en aula de biblioteca.

Colegio Los Alpes - Sede A. Se realiza trasiego, retiro y disposición final de RCD, extendido y compactación de recebo, excavación de zanja e instalación de sardinel, transporte y acopio de aulas prefabricadas. Se suscribe acta de entrega por tala y poda de árboles.

Colegio José Joaquín Castro - Sede B. Se realiza instalación de tejas en cubierta.

COMPONENTE SST: Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio La Belleza- sede A, Moralba Sede A

COMPONENTE AMBIENTAL: **Se realizo acompañamiento a la actividad de tala de arboles del colegio Manuelita Saenz, se realizco solicitud de retiro de RCD de colegio Juan Rey Sede A y Jose Joaquin Sede b**

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
69,89%	12,15%	82,05%

ESTADO DE AVANCE

NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER	3
EMERGENCIAS EN EJECUCION	6
EMERGENCIAS ATENDIDAS	36
REPORTADAS -TOTAL	45

EMERGENCIAS ATENDIDAS

* Colegio El Rodeo - Sede A. (Sum e Inst sistema de bombeo)
* Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst equipos de bombeo)
* Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, construcción de escalon)
* Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación plazoleta principal)
* Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto electrico)
* Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de Tanques de agua potable)
* Colegio Jose Joaquin Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas)
* Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas)
* Colegio Manuelita Saenz. (Ruptura de tuberia de agua potable 2" en acero galvanizado)
* Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refirgeradores de comedor escolar)
* Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores)
* Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tubería desague tienda escolar)
* Colegio San José Sur Oriental (Cambio cubierta aula rectoria)
* Colegio Los Alpes - Sede C. (Suspensión punto hidráulico sanitario)
* Colegio Florentino Gonzalez. (Tratmiento fisuras en muros, pintura e impermeabilización viga canal)
* Colegio Gloria Valencia de Castaño. (Poda de cesped y fumigación)

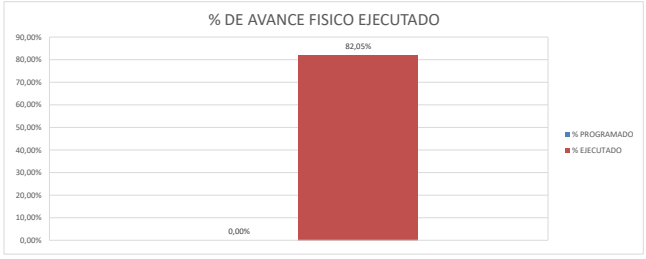

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

Nº	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**	
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	**TERMINADO**	
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	**TERMINADO**	
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**	
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PLAZOLETA	**TERMINADO**	
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	BARANDA	**TERMINADO**	
7	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	**TERMINADO**	
8	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	**TERMINADO**	
9	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**	
10	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	GRIETAS Y PINTURA MUROS, IMPERM VIGACANAL	**TERMINADO**	
12	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE	**TERMINADO**	
13	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	**TERMINADO**	
14	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**	
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	**TERMINADO**	
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**	
17	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	**TERMINADO**	
18	VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES- PODA	**TERMINADO**	
19	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**	
20	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**	
21	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**	
22	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**	
23	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ARBOLES	REPORTADA	
24	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	**TERMINADO**	
25	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**	
26	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	**TERMINADO**	
27	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y PODA	**TERMINADO**	
28	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA	
29	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**	
30	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	**TERMINADO**	
31	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	REPORTADA	
32	EL RODEO - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE ALMACENAMIENTO	EN EJECUCIÓN	
33	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	**TERMINADO**	
34	SAN CRISTOBAL - SEDE A	FLANCHE MURO COLINDANTE	**TERMINADO**	
35	GRAN COLOMBIA	MANTENIMIENTO CUBIERTA	**TERMINADO**	
36	JOSE JOAQUIN CASTRO - SEDE B	CAMBIO CUBIERTA	EN EJECUCIÓN	
37	LOS ALPES - SEDE A	TALA DE ÁRBOL	**TERMINADO**	
38	LOS ALPES - SEDE A	CONSTRUCCIÓN AULAS PREFABRICADAS	EN EJECUCIÓN	
39	JUAN REY - SEDE A	MANTENIMIENTO BOMBAS	EN EJECUCIÓN	
40	VITELMA	PINTURA BAÑO PREESCOLAR, FUMIGACIÓN, CINTA FLANCHE, ARBOL SANITARIOS	**TERMINADO**	
41	MANUELITA SAENZ	PODA Y TALA DE ÁRBOLES	**TERMINADO**	
42	JUANA ESCOBAR - SEDE A	FALLA ELECTRICA - COCINA	**TERMINADO**	
43	MANUELITA SAENZ	DESMONTE DE VENTANA	EN EJECUCIÓN	
44	VEINTE DE JULIO	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN MURO	**TERMINADO**	
45	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FALLA ELECTRICA - COCINA	**TERMINADO**	
46	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	ADECUCIÓN SHUT BASURAS	REPORTADA / RETIRADA	
47	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA / RETIRADA	
48	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA / RETIRADA	

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*** Se realiza juste de valores de emergencias aprobadas teniendo como nuevo valor la suma de $997.037.102, valor con el cual se estan reportando el avance ejecutado.**

Elaborado Por:
Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:
Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 36**		
DEL	18/09/2023	**AL**	24/09/2023





FOTO 1: Instalación de sistema de equipos de bombeo reparados. Colegio Juan Rey - Sede A.





FOTO 2: Suscripción de acta de entrega por instalación de acometida eléctrica desde tablero de distribución principal a tablero de cocina. Colegio Juana Escobar - Sede A.





FOTO 3: Suscripción de acta de entrega por instalación de acometida eléctrica en cocina. Colegio Gloria Valencia de Castaño.





FOTO 4: Instalación de ventana en aula de biblioteca. Colegio Manuelita Saenz.





FOTO 5: Trasiego, retiro y disposición final de RCD. Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 6: Extendido y compactación de recebo. Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 7: Excavación de zanja e instalación de sardinel. Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 8: Transporte y acopio de aulas prefabricadas. Colegio Los Alpes - Sede A.





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO: CDO PCONTR-4077644
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL: LOS ALPES – SEDE A
DIRECCIÓN: CARRERA 12 ESTE # 31A – 80 SUR
LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL SUR
FECHA DE ENTREGA: 21 SEPTIEMBRE 2023

1. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA.

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION: Sandra Liliana Rueda Peñaloza, en su calidad de Supervisor
POR LA INTERVENTORIA: JOHN CASAS DE SANTANA, como representante del CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA
POR EL CONTRATISTA: UNIDISA RGDO Como representante de PROFESIONALES ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS

2. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA.

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del COLEGIO LOS ALPES – SEDE A, ubicado en la Carrera 12 Este # 31A – 80 Sur, que corresponde a la intervención actual con la tala de árboles.

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE RELACIÓN
CERRAMIENTO CUBIERTAS GENERAL	ZONA VERDE	1 UND 1 UND 1 UND	TALA DE ARBOLES CLASE I (4 UND) PODA DE ARBOLES CLASE II (UNIDADES) PODA DE ARBOLES CLASE III (UNIDADES) DISPOSICIÓN FINAL DE ARBOLES CLASE III (UNIDADES)
CERRAMIENTO		2 UND	TALA DE ARBOLES CLASE I (4 UND)


FOTO 9: Suscripción de acta de entrega por tala y poda de árboles. Colegio Los Alpes - Sede A.






FOTO 10: Instalación de tejas en cubierta. Colegio José Joaquín Castro - Sede B







INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 37**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	25/09/2023 **AL**	1/10/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**			ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	$ 13.074.041.772,00	$ 6.317.500.000,00	$ 19.391.541.772,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	$ 951.700.910,00	$ 372.223.480,00	$ 1.323.924.390,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se programa realizar el comité de obra N°35 el 06/10/2023; está pendiente por definir el lugar.

Se realizan ajustes de presupuestos y tiempos en cada uno de los colegios de a cuerdo a lo comentado en el comité No. 32 y a la mesas de trabajo de presupuestos de 31 de agosto y 01 de septiembre.

Se realiza ajuste de porcentaje de avance programado, de acuerdo al flujo de caja V5.

COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:

La interventoria solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz).

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO
43,05%	39,04%	1,69%	38,06%


ESTADO DE AVANCE


COLEGIOS EN INTERVENCIÓN	16	**Actas de vecindad**
COLEGIOS POR INTERVENIR	5	10
COLEGIOS TERMINADOS	7	
TOTAL	28	

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	364	262	103
		72,0%	28,3%

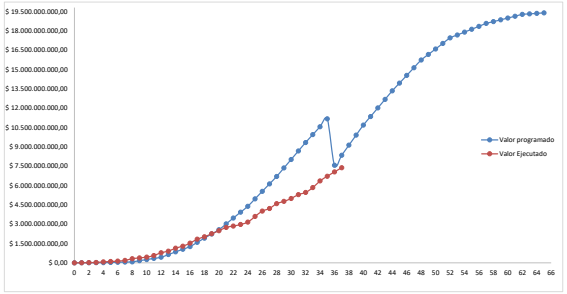

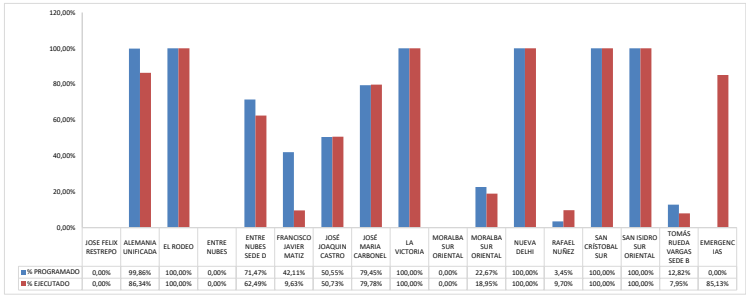



OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta los inicios de los frentes de obra y el atraso presentado se realizaron reprogramaciones en los frentes de obra que tenian un atraso significativo o su valor inicial vario, por tal motivo la programación general se afectada, lo que justifica el porcentaje de avance reportado el presente periodo
Se ajusto al porcentaje ejecutado y programado segun valores de adición No.1 al contrato de obra
Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se encuentra en trámite el modificatorio para la adición para los contratos de obra e interventoría.
Se continua con la atención de emergencias según el reporte por parte de la SED.
Se realiza adición al contrato de obra por un porcentaje del 48,32 del valor inicial del contrato
Se realiza adición al contrato de interventoria por un porcentaje del 39,11 del valor inicial del contrato

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A**		**SEMANA**	**No. 37**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	4 de octubre de 2023			**DEL**	25/09/2023	**AL** 1/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 25/09/2023 Inicia la instalación del enchape de piso tipo Mikonos en la bodega del bloque 4
El día 25/09/2023 Continúa la pintura de muros interiores del aula 22 y el salón de espejos del bloque 4
El día 26/09/2023 Continúan los resanes, la ejecución de filos de vigas y columnas en los espacios del bloque 4
El día 26/09/2023 Continúa la aplicación de pintura tipo esmalte en la estructura metálica de la cubierta del bloque 4
El día 27/09/2023 Continúan la instalación de enchape de piso tipo Mikonos de la bodega del bloque 4
El día 27/09/2023 Continúa la instalación de tapaluces en superboard en las aulas del bloque 4
El día 28/09/2023 Continúa la instalación de la teja de cubierta en el laboratorio del bloque 4
El día 28/09/2023 Continúan los resenes con estuco en los muros interiores de las aulas 22 y espejos del bloque 4
El día 29/09/2023 Inician los remates de filos de ventanas en el aula de la emisora y pagaduría del bloque 4
El día 29/09/2023 Inicia el mantenimiento de soldadura y aplicación de pintura de las puertas del bloque 4

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
99,86%	97,84%	4,72%	86,34%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	265	262	3
		98,9%	1,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OFICIALES DE OBRA	3	SIGMA
AYUDANTE DE OBRA	7	SIGMA
INSTALADORES ELÉCTRICOS	2	SIGMA
ORNAMENTADOR	1	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	X		JAJ 907		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se disminuye el atraso acumulado del 16,23% al 13,52%, ya que se realizó el ajuste del presupuesto con base en el presentado en la reunión mensual del día 05 de Septiembre por un valor de $1,445.618.469,22 y el contratista presentó la actualización de la programación con el respectivo flujo de caja; de acuerdo a lo anterior, el atraso que se ve reflejado aún es por las actividades de finalización del bloque 4 que aún se encuentran en ejecución. La fecha de finalización propuesta en la nueva programación es el 04 de Octubre de 2023.
*Se realizó la instalación de toda la teja tipo sandwich en el espacio de la emisora, la pagaduría, el aula de espejos, el aula 22, el laboratorio y las bodegas de almacenamiento.
*Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal y conductores de los vehiculos; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo; se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor); es necesario conservar el cerramiento provisional de obra en el frente de trabajo en buen estado en el espacio de los baños del piso 1; se solicita mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 37		
DEL	25/09/2023	AL	1/10/2023



FOTO 1: Inicia la instalación del enchape de piso tipo Mikonos en la bodega del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 2: Continúa la pintura de muros interiores del aula 22 y el salón de espejos del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 3: Continúan los resanes, la ejecución de filos de vigas y columnas en los espacios del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 4: Continúa la aplicación de pintura tipo esmalte en la estructura metálica de la cubierta del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 5: Continúan la instalación de enchape de piso tipo Mikonos de la bodega del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 6: Continúa la instalación de tapaluces en superboard en las aulas del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 7: Continúa la instalación de la teja de cubierta en el laboratorio del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 8: Continúan los resanes con estuco en los muros interiores de las aulas 22 y cubículos del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 9: Inician los remates de filos de ventanas en el aula de la emistora y pagadura del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 10: Inicia el mantenimiento de soldadura y aplicación de pintura de las puertas del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A**	**SEMANA**	**No. 37**		
FECHA INICIO OBRA:	6 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	7 de noviembre de 2023		**DEL**	25/09/2023	**AL**	1/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 26/09/2023 Finaliza la instalación de la teja tipo sandwich de cubierta en el aula de danzas del bloque 3

El día 26/09/2023 Se realiza la soldadura de los módulo de la malla contra impacto de la cancha de la sede primaria

El día 26/09/2023 Continúa la instalación de tapaluces de cubierta del aula de danzas del bloque 3

El día 26/09/2023 Se realiza la instalación de correas metálicas de pasillos en el aula 4 del bloque 3

El día 27/09/2023 Continúa la instalación de tapaluces de cubierta del aula #4 del bloque 3

El día 27/09/2023 Continúa la soldadura de los módulos de la malla contra impacto de la cancha de la sede primaria

El día 28/09/2023 Se realiza la mampostería de las vigas cuchillas del aula de danzas en el bloque 3

El día 28/09/2023 Inicia la pintura de los muros interiores del aula de danzas del bloque 3

El día 29/09/2023 Continúa la pintura de los muros interiores del aula de danzas del bloque 3

El día 29/09/2023 Continúa la instalación de tapaluces en superboard bajo cubierta del aula 4 en el bloque 3

COMPONENTE AMBIENTAL:

*Se realiza jornada de retiro de residuos RCD's el día viernes 08 de Septiembre.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
50,55%	47,31%	2,17%	50,73%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	274	237	37
		86,5%	13,5%

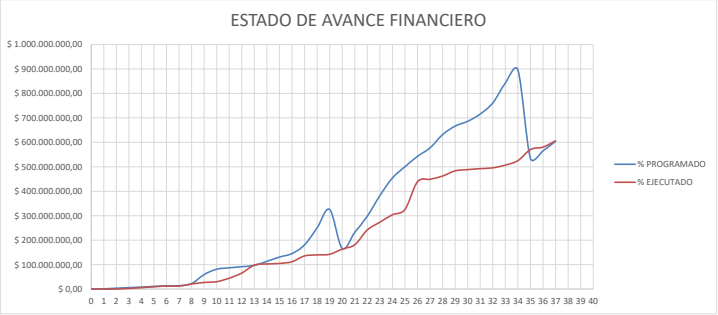

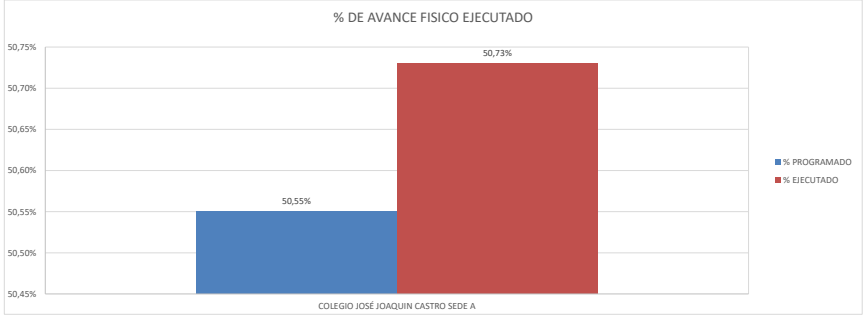

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	3	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se sigue conservando un adelanto del 0,18%, ya que se realizó el ajuste del presupuesto con base en el presentado en la reunión mensual del día 30 de Agosto por un valor de $1,194.848.678 y también se actualiza la programación del colegio con su respectivo flujo de caja. Se aclara que no se pueden ejecutar en simultáneo las obras del bloque 2 con las del bloque 3 dado que el colegio no tiene más espacios para re-ubicar a los estudiantes mientras se realiza la intervención.
*La interventoría sugiere nuevamente ingresar mayor cantidad de personal operativo para ejecutar las actividades que faltan en el frente de las aulas pre-formadas dado que no hay algún impedimento para realizarlas en simultáneo con las obras del bloque 2.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal y conductores de los vehiculos; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo; se solicita mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 37		
DEL	25/09/2023	AL	1/10/2023



FOTO 1: Finaliza la instalación de la teja tipo sandwich de cubierta en el aula de danzas del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Se realiza la soldadura de los módulo de la malla contra impacto de la cancha de la sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Continúa la instalación de tapaluces de cubierta del aula de danzas del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Se realiza la instalación de correas metálicas de pasillos en el aula 4 del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5: Continúa la instalación de tapaluces de cubierta del aula #4 del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Continúa la soldadura de los módulos de la malla contra impacto de la cancha de la sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Se realiza la mampostería de las vigas cuchillas del aula de danzas en el bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 8: Inicia la pintura de los muros interiores del aula de danzas del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 9: Continúa la pintura de los muros interiores del aula de danzas del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 10: Continúa la instalación de tapaluces en superboard bajo cubierta del aula 4 en el bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO RAFAEL NUÑEZ SEDE B**	**SEMANA**	**No. 07**		
FECHA INICIO OBRA:	14 de agosto de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de marzo de 2024		**DEL**	25/09/2023	**AL**	1/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 25/09/2023 Inicia la excavación mecánica de la zona de la cancha de juegos para mejoramiento granular de patio propuesto

El día 26/09/2023 Inicia la instalación de la estructura metálica de cubierta de las aulas de preescolar

El día 27/09/2023 Inicia la aplicación de anticorrosivo sobre la estructura metálica de cubierta previo al montaje

El día 27/09/2023 Continúa la excavación mecánica de la zona de la cancha de juegos para mejoramiento granular de patio propuesto

El día 28/09/2023 Continúa la aplicación de anticorrosivo sobre la estructura metálica de cubierta previo al montaje

El día 29/09/2023 Inicia la demolición de la losa peatonal del pasillo posterior del bloque alianza

El día 29/09/2023 Continúa la instalación de estructura metálica de cubierta de las aulas de preescolar

El día 30/09/2023 Continúa la excavación mecánica de la zona de la cancha de juegos para mejoramiento granular de patio propuesto

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.
- Se realiza la adecuación del espacio de almacenamiento de residuos RCD en el costado occidental de la cancha múltiple del colegio con polisombra y varas rollizas. Este espacio fue aprobado por la inspectora SST de la interventoría.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
3,45%	2,38%	6,40%	9,70%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	229	48	181
		21,0%	79,0%

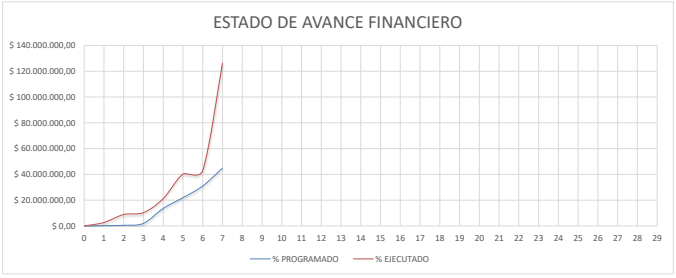

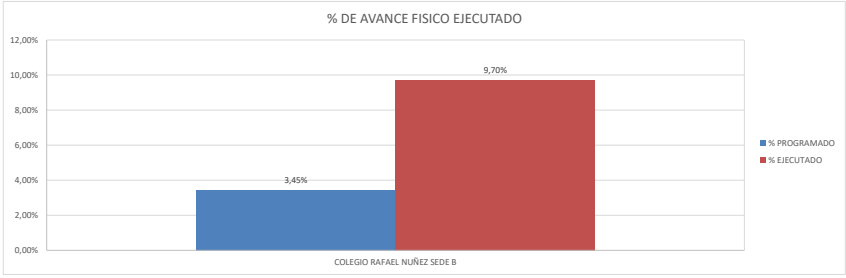

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**	**CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.	OFICIAL	1	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra	AYUDANTES	3	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra			
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector			
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector			
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector			
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST			
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST			
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST			
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	x		GMJ618		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
Pasos y senderos peatonales	**NO**
Rutas de evacuación	**SI**
Manejo de Residuos (RCD's)	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**NO**

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se inicia la instalación de la estructura metálica de cubierta de las aulas de preescolar; en el bloque alianza no se generó un avance considerable dado que el personal de obra civil estuvo en otros frentes de trabajo del contrato. Fueron retirados durante la semana.
*De acuerdo al porcentaje de avance programado semanal, se tiene un 3,45% programado y un 9,70% ejecutado lo que muestra un adelanto considerable. Se recomienda seguir con este ritmo de trabajo para no generar atrasos durante la ejecución del proyecto.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

CONSORCIO INTERVENTORY COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 07**		
DEL	25/09/2023	**AL**	1/10/2023



FOTO 1: Inicia la excavación mecánica de la zona de la cancha de juegos para mejoramiento granular de patio propuesto - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 2: Inicia la instalación de la estructura metálica de cubierta de las aulas de preescolar - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 3: Inicia la aplicación de anticorrosivo sobre la estructura metálica de cubierta previo al montaje - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 4: Continúa la excavación mecánica de la zona de la cancha de juegos para mejoramiento granular de patio propuesto - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 5: Continúa la aplicación de anticorrosivo sobre la estructura metálica de cubierta previo al montaje - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 6: Inicia la demolición de la losa peatonal del pasillo posterior del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 7: Continúa la instalación de estructura metálica de cubierta de las aulas de preescolar - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 8: Continúa la excavación mecánica de la zona de la cancha de juegos para mejoramiento granular de patio propuesto - Colegio Rafael Nuñez Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE A**	**SEMANA**	**No. 23**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023		**DEL**	25/09/2023	**AL**	1/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 25/09/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 26/09/2023 Se realiza la instalación de las rejillas de los sumideros laterales de las canchas múltiples intervenidas.

El día 27/08/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 28/08/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 29/09/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 30/09/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de separaración adecuada de los RCD's generados durante la semana.
- Se mantiene la identificación de los puntos de acopio de RCD's y materiales de construcción.
- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	0,21%	100,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	160	-34
		127,0%	-27,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**	**CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.	AYUDANTE	3	CARLOS GUTIERREZ / DFL S.A.S.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra	OFICIAL	1	DFL S.A.S.
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra			
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector			
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector			
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector			
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST			
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST			
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST			
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	**SI**
Rutas de evacuación	**SI**
Manejo de Residuos (RCD's)	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*En Mesa de trabajo realizada el dia 31 de agosto de 2023, se ajusto el presupuesto del colegio de acuerdo a las actividades que se deben realizar para cumplir con el alcance de intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $ 431.422.080.
*Se realiza la instalación de la única actividad pendiente la instalación de las rejillas de los sumideros laterales de la cancha múltiple por un valor de $1.035.000; estas rejillas se instalaron el día martes 26 de septiembre.
*Se Se realizó la entrega de los espacios al colegio el día martes 26 de septiembre en compañía de la Ing. Julieta Mercado las canchas múltiples intervenidas y el shut de basuras construido.

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoria

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoria

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 23**		
DEL	25/09/2023	**AL**	1/10/2023



FOTO 1: No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista. - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A



FOTO 2: Se realiza la instalación de las rejillas de los sumideros laterales de las canchas múltiples intervenidas. - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE B**	**SEMANA**	**No. 11**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	25/09/2023	**AL**	1/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 25/09/2023 Se realiza inspección de cubierta de las aulas de primera infancia en jardín bloque 4

El día 26/09/2023 Se realiza organización de espacio para comité de obra

El día 27/09/2023 Continúa la instalación de estructura metálica para cubierta del bloque 2

El día 28/09/2023 Se realiza la mampostería de la caja de aguas servidas de los baños del costado de la portería

El día 29/09/2023 Continúa el proceso del pañete de muros interiores de los baños del costado de la portería

El día 30/09/2023 Finaliza la mampostería de muros de fachada de los baños del costado de la portería

COMPONENTE SST:

*Se acopian en obra en los espacios de punto de acopio los residuos de construcción y demolición que se generaron durante el proceso de desmonte de cubiertas existentes en asbesto de la semana en curso.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Elaboración de ATS, pausas activas, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área SST del contratista y de la interventoría.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
12,82%	10,57%	3,06%	7,95%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	171	69	102
		40,4%	59,6%

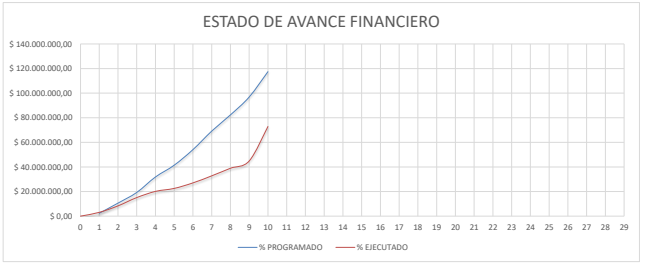

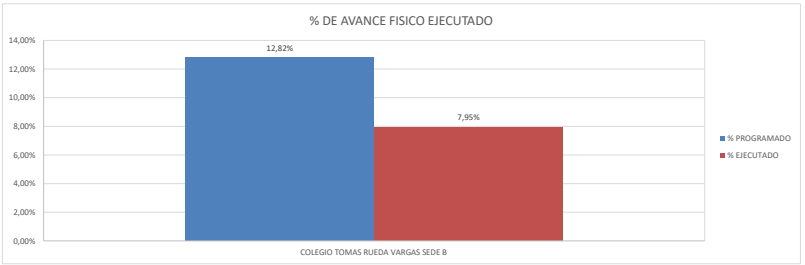

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	3	EULISES GÓMEZ / D&J SERVICIOS
AYUDANTE	5	EULISES GÓMEZ / D&J SERVICIOS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	X		EQR 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	**SI**
Rutas de evacuación	**SI**
Manejo de Residuos (RCD's)	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se tiene un porcentaje programado para la semana en curso del 12,82% y se tiene un ejecutado del 7,95% lo que refleja un atraso del 4,87%. Se sugiere acelarar las actividades de instalación de la estructura metálica de cubiertas en las aulas 6 a 12 aprobadas para recuperar el avance perdido durante el periodo.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 11**		
DEL	25/09/2023	**AL**	1/10/2023



FOTO 1: Se realiza inspección de cubierta de las aulas de primera infancia en jardín bloque 4 - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 2: Se realiza organización de espacio para comité de obra - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 3: Continúa la instalación de estructura metálica para cubierta del bloque 2 - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 4: Se realiza la mampostería de la caja de aguas servidas de los baños del costado de la portería - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 5: Continúa el proceso del pañete de muros interiores de los baños del costado de la portería - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 6: Finaliza la mampostería de muros de fachada de los baños del costado de la portería - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A**	**SEMANA**	**No. 37**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	5 de agosto de 2023		**DEL**	25/09/2023	**AL**	1/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 25/09/23 No se realizaron actividades. Se programo fundida de placa con concreto premezclado, no se realizó por cancelación de la planta de concreto

El 26/09/23 Se realiza fundida de placa en concreto premezclado con bomba en cancha, y se construye tramo de cañuela en sitio.

El 27/09/23 Se encuentra personal realizando acabados de piso resanes y adecuación para instalación de arcos de cancha.

El 28/09/23 Se realiza instalación de arcos o portería de cancha, también se realiza resanes en muros.

El 29/09/23 Se realizan cortes con pulidora en piso, también se realiza construcción de placa de carcamo y muros para apoyar rejillas de carcamo

El 30/09/23 Se realiza construcción de muro vigueta y columneta faltante

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	10,09%	84,92%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	103	158	-55
		153,4%	-53,4%

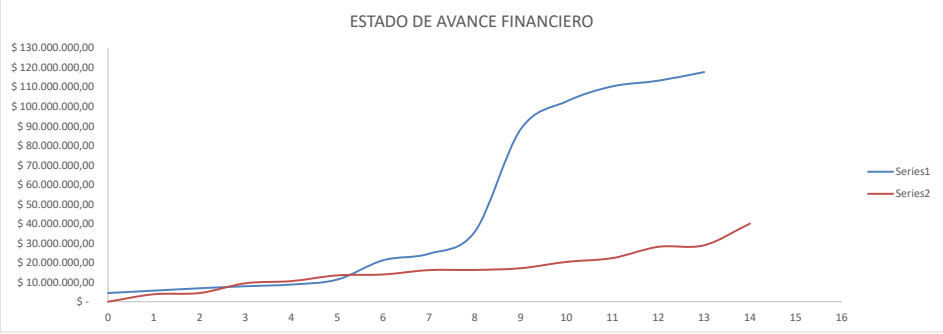

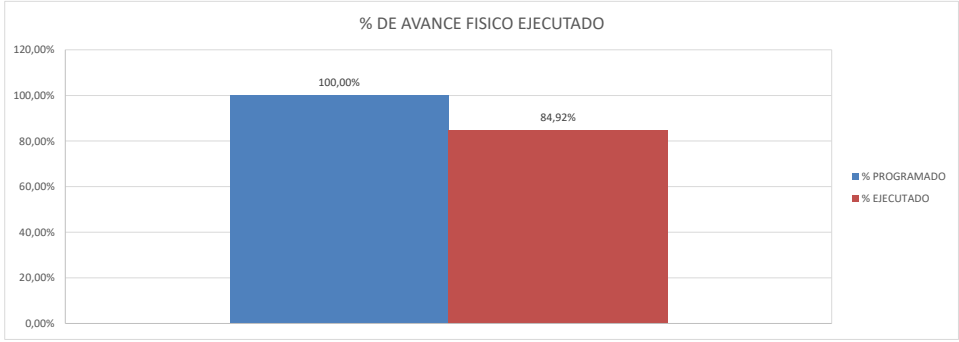

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	5	DYJ
OFICIAL DE OBRA	2	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se recordo a contratista la importancia de avanzar en la ejecución de actividades de manera más productiva, debido a la diferencia que hay entre programación y ejecución.
Se recuerda que ya se cumplio el 100 % del tiempo de ejecución.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA No. 37

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DEL	25/09/2023	AL	1/10/2023



FOTO 1: Fundición de placa de concreto de contrapiso de cancha - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 2: Instalación de arcos de cancha - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 3: Fundición de cañuela en sitio, debido a tubería y zapata existente - Colegio Entre Nubes Sede A Sede A



FOTO 4 : Construcción de muro en ladrillo en zona de carcamo para poder realizar apoyo de rejilla de carcamo - Colegio Entre Nubes sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO SEDE C**	**SEMANA**	**No. 37**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de mayo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de diciembre de 2023		**DEL** 25/09/2023	**AL**	1/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 25/09/23 No realizaron actividades.

El 26/09/23 No realizaron actividades.

El 27/09/23 Continuan con instalación de divisiones de acero inoxidable.

El 28/09/23 Remate de filos de rejillas, en hueco que quedo entre está y la viga existente, devido a desnivel.

El 29/09/23 Remate de filos de rejillas, en hueco que quedo entre está y la viga existente, devido a desnivel.

El 30/09/23 Remate de filos de rejillas, en hueco que quedo entre está y la viga existente, devido a desnivel.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda acopio provisional de material RCD y material de obra sobrante.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
77,95%	75,54%	1,25%	45,50%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	242	150	92
		62,0%	38,0%

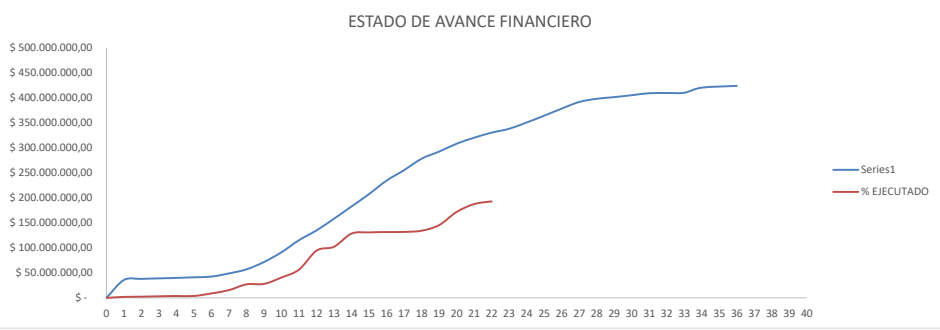

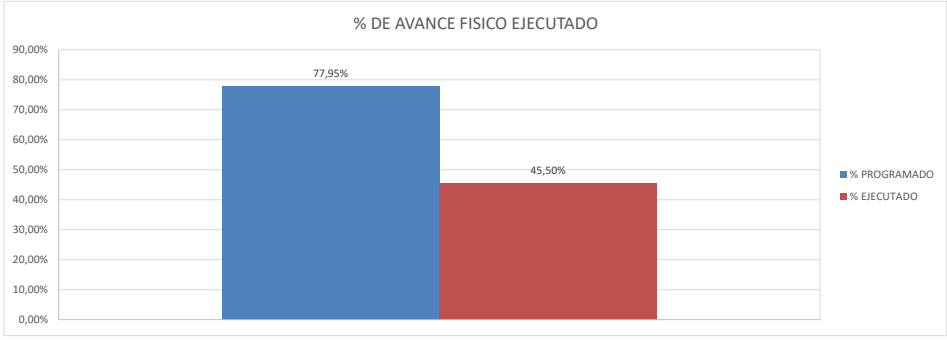

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	CARLOS JULIO GUTIERREZ
OFICIAL DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 37		
DEL	25/09/2023	AL	1/10/2023



FOTO 1: Remate de filos de rejillas, en hueco que quedo entre está y la viga existente, devido a desnivel. - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 2: Remate de filos de rejillas, en hueco que quedo entre está y la viga existente, devido a desnivel. - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 3: Continuan con instalación de divisiones de acero inoxidable - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 4: Remate de filos de rejillas, en hueco que quedo entre está y la viga existente, devido a desnivel. - Colegio José Felix Restrepo Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B**		**SEMANA**	**No. 37**	
FECHA INICIO OBRA:	10 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	9 de septiembre de 2023			**DEL**	25/09/2023	**AL** 1/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 25/09/23 Construcción de muro en mamposteria en zona de cancha

El 26/09/23 Construcción de muro en mamposteria en zona de cancha

El 27/09/23 Figurado de acero para viga cinta sobre muro en mamposteria, instalación de formaletas para viga cinta e inician con instalación de reja eslabonada.

El 28/09/23 Instalación de formaletas para fundición de viga cinta, fundición de viga cinta sobre muro en mamposteria

El 29/09/23 Figurado de acero para rampa en zona de cancha, fundición de rampa en zona de cancha

El 30/09/23 Aseo y acopio de materiales, reinstalación de enchape en zona de acceso de baño

COMPONENTE SST: Revisión y aprobación documental de ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección preoperacionales, verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra

COMPONENTE AMBIENTAL: Se reitera observación sobre retirar material que se encuentra en anden público.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
77,76%	54,24%	6,62%	36,66%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	91	111	-20
		122,0%	-22,0%

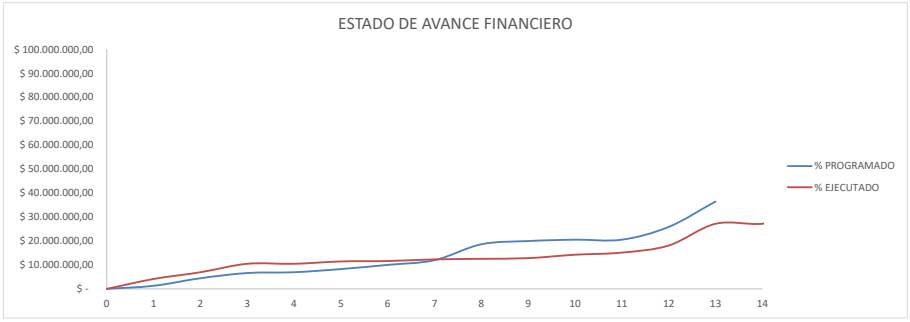

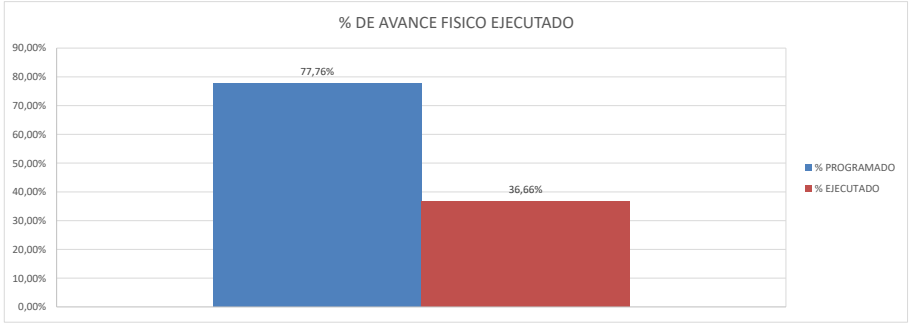

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	INERCIA INGENIERIA
OFICIAL DE OBRA	1	INERCIA INGENIERIA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 37		
DEL	25/09/2023	AL	1/10/2023



FOTO 1: Inician con instalación de reja eslabonada - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 2: Construcción de muro en ladrillo a la vista - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 3: Inician con instalación de reja eslabonada - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 4: Construcción de muro en ladrillo a la vista - Colegio José Acevedo y Gomez sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A**	**SEMANA**	**No. 37**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	25/09/2023	**AL**	1/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 25/09/23 Aplicación de esmalte sobre estructura metálica de cubierta según correcciones, raspado de pintura de muros, aplicación de estuco en muros

El 26/09/23 Aplicación de esmalte y anticorrosivo a estructura de cubierta en zona de comedor, aplicación de esmalte a estructura metálica en el tercer piso

El 27/09/23 Aplicación de esmalte y anticorrosivo a estructura de cubierta, aplicación de esmalte a estructura metálica en el piso 3, instalación de teja en cubierta del piso 3

El 28/09/23 Instalación de teja en cubierta del piso 3, instalación de teja en cubierta del comedor, levante de muro en mamposteria en zona del comedor, aplicación de esmalte a estructura metálica en el piso 3, instalación de tapas en tuberia de estructura del comedor

El 29/09/23 Instalación de tejas en cubierta del piso 3, lijado de estuco en aulas del pisp 3, fundición de dovelas para muro en el comedor, fundición de viga cinta para muro en zona del comedor

El 30/09/23 Se lija muros con estuco en muros del piso 3, instalación de teja en cubierta del piso 3, aplicación de esmalte en estructura del piso 3, pañetado de muros en zona del comedor

COMPONENTE SST: Verificación ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección ATS, permisos de trabajo, preoperacionales. Verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra,Validacion de retiro material RCD (Teja de asbesto), validación punto de acopio, verificación actividades de trabajo en alturas, Inspección armado de andamio.

COMPONENTE AMBIENTAL: Retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
42,11%	33,12%	1,07%	9,63%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	171	69	102
		40,4%	59,6%

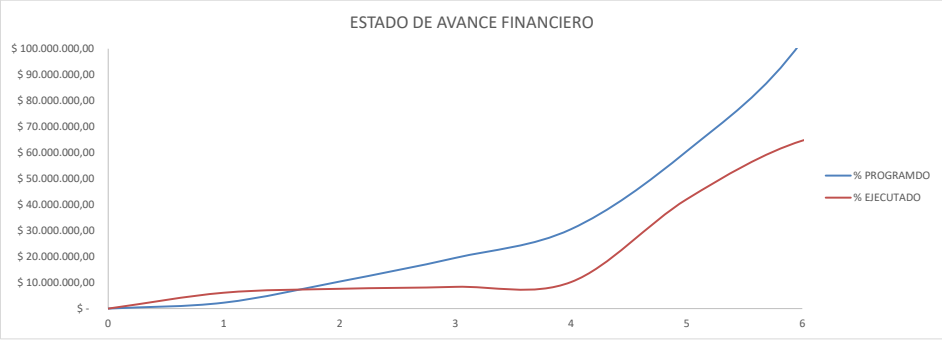

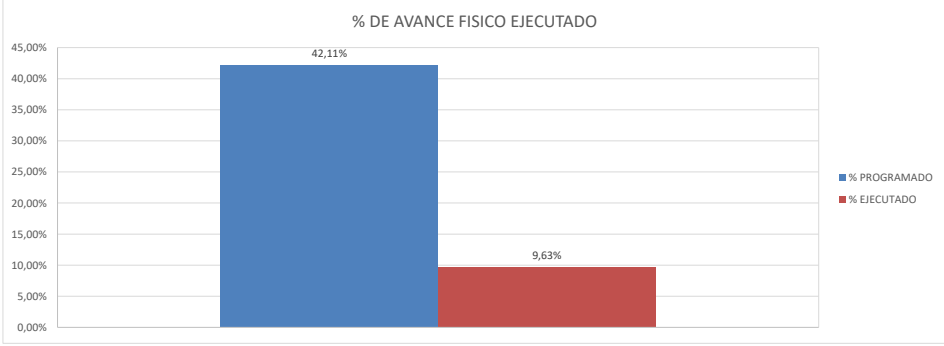

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	HOME SERVICE
OFICIAL DE OBRA	2	HOME SERVICE
OFICIAL DE OBRA	1	Onepro servise S.AS
AYUDANTE DE OBRA	2	Onepro servise S.AS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 37		
DEL	25/09/2023	AL	1/10/2023



FOTO 1: Resanes de muros en mal estado - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 2: Resanes de muros en mal estado y aplicación de pintura en estructura metálica según observaciones - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 3: Resanes de muros en mal estado - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 4: Resanes de muros en mal estado y aplicación de pintura en estructura metálica según observaciones - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**	**SEMANA**	**No. 37**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL**	25/09/2023	**AL**	1/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 25/09/23 instalación de tuberia electrica aulas, gravialla lavada en escaleras externas, pintura de muros aula 2, pintura en eterboard para muros en culatas aulas 5-7, filos de pañetes para muros internos aulas 5-7, destronque de piso aula informatica, mamposteria de culata posterior aula 5, pinturas muros aula 6, fabricación de soportes para canales.

El 26/09/23 Instalación de tuberia electrica aulas, gravilla lavada escaleras externas, pintura muros aula 1, instalación de eterboard para muros en culatas aula 5, destronque de piso aula informatica, pintura muros aula 6, fabricación de soportes de canales.

El 27/09/23 Pulida de puertas aulas, filos de pañetes para muros internos aulas 5-7, destronque de aula de informatica, pitnura de muros de aula 6, perforación de soportes canales, instalación de tuberia electrica coordinación, pintura fachada, retoque de pintura de aulas primer piso.

El 28/09/23 Pintura de estructura metalica aulas, destronque de corredores, mamaposteria culata posterior aula 5, pintura de muros de aula 6, instalación de soportes de canal aula 7, instalación de tuberia electrica aula 5-7, pintura de fachada, retoques de pintura aulas primer piso, pulida de guarda escobas aula 5, remates estrcutura cubierta rampa.

El 29/09/23 Pintura estructura metalica aulas, instalación de lamnias superboard aula 5, destronque de piso aula 1m pintura puertas aulas, pinturas de aula 6, instalación de soportes canal aula 7, instalción de tuberia electrica aula 5-7, pintura aula informatica, retoques de pintura aulas primer piso, gravilla lavada escaleras exterior, remates de estructura de cubierta rampa.

El 30/09/23 Pintura de puertas, instalación de laminas superboard aula 5, destronque de piso aula 1, pintura muro aula informatica, pintura muros aula 3, retoques de pintura aulas de primer piso, gravilla lavada escalera exterior.

COMPONENTE SST: Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, revisión y probacion documental ingreso de personal, verificación uso adecuado de EPP, Inspección y aprobación de usos de sistemas de acceso (Andamio)

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
71,47%	65,08%	2,48%	62,49%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	291	262	29
		90,0%	10,0%

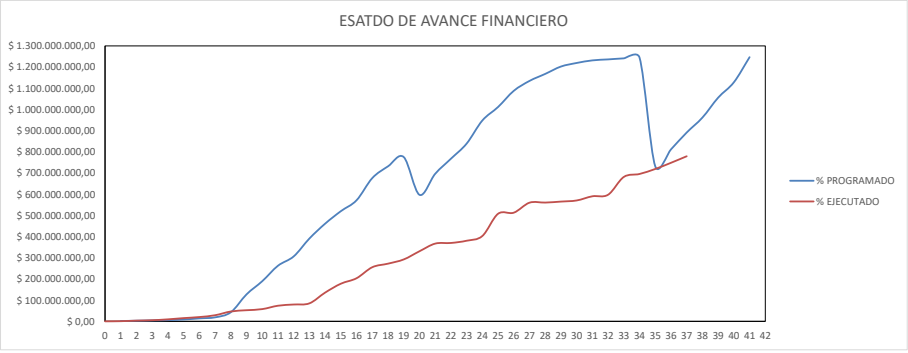

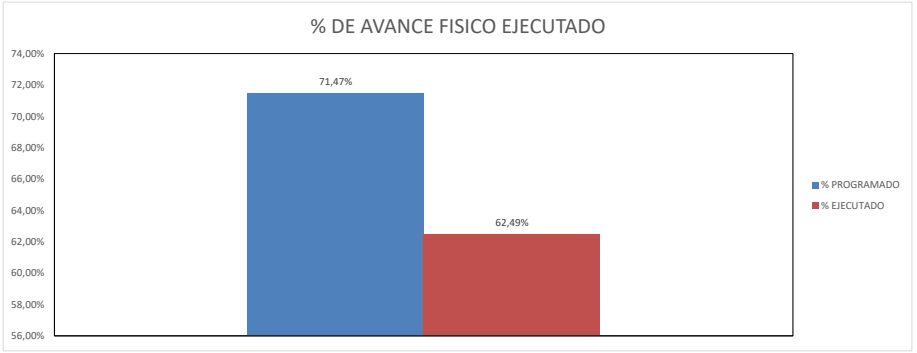

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
AYUDANTE DE OBRA	3	HOME SERVICE

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**SI**

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.246.912.368 y nueva fecha de terminación el 30/10/23.
-Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 37		
DEL	25/09/2023	AL	1/10/2023





FOTO 1: Culatas de cubierta - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 2: Instalación de tuberia emt- Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita







FOTO 3: Pintura de salones segundo piso- Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 4: Destronque de pisos de aula infromatica - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



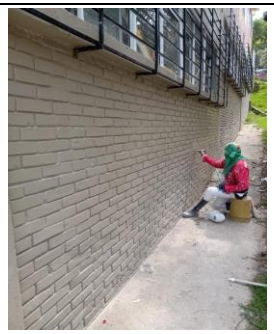


FOTO 5: Pintura de fachada - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 6: Pintura de estrcutura de refuerzo - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

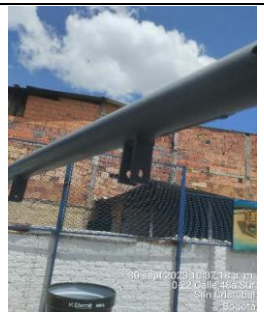






FOTO 9: Anticorrosivo de juegos en Sede B - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

FOTO 10:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL SEDE A**	**SEMANA**	**No. 37**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	31 de octubre de 2023		**DEL**	25/09/2023	**AL**	1/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 25/09/23 Se realiza pintura vinilo bloque primaria, estuvo en techo drywall, pintura de pasillo de piso 1

El 26/09/23 Se realiza pintura vinilo bloque primaria, estuco en techo drywall, alistado de placa cubierta en cafeteria.

El 27/09/23 Se realiza pintura de fachada oriental, pintura de fachada bloque administrativo, pintura de bloque primaria.

El 28/09/23 Se realiza pintura vinilo bloque primaria, pintura de fachada bloque oriental bloque bachillerato, rejilla para carcamo.

El 29/09/23 Se realiza pintura de fachada, trabajos de soldaduras de puertas, rejilla de carcamo.

El 30/09/23 Se realiza pintura de fachada de bloque administrativo, trabajos de soldadura de puertas y rejilla de carcamo.

COMPONENTE SST: Verificar documentación SST: permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales, Inspección de orden y aseo en frentes de trabajo, Verificación de uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación documental ingreso de personal a obra, inspección y aprobación de uso de sistema de acceso(Andamio), Inspección actividades de trabajo en altururas

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
79,45%	77,39%	0,89%	79,78%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	292	262	30
		89,7%	10,3%

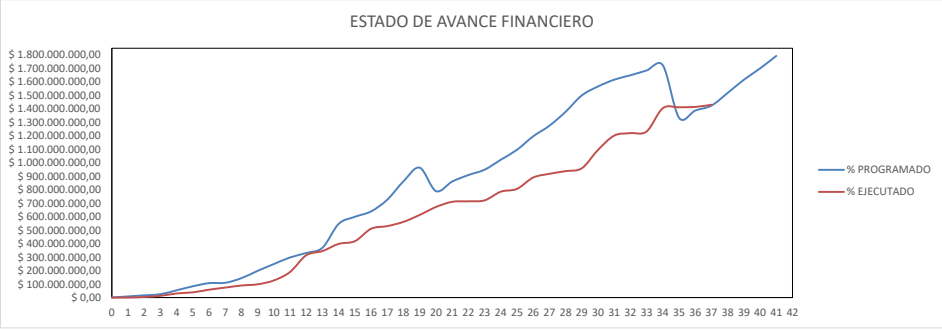

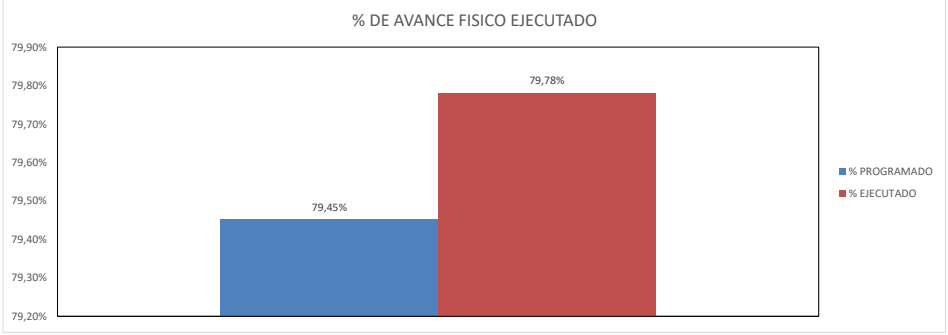

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	9	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL	1	JLIO GUTIERREZ MUÑOZ
INSTALADOR DE DIVISIONES DE ACERO INOXIDABLE	2	ARQUITECTURA DISEÑO Y MODULAR

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.793.050.180 y nueva fecha de terminación el 31/10/23.
-Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 37		
DEL	25/09/2023	AL	1/10/2023





FOTO 1: Pintura en salones de bloque de primaria y pasillos - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 2: Alistado de placa - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 3: Estuco bajo techo de drywall - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 4: Trabajos de soldadura en puertas - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL SEDE C**		**SEMANA**	**No. 37**	
FECHA INICIO OBRA:	3 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	25/09/2023 **AL**	1/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 25/09/23 Anticorrsivo estructura metalica de baños, mamposteria de muro de cerramiento.

El 26/09/23 Se realiza mamposteria muro de cerramiento.

El 27/09/23 Se realiza mamposteria de muro de cerramiento.

El 28/09/23 Se realiza mamposteria de muro de cerramiento, fundida de dovelas, pintura de estructura metalica de baños.

El 29/09/23 Se realiza mamposteria de muro de cerramiento, fundida de dovelas y pintura de estructura metalica de baños.

El 30/09/23 Se realiza fundida de columnetas de muro de cerramiento, pintura de estructura metalica de baños.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Validación evacuación material RCD.(Madera)
Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
22,67%	20,99%	0,54%	18,95%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	283	179	104
		63,3%	36,7%

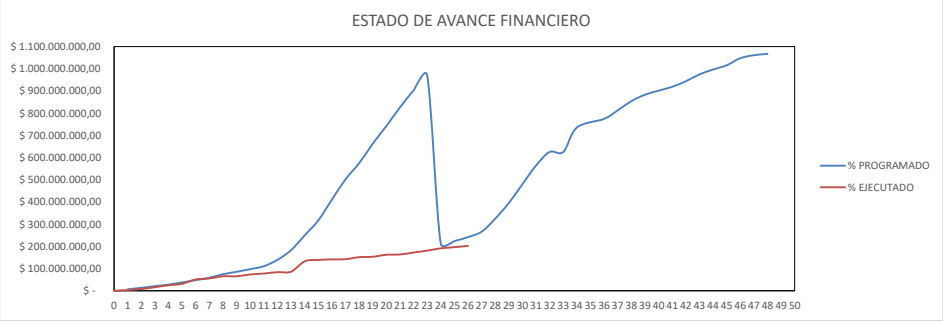

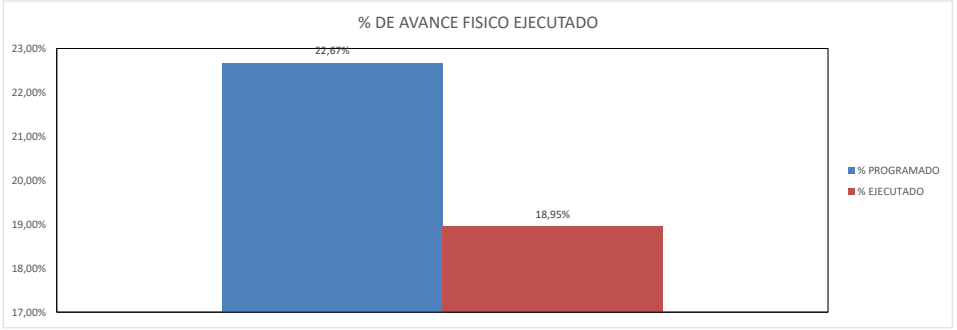

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AXN
OFICIAL	2	AXN
MAESTRO	1	AXN

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.067.082.680 y nueva fecha de terminación el 11/01/24.
* Por las fuertes lluvias presentadas en la semana no se ha podido realizar la demolición de placa cubierta de manera continua.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 37		
DEL	25/09/2023	AL	1/10/2023



FOTO 1: Anticorrosivo y pintura de estructura metalica- Colegio Moralba Sede C



FOTO 2: Muro de cerramiento - Colegio Moralba Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CIRSTOBAL SUR SEDE B**	**SEMANA**	**No. 37**	
FECHA INICIO OBRA:	20 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL** 25/09/2023	**AL**	1/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 25/09/23 Franja de pañete en salones de segundo piso, alistado de escaleras

El 26/09/23 Pintura vinilo en salones, enchape pasillo segundo piso

El 27/09/23 Enchape de pasillo de segundo piso, pañete de muros de tableros

El 28/09/23 Pintura vinilo en salones de primer piso, enchape de pasillo de segundo piso.

El 29/09/23 Pintura vinilo en salones de primer piso, franja de pañete en salones de segundo piso.

El 30/09/23 Guarda escobas de pasilo segundo piso

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
81,12%	74,08%	1,30%	64,76%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	132	101	31
		76,5%	23,5%

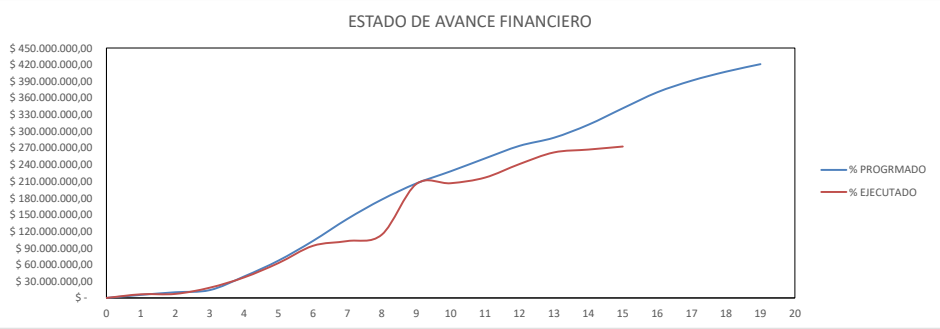

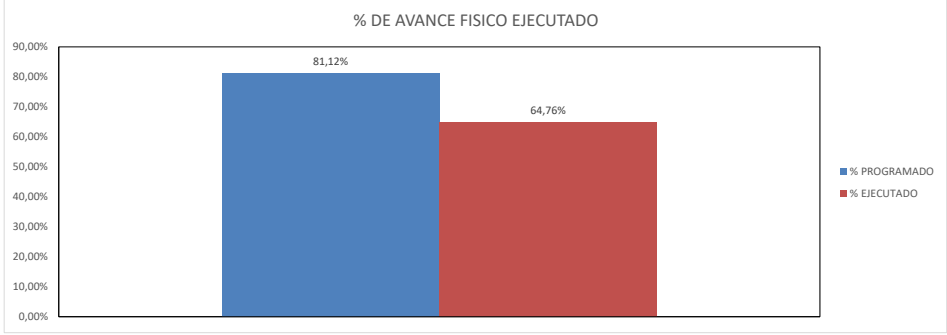

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIALES	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $420.914.867

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 37		
DEL	25/09/2023	AL	1/10/2023





FOTO 1: Pintura vinilo primer piso - Colegio San Cristobal Sede B





FOTO 2: Enchape de piso de pasillo segundo piso - Colegio San Cristobal Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ SEDE A**		**SEMANA**	**No. 37**	
FECHA INICIO OBRA:	4 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	25/09/2023	**AL** 1/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 25/09/23 No se realizaron actividades

El 26/09/23 Soldadura de estructura metalica para cubierta ala occiedental, picado de mamposteria, filos en puertas.

El 27/09/23 Soldadura de estructura metalica para cubierta ala occiedental, filos en puertas.

El 28/09/23 Soldadura de estructura metalica para cubierta ala occidental.

El 29/09/23 Soldadura de estructura metalica para cubierta ala occidental, demolición de muro de carcamo.

El 30/09/23 Soldadura de estructura metalica para cubierta ala occidental.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
45,09%	38,81%	0,54%	14,48%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	191	87	104
		45,5%	54,5%

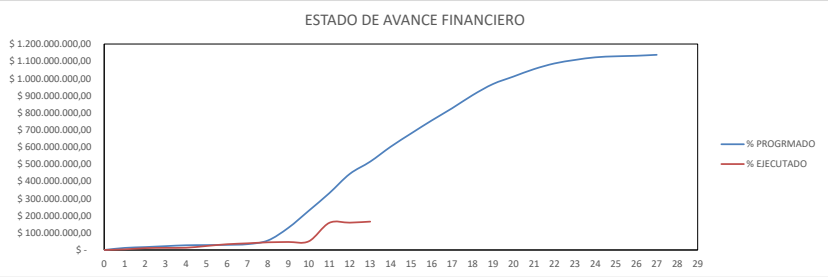

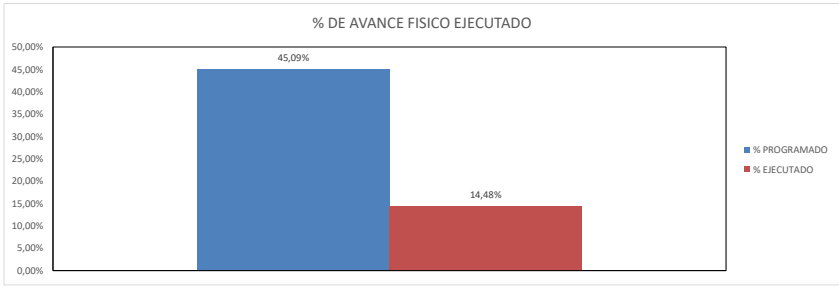

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	4	STOR CONSTRUCCIONES SAS
OFICIAL	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.142.104.067

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ





FOTO 1: Trabajos de ornamentación de estructura metalica cubierta ala occidental - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A



FOTO 2: Filos de puertas- Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 37**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	25/09/2023	**AL**	1/10/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio La Victoria - Sede B. Se realiza visita por reporte de fuga de agua en cuarto de equipos de bombeo.

Colegio Juan Rey - Sede A. Se suscribe acta de entrega mantenimiento de equipos de bombeo. Se realiza entrega de llaves al colegio referentes a cerraduras de puertas de shut de basuras y baño de profesores.

Colegio José Joaquín Castro - Sede B. Se realiza instalación de tejas y caballetes en cubierta.

Colegio El Rodeo - Sede A. Se realiza aplicación de segunda capa de impermeabilizante en muros y piso de tanque de almacenamiento de agua potable.

Colegio Los Alpes - Sede A. Se realiza compactación y prueba de desnsidades en recebo compactado, suministro e instalación de malla electrosoldada y fundida de placa en concreto.


Dirección Local de San Cristobal. Se realiza desmonte y reinstalación de salpicadero en mesón de cuarto de cafetería.

COMPONENTE SST: Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio La Belleza- sede A, Moralba Sede A

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realizo acompañamiento a la actividad de tala de arboles del colegio Manuelita Saenz, se realizco solicitud de retiro de RCD de colegio Juan Rey Sede A y Jose Joaquin Sede b

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			ESTADO DE AVANCE			
% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO**	**NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER**	**3**		
82,05%	1,40%	83,45%	**EMERGENCIAS EN EJECUCION**	**5**		
			EMERGENCIAS ATENDIDAS	**38**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	* Colegio El Rodeo - Sede A. (Sum e Inst equipos de bombeo) * Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst equipos de bombeo) * Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst cerramiento) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Dem y const de muro cerramiento, cambio de teja cafetería, const de escalón) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación plazoleta principal) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Sum e Insta baranda) * Colegio La Belleza - Sede A. (Adecuación shut basuras) * Colegio Aguas Claras. (Construcción red sanitaria baños preescolar) * Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto eléctrico) * Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de tanques de agua potable) * Colegio Florentino González. (Tratamiento fisuras en muros, pintura e impermeabilización viga canal) * Colegio Florentino González. (Impermeabilización de tanque de almacenamiento agua potable) * Colegio Rafael Núñez – Sede A. (Desmonte, Sum e Insta de cubierta y canal) * Colegio José Joaquín Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Sum e Inst de divisiones para oficina y orinal) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Sum de switch) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas) * Colegio Vitelma. (Cambio cubierta baño, tratamiento humedades, cambio luminarias) * Colegio Manuelita Sáenz. (Reparación tubo hidráulico) * Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refrigeradores de comedor escolar) * Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores) * Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tubería desagüe tienda escolar) * Colegio Moralba – Sede A. (Sum e Insta de rejas para ventanas) * Colegio San José Sur Oriental (Cambio cubierta aula rectoría) * Colegio Republica de Ecuador – Sede A. (Mantenimiento ascensor) * Colegio Gloria Valencia de Castaño. (Poda de cesped y fumigación) * Colegio Los Alpes - Sede C. (Suspensión punto hidráulico sanitario) * Colegio Vitelma. (Lavado de tanques y poda) * Colegio Juan Rey – Sede A. (Construcción de baño de profesores y shut de basuras) * Colegio San Cristóbal – Sede A. (Sum e Inst de flanche) * Colegio Gran Colombia (Mantenimiento cubierta) * Colegio Los Alpes – Sede A (Poda y tala de árboles) * Colegio Juan Rey – Sede A. (Mantenimiento equipos de bombeo) * Colegio Vitelma. (Pintura muros de baño, cinta flanche y fumigación) * Colegio Manuelita Sáenz. (Poda y tala de árboles) * Colegio Juana Escobar – Sede A. (Sum e Inst acometida eléctrica)
			REPORTADAS -TOTAL	**46**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

N°	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**	
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	**TERMINADO**	
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	**TERMINADO**	
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**	
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PLAZOLETA	**TERMINADO**	
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	BARANDA	**TERMINADO**	
7	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	**TERMINADO**	
8	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	**TERMINADO**	
9	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**	
10	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	GRIETAS Y PINTURA MUROS, IMPERM VIGACANAL	**TERMINADO**	
12	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE	**TERMINADO**	
13	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	**TERMINADO**	
14	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**	
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	**TERMINADO**	
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**	
17	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	**TERMINADO**	
18	VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES- PODA	**TERMINADO**	
19	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**	
20	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**	
21	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**	
22	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**	
23	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ARBOLES	REPORTADA	
24	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	**TERMINADO**	
25	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**	
26	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	**TERMINADO**	
27	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y PODA	**TERMINADO**	
28	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA	
29	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**	
30	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	**TERMINADO**	
31	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	REPORTADA	
32	EL RODEO - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE ALMACENAMIENTO	EN EJECUCIÓN	
33	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	**TERMINADO**	
34	SAN CRISTOBAL - SEDE A	FLANCHE MURO COLINDANTE	**TERMINADO**	
35	GRAN COLOMBIA	MANTENIMIENTO CUBIERTA	**TERMINADO**	
36	JOSE JOAQUIN CASTRO - SEDE B	CAMBIO CUBIERTA	EN EJECUCIÓN	
37	LOS ALPES - SEDE A	TALA DE ÁRBOL	**TERMINADO**	
38	LOS ALPES - SEDE A	CONSTRUCCIÓN AULAS PREFABRICADAS	EN EJECUCIÓN	
39	JUAN REY - SEDE A	MANTENIMIENTO BOMBAS	**TERMINADO**	
40	VITELMA	PINTURA BAÑO PREESCOLAR, FUMIGACION, CINTA FLANCHE, ARBOL SANITARIOS	**TERMINADO**	
41	MANUELITA SAENZ	PODA Y TALA DE ÁRBOLES	**TERMINADO**	
42	JUANA ESCOBAR - SEDE A	FALLA ELECTRICA - COCINA	**TERMINADO**	
43	MANUELITA SAENZ	DESMONTE DE VENTANA	EN EJECUCIÓN	
44	VEINTE DE JULIO	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN MURO	**TERMINADO**	
45	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FALLA ELECTRICA - COCINA	**TERMINADO**	
46	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	ADECUCIÓN SHUT BASURAS	REPORTADA / RETIRADA	
47	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA / RETIRADA	
48	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA / RETIRADA	

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*** Se realiza juste de valores de emergencias aprobadas teniendo como nuevo valor la suma de $997.037.102, valor con el cual se estan reportando el avance ejecutado.**

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoria

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoria

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 37		
DEL	25/09/2023	AL	1/10/2023





FOTO 1: Visita por reporte de fuga de agua en cuarto de equipos de bombeo. Colegio La Victoria - Sede B





ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

FOTO 2: Suscripción de acta de entrega mantenimiento de equipos de bombeo. Colegio Juan Rey - Sede A.





FOTO 3: Instalación de tejas y caballetes en cubierta. Colegio José Joaquín Castro - Sede B.





FOTO 4: Aplicación de segunda capa de impermeabilizante en muros y piso de tanque de almacenamiento de agua potable. Colegio El Rodeo - Sede A.






FOTO 5: Prueba de desnsidades en recebo compactado. Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 6: Suministro e instalación de malla electrosoldada y fundida de placa en concreto. Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 7: Desmonte y reinstalación de salpicadero en mesón de cuarto de cafetería. Dirección Local de San Cristobal.

FOTO 8:

FOTO 9: Suscripción de acta de entrega por tala y poda de árboles. Colegio Los Alpes - Sede A.

FOTO 10: Instalación de tejas en cubierta. Colegio José Joaquín Castro - Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 38**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	2/10/2023 **AL**	8/10/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**			ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	$ 13.074.041.772,00	$ 6.317.500.000,00	$ 19.391.541.772,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	$ 951.700.910,00	$ 372.223.480,00	$ 1.323.924.390,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se programa realizar el comité de obra N°36 el 12/10/2023; está pendiente por definir el lugar.

Se realizan ajustes de presupuestos y tiempos en cada uno de los colegios de a cuerdo a lo comentado en el comité No. 32 y a la mesas de trabajo de presupuestos de 31 de agosto y 01 de septiembre.

Se realiza ajuste de porcentaje de avance programado, de acuerdo al flujo de caja V5.

COMPONENTE SST:
Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:
La interventoria solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz).

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO
47,07%	43,05%	1,17%	39,23%


ESTADO DE AVANCE


COLEGIOS EN INTERVENCIÓN	16	**Actas de vecindad**
COLEGIOS POR INTERVENIR	5	10
COLEGIOS TERMINADOS	7	
TOTAL	28	

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	364	269	96
		73,9%	26,4%

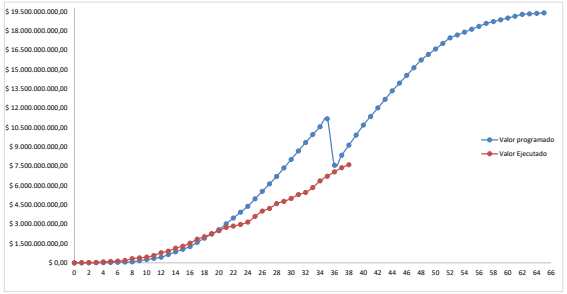

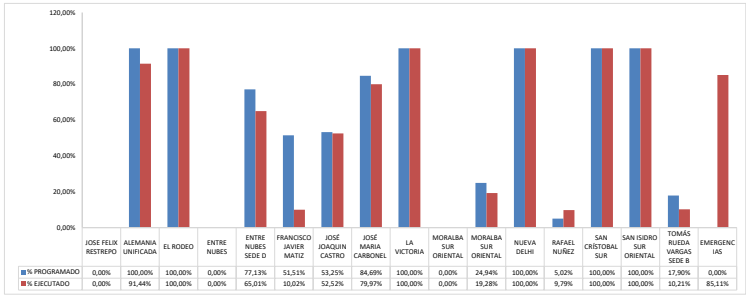



OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta los inicios de los frentes de obra y el atraso presentado se realizaron reprogramaciones en los frentes de obra que tenian un atraso significativo o su valor inicial vario, por tal motivo la programación general se afectada, lo que justifica el porcentaje de avance reportado el presente periodo
Se ajusto al porcentaje ejecutado y programado segun valores de adición No.1 al contrato de obra
Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se encuentra en trámite el modificatorio para la adición para los contratos de obra e interventoría.
Se continua con la atención de emergencias según el reporte por parte de la SED.
Se realiza adición al contrato de obra por un porcentaje del 48,32 del valor inicial del contrato
Se realiza adición al contrato de interventoria por un porcentaje del 39,11 del valor inicial del contrato

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A**	**SEMANA**	**No. 38**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	4 de octubre de 2023		**DEL**	2/10/2023	**AL**	8/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 02/10/2023 Continúan los trabajos de pintura koraza sobre la fachada principal del bloque 4
El día 02/10/2023 Se realiza el cableado de las salidas eléctricas de las lámparas del bloque 4
El día 04/10/2023 Continúa la aplicación de pintura sobre muros interiores del espacio de laboratorio
El día 04/10/2023 Continúa la instalación de los tapaluces de cubierta en aulas 2 y 22 del bloque 4
El día 04/10/2023 Se realiza la instalación de la cubierta en el hall de acceso del bloque 4
El día 04/10/2023 Continúan los trabajos de instalacion de lamparas tipo led en los espacios del bloque 4
El día 05/10/2023 Continúan los trabajos de estuco y pintura del aula de espejos en el bloque 4
El día 05/10/2023 Se realiza el montaje y la instalación de la canal de recolección de aguas lluvias del bloque 4
El día 06/10/2023 Se realiza la aplicación de la pintura koraza sobre la fachada posterior del área del almacen del bloque 4
El día 06/10/2023 Se realiza el suministro y la instalación de las ventanas en aluminio de la fachada

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	99,86%	5,10%	91,44%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	265	269	-4
		101,5%	-1,5%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OFICIALES DE OBRA	5	SIGMA
AYUDANTE DE OBRA	7	SIGMA
INSTALADORES ELÉCTRICOS	1	SIGMA
SOLDADOR	1	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	X		JAJ 907		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se disminuye el atraso acumulado del 13,52% al 8,56%, ya que se realizó el ajuste del presupuesto con base en el presentado en la reunión mensual del día 05 de Septiembre por un valor de $1,445.618.469,22 y el contratista presentó la actualización de la programación con el respectivo flujo de caja; de acuerdo a lo anterior, el atraso que se ve reflejado aún es por las actividades de finalización del bloque 4 que aún se encuentran en ejecución. La fecha de finalización propuesta en la nueva programación es el 04 de Octubre de 2023.
*Se culminaron todas las actividades de construcción contractuales en el bloque 4; se encuentra en etapa de remate final de actividades de mampostería seca, pintura y aseo en los espacios intervenidos. Se realizará entrega al colegio el día Lunes 09 de Octubre en horas de la tarde.
*Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal y conductores de los vehiculos; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo; se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor); es necesario conservar el cerramiento provisional de obra en el frente de trabajo en buen estado en el espacio de los baños del piso 1; se solicita mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 38**		
DEL	2/10/2023	**AL**	8/10/2023



FOTO 1: Continúan los trabajos de pintura koraza sobre la fachada principal del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 2: Se realiza el cableado de las salidas eléctricas de las lámparas del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 3: Continúa la aplicación de pintura sobre muros interiores del espacio de laboratorio - Colegio Alemania Unificada



FOTO 4: Continúa la instalación de los tapaluces de cubierta en aulas 2 y 22 del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 5: Se realiza la instalación de la cubierta en el hall de acceso del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 6: Continúan los trabajos de instalación de lámparas tipo led en los espacios del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 7: [illegible] Unificada



FOTO 8: Se [illegible] emania Unificada



FOTO 9: Se realiza [illegible] gio Alemania Unificada



FOTO 1[illegible] a Unificada

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A**	**SEMANA**	**No. 38**		
FECHA INICIO OBRA:	6 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	7 de noviembre de 2023		**DEL**	2/10/2023	**AL**	8/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 02/10/2023 Avanza la instalación de lamparas tipo led en las aulas bloque 3

El dia 02/10/2023 Continúan los trabajos de pintura en esmalte 1 mano salon de danzas

El dia 03/10/2023 Continúa la instalacion de lamparas tipo led en las aulas del bloque 3

El dia 03/10/2023 Avanza la instalación de las canales del costado posterior de las aulas bloque 3

El dia 04/10/2023 Se reanudan las activiades de soldadura de los modulos de la malla contra impacto

El dia 04/10/2023 Se inicia la instalación de las ventanas en aluminio del bloque 3

El dia 05/10/2023 Avanza la instalación de las ventanas en aluminio del salon de danzas

El dia 05/10/2023 Suministro e instalación de lámpara led del cuarto de video del bloque 3

El dia 06/10/2023 Avanzan los trabajos de instalación de ventanas en aluminio

El dia 06/10/2023 Se realiza el remate de la parte electrica de las aulas 4, el salon de danzas y el de video

COMPONENTE AMBIENTAL:

*Se solicita retirar los residuos de chatarra, PVC y retales de superboard resultantes de la intervención de las aulas de danzas y #4 del bloque 3 que se encuentran acopiados en la fachada posterior del mismo.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
53,25%	50,55%	1,79%	52,52%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	274	244	30
		89,1%	10,9%

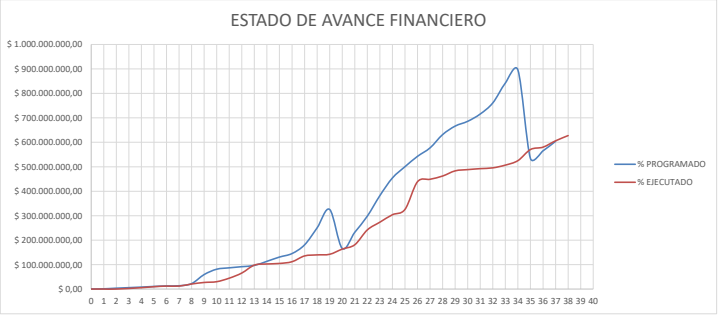

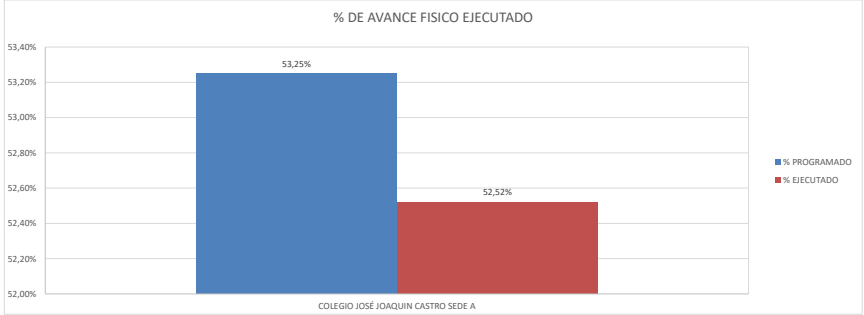

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	3	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
MAESTRO	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se empieza a generar un atraso del 0,73%, ya que se realizó el ajuste del presupuesto con base en el presentado en la reunión mensual del día 30 de Agosto por un valor de $1,194.848.678 y también se actualiza la programación del colegio con su respectivo flujo de caja. Se aclara que no se pueden ejecutar en simultáneo las obras del bloque 2 con las del bloque 3 dado que el colegio no tiene más espacios para re-ubicar a los estudiantes mientras se realiza la intervención.

*La interventoría sugiere nuevamente ingresar personal operativo para ejecutar las actividades que faltan en el frente de las aulas pre-formadas dado que no hay algún impedimento para realizarlas en simultáneo con las obras del bloque 2; además de estar aprobada estructura metálica nueva para los muros y la cubierta de estas aulas.

**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal y conductores de los vehiculos; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo; se solicita mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 38		
DEL	2/10/2023	AL	8/10/2023



FOTO 1: Avanza la instalación de lamparas tipo led en las aulas bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Continúan los trabajos de pintura en esmalte 1 mano salon de danzas - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Continúa la instalacion de lamparas tipo led en las aulas del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Avanza la instalación de las canales del costado posterior de las aulas bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5: Se reanudan las activiades de soldadura de los modulos de la malla contra impacto - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Se inicia la instalación de las ventanas en aluminio del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Avanza la instalación de las ventanas en aluminio del salon de danzas - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 8: Suministro e instalación de lámpara led del cuarto de video del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 9: Avanzan los trabajos de instalación de ventanas en aluminio - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 10: Se realiza el remate de la parte electrica de las aulas 4, el salon de danzas y el de video - Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO RAFAEL NUÑEZ SEDE B**	**SEMANA**	**No. 08**		
FECHA INICIO OBRA:	14 de agosto de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de marzo de 2024		**DEL**	2/10/2023	**AL**	8/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 02/10/2023 Continúan los trabajos de pintura en esmalte sobre la estructura metálica de cubierta del bloque de pre jardín

El día 02/10/2023 Inician los trabajos de mamposteria interior en el aula 5 del bloque alianza

El día 03/10/2023 Comienzan actividades de mampostería sobre la fachada sur del bloque alianza

El día 03/10/2023 Inicia la fundida de los dados reforzados en acero para la instalación de columnas metalicas en el bloque Alianza

El día 04/10/2023 Se continua con la demolición y la adecuación para los dados de las columnas

El día 04/10/2023 Continúa la mamposteria de los muros interiores del bloque alianza

El día 06/10/2023 Continúan las actividades de mampostería en las fachadas del costado norte del bloque alianza

El día 06/10/2023 Continúa la demolición de pisos para la instalacion de tuberia sanitaria en el cuarto de servicios generales

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.
- Se realiza la adecuación del espacio de almacenamiento de residuos RCD en el costado occidental de la cancha múltiple del colegio con polisombra y varas rollizas. Este espacio fue aprobado por la inspectora SST de la interventoría.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
5,02%	3,45%	0,09%	9,79%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	229	55	174
		24,0%	76,0%

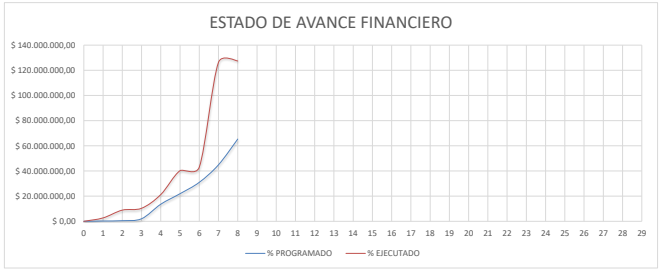

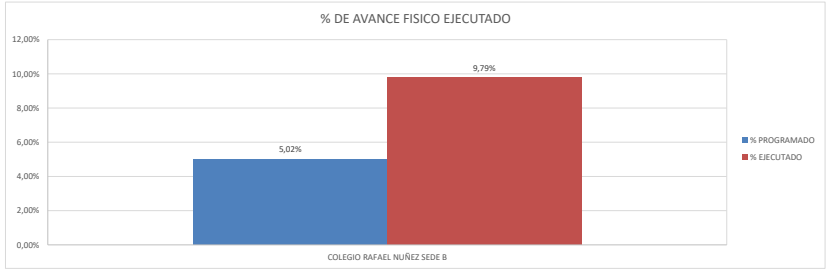

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	1	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
AYUDANTES	3	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
SOLDADORES	5	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	x		GMJ618		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	**NO**
Rutas de evacuación	**SI**
Manejo de Residuos (RCD's)	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**NO**

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se finaliza la instalación de la estructura metálica de cubierta de las aulas de preescolar; en el bloque alianza se inicia la instalación de la perfilería metálica de columnas y vigas de cubierta.
*De acuerdo al porcentaje de avance programado semanal, se tiene un 5,02% programado y un 9,79% ejecutado lo que muestra un adelanto considerable. Se recomienda seguir con este ritmo de trabajo para no generar atrasos durante la ejecución del proyecto.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 08**		
DEL	2/10/2023	**AL**	8/10/2023



FOTO 1: Continúan los trabajos de pintura en esmalte sobre la estructura metálica de cubierta del bloque de pre jardín - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 2: Inician los trabajos de mamposteria interior en el aula 5 del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 3: Comienzan actividades de mampostería sobre la fachada sur del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 4: Inicia la fundida de los dados reforzados en acero para la instalación de columnas metalicas en el bloque Alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 5: Se continua con la demolición y la adecuación para los dados de las columnas - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 6: Continúa la mamposteria de los muros interiores del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 7: Continúan las actividades de mampostería en las fachadas del costado norte del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 8: Continúa la demolición de pisos para la instalacion de tuberia sanitaria en el cuarto de servicios generales - Colegio Rafael Nuñez Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE A**	**SEMANA**	**No. 23**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023		**DEL**	25/09/2023	**AL**	1/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 25/09/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 26/09/2023 Se realiza la instalación de las rejillas de los sumideros laterales de las canchas múltiples intervenidas.

El día 27/08/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 28/08/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 29/09/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 30/09/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de separaración adecuada de los RCD's generados durante la semana.
- Se mantiene la identificación de los puntos de acopio de RCD's y materiales de construcción.
- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	0,21%	100,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	160	-34
		127,0%	-27,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**	**CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.	AYUDANTE	3	CARLOS GUTIERREZ / DFL S.A.S.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra	OFICIAL	1	DFL S.A.S.
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra			
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector			
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector			
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector			
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST			
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST			
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST			
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	**SI**
Rutas de evacuación	**SI**
Manejo de Residuos (RCD's)	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*En Mesa de trabajo realizada el dia 31 de agosto de 2023, se ajusto el presupuesto del colegio de acuerdo a las actividades que se deben realizar para cumplir con el alcance de intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $ 431.422.080.
*Se realiza la instalación de la única actividad pendiente la instalación de las rejillas de los sumideros laterales de la cancha múltiple por un valor de $1.035.000; estas rejillas se instalaron el día martes 26 de septiembre.
*Se Se realizó la entrega de los espacios al colegio el día martes 26 de septiembre en compañía de la Ing. Julieta Mercado las canchas múltiples intervenidas y el shut de basuras construido.

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoria

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoria

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 23**		
DEL	25/09/2023	**AL**	1/10/2023



FOTO 1: No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista. - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A



FOTO 2: Se realiza la instalación de las rejillas de los sumideros laterales de las canchas múltiples intervenidas. - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE B**	**SEMANA**	**No. 12**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	2/10/2023	**AL**	8/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 02/10/2023 Se inicia el desmonte de la cubierta existente en asbesto-cemento del bloque B

El día 03/10/2023 Continúa la instalación de la estructura metálica de cubierta del bloque A

El día 04/10/2023 Se realiza la instalación de la tubería de 4¨ pvcs para desagues de los baños del bloque 1

El día 05/10/2023 Se realiza la instalación del acero del refuerzo para las columnetas de confinamiento de muros del bloque 1

El día 06/10/2023 Se realiza el pañete de muros interiores de la caja 1 del desague del bloque 1

El día 07/10/2023 Se finaliza el desmonte de la cubierta de los baños de la zona de la cancha

COMPONENTE SST:

*Se acopian en obra en los espacios de punto de acopio los residuos de construcción y demolición que se generaron durante el proceso de desmonte de cubiertas existentes en asbesto de la semana en curso.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Elaboración de ATS, pausas activas, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área SST del contratista y de la interventoría.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
17,90%	12,82%	2,25%	10,21%

DIAS DEL CONTRATO

TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
	171	76	95
		44,4%	55,6%

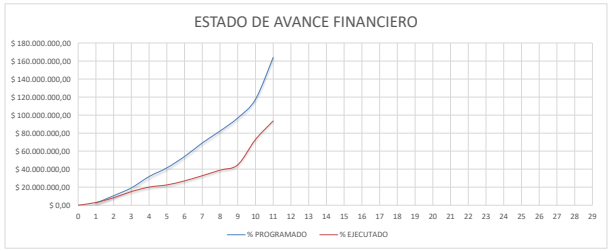

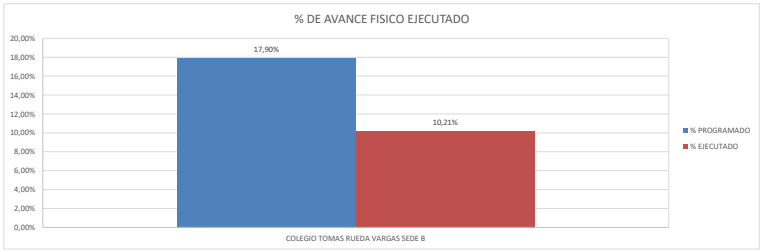

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	1	EULISES GÓMEZ / D&J SERVICIOS
AYUDANTE	2	EULISES GÓMEZ / D&J SERVICIOS
ARMADOR	1	D&J SERVICIOS
SOLDADOR	1	D&J SERVICIOS
INSPECTOR DE SOLDADURA	1	D&J SERVICIOS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.
VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	X		EQR 478
VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	X		LCN 533

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO


SEÑALIZACIÓN

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se tiene un porcentaje programado para la semana en curso del 17,90% y se tiene un ejecutado del 10,21% lo que refleja un atraso del 7,67%. Se sugiere acelarar las actividades de instalación de la estructura metálica de cubiertas en las aulas 6 y 7 aprobadas para recuperar el avance perdido durante el periodo.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:



Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:



Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría



FOTO 1: Se inicia el desmonte de la cubierta existente en asbesto-cemento del bloque B - Colegio Tomás Rueda Vargas Sede B



FOTO 2: Continúa la instalación de la estructura metálica de cubierta del bloque A - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 3: Se realiza la instalación de la tubería de 4¨ pvcs para desagues de los baños del bloque 1 - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 4: Se realiza la instalación del acero del refuerzo para las columnetas de confinamiento de muros del bloque 1 - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 5: Se realiza el pañete de muros interiores de la caja 1 del desague del bloque 1 - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 6: Se finaliza el desmonte de la cubierta de los baños de la zona de la cancha - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A**	**SEMANA**	**No. 38**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	5 de agosto de 2023		**DEL**	2/10/2023	**AL**	8/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 02/10/23 Remates generales en muros y carcamo

El 03/10/23 Remates generales de placas, y muros arreglo de supercies

El 04/10/23 Inician con demolición de placa en zona donde fue necesario realizar una rampa faltante, y continuan con resanes de muros costado oriental

El 05/10/23 Continuan con demolición de placa en zona donde fue necesario realizar una rampa faltante, continuan con resanes de muros costado oriental y realizarón aplicación de soldadura de rejas existentes

El 06/10/23 Instalación de malla electrosoldada para fundida de placa de rampas, realizan aplicación de pintura de muro oriental

El 07/10/23 Fundida de placas de rampas, continuan con pintura en muro oriental y fundida de tapas de cajas de inspección existentes

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	6,45%	91,37%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	103	165	-62
		160,2%	-60,2%

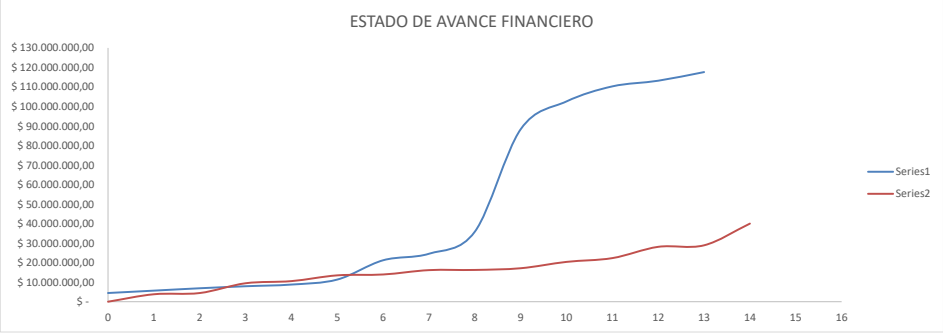

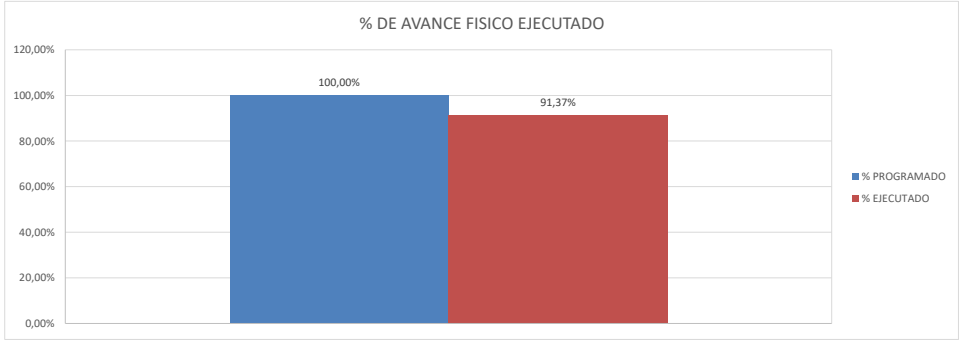

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	5	DYJ
OFICIAL DE OBRA	2	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se recordo a contratista la importancia de avanzar en la ejecución de actividades de manera más productiva, debido a la diferencia que hay entre programación y ejecución.
Se recuerda que ya se cumplio el 100 % del tiempo de ejecución.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA No. 38

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DEL	2/10/2023	AL	8/10/2023



FOTO 1: Demolición de placa de concreto para poder realizar rampa debido a diferencia en los niveles - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 2: Continuan con aplicación de soldadura en reja que se reinstalo - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 3: Instalación de malla electrosoldad para rampas - Colegio Entre Nubes Sede A Sede A



FOTO 4 : Pintura de muro posterior de cancha - Colegio Entre Nubes sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO SEDE C**		**SEMANA**	**No. 38**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de mayo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de diciembre de 2023			**DEL**	2/10/2023 **AL**	8/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 02/10/23 Aseo y limpieza general, mantenimiento a reja existente ubicada en hall de baño

El 03/10/23 Aseo y limpieza general, mantenimiento a reja existente ubicada en hall de baño

El 04/10/23 Llega maquina para excavación de cancha, inician con instalación de cerramiento en polisombra para área de intervención de cancha, también se encuentran en desmonte de estructura que quedo mal en hall de baños

El 05/10/23 Se inicia con excavación mecánica en cancha también se encuentran en desmonte de estructura que quedo mal en hall de baños. Culminan instalación de acero inoxidable de divisiones de baños

El 06/10/23 Realizan instalación de tubería de desagüe faltante, continúan con demolición y excavación en cancha, también realizan instalación de lámparas en aula 06 y 07

El 07/10/23 Continúan con demolición y excavación en cancha, inician con instalación de estructura metálica de hall de baños, se instalan 3 desagües en lavamanos

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda acopio provisional de material RCD y material de obra sobrante.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
79,77%	77,95%	7,17%	52,67%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	242	157	85
		64,9%	35,1%

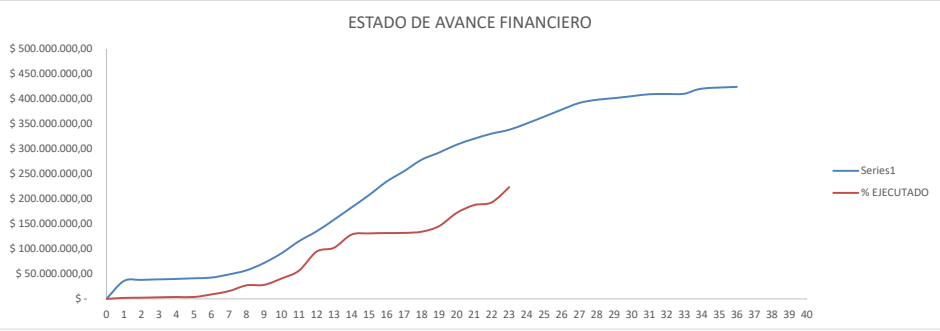

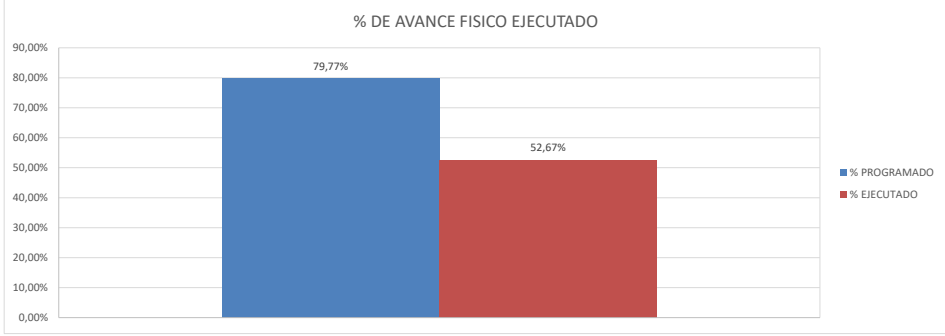

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	CARLOS JULIO GUTIERREZ
OFICIAL DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 38		
DEL	2/10/2023	AL	8/10/2023



FOTO 1: Demolición de capa de asfalto existente de cancha - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 2: Finalizan divisiones de acero inoxidable de baños - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 3: Demolición de capa de asfalto existente de cancha - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 4: Instalación de lamparas en aulas - Colegio José Felix Restrepo Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B**		**SEMANA**	**No. 38**	
FECHA INICIO OBRA:	10 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	9 de septiembre de 2023			**DEL**	2/10/2023 **AL**	8/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 02/10/23 No realizaron actividades

El 03/10/23 Picado de acabado de muro de aula contigua al baño, debido a mal estado por humedad anterior

El 04/10/23 Aplicación de pañete impermeabilizado en muro de aula contigua al baño, instalación de puntos de anclaje y platinas, así mismo inician con instalación de estructura metálica de Shut de basuras

El 05/10/23 Instalación de malla para cerramiento, continuan con instalación de estructura metálica, además inician con instalación de puerta del shut de basura

El 06/10/23 Reinstalación de parque de juegos, aplicación de pintura de esmalte sobre estructura metálica

El 07/10/23 No realizaron actividades.

COMPONENTE SST: Revisión y aprobación documental de ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección preoperacionales, verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra

COMPONENTE AMBIENTAL: Se reitera observación sobre retirar material que se encuentra en anden público.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
88,74%	77,76%	4,87%	41,53%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	91	118	-27
		129,7%	-29,7%

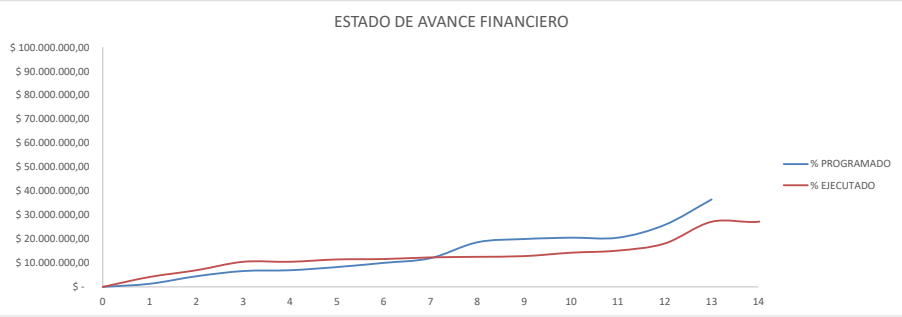

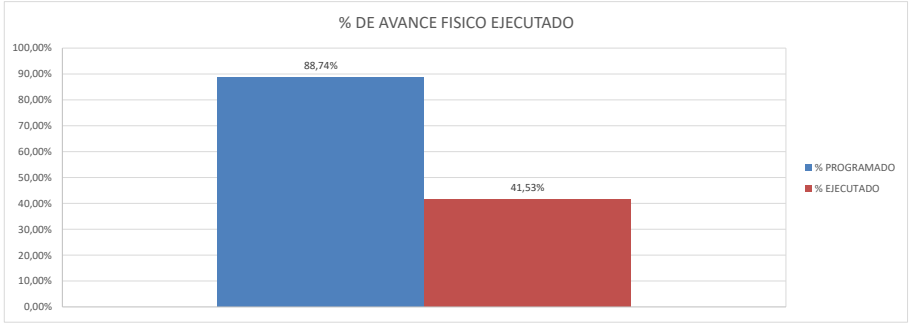

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	INERCIA INGENIERIA
OFICIAL DE OBRA	1	INERCIA INGENIERIA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 38		
DEL	2/10/2023	AL	8/10/2023



FOTO 1: Picado de acabado de muro de aula contigua al baño - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 2: Aplicación de pañete impermeabilizado en muro de aula contigua al baño - Colegio José Acevedo y Gomez sede B





FOTO 3: Continuan con instalación de reja eslabonada - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 4: Construcción de Shut de basuras - Colegio José Acevedo y Gomez sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A**	**SEMANA**	**No. 38**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	2/10/2023	**AL**	8/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 02/10/23 Aplicación de pañete de muro en zona de comedor, aplicación de estuco en muros de aulas de tercer piso, continúan con aplicación de pintura en esmalte a estructura metálica

El 03/10/23 Aplicación de esmalte sobre estructura metálica, aplicación de pintura tipo vinilo en muros del piso 3

El 04/10/23 Aplicación de esmalte sobre estructura metálica, aplicación de pintura tipo vinilo en muros del piso 3

El 05/10/23 Aplicación de esmalte sobre estructura metálica, aplicación de pintura tipo vinilo en muros del piso 3

El 06/10/23 Aplicación de esmalte sobre estructura metálica, aplicación de pintura tipo vinilo en muros del piso 3, continuan con instalación de primera capa de cubierta tipo sandwich en aulas de tercer piso

El 07/10/23 Aplicación de estuco y pintura tipo vinilo sobre muros de aulas del piso 3

COMPONENTE SST: Verificación ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección ATS, permisos de trabajo, preoperacionales. Verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra,Validacion de retiro material RCD (Teja de asbesto), validación punto de acopio, verificación actividades de trabajo en alturas, Inspección armado de andamio.

COMPONENTE AMBIENTAL: Retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
51,51%	42,11%	0,39%	10,02%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	171	76	95
		44,4%	55,6%

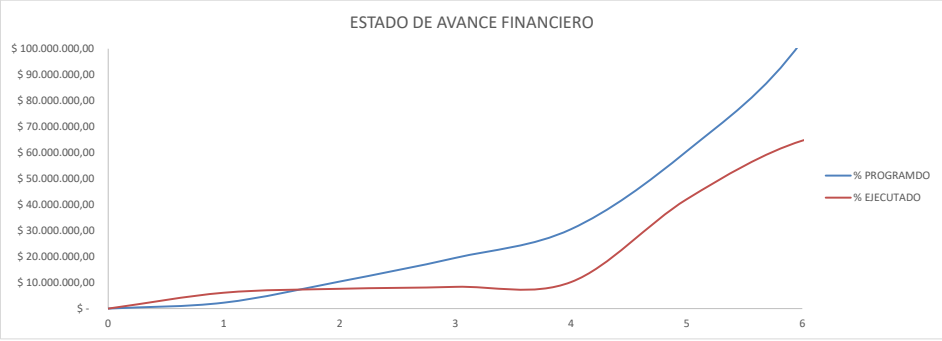

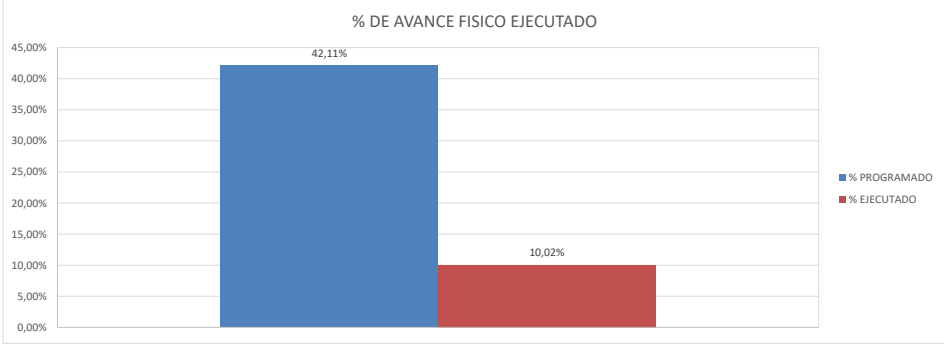

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	HOME SERVICE
OFICIAL DE OBRA	2	HOME SERVICE
OFICIAL DE OBRA	1	Onepro servise S.AS
AYUDANTE DE OBRA	2	Onepro servise S.AS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 38		
DEL	2/10/2023	AL	8/10/2023



FOTO 1: Aplicación de pintura en esmalte para estructura metálica de cubierta - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 2: Aplicación de pintura en aulas de tercer piso - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 3: Instalación de primera capa de cubierta tipo sandwich - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 4: Resanes de muros en mal estado y aplicación de estuco - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**	**SEMANA**	**No. 38**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL**	2/10/2023	**AL**	8/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 02/10/23 Se realiza pintura de puertas, pinturas de muros aula informatica, pintura muros aula 1 y 2, gravilla lavada escaleras exteriór, fundida de bordillo rampa, instalación de tuberia EMT en salones.

El 03/10/23 Se realiza pintura de puertas, pinturas de muros aula informatica, pintura muros aula 5, gravilla lavada escaleras exteriór, fundida de bordillo rampa, instalación de tuberia EMT en salones.

El 04/10/23 Se realiza fabricación depuertas, pintura de muro de aula 5, pañete de interiór de corredo, pintura fachada.

El 05/10/23 Fabricación de puertas, pintura de muro aula 5, pañete interior de corredor, pintura exterior, instalación de canal aula 7.

El 06/10/23 Fabricación de puertas, pinturas muro aula 4, pañete interior corredor, instalación de baranda de rampa, gravilla lavada garita celaudira.

El 07/10/23 Fabricación de puertas, pinturas de muro aula 4, pañete interior corredor, pintura corredor segundo piso, gravilla lavada corredor segundo piso, instalación de perfil cubierta rampa.

COMPONENTE SST: Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, revisión y probacion documental ingreso de personal, verificación uso adecuado de EPP, Inspección y aprobación de usos de sistemas de acceso (Andamio)

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
77,13%	71,47%	2,52%	65,01%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
	291	269	22
		92,4%	7,6%

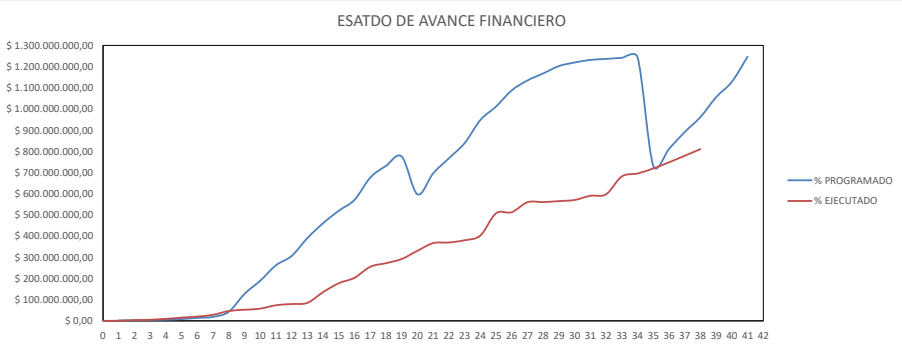

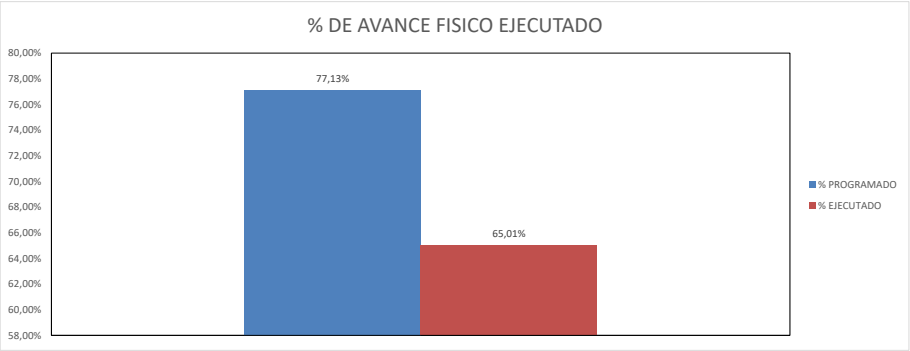

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
AYUDANTE DE OBRA	3	HOME SERVICE

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**SI**

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.246.912.368 y nueva fecha de terminación el 30/10/23.
-Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 38		
DEL	2/10/2023	AL	8/10/2023





FOTO 1: Instalación de tuberia EMT 3/4" - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 2: Pintura de salones - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita







FOTO 3: Instlación de baranda para rampa - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 4: Remates de pañete en corredor - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 5: Instalación de canal de aula 5 y 6 - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

FOTO 6:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL SEDE A**	**SEMANA**	**No. 38**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	31 de octubre de 2023		**DEL**	2/10/2023	**AL**	8/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 02/10/23 Soldadura de puertas, pintura vinilo bloque primaria, franja de granito, pintura koraza facahda.

El 03/10/23 Pintura vinilo bloque primaria, franja de granito, pintura fachada, picado y demolición muro fachada lateral.

El 04/10/23 Pintura vinilo bloque primaria, franja de granito, pintura fachada, picado y demolición muro fachada lateral.

El 05/10/23 Se realiza alistado de escalera bloque administrativo, pañete de muro de entrada principal, pintura fachada, pintura de bloque de primaria, lavado de espacio de cancha, picado de muro blanco.

El 06/10/23 Se realiza alistado de escalera bloque administrativo, pañete de muro de entrada principal, pintura fachada, pintura de bloque de primaria, lavado de espacio de cancha, picado de muro blanco, lado y desinfección de tanques de bloque primaria, slurry en cancha.

El 07/10/23 e realiza alistado de escalera bloque administrativo, pañete de muro de entrada principal, pintura fachada, pintura de bloque de primaria, lavado de espacio de cancha, picado de muro blanco.

COMPONENTE SST: Verificar documentación SST: permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales, Inspección de orden y aseo en frentes de trabajo, Verificación de uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación documental ingreso de personal a obra, inspección y aprobación de uso de sistema de acceso(Andamio), Inspección actividades de trabajo en altururas

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
84,69%	79,45%	0,19%	79,97%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	292	269	23
		92,1%	7,9%

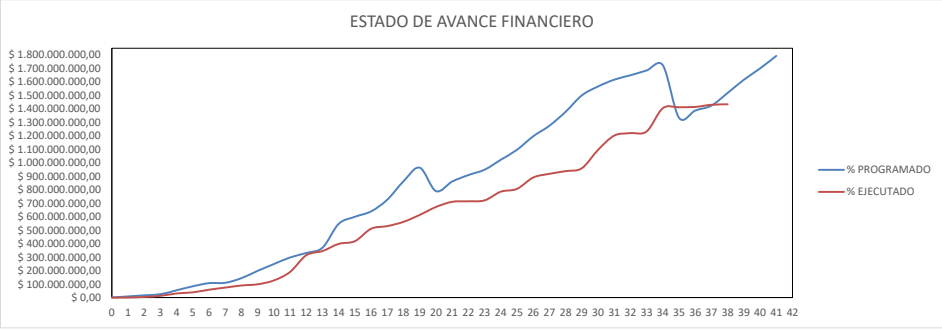

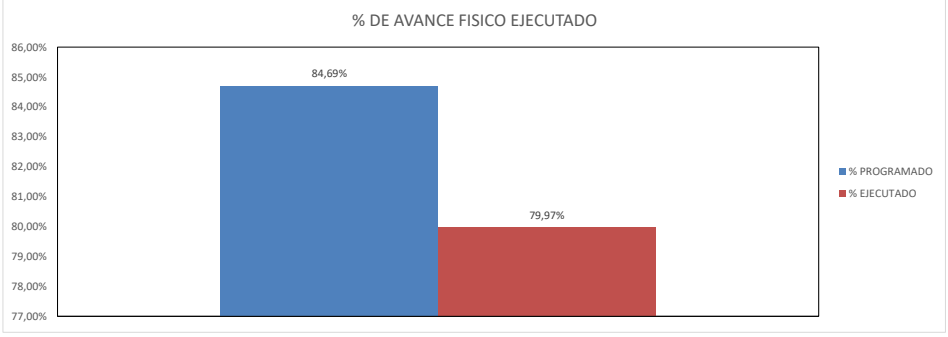

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.	AYUDANTE DE OBRA	9	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra	OFICIAL	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra	INSTALADOR DE DIVISIONES DE ACERO INOXIDABLE	2	ARQUITECTURA DISEÑO Y MODULAR
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector			
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector			
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector			
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST			
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST			
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST			
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental			
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.793.050.180 y nueva fecha de terminación el 31/10/23.
-Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 38		
DEL	2/10/2023	AL	8/10/2023



FOTO 1: Pañete de muros de entrada - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 2: Escalera en granito frente a bloque de administrativo - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 3: Picado de muro en muro blanco - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 4: Limpieza de tanque de alamcenamiento de bloque primaria - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 5: Pintura de fachada ala oriental - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 6: Reci-base en cancha - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL SEDE C**		**SEMANA**	**No. 38**	
FECHA INICIO OBRA:	3 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	2/10/2023 **AL**	8/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 02/10/23 Se realiza fundida de columnetas muro de cerramiento, pintura color amarillo estructura metalica de baños.

El 03/10/23 Se realiza amarre de acero viga muro de cerramiento, pinturaestrcutura metalica de baños.

El 04/10/23 Se realiza fundida de viga superior de muro de cerramiento, pintura de estructura metalica de baños.

El 05/10/23 Se realiza reamte de viga superior muro de cerramiento, pintura de estrcutura metalica de baños.

El 06/10/23 Se realizan dilataciones de viga y columnas muro de cerramiento, resane y detalles estrcutura metalica baños,retiro RCD

El 07/10/23 Se realiza pintura de estructura metalica, retiro de RCD

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Validación evacuación material RCD.(Madera)
Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
24,94%	22,67%	0,33%	19,28%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	283	186	97
		65,7%	34,3%

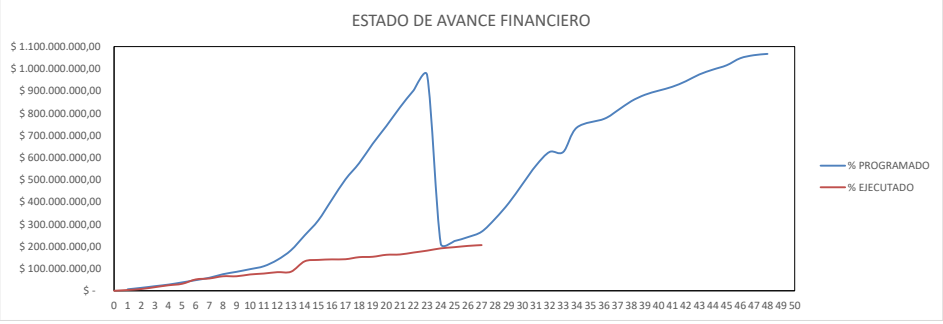

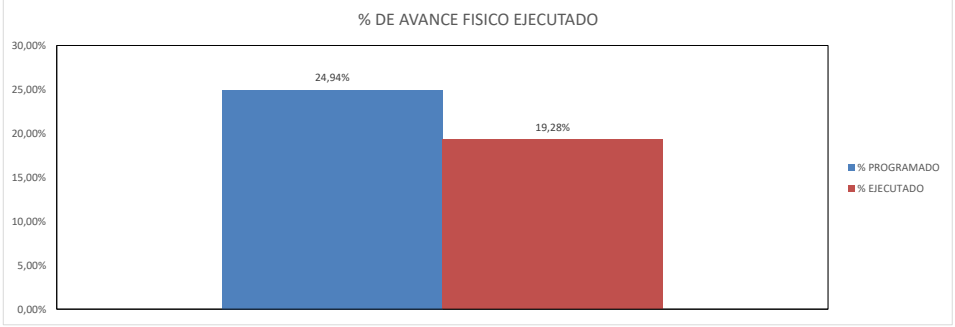

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AXN
OFICIAL	2	AXN
MAESTRO	1	AXN

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.067.082.680 y nueva fecha de terminación el 11/01/24.
* Por las fuertes lluvias presentadas en la semana no se ha podido realizar la demolición de placa cubierta de manera continua.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 38		
DEL	2/10/2023	AL	8/10/2023





FOTO 1: Fundida de columnetas de muro de cerramiento - Colegio Moralba Sede C





FOTO 2: Pintura de estructura metalica de baños - Colegio Moralba Sede C





FOTO 3: Fundida de viga de corona de muro de cerramiento - Colegio Moralba Sede C

FOTO 4:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CIRSTOBAL SUR SEDE B**	**SEMANA**	**No. 38**	
FECHA INICIO OBRA:	20 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL**	2/10/2023 **AL**	8/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 02/10/23 Se realiza pañete de cuarto de servicios, filos de ventaneria en aula de danzas, pintura de aulas primer piso, enchape de descanso de escalera.

El 03/10/23 Se realiza pintura de salones de primer piso, escalera en gravilla mona lavada, boca puertas de salones, pañete de shut y cuarto de aseo.

El 04/10/23 Se realiza gravilla en escalera, pintura de techo de pasillo primer piso, pañete de shut de basuras.

El 05/10/23 Se realiza escalera en gravilla, pintura de techo de pasillo primer piso.

El 06/10/23 Se realiza enchape de cuarto de aseo y shut de basuras, se inicia la instalación de tuberia emt para red lectrica.

El 07/10/23 Se realiza enchape de cuarto de aseo y shut de basuras, se inicia la instalación de tuberia emt para red lectrica.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
87,96%	81,12%	0,58%	65,34%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	132	108	24
		81,8%	18,2%

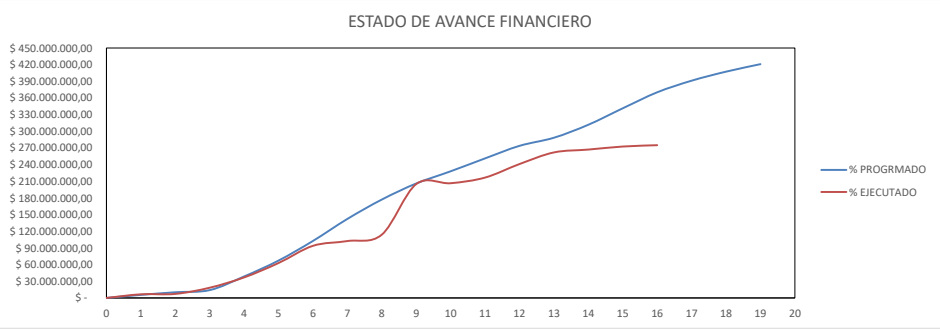

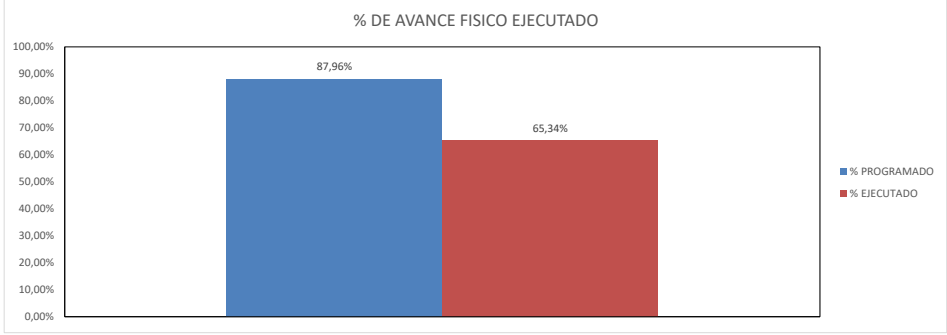

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIALES	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $420.914.867

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 38		
DEL	2/10/2023	AL	8/10/2023





FOTO 1: Pintura salones de primer piso - Colegio San Cristobal Sede B





FOTO 2: Pintra bajo placa de pasillo - Colegio San Cristobal Sede B





FOTO 3: Pañete de cuarto de aseo y shut de basura - Colegio San Cristobal Sede B



FOTO 4: Boca puerta en gravilla lavda - Colegio San Cristobal Sede B

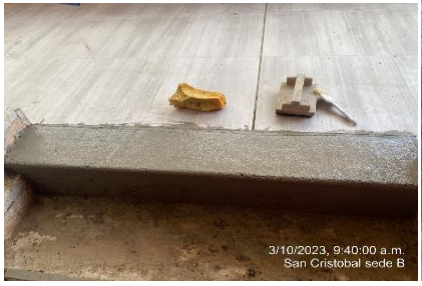




FOTO 5: Gravilla lavada en escalera - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 6: Instalación de tuberia EMT - Colegio San Cristobal Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ SEDE A**		**SEMANA**	**No. 38**	
FECHA INICIO OBRA:	4 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	2/10/2023	**AL** 8/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 02/10/23 Se realiza muro en maposteria de bodega, instalación de correas de estructura metalica de bloque alianza ala occidental.

El 03/10/23 Se realiza muro en mamposteria de bodega, instalación de estrcutura metalica de bloque alianza ala occidental.

El 04/10/23 Se realiza muro de mapostria de bodega, formaleta para columnas de nivel superior en zona de baños.

El 05/10/23 Se realiza fundida de columnas e instalación de acero de viga de nivel superior de baños, mamposteria para cana de bloque alianza, fundida de columnas de muro debodega.

El 06/10/23 Se realiza ensayo de tintas penetrantes en soldadura de estructura metalica de cubierta, fundida de viga de muro de bodega.

El 07/10/23 Se realiza soldadura de estructura metalica de bloque alianza ala occidental, tapa culatas en mamposteria de cubierta.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
52,68%	45,09%	1,90%	16,37%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	191	94	97
		49,2%	50,8%

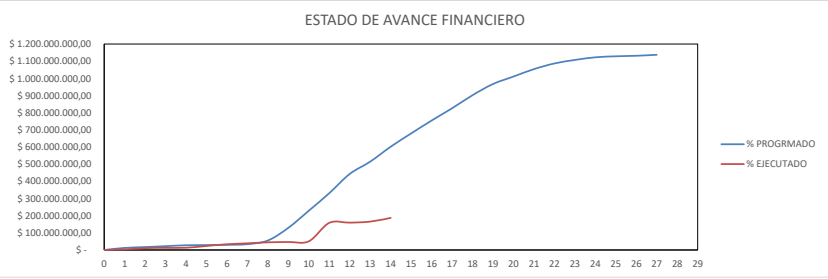

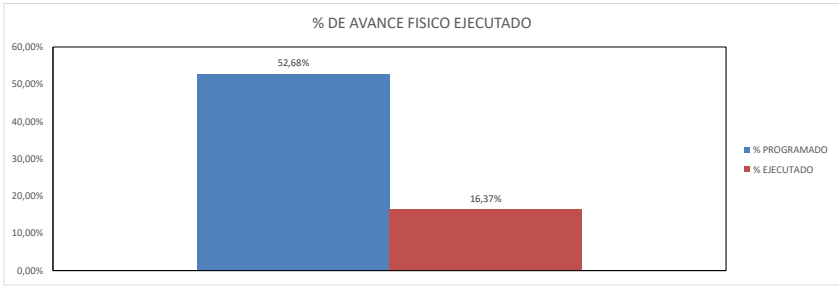

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	4	STOR CONSTRUCCIONES SAS
OFICIAL	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.142.104.067

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PÁGINA 1 DE 1			
SEMANA	No. 38		
DEL	2/10/2023	AL	8/10/2023





FOTO 1: Montaje de estructura metalica de bloque alianza ala occidental - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A





FOTO 2: Muro de bodega- Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A





FOTO 3: Ensayo de tintas penetrantes - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A





FOTO 4: Fundida de columnas en zona superior de baños - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 38**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	2/10/2023	**AL**	8/10/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Dirección Local de San Cristobal. Se realiza pintura en salpicadero de mesón de cuarto de cafetería y se suscribe acta de entrega.

Colegio Juan Rey - Sede A. Se realiza cambio de niples y puesta e marcha del sistema de bombeo de agua potable.

Colegio La Victoria - Sede B. Se realiza desmonte y retiro de bomba 1 y bomba 2 perteneciente a sistema de bombeo de agua potable. Se realiza revisión de registros y flotador mecánico en tanque de almacenamiento de agua.

Colegio El Rodeo - Sede A. Se realiza llenado de tanque de almacenamiento de agua potable y puesta en marcha de sistema de bombeo.

Colegio José Joaquín Castro - Sede B. Se realiza desmonte de cubierta en aulas 203 y 204 e instalación de platinas maquinadas.

Colegio Los Alpes - Sede A. Se realiza excavación de zanja para instalación de filtro. Se realiza trasiego de materiales correspondientes a aulas prefrabricadas. Se realiza desmonte de cubierta en aula preescolar.

COMPONENTE SST: Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio La Belleza- sede A, Moralba Sede A

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realizo acompañamiento a la actividad de tala de arboles del colegio Manuelita Saenz, se realizco solicitud de retiro de RCD de colegio Juan Rey Sede A y Jose Joaquin Sede b

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
81,42%	1,66%	85,11%

ESTADO DE AVANCE

NÚMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER	**2**	
EMERGENCIAS EN EJECUCION	**4**	
EMERGENCIAS ATENDIDAS	**39**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**
REPORTADAS -TOTAL	**45**	

EMERGENCIAS ATENDIDAS

* **Colegio El Rodeo - Sede A. (Sum e Inst equipos de bombeo)**
* **Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst equipos de bombeo)**
* **Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst cerramiento)**
* **Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Dem y const de muro cerramiento, cambio de teja cafetería, const de escalón)**
* **Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación plazoleta principal)**
* **Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Sum e Insta baranda)**
* **Colegio La Belleza - Sede A. (Adecuación shut basuras)**
* **Colegio Aguas Claras. (Construcción red sanitaria baños preescolar)**
* **Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto eléctrico)**
* **Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de tanques de agua potable)**
* **Colegio Florentino González. (Tratamiento fisuras en muros, pintura e impermeabilización viga canal)**
* **Colegio Florentino González. (Impermeabilización de tanque de almacenamiento agua potable)**
* **Colegio Rafael Núñez – Sede A. (Desmonte, Sum e Insta de cubierta y canal)**
* **Colegio José Joaquín Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas)**
* **Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Sum e Inst de divisiones para oficina y orinal)**
* **Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Sum de switch)**
* **Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas)**
* **Colegio Vitelma. (Cambio cubierta baño, tratamiento humedades, cambio luminarias)**
* **Colegio Manuelita Sáenz. (Reparación tubo hidráulico)**
* **Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refrigeradores de comedor escolar)**
* **Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores)**
* **Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tubería desagüe tienda escolar)**
* **Colegio Moralba – Sede A. (Sum e Insta de rejas para ventanas)**
* **Colegio San José Sur Oriental (Cambio cubierta aula rectoria)**
* **Colegio Republica de Ecuador – Sede A. (Mantenimiento ascensor)**
* **Colegio Gloria Valencia de Castaño. (Poda de cesped y fumigación)**
* **Colegio Los Alpes - Sede C. (Suspensión punto hidráulico sanitario)**
* **Colegio Vitelma. (Lavado de tanques y poda)**
* **Colegio El Rodeo - Sede A. (Impermeabilización tanque de almacenamiento agua potable)**
* **Colegio Juan Rey – Sede A. (Construcción de baño de profesores y shut de basuras)**
* **Colegio San Cristóbal – Sede A. (Sum e Inst de flanche)**
* **Colegio Gran Colombia (Mantenimiento cubierta)**
* **Colegio Los Alpes – Sede A (Poda y tala de árboles)**
* **Colegio Juan Rey – Sede A. (Mantenimiento equipos de bombeo)**
* **Colegio Vitelma. (Pintura muros de baño, cinta flanche y fumigación)**
* **Colegio Manuelita Sáenz. (Poda y tala de árboles)**
* **Colegio Juana Escobar – Sede A. (Sum e Inst acometida eléctrica)**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

N°	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**	
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	**TERMINADO**	
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	**TERMINADO**	
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**	
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PLAZOLETA	**TERMINADO**	
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	BARANDA	**TERMINADO**	
7	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	**TERMINADO**	
8	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	**TERMINADO**	
9	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**	
10	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	GRIETAS Y PINTURA MUROS, IMPERM VIGACANAL	**TERMINADO**	
12	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE	**TERMINADO**	
13	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	**TERMINADO**	
14	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**	
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	**TERMINADO**	
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**	
17	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	**TERMINADO**	
18	VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES- PODA	**TERMINADO**	
19	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**	
20	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**	
21	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**	
22	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**	
23	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	**TERMINADO**	
24	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**	
25	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	**TERMINADO**	
26	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y PODA	**TERMINADO**	
27	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**	
28	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	**TERMINADO**	
29	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	EN EJECUCIÓN	
30	EL RODEO - SEDE A	IMPERMEABILIZACION TANQUE ALMACENAMIENTO	**TERMINADO**	
31	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	**TERMINADO**	
32	SAN CRISTOBAL - SEDE A	FLANCHE MURO COLINDANTE	**TERMINADO**	
33	GRAN COLOMBIA	MANTENIMIENTO CUBIERTA	**TERMINADO**	
34	JOSE JOAQUIN CASTRO - SEDE B	CAMBIO CUBIERTA	EN EJECUCIÓN	
35	LOS ALPES - SEDE A	TALA DE ÁRBOL	**TERMINADO**	
36	LOS ALPES - SEDE A	CONSTRUCCIÓN AULAS PREFABRICADAS	EN EJECUCIÓN	
37	JUAN REY - SEDE A	MANTENIMIENTO BOMBAS	**TERMINADO**	
38	VITELMA	PINTURA BAÑO PREESCOLAR, FUMIGACION, CINTA FLANCHE, ARBOL SANITARIOS	**TERMINADO**	
39	MANUELITA SAENZ	PODA Y TALA DE ÁRBOLES	**TERMINADO**	
40	JUANA ESCOBAR - SEDE A	FALLA ELECTRICA - COCINA	**TERMINADO**	
41	MANUELITA SAENZ	DESMONTE DE VENTANA	**TERMINADO**	
42	VEINTE DE JULIO	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN MURO	**TERMINADO**	
43	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FALLA ELECTRICA - COCINA	**TERMINADO**	
44	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA / RETIRADA	
45	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ARBOLES	REPORTADA / RETIRADA	
46	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	ADECUCIÓN SHUT BASURAS	REPORTADA / RETIRADA	
47	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA / RETIRADA	
48	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA / RETIRADA	

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*** Se realiza juste de valores de emergencias aprobadas teniendo como nuevo valor la suma de $997.037.102, valor con el cual se estan reportando el avance ejecutado.**

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 38		
DEL	2/10/2023	AL	8/10/2023





FOTO 1: Pintura en salpicadero de mesón de cuarto de cafetería y se suscribe acta de entrega. Dirección Local de San Cristobal.





FOTO 2: Cambio de niples y puesta e marcha del sistema de bombeo de agua potable. Colegio Juan Rey - Sede A





FOTO 3: Desmonte y retiro de bombas perteneciente a sistema de bombeo de agua potable. Revisión de registros y flotador mecánico en tanque de almacenamiento de agua. Colegio La Victoria - Sede B.





FOTO 4: Llenado de tanque de almacenamiento de agua potable y puesta en marcha de sistema de bombeo. Colegio El Rodeo - Sede A.





FOTO 5: Desmonte de cubierta en aulas 203 y 204. Colegio José Joaquín Castro - Sede B.





FOTO 6: Instalación de platinas maquinadas. Colegio José Joaquín Castro - Sede B.

PAGINA 2 DE 2			
SEMANA	No. 38		
DEL	2/10/2023	AL	8/10/2023





FOTO 7: Excavación de zanja para instalación de filtro. Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 8: Trasiego de materiales correspondientes a aulas prefrabricadas. Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 9: Desmonte de cubierta en aula preescolar. Colegio Los Alpes - Sede A.

FOTO 10:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 39**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	9/10/2023	**AL** 15/10/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**			ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	$ 13.074.041.772,00	$ 6.317.500.000,00	$ 19.391.541.772,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	$ 951.700.910,00	$ 372.223.480,00	$ 1.323.924.390,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se programa realizar el comité de obra N°37 el 20/10/2023; está pendiente por definir el lugar.

Se realiza ajuste de porcentaje de avance programado, de acuerdo al flujo de caja V5.

Se inicia el frente de obra del colegio José Feliz Sede A el 07/10/23

COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:

La interventoria solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz).

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO
51,09%	47,07%	2,18%	41,40%


ESTADO DE AVANCE


COLEGIOS EN INTERVENCIÓN	16	**Actas de vecindad**
COLEGIOS POR INTERVENIR	5	10
COLEGIOS TERMINADOS	7	
TOTAL	28	

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	364	276	89
		75,8%	24,5%

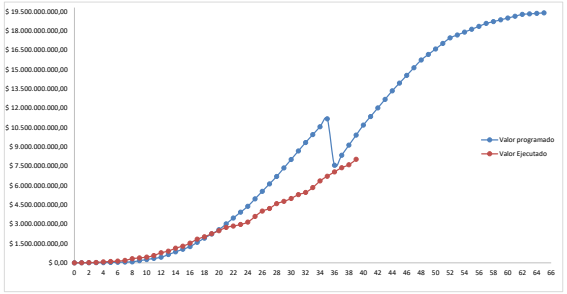

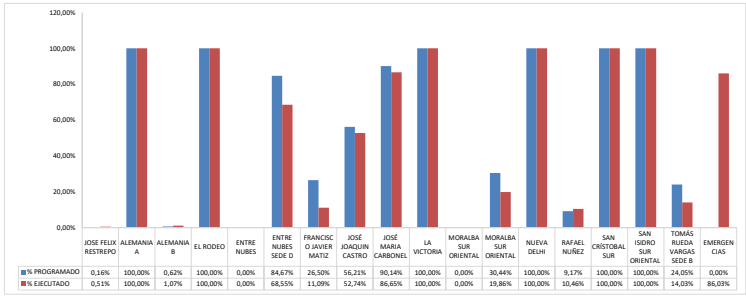



OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta los inicios de los frentes de obra y el atraso presentado se realizaron reprogramaciones en los frentes de obra que tenian un atraso significativo o su valor inicial vario, por tal motivo la programación general se afectada, lo que justifica el porcentaje de avance reportado el presente periodo
Se ajusto al porcentaje ejecutado y programado segun valores de adición No.1 al contrato de obra
Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se encuentra en trámite el modificatorio para la adición para los contratos de obra e interventoría.
Se continua con la atención de emergencias según el reporte por parte de la SED.
Se realiza adición al contrato de obra por un porcentaje del 48,32 del valor inicial del contrato
Se realiza adición al contrato de interventoria por un porcentaje del 39,11 del valor inicial del contrato

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A**	**SEMANA**	**No. 39**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	4 de octubre de 2023		**DEL**	9/10/2023	**AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 09/10/2023 Se realiza la devolución de los espacios intervenidos del bloque 4 al colegio en compañía de la Ing. Julieta Mercado.
El día 10/10/2023 La intervención del colegio está terminada.
El día 11/10/2023 La intervención del colegio está terminada.
El día 12/10/2023 La intervención del colegio está terminada.
El día 13/10/2023 La intervención del colegio está terminada.
El día 14/10/2023 La intervención del colegio está terminada.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	8,56%	100,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	265	276	-11
		104,2%	-4,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OFICIALES DE OBRA	4	SIGMA
AYUDANTE DE OBRA	2	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	X		JAJ 907		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se culminaron todas las actividades de construcción contractuales en el bloque 4. Se realizó la entrega al colegio de los espacios intervenidos el día Lunes 09 de Octubre en horas de la tarde.
*Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal y conductores de los vehiculos; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo; se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor); es necesario conservar el cerramiento provisional de obra en el frente de trabajo en buen estado en el espacio de los baños del piso 1; se solicita mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 39		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023



FOTO 1: Se realizo la devolucion de la fachada posterior del bloque 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 2: Devolucion de los espacios del bloque 4 y laboratorio - Colegio Alemania Unificada



FOTO 3: Devolución de espacios salón de espejos bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 4: Devolución del aula 22 bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 5: Se realiza la devolució de espacios del almacen del bloque 4 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 6: Devolución del espacio de la emisora - Colegio Alemania Unificada


13 oct 2023 8:52:01
Tv 4B Calle 37 Sur
San Cristóbal
Bogotá
Cundinamarca
colegio Alemania Unificada sede A


13 oct 2023 8:52:25
#1-74 Calle 37a Bis Sur
San Cristóbal
Bogotá
colegio Alemania Unificada sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE B**	**SEMANA**	**No. 01**		
FECHA INICIO OBRA:	11 de octubre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de febrero de 2024		**DEL**	11/10/2023	**AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 10/10/2023 Se inicia el desmonte de los aparatos saniarios de la batería de banos de los niños

El día 10/10/2023 Se inicia el demonte de las puertas de la batería de los baños de los niños

El día 11/10/2023 Avanzan los trabajos de demolición de la batería de baños de los niños

El día 11/10/2023 Inicia el desmonte de la cubierta existente del patio de juegos

El día 12/10/2023 Continúan los trabajos de demolición de enchape de los muros de la bateria de baños de los niños

El día 12/10/2023 Se culminan las actividades de desmonte de la cubierta existente del patio de juegos

COMPONENTE SST:

*Se acopian en obra en los espacios de punto de acopio los residuos de construcción y demolición que se generaron durante el proceso de desmonte de cubiertas existentes de la semana en curso.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Elaboración de ATS, pausas activas, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área SST del contratista y de la interventoría.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
0,62%	$ -	1,07%	1,07%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	136	4	132
		2,9%	97,1%

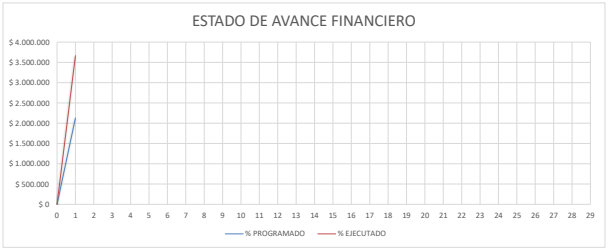

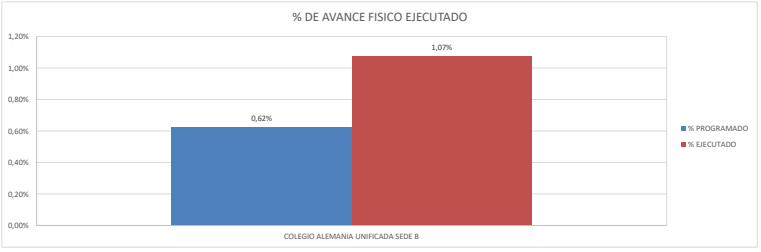

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	4	INERZIA INGENIERIA S.A.
AYUDANTE	2	INERZIA INGENIERIA S.A.

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se tiene un porcentaje programado para la semana en curso del 0,62% y se tiene un ejecutado del 1,07% lo que refleja un adelanto del 0,45%. Se sugiere seguir con este ritmo de ejecución para no perder avance durante la ejecución de la intervención.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:



Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:



Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN · BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA



FOTO 1: Se inicia el desmonte de los aparatos saniarios de la batería de banos de los niños - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 2: Se inicia el demonte de las puertas de la batería de los baños de los niños - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 3: Avanzan los trabajos de demolición de la batería de baños de los niños - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 4: Inicia el desmonte de la cubierta existente del patio de juegos - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 5: Continúan los trabajos de demolición de enchape de los muros de la bateria de baños de los niños - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 6: Se culminan las actividades de desmonte de la cubierta existente del patio de juegos - Colegio Alemania Unificada sede B







FOTO 7. Inicio de demolición de encerramiento de los muros del shut de basuras – Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 8. [illegible] – Colegio Alemania Unificada sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A**	**SEMANA**	**No. 39**		
FECHA INICIO OBRA:	6 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	7 de noviembre de 2023		**DEL**	9/10/2023	**AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 10/10/2023 Se inicia el montaje de la tubería vertical para la instalación de los módulos de la malla contra impacto

El dia 10/10/2023 Se realiza la instalación de las bajantes de aguas lluvias de las aula de danzas y pre kinder

El dia 10/10/2023 Continúa la aplicación de anticorrosivo en la estructura metálica de cubierta nueva del salon de profesores del bloque 3

El dia 10/10/2023 Se realiza la instalación de las bajantes de aguas lluvias del costado posterior de las aulas del bloque 3

El dia 11/10/2023 Se reciben las 3 aulas del bloque 3 para avanzar con la intervención y adecuación

El dia 11/10/2023 Continúan los trabajos de soldadura de las mallas contra impacto

El dia 12/10/2023 Avanzan las actividades de soldadura de los módulos de la malla contra impacto de la sede de primaria

El dia 12/10/2023 Se realiza adecuación y demarcación previo al inicio del desmonte de la cubierta de las 3 aulas del bloque 3

El dia 13/10/2023 Inicia el montaje de los módulos de la malla contra impacto de la sede de primaria

El dia 13/10/2023 Inicia el desmonte de la cubierta de las aulas 5, 6 y de profesores del bloque 3

COMPONENTE AMBIENTAL:

*Se solicita retirar los residuos de chatarra, PVC y retales de superboard resultantes de la intervención de las aulas de danzas y #4 del bloque 3 que se encuentran acopiados en la fachada posterior del mismo.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
56,21%	53,25%	0,22%	52,74%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	274	251	23
		91,6%	8,4%

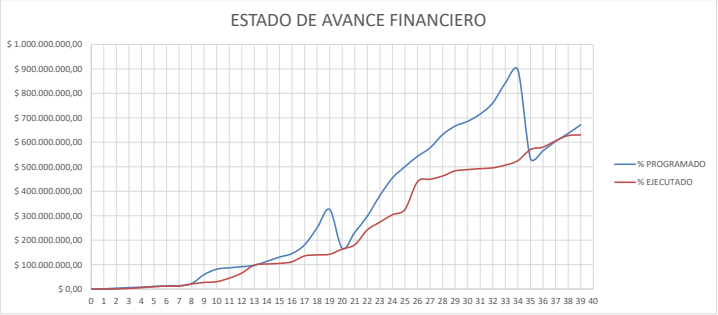

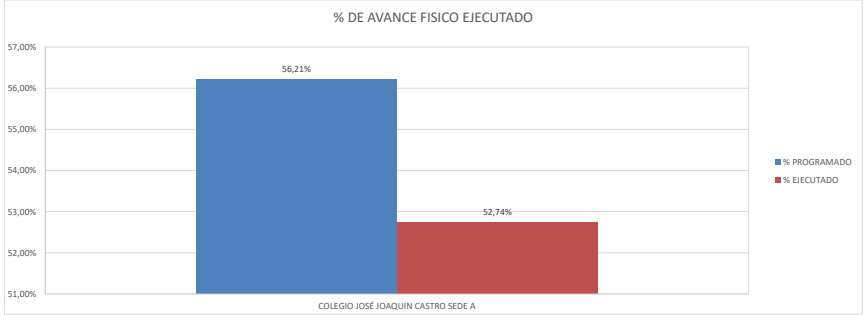

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
MAESTRO	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se empieza a generar un atraso del 3,47%, ya que se realizó el ajuste del presupuesto con base en el presentado en la reunión mensual del día 30 de Agosto por un valor de $1,194.848.678 y también se actualiza la programación del colegio con su respectivo flujo de caja. Se aclara que no se pueden ejecutar en simultáneo las obras del bloque 2 con las del bloque 3 dado que el colegio no tiene más espacios para re-ubicar a los estudiantes mientras se realiza la intervención.

*La interventoría sugiere nuevamente ingresar personal operativo para ejecutar las actividades que faltan en el frente de las aulas pre-formadas dado que no hay algún impedimento para realizarlas en simultáneo con las obras del bloque 2; además de estar aprobada estructura metálica nueva para los muros y la cubierta de estas aulas.

**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal y conductores de los vehiculos; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo; se solicita mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 39		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023



FOTO 1: Se inicia el montaje de la tubería vertical para la instalación de los módulos de la malla contra impacto - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Se realiza la instalación de las bajantes de aguas lluvias de las aula de danzas y pre kinder - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Continúa la aplicación de anticorrosivo en la estructura metálica de cubierta nueva del salon de profesores del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Se realiza la instalación de las bajantes de aguas lluvias del costado posterior de las aulas del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5: Se reciben las 3 aulas del bloque 3 para avanzar con la intervención y adecuación - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Continúan los trabajos de soldadura de las mallas contra impacto - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Avanzan las actividades de soldadura de los módulos de la malla contra impacto de la sede de primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 8: Se realiza adecuación y demarcación previo al inicio del desmonte de la cubierta de las 3 aulas del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 9: Inicia el montaje de los módulos de la malla contra impacto de la sede de primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 10: Inicia el desmonte de la cubierta de las aulas 5, 6 y de profesores del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO RAFAEL NUÑEZ SEDE B**	**SEMANA**	**No. 09**		
FECHA INICIO OBRA:	14 de agosto de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de marzo de 2024		**DEL**	9/10/2023	**AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 10/10/2023 Se reanudan las actividades de pañete impermeabilizado en los muros de las baterias de baños

El día 10/10/2023 Continúa la instalación de la estructura metálica para cubierta del bloque alianza

El día 10/10/2023 Continúa la mampostería de fachada del costado norte del bloque alianza

El día 10/10/2023 Inicia la extendida y la compactación del recebo B200 de la cancha intervenida

El día 11/10/2023 Se realiza la instalación de acero de la viga cinta para amarre de muros de fachada

El día 11/10/2023 Continúa la aplicación de pintura tipo esmalte en la estructura de cubierta del bloque de pre jardin

El día 12/10/2023 Continúa la compactación del recebo B200 de la cancha múltiple intervenida

El día 12/10/2023 Continúa la mampostería de muros de fachada del costado norte del bloque alianza

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.
- Se realiza la adecuación del espacio de almacenamiento de residuos RCD en el costado occidental de la cancha múltiple del colegio con polisombra y varas rollizas. Este espacio fue aprobado por la inspectora SST de la interventoría.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
9,17%	5,02%	0,68%	10,46%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	229	62	167
		27,1%	72,9%

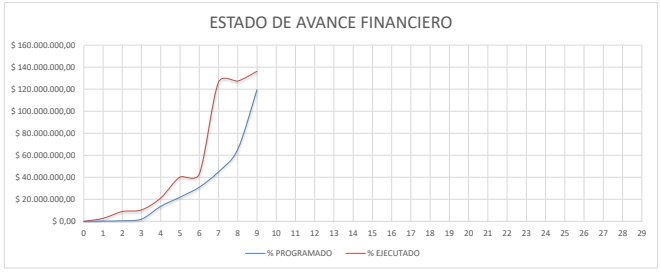

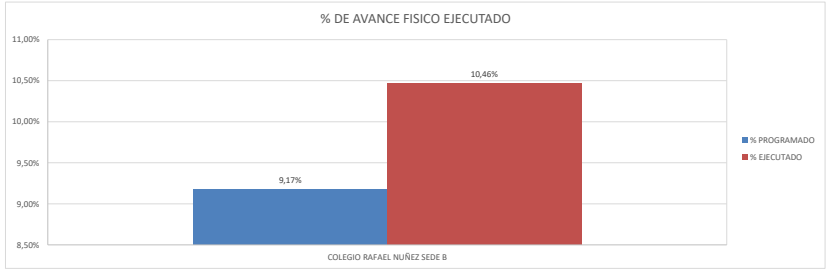

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	2	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
AYUDANTES	6	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
SOLDADORES	4	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
MAESTRO	1	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	x		GMJ618		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	NO
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*De acuerdo al porcentaje de avance programado semanal, se tiene un 9,17% programado y un 10,46% ejecutado lo que muestra un adelanto leve. Se recomienda seguir con este ritmo de trabajo para no generar atrasos durante la ejecución del proyecto.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**0**		
DEL	0/01/1900	**AL**	0/01/1900



FOTO 1: Se reanudan las actividades de pañete impermeabilizado en los muros de las baterias de baños - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 2: Continúa la instalación de la estructura metálica para cubierta del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 3: Continúa la mampostería de fachada del costado norte del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 4: Inicia la extendida y la compactación del recebo B200 de la cancha intervenida - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 5: Se realiza la instalación de acero de la viga cinta para amarre de muros de fachada - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 6: Continúa la aplicación de pintura tipo esmalte en la estructura de cubierta del bloque de pre jardin - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 7: Continúa la compactación del recebo B200 de la cancha múltiple intervenida - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 8: Continúa la mampostería de muros de fachada del costado norte del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE A**	**SEMANA**	**No. 23**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023		**DEL**	25/09/2023	**AL**	1/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 25/09/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 26/09/2023 Se realiza la instalación de las rejillas de los sumideros laterales de las canchas múltiples intervenidas.

El día 27/08/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 28/08/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 29/09/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

El día 30/09/2023 No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista.

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de separaración adecuada de los RCD's generados durante la semana.
- Se mantiene la identificación de los puntos de acopio de RCD's y materiales de construcción.
- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	0,21%	100,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	160	-34
		127,0%	-27,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**	**CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.	AYUDANTE	3	CARLOS GUTIERREZ / DFL S.A.S.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra	OFICIAL	1	DFL S.A.S.
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra			
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector			
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector			
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector			
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST			
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST			
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST			
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	**SI**
Rutas de evacuación	**SI**
Manejo de Residuos (RCD's)	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*En Mesa de trabajo realizada el dia 31 de agosto de 2023, se ajusto el presupuesto del colegio de acuerdo a las actividades que se deben realizar para cumplir con el alcance de intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $ 431.422.080.
*Se realiza la instalación de la única actividad pendiente la instalación de las rejillas de los sumideros laterales de la cancha múltiple por un valor de $1.035.000; estas rejillas se instalaron el día martes 26 de septiembre.
*Se Se realizó la entrega de los espacios al colegio el día martes 26 de septiembre en compañía de la Ing. Julieta Mercado las canchas múltiples intervenidas y el shut de basuras construido.

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoria

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoria

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 23**		
DEL	25/09/2023	**AL**	1/10/2023



FOTO 1: No se realizan actividades durante el día en el colegio por parte del contratista. - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A



FOTO 2: Se realiza la instalación de las rejillas de los sumideros laterales de las canchas múltiples intervenidas. - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE B**	**SEMANA**	**No. 13**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	9/10/2023	**AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 09/10/2023 Se contnua con instalacion de estructura metalica en bloque 2

El día 10/10/2023 Se continua con instalacion de estructura metalca en bloque A, se evidencia formalets para columnetas bloque 1

El día 11/10/2023 Se inicia con mamposteria para muro en aula 1 bloque A,

El día 12/10/2023 Se continua con instalacion de estructura metalica en bloque A, se incia con pañete en muros bloque 1

El día 13/10/2023 se continua con instalacion de estructuta metalca

El día 14/10/2023 Se continua con instalacion de estructura metalica en bloque 2 y se continua con pañete en muros en bloque 1

COMPONENTE SST:

*Se acopian en obra en los espacios de punto de acopio los residuos de construcción y demolición que se generaron durante el proceso de desmonte de cubiertas existentes en asbesto de la semana en curso.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Elaboración de ATS, pausas activas, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área SST del contratista y de la interventoría.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
24,05%	17,90%	3,82%	14,03%

DIAS DEL CONTRATO

TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
	171	83	88
		48,5%	51,5%

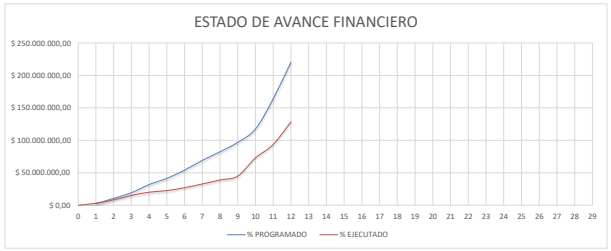

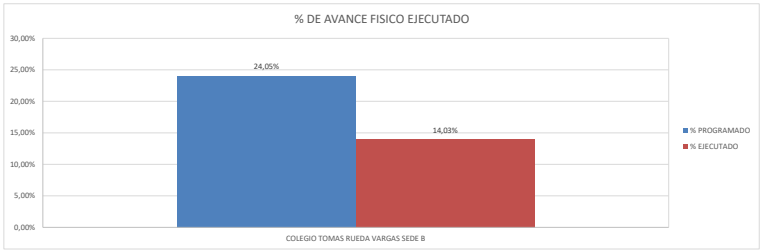

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	4	EULISES GÓMEZ / D&J SERVICIOS
AYUDANTE	3	EULISES GÓMEZ / D&J SERVICIOS
SOLDADOR	1	D&J SERVICIOS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se tiene un porcentaje programado para la semana en curso del 24,05% y se tiene un ejecutado del 14,03% lo que refleja un atraso del 9,98%. Se sugiere acelarar las actividades de instalación de la estructura metálica de cubiertas en las aulas 6 y 7 aprobadas para recuperar el avance perdido durante el periodo.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:



Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:



Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 13**		
DEL	9/10/2023	**AL**	15/10/2023



FOTO 1: Se continua con instalación de estructura metalica en bloque 2



FOTO 2: Se instala formaleta para columentas bloque 1 - Rueda Vargas Sede B



FOTO 3: Se realiza mamposteria para muro de aula 1 - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 4: Se inicia con pañete para muros en bloque 1 - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 5: Se continua con instalacion de estructura metalica en bloque b - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 6: Se continua con pañete para muro bloque 1 - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A**	**SEMANA**	**No. 39**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	5 de agosto de 2023		**DEL**	9/10/2023	**AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 09/10/23 No se realizaron actividades.

El 10/10/23 No se realizaron actividades.

El 11/10/23 Se realizan cortes de pisos para dilataciones de concreto en cancha y se realizan resanes de fisuras de placa de concreto

El 12/10/23 Se realiza sello de dilataciones con reci-base y aplicación de pintura sobre rejas

El 13/10/23 Aplicación de pintura esmalte sobre rejas

El 14/10/23 Aplicación de pintura esmalte sobre rejas

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda el orden y aseo general, retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	0,38%	91,75%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	103	172	-69
		167,0%	-67,0%

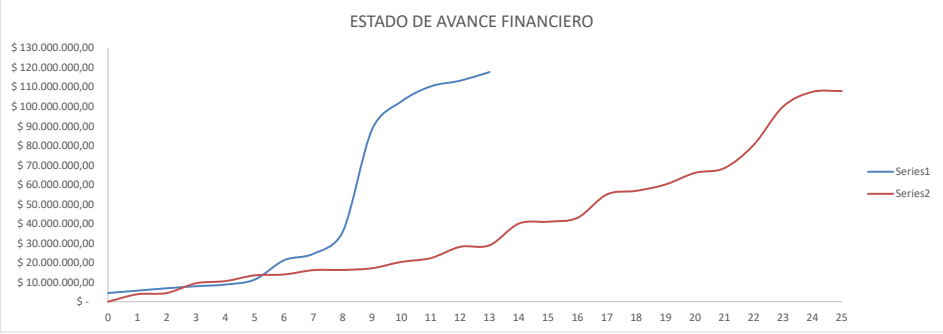

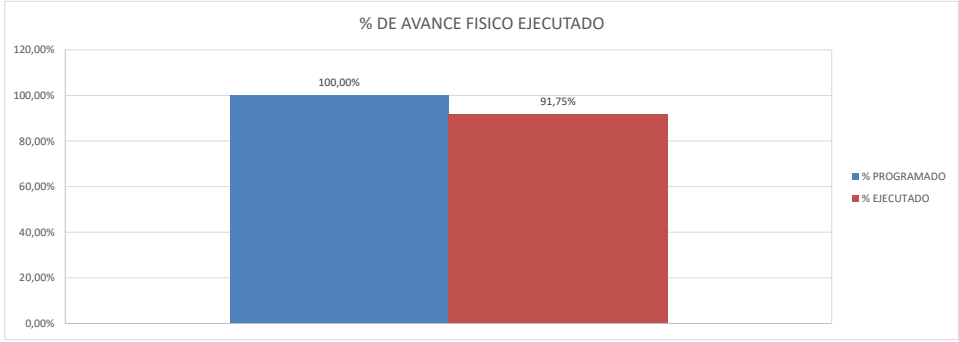

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	DYJ
OFICIAL DE OBRA	1	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se recordo a contratista la importancia de avanzar en la ejecución de actividades de manera más productiva, debido a la diferencia que hay entre programación y ejecución.
Se recuerda que ya se cumplio el 100 % del tiempo de ejecución.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA No. 39

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023



FOTO 1: Aplicación de pintura en reja - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 2: No se ha culminado la instalaicón de arcos - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 3: Cortes de pisos para dilataciones de concreto en cancha - Colegio Entre Nubes Sede A Sede A



FOTO 4 : Se realiza sello de dilataciones con reci-base - Colegio Entre Nubes sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO SEDE C**	**SEMANA**	**No. 39**		
FECHA INICIO OBRA:	2 de mayo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de diciembre de 2023		**DEL**	9/10/2023	**AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 09/10/23 Remates de estuco y pintura en aulas e instalación de estructura metalica frente a baños, continúan con excavación en cancha

El 10/10/23 Continúan con excavación y retiro de escombros en cancha, se realizan resanes en baños y aplicación de pintura a estructuras metálicas externas

El 11/10/23 Culminan excavación en cancha y retiran maquinaria de obra, continúan con remates generales

El 12/10/23 Realizan resanes generales y aplicación de pintura en columnas y vigas parte posterior de aulas

El 13/10/23 Realizan instalación de tapa en drywall parte externa de aulas, continúan con resanes generales

El 14/10/23 Se realiza retoques de pintura en aulas e instalación de tanque sobre placa de baño

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda acopio provisional de material RCD y material de obra sobrante.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
82,73%	79,77%	2,09%	54,77%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	242	164	78
		67,8%	32,2%

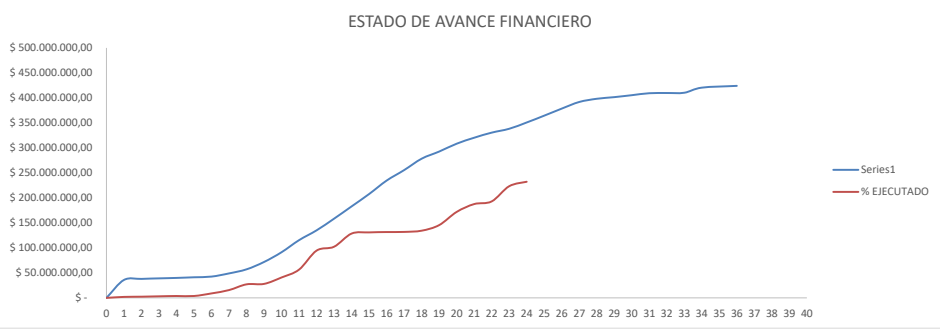

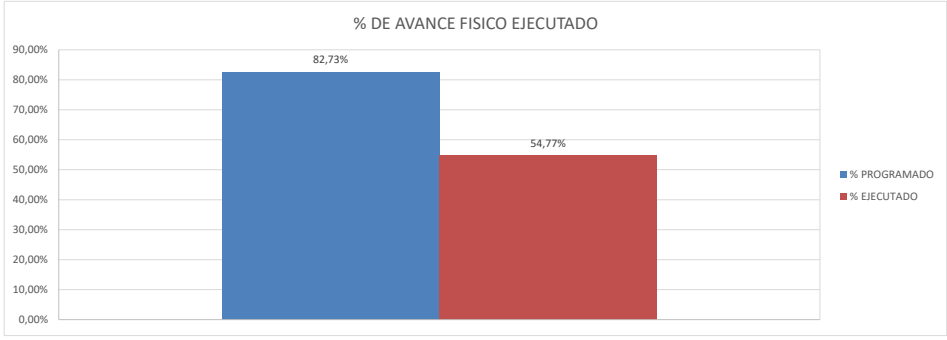

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	CARLOS JULIO GUTIERREZ
OFICIAL DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 39		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023



FOTO 1: Remates de pintura en vigas - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 2: Construcción de estructura de cubierta de hall de baño- Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 3: Excavación de perfil de cancha - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 4: Excavación de perfil de cancha - Colegio José Felix Restrepo Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B**		**SEMANA**	**No. 39**	
FECHA INICIO OBRA:	10 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	14 de octubre de 2023			**DEL**	9/10/2023	**AL** 15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 09/10/23 Aplicación de pintura tipo vinilo y esmalte en muros de aula contigua al baño

El 10/10/23 Picado de muros en aula contigua a acceso

El 11/10/23 Resane de muro, aplicación de estuco en muro de aula contigua a acceso

El 12/10/23 Inician instalación de piso chip, aplicación de vinilo en muros del shut

El 13/10/23 Retiro de escombros, instalacion de enchape de muros en el shut

El 14/10/23 Instalación de enchape de muros en el shut de basuras

COMPONENTE SST: Revisión y aprobación documental de ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección preoperacionales, verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra

COMPONENTE AMBIENTAL: Se reitera observación sobre retirar material que se encuentra en anden público.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	88,74%	6,19%	47,72%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	125	1
		99,2%	0,8%

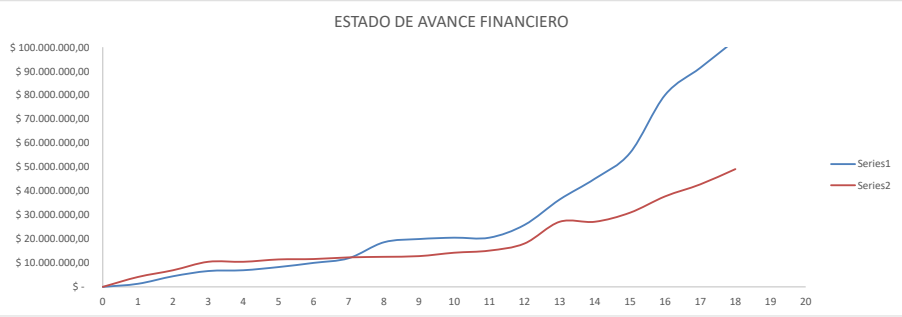

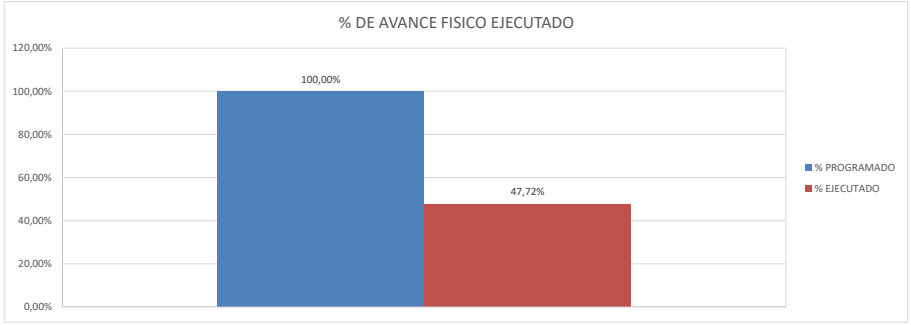

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	INERCIA INGENIERIA
OFICIAL DE OBRA	2	INERCIA INGENIERIA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 39		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023



FOTO 1: Picado de acabado de muro de aula contigua a acceso - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 2: Inico de instalación de piso chip - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 3: Instalación de enchape de muros de shut de basuras - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 4: Aplicación de estuco y pintura en muro de aula contigua a acceso - Colegio José Acevedo y Gomez sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A**	**SEMANA**	**No. 39**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	17 de febrero de 2024		**DEL**	9/10/2023	**AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 09/10/23 instalación de primera capa de tejas para cubierta tipo sandwich

El 10/10/23 Resane de muros, aplicación de estuco en muros, aplicación de pintura tipo vinilo en muros en tercer piso

El 11/10/23 Aplicación de anticorrosivo a perfiles metálicos, aplicación de estuco en muros, aplicación de pintura tipo vinilo en muros

El 12/10/23 Instalación de refuerzo a cercha de la cubierta central, instalación de puntos de anclajes y platinas para estructura metálica, aplicación de anticorrosivo a perfiles

El 13/10/23 Demolición de encorazado de muros, aplicación de estuco y pintura tipo vinilo en muros, instalación de refuerzo a cercha de cubierta central

El 14/10/23 Demolición de encorazado de muro, desmonte de cubierta de asbesto, aplicación de estuco y pintura tipo vinilo en muros, instalación de refuerzo para cercha de cubierta central

COMPONENTE SST: Verificación ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección ATS, permisos de trabajo, preoperacionales. Verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra,Validacion de retiro material RCD (Teja de asbesto), validación punto de acopio, verificación actividades de trabajo en alturas, Inspección armado de andamio.

COMPONENTE AMBIENTAL: Retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
26,50%	13,74%	1,06%	11,09%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	208	83	125
		39,9%	60,1%

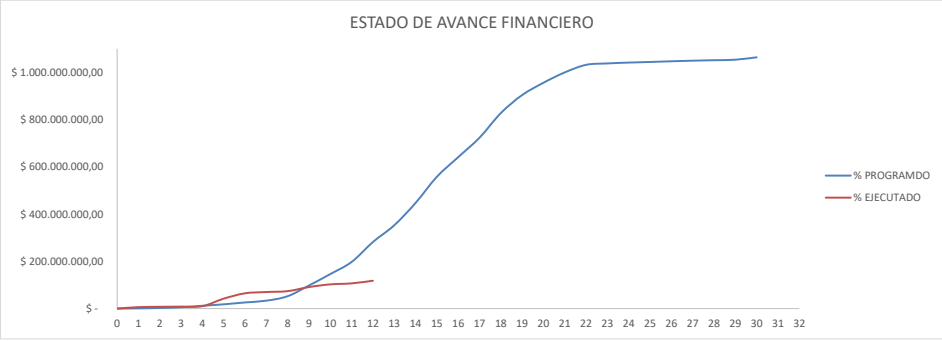

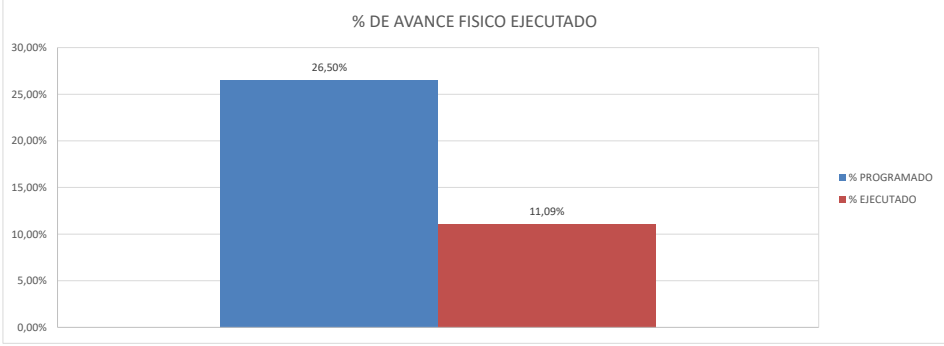

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	4	HOME SERVICE
OFICIAL DE OBRA	3	HOME SERVICE

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se actualiza progrmación, por ende se actualiza valor de ejecutado según este cambio.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 39		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023



FOTO 1:Instalación de primera capa de cubierta tipo sandwich - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 2: Inician instalación de estructura metálica de cubierta de segundo piso - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 3: Instalación de estructura para cubierta de patio central - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 4: Aplicaicón de pintura en muros de tercer piso- Colegio Francisco Javier Matiz Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**	**SEMANA**	**No. 39**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL**	9/10/2023	**AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 09/10/23 Fabricación de puertas, pintura de muro aula5, pañete interior de fachada baños, pintura corredor primer piso, lavado de muro cuarto de aseo, pintura de puertas de aulas.

El 10/10/23 Fabricación de puertas, pintura muro aula 6,pañete de interior fachada de baños, pintura corredor primer piso, gravilla lavada corredor segundo piso, pintura de puertas de aulas, refuerzo estructura pergola.

El 11/10/23 Fabricación, pintura e instalación de puertas, pintura muro aula 7, pañete shut de basuras, demolición de placa area baños profesores, fundida de placa frente a baño de profesores, instalación de marco de tapa de caja de inspección.

El 12/10/23 Fabricación, pintura e instalación de puertas, pintura muro aula 7, pañete shut de basuras, instalación de canal bloque 1, pintura muros cuarto de aseo, pintura estructura metalica aulas.

El 13/10/23 Pintura e instalación de puertas, pinturas muro aula 6,enchape shut de basuras, limpieza de ventaneria, instalación de canal bloque 1, pintura muros cuarto de aseo, pintura estructura metalica aulas, normalización medidor energia.

El 14/10/23 Pintura e instalación de puertas, pinturas muro aula 6,enchape shut de basuras, limpieza de ventaneria, instalación de canal bloque 1, pintura muros cuarto de aseo, pintura estructura metalica aulas, normalización medidor energia.

COMPONENTE SST: Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, revisión y probacion documental ingreso de personal, verificación uso adecuado de EPP, Inspección y aprobación de usos de sistemas de acceso (Andamio)

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
84,67%	77,13%	3,54%	68,55%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	291	276	15
		94,8%	5,2%

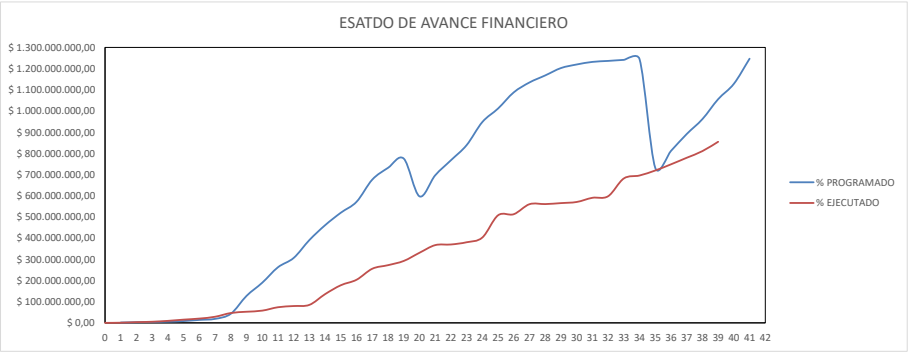

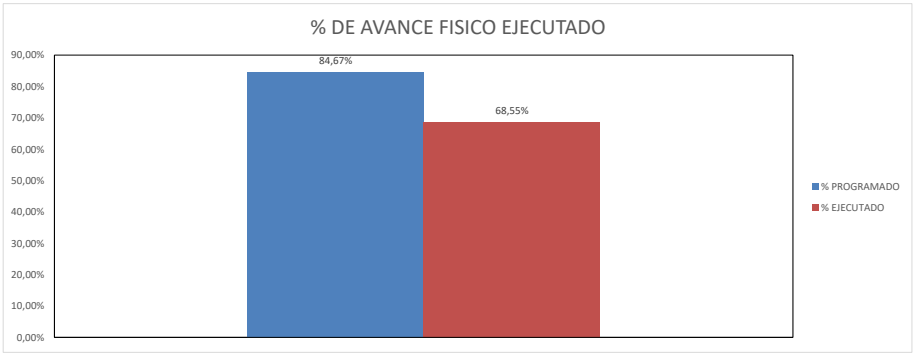

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
AYUDANTE DE OBRA	3	HOME SERVICE

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**SI**

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.246.912.368 y nueva fecha de terminación el 30/10/23.
-Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 39		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023





FOTO 1: Pintura e instalación de puertas - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 2: Pfabricación de puertas - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 3: Retoques de pintiura estructura metalica - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 4: Perfil de correa de pergola - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 5: Instalación de canal aula informatica - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 6: Pundida de placa frente a baños de profesores - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



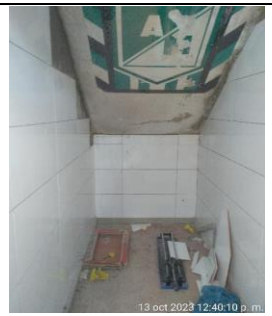


FOTO 9: Pañete y enchape de shut de basuras - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

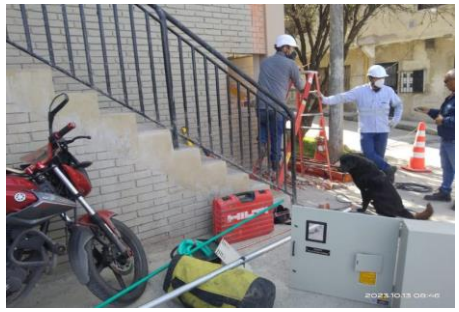




FOTO 10: Normalización de medidor de energia - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL SEDE A**	**SEMANA**	**No. 39**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	31 de octubre de 2023		**DEL**	9/10/2023	**AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 09/10/23 Pintura esmalte ingreso de colegio, estuco cielo raso, pintura de fachada oriental.

El 10/10/23 Pintura esmalte ingreso colegio, estuco cielo raso, instalación de manto asfaltico placa cubierta cafeteria, picado muro blanco, escalera en gravilla, pintura de cielo raso pasillo.

El 11/10/23 Pintura esmalte ingreso colegio, estuco cielo raso, instalación de manto asfaltico placa cubierta cafeteria, picado y pañete muro blanco, impermeabilización de placa de cafeteria, instalación de mesones tipo sokoda

El 12/10/23 Pintura esmalte ingreso colegio, estuco cielo raso, picado de muro blanco.

El 13/10/23 Pintura esmalte ingreso colegio, estuco cielo raso, pañete de muro blanco, pintura de cancha

El 14/10/23 Pintura esmalte ingreso colegio, estuco cielo raso, pintura de cancha

COMPONENTE SST: Verificar documentación SST: permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales, Inspección de orden y aseo en frentes de trabajo, Verificación de uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación documental ingreso de personal a obra, inspección y aprobación de uso de sistema de acceso(Andamio), Inspección actividades de trabajo en altururas

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
90,14%	84,69%	6,69%	86,65%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	292	276	16
		94,5%	5,5%

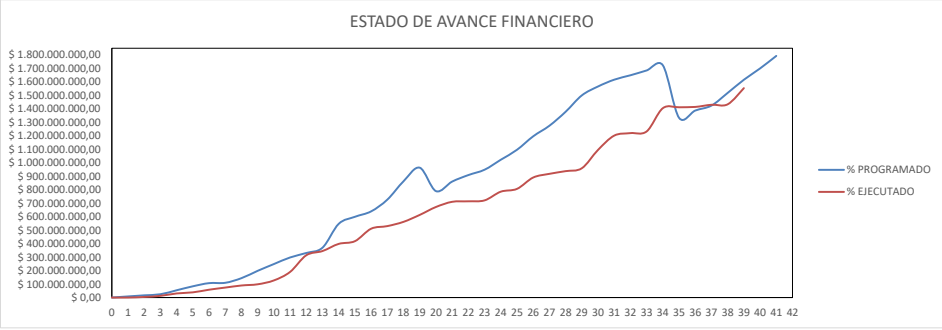

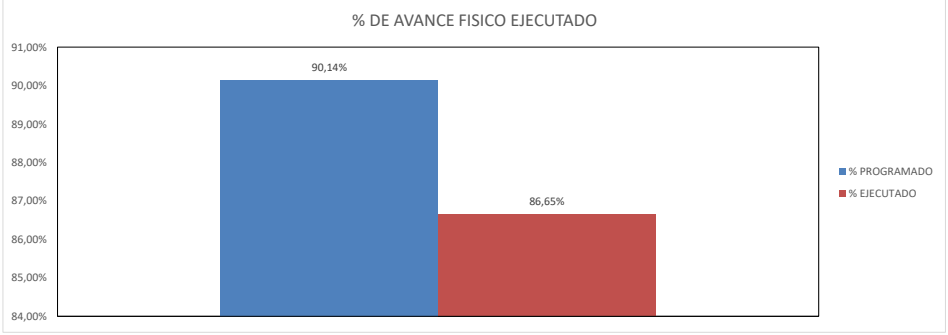

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.	AYUDANTE DE OBRA	9	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra	OFICIAL	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra	INSTALADOR DE DIVISIONES DE ACERO INOXIDABLE	2	ARQUITECTURA DISEÑO Y MODULAR
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector			
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector			
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector			
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST			
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST			
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST			
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental			
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.793.050.180 y nueva fecha de terminación el 31/10/23.
-Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 39		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023





FOTO 1: Picado y pañete de muro blanco - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 2: Escalera en granito frente a bloque de administrativo - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 3: Pintura de fachada oriental - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 4: Manto asflatico de placa de cafeteria - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 5: Pmeson tipo Sokoda - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 6: Pintura de techos en superboard - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL SEDE C**		**SEMANA**	**No. 39**	
FECHA INICIO OBRA:	3 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	9/10/2023 **AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 09/10/23 Se realizan dilataciones de viga y columnas de muro de cerramiento, cambio de piezas de dovelas de muro de cerramiento.

El 10/10/23 Se realiza dilataciones de viga y columnas de muro de cerramiento, demolición placa cubierta.

El 11/10/23 Se realiza pañete de baños, cuchillas de cubierta de baños, demolición de placa cubierta.

El 12/10/23 Se realiza pañete de baños, cuchillas de cubierta de baños, demolición de placa cubierta.

El 13/10/23 Se realiza pañete de baños, muro en bloque de baños.

El 14/10/23 Se realiza pañete de baños, muro en bloque de baños.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Validación evacuación material RCD.(Madera)
Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
30,44%	24,94%	0,58%	19,86%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	283	193	90
		68,2%	31,8%

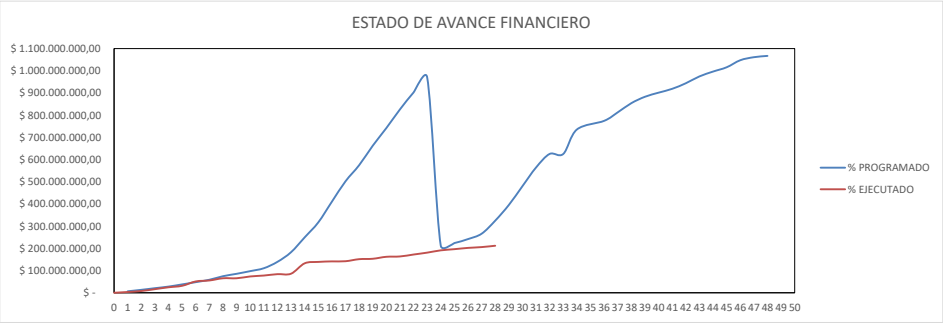

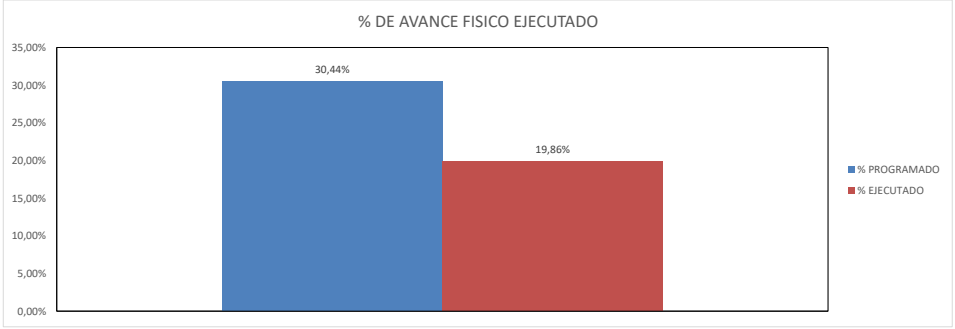

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AXN
OFICIAL	2	AXN
MAESTRO	1	AXN

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.067.082.680 y nueva fecha de terminación el 11/01/24.
* Por las fuertes lluvias presentadas en la semana no se ha podido realizar la demolición de placa cubierta de manera continua.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 39		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023





FOTO 1: Dilataciones de vigas y columnas, cambio de piezas de dovelas - Colegio Moralba Sede C



FOTO 2: Cuchillas de cubierta baños - Colegio Moralba Sede C





FOTO 3: Demolición de placa de cubierta - Colegio Moralba Sede C



FOTO 4: Muro de culata de cubierta baño - Colegio Moralba Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CIRSTOBAL SUR SEDE B**	**SEMANA**	**No. 39**		
FECHA INICIO OBRA:	20 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL**	9/10/2023	**AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 09/10/23 Se realiza pintura vinilo en salones, enchape de shut de basuras.

El 10/10/23 Se realiza pintura de vinilo en salones, enchape de shur de basuras, tuberia EMT.

El 11/10/23 Se realiza pintura en esmalte en salones, guarda escoba granito escalera, pintura de estrcutura concreto.

El 12/10/23 Se realiza pintura en esmalte de salones, guarda es coba en pasillo segundo piso.

El 13/10/23 Se realiza guarda escoba de pasillo segundo piso, cableado electrico.

El 14/10/23 Se realiza guarda escoba de pasillo segundo piso, cableado electrico.

El 15/10/23 Cableado electrico.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
92,93%	87,96%	2,52%	67,86%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	132	115	17
		87,1%	12,9%

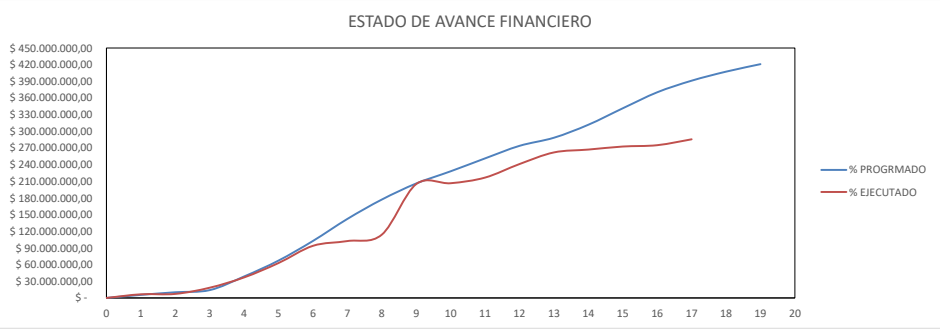

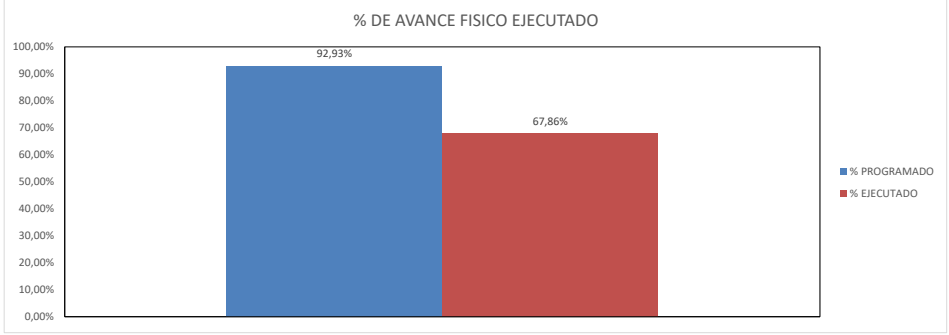

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIALES	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $420.914.867

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 39		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023





FOTO 1: Pintura salones de primer piso - Colegio San Cristobal Sede B





FOTO 2: Esclaera gravilla lavada - Colegio San Cristobal Sede B





FOTO 3: Pintura de estructura de concreto - Colegio San Cristobal Sede B



FOTO 4: Instalaciones electricas. - Colegio San Cristobal Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ SEDE A**	**SEMANA**	**No. 39**		
FECHA INICIO OBRA:	4 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	9/10/2023	**AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 09/10/23 Se realiza montaje de estructura metalica, encorose de muro.

El 10/10/23 Se realiza montaje de estructura metalica, encorose de muro, mamposteria muros de oficinas.

El 11/10/23 Se realiza montaje de estructura metalica, encorose de muro, mamposteria muros de oficinas, desmonte de cubierta ala oriental alianza.

El 12/10/23 Se realiza montaje de estructura metalica, mamposteria muros de oficinas, incia la estructura metalica de cubierta en pasillos,

El 13/10/23 Se realiza montaje de estructura metalica, mamposteria muros de oficinas, fundida de vigas y columnas de coronación de baño.

El 14/10/23 Se realiza montaje de estructura metalica, mamposteria muros de oficinas, fundida de vigas y columnas de coronación de baño.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
34,67%	25,10%	2,34%	18,71%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	191	101	90
		52,9%	47,1%

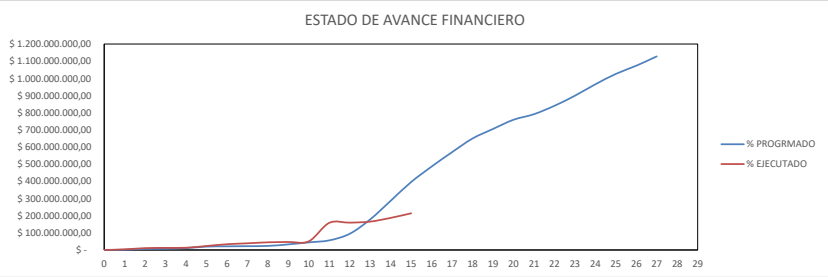

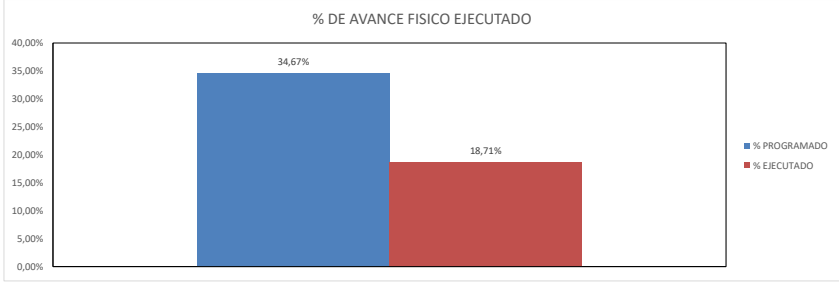

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	4	STOR CONSTRUCCIONES SAS
OFICIAL	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.142.104.067
Se ajustan porcentaje programado de acuerdo a programación V2 con valor anteriormente mencionado.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PÁGINA 1 DE 1			
SEMANA	No. 39		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023





FOTO 1: Montaje de estructura metalica de bloque alianza ala occidental y pasillo - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A



FOTO 2: Mamposteria de canal - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A



FOTO 3: Mamposteria de oficinas - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A



FOTO 4: Desmonte de cubierta ala oriental - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ FLÍX RESTREPO SEDE A**	**SEMANA**	**No. 39**		
FECHA INICIO OBRA:	9 de octubre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de marzo de 2024		**DEL**	9/10/2023	**AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 09/10/23 Se realiza instalación de cerramiento, desmonte de luminarias y redes electricas.

El 10/10/23 Se realiza desmonte de cubierta aula 205.

El 11/10/23 Se realiza desmonte de cubierta aula 206.

El 12/10/23 Se realiza suministro e instalación de cerramiento para punto de acopio, trasiego de RCD a punto de acopio.

El 13/10/23 Se realiza pintura de estrcutura metalica de cubierta.

El 14/10/23 Se realiza pintura de estrcutura metalica de cubierta.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
0,16%	$ -	0,51%	0,51%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	154	4	150
		2,6%	97,4%

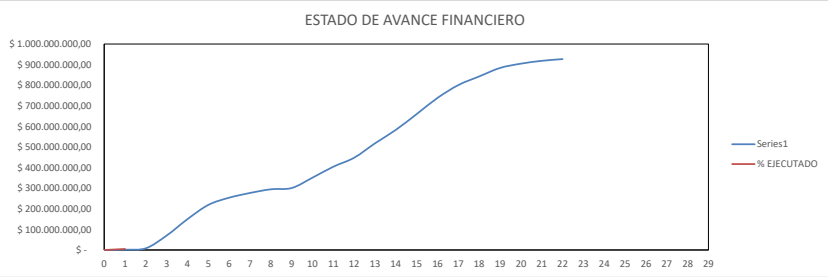

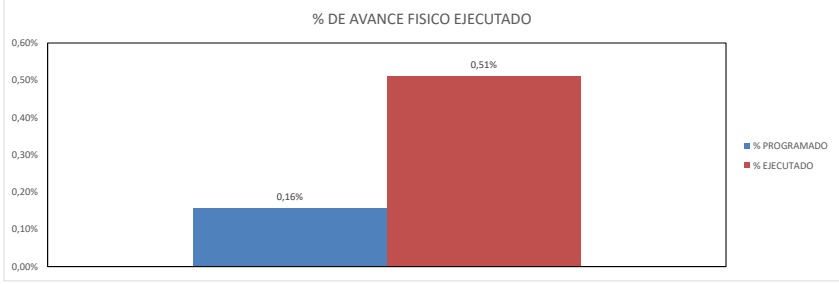

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	2	DYJ
SOLDADORES	2	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se da inicio al frente de obra el dia 07/10/23, con el cerramiento en el bloque.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PÁGINA 1 DE 1			
SEMANA	No. 39		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023





FOTO 1: Cerramiento bloque de aulas y punto de acopio - José Felix Restrepo Sede A



FOTO 2: Desmonte de luminarias - José Felix Restrepo Sede A





FOTO 3: Desmonte de cubiertas aulas 205 y 206 - José Felix Restrepo Sede A



FOTO 4: Pintura de estrcutura metalica de cubierta - José Felix Restrepo Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 39**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	9/10/2023	**AL**	15/10/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio José Joaquín Castro - Sede B. Se realiza instalación y soldadura de estructura metálica para cubierta en aulas 203 y 204. Se realiza instaación de caballetes en aulas 201 y 202.

Colegio Los Alpes - Sede A. Se realiza instalación de filtro en contorno de placa para aulas prefabricadas. Se realiza trasiego de materiales correspondientes a aulas prefrabricadas. Se realizan apiques en muros de aula preescolar.

COMPONENTE SST: Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio La Belleza- sede A, Moralba Sede A

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realizo acompañamiento a la actividad de tala de arboles del colegio Manuelita Saenz, se realizco solicitud de retiro de RCD de colegio Juan Rey Sede A y Jose Joaquin Sede b


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
85,11%	0,90%	86,01%

ESTADO DE AVANCE

NÚMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER	**0**		
EMERGENCIAS EN EJECUCION	**3**		
EMERGENCIAS ATENDIDAS	**40**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	*** Colegio El Rodeo - Sede A. (Sum e Inst equipos de bombeo) * Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst equipos de bombeo) * Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst cerramiento) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Dem y const de muro cerramiento, cambio de teja cafetería, const de escalón) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación plazoleta principal) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Sum e Insta baranda) * Colegio La Belleza - Sede A. (Adecuación shut basuras) * Colegio Aguas Claras. (Construcción red sanitaria baños preescolar) * Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto eléctrico) * Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de tanques de agua potable) * Colegio Florentino González. (Tratamiento fisuras en muros, pintura e impermeabilización viga canal) * Colegio Florentino González. (Impermeabilización de tanque de almacenamiento agua potable) * Colegio Rafael Núñez – Sede A. (Desmonte, Sum e Insta de cubierta y canal) * Colegio José Joaquín Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Sum e Inst de divisiones para oficina y orinal) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Sum de switch) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas) * Colegio Vitelma. (Cambio cubierta baño, tratamiento humedades, cambio luminarias) * Colegio Manuelita Sáenz. (Reparación tubo hidráulico) * Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refrigeradores de comedor escolar) * Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores) * Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tubería desagüe tienda escolar) * Colegio Moralba – Sede A. (Sum e Insta de rejas para ventanas) * Colegio San José Sur Oriental (Cambio cubierta aula rectoria) * Colegio Republica de Ecuador – Sede A. (Mantenimiento ascensor) * Colegio Gloria Valencia de Castaño. (Poda de cesped y fumigación) * Colegio Los Alpes - Sede C. (Suspensión punto hidráulico sanitario) * Colegio Vitelma. (Lavado de tanques y poda) * Colegio El Rodeo - Sede A. (Impermeabilización tanque de almacenamiento agua potable) * Colegio Juan Rey – Sede A. (Construcción de baño de profesores y shut de basuras) * Colegio San Cristóbal – Sede A. (Sum e Inst de flanche) * Colegio Gran Colombia (Mantenimiento cubierta) * Colegio Los Alpes – Sede A (Poda y tala de árboles) * Colegio Juan Rey – Sede A. (Mantenimiento equipos de bombeo) * Colegio Vitelma. (Pintura muros de baño, cinta flanche y fumigación) * Colegio Manuelita Sáenz. (Poda y tala de árboles) * Colegio Juana Escobar – Sede A. (Sum e Inst acometida eléctrica) * Colegio Veinte de Julio - Sede A. (Demolición de fachaleta, pañete y pintura de muro) * Colegio Gloria Valencia de Castaño. (Sum e Inst acometida eléctrica)**
REPORTADAS -TOTAL	**48**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

N°	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**	
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	**TERMINADO**	
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	**TERMINADO**	
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**	
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PLAZOLETA	**TERMINADO**	
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	BARANDA	**TERMINADO**	
7	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	**TERMINADO**	
8	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	**TERMINADO**	
9	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**	
10	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	GRIETAS Y PINTURA MUROS, IMPERM VIGACANAL	**TERMINADO**	
12	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE	**TERMINADO**	
13	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	**TERMINADO**	
14	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**	
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	**TERMINADO**	
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**	
17	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	**TERMINADO**	
18	VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES-PODA	**TERMINADO**	
19	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**	
20	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**	
21	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**	
22	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**	
23	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	**TERMINADO**	
24	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**	
25	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	**TERMINADO**	
26	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y PODA	**TERMINADO**	
27	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**	
28	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	**TERMINADO**	
29	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	EN EJECUCIÓN	
30	EL RODEO - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE ALMACENAMIENTO	**TERMINADO**	
31	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	**TERMINADO**	
32	SAN CRISTOBAL - SEDE A	FLANCHE MURO COLINDANTE	**TERMINADO**	
33	GRAN COLOMBIA	MANTENIMIENTO CUBIERTA	**TERMINADO**	
34	JOSE JOAQUIN CASTRO - SEDE B	CAMBIO CUBIERTA	EN EJECUCIÓN	
35	LOS ALPES - SEDE A	TALA DE ÁRBOL	**TERMINADO**	
36	LOS ALPES - SEDE A	CONSTRUCCIÓN AULAS PREFABRICADAS	EN EJECUCIÓN	
37	JUAN REY - SEDE A	MANTENIMIENTO BOMBAS	**TERMINADO**	
38	VITELMA	PINTURA BAÑO PREESCOLAR, FUMIGACIÓN, CINTA FLANCHE, ARBOL SANITARIOS	**TERMINADO**	
39	MANUELITA SAENZ	PODA Y TALA DE ÁRBOLES	**TERMINADO**	
40	JUANA ESCOBAR - SEDE A	FALLA ELECTRICA - COCINA	**TERMINADO**	
41	MANUELITA SAENZ	DESMONTE DE VENTANA	**TERMINADO**	
42	VEINTE DE JULIO	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN MURO	**TERMINADO**	
43	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FALLA ELECTRICA - COCINA	**TERMINADO**	
44	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA / RETIRADA	
45	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ARBOLES	REPORTADA / RETIRADA	
46	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	ADECUCIÓN SHUT BASURAS	REPORTADA / RETIRADA	
47	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA / RETIRADA	
48	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA / RETIRADA	

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*** Se realiza juste de valores de emergencias aprobadas teniendo como nuevo valor la suma de $997.037.102, valor con el cual se estan reportando el avance ejecutado.**

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 39		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023





FOTO 1: Instalación y soldadura de estructura metálica para cubierta en aulas 203 y 204. Colegio José Joaquín Castro - Sede B.





FOTO 2: Instaación de caballetes en cubierta de aulas 201 y 202. Colegio José Joaquín Castro - Sede B.





FOTO 3: Instalación de filtro en contorno de placa para aulas prefabricadas. Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 4: Conformación de talud en contorno de placa para ualas prefabricadas. Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 5: Trasiego de materiales correspondientes a aulas prefrabricadas. Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 6: Apiques en muros de aula preescolar. Colegio Los Alpes - Sede A.
