INFORME DE ACTIVIDADES FERNANDO ISAAC CERÓN ROSADA APOYO A LA SUPERVISIÓN CORPORACIÓN NASA KIWE – ÁREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO DE OBRA No. 158-2023


CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS


PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2023


SEGUIMIENTO CONTRATO


Fecha: 12 de septiembre de 2023 (Contrato de obra 158-2023 – JAIR LOPEZ ROJAS)

Laureles, Páez: *Se visita el sitio, se realiza recorrido del trayecto de ruta del sistema de acueducto en compañía del ingeniero supervisor de obra del contratista, maestro de obra, topógrafo y comuneros de la zona con el fin de hacer un reconocimiento del sitio, ubicación de estructuras principales, viaductos, posibles rutas de transporte y acopio de materiales de construcción con el fin de realizar la respectiva logística de la ejecución de la obra. En el recorrido los comuneros manifiestan se trabaja en un posible proyecto futuro por parte de la administración municipal para la construcción de una vía que conecta el sector de laureles con el sector de Chilpel (Togoima centro) interviniendo parte del camino de servidumbre existente, el cual de acuerdo al corredor de ruta indicado por los comuneros coincide en algunos trayectos con el trazado del acueducto por tal razón se evidencia la necesidad de desplazarse algunos metros con respecto a la ubicación actual considerando no presentar modificaciones significativas que puedan afectar el diseño del acueducto, de esta manera se solicita a la comunidad de acuerdo a las tentativas de trazado de vía preliminar demarcar los espacios proyectados a intervenir y la consecución de los respectivos permisos de predios que se podrían ver afectados en estos supuestos desplazamientos.*



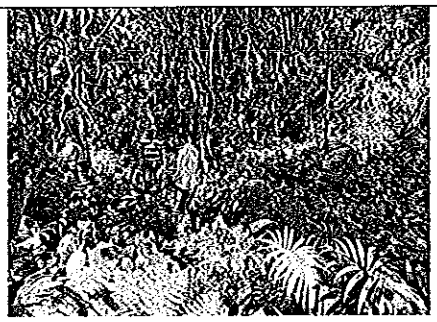

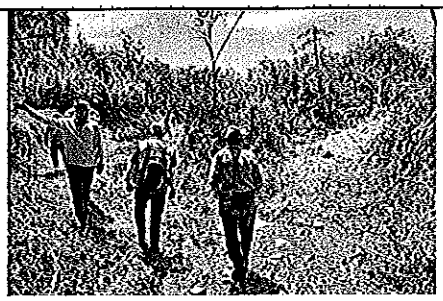

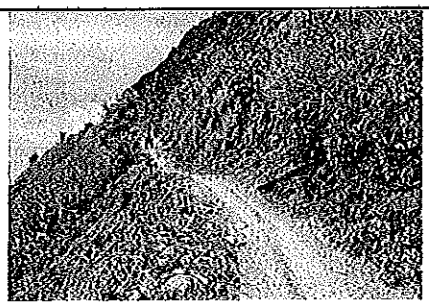

PROYECTO		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Contrato de obra No. 158 de 2023: Construcción del sistema de acueducto en fase básica de la localidad de Laureles y sectores aledaños, resguardo de Togoima, municipio de Páez, Departamento del Cauca.	PROGRAMADO (%)	4%	20%			
	EJECUTADO (%)	0%	5%			

El avance en el mes de septiembre de 2023 es de 5% considerando que se adelanta actividad de topografía, excavaciones y acarreo de materiales hasta los sitios de ubicación de las estructuras, se evidencia con respecto al avance programado del 20% que se presenta un déficit para el cual deberán tomarse las medidas necesarias como la implementación de otros frentes de trabajo y la celeridad en la ejecución de las actividades que permitan compensar los tiempos perdidos, para lo cual el contratista manifiesta que se vinculará más personal al equipo de trabajo.

Ing. FERNANDO ISAAC CERON ROSADA
Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico
