				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

 https://drive.google.com/open?id=14bpzKLTWxHeemtxPHgZ-mB94		 https://drive.google.com/open?id=1HNzYEJOcnYBcHOAGypbZ-WJEWA6	
FOTO 1	Instalación de acero INOCENCIO CHINCA	**FOTO 2**	Instalación de encofrado para fundida INOCENCIO CHINCA
 https://drive.google.com/open?id=1F3pBJEOtSbxdHn28bSOQ19fIt5		 https://drive.google.com/open?id=1oHTQWuSCHWAVW_RQG3Z8rJZ0xxSxWn	
FOTO 3	Demolición INOCENCIO CHINCA	**FOTO 4**	Demolición INOCENCIO CHINCA

7. OBSERVACIONES

Se registran cantidades de las actividades:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR
EMPEDRADO e=20CM, INCLUYE PIEDRA RAJON

Dichas actividades son requeridas bajo logica constructiva, no obstante no son relacionadas dentro de las actividades en presupuesto

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE ANGELO SANCHEZ	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE INOCENCIO CHINCA No. 29**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	18	AL	24

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	3.02%	0.92%	0.92%	7	3.02%	0.92%	$8,094,054	0.92%
8	22/1/2023	28/1/2023	4.45%	6.84%	7.77%	8	4.45%	6.84%	$59,999,762	7.77%
9	29/1/2023	4/2/2023	8.15%	4.60%	12.36%	9	8.15%	4.60%	$40,295,639	12.36%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.41%	2.58%	14.94%	10	1.41%	2.58%	$22,617,115	14.94%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	11	0.00%	0.00%	$0	14.94%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	12	0.00%	0.00%	$0	14.94%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	13	0.00%	0.00%	$0	14.94%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	14	0.00%	0.00%	$0	14.94%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	15	0.00%	0.00%	$0	14.94%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	16	0.00%	0.00%	$0	14.94%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	17	0.00%	0.00%	$0	14.94%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	18	0.00%	0.00%	$0	14.94%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	19	0.00%	0.00%	$0	14.94%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	20	0.00%	0.00%	$0	14.94%
21	23/4/2023	29/4/2023	3.26%	0.00%	14.94%	21	3.26%	0.00%	$0	14.94%
22	30/4/2023	6/5/2023	3.26%	0.00%	14.94%	22	3.26%	0.00%	$0	14.94%
23	7/5/2023	13/5/2023	3.26%	1.23%	16.17%	23	3.26%	1.23%	$10,787,932	16.17%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.26%	0.54%	16.72%	24	3.26%	0.54%	$4,760,176	16.72%
25	21/5/2023	27/5/2023	3.26%	1.30%	18.02%	25	3.26%	1.30%	$11,392,850	18.02%
26	28/5/2023	3/6/2023	3.26%	1.77%	19.79%	26	3.26%	1.77%	$15,539,638	19.79%
27	4/6/2023	10/6/2023	3.26%	3.28%	23.07%	27	3.26%	3.28%	$28,721,045	23.07%
28	11/6/2023	17/6/2023	3.26%	3.37%	26.43%	28	3.26%	3.37%	$29,524,638	26.43%
29	18/6/2023	24/6/2023	4.26%	3.05%	29.48%	29	4.26%	3.05%	$26,740,797	29.48%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

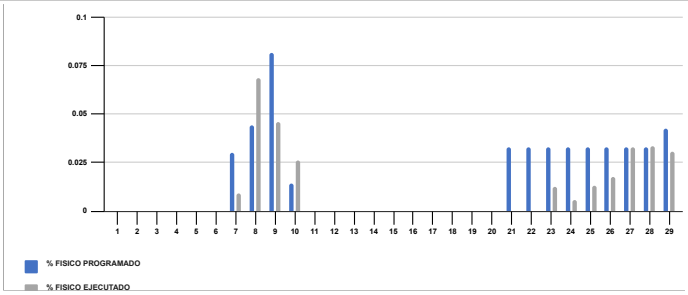

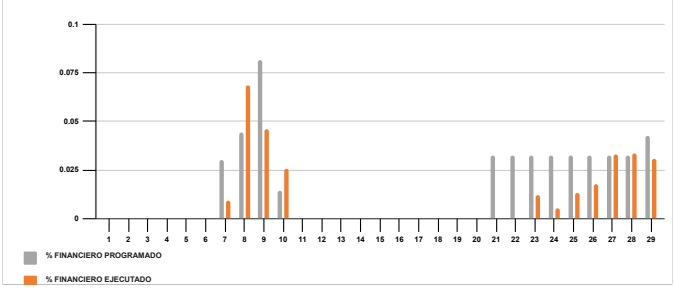

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
INOCENCIO CHINCA	KR 6 #54 A - 149	2023-06-18	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-19	Desencofrado de formaletas. Excavación manual.	N/A
		2023-06-20	Instalación de formaletas para fundida de muros.	N/A
		2023-06-21	Fundida de muros. Desencofrado de formaletas. Excavación manual.	N/A
		2023-06-22	Instalación de formaletas para fundida de muros. Excavación manual. Fundida de muros.	N/A
		2023-06-23	Figurado y armado de parrilla. Desencofrado de formaletas. Excavación manual. Instalación de formaletas para fundida de muros.	N/A
		2023-06-24	Fundida de muros. Excavación manual. Solado.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2415		711.87	0.00	$4,221	$0	711.87	1,703.13
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	35		35.00	0.00	$454,545	$0	35.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	2415		177.00	706.65	$9,648	$6,817,759	883.65	1,531.35
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	59		59.00	0.00	$23,673	$0	59.00	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	815		803.29	0.00	$25,396	$0	803.29	11.71
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	132.18		47.78	0.00	$252,961	$0	47.78	84.40
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	488.03		72.35	15.58	$93,507	$1,456,839	87.93	400.10
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	368.59		24.71	0.00	$192,928	$0	24.71	343.88
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	624.76		99.62	30.77	$54,171	$1,666,842	130.39	494.37
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	26229.87		7,854.36	988.09	$9,568	$9,454,045	8,842.45	17,387.42
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	35.15		22.71	5.73	$894,392	$5,124,866	28.44	6.71
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.45		7.45	0.00	$1,742,818	$0	7.45	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	4.93		4.93	0.00	$1,894,074	$0	4.93	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	26.19		23.46	2.73	$813,350	$2,220,446	26.19	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	118.85		118.85	0.00	$32,154	$0	118.85	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	140.97		140.97	0.00	$100,669	$0	140.97	-
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	80		80.00	0.00	$67,760	$0	80.00	-
							VALOR DE OBRA	$26,740,797		
							INCIDENCIA	3.05%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
INOCENCIO CHINCA	Alberto Diaz	ANGELO SANCHEZ	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA

				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

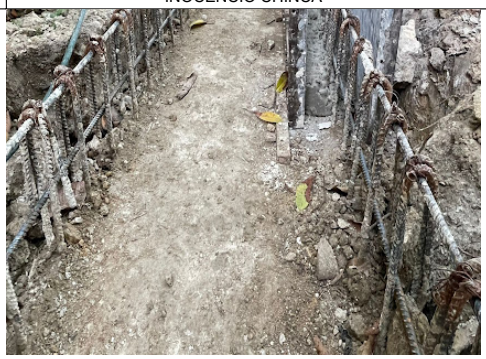 https://drive.google.com/open?id=1600WBe6jmO_D09KhtzihaRyc6		 https://drive.google.com/open?id=1GTt_gLsG_CUDNJCsVdSNEcBtUfn_f	
FOTO 1	Desencofrado INOCENCIO CHINCA	**FOTO 2**	Instalación de encofrado para fundida INOCENCIO CHINCA
 https://drive.google.com/open?id=1_yqpm1hAD1zlzn2QqqTUR1_Y2L		 https://drive.google.com/open?id=1G7yGrMUOvFqHQJE18WRshEcBtUfnVN	
FOTO 3	Instalación de encofrado para fundida INOCENCIO CHINCA	**FOTO 4**	Fundida de muros de cárcamos INOCENCIO CHINCA

7. OBSERVACIONES

Se registran cantidades de las actividades:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR
EMPEDRADO e=20CM, INCLUYE PIEDRA RAJON

Dichas actividades son requeridas bajo logica constructiva, no obstante no son relacionadas dentro de las actividades en presupuesto

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE ANGELO SANCHEZ	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

JESUS DE NAZARETH

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JESUS DE NAZARETH No. 26**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	28	AL	3

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	3,45%	3,52%	3,52%	6	3,45%	3,52%	$57.817.209	3,52%
7	15/1/2023	21/1/2023	3,45%	10,59%	14,11%	7	3,45%	10,59%	$173.944.386	14,11%
8	22/1/2023	28/1/2023	3,45%	5,18%	19,29%	8	3,45%	5,18%	$85.083.279	19,29%
9	29/1/2023	4/2/2023	3,45%	5,52%	24,81%	9	3,45%	5,52%	$90.667.895	24,81%
10	5/2/2023	11/2/2023	3,45%	2,12%	26,93%	10	3,45%	2,12%	$34.821.728	26,93%
11	12/2/2023	18/2/2023	3,45%	4,33%	31,26%	11	3,45%	4,33%	$71.121.737	31,26%
12	19/2/2023	25/2/2023	3,45%	11,92%	43,18%	12	3,45%	11,92%	$195.790.093	43,18%
13	26/2/2023	4/3/2023	3,45%	0,37%	43,55%	13	3,45%	0,37%	$6.077.377	43,55%
14	5/3/2023	11/3/2023	3,45%	0,02%	43,57%	14	3,45%	0,02%	$328.507	43,57%
15	12/3/2023	18/3/2023	3,45%	0,01%	43,58%	15	3,45%	0,01%	$164.253	43,58%
16	19/3/2023	25/3/2023	5,45%	0,11%	43,69%	16	5,45%	0,11%	$1.806.788	43,69%
17	26/3/2023	1/4/2023	3,45%	20,94%	64,63%	17	3,45%	20,94%	$343.946.690	64,63%
18	2/4/2023	8/4/2023	5,45%	7,71%	72,34%	18	5,45%	7,71%	$126.639.397	72,34%
19	9/4/2023	15/4/2023	3,45%	3,71%	76,05%	19	3,45%	3,71%	$60.938.024	76,05%
20	16/4/2023	22/4/2023	3,45%	4,16%	80,21%	20	3,45%	4,16%	$68.329.428	80,21%
21	23/4/2023	29/4/2023	5,45%	2,34%	82,55%	21	5,45%	2,34%	$38.435.303	82,55%
22	30/4/2023	6/5/2023	3,45%	0,64%	83,19%	22	3,45%	0,64%	$10.512.220	83,19%
23	7/5/2023	13/5/2023	3,45%	1,80%	84,99%	23	3,45%	1,80%	$29.565.618	84,99%
24	14/5/2023	20/5/2023	5,45%	3,03%	88,02%	24	5,45%	3,03%	$49.768.790	88,02%
25	21/5/2023	27/5/2023	3,45%	3,00%	91,02%	25	3,45%	3,00%	$49.276.030	91,02%
26	28/5/2023	3/6/2023	3,45%	0,17%	91,19%	26	3,45%	0,17%	$2.792.308	91,19%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

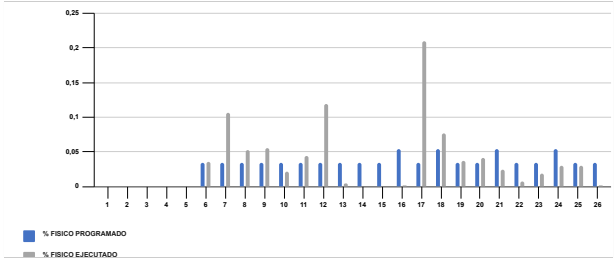

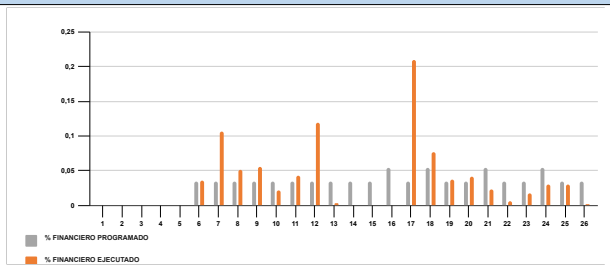

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JESUS DE NAZARETH	KR 6 #54 A - 149	2023-05-28	No se ejecutaron Actividades constructivas.	N/A
		2023-05-29	Limpieza del área externa.	N/A
		2023-05-30	Pintura de superboard en salones, pañete de muro en cancha.	N/A
		2023-05-31	Pintura de superboard en salones. Instalación de ventanas.	N/A
		2023-06-01	Pintura de superboard en salones. Armado de estructura metálica para el cielo raso del quiosco.	N/A
		2023-06-02	Armado de estructura metálica para cielo raso del quiosco.	N/A
		2023-06-03	No se ejecutaron Actividades constructivas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	983,01		983,01		$4.221	$0	983,01	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	15		15,00		$454.545	$0	15,00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	983,01		983,01		$9.648	$0	983,01	-
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	85,14		85,14		$116.390	$0	85,14	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	45,42		45,42		$252.961	$0	45,42	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	1065,5		1.065,50		$20.699	$0	1.065,50	-
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	26		26,00		$20.794	$0	26,00	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	385,57		385,57		$93.507	$0	385,57	-
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	113,215		113,21		$90.362	$0	113,21	0,00
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	638,47		638,47		$49.030	$0	638,47	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	584,21		584,21		$192.928	$0	584,21	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	117,13		117,13		$54.171	$0	117,13	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	13689,05		13.689,05		$9.568	$0	13.689,05	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	26,51		26,51		$894.392	$0	26,51	0,00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19,05		19,05		$1.742.818	$0	19,05	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	3,6		3,60		$1.894.074	$0	3,60	-
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	1015,405		1.015,40		$99.065	$0	1.015,40	0,00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	823,65		774,44		$27.186	$0	774,44	49,21
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	48,6		48,60		$48.408	$0	48,60	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	496,03		496,03		$18.074	$0	496,03	-
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	3,28		3,28		$1.933.197	$0	3,28	-
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	33,44		33,44		$1.254.738	$0	33,44	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	21,35		21,35		$813.350	$0	21,35	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	628,92		628,92		$32.154	$0	628,92	-
3.03	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO H<0.8m. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	12		12,00		$16.526	$0	12,00	-
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	14,98		14,98		$13.644	$0	14,98	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	1012,14		996,92		$100.669	$0	996,92	15,22
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	489,02		96,08	2,24	$39.705	$88.939	98,32	390,70
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	13575,84		13.575,84		$24.307	$0	13.575,84	-

5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	399,56		399,56		$33.985	$0	399,56	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	625,76		625,76		$138.761	$0	625,76	-
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 0,30x0,35x0,30 M PARA CUBIERTA	ML	13,87		13,87		$151.298	$0	13,87	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	822,65		822,65		$16.524	$0	822,65	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	382,75		382,75		$20.865	$0	382,75	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	397,3		397,30		$32.600	$0	397,30	-
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON VITRIFICADO DE 30X30 CMS PARA EXTERIORES	MT2	297,64		289,80		$73.815	$0	289,80	7,84
6.16	ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.20 X 0.20 METROS. INCLUYE BOQUILLA	MT2	80,305		80,30		$77.136	$0	80,30	0,00
6.22	CONSTRUCCIÓN MURO EN SUPERBOARD A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2	77,16		51,00	12,78	$93.422	$1.193.933	63,78	13,38
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	20		18,00	1,32	$77.644	$102.490	19,32	0,68
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	20		20,00		$67.320	$0	20,00	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12,00		$38.451	$0	12,00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12,00		$57.053	$0	12,00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	14		14,00		$32.669	$0	14,00	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	87,13		87,13		$323.953	$0	87,13	-
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR	M2	37,5		34,50		$891.836	$0	34,50	3,00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 4"	UND	12		8,00		$50.230	$0	8,00	4,00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	3		3,00		$1.488.291	$0	3,00	-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	3		3,00		$35.397	$0	3,00	-
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	80		80,00		$27.015	$0	80,00	-
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	60,5		60,50		$58.180	$0	60,50	-
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	4		3,00		$173.513	$0	3,00	1,00
12.01	TALA DE ARBOLES MEDIANOS INC RETIRO	UND	1		1,00		$1.556.196	$0	1,00	-
12.02	PODA DE ARBOLES MEDIANOS INC RETIRO	UND	2		1,00		$1.088.110	$0	1,00	1,00
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	355,73		355,73		$134.924	$0	355,73	-
NP 21	ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO	ML	218,8		218,80		$39.518	$0	218,80	-
NP 23	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN DRYWALL A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA INTERIOR A 3 MANOS	M2	108,51		90,02	12,14	$110.546,2	$1.342.031,4	102,16	6,35

VALOR DE OBRA	$2.727.394
INCIDENCIA	0,17%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS	
PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	EQUIPOS EN OBRA

FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JESUS DE NAZARETH	Alberto Diaz	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1yVneP5tI1zqy6IwTfN_QFTtU

FOTO 1	Instalación de superboard



https://drive.google.com/open?id=1RPUG-OpmXoqQuRRuQfZAbQxFJmdn

FOTO 2	Instalación de superboard



https://drive.google.com/open?id=1yVneP5tI1zqy6IwTfN_QFTtU

FOTO 3	Pintura de superboard



https://drive.google.com/open?id=1k81ZRfa_tu6zXubpxW2tSEzPkN@oJP

FOTO 4	Instalación de ventanas.

7. OBSERVACIONES

Elaborado por: Ricardo Caballero	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JESUS DE NAZARETH No. 27**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	4	AL	10

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	3,45%	3,52%	3,52%	6	3,45%	3,52%	$57.817.209	3,52%
7	15/1/2023	21/1/2023	3,45%	10,59%	14,11%	7	3,45%	10,59%	$173.944.386	14,11%
8	22/1/2023	28/1/2023	3,45%	5,18%	19,29%	8	3,45%	5,18%	$85.083.279	19,29%
9	29/1/2023	4/2/2023	3,45%	5,52%	24,81%	9	3,45%	5,52%	$90.667.895	24,81%
10	5/2/2023	11/2/2023	3,45%	2,12%	26,93%	10	3,45%	2,12%	$34.821.728	26,93%
11	12/2/2023	18/2/2023	3,45%	4,33%	31,26%	11	3,45%	4,33%	$71.121.737	31,26%
12	19/2/2023	25/2/2023	3,45%	11,92%	43,18%	12	3,45%	11,92%	$195.790.093	43,18%
13	26/2/2023	4/3/2023	3,45%	0,37%	43,55%	13	3,45%	0,37%	$6.077.377	43,55%
14	5/3/2023	11/3/2023	3,45%	0,02%	43,57%	14	3,45%	0,02%	$328.507	43,57%
15	12/3/2023	18/3/2023	3,45%	0,01%	43,58%	15	3,45%	0,01%	$164.253	43,58%
16	19/3/2023	25/3/2023	5,45%	0,11%	43,69%	16	5,45%	0,11%	$1.806.788	43,69%
17	26/3/2023	1/4/2023	3,45%	20,94%	64,63%	17	3,45%	20,94%	$343.946.690	64,63%
18	2/4/2023	8/4/2023	5,45%	7,71%	72,34%	18	5,45%	7,71%	$126.639.397	72,34%
19	9/4/2023	15/4/2023	3,45%	3,71%	76,05%	19	3,45%	3,71%	$60.938.024	76,05%
20	16/4/2023	22/4/2023	3,45%	4,16%	80,21%	20	3,45%	4,16%	$68.329.428	80,21%
21	23/4/2023	29/4/2023	5,45%	2,34%	82,55%	21	5,45%	2,34%	$38.435.303	82,55%
22	30/4/2023	6/5/2023	3,45%	0,64%	83,19%	22	3,45%	0,64%	$10.512.220	83,19%
23	7/5/2023	13/5/2023	3,45%	1,80%	84,99%	23	3,45%	1,80%	$29.565.618	84,99%
24	14/5/2023	20/5/2023	5,45%	3,03%	88,02%	24	5,45%	3,03%	$49.768.790	88,02%
25	21/5/2023	27/5/2023	3,45%	3,00%	91,02%	25	3,45%	3,00%	$49.276.030	91,02%
26	28/5/2023	3/6/2023	3,45%	0,17%	91,19%	26	3,45%	0,17%	$2.792.308	91,19%
27	4/6/2023	10/6/2023	5,45%	0,12%	91,31%	27	5,45%	0,12%	$1.971.041	91,31%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

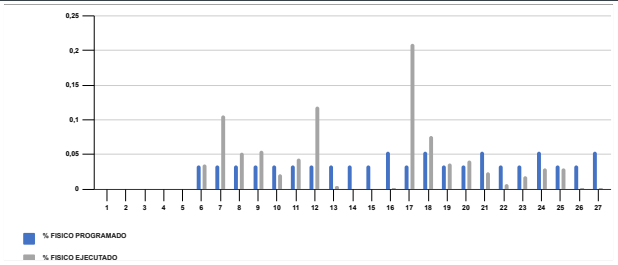

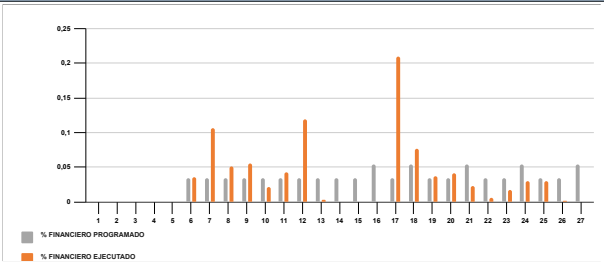

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JESUS DE NAZARETH	KR 6 #54 A - 149	2023-06-04	No se ejecutaron Actividades constructivas.	N/A
		2023-06-05	Instalación de lamina superboard del quiosco. Estuco en cielo raso en Drywall del quiosco.	N/A
		2023-06-06	Estuco en cielo raso del quiosco. Resane en area de ventanas.	N/A
		2023-06-07	Estuco en superboard de fachada del quiosco y en cielo raso en Drywall.. Resane en área de ventanas.	N/A
		2023-06-08	No se ejecutaron Actividades constructivas.	N/A
		2023-06-09	Pintura en cielo raso del quiosco.	N/A
		2023-06-10	No se ejecutaron Actividades constructivas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	983,01		983,01		$4.221	$0	983,01	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	15		15,00		$454.545	$0	15,00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	983,01		983,01		$9.648	$0	983,01	-
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	85,14		85,14		$116.390	$0	85,14	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	45,42		45,42		$252.961	$0	45,42	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	1065,5		1.065,50		$20.699	$0	1.065,50	-
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	26		26,00		$20.794	$0	26,00	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	385,57		385,57		$93.507	$0	385,57	-
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	113,215		113,21		$90.362	$0	113,21	0,00
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	638,47		638,47		$49.030	$0	638,47	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	584,21		584,21		$192.928	$0	584,21	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	117,13		117,13		$54.171	$0	117,13	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	13689,05		13.689,05		$9.568	$0	13.689,05	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	26,51		26,51		$894.392	$0	26,51	0,00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19,05		19,05		$1.742.818	$0	19,05	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	3,6		3,60		$1.894.074	$0	3,60	-
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	1015,405		1.015,40		$99.065	$0	1.015,40	0,00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	823,65		774,44		$27.186	$0	774,44	49,21
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	48,6		48,60		$48.408	$0	48,60	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	496,03		496,03		$18.074	$0	496,03	-
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	3,28		3,28		$1.933.197	$0	3,28	-
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	33,44		33,44		$1.254.738	$0	33,44	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	21,35		21,35		$813.350	$0	21,35	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	628,92		628,92		$32.154	$0	628,92	-
3.03	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO H<0.8m. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	12		12,00		$16.526	$0	12,00	-
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	14,98		14,98		$13.644	$0	14,98	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	1012,14		996,92		$100.669	$0	996,92	15,22
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	489,02		98,32		$39.705	$0	98,32	390,70
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	13575,84		13.575,84		$24.307	$0	13.575,84	-

5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	399,56		399,56		$33.985	$0	399,56	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	625,76		625,76		$138.761	$0	625,76	-
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 0,30x0,35x0,30 M PARA CUBIERTA	ML	13,87		13,87		$151.298	$0	13,87	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	822,65		822,65		$16.524	$0	822,65	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	382,75		382,75		$20.865	$0	382,75	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	397,3		397,30		$32.600	$0	397,30	-
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON VITRIFICADO DE 30X30 CMS PARA EXTERIORES	MT2	297,64		289,80		$73.815	$0	289,80	7,84
6.16	ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.20 X 0.20 METROS. INCLUYE BOQUILLA	MT2	80,305		80,30		$77.136	$0	80,30	0,00
6.22	CONSTRUCCIÓN MURO EN SUPERBOARD A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2	77,16		63,78	7,22	$93.422	$674.507	71,00	6,16
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	20		19,32	0,68	$77.644	$52.798	20,00	-
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	20		20,00		$67.320	$0	20,00	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12,00		$38.451	$0	12,00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12,00		$57.053	$0	12,00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	14		14,00		$32.669	$0	14,00	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	87,13		87,13		$323.953	$0	87,13	-
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR	M2	37,5		34,50		$891.836	$0	34,50	3,00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 4"	UND	12		8,00		$50.230	$0	8,00	4,00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	3		3,00		$1.488.291	$0	3,00	-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	3		3,00		$35.397	$0	3,00	-
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	80		80,00		$27.015	$0	80,00	-
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	60,5		60,50		$58.180	$0	60,50	-
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	4		3,00		$173.513	$0	3,00	1,00
12.01	TALA DE ARBOLES MEDIANOS INC RETIRO	UND	1		1,00		$1.556.196	$0	1,00	-
12.02	PODA DE ARBOLES MEDIANOS INC RETIRO	UND	2		1,00		$1.088.110	$0	1,00	1,00
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	355,73		355,73		$134.924	$0	355,73	-
NP 21	ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO	ML	218,8		218,80		$39.518	$0	218,80	-
NP 23	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN DRYWALL A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA INTERIOR A 3 MANOS	M2	108,51		102,16	6,35	$110.546,2	$701.968,6	108,51	0,00
							VALOR DE OBRA	$1.429.273		
							INCIDENCIA	0,09%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS		
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	EQUIPOS EN OBRA

FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JESUS DE NAZARETH	Alberto Diaz	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1QNdxV4ujbSDiH4-EbDXdsd4

FOTO 1	Instalación de cubierta en el quiosco.



https://drive.google.com/open?id=1FqKjc2D-uC19xqiN9RN8CiApG2gMe

FOTO 2	Estuco en cielo raso



https://drive.google.com/open?id=1QNdxV4ujbSDiH4-EbDXdsd4

FOTO 3	Estuco en superboard de fachada



https://drive.google.com/open?id=19FqKjc2D-uC19xqiN9RN8CiApG2gMe

FOTO 4	Estuco en superboard de fachada

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JESUS DE NAZARETH No. 28**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	11	AL	17

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	3,45%	3,52%	3,52%	6	3,45%	3,52%	$57.817.209	3,52%
7	15/1/2023	21/1/2023	3,45%	10,59%	14,11%	7	3,45%	10,59%	$173.944.386	14,11%
8	22/1/2023	28/1/2023	3,45%	5,18%	19,29%	8	3,45%	5,18%	$85.083.279	19,29%
9	29/1/2023	4/2/2023	3,45%	5,52%	24,81%	9	3,45%	5,52%	$90.667.895	24,81%
10	5/2/2023	11/2/2023	3,45%	2,12%	26,93%	10	3,45%	2,12%	$34.821.728	26,93%
11	12/2/2023	18/2/2023	3,45%	4,33%	31,26%	11	3,45%	4,33%	$71.121.737	31,26%
12	19/2/2023	25/2/2023	3,45%	11,92%	43,18%	12	3,45%	11,92%	$195.790.093	43,18%
13	26/2/2023	4/3/2023	3,45%	0,37%	43,55%	13	3,45%	0,37%	$6.077.377	43,55%
14	5/3/2023	11/3/2023	3,45%	0,02%	43,57%	14	3,45%	0,02%	$328.507	43,57%
15	12/3/2023	18/3/2023	3,45%	0,01%	43,58%	15	3,45%	0,01%	$164.253	43,58%
16	19/3/2023	25/3/2023	5,45%	0,11%	43,69%	16	5,45%	0,11%	$1.806.788	43,69%
17	26/3/2023	1/4/2023	3,45%	20,94%	64,63%	17	3,45%	20,94%	$343.946.690	64,63%
18	2/4/2023	8/4/2023	5,45%	7,71%	72,34%	18	5,45%	7,71%	$126.639.397	72,34%
19	9/4/2023	15/4/2023	3,45%	3,71%	76,05%	19	3,45%	3,71%	$60.938.024	76,05%
20	16/4/2023	22/4/2023	3,45%	4,16%	80,21%	20	3,45%	4,16%	$68.329.428	80,21%
21	23/4/2023	29/4/2023	5,45%	2,34%	82,55%	21	5,45%	2,34%	$38.435.303	82,55%
22	30/4/2023	6/5/2023	3,45%	0,64%	83,19%	22	3,45%	0,64%	$10.512.220	83,19%
23	7/5/2023	13/5/2023	3,45%	1,80%	84,99%	23	3,45%	1,80%	$29.565.618	84,99%
24	14/5/2023	20/5/2023	5,45%	3,03%	88,02%	24	5,45%	3,03%	$49.768.790	88,02%
25	21/5/2023	27/5/2023	3,45%	3,00%	91,02%	25	3,45%	3,00%	$49.276.030	91,02%
26	28/5/2023	3/6/2023	3,45%	0,17%	91,19%	26	3,45%	0,17%	$2.792.308	91,19%
27	4/6/2023	10/6/2023	5,45%	0,12%	91,31%	27	5,45%	0,12%	$1.971.041	91,31%
28	11/6/2023	17/6/2023	3,45%	0,11%	91,42%	28	3,45%	0,11%	$1.806.788	91,42%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

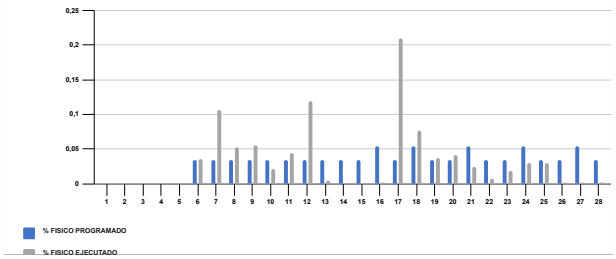

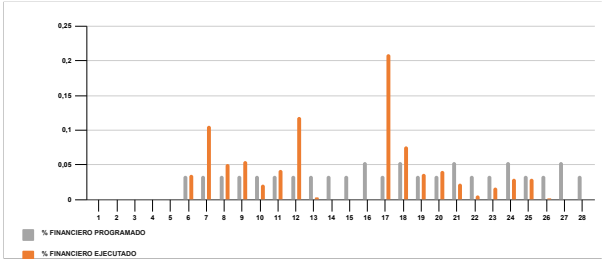

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JESUS DE NAZARETH	KR 6 #54 A - 149	2023-06-11	No se ejecutaron Actividades constructivas.	N/A
		2023-06-12	No se ejecutaron Actividades constructivas.	N/A
		2023-06-13	No se ejecutaron Actividades constructivas.	N/A
		2023-06-14	Pintura cubierta del quiosco. Granito en el empalme del tablon rojo con el piso del baño. Resanes en paredes.	N/A
		2023-06-15	se realizó instalación de piso antideslizante en baños.	N/A
		2023-06-16	Se realizó instalación de piso antideslizante en baños.	N/A
		2023-06-17	No se ejecutaron Actividades constructivas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	983,01		983,01		$4.221	$0	983,01	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	15		15,00		$454.545	$0	15,00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	983,01		983,01		$9.648	$0	983,01	-
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	85,14		85,14		$116.390	$0	85,14	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	45,42		45,42		$252.961	$0	45,42	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	1065,5		1.065,50		$20.699	$0	1.065,50	-
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	26		26,00		$20.794	$0	26,00	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	385,57		385,57		$93.507	$0	385,57	-
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	113,215		113,21		$90.362	$0	113,21	0,00
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	638,47		638,47		$49.030	$0	638,47	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	584,21		584,21		$192.928	$0	584,21	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	117,13		117,13		$54.171	$0	117,13	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	13689,05		13.689,05		$9.568	$0	13.689,05	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	26,51		26,51		$894.392	$0	26,51	0,00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19,05		19,05		$1.742.818	$0	19,05	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	3,6		3,60		$1.894.074	$0	3,60	-
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	1015,405		1.015,40		$99.065	$0	1.015,40	0,00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	823,65		774,44		$27.186	$0	774,44	49,21
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	48,6		48,60		$48.408	$0	48,60	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	496,03		496,03		$18.074	$0	496,03	-
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	3,28		3,28		$1.933.197	$0	3,28	-
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	33,44		33,44		$1.254.738	$0	33,44	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	21,35		21,35		$813.350	$0	21,35	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	628,92		628,92		$32.154	$0	628,92	-
3.03	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO H<0.8m. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	12		12,00		$16.526	$0	12,00	-
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	14,98		14,98		$13.644	$0	14,98	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	1012,14		996,92		$100.669	$0	996,92	15,22
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	489,02		98,32		$39.705	$0	98,32	390,70
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	13575,84		13.575,84		$24.307	$0	13.575,84	-

5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	399,56		399,56		$33.985	$0	399,56	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	625,76		625,76		$138.761	$0	625,76	-
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 0,30x0,35x0,30 M PARA CUBIERTA	ML	13,87		13,87		$151.298	$0	13,87	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	822,65		822,65		$16.524	$0	822,65	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	382,75		382,75		$20.865	$0	382,75	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	397,3		397,30		$32.600	$0	397,30	-
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON VITRIFICADO DE 30X30 CMS PARA EXTERIORES	MT2	297,64		289,80		$73.815	$0	289,80	7,84
6.16	ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.20 X 0.20 METROS. INCLUYE BOQUILLA	MT2	80,305		80,30		$77.136	$0	80,30	0,00
6.22	CONSTRUCCIÓN MURO EN SUPERBOARD A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2	77,16		71,00	5,16	$93.422	$482.058	76,16	1,00
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	20		20,00		$77.644	$0	20,00	-
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	20		20,00		$67.320	$0	20,00	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12,00		$38.451	$0	12,00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12,00		$57.053	$0	12,00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	14		14,00		$32.669	$0	14,00	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	87,13		87,13		$323.953	$0	87,13	-
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR	M2	37,5		34,50		$891.836	$0	34,50	3,00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 4"	UND	12		8,00		$50.230	$0	8,00	4,00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	3		3,00		$1.488.291	$0	3,00	-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	3		3,00		$35.397	$0	3,00	-
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	80		80,00		$27.015	$0	80,00	-
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	60,5		60,50		$58.180	$0	60,50	-
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	4		3,00		$173.513	$0	3,00	1,00
12.01	TALA DE ARBOLES MEDIANOS INC RETIRO	UND	1		1,00		$1.556.196	$0	1,00	-
12.02	PODA DE ARBOLES MEDIANOS INC RETIRO	UND	2		1,00		$1.088.110	$0	1,00	1,00
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	355,73		355,73		$134.924	$0	355,73	-
NP 21	ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO	ML	218,8		218,80		$39.518	$0	218,80	-
NP 23	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN DRYWALL A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA INTERIOR A 3 MANOS	M2	108,51		108,51		$110.546,2	$0,0	108,51	0,00
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES (45X45) HASTA (60X60) O SIMILAR	M2	16,81		-	16,81	$108.791,00	$1.828.776,71	16,81	-

VALOR DE OBRA	$2.310.834
INCIDENCIA	0,14%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JESUS DE NAZARETH	Alberto Diaz	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

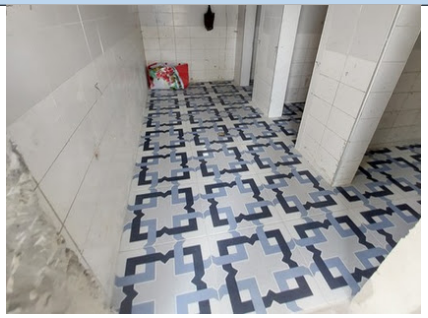

https://drive.google.com/open?id=1rkqfyVI6ICTp3fyyqVJrogrP

FOTO 1	Instalación de piso antideslizante



https://drive.google.com/open?id=1YxyfsZ1ShDCOK-GiFyJmtGwvNxb1Ez

FOTO 2	Instalación de piso antideslizante



https://drive.google.com/open?id=1Z3YzRmSY1BkvSSO7thRVY1M8

FOTO 3	Muro en superboard



https://drive.google.com/open?id=1nfi33C3GxdKHnZOPzFFrXuh-niPusc

FOTO 4	Muro en drywall.

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JESUS DE NAZARETH No. 29**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	18	AL	24

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	$0	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	3,45%	3,52%	3,52%	6	3,45%	3,52%	$57.817.209	3,52%
7	15/1/2023	21/1/2023	3,45%	10,59%	14,11%	7	3,45%	10,59%	$173.944.386	14,11%
8	22/1/2023	28/1/2023	3,45%	5,18%	19,29%	8	3,45%	5,18%	$85.083.279	19,29%
9	29/1/2023	4/2/2023	3,45%	5,52%	24,81%	9	3,45%	5,52%	$90.667.895	24,81%
10	5/2/2023	11/2/2023	3,45%	2,12%	26,93%	10	3,45%	2,12%	$34.821.728	26,93%
11	12/2/2023	18/2/2023	3,45%	4,33%	31,26%	11	3,45%	4,33%	$71.121.737	31,26%
12	19/2/2023	25/2/2023	3,45%	11,92%	43,18%	12	3,45%	11,92%	$195.790.093	43,18%
13	26/2/2023	4/3/2023	3,45%	0,37%	43,55%	13	3,45%	0,37%	$6.077.377	43,55%
14	5/3/2023	11/3/2023	3,45%	0,02%	43,57%	14	3,45%	0,02%	$328.507	43,57%
15	12/3/2023	18/3/2023	3,45%	0,01%	43,58%	15	3,45%	0,01%	$164.253	43,58%
16	19/3/2023	25/3/2023	5,45%	0,11%	43,69%	16	5,45%	0,11%	$1.806.788	43,69%
17	26/3/2023	1/4/2023	3,45%	20,94%	64,63%	17	3,45%	20,94%	$343.946.690	64,63%
18	2/4/2023	8/4/2023	5,45%	7,71%	72,34%	18	5,45%	7,71%	$126.639.397	72,34%
19	9/4/2023	15/4/2023	3,45%	3,71%	76,05%	19	3,45%	3,71%	$60.938.024	76,05%
20	16/4/2023	22/4/2023	3,45%	4,16%	80,21%	20	3,45%	4,16%	$68.329.428	80,21%
21	23/4/2023	29/4/2023	5,45%	2,34%	82,55%	21	5,45%	2,34%	$38.435.303	82,55%
22	30/4/2023	6/5/2023	3,45%	0,64%	83,19%	22	3,45%	0,64%	$10.512.220	83,19%
23	7/5/2023	13/5/2023	3,45%	1,80%	84,99%	23	3,45%	1,80%	$29.565.618	84,99%
24	14/5/2023	20/5/2023	5,45%	3,03%	88,02%	24	5,45%	3,03%	$49.768.790	88,02%
25	21/5/2023	27/5/2023	3,45%	3,00%	91,02%	25	3,45%	3,00%	$49.276.030	91,02%
26	28/5/2023	3/6/2023	3,45%	0,17%	91,19%	26	3,45%	0,17%	$2.792.308	91,19%
27	4/6/2023	10/6/2023	5,45%	0,12%	91,31%	27	5,45%	0,12%	$1.971.041	91,31%
28	11/6/2023	17/6/2023	3,45%	0,11%	91,42%	28	3,45%	0,11%	$1.806.788	91,42%
29	18/6/2023	24/6/2023	3,45%	0,41%	91,84%	29	3,45%	0,41%	$6.734.391	91,84%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

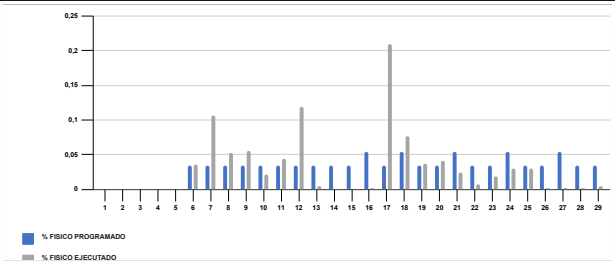

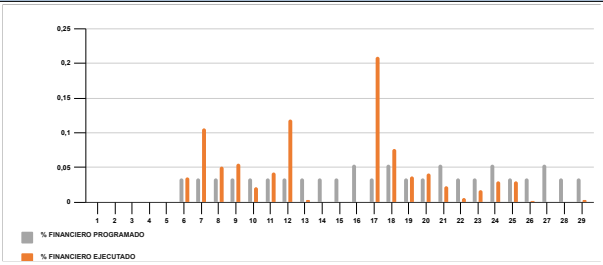

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JESUS DE NAZARETH	KR 6 #54 A - 149	2023-06-18	No se ejecutaron Actividades constructivas.	N/A
		2023-06-19	No se ejecutaron Actividades constructivas.	N/A
		2023-06-20	Instalación de puerta de acero del colegio.	N/A
		2023-06-21	Resanes de muros. Pañete allanado, así como filos y cortes de pañete en muro bajo de cancha.	N/A
		2023-06-22	dovelas en Levante de muro bajo. Limpieza de salones. se realizó instalación de wind en aluminio.	N/A
		2023-06-23	Pañete allanado en muro bajo de chanchas. Desbaste de baldosa en aulas. se realizó poda de árbol exterior.	N/A
		2023-06-24	No se ejecutaron Actividades constructivas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	983,01		983,01		$4.221	$0	983,01	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	15		15,00		$454.545	$0	15,00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	983,01		983,01		$9.648	$0	983,01	-
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	85,14		85,14		$116.390	$0	85,14	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	45,42		45,42		$252.961	$0	45,42	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	1065,5		1.065,50		$20.699	$0	1.065,50	-
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	26		26,00		$20.794	$0	26,00	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	385,57		385,57		$93.507	$0	385,57	-
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	113,215		113,21		$90.362	$0	113,21	0,00
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	638,47		638,47		$49.030	$0	638,47	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	584,21		584,21		$192.928	$0	584,21	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	117,13		117,13		$54.171	$0	117,13	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	13689,05		13.689,05		$9.568	$0	13.689,05	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	26,51		26,51		$894.392	$0	26,51	0,00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19,05		19,05		$1.742.818	$0	19,05	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	3,6		3,60		$1.894.074	$0	3,60	-
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	1015,405		1.015,40		$99.065	$0	1.015,40	0,00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	823,65		774,44	49,21	$27.186	$1.337.823	823,65	-
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	48,6		48,60		$48.408	$0	48,60	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	496,03		496,03		$18.074	$0	496,03	-
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	3,28		3,28		$1.933.197	$0	3,28	-
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	33,44		33,44		$1.254.738	$0	33,44	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	21,35		21,35		$813.350	$0	21,35	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	628,92		628,92		$32.154	$0	628,92	-
3.03	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO H<0.8m. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	12		12,00		$16.526	$0	12,00	-
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	14,98		14,98		$13.644	$0	14,98	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	1012,14		996,92		$100.669	$0	996,92	15,22
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	489,02		98,32	79,12	$39.705	$3.141.460	177,44	311,58
3.12	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	82,2405		-	54,82	$15.618	$856.179	54,82	27,42

4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	13575,84		13.575,84		$24.307	$0	13.575,84	-
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	399,56		399,56		$33.985	$0	399,56	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	625,76		625,76		$138.761	$0	625,76	-
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 0,30x0,35x0,30 M PARA CUBIERTA	ML	13,87		13,87		$151.298	$0	13,87	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	822,65		822,65		$16.524	$0	822,65	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	382,75		382,75		$20.865	$0	382,75	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	397,3		397,30		$32.600	$0	397,30	-
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON VITRIFICADO DE 30X30 CMS PARA EXTERIORES	MT2	297,64		289,80		$73.815	$0	289,80	7,84
6.16	ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.20 X 0.20 METROS. INCLUYE BOQUILLA	MT2	80,305		80,30		$77.136	$0	80,30	0,00
6.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIND DE ALUMINIO NATURAL ACOLILLADA SOBRE MURO	ML	2,34		-	2,34	$12.513	$29.280	2,34	-
6.22	CONSTRUCCIÓN MURO EN SUPERBOARD A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2	77,16		76,16		$93.422	$0	76,16	1,00
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	20		20,00		$77.644	$0	20,00	-
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	20		20,00		$67.320	$0	20,00	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12,00		$38.451	$0	12,00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12,00		$57.053	$0	12,00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	14		14,00		$32.669	$0	14,00	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	87,13		87,13		$323.953	$0	87,13	-
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR	M2	37,5		34,50		$891.836	$0	34,50	3,00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 4"	UND	12		8,00		$50.230	$0	8,00	4,00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	3		3,00		$1.488.291	$0	3,00	-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	3		3,00		$35.397	$0	3,00	-
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	80		80,00		$27.015	$0	80,00	-
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	60,5		60,50		$58.180	$0	60,50	-
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	4		3,00		$173.513	$0	3,00	1,00
12.01	TALA DE ARBOLES MEDIANOS INC RETIRO	UND	1		1,00		$1.556.196	$0	1,00	-
12.02	PODA DE ARBOLES MEDIANOS INC RETIRO	UND	2		1,00	1,00	$1.088.110	$1.088.110	2,00	-
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	355,73		355,73		$134.924	$0	355,73	-
NP 21	ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO	ML	218,8		218,80		$39.518	$0	218,80	-

NP 23	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN DRYWALL A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA INTERIOR A 3 MANOS	M2	108,51		108,51		$110.546,2	$0,0	108,51	0,00
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES (45X45) HASTA (60X60) O SIMILAR	M2	16,81		16,81		$108.791,00	$0,00	16,81	-

VALOR DE OBRA	$6.452.852
INCIDENCIA	0,39%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JESUS DE NAZARETH	Alberto Diaz	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=18AR1oNcVczjqsOkniwFqtumW

FOTO 1	Pañete allanado en muro.



https://drive.google.com/open?id=14hqPNYvD6K5fqDTpQfM_E-g-KqwG30

FOTO 2	Filos de muros.



https://drive.google.com/open?id=1IMhtmfMY4SEDDg_pokrPqW

FOTO 3	Instalación de Wind en aluminio.



https://drive.google.com/open?id=1qTTRHEcMTIaTBPAAPHmAIC_0NUJ0

FOTO 4	Limpieza general.

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JOSE EUSEBIO CARO

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 26**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	28	AL	3

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.63%	0.00%	0.00%	8	2.63%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.63%	0.34%	0.34%	9	2.63%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.63%	0.93%	1.27%	10	2.63%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.63%	1.27%	2.54%	11	2.63%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.63%	0.49%	3.03%	12	2.63%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	13	2.63%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	14	2.63%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	15	2.63%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	16	2.63%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	17	2.63%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	18	2.63%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	19	2.63%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.63%	1.42%	4.45%	20	2.63%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.63%	1.16%	5.61%	21	2.63%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.63%	0.41%	6.02%	22	2.63%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.63%	0.06%	6.08%	23	2.63%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.63%	0.03%	6.11%	24	2.63%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.63%	0.08%	6.19%	25	2.63%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.63%	0.01%	6.19%	26	2.63%	0.01%	$67,212	6.19%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

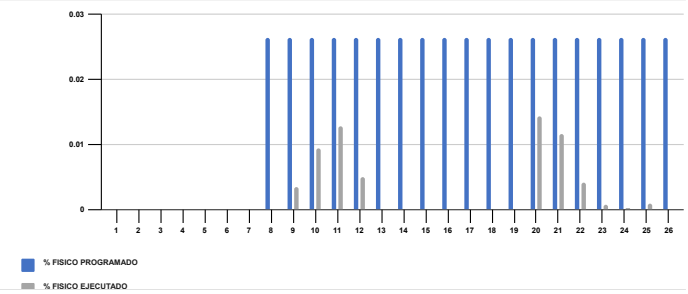

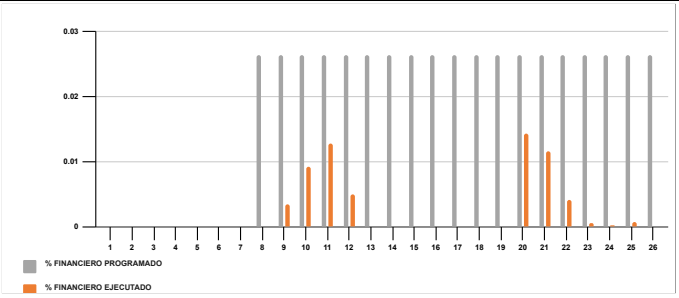

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
		2023-05-28	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-05-29	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A

JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-05-30	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-05-31	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-06-01	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-06-02	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-06-03	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	875.15		583.06	0.00	$4,221	$0	583.06	292.09
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	942.32		634.72	0.00	$9,648	$0	634.72	307.60
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	41.1205		41.12	0.00	$23,673	$0	41.12	0.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	93.66		76.50	0.00	$140,481	$0	76.50	17.16
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	215.15		96.60	0.00	$20,699	$0	96.60	118.55
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	111.28		9.23	0.00	$266,275	-	9.23	102.05
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		56.50	0.00	$25,547	$0	56.50	129.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		30.19	0.00	$16,513	$0	30.19	621.31
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		43.22	0.00	$93,507	$0	43.22	112.58
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	74.15		2.56	0.00	$3,219,697	-	2.56	71.59
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	280		140.00	0.00	$14,939	$0	140.00	140.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740.25		545.17	0.00	$34,014	$0	545.17	195.08
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	7.21		7.21		$133,816	-	7.21	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	530.72		530.72	0.00	$20,865	$0	530.72	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		32.02	0.00	$17,948	$0	32.02	584.58
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	132.02		32.02	0.00	$20,720	$0	32.02	100.00
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	1		1.00	0.00	$38,451	-	1.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	4		4.00	0.00	$57,053	-	4.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	5		5.00	0.00	$32,669	-	5.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	85		65.00	0.00	$19,629	$0	65.00	20.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	22		22.00	0.00	$16,601	$0	22.00	-

9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		4.00	0.00	$19,709	$0	4.00	-

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
JOSE EUSEBIO CARO				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

No se ejecutaron actividades constructivas

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 27**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	4	AL	10

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.63%	0.00%	0.00%	8	2.63%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.63%	0.34%	0.34%	9	2.63%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.63%	0.93%	1.27%	10	2.63%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.63%	1.27%	2.54%	11	2.63%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.63%	0.49%	3.03%	12	2.63%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	13	2.63%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	14	2.63%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	15	2.63%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	16	2.63%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	17	2.63%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	18	2.63%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	19	2.63%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.63%	1.42%	4.45%	20	2.63%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.63%	1.16%	5.61%	21	2.63%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.63%	0.41%	6.02%	22	2.63%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.63%	0.06%	6.08%	23	2.63%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.63%	0.03%	6.11%	24	2.63%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.63%	0.08%	6.19%	25	2.63%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.63%	0.01%	6.19%	26	2.63%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.63%	0.05%	6.24%	27	2.63%	0.05%	$549,462	6.24%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-06-04	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-06-05	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-06-06	Desmonte de cubieta, Apuntalamiento de losa, Escarificación de columnas.	N/A
		2023-06-07	Escarificación de columnas. Limpieza de material RCD.	N/A
		2023-06-08	Escarificación de columnas. Limpieza de material RCD.	N/A
		2023-06-09	Escarificación de columnas.	N/A
		2023-06-10	Escarificación de columnas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**875.15**		**583.06**	**0.00**	**$4,221**	**$0**	**583.06**	**292.09**

1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	942.32		634.72	0.00	$9,648	$0	634.72	307.60
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	41.1205		41.12	0.00	$23,673	$0	41.12	0.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	93.66		76.50	0.00	$140,481	$0	76.50	17.16
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	215.15		96.60	0.00	$20,699	$0	96.60	118.55
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		56.50	18.00	$25,547	$459,846	74.50	111.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		30.19	0.00	$16,513	$0	30.19	621.31
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		43.22	0.00	$93,507	$0	43.22	112.58
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	280		140.00	0.00	$14,939	$0	140.00	140.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740.25		545.17	0.00	$34,014	$0	545.17	195.08
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	530.72		530.72	0.00	$20,865	$0	530.72	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		32.02	0.00	$17,948	$0	32.02	584.58
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	132.02		32.02	0.00	$20,720	$0	32.02	100.00
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	85		65.00	0.00	$19,629	$0	65.00	20.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	22		22.00	0.00	$16,601	$0	22.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		4.00	0.00	$19,709.00	$0.00	4.00	-
								VALOR DE OBRA	$549,462	
								INCIDENCIA	0.05%	

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
JOSE EUSEBIO CARO				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Apuntalamiento de losa, Escarificación de columnas. JOSE EUSEBIO CARO



FOTO 2	Apuntalamiento de losa, Escarificación de columnas. JOSE EUSEBIO CARO



FOTO 3	Apuntalamiento de losa, Escarificación de columnas. JOSE EUSEBIO CARO



FOTO 4	Apuntalamiento de losa, Escarificación de columnas. JOSE EUSEBIO CARO

			
FOTO 5	Apuntalamiento de losa, Excarificación de columnas. JOSE EUSEBIO CARO	FOTO 6	Apuntalamiento de losa, Excarificación de columnas. JOSE EUSEBIO CARO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 28**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	11	AL	17

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.63%	0.00%	0.00%	8	2.63%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.63%	0.34%	0.34%	9	2.63%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.63%	0.93%	1.27%	10	2.63%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.63%	1.27%	2.54%	11	2.63%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.63%	0.49%	3.03%	12	2.63%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	13	2.63%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	14	2.63%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	15	2.63%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	16	2.63%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	17	2.63%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	18	2.63%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	19	2.63%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.63%	1.42%	4.45%	20	2.63%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.63%	1.16%	5.61%	21	2.63%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.63%	0.41%	6.02%	22	2.63%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.63%	0.06%	6.08%	23	2.63%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.63%	0.03%	6.11%	24	2.63%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.63%	0.08%	6.19%	25	2.63%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.63%	0.01%	6.19%	26	2.63%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.63%	0.05%	6.24%	27	2.63%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.63%	0.34%	6.57%	28	2.63%	0.34%	$4,080,259	6.57%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

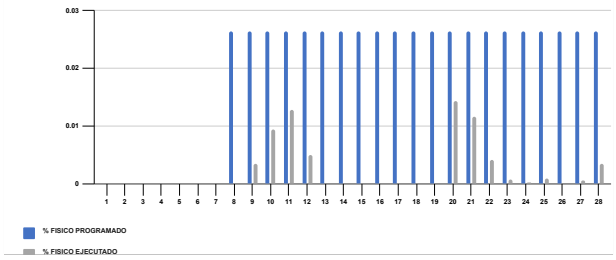

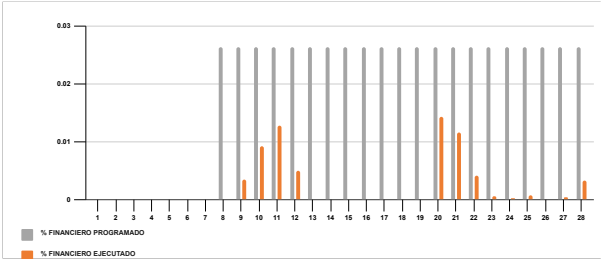

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-06-11	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-06-12	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-06-13	Escarificación de columnas.	N/A
		2023-06-14	Escarificación de columnas.	N/A
		2023-06-15	Escarificación de columnas.	N/A
		2023-06-16	Escarificación de columnas.	N/A
		2023-06-17	Escarificación de columnas. Se realizó vaciado de concreto para columnas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	875.15		583.06	0.00	$4,221	$0	583.06	292.09
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	942.32		634.72	0.00	$9,648	$0	634.72	307.60
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	41.1205		41.12	0.00	$23,673	$0	41.12	0.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	93.66		76.50	0.00	$140,481	$0	76.50	17.16
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	215.15		96.60	0.00	$20,699	$0	96.60	118.55
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	111.28		9.23	0.00	$266,275	$0	9.23	102.05
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		74.50	11.00	$25,547	$281,017	85.50	100.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		30.19	0.00	$16,513	$0	30.19	621.31
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		43.22	0.00	$93,507	$0	43.22	112.58
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	74.15		2.56	1.18	$3,219,697	$3,799,242	3.74	70.41
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	280		140.00	0.00	$14,939	$0	140.00	140.00
5.04	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	7		7.00		$22,404	$0	7.00	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740.25		545.17	0.00	$34,014	$0	545.17	195.08
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	7.21		7.21		$133,816	$0	7.21	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	530.72		530.72	0.00	$20,865	$0	530.72	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		32.02	0.00	$17,948	$0	32.02	584.58
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	132.02		32.02	0.00	$20,720	$0	32.02	100.00
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	1		1.00	0.00	$38,451	$0	1.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	4		4.00	0.00	$57,053	$0	4.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	5		5.00	0.00	$32,669	$0	5.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	85		65.00	0.00	$19,629	$0	65.00	20.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	22		22.00	0.00	$16,601	$0	22.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		4.00	0.00	$19,709	$0	4.00	-
							VALOR DE OBRA	$4,080,259		
							INCIDENCIA	0.34%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA

JOSE EUSEBIO CARO				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

			
FOTO 1	Escarificación de columnas. JOSE EUSEBIO CARO	FOTO 2	Escarificación de columnas. JOSE EUSEBIO CARO
			
FOTO 3	Escarificación de columnas. JOSE EUSEBIO CARO	FOTO 4	Escarificación de columnas. JOSE EUSEBIO CARO
			
FOTO 5	Ampliación de excavación de zapatas JOSE EUSEBIO CARO	FOTO 6	Ampliación de excavación de zapatas JOSE EUSEBIO CARO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 29**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	18	AL	24

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.63%	0.00%	0.00%	8	2.63%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.63%	0.34%	0.34%	9	2.63%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.63%	0.93%	1.27%	10	2.63%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.63%	1.27%	2.54%	11	2.63%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.63%	0.49%	3.03%	12	2.63%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	13	2.63%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	14	2.63%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	15	2.63%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	16	2.63%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	17	2.63%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	18	2.63%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	19	2.63%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.63%	1.42%	4.45%	20	2.63%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.63%	1.16%	5.61%	21	2.63%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.63%	0.41%	6.02%	22	2.63%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.63%	0.06%	6.08%	23	2.63%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.63%	0.03%	6.11%	24	2.63%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.63%	0.08%	6.19%	25	2.63%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.63%	0.01%	6.19%	26	2.63%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.63%	0.05%	6.24%	27	2.63%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.63%	0.34%	6.57%	28	2.63%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.63%	0.40%	6.98%	29	2.63%	0.40%	$4,913,054	6.98%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

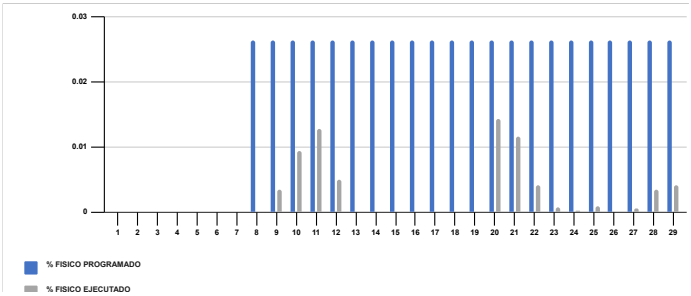

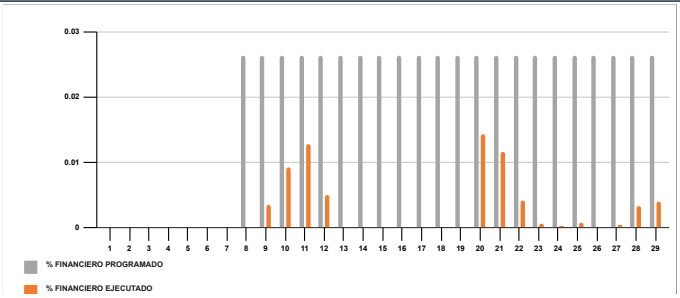

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-06-18	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-06-19	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-06-20	Se contiuó con el armado de formaleta para columnas.	N/A
		2023-06-21	Se contiuó con el armado de formaleta para columnas.	N/A
		2023-06-22	Se contiuó con el armado de formaleta para columnas.	N/A
		2023-06-23	Se contiuó con el armado de formaleta para columnas.	N/A
		2023-06-24	Se realizó el vaciado de concreto para columnas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	875.15		583.06	0.00	$4,221	$0	583.06	292.09
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	942.32		634.72	0.00	$9,648	$0	634.72	307.60
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	41.1205		41.12	0.00	$23,673	$0	41.12	0.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	93.66		76.50	0.00	$140,481	$0	76.50	17.16
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	215.15		96.60	0.00	$20,699	$0	96.60	118.55
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	111.28		9.23	0.00	$266,275	$0	9.23	102.05
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		85.50	0.00	$25,547	$0	85.50	100.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		30.19	0.00	$16,513	$0	30.19	621.31
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		43.22	0.00	$93,507	$0	43.22	112.58
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	74.15		3.74	1.38	$3,219,697	$4,443,182	5.12	69.03
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	280		140.00	0.00	$14,939	$0	140.00	140.00
5.04	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	7		7.00	0.00	$22,404	$0	7.00	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740.25		545.17	0.00	$34,014	$0	545.17	195.08
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	7.21		7.21	0.00	$133,816	$0	7.21	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	530.72		530.72	0.00	$20,865	$0	530.72	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		32.02	0.00	$17,948	$0	32.02	584.58
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	132.02		32.02	0.00	$20,720	$0	32.02	100.00
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	1		1.00	0.00	$38,451	$0	1.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	4		4.00	0.00	$57,053	$0	4.00	-

7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	5		5.00	0.00	$32,669	$0	5.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	85		65.00	0.00	$15,629	$0	65.00	20.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	22		22.00	0.00	$16,601	$0	22.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		4.00	0.00	$15,709	$0	4.00	-
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	16		-	16.00	$29,367	$469,872	16.00	-
							VALOR DE OBRA	$4,913,054		
							INCIDENCIA	0.40%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
JOSE EUSEBIO CARO				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Ampliación de excavación de zapatas. JOSE EUSEBIO CARO



FOTO 2	Ampliación de excavación de zapatas. JOSE EUSEBIO CARO



FOTO 3	Figuración de acero. JOSE EUSEBIO CARO



FOTO 4	Demolición de muro JOSE EUSEBIO CARO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MAYOR DE BARRANQUILLA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 26**	**Código:** IP-FM-31 **VERSION:** 01 **FECHA:** 6/9/2021 **Paginas:** 1 de 1

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	28	AL	3

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	4.17%	0.12%	0.12%	11	4.17%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.17%	0.79%	0.90%	12	4.17%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	4.17%	0.82%	1.72%	13	4.17%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	4.17%	0.78%	2.50%	14	4.17%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	4.17%	0.78%	3.27%	15	4.17%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	4.17%	0.39%	3.66%	16	4.17%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	4.17%	0.39%	4.05%	17	4.17%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	4.17%	0.00%	4.05%	18	4.17%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.17%	0.61%	4.66%	19	4.17%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	4.17%	0.81%	5.47%	20	4.17%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	4.17%	0.38%	5.85%	21	4.17%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	4.17%	0.83%	6.68%	22	4.17%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	4.17%	0.31%	6.99%	23	4.17%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.17%	0.75%	7.74%	24	4.17%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	4.17%	1.20%	8.94%	25	4.17%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	4.17%	0.79%	9.73%	26	4.17%	0.79%	$28,760,680	9.73%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

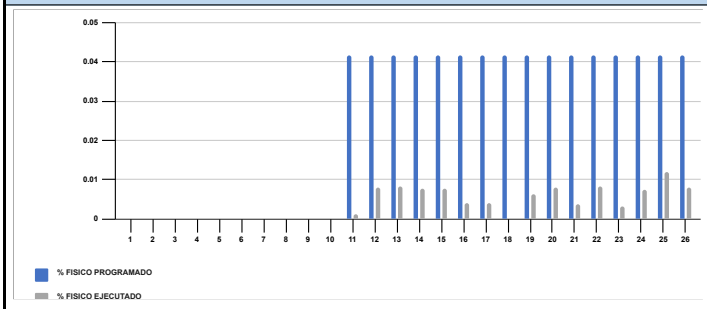

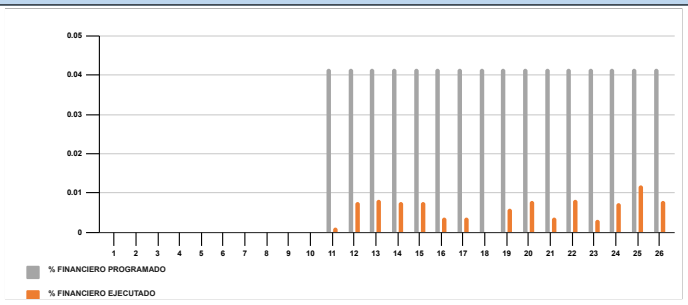

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
		2023-05-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	2023-05-29	Bloque 1 :Figuración de acero. Bloque 2 : Demolición de muros. Figuración de acero. Bloque 3: Encofrado de columnas.	N/A
		2023-05-30	Bloque 1 : Encofrado de columnas. Bloque 2 : Demolición de muros. Figuración de acero. Encofrado de columnetas. Bloque 3: Encofrado de columnas. Figuración de acero.	N/A
		2023-05-31	Bloque 1 :Figuración de acero. Encofrado de columnas. Bloque 2 : Demolición de muros. Figuración de acero. Encofrado de columnas. Bloque 3: Encofrado de columnas. Figuración de acero	N/A
		2023-06-01	Bloque 1 :Figuración de acero. Encofrado de columnas. Bloque 2 : Encofrado de columnetas.	N/A
		2023-06-02	Bloque 1 :Encofrado y fundida de columnas. Bloque 2 : Fundida de columnetas.	N/A
		2023-06-03	Bloque 1 :Encofrado de columnas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**2717.92**		**2,717.92**		**$4,221**	**$0**	**2,717.92**	**-**
2.01	**DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.**	M3	**3.15**		**0.74**		**$252,961**	**$0**	**0.74**	**2.41**
2.02	**DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m**	MT2	**586**		**87.60**		**$20,699**	**$0**	**87.60**	**498.40**
2.05	**DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	M3	**22.5354**		**3.24**		**$266,275**	**$0**	**3.24**	**19.30**
2.06	**ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M**	M2	**1449.1**		**161.28**		**$32,124**	**$0**	**161.28**	**1,287.82**
2.09	**EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA**	MT3	**220**		**96.19**		**$93,507**	**$0**	**96.19**	**123.81**
2.15	**ACERO DE REFUERZO FIGURADO**	KGS	**45405.50004**		**8,666.57**	**1,098.18**	**$9,568**	**$10,507,386**	**9,764.75**	**35,640.75**
2.16	**ANCLAJE EPOXICO**	UND	**2512**		**1,214.80**	**180.00**	**$40,436**	**$7,278,480**	**1,394.80**	**1,117.20**
2.18	**COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**139.69**		**38.29**	**5.68**	**$1,742,818**	**$9,899,206**	**43.97**	**95.72**
2.28	**CORTE DE LOSA EN CONCRETO**	ML	**306.6**		**150.00**		**$18,074**	**$0**	**150.00**	**156.60**
3.01	**CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	ML	**1736**		**892.80**	**72.00**	**$14,939**	**$1,075,608**	**964.80**	**771.20**
3.02	**DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL**	MT2	**845.24**		**336.14**		**$32,154**	**$0**	**336.14**	**509.10**
5.02	**DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL**	MT2	**1254.6**		**668.13**		**$33,985**	**$0**	**668.13**	**586.47**
5.03	**DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL**	MT2	**570.6**		**495.11**		**$39,196**	**$0**	**495.11**	**75.49**
6.04	**DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	MT2	**1140**		**1,108.87**		**$20,865**	**$0**	**1,108.87**	**31.13**
8.01	**DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL**	UND	**12**		**12.00**		**$32,643**	**$0**	**12.00**	**-**
9.01	**DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS**	UND	**105**		**20.00**		**$19,629**	**$0**	**20.00**	**85.00**
							VALOR DE OBRA	**$28,760,680**		
							INCIDENCIA	**0.79%**		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	**INTERVENTORIA**	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
MAYOR DE BARRANQUILLA	**Anderson Saavedra**	**Angelo Sanchez**	**Herramientas menores, Andamios**	**NO APLICA**
				NO APLICA

				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

			
FOTO 1	Acero de refuerzo figurado MAYOR DE BARRANQUILLA	**FOTO 2**	Encofrado de Columnas MAYOR DE BARRANQUILLA
			
FOTO 3	Figurado de acero. MAYOR DE BARRANQUILLA	**FOTO 4**	Corte de losa MAYOR DE BARRANQUILLA
			
FOTO 5	Armado de acero para encofrar. MAYOR DE BARRANQUILLA	**FOTO 6**	Encofrado de columnas MAYOR DE BARRANQUILLA
			
FOTO 7	Figurado de acero. MAYOR DE BARRANQUILLA	**FOTO 8**	Excavacion para zapatas. MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 27**	**Código:** IP-FM-31 **VERSION:** 01 **FECHA:** 6/9/2021 **Paginas:** 1 de 1

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	4	AL	10

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	4.17%	0.12%	0.12%	11	4.17%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.17%	0.79%	0.90%	12	4.17%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	4.17%	0.82%	1.72%	13	4.17%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	4.17%	0.78%	2.50%	14	4.17%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	4.17%	0.78%	3.27%	15	4.17%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	4.17%	0.39%	3.66%	16	4.17%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	4.17%	0.39%	4.05%	17	4.17%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	4.17%	0.00%	4.05%	18	4.17%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.17%	0.61%	4.66%	19	4.17%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	4.17%	0.81%	5.47%	20	4.17%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	4.17%	0.38%	5.85%	21	4.17%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	4.17%	0.83%	6.68%	22	4.17%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	4.17%	0.31%	6.99%	23	4.17%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.17%	0.75%	7.74%	24	4.17%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	4.17%	1.20%	8.94%	25	4.17%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	4.17%	0.79%	9.73%	26	4.17%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	4.17%	0.80%	10.53%	27	4.17%	0.80%	$29,144,889	10.53%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

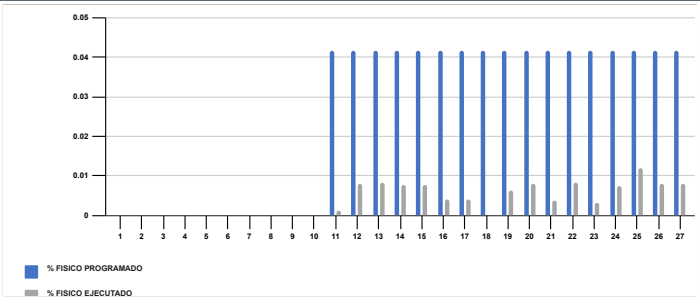

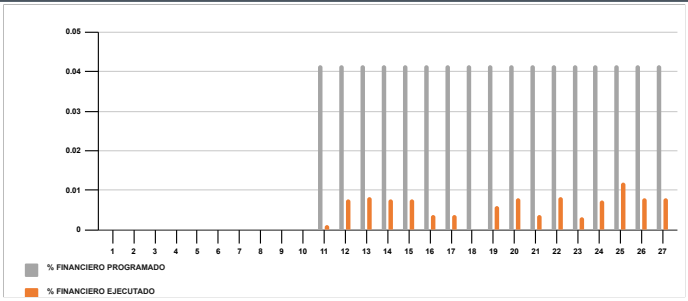

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES

MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	2023-06-04	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-05	Bloque 1 :Encofrado de columnas. Escarificación de columnas. Figuración de acero.	N/A
		2023-06-06	Bloque 1 :Encofrado de columnas. Escarificación de columnas. Figuración de acero.	N/A
		2023-06-07	Bloque 1 :Fundida de columnas. Escarificación de columnas. Figuración de acero.	N/A
		2023-06-08	Bloque 1 :Escarificación de columnas. Figuración de acero.	N/A
		2023-06-09	Bloque 1 :Escarificación de columnas. Figuración de acero.	N/A
		2023-06-10	Bloque 1 :Fundida de 6 columnas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2717.92		2,717.92		$4,221	$0	2,717.92	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.74		$252,961	$0	0.74	2.41
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		87.60		$20,699	$0	87.60	498.40
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		3.24		$266,275	$0	3.24	19.30
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		161.28	21.94	$32,124	$704,801	183.22	1,265.88
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	220		96.19		$93,507	$0	96.19	123.81
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		9,764.75	1,188.74	$9,568	$11,373,864	10,953.49	34,452.01
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	2512		1,394.80	210.00	$40,436	$8,491,560	1,604.80	907.20
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		43.97	4.92	$1,742,818	$8,574,665	48.89	90.80
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	306.6		150.00		$18,074	$0	150.00	156.60
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		964.80		$14,939	$0	964.80	771.20
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	845.24		336.14		$32,154	$0	336.14	509.10
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		668.13		$33,985	$0	668.13	586.47
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		495.11		$39,196	$0	495.11	75.49
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1140		1,108.87		$20,865	$0	1,108.87	31.13
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		20.00		$19,629	$0	20.00	85.00
							VALOR DE OBRA	$29,144,889		
							INCIDENCIA	0.801%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA

				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1dlPzluTTlHO3fMRneDloTnaX7AId7i

FOTO 1	Escarificación de elementos estructurales MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1BTTZ3kEaSJybcl_l4mTRIADvK7i4WS1o

FOTO 2	Encofrado de columna MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1M_ZyB2MiaxJRoeB37twt4KVk4Le9

FOTO 3	Figurado de acero. MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1x2YTZmBT15yBqIbq_ZKpNS7ehl8EjZ40

FOTO 4	Columnas en concreto. MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1deA90cZaw3Souh3B90GVjKGl-sXq

FOTO 5	Excavación para zapatas. MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1EwDxH6MiztLnfseATQOD1aPVP1WPkMu

FOTO 6	Fundida de columnas MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1dfFsNyt1JxqqahthJxov_OeMXvyzLI

FOTO 7	Encofrado de Columnas MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1aecQwZbAMlBwZKOLxKNlBzCyOFVkBQ6

FOTO 8	Escarificación de elementos estructurales MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 28**	**Código:** IP-FM-31 **VERSION:** 01 **FECHA:** 6/9/2021 **Paginas:** 1 de 1

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	11	AL	17

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	4.17%	0.12%	0.12%	11	4.17%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.17%	0.79%	0.90%	12	4.17%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	4.17%	0.82%	1.72%	13	4.17%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	4.17%	0.78%	2.50%	14	4.17%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	4.17%	0.78%	3.27%	15	4.17%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	4.17%	0.39%	3.66%	16	4.17%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	4.17%	0.39%	4.05%	17	4.17%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	4.17%	0.00%	4.05%	18	4.17%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.17%	0.61%	4.66%	19	4.17%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	4.17%	0.81%	5.47%	20	4.17%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	4.17%	0.38%	5.85%	21	4.17%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	4.17%	0.83%	6.68%	22	4.17%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	4.17%	0.31%	6.99%	23	4.17%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.17%	0.75%	7.74%	24	4.17%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	4.17%	1.20%	8.94%	25	4.17%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	4.17%	0.79%	9.73%	26	4.17%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	4.17%	0.80%	10.53%	27	4.17%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	4.17%	0.45%	10.98%	28	4.17%	0.45%	$16,560,783	10.98%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

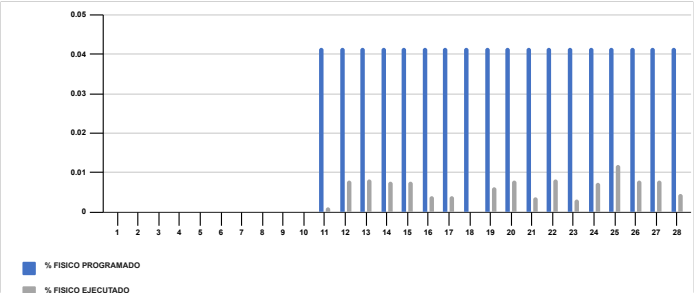

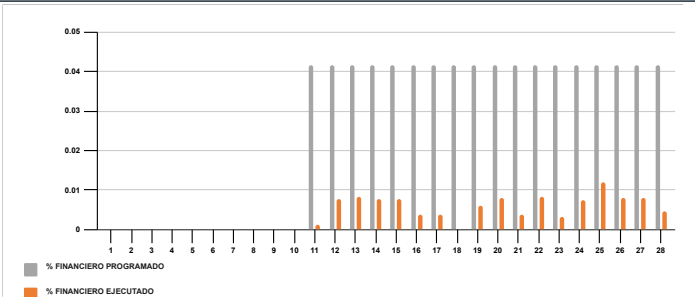

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	2023-06-11	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-12	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-13	Bloque 1 :Escarificación de columnas. Figuración de acero.	N/A
		2023-06-14	Bloque 1 :Escarificación de columnas. Armado de acero.	N/A
		2023-06-15	Bloque 1 :Escarificación de columnas. Armado de acero. Fundida de columnas.	N/A
		2023-06-16	Bloque 1 :Escarificación de columnas. Armado de acero. Desencofrado. de columnas.	N/A
		2023-06-17	Bloque 1 :Escarificación de columnas. Armado de acero. Desencofrado. de columnas.	N/A



4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2717.92		2,717.92	0.00	$4,221	$0	2,717.92	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.74	0.00	$252,961	$0	0.74	2.41
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		87.60	0.00	$20,699	$0	87.60	498.40
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		3.24	0.00	$266,275	$0	3.24	19.30
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		183.22	27.39	$32,124	$879,876	210.61	1,238.49
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	220		96.19	0.00	$93,507	$0	96.19	123.81
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		10,953.49	878.18	$9,568	$8,402,426	11,831.67	33,573.83
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	2512		1,604.80	180.00	$40,436	$7,278,480	1,784.80	727.20
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		48.89	0.00	$1,742,818	$0	48.89	90.80
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	306.6		150.00	0.00	$18,074	$0	150.00	156.60
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		964.80	0.00	$14,939	$0	964.80	771.20
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	845.24		336.14	0.00	$32,154	$0	336.14	509.10
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		668.13	0.00	$33,985	$0	668.13	586.47
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		495.11	0.00	$39,196	$0	495.11	75.49
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1140		1,108.87	0.00	$20,865	$0	1,108.87	31.13
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00	0.00	$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		20.00	0.00	$19,629	$0	20.00	85.00
							VALOR DE OBRA	$16,560,783		
							INCIDENCIA	0.45%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA

				NO APLICA

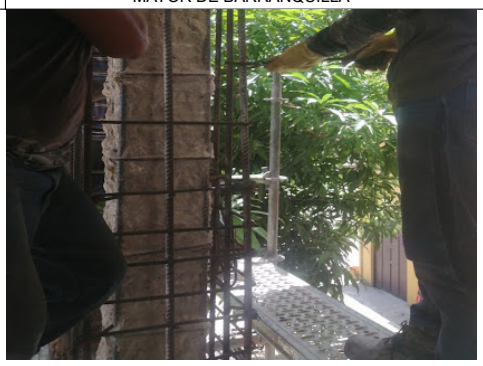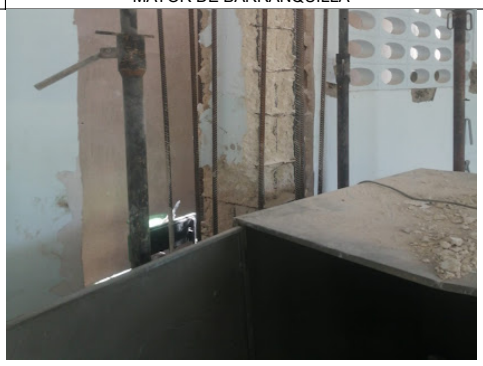6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO			
			
FOTO 1	Figurado de acero. MAYOR DE BARRANQUILLA	**FOTO 2**	Encofrado de columna MAYOR DE BARRANQUILLA
			
FOTO 3	Escarificación de elementos estructurales MAYOR DE BARRANQUILLA	**FOTO 4**	Escarificación de elementos estructurales MAYOR DE BARRANQUILLA
			
FOTO 5	Armado de acero para encofrar. MAYOR DE BARRANQUILLA	**FOTO 6**	Escarificación de elementos estructurales MAYOR DE BARRANQUILLA
			
FOTO 7	Escarificación de elementos estructurales MAYOR DE BARRANQUILLA	**FOTO 8**	Armado de acero. MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 29**	**Código:**	**IP-FM-31**
			VERSION:	**01**
			FECHA:	**6/9/2021**
			Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**	
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	18	AL	24	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO

VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	4.17%	0.12%	0.12%	11	4.17%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.17%	0.79%	0.90%	12	4.17%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	4.17%	0.82%	1.72%	13	4.17%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	4.17%	0.78%	2.50%	14	4.17%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	4.17%	0.78%	3.27%	15	4.17%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	4.17%	0.39%	3.66%	16	4.17%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	4.17%	0.39%	4.05%	17	4.17%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	4.17%	0.00%	4.05%	18	4.17%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.17%	0.61%	4.66%	19	4.17%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	4.17%	0.81%	5.47%	20	4.17%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	4.17%	0.38%	5.85%	21	4.17%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	4.17%	0.83%	6.68%	22	4.17%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	4.17%	0.31%	6.99%	23	4.17%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.17%	0.75%	7.74%	24	4.17%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	4.17%	1.20%	8.94%	25	4.17%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	4.17%	0.79%	9.73%	26	4.17%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	4.17%	0.80%	10.53%	27	4.17%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	4.17%	0.45%	10.98%	28	4.17%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	4.17%	0.53%	11.52%	29	4.17%	0.53%	$19,388,185	11.52%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO



3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	2023-06-18	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-19	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-20	Bloque 1 :Figuración de acero.	N/A
		2023-06-21	Excavación de zapatas, escarificación de columnas. Figuración de acero. Demolición de zapatas.	N/A
		2023-06-22	Excavación de zapatas. Figuración de acero. Demolición de muro.	N/A
		2023-06-23	Excavación de zapatas. Figuración de acero. se realizó el vaciado de la placa de contrapiso reforzado con la malla electrosoldada	N/A
		2023-06-24	Bloque 1: Excavación de zapatas. demolicion de losa.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2717.92		2,717.92	0.00	$4,221	$0	2,717.92	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.74	0.10	$252,961	$25,296	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		87.60	58.64	$20,699	$1,213,789	146.24	439.76
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		3.24	2.68	$266,275	$713,617	5.92	16.62
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		210.61	18.05	$32,124	$579,838	228.66	1,220.44
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	220		96.19	24.27	$93,507	$2,269,415	120.46	99.54
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		119.05	0.00	$34,062	$0	119.05	73.76
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		11,831.67	445.19	$9,568	$4,259,578	12,276.86	33,128.64
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	2512		1,784.80	154.00	$40,436	$6,227,144	1,938.80	573.20
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		48.89	0.00	$1,742,818	$0	48.89	90.80
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		-	39.12	$99,065	$3,875,423	39.12	619.05
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	306.6		150.00	0.00	$18,074	$0	150.00	156.60
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		964.80	15.00	$14,939	$224,085	979.80	756.20
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	845.24		336.14	0.00	$32,154	$0	336.14	509.10
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		668.13	0.00	$33,985	$0	668.13	586.47
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		495.11	0.00	$39,196	$0	495.11	75.49
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1140		1,108.87	0.00	$20,865	$0	1,108.87	31.13
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00	0.00	$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		20.00	0.00	$19,629	$0	20.00	85.00
							VALOR DE OBRA	$19,388,185		
							INCIDENCIA	0.53%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Excavación de zapatas MAYOR DE BARRANQUILLA



FOTO 2	Demolición de losa MAYOR DE BARRANQUILLA





			
FOTO 3	Excavación de zapatas MAYOR DE BARRANQUILLA	FOTO 4	Excavación de zapatas MAYOR DE BARRANQUILLA
			
FOTO 5	Excavación de zapatas MAYOR DE BARRANQUILLA	FOTO 6	Demolición de losa MAYOR DE BARRANQUILLA
			
FOTO 7	Encofrado de Columnas MAYOR DE BARRANQUILLA	FOTO 8	Excarificación de elementos estructurales MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	No. 29	Código:	IP-FM-31
			VERSION:	01
			FECHA:	6/9/2021
			Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES	6	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	18	AL	24

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA2	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	17	0.00%	0.00%	$0	0.00%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	18	0.00%	0.00%	$0	0.00%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	19	0.00%	0.00%	$0	0.00%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	20	0.00%	0.00%	$0	0.00%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	21	0.00%	0.00%	$0	0.00%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	22	0.00%	0.00%	$0	0.00%

23	7/5/2023	13/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	23	0.00%	0.00%	$0	0.00%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	24	0.00%	0.00%	$0	0.00%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	25	0.00%	0.00%	$0	0.00%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	26	0.00%	0.00%	$0	0.00%
27	4/6/2023	10/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	27	0.00%	0.00%	$0	0.00%
28	11/6/2023	17/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	28	0.00%	0.00%	$0	0.00%
29	18/6/2023	24/6/2023	0.16%	0.16%	0.16%	29	0.16%	0.16%	$1,212,442	0.16%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

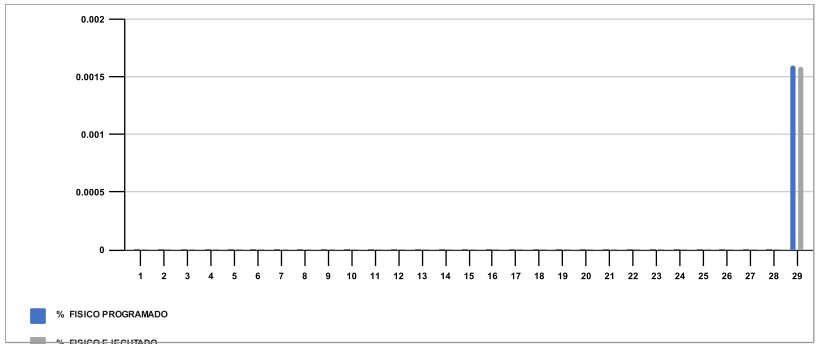

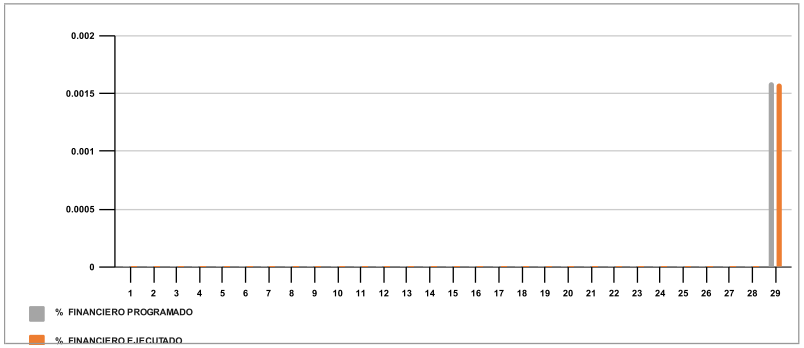

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	CL 47 #44 - 100	2023-06-18		N/A
		2023-06-19		N/A
		2023-06-20		N/A
		2023-06-21		N/A
		2023-06-22		N/A
		2023-06-23	Inicio de actividades. Desmonte de luminarias y de abanicos, desmonte de cielo raso en piso 2 y pasillo. Acopio de residuos.	N/A
		2023-06-24	Desmonte de cielo raso y perfilería en piso 2 y pasillo. Acopio de residuos.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	926.47			152.00	$4,221	641,592.00	152.00	774.47
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	796.53			22.15	$20,865	462,159.75	22.15	774.38
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	79			3.00	$19,629	58,887.00	3.00	76.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	79			3.00	$16,601	49,803.00	3.00	76.00

VALOR DE OBRA	1,212,441.75
INCIDENCIA	0.16%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	Alberto Diaz	Sahair Ordoñez	Andamio, Tronzadora, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1ihv7PWCBzRIi9g4OoN0V5HIsAyO5zpPS

FOTO 1	Desmonte de cielo raso y perfilería NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO



https://drive.google.com/open?id=1dhEDbo-zvnAzEI2w92rQE3dkdV9YFIe7

FOTO 2	Desmonte de cielo raso y perfilería NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NUEVO BOSQUE SEDE 2

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 26**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	28	AL	3

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.99%	0.99%	8	2.86%	0.99%	$41,464,803	0.99%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.95%	2.94%	9	2.39%	1.95%	$81,848,134	2.94%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.63%	3.57%	10	0.54%	0.63%	$26,215,212	3.57%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	2.06%	5.63%	11	5.00%	2.06%	$86,475,827	5.63%
12	19/2/2023	25/2/2023	5.00%	16.61%	22.24%	12	5.00%	16.61%	$696,270,832	22.24%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.77%	24.01%	13	5.00%	1.77%	$74,110,161	24.01%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.19%	1.52%	25.52%	14	0.19%	1.52%	$63,505,031	25.52%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.99%	31.51%	15	1.11%	5.99%	$250,968,527	31.51%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	8.13%	39.64%	16	0.91%	8.13%	$340,692,962	39.64%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.61%	47.25%	17	1.11%	7.61%	$318,983,882	47.25%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.28%	49.53%	**18**	3.49%	2.28%	$95,500,667	49.53%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.63%	51.15%	**19**	2.47%	1.63%	$68,124,340	51.15%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.40%	51.55%	**20**	1.47%	0.40%	$16,880,182	51.55%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.17%	51.72%	**21**	0.85%	0.17%	$7,042,142	51.72%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.06%	51.78%	**22**	0.99%	0.06%	$2,392,368	51.78%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.77%	0.00%	51.78%	**23**	1.77%	0.00%	$0	51.78%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	51.78%	**24**	4.50%	0.00%	$0	51.78%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	51.78%	**25**	2.43%	0.00%	$0	51.78%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.02%	0.00%	51.78%	**26**	1.02%	0.00%	$0	51.78%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

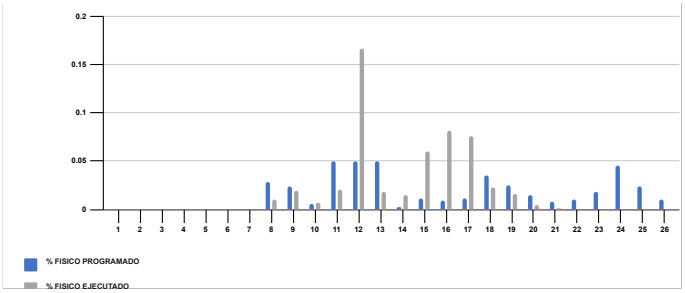

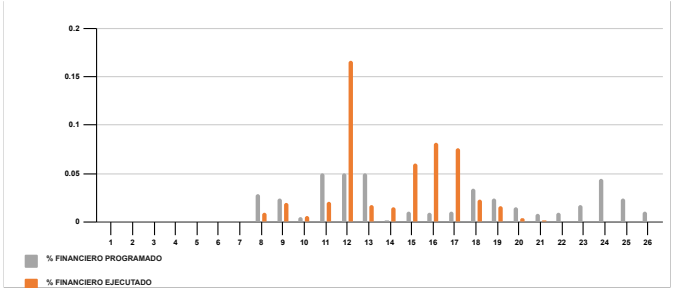

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO		2023-05-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-05-29	Instalación de adoquín con sus confinamientos. Gases del caribe terminó la instalación del medidor del gas.	N/A
		2023-05-30	Instalación de adoquín con sus confinamientos en la fachada de la carrera 7.	N/A

NUEVO BOSQUE SEDE 2	**KR 6 A # 60 B - 59**	2023-05-31	Instalación de adoquín con sus confinamientos en la fachada de la carrera 7.	N/A
		2023-06-01	Instalación de adoquín con sus confinamientos en la fachada de la carrera 7.	N/A
		2023-06-02	Instalación de adoquín con sus confinamientos en la fachada de la carrera 7.	N/A
		2023-06-03	Instalación de adoquín con sus confinamientos en la fachada de la carrera 7. Arreglos en paños afectados por lluvia.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**2013**	**4,408.63**	**4,378.63**	**-**	**$4,221**	**-**	**4,378.63**	**30.00**
1.02	**COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL**	DIA	**7**	**105.00**	**105.00**	**-**	**$454,545**	**-**	**105.00**	**-**
1.03	**LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE**	MT2	**805.2**	**4,156.24**	**3,930.74**	**-**	**$9,648**	**-**	**3,930.74**	**225.50**
1.08	**DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M**	M2	**0**	**213.00**	**213.00**	**-**	**$25,396**	**-**	**213.00**	**-**
2	**ESTRUCTURA**				**0%**			**-**	**0%**	**0%**
2.03	**DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M**	M2	**33.15**	**425.88**	**355.00**	**0.00**	**$20,853**	**-**	**355.00**	**70.88**
2.04	**DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL**	ML	**33**	**388.00**	**355.00**	**0.00**	**$20,794**	**-**	**355.00**	**33.00**
2.09	**EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA**	MT3	**68**	**1,117.58**	**1,016.33**	**0.00**	**$93,507**	**-**	**1,016.33**	**101.25**
2.10	**EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA**	M3	**108.11**	**1,578.18**	**1,463.65**	**0.00**	**$90,362**	**-**	**1,463.65**	**114.53**
2.11	**BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS**	MT2	**145.68**	**1,561.94**	**1,417.13**	**0.00**	**$49,030**	**-**	**1,417.13**	**144.81**
2.13	**RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO**	MT3	**60.3205**	**2,398.59**	**2,338.27**	**0.00**	**$192,928**	**-**	**2,338.27**	**60.32**
2.14	**SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS**	MT2	**0**	**921.13**	**921.13**	**0.00**	**$54,171**	**-**	**921.13**	**0.00**
2.24	**DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.**	ML	**88**	**88.00**	**88.00**	**0.00**	**$27,186**	**-**	**88.00**	**0.00**
2.28	**CORTE DE LOSA EN CONCRETO**	ML	**34.7**	**431.50**	**396.80**	**0.00**	**$18,074**	**-**	**396.80**	**34.70**
5.01	**PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.**	M2	**0**	**1,765.79**	**661.42**	**-**	**$96,354**	**-**	**661.42**	**1,104.37**
5.13	**IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA**	MT2	**1692**	**1,395.24**	**1,319.84**	**-**	**$59,248**	**-**	**1,319.84**	**75.40**
6.08	**PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR**	MT2	**0**	**298.63**	**298.63**	**-**	**$18,887**	**-**	**298.63**	**-**
6.11	**PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS**	MT2	**0**	**468.73**	**468.73**	**-**	**$32,600**	**-**	**468.73**	**-**
6.24	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL**	MT2	**570**	**298.63**	**298.63**	**-**	**$67,320**	**-**	**298.63**	**-**
9.01	**DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS**	UND	**0**	**57.00**	**57.00**	**-**	**$19,629**	**-**	**57.00**	**-**
10.19	**CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.**	ML	**0**	**267.65**	**255.00**	**-**	**$534,334**	**-**	**255.00**	**12.65**
11.06	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES**	M2	**144**	**789.40**	**738.37**	**-**	**$160,737**	**-**	**738.37**	**51.03**
13	**NO PREVISTOS**				0%			-	0%	0%
NP 1	**SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU**	UND	**5**	**10**	**5.00**		**$6,216,101**	-	**5.00**	**5.00**
NP 2	**SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU**	UND	**10**	**20**	**10.00**		**$7,849,119**	-	**10.00**	**10.00**
NP 3	**SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU**	UND	**4**	**4**	**4.00**		**$10,977,640**	-	**4.00**	**-**
NP 4	**SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU**	UND	**34**	**34**	**34.00**		**$16,129,708**	**-**	**34.00**	**-**
NP 10	**SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM**	ML	**668.25**	**668.25**	**648.25**		**$120,900**	**-**	**648.25**	**20.00**
							VALOR DE OBRA	**-**		
							INCIDENCIA	**0.00%**		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

 https://drive.google.com/open?id=19SJ0Uy6hy-k9ZTH90SvgKgAtXSp-c		 https://drive.google.com/open?id=1U0PmC3HrUenY9sIZ682je13PpaRBOli	
FOTO 1	Adoquín para andenes exterior NUEVO BOSQUE SEDE 2	**FOTO 2**	Adoquín para andenes exterior NUEVO BOSQUE SEDE 2
 https://drive.google.com/open?id=1uDALmaUaYTd_KTl3vBbNRYnGayp5		 https://drive.google.com/open?id=1n3K-wf0K9w9bZZJcTtl4l7SAN1raLLdz	
FOTO 3	Instalación del contador del gas por Gases del caribe. NUEVO BOSQUE SEDE 2	**FOTO 4**	Instalación del contador del gas por Gases del caribe. NUEVO BOSQUE SEDE 2

7. OBSERVACIONES

Se registran cantidades de las actividades:

ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3

ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI , REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS INCLUYE BASE EN MAYTERIAL SELECCIONADO

ALFAJIA EN CONCRETO 3000 PSI

LIMPIEZA MURO FACHADA CON ACIDO NITRICO

Dichas actividades son requeridas bajo logica constructiva, no obstante no son relacionadas dentro de las actividades en presupuesto

Elaborado por: Ricardo Caballero.	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 27**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	4	AL	10

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.99%	0.99%	8	2.86%	0.99%	$41,464,803	0.99%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.95%	2.94%	9	2.39%	1.95%	$81,848,134	2.94%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.63%	3.57%	10	0.54%	0.63%	$26,215,212	3.57%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	2.06%	5.63%	11	5.00%	2.06%	$86,475,827	5.63%
12	19/2/2023	25/2/2023	5.00%	16.61%	22.24%	12	5.00%	16.61%	$696,270,832	22.24%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.77%	24.01%	13	5.00%	1.77%	$74,110,161	24.01%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.19%	1.52%	25.52%	14	0.19%	1.52%	$63,505,031	25.52%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.99%	31.51%	15	1.11%	5.99%	$250,968,527	31.51%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	8.13%	39.64%	16	0.91%	8.13%	$340,692,962	39.64%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.61%	47.25%	17	1.11%	7.61%	$318,983,882	47.25%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.28%	49.53%	18	3.49%	2.28%	$95,500,667	49.53%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.63%	51.15%	19	2.47%	1.63%	$68,124,340	51.15%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.40%	51.55%	20	1.47%	0.40%	$16,880,182	51.55%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.17%	51.72%	21	0.85%	0.17%	$7,042,142	51.72%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.06%	51.78%	22	0.99%	0.06%	$2,392,368	51.78%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.77%	0.00%	51.78%	23	1.77%	0.00%	$0	51.78%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	51.78%	24	4.50%	0.00%	$0	51.78%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	51.78%	25	2.43%	0.00%	$0	51.78%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.02%	0.00%	51.78%	26	1.02%	0.00%	$0	51.78%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.50%	52.28%	27	1.65%	0.50%	$20,958,756	52.28%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

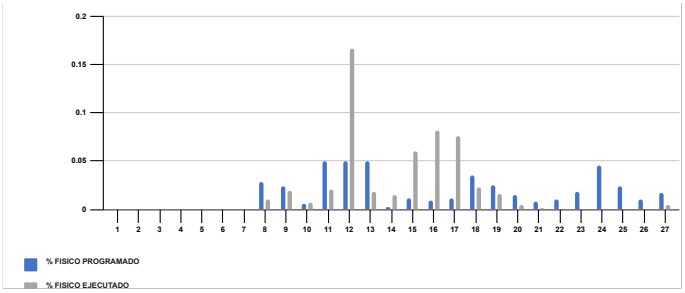

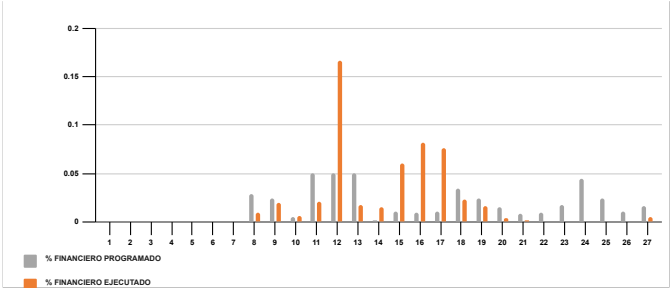

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
		2023-06-04	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-05	Arreglos en paños afectados por lluvia.	N/A

NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2023-06-06	Arreglos en paños afectados por lluvia. Sellado de adoquín por medio de raneado (vibración a máquina)	N/A
		2023-06-07	Arreglos en paños afectados por lluvia. Se termina sellado de adoquín por medio de raneado (vibración a máquina)	N/A
		2023-06-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-09	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-10	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63	-	$4,221	-	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00	-	$454,545	-	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	805.2	4,156.24	3,930.74	-	$9,648	-	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00	-	$25,396	-	213.00	-
2	ESTRUCTURA				0%			-	0%	0%
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	355.00	0.00	$20,853	-	355.00	70.88
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	355.00	0.00	$20,794	-	355.00	33.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	68	1,117.58	1,016.33	0.00	$93,507	-	1,016.33	101.25
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65	0.00	$90,362	-	1,463.65	114.53
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	145.68	1,561.94	1,417.13	0.00	$49,030	-	1,417.13	144.81
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,338.27	0.00	$192,928	-	2,338.27	60.32
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13	0.00	$54,171	-	921.13	0.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00	0.00	$27,186	-	88.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	34.7	431.50	396.80	0.00	$18,074	-	396.80	34.70
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42	-	$96,354	-	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,319.84	-	$59,248	-	1,319.84	75.40
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63	-	$18,887	-	298.63	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	0	468.73	468.73	-	$32,600	-	468.73	-
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	570	298.63	298.63	-	$67,320	-	298.63	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00	-	$19,629	-	57.00	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00	-	$534,334	-	255.00	12.65
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	-	152.15	$136,534	$20,773,648.10	152.15	297.85
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	738.37	-	$160,737	-	738.37	51.03
13	NO PREVISTOS				0%			-	0%	0%
NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	5.00		$6,216,101	-	5.00	5.00
NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	10.00		$7,849,119	-	10.00	10.00
NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	-	4.00	-
NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	-	34.00	-

NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	-	648.25	20.00

VALOR DE OBRA	$20,773,648.10
INCIDENCIA	0.50%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1q7nL_8bsbldT2jiiblLAf-_ukPYb4RbAO



https://drive.google.com/open?id=1K5lmbuD9pg-HfrZdWtEbSXYUxIFOcKob

FOTO 1	Sellado de adoquín por vibración a máquina. NUEVO BOSQUE SEDE 2	FOTO 2	Sellado de adoquín por vibración a máquina. NUEVO BOSQUE SEDE 2



https://drive.google.com/open?id=1Q-RHcjl8RRClFFQ57h3Zu8dhBMT5X



https://drive.google.com/open?id=1J6R03SEO8i6la1BY0hR40u-YVx2PT2Q-

FOTO 3	Sellado de adoquín por vibración a máquina. NUEVO BOSQUE SEDE 2	FOTO 4	Sellado de adoquín por vibración a máquina. NUEVO BOSQUE SEDE 2

7. OBSERVACIONES

Se registran cantidades de las actividades:

ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3

ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI , REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS INCLUYE BASE EN MAYTERIAL SELECCIONADO

ALFAJIA EN CONCRETO 3000 PSI

LIMPIEZA MURO FACHADA CON ACIDO NITRICO

Dichas actividades son requeridas bajo logica constructiva, no obstante no son relacionadas dentro de las actividades en presupuesto

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 28**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	11	AL	17

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.99%	0.99%	8	2.86%	0.99%	$41,464,803	0.99%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.95%	2.94%	9	2.39%	1.95%	$81,848,134	2.94%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.63%	3.57%	10	0.54%	0.63%	$26,215,212	3.57%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	2.06%	5.63%	11	5.00%	2.06%	$86,475,827	5.63%
12	19/2/2023	25/2/2023	5.00%	16.61%	22.24%	12	5.00%	16.61%	$696,270,832	22.24%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.77%	24.01%	13	5.00%	1.77%	$74,110,161	24.01%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.19%	1.52%	25.52%	14	0.19%	1.52%	$63,505,031	25.52%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.99%	31.51%	15	1.11%	5.99%	$250,968,527	31.51%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	8.13%	39.64%	16	0.91%	8.13%	$340,692,962	39.64%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.61%	47.25%	17	1.11%	7.61%	$318,983,882	47.25%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.28%	49.53%	**18**	3.49%	2.28%	$95,500,667	49.53%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.63%	51.15%	**19**	2.47%	1.63%	$68,124,340	51.15%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.40%	51.55%	**20**	1.47%	0.40%	$16,880,182	51.55%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.17%	51.72%	**21**	0.85%	0.17%	$7,042,142	51.72%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.06%	51.78%	**22**	0.99%	0.06%	$2,392,368	51.78%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.77%	0.00%	51.78%	**23**	1.77%	0.00%	$0	51.78%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	51.78%	**24**	4.50%	0.00%	$0	51.78%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	51.78%	**25**	2.43%	0.00%	$0	51.78%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.02%	0.00%	51.78%	**26**	1.02%	0.00%	$0	51.78%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.50%	52.28%	**27**	1.65%	0.50%	$20,958,756	52.28%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.21%	52.49%	**28**	6.15%	0.21%	$8,802,678	52.49%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

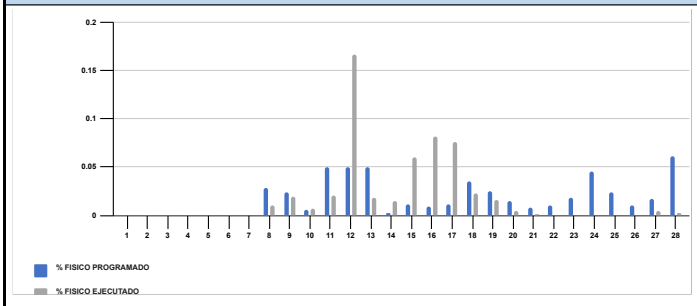

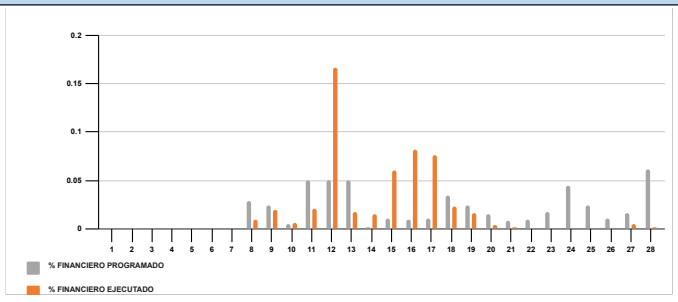

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
		2023-06-11	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2023-06-12	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-13	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-14	Levantamiento en la fachada norte. se realizó la ornamentación en la zona de verdes externas.	N/A
		2023-06-15	Jornada de orden y aseo. se realizó la ornamentación en la zona de verdes externas.	N/A
		2023-06-16	Jornada de orden y aseo. se realizó la ornamentación en la zona de verdes externas.	N/A
		2023-06-17	Excavación en acceso peatonal para fundir bordillos de confinamiento. se realizó la ornamentación en la zona de verdes externas. Jornada de orden y aseo.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63	-	$4,221	-	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00	-	$454,545	-	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	805.2	4,156.24	3,930.74	-	$9,648	-	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00	-	$25,396	-	213.00	-
2	**ESTRUCTURA**				0%			-	0%	0%
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	355.00	0.00	$20,853	-	355.00	70.88
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	355.00	0.00	$20,794	-	355.00	33.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	68	1,117.58	1,016.33	0.00	$93,507	-	1,016.33	101.25
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65	0.00	$90,362	-	1,463.65	114.53
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	145.68	1,561.94	1,417.13	0.00	$49,030	-	1,417.13	144.81
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,338.27	0.00	$192,928	-	2,338.27	60.32
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13	0.00	$54,171	-	921.13	0.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00	0.00	$27,186	-	88.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	34.7	431.50	396.80	0.00	$18,074	-	396.80	34.70
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42	-	$96,354	-	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,319.84	-	$59,248	-	1,319.84	75.40
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63	-	$18,887	-	298.63	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	0	468.73	468.73	-	$32,600	-	468.73	-
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	570	298.63	298.63	-	$67,320	-	298.63	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00	-	$19,629	-	57.00	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00	-	$534,334	-	255.00	12.65
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	152.15	64.42	$136,534	$8,795,520.28	216.57	233.43
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	738.37	-	$160,737	-	738.37	51.03
13	**NO PREVISTOS**				0%			-	0%	0%
NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	5.00		$6,216,101	-	5.00	5.00
NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	10.00		$7,849,119	-	10.00	10.00
NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	-	4.00	-
NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	-	34.00	-

NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	-	648.25	20.00

VALOR DE OBRA	8,795,520.28
INCIDENCIA	0.21%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1O-RHcil8RRCiFFQ57h3Zu8dhBMT5X-

FOTO 1	Sellado de adoquín por vibración a máquina. NUEVO BOSQUE SEDE 2



https://drive.google.com/open?id=1J6R03SEO8i6la1BY0hR40u-YVx2PT2Q-

FOTO 2	Sellado de adoquín por vibración a máquina. NUEVO BOSQUE SEDE 2

7. OBSERVACIONES

Elaborado por: Ricardo Caballero.	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 29**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	18	AL	24

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.99%	0.99%	8	2.86%	0.99%	$41,464,803	0.99%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.95%	2.94%	9	2.39%	1.95%	$81,848,134	2.94%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.63%	3.57%	10	0.54%	0.63%	$26,215,212	3.57%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	2.06%	5.63%	11	5.00%	2.06%	$86,475,827	5.63%
12	19/2/2023	25/2/2023	5.00%	16.61%	22.24%	12	5.00%	16.61%	$696,270,832	22.24%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.77%	24.01%	13	5.00%	1.77%	$74,110,161	24.01%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.19%	1.52%	25.52%	14	0.19%	1.52%	$63,505,031	25.52%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.99%	31.51%	15	1.11%	5.99%	$250,968,527	31.51%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	8.13%	39.64%	16	0.91%	8.13%	$340,692,962	39.64%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.61%	47.25%	17	1.11%	7.61%	$318,983,882	47.25%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.28%	49.53%	**18**	3.49%	2.28%	$95,500,667	49.53%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.63%	51.15%	**19**	2.47%	1.63%	$68,124,340	51.15%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.40%	51.55%	**20**	1.47%	0.40%	$16,880,182	51.55%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.17%	51.72%	**21**	0.85%	0.17%	$7,042,142	51.72%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.06%	51.78%	**22**	0.99%	0.06%	$2,392,368	51.78%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.77%	0.00%	51.78%	**23**	1.77%	0.00%	$0	51.78%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	51.78%	**24**	4.50%	0.00%	$0	51.78%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	51.78%	**25**	2.43%	0.00%	$0	51.78%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.02%	0.00%	51.78%	**26**	1.02%	0.00%	$0	51.78%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.50%	52.28%	**27**	1.65%	0.50%	$20,958,756	52.28%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.21%	52.49%	**28**	6.15%	0.21%	$8,635,007	52.49%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	1.04%	53.52%	**29**	3.12%	1.04%	$43,538,904	53.52%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

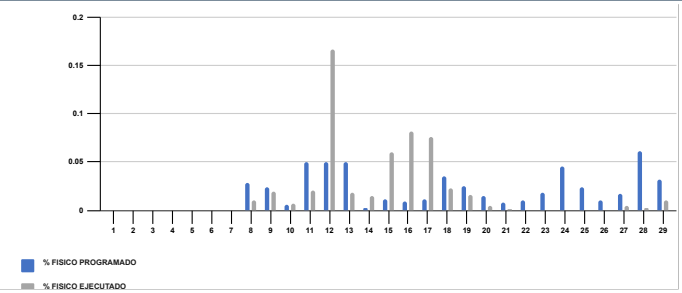

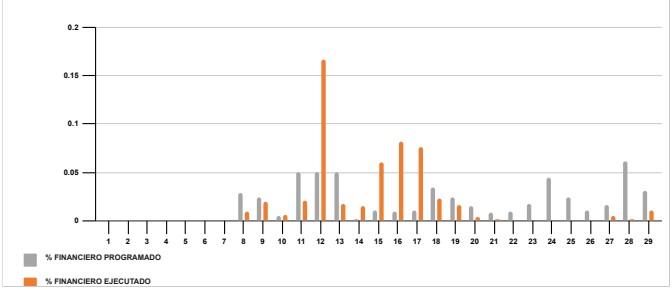

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES

NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2023-06-18	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-19	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-20	llegada y descargue de mobiliario. Excavación en la entrada vehicular. se realizó la ornamentación en la zona de verdes externas.	N/A
		2023-06-21	Nivelacion y compactacion del terreno con suelo cemento en acceso peatonal y fundida de bordillos internos y externos. Excavación en la entrada vehicular. se realizó la ornamentación en la zona de verdes externas.	N/A
		2023-06-22	Excavación en la entrada vehicular. limpieza y acopio de materiales. se realizó la ornamentación en la zona de verdes externas.	N/A
		2023-06-23	Figuración de acero para acceso peatonal. Fundida de acceso peatonal. se realizó la ornamentación en la zona de verdes externas.	N/A
		2023-06-24	Excavación en la entrada vehicular. Demolición de bordillo en acceso vehicular se realizó la ornamentación en la zona de verdes externas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63	-	$4,221	$0.00	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00	-	$454,545	$0.00	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	805.2	4,156.24	3,930.74	-	$9,648	$0.00	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00	-	$25,396	$0.00	213.00	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	355.00	0.00	$20,853	$0.00	355.00	70.88
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	355.00	22.00	$20,794	$457,468.00	377.00	11.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	68	1,117.58	1,016.33	3.12	$93,507	$291,741.84	1,019.45	98.13
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65	0.00	$90,362	$0.00	1,463.65	114.53
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	145.68	1,561.94	1,417.13	36.70	$49,030	$1,799,401.00	1,453.83	108.11
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,338.27	0.00	$192,928	$0.00	2,338.27	60.32
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13	0.00	$54,171	$0.00	921.13	0.00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	719	835.00	0.00	117.96	$9,568	$1,128,641.28	117.96	717.04
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00	0.00	$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	34.7	431.50	396.80	0.00	$18,074	$0.00	396.80	34.70
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	0.00	22.90	$154,549	$3,539,172.10	22.90	0.00
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42	-	$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,319.84	-	$59,248	$0.00	1,319.84	75.40
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63	-	$18,887	$0.00	298.63	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	0	468.73	468.73	-	$32,600	$0.00	468.73	-
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	570	298.63	298.63	-	$67,320	$0.00	298.63	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00	-	$19,629	$0.00	57.00	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00	-	$534,334	$0.00	255.00	12.65
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	216.57	60.00	$136,534	$8,192,040.00	276.57	173.43
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	738.37	-	$160,737	$0.00	738.37	51.03
NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	5.00	2.00	$6,216,101	$12,432,202.00	7.00	3.00

NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	10.00	2.00	$7,849,119	$15,698,238.00	12.00	8.00
NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
							VALOR DE OBRA	$43,538,904.22		
							INCIDENCIA	1.04%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1PgPsbiH-jTl07FJRyGkcYpOkQW-4Mg

FOTO 1	Excavación en la entrada vehicular. NUEVO BOSQUE SEDE 2



https://drive.google.com/open?id=1AJPIEu55fTFJbiXJZ7IJoKIL3nJac1FI

FOTO 2	Armado y figurado de acero para fundir placa NUEVO BOSQUE SEDE 2



https://drive.google.com/open?id=1NvUnDr_NzFvxs2Uma7byU866Lexx

FOTO 3	Bordillos externos . NUEVO BOSQUE SEDE 2



https://drive.google.com/open?id=1AANDFTPhqCSrtSJdGqVJ2eiOXWGrLj

FOTO 4	Fundida de bordillos. NUEVO BOSQUE SEDE 2

7. OBSERVACIONES

Elaborado por: Ricardo Caballero	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REUVEN FEUERSTEIN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 26**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	28	AL	3

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.23%	0.68%	0.68%	7	0.23%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.94%	1.00%	1.68%	8	2.94%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.68%	0.91%	2.59%	9	1.68%	0.91%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.42%	0.94%	3.53%	10	2.42%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.31%	0.55%	4.08%	11	2.31%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	1.11%	0.29%	4.37%	12	1.11%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	8.83%	5.17%	16.35%	14	8.83%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	10.02%	0.95%	17.31%	15	10.02%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	7.12%	0.49%	17.80%	16	7.12%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.21%	0.42%	18.22%	17	1.21%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	1.28%	0.00%	18.22%	18	1.28%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.29%	0.96%	19.18%	19	0.29%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.40%	1.14%	20.33%	20	0.40%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.33%	0.43%	20.76%	21	0.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.97%	1.66%	22.42%	22	1.97%	1.66%	$19,836,503	22.42%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.95%	1.15%	23.57%	23	0.95%	1.15%	$13,742,156	23.57%
24	14/5/2023	20/5/2023	1.16%	2.01%	25.58%	24	1.16%	2.01%	$24,018,899	25.58%
25	21/5/2023	27/5/2023	3.12%	1.28%	26.86%	25	3.12%	1.28%	$15,295,617	26.86%
26	28/5/2023	3/6/2023	3.92%	2.43%	29.28%	26	3.92%	2.43%	$29,016,888	29.28%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

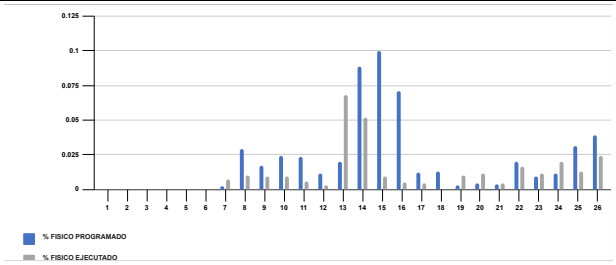

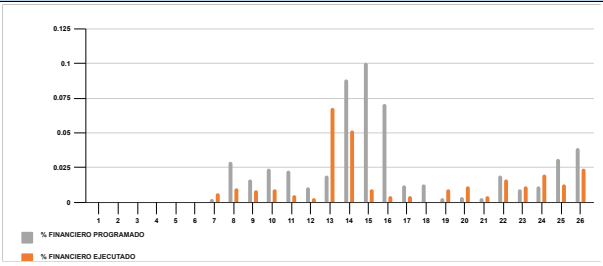

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-05-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-05-29	Levente en mampostería de muro de cerramiento. Reubicación elementos de cocina. se realizó relleno de las zapatas previamente excavadas.Orden y aseo.	N/A
		2023-05-30	Excavación de viga cimiento.se realizó relleno de las zapatas previamente excavadas. Corte y figuración de acero. Levante en mampostería de muro de cerramiento. Demolición de plantilla de piso. desmonte de cielo raso, puntos eléctricos y campana extractora en la cocina.	N/A
		2023-05-31	Levante mampostería en tramo final del muro de cerramiento. Demolición de mesón en la cocina. se realizó relleno de las zapatas previamente excavadas.	N/A
		2023-06-01	Levante de muro en mampostería . Desmonte de cielo raso en bodega. Se inicia con el desmonte de cubierta.se realizó relleno de las zapatas previamente excavadas.	N/A
		2023-06-02	Levante de mampostería en los baños del aula 2. Fundida de viga cimiento.	N/A
		2023-06-03	Levante de mampostería rayada.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		253.58	0.00	$4,221	-	253.58	695.63
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		223.58		$9,648	-	223.58	725.63
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07		$116,390	-	26.07	58.35
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	23		-	0.00	$140,481	-	-	23.00
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		5.00		$252,961	-	5.00	565.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		218.00		$20,699	-	218.00	152.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	162.94		19.19	4.62	$93,507	$432,002.34	23.81	139.13
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		11.02		$49,030	-	11.02	55.41
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	178.42		45.54	21.86	$34,062	$744,595.32	67.40	111.02
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		11.02		$54,171	-	11.02	17,280.10
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		3,060.94	185.73	$9,568	$1,777,064.64	3,246.67	4,574.26
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		5.84		$894,392	-	5.84	13.76
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		2.67		$1,742,818	-	2.67	17.39
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		2.63	0.00	$1,894,074	-	2.63	264.60
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55		$27,186	-	278.55	357.45
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	6.73		-		$1,254,738	-	-	6.73
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		11.01	13.00	$813,350	$10,573,550.00	24.01	18.61
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		146.81		$32,154	-	146.81	289.58
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	305.52		55.12	49.93	$100,669	$5,026,403.17	105.05	200.47
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06	0.00	$33,985	-	150.06	170.17
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		82.72	44.36	$16,524	$733,004.64	127.08	203.25
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		-	0.00	$20,865	-	-	555.16
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		-	0.00	$38,451	-	-	15.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		-	0.00	$57,053	-	-	16.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		-	0.00	$32,669	-	-	25.12
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	56		-	0.00	$19,629	-	-	56.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		-	2.00	$16,601	$33,202.00	2.00	14.00
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		-	1.00	$19,709	$19,709.00	1.00	410.20
							VALOR DE OBRA	$29,016,888.03		
							INCIDENCIA	2.43%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Cortadora de Losa, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
REUVEN FEUERSTEIN				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1TmwYpZw9FOFAzXFPp8_zhUvMwGadyrhmCqy80_d4IYQdqIDEC1Gadgy

FOTO 1	Excavación de viga cimiento REUVEN FEUERSTEIN




https://drive.google.com/open?id=1_CUU1Bbsqyrhhrwsqdbw-0Xd

FOTO 2	Excavación de viga cimiento REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1TmwYpZw9FOFAzXFPp8_zhUvMw

FOTO 3	Corte y figuracion de acero. REUVEN FEUERSTEIN

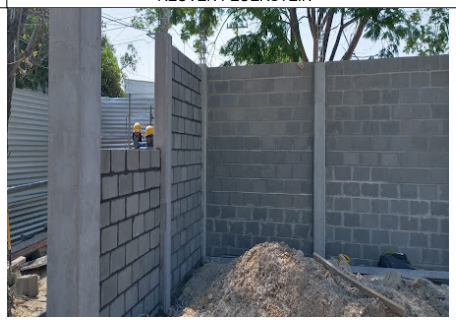

https://drive.google.com/open?id=1_738Kg5IESM9C6N_I1nzr73HJ6lSlSE7

FOTO 4	Levante mampostería REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1X-MHI9ZKKIAXc4876rKlwit_YTUZv1I

FOTO 5	Demolición de plantilla. REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1dOUWJBERH_ag8adZqu-lsMcwFVAQVY

FOTO 6	Demolición de mesón REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DÍRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DÍRECTOR DE INTERVENTORIA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 27**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	4	AL	10

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.23%	0.68%	0.68%	7	0.23%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.94%	1.00%	1.68%	8	2.94%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.68%	0.91%	2.59%	9	1.68%	0.91%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.42%	0.94%	3.53%	10	2.42%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.31%	0.55%	4.08%	11	2.31%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	1.11%	0.29%	4.37%	12	1.11%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	8.83%	5.17%	16.35%	14	8.83%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	10.02%	0.95%	17.31%	15	10.02%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	7.12%	0.49%	17.80%	16	7.12%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.21%	0.42%	18.22%	17	1.21%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	1.28%	0.00%	18.22%	18	1.28%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.29%	0.96%	19.18%	19	0.29%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.40%	1.14%	20.33%	20	0.40%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.33%	0.43%	20.76%	21	0.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.97%	1.66%	22.42%	22	1.97%	1.66%	$19,836,503	22.42%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.95%	1.15%	23.57%	23	0.95%	1.15%	$13,742,156	23.57%
24	14/5/2023	20/5/2023	1.16%	2.01%	25.58%	24	1.16%	2.01%	$24,018,899	25.58%
25	21/5/2023	27/5/2023	3.12%	1.28%	26.86%	25	3.12%	1.28%	$15,295,617	26.86%
26	28/5/2023	3/6/2023	3.92%	2.43%	29.28%	26	3.92%	2.43%	$29,016,888	29.28%
27	4/6/2023	10/6/2023	6.61%	0.50%	29.78%	27	6.61%	0.50%	$5,921,352	29.78%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

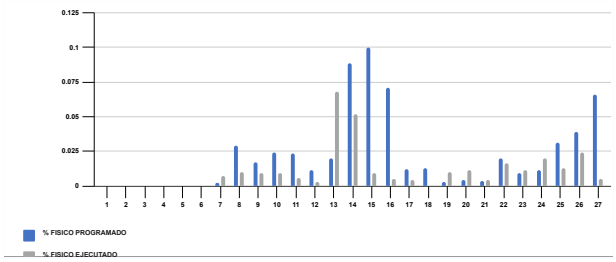

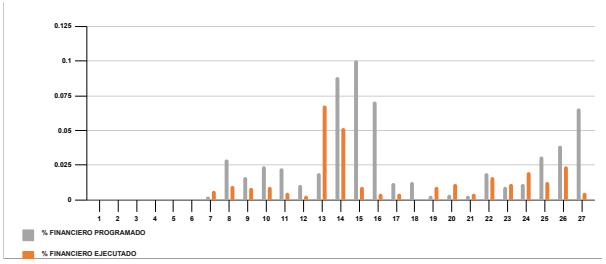

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-06-04	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-05	Levante de mampostería rayada área de oficina y baños. Excavación de zapata medianera.	N/A
		2023-06-06	Levante de mampostería rayada área de oficina y baños. Excavación de zapata medianera. Demolición de plantilla.	N/A
		2023-06-07	Levante de mampostería. Excavación de zapata medianera.	N/A
		2023-06-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-09	Demoliciones de muros. Demolición de vigas áreas	N/A
		2023-06-10	Levante de mampostería en área de baños y sala de profesores. Corte y figuración de acero.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		253.58	0.00	$4,221	-	253.58	695.63
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		223.58	0.00	$9,648	-	223.58	725.63
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07	0.00	$116,390	-	26.07	58.35
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	23		-	0.00	$140,481	-	-	23.00
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		5.00	0.00	$252,961	-	5.00	565.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		218.00	0.00	$20,699	-	218.00	152.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	162.94		23.81	3.09	$93,507	$288,936.63	26.90	136.04
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		11.02	0.00	$49,030	-	11.02	55.41
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	178.42		67.40	0.00	$34,062	-	67.40	111.02
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		11.02	0.00	$54,171	-	11.02	17,280.10
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		3,246.67	92.86	$9,568	$888,484.48	3,339.53	4,481.40
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		5.84	0.00	$894,392	-	5.84	13.76
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		2.67	0.00	$1,742,818	-	2.67	17.39
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		2.63	0.00	$1,894,074	-	2.63	264.60
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55	0.00	$27,186	-	278.55	357.45
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	6.73		-	0.00	$1,254,738	-	-	6.73
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01	0.00	$813,350	-	24.01	18.61
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		146.81	0.00	$32,154	-	146.81	289.58
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	305.52		105.05	33.69	$100,669	$3,391,538.61	138.74	166.78
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06	0.00	$33,985	-	150.06	170.17
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		127.08	67.18	$16,524	$1,110,082.32	194.26	136.07
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		-	0.00	$20,865	-	-	555.16
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		-	0.00	$38,451	-	-	15.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		-	0.00	$57,053	-	-	16.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		-	0.00	$32,669	-	-	25.12
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	56		-	0.00	$19,629	-	-	56.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		2.00	0.00	$16,601	-	2.00	14.00
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00	0.00	$19,709	-	1.00	410.20
							VALOR DE OBRA	$5,921,352.29		
							INCIDENCIA	0.50%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA

REUVEN FEUERSTEIN	**Anderson Saavedra**	**Sahair Ordoñez**	**Trompo, Andamio, Herramienta Menor**	**NO APLICA**
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1NSMWXGdWh_ZQ8yIDMEmrZs8_

FOTO 1	Levante mampostería REUVEN FEUERSTEIN	**FOTO 2**	Demoliciones de muros. REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1PBqUHvtBRMXTpzPbgaWwcJbeb

FOTO 3	Excavación de zapata REUVEN FEUERSTEIN	**FOTO 4**	Excavación de zapata REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1z_nDZuz0A1eLT6uJfXY7bngDXvu8

FOTO 5	Corte y figuración de acero. REUVEN FEUERSTEIN	**FOTO 6**	Demolición de vigas. REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 28**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	11	AL	17

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.23%	0.68%	0.68%	7	0.23%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.94%	1.00%	1.68%	8	2.94%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.68%	0.91%	2.59%	9	1.68%	0.91%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.42%	0.94%	3.53%	10	2.42%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.31%	0.55%	4.08%	11	2.31%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	1.11%	0.29%	4.37%	12	1.11%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	8.83%	5.17%	16.35%	14	8.83%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	10.02%	0.95%	17.31%	15	10.02%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	7.12%	0.49%	17.80%	16	7.12%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.21%	0.42%	18.22%	17	1.21%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	1.28%	0.00%	18.22%	18	1.28%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.29%	0.96%	19.18%	19	0.29%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.40%	1.14%	20.33%	20	0.40%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.33%	0.43%	20.76%	21	0.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.97%	1.66%	22.42%	22	1.97%	1.66%	$19,836,503	22.42%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.95%	1.15%	23.57%	23	0.95%	1.15%	$13,742,156	23.57%
24	14/5/2023	20/5/2023	1.16%	2.01%	25.58%	24	1.16%	2.01%	$24,018,899	25.58%
25	21/5/2023	27/5/2023	3.12%	1.28%	26.86%	25	3.12%	1.28%	$15,295,617	26.86%
26	28/5/2023	3/6/2023	3.92%	2.43%	29.28%	26	3.92%	2.43%	$29,016,888	29.28%
27	4/6/2023	10/6/2023	6.61%	0.50%	29.78%	27	6.61%	0.50%	$5,921,352	29.78%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.51%	1.78%	31.56%	28	1.51%	1.78%	$21,262,879	31.56%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

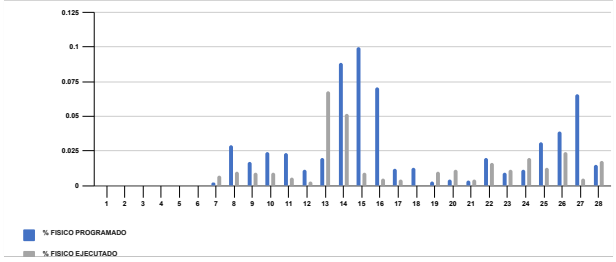

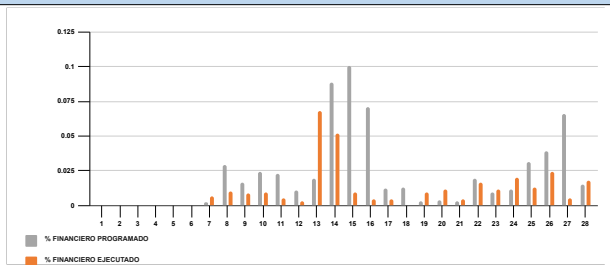

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-06-11	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-12	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-13	Levante de mampostería en área sala de profesores. Corte y figuración de acero. Excavación de zapatas.	N/A
		2023-06-14	Levante de mampostería. Corte y figuración de acero. Demolición de viga existente. Armado de dintel. Se realizó desmonte de puerta, reja y ventana metálica.	N/A
		2023-06-15	Levante de mampostería. Corte y figuración de acero. fundida de dintel. Descapote de terreno zona de jardín.Se realizó desmonte de puerta, reja y ventana metálica.	N/A
		2023-06-16	Levante de mampostería. Corte y figuración de acero para viga aérea. Descapote de terreno zona de jardín.Se realizó desmonte de puerta, reja y ventana metálica.	N/A
		2023-06-17	Levante de mampostería en area de sala de profesores. Descapote de terreno zona de jardín. limpieza sobre la calle 46G. Se realizó desmonte de puerta, reja y ventana metálica.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		253.58	0.00	$4,221	-	253.58	695.63
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		35.00	0.00	$454,545	-	35.00	535.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		223.58	0.00	$9,648	-	223.58	725.63
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07	0.00	$116,390	-	26.07	58.35
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	23		-	0.00	$140,481	-	-	23.00
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		5.00	0.00	$252,961	-	5.00	565.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		218.00	0.00	$20,699	-	218.00	152.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,206.60	0.94	$266,275	$250,298.50	1,207.54	73.08
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	162.94		26.90	0.00	$93,507	-	26.90	136.04
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		11.02	0.00	$49,030	-	11.02	55.41
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	178.42		67.40	0.00	$34,062	-	67.40	111.02
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		11.02	0.00	$54,171	-	11.02	17,280.10
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		3,339.53	371.45	$9,568	$3,554,033.60	3,710.98	4,109.95
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		5.84	0.00	$894,392	-	5.84	13.76
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		2.67	0.00	$1,742,818	-	2.67	17.39
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		2.63	4.06	$1,894,074	$7,689,940.44	6.69	260.54
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55	0.00	$27,186	-	278.55	357.45
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	24.51		6.48	0.00	$1,933,197	-	6.48	18.03
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	6.73		-	0.00	$1,254,738	-	-	6.73
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01	0.00	$813,350	-	24.01	18.61
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		146.81	0.00	$32,154	-	146.81	289.58
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	305.52		138.74	85.71	$100,669	$8,628,339.99	224.45	81.07
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06	0.00	$33,985	-	150.06	170.17
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		194.26	0.00	$16,524	-	194.26	136.07
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		-	0.00	$20,865	-	-	555.16
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		-	11.00	$38,451	$422,961.00	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		-	12.00	$57,053	$684,636.00	12.00	4.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		-	1.00	$32,669	$32,669.00	1.00	24.12
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	56		-	0.00	$19,629	-	-	56.00

9.02	**DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO**	UND	**16**		**2.00**	**0.00**	**$16,601**	-	2.00	14.00
9.03	**DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO**	UND	**411.2**		1.00	**0.00**	**$19,709**	-	1.00	410.20

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		**EQUIPOS EN OBRA**	
FRENTE DE TRABAJO	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
REUVEN FEUERSTEIN	**Anderson Saavedra**	**Sahair Ordoñez**	**Trompo, Andamio, Herramienta Menor**	**NO APLICA**
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1PSDZ_RHEVWqHn




https://drive.google.com/open?id=1wmRnN1Gxh_kVNYddXCVYSmPwMWiOI

FOTO 1	Levante mampostería. Dintel REUVEN FEUERSTEIN	**FOTO 2**	Descapote de terreno REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1HKsKU5YZY2AiI1CdmsHn7HIAzRI

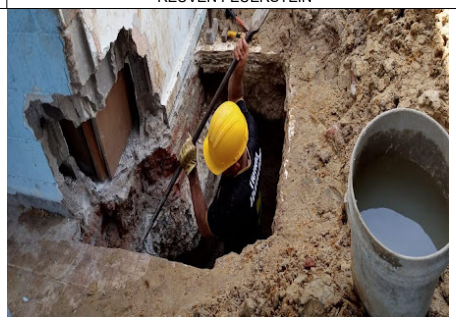


https://drive.google.com/open?id=1WmRnN1Gxh_kVNYddXCVYSmPwMWiOI

FOTO 3	Levante mampostería REUVEN FEUERSTEIN	**FOTO 4**	Excavación de zapata REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1Z4bmN2AYaVY0IeHO4E4HsYmd

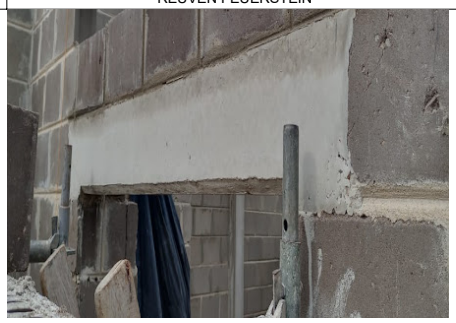

https://drive.google.com/open?id=1tzS_EXQ1TDhhtC4XbTPHqSlLbR3PG

FOTO 5	Armado de dintel. REUVEN FEUERSTEIN	**FOTO 6**	Fundida de dintel. REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 29**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**6**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	18	AL	24

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.23%	0.68%	0.68%	7	0.23%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.94%	1.00%	1.68%	8	2.94%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.68%	0.91%	2.59%	9	1.68%	0.91%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.42%	0.94%	3.53%	10	2.42%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.31%	0.55%	4.08%	11	2.31%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	1.11%	0.29%	4.37%	12	1.11%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	8.83%	5.17%	16.35%	14	8.83%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	10.02%	0.95%	17.31%	15	10.02%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	7.12%	0.49%	17.80%	16	7.12%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.21%	0.42%	18.22%	17	1.21%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	1.28%	0.00%	18.22%	18	1.28%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.29%	0.96%	19.18%	19	0.29%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.40%	1.14%	20.33%	20	0.40%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.33%	0.43%	20.76%	21	0.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.97%	1.66%	22.42%	22	1.97%	1.66%	$19,836,503	22.42%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.95%	1.15%	23.57%	23	0.95%	1.15%	$13,742,156	23.57%
24	14/5/2023	20/5/2023	1.16%	2.01%	25.58%	24	1.16%	2.01%	$24,018,899	25.58%
25	21/5/2023	27/5/2023	3.12%	1.28%	26.86%	25	3.12%	1.28%	$15,295,617	26.86%
26	28/5/2023	3/6/2023	3.92%	2.43%	29.28%	26	3.92%	2.43%	$29,016,888	29.28%
27	4/6/2023	10/6/2023	6.61%	0.50%	29.78%	27	6.61%	0.50%	$5,921,352	29.78%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.51%	1.78%	31.56%	28	1.51%	1.78%	$21,262,879	31.56%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.56%	1.40%	32.96%	29	3.56%	1.40%	$16,767,491	32.96%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

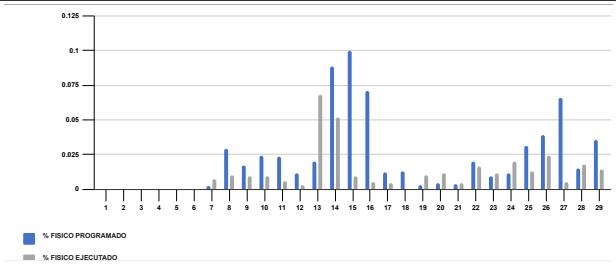

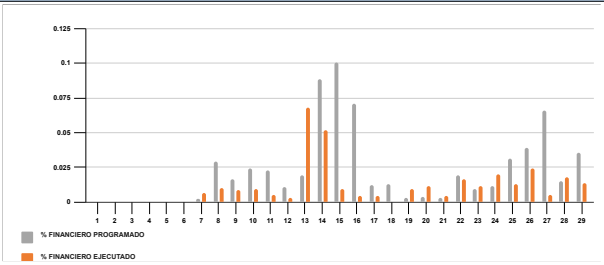

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-06-18	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-19	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-20	Levante de mampostería en area de sala de profesores. Descapote de terreno zona de jardín. Desmonte de cielo raso en aulas de preescolar fase 2. Desmonte de puntos eléctricos y lámparas.	N/A
		2023-06-21	Escarificación de pañete en aulas de preescolar fase 2. Corte y armado de acero. Armado de viga sobre muro. Pañete en bloque interno. Levante de mampostería área de baños.	N/A
		2023-06-22	Escarificación de pañete aulas de prescolar fase 2 . Corte y figuración de acero. Levante de mampostería. Aplicación de pañete interno. Armado de viga sobre muro de cerramiento.	N/A
		2023-06-23	Escarificación de pañete y demolición de piso en aulas de prescolar fase 2 . Aplicación de pañete interno. Levante en mampostería. Armado de viga aérea y fundida.	N/A

	2023-06-24	Escarificación de pañete y demolición de piso en aulas de prescolar fase 2. Levante en mampostería en tramo C5-C6 de cocina. Aplicación de pañete en sala de profesores. Armado de viga aérea y fundida.		N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		253.58	0.00	$4,221	-	253.58	695.63
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		35.00	0.00	$454,545	-	35.00	535.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		223.58	0.00	$9,648	-	223.58	725.63
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07	0.00	$116,390	-	26.07	58.35
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	23		-	0.00	$140,481	-	-	23.00
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		5.00	0.00	$252,961	-	5.00	565.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		218.00	0.00	$20,699	-	218.00	152.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54	0.00	$266,275	-	1,207.54	73.08
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	162.94		26.90	0.00	$93,507	-	26.90	136.04
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		11.02	0.00	$49,030	-	11.02	55.41
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	178.42		67.40	0.00	$34,062	-	67.40	111.02
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		11.02	0.00	$54,171	-	11.02	17,280.10
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		3,710.98	371.45	$9,568	$3,554,033.60	4,082.43	3,738.50
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		5.84	0.00	$894,392	-	5.84	13.76
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		2.67	0.00	$1,742,818	-	2.67	17.39
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69	0.00	$1,894,074	-	6.69	260.54
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55	0.00	$27,186	-	278.55	357.45
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	24.51		6.48	0.00	$1,933,197	-	6.48	18.03
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	6.73		-	0.00	$1,254,738	-	-	6.73
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01	0.00	$813,350	-	24.01	18.61
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		146.81	0.00	$32,154	-	146.81	289.58
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	305.52		224.45	41.84	$100,669	$4,211,990.96	266.29	39.23
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	601		14.00	340.26	$23,961	$8,152,969.86	354.26	246.74
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06	0.00	$33,985	-	150.06	170.17
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		194.26	49.34	$16,524	$815,294.16	243.60	86.73
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		-	0.00	$20,865	-	-	555.16
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00	0.00	$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		12.00	0.00	$57,053	-	12.00	4.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		1.00	0.00	$32,669	-	1.00	24.12

9.01	**DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS**	UND	**56**		-	**0.00**	**$19,629**	-	-	56.00
9.02	**DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO**	UND	**16**		**2.00**	**2.00**	**$16,601**	**$33,202.00**	4.00	12.00
9.03	**DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO**	UND	**411.2**		1.00	**0.00**	**$19,709**	-	1.00	410.20

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
REUVEN FEUERSTEIN	**Anderson Saavedra**	**Sahair Ordoñez**	**Trompo, Andamio, Herramienta Menor**	**NO APLICA**
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1crhizAockUdECBXUMHSGABM1IvC

FOTO 1	Pañete sobre muros. REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=16oB3TPcOKFzvL4Ptbl4_JIhmwp1HIAOr

FOTO 2	Escarificación de muros. REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1aW7Y2bLEFaUpnDCYDZVoynKxC

FOTO 3	Demolición de piso REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1qnJc1e3Ubb2Q21Gs9rAzV_1HnYmGB4

FOTO 4	Levante mampostería REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=18-qcap37vEEIbMJacB248coJZ8Cw

FOTO 5	Armado de viga aérea y fundida. REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1IKBd3IGtLn3vEwA3B1hHKJ_a4cfwGJJF

FOTO 6	Desmonte de cielo raso y puntos eléctricos. REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE **Sahair Ordoñez**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

ANEXO 8 COMUNICACIONES

ENVIADOS

Barranquilla, 29 de mayo de 2023 **CIED-2023-076**

SEÑORES
EDUBAR

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: INFORMACION TECNICA

Cordial saludo,

Por medio de la presente, hacemos la entrega del informe mensual 2 y 3 correspondientes a los meses de enero y febrero respectivamente del Consorcio IE Distrito con sus respectivos anexos.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Informe mensual 2 y 3, anexos

Barranquilla, 30 de mayo de 2023 **CIED-2023-077**

SEÑORES
EDUBAR

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: INFORME MENSUAL N°1

Cordial saludo,

Por medio de la presente, hacemos la entrega del informe mensual 1 correspondiente al mes de diciembre de 2022 con sus respectivos anexos.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Informe mensual 1, anexos.

Barranquilla, 05 de Junio de 2023 **CIED-2023-078**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: INFORME MENSUAL N°4

Cordial saludo,

Por medio de la presente, hacemos llegar las correcciones observadas en el informe mensual N°4 de obra entregado a esta interventoría.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Informe mensual 1, anexos.

Barranquilla, 06 de junio de 2023 **CIED-2023-079**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: INFORME MENSUAL N°5

Cordial saludo,

Por medio de la presente, hacemos llegar las correcciones observadas en el informe mensual N°5 de obra entregado a esta interventoría.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Informe mensual 5

Barranquilla, 07 de junio de 2023 **CIED-2023-080**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: INFORME MENSUAL N°4

Cordial saludo,

Por medio de la presente, hacemos llegar las correcciones observadas en el informe mensual N°4 de obra entregado a esta interventoría.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Informe mensual 4

Barranquilla, 07 de junio de 2023 **CIED-2023-081**

SEÑORES
EDUBAR

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Cordial saludo,

Una vez culminada la revisión de la documentación suministrada por el Contratista de Obra, con respecto a las actividades no previstas relacionadas en la siguiente tabla:

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1/2"	ML	$ 364.166,79
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 5/8"	ML	$ 435.840,84
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 3/4"	ML	$ 439.157,61
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 7/8"	ML	$ 771.685,26
NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1 1/8"	ML	$ 878.505,61
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	$ 120.900,00
NP 11	DESBASTE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO PULIDO	M2	$ 39.320,00
NP 12	ZOCALO MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4 h=7cm	ML	$ 49.400,00
NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 15CM SOBRE LOSA Y MURO	UND	$ 65.771,40
NP 14	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 15CM SOBRE LOSA Y MURO	UND	$ 125.226,57
NP 15	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	UND	$ 27.196,48
NP 16	DESMONTE DE ORINALES, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	UND	$ 25.876,00
NP 17	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	UND	$ 20.652,00
NP 18	DESMONTE DE CUBIERTA LONA Y ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	$ 10.531,00
NP 19	DEMOLICION DE MESONES	ML	$ 16.865,00
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR EN PLATINA DE 2X 1/4, INCLUYE VARILLA REDONDA LISA 5/8, SOLDADURA 6011, ANTICORROSIVO, ESMALTE, DISCO DE CORTE, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS.	M2	$ 1.057.000,00

NP 21	MORTEROS DE REPARACION PARA ELEMENTOS EN CONCRETO REFORZADO, (POR CARA)	ML	$ 274.642,53
NP 22	MANTENIMIENTO DE CORREAS Y ELEMENTOS DE SOPORTE EN ESTRUCTURA METALICA	ML	$ 160.365,90
NP 23	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	$ 134.923,50
NP 24	ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO	ML	$ 39.517,87
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA GALVANIZADA 1/2" X cal 16 Y MARCO EN ANGULO 1-1/4" X 1/8". ANCHOS VARIABLES ENTRE 30 Y	ML	$ 530.242,54

Tabla 1 Actividades No Previstas

Esta interventoría se permite remitir la aprobación de dicha documentación, de modo que estas sean validadas y aprobadas por la entidad.

Adjunto a la presente, se encuentran los documentos de soporte de lo mencionado anteriormente.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Relacion de actividades no previstas

Barranquilla, 07 de junio de 2023 **CIED-2023-081**

SEÑORES
EDUBAR

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Cordial saludo,

Una vez culminada la revisión de la documentación suministrada por el Contratista de Obra, esta interventoría se permite remitir la aprobación de las Actividades No Previstas, de modo que estas sean validadas y aprobadas por la entidad.
Adjunto a la presente, se encuentran los documentos de soporte de lo mencionado anteriormente.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Relacion de actividades no previstas

Barranquilla, 08 de junio de 2023 **CIED-2023-082**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: CORRECCIONES INFORME MENSUAL N°5

Cordial saludo,

Una vez culminada la información técnica suministrada en el INFORME MENSUAL N°5 nos permitimos remitirles el documento con las correcciones necesarias para la aprobación del mismo.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Informe mensual N°5

Barranquilla, 09 de junio de 2023 **CIED-2023-083**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: CORRECCIONES INFORME MENSUAL N°5

Cordial saludo,

Una vez culminada la información técnica suministrada en el INFORME MENSUAL N°5 nos permitimos remitirles el documento con las correcciones necesarias para la aprobación del mismo.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Informe mensual N°5

Barranquilla, 09 de junio de 2023 **CIED-2023-084**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: INFORMACION TECNICA IED JOSE EUSEBIO CARO

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en respuesta a su comunicado CED-102-2023 referente a la propuesta para intervención de reforzamiento estructural en la Institución Educativa José Eusebio Caro, sírvase remitir la entrega del informe técnico con memoria de cantidades soporte del diseño propuesto.

Agradecemos la remisión de este documento en la mayor brevedad posible para culminar la revisión y posterior aprobación.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

RECIBIDOS

IP-00637

Barranquilla, 08 de junio de 2023

Señores
CONSORCIO I.E. DISTRITO
ATN. MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE
Representante legal

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SA-EDU-0001-2022 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Asunto: ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.

Cordial saludo

Mediante la presente, EDUBAR S.A. en calidad de supervisión del contrato de la referencia, en el marco de la ejecución de este y en concordancia con las obligaciones establecidas en su CLÁUSULA SÉPTIMA – "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA"

"(...)
60. Elaborar y presentar oportunamente informes semanales y mensuales de avance de obras. Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotográfico, copia de la bitácora y esquemas de ubicación, además de otros informes que solicite EDUBAR S.A."

Les solicita comedidamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales respecto a la entrega de informes mensuales, remitiendo la información que a continuación se detalla:

INFORME	PERIODO	ESTADO
No. 1	06 al 31 de diciembre de 2022	En revisión por la entidad
No. 2	01 al 31 de enero de 2023	En revisión por la entidad
No. 3	01 al 24 de febrero de 2023	En revisión por la entidad
No. 4	25 de febrero al 24 de marzo de 2023	Se devolvió con observaciones
No. 5	25 de marzo al 24 de abril de 2023	Presentado incompleto
No. 6	25 de abril al 24 de mayo de 2023	No se ha presentado

IP-00637

Lo anterior en un término de dos (2) días hábiles una vez recibida la presente comunicación.

Agradecemos su atención y colaboración.

Atentamente,

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Gerente – Representante Legal.
EDUBAR S.A.
Proyecto: Valentina Barrios Andrade
Reviso: Evert Salgado Saballeth

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co

IP-00595

Barranquilla, 29 de mayo de 2023

Señores
CONSORCIO I.E. DISTRITO
ATN. MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE
Representante legal

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SA-EDU-0001-2022 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Asunto: SOLICITUD AJUSTES INFORMES MENSUALES SST–AMBIENTAL.

Cordial saludo

Actuando en calidad de supervisora del contrato de la referencia y en el ejercicio de mis funciones, les solicito comedidamente, el envío de los informes mensuales correspondientes a los periodos de enero, febrero y marzo de 2023, con los ajustes solicitados, relacionados con el seguimiento y verificación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Así mismo, les insto a que se remita el informe correspondiente al mes de abril de 2023, el cual se encuentra pendiente hasta la fecha.

Es importante recordarles que los informes mensuales deben contener un seguimiento detallado de las actividades desarrolladas por el contratista de obra durante el periodo evaluado, respaldadas con la documentación correspondiente. Además, es fundamental resaltar en dichos informes las labores llevadas a cabo por interventoría para supervisar, verificar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo durante cada periodo de ejecución, garantizando su entrega puntual.

Quedo atenta a su respuesta y colaboración.

Atentamente.

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Gerente – Representante Legal.
EDUBAR S.A.
Proyecto: Jhonathan Beltrán
Reviso: Evert Salgado

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4

IP-00652

Barranquilla, 15 de junio de 2023

Señores

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
CRISTIAN DAVID JIMENEZ YEJAS
Representante legal

CONSORCIO I.E. DISTRITO
ATN. MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE.
Representante Legal.

REF: CONTRATO No. SA-EDU-0001-2022 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".
CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILIA.

ASUNTO: Falencias identificadas en procesos constructivos

Cordial saludo

Durante visita técnica por parte de la supervisión el día martes 13 de junio del 2023 en los colegios "IED REUVEN FEUERSTEIN" y "IED INOCENCIO CHINCÁ", se evidenciaron falencias en diversos procesos constructivos. De acuerdo con lo evidenciado en el recorrido, presentamos a continuación un listado de las falencias más relevantes identificadas.

IED REUVEN FEUERSTEIN

- El aparejo de diversos bloques se observó trabado incorrectamente, evidenciándose que el traslapo de estos con las hiladas inmediatamente inferiores no es el adecuado, en lugar de esto, se identificaron bloques traslapados con una distancia menor a la establecida por la norma.
- Grietas y roturas puntuales en bloques, principalmente en vértices y aristas.
- Juntas verticales con espesores muy bajos e irregulares

IED INOCENCIO CHINCÁ

- Acero de cárcamos sin recubrimiento en la parrilla inferior y con distanciamientos superiores a los establecidos en planos y especificaciones

Por lo anterior, solicitamos al contratista de obra, que se realicen los correctivos necesarios en las instituciones correspondientes. Cabe resaltar, que la supervisión no recibirá a satisfacción dichas actividades de no realizarse los correctivos solicitados.

Asimismo, solicitamos a la interventoría, en virtud de sus funciones, realizar el seguimiento y verificación de los procesos constructivos de todas las actividades que se están desarrollando en cada uno de los frentes de obra que se encuentran en ejecución a la fecha, garantizando el control y seguimiento de estas y que se lleven a cabo adecuadamente.

Anexamos registro fotográfico como soporte de las falencias anteriormente mencionadas.

Agradecemos su atención.

Atentamente,

Angelly Criales Anibal
Gerente General
EDUBAR S.A.
Proyectó: Samuel Iglesias Jimenez
Aprobó: Evert Juset Salgado Saballeth

ANEXO 1 (REGISTRO FOTOGRÁFICO)

	
Traslapo de bloques con poca distancia (IED REUVEN FEUERSTEIN)	Grietas y roturas puntuales en bloques (IED REUVEN FEUERSTEIN)
	
Grietas y roturas puntuales en bloques (IED REUVEN FEUERSTEIN)	Bloques salidos y desalineados (IED REUVEN FEUERSTEIN)
	
Acero de refuerzo sin recubrimiento en parrilla inferior (IED INOCENCIO CHINCA)	Acero de refuerzo sin recubrimiento en parrilla inferior (IED INOCENCIO CHINCA)

Dirección: VÍA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Teléfonos: 3605148 - 3602561
Direccion web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT. 800.091.140-4

IP-00653

Barranquilla, 22 de junio de 2023

Señores
CONSORCIO IE DISTRITO
MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE
Representante legal

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SA-EDU-0001-2022, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: ESCASEZ DE PERSONAL Y BAJO RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES EN "IED MAYOR DE BARRANQUILLA" Y "IED JOSE EUSEBIO CARO".

Cordial saludo

Durante las visitas de seguimiento realizadas por parte de la supervisión desde el día 13 hasta el 22 de junio de 2023, se ha detectado escasez de personal en obra en las instituciones educativas "IED MAYOR DE BARRANQUILLA" y "IED JOSE EUSEBIO CARO", como se evidencia a continuación en las siguientes tablas:

Tabla 1 Personal evidenciado en obra IED Mayor de Barranquilla

Junio	Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3	Total trabajadores por día
13	7	0	0	7
14	6	0	0	6
15	6	0	0	6
16	6	0	0	6
17	6	0	0	6
20	6	0	0	6
21	6	0	0	6
22	6	0	0	6

Tabla 2 Personal evidenciado en obra IED José Eusebio Caro

Junio	Total trabajadores por día
13	2
14	2
15	2
16	2
17	3
20	3
21	2
22	6

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, esta situación incumple con las obligaciones especificas establecidas en el contrato de obra firmado entre las partes, en particular en sus numerales:

> 5. ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra.
>
> 20. Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos.
>
> 21. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución.

En este orden de ideas, hacemos énfasis en que la presencia de personal calificado en obra es esencial para garantizar el cumplimiento de los plazos y la calidad de los trabajos realizados. Por lo tanto, solicitamos que se tomen medidas inmediatas a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato.

Agradecemos su atención y colaboración.

Atentamente,

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Supervisor
EDUBAR S.A.
Proyectó: Samuel Iglesias Jimenez
Aprobó: Evert Salgado Saballeth

IP-00677

Barranquilla, 21 de junio de 2023

Señores

CONSORCIO I.E. DISTRITO
ATN. MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE.
Representante Legal.

REF: CONTRATO No. SA-EDU-0001-2022 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".

ASUNTO: Solicitud de entrega de programaciones actualizadas.

Cordial saludo

Mediante la presente y calidad de supervisión del contrato de la referencia, solicito se tomen las observaciones enviadas de las siguientes programaciones de obra, puesto que se identificaron discrepancias en las fechas de inicio y/o se encuentran con actividades en desfase.

1. IED Mayor de Barranquilla
2. IED Reuven Feuerstein
3. IED Carrizal
4. IED José Eusebio Caro
5. IED Castillo la Alboraya

Adicionalmente, se solicita la actualización de las programaciones de obra de los siguientes frentes, ya que por imprevistos en la ejecución y/o ampliación de los alcances a intervenir, no se entregaron en la fecha fin estipulada.

1. IED Jesús de Nazareth sede 2
2. IED Comunitaria 7 de abril
3. CEB 161
4. IED Carlos Meisel

Finalmente, solicito esta información sea entregada en un plazo no mayor a 3 días, ya que es obligación de las partes garantizar el correcto seguimiento de las intervenciones en ejecución.

Agradecemos su atención.

Atentamente,

Angelly Criales Anibal
Gerente General
EDUBAR S.A.
Proyectó: Diana Sanguino González DS
Aprobó: Lizz Figueredo Arce

Dirección: VÍA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Teléfonos: 3605148 - 3602561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT. 800.091140-4

IP-00678

Barranquilla, 21 de junio de 2023

Señores

CONSORCIO I.E. DISTRITO
ATN. MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE.
Representante Legal.

REF: CONTRATO No. SA-EDU-0001-2022 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".

ASUNTO: Solicitud de entrega de balance presupuestal.

Cordial saludo

Mediante la presente y calidad de supervisión del contrato de la referencia, solicito la entrega del balance de ejecución presupuestal a la fecha de todos los frentes en el marco del contrato de obra N° EDU-345-2022, con el fin de garantizar la validación de los alcances vigentes aprobados y la toma de decisiones sobre estos.

Por lo anterior, es importante incluir en dicho balance los frentes que se encuentran en ejecución, así como aquellos en que los alcances iniciales hayan finalizado, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Cantidades ejecutadas a la fecha
- Cantidades facturadas
- Cantidades por ejecutar

Finalmente, solicito esta información sea entregada en un plazo de 3 días.

Agradecemos su atención.

Atentamente,

Angelly Criales Anibal
Gerente General
EDUBAR S.A.
Proyectó: Diana Sanguino González
Aprobó: Evert Salgado Saballeth

Barranquilla, 30 de mayo de 2023

CED-100-2023

Señores

EDUBAR

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL

CONSORCIO IE DISTRITO

MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: INFORME TECNICO 4

Cordial saludo

Por medio de la presente, de acuerdo a las correcciones realizadas por interventoría se envía informe técnico No. 4 correspondiente al periodo que va desde el 25 de febrero al 24 de marzo del 2023, para su revisión y fines pertinentes.

Sin otro particular, agradeciendo su atención.



CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	**Alberto Calderón**	**Director del Proyecto**
Aprobó	**Cristian Jiménez Yejas**	**Representante legal**

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 31 de mayo de 2023

CED-101-2023

Señores

EDUBAR

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL

CONSORCIO IE DISTRITO

MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: INFORME TECNICO 5

Cordial saludo

Por medio de la presente, de acuerdo a las correcciones realizadas por interventoría se envía informe técnico No. 5 correspondiente al periodo que va desde el 25 de marzo al 28 de abril del 2023, para su revisión y fines pertinentes.

Sin otro particular, agradeciendo su atención.



CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	**Alberto Calderón**	**Director del Proyecto**
Aprobó	**Cristian Jiménez Yejas**	**Representante legal**

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 6 de junio de 2023

CED-102-2023

Señores

EDUBAR

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL

CONSORCIO IE DISTRITO

MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: DOCUMENTACION REFORZAMIENTO IED JOSE EUSEBIO CARO.

Cordial saludo

Por medio de la presente, se envía presupuesto y diseño estructural del reforzamiento de la IED José Eusebio Caro, para su revisión y fines pertinentes.

Sin otro particular, agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	**Alberto Calderón**	**Director del Proyecto**
Aprobó	**Cristian Jiménez Yejas**	**Representante legal**

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 6 de junio de 2023

CED-103-2023

Señores

EDUBAR

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL

CONSORCIO IE DISTRITO

MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: CORRECCIONES INFORME TECNICO 4

Cordial saludo

Por medio de la presente, se envía informe técnico 4, con las correcciones solicitadas por interventoría.

Sin otro particular, agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	**Alberto Calderón**	**Director del Proyecto**
Aprobó	**Cristian Jiménez Yejas**	**Representante legal**

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 7 de junio de 2023

CED-104-2023

Señores

EDUBAR

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL

CONSORCIO IE DISTRITO

MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: CORRECCIONES INFORME TECNICO 4

Cordial saludo

Por medio de la presente, se envía informe técnico 4, con las correcciones solicitadas por interventoría.

Sin otro particular, agradeciendo su atención.



CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	**Alberto Calderón**	**Director del Proyecto**
Aprobó	**Cristian Jiménez Yejas**	**Representante legal**

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 8 de junio de 2023

CED-105-2023

Señores

EDUBAR

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL

CONSORCIO IE DISTRITO

MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: CORRECCIONES INFORME TECNICO 5

Cordial saludo

Por medio de la presente, se envía informe técnico 5, para su revisión y aprobación, al documento adjunto le falta el anexo de acta de acuerdo de precios que a la fecha no ha sido firmado. Lo anterior para su revisión y aprobación.

Sin otro particular, agradeciendo su atención.



CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	**Alberto Calderón**	**Director del Proyecto**
Aprobó	**Cristian Jiménez Yejas**	**Representante legal**

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 8 de junio de 2023

CED-106-2023

Señores

EDUBAR

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL

CONSORCIO IE DISTRITO

MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: CASO OMISO CED-105-2023 - CORRECCIONES INFORME TECNICO 5

Cordial saludo

Por medio de la presente, se solicita hacer caso omiso al oficio CED-105-2023 y su respectivo anexo y se envía nuevamente el informe técnico 5, para su revisión y aprobación, al documento adjunto le falta el anexo de acta de acuerdo de precios que a la fecha no ha sido firmado. Lo anterior para su revisión y aprobación.

Sin otro particular, agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	**Alberto Calderón**	**Director del Proyecto**
Aprobó	**Cristian Jiménez Yejas**	**Representante legal**

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 8 de junio de 2023

CED-107-2023

Señores

EDUBAR

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL

CONSORCIO IE DISTRITO

MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: CORRECCIONES INFORME TECNICO 5

Cordial saludo

Por medio de la presente, se envía el informe técnico 5, para su revisión y aprobación, al documento adjunto le falta el anexo de acta de acuerdo de precios que a la fecha no ha sido firmado. Lo anterior para su revisión y aprobación.

Sin otro particular, agradeciendo su atención.



CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	**Alberto Calderón**	**Director del Proyecto**
Aprobó	**Cristian Jiménez Yejas**	**Representante legal**

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 9 de junio de 2023

CED-108-2023

Señores

EDUBAR

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL

CONSORCIO IE DISTRITO

MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: CORRECCIONES INFORME TECNICO 5

Cordial saludo

Por medio de la presente, se envía el informe técnico 5, con sus respectivos anexos para revisión y aprobación.

Sin otro particular, agradeciendo su atención.



CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	**Alberto Calderón**	**Director del Proyecto**
Aprobó	**Cristian Jiménez Yejas**	**Representante legal**

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 20 de junio de 2023

CED-114-2023

Señores

EDUBAR

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL

CONSORCIO IE DISTRITO

MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: INFORME TECNICO Y MEMORIA DE CANTIDADES REFORZAMIENTO JOSE EUSEBIO CARO

Cordial saludo

Por medio de la presente y en respuesta al oficio CIED-2023-084 se envía informe técnico y memoria de cantidades del reforzamiento estructural propuesto para la IED José Eusebio Caro, lo anterior para su revisión y aprobación.



CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	**Alberto Calderón**	**Director del Proyecto**
Aprobó	**Cristian Jiménez Yejas**	**Representante legal**

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.
