5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
JOSE EUSEBIO CARO				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO




https://drive.google.com/open?id=1ZEfG2hFKZOYEbyenbiNKZW_zk-fr_IC

FOTO 1	Ampliación de excavación de zapatas. JOSE EUSEBIO CARO



https://drive.google.com/open?id=1tL5hDEfBfZwFyqGRdA9IHXRmSRB

FOTO 2	Demolición de losa JOSE EUSEBIO CARO

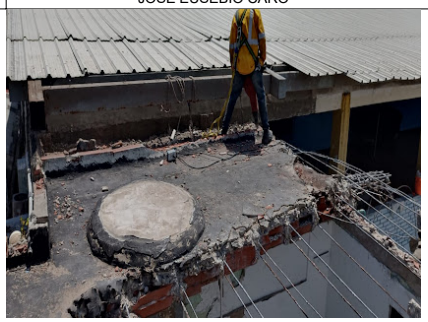

https://drive.google.com/open?id=1dqGBDY2-4S1DuynPZ0TBHpv_y

FOTO 3	Demolición de losa JOSE EUSEBIO CARO



https://drive.google.com/open?id=1SrSNAB8DZSBdJbyQcSmpdF3nBaUp

FOTO 4	Escarificación de columnas. JOSE EUSEBIO CARO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 31**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	2	AL	8

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.63%	0.00%	0.00%	8	2.63%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.63%	0.34%	0.34%	9	2.63%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.63%	0.93%	1.27%	10	2.63%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.63%	1.27%	2.54%	11	2.63%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.63%	0.49%	3.03%	12	2.63%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	13	2.63%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	14	2.63%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	15	2.63%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	16	2.63%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	17	2.63%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	18	2.63%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	19	2.63%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.63%	1.42%	4.45%	20	2.63%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.63%	1.16%	5.61%	21	2.63%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.63%	0.41%	6.02%	22	2.63%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.63%	0.06%	6.08%	23	2.63%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.63%	0.03%	6.11%	24	2.63%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.63%	0.08%	6.19%	25	2.63%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.63%	0.01%	6.19%	26	2.63%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.63%	0.05%	6.24%	27	2.63%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.63%	0.34%	6.57%	28	2.63%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.63%	0.40%	6.98%	29	2.63%	0.40%	$4,913,054	6.98%
30	25/6/2023	1/7/2023	12.68%	2.98%	9.96%	30	12.68%	2.98%	$36,207,192	9.96%
31	2/7/2023	8/7/2023	4.85%	3.12%	13.08%	31	4.85%	3.12%	$37,840,801	13.08%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

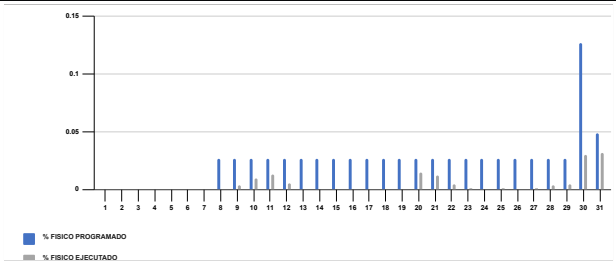

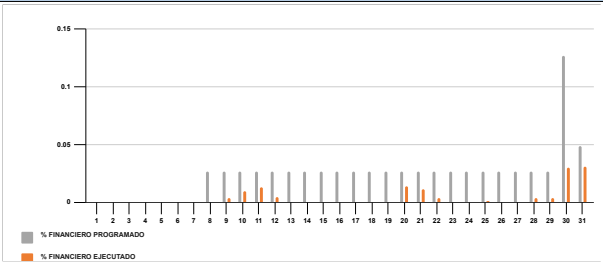

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	**KR 33 #45 - 71**	2023-07-02	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-07-03	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-07-04	Corte y figurado de acero para zapatas.	N/A
		2023-07-05	Perforaciones para anclajes del bloque 2. Acopio de material RCD.	N/A
		2023-07-06	Anclaje de acero en zapata del bloque 2. Ampliación de excavación de zapatas en bloque 3.	N/A
		2023-07-07	Ampliación de excavación de zapatas en bloque. Demolición de plantilla de zapata del bloque 3. Corte y figuración de acero para zapata del bloque 2.	N/A

	2023-07-08	Corte y figuración de acero para columna del bloque 1. Demolición de plantilla esmaltada bloque 3.		N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**875.15**		**875.15**		**$4,221**	**$0**	**875.15**	**0.00**
1.03	**LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE**	MT2	**942.32**		**634.72**		**$9,648**	**$0**	**634.72**	**307.60**
1.05	**CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS**	ML	**41.1205**		**41.12**		**$23,673**	**$0**	**41.12**	**0.00**
1.07	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt**	ML	**93.66**		**76.50**		**$140,481**	**$0**	**76.50**	**17.16**
2.02	**DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m**	MT2	**215.15**		**103.76**	**18.04**	**$20,699**	**$373,410**	**121.80**	**93.35**
2.05	**DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	M3	**111.28**		**9.23**		**$266,275**	**$0**	**9.23**	**102.05**
2.07	**ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M**	M2	**185.5**		**85.50**		**$25,547**	**$0**	**85.50**	**100.00**
2.08	**ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO**	ML	**651.5**		**30.19**		**$16,513**	**$0**	**30.19**	**621.31**
2.09	**EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA**	MT3	**155.8**		**43.22**		**$93,507**	**$0**	**43.22**	**112.58**
2.15	**ACERO DE REFUERZO FIGURADO**	KGS	**14687.17**		1,257.48	**987.17**	**$9,568**	**9,445,242.56**	2,244.65	12,442.52
2.16	**ANCLAJE EPOXICO**	UND	**4815**		537.00	**693.00**	**$40,436**	**28,022,148.00**	1,230.00	3,585.00
2.41	**CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.**	MT3	**74.15**		**5.12**		**$3,219,697**	**$0**	**5.12**	**69.03**
3.01	**CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	ML	**280**		**140.00**		**$14,939**	**$0**	**140.00**	**140.00**
3.02	**DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL**	MT2	**68.17**		33.60		**$32,154**	-	33.60	34.57
5.04	**DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	MT2	**7**		**7.00**		**$22,404**	**$0**	**7.00**	**-**
5.14	**DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.**	MT2	**740.25**		**545.17**		**$34,014**	**$0**	**545.17**	**195.08**
5.15	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD**	MT2	**7.21**		**7.21**		**$133,816**	**$0**	**7.21**	**-**
6.04	**DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	MT2	**530.72**		**530.72**		**$20,865**	**$0**	**530.72**	**-**
6.05	**ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO**	MT2	**616.6**		**32.02**		**$17,948**	**$0**	**32.02**	**584.58**
6.07	**PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS**	MT2	**132.02**		**32.02**		**$20,720**	**$0**	**32.02**	**100.00**
7.01	**DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL**	UND	**1**		**1.00**		**$38,451**	**$0**	**1.00**	**-**
7.02	**DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL**	UND	**4**		**4.00**		**$57,053**	**$0**	**4.00**	**-**
7.03	**DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL**	UND	**5**		**5.00**		**$32,669**	**$0**	**5.00**	**-**
9.01	**DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS**	UND	**85**		**65.00**		**$19,629**	**$0**	**65.00**	**20.00**
9.02	**DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO**	UND	**22**		**22.00**		**$16,601**	**$0**	**22.00**	**-**
9.03	**DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO**	UND	**4**		**4.00**		**$19,709**	**$0**	**4.00**	**-**
10.07	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"**	ML	**16**		**16.00**		**$29,367**	**$0**	**16.00**	**-**

VALOR DE OBRA	$37,840,801
INCIDENCIA	3.12%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
JOSE EUSEBIO CARO				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1DSbVbnPBPVRdnyOeSmyyaFs7

FOTO 1	Escarificación de columnas. JOSE EUSEBIO CARO



https://drive.google.com/open?id=1bBPcvnbTVDqAA1o0gaoRaBCqg

FOTO 2	Acopio de Escombros JOSE EUSEBIO CARO



https://drive.google.com/open?id=1RIkmw1DD6eg2OabujalYg7vK7qa7

FOTO 3	Acopio de Escombros JOSE EUSEBIO CARO



https://drive.google.com/open?id=12Ur_9aR1NU6CSv1DWoXa0YOI0grqLxZg

FOTO 4	Acopio de Escombros JOSE EUSEBIO CARO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 32**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	9	AL	15

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.63%	0.00%	0.00%	8	2.63%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.63%	0.34%	0.34%	9	2.63%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.63%	0.93%	1.27%	10	2.63%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.63%	1.27%	2.54%	11	2.63%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.63%	0.49%	3.03%	12	2.63%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	13	2.63%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	14	2.63%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	15	2.63%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	16	2.63%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	17	2.63%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	18	2.63%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	19	2.63%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.63%	1.42%	4.45%	20	2.63%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.63%	1.16%	5.61%	21	2.63%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.63%	0.41%	6.02%	22	2.63%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.63%	0.06%	6.08%	23	2.63%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.63%	0.03%	6.11%	24	2.63%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.63%	0.08%	6.19%	25	2.63%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.63%	0.01%	6.19%	26	2.63%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.63%	0.05%	6.24%	27	2.63%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.63%	0.34%	6.57%	28	2.63%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.63%	0.40%	6.98%	29	2.63%	0.40%	$4,913,054	6.98%
30	25/6/2023	1/7/2023	12.68%	2.98%	9.96%	30	12.68%	2.98%	$36,207,192	9.96%
31	2/7/2023	8/7/2023	4.85%	3.12%	13.08%	31	4.85%	3.12%	$37,840,801	13.08%
32	9/7/2023	15/7/2023	8.15%	2.97%	16.05%	32	8.15%	2.97%	$36,089,216	16.05%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

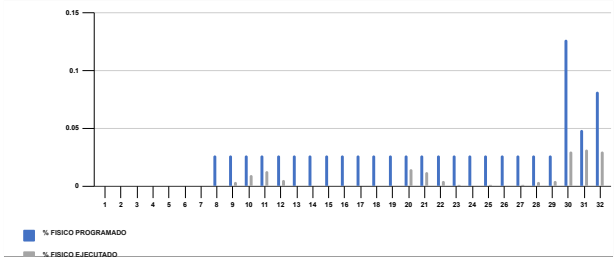

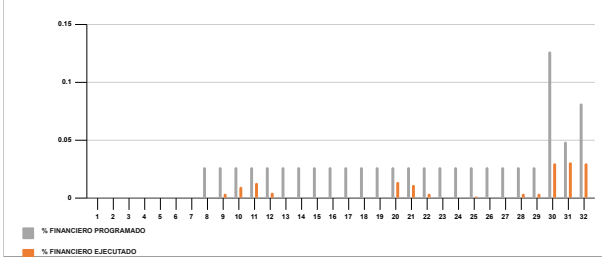

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-07-09	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-07-10	Corte y figurado de acero para zapatas.	N/A
		2023-07-11	Limpieza de zapatas para aplicar adhesivo epóxico sikadur 32 en bloque 1. Encofrado de zapata bloque 1.	N/A
		2023-07-12	Fundida de zapata. Aplicación de adhesivo epóxico sikadur 32. Anclajes con epóxico. Excavaciones para ampliar zapatas.	N/A
		2023-07-13	Excavaciones de zapatas bloque 3. Escarificación de columna bloque 2. Anclajes de zapata bloque 2.	N/A

		2023-07-14	Armado de estructura para aula provisional. Escarificación de columnas del bloque 2. Perforaciones para anclajes bloque 2. Excavación de zapatas.	N/A
		2023-07-15	Instalacion de laminas de Eterboard para aula provisional. Escarificación de columnas del bloque 2. Cerramiento de Eterboard para proteger tanques de agua.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	875.15		875.15		$4,221	-	875.15	0.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	942.32		634.72		$9,648	-	634.72	307.60
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	41.1205		41.12		$23,673	-	41.12	0.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	93.66		76.50	12.17	$140,481	$1,708,951	88.67	5.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	215.15		121.80		$20,699	$0	121.80	93.35
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	111.28		9.23		$266,275	$0	9.23	102.05
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		85.50		$25,547	$0	85.50	100.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		30.19		$16,513	$0	30.19	621.31
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		43.22		$93,507	$0	43.22	112.58
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	14687.17		2,244.65	715.87	$9,568	6,849,444.16	2,960.52	11,726.65
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	4815		1,230.00	352.00	$40,436	14,233,472.00	1,582.00	3,233.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	74.15		5.12	4.13	$3,219,697	$13,297,349	9.25	64.90
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	280		140.00		$14,939	$0	140.00	140.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	68.17		33.60		$32,154	-	33.60	34.57
5.04	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	7		7.00		$22,404	$0	7.00	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740.25		545.17		$34,014	$0	545.17	195.08
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	7.21		7.21		$133,816	$0	7.21	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	530.72		530.72		$20,865	$0	530.72	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		32.02		$17,948	$0	32.02	584.58
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	132.02		32.02		$20,720	$0	32.02	100.00
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	1		1.00		$38,451	$0	1.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	4		4.00		$57,053	$0	4.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	5		5.00		$32,669	$0	5.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	85		65.00		$19,629	$0	65.00	20.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	22		22.00		$16,601	$0	22.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		4.00		$19,709	$0	4.00	-

10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	16		16.00		$29,367	$0	16.00	-

VALOR DE OBRA	36,089,216.14
INCIDENCIA	2.97%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
JOSE EUSEBIO CARO				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1KiB62CvL_grOHeoSX0xjTZ9b88IUF

FOTO 1	Excavación y limpieza de zapatas. JOSE EUSEBIO CARO



https://drive.google.com/open?id=1cwFvIlLDqWxqNgAKVD3j1AY3ZOUgkXC

FOTO 2	Anclaje en columna. JOSE EUSEBIO CARO



https://drive.google.com/open?id=1RZPDI9omLErTlwVgpuJtP1ox7770

FOTO 3	Excavación de zapatas. JOSE EUSEBIO CARO



https://drive.google.com/open?id=1FhKePOI-9IY5qUAtldp5IRlHrZEhm2nU

FOTO 4	Aula Provisional. JOSE EUSEBIO CARO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 33**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	16	AL	22

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.63%	0.00%	0.00%	8	2.63%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.63%	0.34%	0.34%	9	2.63%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.63%	0.93%	1.27%	10	2.63%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.63%	1.27%	2.54%	11	2.63%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.63%	0.49%	3.03%	12	2.63%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	13	2.63%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	14	2.63%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	15	2.63%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	16	2.63%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	17	2.63%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	18	2.63%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	19	2.63%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.63%	1.42%	4.45%	20	2.63%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.63%	1.16%	5.61%	21	2.63%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.63%	0.41%	6.02%	22	2.63%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.63%	0.06%	6.08%	23	2.63%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.63%	0.03%	6.11%	24	2.63%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.63%	0.08%	6.19%	25	2.63%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.63%	0.01%	6.19%	26	2.63%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.63%	0.05%	6.24%	27	2.63%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.63%	0.34%	6.57%	28	2.63%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.63%	0.40%	6.98%	29	2.63%	0.40%	$4,913,054	6.98%
30	25/6/2023	1/7/2023	12.68%	2.98%	9.96%	30	12.68%	2.98%	$36,207,192	9.96%
31	2/7/2023	8/7/2023	4.85%	3.12%	13.08%	31	4.85%	3.12%	$37,840,801	13.08%
32	9/7/2023	15/7/2023	8.15%	2.97%	16.05%	32	8.15%	2.97%	$36,089,216	16.05%
33	16/7/2023	22/7/2023	7.17%	7.40%	23.46%	33	7.17%	7.40%	$89,822,794	23.46%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

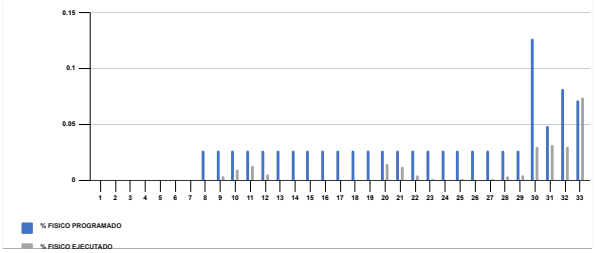

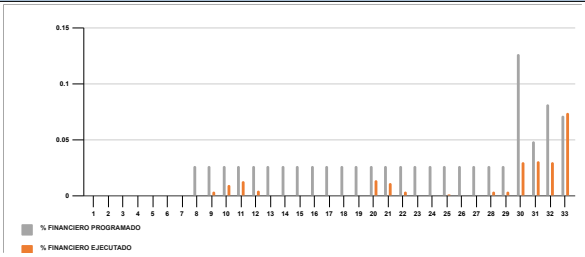

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO	KR 33 #45 - 71	2023-07-16	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-07-17	Instalacion de laminas de Eterboard para aula provisional. Instalacion de cielo raso. Cerramiento en eterboard en área de zapatas del bloque 3. Escarificación de columna del bloque 3.	N/A
		2023-07-18	Escarificación de columna del bloque 2. Anclaje de columna del bloque 2. Corte y figuración de acero. Aplicación de estuco para aula provisional.	N/A
		2023-07-19	Aplicación de sikaflex y estuco en aula provisional. Armado de acero y encofrado de columna G9-I9. Aplicación de adhesivo epóxico sikadur 32 en columnas. Anclajes de columnas H9 en parte superior.	N/A

EUSEBIO CARO	[illegible]	2023-07-20	Fundida de columna G9-I9. Corte y figuración de acero. Armado de acero para columna. Aplicación de estuco y pintura en aula provisional. Soporte de madera para marcos de ventanas y puertas. Aplicación de sikaflex para juntas del aula provisional.	N/A
		2023-07-21	Aplicación de estuco y pintura en aula provisional. Armado de acero en columna del bloque 2. Corte y figuración de acero.	N/A
		2023-07-22	Aplicación de estuco y pintura en aula provisional. Armado de acero en columna del bloque 2. Relleno con material seleccionado.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	875.15		875.15		$4,221	-	875.15	0.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	942.32		634.72		$9,648	-	634.72	307.60
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	41.1205		41.12		$23,673	-	41.12	0.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	93.66		88.67	5.00	$140,481	$701,703	93.66	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	215.15		121.80		$20,699	$0	121.80	93.35
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	111.28		9.23		$266,275	$0	9.23	102.05
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		85.50		$25,547	$0	85.50	100.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		30.19		$16,513	$0	30.19	621.31
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		43.22		$93,507	$0	43.22	112.58
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	89.18		-	24.17	$192,928	4,663,069.76	24.17	65.01
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	14687.17		2,960.52	1,369.15	$9,568	13,100,027.20	4,329.67	10,357.50
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	4815		1,582.00	893.00	$40,436	36,109,348.00	2,475.00	2,340.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	74.15		9.25	3.44	$3,219,697	$11,075,758	12.69	61.46
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	280		140.00		$14,939	$0	140.00	140.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	68.17		33.60		$32,154	-	33.60	34.57
5.04	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	7		7.00		$22,404	$0	7.00	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740.25		545.17		$34,014	$0	545.17	195.08
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	7.21		7.21		$133,816	$0	7.21	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	530.72		530.72		$20,865	$0	530.72	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		32.02	7.00	$17,948	$125,636	39.02	577.58
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	132.02		32.02		$20,720	$0	32.02	100.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	136.46		-	32.15	$18,887	607,217.05	32.15	104.31
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	42		-	42.00	$67,320	2,827,440.00	42.00	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	1		1.00		$38,451	$0	1.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	4		4.00		$57,053	$0	4.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	5		5.00		$32,669	$0	5.00	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	4		-	4.00	$323,953	1,295,812.00	4.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	85		65.00		$19,629	$0	65.00	20.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	22		22.00		$16,601	$0	22.00	-

9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		4.00		$19,709	$0	4.00	-
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	16		16.00		$29,367	$0	16.00	-
NP 32	CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR.	M3	27.131			11.15	$1,732,447	19,316,784.05	11.15	15.98

VALOR DE OBRA	89,822,794.34
INCIDENCIA	7.40%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
JOSE EUSEBIO CARO				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1yOvKz60C_lobfUIdIlxULdPPxwHPEW_d

FOTO 1	Armado de acero para columna. JOSE EUSEBIO CARO



https://drive.google.com/open?id=1Zb_uaDmOrM4qtuvASoLyVb8d1tspu36

FOTO 2	Armado de acero para columna. JOSE EUSEBIO CARO



https://drive.google.com/open?id=1XOVOnIB1EA1B2EYEmqgEdrBHN6d

FOTO 3	Desencofrado de columna JOSE EUSEBIO CARO



https://drive.google.com/open?id=1RE7BGBGbLPBcHOlqbpKbcqvGyB1b6WE

FOTO 4	Cerramiento. JOSE EUSEBIO CARO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 34**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	23	AL	29

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.63%	0.00%	0.00%	8	2.63%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.63%	0.34%	0.34%	9	2.63%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.63%	0.93%	1.27%	10	2.63%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.63%	1.27%	2.54%	11	2.63%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.63%	0.49%	3.03%	12	2.63%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	13	2.63%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	14	2.63%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	15	2.63%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.63%	0.00%	3.03%	16	2.63%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	17	2.63%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	18	2.63%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.63%	0.00%	3.03%	19	2.63%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.63%	1.42%	4.45%	20	2.63%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.63%	1.16%	5.61%	21	2.63%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.63%	0.41%	6.02%	22	2.63%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.63%	0.06%	6.08%	23	2.63%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.63%	0.03%	6.11%	24	2.63%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.63%	0.08%	6.19%	25	2.63%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.63%	0.01%	6.19%	26	2.63%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.63%	0.05%	6.24%	27	2.63%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.63%	0.34%	6.57%	28	2.63%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.63%	0.40%	6.98%	29	2.63%	0.40%	$4,913,054	6.98%
30	25/6/2023	1/7/2023	12.68%	2.98%	9.96%	30	12.68%	2.98%	$36,207,192	9.96%
31	2/7/2023	8/7/2023	4.85%	3.12%	13.08%	31	4.85%	3.12%	$37,840,801	13.08%
32	9/7/2023	15/7/2023	8.15%	2.97%	16.05%	32	8.15%	2.97%	$36,089,216	16.05%
33	16/7/2023	22/7/2023	7.17%	7.40%	23.46%	33	7.17%	7.40%	$89,822,794	23.46%
34	23/7/2023	29/7/2023	8.15%	5.57%	29.02%	34	8.15%	5.57%	$67,542,563	29.02%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

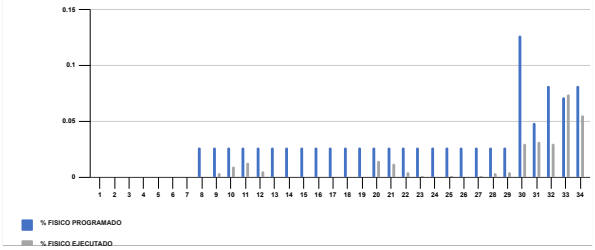

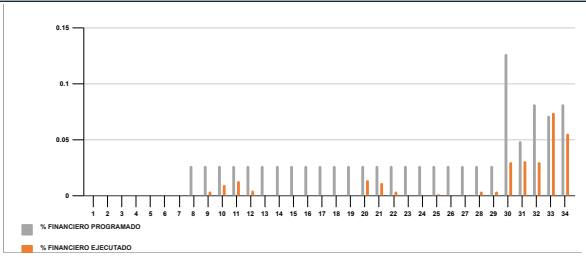

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
		2023-07-23	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-07-24	Aplicacion de pintura en aula provisional. Instalación de puerta y ventana en aula provisional. Anclaje con epóxico. Armado de encofrado para columna. Escarificación de columna del bloque 3. Relleno con material seleccionado de zapatas y vigas.	N/A
JOSE		2023-07-25	Corte y figuración de acero para columnas. Anclaje para columnas parte superior. Aplicación de estuco en aula provisional. Relleno con material seleccionado. Escarificación de columnas del bloque 3.	N/A

JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-07-26	Armado de eterboard en garita de celadores. Escarificación de columnas del bloque 2 y 3. Anclajes de acero en bloque 2 parte posterior. Armado de acero en columna del bloque 1. Corte y figuración de acero para columnas.	N/A
		2023-07-27	Escarificación y encofrado de columnas. Armado de acero parte posterior. Perforación de zapata tipo 4 en bloque 2.	N/A
		2023-07-28	Fundida de una columna del eje 4. Escarificación de columnas. Relleno de material seleccionado. Perforaciones para anclajes.	N/A
		2023-07-29	Escarificación de columnas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	875.15		875.15		$4,221	-	875.15	0.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	942.32		634.72		$9,648	-	634.72	307.60
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	41.1205		41.12		$23,673	-	41.12	0.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	93.66		93.66		$140,481	$0	93.66	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	215.15		121.80		$20,699	$0	121.80	93.35
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	111.28		9.23		$266,275	$0	9.23	102.05
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		85.50		$25,547	$0	85.50	100.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		30.19		$16,513	$0	30.19	621.31
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		43.22		$93,507	$0	43.22	112.58
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	89.18		24.17	19.13	$192,928	3,690,712.64	43.30	45.88
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	14687.17		4,329.67	739.18	$9,568	7,072,474.24	5,068.85	9,618.32
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	4815		2,475.00	528.00	$40,436	21,350,208.00	3,003.00	1,812.00
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	69.17		-	18.15	$99,065	1,798,029.75	18.15	51.02
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	74.15		12.69	2.17	$3,219,697	$6,986,742	14.86	59.29
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	280		140.00		$14,939	$0	140.00	140.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	68.17		33.60		$32,154	-	33.60	34.57
5.04	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	7		7.00		$22,404	$0	7.00	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740.25		545.17		$34,014	$0	545.17	195.08
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	7.21		7.21		$133,816	$0	7.21	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	530.72		530.72		$20,865	$0	530.72	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		39.02	8.00	$17,948	$143,584	47.02	569.58
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	132.02		32.02		$20,720	$0	32.02	100.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	136.46		32.15	9.85	$18,887	186,036.95	42.00	94.46
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	42		42.00		$67,320	-	42.00	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	1		1.00		$38,451	$0	1.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	4		4.00		$57,053	$0	4.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	5		5.00		$32,669	$0	5.00	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	4		4.00		$323,953	-	4.00	-

7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR	M2	2		-	2.00	$891,836	1,783,672.00	2.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	85		65.00		$19,629	$0	65.00	20.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	22		22.00		$16,601	$0	22.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		4.00		$19,709	$0	4.00	-
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	16		16.00		$29,367	$0	16.00	-
NP 32	CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR.	M3	27.131			7.38	$1,732,447	12,785,458.86	7.38	19.75
NP 40	CONSTRUCCIÓN MURO EN ETERBOARD DE 8 MM A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2	97.86			97.86	$120,025	11,745,644.54	97.86	-
							VALOR DE OBRA	67,542,563.47		
							INCIDENCIA	5.57%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
JOSE EUSEBIO CARO				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Escarificación y armado de acero para columna. JOSE EUSEBIO CARO	FOTO 2	Anclaje para columnas JOSE EUSEBIO CARO



FOTO 3	Relleno con material seleccionado. JOSE EUSEBIO CARO	FOTO 4	Encofrado de columna JOSE EUSEBIO CARO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUAN ACOSTA SOLERA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN ACOSTA SOLERA No. 30**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	25	AL	1

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
29	18/6/2023	24/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	29	0.00%	0.00%	**$0**	0.00%
30	25/6/2023	1/7/2023	11.52%	4.92%	4.92%	30	11.52%	4.92%	**$11,629,492**	4.92%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

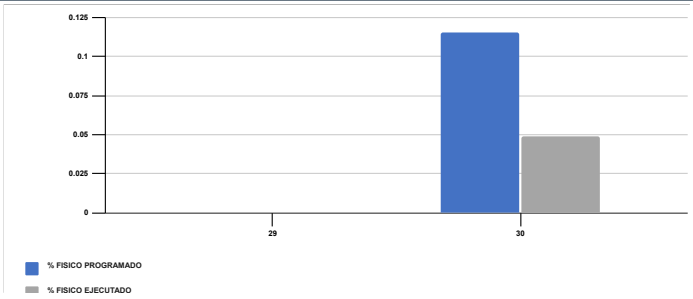

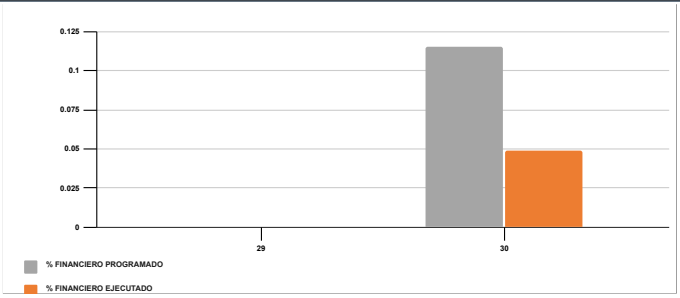

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN ACOSTA SOLERA	CL 112 B # 24 - 14	2023-06-25	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-06-26	Desmonte de cielo raso y perfiles. Desmonte de puntos eléctricos.	N/A
		2023-06-27	Desmonte de cubierta.	N/A
		2023-06-28	Desmonte de cubierta salon 6.	N/A
		2023-06-29	Desmonte de cubierta salones 4 y 5.	N/A
		2023-06-30	Desmonte de cubierta salon 3.	N/A
		2023-07-01	Desmonte de cubierta salon 2.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
5.14	**DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.**	MT2	**288.44**			**112.18**	**$34,014**	**3,815,690.52**	112.18	176.26
9.01	**DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS**	UND	**34**			**29.00**	**$19,629**	**569,241.00**	29.00	5.00
							VALOR DE OBRA	**11,629,491.85**		
							INCIDENCIA	**4.92%**		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA

JUAN ACOSTA SOLERA	**Anderson Saavedra**	**Ricardo Caballero**	**Andamio, Tronzadora, Demoledor, Pulidora, Herramienta Menor**	**NO APLICA**
		Inspector Luis Mendoza		**NO APLICA**
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1OC3IYX6My4wUa_u4fzbsb2fwHl0s

FOTO 1	Desmonte de cielo raso y perfiles. Desmonte de puntos eléctricos. JUAN ACOSTA SOLERA



https://drive.google.com/open?id=1xE_eXuWhtwaV27A1z70G4VpzRM8MUI2u

FOTO 2	Desmonte de cubierta. JUAN ACOSTA SOLERA



https://drive.google.com/open?id=1YiGs5h235NTwnVtJaH30oTlz4Ah6z

FOTO 3	Desmonte de cubierta. JUAN ACOSTA SOLERA



https://drive.google.com/open?id=1cYs2vkxSI0lC_WWe5ayUUIIusDVpvLoX

FOTO 4	Desmonte de cubierta. JUAN ACOSTA SOLERA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por: Ricardo Caballero	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN ACOSTA SOLERA No. 31**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	2	AL	8

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
29	18/6/2023	24/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	29	0.00%	0.00%	**$0**	0.00%
30	25/6/2023	1/7/2023	11.52%	4.92%	4.92%	30	11.52%	4.92%	**$11,629,492**	4.92%
31	2/7/2023	8/7/2023	21.68%	9.88%	14.80%	31	21.68%	9.88%	**$23,354,312**	14.80%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

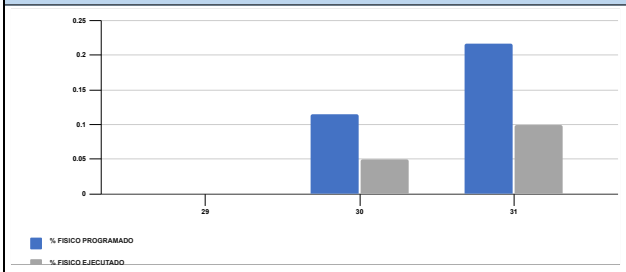

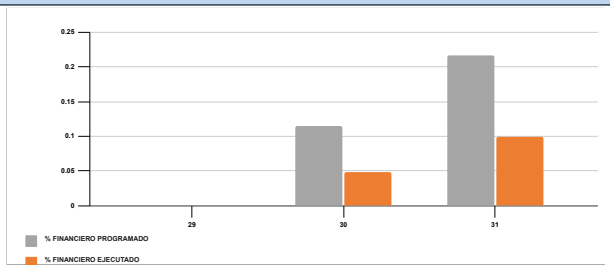

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN ACOSTA SOLERA	**CL 112 B # 24 - 14**	2023-07-02	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-07-03	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-07-04	Demolición de dos hiladas de bloque de cuchillas. Desmonte de estructura de madera. Acopio De material orden y aseo.	N/A
		2023-07-05	Desmonte de estructura de madera de salon 2.	N/A
		2023-07-06	Desmonte de cubierta y de estructura de madera de salon 1.	N/A
		2023-07-07	Corte y figuración de acero para columnetas. Corte y soldadura sobre estructura metálica	N/A
		2023-07-08	Desmonte de tubería de soporte en pasillo. Corte y figuración de acero para columnetas. Corte de estructura metálica perfiles.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**288.44**		**279.43**		**$4,221**	**-**	**279.43**	**9.01**
2.15	**ACERO DE REFUERZO FIGURADO**	KGS	**568**		-	**127.75**	**$9,568**	**1,222,312.00**	127.75	440.25
3.01	**CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	ML	**68.12**		-	**49.16**	**$14,939**	**734,401.24**	49.16	18.96
3.02	**DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL**	MT2	**11.55**		-	**5.14**	**$32,154**	**165,271.56**	5.14	6.41
3.16	**DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .**	MT2	**8.88**		-	**8.88**	**$38,862**	**345,094.56**	8.88	-
4.03	**SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO**	KGS	**3902.72**		-	**634.00**	**$24,307**	**15,410,638.00**	634.00	3,268.72

5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	288.44		112.18	161.01	$34,014	5,476,594.14	273.19	15.25
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	210.02		210.02		$20,865	-	210.02	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	13		13.00		$32,669	-	13.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	6		6.00		$32,643	-	6.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	34		29.00		$19,629	-	29.00	5.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	64		64.00		$16,601	-	64.00	-
							VALOR DE OBRA	23,354,311.50		
							INCIDENCIA	9.88%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN ACOSTA SOLERA	Anderson Saavedra	Ricardo Caballero	Andamio, Tronzadora, Demoledor, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1Y9eaZ0vc1vkXVvM2K1npKQxk1e1

FOTO 1	Desmonte de cubierta. JUAN ACOSTA SOLERA



https://drive.google.com/open?id=1G1Fu1WusBzjRlWuGAQ33DZIny9O4wprs

FOTO 2	Desmonte de cubierta. JUAN ACOSTA SOLERA



https://drive.google.com/open?id=1TW-hWXHMZAEA_VkzHRXZvNgbcV

FOTO 3	Desmonte de estructura de madera JUAN ACOSTA SOLERA



https://drive.google.com/open?id=1NIE-EYcgGAEaZzDMRTMTHRRZHRS

FOTO 4	Desmonte de estructura de madera JUAN ACOSTA SOLERA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN ACOSTA SOLERA No. 32**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	9	AL	15

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
29	18/6/2023	24/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	29	0.00%	0.00%	**$0**	0.00%
30	25/6/2023	1/7/2023	11.52%	4.92%	4.92%	30	11.52%	4.92%	**$11,629,492**	4.92%
31	2/7/2023	8/7/2023	21.68%	9.88%	14.80%	31	21.68%	9.88%	**$23,354,312**	14.80%
32	9/7/2023	15/7/2023	23.07%	8.60%	23.40%	32	23.07%	8.60%	**$20,335,788**	23.40%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN ACOSTA SOLERA	**CL 112 B # 24 - 14**	2023-07-09	Corte y soldadura sobre estructura metálica perfiles. Orden y aseo.	N/A
		2023-07-10	Corte y figuración de acero. Corte y soldadura sobre estructura metálica perfiles. Corte de lamina galvanizada . Escarificación para armado de columnetas.	N/A
		2023-07-11	Soldadura sobre estructura metálica perfiles. Escarificación para armado de columnetas. Encofrado y fundido de columnetas.	N/A
		2023-07-12	Aplicacion de pintura epóxica sobre estructura metálica. Encofrado y fundido de columnetas. Escarificación para armado de columnetas.	N/A
		2023-07-13	Aplicacion de pintura epóxica sobre estructura metálica. Encofrado y fundido de columnetas. Escarificación de pared para armado de columnetas. Soldadura sobre estructura metálica perfiles.	N/A
		2023-07-14	Soldadura y Aplicación de pintura epóxica sobre estructura metálica. Levante de muro en salon 1. Orden y aseo.	N/A
		2023-07-15	Aplicacion de pintura epóxica sobre estructura metálica. Levante de muro. Orden y aseo.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**288.44**		**279.43**		**$4,221**	**-**	**279.43**	**9.01**
2.15	**ACERO DE REFUERZO FIGURADO**	KGS	**568**		**127.75**	**98.15**	**$9,568**	**939,099.20**	**225.90**	**342.10**
2.16	**ANCLAJE EPOXICO**	UND	**384**		**-**	**44.00**	**$40,436**	**1,779,184.00**	**44.00**	**340.00**
2.18	**COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**3.32**		**-**	**0.57**	**$1,742,818**	**993,406.26**	**0.57**	**2.75**
3.01	**CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	ML	**68.12**		**49.16**		**$14,939**	**-**	**49.16**	**18.96**
3.02	**DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL**	MT2	**11.55**		**5.14**		**$32,154**	**-**	**5.14**	**6.41**
3.07	**LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,**	ML	**132.75**		**-**	**66.17**	**$60,337**	**3,992,499.29**	**66.17**	**66.58**
3.16	**DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .**	MT2	**8.88**		**8.88**		**$38,862**	**-**	**8.88**	**-**

4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	3902.72		634.00	450.65	$24,307	10,953,949.55	1,084.65	2,818.07
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	288.44		273.19		$34,014	-	273.19	15.25
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	210.02		210.02		$20,865	-	210.02	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	13		13.00		$32,669	-	13.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	6		6.00		$32,643	-	6.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	34		29.00		$19,629	-	29.00	5.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	64		64.00		$16,601	-	64.00	-
NP 24	ESCARIFICIACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	252.62			252.62	$6,641	1,677,649.42	252.62	-
							VALOR DE OBRA	20,335,787.72		
							INCIDENCIA	8.60%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN ACOSTA SOLERA	Anderson Saavedra	Ricardo Caballero	Andamio, Tronzadora, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

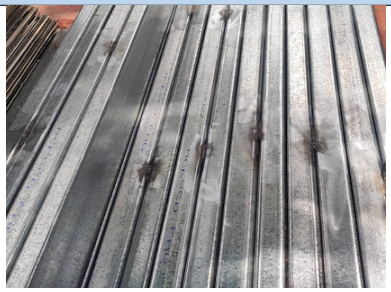


FOTO 1	Corte y soldadura sobre estructura metálica perfiles. JUAN ACOSTA SOLERA



FOTO 2	Aplicacion de pintura epóxica sobre estructura metálica. JUAN ACOSTA SOLERA



FOTO 3	Corte y figuración de acero. JUAN ACOSTA SOLERA



FOTO 4	Escarificación para espacio de columnetas. JUAN ACOSTA SOLERA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por: Ricardo Caballero	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN ACOSTA SOLERA No. 33**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	16	AL	22

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
29	18/6/2023	24/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	29	0.00%	0.00%	**$0**	0.00%
30	25/6/2023	1/7/2023	11.52%	4.92%	4.92%	30	11.52%	4.92%	**$11,629,492**	4.92%
31	2/7/2023	8/7/2023	21.68%	9.88%	14.80%	31	21.68%	9.88%	**$23,354,312**	14.80%
32	9/7/2023	15/7/2023	23.07%	8.60%	23.40%	32	23.07%	8.60%	**$20,335,788**	23.40%
33	16/7/2023	22/7/2023	21.09%	2.28%	25.68%	33	21.09%	2.28%	**$5,391,478**	25.68%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

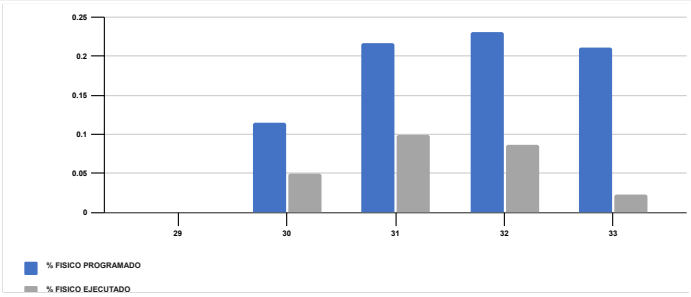

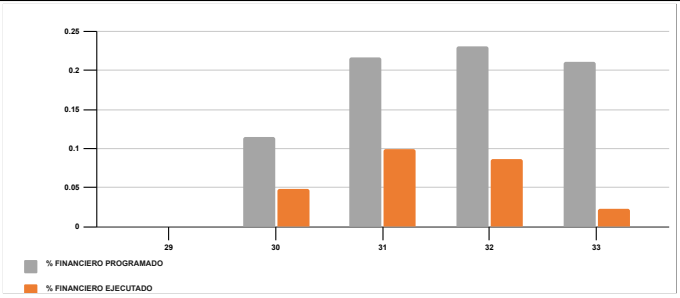

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN ACOSTA SOLERA	**CL 112 B # 24 - 14**	2023-07-16	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-07-17	Levante de muro. Pañete de columnetas. Orden y aseo.	N/A
		2023-07-18	Levante de muro. Pañete sobre muro. Orden y aseo.	N/A
		2023-07-19	Pañete allanado sobre muro. Orden y aseo.	N/A
		2023-07-20	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-07-21	Pañete allanado sobre muro. Orden y aseo.	N/A
		2023-07-22	Encofrado de vigas sobre muro. Fundida de vigas. Orden y aseo.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**288.44**		**279.43**		**$4,221**	**-**	**279.43**	**9.01**
2.15	**ACERO DE REFUERZO FIGURADO**	KGS	**568**		225.90	**68.15**	**$9,568**	**652,059.20**	294.05	273.95
2.16	**ANCLAJE EPOXICO**	UND	**384**		44.00		**$40,436**	**-**	44.00	340.00
2.18	**COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**3.32**		0.57		**$1,742,818**	**-**	0.57	2.75

2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	1.9		-	0.66	$1,894,074	1,250,088.84	0.66	1.24
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	68.12		49.16		$14,939	-	49.16	18.96
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	11.55		5.14		$32,154	-	5.14	6.41
3.07	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	ML	132.75		66.17	45.56	$60,337	2,748,953.72	111.73	21.02
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	112.78		-	37.18	$17,610	654,739.80	37.18	75.60
3.15	LEVANTE DE MURO EN LADRILLO TOLETE DE 0.20 X 0.06 X 0.10 METROS, CON MORTERO DE PEGA.	MT2	0.8		-	0.80	$107,045	85,636.00	0.80	-
3.16	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .	MT2	8.88		8.88		$38,862	-	8.88	-
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	3902.72		1,084.65		$24,307	-	1,084.65	2,818.07
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	288.44		273.19		$34,014	-	273.19	15.25
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	210.02		210.02		$20,865	-	210.02	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	13		13.00		$32,669	-	13.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	6		6.00		$32,643	-	6.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	34		29.00		$19,629	-	29.00	5.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	64		64.00		$16,601	-	64.00	-
NP 24	ESCARIFICIACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	252.62		252.62		$6,641	-	252.62	-

VALOR DE OBRA	5,391,477.56
INCIDENCIA	2.28%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN ACOSTA SOLERA	Anderson Saavedra	Ricardo Caballero	Andamio, Tronzadora, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1jiZO53-OVptfUBU79Q0kREhym75P



https://drive.google.com/open?id=1fiNFMt8xI-VMaVA9WpwyaxYqDhJ-ym

FOTO 1	Levante de muro JUAN ACOSTA SOLERA	FOTO 2	Pañete allanado. JUAN ACOSTA SOLERA

 https://drive.google.com/open?id=1OA8lJdOnvCXwVBl3lYGlnDxwX-Hl		 https://drive.google.com/open?id=1GD931r_J9ZsHAVMKGZzZAN3ZRhoMJHG	
FOTO 3	Pañete allanado. JUAN ACOSTA SOLERA	**FOTO 4**	Levante de muro JUAN ACOSTA SOLERA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero.		
NOMBRE Ricardo Caballero	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN ACOSTA SOLERA No. 34**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	23	AL	29

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
29	18/6/2023	24/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	29	0.00%	0.00%	**$0**	0.00%
30	25/6/2023	1/7/2023	11.52%	4.92%	4.92%	30	11.52%	4.92%	**$11,629,492**	4.92%
31	2/7/2023	8/7/2023	21.68%	9.88%	14.80%	31	21.68%	9.88%	**$23,354,312**	14.80%
32	9/7/2023	15/7/2023	23.07%	8.60%	23.40%	32	23.07%	8.60%	**$20,335,788**	23.40%
33	16/7/2023	22/7/2023	21.09%	2.28%	25.68%	33	21.09%	2.28%	**$5,391,478**	25.68%
34	23/7/2023	29/7/2023	15.94%	1.31%	26.99%	34	15.94%	1.31%	**$3,108,593**	26.99%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

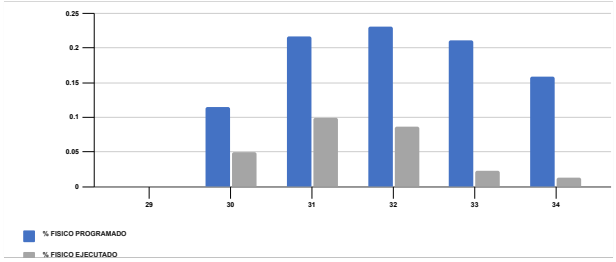

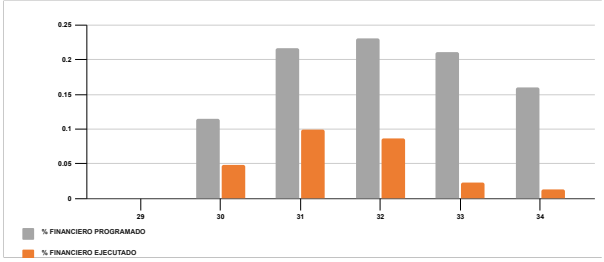

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN ACOSTA SOLERA	CL 112 B # 24 - 14	2023-07-23	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-07-24	Encofrado de vigas sobre muro. Fundida de vigas. Orden y aseo.	N/A
		2023-07-25	Encofrado de vigas sobre muro. Fundida de vigas. Orden y aseo.	N/A
		2023-07-26	Encofrado de vigas sobre muro. Fundida de vigas.	N/A
		2023-07-27	Encofrado de vigas sobre muro. Fundida de vigas.	N/A
		2023-07-28	Nivelación de cuchillas. Corte y figuración de hierro para columnas. Encofrado de vigas sobre muro. Pañete sobre levante de cuchilla.	N/A
		2023-07-29	Fundida de vigas. Corte y figuración de hierro para columnas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**288.44**		**279.43**		**$4,221**	**-**	**279.43**	**9.01**
2.15	**ACERO DE REFUERZO FIGURADO**	KGS	**568**		**294.05**	**67.30**	**$9,568**	**643,926.40**	**361.35**	**206.65**
2.19	**VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**1.9**		**0.66**	**0.74**	**$1,894,074**	**1,401,614.76**	**1.40**	**0.50**
3.01	**CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	ML	**68.12**		**49.16**	**0.00**	**$14,939**	**-**	**49.16**	**18.96**
3.02	**DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL**	MT2	**11.55**		**5.14**		**$32,154**	**-**	**5.14**	**6.41**
3.09	**PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4**	ML	**112.78**		**37.18**	**28.09**	**$17,610**	**494,664.90**	**65.27**	**47.51**
3.11	**PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO**	ML	**68.17**		**-**	**20.45**	**$27,794**	**568,387.30**	**20.45**	**47.72**

3.16	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .	MT2	8.88		8.88		$38,862	-	8.88	-
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	3902.72		1,084.65		$24,307	-	1,084.65	2,818.07
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	288.44		273.19		$34,014	-	273.19	15.25
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	210.02		210.02		$20,865	-	210.02	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	13		13.00		$32,669	-	13.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	6		6.00		$32,643	-	6.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	34		29.00		$19,629	-	29.00	5.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	64		64.00		$16,601	-	64.00	-

VALOR DE OBRA	3,108,593.36
INCIDENCIA	1.31%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN ACOSTA SOLERA	Anderson Saavedra	Ricardo Caballero	Andamio, Tronzadora, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1ike1vufbUBIeHJJQW64SqxOTex1m

FOTO 1	Encofrado y fundida de vigas sobre muro JUAN ACOSTA SOLERA



https://drive.google.com/open?id=1IiaArmrFUDYpYJT2bfSlsXkzCowfaLI

FOTO 2	Encofrado y fundida de vigas sobre muro JUAN ACOSTA SOLERA



https://drive.google.com/open?id=1SF-FrcqrqbOVZAUWWDWSxS4U

FOTO 3	Encofrado y fundida de vigas sobre muro JUAN ACOSTA SOLERA



https://drive.google.com/open?id=1VaXPRSudRVRQLTLowOYBcPHc_PsHA3

FOTO 4	Encofrado y fundida de vigas sobre muro JUAN ACOSTA SOLERA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero.		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MAYOR DE BARRANQUILLA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA	No. 30	Código:	IP-FM-31
			VERSION:	01
			FECHA:	6/9/2021
			Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES	7	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	25	AL	1

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	4.17%	0.12%	0.12%	11	4.17%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.17%	0.79%	0.90%	12	4.17%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	4.17%	0.82%	1.72%	13	4.17%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	4.17%	0.78%	2.50%	14	4.17%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	4.17%	0.78%	3.27%	15	4.17%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	4.17%	0.39%	3.66%	16	4.17%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	4.17%	0.39%	4.05%	17	4.17%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	4.17%	0.00%	4.05%	18	4.17%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.17%	0.61%	4.66%	19	4.17%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	4.17%	0.81%	5.47%	20	4.17%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	4.17%	0.38%	5.85%	21	4.17%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	4.17%	1.05%	6.90%	22	4.17%	1.05%	$38,152,956	6.90%
23	7/5/2023	13/5/2023	4.17%	0.10%	6.99%	23	4.17%	0.10%	$3,505,414	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.17%	0.75%	7.74%	24	4.17%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	4.17%	1.20%	8.94%	25	4.17%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	4.17%	0.79%	9.73%	26	4.17%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	4.17%	0.80%	10.53%	27	4.17%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	4.17%	0.45%	10.98%	28	4.17%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	4.17%	0.53%	11.52%	29	4.17%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	4.17%	0.17%	11.69%	30	4.17%	0.17%	$6,267,738	11.69%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

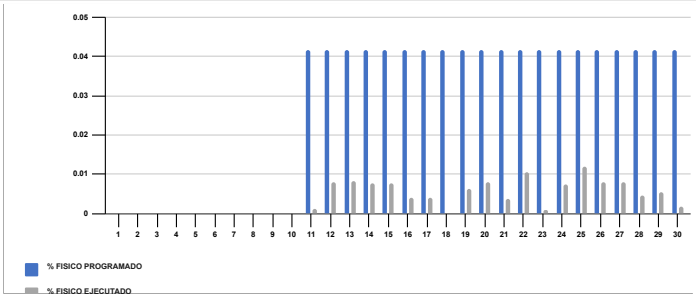

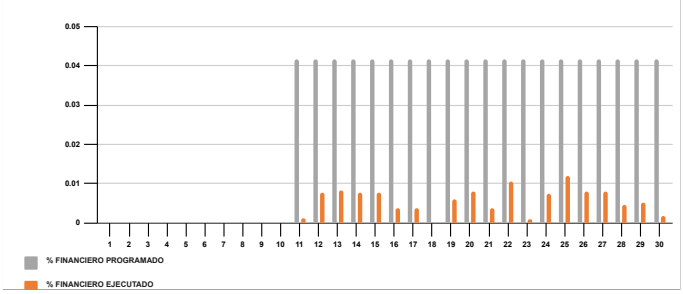

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	2023-06-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-26	Bloque 1: Figuración de acero. Escarificación de columna.	N/A
		2023-06-27	Bloque 1: Demolición de losa. Retiro de material. Bloque 2: Corte de muros para columneta.	N/A
		2023-06-28	Bloque 1: Demolición de losa. Bloque 2: Retiro de material.	N/A
		2023-06-29	Bloque 1: Demolición de losa. Bloque 2: Corte de muros para columneta.	N/A
		2023-06-30	Bloque 1: Armado de acero. Escarificación de columna. Bloque 2: Sin actividad.	N/A
		2023-07-01	Bloque 1: Armado de acero. Encofrado.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2717.92		2,717.92		$4,221	$0	2,717.92	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		146.24	29.76	$20,699	$616,002	176.00	410.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		5.92		$266,275	$0	5.92	16.62
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		228.66	36.76	$32,124	$1,180,878	265.42	1,183.68
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	220		120.46		$93,507	$0	120.46	99.54
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		119.05		$34,062	$0	119.05	73.76
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		12,276.86		$9,568	$0	12,276.86	33,128.64
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	2512		1,938.80		$40,436	$0	1,938.80	573.20
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		48.89		$1,742,818	$0	48.89	90.80
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		39.12		$99,065	$0	39.12	619.05
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	306.6		150.00		$18,074	$0	150.00	156.60
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		979.80		$14,939	$0	979.80	756.20
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	845.24		336.14	113.15	$32,154	$3,638,225	449.29	395.95
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		668.13	24.50	$33,985	$832,633	692.63	561.97
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		495.11		$39,196	$0	495.11	75.49
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1140		1,108.87		$20,865	$0	1,108.87	31.13
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		20.00		$19,629	$0	20.00	85.00
							VALOR DE OBRA	$6,267,738		
							INCIDENCIA	0.17%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA

				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1LFPVwwIA1_GDqNr1NR3DDvYv_T

FOTO 1	Demolicion de losa MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1aecOwZbAMl8wZKQLxKNjBzCyOFVkBQ6

FOTO 2	Demolicion de losa MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=16clwZZoTHSfrVMHe3MjEIZRWsjRJ

FOTO 3	Escarificación de elementos estructurales MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1yOzJXw2o80NDHmwUjmQERsJWKHJgEa

FOTO 4	Escarificación de elementos estructurales MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 31**	**Código:** IP-FM-31 **VERSION:** 01 **FECHA:** 6/9/2021 **Paginas:** 1 de 1

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	2	AL	8

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	4.17%	0.12%	0.12%	11	4.17%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.17%	0.79%	0.90%	12	4.17%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	4.17%	0.82%	1.72%	13	4.17%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	4.17%	0.78%	2.50%	14	4.17%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	4.17%	0.78%	3.27%	15	4.17%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	4.17%	0.39%	3.66%	16	4.17%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	4.17%	0.39%	4.05%	17	4.17%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	4.17%	0.00%	4.05%	18	4.17%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.17%	0.61%	4.66%	19	4.17%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	4.17%	0.81%	5.47%	20	4.17%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	4.17%	0.38%	5.85%	21	4.17%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	4.17%	1.05%	6.90%	22	4.17%	1.05%	$38,152,956	6.90%
23	7/5/2023	13/5/2023	4.17%	0.10%	6.99%	23	4.17%	0.10%	$3,505,414	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.17%	0.75%	7.74%	24	4.17%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	4.17%	1.20%	8.94%	25	4.17%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	4.17%	0.79%	9.73%	26	4.17%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	4.17%	0.80%	10.53%	27	4.17%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	4.17%	0.45%	10.98%	28	4.17%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	4.17%	0.53%	11.52%	29	4.17%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	4.17%	0.17%	11.69%	30	4.17%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	4.17%	2.25%	13.94%	31	4.17%	2.25%	$81,785,033	13.94%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

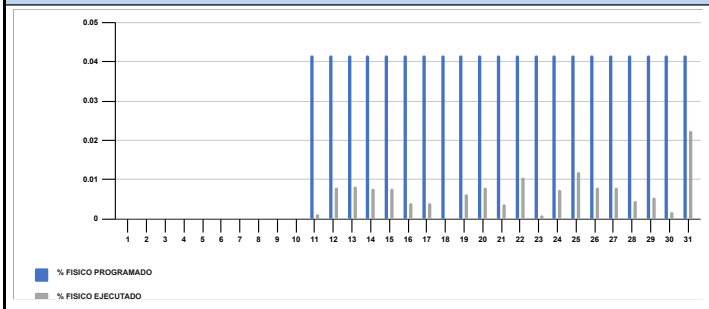

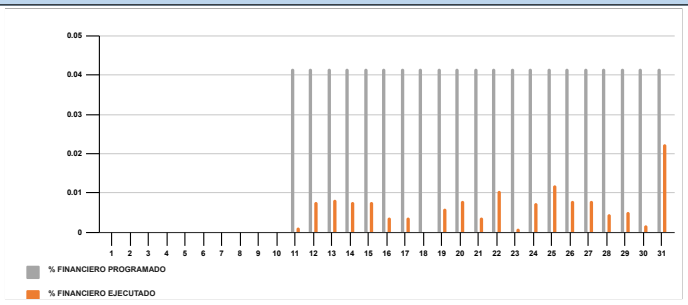

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	2023-07-02	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-07-03	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-07-04	Bloque 1: Fundida de columna. Figuración de acero. Encofrado. Excavación en columnas.	N/A
		2023-07-05	Bloque 1: Fundida de columna. Figuración de acero. Encofrado. Escarificación de columnas. Bloque 2: Demolición para columnetas segundo piso.	N/A
		2023-07-06	Bloque 1: Desencofrado de columna A5. escarificación de columna segundo piso B11 y B13. Encofrado de columna A13. Fundida de columna a5 del segundo piso y A13 del primer piso.	N/A
		2023-07-07	Bloque 1: Desencofrado de columna B5 en primer y segundo piso. Encofrado de columnas A13 y B11 del segundo piso. Escarificación de columnas A13, A11, A9.	N/A
		2023-07-08	Bloque 1: Fundida de columna B13 y A13 del primer piso y B11 del segundo piso.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2717.92		2,717.92		$4,221	$0	2,717.92	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		176.00		$20,699	$0	176.00	410.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		5.92		$266,275	$0	5.92	16.62
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		265.42	38.55	$32,124	$1,238,380	303.97	1,145.13
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	220		120.46	21.33	$93,507	$1,994,504	141.79	78.21
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		119.05		$34,062	$0	119.05	73.76
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		12,276.86	5,320.00	$9,568	$50,901,760	17,596.86	27,808.64
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	2512		1,938.80		$40,436	$0	1,938.80	573.20
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		48.89	15.30	$1,742,818	$26,665,115	64.19	75.50
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		39.12		$99,065	$0	39.12	619.05
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	306.6		150.00		$18,074	$0	150.00	156.60
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		979.80		$14,939	$0	979.80	756.20
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	845.24		449.29		$32,154	$0	449.29	395.95
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		692.63	16.78	$33,985	$570,268	709.41	545.19
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		495.11		$39,196	$0	495.11	75.49
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1140		1,108.87	19.89	$20,865	$415,005	1,128.76	11.24
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		20.00		$19,629	$0	20.00	85.00
							VALOR DE OBRA	$81,785,033		
							INCIDENCIA	2.25%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA

				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=197i5KjSdRQFHbHLnRoH0lEXZ2Qn

FOTO 1	Encofrado de columna MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1f2lCzwT07xP-LcdMGlr2T2NMOWsZrOW7e

FOTO 2	Armado de acero en columna MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1doPlXJ7JDYxP5Y_jUseozb4ILRoiLc

FOTO 3	Excavación de zapatas MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1Tae2WsNWm8fOegkNVLmozBMUh4a8IEL

FOTO 4	Armado de acero en columna MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1c-Rbbaz2qprfsnxw6-b3fswsR-0_oR

FOTO 5	Armado de acero en columna MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1qQKudx-QWWTQHQ_IIXBefFTk_G8LptXD

FOTO 6	Encofrado de columna MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA No. 32	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES	7	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	9	AL	15

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	4.17%	0.12%	0.12%	11	4.17%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.17%	0.79%	0.90%	12	4.17%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	4.17%	0.82%	1.72%	13	4.17%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	4.17%	0.78%	2.50%	14	4.17%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	4.17%	0.78%	3.27%	15	4.17%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	4.17%	0.39%	3.66%	16	4.17%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	4.17%	0.39%	4.05%	17	4.17%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	4.17%	0.00%	4.05%	18	4.17%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.17%	0.61%	4.66%	19	4.17%	0.61%	$22,216,692	4.66%

20	16/4/2023	22/4/2023	4.17%	0.81%	5.47%	20	4.17%	0.81%	**$29,404,355**	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	4.17%	0.38%	5.85%	21	4.17%	0.38%	**$13,861,882**	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	4.17%	0.83%	6.68%	22	4.17%	0.83%	**$30,363,456**	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	4.17%	0.31%	6.99%	23	4.17%	0.31%	**$11,294,914**	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.17%	0.75%	7.74%	24	4.17%	0.75%	**$27,168,253**	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	4.17%	1.20%	8.94%	25	4.17%	1.20%	**$43,713,028**	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	4.17%	0.79%	9.73%	26	4.17%	0.79%	**$28,760,680**	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	4.17%	0.80%	10.53%	27	4.17%	0.80%	**$29,144,889**	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	4.17%	0.45%	10.98%	28	4.17%	0.45%	**$16,560,783**	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	4.17%	0.53%	11.52%	29	4.17%	0.53%	**$19,388,185**	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	4.17%	0.17%	11.69%	30	4.17%	0.17%	**$6,267,738**	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	4.17%	2.25%	13.94%	31	4.17%	2.25%	**$81,785,033**	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	4.17%	1.41%	15.35%	32	4.17%	1.41%	**$51,449,799**	15.35%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

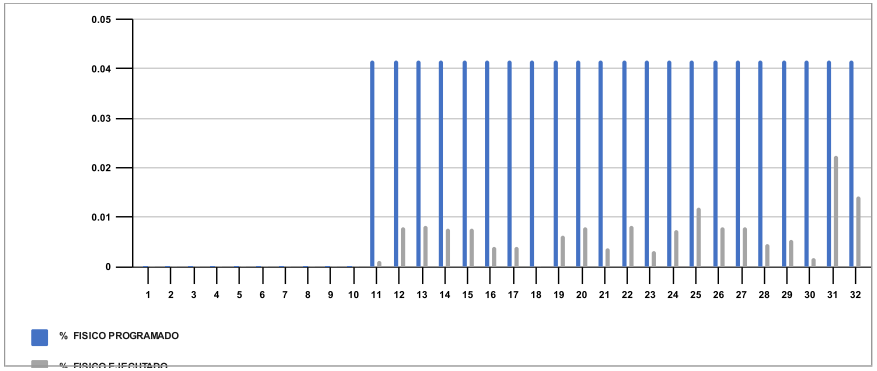

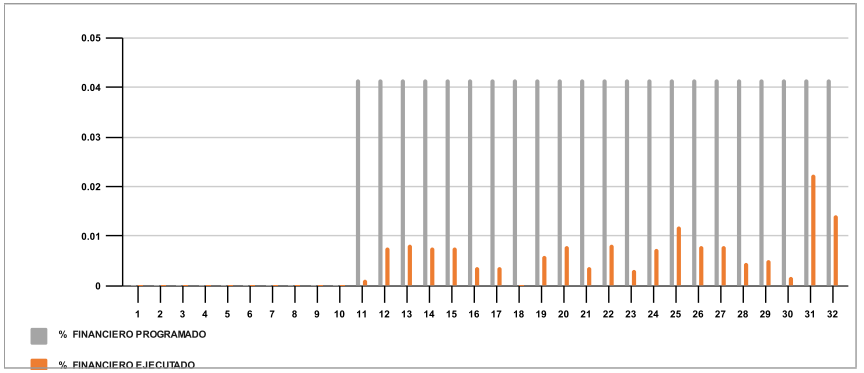

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	2023-07-09	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-07-10	Bloque 1: Desencofrado de columna B13 y A13 del primer piso y B11 del segundo piso. Bloque 2: Escarificación de columnas. Bloque 3: demsonte de Instalaciones parte eléctrica. se realizó desmonte de cubierta	N/A
		2023-07-11	Bloque 1: Escarificación de columnas y excavación de zapatas. Bloque 2: Armado de columnetas. Bloque 3: Escarificación de columnas. se realizó desmonte de cielo raso	N/A
		2023-07-12	Bloque 1: Armado de acero de columnas A8, b8, A5. Bloque 2: Fundida de columnetas. Bloque 3: Escarificación de columnas. Demolicion de plantilla. Excavacion para tuberia electrica	N/A

		2023-07-13	Bloque 1: Fundida de columnas A8, b8, A5. Armado de acero de columnas B5. Bloque 2: Fundida de columnetas. Bloque 3: Armado de acero y encofrado de columnas E6 y D9.	N/A
		2023-07-14	Bloque 1: Fundida de columnas B11, B5 y A5. Bloque 2: Sin Actividad. Bloque 3: Fundida de columnas E6 y D9 piso 1. Armado de acero de columnas D7, D6 piso 2.	N/A
		2023-07-15	Bloque 1: Fundida de columnas A12 y B13 Bloque 2: Sin Actividad. Bloque 3: Fundida de columnas D7, D6 piso 2.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2717.92		2,717.92		$4,221	$0	2,717.92	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		176.00	48.34	$20,699	$1,000,590	224.34	361.66
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		5.92		$266,275	$0	5.92	16.62
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		303.97	72.34	$32,124	$2,323,850	376.31	1,072.79
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	220		141.79	22.45	$93,507	$2,099,232	164.24	55.76
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		119.05		$34,062	$0	119.05	73.76
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		17,596.86	2,384.18	$9,568	$22,811,834	19,981.04	25,424.46
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	2512		1,938.80		$40,436	$0	1,938.80	573.20
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		64.19	10.90	$1,742,818	$18,996,716	75.09	64.60
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		39.12		$99,065	$0	39.12	619.05
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	306.6		150.00		$18,074	$0	150.00	156.60
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		979.80		$14,939	$0	979.80	756.20
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	845.24		449.29		$32,154	$0	449.29	395.95
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		709.41	21.50	$33,985	$730,678	730.91	523.69
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		495.11		$39,196	$0	495.11	75.49
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1140		1,128.76	21.91	$20,865	$457,152	1,150.67	- 10.67
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		20.00	85.00	$19,629	$1,668,465	105.00	-

9.02	**DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO**	UND	**82**		**-**	**82.00**	**$16,601**	**1,361,282.00**	82.00	-

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
MAYOR DE BARRANQUILLA	**Anderson Saavedra**	**Angelo Sanchez**	**Herramientas menores, Andamios**	**NO APLICA**
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO




https://drive.google.com/open?id=17O2TSvd1u0gjXZ8TmXHKRuKdJ_ZrZEAA

FOTO 1	Fundida de columna MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1iju1IlabxuZC5__a8l4iLtZu4SSeX1Kj

FOTO 2	Fundida de columna MAYOR DE BARRANQUILLA



			
https://drive.google.com/open?id=1j1TjjnvfCSLbqKpc3tNx_Re0MNJcplAc		https://drive.google.com/open?id=1LchWLgVE9uo5l5L1m3SSy8LPi2IsrM7M	
FOTO 3	Escarificación de elementos estructurales MAYOR DE BARRANQUILLA	**FOTO 4**	Compactación de zapata. MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 33**	**Código:** IP-FM-31 **VERSION:** 01 **FECHA:** 6/9/2021 **Paginas:** 1 de 1

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	16	AL	22

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	4.17%	0.12%	0.12%	11	4.17%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.17%	0.79%	0.90%	12	4.17%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	4.17%	0.82%	1.72%	13	4.17%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	4.17%	0.78%	2.50%	14	4.17%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	4.17%	0.78%	3.27%	15	4.17%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	4.17%	0.39%	3.66%	16	4.17%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	4.17%	0.39%	4.05%	17	4.17%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	4.17%	0.00%	4.05%	18	4.17%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.17%	0.61%	4.66%	19	4.17%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	4.17%	0.81%	5.47%	20	4.17%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	4.17%	0.38%	5.85%	21	4.17%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	4.17%	1.05%	6.90%	22	4.17%	1.05%	$38,152,956	6.90%
23	7/5/2023	13/5/2023	4.17%	0.10%	6.99%	23	4.17%	0.10%	$3,505,414	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.17%	0.75%	7.74%	24	4.17%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	4.17%	1.20%	8.94%	25	4.17%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	4.17%	0.79%	9.73%	26	4.17%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	4.17%	0.80%	10.53%	27	4.17%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	4.17%	0.45%	10.98%	28	4.17%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	4.17%	0.53%	11.52%	29	4.17%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	4.17%	0.17%	11.69%	30	4.17%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	4.17%	2.25%	13.94%	31	4.17%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	4.17%	1.41%	15.35%	32	4.17%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	4.17%	1.22%	16.57%	33	4.17%	1.22%	$44,326,397	16.57%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

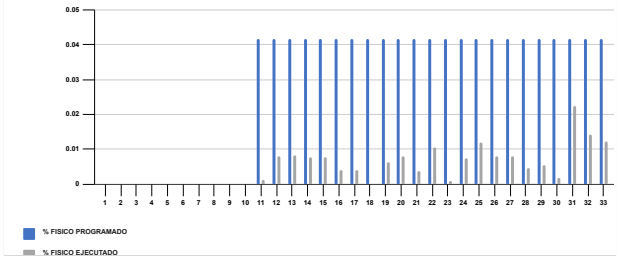

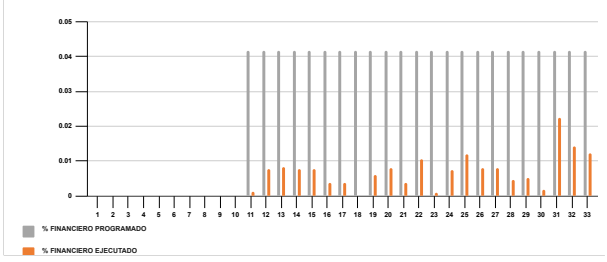

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
		2023-07-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-07-17	Bloque 1: Excavación de zapatas de columnas A9, A11, B9. Bloque 2: Sin Actividad. Bloque 3: Escarificación de columnas E6, E5 piso 2.	N/A

MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	2023-07-18	Bloque 1: Escarificación de columnas A9, A11, B9. Bloque 2: Sin Actividad. Bloque 3: Armado de acero de columnas E6, E5. Escarificación de columnas E9, D9.	N/A
		2023-07-19	Bloque 1: Armado de acero de columnas A9, A11. Desencofrado de columna B13 piso 3. Bloque 2: Sin Actividad. Bloque 3: Armado de acero y fundida de columnas E6, E5. Escarificación de columnas E9, D9. Demolición de plantilla existente en teatrino.	N/A
		2023-07-20	Bloque 1: Armado de acero de columnas A9, A11. Escarificación de columnas b9 en piso 1 y 2. Bloque 2: Sin Actividad. Bloque 3: Armado de acero y fundida de columnas E9, D9. Demolición de plantilla existente en teatrino.	N/A
		2023-07-21	Bloque 1: Armado de acero de columnas Escarificación de columnas en piso 1 y 2. Fundida de columnas A5 y A11 piso 1. . Bloque 2: Sin Actividad. Bloque 3: Desencofrado de columnas. Armado de acero piso 3. Demolición de plantilla existente en teatrino y retiro de material.	N/A
		2023-07-22	Bloque 1: Armado de acero y Fundida de columnas A9 y A11 piso 2. Bloque 2: Sin Actividad. Bloque 3: Fundida de columnas E9,E6 y D9 piso 3.	N/A


4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2717.92		2,717.92		$4,221	-	2,717.92	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		224.34	34.76	$20,699	$719,497	259.10	326.90
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		5.92		$266,275	$0	5.92	16.62
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		376.31	68.34	$32,124	$2,195,354	444.65	1,004.45
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	220		164.24	23.45	$93,507	$2,192,739	187.69	32.31
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		119.05		$34,062	$0	119.05	73.76
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		19,981.04	2,678.18	$9,568	$25,624,826	22,659.22	22,746.28
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	2512		1,938.80		$40,436	$0	1,938.80	573.20
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		75.09	7.80	$1,742,818	$13,593,980	82.89	56.80
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		39.12		$99,065	$0	39.12	619.05
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	306.6		150.00		$18,074	$0	150.00	156.60
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		979.80		$14,939	$0	979.80	756.20
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	845.24		449.29		$32,154	$0	449.29	395.95
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		730.91		$33,985	$0	730.91	523.69
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		495.11		$39,196	$0	495.11	75.49
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1140		1,150.67		$20,865	$0	1,150.67	- 10.67
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
							VALOR DE OBRA	44,326,397.19		
							INCIDENCIA	1.22%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

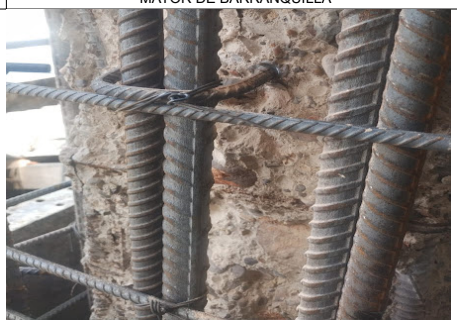			
FOTO 1	Escarificación de elementos estructurales MAYOR DE BARRANQUILLA	**FOTO 2**	Demolición de plantilla. MAYOR DE BARRANQUILLA
			
FOTO 3	Excavaciones para acometida eléctrica bloque 3. MAYOR DE BARRANQUILLA	**FOTO 4**	Armado de acero en columna MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 34**	**Código:** IP-FM-31 **VERSION:** 01 **FECHA:** 6/9/2021 **Paginas:** 1 de 1

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	23	AL	29

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	4.17%	0.12%	0.12%	11	4.17%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.17%	0.79%	0.90%	12	4.17%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	4.17%	0.82%	1.72%	13	4.17%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	4.17%	0.78%	2.50%	14	4.17%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	4.17%	0.78%	3.27%	15	4.17%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	4.17%	0.39%	3.66%	16	4.17%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	4.17%	0.39%	4.05%	17	4.17%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	4.17%	0.00%	4.05%	18	4.17%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.17%	0.61%	4.66%	19	4.17%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	4.17%	0.81%	5.47%	20	4.17%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	4.17%	0.38%	5.85%	21	4.17%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	4.17%	1.05%	6.90%	22	4.17%	1.05%	$38,152,956	6.90%
23	7/5/2023	13/5/2023	4.17%	0.10%	6.99%	23	4.17%	0.10%	$3,505,414	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.17%	0.75%	7.74%	24	4.17%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	4.17%	1.20%	8.94%	25	4.17%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	4.17%	0.79%	9.73%	26	4.17%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	4.17%	0.80%	10.53%	27	4.17%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	4.17%	0.45%	10.98%	28	4.17%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	4.17%	0.53%	11.52%	29	4.17%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	4.17%	0.17%	11.69%	30	4.17%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	4.17%	2.25%	13.94%	31	4.17%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	4.17%	1.41%	15.35%	32	4.17%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	4.17%	1.22%	16.57%	33	4.17%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.02%	2.65%	19.22%	34	3.02%	2.65%	$96,619,522	19.22%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

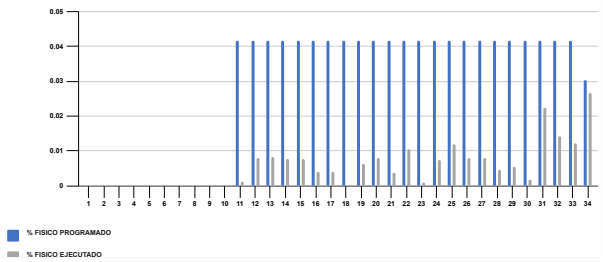

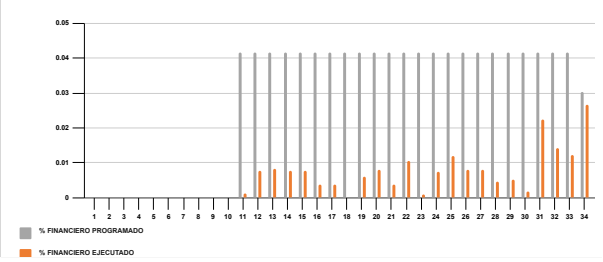

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
		2023-07-23	Bloque 1: Armado de acero y Fundida de columnas A9 y A11 piso 3. Armado de acero de columnas B9 piso 1	N/A

MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	2023-07-24	Bloque 1: Escarificación de columnas. Pasante de losa. Armado de acero de columnas. Bloque 2: Sin Actividad. Bloque 3: Escarificación de columnas. Pasante de losa. Excavación de zapata íso 1. Demolición de plantilla existente en teatrino y retiro de material.	N/A
		2023-07-25		N/A
		2023-07-26		N/A
		2023-07-27	Figurado de acero de tres columnas y fundido. Armado de parrilla de 4 registros eléctricos y su fundida. Excavación e instalación de tubería eléctrica.	N/A
		2023-07-28	Bloque 1: Armado de acero y fundida de 2 columnas de piso 2 y 1 columna en piso 1. Armado y levante de 2 registros eléctricos y las tuberías. Bloque 3: Escarificación de columnas	N/A
		2023-07-29	Bloque 1: Armado de acero y fundida de 1 columnas. levante de registros eléctricos. Bloque 3: Escarificación de columnas	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2717.92		2,717.92		$4,221	-	2,717.92	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		259.10	29.81	$20,699	$617,037	288.91	297.09
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		5.92		$266,275	$0	5.92	16.62
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		444.65	54.32	$32,124	$1,744,976	498.97	950.13
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	220		187.69	18.20	$93,507	$1,701,827	205.89	14.11
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		119.05		$34,062	$0	119.05	73.76
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		22,659.22	3,187.64	$9,568	$30,499,340	25,846.86	19,558.64
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	2512		1,938.80	508.00	$40,436	$20,541,488	2,446.80	65.20
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		82.89	10.81	$1,742,818	$18,839,863	93.70	45.99
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		39.12	66.34	$99,065	$6,571,972	105.46	552.71
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	306.6		150.00		$18,074	$0	150.00	156.60
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		979.80		$14,939	$0	979.80	756.20
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	845.24		449.29		$32,154	$0	449.29	395.95
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		730.91		$33,985	$0	730.91	523.69
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		495.11		$39,196	$0	495.11	75.49
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1140		1,150.67		$20,865	$0	1,150.67	- 10.67
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		-	2.00	$190,755	381,510.00	2.00	309.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		-	2.00	$282,244	564,488.00	2.00	44.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		-	22.00	$283,058	6,227,276.00	22.00	152.00

10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		-	6.00	$1,488,291	8,929,746.00	6.00	-
							VALOR DE OBRA	96,619,522.47		
							INCIDENCIA	2.65%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1PZzGuu0VteMUvPiQRiil42lO1tBeSr

FOTO 1	Demolición de piso. MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=12lPnvMHDD3N_pImvkpAfpZOkDmfE14Fs

FOTO 2	Encofrado de columna MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1kxbXqnVqi43slHm6RJOM0eR3FYb

FOTO 3	Escarificación de elementos estructurales MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1p54AbHlgonJlug3dDS_vJ16CPETfiLLt

FOTO 4	Excavación de zapatas MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO No. 30**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	25	AL	1

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	17	0.00%	0.00%	$0	0.00%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	18	0.00%	0.00%	$0	0.00%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	19	0.00%	0.00%	$0	0.00%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	20	0.00%	0.00%	$0	0.00%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	21	0.00%	0.00%	$0	0.00%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	22	0.00%	0.00%	$0	0.00%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	23	0.00%	0.00%	$0	0.00%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	24	0.00%	0.00%	$0	0.00%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	25	0.00%	0.00%	$0	0.00%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	26	0.00%	0.00%	$0	0.00%
27	4/6/2023	10/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	27	0.00%	0.00%	$0	0.00%
28	11/6/2023	17/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	28	0.00%	0.00%	$0	0.00%
29	18/6/2023	24/6/2023	0.16%	0.13%	0.13%	29	0.16%	0.13%	$1,212,442	0.13%
30	25/6/2023	1/7/2023	16.85%	6.74%	6.88%	30	16.85%	6.74%	$61,521,756	6.88%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	CL 47 #44 - 100	2023-06-25	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-06-26	Desmonte de luminarias y de abanicos de piso 3. Desmonte de cielo raso en piso 2. Acopio de residuos.	N/A
		2023-06-27	Desmonte de cielo raso y perfilería del piso 3. Desmonte de cubierta en piso 2. Acopio de residuos.	N/A
		2023-06-28	Desmonte de cubierta existente, de asbesto cemento de las aulas y del pasillo del piso 2. Desmonte de perfil y cubierta en piso 3.	N/A
		2023-06-29	Desmonte de cubierta existente de las aulas y del pasillo del piso 2. Acopio de residuos. Inventario de lamias desmontadas y entregadas a la institución educativa.	N/A
		2023-06-30	Desmonte de cubierta existente de las aulas del piso 2. Desmontaje de tuberías, cielo raso y perfiles del piso 3. Corte y figuración de acero para viga.	N/A
		2023-07-01	Escarificación de viga canal piso 2. figuración de hierro para vigas de piso 2 y 3. Armado de formaleta para viga del piso 2. Levante de muro en bloque vibrado para cuchilla y laterales de aula piso 2 y 3.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	926.47		152.00	774.47	$4,221	3,269,037.87	926.47	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	5.93		-	5.93	$25,547	151,493.71	5.93	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	1458.19		-	836.12	$9,568	7,999,996.16	836.12	622.07
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	8.2		-	8.20	$32,154	263,662.80	8.20	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	132		-	38.08	$100,669	3,833,475.52	38.08	93.92
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	796.55		-	796.53	$34,014	27,093,171.42	796.53	0.02
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	796.53		22.15	774.38	$20,865	16,157,438.70	796.53	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	79		3.00	76.00	$19,629	1,491,804.00	79.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	79		3.00	76.00	$16,601	1,261,676.00	79.00	-
							VALOR DE OBRA	61,521,756.18		
							INCIDENCIA	6.74%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	Anderson Saavedra	SAHAIR ORDOÑEZ	Andamio, Tronzadora, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1ntRxcRnDx3QH5bw_sTOwC7xcIjtl

FOTO 1	Desmonte de cielo raso y perfilería NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO



https://drive.google.com/open?id=1GLz5lcjvEYYO8CJFa_11q6PLEK4wda74W

FOTO 2	Desmonte de cubierta existente NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO



https://drive.google.com/open?id=1Ge1Ge1Ge

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO No. 31	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES	7	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	2	AL	8

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	17	0.00%	0.00%	$0	0.00%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	18	0.00%	0.00%	$0	0.00%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	19	0.00%	0.00%	$0	0.00%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	20	0.00%	0.00%	$0	0.00%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	21	0.00%	0.00%	$0	0.00%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	22	0.00%	0.00%	$0	0.00%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	23	0.00%	0.00%	$0	0.00%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	24	0.00%	0.00%	$0	0.00%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	25	0.00%	0.00%	$0	0.00%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	26	0.00%	0.00%	$0	0.00%
27	4/6/2023	10/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	27	0.00%	0.00%	$0	0.00%
28	11/6/2023	17/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	28	0.00%	0.00%	$0	0.00%
29	18/6/2023	24/6/2023	0.16%	0.13%	0.13%	29	0.16%	0.13%	$1,212,442	0.13%
30	25/6/2023	1/7/2023	16.85%	6.74%	6.88%	30	16.85%	6.74%	$61,521,756	6.88%
31	2/7/2023	8/7/2023	14.28%	27.78%	34.65%	31	14.28%	27.78%	$253,433,782	34.65%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

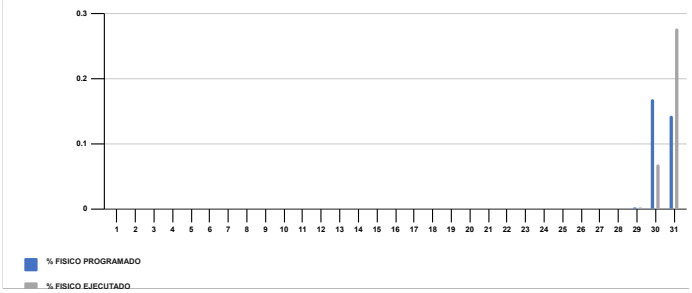

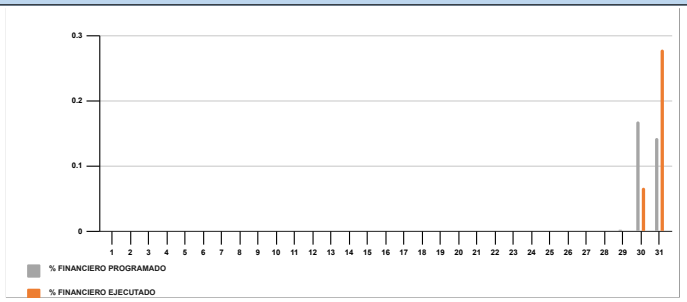

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	CL 47 #44 - 100	2023-07-02	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-07-03	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-07-04	Levante de muro salones de piso 2 y 3. Resane de viga canal piso 2.	N/A
		2023-07-05	Fundida de vigas en aulas del piso 2. Levante de muro en bloque del piso 3. Retiro de material RCD.	N/A
		2023-07-06	Pañete en muro piso 2. Fundida de vigas en salones del piso 2. Armado de formaleta para viga de piso 3. Figuración de acero para vigas. Levante en bloque de piso 3.	N/A
		2023-07-07	Escarificación de pintura y estuco en muro del piso 2. Fundida de cuchilla. Figuración de hierro.	N/A
		2023-07-08	Instalación de perfiles metálicos para cubiertas, anclajes epóxico para platinas de perfiles piso 2 y 3. Figuración de acero. Fundida de columnas y columnetas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	926.47		926.47		$4,221	-	926.47	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	5.93		5.93		$25,547	-	5.93	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	1458.19		836.12	131.18	$9,568	1,255,130.24	967.30	490.89
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	312		-	159.00	$40,436	6,429,324.00	159.00	153.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.5		-	0.50	$1,742,818	871,409.00	0.50	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	14.57		-	14.57	$1,894,074	27,596,658.18	14.57	-
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	19.8		-	19.80	$27,186	538,282.80	19.80	-
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	5.93		-	5.93	$559,014	3,314,953.02	5.93	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	8.2		8.20		$32,154	-	8.20	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	132		38.08	86.72	$100,669	8,730,015.68	124.80	7.20
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	228.18		-	67.78	$23,961	1,624,076.58	67.78	160.40
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	11945.48		-	8,268.30	$24,307	200,977,568.10	8,268.30	3,677.18
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	796.55		796.53		$34,014	-	796.53	0.02
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	796.53		796.53		$20,865	-	796.53	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	79		79.00		$19,629	-	79.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	79		79.00		$16,601	-	79.00	-
NP 24	ESCARIFICIACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	483.841			315.67	$6,641	2,096,364.47	315.67	168.17
							VALOR DE OBRA	253,433,782.07		
							INCIDENCIA	27.78%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Andamio, Tronzadora, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=17Y6xLVOG5tPLyOqV62zsi_YtnOUn



https://drive.google.com/open?id=1lWgy--2XqzCDNwlO2fX_zWQN0b4Xlo

FOTO 1	Corte y figuración de acero. NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	FOTO 2	Soldadura en perfiles para las cubiertas NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO



https://drive.google.com/open?id=1f9B2JkWsL08rdRYFcP-Ei5Kv8yBgj



https://drive.google.com/open?id=1Qo76OVerNyqpDSCIIICJ-J_-1zb29f50

FOTO 3	Soldadura en perfiles para las cubiertas NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	FOTO 4	Soldadura en perfiles para las cubiertas NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO No. 32	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES 7	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL 9	AL	15	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	17	0.00%	0.00%	$0	0.00%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	18	0.00%	0.00%	$0	0.00%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	19	0.00%	0.00%	$0	0.00%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	20	0.00%	0.00%	$0	0.00%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	21	0.00%	0.00%	$0	0.00%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	22	0.00%	0.00%	$0	0.00%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	23	0.00%	0.00%	$0	0.00%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	24	0.00%	0.00%	$0	0.00%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	25	0.00%	0.00%	$0	0.00%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	26	0.00%	0.00%	$0	0.00%
27	4/6/2023	10/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	27	0.00%	0.00%	$0	0.00%
28	11/6/2023	17/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	28	0.00%	0.00%	$0	0.00%
29	18/6/2023	24/6/2023	0.16%	0.13%	0.13%	29	0.16%	0.13%	$1,212,442	0.13%
30	25/6/2023	1/7/2023	16.85%	6.74%	6.88%	30	16.85%	6.74%	$61,521,756	6.88%
31	2/7/2023	8/7/2023	14.28%	27.78%	34.65%	31	14.28%	27.78%	$253,433,782	34.65%
32	9/7/2023	15/7/2023	20.13%	26.09%	60.75%	32	20.13%	26.09%	$238,102,232	60.75%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	CL 47 #44 - 100	2023-07-09	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-07-10	Escarificación de pintura y estuco en muros de aulas de piso 2. Instalación de perfiles metálicos para cubiertas en aulas de piso 2 y 3. Acopio de material RCD.	N/A
		2023-07-11	Instalacion de tuberia EMT del piso 2. Estuco plástico en aula de piso 2. Instalación de cubierta piso 3.	N/A
		2023-07-12	Instalación de cubierta piso 3. Estuco en muro de piso 2. Instalacion de tuberia EMT y cableado del piso 2.	N/A
		2023-07-13	Instalación de cubierta piso 2 y 3. Estuco en muro de piso 2. Encoroce de muro a cubierta. Instalacion de tuberia EMT y cableado del piso 2 y 3.	N/A
		2023-07-14	Instalación de luminarias en aulas de piso 2. Estuco en muro y pasillo de piso 2. Instalacion de tuberia EMT y cableado del piso 2 y 3. Instalación de Caja Rawelt.	N/A

		2023-07-15	Instalación cubierta termoacustica en área de baño de piso 3. Instalacion de tuberia EMT y cableado del piso 2 y 3. Instalación de luminarias. estuco en muro de pasillo piso 2.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	926.47		926.47		$4,221	-	926.47	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	5.93		5.93		$25,547	-	5.93	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	1458.19		967.30	215.09	$9,568	2,057,981.12	1,182.39	275.80
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	312		159.00	153.00	$40,436	6,186,708.00	312.00	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.5		0.50		$1,742,818	-	0.50	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	14.57		14.57		$1,894,074	-	14.57	-
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	19.8		19.80		$27,186	-	19.80	-
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	5.93		5.93		$559,014	-	5.93	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	8.2		8.20		$32,154	-	8.20	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	132		124.80		$100,669	-	124.80	7.20
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	228.18		67.78		$23,961	-	67.78	160.40
3.13	ENCOROCE DE MURO A CUBIERTA	ML	198.15		-	187.26	$20,000	3,745,200.00	187.26	10.89
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	11945.48		8,268.30	3,677.18	$24,307	89,381,214.26	11,945.48	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	1329.53		-	586.18	$138,761	81,338,922.98	586.18	743.35
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	796.55		796.53		$34,014	-	796.53	0.02
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	796.53		796.53		$20,865	-	796.53	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	1345		-	282.15	$17,948	5,064,028.20	282.15	1,062.85
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	79		79.00		$19,629	-	79.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	79		79.00		$16,601	-	79.00	-
9.04	ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	214.97		-	18.15	$57,278	1,039,595.70	18.15	196.82
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	130		-	28.00	$190,218	5,326,104.00	28.00	102.00
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	68		-	8.00	$190,755	1,526,040.00	8.00	60.00

9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	2		-	2.00	$100,299	200,598.00	2.00	-
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG X3 METRO LINEAL LIBRE DE HALOGENO	ML	230		-	78.00	$18,863	1,471,314.00	78.00	152.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	122.4		-	122.40	$283,058	34,646,299.20	122.40	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	215		-	80.00	$55,395	4,431,600.00	80.00	135.00
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	67		-	19.00	$29,990	569,810.00	19.00	48.00
NP 24	ESCARIFICIACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	483.841		315.67	168.17	$6,641	1,116,816.97	483.84	0.00
								VALOR DE OBRA		238,102,232.43
								INCIDENCIA		26.09%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	Anderson Saavedra	SAHAIR ORDOÑEZ	Andamio, Tronzadora, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Soldadura en perfiles para las cubiertas NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO



FOTO 2	Instalación de perfiles metálicos. NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO

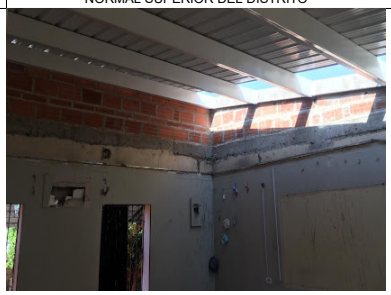


FOTO 3	Instalación de cubiertas. NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO



FOTO 4	Instalación de cubiertas. NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE SAHAIR ORDOÑEZ	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO No. 33	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES	7	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	16	AL	22

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	17	0.00%	0.00%	$0	0.00%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	18	0.00%	0.00%	$0	0.00%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	19	0.00%	0.00%	$0	0.00%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	20	0.00%	0.00%	$0	0.00%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	21	0.00%	0.00%	$0	0.00%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	22	0.00%	0.00%	$0	0.00%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	23	0.00%	0.00%	$0	0.00%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	24	0.00%	0.00%	$0	0.00%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	25	0.00%	0.00%	$0	0.00%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	26	0.00%	0.00%	$0	0.00%
27	4/6/2023	10/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	27	0.00%	0.00%	$0	0.00%
28	11/6/2023	17/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	28	0.00%	0.00%	$0	0.00%
29	18/6/2023	24/6/2023	0.16%	0.13%	0.13%	29	0.16%	0.13%	$1,212,442	0.13%
30	25/6/2023	1/7/2023	16.85%	6.74%	6.88%	30	16.85%	6.74%	$61,521,756	6.88%
31	2/7/2023	8/7/2023	14.28%	27.78%	34.65%	31	14.28%	27.78%	$253,433,782	34.65%
32	9/7/2023	15/7/2023	20.13%	26.09%	60.75%	32	20.13%	26.09%	$238,102,232	60.75%
33	16/7/2023	22/7/2023	17.79%	7.94%	68.69%	33	17.79%	7.94%	$72,449,480	68.69%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

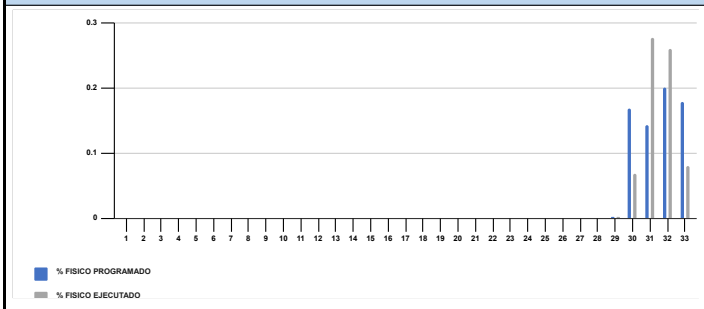

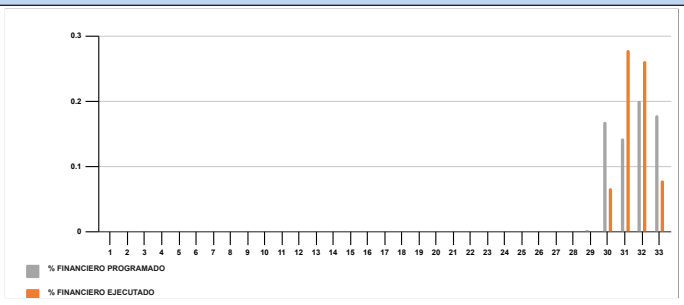

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	CL 47 #44 - 100	2023-07-16	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-07-17	Instalacion de tuberia EMT y cableado del piso 2. Estuco en muros de salones y pasillo del piso 2.	N/A
		2023-07-18	Instalacion de tuberia EMT y cableado del piso 2. Instalación de luminarias. Estuco en muros de pasillo del piso 2.	N/A
		2023-07-19	Instalación de luminarias piso 2 , 3 y pasillo. Estuco en muros del piso 2. Instalacion de tuberia EMT y cableado.	N/A
		2023-07-20	Instalación de caballetes en la cubierta del piso 3. Pañete en muro de tercer piso. Limpieza y acopio de material RCD.	N/A
		2023-07-21	Instalacion de tuberia EMT y cableado del piso 2 y 3. Estuco en muros y pasillo del piso 2. Instalación de luminarias piso 2 , 3. Instalación de toma corriente e interruptores.	N/A
		2023-07-22	Instalación de luminarias. Instalacion de estructura metalica para cielo raso en piso 2. Instalacion de tuberia EMT y cableado en piso 2 y 3.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	926.47		926.47		$4,221	-	926.47	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	5.93		5.93		$25,547	-	5.93	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	1458.19		1,182.39	35.48	$9,568	339,472.64	1,217.87	240.32
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	312		312.00		$40,436	-	312.00	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.5		0.50		$1,742,818	-	0.50	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	14.57		14.57		$1,894,074	-	14.57	-
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	19.8		19.80		$27,186	-	19.80	-
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	5.93		5.93		$559,014	-	5.93	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	8.2		8.20		$32,154	-	8.20	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	132		124.80		$100,669	-	124.80	7.20
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	228.18		67.78	118.04	$23,961	2,828,356.44	185.82	42.36
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	11945.48		11,945.48		$24,307	-	11,945.48	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	1329.53		586.18	210.35	$138,761	29,188,376.35	796.53	533.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	796.55		796.53		$34,014	-	796.53	0.02
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	796.53		796.53		$20,865	-	796.53	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	1345		282.15	177.15	$17,948	3,179,488.20	459.30	885.70

6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	298.15		-	23.16	$77,644	1,798,235.04	23.16	274.99
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	776.75		-	87.15	$67,320	5,866,938.00	87.15	689.60
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	79		79.00		$19,629	-	79.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	79		79.00		$16,601	-	79.00	-
9.04	ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	214.97		18.15	90.98	$57,278	5,211,152.44	109.13	105.84
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	130		28.00	15.00	$190,218	2,853,270.00	43.00	87.00
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	68		8.00	15.00	$190,755	2,861,325.00	23.00	45.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	7		-	3.00	$282,244	846,732.00	3.00	4.00
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	35		-	10.00	$235,052	2,350,520.00	10.00	25.00
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG X3 METRO LINEAL LIBRE DE HALOGENO	ML	230		78.00	118.00	$18,863	2,225,834.00	196.00	34.00
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	68		-	68.00	$121,310	8,249,080.00	68.00	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	215		80.00	78.00	$55,395	4,320,810.00	158.00	57.00
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	67		19.00	11.00	$29,990	329,890.00	30.00	37.00
NP 24	ESCARIFICIACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	483.841		483.84		$6,641	-	483.84	0.00

VALOR DE OBRA	72,449,480.11
INCIDENCIA	7.94%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA

NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	Anderson Saavedra	SAHAIR ORDOÑEZ	Andamio, Tronzadora, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1X2XKiid0EfwiH-aN03Zpja.IcCK_Y-g

FOTO 1	Estuco en salones NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO




https://drive.google.com/open?id=1HDISTxvX_4PA-gIGxY4E8h_FUVg5qvfL

FOTO 2	Estuco en salones NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO



https://drive.google.com/open?id=1vZf8o07fXYiRL5RLhilFwBZDmSkK4

FOTO 3	Instalaciones eléctricas NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO

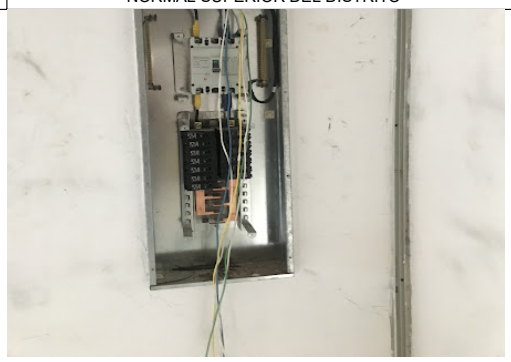

https://drive.google.com/open?id=1ccrTk4EHxTWr7sHal08HqTw5uzLFfE4l

FOTO 4	Instalaciones eléctricas NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE SAHAIR ORDOÑEZ	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO No. 34**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	23	AL	29

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	17	0.00%	0.00%	$0	0.00%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	18	0.00%	0.00%	$0	0.00%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	19	0.00%	0.00%	$0	0.00%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	20	0.00%	0.00%	$0	0.00%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	21	0.00%	0.00%	$0	0.00%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	22	0.00%	0.00%	$0	0.00%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	23	0.00%	0.00%	$0	0.00%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	24	0.00%	0.00%	$0	0.00%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	25	0.00%	0.00%	$0	0.00%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	26	0.00%	0.00%	$0	0.00%
27	4/6/2023	10/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	27	0.00%	0.00%	$0	0.00%
28	11/6/2023	17/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	28	0.00%	0.00%	$0	0.00%
29	18/6/2023	24/6/2023	0.16%	0.13%	0.13%	29	0.16%	0.13%	$1,212,442	0.13%
30	25/6/2023	1/7/2023	16.85%	6.74%	6.88%	30	16.85%	6.74%	$61,521,756	6.88%
31	2/7/2023	8/7/2023	14.28%	27.78%	34.65%	31	14.28%	27.78%	$253,433,782	34.65%
32	9/7/2023	15/7/2023	20.13%	26.09%	60.75%	32	20.13%	26.09%	$238,102,232	60.75%
33	16/7/2023	22/7/2023	17.79%	7.94%	68.69%	33	17.79%	7.94%	$72,449,480	68.69%
34	23/7/2023	29/7/2023	27.02%	4.22%	72.91%	34	27.02%	4.22%	$38,520,668	72.91%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

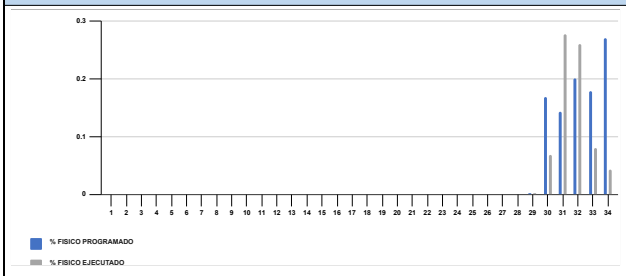

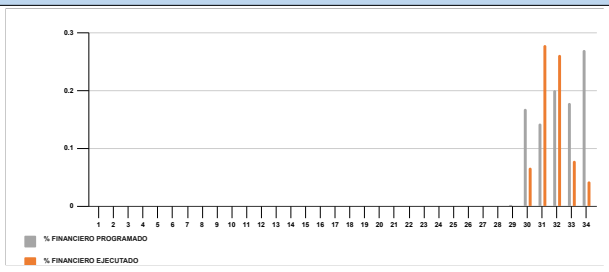

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
		2023-07-23	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-07-24	Instalacion de tuberia EMT y cableado del piso 2 y 3. Instalacion de estructura metalica para cielo raso en piso 2. Instalación de luminarias piso 2 , 3. Instalación de toma corriente e interruptores. Se realizó el proceso de pintura exterior en vinilo	N/A

NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	CL 47 #44 - 100	2023-07-25	Instalación de toma corriente e interruptores piso 2 y 3. Instalacion de estructura metalica para cielo raso en piso 2. Estuco en muro de piso 2. Se realizó el proceso de pintura exterior en vinilo	N/A
		2023-07-26	Inspección de Seguridad y salud en el trabajo.	N/A
		2023-07-27	Instalación de toma corriente e interruptores piso 2 y 3. Instalacion de estructura metalica para cielo raso en piso 2. Instalación de cable encauchetado. Se realizó el proceso de pintura exterior en vinilo	N/A
		2023-07-28	Detallan en estuco en muros de piso 2. Instalación de luminaria.Se realizó el proceso de pintura exterior en vinilo	N/A
		2023-07-29	Instalacion de tuberia EMT y cableado en aulas de piso 2 y 3. Instalación de luminarias de piso 2 y 3.Se realizó el proceso de pintura exterior en vinilo	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	926.47		926.47		$4,221	-	926.47	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	5.93		5.93		$25,547	-	5.93	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	1458.19		1,217.87	87.18	$9,568	834,138.24	1,305.05	153.14
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	312		312.00		$40,436	-	312.00	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.5		0.50		$1,742,818	-	0.50	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	14.57		14.57		$1,894,074	-	14.57	-
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	19.8		19.80		$27,186	-	19.80	-
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	5.93		5.93		$559,014	-	5.93	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	8.2		8.20		$32,154	-	8.20	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	132		124.80		$100,669	-	124.80	7.20
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	228.18		185.82		$23,961	-	185.82	42.36
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	11945.48		11,945.48		$24,307	-	11,945.48	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	796.55		796.53		$34,014	-	796.53	0.02
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	796.53		796.53		$20,865	-	796.53	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	1345		459.30	24.54	$17,948	440,443.92	483.84	861.16
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	548		-	312.17	$17,384	5,426,763.28	312.17	235.83
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	298.15		23.16	14.12	$77,644	1,096,333.28	37.28	260.87
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	776.75		87.15	97.15	$67,320	6,540,138.00	184.30	592.45
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	79		79.00		$19,629	-	79.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	79		79.00		$16,601	-	79.00	-
9.04	ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	214.97		109.13	77.69	$57,278	4,449,927.82	186.82	28.15

9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	130		43.00	7.00	$190,218	1,331,526.00	50.00	80.00
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	30		-	10.00	$40,541	405,410.00	10.00	20.00
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	68		23.00	21.00	$190,755	4,005,855.00	44.00	24.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	7		3.00	3.00	$282,244	846,732.00	6.00	1.00
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	35		10.00	19.00	$235,052	4,465,988.00	29.00	6.00
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS	ML	100.5		-	19.50	$16,480	321,360.00	19.50	81.00
9.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES	UND	1		-	1.00	$872,036	872,036.00	1.00	-
9.24	SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	8		-	4.00	$212,527	850,108.00	4.00	4.00
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG X3 METRO LINEAL LIBRE DE HALOGENO	ML	230		196.00	22.00	$18,863	414,986.00	218.00	12.00
9.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 24 CIRCUITOS BIFASICO	UND	1		-	1.00	$550,917	550,917.00	1.00	-
9.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 36 CIRCUTOS	UND	1		-	1.00	$794,611	794,611.00	1.00	-
9.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO DE 15A HASTA 30A	UND	15		-	15.00	$24,609	369,135.00	15.00	-
9.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 15A HASTA 40A	UND	15		-	8.00	$93,368	746,944.00	8.00	7.00
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	215		158.00	57.00	$55,395	3,157,515.00	215.00	-
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	67		30.00	20.00	$29,990	599,800.00	50.00	17.00
NP 24	ESCARIFICIACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	483.841		483.84		$6,641	-	483.84	0.00
							VALOR DE OBRA	38,520,667.54		
							INCIDENCIA	4.22%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	Anderson Saavedra	SAHAIR ORDOÑEZ	Andamio, Tronzadora, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1bOlA5VIvwmqh4DmOm8s6yBAdnlt



https://drive.google.com/open?id=1TXpMkmtFSRdldLXtZxmg-9ZXA-DDjkL

FOTO 1	Estuco en muros NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	**FOTO 2**	Instalacion de luminarias y pintura de muros NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO



https://drive.google.com/open?id=1WZ2p6-qLRs2dlKTDcJlIrcXOtZTtpYW



https://drive.google.com/open?id=1DsvI9W0pwvT857QIXpmRoYdR2tVCyQ91

FOTO 3	Instalacion de luminarias NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	**FOTO 4**	Instalacion de luminarias NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE SAHAIR ORDOÑEZ	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

NUEVO BOSQUE SEDE 2

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 30**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	25	AL	1

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.99%	0.99%	8	2.86%	0.99%	$41,464,803	0.99%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.95%	2.94%	9	2.39%	1.95%	$81,848,134	2.94%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.63%	3.57%	10	0.54%	0.63%	$26,215,212	3.57%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	2.06%	5.63%	11	5.00%	2.06%	$86,475,827	5.63%
12	19/2/2023	25/2/2023	5.00%	16.61%	22.24%	12	5.00%	16.61%	$696,270,832	22.24%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.77%	24.01%	13	5.00%	1.77%	$74,110,161	24.01%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.19%	1.52%	25.52%	14	0.19%	1.52%	$63,505,031	25.52%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.99%	31.51%	15	1.11%	5.99%	$250,968,527	31.51%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	8.13%	39.64%	16	0.91%	8.13%	$340,692,962	39.64%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.61%	47.25%	17	1.11%	7.61%	$318,983,882	47.25%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.28%	49.53%	**18**	3.49%	2.28%	$95,500,667	49.53%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.63%	51.15%	**19**	2.47%	1.63%	$68,124,340	51.15%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.40%	51.55%	**20**	1.47%	0.40%	$16,880,182	51.55%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.11%	51.66%	**21**	0.85%	0.11%	$4,532,534	51.66%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.06%	51.72%	**22**	0.99%	0.06%	$2,392,368	51.72%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.77%	0.00%	51.72%	**23**	1.77%	0.00%	$0	51.72%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	51.72%	**24**	4.50%	0.00%	$0	51.72%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	51.72%	**25**	2.43%	0.00%	$0	51.72%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.02%	0.00%	51.72%	**26**	1.02%	0.00%	$0	51.72%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.50%	52.22%	**27**	1.65%	0.50%	$20,958,756	52.22%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.21%	52.43%	**28**	6.15%	0.21%	$8,802,678	52.43%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	1.04%	53.47%	**29**	3.12%	1.04%	$43,538,904	53.47%
30	25/6/2023	1/7/2023	9.34%	4.93%	58.40%	**30**	9.34%	4.93%	$206,551,380	58.40%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

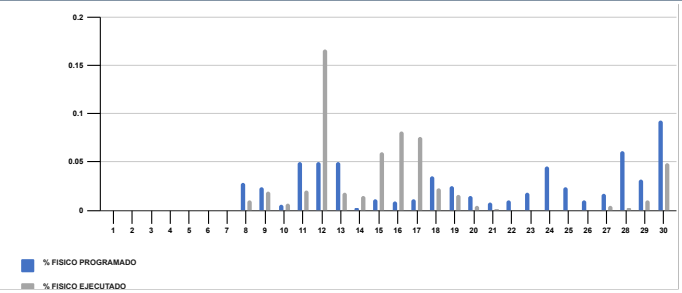

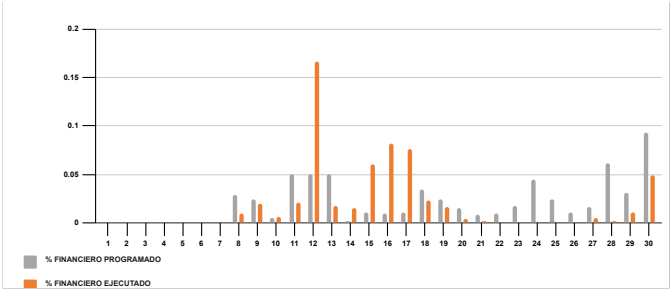

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2023-06-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-26	Armado de acero en la entrada vehicular de vigas y de rampa. Se funde plantilla de desnivel en área de paisajismo de bloque 2	N/A
		2023-06-27	Fundida de rampa de acceso vehicular. Excavación en anden afuera de la sala de profesores.	N/A
		2023-06-28	Excavación en anden afuera de la sala de profesores. Fundida de bordillos. Fundida de rampa de acceso. Relleno con material seleccionado del andén.	N/A
		2023-06-29	Nivelacion y compactacion del terreno con suelo cemento en área contigua a rampa de acceso. Fundida de bordillo de rampa. se realiza la adecuacion de registros.	N/A
		2023-06-30	Nivelacion y compactacion del terreno en area de anden afuera de la sala de profesores. Fundida de andén con malla electrosoldada para acceso peatonal. se realiza la adecuacion de registros sanitarios	N/A
		2023-07-01	Fundida de andén con malla electrosoldada. Se realiza instalación de enchape ceramico.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63		$4,221	$0.00	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00		$454,545	$0.00	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	805.2	4,156.24	3,930.74		$9,648	$0.00	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00		$25,396	$0.00	213.00	-
2	ESTRUCTURA				0%			-	0%	0%
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		0.00		$252,961	-	0.00	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	32.38	355.00	0.00		$20,699	-	0.00	355.00
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	355.00		$20,853	$0.00	355.00	70.88
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	377.00		$20,794	$0.00	377.00	11.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	0	695.00	0.00		$266,275	-	0.00	695.00
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	0		0.00		$32,124	-	0.00	0.00
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	0		0.00		$25,547	-	0.00	0.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	64.87	75.00	0.00		$16,513	-	0.00	75.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	68	1,117.58	1,019.45	28.18	$93,507	$2,635,027.26	1,047.63	69.95
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65		$90,362	$0.00	1,463.65	114.53
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	145.68	1,561.94	1,453.83	108.11	$49,030	$5,300,633.30	1,561.94	0.00
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	60.3205	150.68	0.00		$34,062	-	0.00	150.68
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,338.27	32.34	$192,928	$6,239,291.52	2,370.61	27.98
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13		$54,171	$0.00	921.13	0.00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	719	835.00	117.96		$9,568	$0.00	117.96	717.04
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	513	514.00	0.00		$40,436	-	0.00	514.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.57	0.57	0.00		$894,392	-	0.00	0.57
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$1,742,818	-	0.00	0.00
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$1,894,074	-	0.00	0.00
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	56.5	112.47	0.00		$99,065	-	0.00	112.47

2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	61.14	61.14	0.00	56.49	$260,694	14,726,604.06	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00		$149,548	-	0.00	0.00
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	0	240.00	0.00		$513,566	-	0.00	240.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00		$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00		$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00		$274,649	-	0.00	0.00
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00		$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	34.7	431.50	396.80		$18,074	$0.00	396.80	34.70
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00		$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00		$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90		$154,549	$0.00	22.90	0.00
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00		$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00		$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00		$190,540	-	0.00	0.00
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00		$351,058	-	0.00	0.00
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00		$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00		$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00		$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$813,350	-	0.00	0.00

2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00		$354,181	-	0.00	0.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00		$3,219,697	-	0.00	0.00
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42		$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,319.84		$59,248	$0.00	1,319.84	75.40
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63		$18,887	$0.00	298.63	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	0	468.73	468.73		$32,600	$0.00	468.73	-
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	570	298.63	298.63		$67,320	$0.00	298.63	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00		$19,629	$0.00	57.00	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00		$534,334	$0.00	255.00	12.65
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57		$136,534	$0.00	276.57	173.43
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	738.37		$160,737	$0.00	738.37	51.03
13	NO PREVISTOS				0%			-	0%	0%
NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00
NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	-	37.90	$116,560	$4,417,625.82	37.90	-
NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	-	368.15	$200,000	$73,630,000.00	368.15	372.50
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	-	102.30	$112,945	$11,554,242.81	102.30	-
NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	102.3	102.3	-	102.30	$21,825	$2,232,697.50	102.30	-
NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3		102.30	$129,525	$13,250,376.81	102.30	-
NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3		102.30	$42,793	$4,377,723.90	102.30	-
NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57		26.57	$302,694	$8,042,579.58	26.57	-
NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2		156.49	$127,379	$19,933,461.47	156.49	89.71

NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17		11.00	$510,722	5,617,941.12	11.00	6.00
NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81		6,812.00	$5,078	34,593,175.24	6,812.00	13,395.81
							VALOR DE OBRA	$206,551,380.38		
							INCIDENCIA	4.93%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1dmWqJlL6Dlv03jblrp1JZrmU_i8FBkN7

FOTO 1	Fundida de rampa de acceso NUEVO BOSQUE SEDE 2



https://drive.google.com/open?id=1fVA8ssRxHMJ1moPdgHkgGkjzmFil7eW

FOTO 2	Emparrillado de refuerzo NUEVO BOSQUE SEDE 2



https://drive.google.com/open?id=1OxaYl3yqzdS_ZpzVExyOPZSKVCIlhc

FOTO 3	Fundida de placa NUEVO BOSQUE SEDE 2



https://drive.google.com/open?id=1MF_93c8SteKRRs7mdcEOSHMaB1ug1

FOTO 4	Fundida de placa NUEVO BOSQUE SEDE 2

7. OBSERVACIONES

En relación al comite de obra realizado el dia 09 de mayo de 2023, en el cual el contratista de obra expuso los items no previstos necesarios para cumplir con los estandares de calidad en el cual se autorizó por parte de la entidad contratante la ejecucion de los mismos, a falta de ajustar el balance presuspuestal, no obstante mediante el acta de acuerdo de precios No. 04 del 26 de junio de 2023, se acordó el costo directo por actividad para los items NP 44 - NP 45 - NP 46 - NP 47, reportados durante el periodo inmediato a su aprobación.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 31**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	2	AL	8

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.99%	0.99%	8	2.86%	0.99%	$41,464,803	0.99%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.95%	2.94%	9	2.39%	1.95%	$81,848,134	2.94%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.63%	3.57%	10	0.54%	0.63%	$26,215,212	3.57%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	2.06%	5.63%	11	5.00%	2.06%	$86,475,827	5.63%
12	19/2/2023	25/2/2023	5.00%	16.61%	22.24%	12	5.00%	16.61%	$696,270,832	22.24%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.77%	24.01%	13	5.00%	1.77%	$74,110,161	24.01%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.19%	1.52%	25.52%	14	0.19%	1.52%	$63,505,031	25.52%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.99%	31.51%	15	1.11%	5.99%	$250,968,527	31.51%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	8.13%	39.64%	16	0.91%	8.13%	$340,692,962	39.64%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.61%	47.25%	17	1.11%	7.61%	$318,983,882	47.25%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.28%	49.53%	18	3.49%	2.28%	$95,500,667	49.53%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.63%	51.15%	19	2.47%	1.63%	$68,124,340	51.15%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.40%	51.55%	20	1.47%	0.40%	$16,880,182	51.55%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.11%	51.66%	21	0.85%	0.11%	$4,532,534	51.66%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.06%	51.72%	22	0.99%	0.06%	$2,392,368	51.72%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.77%	0.00%	51.72%	23	1.77%	0.00%	$0	51.72%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	51.72%	24	4.50%	0.00%	$0	51.72%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	51.72%	25	2.43%	0.00%	$0	51.72%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.02%	0.00%	51.72%	26	1.02%	0.00%	$0	51.72%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.50%	52.22%	27	1.65%	0.50%	$20,773,648	52.22%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.21%	52.43%	28	6.15%	0.21%	$8,795,520	52.43%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	1.04%	53.46%	29	3.12%	1.04%	$43,538,904	53.46%
30	25/6/2023	1/7/2023	9.34%	4.93%	58.39%	30	9.34%	4.93%	$206,551,380	58.39%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.56%	2.38%	60.77%	31	2.56%	2.38%	$99,577,968	60.77%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

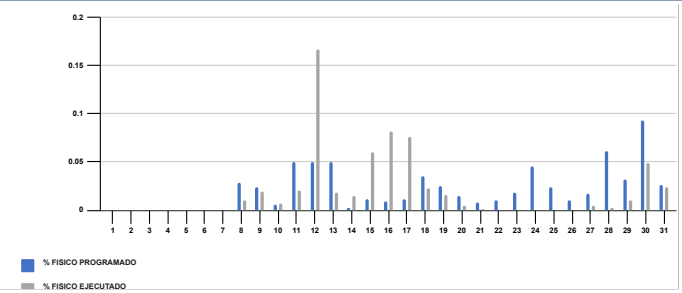

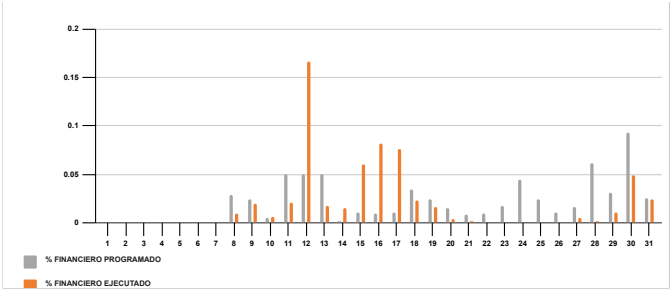

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	**DIRECCIONES**	**FECHA**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**OBSERVACIONES**
NUEVO BOSQUE SEDE 2	**KR 6 A # 60 B - 59**	2023-07-02	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-07-03	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-07-04	Instalacion de adoquin en área contigua a rampas de acceso.	N/A
		2023-07-05	Instalacion de adoquin en área contigua a rampas de acceso. Fundida de viga de confinamiento.	N/A
		2023-07-06	Limpieza de registro afectado por lluvias.	N/A
		2023-07-07	Arreglo de registro y fabricación de tapa nueva de registro, empieza las perforaciones o saca núcleo para los desagües y parte eléctrica de los aires acondicionados	N/A
		2023-07-08	Se continúan las perforaciones en bloque 3 y 4. Arreglos en anden de calle 75.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD INICIAL TOTAL**	**CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA**	**CANTIDAD POR EJECUTAR**
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**2013**	**4,408.63**	**4,378.63**		**$4,221**	**$0.00**	**4,378.63**	**30.00**
1.02	**COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL**	DIA	**7**	**105.00**	**105.00**		**$454,545**	**$0.00**	**105.00**	**-**
1.03	**LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE**	MT2	**805.2**	**4,156.24**	**3,930.74**		**$9,648**	**$0.00**	**3,930.74**	**225.50**
1.08	**DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M**	M2	**0**	**213.00**	**213.00**		**$25,396**	**$0.00**	**213.00**	**-**
2	**ESTRUCTURA**				**0%**			**-**	**0%**	**0%**
2.01	**DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.**	M3	**0**		**0.00**		**$252,961**	**-**	**0.00**	**0.00**
2.02	**DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m**	MT2	**32.38**	**355.00**	**0.00**		**$20,699**	**-**	**0.00**	**355.00**
2.03	**DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M**	M2	**33.15**	**425.88**	**355.00**		**$20,853**	**$0.00**	**355.00**	**70.88**
2.04	**DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL**	ML	**33**	**388.00**	**377.00**		**$20,794**	**$0.00**	**377.00**	**11.00**
2.05	**DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	M3	**0**	**695.00**	**0.00**		**$266,275**	**-**	**0.00**	**695.00**
2.06	**ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M**	M2	**0**		**0.00**		**$32,124**	**-**	**0.00**	**0.00**
2.07	**ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M**	M2	**0**		**0.00**		**$25,547**	**-**	**0.00**	**0.00**
2.08	**ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO**	ML	**64.87**	**75.00**	**0.00**		**$16,513**	**-**	**0.00**	**75.00**
2.09	**EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA**	MT3	**68**	**1,117.58**	**1,047.63**		**$93,507**	**$0.00**	**1,047.63**	**69.95**
2.10	**EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA**	M3	**108.11**	**1,578.18**	**1,463.65**		**$90,362**	**$0.00**	**1,463.65**	**114.53**
2.11	**BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS**	MT2	**145.68**	**1,561.94**	**1,561.94**		**$49,030**	**$0.00**	**1,561.94**	**0.00**
2.12	**RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO**	MT3	**60.3205**	**150.68**	**0.00**		**$34,062**	**-**	**0.00**	**150.68**
2.13	**RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO**	MT3	**60.3205**	**2,398.59**	**2,370.61**		**$192,928**	**$0.00**	**2,370.61**	**27.98**
2.14	**SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS**	MT2	**0**	**921.13**	**921.13**		**$54,171**	**$0.00**	**921.13**	**0.00**
2.15	**ACERO DE REFUERZO FIGURADO**	KGS	**719**	**835.00**	**117.96**		**$9,568**	**$0.00**	**117.96**	**717.04**
2.16	**ANCLAJE EPOXICO**	UND	**513**	**514.00**	**0.00**		**$40,436**	**-**	**0.00**	**514.00**
2.17	**VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**0.57**	**0.57**	**0.00**	**0.57**	**$894,392**	**509,803.44**	**0.57**	**0.00**
2.18	**COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**0**		**0.00**		**$1,742,818**	**-**	**0.00**	**0.00**
2.19	**VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**0**		**0.00**		**$1,894,074**	**-**	**0.00**	**0.00**
2.20	**PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS**	MT2	**56.5**	**112.47**	**0.00**		**$99,065**	**-**	**0.00**	**112.47**

2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	61.14	61.14	56.49		$260,694	-	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00		$149,548	-	0.00	0.00
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	0	240.00	0.00		$513,566	-	0.00	240.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00		$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00		$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00		$274,649	-	0.00	0.00
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00		$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	34.7	431.50	396.80		$18,074	$0.00	396.80	34.70
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00		$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00		$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90		$154,549	$0.00	22.90	0.00
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00		$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00		$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00		$190,540	-	0.00	0.00
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00		$351,058	-	0.00	0.00
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00		$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00		$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00		$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$813,350	-	0.00	0.00

2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00		$354,181	-	0.00	0.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00		$3,219,697	-	0.00	0.00
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42		$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,319.84		$59,248	$0.00	1,319.84	75.40
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63		$18,887	$0.00	298.63	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	0	468.73	468.73		$32,600	$0.00	468.73	-
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	570	298.63	298.63		$67,320	$0.00	298.63	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00		$19,629	$0.00	57.00	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00		$534,334	$0.00	255.00	12.65
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57		$136,534	$0.00	276.57	173.43
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	738.37		$160,737	$0.00	738.37	51.03
13	NO PREVISTOS				0%			-	0%	0%
NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00
NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	30	30	-	15.00	$125,227	$1,878,398.55	15.00	15.00
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA 20X20 X 0.06	ML	349.9	349.9	-	349.90	$38,563	$13,493,018.75	349.90	-
NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	37.90		$116,560	$0.00	37.90	-
NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	368.15	372.50	$200,000	$74,500,000.00	740.65	-
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	102.30		$112,945	$0.00	102.30	-
NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	102.3	102.3	102.30		$21,825	$0.00	102.30	-
NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3	102.30		$129,525	$0.00	102.30	-
NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3	102.30		$42,793	$0.00	102.30	-

NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57	26.57		$302,694	$0.00	26.57	-
NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2	156.49		$127,379	$0.00	156.49	89.71
NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17	11.00		$510,722	-	11.00	6.00
NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81	6,812.00	1,811.00	$5,078	9,196,746.97	8,623.00	11,584.81
							VALOR DE OBRA	$99,577,967.71		
							INCIDENCIA	2.38%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO




https://drive.google.com/open?id=1PDLI1ocycrPGXpJGX9nCzfbbmbiBSG

FOTO 1	Adoquín para andenes exterior NUEVO BOSQUE SEDE 2



https://drive.google.com/open?id=1I8dlnSxu6BHqSNI7rr4MHEOfV9GDS9Y

FOTO 2	Adoquín para andenes exterior NUEVO BOSQUE SEDE 2

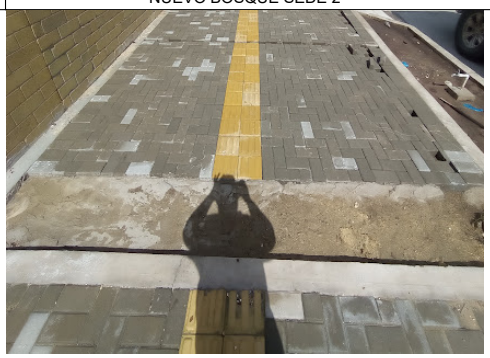

https://drive.google.com/open?id=1aQGCA0sv-WowB4CIOK-9ta835kZFS

FOTO 3	Adoquín para andenes exterior NUEVO BOSQUE SEDE 2



https://drive.google.com/open?id=1wOnY8lvL9jv57iWWv6OvWRkSK1k-ssU

FOTO 4	Descripción foto 4 NUEVO BOSQUE SEDE 2

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 32**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	9	AL	15

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.99%	0.99%	8	2.86%	0.99%	$41,464,803	0.99%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.95%	2.94%	9	2.39%	1.95%	$81,848,134	2.94%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.63%	3.57%	10	0.54%	0.63%	$26,215,212	3.57%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	2.06%	5.63%	11	5.00%	2.06%	$86,475,827	5.63%
12	19/2/2023	25/2/2023	5.00%	16.61%	22.24%	12	5.00%	16.61%	$696,270,832	22.24%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.77%	24.01%	13	5.00%	1.77%	$74,110,161	24.01%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.19%	1.52%	25.52%	14	0.19%	1.52%	$63,505,031	25.52%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.99%	31.51%	15	1.11%	5.99%	$250,968,527	31.51%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	8.13%	39.64%	16	0.91%	8.13%	$340,692,962	39.64%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.61%	47.25%	17	1.11%	7.61%	$318,983,882	47.25%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.28%	49.53%	18	3.49%	2.28%	$95,500,667	49.53%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.63%	51.15%	19	2.47%	1.63%	$68,124,340	51.15%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.40%	51.55%	20	1.47%	0.40%	$16,880,182	51.55%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.11%	51.66%	21	0.85%	0.11%	$4,532,534	51.66%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.06%	51.72%	22	0.99%	0.06%	$2,392,368	51.72%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.77%	0.00%	51.72%	23	1.77%	0.00%	$0	51.72%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	51.72%	24	4.50%	0.00%	$0	51.72%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	51.72%	25	2.43%	0.00%	$0	51.72%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.02%	0.00%	51.72%	26	1.02%	0.00%	$0	51.72%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.50%	52.22%	27	1.65%	0.50%	$20,958,756	52.22%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.21%	52.43%	28	6.15%	0.21%	$8,802,678	52.43%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	1.04%	53.47%	29	3.12%	1.04%	$43,538,904	53.47%
30	25/6/2023	1/7/2023	9.34%	4.93%	58.40%	30	9.34%	4.93%	$206,551,380	58.40%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.56%	2.38%	60.77%	31	2.56%	2.38%	$99,577,968	60.77%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.26%	0.58%	61.35%	32	3.26%	0.58%	$24,153,601	61.35%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

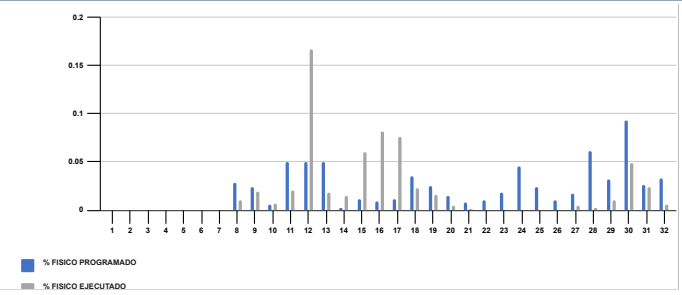

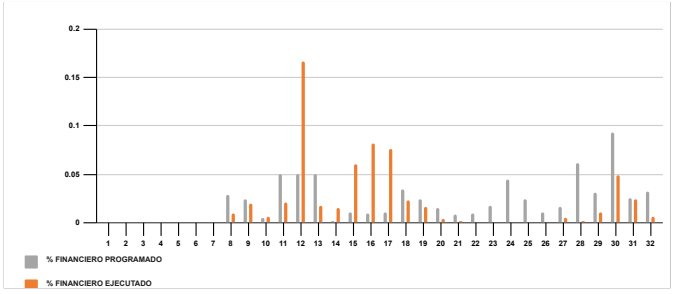

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	**DIRECCIONES**	**FECHA**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**OBSERVACIONES**
NUEVO BOSQUE SEDE 2	**KR 6 A # 60 B - 59**	2023-07-09	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-07-10	Perforaciones en el bloque 3 y 4. LLegó mobiliario y se almacena en sala de profesores.	N/A
		2023-07-11	Perforaciones en el bloque 4. Levantamiento en cocina para enchape. Se encuentra fuga en tubería de baños de la planta superior. Escarificación de muros de la cocina.	N/A
		2023-07-12	Escarificación de muros de la cocina.	N/A
		2023-07-13	Escarificación de muros de la cocina. Aplicación de acronal en muros de cocina. Instalación de enchape de cocina.	N/A
		2023-07-14	Se continuó con la excavacion y relleno en el area de andenes internos	N/A
		2023-07-15	Se continuó con la excavacion y relleno en el area de andenes internos	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD INICIAL TOTAL**	**CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA**	**CANTIDAD POR EJECUTAR**
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**2013**	**4,408.63**	**4,378.63**		**$4,221**	**$0.00**	**4,378.63**	**30.00**
1.02	**COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL**	DIA	**7**	**105.00**	**105.00**		**$454,545**	**$0.00**	**105.00**	**-**
1.03	**LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE**	MT2	**805.2**	**4,156.24**	**3,930.74**		**$9,648**	**$0.00**	**3,930.74**	**225.50**
1.08	**DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M**	M2	**0**	**213.00**	**213.00**		**$25,396**	**$0.00**	**213.00**	**-**
2	**ESTRUCTURA**				**0%**			**-**	**0%**	**0%**
2.01	**DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.**	M3	**0**		**0.00**		**$252,961**	**-**	**0.00**	**0.00**
2.02	**DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m**	MT2	**32.38**	**355.00**	**0.00**		**$20,699**	**-**	**0.00**	**355.00**
2.03	**DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M**	M2	**33.15**	**425.88**	**355.00**		**$20,853**	**$0.00**	**355.00**	**70.88**
2.04	**DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL**	ML	**33**	**388.00**	**377.00**		**$20,794**	**$0.00**	**377.00**	**11.00**
2.05	**DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	M3	**0**	**695.00**	**0.00**		**$266,275**	**-**	**0.00**	**695.00**
2.06	**ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M**	M2	**0**		**0.00**		**$32,124**	**-**	**0.00**	**0.00**
2.07	**ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M**	M2	**0**		**0.00**		**$25,547**	**-**	**0.00**	**0.00**
2.08	**ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO**	ML	**64.87**	**75.00**	**0.00**		**$16,513**	**-**	**0.00**	**75.00**
2.09	**EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA**	MT3	**68**	**1,117.58**	**1,047.63**	**36.69**	**$93,507**	**$3,430,771.83**	**1,084.32**	**33.26**
2.10	**EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA**	M3	**108.11**	**1,578.18**	**1,463.65**		**$90,362**	**$0.00**	**1,463.65**	**114.53**
2.11	**BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS**	MT2	**145.68**	**1,561.94**	**1,561.94**		**$49,030**	**$0.00**	**1,561.94**	**0.00**
2.12	**RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO**	MT3	**60.3205**	**150.68**	**0.00**		**$34,062**	**-**	**0.00**	**150.68**
2.13	**RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO**	MT3	**60.3205**	**2,398.59**	**2,370.61**	**27.98**	**$192,928**	**$5,398,125.44**	**2,398.59**	**0.00**
2.14	**SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS**	MT2	**0**	**921.13**	**921.13**		**$54,171**	**$0.00**	**921.13**	**0.00**
2.15	**ACERO DE REFUERZO FIGURADO**	KGS	**719**	**835.00**	**117.96**		**$9,568**	**$0.00**	**117.96**	**717.04**
2.16	**ANCLAJE EPOXICO**	UND	**513**	**514.00**	**0.00**		**$40,436**	**-**	**0.00**	**514.00**
2.17	**VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**0.57**	**0.57**	**0.57**		**$894,392**	**-**	**0.57**	**0.00**
2.18	**COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**0**		**0.00**		**$1,742,818**	**-**	**0.00**	**0.00**
2.19	**VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**0**		**0.00**		**$1,894,074**	**-**	**0.00**	**0.00**
2.20	**PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS**	MT2	**56.5**	**112.47**	**0.00**		**$99,065**	**-**	**0.00**	**112.47**

2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	61.14	61.14	56.49		$260,694	-	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00		$149,548	-	0.00	0.00
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	0	240.00	0.00		$513,566	-	0.00	240.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00		$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00		$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00		$274,649	-	0.00	0.00
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00		$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	34.7	431.50	396.80		$18,074	$0.00	396.80	34.70
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00		$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00		$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90		$154,549	$0.00	22.90	0.00
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00		$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00		$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00		$190,540	-	0.00	0.00
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00		$351,058	-	0.00	0.00
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00		$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00		$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00		$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$813,350	-	0.00	0.00

2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00		$354,181	-	0.00	0.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00		$3,219,697	-	0.00	0.00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	214.73	214.73	-	172.63	$13,644	2,355,363.72	172.63	42.10
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42		$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,319.84		$59,248	$0.00	1,319.84	75.40
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63		$18,887	$0.00	298.63	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	0	468.73	468.73		$32,600	$0.00	468.73	-
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	570	298.63	298.63		$67,320	$0.00	298.63	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00		$19,629	$0.00	57.00	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00		$534,334	$0.00	255.00	12.65
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57		$136,534	$0.00	276.57	173.43
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	738.37		$160,737	$0.00	738.37	51.03
13	NO PREVISTOS				0%			-	0%	0%
NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00
NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	30	30	15.00	15.00	$125,227	$1,878,398.55	30.00	-
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA 20X20 X 0.06	ML	349.9	349.9	349.90		$38,563	$0.00	349.90	-
NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	37.90		$116,560	$0.00	37.90	-
NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	740.65		$200,000	$0.00	740.65	-
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	102.30		$112,945	$0.00	102.30	-
NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	102.3	102.3	102.30		$21,825	$0.00	102.30	-
NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3	102.30		$129,525	$0.00	102.30	-
NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3	102.30		$42,793	$0.00	102.30	-

NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57	26.57		$302,694	$0.00	26.57	-
NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2	156.49		$127,379	$0.00	156.49	89.71
NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17	11.00		$510,722	-	11.00	6.00
NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81	8,623.00	2,184.00	$5,078	11,090,941.68	10,807.00	9,400.81
							VALOR DE OBRA	$24,153,601.22		
							INCIDENCIA	0.58%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO




https://drive.google.com/open?id=1I3sX1AhWSG2fGnh0rPZKxNNLcMsfo

FOTO 1	Escarificación de muros. NUEVO BOSQUE SEDE 2



https://drive.google.com/open?id=1g3QE_kuLzOlVYkMOOQ3BCIlJ5buaDzo8

FOTO 2	Escarificación de muros. NUEVO BOSQUE SEDE 2

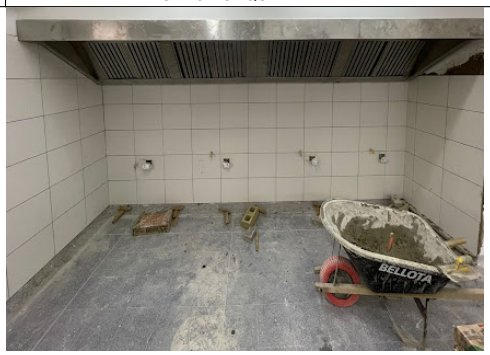

https://drive.google.com/open?id=1ITOZ4ZhBOgMECnM1zDLeRjJtZGwJI

FOTO 3	Instalación de enchape en la cocina. NUEVO BOSQUE SEDE 2



https://drive.google.com/open?id=11AOPYyVFdq3CfnmhSdodoedB0IC8Xe

FOTO 4	Instalación de enchape en la cocina. NUEVO BOSQUE SEDE 2

7. OBSERVACIONES

Elaborado por: Ricardo Caballero	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 33**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	16	AL	22

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.99%	0.99%	8	2.86%	0.99%	$41,464,803	0.99%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.95%	2.94%	9	2.39%	1.95%	$81,848,134	2.94%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.63%	3.57%	10	0.54%	0.63%	$26,215,212	3.57%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	2.06%	5.63%	11	5.00%	2.06%	$86,475,827	5.63%
12	19/2/2023	25/2/2023	5.00%	16.61%	22.24%	12	5.00%	16.61%	$696,270,832	22.24%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.77%	24.01%	13	5.00%	1.77%	$74,110,161	24.01%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.19%	1.52%	25.52%	14	0.19%	1.52%	$63,505,031	25.52%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.99%	31.51%	15	1.11%	5.99%	$250,968,527	31.51%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	8.13%	39.64%	16	0.91%	8.13%	$340,692,962	39.64%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.61%	47.25%	17	1.11%	7.61%	$318,983,882	47.25%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.28%	49.53%	**18**	3.49%	2.28%	$95,500,667	49.53%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.63%	51.15%	**19**	2.47%	1.63%	$68,124,340	51.15%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.40%	51.55%	**20**	1.47%	0.40%	$16,880,182	51.55%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.11%	51.66%	**21**	0.85%	0.11%	$4,532,534	51.66%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.06%	51.72%	**22**	0.99%	0.06%	$2,392,368	51.72%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.77%	0.00%	51.72%	**23**	1.77%	0.00%	$0	51.72%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	51.72%	**24**	4.50%	0.00%	$0	51.72%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	51.72%	**25**	2.43%	0.00%	$0	51.72%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.02%	0.00%	51.72%	**26**	1.02%	0.00%	$0	51.72%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.50%	52.22%	**27**	1.65%	0.50%	$20,773,648	52.22%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.21%	52.43%	**28**	6.15%	0.21%	$8,795,520	52.43%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	1.04%	53.46%	**29**	3.12%	1.04%	$43,538,904	53.46%
30	25/6/2023	1/7/2023	9.34%	4.93%	58.39%	**30**	9.34%	4.93%	$206,551,380	58.39%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.56%	2.38%	60.77%	**31**	2.56%	2.38%	$99,577,968	60.77%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.26%	0.58%	61.34%	**32**	3.26%	0.58%	$24,153,601	61.34%
33	16/7/2023	22/7/2023	16.17%	0.87%	62.21%	**33**	16.17%	0.87%	$36,484,902	62.21%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

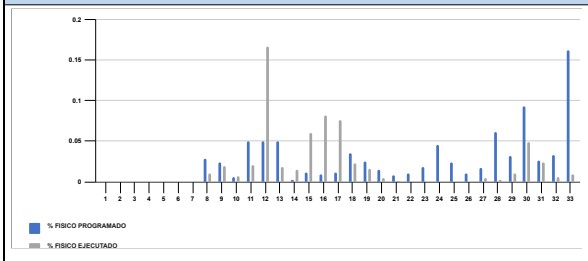

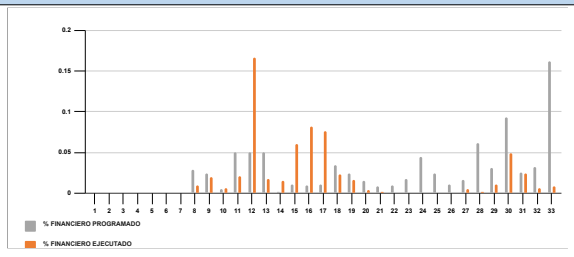

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2023-07-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-07-17	Instalación de enchape de cocina. Fundida de rampa de acceso. Legada de mobiliario.	N/A
		2023-07-18	Instalación de enchape de cocina.	N/A
		2023-07-19	Instalación de enchape de cocina y despensa. Pañete de muro de vestidor y zona de basuras.	N/A
		2023-07-20	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-07-21	Escarificación de muros de despensa y aplicación de acronal. Enchape de muros en estas áreas. Corte y soldadura de soportes para instalación de concertinas.	N/A
		2023-07-22	Instalación de enchape de cocina y despensa. Instalacion de concertina en fachada norte (Cra. 7B)	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63		$4,221	$0.00	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00		$454,545	$0.00	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	805.2	4,156.24	3,930.74		$9,648	$0.00	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00		$25,396	$0.00	213.00	-
2	ESTRUCTURA				0%			-	0%	0%
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		0.00		$252,961	-	0.00	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	32.38	355.00	0.00		$20,699	-	0.00	355.00
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	355.00		$20,853	$0.00	355.00	70.88
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	377.00		$20,794	$0.00	377.00	11.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	0	695.00	0.00		$266,275	-	0.00	695.00
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	0		0.00		$32,124	-	0.00	0.00
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	0		0.00		$25,547	-	0.00	0.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	64.87	75.00	0.00		$16,513	-	0.00	75.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	68	1,117.58	1,084.32		$93,507	$0.00	1,084.32	33.26
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65		$90,362	$0.00	1,463.65	114.53
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	145.68	1,561.94	1,561.94		$49,030	$0.00	1,561.94	0.00
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	60.3205	150.68	0.00		$34,062	-	0.00	150.68
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,398.59		$192,928	$0.00	2,398.59	0.00
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13		$54,171	$0.00	921.13	0.00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	719	835.00	117.96		$9,568	$0.00	117.96	717.04
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	513	514.00	0.00		$40,436	-	0.00	514.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.57	0.57	0.57		$894,392	-	0.57	0.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$1,742,818	-	0.00	0.00
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$1,894,074	-	0.00	0.00
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	56.5	112.47	0.00		$99,065	-	0.00	112.47
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	61.14	61.14	56.49		$260,694	-	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00		$149,548	-	0.00	0.00
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	0	240.00	0.00		$513,566	-	0.00	240.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00		$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00		$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00		$274,649	-	0.00	0.00
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00		$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	34.7	431.50	396.80		$18,074	$0.00	396.80	34.70
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00		$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00		$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90		$154,549	$0.00	22.90	0.00
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00		$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00		$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00		$190,540	-	0.00	0.00

2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00		$351,058	-	0.00	0.00
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00		$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00		$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00		$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$813,350	-	0.00	0.00
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00		$354,181	-	0.00	0.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00		$3,219,697	-	0.00	0.00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	214.73	214.73	172.63	42.10	$13,644	574,412.40	214.73	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	45.63	45.63	-	22.12	$23,961	530,017.32	22.12	23.51
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42		$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,319.84		$59,248	$0.00	1,319.84	75.40
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63		$18,887	$0.00	298.63	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	0	468.73	468.73		$32,600	$0.00	468.73	-
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	570	298.63	298.63		$67,320	$0.00	298.63	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00		$19,629	$0.00	57.00	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00		$534,334	$0.00	255.00	12.65
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57		$136,534	$0.00	276.57	173.43
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	738.37		$160,737	$0.00	738.37	51.03
13	NO PREVISTOS				0%			-	0%	0%
NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00
NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	30	30	30.00		$125,227	$0.00	30.00	-
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA 20X20 X 0.06	ML	349.9	349.9	349.90		$38,563	$0.00	349.90	-
NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	37.90		$116,560	$0.00	37.90	-
NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	740.65		$200,000	$0.00	740.65	-
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	102.30		$112,945	$0.00	102.30	-
NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	102.3	102.3	102.30		$21,825	$0.00	102.30	-
NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3	102.30		$129,525	$0.00	102.30	-
NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3	102.30		$42,793	$0.00	102.30	-
NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57	26.57		$302,694	$0.00	26.57	-
NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2	156.49		$127,379	$0.00	156.49	89.71
NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17	11.00		$510,722	-	11.00	6.00
NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81	10,807.00	2,178.00	$5,078	11,060,472.06	12,985.00	7,222.81

NP 57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DOBLE ALTURA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO CON CUCHILLAS , LA INSTALACION INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE ½ A ¼ , TENSORES DE ¼ TORNILLOS DE ANCLAJES DE 3/8 X2 Y 2 ½ . ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 ALTURA DE INSTALACION > 6 MTS	ML	331.3	331.3		128.00	$190,000	24,320,000.00	128.00	203.30
							VALOR DE OBRA	$36,484,901.78		
							INCIDENCIA	0.87%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Enchape de muros. NUEVO BOSQUE SEDE 2	FOTO 2	Excavación para bordillo. NUEVO BOSQUE SEDE 2



FOTO 3	Instalación de enchape. NUEVO BOSQUE SEDE 2	FOTO 4	Instalación de enchape. NUEVO BOSQUE SEDE 2

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 34**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**	
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	23	AL	29	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.99%	0.99%	8	2.86%	0.99%	$41,464,803	0.99%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.95%	2.94%	9	2.39%	1.95%	$81,848,134	2.94%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.63%	3.57%	10	0.54%	0.63%	$26,215,212	3.57%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	2.06%	5.63%	11	5.00%	2.06%	$86,475,827	5.63%
12	19/2/2023	25/2/2023	5.00%	16.61%	22.24%	12	5.00%	16.61%	$696,270,832	22.24%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.77%	24.01%	13	5.00%	1.77%	$74,110,161	24.01%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.19%	1.52%	25.52%	14	0.19%	1.52%	$63,505,031	25.52%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.99%	31.51%	15	1.11%	5.99%	$250,968,527	31.51%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	8.13%	39.64%	16	0.91%	8.13%	$340,692,962	39.64%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.61%	47.25%	17	1.11%	7.61%	$318,983,882	47.25%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.28%	49.53%	18	3.49%	2.28%	$95,500,667	49.53%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.63%	51.15%	19	2.47%	1.63%	$68,124,340	51.15%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.40%	51.55%	20	1.47%	0.40%	$16,880,182	51.55%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.11%	51.66%	21	0.85%	0.11%	$4,532,534	51.66%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.06%	51.72%	22	0.99%	0.06%	$2,392,368	51.72%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.77%	0.00%	51.72%	23	1.77%	0.00%	$0	51.72%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	51.72%	24	4.50%	0.00%	$0	51.72%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	51.72%	25	2.43%	0.00%	$0	51.72%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.02%	0.00%	51.72%	26	1.02%	0.00%	$0	51.72%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.50%	52.22%	27	1.65%	0.50%	$20,773,648	52.22%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.21%	52.43%	28	6.15%	0.21%	$8,795,520	52.43%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	1.04%	53.46%	29	3.12%	1.04%	$43,538,904	53.46%
30	25/6/2023	1/7/2023	9.34%	4.93%	58.39%	30	9.34%	4.93%	$206,551,380	58.39%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.56%	2.38%	60.77%	31	2.56%	2.38%	$99,577,968	60.77%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.26%	0.58%	61.34%	32	3.26%	0.58%	$24,153,601	61.34%
33	16/7/2023	22/7/2023	16.17%	0.87%	62.21%	33	16.17%	0.87%	$36,484,902	62.21%
34	23/7/2023	29/7/2023	12.67%	6.07%	68.28%	34	12.67%	6.07%	$254,306,093	68.28%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

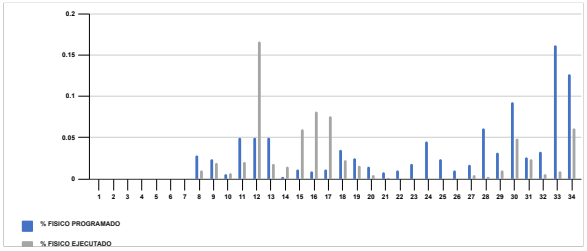

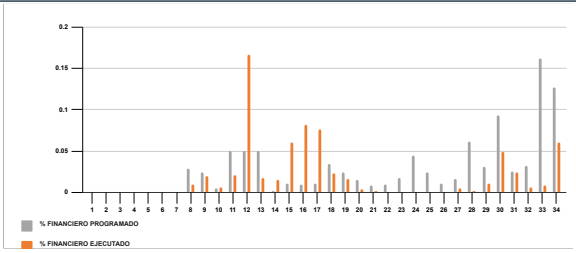

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	**KR 6 A # 60 B - 59**	2023-07-23	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-07-24	Instalacion de concertina (Cra. 7B y calle 75)	N/A
		2023-07-25	Instalacion de concertina. Instalación de escalera en registro eléctrico exterior. Entrega de cuarto de subestación y aledaños. Fundida de bordillos en zona verde frente a la sala de profesores.	N/A
		2023-07-26	Instalación de concertina. Instalación de tubería de aires acondicionados. Pañete en área de lavamanos de preescolar.	N/A
		2023-07-27	Pañete en área de lavamanos de preescolar. Instalación de tubería de aires acondicionados en bloque #2. Instalación de concertina perimetral.	N/A

		2023-07-28	Pañete en área de lavamanos de preescolar. Instalación de tubería de aires acondicionados en bloque #2. Instalación de concertina perimetral. Demolición en la cancha para instalar porterías. Relleno con arena negra en zona verde entre el bloque 2 y la sala de profesores. Se funde placa y se arregla registro.	N/A
		2023-07-29	Pañete en área de lavamanos de preescolar. Instalación de tubería de aires acondicionados en bloque #2. Instalación de concertina perimetral. Demolición en la cancha para instalar porterías. Instalación de tableros eléctricos para aires acondicionados.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63		$4,221	$0.00	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00		$454,545	$0.00	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	805.2	4,156.24	3,930.74		$9,648	$0.00	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00		$25,396	$0.00	213.00	-
2	ESTRUCTURA				0%			-	0%	0%
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		0.00		$252,961	-	0.00	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	32.38	355.00	0.00		$20,699	-	0.00	355.00
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	355.00		$20,853	$0.00	355.00	70.88
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	377.00		$20,794	$0.00	377.00	11.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	0	695.00	0.00		$266,275	-	0.00	695.00
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	0		0.00		$32,124	-	0.00	0.00
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	0		0.00		$25,547	-	0.00	0.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	64.87	75.00	0.00		$16,513	-	0.00	75.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	68	1,117.58	1,084.32		$93,507	$0.00	1,084.32	33.26
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65		$90,362	$0.00	1,463.65	114.53
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	145.68	1,561.94	1,561.94		$49,030	$0.00	1,561.94	0.00
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	60.3205	150.68	0.00		$34,062	-	0.00	150.68
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,398.59		$192,928	$0.00	2,398.59	0.00
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13		$54,171	$0.00	921.13	0.00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	719	835.00	117.96		$9,568	$0.00	117.96	717.04
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	513	514.00	0.00		$40,436	-	0.00	514.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.57	0.57	0.57		$894,392	-	0.57	0.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$1,742,818	-	0.00	0.00
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$1,894,074	-	0.00	0.00
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	56.5	112.47	0.00		$99,065	-	0.00	112.47
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	61.14	61.14	56.49		$260,694	-	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00		$149,548	-	0.00	0.00
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	0	240.00	0.00		$513,566	-	0.00	240.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00		$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00		$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00		$274,649	-	0.00	0.00
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00		$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	34.7	431.50	396.80		$18,074	$0.00	396.80	34.70
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00		$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00		$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90		$154,549	$0.00	22.90	0.00

2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00		$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00		$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00		$190,540	-	0.00	0.00
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00		$351,058	-	0.00	0.00
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00		$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00		$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00		$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$813,350	-	0.00	0.00
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00		$354,181	-	0.00	0.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00		$3,219,697	-	0.00	0.00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	214.73	214.73	214.73		$13,644	-	214.73	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	45.63	45.63	22.12	23.51	$23,961	563,323.11	45.63	-
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42		$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,319.84		$59,248	$0.00	1,319.84	75.40
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63		$18,887	$0.00	298.63	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	0	468.73	468.73		$32,600	$0.00	468.73	-
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	570	298.63	298.63		$67,320	$0.00	298.63	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00		$19,629	$0.00	57.00	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00		$534,334	$0.00	255.00	12.65
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57		$136,534	$0.00	276.57	173.43
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	738.37		$160,737	$0.00	738.37	51.03
13	NO PREVISTOS				0%			-	0%	0%
NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00
NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-
* NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1/2"	ML	75	668.25		75.00	$364,167	$27,312,509.25	75.00	593.25
* NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 7/8"	ML	290.01	290.01		151.00	$771,685	$116,524,474.26	151.00	139.01
* NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1 1/8"	ML	168.8	168.8		73.15	$878,506	$64,262,685.37	73.15	95.65
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	30	30	30.00		$125,227	$0.00	30.00	-
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA 20X20 X 0.06	ML	349.9	349.9	349.90		$38,563	$0.00	349.90	-
NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	37.90		$116,560	$0.00	37.90	-
NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	740.65		$200,000	$0.00	740.65	-
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	102.30		$112,945	$0.00	102.30	-
NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	102.3	102.3	102.30		$21,825	$0.00	102.30	-
NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3	102.30		$129,525	$0.00	102.30	-
NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3	102.30		$42,793	$0.00	102.30	-

NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57	26.57		$302,694	$0.00	26.57	-
NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2	156.49		$127,379	$0.00	156.49	89.71
NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17	11.00	6.00	$510,722	3,064,331.52	17.00	-
NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81	10,807.00	5,484.00	$5,078	27,849,232.68	16,291.00	3,916.81
NP 57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DOBLE ALTURA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO CON CUCHILLAS , LA INSTALACION INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE ½ A ¼ , TENSORES DE ¼ TORNILLOS DE ANCLAJES DE 3/8 X2 Y 2 ½ . ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 ALTURA DE INSTALACION > 6 MTS	ML	331.3	331.3	128.00	59.00	$190,000	11,210,000.00	187.00	144.30
NP 58	FABRICACION E INSTALACION ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA RIGID METAL , INCLUYE SOLDADURA Y DEMAS ACCESORIO (RETIE)	UND	1	1		1.00	$1,898,400	1,898,400.00	1.00	-
							VALOR DE OBRA	$254,306,093.15		
							INCIDENCIA	6.07%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1K3sb_dATQCZGSECv_Fw4vx6Lbl7KdXa6

FOTO 1	Instalación de concertina. NUEVO BOSQUE SEDE 2




https://drive.google.com/open?id=1Fxr0qmvKeqUvqN5fk0l0U3ELQBmzUO3p

FOTO 2	Pañete en área de lavamanos. NUEVO BOSQUE SEDE 2



https://drive.google.com/open?id=1PI_lEzACKoICUcCbsGIMYn_PAEeSwUn7a

FOTO 3	Instalación de enchape. NUEVO BOSQUE SEDE 2

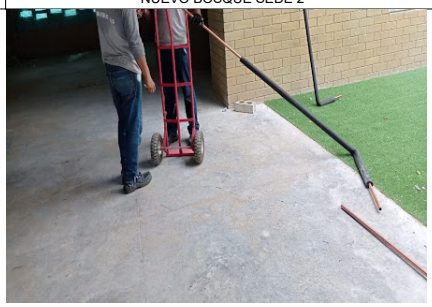

https://drive.google.com/open?id=1lo7BQWIAAxBXXuqzvjo_Ele5Vlb9L_U7

FOTO 4	Instalación tuberías de aires acondicionados. NUEVO BOSQUE SEDE 2

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REUVEN FEUERSTEIN

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 30**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	25	AL	1

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.23%	0.68%	0.68%	7	0.23%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.94%	1.00%	1.68%	8	2.94%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.68%	0.91%	2.59%	9	1.68%	0.91%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.42%	0.94%	3.53%	10	2.42%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.31%	0.55%	4.08%	11	2.31%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	1.11%	0.29%	4.37%	12	1.11%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	8.83%	5.17%	16.35%	14	8.83%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	10.02%	0.95%	17.31%	15	10.02%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	7.12%	0.49%	17.80%	16	7.12%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.21%	0.42%	18.22%	17	1.21%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	1.28%	0.00%	18.22%	18	1.28%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.29%	0.96%	19.18%	19	0.29%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.40%	1.14%	20.33%	20	0.40%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.33%	0.43%	20.76%	21	0.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.97%	1.66%	22.42%	22	1.97%	1.66%	$19,893,426	22.42%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.95%	1.15%	23.57%	23	0.95%	1.15%	$13,708,736	23.57%
24	14/5/2023	20/5/2023	1.16%	2.01%	25.58%	24	1.16%	2.01%	$24,010,801	25.58%
25	21/5/2023	27/5/2023	3.12%	1.28%	26.86%	25	3.12%	1.28%	$15,311,635	26.86%
26	28/5/2023	3/6/2023	3.92%	2.43%	29.29%	26	3.92%	2.43%	$29,016,888	29.29%
27	4/6/2023	10/6/2023	6.61%	0.50%	29.78%	27	6.61%	0.50%	$5,921,352	29.78%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.51%	1.78%	31.56%	28	1.51%	1.78%	$21,262,879	31.56%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.56%	1.40%	32.96%	29	3.56%	1.40%	$16,767,491	32.96%
30	25/6/2023	1/7/2023	7.73%	1.76%	34.73%	30	7.73%	1.76%	$21,056,726	34.73%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

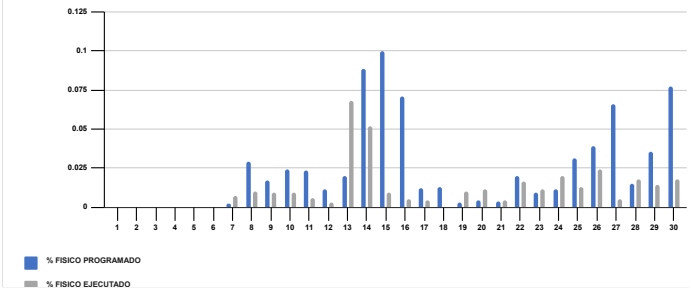

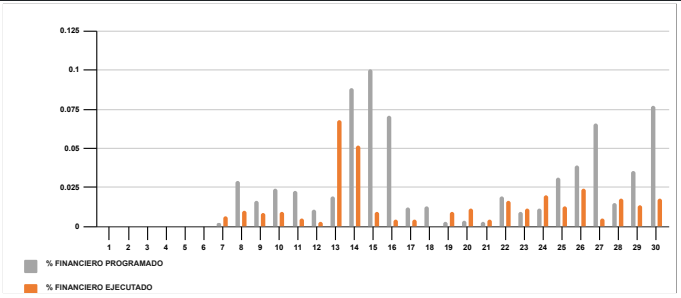

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-06-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-06-26	Levante en mampostería en area de cocina. Aplicación de pañete en sala de profesores. Escarificación de pañete y demolición de piso, plantilla de concreto y zocalos en aulas de prescolar fase 2. Fundida de viga aérea. Pañete en muro.	N/A
		2023-06-27	Escarificación de pañete y demolición de piso, plantilla de concreto en aulas de prescolar fase 2. Pañete en sala de profesores. Desencofrado de viga aérea.	N/A
		2023-06-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra. Revisión de actividades no aprobadas.	N/A
		2023-06-29	Aplicación de pañete y levante en mampostería. demolicion de piso, plantilla de concreto en aulas de prescolar fase 2. Desencofrado de viga aérea sobre muro de cerramiento.	N/A
		2023-06-30	Aplicación de pañete y levante en mampostería. demolicion de piso en aulas de prescolar fase 2. Desencofrado de columneta tipo pérgola, fase 1. Levante de mampostería fase 1. Corte y figuración de acero.	N/A
		2023-07-01	Aplicación de pañete y demolición de piso, plantilla de concreto en aulas de prescolar fase 2.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		253.58	695.63	4221	2,936,254.23	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		35.00	5.00	$454,545	2,272,725.00	40.00	530.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		223.58		$9,648	-	223.58	725.63
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07		$116,390	-	26.07	58.35
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15		$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58		$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87		$36,506	-	20.87	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		5.00	6.00	$252,961	1,517,766.00	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		218.00	89.69	$20,699	1,856,493.31	307.69	62.31
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54		$266,275	-	1,207.54	73.08
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95		$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52		$16,513	-	2.52	2.36
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	162.94		26.90	42.85	$93,507	4,006,774.95	69.75	93.19
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		11.02		$49,030	-	11.02	55.41
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	178.42		67.40		$34,062	-	67.40	111.02
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		11.02		$54,171	-	11.02	17,280.10
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		4,082.43	368.00	$9,568	3,521,024.00	4,450.43	3,370.50
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		5.84	1.30	$894,392	1,162,709.60	7.14	12.46
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		2.67		$1,742,818	-	2.67	17.39
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69		$1,894,074	-	6.69	260.54
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08		$149,548	-	248.08	-
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55		$27,186	-	278.55	357.45

2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	24.51		6.48		$1,933,197	-	6.48	18.03
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17		$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58		$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01		$813,350	-	24.01	18.61
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17		$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		146.81		$32,154	-	146.81	289.58
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	223.605		-	82.15	$13,644	1,120,854.60	82.15	141.46
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	305.52		266.29		$100,669	-	266.29	39.23
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	601		354.26	38.00	$23,961	910,518.00	392.26	208.74
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	89		16.00	7.00	$17,610	123,270.00	23.00	66.00
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00		$39,705	-	13.00	-
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		300.12		$33,985	-	300.12	20.11
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		243.60	86.73	$16,524	1,433,126.52	330.33	-
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	456		-	54.00	$3,615	195,210.00	54.00	402.00
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00		$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		12.00		$57,053	-	12.00	4.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		1.00		$32,669	-	1.00	24.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		4.00		$16,601	-	4.00	12.00
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00		$19,709	-	1.00	410.20
								VALOR DE OBRA	21,056,726.21	
								INCIDENCIA	1.76%	

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO





			
FOTO 1	Demolición de piso REUVEN FEUERSTEIN	**FOTO 2**	Demolición de piso REUVEN FEUERSTEIN
			
FOTO 3	Escarificación de muros. REUVEN FEUERSTEIN	**FOTO 4**	Pañete sobre muros. REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 31**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	2	AL	8

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.23%	0.68%	0.68%	7	0.23%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.94%	1.00%	1.68%	8	2.94%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.68%	0.91%	2.59%	9	1.68%	0.91%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.42%	0.94%	3.53%	10	2.42%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.31%	0.55%	4.08%	11	2.31%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	1.11%	0.29%	4.37%	12	1.11%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	8.83%	5.17%	16.35%	14	8.83%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	10.02%	0.95%	17.31%	15	10.02%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	7.12%	0.49%	17.80%	16	7.12%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.21%	0.42%	18.22%	17	1.21%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	1.28%	0.00%	18.22%	18	1.28%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.29%	0.96%	19.18%	19	0.29%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.40%	1.14%	20.33%	20	0.40%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.33%	0.43%	20.76%	21	0.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.97%	1.66%	22.42%	22	1.97%	1.66%	$19,893,426	22.42%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.95%	1.15%	23.57%	23	0.95%	1.15%	$13,708,736	23.57%
24	14/5/2023	20/5/2023	1.16%	2.01%	25.58%	24	1.16%	2.01%	$24,010,801	25.58%
25	21/5/2023	27/5/2023	3.12%	1.28%	26.86%	25	3.12%	1.28%	$15,311,635	26.86%
26	28/5/2023	3/6/2023	3.92%	2.43%	29.29%	26	3.92%	2.43%	$29,016,888	29.29%
27	4/6/2023	10/6/2023	6.61%	0.50%	29.78%	27	6.61%	0.50%	$5,921,352	29.78%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.51%	1.78%	31.56%	28	1.51%	1.78%	$21,262,879	31.56%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.56%	1.40%	32.96%	29	3.56%	1.40%	$16,767,491	32.96%
30	25/6/2023	1/7/2023	7.73%	1.76%	34.73%	30	7.73%	1.76%	$21,056,726	34.73%
31	2/7/2023	8/7/2023	6.69%	1.22%	35.94%	31	6.69%	1.22%	$14,530,148	35.94%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

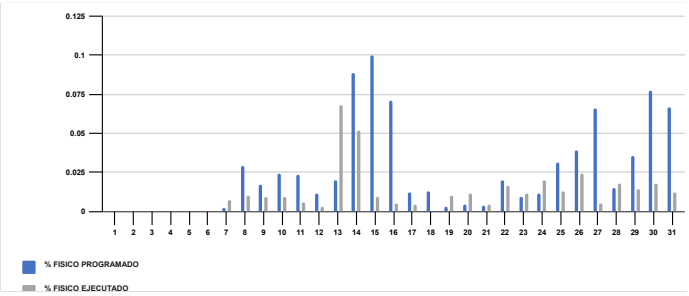

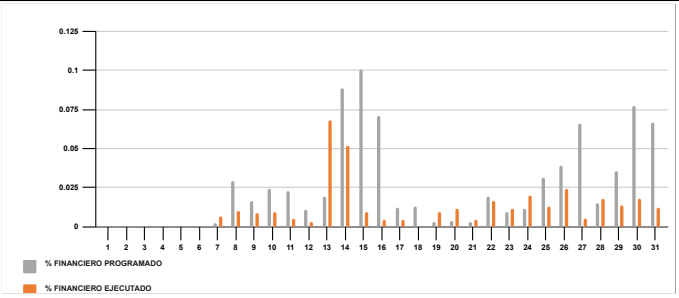

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-07-02	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-07-03	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-07-04	Pañete en aulas de prescolar fase 2. Escarificación de pañete.	N/A
		2023-07-05	Pañete en aulas de prescolar fase 2. Escarificación de pañete. Encofrado para viga. Corte y figuración de acero.	N/A
		2023-07-06	Pañete en aulas de prescolar fase 2. Escarificación de pañete. Corte y figuración de acero.	N/A
		2023-07-07	Pañete en aulas de prescolar fase 2. Escarificación de pañete. Corte y figuración de acero. Armado de mesa para viga aérea.	N/A
		2023-07-08	Pañete en aulas de prescolar fase 2. Escarificación de pañete. Corte y figuración de acero.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		949.21		4221	-	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		40.00	5.00	$454,545	2,272,725.00	45.00	525.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		223.58		$9,648	-	223.58	725.63
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07		$116,390	-	26.07	58.35
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15		$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58		$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87		$36,506	-	20.87	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		11.00		$252,961	-	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		307.69		$20,699	-	307.69	62.31
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54		$266,275	-	1,207.54	73.08
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95		$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52		$16,513	-	2.52	2.36
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	162.94		69.75	31.92	$93,507	2,984,743.44	101.67	61.27
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		11.02		$49,030	-	11.02	55.41
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	178.42		67.40		$34,062	-	67.40	111.02
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		11.02		$54,171	-	11.02	17,280.10
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		4,450.43	302.48	$9,568	2,894,128.64	4,752.91	3,068.02
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		7.14		$894,392	-	7.14	12.46
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		2.67		$1,742,818	-	2.67	17.39
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69		$1,894,074	-	6.69	260.54
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08		$149,548	-	248.08	-
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55		$27,186	-	278.55	357.45

2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	24.51		6.48	2.20	$1,933,197	4,253,033.40	8.68	15.83
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17		$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58		$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01		$813,350	-	24.01	18.61
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17		$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		146.81		$32,154	-	146.81	289.58
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	223.605		82.15	32.18	$13,644	439,063.92	114.33	109.28
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	305.52		266.29		$100,669	-	266.29	39.23
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	601		392.26	47.60	$23,961	1,140,543.60	439.86	161.14
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	89		23.00	31.00	$17,610	545,910.00	54.00	35.00
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00		$39,705	-	13.00	-
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		300.12		$33,985	-	300.12	20.11
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33		$16,524	-	330.33	-
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	456		54.00		$3,615	-	54.00	402.00
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00		$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		12.00		$57,053	-	12.00	4.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		1.00		$32,669	-	1.00	24.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		4.00		$16,601	-	4.00	12.00
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00		$19,709	-	1.00	410.20
								VALOR DE OBRA	14,530,148.00	
								INCIDENCIA	1.22%	

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO




 https://drive.google.com/open?id=17x1sIEI8DbQ2NBFtu-5hWUI4TvBvL		 https://drive.google.com/open?id=1ghga_0pMQWEDsM-X5Wtf4NMrzZ9ds00B	
FOTO 1	Pañete sobre muros. REUVEN FEUERSTEIN	**FOTO 2**	Corte y figuración de acero REUVEN FEUERSTEIN
 https://drive.google.com/open?id=1CCERk-9lhD0k7rsjvNjQgfcSznmdFv		 https://drive.google.com/open?id=1zpUV2KQK9KeLhCeM950vr7F9aRJG83ff	
FOTO 3	Mesa para viga aerea. REUVEN FEUERSTEIN	**FOTO 4**	Encofrado de viga REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 32**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	9	AL	15

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.23%	0.68%	0.68%	7	0.23%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.94%	1.00%	1.68%	8	2.94%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.68%	0.91%	2.59%	9	1.68%	0.91%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.42%	0.94%	3.53%	10	2.42%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.31%	0.55%	4.08%	11	2.31%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	1.11%	0.29%	4.37%	12	1.11%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	8.83%	5.17%	16.35%	14	8.83%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	10.02%	0.95%	17.31%	15	10.02%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	7.12%	0.49%	17.80%	16	7.12%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.21%	0.42%	18.22%	17	1.21%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	1.28%	0.00%	18.22%	18	1.28%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.29%	0.96%	19.18%	19	0.29%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.40%	1.14%	20.33%	20	0.40%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.33%	0.43%	20.76%	21	0.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.97%	1.66%	22.42%	22	1.97%	1.66%	$19,893,426	22.42%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.95%	1.15%	23.57%	23	0.95%	1.15%	$13,708,736	23.57%
24	14/5/2023	20/5/2023	1.16%	2.01%	25.58%	24	1.16%	2.01%	$24,010,801	25.58%
25	21/5/2023	27/5/2023	3.12%	1.28%	26.86%	25	3.12%	1.28%	$15,311,635	26.86%
26	28/5/2023	3/6/2023	3.92%	2.43%	29.29%	26	3.92%	2.43%	$29,016,888	29.29%
27	4/6/2023	10/6/2023	6.61%	0.50%	29.78%	27	6.61%	0.50%	$5,921,352	29.78%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.51%	1.78%	31.56%	28	1.51%	1.78%	$21,262,879	31.56%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.56%	1.40%	32.96%	29	3.56%	1.40%	$16,767,491	32.96%
30	25/6/2023	1/7/2023	7.73%	1.76%	34.73%	30	7.73%	1.76%	$21,056,726	34.73%
31	2/7/2023	8/7/2023	6.69%	1.22%	35.94%	31	6.69%	1.22%	$14,530,148	35.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	7.55%	1.14%	37.08%	32	7.55%	1.14%	$13,609,871	37.08%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

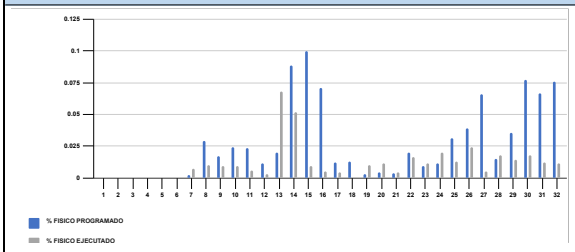



3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-07-09	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-07-10	Pañete en aulas de prescolar fase 2. Escarificación de pañete. Fundida de viga de cerramiento.	N/A
		2023-07-11	Demolición del muro de cerramiento de la iglesia. Corte y figuración de acero . escarificación de pañete en aulas de preescolar.	N/A
		2023-07-12	Escarificación de pañete. Pañete en aulas de prescolar fase 2. Acopio de material de zona del muro del cerramiento de iglesia. Armado de viga aérea.	N/A
		2023-07-13	Escarificación de pañete. Pañete en aulas de preescolar. Corte y figuración de acero. Excavación de zapata para muro de cerramiento del lado de la iglesia. Levante de mampostería rayada fachada frontal.	N/A
		2023-07-14	Corte y figuración de acero para viga aérea. Levante de mampostería rayada. Excavación de viga para instalacion de tuberia fluvial. Demolición de columna. Aplicación de pañete. Encofrado de viga aérea.	N/A

		2023-07-15	Excavación manual para instalacion de tuberia fluvial. Demolición de viga cimiento. Excavación de zapata para muro de cerramiento del lado de la iglesia. Aplicación de pañete. Armado de acero para vigas aéreas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		949.21		4221	-	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		45.00	5.00	$454,545	2,272,725.00	50.00	520.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		223.58		$9,648	-	223.58	725.63
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07		$116,390	-	26.07	58.35
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15		$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58		$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87		$36,506	-	20.87	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		11.00		$252,961	-	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		307.69		$20,699	-	307.69	62.31
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54		$266,275	-	1,207.54	73.08
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95		$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52		$16,513	-	2.52	2.36
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	162.94		101.67		$93,507	-	101.67	61.27
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		11.02		$49,030	-	11.02	55.41
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	178.42		67.40		$34,062	-	67.40	111.02
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		11.02		$54,171	-	11.02	17,280.10
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		4,752.91	352.15	$9,568	3,369,371.20	5,105.06	2,715.87
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		7.14		$894,392	-	7.14	12.46
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		2.67		$1,742,818	-	2.67	17.39
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69		$1,894,074	-	6.69	260.54
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08		$149,548	-	248.08	-
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55		$27,186	-	278.55	357.45
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	24.51		8.68	1.76	$1,933,197	3,402,426.72	10.44	14.07
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17		$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58		$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01		$813,350	-	24.01	18.61

2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17		$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		146.81	44.55	$32,154	1,432,460.70	191.36	245.03
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	223.605		114.33	88.87	$13,644	1,212,542.28	203.20	20.41
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	305.52		266.29		$100,669	-	266.29	39.23
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	601		439.86	75.00	$23,961	1,797,075.00	514.86	86.14
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	89		54.00	7.00	$17,610	123,270.00	61.00	28.00
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00		$39,705	-	13.00	-
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		300.12		$33,985	-	300.12	20.11
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33		$16,524	-	330.33	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00		$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		12.00		$57,053	-	12.00	4.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		1.00		$32,669	-	1.00	24.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		4.00		$16,601	-	4.00	12.00
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00		$19,709	-	1.00	410.20
								VALOR DE OBRA	13,609,870.90	
								INCIDENCIA	1.14%	

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO




https://drive.google.com/open?id=1O2zqtlB-1UgXaYySwjdaIA6DJOUjqI



https://drive.google.com/open?id=1wxqUPCMxEfvdSSUo5hiPwlM141eqmI

FOTO 1	Pañete sobre muros. REUVEN FEUERSTEIN	FOTO 2	Encofrado de viga aérea REUVEN FEUERSTEIN

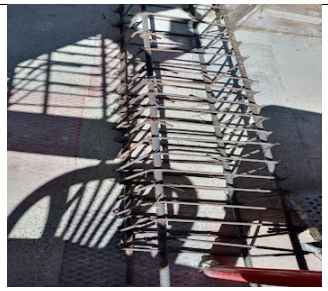

https://drive.google.com/open?id=1DYCdS1UdHRFBYQIBjEqSLo_O0k



https://drive.google.com/open?id=1WDFe-bTBIbU0Z5vY4B_jDVQLOzN9m

FOTO 3	Corte y figuración de acero REUVEN FEUERSTEIN	**FOTO 4**	Excavación de zapata REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 33**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	16	AL	22

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.23%	0.68%	0.68%	7	0.23%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.94%	1.00%	1.68%	8	2.94%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.68%	0.91%	2.59%	9	1.68%	0.91%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.42%	0.94%	3.53%	10	2.42%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.31%	0.55%	4.08%	11	2.31%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	1.11%	0.29%	4.37%	12	1.11%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	8.83%	5.17%	16.35%	14	8.83%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	10.02%	0.95%	17.31%	15	10.02%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	7.12%	0.49%	17.80%	16	7.12%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.21%	0.42%	18.22%	17	1.21%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	1.28%	0.00%	18.22%	18	1.28%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.29%	0.96%	19.18%	19	0.29%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.40%	1.14%	20.33%	20	0.40%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.33%	0.43%	20.76%	21	0.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.97%	1.66%	22.42%	22	1.97%	1.66%	$19,893,426	22.42%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.95%	1.15%	23.57%	23	0.95%	1.15%	$13,708,736	23.57%
24	14/5/2023	20/5/2023	1.16%	2.01%	25.58%	24	1.16%	2.01%	$24,010,801	25.58%
25	21/5/2023	27/5/2023	3.12%	1.28%	26.86%	25	3.12%	1.28%	$15,311,635	26.86%
26	28/5/2023	3/6/2023	3.92%	2.43%	29.29%	26	3.92%	2.43%	$29,016,888	29.29%
27	4/6/2023	10/6/2023	6.61%	0.50%	29.78%	27	6.61%	0.50%	$5,921,352	29.78%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.51%	1.78%	31.56%	28	1.51%	1.78%	$21,262,879	31.56%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.56%	1.40%	32.96%	29	3.56%	1.40%	$16,767,491	32.96%
30	25/6/2023	1/7/2023	7.73%	1.76%	34.73%	30	7.73%	1.76%	$21,056,726	34.73%
31	2/7/2023	8/7/2023	6.69%	1.22%	35.94%	31	6.69%	1.22%	$14,530,148	35.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	7.55%	1.14%	37.08%	32	7.55%	1.14%	$13,609,871	37.08%
33	16/7/2023	22/7/2023	5.19%	2.93%	40.01%	33	5.19%	2.93%	$35,021,509	40.01%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

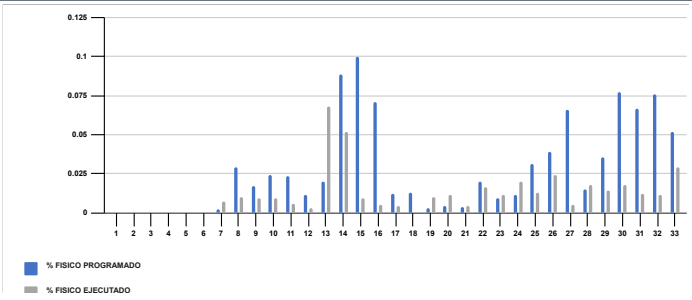

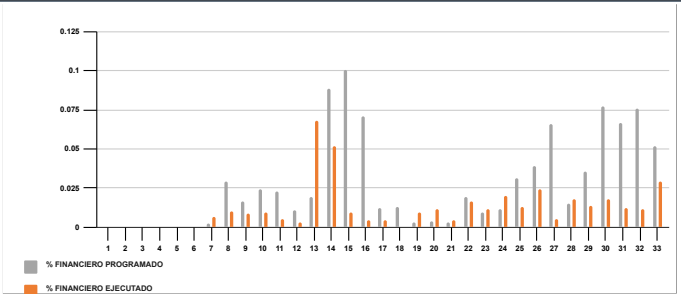

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-07-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-07-17	Excavación manual para instalacion de tuberia fluvial. Escarificación de pañete. Armado de viga aérea. Toma de niveles para plantilla de aula preescolar. Excavación de zapata para muro de cerramiento del lado de la iglesia	N/A
		2023-07-18	Fundida de zapata para muro de cerramiento del lado de la iglesia. Corte y figuración de acero. Excavación de viga cimiento de muro de divisiones. Escarificación de pañetes.	N/A
		2023-07-19	Relleno con material seleccionado aulas preescolar. Compactación de terreno, con ranas en aulas de preescolar. Fundida de viga aérea.	N/A
		2023-07-20	Colocación de malla electrosoldada en aula de preescolar. Toma de niveles para plantilla de concreto. Orden y aseo.	N/A
		2023-07-21	Desencofrado de viga aérea. Corte y figuración de acero para columna. Escarificación de pañete. Aplicación de pañete.	N/A
		2023-07-22	Desmonte de cubierta en aulas de preescolar y en cancha.. Corte y figuración de acero para viga. Desencofrado de viga.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		949.21		4221	-	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		50.00		$454,545	-	50.00	520.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		223.58		$9,648	-	223.58	725.63
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07		$116,390	-	26.07	58.35
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15		$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58		$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87		$36,506	-	20.87	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		11.00		$252,961	-	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		307.69		$20,699	-	307.69	62.31
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54		$266,275	-	1,207.54	73.08
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95		$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52		$16,513	-	2.52	2.36
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	162.94		101.67		$93,507	-	101.67	61.27
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		11.02	9.88	$49,030	484,416.40	20.90	45.53
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	178.42		67.40		$34,062	-	67.40	111.02
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	188.01		-	68.78	$192,928	13,269,587.84	68.78	119.23
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		11.02	9.72	$54,171	526,542.12	20.74	17,270.38
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		5,105.06	285.88	$9,568	2,735,299.84	5,390.94	2,429.99
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		7.14		$894,392	-	7.14	12.46
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		2.67		$1,742,818	-	2.67	17.39
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69		$1,894,074	-	6.69	260.54

2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08		$149,548	-	248.08	-
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55		$27,186	-	278.55	357.45
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	24.51		10.44	3.35	$1,933,197	6,476,209.95	13.79	10.72
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17		$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58		$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01		$813,350	-	24.01	18.61
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17		$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		191.36		$32,154	-	191.36	245.03
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	223.605		203.20	20.40	$13,644	278,337.60	223.60	0.00
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	305.52		266.29		$100,669	-	266.29	39.23
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	601		514.86	63.00	$23,961	1,509,543.00	577.86	23.14
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	89		61.00	18.00	$17,610	316,980.00	79.00	10.00
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00		$39,705	-	13.00	-
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		300.12		$33,985	-	300.12	20.11
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	95.55		-	40.68	$39,196	1,594,493.28	40.68	54.87
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	220.8		-	177.00	$34,014	6,020,478.00	177.00	43.80
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33		$16,524	-	330.33	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		-	86.73	$20,865	1,809,621.45	86.73	468.43
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00		$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		12.00		$57,053	-	12.00	4.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		1.00		$32,669	-	1.00	24.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		4.00		$16,601	-	4.00	12.00

9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00		$19,709	-	1.00	410.20

VALOR DE OBRA	35,021,509.48
INCIDENCIA	2.93%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1PuC-ymMlADJ--yrXe2D1aOLV1fG7

FOTO 1	Excavación manual. REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1wyEe2KOXZnfdPEY3BOmVyxKP1pchzc7I

FOTO 2	Excavación de zapata REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1R2l_MyF0sh-9DenNCMQ7Hqr0SIbL

FOTO 3	Corte y figuración de acero REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1hdUSOd7uX2dWayY7S_M3BJHbsROh8yd

FOTO 4	Excavación manual para instalacion de tuberia pluvial REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 34**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**7**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	23	AL	29

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.23%	0.68%	0.68%	7	0.23%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.94%	1.00%	1.68%	8	2.94%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.68%	0.91%	2.59%	9	1.68%	0.91%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.42%	0.94%	3.53%	10	2.42%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.31%	0.55%	4.08%	11	2.31%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	1.11%	0.29%	4.37%	12	1.11%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	8.83%	5.17%	16.35%	14	8.83%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	10.02%	0.95%	17.31%	15	10.02%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	7.12%	0.49%	17.80%	16	7.12%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.21%	0.42%	18.22%	17	1.21%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	1.28%	0.00%	18.22%	18	1.28%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.29%	0.96%	19.18%	19	0.29%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.40%	1.14%	20.33%	20	0.40%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.33%	0.43%	20.76%	21	0.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.97%	1.66%	22.42%	22	1.97%	1.66%	$19,893,426	22.42%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.95%	1.15%	23.57%	23	0.95%	1.15%	$13,708,736	23.57%
24	14/5/2023	20/5/2023	1.16%	2.01%	25.58%	24	1.16%	2.01%	$24,010,801	25.58%
25	21/5/2023	27/5/2023	3.12%	1.28%	26.86%	25	3.12%	1.28%	$15,311,635	26.86%
26	28/5/2023	3/6/2023	3.92%	2.43%	29.29%	26	3.92%	2.43%	$29,016,888	29.29%
27	4/6/2023	10/6/2023	6.61%	0.50%	29.78%	27	6.61%	0.50%	$5,921,352	29.78%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.51%	1.78%	31.56%	28	1.51%	1.78%	$21,262,879	31.56%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.56%	1.40%	32.96%	29	3.56%	1.40%	$16,767,491	32.96%
30	25/6/2023	1/7/2023	7.73%	1.76%	34.73%	30	7.73%	1.76%	$21,056,726	34.73%
31	2/7/2023	8/7/2023	6.69%	1.22%	35.94%	31	6.69%	1.22%	$14,530,148	35.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	7.55%	1.14%	37.08%	32	7.55%	1.14%	$13,609,871	37.08%
33	16/7/2023	22/7/2023	5.19%	2.93%	40.01%	33	5.19%	2.93%	$35,021,509	40.01%
34	23/7/2023	29/7/2023	4.59%	6.53%	46.55%	34	4.59%	6.53%	$78,082,088	46.55%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

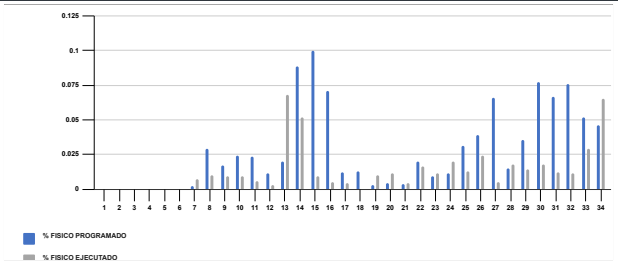

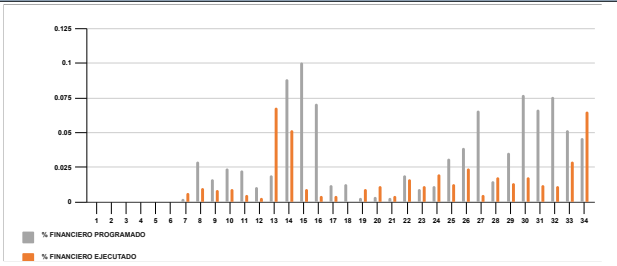

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
		2023-07-23	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-07-24	Corte y figuración de acero para carcamo. Armado de acero para cárcamo del ingreso al colegio para el desagüe pluvial. Desmonte de cubierta en lamina ondulada zona cancha. Desmonte de cubierta aulas de preescolares . Armado y alineación de columna para el muro de cerramiento iglesia. Armado de viga aérea. Levante de mampostería rayada área de rectoría. Fundida de viga aérea.	N/A
		2023-07-25	Fundida de zapata para muro de cerramiento del lado de la iglesia. Aplicacion de pintura anticorrosivo en estructura metálica de cancha. Armado de viga. Fundida de cárcamo de desagüe. Orden y aseo.	N/A
		2023-07-26	Aplicacion de pintura de acabado en estructura metálica de cancha. Corte y figuración de acero para viga. Armado y montaje de acero para viga sobre muro en aulas de preescolar. Fundida de viga. Orden y aseo.	N/A
		2023-07-27	Aplicacion de pintura de acabado en estructura metálica de cancha. Fundida de viga. Encofrado de viga. Desencofrado de viga. Corte y figuración de acero.	N/A
		2023-07-28	Instalación de cubierta en lamina ondulada en cancha. Encofrado de viga bloque y viga sobre muro aula de preescolar. Armado de acero para viga bloque. Desmonte de ventana rectoría antigua. Levante de mampostería. Aseo general.	N/A
		2023-07-29	Fundida de viga bloque C5-C6. Fundida de viga sobre muro en aula de preescolar. Armado de viga bloque. Desencofrado de viga sobre muro aula preescolar. Excavación manual.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**949.21**		**949.21**		**4221**	**-**	**949.21**	**-**
1.02	**COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL**	DIA	**570**		**50.00**		**$454,545**	**-**	**50.00**	**520.00**
1.03	**LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE**	MT2	**949.21**		**223.58**		**$9,648**	**-**	**223.58**	**725.63**
1.06	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS**	ML	**84.42**		**26.07**		**$116,390**	**-**	**26.07**	**58.35**
1.08	**DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M**	M2	**6.15**		**6.15**		**$25,396**	**-**	**6.15**	**-**
1.09	**DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M**	M2	**223.58**		**223.58**		**$27,679**	**-**	**223.58**	**-**
1.10	**DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M**	M2	**20.87**		**20.87**		**$36,506**	**-**	**20.87**	**-**
2.01	**DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.**	M3	**570**		**11.00**		**$252,961**	**-**	**11.00**	**559.00**
2.02	**DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m**	MT2	**370**		**307.69**		**$20,699**	**-**	**307.69**	**62.31**
2.05	**DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	M3	**1280.62**		**1,207.54**		**$266,275**	**-**	**1,207.54**	**73.08**
2.07	**ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M**	M2	**3.35**		**0.95**		**$25,547**	**-**	**0.95**	**2.40**
2.08	**ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO**	ML	**4.88**		**2.52**		**$16,513**	**-**	**2.52**	**2.36**
2.09	**EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA**	MT3	**162.94**		**101.67**	**32.72**	**$93,507**	**3,059,549.04**	**134.39**	**28.55**
2.11	**BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS**	MT2	**66.43**		**20.90**		**$49,030**	**-**	**20.90**	**45.53**
2.12	**RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO**	MT3	**178.42**		**67.40**		**$34,062**	**-**	**67.40**	**111.02**
2.13	**RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO**	MT3	**188.01**		**68.78**		**$192,928**	**-**	**68.78**	**119.23**
2.14	**SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS**	MT2	**17291.12**		**20.74**		**$54,171**	**-**	**20.74**	**17,270.38**
2.15	**ACERO DE REFUERZO FIGURADO**	KGS	**7820.93**		**5,390.94**	**362.77**	**$9,568**	**3,470,983.36**	**5,753.71**	**2,067.22**
2.17	**VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**19.6**		**7.14**		**$894,392**	**-**	**7.14**	**12.46**
2.18	**COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**20.06**		**2.67**	**1.24**	**$1,742,818**	**2,161,094.32**	**3.91**	**16.15**
2.19	**VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**267.23**		**6.69**		**$1,894,074**	**-**	**6.69**	**260.54**
2.22	**MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE**	ML	**248.08**		**248.08**		**$149,548**	**-**	**248.08**	**-**
2.23	**CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.**	ML	**147**		**-**	**3.80**	**$513,566**	**1,951,550.80**	**3.80**	**143.20**

2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55		$27,186	-	278.55	357.45
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	24.51		13.79	4.68	$1,933,197	9,047,361.96	18.47	6.04
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17		$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58		$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01		$813,350	-	24.01	18.61
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17		$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		191.36		$32,154	-	191.36	245.03
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	223.605		223.60		$13,644	-	223.60	0.00
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	305.52		266.29		$100,669	-	266.29	39.23
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	601		577.86		$23,961	-	577.86	23.14
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	89		79.00		$17,610	-	79.00	10.00
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00		$39,705	-	13.00	-
4.01	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	MT2	220.89		-	115.68	$74,907	8,665,241.76	115.68	105.21
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	3189.15		-	1,228.63	$24,307	29,864,309.41	1,228.63	1,960.52
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		300.12		$33,985	-	300.12	20.11
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	95.55		40.68	54.87	$39,196	2,150,684.52	95.55	-
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	MT2	456		-	28.15	$127,907	3,600,582.05	28.15	427.85
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	220.8		177.00	43.80	$34,014	1,489,813.20	220.80	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33		$16,524	-	330.33	-
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	456		54.00		$3,615	-	54.00	402.00
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		86.73		$20,865	-	86.73	468.43
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00		$38,451	-	11.00	4.00

7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		12.00	3.00	$57,053	171,159.00	15.00	1.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		1.00	3.00	$32,669	98,007.00	4.00	21.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		4.00	12.00	$16,601	199,212.00	16.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00		$19,709	-	1.00	410.20
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	167		-	158.00	$58,180	9,192,440.00	158.00	9.00
NP 59	REINSTALACION DE CUBIERTA FIBROCEMENTO O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA EN LAMINAS	M2	82.8			82.80	$35,750	2,960,100.00	82.80	-
							VALOR DE OBRA	78,082,088.42		
							INCIDENCIA	6.53%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO




https://drive.google.com/open?id=1HRDSE-9DUS_Pbs-JEKsHpqGHaT

FOTO 1	Fundida de cárcamo de desagüe. REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1bGBcNTRRKVmNdLeRTHOYzLsMqrkcBtx

FOTO 2	Aplicacion de pintura de acabado REUVEN FEUERSTEIN

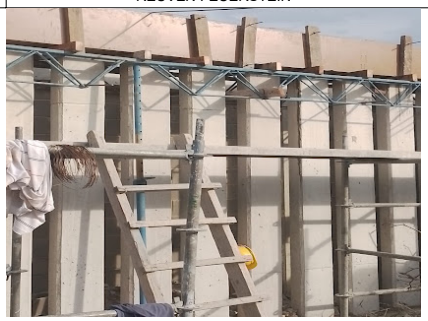

https://drive.google.com/open?id=1acT-VHXi5qDlpGCSJDTRzBx3bwyF

FOTO 3	Viga sobre muro REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1OCThx1el4EtlMxBUyOkhpc4ZskBUl8dL

FOTO 4	Montaje de cubierta. REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 8 PRORROGA No 2
SA-EDU-0001-2022

PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°SA-EDU-0001-2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO IE DISTRITO

IDENTIFICACIÓN: 901.646.712-7

Entre los suscritos, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, mayor de edad, vecina de Barranquilla, identificada con cédula de ciudadanía No. 55.221.166, quien actúa en su calidad de Representante legal de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.,** con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el texto de este documento se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE,** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 1.123.731.019, en Representación del CONSORCIO IE DISTRITO, identificado con NIT: 901.646.712-7 estructura plural integrada por: CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S., identificada con NIT: 901.013.669-1, con un porcentaje de participación del 40%, HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S., identificada con NIT: 900.497.862-1, con un porcentaje de participación del 30% y HM INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT: 800.187.291-1, con un porcentaje de participación del 30%, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar Prórroga No. 2 al contrato de Interventoría Nº SA-EDU-0001-2022, suscrito el día veintiocho (28) de noviembre de 2022, que se regulará por las siguientes cláusulas, previa las siguientes consideraciones: **1.-** Que el día veintiocho (28) de noviembre de 2022, se suscribió contrato de interventoría Nº SA-EDU-0001-2022, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA". 2.-** Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **3.-** Que el valor del contrato se estableció en la suma de **MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.349.952.660)** incluido IVA, así como todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **4.-** Que el día seis (06) de diciembre de 2022 se aprobaron las garantías exigidas en el contrato. **5.-** Que el día seis (06) de diciembre de 2022 se suscribió Acta de inicio al contrato de Interventoría Nº SA-EDU-0001-2022. **6.-** Que el día veintinueve (29) de diciembre del 2022, se suscribió prórroga No. 1 al contrato de interventoría No. SA-EDU-0001-2022, ampliando el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de julio del 2023. **7.-** Que mediante oficio CIED-2023-071 de fecha once (11) de mayo de 2023, el interventor del contrato de obra N° EDU-345-2022, solicita a EDUBAR S.A., prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría Nº SA-EDU-0001-2022, en los siguientes términos: *"(...) con el fin de ejecutar las obras de AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, considerando que durante la ejecución de las actividades en los frentes del contrato han surgido complejidades constructivas que han obligado a realizar ajustes a la información técnica de soporte para la ejecución de estas, así como condiciones sobrevinientes como identificar afectaciones a la estructura de cimentación de unas de las instituciones educativas en intervención. Además, durante el transcurrir del contrato se ha autorizado la ejecución de las actividades de una institución educativa con alcances importantes, por lo que se requiere un tiempo adicional para su ejecución, esta interventoría considera que debido al carácter de urgencia de las intervenciones y la simultaneidad con que se deben ejecutar las intervenciones, (3) meses adicionales es tiempo suficiente para concluir el contrato. Adicionalmente, para garantizar el cumplimiento de las funciones de vigilancia y control técnico, administrativo, social, ambiental y financiero del contrato de obra No. EDU-345-2022 cuyo objeto es "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA" y fundamentado en lo establecido en el articulo 85, de la ley 1474 de 2011, referente a la continuidad del contrato de interventoría cuando se haya prorrogado el vínculo objeto de la vigilancia. Solicitamos a la entidad contratante que estudie y*

analice prorrogar el contrato de interventoría No. SA-EDU-0001-2022 hasta el 31 de octubre del 2023". **8.-** Que mediante oficio de fecha diez (10) de julio del 2023, la Ingeniera LIZZ FIGUEREDO ARCE, contratista en calidad de apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría **N° SA-EDU-0001-2022,** recomienda a la Gerencia General, prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2023, contados a partir de la fecha de terminación estipulada en el contrato principal y la prórroga No. 1, de acuerdo a los argumentos expuestos por el contratista de obra mediante comunicación CED-094-2023 de fecha once (11) de mayo del 2023, y avalada por la interventoría mediante oficio CIED-2023-071 de fecha once (11) de mayo del 2023. **9.-** Que teniendo en cuenta lo anterior, y que el contrato se encuentra vigente, la Gerencia General procedió a realizar la verificación previa del expediente contractual, y estima que resulta conveniente llevar a cabo la PRORROGA N° 2 al contrato de interventoría SA-EDU-0001-2022. **10.-** Que en atención a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: **CLÁUSULA PRIMERA: - OBJETO:** El presente tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría SA-EDU-0001-2022, suscrito entre las partes el día veintiocho (28) de noviembre de 2022. **CLÁUSULA SEGUNDA: - PLAZO A PRORROGAR:** El plazo a prorrogar será hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2023, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido en el contrato principal y la prórroga No. 1. **CLÁUSULA TERCERA: - EQUILIBRIO ECONÓMICO:** La presente modificación no afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripción de este documento. **CLÁUSULA CUARTA – GARANTIAS: EL CONTRATISTA** se compromete a ampliar las pólizas originales otorgadas, establecida en el contrato principal en los mismos términos allí pactados y de acuerdo con la Prórroga No. 2 aquí estipulada. **CLÁUSULA QUINTA: - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. **CLÁUSULA SEXTA: - PERFECCIONAMIENTO:** la presente prórroga N° 2, se considera perfeccionada con la firma de la misma por las partes.

Proyectó. Jaime Villa
Revisó: Mauricio Valdeblanquez

ANEXO 9 CORRESPONDENCIA

ENVIADA

Barranquilla, 26 de junio de 2023 **CIED-2023-085**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Traslado oficio IP-00677

Estimados ingenieros,
Por medio de la presente y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, se realiza el traslado del comunicado IP-00677 emitido por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A. en solicitud de las programaciones ajustadas para los frentes a trabajar dentro del marco del contrato EDU-345-2022, según sigue:

(…) "Mediante la presente y calidad de supervisión del contrato de la referencia, solicito se tomen las observaciones enviadas de las siguientes programaciones de obra, puesto que se Identificaron discrepancias en las fechas de inicio y/o se encuentran con actividades en desfase.
1. IED Mayor de Barranquilla
2.IED Reuven Feuerstein
3.IED Carrizal
4.IED José Eusebio Caro
5.IED Castillo la Alboraya

Adicionalmente, se solicita la actualización de las programaciones de obra de los siguientes frentes, ya que por Imprevistos en la ejecución y/o ampliación de los alcances a intervenir, no se entregaron en la fecha fin estipulada.

1. IED Jesús de Nazareth sede 2
2. IED Comunitaria 7 de abril
3. CEB 161
4. IED Carlos Meisel

Finalmente, solicito esta información sea entregada en un plazo no mayor a 3 días, ya que es obligación de las partes garantizar el correcto seguimiento de las Intervenciones en ejecución."

Así las cosas, es requerido el pronunciamiento del Contratista de Obra de manera inmediata por lo cual les agradecemos remitir todos los respectivos soportes en un plazo máximo de dos (2) días hábiles a partir del recibo del presente comunicado.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 26 de junio de 2023 **CIED-2023-086**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Traslado IP-00678 – Balance de Ejecución Presupuestal

Estimados ingenieros,
Por medio de la presente y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, se realiza el traslado del comunicado IP-00678 emitido por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A. en requerimiento de balance de ejecución presupuestal frente a frente para todos los colegios dentro del marco del Contrato de Obra EDU-345-2022.
Es menester señalar que estos balances son un aspecto clave para la toma de decisiones sobra las intervenciones a realizar en las instituciones educativas, motivo por el cual, les solicitamos remitir dicho balance para las instituciones en ejecución, así como para las instituciones finalizadas y las proyectadas a iniciar, desglosando las actividades ejecutadas a la fecha, cantidades por ejecutar y lo facturado a la fecha.

Dichos alcances deberán relacionar igualmente la inclusión de los nuevos alcances solicitados por la Secretaría Distrital de Educación en las instituciones que corresponda con el fin de esclarecer igualmente el balance general del contrato.

Agradecemos remitir esta información en un plazo no superior a 3 días hábiles a partir del recibo del presente comunicado.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 26 de junio de 2023 **CIED-2023-087**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Traslado IP-00653

Por medio de la presente y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, se realiza el traslado del comunicado IP-00653 emitido por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A. donde se indica un bajo personal en obra, así como bajos rendimientos obtenidos en IED Mayor de Barranquilla e IED José E Caro, ambos frentes sujetos a planes de contingencia en vista de los incumplimientos sobre los objetivos propuestos y compromisos adquiridos sobre las instituciones y la comunidad educativas.

Así las cosas, les solicitamos atender estos aspectos de manera inmediata, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos sobre la ejecución de cada frente y lograr los rendimientos necesarios para cada intervención.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 27 de junio de 2023 **CIED-2023-088**

SEÑORES
EDUBAR

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: INFORMACION TECNICA CONSORCIO IE DISTRITO

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en cumplimiento de nuestros compromisos contractuales, se hace entrega del Informe mensual de Interventoría No. 4 y el Informe Mensual de interventoría No. 5 correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de febrero al 24 de marzo de 2023 y el 25 de marzo al 28 de abril de 2023, respectivamente.

Adjuntamos a este documento el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE INTERVENTORIA N°1, con su respectiva documentación para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: INFORMES MENSUALES 1-5
ACTA DE RECIBO PARCIAL
ANEXOS DE INFORMES

Barranquilla, 11 de julio de 2023 **CIED-2023-090**

SEÑORES
EDUBAR
Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: CORRECCION DE ANEXOS PARA FACTURA N°1 CONSORCIO IE DISTRITO

Cordial saludo,

En ocasión de la solicitud de corrección de los anexos suministrados para Factura N°1 del contrato de Interventoría SA-EDU-0001-2022, nos permitimos allegar ante EDUBAR S.A. la corrección de los mismos asi como los anexos adicionales solicitados para el trámite de cobro.

En tal sentido, se remiten:

1. Factura
2. Copia de Resolución de la DIAN
3. Copia de Certificación Bancaria
4. Copia RUT
5. Copia Contrato
6. Copia Prorroga al Contrato
7. Pólizas Actualizadas
8. Pago de Planillas de Seguridad Social
9.Certificacion de Aportes de Seguridad Social en Membrete de la Empresa
10. Informe de Gestión N°1
11. Acta Parcial interventoría N°1
12. Acta Recibo o Satisfacción N°1
13. Documento Consorcial
14. Documento Contador y/o revisor fiscal
15. Copia de certificado JCC
16. Informes Mensuales y Anexos No.1 al No. 5

Sin otro particular, nos suscribimos de Ud. Atentos a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 11 de julio de 2023 **CIED-2023-090**

SEÑORES
EDUBAR
Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: CORRECCION DE ANEXOS PARA FACTURA N°1 CONSORCIO IE DISTRITO

Cordial saludo,

En ocasión de la solicitud de corrección de los anexos suministrados para Factura N°1 del contrato de Interventoría SA-EDU-0001-2022, nos permitimos allegar ante EDUBAR S.A. la corrección de los mismos asi como los anexos adicionales solicitados para el trámite de cobro.

En tal sentido, se remiten:

1. Factura
2. Copia de Resolución de la DIAN
3. Copia de Certificación Bancaria
4. Copia RUT
5. Copia Contrato
6. Copia Prorroga al Contrato
7. Pólizas Actualizadas
8. Pago de Planillas de Seguridad Social
9.Certificacion de Aportes de Seguridad Social en Membrete de la Empresa
10. Informe de Gestión N°1
11. Acta Parcial interventoría N°1
12. Acta Recibo o Satisfacción N°1
13. Documento Consorcial
14. Documento Contador y/o revisor fiscal
15. Copia de certificado JCC
16. Informes Mensuales y Anexos No.1 al No. 5

Sin otro particular, nos suscribimos de Ud. Atentos a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 13 de julio de 2023 **CIED-2023-091**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: CORRECCIONES INFORME MENSUAL N6

Cordial saludo,

Una vez culminada la revisión del documento “Informe técnico 6” allegado a esta interventoría, nos permitimos remitirle el documento con las correcciones a realizar.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Informe Tecnico 6

Barranquilla, 14 de julio de 2023 **CIED-2023-092**

SEÑORES
EDUBAR S.A

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Remisión Actividades No Prevista

Estimados ingenieros,

En ocasión al recibimiento de solicitud de revisión y validación de Actividades No Previstas por parte del Contratista de Obra, a través de su comunicado No CED-124-2023, no permitimos, remitir concepto de aceptación sobre el radicado recibido ante la entidad EDUBAR S.A, una vez que:

- La solicitud emitida corresponde a alcances adicionales solicitados por la Secretaría de Educación Distrital.
- La especificación de los requerimientos no se encuentra relacionada en las actividades relacionadas en los pliegos del objeto contratado.
- El Contratista de Obra ha adelantado la elaboración de los Acus, soportados en cotizaciones actualizadas de los insumos requeridos.
- Esta interventoría, ejerciendo a cabalidad sus funciones, ha realizado la revisión y análisis de lo anteriormente expuesto, validando las cotizaciones y la pertinencia de inclusión de estas actividades según lo solicitado.

Así las cosas, esta Interventoría estima aceptable la solicitud y recomienda a la entidad, EDUBAR S.A. considerar la inclusión de estas actividades, en aras de avanzar en el desarrollo del contrato.
Las actividades en mención corresponden a:

- CERRAMIENTO EN MALLA CICLÓN CALIBRE 10 INCLUYE SOPORTES DE 1 ½ CALIBRE 16 ZINCADOS. PROTECCION FINAL CERRAMIENTO TONO VERDE, ALTURA DE INSTALACION > 6 MTRS.
- BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8
- ANDEN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15X.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ¼ A CADA .32 METROS
- ALFAJIA EN CONCRETO 3000 PSI
- MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DOBLE ALTURA DE 18” DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26, CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERDADO CON CUCHILLAS, LA INSTLACION INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE ½ A ¼ , TENSORES DE ¼ TORNILLOS DE ANCLAJES DE 3/8 X2 Y 2 1/2 , ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 ALTURA DE INSTALACION > 6 MTS
- SUMINISTRO TROQUELAJE DOBLECES Y MONTAJE DE PERFILERIA ESTRUCTURAL PAG 160-60 CON CONEXIONES Y SOLDADURA CON EQUIPO ARC INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA ALTO SOLIDO EN ZINC Y POLIURETANO.

Anexo a la presente los APU’s y soportes.

Sin otro particular, nos suscribimos de Ud. atentos a su consideración en el caso.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: CED-124-2023, APU

Barranquilla 18 de julio de 2023 **CIED-2023-093**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
Cristian Jimenez Yejas

Ref. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Aprobación Diseño Estructural - José Eusebio Caro

Estimados ingenieros,

Por medio de la presente, en cumplimiento de las funciones y obligaciones de esta Interventoría, nos permitimos allegar concepto de aprobación sobre el diseño propuesto en el frente IED José Eusebio Caro.

Como es de su conocimiento, dicho diseño ha sido objeto de estudio y discusión en comités y mesas de trabajo, donde se han destacado varios factores en aras de determinar la mejor alternativa para garantizar la calidad una funcionalidad de la obra propuesta.

Así las cosas, se emite concepto de aprobación del diseño recibido bajo título JRET-23-23-REFORZAMIENTO_IED_JEC_20230530_Rev A.dwg toda vez que esta interventoría ejerciendo a cabalidad sus funciones revisó y verificó el comportamiento de la estructura propuesta y su cumplimiento con la NSR-10.

Es de mencionar, sin embargo, la necesidad de determinar los procesos constructivos adecuados para garantizar la calidad de ejecución de toda la obra, en particular, sobre las ménsulas para las columnas del segundo piso, dado que no existe conexión entre los elementos que permita el correcto desarrollo considerado en el modelo. Este aspecto fue discutido anteriormente, y se recibió proceso constructivo a través de su comunicado bajo N° CED-122-2023 se sugiere un proceso constructivo el cual únicamente menciona:

> *"Para realizar la fundida, se debe hacer por la parte de arriba lentamente y vibrando además de usar un concreto lo suficientemente fluído para evitar hormigueos."*

Así las cosas, se solicita dar alcance al diseño propuesto remitiendo diseño de mezcla detallando la dosificación, relación A/C, uso de aditivos u otros parámetros requeridos para garantizar la correcta ejecución en obra.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Informe de Revisión Técnico -Memorias Revisión Estructural
CC: EDUBAR S.A.

Barranquilla 18 de julio de 2023 **CIED-2023-094**

SEÑORES
EDUBAR S.A.
Angelly Melissa Criales

Ref. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Balance de Obra Frente Jesús de Nazareth

Estimados ingenieros,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestros compromisos y obligaciones adquiridas en virtud de la firma del contrato bajo N° SA-EDU-0001-2022, nos permitimos comedidamente allegar a la entidad EDUBAR S.A. el balance de obra del frente I.E.D. JESUS DE NAZARETH SEDE 2.

Este documento tiene como objetivo presentar un resumen detallado del estado actual del proyecto, así como los avances, resultados y otros aspectos relevantes.

El alcance establecido para el frente contemplaba la demolición y reconstrucción de los bloques de aulas de clase en la institución, así como intervención en áreas comunes, como patio de juegos y la cancha múltiple, incluyendo actividades estructurales, cubiertas, mampostería, pisos, estructura metálica, entre otros, según los diseños propuestos. Según la última modificación sobre la proyección de dicho frente disponía para tal fin un rubro otorgado de 1.445.682.199.28M/CTE, el cual se ha ejecutado según indica el cuadro anexo a la presente.

A la fecha, la institución ha cumplido con la ejecución de las obras asignadas según el alcance y las necesidades en este frente. Es menester destacar, sin embargo, que las situaciones y necesidades puntuales en la ejecución del proyecto han requerido ejecución de mayores cantidades a las previstas al inicio de la obra, así como menores cantidades para algunas actividades. Dichas variaciones obedecen a cambios y ajustes solicitados durante la ejecución, sobre los cuales se llegó a consenso para ejecución, alcanzando un 99.28% de ejecución, según ultimo ajuste presupuestal, permaneciendo por entrega únicamente instalaciones eléctricas y acabados en áreas puntuales.

Si bien la ejecución se acerca a su totalidad, entendiendo las necesidades de este frente, y el acabado final previsto para este frente, esta interventoría recomienda contemplar el recurso otorgado al frente según la proyección inicial del mismo, ampliando el recurso al proyectado inicialmente por un valor de $ 1.637.262.915 M/CTE, en aras de avanzar y ejecutar las obras y acabados a cabalidad.

Adjunto a este oficio, encontrará el Balance de Obra completo, el cual detalla los elementos mencionados anteriormente. Quedamos a su disposición para brindar cualquier aclaración adicional.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Balance Obra Jesús de Nazareth

PORCENTAJE DE AVANCE:	99,29 %	BALANCE IED JESUS DE NAZARETH SEDE 2							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		CANTIDAD ACUMULADA		CANTIDAD POR EJECUTAR	
1	PRELIMINARES								
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT 2	983,01	$ 4.221,00	$ 4.149.280,14	983,01	$ 4.149.280,14	0,00	$ -
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACION TOTAL	DIA	30,00	$ 454.545,00	$ 13.636.350,00	15,00	$ 6.818.175,00	15,00	$ 6.818.175,00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT 2	983,01	$ 9.648,00	$ 9.484.068,90	983,01	$ 9.484.068,90	0,00	$ -
1.04	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	MES	0,00	$ 578.772,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML		$ 23.673,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	85,14	$ 116.390,00	$ 9.909.444,60	85,14	$ 9.909.444,60	0,00	$ -
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML		$ 140.481,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2		$ 25.396,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.09	DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0,00	$ 27.679,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.10	DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2		$ 36.506,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	ESTRUCTURA								
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO <	M3	12,43	$ 252.961,00	$ 3.145.152,65	45,42	$ 11.490.626,94	-32,99	-$ 8.345.474,30

	0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.								
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT 2	736,79	$ 20.699,00	$ 15.250.745,83	1065,50	$ 22.054.736,89	-328,71	-$ 6.803.991,06
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2		$ 20.853,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.04	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML		$ 20.794,00	$ -	26,00	$ 540.644,00	-26,00	-$ 540.644,00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AEREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3		$ 266.275,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.06	ESCARIFICACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2		$ 32.124,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.07	ESCARIFICACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.08	ESCARIFICACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML		$ 16.513,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT 3		$ 93.507,00	$ -	385,57	$ 36.053.860,54	-385,57	-$ 36.053.860,54
2.10	EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	116,31	$ 90.362,00	$ 10.509.751,21	113,21	$ 10.229.583,83	3,10	$ 280.167,38
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT 2	543,20	$ 49.030,00	$ 26.633.096,00	638,47	$ 31.303.938,95	-95,27	-$ 4.670.842,95
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT 3		$ 34.062,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT 3	284,76	$ 192.928,00	$ 54.938.143,52	649,45	$ 125.297.536,23	-364,69	-$ 70.359.392,71
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT 2	110,14	$ 54.171,00	$ 5.966.448,11	117,13	$ 6.345.103,40	-6,99	-$ 378.655,29
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG S	10824,59	$ 9.568,00	$ 103.569.669,21	13706,48	$ 131.143.600,77	-2881,89	-$ 27.573.931,56
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UN D	285,68	$ 40.436,00	$ 11.551.601,21	0,00	$ -	285,68	$ 11.551.601,21

2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT 3	23,66	$ 894.392,00	$ 21.161.314,72	26,51	$ 23.714.133,09	-2,85	-$ 2.552.818,37
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT 3	19,05	$ 1.742.818,00	$ 33.200.682,90	19,05	$ 33.200.682,90	0,00	$ -
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT 3	4,56	$ 1.894.074,00	$ 8.642.659,66	3,60	$ 6.827.189,73	0,96	$ 1.815.469,93
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT 2	676,37	$ 99.065,00	$ 67.004.554,42	1008,18	$ 99.874.925,72	-331,81	-$ 32.870.371,30
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT 2	75,00	$ 260.694,00	$ 19.552.050,00	0,00	$ -	75,00	$ 19.552.050,00
2.22	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	4,50	$ 149.548,00	$ 672.966,00	0,00	$ -	4,50	$ 672.966,00
2.23	CARCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML		$ 513.566,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	606,00	$ 27.186,00	$ 16.474.716,00	1116,44	$ 30.351.581,34	-510,44	-$ 13.876.865,34
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML		$ 48.408,00	$ -	48,60	$ 2.352.628,80	-48,60	-$ 2.352.628,80
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE	ML		$ 274.649,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

	PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO								
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT 2		$ 559.014,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	256,38	$ 18.074,00	$ 4.633.812,12	387,48	$ 7.003.313,52	-131,10	-$ 2.369.501,40
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML		$ 229.078,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2		$ 154.549,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2		$ 154.549,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2		$ 113.318,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	22,84	$ 1.933.197,00	$ 44.145.036,79	3,54	$ 6.842.792,43	19,30	$ 37.302.244,36
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2		$ 190.540,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2		$ 351.058,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT 3	33,00	$ 1.254.738,00	$ 41.406.354,00	33,44	$ 41.958.438,72	-0,44	-$ 552.084,72

2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML		$ 28.100,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML		$ 9.165,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT 3	21,35	$ 813.350,00	$ 17.366.649,20	21,35	$ 17.366.649,20	0,00	$ -
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT 2		$ 354.181,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT 3		$ 3.219.697,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	**MAMPOSTERIA**								
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML		$ 14.939,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT 2	628,92	$ 32.154,00	$ 20.222.293,68	628,92	$ 20.222.293,68	0,00	$ -
3.03	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO H<0.8m. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML		$ 16.526,00	$ -	12,00	$ 198.312,00	-12,00	-$ 198.312,00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT 2		$ 13.644,00	$ -	1,74	$ 23.685,98	-1,74	-$ 23.685,98
3.05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	MT 2		$ 92.552,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT 2	800,00	$ 100.669,00	$ 80.535.200,00	1006,64	$ 101.337.583,10	-206,64	-$ 20.802.383,10

3.07	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	ML		$ 60.337,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT 2		$ 23.961,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML		$ 17.610,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT 2		$ 39.705,00	$ -	489,01	$ 19.415.999,11	-489,01	-$ 19.415.999,11
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML		$ 27.794,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.12	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	165,00	$ 15.618,00	$ 2.576.970,00	0,00	$ -	165,00	$ 2.576.970,00
3.13	ENCOROCE DE MURO A CUBIERTA	ML		$ 20.000,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.14	IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO PARA MUROS	MT 2		$ 18.861,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.15	LEVANTE DE MURO EN LADRILLO TOLETE DE 0.20 X 0.06 X 0.10 METROS, CON MORTERO DE PEGA.	MT 2		$ 107.045,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.16	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .	MT 2		$ 38.862,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4	**ESTRUCTURA METALICA**								
4.01	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO-POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	MT 2		$ 74.907,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE	KGS		$ 21.652,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

	PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO								
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	12978,54	$ 24.307,00	$ 315.469.469,01	13575,84	$ 329.987.894,27	-597,29	-$ 14.518.425,26
5	**CUBIERTAS**								
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2		$ 96.354,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	382,75	$ 33.985,00	$ 13.007.911,68	382,75	$ 13.007.911,68	0,00	$ -
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2		$ 39.196,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.04	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2		$ 22.404,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.05	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA METÁLICA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICIÓN FINAL	M2		$ 21.532,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.06	DESMONTE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PVC. INCLUYE RETIRO	ML		$ 9.892,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.07	DESMONTE DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC. INLCUYE RETIRO	ML		$ 8.357,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	382,75	$ 138.761,00	$ 53.111.397,17	625,76	$ 86.830.417,31	-243,00	-$ 33.719.020,13
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	MT2		$ 127.907,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 0,30x0,35x0,30 M PARA CUBIERTA	ML		$ 151.298,00	$ -	13,87	$ 2.098.503,26	-13,87	-$ 2.098.503,26
5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL TIPO AMAZONAS DE PVC (Ala alta:13.5cm x Ala baja: 9.6cm x Base: 12cm)	ML		$ 90.800,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE TIPO AMAZONAS	ML		$ 51.908,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT 2		$ 59.248,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT 2		$ 34.014,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT 2		$ 133.816,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	**ACABADOS**								
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT 2	736,85	$ 16.524,00	$ 12.175.689,57	822,65	$ 13.593.448,77	-85,80	-$ 1.417.759,20
6.02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	MT 2		$ 24.487,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	66,00	$ 3.615,00	$ 238.590,00	0,00	$ -	66,00	$ 238.590,00
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT 2	382,75	$ 20.865,00	$ 7.986.172,64	382,75	$ 7.986.172,64	0,00	$ -
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT 2	695,10	$ 17.948,00	$ 12.475.654,80	0,00	$ -	695,10	$ 12.475.654,80

6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT 2	360,84	$ 17.384,00	$ 6.272.842,56	0,00	$ -	360,84	$ 6.272.842,56
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT 2	45,81	$ 20.720,00	$ 949.183,20	0,00	$ -	45,81	$ 949.183,20
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT 2		$ 18.887,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT 2	150,00	$ 20.457,00	$ 3.068.550,00	0,00	$ -	150,00	$ 3.068.550,00
6.10	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML		$ 5.765,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT 2	234,00	$ 32.600,00	$ 7.628.400,00	397,29	$ 12.951.719,20	-163,29	-$ 5.323.319,20
6.12	PISO EN BALDOSA DURO PISO	MT 2	400,00	$ 96.982,00	$ 38.792.800,00	355,73	$ 34.498.921,95	44,28	$ 4.293.878,05
6.13	ZÓCALO EN BALDOSA DURO PISO	ML	66,00	$ 19.156,00	$ 1.264.296,00	223,80	$ 4.287.112,80	-157,80	-$ 3.022.816,80
6.14	ENCHAPE DE PISO PORCELANATO INCLUYE RELLENO DE JUNTAS	MT 2		$ 115.802,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON VITRIFICADO DE 30X30 CMS PARA EXTERIORES	MT 2	236,33	$ 73.815,00	$ 17.444.698,95	289,80	$ 21.391.852,73	-53,47	-$ 3.947.153,78
6.16	ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.20 X 0.20 METROS. INCLUYE BOQUILLA	MT 2		$ 77.136,00	$ -	78,11	$ 6.025.092,96	-78,11	-$ 6.025.092,96
6.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIND DE ALUMINIO NATURAL ACOLILLADA SOBRE MURO	ML	20,00	$ 12.513,00	$ 250.260,00	4,68	$ 58.560,84	15,32	$ 191.699,16
6.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN GRANITO PULIDO ANCHO 0.50 H=0.90. INCLUYE VANOS PARA LAVAMANOS Y SOPORTE PARA MESON.	ML		$ 616.876,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.19	ENCHAPE EN BALDOSA DE CEMENTO ≥ 0.20 X 0.20	M2		$ 78.933,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.20	ZÓCALO EN BALDOSA DE CEMENTO DE E ≥ 0.08 M	ML		$ 27.022,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.21	ZÓCALO EN ENCHAPE CERÁMICO h= 0,1 M	ML		$ 21.507,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

6.22	CONSTRUCCIÓN MURO EN SUPERBOARD A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2		$ 93.422,00	$ -	143,53	$ 13.408.485,97	-143,53	-$ 13.408.485,97
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT 2		$ 77.644,00	$ -	20,00	$ 1.552.880,00	-20,00	-$ 1.552.880,00
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT 2		$ 67.320,00	$ -	20,00	$ 1.346.400,00	-20,00	-$ 1.346.400,00
6.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO AUTOADHESIVO	MT 2		$ 89.140,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.26	ZÓCALO EN BALDOSA DE PORCELANATO	ML		$ 21.660,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7									
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	30,00	$ 38.451,00	$ 1.153.530,00	12,00	$ 461.412,00	18,00	$ 692.118,00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	30,00	$ 57.053,00	$ 1.711.590,00	12,00	$ 684.636,00	18,00	$ 1.026.954,00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	20,00	$ 32.669,00	$ 653.380,00	14,00	$ 457.366,00	6,00	$ 196.014,00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT 2	78,90	$ 323.953,00	$ 25.559.891,70	77,15	$ 24.994.107,79	1,75	$ 565.783,91
7.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN REJA DE VARILLAS DE 5/8" A CADA 0.12 METROS ENTRE EJES, REFUERZO HORIZONTAL EN PLATINA DE 2 1/2" X 1/4" A CADA 0.40 METROS, CON MARCO Y CONTRA MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	MT 2		$ 819.193,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE	MT 2	20,00	$ 493.556,00	$ 9.871.120,00	0,00	$ -	20,00	$ 9.871.120,00

	FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00 MTS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, CERRADURAS Y HERRAJES								
7.07	MANTENIMIENTO DE REJAS METÁLICAS CON VARILLA CORRUGADA O LISA DE DIAMETRO ENTRE 1/4" A 1/2" Y ENTRAMADO DE ENTRE 0.05 X 0.10 HASTA 0.10 X 0.30 INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA CON SISTEMA EPOXICO, DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA Y GRATA METÁLICA	M2		$ 37.426,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA FORTINET, DOBLE HILO, CLÁSICA O SIMILAR. INCLUYE FIJACIONES, POSTES VERTICALES Y ACABADO EN PINTURA EPOXICO-POLIURETANO, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	M2		$ 162.600,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS EN VARILLA LISA O CORRUGADA DE 1/4" A 5/8" ENTRAMADO DE ENTRE 0.05 X 0.05 Y 0.20 X 0.20 PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE RESANES EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	M2	98,90	$ 334.742,00	$ 33.105.983,80	0,00	$ -	98,90	$ 33.105.983,80
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS ALTURA DE HASTA 1.20 M DE ENTRE 2 Y 5 BARANDALES. CON SISTEMA EPOXICO-POLIURETANO. INCLUYE EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML		$ 306.616,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO CON SISTEMA EPOXICO. INCLUYE CERRADURAS Y HERRAJES	M2		$ 387.804,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR	M2		$ 891.836,00	$ -	33,15	$ 29.564.363,40	-33,15	-$ 29.564.363,40
7.13	PUERTA PRINCIPAL DE 2 HOJAS ABATIBLE EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM DIMENSION: 2.10X0,90 m. INCLUYE ACCESORIOS, CERRADURA DE SEGURIDAD MARCA SCHLAGE REF B-362 O SIMILAR, CERRADURA CENTRAL, SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE MANILLAS Y ACCESORIOS ACERO INOX	UND		$ 5.071.625,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA FORRADA EN PVC, TUBERIA GALVANIZADA DE 2" Y TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/4" POR PARTE SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE PINTURA DEL CERRAMIENTO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR.	MT2		$ 135.924,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTAFUEGO MEDIDAS 1 X 2,10m	UND		$ 2.939.968,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE VENTANA EN REJA DE VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.10 METROS ENTRE BARROTES VERTICALES Y 0,20 METROS ENTRE BARROTES HORIZONTALES, MARCO EN VARILLA DE 1/2", INCLUYE ELEMENTO DE FIJACION, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	MT2		$ 192.251,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE	MT2		$ 1.381.283,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

	PUERTA, TABIQUE LISO, PARAL Y C EXTREMA.								
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND		$ 5.040.480,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	**CARPINTERIA DE MADERA**								
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND		$ 32.643,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN MADERA DE CEDRO O ROBLE, INCLUYE MARCO, BISAGRAS, VIDRIOS Y PINTURA EN TINTILLA	MT 2		$ 592.927,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.03	PINTURA DE PUERTAS EN ESMALTE TIPO PINTUCO O SIMILAR	MT 2		$ 32.151,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA COLOR NATURAL	M2		$ 204.956,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.05	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE DESMONTE, CAMBIO DE CERRADURA TIPO POMO Y BISAGRAS.	M2		$ 58.613,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	**ELECTRICO**								
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	112,00	$ 19.629,00	$ 2.198.448,00	0,00	$ -	112,00	$ 2.198.448,00

9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	32,00	$ 16.601,00	$ 531.232,00	0,00	$ -	32,00	$ 531.232,00
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	20,00	$ 19.709,00	$ 394.180,00	0,00	$ -	20,00	$ 394.180,00
9.04	ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	822,40	$ 57.278,00	$ 47.105.427,20	0,00	$ -	822,40	$ 47.105.427,20
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	120,00	$ 190.218,00	$ 22.826.160,00	0,00	$ -	120,00	$ 22.826.160,00
9.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector Led 100w Luz Blanca 8500lm PARA EXTERIORES, INCLUYE SALIDA 5m.	UND	12,00	$ 320.817,00	$ 3.849.804,00	0,00	$ -	12,00	$ 3.849.804,00
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero Bifasico con Puerta de 8 Circuitos - Ref: TB8P	UND	1,00	$ 439.996,00	$ 439.996,00	0,00	$ -	1,00	$ 439.996,00
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	156,00	$ 40.541,00	$ 6.324.396,00	0,00	$ -	156,00	$ 6.324.396,00
9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	300,00	$ 27.090,00	$ 8.127.000,00	0,00	$ -	300,00	$ 8.127.000,00
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	120,00	$ 190.755,00	$ 22.890.600,00	0,00	$ -	120,00	$ 22.890.600,00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	48,00	$ 282.244,00	$ 13.547.712,00	0,00	$ -	48,00	$ 13.547.712,00
9.12	SALIDA DE VENTILADORES TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS	UND	20,00	$ 194.230,00	$ 3.884.600,00	0,00	$ -	20,00	$ 3.884.600,00

	Y ELEMENTOS DE FIJACION.								
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	24,00	$ 235.052,00	$ 5.641.248,00	0,00	$ -	24,00	$ 5.641.248,00
9.14	SALIDA DE INTERUPTOR SENCILLO EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	32,00	$ 191.338,00	$ 6.122.816,00	0,00	$ -	32,00	$ 6.122.816,00
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS	ML	50,00	$ 16.480,00	$ 824.000,00	0,00	$ -	50,00	$ 824.000,00
9.16	ALIMENTADOR EN CABLE 3#12AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 1", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	120,00	$ 60.015,00	$ 7.201.800,00	0,00	$ -	120,00	$ 7.201.800,00
9.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 150W 220VAC No incluye alimentador o salida.	UND	4,00	$ 441.714,00	$ 1.766.856,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.766.856,00
9.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES	UND		$ 872.036,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES	UND		$ 693.591,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.20	TUBERIA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML		$ 53.959,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND		$ 100.299,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO 220VAC DE 12 CIRCUITOS, NO INCLUYE PROTECCIONES	UND		$ 615.867,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

9.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION	UND		$ 4.003.454,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.24	SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND		$ 212.527,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG X3 METRO LINEAL LIBRE DE HALOGENO	ML		$ 18.863,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 24 CIRCUITOS BIFASICO	UND		$ 550.917,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 30 CIRCUITOS BIFASICO	UND		$ 765.112,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 36 CIRCUTOS	UND		$ 794.611,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO DE 15A HASTA 30A	UND		$ 24.609,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO MAYOR DE 30A	UND		$ 27.466,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 15A HASTA 40A	UND		$ 93.368,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO MAYOR DE 50A	UND		$ 119.225,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLO MAYOR DE 40A	UND		$ 99.435,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.34	CABLE #8 AWG LIBRE DE HALOGENO ML	ML		$ 15.260,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.35	CABLE #6 AWG LIBRE DE HALOGENO ML	ML		$ 21.034,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

9.36	TUBERIA EMT DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML		$ 68.275,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector Led 150w Luz Blanca 12700lm no incluye salida ni alimentador.	UND		$ 455.958,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.38	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS A 42 CIRCUITOS	UND		$ 447.467,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.39	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN - 2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#8F+1#8N+1#10T EN TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML		$ 106.707,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.40	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN - 2 LIBRE DE HALOGENOS EN 3#8F+1#8N+1#10T EN TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML		$ 117.110,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN - 2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML		$ 121.310,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN - 2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML		$ 283.058,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.43	Breaker Industrial ABB Formula 50A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B - Ref: 1SDA066702R1 o similar	UND		$ 298.701,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.44	Breaker Industrial Graduable ABB 44 1 - 63A - 25 KA - XT1B TMAX XT - Ref: 1SDA066805R1 o similar	UND		$ 298.801,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

9.45	Breaker Industrial ABB Formula 125A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B - Ref: 1SDA066708R1 o similar	UND		$ 709.717,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.46	Breaker Industrial ABB Formula 150A Capacidad de Ruptura 50KA - A2C o similar	UND	20,00	$ 761.041,00	$ 15.220.820,00	0,00	$ -	20,00	$ 15.220.820,00
9.47	Breaker Industrial ABB Formula 225A Capacidad de Ruptura 50KA - A2C o similar	UND		$ 814.922,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.48	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND		$ 282.196,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.49	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC TIERRA AISLADA COLOR NARANJA. (REGULADAS) EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND		$ 161.147,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DISP. TRIANGULO B=3M. INCLUYE: 3 JABALINAS DE Cu 5/8 X 2.40M EN CU- 20ML DE CABLE 1/0 CU, SOLDADURA EXOTERMICA CON MOLDE Y TERMINAL PONCHABLE PARA CABLE 1/0. INCLUYE SUELO ARTIFICIAL 75KG.	UND		$ 3.158.957,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DISPOSICION JABALINA VERTICAL. INCLUYE: 1 JABALINA DE Cu 5/8 X 2.40M EN CU-CU 9ML DE CABLE 1/0 CU, SOLDADURA EXOTERMICA CON MOLDE Y TERMINAL PONCHABLE PARA CABLE 1/0. INCLUYE SUELO ARTIFICIAL 25KG.	UND		$ 1.195.602,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML		$ 55.395,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.53	SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO SEGUN PICTOGRAMA RETIE PARA SUBESTACIONES Y TABLEROS ELECTRICOS, PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO Y ADHESIVOS DE RIESGO ELECTRICO PARA TABLEROS	UND		$ 175.757,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.54	S.E.I. SUBESTACION TIPO POSTE INCLUYE, Transformador Monofasico en Aceite de 75 KVA - 13.2Kv - 120 - 240v 2 CORTACIRCUITOS DE 27 KV, 100A, 2 PARARRAYOS DE 15 KV, KIT SPT, ARMADO Y ELEMENTOS Y TRAMITES NO DESCRITOS PARA PUESTA EN SERVICIO DE LA S/E.	UND		$ 19.388.197,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO EN POSTE DE HORMIGON 12m X 1050 INCLUYE TRANSPORTE, HOYADO, APLOMADO Y CIMENTADO.	UND		$ 3.300.808,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS EN 2#1/0F+1#1/0N DESDE TRANSFORMADOR HASTA TGD	ML		$ 301.739,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.57	S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 160A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 80A 1un, 60A 2 un, 40A 2 un barrajes FFFNT, p/planos, frente muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.	UND		$ 7.695.992,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA WALLPACK LED, TIPO BUQUE O SIMILAR. IP-65 , INCLUYE PRENSOESTOPA Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND		$ 145.709,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

9.59	Suministro e instalacion de reflector Led Highbay 200w Luz Blanca Gc015 24000 Lúmenes 100-240v o similar para canchas multiples	UND		$ 1.156.414,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.60	S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 400A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 125A 1un, 80A 2 un, 60A 2 un 40A 3 un, barrajes FFFNT, 2 reservas, p/planos, f. muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.	UND		$ 9.564.962,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.61	S.E.I. Panel LED RECTANGULAR 30x120 Cm 40w Luz Blanca incluye accesorios y elementos de soporte o fijacion.	UND		$ 190.218,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.62	S.E.I. PANEL LED CUADRADO 60x60 40w Luz Blanca 100-277v incluye accesorios y elementos de soporte o fijacion.	UND		$ 190.218,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.63	S.E.I. PANEL LED REDONDO Rd 24w Luz Blanca 100-240v 1600 Lúmenes incluye accesorios y elementos de soporte o fijacion.	UND		$ 117.374,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.64	S.E.I. CABLE UTP CAT 6 MARCA SIEMON O SIMILAR	ML		$ 39.900,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND		$ 29.990,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10	**HIDRAULICO, AGUAS LLUVIAS Y AGUA POTABLE**								
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUBETAS CON ALA EN LOS EXTREMOS, LONGITUD 2.00 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA CUELLO DE GANSO METÁLICA	UND		$ 831.933,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 4"	UND	4,00	$ 50.230,00	$ 200.920,00	3,00	$ 150.690,00	1,00	$ 50.230,00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y	UND	2,00	$ 1.488.291,00	$ 2.976.582,00	3,00	$ 4.464.873,00	-1,00	-$ 1.488.291,00

	REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION								
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	6,00	$ 64.019,00	$ 384.114,00	0,00	$ -	6,00	$ 384.114,00
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	12,00	$ 96.952,00	$ 1.163.424,00	0,00	$ -	12,00	$ 1.163.424,00
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	60,00	$ 35.397,00	$ 2.123.820,00	3,00	$ 106.191,00	57,00	$ 2.017.629,00
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	150,00	$ 29.367,00	$ 4.405.050,00	0,00	$ -	150,00	$ 4.405.050,00
10.08	LLAVE MANGUERA D=1/2" TIPO PESADO.	UND		$ 51.641,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML		$ 29.268,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND		$ 859.102,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR O SOBREPONER ACUACER O SIMILAR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND		$ 212.285,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA TRADICIONAL	UND		$ 756.617,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML		$ 45.401,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML		$ 27.015,00	$ -	80,00	$ 2.161.200,00	-80,00	-$ 2.161.200,00
10.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASIENTO SANITARIO CONFORTO CORONA BLANCO	UND		$ 156.389,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

10.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS	UND		$ 67.036,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA ATLAS PLUS PARA TANQUE SANITARIO	UND		$ 75.701,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	70,00	$ 58.180,00	$ 4.072.600,00	60,50	$ 3.519.890,00	9,50	$ 552.710,00
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 534.334,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.20	FILTRO FRANCES 0,60 X 0,40 MTS, TUBO RANURADO DE 4". INCLUYE GEOTEXTIL NT2000	ML		$ 104.031,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND		$ 173.513,00	$ -	3,00	$ 520.539,00	-3,00	-$ 520.539,00
10.22	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO RUBATEX 3/4" PARA DESAGUE DE AIRES ACONDICIONADOS.	ML		$ 17.877,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.23	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH O SIMILAR	UND		$ 451.081,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC ≥ 0.15 X 0.15 METROS	UND		$ 43.887,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO 2"	UND	6,00	$ 38.020,00	$ 228.120,00	0,00	$ -	6,00	$ 228.120,00
10.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TAZA BÁLTICA DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA DE FLUXÓMETRO REF. 02657, LÍNEA CORONA O SIMILAR	UND		$ 1.587.962,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL GOTTA COLOR BLANCO, LÍNEA	UND		$ 674.797,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

	CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA PUSH ANTIVANDÁLICA								
10.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER MANANTIAL DUO, LINEA CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA PUSH ANTIVANDÁLICA.	UND		$ 849.125,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND		$ 719.231,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1/2" O SIMILAR	UND		$ 38.138,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.31	LLAVE MANGUERA D=1/2" TIPO PESADO.	UND		$ 51.125,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	**URBANISMO**								
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT 2	40,21	$ 136.534,00	$ 5.490.032,14	0,00	$ -	40,21	$ 5.490.032,14
11.02	ORNAMENTACIÓN Y JARDINERÍA - RELLENO EN ARENA NEGRA ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE TRANSPORTE	MT 3		$ 146.312,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.03	JARDINERAS EN LADRILLO COMUN H=0.40 MTS	ML	23,23	$ 107.839,00	$ 2.505.099,97	0,00	$ -	23,23	$ 2.505.099,97
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	52,00	$ 67.760,00	$ 3.523.520,00	0,00	$ -	52,00	$ 3.523.520,00

11.05	ANDÉN EN ADOQUÍN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.32 METROS, INCLUYE BASE EN MATERIAL SELECCIONADO.	MT 2		$ 162.652,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2		$ 160.737,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	**AMBIENTAL**								
12.01	TALA DE ARBOLES MEDIANOS INC RETIRO	UN D		$ 1.556.196,00	$ -	1,00	$ 1.556.196,00	-1,00	-$ 1.556.196,00
12.02	PODA DE ARBOLES MEDIANOS INC RETIRO	UN D		$ 1.088.110,00	$ -	2,00	$ 2.176.220,00	-2,00	-$ 2.176.220,00
12.03	CONTROL DE PLAGAS (CUCARACHAS, ROEDORES, PLAGAS DE LA MADERA, PLAGAS DE CHINCHES, HORMIGAS, RASTREROS, AVES Y MURCIÉLAGOS, PULGA, GARRAPATAS, ÁCAROS, MOSCAS Y VECTORES). INCLUYE PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.	MT 2		$ 3.387,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.04	PODA DE ARBOLES GRANDES INC RETIRO Y TRAMITES	UN D		$ 1.397.697,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

VALOR TOTAL		**$ 1.404.500.799,28**	**$ 1.435.353.868,09**	**-$ 30.853.068,81**

Barranquilla, 24 de julio de 2023 **CIED-2023-095**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Correcciones INFORME MENSUAL 7

Cordial saludo,

Por medio de la presente, luego de haber culminado la revisión correspondiente del archivo allegado a esta interventoria, nos permitimos remitir las observaciones pertinentes en dicho archivo.

1- INFORME TECNICO 7

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Informe técnico 7

Barranquilla, 28 de julio de 2023 **CIED-2023-096**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
Cristian Jiménez Yejas

Ref. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Citación mesa de Trabajo - Actividades No Previstas Acta Parcial de Obra N°3

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestras obligaciones y funciones contractuales, nos permitimos extender solicitud de mesa de trabajo para revisión de las actividades No Previstas consideradas para el Acta Parcial del Obra N°3.

Sobre estas, es pertinente esclarecer los criterios en rubros asignados en los diferentes componentes de los APUs, así como la pertinencia de inclusión de actividades dentro del contrato. Así las cosas, en aras de adelantar el tramite sobre la solicitud de inclusión de actividad No Prevista recibida, les solicitamos comedidamente asistir a Mesa de Trabajo el día 31 de julio de 2023 a las 8:30am, en las oficinas de Interventoría, con el fin de valorar y aprobar la inclusión de las actividades que corresponda.

Sin otro particular,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

RECIBIDA

IP-00653

Barranquilla, 22 de junio de 2023

Señores
CONSORCIO IE DISTRITO
MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE
Representante legal

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SA-EDU-0001-2022, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: ESCASEZ DE PERSONAL Y BAJO RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES EN "IED MAYOR DE BARRANQUILLA" Y "IED JOSE EUSEBIO CARO".

Cordial saludo

Durante las visitas de seguimiento realizadas por parte de la supervisión desde el día 13 hasta el 22 de junio de 2023, se ha detectado escasez de personal en obra en las instituciones educativas "IED MAYOR DE BARRANQUILLA" y "IED JOSE EUSEBIO CARO", como se evidencia a continuación en las siguientes tablas:

Tabla 1 Personal evidenciado en obra IED Mayor de Barranquilla

Junio	Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3	Total trabajadores por día
13	7	0	0	7
14	6	0	0	6
15	6	0	0	6
16	6	0	0	6
17	6	0	0	6
20	6	0	0	6
21	6	0	0	6
22	6	0	0	6

Tabla 2 Personal evidenciado en obra IED José Eusebio Caro

Junio	Total trabajadores por día
13	2
14	2
15	2
16	2
17	3
20	3
21	2
22	6

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, esta situación incumple con las obligaciones especificas establecidas en el contrato de obra firmado entre las partes, en particular en sus numerales:

> 5. ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra.
>
> 20. Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos.
>
> 21. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución.

En este orden de ideas, hacemos énfasis en que la presencia de personal calificado en obra es esencial para garantizar el cumplimiento de los plazos y la calidad de los trabajos realizados. Por lo tanto, solicitamos que se tomen medidas inmediatas a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato.

Agradecemos su atención y colaboración.

Atentamente,

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Supervisor
EDUBAR S.A.
Proyectó: Samuel Iglesias Jimenez
Aprobó: Evert Salgado Saballeth

IP-00677

Barranquilla, 21 de junio de 2023

Señores

CONSORCIO I.E. DISTRITO
ATN. MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE.
Representante Legal.

REF: CONTRATO No. SA-EDU-0001-2022 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".

ASUNTO: Solicitud de entrega de programaciones actualizadas.

Cordial saludo

Mediante la presente y calidad de supervisión del contrato de la referencia, solicito se tomen las observaciones enviadas de las siguientes programaciones de obra, puesto que se identificaron discrepancias en las fechas de inicio y/o se encuentran con actividades en desfase.

1. IED Mayor de Barranquilla
2. IED Reuven Feuerstein
3. IED Carrizal
4. IED José Eusebio Caro
5. IED Castillo la Alboraya

Adicionalmente, se solicita la actualización de las programaciones de obra de los siguientes frentes, ya que por imprevistos en la ejecución y/o ampliación de los alcances a intervenir, no se entregaron en la fecha fin estipulada.

1. IED Jesús de Nazareth sede 2
2. IED Comunitaria 7 de abril
3. CEB 161
4. IED Carlos Meisel

Finalmente, solicito esta información sea entregada en un plazo no mayor a 3 días, ya que es obligación de las partes garantizar el correcto seguimiento de las intervenciones en ejecución.

Agradecemos su atención.

Atentamente,

Angelly Criales Anibal
Gerente General
EDUBAR S.A.
Proyectó: Diana Sanguino González DS
Aprobó: Lizz Figueredo Arce

Dirección: VÍA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Teléfonos: 3605148 - 3602561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT. 800.091140-4

IP-00678

Barranquilla, 21 de junio de 2023

Señores

CONSORCIO I.E. DISTRITO
ATN. MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE.
Representante Legal.

REF: CONTRATO No. SA-EDU-0001-2022 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".

ASUNTO: Solicitud de entrega de balance presupuestal.

Cordial saludo

Mediante la presente y calidad de supervisión del contrato de la referencia, solicito la entrega del balance de ejecución presupuestal a la fecha de todos los frentes en el marco del contrato de obra N° EDU-345-2022, con el fin de garantizar la validación de los alcances vigentes aprobados y la toma de decisiones sobre estos.

Por lo anterior, es importante incluir en dicho balance los frentes que se encuentran en ejecución, así como aquellos en que los alcances iniciales hayan finalizado, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Cantidades ejecutadas a la fecha
- Cantidades facturadas
- Cantidades por ejecutar

Finalmente, solicito esta información sea entregada en un plazo de 3 días.

Agradecemos su atención.

Atentamente,

Angelly Criales Anibal
Gerente General
EDUBAR S.A.
Proyectó: Diana Sanguino González
Aprobó: Evert Salgado Saballeth
