CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Instalación de estructura para cielo raso en batería sanitaria de niños	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Instalación de puerta metálica en baño PMR
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 15 de junio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 15 de junio de 2023
UBICACIÓN: Colegio Manuela Beltrán Sede B	**UBICACIÓN:** Colegio Manuela Beltrán Sede B

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Instalación de estructura para cielo raso en batería sanitaria de niñas	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Demolición de pisos en batería sanitaria de niños
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 15 de junio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 15 de junio de 2023
UBICACIÓN: Colegio Manuela Beltrán Sede B	**UBICACIÓN:** Colegio Manuela Beltrán Sede B

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Desmonte de teja de barro y teja onduline en cubierta sobre aulas	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Terminación impermeabilización con poliuria en cubierta del área de auditorio
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 15 de junio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 15 de junio de 2023
UBICACIÓN: Colegio Técnico Palermo	**UBICACIÓN:** Colegio Técnico Palermo

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Material de lamina OBS para cubierta de aulas	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Desmonte de teja de barro y teja onduline en cubierta sobre aulas
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 15 de junio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 15 de junio de 2023
UBICACIÓN: Colegio Técnico Palermo	**UBICACIÓN:** Colegio Técnico Palermo

OBSERVACIONES

Registro Fotográfico en el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de junio de 2023

RESPONSABLE		**FECHA**
NOMBRE	CAMILO TARQUINO	**15/06/2023**
CARGO	RESIDENTE INTERVENTORIA	
FIRMA		

Vo. Bo. DIRECTOR

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA instalacion recebo en senderos	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** piso em grano de marmol area administrativa
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 13 de junio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 14 de junio 2023**
UBICACIÓN: Colegio Usaquen sede A	**UBICACIÓN: Colegio Usaquen sede A**

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA desmonte de piso en madera de aulas de 11	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** anden en concreto
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:14 de junio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 15 de junio de 2023**
UBICACIÓN: Colegio Usaquen sede A	**UBICACIÓN: Colegio Usaquen sede A**

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA piso en grano de marmol aula prefbricada	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** instalacion de adoquin
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 29 de mayo de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 29 de mayo de 2023**
UBICACIÓN: Nuevo Horizonte sede D	**UBICACIÓN: Nuevo Horizonte sede D**

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA instalacion de adoquin	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** urbanismo
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 09 de junio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 15 de junio de 2023**
UBICACIÓN: colegio nuevo horizonte sede D	**UBICACIÓN: colegio nuevo horizonte sede D**

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Demolición de acabado de piso y enchape de muros de baño de preescolar	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** demolición de muros divisorios de baños de preescolar
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 17 de mayo de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:** 17 de mayo de 2023
UBICACIÓN: Colegio Cristobal Colon sede C	**UBICACIÓN: Colegio Cristobal Colon sede C**

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA pañete muros de baños de preescolar	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** pañete muros de baños de preescolar
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 09 de junio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 09 de junio de 2023
UBICACIÓN: Colegio Cristobal Colon sede C	**UBICACIÓN: Colegio Cristobal Colon sede C**

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED


	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA cambio de ventaneria	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** cambio de ventaneria
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 9 de junio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 15 de junio de 2023
UBICACIÓN: Colegio Divino Maestro sede C	**UBICACIÓN: Colegio Divino Maestro sede C**

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA demolición de acabado de piso	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** demolición de acabado de piso
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 29 de mayo de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 9 de junio de 2023
UBICACIÓN: Colegio Divino Maestro sede B	**UBICACIÓN: Colegio Divino Maestro sede B**

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA retiro de manto asfaltico	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** demolición de acabado de piso
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 15 de junio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 22 de mayo de 2023
UBICACIÓN: Colegio Divino Maestro sede B	**UBICACIÓN: Colegio Divino Maestro sede A**

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

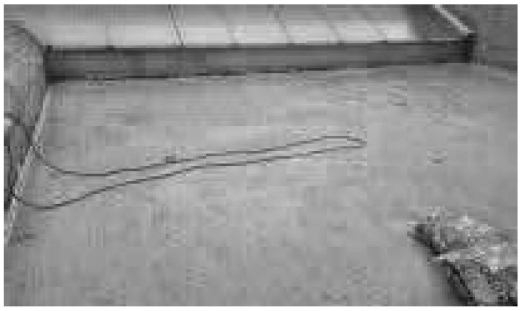	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA demolición de acabado de piso	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** sello de fisuras
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 9 de junio de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 15 de junio de 2023
UBICACIÓN: Colegio Divino Maestro sede A	**UBICACIÓN: Colegio Divino Maestro sede A**

OBSERVACIONES

Registro Fotografico en el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de junio de 2023

RESPONSABLE		**FECHA**
NOMBRE	VILMA ZARATE	
CARGO	RESIDENTE INTERVENTORIA	
FIRMA		

Vo. Bo. DIRECTOR

Anexo No. 3 Resultados de ensayos y fichas técnicas

BAÑOS **CORONA** | **SANITARIOS**

POWER ONE

Sanitario alongado de dos piezas

Descarga sencilla de manija



- **Consumo de agua 3.8 Lpf. - 1.0 gpf**
- Altura de taza confortable para personas con movilidad reducida (A.D.A).
- Posee mayor capacidad de evacuación de sólidos que sanitarios estándar, siendo un sanitario óptimo para instituciones de tráfico medio (800 gr. de MISO).
- Válvula de suministro hidroestático antisifón.
- Gran superficie de agua para mayor higiene y limpieza.
- Sifón 100% esmaltado y de mayor diámetro con alto poder de descarga, manteniendo limpio el sanitario.

REF. 101651001

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Porcelana Vítrea
Dimensiones Generales (L x W x H)	774 x 547 x 764 mm 30 1/2 x 21 1/2 x 30 1/8 pulg
Presión de agua	20 - 80 PSI
Sistema de descarga	Por gravedad - anillo cerrado
Espejo de agua	166 x 232 mm - 6 9/16 x 9 5/32 pulg
Altura de sello	55 mm - 2 pulg
Paso de sifón	44.6 mm (1 3/4 pulg)
Peso Neto	39.6 kg (87.3 lb) aprox.

IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraidos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	% aprox.	Extr. / Fabr.
Pasta cerámica: 93,5% peso aproximado producto.		
Arcillas Arcabuco (Boyacá)		Extraído
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído
Caolín (La Unión - Antioquia)	89,5%	Extraído
Feldespato (Ibagué - Tolima)		Extraído
Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid)		Fabricado
Caolín (EE.UU, Portugal, Inglaterra)	4%	Extraído
Arcillas Finas (Inglaterra)		
Esmalte Vidriado: 6,5% peso aproximado producto.		
Esmalte (Sabaneta - Antioquia)	6,5%	Fabricado

COMPONENTES INCLUIDOS

Referencia	Descripción	Peso aproximado
O1014	TZ POWER ONE AL	24.7 kg (54.4 lb)
O4767	TANQUE-TP POWER ONE 3A	14.2 kg (31.3 lb)
799060001	VÁLVULA LLENADO A1330	0.29 kg (0.63 lb)
708400001	VÁLVULA DESCARGA CASCADE	0.42 kg (0.92 lb)
707340001	MANIJA MAVERICK	0.10 kg (0.22 lb)
609461001	ASIENTO ACTIVE CS AL BLANCO	1.8 kg (3.9 lb)

INSTALACIÓN

Para instalación tradicional de **305 mm. - 12 pulg.** de la pared terminada.

COLORES

100 Blanco

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.

12% Planta Girardota (Antioquia - Col.)

17% Planta Madrid (Cundinamarca - Col.)

MATERIAL EMPAQUE

FSC: Papel proveniente de recursos responsables.

70% Fibra virgen

30% Reciclado

Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en: **LEED, CASA COLOMBIA** y **EDGE.**

corona

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontarlo en el siguente link: **https://empresa.corona.co/sostenibilidad**

POWER ONE

Sanitario alongado de dos piezas


icontec Sello de Calidad
NTC 920-2011
Aparatos Sanitarios de Cerámica

Producto	Línea Base **EDGE**	Línea Base **LEED V.4**	Consumo de agua en el pdto.	Reducción vs. Línea Base **EDGE***	Reducción vs. Línea Base **LEED V.4****
	gpf / Lpf	gpf / Lpf	gpf / Lpf		
Sanitario Power One AL	1.6 / 6.0	1.6 / 6.0	1.0 / 3.8	36.6%	36.6%


* En algunos casos los valores de la línea base del software **EDGE** se encuentran por encima de los valores máximos permitidos por la normativa colombiana, lo cual implica que podría alcanzarse el 20% mínimo para lograr la certificación.
** Un proyecto gana puntos **LEED V.4** a partir de un **ahorro del 25%** de agua, el prerrequisito es 20%.

PLANOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO


SUPERIOR

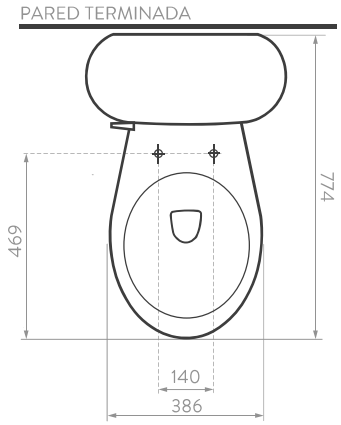

LATERAL

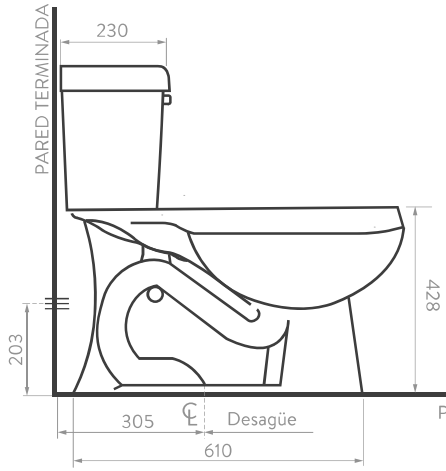

FRONTAL

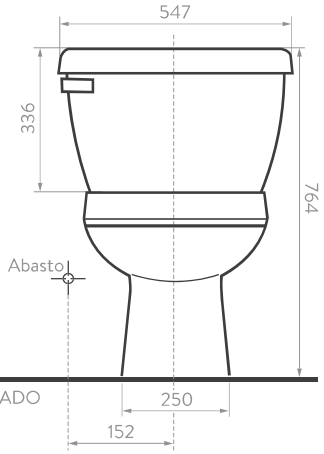

Unidades: mm.
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA COMPLETA PARA SIEMPRE
En porcelana vítrea

GARANTÍA DE 5 AÑOS
En grifería tanque

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEAS DE ATENCIÓN PANAMERICANAS

COLOMBIA: 01 8000 5120 30 / Bogotá **404 88 84**

CENTRO AMÉRICA: Guatemala **(502) 1-800-6240-109 /** Nicaragua **(505) 2249-5521**
El Salvador **(503) 2274-4620 /** Honduras San Pedro Sula **(504) 9482-6710**
Honduras Tegucigalpa **(504) 9767-0821 /** Costa Rica **(506) 4001-4966 /** Panamá **(507) 8000-202**

MÉXICO: Directo **(81) 8125 2000** / LADA sin costo **01 800 705 1020**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

SANITARIOS **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

INFANTIL

Sanitario Redondo en Porcelana 4.8 lpf (1.28 gpf). Ref. 501101001 / 501102171

Sanitario cómodo, ergonómico y funcional diseñado con altura Infantil para facilitar el uso de los niños, diseñado a la medida ideal.

- Sanitario infantil disponible en color blanco y bicolor.
- Capacidad de evacuación en la descarga de 250 gr de sólidos.
- Incluye asiento sanitario cierre suave que impide la caída brusca.
- Incluye tornillo de fijación que asegura la tapa al tanque, para evitar actos vandálicos.
- Botón Superior con diseño moderno e innovador.




INFORMACIÓN TÉCNICA

· Material	Porcelana Vitrificada.
· Rango de presión de agua	"10 a 80 P.S.I.".
· Sistema de descarga	Anillo abierto.
· Consumo de agua	4,8 lpf (1,28 gpf).
· Espejo de agua	207 x198 mm.
· Diámetro de sifón	44,4 mmØ.
· Dimensión	573mm x 579mm x 293mm.
· Garantía	Garantía Corona limitada de por vida para la Porcelana.

INSTALACIÓN

Para instalación tradicional de **305 mm. - 12 pulg.** de la pared terminada.

PLANOS TÉCNICOS

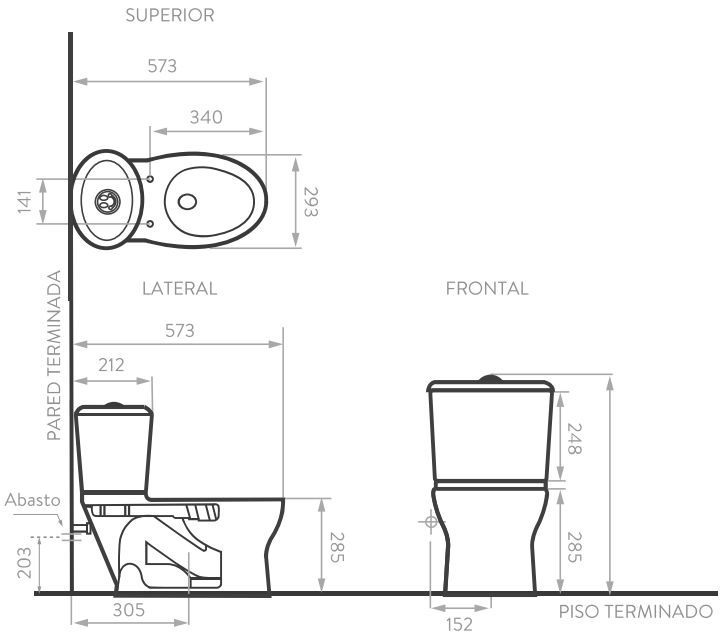

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Blanco

SERVICIO POST VENTA · GARANTÍA INTEGRAL · TAZA REDONDA · 5 AÑOS DE GARANTÍA (griferia)

Cumple con las normas Icontec NTC 920-1 y ASME/ANSI A112.192
Garantía Corona limitada de por vida para la Porcelana

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

INFANTIL

Sanitario Redondo en Porcelana 4.8 lpf (1.28 gpf).

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

COMPONENTES

Referencia	Descripción	Peso Aprox.
501101001	Sanitario Infantil de dos piezas. Válvula de entrada Hidro 26. con accionamiento con Botón parte superior del Tanque (Carita Feliz). Con tornillo asegurador de la tapa tanque al tanque porcelana.	53 libras
501102171	Sanitario Infantil de dos piezas. Válvula de entrada Hidro 26. con accionamiento con Botón parte superior del Tanque (Carita Feliz). Con tornillo asegurador de la tapa tanque al tanque porcelana.	53 libras
039440001	Accesorio de sujeción de la tapa tanque al tanque porcelana, para evitar riesgos de rotura del tanque.	
039420001	Carita Feliz en color Blanco.	

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona

GRIFERÍAS **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

LAVAMANOS PUSH

Grifería Lavamanos Mesa Push Ref. 947120001

Las griferías de lavamanos Corona son el aliado perfecto para las necesidades de las instituciones de alto tráfico, están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas

- Grifería de Lavamanos tipo push antivandálica
- Consumo de agua desde 0.45 L hasta 1.9 L de acuerdo al cartucho.
- Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos.
- Graduación de caudal por facilidad de las 7 posiciones que trae el cartucho.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Productos para uso institucional de alto tráfico.

PRESIÓN DE SERVICIO


· Presión mínima: 20 psi.
· Presión de trabajo: 20 - 80 Psi.
· Presión máxima: 80 Psi.
· Flujo max @80psi: 9,68 L/min - 0,49 L/Descarga.
· Flujo reaL (L/min): 6,5 - 9,68 L/min - 0,33 - 0,49 L/Descarga.
· Ciclo de Vida y Desempeño de la descarga: 150,000 ciclos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


· Material:
Cuerpo: Latón acabado cromo.
Boton: Latón con recubrimiento de cromo.
Escudo y Portaescudo: latón con recubrimiento de cromo.
· Peso Neto: 640gr. / 1,41Lb.
· Peso Bruto: 720gr. / 1,59Lb.
· Diametro de tubería entrada: 1/2" NPT.

PLANOS TÉCNICOS

LATERAL

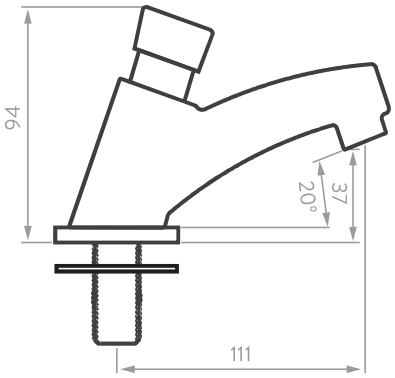

FRONTAL



Unidades: mm.
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Cromado

SERVICIO TÉCNICO
CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES
AHORRO DE AGUA
2 AÑOS DE GARANTÍA DEL ACABADO
3 AÑOS DE GARANTÍA DE PRODUCTO

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD NTC 1644

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.** co

corona

LAVAMANOS PUSH


Grifería Lavamanos Mesa Push

DIAGRAMA DE CAUDAL

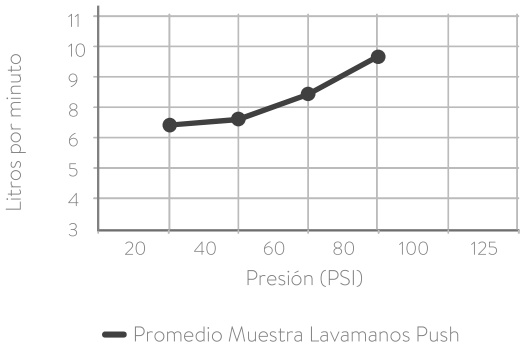

Los valores dados en esta gráfica son promedios tomados en fabrica. Los caudales pueden variar según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica.

Grafica de consumo lavamanos sensor (ciclo de 10 segundos)

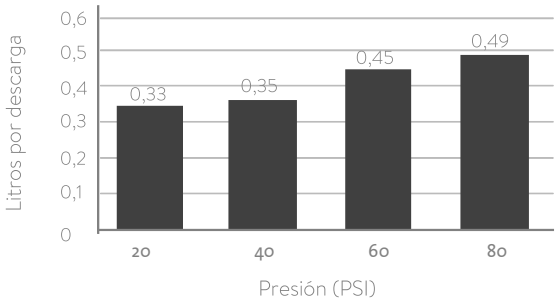

	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
REQUISITO DE NORMA: NTC 1644	20-80	6,35-9,68	Máx/Mín

	PRESIÓN (psi)	PROM. MUESTRA (Regadera)
REQUISITO DE NORMA: NTC No. 1644	20	6,35
	40	6,72
	60	8,30
	80	9,68

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

CURVA DE CAUDAL

Los valores indicados en gráfica corresponden a caudales promedios calculados en la posición 2 del cartucho (Ver hoja de instruccion), estas tomadas como referencias máximas y mínimas.
Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica..

REPUESTOS

- **Ref. O21121111** "Cartucho Push".
- **Ref. O21081111** "Empaques O-ring Cratucho Push".
- **Ref. O22071111** "Llave Boca Fija Institucional".

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. www.corona.com.co/web/Files/Uploads/Corona/Home/Informe-Sostenibilidad-2012/
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

LAVAMANOS **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

AQUAJET

Lavamanos de colgar Ref. O12911001

Lavamanos de colgar en porcelana , ideal para instituciones que requieren facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

- Diseño ergonómico con frente cóncavo.
- Tecnología AquaFlow, superficie homogénea que impide la acumulación de agua y residuos.
- Tecnología CoverGloss, alta resistencia al rayado y/o cambios de temperatura.
- Cumple requerimientos ADA, apto para personas con movilidad reducida cuando se instala correctamente según recomendaciones de CORONA.
- Requiere brazos para su instalación y cumplimiento según tipo de infra-estructura drywall y/o concreto.




INFORMACIÓN TÉCNICA

· Material	Porcelana Vitrificada.
· Dimensiones Generales	22" x 19 7/8" (56 cm x 50.5 cm).
· Dimensiones del pozo	14 1/8" x 12 3/8" (36 cm x 31.5 cm).
· Agujeros para griferia	1 3/8" (3.5 cm).
· Dimensiones del producto empacado	22 5/8" x 6 1/2" x 20 1/4" (57.5 cm x 16.5 cm x 51.5 cm).
· Peso del producto empacado	31.5 lbs (14.3kg).
· Garantía	Garantía Integral de por vida.

Accesorios Complementarios	
718030001	Brazos Lavamanos Free para mamposterías (concreto, ladrillo).
718040001	Brazos Lavamanos Free para drywall o madera. (muros livianos en madera o drywall).

* se vende por separado.

PLANOS TÉCNICOS

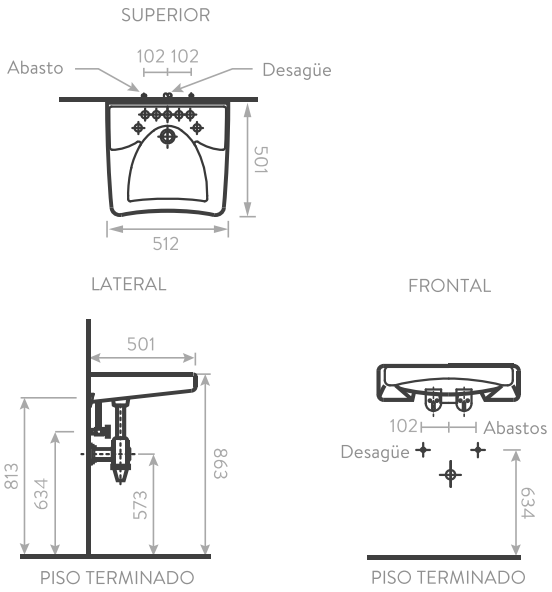

Unidades: mm. **Unidades:** milímetros

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Blanco

SERVICIO POST VENTA · GARANTÍA INTEGRAL · MOVILIDAD REDUCIDA

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.**co

AQUAJET
Lavamanos de colgar

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

Referencia	Descripción
01291	Lavamanos de colgar de 22" x 19 7/8" (56 cm x 50.5 cm), disponible con agujeros insinuados. Cumple con los requerimientos ADA.

Productos Compatibles	
Mx1010001	Lvm push mesa max plus.
Mx1020001	Lvm mesa push max.
Ec1010001	Lvm electrónico eco power.
St1030001	Gf lvm inst de sensor dolphin.
Ec1020001	Gf lvm inst electrónica eco smart.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona

LAVAMANOS **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

AQUAJET

Lavamanos de colgar Ref. O12911001

Lavamanos de colgar en porcelana , ideal para instituciones que requieren facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

- Diseño ergonómico con frente cóncavo.
- Tecnología AquaFlow, superficie homogénea que impide la acumulación de agua y residuos.
- Tecnología CoverGloss, alta resistencia al rayado y/o cambios de temperatura.
- Cumple requerimientos ADA, apto para personas con movilidad reducida cuando se instala correctamente según recomendaciones de CORONA.
- Requiere brazos para su instalación y cumplimiento según tipo de infra-estructura drywall y/o concreto.




INFORMACIÓN TÉCNICA

· Material	Porcelana Vitrificada.
· Dimensiones Generales	22" x 19 7/8" (56 cm x 50.5 cm).
· Dimensiones del pozo	14 1/8" x 12 3/8" (36 cm x 31.5 cm).
· Agujeros para griferia	1 3/8" (3.5 cm).
· Dimensiones del producto empacado	22 5/8" x 6 1/2" x 20 1/4" (57.5 cm x 16.5 cm x 51.5 cm).
· Peso del producto empacado	31.5 lbs (14.3kg).
· Garantía	Garantía Integral de por vida.

Accesorios Complementarios	
718030001	Brazos Lavamanos Free para mamposterías (concreto, ladrillo).
718040001	Brazos Lavamanos Free para drywall o madera. (muros livianos en madera o drywall).

* se vende por separado.

PLANOS TÉCNICOS

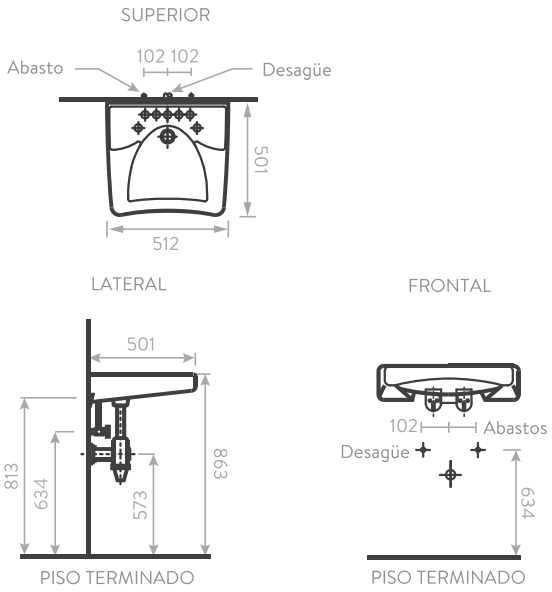

Unidades: mm. **Unidades:** milímetros

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Blanco

SERVICIO POST VENTA · GARANTÍA INTEGRAL · MOVILIDAD REDUCIDA

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.**co

AQUAJET
Lavamanos de colgar

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

Referencia	Descripción
01291	Lavamanos de colgar de 22" x 19 7/8" (56 cm x 50.5 cm), disponible con agujeros insinuados. Cumple con los requerimientos ADA.

Productos Compatibles	
Mx1010001	Lvm push mesa max plus.
Mx1020001	Lvm mesa push max.
Ec1010001	Lvm electrónico eco power.
St1030001	Gf lvm inst de sensor dolphin.
Ec1020001	Gf lvm inst electrónica eco smart.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona

BAÑOS **CORONA** | **SANITARIOS**

LAGUNA

Sanitario redondo de dos piezas

Descarga sencilla de botón tipo push



- **Consumo de agua 4.8 Lpf. - 1.28 gpf**
- Capacidad de evacuación de sólidos 250gr.
- Válvula de suministro de agua hidrostática antisifón
- Altura tradicional de taza para uso familiar
- Tanque compacto y moderno que optimiza el espacio del baño
- Sifón 100% esmaltado de mayor diámetro que optimiza el funcionamiento y mantiene limpio el sanitario

SERVICIO POST VENTA

GARANTÍA INTEGRAL

5 AÑOS DE GARANTÍA (grifería)

AHORRO DE AGUA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Porcelana Vítrea
Dimensiones Generales (H x L x W)	719 x 686 x 370 mm 28,3 x 27 x 14,8 pulg
Presión de agua	20 - 80 PSI
Sistema de descarga	Por gravedad - anillo abierto
Espejo de agua	185 x 213 mm. - 7,3 x 8,4 pulg
Altura de sello	58 mm. - 2,3 pulg
Peso Neto aprox.	24,6 kg. - 54,2 lbs
Peso Bruto aprox.	26,1 kg. - 57,5 lbs

*El asiento sanitario CONFORTO blanco ref. 909000001 viene incluido

IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraidos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	% aprox.	Extr. / Fabr.
Pasta cerámica: 93,5% peso aproximado producto.		
Arcillas Arcabuco (Boyacá)		Extraído
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído
Caolín (La Unión - Antioquia)	89,5%	Extraído
Feldespato (Ibagué - Tolima)		Extraído
Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid)		Fabricado
Caolín (EE.UU, Portugal, Inglaterra)	4%	Extraído
Arcillas Finas (Inglaterra)		
Esmalte Vidriado: 6,5% peso aproximado producto.		
Esmalte (Sabaneta - Antioquia)	6,5%	Fabricado

INSTALACIÓN

Para instalación tradicional de **305 mm. - 12 pulg.** de la pared terminada.

COMPONENTES

Referencia	Descripción	Peso arpoximado
340021001	Sanitario Laguna 4,8 de dos piezas	26,1 kg. - 57,5 lb
03007___1	Taza Acuacer 4,8	16,5 kg. - 36,4 lb
034031001	Tanque, tapa y grifería Laguna 4,8	9,3 kg. - 20,5 lb
03500___5	Tapa Laguna	1,6 kg. - 3,5 lb
909000001	Asiento sanitario redondo CONFORTO Blanco	730 gr. - 1,6 lb

COLORES

100 Blanco	Ref. 340211031
103 Bone	Ref. 340021031
111 Azul cielo	Ref. 340021111
141 Verde claro	Ref. 340021141

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.

12% Planta Girardota (Antioquia - Col.)

17% Planta Madrid (Cundinamarca - Col.)

MATERIAL EMPAQUE

FSC: Papel proveniente de recursos responsables.

70% Fibra virgen

30% Reciclado

Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en: **LEED, CASA COLOMBIA** y **EDGE.**

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontarlo en el siguente link: **https://empresa.corona.co/sostenibilidad**

corona

LAGUNA

Sanitario redondo de dos piezas

NTC 920-2011
Aparatos Sanitarios de Cerámica

CARACTERÍSTICAS Y ACTUALIZACIONES



· Tecnología de descarga por gravedad:

Potente sistema de descarga caracterizado por botón de accionamiento suave tipo push diseñado para el público en general, una válvula de suministro de agua libre de ajuste y válvula de descarga de fácil mantenimiento y alta duración, tipo torre.


· Válvula de suministro antisifón:

Silenciosa válvula de entrada con sistema hidrostático que no requiere ajuste por cambios de presiones en la línea de suministro.

· Válvula de descarga:

Válvula de descarga de fácil mantenimiento, menor probabilidad de fugas y mayor resistencia a ataques químicos.

PLANOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

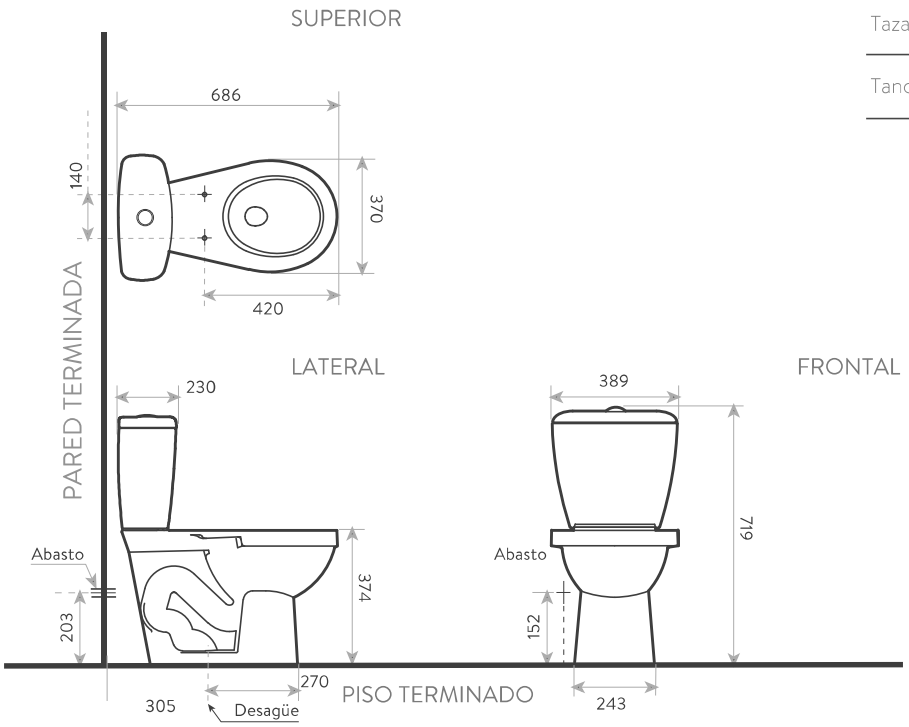

PRODUCTO EMPACADO

Referencia	Dimensiones (H x L x W)	Peso aproximado
Taza	410 x 620 x 395 mm 16,1 x 24,4 x 15,5 pulg	16,5 kg. - 36,4 lb
Tanque	405 x 360 x 225 mm 15,9 x 14,2 x 8,9 pulg	9,6 kg. - 22,2 lb

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEAS DE ATENCIÓN PANAMERICANAS

COLOMBIA: 01 8000 5120 30 / Bogotá **404 88 84**

CENTRO AMÉRICA: Guatemala **(502) 1-800-6240-109 /** Nicaragua **(505) 1-800-2202-304**
El Salvador **(503)-2136-8523 /** Honduras San Pedro Sula **(504) 2558-0529**
Honduras Tegucigalpa **(504) 2221-1203 /** Costa Rica **(506) 4001-4966 /** Panamá **(507) 8000-202**

MÉXICO: Directo **(81) 8125 2000** / LADA sin costo **01 800 705 1020**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

CONSORCIO
SED-DISTRITAL

Anexo No. 4 Bitácora.

Colegio Nuevo Horizonte sede D


2/4/23. Sabado. clima Moderado. Nuboso. /

Actividades.

- Caminata. Coloracion. Composicion Estructural. Area Acceso. Estudiantes.
- Verificacion. Estacionamiento. - Caminata. Especie publico. - Techo. Vigas Sogas. Almacenamiento y Muebles.

Herramienta Mano.

Personal. (1) Maestro. (2) oficiales - (4) Ayudantes.




Ultima Parada
CONSORCIO SED ORIENTAL

3/4/23. Lunes. clima. Moderado.

Actividades


- Excavaciones. Area. de Acceso. a Estudiantes Colegio.

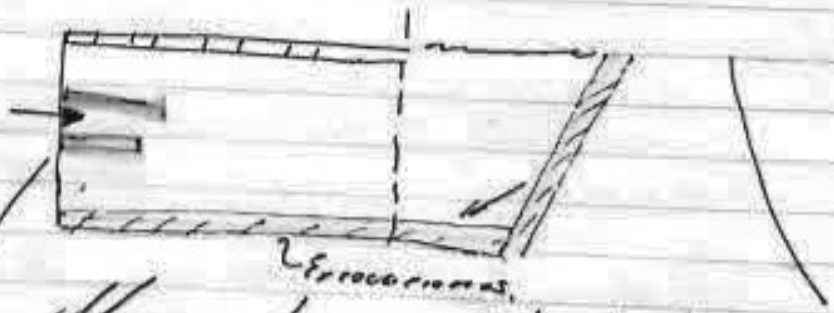

- Coloracion. Composicion Estructural. Acceso. Ingreso Estudiantes.
- Techo. formaleta. Perimetral. Area de Placa de Piso Sostr. pergos.
- Reforzacion. de Almacenes. Vigas.



Verificación. Niveles Continuación Espacio Público. Zonas Verdes.

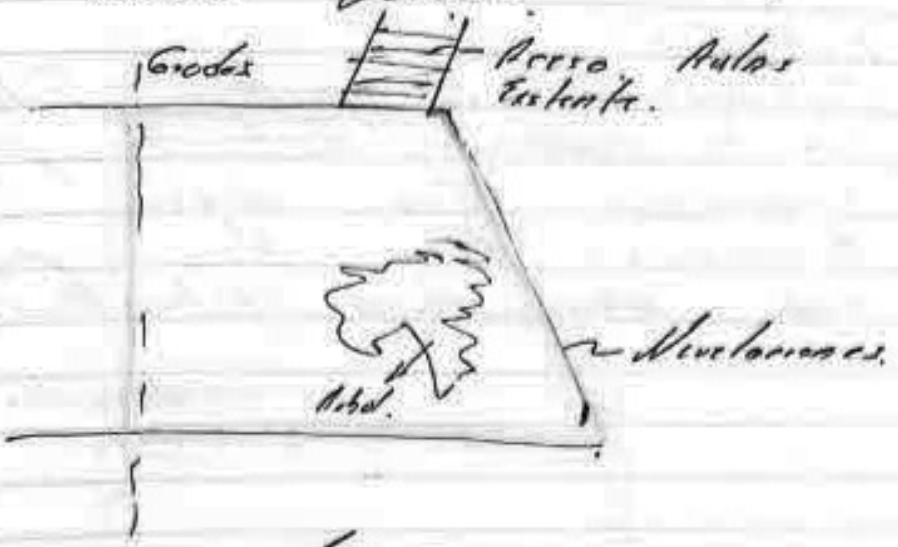

Alumbrado Muro.

Personal. (1) Maestro. (2) ofriales. (2) Ayudantes.


CONSORCIO OBRAS M.6.

Arq. Edwin Zarate
Consorcio Constructor

- Martes. 4/4/23. Clima. Nublado.

Actividades

- Continuación Colocación. Mampostería. Estructural
- Espacio. público. Acceso. Estudiantes.
- Verificación. Area Gradas. - Juegos.
- Niveladores. Pendientes Acceso Area de juego.

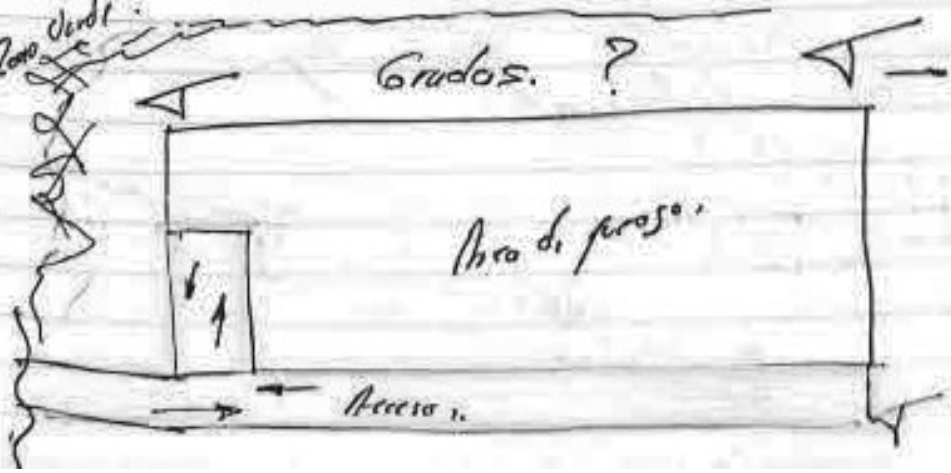


Powered by CamScanner

Miercoles 5/4/23. Tiempo. Nuboso.

1/

Actividades

- Continuacion. Hormigonado Estructural Area de. Gradas. Seccion de pegos.
- Excavaciones. Zapatas. Gradas.
- Excavaciones. Area. Vigas. para conformacion. Hormigonado Estructural.

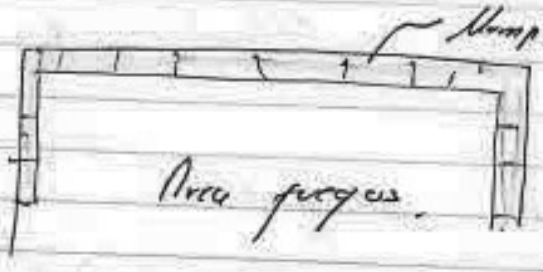

Jueves 6, Viernes 7, Sabado 8, Domingo 9.

Semana Santa.

3/


Consorcio Obras M.6

Arq. Alma Zárate
Consorcio SED Municipal


Lunes. 10/4/23. Clima. Moderado.

Actividades.

- Continuacion. Colocacion Hormigonado. Estructural.
- Area de pegos.
- Colocacion Concreto. Area Vigas. Sector. Acceso de Estudiantes.

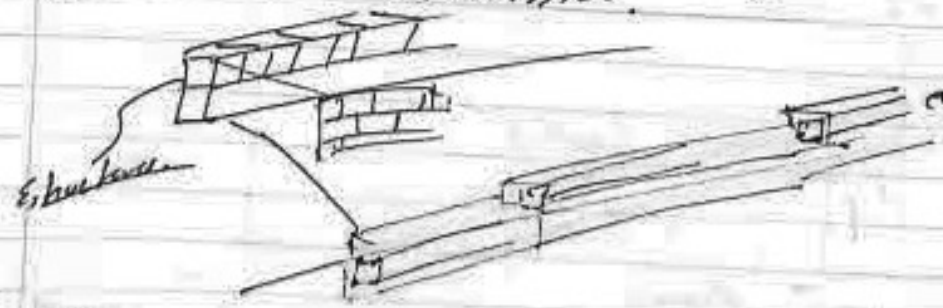

- Continuacion Excavacion Area de pegas. Gradas.



Area pegas.



CONSORCIO OBRAS M.G.

Palma Zarate
CONSORCIO SCD DBB Rtd.

Martes. 11/4/23. Clima. Lluvioso.

Actividades.
- Continuacion. Actividades de Gradas. Area de pegas. Segunda Vaciado. Placa. Superior. y proyeccion de Armadura.
- Continuacion. Excavaciones. y colocacion. de Muestreo. Vigas. Fierro publico. Acceso. Estudiantes.
- Limpieza General.


Movimientos. - Maquinas.
Personal. (1) Maestro. (7) oficiales. (3) Ayud.

Palma Zarate
C SCD DBB Rtd.

Miercoles. 12/4/23. Clima. Templado.

Actividades.

- Cohesivos. Propiedades. Concreto. Placa - Viga Cimientos. Zona de Cargas.
- Cohesivos. Expansivos. Nivel Freático. Poco Elevados. Losetas.

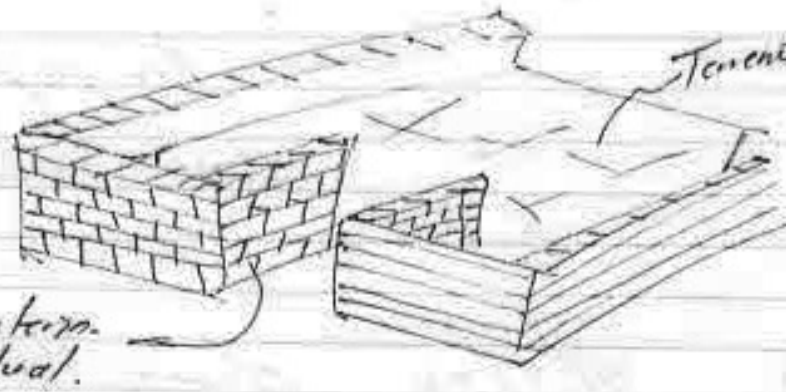

- Arcilla. Natural. Roca y Grava.
- Humedad. - Viga.

Personal. (1) Maestro. (2) Ayudantes (2) Oficiales.

Palma Zárate
C. Seguridad

Viernes. 14/4/23. Clima. Moderado.

Actividades.
- Cohesivos. Colocación. Temperatura. Viga Cimientos. - Zona de Cargas. Segunda. Helado.
- Cohesivos. Colocación. Concreto. Vigas. Por Cohesivos. Suelo. Estructura en Temperatura.
- Resto General.

Herramenta Manual.

Personal. (1) Hierro. (2) Granito (3) Ayudantes.

Palma Zarate
C.S.E.J. Distrital.

. Sabado. 15/4/23. Clima. Nuboso.

- Actividades.
- Continuación Colocación. Mampostería
Estructural. Segunda Hilada.
- Colocación. Mampostería Estructural
Zona Acceso de Estudiante - Cubículo.
Sur. y Norte.
Piso General.

- Herramenta Manual.

Personal. (1) Hierro. (2) Granito (3) Ayud.

Palma Zarate
C.S.E.J. Distrital.

- Lunes. 17/4/23 Clima. Nuboso.
Moderado.

Actividades.
- Continuación colocación. Mampostería y
Tratamiento. Granito. piso Planta.
Superior. Gradas.


Armadura de Losa.



Powered by CamScanner

- Construcción. Estructuras. Área. Acceso. Pabellón. Patio. Superficie. Acceso. Cerdos y Corrales Existentes.

Pabellón

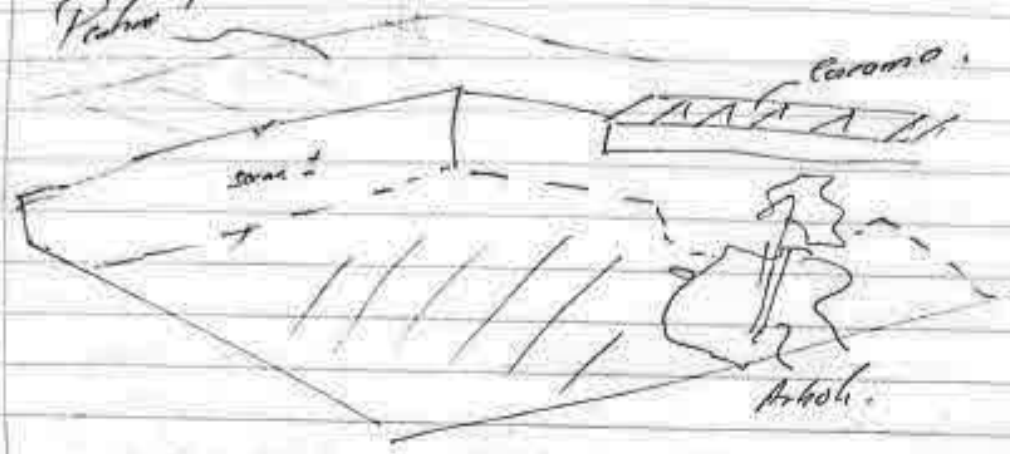

- Funcionamiento Menor.

Personal- (1) Marsha (2) ofrecidos, (3) Apoderados.

~~X~~ Wilma Zarate
(Sed Distrital.


- Martes. 18/4/23. Lima Mallorado.

Actividades.


- Construcción. colocación Concreto. Área. Cerdos. Zona de juegos.



- Pre Práctica. Muestra. Colocación. de Asistencia. Salida. Laboratorio.

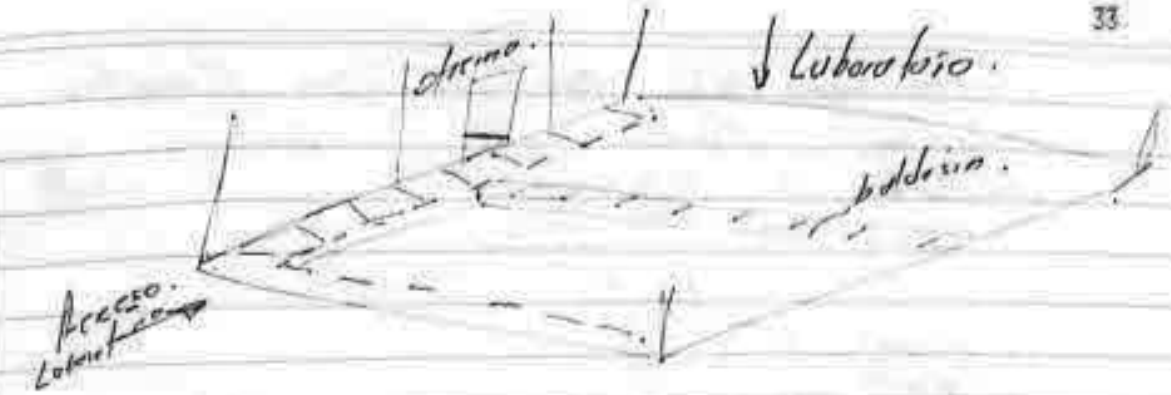

- Inicio. Colocacion. Estructura. Metalica Nave. Prefabricada. - Columnas. y Vigas.

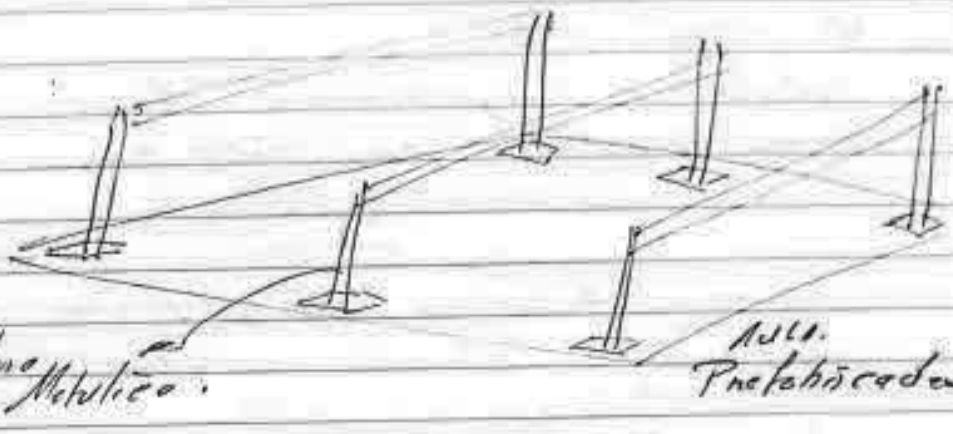


Humanicate - Menor. - Equipos Soldadores.
Personal. (1) Maestro. (1) Ayudante (4) Ayudantes. Estructura. (2) Gruas. (3) Colaboradores.

Palma Zarate
CSED. DSSI/TZL.


. Miercoles. 19/4/23.

Actividades.
- Concreto - Area. Acero. Encofrado. Grados. Tercero (3) Actividades.
- Excavacion. Mic Acero. Estabilizantes. Suelo. Zona Verde.

- Contratista. Cia Constructora. Estructura Metalica. Aula II. - Columnas. Vigas. (2) Cimientos.

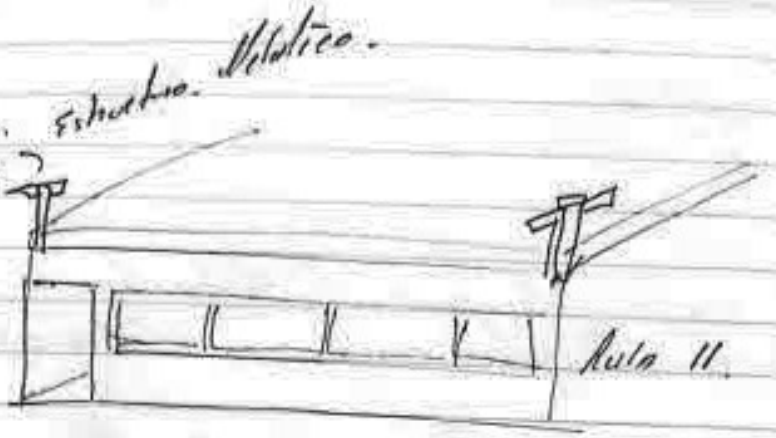

Rellenos y Compactaciones Area. Acceso. Estacionamiento. Zona Verde. para Colocacion Losetas.



Herramienta - Menor. Equipos Soldadoras.

Personal (1) Maestro (2) ofic. (3) Ayudantes. (1) Cuadrillas. - (3) Colaboradores.

Victima Zárate
C. Sec Desarrollo.

- Viernes. 20/4/23.

Personal en obra: 1 maestro . 2 oficiales . 3 ayudantes - 1 Inspector SST . 1 Inspector de obra . 1 Residente

✓ Herramienta menor. compactadora

✓ ACTIVIDADES : DÍA SOLEADO

- CONFORMACION DE GRADAS UBICADAS EN LA ZONA DE JUEGOS, EXCAVADO DE RECEGO 3600 Y COMPACTA. CON DE MANERA MECANICA.

- CONFORMACION DE PLACA DE CONTRAPISO EN GRADA N-1, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA Y ENCOFRADO

- ACONDICIONAMIENTO DE TIERRA NEGRA EN ZONA VERDE

Yelma Zarate
C. SEGURIDAD.
JUEVES 21/04/2023

Consorcio Obras MG

✓ PERSONAL EN OBRA :

- 1 MAESTRO - 2 OFICIALES - 3 AYUDANTES - 1 INSPECTOR SST - 1 INSPECTOR SST - 1 INSPECTOR DE OBRA - 4 INSTALADORES DE ESTRUCTURA METALICA

✓ - HERRAMIENTA MENOR - EQUIPO SOLDADURA - PULIDORA

✓ ACTIVIDADES: DÍA SOLEADO

- VACIADO DE CONCRETO A GRADA N-1 DE LA ZONA DE JUEGOS

- INSTALACION DE TUBERIA PVC 4" EN SECTORES PARA CAJAS

- INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN AULA PREFABRICADA

Consorcio Obras MG

Yelma Zarate
C. SEGURIDAD

SÁBADO 22/04/2023

✓ PERSONAL EN OBRA

- 1 MAESTRO - 2 OFICIALES - 3 AYUDANTES - 1 INSPECTOR SST

✓ HERRAMIENTA MENOR - EQUIPO DE SOLDADURA - PULIDORA - COMPACTADORA

✓ ACTIVIDADES: DÍA CON PRESENCIA DE LLUVIAS

- CONTINÚA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN AULA PREFABRICADA Y AULA N° 11

- INSTALACIÓN DE PISO ALFA 20x20 EN LABORATORIO DE QUÍMICA.

- RELLENO Y COMPACTACIÓN EN SANITARIOS.

Palma Zarate
R.S.S.T. Residente

Cristian Ortiz MG

LUNES 24/04/2023

✓ PERSONAL EN OBRA

- 1 MAESTRO - 2 OFICIALES - 3 AYUDANTES - 1 INSPECTOR SST - 4 INSTALADORES ESTRUCTURA METÁLICA

✓ HERRAMIENTA MENOR - PULIDORA - EQUIPO SOLDADURA - COMPACTADORA

Powered by CamScanner

✓ ACTIVIDADES DIA SOLEADO

- CONTINUA INSTALACION DE PISO ALFA 30x30 EN LABORATORIO DE QUIMICA

- INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA A CUBIERTA AULA N:- 11.

- APLICACION DE PINTURA EN ESMALTE 3 EN 1 COLOR GRIS PUNTA A ESTRUCTURA DEL AULA PREFABRICADA.

- CONFORMACION A GRADA N:- 2 CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE JUEGOS, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA Y ENCOFRADO METALICO.

- RELLENO Y COMPACTACION DE PISO EN SANITARIOS.

Yelma Zarate
C. SEG. DISCAPACIDAD

Ing. CARLOS OSCAR MG

MARTES 25/04/2023

✓ PERSONAL EN OBRA

- 1 MAESTRO - 2 OFICIALES - 3 AYUDANTES
- 1 INSPECTOR SST - 1 SUPERVISOR DE OBRA - 4 INSTALADORES ESTRUCTURA METALICA

✓ HERRAMIENTA MENOR - PULIDORA - COMPACTADOR - MAQUINA DE SOLDAR

✓ ACTIVIDADES DIA CON PRESENCIA DE LLUVIAS.

- CONTINUA INSTALACIÓN PISO ALFA 30x30 EN LABORATORIO DE QUÍMICA

- EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE SONDEO

- CONTINÚA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA A CUBIERTA DEL AULA II

- CONTINÚA ADECUACIÓN DE GRADAS DE LA ZONA JUEGO

- RELLENO CON RECEBO B100 PARA SOLADOS Y COMPACTACIÓN

- CONTINÚA INSTALACIÓN PISO ALFA DE 30x30 EN LABORATORIO.

Palma Sarela
C.C. [illegible]

[illegible] OSMAR MG

Miércoles 26/04/2023

✓ PERSONAL EN OBRA

✓ 1 MAESTRO 1 OFICIAL 3 AYUDANTES
1 INSPECTOR SST 1 INSPECTOR DE OBRAS
4 INSTALADORES DE ESTRUCTURA

✓ HERRAMIENTA MENOR - PALUSTRA - EQUIPO DE SOLDADURA - COMPACTADORA

✓ ACTIVIDADES: TRABAJO CON PRESENCIA DE LLUVIAS

- Se Recibe 14 m^3 De Recebo Sub Para Rellenos

- Conformación De Senderos Peatonales con Recebo Sub.

- Continúa Instalación De Piso Alfa en Laboratorio

- Construcción De Muros De Mampostería en Ladrillo estructural

Plumas Serrato
C. Sed. Distrital

Consorcio Obras MG

Jueves 27/04/2023

Día Soleado

✓ Personal en obra

- 1 Maestro 3 Oficiales - 2 Ayudantes
1 Inspector SST - 1 Residente de Obra - 1 Residente de Obra

✓ Herramienta menor - Pulidora - Equipo de soldadura - Compactadora

- Excavación manual para conformación de Senderos

- Vaciado de concreto en Graderías de Zona de Juegos

- Colocación De Piso Alfa 30x30 en Laboratorio De Química

- Encofrados De Viga Canal para Muros De Mampostería

Consorcio Obras MG
C. Sed. Distrital

Viernes 28/04/2023

✓ Personal en obra

- 1 maestro - 2 oficiales - 1 ayudante
- 1 inspector SST - 1 inspector de obra

✓ Herramienta menor - Pulidora - completado

✓ Actividades - Día con presencia de lluvias

- Relleno y compactación de recebo base en sardineles

- Vaciado de concreto para vigas cimas de muros de contención.

- excavación manual para sardineles

- Se reciben 90 sacos de concreto gris x50 kg

Firma Zorayda
C. Seguridad.
Sábado 29/04/2023

Cristian Ortiz MG

✓ Personal en obra

- 1 maestro 1 ayudante 3 oficiales
- 1 inspector SST

✓ Herramienta menor - Pulidora

✓ Actividades

- Aseo general en obra

Días con presencia de lluvias

Cristian Ortiz MG

Norma

Powered by CamScanner

LUNES 01/05/2023 FESTIVO
MARTES 02/05/2023 DIA SOLEADO

✓ PERSONAL EN OBRA

1 MAESTRO 3 OFICIALES 1 AYUDANTE
1 INSPECTOR SST 1 INSPECTOR DE OBRA

✓ HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
- HERRAMIENTA MENOR - PULIDORA - TALADRO

✓ ACTIVIDADES:

- INSTALACIÓN DE ADOQUIN DE 20cm x 20cm EN PLATAFORMA BAJA

- RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SOBRANTE, PARTE BAJA

- RELLENO CON RECEBO B600 EN SOBRANTES Y PLATAFORMAS CENTRALES

MIERCOLES 03/05/2023

✓ PERSONAL EN OBRA

1 MAESTRO 3 OFICIALES 2 AYUDANTES

✓ HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

- PULIDORA - HERRAMIENTA MENOR

✓ ACTIVIDADES EN OBRA

- VACIADO DE CONCRETO EN VIGAS CANALES PARA MUROS

Powered by CamScanner
