GRIFERÍAS **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

LAVAMANOS PUSH

Grifería Lavamanos Mesa Push Ref. 947120001

Las griferías de lavamanos Corona son el aliado perfecto para las necesidades de las instituciones de alto tráfico, están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas

- Grifería de Lavamanos tipo push antivandálica
- Consumo de agua desde 0.45 L hasta 1.9 L de acuerdo al cartucho.
- Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos.
- Graduación de caudal por facilidad de las 7 posiciones que trae el cartucho.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Productos para uso institucional de alto tráfico.

PRESIÓN DE SERVICIO


· Presión mínima: 20 psi.
· Presión de trabajo: 20 - 80 Psi.
· Presión máxima: 80 Psi.
· Flujo max @80psi: 9,68 L/min - 0,49 L/Descarga.
· Flujo reaL (L/min): 6,5 - 9,68 L/min - 0,33 - 0,49 L/Descarga.
· Ciclo de Vida y Desempeño de la descarga: 150,000 ciclos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


· Material:
Cuerpo: Latón acabado cromo.
Boton: Latón con recubrimiento de cromo.
Escudo y Portaescudo: latón con recubrimiento de cromo.
· Peso Neto: 640gr. / 1,41Lb.
· Peso Bruto: 720gr. / 1,59Lb.
· Diametro de tubería entrada: 1/2" NPT.

PLANOS TÉCNICOS

LATERAL

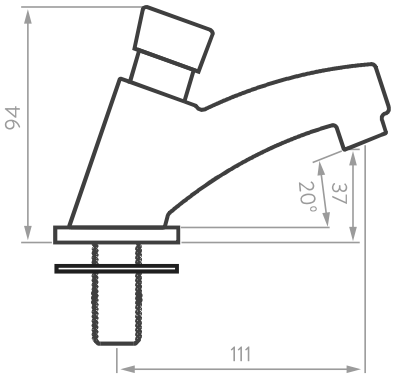

FRONTAL



Unidades: mm.
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Cromado

SERVICIO TÉCNICO
CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES
AHORRO DE AGUA
2 AÑOS DE GARANTÍA DEL ACABADO
3 AÑOS DE GARANTÍA DE PRODUCTO

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD NTC 1644

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.** co

corona

LAVAMANOS PUSH


Grifería Lavamanos Mesa Push

DIAGRAMA DE CAUDAL

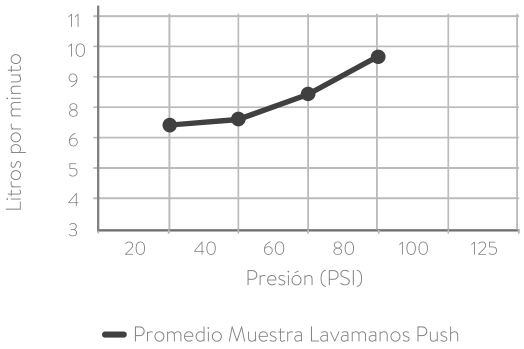

Los valores dados en esta gráfica son promedios tomados en fabrica. Los caudales pueden variar según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica.

Grafica de consumo lavamanos sensor (ciclo de 10 segundos)

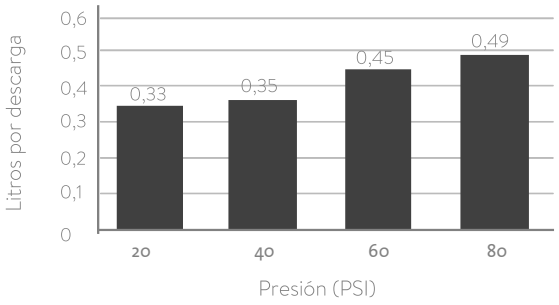

	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
REQUISITO DE NORMA: NTC 1644	20-80	6,35-9,68	Máx/Mín

	PRESIÓN (psi)	PROM. MUESTRA (Regadera)
REQUISITO DE NORMA: NTC No. 1644	20	6,35
	40	6,72
	60	8,30
	80	9,68

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

CURVA DE CAUDAL

Los valores indicados en gráfica corresponden a caudales promedios calculados en la posición 2 del cartucho (Ver hoja de instruccion), estas tomadas como referencias máximas y mínimas.
Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica..

REPUESTOS

- **Ref. O21121111** "Cartucho Push".
- **Ref. O21081111** "Empaques O-ring Cratucho Push".
- **Ref. O22071111** "Llave Boca Fija Institucional".

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. www.corona.com.co/web/Files/Uploads/Corona/Home/Informe-Sostenibilidad-2012/
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

LAVAMANOS **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

AQUAJET

Lavamanos de colgar Ref. O12911001

Lavamanos de colgar en porcelana , ideal para instituciones que requieren facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

- Diseño ergonómico con frente cóncavo.
- Tecnología AquaFlow, superficie homogénea que impide la acumulación de agua y residuos.
- Tecnología CoverGloss, alta resistencia al rayado y/o cambios de temperatura.
- Cumple requerimientos ADA, apto para personas con movilidad reducida cuando se instala correctamente según recomendaciones de CORONA.
- Requiere brazos para su instalación y cumplimiento según tipo de infra-estructura drywall y/o concreto.




INFORMACIÓN TÉCNICA

· Material	Porcelana Vitrificada.
· Dimensiones Generales	22" x 19 7/8" (56 cm x 50.5 cm).
· Dimensiones del pozo	14 1/8" x 12 3/8" (36 cm x 31.5 cm).
· Agujeros para griferia	1 3/8" (3.5 cm).
· Dimensiones del producto empacado	22 5/8" x 6 1/2" x 20 1/4" (57.5 cm x 16.5 cm x 51.5 cm).
· Peso del producto empacado	31.5 lbs (14.3kg).
· Garantía	Garantía Integral de por vida.

Accesorios Complementarios	
718030001	Brazos Lavamanos Free para mamposterías (concreto, ladrillo).
718040001	Brazos Lavamanos Free para drywall o madera. (muros livianos en madera o drywall).

* se vende por separado.

PLANOS TÉCNICOS

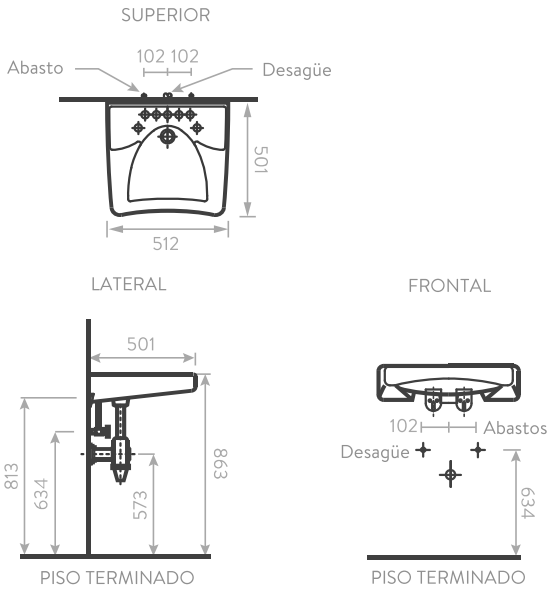

Unidades: mm. **Unidades:** milímetros

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Blanco

SERVICIO POST VENTA · GARANTÍA INTEGRAL · MOVILIDAD REDUCIDA

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.**co

AQUAJET
Lavamanos de colgar

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

Referencia	Descripción
01291	Lavamanos de colgar de 22" x 19 7/8" (56 cm x 50.5 cm), disponible con agujeros insinuados. Cumple con los requerimientos ADA.

Productos Compatibles	
Mx1010001	Lvm push mesa max plus.
Mx1020001	Lvm mesa push max.
Ec1010001	Lvm electrónico eco power.
St1030001	Gf lvm inst de sensor dolphin.
Ec1020001	Gf lvm inst electrónica eco smart.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona

LAVAMANOS **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

AQUAJET

Lavamanos de colgar Ref. O12911001

Lavamanos de colgar en porcelana , ideal para instituciones que requieren facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

- Diseño ergonómico con frente cóncavo.
- Tecnología AquaFlow, superficie homogénea que impide la acumulación de agua y residuos.
- Tecnología CoverGloss, alta resistencia al rayado y/o cambios de temperatura.
- Cumple requerimientos ADA, apto para personas con movilidad reducida cuando se instala correctamente según recomendaciones de CORONA.
- Requiere brazos para su instalación y cumplimiento según tipo de infra-estructura drywall y/o concreto.




INFORMACIÓN TÉCNICA

· Material	Porcelana Vitrificada.
· Dimensiones Generales	22" x 19 7/8" (56 cm x 50.5 cm).
· Dimensiones del pozo	14 1/8" x 12 3/8" (36 cm x 31.5 cm).
· Agujeros para griferia	1 3/8" (3.5 cm).
· Dimensiones del producto empacado	22 5/8" x 6 1/2" x 20 1/4" (57.5 cm x 16.5 cm x 51.5 cm).
· Peso del producto empacado	31.5 lbs (14.3kg).
· Garantía	Garantía Integral de por vida.

Accesorios Complementarios	
718030001	Brazos Lavamanos Free para mamposterías (concreto, ladrillo).
718040001	Brazos Lavamanos Free para drywall o madera. (muros livianos en madera o drywall).

* se vende por separado.

PLANOS TÉCNICOS

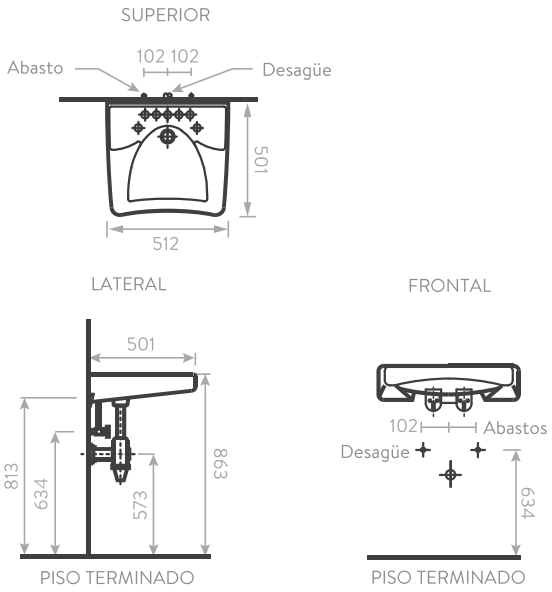

Unidades: mm. **Unidades:** milímetros

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Blanco

SERVICIO POST VENTA · GARANTÍA INTEGRAL · MOVILIDAD REDUCIDA

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.**co

AQUAJET
Lavamanos de colgar

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

Referencia	Descripción
01291	Lavamanos de colgar de 22" x 19 7/8" (56 cm x 50.5 cm), disponible con agujeros insinuados. Cumple con los requerimientos ADA.

Productos Compatibles	
Mx1010001	Lvm push mesa max plus.
Mx1020001	Lvm mesa push max.
Ec1010001	Lvm electrónico eco power.
St1030001	Gf lvm inst de sensor dolphin.
Ec1020001	Gf lvm inst electrónica eco smart.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona

BAÑOS **CORONA** | **SANITARIOS**

LAGUNA

Sanitario redondo de dos piezas

Descarga sencilla de botón tipo push



- **Consumo de agua 4.8 Lpf. - 1.28 gpf**
- Capacidad de evacuación de sólidos 250gr.
- Válvula de suministro de agua hidrostática antisifón
- Altura tradicional de taza para uso familiar
- Tanque compacto y moderno que optimiza el espacio del baño
- Sifón 100% esmaltado de mayor diámetro que optimiza el funcionamiento y mantiene limpio el sanitario

SERVICIO POST VENTA

GARANTÍA INTEGRAL

5 AÑOS DE GARANTÍA (grifería)

AHORRO DE AGUA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Porcelana Vítrea
Dimensiones Generales (H x L x W)	719 x 686 x 370 mm 28,3 x 27 x 14,8 pulg
Presión de agua	20 - 80 PSI
Sistema de descarga	Por gravedad - anillo abierto
Espejo de agua	185 x 213 mm. - 7,3 x 8,4 pulg
Altura de sello	58 mm. - 2,3 pulg
Peso Neto aprox.	24,6 kg. - 54,2 lbs
Peso Bruto aprox.	26,1 kg. - 57,5 lbs

*El asiento sanitario CONFORTO blanco ref. 909000001 viene incluido

IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraidos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	% aprox.	Extr. / Fabr.
Pasta cerámica: 93,5% peso aproximado producto.		
Arcillas Arcabuco (Boyacá)		Extraído
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído
Caolín (La Unión - Antioquia)	89,5%	Extraído
Feldespato (Ibagué - Tolima)		Extraído
Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid)		Fabricado
Caolín (EE.UU, Portugal, Inglaterra)	4%	Extraído
Arcillas Finas (Inglaterra)		
Esmalte Vidriado: 6,5% peso aproximado producto.		
Esmalte (Sabaneta - Antioquia)	6,5%	Fabricado

INSTALACIÓN

Para instalación tradicional de **305 mm. - 12 pulg.** de la pared terminada.

COMPONENTES

Referencia	Descripción	Peso arpoximado
340021001	Sanitario Laguna 4,8 de dos piezas	26,1 kg. - 57,5 lb
03007___1	Taza Acuacer 4,8	16,5 kg. - 36,4 lb
034031001	Tanque, tapa y grifería Laguna 4,8	9,3 kg. - 20,5 lb
03500___5	Tapa Laguna	1,6 kg. - 3,5 lb
909000001	Asiento sanitario redondo CONFORTO Blanco	730 gr. - 1,6 lb

COLORES

100 Blanco	Ref. 340211031
103 Bone	Ref. 340021031
111 Azul cielo	Ref. 340021111
141 Verde claro	Ref. 340021141

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.

12% Planta Girardota (Antioquia - Col.)

17% Planta Madrid (Cundinamarca - Col.)

MATERIAL EMPAQUE

FSC: Papel proveniente de recursos responsables.

70% Fibra virgen

30% Reciclado

Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en: **LEED, CASA COLOMBIA** y **EDGE.**

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontarlo en el siguente link: **https://empresa.corona.co/sostenibilidad**

corona

LAGUNA

Sanitario redondo de dos piezas

NTC 920-2011
Aparatos Sanitarios de Cerámica

CARACTERÍSTICAS Y ACTUALIZACIONES



· Tecnología de descarga por gravedad:

Potente sistema de descarga caracterizado por botón de accionamiento suave tipo push diseñado para el público en general, una válvula de suministro de agua libre de ajuste y válvula de descarga de fácil mantenimiento y alta duración, tipo torre.


· Válvula de suministro antisifón:

Silenciosa válvula de entrada con sistema hidrostático que no requiere ajuste por cambios de presiones en la línea de suministro.

· Válvula de descarga:

Válvula de descarga de fácil mantenimiento, menor probabilidad de fugas y mayor resistencia a ataques químicos.

PLANOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

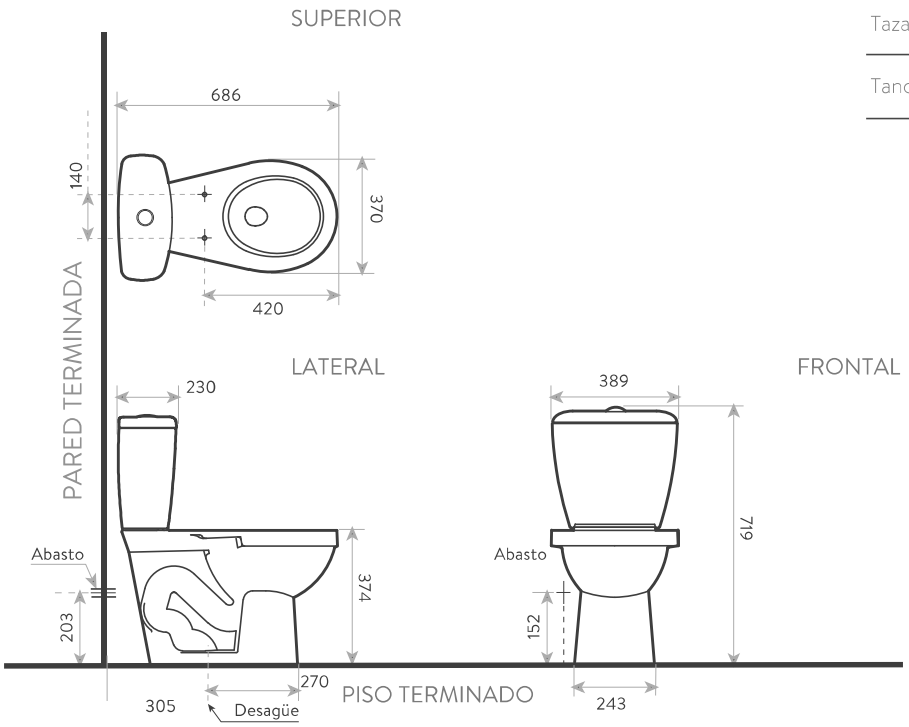

PRODUCTO EMPACADO

Referencia	Dimensiones (H x L x W)	Peso aproximado
Taza	410 x 620 x 395 mm 16,1 x 24,4 x 15,5 pulg	16,5 kg. - 36,4 lb
Tanque	405 x 360 x 225 mm 15,9 x 14,2 x 8,9 pulg	9,6 kg. - 22,2 lb

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEAS DE ATENCIÓN PANAMERICANAS

COLOMBIA: 01 8000 5120 30 / Bogotá **404 88 84**

CENTRO AMÉRICA: Guatemala **(502) 1-800-6240-109 /** Nicaragua **(505) 1-800-2202-304**
El Salvador **(503)-2136-8523 /** Honduras San Pedro Sula **(504) 2558-0529**
Honduras Tegucigalpa **(504) 2221-1203 /** Costa Rica **(506) 4001-4966 /** Panamá **(507) 8000-202**

MÉXICO: Directo **(81) 8125 2000** / LADA sin costo **01 800 705 1020**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

Anexo No. 4 Bitácora.

Colegio Nuevo Horizonte sede D

✓ ACTIVIDADES

- VACIADO DE VIGAS SOBRE PARA MUROS DE ACCESO AL AULA PREFABRICADA
- COMPACTACION DE SUELO SEGUNDO NIVEL PREFABRICADA

CONSORCIO OBRAS M.G. RESIDENTE

JUEVES 30/06/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES 4 AYUDANTES
1 INSP. SST

✓ ACTIVIDADES
- PREPARACION A EXCAVACIONES DE ESCALERAS
- EXCAVACION PARA SEGUNDO PISO
- CONSTRUCCION DE MURO PARA CONFINAR SEGUNDO PISO PARTE ALTA AULA PREFABRICADA.

CONSORCIO OBRAS M.G. RESIDENTE

SABADO 01/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES 4 AYUDANTES
1 INSP SST 1 INSP DE OBRA

✓ ACTIVIDADES
- REPLANTEO DE SEGUNDO PISO PARTE BAJA
- EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE AMARRE PARA MUROS.
- ASEO GENERAL DE OBRA

CONSORCIO OBRAS M.G. RESIDENTE

Powered by CamScanner

MARTES 04/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
- 2 OFICIALES 6 AYUDANTES
- 1 INSP SST 1 INSP OBRA

✓ ACTIVIDADES
- DESMONTE DE VENTANAS MODULO DE AULA II
- RECTIFICAR FILOS VENTANAS AULA II
- ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DEL SEGUNDO PISO
- INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE LABORATORIO
- CONFORMACION DE SEGUNDO AULA PREFABRICADA.

RESIDENTE.

CONTRATISTA OBRAS M.C.

MIERCOLES. 05/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
- 2 OFICIALES 6 AYUDANTES 2 INSTALADORES
1 INSP DE OBRA 1 INSP SST

✓ ACTIVIDADES
- ACONDICIONAMIENTO DE FILOS PARA VENTANAS DEL AULA II
- INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION DE MUROS
- APLICACION DE PINTURA PARA EXTERIORES DEL AULA II
- APLICACION DE PINTURA PARA INTERIORES DEL AULA II
- INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DEL LABORATORIO

RESIDENTE.

CONTRATISTA OBRAS M.C.

JUEVES, 06/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES 6 AYUDANTES 2 INSTALADORES
1 RESIDENTE DE OBRA 1 INSP SST 1 INSP DE OBRA

✓ ACTIVIDADES
- PUNTO INTENSION LABORATORIO
- DEMOLICION ENCHAPE LABORATORIO
- CONTINUA INSTALACION DE PERFILES PARA FIJACION DE MUROS.
- INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH A LABORATORIO
- APLICACION PINTURA MODULO DE 11

CONSORCIO OBRAS N.6

VIERNES. 07/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
- 2 OFICIALES 8 AYUDANTES 2 INSTALADORES
1 INSP SST

✓ ACTIVIDADES
- PICADO DE CONCRETO REMEZCLADO A ESCALERA DE ACCESO AL AULA PRETRANSMISION
- LAVADO DE MUROS DE KIOSCOS
- INSTALACION DE PERFILES METALICOS PARA FIJACION DE MUROS.
- PICADO DE CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO DEL SALON NUEVO

CONSORCIO OBRAS N.6

SABADO. 08/07/2023
✓ PERSONAL EN OBRA
- 1 OFICIAL 4 AYUDANTES 2 INSTALADORES

✓ Actividades:

- Desencofrado de vigas
- Aseo general en obra.
- Instalacion de estructura base cubierta de lamina.

consorcio obras M.G.

Residente.

Lunes, 10/07/2023

✓ Personal en obra
✓ 2 oficiales 5 ayudantes 2 instaladores
1 insp. de obra 1 insp SST

✓ Actividades
- Inicia Destroncado del piso aula 11
- Relleno con Recebo B600, segundo parte baja
- Aplicacion pintura Koraza fachadas de Kioscos
- Lavado de manos a la vista

Residente. consorcio obras M.G

Martes, 11/07/2023

✓ Personal en obra
2 oficiales 5 ayudantes 2 instaladores
1 insp. de obra 1 insp. SST

✓ Actividades
- Aplicacion de pintura al aula 11 (interior)
- Continua el Destroncado Piso Aula 11
- Relleno y compactacion de Recebo B600 Segundo
- Instalacion de cubierta tipo sandwich Lasonatado

consorcio obras M.G.

Residente.

MARTES MIERCOLES, 12/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES 5 AYUDANTES 2 INSTALADORES
1 RESP SST

✓ ACTIVIDADES
- APLICACION DE PINTURA 3 en 1 CASA GRIS PLATA A PERFILES PARA FIJACION DE MUROS DE MUROS DEL AULA PREFABRICADA
- INSTALACION DE VEREDA SENTIDO PORTE BAJA
- PULIDO DE PISO AULA 11
- INSTALACION DE TEJA TRASLUCIDA AULA 11

CONSORCIO OBRAS M.G.

JUEVES 13/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES 5 AYUDANTES 2 INSTALADORES
1 RESIDENTE DE OBRA 1 RESP. DE OBRA

✓ ACTIVIDADES
- CONTINUA PULIDO DE PISO AULA 11
- INSTALACION DE VENTANERIA (AULA LL - PREFABRICADA)
- RELLENO Y COMPACTACION DE RECREO DOBLE SENTIDO PORTE BAJA
- SE RECIBEN 05 PUERTAS
  * RECICLAJES 01
  * AULA 11 01
  * AULA PREFABRICADA 01
  * LABORATORIO 02

05 UND

CONSORCIO OBRAS M.G.

Viernes, 14/07/2023

✓ Personal en obra
2 Oficiales 5 Ayudantes 4 instaladores
1 Insp de obra 1 Insp SST

✓ Actividades
- Instalación de loseta, sendero parte baja
- Bancas cantera Veintiocheña
- Instalación de puertas Aula 11 (ajuste)
- Aplicación de pintura color blanco intención Aula 11
- Instalación de remates y flaveles Aula 11

Contratista obra M.C.

Sábado, 15/07/2023

✓ Personal en obra
- 2 Oficiales 5 Ayudantes 2 instaladores
1 Insp de obra 1 Insp SST

✓ Actividades
- Pintura intención color blanco laboratorio
- Instalación de loseta sendero parte baja
- Pintura madera kiosco
- Pintura en esmalte 3 en 1 color gris plata a estructura aula prefabricada
- Llega estructura zona de juegos

Contratista obra M.C.

LUNES 17/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES 5 AYUDANTES 2 INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES
- INSTALACION DE ESTRUCTURA A ZONA DE JUEGOS
- INSTALACION DE LOSETA PARTE BAJA
- APLICACION DE PINTURA KONAZA EXTERIORES
- APLICACION DE PINTURA 3 EN 1 ESTRUCTURA AULA PREFABRICADA

CONSERVACIÓN OBRAS M.C.

MARTES 18/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES 5 AYUDANTES 4 INSTALADORES
1 INSP SST

✓ ACTIVIDADES
- CONTINUA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA ZONA DE JUEGOS
- CONSTRUCCION DE MURO PARA JARDINERA SENDERO BAJO
- RESANES DE PUENTES VARIOS DE PUENTES
- INSTALACION DE LOSETAS SENDERO PARTE BAJA

CONSERVACIÓN OBRAS M.C.

MIERCOLES 19/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES 5 AYUDANTES 2 INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES
- INSTALACION DE LOSETA SENDERO PARTE BAJA
- CONTINUÍA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA ZONA DE JUEGOS
- PINTURA KONAZA KIOSCOS

Norma

Powered by CamScanner

. Jueves 20/07/2023

✓ Personal en obra
. 2 oficiales 5 ayudantes 2 instaladores

✓ Actividades
- Instalacion de guardaescoba en granito en aulo 11
- Instalacion de estructura metalica zona de juegos
- Instalacion de loseta sandino parte baja
- Lavado de muros a lavista
- Pintura 3 en 1 color gris plata a estructura zona de juegos

Residente.

Contratista Obra M.G

Jueves 21/07/2023

✓ Personal en obra
2 oficiales 5 ayudantes 2 instaladores

✓ Actividades
- Continua instalacion de loseta sandino parte baja
- Instalacion de estructura metalica zona de juegos
- Instalacion de canales zona de juegos aguas lluvias
- Instalacion de cubierta ecoroof color blanco zona de juegos

Residente.

Contratista Obra M.G

SABADO 22/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES 4 AYUDANTES 2 INSTALADORES
1 INSP DE OBRA 1 INSP SST

✓ ACTIVIDADES
- REMATES Y ASEO AULA 11
- INSTALACION DE LOSETA SOBRE PARTE BAJA
- INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA ZONA DE JUEGOS
- INSTALACION CUBIERTA ECOROOF COLOR BLANCO ZONA DE JUEGOS

CONSORCIO OBRAS M.G.

CSED DRISTRIL.

LUNES 24/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL 5 AYUDANTES 2 INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES
- ENLUCIDA DE VIGAS CINTAS EN MUROS SOBRE PARTE BAJA
- APLICACION DE PINTURA 3EAL 1 COLOR GRIS PLATA ESTRUCTURA ZONA DE JUEGOS
- INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF ZONA DE JUEGOS

CONSORCIO OBRAS M.G.

CSED DRISTRIL.

MARTES 25/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES 4 AYUDANTES 2 INSTALADORES
2 ELECTRICISTAS

✓ ACTIVIDADES
- INSTALACION DE LOSETA SOBRE PARTE BAJA
- APLICACION DE PINTURA 3 EAL COLOR GRIS PLATA
- A ESTRUCTURA METALICA ZONA DE JUEGOS

- INSTALACION CUBIERTA ECOROOF A ZONA DE JUEGOS
- INYECTAN INSTALACIONES ELECTRICAS AULA II
- INICIAN REMATES URBANISMO AULA PREFABRICADA

Consorcio obras M.C.
Miercoles 26/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES 5 AYUDANTES 2 INSTALADORES
2 ELECTRICISTAS 1 INSP DE OBRAS

✓ ACTIVIDADES
- CONTINÚA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN AULA II.
- INSTALACIONES AULA PREFABRICADA REMATES URBANISMO.
- INSTALACION DE CANALETAS AGUAS LLUVIAS ZONA DE JUEGOS
- INSTACION DE CUBIERTA ECOROOF ZONA DE JUEGOS
- REMATES DE SEGUNDO PONTE BAJO

Consorcio obras M.C
JUEVES 27/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES 5 AYUDANTES 2 INSTALADORES
2 ELECTRICISTAS 1 INSP SST

✓ ACTIVIDADES
- PONER MURO PARA NIVELAR MURO DE LABORATORIO
- INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF ZONA DE JUEGOS
- REMATE URBANISMO AULA PREFABRICADA

consorcio obras M.C

VIERNES 28/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
- 2 OFICIALES 4 AYUDANTES 2 INSTALADORES
- 1 RESIDENTE DE OBRA 1 INSP DE OBRA
- 1 INSP SST

✓ ACTIVIDADES
- INSTALACION DE CUBIERTA ECONOOF ZONA DE JUEGOS
- REMATES A CUBIERTA LABORATORIO
- LAVADO DE MANOS A LA VISTA
- INSTALACION DE LAMPARAS AULA 11
- PINTURA 3 EN 1 GRIS PLATA A ESTRUCTURA ZONA DE JUEGOS

CONSORCIO OBRAS M.C.

SABADO, 29/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES 4 AYUDANTES 2 INSTALADORES
1 RESIDENTE DE OBRA 1 INSP. DE OBRAS

✓ ACTIVIDADES
- INSTALANDO EN CUBIERTA ECONOOF ZONA DE JUEGOS
- PINTURA 3 EN 1 ESTRUCTURA METALICA ZONA DE JUEGOS
- LAVADO DE MANOS A LA VISTA
- REMATES DE PINTURA DE PISOS LABORATORIO

MARTES, 01/08/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
✓ 2 OFICIALES 5 AYUDANTES 2 INSTALADORES
1 INSP DE OBRA 1 INSP SST

Powered by CamScanner

✓ ACTIVIDADES

- LAVADO DE MUROS A LA VISTA
- INSTALACION DE REMATES A CUBIERTA ECOTECHO
- ZONA DE JUEGOS
- LAVADO DE CARCAMO INGRESO A LABORATORIO
- REMATES DE PINTURA 3 EN 1 A ESTRUCTURA
- ZONA DE JUEGOS

CONSORCIO OBRAS M.G.

MIERCOLES, 02/08/2023

✓ PERSONAL EN OBRA

- 2 OFICIALES 5 AYUDANTES 2 INSTALADORES
  1 RESIDENTE DE OBRA 1 INSP SST

✓ ACTIVIDADES

- CONTINUA INSTALACION DE MUROS TIPO SANDWICH AULA PREFABRICADA
- REMATES DE URBANISMO AULA PREFABRICADA
- ENCHAPE MURO DE LABORATORIO
- REMATES DE PINTURA LABORATORIO

CONSORCIO OBRAS M.G.

JUEVES, 03/08/2023

✓ 2 OFICIALES 5 AYUDANTES 2 INSTALADORES
1 RESIDENTE DE OBRA 1 INSP SST

✓ ACTIVIDADES

- CONTINUA INSTALACION DE MUROS TIPO SANDWICH AULA PREFABRICADA.
- LAVADO DE MUROS A LA VISTA
- REMATES URBANISMO AULA PREFABRICADA
- ENCHAPE LABORATORIO

Norma

Powered by CamScanner

Viernes. 04/08/2023

✓ Personal en obra
2 oficiales 4 ayudantes 2 soldadores
1 insp de obra

✓ Actividades

- Instalación de malla tipo solución AL
- Aula prefabricada
- Encofrado lateral
- Lavado de manos a la vista

[signature] CSED DRILL.

Sábado 05/08/2023

✓ Personal en obra
2 oficiales 5 ayudantes
1 insp de obras 1 insp SST

✓ Actividades

- Fundida encofrado muro norte de cabezal 2
- Excavación para viga de muro costado occidental en el aula prefabricada
- Aseo general de obra

[signature] CSED DRILL.

Martes 08/08/2023
✓ Personal en obra

2 oficiales 5 ayudantes
1 insp de obras 1 insp SST

Powered by CamScanner

✓ ACTIVIDADES

- FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGA DE REFUERZO Y ANCLAJE DE MURO DE CONTENCION - AULA PREFABRICADA
- SE RECIBEN TUBOS PARA BARANDAS
- INSTALACION AGUAS LLUVIAS (BAJANTES) AULA 11
- CONTINUA ENCHAPE MURO FRENTE LABORATORIO

CSSD Detail

MIERCOLES 09/08/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES 5 AYUDANTES
1 RESIDENTE DE OBRA 1 TASP SST

✓ ACTIVIDADES
- FUNDIDA DE CONCRETO PARA VIGA DE ANCLAJE MURO DE CONTENCION - AULA PREFABRICADA
- INICIA REPARACION DE CUBIERTA EN CASONA ACCESO A COMEDOR DEL COLEGIO
- INSTALACION DE BARANDAS (ZONA DE JUEGOS)

CSSD Detail

JUEVES 10/08/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES 5 AYUDANTES
1 TASP DE OBRAS 1 TASP SST

✓ ACTIVIDADES
- CONTINUA REPARACIÓN DE CUBIERTA EN CASONA ACCESO COMEDOR DEL COLEGIO
- PINTURA EN ESMALTE COLOR GRIS A BARANDE
- INICIA A COLOCACION DE DILATACIONES

Powered by CamScanner

PLANILLA PARA ESCALERAS AULA PREFABRICADA.

VIERNES 11/08/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES 5 AYUDANTES
1 INGº SST 1 INGº DE OBRA

✓ ACTIVIDADES
- FUNDIDA CON GRANILLA DE ESCALERA DE ACCESO A AULA PREFABRICADA
- PINTURA A BASANTE COLOR GRIS PINTA

SABADO 12/08/2023

✓ PERSONAL EN OBRA

1 OFICIAL 3 AYUDANTES 1 INGº SST

✓ ACTIVIDADES
- ASEO GENERAL EN OBRA
- COLOCACION Y ADECUACION DE CERAMICOS

LUNES 14/8/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO 3 OFICIALES 5 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES
- SE TRAEN CONTE DE TUBERIA REDONDA PARA BARANDAS
- PINTURA VINILO COLOR BLANCO A MUROS INTERNOS DEL LABORATORIO.

Martes 15/08/2023

✓ Personal en obra
1 Maestro 3 oficiales 6 ayudantes
1 Inspector 1 Jefe de obra

✓ Actividades
- Continuar con el trabajo pendiente para mañana
- Remates de muro al encontrarse
- Construcción de muro y losa con cajuela estructural ambientes aula refrigerada

Miércoles 16/08/2023

✓ Personal en obra
1 Maestro 3 oficiales 6 ayudantes
1 Residente de obra
1 Jefe de obra
1 Insp. SST

✓ Actividades
- Continua fundida de corrida muro a escalera del aula refrigerada
- Construcción de muro con cajuela estructural y losa del aula refrigerada
- Corte de tuberías aguas negras para baterías e inicia instalación de tuberías
- Remates ambientes aula refrigerada

Jueves 16/08/2023

✓ Personal en obra
1 Maestro 3 oficiales 4 ayudantes
1 Insp SST 1 Jefe de obras

Colegio Aquileo Parra

14 Julio /23	Personal: 16 colaboradores Clima: Nublado. Se continua con la demolición del piso, se funden las tapas de las cajas electricas, se continua con las hechuras de los vanos de la ventanas, la instalacion de la estructura faltante en cobierta bloque de 1 piso, se inicio la pulida del piso en el pasillo y los salones faltantes en el bloque de dos pisos. Residente Contratista Consorcio M6
15 Julio/23	Personal: 16 colaboradores Clima: Soleado. Se entrega el piso de los salones faltantes en bloque de dos pisos, se corrigen fisuras puntuales resanan y se rellenan los marcos de las ventanas.
	Residente Consorcio M6
17 Julio/23	Clima: Nublado Se observa que se continua con los vanos de ventanas de salones del bloque de 1 piso, se inicio instalacion de puertas laminadas y vano de ventana en baño de pasillo, en cuanto a demoliciones de pisos existentes se tienen demolidos 4 aulas y baño de pasillo, siguiendo pendiente por demolar 2 aulas. Se encuentra pendiente por entregar tapa de registro para salones 2 y 4 ya se le entrego al Contratista se dice que de acuerdo a la estructura de la estatal se ocupan plegables de las mismas de cada uno para pasillos, se solicita también construir de chuma mineralizada las pendientes del bloque de 1 piso. Residente Contratista Consorcio

Powered by CamScanner

18.- Julio 2023	Personal: 16 colaboradores Clima: Soleado. Se inicia instalación de piso en pasillo y salones de Hogar de 1 piso dejando desnivel hacia la cuneta multiple de igual manera se continua en la echura de los vanos de ventanas, se hace prueba de tintas a la estructura de cubierta faltante. se realiza inventario de equipos y material que se encuentra en la oficina. Consorcio del Distrito 1 — Consorcio M6
19.- Julio 2023	Colaboradores: 18 Clima: Soleado y nublado Se continua con la instalacion de piso en salones, se continua con la echura de los vanos de las ventanas, se inicia abogualado de muros, se inicia trabajo electrico de acometida para poner la luz definitiva en salones del segundo y primer piso. Consorcio del Distrito 1 — Consorcio M6
20.- Julio 2023	Colaboradores: 18 y 1 residente. Clima: Soleado. Se inicia fundida de escalon de pasillo en granito, instalacion de tapas cajas electricas, se continua con la instalacion de piso en granito pulido, se terminan los tibos y echuras de vanos para ventanas. se termina de poner la primera teja de la cubierta faltante y se inicia la estructura del cuarto bodega sobre los salones. Consorcio del Distrito 1 — Consorcio M6

24- Julio 2023	Clima: Soleado Personal: 10 colaboradores 4 piso 1 Electrico. 4 Cubierta. Se continua con la demolicion de piso y se inicia en la guias de piso para iniciar instalacion de granito, se inicia limpieza de ladrillo en salones para posteriormente pintar, se inicia la instalacion de tuberia EMT para acometida electrica, se instala parte superior de teja en bloque de 1 piso, se instalan flanches faltantes en bloque de dos pisos. Consorcio M6 Consorcio Patrimonial
25- Julio 2023	Clima: Soleado Personal 19 Colaboradores. Se Continua instalacion de piso a bloque 1 piso se instalaron ventanas y cuartos que hacen falta para la instalacion de ventanas que quedo mal se continua con la instalacion de flanches en cubierta y duros, se continua con la instalacion de tuberia de acometida, se continua en la limpieza y empaste de ladrillo en los salones Consorcio M6 Consorcio Patrimonial
26 -Julio	Clima: Soleado Personal: 18 Colaboradores Se inicia con los cuartos en soleras, los ventanos, ostoco- en tableros, y muros, embarrilada pisos. Se inicia instalacion estructura techos sobre vigas, pintura de la entrada, se llena mochetas para instalacion de flanches se hace retiro de escombros y llenado material para pisos. Consorcio M6 Consorcio Seal Patrimonial

Powered by CamScanner

29 Julio 2023 | Clima: Soleado
Personal 20 colaboradores
se inicia romper de muros a cuarenta hilada de dos a 3 ladrillos por saber a los meses entre soleros y otro pasillo, pinete sobre ventanas todo arriba se obtiene con aseo y pintura sobre paredes superiores de ladrillo, se continua en el nivel de cubierta bodega sobre bovedas, se continua con la instalacion de gibes y enlapillado del mismo. Se obtiene en la instalacion de la tuberia de acometida electrica

Consorcio Seal Distrital
Consorcio MG

28-Julio 2023 | Clima: Soleado
Se observa personal realizando instalaciones de pozo bodega y zona de nivel en pasillo del bloque de 2 pisos, continua con mampostería entre vigas y contra viga cubierta, se evidencia y esta continuando instalaciones de acometida eléctrica principal que alimenta bloque de 2 pisos, se evidencia interruptores de cargas 2 y acometida llegando al tablero general, faltan canaletas, cables para terminar la cubierta de semana
El Contratista indica que este fin de semana apagan alguna subestación el tema eléctrico del pasillo del bloque de 2 pisos.

Consorcio Seal Distrital

29-Julio 2023 | Clima: Nublado
Personal: 20 colaboradores
Se continua en las labores de instalación de PVC, tubería para acometida eléctrica, se inicia con la pintura de los muros para la colocación del salón gallineo y salones faltantes,

Consorcio MG

Consorcio Seal Distrital

31 - Julio 2023	Obra: Soledad Personal: 20 colaboradores Se termina la instalación de tubería acometida para el inicio de cubierta en salones de segundo piso. Se instala la instalación de cable libre de halógenos, se continua con la instalación de pisos y enlozado del mismo, se continua con la hechura de rondas muros abiertos en bloque en todos sus salones, se continua en pintura sobre vitrinas y muros de verde arbry cubierta se continua con el recubrimiento de ladrillo y se inicia pintura. Consorcio MG Consorcio del Distrital
01 - Agosto 2023	Obra: Pulido Personal: 20 Colaboradores. Se inicia corte y desmonte de cerchas estructura antigua de cubierta se hace la instalación de muros y guarda escobas en salones y pasillo se instala el entregadillado en piso de cemento, llegada de tuberías para cubiertas, y se hace la respectiva instalación se programa inicio de instalación de drywall para el jueves 03 de Agosto. Consorcio MG Consorcio del Distrital
02 - Agosto 2023	Obra: Muros Personal 20 colaboradores. Se continua con el desmonte de cerchas en salones, se continua en la instalación de piso, entregadillado y pulida, se continuan la instalación de guardaescobas se continua en el estuco en muros y pintura sobre ladrillo se instala cable provisional. Se continua con pintura de estructura para salones faltantes y pulido general. Consorcio MG Consorcio del Distrital

03-Oct-23

2023 Personal: 27 Colaboradores
Clima. Soleado
Se continua con la instalacion de piso en los salones y con el resane en filas entre canchas multiple, se inicia con el corte y demolicion de muro existente en bodega sobre baños, se continua con el desmonte de cerchas y se continua con el estuco sobre pared y pintura sobre la doilla del mismo modo se continua con enlozagullado y pulida de piso.

Casarrio HC

Auxiliar Seal Distrital

04.08.23 Observaciones SST / Ambiental.
1- Se Solicita Retirar Residuos.
2- Se solicita Señalizar Riesgo Electrico y locativo. tableta desubicada.
3- se Solicita Reubicar punto de Emergencia.
Se Extolencia botiquin, camilla, extintor.
4- Se Solicita Hoja de Seguridad de. Productos Quimicos. 5- Se Evidencia orden y aseo.
6- se solicita que los Andamios Sean Certificado, cuando se Realicen trabajo en Altura.
Att. Inspectora SST - Yisela Ania - Seal Distrital.

05-08 Personal 21 Colaboradores
2023 Clima: Soleado
se continua con el derrite de cerchas en los salones y se continua con la instalacion de pisos en granito en Colegio de 1 piso y bloque de dos pisos se continua con la instalacion electrica, acometida y distribucion para salones segundo piso

Carrasco HC

Auxiliar Seal Distrital

08-Agosto 2023	Personal. 15 colaboradores Clima: Soleado Se realiza en el contratista electrico la acometida y distribucion electrica de bloque de 1 piso, se acuerda detener la acometida hasta definir que pasara con la placa de la techada del mismo modo se acuerda el inicio dentro de salones se continua en la instalacion de piso y estucado de salones. se continua en iladas contra cubierta en los muros divisorios de los salones. Consorcio MG Consorcio Sol Oriental
09-Agosto 2023	Personal. 5 electricos 15 colaboradores Clima: Soleado Se realiza el ingreso y capacitacion SST a personal nuevo del contratista electrico, se inician trabajos de instalacion de tuberia y cableado en salones de bloque de 1 piso, se continua en la instalacion de pisos, pañete sobre muros divisorios de salones, estuco sobre parete y reemboquillado de ladrillo en salones se inicia pintura dentro de salones. Consorcio MG Consorcio Sol Oriental
10-Agosto 2023	Personal: 5 electricos 15 colaboradores Clima: Soleado. Se continua con la instalacion de tuberia y cableado en los salones del bloque de 1 piso. se continua en la instalacion y pulida de pisos en granito se hace filos en pasillo en granito en su respectiva cantidad aleatoria. se continua limpiando, y resanando y emboquillando paredes de los salones. Consorcio MG Consorcio Sol Oriental

Powered by CamScanner

11-Agosto 2023	Personal: 5 electricos 15 colaboradores clima: Soleado Se continua en la instalacion de tuberia en los salones y se inicia a poner dos capas en cable encauchetado. Se hace trasiego de materia del poliester de la teja para liberar el ultimo salon del blogue 1 y asi poder iniciar con la instalacion de pisos y de la tuberia y cableado electrico. se continua en la embogullado del ladrillo y la pintura blanca en esmalte sobre los muros se continua con el estuco sobre el pañete Consorcio M G
12-Agosto 2023	Personal: 5 electricos 15 colaboradores. Clima: Soleado. Se continua con la instalacion de cable encauchetado en los salones, se inicia el levantamiento del muro de la bodega sobre los baños se detallan los vanos para puertas del blogue de 1 piso, se continua estucando sobre pañete en muros de salones reembogullado los muros en ladrillo y aplicando primera mano de pintura en esmalte. Consorcio M G
14-Agosto 2023	Personal 3 electricos, 10 colaboradores Clima: soleado. Se continua en la instalacion de cable encauchetado y tuberia y cable en el ultimo salon, se continua con la pulida del piso y se inicia brillado de los que ya estan con dos manos de pintura y rematados en tuberia y cableado electrico, se continua con el muro de la bodega sobre terraza del baño, se termina la instalacion de estantes sobre cabecera. Consorcio M G

15-Agosto	Personal: 3 electricos 10 colaboradores. Clima. Soleado Se continua con la polida de piso. y la brillada dlgunos salones, se continua en pintura sobre ladrillo y muro para resanbaguilla partes que haga falta, llegada de marcos electricos para instalacion de iluminaria en salones, se hace aseo general a la obra y trasiego de cemento y arena para liberar nuevos espacios de trabajo Consorcio M6 Interventoria Local Distrital
16-Agosto 2023	Personal: 3 electricos 7 colaboradores. Clima: Soleado. Se realiza comite de obra y recorrido a las instalaciones del colegio para definir los nuevos alcances del mejoramiento, se acuerda pasar un presupuesto de lo nuevo que se va a ejecutar y espera aprobacion de interventoria y secretaria para asi iniciar en estos trabajos. Se inicia en la instalacion de lamparas dentro de los salones, se continua en la pintura en salones y la polida del piso, se hace demolicion de acabado en pasillo para resanar en piso granito la parte que hace falta, se Continue Con la instalacion de bloque para la subida de los muros en bodega sobre terraza de los baños Se reciben epps correspondientes para la proxima entrega a los colaboradores Consorcio M6 Interventoria Local Distrital

Powered by CamScanner
