Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 09

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



Proyecto

REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 09

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROYECTO: "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA EN VALLEDUPAR (CESAR)."

1. GENERALIDADES

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA No	: CO1.PCCNTR.4332011 No 323 del 29 de diciembre de 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: LICITACIÓN PÚBICA No. 10 de 2022
CONTRATISTA	: CONSORCIO JUDICIALES (Integrante 1- JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO 5% Integrante 2- SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGIENERIA Y CONSTRUCCIÓN 29%, Integrante 3 CONSTRUVAL INGENIERIA SAS 33%- Integrante 4 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTV SAS 33%)
OBJETO	: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)
VALOR DEL CONTRATO	: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($49.420.492.192) Incluido impuestos y contribuciones de Ley.
PLAZO INICIAL	: TREINTA Y CINCO (35) MESES
FECHA DE INICIO	: 11 DE ENERO DE 2023
FECHA FINAL	: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

Descripción de las obras en general

Obras

1. CRITERIOS GENERALES DEL PROYECTO

- **Descripción**

En este octavo informe se describe de manera detallada del control técnico administrativo de las actividades ejecutadas a la fecha por parte del Consorcio Obras Judiciales para *REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)*

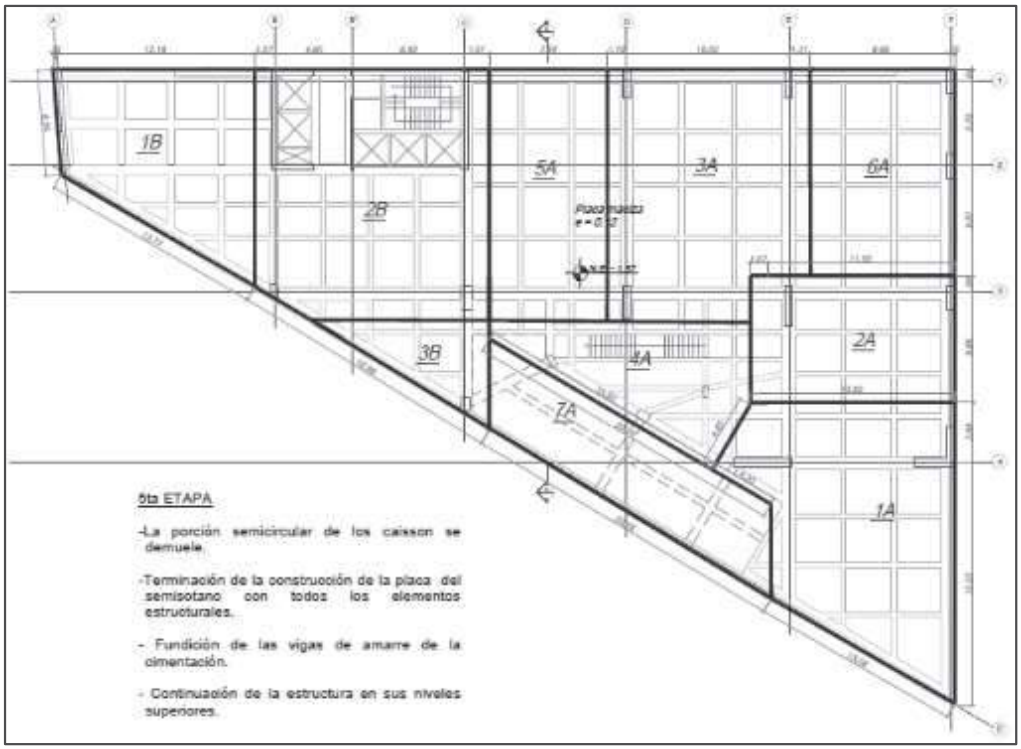


Figura. 1: Proceso constructivo ajustado.

2. ANTECEDENTES

En las antiguas instalaciones del parqueadero del Palacio de Justicia, se está ejecutando la ampliación de la misma, habiéndose concluido la construcción de los caissons como parte del proceso constructivo para estabilización del terreno y posterior demolición.

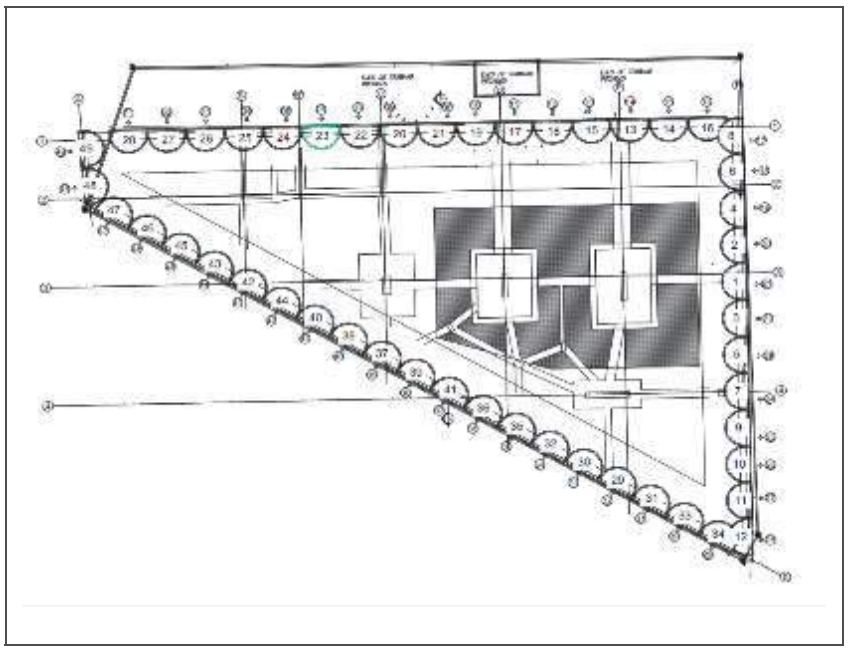


Figura. 2: Implantación sistema de caisson y estructura

3. INFORMACION GENERAL:

En este informe se encontrará información sobre el proceso y estado actual del Contrato de CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA EN VALLEDUPAR (CESAR). Ejecutado por el Consorcio Obras Judiciales

Con fecha 11 de enero de 2022 se firma el acta de inicio de Obras con Consorcio obras judiciales en calidad de contratista con su representante legal Julio Roberto Balbuena Alarcón, el señor Néstor Camilo Artunduaga Ávila como representante legal del consorcio Intervalledupar 2022 en calidad de interventoría externa y el arquitecto Jorge Enrique Fernández Becerra profesional universitario grado 20 del grupo de proyectos especiales de infraestructura de la dirección ejecutiva de administración judicial en calidad de coordinador de proyecto y la señora Ángela Aránzazu Montoya coordinadora grupo de proyectos especiales de infraestructura.

Se posesiona de parte del Consorcio Obras Judiciales al Ingeniero Julián Andrés Cogollo como Representante legal.

Que mediante Otro Si #1 con fecha 22 de febrero de 2023, el Consorcio Obras Judiciales delega al Señor Víctor Anderson Valbuena Quiroga como nuevo Representante Legal del Consorcio, y al Señor Julián Andrés Cogollo y al Señor Sergio Sereda Martínez como Representantes Suplentes del Consorcio.

Dificultades Presenciadas Durante el Desarrollo del Contrato

En el transcurso del mes de octubre de 2023 el desarrollo del proyecto ha tenido retrasos frente a cronograma presentado debido a diversas variables, descritas a continuación:

- La demolición parcial de las rocas para evitar la interferencia con la estructura de la zarpa de la nueva edificación.
- Las diversas revisiones a la zapata Z-9 entre especialistas de interventoría y constructor junto con el diseñador estructural Jaime Buitrago, conllevaron a detener actividades en dicha zona hasta dar claridad a los temas suscitados.
- Las fuertes lluvias presentes a lo largo de todo el mes han ocasionado atrasos considerables debido a que las excavaciones se inundad y el proceso de evacuación mecánica imposibilitar avanzar de manera normal en esos sectores.

3.1 SITUACIÓN DE LA OBRA.

Al finalizar el 31 de octubre de 2023, las actividades del Proyecto han progresado como a continuación se describe:

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO PARA UBICACIÓN Y MARCADO EN EL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN LOS EJES PRINCIPALES, PARALELOS Y PERPENDICULARES SEÑALADOS EN EL PLANO DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS LINDEROS DEL MISMO.
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN PARA ELEMENT - INCLUYE LA CONFORMACION DE TALUDES Y TRINCHERAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
EXCAVACION MECANICA EN ROCA PARA CONFORMACION DE HUELLAS DE ELEMENTOS DE CIMENTACION - ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
EXCAVACION MANUAL EN ROCA PARA CONFORMACION DE HUELLAS DE ELEMENTOS DE CIMENTACION - ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
PERFILADA FONDO DE EXCAVACION ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
BASES EN CONCRETO CICLOPEO TIPO_1 3000 PSI - 60% RAJON 40% CONCRETO - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
ZAPATAS EN CONCRETO TIPO_1 5000 PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
ZARPA MUROS DE CONTENCION TIPO_2 4000 PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO TIPO_1 5000 PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO FUNDIDO TIPO_1 4000 PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 1.500PSI (CONCRETO DE LIMPIEZA) SEGÚN PROCESO CONSTRUCTIVO Y/O DISEÑO ESTRUCTURAL
COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO A LA VISTA TIPO_1 DE 6000PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LAS DEFINICIONES ARQUITECTONICAS DEL CONCRETO, SEGUN DISEÑO
MUROS EN CONCRETO A LA VISTA TIPO_1 DE 6000PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LAS DEFINICIONES ARQUITECTONICAS DEL CONCRETO, SEGUN DISEÑO
SUMINISTRO Y MANEJO DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA INCLUYE ALAMBRE NEGRO DE AMARRE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE DE TALUDES SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS
EXCAVACION MANUAL PARA REDES DE TUBERIAS SEGÚN PLANOS HIDROSANITARIOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
INSTALACION DE GEODREN TIPO VIAL
INSTALACION DE TECDREN
ASEO GENERAL

3.2 CONTROLES DE OBRA

Controles Generales de procesos

De acuerdo con el desempeño de las actividades y procesos que se llevan a cabo para asegurar que los objetivos de la empresa y las obras contractuales sean alcanzados.

3.3 CONTROLES TÉCNICOS

Se cumple con las especificaciones técnicas en las ejecuciones de actividades realizadas a la fecha cumpliendo con todos los estándares de calidad y especificaciones técnicas.

- Se realizan actas de liberación de excavaciones, amarrado de aceros de refuerzo y fundición de concretos para los elementos estructurales tales como vigas de cimentación, zapatas, zarpas, columnas y muros.
- Se realizan actas de liberación para instalación de drenajes tipo geodren vial y tecdren, revisando que se cumplan las pendientes de diseño y localización.
- Se realizan ensayos a los concretos fundidos en obra de acuerdo con el artículo C.5.1.3 de la NSR-10.

3.4 CONTROLES GENERALES

Se realiza el seguimiento según el nuevo cronograma del proceso constructivo, se está monitoreando semanalmente el avance de los trabajos, sin embargo, es necesario ajustarlo dados los hallazgos presentados en campo, condiciones climáticas y limitaciones del sector.

3.5. CONTROLES GENERALES DE SUBCONTRATISTAS

Los trabajos son realizados por personal de mano de obra calificada, siendo únicamente un subcontratista que viene desarrollando trabajos de excavación y retiro de material.

3.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

LOCALIZACION Y REPLANTEO.

- Se realiza levantamiento topográfico para la ubicación, verificación de ejes estructurales y niveles de los diferentes elementos del proyecto

EXCAVACION MANUAL Y A MAQUINA

- Excavación para alcanzar el nivel de sótano, conformación de vigas de cimentación y zapatas principales.

ARMADO DE ACERO

- Armado de aceros para zapatas Z-1, Z-4 y Z-6, columna D-3, muros M-7, M-8 y M-9, vigas 02-04-06, zarpas y muros de contención sobre eje 5 y eje F.

FUNDICION DE CIMENTACIONES

- Zapatas en concreto de baja permeabilidad 5000 psi - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento).

- Zarpa muros de contención tipo_2 4000 psi - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento).

- Vigas de cimentación en concreto tipo_1 5000 psi - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento).

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO

- Suministro e instalación de muros de contención en concreto fundido tipo_1 4000 psi - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en

el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento)

- Columnas rectangulares en concreto a la vista tipo_1 de 6000psi - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento) se deberá tener en cuenta las definiciones arquitectónicas del concreto, según diseño.

- Muros en concreto a la vista tipo_1 de 6000psi - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento) se deberá tener en cuenta las definiciones arquitectónicas del concreto, según diseño

CONDICIONES CLIMATICAS

- Durante la ejecución de las obras correspondientes al mes de octubre de 2023 se presentaron días de lluvia; impidiendo la ejecución de las actividades durante 624 HH/m.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X						X	X	X	X	
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																	X					X	X	X	X	X					X

PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

Para el desarrollo de las actividades del presente contrato, Consorcio Obras Judiciales utilizó el siguiente personal:

PERSONAL	CANT.	ACTIVIDADES REALIZADAS
Director	1	Dirección de actividades de construcción de obras, dirección del personal de obra, dirección de obras, administración de materiales.
Arq. Residente de Obra	1	Supervisión de actividades técnicas ejecutadas Actividades de construcción de Obras inherentes al contrato.
Ing. Residente de Obra	1	Supervisión de actividades técnicas ejecutadas Actividades de construcción de Obras inherentes al contrato.
Auxiliar Administrativo	1	Actividades administrativas, compras, recepción de

		Documentos, etc.
Delineante arquitectónico y de ingeniería	1	Realizar los ajustes, modificaciones y generación de planos récord que se requieran
Residente SST	2	Actividades de seguridad y salud en el trabajo

CONTRATISTA TOPOGRAFÌA

Topógrafo	1	Trazado y levante de ejes estructurales
Auxiliar de topografía	1	Ayudante trazado y levante de ejes estructurales demolición de muros y retiro de materiales

CONTRATISTA EXCAVACION.

Operario maquinaria	1	Excavación mecánica.

MATERIALES UTILIZADOS.

- Acero
- Alambre negro
- Tablas

EQUIPOS UTILIZADOS.

Los equipos usados para la ejecución de las obras objeto del presente contrato fueron las siguientes:

- Tronzadora.
- Taladro.
- Taladro demoledor.
- Herramientas menores
- Formaleta metálica.
- Andamio certificado multidireccional.
- Volquetas.
- Excavadora.
- Mixer.
- Bombas de succión de lodos.

4. CONTROL DE ACTIVIDADES

4.1 Actividades Realizadas

- Se realizó revisión completa de los contratos en el mes, tiempo de entrega, revisión de actividades, ajuste de programación de instalación de actividades a realizar.
- Se ha supervisado que se inicie cada actividad con los respectivos implementos de seguridad.
- Se lleva un control del proceso constructivo de cada actividad en todas las obras supervisadas.

- Elaboración de registros fotográficos de todas las actividades desde su inicio en el transcurso de las mismas.
- Revisión de entrega y revisión física de cantidades de obra ejecutada.
- Revisión y supervisión de los materiales utilizados en la obra.
- Se supervisa que se trabaje con las herramientas adecuadas en los procesos constructivos de las obras.
- Se controla que se mantenga despejado y limpio el área de trabajo para no crear congestión o traumas en el tiempo y espacio del desarrollo del contrato.
- De cada actividad en la construcción de las obras, el control de actividades está basado en la revisión de cada ítem y de las medidas de cada ítem en el desarrollo de las obras.
- Todo se está llevando de acuerdo con las normas de la construcción y las especificaciones técnicas.

A. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

A continuación, se hace la relación de las actividades administrativas realizadas por el Consorcio Obras Judiciales en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2023:

Comités de obra: Durante el periodo del presente informe se realizaron los siguientes comités de seguimiento de obra:

- 05 de octubre de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 37 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ.
- 13 de septiembre de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 38 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
- 20 de septiembre de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 39 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
- 27 de septiembre de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 40 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ

- Bitácora: Se ha diligenciado normalmente la bitácora de obra del proyecto por parte de interventoría

5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- Se presentan mayores tiempos de ejecución a los contemplados en cronograma en las actividades previstas dentro del proceso constructivo ajustado, por hallazgos en el terreno, definiciones de algunos elementos estructurales y las contingencias causadas por el estado meteorológico.

- Se radica factura acta parcial No. 3 con correcciones.

6. RELACIÓN DE PAGOS:

No. O.P.	Fecha	Valor Factura	Concepto
1	2022/12/29	$ 9.884.098.438	Anticipo 20%
DESEMBOLSO	2023/02/13	$ 9.884.098.438	Anticipo 20%
FE 04	2023/06/28	$ 99.782.870,00	Acta 01
FE 06	2023/09/06	$ 142.171.005,00	Acta 02

Nota: Ver en anexo reporte de rendimientos financieros del desembolso

7. CORREPONDECIA ENVIADA

10/2/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 406	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA TRANSPORTE ASCANIO
10/2/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 407	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	INFORME AMBIENTAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
10/3/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 408	JMR SALUD OCUPACIONAL	AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS A PERSONAL DE COJ
10/3/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 409	DOCUMENTOS DE INFORME SST MES DE AGOSTO	DOCUMENTOS DE INFORMES SST MES DE AGOSTO
10/3/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 410	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	REVISIÓN CALCULO ZAPATA Z9 MURO M1
10/3/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 411	JMR SALUD OCUPACIONAL	AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS A PERSONAL DE COJ
10/5/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 413	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	INFORME MENSUAL DE OBRA PALACIO DE JUSTICIA V/PAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
10/5/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 414	CEMENTOS ARGOS VALLEDUPAR	CARTA DE SUSPENCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
10/7/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 415	CONCRETOS EL DORADO S.A.S	DISPONIBILIDAD DE CONCRETO DE 5000 Y 6000 PSI DE COLOR BLANCO
10/6/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 416	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR	SOLICITUD DE LISTADO DE PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE MATERIAL VEGETAL SEGUN LA RESOLUCIÓN 0017 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2023
10/7/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 417	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO DOCUMENTOS DE INGRESO A OBRA - CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
10/7/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 418	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ZAPATA Z9 MURO M11 ENTREGA DE DESPIECE
10/7/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 419	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN PROCESO CONSTRUCTIVO CIMENTACIÓN
10/9/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 420	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - SECURITY FORCE
10/10/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 421	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENTREGA DE ACTA DE MODIFICACIÓN No.2 FIRMADA Y DOCUMENTO BALANCE

10/11/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 422	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DOCUMENTACIÓN PARA PAGO DEL ACTA DE CORTE DE OBRA No.3
10/12/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 423	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	RESPUESTA AL OFICIO No. CSJ-140-2023 SUBSANACONES PLAN DE CALIDAD
10/13/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 424	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	INFORME EXCENTRICIDAD ZAPATA 9 MURO M1
10/13/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 425	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DOCUMENTACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DEL SG SST
10/13/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 426	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PROPUESTA DE TRASLADO DE LOS TANQUES A INSTALAR PARA LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA
10/14/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 427	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DOCUMENTOS DE INGRESO A OBRA - CONTRATISTA B3D ASOCIADOS Y CONSULTORES & CONSTRUCTORES SAS
10/14/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 428	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
10/14/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 429	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	AJUSTE DE APU PARA LA PROVISIONAL DE ENERGIRA ELECTRICA EN OBRA
10/17/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 430	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DOCUMENTOS DE INGRESO A OBRA - CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
10/18/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 431	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	SOLICITUD DEFINICIÓN ZAPATA 9 MURO M1
10/19/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 432	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - CONTRATISTA JER TOPOGRAFIA
10/20/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 433	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	CERTIFICADO DE COMPETENCUA PERSONAL CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
10/25/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 434	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	RESPUESTA A OFICIO No.CSJ-160-2023 CURADO Y HORMIGUEROS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
10/25/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 435	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	REMISIÓN DISEÑO DE MEZCLA CONCRETOS DE 42MPA
10/25/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 436	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	REPORTE DE RESULTADOS DE CILINDROS A COMPRESIÓN
10/25/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 437	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	REVISIÓN DE CONDICIONES DE VENTILACIÓN SEMISOTANO
10/26/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 438	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATISTA RAMON ASCANIO
10/26/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 439	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DOCUMENTOS DE INGRESO A OBRA
10/28/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 440	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PROCEDIMIENTO PARA ARMADO Y VACIADO DE PLACA ENTRE PISO
10/31/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 441	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DOCUMENTOS DEL PERSONAL CONTRATISTA KELLY J VARGAS FABRICA DE CASETONES SAS EN OBRA
10/31/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 442	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DETALLE CONFINAMIENTO DE BORDES VACIOS

Nota: Ver en anexo el contenido de cada correspondencia.

8. ANEXOS.

REGISTRO FOTOGRÀFICO



Armado de acero para muros



Encofrado de muros



Bombeo de agua de nivel freático



Excavación manual para zapata del punto fijo



Encofrado de muros de contención



Fundición de muros de contención

	
Instalación tecdren	Armado de acero para columna.
	
Armado de acero zapata, columna y vigas	Fundición de zarpa de contención
	
Fundición de zarpa tipo 2	Fundición vigas de cimentación

	
Pañete de taludes	Armado de acero muro M-7

t: (601) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FIDEICOMISO PARA REALIAR LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CODIGO SIFI 112122

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 1/25/2023, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000006315

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSTRUCCI¨N NUEVA TORRE P

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	6,993,818,244.66	*SALDO PROMEDIO*	$	6,808,147,303
TOTAL ABONOS	$	14,730,528.67	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	340,552,501.30	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,180,454.67
SALDO ACTUAL	$	6,667,996,272.03	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	PAGO NO APLICADO DIRECCION DEL			4,689,756.00	6,998,508,000.66
1/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,256.34	6,998,506,744.32
1/09	PAGO A PROV DIRECCION DEL TESO			-4,689,756.00	6,993,816,988.32
1/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5.98	6,993,816,982.34
1/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-238.71	6,993,816,743.63
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,860,966.90	6,995,677,710.53
14/09	PAGO INTERBANC CONSORCIO OBRAS			1,320,000.00	6,996,997,710.53
14/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-960.09	6,996,996,750.44
14/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,920.18	6,996,994,830.26
14/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,319,997.71	6,995,674,832.55
14/09	PAGO A PROVE INTEGRAL SAS			-20,000,000.00	6,975,674,832.55
14/09	PAGO A PROVE USTARIZ MORA ZU			-9,996,000.00	6,965,678,832.55
14/09	PAGO A PROVE CONCRETOS EL DO			-300,000,000.00	6,665,678,832.55
14/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.42	6,665,678,650.13
14/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-364.84	6,665,678,285.29
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,046,565.02	6,667,724,850.31
29/09	PAGO NO APLICADO DIRECCION DEL			4,540,318.00	6,672,265,168.31
29/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,256.34	6,672,263,911.97
29/09	PAGO A PROV DIRECCION DEL TESO			-4,540,318.00	6,667,723,593.97
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5.98	6,667,723,587.99
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-238.71	6,667,723,349.28
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			272,922.75	6,667,996,272.03
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 02 de Octubre de 2023

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-406

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022
CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DEJUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA TRANSPORTE ASCANIO.

La presente con el fin de enviar planilla de seguridad social contratista transporte Ascanio (Maquinaria Amarilla).

A continuación relaciono personal contratista transporte Ascanio:

Información Trabajadores			
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area
1065639870	OLBER DONADO VILLAFAÑE	OPERADOR DE MAQUINARIA	OPERATIVA

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

Ing. Ferney Peña Rojas
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra
KSF

TOTAL APORTES A SALUD

	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		
		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZAC
	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.100	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		L
		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	
	1		$ 0	$ 0		$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA

NOMBRE

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL														
					PENSIÓN									SALUD					
					ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
									SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO							
					231001-COLFONDOS	2	$ 77.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.400	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 77.334	$ 3.100	$ 0

Planilla Pagada

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2
1.1 LOCALIZACIÓN 2
1.2 Características Técnicas del proyecto 5
2. OBJETIVO GENERAL 5
3. METODOLOGIA 6
4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO 6
5 OBLIGACIONES DE PERMISOS 7
5.1. GENERALIDADES 7
6. DESARROLLO DE LOS PROGRAMA DEL PGAS 7
6.1. Programa y Proyecto de PGAS 8
61.1. Gestión Ambiental del proyecto 8
1.1. Grupo de Gestión Ambiental y social 8
1.2. Trámite y Cumplimiento de Requisitos Legales 8
1.3 Capacitación Ambiental y Social 8
2 Componente Abiótico 8
2.1 Manejo Integral de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipos 8
2.2 Manejo del Recurso Hídrico 8
2.3. Control de las Excavaciones y Demoliciones 8
2.4. Residuos Sólidos Generados 8
2.5. Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas 8
2.6. Instalación, Funcionamiento y Retiro de Campamento 8
2.7. Manejo de la Maquinaria y Equipos 8
2.8. Control de la Calidad del Aire y las Emisiones 8
3. Componente Biótico 8
3.1. 1. Manejo de la Fauna Silvestre 8
63.2. Manejo de la Vegetación en Obra 8

3.3. Protección vegetal del suelo……..……8

4 Gestión Social……..……..……..……8

4.1 Atención a la Comunidad y Autoridades……..……8

4.2. Información y Participación de la Comunidad……..……..8

4.3. Manejo de Infraestructura Privada, Pública, de Servicios Públicos, Redes y Activos……..…..……8

4.4. Gestión de la Mano de Obra……..…..8

7. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL... ¡Error! Marcador no definido.

8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS..... 9

9. MATRIZ DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL ..... ¡Error! Marcador no definido.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... ¡Error! Marcador no definido.

1. INTRODUCCIÓN

Para el mejoramiento continuo de las instalaciones físicas, el Consejo Superior de la Judicatura en cabeza del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura, en el continuo ejercicio de sus funciones, robusteciendo las edificaciones propias, con calidad en la construcción, garantizando la vida útil de los inmuebles y asegurando los niveles de bienestar, calidad de vida, eficiencia, productividad y ante todo la seguridad física de sus ocupantes.

De esta manera, cumpliendo con la anterior directriz, para la ciudad de Valledupar (Cesar) se creará una nueva torre para el Palacio de Justicia, teniendo en cuenta que se tiene un área libre para la implantación de un nuevo edificio que proporcione todas las garantías de seguridad, permanencia y bienestar tanto para funcionarios, empleados y usuarios.

Este nuevo bloque albergará las diferentes corporaciones, tales como: El Tribunal Superior de Valledupar, El Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, El Consejo de la Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, los cuales se encuentran dispersos en diferentes inmuebles de la ciudad, lo cual permitirá reunir estas Corporaciones ofreciéndoles a los usuarios un correcto acceso a la justicia y una óptima prestación del servicio, digno para funcionarios, empleados y habitantes de la ciudad de Valledupar.

1.1. LOCALIZACIÓN

La construcción se desarrollará dentro de un predio de propiedad de la Rama Judicial de un área de 4.525,00 m², predio donde actualmente funciona el Palacio de Justicia de la ciudad de Valledupar y que está destinado como área de parqueadero descubierto.

El Palacio de Justicia existente consta de un bloque de 8 pisos y cuenta con las siguientes áreas generales:

- Área bruta total predio: 4.525.00 m²
- Área total edificio ocho pisos: 7.758.21 M²
- Área total neta del uso edificio ocho pisos: 5.386.83 M²
- Ocupación edificio ocho pisos: 1.063,61 m²

El predio se encuentra ubicado geográficamente, dentro de la COMUNA 1, barrio catastral 01-01-0468- denominado “ALFONSO LOPEZ”, cuya ubicación geográfica responde a las siguientes coordenadas:

- 10°28'27.4"N ,73°15'07.6"W.

Los datos del inmueble son los siguientes:

- Nomenclatura: Calle 14 No. 12-189
- Matrícula Inmobiliaria No: 190-33450 predio total
- Código Único Catastral: 01-01-0468-0002-000

- Escritura Pública: No. 2105 del 10 de agosto de 1984



Figura No. 1 Localización del proyecto.
Fuente: *Estudios previos del proyecto*

Linderos:

- Norte: 67.50 m
- Este: 84.65m
- Sur: 77 m
- Oeste: 49.45 m



Edificio actual del Palacio de Justicia



Zona en donde se ejecutará el proyecto, parqueadero actual del Palacio de Justicia.

Las principales vías de acceso a los frentes de obra son; Carrera 14 y la calle 14.

Debido al poco espacio en la obra se instalará un campamento, pero la oficina administrativa se ubicará fuera del proyecto, lo más cercano posible al frente de obra.

Tabla 1. Información del proyecto.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
Razón social:	Consorcio Obras Judiciales.
Nit:	901665448-8
Objeto del proyecto	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar).
Ciudad: Dirección:	Bogotá Carrera 61 # 100-68
Celular:	3004708 / Cel: 3014683375
Representante legal	Víctor Anderson Valbuena Quiroga
Duración del Proyecto:	35 meses

1.2. Características técnicas del proyecto

El proyecto contempla un recorrido vertical en 11 niveles y 2 sótanos. Un acceso de funcionarios y zona de archivo se ubican en el primer piso, en los tres siguientes niveles se localizan servicios netamente públicos con acceso diferenciado. El acceso de usuarios se encuentra en el piso 1 el cual distribuye a los pisos superiores rematando en el piso 10. Es importante resaltar que por funcionamiento de la entidad y su nivel de seguridad se plantean dos puntos fijos diferenciados para la atención del público y otro para el transporte de los funcionarios con circulaciones que no contemplan contacto son los usuarios.



Plano TOP Valledupar

2. OBJETIVO GENERAL

Establecer el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para la ejecución del proyecto "Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar", en el departamento del Cesar, con el fin de ofrecerle a los usuarios y a los equipos de trabajo un espacio con mejor infraestructura el área de estudio y la zona de influencia, reconocer los posibles impactos ambientales, las medidas y acciones de manejo ambiental que se deben implementar durante la intervención en los frentes de obra.

Objetivos específicos

Recolectar información para establecer la demanda de recursos naturales, al igual que los permisos por su uso y aprovechamiento, que se requieran tramitar ante las autoridades ambientales y que son parte integral de PGAS, es decir, los requerimientos y obligaciones que de ellos se emanen.

Respetar el entorno donde se desarrollarán las obras; la eliminación, el control, la prevención y la compensación ante posibles impactos ambientales y sociales negativos, a través de la implementación del PGAS y cada uno de sus programas y proyectos, que se determinen de acuerdo con el proyecto a ejecutar y el estudio previo según el alcance de la obra proyectada.

Conocer y establecer comunicación con las autoridades ambientales y en general, instituciones, operadores de servicios públicos, comunidad y todas las entidades que puedan estar involucradas en el proceso constructivo, el establecimiento de buenas relaciones, así como también la atención y solución de quejas, peticiones o reclamos que se puedan generar durante la ejecución del proyecto.

- Determinar los indicadores de gestión, según los programas y proyectos identificados, que pueden desarrollarse en cada Contrato para conformar el seguimiento y el nivel de cumplimiento ambiental.

El principal responsable del diseño e implementación y seguimiento del PGAS es el director de proyecto, quien provee los recursos necesarios y suficientes para el desarrollo del PGAS de acuerdo con el análisis de las diferentes actividades de obra y no solo interviene el Residente ambiental.

En pago del PGAS está inmerso en el presupuesto de obra y el pago no se realiza por separado de las actividades ambientales y sociales.

3. METODOLOGIA

La metodología para implementar para la realización del Plan de Gestión Ambiental y Social es en primera instancia la Guía PGAS DEAJ, la recolección y análisis de información, los estudios previos, pliego de condiciones, información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, CORPOCESAR, entre otras.

De acuerdo con la información recolectada se elaborará un diagnóstico de la situación actual para el área de influencia directa e indirecta.

4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Excavación mecánica en material común para elemento - incluye la conformación de taludes y trincheras del proceso constructivo. Esta actividad se hará de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en el estudio de suelos, las recomendaciones estructurales y las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. - incluye retiro y disposición final
Excavación mecánica en Roca para conformación de huellas de elementos de cimentación.
CAISSON
Excavación manual caissón constructivos. Excavación manual en Roca para conformación de huellas de elementos de cimentación. Perfilado fondo de excavación
Suministro e instalación de anillos de caissón en concreto tipo_1 3000 psi incluye posterior demolición - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento)
suministro y manejo de acero 60.000 psi/420 mpa.
Fundición de solado de limpieza en concreto
bases en concreto ciclópeo tipo_1 3000 psi - 60% rajón 40% concreto
zapatas en concreto tipo_1 5000 psi Zarpa muro de contención tipo_ 2 4000 psi
suministro e instalación de pañete de taludes según estudio de suelos
Vigas de cimentación en concreto tipo_1 5000 psi
Suministro e instalación de concreto 1 5000 psi (concreto de limpieza) Suministro e instalación de sistema de drenaje con Geodren vial Suministro e instalación de sistema de Tecdren
Replanteo de estructura
Columnas rectangulares en concreto a la vista tipo _1 de 6000 psi.

5. OBLIGACIONES DE PERMISOS DE TALA

5.1. GENEREALIDADES

De acuerdo a las obligaciones dadas por CORPOCESAR se están atendiendo las obligaciones impuestas en la Resolución No. 0017 del 28 de febrero del 2023.

6. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL PGAS

A continuación, se describirán todas las actividades, con las respectivas metas de los programas establecidos para la ejecución del proyecto y describir las medidas desarrolladas durante el periodo de este informe.

1. Programa y proyecto del PGAS

De acuerdo con lo establecido en el plan de manejo ambiental, el proyecto se desarrollará desde el proceso ambiental de acuerdo a los programas establecidos durante la ejecución del proyecto:

ítem	Programas	Proyectos	Código
1	Gestión Ambiental del Proyecto	1. Grupo de Gestión Ambiental y Social	1.1-GAP
		2. Trámite y Cumplimiento de Requisitos Legales	1.2-GAP
		3. Capacitación Ambiental y Social	1.3-GAP
2	Componente Abiótico	1.Manejo Integral de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipos	2.1-MCA
		2. Manejo del Recurso Hídrico	2.2-MCA
		3. Control de las Excavaciones y Demoliciones	2.3-MCA
		4. Residuos Sólidos Generados	2.4-MCA
		5. Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas	2.5-MCA
		6.Instalación, Funcionamiento y Retiro de Campamento	2.6-MCA
		7. Manejo de la Maquinaria y Equipos	2.7-MCA
		8. Control de la Calidad del Aire y las Emisiones	2.8 MCA
3	Componente Biótico	1. Manejo de la Fauna Silvestre	3.1-MCB
		2. Manejo de la Vegetación en Obra	3.2-MCB
		2. Protección vegetal del suelo	No aplica
4	Gestión Social	1. Atención a la Comunidad y Autoridades	4.1-GSP
		2. Información y Participación de la Comunidad	4.2-GSP

		3. Manejo de Infraestructura Privada, Pública, de Servicios Públicos, Redes y Activos	4.3-GSP
		4. Gestión de la Mano de Obra	4.4-GSP
		5. Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural	No aplica

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Gestión Ambiental del proyecto	1. Grupo de Gestión Ambiental y Social	1.1-GAP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Cumplir, monitorear y vigilar los planes PGAS, SG-SST, socio ambiental, en la fase de construcción.	Garantizar la estructura de profesionales idóneos, con la preparación y experiencia para cumplir con la gestión legal
El grupo de gestión ambiental y social debe elaborar todos los estudios previos para la elaboración del PGAS e implementarlo y cumplir con la gestión tanto preventiva, como la de control, mitigación y compensación en los casos que se requiera.	Garantizar el desarrollo de la obra cumpliendo con las medidas de manejo y protección del medio ambiente, aplicando las medidas de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de los habitantes del sector y del personal vinculado a las obras.

IMPACTOS POTENCIALES

Alteración de las actividades cotidianas	Contaminación del suelo
Quejas y reclamos de la comunidad	Contaminación del aire
Vandalismo	Contaminación del agua

TIPO DE MEDIDA

Control	**x**	**Prevención**	**x**	**Mitigación**	**x**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Una de las estrategias para asegurar una correcta implementación del plan de manejo ambiental durante la ejecución del proyecto, es contar con profesionales que conforman el grupo de gestión ambiental, los cuales reportan al director del proyecto las diferentes actividades con el fin de coordinar y alinear el proceso constructivo.

En el mes de septiembre de 2023 continua el grupo ambiental y como evidencia se presenta en el anexo 2.

Dando cumplimiento a la ficha ambiental a continuación se relaciona el personal miembro del grupo ambiental.

Cargo	Nombre y Apellido	Dedicación	# de contacto
Director de Proyecto	Ferney Peña Rojas	100%	3102981094
Ing. Residente de Obra	Emel Larios	100%	3014683375

Residente Ambiental	Mabely Toncel	50%	301 4683375
Administrativa	Wendy Quiroz	100%	311 8884207
Residente SST	Luz Damaris Salcedo	100%	312 4598360

- **Reuniones y comités de seguimiento**

En este periodo se continua con los comités internos del proyecto para seguir implementando y monitoreando las diferentes actividades ambientales.

Durante el mes de septiembre se realizaron charlas, socialización y capacitación de temas ambiental con el fin de recordar al personal en obra, las medidas de manejo y protección del medio ambiente. Las actividades mencionadas se evidencian en el siguiente informe.

De igual forma se evidencia reunión realizada con el equipo ambiental donde se trataron temas como:

Sitio asignado para la siembra de los árboles en cumplimiento a lo requerido por la entidad de Corpocesar en compensación por la tala de árbol realizada en el proyecto.

Se solicita nuevamente a la empresa DESCONT (Proveedor gestora de residuos peligros y aprovechables) licencia de funcionamiento con el fin de verificar la acreditación de la entidad, para posteriormente radicar a interventoría para su aprobación.

Se radica ante la entidad de Corpocesar Oficio CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC-381 RADICACIÓN INFORME FORESTAL. Recibido con radicado número 08984. Oficio CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC-388 REITERACIÓN RADICACIÓN PGAS. Recibido con radicado número 09261. CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC-400 RESPUESTA PETICIÓN RADICADO Nos 07908, 07010 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023. Recibido con Radicado numero 09592 CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC-403 RADICACIÓN INFORME TRIMESTRAL. Recibido con radicado número 09739

	
Fotografía No. 1 Acta de Reunión	Fotografía No. 2 Evidencia asistencia reunión

FECHA	TEMA	OBJETIVO
02/09/2023	Protección de la flora y de la fauna.	**Charla:** Se realiza charla con el tema mencionado, debido a la necesidad de concienciar al personal sobre la importancia y responsabilidad que témenos con la flora y la fauna.
05/09/2023	Protección de los recursos hídricos, prohibiciones, permisos y obligaciones al respecto.	**Charla:** Al objetivo de esta charla es busca dar un buen manejo al agua y así ayudar a proteger los recursos hídricos en el proyecto.
08/09/2023	Manejo de los residuos líquidos o vertimientos, permisos y obligaciones al respecto.	**Charla:** Se realiza charla al Personal con el objetivo de prepararlos para que se maneje con efectividad los residuos líquidos, o vertimientos generados en obra.
09/09/2023	Manejo integral de residuos sólidos, domésticos y peligrosos	**Socialización:** Con esta socialización se busca lograr un manejo ambientalmente adecuado de los residuos sólidos, domésticos y peligrosos generados en obra.
14/09/2023	Manejo de materiales sobrantes y materiales de construcción.	**Socialización:** El objetivo de este tema son socializar las medidas a tomar para el manejo y y disposición final de los materiales sobrantes en la contracción.
16/09/2023	Responsabilidad social en un adecuado manejo ambiental en obra.	**Socialización:** se realiza la socialización con el objetivo de concienciar al personal la responsabilidad que tiene cada uno de ellos con el cuidado y manejo ambiental en obra.
18/09/2023	Cambios climáticos	**Socialización:** Se tratan temas sobre los cambios de temperatura a los que estamos expuestos. Las causas de estos cambios climáticos y las medidas que debemos tomar para prevenir lesiones por las temperaturas extremas (calor) que se presentando.

21/09/2023	Ahorro de recursos hídricos.	**Capacitación:** Sensibilizar al personal Sobre la protección de unos de los recursos naturales más valiosos y a la vez más amenazados del planeta.
23/09/2023	Respeto mutuo entre compañeros.	**Charla:** Se realiza la charla con el fin concientizar al personal en obra que todos merecen respeto incluyendo las opiniones de los demás sin importar que estemos o no de acuerdo.



Fotografía No. 3



Fotografía No. 4



Fotografía No. 5



Fotografía No. 6

INDICADORES DE SEGUIMIENTO				
Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis


Número de profesionales que componen el grupo de gestión ambiental	No. de profesionales contratados / No. profesionales propuestos	Mensual	5 / 5	Positivo

SOPORTES DE SEGUIMIENTO


Una de las estrategias para asegurar una correcta implementación del plan de manejo ambiental durante la ejecución del proyecto, es contar con profesionales que conforman el grupo de gestión ambiental, los cuales reportan al director del proyecto las diferentes actividades con el fin de coordinar y alinear el proceso constructivo.

Anexo 1.


- Soporte Asistencia a charlas, Socialización y capacitación ambiental realizadas al personal durante el mes de septiembre 2023.

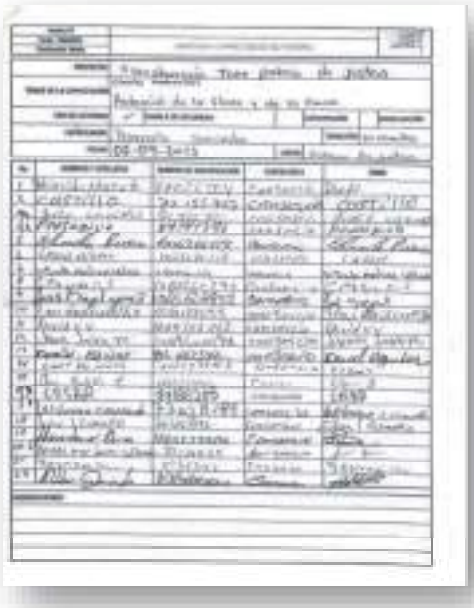


Fotografía No. 7

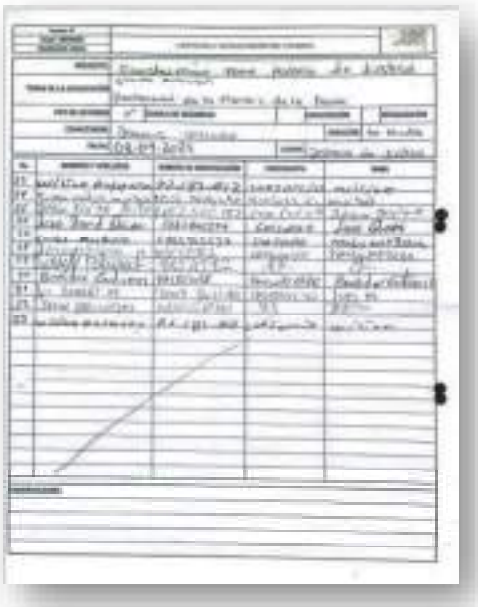


Fotografía No. 8

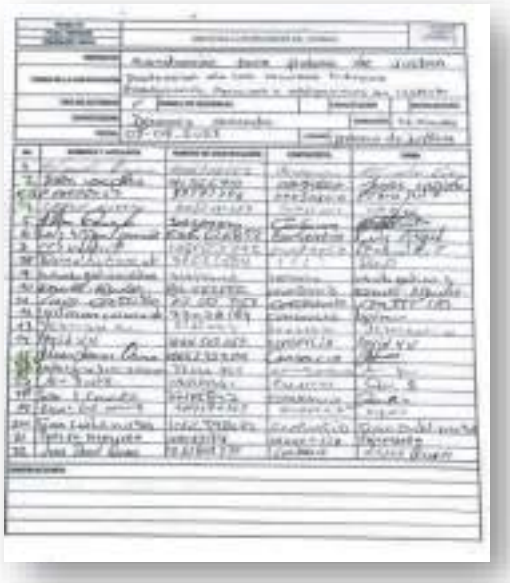


Fotografía No. 9

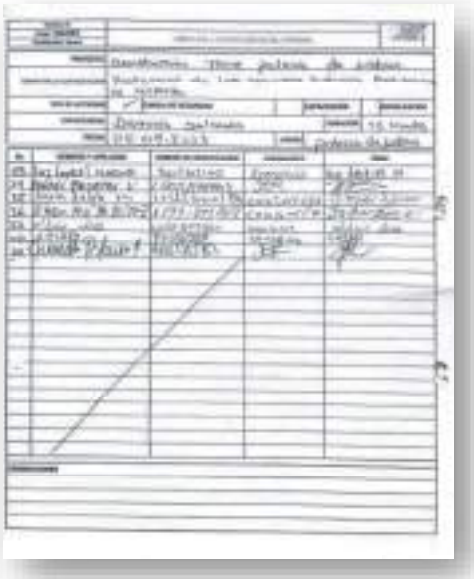




Fotografía No. 10

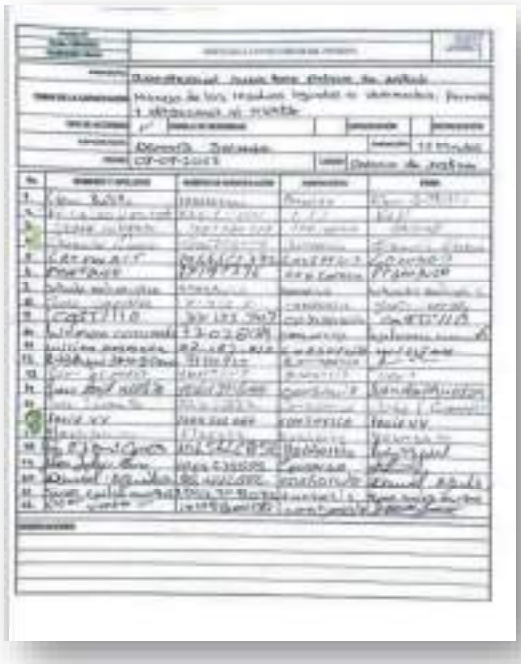


Fotografía No. 11

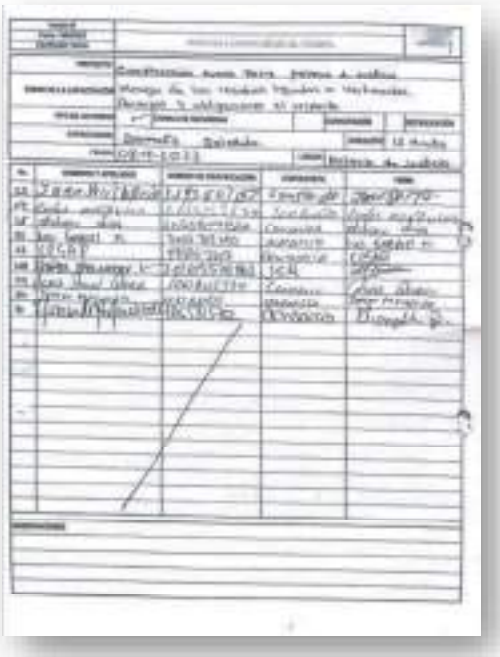


Fotografía No. 12

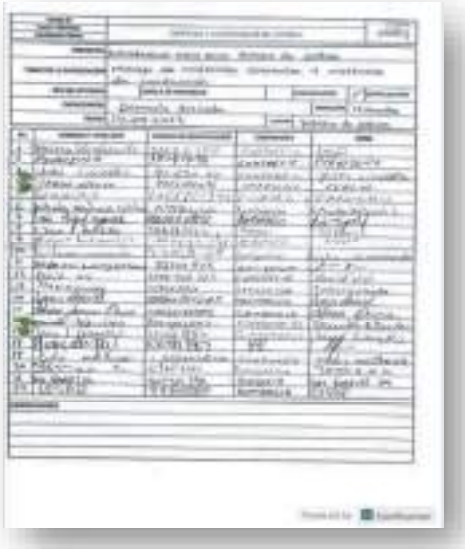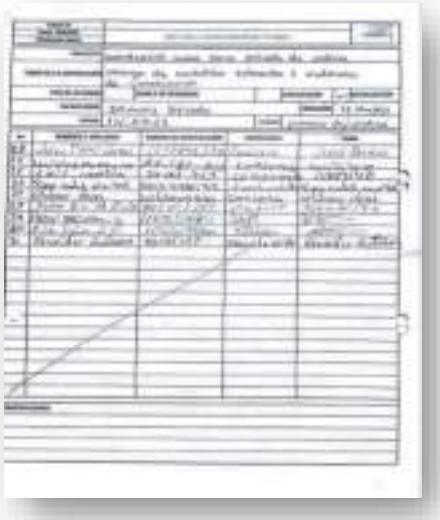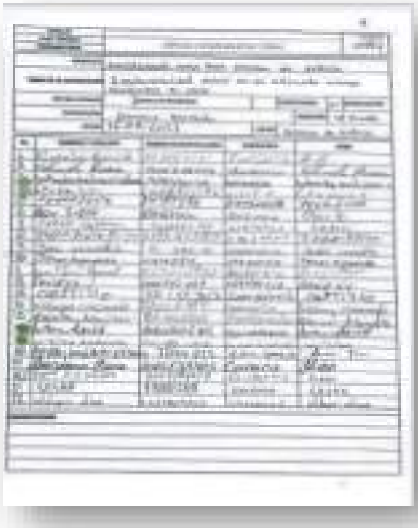
	
Fotografía No. 13	Fotografía No. 14
	
Fotografía No. 15	Fotografía No. 16

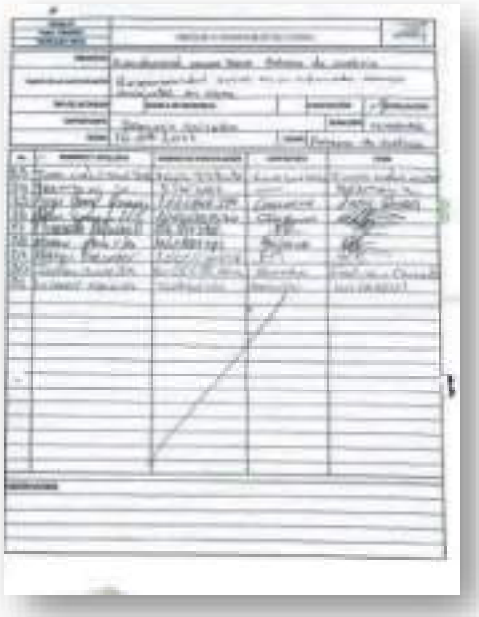


Fotografía No. 17

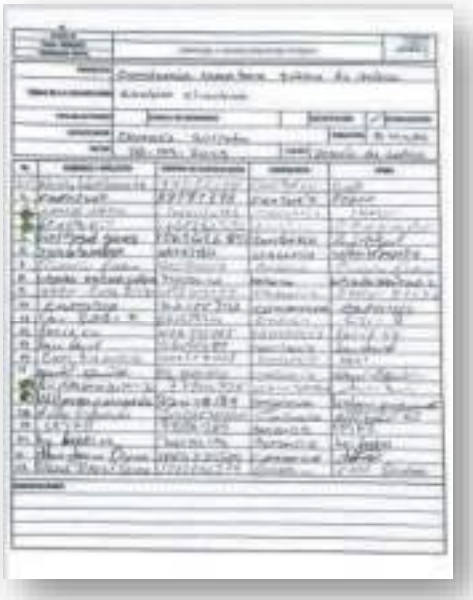


Fotografía No. 18

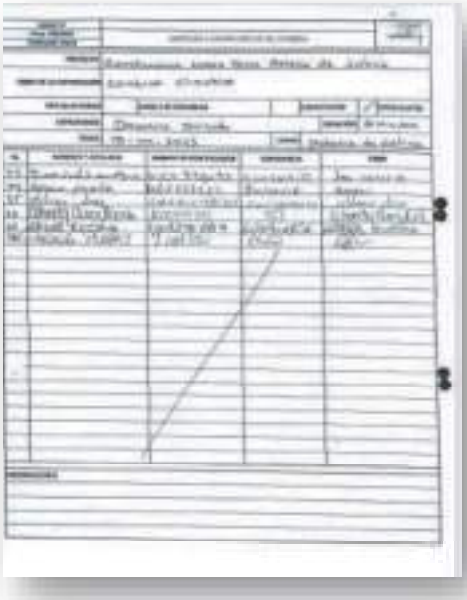


Fotografía No. 19

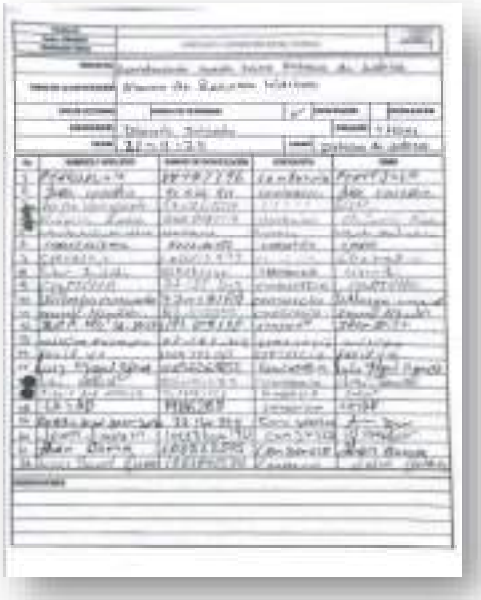


Fotografía No. 20

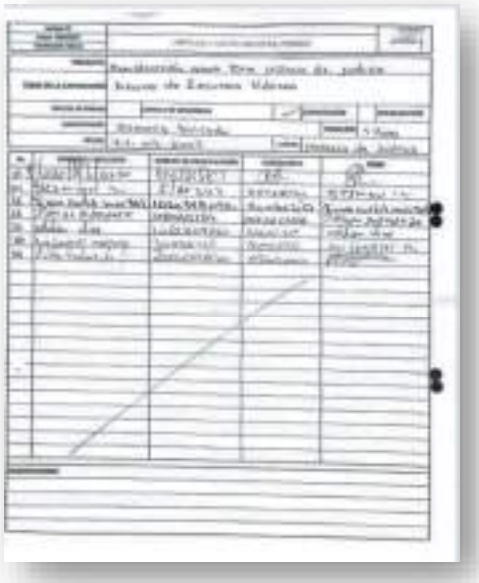

Fotografía No. 21

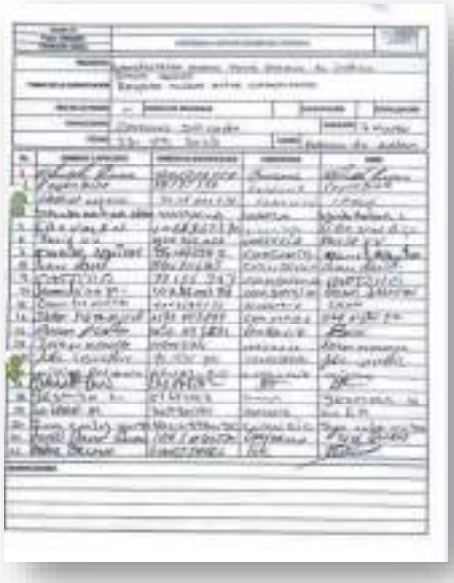

Fotografía No. 22

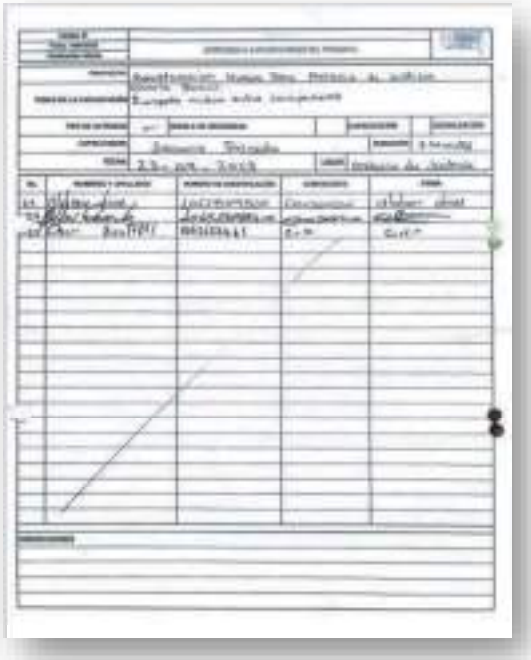

Fotografía No. 23

Estas reuniones se desarrollarán mensualmente hasta terminar el contrato.

- **Reuniones y comités de seguimiento**

Se informa en el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2023 la realización de la reunión del grupo ambiental (anexo acta) del proyecto en donde se reitera al equipo el PGAS, al igual que los comités internos del proyecto para implementar y monitorear las diferentes actividades ambientales.



Fotografía No. 24 Acta de Reunión



Fotografía No. 25 evidencia asistencia reunión

Por otra parte, se tiene comité con interventoría donde se trataron los siguientes temas ambientales en el periodo comprendido en el informe: Ampliación de la resolución 0017 del 28 de febrero del 2023, solicitud relación de proveedores gestores de residuos peligrosos, residuos aprovechables, sitio asignado por Corpocesar para la siembra de árboles. Radicado informe Forestal, radicación informe trimestral de acuerdo a la resolución 1257 de 2021 Anexo 5.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADA/RECIBIDA	DESTINATARIO
08/09/2023	381	Radicado informe forestal	enviado	Corpocesar
12/09/2023		Recibido con radicado numero 08984	recibido	Corpocesar
15/09/2023	388	Reiteración radicación PGAS	enviado	Corpocesar
18/09/2023		Recibido con radicado número 09261.	recibido	Corpocesar
18/09/2023	400	Respuesta petición radicados Nos. 07908, 07010.	enviado	Corpocesar
18/09/2023		Recibido con radicado número 09592.	recibido	Corpocesar
18/09/2023	403	Radicación informe trimestral	enviado	Corpocesar

18/09/2023		Recibido con radicado número 09739.	recibido	Corpocesar

- **Anexos:**

Oficios enviados y recibidos sobre temas ambientales



Fotografía No. 26 Radicación informe Forestal



Fotografía No. 27 Radicación informe Forestal.



Fotografía No. 28 Reiteración radicación PGAS



Fotografía No. 29. Respuesta petición radicados Nos. 07908, 07010.



Fotografía No.30. Respuesta petición radicados Nos. 07908, 07010.



Fotografía No.31. Radicación informe trimestral.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
PROGRAMA	**PROYECTO**		**IDENTIFICACION**
Gestión Ambiental del proyecto	2. Tramite y cumplimiento de requisitos legales		1.2.-GAP
OBJETIVOS DEL PROYECTO			
Garantizar el cumplimento de las obligaciones del Consorcio de identificar, tramitar y/u obtener todos los permisos de acuerdo con la legislación colombiana y el cumplimiento de las normas locales de la ciudad de Valledupar		Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y con las obligaciones contractuales entre la Nación	
Cumplir con los requisitos adquiridos derivados de los permisos que se deban generar para la ejecución del		Revisar el estado, alcance y condiciones específicas de todos los permisos y licencias que debe tener el	

proyecto	proyecto.
IMPACTOS POTENCIALES	
Alteración de las actividades cotidianas	Contaminación del suelo
Quejas y reclamos de la comunidad	Contaminación del aire
Vandalismo	Contaminación del agua

TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Del proyecto del Consorcio Obras Judiciales seguimos identificando todos los requisitos legales y permisos a tramitar, cambios y novedades normativas.

Los permisos identificados son los siguientes:

- **Seguimiento de la licencia o permisos**

TIPO DE PERMISO	ENTIDAD	ACTO ADMINISTRATIVO	PLAZO
Tala de arboles	Corpocesar	Resolución No. 0017 del 28 de febrero del 2023	Seis (6) meses
Radicación del PG-RCD	Corpocesar	Fecha de radiado 02/03/2023	Duración del proyecto
solicitud vertimientos de Aguas Residuales	Corpocesar	Abril 27 del 2023	Duración del proyecto

- **Permisos ambientales de proveedores**

Agregados

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN m³	FUENTE	TITULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL	CESIÓN DE DERECHOS	RUCOM
Arena	24 m³	Pavimentos el dorado S.A.S	Resolución 0282 del 06/10/2020	N° 0167-2-20	RUCOM-2022080122230
Gravilla	24 m³	Pavimentos el dorado S.A.S	Resolución 0282 del 06/10/2020	N° 0167-2-20	RUCOM-2022080122230

RELACIÓN INGRESO MATERIALES PETREOS A OBRA.		
MES	**CANTIDAD GRAVA 3/4**	**CANTIDAD ARENA**
ENERO	0	0
FEBRERO	0	0
MARZO	0	0
ABRIL	16	16
MAYO	32	32
JUNIO	56	40
JULIO	48	40
AGOSTO	48	40
SEPTIEMBRE	24	24
TOTAL	**224**	**192**

Concretos

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN m3	FUENTE	TITULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL	CERTIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL CON LOS DATOS DEL PROYECTO
Concretos plástico asent.6"+/-1" 3000 psi 3/4"	640	Argos	Se ha desarrollado la construcción de los caissón en concreto de 3000 psi. Se realiza fundida de zapata en concreto 5000 psi.	
concretos plástico asent.6"+/-1" 4000 psi 3/4	5500	Argos		
concretos plástico asent.6"+/-1" 5000 psi 3/4"	1540	Argos		
concretos plástico asent.6"+/-1" 6000 psi 1"	640	Argos		

Disposición de RCD pétreos y no pétreos

TIPO DE RDC	VOLUMEN PROYECTADO m³	SITIO DE DISPOSICIÓN	PERMISO AMBIENTAL
RCD	1.144 m³	AGREGADOS DEL CESAR.	Auto 432-09-10-2019 RCD
Excavación de material común	0		
Excavación en roca	915,2 m³		
RESPEL	4 kl.	A la fecha se tienen acopiados en obra a espera de	

		documentación de funcionamiento de empresa gestora de residuos peligrosos.

	
Fotografía No.32. Retiro RCD de obra	Fotografía No.33. Retiro RCD de obra
	
Fotografía No.34. Retiro RCD de obra	Fotografía No.35. Retiro RCD de obra

RCD GENERADOS POR MES	
MES	**CANTIDAD**
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0

JUNIO	3005,76
JULIO	2755,3
AGOSTO	108,28
SEPTIEMBRE	1144
TOTAL	**7181,34**

Para los materiales de construcción y sitios de disposición de escombros el Consorcio Obras Judiciales adjuntará en cada informe la certificación del titular del permiso o licencia, manifestando la prestación del servicio o venta de materiales, en donde se indica el objeto del contrato.

En el periodo de este informe no se evidencian hallazgos arqueológicos.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Obligaciones y requerimientos de las autoridades ambientales	No. de requerimientos de autoridades	Anual	2	50 % (Compra y Siembra de árboles)
Permisos, autorizaciones o concesiones	No. Permisos otorgados por la autoridad / No. Permisos identificados en el proyecto	Mensual	1	100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Licencias ambientales de las canteras y demás proveedores - resolución de tala (hacer listado y en una sola carpeta)

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Gestión Ambiental del Proyecto	Capacitación Ambiental y Social	1.3 - GAP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto, en lo relacionado con los temas de carácter ambiental, social y técnico de la obra	Garantizar el desarrollo de la obra cumpliendo con las medidas de manejo y protección del medio ambiente, aplicando las medidas de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de los habitantes del sector y del personal

	vinculado a las obras.
Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y con las obligaciones contractuales entre la Nación	

IMPACTOS POTENCIALES

Alteración de las actividades cotidianas	Quejas y reclamos de la comunidad
Vandalismo	

TIPO DE MEDIDA

Control	**x**	**Prevención**	**x**	**Mitigación**	**x**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

El Consorcio Obras Judiciales establece en el anexo 2, el cronograma de charlas, Socialización y capacitación ambiental y social.

Tema de capacitación	Fecha
Protección de la flora y de la fauna.	02/09/2023
Protección de los recursos hídricos, prohibiciones, permisos y obligaciones al respecto.	05/09/2023
Manejo de los residuos líquidos o vertimientos, permisos y obligaciones al respecto.	08/09/2023
Manejo integral de residuos sólidos, domésticos y peligrosos	09/09/2023
Manejo de materiales sobrantes y materiales de construcción.	14/09/2023
Responsabilidad social en un adecuado manejo ambiental en obra.	16/09/2023
Cambios climáticos	18/09/2023
Ahorro de recursos hídricos.	21/09/2023
Respeto mutuo entre compañeros.	23/09/2023

Para el cumplimiento de esta ficha ambiental todas las capacitaciones son de carácter obligatorio para los colaboradores del proyecto y el director de obra garantiza y autoriza la ejecución de las mismas.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO				
Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Capacitaciones cumplidas	No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas	Mensual	09 / 09	100%
Personal Capacitado	No. Personal Capacitado / No. de personal laborando	Mensual	38	100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO
Durante el mes de septiembre se realizaron 3 charlas Ambientales 1 charla social 1 capacitación, 4 socialización al personal en obra con el fin de retroalimentar temas ambientales y social.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Manejo Integral de materiales de construcción, Mobiliario y Equipos	2.1 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO	
Establecer las medidas de control, prevención y mitigación de impactos que puedan generar el manejo integral de los materiales de construcción en obra.	Implementar medidas para el manejo de los materiales de construcción, para prevenir y/o mitigar los impactos que se pueden generar por manejos inadecuados de los materiales de construcción y los equipos vinculados.
Cumplir con la Legislación Colombiana actual vigente	

IMPACTOS POTENCIALES	
Contaminación del aire (emisiones de material particulado e incremento en los niveles sonoros)	Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.)
Contaminación del suelo	Alteración calidad visual
Riesgo de Accidentalidad	Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores.

TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Agregados Pétreos (arenas y triturados frente de obra):

- el Consorcio Obras Judiciales, está realizando la compra de materiales pétreos solo en canteras que cuentan con permisos ambientales, licencias ambientales y mineros, teniendo especial cuidado en que estén vigentes los permisos y que no se encuentren vencidos, cancelados o suspendidos.

En este periodo ingresaron las siguientes volquetas al proyecto:

	
Fotografía No 36. Suministro de gravilla	Fotografía No 37 Suministro de arena

En el frente de obra se tienen los siguientes materiales pétreos: Se cuenta con material en obra.

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN	FUENTE	TITULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL	CERTIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL CON LOS DATOS DEL PROYECTO
Arena	24 M3	Cantera	Resolución 0282 del 06/10/2020	SI
Gravilla	24 M3	Cantera	Resolución 0282 del 06/10/2020	SI

RELACIÓN INGRESO MATERIALES PETREOS A OBRA.		
MES	CANTIDAD GRAVA 3/4	CANTIDAD ARENA
ENERO	0	0
FEBRERO	0	0

MARZO	0	0
ABRIL	16	16
MAYO	32	32
JUNIO	56	40
JULIO	48	40
AGOSTO	48	40
SEPTIEMBRE	24	24
TOTAL	**224**	**192**

Anexo No. 01. Resolución Licencia Ambiental

- En caso de lluvias, disturbios o por exigencias legales, el material de construcción que se encuentre en la obra que no se utilice, se acordonará (como mínimo con señalizadores tubulares y cinta de señalización) y protegerá de la acción de las precipitaciones o el viento cubriéndolos con lonas o plástico, delimitándolos con barreras de contención como ladrillos y alejados de los drenajes superficiales de agua, o sumideros.

- En cada frente de obra y según el programa de inspecciones planeadas, se realizarán inspecciones a los acopios temporales de materiales de construcción, identificando condiciones de señalización y cubrimiento del material.

TIPO DE MATER	FECHA
Arena	A la fecha no se tiene material acopiado en obra.
Gravilla	A la fecha no se tiene material acopiado en obra.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO				
Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Fuentes de materiales con permisos vigentes	No. Fuentes con permisos vigentes / No. Fuentes de materiales presentadas	Mensual	1/1	Cumplido 100 %
Volumen de material en obra (por cada tipo de materiales)	Volumen certificado por fuentes autorizadas / Volumen de materiales ingresado a la obra	Mensual	100 / 100	Cumplido 100 %
SOPORTES DE SEGUIMIENTO				

Agregados Pétreos (arenas y triturados frente de obra)

- Arena
- Gravilla ¾"



Fotografía No. 38. Certificado cantidad de material pétreos ingresados a obra – septiembre 23

Concretos

- Se ha realizado concretos en obra de 3000 psi para la construcción de anillos para caissón



Fotografía No. 39 para el mes de septiembre ingresaron a obra 100 bolsas de cemento marca Argos.
Prefabricados • Certificados de calidad.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Componente Abiótico	Manejo del Recurso Hídrico	2.2 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Establecer la demanda del recurso hídrico en el proyecto REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR), y determinar las medidas de manejo de acuerdo con la normatividad vigente, estableciendo controles de protección y prevención de impactos.
Prevenir, minimizar y controlar los impactos en el recurso hídrico con el fin de llevar a cabo acciones de seguimiento y control para prevenir posibles modificaciones a las características fisicoquímicas e hidrobiológicas de los cuerpos de agua en la zona de influencia del proyecto, por actividades derivadas de la ejecución del contrato.
Implementar las acciones para realizar el manejo adecuado de las aguas de escorrentía, los residuos líquidos y sólidos para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua existentes en el área de influencia del proyecto.
Minimizar los impactos que se puedan generar a partir de la construcción del proyecto.

IMPACTOS POTENCIALES	
Contaminación por escorrentía superficial	Contaminación del suelo
Incremento en la demanda de bienes o servicios	Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores.

TIPO DE MEDIDA							
Control		**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS
El Consorcio ha identificado que el agua que se utiliza en el proyecto se hará a través de un contador independiente del Palacio de Justicia de Valledupar para el desarrollo del proyecto, que el agua será con acometida la cual se ha solicitado directamente por el proyecto a EMDUPAR con solicitud número: CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-006 y se hará el pago de servicio de manera independiente del Palacio de Justicia. Para el mes de septiembre Emdupar hace la entrega de la factura de consumo del agua gastada en obra.

	
Fotografía No 40. Consumo de agua a la fecha 30/09/2023	Fotografía No 41 Pago Factura Consumo de agua a la fecha 30/09/2023

Uso eficiente del recurso agua

- No se tienen cuerpos de agua cerca al proyecto, los sumideros aledaños al proyecto serán protegido con poli sombra con el fin de evitar el arrastre de material o sedimentos que puedan llegar a obstruir o contaminar los cuerpos de agua.
- No se presenta ni desviación ni canalización de cauces de ríos o cuerpos de agua cercanos al proyecto.
- Se puede reutilizar las aguas lluvias para su reutilización como aguas grises (uso y arrastre en aparatos sanitarios y para riego).

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Control de la calidad del agua	No. parámetros que cumplen norma de referencia / No. parámetros medidos de calidad del agua	No aplica para el proyecto	0 / 0	100%
Obras para el control de sedimentos	No. obras de control de sedimentos construidas / No. obras de control de sedimentos planeadas	Mensual	0 / 0	No hay fracturado para controlar 100%
Consumo de agua en obra	Vol. Agua certificada para consumo en obra / Vol. Agua consumida durante el en obra	Mensual	000020	Se evidencia en la factura emitida por Endupar. 100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

El soporte de seguimiento de esta ficha se realizará a través de:

- Cumplimiento de indicadores formato de la entidad.
- Registro fotográfico.
- F-EVSG-19 Control Consumo Agua formato de la entidad.



Fotografía No 42. Consumo de agua en obra a la fecha. 30//09/2023

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Componente Abiótico	Control de la excavación y demoliciones	2.3 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO	
Realizar el control de las demoliciones y excavaciones, cumpliendo con la normatividad legal vigente ambiental, Implementando las medidas de control y mitigación en la ejecución de las actividades de obra, transporte y disposición o su reutilización	Efectuar un manejo adecuado de los materiales resultantes de las excavaciones, como de los materiales que se utilizarán en la conformación de rellenos, bases con el objetivo de prevenir los impactos.
Disminuir el riesgo de afectación a redes de servicios públicos enterradas. Cumplir con la normatividad legal vigente.	Utilización de todo el material de descapote obtenido en las excavaciones, en la conformación de zonas verdes de la obra o para la recuperación de otras zonas ubicadas dentro de la zona de influencia del proyecto
Prevenir accidentes que se pueden presentar con el personal de la obra, peatones y vehículos.	Disponer todo el material sobrante de excavación generado, en el sitio autorizado para tal fin

IMPACTOS POTENCIALES	
Contaminación del aire (emisiones de material particulado e incremento en los niveles sonoros)	Generación y aporte de sólidos por escorrentía en redes de alcantarillado
Alteración de la calidad visual	Afectación de la cotidianidad
Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.).	Riesgo de Accidentalidad

TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

En el proyecto no se podrá hacer limpieza manual de la vegetación de la zona de obra ya que en la actualidad se tiene una placa de concreto lo cual impide tener suelo orgánico en caso de que se encuentre solo se extrae el suelo orgánico con un espesor de 0,1 metros a 0,5 metros, según las especificaciones y la interventoría del proyecto se indicará la cantidad de material a utilizar con los equipos apropiados, en donde se pueda prevenir daños a las estructuras aledañas.

El área a excavar no presenta potencial arqueológico, pero en el momento que se presente se tomaran las medidas establecidas en la ficha Protección del patrimonio arqueológico y cultural, la cual será incluida en el presente documento.

Excavaciones

A la fecha se han realizado actividades de excavación

Actividad	Cantidad m³
Excavación	1.144 m³
Demolición	0
Excavación en roca	915,2

- Una vez se tengan identificadas las estructuras que deben ser demolidas, los residuos resultantes y que no puedan ser reutilizados serán dispuestos en los siguientes sitios de disposición:

EXPEDIENTE	SITIO DE DISPOSICIÓN	ACTIVIDAD QUE REALIZA	LOCALIZACIÓN
Auto No. 432	Agregados del Cesar E. U	Gestor de RCD de puntos limpios y plantas de aprovechamiento y sitios de disposición final	Sede Operaria: Km 3 Vía a La Mesa – Valledupar – Cesar

El auto No. 432 del 10 de octubre del 2019 Corpocesar emitió el respectivo permiso de este gestor

Transporte

En este periodo ingresaron las siguientes volquetas al proyecto:

Anexo: 2 Soporte Soat, Licencia de conducir, Tecno mecánica.

PLACA VOLQUETA	SOAT	LICENCIA DE CONDUCIR	TECNOMECANICA VIGENTE
PKB 173	X	X	X
UZA 362	X	X	X
FDJ 465	X	X	X

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Sitios de disposición de escombros y excavaciones	No. Sitios de disposición autorizados / No. Sitios de disposición de escombros necesarios	Mensual	1/1	Agregados del Cesar E. U 100%
Material dispuesto en sitio de disposición autorizado	Volumen de materiales dispuestos en sitio autorizados / Volumen de material para disposición final	Mensual	1.144 m³ / 1.144 m³	Agregados del Cesar E. U 100%
Material reutilizable	Volumen reutilizado en obra o por terceros / Volumen de material reutilizable.	Mensual	0	N/A
Reutilización de descapote	Volumen descapote reutilizado en el proyecto/ Volumen descapote obtenido y almacenado	Mensual	0	N/A

SOPORTES DE SEGUIMIENTO



Fotografía No 43. Certificado Recepción material RCD

Excavaciones

- Registro Fotográfico

	
Fotografía. No. 44 excavación y fundida de solado, zarpa e instalación de filtro, Geodren, Tecdren.	Fotografía No.45 excavación y fundida de solado, zarpa e instalación de filtro, Geodren, Tecdren.

Transporte

- Registro Fotográfico

	
Fotografía No 46. Transporte de arena de Rio.	Fotografía No 47. Transporte de gravilla

Versión: 02	INFORME	
Fecha: 25/05/2022	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO PGAS	
Clasificación: Interno		

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Residuos sólidos generados	2.4 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Aplicar por parte del Consorcio Obras Judiciales las políticas ambientales en cuanto a la disminución en la generación de residuos sólidos.
El Consorcio Obras Judiciales cumple para la ejecución del proyecto las condiciones legales desde la clasificación, almacenamiento, presentación y disposición final de los residuos sólidos con el gestor autorizado.
Implementar medidas para el manejo de los residuos sólidos, para prevenir y/o mitigar los impactos que se pueden generar por manejos inadecuados de este tipo de residuos.
Cumplir con la Legislación Colombiana actual vigente.

IMPACTOS POTENCIALES

Contaminación del suelo	Alteración calidad visual
Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores.	Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.)

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

El Consorcio Obras Judiciales este encargado de gestionar los residuos en la obra, de acuerdo con las normas ambientales en Colombia.

En el proyecto se establece un sitio, el cual tenga sea de fácil acceso, el cual tiene como objeto al destinado al almacenamiento de RCD's, esta zona debe tener la señalización de acuerdo al tipo de residuo que se dispone, y debe estar el residuo confinado y el suelo debe contar con recubrimiento en polietileno de alta densidad, La estructura no debe encontrarse cerca de cuerpos de agua artificiales o naturales, los sumideros del área de influencia del proyecto deben estar cubiertos y realizarse manteniendo frecuente.

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD	SITIO DE DISPOSICIÓN
Material vegetal y suelo orgánico	0	N/A
Chatarra y llantas.	0	N/A
Empaques, envases y embalajes.	0	N/A
Papel blanco oficinas.	15	Se están reutilizando en oficina.
Residuos especiales y/o peligrosos	4 kilos	Punto de acopio
Residuos Orgánicos.	15	Vehículo recolector en áreas de influencias del proyecto.
Basura		Vehículo recolector en áreas de influencias

		2	del proyecto.	

Ubicación de recipientes de recolección de residuos sólidos / Residuos no aprovechables

Ubicar de manera estratégica y visible, recipientes adecuados para la separación en la fuente de los residuos.
Residuos orgánicos: serán entregados a las empresas dedicadas al aprovechamiento de este tipo de residuos que se encuentran en el área de influencia del proyecto o a personas que puedan hacer aprovechamiento de estos residuos en actividades agropecuarias.
Residuos no aprovechables – basuras: estos residuos serán almacenados hasta su recolección por las empresas prestadoras de este servicio para su disposición en el relleno sanitario que se encuentre debidamente autorizados para realzar este manejo.

Caneca color verde: Se deposita residuos orgánicos aprovechables
Caneca color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel, cartón.
Caneca color negro: Para depositar residuos no aprovechables.

Lo anteriormente mencionado es tomado de la resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019, por la cual se modifica la resolución 668 del 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.

Separación de residuos solidos

En los campamentos, instalaciones temporales y áreas de trabajo se realizará la separación de residuos en contendores debidamente marcados según tipo de residuo.

	
Fotografía No 48. Punto ecológico ubicación ingreso a obra.	Fotografía No 49. Punto ecológico obra área de caissón.

Vertimiento de aguas producto de la excavación en obra

Debido a que el proceso constructivo del proyecto presenta un nivel freático alto, es necesario instalar sedimentadores para reducir la turbulencia, velocidad y decantar las aguas productos de las excavaciones por la

cimentación del proyecto, la baja velocidad del flujo de agua permite que las partículas sedimentables se hundan, mientras los componentes que pesan menos que agua floten hacia la superficie, lo que permite el vertimiento de estos residuos líquidos que no son contaminados ya que no tendrán ningún tipo de sustancia química serán reutilizada para humectación, lavado de baños y lavado de llantas (en caso de requerirse) reincorporando en el proceso constructivo este tipo de residuo.

	
Fotografía No 50. Medición nivel freático	Fotografía No 51. Medición nivel freático

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Residuos sólidos convencionales dispuestos en relleno sanitario	RSI dispuesto en relleno sanitario / RSI generados en la obra	Mensual	0/0	No se generó residuos sólidos en obra. 100%
Residuos sólidos reutilizados por gestores construidos	RSR +RSO reutilizados por gestores autorizados / RSR + RSO generados en obra	Mensual	0/0	No se generan residuos sólidos para ser reutilizados por gestores. 100%
Residuos peligrosos manejados por operador autorizado	RSP entregados a gestor autorizado /RSP generados en obra	Mensual	5 kilos	El único RSP generado en obra son Bolsa de cemento se encuentran almacenadas en punto de acopio en espera de

				aprobación del gestor a quien va hacer entregado

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Construcción centro de recolección residuos solidos

- Centro de acopio debidamente señalizado.



Fotografía No. 52. Acopio de Residuos



Fotografía No. 53. Acopio de Residuos

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Residuos líquidos y sustancias peligrosas	2.5 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo de esta ficha ambiental es definir las soluciones y herramientas técnicas para el adecuado manejo, control y aplicación de las contingencias, para el manejo de los residuos líquidos y sustancias peligrosas del proyecto.	Implementar las acciones para realizar el manejo adecuado de las aguas de escorrentía, los residuos líquidos y sustancias peligrosas para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua existentes en el área de influencia del proyecto.
Minimizar los impactos que se puedan generar a partir de la construcción del proyecto	

IMPACTOS POTENCIALES

Contaminación del agua	Contaminación del suelo

Contaminación del aire	Alteración calidad visual
Generación de residuos peligrosos producto de filtros y residuos de grasas y aceites	Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores.

TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Manejo de Aguas residuales domesticas

- La obra tiene cobertura del sistema de alcantarillado, se dispondrá en la obra de baños fijos para los trabajadores los cuales se establece uno para mujeres y tres para hombres, en caso de contingencias, se dispondrán baños portátiles, los cuales contarán con el certificado de manejo adecuado y disposición final de los residuos sólidos y líquidos.

- Los baños cuentan con sanitario y lavamanos, en relación de una unidad sanitaria por cada quince trabajadores, separados por sexo y dotados con jabón desinfectante, papel higiénico, toallas y recipientes para basura.



Fotografía No. 54. Baños



Fotografía No 55. Lavamanos

Residuos Líquidos Industriales

- En el proyecto no se tiene permitido lavar vehículos o maquinaria de obra.
- En el proyecto no se establece la necesidad de tener un contenedor de residuos para este tipo de residuos líquidos industriales, en el caso que por las actividades generadas se requiera y este, se colmate se realiza su limpieza y mantenimiento respectivo.
- No se hará, por ningún motivo, disposición de residuos en los cuerpos de agua superficiales ni en la vía pública, con lo cual se asegura que no se verán afectados como consecuencia de las actividades constructivas.

Residuos de aceite y/o combustibles

En el proyecto no se ha implementado esta actividad debido a que esta actividad no se realiza en obra.

Manejo de Sustancias Peligrosas

- Si se presentan derrames accidentales de aceites, aditivos de concreto, solventes, pinturas no acrílicas, agua-cemento, lubricantes u otras sustancias peligrosas, se debe realizar el procedimiento estipulado en el plan de contingencias y emergencias ambientales y utilizar el kit de derrames del proyecto.

- El almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas, debe ser conforme a las indicaciones de la hoja de seguridad del producto y tener a todo el personal entrenado en su manejo en caso de algún incidente.

- En el lugar de almacenamiento se tiene en cuenta la señalización del sitio.

- Para un apropiado almacenamiento, el Consorcio tiene en cuenta:

a. El volumen máximo de almacenamiento.
b. Volumen máximo de almacenamiento por clase.
c. Secciones de almacenamiento donde están localizadas las distintas clases de sustancias.
d. Cantidad almacenada según sustancias y clases de sustancias.
e. Se tendrá un registro de recepción, despacho e inspección.
f. No se deben mezclar sustancias peligrosas que sean incompatibles para esto se publica la matriz de sustancias químicas.
g. El acopio de recipientes de sustancias combustibles, tóxicas u oxidantes no podrá ser superior a la recomendada según el tipo de recipientes.
h. En el proyecto se implementa un Plan de Contingencias y Emergencias Ambientales por derrame de sustancias peligrosas, socializado a todo el personal que haga parte del proyecto. Este plan se entregará junto con el PGAS
i. En el periodo de realización de este informe no se presentaron derrames o emergencias ambientales
En el proyecto se dispondrá un cuarto de sustancias químicas el cual estará en zona dura y cuenta con un dique de confinamiento en caso de derrames y tendrá una capacidad calculada en 110% del volumen almacenado.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Permiso de vertimientos	No. permisos de vertimientos obtenidos / No. permisos de vertimientos identificados	Mensual	0 / 0	No se tienen baños portátiles en obra 100%
Disposición de residuos líquidos	Volumen de residuos líquidos entregados a un gestor autorizado /	Mensual	0 / 0	No se generan

	Volumen de residuos líquidos generados			residuos líquidos. 100%
Manejo de sustancias peligrosas	Volumen sustancias químicas almacenadas correctamente / Volumen sustancias químicas almacenadas.	Mensual	100 /100 (ingresa cemento a obra)	Al ingresar a obra se acopian en el almacén. 100%
Atenciones incidentes y accidentes ambientales	No. de emergencias atendidas correctamente / No. de emergencias con sustancias peligrosas	Mensual	0/0	No se presentan emergencia con sustancias peligrosas 100%
SOPORTES DE SEGUIMIENTO				
Residuos líquidos				

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Componente Abiótico	Instalación, Funcionamiento y retiro de campamentos	2.6 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO	
Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento en caso de ser necesario construirlo.	Implementar medidas para el manejo de los materiales de construcción, para prevenir y/o mitigar los impactos que se pueden generar por manejos inadecuados de los materiales de construcción y los equipos vinculados.
Restaurar ambientalmente las áreas donde se han llevado a cabo desmantelamientos de instalaciones útiles en el momento de la construcción de obras.	

IMPACTOS POTENCIALES	
Alteración de la calidad paisajística	Alteración de la estabilidad del terreno
Alteración de las características del suelo	Alteración de la calidad de agua por arrastre de sedimentos.

TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación



Fotografía No 56 campamento de obra



Fotografía No 57. Orden y aseo campamento de obra



Fotografía No 58. Dotación campamento de obra

- En el proyecto se cuenta con una franja de aproximadamente cuatro metros, el cual se dispone para campamentos de obra, cuenta con cobertura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Funcionamiento del Campamento

- En el campamento están ubicados los profesionales del pliego de condiciones, el cual están dotado de equipos de cómputo, escritorios y demás insumos necesarios para la ejecución administrativa del proyecto.

- Se tiene asignado un trabajador para orden y aseo de las instalaciones temporales el cual debe cumplir con la establecido en la ficha ambiental 2.5 MCA Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas.
- Se instalará un punto de emergencia que está dotado de extintor, camilla y botiquín.
- La señalización es indispensable, por ende, se cuenta con esta, instalada en todos los sitios de almacenamiento y acopio de material incluyendo las señales informativas y de advertencia de acuerdo con el producto que se tenga.
- Con el propósito de implementar el uso eficiente al agua, se podrán implementar sistemas de recolección de aguas lluvias y recirculación, que pueda emplearse para usos específicos.
- No se instalarán plantas de producción de concreto en obra, el concreto será suministrado por una planta de concretos.

Desmantelamiento de instalaciones

- El desmantelamiento de instalaciones se realiza inmediatamente después de terminadas las obras, y así se dará por terminada la obra.
- Este desmantelamiento será de toda la infraestructura que se utilizó para la construcción del proyecto, así como los equipos, la acometida temporal que suministra el agua potable, luz y demás servicios públicos que se utilizaron el a etapa constructivo del proyecto.
- Del área de construcción se retiran todos los escombros y chatarras sobrantes hacia los sitios de disposición final.
- Como parte del cierre ambiental del PGAS, el Consorcio Obras Judiciales entregará una paz y salvo de propietario del predio de las instalaciones temporales, de lo contrario no podrá ser liquidado su contrato.

Esta parte de la ficha se implementa al finalizar el proyecto.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Medidas de Manejo ambiental en campamentos (se realiza inspección donde se evidencia que se encuentra limpio y ordenado.	Medidas de manejo ambiental aplicadas en el campamento e instalaciones / Medidas de manejo ambiental necesarias	Mensual	N/A	N/A
Calidad del aire	No. Quejas atendidas y cerradas de aire o ruido / No. quejas por mala calidad del aire o ruido	Mensual	100%	No se presentan quejas de la comunidad durante el mes de septiembre. 100 %

Calidad del agua	No. Quejas resueltas calidad del agua / No. Quejas por la mala calidad del agua	Mensual	100 %	No se presentan quejas por la calidad del agua 100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Los soportes de seguimiento de esta ficha ambiental se establecen:

- Lista de chequeo de medidas de manejo ambiental en campamentos

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Manejo de la maquinaria y equipo	2.6 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Como objetivo de esta ficha es la prevención de los potenciales impactos negativos que se pueden producir por el uso de maquinaria y equipos en el proyecto.

Establecer los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo para que todos los equipos, vehículos y maquinaria para la ejecución del proyecto, el cual debe permanecer en óptimas condiciones, cumpliendo las normas ambientales y su operación se realice en seguridad y protección del medio ambiente.

IMPACTOS POTENCIALES

Contaminación del aire (emisiones de material particulado e incremento en los niveles sonoros	Generación de residuos peligrosos producto de filtros y residuos de grasas y aceites
Contaminación del suelo	Emisiones de gases de combustión
Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores	Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.)

TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Maquinaria y Equipos

- Para este periodo continua en obras el siguiente equipo.

EQUIPO O MAQUIRIA	FECHA DE INGRESO
TROMPO	10/06/2023

- Anexo a este informe se entrega a la Interventoría los documentos de la maquinaria, equipos y vehículos que estarán al servicio de la obra, en donde se adjuntan:

  a. Registros del último mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos.
  b. Revisión técnico-mecánica (N.A)
  c. Seguridad Social del operador.
  d. Preoperacional.



Foto No 59 Inspección visual 01 al 30 de septiembre de 2023

- En el momento que se requiera programas y ejecutar actividades de obra en horario nocturno, se solicitará el respectivo permiso ante la alcandía si así se requiere.

- Este apartado se entrega en el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo

- El mantenimiento y lavado se realiza en centros especializados y autorizados ambientalmente para tal fin. Y están prohibido este tipo de prácticas en el proyecto.

- En la actualidad se encuentra en el proyecto mezcladoras portátiles, el lavado del trompo de mezcladora de concreto se realiza en un lugar con las medidas de manejo ambiental, que garantizando la protección de los recursos naturales
- El Consorcio no ejecutara mantenimientos preventivos ni correctivos en el proyecto de ninguno de la maquinaria o equipos del proyecto, solo en casos de extrema urgencia y con previa autorización de la interventoría y siguiendo los lineamientos de este documento.
- Para la permanente entrada y salida de vehículos se debe realizar mantenimiento periódico de los sedimentadores presentes en el área de intervención, para evitar su colmatación. El material seco será manejado como material de excavaciones, previo proceso de secado, realizado en lechos de secado por evaporación, tal como se explicó en la ficha ambiental 2.3 MCA CONTROL DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, de este documento.

- Se instalará en la puerta de ingreso un desarenador con su respectiva rejilla para el lavado de llantas de las volquetas, con el objetivo de mantener el espacio público limpio y evitar aumento del material particulado afectando la calidad del aire, aporte de sedimentos al alcantarillado y aumentar el riesgo de accidente en las vías aledañas al proyecto; a la fecha de presentación de este informe aún no se ha instalado este tipo de estructura debido a que no se ha tenido la necesidad de este tipo

- Se restringe la velocidad de acuerdo con el PMT de circulación de los vehículos y maquinaria, dentro y alrededor de la obra. Vale la pena resaltar que este fue aprobado para el mes de mayo.

- El proyecto cuenta con un cerramiento en zinc para evitar cualquier tipo de incidente con la comunidad.
- Los trabajos del proyecto no ocuparán el espacio público, para los cortes de acero o ladrillo se dispondrán de barreras acústicas en icopor. En lo posible se utilizarán martillos de goma y cortadoras con reductores de ruido incorporados; para disminuir la emisión de ruido.



Fotografía No 60 Cerramiento de la zona de obra



Fotografía No 61 Cerramiento de la zona de obra

MANEJO DEL MATERIAL PARTICULADO

- El material agregado que se tenga en el proyecto deberá permanecer cubiertos en todo momento con el fin de evitar la fuga de partículas al proyecto.
- Se instala poli sombra para aislar la zona de construcción de la zona del Palacio de Justicia.
- Durante los días más calurosos se hará dispersión o humedecimiento de la zona de trabajo, pero sin formar charcos de agua o humectación excesiva.
- Minimizar el flujo de vehículos dentro y sobre los lugares de acopio del material pétreo.

- Se garantiza el aislamiento del equipo y de los operarios para el uso de cortadoras y pulidoras, con el fin de mitigar el ruido y la generación de material particulado.
- En el momento de barrer zonas de obra se hará humectación del sitio de limpieza para garantizar que el material particulado no este suspendido en el aire.
- Para la cortadora de ladrillo se dispondrá un lugar aislado dentro del proyecto en donde se realiza un cerramiento perimetral, aislado por polisombra e icopor, para minimizar el ruido que genera la operación del equipo.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
vehículos y maquinaria con revisión tecno mecánica	No. Vehículos y maquinaria con revisión tecno mecánica / No. Vehículos y maquinaria en el proyecto	Mensual	3 / 3	Todos los documentos al día 100 %
Accidentes registrados	No. eventos atendidos correctamente / No. Accidentes ocurridos por manejo de vehículos y maquinaria	Mensual	0 /0	No se ha presentado accidente y/o incidentes en obra 100 %

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Los soportes de esta ficha ambiental son:

- Registros del último mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos.
- Seguridad Social del operador
- Revisión Tecno mecánica de vehículos (No aplica)
- Ultimo mantenimiento
- Preoperacionales de maquinaria y equipos

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Control de la calidad del aire y las emisiones	2.7 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Identificar y plantear las medidas que debe realizar el Consorcio Obras Judiciales, con el fin de no alterar la calidad del aire y el ruido ambiental en el entorno donde se desarrolla la obra civil

Mitigar los posibles efectos negativos que se presentan, principalmente sobre el componente atmosférico durante la etapa de construcción y operación del proyecto

IMPACTOS POTENCIALES	
Deterioro de la calidad del aire, por el aumento en las concentraciones de material particulado y gases contaminantes	Deterioro de las zonas verdes y en general del paisaje por acumulación de polvo.
Molestias a la comunidad y los trabajadores, por la presencia de polvo, gases y ruido.	

TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO

Calidad del Aire

- El proyecto tendrá un cerramiento en teja de zinc y si se requiere se protegerá con malla ecológica o polisombra para el control del material particulado.
- El control en la fuente se realiza cubriendo los materiales con plástico negro de construcción para evitar el efecto del viento que dispersa el material fino en el aire.
- Se hace control estricto del PMT del proyecto para evitar posibles accidentes con la comunidad.
- En el proyecto no hay perdida de cobertura en el área de intervención, pero se aplicarán medidas de disminución del material particulado que produce la circulación de maquinaria, vehículos, el personal de obra y la acción del viento.
- Se prohíbe el riego de aceite quemado como medida para este aspecto ambiental y cualquier mantenimiento en la zona del proyecto.
- Se debe cumplir con las medidas de manejo establecidas en la ficha 2.7 MCA MANEJO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS, especialmente en lo relacionado con las emisiones de los vehículos, equipos y maquinaria; además de las establecidas en la legislación colombiana sobre emisiones de ruido, ruido ambiental, emisiones atmosféricas de fuentes móviles y fijas, así como de la calidad del aire.

MOMENTO DE IMPLEMENTACIÓN EN EL PROYECTO

Las actividades de esta ficha se están implementando este mes, y así mismo dando cumplimiento al proceso constructivo.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad
N. A	N. A	N. A

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Revisión tecno mecánica
- Documentos volquetas

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Biótico	Manejo de la Fauna Silvestre	3.1-MCB

OBJETIVOS DEL PROYECTO	
Proteger la fauna presente en el área de influencia directa del proyecto.	Capacitar al personal sobre el componente ambiental.

IMPACTOS POTENCIALES	
Alteración al paisaje.	Minimizar el impacto en la avifauna que pueda estar en el proyecto.

TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Esta ficha ambiental será aplicada en el proyecto en el caso que se detecte fauna en el proyecto o los permisos emitidos por CORPOCESAR lo requieran y se hará de la siguiente manera:
- En el caso de tener fauna en el proyecto se escogerán los lugares de relocalización, contando con el apoyo de las autoridades y entidades ambientales especializadas según las especies, para garantizar su conservación.
- El personal de la obra será capacitado según el cronograma de capacitaciones anexo al PGAS.
- Se informa al personal que está prohibida la caza de cualquier especie de fauna silvestre.
- Cuando se requiera de rescate de fauna, se debe concertar los sitios de captura y de liberación, así como gestionar los permisos para esta actividad.
- Todas las actividades de estudio, rescate y relocalización de la fauna hallada, se cumplirán antes de la intervención a la vegetación del área de influencia directa del proyecto.
- Cuando se encuentren animales heridos o enfermos, deben ser entregados a la autoridad ambiental, elaborar un acta de la entrega, especificando el sitio, la especia, su estado, funcionario y entidad que recibe.
- Se debe llevar un registro fotográfico, georreferenciar todos los procedimientos que se realicen, nombre científico y común de la especie rescatada y liberada.
- En caso de necesitarlo, el Consorcio Obras Judiciales debe llevar un formato de registro de fauna, donde se debe reportar todos los procedimientos realizados. Como mínimo debe contener el nombre científico y común de la especie, sexo, cantidad, ubicación, si está dentro de alguna clasificación de conservación o protección, su estado de salud, el sitio de la liberación y registro fotográfico.

Rescate de Avifauna

- En el caso de rescate de nidos con huevos o neonatos se hará a través de un biólogo quien está capacitado para ejercer esta labor.

- Se tendrá especial cuidado en la etapa de tala, con el fin de garantizar que en el momento de la ejecución de esta actividad los individuos no cuenten con nidos activos, para esperar que los huevos o neonatos se desarrollen hasta la formación de plumas.

Para el mes de junio se realizó la tala de un árbol, el cual se verificó con anterioridad que no se viera afectada la avifauna. Para este periodo de agosto no se realiza tala de árboles.

Rescate de Mamíferos

- En el caso de tener que realizar el procedimiento para el rescate de mamíferos se hará con un biólogo, quien tendrá en cuenta las características de las jaulas y tener un espacio mínimo dos veces el tamaño del animal, tener ventilación y recubierta con material poroso como la tela.
- Cuando se empleen anestésicos o sedantes, solo se podrá hacer cuando se haga bajo la supervisión de un veterinario experto.

Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

Rescate de Reptiles

- Cuando se identifique una de especies en el proyecto se procederá al ahuyenta miento de la misma y su rescate se hará con ayuda de personal especializado para este fin. En el proyecto no se tendrá disponible suero antiofídico.
- El procedimiento de captura se debe realizar preferiblemente en días soleados entre 10:00 y 13:00 horas del día o entre las 17:00 hasta máximo 18:00 horas del día.
- Se deben transportar en bolsas de tela gruesa y cuando sean serpientes venenosas, se tienen que utilizar recipientes rígidos, que la tapa se pueda cerrar de manera segura y que reciba ventilación suficiente.

No se pueden poner especies distintas en un mismo contenedor.
Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

Rescate, Traslado y Reubicación de Enjambre Silvestre

- En caso de identificarse este tipo de rescate se tendrá el apoyo de personal especializado ya que en obra no se cuenta con este tipo de expertos y se seguirán los siguientes pasos:

a. Hacer reconocimiento del sitio específico donde está el enjambre, verificar las condiciones del tiempo, para no actuar en condiciones de lluvia ni de extremo calor.
b. Con el equipo de trabajo se planificar esta intervención.
c. La intervención se hará mínimo tres (3) personas.
d. Usar siempre el traje de protección enterizo, guantes y botas.
e. En el área sólo debe permanecer el equipo que hará el procedimiento, instalar señales y personal que controle el paso por el sitio, habrá un responsable de la seguridad.
f. Es importante contar con personal médico dentro del equipo de trabajo.
g. Tener permanente comunicación y contacto visual con sus compañeros.
h. El procedimiento termina cuando la colmena se haya trasladado

Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

Preparación: Capacitación en manejo de abejas y primeros auxilios; identificación y compra de equipos de protección, equipos y accesorios; identificar e informar a organismos de respuesta como Bomberos, Defensa Civil y

Cruz Roja.

Acercamiento al Sitio: Establecer las condiciones, rutas que se van a manejar, duración del procedimiento y verificar si existen algunas condiciones especiales de las abejas o avispas, agresividad de la colonia, o si hay personas heridas.

Operación: Asegurar la zona, colocar una unidad generadora de humo a fin de neutralizar la capacidad de ataque de las abejas y transcurrido un tiempo prudente, retirar las abejas.

Reporte de la Actividad: En el mismo formato de rescate de fauna, se hará un reporte de la actividad con todas las características de la especie y el registro fotográfico. Informar a la autoridad ambiental, cuando así lo requiera.

Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO				
Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Protección de la fauna existente	No. Fauna silvestre rescatada y reubicada / No. No. Fauna silvestre encontrada en el AID	Mensual	0 / 0	Para este periodo no se realiza tala de Árbol. 100 %

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Para el mes de septiembre 2023, No se realizó tala de árbol.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Manejo de la vegetación en obra	3.2 - MCB

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Definir los requisitos para la intervención de la vegetación y las actividades apropiadas en el manejo de la flora, para disminuir y compensar el impacto negativo que genera su afectación, en el proyecto.

Identificar la vegetación que se intervendrá, por la ejecución de las obras dentro del área de influencia directa; los trámites que sean necesarios ante CORPOCESAR y llevar a cabo las actividades como tala, poda radicular, poda aérea, bloqueo y traslado, mantenimiento, establecimiento, fertilización y control sanitario.

IMPACTOS POTENCIALES

Afectación a la capa vegetal	Alteración al paisaje.
Migración de la fauna silvestre	Generación de ruido y material particulado

TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	X

MEDIDAS DE MANEJO/ACTIVIDADES EJECUTADAS

Inventario Forestal y Plan de Manejo Forestal

- Para este mes de agosto se continua con el riego de los árboles que fueron intervenidos en la raíz y los árboles que se encuentran dentro del proyecto.



Fotografía No 52. Riego de árbol



Fotografía No 53. Riego de Árbol

En pro de mantener los procesos de mejora continua, para la ejecución de dicha poda, se realiza el riego de los árboles intervenidos con el fin de evitar la deshidratación de los mismos.
Vale la pena mencionar que dicho proceso se evidencia en el informe forestal enviado al área de interventoría el día 18 de mayo de 2023 con radicado No. CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC- 210

Permisos para la Ejecución de la Intervención

- En el momento que se cuente con el inventario forestal, se inicia el trámite de permisos y autorizaciones por parte de CORPOCESAR, según el caso.

- En la actualidad se cuenta con el permiso ambiental de tala el cual se relaciona a continuación

TIPO DE PERMISO	ENTIDAD	ACTO ADMINISTRATIVO	PLAZO

	Tala de arboles	Corpocesar	Resolución No. 0017 del 28 de febrero del 2023	Seis (6) meses

Manejo de la Vegetación: Podas, Talas y Traslados

En este periodo No se realizó tala de árbol.

Se anexa la siguiente documentación al presente informe:

La Interventoría aprobó el documento PGAS, a la fecha se ha venido realizando seguimiento a todos los compromisos y a lo que la ley refiere. el Consorcio entrego a la Interventoría, el acto administrativo mediante el cual se le otorga el permiso para el manejo de la vegetación y deberá cumplir con los requerimientos que establezca la autoridad ambiental,

Manejo de la Vegetación Para Permanecer:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO				
Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Vegetación con veda nacional o regional	No. individuos con permisos de levantamiento de veda otorgado por autoridad ambiental competente / No. individuos inventariados identificados con veda	N/A	0/0	No Se realiza tala de árbol para este mes 100 %

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Certificados de disposición vegetal
- Permisos ambientales /forestales

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Gestión Social	Atención a la Comunidad y Autoridades	4.1 GSP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Este proyecto asume el manejo de las obligaciones ante la comunidad directa de influencia del proyecto la cual son los funcionarios y visitantes al Palacio de Justicia de Valledupar, autoridades municipales, Juntas de Acción Comunal – JAC, líderes, directivas de instituciones, empresas de servicios públicos de la ciudad de Valledupar, los cuales presenten inquietudes, quejas, reclamos y consultas relacionadas con el proyecto.

El proyecto debe implementar mecanismos para recibir, atender y dar respuesta oportuna a todas las PQRS que

las partes interesadas presenten al proyecto.

IMPACTOS POTENCIALES	
Minimizar impactos ambientales que puedan generarse desde el personal del proyecto.	Disminuir el impacto de las comunidades de influencia directa del proyecto.

TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS

Instalación y Funcionamiento del CAC

- El Consorcio Obras Judiciales en el ingreso del proyecto instala un espacio de atención a la ciudadanía, la cual tendrá atención a las partes interesadas en la etapa de inicio de las actividades constructivas, y se desarrollan las siguientes actividades:

a. Actas de vecindad: Ya fueron realizadas las de actas de Inicio

b. Gestión de mano de obra local: Se está contratando personal de la localidad

Este espacio estará abierto y disponible durante todo el proyecto, en los horarios 10:00 a.m. a 12:00, los lunes, miércoles y viernes, en dónde se tendrán los documentos técnicos del contrato, estos horarios serán divulgados a la comunicada comunidad en la reunión de inicio, adicional se publicarán los horarios de atención.

- Debe registrarse en el formato, el estado en el que queda la visita del ciudadano:

Cerrada: Cuando la manifestación ciudadana ha sido resuelta y las partes interesadas o quien presento la queja este satisfecha con la respuesta o acción desarrollada por parte del Consorcio Obras Judiciales.

Abierta: cuando la manifestación ciudadana no ha sido resuelta, está pendiente o en proceso de trámite.

En los informes mensuales del Consorcio Obras Judiciales se presentará al Interventor un consolidado de todas las solicitudes de los ciudadanos, entregando los siguientes valores y porcentajes:

a. Total, de manifestaciones en el periodo y acumuladas.
b. Total, de manifestaciones por tipo en el periodo y acumuladas.
c. Total, de casos cerrados en el periodo y acumulados.
d. Total, de casos abiertos en el periodo y acumulados.
e. Para el cierre ambiental y social del proyecto, el Contratista debe tener paz y salvo de todos los eventos registrados de manifestaciones ciudadanas y actas de vecindad.
   En esta oficina deben permanecer las Actas de Vecindad que se realizaron en el periodo previo a las actividades constructivas y documentos en general que sean de consulta por la comunidad y las autoridades.

En Este periodo no se han presentado quejas y se ha presentado público.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO				
Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Quejas y reclamos durante el proyecto	No. manifestaciones cerradas / No. manifestaciones de la comunidad	Mensual	0 / 0	A la fecha No se presentan quejas por la comunidad 100 %

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Formato de PQRS
- Reunión de inicio
- Actas de vecindad (del cliente)
- Gestión de mano de obra local

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Gestión Social	Información y Participación de la Comunidad	4.2 - GSP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Que el consorcio Obras Judiciales proporcione información que oportuna, suficiente, clara y necesaria para todas las partes interesadas del proyecto.

El Consorcio Obras Judiciales debe darle un buen manejo a la información relativa al proyecto, con las autoridades locales, la comunidad del área de influencia directa

IMPACTOS POTENCIALES

Disminuir el impacto de las comunidades de influencia directa del proyecto.

La comunidad aledaña al proyecto puede tener dudas sobre el proyecto las cuales pueden influir en el desarrollo del proyecto

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS

Actividades de Comunicaciones y Publicidad

Son las actividades para distribuir elementos de comunicación para citar reuniones y divulgar información relevante relacionada con el proyecto.

Comunicaciones Personalizadas: Cuando es necesaria la elaboración de una comunicación formal dirigía a una persona, funcionario o entidad en particular, donde se entregue información o invitación a alguna reunión. Deberán estar revisadas por la Interventoría antes de su envío.

Volantes de Información: Cuando se distribuya información a través de volantes informativos en el área de influencia del proyecto, se tomará el recibido de los ciudadanos que lo recibieron dentro de un formato con la fecha, identificación completa de la persona que recibió la información y firma o huella.
En caso de que se requiera intervención de redes de servicios públicos que genere su suspensión temporal, la restricción de tráfico y cierre de vías, entre otras, se deberá dar aviso oportuno a la población afectada, mediante volantes y reuniones con la Junta de Acción Comunal, entre otras formas organizativas, con mínimo 5 días de anticipación; también deberá contar con los permisos respectivos para realizar este tipo de cierres y suspensiones.

Información por Medios Locales: A través de medios como la televisión local, radio comunitaria o perifoneo autorizado, se podrá hacer divulgación de reuniones programadas para la invitación a la comunidad en general.

Manejo del Flujo Peatonal

	
Fotografía No. 64. sendero peatonal dentro de obra	Fotografía No. 65. Sendero peatonal provisional fuera de obra.

- El Plan de Manejo de Tráfico – PMT Con fecha de aprobación 17 de mayo del 2023 y radicado a interventoría el día 18 de mayo de 2023 con oficio CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC-212, debe cumplir el objetivo de mantener o mejorar la velocidad de la circulación vehicular, con el fin de evitar la densificación y/o concentración de las emisiones, como también el malestar a terceros dentro del

área de influencia.

- De igual forma se implementa la señalización de seguridad adecuada. Todos los elementos de señalización permanecerán limpios y debidamente instalados para que cumplan su función.
- Cuando el PMT aprobado por la oficina de tránsito o Alcaldía correspondiente, contemple los controladores viales, se deberá disponer del personal necesario, sin que esto implique costos adicionales a la DEAJ.
- En el caso de requerir senderos externos para uso peatonal con un ancho suficiente, para que el tráfico peatonal normal no sufra congestiones.
- Los senderos peatonales no podrán ser ocupados por la obra, como por equipos, vehículos, ni por el cargue y descargue, ni por el acopio temporal de materiales.
- Las obras en espacio público deben realizar cerramientos, buscando el bienestar y la seguridad de los transeúntes.
- Los accesos y el perímetro de la obra deberán mantenerse bien señalizados, de tal forma que sean claramente visibles, identificables y que permitan una fácil orientación a los peatones.
- Se deben ubicar los factores generadores de ruido alejados del perímetro que limita la obra con el espacio público; aislar las áreas de corte y de otras actividades propias de la obra que generen ruido, mediante la construcción de estructuras temporales que mitiguen estas emisiones

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Reuniones de apertura, seguimiento y cierre	o. de reuniones desarrolladas / No. Reuniones programadas	Mensuales	N/A	N/A

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Acta de reunión de inicio
- Cronograma de reuniones de avance
- Informe general del avance del proyecto.
- Resultados de la gestión social y ambiental del Contratista.
- Reunión de finalización
- Comunicaciones personalizadas
- Volantes de información
- Plan de Manejo de Tráfico

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
PROGRAMA	PROYECTO		IDENTIFICACION

Gestión Social	Manejo de Infraestructura Privada, Publica, de Servicios Públicos, Redes y Activos.	4.3 – GSP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal de esta ficha es la elaboración del estado físico de la infraestructura pública y privada, así como de las redes de servicios públicos cercanos al área de influencia directa del proyecto, generar espacios y relaciones con propietarios y empresas administradoras u operadores; con el propósito de prevenir conflictos con las comunidades y las entidades correspondientes.

IMPACTOS POTENCIALES

Impactos derivados de la construcción del proyecto que puede generar daños a la infraestructura pública al igual que las redes de servicios públicos en el área de influencia del proyecto.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para la atención a los ciudadanos o partes interesadas del proyecto se tiene designado el siguiente horario de atención de la comunidad:

Martes, jueves y sábados desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. lugar donde se decepcionará y aclararán todas las inquietudes presentadas por las partes interesadas o a través del correo electrónico: atencionpqrscoj@hotmail.com



Fotografía No. 56. Sitio de atención a las partes interesadas



Fotografía No 57. Sitio de atención a las partes interesadas

Actas de Vecindad de Predios

Corresponde al registro del estado de la construcción y de toda la infraestructura vecina a las actividades de obra y en los sitios que el contratista requiere de manera temporal para el desarrollo de la obra, empleando el Formato del

Acta de Vecindad del Anexo 8.3 de la guía para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social.

Las actas de vecindad se entregaron a los usuarios firmadas y autenticadas el día 12 de mayo de 2023 y radicados a interventorías mediante oficio No. CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC- 190.

- Se registrará el estado físico de las construcciones, viviendas, locales de actividades económicas, casetas, cercas, postes, portillos, árboles, vallas, redes de acueductos, de distribución de energía, redes de tecnología de la información y las comunicaciones o de la industria del petróleo y demás obras que se encuentren a lado y lado de las futuras actividades constructivas.

- Esta será una actividad que debe liderar el profesional social del contratista, con el acompañamiento del Residente de Obra, quien será la persona entendida en los aspectos técnicos del acta de vecindad en el momento de realizarla.

- La Interventoría también debe acompañar las actas de vecindad, con el fin de verificar que se cumpla con el procedimiento y apoyar técnicamente las observaciones.

- Cuando existan posibles interferencias de la obra con redes u infraestructura existente, que no está contemplado en el diseño, el Contratista debe informar formalmente a la Interventoría para que se realicen las gestiones y ajustes oportunos para la buena ejecución de la obra.

- Se debe informar a la comunidad sobre esta actividad en la reunión de inicio, señalando la importancia de la participación del responsable o del propietario del predio.

- Antes de iniciar, el equipo social del Contratista establecerá contacto con el propietario, administrador o directiva de las construcciones. En el caso de infraestructura social (parques, paraderos, bienes de interés religioso o cultural) se debe realizar contacto con el Director del Palacio de Justicia de Valledupar para informarle sobre el levantamiento del Acta de Vecindad en esa área.

- Las actas de vecindad se entregaron a los usuarios firmadas y autenticadas el día 12 de mayo de 2023 y radicados a interventorías mediante oficio No. CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC- 190.

- El Consorcio Obras Judiciales recibe y resolver las quejas y reclamos que la comunidad o entidades puedan presentar por afectación a la infraestructura vecina a la obra.
- El Formato del Acta de Vecindad será el que se encuentra en el Anexo 8.3 de la guía para el Plan de Gestión Ambiental y Social.
- En el proyecto no se tiene proximidad con actividades agrícolas, por eso no se hará registro del estado de cultivos, pasto, cercas, fuentes de agua.
- El Consorcio Obras Judiciales entregara al propietario o responsable del predio, la copia física del Acta de Vecindad, dentro de los 15 días calendario, posterior a la fecha de la diligencia.
- El archivo magnético deberá estar almacenado en la oficina de Centro de Atención Ciudadana CAC, para ser consultado en el momento que sea necesario.
  El Profesional Social al finalizar la obra, se llevarán a cabo las Actas de Vecindad de Cierre en las mismas construcciones y predios donde se levantó el Acta de Vecindad de Inicio; dicha acta consiste en la

verificación final del estado físico en que quedaron, una vez terminadas las actividades constructivas y con la aceptación del dueño o responsable.

Manejo de las Quejas de Actas de Vecindad

Cuando en el CAC se reciba alguna queja por daños a la infraestructura, donde se adjudique dicho daño a las actividades constructivas, el Consorcio Obras Judiciales deberá tomar las siguientes acciones para atención a este evento:

- El Profesional Social del Consorcio Obras Judiciales deberá tomar nota en el formato de Atención al Ciudadano, diligenciando toda la información, en este caso de la queja por la posible afectación del predio.

- Se recomienda mantener una relación amable y diligente con el ciudadano que manifiesta una afectación.

- Se debe programar en el formato de Atención al Ciudadano una fecha y hora de visita, en un plazo no mayor a 24 horas, para determinar y cotejar la situación que expone el quejoso, frente a las condiciones en las cuales estaba el bien, previo al inicio de obra.

- Se deberá tener el acompañamiento de un garante como la Personería, lo cual se solicitará con el fin de ofrecer garantías al ciudadano.

- Habrá que establecer la responsabilidad de los daños provocados y el origen de los mismos, a fin de que no continúen tal secuela o en su defecto, aclarar que no corresponden a la ejecución del proyecto.

- Una vez se verifique la responsabilidad de la obra en el daño, se procederá a determinar los recursos y actividades que se requieren para solucionar la manifestación ciudadana presentada.

- En todos los casos de un proceso de restauración de las condiciones del predio deben quedar explícitas en el formato de Atención al Ciudadano, sobre el acuerdo en el cual firmen las partes y como mínimo indicando la siguiente información:

    - Fecha en que se instauró la queja en el CAC
    - Fecha en la que se hizo la diligencia de la visita para verificar el daño y sus causas
    - Registro fotográfico del espacio afectado
    - Concepto técnico del equipo profesional del Contratista
    - Registro fotográfico del archivo del acta de vecindad
    - Descripción del estado inicial, es decir, el que se encuentra en el acta de vecindad
    - Se debe señalar el tipo de arreglo que debe producirse: reparación, reposición o compensación. En cada caso debe explicarse la forma en que se cumplirá la acción.

Tendrá el seguimiento de las actividades programadas para la restauración, incluyendo:

- Registro fotográfico finalizado o cumplido el acuerdo
- Un recibido a satisfacción del ciudadano que formalizó la queja, firmada por el ciudadano

Fecha del cierre de la manifestación ciudadana

- Todo el proceso deberá ser informado a la Interventoría, quien podrá aportar su concepto y recomendaciones en la medida que lo considere pertinente.
- Cuando se presenten discrepancias entre la Interventoría y el Contratista sobre la responsabilidad en los daños presentados, se acudirá al Coordinador asignado por la DEAJUIF del Contrato de Obra o al funcionario que esta designe para dar solución a las diferencias presentadas.
- Si la DEAJ establece que la responsabilidad del daño es del Contratista, este deberá proceder a reparar los daños ocasionados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Las reparaciones por razones imputables al Contratista no serán objeto de pago por el Contrato. En el caso que el contratista no repare los daños dentro del plazo previsto, será considerado como un incumplimiento del contrato

Medidas de Manejo de Infraestructura de Servicios Públicos

Se deberán tener en cuenta las siguientes actividades previas y durante las actividades de obra, para evitar la afectación de los servicios públicos:

- Antes de las actividades de descapote y excavaciones se debe comprobar la existencia de redes de servicios públicos en el área a intervenir.
- Se debe establecer comunicación formal con las entidades dueñas de redes y activos, operadores o administradores.
- Las redes deben ser localizadas junto con el operador con un plano de catastro de red actualizado, para determinar su posición y especificaciones.
- Para cuando se deban intervenir redes de servicios públicos. se debe informar oportunamente a las entidades encargadas de la prestación del servicio, de manera que no se presenten improvisaciones y al momento de la instalación no se pueda desarrollar por falta de alguna autorización.
- No se puede iniciar excavaciones para el retiro de redes hasta tanto no se cuente con los permisos respectivos.
- Cuando se esté interviniendo una red subterránea, se recomienda que se efectúe por tramos y sin que permanezca abierta la excavación por un tiempo mayor de 12 horas, por lo que para este tipo de trabajos debe programarse iniciar temprano en la mañana, para tener instalado y cubierto al finalizar la jornada.
- En caso de ser necesario cortes de los servicios públicos, se debe informar anticipadamente a la comunidad cuya cobertura será afectada y adicionalmente tener preparado el Plan de Contingencia, que hará parte del PGAS, en el caso de que por algún motivo no se pueda restablecer el servicio interrumpido.
- En el CAC y en otros puntos del campamento, deberá permanecer publicados todos los números telefónicos de las empresas prestadoras de los servicios públicos, en caso de cualquier emergencia.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultados	Análisis
Levantamiento actas de vecindad (predios, redes y activos de servicios públicos, infraestructura	No. de actas de vecindad diligenciadas / No. de actas de vecindad identificadas	Mensual	6 / 6	100%

Cierre actas de vecindad	No. de actas de vecindad cerradas / de actas de vecindad diligenciadas	Mensual	6 / 6	100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Acta de reunión de inicio
- Actas de vecindad

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Gestión Social	Gestión de la Mano de Obra	4.4 - GSP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Realizar el manejo de contratación de mano de obra donde se considera que es trascendental priorizar la mano de obra local e impedir la migración de trabajadores al Área de Influencia Directa – AID del proyecto; toda vez que el incremento de población foránea puede generar escenarios negativos

Generar ingresos en los habitantes y comunidad del AID del proyecto, mejoramiento de su calidad de vida, previniendo la migración de trabajadores foráneos y la gestación de conflictos con la comunidad establecida.

IMPACTOS POTENCIALES

Desmejoramiento de la calidad de vida de los residentes permanentes o conflictos de aspecto socioeconómico y cultural.	Causar un impacto positivo general en la comunidad de influencia

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO / ACTIVIDADES EJECUTADAS

Medidas de manejo

El Contratista tendrá que contratar un porcentaje de personal no profesional para la obra y dentro de ese total se establece que mínimo el 50% deben pertenecer al AID del proyecto. La Interventoría tendrá la obligación de hacer el seguimiento sobre el cumplimiento de este requisito o el que se establezca en los documentos técnicos del Contrato, cuando así ocurra.

- El equipo mínimo de profesionales del Consorcio Obras Judiciales será personal de su confianza, por lo tanto, este personal podrá ser foráneo en la medida y autonomía administrativa que tiene el Consorcio, sin embargo, preferiblemente podrá optar por personal de la zona donde se realizar la obra.
- Todo el personal deberá ser aprobado por la Interventoría de acuerdo con los documentos técnicos del proyecto.
- Se debe conformar una línea base del componente socioeconómico y cultural, la cual debe indicar la dinámica del empleo en el AID, los perfiles laborales presentes en el área y a fin de conocer la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada. Con esta información, el Contratista establecerá

la mano de obra a contratar para el desarrollo de su obra.

- El Contratista podrá solicitar apoyo de entidades públicas de gestión de empleo como del SENA u otras como, las Cajas de Compensación Familiar de la región y la Unidad de Servicio Público de Empleo: http://serviciodeempleo.gov.co/
- A través de las Alcaldías apoyadas en las Juntas de Acción Comunal – JAC, podrá certificar la residencia en el AID, en algunos lugares conocido como "Certificado de Territorialidad".
- En los informes mensuales del Contratista a la Interventoría, presentará toda la información correspondiente, soportes y los indicadores de la mano de obra contratada.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Generación de empleado en el área de influencia directa AID	No. personal contratado y vinculado al proyecto No. profesional del AID / No. Personal contratado y vinculado no profesional	Mensual	32	100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Contratación de personal
- Cumplimiento del indicador
- Informe Mensual

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS

El periodo objeto de este informe no se presentaron incidentes que deban ser reportados.

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 02 de septiembre 2023

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-407

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022
CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO INFORME AMBIENTAL MES DE SEPTIEMBRE 2023.


La presente con el fin de enviar informe Ambiental correspondiente al mes de septiembre 2023.

Adjunto Anexos

ANEXO 1. ACTA DE REUNIÓN AMBIENTAL.
ANEXO 2. CHARLAS AMBIENTALES.
ANEXO 3. CARPETA PLAN DE CAPACITACIONES.
ANEXO 4. OFICIOS RADICADOS.
ANEXO 5. PERMISOS TALA DE ARBOL.
ANEXO 6. PERMISOS DE AGREGADOS.
ANEXO 7. INGRESOS MATERIALES PETREOS A OBRA.
ANEXO 8. PERMISOS DE DISPOSICIÓN FINAL RCD.
ANEXO 9. CERTIFICADO SALIDA RCD.
ANEXO 10. DOCUMENTOS VEHICULOS.
ANEXO 11. FACTURA CONSUMO DE AGUA.
ANEXO 12. PREFABRICADO - CERTIFICADO DE CALIDAD.
ANEXO 13. SOCIALIZACIÓN INICIO DE PROYECTO.
ANEXO 14. INSPECCIÓN PROPERACIONAL.
ANEXO 15. INSPECCIÓN AMBIENTAL.

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,



Ing. Ferney Peña Rojas
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 03 de octubre de 2023

Señores:
JMR SALUD OCUPACIONAL
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-408

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS A PERSONAL DE COJ.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito enviar la autorización para realizarse el Examen De Ingreso Orientado Al Riego De Trabajo En Altura al personal que a continuación se relaciona:

Autorización Para Exámenes Médicos De Ingreso A Personal A Contratar De Manera Directa Con El Consorcio Obras Judiciales			
No.	**Nombre Y Apellidos**	**Cedula**	**Cargo**
1	Rafael Ernesto Moreno Moreno	80.375.693	Oficial
2	Victor Alfonso Escalante Mora	1.967.808.935	Oficial
3	Alber De Jesús Altamar Bernal	15.173.023	Oficial
4	Hans Keiver Sanmiguel Barrozo	1.143.129.980	Oficial
5	Walter Enrique García Acuña	12.646.284	Oficial
6	Antthony Barrios Rodríguez	1.042.445.918	Oficial

Cordialmente,

Ing. Fernando Bernal
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

Elaboró: WQ

Valledupar, 03 de Octubre de 2023

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-409

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022
CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO DOCUMENTOS DE INFORME SST MES DE AGOSTO

La presente es con el fin de enviar informe SST del mes de Septiembre del 2023.

Anexos

- Anexo 1 Documentos para ingreso a obra (C.C, ARL, EPS, AFP, CCF, Examen médicos, Certificado de competencia).
- Anexo 2 Inducción, evaluación de inducción, notificación de riesgo.
- Anexo 3 Notificación de Riesgos visitantes.
- Anexo 4 Pre operacionales.
- Anexo 5 ATS –Permisos.
- Anexo 6 Planilla de seguridad Social.
- Anexo 7 Asistencia Charla SST.
- Anexo 8 Evaluación Capacitación.
- Anexo 9 Acta reunión COPASST.
- Anexo 10 Inspección de pre-uso equipos de alturas.
- Anexo 11 Entrega de EPP.
- Anexo 12 Documentos maquinaria amarilla (Tarjeta de registro, Declaración de importación, Mantenimiento) y operador (licencia de conducción, certificado de idoneidad.
- Anexo 13 Actos y Condiciones inseguras.

Quedamos atentos a comentarios

Cordialmente,

ING. Ferney Peña Rojas
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra
KSF

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 2

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 2

2.1 Descripción del proyecto 2

2.1.1 Localización general del proyecto 2

2.1.2 Contrato de Obra 3

3. PERSONAL DEL PROYECTO 4

3.1 Personal Administrativo del proyecto 4

3.2 Detalles del personal Administrativo y operativo en obra 4

4. INDICADORES 7

4.1 Horas hombres Trabajadas Personal Operativo 7

4.2 Ausentismo en el proyecto. 10

4.3 Accidentalidad del Proyecto 10

5. MEDICINA PREVENTIVA LABORAL 11

6. ACTIVIDADES EN OBRA 12

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre del presente año se realizaron las siguientes actividades: 12

6.1 Registro de inspecciones planeadas y permisos de trabajo. 13

6.2 Formación de personal en Seguridad y Salud en el Trabajo 14

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL 15

8. ANEXOS 25

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se presenta con el fin de asegurar y evidenciar la gestión de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto **CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR** de acuerdo con las actividades definidas en el CONTRATODE OBRA No. 323 DEL 2022.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 Descripción del proyecto

El proyecto se encuentra situado en el municipio de Valledupar en el departamento del Cesar, zona urbana, en la calle14 # 12-189 (Palacio de justicia) sitio de ejecución.

2.1.1 Localización general del proyecto

El proyecto se desarrollará en el bloque de parqueaderos y áreas complementarias del Palacio de Justicia.

Ubicación Palacio de Justicia



Figura 1. Localización del palacio de justicia (Valledupar)

Fuente: Google Earth

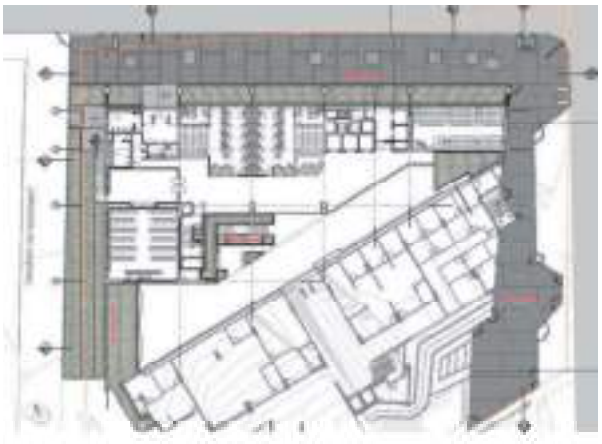


Figura 2. Localización de edificio Palacio de Justicia (Valledupar)

2.1.2 Contrato de Obra

CONTRATANTE:	CONCEJO SUPERIOR DE JUDICATURA
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
OBJETO:	"REALIZAR OBRA DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR) "
PLAZO INICIAL DEEJECUCIÓN:	TREINTA Y CINCO MESAR (35) contados a partir de la respectiva acta de inicio, previa legalización del contrato.
VALOR PRESUPUESTO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (49.420.492.192) incluidos impuestos y contribuciones de ley

Tabla No. 1

3. PERSONAL DEL PROYECTO

El proyecto se ha integrado en el periodo de la presentación del siguiente informe desde el 01 Al 30 de Septiembre del 2023 respectivamente.

3.1 Personal Administrativo del proyecto

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre del presente año, se mantiene el personal operativo en el proyecto el cual desarrolla las actividades de obra civil.

3.2 Detalles del personal Administrativo y operativo en obra

Desde el 01 al 30 de Septiembre de 2023 se contó con la participación permanente del siguiente personal en obra.

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

Información Trabajadores						Estado		
No	CC	Nombres y apellidos del Trabajador	No Asignado	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
1	72339619	EMEL DARIO LARIOS MEDINA	3	RESIDENTE DE OBRA	ADMINISTRATIVA	SI	06/03/2023	NA
2	40960020	LUZDAMARYS SALCEDO VALDEBLANQUEZ	5	RESIDENTE SST	ADMINISTRATIVA	SI	15/04/2023	NA
3	1065809341	WENNDY JULIETH QUIRIZ AYOLA	6	RESIDENTE ADMON	ADMINISTRATIVA	SI	25/04/2023	NA
4	1065657761	OSCAR EDUARDO BUSTILLO ECHAVEZ	7	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
5	1065842379	JESÚS DAVID QUIROZ LÓPEZ	8	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
6	1193403152	JUAN YESITH BRITO ZABALETA	10	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
7	1193561205	SEGUNDO ANTONIO MARTÍNEZ CALDERA	11	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
8	1062398032	JUAN CARLOS MURGAS MINDIOLA	12	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
9	1065837582	DUBAN ENRIQUE PERALTA PORTO	13	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
10	77028189	WILMAN IGNACIO CORONADO SILVA	14	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
11	1004502067	FARID ALBERTO VAN STRALRN VIZCAINO	15	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
12	77186837	JOSE LUIS CAMPO CALDERÓN	16	AUXILIAR OF. VARIOS	OPERATIVO	NO	16/05/2023	15/09/2023
13	77186289	CESAR RAFAEL NÚÑEZ ACUÑA	17	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA

14	1003376653	CESAR LUIS NÚÑEZ ARRIETA	18	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
15	91526911	JORGE USECHUE	23	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
16	77155343	LUIS ALBERTO CASTILLO CAMELO	25	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
17	77026504	REINALDO MOSCOTE PACHECO	26	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
18	1007392140	LUIS GABRIEL MARQUEZ JULIO	27	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
19	1065235505	JHON JAVIER OSMA ORTEGA	28	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
20	1052080418	CARLOS ANDRES OLIVERA FRANCO	29	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
21	5165243	YESMAN ENRRIQUE MENDOZA MENDOZA	30	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
22	1048600194	JHON JAIRO MORALES CABRERA	31	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
23	1064711685	JUAN DAVID MEJIA CININ	32	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
24	1080431816	JEINER DAVID MENDOZA RODRIGUEZ	33	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
25	85442542	DANIEL ENRIQUE AGUILAR VANEGAS	34	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
26	77154925	ANIBAL JOSE JIMENEZ ESCORCIA	37	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
27	1065626852	LUIS MIGUEL GOMEZ GUTIERREZ	38	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
28	1065809820	ALDAIR LUIS DIAZ OÑATE	39	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
29	77171396	PEDRO JULIO SANDOVAL VANEGAS	42	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
30	1006714113	EDUARDO ENRIQUE RIVERA ALVAREZ	48	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	07/06/2023	NA
31	106556239	GEOVALDI ENRIQUE FONTALVO MATOS	49	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	07/06/2023	25/09/2023
32	1065823637	CARLOS ANDRES MOSQUERA PALMERA	50	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	07/06/2023	15/09/2023
33	77183812	WILLIAM ENRIQUE PALMERA SANTANA	54	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	14/06/2023	NA
34	1032449361	JUAN CAMILO VELAZCO VALDERRAMA	55	RESIDENTE DE OBRA	ADMINISTRATIVA	SI	21/06/2023	NA
35	1120748067	KAREN KATIUSCA SOTO FUENTES	56	RESIDENTE SST	ADMINISTRATIVA	SI	07/07/2023	NA
36	79750423	YUBER FERNANDO BERNAL CONTENTO	57	DIRECTOR DE OBRA	ADMINISTRATIVA	SI	08/07/2023	NA
37	8664000	EMIRO EVENDAÑO GUERRA	58	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVO	SI	21/07/2023	NA

Tabla No. 2

JER TOPOGRAFIA

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
1003240689	ASNER ROCHA WILCHES	TOPOGRAFO	TOPOGRAFIA	SI	17/03/2023	
1065576867	RAFAEL AUGUSTO BALCAZAR VERDECIA	CADENERO 2	TOPOGRAFIA	SI	17/03/2023	
1065815762	ELIANETH PALOMINO RANGEL	AUX TOPOGRAFO	TOPOGRAFIA	SI	25/04/2023	

Tabla No. 3

ANILLOS DE SEGURIDAD

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
77185068	ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	20/03/2023	31/08/2023
1062400397	HAWIN NAVARRO ANGARITA	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	20/03/2023	31/08/2023
11800493	YELMER EMIR CORDOBA MENA	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	20/03/2023	31/08/2023

Tabla No. 4

SECURITY ELYTE

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
77185068	ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	01/09/2023	20/09/2023
10655595702	FABIAN ORRALES HERRERA	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	01/09/2023	20/09/2023
6084471	RICARDO JAVIER ROMERO PETIT	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	01/09/2023	20/09/2023

Tabla No. 5

TRANSPORTE ASCANIO

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
1065639870	OLBER DONADO VILLAFAÑE	OPERADOR DE MAQUINARIA	OPERATIVA	SI	01/09/2023	N/A

Tabla No. 6

SECURITY FORCE

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
77185068	ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	21/09/2023	N/A
1122396146	JEISON ANDRES CHAMORRO SARIA	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	21/09/2023	N/A
1065646526	JOSE ALBERTO GUTIERREZ SANTIAGO	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	21/09/2023	N/A

Tabla No. 7

Anexo 1 Documentos para ingreso a obra (C.C, ARL, EPS, AFP, CCF, Examen médicos)

4. INDICADORES

Para este contrato se contemplan indicadores de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales nos permiten evaluar la gestión de SST y sus diferentes variaciones durante cada periodo de ejecución del proyecto a continuación se relacionan cada uno de los indicadores para el periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2023.

4.1 Horas hombres Trabajadas Personal Operativo

Para las labores ejecutadas en este proyecto, los resultados obtenidos durante el periodo objeto de este informe se determinó que se trabajaron las horas estipuladas. Así mismo se evidencia el reporte del ausentismo que tuvo incidencia en el proyecto durante el mes de Septiembre como se relaciona en la siguiente tabla.

Versión:1	INDICADORES DE GESTION PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES - VALLEDUPAR
Fecha: 31/05/2023	
Clsificación: Interno	

PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES.

MES	Días Labor	N. Trabajadores	Horas Hombre Trabajadas	H.E	Ausentismo laboral				TOTAL DIAS PERDIDOS 2023	OBSERVACIÓN
					Por Accidente Laboral	Por Enfermedad comun	Ausencia no Justificada	Ausencia Justificada		
MARZO	26	13	2704	0	0	0	1		0	
ABR	23	27	4968	0	0	0	0		0	
MAY	23	42	7728	0	0	0	0		0	
JUN	24	50	9600	0	2	37	6		45	
JUL	24	37	7104	0	0	37	0	28	65	Ausentismo por licencia de paternidad (trabajadores: Segundo Martinez, Juan Carlos Murgas.
AGO	25	36	7200	0	0	33	17	0	50	
SEP	26	36	7488	0	0	33	17	0	42	Trabajador Carlos Mosquera presenta incapacidad medica emitida por EPS. Trabajador Juan Yesith Brito y Aldair
TOTAL	171	34	46792	0	2	140	41	28	202	

Tabla No. 8

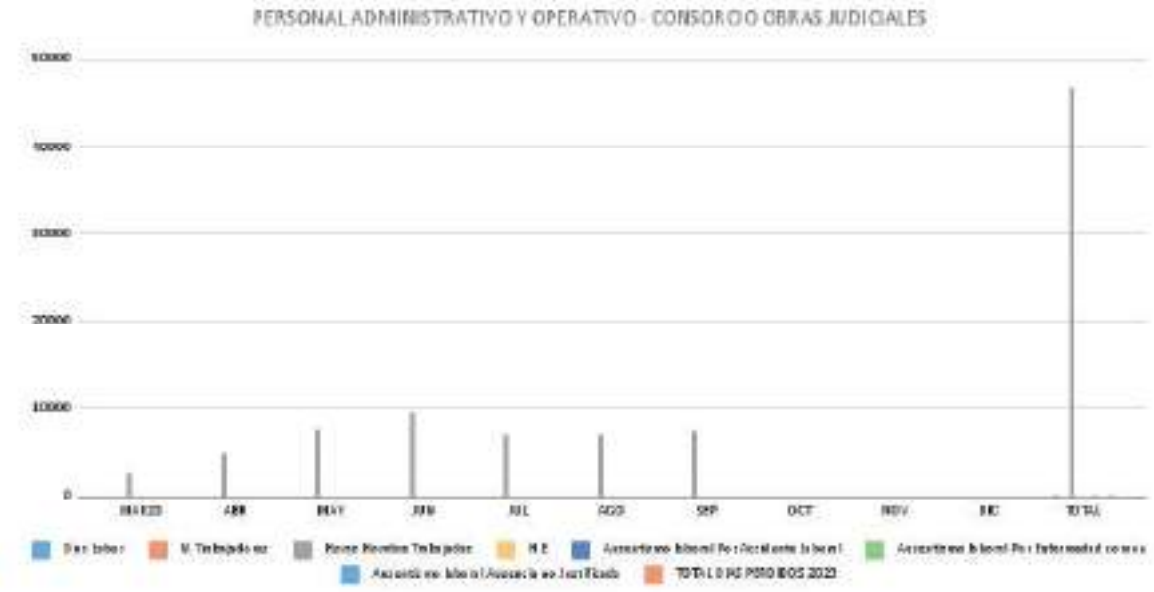


Gráfico No. 1

Versión:1	INDICADORES DE GESTION PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES - VALLEDUPAR	
Fecha: 31/05/2023		
Clsificación: Interno		

PERSONAL CONTRATISTAS										
MES	Días Labor	N. Trabajadores	Horas Hombre Trabajadas	H.E	Ausentismo laboral				TOTAL DIAS 2023	OBSERVACIÓN
					Accidente Laboral	Enfermedad comun	Ausencia no Justificada			
MARZO	13	6	624	0	0	0	0		0	
ABR	23	6	1104	0	0	0	0		0	
MAY	23	19	3496	0	0	0	0		0	
JUN	24	13	2496	0	0	0	0		0	
JUL	24	8	1536	0	0	0	0		0	
AGO	25	7	1400	0	0	0	0		0	
SEP	26	7	1456	0	0	0	0		0	
TOTAL	***158***	**9**	**12112**	**0**	**0**		**0**		**0**	

Tabla No. 9

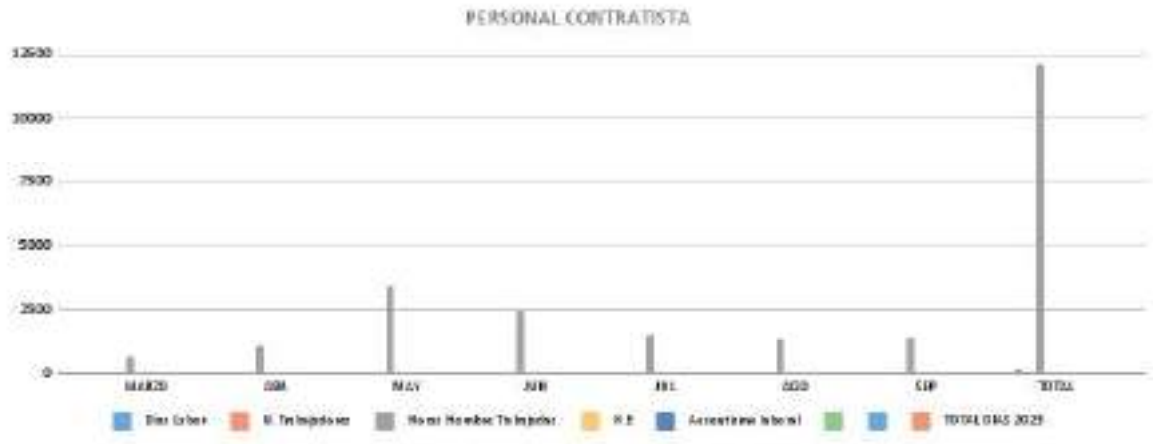


Gráfico No. 2

Se evidencia que el periodo de este informe se aumentó los tiempos de labores en obra, por la cantidad de personal que hizo presencia en el mismo.

4.2 Ausentismo en el proyecto.

En el periodo de presentación de este informe se presentan ausentismo en el proyecto, los cuales son relacionados a continuación.

INCAPACIDADES AGOSTO 2023									
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CONTRATISTA	CARGO	FECHA INICIO DE INCAPACIDAD	FECHA FIN DE INCAPACIDAD	DIAS DE INCAPACIDAD ACCIDENTE LABORAL	DIAS DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD COMUN	DIAS DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD LABORAL	DIAS TOTAL DE INCAPACIDAD
DUVAN ENRIQUE PERALTA PORTO	1065837582	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	28/07/2023	13/09/2023	0	13	0	13
CARLOS ANDRES MOSQUERA PALMERA	1065823637	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	01/09/2023	03/09/2023	0	3	0	3
ALDAIR LUIS DIAZ OÑATE	1065809820	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	01/09/2023	02/09/2023	0	1	0	1
JUAN YESITH BRITO ZABALETA	1193403152	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	08/09/2023	10/09/2023	0	3	0	3
JEINER DAVID MENDOZA RODRIGUEZ	1080431816	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	OFICIAL DE OBRA	08/09/2023	09/09/2023	0	2	0	2
JHON JAIRO MORALES CABRERA	1048600194	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	OFICIAL DE OBRA	11/09/2023	19/09/2023	0	9	0	9
LUIS GABRIEL MARQUEZ JULIO	1007392140	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	18/09/2023	18/09/2023	0	1	0	1
GEOVALDI ENRIQUE FONTALVO MATOS	1065562392	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	19/09/2023	19/09/2023	0	1	0	1
TOTAL						0	17	0	17

Tabla No. 10

4.3 Accidentalidad del Proyecto

Para el periodo de este informe comprendido desde el día 01 al 30 de Septiembre del 2023 no se presentó accidente laboral en el proyecto.

INDICE MENSUAL	I.F	I.S	I.L.I
sep-23	NA	NA	NA
CONSOLIDADO 2023			

INDICE MENSUAL	I.F	I.S	I.L.I
ene-23	N/A	N/A	N/A
feb-23	N/A	N/A	N/A
mar-23	N/A	N/A	N/A
abr-23	N/A	N/A	N/A
may-23	N/A	N/A	N/A
jun-23	2,08	2,08	0
jul-23	N/A	N/A	N/A
ago-23	N/A	N/A	N/A
sep-23	N/A	N/A	N/A

Tabla No. 11

5. MEDICINA PREVENTIVA LABORAL

Durante el mes de Septiembre del 2023 se presentó nuevo ingreso de personal a obra, los cuales se valida todo lo reglamentario con Seguridad Social (ARL, EPS, AFP, CCF) y posteriormente se procede a realizar la inducción SST, evaluación, Notificación de Riesgos.

Anexo 2 Inducción SST, Evaluación, Notificación de Riesgos.



Fotografía N°1: Fotografía N°1: Inducción personal Contratista Security Elite



Fotografía N°2: Fotografía N°2: Inducción personal Contratista Transporte Ascanio

	
Fotografía N°3: Fotografía N°3: Reinducción personal Consorcio Obras Judiciales	**Fotografía N°4: Fotografía N°4: Inducción personal Contratista Security Force**

Anexo 3 Notificación de riesgo visitante

6. ACTIVIDADES EN OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre del presente año se realizaron las siguientes actividades:

- **Topografía**

Toma de niveles para excavación de caissón, zapatas vigas y columnas.

Localización de puntos de zapatas y columnas.

Verificación de verticalidad.

- **Obra civil**

Excavación manual para caissón

Retiro manual de material.

Corte de acero

Armado de acero para caissón

Encofrado para fundir anillos

Fundida de anillos para caissón

Instalación de filtros Geodren Tecdren

Armado de acero para zapata

Colocación y aplomado de formaletas

Fundida de zarpa y zarpa

Desencofrado de zapata

6.1 Registro de inspecciones planeadas y permisos de trabajo.

En el periodo de este informe se realizaron las siguientes inspecciones.

Anexo 4 Pre operacionales

Anexo 5 ATS, Permisos para trabajo en excavación, permisos para trabajo en Alturas.

GESTIÓN DOCUMENTAL SST	MES DE EJECUCIÓN	CANTIDAD
Inspección de pulidora, taladro, trazadora, Sierra circular mezclador de concreto, herramientas manuales, Bomba estacionaria, Bomba de agua, Inspección de botiquín, Camilla, extintores.	Septiembre	40
Inspección de EPCC	Septiembre	26
Análisis de Trabajo Seguro	Septiembre	
Permiso para trabajo en excavación.	Septiembre	24
Permiso para trabajo en Alturas.	Septiembre	58
Permiso para trabajo en caliente.	Septiembre	17

Tabla No. 12

6.2 Formación de personal en Seguridad y Salud en el Trabajo

Charla SST – Capacitación.

Fecha	Tipo de actividad	Tema	Duración
01/09/2023	Charla SST	Protección facial	12 Minutos
02/09/2023	Charla SST	Protección de la flora y la fauna	10 Minutos
04/09/2023	Charla SST	Seguridad en el uso de eslinga	8 Minutos
05/09/2023	Charla SST	Protección de los recursos hídricos, prohibiciones al respeto	12 Minutos
06/09/2023	Charla SST	Riesgo del ruido	10 Minutos
07/09/2023	Charla SST	Golpe de calor	10 Minutos
08/09/2023	Charla SST	Manejo de los residuos líquidos o Vertimiento, permisos y obligaciones	12 Minutos
09/09/2023	Charla SST	Manejo integral de residuos sólidos, domésticos y peligrosos	10 Minutos
11/09/2023	Charla SST	Socialización ATS	10 Minutos
12/09/2023	Charla SST	Resbalones, Tropezones y caídas	12 Minutos
13/09/2023	Charla SST	Pensar antes de actuar, Practicando el autocuidado	15 Minutos
14/09/2023	Capacitación	Manejo de materiales sobrantes y materiales de construcción	12 Minutos
15/09/2023	Charla SST	Respetar la señalización en obra	10 Minutos
16/09/2023	Charla SST	Responsabilidad social en un adecuado manejo ambiental en obra	15 Minutos

18/09/2023	Capacitación	Cambios climáticos	8 Minutos
19/09/2023	Charla SST	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas.	7 Minutos
20/09/2023	Charla SST	Riesgos básicos de seguridad	5 Minutos
21/09/2023	Capacitación	Ahorro de recursos Hídricos	1 Hora
22/09/2023	Charla SST	Cuidado de los equipos o elementos de protección personal	9 Minutos
23/09/2023	Charla SST	Respeto mutuo entre compañeros	7 Minutos
25/09/2023	Capacitación	Prevención consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas	1 Hora
26/09/2023	Charla SST	Inspeccionar las herramientas antes de usar	10 Minutos
27/09/2023	Charla SST	Trabajo en equipo	12 Minutos
28/09/2023	Charla SST	Orden y aseo	12 Minutos
29/09/2023	Charla SST	Practica el Autocuidado	12 Minutos
30/09/2023	Charla SST	Cuido mis manos	10 Minutos

Tabla No. 13

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL

La prevención de accidentes como factor primordial en el proyecto se ha efectuado gracias a la colaboración obtenida por parte del personal y el área SST. Quienes mutuamente por medio de actividades de inspección, control, aprendizaje y mejora continua. Ayudan a prevenir la ocurrencia de factores que sean potenciales en la influencia para la generación de actos y condiciones inseguras.

En la siguiente tabla se exponen a manera de resumen algunas de las actividades potencialmente relevantes encaminadas a contribuir con la seguridad y salud en el trabajo durante el mes de Septiembre de 2023.

DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Charlas de seguridad: las charlas de seguridad se realizan todos los días antes de iniciar la jornada laboral con el objetivo de informar y concienciar a los trabajadores sobre su propia seguridad y salud en el trabajo.	   

Orden y aseo: El orden y el aseo en obra son factores importantes para la prevención de incidentes y accidentes ayudan a mejorar las condiciones de seguridad en general.










Aseo parte externa de la obra



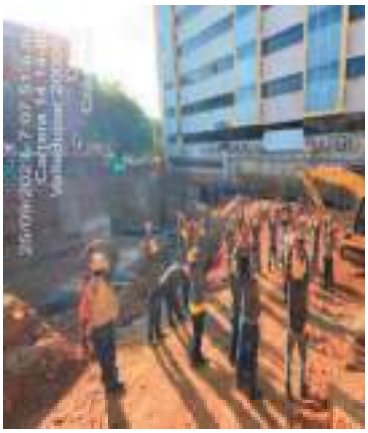

Pausas activas: su finalidad es contribuir con la liberación, descanso y esparcimiento del sistema locomotor de cada individuo.	   
Inspección pre operacional de herramientas, equipos y maquinaria a utilizar: Se realiza con el fin de revisar y examinar el estado de cada uno de estos y determinar si están aptos para ser utilizados.	 

	 
Entrega de EPP: Se realiza la entrega del elemento y se les recuerda la importancia del su uso. (protegerse minimizando los riesgos de accidente)	 
Señalización áreas intervenidas: Se realiza con el fin mitigar el riesgo o peligro existente.	 

<table>
<tr>
<td></td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Inspección de EPCC: Se realiza la inspección cada vez que se va a utilizar con el fin de verificar que no tenga ningún desgaste, daños o corrosivos.</td>
<td> 
 </td>
</tr>
</table>

Reunión de COPASST se realizan reuniones mensuales con el comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, así dando cumplimiento a la normatividad establecida.	 
Capacitación: **Prevención de consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.**	 
Instalación de sendero peatonal provisional: Se instala sendero peatonal provisional con el fin de garantizar el paso del peatonal durante el descargue de material en obra.	 

Actos y condiciones inseguras Se anexan formatos de actos y condiciones inseguras.	
Acto inseguro: Los trabajadores Carlos Andrés Mosquera Palmera, Aníbal José Jiménez Escorcia, Eduardo Enrique Rivera Álvarez, Juan David Mejía Cinin, Aldair Luis Díaz Oñate, Rafael Augusto Balcázar Verdecia, se encontraban en un caissón a una altura negativa aproximadamente de 4.70 Mts, sin la debida protección. Se evidencian trabajadores sin EPCC (Equipo de Protección Contra Caída) y los que tienen no se encuentran anclados a una línea de vida. Vale la pena aclarar que este sistema se requiere de uso obligatorio como medida preventiva en caso de presentarse una emergencia (Desplome de caissón) poder identificar al personal que se encuentra expuesto para un posible rescate.  	Se corrige el acto inseguro realizando un llamado de atención al personal el cual se evidencia cometiendo el acto inseguro.

Acto inseguro: Se evidencia al señor Emiro Avendaño Maestro de obra, cometiendo acto inseguro, sentado de una manera no apropiada en el borde de un muro a una altura aproximada de 5 mts, sin EPCC (Elemento de Proteccion Contra Caida) siendo este una medida obligatorio por norma vigente (Resolucion 4272 de 2021) Donde se establecen los requisitos minimos para trabajo en altura despues de 2.0 Mts, como medida preventiva para riesgo de caida.  	Se corrige el acto inseguro realizando llamado de atención y asignando un arnés con eslinga al colaborador.

Condición insegura: Se evidencia sendero peatonal obstruido por material desorganizado. 	Se corrige la condicion insegura organizando nuevamente y señalizando sendero peatonal. 
Condición insegura: Se evidencia áreas con condiciones inseguras sin señalización, debido a las excavaciones para llevar a cabo las actividades de la máquina. 	Se corrige condicion insegura realizando demarcacion con señalizacion de colombinas con malla, por terrenos con diferencias de nivel. 

Tabla No. 14

8. ANEXOS

- Anexo 1 Documentos para ingreso a obra (C.C, ARL, EPS, AFP, CCF, Examen médicos, Certificado de competencia).
- Anexo 2 Inducción, evaluación de inducción, notificación de riesgo.
- Anexo 3 Notificación de Riesgos visitantes.
- Anexo 4 Pre operacionales.
- Anexo 5 ATS –Permisos.
- Anexo 6 Planilla de seguridad Social.
- Anexo 7 Asistencia Charla SST.
- Anexo 8 Evaluación Capacitación.
- Anexo 9 Acta reunión COPASST.
- Anexo 10 Inspección de pre-uso equipos de alturas.
- Anexo 11 Entrega de EPP.
- Anexo 12 Documentos maquinaria amarilla (Tarjeta de registro, Declaración de importación, Mantenimiento)
- Anexo 13 Actos y Condiciones inseguras.


Residente SST
KAREN SOTO FUENTES
CC: 1120748067
Resolución 1348 del 26 de Diciembre del 2017

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 03 de octubre de 2023

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-410

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. Revisión calculo zapata Z9 muro M1

Siguiendo con la inquietud presentada sobre la excentricidad de la zapata Z9 por la altura del muro M1, luego de revisado el calculo y lo mencionado por Diseño Estructural en su comunicado JEB-2023-122 del 27 de septiembre, remitimos análisis, cálculos y detalle de estructura, de nuestro asesor estructural el Ing. Atenógenes Beleño, para su análisis y respuesta al respecto.

Es de aclarar como fue presentado en comité, que este hecho ha causado retraso a la obra y costo ya que la actividad debe ser desarrollada de manera manual y que se debe modificar el programa de cimentación.

Sin otro en particular,

Ing. Ferney Peña
Director de Obra
Consorcio Obras Judiciales

Valledupar, octubre 02 de 2023

OBRA: PALACIO DE JUSTICIA – VALLEDUPAR
REF: RESPUESTA DE EXCENTRICIDAD ZAPATA Z9 DEL MURO 1 – DISEÑADOR
ATTN: FERNANDO BERNAL
COORDINADOR DE OBRA
Cordial saludo.

Por medio de la presente, de acuerdo al comunicado del 27 de septiembre:

DISEÑO ESTRUCTURAL

JEB-2023-122

Bogotá D.C., septiembre 27 de 2023


Señores:
MC ARQUITECTOS
Atn, ARQ. ANDRES CABRERA
Ciudad

REF. PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR

En respuesta a su solicitud mediante correo electrónico del día 26 de septiembre de 2023, en el que relaciona el siguiente comentario:
"sobre el punto siguiente de la consulta realizada al ing. Jaime Buitrago, tanto el asesor estructural del contratista de obra como el revisor estructural externo de estructura manifiestan que no tienen claro los contrapesos en el sistema estructural que identifique la zapata Z9 del muro m1.
arq. Andrés la solicitud es que por favor el ingeniero Jaime amplie la respuesta a la inquietud de los especialistas."


Por medio de la presente comunicación reiteramos lo manifestado en nuestro oficio JEB-2023-083 y hacemos las siguientes aclaraciones adicionales:

1. El cimiento del muro pantalla M1 es la zapata Z9, la cual ha sido diseñada como un cimiento continuo y excéntrico, conforme a la condición de lindero indicada en la siguiente imagen:

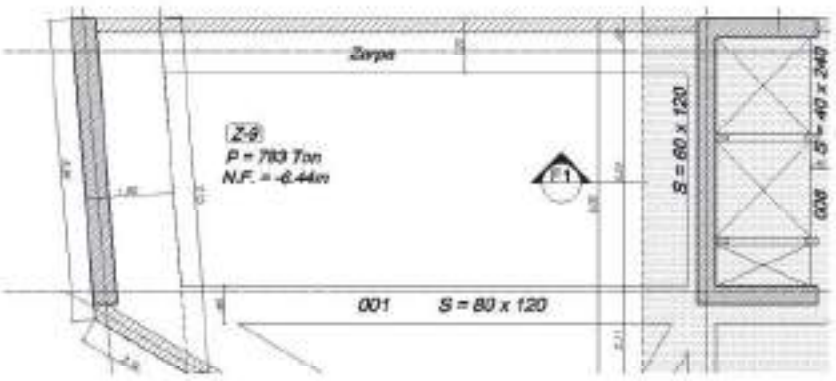

DISEÑO ESTRUCTURAL

2. La configuración de esta zapata es similar a la utilizada para las "zarpas" de los muros de contención por lo que no se especifican contrapesos, estos últimos usuales solamente en arreglos para zapatas aisladas y excéntricas sin la posibilidad de equilibrarlas con columnas adyacentes, como es el caso de una bodega.
3. La estabilidad del cimiento es total, debido a la ubicación de la viga 001 S=80x120 y al muro de contención del eje 1.
4. El espesor de muro pantalla M1 es de 50cm lo que permite cumplir con la longitud de desarrollo Ldh para barras #7 con gancho estándar a 90° conforme a lo exigido en C.12.5 y C.21.7.5
5. El resumen del diseño a flexión y cortante de la zapata está incluido en el cuadro de la pagina 52 de las memorias de cálculo, conforme a la siguiente condición:

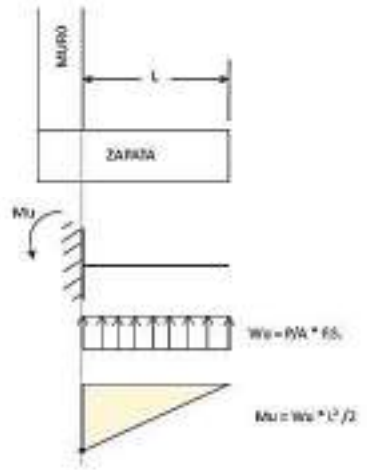

Cordialmente,

JAIME ELISEO BUITRAGO NOVA
Ing. Civil – Especialista en Estructuras
MAT. 25202 43302 CND

Se encuentra que la explicación presentada por el ingeniero estructural no muestra la comprobación que el momento actuante sea soportado adecuadamente por la zapata y la viga de cimentación y contrapeso. Para esto se muestra un ejemplo que detalla la excentricidad a la cual esta aplicada la carga, en la cual los valores de cortante y momento último deben ser soportados por la sección y refuerzo tanto de la viga como de la zapata.

De acuerdo a lo anterior, se realizó un cálculo con las cargas que llegan a la zapata Z9, calculando el momento resistente que aporta la viga de cimentación, el contrapeso necesario para soportar los esfuerzos y el diseño de la viga de cimentación adicional que sería necesaria para garantizar la estabilidad del sistema.

EngSolutions RCB Version 9.1.3 - License No: A147-A8390 Page No. 1

Company: B3D
Project: Resultados del Analisis y diseño
File: I:\RCB\RCB2023\PALACIO DE JUSTICIA\PRRUEBA MODELO V2.rcb

Engineer: Atenogenes Beleño Perez
4:01:59 p. m. 2/10/2023

LINEAR ANALYSIS-NODAL DISPLACEMENTS

Location		Load	Displacements (cm)			Rotations (rad)		
Axis	Floor	LdComb	Dx	Dy	Dz	Rx	Ry	Rz
A-1	1	1	0.0000	0.0000	0.0164	0.0000	0.0000	0.0000
		2	0.0000	0.0000	0.0189	0.0000	0.0000	0.0000
A-2	1	1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
A-3	1	1	0.0000	0.0000	0.0729	0.0000	0.0035	0.0000
		2	0.0000	0.0000	0.1145	0.0000	0.0054	0.0000
A-4	1	1	0.0000	0.0000	-0.7197	0.0000	0.0152	0.0000
		2	0.0000	0.0000	-1.1158	0.0000	0.0236	0.0000
A-5	1	1	0.0000	0.0000	-73.2197	0.0000	0.0962	0.0000
		2	0.0000	0.0000	-113.4758	0.0000	0.1398	0.0000

Linear Analysis- Beam End Forces

Units: ton, ton-m

			END I X/L = 0.0						MZ(+)max		END J X/L = 1.0					
Beam	Floor	Load	Axl	Shr2	Shr3	Torque	MZ	MY	MZ	X/L	Axl	Shr2	Shr3	Torque	MZ	MY
A(1-2)	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	1.0	0.0	0.0	-189.0	0.0	15.8	0.0
		2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	1.0	0.0	0.0	-189.0	0.0	21.1	0.0
A(2-3)	1	1	0.0	0.0	674.0	0.0	12.6	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	368.7	0.0	-351.3	0.0
		2	0.0	0.0	1044.7	0.0	21.1	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	571.5	0.0	-544.5	0.0
A(3-4)	1	1	0.0	0.0	368.7	0.0	-351.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.6	0.0	-834.8	0.0
		2	0.0	0.0	571.5	0.0	-544.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-70.6	0.0	-782.4	0.0
A(4-5)	1	1	0.0	0.0	-45.6	0.0	-834.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.6	0.0	0.0	0.0
		2	0.0	0.0	-70.6	0.0	-782.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-70.6	0.0	0.0	0.0

Linear Analysis- Support Reactions

Support		Load	Force (ton)			Moment (ton-m)		
Axis	Floor	LdComb	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
A-2	1	1	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
		2	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

LOAD COMBINATIONS

No	Load Combination
1	DT
2	1.5SOI

Imagen 1. Calculo de momento último de la zapata Z9 = 782.4 Ton.m


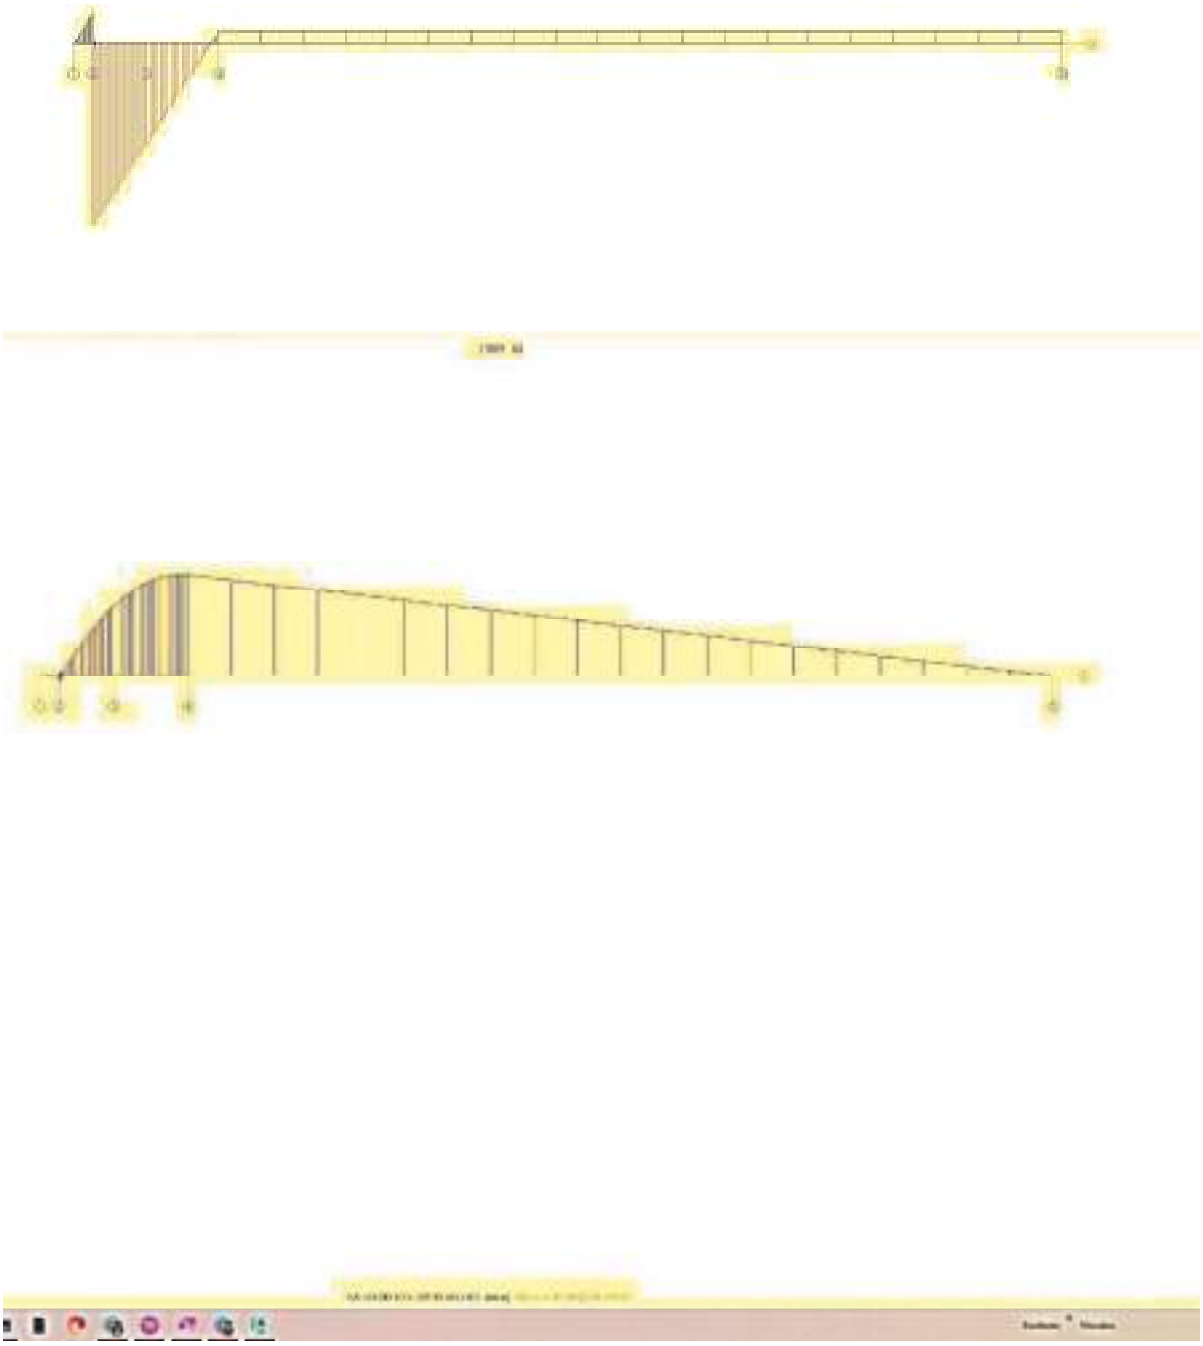


Imagen 2. Calculo de cortante y momento último de la zapata Z9 = 782.4 Ton.m

CALCULO MOMENTO RESISTENTE V.C. 29-9-23



$f'c = 350\ Kg/cm^2 = 5000\ psi$

$As = 7\ \phi\ N°8$ $\quad d = 107.5\ cm$

$fy = 4200\ Kg/cm^2$

ACI 318/19 $\quad MR = \phi\, f'c.b.d^2.w(1-0.59w)$

$\therefore w = \frac{p\,fy}{f'c} \Rightarrow p = \frac{As}{b.d} = \frac{5.1\,cm^2 * 7\,und}{(107.5 * 80)\,cm}$

$p = 0.00415$

$w = \frac{0.00415(4200)}{350} = 0.0499$


$\therefore a = d - \sqrt{d^2 - \frac{2Mu}{0.85 f'c.b}}$ $\quad a = \frac{5.1\,cm^2 * 7\,und * 4200}{0.85(350)80} = 6.3$

$\Rightarrow C = \frac{6.3}{0.85} = 7.41$ $\quad \varepsilon_t = \varepsilon_c\left(\frac{d}{c} - 1\right) = 0.003\left(\frac{107.5}{7.41} - 1\right) = 0.041$

Tensada Módulo Elasticidad $= \frac{fy}{ES} = \frac{4200}{2.100.000} = 0.002$

$\therefore 0.041 > 0.002 + 0.003$

$0.041 > 0.005$



$\Rightarrow$ Falla ductil, sección controlada por TENSION.

$MR = 0.9(350)80(107.5)^2 * 0.0499(1-0.59(0.0499))$

$MR = 14.103.066\ Kg.cm$

$MR = 141,03\ Ton.m$

Imagen 3. Calculo resistente viga actual= 141.03 Ton.m


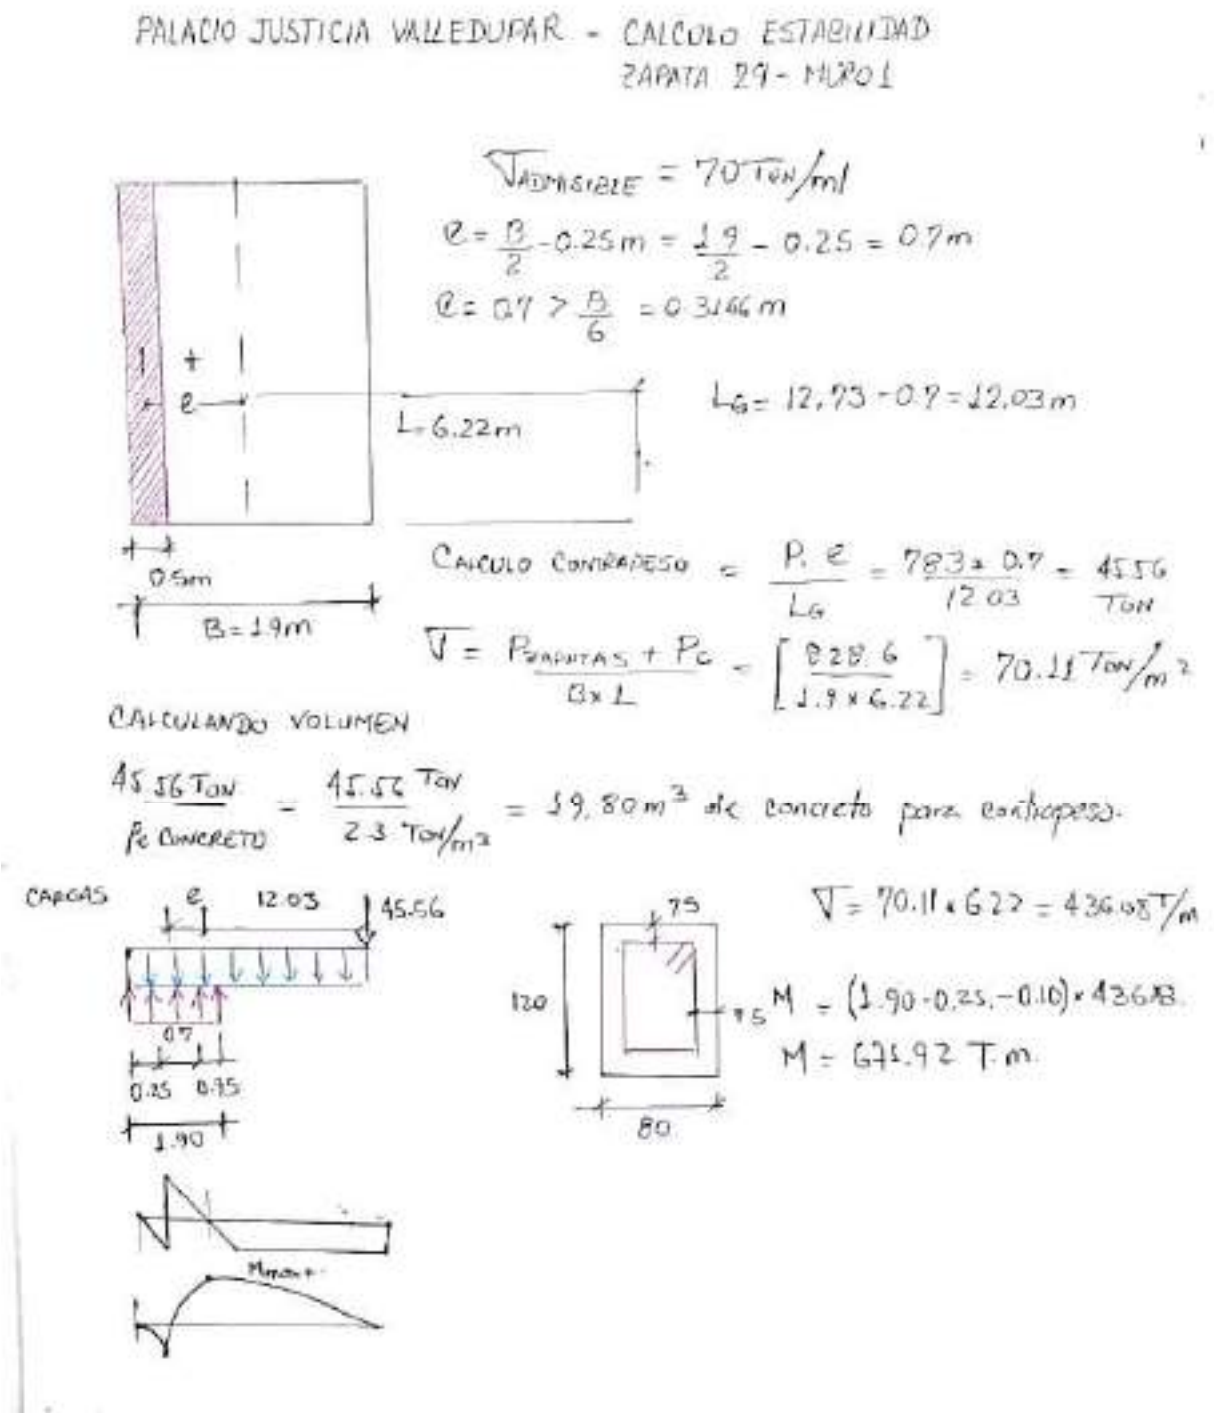


Imagen 4. Cálculo de contrapeso necesario para soportar el momento último.

02-10-23

PALACIO JUSTICIA VALLEDUPAR

CALCULO VIGAS ESTABILIZADORAS

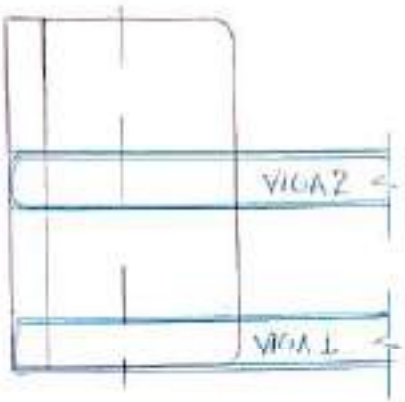

Nota: Es necesario una viga adicional para soportar el Momento último.

$M_{u_{V2}} = \frac{7820\ Ton.m}{2} = 391\ Ton\ m$

CALCULO ACERO PARA VIGA 2

$\rho = \frac{1}{m}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{2mK}{\phi f_y}}\right)$


$\therefore\ m = \frac{f_y}{\phi f_t} = \frac{4200}{0.85 \cdot 350} = 14.11$

$K = \frac{M_{uV_2}}{b \cdot d^2} = \frac{391\ Ton.m}{80 \cdot 107.5^2} = 42.3$

$\therefore\ \rho = \frac{1}{14.11}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{2m(42.3)}{0.9 \cdot 4200}}\right) = \frac{1}{14.11}(0.173) = 0.1226$

$As_{V_2} = \rho \cdot b \cdot d$

$As_{V_2} = 0.1226(80)(107.5) = 105.44\ cm^2$

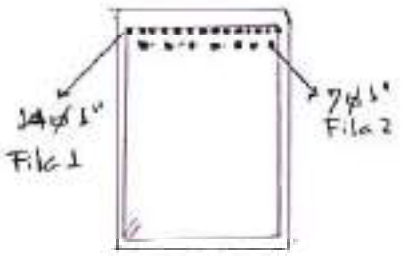

Usando $\phi 1" = \frac{105.44}{5.07} = 20.79 \approx 21$ barras


$21\phi 1" = 21 \cdot 5.09 = 106.47\ cm^2$

Imagen 5. Cálculo de viga adicional, cuantía de diseño y acero necesario

PALACIO JUSTICIA VALLEDUPAR

Verificacion cuantías

$$\rho_{bal} = 0.85 \frac{f'c}{fy} \cdot K_1 \cdot K_u$$

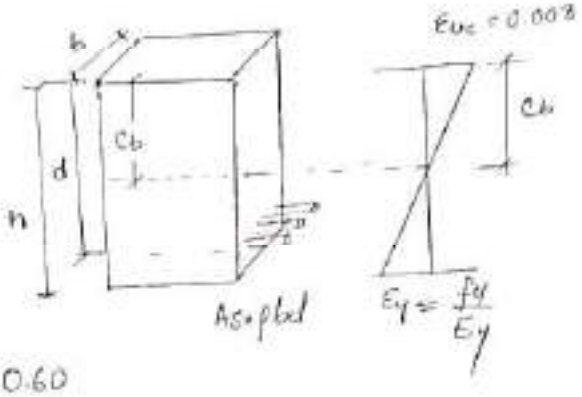

$$\cdot K_u = \frac{Euc}{Euc + Ey}$$

$$K_u = \left(\frac{0.003}{0.003 \cdot \frac{4200}{2100000}} \right) = 0.60$$

$$\therefore K_1 = \frac{K_2}{0.85 m.} = 0.8 \quad \text{Para resistencias } f'c = 35 MPa$$

$$\rho = 0.85 \left(\frac{35}{420} \right) 0.8 \cdot 0.6$$

$$\rho_{bal.} = 0.034$$

$$\rho_{maximo} = 0.75\ \rho_{balanceado}$$

$$\rho_{max} = 0.75\ (0.034) = 0.0255$$

$$\rho_{min} \leq \rho_{diseño} \leq \rho_{max}$$

$$0.0033 \leq 0.1226 \leq 0.0255$$

Imagen 6. Comprobación ρ mínimo, vs ρ diseño vs ρ máximo

Diseño de la viga adicional: Se requieren dos vigas de peralte de 1.20m x0.80m con el refuerzo que se muestra a continuación:

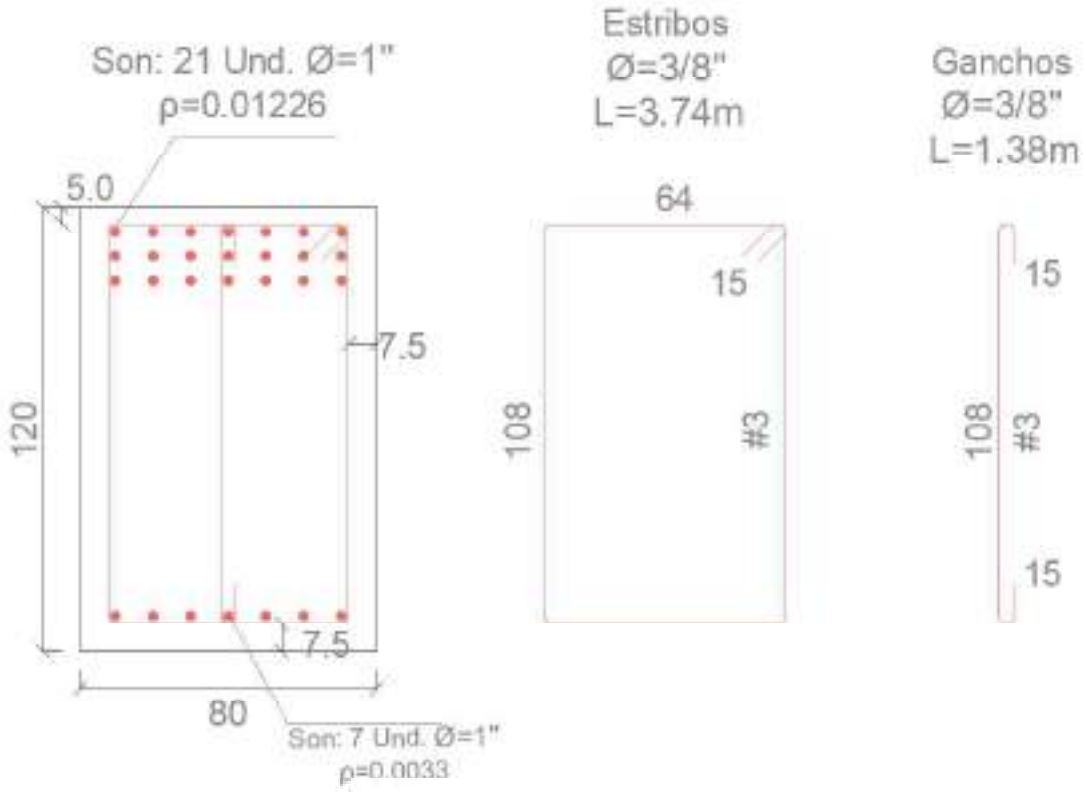


Imagen 7. Diseño de acero de vigas de 1.20x0.80 que soportan el momento último de 782.4 Ton.m

En la parte superior, se requieren 3 filas de acero de 7 unidades cada una, separadas 5 cms, de un diámetro de 1'' para un total de acero de 106.47 cms2. Para la parte inferior se tomó la cuantía mínima la cual tiene un área de 35.49 cms2, lo cual cumple la cuantía de 0.0033

Por todo lo anterior, se solicita amablemente tener en cuenta esta comprobación para incluir el elemento tipo viga para estabilizar el sistema.

Atte.:

Atenogenes Beleño Perez
Ing. Civil.
Mat. Pro[illegible]820-2650-09 Atl.

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 03 de octubre de 2023

Señores:
JMR SALUD OCUPACIONAL
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-411

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS A PERSONAL DE COJ.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito enviar la autorización para realizarse el Examen De Ingreso Orientado Al Riego De Trabajo En Altura al personal que a continuación se relaciona:

Autorización Para Exámenes Médicos De Ingreso A Personal A Contratar De Manera Directa Con El Consorcio Obras Judiciales			
No.	**Nombre Y Apellidos**	**Cedula**	**Cargo**
1	Jefferson Jesús Paba Vargas	1030707288	Oficial
2	Raúl Eduardo Marcelo Ocampo	79.675.098	Oficial

Cordialmente,

Ing. Fernando Bernal
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

Elaboró: WQ

Valledupar, 04 de Octubre de 2023

Señores:
SEGURITY ELITE
Contratista

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-412

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022
CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. SOLITUD PAGO DE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA SECURITY ELITE.

Mediante la presente solicito el pago de la planilla de seguridad social del personal que laboró durante el periodo correspondiente a los días del 01 de septiembre de 2023 al 20 de septiembre de 2023.

Quedamos atentos a comentarios

Cordialmente,

ING. Ferney Peña Rojas
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra
KSF

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 5 de octubre de 2023

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-413

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. INFORME MENSUAL DE OBRA PALACIO DE JUSTICIA V/PAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito enviar informe mensual de obra Palacio de Justicia V/par. correspondiente al mes de septiembre de 2023 con sus respectivos anexos.

Quedamos atentos a sus inquietudes.

Cordialmente,

FERNEY PEÑA
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

CV

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 08

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Proyecto

REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 08

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROYECTO: "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA EN VALLEDUPAR (CESAR)."

1. GENERALIDADES

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA No	: CO1.PCCNTR.4332011 No 323 del 29 de diciembre de 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: LICITACIÓN PÚBICA No. 10 de 2022
CONTRATISTA	: CONSORCIO JUDICIALES (Integrante 1- JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO 5% Integrante 2- SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGIENERIA Y CONSTRUCCIÓN 29%, Integrante 3 CONSTRUVAL INGENIERIA SAS 33%- Integrante 4 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTV SAS 33%)
OBJETO	: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)
VALOR DEL CONTRATO	: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($49.420.492.192) Incluido impuestos y contribuciones de Ley.
PLAZO INICIAL	: TREINTA Y CINCO (35) MESES
FECHA DE INICIO	: 11 DE ENERO DE 2023
FECHA FINAL	: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

Descripción de las obras en general

Obras

1. CRITERIOS GENERALES DEL PROYECTO

- **Descripción**

En este octavo informe se describe de manera detallada del control técnico administrativo de las actividades ejecutadas a la fecha por parte del Consorcio Obras Judiciales para *REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)*

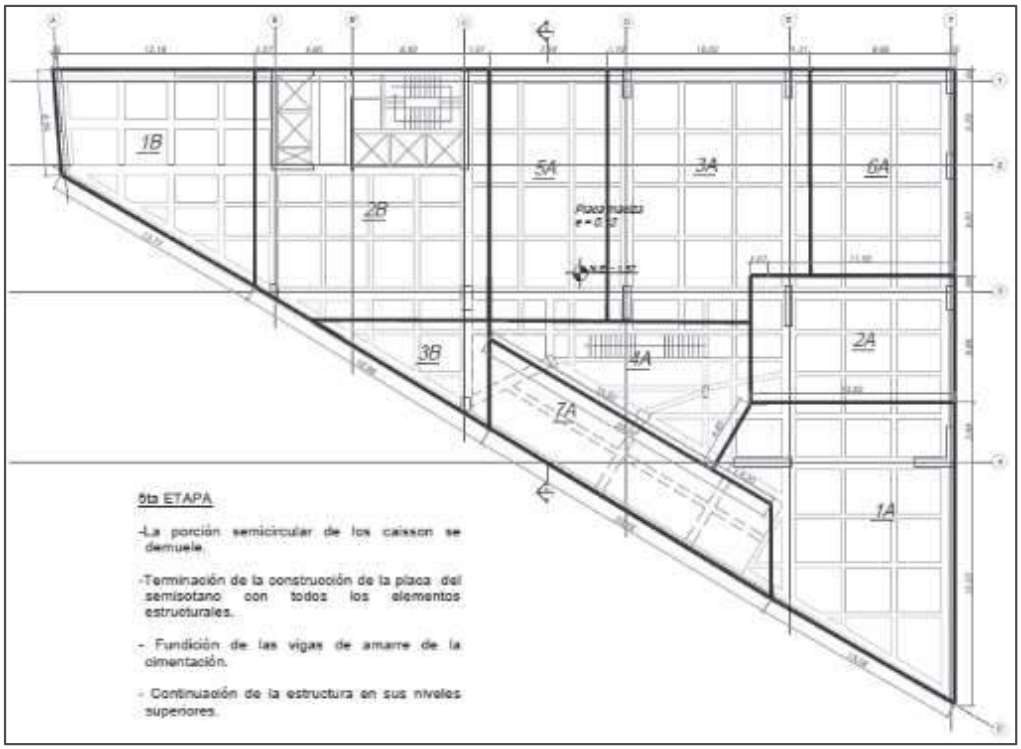


Figura. 1: Proceso constructivo ajustado.

2. ANTECEDENTES

En las antiguas instalaciones del parqueadero del Palacio de Justicia, se está ejecutando la ampliación de la misma, habiéndose concluido la construcción de los caissons como parte del proceso constructivo para estabilización del terreno y posterior demolición.

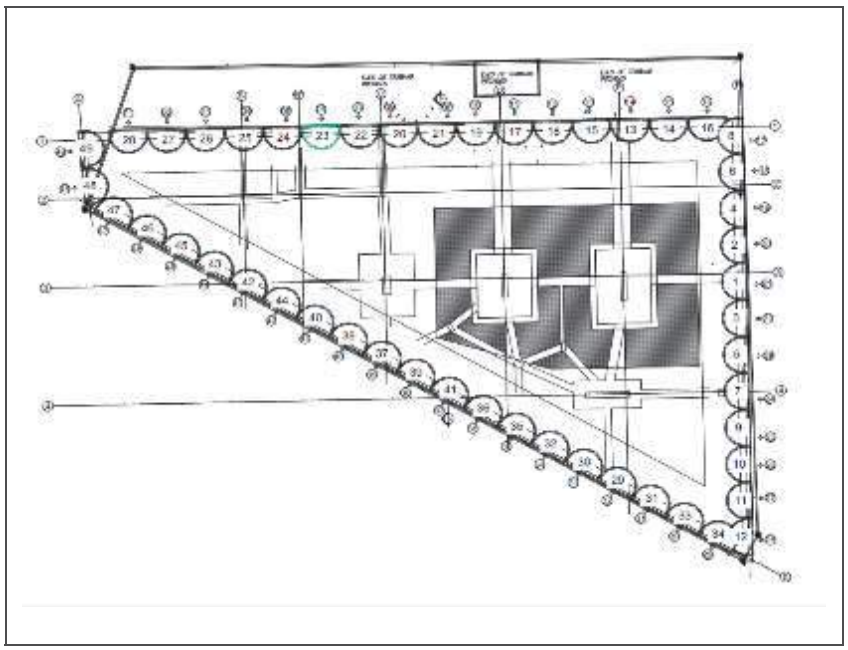


Figura. 2: Implantación sistema de caisson y estructura

3. INFORMACION GENERAL:

En este informe se encontrará información sobre el proceso y estado actual del Contrato de CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA EN VALLEDUPAR (CESAR). Ejecutado por el Consorcio Obras Judiciales

Con fecha 11 de enero de 2022 se firma el acta de inicio de Obras con Consorcio obras judiciales en calidad de contratista con su representante legal Julio Roberto Balbuena Alarcón, el señor Néstor Camilo Artunduaga Ávila como representante legal del consorcio Intervalledupar 2022 en calidad de interventoría externa y el arquitecto Jorge Enrique Fernández Becerra profesional universitario grado 20 del grupo de proyectos especiales de infraestructura de la dirección ejecutiva de administración judicial en calidad de coordinador de proyecto y la señora Ángela Aránzazu Montoya coordinadora grupo de proyectos especiales de infraestructura.

Se posesiona de parte del Consorcio Obras Judiciales al Ingeniero Julián Andrés Cogollo como Representante legal.

Que mediante Otro Si #1 con fecha 22 de febrero de 2023, el Consorcio Obras Judiciales delega al Señor Víctor Anderson Valbuena Quiroga como nuevo Representante Legal del Consorcio, y al Señor Julián Andrés Cogollo y al Señor Sergio Sereda Martínez como Representantes Suplentes del Consorcio.

Dificultades Presenciadas Durante el Desarrollo del Contrato

En el transcurso del mes de septiembre de 2023 el desarrollo del proyecto ha tenido retrasos frente a cronograma presentado debido a diversas variables, descritas a continuación:

- El hallazgo de rocas de sobre tamaño durante de las excavaciones para la instalación del geodren tipo vial, haciendo que interventoría suspenda las actividades en ese tramo hasta que los especialistas definieran el plan de acción.
- La demolición parcial de las rocas para evitar la interferencia con la estructura de la zarpa de la nueva edificación.
- Se detuvo el armado de los muros pantalla mientras los especialistas estructurales definían detalle de armado en los nodos generados entre los mismos, obstaculizando el avance sobre el primer tramo de placa de entre piso a ser erigida.
- Según revisión del asesor estructural del contratista, la zapata Z-9 no tiene contemplado la excentricidad a la que está sometida en su dimensionamiento, por lo tanto, se encuentra en revisión por parte del STI de interventoría y del diseñador estructural el ingeniero Jaime Buitrago.
- En los diseños entregados no existe un detalle que indique la transición del refuerzo de los elementos estructurales entre vigas-zarpas, zapata-zarpa, muro de contención-zapata y muro de contención-muro portante; los tiempos esperando estas definiciones han ocasionado retrasos en el desarrollo de las actividades del proceso constructivo aprobado.
- La concretera con la que se venía trabajando suspende operaciones en la zona, por lo que tocó iniciar un nuevo proceso con la única que está disponible, adicional, no cuentan con concreto de 6.000 psi y están realizando los ensayos pertinentes antes de poder suministrarlo, lo que conlleva a pausar la fundición de los elementos verticales.

3.1 SITUACIÓN DE LA OBRA.

Al finalizar el 30 de septiembre de 2023, las actividades del Proyecto han progresado como a continuación se describe:

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO PARA UBICACIÓN Y MARCADO EN EL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN LOS EJES PRINCIPALES, PARALELOS Y PERPENDICULARES SEÑALADOS EN EL PLANO DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS LINDEROS DEL MISMO.
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN PARA ELEMENT - INCLUYE LA CONFORMACION DE TALUDES Y TRINCHERAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
EXCAVACION MECANICA EN ROCA PARA CONFORMACION DE HUELLAS DE ELEMENTOS DE CIMENTACION - ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
EXCAVACION MANUAL CAISSONS CONSTRUCTIVOS
EXCAVACION MANUAL EN ROCA PARA CONFORMACION DE HUELLAS DE ELEMENTOS DE CIMENTACION - ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
PERFILADA FONDO DE EXCAVACION ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
BASES EN CONCRETO CICLOPEO TIPO_1 3000 PSI - 60% RAJON 40% CONCRETO - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS

ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
ZAPATAS EN CONCRETO TIPO_1 5000 PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
ZARPA MUROS DE CONTENCION TIPO_2 4000 PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO TIPO_1 5000 PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLOS DE CAISSON EN CONCRETO TIPO_1 3000 PSI INCLUYE POSTERIOR DEMOLICION - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 1.500PSI (CONCRETO DE LIMPIEZA) SEGÚN PROCESO CONSTRUCTIVO Y/O DISEÑO ESTRUCTURAL
COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO A LA VISTA TIPO_1 DE 6000PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LAS DEFINICIONES ARQUITECTONICAS DEL CONCRETO, SEGUN DISEÑO
SUMINISTRO Y MANEJO DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA INCLUYE ALAMBRE NEGRO DE AMARRE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE DE TALUDES SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS
EXCAVACION MANUAL PARA REDES DE TUBERIAS SEGÚN PLANOS HIDROSANITARIOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
INSTALACION DE GEODREN TIPO VIAL
INSTALACION DE TECDREN
ASEO GENERAL

3.2 CONTROLES DE OBRA

Controles Generales de procesos

De acuerdo con el desempeño de las actividades y procesos que se llevan a cabo para asegurar que los objetivos de la empresa y las obras contractuales sean alcanzados.

3.3 CONTROLES TÉCNICOS

Se cumple con las especificaciones técnicas en las ejecuciones de actividades realizadas a la fecha cumpliendo con todos los estándares de calidad y especificaciones técnicas.

- Se realizan actas de liberación de excavaciones, acero y concretos para los elementos estructurales tales como vigas de cimentación, zapatas y zarpas.

- Se realizan actas de liberación para instalación de drenajes tipo geodren vial y tecdren.
- Se realizan ensayos a los concretos fundidos en obra de acuerdo con el artículo C.5.1.3 de la NSR-10. Los resultados indican que se obtienen resistencias de hasta el 90% a los 7 días.

3.4 Controles Generales

Se realiza el seguimiento según el nuevo cronograma del proceso constructivo, se está monitoreando semanalmente el avance de los trabajos, sin embargo, es necesario ajustarlo dados los hallazgos presentados en campo y limitaciones del sector.

3.5. Controles Generales de Subcontratistas

Los trabajos son realizados por personal de mano de obra calificada, siendo únicamente un subcontratista principal que viene desarrollando trabajos de excavación y retiro de material.

3.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

LOCALIZACION Y REPLANTEO.

- Se realiza levantamiento topográfico para la ubicación y verificación de ejes estructurales del proyecto

EXCAVACION MANUAL Y A MAQUINA

- Excavación para caisson, sótano, vigas y zapatas principales.

ARMADO DE ACERO

- Armado y figurado de acero manual para caisson, armado de aceros para zapatas Z-2, Z-13, columna B-3 y C-3', muros M-8 y M-9, vigas 02, 03, 06, 07, 10, 11, 12 y 15.

CONSTRUCCION DE CAISSON

- Suministro e instalación de anillos de caisson en concreto tipo_1 3.000 psi incluye posterior demolición - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento).

FUNDICION DE CIMENTACIONES

- Zapatas en concreto de baja permeabilidad 5000 psi - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento).

- Zarpa muros de contención tipo_2 4000 psi - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento).

- Vigas de cimentación en concreto tipo_1 5000 psi - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento).

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO

- Columnas rectangulares en concreto a la vista tipo_1 de 6000psi - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento) se deberá tener en cuenta las definiciones arquitectónicas del concreto, según diseño.

CONDICIONES CLIMATICAS

- Durante la ejecución de las obras correspondientes al mes de septiembre de 2023 se presentaron días de lluvia; impidiendo la ejecución de las actividades durante 45 HH/m.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO															X																

PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

Para el desarrollo de las actividades del presente contrato, Consorcio Obras Judiciales utilizó el siguiente personal:

PERSONAL	CANT.	ACTIVIDADES REALIZADAS
Director	1	Dirección de actividades de construcción de obras, dirección del personal de obra, dirección de obras, administración de materiales.
Arq. Residente de Obra	1	Supervisión de actividades técnicas ejecutadas Actividades de construcción de Obras inherentes al contrato.
Ing. Residente de Obra	1	Supervisión de actividades técnicas ejecutadas Actividades de construcción de Obras inherentes al contrato.
Auxiliar Administrativo	1	Actividades administrativas, compras, recepción de Documentos, etc.

Delineante arquitectónico y de ingeniería	1	Realizar los ajustes, modificaciones y generación de planos récord que se requieran
Residente SST	2	Actividades de seguridad y salud en el trabajo

CONTRATISTA TOPOGRAFÌA

Topógrafo	1	Trazado y levante de ejes estructurales
Auxiliar de topografía	1	Ayudante trazado y levante de ejes estructurales demolición de muros y retiro de materiales

CONTRATISTA EXCAVACION.

Operario maquinaria	1	Excavación mecánica.

MATERIALES UTILIZADOS.

- Acero
- Alambre negro
- Tablas
- Cemento UG
- Arena
- Gravilla

EQUIPOS UTILIZADOS.

Los equipos usados para la ejecución de las obras objeto del presente contrato fueron las siguientes:

- Tronzadora.
- Taladro.
- Taladro demoledor.
- Mezcladora de concreto
- Herramientas menores
- Volquetas.
- Excavadora.
- Mixer.
- Bombas de succión de lodos.

4. CONTROL DE ACTIVIDADES

4.1 Actividades Realizadas

- Se realizó revisión completa de los contratos en el mes, tiempo de entrega, revisión de actividades, ajuste de programación de instalación de actividades a realizar.

- Se ha supervisado que se inicie cada actividad con los respectivos implementos de seguridad.
- Se lleva un control del proceso constructivo de cada actividad en todas las obras supervisadas.
- Elaboración de registros fotográficos de todas las actividades desde su inicio en el transcurso de las mismas.
- Revisión de entrega y revisión física de cantidades de obra ejecutada.
- Revisión y supervisión de los materiales utilizados en la obra.
- Se supervisa que se trabaje con las herramientas adecuadas en los procesos constructivos de las obras.
- Se controla que se mantenga despejado y limpio el área de trabajo para no crear congestión o traumas en el tiempo y espacio del desarrollo del contrato.
- De cada actividad en la construcción de las obras, el control de actividades está basado en la revisión de cada ítem y de las medidas de cada ítem en el desarrollo de las obras.
- Todo se está llevando de acuerdo con las normas de la construcción y las especificaciones técnicas.

A. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

A continuación, se hace la relación de las actividades administrativas realizadas por el Consorcio Obras Judiciales en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2023:

- Comités de obra: Durante el periodo del presente informe se realizaron los siguientes comités de seguimiento de obra:
- 08 de septiembre de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 33 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ.
- 15 de septiembre de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 34 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
- 22 de septiembre de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 35 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
- 28 de septiembre de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 36 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ

- Bitácora: Se ha diligenciado normalmente la bitácora de obra del proyecto por parte de interventoría

5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- Se presentan mayores tiempos de ejecución a los contemplados en cronograma en las actividades previstas dentro del proceso constructivo ajustado, por hallazgos en el terreno y definiciones de algunos elementos estructurales.

- Se radica factura acta parcial No. 3.

6. RELACIÓN DE PAGOS:

No. O.P.	Fecha	Valor Factura	Concepto
1	2022/12/29	$ 9.884.098.438	Anticipo 20%
DESEMBOLSO	2023/02/13	$ 9.884.098.438	Anticipo 20%
FE 04	2023/06/28	$ 99.782.870,00	Acta 01
FE 06	2023/09/06	$ 142.171.005,00	Acta 02

Nota: Ver en anexo reporte de rendimientos financieros del desembolso

7. CORREPONDECIA ENVIADA

9/1/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 371	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	INFORME SST MES DE AGOSTO 2023
9/2/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 373	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DOCUMENTOS DE INGRESO A OBRA - CONTRATISTAS SECURITY ELITE SAS - TRANSPORTE ASCANIO
9/1/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 374	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENTREGA No.4 DE RELACIÓN DE FACTURAS PARA LEGALIZACIÓN DE ANTICIPO
9/2/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 375	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	NUEVO APU PARA LA PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRA
9/4/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 376	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	INFORME MENSUAL DE OBRA PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR MES DE AGOSTO DE 2023
9/6/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 377	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENTREGA INFORME NOVEDADES HIDRAULICAS
9/7/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 378	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DOCUMENTACIÓN DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
9/8/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 379	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	SOLICITUD DE LIBERACIÓN ZONAS DE TRABAJO
9/8/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 380	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS MODIFICATORIA No.1
9/8/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 381	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR	RADICACIÓN INFORME FORESTAL RESOLUCIÓN 0017 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023 EXPEDIENTE CG-RNEEAP 012-2023
9/14/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 382	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	HALLAZGOS EN PLANOS PALACIO DE JUSTICIA No.3
9/13/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 384	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023 - CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
9/13/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 385	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	INFORME OBRAS ALEDAÑAS CON NIVEL FREATICO
9/14/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 386	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	LIBERACIÓN ZONA DE TRABAJO CAISSON 4 Y 5
9/15/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 387	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DOCUMENTOS PARA REINTEGRO LABORAL

9/15/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 388	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR	RADICACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)
9/16/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 389	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA ANILLOS - CONTRATISTA TRANSPORTE ASCANIO
9/18/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 390	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENTREGA BALANCE DE OBRA MODIFICACIÓN No.2
9/19/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 391	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023 - CONTRATISTA JER TOPOGRAFIA
9/19/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 392	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DETALLES EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA
9/21/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 394	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DOCUMENTOS DE INGRESO A OBRA - CONTRATISTA SECURITY FORCE
9/20/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 395	GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS	DOCUMENTOS ORDEN DE TRABAJO OBJ-PLJ-OT-029-23
9/21/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 396	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DETALLES EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA 2
9/22/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 397	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DETALLES EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA 3
9/22/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 398	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DESVIO DE SISTEMA DE FILTRO POR ROCAS
9/22/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 399	PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR	SOLICITUD DE ENTREGA DE ZONAS PISO 1 Y 2
9/25/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 400	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR	RESPUESTA A PETICIÓN RADICADOS N 07908, 07010 DE FECHA DE 11 DE AGOSTO DE 2023 Y 08352, 08360 DE FECHA DE 24 DE AGOSTO DE 2023, RADICADO SGAGA CGITGRF . NO 1057
9/26/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 401	RAMA JUDICIAL	SOLICITUD DE AJUSTE PROGRAMACIÓN Y PAC
9/26/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 402	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENTREGA PROPUESTA DE AJUSTES DETALLES ESTRUCTURA
9/28/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 403	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR	RADICACIÓN INFORME TRIMESTRAL
9/29/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 404	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DOCUMENTACIÓN PARA PAGO DEL ACTA DE CORTE DE OBRA No.3

8. ANEXOS.

REGISTRO FOTOGRÀFICO



Excavación caisson



Excavación zarpa



Excavación zarpa



Perfilada de fondo para zapata



Excavación mecánica y retiro de material



Excavación mecánica para Z-6

	
Excavación mecánica y retiro de material	Descargue de acero para cimentación
	
Fundición zapata Z-7 y Z-8	Armado de acero para zarpa tipo 2
	
Fundición de zarpa tipo 2	Fundición vigas de cimentación

	
Pañete de taludes	Armado de acero muro M-7
	
Instalación geodren tipo vial	Instalación tecdren
	
Armado de acero para muros de contención	Armado de acero zapata Z-13

t: (601) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE AGOSTO DEL 2023

FIDEICOMISO PARA REALIAR LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CODIGO SIFI 112122

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 1/25/2023, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000006315

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSTRUCCI¨N NUEVA TORRE P

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	7,289,551,633.46	*SALDO PROMEDIO*	$	7,155,856,424
TOTAL ABONOS	$	5,482,918.68	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	301,216,307.48	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,540,318.68
SALDO ACTUAL	$	6,993,818,244.66	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,193,574.78	7,290,745,208.24
9/08	PAGO INTERBANC CONSORCIO OBRAS			942,600.00	7,291,687,808.24
17/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,343,178.87	7,293,030,987.11
18/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-960.09	7,293,030,027.02
18/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,200,064.97	7,291,829,962.05
18/08	PAGO A PROVE SODIMAC COLOMBI			-300,015,100.00	6,991,814,862.05
18/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.42	6,991,814,679.63
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,003,565.03	6,993,818,244.66
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

112122 - FIDEICOMISO PARA REALIAR LA CONSTRUCCION

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 19

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : ANULADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 29/09/2023 Fecha de Registro de la Orden: 29/09/2023 Fecha de Pago: 29/09/2023

Proveedor: 899999090 - 2 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL Teléfono:

Tipo de Retención: Gran Contribuyente Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: GP_525953 -GIRO DE RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AGOSTO 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
GP	525953	29/09/2023	4,540,318.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
4,540,318.00	0.00	0	4,540,318.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		4,540,318.00	0.00	0.00
		Totales	4,540,318.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 4,540,318.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 19 Periodo: 202309

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			899999090 - 2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		4,540,318.00
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			899999090 - 2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	4,540,318.00	
						4,540,318.00	4,540,318.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES

FORMATO DE LIBERACION DE ACTIVIDADES	CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

FECHA: 3/4/23

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CARRERA 14 CON CALLE 14

CONTRATO DE OBRA No: 323 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

ACTIVIDAD:
Zapata 5

OBSERVACION	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A	OBSERVACIONES
CONCRETO DE LIMPIEZA	✓			Concreto ciclopeo
DISTANCIAMIENTO DE LOS REFUERZOS EN ACERO	✓			Segun planos estructurales
CALIBRE DEL ACERO DE REFUERZO	✓			Segun planos estructurales
RECUBRIMIENTO DEL ACERO	✓			
PANELAS DE DISTANCIAMIENTO	✓			75 cms.
ARMADO DE FORMALETA	✓			mecheados
TIPO Y RESISTENCIA DE CONCRETO	✓			5000 PSI. bajo Permeabilidad
PRUEBA DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO	✓			
TIPO DE ELEMENTO A FUNDIR	✓			Zapata
DIMENSIONES DEL ELEMENTO	✓			5.70 X 2.50 X 1.0
EQUIPO DE VIBRADO DEL CONCRETO	✓			Electrico
MATERIAL DE CURADO UTILIZADO	✓			Agua
TIPO DE ACABADO			✓	
EQUIPO DE COLOCACIÓN DEL CONCRETO				
TIPO DE CURADO DEL CONCRETO				
MUESTRAS DE CONCRETO REALIZADAS	✓			8 UNDS.

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	Ing. Carlos [illegible] - Maestro de obra	Ing. Emer Cantes - Residente de obra
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	Arq. Miguel Angel Algarin	Arq. Alejandro Gomez - Residente interventoria

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES

FORMATO DE LIBERACION DE ACTIVIDADES	CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

FECHA: 20/9/25

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CARRERA 14 CON CALLE 14

CONTRATO DE OBRA No: 323 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

ACTIVIDAD:
INSTALACIONES DE GEOTREX Y TRANSFER (EJE 5A - 5E)

OBSERVACION	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A	OBSERVACIONES
Tubería 4"	✓			
Pendiente 2%	✓			-5%
Traslapo TRANSFER - GEOTREX	✓			80 cms
Traslapo TRANSFER - TRANSFER	✓			30 cms

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	Ing. [illegible] - Maestro de obra	Ing. Ernel [illegible] - Residente de obra
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	Ingeniero Miguel Angel Algarin	Arq. Alejandro Gomez - Residente interventoria

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES

FORMATO DE LIBERACION DE ACTIVIDADES	CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

FECHA: 21/9/23

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CARRERA 14 CON CALLE 14

CONTRATO DE OBRA No: 323 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

ACTIVIDAD:

VACIADO ZAPATA TIPO 2 DE LOS EJES 3B Y 5C

OBSERVACION	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A	OBSERVACIONES
CONCRETO DE LIMPIEZA	✓			Soldado e= 5 cm
DISTANCIAMIENTO DE LOS REFUERZOS EN ACERO	✓			
CALIBRE DEL ACERO DE REFUERZO	✓			Segun diseños estructurales
RECUBRIMIENTO DEL ACERO	✓			7.5 cms
PANELAS DE DISTANCIAMIENTO	✓			
ARMADO DE FORMALETA			✓	
TIPO Y RESISTENCIA DE CONCRETO	✓			5000 PSI, bajo permeabilidad
PRUEBA DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO				
TIPO DE ELEMEMENTO A FUNDIR	✓			zapata
DIMENSIONES DEL ELEMENTO	✓			1.50 X 1.85 X 0.70
EQUIPO DE VIBRADO DEL CONCRETO	✓			Vibrador electrico
MATERIAL DE CURADO UTILIZADO				
TIPO DE ACABADO				
EQUIPO DE COLOCACION DEL CONCRETO	✓			
TIPO DE CURADO DEL CONCRETO				
MUESTRAS DE CONCRETO REALIZADAS				

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	Ing. [illegible] - Maestro de obra	Ing. Enel Larios - Residente de obra
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	Ingeniero Miguel Angel Alguero	Arq. Alejandro Gomez - Residente interventoria

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

FECHA: 21/9/23

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CARRERA 14 CON CALLE 14

CONTRATO DE OBRA No: 323 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

ACTIVIDAD: VIGA CIMENTACION 006 EJES 4E - 5E

OBSERVACION	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A	OBSERVACIONES
Concreto de limpieza	✓			Concreto ciclopeo
Distanciamiento de los refuerzos	✓			
Amarre del Acero	✓			Segun Diseños estructurales
Recubrimiento del Acero	✓			7.5 cm
Paneles de distanciamiento	✓			
Armado de formaletas	✓			formaletas metalicas
Tipo y Resistencia del concreto				3000 PSI bajo Premezclado

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	Residente de obra	Ing. Email Larios - Residente de obra
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	Interventor Miguel Angel Algarin	Arq. Alejandro Gomez - Residente interventoria

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

FORMATO DE LIBERACION DE ACTIVIDADES	CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

FECHA: 31/01/23

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CARRERA 14 CON CALLE 14

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

ACTIVIDAD:
ZAPATA H-2

OBSERVACION	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A	OBSERVACIONES
Concreto de Limpieza	✓			Solado e:5 cm
Distanciamiento de los Refuerzos	✓			
Cantidad del Acero de refuerzo	✓			Según Diseños estructurales
Recubrimiento del Acero	✓			7.5 cm.
Parrilla de distanciamiento	✓			
Tipo y Resistencia de concreto	✓			3000 PSI bajo Premezclado
Elemento a fundir	✓			Zapata
Dimensiones del elemento	✓			2.4 X 1.50 X 0.50

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	Ender [illegible] - Maestro de obra	Ing. Uriel Lagos - Residente de obra
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	Interventor Miguel Angel Algarin	Arq. Alejandro Gómez - Residente interventoría

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.447.468-8

FORMATO DE LIBERACION DE ACTIVIDADES	CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

FECHA: 27/9/23

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CARRERA 14 CON CALLE 14

CONTRATO DE OBRA No: 323 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

ACTIVIDAD:

Instalaciones Eléctricas y Tecnicas (ESC 4P - 5P)

OBSERVACION	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A	OBSERVACIONES
Tuberia 4"	✓			
Pendiente tuberia	✓			.3%
Trayecto Tecnicas - Escalera	✓			80 cms
Trayecto Tecnicas - Tecnicas	✓			30 cms

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	Ing. Residente de obra	Ing. Residente de obra
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	Arq. Residente interventoria	Arq. Residente interventoria

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES

FORMATO DE LIBERACION DE ACTIVIDADES	CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

FECHA: 28/9/23

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CARRERA 14 CON CALLE 14

CONTRATO DE OBRA No: 323 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

ACTIVIDAD: zarpa entre eje (4 F) y (5 F)

OBSERVACION	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A	OBSERVACIONES
CONCRETO DE LIMPIEZA	✓			
DISTANCIAMIENTO DE LOS REFUERZOS EN ACERO	✓			
CALIBRE DEL ACERO DE REFUERZO	✓			
RECUBRIMIENTO DEL ACERO	-			
PANELAS DE DISTANCIAMIENTO	-			
ARMADO DE FORMALETA	-			
TIPO Y RESISTENCIA DE CONCRETO	-			
PRUEBA DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO	-			
TIPO DE ELEMBMENTO A FUNDIR				zarpa.
DIMENSIONES DEL ELEMENTO				11.50 - 0.50 - 1.20m.
EQUIPO DE VIBRADO DEL CONCRETO				Eléctrico.
MATERIAL DE CURADO UTILIZADO				Lagun.
TIPO DE ACABADO				N/A.
EQUIPO DE COLOCACION DEL CONCRETO				Bomba estacionaria.
TIPO DE CURADO DEL CONCRETO				
MUESTRAS DE CONCRETO REALIZADAS				

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	Ernesto Ramírez Soto - Maestro de obra	Ing. Eriel Larios - Residente de obra
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	Ing. Miguel Angel Alguero	Arq. Alejandro Gómez - Residente interventoría

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES

FORMATO DE LIBERACION DE ACTIVIDADES	CONTRATO DE OBRA No. 123 de 2022 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

FECHA: 28/9/23

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CARRERA 14 CON CALLE 14

CONTRATO DE OBRA No: 123 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

ACTIVIDAD:
ZAPATA 13

OBSERVACION	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A	OBSERVACIONES
CONCRETO DE LIMPIEZA	✓			Concreto ciclopeo
DISTANCIAMIENTO DE LOS REFUERZOS EN ACERO	✓			
CALIBRE DEL ACERO DE REFUERZO	✓			Según planos estructurales
RECUBRIMIENTO DEL ACERO	✓			
PANELAS DE DISTANCIAMIENTO	✓			7.5 cm
ARMADO DE FORMALETA	✓			Metálica
TIPO Y RESISTENCIA DE CONCRETO				3000 PSI Bajo formaleta
PRUEBA DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO				
TIPO DE ELEMEMENTO A FUNDIR				Zapata
DIMENSIONES DEL ELEMENTO	✓			
EQUIPO DE VIBRADO DEL CONCRETO				Electrico
MATERIAL DE CURADO UTILIZADO				Agua
TIPO DE ACABADO			✓	
EQUIPO DE COLOCACION DEL CONCRETO				Bomba estacionaria
TIPO DE CURADO DEL CONCRETO				
MUESTRAS DE CONCRETO REALIZADAS				

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	Ing. Enrique Pabón - Maestro de obra	Ing. Lineth Larios - Residente de obra
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	Ingeniero Miguel Angel Algarin	Arq. Alejandra Gomez - Residente interventoria

	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
ALMASA LA EVOLUCIÓN DEL ACERO	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2022-06-07

FACTURA(S): 76725 - 10028
CARTILLA: 4485-2

FECHA INFORME: 2023-09-12
CONSECUTIVO: VTF-3223

DIAMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/8"		
COLADA	-	-	-	-	-	-	BTY025886	-	-	JB109836704	-	-	-	-	-	-	-	-	137032	-	-	-	-	-
FABRICANTE	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECANICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MAXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kg/mm²)	Resistencia (kg/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso nominal (kg)		Altura de resaltos (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltos (mm)	
MIN	42,20	56,90	60000	420	(#4" a 3/4" 14%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor
MAX	56,00	N.E.	79800	560	(7/8" a 1 1/4" 12%)	0,33	1,56	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55	MIN		MIN		MAX		MAX	
1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
1/2"	50,02	63,38	71.140	491	16,0	0,27	1,11	0,18	0,036	0,008	-	-	-	-	-	0,46		0,962		0,76		8,3		2,0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,994	-	0,81	-	9,9	-	4,9	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
5/8"	47,35	63,43	67.349	464	16,0	0,27	1,12	0,20	0,011	0,035	-	-	-	-	-	0,48		1,512		1,17		10,7		4,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,493	-	0,71	-	11,1	-	6,1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
7/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
1"	60,68	64,31	72.377	495	13,3	0,27	0,68	0,15	0,036	0,015	-	-	-	-	-	0,40		3,003		1,83		16,2		4,0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,705	-	1,27	-	17,8	-	9,7	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento

Aprobado por: Director del Sistema de Gestion Integral

	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
ALMASA	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2022-05-07

FACTURA(S): 76274 - 10029
CARTILLA: 4486-2

FECHA INFORME: 2023-09-12
CONSECUTIVO: VTF-3222

DIAMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			
COLADA	-	-	-	ST1010560	-	-	ST1023089	-	-	ST1012480	-	-	132645	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FABRICANTE	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECANICAS					PROPIEDADES QUIMICAS % MAXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kg/mm²)	Resistencia (kg/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltos (mm)	
																	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor
MIN	42.00	54.00	60000	420	[illegible]	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	MIN		MIN		MAX		MAX	
MAX	56.00	N.E.	79800	540		0.23	1.56	0.55	0.040	0.053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0.55								
3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	52.00	72.82	74.671	510	16.0	0.20	1.13	0.18	0.034	0.032	-	-	-	-	-	0.48	0.559	0.572	0.39	0.51	6.7	5.9	3.6	2.4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1/2"	50.50	63.38	71.140	491	16.0	0.27	1.11	0.19	0.036	0.038	-	-	-	-	-	0.48	0.934	0.962	0.51	0.79	8.9	8.0	4.8	3.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
5/8"	49.89	60.73	69.653	480	14.0	0.27	1.09	0.20	0.034	0.038	-	-	-	-	-	0.49	1.459	1.503	0.71	0.98	11.1	10.7	6.1	3.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
3/4"	50.08	63.70	71.230	491	16.5	0.27	0.99	0.17	0.010	0.018	-	-	-	-	-	0.44	2.101	2.150	0.87	1.11	13.3	12.9	7.2	4.2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
7/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-

N.E.: NO ESPECIFICA N.D.: NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento **Aprobado por:** Director del Sistema de Gestion Integral

ALMASA	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2022-06-07

FACTURA(S): 10030
CARTILLA: 4493-2

FECHA INFORME: 2023-09-12
CONSECUTIVO: VTF-3224

DIAMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
COLADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACOMETA	-	-	133445	-	-	-	-	-	127856	-	-	-	-	-
FABRICANTE																								

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECANICAS					PROPIEDADES QUIMICAS % MAXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kg/mm²)	Resistencia (kg/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso nominal (kg)		Altura de resaltos (mm)		Espaciamiento (mm)		Separacion extremos resaltos (mm)	
MIN	42.00	56.00	60000	420	(1/4" a 5/8" (4%) (7/8" a 1 1/4" (5%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES MIN	Valor	LIMITES MIN	Valor	LIMITES MAX	Valor	LIMITES MAX	Valor
MAX	55.00	N.E.	78000	540		0.23	1.50	0.50	0.043	0.053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0.55								
1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/8"	47.20	63.40	67 340	464	15.3	0.27	1.12	0.20	0.011	0.030	-	-	-	-	-	-	0.46	1.404	1.372	0.37	0.71	11.1	10.7	5.1	4.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-		-
3/4"	50.08	63.70	71 230	491	15.5	0.27	0.99	0.17	0.012	0.033	-	-	-	-	-	-	0.46	2.191	2.192	0.11	0.97	13.3	12.3	7.3	4.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-		-
7/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"	49.49	64.31	70 377	485	15.5	0.27	0.98	0.15	0.009	0.031	-	-	-	-	-	-	0.45	3.798	3.809	0.83	1.29	17.8	19.8	9.7	4.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-		-
1 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N.E.: NO ESPECIFICA N.D.: NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento

Aprobado por: Director del Sistema de Gestion Integral

www.almasa.com.co
Tel: (575) 3700220
Sector Parque Ind. Malambo SA, PIMSA Km 3

	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
ALMASA	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2022-06-07

FACTURA(S): 76284 - 10036
CARTILLA: 4485-3

FECHA INFORME: 2023-09-14
CONSECUTIVO: VTF-3232

DIAMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
COLADA	-	-	-	BTV2108563	-	-	-	-	-	-	-	-	137992	-	-	137943	-	-	138009	-	-	-	-	-	-
FABRICANTE	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kgf/mm²)	Resistencia (kgf/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltes (mm)	
MIN	42,00	56,80	60000	420	(1/4" a 3/4" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor
MAX	55,00	N.E.	79000	540		0,33	1,50	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55	MIN.		MIN.		MAX.		MAX.	
1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	52,50	72,82	74 673	515	15,0	0,29	1,13	0,18	0,004	0,005	-	-	-	-	-	0,46	0,526	0,572	0,38	0,07	6,7	0,9	3,6	2,4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
5/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
3/4"	49,05	63,03	71 046	490	15,6	0,28	0,98	0,16	0,010	0,010	-	-	-	-	-	0,46	2,101	2,150	0,97	0,33	13,3	12,7	7,3	8,9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
7/8"	45,56	60,99	63 399	451	16,3	0,29	1,01	0,12	0,005	0,033	-	-	-	-	-	0,47	2,809	2,940	1,12	0,50	15,5	14,9	8,5	0,6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1"	46,12	62,01	66 443	472	15,1	0,29	0,70	0,18	0,003	0,006	-	-	-	-	-	0,43	3,735	3,820	1,27	1,66	17,5	17,4	9,7	4,6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-

N.E.: NO ESPECIFICA N.D.: NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento

Aprobado por: Director del Sistema de Gestion Integral

	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
ALMASA	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2022-09-07

FACTURA(S): 79282 - 10037
CARTILLA: 4486-3

FECHA INFORME: 2023-09-14
CONSECUTIVO: VTF-3230

DIAMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"	
COLADA	-	-	-	BTY0109582	-	-	BTY0153499	-	-	-	-	-	137092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FABRICANTE				[illegible]	-	-	[illegible]						[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kgf/mm²)	Resistencia (kgf/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongacion (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso neto (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltes (mm)	
MIN	42.00	56.00	60000	420	[illegible]	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.							
MAX	55.00	N.E.	78000	540	[illegible]	0.33	1.56	0.55	0.043	0.053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0.55	LIMITES MIN	Valor	LIMITES MIN	Valor	LIMITES MAX	Valor	LIMITES MAX	Valor
1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	52.50	72.80	74.673	515	16.0	0.29	1.13	0.19	0.034	0.053	-	-	-	-	-	-	0.48	0.526	0.572	0.38	0.61	4.7	5.8	3.8	2.4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1/2"	50.02	63.38	71.143	491	16.2	0.27	1.11	0.19	0.006	0.008	-	-	-	-	-	-	0.48	0.934	0.962	0.51	0.79	6.9	8.3	4.3	3.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
5/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
3/4"	49.95	65.65	71.046	490	15.6	0.29	0.98	0.16	0.010	0.014	-	-	-	-	-	-	0.48	2.101	2.159	0.97	1.39	13.3	12.7	7.5	4.8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
7/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento

Aprobado por: Director del Sistema de Gestion Integral

	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
ALMASA LA EVOLUCIÓN DEL ACERO	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2022-06-07

FACTURA(S): 76283 - 10038
CARTILLA: 4403-3

FECHA INFORME: 2023-09-14
CONSECUTIVO: VTF-3231

DIAMETRO	1/8"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
COLADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137943	-	-	138009	-	-	-	-	-
FABRICANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIACERO	-	-	DIACERO	-	-	-	-	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MAXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kgf/mm²)	Resistencia (kgf/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltos (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltos (mm)	
MIN	42,00	56,00	58000	420	(1/4" a 3/4" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor
MAX	55,00	N.E.	78000	540		0,33	1,56	0,55	0,040	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,65	MIN		MIN		MAX		MAX	
1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/8"	45,59	60,59	65000	451	16,3	0,29	1,01	0,12	0,009	0,033	-	-	-	-	-	0,47	2,940	2,940	1,00	1,12	15,5	14,5	8,5	3,0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-
1"	48,12	62,03	68440	472	15,1	0,29	0,70	0,16	0,009	0,035	-	-	-	-	-	0,43	3,720	3,820	1,66	1,27	17,6	17,4	9,7	4,0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-
1 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento

Aprobado por: Director del Sistema de Gestion Integral

	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
ALMASA	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2022-06-07

FACTURA(S): 75236 - 10049
CARTILLA: 4485-1

FECHA INFORME: 2023-09-19
CONSECUTIVO: VTF-3242

DIAMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
COLADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EITY010JAN0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FABRICANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO												PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kgf/mm²)	Resistencia (kgf/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltos (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltos (mm)	
MIN	42,00	56,00	60000	420	(1/4" a 3/4" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor
MAX	55,00	N.E.	79000	540		0,33	1,56	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,58	MIN		MIN		MAX		MAX	
1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/8"	44,93	63,73	64.003	440	14,0	0,27	1,09	0,20	0,034	0,009	-	-	-	-	-	0,45	1,409	1,423	0,71	0,99	11,1	10,7	6,1	8,6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento

Aprobado por: Director del Sistema de Gestion Integral

	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
ALMASA	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2022-06-07

FACTURA(S): 76297 - 76350
CARTILLA: 4436-1

FECHA INFORME: 2023-09-19
CONSECUTIVO: VTF-3243

DIAMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"	
COLADA	-	-	-	ETY0104560	-	-	ETY0202289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FABRICANTE	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kgf/mm²)	Resistencia (kgf/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resalte (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltes (mm)	
																	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor
MIN	42,00	56,00	60000	420	[illegible]	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	MIN		MIN		MAX		MAX	
MAX	55,00	N.E.	79000	540	[illegible]	0,23	1,50	0,50	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55								
1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
3/8"	52,50	72,62	74.673	515	15,0	0,29	1,13	0,15	0,068	0,065	-	-	-	-	-	0,49		0,572		0,81		0,8		2,8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,526	-	0,38	-	0,7	-	0,8	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1/2"	50,00	69,38	71.145	490	16,0	0,27	1,11	0,16	0,060	0,058	-	-	-	-	-	0,46		0,952		0,76		0,3		3,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,504	-	0,51	-	0,9	-	4,0	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
5/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
7/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento

Aprobado por: Director del Sistema de Gestion Integral

ALMASA	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2022-06-07

FACTURA(S): 76298 - 10051
CARTILLA: 4493-1

FECHA INFORME: 2023-09-19
CONSECUTIVO: VTF-3244

DIAMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
COLADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DT1232440	-	-	-	-	-	1127643	-	-	-	-	-	-	-	-
FABRICANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO										PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kg/cm²)	Resistencia (kg/cm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltes (mm)	
MIN	42.00	55.00	60000	420	(1/4" a 3/4" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor
MAX	55.00	N.E.	79800	548		0.33	1.56	0.55	0.043	0.053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0.55	MIN		MIN		MAX		MAX	
1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/8"	46.89	60.73	66.693	460	14.0	0.27	1.09	0.20	0.004	0.008	-	-	-	-	-	-	0.45	1.533	0.71	0.89	11.1	10.7	6.1	3.5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/8"	45.94	60.99	65.309	451	16.8	0.29	1.01	0.12	0.009	0.003	-	-	-	-	-	-	0.47	2.940	1.12	1.50	15.5	14.9	6.5	3.6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento

Aprobado por: Director del Sistema de Gestion Integral

PROALCO BEKAERT	ALAMBRES CON TRATAMIENTO TERMICO	CÓDIGO	AC-F-008
		VERSION	4

NUMERO DE INFORME
DCE-190-2022

FECHA DE ELABORACION
8/06/2022

	CLIENTE	CIUDAD
	ALAMBRES Y MALLAS SA	MALAMBO
PRODUCTO :	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO Ø 1,47mm	

CODIGO DEL PRODUCTO:	072460	LOTES DE PRODUCCION:	FABQ005011
		DESARROLLO:	NA
		FICHA TECNICA :	AC-F-008

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS							
ESPECIFICACION	CALIBRE (BWG)	DIÁMETRO (mm)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kgf/mm²)	PROMEDIO (kgf/mm²)	ELONGACION (%)	REDUCCIÓN DE AREA (%)	OVALIDAD
	17	1,47 +/- 0,02	Max 42	38	30	60	MAX 0,02

CARACTERÍSTICAS DEL DESPACHO		
NUMERO DE UNIDADES (UND)	PESO PROMEDIO (Kg)	PESO TOTAL (kg)
NO APLICA	NO APLICA	5.017,8

OBSERVACIONES :

Material libre de Radiactividad

PROALCO BEKAERT

"Se recomienda que la selección, adquisición y disposición de residuos de los Productos de Proalco SAS, se realice de acuerdo a la Norma técnica Colombiana GTC 24"

GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS S.A.S

INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN EXPLORACIONES DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS

FOR-EO-16
VERSION 1
FECHA: 01-10-2021

RESULTADOS CILINDROS COMPRESION SIMPLE

OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR

HOJA No. 1 De 1

SOLICITANTE: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

FECHA:11/09/2023

COD.CLIENTE: G024

RESISTENCIA ESPECIFICADA: 5000 y 6000 PSI

FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESIST. PSI	RESIST. (KG/CM^2)	ASENTAMIENTO	LOCALIZACION	TIPO DE FALLA	OBSERVACION
25-ago	8-sep	14	5421	379	NO REPORTA	ZAPATA Z-7 M2	Cono	F´C=5000PSI
25-ago	8-sep	14	5437	381			Cono	
25-ago	8-sep	14	5615	393		ZAPATA Z-7 M3	Cono	
25-ago	8-sep	14	5616	393			Cono	
4-sep	11-sep	7	3722	261		VIGA 012 ENTRE EJESZ 3E - E4 Y ZP8 M6	Cono	
4-sep	11-sep	7	3851	270			Cono	
4-sep	11-sep	7	5524	387		COLUMNAS B3 M5	Cono	F´C=6000PSI
4-sep	11-sep	7	5540	388			Cono	

NOTA: LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS, ROTULADAS Y TRANSPORTADAS POR EL SOLICITANTE.

NOTA 2: De acuerdo con el artículo C.5.1.3 de la NSR-10 los resultados normativos son a 28 días a menos que se indique lo contrario en los planos.

ING. JEFE LABORATORIO

Sede operativa: Diagonal 20B # 18B - 63 Local #2 Tel: 3173310685 - Valledupar
E-mail: administrativo@geoexplolab.com; gerencia@geoexplolab.com

INFORME TOPOGRAFICO DEL CONTRATO DE OBRA "CONSTRUCCION NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR-CESAR".

SEPTIEMBRE 2023

TOPOGRAFO

JOEL ENRIQUE ROCHA WILCHEZ

CC. 1065580756

VALLEDUPAR 2023

CONTENIDO

1. GENERALIDADES
2. OBJETIVOS
3. LOCALIZACION
4. ORGANIZACION
5. PERSONAL Y EQUIPOS
6. ASPECTOS TECNICOS
7. CONDICIONES LABORALES
    a. Condiciones climaticas
    b. Condiciones de orden publico
    c. Condiciones tecnicas
8. ACTIVIDADES DE CAMPO

1. GENERALIDADES

A continuación, se presenta un informe técnico detallado donde se describen las principales actividades realizadas necesarias para lograr un desarrollo de acuerdo con los diseños arquitectónicos y estructurales de la nueva torre y dotación del Palacio de Justicia del municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

2. OBJETIVOS

- Aplicar conocimientos básicos de topografía para la generación de información usando equipos (Nivel de precisión, Estación total de alta precisión)
- Localizar con precisión el área haciendo los amarres en coordenadas y cotas, y la edición de planos topográficos definitivos al diseño a realizar.

3. LOCALIZACION

Este proyecto arquitectónico se encuentra ubicado en el municipio de Valledupar en el Departamento del Cesar en la dirección Calle 14 Nro. 14-189, esquina.

A continuación, se presenta una imagen general del predio objeto de proyecto.

4. ORGANIZACION

Las actividades topográficas fueron realizadas por el topógrafo Joel Enrique Rocha Wilches; quien tuvo bajo su responsabilidad las siguientes actividades:

- Programar, coordinar y controlar las diferentes etapas de las labores de campo y oficina.
- Realizar las actividades necesarias para la toma de la información y la generación de cálculos de volúmenes

5. PERSONAL Y EQUIPOS

Para el desarrollo de las actividades de campo se conformó un (1) grupo de topografía los cuales fueron encargados de suministrar y tomar la información pertinente en base a los diseños estructurales y arquitectónicos del objeto en ejecución.

La comisión de trabajo se conformó por el siguiente personal y equipos:

Personal

- Un (1) topógrafo
- Un (1) cadenero primero
- Un (1) cadenero segundo

Equipos

- Una (1) estación total (marca stonex)
- Un (1) nivel de precisión (marca topcon AT-B4)
- Herramientas menores (Estacas, puntillas, cincel, flexómetro, etc)

6. ASPECTOS TECNICOS

- **Complementación técnica:** Esta comisión de topografia establecio los controles pertinentes de cada estructura ejecutada durante este periodo.
- **Inspección de Obra:** Inicialmente la comision de topografia realiza el control de las actividades en el frente de trabajo, revisando que estas cumplan con las especificaciones tecnicas y constructivas del proyecto.

7. CONDICIONES LABORALES

- **Condiciones Climaticas:** En general, el desarrollo de la obra se ha dado en unas condiciones climaticas optimas aunque se han presentado precipitaciones pero no han afectado a la obra, solo se suspende mientras se presenta dichas precipitaciones.
- **Condiciones de Orden Publico:** No se ha presentado problema alguno en lo referente al orden publico con la ejecucion de los trabajos.
- **Condiciones Tecnicas**: Las obras se desarrollan según las instrucciones dadas por el director y el residente de obra contando con la participacion de la comision de topografia.

Se estan ejecutando las actividades descritas con las caracteristicas indicadasen los respectivos pliegos de condiciones y especificaciones constructivas entregadas al contratista de obra, con las respectivas cotas y lineamientos.

A continuacion se encuentra descrita la continuidad de las actividades ralizadas durante el desarrollo de la obra teniendo en cuenta la fecha de inicio ejecucion del proyecto.

8. ACTIVIDADES EN CAMPO

- **Replanteo**: Se procede a hacer el replanteo de ejes, para luego realizar las localizaciones de las zapatas tipo Z-2, Z-6, Z-8, Z-10 y Z-13; las vigas 005, 006, 007, 010, 012 y 015; muro tipo 2 y M-7 y columnas B3 y C5.








- **Excavaciones**: Se avanza la excavación mecánica de las zapatas Z-2, Z-6, Z-10 y Z-13; Zarpas, vigas y contrapiso.





- **Armado de hierro:** Se realiza el armado de hierro para la zapata Z-8, zarpa tipo 1, vigas 005,006, 007, 010 y 012; columna C-3; y muros M-7 y tipo 2.

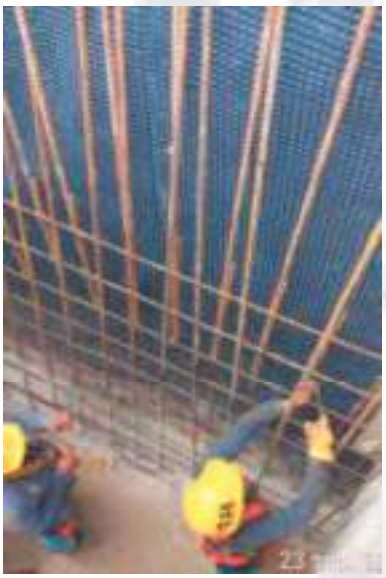



- **Fundida:** Se avanza en la fundida de elementoss estrucurales como zarpas,columnas, vigas, zapatas y caisson.

- Fundida de la columna E-3.





- Fundida de la zapata Z-8 y la viga 012 correspondiente a las medidas 80x120cm





- Fundida de Zarpas tipo 1, zapatas Z-2 y Z-13 y viga 006 con medidas de 80x120cm.





- Fundida de anillos de caisson





- **Niveles:** Se realiza la verificacion de los niveles de zapatas, zarpas, geodren, contrapiso y columnas a alturas de semi-sotano.





- **Verticalidad:** Es el control de alta precisión de la estructura existente en el que verificamos si está teniendo algún movimiento horizontal o vertical.







CARTERA DEL CONTROL VERTICALIDAD					
FECHA DE VERIFICACION: 26 septiembre del 2023					
INSTRUMENTO DE VERIFICACION: Estación total KOLIDA CTS-632					
No. PUNTO	**COORDENADAS SEPTIEMBRE**		**COORDENADAS AGOSTO**		**DIFERENCIA**
	NORTE	**ESTE**	**NORTE**	**ESTE**	
1	1650179,088	1090339,803	1650179,082	1090339,807	0,001
2	1650181,125	1090369,835	1650181,121	1090369,829	0,005
3	1650181,73	1090379,012	1650181,728	1090379,02	-0,003
4	1650182,601	1090392,029	1650182,596	1090392,025	0,005
5	1650183,2	1090400,975	1650183,195	1090400,986	-0,003
6	1650179,789	1090350,259	1650179,782	1090350,258	0,004
7	1650181,407	1090374,003	1650181,41	1090374,009	-0,005
8	1650179,822	1090350,488	1650179,817	1090350,486	0,003
9	1650180,801	1090365,165	1650180,804	1090365,171	-0,005
10	1650182,633	1090392,136	1650182,62	1090392,148	0,000
11	1650179,816	1090350,208	1650179,813	1090350,2	0,006
12	1650181,411	1090374,036	1650181,412	1090374,042	-0,003
13	1650182,454	1090389,32	1650182,444	1090389,318	0,006
14	1650170,798	1090346,503	1650170,798	1090346,505	-0,001
15	1650165,644	1090364,298	1650165,642	1090364,301	-0,000
16	1650170,78	1090346,524	1650170,78	1090346,521	0,002
17	1650165,674	1090364,668	1650165,672	1090364,666	0,002

- **Levantamientos topográficos:** Se realiza levantamiento topográfico con el fin de determinar el cálculo de volumen en movimientos de terreno y cimentación, para visualizar el avance de obra.







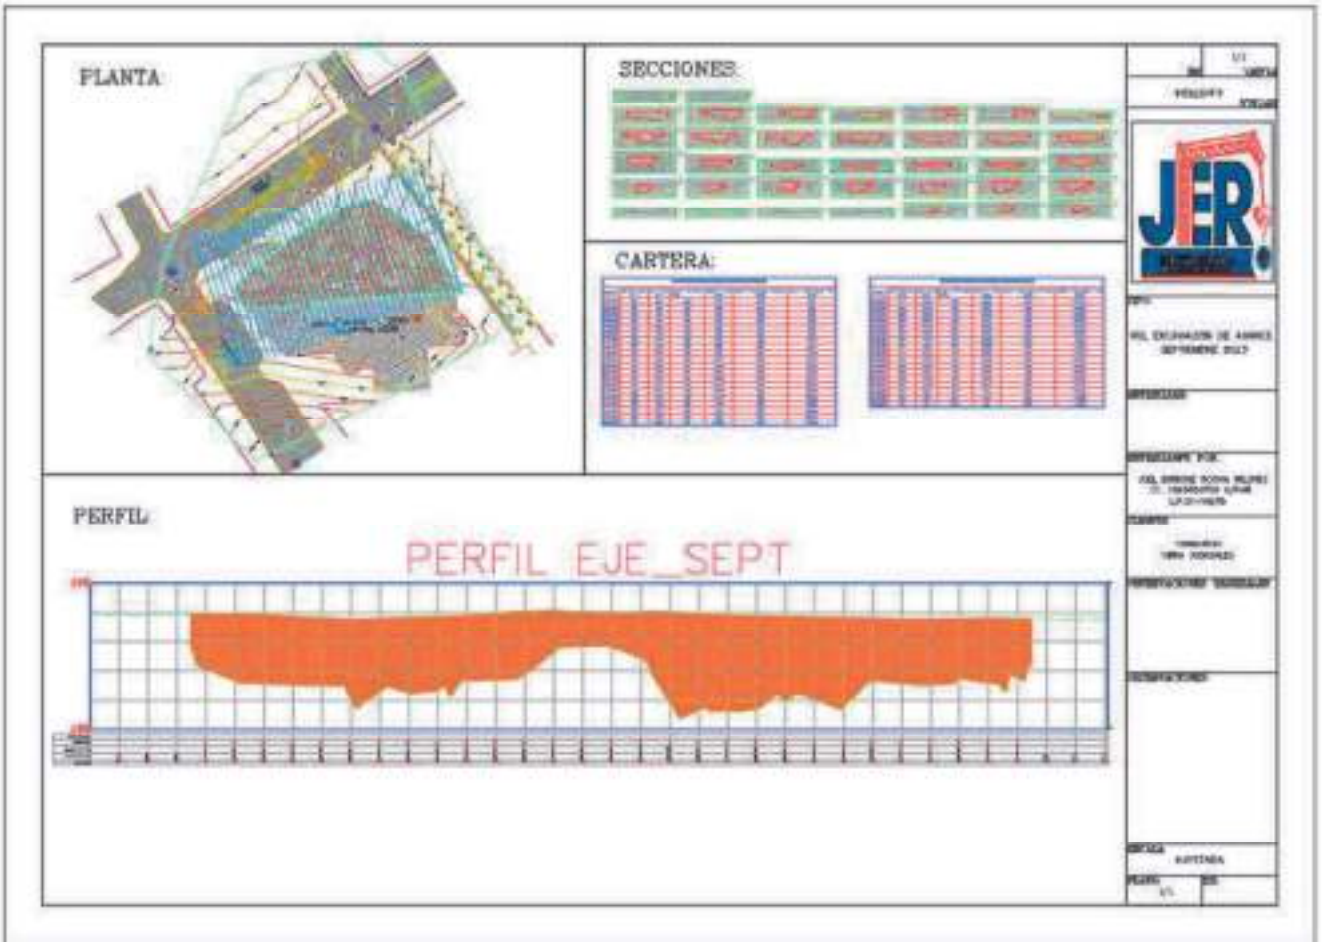


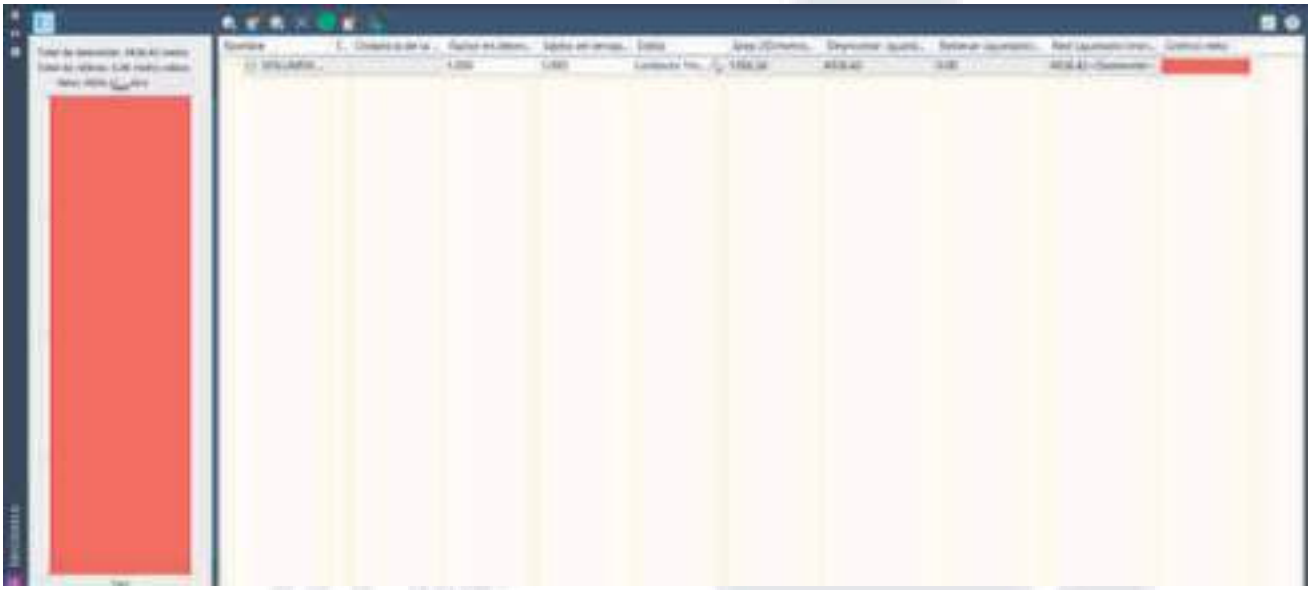

CARTERA DE EXCAVACION DE AVANCE DEL MES DE SEPTIEMBRE TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR-CESAR".						
P.K	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Volumen reutilizable (metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (metros cúbicos)	Vol. reutilizable acumul. (metros cúbicos)	Vol. neto acumul. (pies cúbicos)
0+000.000	0	0	0	0	0	0
0+002.000	0	0	0	0	0	0
0+004.000	0	0	0	0	0	0
0+006.000	0	0	0	0	0	0
0+008.000	22.57	22.57	22.57	22.57	22.57	22.57
0+010.000	35.24	57.82	57.82	80.39	80.39	80.39
0+012.000	41.6	76.84	76.84	157.23	157.23	157.23
0+014.000	46.4	88	88	245.23	245.23	245.23
0+016.000	50.85	97.25	97.25	342.52	342.52	342.52
0+018.000	62.07	112.96	112.96	455.48	455.48	455.48
0+020.000	62.78	124.83	124.83	580.31	580.31	580.31
0+022.000	74.87	137.62	137.62	717.93	717.93	717.93
0+024.000	86.94	161.81	161.81	879.74	879.74	879.74
0+026.000	85.42	172.36	172.36	1052.1	1052.1	1052.1
0+028.000	84.1	169.51	169.51	1221.61	1221.61	1221.61
0+030.000	71.55	155.65	155.65	1377.26	1377.26	1377.26
0+032.000	50.24	121.8	121.8	1499.06	1499.06	1499.06
0+034.000	41.94	92.19	92.19	1591.25	1591.25	1591.25
0+036.000	47.9	89.84	89.84	1681.09	1681.09	1681.09
0+038.000	55.36	106.68	106.68	1787.77	1787.77	1787.77
0+040.000	87.37	146.35	146.35	1934.12	1934.12	1934.12
0+042.000	112.38	199.72	199.72	2134.04	2134.04	2134.04
0+044.000	123.2	235.95	235.95	2369.99	2369.99	2369.99
0+046.000	105.22	251.42	251.42	2621.01	2621.01	2621.01
0+048.000	129.36	257.59	257.59	2878.6	2878.6	2878.6
0+050.000	134.27	263.64	263.64	3142.23	3142.23	3142.23
0+052.000	144.01	278.28	278.28	3420.51	3420.51	3420.51
0+054.000	132.89	276.89	276.89	3697.4	3697.4	3697.4
0+056.000	119.41	252.3	252.3	3949.7	3949.7	3949.7
0+058.000	111.80	231.23	231.23	4180.93	4180.93	4180.93
0+060.000	100.7	212.57	212.57	4393.58	4393.58	4393.58
0+062.000	90.01	190.71	190.71	4584.29	4584.29	4584.29
0+064.000	71.35	161.36	161.36	4745.64	4745.64	4745.64
0+066.000	38.86	110.02	110.02	4855.66	4855.66	4855.66
0+068.000	16.94	55.6	55.6	4911.26	4911.26	4911.26
0+070.000	2.61	19.55	19.55	4930.81	4930.81	4930.81
0+070.207	1.2	0.43	0.43	4931.25	4931.25	4931.25

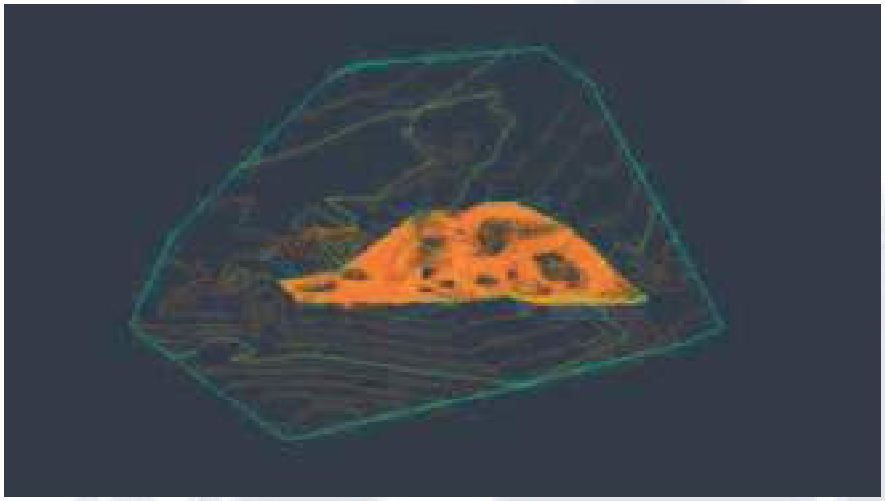

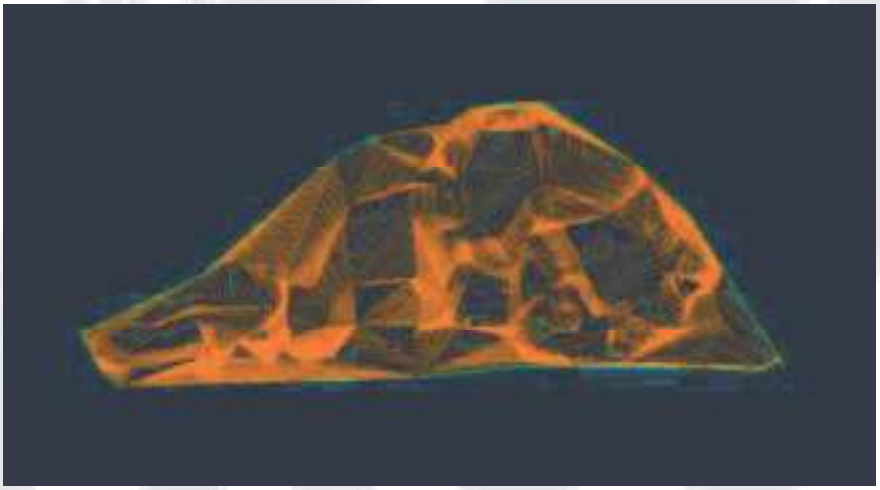

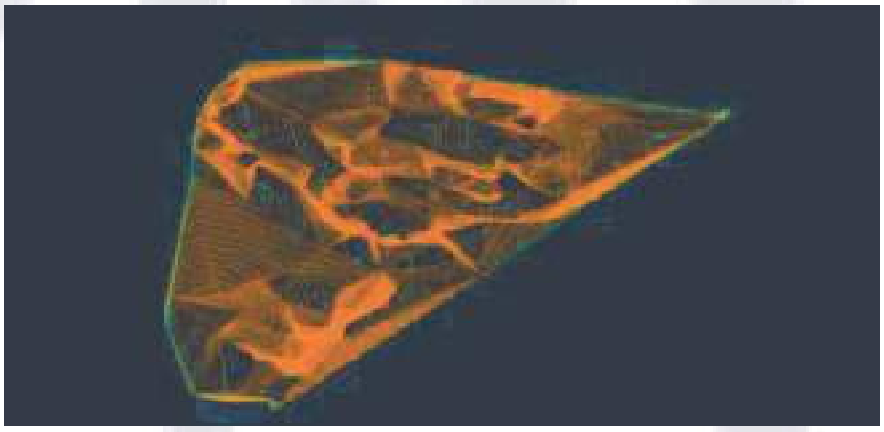



JOEL ENRIQUE ROCHA WILCHEZ
C.c. 1.065.580.756 de Valledupar
Tel:3167 833981-3217342538

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 2

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 2

2.1 Descripción del proyecto 2

2.1.1 Localización general del proyecto 2

2.1.2 Contrato de Obra 3

3. PERSONAL DEL PROYECTO 4

3.1 Personal Administrativo del proyecto 4

3.2 Detalles del personal Administrativo y operativo en obra 4

4. INDICADORES 7

4.1 Horas hombres Trabajadas Personal Operativo 7

4.2 Ausentismo en el proyecto. 10

4.3 Accidentalidad del Proyecto 10

5. MEDICINA PREVENTIVA LABORAL 11

6. ACTIVIDADES EN OBRA 12

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre del presente año se realizaron las siguientes actividades: 12

6.1 Registro de inspecciones planeadas y permisos de trabajo. 13

6.2 Formación de personal en Seguridad y Salud en el Trabajo 14

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL 15

8. ANEXOS 26

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se presenta con el fin de asegurar y evidenciar la gestión de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto **CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR** de acuerdo con las actividades definidas en el CONTRATODE OBRA No. 323 DEL 2022.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 Descripción del proyecto

El proyecto se encuentra situado en el municipio de Valledupar en el departamento del Cesar, zona urbana, en la calle14 # 12-189 (Palacio de justicia) sitio de ejecución.

2.1.1 Localización general del proyecto

El proyecto se desarrollará en el bloque de parqueaderos y áreas complementarias del Palacio de Justicia.

Ubicación Palacio de Justicia



Figura 1. Localización del palacio de justicia (Valledupar)

Fuente: Google Earth



Figura 2. Localización de edificio Palacio de Justicia (Valledupar)

2.1.2 Contrato de Obra

CONTRATANTE:	CONCEJO SUPERIOR DE JUDICATURA
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
OBJETO:	"REALIZAR OBRA DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR) "
PLAZO INICIAL DEEJECUCIÓN:	TREINTA Y CINCO MESAR (35) contados a partir de la respectiva acta de inicio, previa legalización del contrato.
VALOR PRESUPUESTO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (49.420.492.192) incluidos impuestos y contribuciones de ley

Tabla No. 1

3. PERSONAL DEL PROYECTO

El proyecto se ha integrado en el periodo de la presentación del siguiente informe desde el 01 Al 30 de Septiembre del 2023 respectivamente.

3.1 Personal Administrativo del proyecto

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre del presente año, se mantiene el personal operativo en el proyecto el cual desarrolla las actividades de obra civil.

3.2 Detalles del personal Administrativo y operativo en obra

Desde el 01 al 30 de Septiembre de 2023 se contó con la participación permanente del siguiente personal en obra.

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

Información Trabajadores						Estado		
No	CC	Nombres y apellidos del Trabajador	No ASIGNADO	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
1	72339619	EMEL DARIO LARIOS MEDINA	3	RESIDENTE DE OBRA	ADMINISTRATIVA	SI	06/03/2023	NA
2	40960020	LUZDAMARYS SALCEDO VALDEBLANQUEZ	5	RESIDENTE SST	ADMINISTRATIVA	SI	15/04/2023	NA
3	1065809341	WENNDY JULIETH QUIRIZ AYOLA	6	RESIDENTE ADMON	ADMINISTRATIVA	SI	25/04/2023	NA
4	1065657761	OSCAR EDUARDO BUSTILLO ECHAVEZ	7	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
5	1065842379	JESÚS DAVID QUIROZ LÓPEZ	8	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
6	1193403152	JUAN YESITH BRITO ZABALETA	10	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
7	1193561205	SEGUNDO ANTONIO MARTÍNEZ CALDERA	11	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
8	1062398032	JUAN CARLOS MURGAS MINDIOLA	12	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
9	1065837582	DUBAN ENRIQUE PERALTA PORTO	13	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
10	77028189	WILMAN IGNACIO CORONADO SILVA	14	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
11	1004502067	FARID ALBERTO VAN STRALRN VIZCAINO	15	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
12	77186837	JOSE LUIS CAMPO CALDERÓN	16	AUXILIAR OF. VARIOS	OPERATIVO	NO	16/05/2023	15/09/2023

13	77186289	CESAR RAFAEL NÚÑEZ ACUÑA	17	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
14	1003376653	CESAR LUIS NÚÑEZ ARRIETA	18	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
15	91526911	JORGE USECHUE	23	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
16	77155343	LUIS ALBERTO CASTILLO CAMELO	25	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
17	77026504	REINALDO MOSCOTE PACHECO	26	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
18	1007392140	LUIS GABRIEL MARQUEZ JULIO	27	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
19	1065235505	JHON JAVIER OSMA ORTEGA	28	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
20	1052080418	CARLOS ANDRES OLIVERA FRANCO	29	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
21	5165243	YESMAN ENRRIQUE MENDOZA MENDOZA	30	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
22	1048600194	JHON JAIRO MORALES CABRERA	31	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
23	1064711685	JUAN DAVID MEJIA CININ	32	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
24	1080431816	JEINER DAVID MENDOZA RODRIGUEZ	33	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
25	85442542	DANIEL ENRIQUE AGUILAR VANEGAS	34	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
26	77154925	ANIBAL JOSE JIMENEZ ESCORCIA	37	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
27	1065626852	LUIS MIGUEL GOMEZ GUTIERREZ	38	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
28	1065809820	ALDAIR LUIS DIAZ OÑATE	39	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
29	77171396	PEDRO JULIO SANDOVAL VANEGAS	42	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
30	1006714113	EDUARDO ENRIQUE RIVERA ALVAREZ	48	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	07/06/2023	NA
31	106556239	GEOVALDI ENRIQUE FONTALVO MATOS	49	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	07/06/2023	25/09/2023
32	1065823637	CARLOS ANDRES MOSQUERA PALMERA	50	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	07/06/2023	15/09/2023
33	77183812	WILLIAM ENRIQUE PALMERA SANTANA	54	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	14/06/2023	NA
34	1032449361	JUAN CAMILO VELAZCO VALDERRAMA	55	RESIDENTE DE OBRA	ADMINISTRATIVA	SI	21/06/2023	NA
35	1120748067	KAREN KATIUSCA SOTO FUENTES	56	RESIDENTE SST	ADMINISTRATIVA	SI	07/07/2023	NA
36	79750423	YUBER FERNANDO BERNAL CONTENTO	57	DIRECTOR DE OBRA	ADMINISTRATIVA	SI	08/07/2023	NA
37	8664000	EMIRO EVENDAÑO GUERRA	58	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVO	SI	21/07/2023	NA

Tabla No. 2

JER TOPOGRAFIA

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
1003240689	ASNER ROCHA WILCHES	TOPOGRAFO	TOPOGRAFIA	SI	17/03/2023	
1065576867	RAFAEL AUGUSTO BALCAZAR VERDECIA	CADENERO 2	TOPOGRAFIA	SI	17/03/2023	
1065815762	ELIANETH PALOMINO RANGEL	AUX TOPOGRAFO	TOPOGRAFIA	SI	25/04/2023	

Tabla No. 3

ANILLOS DE SEGURIDAD

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
77185068	ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	20/03/2023	31/08/2023
1062400397	HAWIN NAVARRO ANGARITA	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	20/03/2023	31/08/2023
11800493	YELMER EMIR CORDOBA MENA	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	20/03/2023	31/08/2023

Tabla No. 4

SECURITY ELYTE

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
77185068	ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	01/09/2023	20/09/2023
1065595702	FABIAN CORRALES HERRERA	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	01/09/2023	20/09/2023
6084471	RICARDO JAVIER ROMERO PETIT	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	01/09/2023	20/09/2023

Tabla No. 5

TRANSPORTE ASCANIO

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
1065639870	OLBER DONADO VILLAFAÑE	OPERADOR DE MAQUINARIA	OPERATIVA	SI	01/09/2023	N/A

Tabla No. 6

SECURITY FORCE

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
77185068	ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDA D FISICA	SI	21/09/2023	N/A
1122396146	JEISON ANDRES CHAMORRO SARIA	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDA D FISICA	SI	21/09/2023	N/A
1065646526	JOSE ALBERTO GUTIERREZ SANTIAGO	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDA D FISICA	SI	21/09/2023	N/A

Tabla No. 7

Anexo 1 Documentos para ingreso a obra (C.C, ARL, EPS, AFP, CCF, Examen médicos)

4. INDICADORES

Para este contrato se contemplan indicadores de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales nos permiten evaluar la gestión de SST y sus diferentes variaciones durante cada periodo de ejecución del proyecto a continuación se relacionan cada uno de los indicadores para el periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2023.

4.1 Horas hombres Trabajadas Personal Operativo

Para las labores ejecutadas en este proyecto, los resultados obtenidos durante el periodo objeto de este informe se determinó que se trabajaron las horas estipuladas. Así mismo se evidencia el reporte del ausentismo que tuvo incidencia en el proyecto durante el mes de julio como se relaciona en la siguiente tabla.

Versión:1	INDICADORES DE GESTION PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES - VALLEDUPAR
Fecha: 31/05/2023	
Clsificación: Interno	

PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES.

MES	Días Labor	N. Trabajadores	Horas Hombre Trabajadas	H.E	Ausentismo laboral				TOTAL DIAS PERDIDOS 2023	OBSERVACIÓN
					Por Accidente Laboral	Por Enfermedad comun	Ausencia no Justificada	Ausencia Justificada		
MARZO	26	13	2704	0	0	0	1		0	
ABR	23	27	4968	0	0	0	0		0	
MAY	23	42	7728	0	0	0	0		0	
JUN	24	50	9600	0	2	37	6		45	
JUL	24	37	7104	0	0	37	0	28	65	Ausentismo por licencia de paternidad (trabajadores: Segundo Martinez, Juan Carlos Murgas.
AGO	25	36	7200	0	0	33	17	0	50	
SEP	26	36	7488	0	0	33	17	0	42	Trabajador Carlos Mosquera presenta incapacidad medica emitida por EPS. Trabajador Juan Yesith Brito y Aldair
TOTAL	171	34	46792	0	2	140	41	28	202	

Tabla No. 8

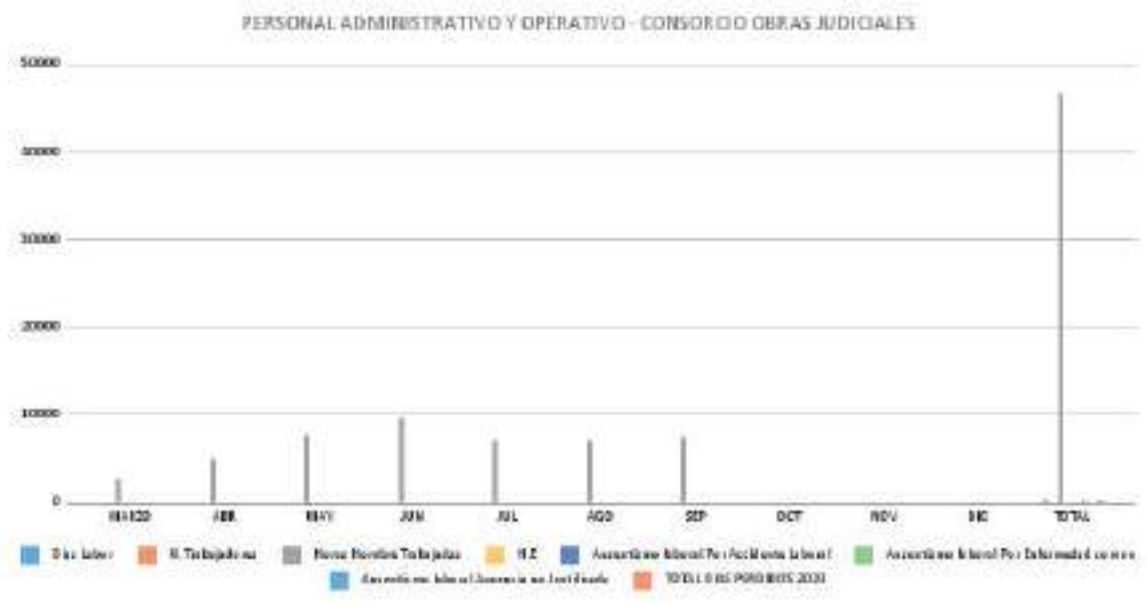


Gráfico No. 1

Versión:1	INDICADORES DE GESTION PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES - VALLEDUPAR
Fecha: 31/05/2023	
Clsificación: Interno	

PERSONAL CONTRATISTAS										
MES	Días Labor	N. Trabajadores	Horas Hombre Trabajadas	H.E	Ausentismo laboral				TOTAL DIAS 2023	OBSERVACIÓN
					Accidente Laboral	Enfermedad comun	Ausencia no Justificada			
MARZO	13	6	624	0	0	0	0		0	
ABR	23	6	1104	0	0	0	0		0	
MAY	23	19	3496	0	0	0	0		0	
JUN	24	13	2496	0	0	0	0		0	
JUL	24	8	1536	0	0	0	0		0	
AGO	25	7	1400	0	0	0	0		0	
SEP	26	7	1456	0	0	0	0		0	
TOTAL	***158***	**9**	**12112**	**0**	**0**		**0**		**0**	

Tabla No. 9

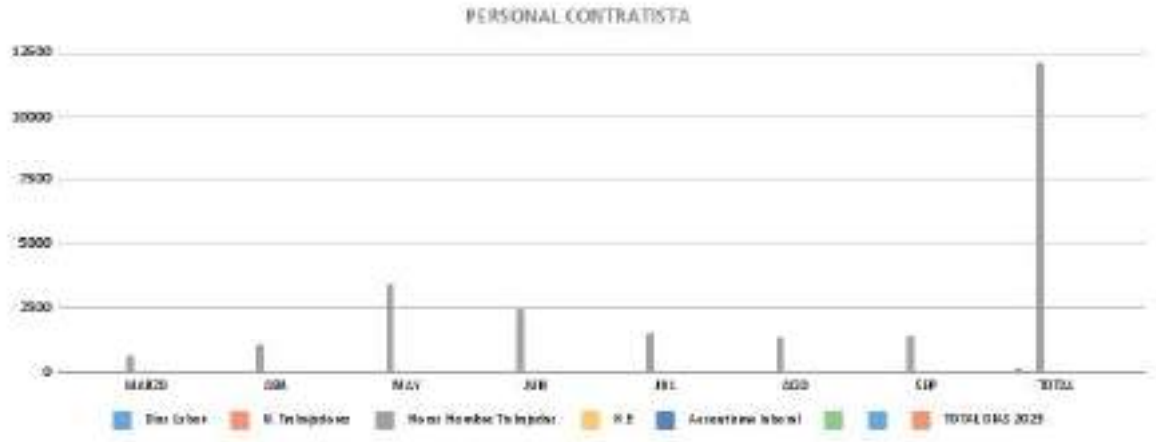


Gráfico No. 2

Se evidencia que el periodo de este informe no se aumentó los tiempos de labores en obra, por la cantidad de personal que hizo presencia en el mismo.

4.2 Ausentismo en el proyecto.

En el periodo de presentación de este informe se presentan ausentismo en el proyecto, los cuales son relacionados a continuación.

INCAPACIDADES AGOSTO 2023									
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CONTRATISTA	CARGO	FECHA INICIO DE INCAPACIDAD	FECHA FIN DE INCAPACIDAD	DIAS DE INCAPACIDAD ACCIDENTE LABORAL	DIAS DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD COMUN	DIAS DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD LABORAL	DIAS TOTAL DE INCAPACIDAD
DUVAN ENRIQUE PERALTA PORTO	1065837582	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	28/07/2023	13/09/2023	0	13	0	13
CARLOS ANDRES MOSQUERA PALMERA	1065823637	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	01/09/2023	03/09/2023	0	3	0	3
ALDAIR LUIS DIAZ OÑATE	1065809820	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	01/09/2023	02/09/2023	0	1	0	1
JUAN YESITH BRITO ZABALETA	1193403152	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	08/09/2023	10/09/2023	0	3	0	3
JEINER DAVID MENDOZA RODRIGUEZ	1080431816	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	OFICIAL DE OBRA	08/09/2023	09/09/2023	0	2	0	2
JHON JAIRO MORALES CABRERA	1048600194	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	OFICIAL DE OBRA	11/09/2023	19/09/2023	0	9	0	9
LUIS GABRIEL MARQUEZ JULIO	1007392140	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	18/09/2023	18/09/2023	0	1	0	1
GEOVALDI ENRIQUE FONTALVO MATOS	1065562392	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	19/09/2023	19/09/2023	0	1	0	1
TOTAL						0	17	0	17

Tabla No. 10

4.3 Accidentalidad del Proyecto

Para el periodo de este informe comprendido desde el día 01 al 30 de Septiembre del 2023 no se presentó accidente laboral en el proyecto.

INDICE MENSUAL	I.F	I.S	I.L.I
sep-23	NA	NA	NA
CONSOLIDADO 2023			

INDICE MENSUAL	I.F	I.S	I.L.I
ene-23	N/A	N/A	N/A
feb-23	N/A	N/A	N/A
mar-23	N/A	N/A	N/A
abr-23	N/A	N/A	N/A
may-23	N/A	N/A	N/A
jun-23	2,08	2,08	0
jul-23	N/A	N/A	N/A
ago-23	N/A	N/A	N/A
sep-23	N/A	N/A	N/A

Tabla No. 11

5. MEDICINA PREVENTIVA LABORAL

Durante el mes de Septiembre del 2023 se presentó nuevo ingreso de personal a obra, los cuales se valida todo lo reglamentario con Seguridad Social (ARL, EPS, AFP, CCF) y posteriormente se procede a realizar la inducción SST, evaluación, Notificación de Riesgos.

Anexo 2 Inducción SST, Evaluación, Notificación de Riesgos.



Fotografía N°1: Fotografía N°1: Inducción personal Contratista Security Elite



Fotografía N°2: Fotografía N°2: Inducción personal Contratista Transporte Ascanio

	
Fotografía N°3: Fotografía N°3: Reinducción personal Consorcio Obras Judiciales	**Fotografía N°4: Fotografía N°4: Inducción personal Contratista Security Force**

Anexo 3 Notificación de riesgo visitante

6. ACTIVIDADES EN OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre del presente año se realizaron las siguientes actividades:

- **Topografía**

Toma de niveles para excavación de caissón, zapatas vigas y columnas.

Localización de puntos de zapatas y columnas.

Verificación de verticalidad.

- **Obra civil**

Excavación manual para caissón

Retiro manual de material.

Corte de acero

Armado de acero para caissón

Encofrado para fundir anillos

Fundida de anillos para caissón

Instalación de filtros Geodren Tecdren

Armado de acero para zapata

Colocación y aplomado de formaletas

Fundida de zarpa y zarpa

Desencofrado de zapata

6.1 Registro de inspecciones planeadas y permisos de trabajo.

En el periodo de este informe se realizaron las siguientes inspecciones.

Anexo 4 Pre operacionales

Anexo 5 ATS, Permisos para trabajo en excavación, permisos para trabajo en Alturas.

GESTIÓN DOCUMENTAL SST	MES DE EJECUCIÓN	CANTIDAD
Inspección de pulidora, taladro, trazadora, Sierra circular mezclador de concreto, herramientas manuales, Bomba estacionaria, Bomba de agua, Inspección de botiquín, Camilla, extintores.	Septiembre	40
Inspección de EPCC	Septiembre	26
Análisis de Trabajo Seguro	Septiembre	
Permiso para trabajo en excavación.	Septiembre	24
Permiso para trabajo en Alturas.	Septiembre	58
Permiso para trabajo en caliente.	Septiembre	17

Tabla No. 12

6.2 Formación de personal en Seguridad y Salud en el Trabajo

Charla SST – Capacitación.

Fecha	Tipo de actividad	Tema	Duración
01/09/2023	Charla SST	Protección facial	12 Minutos
02/09/2023	Charla SST	Protección de la flora y la fauna	10 Minutos
04/09/2023	Charla SST	Seguridad en el uso de eslinga	8 Minutos
05/09/2023	Charla SST	Protección de los recursos hídricos, prohibiciones al respeto	12 Minutos
06/09/2023	Charla SST	Riesgo del ruido	10 Minutos
07/09/2023	Charla SST	Golpe de calor	10 Minutos
08/09/2023	Charla SST	Manejo de los residuos líquidos o Vertimiento, permisos y obligaciones	12 Minutos
09/09/2023	Charla SST	Manejo integral de residuos sólidos, domésticos y peligrosos	10 Minutos
11/09/2023	Charla SST	Socialización ATS	10 Minutos
12/09/2023	Charla SST	Resbalones, Tropezones y caídas	12 Minutos
13/09/2023	Charla SST	Pensar antes de actuar, Practicando el autocuidado	15 Minutos
14/09/2023	Capacitación	Manejo de materiales sobrantes y materiales de construcción	12 Minutos
15/09/2023	Charla SST	Respetar la señalización en obra	10 Minutos
16/09/2023	Charla SST	Responsabilidad social en un adecuado manejo	15 Minutos

		ambiental en obra	
18/09/2023	Capacitación	Cambios climáticos	8 Minutos
19/09/2023	Charla SST	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas.	7 Minutos
20/09/2023	Charla SST	Riesgos básicos de seguridad	5 Minutos
21/09/2023	Capacitación	Ahorro de recursos Hídricos	1 Hora
22/09/2023	Charla SST	Cuidado de los equipos o elementos de protección personal	9 Minutos
23/09/2023	Charla SST	Respeto mutuo entre compañeros	7 Minutos
25/09/2023	Capacitación	Prevención consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas	1 Hora
26/09/2023	Charla SST	Inspeccionar las herramientas antes de usar	10 Minutos
27/09/2023	Charla SST	Trabajo en equipo	12 Minutos
28/09/2023	Charla SST	Orden y aseo	12 Minutos
29/09/2023	Charla SST	Practica el Autocuidado	12 Minutos
30/09/2023	Charla SST	Cuido mis manos	10 Minutos

Tabla No. 13


7. SEGURIDAD INDUSTRIAL

La prevención de accidentes como factor primordial en el proyecto se ha efectuado gracias a la colaboración obtenida por parte del personal y el área SST. Quienes mutuamente por medio de actividades de inspección, control, aprendizaje y mejora continua. Ayudan a prevenir la ocurrencia de factores que sean potenciales en la influencia para la generación de actos y condiciones inseguras.

En la siguiente tabla se exponen a manera de resumen algunas de las actividades potencialmente relevantes encaminadas a contribuir con la seguridad y salud en el trabajo durante el mes de Septiembre de 2023.

DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Charlas de seguridad: las charlas de seguridad se realizan todos los días antes de iniciar la jornada laboral con el objetivo de informar y concienciar a los trabajadores sobre su propia seguridad y salud en el trabajo.	   

Orden y aseo: El orden y el aseo en obra son factores importantes para la prevención de incidentes y accidentes ayudan a mejorar las condiciones de seguridad en general.	   
Aseo parte externa de la obra	 

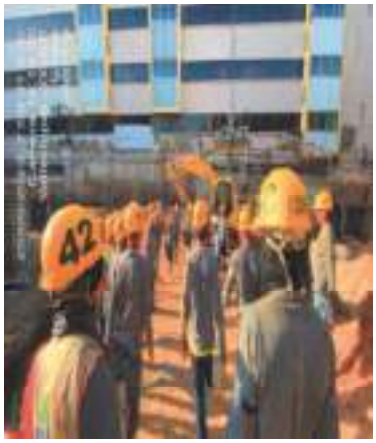Pausas activas: su finalidad es contribuir con la liberación, descanso y esparcimiento del sistema locomotor de cada individuo.	   
Inspección pre operacional de herramientas, equipos y maquinaria a utilizar: Se realiza con el fin de revisar y examinar el estado de cada uno de estos y determinar si están aptos para ser utilizados.	 

	 
Entrega de EPP: Se realiza la entrega del elemento y se les recuerda la importancia del su uso. (protegerse minimizando los riesgos de accidente)	 
Señalización áreas intervenidas: Se realiza con el fin mitigar el riesgo o peligro existente.	 

	 
Inspección de EPCC: Se realiza la inspección cada vez que se va a utilizar con el fin de verificar que no tenga ningún desgaste, daños o corrosivos.	   

Reunión de COPASST se realizan reuniones mensuales con el comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, así dando cumplimiento a la normatividad establecida.





Capacitación:

Funciones y responsabilidades del COPASST.
Funciones y responsabilidades Comité de Convivencia Laboral.





Prevención de consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.





Instalación de sendero peatonal provisional: Se instala sendero peatonal provisional con el fin de garantizar el paso del peatonal durante el descargue de material en obra.	 

Actos y condiciones inseguras Se anexan formatos de actos y condiciones inseguras.	
Acto inseguro: Los trabajadores Carlos Andrés Mosquera Palmera, Aníbal José Jiménez Escorcia, Eduardo Enrique Rivera Álvarez, Juan David Mejía Cinin, Aldair Luis Díaz Oñate, Rafael Augusto Balcázar Verdecia, se encontraban en un caissón a una altura negativa aproximadamente de 4.70 Mts, sin la debida protección. Se evidencian trabajadores sin EPCC (Equipo de Protección Contra Caída) y los que tienen no se encuentran anclados a una línea de vida. Vale la pena aclarar que este sistema se requiere de uso obligatorio como medida preventiva en caso de presentarse una emergencia (Desplome de caissón) poder identificar al personal que se encuentra expuesto para un posible rescate.  	Se corrige el acto inseguro realizando un llamado de atención al personal el cual se evidencia cometiendo el acto inseguro.

Acto inseguro: Se evidencia al señor Emiro Avendaño Maestro de obra, cometiendo acto inseguro, sentado de una manera no apropiada en el borde de un muro a una altura aproximada de 5 mts, sin EPCC (Elemento de Proteccion Contra Caida) siendo este una medida obligatorio por norma vigente (Resolucion 4272 de 2021) Donde se establecen los requisitos minimos para trabajo en altura despues de 2.0 Mts, como medida preventiva para riesgo de caida.  	Se corrige el acto inseguro realizando llamado de atención y asignando un arnés con eslinga al colaborador.

Condición insegura: Se evidencia sendero peatonal obstruido por material desorganizado. 	Se corrige la condicion insegura organizando nuevamente y señalizando sendero peatonal. 
Condición insegura: Se evidencia áreas con condiciones inseguras sin señalización, debido a las excavaciones para llevar a cabo las actividades de la máquina. 	Se corrige condicion insegura realizando demarcacion con señalizacion de colombinas con malla, por terrenos con diferencias de nivel. 

Tabla No. 14

8. ANEXOS

- Anexo 1 Documentos para ingreso a obra (C.C, ARL, EPS, AFP, CCF, Examen médicos, Certificado de competencia).
- Anexo 2 Inducción, evaluación de inducción, notificación de riesgo.
- Anexo 3 Notificación de Riesgos visitantes.
- Anexo 4 Pre operacionales.
- Anexo 5 ATS –Permisos.
- Anexo 6 Planilla de seguridad Social.
- Anexo 7 Asistencia Charla SST.
- Anexo 8 Evaluación Capacitación.
- Anexo 9 Acta reunión COPASST.
- Anexo 10 Inspección de pre-uso equipos de alturas.
- Anexo 11 Entrega de EPP.
- Anexo 12 Documentos maquinaria amarilla (Tarjeta de registro, Declaración de importación, Mantenimiento)
- Anexo 13 Actos y Condiciones inseguras.


Residente SST
KAREN SOTO FUENTES
CC: 1120748067
Resolución 1348 del 26 de Diciembre del 2017


1.065.595.702
CORRALES HERRERA
FABIAN


14-MAY-2001
VALLEDUPAR
1.70
A+
M





Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MIGRACIÓN

NO. 6084471

ROMERO PETIT

RICARDO JAVIER

VEN


M

14385250

08-11-1979

15-10-2021 BOGOTA D.C.

30-05-2031



MIGRACIÓN

IPCOL6084471<<4<<<<<<<<<<<<<<<
7911082M3105308VENE1947864<<<9
ROMERO<PETIT<<RICARDO<JAVIER<<

Powered by CamScanner

F. I.
19/09/2023

EPS
Sanitas

AFP
Porvenir






REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
77.185.068
GUTIERREZ ESCOBAR
ESNEIDER JOSE


23-OCT-1974
GUAMAL
(MAGDALENA)
1.83
O+
M
30-JUN-1994 VALLEDUPAR

F. I.
19/09/2023

EPS.
Sanitas

A.F.P.
Colpensiones





OLBER DONADO VILLAFAÑE





Powered by CamScanner



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/08/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901218055	Cédula Usuario:	CC 37336088
Nombre:	SECURITY ELITE SAS				
Dirección:	CLL 18 C NO 21-27				
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR		
Correo electrónico:	seguridadelite3000@gmail.com				
Teléfono:	3175485374	Tarifa:	4.350		
Actividad Económica:	4801001 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA, INCLUYE SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD.				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 37336088	SANDRA PATRICIA GALEANO LOPEZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	143	31/08/2023	CC 77160069	GUTIERREZ ESCOBAR ESNEIDER	4	4.35000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3507000.

Cordial saludo.

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

1337D4A21CB660047B7658118CABCD62 Certificado impreso el día 8/30/2023 7:28:17 PM por el portal de empresas Edoco

Positiva Compañía de Seguros S.A. • NIT: 860.011.153-6 • Línea gratuita 01-8000-111-170.
Bogotá: 330-7930 • Portal Web: www.positiva.gov.co
Positiva Compañía de Seguros · @PositivaCol · PositivaColombia

El empoderamiento es de todos

Powered by CamScanner



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACION DE LA AFILIACION DEL DIA 31/08/2023

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cotización	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo Dependiente
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES

Cordial saludo

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Positiva Compañía de Seguros S.A. • [illegible]

Positiva Compañía de Seguros | @PositivaCo | PositivaColombia

Powered by CamScanner

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el ramo de Riesgos Laborales de **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.** se identificó que **RICARDO JAVIER ROMERO PETIT** con **PT** No. **6084471**, registra afiliación en nuestra ARL, con la siguiente información:

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
Empleador: N 901216068 - SECURITY ELITE SAS	**Fecha de última cobertura:** 19/10/2022 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 4 **Cargo :** SUPERVISOR RECORREDOR PATRULLA SEGURIDAD Y VIGILANCIA **Fecha fin de Retiro:** SIN FECHA DE RETIRO

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS', ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20230301853864 9.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 30 días del mes de agosto de 2023.

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 900020118
Número Afiliación: 183343
Razón social: SECURITY FORCE LTDA

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 1065646526
Nombre: JEISON ANDRES CHAMORRO SARIA
Fecha Ingreso: 19/09/2023
Salario básico: 1,160,000
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: SUCURSAL 1
Centro de trabajo: 005
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 18/09/2023 04:13:41 p.m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 900020118
Número Afiliación: 183343
Razón social: SECURITY FORCE LTDA

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 1122396146
Nombre: JOSE ALBERTO GUTIERREZ SANTIAGO
Fecha Ingreso: 19/09/2023
Salario básico: 1,160,000
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: SUCURSAL 1
Centro de trabajo: 005
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 18/09/2023 04:03:22 p.m.

AXA COLPATRIA


INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 900020118
Número Afiliación: 183343
Razón social: SECURITY FORCE LTDA

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 77185068
Nombre: ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR
Fecha Ingreso: 21/09/2023
Salario básico: 1,160,000
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: SUCURSAL 1
Centro de trabajo: 005
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 18/09/2023 04:20:38 p.m.

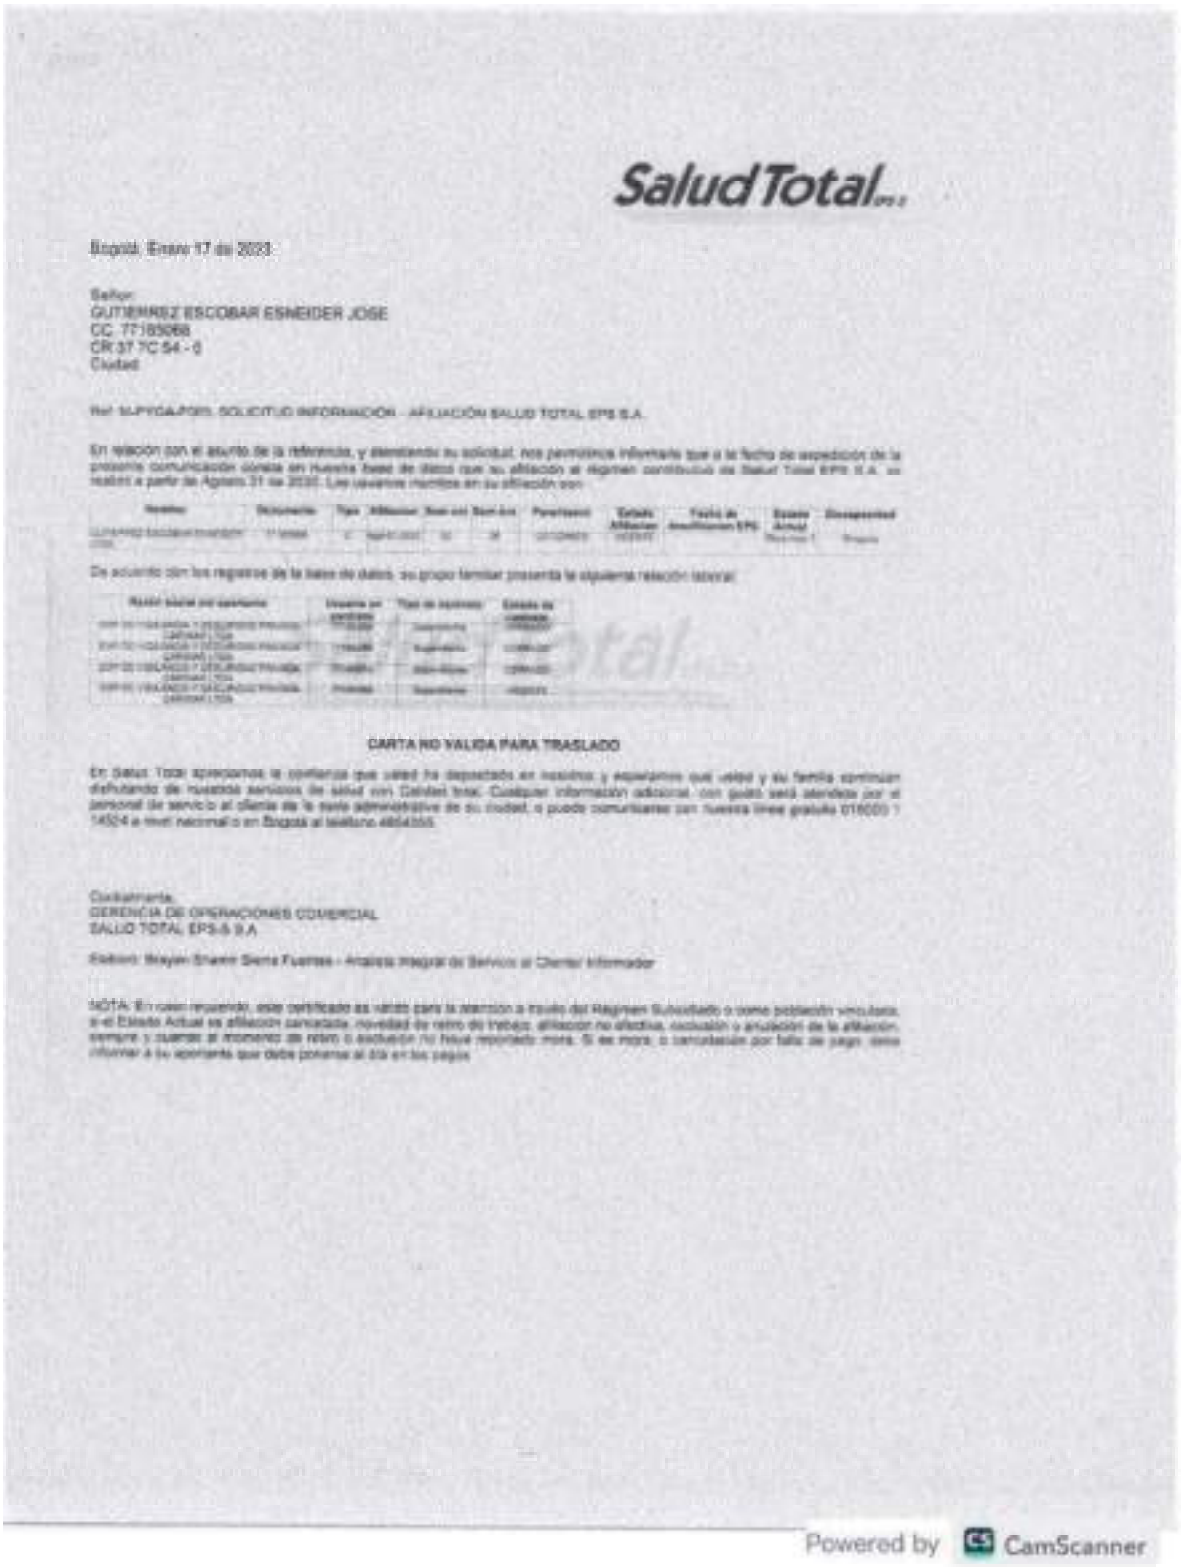

Salud Total...

Bogotá, Enero 17 de 2023

Señor
GUTIERREZ ESCOBAR ESNEIDER JOSE
CC 77183068
CR 37 7C 54 - 0
Ciudad

Ref: SUPERSALUD/EPS. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Agosto 31 de 2020. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliación	Sem cot	Sem ant	Parentesco	Estado Afiliación	Fecha de inscripción EPS	Estado Actual	Discapacidad
GUTIERREZ ESCOBAR ESNEIDER JOSE	CC 77183068	C	Agosto 2020	52	34	COTIZANTE	ACTIVO		Activo	Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del empleador	Usuario en empresa	Tipo de empleo	Estado de vinculación
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO


En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad Total. Cualquier información adicional con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4864555.

Cordialmente,
GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIAL
SALUD TOTAL EPS-S S.A

Elaboró: Brayan Sharon Sierra Fuentes - Analista Integral de Servicio al Cliente Informador

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la afiliación a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora o cancelación por falta de pago debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos.

Powered by CamScanner

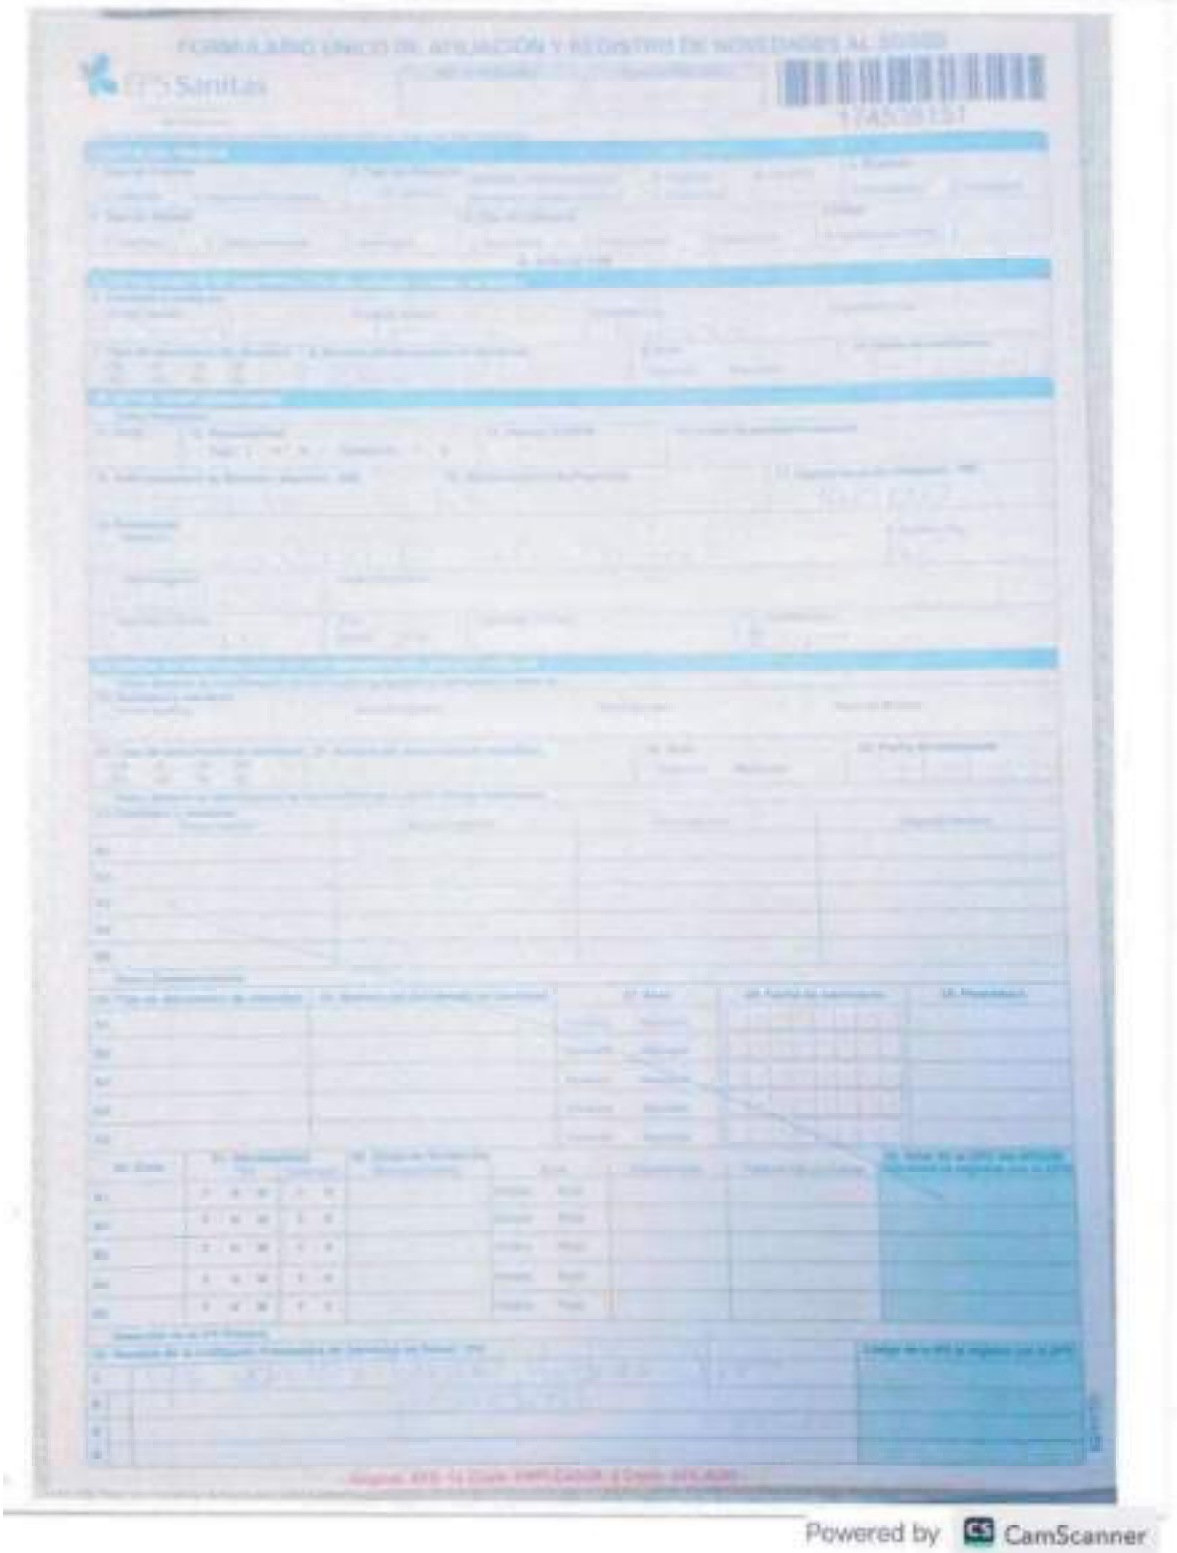
Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La EPS SANITAS en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado **EPS SANITAS**,

CERTIFICA

Que **Ricardo Javier Romero Petit** identificado(a) con **PERMISO POR PROTECCION TEMPORAL** número **6084471,** está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	PT 6084471
NOMBRES Y APELLIDOS	Ricardo Javier Romero Petit
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	11/06/1979
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	6 No Ha Iniciado Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	27 - Afiliación Aún No Inicia Cobertura En La Eps
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	01/09/2023
FECHA RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	01/09/2023
NIVEL SISBEN	No aplica


EMPLEADOR(ES)*

N.I.T. 901216068 SECURITY ELITE SAS Desde 01/09/2023 - Vigente

*Se reportan, a partir de la fecha de este certificado, los empleadores con los cuales ha estado afiliado en EPS SANITAS en los últimos 12 meses.

Generado por clicriales 31/08/2023

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS

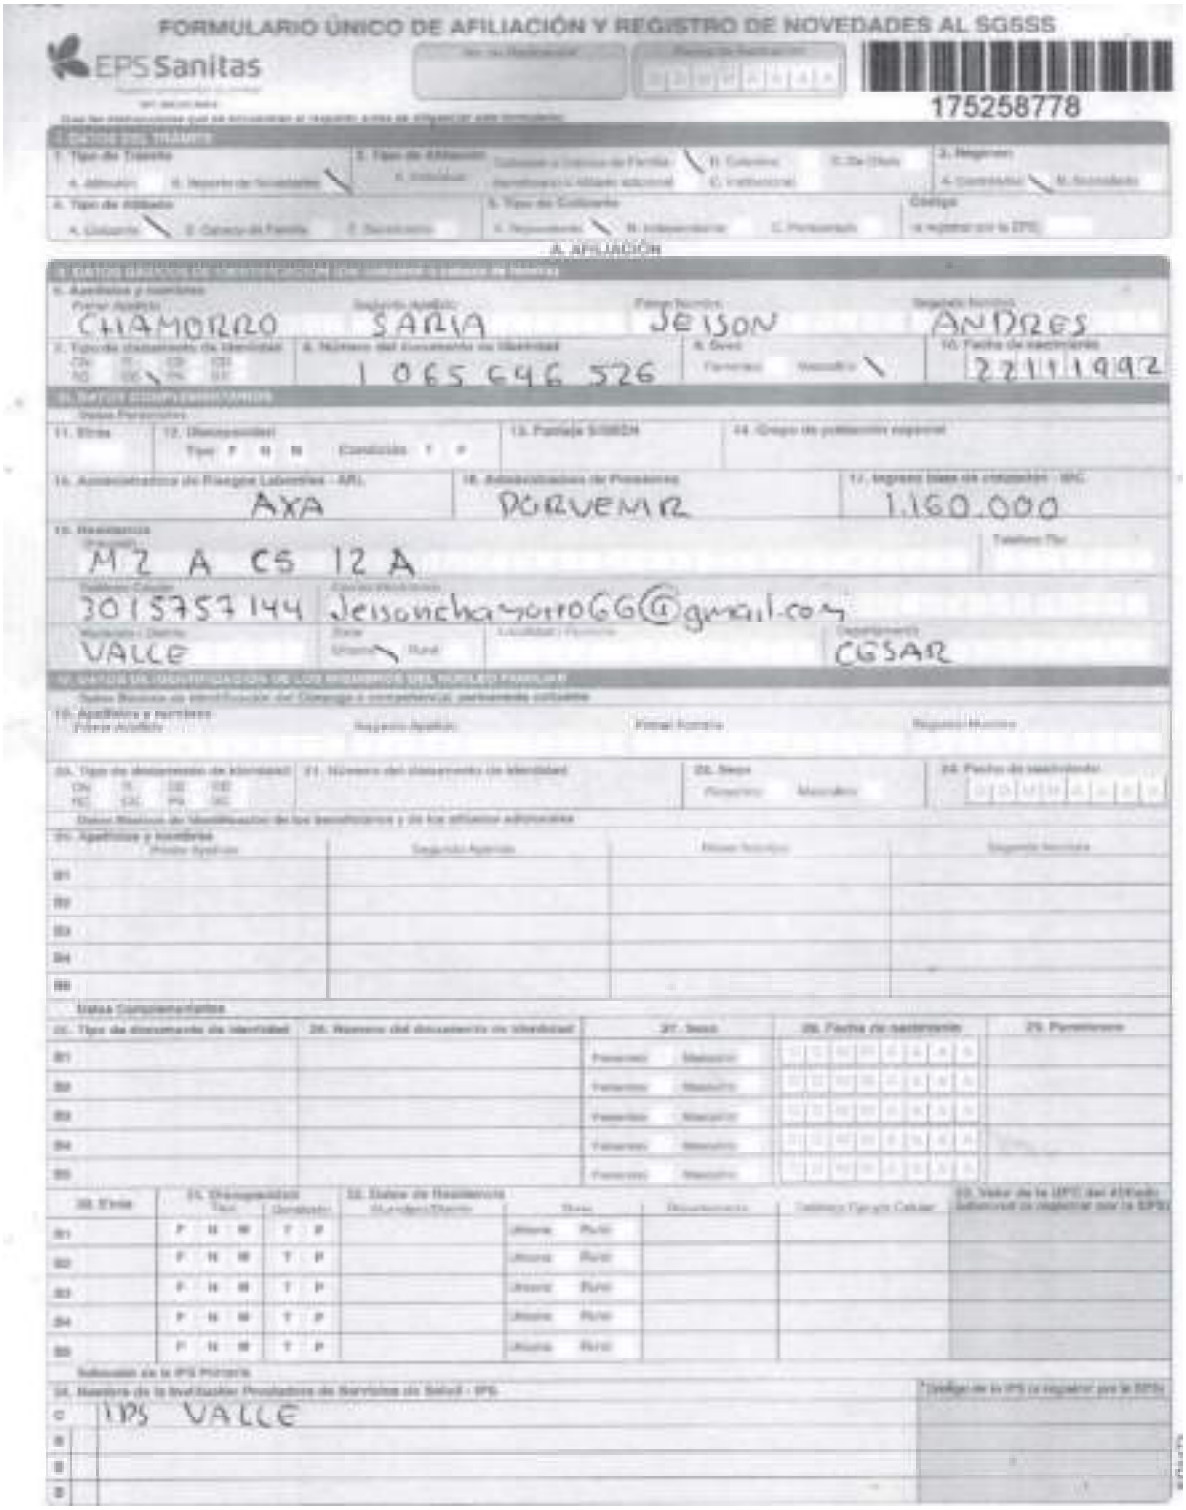

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

EPS Sanitas

175258778


A. AFILIACIÓN

Primer Apellido	CHAMORRO
Segundo Apellido	SARIA
Primer Nombre	JEISON
Segundo Nombre	ANDRES
Número de Identificación	1065646526
Fecha de nacimiento	22/11/1992
Administradora de Riesgos Laborales - ARL	AXA
Administradora de Pensiones	PORVENIR
Ingreso base de cotización - IBC	1.160.000
Dirección	MZ A CS 12 A
Teléfono Celular	3015757144
Correo Electrónico	Jeisonchamorro66@gmail.com
Departamento	CESAR

1. Tipo de Trámite	
2. Tipo de Afiliado	
3. Régimen	
4. Tipo de Cotizante	
5. Tipo de Cotizante	
Código	

1. Apellidos y nombres	
2. Tipo de documento de identidad	
3. Número del documento de identidad	
4. Sexo	
5. Fecha de nacimiento	
6. Parentesco	
7. Discapacidad	
8. Datos de Residencia	
9. Valor de la UPC del Afiliado adicional o registrar por la EPS	

Solicitud en la IPS Primaria	
10. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	IPS VALLE
*Código de la IPS a registrar por la EPS	

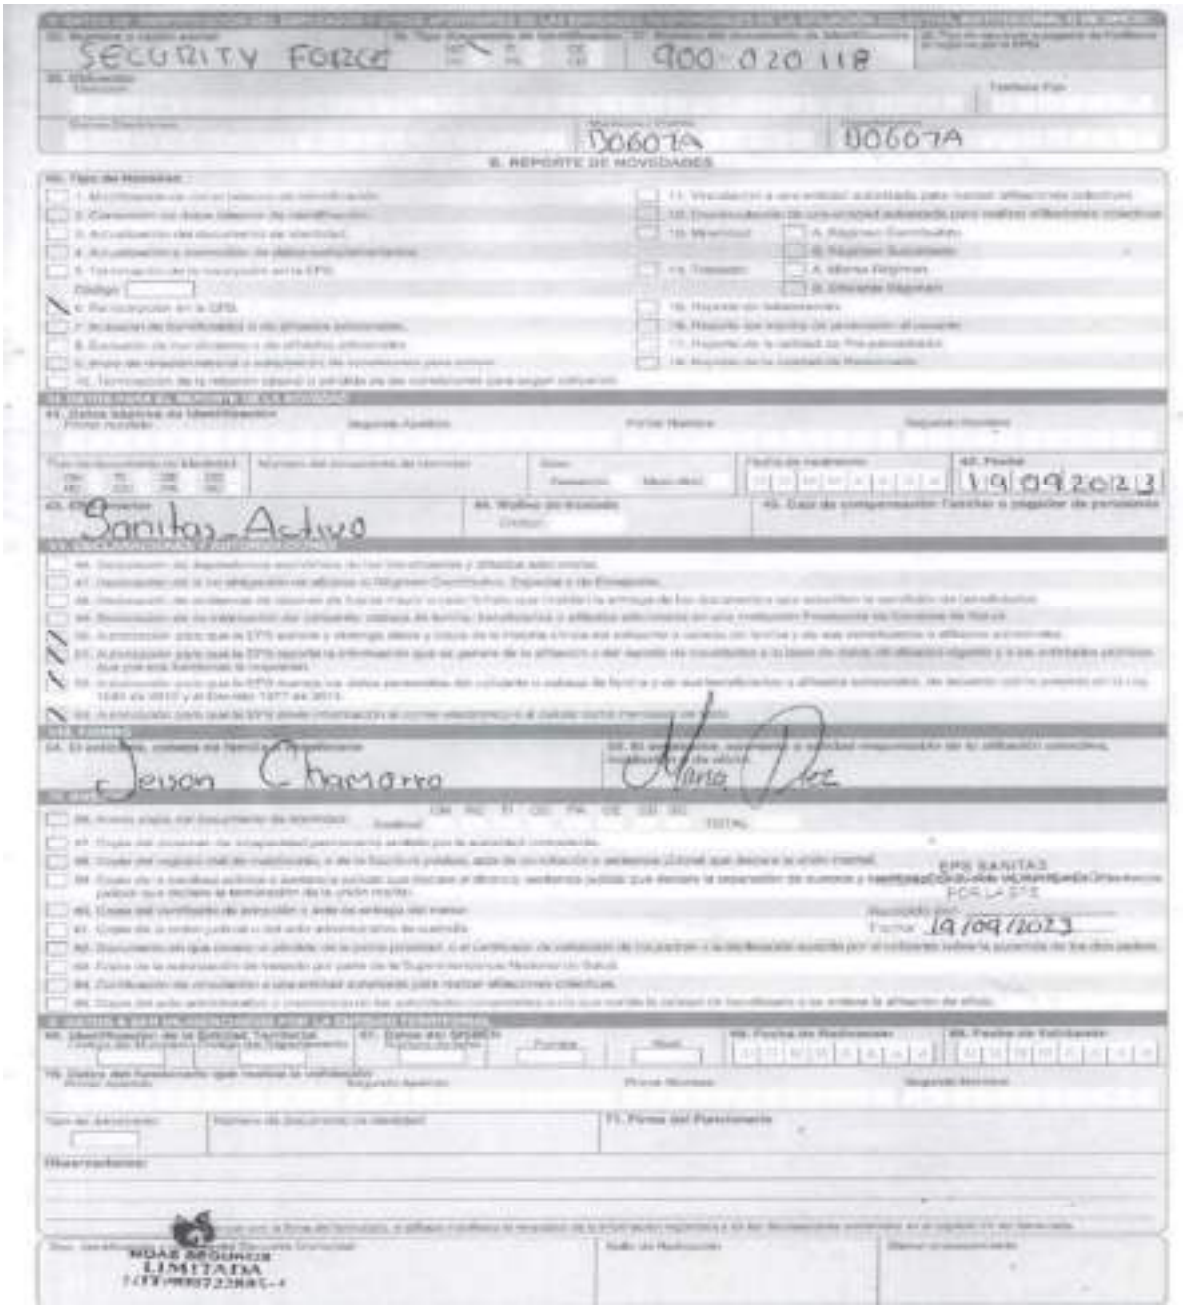
SECURITY FORCE
900.020.118
D0607A
D0607A
8. REPORTE DE NOVEDADES
19/09/2023
Sanitas Activo
Jeison Chamarra
19/09/2023
EPS SANITAS
POR LA EPS
NOAS SEGURIDAD LIMITADA



No de Radicacion
401160230

Página 2 de 2

II. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación datos básicos de identificación
2. Corrección datos básicos de identificación
3. Actualización documento de identidad
4. Actualización y/o corrección datos complementarios
5. Terminación de la relación con la EPS
Código:
6. Re-ingreso en la EPS
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
8. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
9. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo; B. Régimen Subsidiado
14. Traslado: A. Mismo régimen; B. Diferente régimen
15. Reporte de fallecimiento
16. Reporte del cambio de población al pensionado
17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
18. Reporte de la calidad del pensionado

V. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo (Femenino / Masculino)	Fecha de nacimiento	42. Fecha
				2/08/2020

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VI. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
47. Declaración de que no obligado a afiliarse al Régimen Contributivo Especial o de Excepción
48. Declaración de ocurrencia de casos de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acrediten la condición de beneficiarios
49. Declaración de no información del cotizante jefe de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud
50. Autorización para que la EPS solicite y entregue datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran
52. Autorización para que la EPS incorpore los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Osneider Gutierrez	Maria Paz

IX ANEXOS

56. Anexo Copia del documento de identidad: CN ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☐ PA ☐ CE ☐ CD ☐ SC ☐
Cantidad: Total: 0

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. Copia registro civil de nacimiento, o de la escritura pública que de conclusión o sentencia judicial que declare la unión marital
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública que da constitución o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital
60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración escrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conceden la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN: Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autenticaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

MIPYGA F001 V 1.0.2019

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SaludTotal EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicacion
401102939	19/03/2021

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo) Página 1 de 2

1.Tipo de tramite: A. Afiliacion ☐ B.Reporte de Novedades ☒
2.Tipo afiliacion: A. Individual ☐ B. Colectivo ☐ B. Institucional ☐ Cotizante Cabeza de familia ☒ Beneficiario afiliado adicional ☐ B. De oficio ☐
3.Regimen: A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
Código (a registrar por la EPS): 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
PATIÑO (Primer apellido)	ESCOBAR (Segundo apellido)	EDWIN (Primer nombre)	JOSE (Segundo nombre)

7.Tipo documento de identidad	8.Número del documento de identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
CC	77190350	Femenino ☐ Masculino ☒	23/10/1974

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo: Condicion: TDI		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	PORVENIR PC	1160000

18.Residencia: Direccion	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CR 17 7C 54		3126316029	EMEDERO@TIEBREZESCOBAR77@GMAIL.COM

Municipio/Distrito	Zona	Localidad / comuna	Departamento
VALLEDUPAR	Urbana ☒ Rural ☐	07	CESAR

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos basicos de identificacion del conyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número documento identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
01					
02					
03					
04					
05					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo		Condición	
01							
02							
03							
04							
05							

32. Datos de residencia

	Municipio Distrito	Zona		Departamento	Telefono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del 1er grado adicional (a registrar por la EPS)
		Urbana	Rural			
01						
02						
03						
04						
05						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institucion Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS (a registrar por la EPS)
C	VS CLINICA LOPERENA - VS CLINICA LOPERENA	VSCLOPER05 - VSCLOPER05
01	-	-
02	-	-
03	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA INSTITUCIONAL O DE OFICIO

36. Nombre o razón social	36. Tipo de identificacion	37. Numero de documento de identificacion	38. Tipo de aportante a registrar de pensionado registrar por la EPS)
SECURITY FORCE LTDA	NIT	900926118	01

39.Ubicacion: Direccion	Telefono	Correo electronico	Municipio/distrito	Departamento
CL 67 #JU 98 51	3104458865	SECURITYVIC@HOTMAIL.COM	MEDELLIN	ANTIOQUIA

M.FYGJL7.001 V 1.0.2013



porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR, identificado(a) con cédula de ciudadanía **77.185.068**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 30 de Agosto del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y entuelice su Historia Laboral.*

Grupo AVAL

Powered by CamScanner



porvenir

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

FABIAN CORRALES HERRERA [illegible] con cédula de ciudadanía 1.065.595.702, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 31 de Agosto del 2023.

Cordialmente,


Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por qué? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Grupo AVAL

Powered by CamScanner

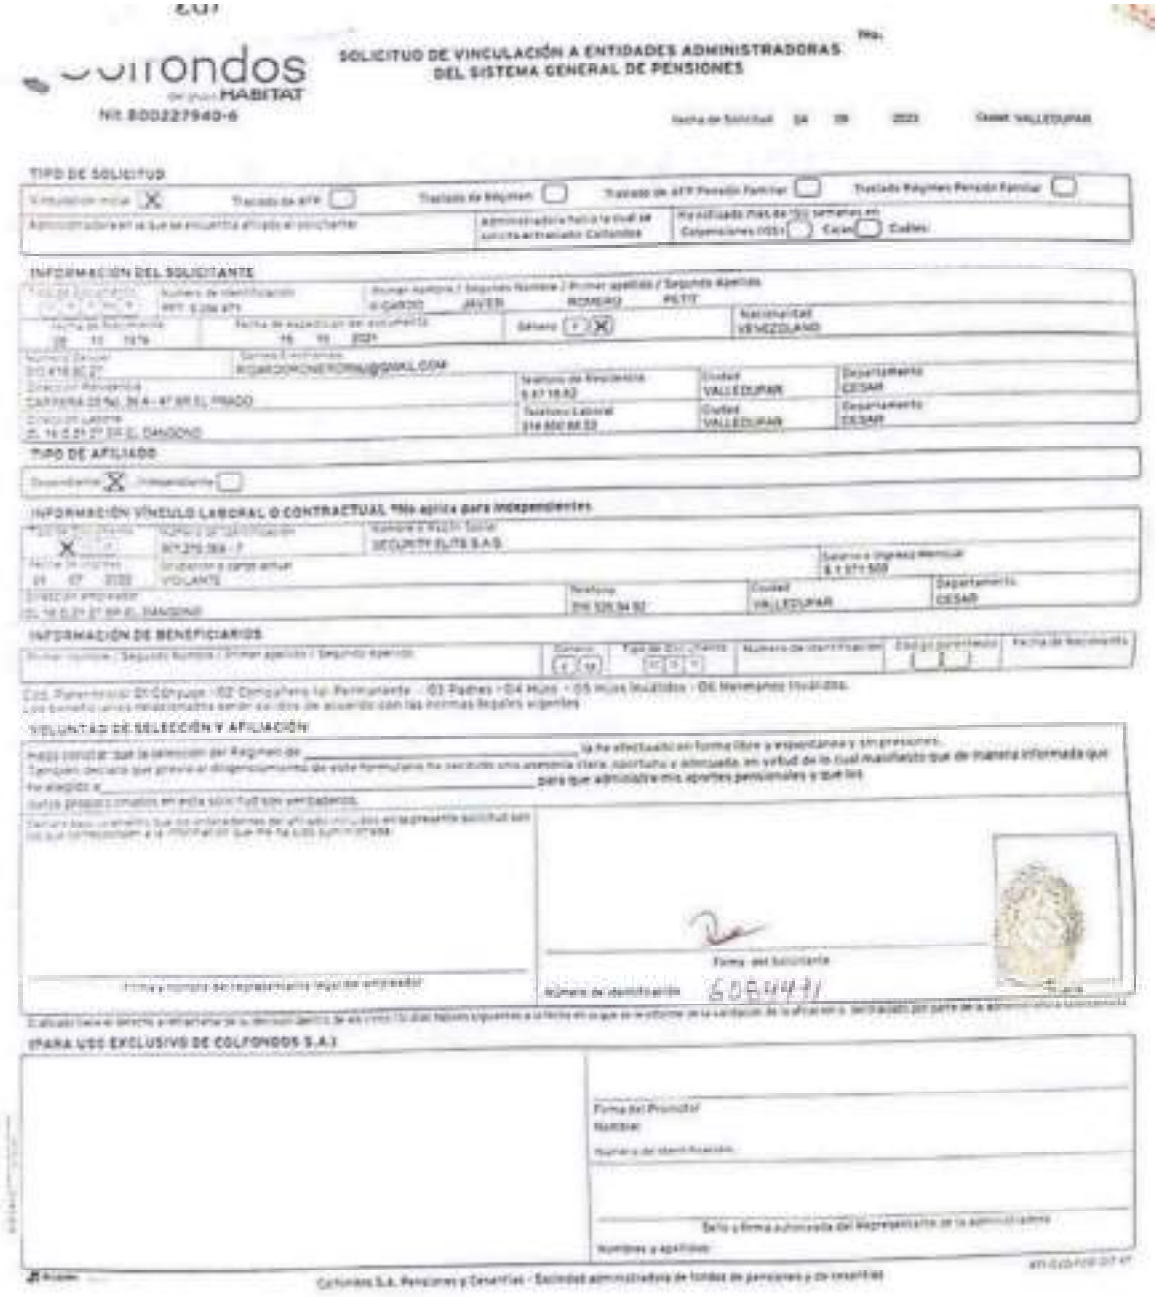

SOLICITUD DE VINCULACIÓN A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Colfondos — Nit 800227940-6

TIPO DE SOLICITUD

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

TIPO DE AFILIADO

INFORMACIÓN VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL *No aplica para independientes

INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS

VOLUNTAD DE SELECCIÓN Y AFILIACIÓN

PARA USO EXCLUSIVO DE COLFONDOS S.A.

Powered by CamScanner

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-9

CERTIFICA QUE:

JEISON ANDRES CHAMORRO SARIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.065.646.526**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 18 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR, identificado(a) con cédula de ciudadanía **77.185.068**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 19 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) JOSE ALBERTO GUTIERREZ SANTIAGO identificado(a) con C.C No. 1.122.396.146, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-8.


Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 15 de septiembre del 2023.


El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción PQR's, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 601 748 48 88, Barranquilla 605 386 98 88, Bucaramanga 607 698 58 88, Cali 602 489 98 98, Cartagena 605 694 96 88, Medellín 604 604 28 88 y en el resto del país 01 800 05 10000.

Leonardo Cáceres García
Gerente Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

Powered by CamScanner

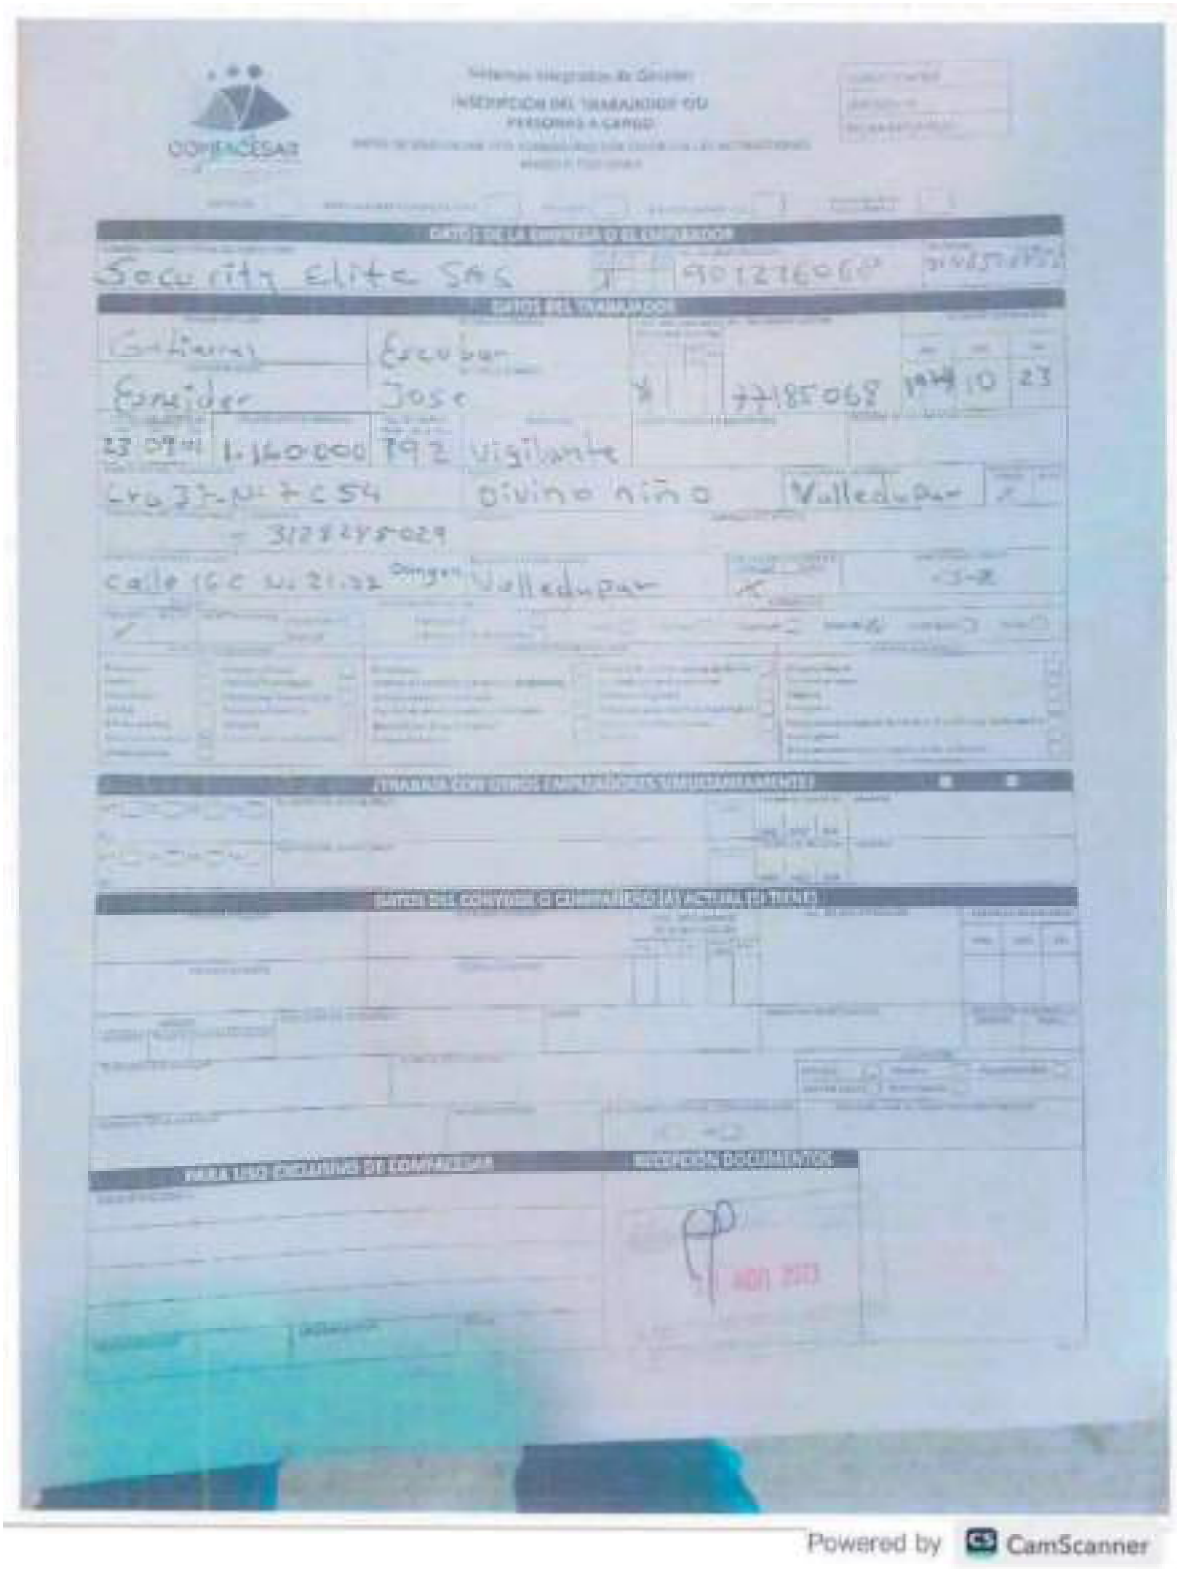
COMFACESAR
Security Elite SAS
Escobar
Jose
77185068
vigilante
Divino niño
Valledupar
3128248029
Calle 16C N. 21-32
Valledupar
Powered by CamScanner

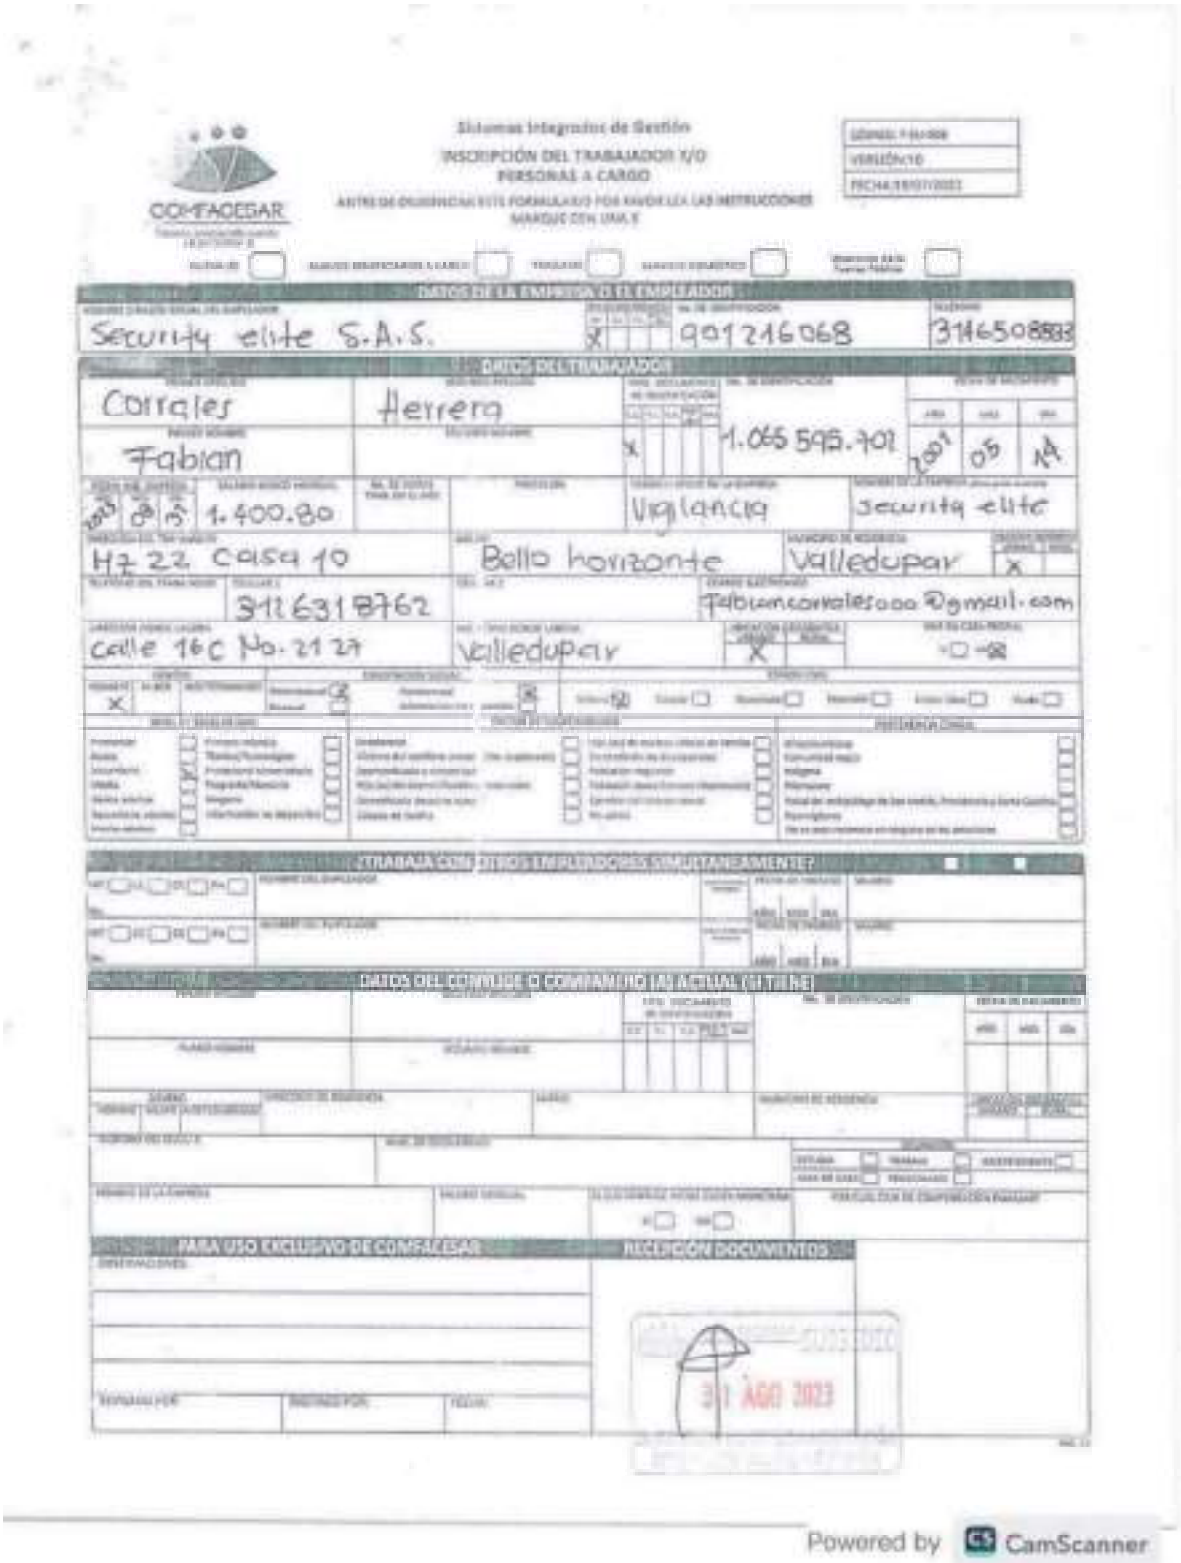

Sistemas Integrados de Gestión

INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR Y/O PERSONAS A CARGO

COMFACESAR

DATOS DE LA EMPRESA O EL EMPLEADOR

Security elite S.A.S. | 901216068 | 3146508883

DATOS DEL TRABAJADOR

Corrales | Herrera | Fabian | 1.065 595.701 | 1400.80 | Vigilancia | Security elite

Hz 22 casa 10 | Bello horizonte | Valledupar

3116318762 | Fabiancorrales000@gmail.com

Calle 16C No. 21 27 | Valledupar


¿TRABAJA CON OTROS EMPLEADORES SIMULTANEAMENTE?

DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO (A) ACTUAL (O ULTIMO)

PARA USO EXCLUSIVO DE COMFACESAR | RECEPCIÓN DOCUMENTOS

31 AGO 2023

Powered by CamScanner

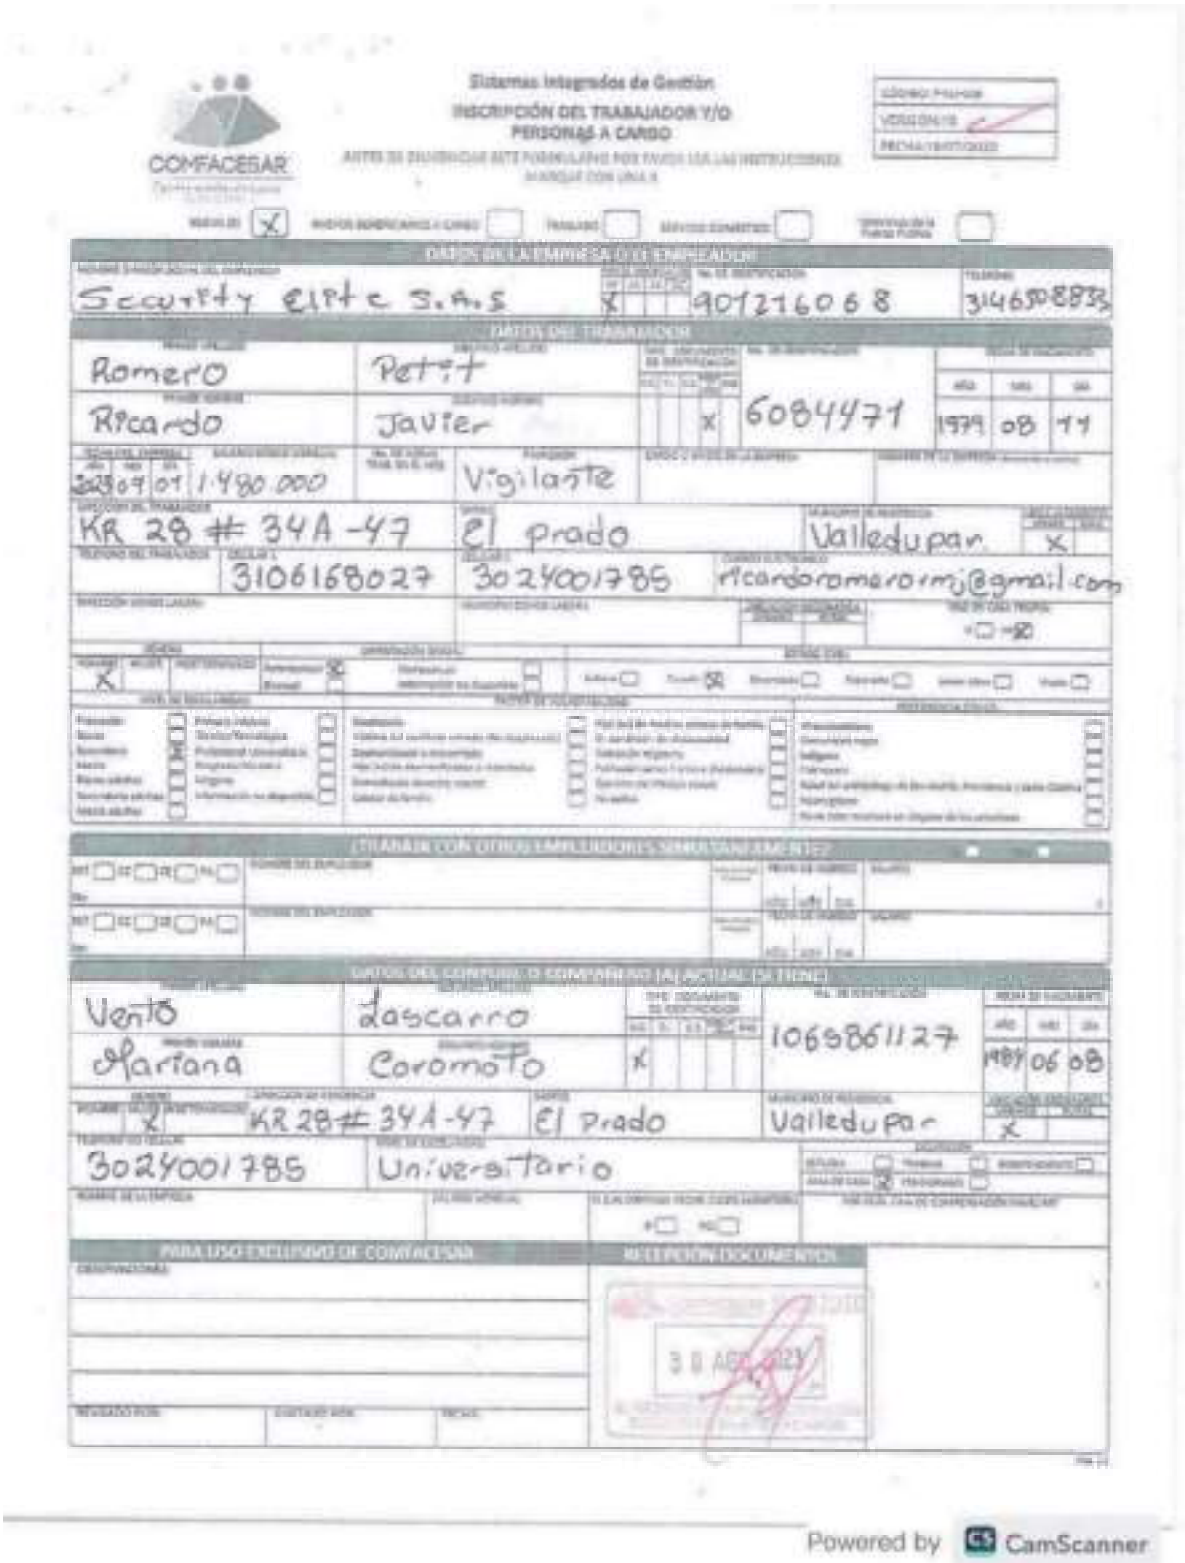

COMFACESAR

Sistemas Integrados de Gestión

INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR Y/O PERSONAS A CARGO

DATOS DE LA EMPRESA O EL EMPLEADOR

Security Elite S.A.S — 901216068 — 3146508853

DATOS DEL TRABAJADOR

Romero Pertt — Ricardo Javier — 6084471 — 1979 08 11

2023 09 01 — 1.480.000 — Vigilante

KR 28 # 34A -47 — El prado — Valledupar

3106168027 — 3024001785 — ricardoromerorm@gmail.com

¿TRABAJA CON OTROS EMPLEADORES SIMULTÁNEAMENTE?

DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO (A) ACTUAL (SI TIENE)

Vento Lascarro — Mariana Coromoto — 1065861127 — 1987 06 08

KR 28 # 34A-47 — El Prado — Valledupar


3024001785 — Universitario

PARA USO EXCLUSIVO DE COMFACESAR


RECEPCIÓN DOCUMENTOS

30 ABR 2021

Powered by CamScanner

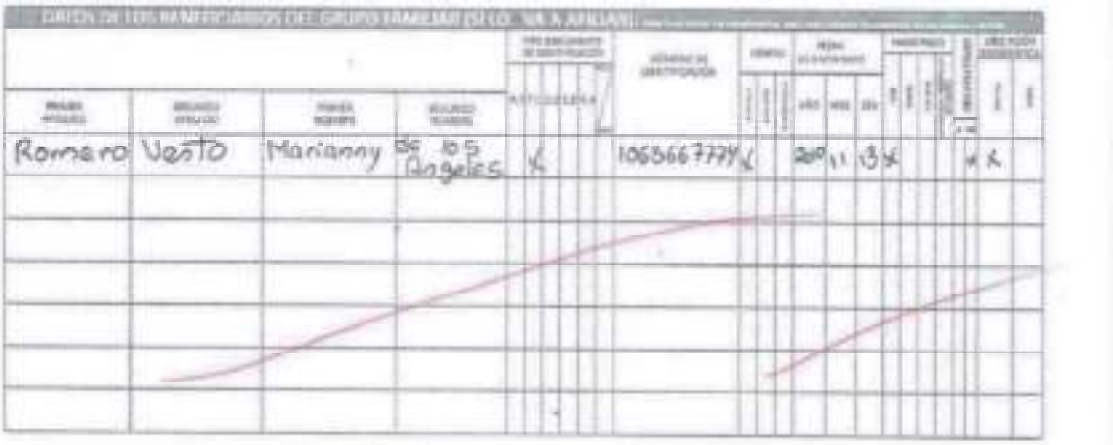

| | | |

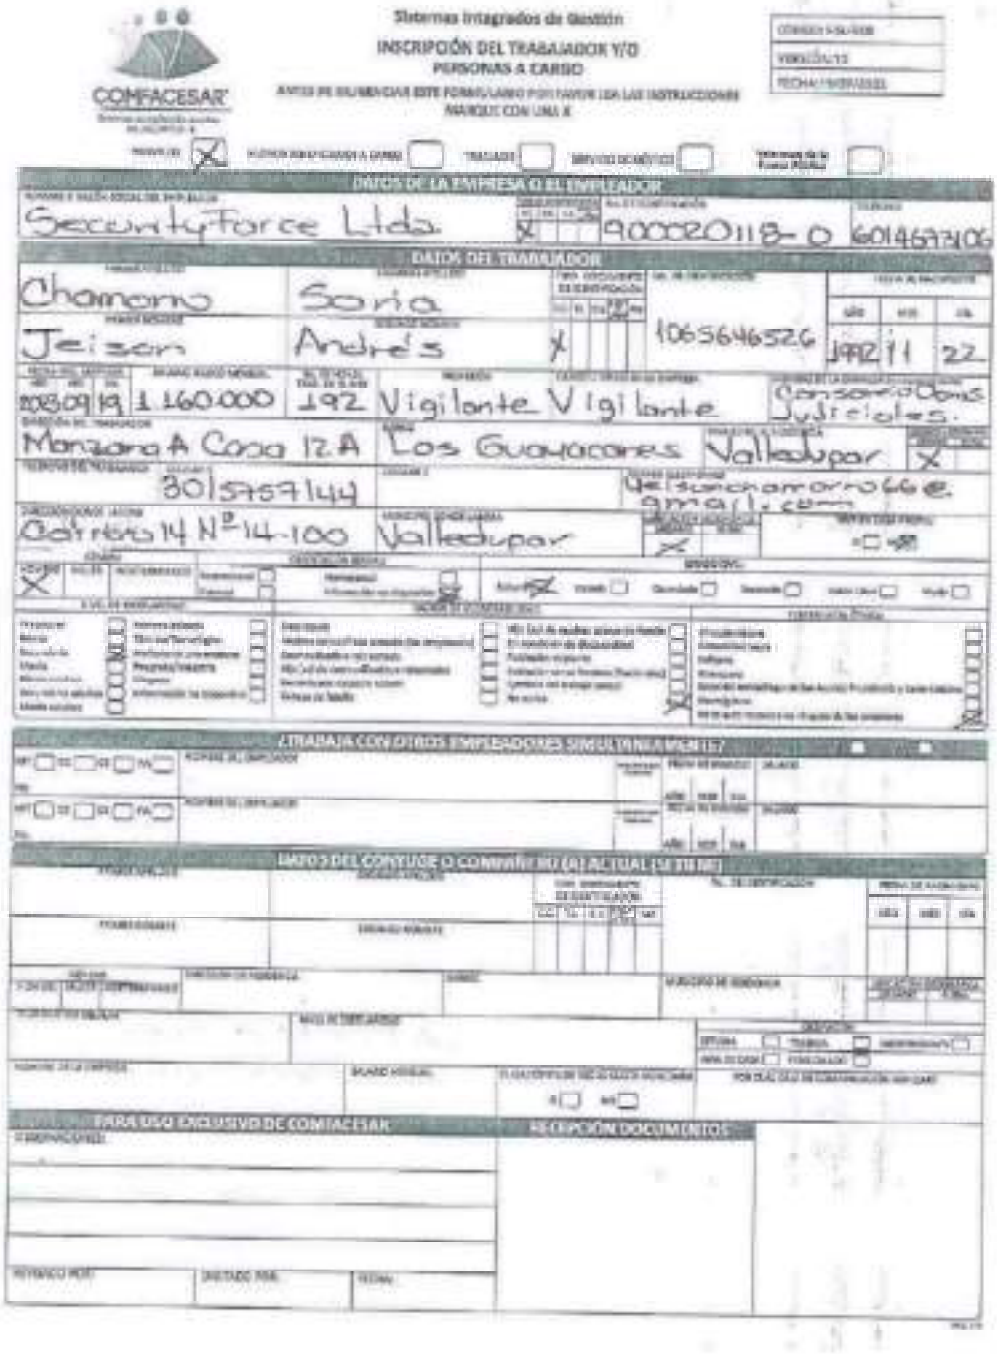

COMFACESAR

Sistemas Integrados de Gestión

INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR Y/O PERSONAS A CARGO

DATOS DE LA EMPRESA O EL EMPLEADOR

SecurityForce Ltda. 900020118-0 6014677406

DATOS DEL TRABAJADOR

Chamorro Soria

Jeison Andrés 1065646526 1992/11/22

2023/09/19 1.160.000 192 Vigilante Vigilante Conserjes Judiciales.

Manzana A Casa 12 A Los Guayacanes Valledupar

3015757144 yeisonchamorro66@gmail.com


Carrera 14 N° 14-100 Valledupar

¿TRABAJA CON OTROS EMPLEADORES SIMULTÁNEAMENTE?

DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO (A) ACTUAL (SI LO HAY)

PARA USO EXCLUSIVO DE COMFACESAR

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

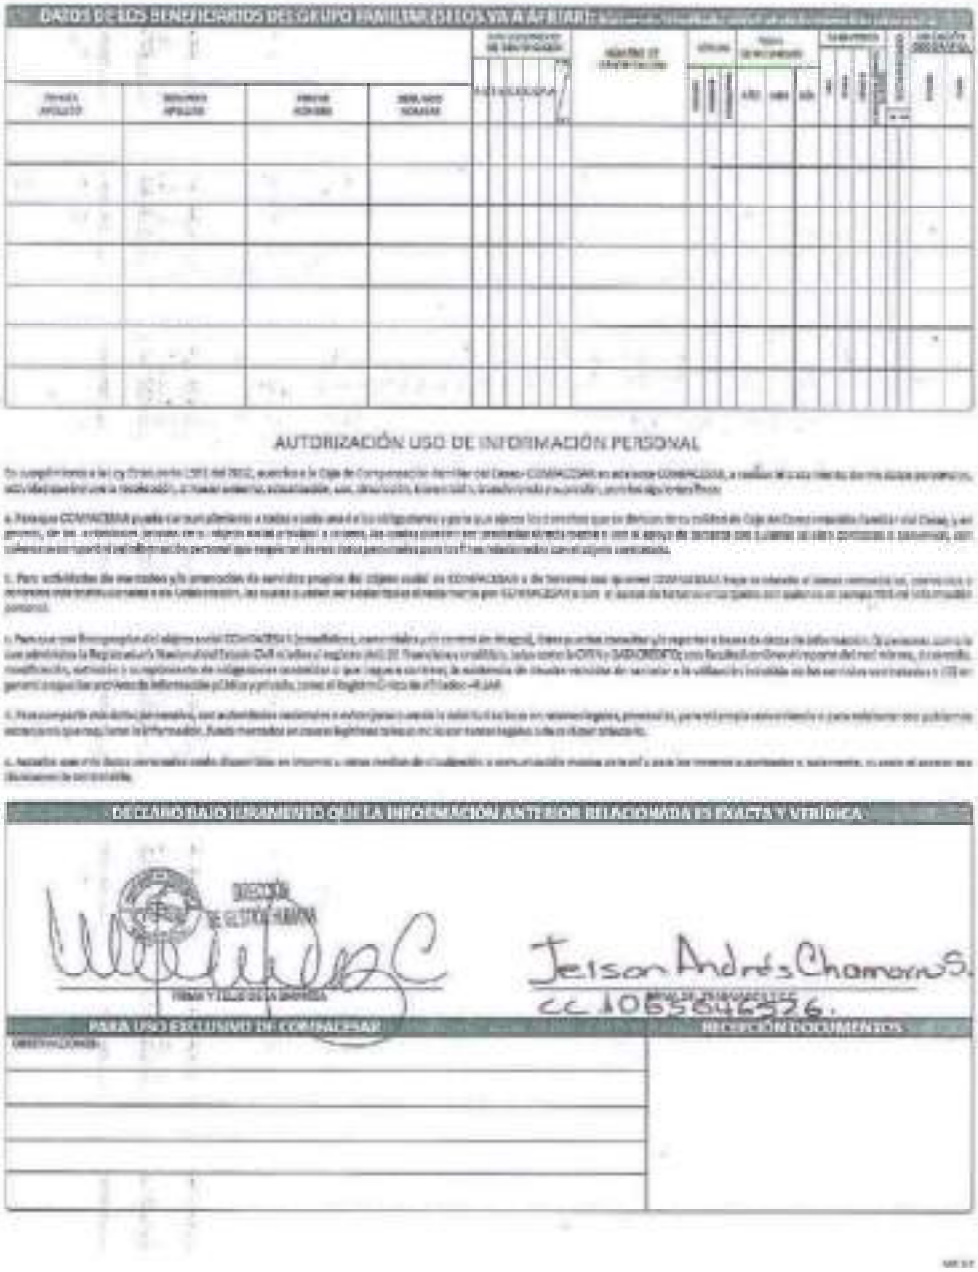

DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL GRUPO FAMILIAR QUE SE VA A AFILIAR

AUTORIZACIÓN USO DE INFORMACIÓN PERSONAL


DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR RELACIONADA ES EXACTA Y VERÍDICA

Jeison Andres Chamorro S.

cc 1065646526.

PARA USO EXCLUSIVO DE COMPACSAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

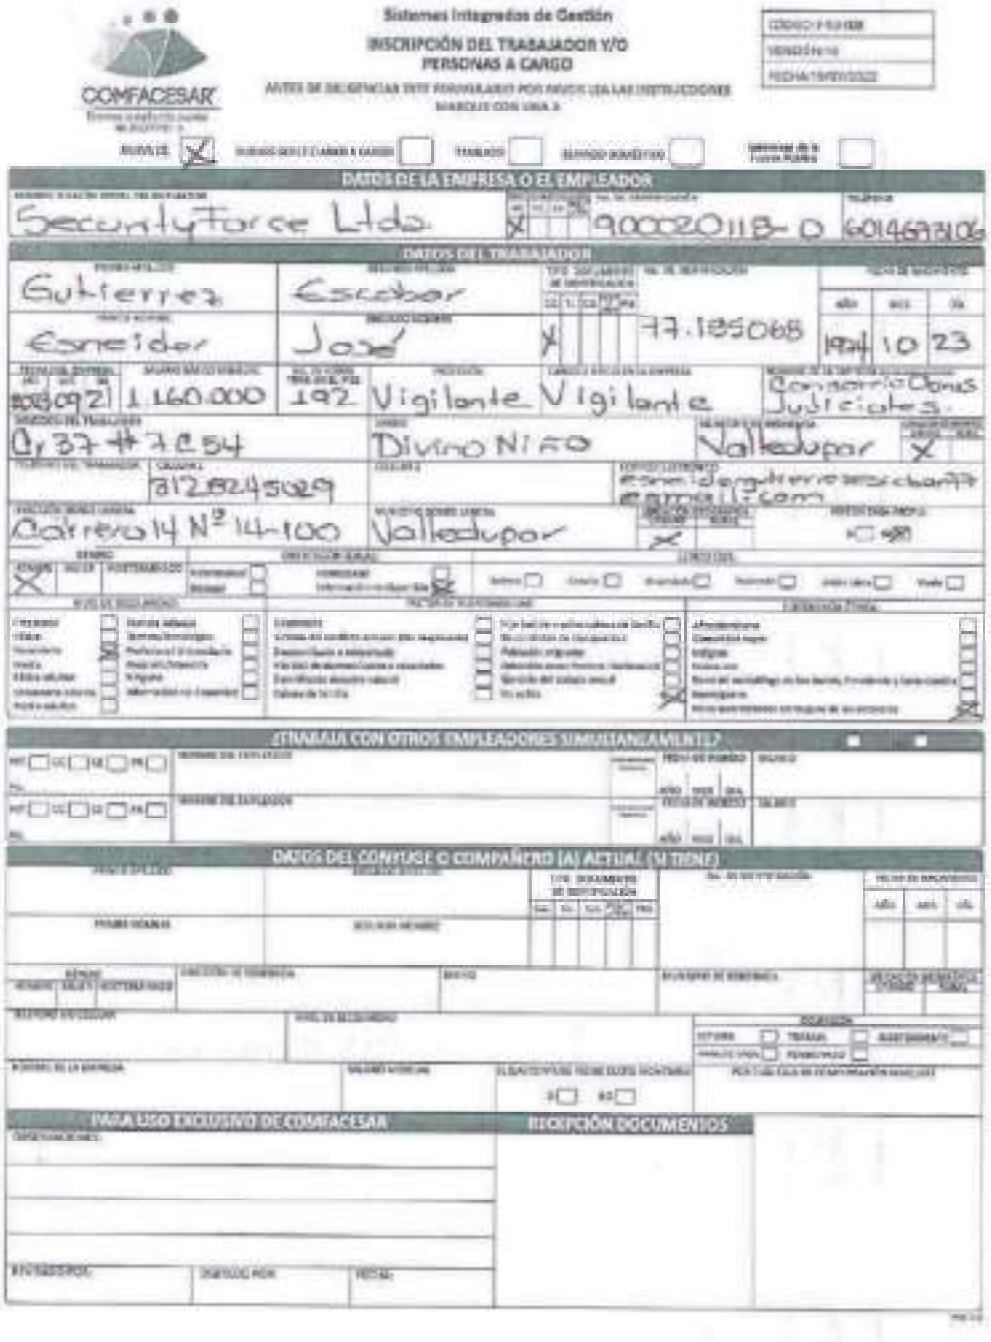

COMFACESAR

Sistemas Integrados de Gestión

INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR Y/O PERSONAS A CARGO

DATOS DE LA EMPRESA O EL EMPLEADOR

SecurityForce Ltda. — 900020118-0 — 6014697806

DATOS DEL TRABAJADOR

Gutierrez Escobar — Esneider Jose — 77.185068 — 1994 10 23

2003021 — 1.160.000 — 192 — Vigilante — Vigilante — Consorcio Obras Judiciales S.

0,37 # 7C 54 — Divino NIÑO — Valledupar


3128245029

Carrera 14 N° 14-100 — Valledupar

¿TRABAJA CON OTROS EMPLEADORES SIMULTÁNEAMENTE?

DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO (A) ACTUAL (SI TIENE)

PARA USO EXCLUSIVO DE COMFACESAR — RECEPCIÓN DOCUMENTOS

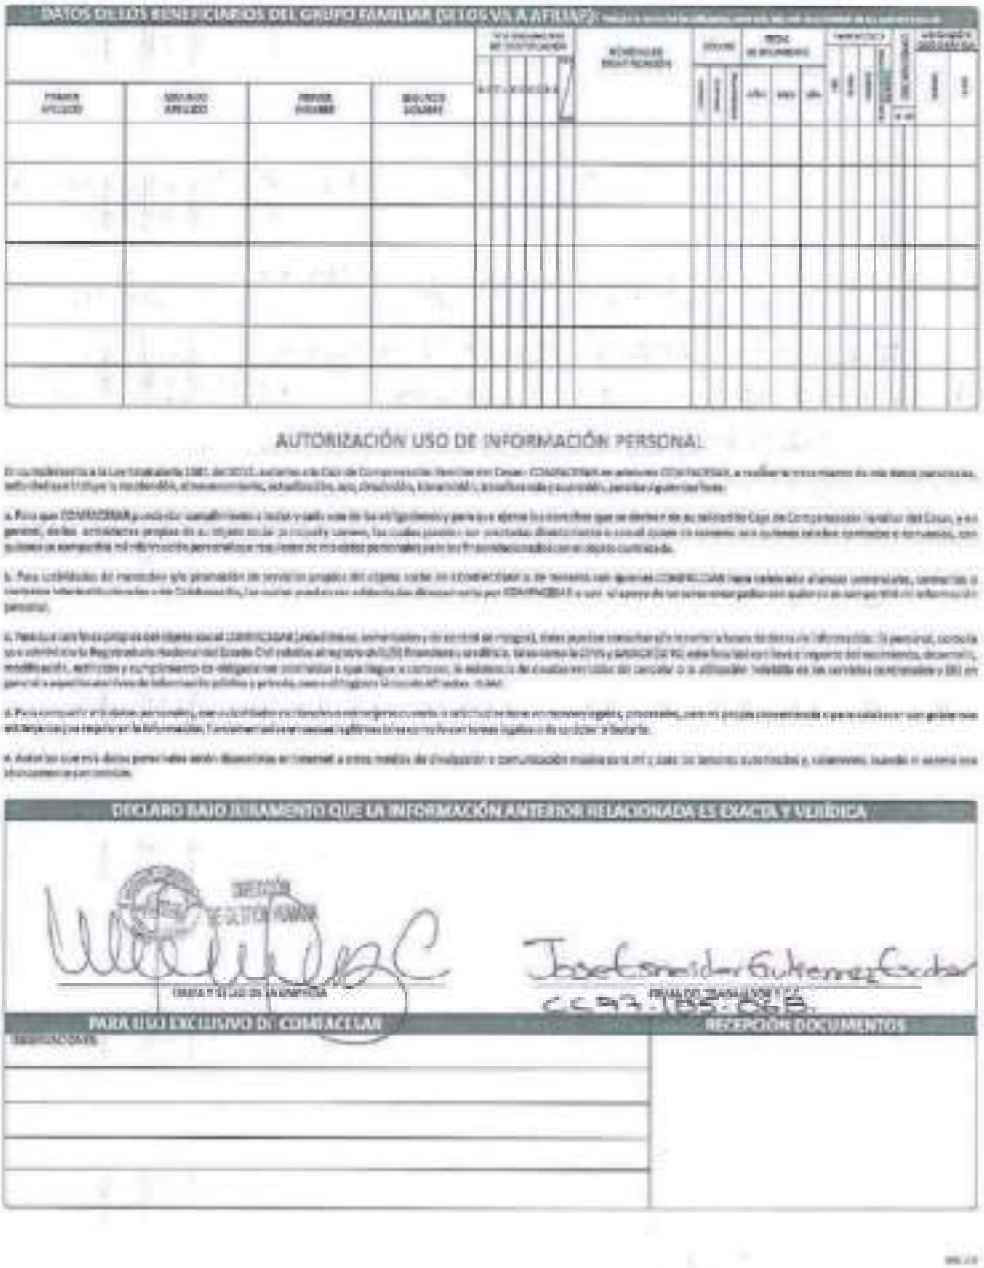


DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL GRUPO FAMILIAR (SI LOS VA A AFILIAR):

AUTORIZACIÓN USO DE INFORMACIÓN PERSONAL

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR RELACIONADA ES EXACTA Y VERÍDICA

PARA USO EXCLUSIVO DE COMFACESAR

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

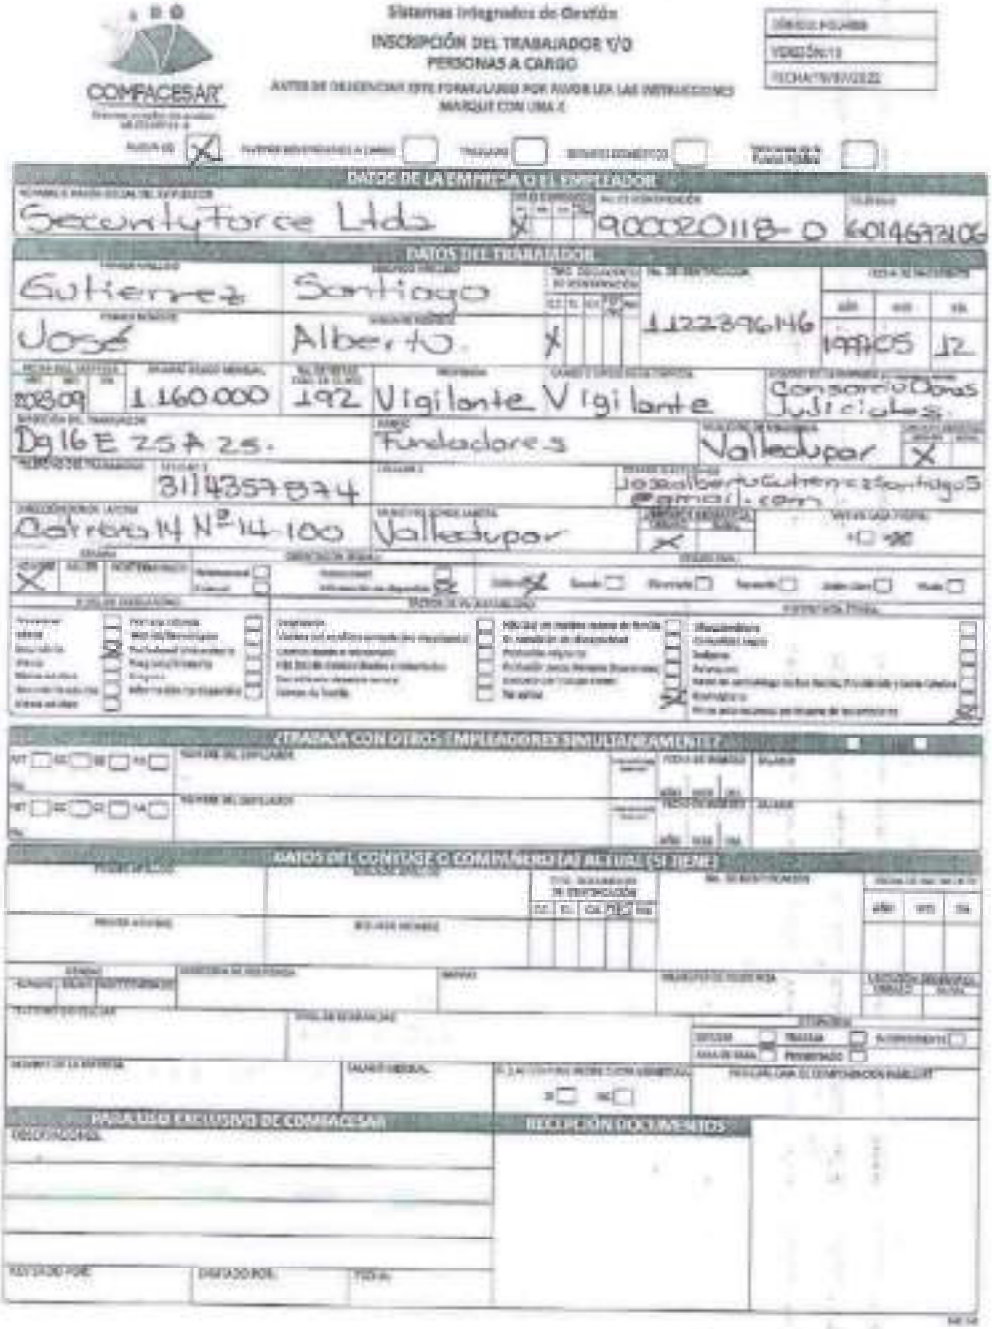

COMPACESAR

Sistemas Integrados de Gestión

INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR Y/O PERSONAS A CARGO

DATOS DE LA EMPRESA O EL EMPLEADOR

Securityforce Ltda 900020118-0 6014692106

DATOS DEL TRABAJADOR

Gutierrez Santiago

Jose Alberto X 1122396146 199105 12

208.09 1.160.000 192 Vigilante Vigilante Consorcio Obras Judiciales

Dg 16 E 25A 25. Fundadores Valledupar X

3114357874 josealbertogutierrez25santiago5@gmail.com

Carrera 14 N° 14-100 Valledupar X

¿TRABAJA CON OTROS EMPLEADORES SIMULTÁNEAMENTE?


DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO (A) ACTUAL (SI TIENE)


USO EXCLUSIVO DE COMPACESAR

RECEPCIÓN DOCUMENTOS



AUTORIZACIÓN USO DE INFORMACIÓN PERSONAL

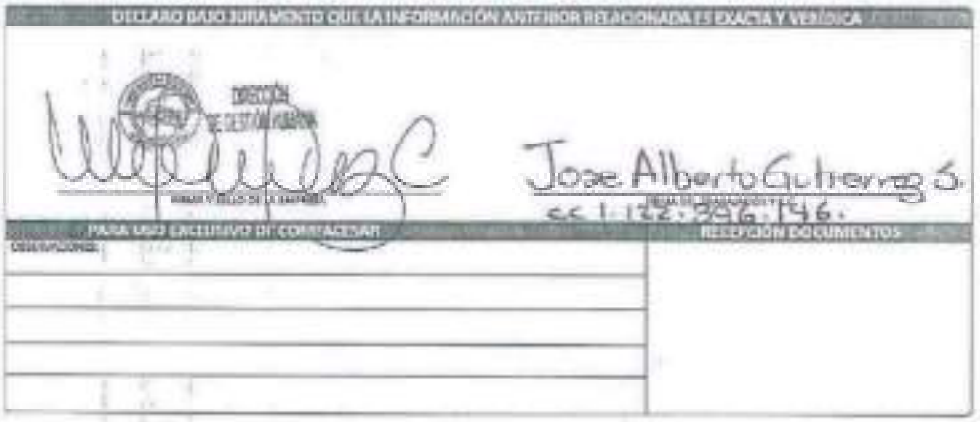

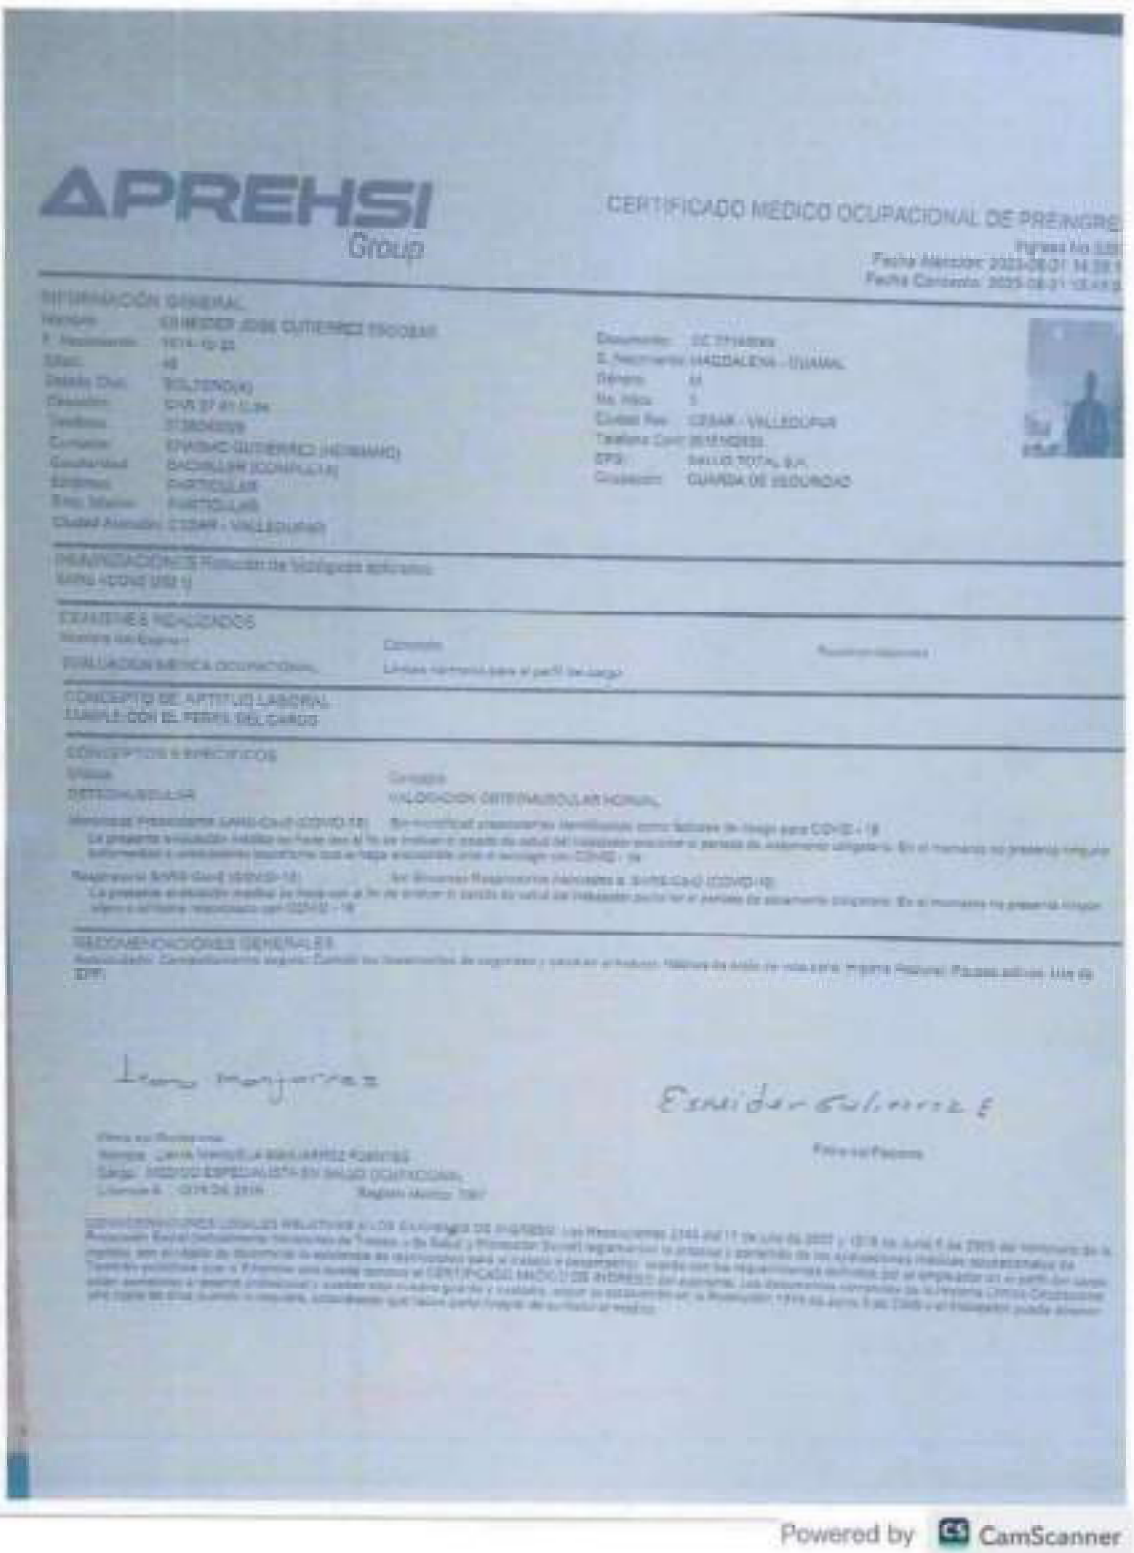

APREHSI Group

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL DE PREINGRE

INFORMACIÓN GENERAL

EXAMENES REALIZADOS

EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

CUMPLE CON EL PERFIL DEL CARGO

CONCEPTOS Y RECOMENDACIONES

DETERMINOLOGIA

VALORACION OSTEOMUSCULAR HORUS

RECOMENDACIONES GENERALES

Powered by CamScanner

APREHSI Group

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL DE PREINGRESO

Ingreso No 337035
Fecha Atención: 2023-08-31 09:57:26.0
Fecha Concepto: 2023-08-31 10:56:37.0



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre:	FABIAN CORRALES HERRERA	Documento:	CC 1065585752
F. Nacimiento:	2001-05-14	C. Registro:	CESAR - VALLEDUPAR
Edad:	22	Genero:	M
Estado Civil:	SOLTERO(A)	No. Hijos:	0
Dirección:	MZ 22 CSA 16	Ciudad Res:	CESAR - VALLEDUPAR
Telefono:	3126318782	Telefono Cont:	3234827880
Contacto:	LUZDARIS HERRERA (MAMA)	EPS:	EPS SANITAS - CM
Escolaridad:	NO APLICA (INCOMPLETA)	Ocupación:	VIGILANTE
Empresa:	PARTICULAR		
Emp. Medio:	PARTICULAR		
Ciudad Atención:	CESAR - VALLEDUPAR		

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados
No presenta carnet de vacunación para revisión.

EXAMENES REALIZADOS

Nombre del Examen	Concepto	Recomendaciones
EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL	Limites normales para el perfil del cargo	

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL
CUMPLE CON EL PERFIL DEL CARGO

CONCEPTOS ESPECIFICOS

Sintesis	Concepto
OSTEOMUSCULAR	VALORACION OSTEOMUSCULAR NORMAL

RECOMENDACIONES GENERALES
Autocuidado: Cumplir los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo; Dieta balanceada; Ejercicio Regular; Evite llevarse la boca, ojos y nariz; antes de llevarse las manos. Hábitos de estilo de vida sana; Higiene Postural; Lave y desinfecte frecuentemente objetos y superficies de trabajo.

Firma del Profesional
Nombre: LINA MARCELA RIVERA CASTILLO
Cargo: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
Licencia S... 5136 de 2021 Registro Medico: 1065612469

Firma del Paciente

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerio de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo o desempeñar acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MÉDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clínica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, según lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial medico

Fecha de Impresión: 2023-08-31 10:59 AM
Impreso por: MAYERLIN MARIA LOPEZ RESTREPO

Página 1 de 1

Powered by CamScanner

APREHSI Group

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL DE PREINGRESO

Ingreso No 337359
Fecha Atención: 2023-08-30 10:38:31.0
Fecha Concepto: 2023-08-30 10:57:51.0



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre:	RICARDO JAVIER ROMERO PETIT	Documento:	PE 0284471
F. Nacimiento:	1975-11-08	Lugar Nacimiento:	Venezuela
Edad:	47	Genero:	M
Estado Civil:	CASADO(A)	No. Hijos:	2
Dirección:	DAR 23 34 A 47	Ciudad Res:	CESAR - VALLEDUPAR
Telefono:	3106188027	Telefono Cont:	3107221208
Contacto:	NORIS JIMENEZ (AMIGA)	EPS:	NUEVA EPS S.A
Escolaridad:	BACHILLER (COMPLETA)	Ocupación:	VIGILANTE
Empresa:	PARTICULAR		
Emp. Misión:	PARTICULAR		
Ciudad Atención:	CESAR - VALLEDUPAR		

INMUNIZACIONES Relacion de biológicos aplicados
SARS nCOV2 (2022)

EXAMENES REALIZADOS

Nombre del Examen	Concepto	Recomendaciones
EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL:	Limites normales para el perfil del cargo	

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL
CUMPLE CON EL PERFIL DEL CARGO

CONCEPTOS ESPECIFICOS

Sintesis	Concepto
OSTEOMUSCULAR	VALORACION OSTEOMUSCULAR NORMAL

Morbilidad Preexistente SARS-Cov2 (COVID-19): Sin morbilidad preexistente identificadas como factores de riesgo para COVID - 19
La presente evaluación médica se hace con el fin de evaluar el estado de salud del trabajador posterior al periodo de aislamiento obligatorio. En el momento no presenta ninguna enfermedad o antecedente importante que lo haga susceptible ante el contagio con COVID - 19

Respiratorio SARS-Cov2 (COVID-19): Sin Síntomas Respiratorios Asociados a SARS-Cov2 (COVID-19)
La presente evaluación médica se hace con el fin de evaluar el estado de salud del trabajador posterior al periodo de aislamiento obligatorio, En el momento no presenta ningun signo o síntoma relacionado con COVID - 19

RECOMENDACIONES GENERALES
Autocuidado: Cambio frecuente de posturas; Comportamiento seguro; Cumplir los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo; Dieta balanceada; Ejercicio Regular; Hábitos de estilo de vida sana; Higiene Postural; Pausas activas; Uso de EPP; Uso permanente de lapiceras;

Firma del Profesional
Nombre: RICARDO JAVIER BORREGO DE LA CRUZ
Cargo: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
Licencia S... 3184 Registro Medico: 44 8142010

Firma del Paciente

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. Tambien establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MÉDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clínica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico

Fecha de impresión: 2023-08-30 10:59 AM
Impreso por: MAYERLIN MARIA LOPEZ RESTREPO

Powered by CamScanner

Omnisalud

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

Dando cumplimiento a la Resolución 2346 del Ministerio de Protección Social, a la empresa solo se le entrega el informe con el concepto respectivo y el resultado de los exámenes generados en la consulta.



Nombre de la Empresa		Empresa en Misión		
SECURITY FORCE LTDA				
NIT	Dirección Empresa	Telefono Empresa	Ciudad	
900020118	CR 54 CL 35 47	5613099	Bogota, D.C.	

INFORMACIÓN DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR

Apellidos y Nombres		Documento de Identidad	Edad	Género
CHAMORRO SARIA JESUS ANDRES		CC 1007440526	30 Años	M
Lugar de Nacimiento		Lugar de Residencia		Estado Civil
VALLEDUPAR		Valledupar		SOLTERO
Telefono Fijo		Dirección		Celular
3015757144		MANZ A CASA12		3128953004
Correo Electronico		Grado de Escolaridad		Hemoclasificación
JHOSEPHCHAMORRO@GMAIL.COM		BACHILLER		AB +
IMC		Hijos	EPS	
23.08		0	SANITAS EPS SA	
VACUNACION COVID-19	COVID-19 DOSIS	VACUNA		VACUNA REFUERZO
SI	NO APLICADA	1° NO APLICA 2° NO APLICA		NO APLICA

INFORMACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL

Cargo	Fecha	Hora Ingreso	Hora Inicio Atencion	Hora Salida Atencion
GUARDA DE SEGURIDAD	2023-09-19		09:21:07	10:55:54

Lugar de realizacion examen:	VALLEDUPAR

EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL

Tipo de examen realizado	
PREOCUPACIONAL	
CONCEPTO	TIPO DE RESTRICCIONES
CUMPLE PARA EL CARGO SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO	NO APLICA
MOTIVO	CERTIFICADOS ADICIONALES
NO APLICA	NINGUNO
AREA DE LAS RESTRICCIONES	INGRESO AL PROGRAMA PREVENTIVO
APTITUD DE TAREAS	

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO: SE REALIZA
VISIOMETRIA OCUPACIONAL: SE REALIZA
EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL: SE REALIZA
ENFASIS OSTEOMUSCULAR: SE REALIZA

ANEXOS EXAMENES COMPLEMENTARIOS
VALORACION COMPLEMENTARIA (EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL)
Sin capacidad auditiva en ambos oídos
MEDICAS PERSONALES
Ninguna
CONDUCTAS - (CONDUCTAS RESTRICTIVAS)
Ninguna
CONDUCTAS - (CONDUCTAS PREVENTIVAS)
Ninguna
OBSERVACIONES GENERALES (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)
Cumplir Con Los Procedimientos Definidos Para Desarrollar Su Trabajo. Informar Oportunamente De Los Peligros Identificados En El Trabajo. Participar En Las Actividades Que Se Desarrollen En El Sistema De Gestión Y Seguridad Y Salud En El Trabajo. Desplácese En Forma Segura , si va manejar cargas cumplir Con La Normatividad De Manejo O Manipulación De Cargas, Mantenga Buena Higiene Postural, Ubicando Adecuadamente La Pantalla De Su Monitor. Si Va Estar Expuesto Utilizar Protección Respiratoria Y Auditiva, Utilizar La Dotación Y Los Elementos De Protección Personal Suministrados por El Empleador./ Dar Aviso A Supervisor O Superior Si Sus Condiciones De Salud Se Han Modificados Y Presenta Alguna Limitación O Restricción Para Realizar La Labor
OTRAS OBSERVACIONES
Ninguna
OBSERVACION Y CONCLUSION FINAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)
ENFASIS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA: Este examen Médico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y está enfocado en una revisión, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares extremidades y columna, durante su evaluación no se evidencia patología u sintomatología de origen osteomuscular que pudieran genera limitaciones o riesgo para desempeñar sus funciones laborales
OBSERVACION AREA DE VACUNACION
Durante su evaluación médica ocupacional se realizó revisión de los antecedentes de vacunación, en el momento no cuenta con vacunación para prevención de infección por sars cov-2, se recomienda iniciar y completar el esquema de vacunación contra el covid-19, se indica cumplir con las medidas generales de bioseguridad

CLASIFICACION GATISO OSTEOMUSCULAR: SI	**TIPO:** 1	**GRUPO:** D
EXAMEN MEDICO CON ÉNFASIS	ENFASIS OSTEOMUSCULAR	
INCREARLO AL PVE PREVENTIVO		
REMISION Y CONTROLES POR SU EPS	NINGUNA	
ESTÁ EN CONTROLES CON LA ARL	NO	

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVO A LOS EXAMENES

Las respuestas dadas por mí en este(s) exámenes(os) están completas y son verificadas autorizo a la IPS para que suministre las recomendaciones médicas ocupacionales descritas. Adicionalmente, dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, para retroalimentar los SVE (SISTEMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICOS / programas de salud y se recomienda realizar exámenes ocupacionales anualmente acorde a la matriz de peligro y profesiograma.

Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o otros), dando cumpliendo con la (Resolución 2346 del 2007 Art. 10), y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de las medidas de prevención y control de alteraciones de la salud.

Según lo contemplado en las resoluciones 2346 de: 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009,la resolución 630 del 23 de marzo del 2017 y Decreto 1072/2015 - Artículo 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2 del ministerio de trabajo y salud y protección social, y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen. las evaluaciones médicas ocupacionales tiene como objeto monitorear la exposición a factores de riesgo ocupacional e identificar las posibles alteraciones de la salud temporales, permanentes o secundarias a la labor o por el medio ambiente de trabajo al cual está expuesto el trabajador, y para detectar precozmente enfermedades de origen común agravadas por la exposición a los mismos. Fortaleciendo los sistemas de prevención y promoción de la salud de los trabajadores. Dichas resoluciones hacen énfasis en la confidencialidad de la Historia clínica ocupacional, la reserva profesional de la misma, y el hecho de que dicha información queda bajo nuestra guarda y custodia y solo se obtendrá dicha información bajo los requerimientos legales establecidos por la ley o cuando el trabajador lo demande, solo los certificados médicos serán conocidos por la empresa.

RIVERA RAMOS TATIANA
1065664329
RM: 000299
Firma y sello del médico evaluador

JEISON ANDRES CHAMORRO SANSA
Documento: 1065665526
Firma del trabajador

La información incluida en este concepto es copia fiel de los datos contenidos en la historia clínica ocupacional.

Omnisalud

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

Dando cumplimiento a la Resolución 2346 del Ministerio de Protección Social, a la empresa solo se le enviará el informe con el concepto respectivo y el resultado de los exámenes generados en la consulta.



Nombre de la Empresa		Empresa en Misión	
SECURITY FORCE LTDA			
NIT	**Dirección Empresa**	**Telefono Empresa**	**Ciudad**
900320118	CR 64 CL 35 47	3813099	Bogota, D.C.

INFORMACION DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR

Apellidos y Nombres		Documento de identidad	Edad	Género
GUTIERREZ ESCOBAR ENRIQUE JOSE		CC 7710008	46 Años	M
Lugar de Nacimiento		**Lugar de Residencia**		**Estado Civil**
GUAMAL MAGDALENA		Valledupar		UNION LIBRE
Telefono Fijo		**Direccion**		**Celular**
5726585		CRA 37 #70 54 CENTRO 1ER		3002886723
Correo Electronico		**Grado de Escolaridad**		**Hemoclasificacion**
ENRIQUEGUTIERREZESCOBAR77@GMAIL.COM		BACHILLER		O +
IMC		**Hijos**	**EPS**	
20.9		0	SALUD TOTAL SA EPS	

VACUNACION COVID-19	COVID-19 DOSIS	VACUNA	VACUNA REFUERZO
SI	ESQUEMA COMPLETO CON REFUERZO	1° JANSSEN 2° NO APLICA	JANSSEN

INFORMACION DEL EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

Cargo	Fecha	Hora Ingreso	Hora Inicio Atencion	Hora Salida Atencion
GUARDA DE SEGURIDAD	2023-09-18		08:17:25	10:25:20
Lugar de realizacion examen	VALLEDUPAR			

EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL

Tipo de examen realizado
PREINGRESO

CONCEPTO	TIPO DE RESTRICCIONES
CUMPLE PARA EL CARGO SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO	NO APLICA
MOTIVO	**CERTIFICADOS ADICIONALES**
NO APLICA	NINGUNO
AREA DE LAS RESTRICCIONES	**INGRESO AL PROGRAMA PREVENTIVO**
APTITUD DE TAREAS	

EXAMENES COMPLEMENTARIOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO: SE REALIZA
VISIOMETRIA OCUPACIONAL: SE REALIZA
EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL: SE REALIZA
ENFASIS OSTEOMUSCULAR: SE REALIZA

ANEXOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
VALORACION COMPLEMENTARIA (EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL)
Su capacidad auditiva es adecuada
MEDICAS PERSONALES
Ninguna
CONDUCTAS - (CONDUCTAS RESTRICTIVAS)
Ninguna
CONDUCTAS - (CONDUCTAS PREVENTIVAS)
Ninguna
OBSERVACIONES GENERALES: (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)
Cumplir Con Los Procedimientos Definidos Para Desarrollar Su Trabajo. Informar Oportunamente De Los Peligros Identificados En El Trabajo. Participar En Las Actividades Que Se Desarrollen En El Sistema De Gestión Y Seguridad Y Salud En El Trabajo. Desplazarse En Forma Segura , si va manejar cargas cumple Con La Normatividad De Manejo O Manipulación De Cargas. Mantenga Rutina Higiene Postural, Ubicando Adecuadamente La Pantalla De Su Monitor. Si Va Estar Expuesto Utilizar Protección Respiratoria Y Auditiva, Utilizar La Dotación Y Los Elementos De Protección Personal Suministrados por El Empleador / Dar Aviso A Supervisor O Superior Si Sus Condiciones De Salud Se Han Modificador Y Presenta Alguna Limitación O Restricción Para Realizar La Labor
OTRAS OBSERVACIONES
Ninguna
OBSERVACION Y CONCLUSION FINAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)
ENFASIS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA: Este examen Medico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y está enfocado en una revisión, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares sobreinvolucro y columna, durante su evaluación no se evidencio patología o sintomatología de origen osteomuscular que poderar genera limitaciones o riesgo para desempeñar sus funciones laborales
OBSERVACION AREA DE VACUNACION
Durante su evaluación médico ocupacional se realizó revisión de los antecedentes de vacunación, en el momento cuenta con esquema de vacunación completo para prevención de infección por sars cov-2; debe seguir tomando las medidas preventivas; cumpliendo con las medidas generales de bioseguridad

CLASIFICACION GATISO OSTEOMUSCULAR: SI	TIPO: 1	GRUPO: A
EXAMEN MEDICO CON ÉNFASIS	ENFASIS OSTEOMUSCULAR	
INCREARLO AL PVE PREVENTIVO		
REMISION Y CONTROLES POR SU EPS	NINGUNA	
ESTA EN CONTROLES CON LA ARL	NO	

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVO A LOS EXAMENES

Las respuestas dadas por mí en este(s) examenes(os) están completas y son verificadas autorizo a la IPS para que suministre las recomendaciones médicas ocupacionales derivadas. Adicionalmente, dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, para retroalimentar los SVE (SISTEMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICOS / programas de salud y se recomienda realizar exámenes ocupacionales anualmente acorde a la matriz de peligro y profesiograma.

Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o otros), dando cumpliendo con la (Resolución 2346 del 2007 Art. 10), y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de las recomendaciones de prevención y control de alteraciones de la salud.

Según lo contemplado en las resoluciones 2346 de: 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009,la resolución 630 del 23 de marzo del 2017 y Decreto 1072/2015 - Artículo 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2 del ministerio de trabajo y salud y protección social, y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen. las evaluaciones médicas ocupacionales tiene como objeto monitorear la exposición a factores de riesgo ocupacional e identificar las posibles alteraciones de la salud temporales, permanentes o secundarias a la labor o por el medio ambiente de trabajo al cual está expuesto el trabajador, y para detectar precozmente enfermedades de origen común agravadas por la exposición a los mismos. Fortaleciendo los sistemas de prevención y promoción de la salud de los trabajadores. Dichas resoluciones hacen énfasis en la confidencialidad de la Historia clínica ocupacional, la reserva profesional de la misma, y el hecho de que dicha información queda bajo nuestra guarda y custodia y solo se obtendrá dicha información bajo los requerimientos legales establecidos por la ley o cuando el trabajador lo demande, solo los certificados médicos serán conocidos por la empresa.

Bryder Gutierrez

Tatiana Rivera

RIVERA RAMOS TATIANA
1067564329
RM: 000299
Firma y sello del médico evaluador

ENRIQUE JOSE GUTIERREZ ESCOBAR
Documento: 7738068
Firma del trabajador

La información incluida en este concepto es copia fiel de los datos contenidos en la historia clínica ocupacional.

Omnisalud

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

Dando cumplimiento a la Resolución 2346 del Ministerio de Protección Social, a la empresa solo se le enviará el informe con el concepto respectivo y el resultado de los exámenes generados en la consulta.

Nombre de la Empresa		Empresa en Misión		
SECURITY FORGE LTDA				
NIT	Dirección Empresa	Teléfono Empresa	Ciudad	
900320118	CR 64 CL 35 47	3813099	Bogota, D.C.	

INFORMACIÓN DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR

Apellidos y Nombres	Documento de Identidad	Edad	Género
GUTIERREZ SANTIAGO JOSE ALBERTO	CC 1122869481	29 Años	M
Lugar de Nacimiento	**Lugar de Residencia**		**Estado Civil**
SAN JUAN DEL CESAR	Valledupar		SOLTERO
Teléfono Fijo	**Dirección**		**Celular**
5154357674	DIAGONAL 18E #25A-25 LOS FUNDADORES		3208272742
Correo Electrónico	**Grado de Escolaridad**		**Hemoclasificación**
JOSEALBERTOGUTIERREZSANTIAGO@GMAIL.COM	BACHILLER		A+
IMC	**Hijos**	**EPS**	
20.91	0	SANITAS EPS SA	

VACUNACION COVID-19	COVID-19 DOSIS	VACUNA	VACUNA REFUERZO
SI	SEGUNDA DOSIS	1° ASTRAZENECA 2° ASTRAZENECA	NO APLICA

INFORMACIÓN DEL EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

Cargo	Fecha	Hora Ingreso	Hora Inicio Atencion	Hora Salida Atencion
QUIMICA DE INGENIERIA	2023-09-18		08:07:28	10:25:50
Lugar de realización examen	VALLEDUPAR			

EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL

Tipo de examen realizado	
PREINGRESO	
CONCEPTO	**TIPO DE RESTRICCIONES**
CURABLE PARA EL CARGO SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO	NO APLICA
MOTIVO	**CERTIFICADOS ADICIONALES**
NO APLICA	NINGUNO
AREA DE LAS RESTRICCIONES	**INGRESO AL PROGRAMA PREVENTIVO**
APTITUD DE TAREAS	

EXAMENES COMPLEMENTARIOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO: SE REALIZA
EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL: SE REALIZA
VISIOMETRIA OCUPACIONAL: SE REALIZA
ENFASIS OSTEOMUSCULAR: SE REALIZA

ANEXOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
VALORACION COMPLEMENTARIA (EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL)
Su capacidad auditiva es adecuada
MEDICAS PERSONALES
Se informa asistir a controles preventivos por el medico u especialista tratante (cirujano General) para definir conducta a seguir.
CONDUCTAS - (CONDUCTAS RESTRICTIVAS)
Ninguna
CONDUCTAS - (CONDUCTAS PREVENTIVAS)
Ninguna
OBSERVACIONES GENERALES: (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)
Cumplir Con Los Procedimientos Definidos Para Desarrollar Su Trabajo. Informar Oportunamente De Los Peligros Identificados En El Trabajo. Participar En Las Actividades Que Se Desarrollen En El Sistema De Gestión Y Seguridad Y Salud En El Trabajo. Desplazarse En Forma Segura , si va manejar cargas cumple Con La Normatividad De Manejo O Manipulación De Cargas. Mantenga Rutina Higiena Postural, Ubicando Adecuadamente La Pantalla De Su Monitor. Si Va Estar Expuesto Utilizar Protección Respiratoria Y Auditiva, Utilizar La Dotación Y Los Elementos De Protección Personal Suministrados por El Empleador / Dar Aviso A Supervisor O Superior Si Sus Condiciones De Salud Se Han Modificador Y Presenta Alguna Limitación O Restricción Para Realizar La Labor
OTRAS OBSERVACIONES
Ninguna
OBSERVACION Y CONCLUSION FINAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)
ENFASIS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA: Este examen Medico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y está enfocado en una revisión, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares sobreinstalados y columna, durante su evaluación no se evidencio patología o sintomatología de origen osteomuscular que poderar genera limitaciones o riesgo para desempeñar sus funciones laborales
OBSERVACION AREA DE VACUNACION
Durante su evaluación médico ocupacional se realizó revisión de los antecedentes de vacunación, en el momento cuenta con esquema de vacunación completo para prevención de infección por sars cov-2; debe seguir tomando las medidas preventivas; cumpliendo con las medidas generales de bioseguridad

CLASIFICACION GATISO OSTEOMUSCULAR: SI	**TIPO:** 1	**GRUPO:** C
EXAMEN MEDICO CON ÉNFASIS	ENFASIS OSTEOMUSCULAR	
INCREARLO AL PVE PREVENTIVO		
REMISION Y CONTROLES POR SU EPS	CIRUGIA GENERAL	
ESTÁ EN CONTROLES CON LA ARL	NO	

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVO A LOS EXAMENES

Las respuestas dadas por mí en este(s) exámenes(os) están completas y son verificadas autorizo a la IPS para que suministre las recomendaciones médicas ocupacionales derivadas. Adicionalmente, dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, para retroalimentar los SVE (SISTEMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICOS / programas de salud y se recomienda realizar exámenes ocupacionales anualmente acorde a la matriz de peligro y profesiograma.

Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o otros), dando cumpliendo con la (Resolución 2346 del 2007 Art. 10), y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de las recomendaciones de prevención y control de alteraciones de la salud.

Según lo contemplado en las resoluciones 2346 de: 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009,la resolución 630 del 23 de marzo del 2017 y Decreto 1072/2015 - Artículo 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2 del ministerio de trabajo y salud y protección social, y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen. las evaluaciones médicas ocupacionales tiene como objeto monitorear la exposición a factores de riesgo ocupacional e identificar las posibles alteraciones de la salud temporales, permanentes o secundarias a la labor o por el medio ambiente de trabajo al cual está expuesto el trabajador, y para detectar precozmente enfermedades de origen común agravadas por la exposición a los mismos. Fortaleciendo los sistemas de prevención y promoción de la salud de los trabajadores. Dichas resoluciones hacen énfasis en la confidencialidad de la Historia clínica ocupacional, la reserva profesional de la misma, y el hecho de que dicha información queda bajo nuestra guarda y custodia y solo se obtendrá dicha información bajo los requerimientos legales establecidos por la ley o cuando el trabajador lo demande, solo los certificados médicos serán conocidos por la empresa.

RIVERA RAMOS TATIANA
1067984329
RM: 000299
Firma y sello del médico evaluador

JOSE ALBERTO GUTIERREZ SANTIAGO
Documento: 1122398146
Firma del trabajador

La información incluida en este concepto es copia fiel de los datos contenidos en la historia clínica ocupacional.

NIT: 900933659

DIRECCION:
Calle 168 N° 19-54 BARRIO. DANGON
TEL: 6797972 CEL: 301 4503792
VALLEDUPAR-CESAR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN



Ciudad: Valledupar-Cesar Fecha: 29-ago.-22
Paciente: DUBER DONADO VILLAFAÑE
Fecha nacimiento: 1/01/1992 Edad: 30 Años 7 Meses y 28 Días
Estado Civil: UNIÓN LIBRE N° Documento: 1067698870 Tipo: CC
Teléfonos: 3113145349 Dirección: VALENCIA DE JESUS
Nombre de la empresa: RAMON ASCANIO ROCHA
Cargo: OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

TIPO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL: INGRESO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

EXAMENES REALIZADOS:
EXAMEN MEDICO OSTEOMUSCULAR CON ENFASIS EN MAQUINARIA PESADA :NORMAL

RECOMENDACIONES AUDIOMETRÍA:
NORMAL
CONTROL ANUAL

RECOMENDACIONES ESPIROMETRÍA:
N.R

RECOMENDACIONES EVALUACIÓN VISUAL:
NORMAL
CONTROL ANUAL

RECOMENDACIONES MEDICAS:
VALORACION POR NUTRICION
ESTILO DE VIDA SALUDABLE
ACTIVIDAD FISICA
USO DE EPP
HIGIENE POSTURAL
MANEJO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19
CONTROL MEDICO ANUAL

REMISIÓN:
Apto para Trabajo en alturas: SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☒

Concepto de Aptitud: APTO CON PATOLOGIA MODIFICABLE CON ESTILO DE VIDA SALUDABLES

Katia Perez D.

Nombre : KATIA VANETH PEREZ GONSINGUEZ
Especialidad : MEDICINA OCUPACIONAL
Licencia S.O. : [illegible]

Nombre : DUBER DONADO VILLAFAÑE
N° y Tipo Documento : CC 1067698870



MARSHALS SERVICE LTDA.

ACADEMIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CERTIFICA QUE:

GUTIERREZ ESCOBAR ESNEIDER JOSE

VIGILADO SUPERVIGILANCIA


DIRECTORA GENERAL

DIRECTORA ACADEMICA

ACASEP

CAMARA


República de Colombia
Ministerio de Defensa Nacional
AESS
FABIAN CORRALES HERRERA
FUNDAMENTACION DE VIGILANCIA
AESS

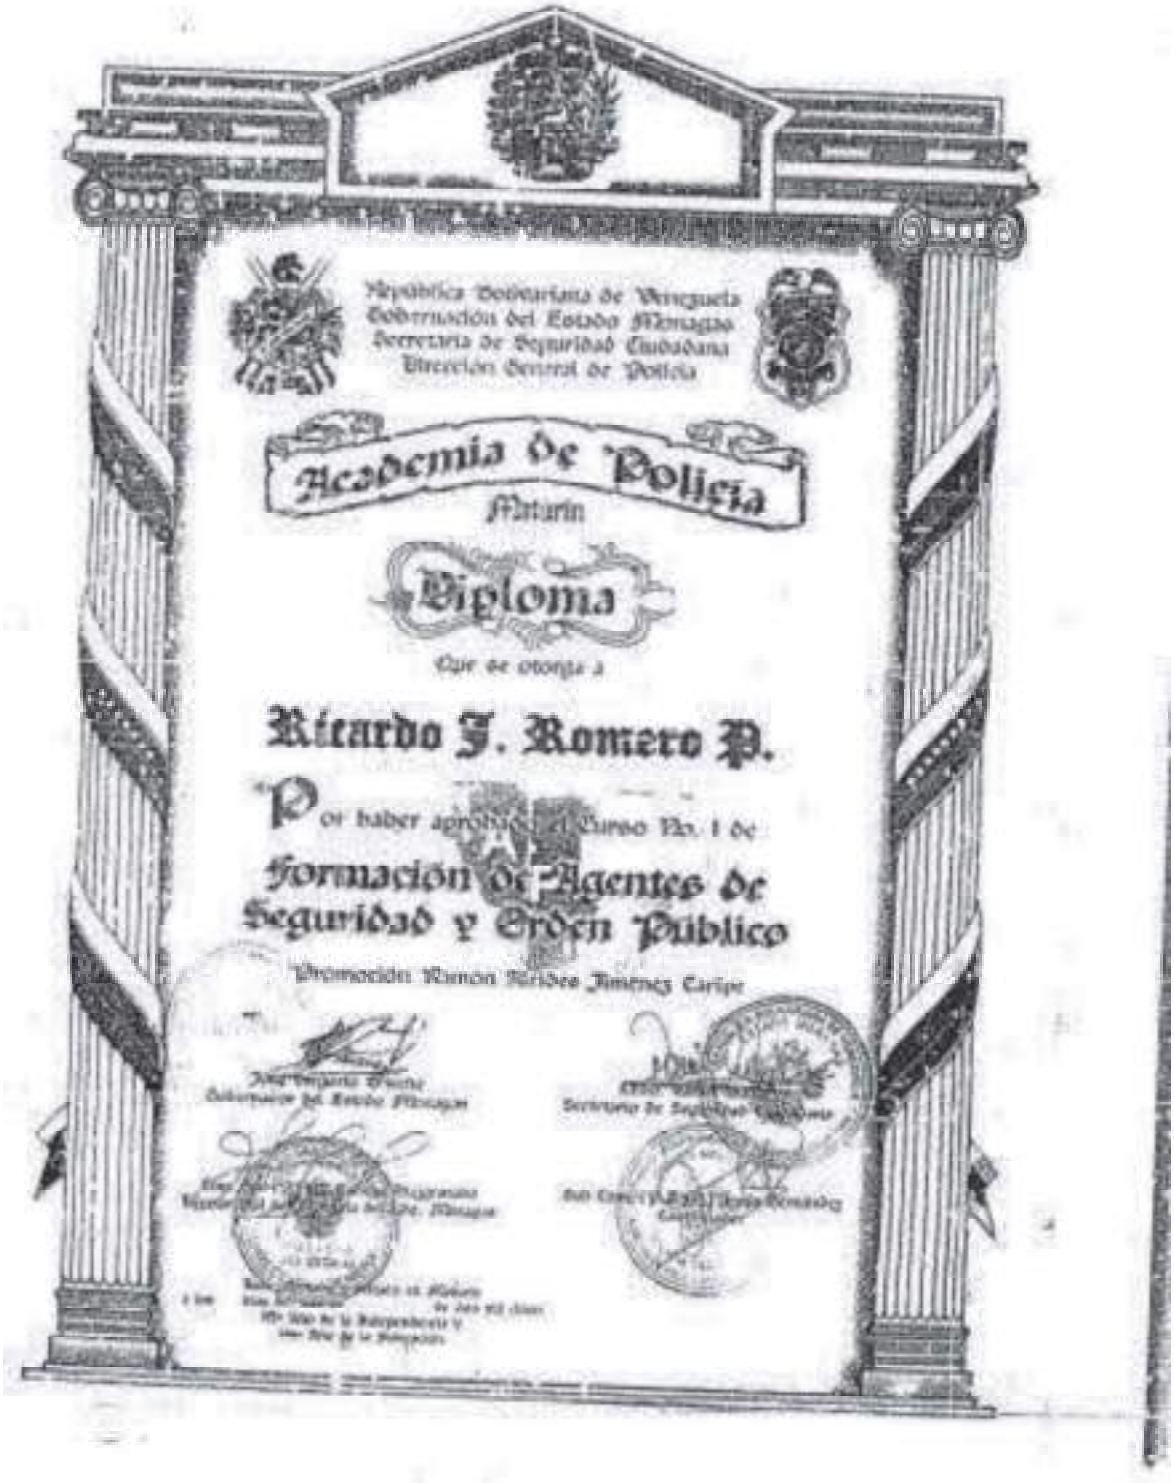

República Bolivariana de Venezuela
Gobernación del Estado Monagas
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Dirección General de Policía

Academia de Policía
Maturín

Diploma

Que se otorga a

Ricardo J. Romero P.

Por haber aprobado el Curso Básico de
Formación de Agentes de
Seguridad y Orden Público

Promoción Ramón Muñoz Jiménez Caripe



República de Colombia

Ministerio de Defensa Nacional Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESCUELA DE CAPACITACIÓN EN VIGILANCIA PRIVADA

ANTORCHA LTDA.

NIT. 900.994.890-8

Licencia de funcionamiento según Resolución No. 20204400014277 del 19/04/2020

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Ministerio de Defensa

CERTIFICA QUE:

JEISON ANDRES CHAMORRO SARIA

Con cédula de ciudadanía N° 1.065.640.586 de Valledupar

Asistió y aprobó el curso de:

REENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA

Expedida en la ciudad de Valledupar el 28 de abril 2023

Con una intensidad teórica de 30 horas

NBO ECSP3014-E506570 NCI-016570

CHRISTIAN RODRIGUEZ
Director General

MARLENY ZAMBRANO
Director Academico

El presente Certificado solo es valido con la firma y el sello seco.

Dirección: Calle 16 C No. 21 - 27 Barrio Dangond - Tel. 580 5717 - Cel. 311 404 2579 - 317 397 8967 - 314 5[illegible]

E-mail: secretaria@escueladeseguridadantorcha.com pagina web: www.escueladeseguridad[illegible]



MARSHALS SERVICE LTDA.

Nit. 830083378-5

ACADEMIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Resolución de Aprobación Licencia de Funcionamiento 46777 del 12-09-2020 hasta 2029

Resolución de Aprobación P.E.I.S 014684-053487 de 2022

MARSHALS SERVICE LTDA

CERTIFICA QUE:

GUTIERREZ ESCOBAR ESNEIDER JOSE

Cédula de Ciudadanía No 77.185.068

Asistió al: CURSO REENTRENAMIENTO VIGILANCIA

Con una Capacitación de 50 Horas.

VIGILADO SUPERVIGILANCIA

VBO 6ACSP1124-021736T

Terminación del Curso: 23-05-2023 Acta No 978

DIRECTORA GENERAL

DIRECTORA ACADEMICA

PARA VERIFICAR AUTENTICIDAD COMUNIQUESE AL

CEL: 311 229 1976 - 310 774 6861 - FIJO: 772 1547

AVENIDA PASTRANA KRA 19 No. 26-40 BARRIO SIMON BOLIVAR

MARSHALS SERVICE LTDA

ACASEP

CAMARA



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015

otorga

Certificado de Competencia Laboral a

OLBER DONADO VILLAFAÑE

Con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1065639870

Quien demostró su Competencia Laboral en la

Norma

Operar maquinaria pesada de acuerdo con manual del fabricante y tipo de labor / Excavadora hidráulica - NIVEL AVANZADO

Código: 270101126 - Versión: 1

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en MOSQUERA. A los veintidós (22) días del mes de Junio de dos mil veintitres (2023)

Firmado Digitalmente por



1597732 - 22/06/2023
No Y FECHA REGISTRO

NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO
Subdirector CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA
REGIONAL CUNDINAMARCA

Vigencia:
hasta el 22 de Junio de 2026


La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 951065639870C

Versión: 01		
Fecha: 19/04/2021	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interna		

PROYECTO:	Consorcio obras Judiciales				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Inducción SST. Política SST, Política de alcohol y drogas, Reglamento de higiene y SST, notificación de Riesgo, evaluación SST.				
TIPO DE ACTIVIDAD:		CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo			DURACIÓN:	1 Hora
FECHA:	01-09-2023			LUGAR:	Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Fabian Corrales R.	1065595702	Securitélite	Fabian Corrales
2	Ricardo Romero	6084471	Securitélite	Ricardo Romero
3	Eneider Gutierrez	77185068	Securitélite	Eneider Gutierrez

OBSERVACIONES

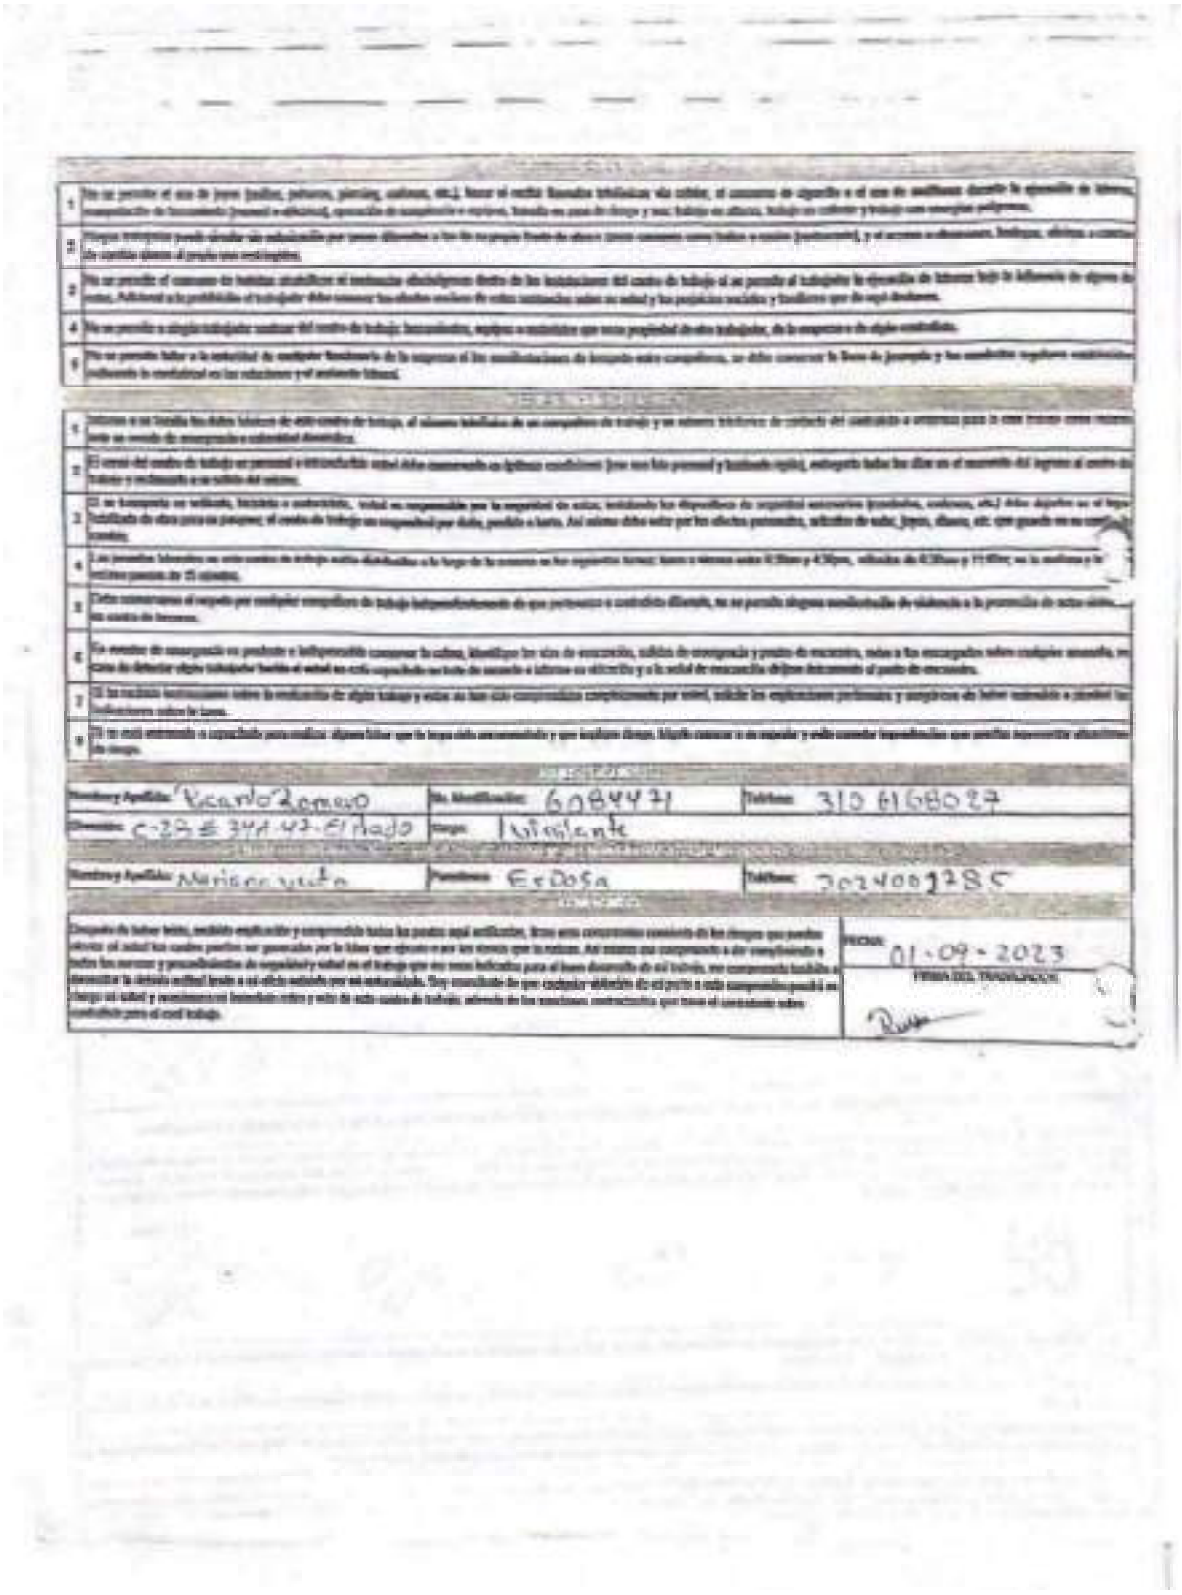

2.

Versión: 01
Fecha: 25/03/2021
Clasificación: Interna

NOMBRE: Ricardo Romero CÉDULA: 6084471

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a. Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b. Proteger y promover la salud
c. Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X d. Todas las anteriores

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

a. Política SST
b. Política de alcohol y tabaquismo
c. Política de Calidad
X d. Todas las anteriores

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

a. Quemadura — X d. Lesiones osteomusculares — X g. Caídas del mismo nivel
X b. Fracturas - Esguinces — e. Pérdida de peso — h. Todas las anteriores
X c. Cuerpo extraño en ojos — X f. Mareos — i. a, b, d

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

1) USO EPP
2) Inspeccion de Elementos de trabajo
3) asistir capacitaciones
4) Inspecciones area asignada

5. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X a. Protección auditiva — e. Camisa bajol — i. X Casco
X b. Botas de seguridad con puntera — f. Respirador de doble cartucho — j. X Camisa manga larga
X c. Tapabocas — g. Guantes plásticos — k. X Gafas de protección / Caps
d. Guantes de carnaza / Dieléctrico — h. Guantes de nitrilo — l. X Gafas de seguridad

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarlo en obra:

Informar al SST

7. Marque con un X los tipos de comité que existen en la Organización

a. X Comité Paritario de Salud — d. Comité de Convivencia
b. Comité de tareas y respons
c. X Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

8. Marque con un X las prohibiciones

a. Utilización de joyas y relojes — d. Laborar sin EPP
b. Llegar en estado de embriaguez — e. No portar identificación
c. Consumir sustancias alucinógenas — f. X c, b, d

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo

a. Trabajos en Caliente
b. Trabajos con energías peligrosas
c. Trabajo en alturas
d. X Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo

a. Utilización de taladro, cortadora o pulidora
b. Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente
c. Ninguna
d. X Respuesta a y b

OBSERVACIONES:

Firma del Trabajador
No. Identificación 6084471

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Erneiber Gutierrez Escobar portador de la cedula de ciudadanía 77185068 desempeñando el cargo de Guarda de Seguridad he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual; guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras Blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

Versión 02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo Cumplimiento de las señales de tránsito
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Erneider Gutierrez

Firma: Erneider Gutierrez Fecha: 07-09-2023

Fecha: 01-09-2023 | Nombre y Apellido: Esneider Gutierrez | Contratista: Security Elite

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, Opera a través de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometida con llevar a cabo sus procesos de manera que proteja la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, al mismo tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, mejorando continuamente sus procesos por ello la gerencia se compromete a asignar los recursos necesarios para ejecutarse y cumplirse

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete a la gestión de riesgo laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a todo nivel en la Organización a través del cuidado de la integridad física, la protección y la promoción de la salud de nuestros equipos de trabajo, contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral; es nuestro carácter de trabajo, implementado y estableciendo los mejores cumbres el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas orientados al autocuidado, mejoramiento de condiciones, los accidentes, enfermedades laborales.
Somos conscientes de los impactos que genera nuestra labor y es por esto que Consorcio obras judiciales promueve en sus colaboradores la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: Es un permiso el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, solicitudes, o durante la realización de equipos, movilización y horarios de los clientes. De igual manera, no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo síntomas de embriaguez o bajo efectos de drogas de tipo alucinógenos, Asimismo la compañía se compromete a la presente política efectuara pruebas aleatorias de alcoholemia.

Todos los trabajadores que ingresen a la empresa se deben contar registro y cumplimiento legal con afiliaciones al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluya administradora de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que sabol labora realizar los aportes mensuales al sistema, descontando a todos los porcentajes establecidos en la ley.


Un accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, sea dentro del lugar y horas de trabajo.
El accidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe directo y al residente SST del proyecto, quien le dirá en que ARL está afiliado de acuerdo a la afiliación realizada por su patrón, en el caso de los contratistas.

Al interior de la organización se han conformado un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que se encargara de vigilar el desarrollo del que hay y participar de actividades que busquen mejorar las seguridad en el trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores; actividades como inspecciones, capacitaciones, investigación de accidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conducta de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, que dentro de sus funciones conocerán conflictos de convivencia suscitados al interior de la Organización, los denuncias no pueden ser anónimas.

Cualquier incumplimiento o falta a las normas de seguridad en el trabajo o asistencia a la actividades en este documento por parte del trabajador es incumplimiento al compromiso que se pacta desde el momento de su firma y acarreara su caso de sanciones.

1	El uso del casco de protección para la cabeza dentro de este centro de trabajo es permanente y obligatorio. Bajo ninguna circunstancia se permite usar dotajo de este elementos diferentes a los que la integran (gorras, gafetines, viseras, etc.).
2	El uso de los elementos de protección personal para ojos, oídos, respiratorios y orales es obligatorio, al igual que el uso de elementos contra quemaduras, caídas o caídas de trabajo. Los tipos de elementos dependerán de la labor que se ejecute en el ambiente dentro del cual se desarrollan los labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de la dotación apropiada y los elementos de protección personal adecuados; así mismo responsabilidad del trabajador es su uso debido y cuidado necesario para garantizar la efectividad de la protección que proporcionan. 
3	Los zonas de trabajo deben permanecer en correcto orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor usted debe velar por el aseo del área de trabajo y el orden en material e equipo utilizado.
4	Todo trabajo que se ejecute y que tenga riesgo de caída por encima de 2.0 metros, en de trabajo en altura para realizarlo es necesario tener el certificado en trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas o inspector SST. (Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas) es responsabilidad del trabajador y del coordinador tener el correspondiente permiso de trabajo, tener correcto uso de los elementos y equipos de protección personal requeridos para el desarrollo de la labor así como el cuidado de plataformas y andamios. 
5	Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior encargado, al encargado general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para brindarle la atención oportuna y seguir el debido procedimiento
6	Todo trabajador debe notificar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeña o en la que vea ejecutada por otra persona y que pueda generar sobre salud o sobre los demás trabajadores cerca en la salud.
7	Todo trabajador debe permanecer atento y cumplir todo lo establecido durante su labor; uso de elementos de protección personal, rutas de evacuación, señales de emergencia, punto de encuentro, zonas de cargue y descargue de materiales, puntos restringidos, cordones de cinta en zonas de riesgo, entrenamiento, equipos de emergencia (botiquines), encerramientos, etc.
8	Todo herramienta eléctrica que utilice disco de corte, equipo que cuente con transmisión de poleas o equipo con acoples por yoga debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiera como guardas de disco, guardas de poleas, bandas, etc. si en el trabajo con pobleros, contadores, planos, ramas, aseguras, alimentos, transporte, etc. social detectar la falta de este dispositivos, debe notificar inmediatamente a su encargado, al encargado general o al inspector

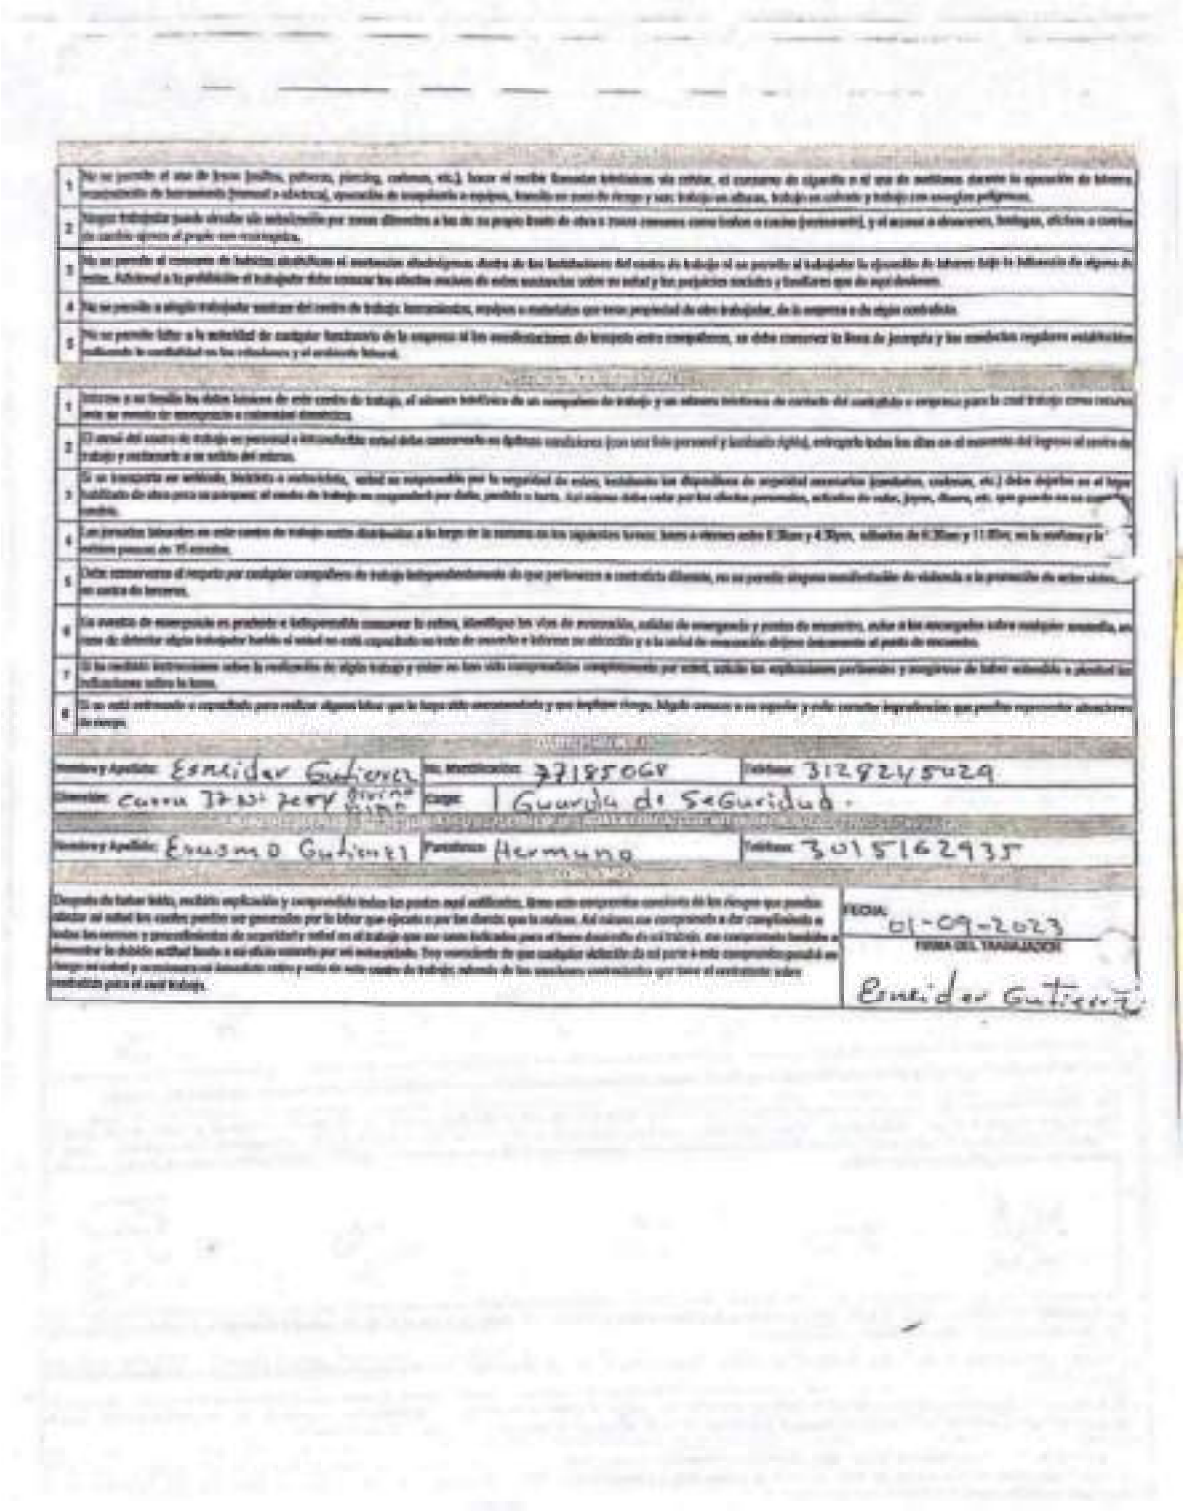

1	
2	
3	
4	
5	

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	


Nombres y Apellidos:	Esneider Gutierrez	No. Identificación:	77185068
Dirección:	Carrera 72 B # 70 B 49 Sur	Cargo:	Guardia de Seguridad.
Nombres y Apellidos:	Erasmo Gutierrez	Parentesco:	Hermano
		Teléfono:	3015162935

Después de haber leído, recibido explicación y comprendido todos los puntos aquí indicados, firmo este compromiso consciente de los riesgos que pueden afectar mi salud los cuales pueden ser generados por la labor que ejecuto o por los diversos que lo rodean. Así mismo me comprometo a dar cumplimiento a todas las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que me sean indicados para el buen desarrollo de mi labor. me comprometo también a demostrar la debida actitud hacia a mi oficio asignado por mi empleador. Soy consciente de que cualquier violación de mi parte a este compromiso generará un riesgo mi salud y en consecuencia mi inmediato retiro y retiro de este cuadro de trabajo, relevando de las anteriores consideraciones que tiene el contratante sobre condiciones para el cual trabajo.

FECHA: 01-09-2023

FIRMA DEL TRABAJADOR

Esneider Gutierrez

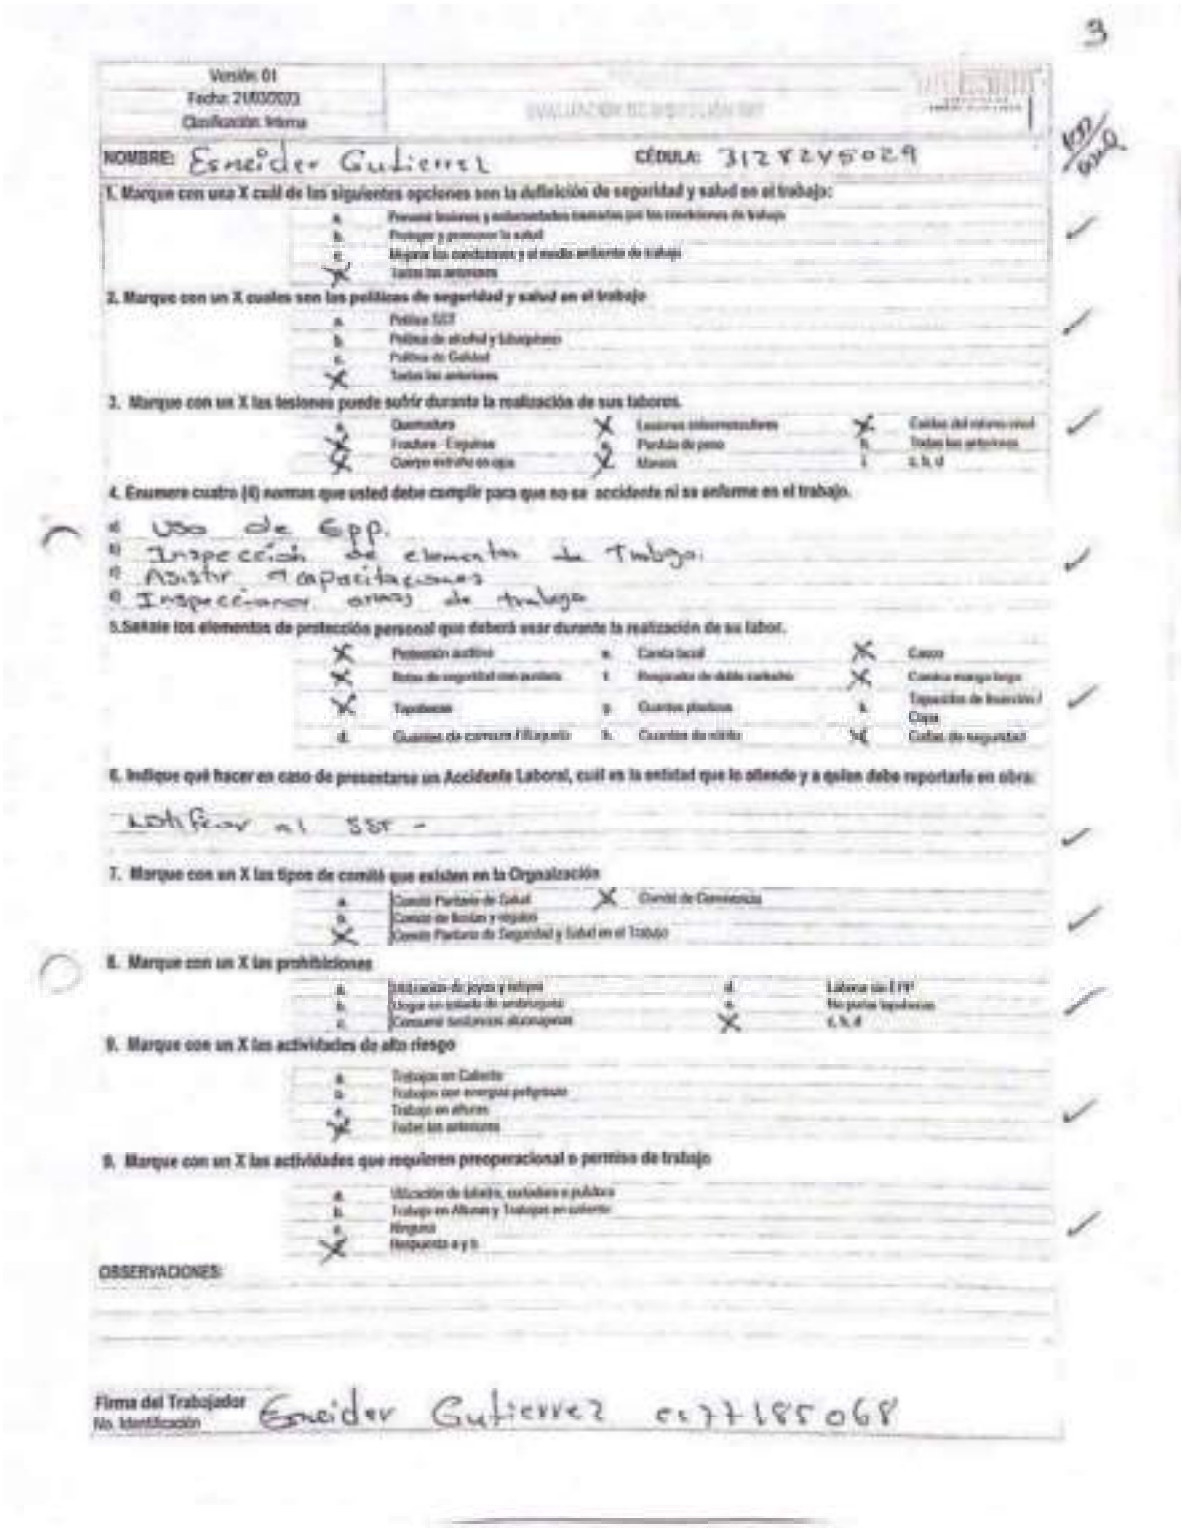

3

Versión: 01
Fecha: 21/03/2023
Clasificación: Interna

NOMBRE: Eneider Gutierrez CÉDULA: 3128295029

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:
   - a. Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
   - b. Proteger y promover la salud
   - c. Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
   - X Todas las anteriores

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo
   - a. Política SST
   - b. Política de alcohol y tabaquismo
   - c. Política de Calidad
   - X Todas las anteriores

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.
   - a. Quemaduras — X Lesiones osteomusculares — X Caídas del mismo nivel
   - X Fractura - Esguinces — g. Perdida de peso — h. Todas las anteriores
   - X Cuerpo extraño en ojos — X Mareos — i. a, b, d

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.
   a) Uso de Epp.
   b) Inspección de elementos de Trabajo.
   c) Asistir a capacitaciones
   d) Inspeccionar arnes de trabajo

5. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.
   - X Protección auditiva — e. Gorra facial — X Casco
   - X Botas de seguridad con puntera — f. Respirador de doble cartucho — X Careta manga larga
   - X Tapabocas — g. Guantes plásticos — k. Tapaoidos de inserción / Copa
   - d. Guantes de carnaza / Hilaza — h. Guantes de nitrilo — X Gafas de seguridad

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarlo en obra:
   Informar al SST -

7. Marque con un X los tipos de comité que existen en la Organización
   - a. Comité Paritario de Salud — X Comité de Convivencia
   - b. Comité de Bodega y seguro
   - X Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

8. Marque con un X las prohibiciones
   - a. Utilización de joyas y relojes — d. Laborar sin EPP
   - b. Ingerir en estado de embriaguez — e. No portar herramientas
   - c. Consumir sustancias alucinógenas — X a, b, d

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo
   - a. Trabajos en Caliente
   - b. Trabajos con energías peligrosas
   - c. Trabajo en alturas
   - X Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren precperacional o permiso de trabajo
   - a. Utilización de taladro, cortadora o pulidora
   - b. Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente
   - c. Ninguna
   - X Respuesta a y b

OBSERVACIONES:

Firma del Trabajador: Eneider Gutierrez
No. Identificación: 1.077185068


Versión: 01 Fecha: 15/04/2023 Clasificación: Interna	FORMATO ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Construcción nueva Torre palacio de justicia				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Reinducción, notificación de riesgos, política SST, política de alcohol y drogas, Reglamento de higiene y seguridad, inducción, evaluación de inducción, notificación Restricciones medicas.				
TIPO DE ACTIVIDAD:		CHARLA DE SEGURIDAD	/	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo			DURACIÓN:	1 Hora
FECHA:	13/09/23			LUGAR:	palacio de justicia


No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Duvan Peralta	1065833582	Consorcio	Duvan

OBSERVACIONES

Trabajador Duvan Peralta identificado con cedula N° 1065833582 se le realiza reinducción para ingreso a obra se le notifica restricción medica. Se le informa que solo debe transitar por el area de las oficinas y el pasillo del mismo. Se le prohibe ingresar a campo por las condiciones locativas en caso de hacer caso omiso es su responsabilidad. Duvan

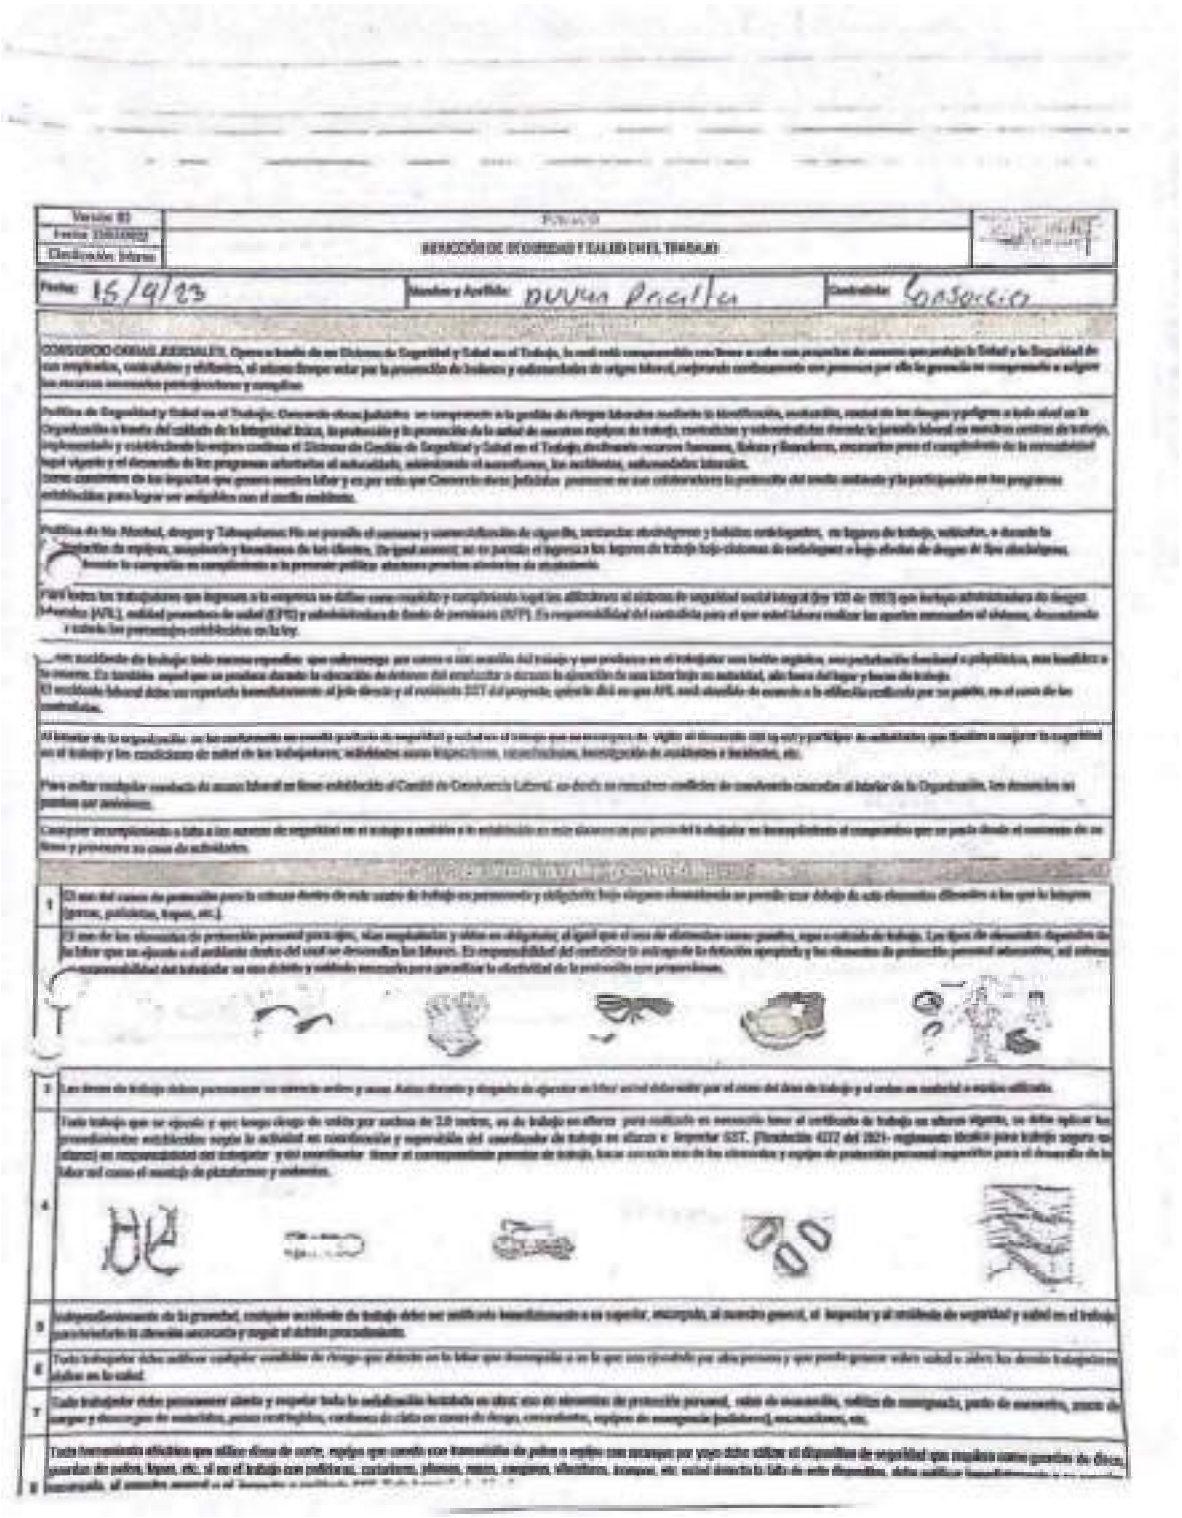

Fecha: 15/9/23 — Nombre y Apellido: DUVAN PRADILLA — Contratista: CONSORCIO

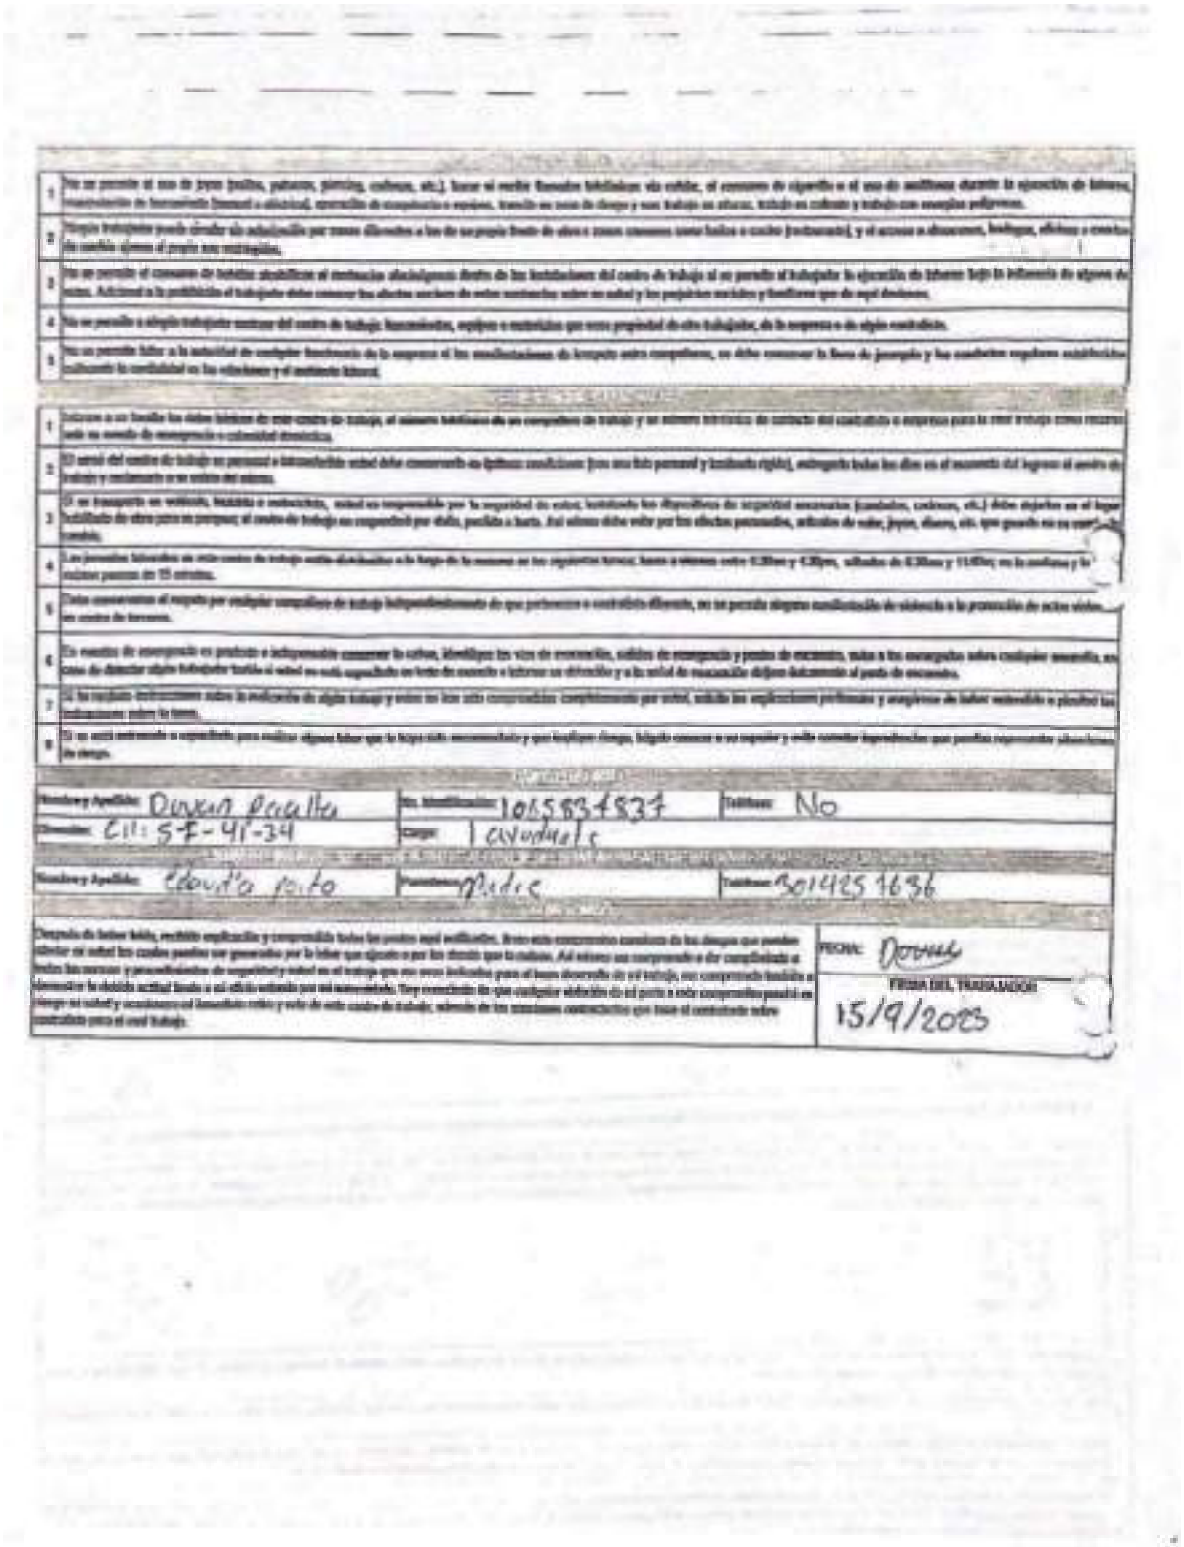

1	
2	
3	
4	
5	

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Nombre y Apellido: Dixsan Peralta	No. Identificación: 1015834837	Teléfono: No
Dirección: Cll: 5F-41-34	Cargo: Ayudante	
Nombre y Apellido: Eduardo Soto	Parentesco: Padre	Teléfono: 3014251636

	FECHA: Domingo
	FIRMA DEL TRABAJADOR: 15/9/2023

Versión:02
Fecha: 22/07/2022
Clasificación: Interno

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Conforme a lo expuesto yo, Fabian Camilo Moreno portador de la cedula de ciudadanía 1026595709 desempeñando el cargo de Guarda de seguridad he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánicos	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
	Virus	
	Bacterias	
	Hongos	
Biológico	Rickettsias	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI.
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en casa de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras físicas (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No comer dentro del lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interna		

Conforme a lo expuesto yo, Duvan [illegible] Soto, portador de la cedula de ciudadanía 1065831582 desempeñando el cargo de Ayudante, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	El oidor ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipo adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras Aislado (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Presión anormal (hiperbárica)	

Versión:02 Fecha: 22/07/2022 Clasificación: Interna	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que dispongan de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: - Dayan Peralta Pacheco

Firma: -Dayan-

Fecha: 15/9/2022

Versión: 01
Fecha: 21/03/2023
Clasificación: Interna

NOMBRE: Devan Pineda CÉDULA: 1065531582

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a. Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b. Proteger y promover la salud
c. Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X d. Todas las anteriores

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

a. Política SST
b. Política de alcohol y tabaquismo
c. Política de Calidad
X d. Todas las anteriores

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

a.	Quemadura	d.	Lesiones osteomusculares	g.	Caídas del mismo nivel
b.	Fracturas - Esguinces	e.	Pérdida de pares	h.	Todas las anteriores
X c.	Cuerpo extraño en ojos	f.	Mareos	i.	a, b, d

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) Usar EPP
b) Inspección área
c) Inspección área de trabajo
d) Cuidado a charlas

5. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a.	Protección auditiva	e.	Careta facial	i.	Casco
X b.	Botas de seguridad con puntera	f.	Respirador de doble cartucho	X j.	Camisa manga larga
c.	Tapabocas	g.	Guantes plásticos	k.	Tapones de inserción / Copa
d.	Guantes de carnaza / Baquetá	h.	Guantes de nitrilo	l.	Gafas de seguridad

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarlo en obra:

Notificar al SST _ ArlColmena

7. Marque con un X los tipos de comité que existen en la Organización

a.	Comité Paritario de Salud	X	Comité de Convivencia
b.	Comité de Rentas y regalos		
X c.	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo		

8. Marque con un X las prohibiciones

a.	Ubicación de armas y mirones	d.	Laborar sin EPP
b.	Llegar en estado de embriaguez	e.	No portar tapabocas
c.	Consumir sustancias alucinogenas	X	c, b, d

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo

a. Trabajos en Caliente
b. Trabajos con energías peligrosas
c. Trabajo en alturas
X d. Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo

a. Utilización de taladro, cortadora o pulidora
b. Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente
c. Ninguna
X d. Respuesta a y b

OBSERVACIONES:

Devan
Firma del Trabajador
No. Identificación 1065534582

Versión: 1.0	Formato	
Fecha: 21/04/2023	RECOMENDACIONES MEDICAS OCUPACIONALES	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Clasificación: Interna		

Valledupar, 15 de Septiembre de 2023

Señor: DUVAN ENRIQUE PERALTA PORTO
Numero D.I. (C.C): 1065837582
Cargo: Ayudante de obra

Tipo de Examen Médico: Post incapacidad

A partir de dicho documento en donde se especifican las recomendaciones y restricciones médicas ocupacionales para que usted pueda desarrollar sus labores son:

Recomendaciones:

- Higiene postural estilo de vida saludable dieta y ejercicio extremar medida de bioseguridad.
- Pausas activas cada 2 hrs.
- Control por ortopedia control por EPS.

Restricciones laborales:

- Evitar subir y bajar escaleras.
- Evitar levantamiento de peso > 5 kg.
- Evitar permanecer mucho tiempo de pie.
- Evitar movimiento repetitivo miembros inferiores.
- Evitar caminar por terrenos irregulares.

Las anteriores recomendaciones y restricciones deben ser aplicadas en su totalidad por su parte, para que sus condiciones de salud mejoren, se le informa la restricción del ingreso al área operativa, solo debe transitar por áreas de oficina.
Es necesario que solicite las citas médicas respectivas con su EPS y mantener informada a la empresa de cualquier evento de salud que presente.
Es necesario que cualquier recomendación médica realizada por su EPS, sea notificada y entregada por escrito a la Residente SST a la mayor brevedad posible.
Si llega a presentar algún tipo de molestia o malestar en su jornada o condición insegura en su puesto de trabajo debe reportarla de manera inmediata a la Residente SST.

Firma
KAREN SOTO
Cargo: Residente SST

Firma del Trabajador
DUVAN ENRIQUE PERALTA PORTO
Cargo: Ayudante de obra


DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

Versión: 01 Fecha: 10/04/2023 Clasificación: Interna	FORMATO ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia.				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Notificación de Riesgo, Inducción, Política de alcohol y drogas, Reglamento de higiene y SST, Evaluación SST.				
TIPO DE ACTIVIDAD:		CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	1 Hora
FECHA:	21-09/2023			LUGAR:	Palacio de Justicia.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
	José Alberto Gutierrez	1122.396.446	Security force	
	Jeison Andres Chamorro	1065646526	Security force	
	Esneider Gutierrez	77185068	Security Force	


OBSERVACIONES

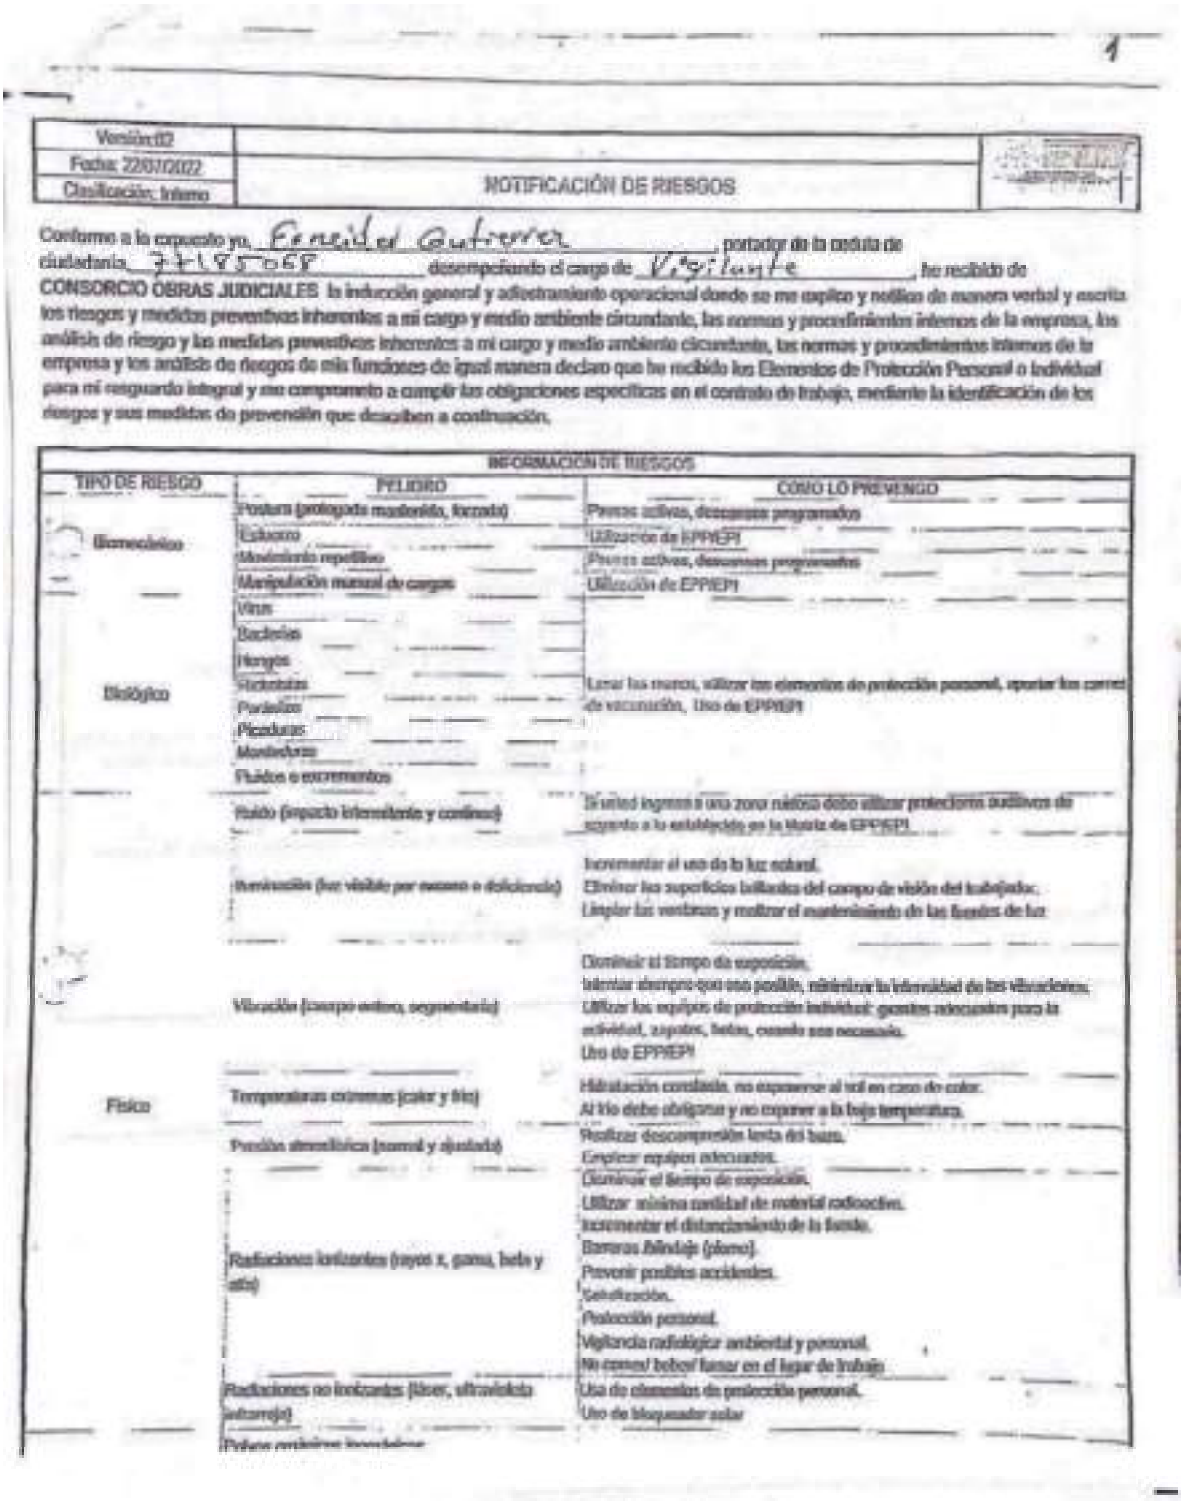

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Ernesto Gutierrez, portador de la cedula de ciudadanía 77185068 desempeñando el cargo de Vigilante, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y mantener el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras Blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

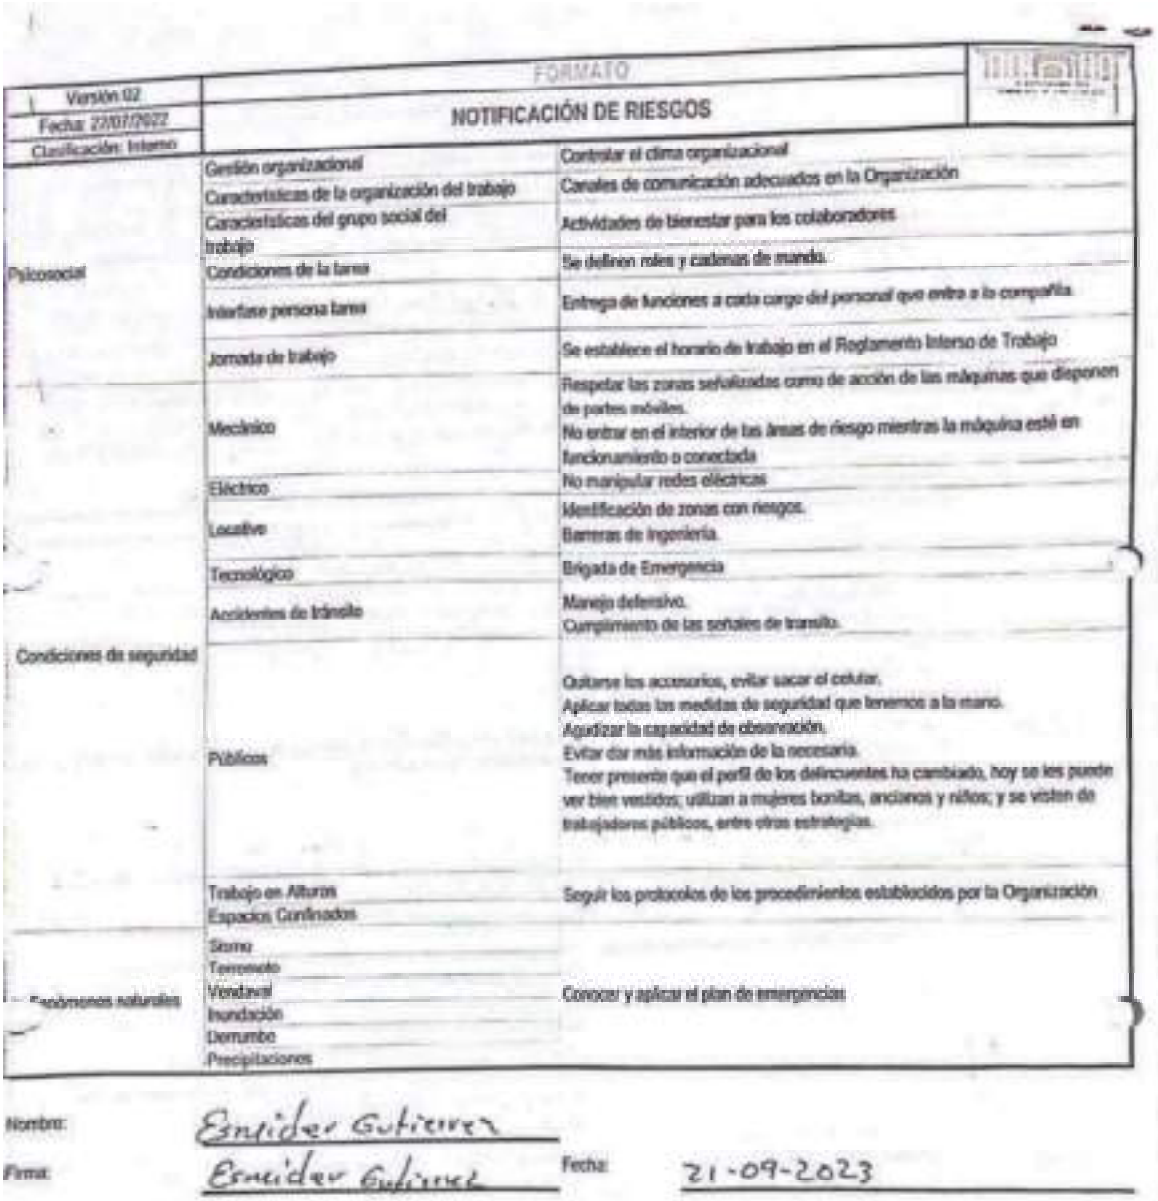

FORMATO

Versión 02
Fecha: 27/07/2022
Clasificación: Interno

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interface persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Storno Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Esneider Gutierrez

Firma: Esneider Gutierrez

Fecha: 21-09-2023

Versión: 03
Fecha: 20010002
Clasificación: Interna

INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 21-09-2023 Nombre y Apellido: Bruiler Gutierrez Contratista: Security Force

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, Cuenta a través de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometida con llevar a cabo sus proyectos de manera que proteja la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, el mismo tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, mejorando continuamente con procesos por ello la gerencia se compromete a asignar los recursos necesarios para ejecutar y cumplirlo.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete a la gestión de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a todo nivel en la Organización a través del cuidado de la integridad física, la protección y la promoción de la salud de nuestros equipos de trabajo, contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementando y estableciendo los mejores controles el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, distribuyendo recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas orientados al autocuidado, mantenimiento de instalaciones, los ambientes, enfermedades laborales.
Somos conscientes de los impactos que genera nuestra labor y es por esto que Consorcio obras judiciales promueve en sus colaboradores la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, vehículos, o durante la prestación de equipos, maquinaria y locaciones de los clientes. De igual manera, no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo síntomas de embriaguez o bajo efectos de drogas ilícitas alucinógenas. Nuestra compañía se compromete a la presente política efectuara pruebas aleatorias de alcoholemia

Para todos los trabajadores que ingresen a la empresa se deben estar vinculados y cumplimiento legal con: afiliaciones al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluya administradora de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que usted labora realizar los aportes mensuales al sistema, descontando el salario los porcentajes establecidos en la ley.

Un accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
El artículo Informal Acto: una vez recibida la correspondiente al folio de este y el artículo 227 del presente, quien le dará en que ARL será atendido de acuerdo a la afiliación realizada por su patrón, en el caso de los contratistas.

Al interior de la organización se ha contratado un modelo particular de seguridad y salud en el trabajo que se encargara de velar el desarrollo del mismo y participar de actividades que busquen mejorar la seguridad en el trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores; actividades como inspecciones, mantenimientos, investigación de accidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conducta de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, en donde se resuelven conflictos de convivencia generados al interior de la Organización, los denuncios se pueden ser anónimos.

Cualquier incumplimiento o falta a las normas de seguridad en el trabajo o cambios a la exhibición en este documento por parte del trabajador se incumplimiento al compromiso que se pacto desde el momento de su firma y provocara en casos de actividades.

1 El uso del casco de protección para la cabeza dentro de este centro de trabajo es permanente y obligatorio bajo ninguna circunstancia se permite usar debajo de este elementos diferentes a los que los fabrican (gorras, pañoletas, trapos, etc.).

2 El uso de los elementos de protección personal para ojos, vías respiratorias y oídos es obligatorio, el igual que el uso de elementos contra caídas, según el calculo de trabajo. Los tipos de elementos dependen de la labor que se ejecute o el ambiente dentro del cual se desarrollan las labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de la dotación apropiada y los elementos de protección personal adecuados; así mismo responsabilidad del trabajador en uso debido y cuidado necesario para garantizar la efectividad de la protección que proporcionan.



3 Los áreas de trabajo deben permanecer en correcto orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor usted debe velar por el aseo del área de trabajo y el orden en material o equipo utilizado.

4 Todo trabajo que se ejecute y que tenga riesgo de caída por encima de 2.0 metros, en de trabajo en alturas para cualquiera se necesario tener al certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas o inspector GST. (Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas) es responsabilidad del trabajador y del coordinador llenar el correspondiente permiso de trabajo, tener correcto uso de los elementos y equipo de protección personal requeridos para el desarrollo de la labor así como el montaje de plataformas y andamios.




5 Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior, encargado, al monitor general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para brindarle la atención necesaria y seguir al debido procedimiento.

6 Todo trabajador debe realizar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeña o en la que sea ejecutada por otra persona y que pueda generar daños sobre salud o sobre los demás trabajadores cercanos en la salud.

7 Todo trabajador debe permanecer atento y respetar todo la señalización instalada en obra: uso de elementos de protección personal, rutas de evacuación, salidas de emergencia, punto de encuentro, zonas de cargue y descargue de materiales, puntos ecológicos, cordones de cinta en zonas de riesgo, cerramientos, equipos de emergencia (señalizar), encerramientos, etc.

8 Todo herramienta eléctrica que utilice debe de contar, equipo que cuente con transmisión de poleas o equipo con engranaje por ello debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiera como guardas de disco, guardas de poleas, tapas, etc. si en el trabajo con poliductos, variadores, pitones, ramas, cangrejos, vibradores, transpaleta, etc. usted durante la falta de este dispositivo, debe notificar inmediatamente a su encargado, al momento amerita el al [illegible]

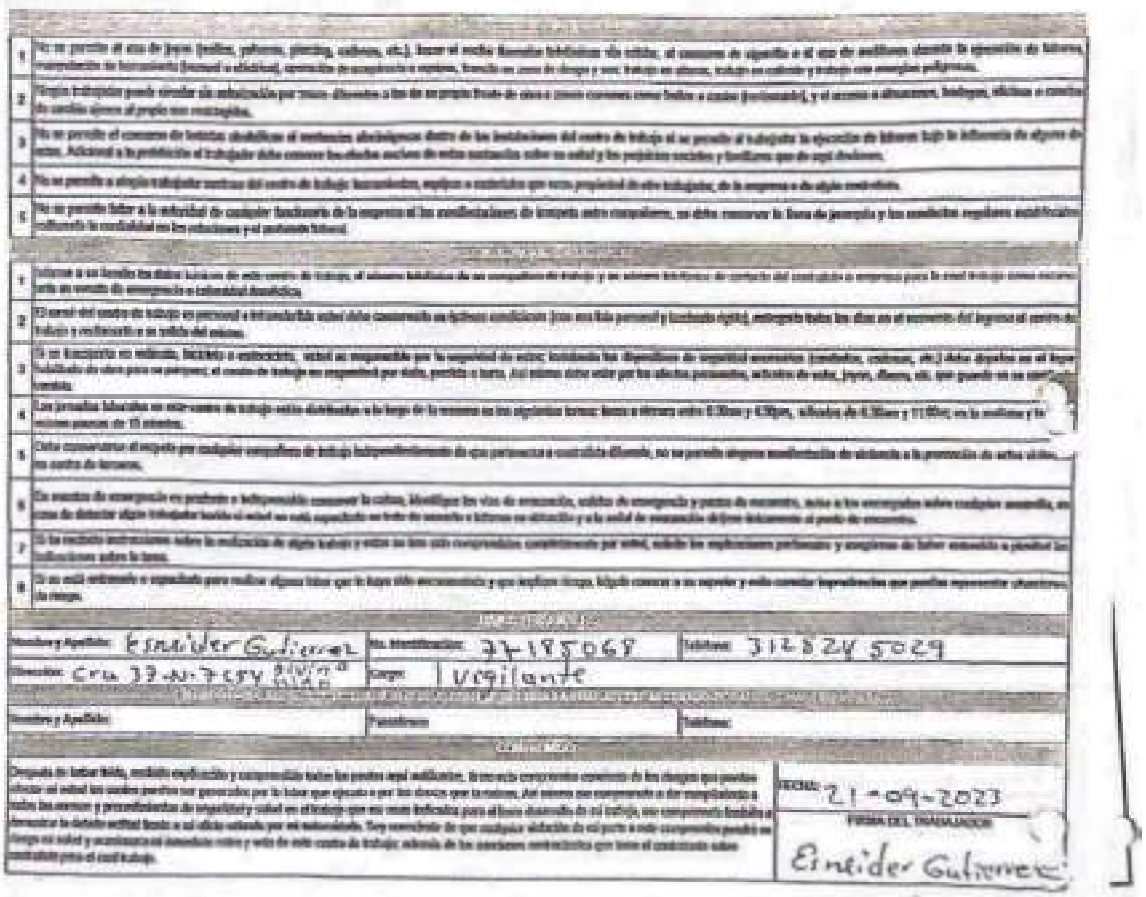


Nombre y Apellido: Ernelder Gutierrez	No. Identificación: 77185068	Teléfono: 3128245029	
Dirección: Cra 33 #0-7 CSV Bivio El Milagro	Cargo: Vigilante		
Nombre y Apellido:	Parentesco:	Teléfono:	

Después de haber leído, recibido explicación y comprendido todos los puntos aquí establecidos. Me comprometo a dar cumplimiento a todas las obligaciones y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que me sean indicados para el buen desarrollo de mi trabajo, este compromiso también se extenderá a mis familiares y personas cercanas.

FECHA: 21-09-2023

FIRMA DEL TRABAJADOR: Ernelder Gutierrez

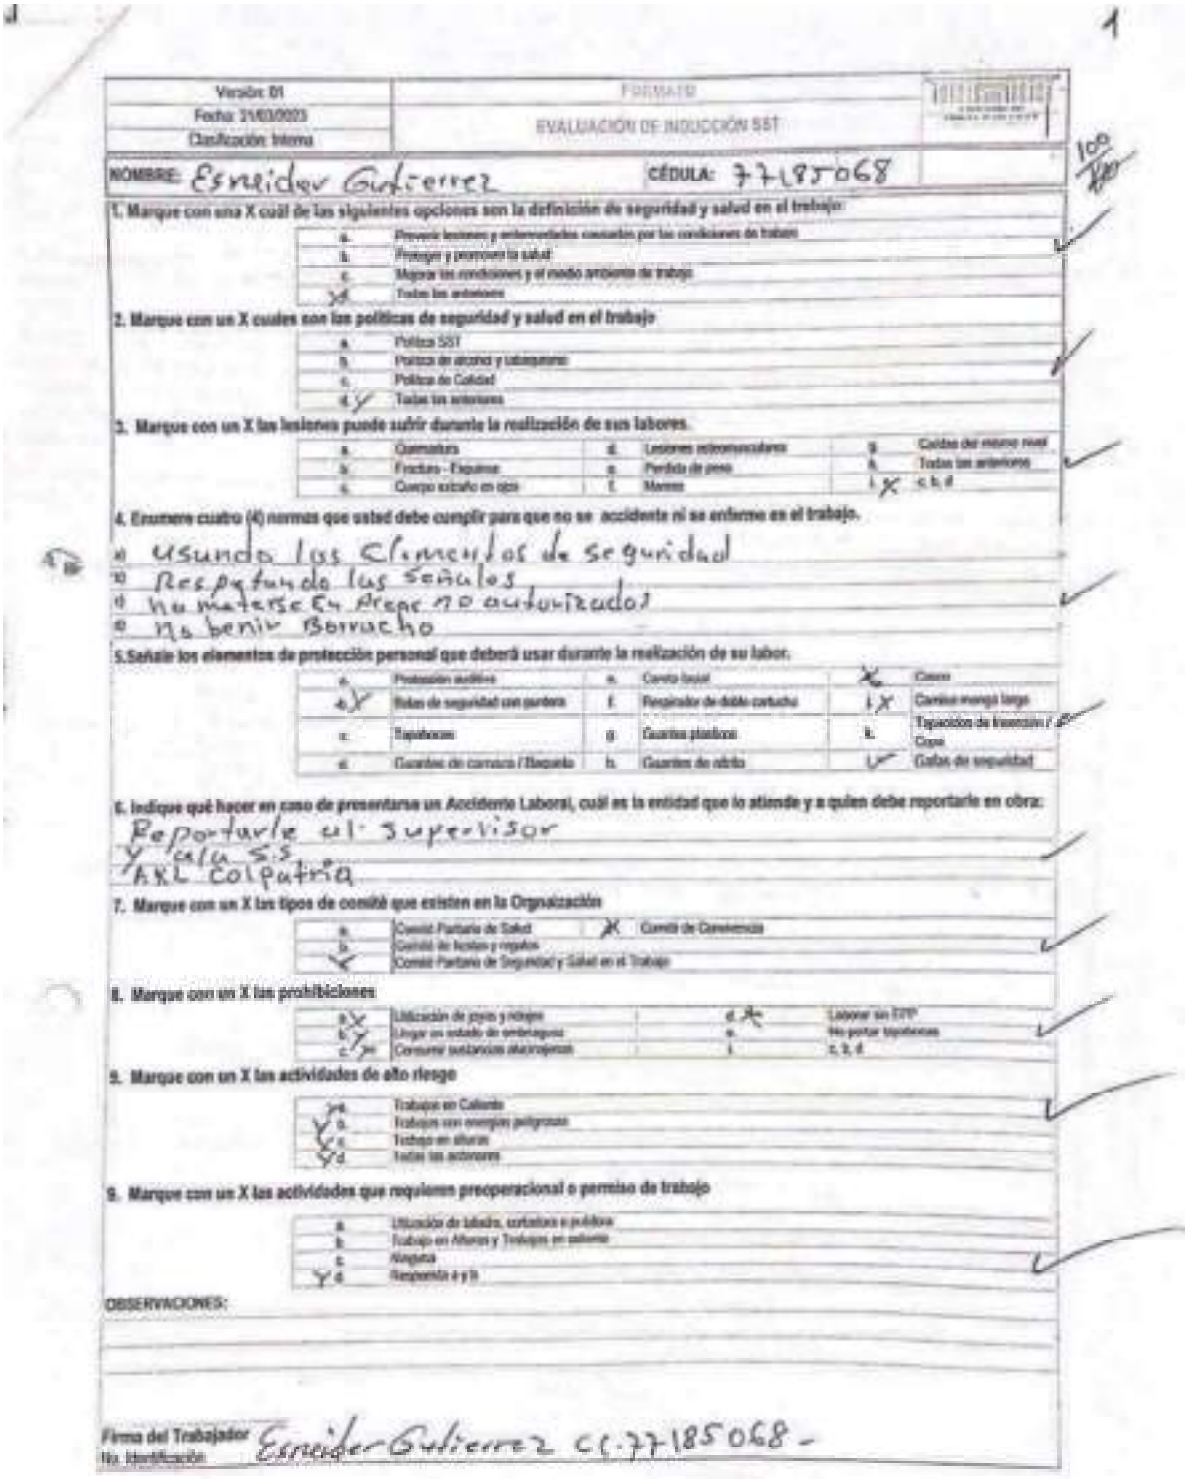

Versión: 01	FORMATO
Fecha: 21/03/2023	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST
Clasificación: Interna	

NOMBRE: Ernesto Gutierrez CÉDULA: 77185068

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X d.	Todas las anteriores

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

a.	Política SST
b.	Política de alcohol y tabaquismo
c.	Política de Calidad
d. ✓	Todas las anteriores

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

a.	Quemaduras	d.	Lesiones osteomusculares	g.	Caidas del mismo nivel
b.	Fracturas - Esguinces	e.	Perdida de peso	h.	Todas las anteriores
c.	Cuerpo extraño en ojos	f.	Mareos	i. X	c, b, d

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) Usando los Elementos de seguridad
b) Respetando las señales
c) No meterse En Areas no autorizadas
d) No benir Borracho

5. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a.	Protección auditiva	e.	Careta facial	X	Casco
a. X	Botas de seguridad con puntera	f.	Respirador de doble cartucho	i. X	Camisa manga larga
c.	Tapabocas	g.	Guantes plasticos	k.	Tapaoidos de inserción / Copa
d.	Guantes de carnaza / Baqueta	h.	Guantes de nitrilo	✓	Gafas de seguridad

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarle en obra:

Reportarle al Supervisor
y calu S.S
ARL Colpatria

7. Marque con un X los tipos de comité que existen en la Organización

a.	Comité Paritario de Salud	X	Comité de Convivencia
b.	Comité de fiestas y regalos		
✓	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo		

8. Marque con un X las prohibiciones

a. X	Utilización de joyas y relojes	d. X	Laborar sin EPP
b. ✓	Llegar en estado de embriaguez	e.	No portar identificación
c. ✓	Consumir sustancias alucinógenas	i.	c, b, d

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo


✓a.	Trabajos en Caliente
✓b.	Trabajos con energías peligrosas
✓c.	Trabajo en alturas
✓d.	Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren precperacional o permiso de trabajo

a.	Utilización de taladro, cortadora o pulidora
b.	Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente
c.	Ninguna
✓d	Respuesta a y b

OBSERVACIONES:

Firma del Trabajador / No. Identificación: Ernesto Gutierrez C.C. 77185068 -

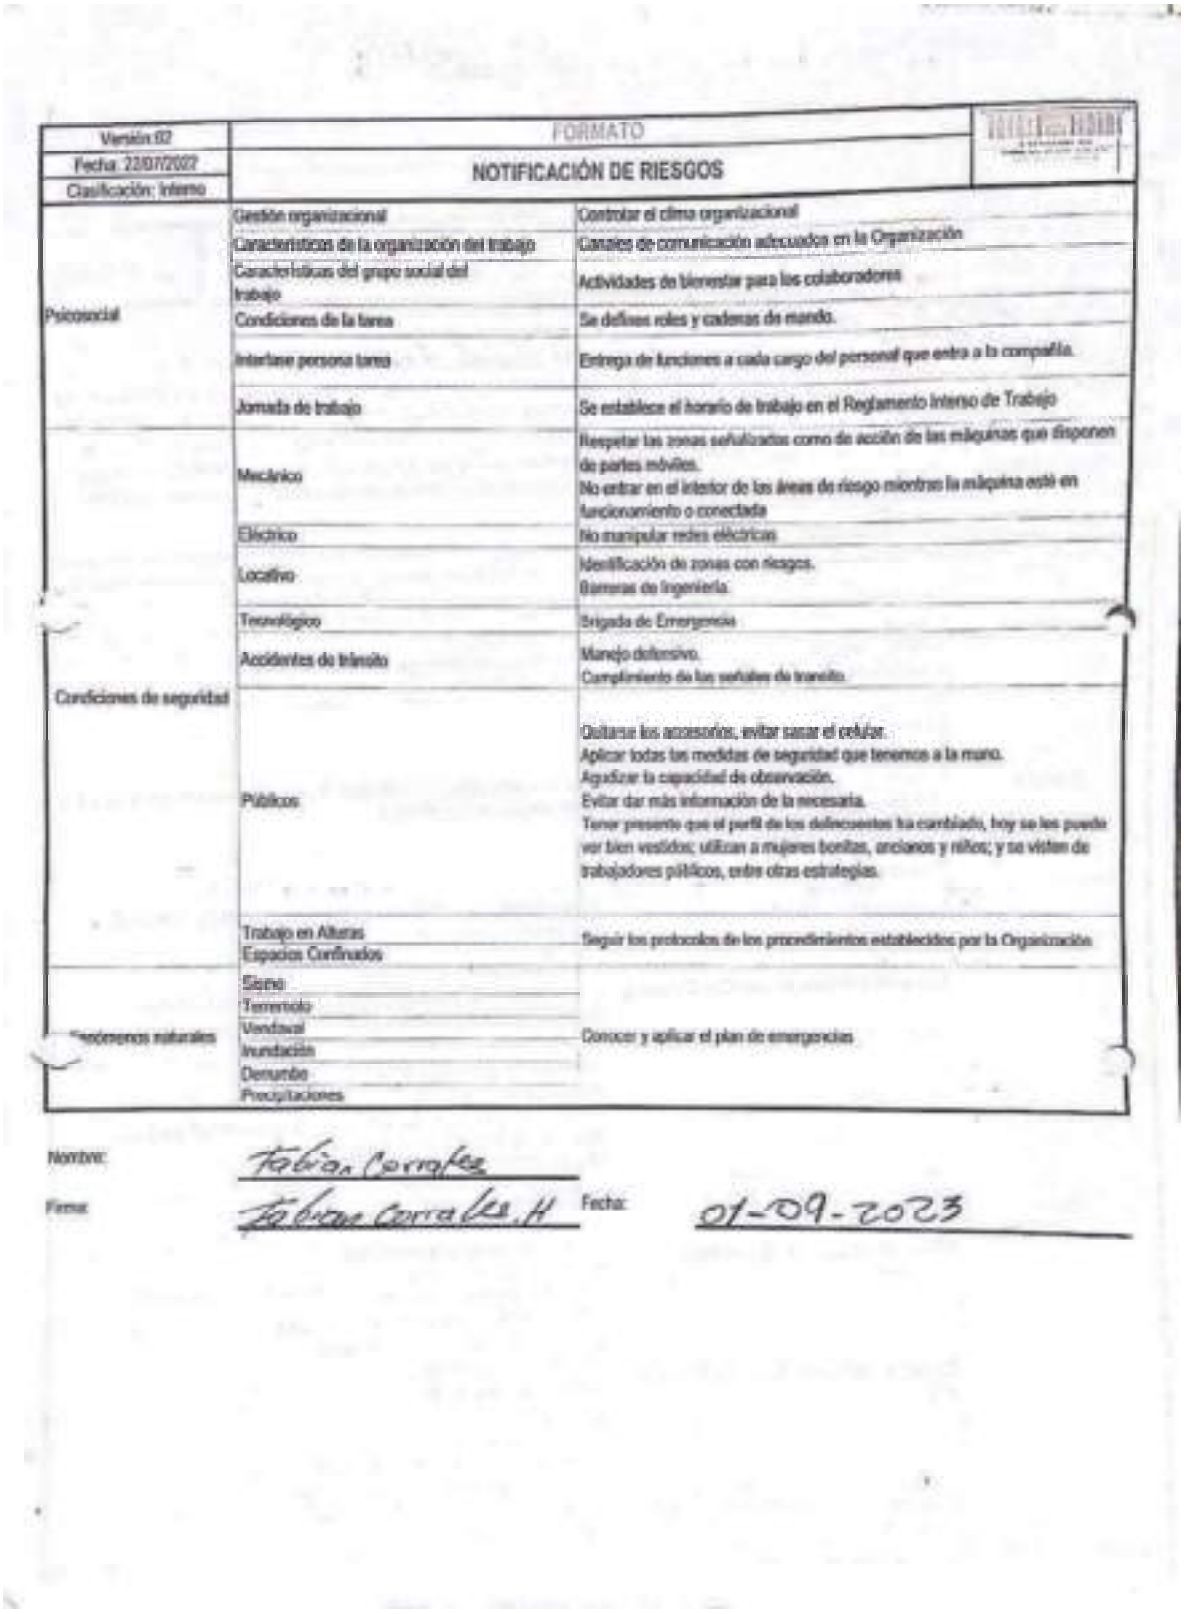

Versión 02	FORMATO	
Fecha: 23/07/2027	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
	Espacios Confinados	
Fenómenos naturales	Sismo	Conocer y aplicar el plan de emergencias
	Terremoto	
	Vendaval	
	Inundación	
	Derrumbe	
	Precipitaciones	

Nombre: Fabian Carrales


Firma: Fabian Carrales H. Fecha: 01-09-2023

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Yeison Andres Chacon Soto, portador de la cedula de ciudadanía, [illegible] desempeñando el cargo de Ing Residente, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentario)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar cambiar que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barrera de blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer, beber, fumar en el lugar de trabajo.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Peligros mecánicos (generados	

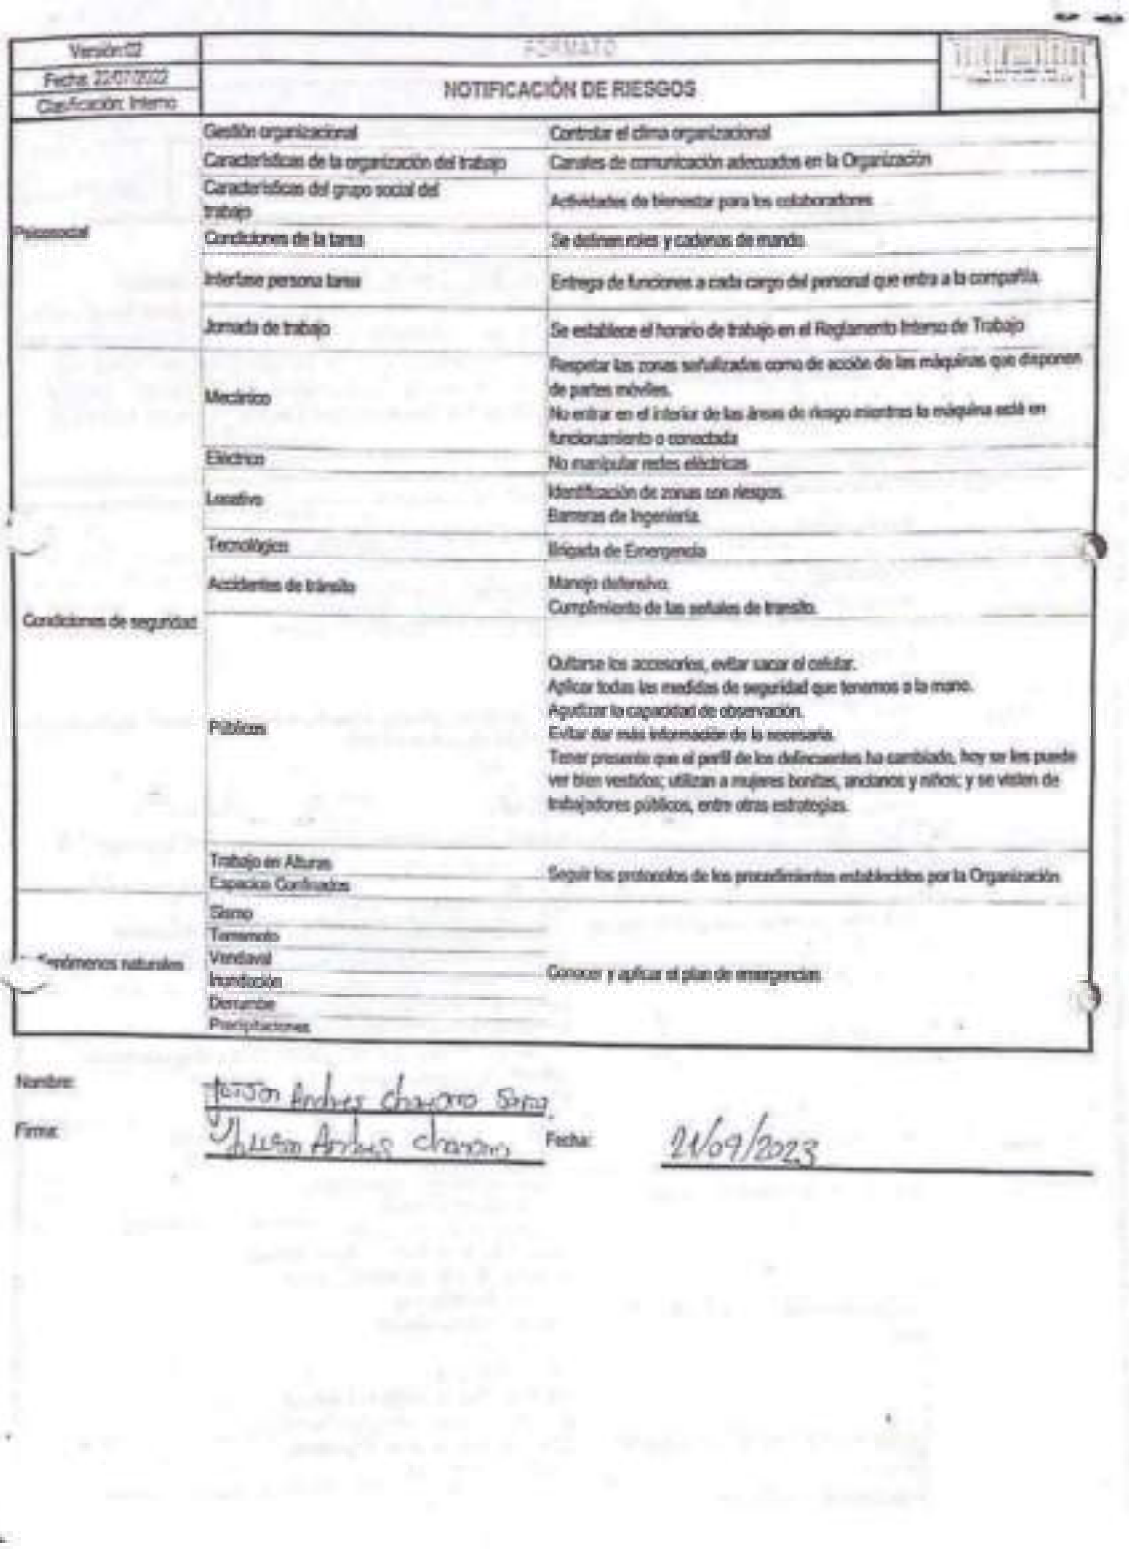

Versión:02
Fecha: 22/07/2022
Clasificación: Interna

FORMATO


NOTIFICACIÓN DE RIESGOS


Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Jairson Andres chaparro Soto

Firma: Jairson Andres chaparro

Fecha: 2/09/2023

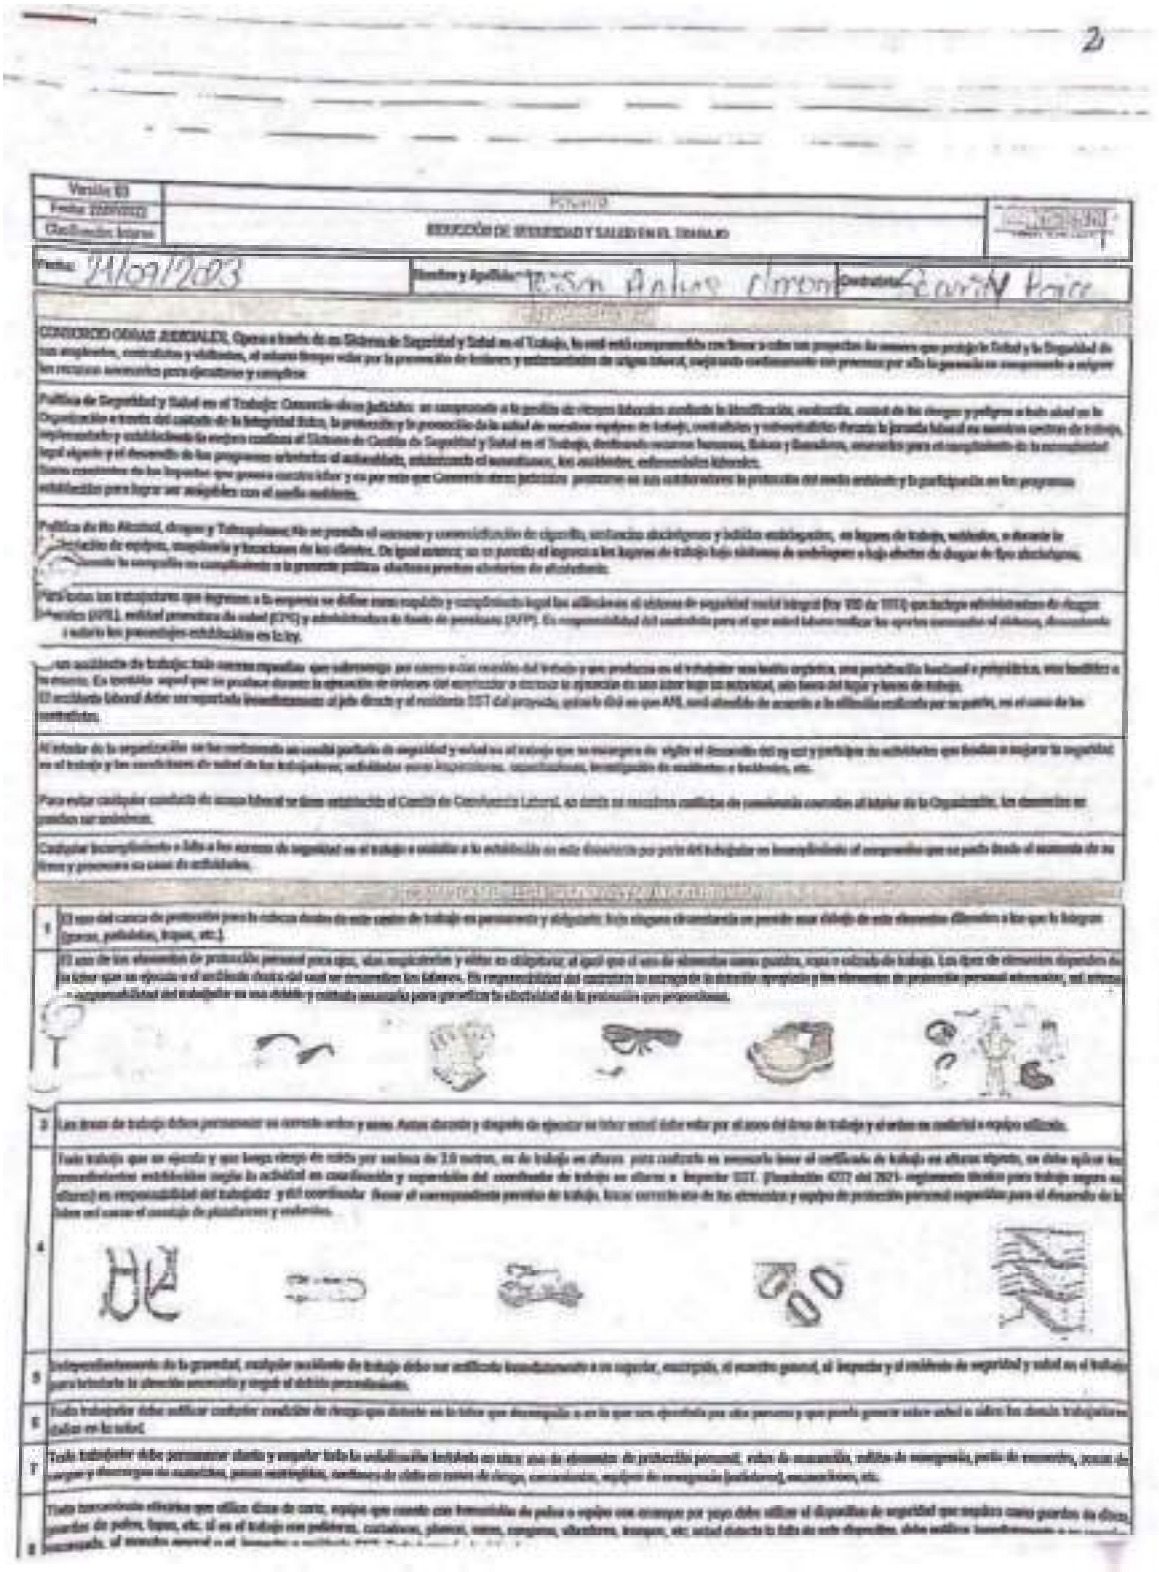

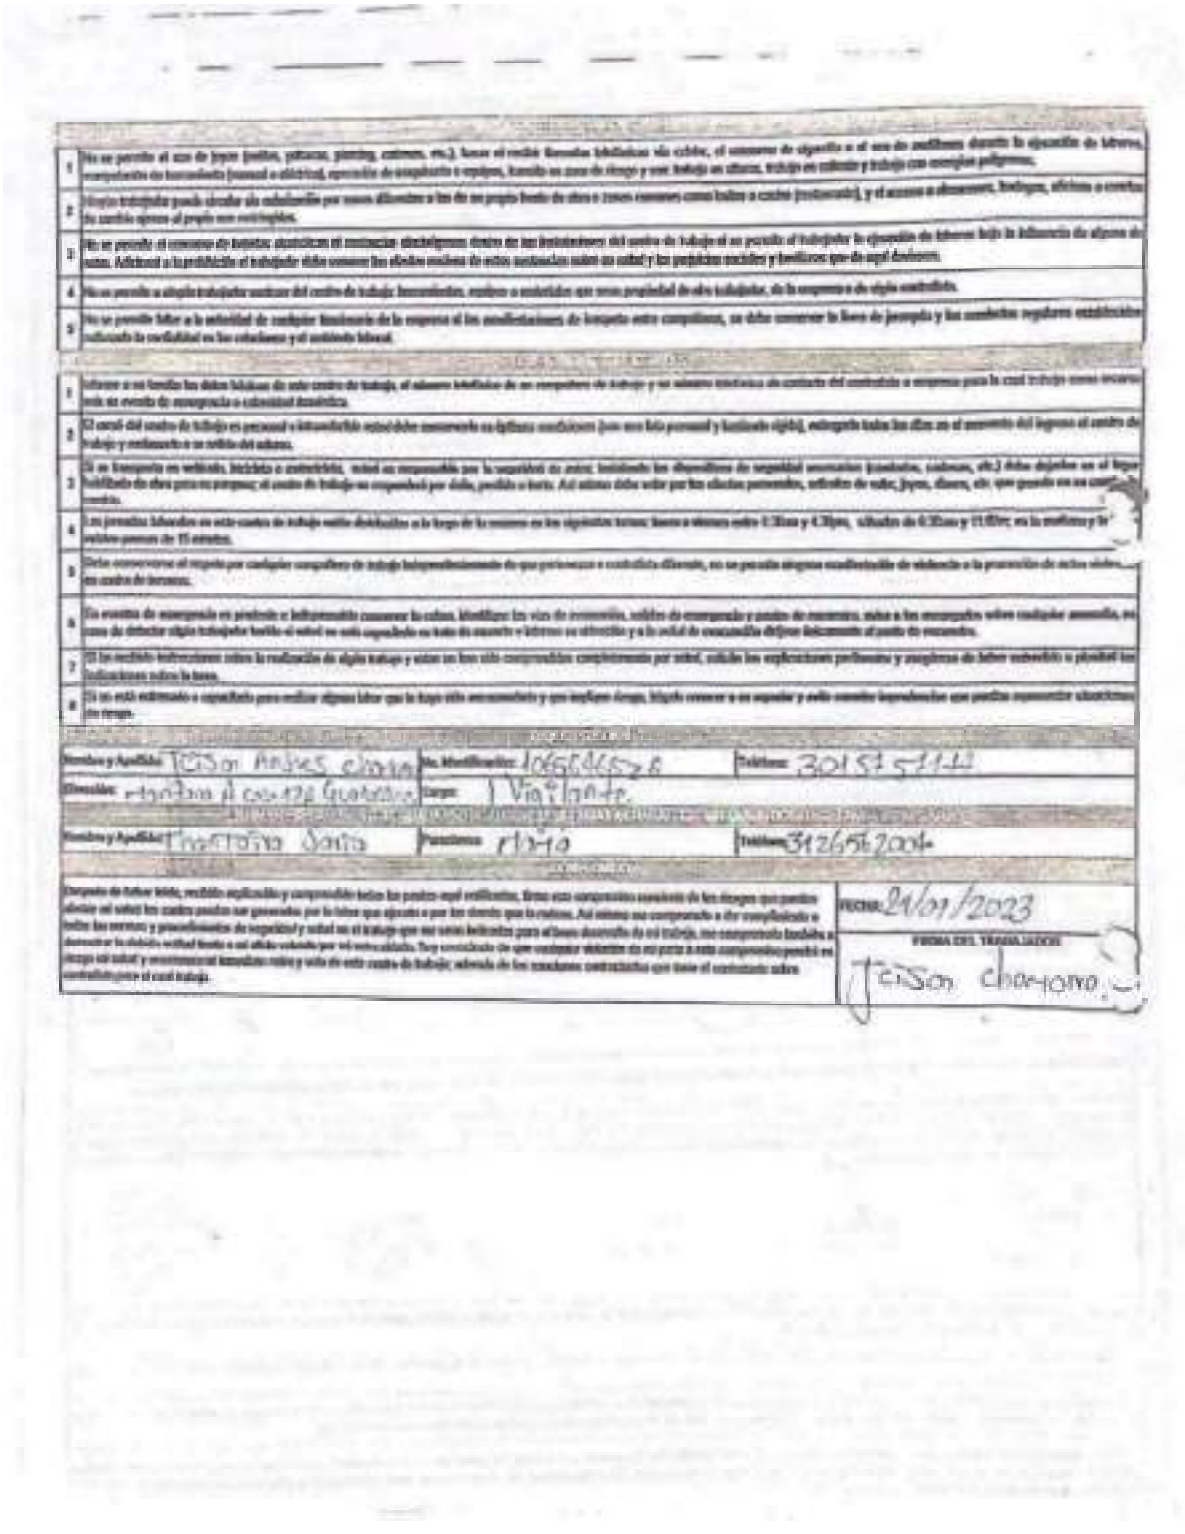

2

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST	
Clasificación: Interna		

NOMBRE: Teison Andres Chamorro Soria CÉDULA: 1065946526

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo	
b.	Proteger y promover la salud	
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo	
(d)	Todas las anteriores	

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

a.	Política SST	
b.	Política de alcohol y tabaquismo	
c.	Política de Calidad	
X	Todas las anteriores	

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

a.	Quemadura	d.	Lesiones osteomusculares	g.	Caídas del mismo nivel
b.	Fractura - Esguince	e.	Pérdida de pelo	X	Todas las anteriores
c.	Cuerpo extraño en ojos	f.	Mareos	i.	a, b, d

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

1) Respetando la señalización.
2) Utilizando los elementos de Protección personal.
3) No caminar por áreas no autorizadas.
4) No Venir bajo los efectos de alcohol a laborar.

5.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a	Protección auditiva	e.	Careta facial	X	Casco
X	Botas de seguridad con puntera	f.	Respirador de doble cartucho	X	Camisa manga larga
X	Tapabocas	g.	Guantes plásticos	k.	Tapaoidos de inserción / Copa
d.	Guantes de cerraza / Baqueta	h.	Guantes de nitrilo	X	Gafas de seguridad

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarlo en obra:

Reportarme a mi Jefe inmediato de lo sucedido.

7. Marque con un X los tipos de comité que existen en la Organización

a.	Comité Paritario de Salud	X	Comité de Convivencia
b.	Comité de fiestas y regalos		
X	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo		

8. Marque con un X las prohibiciones

X	Laboración de joyas y relojes	X	Laborar sin EPP
X	Llegar en estado de embriaguez	X	No portar tapabocas
X	Consumir sustancias alucinógenas	X	a, b, d

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo

X	Trabajos en Caliente
X	Trabajos con energías peligrosas
X	Trabajo en alturas
X	Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren precperacional o permiso de trabajo

a.	Utilización de taladro, cortadora o pulidora	
b.	Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente	
c.	Ninguna	
X	Respuestas a y b	

OBSERVACIONES:

Teison Chamorro.

Firma del Trabajador
No. Identificación 1065946526


3

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, José Alberto Gutierrez Cardenas portador de la cedula de 1122.396.146 ciudadanía, 1122.396.146 desempeñando el cargo de Vigilante, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS


TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentada)	Disminuir el tiempo de exposición. Mantener siempre que sea posible, estabilizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Peligros ambientes biomecánicos	

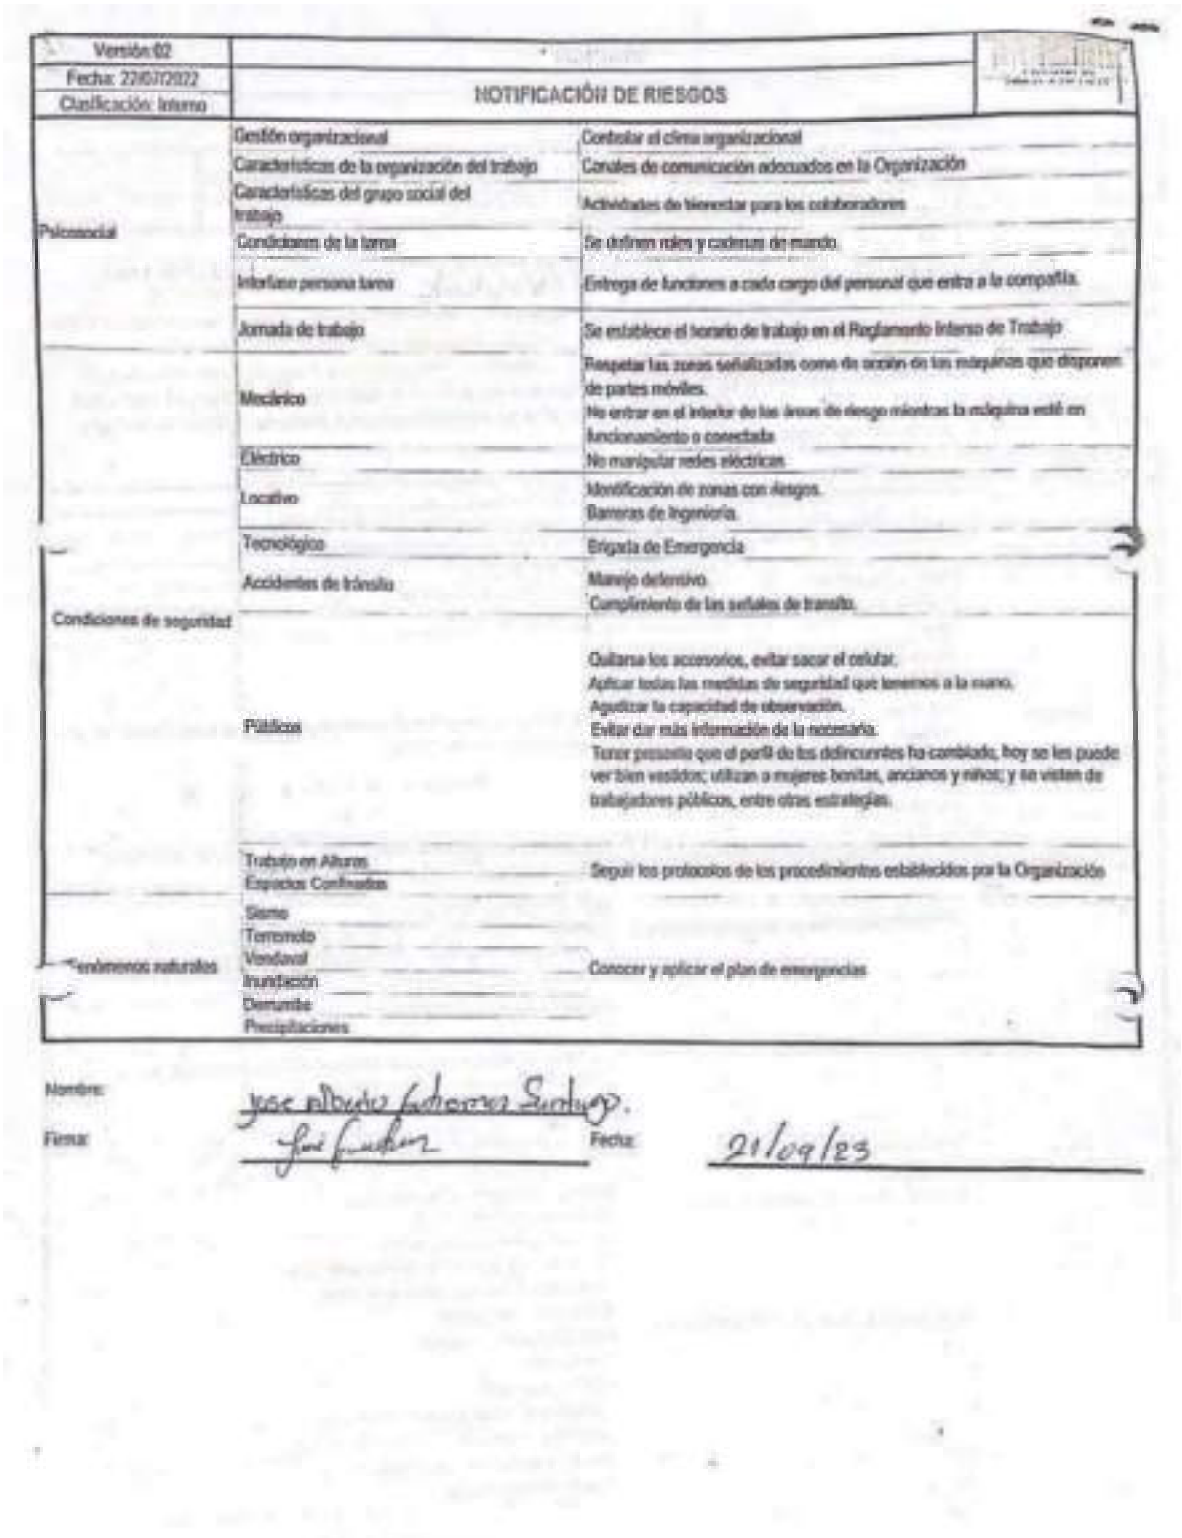

Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: jose alberto fadrones Santiago.

Firma: [signature] Fecha: 21/09/23

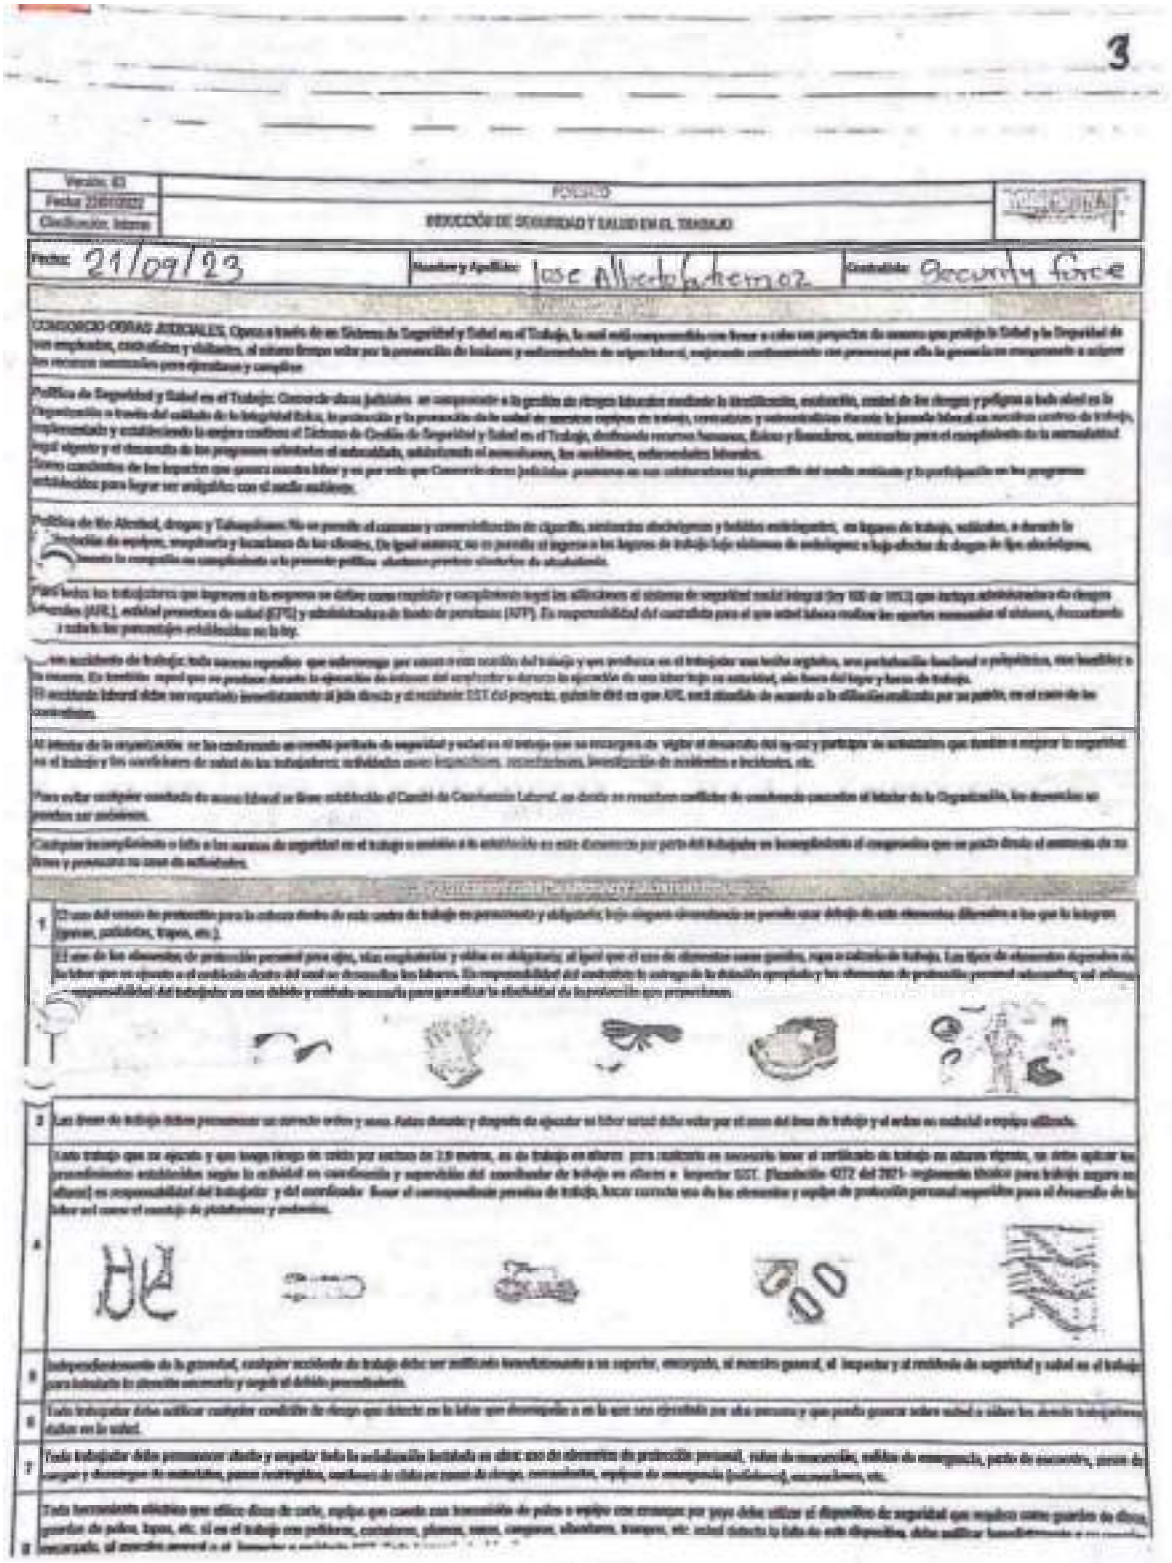

3

Versión: 03
Fecha: 23/01/2022
Clasificación: Interna

FORMATO

REDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 21/09/23 | Nombre y Apellido: Jose Alberto Jaramillo | Contratista: Security force

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, Opera a través de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometida con llevar a cabo sus proyectos de manera que proteja la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, al mismo tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, mejorando continuamente este proceso por ello la gerencia se compromete a asignar los recursos necesarios para ejecutarse y cumplirse

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete a la gestión de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a todo nivel en la Organización a través del cuidado de la integridad física, la protección y la promoción de la salud de nuestros empleos en trabajo, contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementando y estableciendo la mejora continua al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas orientados al autocuidado, salubridad en ambientes laborales, enfermedades laborales.
Somos conscientes de los impactos que genera nuestra labor y es por esto que Consorcio obras judiciales promueve en sus colaboradores la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, vehículos, o durante la prestación de equipos, maquinaria y locaciones de los clientes, De igual manera, no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo síntomas de embriaguez o bajo efectos de drogas de tipo alucinógenas, el incumplimiento a lo establecido en la presente política acarreara procesos disciplinarios de amonestación.

Para todos los trabajadores que ingresen a la empresa se deben cumplir con requisitos y cumplimiento legal (los afiliaciones al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluya administradora de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que usted labora realizar los aportes mensuales al sistema, descontando a todos los porcentajes establecidos en la ley.

Un accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y hora de trabajo.
El accidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe directo y al residente SST del proyecto, quien le dirá en que ARL está afiliado de acuerdo a la afiliación realizada por su patrón, en el caso de los contratistas.

Al interior de la organización se ha conformado un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que se encargara de vigilar el desarrollo del sg-sst y participar de actividades que ayuden a mejorar las condiciones en el trabajo y los ambientes de salud de los trabajadores; actividades como inspecciones, recomendaciones, investigación de incidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier contacto de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, en donde se resuelven conflictos de convivencia suscitados al interior de la Organización, los denuncios se pueden ser anónimos.

Cualquier incumplimiento o falta a las normas de seguridad en el trabajo o omisión a la solicitación en este documento por parte del trabajador se incumplimiento al compromiso que se pacto desde el momento de su ingreso y promueve su cese de actividades.

1 El uso del casco de protección para la cabeza dentro de este centro de trabajo es permanente y obligatorio, bajo ninguna circunstancia se permite usar debajo de este elementos diferentes a los que la integran (gorras, pañoletas, trapos, etc.).

El uso de los elementos de protección personal para ojos, vías respiratorias y oídos es obligatorio, al igual que el uso de elementos como guantes, ropa o calzado de trabajo. Los tipos de elementos dependen de la labor que se ejecute o el ambiente dentro del cual se desarrolla las labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de la dotación apropiada y los elementos de protección personal adecuados; así mismo responsabilidad del trabajador su uso debido y continuo necesario para garantizar la efectividad de la protección que proporcionan.

2 Los frentes de trabajo deben permanecer en correcto orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor usted debe velar por el aseo del área de trabajo y el orden en cualquier equipo utilizado.


4 Todo trabajo que se ejecute y que tenga riesgo de caída por encima de 1.8 metros, en su trabajo en alturas para realizarlo es necesario tener el certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas e inspector SST. [Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas] es responsabilidad del trabajador y del coordinador llevar al correspondiente permiso de trabajo, hacer correcto uso de los elementos y equipos de protección personal requeridos para el desarrollo de la labor así como el montaje de plataformas y andamios.

5 Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior, encargado, al monitor general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para tomarle la atención oportuna y seguir el debido procedimiento.

6 Todo trabajador debe notificar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeña o en la que sea ejecutada por otra persona y que pueda generar daños sobre salud o sobre los demás trabajadores cerca en la salud.

7 Todo trabajador debe permanecer atento y respetar todo la señalización instalada en obra: uso de elementos de protección personal, rutas de evacuación, salidas de emergencia, punto de encuentro, zonas de cargue y descargue de materiales, puntos ecológicos, cordones de cinta por zonas de riesgo, extintores, equipos de emergencia (botiquines), avisos humos, etc.

8 Todo herramienta eléctrica que utilice disco de corte, equipo que cuente con transmisión de poleas o equipo con arranque por jalon debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiera como guardas de disco, guardas de poleas, bandas, etc. si en el trabajo con pulidoras, cortadoras, planeas, sierras, cargueros, alimentadores, transpaleta, etc. usted detecta la falta de este dispositivo, debe notificar inmediatamente a su encargado, al monitor general o al [illegible]

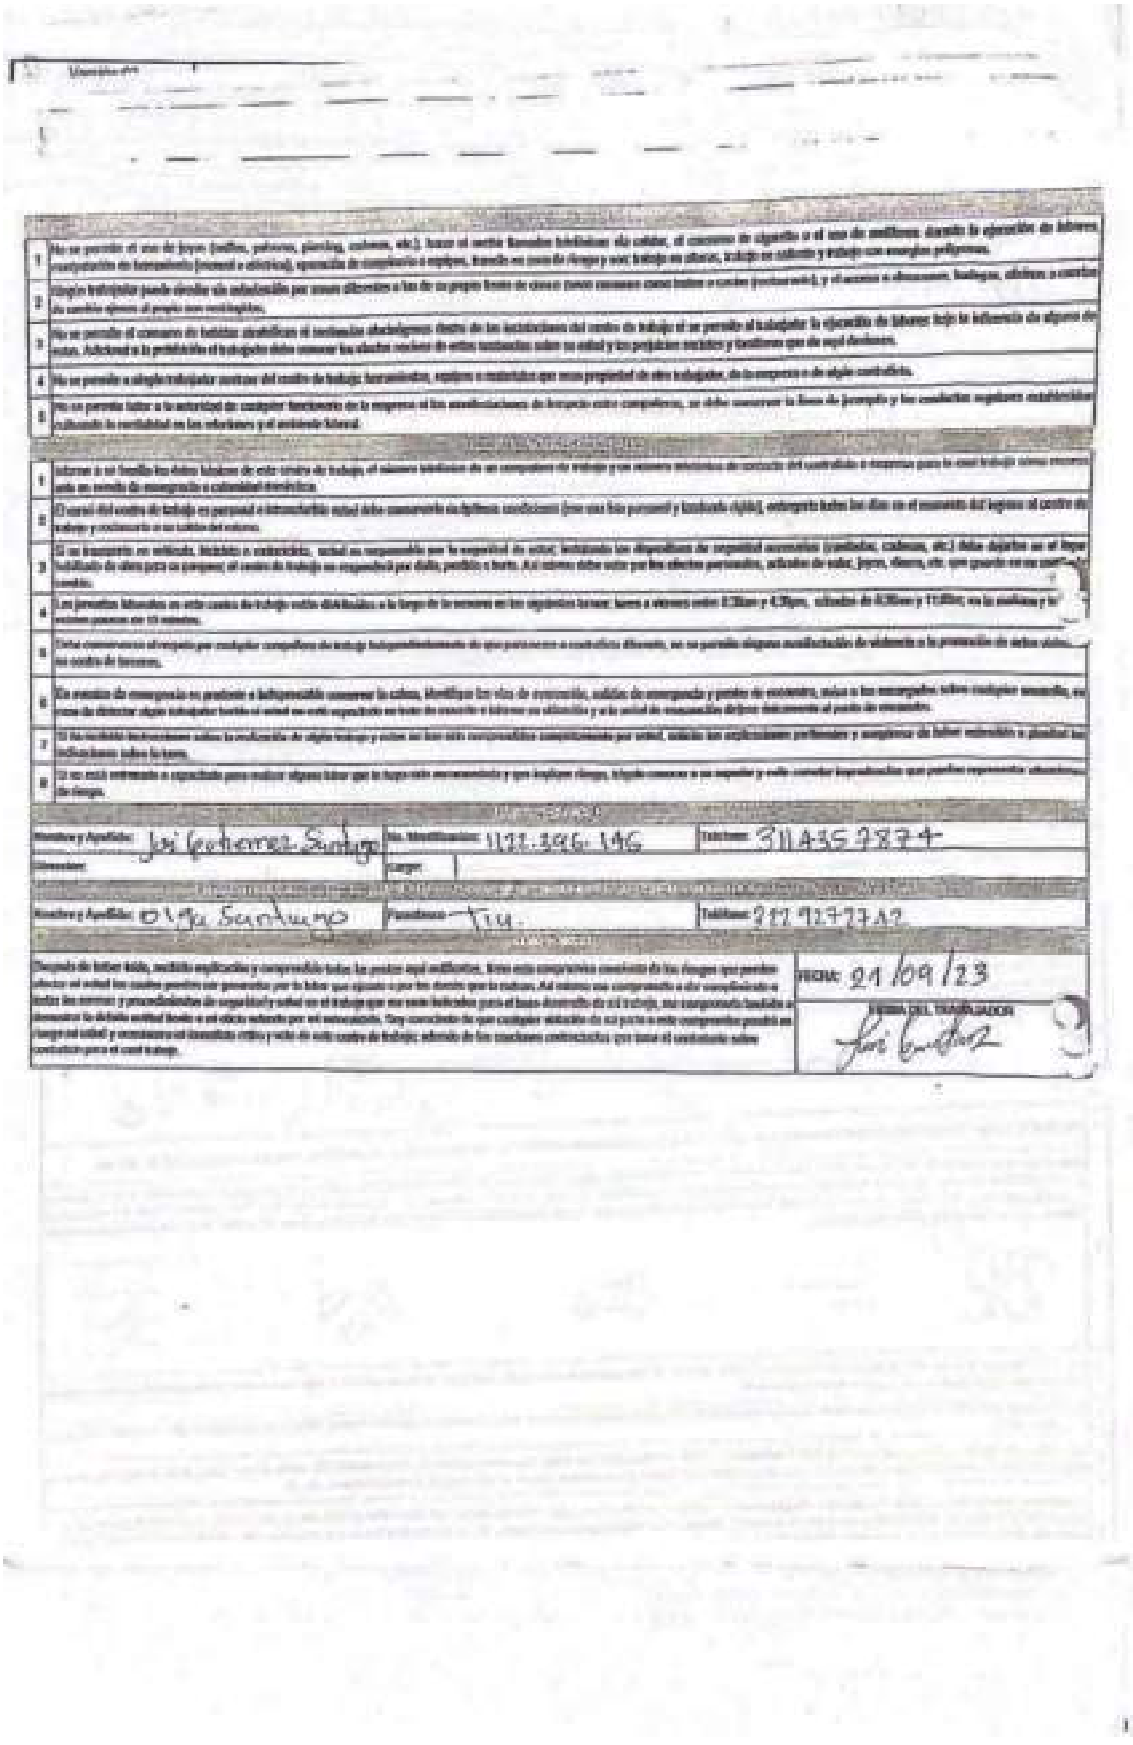

Nombre y Apellido: José Gutierrez Santiago — No. Identificación: 1122.396.196 — Teléfono: 311435 7874

Nombre y Apellido: Olga Santiago — Parentesco: Tía — Teléfono: 317 927 7742

FECHA: 21/09/23

FIRMA DEL TRABAJADOR



3

Versión: 01
Fecha: 21/03/2022
Clasificación: Interna

FORMATO

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST

NOMBRE: José Alberto Federman Cartagena CÉDULA: 1.012.396.146

10/10

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X	Todas las anteriores

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

a.	Política SST
b.	Política de alcohol y tabaquismo
c.	Política de Calidad
X	Todas las anteriores

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

a.	Quemadura	d.	Lesiones osteomusculares	g.	Caídas del mismo nivel
b.	Fractura - Esguince	e.	Pérdida de pena	h.	Todas las anteriores
c.	Cuerpo extraño en ojos	f.	Mareos	X	a, b, d

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

1) No ingresar en Pozos no autorizados
2) Respetar las Señalizaciones
3) No ingresar bajo el efecto del alcohol.
4) Utilizando los elementos de protección

5.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a.	Protección auditiva	e.	Careta facial	i.	Casco
X	Botas de seguridad con puntera	f.	Respirador de doble cartucho	X	Camisa manga larga
X	Tapabocas	g.	Guantes plásticos	k.	Tapaoidos de inserción / Copa
d.	Guantes de carnaza / Baqueta	h.	Guantes de nitrilo	X	Gafas de seguridad

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarle en obra:

Comunicar a nuestro Supervisor del Cargo, indicandole los Sucesos
Colpatria

7. Marque con un X las tipos de comité que existen en la Organización

X	Comité Paritario de Salud	X	Comité de Convivencia
b.	Comité de Revisión y reparto		
X	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo		

8. Marque con un X las prohibiciones

X	Utilización de joyas y relojes	d. X	Laborar sin EPP
X	Llegar en estado de embriaguez	e. X	No portar tapabocas
X	Consumir sustancias alucinogenas	f. X	c, b, d

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo


a.	Trabajos en Caliente
b.	Trabajos con energías peligrosas
c.	Trabajo en alturas
X	Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo

a. X	Utilización de taladro, cortadora o pulidora
b. X	Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente
c.	Ninguna
X	Respuesta a y b

OBSERVACIONES:

Firma del Trabajador
No. Identificación 1012 396 146

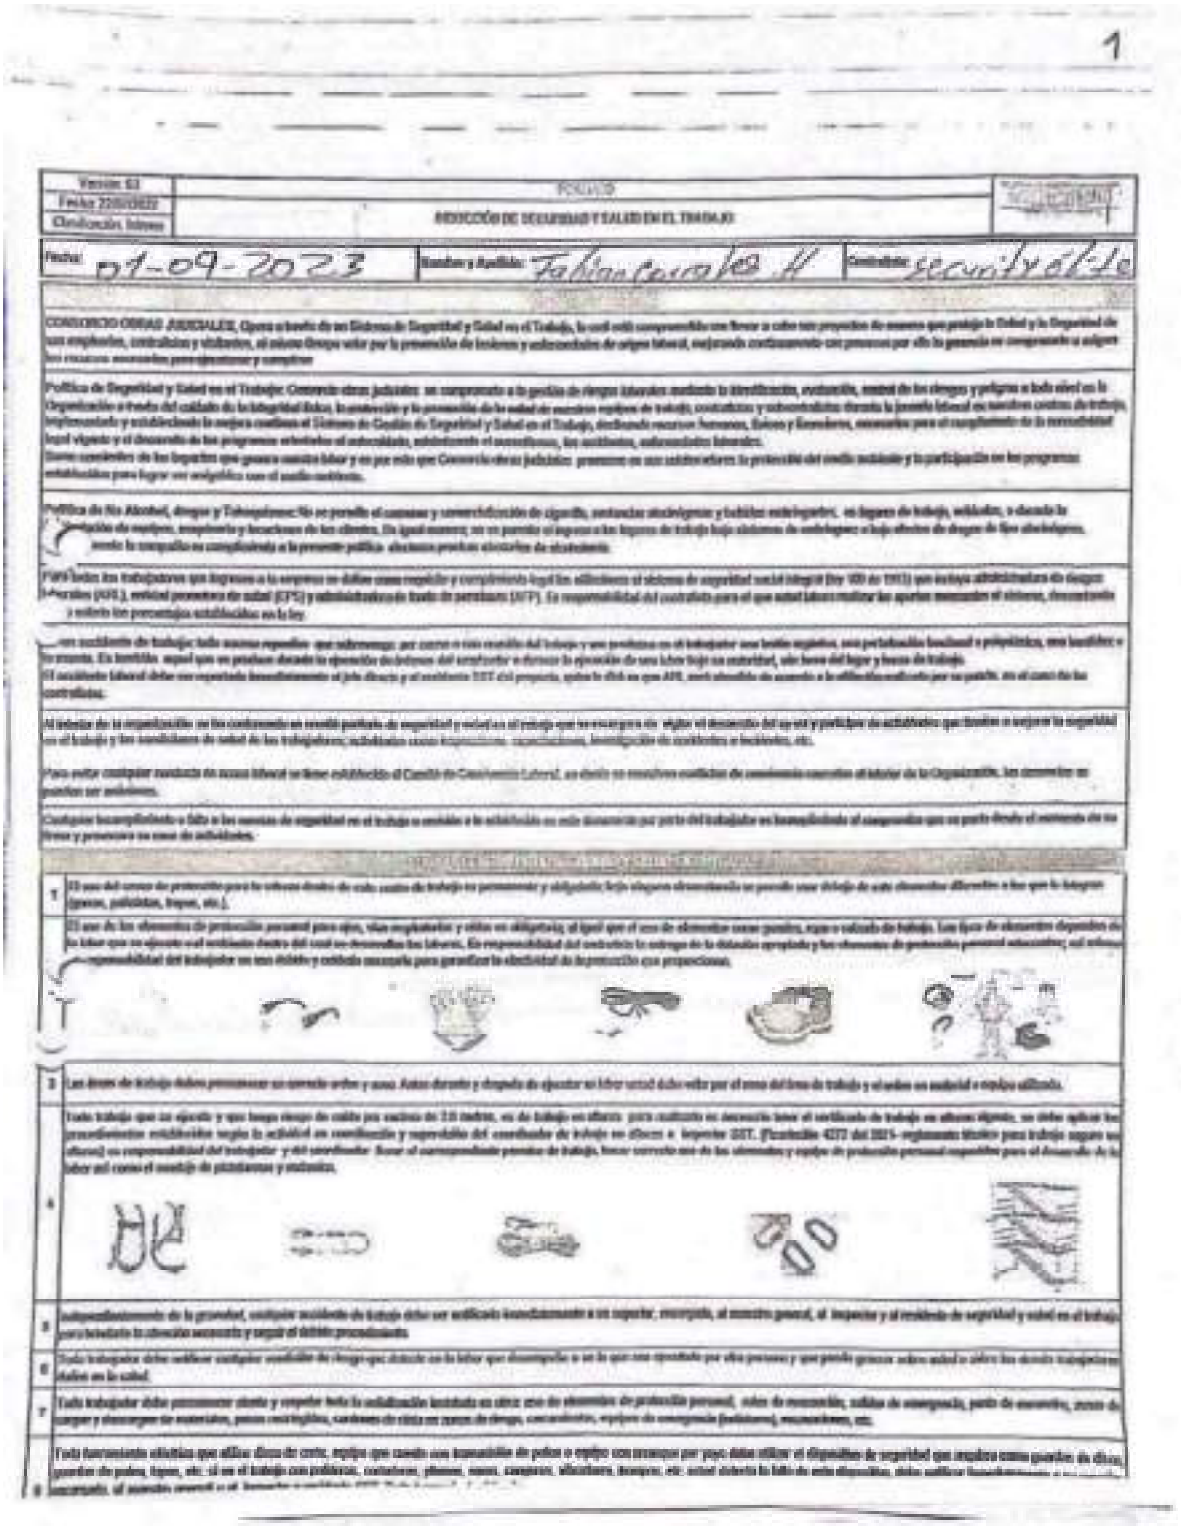

1

Versión: 03	POLITICA	
Fecha: 27/01/2022		
Clasificación: Interna	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

Fecha: 01-09-2023 | Nombre y Apellido: Fabian Perez | Contratista: Seguridad Vial

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, Opera a través de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometida con llevar a cabo sus proyectos de manera que proteja la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, al mismo tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, mejorando continuamente con procesos por ello la gerencia se compromete a asignar los recursos necesarios para ejecutarse y cumplirse

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete a la gestión de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a todo nivel en la Organización a través del cuidado de la integridad física, la protección y la prevención de la salud de nuestros equipos de trabajo, contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementando y estableciendo la mejora continua al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas orientados al autocuidado, estableciendo controles, las accidentes, enfermedades laborales.
Somos conscientes de los logros que genera nuestra labor y es por esto que Consorcio obras judiciales promueve en sus sitios velamos la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias alcohólicas y bebidas embriagantes en lugares de trabajo, vehículos, o durante la ejecución de empleos, empleados y locaciones de los clientes. En igual manera; no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo síntomas de embriaguez o bajo efectos de drogas de tipo alucinógenos, siendo la inobservancia a la presente política sinónimo positivo de abandono

Para todos los trabajadores que ingresen a la empresa se deben estar regulado y cumplimiento legal los aditivamos al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluye administradora de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). La responsabilidad del contratista para el que estos laborar realizar los aportes mensuales al sistema, descontando y sobre los porcentajes establecidos en la ley

Un accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y hora de trabajo.
El accidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe directo y al contratista SST del proyecto, quien le dirá en que ARL está afiliado su usuario a la utilizada suministrado por usted, en el caso de las controladas.

Al interior de la organización se han conformado un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que tendrá por objeto el desarrollo del su rol y participar de actividades que tiendan a mejorar la seguridad en el trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores; actividades como inspecciones, capacitaciones, investigación de accidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conducta en acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, en donde se resolverán conflictos de convivencia suscitados al interior de la Organización, los convocan se pueden ser anónimos.

Cualquier incumplimiento o falla a las normas de seguridad en el trabajo o omisión a la actividades no están documentadas por parte del trabajador se investigaciones al empresarios que en parte donde el momento de una lesión y presencia en zona de actividades.

1 El uso del casco de protección para los cabezas dentro de todo centro de trabajo es permanente y obligatorio, bajo ninguna circunstancia se permite usar dichos de este elementos diferentes a los que le integran (gorras, pañoletas, viseras, etc.).

2 El uso de los elementos de protección personal para ojos, vías respiratorias y oídos es obligatorio, al igual que el uso de elementos contra químicos, aguas o caídas de trabajo. Los tipos de elementos dependen de su labor que se ejecute y el ambiente dentro del cual se desarrollan las labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de los distintos apropiados y los elementos de protección personal adecuados; así mismo responsabilidad del trabajador su uso debido y cuidado necesario para garantizar la efectividad de la protección que proporcionan.

3 Los áreas de trabajo deben permanecer en completo orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor usted debe velar por el aseo del área de trabajo y el orden en maquinaria o equipo utilizado.


4 Todo trabajo que se ejecute y que tenga riesgo de caída por encima de 1.5 metros, en de trabajo en alturas para realizarlo es necesario tener el certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas e inspector SST. (Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas) es responsabilidad del trabajador y del coordinador. Revisar el correspondiente permiso de trabajo, hacer correcto uso de los elementos y equipo de protección personal requeridos para el desarrollo de la labor así como el montaje de plataformas y andamios.


5 Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior, encargado, al monitor general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para brindarle la atención necesaria y seguir el debido procedimiento.

6 Todo trabajador debe realizar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeñe o en la que sea ejecutado por otra persona y que pueda generar sobre salud o sobre los demás trabajadores dañen en la salud.

7 Todo trabajador debe permanecer atento y respetar todo la señalización instalada en cada una de elementos de protección personal, sobre de evacuación, salidas de emergencia, punto de encuentro, zonas de cargue y descargue de materiales, pasos restringidos, cambiantes de ruta en zonas de riesgo, conocimientos, equipos de emergencia (ambulancia), mantenimiento, etc.

8 Toda herramienta eléctrica que utilice: disco de corte, equipo que cuente con suministro de poder o equipo con accesorios por ejes debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiera como guardas de discos, guardas de poleas, topes, etc. si en el trabajo con problemas, cortadores, pliegues, mazos, amperes, alicatadores, destapes, etc. actual elemento la falta de este dispositivo, debe notificar inmediatamente al monitor general o al inspector o residente SST de la obra para tomar las medidas necesarias.

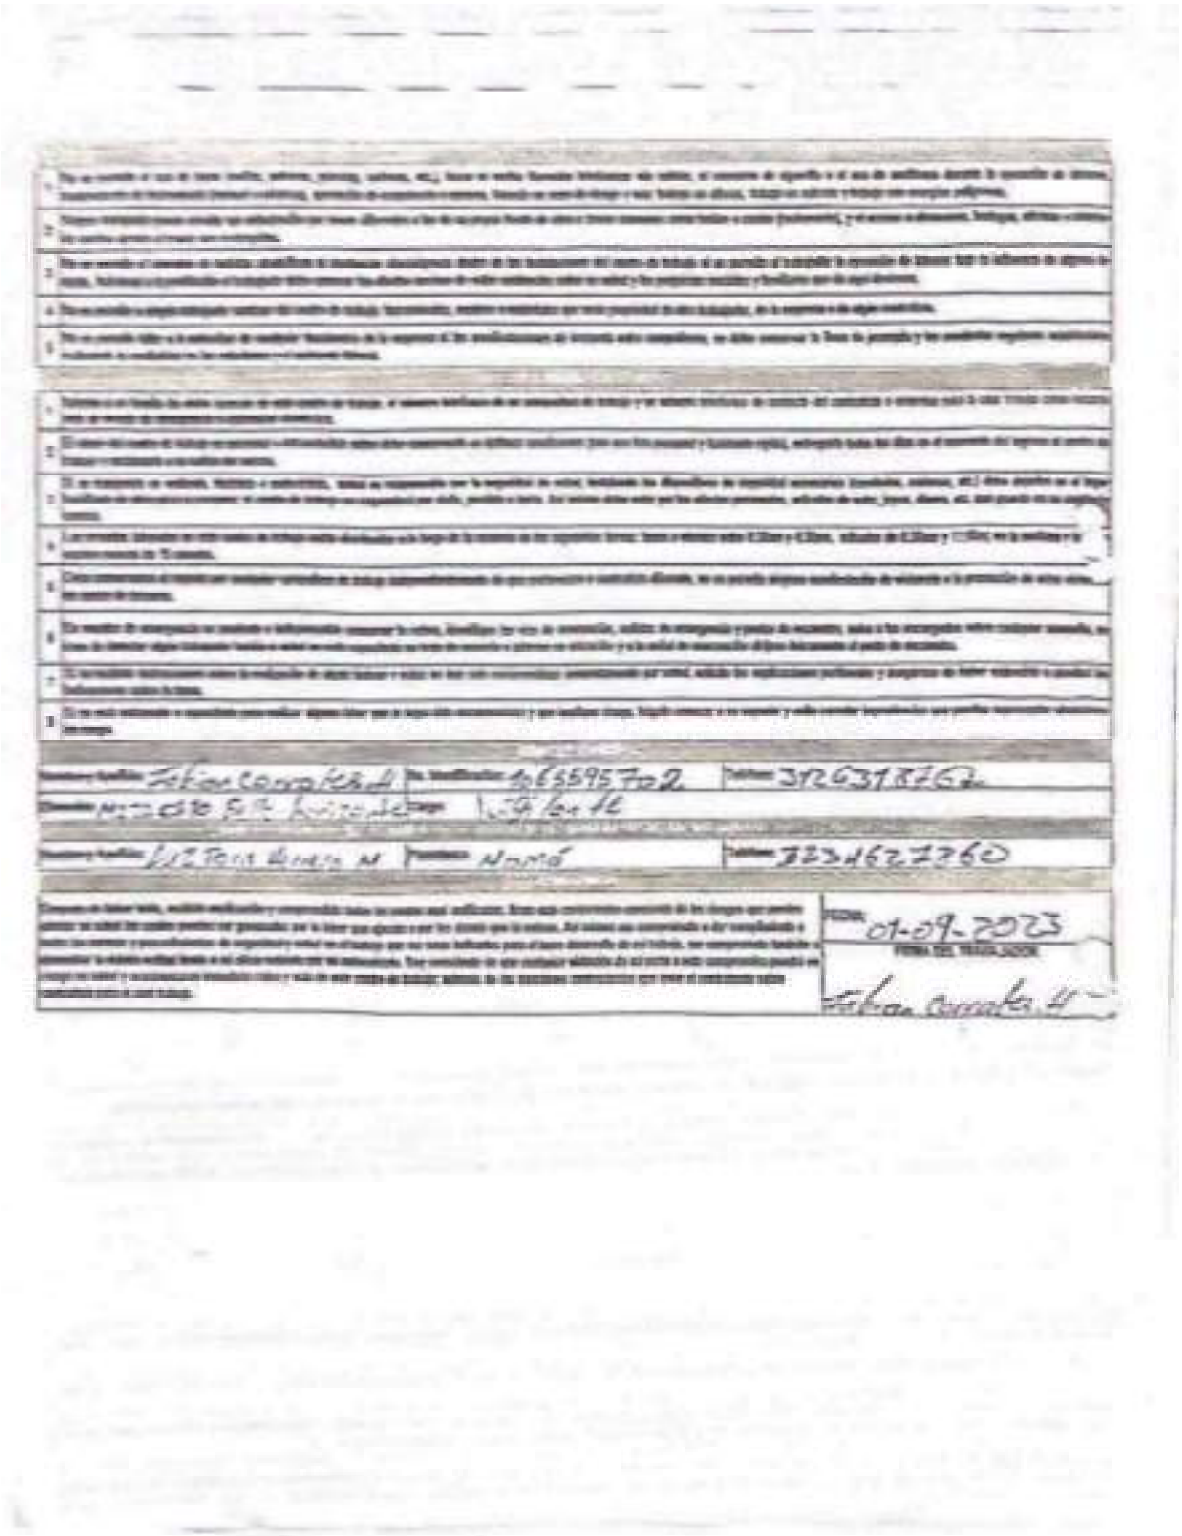

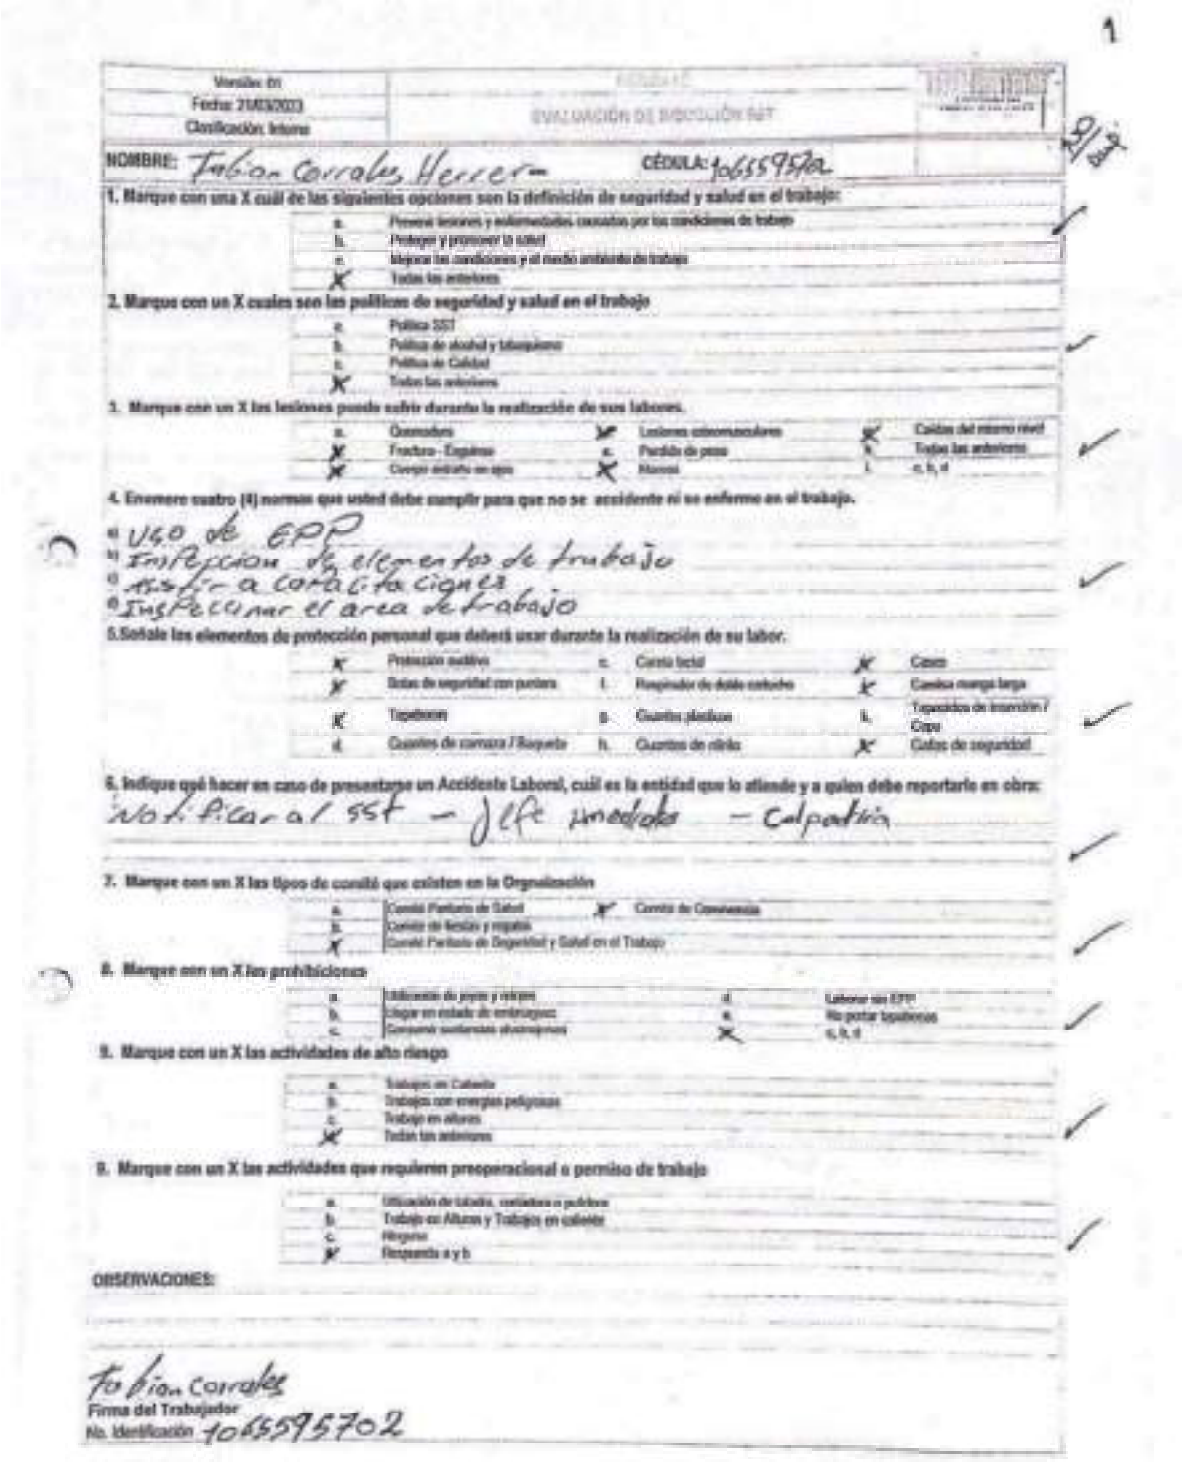

Versión: 01
Fecha: 21/03/2023
Clasificación: Interna

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST

NOMBRE: Fabian Corrales Herrera CÉDULA: 1065595702

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo	✓
b.	Proteger y promover la salud	
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo	
X	Todas las anteriores	

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

a.	Política SST	
b.	Política de alcohol y tabaquismo	✓
c.	Política de Calidad	
X	Todas las anteriores	

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

a.	Quemaduras	X	Lesiones osteomusculares	X	Caídas del mismo nivel
X	Fractura - Esguinces	c.	Perdida de peso	h.	Todas las anteriores ✓
X	Cuerpo extraño en ojos	X	Mareos	i.	a, b, d

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) Uso de EPP
b) Inspección de elementos de trabajo ✓
c) Asistir a capacitaciones
d) Inspeccionar el area de trabajo

5.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X	Protección auditiva	c.	Careta facial	X	Casco
X	Botas de seguridad con puntera	f.	Respirador de doble cartucho	X	Camisa manga larga
X	Tapabocas	g.	Guantes plásticos	h.	Tapaoidos de inserción / Copa ✓
d.	Guantes de carnaza / Baqueta	h.	Guantes de nitrilo	X	Gafas de seguridad

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarlo en obra:

Notificar al SST - Ir a medico - Colpatria ✓

7. Marque con un X los tipos de comité que existen en la Organización

a.	Comité Paritario de Salud	X	Comité de Convivencia
b.	Comité de Ventas y seguros		
X	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo		✓

8. Marque con un X las prohibiciones

a.	Utilización de joyas y relojes	d.	Laborar sin EPP
b.	Llegar en estado de embriaguez	e.	No portar tapabocas
c.	Consumir sustancias alucinogenas	X	c, b, d ✓

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo


a.	Trabajos en Caliente
b.	Trabajos con energías peligrosas
c.	Trabajo en alturas ✓
X	Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo

a.	Utilización de taladro, cortadora o pulidora
b.	Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente ✓
c.	Ninguna
X	Respuesta a y b

OBSERVACIONES:


Fabian Corrales
Firma del Trabajador
No. Identificación 1065595702

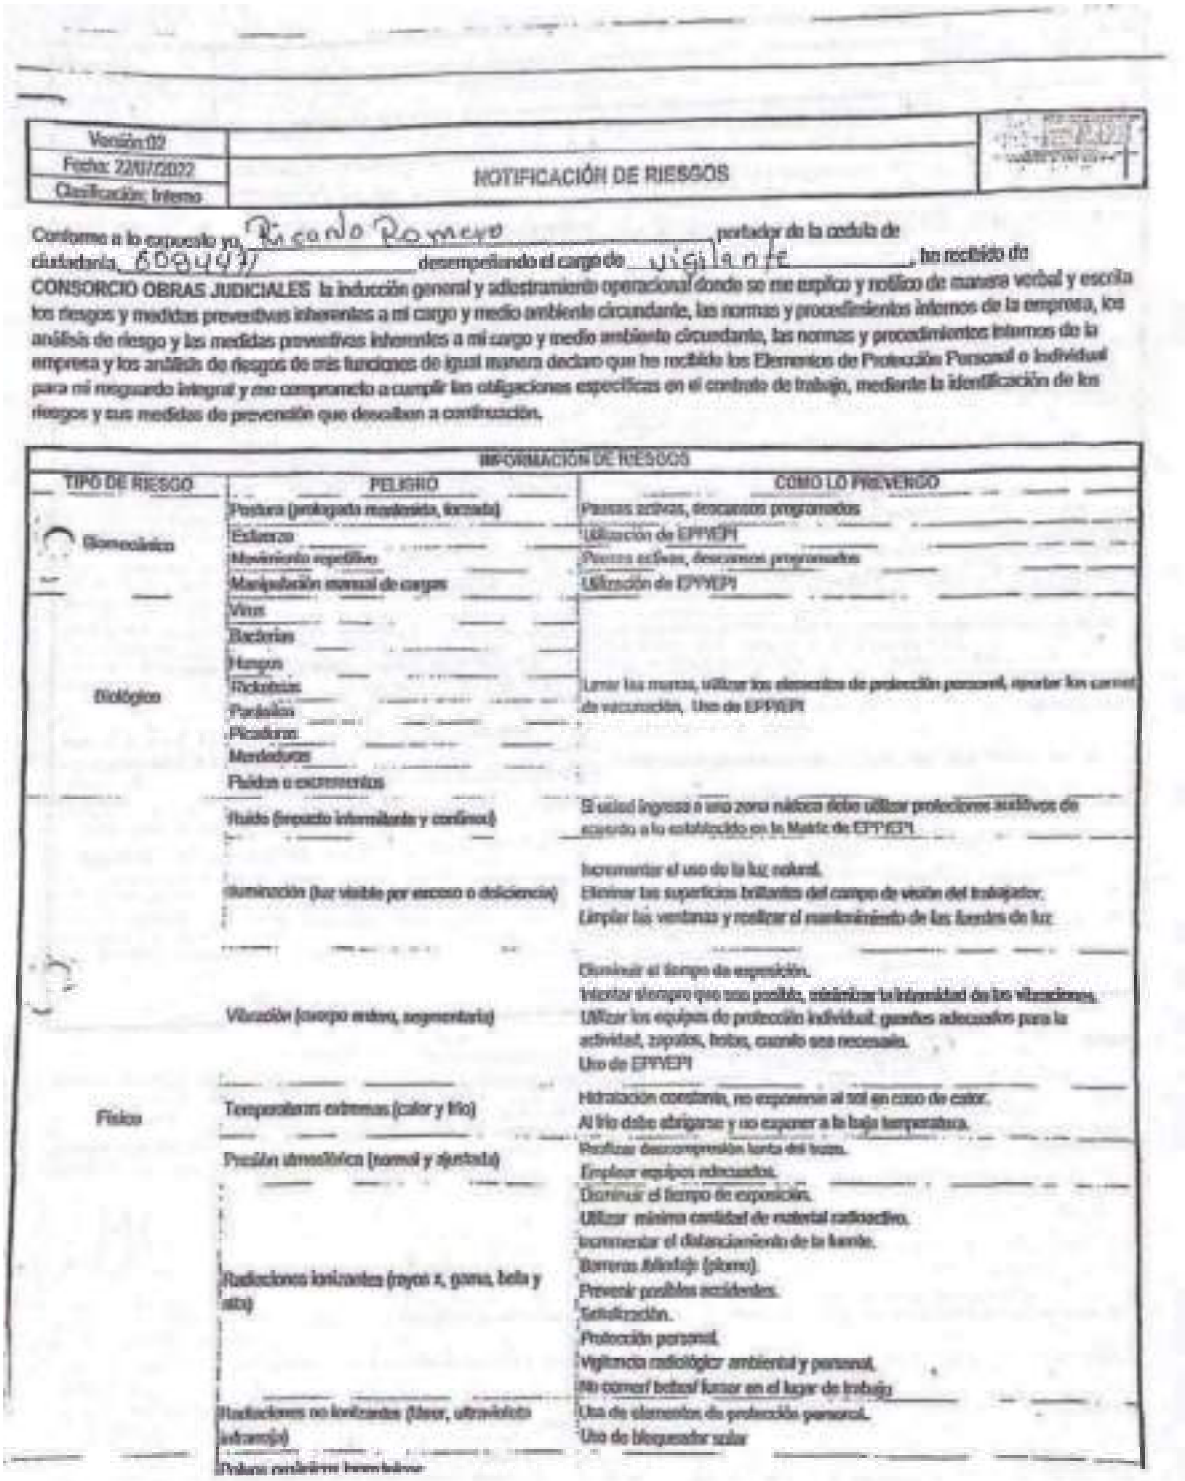

Versión:02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Fecha: 22/07/2022	
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Ricardo Romero portador de la cedula de ciudadanía 6899497 desempeñando el cargo de vigilante he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI.
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras plomadas (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

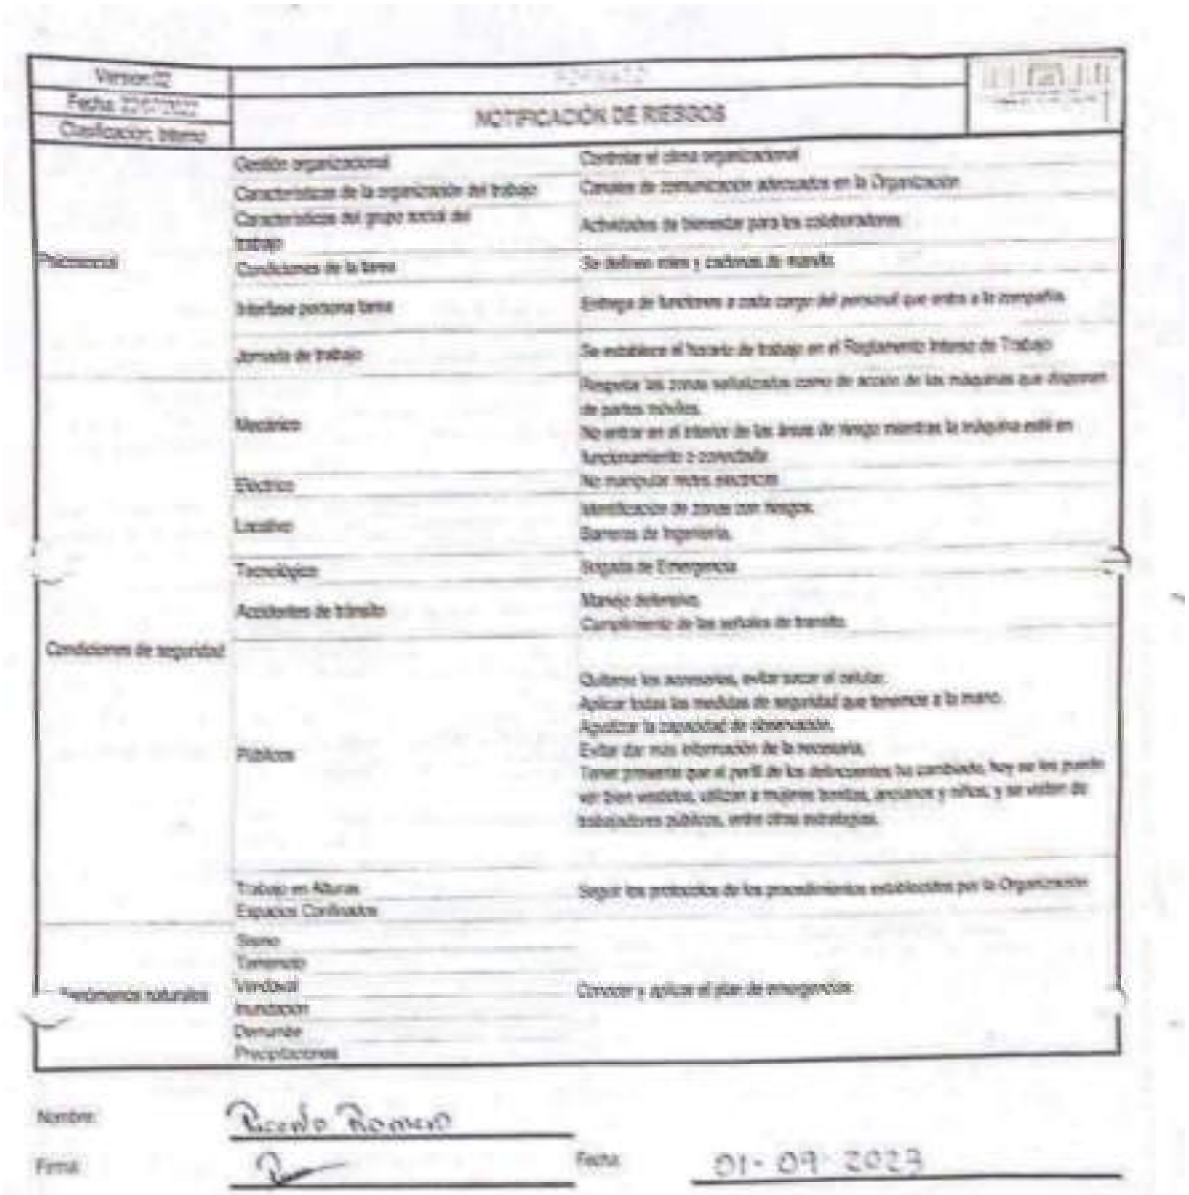

Versión 02 Fecha: [illegible] Clasificación: Interna	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar mas información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños, y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Tormenta Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Ricardo Romero

Firma: [signature] Fecha: 01-09-2023

Fecha: 01-09-2023 Nombre y Apellido: Ricardo Romero Contratista: Security Plus

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, Cuenta a través de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometida con llevar a cabo con proyectos de acuerdo que protege la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, al mismo tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, mejorando continuamente con procesos por ello la gerencia se compromete a asignar los recursos económicos para ejecutarlos y cumplirlos

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete a la gestión de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a todo nivel en la Organización a través del cuidado de la integridad física, la protección y la promoción de la salud de nuestros equipos de trabajo, contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementando y estableciendo la mejora continua al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas orientados al autocuidado, establecimiento de compromisos, los accidentes, enfermedades laborales.
Como consecuencia de los impactos que genera nuestra labor y en pro esto que Consorcio obras judiciales promueve en sus colaboradores la prevención del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias psicoactivas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, vehículos, o durante la prestación de equipos, maquinaria y instalaciones de los clientes. De igual manera, no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo síntomas de embriaguez o bajo efectos de drogas de tipo alucinógenos, durante la ejecución en cumplimiento a la presente política. Realizaremos pruebas aleatorias de alcoholemia.

Para todos los trabajadores que ingresen a la empresa se deben cumplir y cumplimiento legal los afiliaciones al sistema de seguridad social integral (Ley 100 de 1993) son trabajo administradores de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que usted labora realizar los aportes mensuales al sistema, descontando a todos los porcentajes establecidos en la ley.


Al interior de la organización se han establecido un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que se encargara de vigilar el desarrollo del sg sst y participa de actividades que buscan a mejorar la seguridad en el trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores; actividades como inspecciones, investigación de accidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conducta de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, en donde se atenderán posibles de convivencia ocasionales al interior de la Organización, los denuncias son anónimas son anónimas.

Cualquier incumplimiento o falta a las normas de seguridad en el trabajo o omisión a la actividades en este documento por parte del trabajador es incumplimiento al compromiso que se pacto desde el momento de su firma y promueve en causa de sobrellevara.

1. El uso del casco de protección para la cabeza dentro de este centro de trabajo es permanente y obligatorio. Solo ningún circunstancia se permite usar debajo de este elementos diferentes a los que los fabricas (gorras, pañoletas, tapas, etc.).

2. El uso de los elementos de protección personal para ojos, vías respiratorias y oídos es obligatorio, al igual que el uso de elementos contra caídas, cuyo o vehículo de trabajo. Los ítem de elementos dispuestos en la labor que se ejecute o el ambiente dentro del cual se desarrollan las labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de los elementos de protección personal necesarios, así mismo responsabilidad del trabajador en mantenerlo en buen estado y cuidado necesario para garantizar la efectividad de la protección con propósitos.



3. Las áreas de trabajo deben permanecer en completo orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor usted debe velar por el aseo del área de trabajo y el orden en seguridad e equipos utilizados.

4. Todo trabajo que se ejecute y que tenga alturas de más por encima de 2.0 metros, en de trabajo en alturas para realizarlo es necesario tener el certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas e inspector SST. (Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas) es responsabilidad del trabajador y del coordinador llevar al correspondiente permiso de trabajo, hacer correcto uso de los elementos y equipos de protección personal requeridos para el desarrollo de la labor así como el montaje de plataformas y andamios.



5. Independientemente de la gravedad, cualquier incidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su capataz, encargado, al monitor general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para brindarle la atención necesaria y surgir el debido procedimiento.

6. Todo trabajador debe notificar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeña o en la que vea ejecutarse que sea peligrosa y que pueda generar daños sobre salud o sobre los demás trabajadores dentro de la salud.

7. Todo trabajador debe permanecer atento y cumplir toda la señalización instalada en obra: uso de elementos de protección personal, rutas de evacuación, salidas de emergencia, punto de encuentro, zonas de cargue y descargue de materiales, pasos restringidos, cuidados de cielo en zonas de riesgo, cerramientos, avisos de emergencia (señaleros), encamisadores, etc.


8. Todo herramienta eléctrica que utilice disco de corte, equipo que cuente con transmisión de polea o equipo con arranque por pago debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiera como guardas de disco, cuerdas de poder, tapas, etc. si en el trabajo con pulidoras, cortadoras, planas, rasos, rasqueo, vibradores, taqueo, etc. usted detecta la falta de este dispositivo, debe notificar inmediatamente a su capataz, al encargado, al monitor general o al [illegible]


Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interna		

PROYECTO:	Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia.				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Inducción SST, Política SST, Política de alcohol y drogas, Reglamento de higiene y SST, Notificación de Riesgo. Evaluación SST.				
TIPO DE ACTIVIDAD:		CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	1 Hora
FECHA:	01-09/2023			LUGAR:	Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
	[illegible]	1065638270	[illegible]	

OBSERVACIONES

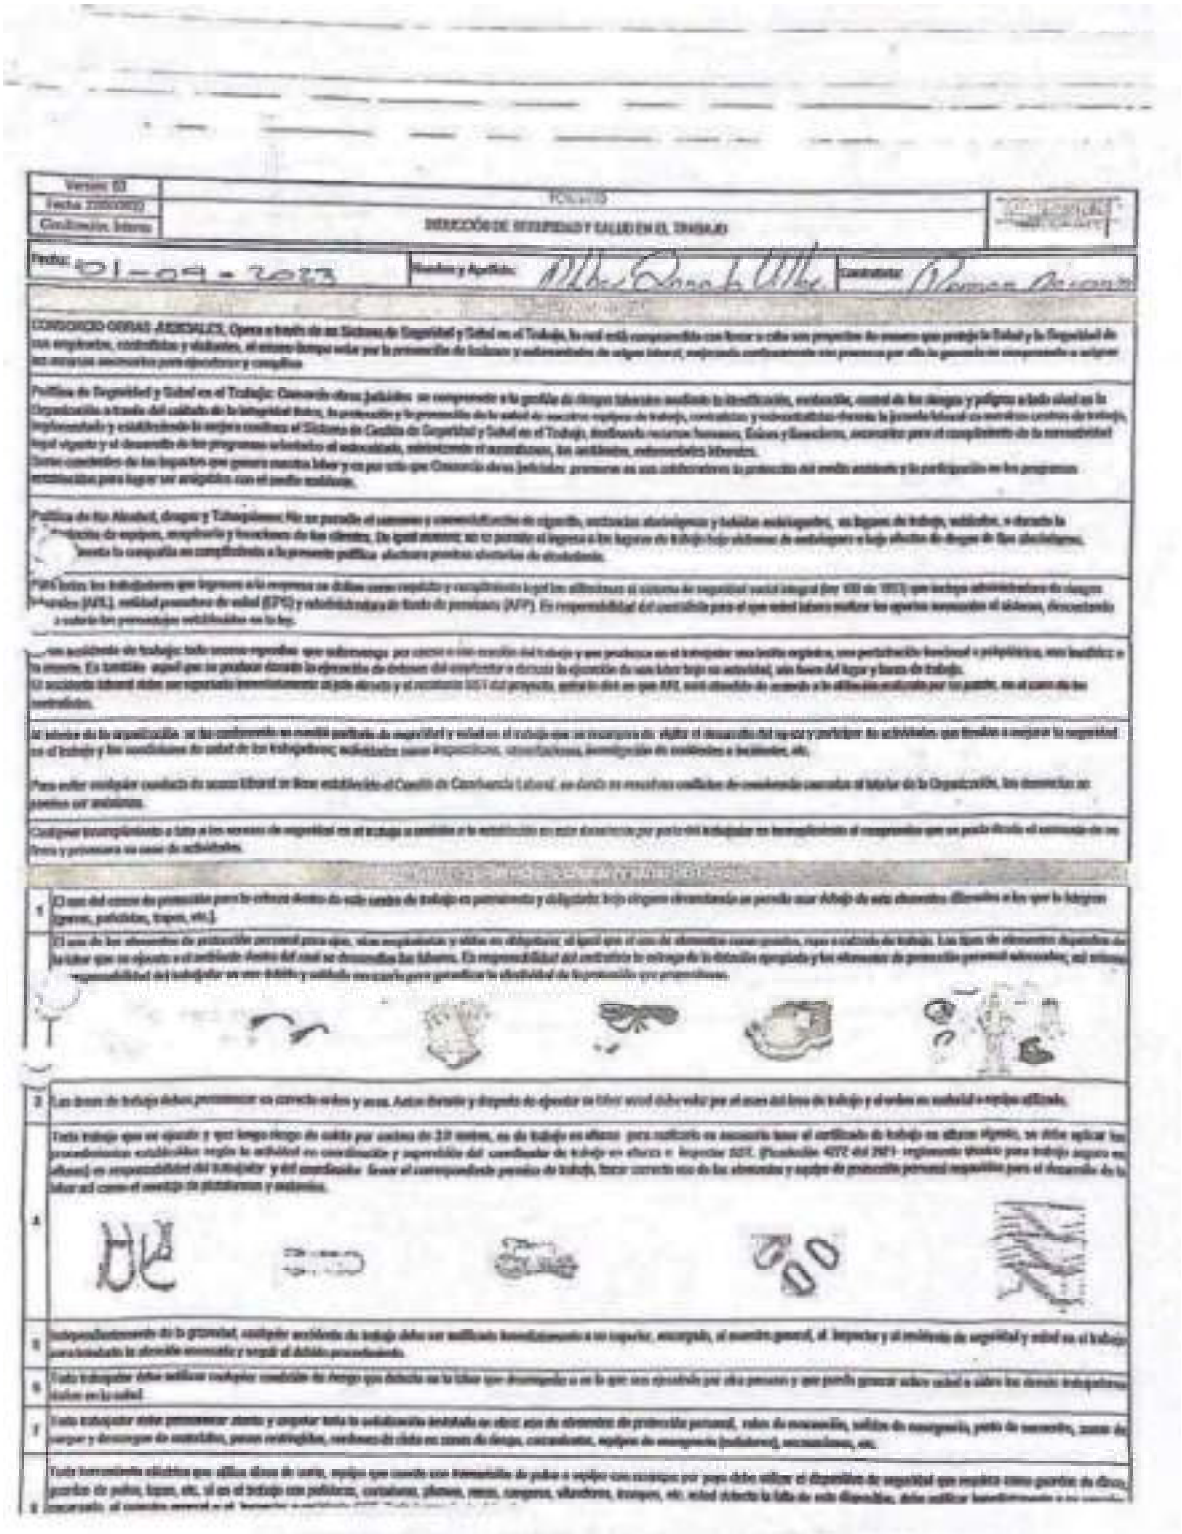


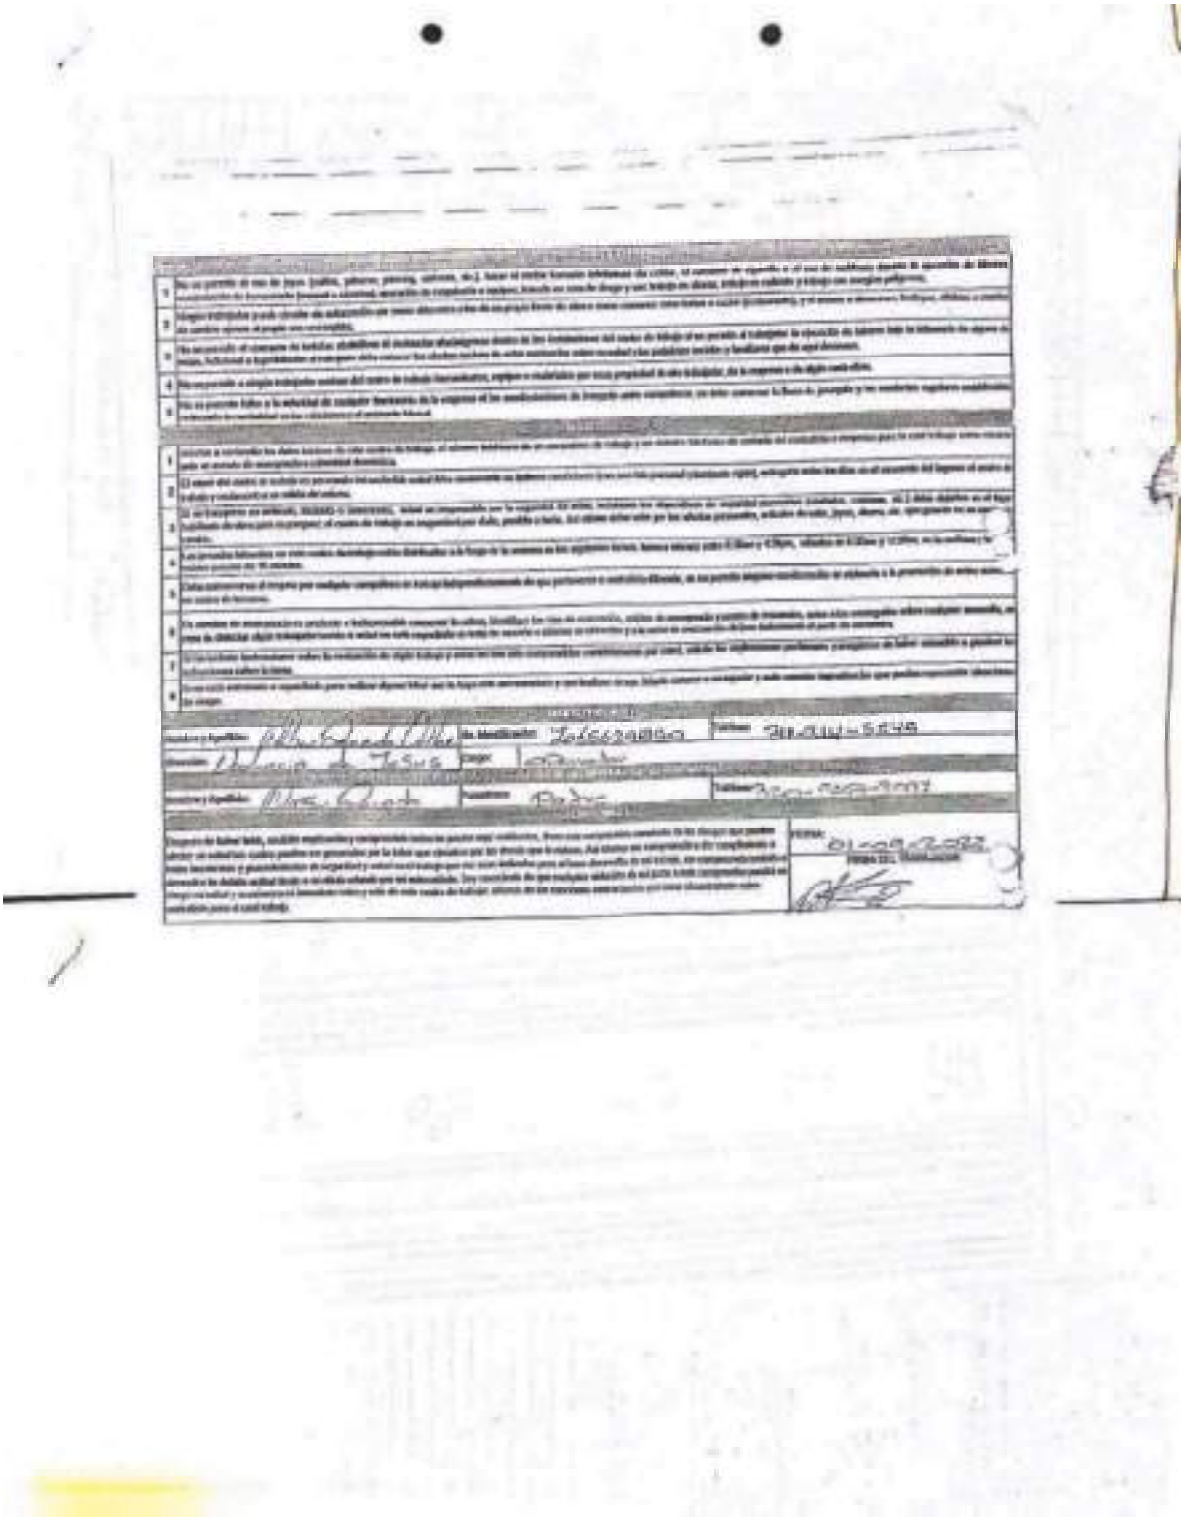

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, _____, portador de la cedula de ciudadanía _____ desempeñando el cargo de _____, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descanso programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descanso programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excreciones	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI.
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, disminuir la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gamma, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras (blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No consumir bebidas con alcohol en el lugar de trabajo. Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Peligro ambiente inundación	

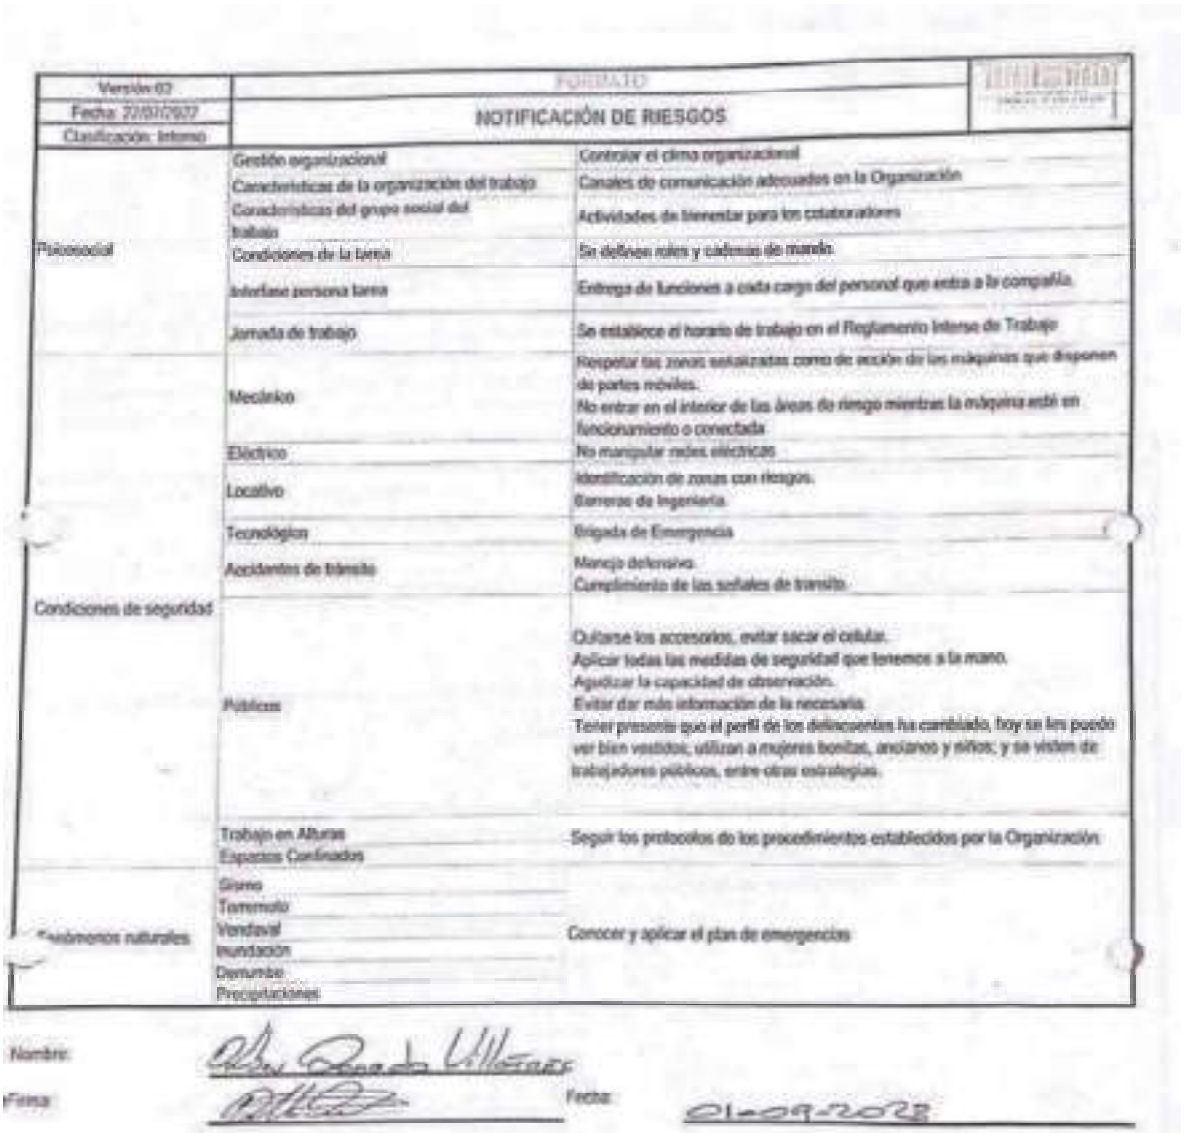

Versión:02 Fecha: 20/07/2022 Clasificación: Interno	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: [illegible]

Firma: [illegible] Fecha: 01-09-2022

Versión: 01
Fecha: 21/03/2023
Clasificación: Interna

NOMBRE: [illegible] CÉDULA: 1065639820

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Previene lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo	
b.	Protege y promueve la salud	
c.	Mejora las condiciones y el medio ambiente de trabajo	
X	Todas las anteriores	

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

a.	Política SST	
b.	Política de alcohol y tabaquismo	
c.	Política de Calidad	
X	Todas las anteriores	

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

a.	Quemaduras	d.	Lesiones osteomusculares	g.	Caidas del mismo nivel
b.	Fracturas - Esguinces	e.	Perdida de vision	h.	Todas las anteriores
c.	Cuerpo extraño en ojos	f.	Mareos	X	a, b, d

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) Respetar la señalización
b) usar EPP
c) asistir a charla
d) Inspecciones antes de trabajo

5. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X	Protección auditiva	a.	Careta facial	X	Casco
X	Botas de seguridad con puntera	f.	Respirador de doble cartucho	j.	Camisa manga larga
X	Tapabocas	g.	Guantes plastizos	X	Tapaoidos de inserción / Copa
d.	Guantes de carnaza / Ruspelo	X	Guantes de vidrio	X	Gafas de seguridad

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarle en obra:

Informar al SST, positiva

7. Marque con un X los tipos de comité que existen en la Organización

a.	Comité Paritario de Salud	X	Comité de Convivencia
b.	Comité de Brigadas y vigilias		
X	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo		

8. Marque con un X las prohibiciones

a.	Laboración de pipas y trabajo	d.	Laborar sin EPP	
b.	Llegar en estado de embriaguez	e.	No portar tapabocas	
c.	Consumir sustancias psicoactivas	X	a, b, d	

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo

a.	Trabajos en Caliente
b.	Trabajos con energías peligrosas
c.	Trabajo en alturas
X	Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo

a.	Utilización de taladro, rotatoria o pulidora
b.	Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente
c.	Ninguna
X	Ninguna a y b

OBSERVACIONES:

Firma del Trabajador
No. Identificación 1065639820

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interna		

PROYECTO:	Construcción Nueva Torre Palacio de Justicia.						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Notificación de Riesgo, Inducción, Política de alcohol y drogas, Reglamento de higiene y SST, Evaluación SST.						
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Karen Soto				DURACIÓN:	1 Hora	
FECHA:	21-09/2023			LUGAR:	Palacio de Justicia.		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
	José Alberto Gutierrez	1122.996.146	Security Force	José Gutierrez
	Tejon Sanchez Chamorro	1065646526	Security Force	Tejon Chamorro
	Esneider Gutierrez	77185068	Security Force	Esneider Gutierrez

OBSERVACIONES

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Jesus Andres Chamorro Soto, portador de la cedula de ciudadanía [illegible], desempeñando el cargo de Vigilante, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS


TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar las carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	El edad ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras: Blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	


Versión:02 Fecha: 22/07/2022 Clasificación: Interno	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de transito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
	Espacios Confinados	
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Jeison Andres chaparro Sanz

Firma: Jeison Andres chaparro

Fecha: 21/09/2023

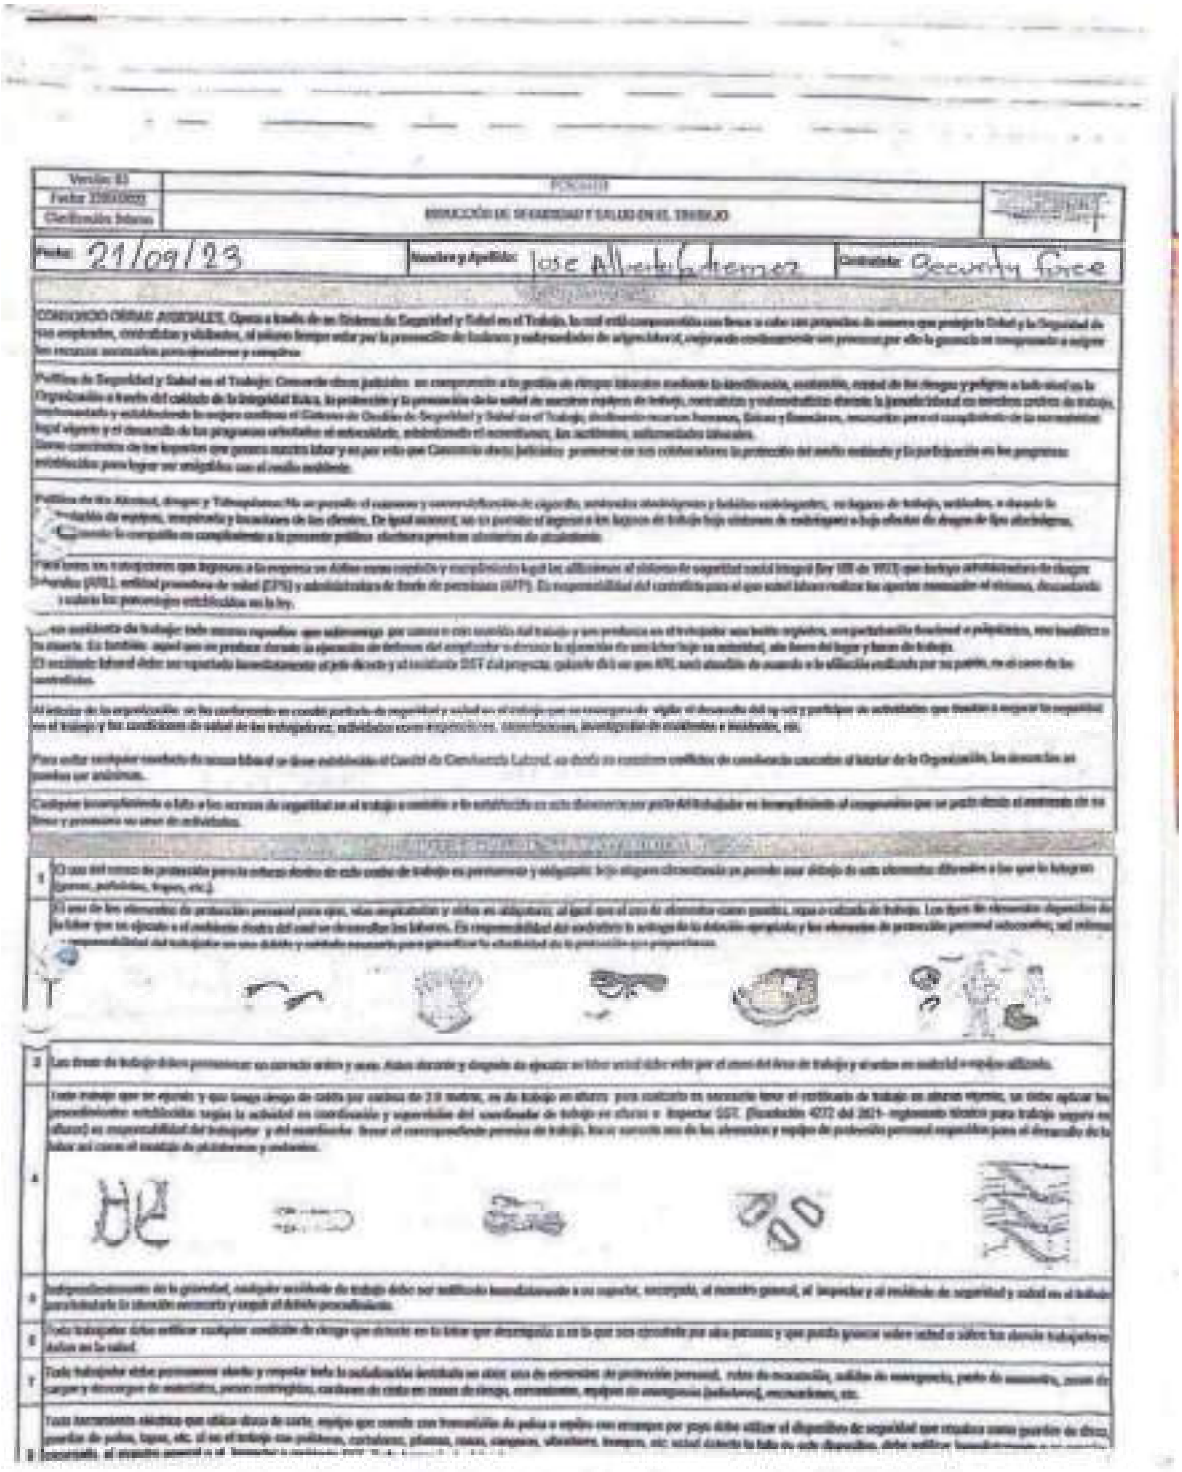

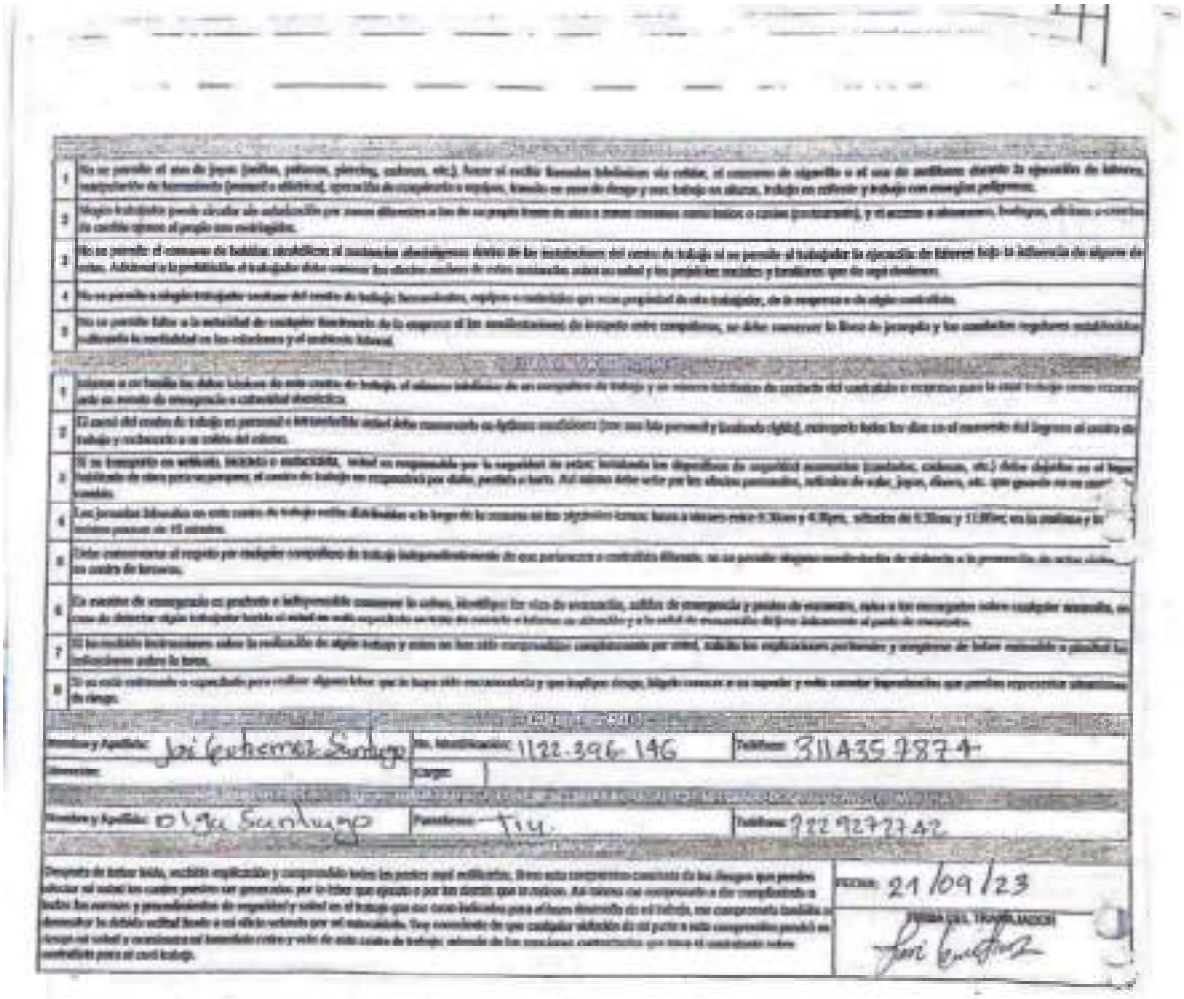

Nombre y Apellido: Jair Guerrero Santiago — No. Identificación: 1122-396-146 — Teléfono: 3114357874

Nombre y Apellido: Olga Santiago — Parentesco: Tía — Teléfono: 322 927 27 42

Después de haber leído, recibido explicación y comprendido todos los puntos aquí enlistados, libre esta comprometo cumplirlo de los riesgos que pueden afectar mi salud los cuales pueden ser generados por la labor que ejecuto o por las demás que se realicen. Así mismo me comprometo a dar cumplimiento a todas las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que son casa indicados para ellevar a desarrollo de mi labor, me comprometo también a denunciar los delitos contra la salud frente a mi oficio ocurrido por mi naturaleza. Soy consciente de que cualquier violación de mi parte a este compromiso pondrá en riesgo mi salud y ocasionara mi inmediato retiro y veto de este centro de trabajo, además de las sanciones contractuales que tiene el contratante sobre controlista para el cual trabajo.

FECHA: 21/09/23

FIRMA DEL TRABAJADOR

Versión: 01 | FORMATO | Fecha: 21/03/2021 | EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST | Clasificación: Interna

NOMBRE: José Alberto Cardenas Cartagena CÉDULA: 1117976146

10/10

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X	Todas las anteriores

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

a.	Política SST
b.	Política de alcohol y tabaquismo
c.	Política de Calidad
X	Todas las anteriores

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

a.	Quemaduras	d.	Lesiones osteomusculares	g.	Caídas del mismo nivel
b.	Fractura - Esguince	e.	Perdida de peso	h.	Todas las anteriores
c.	Cuerpo extraño en ojos	f.	Mareos	X	a, b, e

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

1) No ingresar en Pesos no autorizados
2) Respetar las Señalizacion
3) No ingerir bajo el efecto del alcohol.
4) Utilizando los elementos de proteccion

5.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a.	Protección auditiva	e.	Careta facial	i.	Casco
X	Botas de seguridad con puntera	f.	Respirador de doble cartucho	X	Camisa manga larga
X	Tapabocas	g.	Guantes plásticos	k.	Tapaoidos de Inserción y Copa
d.	Guantes de carnaza / Baquela	h.	Guantes de nitrilo	X	Gafas de seguridad

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarle en obra:

Comunicar a nuestro Supervisor Inmediato, indicandole los Sucesos
Colpatria

7. Marque con un X las tipos de comité que existen en la Organización

X	Comité Paritario de Salud	X	Comité de Convivencia
b.	Comité de tercios y seguros		
X	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo		

8. Marque con un X las prohibiciones

X	Utilización de joyas y relojes	d.	X	Laborar sin EPP	
X	Ingerir sin estado de embriaguez	e.	X	No portar tapabocas	
X	Consumir sustancias alucinogenas	f.	X	a, b, d	

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo

a.	Trabajos en Caliente
b.	Trabajos con energías peligrosas
c.	Trabajo en alturas
X	Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo

a. X	Utilización de taladro, cortadora o pulidora
X	Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente
c.	Ninguna
X	Respuesta a y b


OBSERVACIONES:


Firma del Trabajador
No identificación 1117 397 146

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, José Alberto Gutierrez Gutierrez, portador de la cedula de 1122-396146 ciudadanía 1122 396 146 desempeñando el cargo de Vigilante, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a la señalización en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta de buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Presión anormal (hiperbárica	

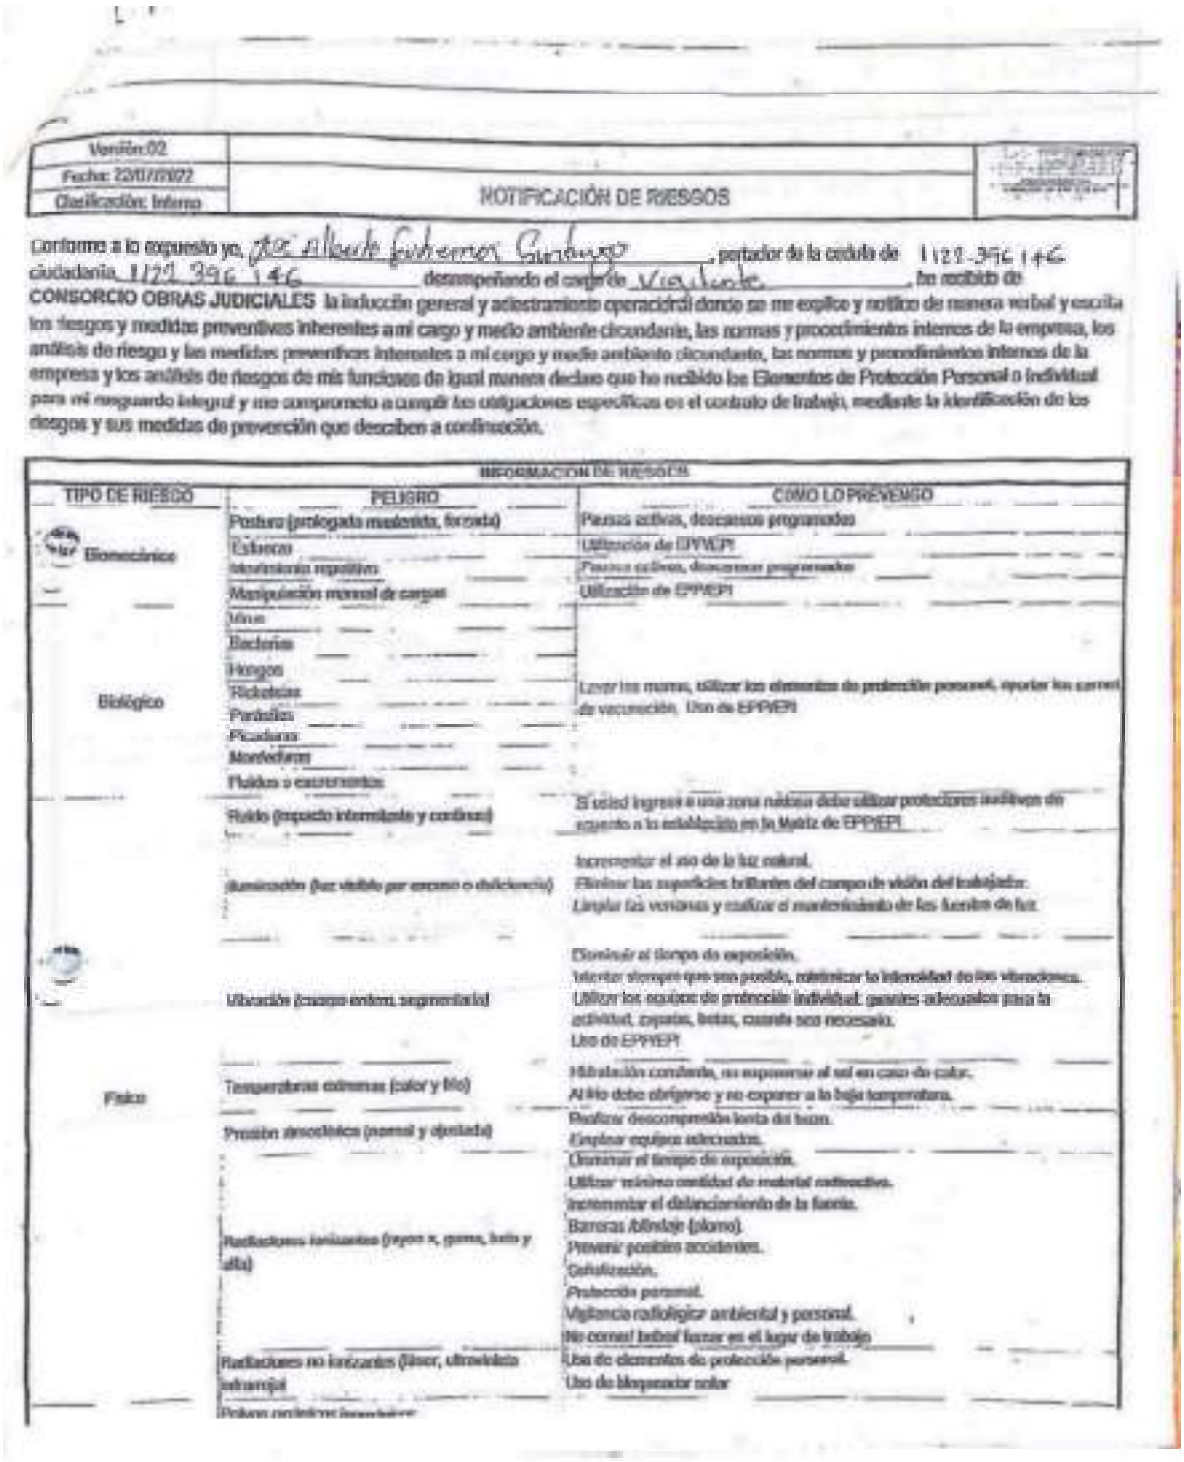


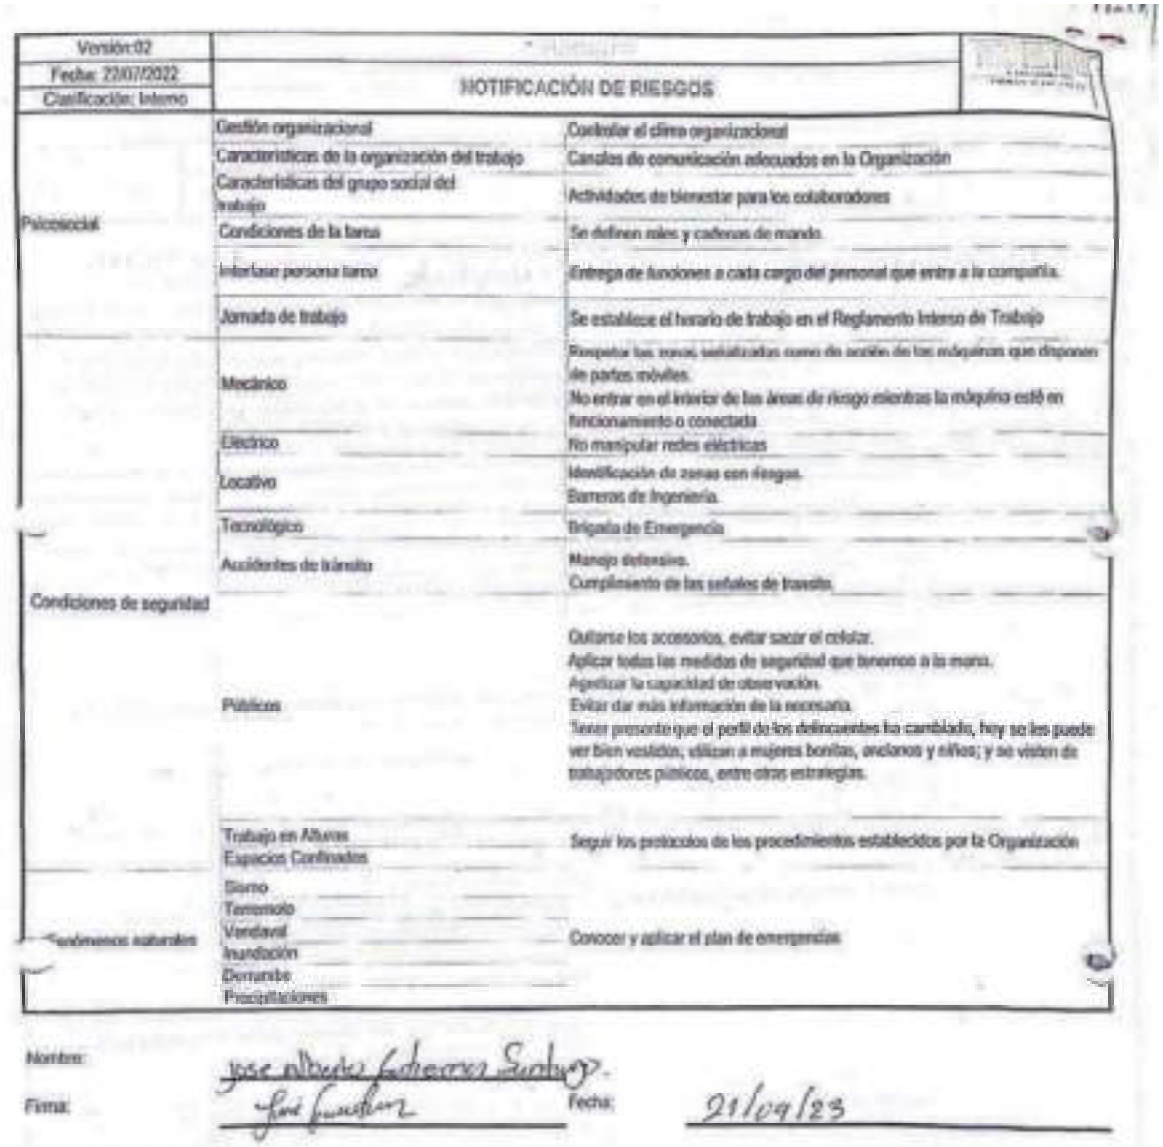


Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las vocas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológicos	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: jose alberto cabezas santos

Firma: [signature] Fecha: 21/04/23

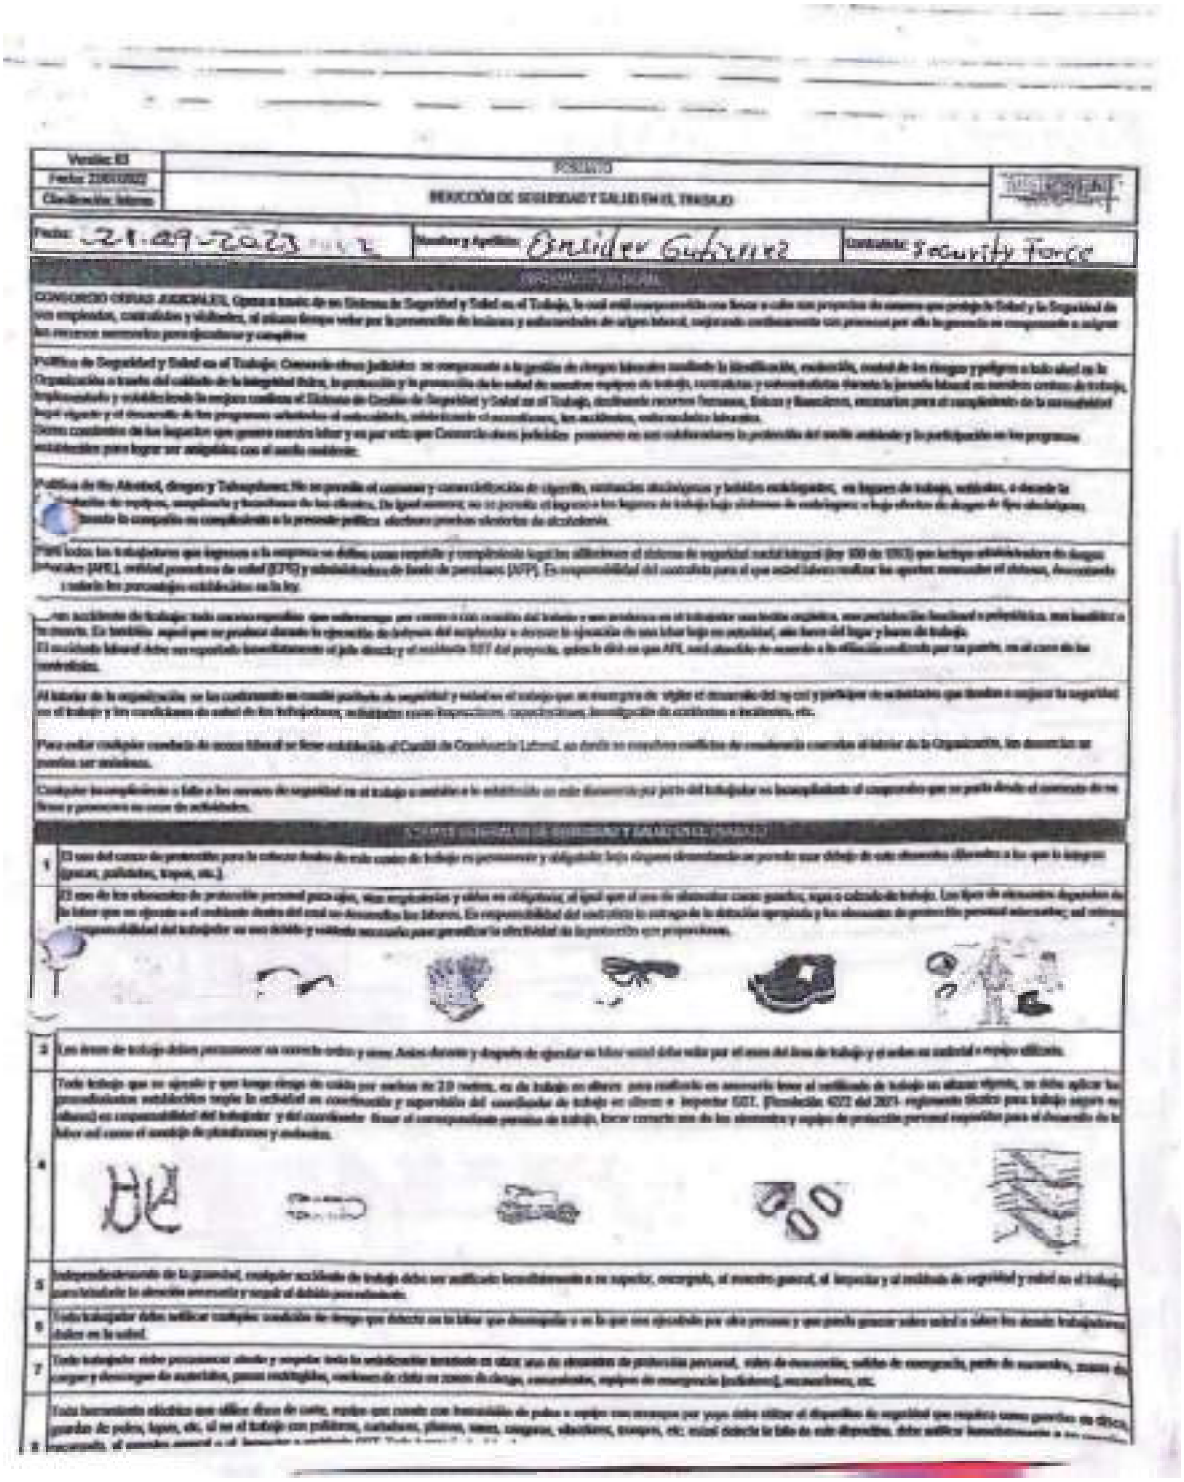

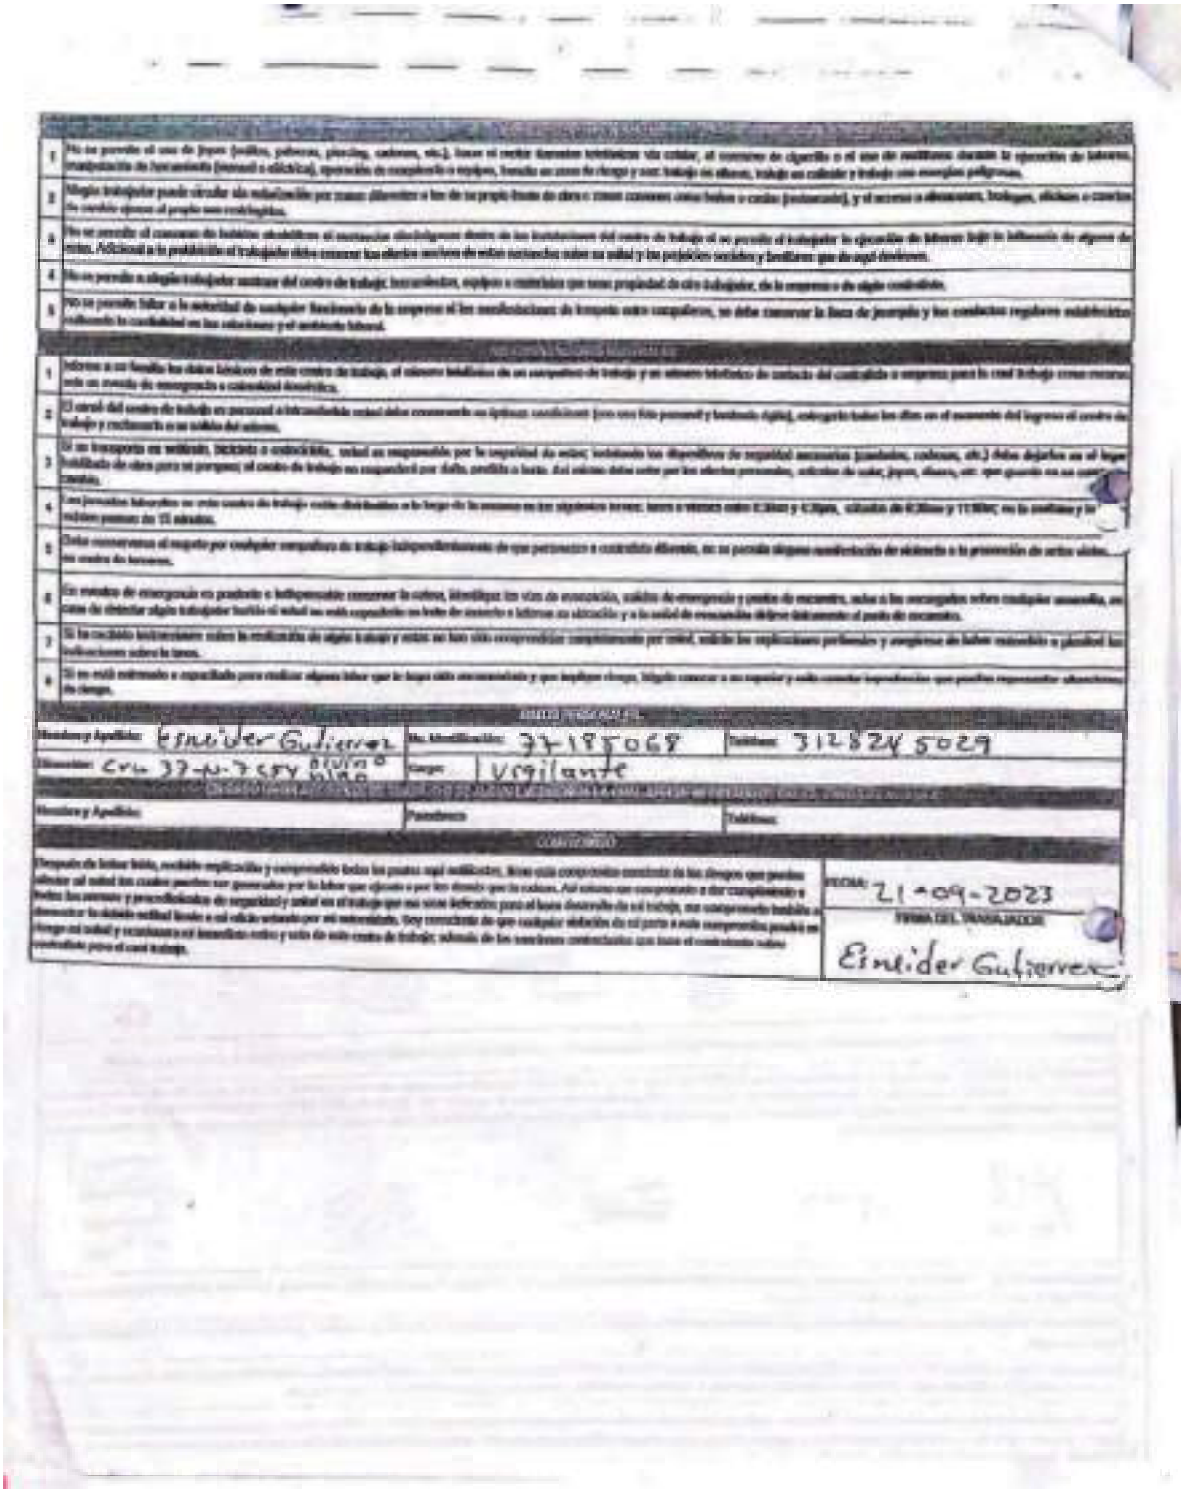


Nombres y Apellidos:	Einider Gutierrez	No. Identificación: 77185068	Teléfono: 3128245029
Dirección:	Cra 37-N-7 C87 Divino Niño	Cargo:	Vigilante

Nombres y Apellidos:	Parentesco	Teléfono:

FECHA: 21-09-2023

FIRMA DEL TRABAJADOR

Einider Gutierrez

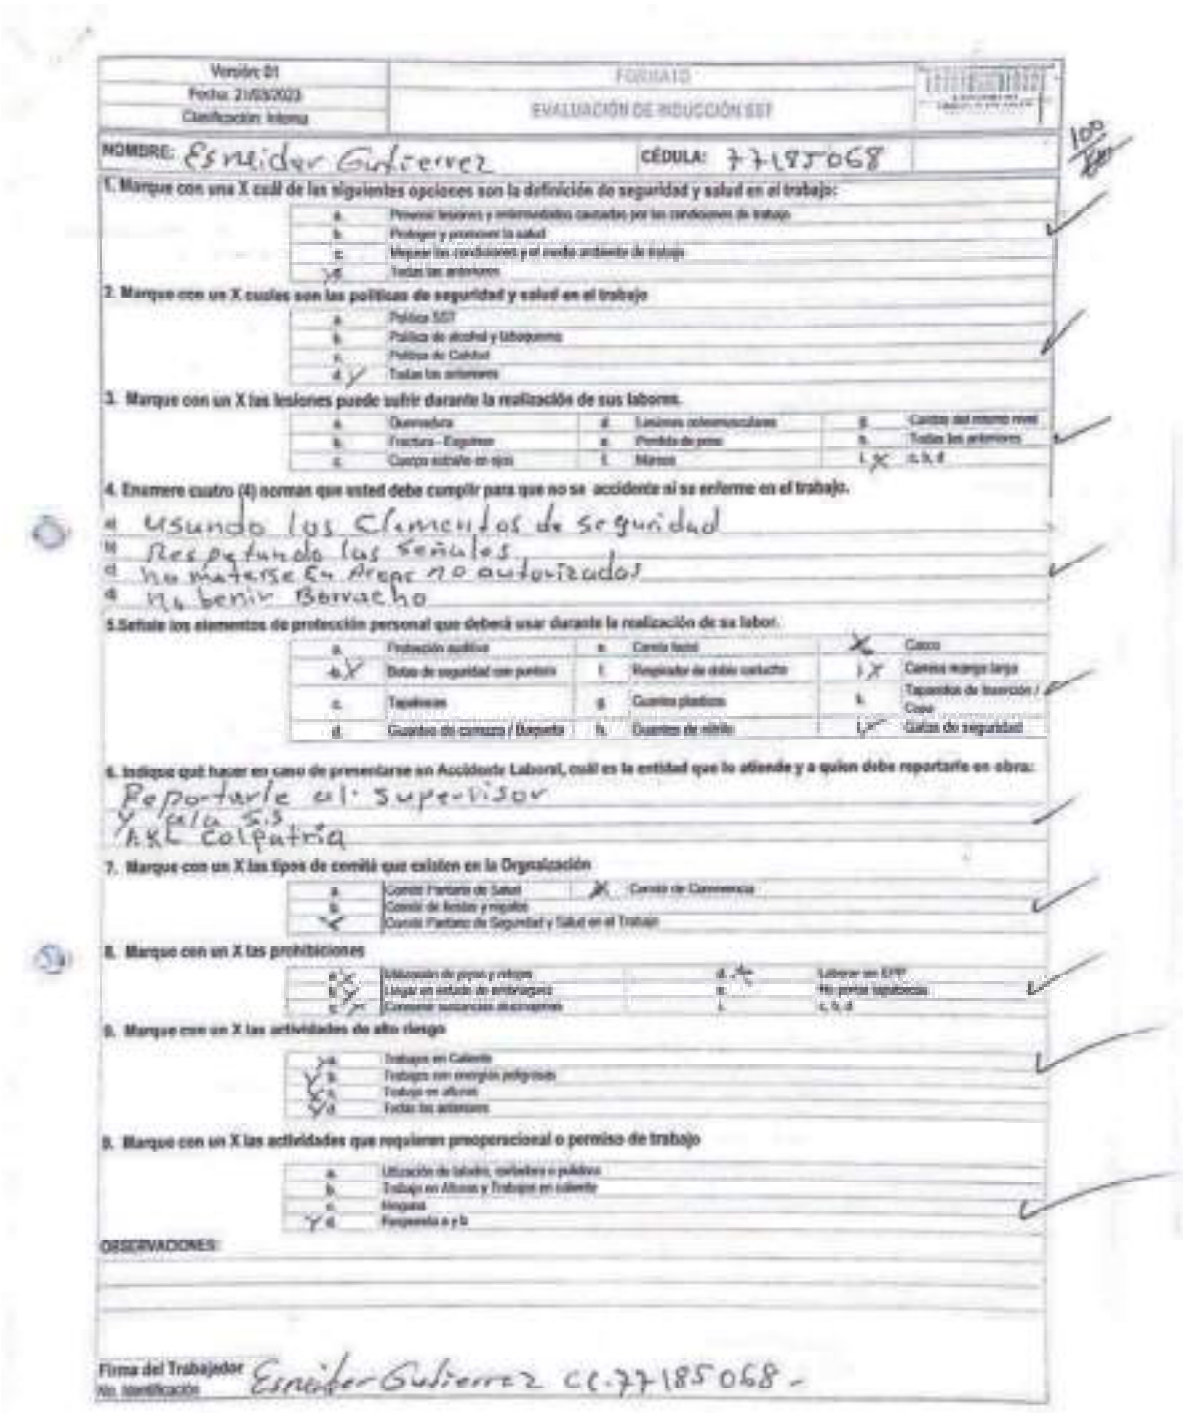

Versión: 01	FORMATO
Fecha: 21/03/2023	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST
Clasificación: Interna	

NOMBRE: Esneider Gutierrez CÉDULA: 77185068

100

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X d.	Todas las anteriores

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

a.	Política SST
b.	Política de alcohol y tabaquismo
c.	Política de Calidad
d. X	Todas las anteriores

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

a.	Quemadura	d.	Lesiones osteomusculares	g.	Caidas del mismo nivel
b.	Fractura - Esguinces	e.	Perdida de pelo	h.	Todas las anteriores
c.	Cuerpo extraño en ojos	f.	Mareos	i. X	a, b, d

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a Usando los Elementos de seguridad
b Respetando las señales
c No matarse En Areas no autorizados
d No venir Borracho

5.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a.	Protección auditiva	e.	Careta facial	X	Casco
a X	Botas de seguridad con puntera	f.	Respirador de doble cartucho	i X	Camisa manga larga
c.	Tapabocas	g.	Guantes plasticos	k.	Tapaoidos de inserción / Copa
d.	Guantes de carnaza / Baqueta	h.	Guantes de nitrilo	L ✓	Gafas de seguridad

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarlo en obra:

Reportarle al Supervisor
y pela los
ARL Colpatria

7. Marque con un X los tipos de comité que existen en la Organización

a.	Comité Paritario de Salud	X	Comité de Convivencia
b.	Comité de Ventas y regalos		
X	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo		

8. Marque con un X las prohibiciones

a X	Utilización de joyas y relojes	d. X	Laborar sin EPP
b X	Llegar en estado de embriaguez	e.	No portar Identificación
c X	Cometer sustancias alucinogenas	f.	a, b, d

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo

X a.	Trabajos en Caliente
X b.	Trabajos con energías peligrosas
X c.	Trabajo en alturas
X d.	Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo

a.	Utilización de taladro, martillera o pulidora
b.	Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente
c.	Ninguna
X d.	Respuesta a y b

OBSERVACIONES:


Firma del Trabajador: Esneider Gutierrez
No. Identificación: CC. 77185068.

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Fernidel Gutierrez, portador de la cedula de ciudadanía 77185068 desempeñando el cargo de: Vigilante, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS


TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI.
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentario)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras plomizo (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No consul bebas/ fumar en el lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Pulsos electrónicos inversionales	

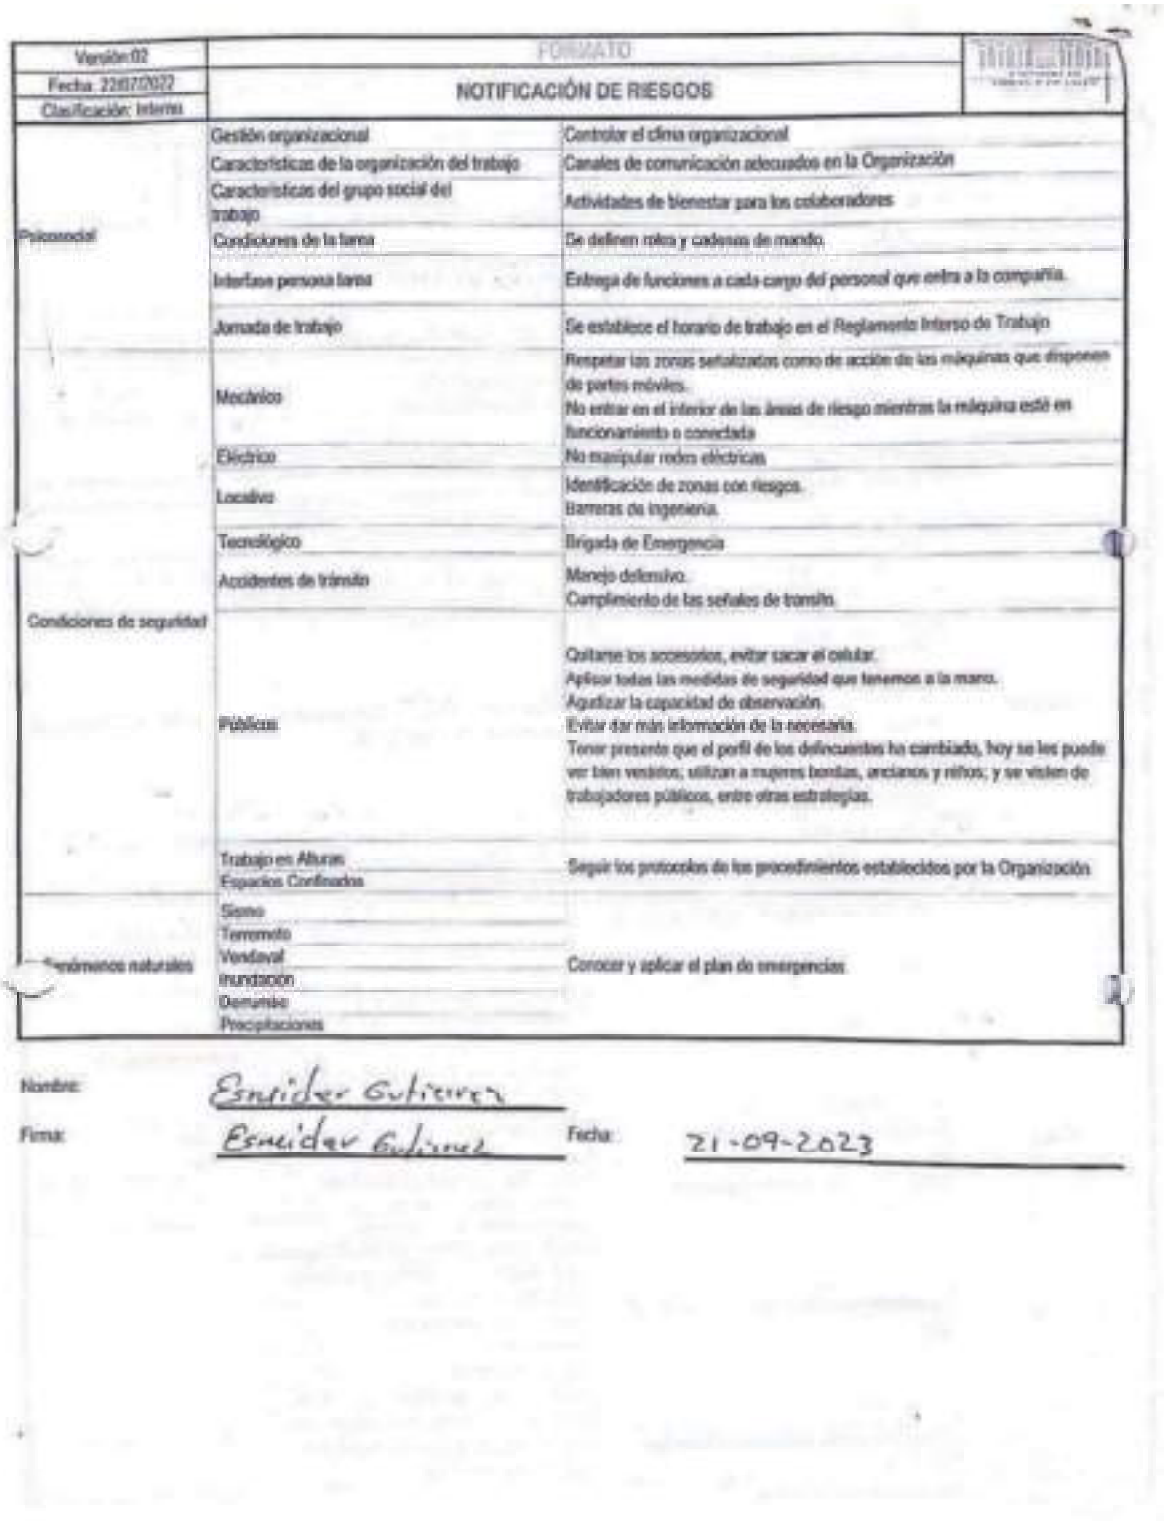


Versión:02	FORMATO	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interna		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños, y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Esneider Gutierrez

Firma: Esneider Gutierrez Fecha: 21-09-2023

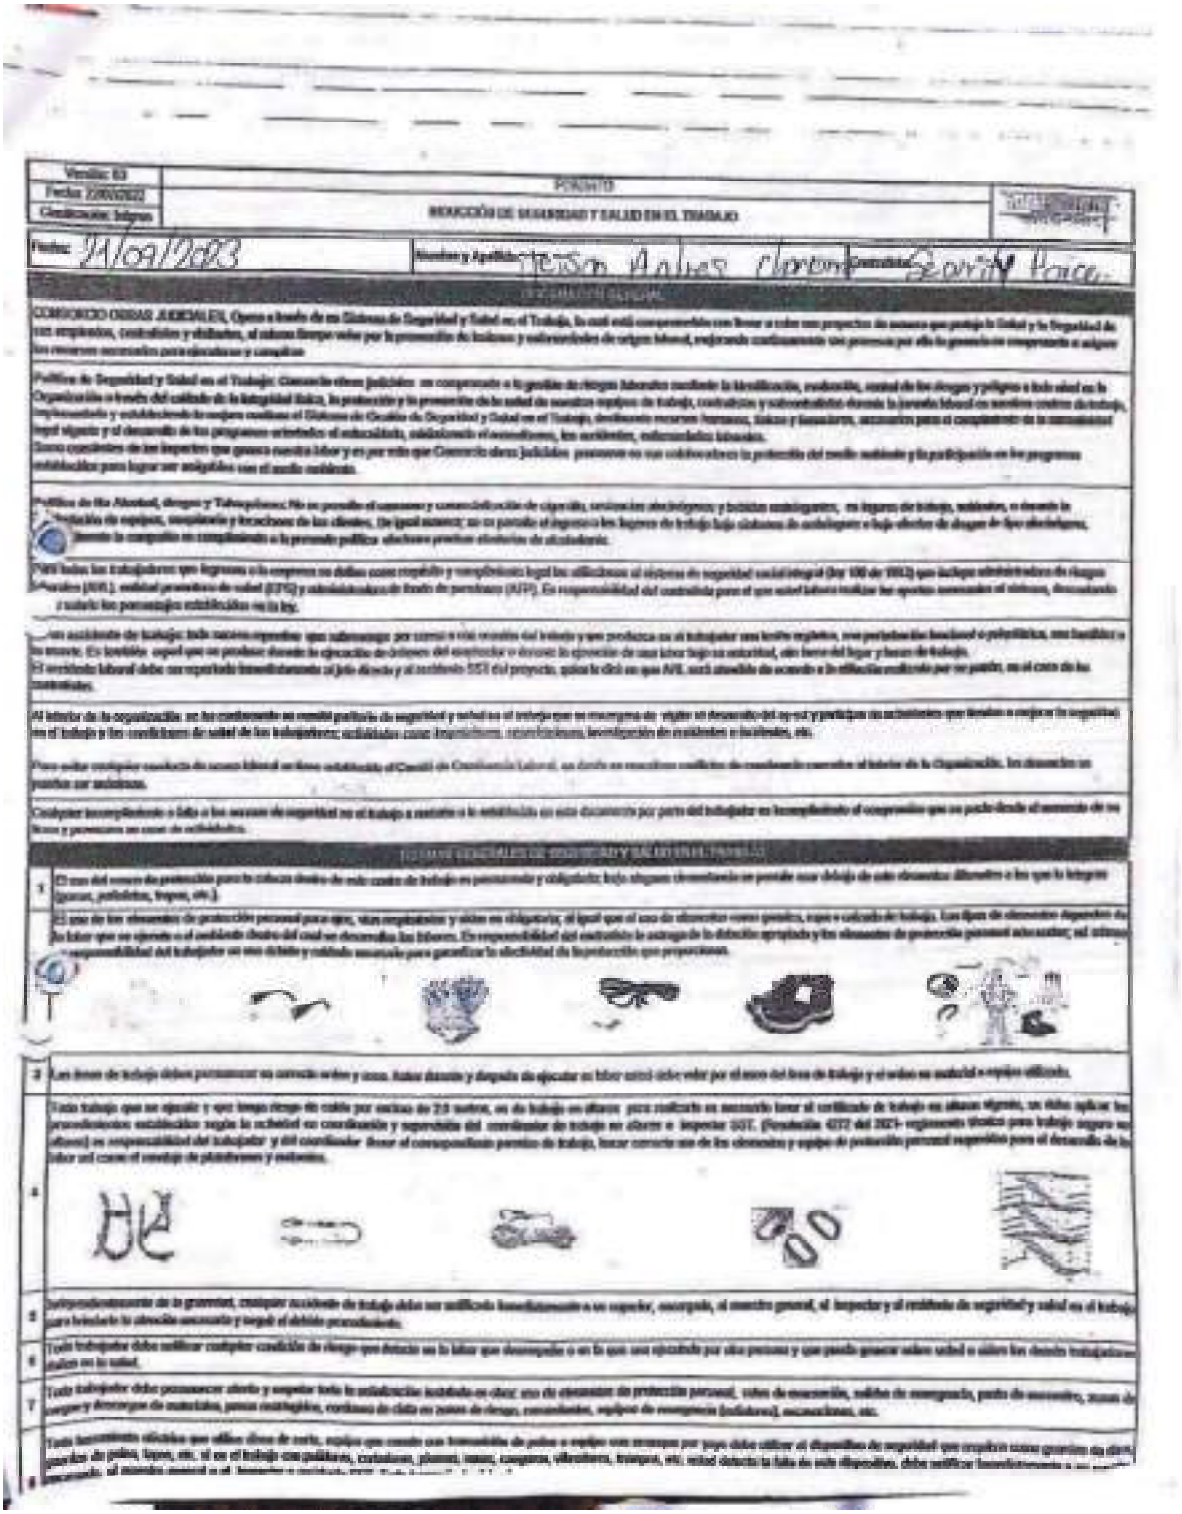

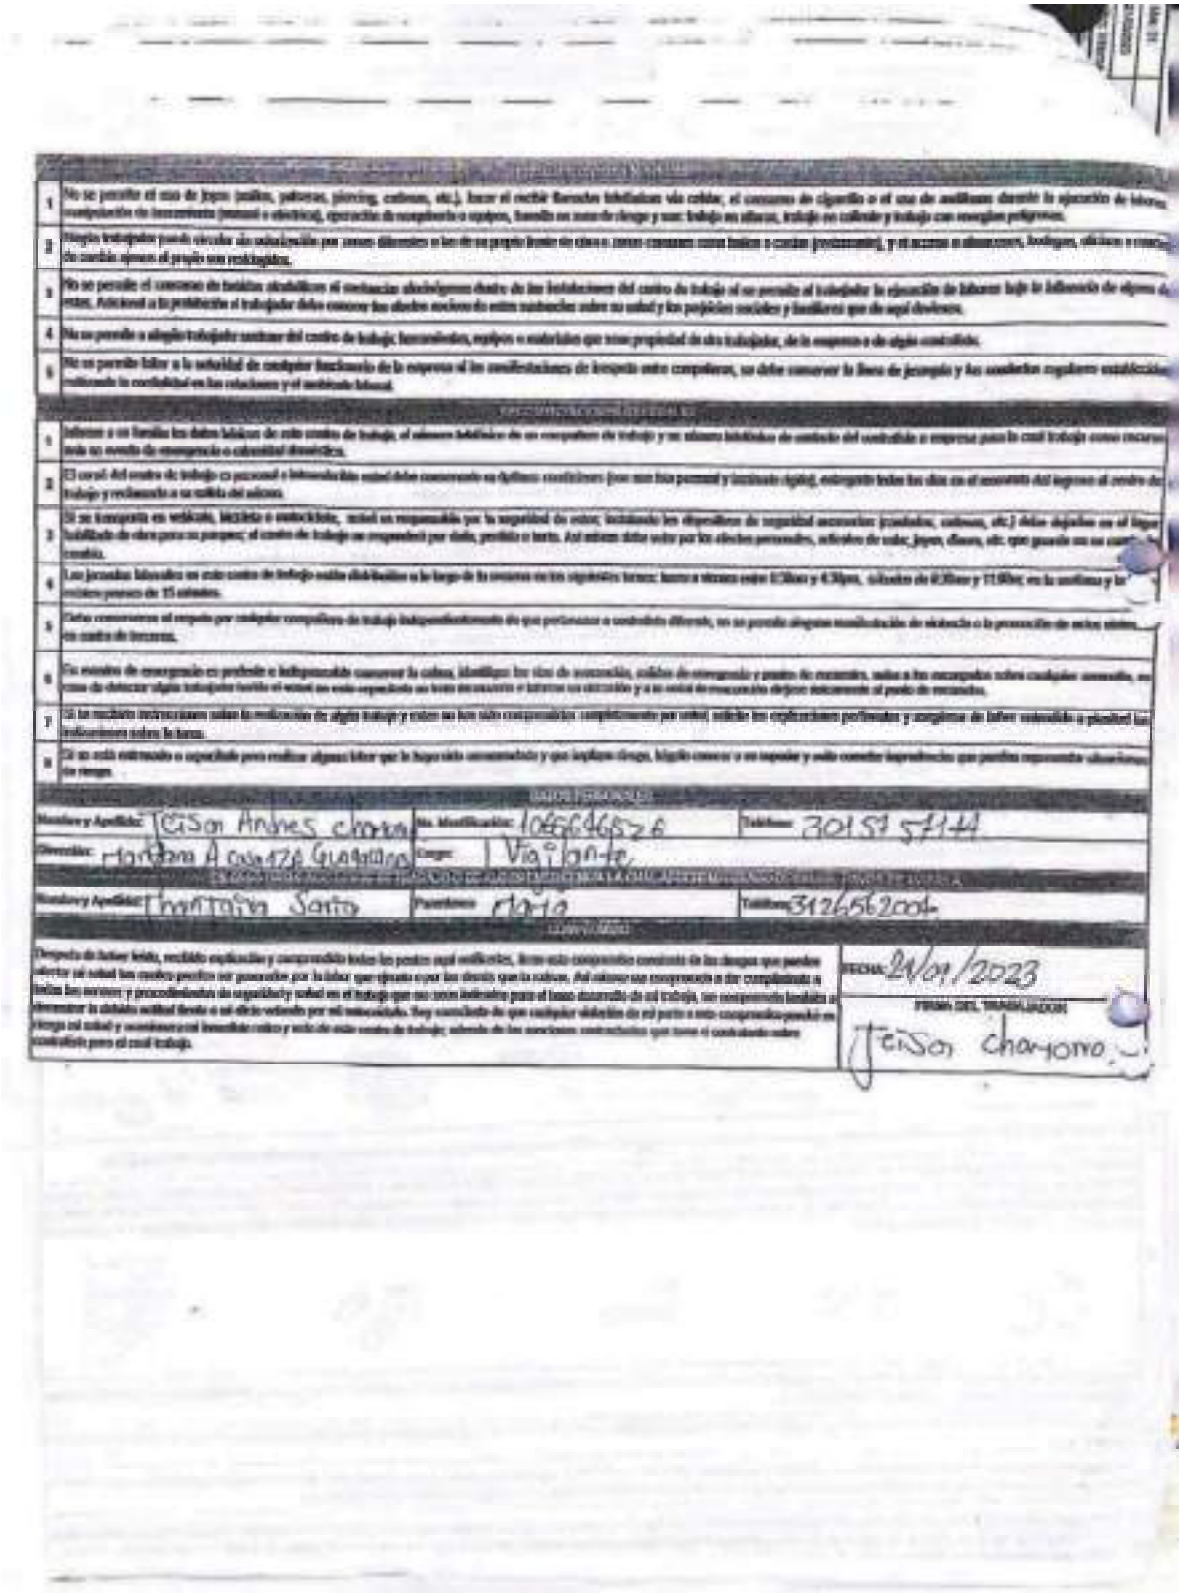

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 21/02/2023	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST	
Clasificación: Interna		

NOMBRE: Teison Andres Chavarro Soto CEDULA: 1065646526

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d. X	Todas las anteriores

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

a.	Política SST
b.	Política de alcohol y tabaquismo
c.	Política de Calidad
d. X	Todas las anteriores

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

a.	Quemaduras	d.	Lesiones osteomusculares	g.	Cuidar del medio ambiente
b.	Fracturas - Esguinces	e.	Perdida de partes	h. X	Todas las anteriores
c.	Cuerpo extraño en ojos	f.	Mareos	i.	a, b, d

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) Respetando la Señalización
b) Utilizando los elementos de Protección personal
c) No Caminar por áreas no autorizadas
d) No Venir bajo los efectos del alcohol a laborar.

5.Señala los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a.	Protección auditiva	e.	Gancho facial	X	Casco
X	Botas de seguridad con puntera	f.	Respirador de doble cartucho	X	Guantes de cuero largo
X	Tapabocas	g.	Guantes plásticos	h.	Tapaoídos de inserción / Copa
d.	Guantes de cuero / Baquetá	h.	Guantes de nitrilo	X	Gafas de seguridad

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarlo en obra:

Reportarle a el jefe Inmediato de lo sucedido.

7. Marque con un X los tipos de comité que existen en la Organización

a.	Comité Paritario de Salud	X	Comité de Convivencia
b.	Comité de Ventas y seguros		
c. X	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo		

8. Marque con un X las prohibiciones

X	Utilización de joyas y relojes	X	Laborar sin EPP
X	Llegar en estado de embriaguez	X	No portar uniformes
X	Consumir sustancias alucinogenas	X	a, b, c

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo

X	Trabajos en Caliente
X	Trabajos con energías peligrosas
X	Trabajo en alturas
X	Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo

a.	Utilización de taladro, esmeriladora o pulidora
b.	Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente
c.	Ninguna
X	Respuesta a y b

OBSERVACIONES:

Teison Chavarro.
Firma del Trabajador
No. Identificación 1065646526.

Entrevistas

Versión 02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Fecha: 22/07/2022		
Clasificación: Interna		

Conforme a lo expuesto yo, Angelo Arrieta, portador de la cedula de ciudadanía 4204515 desempeñando el cargo de Coord. Seguridad y Salud, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánicos	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras Aislantes (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Postura prolongada, mantenida, forzada	

Versión 02	FORMATO	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias


Nombre: Glendy Jimenez Pedroza

Firma: Glendy Jimenez Fecha: 10-09-2023

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, Diego G. Pappa T, portador de la cedula de ciudadanía 7184110, desempeñando el cargo de Asesor Comercial, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar los correctos de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI.
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentario)	Disminuir el tiempo de exposición. Mantener siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras Atenuaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

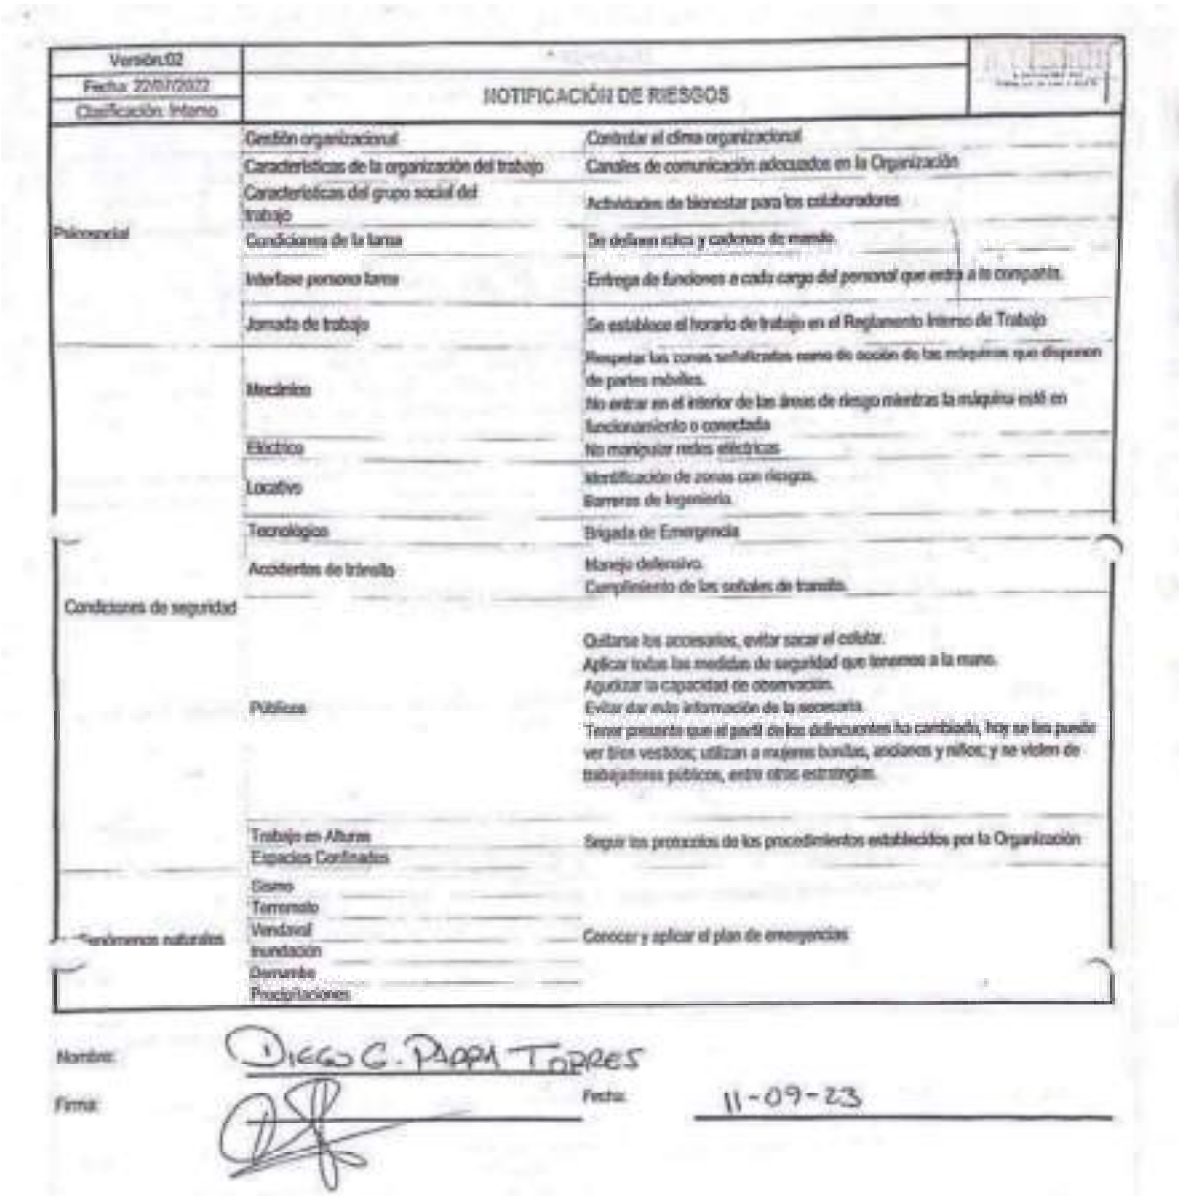


Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se deben usar y cadenas de mando.
	Interface persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar esta información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: DIEGO C. PAPPA TORRES

Firma:

Fecha: 11-09-23

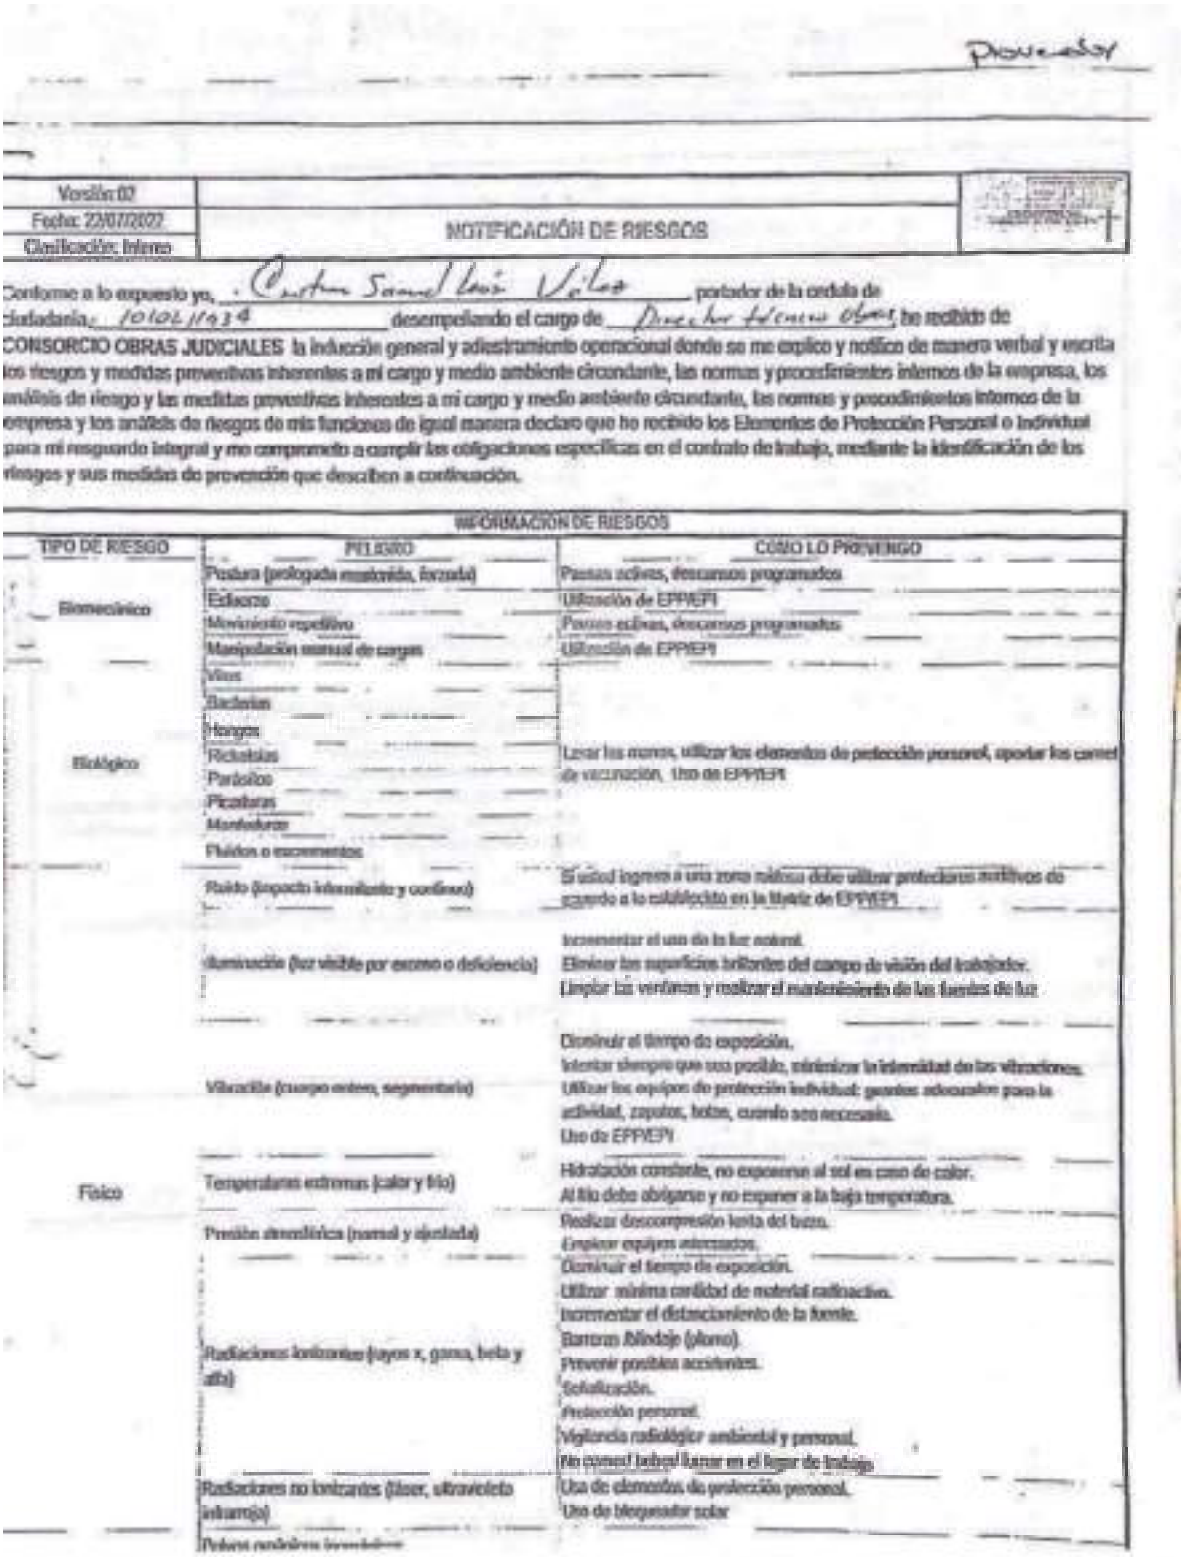

Pruebas

Versión 02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, Cristian Samuel Luis Velez portador de la cedula de ciudadanía: 1010219934 desempeñando el cargo de Derecho de Obras he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Blancos Blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Peligro ambientes hiperbáricos	

Versión:02	FORMATO	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológicos	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todos las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Cristhian S. León Uribe

Firma:

Fecha: Septiembre 11 de 2025.

Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo, Eduardo Martinez Rey, portador de la cedula de ciudadanía, 9632061 desempeñando el cargo de Ejecutivo CTA, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.


INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENIGO
Biomecánicos	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parasitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (espectro intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta/ infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Pulsos magnéticos inaudibles	

Versión 02	FORMATO	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecanico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Ocultarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otros estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Leonardo Martinez

Firma:

Fecha: 14 Septiembre 2023

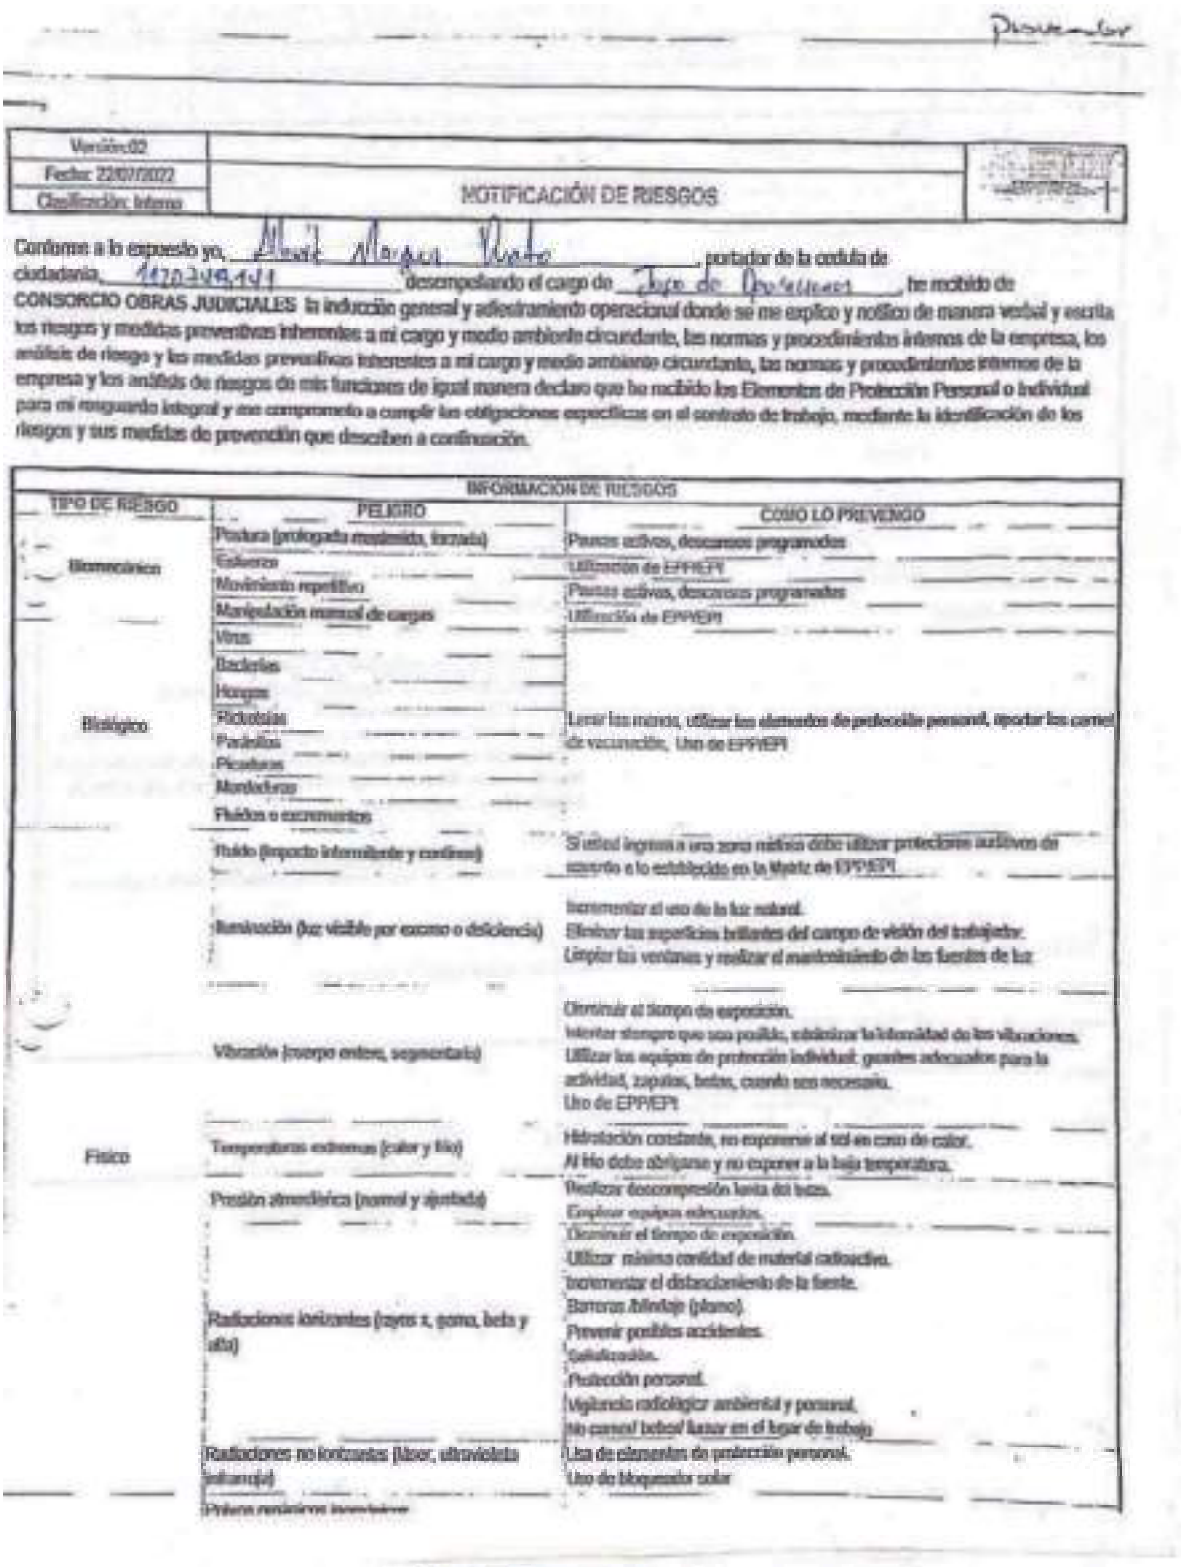

Versión:02
Fecha: 22/07/2022
Clasificación: Interna

MOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Conforme a lo expuesto yo, Maria Magaly Nieto, portador de la cedula de ciudadanía, 1120349191 desempeñando el cargo de Jefe de Operaciones, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilizacion de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentario)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, sustituir la herramienta de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar máxima cordidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras (blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. no comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Fuerzas gravitatorias inadecuadas	



NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
Psicosocial	Condiciones de la tarea	Se deliveri roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acceso de los maquinos que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de los señales de tránsito.
Condiciones de seguridad	Públicos	Ocultarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Aguzar la capacidad de observación. Evitar dar esta información de la monografía. Tomar presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Tormenta Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Alberto Marquez Ortiz

Firma:


Fecha: 11-09-2023

Proveedor

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, carlos contreras, portador de la cedula de ciudadanía, 84009716 desempeñando el cargo de el guia, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describes a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánicos	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
Físico	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras Blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos Inorgánicos	

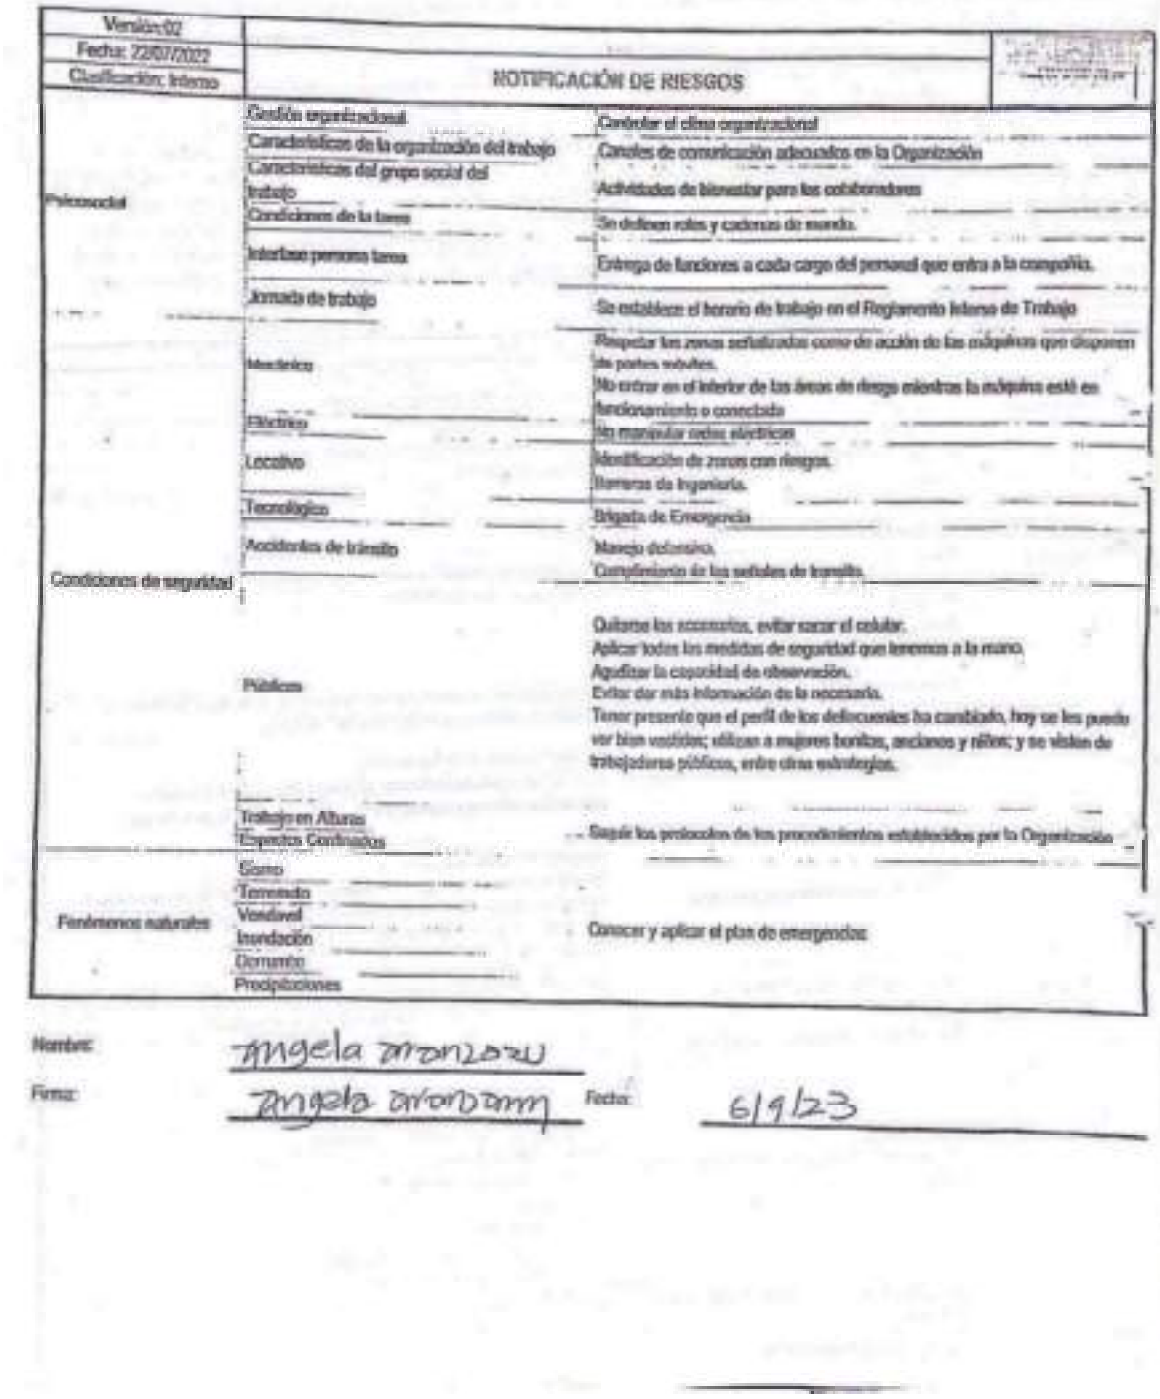

Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Cuidarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
	Espacios Confinados	
Fenómenos naturales	Sismo	Conocer y aplicar el plan de emergencias
	Tormenta	
	Vendaval	
	Inundación	
	Derrumbe	
	Precipitaciones	


Nombre: Angela Arondam


Firma: Angela Arondam Fecha: 6/9/23

Versión:02	FORMATO	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los diferentes tipo cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos: utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: carlos contreras

Firma: carlos c. Fecha: 26-09-2023

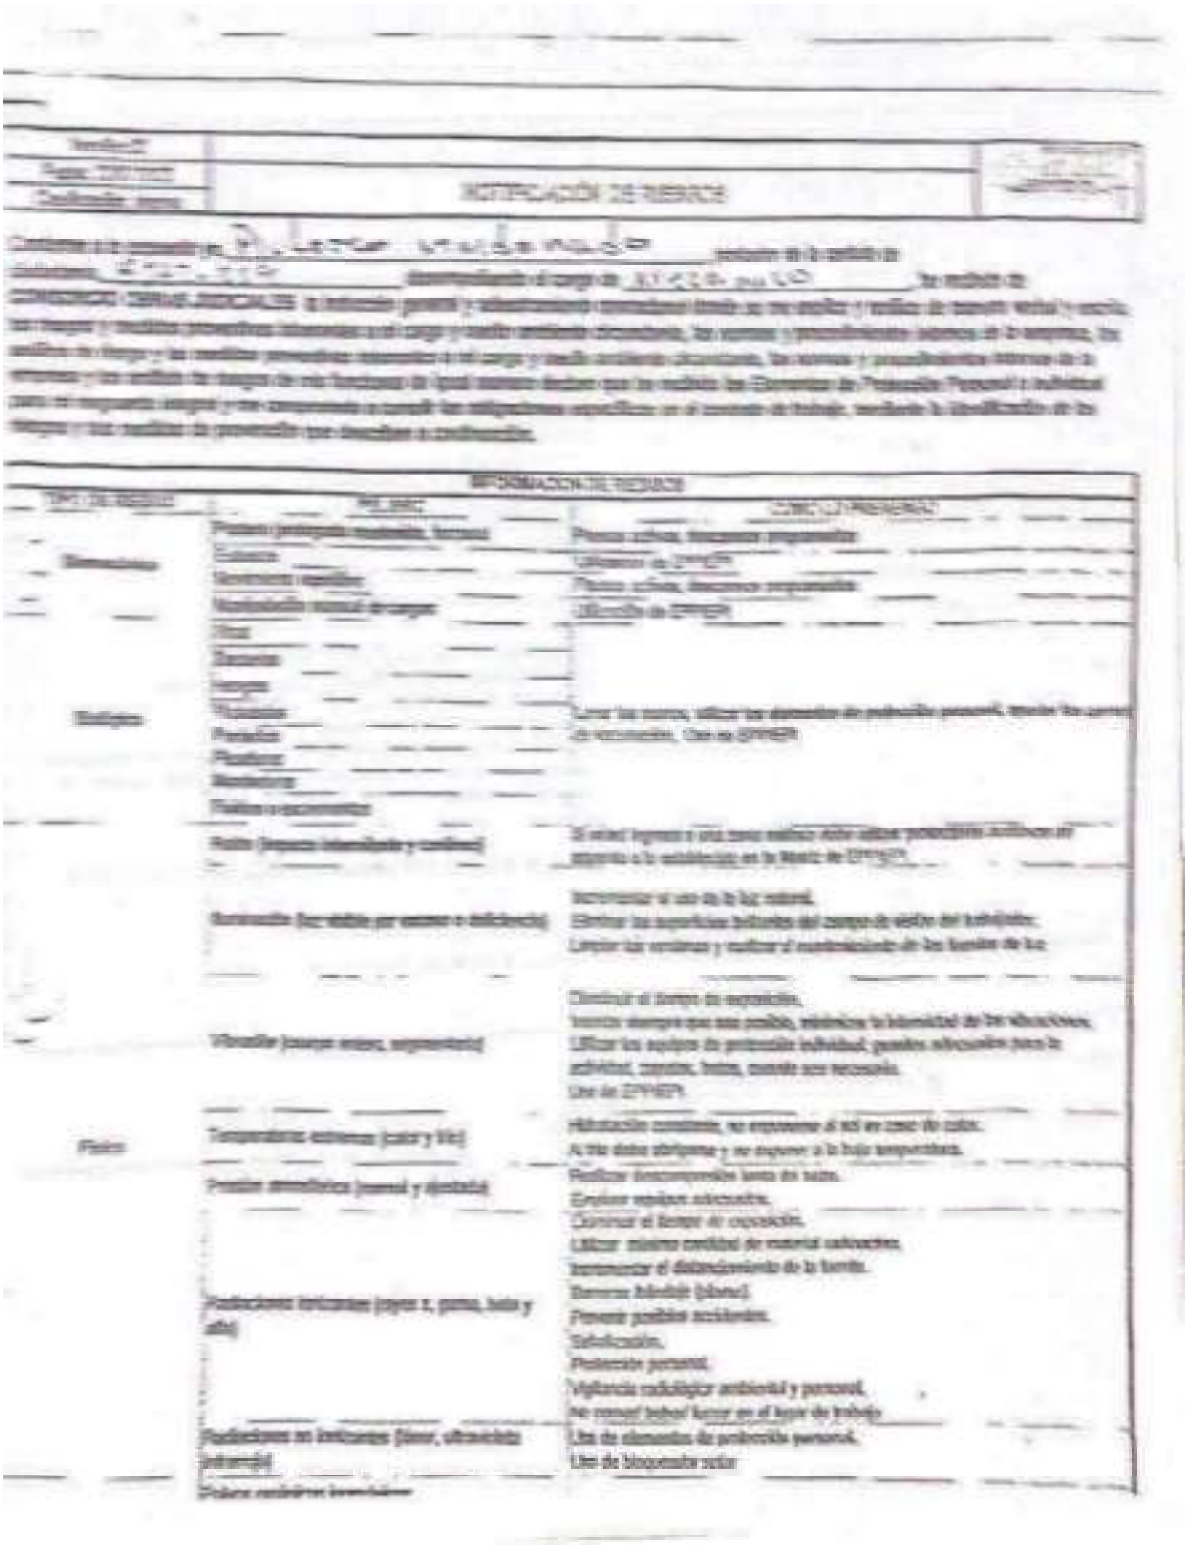

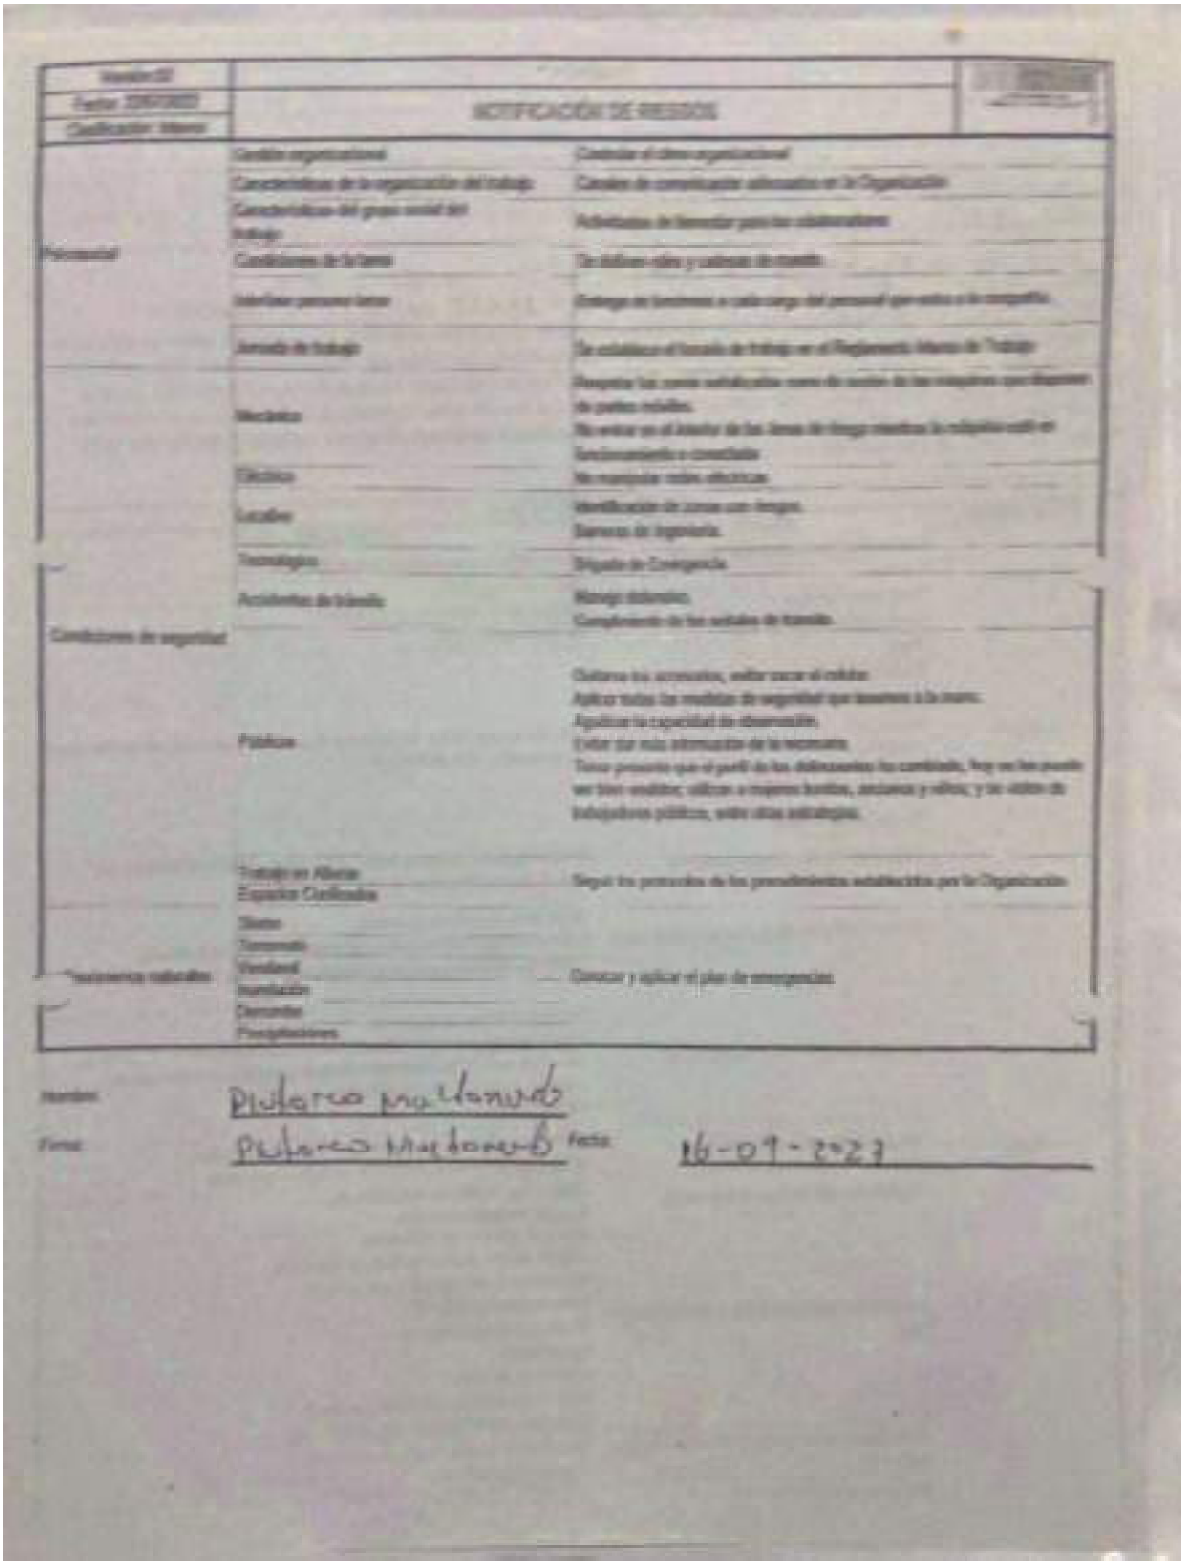

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Psicosocial	Cambio organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de liberación para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se disfrutan vistas y cabinas de descanso
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que realiza o le competen
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Reportar las fuentes generadoras ruidos de motor de las máquinas para disminuir de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o encendida
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Señores de ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Guardar sus accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar su capacidad de observación. Evitar dar mas información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy en los puestos son bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, jovencitas y niños; y los robos de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
Fenómenos naturales	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Según los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
	Sismo Tormenta Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Pilarica maldonado

Firma: Pilarica Maldonado Fecha: 16-09-2021

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Marcelo Mariano Juarez, portador de la cedula de ciudadanía 53190 74 desempeñando el cargo de Operativo client. Interno R, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
	Robo (espacio intermitente y confines)	Si usted ingresa a una zona rudosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
Físicos	Iluminación (fuer visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentario)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras Atenuaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Ruido: continuo intermitente	

Versión 01		
Fecha 30/11/2021	MOTIVACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación Interna		
Psicosocial	Cambio organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Mariela Montaña J

Firma:

Fecha: 18 Septiembre 2023

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Efrain Fuentes Quintero, portador de la cedula de ciudadanía 16.194985 desempeñando el cargo de Ing. Contratista, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal e Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Llevar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras: delantal (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	(Peligros complementarios: Inconfortables)	



NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Psicosocial	Gestión organizacional	Comunicar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se realizan roles y cuidanas de manejo.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de los trabajadores que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería.
	Tecnológico	Simulacro de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Cubrirse los accesorios, evitar sacar el celular Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Aguzar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy no les puede ser bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños, y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Tormenta Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Efraín Fuentes Ortiz

Firma:

Fecha: 18 Septiembre 2023

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, Ricardo Munoz, portador de la cedula de ciudadanía, 79309010 desempeñando el cargo de Director De Obra, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.


INFORMACION DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	El señor ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentario)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Presión atmosférica inversiones	

	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánicos	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Ricardo Murcia

Firma: [signature] Fecha: 19- Sep 2023

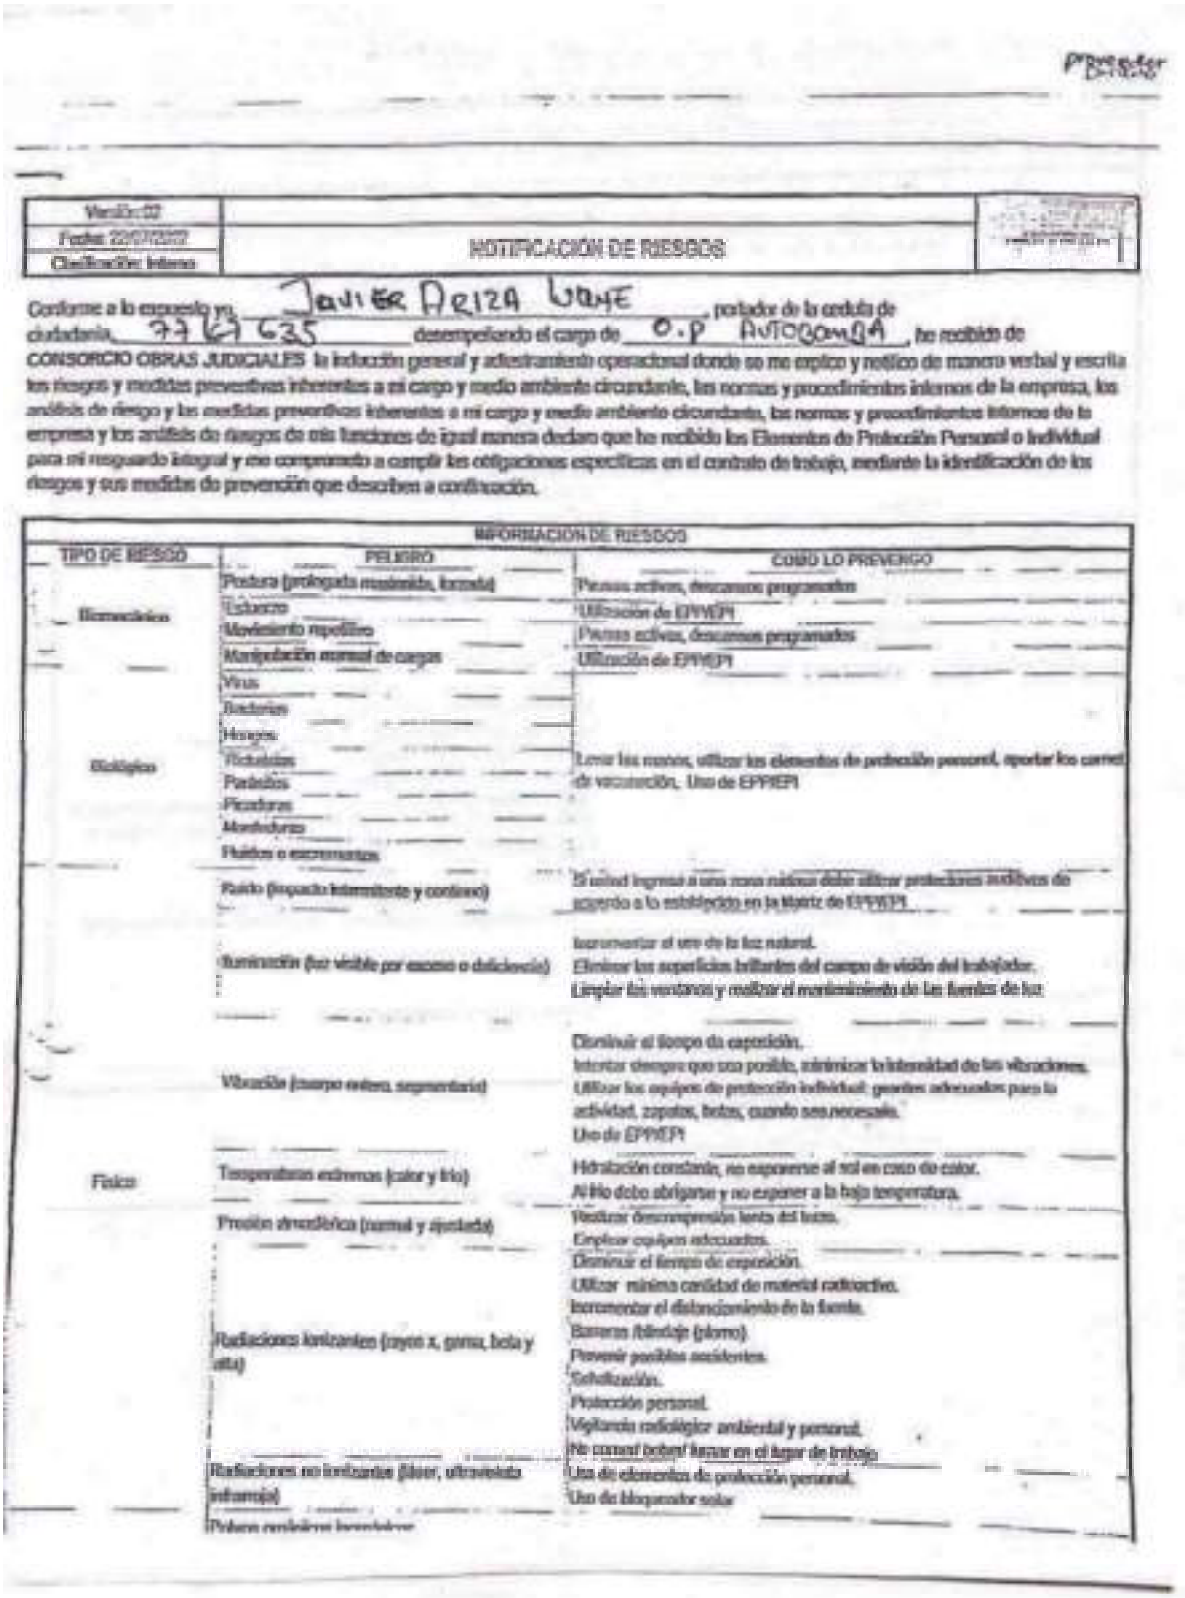


Versión: 02
Fecha: [illegible]
Clasificación: Interna

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Conforme a lo expuesto yo, JAVIER REIZA VANE, portador de la cedula de ciudadanía 77 163 635 desempeñando el cargo de O.P AUTOCOMPA, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánicos	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológicos	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI.
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar cambios que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debo abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras (blindaje (plomo) Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Presión atmosférica (anormales)	

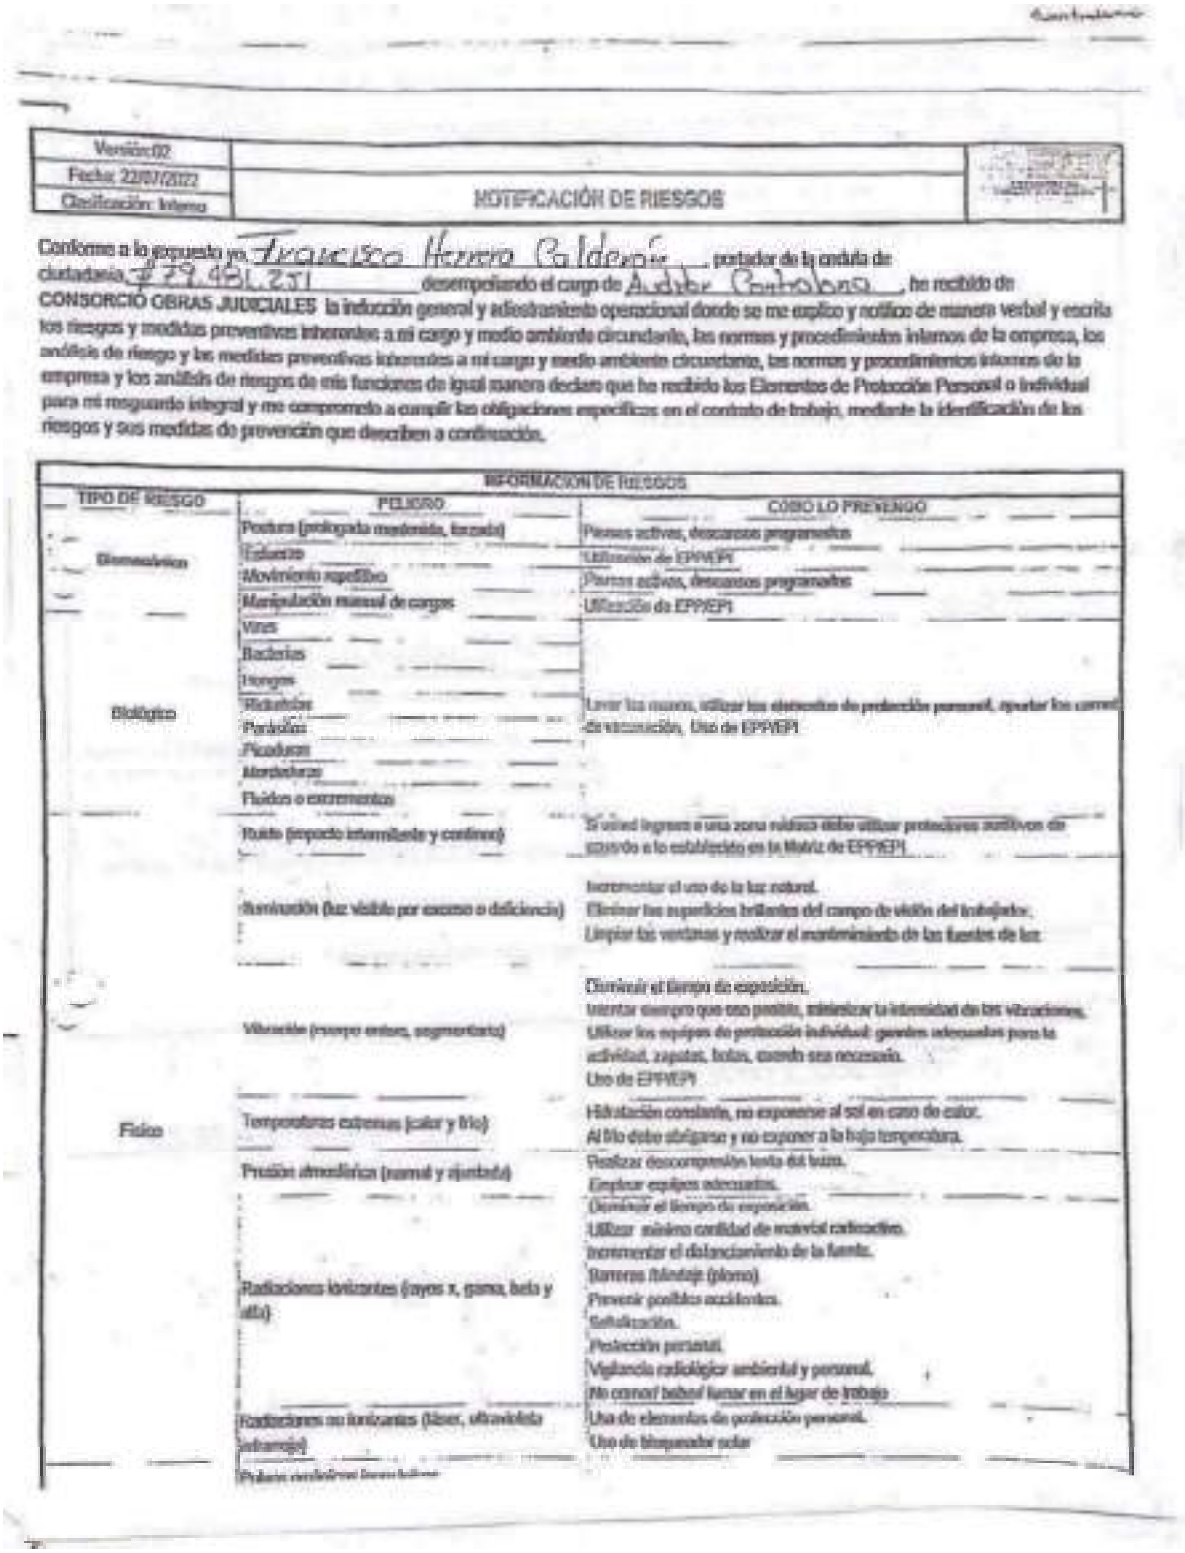

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo Francisco Herrera Calderón, portador de la cedula de ciudadanía # 79.481.231 desempeñando el cargo de Auxiliar Contable, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.


INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar los correctos de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parasitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibraciones (cuerpo entero, segmentario)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, casco si sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras (blindaje (plomo) Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos e inorgánicos	

Versión:02	FORMATO	
Fecha: 22/07/2019	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando
	Interface persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológicos	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Jaycee Arcia

Firma:

Fecha: 19- SEP- 23

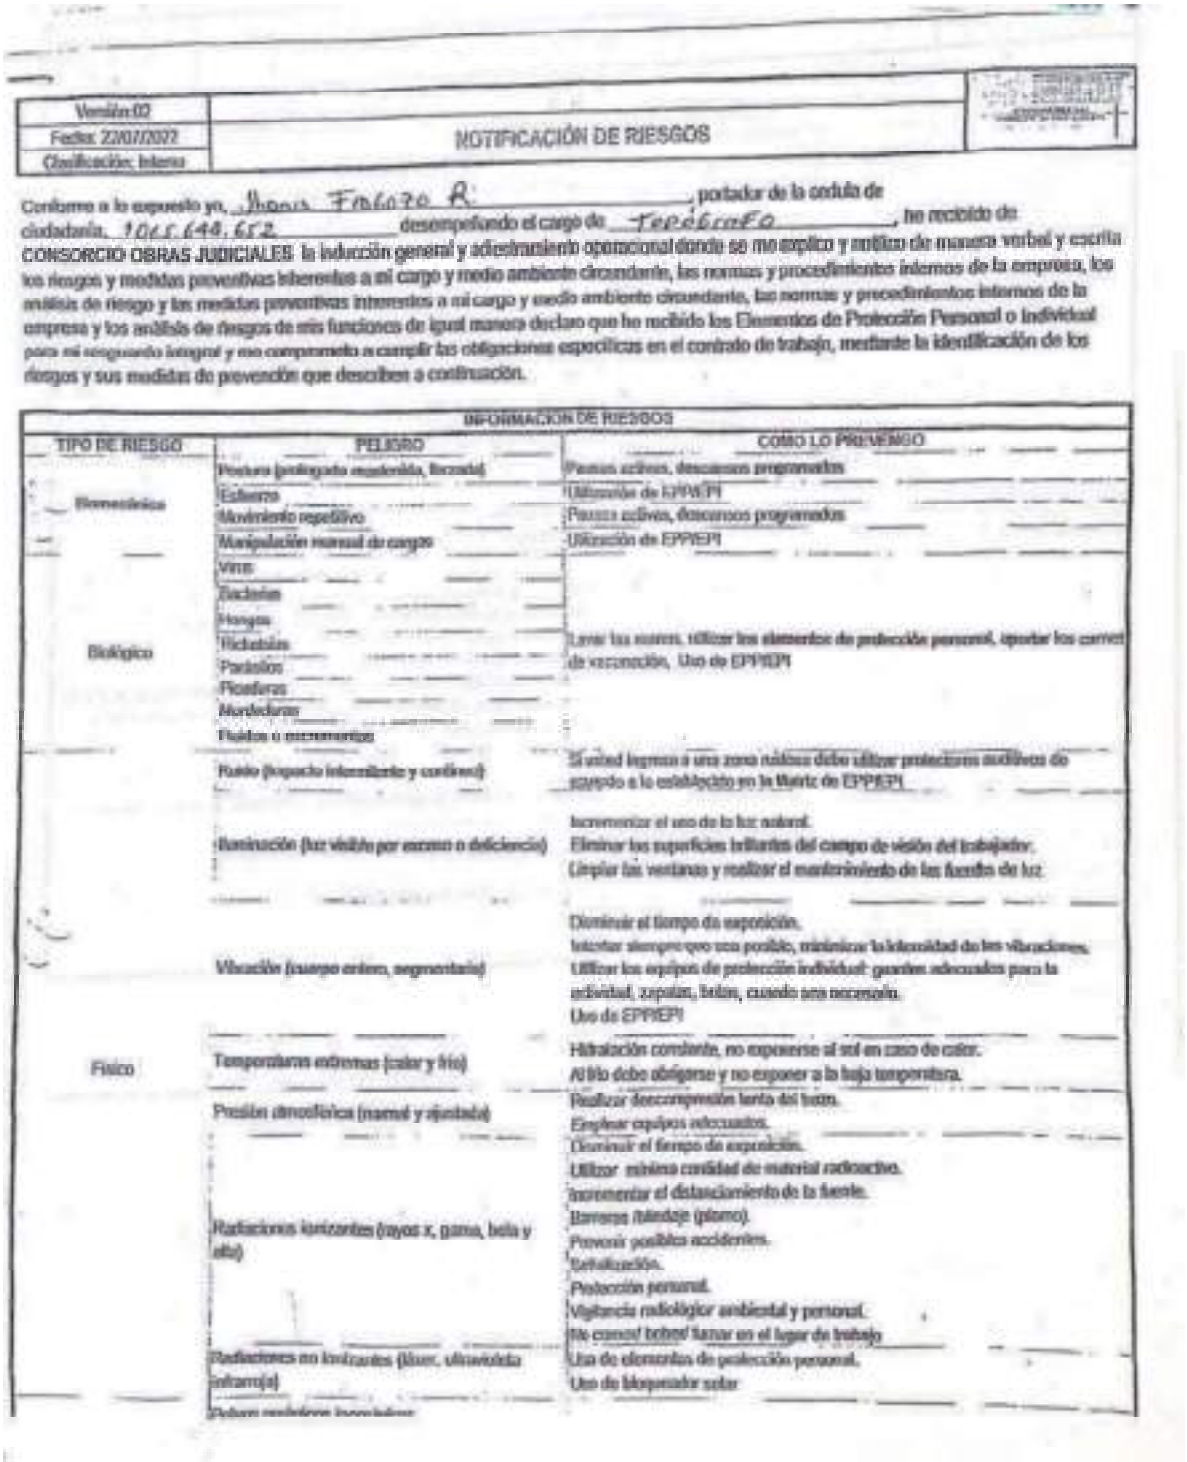

Versión:02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Fecha: 22/07/2022	
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Jhon Fredy R. , portador de la cedula de ciudadanía, 1065 644 652 desempeñando el cargo de Topógrafo , he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y entrego de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los casos de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (ispacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Deben resaltarse locales	

Versión:02	FORMATO	
Fecha: 23/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Ivonne Freyle C


Firma:

Fecha: 26/sep/2023

Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo, Rafael Ortiz Ortiz, portador de la cedula de ciudadanía 1172404134 desempeñando el cargo de Topografo, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánicos	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de inserción o la establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Mantener siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. no comer beber fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta industrial)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Deben considerar [illegible]	

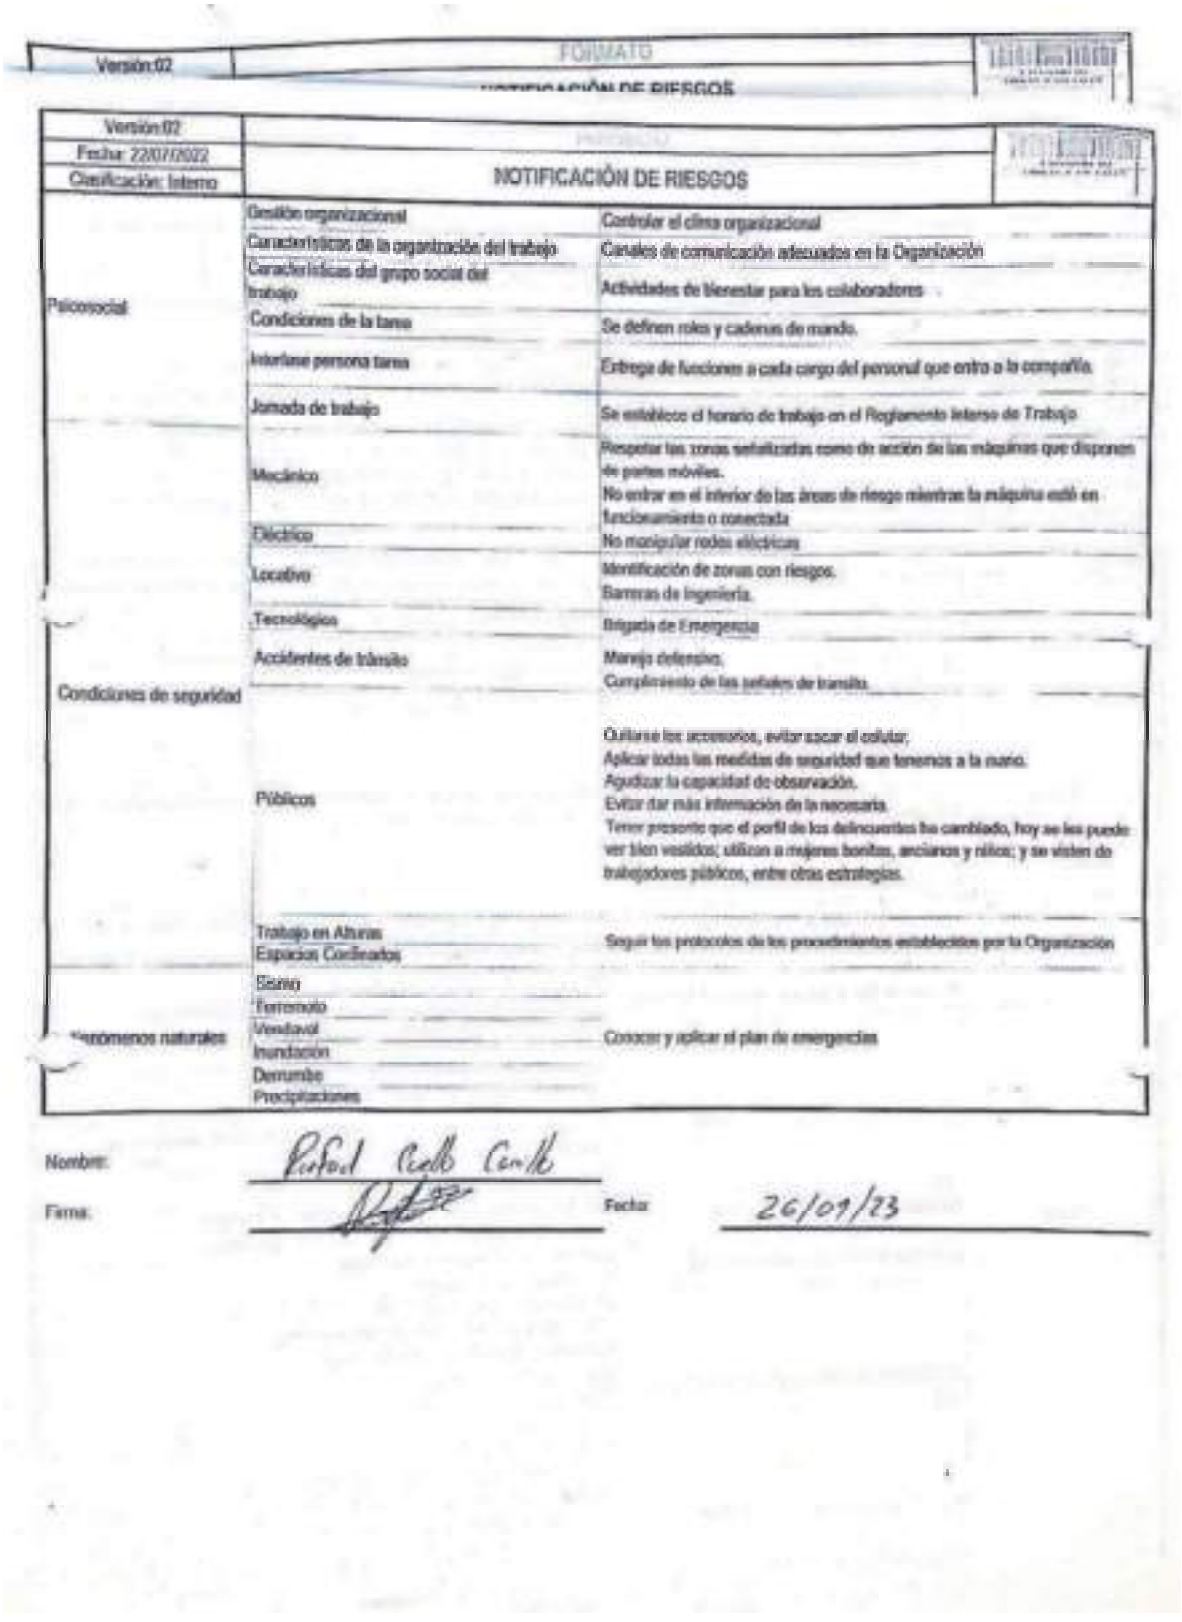

Versión:02	FORMATO
	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Versión:02
Fecha: 22/07/2022
Clasificación: Interno

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológicos	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Profesional Cuello Conde

Firma:

Fecha: 26/09/23

Versión:02	
Fecha: 22/8/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, Brayan Berau Guerrero, portador de la cedula de ciudadanía, 1045 [illegible] desempeñando el cargo de Ejecutor de campo, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal e Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada, mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar los correctos de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, overol son necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras (blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No comer, beber, fumar en el lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos combustivos inorgánicos	

Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy en los puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Diego Ponce C

Firma: [signature]

Fecha: 27-09/2023

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Antonio Campil, portador de la cedula de ciudadanía, 1140833[illegible], desempeñando el cargo de Conductor obs Civiles, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descanso programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descanso programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (fuer visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentario)	Disminuir el tiempo de exposición. Mientras siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual, guantes adecuados para la actividad, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras físicas (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Antagio Cunail

Firma: Antagio Cunail

Fecha: 27-09/2023


Inducción

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, Jhon Deivi Montenegro Méndez, portador de la cedula de ciudadanía 1007076179 desempeñando el cargo de Inspector SST, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnes de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Física	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI.
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual; guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Blancura /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

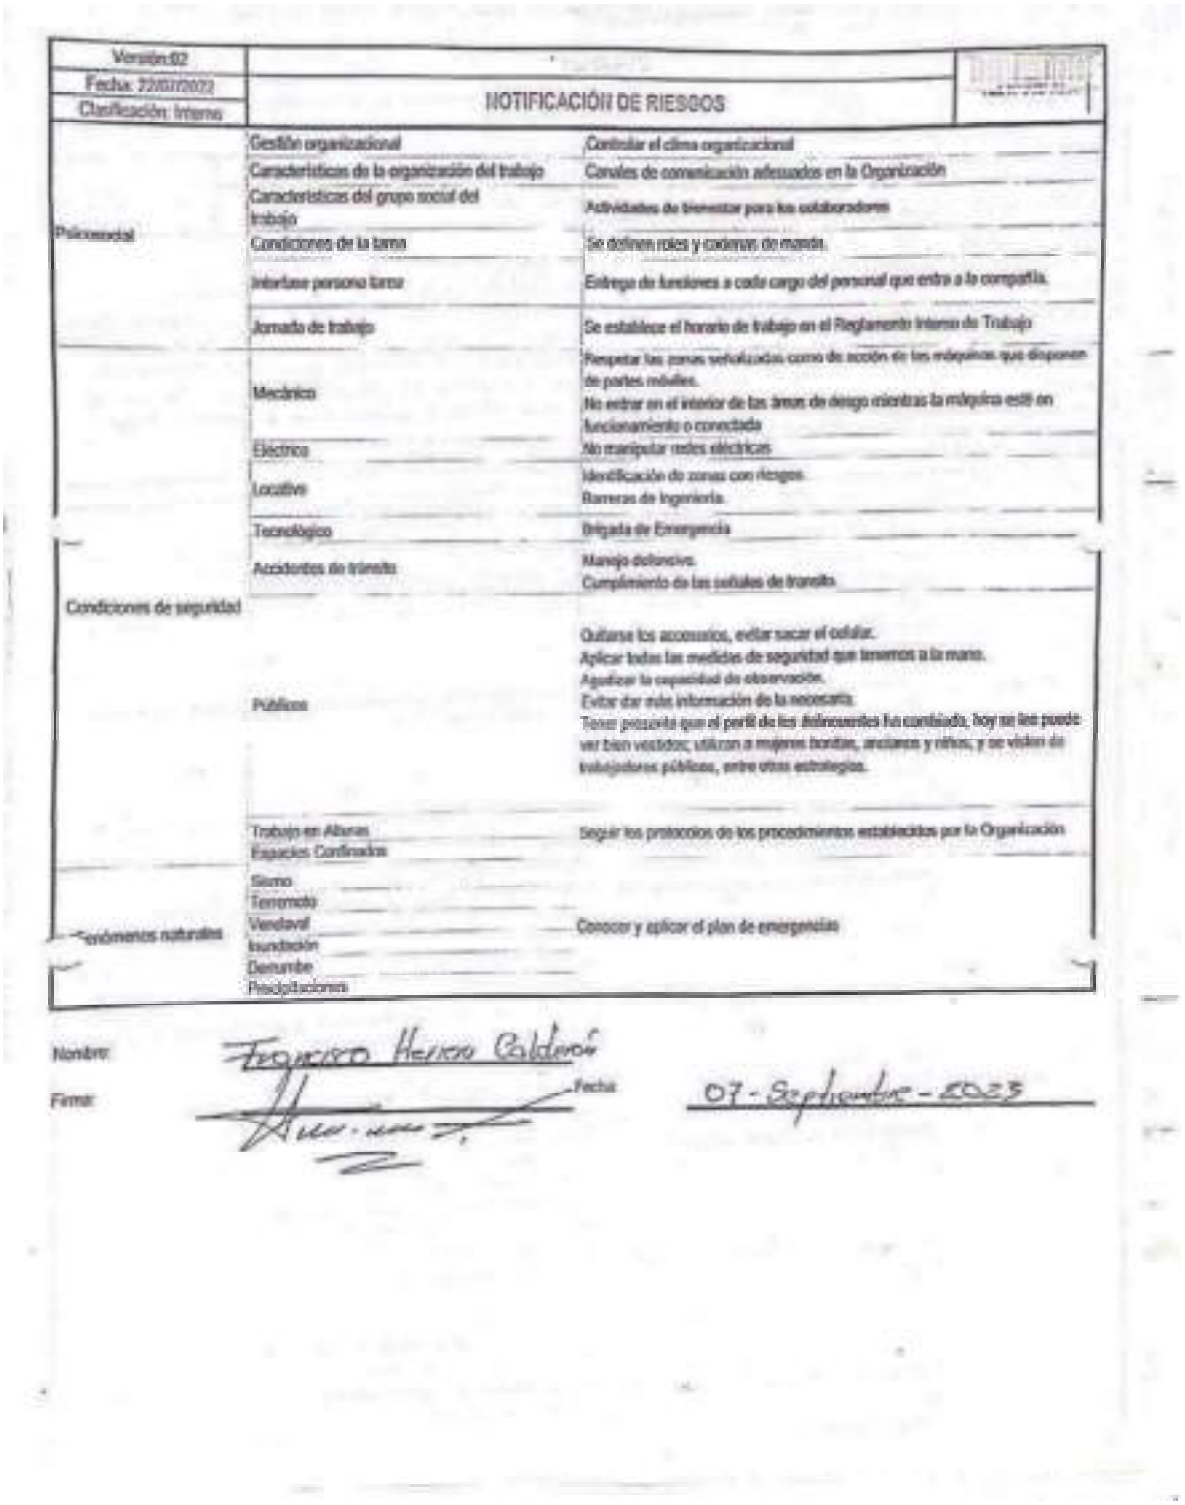


Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interna		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cronogr. de manda.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos Barreras de Ingeniería
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Aguzar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otros estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Francisco Hernán Calderón

Firma:

Fecha: 07 - Septiembre - 2023

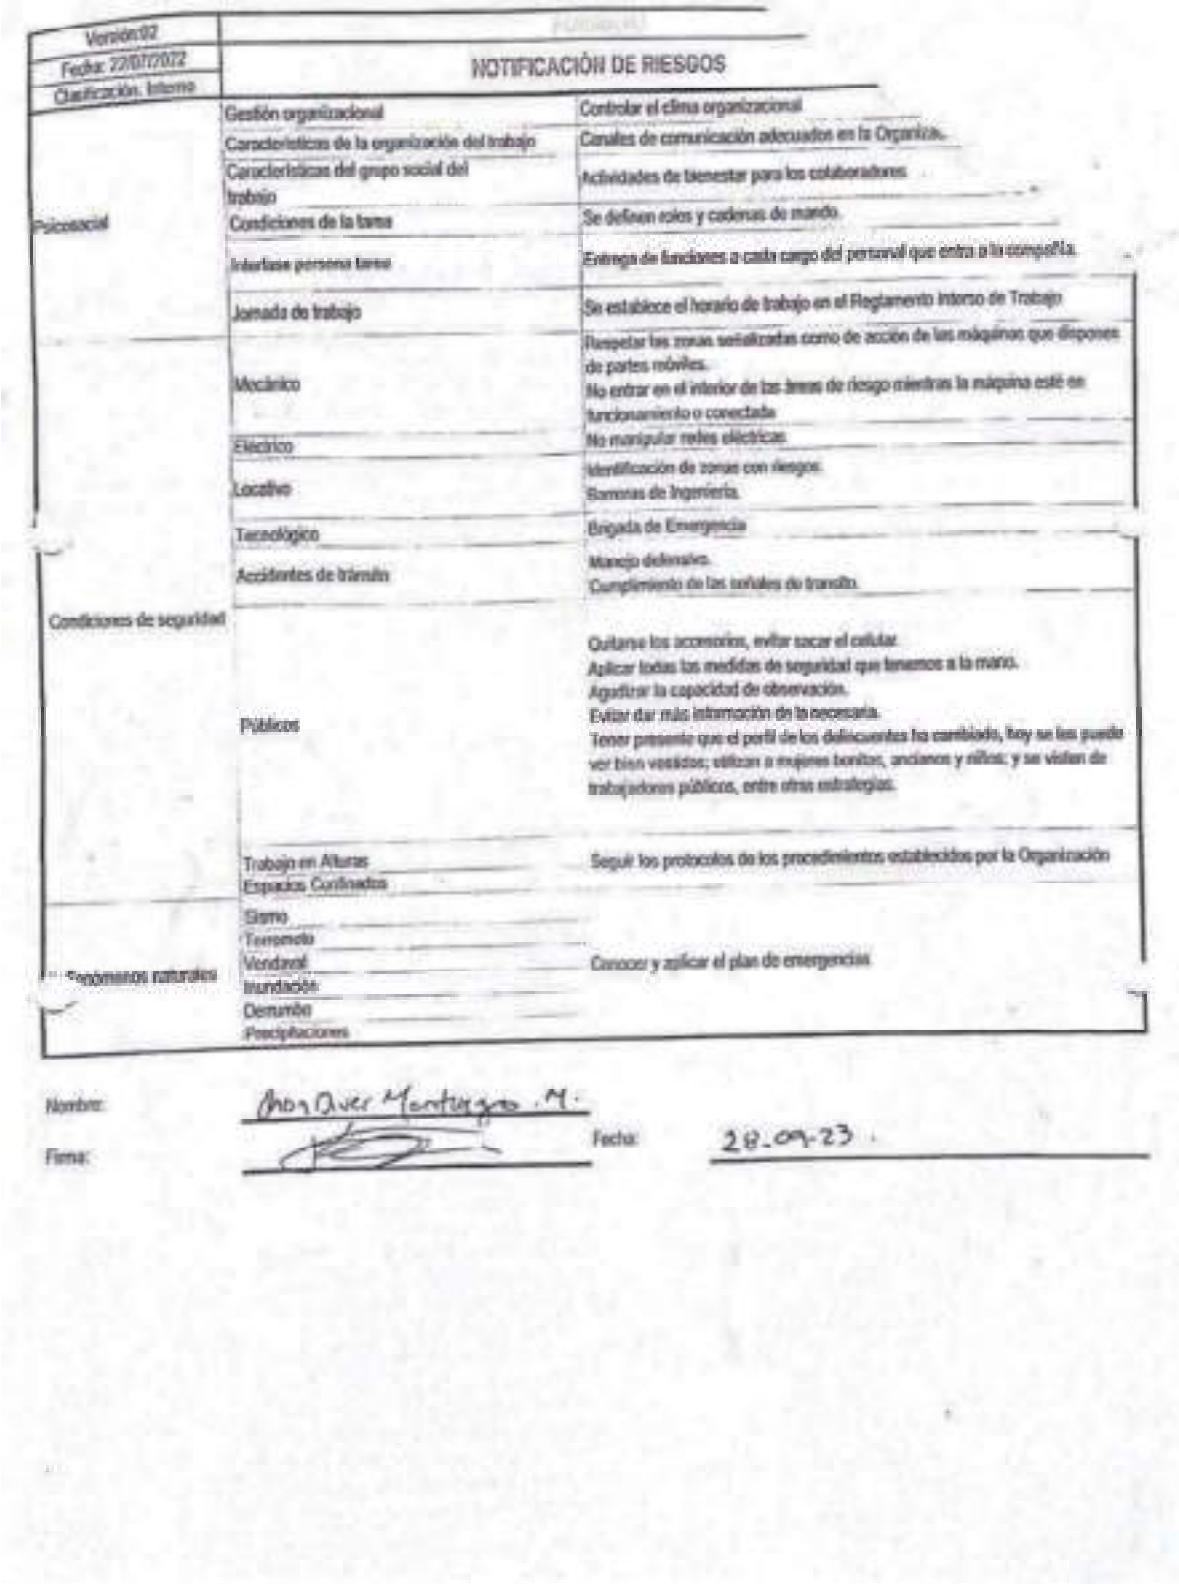

Versión:02
Fecha: 22/07/2022
Clasificación: Interna

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organiza.
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que dispones de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Normas de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
	Espacios Confinados	
Fenómenos naturales	Sismo	Conocer y aplicar el plan de emergencias
	Terremoto	
	Vendaval	
	Inundación	
	Derrumbe	
	Precipitaciones	

Nombre: Andy Over Montezuma M.


Firma:

Fecha: 28-09-23

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Julian A chaca Silva portador de la cedula de ciudadanía 91084[illegible] desempeñando el cargo de [illegible], he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, ejecutar las correct de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentada)	Disminuir el tiempo de exposición. Intervalar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínimo cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barrera filtrante (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

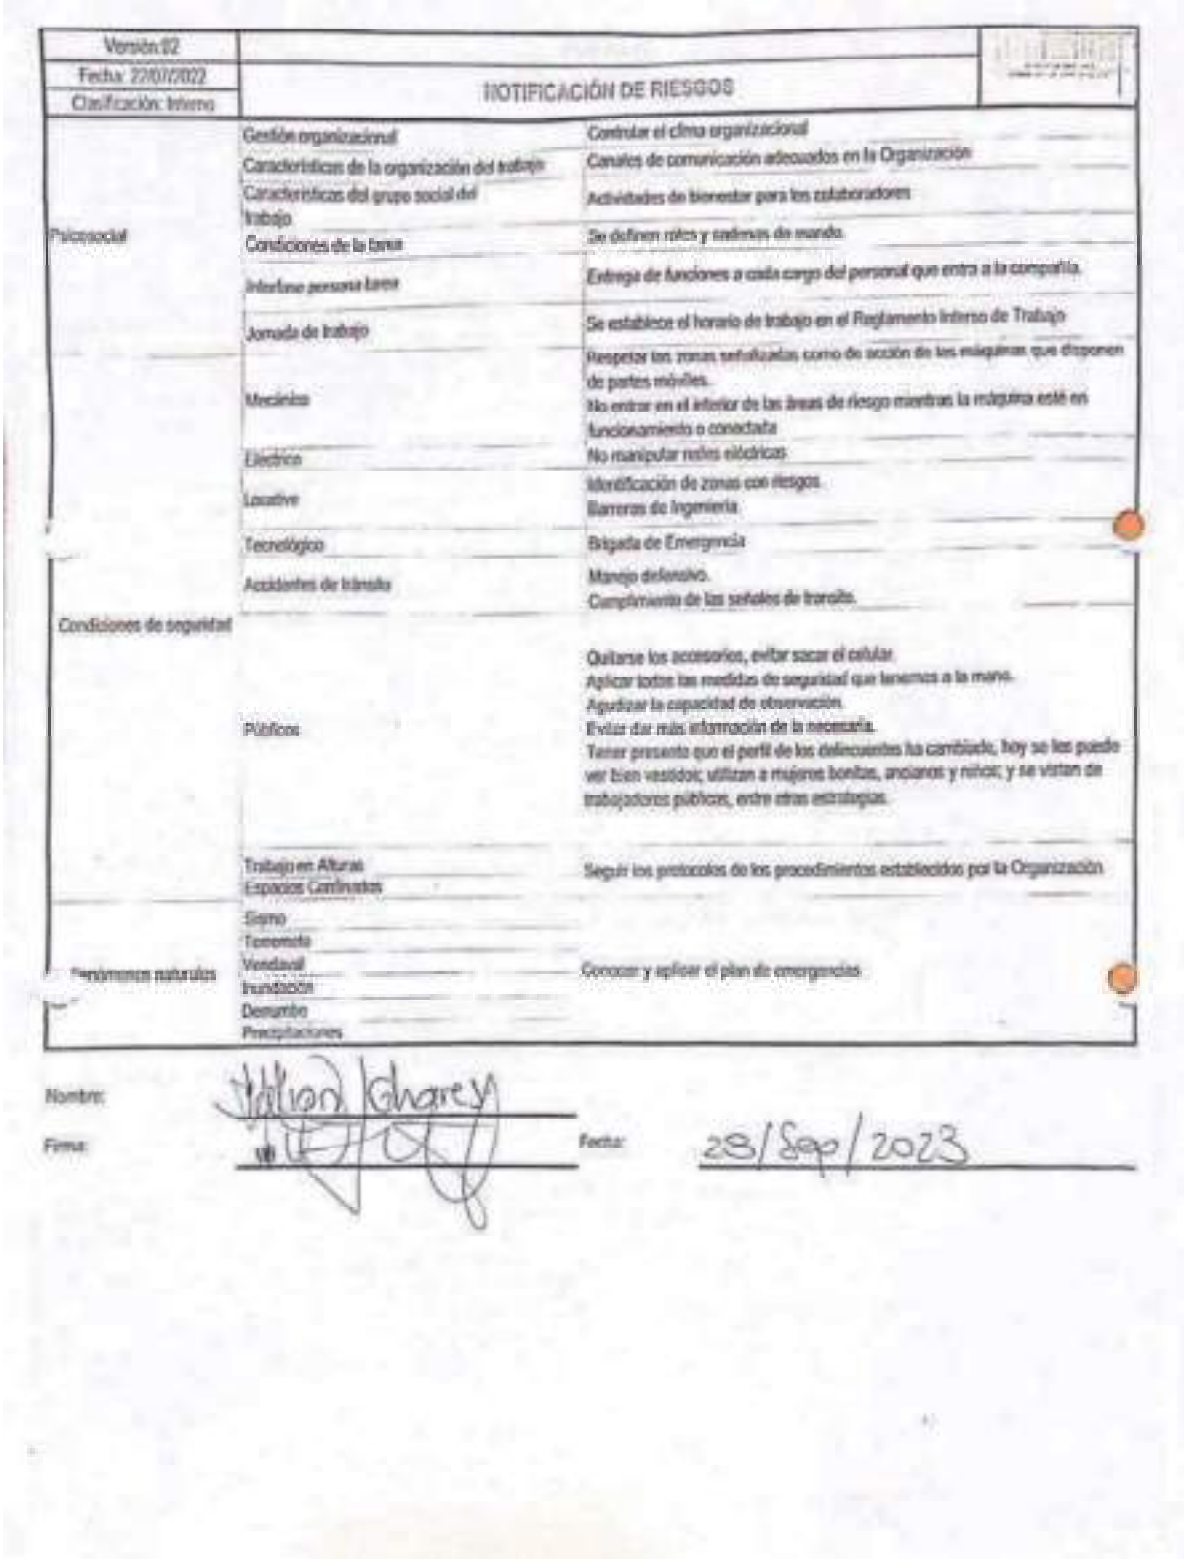


Versión:02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Fecha: 22/07/2022		
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos Barreras de ingeniería
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Yolvan Chacon

Firma:


Fecha: 28/Sep/2023

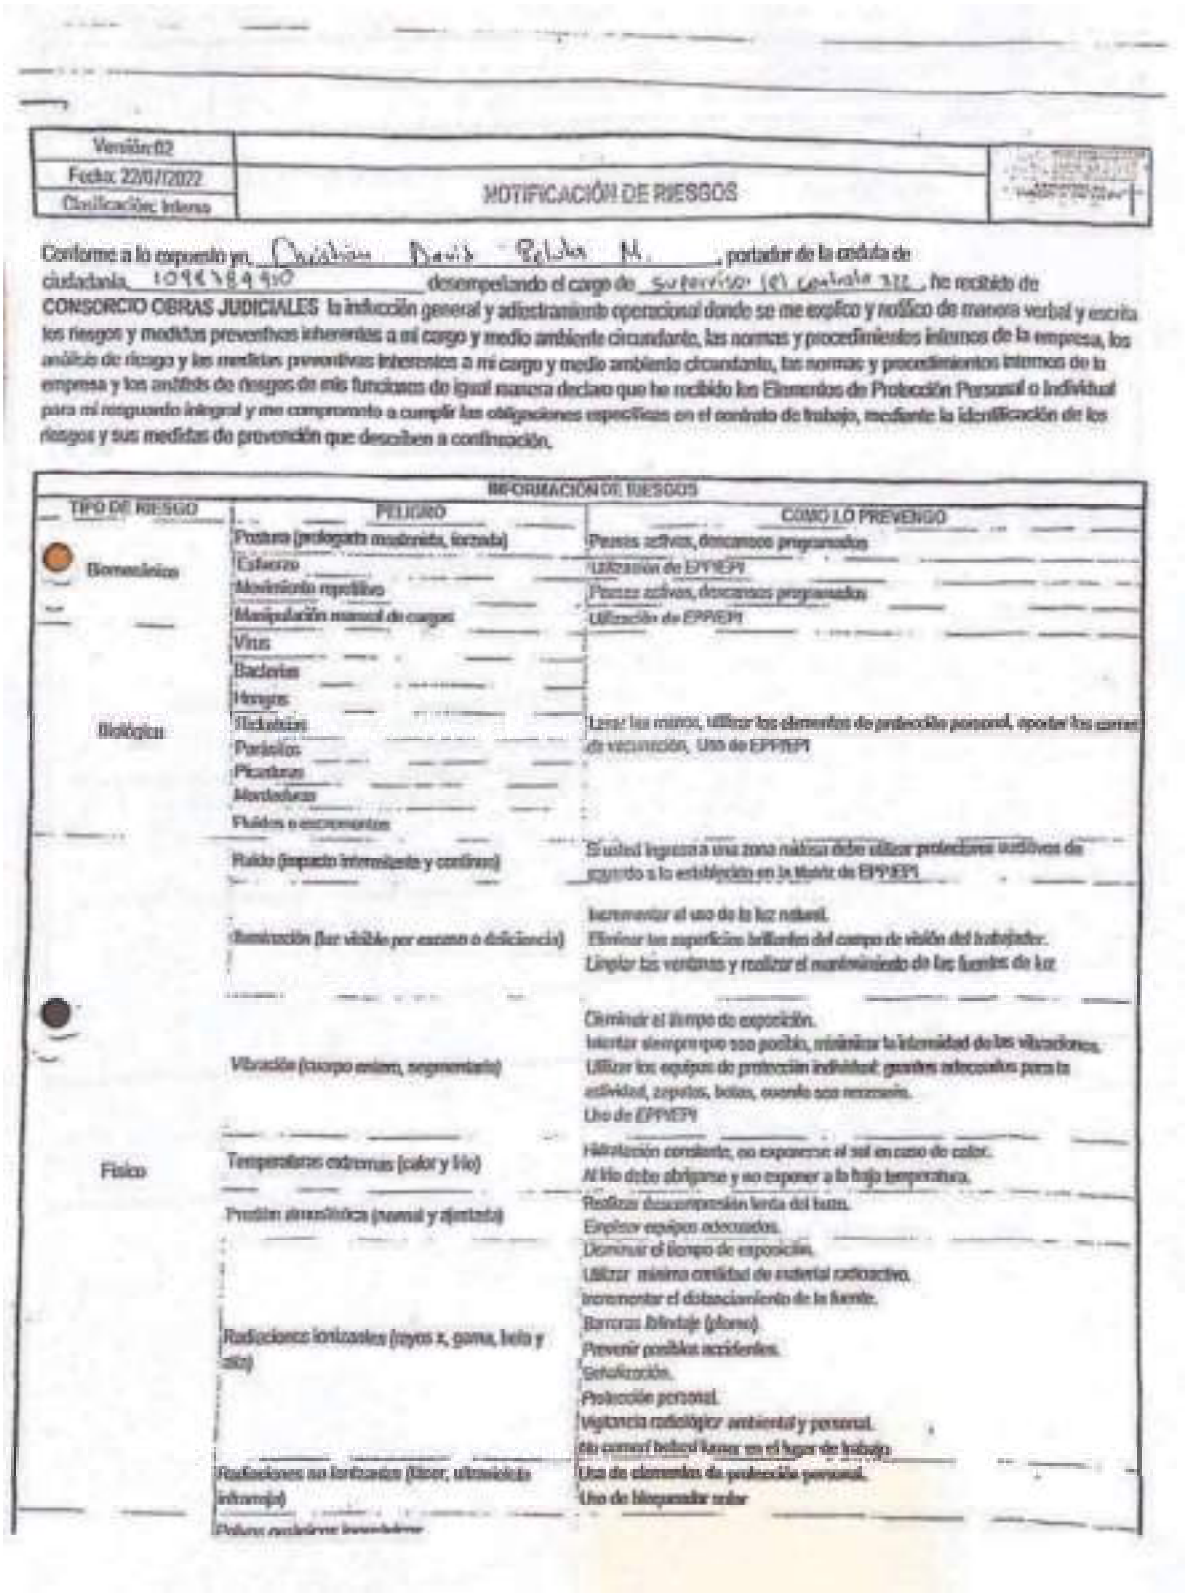

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Christian David Peña M., portador de la cedula de ciudadanía 1098384910 desempeñando el cargo de Supervisor (a) Contable 312, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada, mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los casos de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentario)	Disminuir el tiempo de exposición. Mantener siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras Blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No comer dentro del lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

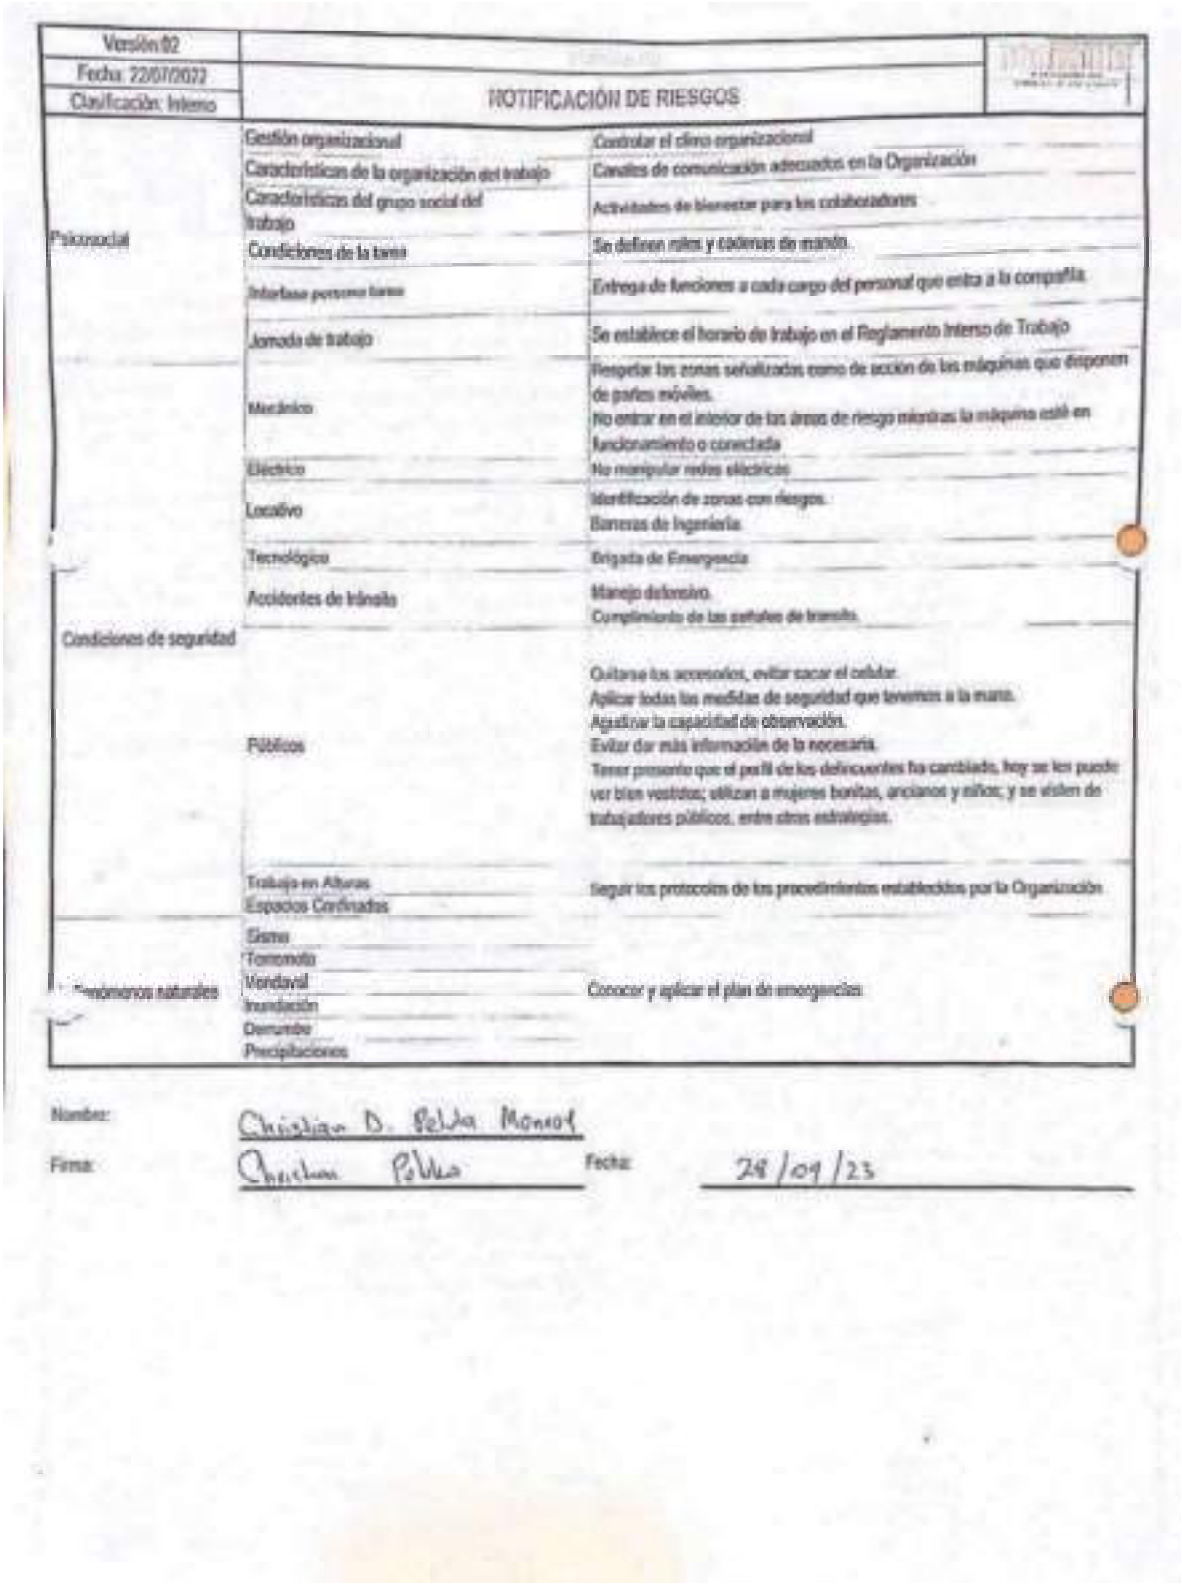

Versión 02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Christian D. Peña Monsalve

Firma: Christian Peña Fecha: 28/09/23

Versión 03	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Sandra Lucía Rama J. portador de la cedula de ciudadanía 52.261.860 desempeñando el cargo de Auditor, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.


INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y mantener el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras plomadas (plomo) Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer bebes fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Presión ambiental (anormal)	

Versión:02	FORMATO	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interna		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas.
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería
	Tecnológicos	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Sandra Lucía Pena J.

Firma: [signature]

Fecha: 28 / Sep / 2023

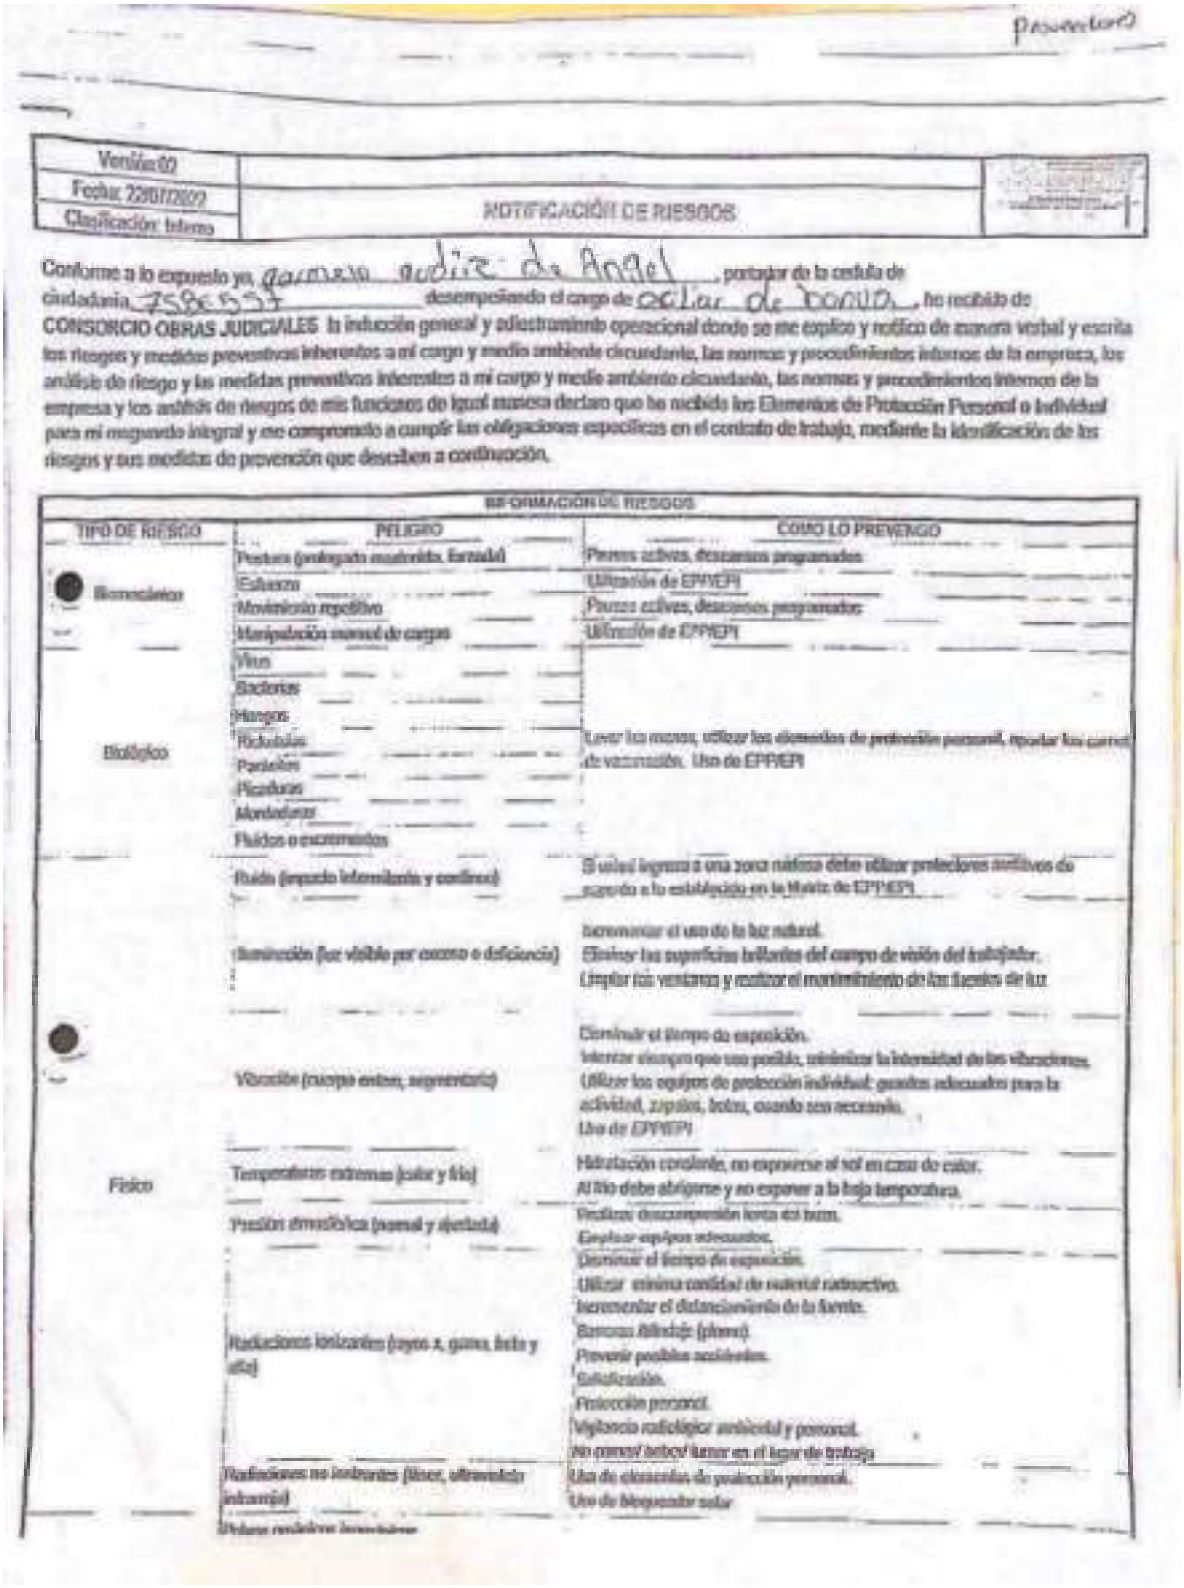

Proveedores

Versión 02		
Fecha: 22/07/2020	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interna		

Conforme a lo expuesto yo, Gerardo Pedraza de Angel, portador de la cedula de ciudadanía 7586527 desempeñando el cargo de oficial de control, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS


TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los casos de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta en boca. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras físicas (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Presión anormales (hiperbaria)	

Versión:02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Fecha: 22/07/2022		
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acceso de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar mas información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy no les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Tormenta Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Carmen Yubiz

Firma: [signature]

Fecha: 29. 5f-2023

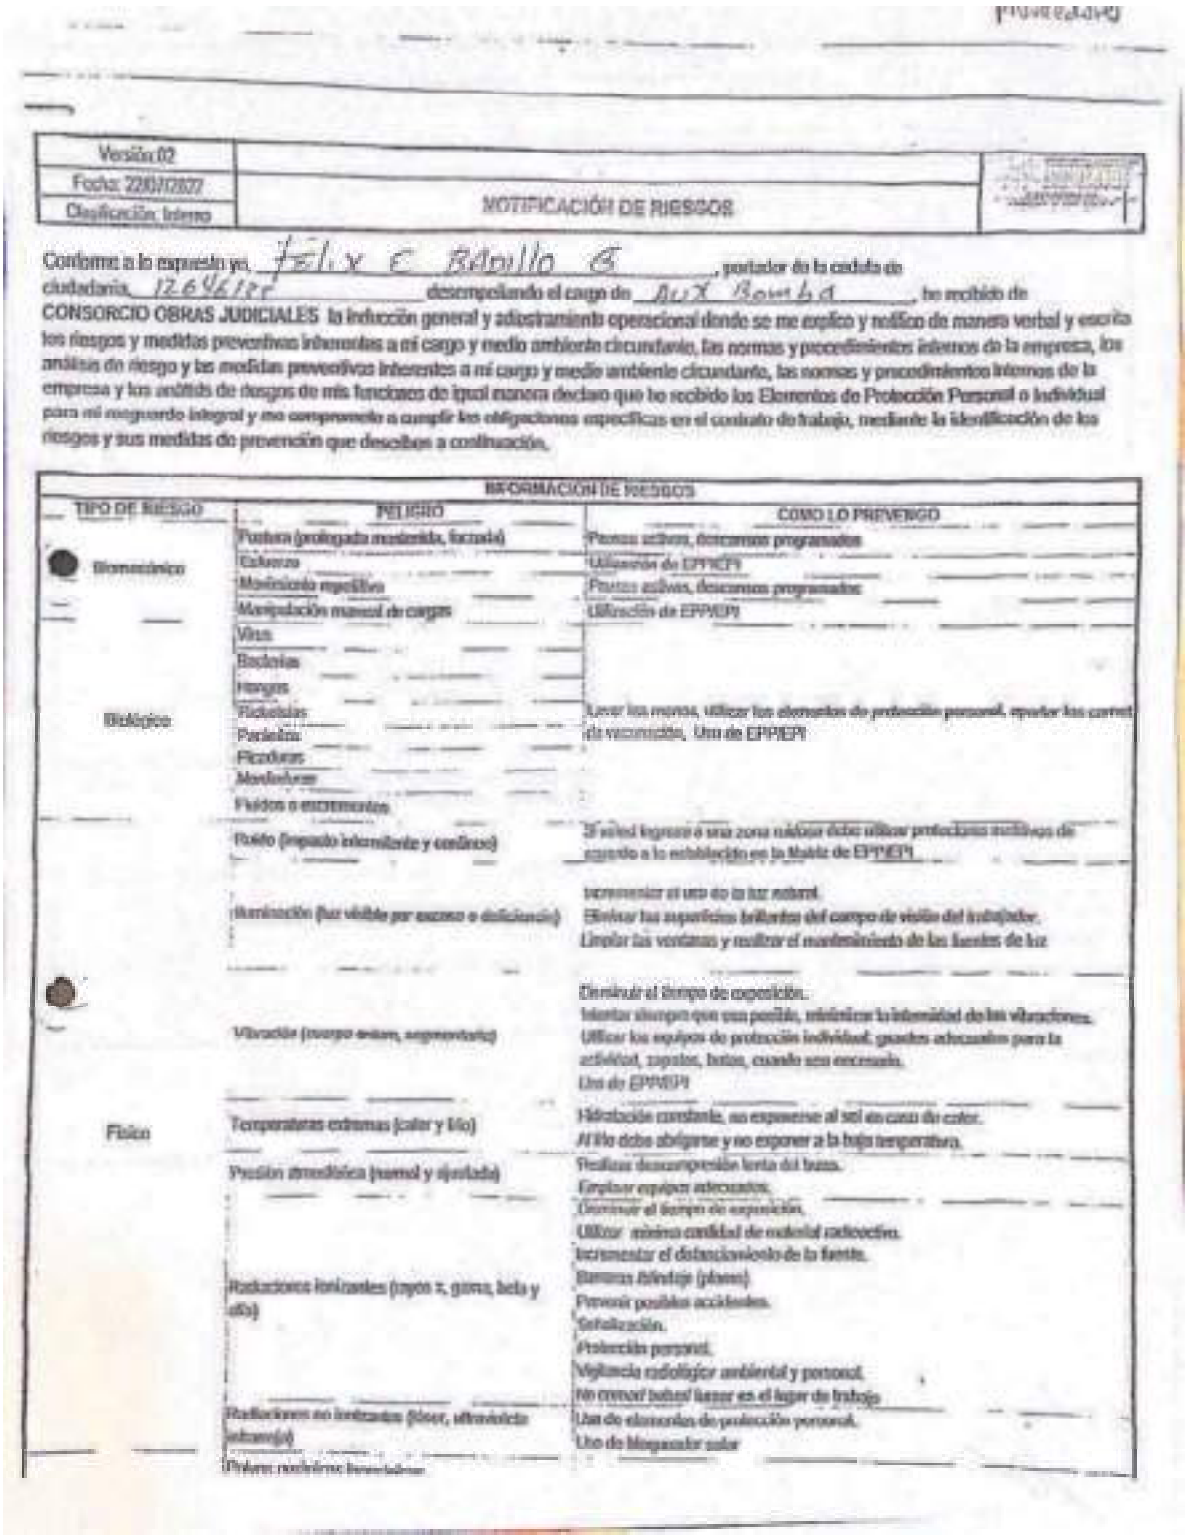

Versión 02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, Felix E Badillo G, portador de la cedula de ciudadanía 12646128 desempeñando el cargo de Aux Bomba, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describo a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parasitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Elevar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar alternar con una pausa, reduciendo la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual, guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras absorbentes (plomo) Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	(Polvos; nombrarlos individualmente)	

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	


Conforme a lo expuesto yo, Yasan Cortés Cardona portador de la cedula de ciudadanía, 1340?357 desempeñando el cargo de Auxiliar Contable he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parasitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras (blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Peligro condiciones locativas	

Versión:02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Fecha: 27/01/2022		
Clasificación: Interna		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Temporal Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Felix Eradillo G

Firma: Felix Radillo Fecha: 29-SEPT-2023

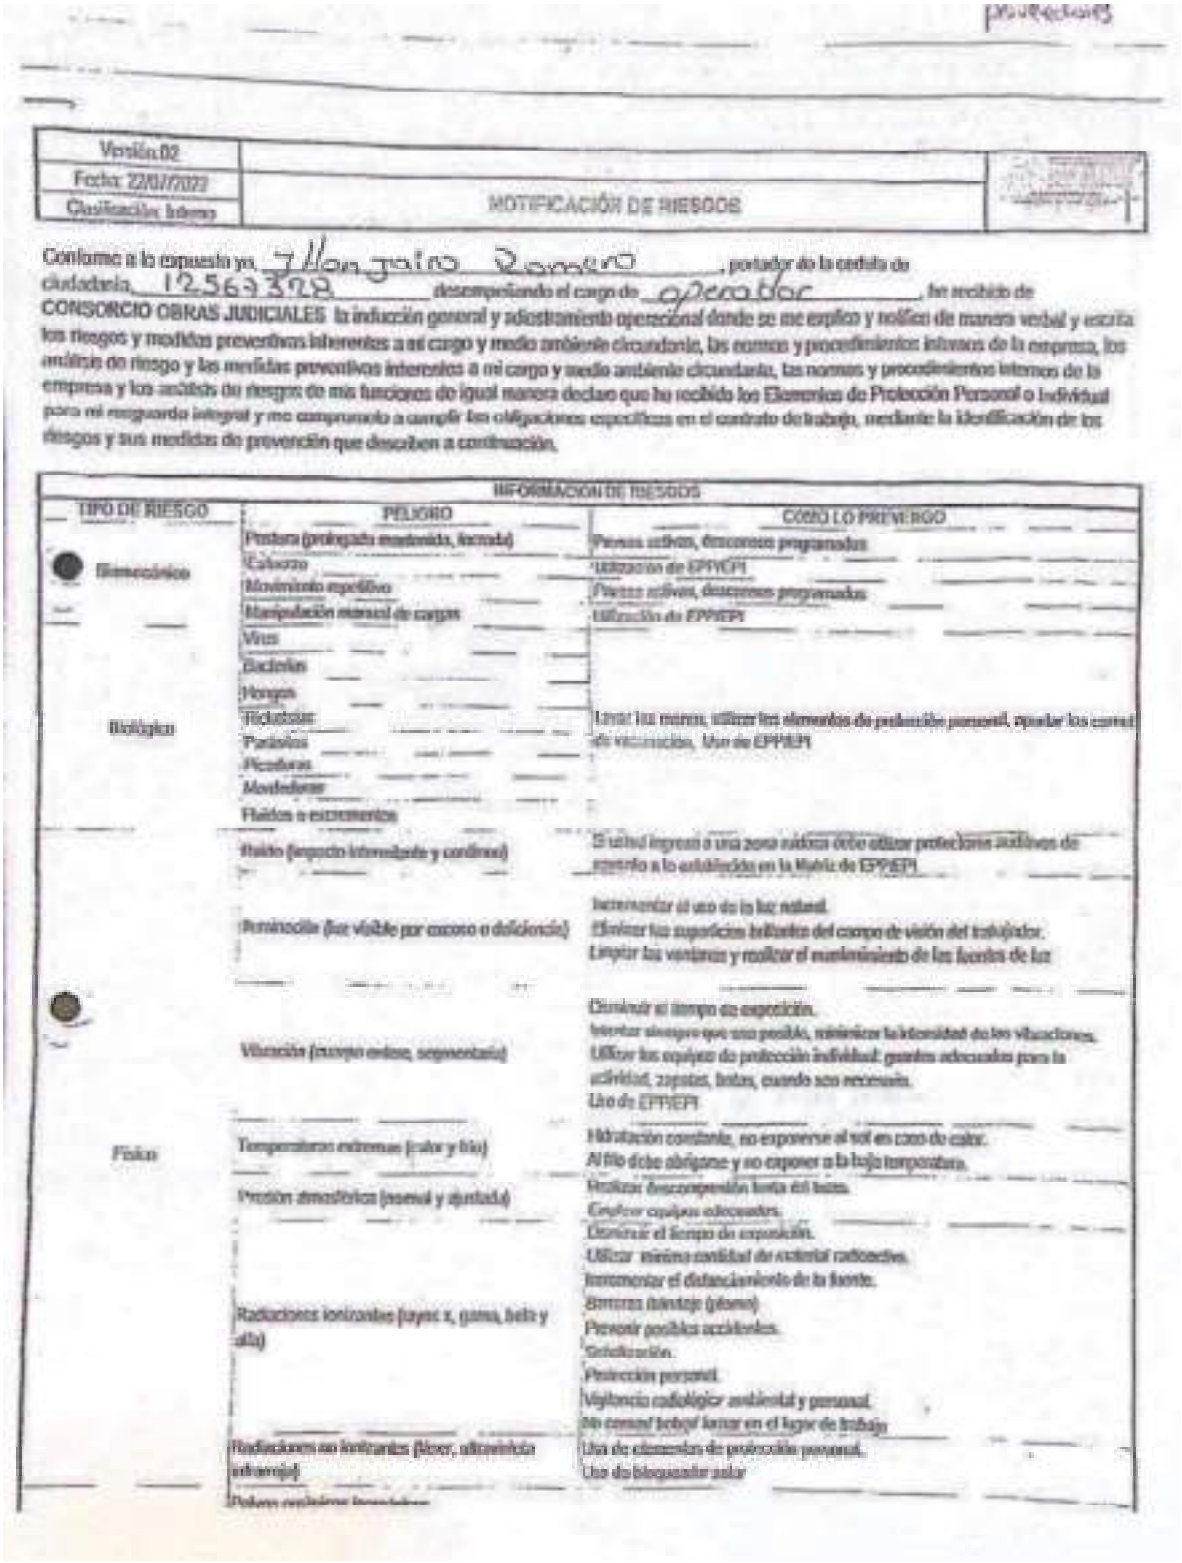


Versión 02
Fecha: 22/07/2021
Clasificación: Interna

MOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Conforme a lo expuesto yo, Wanjaino Romero, portador de la cedula de ciudadanía 12563328 desempeñando el cargo de operador, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENIRGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar los correctos de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (ingreso intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras (blindaje (plomo) Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Presiones anormales (hiperbaricas)	

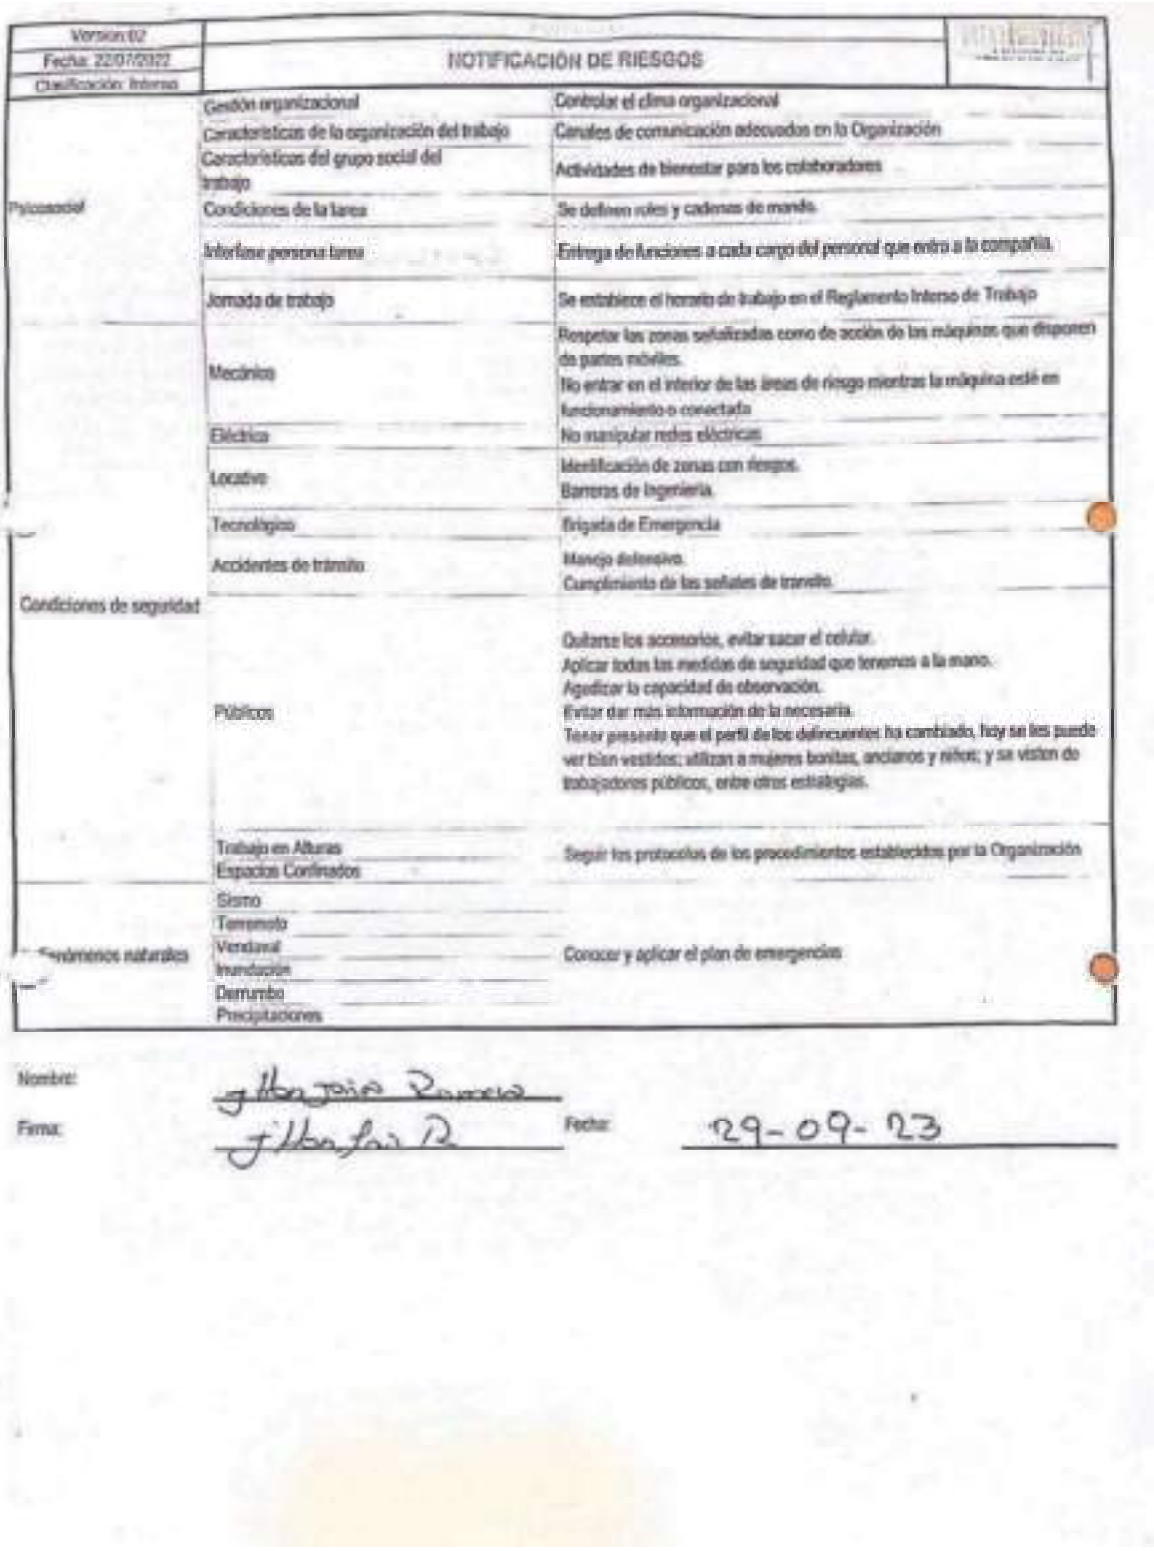

Versión:02
Fecha: 22/07/2022
Clasificación: Interna

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrica	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbo Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Gilberto Ramos


Firma: Gilberto R

Fecha: 29-09-23

Versión:02	
Fecha: 23/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Sandra Lucia Pena J. portador de la cedula de ciudadania 32261860 desempeñando el cargo de Auditor he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describos a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánicos	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
	Virus	
	Bacterias	
	Hongos	
Biológico	Ricketsias	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si ustec ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI.
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
Físico	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínimo cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Elemento delantal (plomo) Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

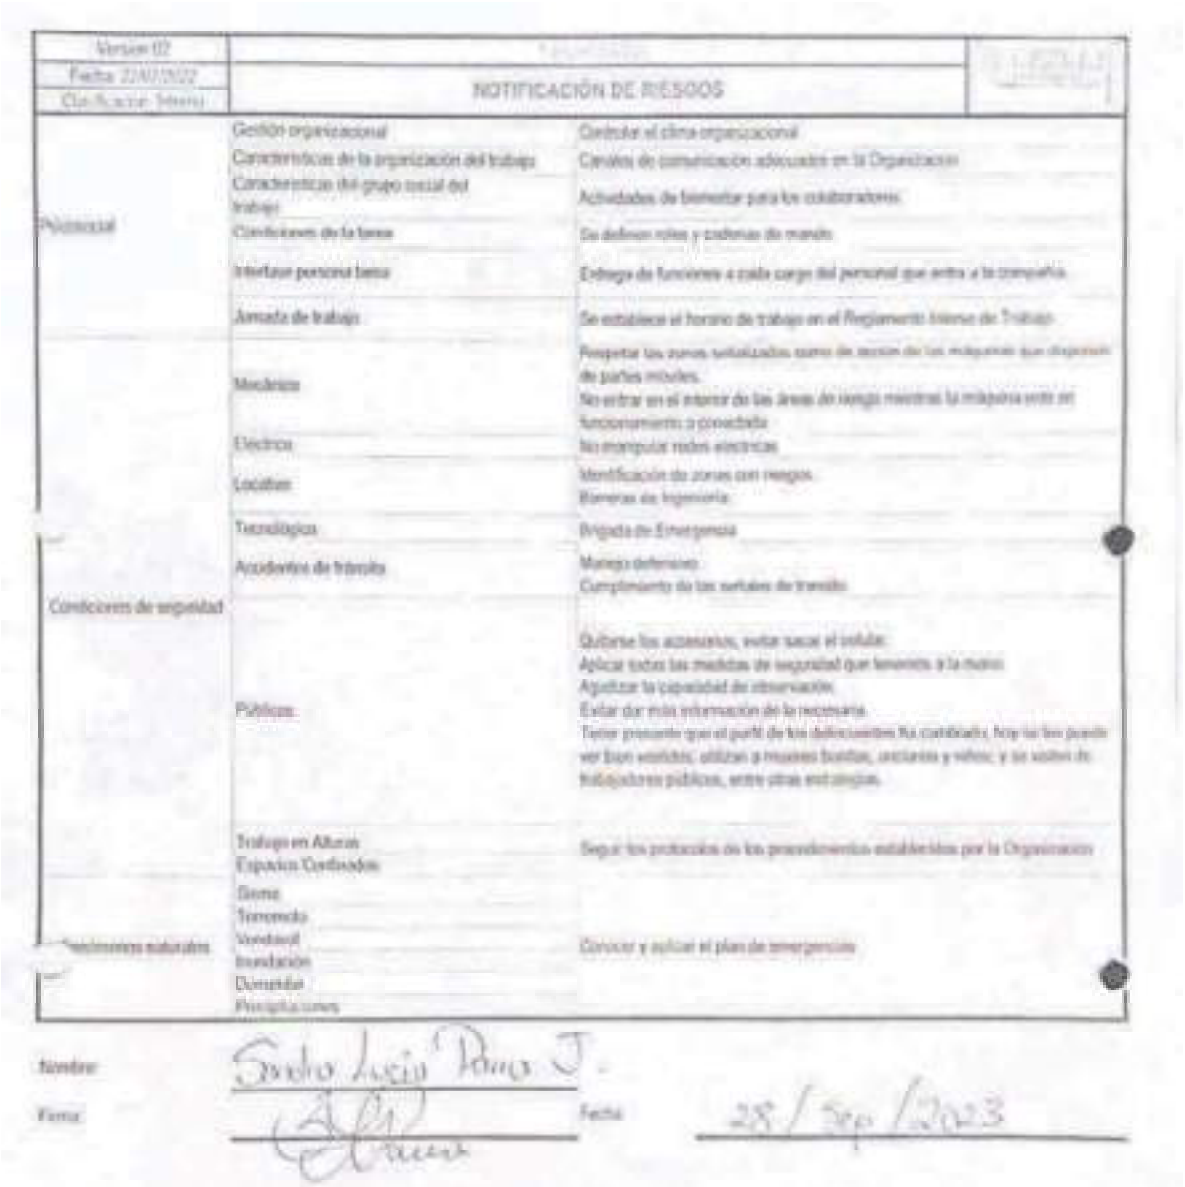


Versión 02		
Fecha 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interna		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánicos	Respetar las zonas señalizadas como de acceso de los maquinas que disponen de partes moviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina este en funcionamiento o conectada
	Electricos	No manipular redes electricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos Barreras de Ingeniería
	Tecnológicos	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo Cumplimiento de las señales de tránsito
	Públicos	Cubrirse los acosenos, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano Agudizar la capacidad de observación Evitar dar mas información de la necesaria Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy no los puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños, y no visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Tormenta Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Sandra Lucia Parra J.

Firma:

Fecha: 28/Sep/2023

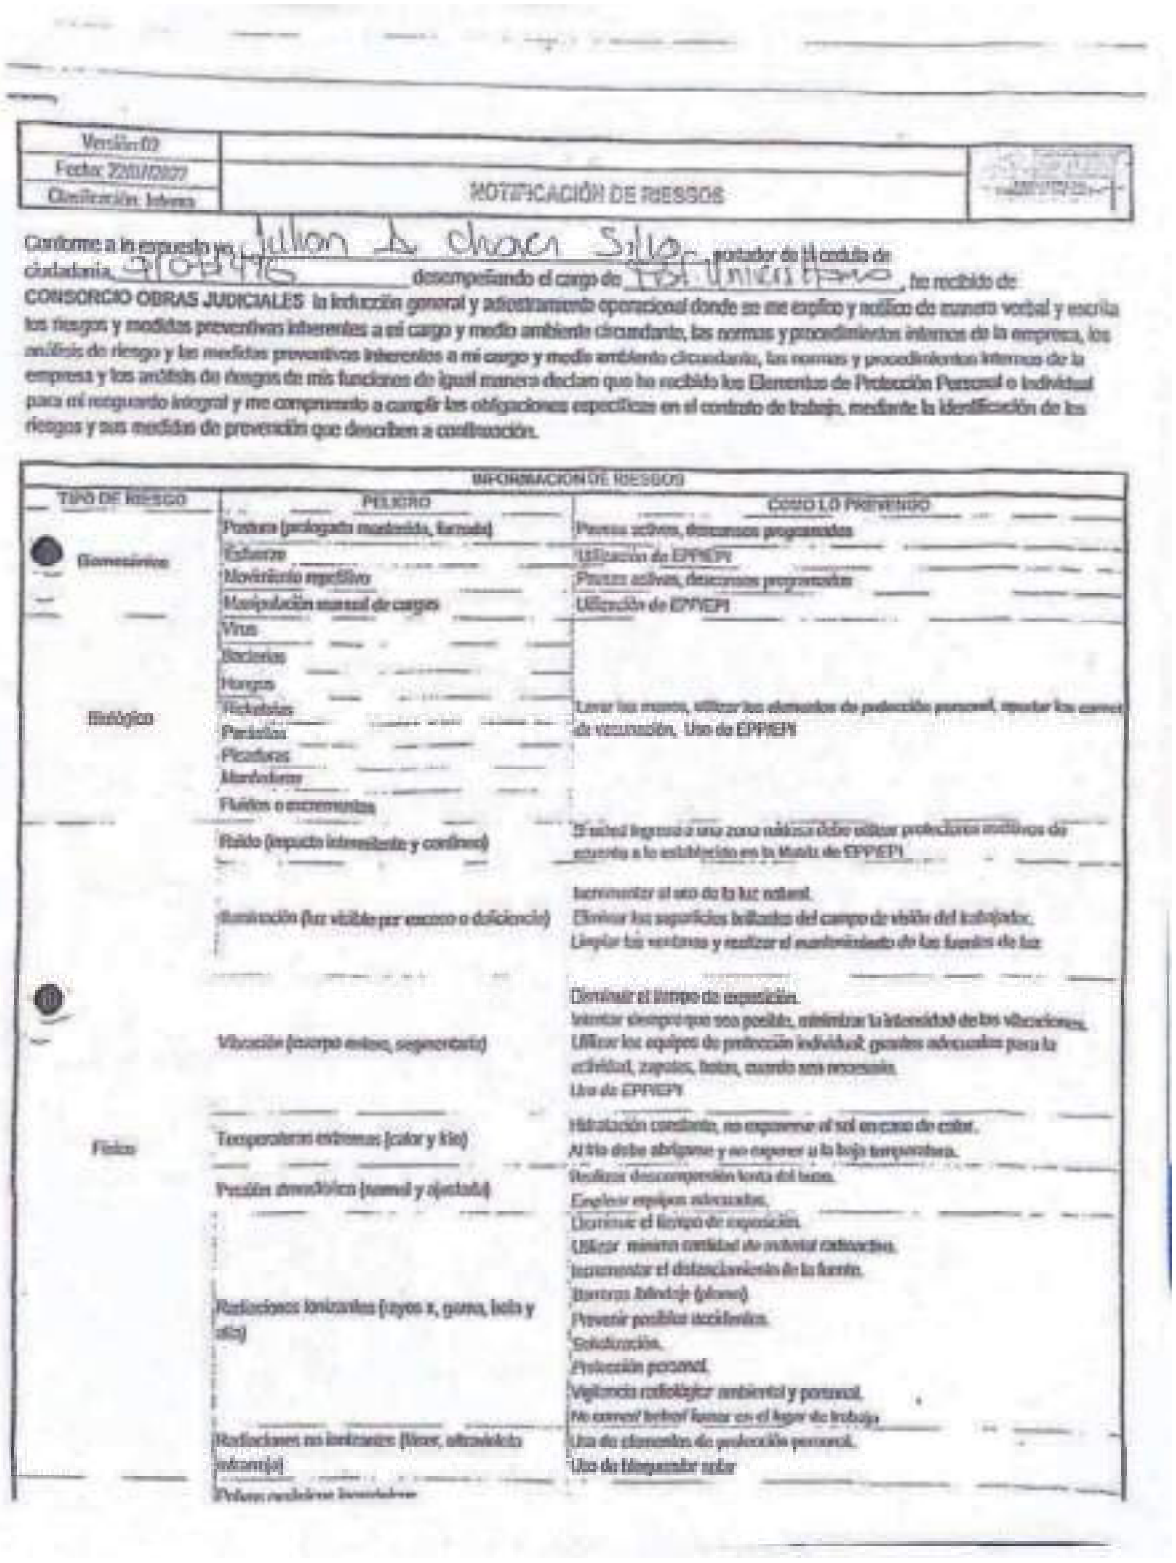

Versión 03	
Fecha: 22/01/2017	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Julian A. Chaca Silva, portador de la cedula de ciudadanía 91081476 desempeñando el cargo de Ayudante, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	CONTROL PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los casos de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Barreras Aislantes (plomo) Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

Versión 02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interna		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Nelson Chacon

Firma:

Fecha: 28/Sep/2023

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, Cristhian David Rojas M. portador de la cedula de ciudadanía 1094284410 desempeñando el cargo de supervisor de cuadrilla III, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y realizo de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a la exposición en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (mano-brazo, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Mientras disponga una pausa, reducir la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras Blindaje (plomo).
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/beber/fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (laser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

Versión 02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interna		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños, y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Christian D. Peña Monsalve


Firma: Christian Peña Fecha: 28/09/23

Versión:02 Fecha: 22/07/2022 Clasificación: Interno	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interface persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Yamileth Cortés

Firma:

Fecha: 7/08/23

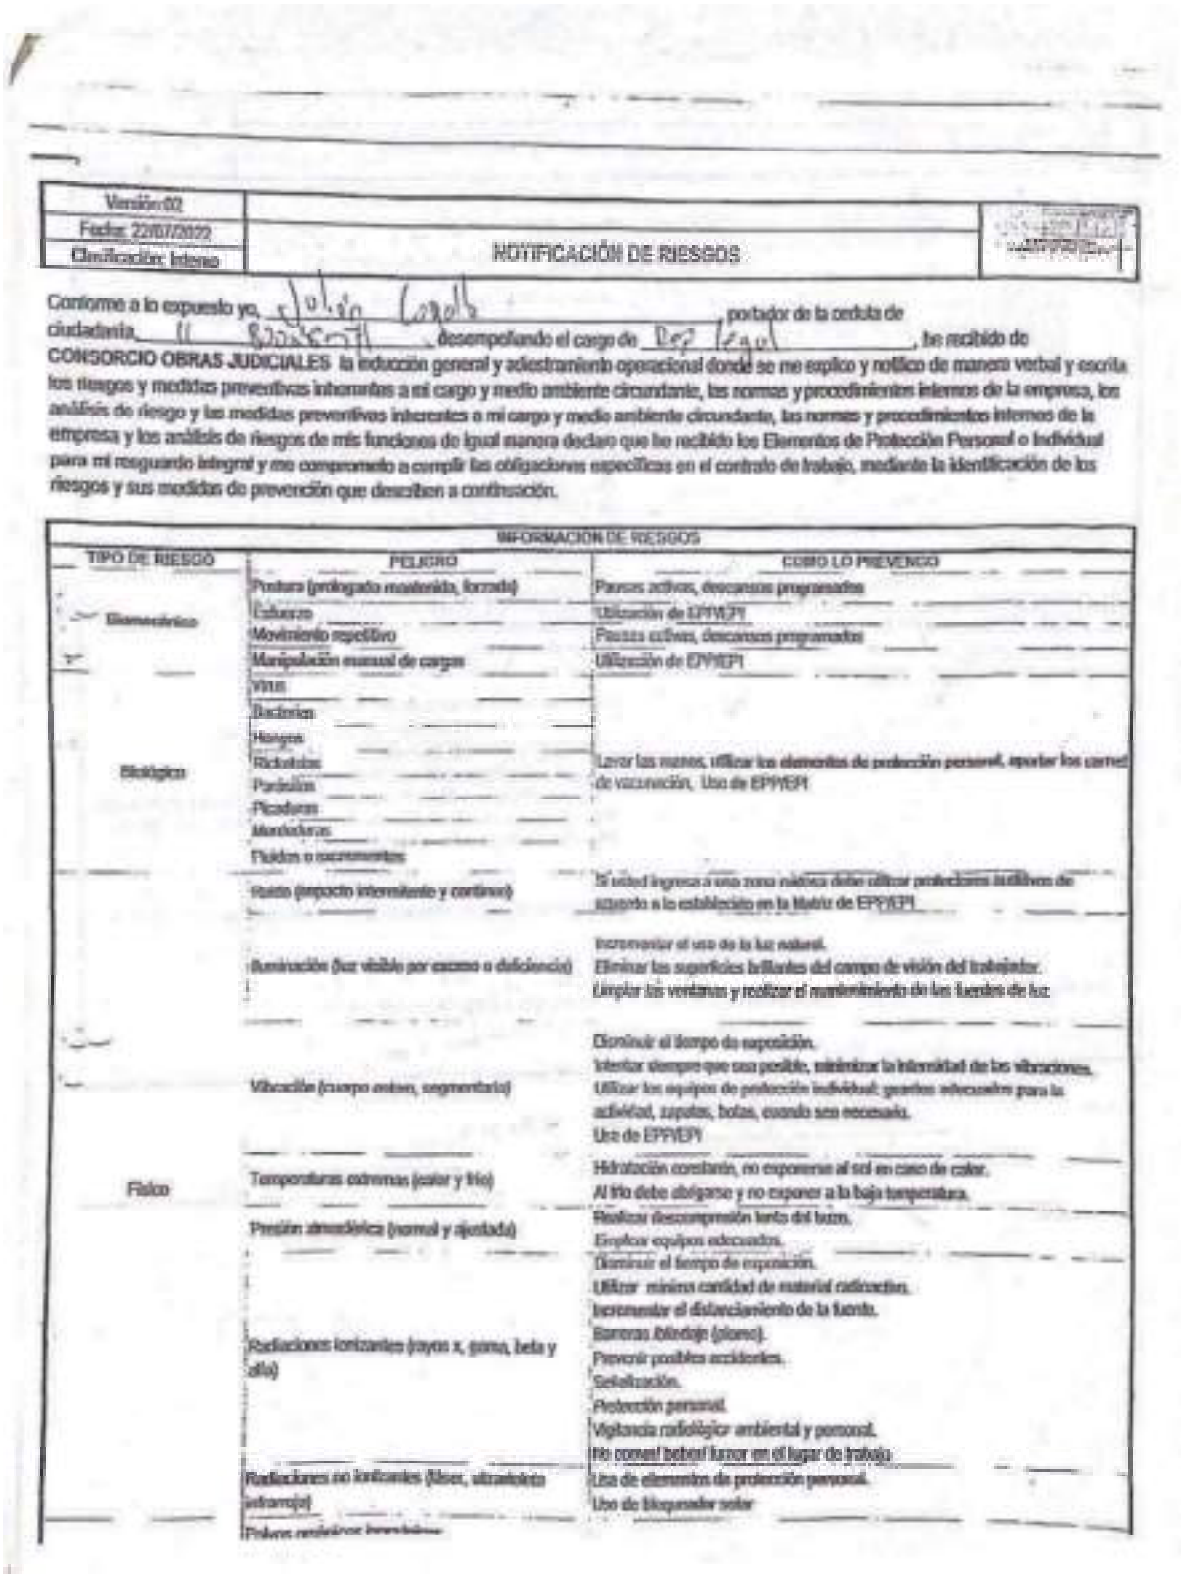

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, Julian Cardo portador de la cedula de ciudadanía 11 [illegible], desempeñando el cargo de Op Logi, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar los vertimos y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras plomadas (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo. Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

Versión 02	FORMATO	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando
	Interface persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológicos	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Julio Cuajib

Firma:

Fecha: 07-09-2023

Proveedor externo

Versión 02	
Fecha: 22/07/2020	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Glendy Jimenez Pechoz O., portador de la cedula de ciudadanía 1067595122 desempeñando el cargo de Sicologa, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentario)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras Adhesiva (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Peligros psicosociales (trabajo	

Versión: 1
Fecha: 18/09/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 28-08-2023 al 02-09-2023

HORA: 08:00A.M - 05:00p.m

OBRA: Construcción palacio de justicias

CONTRATISTA: Consorcio obras judiciales

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	N Aplica	
A	HERRAMIENTAS MANUALES				
1	Se usa la(s) herramienta(s) adecuada al trabajo	✓			
2	Estado de la Herramienta	✓			
3	Estado de Almacenamiento y de Uso	✓			
4	Estado de los mangos de madera	✓			
5	Se usan pernos de bronce			✓	
B	HERRAMIENTAS DE CORTE				
1	Estado de la cabeza de los cinceles			✓	
2	Filo de los cinceles			✓	
3	Estado de los dientes de las terrajas macho o hembra			✓	
4	Instalación de las tapas de seguros	✓			
5	Estado de los mangos de las limas			✓	
6	Empuñaduras y dientes de los serruchos	✓			
7	Estado de los filangos y fundas de los cuchillos			✓	
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE				
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor ?	✓			
2	Sus caras y bordes están en buen estado?	✓			
3	Estado en que se encuentra el mango	✓			
D	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES				
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas ?			✓	
2	Estado de huellas y palancas de la llave			✓	
3	Se dispone de llaves para golpear?			✓	
4	Estado de las mandibulas de las llaves			✓	
5	Estado de las herramientas para trabajos electricos			✓	
6	Aislamiento de las herramientas para los trabajos electricos			✓	
7	Estado de la punta y cubo de los destornilladores			✓	
8	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas?			✓	
E	HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS				
1	Las herramientas son adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)?			✓	
2	Uso de los Elementos de protección Personal de acuerdo al uso de la herramienta	✓			
3	Limpieza y Lubricación de las herramientas	✓			
4	Guardas de seguridad	✓			
5	Aislamientos y sistemas de fijación	✓			
6	Estado del cable y enchufe	✓			
7	Estado y manejo de los taladros			✓	
8	Diametro, especificación y estado de la broca para el taladro a usar			✓	
9	Los esmeriles cuentan con guardas de Seguridad?			✓	
10	Los esmeriles cuentan los soportes de los discos o piedras son los adecuados?			✓	

Versión: 1	FORMATO
Fecha: 20/04/2023	PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO MANUAL (TROMPO)
Clasificación: Interno	

Maquina: A
Obra: Judiciales
Horas inicio: 7:00 AM
Horas fin: 5:00 pm

Semana 04 Al 09 Septiembre /23

INSPECCIÓN VISUAL		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique que la estructura es conforme	✓				✓				✓		✓					
LLANTAS	Verifique la condición de las llantas	✓				✓				✓		✓					
VALVERAS Y BUJES DE ROTACIÓN	Verifique funcionamiento	✓				✓				✓		✓					
MECANISMO PARA VACIADO	Verifique funcionamiento	✓				✓				✓		✓					
FRENO EN BUEN ESTADO	Verifique funcionamiento	✓				✓				✓		✓					
VALVULAS	Verifique funcionamiento	✓				✓				✓		✓					
PATAS DE ANCLAJE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓				✓				✓		✓					
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO																	
TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓				✓				✓		✓					
ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR)	Verifique funcionamiento	✓				✓				✓		✓					
RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓				✓				✓		✓					
RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO	Verifique funcionamiento	✓				✓				✓		✓					
TAPA DEL MOTOR CON SEGURO	Verifique funcionamiento	✓				✓				✓		✓					
CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO	Verifique funcionamiento	✓				✓				✓		✓					
ENCENDIDO DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓				✓				✓		✓					
CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE	Verifique su funcionamiento	✓				✓				✓		✓					

Fecha ultimo mantenimiento del equipo:	
Observación:	

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO	CASTILLO	Damaris Salcedo
CARGO:	JEFE	Residente SST
FIRMA:	CASTILLO	Damaris

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 20/04/2023	PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO MANUAL (TROMPO)	
Clasificación: Interno		

Maquina: _____
Obra: obras judiciales
Horas inicio: 07 hora AM
Hora fin: 05 hora PM

Semana: 11 al 16-09/23

INSPECCIÓN VISUAL		APLICA SI	APLICA NO	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIERC C	MIERC NC	JUEV C	JUEV NC	VIER C	VIER NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique que la estructura es conforme	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Verifique la condición de las llantas	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
VALVERAS Y BUJES DE ROTACIÓN	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
MECANISMO PARA VACIADO	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
FRENO EN BUEN ESTADO	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
VALVULAS	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
PATAS DE ANCLAJE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO																	
TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR)	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
TAPA DEL MOTOR CON SEGURO	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
ENCENDIDO DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE	Verifique su funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			

Fecha último mantenimiento del equipo:	

Observación:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Luis Castillo	Karen Soto
CARGO:	Ayp	Resid. SST
FIRMA:	Castillo	

Versión: 1	FORMATO
Fecha: 20/04/2023	PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO MANUAL (TROMPO)
Clasificación: Interno	

Maquina: 01
Obra: Palacio de Justicia
Horas inicio: 08:00 a.m.
Horas fin: 05:00 p.m.

Semana: 18 al 23 sep/23

INSPECCIÓN VISUAL		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique que la estructura se conforme	✓		✓		✓		✓		✓							
LLANTAS	Verifique la condición de las llantas	✓		✓		✓		✓		✓							
VALVERAS Y BUJES DE ROTACIÓN	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓							
MECANISMO PARA VACIADO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓							
FRENO EN BUEN ESTADO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓							
VALVULAS	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓							
PATAS DE ANCLAJE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓							
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO																	
TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓							
ESTADO DE PAGADORES (BASTIDOR)	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓							
RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓							
RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓							
TAPA DEL MOTOR CON SEGURO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓							
CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓							
ENCENDIDO DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓							
CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE	Verifique su funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓							

Fecha ultimo mantenimiento del equipo:	

Observación:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO:	CASTILLO	Karen Soto
CARGO:	AYE	R. SST
FIRMA:	CASTILLO	

Versión: 1	FORMATO
Fecha: 20/04/2023	PREOPERACIONAL DE RECICLADORA DE CONCRETO MANUAL (PROVIA)
Clasificación: Interno	

Maquina:
Obra: Palacio de Justicia
Horas inicio: 07:00 a.m.
Horas fin: 05:00 p.m.


Semana: 25/07/23 al 30/07/23

INSPECCIÓN VISUAL		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique que la estructura es conforme	✓				✓											
LLANTAS	Verifique la condición de las llantas	✓				✓											
VALERAS Y BUJES DE ROTACIÓN	Verifique funcionamiento	✓				✓											
MECANISMO PARA VACIADO	Verifique funcionamiento	✓				✓											
FRENO EN BUEN ESTADO	Verifique funcionamiento	✓				✓											
VALVULAS	Verifique funcionamiento	✓				✓											
PATAS DE ANCLAJE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓				✓											
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO																	
TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓				✓											
ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR)	Verifique funcionamiento	✓				✓											
RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓				✓											
RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO	Verifique funcionamiento	✓				✓											
TAPA DEL MOTOR CON SEGURO	Verifique funcionamiento	✓				✓											
CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO	Verifique funcionamiento	✓				✓											
ENCENDIDO DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓				✓											
CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE	Verifique su funcionamiento	✓				✓											

Fecha ultimo mantenimiento del equipo:	

Observación:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Luis Alberto Castillo	Karen Soto
CARGO:	Ayudante	R. SST
FIRMA:	CASTILLO	

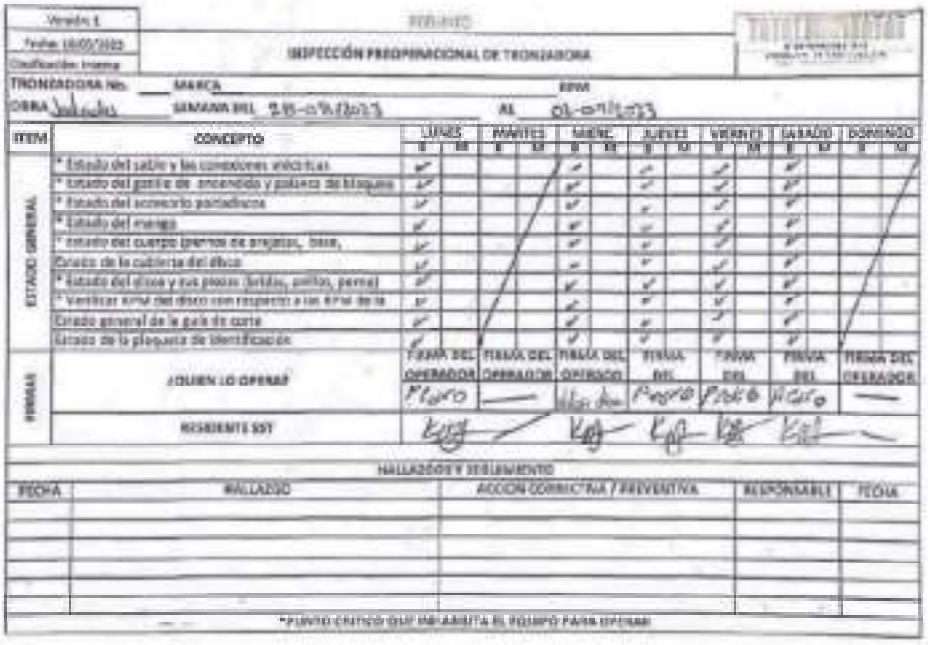

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA

TRONZADORA No. ___ MARCA ___ BPM


OBRA ___ SEMANA DEL 25-09-2023 AL 01-10-2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓				✓		✓		✓		✓			
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	✓				✓		✓		✓		✓			
	* Estado del soporte portadisco	✓				✓		✓		✓		✓			
	* Estado del mango	✓				✓		✓		✓		✓			
	* estado del cuerpo (partes de plastico, tapa,	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado de la cubierta del disco	✓				✓		✓		✓		✓			
	* Estado del disco y sus piezas (brida, pinon, perno)	✓				✓		✓		✓		✓			
	* Verificar nivel del disco con respecto a un nivel de la	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guia de corte	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓				✓		✓		✓		✓			
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL OPERADOR	
		Pedro		—				Pedro		Pedro		Pedro		—	
	RESIDENTE SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE NO AFECTA EL DESEMPEÑO PARA OPERAR

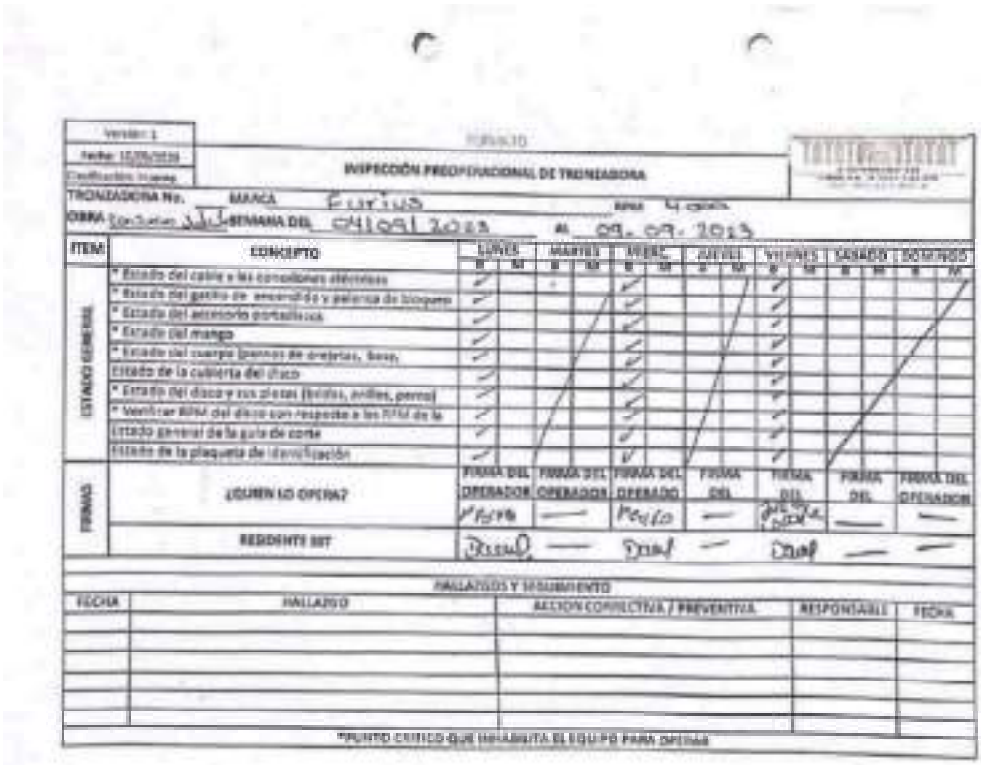

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TROMBADORA

TROMBADORA No. MARCA FURUKAWA


OBRA Consorcio JJ SEMANA DEL 04/09/2023 AL 09-09-2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓				✓				✓					
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	✓				✓				✓					
	* Estado del accesorio portabroca	✓				✓				✓					
	* Estado del mango	✓				✓				✓					
	* Estado del cuerpo (puntos de golpeteo, fisuras,	✓				✓				✓					
	Estado de la cubierta del disco	✓				✓				✓					
	* Estado del disco y sus platos (bridas, arillos, pernos)	✓				✓				✓					
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la	✓				✓				✓					
	Estado general de la guía de corte	✓				✓				✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓				✓				✓					
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADO		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

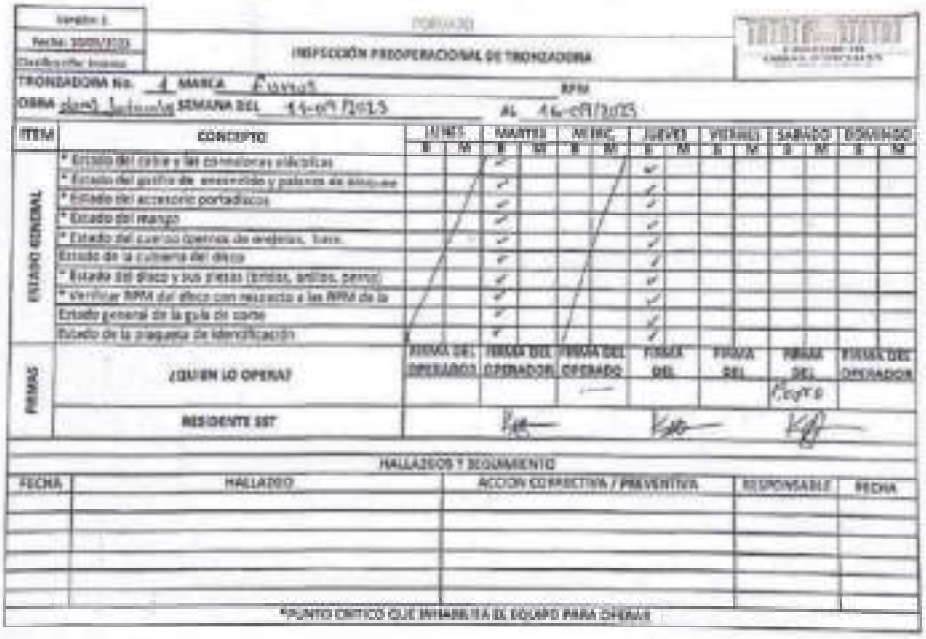

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA

TRONZADORA No. 4 MARCA Evans RPM


OBRA plaza Judicial SEMANA DEL 14-07-2025 AL 16-07-2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC B	MIERC M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓				✓							
	* Estado del guarda de seguridad y palanca de empuje			✓				✓							
	* Estado del accesorio portadiscos			✓				✓							
	* Estado del mango			✓				✓							
	* Estado del cuerpo (perno de anclaje, base,			✓				✓							
	Estado de la cubierta del disco			✓				✓							
	* Estado del disco y sus platos (bridas, anillos, perno)			✓				✓							
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la			✓				✓							
	Estado general de la guía de corte			✓				✓							
	Estado de la plaqueta de identificación			✓				✓							
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADO		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL OPERADOR			
	RESIDENTE SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

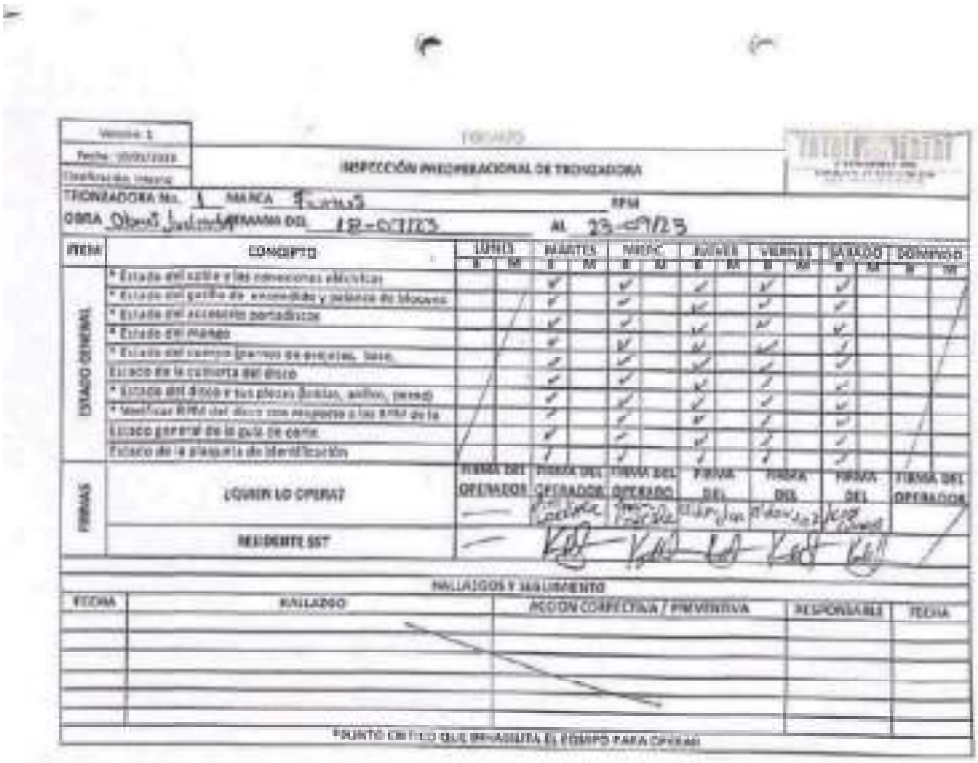

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA

TRONZADORA No. 1 MARCA [illegible] RPM


OBRA [illegible] SEMANA DEL 18-07/23 AL 23-07/23

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del guarda de enmedias y pelanza de blocaves			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del accesorio portadisco			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del mango			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del cuerpo (carros de arrastre, base,			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la cubierta del disco			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillo, pernos)			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guía de corte			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMAS	QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADO		FIRMA DEL OPERADO		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

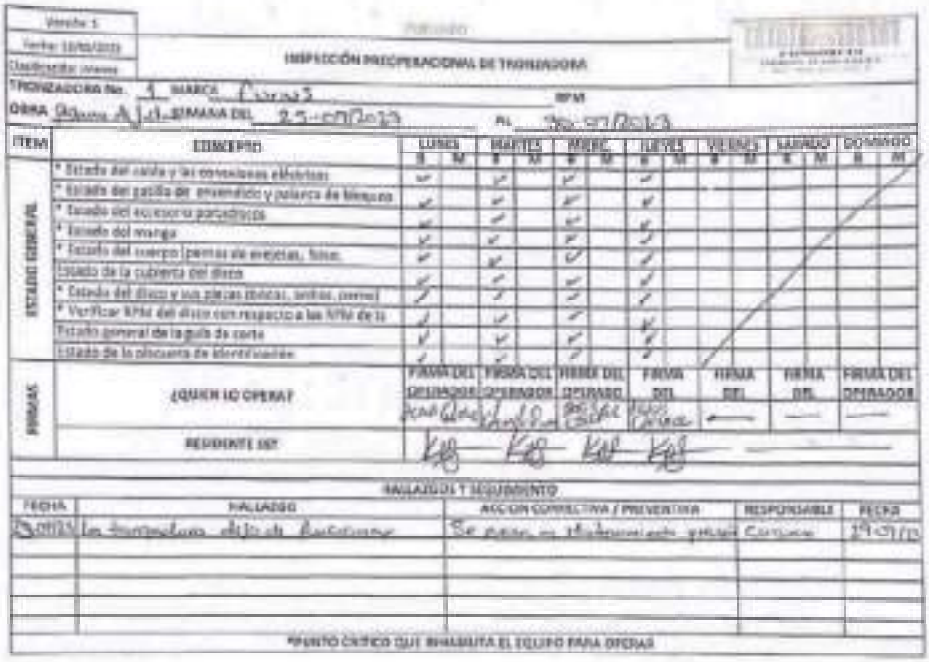

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONADORA

TRONZADORA No. 1 MARCA Lonza 2 RPM


OBRA Obras A.J. SEMANA DEL 23-08-2023 AL 30-08-2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del pasillo de: enseñado y palanca de bloqueo	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del eje sin fin y portadisco	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del cuerpo (partes de empotrar, fijas)	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la cubierta del disco	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del disco y sus placas (bridas, anillos, cuñas)	✓		✓		✓		✓							
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía de corte	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la cincuenta de identificación	✓		✓		✓		✓							
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADO		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
23/08/23	Las herramientas eléctricas	Se pasa la información		24/08/23

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

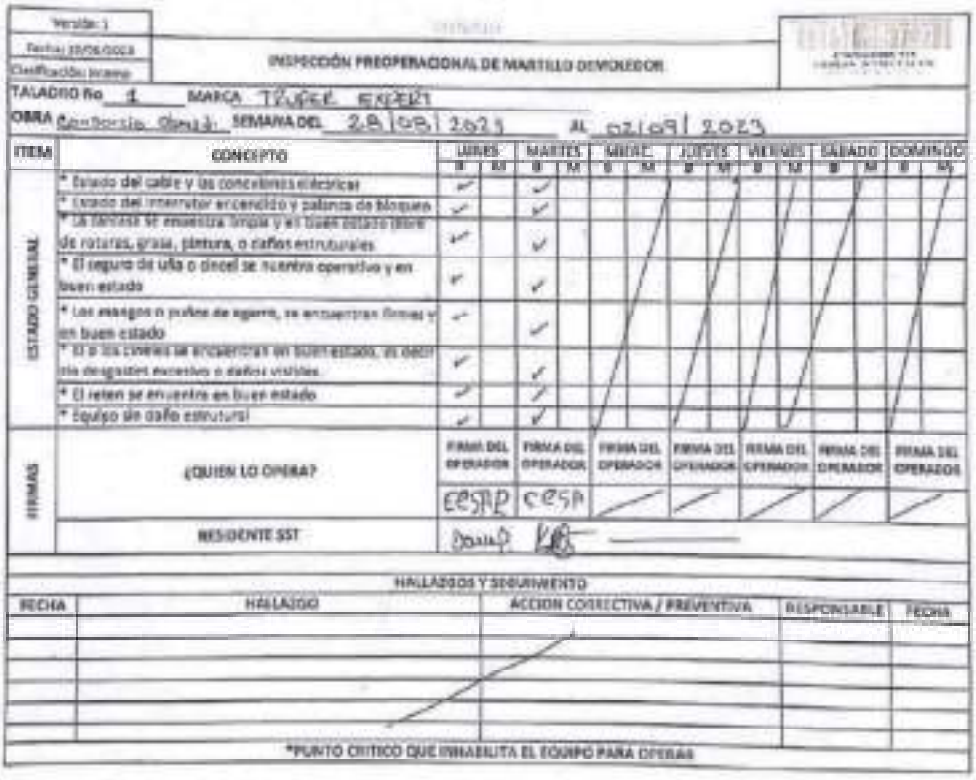

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR

TALADRO No 1 MARCA TRUPER EXPERT

OBRA Centro de Obras SEMANA DEL 28/08/2023 AL 02/09/2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y de conectores eléctricos	✓		✓											
	* Estado del interruptor encendido y palanca de bloqueo	✓		✓											
	* La carcasa se encuentra limpia y en buen estado libre de roturas, grasa, pintura, o daños estructurales	✓		✓											
	* El seguro de uña o dedal se nuentra operativo y en buen estado	✓		✓											
	* Los anagos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado	✓		✓											
	* El o los cinceles se encuentran en buen estado, sin deformidades excesivo o daños visibles	✓		✓											
	* El reten se encuentra en buen estado	✓		✓											
	* Equipo sin daño estructural	✓		✓											
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOS	
		CESAR		CESAR											
	RESIDENTE SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Versión: 1
Fecha: 16/08/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 28-08-2023 al 01-09-2023

HORA: 07:00 A.M - 05:00 P.M


OBRA: Construcción Palacio de Justicia

CONTRATISTA: Consorcio Obras Judiciales

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	N Aplica	
11	Los cilindros conectan en diámetro y están instalados según el oficio?			✓	
12	Estado de las roscas o bordo en las cuchillas abrasivas.			✓	
13	Almacenamiento de los polvorines y discos	✓			
F	HERRAMIENTAS NEUMATICAS				
1	Estado de las mangueras y empates			✓	
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta?			✓	
3	Presiones indicadas			✓	
4	Descarga de la herramienta			✓	
G	HERRAMIENTA POR DETONACIÓN				
1	El personal es autorizado	✓			
2	Emplean los elementos de protección	✓			
3	Descarga y almacenamiento de la herramienta	✓			
H	SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL				
1	El personal que utiliza los equipos y herramientas, ha recibido instrucción?	✓			
2	Las herramientas se seleccionan correctamente para el trabajo a realizar?	✓			
3	Transporte y almacenamiento al sitio del trabajo	✓			
4	Las labores de mantenimiento como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados.	✓			
5	Almacenamiento	✓			
6	Herramientas y equipos en buen estado	✓			
7	Se utilizan correctamente	✓			
8	Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales (ruido como alto voltaje, etc.	✓			

Nota: Los ítem del numeral H siempre deben ser diligenciados independiente del tipo de herramienta que se encuentre en el frente de obra.

	REVISO	APROBO
NOMBRE Y APELLIDO	Pedro Julio Sanabria	Ramon Soto
CARGO	Residente	R. SST
FIRMA	pedrojulio	

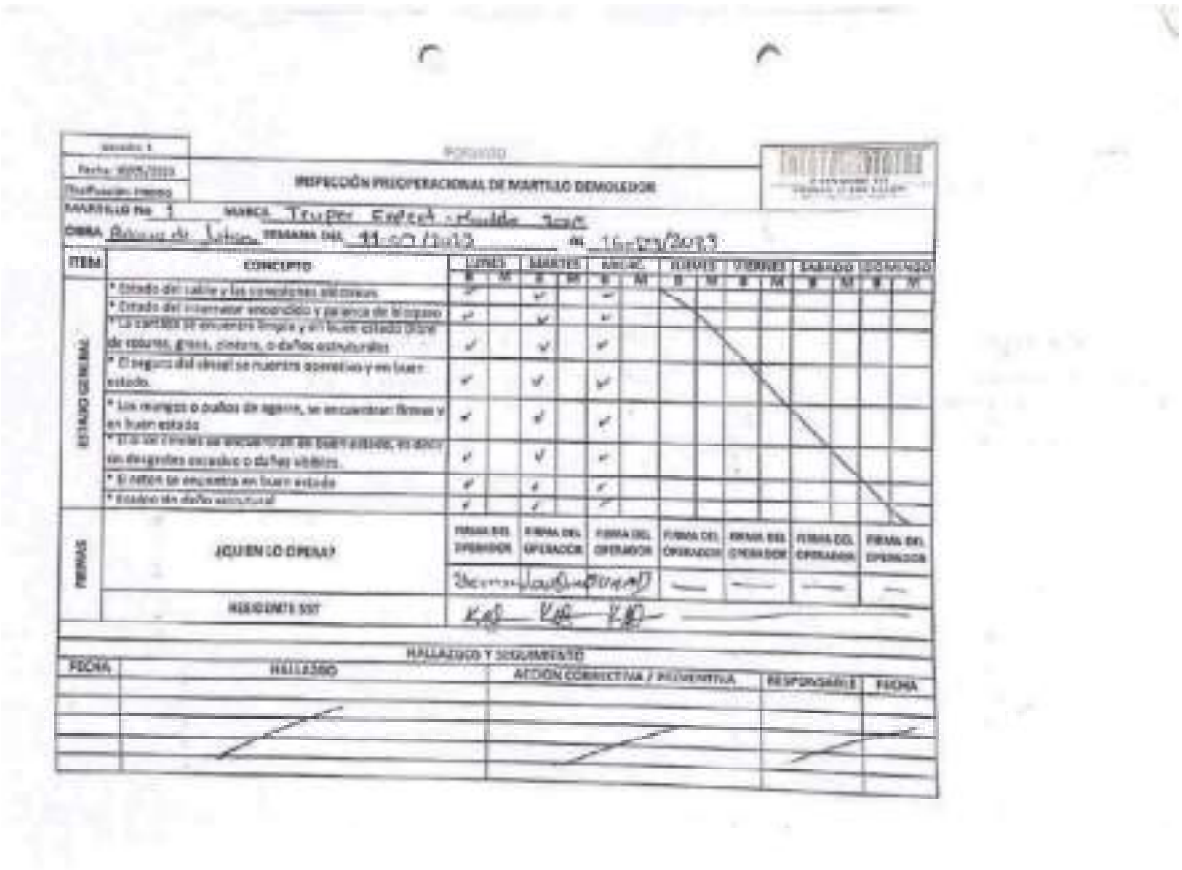

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR


MARTILLO No. 1 MARCA Truper Expert Modelo 7pc

OBRA Palacio de Justicia SEMANA DEL 11-05-2023 AL 16-05-2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	* Estado del interruptor encendido y apagado del equipo	✓		✓		✓									
	* La carcasa se encuentra limpia y en buen estado libre de rayones, grasa, cintura, o daños estructurales	✓		✓		✓									
	* El seguro del cincel se muestra operativo y en buen estado.	✓		✓		✓									
	* Las manijas o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado	✓		✓		✓									
	* El cable se encuentra en buen estado sin desgastes excesivo o daños visibles.	✓		✓		✓									
	* El motor se encuentra en buen estado	✓		✓		✓									
	* Estado sin daños estructural	✓		✓		✓									
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST	KG		KG		KG									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

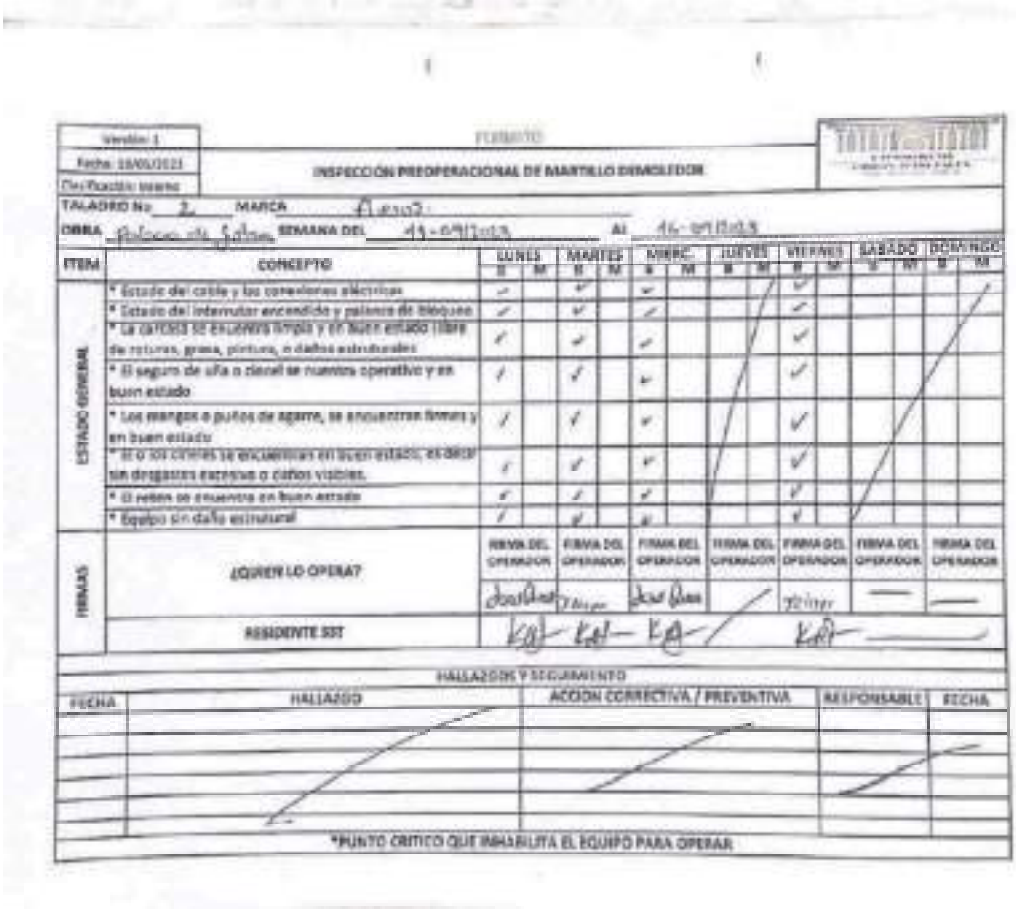

FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR

TALADRO No: 2 MARCA


OBRA SEMANA DEL AL

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓				✓					
	* Estado del interruptor encendido y palanca de bloqueo	✓		✓		✓				✓					
	* La carcasa se encuentra limpia y en buen estado libre de roturas, grasa, pintura, o daños estructurales	✓		✓		✓				✓					
	* El seguro de uña o cincel se muestra operativo y en buen estado	✓		✓		✓				✓					
	* Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado	✓		✓		✓				✓					
	* El o los cortes se encuentran en buen estado, es decir sin desgastes excesivo o cortes visibles.	✓		✓		✓				✓					
	* El resto se encuentra en buen estado	✓		✓		✓				✓					
	* Equipo sin daño estructural	✓		✓		✓				✓					
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

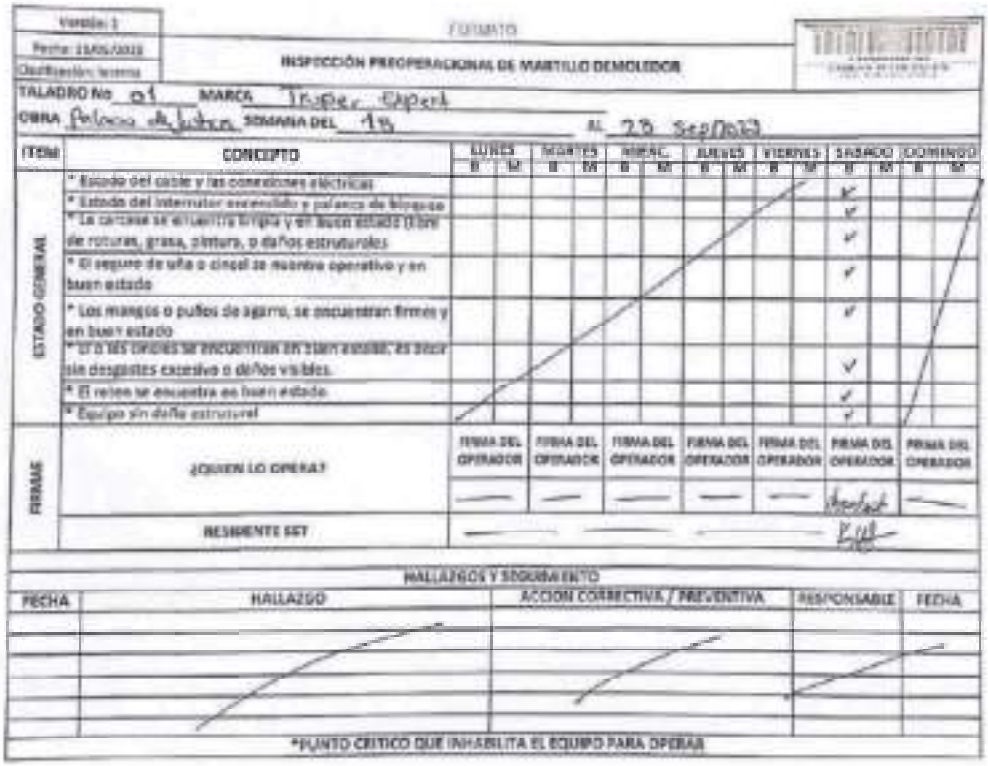

Versión: 1
Fecha: 15/05/2019
Clasificación: Interna

FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR


TALADRO No 01 MARCA Trupper Expert
OBRA Palacio de Justicia SEMANA DEL 16 AL 28 Sep/2019

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas											✓			
	* Estado del interruptor encendido y palanca de bloqueo											✓			
	* La carcasa se encuentra limpia y en buen estado (libre de roturas, grasa, pintura, o daños estructurales											✓			
	* El seguro de uña o cincel se muestra operativo y en buen estado											✓			
	* Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado											✓			
	* El cincel se encuentra en buen estado, es decir sin desgaste excesivo o daños visibles.											✓			
	* El resto se encuentra en buen estado											✓			
	* Equipo sin daño estructural											✓			
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

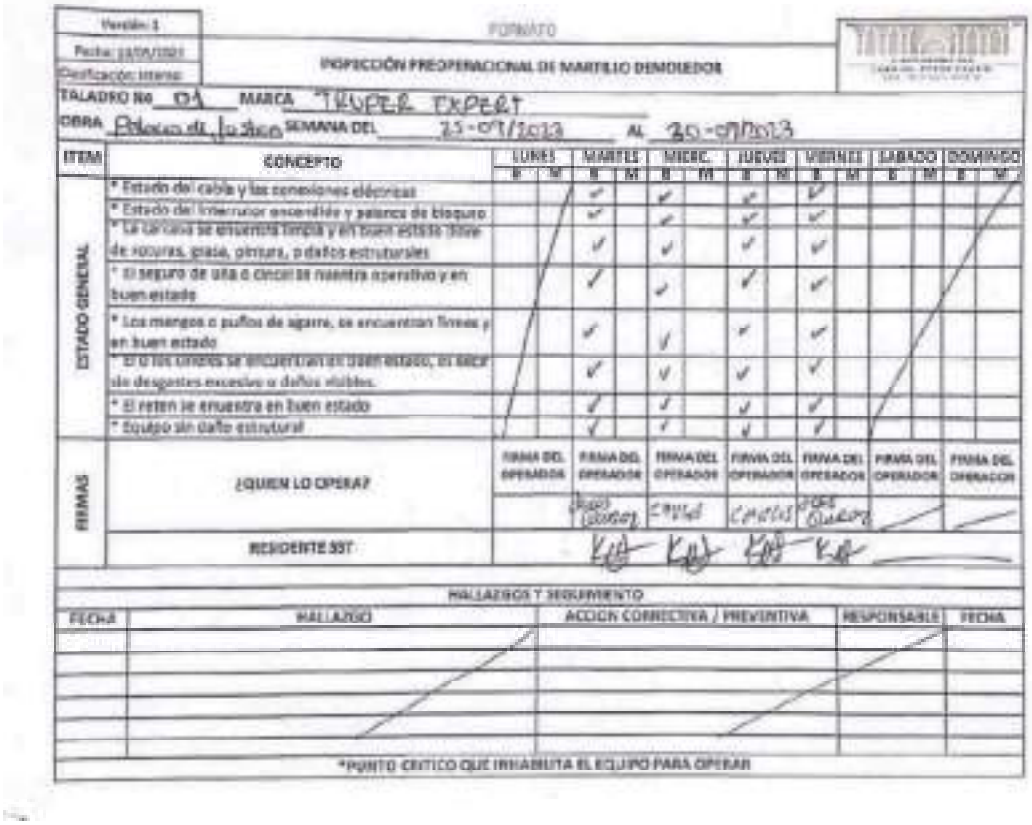

FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR

TALADRO No 04 MARCA TRUPER EXPERT


OBRA Palacio de Justicia SEMANA DEL 25-07/2023 AL 30-07/2023


ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del interruptor encendido y palanca de bloqueo			✓		✓		✓		✓					
	* La carcasa se encuentra limpia y en buen estado libre de roturas, grasa, pintura, o daños estructurales			✓		✓		✓		✓					
	* El seguro de alta o cincel se muestra operativo y en buen estado			✓		✓		✓		✓					
	* Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado			✓		✓		✓		✓					
	* El o los cinceles se encuentran en buen estado, sin exceso de desgastes excesivo o daños visibles			✓		✓		✓		✓					
	* El retén se enuentra en buen estado			✓		✓		✓		✓					
	* Equipo sin daño estructural			✓		✓		✓		✓					
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST														


HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO


FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA


*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

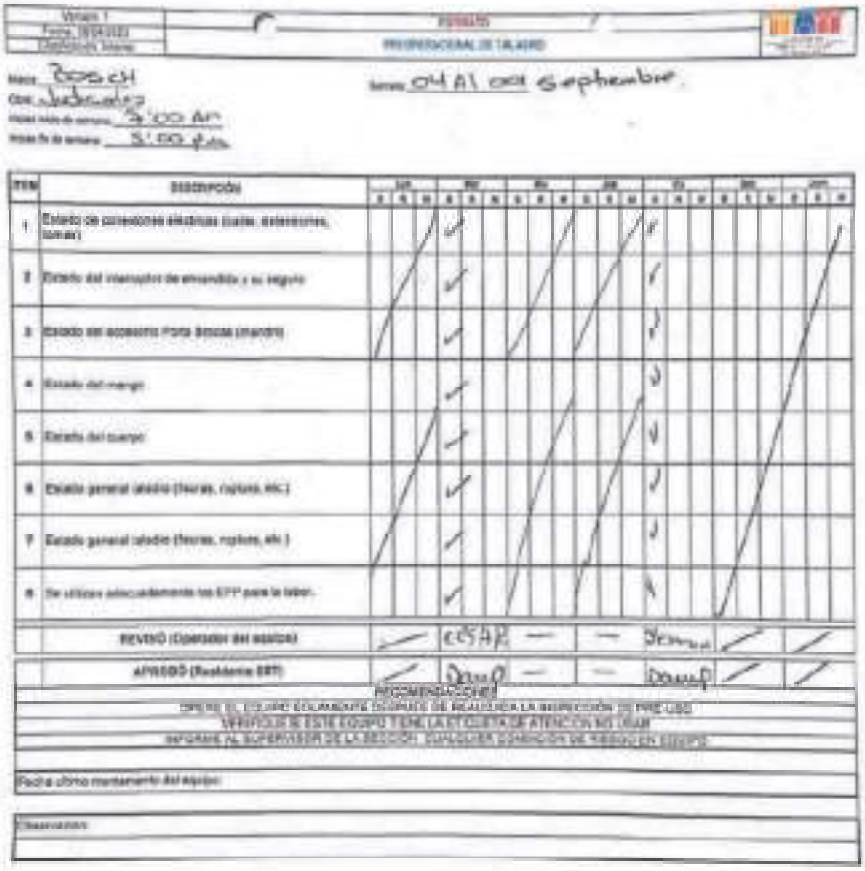


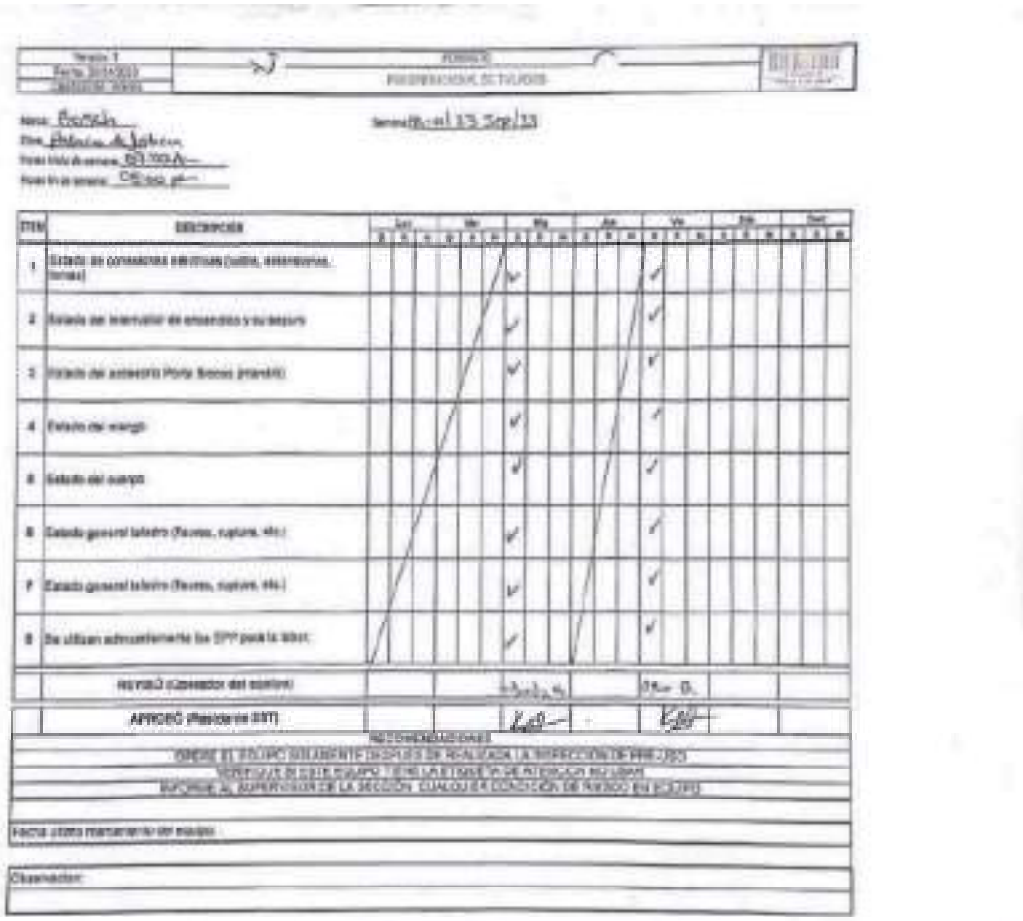

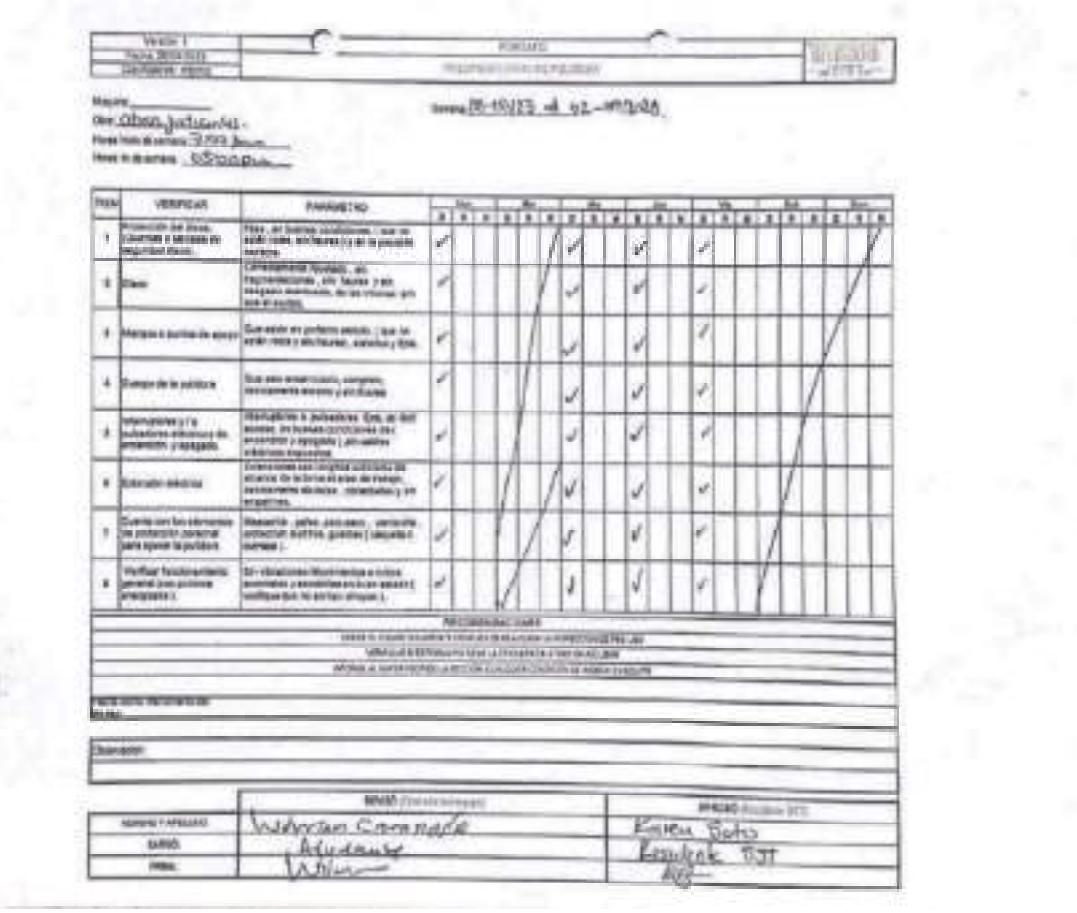

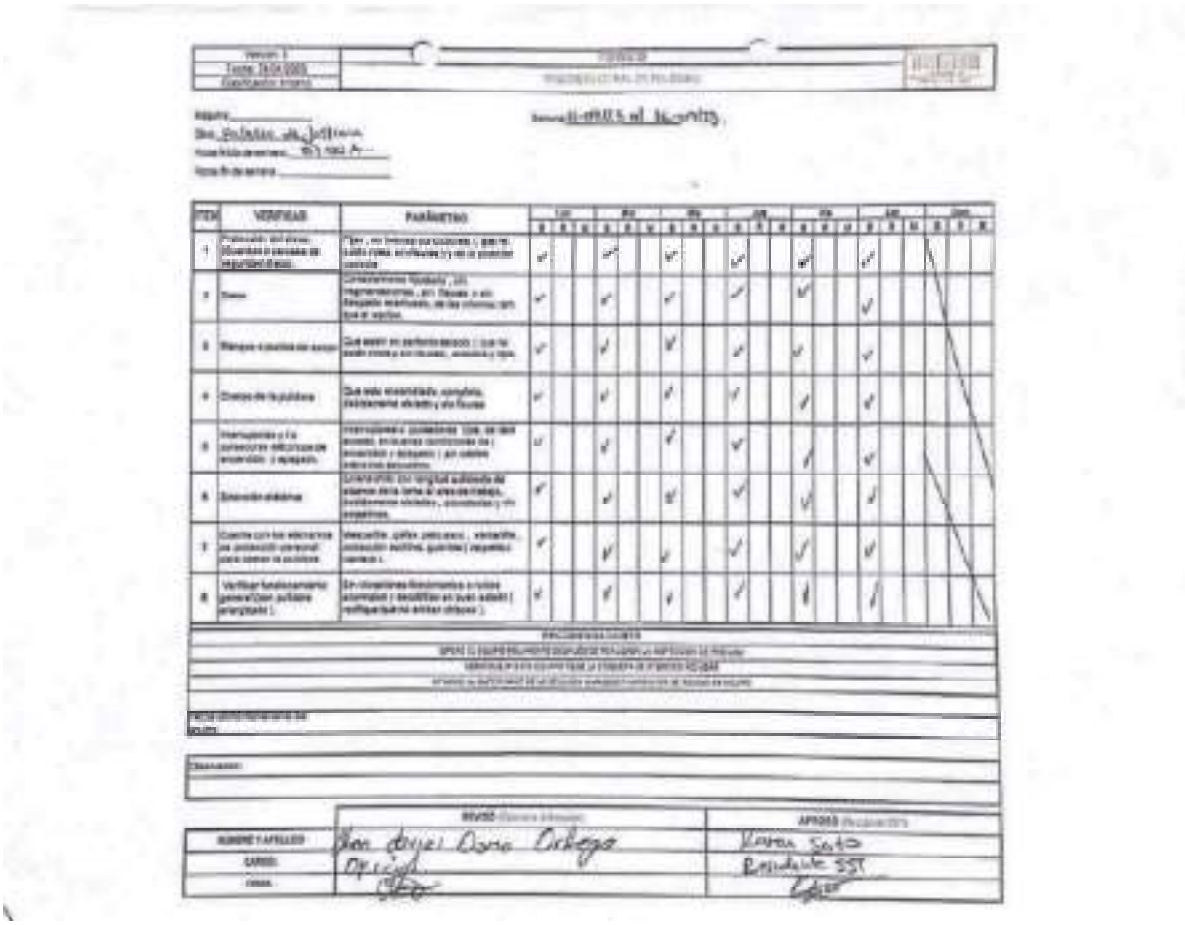

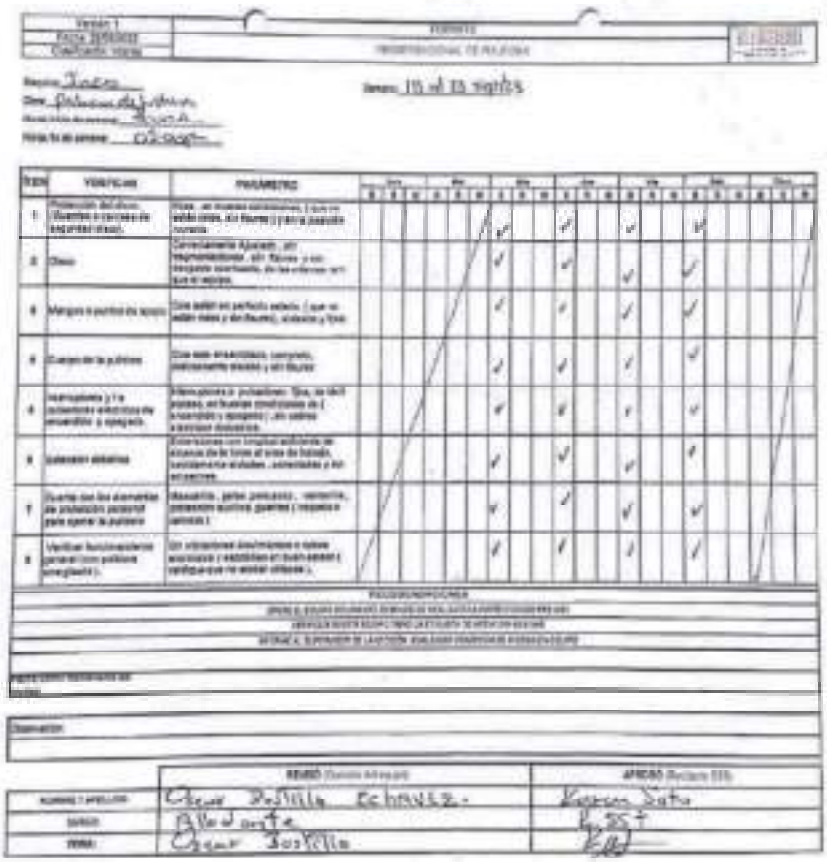

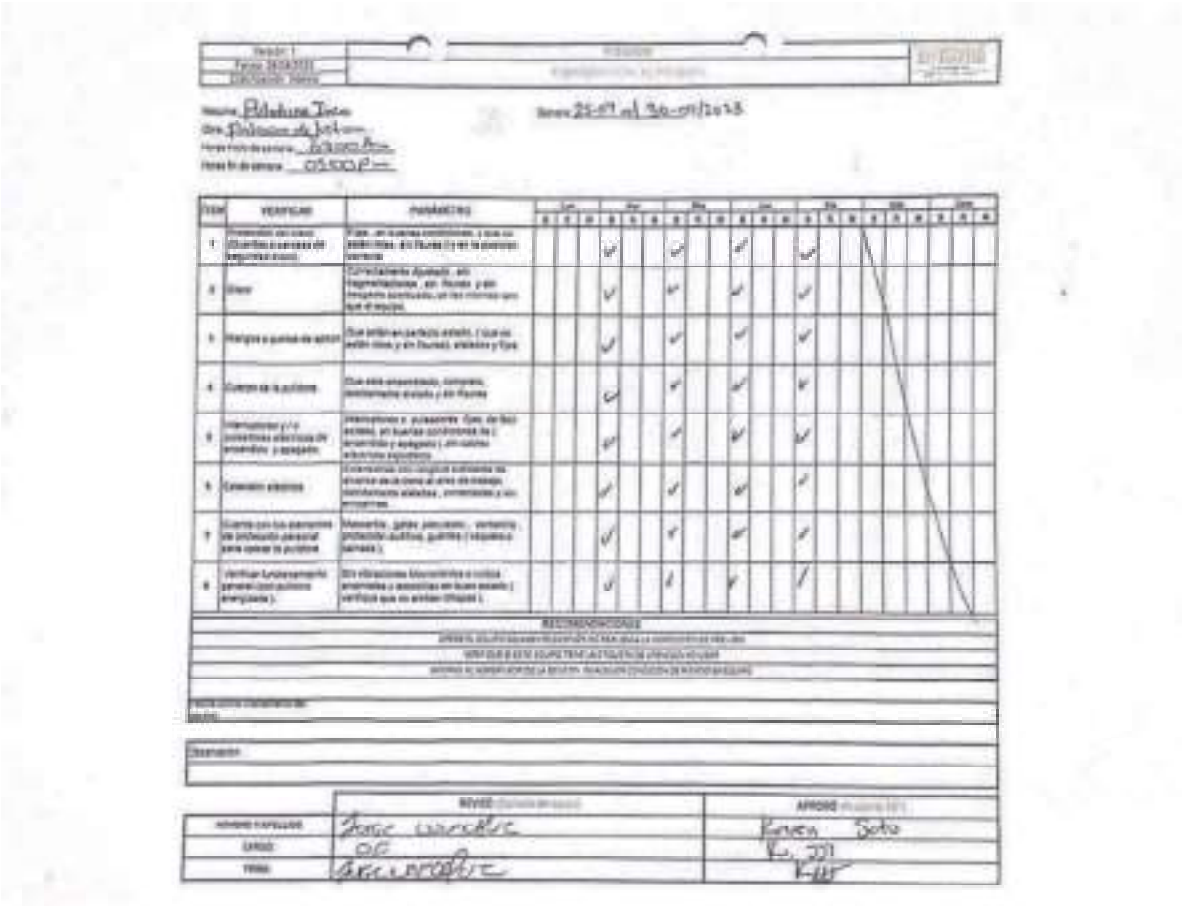





Versión: 1
Fecha: 15/05/2012
Clasificación: Interna

INSPECCION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 11-07-2013 al 17-07-2013
HORA: 0900 A.
OBRA: Construcción Palacio de Justicia
CONTRATISTA: Consorcio Obras Judiciales

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	N Aplica	
A	HERRAMIENTAS MANUALES				
1	Se usa la(s) herramienta(s) adecuada al trabajo	✓			
2	Estado de la Herramienta	✓			
3	Estado de Almacenamiento y de Uso	✓			
4	Estado de los mangos de madera	✓			
5	Se usan prensas de bancos				
B	HERRAMIENTAS DE CORTE				
1	Estado de la cabeza de los cinceles			✓	
2	Filos de los cinceles			✓	
3	Estado de los dientes de las serrojas macho o hembra			✓	
4	Instalacion de las hojas de segueta	-		✓	
5	Estado de los mangos de las limas			✓	
6	Grasa/Aceite y dientes de las serruchos	-		✓	
7	Estado de los Mangos y hendes de los cuchillos			-	
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE				
1	Se emplea el martillo adecuado segun la labor ?	✓			
2	Sus caras y bordes estan en buen estado?	✓			
3	Estado en que se encuentra el mango	✓			
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES				
1	Cuentan con llaves de ajustables y mixtas ?			✓	
2	Estado de huellas y palancas de la llave			✓	
3	Se disponen de llaves para golpear?			✓	
4	Estado de las mordazas de las llaves			✓	
5	Estado de las herramientas para trabajos electricos			✓	
6	Aislamiento de las herramientas para los trabajos electricos			✓	
7	Estado de la punta y cuna de los destornilladores	✓		-	
8	Se dispone de herramientas que no producen chispas?	✓			
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS				
1	Las herramientas son adecuadas segun el riesgo (humedad, vapores)?			✓	
2	Uso de los Elementos de protección Personal de acuerdo al tipo de la herramienta	✓			
3	Limpieza y Lubricación de las herramientas	✓			
4	Guardas de seguridad	✓			
5	Aislamientos y sistemas de tierra	✓			
6	Estado del cable y enchufe	✓			
7	Estado y manejo de los taladros			✓	
8	Diametro, especificación y estado de la broca para el taladro a usar			✓	
9	Las esmeriles cuentan con guardas de Seguridad?			✓	
10	Los esmeriles cuentan los soportes de las discos o muelas son los adecuados?			✓	

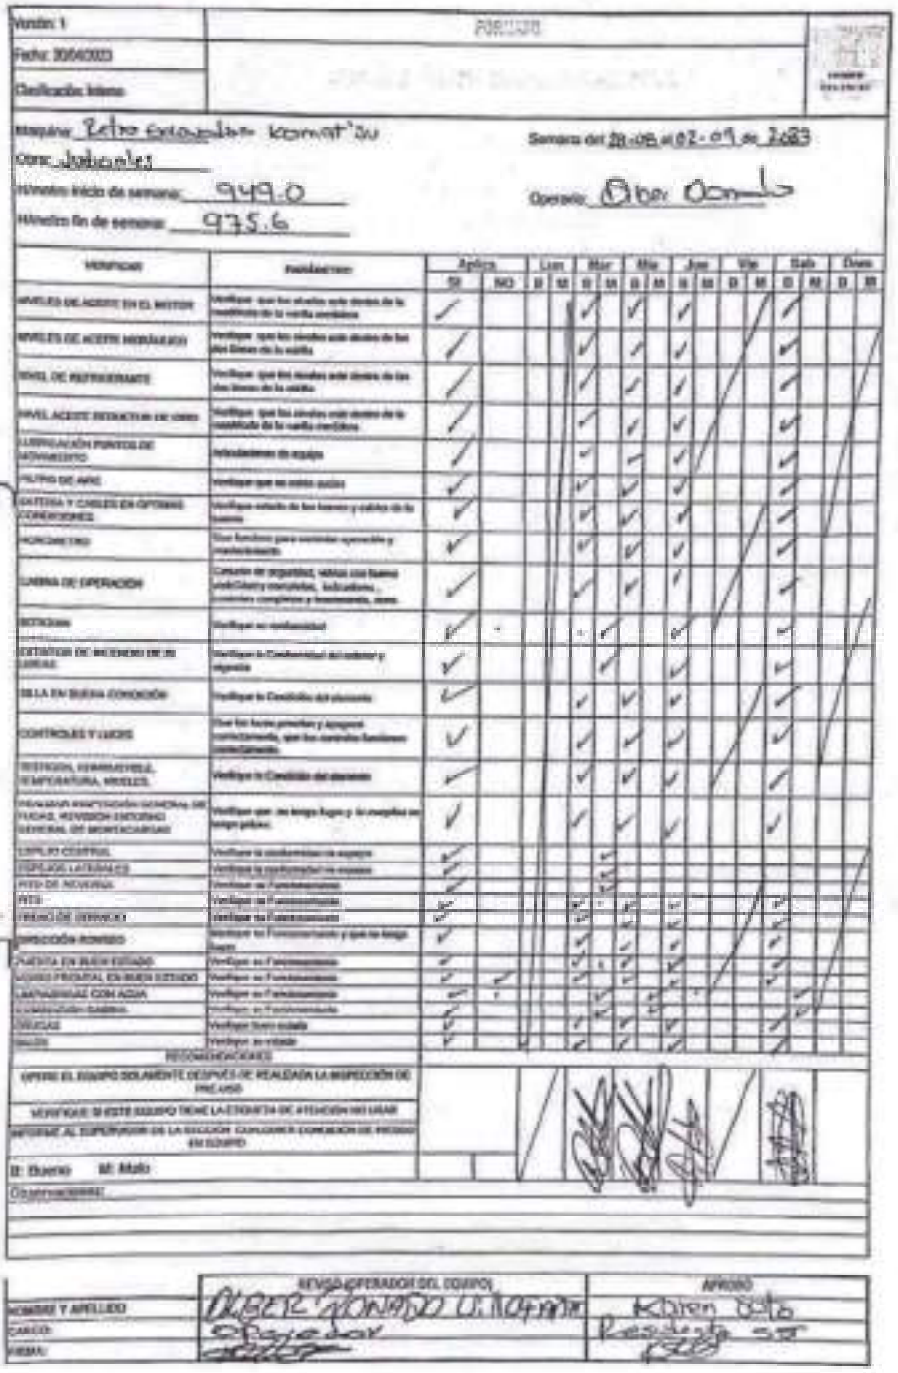

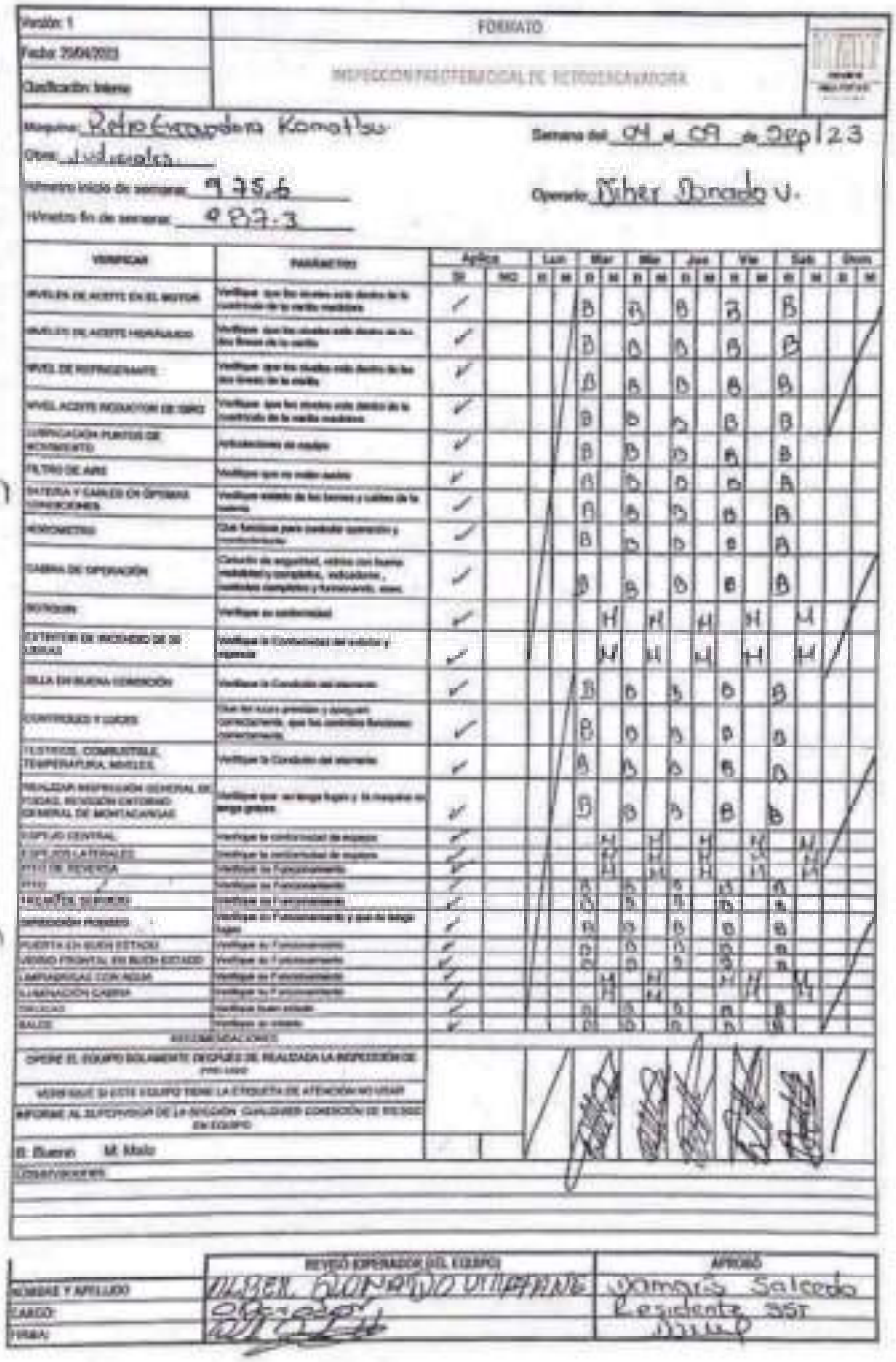

Versión: 1 | FORMATO

Fecha: 29/04/2023

Clasificación: Interna

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

Máquina: Retroexcavadora Komatsu

Obra: Ciudadela

Horómetro inicio de semana: 9356

Horómetro fin de semana: 9893

Semana del: 04 al 09 de Sep 23


Operario: Fiber Posada V.

VERIFICAR	PARÁMETRO	Aplica SI	Aplica NO	Lun D	Lun M	Mar D	Mar M	Mié D	Mié M	Jue D	Jue M	Vie D	Vie M	Sáb D	Sáb M	Dom D	Dom M
NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles estén dentro de la	✓				B		B		B		B		B			
NIVELES DE ACEITE HIDRÁULICO	Verifique que los niveles estén dentro de las	✓				B		B		B		B		B			
NIVEL DE REFRIGERANTE	Verifique que los niveles estén dentro de las	✓				B		B		B		B		B			
NIVEL ACEITE REDUCTOR DE GIRO	Verifique que los niveles estén dentro de la	✓				B		B		B		B		B			
LUBRICACIÓN PUNTOS DE MOVIMIENTO	Articulaciones de equipo	✓				B		B		B		B		B			
FILTRO DE AIRE	Verifique que no estén sucios	✓				B		B		B		B		B			
PANTALLA Y CABLES EN ÓPTIMAS CONDICIONES	Verifique estado de las bornas y cables de la	✓				B		B		B		B		B			
HORÓMETRO	Que funcione para controlar operación y	✓				B		B		B		B		B			
CABINA DE OPERACIÓN	Cinturón de seguridad, cabina con buena	✓				B		B		B		B		B			
BOCINA	Verifique su funcionalidad	✓						H		H		H		H			
EXTINTOR DE INCENDIO DE 20 LIBRAS	Verifique la Conformidad del extintor y	✓						H		H		H		H			
SILLA EN BUENA CONDICIÓN	Verifique la Condición del elemento	✓				B		B		B		B		B			
CONTROLES Y LUCES	Que los luces prendan y apaguen correctamente, que los controles funcionen correctamente	✓				B		B		B		B		B			
FLUIDOS, COMBUSTIBLE, TEMPERATURA, NIVELES	Verifique la Condición del elemento	✓				B		B		B		B		B			
REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, REVISIÓN ENTORNO GENERAL DE MONTACARGAS	Verifique que no tenga fugas y la maquina no tenga golpes	✓				B		B		B		B		B			
SOPLADO CENTRAL	Verifique la conformidad de equipos	✓						H		H		H		H			
EJES LATERALES	Verifique la conformidad de equipos	✓						H		H		H		H			
PITO DE REVERSA	Verifique su Funcionamiento	✓						H		H		H		H			
[illegible]	Verifique su Funcionamiento	✓				B		B		B		B		B			
SEGUROS SUPERIOR	Verifique su Funcionamiento	✓				B		B		B		B		B			
EXTINCIÓN PRIMARIO	Verifique su Funcionamiento y que no tenga fugas	✓				B		B		B		B		B			
PUERTA EN BUEN ESTADO	Verifique su Funcionamiento	✓				B		B		B		B		B			
VIDRIO FRONTAL EN BUEN ESTADO	Verifique su Funcionamiento	✓				B		B		B		B		B			
LIMPIAPARABRISAS CON AGUA	Verifique su Funcionamiento	✓						H		H		H		H			
ILUMINACIÓN CABINA	Verifique su Funcionamiento	✓						H		H		H		H			
ESPEJOS	Verifique buen estado	✓				B		B		B		B		B			
BALDE	Verifique su estado	✓				B		B		B		B		B			
RECOMENDACIONES																	
OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN DE PRE-USO																	
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCIÓN NO USAR																	
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SEGUN CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO EN EQUIPO																	

B: Bueno M: Malo

OBSERVACIONES:

	REVISO OPERADOR DEL EQUIPO	APROBÓ
NOMBRE Y APELLIDO	RUBEN DARIO VILLAMIL	Jamaica Salcedo
CARGO:	Operador	Residente SST
FIRMA:		

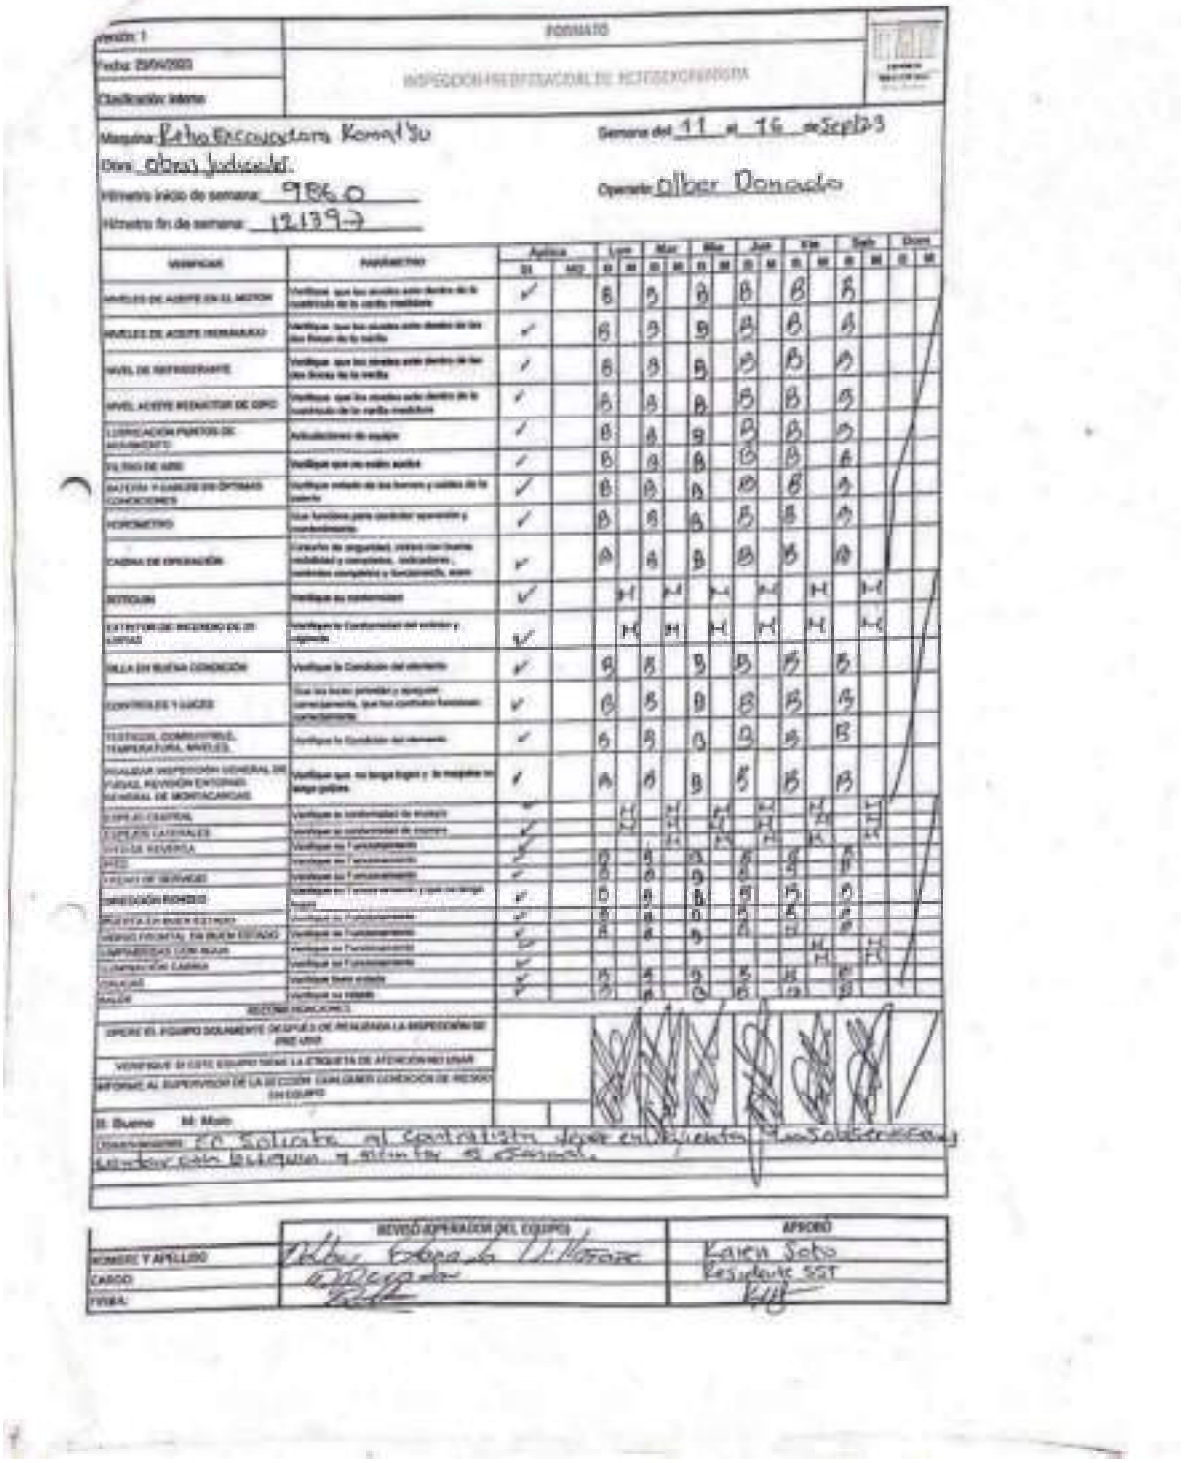

Versión: 1
Fecha: 25/6/2020
Clasificación: Interna

FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOSIERRA/MOTOPODA

Maquina: Retro Excavadora Komatsu
Obra: Obras Judiciales
Horometro inicio de semana: 9860
Horometro fin de semana: 12139
Semana del: 11 al 16 Sept 23
Operario: Olber Dorado

VERIFICAR	PARAMETRO	Aplica SI	Aplica NO	Lun D	Lun M	Mar D	Mar M	Mie D	Mie M	Jue D	Jue M	Vie D	Vie M	Sab D	Sab M	Dom D	Dom M
NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la graduación de la varilla medidora	✓		B		B		B		B		B		B			
NIVELES DE ACEITE HIDRAULICO	Verifique que los niveles este dentro de los dos filtros de la varilla	✓		B		B		B		B		B		A			
NIVEL DE REFRIGERANTE	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la varilla	✓		B		B		B		B		B		B			
NIVEL ACEITE REDUCTOR DE GIRO	Verifique que los niveles este dentro de la graduación de la varilla medidora	✓		B		B		B		B		B		B			
LUBRICACION PUNTOS DE ABASTECIMIENTO	Articulaciones de equipo	✓		B		B		B		B		B		B			
FILTRO DE AIRE	Verifique que no estén sucios	✓		B		B		B		B		B		A			
BATERIA Y CABLES EN OPTIMAS CONDICIONES	Verifique estado de los bornes y cables de la batería	✓		B		B		A		B		B		B			
HORÓMETRO	Que funcione para controlar operación y mantenimiento	✓		B		B		A		B		B		B			
CADENA DE EXCAVACIÓN	Consulte de seguridad, cintura con buena movilidad y cuerpo libre, cubrebocas, cuidado con guantes y botas de seguridad, casco	✓		B		B		B		B		B		B			
BOTADOR	Verifique su funcionalidad	✓		H		H		H		H		H		H			
EXTINTOR DE INCENDIO EN EL EQUIPO	Verifique la Conformidad del extintor y vigencia	✓		H		H		H		H		H		H			
SILLA EN BUENA CONDICIÓN	Verifique la Condición del silla	✓		B		B		B		B		B		B			
CONTROLES Y LUCES	Que los luces prendan y apaguen correctamente, que los controles funcionen correctamente	✓		B		B		B		B		B		B			
TESTIGOS, COMBUSTIBLE, TEMPERATURA, NIVELES	Verifique la Condición del elemento	✓		B		B		B		B		B		B			
REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, REVISIÓN EXTERNA GENERAL DE MONTACARGAS	Verifique que no tenga fugas y de mayores no tenga golpes	✓		A		B		B		B		B		B			
EXTINTOR CENTRAL	Verifique su conformidad de montaje	✓		H		H		H		H		H		H			
CUCHILLAS LATERALES	Verifique su conformidad de montaje	✓		H		H		H		H		H		H			
LUZ DE REVERSA	Verifique su funcionamiento	✓															
ARCO	Verifique su funcionamiento	✓		B		B		B		B		B		B			
CINTURÓN DE SEGURIDAD	Verifique su funcionamiento	✓		B		B		B		B		B		B			
CONDICIÓN RODILLOS	Verifique que no tenga ruidos y que no tenga fugas	✓		B		B		B		B		B		B			
PRESENTA EN BUEN ESTADO	Verifique su funcionamiento	✓		B		B		B		B		B		B			
VIDRIO FRONTAL EN BUEN ESTADO	Verifique su funcionamiento	✓		A		B		B		B		B		B			
LIMPIABRISAS CON WAIPE	Verifique su funcionamiento	✓												H		H	
LUMINARIA CABINA	Verifique su funcionamiento	✓															
CLAXON	Verifique bocina activa	✓		B		B		B		B		B		B			
RADIO	Verifique su estado	✓		B		B		B		B		B		B			


OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCIÓN DE ESTE ITEM	
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR	
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SI ESTE CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO	

El Bueno M. Malo

OBSERVACIONES: El Soldado el Controlador debe en Diciembre Uso Solidario Estudiar Cabina Luminaria y Alarma de Reversa.

	REVISÓ (OPERADOR DEL EQUIPO)	APROBÓ
NOMBRE Y APELLIDO	Olber Eduardo D'Alessandro	Karen Soto
CARGO	Operador	Residente SST
FIRMA:		



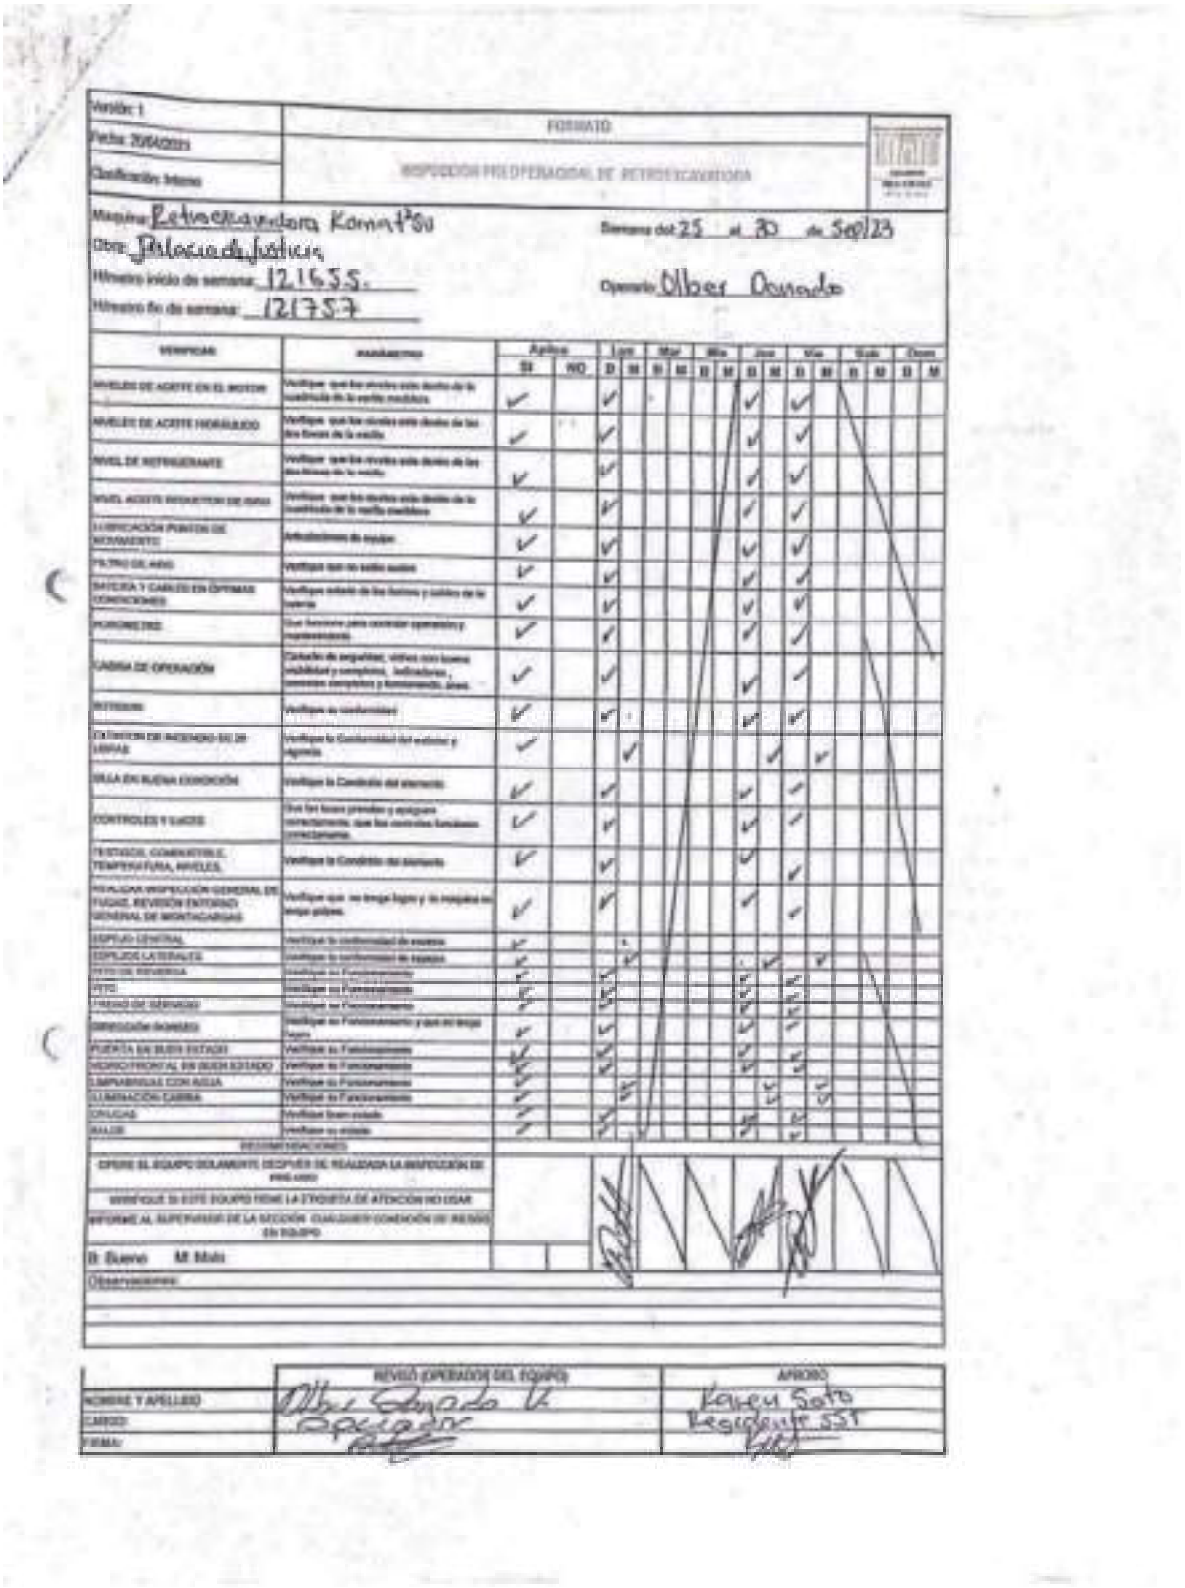

Versión: 1
Fecha: 20/4/2021
Clasificación: Interna

FORMATO

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

Máquina: Retroexcavadora Komatsu
Obra: Palacio de Justicia
Horómetro inicio de semana: 12.165.5.
Horómetro fin de semana: 12175.7

Semana del: 25 al 30 de Sept/23
Operario: Olber Quevedo

VERIFICAR	PARÁMETROS	Aplica SI	Aplica NO	Lun D	Lun M	Mar D	Mar M	Mie D	Mie M	Jue D	Jue M	Vie D	Vie M	Sab D	Sab M	Dom D	Dom M
NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles estén dentro de la cuadrícula de la varilla medidora	✓		✓						✓		✓					
NIVELES DE ACEITE HIDRÁULICO	Verifique que los niveles estén dentro de las dos líneas de la varilla	✓		✓						✓		✓					
NIVEL DE REFRIGERANTE	Verifique que los niveles estén dentro de las dos líneas de la varilla	✓		✓						✓		✓					
NIVEL ACEITE REDUCTOR DE GIRO	Verifique que los niveles estén dentro de la cuadrícula de la varilla medidora	✓		✓						✓		✓					
LUBRICACIÓN PUNTOS DE MOVIMIENTO	Articulaciones de equipo	✓		✓						✓		✓					
FILTRO DE AIRE	Verifique que no estén sucios	✓		✓						✓		✓					
BATERÍA Y CABLES EN ÓPTIMAS CONDICIONES	Verifique estado de los bornes y sujeción de la batería	✓		✓						✓		✓					
PUNTOS DE	Que funcione para controlar operación y mantenimiento	✓		✓						✓		✓					
CABINA DE OPERACIÓN	Cinturón de seguridad, vidrios con buena visibilidad y completos, indicadores, controles completos y funcionando, pitos	✓		✓						✓		✓					
INTERIOR	Verifique su conformidad	✓		✓						✓		✓					
EXTERIOR DE INTERIOR- SU DE LIMPIA	Verifique la Conformidad del exterior y Aseo	✓			✓						✓		✓				
SILLA EN BUENA CONDICIÓN	Verifique la Condición del elemento	✓		✓						✓		✓					
CONTROLES Y LUCES	Que las luces prendan y apaguen correctamente, que los controles funcionen correctamente.	✓		✓						✓		✓					
TESTIGOS, COMBUSTIBLE, TEMPERATURA, NIVELES,	Verifique la Condición del elemento	✓		✓						✓		✓					
REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, REVISIÓN ENTORNO GENERAL DE MONTACARGAS	Verifique que no tenga fugas y la maquina no tenga golpes	✓		✓						✓		✓					
ESPEJO CENTRAL	Verifique la conformidad de espejos	✓			✓						✓		✓				
ESPEJOS LATERALES	Verifique la conformidad de espejos	✓			✓						✓		✓				
PITO DE REVERSA	Verifique su Funcionamiento	✓		✓						✓		✓					
PITO	Verifique su Funcionamiento	✓		✓						✓		✓					
PITAZO DE SERVICIO	Verifique su Funcionamiento	✓		✓						✓		✓					
DIRECCIÓN (VOLANTE)	Verifique su Funcionamiento y que no tenga juego	✓		✓						✓		✓					
PUERTA EN BUEN ESTADO	Verifique su Funcionamiento	✓		✓						✓		✓					
DESPARTIDOR EN BUEN ESTADO	Verifique su Funcionamiento	✓		✓						✓		✓					
LIMPIABRISAS CON AGUA	Verifique su Funcionamiento	✓			✓						✓		✓				
ILUMINACIÓN CABINA	Verifique su Funcionamiento	✓			✓						✓		✓				
CRUCETAS	Verifique buen estado	✓		✓						✓		✓					
RALLER	Verifique su estado	✓		✓						✓		✓					

RECOMENDACIONES

DEJAR EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN DE ENGANCHE


VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCIÓN NO USAR


INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCIÓN CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO EN EQUIPO

B: Bueno M: Malo

Observaciones:

	REVISÓ (OPERADOR DEL EQUIPO)	APROBÓ
NOMBRE Y APELLIDO	Olber Quevedo V.	Karen Soto
CARGO	Operador	Residente SST
FIRMA		

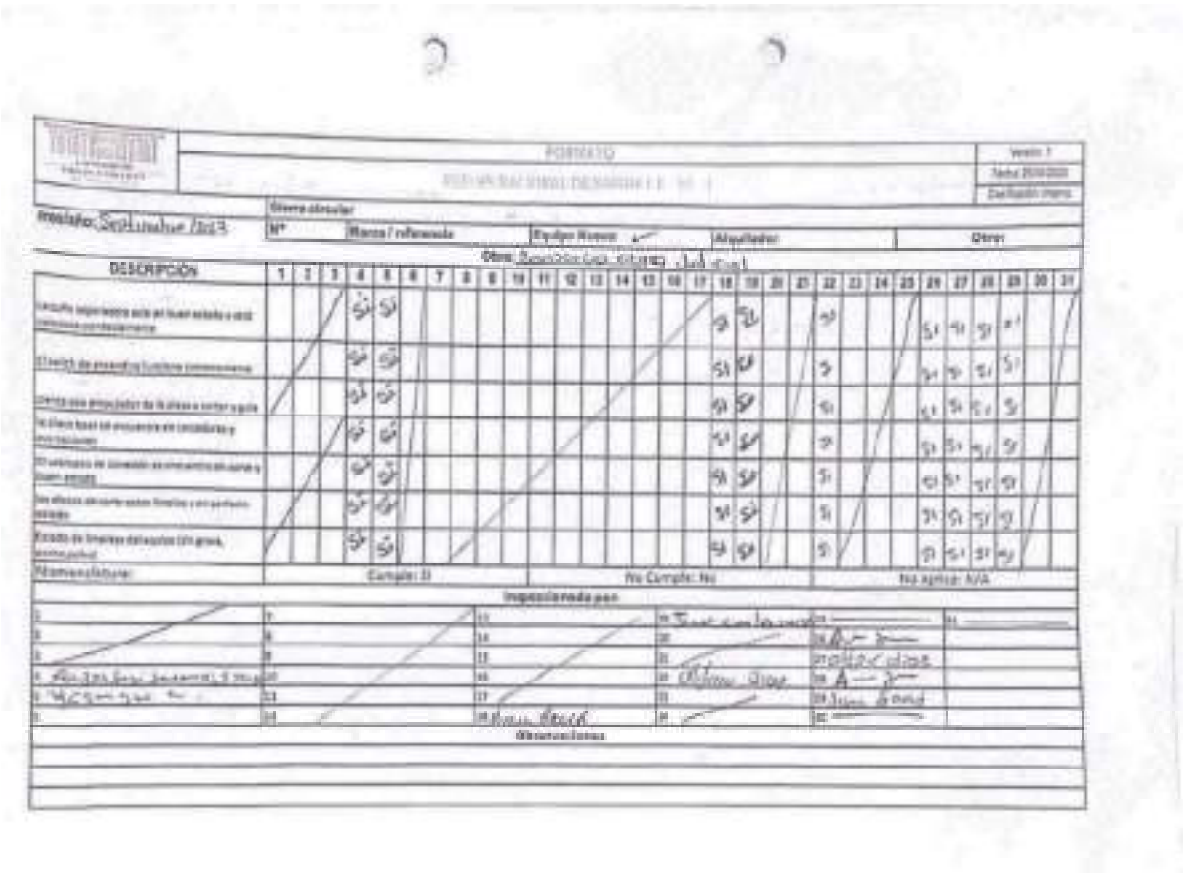

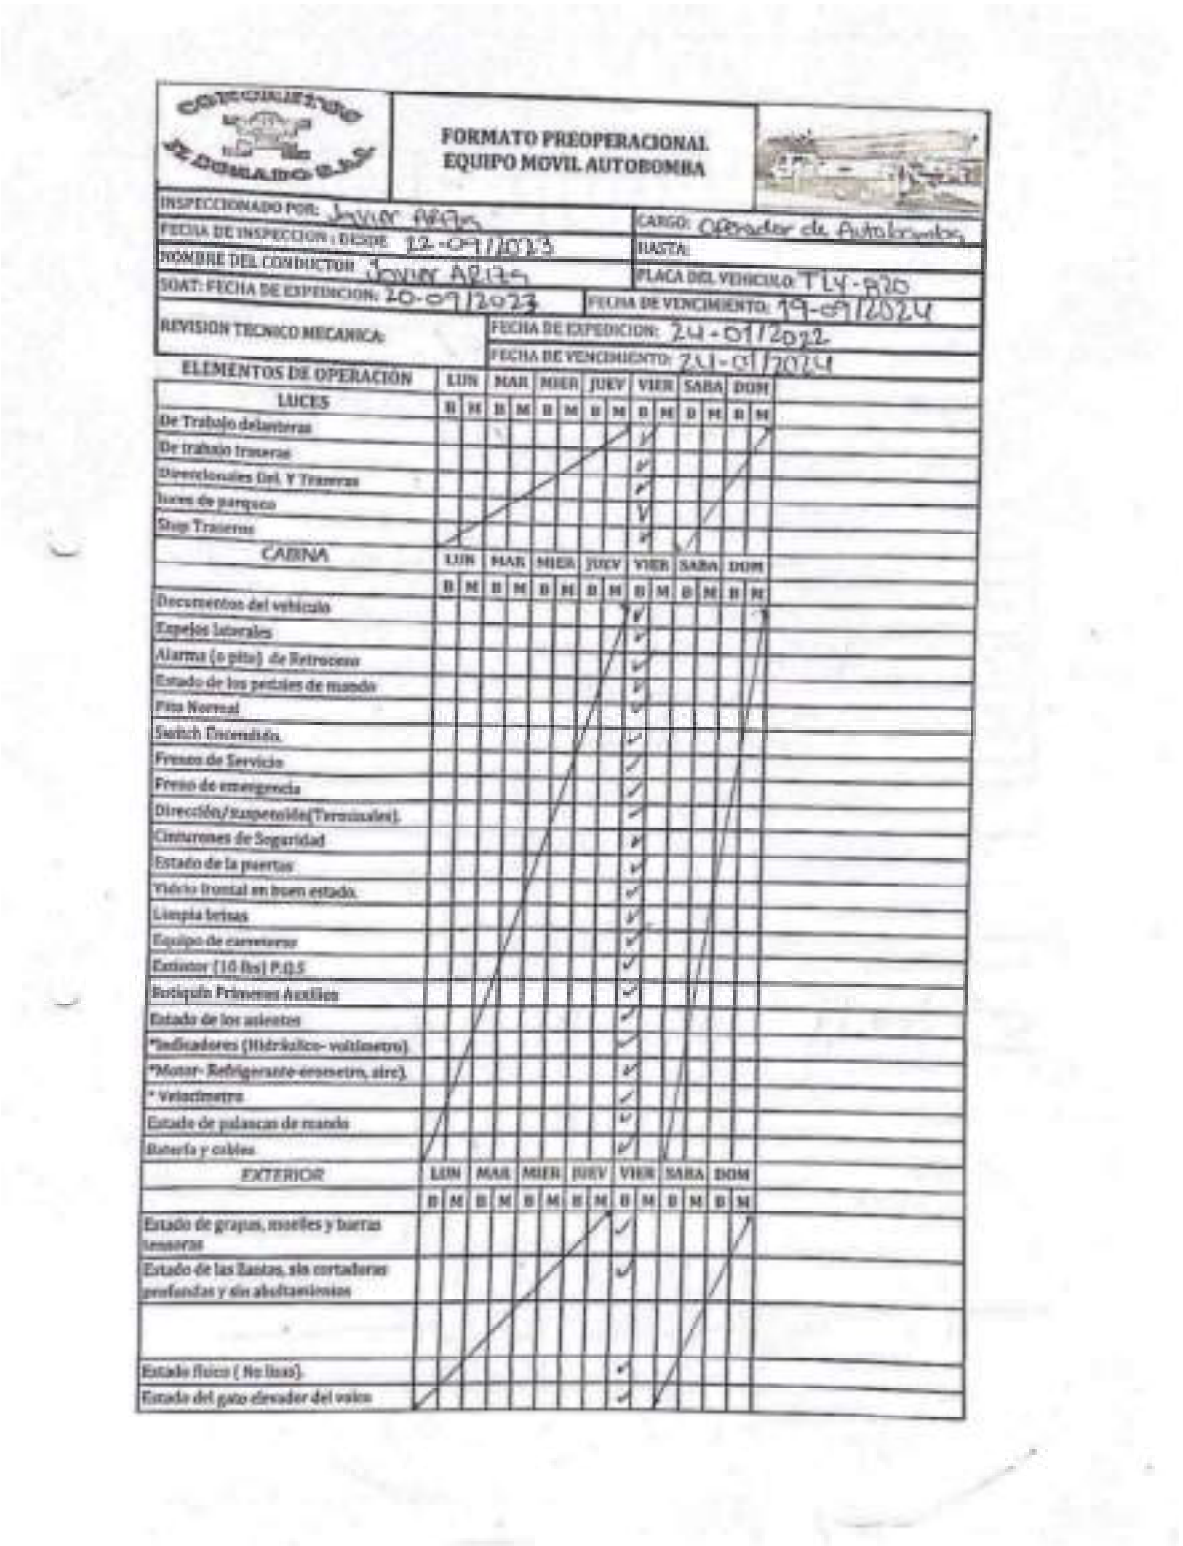

FORMATO PREOPERACIONAL EQUIPO MOVIL AUTOBOMBA

INSPECCIONADO POR: Javier Ariza — CARGO: Operador de Automotores

FECHA DE INSPECCION: DESDE 12-09/2023 — HASTA:

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Javier Ariza — PLACA DEL VEHICULO: TL4-820

SOAT: FECHA DE EXPEDICION: 20-09/2023 — FECHA DE VENCIMIENTO: 19-09/2024

REVISION TECNICO MECANICA: FECHA DE EXPEDICION: 24-01/2022 — FECHA DE VENCIMIENTO: 24-01/2024

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
De Trabajo delanteras									✓					✓
De trabajo traseras									✓					✓
Direccionales Del. Y Traseras									✓					✓
luces de parqueo									✓					✓
Stop Traseros									✓					✓
CABINA	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Documentos del vehiculo									✓					✓
Espejos laterales									✓					✓
Alarma (o pito) de Retroceso									✓					✓
Estado de los pedales de mando									✓					✓
Pito Normal									✓					✓
Switch Encendido									✓					✓
Freno de Servicio									✓					✓
Freno de emergencia									✓					✓
Dirección/suspensión(Terminales).									✓					✓
Cinturones de Seguridad									✓					✓
Estado de la puertas									✓					✓
Vidrio frontal en buen estado									✓					✓
Limpia brisas									✓					✓
Equipo de carretera									✓					✓
Extintor (10 lbs) P.Q.S									✓					✓
Botiquín Primeros Auxilios									✓					✓
Estado de los asientos									✓					✓
*Indicadores (Hidráulico- voltímetro)									✓					✓
*Motor- Refrigerante-aceite-m, aire)									✓					✓
* Velocímetro									✓					✓
Estado de palancas de mando									✓					✓
Bateria y cables									✓					✓
EXTERIOR	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de grapas, muelles y bueras tensoras									✓					✓
Estado de las llantas, sin cortaderas profundas y sin abultamientos									✓					✓
Estado físico (No lisas).									✓					✓
Estado del gato elevador del vaso									✓					✓

Estado de los pasadores															
Estado del yugo															
Estado de las vigas															
ESTADO MECANICO	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM		
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Control de fugas hidráulicas									✓						
* Estado de correas									✓						PEQUEÑAS FUGAS
Caja de cambios en buen estado									✓						
Radiador									✓						
abrazaderas									✓						
Mangueras en general									✓						

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Firma Conductor:

Notificado Responsable del área:	Fecha 22-07-22	Fecha de Corrección
Fecha seguimiento compromiso:		

LUNES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

MARTES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION


MIECOLES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

JUEVES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

VIERNES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

SABADO: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

Vo.Bo. ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

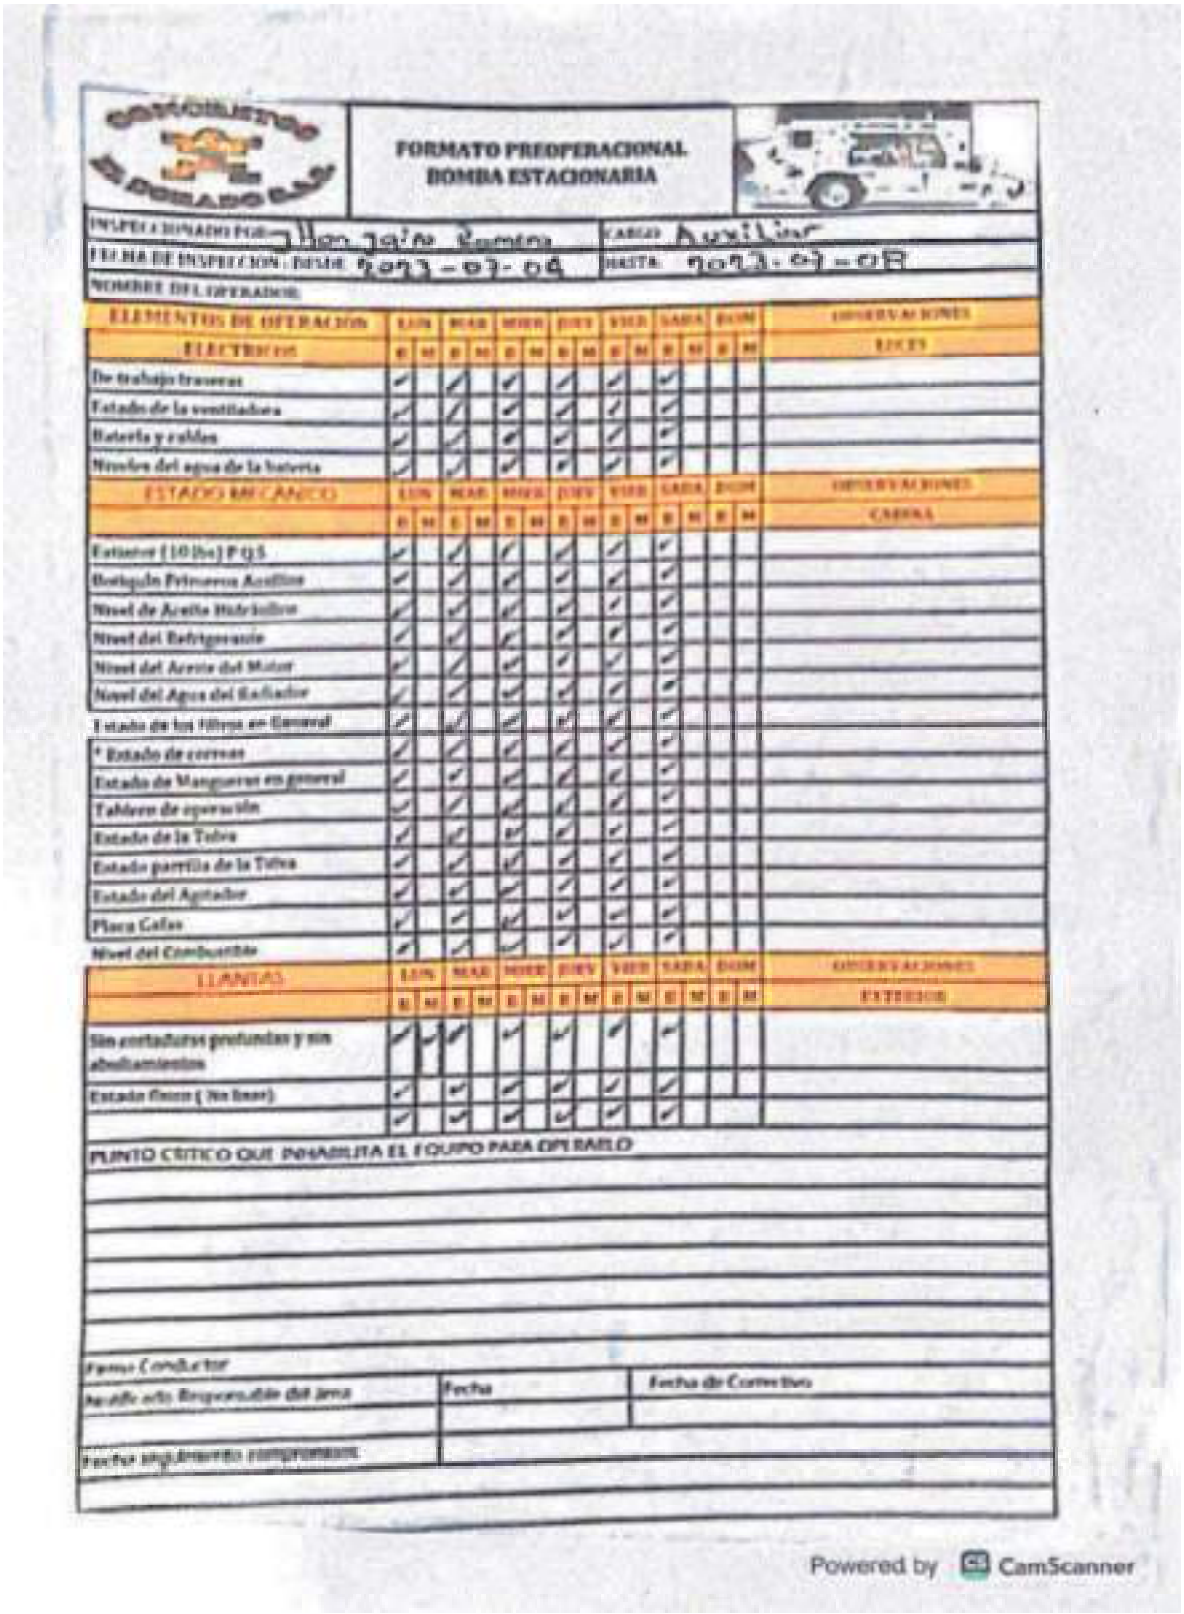

FORMATO PREOPERACIONAL
BOMBA ESTACIONARIA

INSPECCIONADO POR: Jhon Jairo Ramos — CARGO: Auxiliar

FECHA DE INSPECCION: DESDE: 2023-07-04 — HASTA: 2023-07-08

NOMBRE DEL OPERADOR:

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM		OBSERVACIONES
ELECTRICOS	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	LUCES
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de la ventiladora	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Nivelen del agua de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	CABINA
Extintor (10lbs) PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin Primeros Auxilios	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel de Aceite Hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel del Refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel del Aceite del Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel del Agua del Radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de los filtros en General	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
* Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de Mangueras en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tablero de operación	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de la Tolva	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado parrilla de la Tolva	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del Agitador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Placa Gafas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel del Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	EXTERIOR
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓				
Estado Fisico (No liner)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO

Firma Conductor

Fecha	Fecha de Correctivo

Powered by CamScanner

PAVIMENTOS EL DORADO

FORMATO PREOPERACIONAL CAMIONETA TURBO JAC



ESTADO MECANICO	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	ESTADO MECANICO
Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
* Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado Tanque de combustible y abrazaderas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO:

Firma Conductor:

Notificado Responsable del Area:	Fecha	Fecha de Correctivo
Fecha seguimiento compromisos:		

Jhon Jairo Romero
LUNES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

Jhon Jairo Romero
MARTES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

Jhon Jairo Romero
MIECOLES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

Jhon Jairo Romero
JUEVES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

Jhon Jairo Romero
VIERNES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

Jhon Jairo Romero
SABADO: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

TE FORMATO SOLO ES VALIDO SI CUENTA CON LA APROBACION DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Vo.Bo. ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Km 3 via La Popa -La Mesa, Valledupar-Cesar
Email:plantas@concretosdorado.com

Powered by CamScanner

Versión: 1
Fecha: 18/05/2021
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 11-07-2023 al 16-07-2023

HORA: 03:00 A.M. - 05:00 P.M.

OBRA: Construcción Palacios de Justicia

CONTRATISTA: Consorcio Obras Judiciales

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	N. Aplica	
11	Los cañones conservan su diámetro y están lubricados según el relieve?			✓	
12	Estado de los resortes o tornillo en las mordazas abrasivas.			✓	
13	Almacenamiento de las poleadoras y discos	✓			
F	HERRAMIENTAS NEUMATICAS				
1	Estado de las mangueras y acoples			✓	
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta?			✓	
3	Presiones indicadas			✓	
4	Descarga de la herramienta			✓	
G	HERRAMIENTA POR DETONACIÓN			-	
1	El personal es autorizado	✓			
2	Emplean los elementos de protección	✓			
3	Descarga y almacenamiento de la herramienta	✓			
H	SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL				
1	El personal que utiliza los equipos y herramientas, tuvo recibido instrucción?	✓			
2	Las herramientas se seleccionan correctamente para el trabajo a realizar?	✓			
3	Transporte y almacenamiento al sitio del trabajo	✓			
4	Los sitios de mantenimiento como: limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados.	✓			
5	Almacenamiento	✓			
6	Herramientas y equipos en buen estado	✓			
7	Se utilizan correctamente	✓			
8	Se encuentran señalizadas los equipos que revisten peligros especiales tales como alta voltaje, etc.	✓			

Nota: Los ítem del numeral H siempre deben ser diligenciados independiente del tipo de herramienta que se encuentre en el lugar de obra.

	REVISO	APROBO
NOMBRE Y APELLIDO:	Pedro Julio Sandoval	Ramon Soto
CARGO:	Residente SST	Residente SST
FIRMA:		

Versión 1	FORMATO
Fecha 24/8/2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO
Clasificación Interna	

Proyecto: Consorcio obras Judiciales

Semana del 04 al 09 de Septiembre / 23

Vibrador N°: 01

Marca: Makita

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Bateria vibradora en buenas condiciones	X													
Flexible en buen estado	X													
Cuerpo de acople en buenas condiciones	X													
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	X													
Rodamiento de giro (acople) en buen estado.	X													
Motor en buen estado de funcionamiento.	X													
Estructura Metalica en buen estado	X													
Estado físico general del equipo (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras,Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Condiciones de Aseo.	X													
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral,protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes.	X													

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

Nombre del operador: Luis Gabriel M. Firma	Luis Gabriel M.	—	—	—	—	—	—	—
Visita Residente SST Jhonatan S. Firma	Jhon	—	—	—	—	—	—	—

OBSERVACIONES:

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 24/08/2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	
Clasificación: Interna		

Proyecto: Campacio obras Judiciales

Semana del 04 al 09 de Septiembre /23

Vibrador N°: 02


Marca: Makita

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SÁB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Rotalla vibradora en buenas condiciones	X													
Flexible en buen estado	X													
Cuerpo de acople en buenas condiciones	X													
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	X													
Rodamiento de giro (acople) en buen estado.	X													
Motor en buen estado de funcionamiento	X													
Estructura Metálica en buen estado	X													
Estado físico general del equipo (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras,Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Condiciones de Aseo.	X													
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral,protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes.	X													

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

Nombre del operador: JESUS DAVID Firma	Jesus David	—	—	—	—	—	—	
Vo.Bo. Residente SST: Dominis S. Firma	Dom	—	—	—	—	—	—	

OBSERVACIONES:

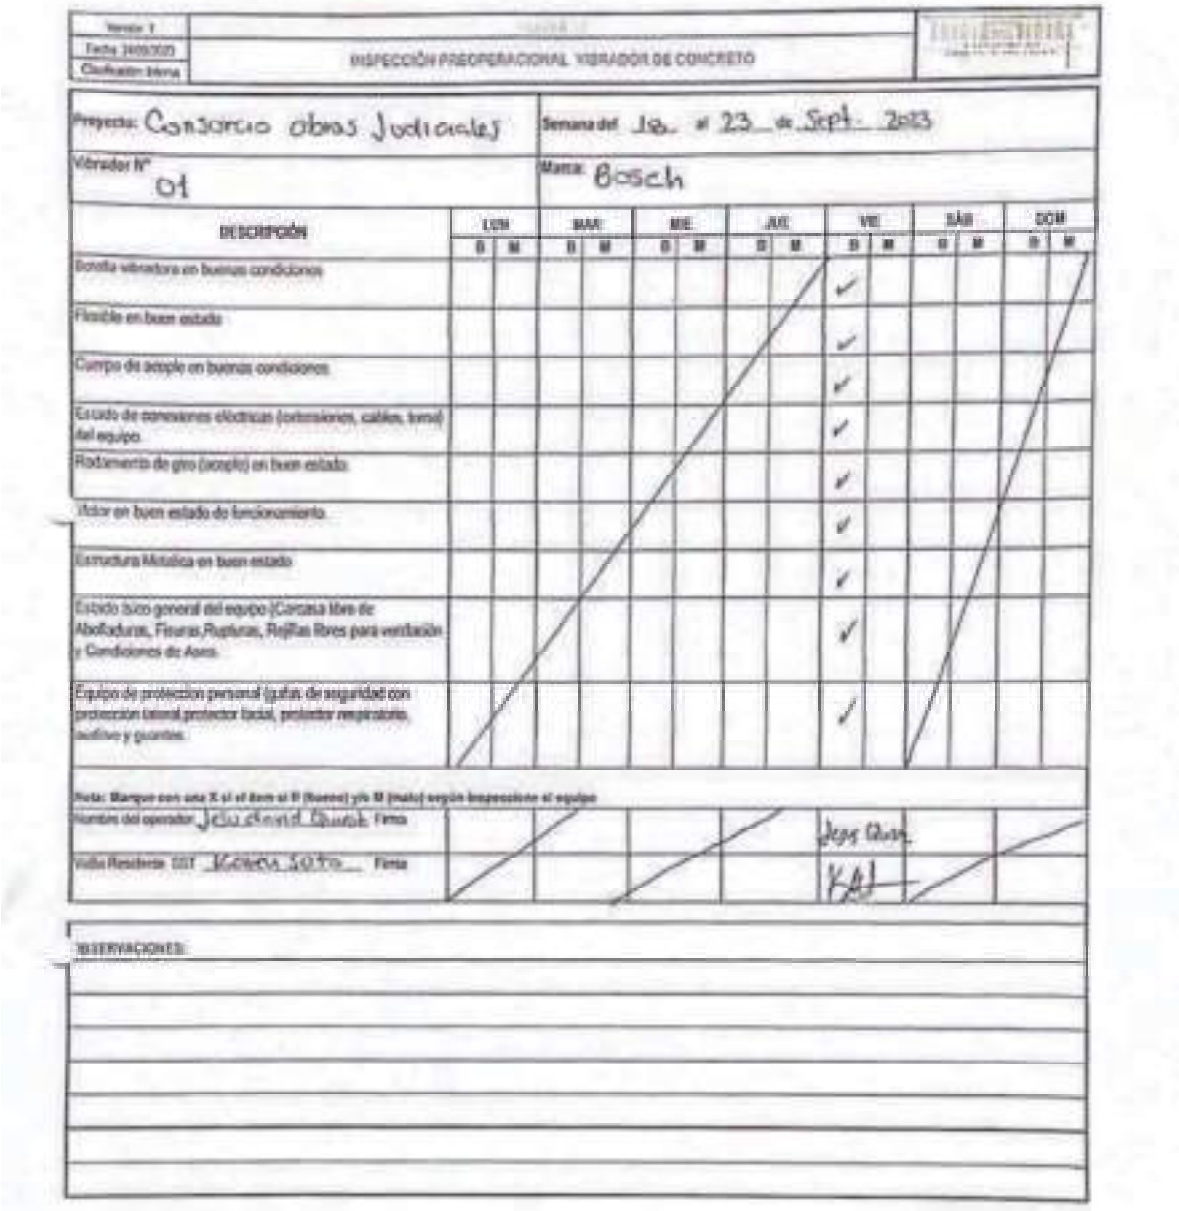

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO

Proyecto: Consorcio obras Judiciales — Semana del 18 al 23 de Sept. 2023

Vibrador N°: 01 — Marca: Bosch


DESCRIPCIÓN	LUN D	LUN M	MAR D	MAR M	MIE D	MIE M	JUE D	JUE M	VIE D	VIE M	SÁB D	SÁB M	DOM D	DOM M
Bomba vibradora en buenas condiciones									✓					
Flexible en buen estado									✓					
Cuerpo de acople en buenas condiciones									✓					
Estado de conexiones eléctricas (cortocircuitos, cables, forros) del equipo									✓					
Rodamiento de giro (acople) en buen estado									✓					
Motor en buen estado de funcionamiento									✓					
Estructura Metálica en buen estado									✓					
Estado físico general del equipo (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras,Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Condiciones de Aseo.									✓					
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral,protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes.									✓					

Nota: Marque con una X si el ítem si B (Bueno) y/o M (malo) según inspección al equipo

Nombre del operador: Jesus David Quiroz Firma: Jesus Quiroz

Nombre Residente SST: Yoreima Soto Firma: [illegible]

OBSERVACIONES:

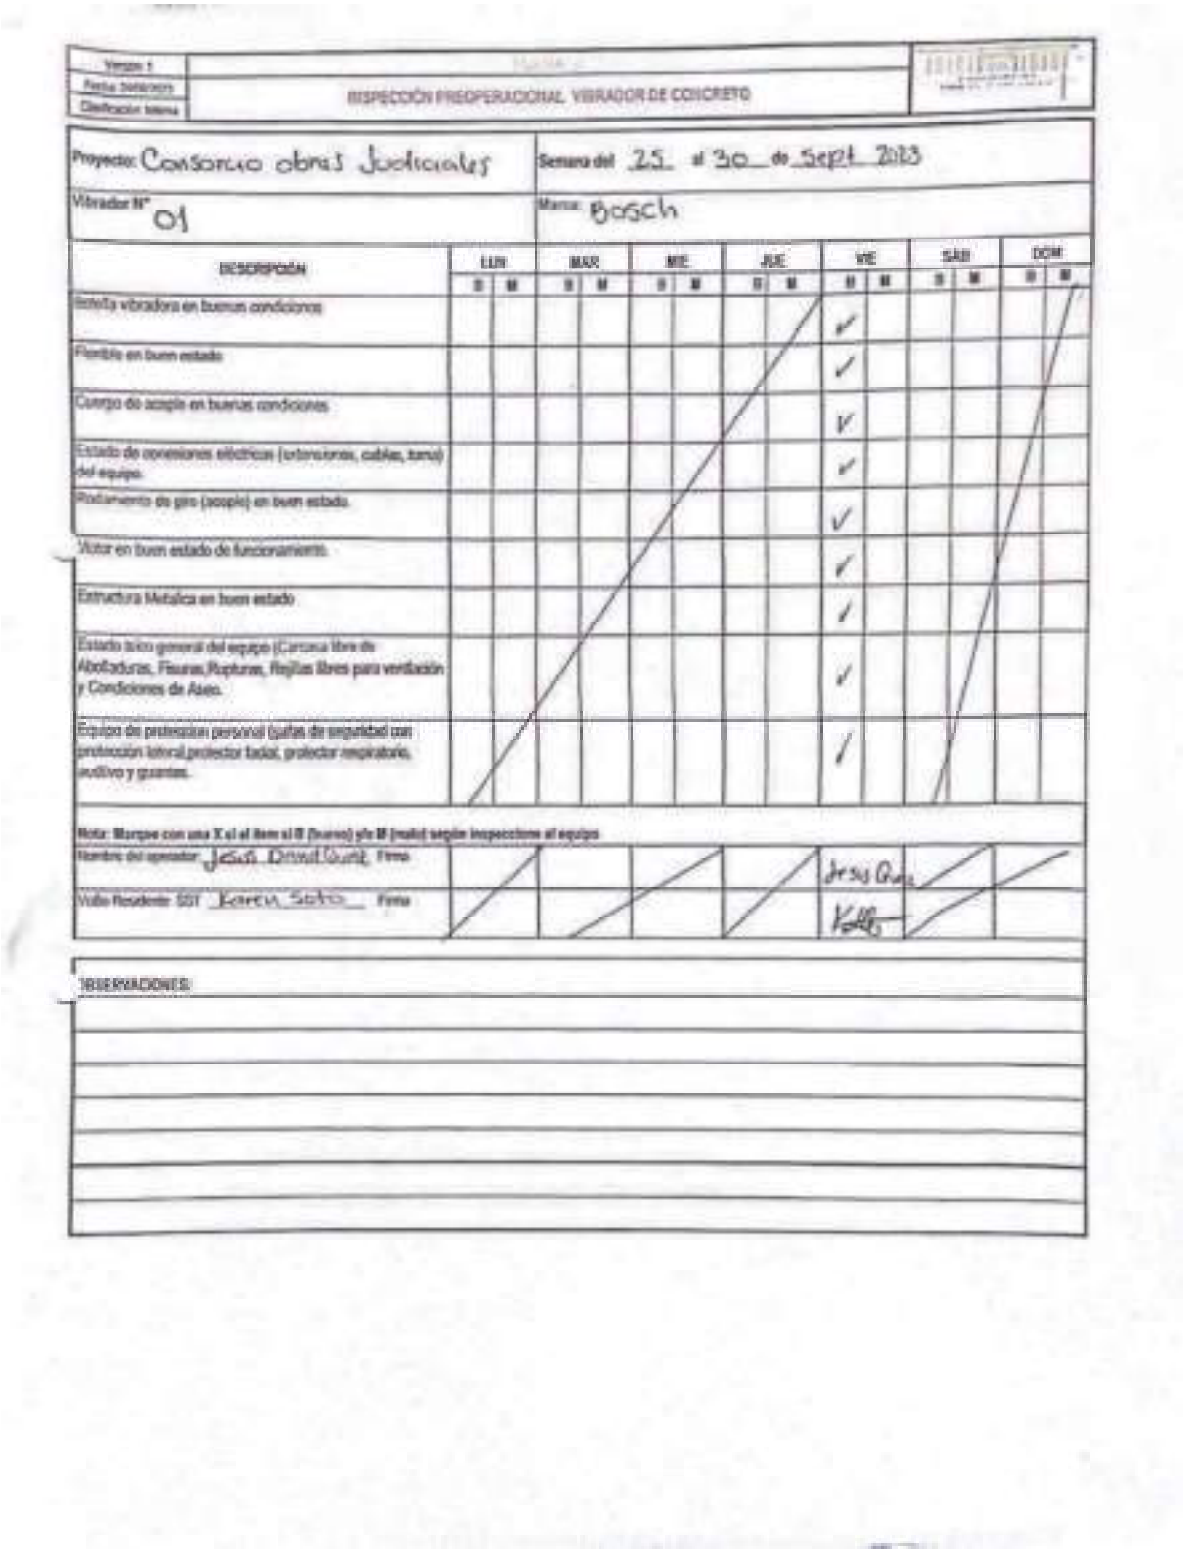

Versión 1
Fecha: 08/08/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO

Proyecto: Consorcio obras Judiciales — Semana del 25 al 30 de Sept 2023

Vibrador N° 01 — Marca: Bosch

DESCRIPCIÓN	LUN D	LUN M	MAR D	MAR M	MIE D	MIE M	JUE D	JUE M	VIE D	VIE M	SÁB D	SÁB M	DOM D	DOM M
Manta vibradora en buenas condiciones									✓					
Flexible en buen estado									✓					
Cuerpo de acople en buenas condiciones									✓					
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.									✓					
Rodamiento de giro (acople) en buen estado									✓					
Motor en buen estado de funcionamiento									✓					
Estructura Metálica en buen estado									✓					
Estado físico general del equipo (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Condiciones de Aseo.									✓					
Equipos de protección personal (botas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes.									✓					

Nota: Marque con una X si el ítem si (bueno) y/o M (malo) según inspección al equipo

Nombre del operador: Jesús David Cruz Firma: Jesus Cruz

Vo.Bo. Residente SST: Karen Sofía Firma: Karen

OBSERVACIONES:

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 20/04/2023	INSPECCION PRE-OPERACIONAL DE MOTOBOMBA	
Clasificado: Interno		


EQUIPO: MOTOBOMBA SEMANA: 25 al 30 Sept/2023

PROYECTO U OBRA: Consorcio Obras Judiciales MARCA: KTC Group 13HP 196cc.


INSPECCIÓN VISUAL		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
NIVEL DE ACEITE	Verificar que se encuentren en buen estado y completos	✓						✓		✓		✓		✓			
ENCENDIDO	Verificar que se encuentre en buen estado	✓						✓		✓		✓		✓			
YOYO	Verificar que se encuentre en buen estado y funcione correctamente	✓						✓		✓		✓		✓			
FILTROS	Verifique que los filtros estén libres de fugas. Verifique que los filtros no estén rotos, trizados, deteriorados	✓						✓		✓		✓		✓			
ACOPLES	Verifique que se encuentren completos, en buen estado y sin fisuras	✓						✓		✓		✓		✓			
ACEITE	Verificar que se encuentre en el nivel requerido y la bomba esté sin fugas.	✓						✓		✓		✓		✓			
COMBUSTIBLE	Verificar que se encuentre en el nivel requerido y la bomba esté sin fugas.	✓						✓		✓		✓		✓			
ESTADO ESTRUCTURA EN GENERAL	Verifique que la estructura no presente agrietamientos, hundimientos	✓						✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

	REVISÓ (OPERADOR DEL EQUIPO)	APROBÓ
NOMBRE Y APELLIDO:	ANIBAL JIMENEZ ESCORCIA	Karen Soto
CARGO:	OFICIAL	R. SST
FIRMA:		

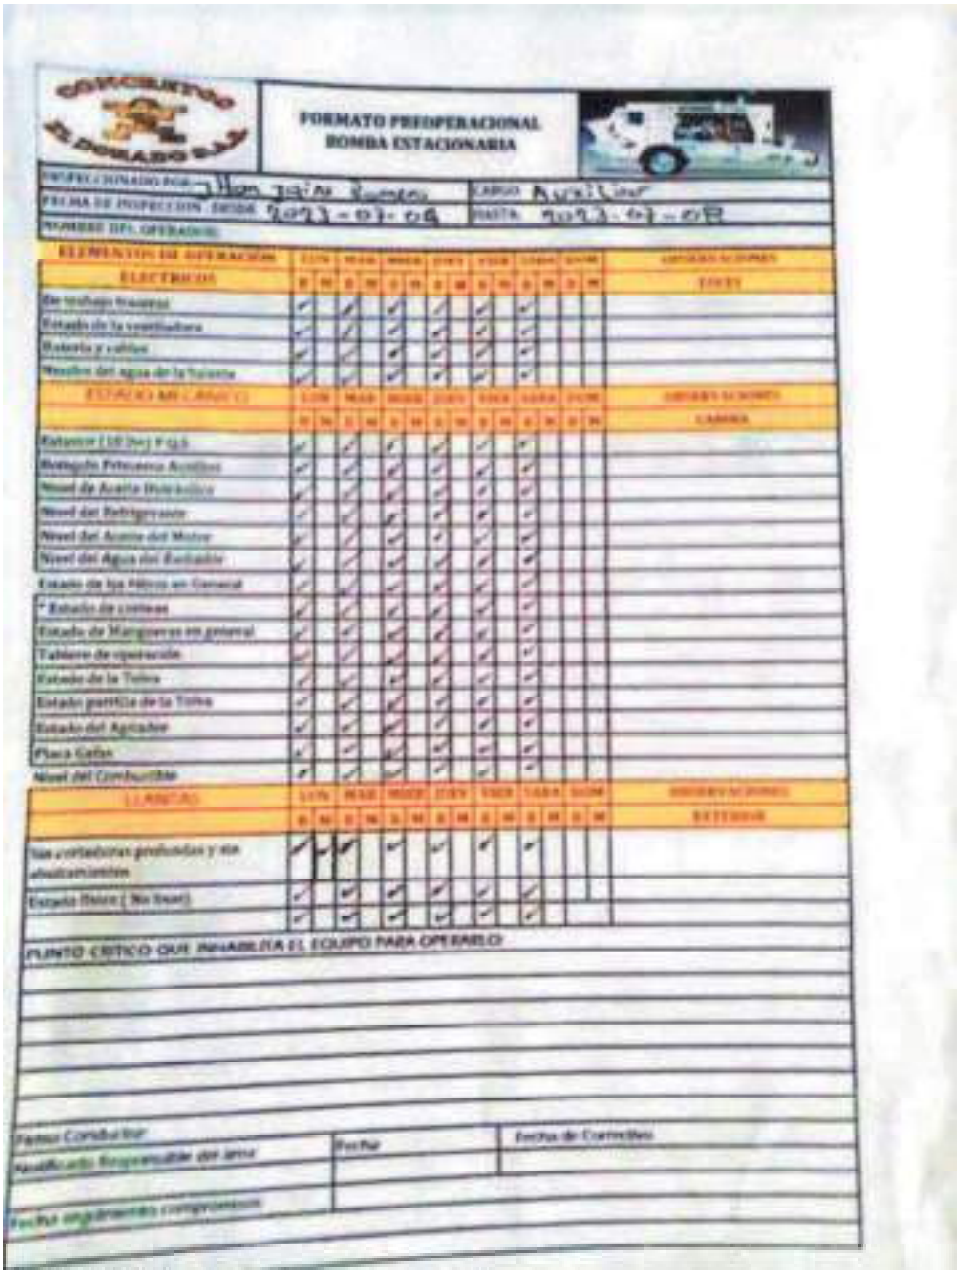

FORMATO PREOPERACIONAL
BOMBA ESTACIONARIA

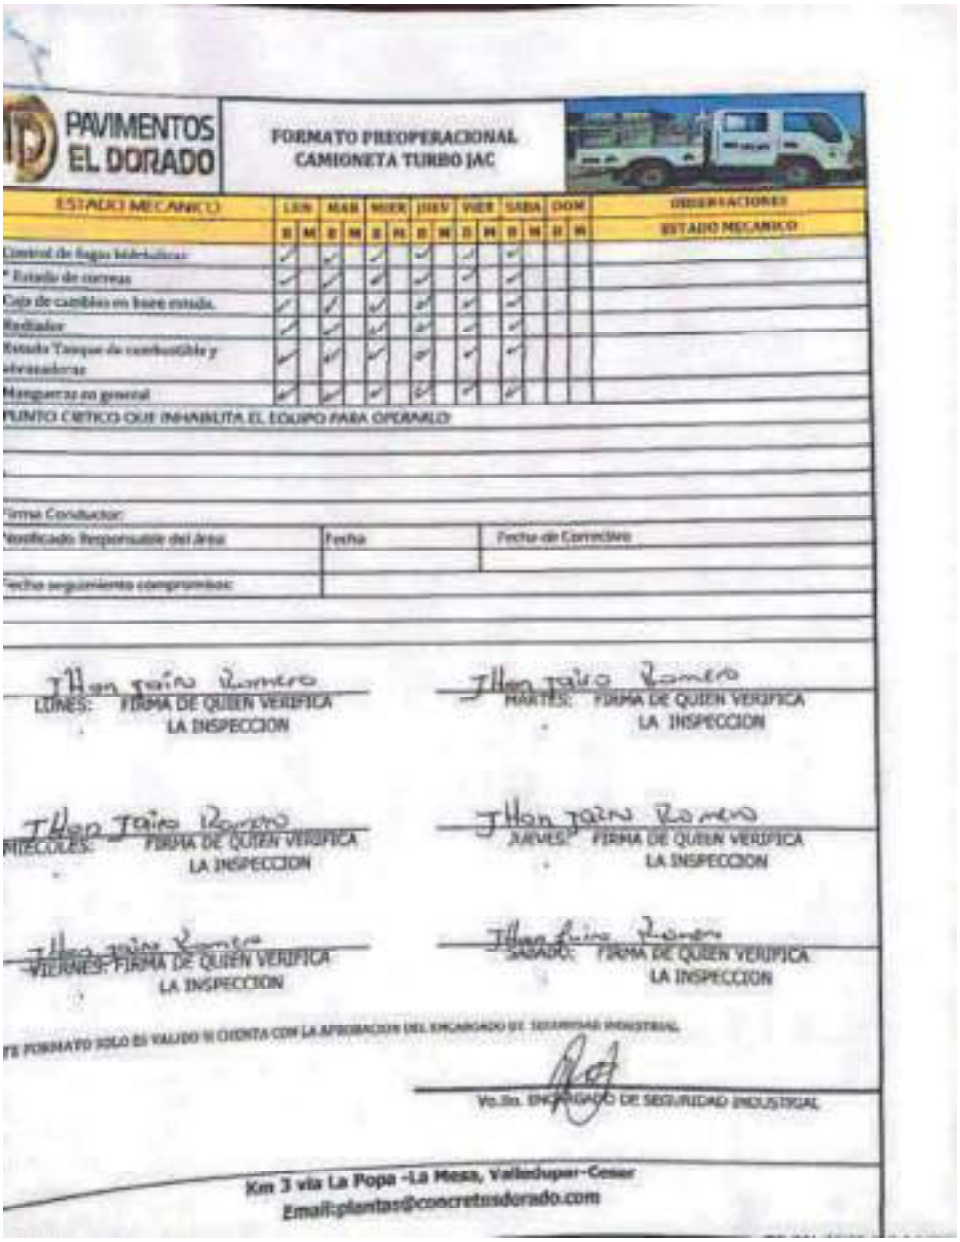

PAVIMENTOS EL DORADO

FORMATO PREOPERACIONAL CAMIONETA TURBO JAC

ESTADO MECANICO	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	ESTADO MECANICO
Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
* Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado Tanque de combustible y abrazaderas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO

Firma Conductor:

Notificado Responsable del Area	Fecha	Fecha de Correctivo
Fecha seguimiento compromisos:		

LUNES: Jhon Jairo Romero FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

MARTES: Jhon Jairo Romero FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

MIECOLES: Jhon Jairo Romero FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

JUEVES: Jhon Jairo Romero FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION


VIERNES: Jhon Jairo Romero FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

SABADO: Jhon Jairo Romero FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

ESTE FORMATO SOLO ES VALIDO SI CUENTA CON LA APROBACION DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Vo.Bo. ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Km 3 via La Popa -La Mesa, Valledupar-Cesar
Email:plantas@concretosdorado.com

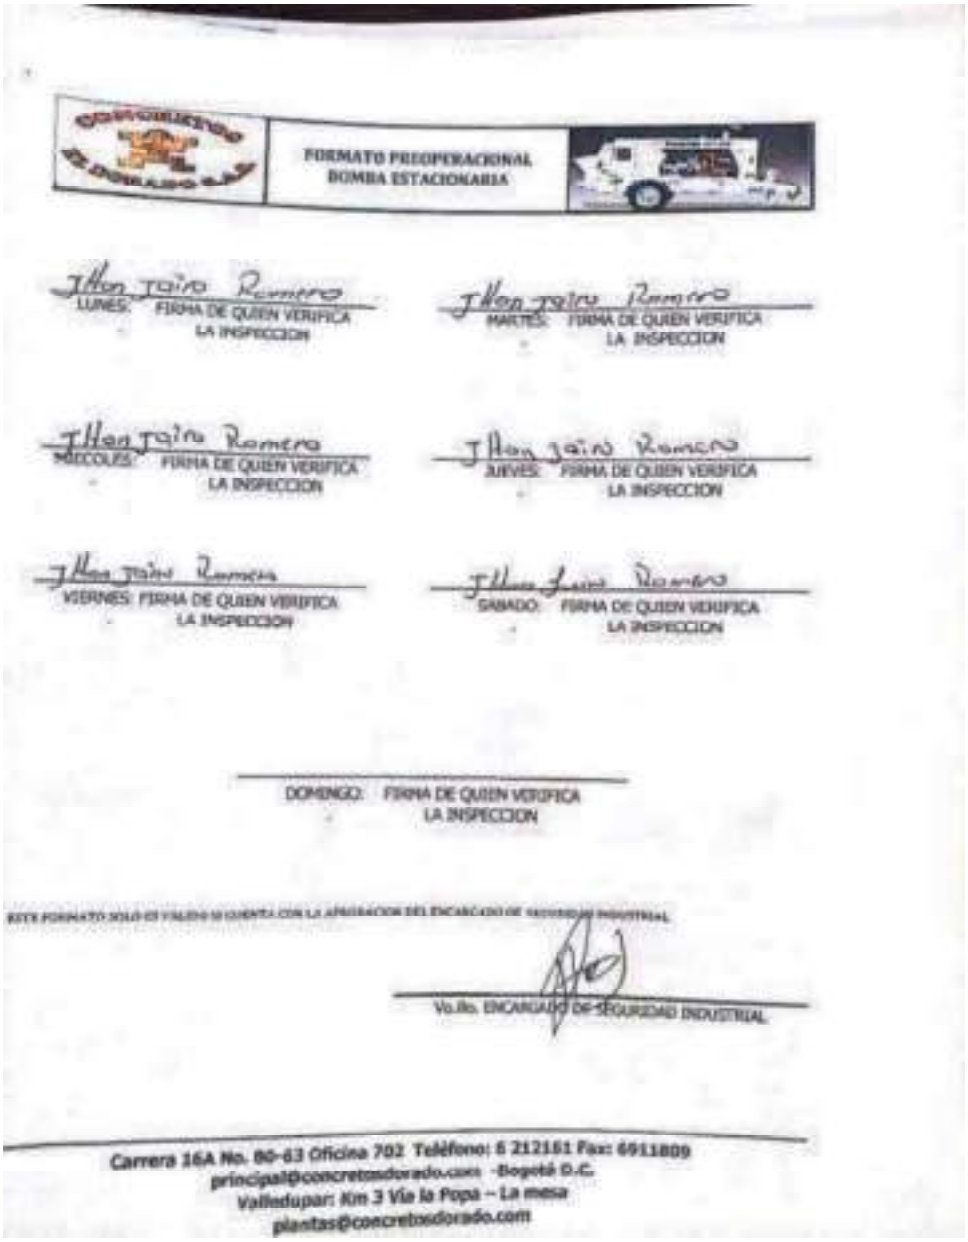

FORMATO PREOPERACIONAL
BOMBA ESTACIONARIA

LUNES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

MARTES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

MIERCOLES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

JUEVES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

VIERNES: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

SABADO: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

DOMINGO: FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INSPECCION

ESTE FORMATO SOLO ES VALIDO SI CUENTA CON LA APROBACION DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Vo.Bo. ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



PAVIMENTOS EL DORADO

FORMATO PREOPERACIONAL CAMIONETA TURBO JAC

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	LUCES
De Trabajo delanteras														
De trabajo traseras														
Direccionales Del. y Traseras														
Luces de parqueo														
Stop Traseros														
CABINA	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	CABINA
Espejos laterales														
Alarma (reversa) de Retroceso														
Pito Normal														
Switch Encendido														
Freno de Servicio														
Freno de emergencia														
Estado del sistema Dirección														
Cinturones de Seguridad														
Estado de la puertas														
Vidrio frontal en buen estado														
Limpia brisas														
Extintor (10 lbs) P.Q.S														
Botiquín Primeros Auxilios														
Estado de los asientos														
*Indicadores (Hidráulico- voltímetro)														
*Motor. Refrigeración aromotro, aire)														
* Velocímetro														
Estado de palancas de mando														
Batería y cables														
EXTERIOR	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	EXTERIOR
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos														
Estado física (No fisas).														
Estado física suspensión(Terminales)														
Estado de los pernos y tornillos de ajustes de las llantas														

Versión: 1
Fecha: 08/08/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 18-07/2023 al 23-07/2023

HORA: 07:00h - 05:00p.m

OBRA: Obra en Construcción palacio de Justicia

CONTRATISTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	N Aplica	
A	HERRAMIENTAS MANUALES				
1	Se usa la(s) herramienta(s) adecuada al trabajo	✓			
2	Estado de la Herramienta	✓			
3	Estado de Almacenamiento y de Uso	✓			
4	Estado de los mangos de madera	✓			
5	Se usan prensas de banco			✓	
B	HERRAMIENTAS DE CORTE			✓	
1	Estado de la cabeza de los cinceles			✓	
2	Filos de los cinceles			✓	
3	Estado de los dientes de las tenazas mache a hembra	✓			
4	Instalación de las hojas de segueta	✓			
5	Estado de los mangos de las limas			✓	
6	Empuñaduras y dientes de los serruchos	✓			
7	Estado de los Mangos y fundas de los cuchillos			✓	
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE				
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor ?	✓			
2	Sus cuñas y fundas están en buen estado?	✓			
3	Estado en que se encuentra el mango	✓			
D	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES				
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas ?			✓	
2	Estado de bocas y pistones de la llave			✓	
3	Se dispone de llaves para golpear?			✓	
4	Estado de los mordazas de las llaves			✓	
5	Estado de las herramientas para trabajos eléctricos			✓	
6	Aislamiento de las herramientas para los trabajos eléctricos			✓	
7	Estado de la punta y cabo de los destornilladores			✓	
8	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas?			✓	
E	HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS			✓	
1	Las herramientas son adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)?			✓	
2	Uso de los Elementos de protección Personal de acuerdo al uso de la herramienta	✓			
3	Limpieza y Lubricación de las herramientas	✓			
4	Guardas de seguridad	✓			
5	Aislamientos y estuches de limas	✓			
6	Estado del cable y enchufe	✓			
7	Estado y aseo de los taladros			✓	
8	Diametro, especificación y estado de la broca para el taladro a usar			✓	
9	Las esmeriles cuentan con guardas de Seguridad?			✓	
10	Los esmeriles cuentan los soportes de las piedras son los adecuados?			✓	

Versión: 1
Fecha: 18/09/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 18 al 23 sep/2023

HORA: 7:00A - 05:00P

OBRA: Construcción Palacio de Justicia

CONTRATISTA: Consorcio Obras Judiciales

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	N Aplica	
11	Los cables no colisionan en diámetro y están instalados según el oficio?			✓	
12	Estado de las mesas o tarrito en las cuales se reviven.			✓	
13	Almacenamiento de los pulidores y discos.			✓	
F	HERRAMIENTAS NEUMATICAS				
1	Estado de las mangueras y acoples			✓	
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta?			✓	
3	Presiones indicadas			✓	
4	Descarga de la herramienta			✓	
G	HERRAMIENTA POR DETONACIÓN			✓	
1	El personal es autorizado			✓	
2	Emplean los elementos de protección			✓	
3	Descarga y almacenamiento de la herramienta			✓	
III	SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL				
1	El personal que utiliza los equipos y herramientas, los recibió instruido?	✓			
2	Las herramientas se seleccionan correctamente para el trabajo a realizar?	✓			
3	Transporte y almacenamiento al sitio del trabajo	✓			
4	Las labores de mantenimiento como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados.	✓			
5	Almacenamiento	✓			
6	Herramientas y equipos en buen estado	✓			
7	Se utilizan correctamente	✓			
8	Se encuentran señalizados los equipos que revelen peligros especiales tales como alta voltaje, etc.	✓			

Nota: Los ítem del numeral III siempre deben ser diligenciados independiente del tipo de herramienta que se encuentre en el frente de obra.

	REVISO	APROBO
NOMBRE Y APELLIDO	Oscar Castillo	Ramiro Soto
CARGO	Aux.	R. SST.
FIRMA		

Versión: 1
Fecha: 18/09/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 25-07/2023 al 30-07/2023

HORA: 07:00A - 05:00P

OBRA: Construcción Palacios de Justicia

CONTRATISTA: Constantes Global Judiciales

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	N Aplica	
A	HERRAMIENTAS MANUALES				
1	Se usa la(s) herramienta(s) adecuada al trabajo	✓			
2	Estado de la Herramienta	✓			
3	Estado de Almacenamiento y de Uso	✓			
4	Estado de los mangos de madera	✓			
5	Se usan prensas de banco	✓			
B	HERRAMIENTAS DE CORTE				
1	Estado de la cabeza de las cinceles				
2	Filos de los cinceles				
3	Estado de los dientes de las tenazas mocha o frontal			✓	
4	Tensionado de las hojas de segueta	✓			
5	Estado de los mangos de las limas			✓	
6	Engrapadoras y clavos de las cerraches	✓			
7	Estado de los Mangos y bordes de los cuchillos			✓	
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE				
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor ?	✓			
2	Sus caras y bordes están en buen estado?	✓			
3	Estado en que se encuentra el mango	✓			
D	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES				
1	Cuentan con llaves de pegados y milimétricas ?			✓	
2	Estado de huellas y palancas de la llave			✓	
3	Se dispone de llaves para golpear?			✓	
4	Estado de las mordazas de las llaves			✓	
5	Estado de las herramientas para trabajos eléctricos			✓	
6	Aislamiento de las herramientas para los trabajos eléctricos			✓	
7	Estado de la punta y cabo de los destornilladores	✓			
8	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas?	✓			
E	HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS				
1	Las herramientas son adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)?			✓	
2	Uso de los Elementos de protección Personal de acuerdo al uso de la herramienta	✓			
3	Limpieza y Lubricación de las herramientas	✓			
4	Guardas de seguridad	✓			
5	Aislamientos y sistemas de fijación	✓			
6	Estado del cable y enchufe	✓			
7	Estado y manejo de los cables	✓			
8	Diámetro, especificación y estado de la broca para el taladro a usar	✓			
9	Las esmeriles cuentan con guardas de Seguridad?	✓			
10	Los esmeriles cuentan los soportes de los discos a utilizar son los adecuados?			✓	

Versión: 1
Fecha: 08/08/2023
Clasificación: Interna

FECHA: 25-08/2023 al 30-09/2023

HORA: 07:00A. - 05:00P.


OBRA: Construcción Palacio de Justicia

CONTRATISTA: Consorcio Obras Judiciales

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	N.Aplica	
11	Los cilindros conectan en diámetro y están instalados según el oficio?			✓	
12	Estado de las mezcla o bandas en las cuerdas abrasivas			✓	
13	Almacenamiento de los pulidores y discos	✓			
F	HERRAMIENTAS NEUMATICAS				
1	Estado de las mangueras y acoples			✓	
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta?			✓	
3	Presiones indicadas			✓	
4	Descarga de la herramienta			✓	
G	HERRAMIENTA POR DETONACIÓN				
1	El personal es autorizado	✓			
2	Emplean los elementos de protección	✓			
3	Descarga y almacenamiento de la herramienta	✓			
H	SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL				
1	El personal que utiliza los equipos y herramientas, ha recibido instrucción?	✓			
2	Las herramientas se seleccionan correctamente para el trabajo a realizar?	✓			
3	Transporte y almacenamiento al sitio del trabajo	✓			
4	Los talleres de mantenimiento como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados.	✓			
5	Almacenamiento	✓			
6	Herramientas y equipos en buen estado	✓			
7	Se utilizan correctamente	✓			
8	Se encuentran señalizados los equipos que generen peligros específicos sobre cuerpo alto voltaje, etc.	✓			

Nota: Los ítem del numeral IV siempre deben ser diligenciados independiente del tipo de herramienta que se encuentre en el frente de obra.

	RESIDENTE	APOYO
NOMBRE Y APELLIDO	Oscar Portilla	Fredy Soto
CARGO	Prof.	Practicante SST
FIRMA		

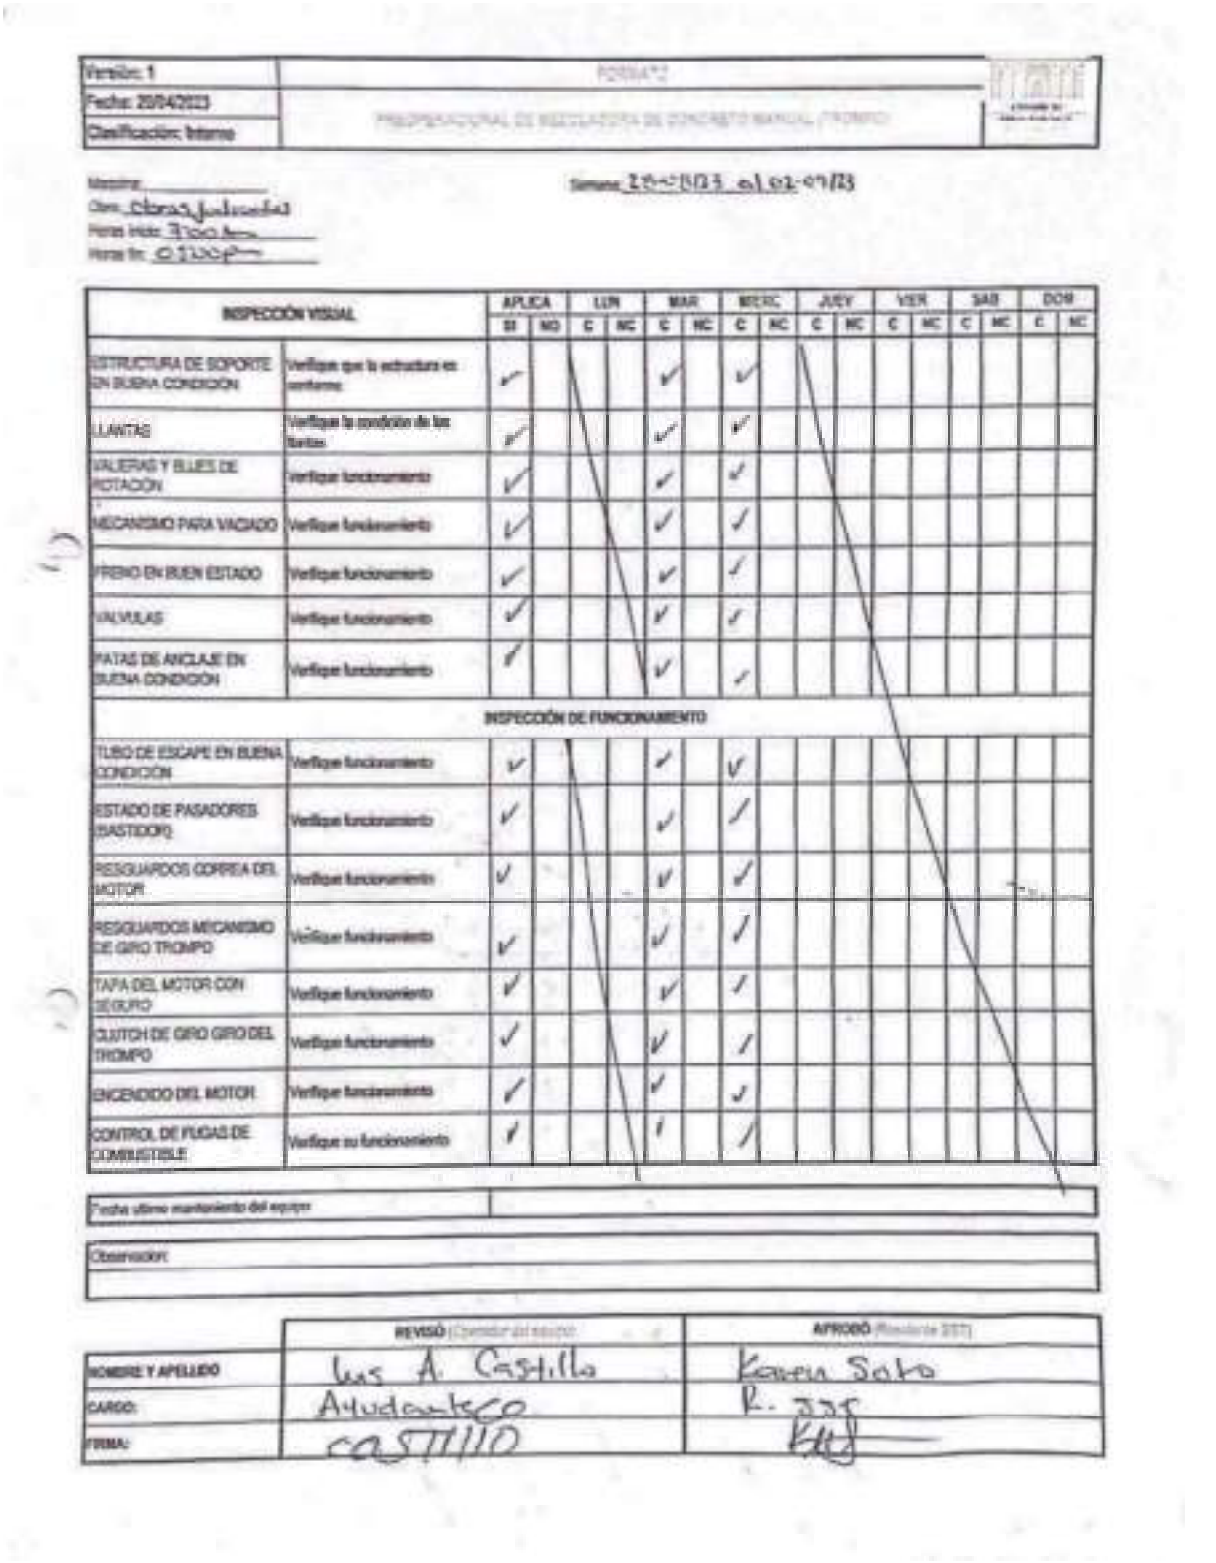

Versión: 1	
Fecha: 20/04/2023	
Clasificación: Interna	


Semana 25-05-23 al 01-07-23


Obra: Obras Judiciales
Hora Inicio: 7:00 Am
Hora fin: 01:00 pm

INSPECCIÓN VISUAL		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique que la estructura es conforme	✓				✓		✓									
LLANTAS	Verifique la condición de las llantas	✓				✓		✓									
VALVERAS Y EJJES DE ROTACIÓN	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓									
MECANISMO PARA VACIADO	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓									
FRENO EN BUEN ESTADO	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓									
VALVULAS	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓									
PATAS DE ANCLAJE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓									
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO																	
TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓									
ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR)	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓									
RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓									
RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓									
TAPA DEL MOTOR CON SEGURO	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓									
CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓									
ENCENDIDO DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓									
CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE	Verifique su funcionamiento	✓				✓		✓									

Fecha último mantenimiento del equipo	
Observación:	

	REVISÓ (Coordinador equipo)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Luis A. Castillo	Karen Soto
CARGO:	Ayudante 6	R. SST
FIRMA:	CASTILLO	

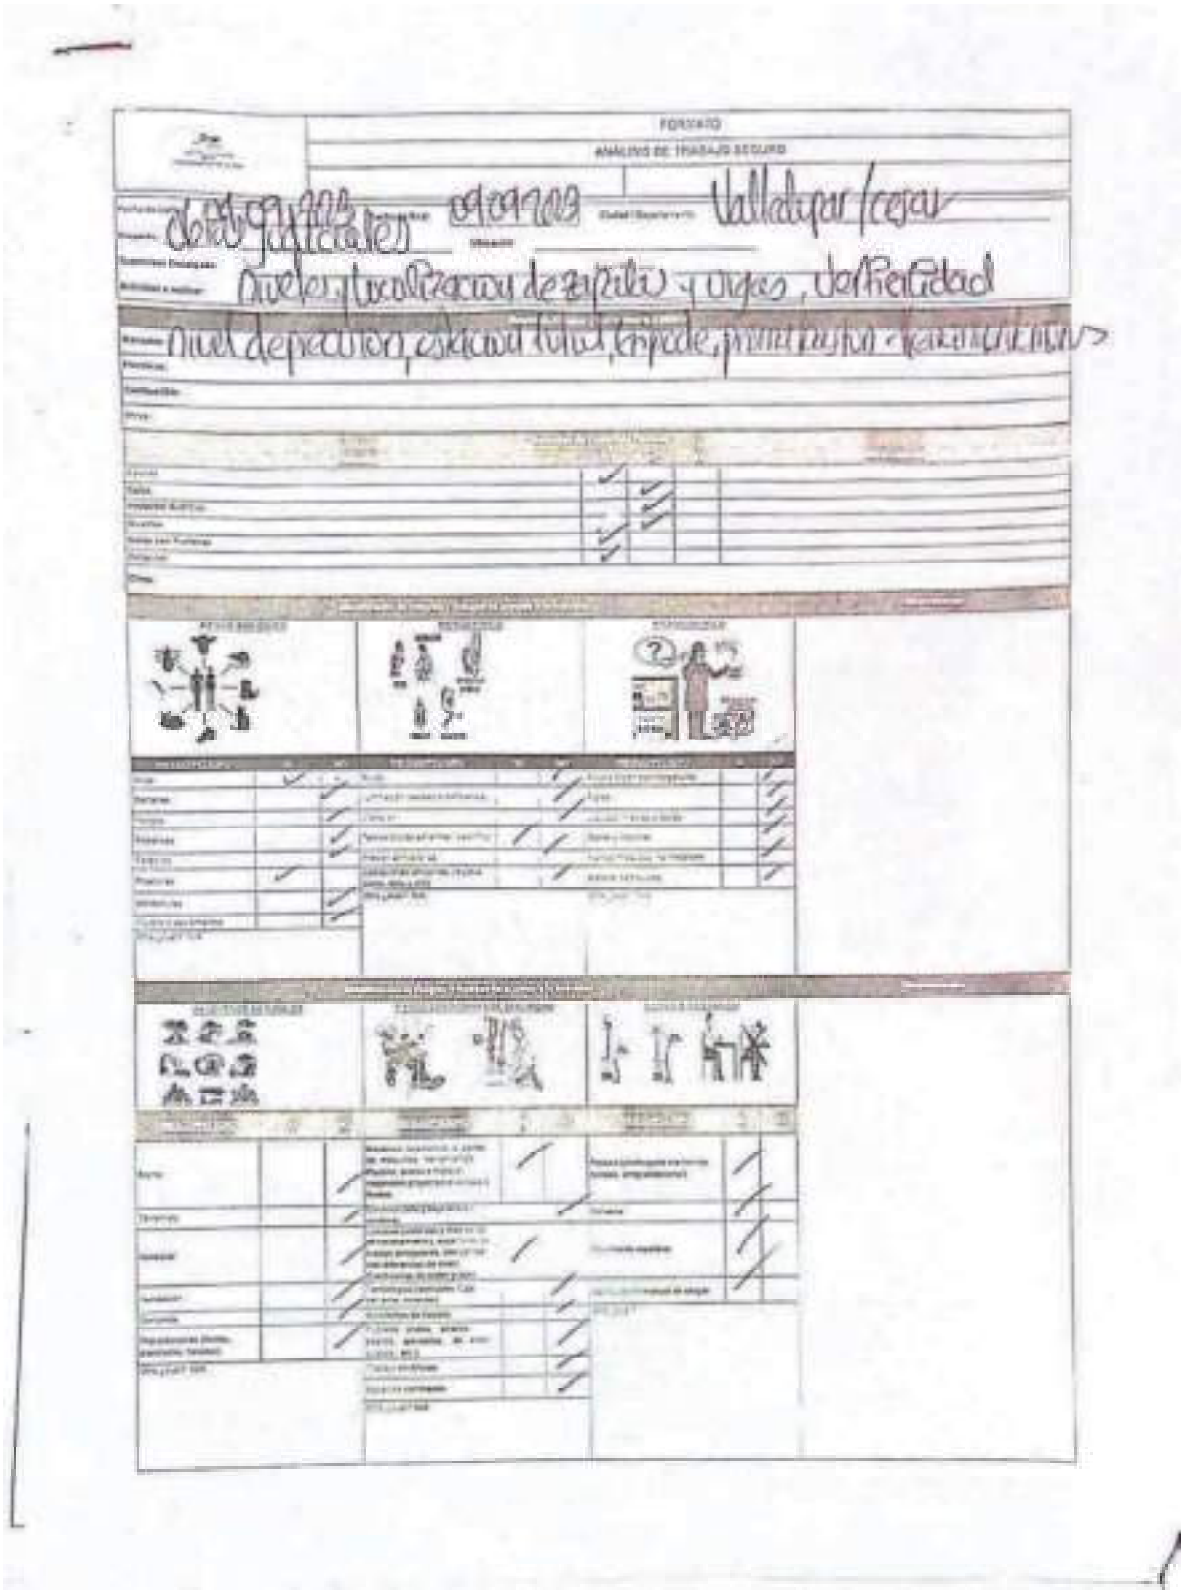

FORMATO
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

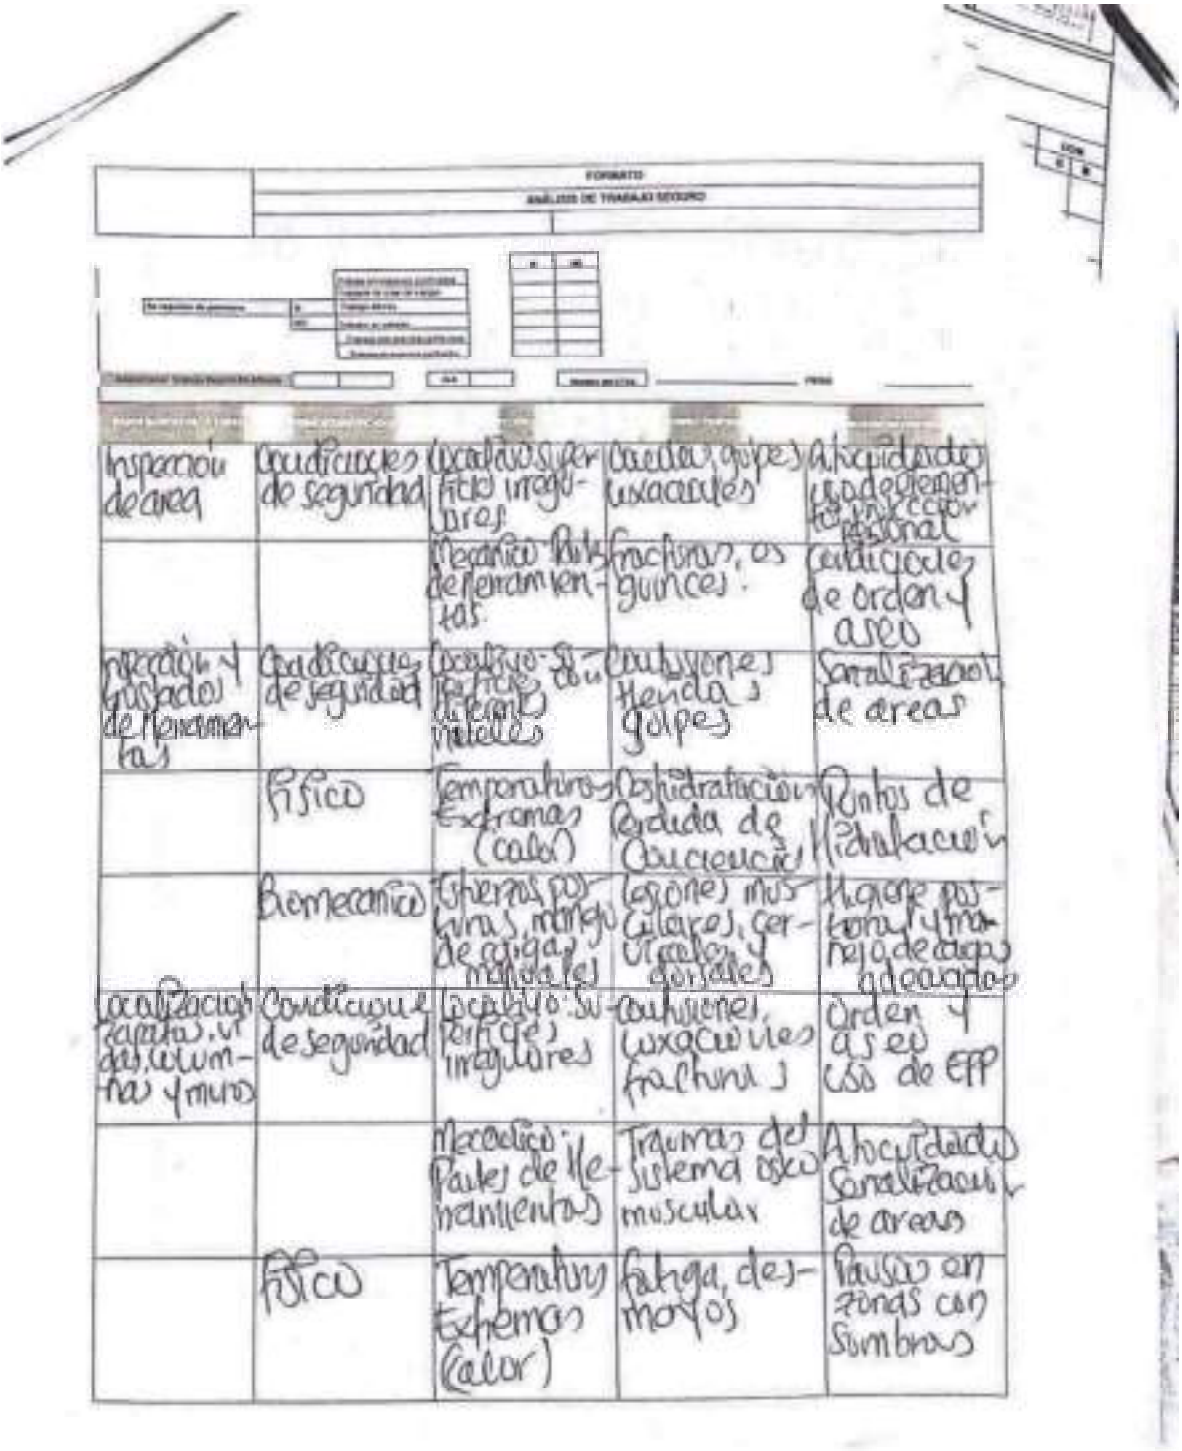



FORMATO


ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Inspección de área	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficie irregulares	Caídas, golpes, luxaciones	Alta rapidez en uso de elementos de protección personal
		Mecánico: Fallas de herramientas	Fracturas, esguinces.	Condiciones de orden y aseo
Operación y uso adecuado de herramientas	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficie irregulares	Contusiones, Herida, golpes	Señalización de áreas
	Físico	Temperaturas Extremas (calor)	Deshidratación, Pérdida de Conciencia	Puntos de Hidratación
	Biomecánico	Esfuerzos por posturas, manejo de carga, movimientos	Lesiones musculares, cervicales y generales	Higiene postural y manejo de cargas adecuado
Localización señalización, vías, columnas y muros	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficies irregulares	Contusiones, luxaciones fracturas	Orden y aseo Uso de EPP
		Mecánico: Fallas de herramientas	Traumas del sistema oseo muscular	Adecuada Señalización de áreas
	Físico	Temperaturas Extremas (calor)	Fatiga, desmayos	Pausas en zonas con Sombras

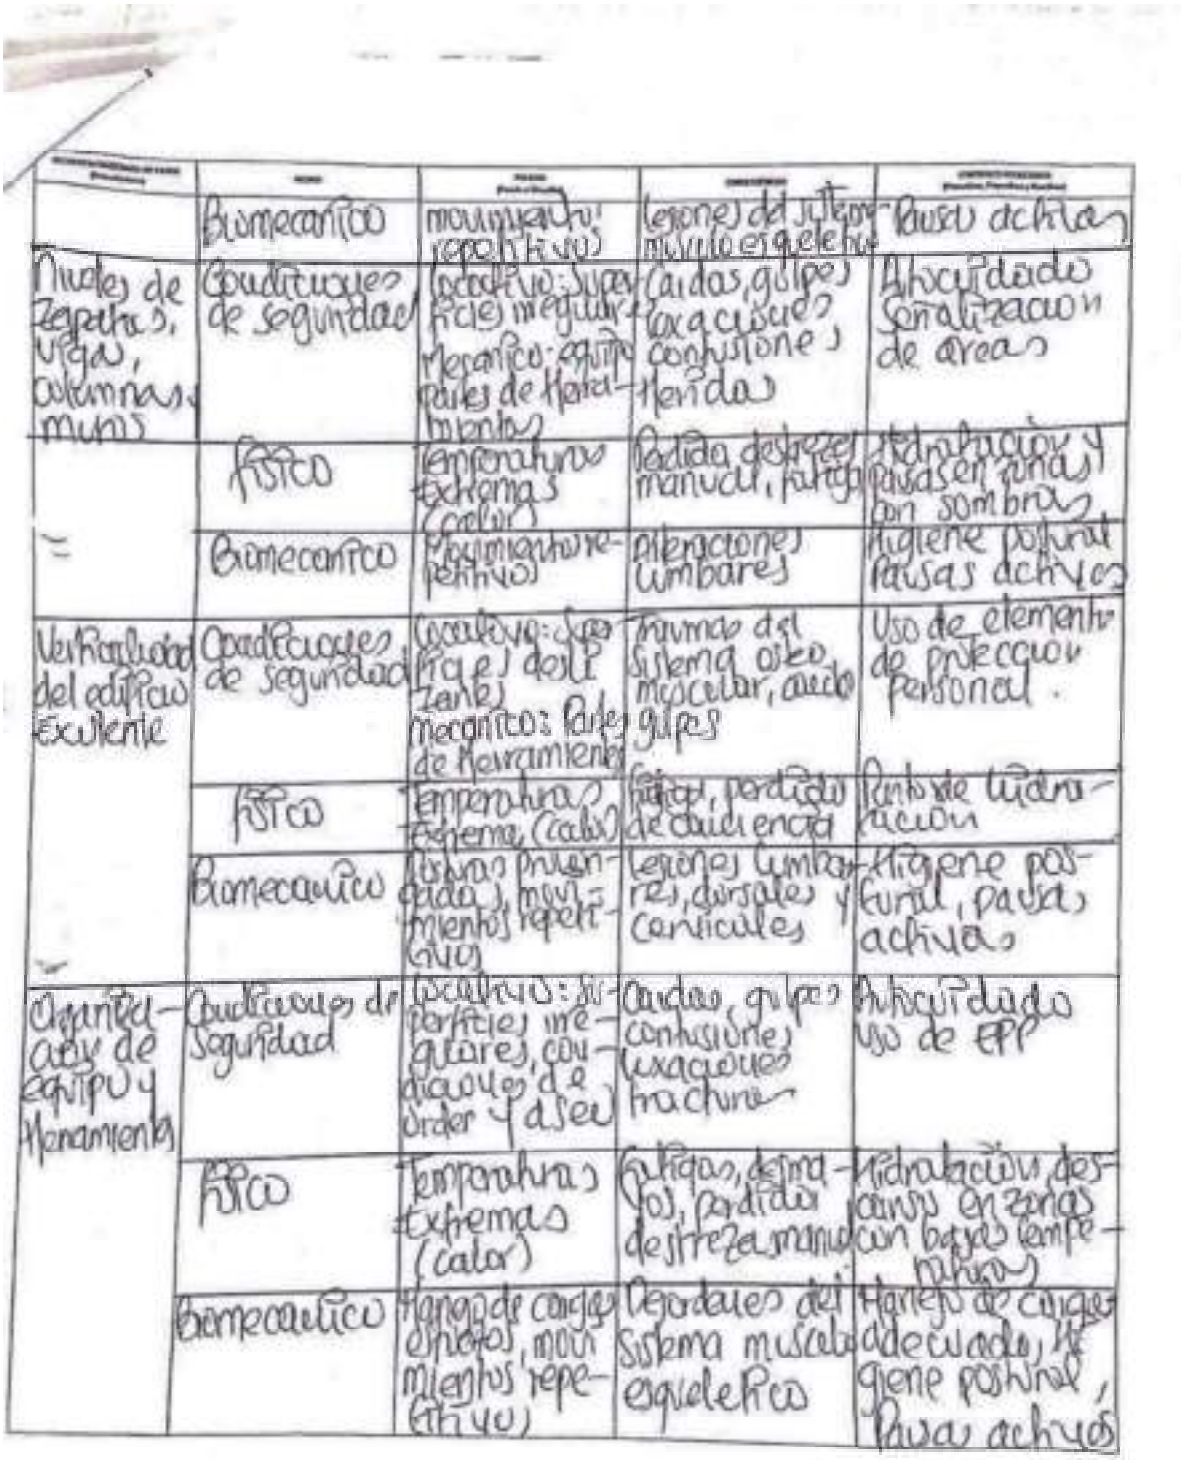

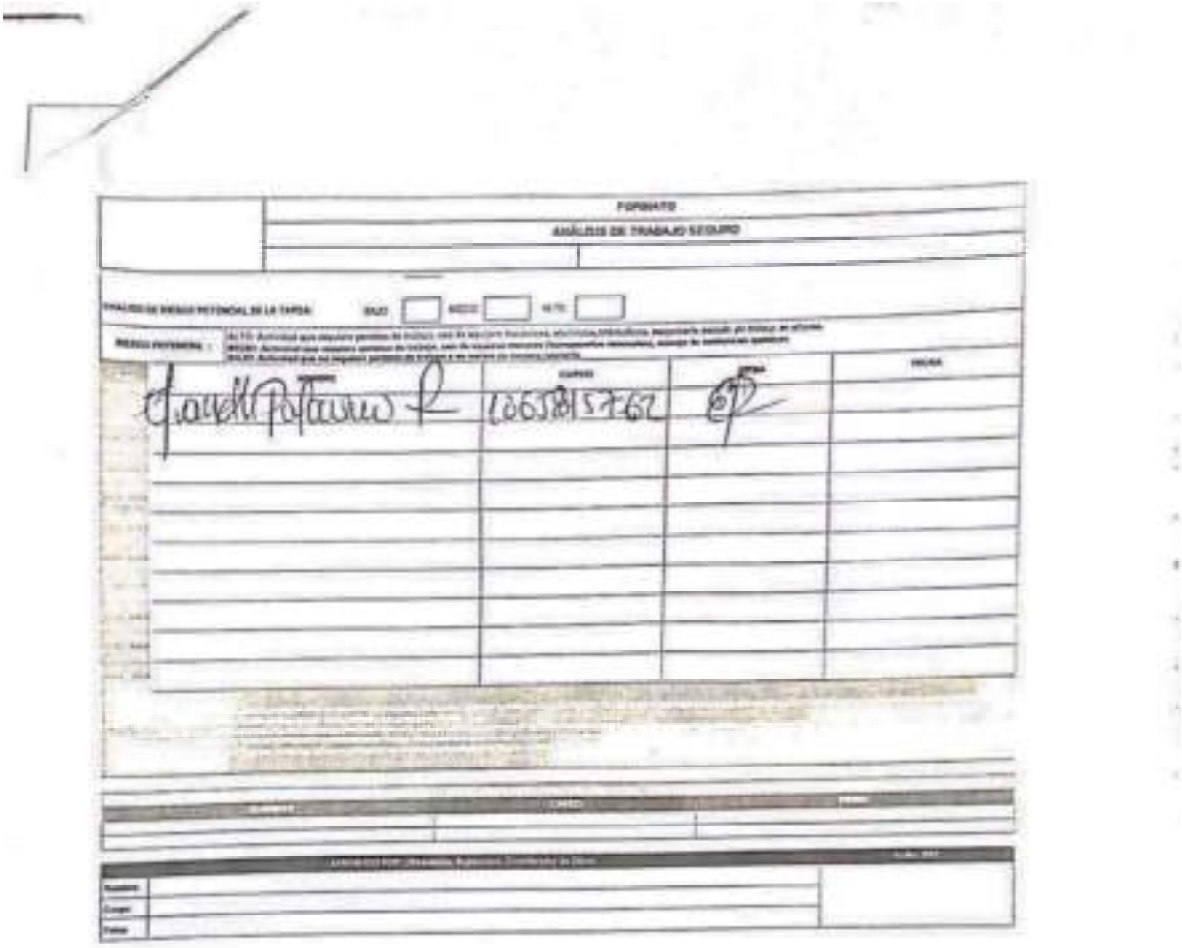

FORMATO
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

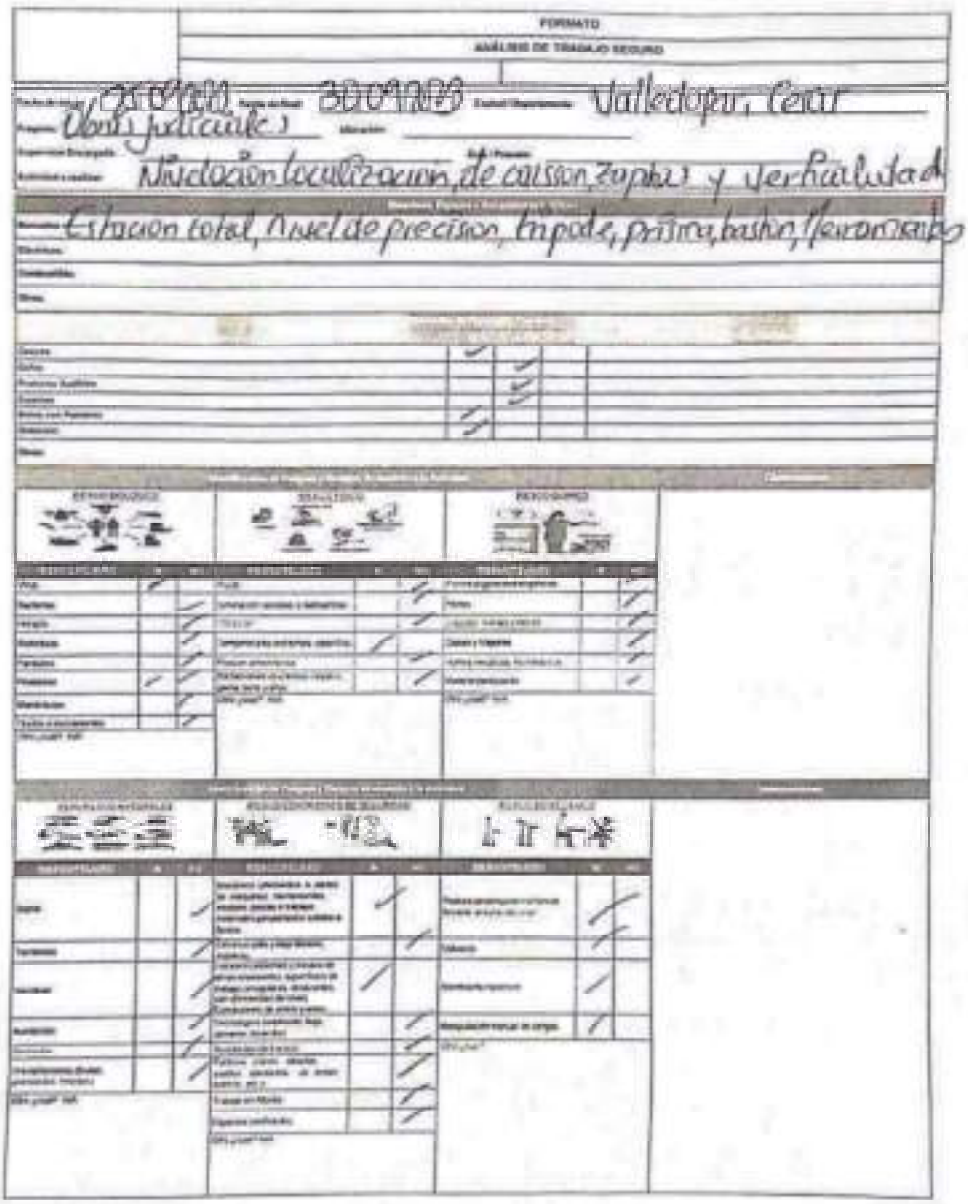
FORMATO
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
Valledupar, Cesar
Obras judiciales
Nivelación localización de caisson zapatas y verificación
Estación total, Nivel de precisión, trípode, prisma, bastón, Herramientas



INSPECCIÓN PRECOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO


Semana del ____ al ____

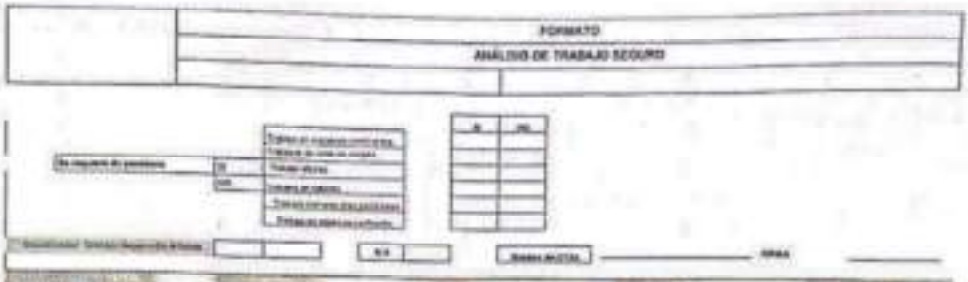

FORMATO


ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Inspeccion de area	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficies irregulares	Caidas, golpes luxaciones	Diligenciar uso de elementos proteccion personal
		Locativo: Caida de Herramientas	fracturas, esguinces	Condiciones de orden y aseo
Inspeccion y traslado de Herramientas	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficies con diferencias de nivel	Contusiones Heridas	Señalizacion de areas
	Fisico	Temperaturas extremas (calor)	Deshidratacion Perdida de conciencia	Pausas de hidratacion
	Biomecanico	Esfuerzos, manejo de cargas manuales	lesiones musculares, cervicales y dorsales	Higiene postural y carga adecuada
Verificacion del edificio existente	Condiciones de seguridad	Locativo: superficies irregulares	Traumas, contusiones, luxaciones	Prevencion y autocuidado
		Mecanico: equipos, material acopiados	Golpes, caidas fracturas	Uso de elementos de Proteccion Personal.
	Fisico	Temperaturas extremas (calor)	fatigas, desmayos	Descanso en zonas con bajas temperaturas

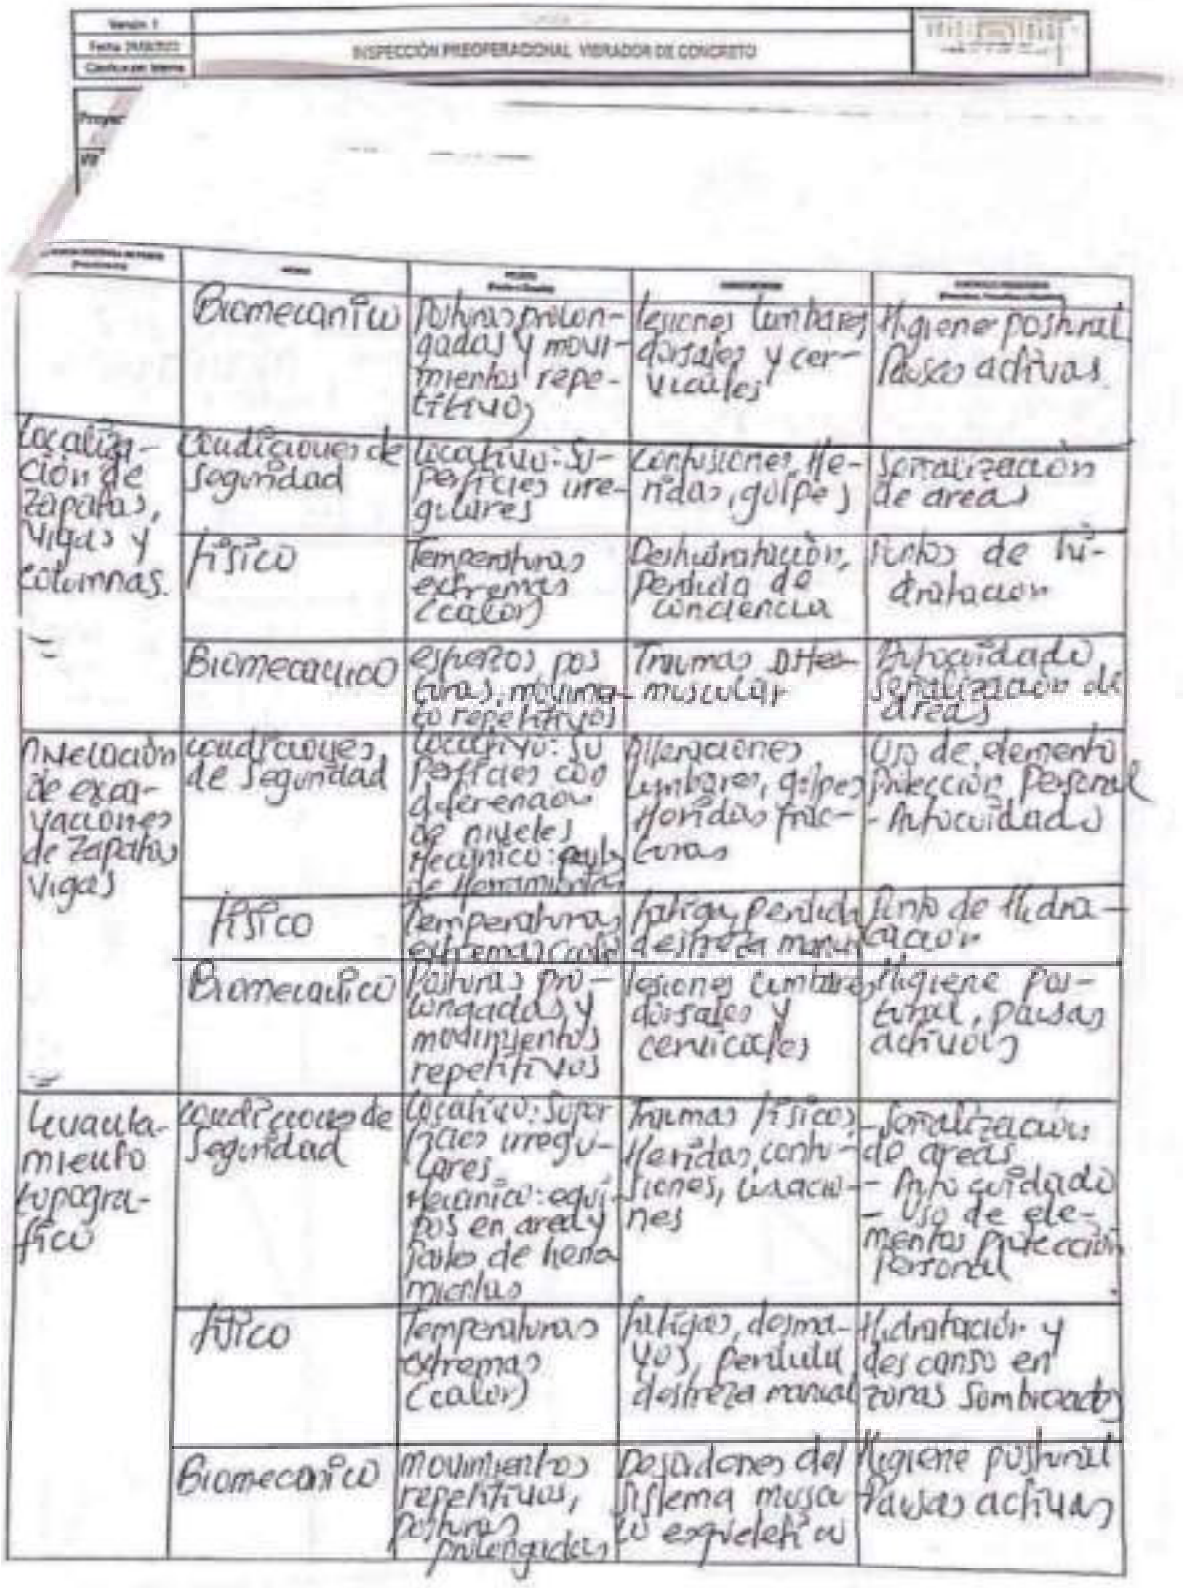

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO

	Biomecanico	Posturas prolongadas y movimientos repetitivos	lesiones lumbares, dorsales y cervicales	Higiene postural Pausas activas
Localización de zapatas, Vigas y columnas.	Condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies irregulares	Caidas, golpes	Señalización de area
	Fisico	Temperaturas extremas (calor)	Deshidratación, perdida de conciencia	Puntos de hidratacion
	Biomecanico	esfuerzo postural, movimiento repetitivos	Trauma, fatiga muscular	Señalización de areas
Nivelación de excavaciones de zapatas Vigas	condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies con diferencia de niveles Mecanico: caida de herramientas	Diferencias lumbares, golpes, Heridas fracturas	Uso de elementos proteccion personal - Señalizacion
	Fisico	Temperaturas extremas (calor)	fatiga, perdida destreza manual	Punto de hidratacion
	Biomecanico	Posturas prolongadas y movimientos repetitivos	lesiones lumbares, dorsales y cervicales	Higiene postural, pausas activas
Levantamiento topografico	condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies irregulares Mecanica: equipos en area y caida de herramientas	Traumas fisicos, Heridas, contusiones, fracturas	- Señalizacion de areas - Autocuidado - Uso de elementos proteccion personal
	fisico	Temperaturas extremas (calor)	fatigas, deshidratacion, perdida destreza manual	Hidratacion y descanso en zonas sombreadas
	Biomecanico	movimientos repetitivos, postura prolongadas	Lesiones del sistema musculo esqueletico	Higiene postural Pausas activas

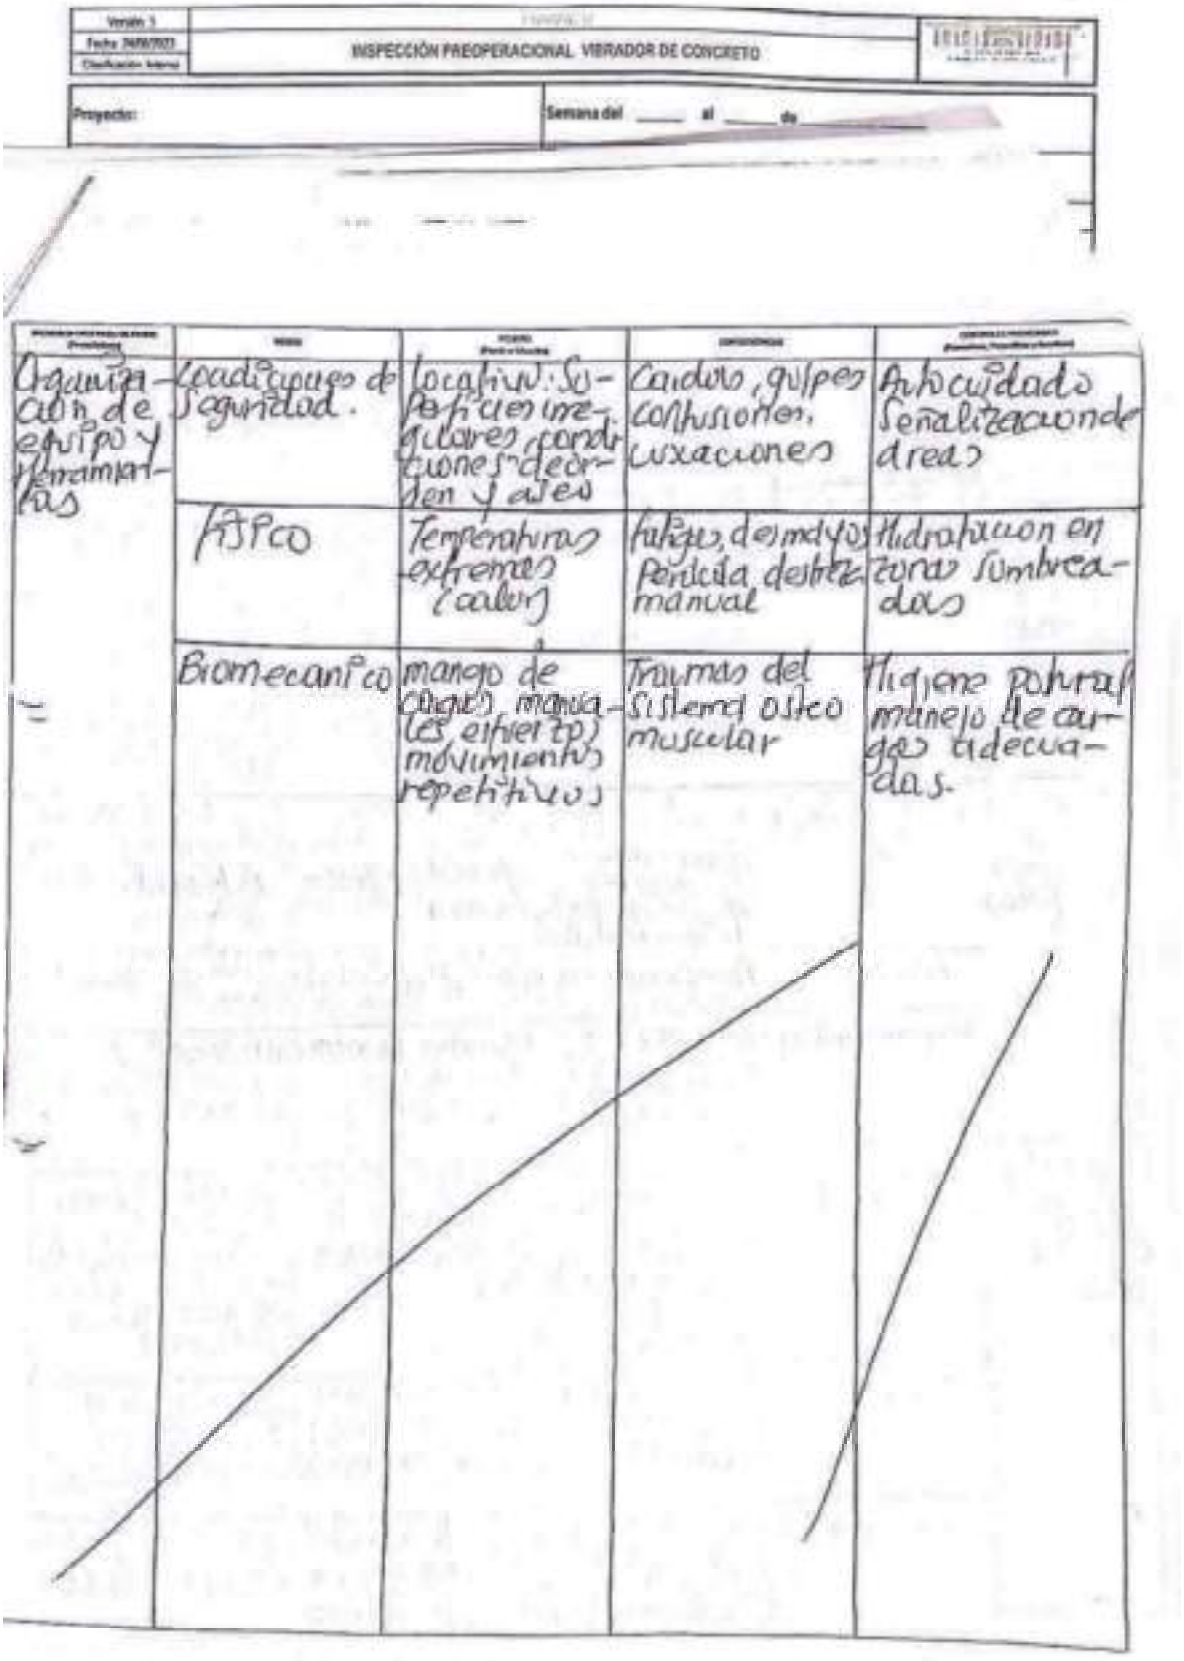

Versión: 1
Fecha: 26/06/2021
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO

Proyecto:

Semana del ____ al ____ de ____


Organización de equipo y herramientas	Condiciones de seguridad.	Locativo: Superficies irregulares, condiciones de orden y aseo	Caídas, golpes contusiones. luxaciones	Autocuidado Señalización de áreas
	Físico	Temperaturas extremas (calor)	Fatigas, deshidratación Pérdida destreza manual	Hidratación en zonas sombreadas
	Biomecánico	manejo de cargas, manuales, esfuerzo, movimientos repetitivos	Traumas del Sistema osteo muscular	Higiene postural manejo de cargas adecuadas.



FORMATO

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Jefferi Barrantes Valverde	Aux Topografo		
Gianella Palomino R	Aux Topografa		

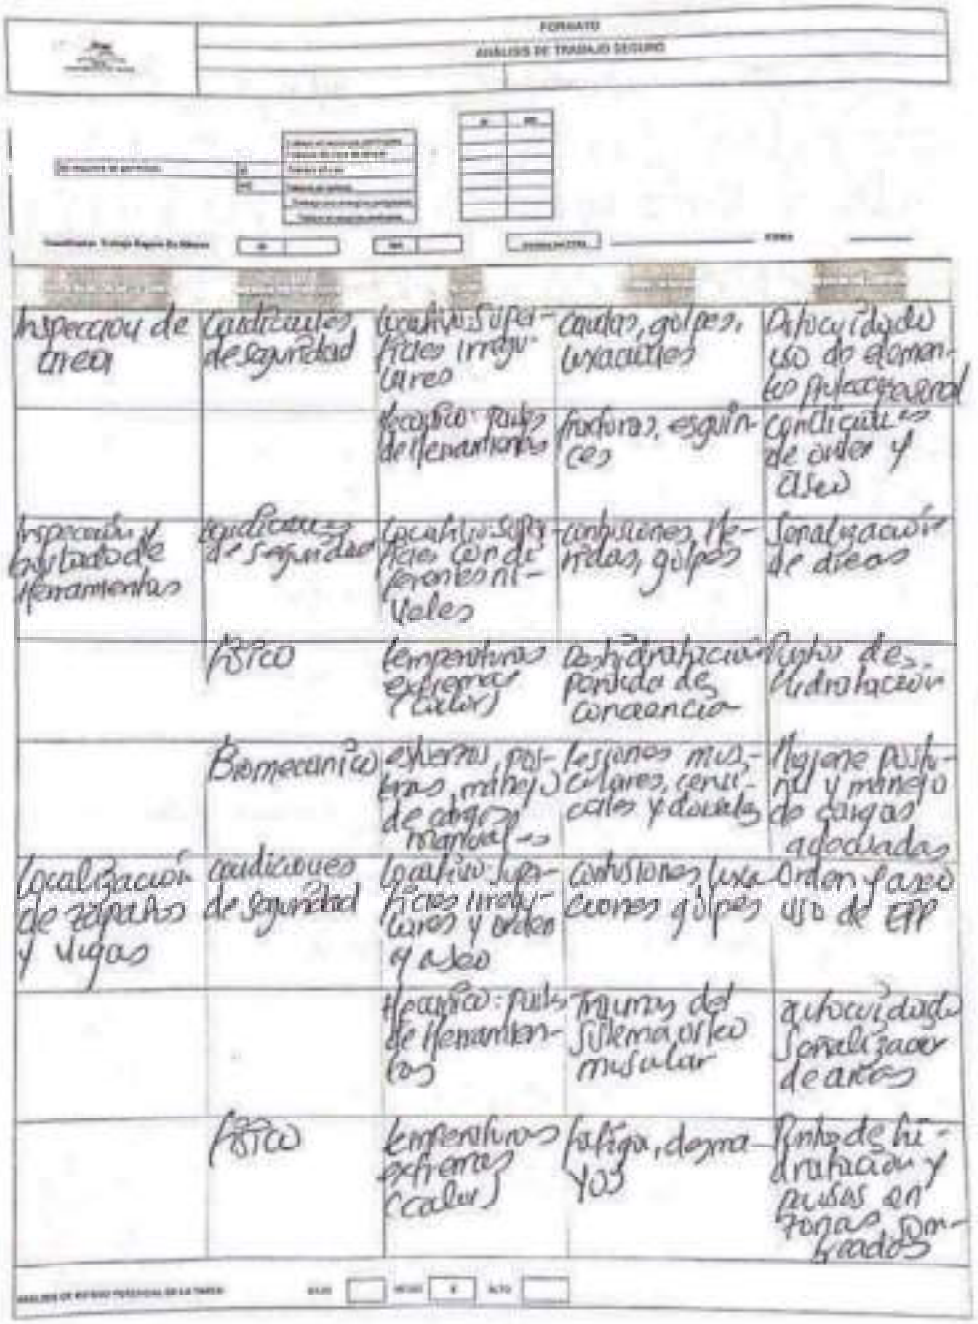


FORMATO


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Inspección de área	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficies irregulares	Caídas, golpes, lesiones	Ausencia de uso de elementos de protección personal
		Locativo: Puntos de herramientas	Fracturas, esguinces	Condiciones de orden y aseo
Inspección y estado de herramientas	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficies con desniveles	Contusiones, heridas, golpes	Señalización de áreas
	Físico	Temperaturas extremas (calor)	Deshidratación, pérdida de concentración	Puntos de hidratación
	Biomecánico	Esfuerzos posturales, manejo de cargas manuales	Lesiones musculares, cervicales y dorsales	Higiene postural y manejo de cargas adecuadas
Localización de zapatas y vigas	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficies irregulares y orden y aseo	Contusiones, luxaciones golpes	Orden y aseo uso de EPP
		Mecánico: Puntos de Herramientos	Traumas del Sistema osteo muscular	Ausencia de señalización de áreas
	Físico	Temperaturas extremas (calor)	Fatiga, desmayos	Puntos de hidratación y pausas en zonas bordeadas

ANALISIS DE RIESGO POTENCIAL DE LA TAREA BAJO [ ] MEDIO [ ] ALTO [ ]

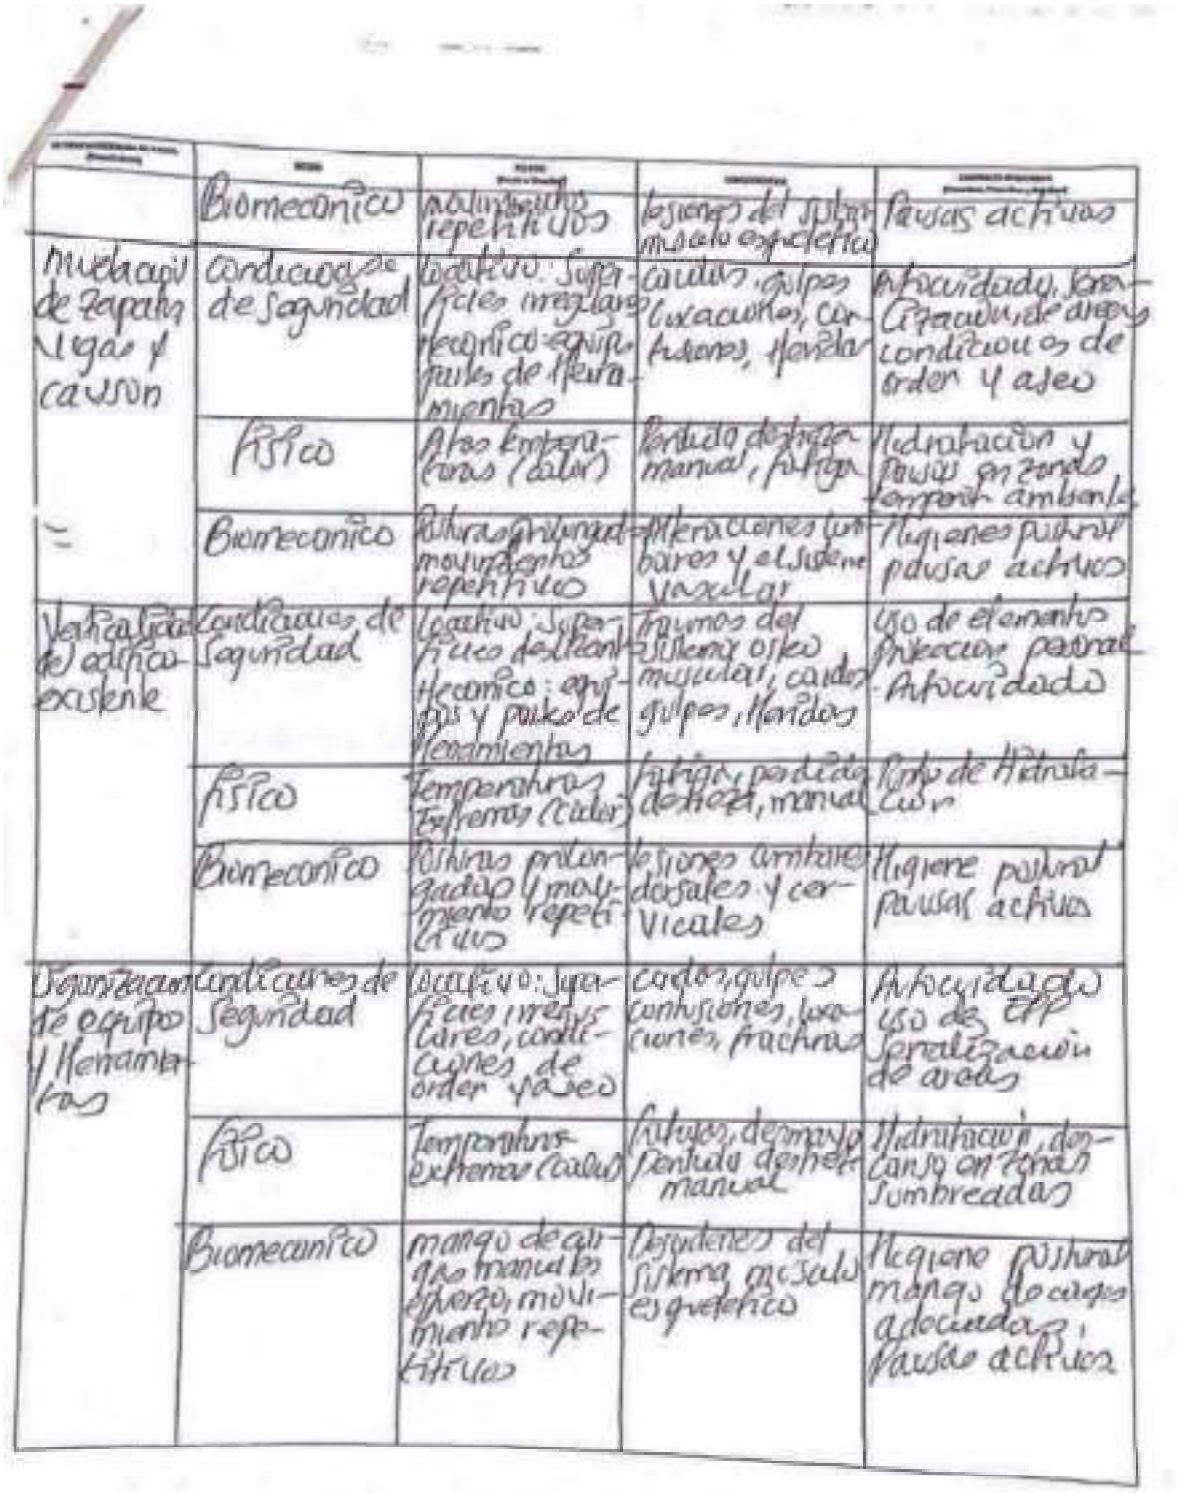

	Biomecanico	posturas repetitivos	lesiones del sistema muscolo esqueletico	Pausas activas
Mudanza de Zapatos Vigas y cavson	Condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies irregulares mecanico equipos de Herramientas	caidas, golpes Luxaciones, cortaduras, Heridas	Autocuidado, Señalizacion de areas y condiciones de orden y aseo
	Fisico	Altas temperaturas (calor)	Perdida de fuerza manual, fatiga	Hidratacion y pausas en zonas temperatura ambiental
=	Biomecanico	Posturas prolongadas movimientos repetitivos	Alteraciones lumbares y el Sistema Vascular	Higiene postural pausas activas
Verificacion de Vehiculo existente	Condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies desiguales Mecanico: equipos y puntos de Herramientas	Traumas del Sistema oseo musculares, caidas golpes, Heridas	Uso de elementos proteccion personal Autocuidado
	Fisico	Temperaturas Extremas (calor)	Fatiga, perdida de fuerza, manual	Punto de Hidratacion
	Biomecanico	Posturas prolongadas y movimiento repetitivos	lesiones lumbares dorsales y cervicales	Higiene postural pausas activas
Señalizacion de equipo y Herramientas	Condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies irregulares, condiciones de orden y aseo	caidas, golpes Contusiones, luxaciones, fracturas	Autocuidado uso de EPP Señalizacion de areas
	Fisico	Temperaturas extremas (calor)	Fatigas, dermatosis Perdida de fuerza manual	Hidratacion, descanso en zonas sombreadas
	Biomecanico	manejo de cargas manuales esfuerzo, movimiento repetitivos	Trastornos del Sistema muscolo esqueletico	Higiene postural manejo de cargas adecuadas, pausas activas

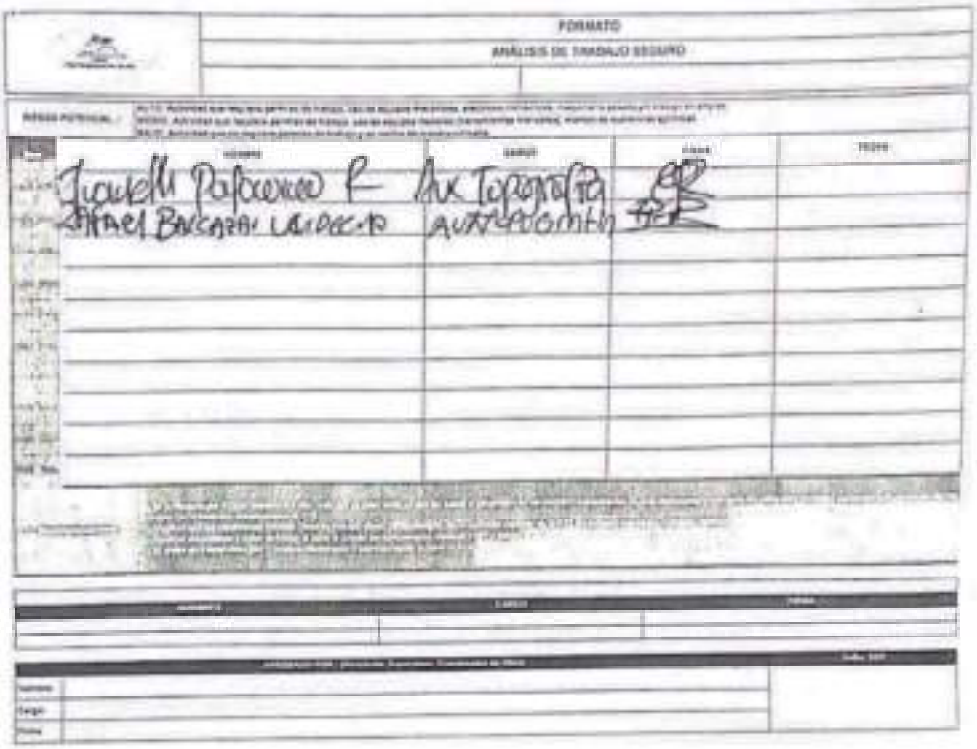

FORMATO

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



FORMATO
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
Obras judiciales
Nivelación, tarrajeo de zapatas, columnas y vigas
Nivel de precaución, estado de salud, pisma, tropezón, caída, atrapamiento menores




FORMATO


ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO


Inspección de área.	Condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies irregulares y diferencia de nivel	Caída a golpes fracturas	-Autocuidado -Señalización de áreas
		Mecánico: Partes de Herramientas material acopiado	Esguinces, Luxaciones, Heridas	-Uso de elemento de protección personal
	Físico	Temperaturas Extremas (calor)	Deshidratación, Fatiga, Desmayo	Pausa en zonas con bajas temperaturas
Inspección y traslado de Herramientas	Condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies con diferencias de nivel	Contusiones golpes, fracturas	Condiciones de orden en las diferentes áreas
		Mecánico: equipos Partes de Herramientas	Esguinces, Luxaciones, Heridas	Autocuidado Señalización de áreas
	Físico	Temperaturas extremas (calor)	Perdida de la destreza manual y conciencia	Hidratación y pausas en zonas de Sombra
	Biomecánico	Manipulación manual de cargas y esfuerzos	Alteraciones Lumbares, cervicales y dorsales	Cargas adecuadas e higiene postural.
Localización de Zapatas, columnas y vigas.	Condiciones de Seguridad	Locativo condiciones de orden y aseo	Luxaciones caídas, fracturas	Señalización de áreas. Mantener de Orden y aseo

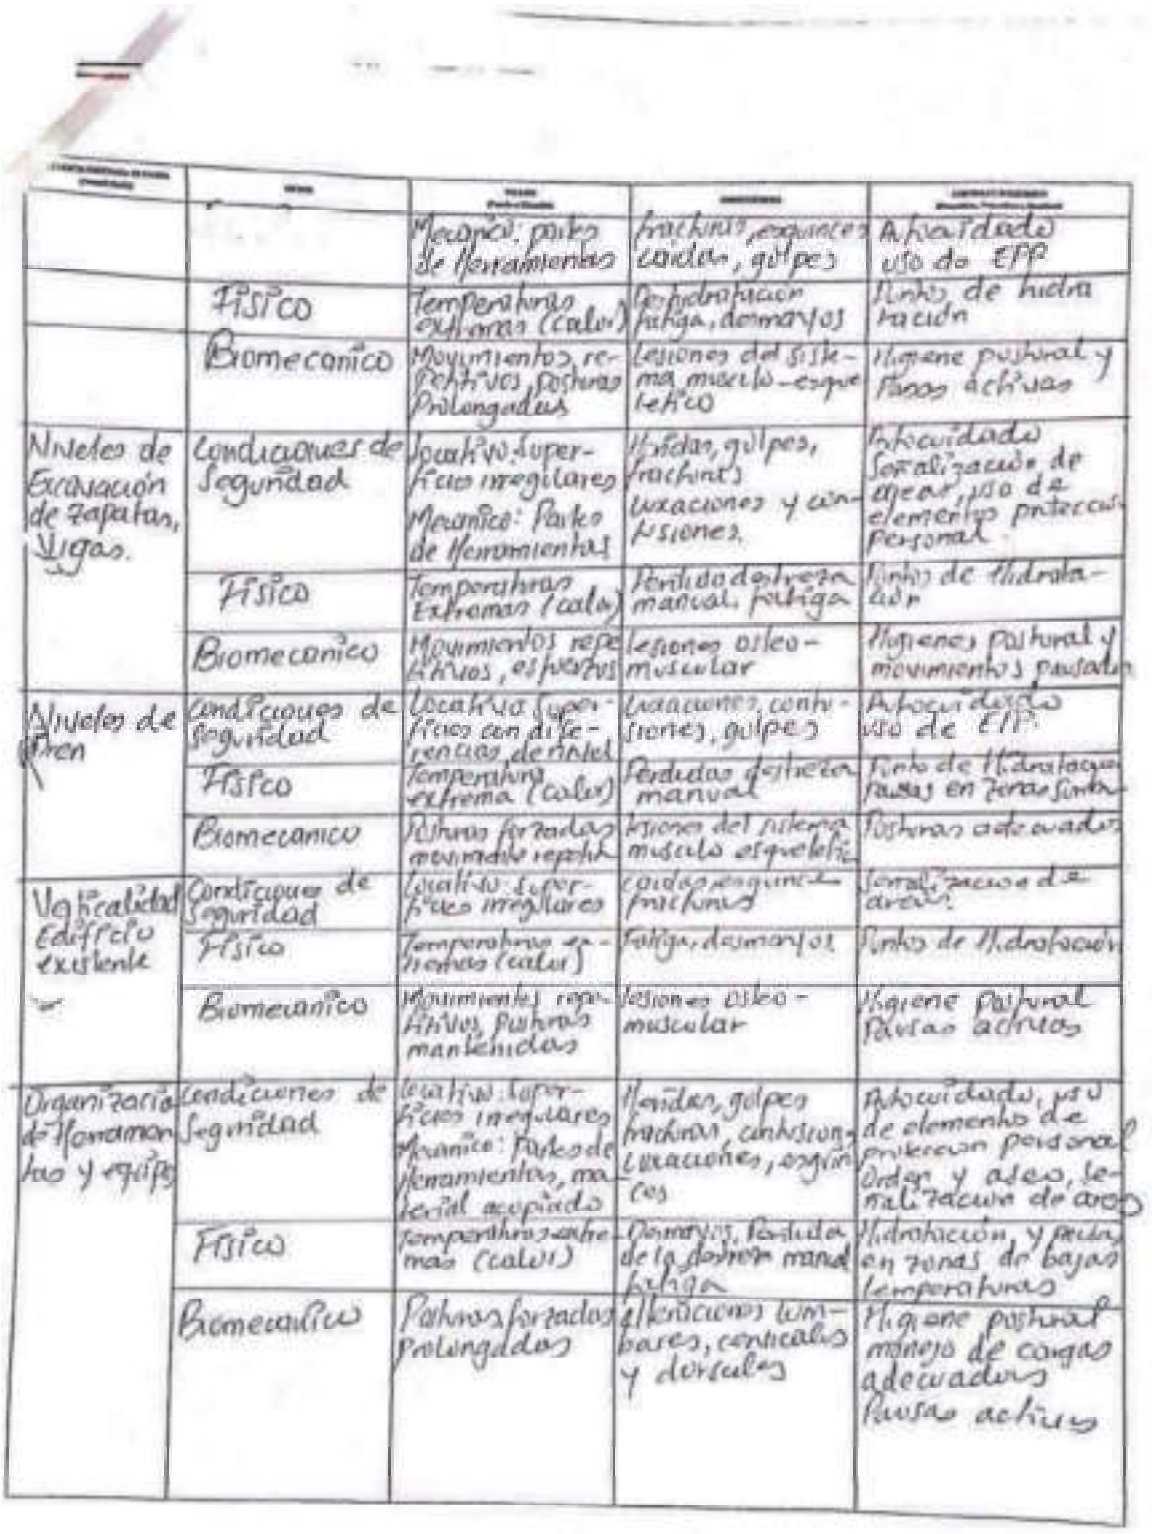

		Mecanico: partes de Herramientas	fracturas, esguinces caidas, golpes	Aplicar todo uso de EPP
	Fisico	Temperaturas extremas (calor)	Deshidratacion fatiga, desmayos	Puntos de hidratacion
	Biomecanico	Movimientos repetitivos, posturas prolongadas	Lesiones del sistema muscelo-esqueletico	Higiene postural y pausas activas
Niveles de Excavación de zapatas, vigas.	Condiciones de Seguridad	Cualitativo: Superficies irregulares Mecanico: Partes de Herramientas	Heridas, golpes, fracturas luxaciones y contusiones	Señalizacion de area, uso de elementos proteccion personal
	Fisico	Temperaturas Extremas (calor)	Perdida de destreza manual, fatiga	Puntos de Hidratacion
	Biomecanico	Movimientos repetitivos, esfuerzos	Lesiones osteo-muscular	Higiene postural y movimientos pausados
Niveles de Pren	Condiciones de Seguridad	Cualitativo: Superficies con diferencias de niveles	Luxaciones, contusiones, golpes	Aplicar todo uso de EPP
	Fisico	Temperatura extrema (calor)	Perdidas destreza manual	Punto de Hidratacion pausas en zonas sombra
	Biomecanico	Posturas forzadas movimiento repetit	Lesiones del sistema musculo esqueletico	Posturas adecuadas
Vegetacion Edificio existente	Condiciones de Seguridad	Cualitativo: Superficies irregulares	caidas, esguinces fracturas	Señalizacion de area
	Fisico	Temperaturas extremas (calor)	Fatiga, desmayos	Puntos de Hidratacion
	Biomecanico	Movimientos repetitivos, posturas mantenidas	lesiones osteo-muscular	Higiene postural pausas activas
Organizacion de Herramientas y equipos	Condiciones de Seguridad	Cualitativo: Superficies irregulares Mecanico: Partes de Herramientas, material acopiado	Heridas, golpes fracturas, contusiones luxaciones, esguinces	Aplicar todo uso de elementos de proteccion personal Orden y aseo, señalizacion de area
	Fisico	Temperaturas extremas (calor)	Desmayos, Perdida de la destreza manual fatiga	Hidratacion, y pausas en zonas de bajas temperaturas
	Biomecanico	Posturas forzadas Prolongadas	Alteraciones lumbares, cervicales y dorsales	Higiene postural manejo de cargas adecuadas Pausas activas

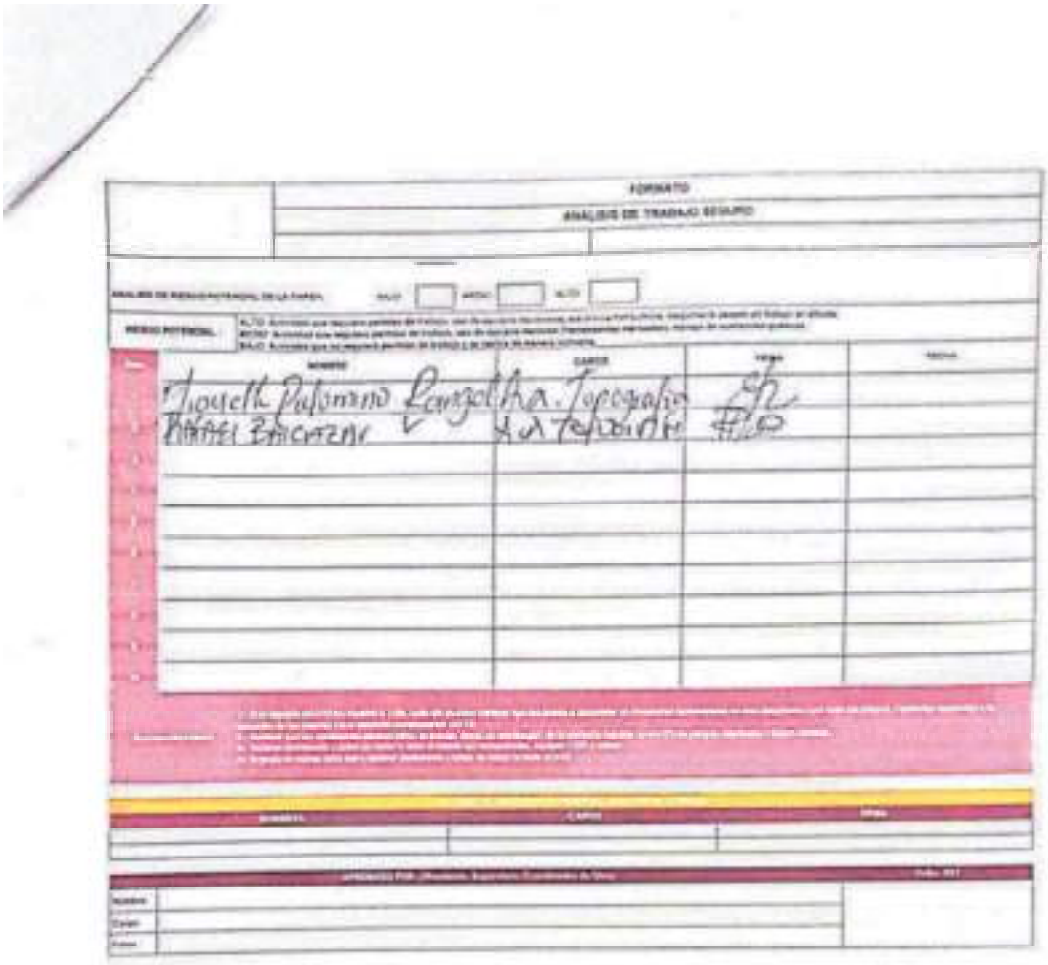

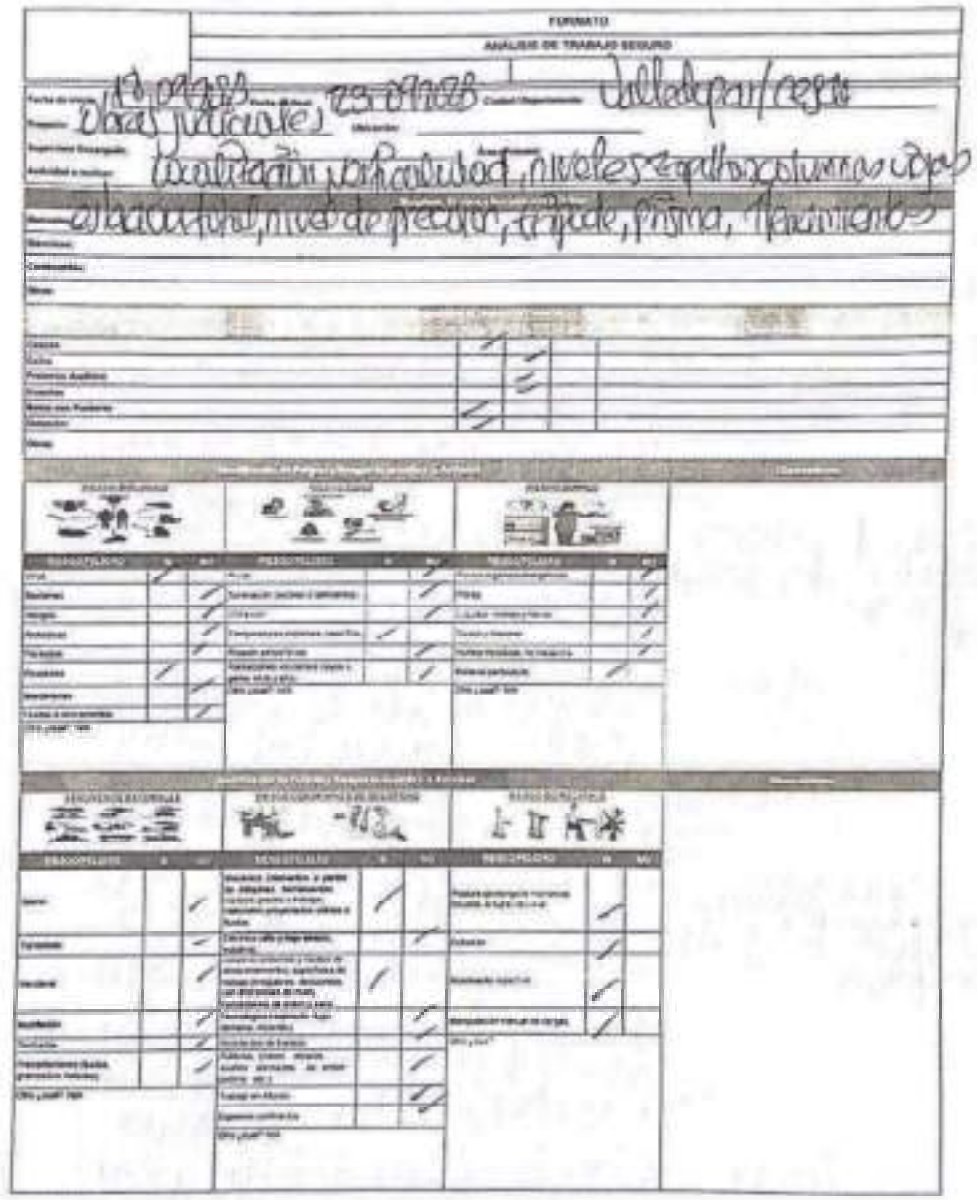
FORMATO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

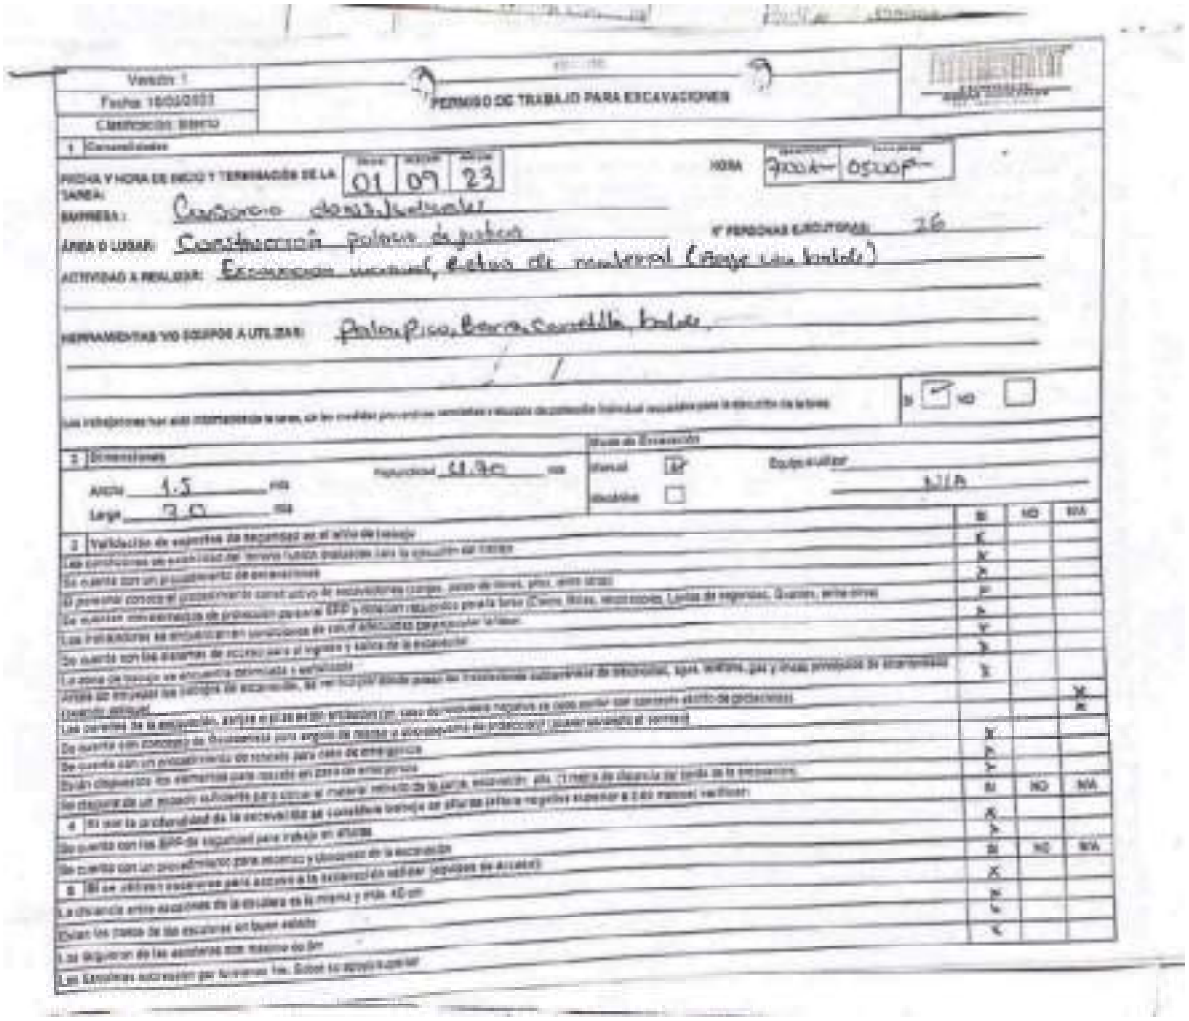

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

Versión: 1
Fecha: 18/03/2021
Clasificación: Interno

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: Día 01 Mes 09 Año 23 — HORA 7:00 a.m. – 05:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia — # PERSONAS EJECUTORAS: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual, retiro de material (Arreglo vías bombeo)

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Balde


Las trabajadores han sido capacitados en temas, en las medidas preventivas mínimas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea — SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.5 mts — Profundidad 1.80 mts
Largo 7.0 mts

Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánico ☐ — Equipo a utilizar: N/A

	SI	NO	N/A
3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo			
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (cargas, zonas de acopio, pisos, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y colectivos requeridos para la tarea (Cascos, Botas, antideslizantes, Gafas de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Las instalaciones se encuentran señalizadas de con el área libre para circular	X		
Se cuenta con las escaleras de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de ingresar las cargas de excavación, se ha revisado donde pasan las instalaciones subterráneas de telecomunicaciones, agua, sanitaria, gas y otras principales de alcantarillado (cámaras, sifones)			X
Las personas de la excavación, cargue o descargue trabajan con casco de seguridad negativo en caso contar con carnetes visible de protección			X
Se cuenta con concepto de trazabilidad para ingreso de material o almacenamiento de protección (cuando aplique) al correcto	X		
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	X		
Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un sistema suficiente para sacar el material removido de la zona excavación, sin tránsito de cargas en toda la excavación.	SI	NO	N/A
4 En caso de profundidad de la excavación se considera bajo o se afecta zonas negativa superior a dos metros realizar:			
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en altura	X		
Se cuenta con un procedimiento para entrada y salida de la excavación	X		
5 En caso de ser necesarios para acceso a la excavación señalar (equipo de acceso)	SI	NO	N/A
La distancia entre escaleras de la escalera es la misma y esta 40 cm	X		
Están las partes de las escaleras en buen estado	X		
Las alguaron de las escaleras son metros de 3m	X		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre la superficie	X		

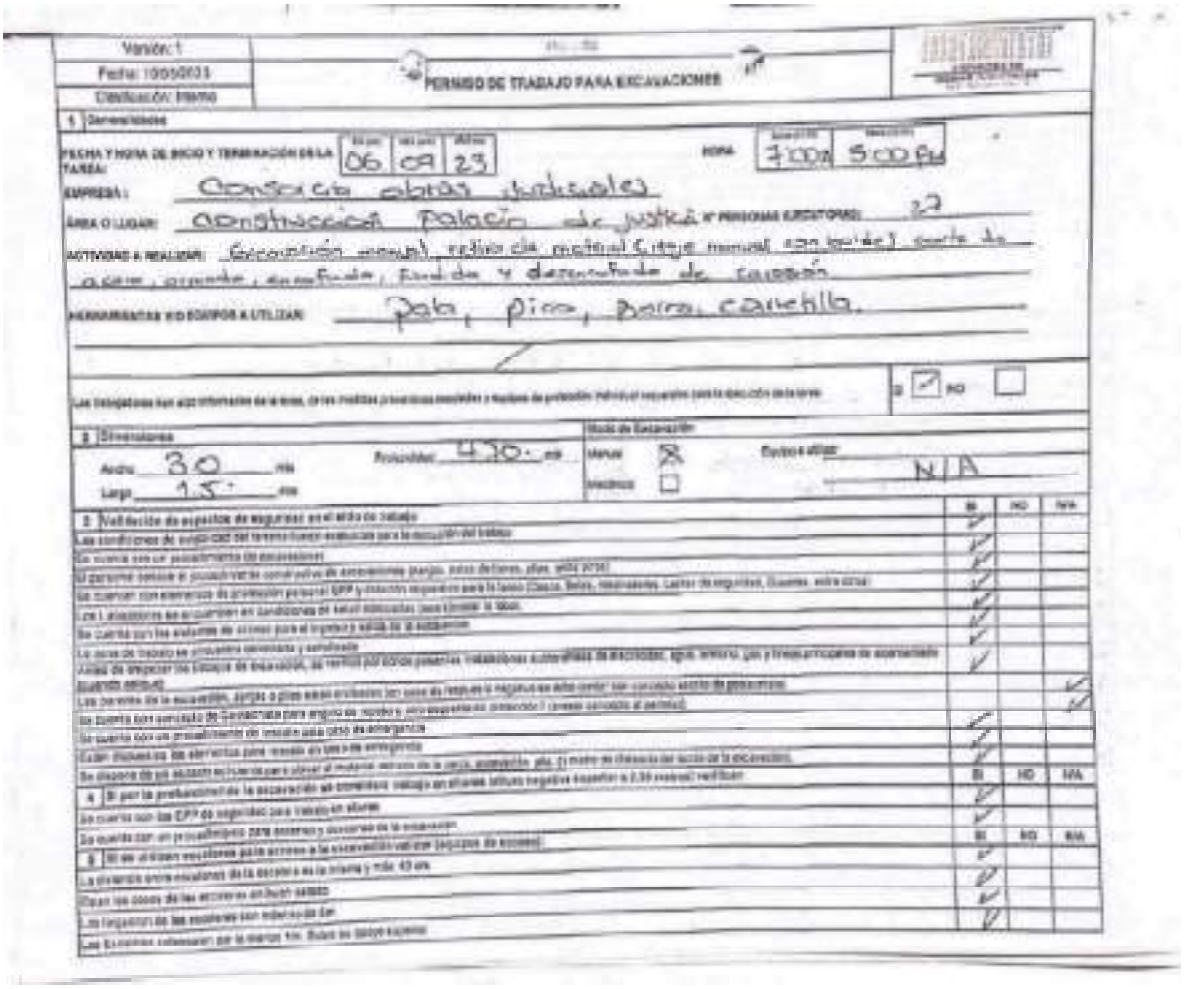

Versión: 1
Fecha: 10/10/2013
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 06 / 09 / 23 — HORA: 7:00 a.m. 5:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de justicia — N° PERSONAS EJECUTORAS: 22

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual, retiro de material sitio temporal con botas y carretillas, cargue, descargue, nivelación, limpieza y descapote de cimientos

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pica, barra, carretilla.


Las indagaciones han sido informadas de riesgos, de las medidas preventivas existentes y medidas de protección. Además el requerido para la ejecución de la tarea — SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho: 3.0 mts — Profundidad: 4.30 mts — Largo: 1.5 mts

Modo de Excavación: Manual ☒ Mecánico ☐ — Equipo a utilizar: N/A


3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones del terreno han sido evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento de excavación (riesgos, actos inseguros, etc.)	✓		
Se cuenta con elementos de protección personal (EPP) y colectiva requeridos para la tarea (Casco, botas, reflectivos, Gafas de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para realizar la labor.	✓		
Se cuenta con los extintores de acuerdo para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra señalizada y demarcada	✓		
Antes de ingresar los trabajos de excavación, se verifica por parte de trabajadores autorizados de electricidad, agua, sanitaria, gas y líneas principales de suministro existentes cercanas			✓
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de requerir) o reforzadas en otra forma con concreto según el procedimiento			✓
Se cuenta con servicio de Ambulancia para ingreso de heridos y otros elementos de protección (camilla, botiquín, etc)	✓		
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un sistema exclusivo para retirar el material retirado de la zona, protección, etc. (y evitar el ingreso de agua de la excavación)	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se requieren trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		
5 En las siguientes excavaciones para acceso a la excavación (en caso de existir)	SI	NO	N/A
La distancia entre escaleras de la escalera es de mínimo 1 mts y más 45 cm.	✓		
Están los bordes de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son sobresalen 1m	✓		
Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Están en buen estado	✓		

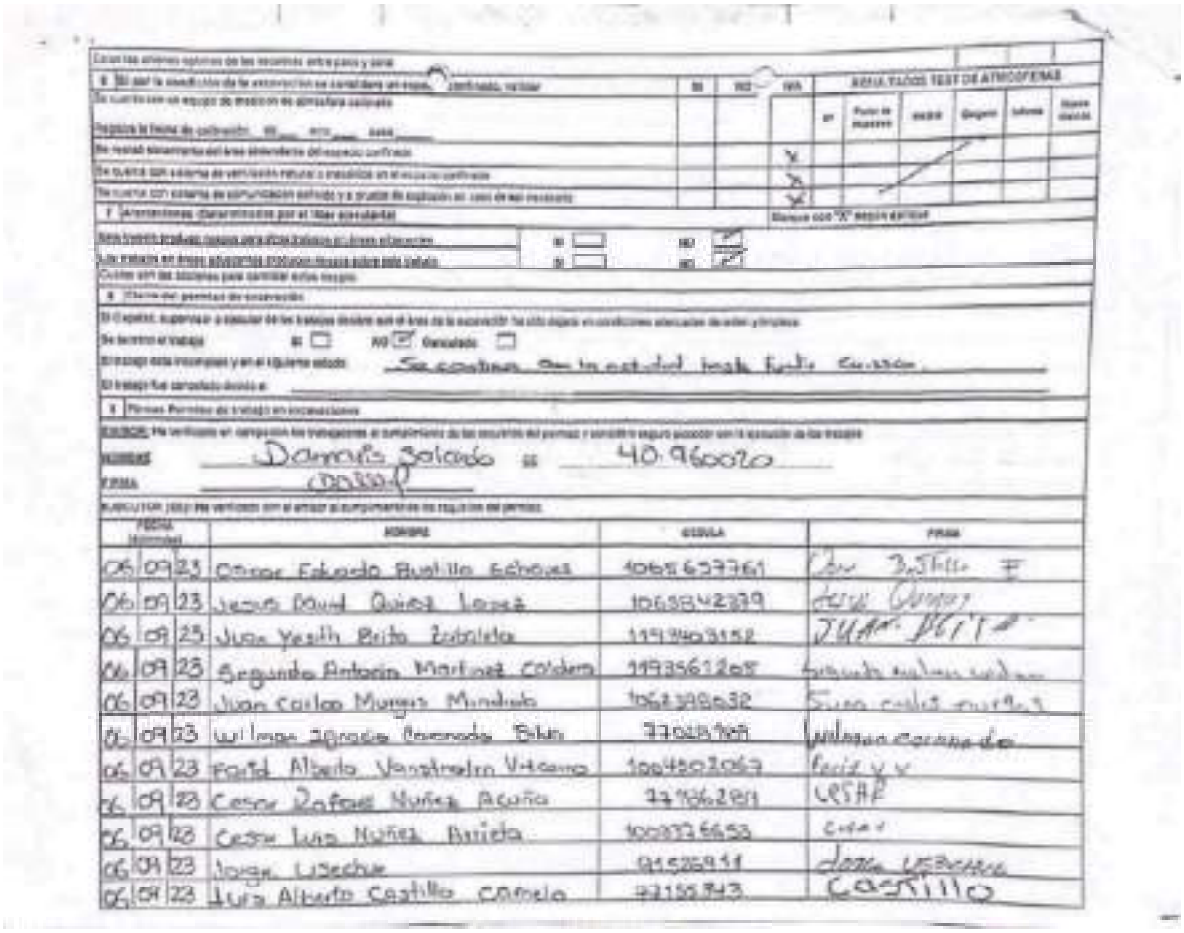

Damaris Salcedo 40.960020

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
06/09/23	Cesar Eduardo Portillo Echeverri	1065627761	
06/09/23	Jesus David Quiroz Lopez	1063842339	
06/09/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193903152	
06/09/23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193561208	
06/09/23	Juan Carlos Murgas Mendoza	1063988632	
06/09/23	Wilmer Ignacio Coronado Baleta	77028769	
06/09/23	Farid Alberto Ventrodem Vizcaino	1064503063	
06/09/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77106291	
06/09/23	Cesar Luis Nuñez Barida	1003336653	
06/09/23	Jorge Lizcano	91526911	
06/09/23	Luis Alberto Castillo Camelo	92155743	

06/09/23	Reinaldo Manuel Pacheco	77026504	
06/09/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1003952183	
06/09/23	Jhon Javier Otero Ortega	1065235805	
06/09/23	Carlos Andres Olivera Franco	1065208418	
06/09/23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	5165245	
06/09/23	Jhon Jairo Montes Cabrera	1048660194	
06/09/23	Juan David Mejia Cano	1064311685	
06/09/23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1080431816	
06/09/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	92442542	
06/09/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77164925	
06/09/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065588552	
06/09/23	Aldair Luis Diaz Conde	1065859820	
06/09/23	Pedro Luis Berdugal Vanegas	77121396	
06/09/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006214113	
06/09/23	Gerardo Enrique Fontalvo Mateo	1065566392	
06/09/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	
06/09/23	William Enrique Palmera Santana	77032612	

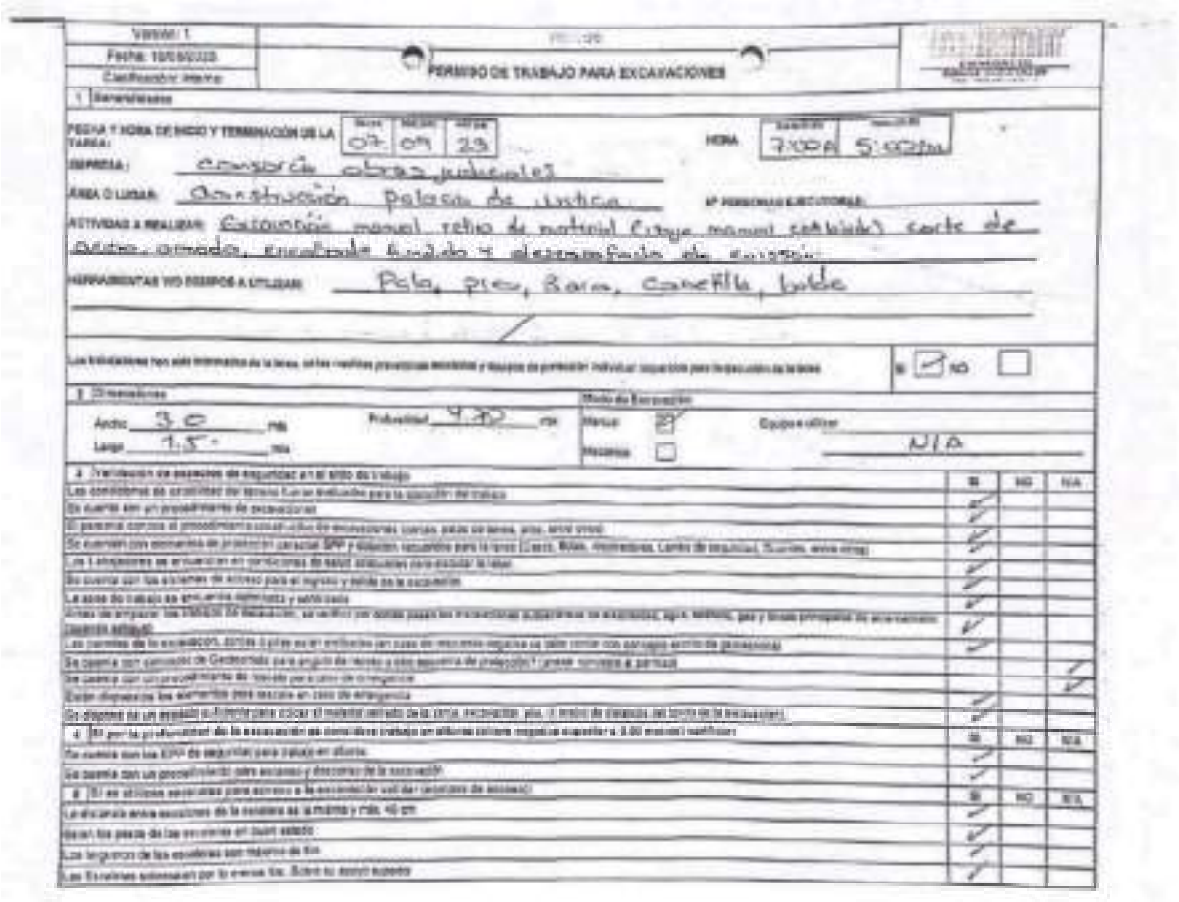

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 02 09 23 HORA 7:00A 5:00PM

EMPRESA: consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción palacio de justicia

Nº PERSONAS EJECUTORAS:

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual retiro de material (viga manual cortable) corte de suelos, armado, encofrado y vaciado y desencofrado de cimiento.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pica, Barra, cuerda, lupa

Los trabajadores han sido instruidos de la tarea, de los riesgos presentes existentes y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea: SI ☑ NO ☐


1. Dimensiones

Ancho: 3.0 mts Profundidad: 4.30 mts


Largo: 1.5 mts


Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánica ☐ Equipo a utilizar: N/A

2. Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Los conductores de vehículos de tareas fueron evaluados para la ejecución de tareas	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (cortes, pasos de tareas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y dotación necesarios para la tarea (Casco, Botas, Overoles, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la tarea	✓		
Se cuenta con las escaleras de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra aislada y señalizada	✓		
Antes de empezar las labores de excavación, se verifica con planos para las interferencias subterráneas (redes eléctricas, agua, teléfono, gas y otras) principales de acometidas (cuando aplique).	✓		
Las cuerdas de las escaleras están sujetas en el extremo superior en caso de escaleras portátiles con dispositivo antideslizante	✓		
Se cuenta con cubiertas de Geotextiles para evitar derrumbes y otro sistema de protección? (cuales sistemas a utilizar)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate en caso de emergencia			✓
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un espacio adecuado para colocar el material retirado de la zona excavación (mín. 1 metro de distancia del borde de la excavación)	✓		
3. En la profundidad de la excavación se consideran trabajos en alturas (altura negativa superior a 1.50 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para acceso y descenso de la excavación	✓		
4. El ser utilizan escaleras para acceso a la excavación cuál es? (describir de acceso)	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es a metro y más, 40 cm	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Las longitudes de las escaleras son mayores de 6m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre la superficie superior	✓		

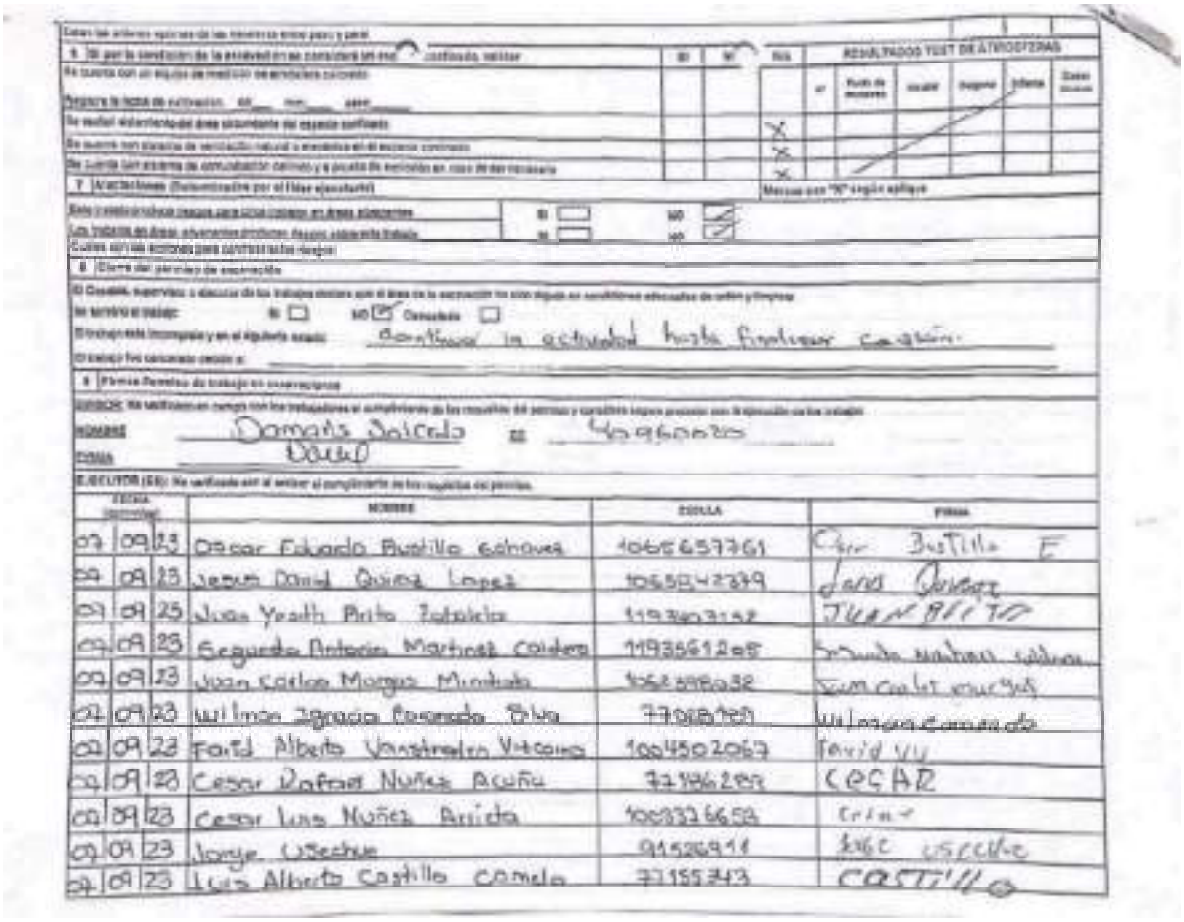


FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
07/09/23	Oscar Eduardo Bustillo Echeverr	1065657761	Oscar Bustillo E
07/09/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065042389	Jesus Quiroz
07/09/23	Juan Yeath Brito Tolosino	1193403142	JUAN BRITO
07/09/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	Segundo Martinez Caldera
07/09/23	Juan Carlos Morgan Montaño	1062898038	Juan Carlos Morgan
07/09/23	Wilmer Ignacio Coronado Silva	77088709	Wilmer Coronado
07/09/23	Farid Alberto Vanstralen Victoria	1064502067	Farid VV
07/09/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77196203	CESAR
07/09/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1063326658	Cesar
07/09/23	Jorge Ustecho	91526911	Jorge Ustecho
07/09/23	Luis Alberto Castillo Conde	77155343	CASTILLO

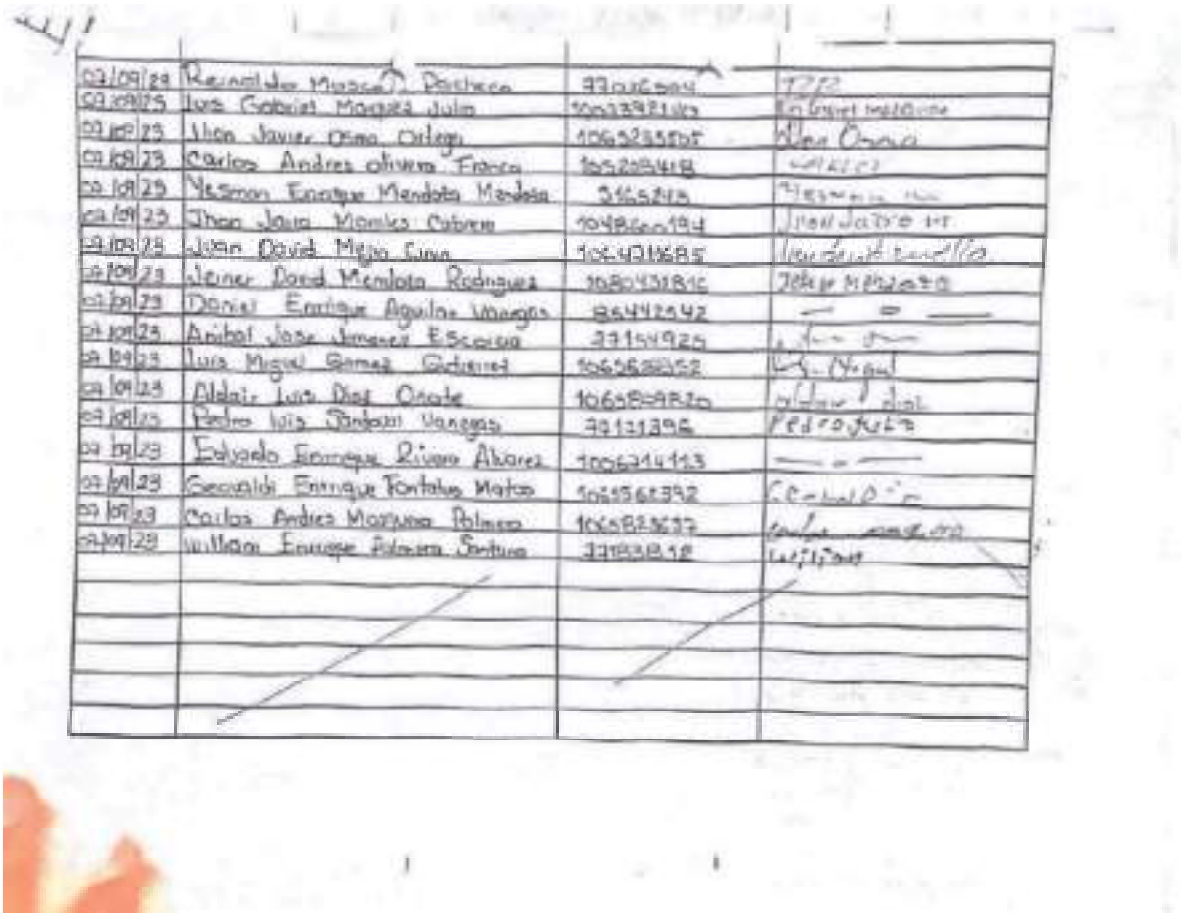

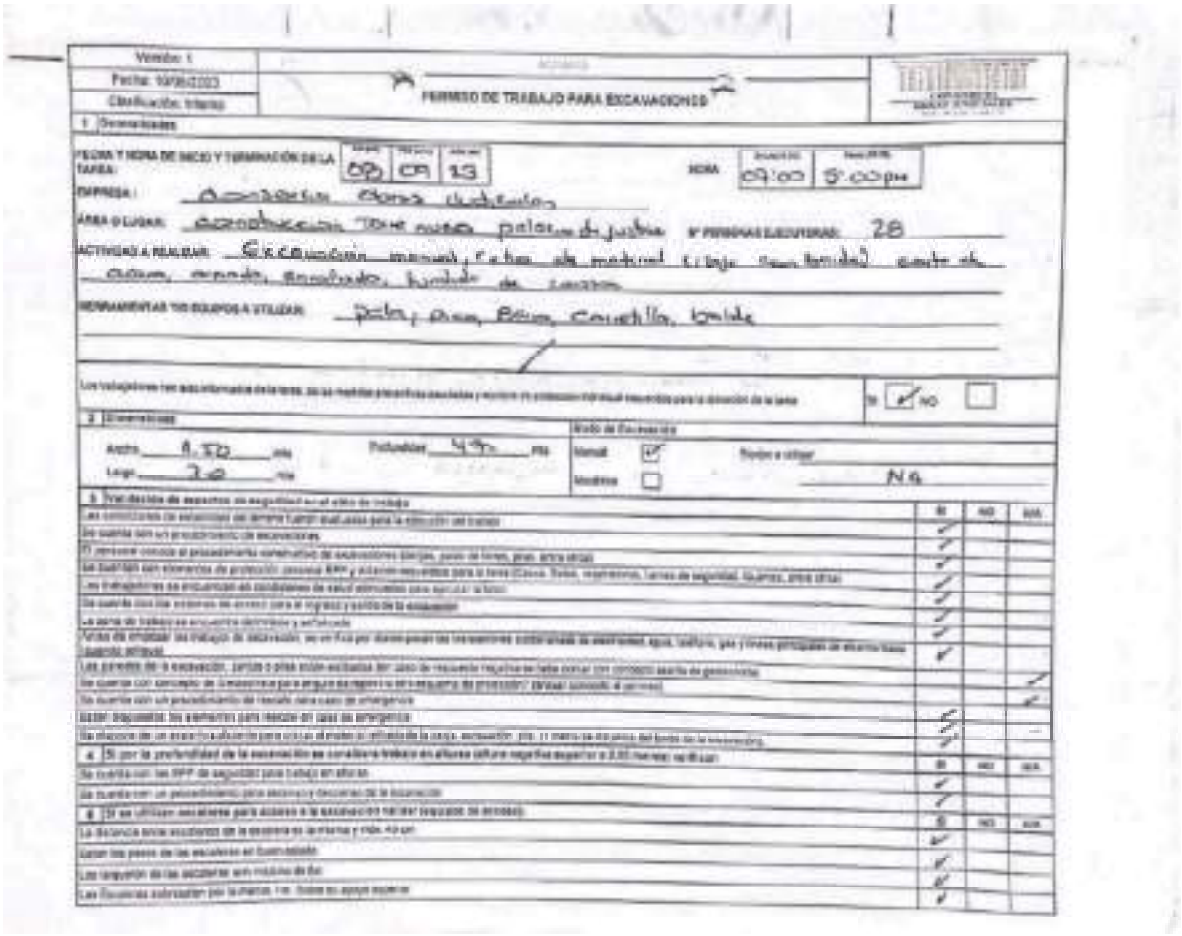


PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

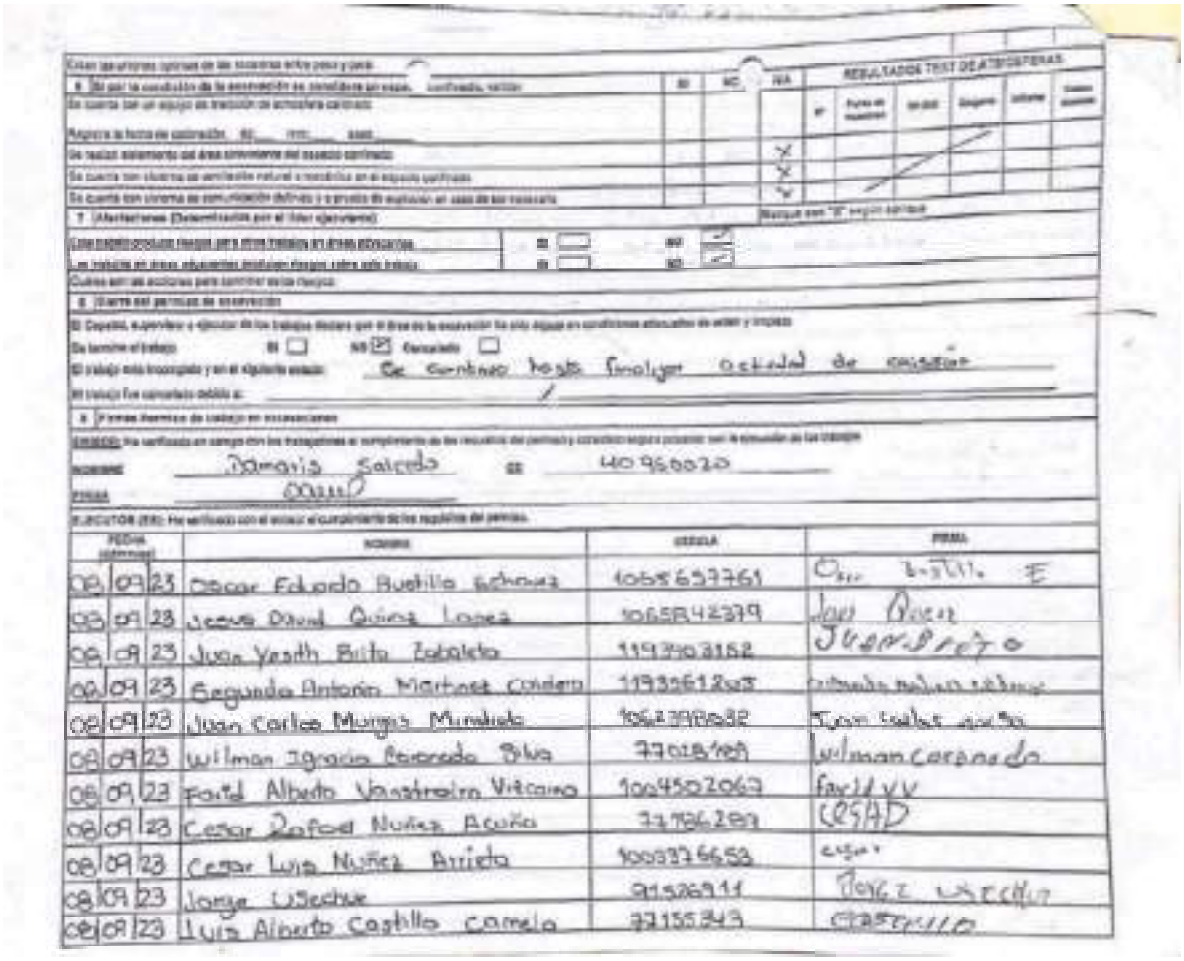

Damaris Salcedo 40960020

FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
08/09/23	Oscar Eduardo Bustillo Echeverz	1065637761	
08/09/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	
08/09/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193903162	
08/09/23	Segunda Antonia Martinez Cordero	1193561203	
08/09/23	Juan Carlos Munoz Mendoza	1064990882	
08/09/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	77018769	
08/09/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1064502063	
08/09/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186203	
08/09/23	Cesar Luis Nuñez Barrios	1003376653	
08/09/23	Jorge Urueta	91526911	
08/09/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	



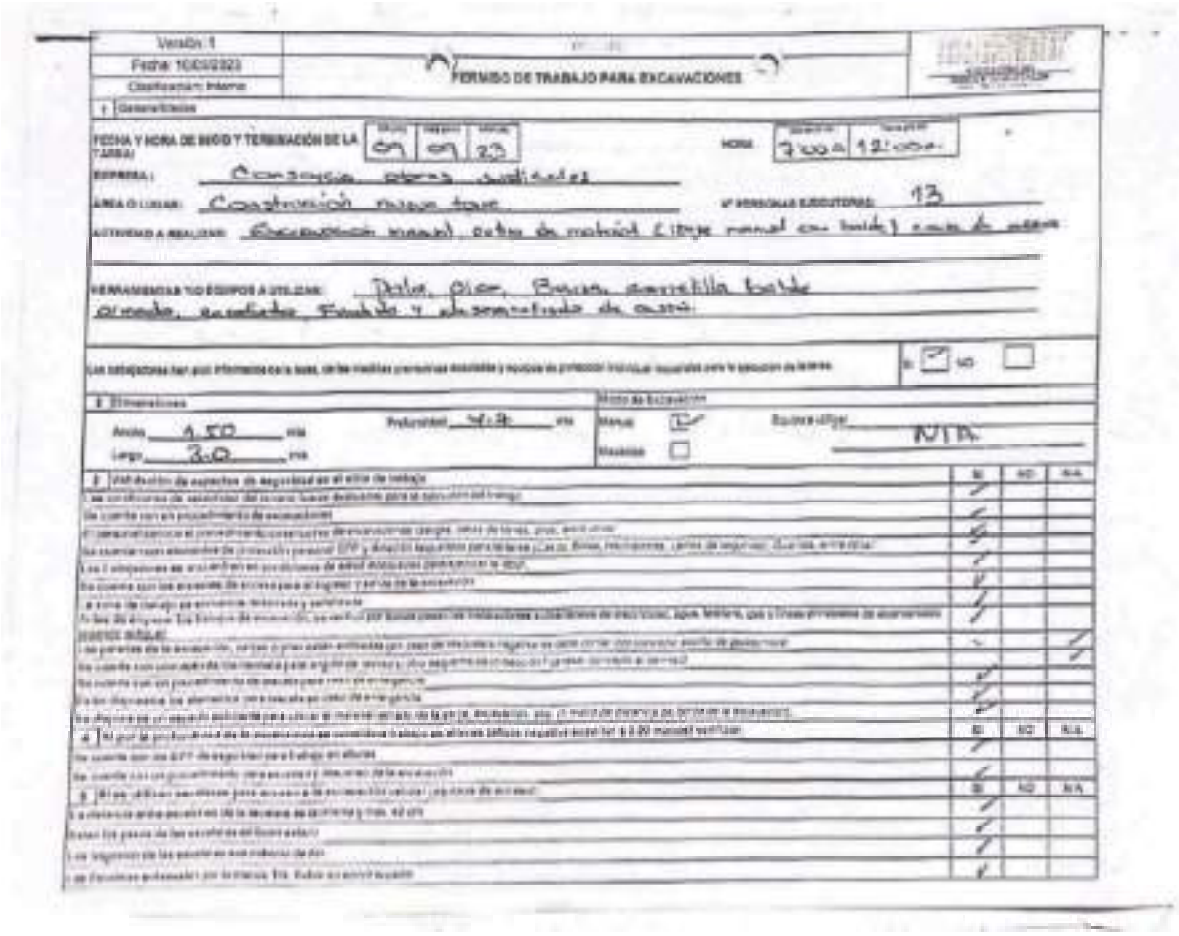

Versión: 1
Fecha: 10/03/2021
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 09 / 09 / 23 HORA: 7:00 a. 12:00 m.

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción nuevo tipo

Nº PERSONAS EJECUTORAS: 13

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual retiro de material (tipo rocoso con bordes cada 1.50 m)

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pica, barra, carretilla, botas, overol, guantes, gafas y almacenado de agua.


Las trabajadoras han sido informadas de los riesgos, de las medidas preventivas existentes y normas de protección incluidas en el plan de trabajo para la ejecución de labores: SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones


Ancho: 1.50 mts
Largo: 3.0 mts
Profundidad: 1.8 mts

Modo de excavación
Manual ☑
Mecánica ☐
Equipo utilizado: N/A

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Se cuenta con el procedimiento de excavaciones	✓		
Se cuenta con elementos de protección personal (EPP) y dotación requeridos para la labor (botas, overol, guantes, gafas de seguridad, casco, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para realizar la labor	✓		
Se cuenta con los equipos de emergencia en el lugar y zonas de excavación	✓		
Se cuenta con personal de vigía para el lugar de excavación	✓		
Se cuenta con puntos de ingreso y salida para el personal	✓		
Se cuenta con puntos de ingreso y salida para vehículos	✓		
Se cuenta con un plan de contingencia para emergencias	✓		
Se dispone de señalización adecuada para alertar al personal sobre los riesgos de excavación, así como para prevenir el ingreso de personas no autorizadas	✓		
4 Se verifica la presencia de la excavación se encuentra a menos de 2 metros de distancia de redes eléctricas, telefónicas, de gas o de alcantarillado	SI	NO	N/A
Se cuenta con un ATS de seguridad para el trabajo en altura	✓		
Se cuenta con un procedimiento de rescate y atención de accidentes	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceder a la excavación, estas cumplen con:	SI	NO	N/A
La escalera está anclada en la parte superior y sobresale 1 metro	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Las escaleras se encuentran en buenas condiciones	✓		
Las escaleras están en la misma excavación	✓		

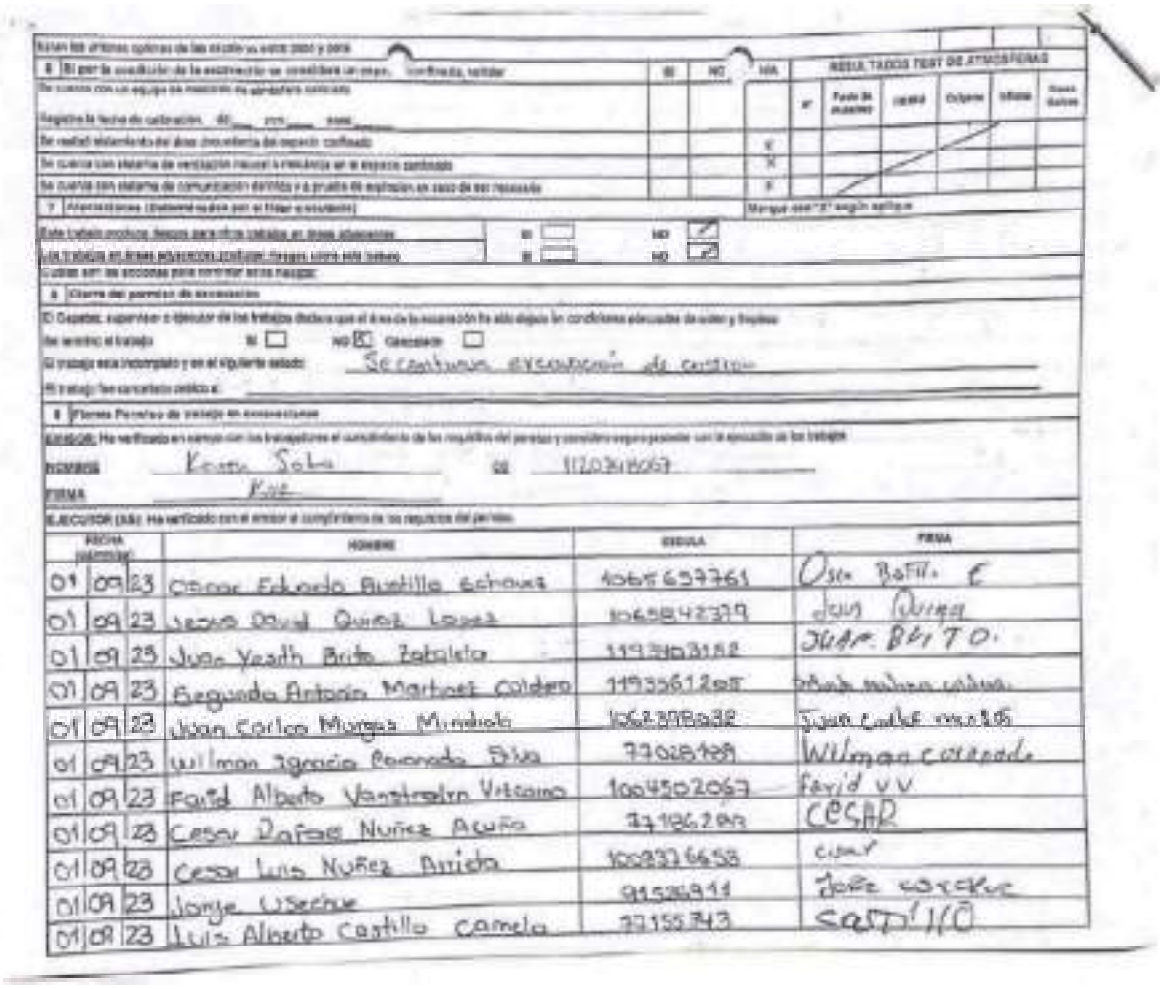

FECHA (planilla)			NOMBRE	CEDULA	FIRMA
01	09	23	Cesar Eduardo Bustillo Echeverri	1065657761	
01	09	23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	
01	09	23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193503188	
01	09	23	Segundo Antonio Martinez Caldero	1193561285	
01	09	23	Juan Carlos Monsalvo Mendoza	1062398832	
01	09	23	Wilmar Ignacio Coronado Silva	77028188	
01	09	23	Farid Alberto Vanstralen Victoria	1064502067	
01	09	23	Cesar Dañas Nuñez Acuña	77186203	
01	09	23	Cesar Luis Nuñez Barida	1002376658	
01	09	23	Jorge Useche	91526911	
01	09	23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155743	

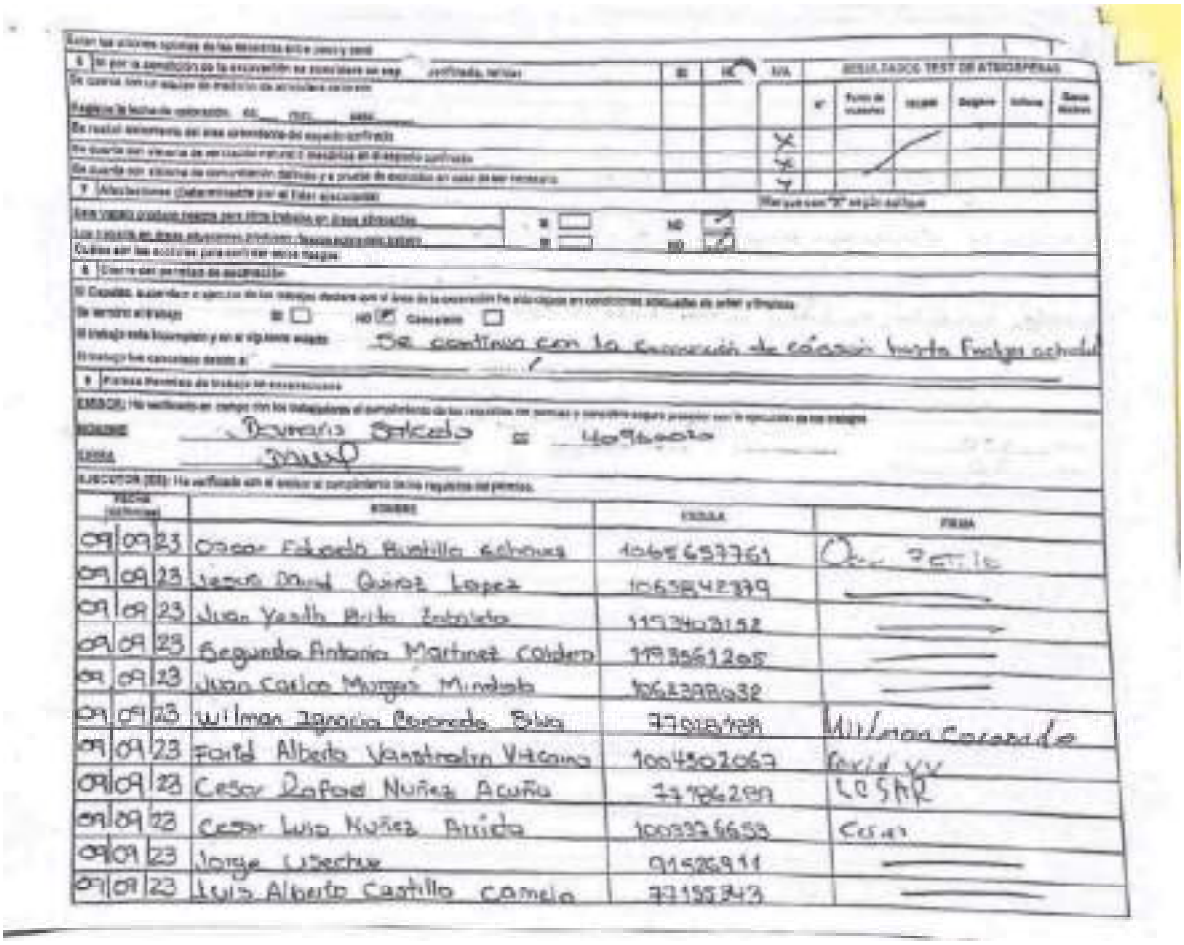



Se continua con la excavación de cárcamo hasta Progresiva actual

FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
09/09/23	Cesar Eduardo Bustillo Echeverry	1045657761	
09/09/23	Jesus David Ojeda Lopez	1065842379	
09/09/23	Juan Yesith Brito Estrada	1193403152	
09/09/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193661205	
09/09/23	Juan Carlos Munoz Mendoza	1063288038	
09/09/23	Wilmar Ignacio Redondo Silva	77018728	Wilmar Redondo
09/09/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1004502063	Farid VV
09/09/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186299	CESAR
09/09/23	Cesar Luis Nuñez Bruzda	1003336653	Cesar
09/09/23	Jorge Ustecho	91526911	
09/09/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77195343	





09/09/23	Reynaldo Marquez Pacheco	77026594	
09/09/23	Juan Gabriel Marquez Julio	1003592140	
09/09/23	Jhon Javier Cano Ortega	1065835505	Jhon Javier Cano O.
09/09/23	Carlos Andres Olivera Franco	1065869418	
09/09/23	Yeisson Enrique Mendoza Mendoza	8165245	Yeisson Mendoza
09/09/23	Jhon Jairo Montes Polanco	1065850194	
09/09/23	Juan David Mejia Cano	1064931685	Juan David Mejia C.
09/09/23	Jaiver David Mendoza Rodriguez	1065931816	
09/09/23	Daniel Enrique Aguilar Venegas	85473542	Daniel Aguilar
09/09/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	7715N925	
09/09/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065869852	
09/09/23	Alblair Luis Diaz Conde	1065899820	
09/09/23	Pedro Luis Sanchez Venegas	73121396	
09/09/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1065719713	Eduardo Rivera
09/09/23	Gerardo Enrique Fontalvo Mateo	1065866892	Gerardo F.
09/09/23	Carlos Andres Marquez Palmera	1065829637	
09/09/23	William Enrique Palmera Santana	73155812	William

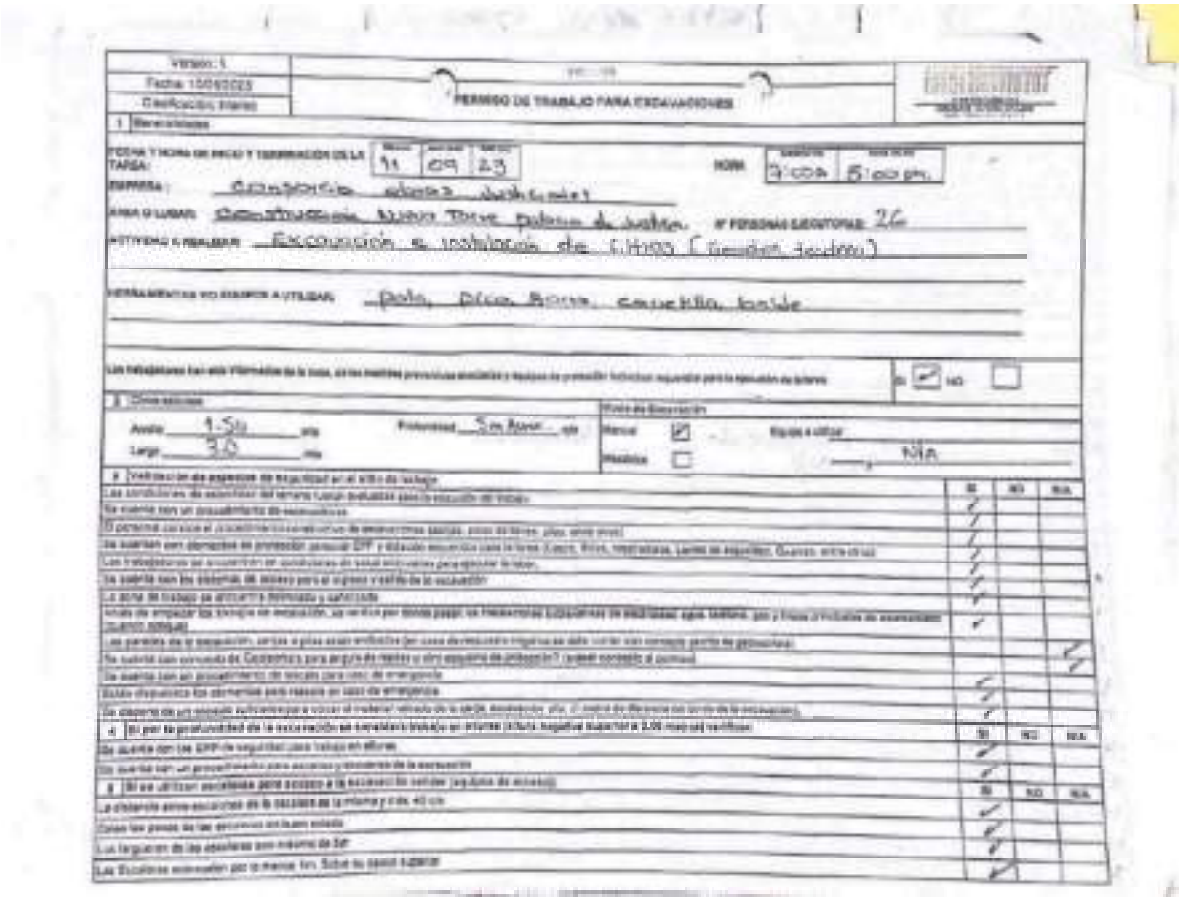

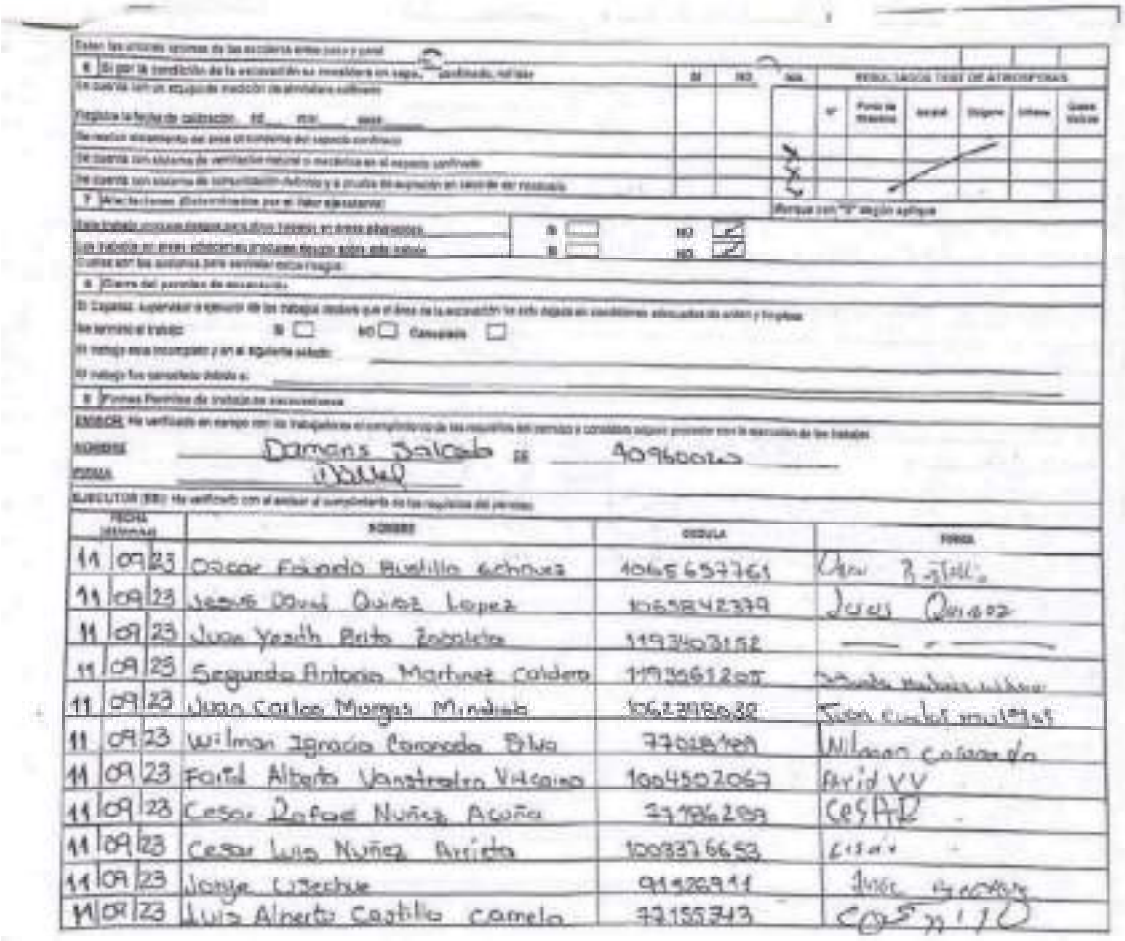

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
11/09/23	Oscar Eduardo Bustillo Echeverri	1065657761	
11/09/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	
11/09/23	Juan Yeath Brito Zabaleta	1193403158	
11/09/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193661205	
11/09/23	Juan Carlos Murgas Mendoza	1062818688	
11/09/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	77018769	
11/09/23	Farid Alberto Vanstralen Villalba	1064502067	
11/09/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	1193862093	
11/09/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003376653	
11/09/23	Jorge Cuchue	91526911	
11/09/23	Luis Alberto Castillo Camelo	72155343	

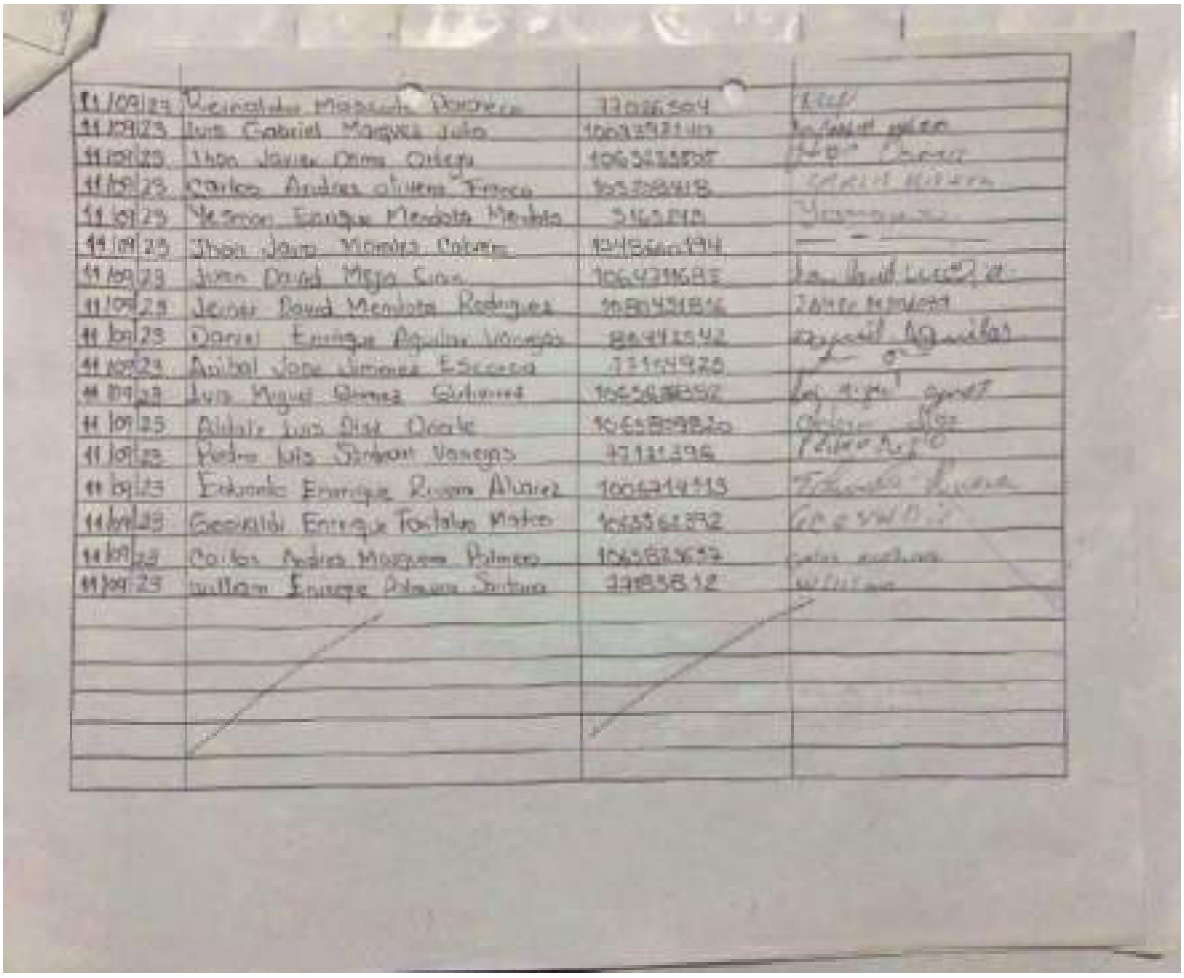

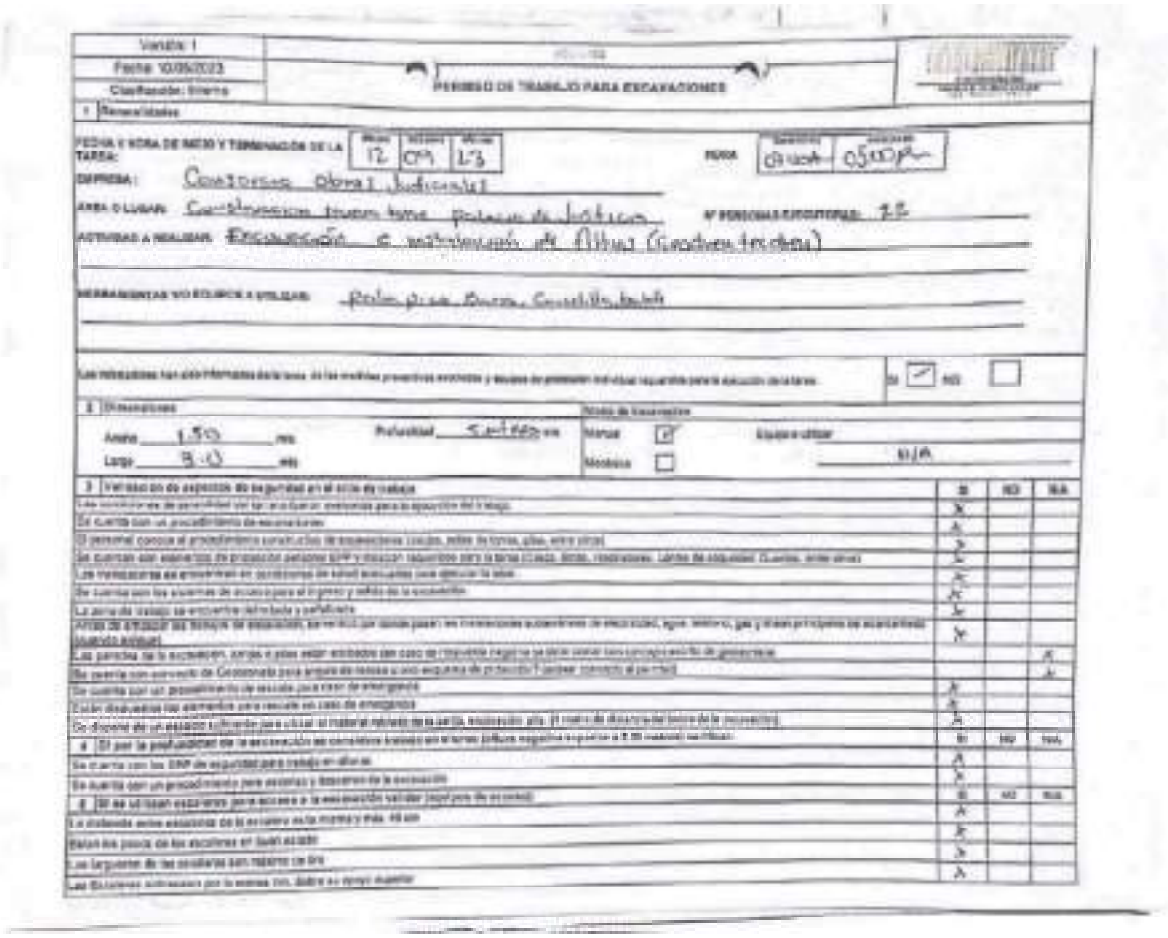

Versión: 1

Fecha: 10/05/2023

Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: Mes 12 Día 07 Año 23

HORA: 05:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción tercer piso Palacio de Justicia

N° PERSONAS EXPUESTAS: 25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de filtros (Cuadrilla tres obras)

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pulm. pica. Barra. Cuadrilla bobcat

Las indicadas han sido informadas durante una de las medidas preventivas existentes y medios de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea: SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts


Largo 3.00 mts

Profundidad 5.40 mts

Medio de excavación: Manual ☑ Mecánico ☐


Equipo a utilizar: N/A

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Los trabajadores de excavación son aptos para la ejecución del trabajo.	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavación.	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (cargas, sobre la torres, grúa, entre otras)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y ropa de trabajo requeridos para la tarea (Casco, botas, reflectivos, Líneas de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	X		
Se cuentan con los avisos de aviso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de iniciar las labores de excavación, se revisó (se deben pasar las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y drenaje principales de acuerdo con los planos suministrados)	X		
Las personas de la excavación, cargas y otras están ubicados con cero de movimiento seguro de grúa para evitar lesiones por operación de maquinaria			X
Se cuenta con servicio de Geotecnia para ampliar de manera o con equipos de protección (Cuidar talud de perfil)			X
Se cuenta con un procedimiento de escape para caso de emergencia	X		
Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para colocar el material retirado de la perfil excavación alto. (1 metro de distancia del borde de la excavación)	X		
4 Si por la profundidad de la excavación se requieren trabajos en el fondo (pilotes, negativos, superior a 1.20 material verificar)	SI	NO	NA
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en altura	X		
Se cuenta con un procedimiento para escalas y descenso de la excavación	X		
5 Si se utilizan escaleras para acceder a la excavación verificar (aplicable de acuerdo)	SI	NO	NA
La distancia entre escalones de la escalera esta menor y mas 40 cm	X		
Están las patas de las escaleras en buen estado	X		
Las largueros de las escaleras son reforzados con tira	X		
Las Escaleras sobresalen por la arena 1m, sobre el nivel superior	X		

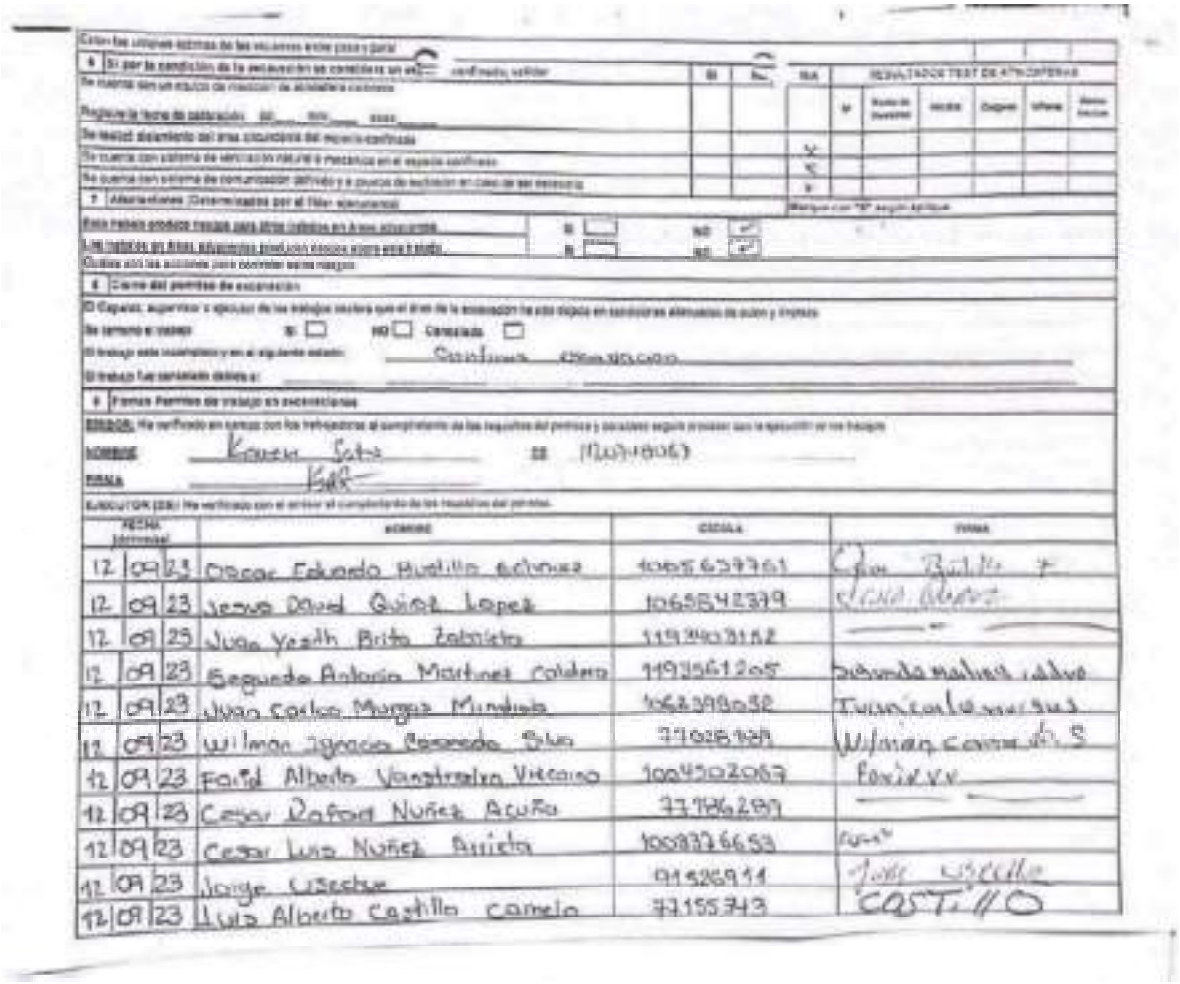

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
12/09/23	Oscar Eduardo Bustillo echeverri	1065639761	
12/09/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	
12/09/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193903182	
12/09/23	Segundo Antonio Martinez caldera	1193561205	
12/09/23	Juan carlos Murgas Mendoza	1063980858	
12/09/23	wilman Ignacio Redondo Silva	1102619129	
12/09/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1004502069	
12/09/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	1193862897	
12/09/23	Cesar Luis Nuñez Avilez	1003776653	
12/09/23	Jorge Ustariz	91526911	
12/09/23	Luis Alberto Castillo camelo	77155743	



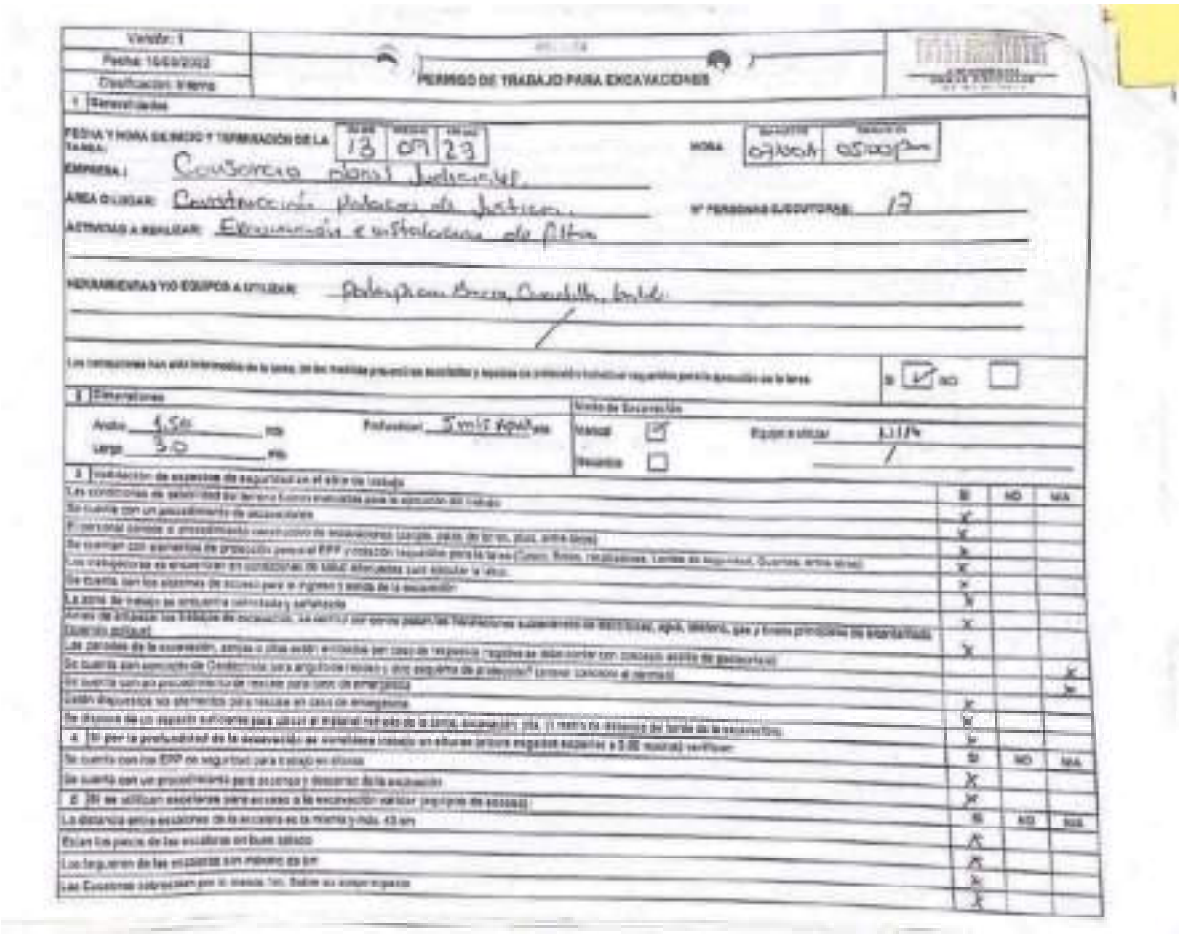

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

Versión: 1
Fecha: 14/09/2022
Clasificación: Interna

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 13 09 23
HORA: 07:30 a.m. 05:00 p.m.
EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales
ÁREA O LUGAR: Construcción palacios de Justicia
Nº PERSONAS EJECUTORAS: 12
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de pilas
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Retroexcavadora, Barra, Canastilla, Taladro


Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y aquellas en protección individual requeridas para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho: 1.50 m
Largo: 3.0 m
Profundidad: 5 mts aprox
Nivel de Excavación: Manual ☑ Mecánica ☐
Equipo a utilizar: Ninguno

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo

	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal cuenta con procedimiento seguro de excavaciones (cargue, pase de tierra, picar, entre otros)	X		
Se cuenta con elementos de protección personal EPP y colectiva requeridos para la tarea (Casco, Botas, Gafas, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la obra	X		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra señalizada	X		
Antes de ingresar los trabajos de excavación, se verifica con apoyo de herramientas suministradas en obra (pala, detector, gas y otros) presencia de estructuras (cuerpos enterrados)	X		
Las paredes de la excavación, zanjas o cilos están entibadas por cada de resistencia (aquellas se debe contar con concepto escrito de geotecnia)	X		
Se cuenta con escalera de Gato/rampa para ángulos rectos y otro sistema de protección? (anexar concepto de técnico)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia			X
Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila, (1 metro de distancia del borde de la excavación)	X		
a. Si por la profundidad de la excavación se requieren realizar en etapas (antes explicado superior a 2.00 metros) verificar:			
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	SI	NO	NA
Se cuenta con un procedimiento para acceso y descenso de la excavación	X		
b. Si se utilizan escaleras para acceder a la excavación señalar (requiere de escalas)	X		
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más 40 cm	SI	NO	NA
Están las patas de las escaleras en buen estado	X		
Los largueros de las escaleras son enteros sin fisuras	X		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su superficie	X		
	X		

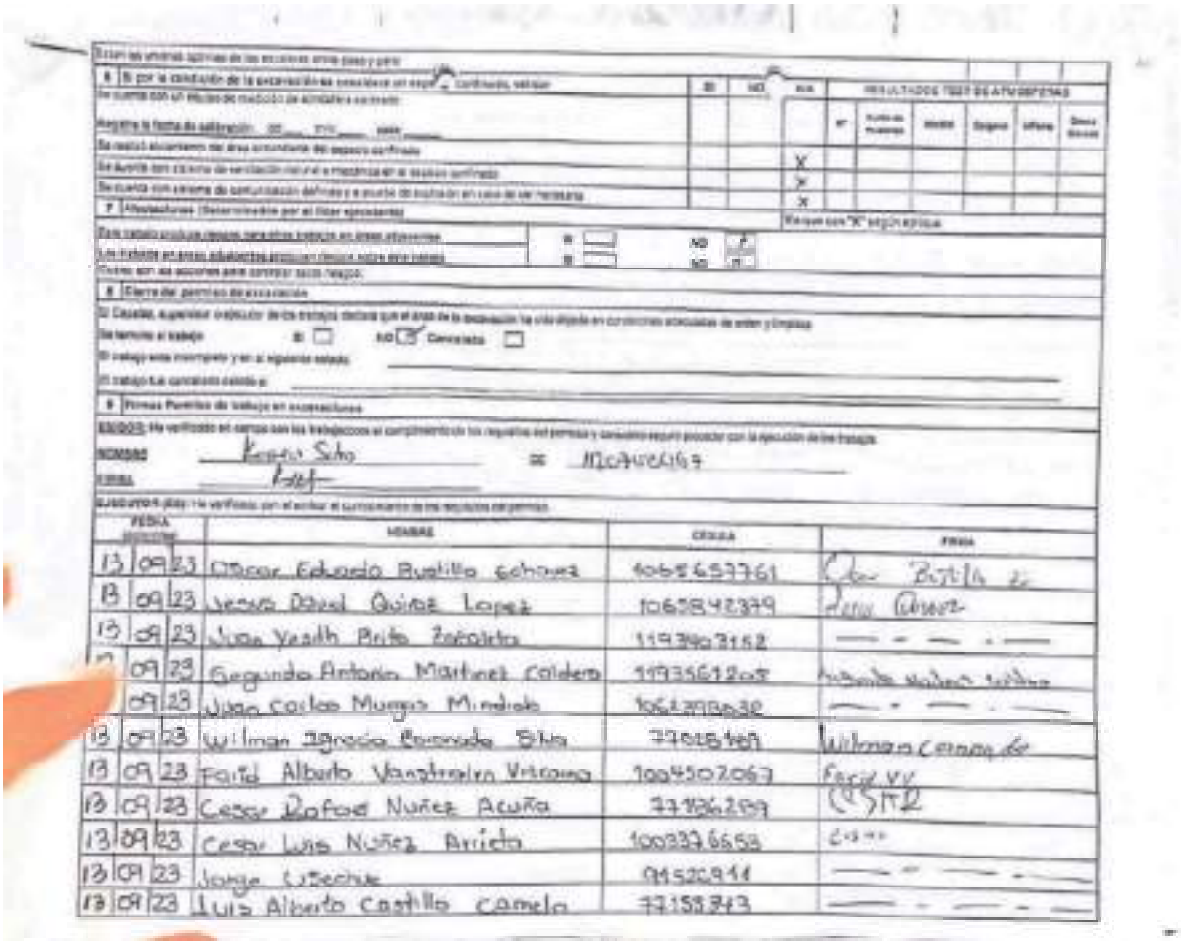


FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
13 09 23	Oscar Eduardo Bustillo Echeverri	1065657761	
13 09 23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	
13 09 23	Juan Yesith Brito Zapateiro	1193903152	
09 23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193561205	
09 23	Juan Carlos Munoz Miranda	1064708630	
13 09 23	Wilman Agresio Coronado Silva	77015169	
13 09 23	Farid Alberto Vanstralen Vitrano	1004502067	
13 09 23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77176299	
13 09 23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003376658	
13 09 23	Jorge Utreche	91520911	
13 09 23	Luis Alberto Castilla Camelo	77155343	

01/09/23	Reinaldo Manuel Pacheco	77026304	
01/09/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1003897403	
01/09/23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235595	
01/09/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052084118	
01/09/23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	5165245	
01/09/23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048660194	
01/09/23	Juan David Mejia Cuna	1064211686	
01/09/23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1050431816	
01/09/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85443542	
01/09/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	73154925	
01/09/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065628892	
01/09/23	Alcides Luis Diaz Conde	1065809820	
01/09/23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	73131395	
01/09/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006214113	
01/09/23	Geovanni Enrique Fontalvo Matos	1065566392	
01/09/23	Carlos Andres Monsalvo Palomino	1065823637	
01/09/23	William Enrique Palmera Santana	73183812	
0			



12/09/23	Reinaldo Manuel Pacheco	77026884	
13/09/23	Juan Gabriel Marquez Julio	1063392143	
13/09/23	Ivan Javier Oona Colega	1065235595	
13/09/23	Carlos Andres olivera Franco	1065282413	
13/09/23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	3165249	
13/09/23	Jhon Jairo Montes Cabrera	1042866194	
13/09/23	Juan David Mejia Cano	1064731695	
13/09/23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1065431816	
13/09/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85442542	
13/09/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	73154925	
13/09/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065585652	
13/09/23	Abdiel Luis Diaz Conde	1065899820	
13/09/23	Pedro Luis Barbosa Vanegas	73131396	
13/09/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006214113	
13/09/23	Gerardo Enrique Fontalvo Matos	1065568392	
13/09/23	Carlos Andres Montero Palmera	1065885637	
13/09/23	William Enrique Palmera Barbosa	73089812	

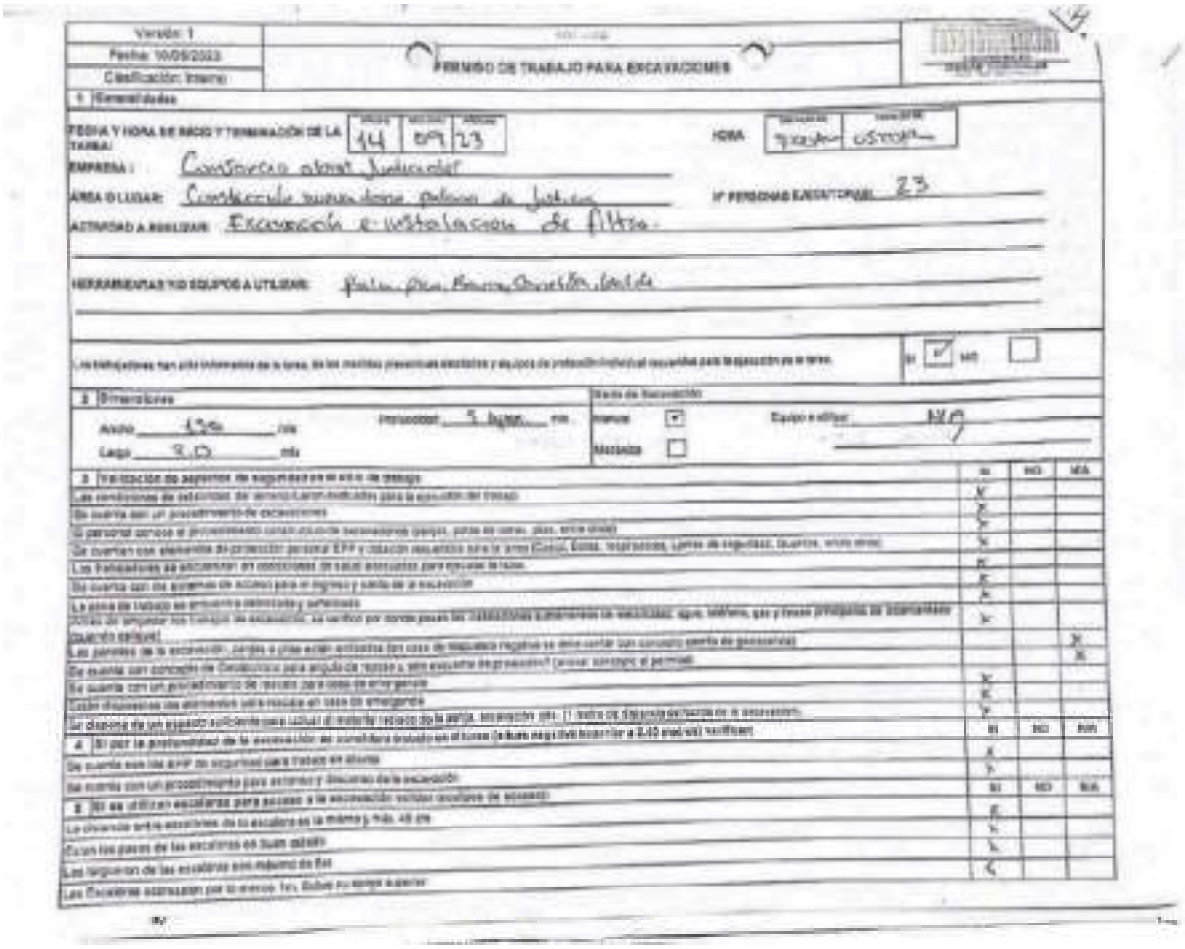

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

Versión: 1
Fecha: 10/09/2003
Clasificación: Interna

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 14 / 09 / 23

HORA: 7:30 am — 05:00 pm

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

AREA O LUGAR: Construcción nueva sede palacio de Justicia

N° PERSONAS EJECUTORAS: 23

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de filtro.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Palas, picas, Barra, Guantes, botas

Las instalaciones han sido informadas de la tarea, de los riesgos prevenibles existentes y alguna de protección individual requerida para la ejecución de la tarea. SI [x] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho: 1.50 mts


Largo: 9.0 mts

Profundidad: 5 hasta mts

Sitio de excavación: manual [x] Mecánica [ ]

Equipo a utilizar: N/A


	SI	NO	N/A
3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo			
Las condiciones de estabilidad del terreno (zanjas inestables) para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal cercano al procedimiento cuenta con los elementos necesarios (guayas, palas de cavar, picas, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requerida para la zona (Cascos, botas, respiradores, gafas de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la tarea.	X		
Se cuenta con los accesos de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verifico por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, telefonía, gas y tomar precauciones de seguridad (cuerpo cercano)	X		
Las paredes de la excavación, cuando a ella estén entrando los casos de seguridad negativa se debe contar con concreto pared de geosintético			X
Se cuenta con concepto de Geotécnico para ángulo de reposo y otro elemento de protección? (anexar concepto o permiso)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate por si ocurre de una persona	X		
Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación (ej.: 1 metro de distancia mínima de la excavación)	X		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en el cruce (altura negativa superior a 2.40 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para entrada y descenso de la excavación	X		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación verificar condiciones de acceso:	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más de 40 cm	X		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	X		
Las longitudes de las escaleras son mayores de 6m	X		
Las Escaleras sobrepasan por lo menos 1m. sobre su borde superior	X		

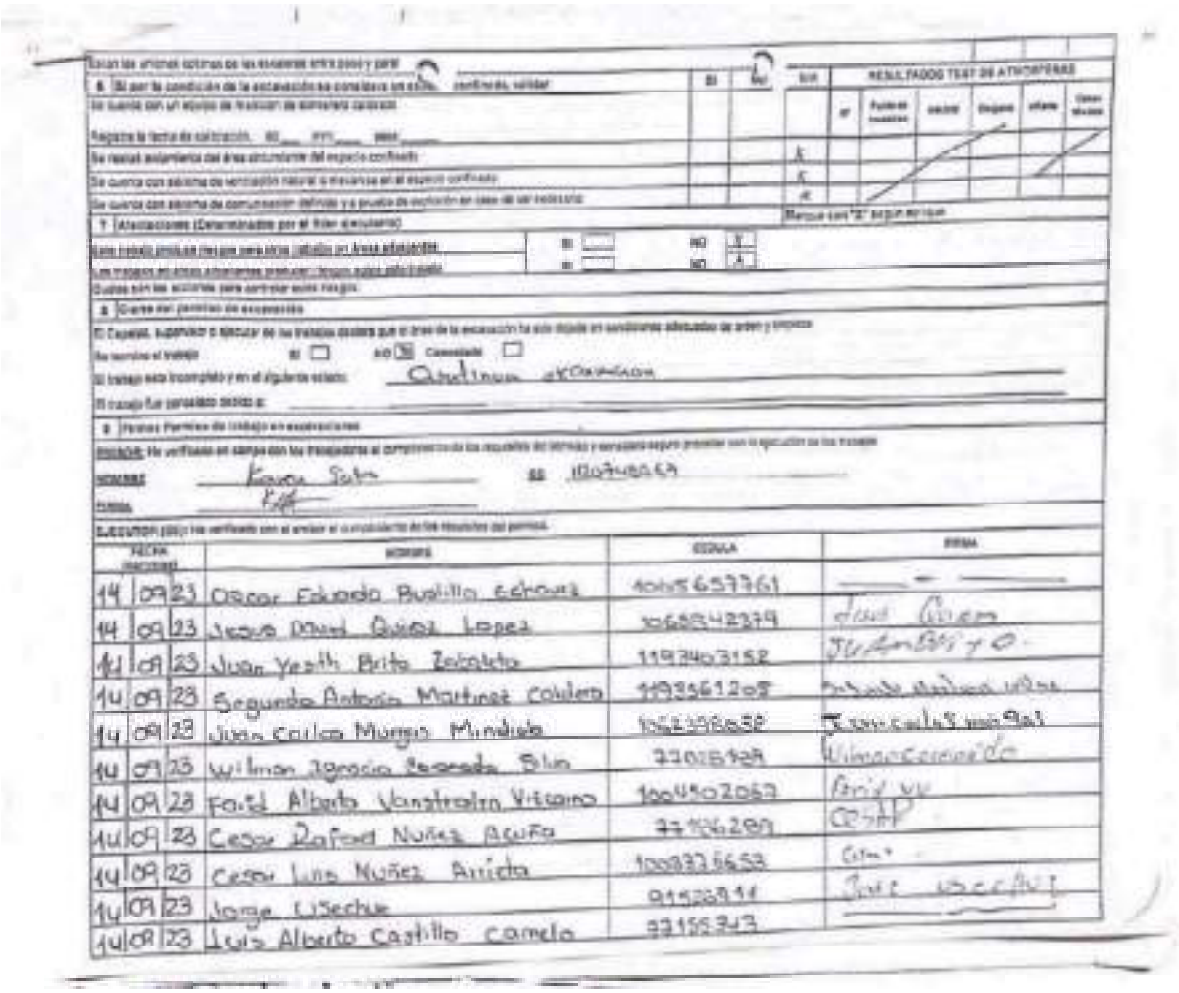


FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
14/09/23	Oscar Eduardo Bustillo echeverri	1045657761	
14/09/23	Jesus David Quiroz Lopez	1068042379	
14/09/23	Juan Yesith Brito Zapateta	1193403152	
14/09/23	Segundo Antonio Martinez Coulero	1193561208	
14/09/23	Juan Carlos Murgas Mendieta	1063398658	
14/09/23	Wilman Ignacio Resenda Silva	72015429	
14/09/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1064902063	
14/09/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77176209	
14/09/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003736653	
14/09/23	Jorge Useche	91520911	
14/09/23	Luis Alberto Castillo Camelo	92155343	



14/09/23	Reinaldo Mario Pacheco	77085904	
14/09/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1003982140	
14/09/23	Jhon Javier Oma Ortega	1065235505	
14/09/23	Carlos Andres oliveira Franco	1052084119	
14/09/23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	5165245	
14/09/23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048660194	
14/09/23	Juan David Mejia Cano	1064316685	
14/09/23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1080431816	
14/09/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85492542	
14/09/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	
14/09/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065628052	
14/09/23	Aldair Luis Diaz Conde	1065899820	
14/09/23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	77171496	
14/09/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1065714113	
14/09/23	Geovanis Enrique Fontalvo Matos	1065568892	
14/09/23	Carlos Andres Marquez Palmera	1065883637	
14/09/23	William Enrique Palmera Santana	77189312	

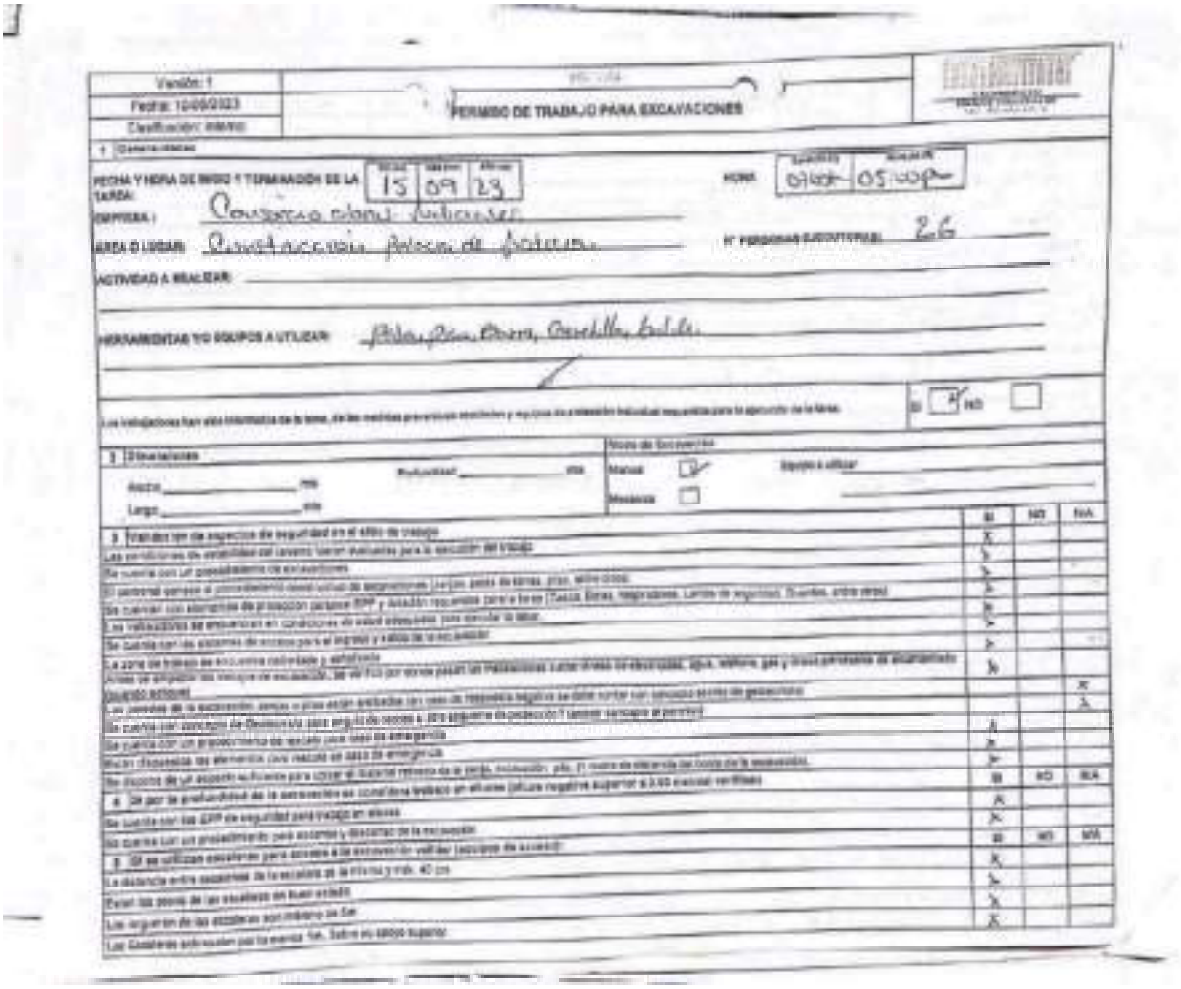


PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

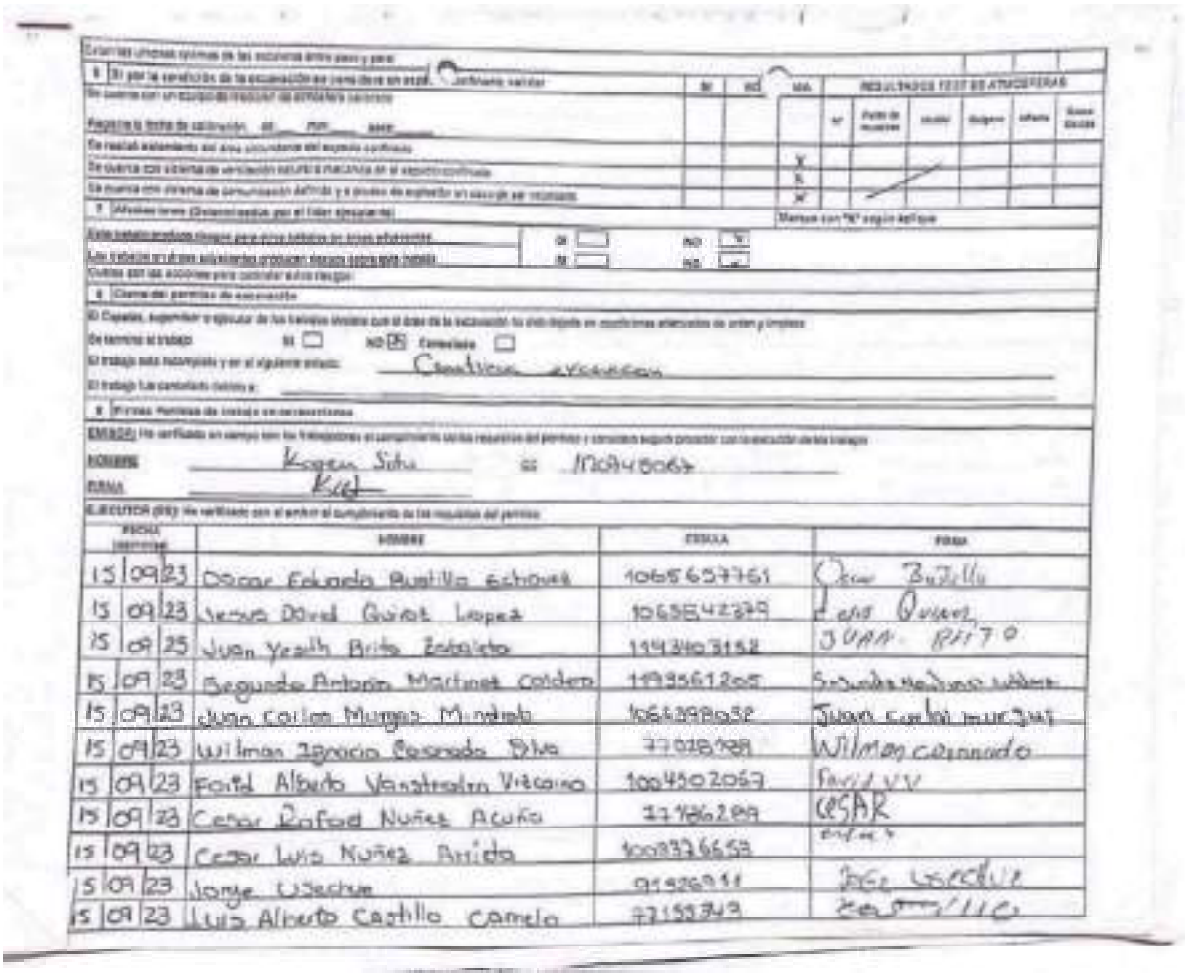

FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
15/09/23	Oscar Eduardo Bustillo echeverri	1065657761	Oscar Bustillo
15/09/23	Jesus David Guiot Lopez	1065542379	Jesus Guiot
15/09/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1143403152	JUAN BRITO
15/09/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	Segundo Martinez
15/09/23	Juan Carlos Murgas Montalvo	1064998052	Juan Carlos Murgas
15/09/23	Wilmar Ignacio Coronado Silva	77028788	Wilmar Coronado
15/09/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1004502057	Farid VV
15/09/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186289	CESAR
15/09/23	Cesar Luis Nuñez Barida	1003376653	
15/09/23	Jorge Ustariz	91926911	Jorge Ustariz
15/09/23	Luis Alberto Castillo Camelo	73155343	Castillo



15/09/23	Reinaldo Manuel Pacheco	77026504	
15/09/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1003931143	
15/09/23	Ivan Javier Otero Ortega	1065835505	
15/09/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052084418	
15/09/23	Yesman Enrique Mendoza Medina	3165243	
15/09/23	Juan Jose Montes Cabrera	1048660194	
15/09/23	Juan David Mejia Cuna	1064731685	
15/09/23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1080431836	
15/09/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	1064825142	
15/09/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	
15/09/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065628652	
15/09/23	Aldair Luis Diaz Conde	1065809820	
15/09/23	Pedro Luis Sanchez Vanegas	77121396	
15/09/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	
15/09/23	Gerardo Enrique Fontalvo Mejia	1065562392	
15/09/23	Carlos Andres Marquez Palmera	1065823637	
15/09/23	William Enrique Palmera Santana	77030812	

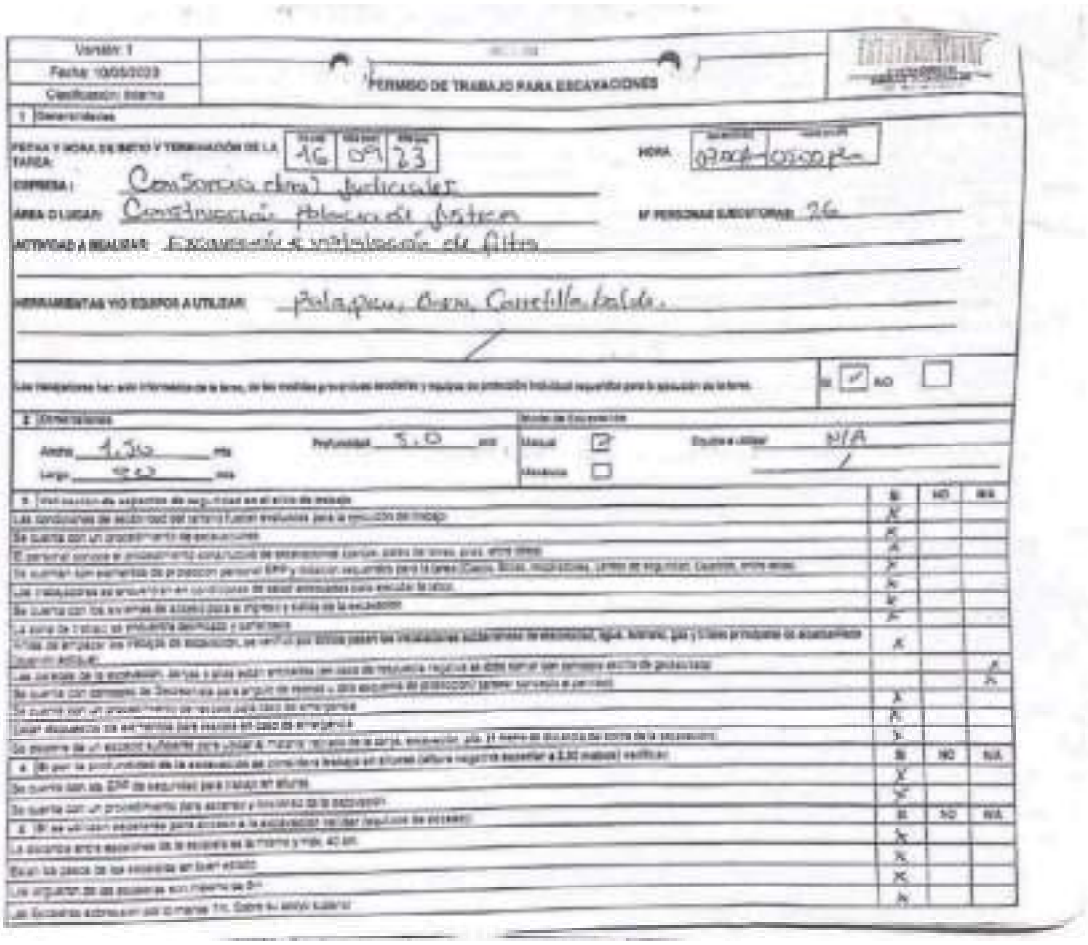

PERMISO DE TRABAJO PARA ESCAVACIONES

Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interna

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 16 09 23

HORA: 07:00 A.M. - 05:00 P.M.

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

AREA O LUGAR: Construcción palacio de justicia

N° PERSONAS EJECUTORAS: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación de cimentación de filtro

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Palas, picas, Carretilla, botellón.


Las inspecciones han sido informadas de la tarea, de las medidas preventivas existentes y requisitos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [✓] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho: 1.30 mts
Largo: 12.43 mts
Profundidad: 5.0 mts

Modo de Excavación: Manual [✓] Mecánica [ ]
Equipo a utilizar: N/A


3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavación	X		
El personal cuenta el procedimiento constructivo de excavaciones cercas antes de iniciar para este tipo	X		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y colectiva requeridos para la tarea (Casco, botas, respiradores, gafas de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Las instalaciones se encuentran en condiciones de aseo adecuadas para ejecutar la labor	X		
Se cuenta con las escaleras de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de empezar las labores de excavación, se verificó por entidad pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, telefonía, gas y otras principales en el cruzamiento (marcar con X)	X		
Las paredes de la excavación, tienen o serán sujetas en caso de requerirlo a algún tipo de sistema de protección (apeos, tablestacados o pantallas)			X
Se cuenta con elementos de Señalización para el ingreso de vehículos y otro equipo de protección (apeos, tablestacados o pantallas)			X
Se cuenta con un plan de rescate para caso de emergencia	X		
Existe disponibilidad de extintores para evacuar en caso de emergencia	X		
Se dispone de un equipo suficiente para evitar la inundación de la zona de la excavación	X		
4 En caso de profundidades de la excavación se considera trabajo en altura (altura requerida superior a 1.50 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en altura	X		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	X		
5 En las actividades requeridas para acceso a la excavación se dan requisitos de ascenso:	SI	NO	N/A
La escalera está separada de la excavación en la mitad y más de 60 cm.	X		
Están las patas de las escaleras en buen estado	X		
Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre el borde superior	X		
Las escaleras están en la mitad 1m. Sobre el borde superior	X		

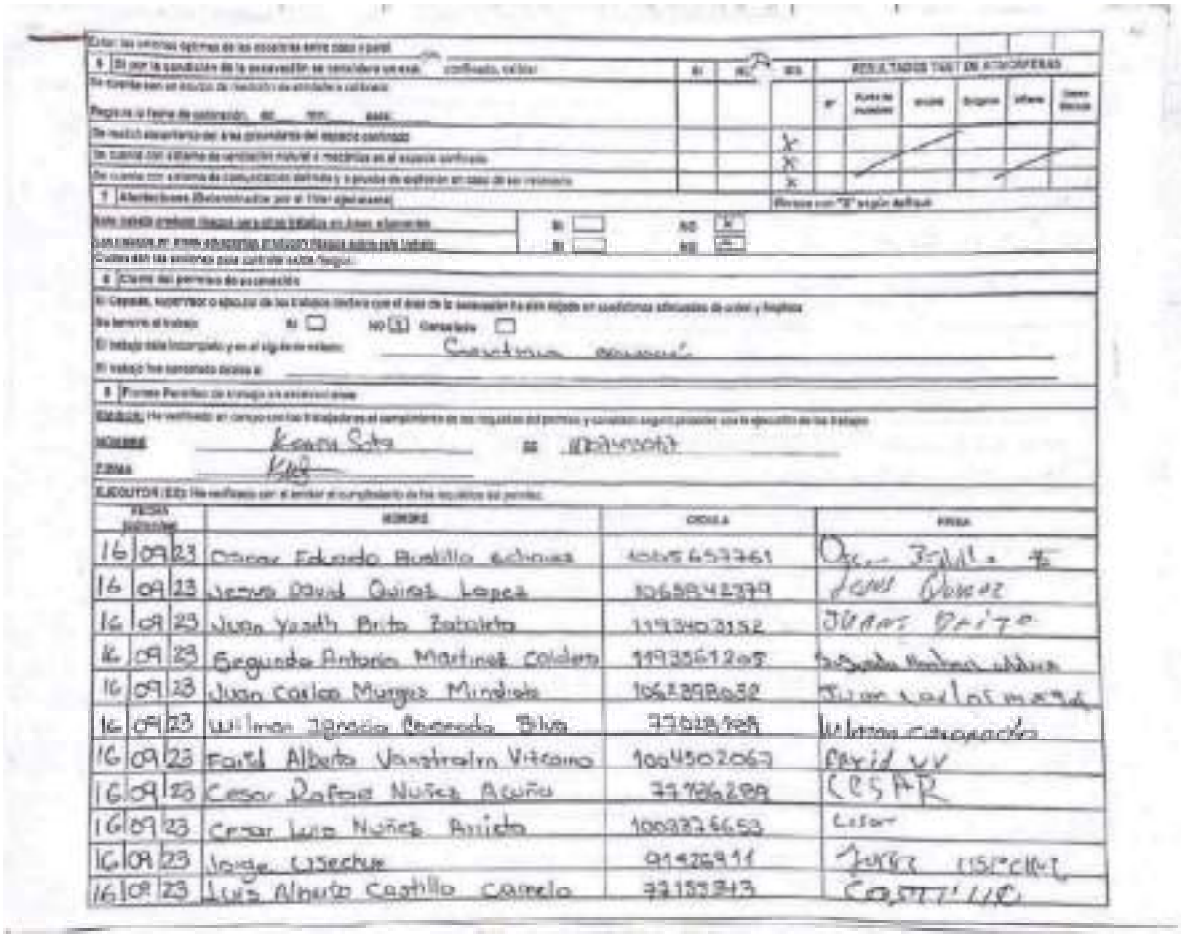

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
16/09/23	Oscar Eduardo Bustillo Echeverri	1014657361	
16/09/23	Jeison David Quiroz Lopez	1068842379	
16/09/23	Juan Yeath Brito Zabaleta	1193403152	
16/09/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	
16/09/23	Juan Carlos Murgas Mendoza	1062898032	
16/09/23	William Ignacio Coronado Silva	77028908	
16/09/23	Farid Alberto Vanstralen Viloria	1064502063	
16/09/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77086289	
16/09/23	Cesar Luis Nuñez Bustos	1003326653	
16/09/23	Jorge Usecheu	91426911	
16/09/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77153313	



16/09/23	Reynaldo Manuel Pacheco	77086204	
16/09/23	Luis Gabriel Maestre Julio	1003998140	
16/09/23	Jhon Jairo Osma Ortega	1065285505	
16/09/23	Carlos Andres olivera Franco	1065809418	
16/09/23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	3165245	
16/09/23	Jhon Jairo Montes Cabrera	1048660194	
16/09/23	Juan David Mejia Cano	1064235683	
16/09/23	Jenner David Mendoza Rodriguez	1080431836	
16/09/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	86442542	
16/09/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	73154929	
16/09/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065628852	
16/09/23	Aldair Luis Diaz Conde	1065809820	
16/09/23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	73131396	
16/09/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006214113	
16/09/23	Geovanis Enrique Fontalvo Mateo	1065862392	
16/09/23	Carlos Andres Manjarres Palmera	1065823632	
16/09/23	William Enrique Palmera Santana	73153818	

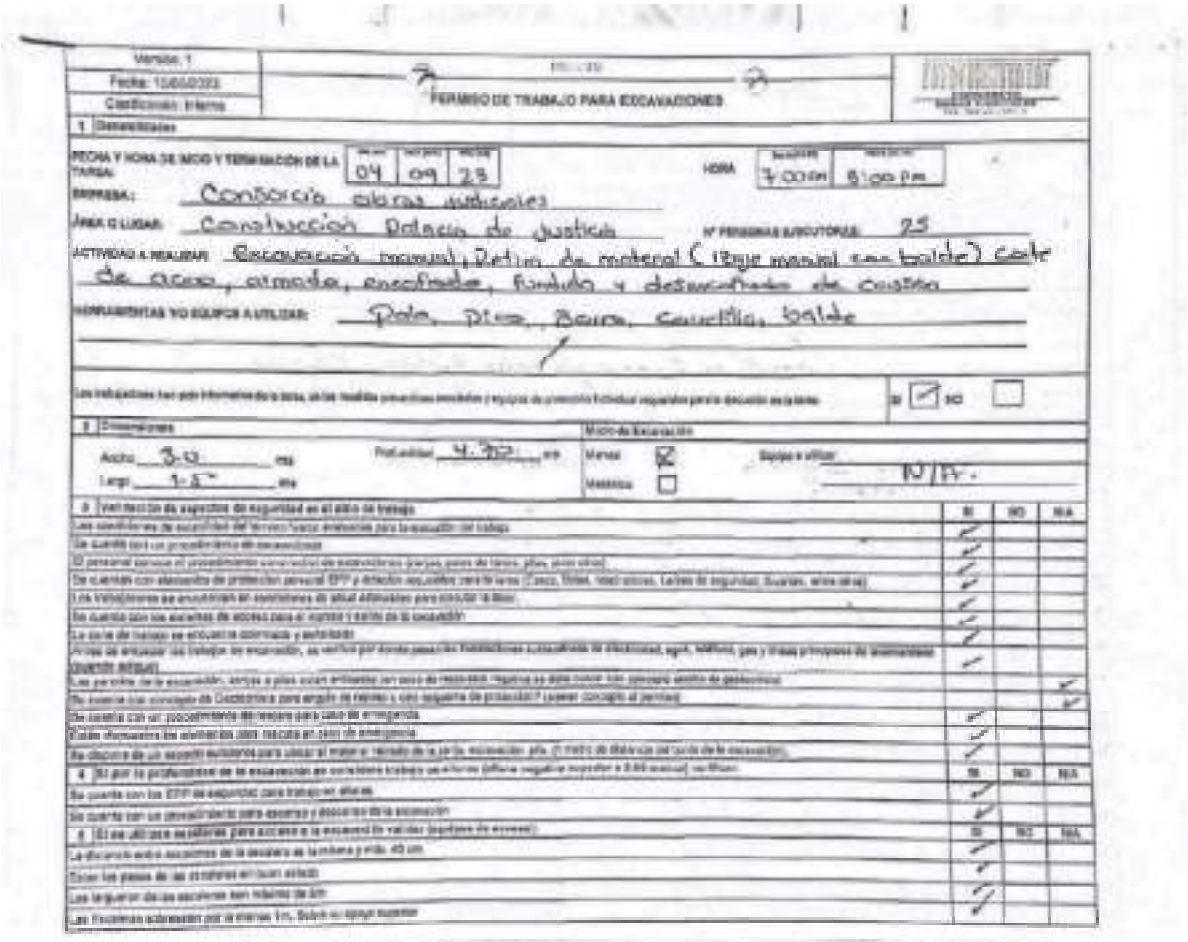

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 04 09 25 — HORA 7:00 am 5:00 pm

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual, Retiro de material (Viaje manual con balde) corte de acero, armado, encofrado, fundida y desencofrado de cuñas

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, balde


Las indicaciones han sido informadas de la tarea, así de: medidas preventivas necesarias y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea — SI ☑ NO ☐


2 Dimensiones

Ancho: 3.0 mts — Profundidad: 4.352 mts — Largo: 1.5" mts

Modo de Excavación: Manual ☒ Mecánica ☐ — Equipo a utilizar: N/A

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de seguridad del terreno hacia alrededores para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con los procedimientos de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento seguro antes de excavaciones (parejas para de tareas, pitos, pitos silbat)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación adecuados para la tarea (casco, botas, visor oscuro, Lentes de seguridad, Guantes, arnés de seg)	✓		
Las Vallas/cintas se encuentran en condiciones de aptitud adecuadas para colocar la tarea	✓		
Se cuenta con los accesos de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar las trabajos de excavación, se verifica por donde pasan las instalaciones (Localización de electricidad, agua, teléfono, gas y otras) principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, arriba a pies están entibadas (en caso de necesitar registro se debe contar con personal experto en geotecnia)			✓
Se cuenta con concepto de Geotécnico para ángulo de reposo y con seguridad de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están informados los contratistas para reacción en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un soporte auxiliares para ubicar al mismo a través de la pared excavación. p/e: (1 metro de distancia del borde de la excavación)	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se requieren trabajos verticales (altura negativa superior a 3.00 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un personal entrenado para rescates y evacuación de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (aplican de acceso):	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y mide 40 cm	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Las largueros de las escaleras son iguales de 3m	✓		
Las escaleras sobresalen por lo menos 1m, sobre su apoyo superior	✓		

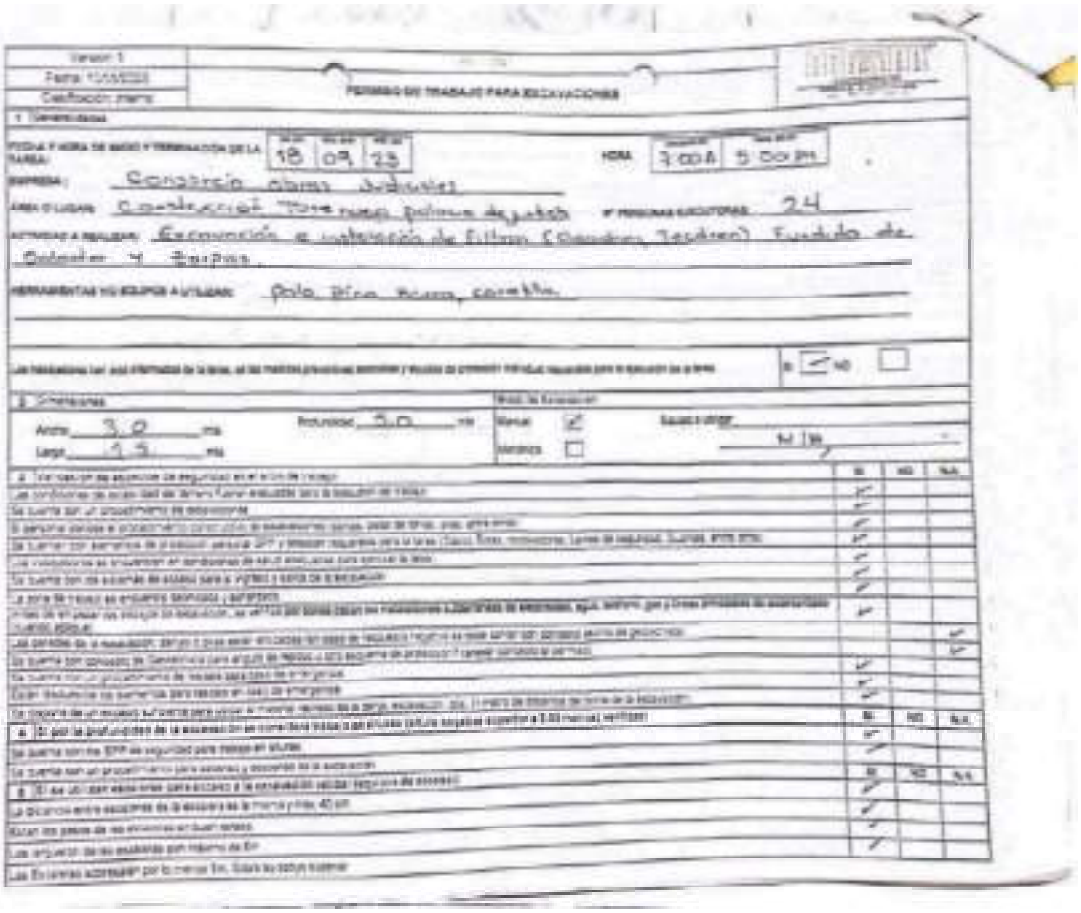

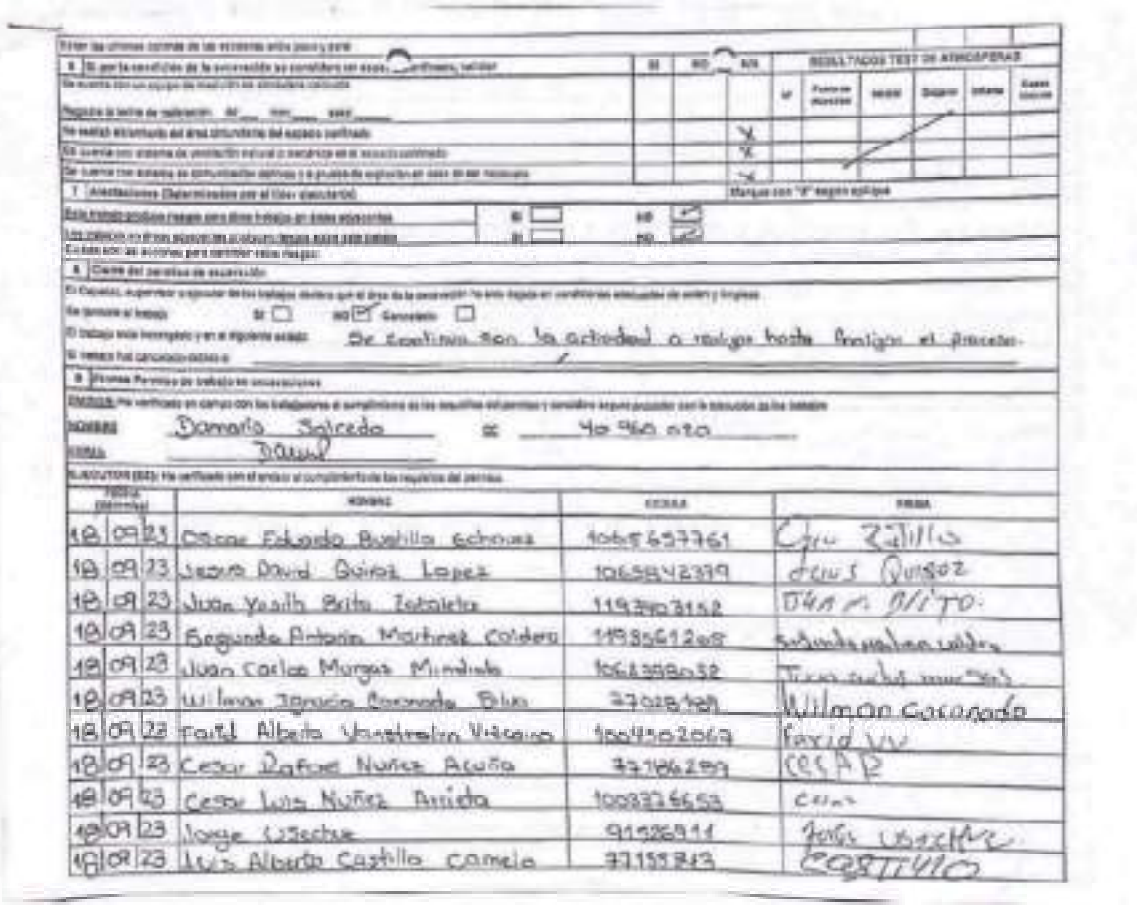


Damaris Salcedo — 40 960 010

18	09	23	Oscar Eduardo Bustillo Echevas	1065637761	Oscar Bustillo
18	09	23	Jesus David Guiraz Lopez	1065842339	Jesus Guiraz
18	09	23	Juan Yesith Brito Istaleta	1193903152	Juan Brito
18	09	23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561208	Segundo Martinez
18	09	23	Juan Carlos Murgas Mendoza	1063998032	Juan Carlos Murgas
18	09	23	Wilman Ignacio Coronado Blas	37018168	Wilman Coronado
18	09	22	Farid Alberto Ynastroza Vizcaino	1065902069	Farid Vv
18	09	23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	37196299	CESAR
18	09	23	Cesar Luis Nuñez Avida	1003336653	Cesar
18	09	23	Jorge Ustache	91128911	Jorge Ustache
18	09	23	Luis Alberto Castillo Camelo	37155343	Castillo



18/09/23	Reinaldo Manuel Pacheco	37026564	
18/09/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1063892143	
18/09/23	Ibon Javier Oma Ortega	1065235505	
18/09/23	Carlos Andres olivera Franco	1052084118	
18/09/23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	3165245	
18/09/23	Ibon Jairo Montes Cabrera	1048644194	
18/09/23	Juan David Mejia Cano	1054711685	
18/09/23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1090431816	
18/09/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	86452442	
18/09/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77164925	
18/09/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065628652	
18/09/23	Aldair Luis Diaz Conde	1065879820	
18/09/23	Pedro Luis Sanjuan Vanegas	77111396	
18/09/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	
18/09/23	Geovaldi Enrique Fontalvo Matos	1065566892	
18/09/23	Carlos Andres Marquez Polanco	1065829637	
18/09/23	William Enrique Palmera Santana	3318338 12	

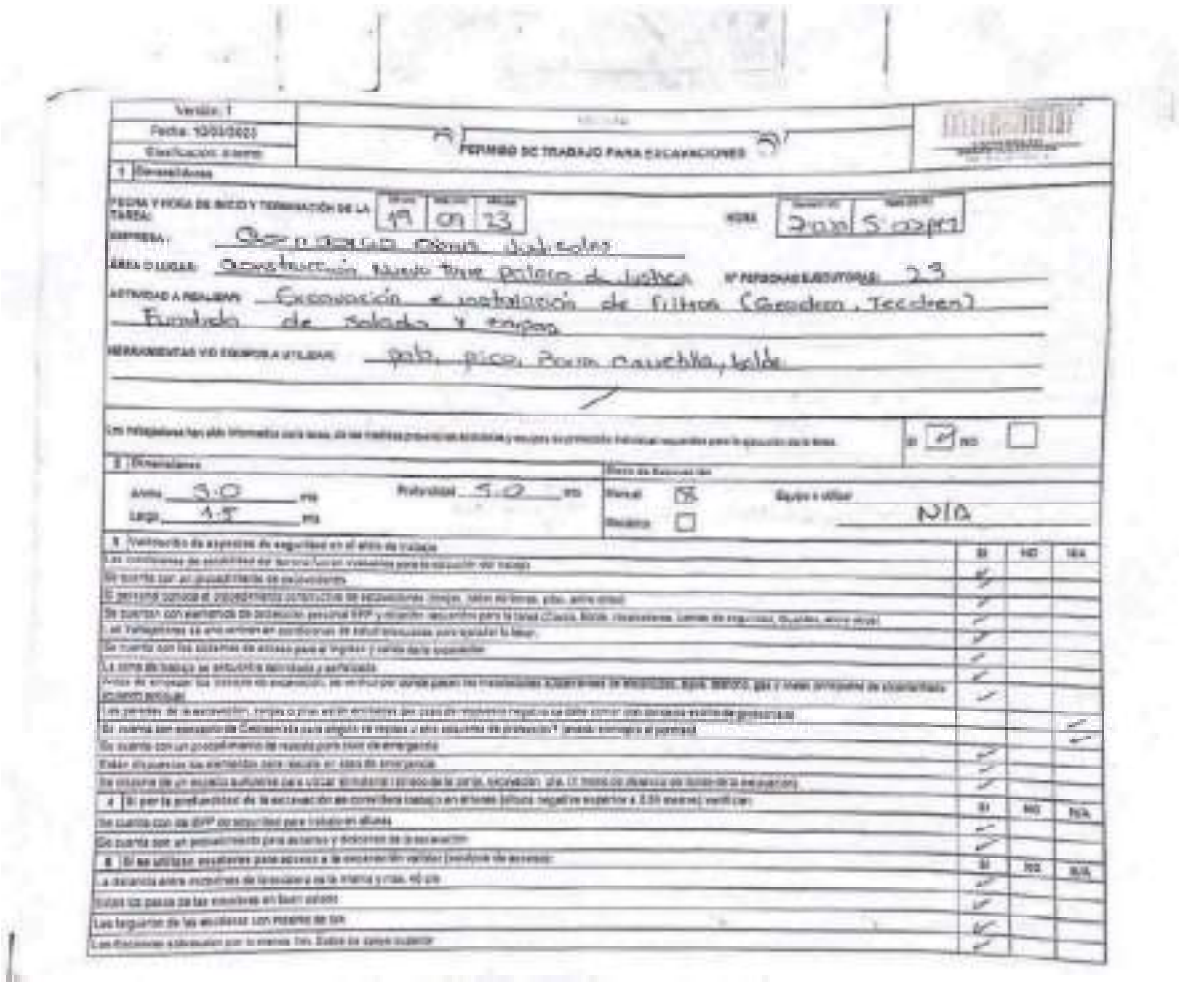

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 19 09 23

HORA: 7:00 5:00pm

EMPRESA: Obras Civiles y Viales

ÁREA O LUGAR: Construcción Nuevo Edificio Palacio de Justicia Nº PERSONAS AUTORIZADAS: 23

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de Filtros (Geodren, Tecdren) Fundido de solados y zapatas

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: pala, pico, Barra, Cuerdas, Lolas

Los trabajadores han sido informados sobre todos los riesgos presentes en la actividad y medidas de prevención necesarias requeridas para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐


2 Dimensiones

Ancho 3.0 mts Profundidad 5.0 mts

Largo 4.5 mts


Manual ☑ Mecánico ☐ Equipo a utilizar N/A


3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno son favorables para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un plan de rescate de excavación	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (rampa, taludes de forma, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requerido para la tarea (Casco, Botas, Overoles, Gafas de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud favorables para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los accesos de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se ha inspeccionado para las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, alcantarillado, gas y otras similares de características peligrosas	✓		
Las pendientes de la excavación, rampas u otras están diseñadas por cada de material resistente se debe contar con elementos mínimos de protección			✓
Se cuenta con señalización Cinta reflectiva para ángulo de riesgos y otro elemento de protección? anexar evidencia al permiso			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están disponibles los extintores para actuar en caso de emergencia	✓		
Se informa de un acceso autorizado a la zona de trabajo (croquis de la zona señalando: pila, tipo de material de excavación, etc.)	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en altura (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para accesos y salidas de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación verificar (escalera de acceso):	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de escalera es la misma y nos es	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Las seguridad de las escaleras con material de tipo	✓		
Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. sobre la zona superior	✓		

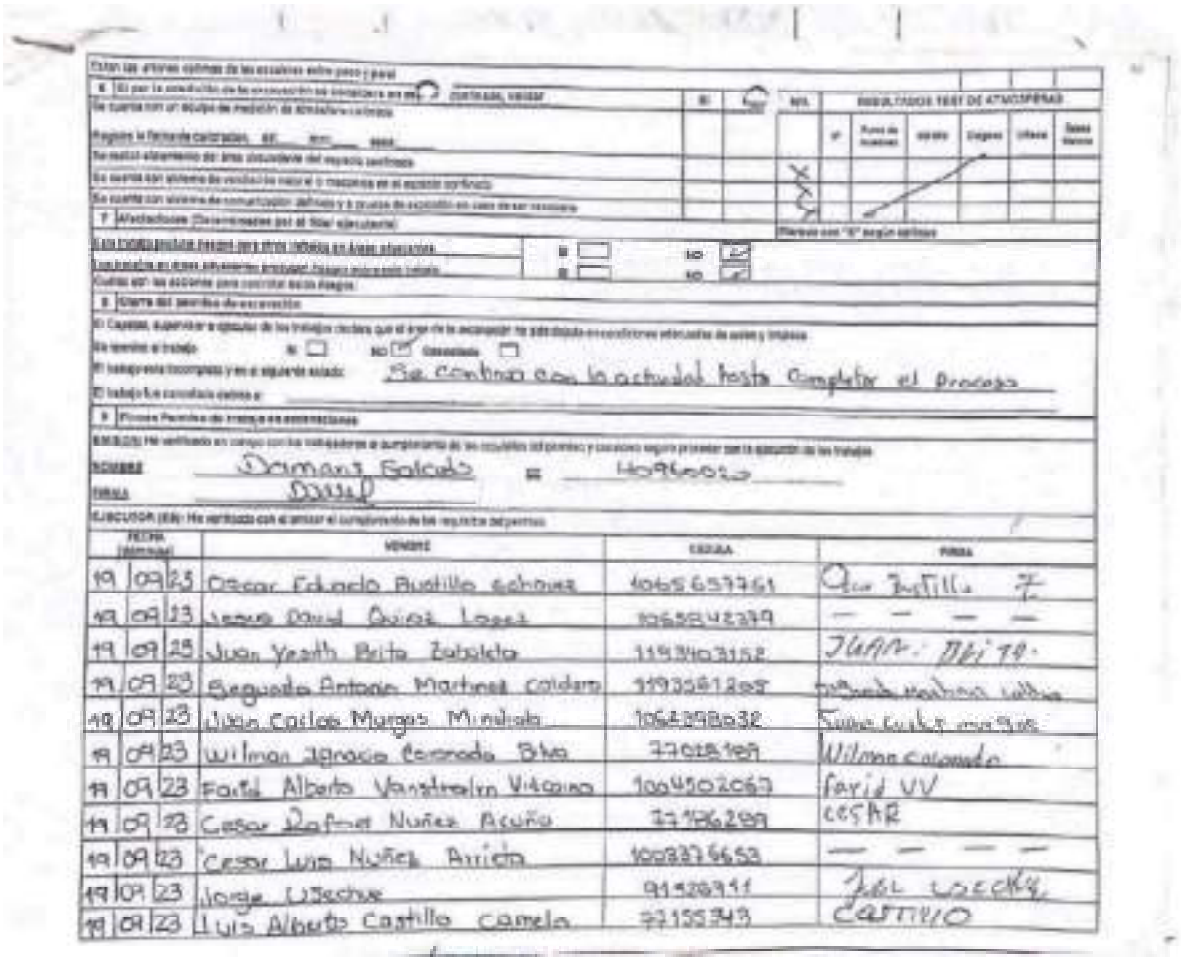

Se continua con la actividad hasta Completar el Proceso

FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
19/09/23	Oscar Eduardo Bustillo Gelvez	1065657761	
19/09/23	Jesus David Ariza Lopez	1065842379	— — — —
19/09/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	
19/09/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561208	
19/09/23	Jhon Carlos Murgas Mendiola	1064398832	
19/09/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	77018109	
19/09/23	Farid Alberto Valestralin Vizcaino	1064502067	
19/09/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186209	
19/09/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003376653	— — — —
19/09/23	Jorge Ustche	91526911	
19/09/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	

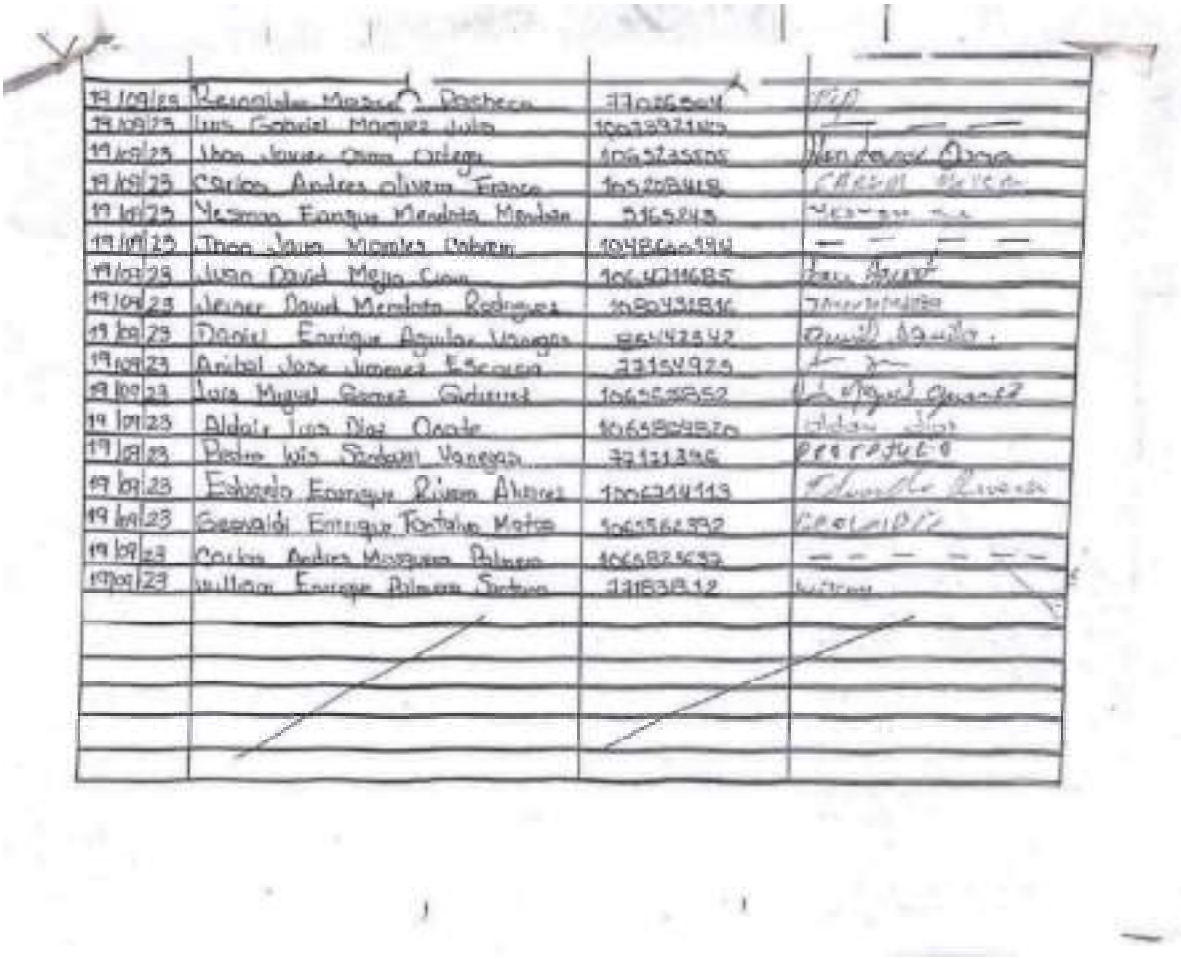

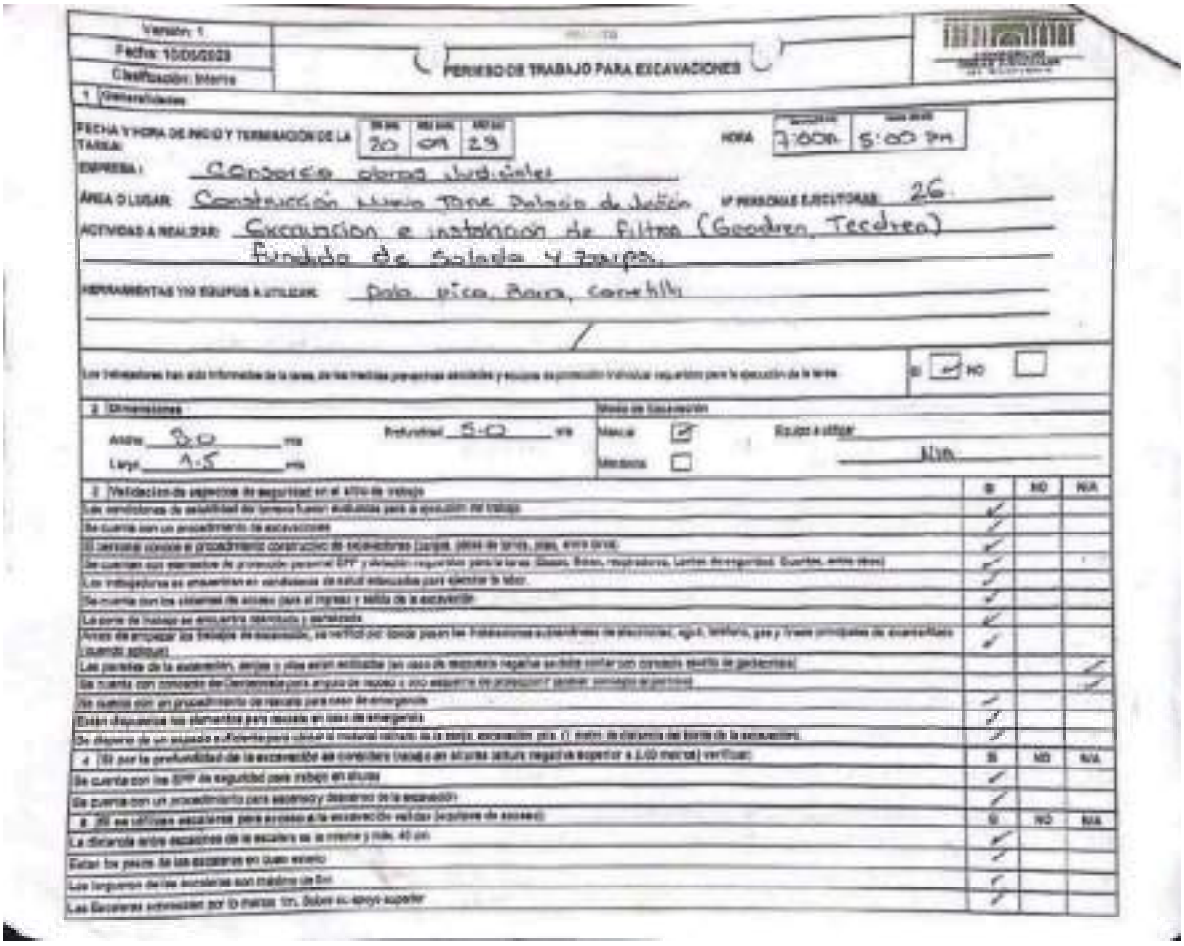

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 20 / 09 / 23 HORA 7:00a 5:00 pm

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción nueva sede Palacio de Justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de Filtros (Geodren, Tecdren) Fundida de Solado y Zapata.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pica, Barra, carretilla


Los trabajadores han sido informados de la tarea, de los riesgos presentes asociados y medidas de prevención individual requeridas para la ejecución de la tarea: SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho: 3.0 mts Profundidad: 5.0 mts Largo: 4.5 mts

Medio de Excavación: Manual ☑ Mecánico ☐ Equipo a utilizar: Mini.

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Los trabajadores de actividad de tareas fueron evaluados para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (cargas, pesos de tierra, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Botas, Botas, respiradores, Cascos de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra señalizada y delimitada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó con donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas y pilas serán entibadas (en caso de requerirse negativo se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo y otro aspecto de protección (taludes, entibados, apuntalados)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para casos de emergencia	✓		
Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un espacio suficiente para colocar el material retirado de la zanja excavación (a 1 metro de distancia del borde de la excavación)	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera (cuando en alguna altura negativa superior a 1.00 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación verificar (ingreso de acceso)	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es a cresta y más. 40 cm	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Las longitudes de las escaleras son mayores de 6m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		

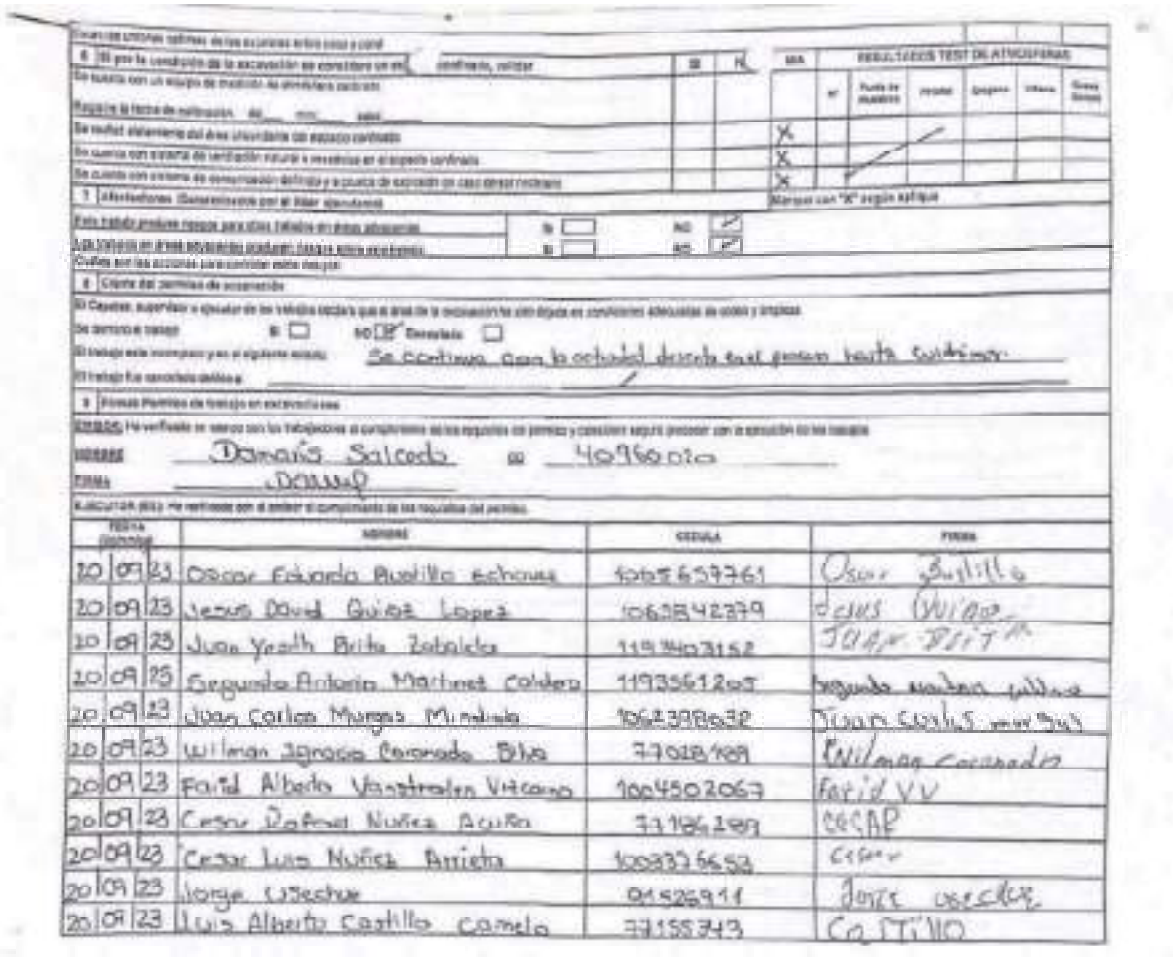


Se continua con la actividad diaria del gestor hasta culminar.

Damaris Salcedo

FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
20/09/23	Oscar Eduardo Portillo Echeverry	1065659761	Oscar Portillo
20/09/23	Jesus David Guiza Lopez	1063842379	
20/09/23	Juan Yeath Brito Zabaleta	1193403152	
20/09/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	11935612	
20/09/23	Juan Carlos Murgas Mendoza	1062388632	
20/09/23	Wilman Ignacio Coronado Diaz	77018169	
20/09/23	Farid Alberto Vanstralen Vitanga	1004502067	
20/09/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186289	
20/09/23	Cesar Luis Nuñez Barrieta	1003376653	
20/09/23	Jorge Ustecher	91529911	
20/09/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155743	



20/09/23	Reinaldo Manuel Pacheco	77076504	
20/09/23	Juan Gabriel Marquez Julio	1003992140	
20/09/23	Jhon Jairo Osma Ortega	1065633507	
20/09/23	Carlos Andres oliveira Franco	1065094418	
20/09/23	Yesmin Enrique Mendoza Mendoza	3166242	
20/09/23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048640194	
20/09/23	Juan David Mejia Cano	1064296885	
20/09/23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1020431846	
20/09/23	Daniel Enrique Aguilar Noriega	8644254 2	
20/09/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154929	
20/09/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065638562	
20/09/23	Alberto Luis Diaz Conde	1065809820	
20/09/23	Pedro Luis Sanchez Noriega	77171896	
20/09/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	
20/09/23	Geovanis Enrique Fontalvo Matos	1065562892	
20/09/23	Carlos Andres Manjarres Palmera	1065823637	
20/09/23	William Enrique Palmera Santana	77185898 12	

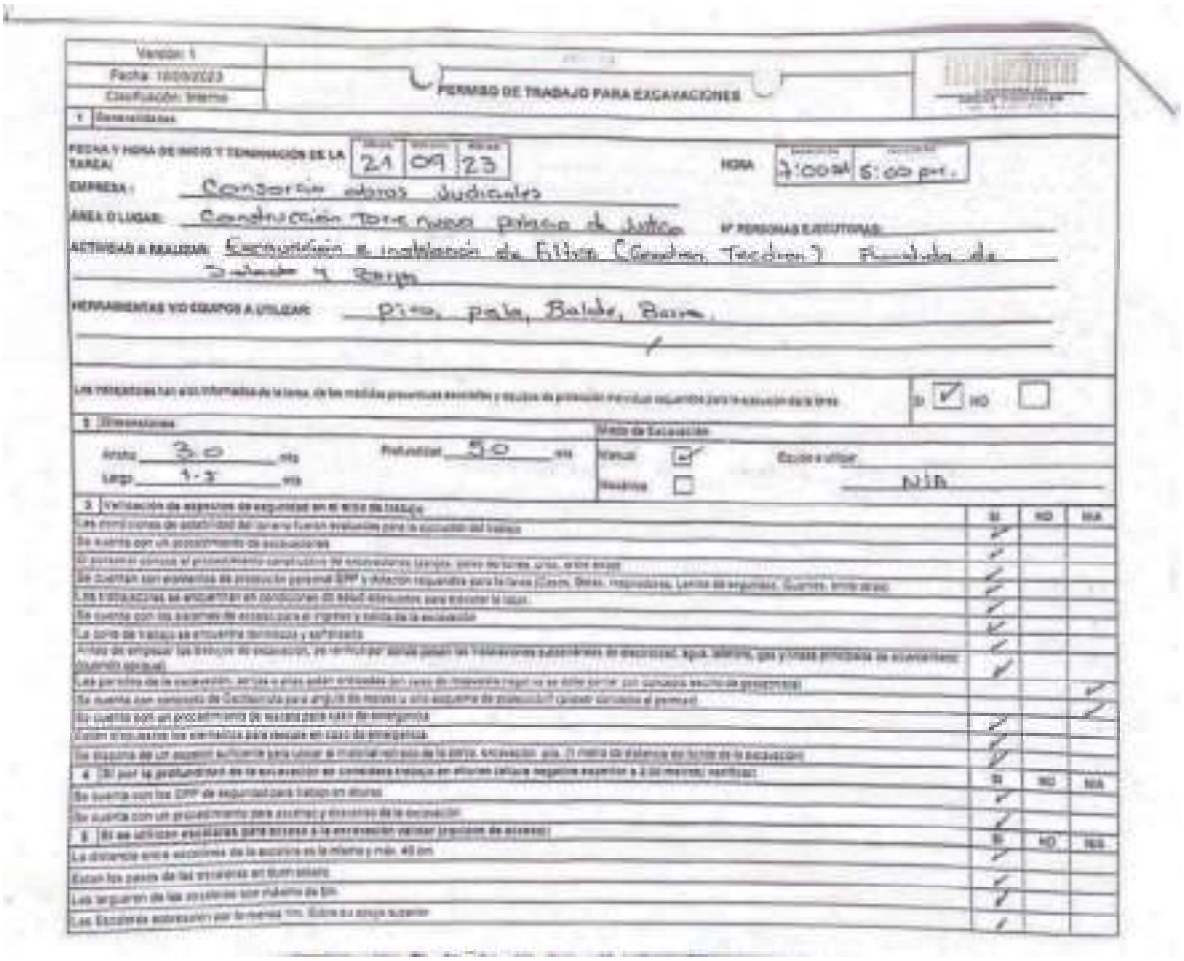

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 21 09 23 HORA 7:00 AM 5:00 pm.

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Torre nuevo palacio de Justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS:

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de filtros (Gaviones, Tuberías) Pantalla de Pilotes y Sotano

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pico, pala, Balde, Barra

Las trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y medios de protección necesarios para la ejecución de la obra. SI ☑ NO ☐


1 Dimensiones

Ancho 3.0 mts Profundidad 5.0 mts


Largo 1.3 mts

Tipo de Excavación: Manual ☑ Mecánica ☐ Equipo a utilizar: N/A

2 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento completo de excavaciones (tiempo, zonas de cortes, otros, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y dotación requeridos para la tarea (Cascos, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Las instalaciones se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la tarea	✓		
Se cuenta con los accesos de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar las labores de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, alcantarillado, gas y cables principales de comunicación (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, en las zonas donde entrarán en caso de requerirse ingresar se sostendrán con soportes (escritos de protección)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnia para ángulo de reposo u otro esquema de estabilización (cuando aplique)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Existen mecanismos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un equipo autónomo para cubrir el material retirado de la zona excavación, p.e. (1 metro de distancia en borde de la excavación)	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en altura (altura negativa superior a 1.5 metros) verificar:	SI	NO	NA
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación verificar (posición de acceso)	SI	NO	NA
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más 40 cm	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Las seguridad de las escaleras son nuevo de fijo	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su punto superior	✓		

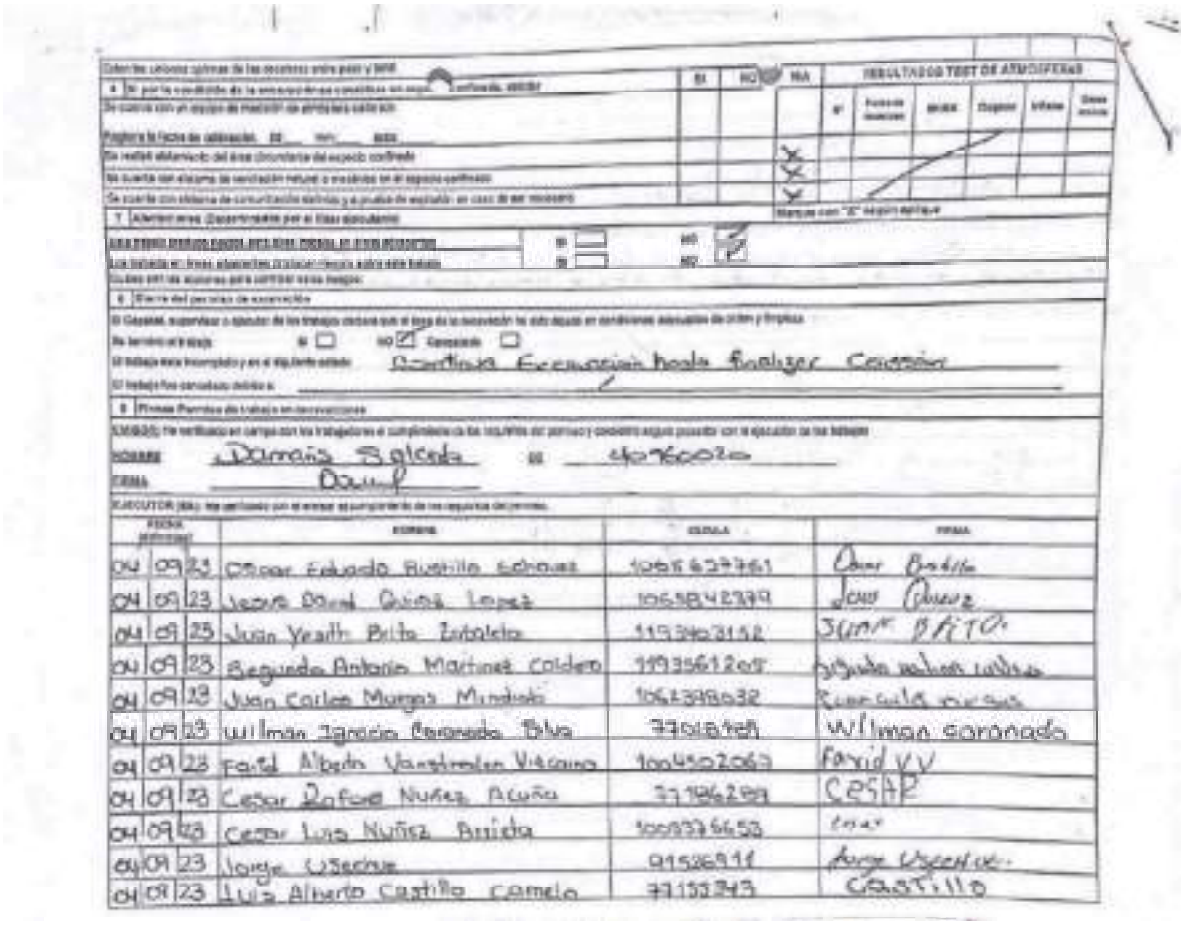


FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
04 09 23	Cesar Eduardo Bustillo Schoues	1065637461	
04 09 23	Jesus Daniel Quiroz Lopez	1065842379	
04 09 23	Juan Yeath Brito Estalella	1193403152	
04 09 23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193561205	
04 09 23	Juan Carlos Murgas Mendoza	1063398632	
04 09 23	Wilman Ignacio Coronado Silva	37018798	
04 09 23	Farid Alberto Vanderlinden Vizcaino	1064502063	
04 09 23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	37196299	
04 09 23	Cesar Luis Nuñez Bustillo	1003336453	
04 09 23	Jorge Useche	91526911	
04 09 23	Luis Alberto Castillo Camelo	77152343	

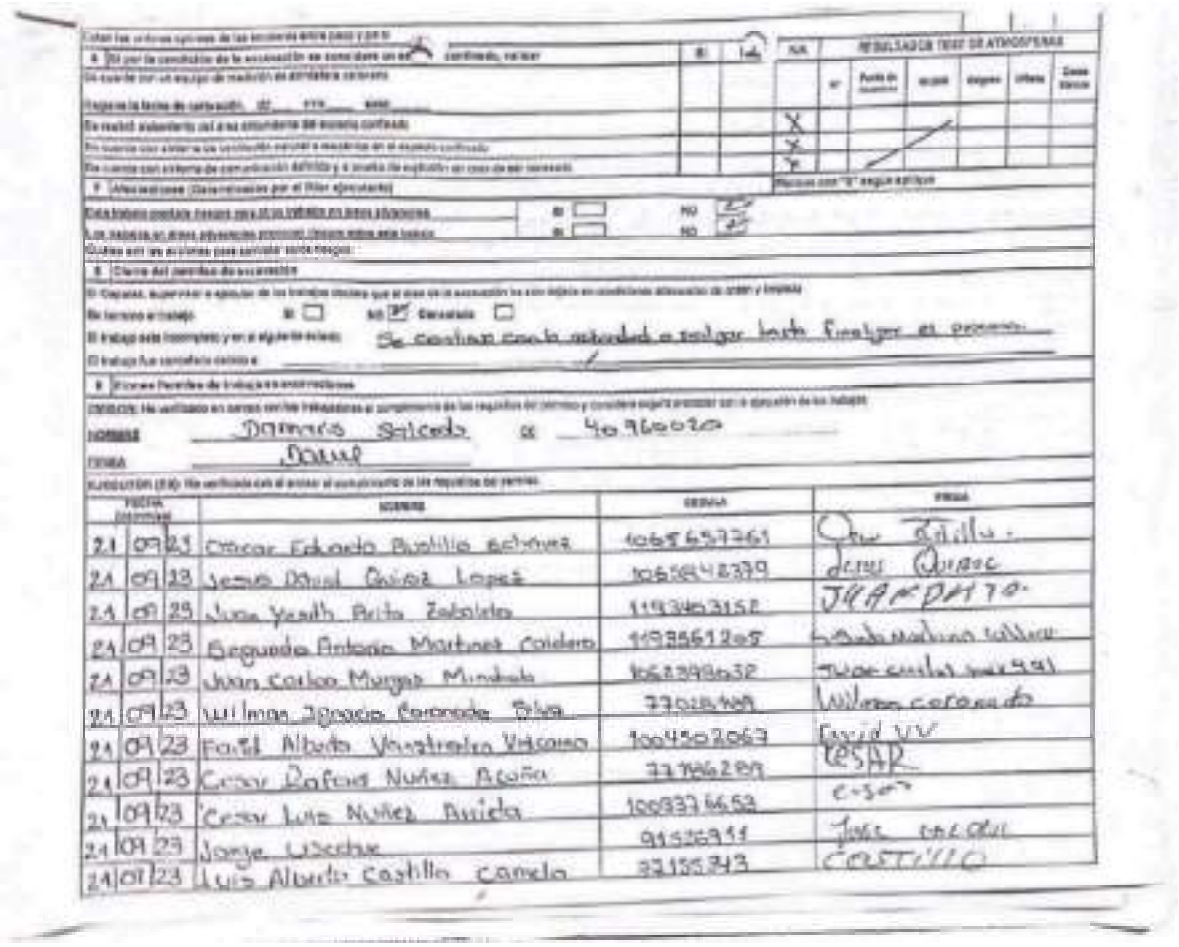


Damaris Salcedo CC 40960?0

Daniel

FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
24 09 23	Oscar Eduardo Bustillo Echeverz	1065697361	
24 09 23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	
24 09 23	Juan Yesith Avila Zabaleta	1193403152	
24 09 23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1935612??	
24 09 23	Juan Carlos Murgas Mendoza	1062398632	
24 09 23	William Ignacio Coronado Silva	73018498	
24 09 23	Farid Alberto Ventrolera Vasquez	1004502063	
24 09 23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77966209	
24 09 23	Cesar Luis Nuñez Bustos	1003776652	
24 09 23	Jorge Urueta	91526951	
24 09 23	Luis Alberto Castillo Camelo	92155743	

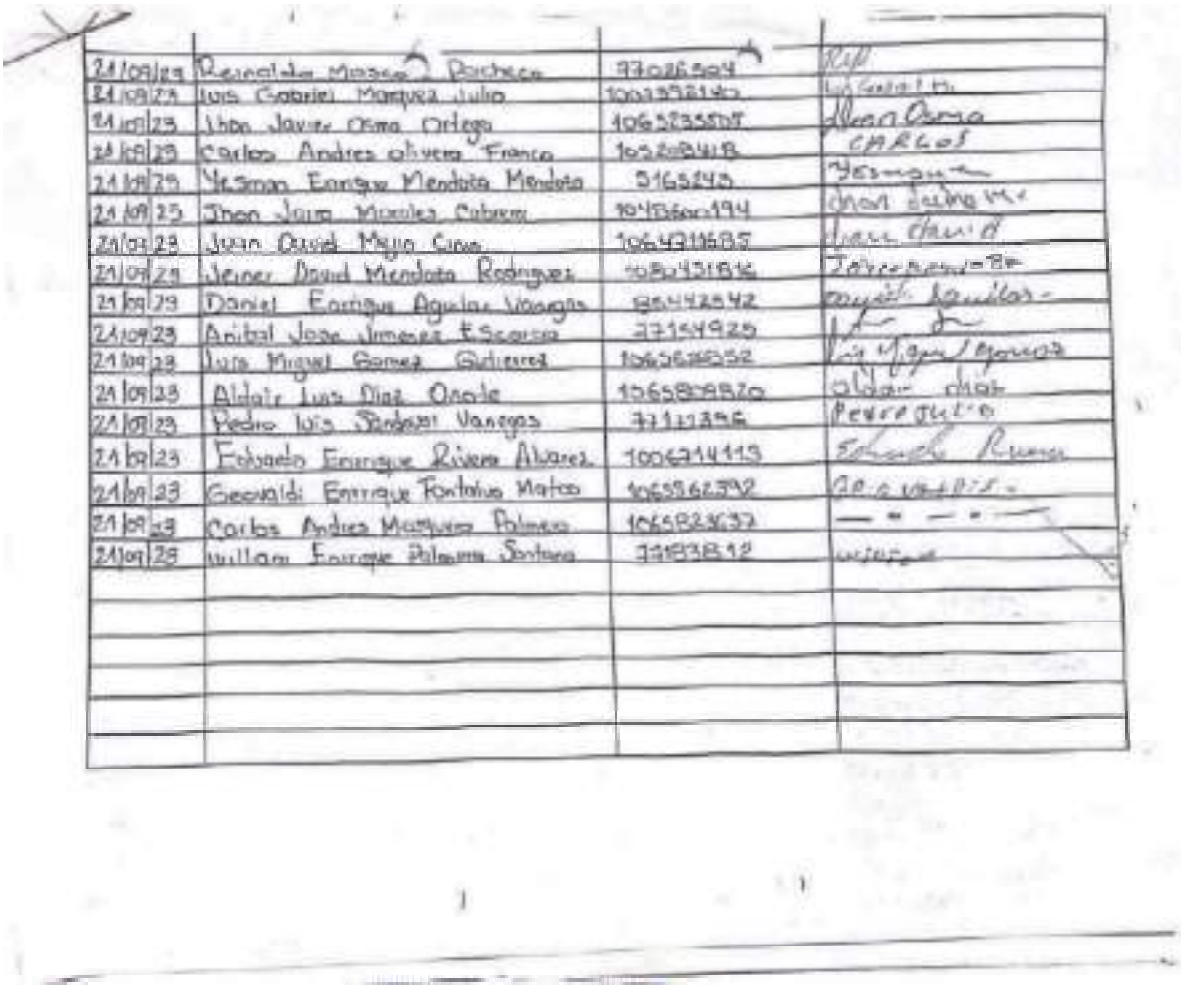

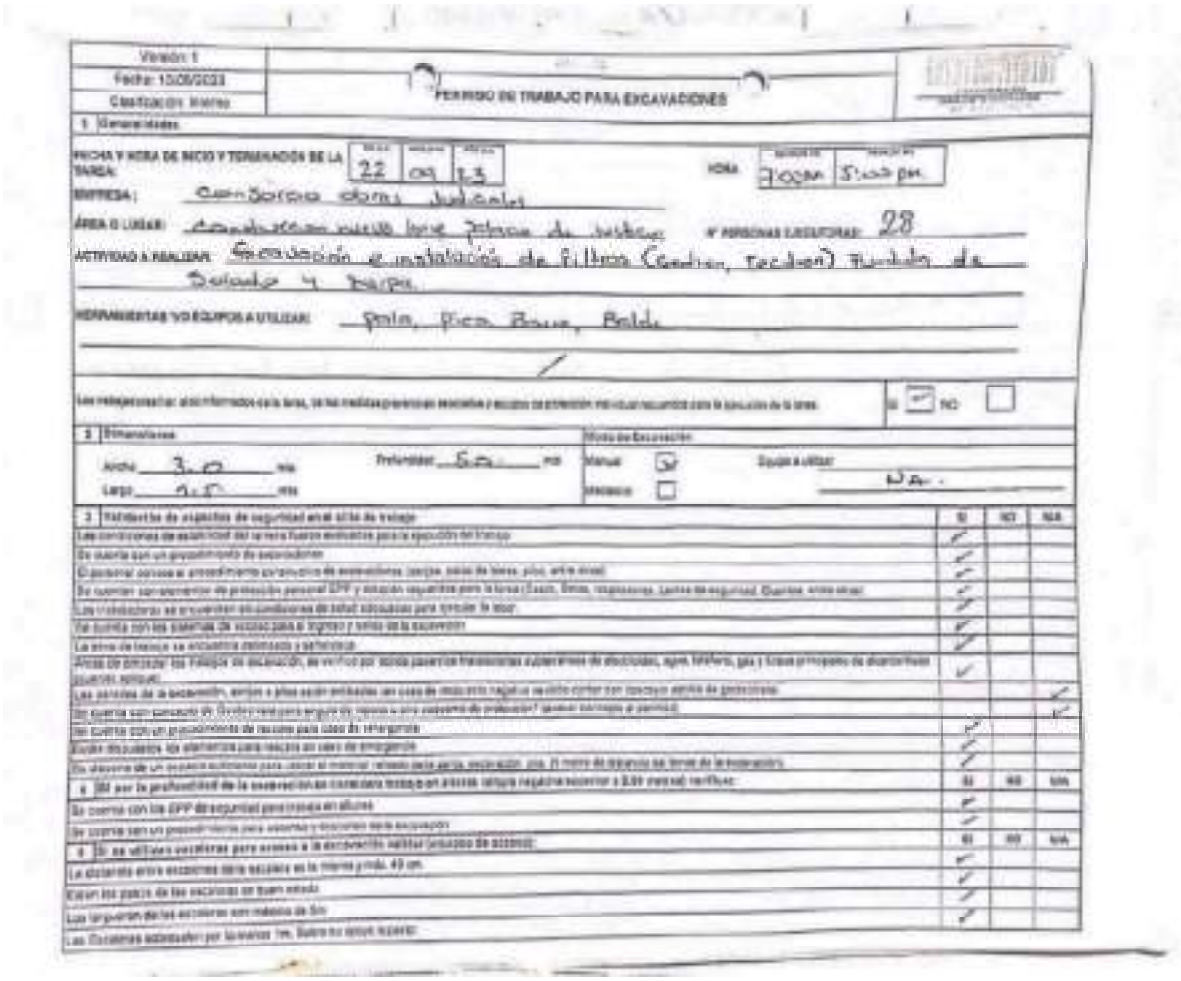

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 22 / 05 / 23 — HORA 7:00 AM 5:00 PM

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción cuerpo bajo Palacio de Justicia — # PERSONAS EJECUTORAS: 28

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación e instalación de filtros (Gaviones, Tendido) Ruidos de Bolívar y Barrio.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Balde


Las máquinas estar debidamente señalizadas y alejadas de excavación. NO utilizar maquinaria cerca a la ejecución de la obra. SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 3.0 mts — Profundidad 5.0 mts — Largo 9.0 mts

Método de Excavación: Manual ☑ Mecánico ☐ — Equipo a utilizar: N.A.


3 Verificación de aspectos de seguridad antes del inicio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (orden, zonas de botar, pico, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y equipos requeridos para la tarea (casco, botas, respiradores, cartas de seguridad, guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	✓		
Se cuenta con las escalas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de ejecutar las labores de excavación, se verifico por medios planos de instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y cables principales de alcantarillado (puntos, equipo)	✓		
Las personas de la excavación, equipo o pilas están ubicadas en caso de caída de material o de otro material (protección)			✓
Se cuenta con personal de vigilancia para seguridad de vecinos y otro personal de protección? (personal contratado o permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se observa de un equipo adecuado para cubrir el material retirado para la excavación (no 1) como de distancia se tiene de la excavación)	✓		
4 En caso de la profundidad de la excavación se considera trabajo en espacio seguro requiere superior a 1.50 mts se verifica:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para cada uno de ellos	✓		
Se cuenta con un personal vigía para visitantes y trabajos para excavación	✓		
5 En las utilizan escaleras para acceso a la excavación, indicar cantidad de accesos:	SI	NO	N/A
La distancia entre escaleras de escalera es la misma y más 40 cm.	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Las largueros de las escaleras son material de Sin	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre el nivel superior			

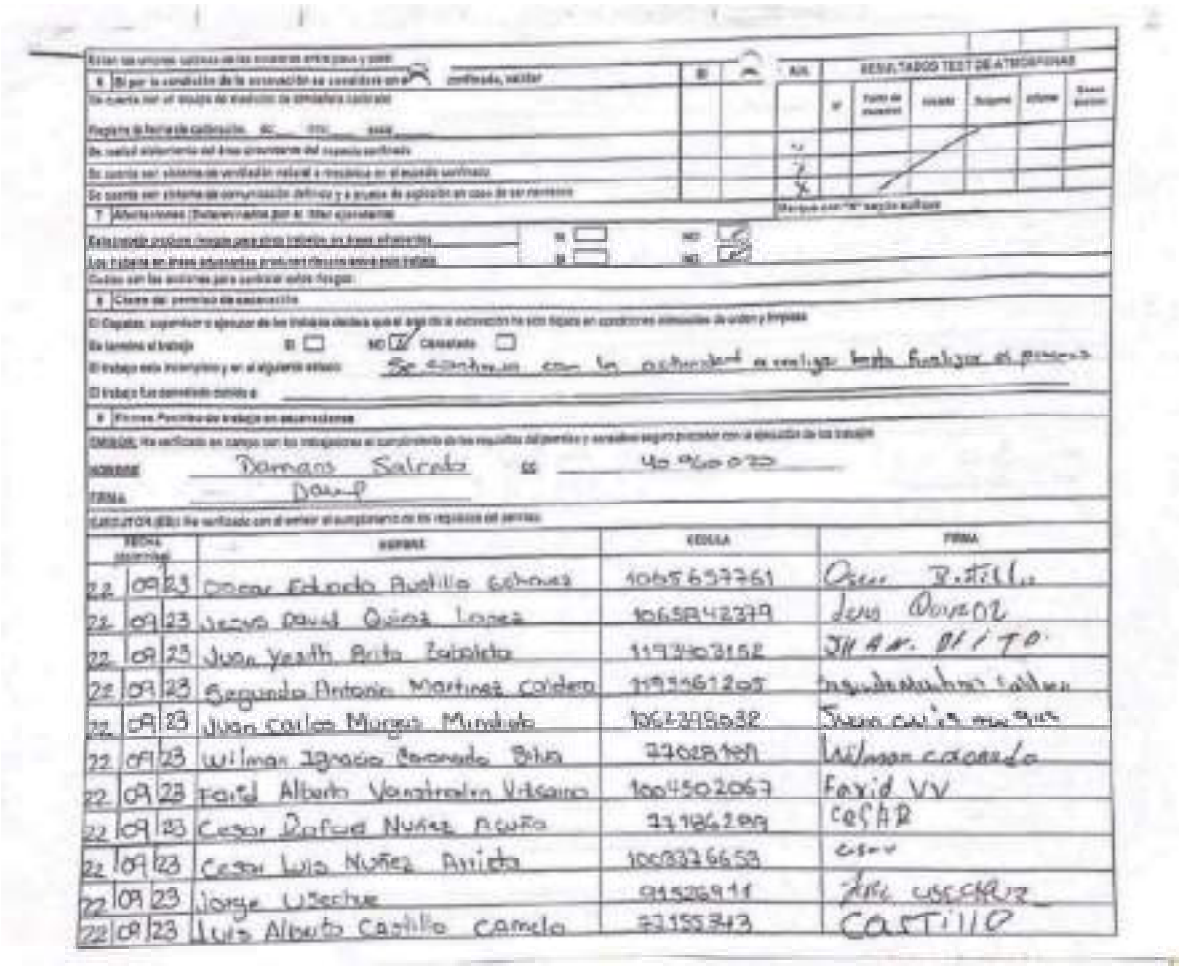


FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
22/09/23	Oscar Eduardo Avellis Echenes	1065637761	
22/09/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	
22/09/23	Juan Yesith Brito Bolaños	1193403158	
22/09/23	Segundo Antonio Martinez Caldero	1193461205	
22/09/23	Juan Carlos Murgas Mendoza	1063795632	
22/09/23	Wilmar Ignacio Coronado Silva	72018191	
22/09/23	Farid Alberto Valentierra Vitalino	1004502067	
22/09/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	1193462109	
22/09/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003926653	
22/09/23	Jorge Utreche	91526911	
22/09/23	Luis Alberto Castillo Camelo	72155343	




22/09/23	Reynaldo Moore Pacheco	8-900-2004	RP
22/09/23	Juan Gabriel Maquez Julio	1006392103	Juan Gabriel Maquez
22/09/23	Ibon Javier Otero Colago	1065235505	Ibon Otero
22/09/23	Carlos Andres olivera Franco	1065084118	CARLOS OLIVERA
22/09/23	Yesman Enrique Mendoza Medina	9166248	Yesman
22/09/23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1047860194	Jhon Jairo Morales
22/09/23	Juan David Mejia Cano	1065431595	Juan David
22/09/23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1065431816	Jeiner Mendoza
22/09/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	8-844-542	Daniel Aguilar
22/09/23	Anibal Jose Jimenez Escarra	8-714-925	[illegible]
22/09/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065585058	Luis Miguel Gomez
22/09/23	Aldair Luis Diaz Conte	1065899820	Aldair Diaz
22/09/23	Pedro Luis Santana Vanegas	7-711-396	PEDRO SANTANA
22/09/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	Eduardo Rivera
22/09/23	Geovaldi Enrique Tortuna Matos	1065566892	[illegible]
22/09/23	Carlos Andres Marquez Palmera	1065835637	[illegible]
22/09/23	William Enrique Palmera Santana	7-718-818	William

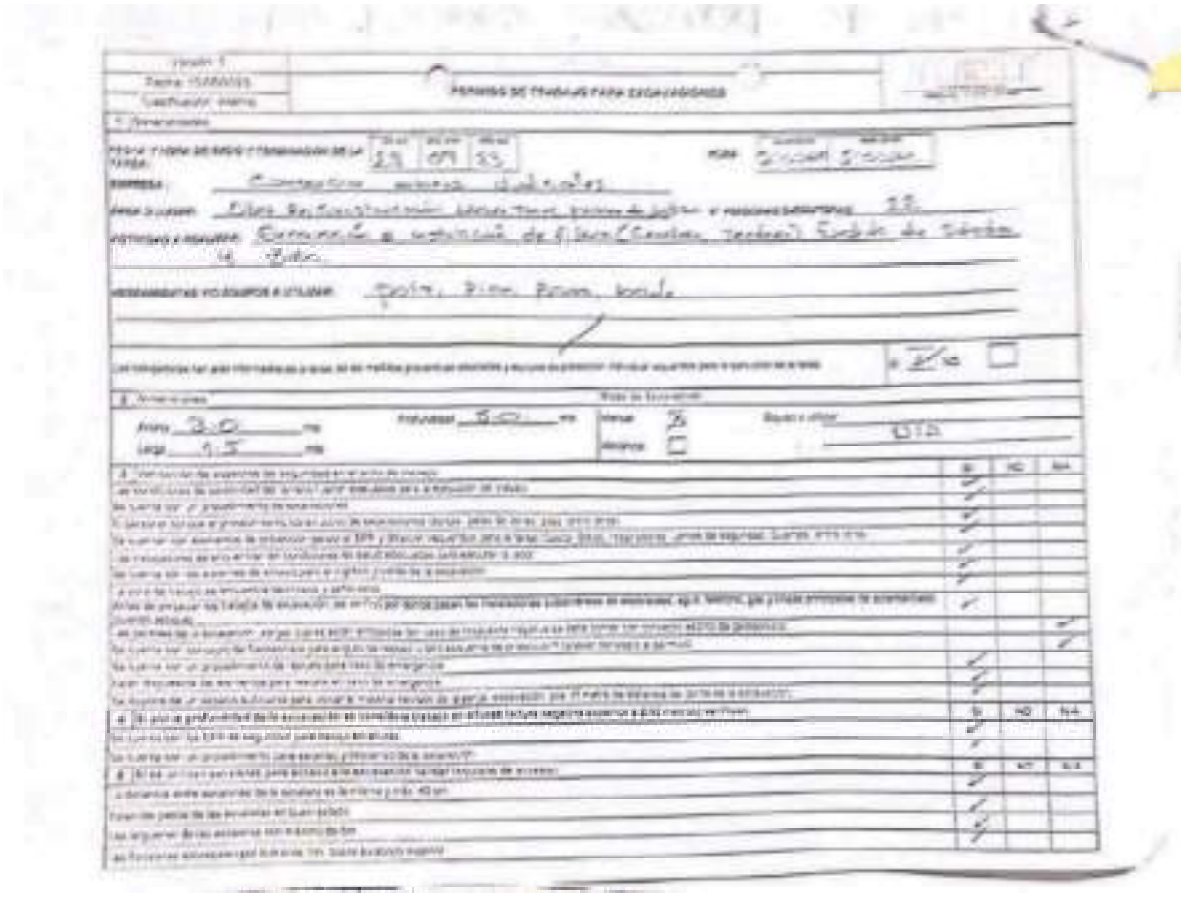

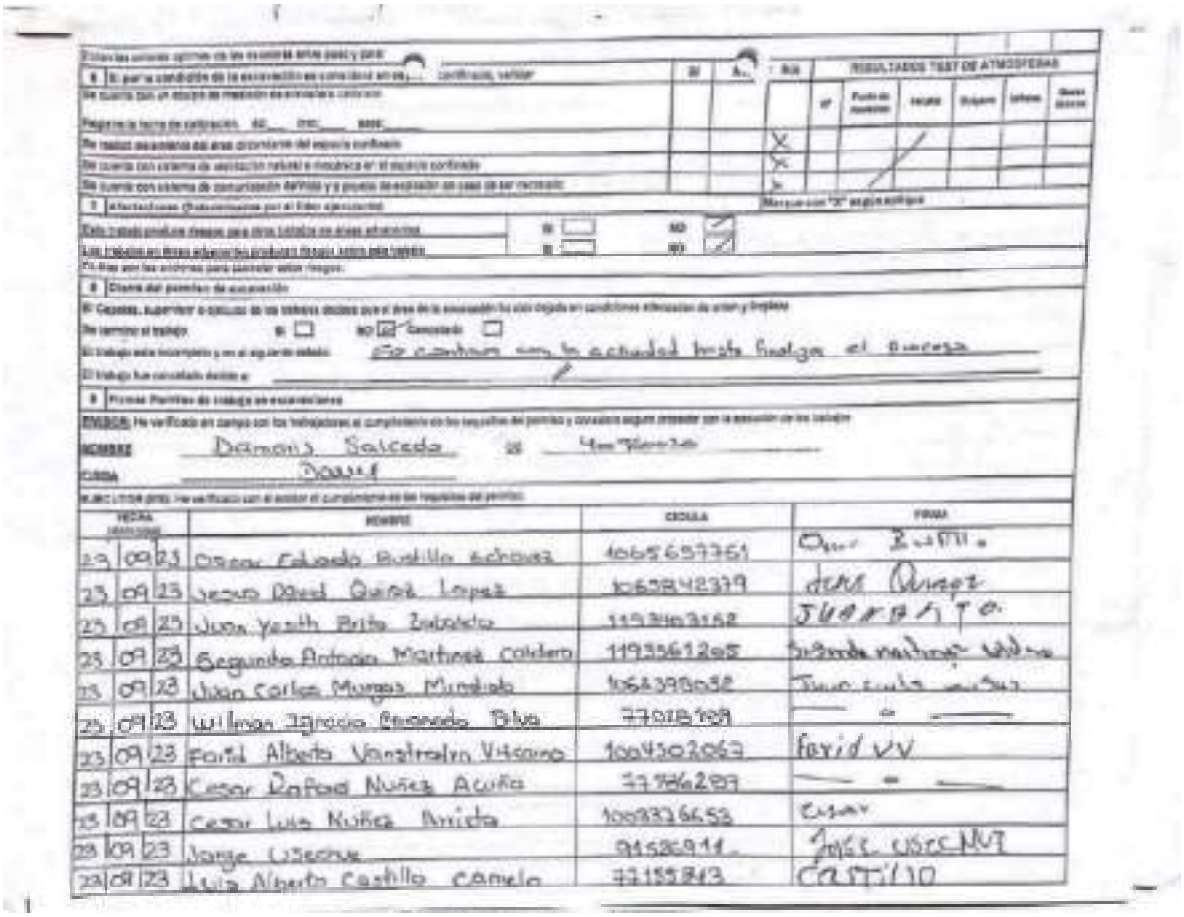

FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
23/09/23	Cesar Eduardo Bustillo Echeverz	1065657761	
23/09/23	Jesus David Quiroz Lopez	1063842339	
23/09/23	Juan Yesith Brito Bolivar	1193103168	
23/09/23	Segundo Antonio Martinez Calderin	11935612	
23/09/23	Juan Carlos Munoz Mendoza	1063980	
23/09/23	Wilman Ignacio Miranda Silva	77018	
23/09/23	Farid Alberto Vanstralen Vitazno	1004302	
23/09/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77986	
23/09/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003	
23/09/23	Jorge Ustariz	9153	
23/09/23	Luis Alberto Castillo Camelo	7215	



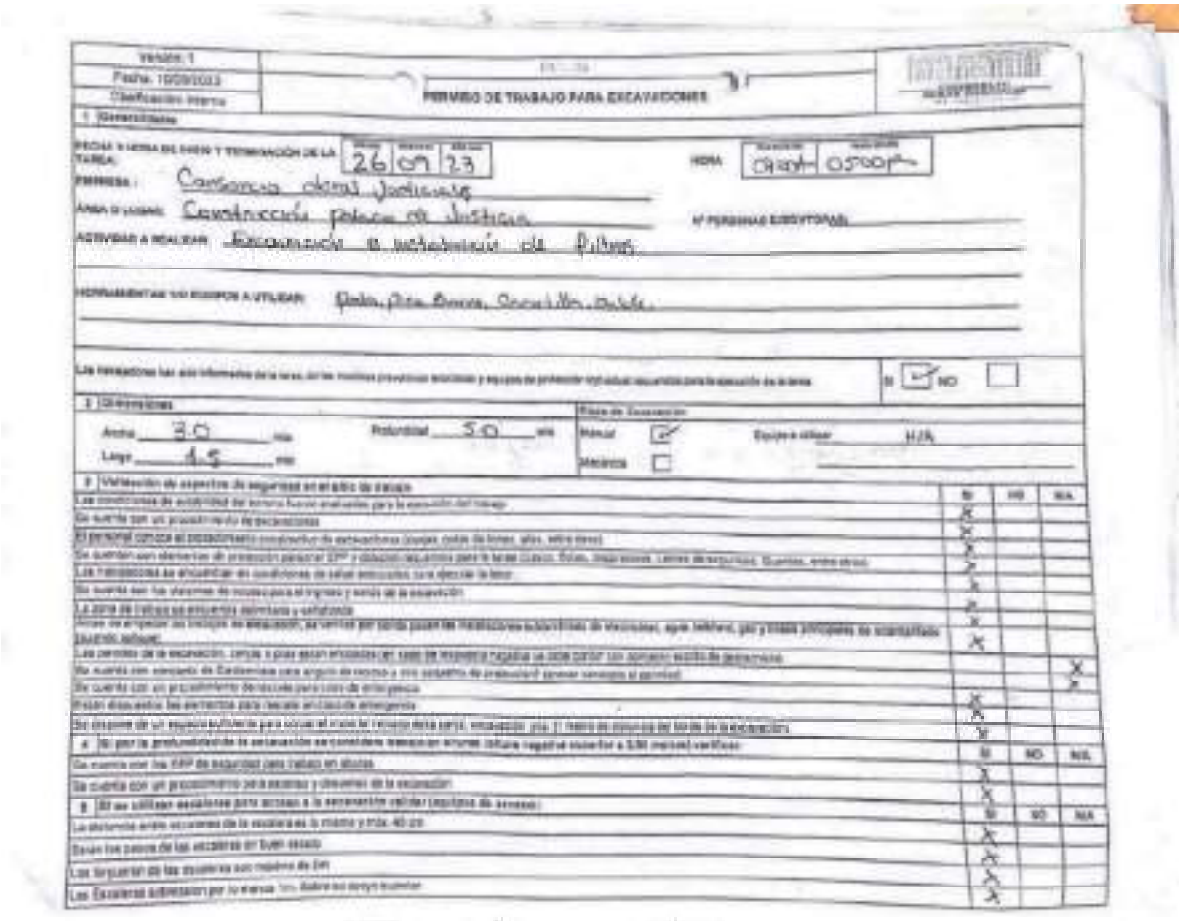

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DEL INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 26 07 23 — HORA: 08:00h – 05:00p.m.

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTANTES:

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación de cimentación de Pilotes

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Martillo


Las recomendaciones aquí informadas de la tarea, así las medidas preventivas colectivas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea: SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones


Ancho 3.0 mts — Profundidad 5.0 mts — Largo 4.5 mts

Clase de Excavación: Manual ☑ — Mecánica ☐ — Equipo a utilizar N/A

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno han sido evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (cuajes, cada de bolas, pilas, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y dotación requeridos para la tarea (casco, botas, chaqueta, camisa de mangas largas, guantes, entre otros)	X		
Las trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	X		
Se cuenta con los elementos de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de cargue se encuentra señalizada y señalizada	X		
Antes de empezar las labores de excavación, se verifica por cerca puede las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y otras principales se encuentran (cuando aplique)	X		
Las paredes de la excavación, cercas y pilas están entibadas en caso de requerirlo teniendo en cuenta como mínimo sistema de apuntalamiento			X
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo y uso sistema de entibado/ planear cercanías al personal			X
Se cuenta con un procedimiento de escala para caso de emergencia	X		
Están disponibles las escaleras para escape en caso de emergencia	X		
Se dispone de un equipo auxiliar de rescate en caso de requerirlo (cuerda, arnés, mosquetón, etc.) cuando la profundidad de la excavación supere los 1.50 metros	X		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera necesario entibar registre cuál de los 3 métodos verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en altura	X		
Se cuenta con un procedimiento para entibado y desarme de la excavación	X		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación verificar requisitos de anexo:	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es mínimo y máx. 40 cm	X		
Tienen los pasos de las escaleras en buen estado	X		
Los largueros de las escaleras son rígidos de 1m	X		
Las Escaleras sobrepasan por lo menos 1m. sobre el nivel superior	X		

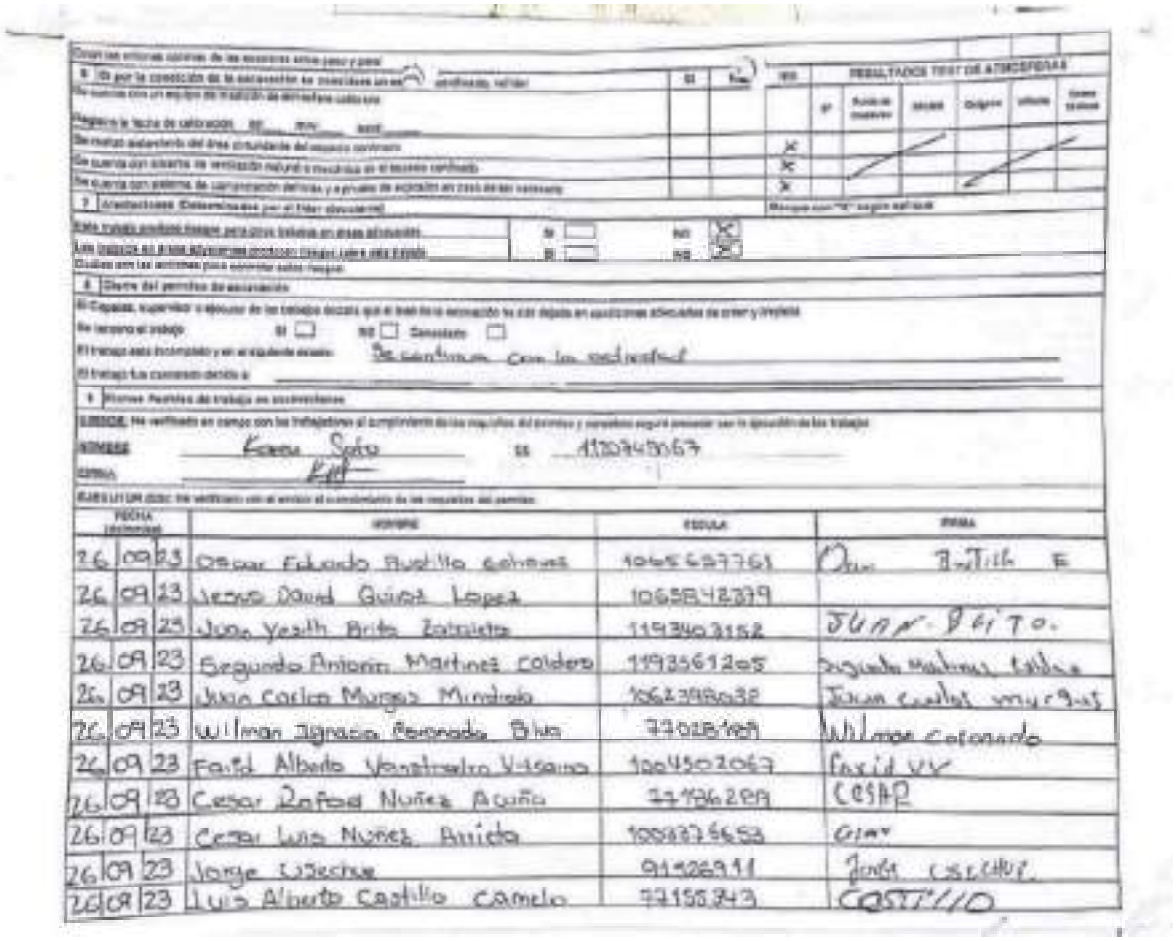

FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
26/09/23	Cesar Eduardo Bustillo Echenes	1065697761	
26/09/23	Jesus David Guiot Lopez	1065842339	
26/09/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	
26/09/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	11935612 05	
26/09/23	Juan Carlos Murgas Mendoza	1062388032	
26/09/23	Wilman Ignacio Fernandez Silva	77028169	
26/09/23	Farid Alberto Ventrolero Vergara	1064502067	
26/09/23	Cesar Rafael Nuñez Aguilo	77186209	
26/09/23	Cesar Luis Nuñez Bustillo	1065837653	
26/09/23	Jorge Ustariz	91928911	
26/09/23	Luis Alberto Castillo Camelo	92155343	

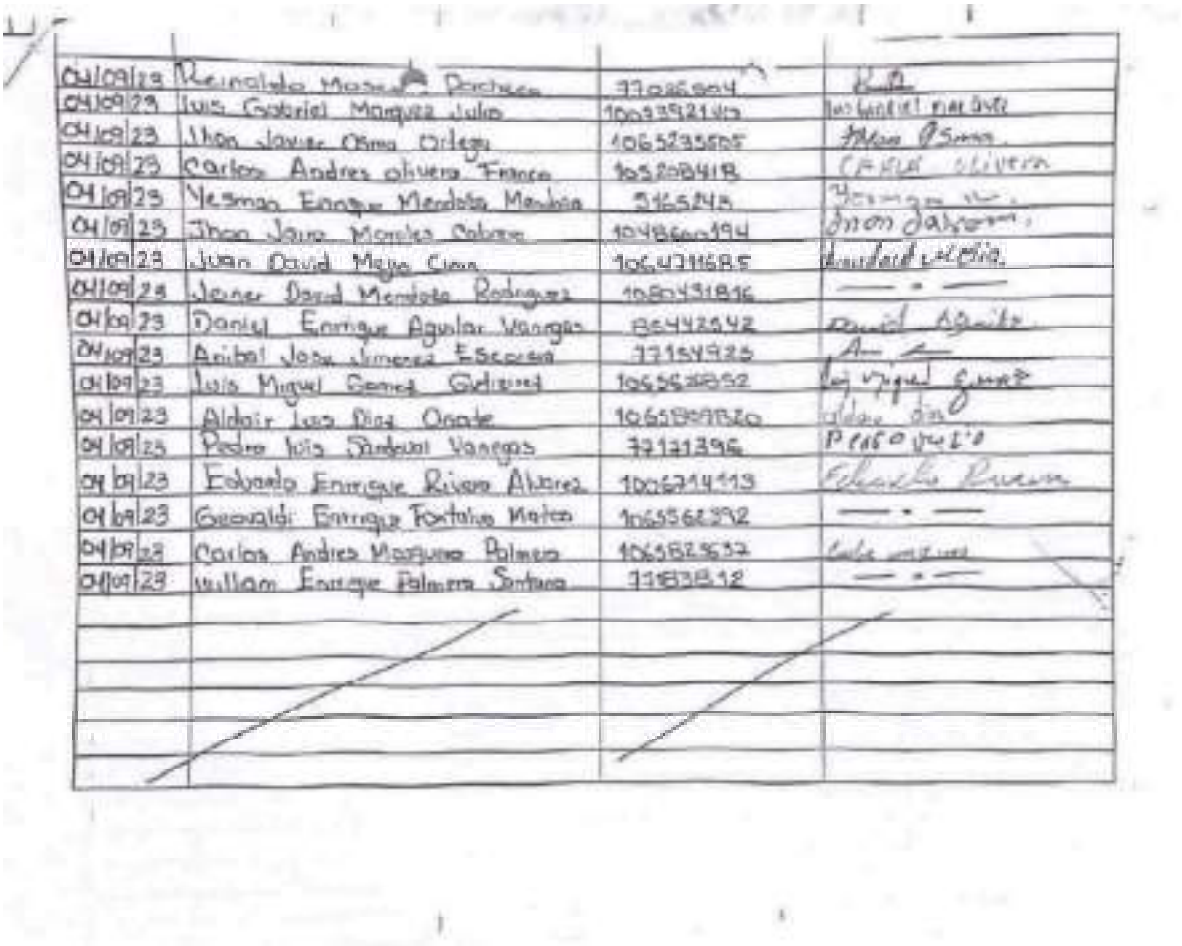

04/09/23	Reinaldo Manuel Pertuz	77086904	
04/09/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1003392143	
04/09/23	Jhon Jairo Ochoa Ortega	1065735505	
04/09/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052084418	
04/09/23	Nesmar Enrique Mendoza Mendoza	3165248	
04/09/23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048664194	
04/09/23	Juan David Mejia Cuan	1064711685	
04/09/23	Jaiver David Mendoza Rodriguez	1080491816	
04/09/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	86442642	
04/09/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77164925	
04/09/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065628852	
04/09/23	Aldair Luis Diaz Conde	1065899820	
04/09/23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	77171396	
04/09/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	
04/09/23	Geovanis Enrique Fontalvo Mateus	1065568392	
04/09/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823632	
04/09/23	William Enrique Palmera Santana	77183812	



26/09/23	Reynaldo Marcos Pacheco	77086564	
26/09/23	Luis Gabriel Marquez Lubo	1067392143	
26/09/23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235805	
26/09/23	Carlos Andres olivera Franco	1052098418	
26/09/23	Yesmen Enrique Mendoza Mendoza	5165245	
26/09/23	Jhon Jairo Montes Cabrera	1047866194	
26/09/23	Juan David Mejia Cano	1064318688	
26/09/23	Jaime David Mendoza Rodriguez	1080431816	
26/09/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	1064135542	
26/09/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154935	
26/09/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065238652	
26/09/23	Aldair Luis Diaz Conde	1065809820	
26/09/23	Pedro Luis Shaljuni Vanegas	92131496	
26/09/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006314143	
26/09/23	Gerardo Enrique Fontalvo Mateo	1065862392	
26/09/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065833632	
26/09/23	William Enrique Palmera Santana	77083812	
