Contrato 268 de 2022

1. Oficio de radicación

Corte de obra N° 2, periodo del 28 enero 2023 al 28 de febrero 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Bogotá D.C. 2 de marzo de 2023 **Radicado N° RH268-06A-2022**

Señores
CONSORCIO INTER 2022
Atn: Ing. John William Casallas Jurado
Representante Legal
Interventoría del contrato de obra 268/2022

CONTRATO DE OBRA N° 268 DE 2022.

OBJETO: "CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: Presentación Corte de obra N°2.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega de la documentación relacionada del Corte N°2, del contrato de obra N° 268-2022; del cual hacen parte los archivos relacionados a continuación:

1.) Oficio de radicación
2.) Lista de chequeo.
3.) Balance financiero
6.) Acta de corte de obra N°2
9.) Informe ejecutivo mensual.
10.) Facturación. (Oficio remisorio de NO facturación)
12.) Certificación de pago de aportes parafiscales.
13.) Certificación de pago de planillas.
14.) Certificación de personal en condición de discapacidad.
17.) Informe de avance mensual.
18.) Informe de PGAS y SG-SST.

Cordialmente.

Martha Lucia Rey Navarro
Director(a) de obra
INGENIERIA RH S.A.S
Nit: 830.061.440-1

Contrato 268 de 2022

2. Lista de chequeo

Corte de obra N° 2, periodo del 28 enero 2023 al 28 de febrero 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Contrato No.	268-2023
Contratista	INGENIERIA RH SAS
Nit.	830.061.440-1
Corte No.	**2**

	LISTA DE CHEQUEO **RECEPCIÓN DE CUENTAS PARA PAGOS DE CONTRATOS**			
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**N/A**	**Pg o Archivo**
1*	**Oficio de radicación** Relacionando claramente entre otra información, contrato, corte y documentos anexos.	**CUMPLE**		CORTE N°2 FEBRERO - Pag. 2
2*	**Formato Lista de checheo.** Anexar la verificación de los documentos relacionados en esta lista de chequeo.	**CUMPLE**		CORTE N°2 FEBRERO - Pag. 4
3*	**Balance Financiero del Contrato de Obra** Debidamente verificado y firmado por el Contratista.	**CUMPLE**		CORTE N°2 FEBRERO - Pag. 7
4*	**Certificado de cumplimiento del servicio prestado** Expedido por la Interventoría del contrato del cumplimiento a las obligaciones.			
5*	**Estado y manejo del Anticipo**		**N/A**	
a	**Certificado de consignación Rendimientos Financieros** Soporte o certificación de consignación de Rendimientos Financieros a la Dirección del Tesoro Público		**N/A**	
b	**Certificado de consignación Excedentes del Anticipo** Soporte o certificación de consignación de Excedentes de Recursos a la Dirección del Tesoro Público		**N/A**	
c	**Certificado de Inversión del Anticipo** Extracto o certificación de inversión del anticipo.		**N/A**	
d	**Certificado de Liquidación Fiducia** Certificado de liquidación de la fiducia, expedido por la fiduciaria.		**N/A**	
6*	**Acta recibo parcial / final del Contrato** Acta de corte debidamente firmada por Contratista e Interventoría		**N/A**	
7*	**Memorias de cantidades** Formatos firmados por Contratista e Interventoría		**N/A**	
8*	**Acta de entrega y recibo final de obra** Copia del Acta de entrega y recibo final de obra, en el cual debe quedar constancia que los items que se ejecutaron, cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones técnicas contratadas, debidamente suscrita por contratista, interventoría, supervisor y quien corresponda por parte de la entidad.		**N/A**	
9*	**Informe Ejecutivo mensual** Corresponde al Formato en excel "Informe ejecutivo Mensual"	**CUMPLE**		CORTE N°2 FEBRERO - Pag. 16
10*	**Factura de Venta** Con los requisitos mínimos exigidos por la DIAN: (NOTA: Una vez aprobada, debera cargarse en Olimpia IT y posteriormente en el SECOP II, sección "Plan de pagos", en donde anexará también los documentos de soporte para pago marcados con asterisco (*) en esta lista de chequeo.)		**N/A**	CORTE N°2 FEBRERO - Pag. 19
a	Nombres y apellidos o Razón social del contratista	**CUMPLE**		
b	Número de Nit.			
c	Dirección y Teléfono			
d	Denominación de ldocumento como Factura de Venta			
e	No. de Factura			
f	Fecha de emisión de la Factura			
g	No. Resolución autorización de la DIAN vigente (no mayor a 2 años)			
h	Discriminar los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, identificando Nombre o Razón Social, C.C. o NIT y Porcentaje de participación.			
i	Detalle o descripción del cobro, indicando: No. del Contrato - No. del Corte - Especificar Obra, Mobiliario, etc.			
j	Detalle de los valores facturados: Discriminar el A.I.U., IVA sobre Utilidad, IVA, Amortización del anticipo o Pago Anticipado.			
11*	**Anexos a la factura** Anexar RUT, Autorización de facturación, certificación bancaria.		**N/A**	

Contrato No.	268-2023
Contratista	INGENIERIA RH SAS
Nit.	830.061.440-1
Corte No.	**2**

	LISTA DE CHEQUEO **RECEPCIÓN DE CUENTAS PARA PAGOS DE CONTRATOS**			
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**N/A**	**Pg o Archivo**
12*	**Certificación de pago Seguridad Social y parafiscales** Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y parafiscales. Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007.	**CUMPLE**		CORTE N°2 FEBRERO - Pag. 21 - 24
a	**Para Empresa:** Firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, del Consorcio o Unión Temporal y de cada uno de sus integrantes. Adjuntar copia certificado de vigencia tarjeta profesional y copia documento de identidad de los contadores que firman la certificación.			
b	**Para personas naturales:** liquidado sobre un IBC mínimo del 40% valor del contrato.			
13*	**Planillas de pago** Copia Planilla de pago aportes de seguridad social del periodo correspondiente			CORTE N°2 FEBRERO - Pag. 26 - 31
14*	**Personal en condición de discapacidad** Certificado del personal en condición de discapacidad			CORTE N°2 FEBRERO - Pag. 33
15*	**Entradas a almacén - Certificación** Certificados de entradas a Almacén por parte del Contratista que se hubieran generado en el periodo correspondiente.		**N/A**	
16*	**Entradas a almacén - Relación** Relación de todas las entradas a Almacén de los elementos entregados en lo que va corrido de la vigencia del contrato, discriminadas por periodo.		**N/A**	
17	**Informe de Avance mensual / final de Obra** Del periodo correspondiente, debidamente firmado por el Contratista. Incluye registro fotográfico, gráficos, porcentajes de avance, desarrollo y estado de ejecución, condiciones particulares, Formatos de informe semanal y mensual y demás soportes del periodo correspondiente.	**CUMPLE**		CORTE N°2 FEBRERO - Pag. 35 - 55
18	**Informe de PGAS y SG-SST** Según corresponda y se especifique en el contrato. Debe incluir Aval de la Interventoría de cumplimiento del Plan de Calidad, PGAS, SG-SST del Contratista de Obra.	**CUMPLE**		CORTE N°2 FEBRERO - Pag. 61
19	**Manifiesto RCD** Manifiesto o constancia de entrega de los Residuos de Construcción y Demolición.		**N/A**	
20	**Formato de registro y actualización PIN** Información para registro mensual de manejo de RCD, en la plataforma de la SDA		**N/A**	
21	**Planos récord** Planos récord finales firmados, de obras ejecutadas.		**N/A**	
22	**Bitácora de obra**		**N/A**	
23	Los demás que se especifiquen en el contrato inicial y/o sus modificaciones.			

NOTAS	
1	1. El Contratista efectuará la radicación de los documentos de pago, solo cuando cuente con el visto bueno de la Supervisión. En caso de devolución de los documentos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Contratista, los términos se reinician con la nueva
2	La factura podrá ser generada y remitida a la plataforma Olimpia IT, solo hasta que el corte, documentos de soporte y la factura sea aprobada por la Interventoría y el Supervisor.
3	Posterior a la remisión de la Factura por Olimpia IT, deberá ser cargada por el contratista en el SECOP II, en "Plan de pagos", junto con los documentos de la lista de chequeo marcados con
4	Los documentos restantes y demás solicitados contractualmente, así como actas de reunión, de NPs, informes y demás que hacen parte de la ejecución del contrato, deberán ser cargados por el contratista en el SECOP II, en "Documentos de ejecución del contrato".

Contrato 268 de 2022

3. Balance financiero del contrato de obra

Corte de obra N° 2, periodo del 28 enero 2023 al 28 de febrero 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

B- CORTES EJECUTADOS PARA PAGO

CONTRATO DE OBRA No. : 268 de 2022 (28 de DICIEMBRE de 2023)

OBJETO : Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de Justicia" Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá, D.C.

CONTRATISTA : INGENIERÍA RH SAS
CONSULTOR INTERVENTORIA : CONSORCIO INTER 2022

VALOR INICIAL : $ 989.251.663,00
ADICIONAL EN VALOR No. 1 :
VALOR TOTAL : $ 989.251.663,00
FECHA DE INICIO : 28-dic.-22
ADICIÓN EN PLAZO No. 1 : 116,0
ADICIÓN EN PLAZO No. 2 :
ADICIÓN EN PLAZO No. 3
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 26-abr.-23

PERIODO DEL CORTE : 29 de enero de 2023 al 28 de febrero de 2023.

A- RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

				0%	0%	100%	
CONCEPTO	MES/AÑO	TIPO OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	VALOR ACTA DE CORTE EJECUTADO	ANTICIPO AMORTIZADO 0%	VALOR ANTICIPO /SALDO POR AMORTIZAR	VALOR FACTURAS A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
ANTICIPO (Fact. No.)					$0,00	$0,00	$989.251.663,00
ACTA DE CORTE Nº 1 (Fact. No.)	Diciembre- Enero	Diseño	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
ACTA DE CORTE Nº 2 (Fact. No.)	Enero-Febrero	Diseño	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
ACTA DE CORTE Nº 3 (Fact. No.)			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
ACTA DE CORTE Nº 4 (Fact. No.)			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$989.251.663,00
TOTALES			**$0,00**		**$0,00**	**$0,00**	**$989.251.663,00**

SALDO POR EJECUTAR	**$989.251.663,00**

B- RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO	TIPO OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	FECHA	VALOR PAGADO		VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
ANTICIPO (Fact. No. __)			$0,00		$0,00	$989.251.663,00
ACTA DE CORTE Nº 1 (Fact. No. __)			$0,00		$0,00	$989.251.663,00
ACTA DE CORTE Nº 2 (Fact. No. ___)			$0,00		$0,00	$989.251.663,00
ACTA DE CORTE Nº 3 (Fact. No. ___)			$0,00		$0,00	$989.251.663,00
ACTA DE CORTE Nº 4 (Fact. No. __)			$0,00		$0,00	$989.251.663,00
TOTALES			**$0,00**		**$0,00**	**$989.251.663,00**

SALDO POR PAGAR	**$989.251.663,00**
VALOR A LIBERAR	**$0,00**

MARTHA LUCIA REY NAVARRO
Director de Obra
INGENIERÍA RH SAS
CONTRATISTA

YEISSON MANUEL TUIRAN ATENCIA
Director de Interventoria
CONSORCIO INTER 2022
Consultor Interventoría

Contrato 268 de 2022

6. Acta de Corte de obra N° 2

Corte de obra N° 2, periodo del 28 enero 2023 al 28 de febrero 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. **268 / 15 de diciembre de 2022**

OBJETO: Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de Justicia" Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá, D.C.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **2** PERIODO MES / AÑO **FEBRERO/2023** **FECHA:** 01/03/2023,

CONTRATISTA	:		**VR. INICIAL OBRA**	: **$ 989.251.663,00**	**LOCALIZACIÓN** : Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia"
		INGENIERÍA RH S.A.S.	**VR. ADICIONAL No.**	: **$ 0,00**	**FECHA INICIO** : 28/12/2022
NIT	:	830.061.440-1	**VR. ADICIONAL No.**	: **$ 0,00**	**PLAZO INICIAL** : 31/12/2022
DIRECCIÓN	:	Cran 56B #128 - 16	**VR. TOTAL**	: **$ 989.251.663,00**	**ADICIONAL EN PLAZO No. 1** : 116
TELÉFONO	:	601 624 5215			**ADICIONAL EN PLAZO No. 2** :
INTERVENTOR	:	**CONSORCIO INTER 2022 (PORCENTAJES DE CONSORCIADOS)**	**ANTICIPO** **0%**	: **$ 0,00**	**PLAZO TOTAL** : 26/04/2023
			AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	: **$ 0,00**	**FECHA SUSPENSIÓN No.** :
NIT	:	901.662.998-3	**SALDO ANTERIOR AMORTIZACION**	: **$ 0,00**	**FECHA REINICIACIÓN No.** :
DIRECCIÓN	:	Cra 43 #24a -61	**TOTAL AMORTIZADO**	: **$ 0,00**	
TELÉFONO	:	(601) 761 4568	**SALDO POR LEGALIZAR**	: **$ 0,00**	**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL** : 26/04/2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
									PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
FASE 1														
1A	**DISEÑO**				$ 76.503			$ 76.503		$ 0		$ 0		$ 0
1.1	Ajustes de diseño (Incluye diseño arquitectónico, elementos no estructurles, eléctricos y de cableado estructurado, aire acondicionado, seguridad, audio y video, presupuesto y especificaciones técnicas, conforme con los ajustes que el proyecto requiera según las necesidades de la entidad)	M2	1,0	$ 76.503,00	$ 76.503	-	-1,00	$ 76.503	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL antes de IVA				$ 76.503			$ 0		$ 0		$ 0	0,00	$ 0
	IVA		19%		$ 14.536			$ 0		$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1A	**TOTAL DISEÑO**				$ 91.039			$ 0		$ 0		$ 0	0,00	$ 0
FASE 2														
2A.	**OBRA CIVIL**													
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 713.090,00**			**$ 713.090**		**$ 0**		**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
1.1	Desmonte de silletería fija tipo auditorio. (Incluye retiro, trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 8.434,00	$ 8.434,00	-	-1,00	$ 8.434	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.2	Desmonte y retiro de tapete. (Incluye retiro, trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 12.524,00	$ 12.524,00	-	-1,00	$ 12.524	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.3	Desmonte de tarimas de madera sobrepuestas. (Incluye estructura y piso, retiro, trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 12.524,00	$ 12.524,00	-	-1,00	$ 12.524	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.4	Desmonte, restauración y mantenimiento mesas en madera sala 3. (Incluye retiro, trasiego, transporte, mantenimiento mecanismos pantallas y reinstalación en sitio)	UN	1,0	$ 61.522,00	$ 61.522,00	-	-1,00	$ 61.522	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.5	Desmonte, restauración y mantenimiento mesas en madera sala 2. (Incluye retiro, trasiego, transporte y reinstalación en sitio)	UN	1,0	$ 61.522,00	$ 61.522,00	-	-1,00	$ 61.522	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.6	Desmonte y restauración atriles en madera. (Inlcuye retiro, traslado trasiego, transporte	UN	1,0	$ 61.522,00	$ 61.522,00	-	-1,00	$ 61.522	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.7	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 7.674,00	$ 7.674,00	-	-1,00	$ 7.674	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.8	Desmonte de plafon en drywall y madera. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,0	$ 29.955,00	$ 29.955,00	-	-1,00	$ 29.955	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.9	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,0	$ 1.624,00	$ 1.624,00	-	-1,00	$ 1.624	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.10	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye desconexión y desmonte aparato, cableado, trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 13.163,00	$ 13.163,00	-	-1,00	$ 13.163	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.11	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 13.819,00	$ 13.819,00	-	-1,00	$ 13.819	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.12	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 7.013,00	$ 7.013,00	-	-1,00	$ 7.013	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.13	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de persianas de madera de 0,90x1.00m (ancho x largo)	UN	1,0	$ 93.846,00	$ 93.846,00	-	-1,00	$ 93.846	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.14	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de persianas de madera de 0,90x1.50m (ancho x largo)	UN	1,0	$ 140.769,00	$ 140.769,00	-	-1,00	$ 140.769	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.15	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de persianas de madera de 0,90x2.00m (ancho x largo)	UN	1,0	$ 156.410,00	$ 156.410,00	-	-1,00	$ 156.410	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.16	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 6.830,00	$ 6.830,00	-	-1,00	$ 6.830	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.17	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 6.950,00	$ 6.950,00	-	-1,00	$ 6.950	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.18	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 9.976,00	$ 9.976,00	-	-1,00	$ 9.976	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.19	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 7.013,00	$ 7.013,00	-	-1,00	$ 7.013	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
2	**MAMPOSTERÍA**				**$ 84.668,00**			**$ 84.668**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
2.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	1,0	$ 41.675,00	$ 41.675,00	-	-1,00	$ 41.675	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
2.2	Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,0	$ 42.993,00	$ 42.993,00	-	-1,00	$ 42.993	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
3	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**$ 93.954,00**			**$ 93.954**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
3.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos)	M2	1,0	$ 80.481,00	$ 80.481,00	-	-1,00	$ 80.481	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
3.2	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 13.473,00	$ 13.473,00	-	-1,00	$ 13.473	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
4	**ALISTADO DE PISOS, PAÑETES**				**$ 31.124,00**			**$ 31.124**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. **268 / 15 de diciembre de 2022**

OBJETO: Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de Justicia" Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá, D.C.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **2** PERIODO MES / AÑO **FEBRERO/2023** **FECHA:** 01/03/2023,

CONTRATISTA	:		**VR. INICIAL OBRA**	:	**$ 989.251.663,00**
		INGENIERÍA RH S.A.S.	**VR. ADICIONAL No.**	:	**$ 0,00**
			VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
NIT	:	830.061.440-1	**VR. TOTAL**	:	**$ 989.251.663,00**
DIRECCIÓN	:	Cran 56B #128 - 16			
TELÉFONO	:	601 624 5215	**ANTICIPO** **0%**	:	**$ 0,00**
INTERVENTOR	:	**CONSORCIO INTER 2022 (PORCENTAJES DE CONSORCIADOS)**	**AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __**	:	**$ 0,00**
			SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
NIT	:	901.662.998-3	**TOTAL AMORTIZADO**	:	**$ 0,00**
DIRECCIÓN	:	Cra 43 #24a -61	**SALDO POR LEGALIZAR**	:	**$ 0,00**
TELÉFONO	:	(601) 761 4568			

LOCALIZACIÓN	:	Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia"
FECHA INICIO	:	28/12/2022
PLAZO INICIAL	:	31/12/2022
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	116
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	26/04/2023
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	26/04/2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				OBRA EJECUTADA					
4.1	Alistado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,0	$ 16.457,00	$ 16.457,00	-	-1,00	$ 16.457	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
4.2	Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 14.667,00	$ 14.667,00	-	-1,00	$ 14.667	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
5	**CIELO RASOS**				**$ 57.361,00**			**$ 57.361**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
5.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel)	M2	1,0	$ 48.709,00	$ 48.709,00	-	-1,00	$ 48.709	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
5.2	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 8.652,00	$ 8.652,00	-	-1,00	$ 8.652	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
6	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 29.866,00**			**$ 29.866**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
6.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 5.918,00	$ 5.918,00	-	-1,00	$ 5.918	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
6.2	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 13.859,00	$ 13.859,00	-	-1,00	$ 13.859	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
6.3	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 10.089,00	$ 10.089,00	-	-1,00	$ 10.089	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
7	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**$ 412.902,00**			**$ 412.902**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
7.1	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 65.718,00	$ 65.718,00	-	-1,00	$ 65.718	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
7.2	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial. (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 88.527,00	$ 88.527,00	-	-1,00	$ 88.527	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
7.3	Enchape pared cerámica 30x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	1,0	$ 69.511,00	$ 69.511,00	-	-1,00	$ 69.511	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
7.4	Piso en Vinilo flotante tipo clic, tráfico comercial de alta resistencia.	M2	1,0	$ 189.146,00	$ 189.146,00	-	-1,00	$ 189.146	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
8	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**$ 3.272.049,00**			**$ 3.272.049**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
8.1	Sanitario de piso linea institucional con válvula antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye grifería, equipos, herrajes, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 847.343,00	$ 847.343,00	-	-1,00	$ 847.343	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
8.2	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 446.152,00	$ 446.152,00	-	-1,00	$ 446.152	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
8.3	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN	1,0	$ 861.021,00	$ 861.021,00	-	-1,00	$ 861.021	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
8.4	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 102.487,00	$ 102.487,00	-	-1,00	$ 102.487	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
8.5	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 182.535,00	$ 182.535,00	-	-1,00	$ 182.535	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
8.6	Dispensador institucional de toallas de papel en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 139.469,00	$ 139.469,00	-	-1,00	$ 139.469	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
8.7	Secador de manos institucional Potenza o similar en acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 669.720,00	$ 669.720,00	-	-1,00	$ 669.720	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
8.8	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 23.322,00	$ 23.322,00	-	-1,00	$ 23.322	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 1.766.853,00**			**$ 1.766.853**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
9.1	Salida interruptor sencillo, Tuberia EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 54.086,00	$ 54.086,00	-	-1,00	$ 54.086	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.2	Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 66.207,00	$ 66.207,00	-	-1,00	$ 66.207	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.3	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 73.404,00	$ 73.404,00	-	-1,00	$ 73.404	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.4	Salida interruptor conmutable sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 89.721,00	$ 89.721,00	-	-1,00	$ 89.721	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.5	Salidas interruptor conmutable doble. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 96.318,00	$ 96.318,00	-	-1,00	$ 96.318	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.6	Salida toma monofasica doble con polo a Tierra. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 54.325,00	$ 54.325,00	-	-1,00	$ 54.325	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.7	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN	1,0	$ 91.403,00	$ 91.403,00	-	-1,00	$ 91.403	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.8	Salida Tomacorriente red regulada L5-20R. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, marcación, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 74.009,00	$ 74.009,00	-	-1,00	$ 74.009	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.9	Salida Toma doble regulada 5-15R, a la vista. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería EMT, toma, marcación, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 124.583,00	$ 124.583,00	-	-1,00	$ 124.583	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.10	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 19.231,00	$ 19.231,00	-	-1,00	$ 19.231	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.11	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 18.711,00	$ 18.711,00	-	-1,00	$ 18.711	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. **268 / 15 de diciembre de 2022**

OBJETO: Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de Justicia" Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá, D.C.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **2** PERIODO MES / AÑO **FEBRERO/2023** **FECHA:** 01/03/2023,

CONTRATISTA	:		**VR. INICIAL OBRA**	:	**$ 989.251.663,00**
		INGENIERÍA RH S.A.S.	**VR. ADICIONAL No.**	:	**$ 0,00**
			VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
NIT	:	830.061.440-1	**VR. TOTAL**	:	**$ 989.251.663,00**
DIRECCIÓN	:	Cran 56B #128 - 16			
TELÉFONO	:	601 624 5215	**ANTICIPO** **0%**	:	**$ 0,00**
INTERVENTOR	:	**CONSORCIO INTER 2022 (PORCENTAJES DE CONSORCIADOS)**	**AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __**	:	**$ 0,00**
			SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
NIT	:	901.662.998-3	**TOTAL AMORTIZADO**	:	**$ 0,00**
DIRECCIÓN	:	Cra 43 #24a -61	**SALDO POR LEGALIZAR**	:	**$ 0,00**
TELÉFONO	:	(601) 761 4568			

LOCALIZACIÓN	:	Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia"
FECHA INICIO	:	28/12/2022
PLAZO INICIAL	:	31/12/2022
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	116
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	26/04/2023
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	26/04/2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
9.12	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 12.471,00	$ 12.471,00	-	-1,00	$ 12.471	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.13	Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 20.838,00	$ 20.838,00	-	-1,00	$ 20.838	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.14	Tubería EMT 1-1/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 23.849,00	$ 23.849,00	-	-1,00	$ 23.849	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.15	Tubo Conduit PVC 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 7.774,00	$ 7.774,00	-	-1,00	$ 7.774	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.16	Tubería Conduit de 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 8.334,00	$ 8.334,00	-	-1,00	$ 8.334	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.17	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 72.148,00	$ 72.148,00	-	-1,00	$ 72.148	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.18	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 51.520,00	$ 51.520,00	-	-1,00	$ 51.520	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.19	Salida iluminación, tubería PVC Conduit. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 62.140,00	$ 62.140,00	-	-1,00	$ 62.140	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.20	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 131.497,00	$ 131.497,00	-	-1,00	$ 131.497	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.21	Salida sensor control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 71.838,00	$ 71.838,00	-	-1,00	$ 71.838	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.22	Salida Sonido Ambiental. Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 29.640,00	$ 29.640,00	-	-1,00	$ 29.640	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.23	Salida Punto de Audio, Tubería 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 56.757,00	$ 56.757,00	-	-1,00	$ 56.757	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.24	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 3/4" PVC. Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 25.622,00	$ 25.622,00	-	-1,00	$ 25.622	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.25	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 1-1/2" PVC. Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 44.549,00	$ 44.549,00	-	-1,00	$ 44.549	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.26	Salidas para audio / microfono en tubo EMT de 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 80.670,00	$ 80.670,00	-	-1,00	$ 80.670	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.27	Salida de micrófono en tubería PVC conduit 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 55.862,00	$ 55.862,00	-	-1,00	$ 55.862	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.28	Salida Televisión. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 72.706,00	$ 72.706,00	-	-1,00	$ 72.706	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.29	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 176.640,00	$ 176.640,00	-	-1,00	$ 176.640	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
10	**LUMINARIAS**				**$ 3.578.741,00**			**$ 3.578.741**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
10.1	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,0	$ 273.098,00	$ 273.098,00	-	-1,00	$ 273.098	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
10.2	Lámpara Panel LED 30x120 cm, 45 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,0	$ 276.654,00	$ 276.654,00	-	-1,00	$ 276.654	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
10.3	Lámpara bala tipo LED 20 W JUPITER Sylvania o similar. Durabilidad mayor a 20.000 horas.(Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,0	$ 107.141,00	$ 107.141,00	-	-1,00	$ 107.141	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
10.4	Luminaria LED lineal de 3m tipo Infinity, regleta rectangular descolgar color blanco 300X3,5X3,5cm - 4612lm - 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240V - CRI>80 - COL	un	1,0	$ 501.413,00	$ 501.413,00	-	-1,00	$ 501.413	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
10.5	Luminaria LED lineal de 6m tipo Infinity, regleta rectangular descolgar color blanco 300x3,5x3,5cm - 4612lm - 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240V CRI>80 - COL	un	1,0	$ 975.391,00	$ 975.391,00	-	-1,00	$ 975.391	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
10.6	Luminaria LED lineal de 9m tipo Infinity, regleta rectangular descolgar color blanco 300X3,5X3,5cm - 4612lm - 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240V - CRI>80 - COL	un	1,0	$ 1.445.044,00	$ 1.445.044,00	-	-1,00	$ 1.445.044	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**$ 6.114.696,00**			**$ 6.114.696**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
11.1	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 91.215,00	$ 91.215,00	-	-1,00	$ 91.215	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.2	Bandeja portacables tipo malla. (Suministro e instalació. Incluye soportería y accesorios de instalación)	ML	1,0	$ 290.504,00	$ 290.504,00	-	-1,00	$ 290.504	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.3	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 6.447,00	$ 6.447,00	-	-1,00	$ 6.447	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.4	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 39.585,00	$ 39.585,00	-	-1,00	$ 39.585	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.5	Rack abierto de 2.10 mts con organizadores verticales de alta densidad frontal trasero. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 2.734.028,00	$ 2.734.028,00	-	-1,00	$ 2.734.028	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. **268 / 15 de diciembre de 2022**

OBJETO: Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de Justicia" Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá, D.C.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **2** PERIODO MES / AÑO **FEBRERO/2023** **FECHA:** 01/03/2023,

CONTRATISTA	:	**INGENIERÍA RH S.A.S.**	
NIT	:	830.061.440-1	
DIRECCIÓN	:	Cran 56B #128 - 16	
TELÉFONO	:	601 624 5215	
INTERVENTOR	:	**CONSORCIO INTER 2022 (PORCENTAJES DE CONSORCIADOS)**	
NIT	:	901.662.998-3	
DIRECCIÓN	:	Cra 43 #24a -61	
TELÉFONO	:	(601) 761 4568	

VR. INICIAL OBRA		:	**$ 989.251.663,00**	
VR. ADICIONAL No.		:	**$ 0,00**	
VR. ADICIONAL No.		:	**$ 0,00**	
VR. TOTAL		:	**$ 989.251.663,00**	
ANTICIPO	**0%**	:	**$ 0,00**	
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __		:	**$ 0,00**	
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION		:	**$ 0,00**	
TOTAL AMORTIZADO		:	**$ 0,00**	
SALDO POR LEGALIZAR		:	**$ 0,00**	

LOCALIZACIÓN	:	Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia"	
FECHA INICIO	:	28/12/2022	
PLAZO INICIAL	:	31/12/2022	
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	116	
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:		
PLAZO TOTAL	:	26/04/2023	
FECHA SUSPENSIÓN No.	:		
FECHA REINICIACIÓN No.	:		
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	26/04/2023	

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
11.6	Multitoma vertical para rack 10 salidas, 20 a, 120v. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 425.984,00	$ 425.984,00	-	-1,00	$ 425.984	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.7	Patch Panel de 48 puertos Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 1.026.243,00	$ 1.026.243,00	-	-1,00	$ 1.026.243	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.8	Organizador horizontal de 80x80 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 120.418,00	$ 120.418,00	-	-1,00	$ 120.418	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.9	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)	UN	1,0	$ 62.388,00	$ 62.388,00	-	-1,00	$ 62.388	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.10	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 7.051,00	$ 7.051,00	-	-1,00	$ 7.051	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.11	Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, Cat 6A, Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 51.242,00	$ 51.242,00	-	-1,00	$ 51.242	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.12	Patch cord de 10 pies Cat 6A, Gris. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 63.669,00	$ 63.669,00	-	-1,00	$ 63.669	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.13	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	1,0	$ 509.981,00	$ 509.981,00	-	-1,00	$ 509.981	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.14	Tablero electrico Tipo Pesado 30 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	1,0	$ 586.220,00	$ 586.220,00	-	-1,00	$ 586.220	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.15	Acometida 3x8 + 1x8 AWG., Cu., THHN/THWN-2. (Suministro e instalación. Incluye equipos, bornes, terminales, cintillos, tubería, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 20.424,00	$ 20.424,00	-	-1,00	$ 20.424	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.16	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 19.231,00	$ 19.231,00	-	-1,00	$ 19.231	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.17	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 2.830,00	$ 2.830,00	-	-1,00	$ 2.830	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.18	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 57.236,00	$ 57.236,00	-	-1,00	$ 57.236	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12	**AIRE ACONDICIONADO**				**$ 45.712.401,00**			**$ 45.712.401**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
12.1	Salida para instalación de cable de control 2x16 AWG Apantallado entre condensadora y manejadoras en ducto PVC 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 44.098,00	$ 44.098,00	-	-1,00	$ 44.098	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.2	Salida de fuerza para equipos del sistema de aire acondicionado. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 299.268,00	$ 299.268,00	-	-1,00	$ 299.268	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.3	Unidad condensadora Multi V,IV, sala fría 20 HP 220/3/60 Ref ARUV200BTS4 o similar. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 28.669.705,00	$ 28.669.705,00	-	-1,00	$ 28.669.705	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.4	Sistema completo de aire acondicionado tipo Ceiling Cassette 24000 BTU/H , 220V, 60hz. Incluye unidad Condensadora. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 8.095.028,00	$ 8.095.028,00	-	-1,00	$ 8.095.028	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.5	Controles inalámbricos. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 194.142,00	$ 194.142,00	-	-1,00	$ 194.142	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.6	Panel de control encendido apagado automatico- control remoto	UND	1,0	$ 677.775,00	$ 677.775,00	-	-1,00	$ 677.775	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.7	Tubería para refrigeracion aislada 1-1/8". (Suministro e instalación.Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 54.769,00	$ 54.769,00	-	-1,00	$ 54.769	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.8	Tubería para refrigeración aislada 1/2". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 36.373,00	$ 36.373,00	-	-1,00	$ 36.373	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.9	Tubería para refrigeración aislada 3/8". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 32.096,00	$ 32.096,00	-	-1,00	$ 32.096	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.10	Tubería para refrigeración aislada 5/8". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 45.365,00	$ 45.365,00	-	-1,00	$ 45.365	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.11	Conducto en lámina galvanizada calibre 24, para secciones de base de 10 pulgadas y altura variable. (Suministro e instalación. Incluye soportería)	ML	1,0	$ 98.809,00	$ 98.809,00	-	-1,00	$ 98.809	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.12	Conducto en lámina galvanizada calibre 24, para secciones de altura de 12 pulgadas y base variable. (Suministro e instalación. Incluye soportería)	ML	1,0	$ 126.802,00	$ 126.802,00	-	-1,00	$ 126.802	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.13	Rejillas de suministro RE 12"X12" L-RA-G. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 159.632,00	$ 159.632,00	-	-1,00	$ 159.632	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.14	ADECUACIONES DEL SISTEMA DE VENTILACION MECÁNICA EN PISO 9º Y 10º PISO - Se adecuará e instalará ducto metálico de 35 cm x 50 cm, (lamina galvanizada en cal 22) de sección cuadrada que permita extraer el aire de las zonas de baños. El ducto se empalma al sistema principal existente.	ML	1,0	$ 140.108,00	$ 140.108,00	-	-1,00	$ 140.108	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.15	EQUIPO DE VENTILACION MECÁNICA - En el decimo piso se suministrará e instalará un nuevo ventilador centrífugo de mayor capacidad que reemplazará al ventilador E-6 (es la numeracion del actual equipo en esa área del piso). El nuevo equipo será del tipo SP-CMX-250/ 2P- MOTOR 1.5 HP, 208 V, carcaza y soporte integrado acabado en pintura elctrostática. El item comprende el desmonte del antiguo equipo, trasiego y disposición final y todos los accesorios, soportes y ductería para la reinstalación en el mismo sitio del nuevo sistema de extracción.	UN	1,0	$ 7.038.431,00	$ 7.038.431,00	-	-1,00	$ 7.038.431	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
13	**ASEO Y VARIOS**				**$ 2.719,00**			**$ 2.719**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. **268 / 15 de diciembre de 2022**

OBJETO: Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de Justicia" Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá, D.C.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **2** PERIODO MES / AÑO **FEBRERO/2023** **FECHA:** 01/03/2023,

CONTRATISTA	:		**VR. INICIAL OBRA**	:	**$ 989.251.663,00**
		INGENIERÍA RH S.A.S.	**VR. ADICIONAL No.**	:	**$ 0,00**
			VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
NIT	:	830.061.440-1	**VR. TOTAL**	:	**$ 989.251.663,00**
DIRECCIÓN	:	Cran 56B #128 - 16			
TELÉFONO	:	601 624 5215	**ANTICIPO** **0%**	:	**$ 0,00**
INTERVENTOR	:	**CONSORCIO INTER 2022 (PORCENTAJES DE CONSORCIADOS)**	**AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __**	:	**$ 0,00**
			SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
NIT	:	901.662.998-3	**TOTAL AMORTIZADO**	:	**$ 0,00**
DIRECCIÓN	:	Cra 43 #24a -61	**SALDO POR LEGALIZAR**	:	**$ 0,00**
TELÉFONO	:	(601) 761 4568			

LOCALIZACIÓN	:	Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia"
FECHA INICIO	:	28/12/2022
PLAZO INICIAL	:	31/12/2022
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	116
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	26/04/2023
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	26/04/2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
13.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	1,0	$ 2.719,00	$ 2.719,00		-	-1,00	$ 2.719	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 61.870.424**				**$ 61.870.424,00**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
ADMINISTRACIÓN	**(17%)**				$ 10.517.972				$ 10.517.972,08		$ 0		$ 0		$ 0
IMPREVISTOS	**(3%)**				$ 1.856.113				$ 1.856.112,72		$ 0		$ 0		$ 0
UTILIDAD	**(5%)**				$ 3.093.521				$ 3.093.521,20		$ 0		$ 0		$ 0
IVA	**(19%)**				$ 587.769				$ 587.769,03		$ 0		$ 0		$ 0
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 77.925.799**				**$ 77.925.799,00**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
2B.	**MOBILIARIO Y EQUIPOS**														
1	**MOBILIARIO Y EQUIPOS**				**$ 3.722.352**				**$ 3.722.352,00**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
1.1	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN	1,0	$ 518.988,00	$ 518.988		-	-1,00	$ 518.988,00	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.2	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela. La silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordobán. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variará según el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordobán y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN	1,0	$ 365.156,00	$ 365.156		-	-1,00	$ 365.156,00	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.3	MESA MULTIPROPÓSITO APILABLE Suministro e instalación de Mesa de 1,40x0,70m h=+-0,75 multiproposito, con estructura en lámina CR Cal. 14, con acabado en pintura epoxi y electropulido, , accesorios y sistema abatible, Superficies en madera tipo táblex de 30mm madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), laminado de alta presión y Balance-Baker en la cara inferior, canto rígido temofundido de 2mm de color similar a la superficie de trabajo, Tablero Abatible con Sistema de bloqueo/desbloqueo, ruedas de goma negras de 65mm con freno, según ficha y diseño.	UN	1,0	$ 2.606.826,00	$ 2.606.826		-	-1,00	$ 2.606.826,00	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.4	MANTENIMIENTO DE SILLAS FIJAS TIPO AUDITORIO - mantenimiento general de las sillas de la marca registrada "Series", existentes en la sala. Incluye retapizado en cuero sintético, reemplazo de espuma y herrajes deteriorados utilizando piezas nuevas originales. Las sillas se anclan al piso o a la tarima elevada utilizando herrajes apropiados para segurar a la superficie de la base.	UN	1,0	$ 231.382,00	$ 231.382		-	-1,00	$ 231.382,00	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
2	**EQUIPOS TECNOLOGÍA**				**$ 15.272.927**				**$ 15.272.927,00**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
2.1	Pantalla industrial de 75" (operatividad 16/7) con resolución nativa 4K UHD 3840 x 2160 (16:9), 50,000 horas de vida útil (al 50% del brillo original), brillo de 400 nits, contraste de 1,400:1, espacio de color (CIE 1931) de 68%, entradas 4 x HDMI (Ver 2.0, HDCP 2.2), DisplayPort (Ver 1.2a, HDCP 1.3), OPS, USB 3.0, salidas de video DisplayPort 1.2a y HDMI 2.0, entrada de audio análoga RCA, slaida de audífonos de 3.5mm, salida óptica de audio, control por RS-232 y LAN (RJ45), soporte HDR10, conectividad por Wi-Fi y Miracast	UN	1,0	$ 14.337.546,00	$ 14.337.546		-	-1,00	$ 14.337.546,00	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
2.2	Soporte de pared para monitor, capacidad de carga mínima de 112 Kg, certificado UL y OSHPD	UN	1,0	$ 935.381,00	$ 935.381		-	-1,00	$ 935.381,00	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL antes de IVA				**$ 18.995.279,00**				**$ 18.995.279,00**						
	IVA		19%		$ 3.609.103,01				$ 3.609.103,01						
2B.	**SUBTOTAL 2B. MOBILIARIO Y EQUIPOS (Incluido IVA)**				**$ 22.604.382,01**				**$ 22.604.382,00**						

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. **268 / 15 de diciembre de 2022**

OBJETO: Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de Justicia" Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá, D.C.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **2** PERIODO MES / AÑO **FEBRERO/2023** **FECHA:** 01/03/2023,

CONTRATISTA	:	**INGENIERÍA RH S.A.S.**
NIT	:	830.061.440-1
DIRECCIÓN	:	Cran 56B #128 - 16
TELÉFONO	:	601 624 5215
INTERVENTOR	:	**CONSORCIO INTER 2022 (PORCENTAJES DE CONSORCIADOS)**
NIT	:	901.662.998-3
DIRECCIÓN	:	Cra 43 #24a -61
TELÉFONO	:	(601) 761 4568

VR. INICIAL OBRA		:	**$ 989.251.663,00**	**LOCALIZACIÓN**	: Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia"
VR. ADICIONAL No.		:	**$ 0,00**		
VR. ADICIONAL No.		:	**$ 0,00**	**FECHA INICIO**	: 28/12/2022
VR. TOTAL		:	**$ 989.251.663,00**	**PLAZO INICIAL**	: 31/12/2022
				ADICIONAL EN PLAZO No. 1	: 116
ANTICIPO	**0%**	:	**$ 0,00**	**ADICIONAL EN PLAZO No. 2**	:
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __		:	**$ 0,00**	**PLAZO TOTAL**	: 26/04/2023
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION		:	**$ 0,00**	**FECHA SUSPENSIÓN No.**	:
TOTAL AMORTIZADO		:	**$ 0,00**	**FECHA REINICIACIÓN No.**	:
SALDO POR LEGALIZAR		:	**$ 0,00**		
				FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	: 26/04/2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRA EJECUTADA**		
1A	**TOTAL DISEÑO (Incluido IVA)**	**$ 91.038,57**					
2A.	**TOTAL OBRA CIVIL + EQUIPOS (Incluido AIU e IVA)**	**$ 77.925.799,00**					
2B.	**TOTAL OBRA**	**$ 22.604.382,01**					
VALOR TOTAL (Incl. IVA)		**$ 100.621.220**			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$ 0**					
VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA	0%	**$ 0**					
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	0%	**$ 0**	**SON:**				

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
Representante Legal
INGENIERIA RH S.A.S.
CONTRATISTA

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
Representante Legal
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Contrato 268 de 2022

9. Informe Ejecutivo mensual Febrero 2023

Corte de obra N° 2, periodo del 28 enero 2023 al 28 de febrero 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No. **2** PERIODO: **DEL 28 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2023.**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Calle 12 N° 8-65, Palacio de justicia "Alfonso Lopez Echandía" , Bogotá D.C	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		4,6266296%	CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER 2022		CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**		
CONTRATO No.:	298 DE 2022		CONTRATO No.:	**268/2022**		
VALOR INICIAL:	$ 45.769.010,55		VALOR INICIAL:	**$**	**989.251.663,00**	
VALOR ADICIÓN 1:			VALOR ADICIÓN 1:	**$**	**-**	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	**$**	**-**	
VALOR ACTUALIZADO:	**$ 45.769.010,55**		VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**989.251.663,00**	
PLAZO INICIAL:	**45**		PLAZO INICIAL:			**31/12/2023**
PLAZO ACTUALIZADO:			PLAZO ACTUALIZADO:			**23/04/2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:	**N.A.**		
FECHA DE INICIACIÓN:	**28/12/2022**		FECHA DE INICIACIÓN:	**28/12/2022**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	**23/04/2023**		FECHA DE TERMINACIÓN:	**26/04/2023**		
VALOR EJECUTADO:	**$ -**	**0,00%**	VALOR EJECUTADO:	**$**	**-**	**0,00%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 45.769.010,55**	**100,00%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**989.251.663,00**	**100,00%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	1,08%	0,00%	-1,08%
Durante el periodo	0,86%	0,00%	-0,86%
Acumulado Actual	1,93%	0,00%	-1,93%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
120	63	57	-2,32

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

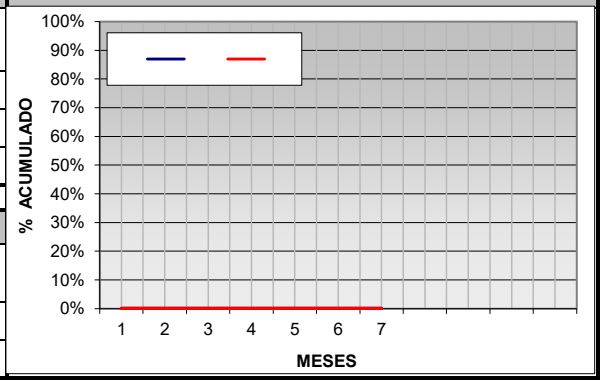


ACTIVIDADES EJECUTADAS
ACTIVIDAD EN FASE N° 1 (DISEÑOS)
Se realiza la observación que en esta fase NO se puede liquidar hasta la aprobación total de los diseños, por tal motivo el avance financiero y economico queda en 0 hasta la aprobación y entrega final de los requerimientos contractuales de esta Fase.

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

	MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
DISEÑO	DICIEMBRE	$ 1.207.974	$ -	0,00%
	ENERO	$ 9.361.800	$ -	0,00%
	FEBRERO	$ 8.455.819	$ -	0,00%
	MARZO	$ 9.059.806	$ -	0,00%
		$ -	$ -	0,00%
		$ -	$ -	0,00%
		$ -	$ -	0,00%
	VALOR TOTAL	**$ 28.085.399**	**$ -**	**0,00%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

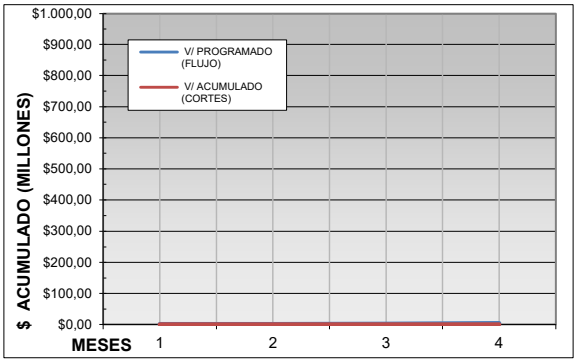

5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Contrato 268 de 2022

10. Facturación

Corte de obra N° 2, periodo del 28 enero 2023 al 28 de febrero 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Bogotá D.C. 28 de febrero de 2023

Señores
CONSORCIO INTER 2022
Atn: Ing. John William Casallas Jurado
Representante Legal
Interventoría del contrato de obra 268/2022

CONTRATO DE OBRA N° 268 DE 2022.

OBJETO: "CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: Exclusión de facturación CORTE N° 2.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace la aclaración que durante el periodo comprendido entre el **30 de enero de 2023 y 28 de febrero de 2023** correspondiente al **corte Nº 2**, no se genera facturación alguna al corte en mención, toda vez, que este corresponde a la FASE I (diseños), la cual se encuentra en etapa de anteproyecto, ajustes de diseños y validación por parte de los usuarios.

MARTHA LUCIA REY NAVARRO
DIRECTORA DE OBRA CONTRATO 268-2022
INGENIERIA RH S.A.S
Nit: 830.061.440-1

Contrato 268 de 2022

12. Certificación de pago de aportes por parte del revisor fiscal

Corte de obra N° 2, periodo del 28 enero 2023 al 28 de febrero 2023.


www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

MODELO CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONAS JURÍDICAS.

Yo, JORGE ALEJANDRO BOJACA DIAZ, identificado con 79.112.791 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 12907-TP de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INGENIERIA RH S.A.S identificado con Nit 830.061.440-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la factura, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los 28 días del mes de febrero de 2023.



JORGE ALEJANDRO BOJACA DIAZ
C.C.79.112.791 DE BOGOTA
T.P. 12907-T
REVISOR FISCAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.112.791**

BOJACA DIAZ

APELLIDOS

JORGE ALEJANDRO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-NOV-1955**

BOGOTA D.C

BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-FEB-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00200853-M-0079112791-20091130 **0018518368A 1** 1130107344



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

12907-T

JORGE ALEJANDRO
BOJACA DIAZ
C.C. 79112791
RESOLUCION INSCRIPCION 1068 FECHA 11/07/1985
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COSPEDRA RES RODRIGUEZ 20323



65804

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 9 C 5 F 9 9 3 7 1 B 2 9 C 8 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ALEJANDRO BOJACA DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79112791 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 12907-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Contrato 268 de 2022

13. Certificación de pago de planillas

Corte de obra N° 2, periodo del 28 enero 2023 al 28 de febrero 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-03-08, 03:12:27 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2023
Empresa	INGENIERIA RH SAS
NIT	NI 830061440
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1052544322
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1959703182
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 13.893.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	6	$ 1.633.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	4	$ 1.499.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	$ 4.625.500	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 320.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 66.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	8	$ 1.024.400	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	4	$ 364.000	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 46.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	$ 186.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 305.200	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	20	$ 1.829.700	$ 0
N891600091	CCF29	CCF DEL CHOCO	1	$ 80.000	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	19	$ 1.912.400	$ 0
		SubTotales:		$ 13.893.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 13.893.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79557480	CARLOS ALFREDO CASTRO HERNANDEZ	CALLE 8 A 79 - 25	6012643789	cdmarxants@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	I	13/06/2023	68481776	$263.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	101.500	0		0		0	116	14.200	0	115.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	130.000	0	0	0	0	116	18.200	0	148.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	101.500	115.700
Pensión	1	130.000	148.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	231.500	263.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79557480	CARLOS ALFREDO CASTRO HERNANDEZ		CALLE 8 A 79 - 25	6012643789	cdmarxants@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	I	13/06/2023	68481776	$263.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79557480	CASTRO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	3	0			N	X																230201	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS008	812.000	101.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CARLOS DANIEL TONGUINO BETANCOURTH**, identificada con **CC** número **10302168**, aportó por el empleado **CARLOS DANIEL TONGUINO BETANCOURTH**, identificado(a) con **CC** número **10302168** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **66122354** para el periodo de salud **2023-02** y pensiones **2023-02** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	INDICA TARIFA PENSIÓN	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
Cajas	CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	57	0															0		30	$1.160.000	0,02000			$23.200	$0	$0	Febrero - 2023	66122354	07/03/2023	N
Pensiones	230301	Porvenir	800224808	57	0															0		30	$1.160.000	0,16000			$185.600	$0	$0	Febrero - 2023	66122354	07/03/2023	N
Riesgos Laborales	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	57	0															0		30	$1.160.000	0,00522	1		$6.100	$0	$0	Febrero - 2023	66122354	07/03/2023	N
Salud	EPS005	Sanitas EPS	800251440	57	0															0		30	$1.160.000	0,12500			$145.000	$0	$0	Febrero - 2023	66122354	07/03/2023	N

PAGADA

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Marzo de 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79532705		CAMPOS CHINCHILLA DIEGO AMIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 16 134 52 casa 7	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4717900	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1959431880	9448097127	I	2023/03/02	2023/03/08	BANCO DE BOGOTA	6	$1,055,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$3,600,000	$21,600			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$3,600,000	$21,600			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$3,600,000	$21,600			$0	$0		$0	$0
1	CC 79532705	CAMPOS DIEGO	25-14	30	$3,600,000	$576,000	EPS008	30	$3,600,000	$450,000	CCF22	30	$3,600,000	$21,600		0	$0	$0	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$3,600,000	$21,600			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79532705		CAMPOS CHINCHILLA DIEGO AMIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 16 134 52 casa 7	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4717900	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1959431880	9448097127	I	2023/03/02	2023/03/08	BANCO DE BOGOTA	6	$1,055,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$576,000	$4,200	$0	$580,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$576,000	$4,200	$0	$580,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,600	$200	$0	$21,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$21,600	$200	$0	$21,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$450,000	$3,300	$0	$453,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$450,000	$3,300	$0	$453,300
TOTAL				**1**	**$1,047,600**	**$7,700**	**$0**	**$1,055,300**

Contrato 268 de 2022

14. Certificación de personal en condición de discapacidad.

Corte de obra N° 2, periodo del 28 enero 2023 al 28 de febrero 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

El empleo es de todos Mintrabajo	**PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL** **FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD**	**Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02** **Versión: 4.0** **Fecha: Enero 31 de 2021** **Página 1 de 1**

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	05EE2022741100000023435
FECHA RADICADO:	11/07/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	INGENIERIA R H S A S
IDENTIFICACIÓN:	830061440-1

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	13
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	7,69%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD01521.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 8 de agosto de 2022

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: : D Ramos

Contrato 268 de 2022

17. Informe de avance mensual FEBRERO 2023.

Corte de obra N° 2, periodo del 28 enero 2023 al 28 de febrero 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO 268 DE 2022

CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA" ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ, D.C.

INGENIERÍA RH

Enero 2023 – febrero 2023

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

INFORME TÉCNICO MENSUAL

PERIODO DEL 29 DE ENERO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONTRATO OBRA 268 DE 2022

OBJETO: "CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA" ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ D.C – CUNDINAMARCA
FEBRERO DE 2023.

Contenido

1 aspecto técnico 4
1.1 descripcion del proyecto: 4
1.2 alcance de las obras contratadas: 4
1.2.1 fase n° 1 (diseños): 4
1.2.2 fase n° 2 (obra civil y eléctrica): 4
1.3 localización: 4
1.4 actividades desarrolladas: 6
1.4.1 otras actividades realizadas: 7
1.5 presupuesto contractual suscrito 7
1.6 estructura de inversion contrato: 14
1.6.1 incidencia porcentual contractual: 14
1.7 avance de obra: 15
2 aspecto administrativo y legal del contrato 16

Ilustraciones:

Ilustración 1: Ubicación Palacio de justicia ALFONSO REYES ECHANDÍA-Bogotá D.C 5

Ilustración 2 : Bloque del piso noveno palacio de justicia 5

Ilustración 3:Distribución porcentual contrato suscrito de obra 268/2022. 15

Ilustración 4: Profesionales contrato 17

Tablas

Tabla 1: MATRIZ DE PRECIOS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA 268/2022 14

Tabla 2: Distribución porcentual contrato suscrito de obra 268/2022 14

1 ASPECTO TÉCNICO

1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El objeto del proyecto es: *"CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA" ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ, D.C.*

1.2 ALCANCE DE LAS OBRAS CONTRATADAS:

El alcance de las obras que se determinan dentro del objeto del contrato y localizadas en la inspección inicial de obra, se establece las diferentes etapas al desarrollo del proyecto; Fase 1: Diseños y Fase 2: Obras civiles y eléctricas:

1.2.1 FASE N° 1 (Diseños):

- ✓ Levantamiento arquitectónico y toma de medidas.
- ✓ Registro fotográfico actual de los espacios. (Sala n° 1, Sala n° 2 y Sala n° 3)
- ✓ Diseño Arquitectónico.
- ✓ Diseño de elementos no estructurales.
- ✓ Diseño de cableado eléctrico, cableado estructurado, audio, video, seguridad, y aires acondicionado.
- ✓ Presupuesto, cronograma y especificaciones técnicas.

1.2.2 FASE N° 2 (Obra civil y eléctrica):

- ✓ Actividades preliminares, desmontes de mobiliario, demoliciones, retiros de escombro.
- ✓ Mampostería y construcción de muros livianos (drywall y superboard)
- ✓ Alistados, morteros y afinados.
- ✓ Cielos rasos y acabados.
- ✓ Estucos y pinturas.
- ✓ Enchapes.
- ✓ Instalaciones eléctricas.
- ✓ Luminarias.
- ✓ Cableado estructurado.
- ✓ Sistema de ventilación mecánica (Extracción y aires acondicionados.)
- ✓ Suministro e instalación de mobiliario.
- ✓ Suministro e instalación de equipos tecnológicos.

1.3 LOCALIZACIÓN:



Ilustración 1: Ubicación Palacio de justicia ALFONSO REYES ECHANDÍA-Bogotá D.C



Ilustración 2 : Bloque del piso noveno palacio de justicia

1.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 29 de enero del 2023 y el 28 de febrero de 2023, se realizó gran avance en cuanto al desarrollo de la FASE N° 1 (diseños) del presente contrato, donde se gestionaron varias reuniones con el personal encargado de los espacios adentro del piso noveno (9°), determinando la espacialidad arquitectónica y el programa arquitectónico a realizar.

- Semana del 29 de enero al 05 de febrero del 2023.
    - Avance en el desarrollo arquitectónico de las salas N° 1, N°2 y N°3; Configuración del programa arquitectónico según retroalimentación de las magistradas.
    - Presentación de primeros acercamientos ajustados de imágenes tridimensionales (3D / Renders).

- Semana del 06 de febrero al 13 de febrero del 2023.
    - El 06 de febrero de 2023 se realiza reunión con la Magistrada Dra. Diana Alexandra Remolina, la interventoría y la supervisión del contrato; Donde se retroalimenta el proyecto y a cargo de la dra. Diana propone una reunión con el profesional y encargado de la producción de eventos del consejo superior de la judicatura. (Ing. Jhon Portella.)
    - Presentación de avance arquitectónico Versión N° 4 a interventoría y supervisión, realizando una mesa de trabajo conjunta para la retroalimentación de los diseños.
    - Ajuste de diseños en salas N° 1 y N° 3.

- Semana del 14 de febrero al 21 de febrero del 2023.
    - Presentación de la reprogramación y reajuste al cronograma inicial de diseños por parte del CONTRATISTA a solicitud de la INTERVENTORÍA.
    - Reunión virtual vía meets con interventoría para asentar y ultimar temas de diseños y espacialidad de las salas.
    - Presentación de cartilla de posibles mobiliarios y paletas de colores.
    - El 21 de febrero se realiza reunión virtual entre el contratista, y la interventoría, Donde se muestra avance del proyecto y producto arquitectónico, haciendo los ajustes dados por interventoría.
    - Reunión con el ingeniero de la entidad encargado en la producción cinemática y de televisión (Jhon Portella).

- Semana del 21 de febrero al 28 de febrero del 2023.
    - Presentación a interventoría y supervisión de los diseños en fase de anteproyecto para su revisión y aprobación.
    - El 22 de febrero se realiza reunión virtual entre el contratista, la supervisión del contrato y la interventoría.
    - Ajustes pertinentes al diseño arquitectónico presentado por INGENIERÍA RH SAS.
    - Presentación de imágenes realistas tridimensionales (Renders) 3 por espacios.
    - Reprogramación y ajuste del programa de diseño arquitectónico.

1.4.1 Otras actividades realizadas:

Actividades complementarias de búsqueda de cotizaciones y muestras de mobiliario y equipo especializado.

1.5 PRESUPUESTO CONTRACTUAL SUSCRITO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA

REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.

INGENIERIA RH SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
FASE 1	**FASE 1**				
1A	**DISEÑO**				**$ 76.503,00**
1.1	Ajustes de diseño (Incluye diseño arquitectónico, elementos no estructurales, eléctricos y de cableado estructurado, aire acondicionado, seguridad, audio y video, presupuesto y especificaciones técnicas, conforme con los ajustes que el proyecto requiera según las necesidades de la entidad)	M2	1,0	$ 76.503,00	$ 76.503,00
	SUBTOTAL antes de IVA				**$ 76.503,00**
	IVA		19%		$ 14.535,57
1A	**TOTAL DISEÑO**				**$ 91.038,57**

FASE 2	**FASE 2**				
2A.	**OBRA CIVIL**				
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 713.090,00**
1.1	Desmonte de silletería fija tipo auditorio. (Incluye retiro, trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 8.434,00	$ 8.434,00
1.2	Desmonte y retiro de tapete. (Incluye retiro, trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 12.524,00	$ 12.524,00
1.3	Desmonte de tarimas de madera sobrepuestas. (Incluye estructura y piso, retiro, trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 12.524,00	$ 12.524,00
1.4	Desmonte, restauración y mantenimiento mesas en madera sala 3. (Incluye retiro, trasiego, transporte, mantenimiento mecanismos pantallas y reinstalación en sitio)	UN	1,0	$ 61.522,00	$ 61.522,00
1.5	Desmonte, restauración y mantenimiento mesas en madera sala 2. (Incluye retiro, trasiego, transporte y reinstalación en sitio)	UN	1,0	$ 61.522,00	$ 61.522,00
1.6	Desmonte y restauración atriles en madera. (Incluye retiro, traslado trasiego, transporte	UN	1,0	$ 61.522,00	$ 61.522,00
1.7	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 7.674,00	$ 7.674,00
1.8	Desmonte de plafón en drywall y madera. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,0	$ 29.955,00	$ 29.955,00
1.9	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,0	$ 1.624,00	$ 1.624,00

1.10	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye desconexión y desmonte aparato, cableado, trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 13.163,00	$ 13.163,00
1.11	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 13.819,00	$ 13.819,00
1.12	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 7.013,00	$ 7.013,00
1.13	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de persianas de madera de 0,90x1.00m (ancho x largo)	UN	1,0	$ 93.846,00	$ 93.846,00
1.14	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de persianas de madera de 0,90x1.50m (ancho x largo)	UN	1,0	$ 140.769,00	$ 140.769,00
1.15	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de persianas de madera de 0,90x2.00m (ancho x largo)	UN	1,0	$ 156.410,00	$ 156.410,00
1.16	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 6.830,00	$ 6.830,00
1.17	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 6.950,00	$ 6.950,00
1.18	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 9.976,00	$ 9.976,00
1.19	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 7.013,00	$ 7.013,00
2	**MAMPOSTERÍA**				**$ 84.668,00**
2.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	1,0	$ 41.675,00	$ 41.675,00
2.2	Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,0	$ 42.993,00	$ 42.993,00
3	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**$ 93.954,00**
3.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos)	M2	1,0	$ 80.481,00	$ 80.481,00
3.2	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 13.473,00	$ 13.473,00
4	**ALISTADO DE PISOS, PAÑETES**				**$ 31.124,00**
4.1	Alistado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,0	$ 16.457,00	$ 16.457,00
4.2	Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 14.667,00	$ 14.667,00
5	**CIELO RASOS**				**$ 57.361,00**
5.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel)	M2	1,0	$ 48.709,00	$ 48.709,00
5.2	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 8.652,00	$ 8.652,00
6	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 29.866,00**
6.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 5.918,00	$ 5.918,00
6.2	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 13.859,00	$ 13.859,00
6.3	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 10.089,00	$ 10.089,00
7	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**$ 412.902,00**
7.1	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 65.718,00	$ 65.718,00
7.2	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial. (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 88.527,00	$ 88.527,00
7.3	Enchape pared cerámica 30x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	1,0	$ 69.511,00	$ 69.511,00
7.4	Piso en Vinilo flotante tipo clic, tráfico comercial de alta resistencia.	M2	1,0	$ 189.146,00	$ 189.146,00
8	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**$ 3.272.049,00**

8.1	Sanitario de piso linea institucional con válvula antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye grifería, equipos, herrajes, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 847.343,00	$ 847.343,00
8.2	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 446.152,00	$ 446.152,00
8.3	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN	1,0	$ 861.021,00	$ 861.021,00
8.4	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 102.487,00	$ 102.487,00
8.5	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 182.535,00	$ 182.535,00
8.6	Dispensador institucional de toallas de papel en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 139.469,00	$ 139.469,00
8.7	Secador de manos institucional Potenza o similar en acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 669.720,00	$ 669.720,00
8.8	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 23.322,00	$ 23.322,00
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 1.766.853,00**
9.1	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 54.086,00	$ 54.086,00
9.2	Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 66.207,00	$ 66.207,00
9.3	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 73.404,00	$ 73.404,00
9.4	Salida interruptor conmutable sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 89.721,00	$ 89.721,00
9.5	Salidas interruptor conmutable doble. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 96.318,00	$ 96.318,00
9.6	Salida toma monofasica doble con polo a Tierra. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 54.325,00	$ 54.325,00
9.7	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN	1,0	$ 91.403,00	$ 91.403,00
9.8	Salida Tomacorriente red regulada L5-20R. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, marcación, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 74.009,00	$ 74.009,00
9.9	Salida Toma doble regulada 5-15R, a la vista. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería EMT, toma, marcación, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 124.583,00	$ 124.583,00
9.10	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 19.231,00	$ 19.231,00
9.11	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 18.711,00	$ 18.711,00
9.12	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 12.471,00	$ 12.471,00
9.13	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 20.838,00	$ 20.838,00
9.14	Tubería EMT 1-1/4¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 23.849,00	$ 23.849,00
9.15	Tubo Conduit PVC 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 7.774,00	$ 7.774,00

9.16	Tubería Conduit de 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 8.334,00	$ 8.334,00
9.17	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 72.148,00	$ 72.148,00
9.18	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 51.520,00	$ 51.520,00
9.19	Salida iluminación, tubería PVC Conduit. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 62.140,00	$ 62.140,00
9.20	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 131.497,00	$ 131.497,00
9.21	Salida sensor control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 71.838,00	$ 71.838,00
9.22	Salida Sonido Ambiental. Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 29.640,00	$ 29.640,00
9.23	Salida Punto de Audio, Tubería 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 56.757,00	$ 56.757,00
9.24	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 3/4" PVC. Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 25.622,00	$ 25.622,00
9.25	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 1-1/2" PVC. Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 44.549,00	$ 44.549,00
9.26	Salidas para audio / micrófono en tubo EMT de 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 80.670,00	$ 80.670,00
9.27	Salida de micrófono en tubería PVC conduit 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 55.862,00	$ 55.862,00
9.28	Salida Televisión. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 72.706,00	$ 72.706,00
9.29	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 176.640,00	$ 176.640,00
10	**LUMINARIAS**				**$ 3.578.741,00**
10.1	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,0	$ 273.098,00	$ 273.098,00
10.2	Lámpara Panel LED 30x120 cm, 45 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,0	$ 276.654,00	$ 276.654,00
10.3	Lámpara bala tipo LED 20 W JUPITER Sylvania o similar. Durabilidad mayor a 20.000 horas.(Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,0	$ 107.141,00	$ 107.141,00
10.4	Luminaria LED lineal de 3m tipo Infinity, regleta rectangular descolgar color blanco 300X3,5X3,5cm - 4612lm - 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240V - CRI>80 - COL	un	1,0	$ 501.413,00	$ 501.413,00
10.5	Luminaria LED lineal de 6m tipo Infinity, regleta rectangular descolgar color blanco 300x3,5x3,5cm - 4612lm - 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240V CRI>80 - COL	un	1,0	$ 975.391,00	$ 975.391,00

10.6	Luminaria LED lineal de 9m tipo Infinity, regleta rectangular descolgar color blanco 300X3,5X3,5cm - 4612lm - 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240V - CRI>80 - COL	un	1,0	$ 1.445.044,00	$ 1.445.044,00
11	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**$ 6.114.696,00**
11.1	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 91.215,00	$ 91.215,00
11.2	Bandeja portacables tipo malla. (Suministro e instalació. Incluye soportería y accesorios de instalación)	ML	1,0	$ 290.504,00	$ 290.504,00
11.3	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 6.447,00	$ 6.447,00
11.4	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 39.585,00	$ 39.585,00
11.5	Rack abierto de 2.10 mts con organizadores verticales de alta densidad frontal trasero. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 2.734.028,00	$ 2.734.028,00
11.6	Multitoma vertical para rack 10 salidas, 20 a, 120v. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 425.984,00	$ 425.984,00
11.7	Patch Panel de 48 puertos Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 1.026.243,00	$ 1.026.243,00
11.8	Organizador horizontal de 80x80 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 120.418,00	$ 120.418,00
11.9	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)	UN	1,0	$ 62.388,00	$ 62.388,00
11.10	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 7.051,00	$ 7.051,00
11.11	Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, Cat 6A, Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 51.242,00	$ 51.242,00
11.12	Patch cord de 10 pies Cat 6A, Gris. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 63.669,00	$ 63.669,00
11.13	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	1,0	$ 509.981,00	$ 509.981,00
11.14	Tablero electrico Tipo Pesado 30 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	1,0	$ 586.220,00	$ 586.220,00
11.15	Acometida 3x8 + 1x8 AWG., Cu., THHN/THWN-2. (Suministro e instalación. Incluye equipos, bornes, terminales, cintillos, tubería, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 20.424,00	$ 20.424,00
11.16	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 19.231,00	$ 19.231,00
11.17	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 2.830,00	$ 2.830,00
11.18	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 57.236,00	$ 57.236,00
12	**AIRE ACONDICIONADO**				**$ 45.712.401,00**
12.1	Salida para instalación de cable de control 2x16 AWG Apantallado entre condensadora y manejadoras en ducto PVC 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 44.098,00	$ 44.098,00
12.2	Salida de fuerza para equipos del sistema de aire acondicionado. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 299.268,00	$ 299.268,00
12.3	Unidad condensadora Multi V,IV, sala fría 20 HP 220/3/60 Ref ARUV200BTS4 o similar. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 28.669.705,00	$ 28.669.705,00
12.4	Sistema completo de aire acondicionado tipo Ceiling Cassette 24000 BTU/H , 220V, 60hz. Incluye unidad Condensadora. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 8.095.028,00	$ 8.095.028,00

12.5	Controles inalámbricos. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 194.142,00	$ 194.142,00
12.6	Panel de control encendido apagado automático- control remoto	UND	1,0	$ 677.775,00	$ 677.775,00
12.7	Tubería para refrigeración aislada 1-1/8". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 54.769,00	$ 54.769,00
12.8	Tubería para refrigeración aislada 1/2". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 36.373,00	$ 36.373,00
12.9	Tubería para refrigeración aislada 3/8". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 32.096,00	$ 32.096,00
12.10	Tubería para refrigeración aislada 5/8". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 45.365,00	$ 45.365,00
12.11	Conducto en lámina galvanizada calibre 24, para secciones de base de 10 pulgadas y altura variable. (Suministro e instalación. Incluye soportería)	ML	1,0	$ 98.809,00	$ 98.809,00
12.12	Conducto en lámina galvanizada calibre 24, para secciones de altura de 12 pulgadas y base variable. (Suministro e instalación. Incluye soportería)	ML	1,0	$ 126.802,00	$ 126.802,00
12.13	Rejillas de suministro RE 12"X12" L-RA-G. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 159.632,00	$ 159.632,00
12.14	ADECUACIONES DEL SISTEMA DE VENTILACION MECÁNICA EN PISO 9º Y 10º PISO - Se adecuará e instalará ducto metálico de 35 cm x 50 cm, (lámina galvanizada en cal 22) de sección cuadrada que permita extraer el aire de las zonas de baños. El ducto se empalma al sistema principal existente.	ML	1,0	$ 140.108,00	$ 140.108,00
12.15	EQUIPO DE VENTILACION MECÁNICA - En el décimo piso se suministrará e instalará un nuevo ventilador centrífugo de mayor capacidad que reemplazará al ventilador E-6 (es la numeración del actual equipo en esa área del piso). El nuevo equipo será del tipo SP-CMX-250/ 2P- MOTOR 1.5 HP, 208 V, carcaza y soporte integrado acabado en pintura electrostática. El ítem comprende el desmonte del antiguo equipo, trasiego y disposición final y todos los accesorios, soportes y ductería para la reinstalación en el mismo sitio del nuevo sistema de extracción.	UN	1,0	$ 7.038.431,00	$ 7.038.431,00
13	**ASEO Y VARIOS**				**$ 2.719,00**
13.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	1,0	$ 2.719,00	$ 2.719,00
	SUBTOTAL				**$ 61.870.424,00**
	Administración		17%		$ 10.517.972,08
	Imprevistos		3%		$ 1.856.112,72
	Utilidad		5%		$ 3.093.521,20
	IVA sobre utilidad		19%		$ 587.769,03
2A.	**SUBTOTAL 2A. OBRA CIVIL**				**$ 77.925.799,03**

2B.	**MOBILIARIO Y EQUIPOS**				
1	**MOBILIARIO Y EQUIPOS**				**$ 3.722.352**

1.1	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara según el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordoban y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en	UN	1,0	$ 518.988,00	$ 518.988
1.2	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela. La silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordobán. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variará según el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordobán y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en	UN	1,0	$ 365.156,00	$ 365.156
1.3	MESA MULTIPROPÓSITO APILABLE Suministro e instalación de Mesa de 1,40x0,70m h=+-0,75 multiproposito, con estructura en lámina CR Cal. 14, con acabado en pintura epoxi y electropulido, , accesorios y sistema abatible, Superficies en madera tipo táblex de 30mm madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), laminado de alta presión y Balance-Baker en la cara inferior, canto rígido temofundido de 2mm de color similar a la superficie de trabajo, Tablero Abatible con Sistema de bloqueo/desbloqueo, ruedas de goma negras de 65mm con freno, según ficha y diseño.	UN	1,0	$ 2.606.826,00	$ 2.606.826
1.4	MANTENIMIENTO DE SILLAS FIJAS TIPO AUDITORIO - mantenimiento general de las sillas de la marca registrada "Series", existentes en la sala. Incluye retapizado en cuero sintético, reemplazo de espuma y herrajes deteriorados utilizando piezas nuevas originales. Las sillas se anclan al piso o a la tarima elevada utilizando herrajes apropiados para segurar a la superficie de la base.	UN	1,0	$ 231.382,00	$ 231.382
2	**EQUIPOS TECNOLOGÍA**				**$ 15.272.927**
2.1	Pantalla industrial de 75" (operatividad 16/7) con resolución nativa 4K UHD 3840 x 2160 (16:9), 50,000 horas de vida útil (al 50% del brillo original), brillo de 400 nits, contraste de 1,400:1, espacio de color (CIE 1931) de 68%, entradas 4 x HDMI (Ver 2.0, HDCP 2.2), DisplayPort (Ver 1.2a, HDCP 1.3), OPS, USB 3.0, salidas de video DisplayPort 1.2a y HDMI 2.0, entrada de audio análoga RCA, slaida de audífonos de 3.5mm, salida óptica de audio, control por RS-232 y LAN (RJ45), soporte HDR10, conectividad por Wi-Fi y Miracast	UN	1,0	$ 14.337.546,00	$ 14.337.546
2.2	Soporte de pared para monitor, capacidad de carga mínima de 112 Kg, certificado UL y OSHPD	UN	1,0	$ 935.381,00	$ 935.381
	SUBTOTAL antes de IVA				**$ 18.995.279,00**
	IVA		19%		$ 3.609.103,01
2B.	**SUBTOTAL 2B. MOBILIARIO Y EQUIPOS (Incluido IVA)**				**$ 22.604.382,01**

2A.	SUBTOTAL 2A. OBRA CIVIL				$ 77.925.799,03
2B.	SUBTOTAL 2B. MOBILIARIO Y EQUIPOS (Incluido IVA)				$ 22.604.382,01
	TOTAL OBRA + MOBLIARIO Y EQUIPOS (A + B)				**$ 100.530.181,04**

1A	**TOTAL DISEÑO (Incluido IVA)**	**$ 91.038,57**
2A.	**TOTAL OBRA CIVIL (Incluido AIU e IVA)**	**$ 100.530.181,04**
2B.	**TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPOS (Incluido IVA)**	**$ 100.621.219,61**

Tabla 1: MATRIZ DE PRECIOS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA 268/2022

1.6 ESTRUCTURA DE INVERSION CONTRATO:

Se estructura el proceso con un listado de actividades de precios unitarios con valores fijos, Donde se ejecuta en el modelo de matriz de desarrollo progresivo en la cual, se determinen las cantidades reales y definitivas de obra, (Terminación de la FASE N° 1), llegando al valor final contractual de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($989.251.663,00).

1.6.1 INCIDENCIA PORCENTUAL CONTRACTUAL:

CONTRATO DE OBRA 268/2022			
ACTIVIDADES	VR. INVERSIÓN		% INCIDENCIA
DISEÑO	$	91.038,57	0,09%
OBRA CIVIL	$	77.925.799,03	77,44%
MOBILIARIO Y EQUIPOS	$	22.604.382,01	22,46%
VR TOTAL UNITARIOS	$	100.621.219,61	100,00%
VR TOTAL CONTRATO	$		989.251.663,00

Tabla 2: Distribución porcentual contrato suscrito de obra 268/2022



	DISEÑO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO Y EQUIPOS
VALORES	$91,038.57	$77,925,799.03	$22,604,382.01
INCIDENCIA PORCENTUAL	0.09%	77.44%	22.46%

Ilustración 3:Distribución porcentual contrato suscrito de obra 268/2022.

1.7 AVANCE DE OBRA:

El avance de obra se encuentra supeditado al aval de aprobación de la FASE N° 1 (Diseños), la cual se ha realizado un avance según programación del 70 % de ejecución de la actividad total, Actividad a liquidación previa aprobación final de diseños.

2 ASPECTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO

A continuación, se presentan las condiciones contractuales suscritas con, la NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. mediante contrato de obra:

CONTRATO No.	268 DE 2022
OBJETO	Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de Justicia" Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá, D.C.
PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA No. 06 DE 2022
CONTRATANTE	NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONTRATISTA	INGENIERIA RH S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
VALOR TOTAL DEL COTRATO	NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($989.251.663)INCLUIDO IVA Y AIU.
FECHA DE INICIO	28/12/2022
FECHA DE TERMINACION	31/12/2022
MODIFICATORIO N°1	PRÓRROGA N° 1 POR 116 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO N° 1	26/14/2023
POLIZAS	No. 21-44-101402157 ANEXO: 0 EXPEDIDA 16/12/2022 No. 21-40-101202552 ANEXO: 0 EXPEDIDA 16/12/2022 No. 21-44-101402157 ANEXO: 1 EXPEDIDA 30/12/2022 No. 21-40-101202552 ANEXO: 1 EXPEDIDA 30/12/2022 No. 21-40-101202552 ANEXO: 2 EXPEDIDA 27/01/2023
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES

POLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA (desde-hasta)	VALOR ASEG.	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN.
21-44-101402157	Seguros del Estado	-Cumplimiento del contrato.	15/12/2022 – 30/06/2023	$197.850.333,00	16/12/2022	
		-Calidad de servicio	15/12/2022 – 30/06/2023	$197.850.333,00		
		-Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Sí ampara 2 años, 0 meses y 0 días.	$98.925.167,00		
		-Estabilidad y calidad de la obra	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días.	$197.850.333,00		
		-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	15/12/2022 – 31/12/2025	$98.925.167,00		
21-40-101202552	seguros del estado	-Predios labores y operación.	15/12/2022 – 31/12/2022	$200.000.000,00	16/12/2022	
		-Contratista y subcontratistas.	15/12/2022 – 31/12/2022	$200.000.000,00		
		-Vehículos propios y no propios.	15/12/2022 – 31/12/2022	$200.000.000,00		
21-44-101402157	seguros del estado	-Cumplimiento del contrato.	15/12/2022 – 26/10/2023	$197.850.333,00	30/12/2022	
		-Calidad de servicio	15/12/2022 – 26/10/2023	$197.850.333,00		
		-Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Sí ampara 2 años, 0 meses y 0 días.	$98.925.167,00		
		-Estabilidad y calidad de la obra	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días.	$197.850.333,00		

		-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	15/12/2022 – 16/04/2026	$98.925.167,00		
21-40-101202552	seguros del estado	-Predios labores y operación.	15/12/2022 – 26/04/2023	$200.000.000,00	30/12/2022	
		-Contratista y subcontratistas.	15/12/2022 – 26/04/2023	$200.000.000,00		
		-Vehículos propios y no propios.	15/12/2022 – 26/04/2023	$200.000.000,00		
21-40-101202552	seguros del estado	-Predios labores y operación.	15/12/2022 – 26/04/2023	$260.121.200,00	27/01/2023	
		-Contratista y subcontratistas.	15/12/2022 – 26/04/2023	$260.121.200,00		
		-Vehículos propios y no propios.	15/12/2022 – 26/04/2023	$260.121.200,00		

El aspecto administrativo del contrato, está conformado por el personal profesional de INGENIERIA RH SAS, ofertado y conformado por los siguientes perfiles profesionales de acuerdo con los términos de contratación:

No.	PROFESIONALES TECNICOS – ADMINISTRATIVOS CONTRATO FASE N° 1	
1	DIRECTOR DE DISEÑOS – Arquitecto	50% de dedicación.
2	DISEÑADOR – Arquitecto.	50% de dedicación.
3	DISEÑADOR ELECTRICO – Ing. Eléctrico o electricista.	20% de dedicación.
4	DISEÑADOR DE EQUIPOS TECNOLOGICOS – Ing. De sistemas o electrónico.	20% de dedicación.
No.	PROFESIONALES TECNICOS – ADMINISTRATIVOS CONTRATO FASE N° 2	
1	DIRECTOR DE OBRA – Arquitecto Y/o Ingeniero civil.	50% de dedicación.
2	RESIDENTE DE OBRA 1 – Arquitecto y/o Ingeniero civil.	100% de dedicación.
3	RESIDENTE DE OBRA 2 – Ing. Electrónico o de sistemas.	50% de dedicación.
4	RESIDENTE DE SST –Técnico o tecnólogo en el área de salud en el trabajo.	30% de dedicación.
5	MAESTRO DE OBRA. – Técnico o tecnólogo en obras civiles.	100% de dedicación.

Ilustración 4: Profesionales contrato

Se anexan los registros fotográficos de las actividades desarrolladas durante este periodo, junto con la programación y la documentación de afiliación del personal de obra que viene laborando en el contrato.


Cordialmente,


Arq. Martha Lucia Rey Navarro
Director(a) de obra y diseño
INGENIERIA RH SAS

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICOS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 /6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO. SALA N° 1

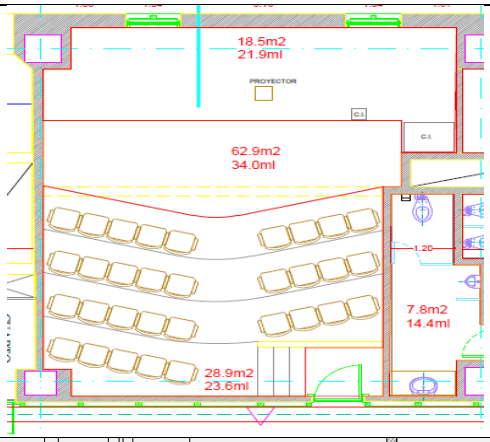

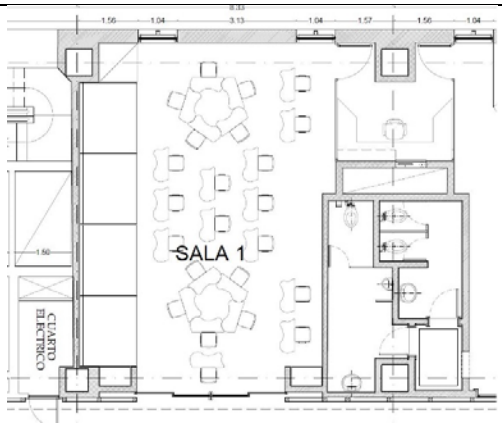













REGISTRO FOTOGRÁFICO. SALA N° 2

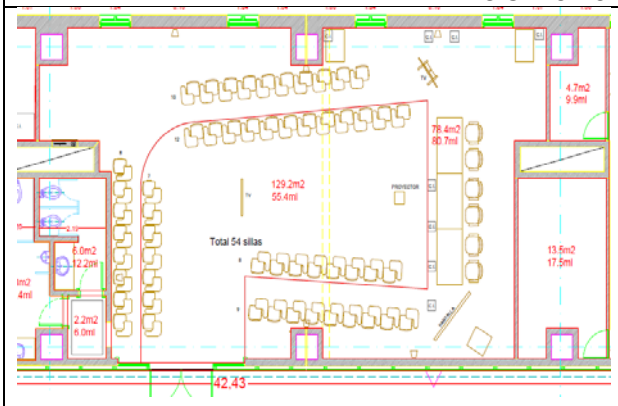

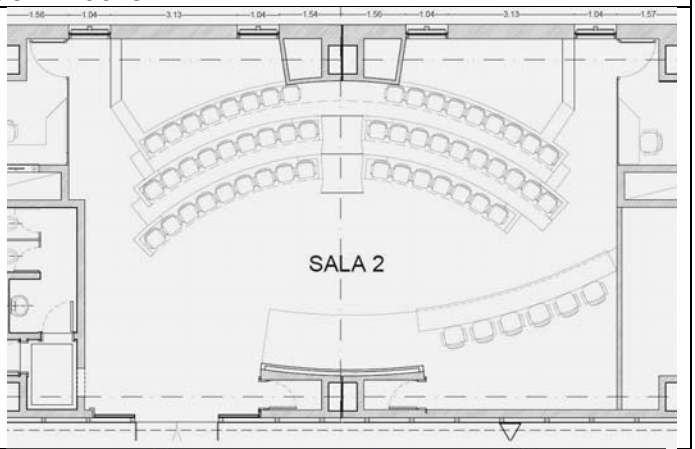

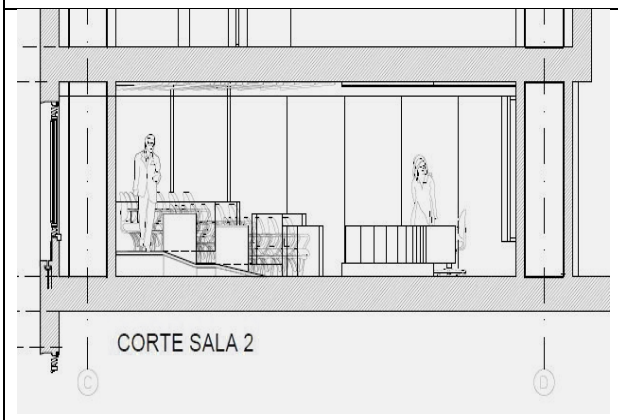


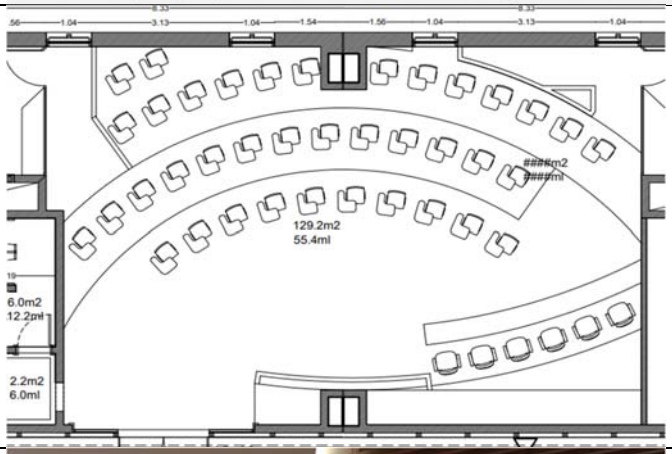






REGISTRO FOTOGRÁFICO. SALA N° 3

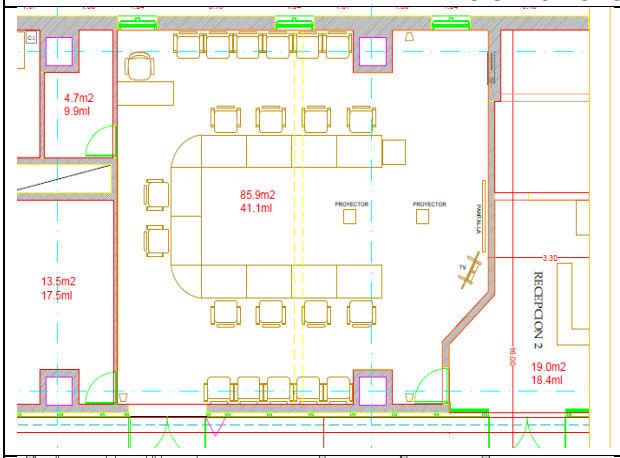

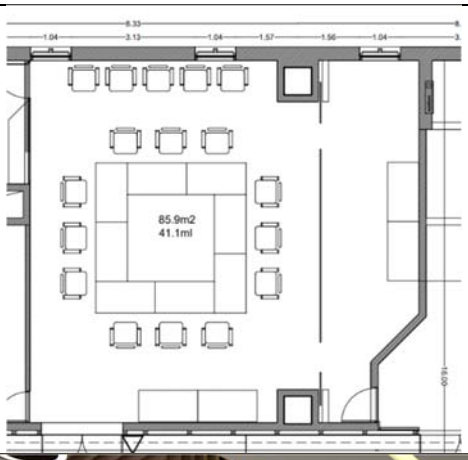










ANEXO DE RE- PROGRAMACIÓN (FASE N° 1)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**CONTRATO 268/2022**	**73 días**	**mié 28/12/22**	**vie 10/03/23**	
2		**FASE 1**	**73 días**	**mié 28/12/22**	**vie 10/03/23**	
3		1. Acta de inicio	0 días	mié 28/12/22	mié 28/12/22	
4		1.1. Preeliminares	8 días	mié 28/12/22	mié 4/01/23	
5		1.2. Levantamiento arquitectónico, registro fotográfico actual, actas de vecindad y ajuste planimetrias	10 días	lun 2/01/23	mié 11/01/23	4CC+5 días
6		1.3. Primera aproximación arquitectónica	7 días	jue 12/01/23	mié 18/01/23	5
7		1.4. Reunión de avance Nº 1	1 día	jue 19/01/23	jue 19/01/23	6
8		1.5. Busqueda e investigación de referentes, presentación de bosquejos	3 días	jue 19/01/23	sáb 21/01/23	7CC-1 día
9		1.6. Reunión de avance Nº2 (Magistrados)	1 día	lun 23/01/23	lun 23/01/23	8CC
10		1.7. Esquema básico	5 días	mar 24/01/23	sáb 28/01/23	9
11		1.8. Revisión de diseños por parte de interventoría y entidad	2 días	sáb 4/02/23	dom 5/02/23	10
12		1.9. Ajuste a esquemas básicos	3 días	dom 5/02/23	mar 7/02/23	11FC-1 día
13		1.10. Anteproyecto Nº 1	7 días	mié 8/02/23	mar 14/02/23	12
14		**Presupuesto fase 2 (APUs, cronograma, especificaciones)**	25 días	vie 10/02/23	lun 6/03/23	13CC+2 días
15		1.11. Revisión y ajuste a diseños presentados en anteproyecto Nº 1	5 días	mié 15/02/23	dom 19/02/23	13
16		1.12. Anteproyecto Nª 2	9 días	lun 20/02/23	mar 28/02/23	15
17		1.13. Revisión y ajuste a diseños presentados en anteproyecto Nª 2	3 días	mié 1/03/23	vie 3/03/23	16
18		1.14. Presentación de proyecto final (renders, memorias, planos y presupuesto)	7 días	sáb 4/03/23	vie 10/03/23	17
19		**Presentación final**	1 día	vie 10/03/23	vie 10/03/23	18FC-1 día;14

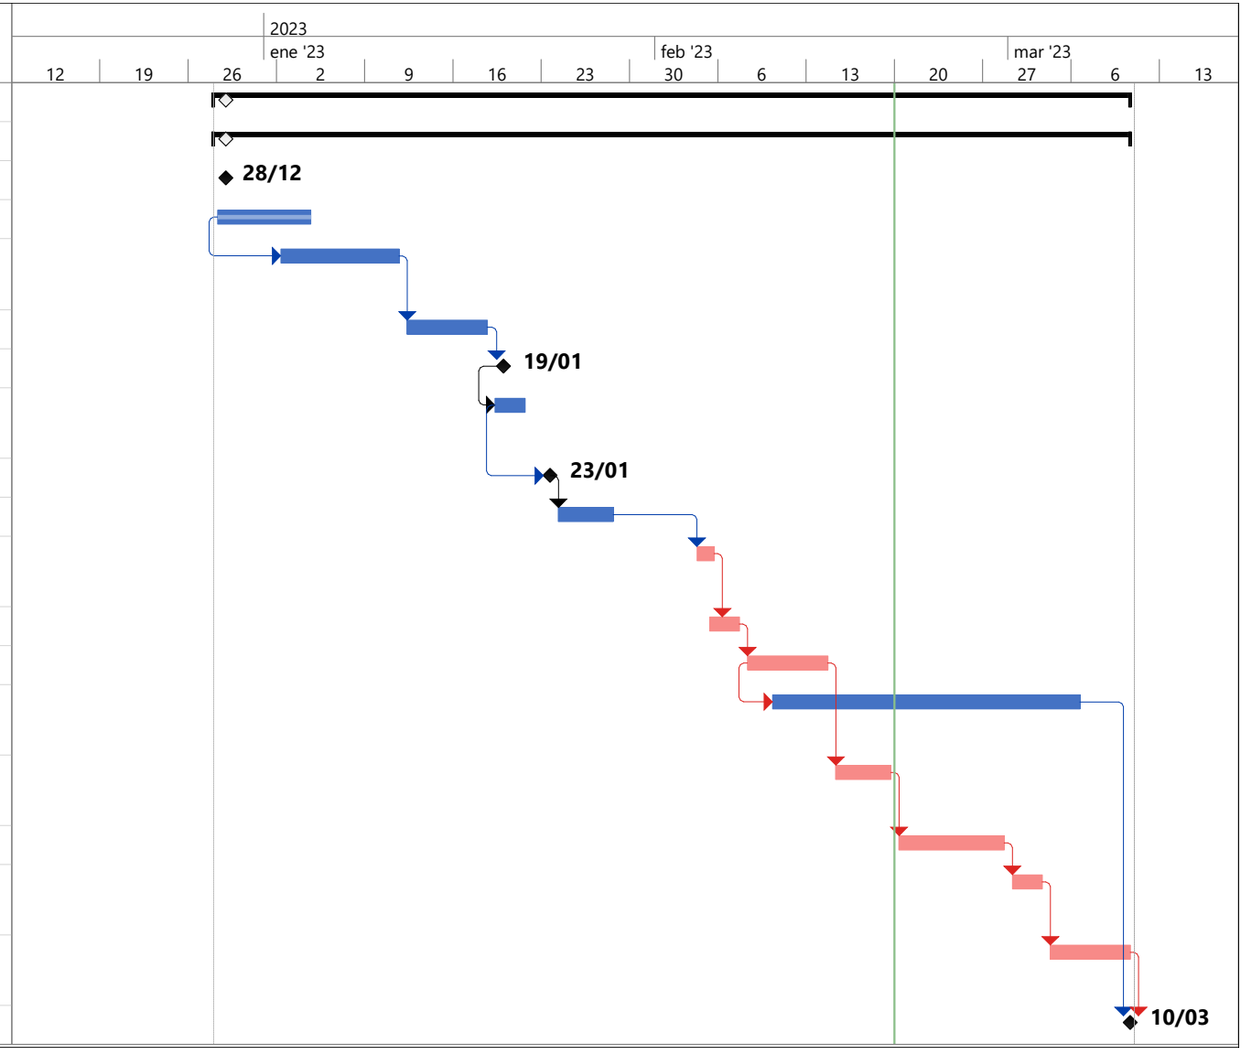

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: lun 20/02/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

ANEXO PLANILLAS DE AFILIACION PERSONAL DE INGENIERIA RH SAS ENERO – FEBRERO 2023

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-02-09, 03:57:02 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2023
Empresa	INGENIERIA RH SAS
NIT	NI 830061440
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1051702992
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1909674468
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 13.764.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	6	$ 1.633.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3	$ 1.440.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	$ 4.625.600	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 320.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 66.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	7	$ 1.009.400	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	4	$ 364.100	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD	1	$ 46.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 186.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 305.300	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	19	$ 1.789.400	$ 0
N891600091	CCF29	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO	1	$ 80.000	$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	18	$ 1.897.600	$ 0
		SubTotales:		$ 13.764.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 13.764.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Contrato 268 de 2022

18. Informe de PGAS y SG-SST

Corte de obra N° 2, periodo del 28 enero 2023 al 28 de febrero 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Bogotá D.C. 28 de febrero de 2023

Señores
CONSORCIO INTER 2022
Atn: Ing. John William Casallas Jurado
Representante Legal
Interventoría del contrato de obra 268/2022

CONTRATO DE OBRA N° 268 DE 2022.

OBJETO: "CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: Justificación presentación Informe PGAS.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace la aclaración que durante el periodo comprendido entre el **31 de enero de 2023 y 28 de febrero de 2023** correspondiente al **corte Nº 2**, no se generó informe PGAS y SST, toda vez, que este periodo corresponde a la FASE I (diseños), la cual se encuentra en etapa de anteproyecto, ajustes de diseños y validación por parte de los usuarios.

MARTHA LUCIA REY NAVARRO
DIRECTORA DE OBRA CONTRATO 268-2022
INGENIERIA RH S.A.S
Nit: 830.061.440-1
