Contrato 268 de 2022

1. Oficio de radicación

Corte de obra N° 3, periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo del 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Bogotá D.C. 31 de marzo de 2023 **Radicado N° RH268-12A-2022**

Señores
CONSORCIO INTER 2022
Atn: Ing. John William Casallas Jurado
Representante Legal
Interventoría del contrato de obra 268/2022

CONTRATO DE OBRA N° 268 DE 2022.

OBJETO: "CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: Presentación Corte de obra N°3.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega de la documentación relacionada del Corte N°3, del contrato de obra N° 268-2022; del cual hacen parte los archivos relacionados a continuación:

1.) Oficio de radicación
2.) Lista de chequeo.
3.) Balance financiero
6.) Acta de corte de obra N°3
9.) Informe ejecutivo mensual.
10.) Facturación. (Oficio remisorio de NO facturación)
12.) Certificación de pago de aportes parafiscales.
13.) Certificación de pago de planillas.
14.) Certificación de personal en condición de discapacidad.
17.) Informe de avance mensual.
18.) Informe de PGAS y SG-SST.
21.) Planos Record

Cordialmente.

Martha Lucia Rey Navarro
Director(a) de obra
INGENIERIA RH S.A.S
Nit: 830.061.440-1

Contrato 268 de 2022

2. Lista de chequeo

Corte de obra N° 3, periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo del 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Contrato No.	268-2023
Contratista	INGENIERIA RH SAS
Nit.	830.061.440-1
Corte No.	**3**

	LISTA DE CHEQUEO **RECEPCIÓN DE CUENTAS PARA PAGOS DE CONTRATOS**			
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**N/A**	**Pg o Archivo**
1*	**Oficio de radicación** Relacionando claramente entre otra información, contrato, corte y documentos anexos.	**CUMPLE**		CORTE N°3 MARZO - Pag. 2
2*	**Formato Lista de checheo.** Anexar la verificación de los documentos relacionados en esta lista de chequeo.	**CUMPLE**		CORTE N°3 MARZO - Pag. 4, 5
3*	**Balance Financiero del Contrato de Obra** Debidamente verificado y firmado por el Contratista.	**CUMPLE**		CORTE N°3 MARZO - Pag. 7
4*	**Certificado de cumplimiento del servicio prestado** Expedido por la Interventoría del contrato del cumplimiento a las obligaciones.			
5*	**Estado y manejo del Anticipo**		**N/A**	
a	**Certificado de consignación Rendimientos Financieros** Soporte o certificación de consignación de Rendimientos Financieros a la Dirección del Tesoro Público		**N/A**	
b	**Certificado de consignación Excedentes del Anticipo** Soporte o certificación de consignación de Excedentes de Recursos a la Dirección del Tesoro Público		**N/A**	
c	**Certificado de Inversión del Anticipo** Extracto o certificación de inversión del anticipo.		**N/A**	
d	**Certificado de Liquidación Fiducia** Certificado de liquidación de la fiducia, expedido por la fiduciaria.		**N/A**	
6*	**Acta recibo parcial / final del Contrato** Acta de corte debidamente firmada por Contratista e Interventoría		**N/A**	
7*	**Memorias de cantidades** Formatos firmados por Contratista e Interventoría		**N/A**	
8*	**Acta de entrega y recibo final de obra** Copia del Acta de entrega y recibo final de obra, en el cual debe quedar constancia que los items que se ejecutaron, cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones técnicas contratadas, debidamente suscrita por contratista, interventoría, supervisor y quien corresponda por parte de la entidad.		**N/A**	
9*	**Informe Ejecutivo mensual** Corresponde al Formato en excel "Informe ejecutivo Mensual"	**CUMPLE**		CORTE N°3 MARZO - Pag. 16
10*	**Factura de Venta** Con los requisitos mínimos exigidos por la DIAN: (NOTA: Una vez aprobada, debera cargarse en Olimpia IT y posteriormente en el SECOP II, sección "Plan de pagos", en donde anexará también los documentos de soporte para pago marcados con asterisco (*) en esta lista de chequeo.)		**N/A**	CORTE N°3 MARZO - Pag. 19
a	Nombres y apellidos o Razón social del contratista	**CUMPLE**		
b	Número de Nit.			
c	Dirección y Teléfono			
d	Denominación de ldocumento como Factura de Venta			
e	No. de Factura			
f	Fecha de emisión de la Factura			
g	No. Resolución autorización de la DIAN vigente (no mayor a 2 años)			
h	Discriminar los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, identificando Nombre o Razón Social, C.C. o NIT y Porcentaje de participación.			
i	Detalle o descripción del cobro, indicando: No. del Contrato - No. del Corte - Especificar Obra, Mobiliario, etc.			
j	Detalle de los valores facturados: Discriminar el A.I.U., IVA sobre Utilidad, IVA, Amortización del anticipo o Pago Anticipado.			
11*	**Anexos a la factura** Anexar RUT, Autorización de facturación, certificación bancaria.		**N/A**	

Contrato No.	268-2023
Contratista	INGENIERIA RH SAS
Nit.	830.061.440-1
Corte No.	**3**

	LISTA DE CHEQUEO **RECEPCIÓN DE CUENTAS PARA PAGOS DE CONTRATOS**			
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**N/A**	**Pg o Archivo**
12*	**Certificación de pago Seguridad Social y parafiscales** Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y parafiscales. Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007.	**CUMPLE**		CORTE N°3 MARZO - Pag. 21 - 24
a	**Para Empresa:** Firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, del Consorcio o Unión Temporal y de cada uno de sus integrantes. Adjuntar copia certificado de vigencia tarjeta profesional y copia documento de identidad de los contadores que firman la certificación.			
b	**Para personas naturales:** liquidado sobre un IBC mínimo del 40% valor del contrato.			
13*	**Planillas de pago** Copia Planilla de pago aportes de seguridad social del periodo correspondiente	**CUMPLE**		CORTE N°3 MARZO - Pag. 26 - 32
14*	**Personal en condición de discapacidad** Certificado del personal en condición de discapacidad	**CUMPLE**		CORTE N°3 MARZO - Pag. 34
15*	**Entradas a almacén - Certificación** Certificados de entradas a Almacén por parte del Contratista que se hubieran generado en el periodo correspondiente.		**N/A**	
16*	**Entradas a almacén - Relación** Relación de todas las entradas a Almacén de los elementos entregados en lo que va corrido de la vigencia del contrato, discriminadas por periodo.		**N/A**	
17	**Informe de Avance mensual / final de Obra** Del periodo correspondiente, debidamente firmado por el Contratista. Incluye registro fotográfico, gráficos, porcentajes de avance, desarrollo y estado de ejecución, condiciones particulares, Formatos de informe semanal y mensual y demás soportes del periodo correspondiente.	**CUMPLE**		CORTE N°3 MARZO - Pag. 36 - 56
18	**Informe de PGAS y SG-SST** Según corresponda y se especifique en el contrato. Debe incluir Aval de la Interventoría de cumplimiento del Plan de Calidad, PGAS, SG-SST del Contratista de Obra.	**CUMPLE**		CORTE N°3 MARZO - Pag. 58
19	**Manifiesto RCD** Manifiesto o constancia de entrega de los Residuos de Construcción y Demolición.		**N/A**	
20	**Formato de registro y actualización PIN** Información para registro mensual de manejo de RCD, en la plataforma de la SDA		**N/A**	
21	**Planos récord** Planos récord finales firmados, de obras ejecutadas.		**N/A**	CORTE N°3 MARZO - Pag. 60 - 71
22	**Bitácora de obra**		**N/A**	
23	Los demás que se especifiquen en el contrato inicial y/o sus modificaciones.			

NOTAS	
1	1. El Contratista efectuará la radicación de los documentos de pago, solo cuando cuente con el visto bueno de la Supervisión. En caso de devolución de los documentos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Contratista, los términos se reinician con la nueva
2	La factura podrá ser generada y remitida a la plataforma Olimpia IT, solo hasta que el corte, documentos de soporte y la factura sea aprobada por la Interventoría y el Supervisor.

Contrato No.	268-2023
Contratista	INGENIERIA RH SAS
Nit.	830.061.440-1
Corte No.	**3**

	LISTA DE CHEQUEO **RECEPCIÓN DE CUENTAS PARA PAGOS DE CONTRATOS**			
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**N/A**	**Pg o Archivo**
3	Posterior a la remisión de la Factura por Olimpia IT, deberá ser cargada por el contratista en el SECOP II, en "Plan de pagos", junto con los documentos de la lista de chequeo marcados con			
4	Los documentos restantes y demás solicitados contractualmente, así como actas de reunión, de NPs, informes y demás que hacen parte de la ejecución del contrato, deberán ser cargados por el contratista en el SECOP II, en "Documentos de ejecución del contrato".			

Contrato 268 de 2022

3. Balance financiero del contrato de obra

Corte de obra N° 3, periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo del 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA
B- CORTES EJECUTADOS PARA PAGO

CONTRATO DE OBRA No. : 268 de 2022 (28 de DICIEMBRE de 2023)

OBJETO : Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de Justicia" Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá, D.C.

CONTRATISTA : INGENIERÍA RH SAS
CONSULTOR INTERVENTORIA : CONSORCIO INTER 2022

VALOR INICIAL : $ 989.251.663,00
ADICIONAL EN VALOR No. 1 :
VALOR TOTAL : $ 989.251.663,00
FECHA DE INICIO : 28-dic.-22
ADICIÓN EN PLAZO No. 1 : 116,0
ADICIÓN EN PLAZO No. 2 :
ADICIÓN EN PLAZO No. 3
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 26-abr.-23

PERIODO DEL CORTE : 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo del 2023.

A- RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

				0%	0%	100%	
CONCEPTO	**MES/AÑO**	**TIPO** OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	**VALOR ACTA DE CORTE EJECUTADO**	**ANTICIPO AMORTIZADO 0%**	**VALOR ANTICIPO /SALDO POR AMORTIZAR**	**VALOR FACTURAS A PAGAR**	**SALDO POR EJECUTAR**
ANTICIPO (Fact. No.)					$0,00	$0,00	$989.251.663,00
ACTA DE CORTE Nº 1 (Fact. No.)	Diciembre- Enero	Diseño	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
ACTA DE CORTE Nº 2 (Fact. No.)	Enero-Febrero	Diseño	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
ACTA DE CORTE Nº 3 (Fact. No.)	Marzo	Diseño	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
ACTA DE CORTE Nº 4 (Fact. No.)			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$989.251.663,00
TOTALES			**$0,00**		**$0,00**	**$0,00**	**$989.251.663,00**

SALDO POR EJECUTAR	**$989.251.663,00**

B- RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO	**TIPO** OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	**FECHA**	**VALOR PAGADO**		**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR PAGAR**
ANTICIPO (Fact. No. __)			$0,00		$0,00	$989.251.663,00
ACTA DE CORTE Nº 1 (Fact. No. __)			$0,00		$0,00	$989.251.663,00
ACTA DE CORTE Nº 2 (Fact. No. ___)			$0,00		$0,00	$989.251.663,00
ACTA DE CORTE Nº 3 (Fact. No. ___)			$0,00		$0,00	$989.251.663,00
ACTA DE CORTE Nº 4 (Fact. No. __)			$0,00		$0,00	$989.251.663,00
TOTALES			**$0,00**		**$0,00**	**$989.251.663,00**

SALDO POR PAGAR	**$989.251.663,00**
VALOR A LIBERAR	**$0,00**

MARTHA LUCIA REY NAVARRO
Director de Obra
INGENIERÍA RH SAS
CONTRATISTA

YEISSON MANUEL TUIRAN ATENCIA
Director de Interventoria
CONSORCIO INTER 2022
Consultor Interventoría

Contrato 268 de 2022

6. Acta de Corte de obra N° 3

Corte de obra N° 3, periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo del 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. **268 / 15 de diciembre de 2022**

OBJETO: Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de Justicia" Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá, D.C.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **3** PERIODO MES / AÑO **MARZO/2023.** **FECHA:** 31/03/2023,

CONTRATISTA	:		**VR. INICIAL OBRA**	: **$ 989.251.663,00**	**LOCALIZACIÓN** : Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia"
		INGENIERÍA RH S.A.S.	**VR. ADICIONAL No.**	: **$ 0,00**	**FECHA INICIO** : 28/12/2022
NIT	:	830.061.440-1	**VR. ADICIONAL No.**	: **$ 0,00**	**PLAZO INICIAL** : 31/12/2022
DIRECCIÓN	:	Cran 56B #128 - 16	**VR. TOTAL**	: **$ 989.251.663,00**	**ADICIONAL EN PLAZO No. 1** : 116
TELÉFONO	:	601 624 5215			**ADICIONAL EN PLAZO No. 2** :
INTERVENTOR	:	**CONSORCIO INTER 2022 (PORCENTAJES DE CONSORCIADOS)**	**ANTICIPO** **0%**	: **$ 0,00**	**PLAZO TOTAL** : 26/04/2023
			AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	: **$ 0,00**	**FECHA SUSPENSIÓN No.** :
NIT	:	901.662.998-3	**SALDO ANTERIOR AMORTIZACION**	: **$ 0,00**	**FECHA REINICIACIÓN No.** :
DIRECCIÓN	:	Cra 43 #24a -61	**TOTAL AMORTIZADO**	: **$ 0,00**	
TELÉFONO	:	(601) 761 4568	**SALDO POR LEGALIZAR**	: **$ 0,00**	**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL** : 26/04/2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
FASE 1														
1A	**DISEÑO**				$ 76.503			$ 76.503		$ 0		$ 0		$ 0
1.1	Ajustes de diseño (Incluye diseño arquitectónico, elementos no estructurles, eléctricos y de cableado estructurado, aire acondicionado, seguridad, audio y video, presupuesto y especificaciones técnicas, conforme con los ajustes que el proyecto requiera según las necesidades de la entidad)	M2	1,0	$ 76.503,00	$ 76.503	-	-1,00	$ 76.503	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL antes de IVA				$ 76.503			$ 0		$ 0		$ 0	0,00	$ 0
	IVA		19%		$ 14.536			$ 0		$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1A	**TOTAL DISEÑO**				$ 91.039			$ 0		$ 0		$ 0	0,00	$ 0
FASE 2														
2A.	**OBRA CIVIL**													
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 713.090,00**			**$ 713.090**		**$ 0**		**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
1.1	Desmonte de silletería fija tipo auditorio. (Incluye retiro, trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 8.434,00	$ 8.434,00	-	-1,00	$ 8.434	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.2	Desmonte y retiro de tapete. (Incluye retiro, trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 12.524,00	$ 12.524,00	-	-1,00	$ 12.524	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.3	Desmonte de tarimas de madera sobrepuestas. (Incluye estructura y piso, retiro, trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 12.524,00	$ 12.524,00	-	-1,00	$ 12.524	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.4	Desmonte, restauración y mantenimiento mesas en madera sala 3. (Incluye retiro, trasiego, transporte, mantenimiento mecanismos pantallas y reinstalación en sitio)	UN	1,0	$ 61.522,00	$ 61.522,00	-	-1,00	$ 61.522	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.5	Desmonte, restauración y mantenimiento mesas en madera sala 2. (Incluye retiro, trasiego, transporte y reinstalación en sitio)	UN	1,0	$ 61.522,00	$ 61.522,00	-	-1,00	$ 61.522	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.6	Desmonte y restauración atriles en madera. (Inlcuye retiro, traslado trasiego, transporte	UN	1,0	$ 61.522,00	$ 61.522,00	-	-1,00	$ 61.522	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.7	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 7.674,00	$ 7.674,00	-	-1,00	$ 7.674	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.8	Desmonte de plafon en drywall y madera. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,0	$ 29.955,00	$ 29.955,00	-	-1,00	$ 29.955	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.9	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,0	$ 1.624,00	$ 1.624,00	-	-1,00	$ 1.624	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.10	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye desconexión y desmonte aparato, cableado, trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 13.163,00	$ 13.163,00	-	-1,00	$ 13.163	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.11	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 13.819,00	$ 13.819,00	-	-1,00	$ 13.819	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.12	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 7.013,00	$ 7.013,00	-	-1,00	$ 7.013	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.13	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de persianas de madera de 0,90x1.00m (ancho x largo)	UN	1,0	$ 93.846,00	$ 93.846,00	-	-1,00	$ 93.846	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.14	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de persianas de madera de 0,90x1.50m (ancho x largo)	UN	1,0	$ 140.769,00	$ 140.769,00	-	-1,00	$ 140.769	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.15	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de persianas de madera de 0,90x2.00m (ancho x largo)	UN	1,0	$ 156.410,00	$ 156.410,00	-	-1,00	$ 156.410	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.16	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 6.830,00	$ 6.830,00	-	-1,00	$ 6.830	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.17	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 6.950,00	$ 6.950,00	-	-1,00	$ 6.950	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.18	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 9.976,00	$ 9.976,00	-	-1,00	$ 9.976	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.19	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 7.013,00	$ 7.013,00	-	-1,00	$ 7.013	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
2	**MAMPOSTERÍA**				**$ 84.668,00**			**$ 84.668**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
2.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	1,0	$ 41.675,00	$ 41.675,00	-	-1,00	$ 41.675	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
2.2	Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,0	$ 42.993,00	$ 42.993,00	-	-1,00	$ 42.993	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
3	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**$ 93.954,00**			**$ 93.954**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
3.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos)	M2	1,0	$ 80.481,00	$ 80.481,00	-	-1,00	$ 80.481	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
3.2	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 13.473,00	$ 13.473,00	-	-1,00	$ 13.473	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
4	**ALISTADO DE PISOS, PAÑETES**				**$ 31.124,00**			**$ 31.124**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. **268 / 15 de diciembre de 2022**

OBJETO: Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de Justicia" Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá, D.C.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **3** PERIODO MES / AÑO **MARZO/2023.** **FECHA:** 31/03/2023,

CONTRATISTA	:		**VR. INICIAL OBRA**	:	**$ 989.251.663,00**
		INGENIERÍA RH S.A.S.	**VR. ADICIONAL No.**	:	**$ 0,00**
			VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
NIT	:	830.061.440-1	**VR. TOTAL**	:	**$ 989.251.663,00**
DIRECCIÓN	:	Cran 56B #128 - 16			
TELÉFONO	:	601 624 5215	**ANTICIPO** **0%**	:	**$ 0,00**
INTERVENTOR	:	**CONSORCIO INTER 2022 (PORCENTAJES DE CONSORCIADOS)**	**AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __**	:	**$ 0,00**
			SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
NIT	:	901.662.998-3	**TOTAL AMORTIZADO**	:	**$ 0,00**
DIRECCIÓN	:	Cra 43 #24a -61	**SALDO POR LEGALIZAR**	:	**$ 0,00**
TELÉFONO	:	(601) 761 4568			

LOCALIZACIÓN	:	Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia"
FECHA INICIO	:	28/12/2022
PLAZO INICIAL	:	31/12/2022
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	116
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	26/04/2023
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	26/04/2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				OBRA EJECUTADA					
4.1	Alistado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,0	$ 16.457,00	$ 16.457,00	-	-1,00	$ 16.457	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
4.2	Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 14.667,00	$ 14.667,00	-	-1,00	$ 14.667	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
5	**CIELO RASOS**				**$ 57.361,00**			**$ 57.361**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
5.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel)	M2	1,0	$ 48.709,00	$ 48.709,00	-	-1,00	$ 48.709	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
5.2	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 8.652,00	$ 8.652,00	-	-1,00	$ 8.652	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
6	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 29.866,00**			**$ 29.866**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
6.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 5.918,00	$ 5.918,00	-	-1,00	$ 5.918	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
6.2	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 13.859,00	$ 13.859,00	-	-1,00	$ 13.859	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
6.3	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 10.089,00	$ 10.089,00	-	-1,00	$ 10.089	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
7	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**$ 412.902,00**			**$ 412.902**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
7.1	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 65.718,00	$ 65.718,00	-	-1,00	$ 65.718	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
7.2	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial. (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 88.527,00	$ 88.527,00	-	-1,00	$ 88.527	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
7.3	Enchape pared cerámica 30x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	1,0	$ 69.511,00	$ 69.511,00	-	-1,00	$ 69.511	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
7.4	Piso en Vinilo flotante tipo clic, tráfico comercial de alta resistencia.	M2	1,0	$ 189.146,00	$ 189.146,00	-	-1,00	$ 189.146	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
8	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**$ 3.272.049,00**			**$ 3.272.049**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
8.1	Sanitario de piso linea institucional con válvula antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye grifería, equipos, herrajes, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 847.343,00	$ 847.343,00	-	-1,00	$ 847.343	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
8.2	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 446.152,00	$ 446.152,00	-	-1,00	$ 446.152	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
8.3	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN	1,0	$ 861.021,00	$ 861.021,00	-	-1,00	$ 861.021	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
8.4	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 102.487,00	$ 102.487,00	-	-1,00	$ 102.487	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
8.5	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 182.535,00	$ 182.535,00	-	-1,00	$ 182.535	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
8.6	Dispensador institucional de toallas de papel en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 139.469,00	$ 139.469,00	-	-1,00	$ 139.469	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
8.7	Secador de manos institucional Potenza o similar en acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 669.720,00	$ 669.720,00	-	-1,00	$ 669.720	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
8.8	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 23.322,00	$ 23.322,00	-	-1,00	$ 23.322	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 1.766.853,00**			**$ 1.766.853**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
9.1	Salida interruptor sencillo, Tuberia EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 54.086,00	$ 54.086,00	-	-1,00	$ 54.086	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.2	Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 66.207,00	$ 66.207,00	-	-1,00	$ 66.207	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.3	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 73.404,00	$ 73.404,00	-	-1,00	$ 73.404	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.4	Salida interruptor conmutable sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 89.721,00	$ 89.721,00	-	-1,00	$ 89.721	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.5	Salidas interruptor conmutable doble. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 96.318,00	$ 96.318,00	-	-1,00	$ 96.318	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.6	Salida toma monofasica doble con polo a Tierra. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 54.325,00	$ 54.325,00	-	-1,00	$ 54.325	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.7	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN	1,0	$ 91.403,00	$ 91.403,00	-	-1,00	$ 91.403	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.8	Salida Tomacorriente red regulada L5-20R. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, marcación, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 74.009,00	$ 74.009,00	-	-1,00	$ 74.009	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.9	Salida Toma doble regulada 5-15R, a la vista. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería EMT, toma, marcación, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 124.583,00	$ 124.583,00	-	-1,00	$ 124.583	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.10	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 19.231,00	$ 19.231,00	-	-1,00	$ 19.231	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
9.11	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 18.711,00	$ 18.711,00	-	-1,00	$ 18.711	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. **268 / 15 de diciembre de 2022**

OBJETO: Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de Justicia" Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá, D.C.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **3** PERIODO MES / AÑO **MARZO/2023.** **FECHA:** 31/03/2023,

CONTRATISTA	:	**INGENIERÍA RH S.A.S.**			
NIT	:	830.061.440-1			
DIRECCIÓN	:	Cran 56B #128 - 16			
TELÉFONO	:	601 624 5215			
INTERVENTOR	:	**CONSORCIO INTER 2022 (PORCENTAJES DE CONSORCIADOS)**			
NIT	:	901.662.998-3			
DIRECCIÓN	:	Cra 43 #24a -61			
TELÉFONO	:	(601) 761 4568			

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 989.251.663,00**	**LOCALIZACIÓN**	:	Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia"
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**			
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**	**FECHA INICIO**	:	28/12/2022
VR. TOTAL	:	**$ 989.251.663,00**	**PLAZO INICIAL**	:	31/12/2022
			ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	116
ANTICIPO **0%**	:	**$ 0,00**	**ADICIONAL EN PLAZO No. 2**	:	
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**	**PLAZO TOTAL**	:	26/04/2023
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**	**FECHA SUSPENSIÓN No.**	:	
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**	**FECHA REINICIACIÓN No.**	:	
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**			
			FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	26/04/2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**				**OBRA EJECUTADA**							
9.12	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 12.471,00	$ 12.471,00	-	-1,00	$	12.471	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
9.13	Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 20.838,00	$ 20.838,00	-	-1,00	$	20.838	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
9.14	Tubería EMT 1-1/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 23.849,00	$ 23.849,00	-	-1,00	$	23.849	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
9.15	Tubo Conduit PVC 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 7.774,00	$ 7.774,00	-	-1,00	$	7.774	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
9.16	Tubería Conduit de 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 8.334,00	$ 8.334,00	-	-1,00	$	8.334	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
9.17	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 72.148,00	$ 72.148,00	-	-1,00	$	72.148	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
9.18	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 51.520,00	$ 51.520,00	-	-1,00	$	51.520	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
9.19	Salida iluminación, tubería PVC Conduit. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 62.140,00	$ 62.140,00	-	-1,00	$	62.140	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
9.20	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 131.497,00	$ 131.497,00	-	-1,00	$	131.497	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
9.21	Salida sensor control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 71.838,00	$ 71.838,00	-	-1,00	$	71.838	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
9.22	Salida Sonido Ambiental. Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 29.640,00	$ 29.640,00	-	-1,00	$	29.640	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
9.23	Salida Punto de Audio, Tubería 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 56.757,00	$ 56.757,00	-	-1,00	$	56.757	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
9.24	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 3/4" PVC. Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 25.622,00	$ 25.622,00	-	-1,00	$	25.622	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
9.25	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 1-1/2" PVC. Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 44.549,00	$ 44.549,00	-	-1,00	$	44.549	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
9.26	Salidas para audio / microfono en tubo EMT de 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 80.670,00	$ 80.670,00	-	-1,00	$	80.670	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
9.27	Salida de micrófono en tubería PVC conduit 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 55.862,00	$ 55.862,00	-	-1,00	$	55.862	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
9.28	Salida Televisión. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 72.706,00	$ 72.706,00	-	-1,00	$	72.706	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
9.29	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 176.640,00	$ 176.640,00	-	-1,00	$	176.640	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
10	**LUMINARIAS**				**$ 3.578.741,00**			**$**	**3.578.741**		**$**	**0**		**$**	**0**		**$ 0**
10.1	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,0	$ 273.098,00	$ 273.098,00	-	-1,00	$	273.098	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
10.2	Lámpara Panel LED 30x120 cm, 45 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,0	$ 276.654,00	$ 276.654,00	-	-1,00	$	276.654	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
10.3	Lámpara bala tipo LED 20 W JUPITER Sylvania o similar. Durabilidad mayor a 20.000 horas.(Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,0	$ 107.141,00	$ 107.141,00	-	-1,00	$	107.141	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
10.4	Luminaria LED lineal de 3m tipo Infinity, regleta rectangular descolgar color blanco 300X3,5X3,5cm - 4612lm - 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240V - CRI>80 - COL	un	1,0	$ 501.413,00	$ 501.413,00	-	-1,00	$	501.413	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
10.5	Luminaria LED lineal de 6m tipo Infinity, regleta rectangular descolgar color blanco 300x3,5x3,5cm - 4612lm - 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240V CRI>80 - COL	un	1,0	$ 975.391,00	$ 975.391,00	-	-1,00	$	975.391	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
10.6	Luminaria LED lineal de 9m tipo Infinity, regleta rectangular descolgar color blanco 300X3,5X3,5cm - 4612lm - 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240V - CRI>80 - COL	un	1,0	$ 1.445.044,00	$ 1.445.044,00	-	-1,00	$	1.445.044	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
11	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**$ 6.114.696,00**			**$**	**6.114.696**		**$**	**0**		**$**	**0**		**$ 0**
11.1	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 91.215,00	$ 91.215,00	-	-1,00	$	91.215	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
11.2	Bandeja portacables tipo malla. (Suministro e instalació. Incluye soportería y accesorios de instalación)	ML	1,0	$ 290.504,00	$ 290.504,00	-	-1,00	$	290.504	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
11.3	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 6.447,00	$ 6.447,00	-	-1,00	$	6.447	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
11.4	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 39.585,00	$ 39.585,00	-	-1,00	$	39.585	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0
11.5	Rack abierto de 2.10 mts con organizadores verticales de alta densidad frontal trasero. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 2.734.028,00	$ 2.734.028,00	-	-1,00	$	2.734.028	0,00	$	0		$	0	0,00	$ 0

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. **268 / 15 de diciembre de 2022**

OBJETO: Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de Justicia" Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá, D.C.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **3** PERIODO MES / AÑO **MARZO/2023.** **FECHA:** 31/03/2023,

CONTRATISTA	:	**INGENIERÍA RH S.A.S.**	
NIT	:	830.061.440-1	
DIRECCIÓN	:	Cran 56B #128 - 16	
TELÉFONO	:	601 624 5215	
INTERVENTOR	:	**CONSORCIO INTER 2022 (PORCENTAJES DE CONSORCIADOS)**	
NIT	:	901.662.998-3	
DIRECCIÓN	:	Cra 43 #24a -61	
TELÉFONO	:	(601) 761 4568	

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 989.251.663,00**	
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**	
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**	
VR. TOTAL	:	**$ 989.251.663,00**	
ANTICIPO **0%**	:	**$ 0,00**	
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**	
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**	
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**	
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**	

LOCALIZACIÓN	:	Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia"
FECHA INICIO	:	28/12/2022
PLAZO INICIAL	:	31/12/2022
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	116
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	26/04/2023
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	26/04/2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
11.6	Multitoma vertical para rack 10 salidas, 20 a, 120v. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 425.984,00	$ 425.984,00	-	-1,00	$ 425.984	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.7	Patch Panel de 48 puertos Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 1.026.243,00	$ 1.026.243,00	-	-1,00	$ 1.026.243	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.8	Organizador horizontal de 80x80 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 120.418,00	$ 120.418,00	-	-1,00	$ 120.418	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.9	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)	UN	1,0	$ 62.388,00	$ 62.388,00	-	-1,00	$ 62.388	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.10	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 7.051,00	$ 7.051,00	-	-1,00	$ 7.051	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.11	Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, Cat 6A, Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 51.242,00	$ 51.242,00	-	-1,00	$ 51.242	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.12	Patch cord de 10 pies Cat 6A, Gris. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 63.669,00	$ 63.669,00	-	-1,00	$ 63.669	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.13	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	1,0	$ 509.981,00	$ 509.981,00	-	-1,00	$ 509.981	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.14	Tablero electrico Tipo Pesado 30 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	1,0	$ 586.220,00	$ 586.220,00	-	-1,00	$ 586.220	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.15	Acometida 3x8 + 1x8 AWG., Cu., THHN/THWN-2. (Suministro e instalación. Incluye equipos, bornes, terminales, cintillos, tubería, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 20.424,00	$ 20.424,00	-	-1,00	$ 20.424	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.16	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 19.231,00	$ 19.231,00	-	-1,00	$ 19.231	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.17	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 2.830,00	$ 2.830,00	-	-1,00	$ 2.830	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11.18	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 57.236,00	$ 57.236,00	-	-1,00	$ 57.236	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12	**AIRE ACONDICIONADO**				**$ 45.712.401,00**			**$ 45.712.401**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
12.1	Salida para instalación de cable de control 2x16 AWG Apantallado entre condensadora y manejadoras en ducto PVC 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 44.098,00	$ 44.098,00	-	-1,00	$ 44.098	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.2	Salida de fuerza para equipos del sistema de aire acondicionado. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 299.268,00	$ 299.268,00	-	-1,00	$ 299.268	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.3	Unidad condensadora Multi V,IV, sala fría 20 HP 220/3/60 Ref ARUV200BTS4 o similar. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 28.669.705,00	$ 28.669.705,00	-	-1,00	$ 28.669.705	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.4	Sistema completo de aire acondicionado tipo Ceiling Cassette 24000 BTU/H , 220V, 60hz. Incluye unidad Condensadora. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 8.095.028,00	$ 8.095.028,00	-	-1,00	$ 8.095.028	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.5	Controles inalámbricos. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 194.142,00	$ 194.142,00	-	-1,00	$ 194.142	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.6	Panel de control encendido apagado automatico- control remoto	UND	1,0	$ 677.775,00	$ 677.775,00	-	-1,00	$ 677.775	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.7	Tubería para refrigeracion aislada 1-1/8". (Suministro e instalación.Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 54.769,00	$ 54.769,00	-	-1,00	$ 54.769	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.8	Tubería para refrigeración aislada 1/2". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 36.373,00	$ 36.373,00	-	-1,00	$ 36.373	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.9	Tubería para refrigeración aislada 3/8". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 32.096,00	$ 32.096,00	-	-1,00	$ 32.096	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.10	Tubería para refrigeración aislada 5/8". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 45.365,00	$ 45.365,00	-	-1,00	$ 45.365	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.11	Conducto en lámina galvanizada calibre 24, para secciones de base de 10 pulgadas y altura variable. (Suministro e instalación. Incluye soportería)	ML	1,0	$ 98.809,00	$ 98.809,00	-	-1,00	$ 98.809	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.12	Conducto en lámina galvanizada calibre 24, para secciones de altura de 12 pulgadas y base variable. (Suministro e instalación. Incluye soportería)	ML	1,0	$ 126.802,00	$ 126.802,00	-	-1,00	$ 126.802	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.13	Rejillas de suministro RE 12"X12" L-RA-G. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 159.632,00	$ 159.632,00	-	-1,00	$ 159.632	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.14	ADECUACIONES DEL SISTEMA DE VENTILACION MECÁNICA EN PISO 9º Y 10º PISO - Se adecuará e instalará ducto metálico de 35 cm x 50 cm, (lamina galvanizada en cal 22) de sección cuadrada que permita extraer el aire de las zonas de baños. El ducto se empalma al sistema principal existente.	ML	1,0	$ 140.108,00	$ 140.108,00	-	-1,00	$ 140.108	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
12.15	EQUIPO DE VENTILACION MECÁNICA - En el decimo piso se suministrará e instalará un nuevo ventilador centrífugo de mayor capacidad que reemplazará al ventilador E-6 (es la numeracion del actual equipo en esa área del piso). El nuevo equipo será del tipo SP-CMX-250/ 2P- MOTOR 1.5 HP, 208 V, carcaza y soporte integrado acabado en pintura elctrostática. El item comprende el desmonte del antiguo equipo, trasiego y disposición final y todos los accesorios, soportes y ductería para la reinstalación en el mismo sitio del nuevo sistema de extracción.	UN	1,0	$ 7.038.431,00	$ 7.038.431,00	-	-1,00	$ 7.038.431	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
13	**ASEO Y VARIOS**				**$ 2.719,00**			**$ 2.719**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. **268 / 15 de diciembre de 2022**

OBJETO: Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de Justicia" Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá, D.C.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **3** PERIODO MES / AÑO **MARZO/2023.** **FECHA:** 31/03/2023,

CONTRATISTA	:		**VR. INICIAL OBRA**	:	**$ 989.251.663,00**
		INGENIERÍA RH S.A.S.	**VR. ADICIONAL No.**	:	**$ 0,00**
			VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
NIT	:	830.061.440-1	**VR. TOTAL**	:	**$ 989.251.663,00**
DIRECCIÓN	:	Cran 56B #128 - 16			
TELÉFONO	:	601 624 5215	**ANTICIPO** **0%**	:	**$ 0,00**
INTERVENTOR	:	**CONSORCIO INTER 2022 (PORCENTAJES DE CONSORCIADOS)**	**AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __**	:	**$ 0,00**
			SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
NIT	:	901.662.998-3	**TOTAL AMORTIZADO**	:	**$ 0,00**
DIRECCIÓN	:	Cra 43 #24a -61	**SALDO POR LEGALIZAR**	:	**$ 0,00**
TELÉFONO	:	(601) 761 4568			

LOCALIZACIÓN	:	Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia"
FECHA INICIO	:	28/12/2022
PLAZO INICIAL	:	31/12/2022
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	116
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	26/04/2023
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	26/04/2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
13.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	1,0	$ 2.719,00	$ 2.719,00		-	-1,00	$ 2.719	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 61.870.424**				**$ 61.870.424,00**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
ADMINISTRACIÓN	**(17%)**				$ 10.517.972				$ 10.517.972,08		$ 0		$ 0		$ 0
IMPREVISTOS	**(3%)**				$ 1.856.113				$ 1.856.112,72		$ 0		$ 0		$ 0
UTILIDAD	**(5%)**				$ 3.093.521				$ 3.093.521,20		$ 0		$ 0		$ 0
IVA	**(19%)**				$ 587.769				$ 587.769,03		$ 0		$ 0		$ 0
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 77.925.799**				**$ 77.925.799,00**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
2B.	**MOBILIARIO Y EQUIPOS**														
1	**MOBILIARIO Y EQUIPOS**				**$ 3.722.352**				**$ 3.722.352,00**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
1.1	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN	1,0	$ 518.988,00	$ 518.988		-	-1,00	$ 518.988,00	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.2	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela. La silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordobán. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variará según el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordobán y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN	1,0	$ 365.156,00	$ 365.156		-	-1,00	$ 365.156,00	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.3	MESA MULTIPROPÓSITO APILABLE Suministro e instalación de Mesa de 1,40x0,70m h=+-0,75 multiproposito, con estructura en lámina CR Cal. 14, con acabado en pintura epoxi y electropulido, , accesorios y sistema abatible, Superficies en madera tipo táblex de 30mm madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), laminado de alta presión y Balance-Baker en la cara inferior, canto rígido temofundido de 2mm de color similar a la superficie de trabajo, Tablero Abatible con Sistema de bloqueo/desbloqueo, ruedas de goma negras de 65mm con freno, según ficha y diseño.	UN	1,0	$ 2.606.826,00	$ 2.606.826		-	-1,00	$ 2.606.826,00	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.4	MANTENIMIENTO DE SILLAS FIJAS TIPO AUDITORIO - mantenimiento general de las sillas de la marca registrada "Series", existentes en la sala. Incluye retapizado en cuero sintético, reemplazo de espuma y herrajes deteriorados utilizando piezas nuevas originales. Las sillas se anclan al piso o a la tarima elevada utilizando herrajes apropiados para segurar a la superficie de la base.	UN	1,0	$ 231.382,00	$ 231.382		-	-1,00	$ 231.382,00	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
2	**EQUIPOS TECNOLOGÍA**				**$ 15.272.927**				**$ 15.272.927,00**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
2.1	Pantalla industrial de 75" (operatividad 16/7) con resolución nativa 4K UHD 3840 x 2160 (16:9), 50,000 horas de vida útil (al 50% del brillo original), brillo de 400 nits, contraste de 1,400:1, espacio de color (CIE 1931) de 68%, entradas 4 x HDMI (Ver 2.0, HDCP 2.2), DisplayPort (Ver 1.2a, HDCP 1.3), OPS, USB 3.0, salidas de video DisplayPort 1.2a y HDMI 2.0, entrada de audio análoga RCA, slaida de audífonos de 3.5mm, salida óptica de audio, control por RS-232 y LAN (RJ45), soporte HDR10, conectividad por Wi-Fi y Miracast	UN	1,0	$ 14.337.546,00	$ 14.337.546		-	-1,00	$ 14.337.546,00	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
2.2	Soporte de pared para monitor, capacidad de carga mínima de 112 Kg, certificado UL y OSHPD	UN	1,0	$ 935.381,00	$ 935.381		-	-1,00	$ 935.381,00	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL antes de IVA				**$ 18.995.279,00**				**$ 18.995.279,00**						
	IVA		19%		$ 3.609.103,01				$ 3.609.103,01						
2B.	**SUBTOTAL 2B. MOBILIARIO Y EQUIPOS (Incluido IVA)**				**$ 22.604.382,01**				**$ 22.604.382,00**						

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. **268 / 15 de diciembre de 2022**

OBJETO: Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de Justicia" Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá, D.C.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **3** PERIODO MES / AÑO **MARZO/2023.** **FECHA:** 31/03/2023,

CONTRATISTA	:	**INGENIERÍA RH S.A.S.**
NIT	:	830.061.440-1
DIRECCIÓN	:	Cran 56B #128 - 16
TELÉFONO	:	601 624 5215
INTERVENTOR	:	**CONSORCIO INTER 2022 (PORCENTAJES DE CONSORCIADOS)**
NIT	:	901.662.998-3
DIRECCIÓN	:	Cra 43 #24a -61
TELÉFONO	:	(601) 761 4568

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 989.251.663,00**	
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**	
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**	
VR. TOTAL	:	**$ 989.251.663,00**	
ANTICIPO **0%**	:	**$ 0,00**	
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**	
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**	
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**	
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**	

LOCALIZACIÓN	:	Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia"
FECHA INICIO	:	28/12/2022
PLAZO INICIAL	:	31/12/2022
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	116
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	26/04/2023
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	26/04/2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRA EJECUTADA**	
1A	**TOTAL DISEÑO (Incluido IVA)**	**$ 91.038,57**				
2A.	**TOTAL OBRA CIVIL + EQUIPOS (Incluido AIU e IVA)**	**$ 77.925.799,00**				
2B.	**TOTAL OBRA**	**$ 22.604.382,01**				
VALOR TOTAL (Incl. IVA)		**$ 100.621.220**			**$ 0**	**$ 0**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$ 0**				
VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA	0%	**$ 0**				
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	0%	**$ 0**				

SON:

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
Representante Legal
INGENIERIA RH S.A.S.
CONTRATISTA

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
Representante Legal
CONSORCIO INTER 2022
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Contrato 268 de 2022

9. Informe Ejecutivo mensual Marzo 2023

Corte de obra N° 3, periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo del 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No. **3** PERIODO: **DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023.**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
Calle 12 N° 8-65, Palacio de justicia "Alfonso Lopez Echandía" , Bogotá D.C	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			4,6266296%
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTER 2022	
CONTRATO No.:		298 DE 2022	
VALOR INICIAL:	$	45.769.010,55	
VALOR ADICIÓN 1:			
VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**45.769.010,55**	
PLAZO INICIAL:		**45**	
PLAZO ACTUALIZADO:			
FECHA DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE INICIACIÓN:		**28/12/2022**	
FECHA DE TERMINACIÓN:		**23/04/2023**	
VALOR EJECUTADO:	**$**	**-**	**0,00%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**45.769.010,55**	**100,00%**

CONTRATO DE OBRA			
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**		
CONTRATO No.:	**268/2022**		
VALOR INICIAL:	**$**	**989.251.663,00**	
VALOR ADICIÓN 1:	**$**	**-**	
VALOR ADICIÓN 2:	**$**	**-**	
VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**989.251.663,00**	
PLAZO INICIAL:			**31/12/2023**
PLAZO ACTUALIZADO:			**23/04/2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**		
FECHA DE REINICIACIÓN:	**N.A.**		
FECHA DE INICIACIÓN:	**28/12/2022**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	**26/04/2023**		
VALOR EJECUTADO:	**$**	**-**	**0,00%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**989.251.663,00**	**100,00%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	1,93%	0,00%	-1,93%
Durante el periodo	0,92%	0,00%	-0,92%
Acumulado Actual	2,85%	0,00%	-2,85%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
120	94	26	-3,42

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDAD EN FASE N° 1 (DISEÑOS)


Se realiza la observación que en esta fase NO se puede liquidar hasta la aprobación total de los diseños, por tal motivo el avance financiero y economico queda en 0 hasta la aprobación y entrega final de los requerimientos contractuales de esta Fase.

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

	MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
DISEÑO	DICIEMBRE	$ 1.207.974	$ -	0,00%
	ENERO	$ 9.361.800	$ -	0,00%
	FEBRERO	$ 8.455.819	$ -	0,00%
	MARZO	$ 9.059.806	$ -	0,00%
		$ -	$ -	0,00%
		$ -	$ -	0,00%
		$ -	$ -	0,00%
	VALOR TOTAL	**$ 28.085.399**	**$ -**	**0,00%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

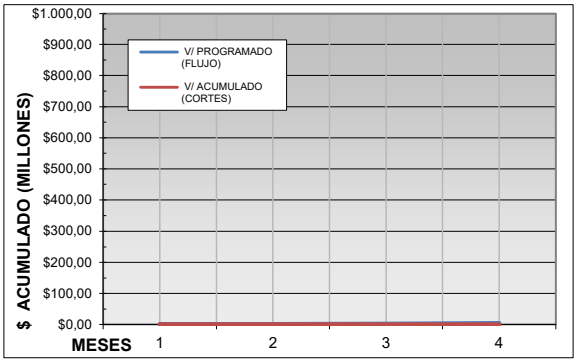

5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Contrato 268 de 2022

10. Facturación

Corte de obra N° 3, periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo del 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Bogotá D.C. 31 de marzo de 2023

Señores
CONSORCIO INTER 2022
Atn: Ing. John William Casallas Jurado
Representante Legal
Interventoría del contrato de obra 268/2022

CONTRATO DE OBRA N° 268 DE 2022.

OBJETO: "CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: Exclusión de facturación CORTE N° 3.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace la aclaración que durante el periodo comprendido entre el **01 de marzo de 2023 y 31 de marzo de 2023** correspondiente al **corte Nº 3**, no se genera facturación alguna al corte en mención, toda vez, que este corresponde a la FASE I (diseños), la cual se encuentra en etapa de anteproyecto, ajustes de diseños y validación por parte de los usuarios.



MARTHA LUCIA REY NAVARRO
DIRECTORA DE OBRA CONTRATO 268-2022
INGENIERIA RH S.A.S
Nit: 830.061.440-1

Contrato 268 de 2022

12. Certificación de pago de aportes por parte del revisor fiscal

Corte de obra N° 3, periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo del 2023.


www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

MODELO CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONAS JURÍDICAS.

Yo, JORGE ALEJANDRO BOJACA DIAZ, identificado con 79.112.791 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 12907-TP de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INGENIERIA RH S.A.S identificado con Nit 830.061.440-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la factura, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los 31 días del mes de marzo de 2023.



JORGE ALEJANDRO BOJACA DIAZ
C.C.79.112.791 DE BOGOTA
T.P. 12907-T
REVISOR FISCAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.112.791**

BOJACA DIAZ

APELLIDOS

JORGE ALEJANDRO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-NOV-1955**

BOGOTA D.C

BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-FEB-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00200853-M-0079112791-20091130 **0018518368A 1** 1130107344



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

12907-T

JORGE ALEJANDRO
BOJACA DIAZ
C.C. 79112791
RESOLUCION INSCRIPCION 1068 FECHA 11/07/1985
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COSPEDRA RES RODRIGUEZ 20323



65804

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 9 C 5 F 9 9 3 7 1 B 2 9 C 8 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ALEJANDRO BOJACA DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79112791 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 12907-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Contrato 268 de 2022

13. Certificación de pago de planillas

Corte de obra N° 3, periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo del 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-04-13, 03:54:41 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	INGENIERIA RH SAS
NIT	NI 830061440
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1053244084
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2022317145
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 13.953.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	6	$ 1.500.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 1.464.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	$ 4.810.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 371.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 66.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	7	$ 1.018.900	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	4	$ 408.500	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 46.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	$ 186.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 283.000	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	19	$ 1.788.600	$ 0
N891600091	CCF29	CCF DEL CHOCO	1	$ 80.000	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	18	$ 1.929.200	$ 0
		SubTotales:		$ 13.953.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 13.953.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79557480	CARLOS ALFREDO CASTRO HERNANDEZ	CALLE 8 A 79 - 25	6012643789	cdmarxants@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	I	16/03/2023	66368863	$330.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	330.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79557480	CARLOS ALFREDO CASTRO HERNANDEZ		CALLE 8 A 79 - 25	6012643789	cdmarxants@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	I	16/03/2023	66368863	$330.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79557480	CASTRO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	3	0			N																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79532705		CAMPOS CHINCHILLA DIEGO AMIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 16 134 52 casa 7	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4717900	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1959431880	9448097127	I	2023/03/02	2023/03/08	BANCO DE BOGOTA	6	$1,055,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$3,600,000	$21,600			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$3,600,000	$21,600			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$3,600,000	$21,600			$0	$0		$0	$0
1	CC 79532705	CAMPOS DIEGO	25-14	30	$3,600,000	$576,000	EPS008	30	$3,600,000	$450,000	CCF22	30	$3,600,000	$21,600		0	$0	$0	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$3,600,000	$21,600			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79532705		CAMPOS CHINCHILLA DIEGO AMIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 16 134 52 casa 7	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4717900	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1959431880	9448097127	I	2023/03/02	2023/03/08	BANCO DE BOGOTA	6	$1,055,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$576,000	$4,200	$0	$580,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$576,000	$4,200	$0	$580,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,600	$200	$0	$21,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$21,600	$200	$0	$21,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$450,000	$3,300	$0	$453,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$450,000	$3,300	$0	$453,300
TOTAL				**1**	**$1,047,600**	**$7,700**	**$0**	**$1,055,300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1053794435

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	CONSTRUCCIONES ACUSTICAS SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800027222
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CALLE 79 A NO. 7 A-29	Teléfono	3177077
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de edificios no
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	**7873474388**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	febrero / 2023	Periodo Cotización Salud	marzo / 2023
Dias de Mora	6	Fecha Pago	2023/03/13
Número Autorización	1967594843		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	JHON FREDY	Apellidos	SANDOVAL MONTENEGRO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1053794435
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 7.500.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Dias	30	IBC	$ 7.500.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	$ 1.200.000
FSP - Solidaridad	$ 37.500	FSP - Subsistencia	$ 37.500
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	**Total Aporte**	**$ 1.275.000**

SALUD		Administradora	EPS008-COMPENSAR
Dias	30	IBC	$ 7.500.000
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	$ 300.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 300.000**

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Dias	30	IBC	$ 7.500.000
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo		**Total Aporte**	**$ 522.000**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF22-COLSUBSIDIO	30	4,000 %	$ 7.500.000	$ 300.000

TOTAL PAGADO:	**$ 2.397.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1032411573
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CAMILO ALEJANDRO MORENO IREGUI MORENO IREGUI
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLLE 23 A BIS # 85A - 75	TELÉFONO:	4107106
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**7873815606**	TIPO DE PLANILLA:			N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/03/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1960225612
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			7868911184	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			2023/02/10

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.800	$ 0	$ 27.800
SUBTOTALES:										**$ 27.800**	**$ 0**	**$ 27.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 21.700
SUBTOTALES:													**$ 21.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 21.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.000	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 7.000
SUBTOTALES:									**$ 7.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN									SALUD						ARP																	
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 1032411573	MORENO IREGUI CAMILO ALEJANDRO	INDEPEND		$ 1.160.000				NO							A										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
2	CC 1032411573	MORENO IREGUI CAMILO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.333.333				NO							C	17-28									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.333.333	$ 213.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 213.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.333.333	$ 166.700	$ 0	$ 166.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.333.333	103241157	$ 7.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
3	CC 1032411573	MORENO IREGUI CAMILO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.333.333				NO							R	17-28									25-14 COLPENSIONES	0	$ 173.333	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 27.800	EPS008-COMPENSAR	0	$ 173.333	$ 21.700	$ 0	$ 21.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.333.333	103241157	$ 7.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL	**$ 56.500**

Contrato 268 de 2022

14. Certificación de personal en condición de discapacidad.

Corte de obra N° 3, periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo del 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

El empleo es de todos Mintrabajo	**PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL** **FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD**	**Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02** **Versión: 4.0** **Fecha: Enero 31 de 2021** **Página 1 de 1**

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	05EE2022741100000023435
FECHA RADICADO:	11/07/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	INGENIERIA R H S A S
IDENTIFICACIÓN:	830061440-1

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	13
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	7,69%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD01521.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 8 de agosto de 2022

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: : D Ramos

Contrato 268 de 2022

17. Informe de avance mensual MARZO 2023.

Corte de obra N° 3, periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo del 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO 268 DE 2022

CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA" ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ, D.C.

INGENIERÍA RH

Marzo 2023

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

INFORME TÉCNICO MENSUAL

PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONTRATO OBRA 268 DE 2022

OBJETO: "CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA" ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ D.C – CUNDINAMARCA
MARZO DE 2023.

Contenido

1 aspecto técnico 4
1.1 descripcion del proyecto: 4
1.2 alcance de las obras contratadas: 4
1.2.1 fase n° 1 (diseños): 4
1.2.2 fase n° 2 (obra civil y eléctrica): 4
1.3 localización: 4
1.4 actividades desarrolladas: 6
1.4.1 otras actividades realizadas: 7
1.5 presupuesto contractual suscrito 7
1.6 estructura de inversion contrato: 14
1.6.1 incidencia porcentual contractual: 14
1.7 avance de obra: 15
2 aspecto administrativo y legal del contrato 16

Ilustraciones:

Ilustración 1: Ubicación Palacio de justicia ALFONSO REYES ECHANDÍA-Bogotá D.C 5

Ilustración 2 : Bloque del piso noveno palacio de justicia 5

Ilustración 3:Distribución porcentual contrato suscrito de obra 268/2022. 15

Ilustración 4: Profesionales contrato 17

Tablas

Tabla 1: MATRIZ DE PRECIOS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA 268/2022 14

Tabla 2: Distribución porcentual contrato suscrito de obra 268/2022 14

1 ASPECTO TÉCNICO

1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El objeto del proyecto es: *"CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA" ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ, D.C.*

1.2 ALCANCE DE LAS OBRAS CONTRATADAS:

El alcance de las obras que se determinan dentro del objeto del contrato y localizadas en la inspección inicial de obra, se establece las diferentes etapas al desarrollo del proyecto; Fase 1: Diseños y Fase 2: Obras civiles y eléctricas:

1.2.1 FASE N° 1 (Diseños):

- ✓ Levantamiento arquitectónico y toma de medidas.
- ✓ Registro fotográfico actual de los espacios. (Sala n° 1, Sala n° 2 y Sala n° 3)
- ✓ Diseño Arquitectónico.
- ✓ Diseño de elementos no estructurales.
- ✓ Diseño de cableado eléctrico, cableado estructurado, audio, video, seguridad, y aires acondicionado.
- ✓ Presupuesto, cronograma y especificaciones técnicas.

1.2.2 FASE N° 2 (Obra civil y eléctrica):

- ✓ Actividades preliminares, desmontes de mobiliario, demoliciones, retiros de escombro.
- ✓ Mampostería y construcción de muros livianos (drywall y superboard)
- ✓ Alistados, morteros y afinados.
- ✓ Cielos rasos y acabados.
- ✓ Estucos y pinturas.
- ✓ Enchapes.
- ✓ Instalaciones eléctricas.
- ✓ Luminarias.
- ✓ Cableado estructurado.
- ✓ Sistema de ventilación mecánica (Extracción y aires acondicionados.)
- ✓ Suministro e instalación de mobiliario.
- ✓ Suministro e instalación de equipos tecnológicos.

1.3 LOCALIZACIÓN:



Ilustración 1: Ubicación Palacio de justicia ALFONSO REYES ECHANDÍA-Bogotá D.C



Ilustración 2 : Bloque del piso noveno palacio de justicia

1.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2023 y el 31 de marzo de 2023, se realizaron los pertinentes ajustes referentes al desarrollo de los diseños arquitectónicos, eléctricos, técnicos y/o tecnológicos de la FASE N° 1 del presente contrato, donde surgieron cambios espaciales por parte de la entidad, razón por el cual se determinó la prolongación de la Fase N° 1 del presente contrato.

- Semana del 01 de marzo al 05 de marzo del 2023.
    - Desarrollo de presentación de la propuesta arquitectónica, ajustándolos al formato institucional por parte de la entidad para las exposiciones ante las magistradas, funcionarios y demás personal referente al consejo superior de la judicatura.

- Semana del 06 de marzo al 12 de marzo del 2023.
    - El día nueve (09) de marzo se realizó una reunión en las instalaciones del centro de servicios Colsubsidio en compañía de la interventoría, la supervisión y las magistradas a cargo del proyecto del piso noveno encabezadas por la Dr. Diana Remolina y la Dr. Gloria Stella López. Donde se socializo las propuestas de diseño arquitectónico de las salas del piso noveno; Sala N° 1- Aula multifuncional; Sala N° 2 – Aula de conferencias y ruedas de prensa y Sala N°3- Salón de juntas.
    - Se hicieron las anotaciones pertinentes de la reunión en la semana del nueve (09) de marzo, por parte de las líderes del proyecto, en donde dieron la aprobación de las salas N° 1 y 3 como anteproyecto para la iniciación y aval en los otros campos de diseños; Dejando en espera de aprobación la sala N°2 realizando la solicitud del aval y visto bueno por parte del Ing. Jhon Portella.

- Semana del 13 de marzo al 19 de marzo del 2023.
    - Se da avance a los diseños de iluminación, eléctricos y de cableado estructurado en las salas aprobadas como anteproyecto por parte del consejo superior de la judicatura.
    - Se realiza planos de detalles arquitectónicos y de elementos no estructurales de las salas aprobadas como anteproyecto Salas N° 1 y 2; donde se muestran especificaciones técnicas de acabados.
    - Se avance en tema presupuestal en cuanto al mobiliario y acabados arquitectónicos, generando una proyección preliminar presupuestal del proyecto.

- Semana del 20 de marzo al 26 de marzo del 2023.
    - El día veintitrés (23) de marzo, se realiza una reunión en las instalaciones del edificio administrativo del consejo superior de la judicatura ubicado en la Calle 72 N° 7-96; En cabeza del supervisor de la entidad para dar claridad sobre algunos puntos administrativos en mención del contrato, y el desarrollo de las actividades de la FASE N° 1, donde se solicitó por parte de la entidad realizar un segundo (2°) diseño en relación a la SALA N° 2, esto con el fin de tener dos propuestas para la presentación a comité ante las magistradas a la cabeza del proyecto..

- Semana del 27 de marzo al 31 de marzo del 2023.

- El día veintisiete (27) de marzo en las instalaciones del palacio de justicia, se tiene una reunión técnica con el ing. Jhon Portella, donde manifiesta y solicita la realización de un segundo diseño para la sala N°2; ya que argumenta que el espacio diseñado no es el ideal para la transmisión de las ruedas de prensa y streming.
- El día veintiocho (28) INGENIERÍA RH y el CONSORCIO INTER 2022 (Interventoría externa), presenta ante la entidad la solicitud de suspensión del contrato por 45 días calendario con motivo y justificación explicadas en el oficio con N° de radicado RH268-12-2022
- El día treinta y uno (31) de marzo se realiza la aprobación y suspensión del presente contrato de obra con N° 268/2022.

1.4.1 Otras actividades realizadas:

Actividades complementarias de búsqueda de cotizaciones y muestras de mobiliario y equipo especializado.

1.5 PRESUPUESTO CONTRACTUAL SUSCRITO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA

REALIZAR LOS AJUSTES DE DISEÑO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NUEVE DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C.

INGENIERIA RH SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
FASE 1	**FASE 1**				
1A	**DISEÑO**				**$ 76.503,00**
1.1	Ajustes de diseño (Incluye diseño arquitectónico, elementos no estructurales, eléctricos y de cableado estructurado, aire acondicionado, seguridad, audio y video, presupuesto y especificaciones técnicas, conforme con los ajustes que el proyecto requiera según las necesidades de la entidad)	M2	1,0	$ 76.503,00	$ 76.503,00
	SUBTOTAL antes de IVA				**$ 76.503,00**
	IVA		19%		$ 14.535,57
1A	**TOTAL DISEÑO**				**$ 91.038,57**
FASE 2	**FASE 2**				
2A.	**OBRA CIVIL**				
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 713.090,00**
1.1	Desmonte de silletería fija tipo auditorio. (Incluye retiro, trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 8.434,00	$ 8.434,00
1.2	Desmonte y retiro de tapete. (Incluye retiro, trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 12.524,00	$ 12.524,00
1.3	Desmonte de tarimas de madera sobrepuestas. (Incluye estructura y piso, retiro, trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 12.524,00	$ 12.524,00

1.4	Desmonte, restauración y mantenimiento mesas en madera sala 3. (Incluye retiro, trasiego, transporte, mantenimiento mecanismos pantallas y reinstalación en sitio)	UN	1,0	$ 61.522,00	$ 61.522,00
1.5	Desmonte, restauración y mantenimiento mesas en madera sala 2. (Incluye retiro, trasiego, transporte y reinstalación en sitio)	UN	1,0	$ 61.522,00	$ 61.522,00
1.6	Desmonte y restauración atriles en madera. (Incluye retiro, traslado trasiego, transporte	UN	1,0	$ 61.522,00	$ 61.522,00
1.7	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 7.674,00	$ 7.674,00
1.8	Desmonte de plafón en drywall y madera. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,0	$ 29.955,00	$ 29.955,00
1.9	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,0	$ 1.624,00	$ 1.624,00
1.10	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye desconexión y desmonte aparato, cableado, trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 13.163,00	$ 13.163,00
1.11	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 13.819,00	$ 13.819,00
1.12	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 7.013,00	$ 7.013,00
1.13	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de persianas de madera de 0,90x1.00m (ancho x largo)	UN	1,0	$ 93.846,00	$ 93.846,00
1.14	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de persianas de madera de 0,90x1.50m (ancho x largo)	UN	1,0	$ 140.769,00	$ 140.769,00
1.15	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de persianas de madera de 0,90x2.00m (ancho x largo)	UN	1,0	$ 156.410,00	$ 156.410,00
1.16	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 6.830,00	$ 6.830,00
1.17	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 6.950,00	$ 6.950,00
1.18	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 9.976,00	$ 9.976,00
1.19	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,0	$ 7.013,00	$ 7.013,00
2	**MAMPOSTERÍA**				**$ 84.668,00**
2.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	1,0	$ 41.675,00	$ 41.675,00
2.2	Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,0	$ 42.993,00	$ 42.993,00
3	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**$ 93.954,00**
3.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos)	M2	1,0	$ 80.481,00	$ 80.481,00
3.2	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 13.473,00	$ 13.473,00
4	**ALISTADO DE PISOS, PAÑETES**				**$ 31.124,00**
4.1	Alistado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,0	$ 16.457,00	$ 16.457,00
4.2	Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 14.667,00	$ 14.667,00
5	**CIELO RASOS**				**$ 57.361,00**
5.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel)	M2	1,0	$ 48.709,00	$ 48.709,00
5.2	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 8.652,00	$ 8.652,00
6	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 29.866,00**
6.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 5.918,00	$ 5.918,00
6.2	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y	M2	1,0	$ 13.859,00	$ 13.859,00

6.3	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,0	$ 10.089,00	$ 10.089,00
7	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**$ 412.902,00**
7.1	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 65.718,00	$ 65.718,00
7.2	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial. (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 88.527,00	$ 88.527,00
7.3	Enchape pared cerámica 30x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	1,0	$ 69.511,00	$ 69.511,00
7.4	Piso en Vinilo flotante tipo clic, tráfico comercial de alta resistencia.	M2	1,0	$ 189.146,00	$ 189.146,00
8	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**$ 3.272.049,00**
8.1	Sanitario de piso linea institucional con válvula antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye grifería, equipos, herrajes, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 847.343,00	$ 847.343,00
8.2	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 446.152,00	$ 446.152,00
8.3	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN	1,0	$ 861.021,00	$ 861.021,00
8.4	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	1,0	$ 102.487,00	$ 102.487,00
8.5	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 182.535,00	$ 182.535,00
8.6	Dispensador institucional de toallas de papel en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 139.469,00	$ 139.469,00
8.7	Secador de manos institucional Potenza o similar en acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 669.720,00	$ 669.720,00
8.8	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 23.322,00	$ 23.322,00
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 1.766.853,00**
9.1	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 54.086,00	$ 54.086,00
9.2	Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 66.207,00	$ 66.207,00
9.3	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 73.404,00	$ 73.404,00
9.4	Salida interruptor conmutable sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 89.721,00	$ 89.721,00
9.5	Salidas interruptor conmutable doble. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 96.318,00	$ 96.318,00
9.6	Salida toma monofasica doble con polo a Tierra. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 54.325,00	$ 54.325,00
9.7	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN	1,0	$ 91.403,00	$ 91.403,00
9.8	Salida Tomacorriente red regulada L5-20R. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, marcación, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 74.009,00	$ 74.009,00
9.9	Salida Toma doble regulada 5-15R, a la vista. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería EMT, toma, marcación, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 124.583,00	$ 124.583,00
9.10	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 19.231,00	$ 19.231,00

9.11	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 18.711,00	$ 18.711,00
9.12	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 12.471,00	$ 12.471,00
9.13	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 20.838,00	$ 20.838,00
9.14	Tubería EMT 1-1/4¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 23.849,00	$ 23.849,00
9.15	Tubo Conduit PVC 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 7.774,00	$ 7.774,00
9.16	Tubería Conduit de 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,0	$ 8.334,00	$ 8.334,00
9.17	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 72.148,00	$ 72.148,00
9.18	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 51.520,00	$ 51.520,00
9.19	Salida iluminación, tubería PVC Conduit. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 62.140,00	$ 62.140,00
9.20	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 131.497,00	$ 131.497,00
9.21	Salida sensor control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 71.838,00	$ 71.838,00
9.22	Salida Sonido Ambiental. Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 29.640,00	$ 29.640,00
9.23	Salida Punto de Audio, Tubería 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 56.757,00	$ 56.757,00
9.24	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 3/4" PVC. Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 25.622,00	$ 25.622,00
9.25	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 1-1/2" PVC. Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 44.549,00	$ 44.549,00
9.26	Salidas para audio / micrófono en tubo EMT de 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 80.670,00	$ 80.670,00
9.27	Salida de micrófono en tubería PVC conduit 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 55.862,00	$ 55.862,00
9.28	Salida Televisión. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 72.706,00	$ 72.706,00
9.29	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,0	$ 176.640,00	$ 176.640,00
10	**LUMINARIAS**				**$ 3.578.741,00**
10.1	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,0	$ 273.098,00	$ 273.098,00
10.2	Lámpara Panel LED 30x120 cm, 45 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,0	$ 276.654,00	$ 276.654,00

10.3	Lámpara bala tipo LED 20 W JUPITER Sylvania o similar. Durabilidad mayor a 20.000 horas.(Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,0	$ 107.141,00	$ 107.141,00
10.4	Luminaria LED lineal de 3m tipo Infinity, regleta rectangular descolgar color blanco 300X3,5X3,5cm - 4612lm - 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240V - CRI>80 - COL	un	1,0	$ 501.413,00	$ 501.413,00
10.5	Luminaria LED lineal de 6m tipo Infinity, regleta rectangular descolgar color blanco 300x3,5x3,5cm - 4612lm - 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240V CRI>80 - COL	un	1,0	$ 975.391,00	$ 975.391,00
10.6	Luminaria LED lineal de 9m tipo Infinity, regleta rectangular descolgar color blanco 300X3,5X3,5cm - 4612lm - 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 - 100-240V - CRI>80 - COL	un	1,0	$ 1.445.044,00	$ 1.445.044,00
11	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**$ 6.114.696,00**
11.1	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 91.215,00	$ 91.215,00
11.2	Bandeja portacables tipo malla. (Suministro e instalació. Incluye soportería y accesorios de instalación)	ML	1,0	$ 290.504,00	$ 290.504,00
11.3	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 6.447,00	$ 6.447,00
11.4	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 39.585,00	$ 39.585,00
11.5	Rack abierto de 2.10 mts con organizadores verticales de alta densidad frontal trasero. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 2.734.028,00	$ 2.734.028,00
11.6	Multitoma vertical para rack 10 salidas, 20 a, 120v. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 425.984,00	$ 425.984,00
11.7	Patch Panel de 48 puertos Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 1.026.243,00	$ 1.026.243,00
11.8	Organizador horizontal de 80x80 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 120.418,00	$ 120.418,00
11.9	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)	UN	1,0	$ 62.388,00	$ 62.388,00
11.10	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 7.051,00	$ 7.051,00
11.11	Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, Cat 6A, Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 51.242,00	$ 51.242,00
11.12	Patch cord de 10 pies Cat 6A, Gris. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 63.669,00	$ 63.669,00
11.13	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	1,0	$ 509.981,00	$ 509.981,00
11.14	Tablero electrico Tipo Pesado 30 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	1,0	$ 586.220,00	$ 586.220,00
11.15	Acometida 3x8 + 1x8 AWG., Cu., THHN/THWN-2. (Suministro e instalación. Incluye equipos, bornes, terminales, cintillos, tubería, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 20.424,00	$ 20.424,00
11.16	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 19.231,00	$ 19.231,00
11.17	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML	1,0	$ 2.830,00	$ 2.830,00
11.18	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 57.236,00	$ 57.236,00

12	**AIRE ACONDICIONADO**				**$ 45.712.401,00**
12.1	Salida para instalación de cable de control 2x16 AWG Apantallado entre condensadora y manejadoras en ducto PVC 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 44.098,00	$ 44.098,00
12.2	Salida de fuerza para equipos del sistema de aire acondicionado. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 299.268,00	$ 299.268,00
12.3	Unidad condensadora Multi V,IV, sala fría 20 HP 220/3/60 Ref ARUV200BTS4 o similar. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 28.669.705,00	$ 28.669.705,00
12.4	Sistema completo de aire acondicionado tipo Ceiling Cassette 24000 BTU/H , 220V, 60hz. Incluye unidad Condensadora. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 8.095.028,00	$ 8.095.028,00
12.5	Controles inalámbricos. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 194.142,00	$ 194.142,00
12.6	Panel de control encendido apagado automático- control remoto	UND	1,0	$ 677.775,00	$ 677.775,00
12.7	Tubería para refrigeración aislada 1-1/8". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 54.769,00	$ 54.769,00
12.8	Tubería para refrigeración aislada 1/2". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 36.373,00	$ 36.373,00
12.9	Tubería para refrigeración aislada 3/8". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 32.096,00	$ 32.096,00
12.10	Tubería para refrigeración aislada 5/8". (Suministro e instalación. Incluye soportes, accesorios necesarios)	ML	1,0	$ 45.365,00	$ 45.365,00
12.11	Conducto en lámina galvanizada calibre 24, para secciones de base de 10 pulgadas y altura variable. (Suministro e instalación. Incluye soportería)	ML	1,0	$ 98.809,00	$ 98.809,00
12.12	Conducto en lámina galvanizada calibre 24, para secciones de altura de 12 pulgadas y base variable. (Suministro e instalación. Incluye soportería)	ML	1,0	$ 126.802,00	$ 126.802,00
12.13	Rejillas de suministro RE 12"X12" L-RA-G. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 159.632,00	$ 159.632,00
12.14	ADECUACIONES DEL SISTEMA DE VENTILACION MECÁNICA EN PISO 9º Y 10º PISO - Se adecuará e instalará ducto metálico de 35 cm x 50 cm, (lámina galvanizada en cal 22) de sección cuadrada que permita extraer el aire de las zonas de baños. El ducto se empalma al sistema principal existente.	ML	1,0	$ 140.108,00	$ 140.108,00
12.15	EQUIPO DE VENTILACION MECÁNICA - En el décimo piso se suministrará e instalará un nuevo ventilador centrífugo de mayor capacidad que reemplazará al ventilador E-6 (es la numeración del actual equipo en esa área del piso). El nuevo equipo será del tipo SP-CMX-250/ 2P- MOTOR 1.5 HP, 208 V, carcaza y soporte integrado acabado en pintura electrostática. El ítem comprende el desmonte del antiguo equipo, trasiego y disposición final y todos los accesorios, soportes y ductería para la reinstalación en el mismo sitio del nuevo sistema de extracción.	UN	1,0	$ 7.038.431,00	$ 7.038.431,00
13	**ASEO Y VARIOS**				**$ 2.719,00**
13.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	1,0	$ 2.719,00	$ 2.719,00
	SUBTOTAL				**$ 61.870.424,00**
	Administración		17%		$ 10.517.972,08
	Imprevistos		3%		$ 1.856.112,72
	Utilidad		5%		$ 3.093.521,20

	IVA sobre utilidad		19%		$ 587.769,03
2A.	**SUBTOTAL 2A. OBRA CIVIL**				**$ 77.925.799,03**

2B.	**MOBILIARIO Y EQUIPOS**				
1	**MOBILIARIO Y EQUIPOS**				**$ 3.722.352**
1.1	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara según el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordoban y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en	UN	1,0	$ 518.988,00	$ 518.988
1.2	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela. La silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordobán. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variará según el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordobán y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en	UN	1,0	$ 365.156,00	$ 365.156
1.3	MESA MULTIPROPÓSITO APILABLE Suministro e instalación de Mesa de 1,40x0,70m h=+-0,75 multiproposito, con estructura en lámina CR Cal. 14, con acabado en pintura epoxi y electropulido, , accesorios y sistema abatible, Superficies en madera tipo táblex de 30mm madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), laminado de alta presión y Balance-Baker en la cara inferior, canto rígido temofundido de 2mm de color similar a la superficie de trabajo, Tablero Abatible con Sistema de bloqueo/desbloqueo, ruedas de goma negras de 65mm con freno, según ficha y diseño.	UN	1,0	$ 2.606.826,00	$ 2.606.826
1.4	MANTENIMIENTO DE SILLAS FIJAS TIPO AUDITORIO - mantenimiento general de las sillas de la marca registrada "Series", existentes en la sala. Incluye retapizado en cuero sintético, reemplazo de espuma y herrajes deteriorados utilizando piezas nuevas originales. Las sillas se anclan al piso o a la tarima elevada utilizando herrajes apropiados para segurar a la superficie de la base.	UN	1,0	$ 231.382,00	$ 231.382
2	**EQUIPOS TECNOLOGÍA**				**$ 15.272.927**
2.1	Pantalla industrial de 75" (operatividad 16/7) con resolución nativa 4K UHD 3840 x 2160 (16:9), 50,000 horas de vida útil (al 50% del brillo original), brillo de 400 nits, contraste de 1,400:1, espacio de color (CIE 1931) de 68%, entradas 4 x HDMI (Ver 2.0, HDCP 2.2), DisplayPort (Ver 1.2a, HDCP 1.3), OPS, USB 3.0, salidas de video DisplayPort 1.2a y HDMI 2.0, entrada de audio análoga RCA, slaida de audífonos de 3.5mm, salida óptica de audio, control por RS-232 y LAN (RJ45), soporte HDR10, conectividad por Wi-Fi y Miracast	UN	1,0	$ 14.337.546,00	$ 14.337.546
2.2	Soporte de pared para monitor, capacidad de carga mínima de 112 Kg, certificado UL y OSHPD	UN	1,0	$ 935.381,00	$ 935.381
	SUBTOTAL antes de IVA				**$ 18.995.279,00**
	IVA		19%		$ 3.609.103,01

2B.	**SUBTOTAL 2B. MOBILIARIO Y EQUIPOS (Incluido IVA)**				**$ 22.604.382,01**

2A.	SUBTOTAL 2A. OBRA CIVIL				$ 77.925.799,03
2B.	SUBTOTAL 2B. MOBILIARIO Y EQUIPOS (Incluido IVA)				$ 22.604.382,01
	TOTAL OBRA + MOBLIARIO Y EQUIPOS (A + B)				**$ 100.530.181,04**

1A	**TOTAL DISEÑO (Incluido IVA)**	**$ 91.038,57**
2A.	**TOTAL OBRA CIVIL (Incluido AIU e IVA)**	**$ 100.530.181,04**
2B.	**TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPOS (Incluido IVA)**	**$ 100.621.219,61**

Tabla 1: MATRIZ DE PRECIOS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA 268/2022

1.6 ESTRUCTURA DE INVERSION CONTRATO:

Se estructura el proceso con un listado de actividades de precios unitarios con valores fijos, Donde se ejecuta en el modelo de matriz de desarrollo progresivo en la cual, se determinen las cantidades reales y definitivas de obra, (Terminación de la FASE N° 1), llegando al valor final contractual de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($989.251.663,00).

1.6.1 INCIDENCIA PORCENTUAL CONTRACTUAL:

CONTRATO DE OBRA 268/2022			
ACTIVIDADES	VR. INVERSIÓN		% INCIDENCIA
DISEÑO	$	91.038,57	0,09%
OBRA CIVIL	$	77.925.799,03	77,44%
MOBILIARIO Y EQUIPOS	$	22.604.382,01	22,46%
VR TOTAL UNITARIOS	$	100.621.219,61	100,00%
VR TOTAL CONTRATO	$		989.251.663,00

Tabla 2: Distribución porcentual contrato suscrito de obra 268/2022



	DISEÑO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO Y EQUIPOS
VALORES	$91,038.57	$77,925,799.03	$22,604,382.01
INCIDENCIA PORCENTUAL	0.09%	77.44%	22.46%

Ilustración 3:Distribución porcentual contrato suscrito de obra 268/2022.

1.7 AVANCE DE OBRA:

El avance de obra se encuentra supeditado al aval de aprobación de la FASE N° 1 (Diseños), la cual se ha realizado un avance según programación del 90 % de ejecución de la actividad total, Actividad a liquidación previa aprobación final de diseños.

2 ASPECTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO

A continuación, se presentan las condiciones contractuales suscritas con, la NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. mediante contrato de obra:

CONTRATO No.	268 DE 2022
OBJETO	Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de Justicia" Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá, D.C.
PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA No. 06 DE 2022
CONTRATANTE	NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONTRATISTA	INGENIERIA RH S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
VALOR TOTAL DEL COTRATO	NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($989.251.663)INCLUIDO IVA Y AIU.
FECHA DE INICIO	28/12/2022
FECHA DE TERMINACION	31/12/2022
MODIFICATORIO N°1	PRÓRROGA N° 1 POR 116 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO N° 1	26/14/2023
POLIZAS	No. 21-44-101402157 ANEXO: 0 EXPEDIDA 16/12/2022 No. 21-40-101202552 ANEXO: 0 EXPEDIDA 16/12/2022 No. 21-44-101402157 ANEXO: 1 EXPEDIDA 30/12/2022 No. 21-40-101202552 ANEXO: 1 EXPEDIDA 30/12/2022 No. 21-40-101202552 ANEXO: 2 EXPEDIDA 27/01/2023
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES

POLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA (desde-hasta)	VALOR ASEG.	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN.
21-44-101402157	Seguros del Estado	-Cumplimiento del contrato.	15/12/2022 – 30/06/2023	$197.850.333,00	16/12/2022	
		-Calidad de servicio	15/12/2022 – 30/06/2023	$197.850.333,00		
		-Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Sí ampara 2 años, 0 meses y 0 días.	$98.925.167,00		
		-Estabilidad y calidad de la obra	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días.	$197.850.333,00		
		-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	15/12/2022 – 31/12/2025	$98.925.167,00		
21-40-101202552	seguros del estado	-Predios labores y operación.	15/12/2022 – 31/12/2022	$200.000.000,00	16/12/2022	
		-Contratista y subcontratistas.	15/12/2022 – 31/12/2022	$200.000.000,00		
		-Vehículos propios y no propios.	15/12/2022 – 31/12/2022	$200.000.000,00		
21-44-101402157	seguros del estado	-Cumplimiento del contrato.	15/12/2022 – 26/10/2023	$197.850.333,00	30/12/2022	
		-Calidad de servicio	15/12/2022 – 26/10/2023	$197.850.333,00		
		-Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Sí ampara 2 años, 0 meses y 0 días.	$98.925.167,00		
		-Estabilidad y calidad de la obra	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días.	$197.850.333,00		

		-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	15/12/2022 – 16/04/2026	$98.925.167,00		
21-40-101202552	seguros del estado	-Predios labores y operación.	15/12/2022 – 26/04/2023	$200.000.000,00	30/12/2022	
		-Contratista y subcontratistas.	15/12/2022 – 26/04/2023	$200.000.000,00		
		-Vehículos propios y no propios.	15/12/2022 – 26/04/2023	$200.000.000,00		
21-40-101202552	seguros del estado	-Predios labores y operación.	15/12/2022 – 26/04/2023	$260.121.200,00	27/01/2023	
		-Contratista y subcontratistas.	15/12/2022 – 26/04/2023	$260.121.200,00		
		-Vehículos propios y no propios.	15/12/2022 – 26/04/2023	$260.121.200,00		

El aspecto administrativo del contrato, está conformado por el personal profesional de INGENIERIA RH SAS, ofertado y conformado por los siguientes perfiles profesionales de acuerdo con los términos de contratación:

No.	PROFESIONALES TECNICOS – ADMINISTRATIVOS CONTRATO FASE N° 1	
1	DIRECTOR DE DISEÑOS – Arquitecto	50% de dedicación.
2	DISEÑADOR – Arquitecto.	50% de dedicación.
3	DISEÑADOR ELECTRICO – Ing. Eléctrico o electricista.	20% de dedicación.
4	DISEÑADOR DE EQUIPOS TECNOLOGICOS – Ing. De sistemas o electrónico.	20% de dedicación.
No.	PROFESIONALES TECNICOS – ADMINISTRATIVOS CONTRATO FASE N° 2	
1	DIRECTOR DE OBRA – Arquitecto Y/o Ingeniero civil.	50% de dedicación.
2	RESIDENTE DE OBRA 1 – Arquitecto y/o Ingeniero civil.	100% de dedicación.
3	RESIDENTE DE OBRA 2 – Ing. Electrónico o de sistemas.	50% de dedicación.
4	RESIDENTE DE SST –Técnico o tecnólogo en el área de salud en el trabajo.	30% de dedicación.
5	MAESTRO DE OBRA. – Técnico o tecnólogo en obras civiles.	100% de dedicación.

Ilustración 4: Profesionales contrato

Se anexan los registros fotográficos de las actividades desarrolladas durante este periodo, junto con la programación y la documentación de afiliación del personal de obra que viene laborando en el contrato.


Cordialmente,


Arq. Martha Lucia Rey Navarro
Director(a) de obra y diseño
INGENIERIA RH SAS


ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICOS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 /6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO. SALA N° 1

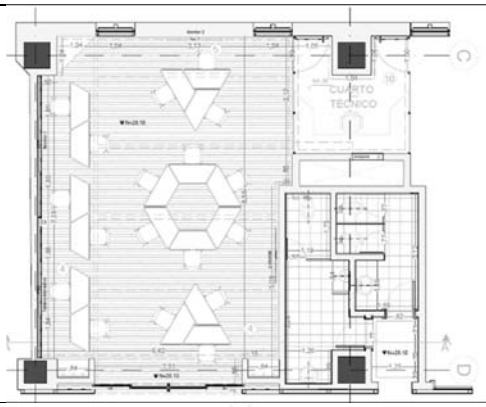

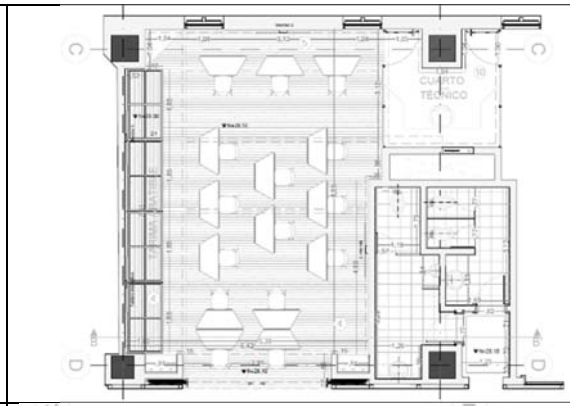

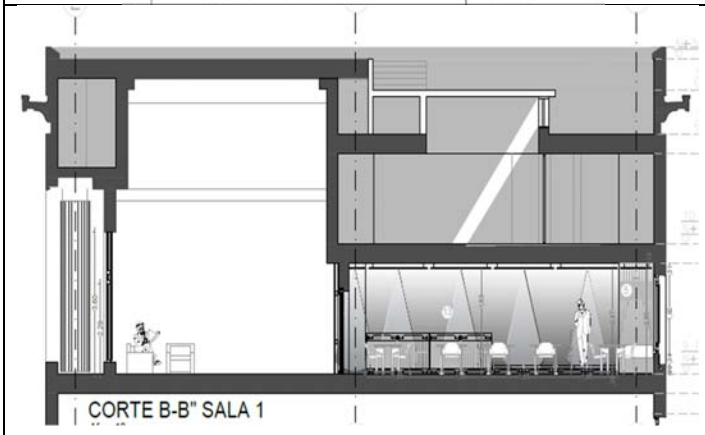











REGISTRO FOTOGRÁFICO. SALA N° 2

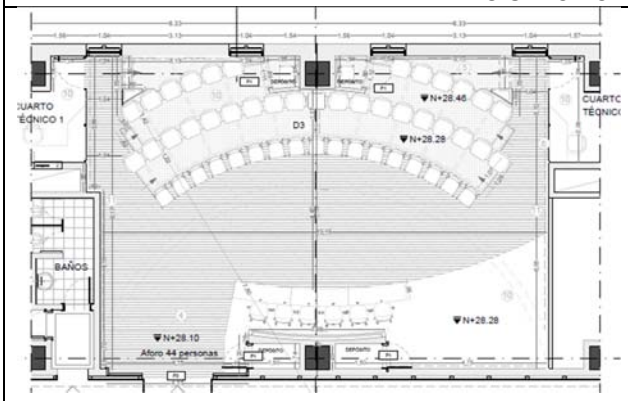

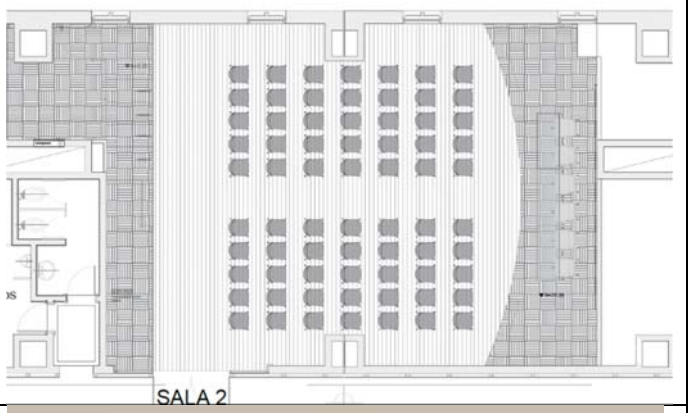

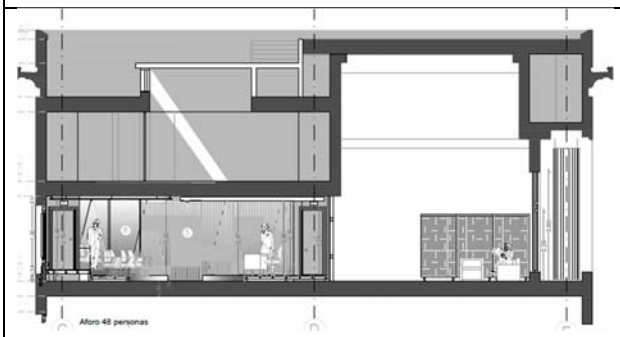


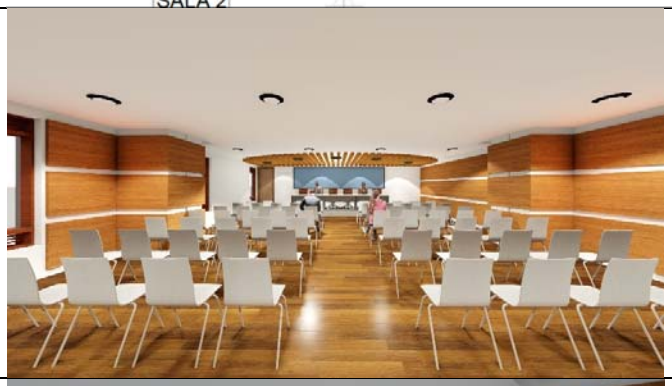






REGISTRO FOTOGRÁFICO. SALA N° 3

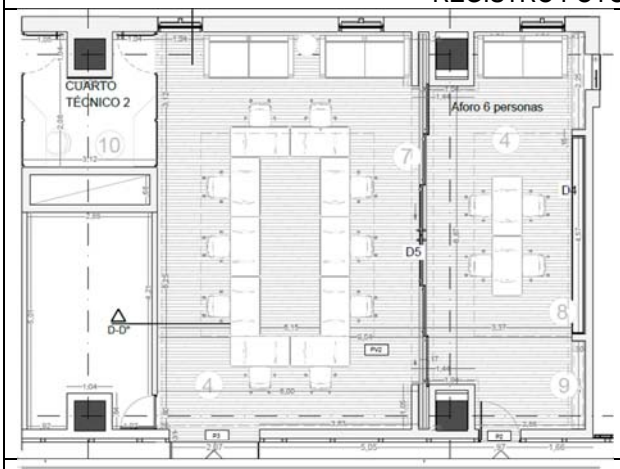

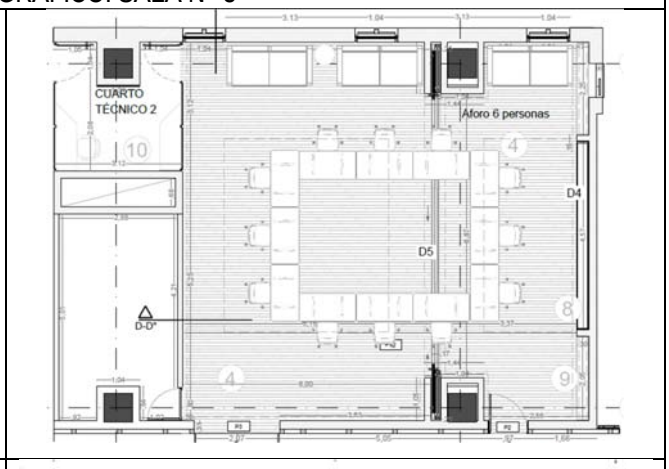









Contrato 268 de 2022

18. Informe de PGAS y SG-SST

Corte de obra N° 3, periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo del 2023.

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Bogotá D.C. 31 de marzo de 2023

Señores
CONSORCIO INTER 2022
Atn: Ing. John William Casallas Jurado
Representante Legal
Interventoría del contrato de obra 268/2022

CONTRATO DE OBRA N° 268 DE 2022.

OBJETO: "CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: Justificación presentación Informe PGAS.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace la aclaración que durante el periodo comprendido entre el **01 de marzo de 2023 y 31 de marzo de 2023** correspondiente al **corte Nº 3**, no se generó informe PGAS y SST, toda vez, que este periodo corresponde a la FASE I (diseños), la cual se encuentra en etapa de anteproyecto, ajustes de diseños y validación por parte de los usuarios.

MARTHA LUCIA REY NAVARRO
DIRECTORA DE OBRA CONTRATO 268-2022
INGENIERIA RH S.A.S
Nit: 830.061.440-1

Contrato 268 de 2022

21. Planos Record


Corte de obra N° 3, periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo del 2023.

Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia



CORTE A-A''' SALA 1

Aforo 24 personas

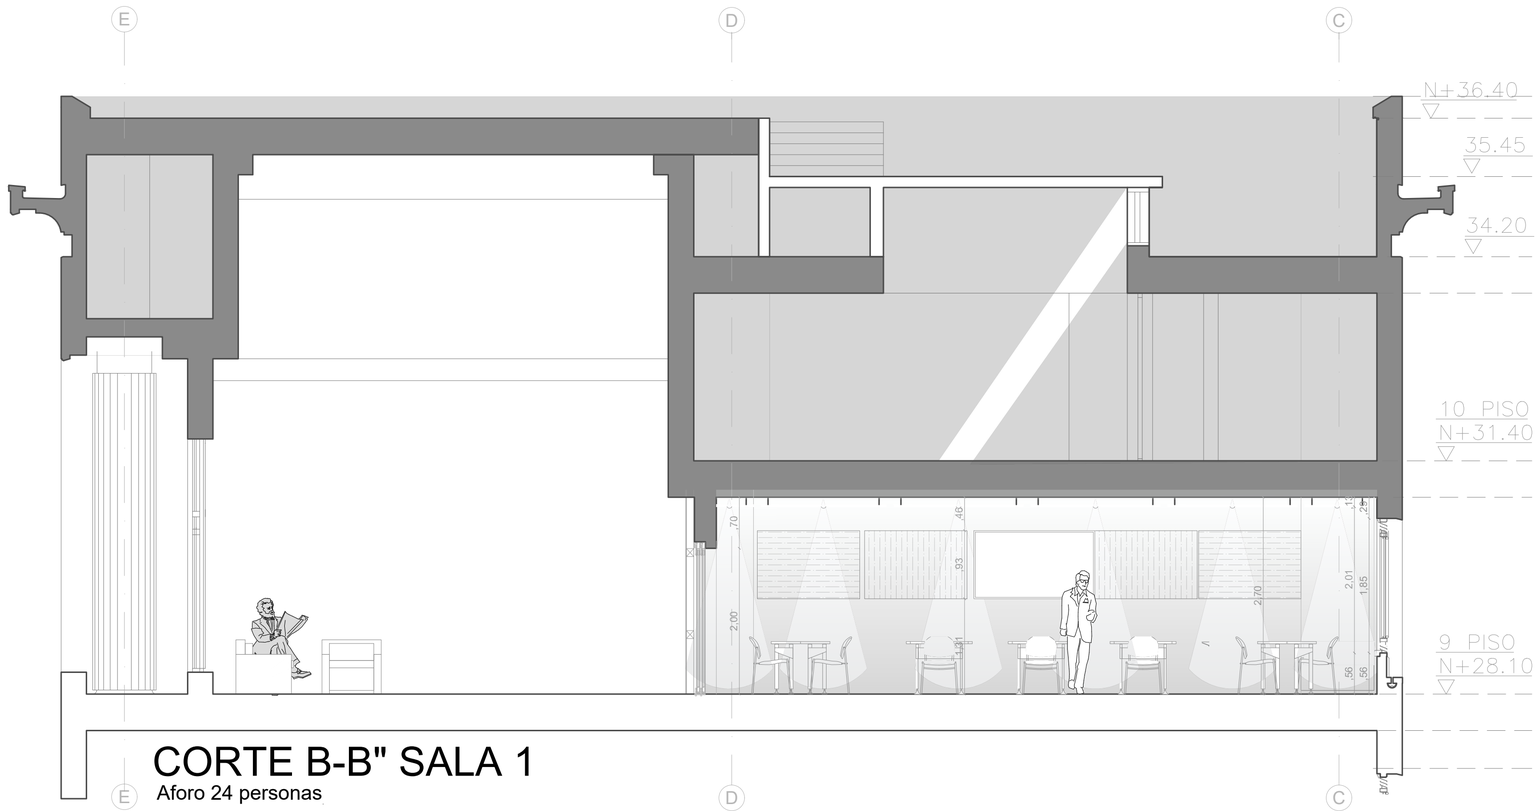

CORTE B-B" SALA 1

Aforo 24 personas

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

PROYECTO:

OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

INTERVENTORIA

Contrato Nº 298 27 de diciembre de 2022

Objeto:
Realizar la Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable al contrato cuyo objeto es "Contratar los diseños y las obras de adecuación del piso noveno del Palacio De Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C".

PROCIVIN S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
(PROCIVIN S.A.S)

OBRA

Contrato Nº 268 de 2022

Objeto:
Contratar los diseños y las obras de adecuacion del piso noveno del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C.

INGENIERÍA RH S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

RODRIGO E. HIDALGO
(INGENIERIA RH S.A.S)

ARQ. DISEÑADOR
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
M.P 25700-67844

ARQ. DIRECTOR
ARQ. HUGO SEBASTIAN ANGARITA
M.P A3582018-1032479891

V°B° DIRECTOR DIVISIÓN DE MEJORAMIIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA:

ING. SERGIO DUARTE

LOCALIZACIÓN:

Información del predio:

Matrícula Inmobiliaria:

Codigo catastral:

Departamento: Bogotá D.C.
Municipio: Bogotá

Licencia de Costrucción:

Resolución:



OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

Dirección: Calle 12 No. 7-65, Bogotá D.C.

OBSERVACIONES:

CONTIENE:

CORTE TRANSVERSAL A-A' Y LONGITUDINAL B-B'`` PROPUESTA SALA Nº 1.

DIGITALIZO:
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
ARQ. VALENTINA PRIETO


ESPECIALISTA DISEÑADOR:
SEIS MAS ARQUITECTURA
&
INGENIERIA S.A.S

seis Arquitectura & Ingeniería

VERSION:	FECHA:
CUATRO	MAYO 2023


ESCALA DE PLOTTER
1 : 50
½ PLIEGO (0.50m x 0.70m)
ARCHIVO
`PROYECTO FINAL V4.dwg

ARQUITECTONICO
A05 DE **07**

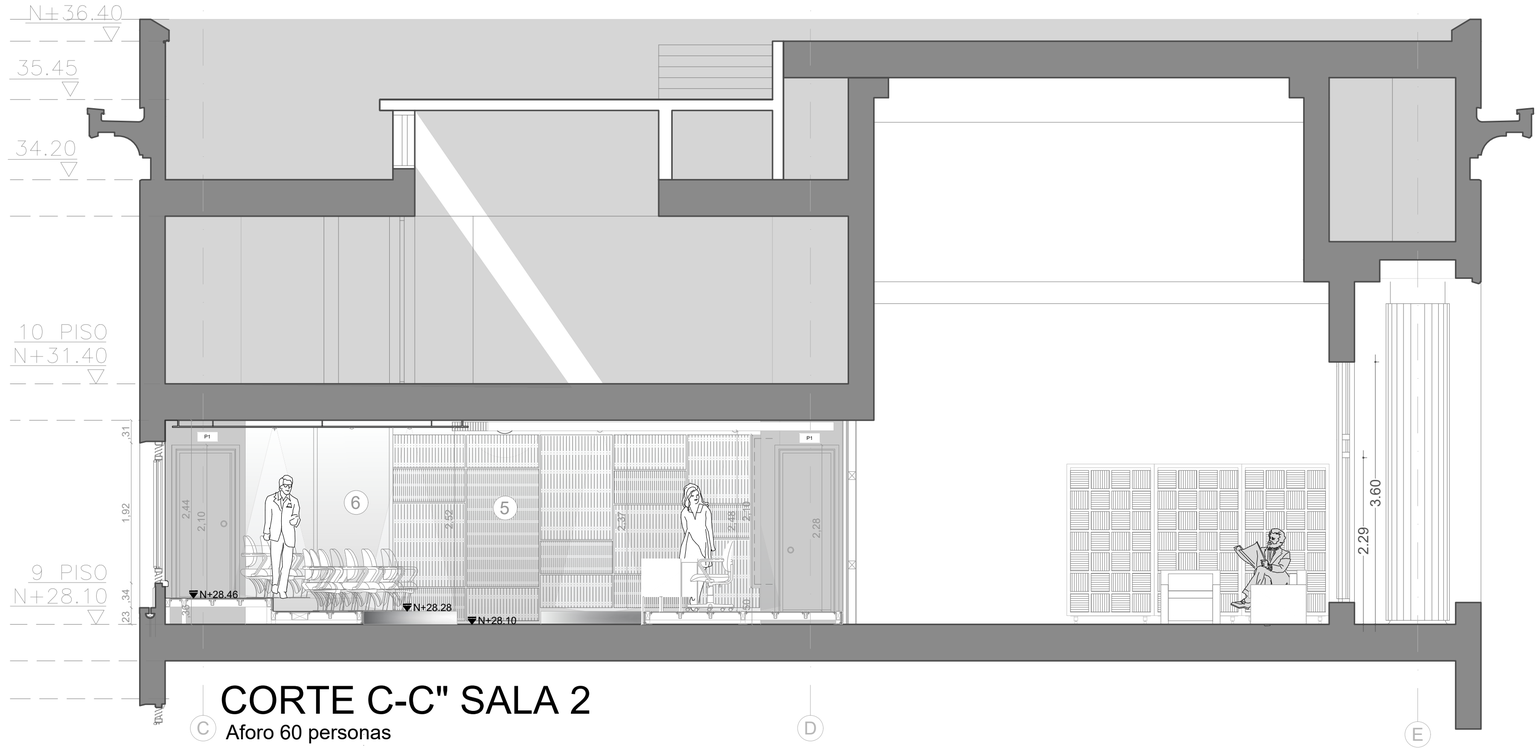

CORTE C-C" SALA 2

Aforo 60 personas

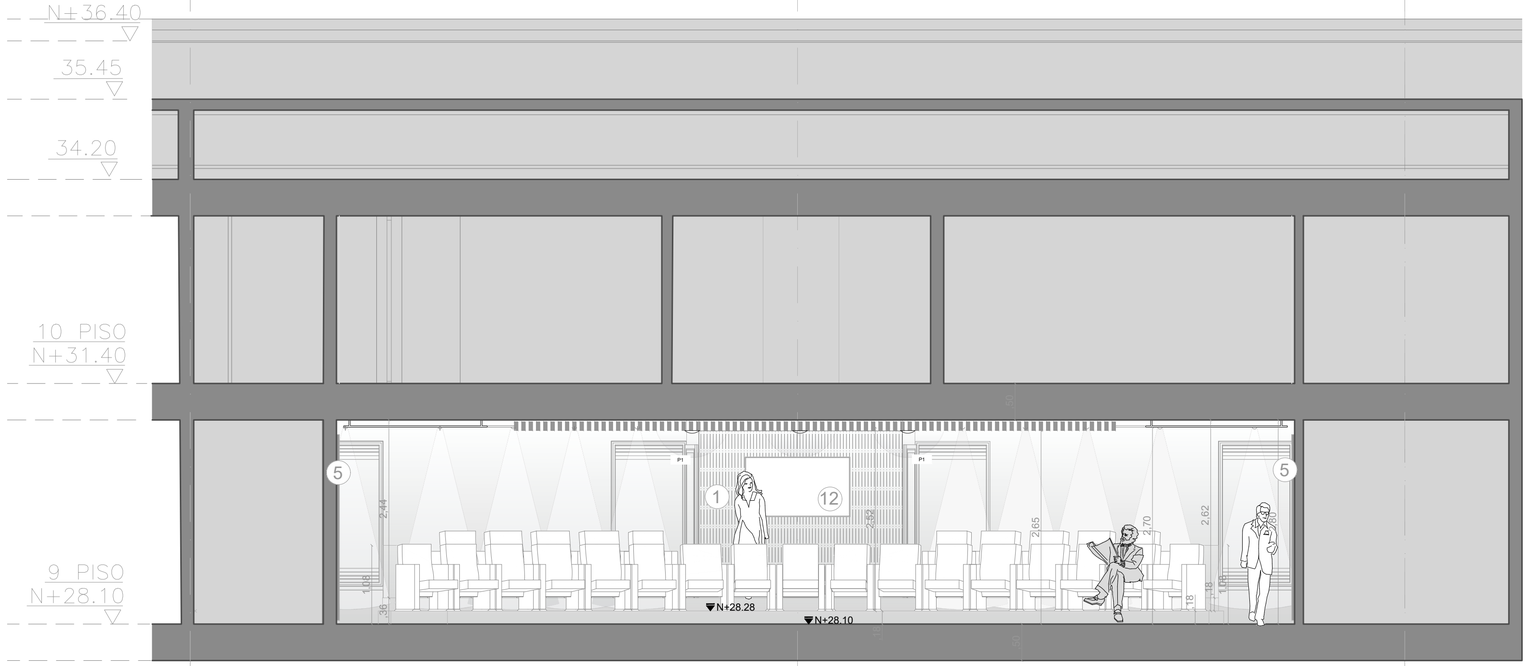

CORTE D-D" SALA 2

Aforo 60 personas

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

PROYECTO:

OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

INTERVENTORIA

Contrato Nº 298 27 de diciembre de 2022

Objeto:
Realizar la Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable al contrato cuyo objeto es "Contratar los diseños y las obras de adecuación del piso noveno del Palacio De Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C".

PROCIVIN S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
(PROCIVIN S.A.S)

OBRA

Contrato Nº 268 de 2022

Objeto:
Contratar los diseños y las obras de adecuacion del piso noveno del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C.

INGENIERÍA RH S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

RODRIGO E. HIDALGO
(INGENIERIA RH S.A.S)

ARQ. DISEÑADOR
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
M.P 25700-67844

ARQ. DIRECTOR
ARQ. HUGO SEBASTIAN ANGARITA
M.P A3582018-1032479891

V°B° DIRECTOR DIVISIÓN DE MEJORAMIIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA:

ING. SERGIO DUARTE

LOCALIZACIÓN:

Información del predio:

Matrícula Inmobiliaria:

Codigo catastral:

Departamento: Bogotá D.C.
Municipio: Bogotá

Licencia de Costrucción:

Resolución:



OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

Dirección: Calle 12 No. 7-65, Bogotá D.C.

OBSERVACIONES:

CONTIENE:

CORTE TRANSVERSAL C-C' Y LONGITUDINAL D-D' PROPUESTA SALA Nº 2.

DIGITALIZO:
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
ARQ. VALENTINA PRIETO

ESPECIALISTA DISEÑADOR:
SEIS MAS ARQUITECTURA
&
INGENIERIA S.A.S

seis Arquitectura & Ingeniería

VERSION:	FECHA:
CUATRO	MAYO 2023

ESCALA DE PLOTTER
1 : 50
½ PLIEGO (0.50m x 0.70m)


ARCHIVO
'PROYECTO FINAL V4.dwg

ARQUITECTONICO
A06
DE
07



CORTE E-E" SALA 3

Aforo 26 personas

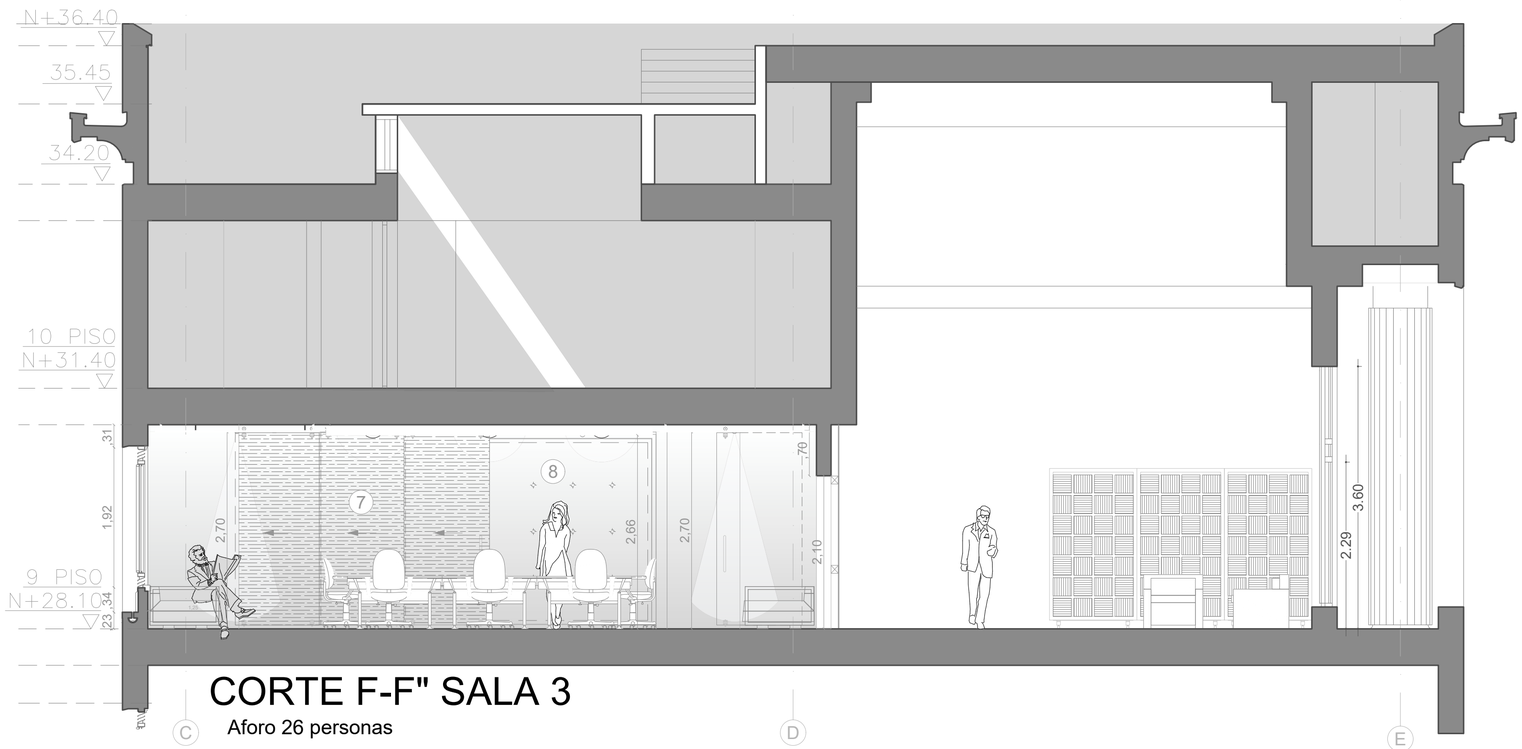

CORTE F-F" SALA 3

Aforo 26 personas

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

PROYECTO:

OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

INTERVENTORIA
Contrato Nº 298 27 de diciembre de 2022
Objeto:
Realizar la Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable al contrato cuyo objeto es "Contratar los diseños y las obras de adecuación del piso noveno del Palacio De Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C".

PROCIVIN S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
(PROCIVIN S.A.S)

OBRA
Contrato Nº 268 de 2022
Objeto:
Contratar los diseños y las obras de adecuacion del piso noveno del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C.

INGENIERÍA RH S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

RODRIGO E. HIDALGO
(INGENIERIA RH S.A.S)


ARQ. DISEÑADOR
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
M.P 25700-67844

ARQ. DIRECTOR
ARQ. HUGO SEBASTIAN ANGARITA
M.P A3582018-1032479891

V°B° DIRECTOR DIVISIÓN DE MEJORAMIIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA:

ING. SERGIO DUARTE

LOCALIZACIÓN:
Información del predio:
Matrícula Inmobiliaria:
Código catastral:
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio: Bogotá
Licencia de Costrucción:
Resolución:



OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

Dirección: Calle 12 No. 7-65, Bogotá D.C.

OBSERVACIONES:

CONTIENE:

CORTE TRANSVERSAL E-E' Y LONGITUDINAL F-F' PROPUESTA SALA Nº 3.

DIGITALIZO:
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
ARQ. VALENTINA PRIETO


ESPECIALISTA DISEÑADOR:
SEIS MAS ARQUITECTURA
&
INGENIERIA S.A.S

VERSION:	FECHA:
CUATRO	MAYO 2023

ESCALA DE PLOTTER
1 : 50
1/2 PLIEGO (0.50m x 0,70m)
ARCHIVO
'PROYECTO FINAL V4.dwg


ARQUITECTONICO
A07
DE
07

PLANTA

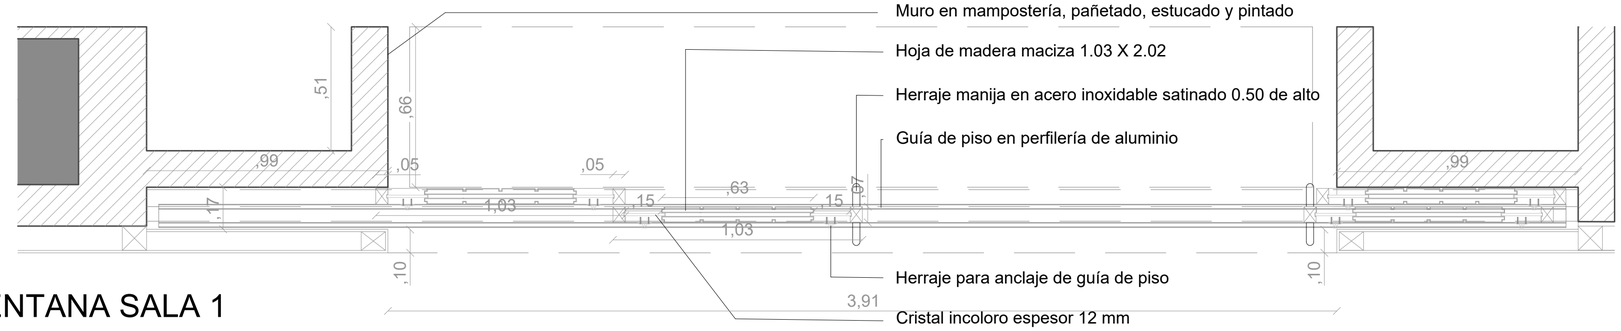


D6 / PUERTA VENTANA SALA 1
ESC. 1:15

FACHADA

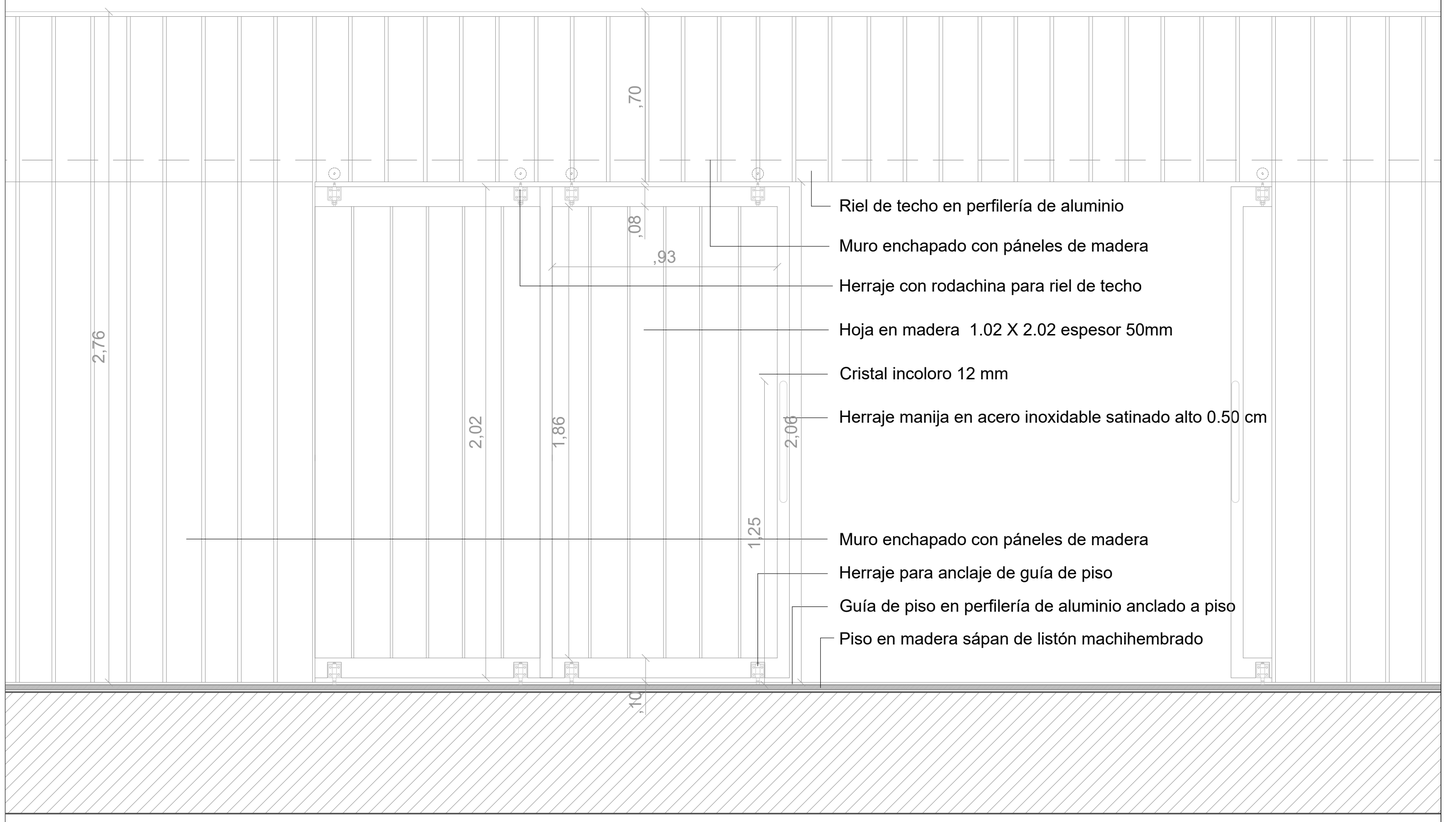

D6 / PUERTA VENTANA SALA 1
ESC. 1:15

CORTE

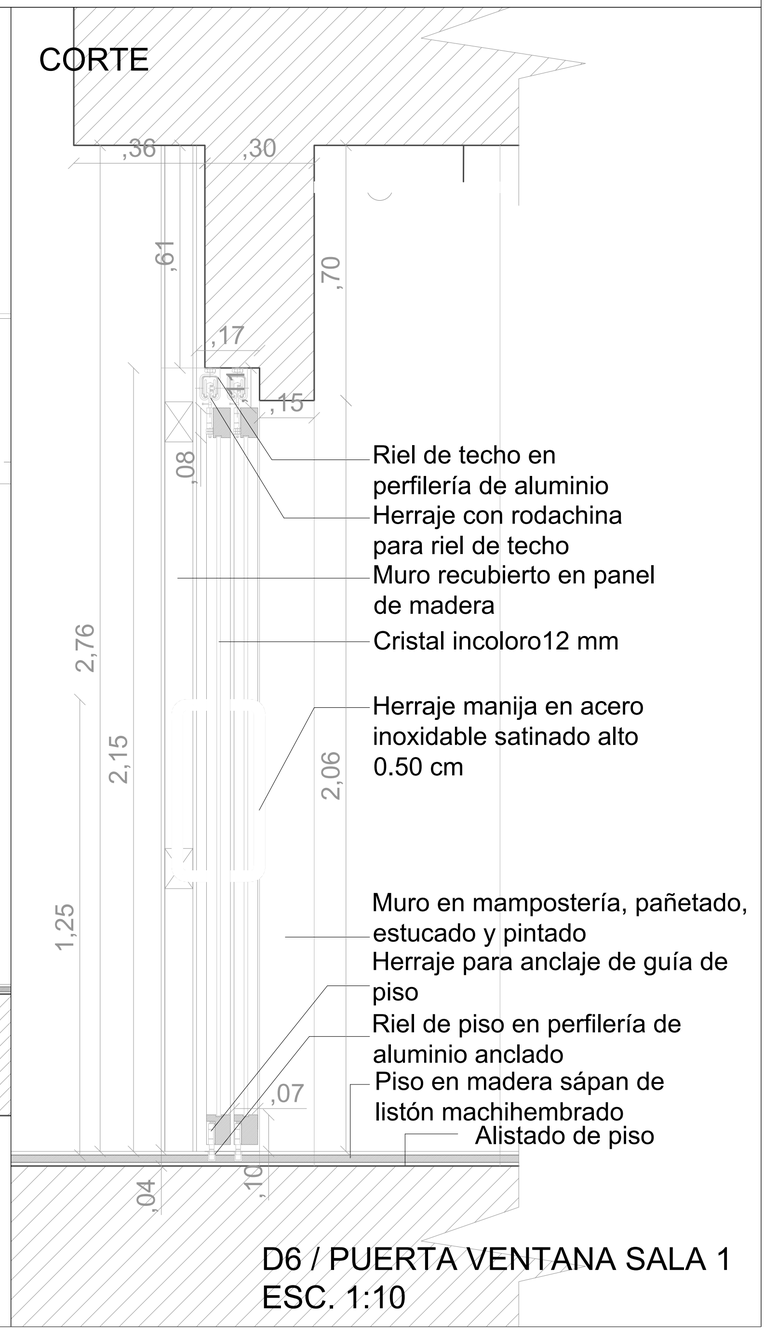

D6 / PUERTA VENTANA SALA 1
ESC. 1:10

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

PROYECTO:

OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

INTERVENTORIA
Contrato Nº 298 27 de diciembre de 2022
Objeto:
Realizar la Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable al contrato cuyo objeto es "Contratar los diseños y las obras de adecuación del piso noveno del Palacio De Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C".

PROCIVIN S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
(PROCIVIN S.A.S)

OBRA
Contrato Nº 268 de 2022
Objeto:
Contratar los diseños y las obras de adecuacion del piso noveno del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C.

INGENIERÍA RH S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

RODRIGO E. HIDALGO
(INGENIERIA RH S.A.S)

ARQ. DISEÑADOR
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
M.P 25700-67844

ARQ. DIRECTOR
ARQ. HUGO SEBASTIAN ANGARITA
M.P A3582018-1032479891

V°B° DIRECTOR DIVISIÓN DE MEJORAMIIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA:

ING. SERGIO DUARTE

LOCALIZACIÓN:
Información del predio:
Matrícula Inmobiliaria:
Codigo catastral:
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio: Bogotá
Licencia de Costrucción:
Resolución:

OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

Dirección: Calle. 12 No. 7-65, Bogotá D.C.

OBSERVACIONES:

CONTIENE:

DETALLES ARQUITECTONICOS
SALAS 1, 2 Y 3

DIGITALIZO:
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
ARQ. VALENTINA PRIETO


ESPECIALISTA DISEÑADOR:
SEIS MAS ARQUITECTURA
&
INGENIERIA S.A.S

VERSION: CUATRO
FECHA: MAYO 2023


ESCALA DE PLOTTER
INDICADA
PLIEGO (0.50m x 0,70m)
ARCHIVO
'PROYECTO FINAL V4.dwg

ARQUITECTONICO
D01
DE
06

D2 / CORTE SALA 1
ESC. 1:10

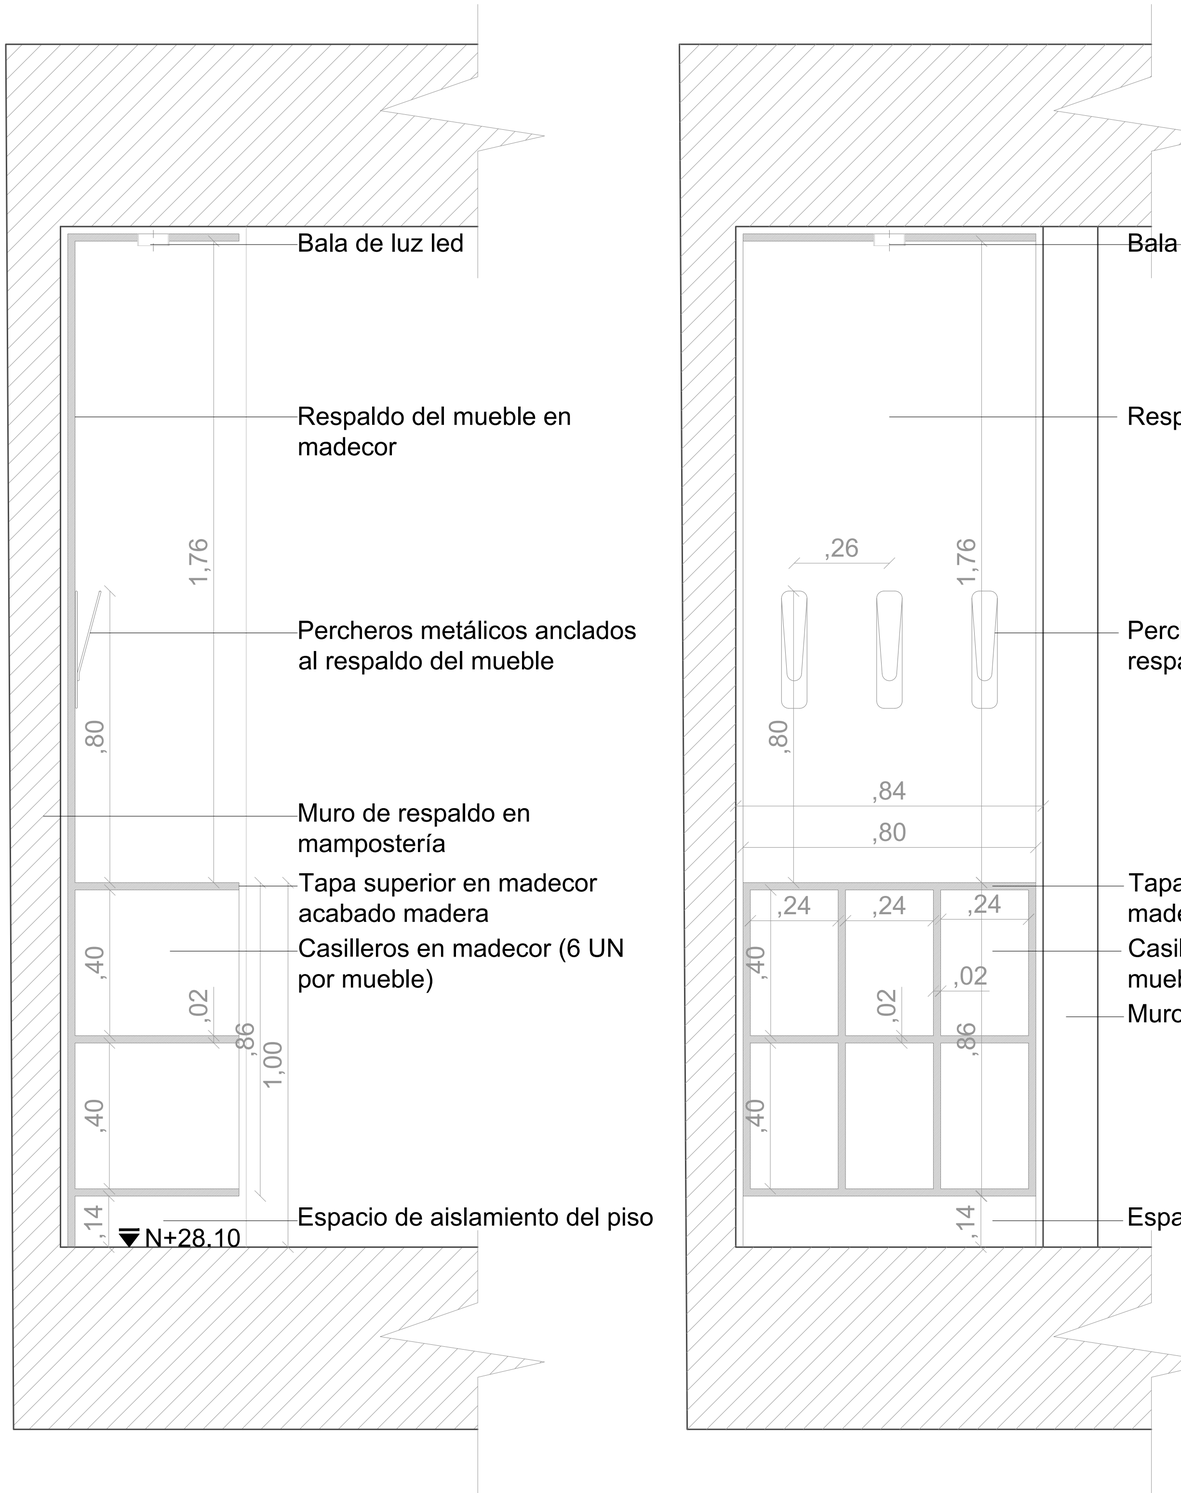

D2 / PLANTA SALA 1
ESC. 1:10

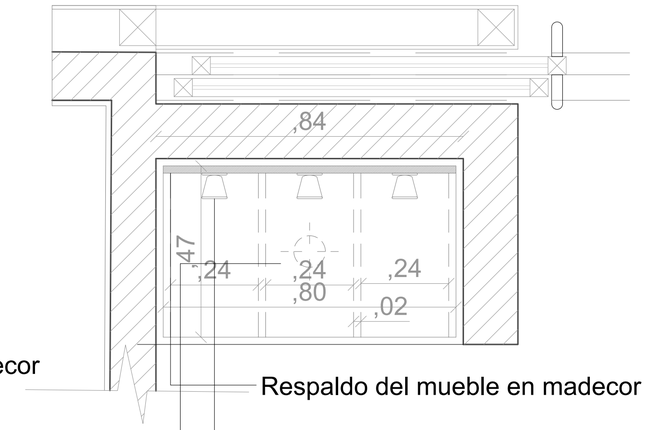

D2 / MUEBLE EMPOTRADO PERCHERO
SALA 1 ESC. 1:10

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

PROYECTO:

OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

INTERVENTORIA
Contrato Nº 298 27 de diciembre de 2022
Objeto:
Realizar la Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable al contrato cuyo objeto es "Contratar los diseños y las obras de adecuación del piso noveno del Palacio De Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C".

PROCIVIN S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
(PROCIVIN S.A.S)

OBRA
Contrato Nº 268 de 2022
Objeto:
Contratar los diseños y las obras de adecuacion del piso noveno del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C.

INGENIERÍA RH S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

RODRIGO E. HIDALGO
(INGENIERIA RH S.A.S)

ARQ. DISEÑADOR
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
M.P 25700-67844

ARQ. DIRECTOR
ARQ. HUGO SEBASTIAN ANGARITA
M.P A3582018-1032479891

V°B° DIRECTOR DIVISIÓN DE MEJORAMIIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA:

ING. SERGIO DUARTE

LOCALIZACIÓN:
Información del predio:
Matrícula Inmobiliaria:
Codigo catastral:
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio: Bogotá
Licencia de Costrucción:
Resolución:



OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

Dirección: Calle 12 No. 7-65, Bogotá D.C.

OBSERVACIONES:

CONTIENE:

DETALLES ARQUITECTONICOS
SALAS 1, 2 Y 3

DIGITALIZO:
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
ARQ. VALENTINA PRIETO


ESPECIALISTA DISEÑADOR:
SEIS MAS ARQUITECTURA
&
INGENIERIA S.A.S

VERSION:	FECHA:
CUATRO	MAYO 2023


ESCALA DE PLOTTER
INDICADA
1/2 PLIEGO (0.50m x 0,70m)
ARCHIVO
'PROYECTO FINAL V4.dwg

ARQUITECTONICO
D02
DE
06

D3 / PLANTA
SALA 2 ESC. 1:20

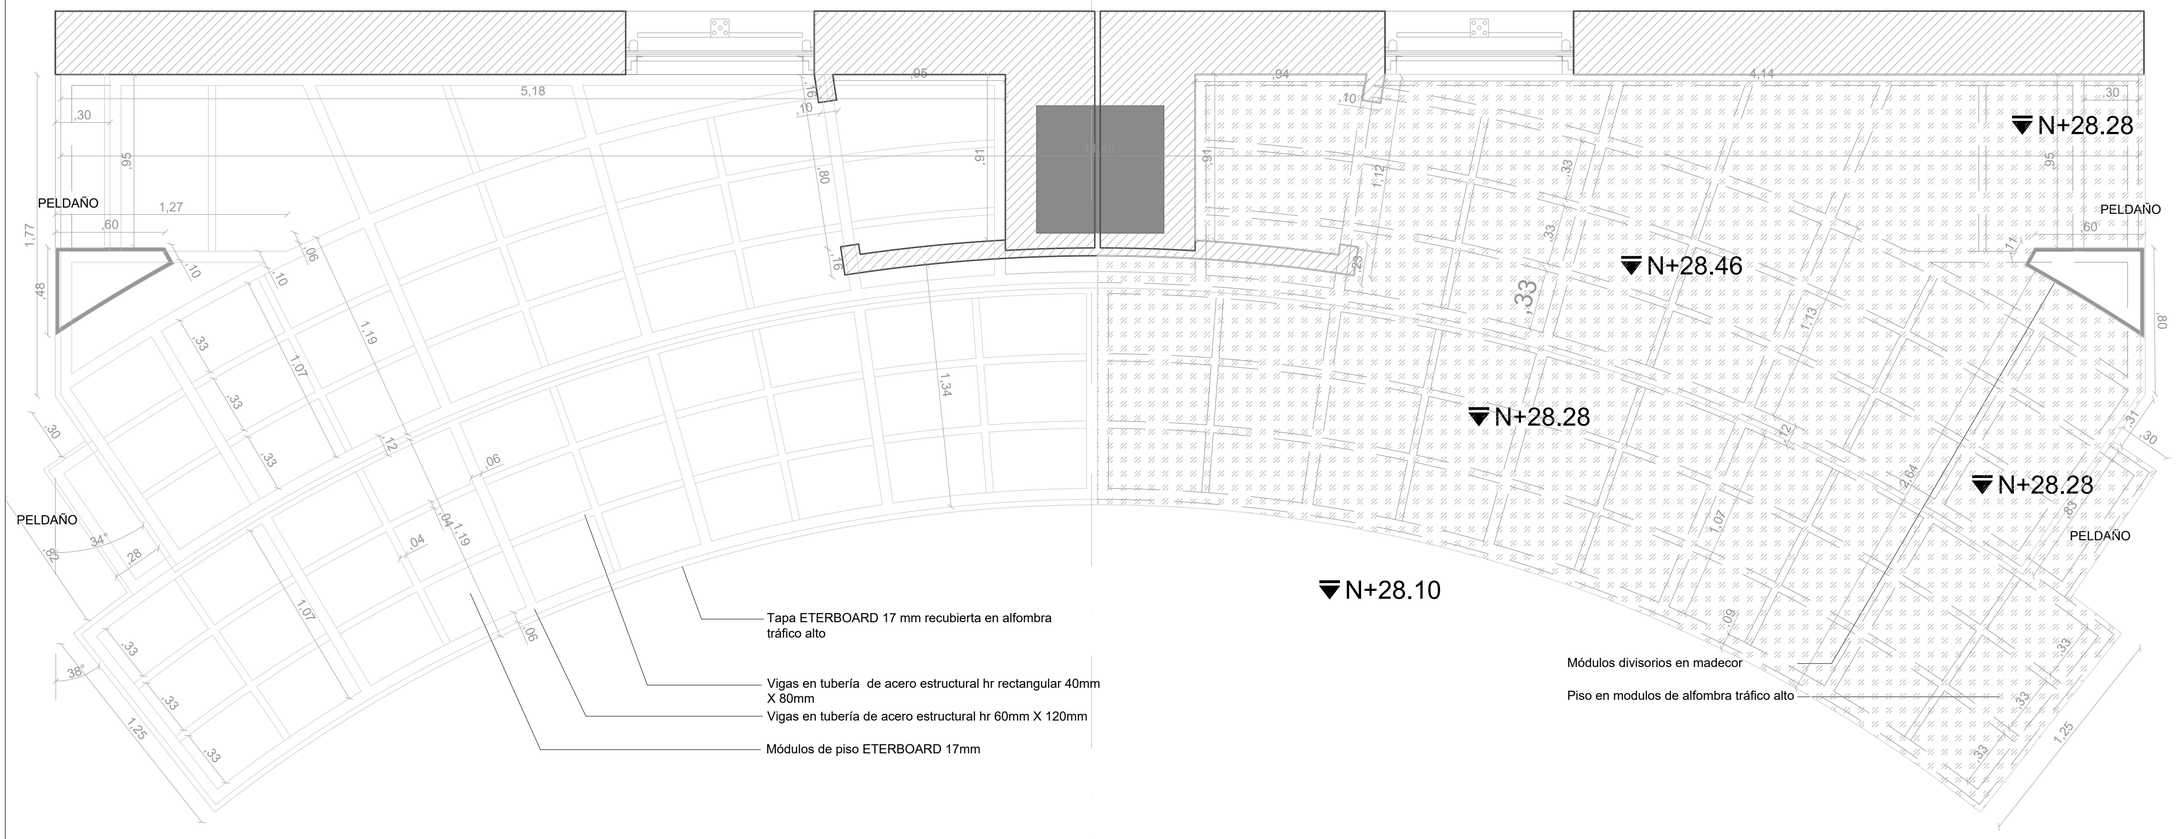

D3 / CORTE
SALA 2 ESC. 1:20

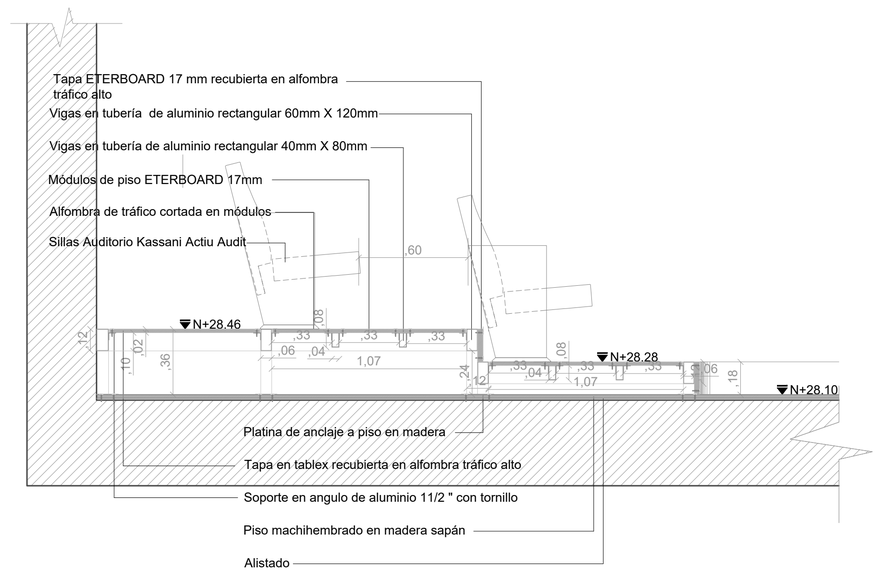

D3 / TARIMA PARA AUDITORIO
SALA 2 ESC. 1:20

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INGENIERIA RH SAS
PROYECTOS Y EDIFICACIONES

PROYECTO:

OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

INTERVENTORIA
Contrato Nº 298 27 de diciembre de 2022
Objeto:
Realizar la Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable al contrato cuyo objeto es "Contratar los diseños y las obras de adecuación del piso noveno del Palacio De Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C".

PROCIVIN S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
(PROCIVIN S.A.S)

OBRA
Contrato Nº 268 de 2022
Objeto:
Contratar los diseños y las obras de adecuacion del piso noveno del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C.

INGENIERÍA RH S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

RODRIGO E. HIDALGO
(INGENIERIA RH S.A.S)

ARQ. DISEÑADOR
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
M.P 25700-67844

ARQ. DIRECTOR
ARQ. HUGO SEBASTIAN ANGARITA
M.P A3582018-1032479891

V°B° DIRECTOR DIVISIÓN DE MEJORAMIIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA:

ING. SERGIO DUARTE

LOCALIZACIÓN:
Información del predio:
Matrícula Inmobiliaria:
Codigo catastral:
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio: Bogotá
Licencia de Costrucción:
Resolución:



OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

Dirección: Calle. 12 No. 7-65, Bogotá D.C.

OBSERVACIONES:

CONTIENE:

DETALLES ARQUITECTONICOS
SALAS 1, 2 Y 3

DIGITALIZO:
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
ARQ. VALENTINA PRIETO

ESPECIALISTA DISEÑADOR:
SEIS MAS ARQUITECTURA
&
INGENIERIA S.A.S


VERSION:
CUATRO

FECHA:
MAYO 2023

ESCALA DE PLOTTER
INDICADA
½ PLIEGO (0.50m x 0,70m)
ARCHIVO
'PROYECTO FINAL V4.dwg


ARQUITECTONICO
D03
DE
06

D4 / PLANTA
ESC. 1:20

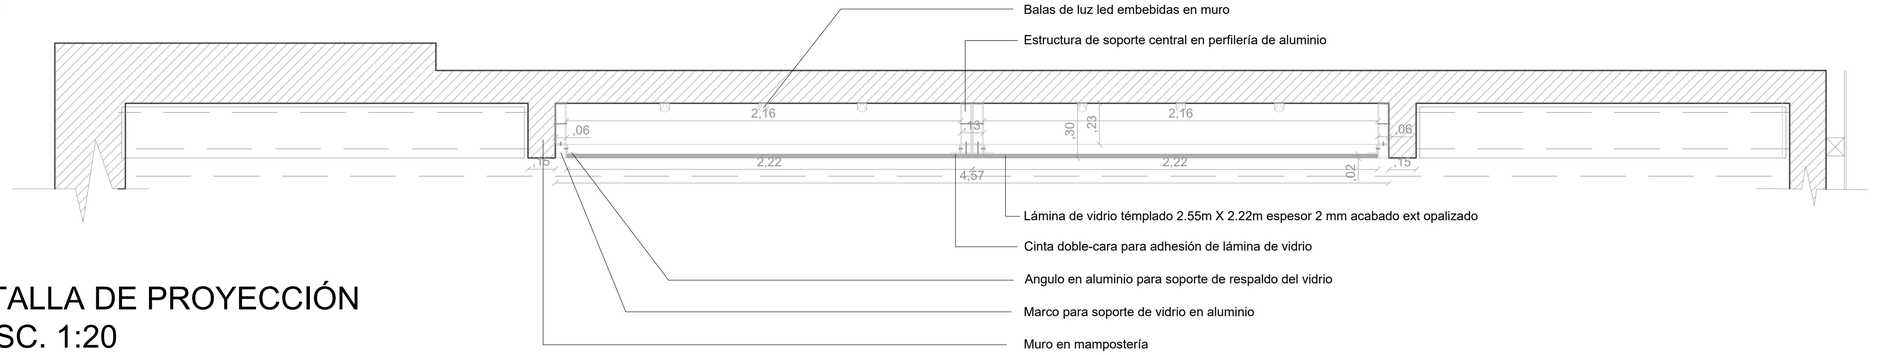


D4 / PANTALLA DE PROYECCIÓN
SALA 3 ESC. 1:20

D4 / FACHADA
ESC. 1:20

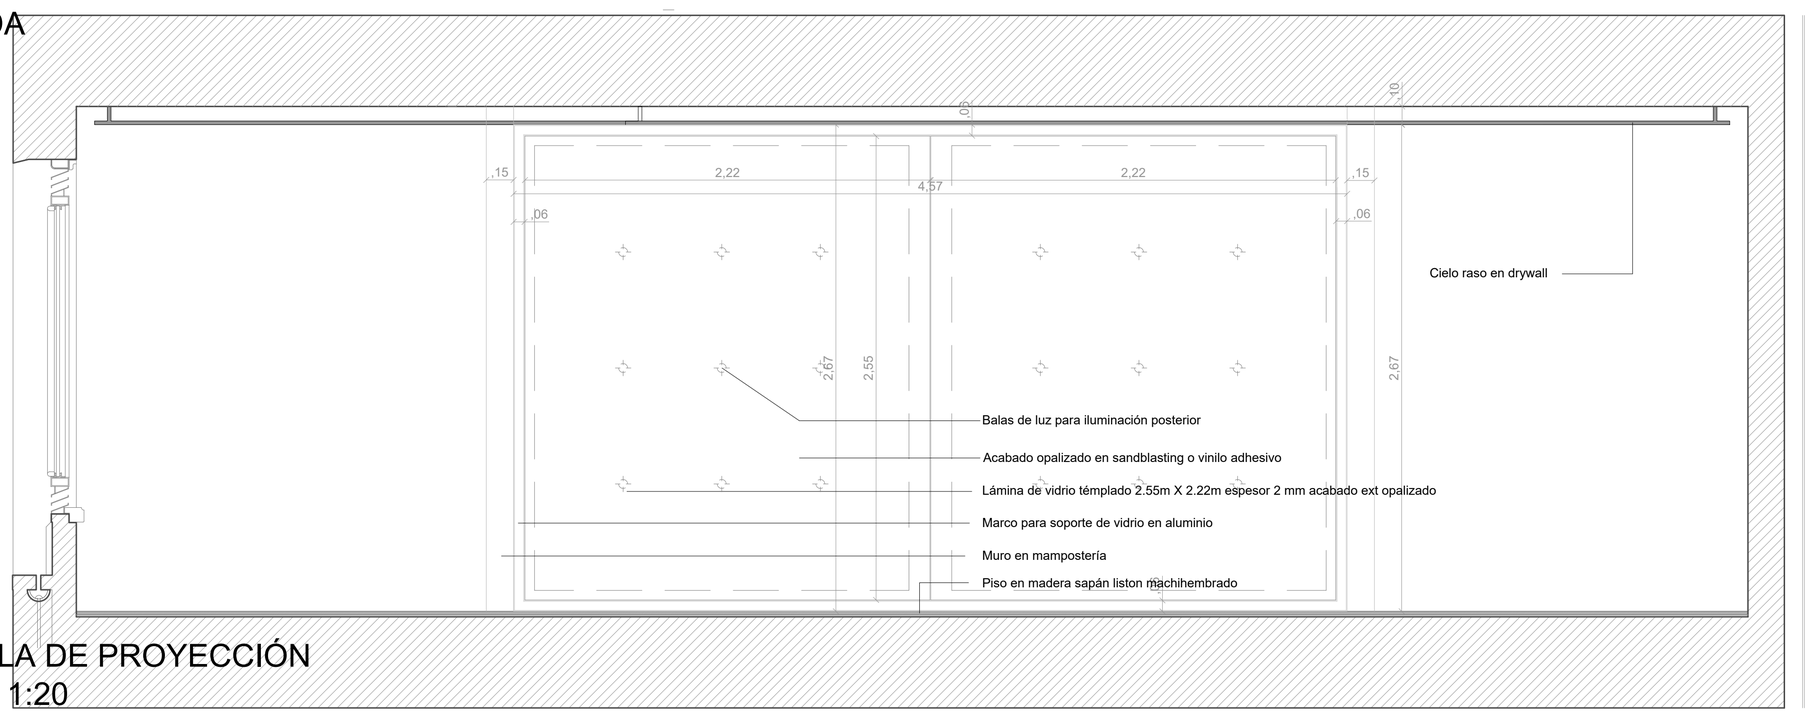

D4 / PANTALLA DE PROYECCIÓN
SALA 3 ESC. 1:20

D4 / CORTE
ESC. 1:25

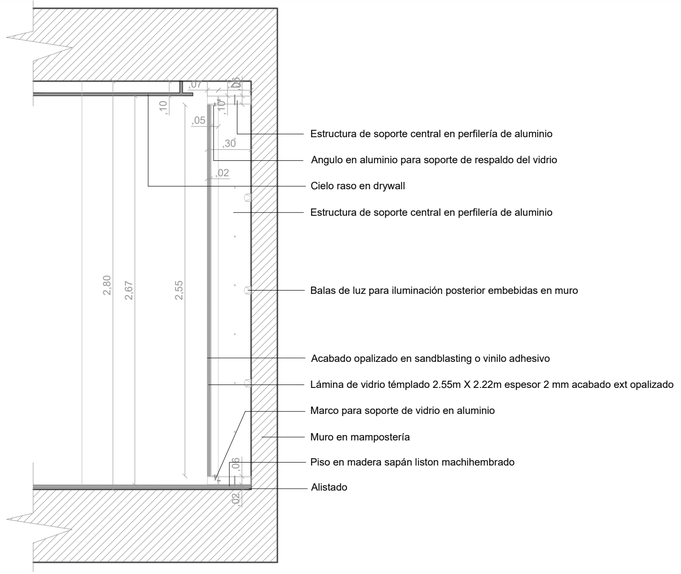

D4 / PANTALLA DE PROYECCIÓN
SALA 3 ESC. 1:25

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

PROYECTO:

OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

INTERVENTORIA
Contrato Nº 298 27 de diciembre de 2022
Objeto:
Realizar la Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable al contrato cuyo objeto es "Contratar los diseños y las obras de adecuación del piso noveno del Palacio De Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C".

PROCIVIN S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
(PROCIVIN S.A.S)

OBRA
Contrato Nº 268 de 2022
Objeto:
Contratar los diseños y las obras de adecuacion del piso noveno del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C.

INGENIERÍA RH S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

RODRIGO E. HIDALGO
(INGENIERIA RH S.A.S)


ARQ. DISEÑADOR
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
M.P 25700-67844

ARQ. DIRECTOR
ARQ. HUGO SEBASTIAN ANGARITA
M.P A3582018-1032479891

V°B° DIRECTOR DIVISIÓN DE MEJORAMIIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA:

ING. SERGIO DUARTE

LOCALIZACIÓN:
Información del predio:
Matrícula Inmobiliaria:
Codigo catastral:
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio: Bogotá
Licencia de Costrucción:
Resolución:



OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA
Dirección: Calle 12 No. 7-65, Bogotá D.C.

OBSERVACIONES:

CONTIENE:

DETALLES ARQUITECTONICOS
SALAS 1, 2 Y 3

DIGITALIZO:
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
ARQ. VALENTINA PRIETO

ESPECIALISTA DISEÑADOR:
SEIS MAS ARQUITECTURA
&
INGENIERIA S.A.S


seis Arquitectura & Ingeniería

VERSION:	FECHA:
CUATRO	MAYO 2023

ESCALA DE PLOTTER
INDICADA
½ PLIEGO (0.50m x 0.70m)
ARCHIVO
'PROYECTO FINAL V4.dwg


ARQUITECTONICO
D04
DE
06

D5 / PLANTA
ESC. 1:20

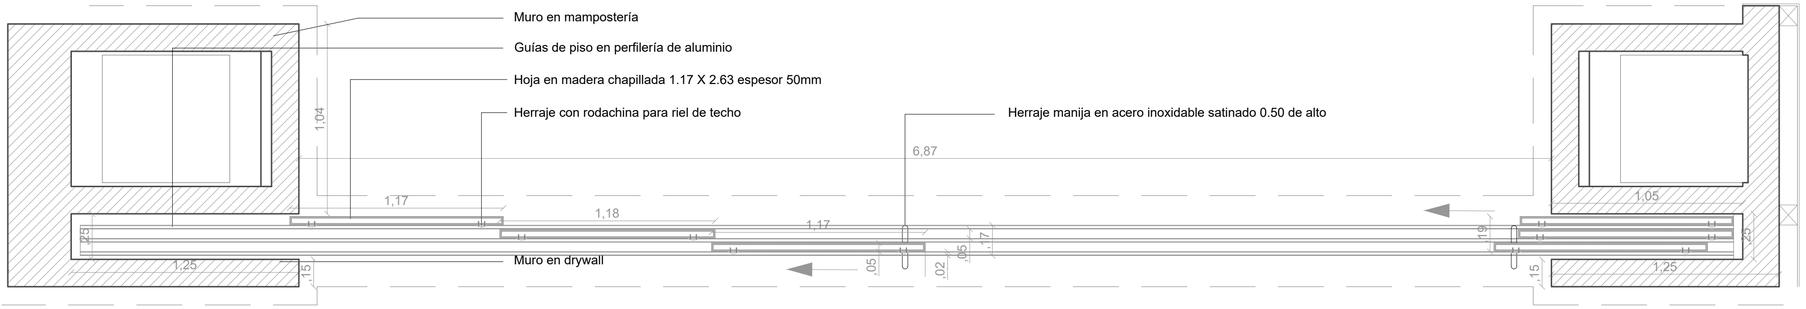

D5 / PUERTA DIVISORIA EN MADERA
SALA 3 ESC. 1:20

D5 / CORTE
ESC. 1:15

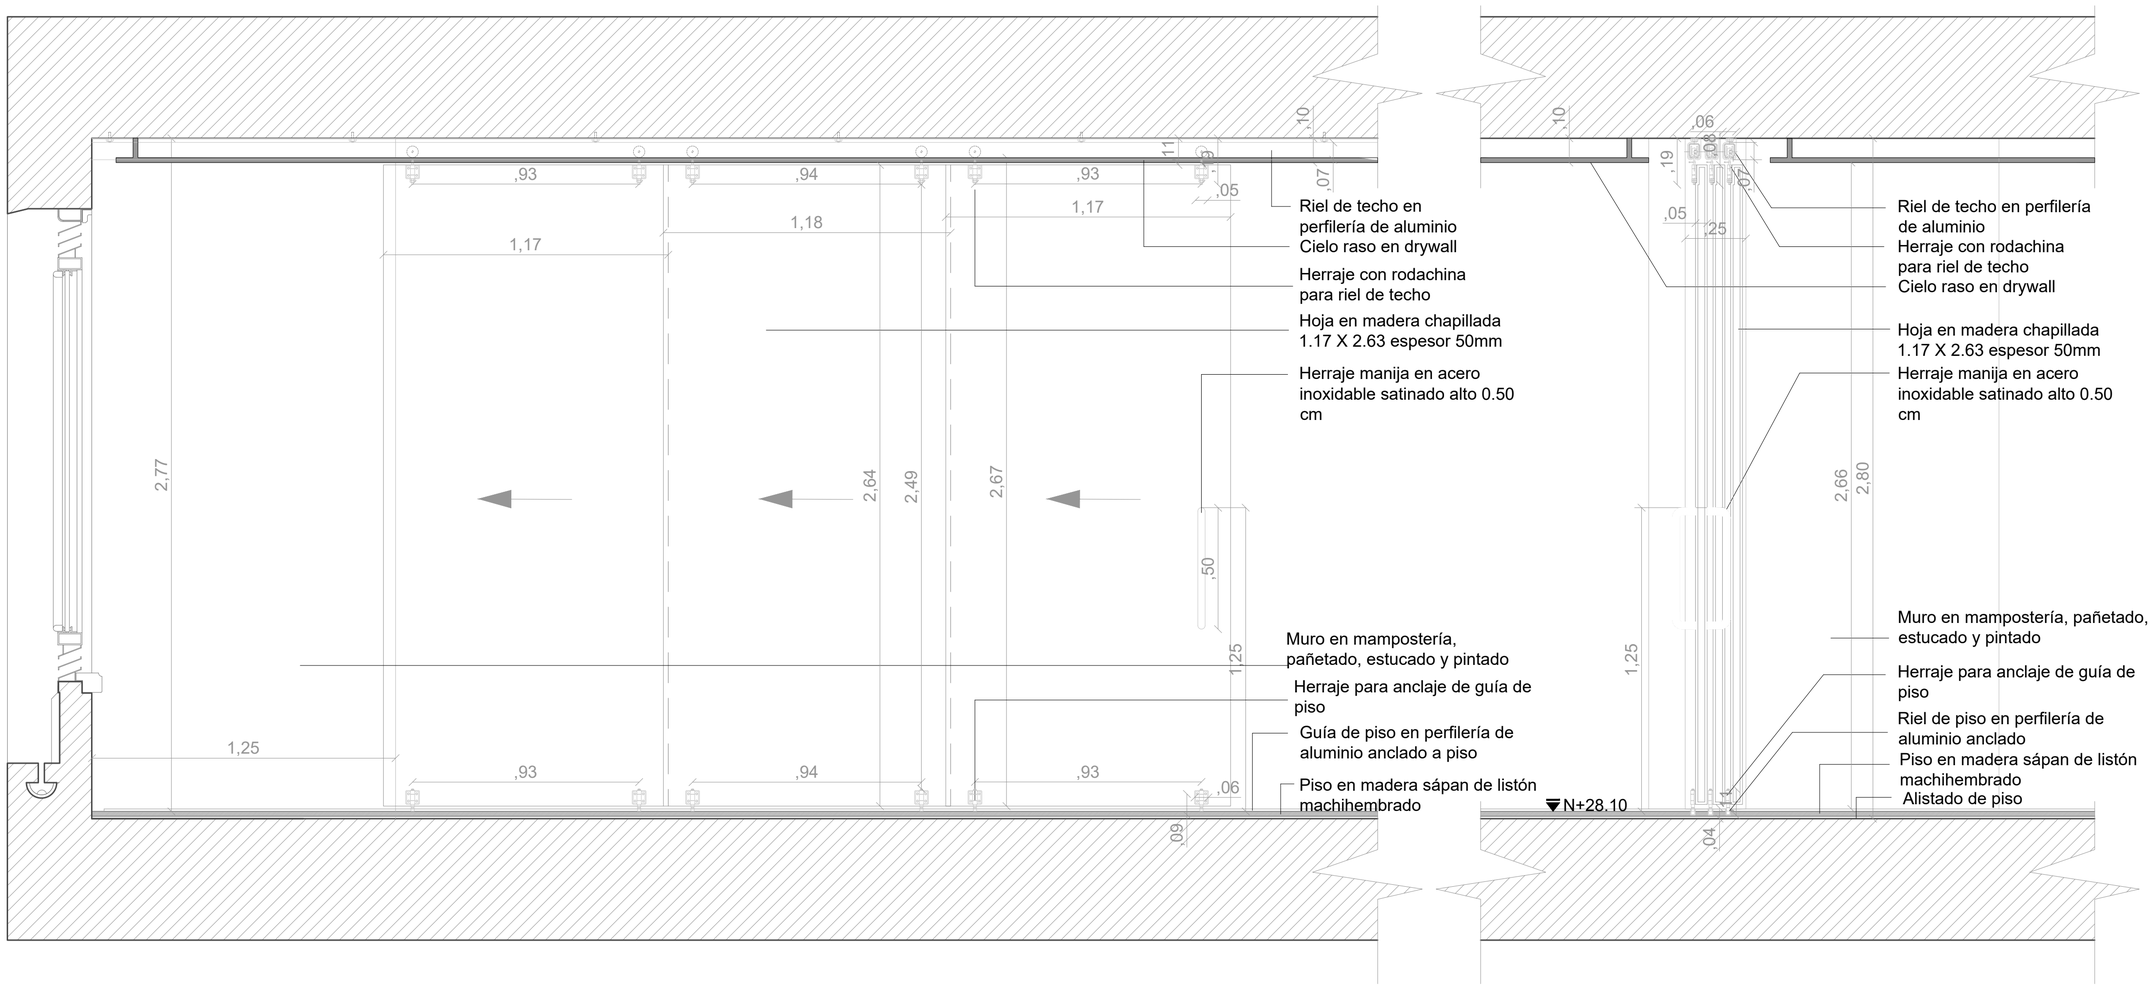

D5 / PUERTA DIVISORIA EN MADERA
SALA 3 ESC. 1:15

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

PROYECTO:

OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

INTERVENTORIA
Contrato Nº 298 27 de diciembre de 2022
Objeto:
Realizar la Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable al contrato cuyo objeto es "Contratar los diseños y las obras de adecuación del piso noveno del Palacio De Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C".

PROCIVIN S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
(PROCIVIN S.A.S)

OBRA
Contrato Nº 268 de 2022
Objeto:
Contratar los diseños y las obras de adecuacion del piso noveno del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C.

INGENIERÍA RH S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

RODRIGO E. HIDALGO
(INGENIERIA RH S.A.S)


ARQ. DISEÑADOR
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
M.P 25700-67844

ARQ. DIRECTOR
ARQ. HUGO SEBASTIAN ANGARITA
M.P A3582018-1032479891

V°B° DIRECTOR DIVISIÓN DE MEJORAMIIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA:

ING. SERGIO DUARTE

LOCALIZACIÓN:
Información del predio:
Matrícula Inmobiliaria:
Codigo catastral:
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio: Bogotá
Licencia de Construcción:
Resolución:



OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA
Dirección: Calle 12 No. 7-65, Bogotá D.C.

OBSERVACIONES:

CONTIENE:

DETALLES ARQUITECTONICOS
SALAS 1, 2 Y 3

DIGITALIZO:
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
ARQ. VALENTINA PRIETO


ESPECIALISTA DISEÑADOR:
SEIS MAS ARQUITECTURA
&
INGENIERIA S.A.S

VERSION:	FECHA:
CUATRO	MAYO 2023


ESCALA DE PLOTTER
INDICADA
½ PLIEGO (0.50m x 0.70m)
ARCHIVO
'PROYECTO FINAL V4.dwg

ARQUITECTONICO
D05
DE
06

PLANTA DE DISEÑO SALA Nº 1
ESC. 1:50

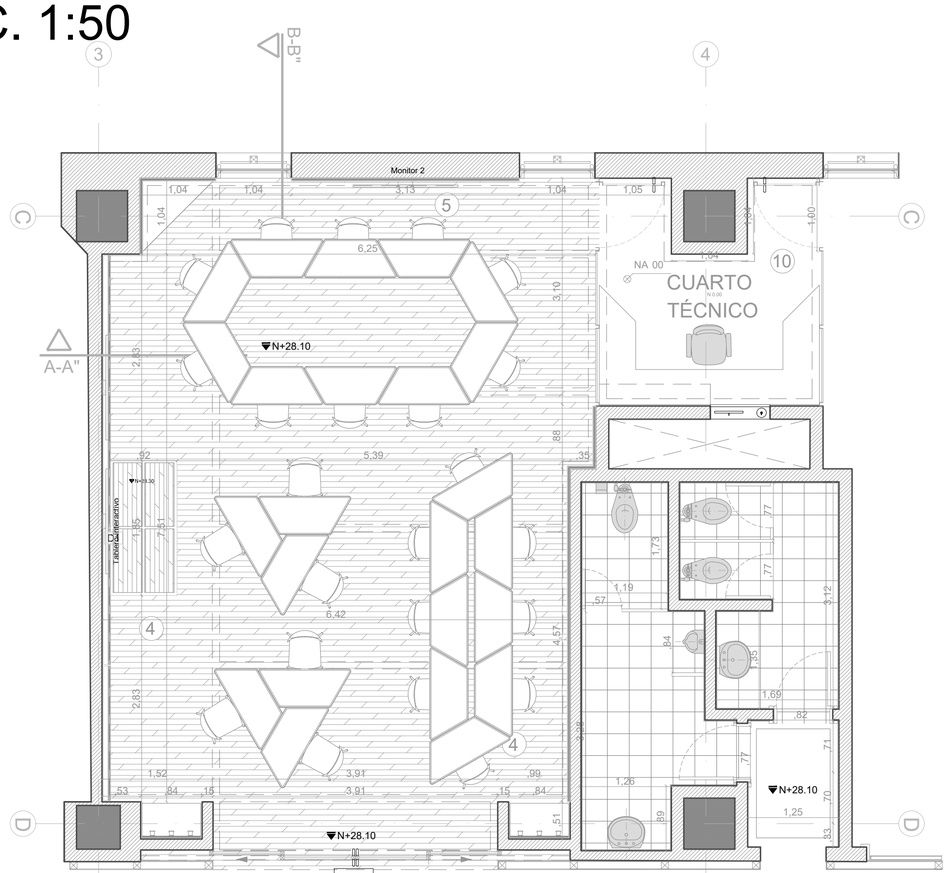

Aforo 24 personas

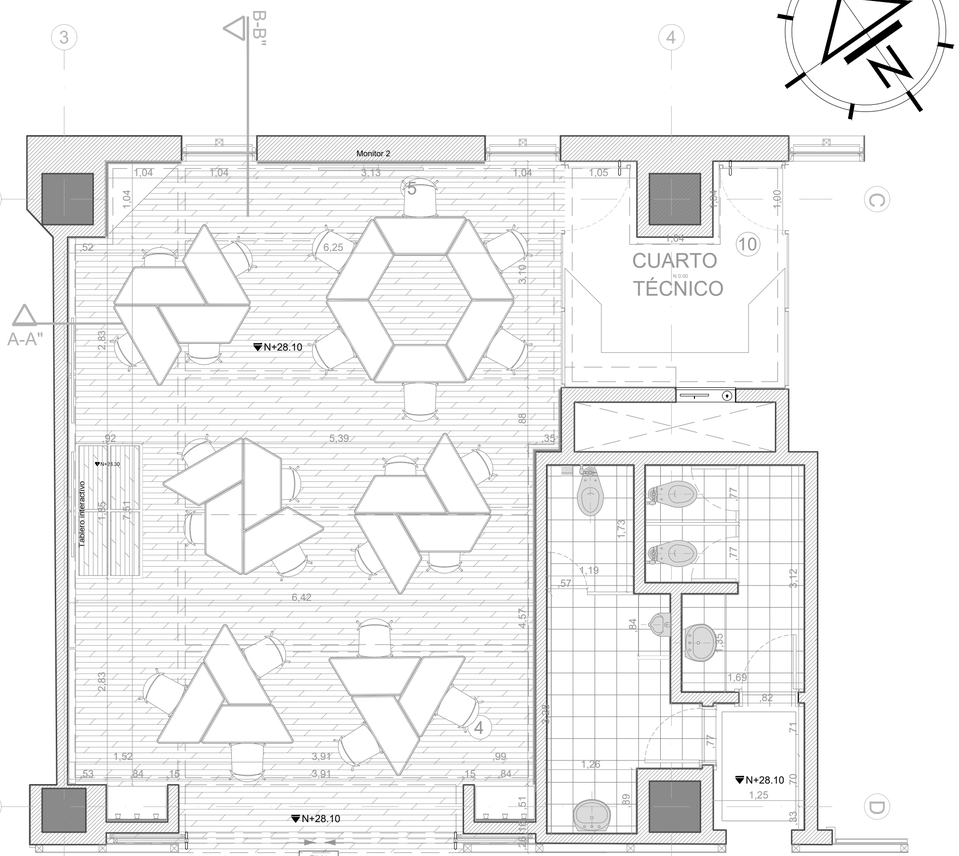

Aforo 24 personas

ESCALA GRÁFICA

1/100 1/75 1/50 1/25

ESCALA GRÁFICA

1/100 1/75 1/50 1/25

MATERIALIDAD

1. Muro enchapado en madera
2. Puertas en madera y vidrio
3. Piso en piedra muñeca
4. Piso original en sapán machihembrado pulido y lacado mate
5. Páneles acústicos recubrimiento en textil
6. División en perfilería de aluminio y vidrio templado 0.18 mm
7. División de páneles traslapables de hojas de madera chapilladas deslizables.
8. Pantalla en vidrio esmerilado con iluminación posterior
9. Consola nicho en madera acabado en poliuretano y madecor
10. Alfombra tráfico alto instalada en modulos 1.00 m x 1.00 m
11. Páneles acústicos liston de madera vertical 2 cm x 2 cm
12. Monitor 65"
13. Tablero interactivo 65"

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

PROYECTO:

OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

INTERVENTORIA
Contrato Nº 298 27 de diciembre de 2022
Objeto:
Realizar la Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable al contrato cuyo objeto es "Contratar los diseños y las obras de adecuación del piso noveno del Palacio De Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C".

PROCIVIN S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
(PROCIVIN S.A.S)

OBRA
Contrato Nº 268 de 2022
Objeto:
Contratar los diseños y las obras de adecuacion del piso noveno del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C.

INGENIERÍA RH S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

RODRIGO E. HIDALGO
(INGENIERIA RH S.A.S)

ARQ. DISEÑADOR
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
M.P 25700-67844

ARQ. DIRECTOR
ARQ. HUGO SEBASTIAN ANGARITA
M.P A3582018-1032479891

V°B° DIRECTOR DIVISIÓN DE MEJORAMIIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA:

ING. SERGIO DUARTE

LOCALIZACIÓN:
Información del predio:
Matricula Inmobiliaria:
Codigo catastral:
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio: Bogotá
Licencia de Costruccion:
Resolución:

OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA
Dirección: Calle 12 No. 7-65, Bogotá D.C.

OBSERVACIONES:

CONTIENE:

PROPUESTA DE DISEÑO SALA Nº 1
- SALÓN DE TRABAJO
COLABORATIVO / COWORKING

DIGITALIZO:
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
ARQ. VALENTINA PRIETO

ESPECIALISTA DISEÑADOR:
SEIS MAS ARQUITECTURA
&
INGENIERIA S.A.S


VERSION: CUATRO

FECHA: MAYO 2023

ESCALA DE PLOTTER
1 : 50
½ PLIEGO (0.50m x 0.70m)
ARCHIVO
'PROYECTO FINAL V4.dwg

ARQUITECTONICO
A02
DE
07

PLANTA DE DISEÑO SALA Nº 2
ESC. 1:30

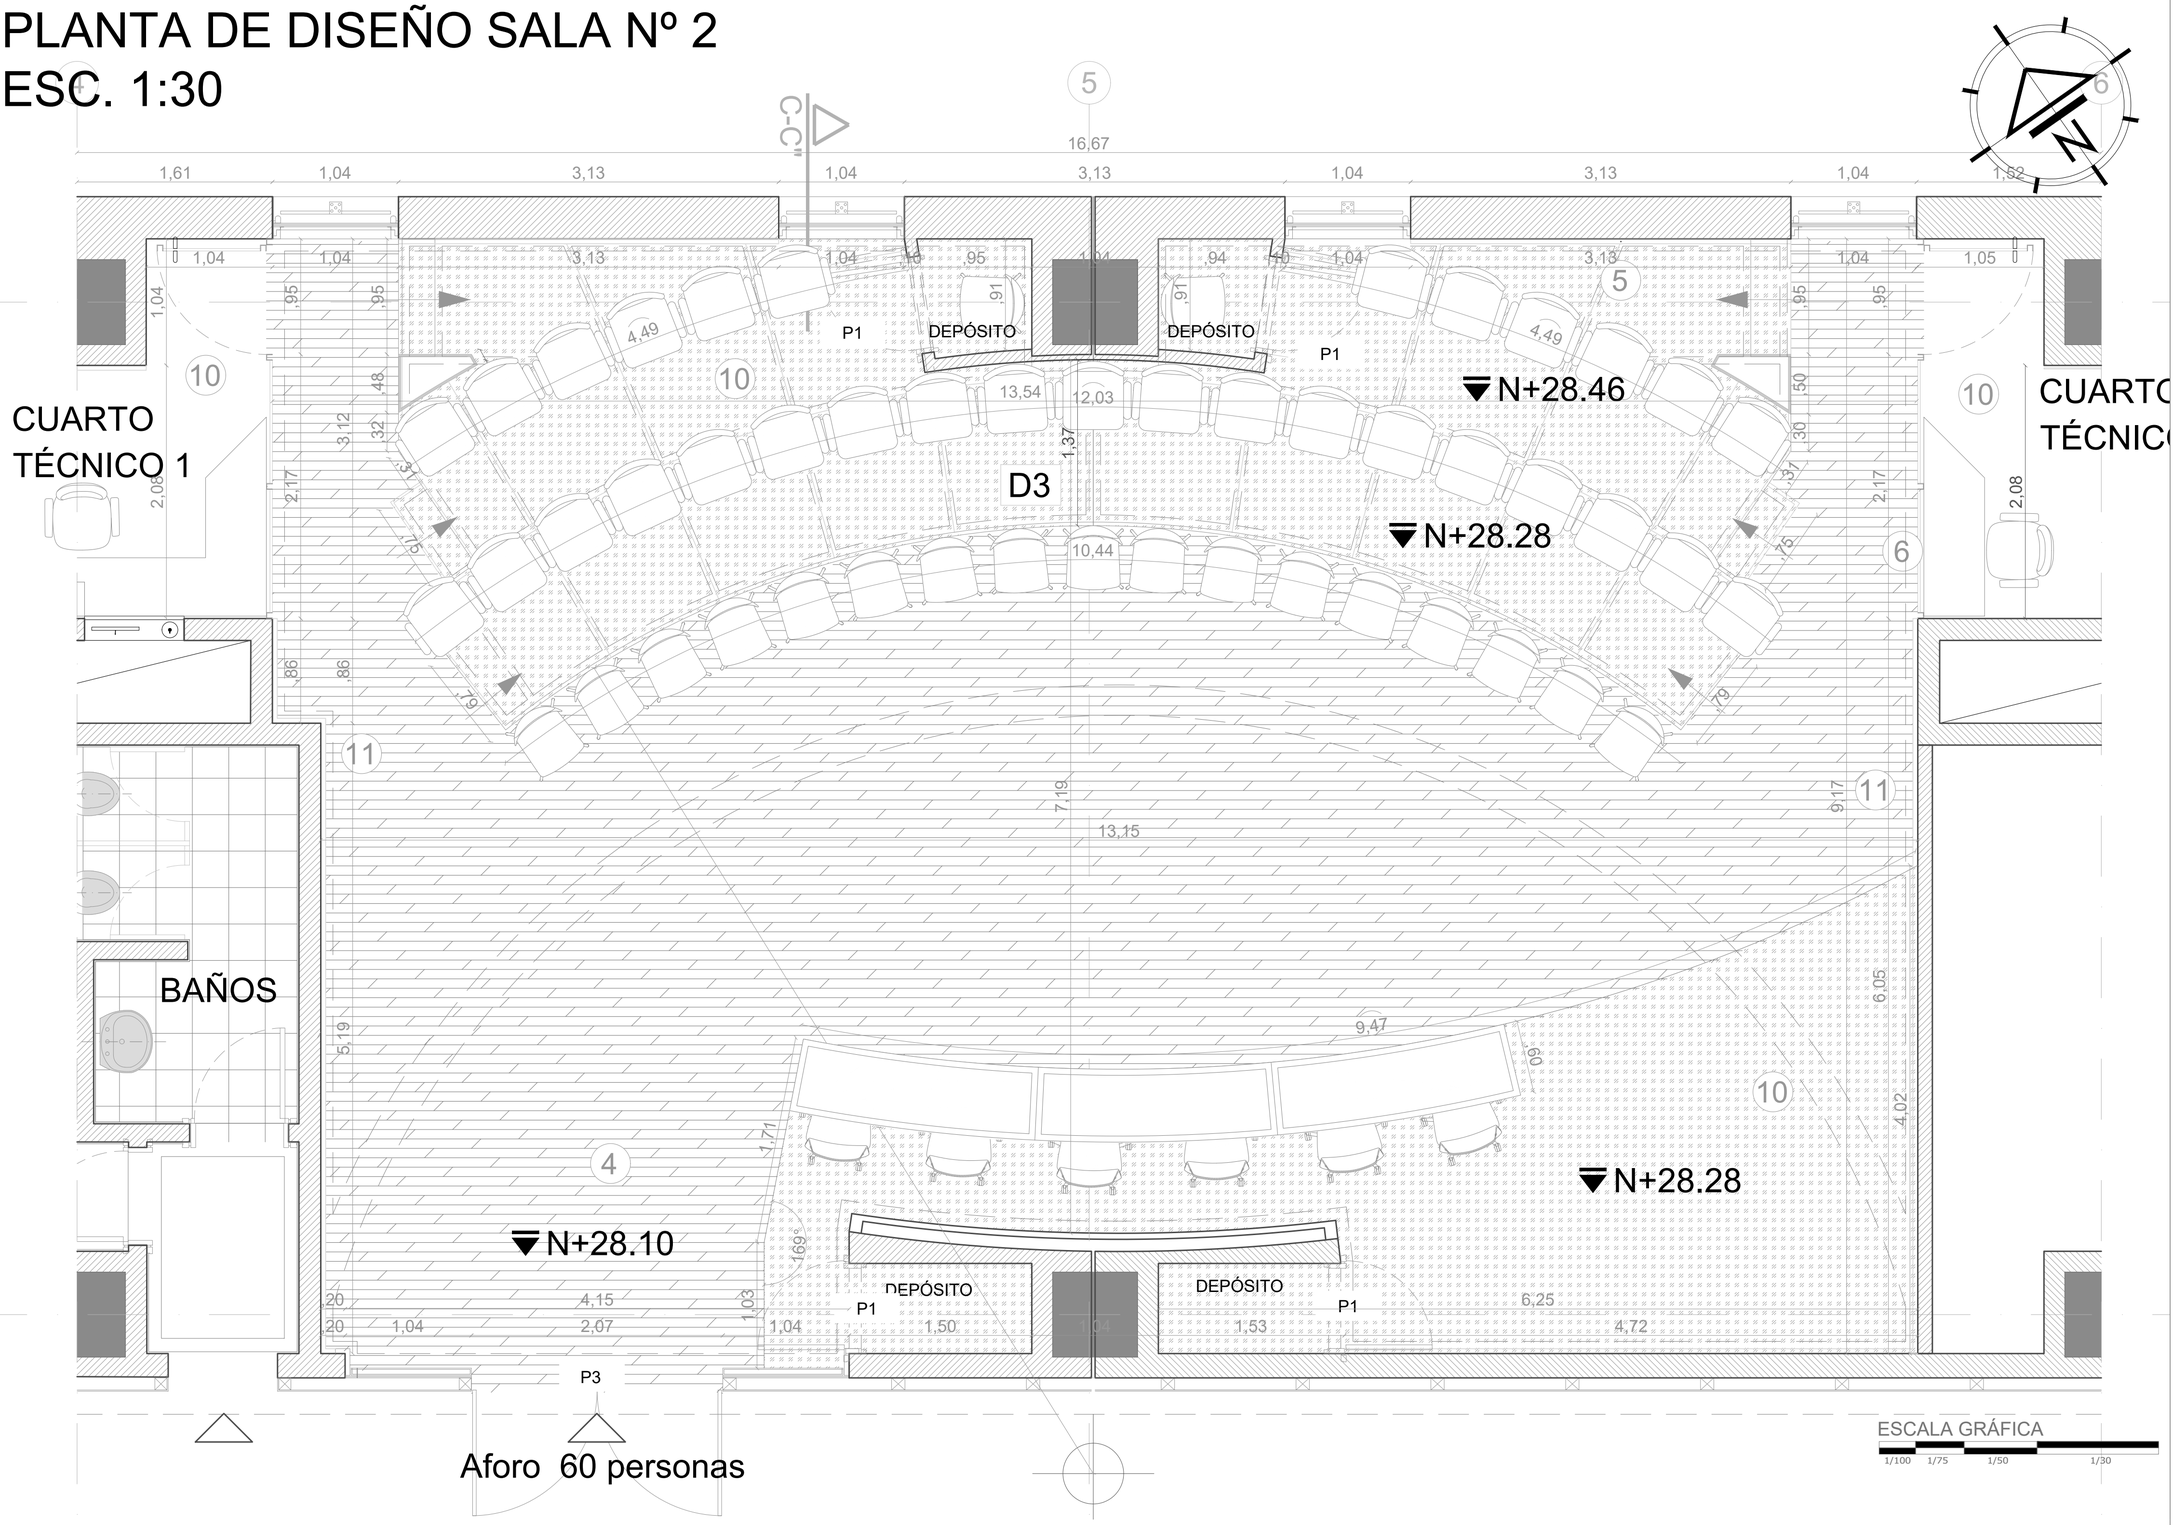

MATERIALIDAD

1. Muro enchapado en madera
2. Puertas en madera y vidrio
3. Piso en piedra muñeca
4. Piso original en sapán machihembrado pulido y lacado mate
5. Páneles acústicos recubrimiento en textil
6. División en perfilería de aluminio y vidrio templado 0.18 mm
7. División de páneles traslapables de hojas de madera chapilladas deslizables.
8. Pantalla en vidrio esmerilado con iluminación posterior
9. Consola nicho en madera acabado en poliuretano y madecor
10. Alfombra tráfico alto instalada en modulos 1.00 m x 1.00 m
11. Páneles acústicos liston de madera vertical 2 cm x 2 cm
12. Monitor 65"
13. Tablero interactivo 65"

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INGENIERIA RH SAS
PROYECTOS Y CONSULTORIOS

PROYECTO:

OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

INTERVENTORIA
Contrato Nº 298 27 de diciembre de 2022
Objeto:
Realizar la Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable al contrato cuyo objeto es "Contratar los diseños y las obras de adecuación del piso noveno del Palacio De Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C".

PROCIVIN S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
(PROCIVIN S.A.S)

OBRA
Contrato Nº 268 de 2022
Objeto:
Contratar los diseños y las obras de adecuacion del piso noveno del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C.

INGENIERÍA RH S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

RODRIGO E. HIDALGO
(INGENIERIA RH S.A.S)

ARQ. DISEÑADOR
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
M.P 25700-67844

ARQ. DIRECTOR
ARQ. HUGO SEBASTIAN ANGARITA
M.P A3582018-1032479891

V°B° DIRECTOR DIVISIÓN DE MEJORAMIIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA:

ING. SERGIO DUARTE

LOCALIZACIÓN:
Información del predio:
Matricula Inmobiliaria:
Codigo catastral:
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio: Bogotá
Licencia de Costrucción:
Resolución:

OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA
Dirección: Calle. 12 No. 7-65, Bogotá D.C.

OBSERVACIONES:

CONTIENE:

PROPUESTA DE DISEÑO SALA Nº 2 - AUDITORIO Y SALÓN DE CONFERENCIAS Y PRENSA.

DIGITALIZO:
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
ARQ. VALENTINA PRIETO


ESPECIALISTA DISEÑADOR:
SEIS MAS ARQUITECTURA & INGENIERIA S.A.S


VERSION:	FECHA:
CUATRO	MAYO 2023

ESCALA DE PLOTTER
1 : 30
½ PLIEGO (0.50m x 0,70m)
ARCHIVO
'PROYECTO FINAL V4.dwg

ARQUITECTONICO
A03 DE **07**

PLANTA DE DISEÑO SALA Nº3
ESC. 1:50

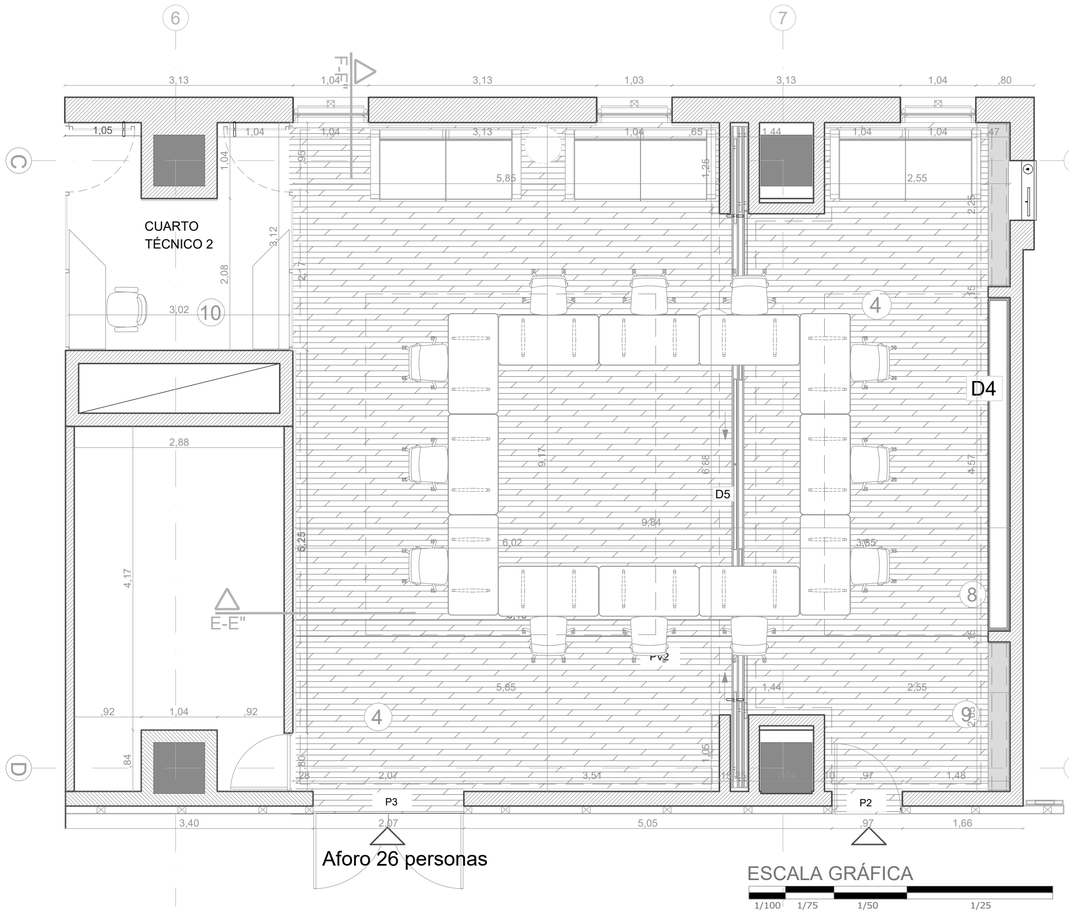

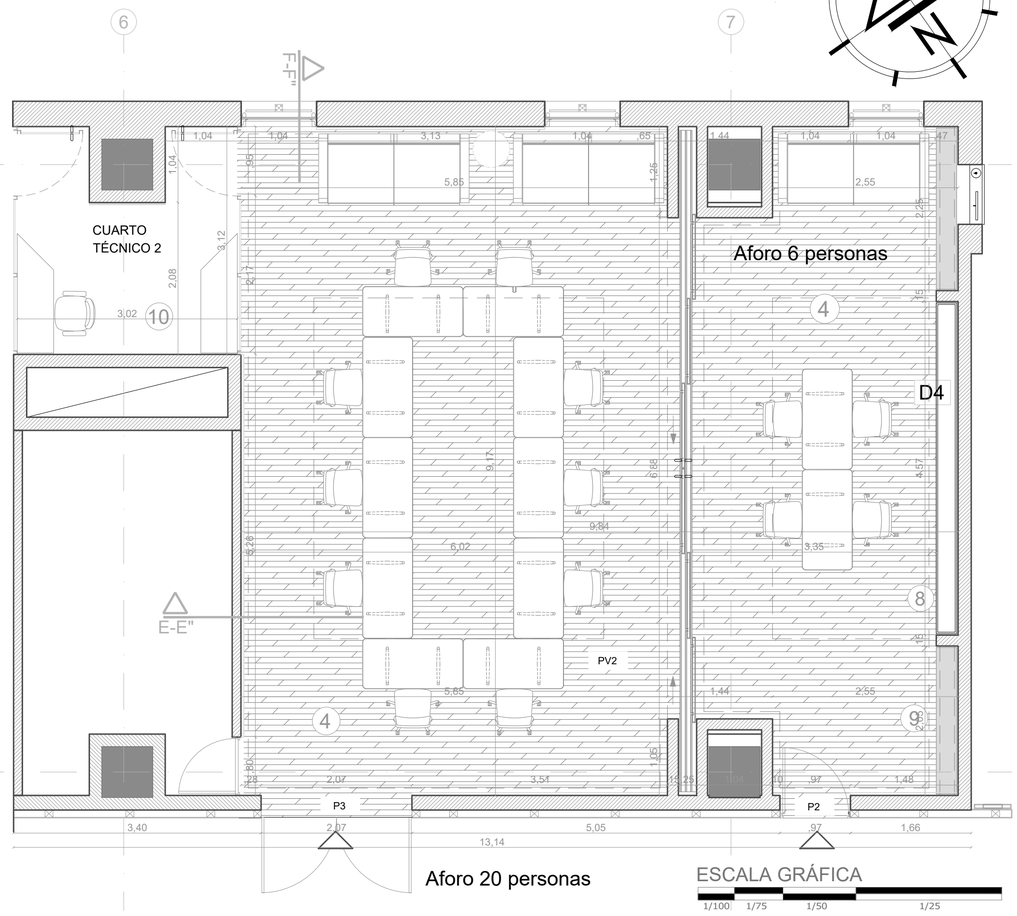

MATERIALIDAD

1. Muro enchapado en madera
2. Puertas en madera y vidrio
3. Piso en piedra muñeca
4. Piso original en sapán machihembrado pulido y lacado mate
5. Páneles acústicos recubrimiento en textil
6. División en perfilería de aluminio y vidrio templado 0.18 mm
7. División de páneles traslapables de hojas de madera chapilladas deslizables.
8. Pantalla en vidrio esmerilado con iluminación posterior
9. Consola nicho en madera acabado en poliuretano y madecor
10. Alfombra tráfico alto instalada en modulos 1.00 m x 1.00 m
11. Páneles acústicos liston de madera vertical 2 cm x 2 cm
12. Monitor 65"
13. Tablero interactivo 65"

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

PROYECTO:

OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

INTERVENTORIA
Contrato Nº 298 27 de diciembre de 2022
Objeto:
Realizar la Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable al contrato cuyo objeto es "Contratar los diseños y las obras de adecuación del piso noveno del Palacio De Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C".

PROCIVIN S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
(PROCIVIN S.A.S)

OBRA
Contrato Nº 268 de 2022
Objeto:
Contratar los diseños y las obras de adecuacion del piso noveno del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C.

INGENIERÍA RH S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

RODRIGO E. HIDALGO
(INGENIERIA RH S.A.S)


ARQ. DISEÑADOR
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
M.P 25700-67844

ARQ. DIRECTOR
ARQ. HUGO SEBASTIAN ANGARITA
M.P A3582018-1032479891

V°B° DIRECTOR DIVISIÓN DE MEJORAMIIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA:

ING. SERGIO DUARTE

LOCALIZACIÓN:
Información del predio:
Matricula Inmobiliaria:
Codigo catastral:
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio: Bogotá
Licencia de Costrucción:
Resolución:



OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

Dirección: Calle 12 No. 7-65, Bogotá D.C.

OBSERVACIONES:

CONTIENE:

PROPUESTA DE DISEÑO SALA Nº 3
- SALA DE JUNTAS Y REUNIONES.

DIGITALIZO:
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
ARQ. VALENTINA PRIETO

ESPECIALISTA DISEÑADOR:
SEIS MAS ARQUITECTURA
&
INGENIERIA S.A.S


seis Arquitectura & Ingeniería

VERSION:	FECHA:
CUATRO	MAYO 2023

ESCALA DE PLOTTER
1 : 50
½ PLIEGO (0.50m x 0.70m)
ARCHIVO
'PROYECTO FINAL V4.dwg

ARQUITECTONICO
A04 DE 07

PLANTA GENERAL PISO 9
ESC. 1:75

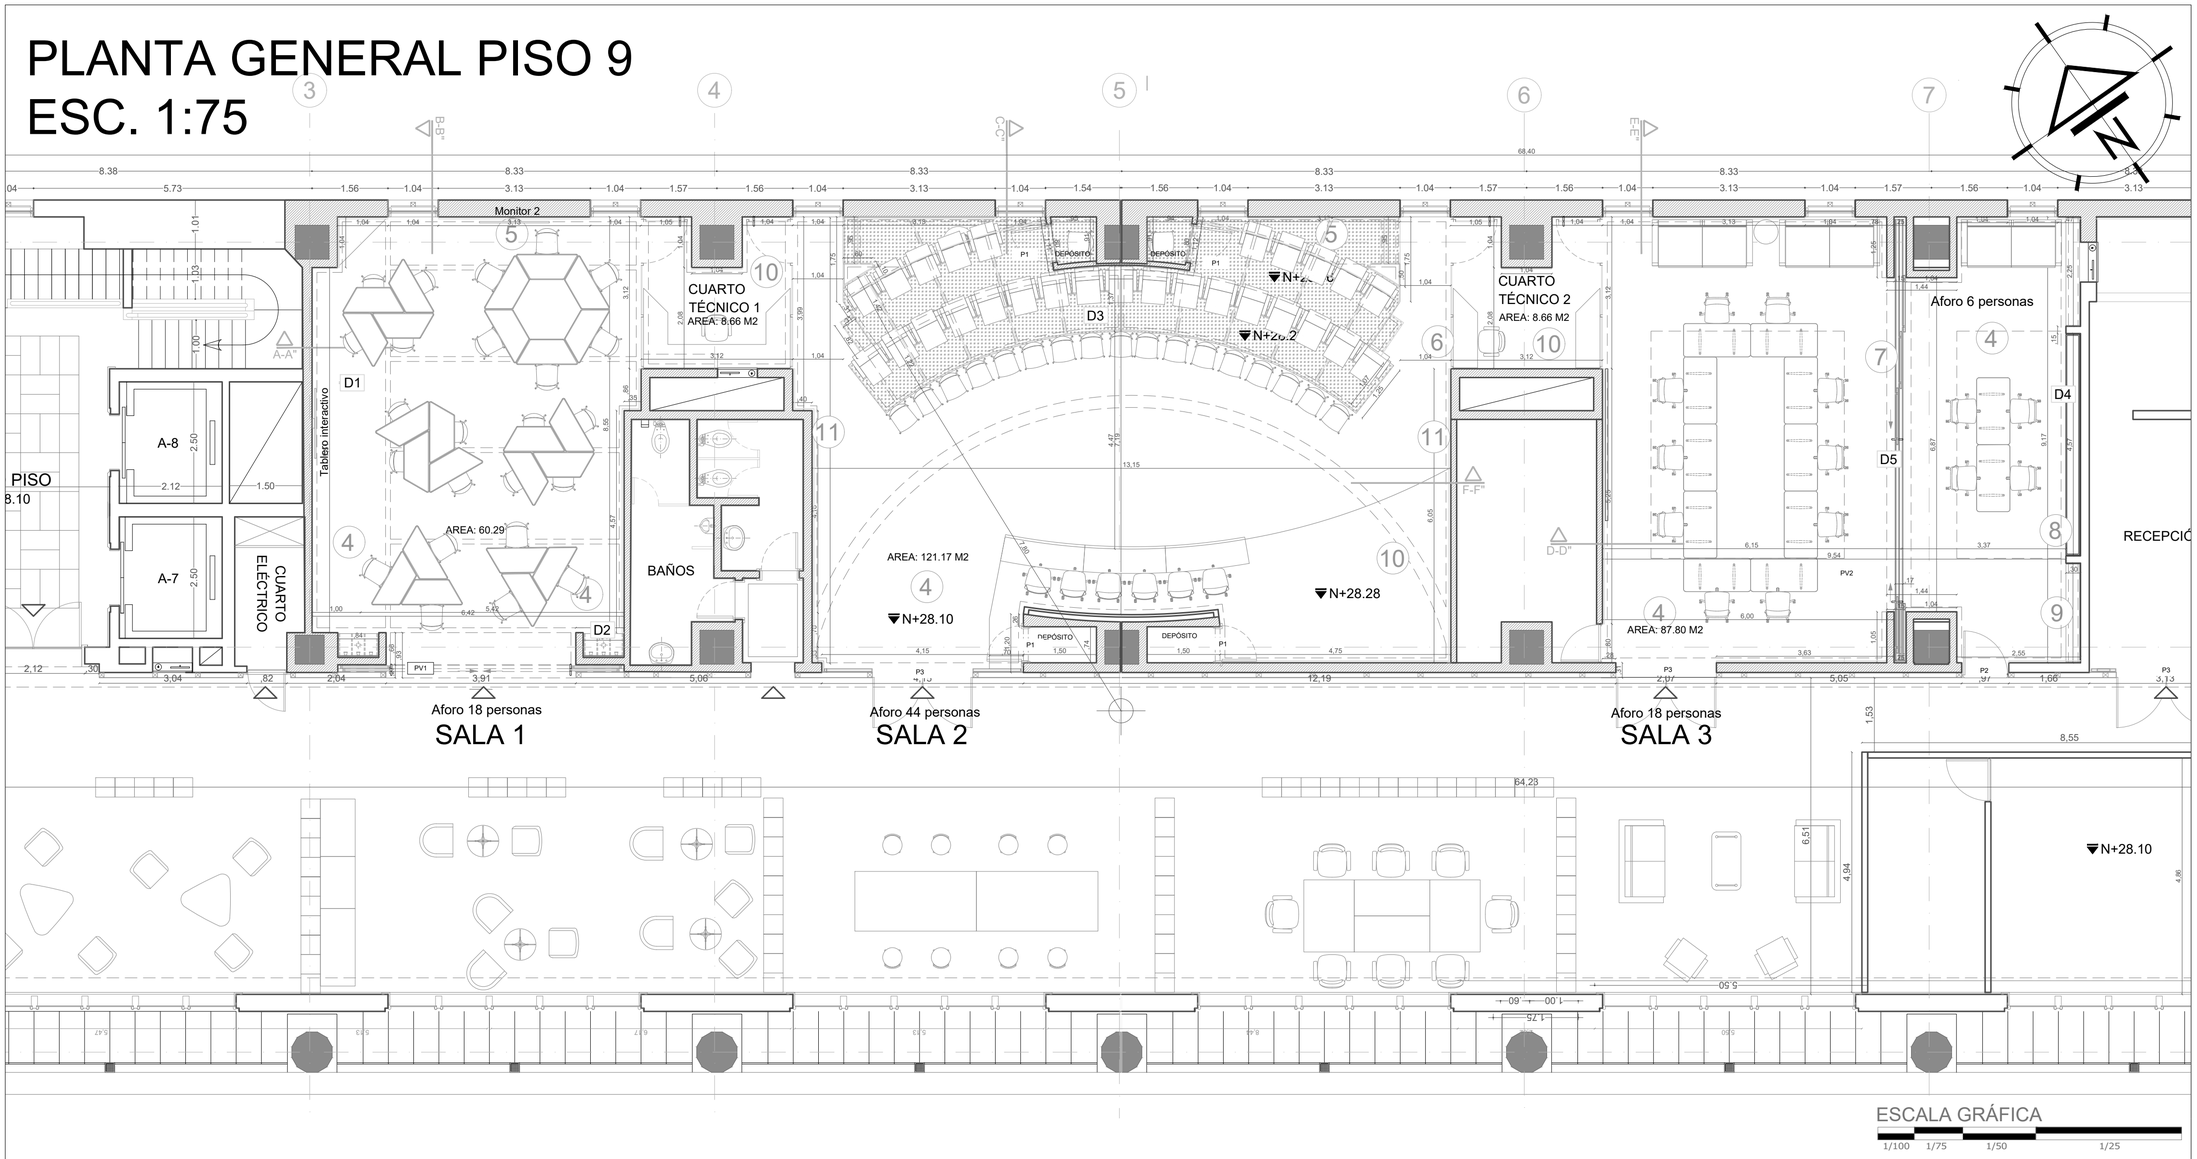

ESCALA GRÁFICA

1/100 1/75 1/50 1/25

MATERIALIDAD

1. Muro enchapado en madera
2. Puertas en madera y vidrio
3. Piso en piedra muñeca
4. Piso original en sapán machihembrado pulido y lacado mate
5. Páneles acústicos recubrimiento en textil
6. División en perfilería de aluminio y vidrio templado 0.18 mm
7. División de páneles traslapables de hojas de madera chapilladas deslizables.
8. Pantalla en vidrio esmerilado con iluminación posterior
9. Consola nicho en madera acabado en poliuretano y madecor
10. Alfombra tráfico alto instalada en modulos 1.00 m x 1.00 m
11. Páneles acústicos liston de madera vertical 2 cm x 2 cm
12. Monitor 65"
13. Tablero interactivo 65"

CUADRO DE AREAS

ESPACIO	AREA
SALA 1	60.29 M2
CUARTO TÉCNICO 1	8.66 M2
SALA 2	121.17 M2
CUARTO TÉCNICO 2	8.66 M2
SALA 3	87.80 M2

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INGENIERIA RH SAS
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

PROYECTO:

OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

INTERVENTORIA
Contrato Nº 298 27 de diciembre de 2022
Objeto:
Realizar la Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable al contrato cuyo objeto es "Contratar los diseños y las obras de adecuación del piso noveno del Palacio De Justicia Alfonso Reyes Echandia de Bogotá D.C".

PROCIVIN S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
(PROCIVIN S.A.S)

OBRA
Contrato Nº 268 de 2022
Objeto:
Contratar los diseños y las obras de adecuacion del piso noveno del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandia de Bogotá D.C.

INGENIERÍA RH S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

RODRIGO E. HIDALGO
(INGENIERIA RH S.A.S)

ARQ. DISEÑADOR
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
M.P 25700-67844

ARQ. DIRECTOR
ARQ. HUGO SEBASTIAN ANGARITA
M.P A3582018-1032479891

V°B° DIRECTOR DIVISIÓN DE MEJORAMIIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA:

ING. SERGIO DUARTE

LOCALIZACIÓN:
Información del predio:
Matrícula Inmobiliaria:
Codigo catastral:
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio: Bogotá
Licencia de Costrucción:
Resolución:



OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9
SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PALACIO DE JUSTICIA

Dirección: Calle. 12 No. 7-65, Bogotá D.C.

OBSERVACIONES:

CONTIENE:

PLANTA GENERAL DISEÑO DEL PISO NOVENO DEL PALACIO DE JUSTICIA

DIGITALIZO:
ARQ. CARLOS ALFREDO CASTRO
ARQ. VALENTINA PRIETO

ESPECIALISTA DISEÑADOR:
SEIS MAS ARQUITECTURA & INGENIERIA S.A.S

VERSION: CUATRO

FECHA: MAYO 2023

ESCALA DE PLOTTER
1 : 75
½ PLIEGO (0.50m x 0,70m)
ARCHIVO
'PROYECTO FINAL V4.dwg

ARQUITECTONICO
A01 DE 07
