CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2022050021

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6

PERIODO DEL INFORME: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO de 2023

ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DEL CESAR

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

JUNIO DE 2023

REVISION Y ESTADO DE INFORMES

CLASE DE DOCUMENTO: INFORME DE GESTIÓN TECNICA N. 6	CODIGO:	FECHA:
REVISIÓN Y ESTADO DE DOCUMENTO	INFTEC2022050021	10/06/2023

REVISIÓN	No. DE REVISIONES	1	2	3	4
	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN: Johanna López Coordinación de Interventoría				
	RESPONSABLE REVISIÓN: José Luis Stapper Director de Interventoría				
	RESPONSABLE APROBACIÓN: Johanna López Representante legal de Interventoría				

CONTROL DE MODIFICACIONES

REVISION No.	MODIFICACION	FECHA DE MODIFICACION	OBSERVACIONES
01	Emisión de informe	10 de junio de 2023	

LISTA DE DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

DESTINATARIO DEL INFORME	No. DE COPIAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DEL CESAR	1

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
   2.2. Características técnicas del proyecto 9
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 10
   3.1. Información general (Incluye seguimiento de garantías contractuales) 10
   3.2. Actividades ejecutadas durante el mes 13
   3.3 INFORMACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 15
   3.4 Informe de avance 18
      3.4.1. Avances de obras programadas, ejecutadas y acumuladas del contrato 18
      3.4.2. Actas de comité técnico semanal de seguimiento al programa de obra 19
   3.2.4 Pago de nómina del contrato de obra 19
   3.2.5 Plan de calidad 19
      3.4.3. Maquinaria y equipo de contratista 19
      3.4.4. Personal del contratista de obra 20
   3.5. Información relacionada con los resultados de los ensayos de laboratorio 20
   3.6. Estado general del tiempo 20
   4. Información financiera del contrato de obra 20
      4.1. Seguimiento financiero del avance de obra 21
   4.2. Anticipo y/o pago anticipado 21
   4.3. Revisión y verificación de pago de aportes a las seguridades sociales y parafiscales del contratista de obra 21
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22
   5.1. Información general del contrato (incluye seguimiento a las garantías contractuales) 22
      5.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte de la interventoría en el mes. 23
      5.3. Informe de seguimiento Plan De Manejo De Tráfico (PMT) 24
      5.4 Informe de seguimiento de Plan De Manejo Ambiental (PMA) 24
      5.5 Informe de seguimiento del Plan De Calidad 24
      En el presente periodo la interventoría realizo seguimiento del plan de calidad del contratista. **Anexo de interventoría No 11,** INFORME DE CALIDAD 24
      5.6 Informe SST interventoría 24

La interventoría desarrolla control continuo de las actividades de SST en la obra. Dirigirse al **Anexos de interventoría No 10**, INFORME SST 24

5.7 Control diario de personal de interventoría 25

5.8 Información financiera del contrato de interventoría. 25

5.9 Informe de inversión y buen manejo del anticipo y/o pago anticipado de interventoría. 25

5.10 Revisión y verificación de pago de aportes a las seguridades sociales y parafiscales de interventoría 25

5.11 Autorización y recibo de actividades 26

En el presente mes solo sea recibido el tramo los Venaos – El Perro porque está en proceso de revisión y recibido de actividades ..... **¡Error! Marcador no definido.**

5.12 Cumplimiento Especificaciones Técnicas 28

El contratista de obra desarrollo las actividades, cumpliendo las especificaciones técnicas del proyecto. Tal como se relaciona en el informe de seguimiento del plan de calidad; **Anexo de interventoría No 11,** INFORME DE CALIDAD 28

5.13 Informes Semanales 28

5 RELACION DE LA CORRESPONDENCIA 29

6 REGISTRO FOTOGRÁFICO 31

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 44

LISTA DE FIGURAS

Figura N. 1 Ubicación del proyecto 8

LISTA DE TABLAS

Tabla N. 1 Priorización de tramos viales 8

Tabla N. 2 Actividades contractuales 9

Tabla N. 3 Datos generales del Contrato de Obra 10

Tabla N. 4 Datos de Pólizas de responsabilidad civil extracontractual - Contrato de Obra 10

Tabla N. 5 Resumen de Porcentaje de Ejecución vs Programado 19

Tabla N. 6 seguimiento financiero 20

Tabla N. 7 Datos generales del Contrato de Interventoría 22

Tabla N. 8 Datos de Pólizas de Cumplimiento - Contrato de Interventoría 22

Tabla N. 9 Datos de Pólizas de Cumplimiento - Acta de inicio Interventoría 23

Tabla N. 10 Relación de Personal - INTERVENTORIA 25

Tabla N. 11 Relación del personal adicional- INTERVENTORIA 25

Tabla N. 12 Cuadro de Relación de Informes Semanales de Interventoría 28

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N. 1 Inicio de actividades rocería segmento San Diego – Media Luna (Repaso) 31

Fotografía N. 2. actividades rocería segmento San Diego – Media Luna (Repaso) 31
Fotografía N. 3 actividades Limpieza de cuneta en concreto segmento San Diego – Media Luna (Repaso) 31
Fotografía N. 4 actividades Limpieza de cuneta en concreto segmento San Diego – Media Luna (Repaso) 31
Fotografía N. 5 actividades Limpieza de cuneta en concreto segmento San Diego – Media Luna (Repaso) 32
Fotografía N. 6. actividades Limpieza de cuneta en concreto segmento San Diego – Media Luna (Repaso) 32
Fotografía N. 7 Evidencia transporte material vegetal - tramo san diego - media luna 32
Fotografía N. 8 Evidencia transporte material vegetal - tramo san diego - media luna 32
Fotografía N. 9. *Evidencia de rocería - tramos Los venaos - El perro - Guaymaral* 33
Fotografía N. 10 *Evidencia de rocería - tramos Los venaos - El perro - Guaymaral* 33
Fotografía N. 11 *Evidencia limpieza de cunetas en tierra Los venaos - El perro - Guaymaral* 33
Fotografía N. 12 *Evidencia limpieza de cunetas en tierra Los venaos - El perro - Guaymaral* 33
Fotografía N. 13 *Evidencia limpieza de cunetas entierra Los venaos - El perro - Guaymaral* 34
Fotografía N. 14 *Evidencia limpieza de cunetas entierra Los venaos - El perro - Guaymaral* 34
Fotografía N. 15 *Evidencia instalacion de defensa metalica tramo Via nacional - pueblo bello* 34
Fotografía N. 16 *Evidencia instalacion de defensa metalica tramo Via nacional - pueblo bello* 34

LISTA DE ANEXOS CONTRATISTA

Anexo de seguimiento de Obra N. 1. Actas de comité técnico semanal de seguimiento al programa de obra 46
Anexo de seguimiento de Obra N. 2. Relación de pago nómina de empleados de contrato de obra 47
Anexo de seguimiento de Obra N. 3. Control diario de equipo del contratista de obra 48
Anexo de seguimiento de Obra N. 4. Seguimiento financiero del avance de obra 49
Anexo de seguimiento de Obra N. 5. Estado general del tiempo 50
Anexo de seguimiento de Obra N. 6. CONTROL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA 51
Anexo de seguimiento de Obra N. 7. Revisión y verificación de pagos de aporte a la seguridad social y parafiscal del contratista de obra 52

LISTA DE ANEXOS INTERVENTORIA

Anexo de Interventoría N. 1. Control diario del personal de interventoría. 54
Anexo de Interventoría N. 2. Relación de pago nómina de empleados de interventoría 55
Anexo de Interventoría N. 3. Revisión y verificación de pagos de aporte a la seguridad social y parafiscal de interventoría 56
Anexo de Interventoría N. 4. Informe PMT 57
Anexo de Interventoría N. 5. Informe PMA 58
Anexo de Interventoría N. 6. Correspondencia 59
Anexo de Interventoría N. 7. Bitácora de obra 60
Anexo de Interventoría N. 8. Informes semanales 61
Anexo de Interventoría N. 9. Soporte alquiler de vehículo 62
Anexo de Interventoría N. 10. Informe mensual SST 63
Anexo de Interventoría N. 11. Informe de seguimiento plan de calidad 64

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe mensual No. 6, este contiene seguimiento de las actividades desarrolladas en la ejecución de los trabajos relacionados con el contrato de obra en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 31 de mayo de 2023, en cumplimiento de las obligaciones contractuales contempladas en el Contrato de interventoría.

Dentro de las funciones de la Interventoría, para este contrato, se tienen en cuenta, la supervisión y control de las actividades y obligaciones del constructor, con el fin de verificar el cumplimiento oportuno y eficaz de las mismas, en sus aspectos técnico, administrativo, financiero y ambiental, contempladas en las condiciones contractuales, acorde a las especificaciones técnicas y de diseño estipuladas.

Estas acciones se ejercen a través de comunicaciones escritas u oficios, bitácora de obra y durante el desarrollo de los comités de obra, de acuerdo con su grado de complejidad, de tal manera que el Contratista, pueda tomar los correctivos de la mejor manera posible, buscando en todo momento orientar los trabajos hacia la obtención de beneficios técnicos y económicos.

El informe mensual está conformado, por un resumen ejecutivo del mes, en el cual se presenta la descripción general del proyecto, el control de la programación, las actividades ejecutadas en el periodo, el control financiero del contrato y los comentarios y recomendaciones de la interventoría, el cuerpo del informe presenta el desarrollo de este, con los respectivos soportes y anexos.

De esta manera, con el presente informe se pretende proporcionar una visión global de las ejecuciones del contrato, dentro de este periodo, en el que se analizan de manera conceptual y gráfica, los rendimientos o avance de las obras, resumen de inversiones, balance general de la obra y demás aspectos importantes de la misma.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El alcance del mantenimiento rutinario incluye actividades para conservar una vía de regular a buen estado, donde se ejecutarán procedimientos de reparación vial para recuperar elementos menores dañados, deteriorados o destruidos como serian: bacheos, sello localizado, limpieza de alcantarillas, control de vegetación, mantenimiento de cunetas, mantenimiento de puentes, colocación de defensas, limpieza de señales, limpieza permanente de la calzada, bermas y drenajes y la reparación y limpieza de los dispositivos para el control del tránsito.

También, incluye la limpieza y reparaciones menores y localizadas de las obras hidráulicas. Aunque el mantenimiento rutinario se debe realizar durante todo el período de vida del pavimento, constituye prácticamente la única actividad que se ejecuta durante su etapa inicial de servicio por lo que este proyecto se plantea para periodos anuales.

Realizar en la red vial del departamento del cesar un mantenimiento rutinario para garantizar el tránsito vehicular y peatonal en forma continua y aceptable, donde la superficie de rodadura presente las condiciones apropiadas para el tráfico en un nivel razonable de transitabilidad y visibilidad.

Garantizar que todas las obras hidráulicas (alcantarillas, cunetas, pontones, box coulvert) estén en funcionamiento para el correcto drenaje de las aguas lluvias, que no presenten obstrucciones en los encoles y descoles, que impidan la tarea de defensa que poseen dichas estructuras.

Las actividades y acciones de mantenimiento que se llevan a cabo en una vía tienen como objetivo principal preservar en buen estado los elementos que la componen, controlar los daños y, en lo posible, conservar las condiciones iniciales de construcción o rehabilitación.


Con el fin de minimizar los riesgos de accidentalidad del personal y de los usuarios de la vía durante la ejecución de las actividades de mantenimiento, se recomienda tener en cuenta lo sugerido en las normas vigentes para la seguridad vial y el manejo provisional del tránsito, así como las condiciones particulares de la actividad que hacen parte del mantenimiento rutinario para la red vial de segundo y tercer orden pavimentada y en afirmado.

El mantenimiento rutinario está conformado por las actividades permanentes de conservación localizada de pequeños defectos en una vía, para garantizar la seguridad y la comodidad del usuario.

2.1. Localización del proyecto

En la siguiente imagen se presenta la localización municipal y departamental del proyecto a realizar.

***Figura N. 1** Ubicación del proyecto*

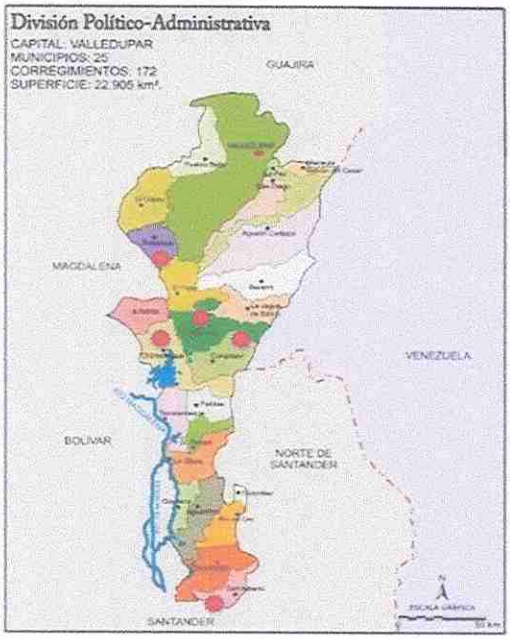

El proyecto contempla la intervención de 22 vías ubicadas en el departamento del Cesar, así:

***Tabla N. 1** Priorización de tramos viales*

CÓDIGO	CORREDOR VIAL	MUNICIPIO	TIPO MANTENIMIENTO
83895	AGUSTÍN CODAZZI- LA DUDA - SAN JACINTO BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA	AGUSTÍN CODAZZI	RUTINARIO
85435	PATILLAL- TZEMUAKE (VILLA RUEDA)	VALLEDUPAR	RUTINARIO
	SAN DIEGO – LAS PITILLAS	SAN DIEGO	RUTINARIO
	SAN DIEGO – LOS TUPES	SAN DIEGO	RUTINARIO
49CS01	SAN DIEGO - MEDIA LUNA	SAN DIEGO	RUTINARIO
	VIA NACIONAL - LA VICTORIA DE SAN ISIDRO	LA JAGUA DE IBIRICO	RUTINARIO
83600	VIA NACIONAL - ESTADOS UNIDOS	BECERRIL	RUTINARIO
85300	LOS VENAOS - EL PERRO - GUAYMARAL – EL VALLITO	VALLEDUPAR / EL PASO	RUTINARIO
	LA LOMA - POTRERILLO	EL PASO	RUTINARIO
82120	MANDINGUILLA - DIOS ME VEA - HIGOAMARILLO	CHIMICHAGUA	RUTINARIO
	RAMAL A CANDELARIA	CHIMICHAGUA	RUTINARIO
45CS06	LAS VEGAS - SALOA	CHIMICHAGUA	RUTINARIO
45CS05	LA RAYA -ZAPATOZA	TAMALAMEQUE	RUTINARIO
74CS01	RAMAL A SIMAÑA	LA GLORIA	RUTINARIO
84310	CARACOLICITO - CHIMILA	EL COPEY	RUTINARIO
20001-	RUTA 8003 (CALLAO) - LOS CALABAZOS	VALLEDUPAR	RUTINARIO

	BECERRIL - LA GUAJIRITA	BECERRIL	RUTINARIO
20001-1	SUBRAMAL A CHEMESQUEMENA	VALLEDUPAR	RUTINARIO
20001-3	ATANQUEZ - GUATAPURÍ	VALLEDUPAR	RUTINARIO
80CS01	RAMAL A PUEBLO BELLO	PUEBLO BELLO	RUTINARIO

2.2. Características técnicas del proyecto

Para la ejecución del contrato que tiene como objeto "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento periódico y rutinario de vías en el departamento del cesar" Se establecieron las actividades y medidas necesarias para realizar la conservación de las vías en el departamento del Cesar, así como la implementación de las actividades de obra necesarias para prolongar la vida útil de las vías que se encuentran a cargo de la gobernación del departamento del Cesar, Colombia.
Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

Tabla N. 2 Actividades contractuales

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTIVIDADES	UNIDADES	TIPO DE ACTIVIDADES	
LIMPIEZA		RUTINARIO	PERIODICO
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	Ha	SI	
LIMPIEZA DE BERMAS	M2	SI	
LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN TIERRA	ML	SI	
LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO	ML	SI	
LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLES DE ALCANTARILLAS	ML	SI	
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600MM Y 900MM	UN	SI	
CARPETA ASFÁLTICA			
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE AGLOMERADO ASFÁLTICO	M3		SI
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0	M2		SI
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2		SI
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3		SI
SUB-BASE Y BASE			
REMOCIÓN DE BASE Y/O SUBBASE	M3		SI
CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2		SI
SUB BASE GRANULAR CLASE C (LOS VENAOS - EL PERRO - GUAYMARAL - EL VALLITO)	M3		SI
SUB BASE GRANULAR (LAS VEGAS- SALOA)	M3		SI
SUB BASE GRANULAR (BECERRIL - LA GUAJIRITA)	M3		SI
SUB BASE GRANULAR (ARJONA - ASTREA)	M3		SI
BASE GRANULAR (LOS VENAOS - EL PERRO - GUAYMARAL - EL VALLITO)	M3		SI
BASE GRANULAR (LAS VEGAS- SALOA)	M3		SI
BASE GRANULAR (BECERRIL - LA GUAJIRITA)	M3		SI
BASE GRANULAR (ARJONA - ASTREA)	M3		SI
RETIRO			
TRANSPORTE REMOCIÓN DE: PAVIMENTO, BASE Y SUBBASE	M3-KM		
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL			
LINEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA	ML	SI	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general (Incluye seguimiento de garantías contractuales)

A continuación, se relaciona los datos del contrato de obra en la siguiente tabla:

Tabla N. 3 Datos generales del Contrato de Obra

CONTRATO No	2022-04-0011
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Obra
OBJETO	"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIA DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL CESAR
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAVIALES, Nit.: 901.625.796-5
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Javier Enrique Triana Morales Cedula de ciudadanía 1.020.756.779
VALOR INICIAL	$ 2.675.979.349
PLAZO	8 meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17 de agosto de 2022
FECHA DE INICIO	SEIS (06) de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	Cinco (06) de agosto de 2023

Asimismo, se relaciona la información de las pólizas que amparan el contrato de obra:

Garantía de cumplimiento según suscripción del contrato

Tabla N. 4 Datos de Pólizas de responsabilidad civil extracontractual - Contrato de Obra

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
No. DE POLIZA	21-40-101196933 Anexo: 0		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**23 DE SEPTIEMBRE 2022**		
FECHA DE APROBACIÓN	**04 DE OCTUBRE 2022**		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23/09/2022	23/05/2023	$ 400.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23/09/2022	23/05/2023	$ 200.000.000

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	23/09/2022	23/05/2023	$ 200.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	23/09/2022	23/05/2023	$ 200.000.000
GASTOS MEDICOS	23/09/2022	23/05/2023	$ 200.000.000
BIENES BAJO CUIDADO TENECIA Y CONTROL	23/09/2022	23/05/2023	$ 200.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	23/09/2022	23/05/2023	$ 200.000.000

Garantía de cumplimiento según suscripción del contrato

Tabla N. 5 *Datos de Pólizas de cumplimiento- Contrato de Obra*

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
No. DE POLIZA	21-44-1013944483 Anexo: 0		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**23 DE SEPTIEMBRE 2022**		
FECHA DE APROBACIÓN	**04 DE OCTUBRE 2022**		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/09/2022	23/11/2023	$ 802,793,804.70
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INMNIZACIONES LABORALES	23/09/2022	23/05/2026	$ 133,798,967.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 802,793,804.70

Garantía de cumplimiento según acta de inicio

Tabla N. 6 *Datos de Pólizas de responsabilidad civil extracontractual según Acta de Inicio - Contrato de Obra*

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
No. DE POLIZA	21-40-101196933 Anexo: 3		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**16 DE DICIEMBRE 2022**		
FECHA DE APROBACION	**15 DE FEBRERO 2023**		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	06/12/2022	05/08/2023	$ 400.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	06/12/2022	05/08/2023	$ 200.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	06/12/2022	05/08/2023	$ 200.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	06/12/2022	05/08/2023	$ 200.000.000
GASTOS MEDICOS	06/12/2022	05/08/2023	$ 200.000.000
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	06/12/2022	05/08/2023	$ 200.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	06/12/2022	05/08/2023	$ 200.000.000
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/12/2022	05/08/2023	$ 200.000.000
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/12/2022	05/08/2023	$ 200.000.000

Tabla N. 7 *Datos de Pólizas de cumplimiento según acta de inicio- Contrato de Obra*

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
No. DE POLIZA	21-44-1013944483 Anexo: 2		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**16 DE DICIEMBRE 2022**		
FECHA DE APROBACION	**15 FEBRERO 2023**		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/09/2022	23/11/2023	$ 802,793,804.70
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INMNIZACIONES LABORALES	23/09/2022	23/05/2026	$ 133,798,967.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5/08/2023	5/08/3038	$ 802,793,804.70

3.2. Actividades ejecutadas durante el mes

Durante el mes transcurrido entre el 1 de mayo de 2023 y el 31 de mayo de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

Semana No. 20 (01/05/2023 – 06/05/2023)

Segmento Mandinguilla – Dios Me ve

- Limpieza de zona no boscosa
- Limpieza de bermas
- Limpieza de alcantarillas con diámetro máximo de 900 mm.
- Limpieza a mano de encoles y descoles de alcantarillas
- Limpieza de cuneta en concreto
- Poda aérea de árboles tipo IV (No incluye transporte)

Segmento Ramal – Pueblo Bello

- Instalación de defensa metálica

Semana No. 21 (08/05/2023 – 13/05/2023)

Segmento Mandinguilla – Dios Me ve

- Limpieza de zona no boscosa
- Limpieza de bermas

Segmento Ramal – Pueblo Bello

- Instalación de defensa metálica

Semana No. 22 (15/05/2023 – 20/05/2023)

Segmento Ramal – La Candelaria

- Limpieza de zona no boscosa
- Limpieza de bermas

Segmento Ramal – Simaña

- Limpieza de zona no boscosa
- Limpieza de bermas

Segmento Tamalameque – Antequera

- Limpieza de zona no boscosa
- Limpieza de encoles y descoles de alcantarillas
- Limpieza a mano de alcantarillas de tubo

Segmento La Raya – Zapatosa

- Limpieza de zona no boscosa
- Limpieza de encoles y descoles de alcantarillas
- Limpieza a mano de alcantarillas de tubo
- Limpieza de cunetas en concreto

Semana No. 23 (22/05/2023 – 27/05/2023)

Segmento La Raya – Zapatosa

- Limpieza de zona no boscosa
- Limpieza de berma

3.3 INFORMACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, y de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico, se presenta resumen de las actividades ejecutadas en cada tramo, en el periodo de evaluación del informe:

- ✓ Callao – Los Calabazos:

  - Desmonte y limpieza de zona no boscosa (Ejecución: 100%).
  - Limpieza de bermas (Ejecución: 100%).
  - Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 m y 900 mm (Ejecución: 100%).
  - Limpieza a mano de encoles y descoles (Ejecución: 100%).
  - Poda de la parte aérea de árboles tipo iv (no incluye transporte) (Ejecución: 100%).
  - Disposición de material vegetal – Proveniente de la limpieza en zona no boscosa (Ejecución:100%)
  - Disposición de material vegetal – proveniente de la poda aérea (Ejecución: 0%).

- ✓ Vía Nacional - Pueblo Bello:

  - Desmonte y limpieza de zona no boscosa (Ejecución: 100%)
  - Limpieza de bermas (ejecución 100%).
  - Limpieza a mano de cunetas en concreto (ejecución: 100%).
  - Limpieza a mano de cunetas en tierra (Ejecución: 100%).
  - Limpieza de alcantarillas de tubo de 600mm y 900 mm (Ejecución: 100%).
  - Limpieza a mano de encoles y descoles (Ejecución: 100%).
  - Defensa Metálica (73%)
  - Disposición de material vegetal – Proveniente de la limpieza en zona no boscosa (100%)

- ✓ San Diego - Pitillas:

  - Desmonte y limpieza de zona no boscosa (Ejecución: 100%).
  - Limpieza de bermas (Ejecución: 100%).
  - Limpieza a mano de cunetas en tierra (Ejecución: 100%).
  - Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 m y 900 mm (Ejecución: 100%).
  - Limpieza a mano de encoles y descoles (Ejecución: 100%).
  - Limpieza a mano de box coulvert. (Ejecución :100%)
  - Poda de la parte aérea de árboles tipo iv (no incluye transporte) (Ejecución: 100%)
  - Transporte de material vegetal (para tramos donde no hay ruta de recolección) (Ejecución: 100%)
  - Transporte, remoción de: pavimento, base y subbase (Ejecución: 100%).
  - Disposición de material vegetal – proveniente de la poda área de árboles (Ejecución: 100%).

✓ San Diego – Media luna:

- Desmonte y limpieza de zona no boscosa (Ejecución: 100%).
- Limpieza de bermas (Ejecución: 100%).
- Limpieza a mano de cunetas en tierra (Ejecución: 100%).
- Limpieza a mano de cunetas en concreto (ejecución: 100%).
- Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 m y 900 mm (Ejecución: 100%).
- Limpieza a mano de encoles y descoles (Ejecución: 100%).
- Limpieza a mano de box coulvert. (Ejecución :100%)
- Poda de la parte aérea de árboles tipo iv (no incluye transporte) (Ejecución: 100%).
- Transporte de material vegetal (para tramos donde no hay ruta de recolección). (Ejecución: 50%).
- Transporte, remoción de: pavimento, base y subbase (Ejecución: 0%)
- Disposición de material vegetal – proveniente de la poda área de árboles (Ejecución: 100%).

✓ San Diego – Los Tupes:

- Desmonte y limpieza de zona no boscosa (Ejecución: 100%).
- Limpieza de bermas (Ejecución: 100%).
- Limpieza a mano de cunetas en tierra (Ejecución: 100%).
- Limpieza a mano de cunetas en concreto (ejecución: 100%).
- Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 m y 900 mm (Ejecución: 100%).
- Limpieza a mano de encoles y descoles (Ejecución: 100%).
- Limpieza a mano de box coulvert. (Ejecución :100%)
- Poda de la parte aérea de árboles tipo iv (no incluye transporte) (Ejecución: 100%).
- Transporte de material vegetal (para tramos donde no hay ruta de recolección) (Ejecución: 100%).
- Transporte, remoción de: pavimento, base y subbase (Ejecución: 100%).
- Disposición de material vegetal – proveniente de la poda área de árboles (Ejecución: 100%).

✓ Patillal – Tzunke (Villa Rueda):

- Desmonte y limpieza de zona no boscosa (Ejecución: 100 %).
- Limpieza de bermas (Ejecución: 100 %).
- Limpieza a mano de cunetas en concreto (Ejecución: 100%).
- Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 m y 900 mm (Ejecución: 100%).
- Limpieza a mano de encoles y descoles (Ejecución: 100%).
- Limpieza a mano de box coulvert. (Ejecución :100%)
- Remoción manual de derrumbes (Ejecución: 100%).
- Transporte, remoción de: pavimento, base y subbase (Ejecución: 100%)

- ✓ Atanquez- Guatapurí:
    - Desmonte y limpieza de zona no boscosa (Ejecución: 100 %).
    - Limpieza de bermas (Ejecución: 100 %).
    - Limpieza a mano de cunetas en concreto (Ejecución: 100%).
    - Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 m y 900 mm (Ejecución: 100%).
    - Limpieza a mano de encoles y descoles (Ejecución: 100%).
    - Remoción manual de derrumbes. (Ejecución: 100%).
    - Transporte, remoción de: pavimento, base y subbase (Ejecución: 100%).

- ✓ Subramal a Chemesquemena:
    - Desmonte y limpieza de zona no boscosa (Ejecución: 100 %).
    - Limpieza de bermas (Ejecución: 100%).
    - Limpieza a mano de cunetas en concreto (Ejecución: 100%).
    - Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 m y 900 mm (Ejecución: 100%).
    - Limpieza a mano de encoles y descoles (Ejecución: 100%).

- ✓ Los Venaos-El Perro-Guaymaral:
    - Desmonte y limpieza de zona no boscosa (Ejecución: 100%).
    - Limpieza de bermas (Ejecución: 100%).
    - Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 m y 900 mm (Ejecución: 100%).
    - Limpieza a mano de encoles y descoles (Ejecución: 100%).
    - Limpieza a mano de cunetas en tierra (Ejecución: 100%).
    - Limpieza a mano de box coulvert. (Ejecución :100%).

- ✓ Mandinguilla – Dios me vea- Higoamarillo:
    - Desmonte y limpieza de zona no boscosa (Ejecución: 100%).
    - Limpieza de bermas (Ejecución: 100 %).
    - Limpieza a mano de cunetas en concreto (Ejecución: 100%).
    - Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 m y 900 mm (Ejecución: 100%).
    - Limpieza a mano de encoles y descoles (Ejecución: 100%).
    - Poda de la parte aérea de árboles tipo IV (no incluye transporte) (Ejecución: 100%).

- ✓ Ramal a Candelaria:
    - Desmonte y limpieza de zona no boscosa (Ejecución: 100%).
    - Limpieza de bermas (Ejecución: 100 %).

- ✓ Ramal a Simaña:
    - Desmonte y limpieza de zona no boscosa (Ejecución: 100%).
    - Limpieza de bermas (Ejecución: 100 %).
    - Poda de la parte aérea de árboles tipo IV (no incluye transporte) (Ejecución: 100%).
- ✓ Tamalameque – Antequera:
    - Desmonte y limpieza de zona no boscosa (Ejecución: 100%).

- Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 m y 900 mm (Ejecución: 100%).
- Limpieza a mano de encoles y descoles (Ejecución: 100%).

✓ La Raya – Zapatosa:

- Desmonte y limpieza de zona no boscosa (Ejecución: 60%).
- Limpieza de bermas (Ejecución: 100 %).
- Limpieza a mano de cunetas en concreto (Ejecución: 100%).
- Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 m y 900 mm (Ejecución: 100%).
- Limpieza a mano de encoles y descoles (Ejecución: 100%).
- Poda de la parte aérea de árboles tipo IV (no incluye transporte) (Ejecución: 100%).

3.4 Informe de avance

3.4.1. Avances de obras programadas, ejecutadas y acumuladas del contrato

Cumpliendo con lo establecido en el manual de interventoría, a continuación, se presenta la relación de documentos los cuales se describen las principales actividades realizadas por el contratista CONSORCIO INFRAVIALES en relación con el avance de obra programadas, ejecutadas y acumuladas del contrato, los informes semanales de interventoría las copias de las actas de comité técnico semanal de seguimiento al programa de obra.

El pasado 22 de febrero se recibió la aprobación del documento denominado Acta modificatorio de menores y mayores cantidades de obra e ítems no previstos, aprobada por el ordenador degasto, una vez se contaba con el aval de las partes interesadas (Gobernación del Cesar, Interventoría y contratista), se procedió a reprogramar la ejecución de las nuevas actividades contratadas que representan algo más del 65% del valor del presupuesto, las actividades incluidas obedecen a las necesidades reales de los tramos viales.

Dentro de las actividades ejecutadas en este periodo se realizó además la limpieza de pontones y box-coulvert, especialmente en San Diego – Las Pitillas, San Diego – Los Tupes y San Diego – Media Luna, entre otros frentes que se intervinieron con actividades no previstas se encuentra la remoción de derrumbes y transporte de material granular en el sector de Patillal – Tzemuake, Atanquez – Guatapurí y Atanquez – Chemesquemena.

Inicialmente la actividad de poda aérea de árboles estaba aprobada únicamente para el tramo de El Callao – Los Calabazos, sin embargo, la entidad se ha visto en la necesidad de realizar poda en distintos tramos viales, para garantizar la seguridad vial, y de acuerdo con lo observado será necesario realizar dicha poda en la gran mayoría de los mismos, situación que se aprobó en el recorrido de obra de la interventoría y la entidad, y posteriormente solicitada a través de la interventoría al contratista.

En el tramo de Ramal a Pueblo Bello el contratista de obra adquirió el 80% del material de defensas metálicas, el cual se inició con la instalación de la defensa metálica en los sectores en donde se encontraba en mal estado, o en puntos críticos que para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario realizar la instalación de estos.

A continuación, se presenta los valores programados y ejecutados a la fecha de 31 de mayo del 2023.

AVANCE DEL PROYECTO ACUMULADO			
PERIODO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO
5	41.50%	51.25%	$ 1.371.315.299,70

Tabla N. 5 Resumen de Porcentaje de Ejecución vs Programado

3.4.2. Actas de comité técnico semanal de seguimiento al programa de obra

Durante el periodo comprendido del 1 de mayo de 2023 y el 31 de mayo de 2023, se realizaron actas de comités técnicas de seguimiento de obra; se adjuntan como **Anexo No 1** de obra del presente informe.

3.2.4 Pago de nómina del contrato de obra

El contratista de obra realizo como es debido el pago de nómina del presente proyecto. En los **Anexos No 2** del presente informe de interventoría se relaciona el pago de nómina del CONSORCIO INFRAVIALES.

3.2.5 Plan de calidad

El contratista CONSORCIO INFRAVIALES presenta el plan de calidad N.4

3.2.6 Plan de manejo ambiental

El contratista CONSORCIO INFRAVIALES presenta el plan de manejo ambiental N.4.

3.2.7 Plan de manejo de transito

El contratista CONSORCIO INFRAVIALES presenta el plan de manejo de tránsito N.4.

3.2.8 Informe SST Contratista

El contratista CONSORCIO INFRAVIALES presenta el informe sst N.4.

3.4.3. Maquinaria y equipo de contratista

La maquinaria, vehículos y equipos de contratistas utilizados en el proyecto se presentan en los **Anexos No 3** del presente informe de interventoría.
Cumplen con el requerimiento según anexo técnico, porque se está presentando el equipo mínimo a utilizar para las actividades de limpieza como lo son guadañadoras, motosierras y equipos de limpieza.
En este mes no se hizo uso de volquetas porque la recolección del material se realizó con el vehículo de recolección de basura del municipio.

3.4.4. Personal del contratista de obra

El personal del contratista en el proyecto se presenta en los **Anexos No 6** del presente informe de interventoría.

3.5. Información relacionada con los resultados de los ensayos de laboratorio

Durante el periodo correspondiente, no se han realizado ensayos de laboratorio.

3.6. Estado general del tiempo

Como **Anexo No 5** de obra, se adjunta el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10 donde se relaciona la información del estado general del tiempo.

4. Información financiera del contrato de obra

***Tabla N. 6** seguimiento financiero*

CUADRO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PERIODO						
SEMANA No.	**FECHA DE CORTE**	**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**		**AVANCE**
		VALOR EN $	**%**	**VALOR EN $**	**%**	
SEMANA No 23.	31/05/2023	$ 513.252.839,14	19,18%	$ 52.338.627	1.96%	1.96

El contratista registra una ejecución en el periodo de mayo del porcentaje programado acumulado para el periodo es de 41.50% y a la fecha la ejecución acumulada es de 51.25%.

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE POR PERIODO

	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
VALOR EJECUTADO	$ 20.569.040	$ 90.448.102	$ 101.419.617	$ 1.024.364.894	$ 81.920.319,00	$ 52.338.627,00	$ 1.371.315.299,70
%EJECUTADO	0.77%	3.38%	3.79%	38.28%	3.06%	1.96%	51.25%
ACUMULADO EN $	$ 20.569.040	111.053.142	212.472.760	$ 1.237.056.353,00	$ 1.318.976.671,70	$ 1.371.315.299,70	
ACUMULADO EN %	0.77%	4.15%	7.94%	46.23%	49.29%	51.25%	

4.1. Seguimiento financiero del avance de obra

El valor total del Contrato es por la suma de **DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS Mcte. ($2.675.979.349, oo)** incluido AIU, equivalentes a 2.675,97935 SMLMV para el año 2022.

4.2. Anticipo y/o pago anticipado

Para el presente contrato la Entidad no entregará al contratista anticipo y/o pago anticipado.

4.3. Revisión y verificación de pago de aportes a las seguridades sociales y parafiscales del contratista de obra

Como **anexo No 7** se adjunta la certificación de los pagos de aporte a la seguridad social y parafiscal del contratista de obra, para el seguimiento y control del personal que labora.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información general del contrato (incluye seguimiento a las garantías contractuales)

A continuación, se relaciona los datos del contrato de interventoría en la siguiente tabla:

Tabla N. 7 Datos generales del Contrato de Interventoría

CONTRATO No	***2022-05-0021***
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Interventoría
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL CESAR
INTERVENTORÍA	DAM SOLUCIONES E INGENIERA SAS, NIT: 900.503.599-3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA	Johanna Ivette López Tinoco, Cedula De Ciudadanía 38.813.115 De Guaduas, Cundinamarca
VALOR INICIAL	$ 198.623.292
PLAZO	**ocho (08) MESES**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Nueve (9) de noviembre de 2022
FECHA DE INICIO	Seis (06) de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Seis (06) de agosto de 2023
SUPERVISOR	María Gabriela Rumbo

Asimismo, se relaciona la información de las pólizas que amparan el contrato de interventoría:

Garantía de cumplimiento según suscripción del contrato

Tabla N. 8 Datos de Pólizas de Cumplimiento - Contrato de Interventoría

EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	21-44-101399152 Anexo: 0		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**17 DE NOVIEMBRE DEL 2022**		
FECHA DE APROBACIÓN	**5 DE DICIEMBRE DEL 2022**		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/11/2022	15/11/2023	$19.862.329,20
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/11/2022	15/07/2026	$19.862.329,20

LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			
CALIDAD DEL SERVICIOS	15/07/2023	15/07/2028	$59.586.987,60

Garantía de cumplimiento según acta de inicio

Tabla N. 9 *Datos de Pólizas de Cumplimiento - Acta de inicio Interventoría*

EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	21-44-101399152 Anexo: 2		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**28 DE DICIEMBRE DEL 2022**		
FECHA DE APROBACIÓN	**17 DE ENERO DEL 2023**		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/12/2022	06/12/2023	$19.862.329,20
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/12/2022	05/08/2026	$19.862.329,20
CALIDAD DEL SERVICIOS	05/08/2023	05/08/2028	$59.586.987,60

5.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte de la interventoría en el mes.

La interventoría tiene como objetivo principal que el proyecto se desarrolle y se termine de manera óptima y en el plazo especificado, así, a continuación, se relacione las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo:

Durante el transcurso del mes comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 31 de mayo de 2023, la interventoría realizó las siguientes actividades:

- Solicitud y revisión de la documentación legal vigente del contratista
- Control y seguimiento a los pagos de salarios, seguridad social y parafiscales del contratista de obra.
- Control y seguimiento al cumplimiento de PMA, PMT y requisitos de calidad del proyecto.
- Acompañamiento permanente y seguimiento a los segmentos iniciados en este periodo: Segmento San Diego – Las Pitillas, San Diego – Los Tupes, San Diego – Media Luna, Segmento Patillal – Tzemuake, Atanquez – Guatapurí, Ramal – Chemesquemena y Venao – El perro
- Control general de las actividades desarrolladas en el presente periodo.
- Revisión, control y seguimiento a la información requerida para la ejecución del contrato de obra.
- Acompañamiento al contratista en la verificación y ejecución de las actividades programadas.
- Revisión la aplicación del protocolo de bioseguridad y SG-SST requerido.
- Elaboración de informe mensuales, semanales, especialistas requeridos y ambiental.

5.3. Informe de seguimiento Plan De Manejo De Tráfico (PMT)

En el presente periodo la interventoría realizo un estricto control y vigilancia a las actividades del contrato de obra. El contratista de obra ha tomado medidas preventivas, de control y manejo para afectar lo menos posible el tránsito en las vías intervenidas y que este sea seguro para los usuarios.

La interventoría desarrolla control continuo de las actividades de PMT en la obra. Dirigirse al **Anexos de interventoría No 4**, PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO.

5.4 Informe de seguimiento de Plan De Manejo Ambiental (PMA)

En el presente periodo la interventoría según los ajustes realizados al pma y aprobado mediante la modificatoria, realizo un estricto control y vigilancia a las actividades del contrato de obra, el contratista tomo las siguientes medidas para prevenir y mitigar el impacto ambiental del proyecto. Cabe resaltar la inclusión de la profesional, ingeniera ambiental, con el fin de llevar a cabo los programas descritos en el pma.

Las actividades de control de interventoría son las siguientes:

- Se verifica que los vehículos y equipos que hagan parte del desarrollo del proyecto estén en buen estado con el fin de mitigar el mayor ruido y emisiones de gases contaminantes.
- Uso adecuado de elementos de protección personal
- Control de manejo de residuos y empaque adecuado de material vegetal proveniente de la rocería.

Los programas que desarrollo el contratista son los siguientes, anexos en el informe pma

- Programa desarrollo y aplicación de la gestión ambiental
- Programa actividades constructivas
- Programa gestión hídrica
- Programa biodiversidad y servicio ecosistémicos

Anexos de interventoría No 5, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

5.5 Informe de seguimiento del Plan De Calidad

En el presente periodo la interventoría realizo seguimiento del plan de calidad del contratista. **Anexo de interventoría No 11,** INFORME DE CALIDAD

5.6 Informe SST interventoría

La interventoría desarrolla control continuo de las actividades de SST en la obra. Dirigirse al **Anexos de interventoría No 10**, INFORME SST

5.7 Control diario de personal de interventoría

La interventoría cuenta con los siguientes profesionales disponibles para el contrato

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN (%)
JOSE LUIS STAPPER SEGRERA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	27.11%
OSCAR MAURICIO MONTENEGRO RODRIGUEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%

Tabla N. 10 Relación de Personal - INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO
MIGUEL ANGEL CARILLO MARTINEZ	INSPECTOR

Tabla N. 11 Relación del personal adicional- INTERVENTORIA

5.8 Información financiera del contrato de interventoría.

El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/cte. ($198.623.292,oo) incluido IVA., suma que se discrimina de la siguiente manera:

Valor de la propuesta sin iva: $ 166.910.329
Valor IVA: $ 31.712.963

5.9 Informe de inversión y buen manejo del anticipo y/o pago anticipado de interventoría.

En la forma de pago establecida contractualmente no estipula anticipo a la interventoría.

5.10 Revisión y verificación de pago de aportes a las seguridades sociales y parafiscales de interventoría.

Se adjunta como **anexo de interventoría No. 4**, donde se encuentran las certificaciones de los pagos de aporte a las seguridades sociales y parafiscales de interventoría, para el seguimiento y control del personal que labora.
labora.

5.11 Autorización y recibo de actividades

ACTIVIDADES RECIBIDAS			
ACTIVIDADES	LOCALIZACION	UND	CANTIDADES RECIBIDAS
DEFENSA METALICA	RAMAL – PUEBLO BELLO	ML	30

ACTIVIDADES RECIBIDAS			
ACTIVIDADES	LOCALIZACION	UND	CANTIDADES RECIBIDAS
DEMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA	MANDINGUILLA – DIOS ME VEA- HIGO AMARILLO	HA	5.05
LIMPIEZA DE BERMAS	MANDINGUILLA – DIOS ME VEA- HIGO AMARILLO	M2	5.310
LIMPIEZA A MANO DE CUNETA EN CONCRETO	MANDINGUILLA – DIOS ME VEA- HIGO AMARILLO	ML	180
PODA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV	MANDINGUILLA – DIOS ME VEA- HIGO AMARILLO	UND	150
LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLES DE ALCANTARILLAS	MANDINGUILLA – DIOS ME VEA- HIGO AMARILLO	ML	70
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600MM Y 900MM	MANDINGUILLA – DIOS ME VEA- HIGO AMARILLO	UND	9

ACTIVIDADES RECIBIDAS			
ACTIVIDADES	LOCALIZACION	UND	CANTIDADES RECIBIDAS
DEMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA	RAMAL – CANDELARIA	HA	1.06
LIMPIEZA DE BERMAS	RAMAL – CANDELARIA	M2	720

ACTIVIDADES RECIBIDAS			
ACTIVIDADES	LOCALIZACION	UND	CANTIDADES RECIBIDAS
DEMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA	RAMAL – SIMAÑA	HA	0.90
LIMPIEZA DE BERMAS	RAMAL – SIMAÑA	M2	2.540
PODA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV	RAMAL – SIMAÑA	UND	70

ACTIVIDADES RECIBIDAS			
ACTIVIDADES	LOCALIZACION	UND	CANTIDADES RECIBIDAS
DEMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA	TAMALAMEQUE - ANTEQUERA	HA	2.10
LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLES DE ALCANTARILLAS	TAMALAMEQUE - ANTEQUERA	ML	70
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600MM Y 900MM	TAMALAMEQUE - ANTEQUERA	UND	7

ACTIVIDADES RECIBIDAS			
ACTIVIDADES	LOCALIZACION	UND	CANTIDADES RECIBIDAS
DEMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA	LA RAYA - ZAPATOSA	HA	5.76
LIMPIEZA DE BERMAS	LA RAYA - ZAPATOSA	M2	1.545
PODA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV	LA RAYA - ZAPATOSA	UND	84
LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLES DE ALCANTARILLAS	LA RAYA - ZAPATOSA	ML	20
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600MM Y 900MM	LA RAYA - ZAPATOSA	UND	2

5.12 Cumplimiento Especificaciones Técnicas

El contratista de obra desarrollo las actividades, cumpliendo las especificaciones técnicas del proyecto. Tal como se relaciona en el informe de seguimiento del plan de calidad; **Anexo de interventoría No 11,** INFORME DE CALIDAD

5.13 Informes Semanales

Los informes de interventoría correspondiente a este mes fueron los siguientes:

SEMANA	ARCHIVO
SEMANA 20	INF. SEMANAL DE INTERVENTARIA No 20 DEL 1 DE MAYO AL 6 DE MAYO DE 2023
SEMANA 21	INF. SEMANAL DE INTERVENTARIA No 21 DEL 08 DE MAYO AL 13 DE MAYO DE 2023
SEMANA 22	INF. SEMANAL DE INTERVENTARIA No 22 DEL 15 DE MAYO AL 20 DE MAYO DE 2023
SEMANA 23	INF. SEMANAL DE INTERVENTARIA No 23 DEL 22 DE MAYO AL 27 DE MAYO DE 2023

***Tabla N. 12** Cuadro de Relación de Informes Semanales de Interventoría*

5 RELACION DE LA CORRESPONDENCIA

La correspondencia generada en el periodo del mes transcurrido se relaciona en el siguiente cuadro:

COMUNICADOS ENVIADOS POR INTERVENTORÍA			
CONSECUTIVO	**REFERENCIA**	**FECHA**	**ASUNTO**
INT-DAM-005-021-2022-001	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	1/12/2022	ENTREGA POLIZAS Y PAGO DE IMPUESTOS
INT-DAM-005-021-2022-002	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	13/12/2022	TRASLADO DE PROGRAMACION CONTRATO DE OBRA NO. 2022040011
INT-DAM-005-021-2022-002A	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	13/12/2022	TRASLADO HOJAS DE VIDA CONTRATO DE OBRA NO. 2022040011
INT-DAM-005-021-2022-003	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	13/12/2022	TRASLADO APUS CONTRATO DE OBRA NO. 2022040011
INT-DAM-005-021-2022-004	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	28/12/2022	TRASLADO HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA NO. 2022040011
INT-DAM-005-021-2022-005	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	29/12/2022	TRASLADO POLIZA CONTRATO DE INTERVENTORIA- ACTUALIZADAS A FECHA DE INICIO
INT-DAM-005-021-2022-005A	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	12/01/2023	TRASLADO POLIZA CONTRATO DE INTERVENTORIA- ACTUALIZADAS A FECHA DE INICIO
INT-DAM-005-021-2022-006	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	11/01/2023	TRASLADO DESGLOSE DE LA ADMINISTRACION CONTRATO DE OBRA NO. 2022040011
INT-DAM-005-021-2022-007	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	11/01/2023	TRASLADO POLIZA CONTRATO DE OBRA NO. 2022040011- ACTUALIZADAS A FECHA DE INICIO
INT-DAM-005-021-2022-008	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	11/01/2023	SOLICITUD PROPUESTA TECNICA DE PAVIMENTOS TRAMOS PRIORIZADOS
INT-DAM-005-021-2022-009	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	11/01/2023	TRASLADO DE PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA NO. 2022040011
INT-DAM-005-021-2022-010	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	30/01/2023	TRASLADO DE INFORME MENSUAL CONTRATISTA DE OBRA NO. 2022040011
INT-DAM-005-021-2022-011	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	13/1/2023	OBSERVACIONES PMA
INT-DAM-005-021-2022-012	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	13/1/2023	APROBACIÓN HV ESP Y SST

INT-DAM-005-021-2022-013	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	20/1/2023	SOLICITUD INFORME MENSUAL COMPLETO
INT-DAM-005-021-2022-014	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	13/2/2023	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA 1
INT-DAM-005-021-2022-015	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	13/2/2023	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO CONTRATISTA
INT-DAM-005-021-2022-016	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	13/2/2023	TRASLADO PMA
INT-DAM-005-021-2022-017	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	16/2/2023	ENTREGA HOJAS DE VIDA AMBIENTAL
INT-DAM-005-021-2022-018	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	16/2/2023	REMISION ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS
INT-DAM-005-021-2022-019	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	22/2/2023	SOLICITUD REPROGRAMACION DE OBRA Y PROGRAMACION SEMANAL
INT-DAM-005-021-2022-020	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	22/2/2023	REMISION ACTA DE RECIBO PARCIAL N. 1
INT-DAM-005-021-2022-021	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	3/3/2023	ATENCION A COMUNICADO INCUMPLIMIENTO 1 DE MARZO
INT-DAM-005-021-2022-022	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	15/03/2023	SOLICITUD SEGUNDA INTERVENCION
INT-DAM-005-021-2022-023	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	16/3/2023	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
INT-DAM-005-021-2022-024	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	16/3/2023	SOLICITUD PROGRAMACION DE OBRA SEGUN MODIFICATORIO
INT-DAM-005-021-2022-025	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	10/3/2023	INFORME MENSUAL CONTRATISTA N.3
INT-DAM-005-021-2022-026	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	21/3/2023	TRASLADO SISTEMA DE GESTION
INT-DAM-005-021-2022-027	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	17/3/2023	REMISION ACTA PARCIAL N.1 INTERVENTORIA
INT-DAM-005-021-2022-028	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	5/4/2023	SOLICITUD DE DISEÑO DE MEZCLA PARA BACHEO
INT-DAM-005-021-2022-029	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	5/4/2023	SOLICITUD INFORME MENSUAL N.4 CONTRATISTA

INT-DAM-005-021-2022-030	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	13/4/2023	CAMBIO HOJA DE VIDA INSPECTOR
INT-DAM-005-021-2022-031	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	4/4/2023	TRASLADO PROGRAMACION ACTUALIZADA SEGUN MODIFICATORIA
INT-DAM-005-021-2022-032	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021	4/5/2023	TRASLADO PROGRAMACION ACTUALIZADA SEGUN MODIFICATORIA

6 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N.1.- Evidencia de desmonte y limpieza en zona no boscosa - *tramo* Mandinguilla – Dios me ve



Fotografía N. 1.- *Evidencia de desmonte y limpieza en zona no boscosa - tramo Mandinguilla – Dios me ve*




Fotografía N. 2 Poda de la parte aérea de árboles tipo iv (no incluye transporte) - *tramo Mandinguilla – Dios me ve*




Fotografía N. 3 Poda de la parte aérea de árboles tipo iv (no incluye transporte) - *tramo Mandinguilla – Dios me ve*




Fotografía N. 4 Evidencia Limpieza de bermas - *tramo Mandinguilla – Dios me ve*

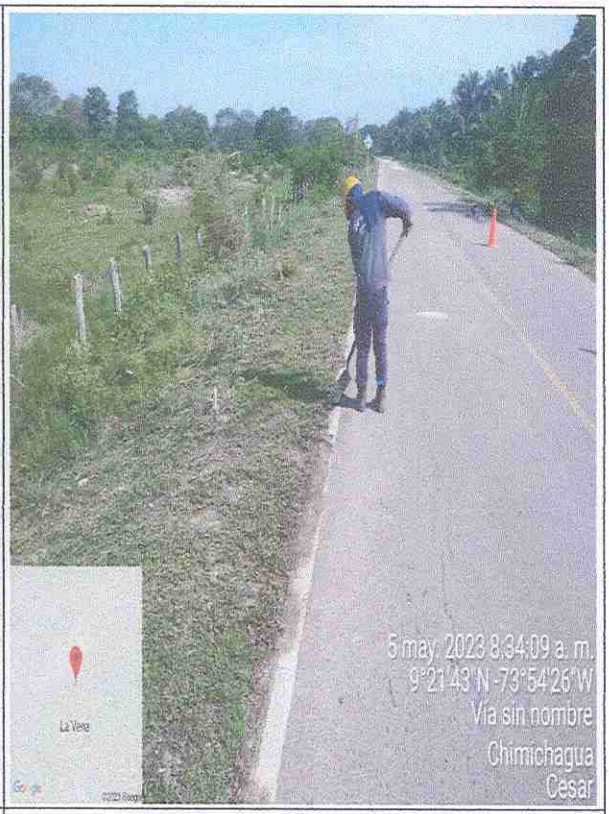


Fotografía N. 5 Evidencia Limpieza de bermas - *tramo Mandinguilla – Dios me ve*

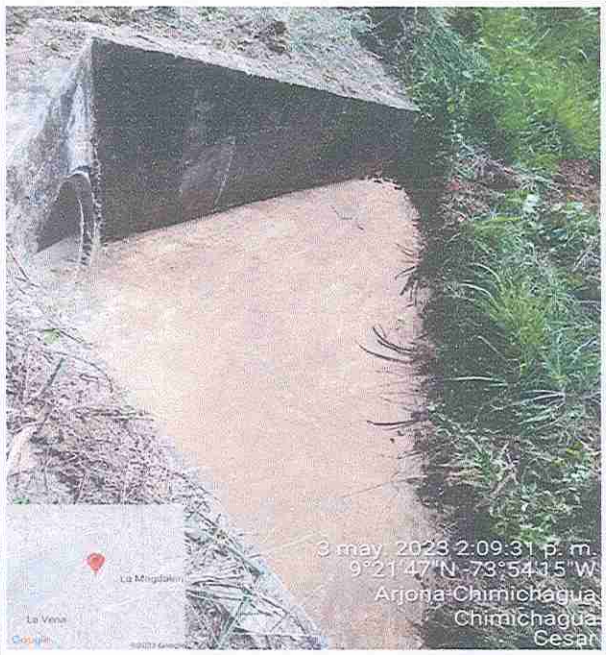


Fotografía N. 6 Evidencia limpieza a mano de encoles y descoles de alcantarillas - *tramo Mandinguilla – Dios me ve*

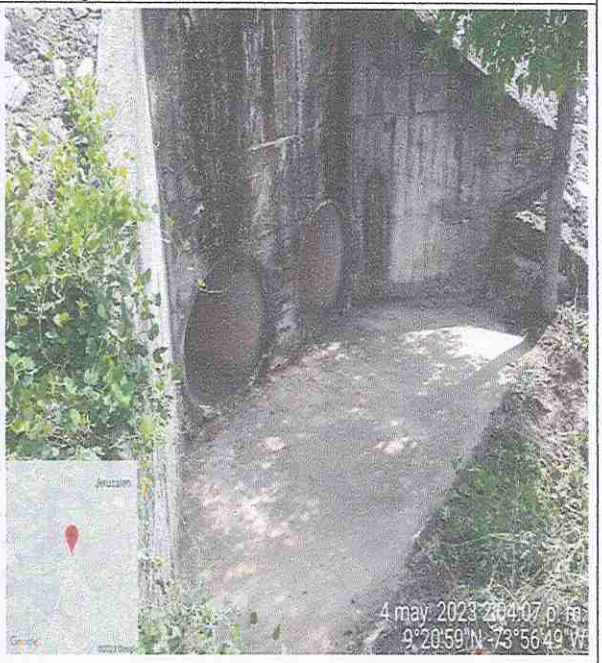


Fotografía N. 7 Evidencia limpieza a mano de encoles y descoles de alcantarillas - *tramo Mandinguilla – Dios me ve*

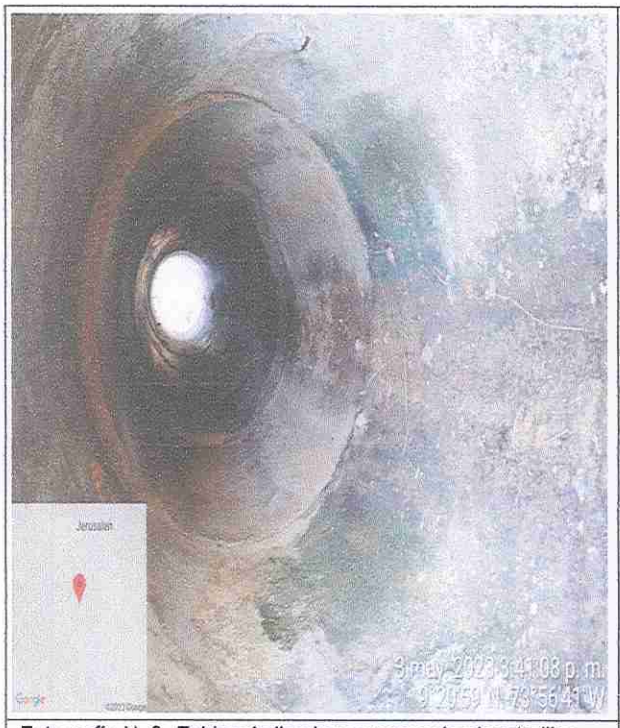


Fotografía N. 8. *Evidencia limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600mm y 900mm - tramo Mandinguilla – Dios me ve*

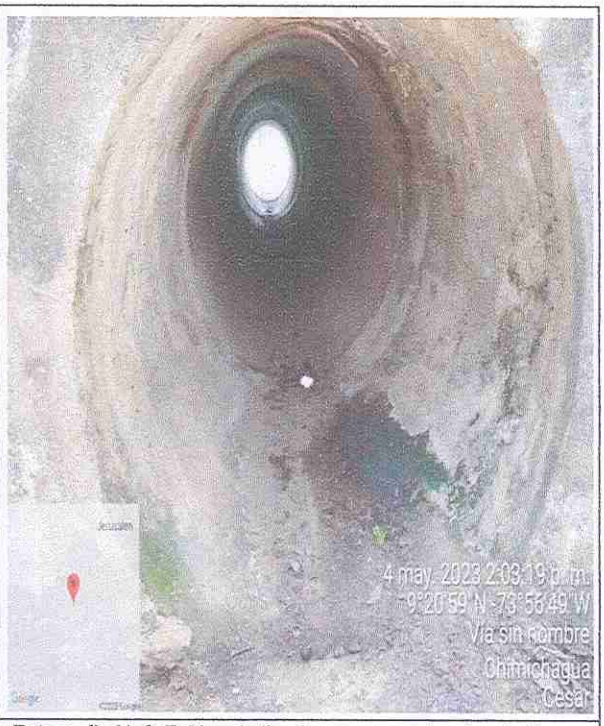


Fotografía N. 9 *Evidencia limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600mm y 900mm - tramo Mandinguilla – Dios me ve*

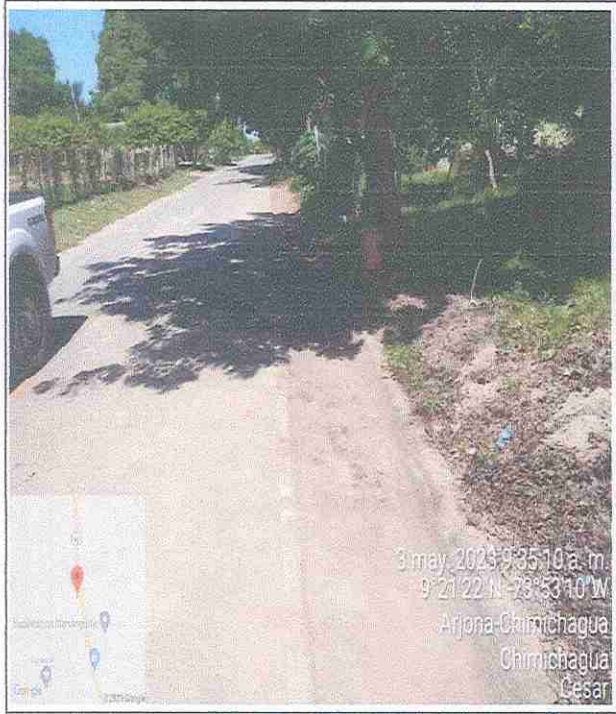


Fotografía N. 10 Evidencia l*impieza a mano de cunetas en concreto - tramo Mandinguilla – Dios me ve*

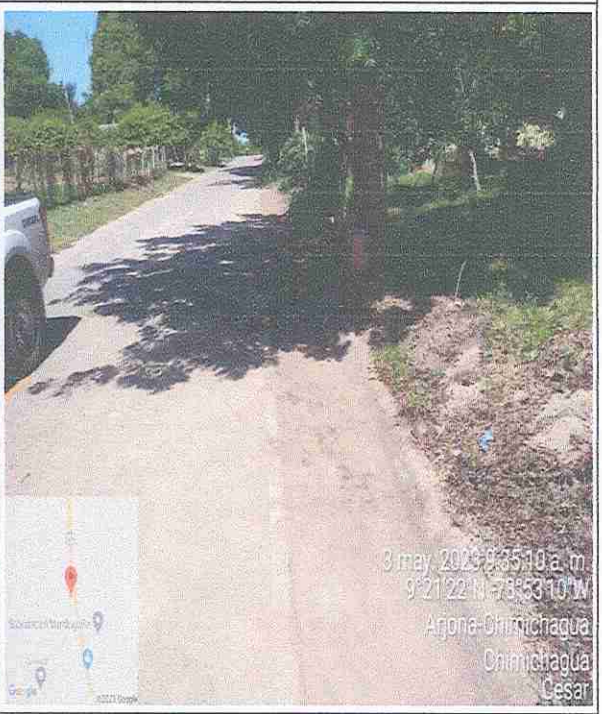


Fotografía N. 11 Evidencia limpieza *a mano de cunetas en concreto - tramo Mandinguilla – Dios me ve*

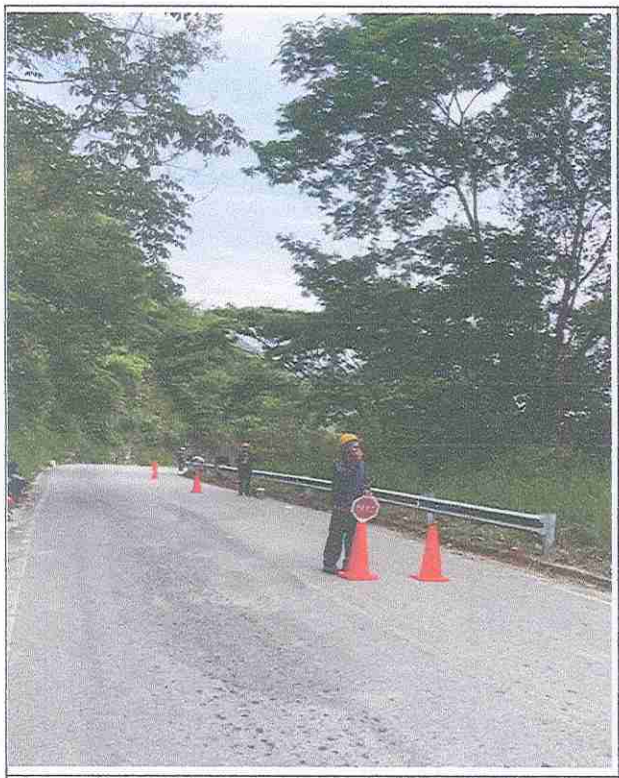


Fotografía N. *Evidencia instalación de defensa metálica tramo Vía nacional - pueblo bello*

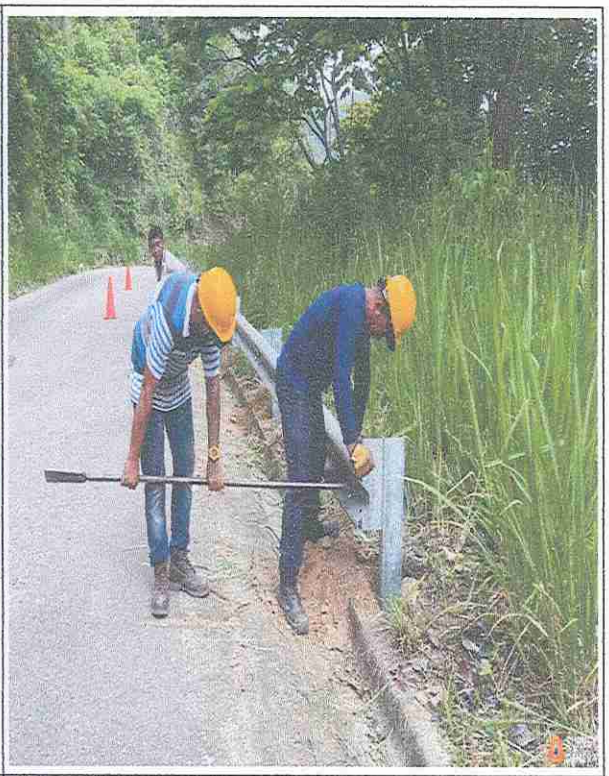


Fotografía N. 12 *Evidencia instalación de defensa metálica tramo Vía nacional - pueblo bello*

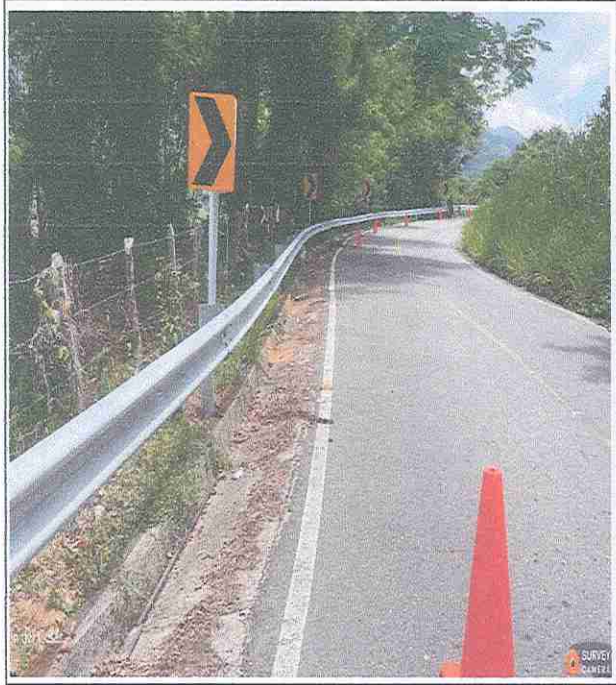


Fotografía N. 13 *Evidencia instalación de defensa metálica tramo Vía nacional - pueblo bello*

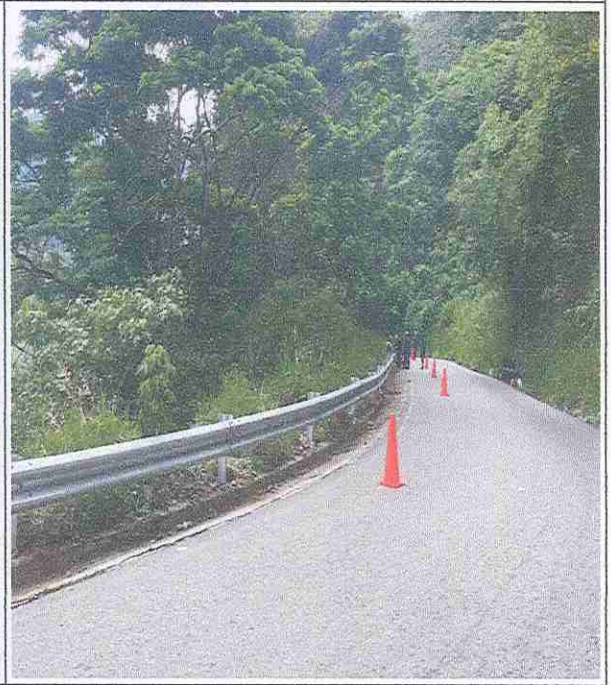


Fotografía N. 14 *Evidencia instalación de defensa metálica tramo Vía nacional - pueblo bello*

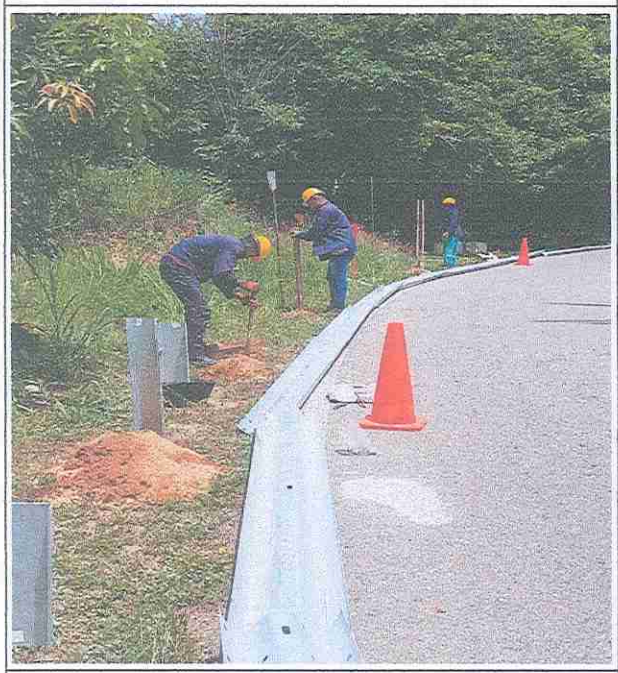

Fotografía N. 17 *Evidencia instalación de defensa metálica tramo Vía nacional - pueblo bello*

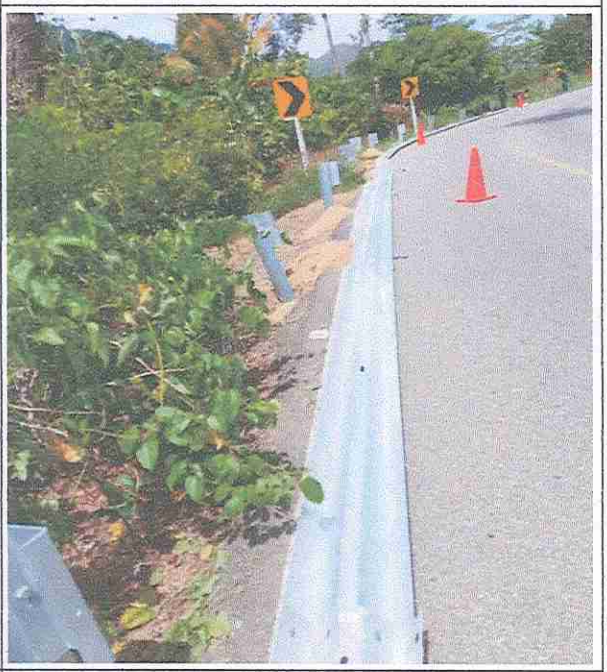


Fotografía N. 18 *Evidencia instalación de defensa metálica tramo Vía nacional - pueblo bello*

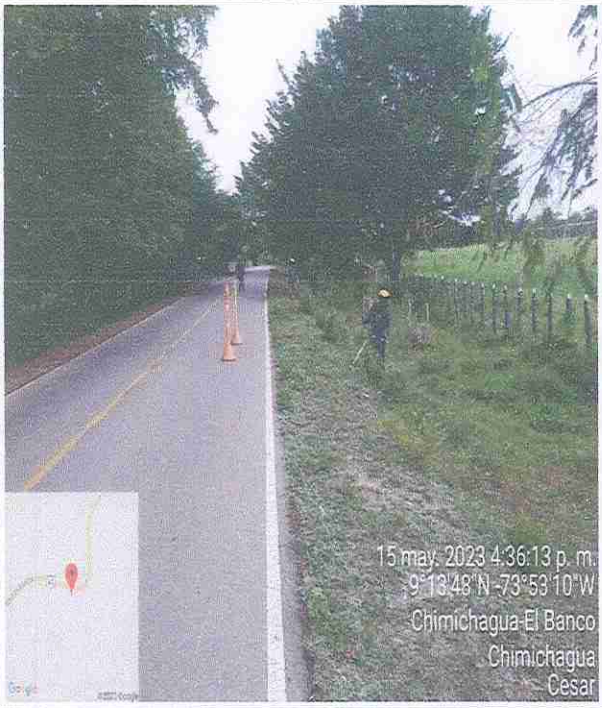


Fotografía N. 19 Evidencia de desmonte y limpieza en zona no boscosa - tramo Ramal - Candelaria



Fotografía N. 20 Evidencia de desmonte y limpieza en zona no boscosa - tramo Ramal - Candelaria

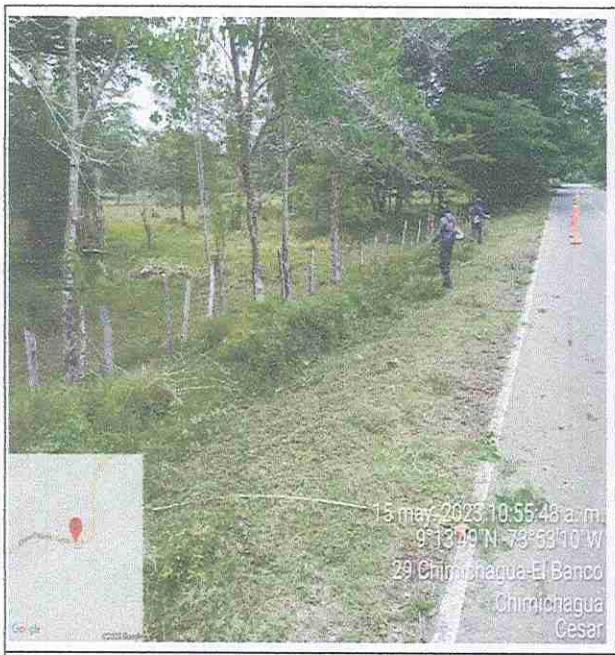


Fotografía N. 21 Evidencia de desmonte y limpieza en zona no boscosa - tramo Ramal - Candelaria

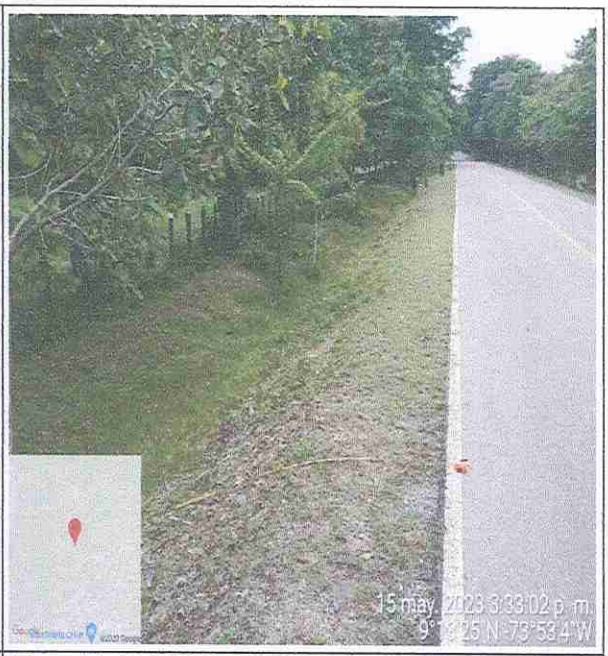

Fotografía N. 22 Evidencia de desmonte y limpieza en zona no boscosa - tramo Ramal - Candelaria




Fotografía N. 23 Evidencia Limpieza de bermas- tramo Ramal – Candelaria

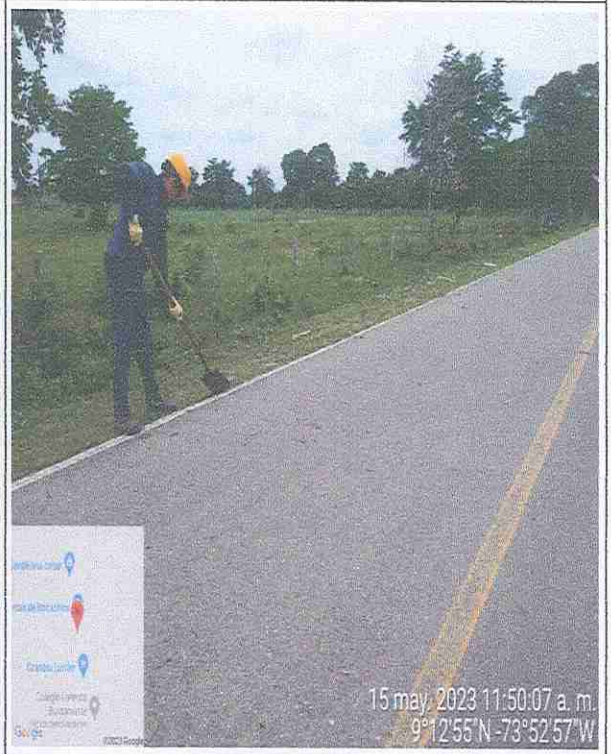


Fotografía N. 24 Evidencia Limpieza de bermas- tramo Ramal - Candelaria



Fotografía N. 25. Evidencia de desmonte y limpieza en zona no boscosa - tramo Tamalameque - Antequera

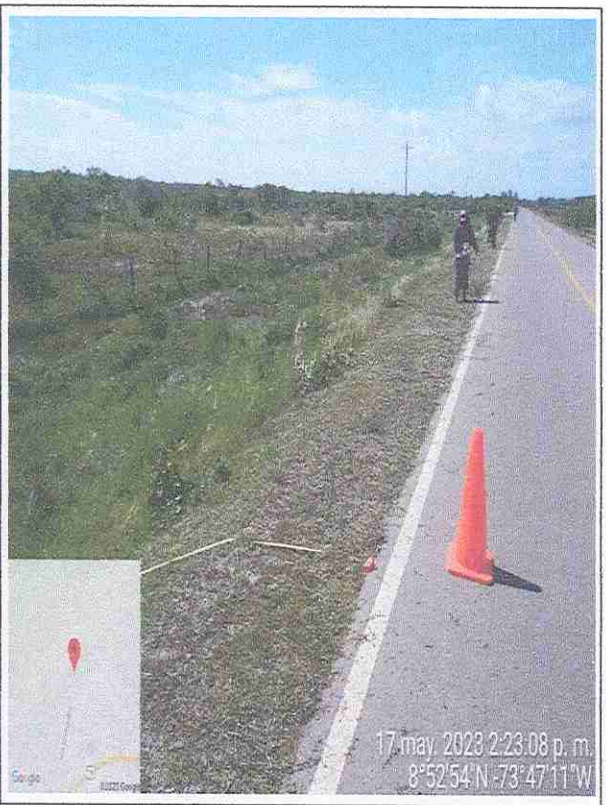


Fotografía N. 26. Evidencia de desmonte y limpieza en zona no boscosa - tramo Tamalameque - Antequera

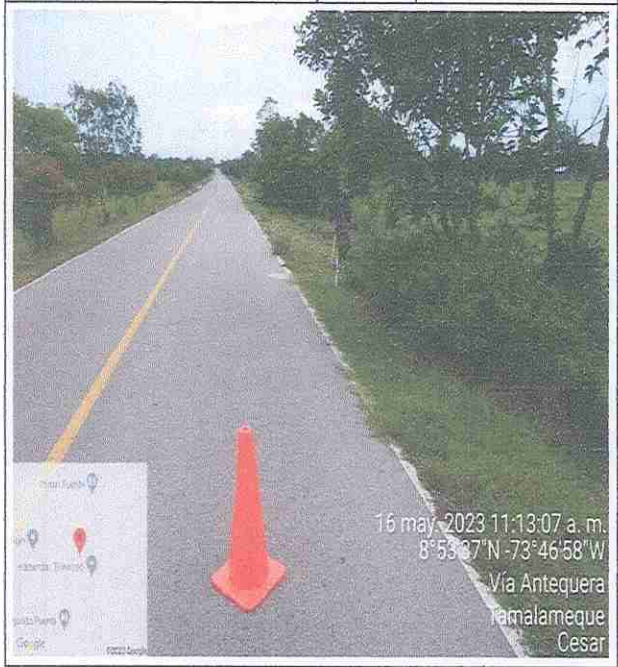


Fotografía N. 27 Evidencia de desmonte y limpieza en zona no boscosa - tramo Tamalameque - Antequera




Fotografía N. 28 Evidencia de desmonte y limpieza en zona no boscosa - tramo Tamalameque - Antequera

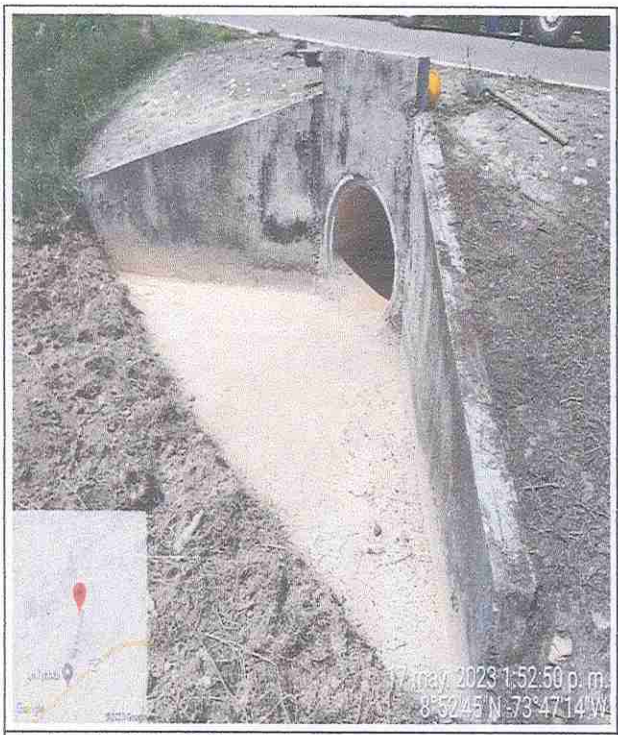

Fotografía N.29. Evidencia limpieza a mano de encoles y descoles de alcantarillas - tramo Tamalameque - Antequera

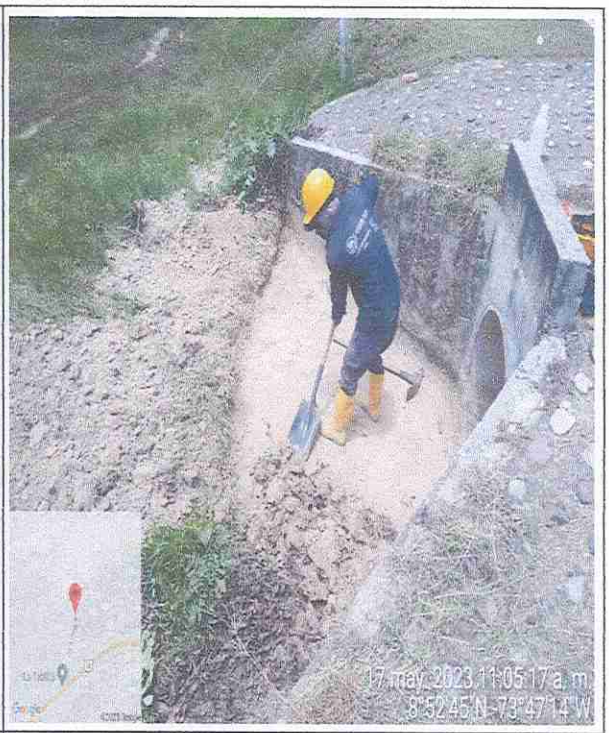


Fotografía N. 30 Evidencia limpieza a mano de encoles y descoles de alcantarillas - tramo Tamalameque - Antequera

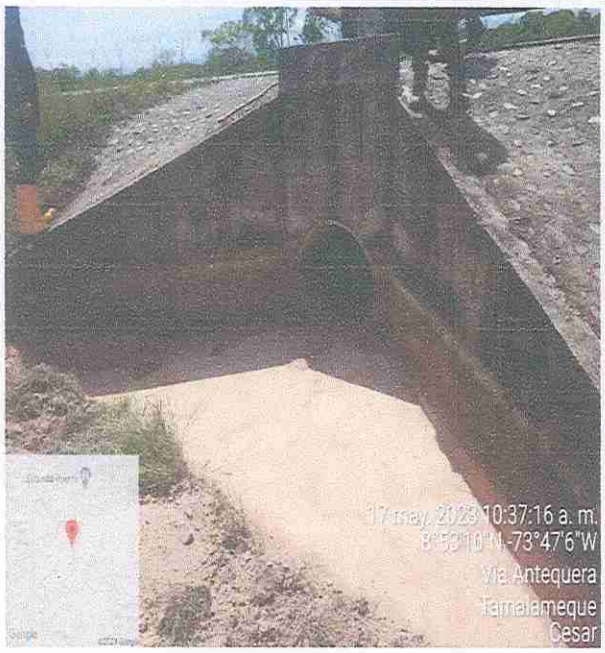


Fotografía N. 31 Evidencia limpieza a mano de encoles y descoles de alcantarillas - tramo Tamalameque – Antequera




Fotografía N. 32 Evidencia limpieza a mano de encoles y descoles de alcantarillas - tramo Tamalameque - Antequera

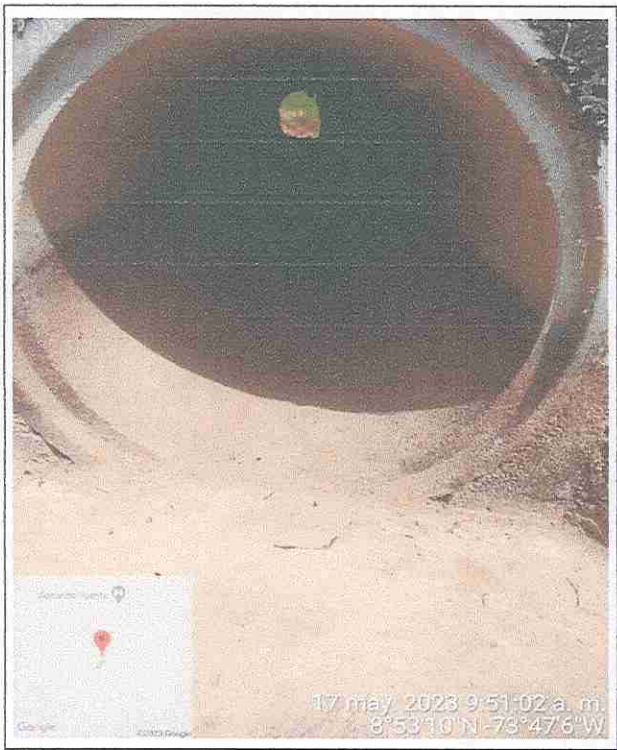


Fotografía N. 33 *Evidencia limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600mm y 900mm* - tramo Tamalameque – Antequera

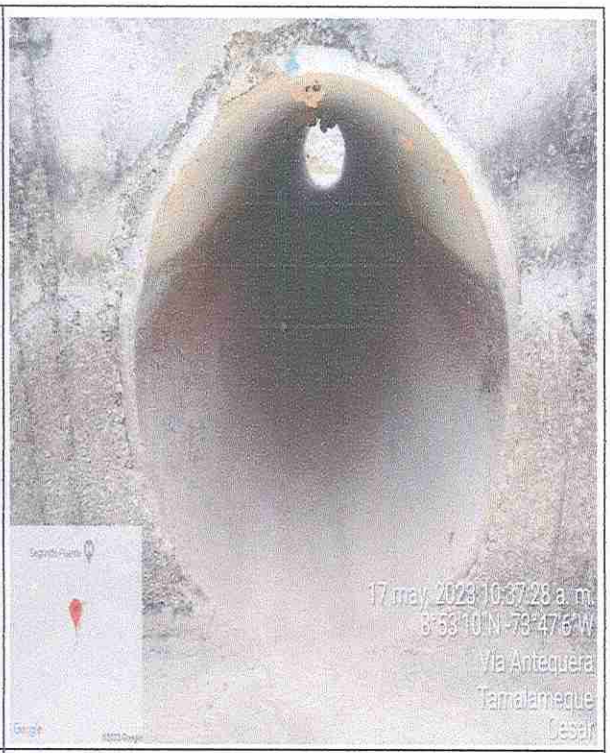


Fotografía N. 34 *Evidencia limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600mm y 900mm* - tramo Tamalameque – Antequera

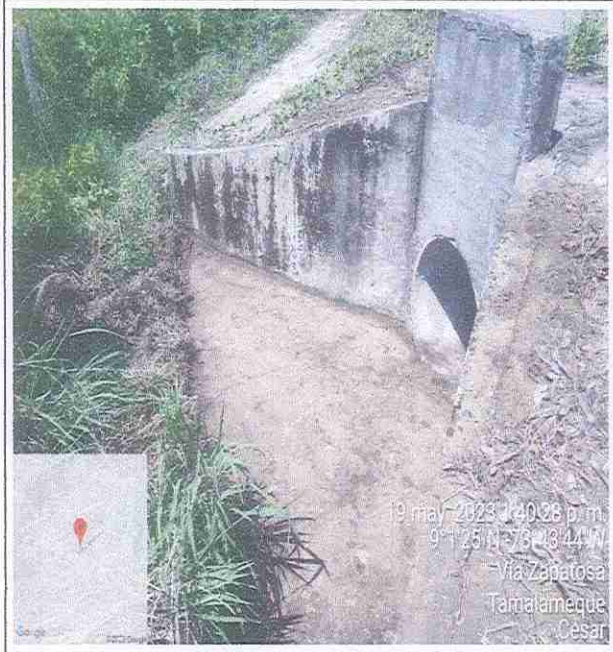

Fotografía N. 35 Evidencia limpieza a mano de encoles y descoles de alcantarillas – tramo La raya – Zapatosa

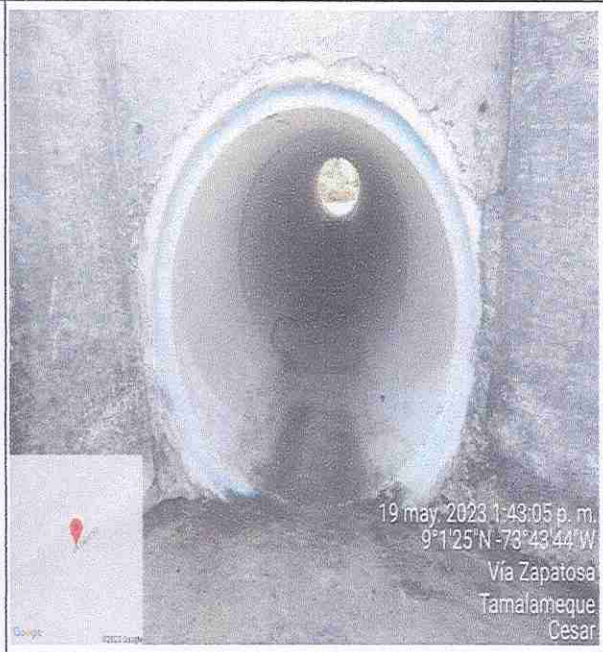

Fotografía N. 36 *Evidencia limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600mm y 900mm* – tramo La raya – Zapatosa

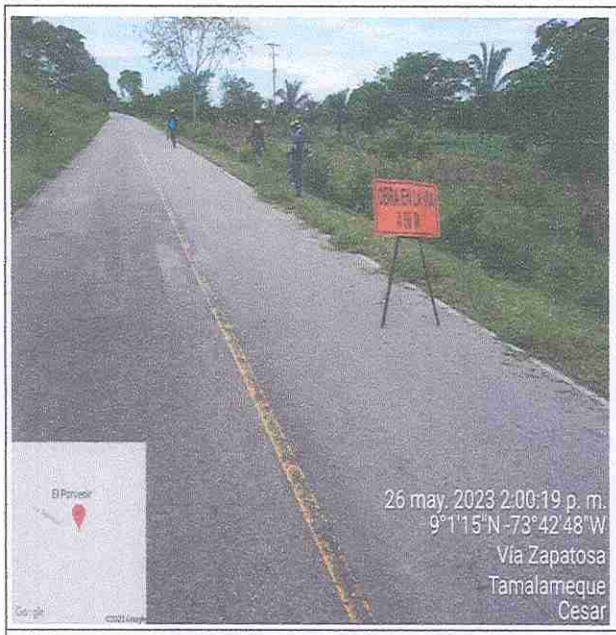

Fotografía N. 37 Evidencia de desmonte y limpieza en zona no boscosa – tramo La raya – Zapatosa



Fotografía N. 38 Evidencia de desmonte y limpieza en zona no boscosa – tramo La raya – Zapatosa




Fotografía N. 39 Poda de la parte aérea de árboles tipo iv (no incluye transporte) – tramo La raya – Zapatosa




Fotografía N. 40 Poda de la parte aérea de árboles tipo iv (no incluye transporte) – tramo La raya – Zapatosa




Fotografía N. 41 Evidencia de limpieza a mano de cunetas en concreto – tramo La raya – Zapatosa

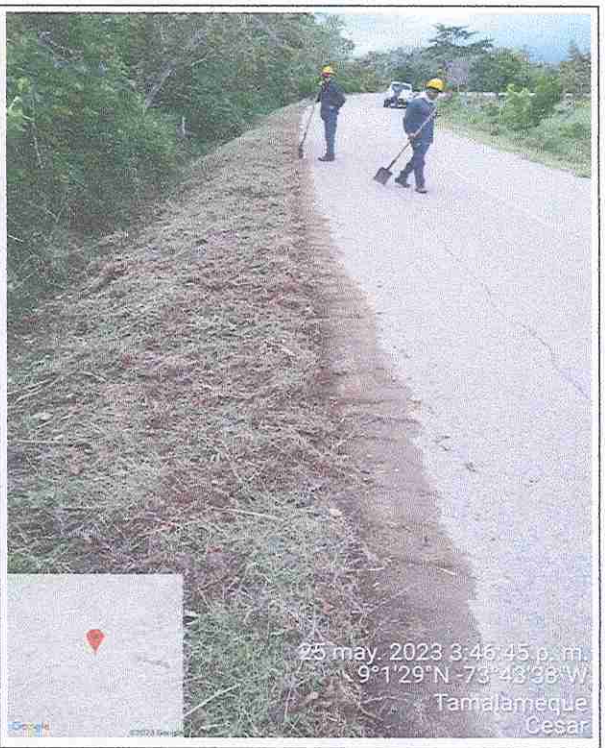


Fotografía N. 42 Evidencia de limpieza de bermas – tramo La raya – Zapatosa

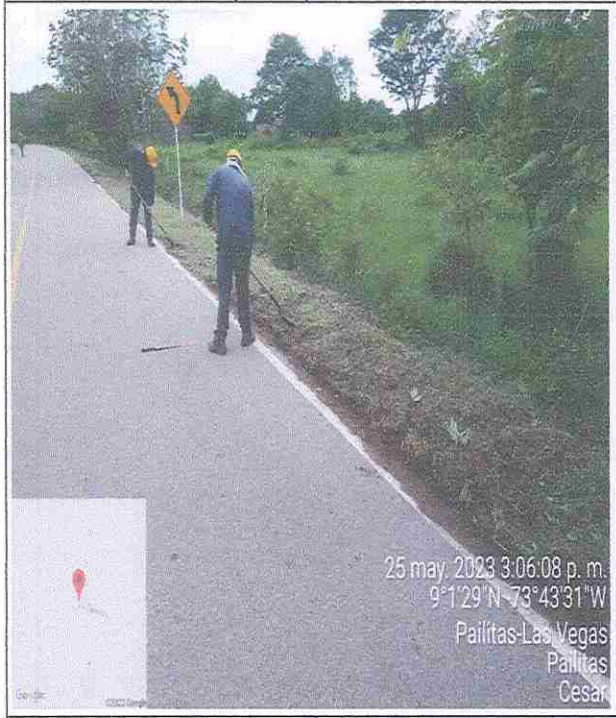


Fotografía N. 43 Evidencia de limpieza de bermas – tramo La raya – Zapatosa

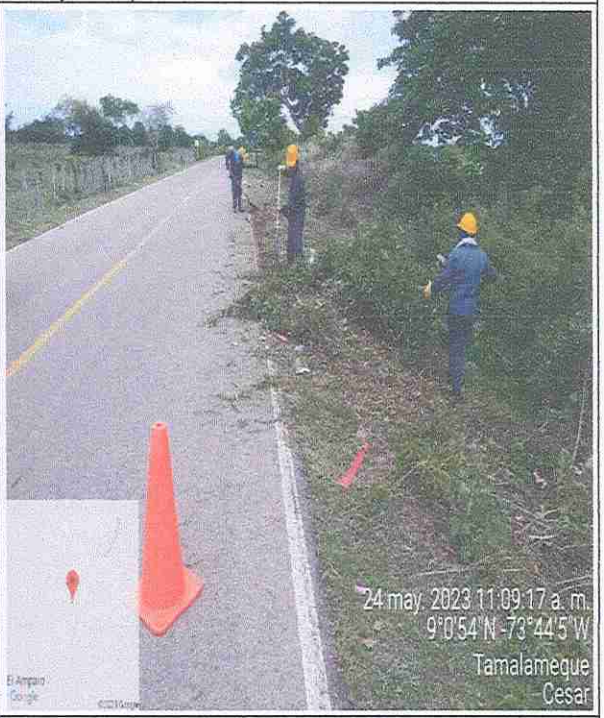

Fotografía N. 44 Evidencia de limpieza de bermas – tramo La raya – Zapatosa

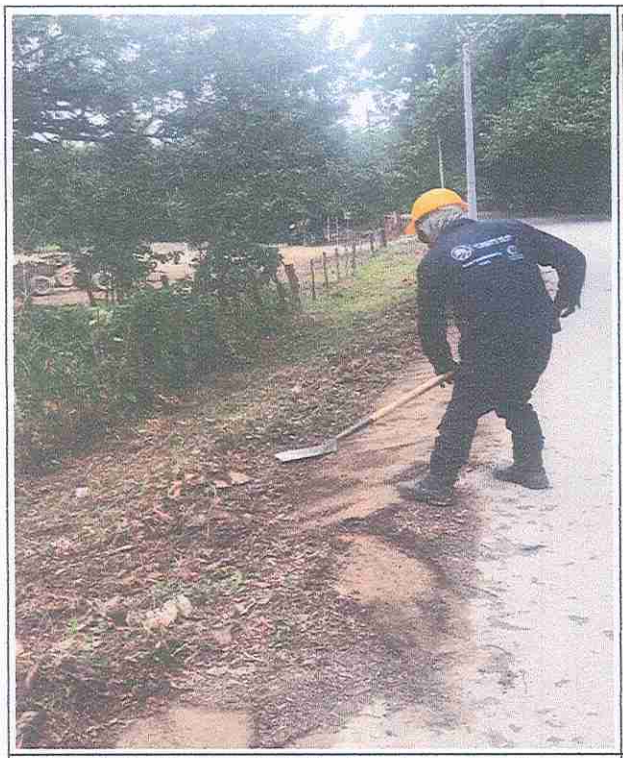

Fotografía N. 45 Evidencia de limpieza de bermas – tramo- Ramal – Simaña

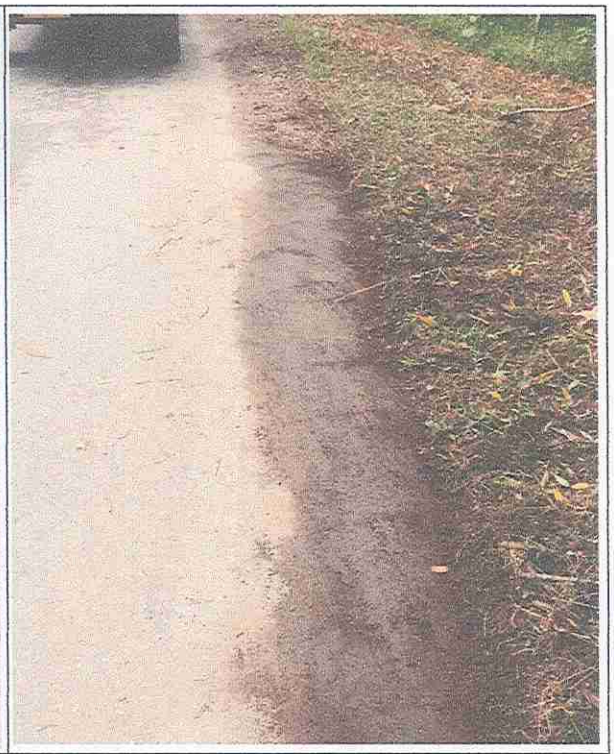



Fotografía N. 46 Evidencia de limpieza de bermas – tramo- Ramal – Simaña



Fotografía N. 47 Evidencia de desmonte y limpieza en zona no boscosa – tramo- Ramal – Simaña




Fotografía N Evidencia de desmonte y limpieza en zona no boscosa – tramo- Ramal – Simaña

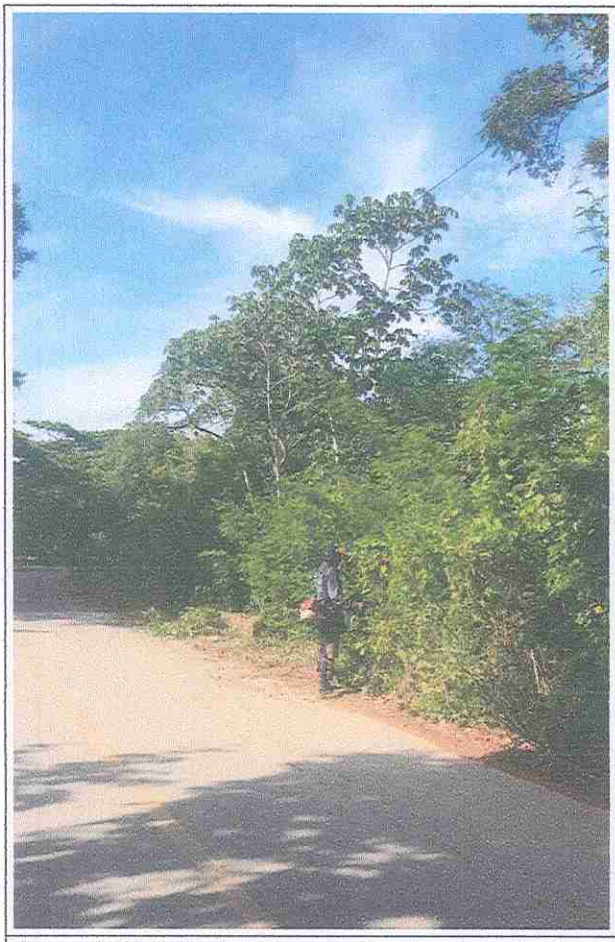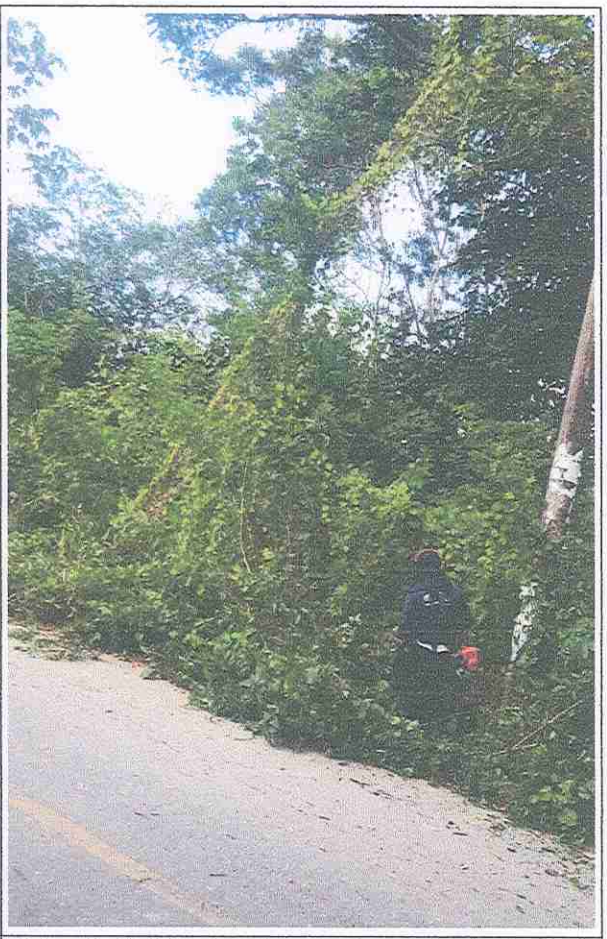	
Fotografía N. 49. Poda de la parte aérea de árboles tipo iv (no incluye transporte) – tramo- Ramal – Simaña	Fotografía N. 50 Poda de la parte aérea de árboles tipo iv (no incluye transporte) – tramo- Ramal – Simaña

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el primer mes de ejecución del contrato de obra No. 2022 04 0011 que tiene como objeto "MANTENIMIENTO RUTIANRIO Y PERIODICO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR" se concluye qué:

- El presente informe comprende el periodo desde el 1 de mayo de 2023 y el 31 de mayo de 2023, en el cual el contratista realizo control de cada uno de los procesos administrativos y financieros.
- En constancia de la programación y avance del contrato, según el cronograma de actividades, el porcentaje de ejecución del periodo es del 1.96 y el acumulado es del 51.25%
- Hasta la fecha, el contratista de obra se encuentra al día con los pagos de aporte a la seguridad social de su personal mínimo requerido.
- Se recomienda realizar seguimiento de mayores y menores cantidades al contrato de obra dado que se debe equilibrar el balance general de obra y ajustar las actividades no previstas con el fin de cumplir con el objeto del contrato.



JOHANNA IVETTE LOPEZ TINOCO
C.C. 38.813.115 de Guaduas
Representante Legal

ANEXOS – SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA

Anexo de seguimiento de Obra N. 1. Actas de comité técnico semanal de seguimiento al programa de obra

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

ACTA DE COMITÉ No. 6.

Republica de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura

	CONTRATO DE OBRA No. 2022040011 **MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2022050021. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR			
3.	**Fecha del Comité** 25 MAYO 2023.	**DD:** 25	**MM:** MAYO	**AA:** 2023.
4.	**Hora:.** 10:09 am.	**Lugar:** Secretaria de Infraestructura	**Municipio:** Valledupar	**Dpto.:** Cesar
5.	**ASISTENTES**			
	1. Johanna I. Lopez. R. legal Interventoría			
	2. Maria Gabriela Rumbo C.			
	3. Javier Triana M			
	4. Kelly Mora Blanco			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
6.	**TEMAS A TRATAR:**			

	1. Avance de Obra a la fecha 2. Actividades pendientes por ejecutar 3. Revisión balance a la fecha. 4. Estado general de documentos.
7.	• **DESARROLLO:** Se da inicio al comité de seguimiento con la revisión del avance de Obra a la fecha: • La Raya - Zapatosa: Rocería, limpieza de bermas y alcantarillas en un avance del 20% para el tramo hasta la fecha Se prevee finalización para la segunda semana del mes de Junio. de 2023. • Mandinguilla - Dios me vea higo ahuillo: Limpieza de bermas, rocería, dimpieza de alcantarillas y limpieza de box coulvert. El tramo esta ejecutado y entregado a la Interventoría • Ramal - La Candelaria: Limpieza de bermas, Rocería, limpieza de bloautonllas. El tramo se encuentra finalizado y entregado en el periodo a la Interventoría. • Ramal - Cimaña: Limpieza de bermas, Limpieza alcantarillas Limpieza box coulvert., rocería. El tramo se encuentra finalizado y entregado a Interventoría. • Tamalameque - Antequera: Rocería, limpieza de bermas y alcantarillas. El tramo se encuentra finalizado. y entregado a Interventoría. • Ramal a Pueblo Bello: Inventario de Defensa metálica, georeferenciación y marcación del tramo instalado. Se instalaron los ultimos 92.5 ml de Defensa. Queda pendiente instalar 120 terminales, realizar reparación de la Defensa existente. y 1588 ml de Defensa por instalar. que están programados para llegada a obra la próxima semana. Se debe incluir en el Informe de Calidad del periodo los documentos de Certificaciones de insumos y materiales.

Los Venados - El Perro - Guaymoral: Durante el periodo se recibió la limpieza del tramo que consistió en rocería limpieza de box coulvert., limpieza de alcantarillas. Cuneta en tierra y Limpieza de bermas.
Se inició vinculación de personal para actividades. de corte, bacheo y arreglo de fisuras.

2. ACTIVIDADES PENDIENTES:
Se entrega a la Supensión del contrato un balance final. del contrato, dado que sensando cantidades definitivas se encuentran algunas actividades que se deben hacer y otros que no. Se debe entregar de manera formal ala Interventoría con el fin de realizar el ajuste pertinente ante la entidad. previa revisión de Interventoría. El archivo se remitió el 24 de Mayo.
- Está pendiente el inicio de instalación de asfalto. la instalación de la señalización, para verificar el inventario., pendiente entrega documentos de calidad de insumos y reflectivos. Se solicito a la entidad la verificación de la documentación para inventario de la señalización.
- VIA NACIONAL LA VICTORIA SAN ISIDRO. Pendiente inicio actividades de limpieza. Inicio programado.
- VIA NACIONAL ESTADOS UNIDOS. Pendiente inicio actividades de limpieza y rocería. Inicio programado.
- LAS VEGAS SALOA. Pendiente inicio actividades de limpieza Inicio programado para la segunda semana de Junio.
Se solicito al contratista llevar a cabo la organización de la logistica para cumplir con los tiempos.
- CARACOLICITO - CHIMILA.
- AGUSTIN CODAZZI - Batallón Alta Montaña.
En estos dos tramos se solicita priorizar zonas críticas con el fin de tomar opciones de Intervención y lograr cumplir con el presupuesto final.

Al periodo se reporto el avance para el periodo del 56,83% acumulado.

3. Se solicito al contratista entrega de la programación general y balance conforme la solicitud de revisión de tramos por parte de Interventoría, mencionado en el cuerpo de la presente acta.

4. Revisión de documentos:
- Entrega de Programaciones semanales. pendientes. con el fin de verificar cumplim. de programación.
- Informe Mensual Mes Mayo. 2023. para entrega proximo 2 de Junio. a Interventoría.
- Se solicita a la supervisión el listado de documentos. para inicio de proceso de terminación y liquidación del Contrato, sin embargo la Interventoría solicitará los documentos basicos, que consoliden la información final. Los informes finales se deben entregar por componente. y definiendo consolidado pos segmento.
- Definir formato de Ingreso de mercancía para inventario del mobiliario urbano que se desmonte. y el que se instale (Señalización - baranda).

8.	COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO PARA ENTREGA

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

ACTA DE COMITÉ No. 6.

Republica de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura

8.	COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO PARA ENTREGA
1.	Inicio de actividades bacheo entramo los Venados - El Perro.	Contratista.	30 Mayo 2023.
2.	Entrega Balance final. con la revisión final de actividades.	Contratista.	25 Mayo 2023.
3.	Certificados Calidad de Defensa. metálica y señalización.	Contratista	Primera semana Junio. /23.
4.	Entrega Reprogramación de obra con ajuste del balance final.	Contratista	30/Mayo/23.
5.	Programaciones semanales pendientes.	Contratista.	2 Junio/23.
6.	Informe Mensual Mes de Mayo.	Contratista.	2 Junio/23

Hora de terminación del comité: 12:30 pm.

Anexo de seguimiento de Obra N. 2. Relación de pago nómina de empleados de contrato de obra

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 7 correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
SILVA GONGORA CARLOS ENRIQUE				***CC 1065835633***	
Cargo: ***Ingeniero Residente***				*Sueldo Básico*	*2.500.000*
Sueldo		30	83.333	2.500.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	100.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	100.000
Firma del Empleado			**Total**	2.500.000	200.000
C.C.			**Neto Pagado**		2.300.000

Carlos Silva G
C.C 1065835633

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 7 correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
PINTO PEÑARANDA LUIS ANTONIO			***CC 5497679***		
Cargo: AYUDANTE DE OBRA			*Sueldo Básico*	*1.160.000*	
Sueldo		30	38.667	1.160.000	0
Auxilio Alimentación		1	323.670	323.670	0
Auxilio de Transporte		30	4.687	140.606	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	46.400
Aportes Salud Trabajador	CAJACOPI EPS			0	46.400
Préstamos				0	50.000
			Total	1.624.276	142.800
			Neto Pagado		1.481.476

Firma del Empleado

C.C.

Luis Pinto P.
5497679

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 7 correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
ZAURITH VACA YORDAN RICARDO				*CC 1065205871*	
Cargo: AYUDANTE DE OBRA				*Sueldo Básico*	*1.160.000*
Sueldo		30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte		30	4.687	140.606	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	46.400
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	46.400
Firma del Empleado			**Total**	**1.300.606**	**92.800**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.207.806**

Yordan Sourith
1065205871

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 7 correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
MAESTRE DE HOYOS DANIEL ESTIBEN				***CC 1000618630***	
Cargo: ***AYUDANTE DE OBRA***				*Sueldo Básico*	*1.160.000*
Sueldo		28	38.667	1.082.667	0
Auxilio de Transporte		28	4.687	131.232	0
Ausencias		2		0	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	43.307
Aportes Salud Trabajador	ASMET SALUD			0	43.307
Firma del Empleado			**Total**	1.213.899	86.614
C.C.			**Neto Pagado**		1.127.285

Daniel
CC 1000618630

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 7 correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
MONTERROSA HOYOS RAFAEL ANDRES				***CC 85486506***	
Cargo: ***AYUDANTE DE OBRA***				*Sueldo Básico*	*1.160.000*
Sueldo		30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte		30	4.687	140.606	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	46.400
Aportes Salud Trabajador	COOSALUD EPS-S			0	46.400
Préstamos				0	180.000
Firma del Empleado		**Total**		1.300.606	272.800
C.C.		**Neto Pagado**			1.027.806

85486506 Rafael monterrosa

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 7 correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
OROZCO CARMONA OSWALDO RAFAEL				***CC 1065583773***	
Cargo: AYUDANTE DE OBRA				*Sueldo Básico*	*1.160.000*
Sueldo		30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte		30	4.687	140.606	0
Anticipo Nómina				0	50.000
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	46.400
Aportes Salud Trabajador	COOSALUD EPS-S			0	46.400
			Total	1.300.606	142.800
			Neto Pagado		1.157.806

Firma del Empleado OSWALDO OROZCO

C.C. 1.065583773

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 7 correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
OROZCO CARMONA ALEX ALFONSO			***CC 1062399642***		
Cargo: AYUDANTE DE OBRA			*Sueldo Básico*	*1.160.000*	
Sueldo		30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte		30	4.687	140.606	0
Bonificacion No salarial		1	50.000	50.000	0
Anticipo Nómina				0	230.000
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	46.400
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	46.400
			Total	1.350.606	322.800
			Neto Pagado		1.027.806

Firma del Empleado Alex A Orozco

C.C. 1062399642

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 7 correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
ACUÑA MEJIA CARLOS MANUEL				***CC 1065641858***	
Cargo: AYUDANTE DE OBRA				*Sueldo Básico*	*1.160.000*
Sueldo		30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte		30	4.687	140.606	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	46.400
Aportes Salud Trabajador	FAMISANAR EPS CAFAM - COLSU			0	46.400
			Total	1.300.606	92.800
			Neto Pagado		1.207.806

Firma del Empleado Carlos Manuel A.

C.C. 1065641858

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 7 correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
LERMA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO				***CC 1062405187***	
Cargo: AYUDANTE DE OBRA				*Sueldo Básico*	*1.160.000*
Sueldo		30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte		30	4.687	140.606	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	46.400
Aportes Salud Trabajador	COOSALUD EPS-S			0	46.400
			Total	1.300.606	92.800
			Neto Pagado		1.207.806

Firma del Empleado 1062405187 Luis Fernando L

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 7 correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Concepto Nómina	*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
CASTILLO RODRIGUEZ KATERYN JULIETH			***CC 1065204198***	
Cargo: RESIDENTE AMBIENTAL			*Sueldo Básico*	*2.500.000*
Sueldo	30	83.333	2.500.000	0
Aportes Pension Trabajador PORVENIR S.A. AFPC			0	100.000
Aportes Salud Trabajador SANITAS EPS			0	100.000
Total			**2.500.000**	**200.000**
Neto Pagado				**2.300.000**

Firma del Empleado

C.C. 1.065.204.198

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 7 correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
DIAZ PEREZ MAYCOL RAFAEL				***CC 1065566087***	
Cargo: AYUDANTE DE OBRA				*Sueldo Básico*	*1.160.000*
Sueldo		28	36.667	1.082.667	0
Auxilio de Transporte		28	4.687	131.232	0
Ausencias				0	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC	2		0	43.307
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	43.307
			Total	1.213.899	86.614
			Neto Pagado		1.127.285

Firma del Empleado

C.C.

Maycol Diaz Perez


cc.1065566087

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 7 correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Concepto Nómina	*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
Melo Granados Maidelin del Rosario			***CC 49608585***	
Cargo: TECNICO SISO			*Sueldo Básico*	*1.700.000*
Sueldo	30	56.667	1.700.000	0
Auxilio de Transporte	30	4.687	140.606	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC		0	68.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS		0	68.000
Firma del Empleado			**Total**	1.840.606	**136.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.704.606**



CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 7 correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
PEREZ GONZALEZ SEVASTIAN				***CC 1065586511***	
Cargo: ***AYUDANTE DE OBRA***			*Sueldo Básico*		*1.160.000*
Sueldo		13	38.667	502.667	0
Auxilio de Transporte		13	4.687	60.929	0
Ausencias		17		0	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	20.107
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	20.107
			Total	563.596	40.214
Firma del Empleado			**Neto Pagado**		523.382
C.C.					

Sebastian Perez.

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 7 correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
ACUÑA MEJIA ALFONSO RAFAEL			***CC 85152050***		
Cargo: AYUDANTE DE OBRA				*Sueldo Básico*	*1.160.000*
Sueldo		19	38.667	734.667	0
Auxilio de Transporte		19	4.687	89.050	0
Incapacidades Empresa 100%		11	38.667	425.333	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	46.400
Aportes Salud Trabajador	FAMISANAR EPS CAFAM - COLSU			0	46.400
Préstamos				0	350.000
Total				1.249.050	442.800
Neto Pagado					806.250

Firma del Empleado ALFONSO ACUÑA

C.C.

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 7 correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
OROZCO CARMONA YEISON				***CC 1062399047***	
Cargo: ***AYUDANTE DE OBRA***				*Sueldo Básico*	*1.160.000*
Sueldo		30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte		30	4.687	140.606	0
Anticipo Nómina				0	142.800
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	46.400
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	46.400
				Total 1.300.606	235.600
				Neto Pagado	1.065.006

Firma del Empleado yeison 07-200

C.C. 1.062399047

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 7 correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
ZAPATA LERMAS JORGE MARIO				*CC 12490976*	
Cargo: AYUDANTE DE OBRA				*Sueldo Básico*	*1.160.000*
Sueldo		30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte		30	4.687	140.606	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	46.400
Aportes Salud Trabajador	COOSALUD EPS-S			0	46.400
Préstamos				0	150.000
			Total	1.300.606	242.800
			Neto Pagado		1.057.806

Jorge Mario Zapata

del Empleado

C. 12.490976.

CONSORCIO INFRAVIALES

Nit: 901625796

Nómina # 7 correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

BECHARA MENDOZA RICARDO JOSE — CC 1127940103

Cargo: OFICIAL DE OBRA — Sueldo Básico 1.200.000

Concepto Nómina		Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Sueldo		30	40.000	1.200.000	0
Auxilio Alimentación		30	8.333	250.000	0
Auxilio de Transporte		30	4.687	140.606	0
Auxilio Movilidad		30	1.980	59.394	0
Anticipo Nómina				0	150.000
Aportes Pension Trabajador	COLFONDOS S.A. AFPC			0	48.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	48.000
			Total	**1.650.000**	**246.000**
			Neto Pagado		**1.404.000**

Firma del Empleado

C.C.

Ricardo B.
1127940103.

Anexo de seguimiento de Obra N. 3. Control diario de equipo del contratista de obra

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO-GIP-076	FORMATO No. 6 - LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	3.0	CONSORCIO INFRAVIALES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No. 2022 04 0011 **DE** 2022

PERIODO EVALUADO

01 AL 31 DE MAYO DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Modelo	Tipo	Referencia	Período Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	001	2022	GUADAÑADORA	HUSQVARNA - 531RS	120	810	800	Engrase, limpieza y cambio de elementos deteriorados.
2	002	2022	GUADAÑADORA	HUSQVARNA - 531RS	120	810	800	Engrase, limpieza y cambio de elementos deteriorados.
3	003	2022	GUADAÑADORA	HUSQVARNA - 531RS	120	810	800	Engrase, limpieza y cambio de elementos deteriorados.
4	004	2022	GUADAÑADORA	HUSQVARNA - 531RS	120	810	800	Engrase, limpieza y cambio de elementos deteriorados.
5	005	2021	SOPLADORA DE ESPALDA	HUSQVARNA - 570 BTS	56	302	1000	Engrase, limpieza y cambio de elementos deteriorados.
6								
7								
8								

NOTAS

No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipos y/o Vehículos vinculados al Proyecto.

MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo.

REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquina, Equipos y/ Vehículo.,

TIPO : Clasificación de la Maquinaria, Equipo o Vehículo, según el trabajo que desarrolla.

Oscar Montenegro

(Firma) Javier Triana

(Nombre) Javier Triana Morales

(Responsable de Maquinaria y Equipos)

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: contratista

Anexo de seguimiento de Obra N. 4. Seguimiento financiero del avance de obra

FORMATO

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y DE EJECUCION

CONSORCIO INFRAVIALES

SUBDIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No 2022 04 0011 - GOB CESAR (Número de Contrato) **FECHA** 31 DE MAYO DE 2023

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

(Indique el objeto del contrato de ejecución sucrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIALES (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTORIA DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISION ING. MARIA GRABRIELA RUMBO (Escriba el nombre del Supervisor)

B. SEGUIMIENTO AL CONTRATO / RELACIÓN DE PAGOS

1 al 31 de Mayo de 2023

	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
VALOR EJECUTADO	0,77%	3,38%	3,79%	38,28%	3,06%	1,96%			
% EJECUTADO	$ 20.605.040,99	$ 90.448.102,00	$ 101.546.313,72	$ 1.024.456.896,00	$ 81.920.319,00	$ 52.338.627,00			
VALOR ACUMULADO	0,77%	4,15%	7,94%	46,23%	49,29%	51,25%			
% ACUMULADO	$ 20.605.040,99	$ 111.053.142,98	$ 212.599.456,70	$ 1.237.056.352,70	$ 1.318.976.671,70	$ 1.371.315.298,70			

Relación de pagos

RELACIÓN ACTAS	FECHA	VALOR ACTA	COMPROBANTE DE EGRESO	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	SALDO POR PAGAR
ACTA No. 1	17/03/2023	$ 212.599.456,70	310 del 05 may. 2023	3941 del 02 may. 2023	17/05/2023	$ 2.463.379.892,30
ACTA No. 2	27/04/2023	$ 1.024.456.896,00	334 del 12 may. 2023	5069 del 12 may. 2023	19/05/2023	$ 1.438.922.996,30

Javier Triana

(Firma)
Nombre del Representante Legal Javier Triana Morales
Director de Obra - Consorcio Infraviales

Oscar Montenegro

Anexo de seguimiento de Obra N. 5. Estado general del tiempo

CONSORCIO INFRAVIALES	CONSORCIO INFRAVIALES ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA	2	DE	MAYO

FECHA: 0 2 (Día) | 0 6 (Mes) | 20 23 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DE CESAR

CONTRATO DE OBRA No: 2022 04 0011 - GOB CESAR **CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAVIALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-23 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CESAR

SECTOR: RAMAL A PUEBLO BELLO; RAMAL A CANDELARIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	17	24	24	24	24	24	24	24	24	24	14	24	16	717
Lluvias moderadas							2												3										3		5	13
Lluvias intensas																			4										7		3	14
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CARLOS ENRIQUE SILVA GONGORA
Residente de Obra
Matrícula No.: 20202-421121 CES

Firma Oscar Montenegro
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo de seguimiento de Obra N. 6. CONTROL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

CONTROL DE PERSONAL	Versión	Código
Vigencia a partir de 14/07/2016	01	FE-24

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 1 DE ABRIL DE 2023 Y EL 30 DE ABRIL DE 2023 PLAZO: 8 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAVIALES CONTRATO No. 2022 04 0011 - GOB CESAR

INTERVENTOR: DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S FRENTE: PUEBLO BELLO; EL PERRO - LOS VENADOS - GUAIMARAL

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA		MES	MARZO																													OBSERVACIONES
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO	NOMBRE/APELLIDO																																	
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER TRIANA MORALES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
INGENIERO RESIDENTE	CARLOS ENRIQUE SILVA GONGORA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TECNICO SISO	MAYDELIS DEL ROSARIO MELO MEJIA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
INGENIERO AMBIENTAL	KATERYN CASTILLO RODRIGUEZ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OFICIAL DE OBRA	RICARDO JOSE BECHARA MENDOZA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS MANUEL ACUÑA MEJIA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	RAFAEL ANDRES MONTERROSA HOYOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	HERNAN DARIO HERNANDEZ FUENTES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AYUDANTE DE OBRA	JORGE MARIO ZAPATA LERMAS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	LUIS ANTONIO PINTO PEÑARANDA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	ALEX ALFONSO OROZCO CARMONA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	YEISON OROZCO CARMONA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	LUIS FERNANDO LEMA RODRIGUEZ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	ALFONSO RAFAEL ACUÑA MEJIA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	YORDAN RICARDO SADITH BACCA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	MAYCOL RAFAEL DIAZ PEREZ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	OSWALDO RAFAEL OROZCO CARMONA		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	DIDIER CARDENAS VIZCAINO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AYUDANTE DE OBRA	DANIEL ESTIBEN MAESTRE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	LUIS EDUARDO SIERRA GARCIA		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AYUDANTE DE OBRA	JUAN JOSE PIMIENTA ZUAREZ		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AYUDANTE DE OBRA	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ ESTRADA		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AYUDANTE DE OBRA	DAIRO AUGUSTO OROZCO CARRANZA		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AYUDANTE DE OBRA	JOSE CARLOS OSPINA ESTRADA		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AYUDANTE DE OBRA	JOSE IVAN MELO VILLALOBOS		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AYUDANTE DE OBRA	SEVASTIAN PEREZ GONZALEZ		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	JAIRO ENRIQUE TORRES ZAPATA		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AYUDANTE DE OBRA	MIGUEL ANGEL ARIAS VASQUEZ		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PERSONAL			27	27	27	18	18	18	18	19	19	19	18	19	19	19	19	19	19	20	20	18	18	18	18	17	18	18	18	18	18	18	18	TOTAL PERIODO 597

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																															SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																																0	0,00%	
De la región	8	8	8	8	8	8	8	11	19	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0	455	76,21%	
De fuera de la región	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	104	17,42%	
MANO OBRA CALIFICADA																																0	0,00%	
De la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
De fuera de la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																																0	0,00%	
De la región	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	81	13,57%	
De fuera de la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	5,03%	
POBLACIÓN VULNERABLE																																0	0,00%	
En proceso de reinserción social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
En condición de desplazamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
MUJERES																																0	0,00%	
Mano de Obra no Calificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Mano de Obra Calificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	51	8,54%	
PROVEEDORES																																		
Local																																		
Nacional	TODOS																																	
Internacional																																		

COMENTARIOS:

Firma:

Nombre: Javier Triana Morales

DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO INFRAVIALES

Oscar Montenegro

Anexo de seguimiento de Obra N. 7. Revisión y verificación de pagos de aporte a la seguridad social y parafiscal del contratista de obra

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901625796-5	CONSORCIO INFRAVIALES		Cra 57 160 15	3166229882	admonbe2c@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	27/06/2023	68857344	$8.184.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	80.500	0		0		0	1	100	0	80.600	3
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	113.100	0		0		0	1	200	0	113.300	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	100.000	0		0		0	1	200	0	100.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	48.400	0		0		0	1	100	0	48.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	96.000	0		0		0	1	200	0	96.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	313.700	0		0		0	1	400	0	314.100	7
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	51.100	0		0		0	1	100	0	51.200	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	4.700	0		0		0	1	100	0	4.800	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	185.600	0		0		0	1	300	0	185.900	4
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	43.400	0		0		0	1	100	0	43.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	336.000	0	0	0	0	1	400	0	336.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	3.101.600	0	0	0	0	1	3.700	0	3.105.300	17
231001	Colfondos	800227940-6	600.600	0	0	0	0	1	700	0	601.300	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	383.700	0	0	0	0	1	500	0	384.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.695.900				1.695.900	1	2.000	1.697.900			16.959	1.697.900	28

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	971.000	1	1.200	972.200	27
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	48.400	1	100	48.500	1

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901625796-5	CONSORCIO INFRAVIALES	Cra 57 160 15	3166229882	admonbe2c@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	27/06/2023	68857344	$8.184.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	1.036.500	1.038.300
Pensión	4	4.421.900	4.427.200
Riesgos Laborales	1	1.695.900	1.697.900
CCF	2	1.019.400	1.020.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	8.173.700	8.184.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901625796-5	CONSORCIO INFRAVIALES		Cra 57 160 15	3166229882	admonbe2c@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	27/06/2023	68857344	$8.184.100	

LE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1000816630	MAESTRE DE HOYOS DANIEL ESTIBEN	1	0			S																	230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	ESSC62	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	5	75.400	CCF15	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
1000816630	MAESTRE DE HOYOS DANIEL ESTIBEN	1	0			S									X								230301	77.334	12.400	0	0	0	0	ESSC62	77.334	0	14-11	77.334	5	0	CCF15	77.334	0	0	0	0	0
1062397070	HERNANDEZ FUENTES HERNAN DARIO	1	0			S		X															230201	773.334	123.800	0	0	0	0	CCFC55	773.334	31.000	14-11	773.334	5	53.900	CCF15	773.334	31.000	0	0	0	0	0
1062399047	OROZCO CARMONA YEISON	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF15	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
1062399642	OROZCO CARMONA ALEX ALFONSO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF15	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
1062405187	LERMA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF15	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
1063955949	PIMIENTA ZUAREZ JUAN JOSE	1	0			S		X															231001	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS041	116.000	4.700	14-11	116.000	5	8.100	CCF15	116.000	4.700	0	0	0	0	0
19707499	SIERRA GARCIA LUIS EDUARDO	1	0			S																	231001	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS002	116.000	4.700	14-11	116.000	5	8.100	CCF15	116.000	4.700	0	0	0	0	0
19707499	SIERRA GARCIA LUIS EDUARDO	1	0			S									X								231001	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS002	1.044.000	0	14-11	1.044.000	5	0	CCF15	1.044.000	0	0	0	0	0
1065586511	PEREZ GONZALEZ SEVASTIAN	1	0			S																	230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS037	618.667	24.800	14-11	618.667	5	43.100	CCF15	618.667	24.800	0	0	0	0	0
1065586511	PEREZ GONZALEZ SEVASTIAN	1	0			S									X								230301	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS037	541.334	0	14-11	541.334	5	0	CCF15	541.334	0	0	0	0	0
1003115707	ARIAS VASQUEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S	X	X															230301	77.334	12.400	0	0	0	0	CCFC55	77.334	3.100	14-11	77.334	5	5.400	CCF15	77.334	3.100	0	0	0	0	0
1065127541	TORRES ZAPATA JAIRO ENRIQUE	1	0			S	X	X															25-14	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS017	77.334	3.100	14-11	77.334	5	5.400	CCF15	77.334	3.100	0	0	0	0	0
1065566087	DIAZ PEREZ MAYCOL RAFAEL	1	0			S																	231001	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS037	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	5	75.400	CCF15	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
1065566087	DIAZ PEREZ MAYCOL RAFAEL	1	0			S									X								231001	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS037	77.334	0	14-11	77.334	5	0	CCF15	77.334	0	0	0	0	0
1065583773	OROZCO CARMONA OSWALDO RAFAEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF15	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
1063946798	OSPINO ESTRADA JOSE CARLOS	1	0			S		X															230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS002	116.000	4.700	14-11	116.000	5	8.100	CCF15	116.000	4.700	0	0	0	0	0
1063953056	OROZCO CARRANZA DAIRO AUGUSTO	1	0			S		X															231001	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS002	116.000	4.700	14-11	116.000	5	8.100	CCF15	116.000	4.700	0	0	0	0	0
1063956293	RODRIGUEZ ESTRADA JULIO ALBERTO	1	0			S		X															230201	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS037	116.000	4.700	14-11	116.000	5	8.100	CCF15	116.000	4.700	0	0	0	0	0
1065204198	CASTILLO RODRIGUEZ KATERYN JULIETH	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF15	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
12646764	MELO VILLALOBOS JOSE IVAN	1	0			S		X															230301	116.000	18.600	0	0	0	0	ESSC07	116.000	4.700	14-11	116.000	5	8.100	CCF15	116.000	4.700	0	0	0	0	0
49608585	MELO GRANADOS MAYDELIN DEL ROSARIO	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	118.400	CCF15	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
5497679	PINTO PEÑARANDA LUIS ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	CCFC55	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF15	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
85152050	ACUÑA MEJIA ALFONSO RAFAEL	1	0			S																	25-14	734.667	117.600	0	0	0	0	EPS017	734.667	29.400	14-11	734.667	5	51.200	CCF15	734.667	29.400	0	0	0	0	0
85152050	ACUÑA MEJIA ALFONSO RAFAEL	1	0			S										X							25-14	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS017	425.334	17.100	14-11	425.334	5	0	CCF15	425.334	0	0	0	0	0
85486506	MONTERROSA HOYOS RAFAEL ANDRES	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF15	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
1073171773	AREVALO ACOSTA DIEGO FERNANDO	1	0			S																	230201	1.210.000	193.600	0	0	0	0	EPS008	1.210.000	48.400	14-11	1.210.000	1	6.400	CCF24	1.210.000	48.400	0	0	0	0	0
1065205871	SAURITH BACCA YORDAN RICARDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF15	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
1065841858	ACUÑA MEJIA CARLOS MANUEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF15	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
1065835633	SILVA GONGORA CARLOS ENRIQUE	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF15	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
1082816516	CARDENAS VIZCAINO DIDIER IZAFETH	1	0			S		X															230301	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS002	773.334	31.000	14-11	773.334	5	53.900	CCF15	773.334	31.000	0	0	0	0	0
1127940103	BECHARA MENDOZA RICARDO JOSE	1	0			S																	231001	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS037	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	5	83.600	CCF15	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
12480976	ZAPATA LERMAS JORGE MARIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF15	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901625796-5	CONSORCIO INFRAVIALES		Cra 57 160 15	3166229882	admonbe2c@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	Y	27/06/2023	68506615	$412.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	1	200	0	145.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	1	300	0	185.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	80.800				80.800	1	100	80.900			808	80.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.200
Pensión	1	185.600	185.900
Riesgos Laborales	1	80.800	80.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	411.400	412.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901625796-5	CONSORCIO INFRAVIALES		Cra 57 160 15	3166229882	admonbe2c@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	Y	27/06/2023	68506615	$412.000	

LE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1020756779	TRIANA MORALES JAVIER ENRIQUE	59	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	60.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXOS DE INTERVENTORÍA

Anexo de Interventoría N. 1. Control diario del personal de interventoría.

LO HACEMOS MEJOR GOBIERNO DEL CESAR	PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 30 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DEL CESAR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: MAYO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2022-05-0021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIA DE VIAS EN EL CESAR

INTERVENTOR: DAM SOLUCIONES E INGENIERIA **SECTOR:**

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
JOSE LUIS STTAPPER SEGRERA	DIRECTOR INTERVENTORIA						1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1													
OSCAR MAURICIO MONTENEGRO RODRIGUEZ	RESIDENTE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	
CARLOS CABANA BRITTO	INSPECTOR	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma OSCAR MONTENEGRO R.
Nombre: Oscar Montenegro Rodriguez
Residente de Interventoría

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo de Interventoría N. 2. Relación de pago nómina de empleados de interventoría

DAM SOLUCIONES E INGENIERIA		DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS			
		NIT: 900.503.599-3			
ITEM	1	PERIODO:	01 AL 31 DE MAYO 2023		
DESPRENDIBLE					
DATOS DEL EMPLEADO					
CEDULA	79.724.383		SUELDO:	$ 1.946.769	
NOMBRE	JOSE LUIS STEPPER SEGRERA		CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
PAGOS			DESCUENTOS		
CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
	SUELDO	$ 1.946.769		SALUD	$ -00
	TRANSP			PENSIONES	$ -00
	INCAPACIDAD 100%	$ -00		F.S.P	$ -00
	INCAPACIDAD 66,67%	$ -00		RETEFUENTE	$ 116.806
	VACACIONES			RETE ICA	$ 16.859
	H.EXTRAS	$ -00			
	PRIMA				
	INT. CESANTIAS				
	BNCS	$ -00			
	TOTAL PAGOS	$ 1.946.769		TOTAL DESCUENTOS	$ 133.665
	NETO A PAGAR	$ 1.813.104			
				MONICA GIRALDO MEJIA	
FIRMA				DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	
DIAS LABORADOS		31		DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS	

SOLUCIONES E INGENIERIA		DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS			
		NIT: 900.503.599-3			
ITEM	1	PERIODO:	01 AL 31 DE MAYO 2023		
DESPRENDIBLE					
DATOS DEL EMPLEADO					
CEDULA	79.724.383		SUELDO:	$ 1.946.769	
NOMBRE	CARLOS CABANA BRITTO		CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
PAGOS			DESCUENTOS		
CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
	SUELDO	$ 1.800.000		SALUD	$ 72.000
	TRANSP	$ 117.172		PENSIONES	$ 72.000
	INCAPACIDAD 100%	$ -00		F.S.P	$ -00
	INCAPACIDAD 66,67%	$ -00		RETEFUENTE	$ -00
	VACACIONES			RETE ICA	$ -00
	H.EXTRAS	$ -00			
	PRIMA				
	INT. CESANTIAS				
	BNCS	$ -00			
	TOTAL PAGOS	$ 1.917.172		TOTAL DESCUENTOS	$ 144.000
	NETO A PAGAR	$ 1.773.172			
			Monica Giraldo Mejia		
			MONICA GIRALDO MEJIA		
FIRMA			DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO		
DIAS LABORADOS		31	DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS		

DAM SOLUCIONES E INGENIERIA		DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS			
		NIT: 900.503.599-3			
ITEM	1	PERIODO:	01 AL 31 DE MAYO 2023		
DESPRENDIBLE					
DATOS DEL EMPLEADO					
CEDULA	79.724.383		SUELDO:	$ 1.946.769	
NOMBRE	OSCAR MAURICIO MONTENEGRO		CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
PAGOS			DESCUENTOS		
CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
	SUELDO	$ 3.800.000		SALUD	$ 152.000
	TRANSP			PENSIONES	$ 152.000
	INCAPACIDAD 100%	$ -00		F.S.P	$ -00
	INCAPACIDAD 66,67%	$ -00		RETEFUENTE	$ -00
	VACACIONES			RETE ICA	$ -00
	H.EXTRAS	$ -00			
	PRIMA				
	INT. CESANTIAS				
	BNCS	$ -00			
	TOTAL PAGOS	$ 3.800.000		TOTAL DESCUENTOS	$ 304.000
	NETO A PAGAR	$ 3.496.000			
				MONICA GIRALDO MEJIA	
FIRMA				DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	
DIAS LABORADOS		31		DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS	

Anexo de Interventoría N. 3. Revisión y verificación de pagos de aporte a la seguridad social y parafiscal de interventoría

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900311008-8	SYM INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA LTDA	CLL 11 No 8-54 OF. 206	3125302542	SYMINGENIERIA1@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	JLSS / JLSS	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E		68489607	$360.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	46.400	0		0		0	3	200	0	46.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	3	700	0	186.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	80.800				80.800	3	300	81.100			808	81.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	46.400	3	200	46.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	46.600
Pensión	1	185.600	186.300
Riesgos Laborales	1	80.800	81.100
CCF	1	46.400	46.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	359.200	360.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900311008-8	SYM INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA LTDA	CLL 11 No 8-54 OF. 208	3125302542	SYMINGENIERIA1@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	JLSS / JLSS	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-06	2023-05	E		68489607	$360.600

LE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No. de dentificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
79724383	STAPPER SEGRERA JOSE LUIS	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

L:	NIT	900503599	
	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
	CALLE 64 G BIS N 85 J 42	4764358	
	01-EMPLEADOR	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429	
	PRIVADA	Construcción de otras obras de ingeniería civil.	
N:	ÚNICO		
PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DEPARTAMENTO:		TELÉFONO:		CLASE APORTANTE:	
ACTIVIDAD ECONOMICA:					

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7887968839			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			11				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/07/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			32957690

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
91- PROTECCION	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 0	$ 480.000	$ 6.100	$ 486.100
									$ 480.000	**$ 6.100**	**$ 486.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 120.000	$ 1.600	$ 0	$ 121.600
												$ 120.000	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 121.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 208.800	$ 208.800	$ 2.700	$ 0	$ 211.500
								$ 208.800	**$ 2.700**	**$ 0**	**$ 211.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
22-COLSUBSIDIO	1	$ 120.000	$ 1.600	$ 121.600
		$ 120.000	**$ 1.600**	**$ 121.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
PEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000

SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000

ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800

PARAFISCALES	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	30	$ 3.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 940.800

Planilla Pagada

en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
00503599	3	DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CRA 7 180 30 OF 507	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2516320	Si

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
04	2023-05	2105307455	9451471762	E	2023/05/24	2023/05/29	BANCOLOMBIA	5	$1,059,400

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
rsal: COLSUBSIDIO (2 Afiliados)					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$236,700		$0	$0
ro de Trabajo: VALLEDUPAR - CESAR (2 dos)					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$236,700		$0	$0
d: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$236,700		$0	$0
CC	1065837309	CABANA CARLOS	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,600	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
CC	1003994661	FAJARDO DANIELA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS041	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
al Afiliados(2)					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$236,700		$0	$0

en línea

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
00503599	3	DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CRA 7 180 30 OF 507	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2516320	Si

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
04	2023-05	2105307455	9451471762	E	2023/05/24	2023/05/29	BANCOLOMBIA	5	$1,059,400

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 2)				2	$544,000	$3,400	$0	$547,400
ORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$1,600	$0	$257,600
ROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$1,800	$0	$289,800
(ADMINISTRADORAS: 1)				2	$236,700	$1,500	$0	$238,200
OLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$236,700	$1,500	$0	$238,200
(ADMINISTRADORAS: 1)				2	$136,000	$900	$0	$136,900
OLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$136,000	$900	$0	$136,900
(ADMINISTRADORAS: 2)				2	$136,000	$900	$0	$136,900
IUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$72,000	$500	$0	$72,500
IUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$64,000	$400	$0	$64,400
TAL				2	$1,052,700	$6,700	$0	$1,059,400

Anexo de Interventoría N. 4. Informe PMT

SOLUCIONES E INGENIERIA

Bogotá D. C., 10 de junio de 2023

Señores:
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Referencia: CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Asunto: CERTIFICACION DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO N. 6 DEL CONTRATO DE OBRA No. 2022 04 0011

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, en cumplimiento a las obligaciones específicas del contrato en referencia, esta interventoría certifica que el contratista CONSORCIO INFRAVIALES cumple con lo descrito en el plan de manejo de tránsito, en el tramo tramos Ramal- Pueblo Bello, Mandinguilla- Dios me ve, Ramal a candelaria, Ramal a Simaña, Tamalameque – Antequera, La Raya – Zapatosa, donde se realizan actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto generado en las condiciones normales de movilización y desplazamientos de usuarios (peatones, vehículos, ciclistas y comunidad en general) causados por la ejecución vial, buscando así garantizar la seguridad y bienestar de quienes participan en la obra en ejecución y de la ciudadanía en general.

Atentamente,


JOHANNA I. LÓPEZ TINOCO
Representante legal
DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORÍA CTO 2022 05 0021


Cra 7 N. 180 - 30 Oficina 507
Bogotá
Tel. (1) 8058201
damsoluing@gmail.com

ANEXO FOTOGRAFICO PMT

RAMAL – PUEBLO BELLO



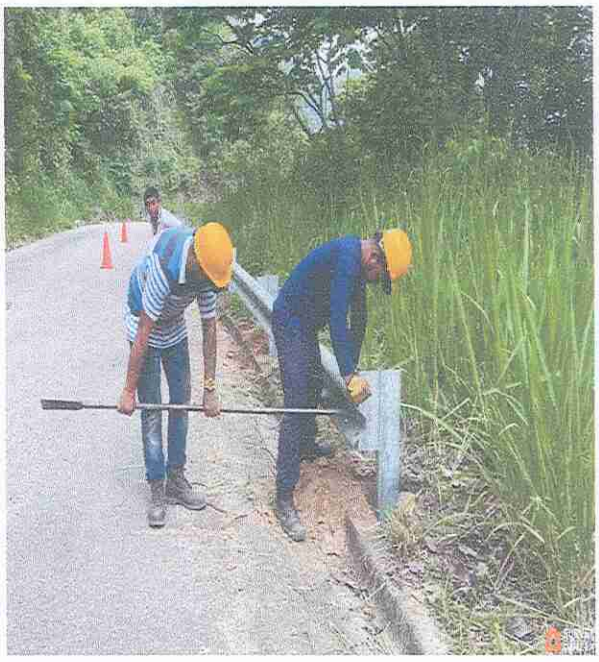


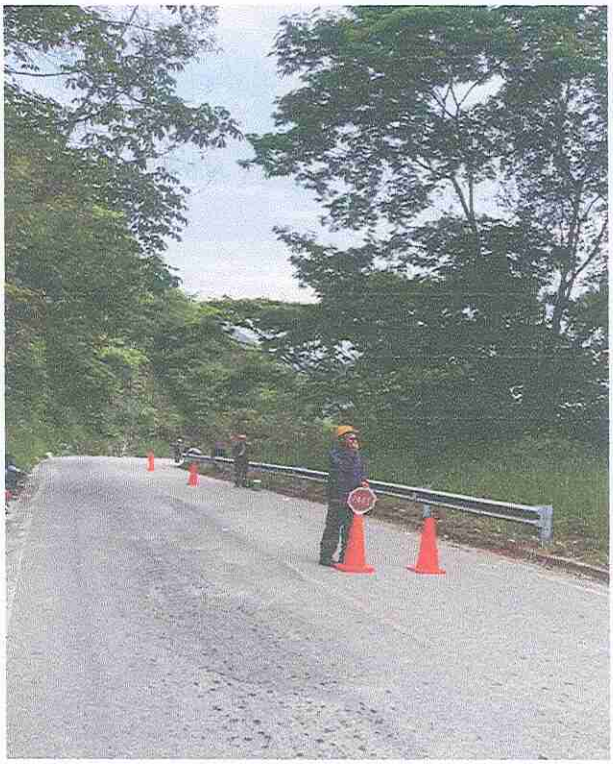




RAMAL – LA CANDELARIA



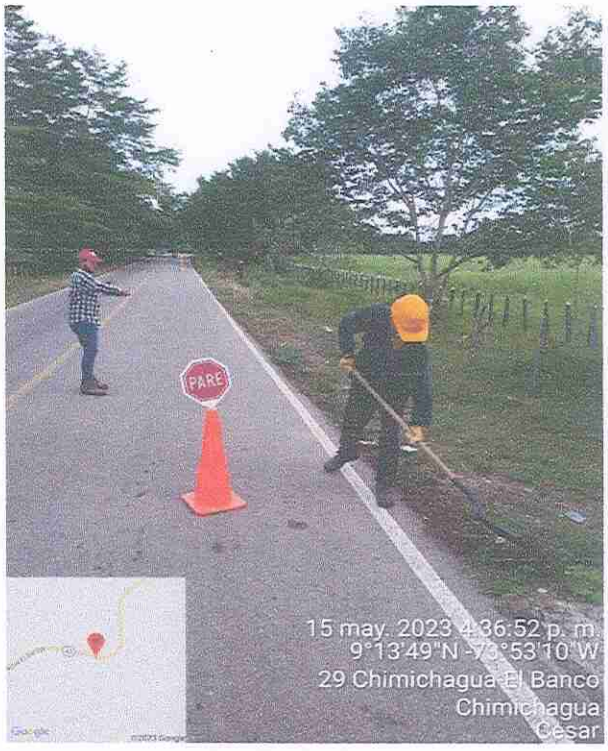

TAMALAMEQUE – ANTEQUERA

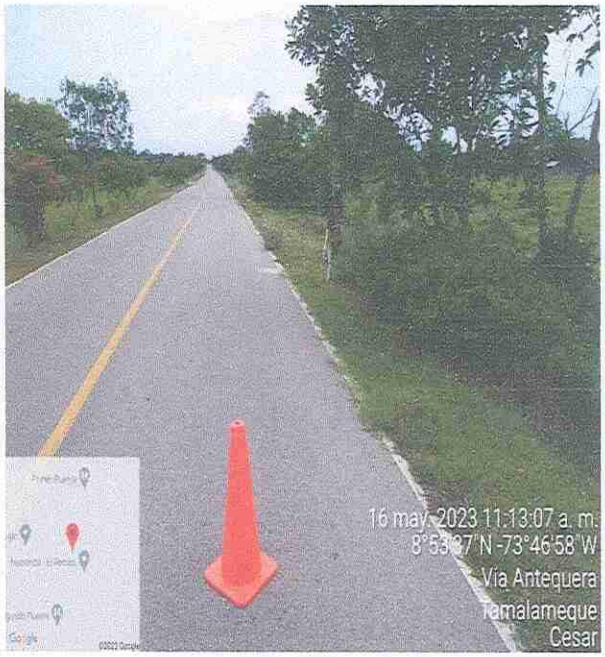




RAMAL – SIMAÑA



LA RAYA – ZAPATOSA

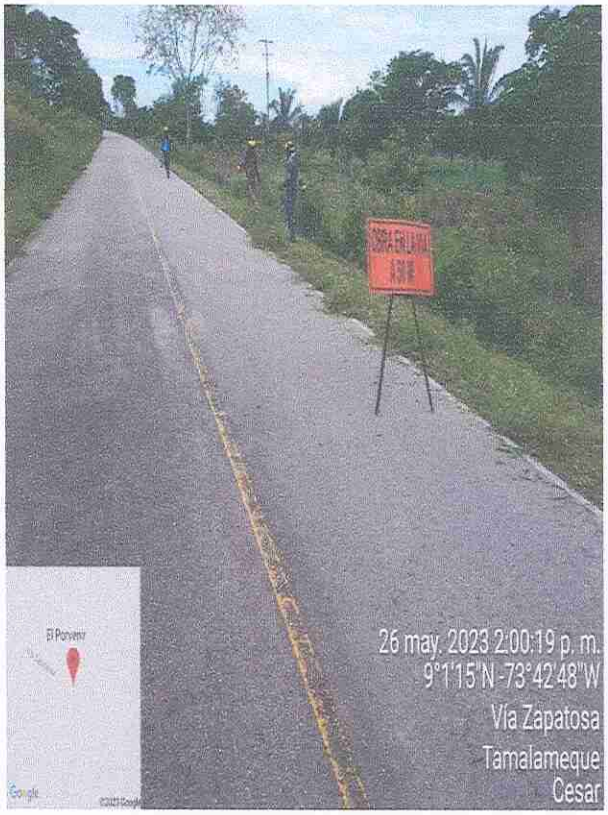



Anexo de Interventoría N. 6. Correspondencia

SOLUCIONES E INGENIERIA

Bogotá D. C., 4 de mayo de 2023

INT-DAM-005-021-2022-032

Señores:
GOBERNACIÓN DEL CESAR
ESTHER MENDOZA PEINADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Atn: Ing. MIGUEL ANTONIO MORALES LASCANO
Profesional de apoyo a la supervisión
Valledupar- Cesar

Referencia: CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Asunto: Traslado programación actualizada según modificatoria del contrato de obra No 2022040011 Cuyo objeto es: *"(...) MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. (...)"*

Respetados señores:

Con la presente me permito remitir la programación actualizada según modificatoria del contrato, una vez radicado por el contratista mediante comunicado *OP-C-GOBCS-22-046con Asunto: REMISIÓN PROGRAMACION ACORDE AL MODIFICATORIO.*, y del mismo modo revisado y aprobado el documento del asunto, nos permitimos dar traslado de este.

Atentamente,

JOHANNA I. LÓPEZ TINOCO
Representante legal
DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORÍA CTO 2022 05 0021

Reviso y Verifico: *ING. JOHANNA I. LÓPEZ TINOCO – Representante Legal*

Con copia: *CONSECUTIVO CONTRATO*

Anexo: *Remisión programación modificatoria del contrato en (1) folios.*

Cra 7 N. 180 - 30 Oficina 507
Bogotá
Tel. (1) 8058201
damsoluing@gmail.com

Anexo de Interventoría N. 7. Bitácora de obra

- 3 de mayo 2023
Asistencia: 10 Ayudantes
* mandinguilla - dios me ve'
Rocería k0+000m - k1+000m (2000m) ambos lados
limpieza cunetas en concreto k0+000m - k0+070m ambos lados
limpieza de 3 alcantarillas sencillas y 1 doble.

* Ramal a pueblo bello.
Instalación defensa metalica
k9+590 - k9+624 (34,2m)
k10+050 - (34,2m)

- 4 de mayo 2023
Asistencia: 10 Ayudantes.
*mandinguilla - dios me ve'
Rocería k1+000 - k3+000m lado izquierdo (2000m)
limpieza de alcantarillas: 2 sencillas y 1 doble con encoles y descoles
Poda.

*Ramal a pueblo bello
Instalación de defensa metálica
k25+000m hasta k25+144m (144,4m)
k27+740 - k27+759m (19m)

- 5 de mayo 2023
Asistencia : 10 Ayudantes
* mandinguilla - dios me ve'
Roceria k1+000m - k3+000m lado derecho (2000m)
limpieza de bermas : 1000m
Poda

* Ramal a pueblo bello.
Instalacion defensa metalica
k22+499m - k22+575m (76m)
k23+599m - k23+625m (26.6m)

- 6 de mayo 2023
Asistencia : 10 Ayudantes.
* Mandinguilla - dios me ve'
Roceria k3+000m - k3+600m ambos lad (1200m)
Limpieza de bermas y poda.

* Ramal a pueblo bello.
Instalacion defensa metalica
k21+947m - k22+020m (72.20m)

- 8 de mayo 2023
Asistencia : 10 Ayudantes
* Mandinguilla - dios me ve'
Roceria k3+600m - k5+000m lado derech
k3+600m - k5+100m (2.9km)
limpieza de bermas y poda

* Ramal a pueblo bello.
Nivelacion e instalacion de captafaro en defensas metalicas instaladas.

- 9 de mayo 2023
Asistencia: 10 Ayudantes
* Mandinguilla - dios me ve'
Roceria k5+000m - k6+400m lado derecho
(1.4km)
k5+400m - k7+100m (2km) lado izq.
limpieza de bermas y poda

- 10 de mayo 2023
Asistencia: 10 Ayudantes
* Tramo ramal a simuña
Roceria k0+000m - k1+500m (ambos lados)
(3km) Terminado.

* Mandinguilla - dios me ve'
limpieza de bermas

* Ramal a pueblo bello.
Excavacion para instalacion de rellus.

- 11 de mayo 2023
Asistencia: 10 Ayudantes
* Mandinguilla - dios me ve'
Roceria k6+400m - k8+000m lado der.
(1.6km)
k7+100m - k8+400m lado izq. (1.3km)
limpieza de bermas

* Ramal a pueblo bello.
Instalacion de defensas metalicas
27 laminas instaladas 140.6 metros.

- 12 de mayo de 2023
Asistencia: 10 Ayudantes
* mandinguilla - dios me ve'
Roceria K8+000m - K8+800m lado derecho.
K8+400m - K8+800m lado izquierdo
(1.2km)
limpieza de berma
Tramo terminado.
Recibe inspector.

- 15 de mayo de 2023
Asistencia: 10 Ayudantes
Tramo Ramal a candelaria
Roceria K0+000m - K1+800m (3.6km)
ambos lados
limpieza de bermas (1080m²)
Tramo terminado.
Recibe Inspector.

15-05-23
Se dan por terminadas las actividades
- limpieza de zona no boscosa
- limpieza de bermas
- limpieza de cunetas en concreto (donde aplica)
- limpieza de alcantarillas, tubos
- limpieza de encoles y descoles

En los tramos
- Mandinguilla - dios me ve' 8.8 km
- Ramal a candelaria 1.8 km
- Ramal a simaña 1.4 km

Se realiza entrega y recibido al inspector de interventoría carlos cabana.

Firmas:

Residente de obra
Carlos Silva

Inspector Interventor
Carlos Cabana.

- 16 de mayo de 2023
Asistencia 10 Ayudantes
* Tramo rumual a simaña
Limpieza de bermas k0+000m - k1+400m ambos lados (2800m)
* Tramo tamalameque - antequera
Poceria k3+500m - k1+400m (2.1km) lado derecho
Tramo simaña terminado.

OMME Ps Interventoria

- 17 de mayo de 2023
Asistencia 10 Ayudantes
* Tamalameque - antequera
Poceria k0+000m - k1+400m ambos lados (2.8km)
Limpieza de alcantarillas: 4
Encoles y descoles 40 metros.

OMME Ps Interventoria

- 18 de mayo de 2023
Asistencia 10 Ayudantes
* Tamalameque - antequera
Poceria k1+400m - k3+500m lado izquierdo (2.1km)
Limpieza de alcantarillas: 3
Encoles y descoles 30 metros.

Terminado tramo tamalameque.

OMME Ps Interventoria

- 19 de mayo de 2023
Asistencia 10 Ayudantes
* Tramo la raya - Zapotana
Roceri K12+400 - K13+500 lado derecho (1.1 km)
limpieza de alcantarillas 2.
limpieza de encoles y descoles 20m.
limpieza de cunetas en concreto 40m

OMMP Rs Intervention

- 20 de mayo de 2023
Asistencia 10 Ayudantes
* Tramo la raya - Zapotana
Roceri K12+900 - K13+500 lado izquierdo (1.0km).
limpieza de bermas.

OMMP Rs Intervention

- 23 de mayo de 2023
Asistencia 10 Ayudantes
* Tramo la raya - Zapotana
Roceri K10+800 - K12+400 lado derecho (1.6km)
limpieza de bermas
Poda de arboles

OMMP Rs Intervention

- 24 de mayo de 2023
Asistencia 10 Ayudantes
* Tramo la raya - Zapotana
Roceri K10+900 - K12+400 lado izquierdo (1.5km)
limpieza de bermas
poda de arboles.

OMMP Rs Intervention

- 25 de mayo de 2023
Asistencia 10 Ayudantes
Tramo: la raya - Zapatosa
Poceni k10+800 - k10+000m
lado derecho (0.8km)
limpieza de bermas
Poceni k10+000 - k10+800 (0,8km)
lado izquierdo
Poda de arboles

- 26 de mayo de 2023
Asistencia 10 Ayudantes
Tramo: la raya - zapatosa
Poceni k10+000 - k8+200
lado derecho (1.8km) Poda.

- 27 de mayo de 2023
Asistencia 10 Ayudantes
Tramo la raya - zapatosa
Poceni k9+400m - k8+200m
lado izquierdo (1.2km)
Poda de arboles.

- 29 de mayo de 2023
Asistencia 7 Ayudantes
Tramo la raya - zapatosa
Poceni k6+900 - k.8+400m (1.5km)
lado derecho.

- 30 de mayo de 2023
Asistencia 7 Ayudantes
Tramo la raya - Zapatosa
Poceni k6+900 - k6+600m (0.3k
lado derecho
k6+600 - k8+800m (1.2km).

31 de mayo de 2023

Tramo la nuya - Zipacho su

Poceri

K5+800 - K6+600m (0,8km)

K7+800 - K8+200m (0,4km)

K9+400 - K10+000m (0,6km)

Lado izquierdo

K5+700 - K6+600 (0,9km)

Total (2,7km)

ONVIF Dirección Intercentro

Powered by CamScanner

Anexo de Interventoría N. 8. Informes semanales

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CÓDIGO: CCE-EICP-IDI-22	VERSIÓN: 01
LO HACEMOS MEJOR	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INFRAVIALES — CONTRATO No: 2022 04 0011

INTERVENTORIA: DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS — CONTRATO No: 2022 05 0021

Semana Número: 20 — Del: 1 5 2023 — Al: 6 5 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 123 Dias

Supervisor Contrato de Interventoría: MARIA GABRIELA RUMBO, SAID LOZANO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINRIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6,44%	28,76%
Valor básico de la Obra	$ 172.333.070,00	$ 769.611.661,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Fisica Ejecutada (%)	1,21%	50,50%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 32.277.201,00	$ 1.351.253.872,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	Consorcio Infraviales
Contrato No.	2022 04 0011
Valor Inicial:	$ 2.675.979.349,00
Valor Actualizado:	$ 2.675.979.349,00
Plazo Inicial:	Ocho (8) meses
Plazo Actualizado:	Ocho (8) meses
Fecha de Iniciación:	06 de Diciembre del 2022
Fecha de Vencimiento:	06 de agosto del 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS
Contrato No.	2022 05 0021
Valor Inicial:	$ 198.623.292,00
Valor Actualizado:	$ 198.623.292,00
Plazo Inicial:	Ocho (8) meses
Plazo Actualizado:	Ocho (8) meses
Fecha de Iniciación:	06 de Diciembre del 2022
Fecha de Vencimiento:	06 de agosto del 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana N°20 se iniciaron las siguientes actividades en el segmento Mandinguilla - Dios me ve

Se realizaron 150 poda de la parte aerea de los arboles tipo IV (no incluye transporte)

Se realizaron 7200 metros de desmonte y limpieza de zona no boscosa, roceria

Se realizaron 1600 metros de limpieza de bermas con un ancho promedio de 24 cm

Se realizaron 9 limpiezas a mano de alcantarillas de tubo de 600mm y 900mm

Se realizaron 70 metros de limpieza a mano de encoles y descoles de alcantarillas

Se realizaron 180 metros de limpieza de cunetas en concreto

En la semana N°20 se iniciaron las siguientes actividades en el segmento Via nacional - Pueblo bello

Se instalaron 456 metros de defensa metalica

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

-Se tomó registro climatico de la semana

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

-Acta de inicio de intervencionde obra: 6 de Diciembre 2022.
-Inicio intervencion primer segmento Callao - Los calabazos (19 de Diciembre 2022)
-Inicio intervencion segundo segmento Ramal- Pueblo Bello(28 de Diciembre 2022)
-Inicio intervencion tercer segmento San Diego - Las Pitillas (26 de Enero 2023)
-Inicio intervencion cuarto segmento San Diego - Los Tupes (30 de Enero 2023)
-Inicio intervencion quinto segmento San Diego - Media Luna (6 de Febrero 2023)
-Inicio de intervencion sexto segmento Patillal - Tzemuake (27 de Febrero de 2023)
Inicio de intervencion septimo segmento Atanquez - Guatapuri (6 de marzo de 2023)
-Inicio de intervencion octavo segmento Subramal - Chemesquemena (6 de marzo de 2023)
-Inicio de intervencion de noveno segmento Los venaos - El perro (13 de marzo de 2023)
-Segunda intervencion segmento San diego - Las pitillas (20 de marzo de 2023)
- segunda intervencio San diego - Los tupes (20 de marzo de 2023)
segunda intervencion segmento San diego - Media luna (03 abril de 2023)
-Inicio intervencion noveno segmento Los venaos - El perro - Guaymaral (11 de abril de 2023)
-Inicio 2 intervencion segmento via nacional- pueblo bello (11 de abril de 2023)
-Intervencion intervencion noveno segmento Los venaos - El perro - Guaymaral (17 de abril de 2023)
-Intervencion segmento Los venaos - El perro - Guaymaral (24 de abril de 2023)
- Intervencion segmento via nacional- pueblo bello (24 de abril de 2023)
-Inicio intervencion segmento Mandinguilla - Dios me vea (1 de mayo de 2023)
-Intervencion segmento via nacional- pueblo bello (1 de mayo de 2023)

	%Programado	% Ejecutado
Avance semanal	6,44%	1,21%
Avance Acumulado	28,76%	50,50%

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma CESAR A. MONTENEGRO E.

Nombre OSCAR MAURICIO MONTENERO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CÓDIGO: CCE-EICP-IDI-22	VERSIÓN: 01
LO HACEMOS MEJOR	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		



Descripción:

FOTO 1. Evidencia de reoceria - tramo Mandinguilla - Dios me vea



Descripción:

FOTO 2. Evidencia de reoceria - tramo Mandinguilla - Dios me vea



Descripción:


FOTO 3. Evidencia limpieza de cunetas en concreto Mandinguilla - Dios me vea



Descripción:


FOTO 4. Evidencia limpieza de encoles y descoles de alcantarillas Mandinguilla - Dios me vea

LO HACEMOS MEJOR	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CÓDIGO: CCE-EICP-IDI-22	VERSIÓN: 01
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

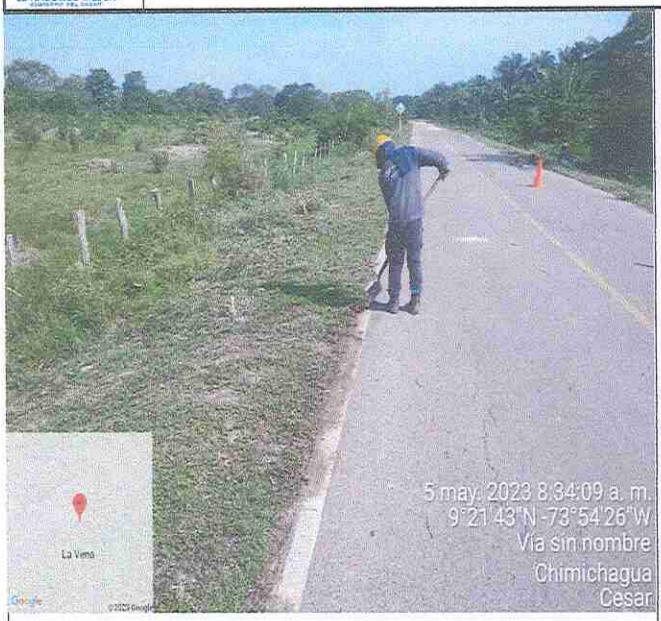

Descripción:

FOTO 5. Evidencia limpieza de bermas Mandinguilla - Dios me vea

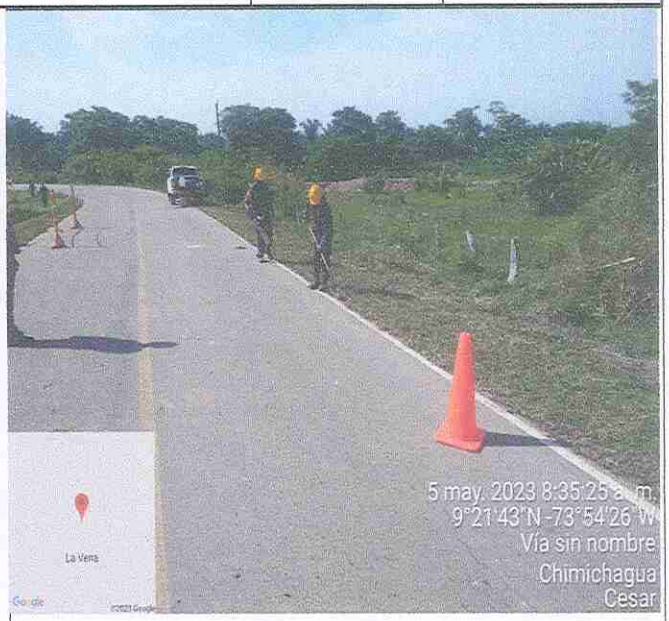

Descripción:

FOTO 6. Evidencia limpieza de bermas Mandinguilla - Dios me vea



Descripción:

FOTO 7. Evidencia instalacion de defensa metalica tramo Via nacional - pueblo bello



Descripción:

FOTO 8. Evidencia instalacion de defensa metalica tramo Via nacional - pueblo bello

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CÓDIGO: CCE-EICP-IDI-22	VERSIÓN: 01
LO HACEMOS MEJOR	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INFRAVIALES — CONTRATO No: 2022 04 0011

INTERVENTORIA: DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS — CONTRATO No: 2022 05 0021

Semana Número: 21 — Del: 8 5 2023 — Al: 13 5 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 135 Días

Supervisor Contrato de Interventoría: MARIA GABRIELA RUMBO, SAID LOZANO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINRIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,50%	32,26%
Valor básico de la Obra	$ 93.659.277,00	$ 863.270.938,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,28%	50,77%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 7.438.817,00	$ 1.358.692.689,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	Consorcio Infraviales
Contrato No.	2022 04 0011
Valor Inicial:	$ 2.675.979.349,00
Valor Actualizado:	$ 2.675.979.349,00
Plazo Inicial:	Ocho (8) meses
Plazo Actualizado:	Ocho (8) meses
Fecha de Iniciación:	06 de Diciembre del 2022
Fecha de Vencimiento:	06 de agosto del 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS
Contrato No.	2022 05 0021
Valor Inicial:	$ 198.623.292,00
Valor Actualizado:	$ 198.623.292,00
Plazo Inicial:	Ocho (8) meses
Plazo Actualizado:	Ocho (8) meses
Fecha de Iniciación:	06 de Diciembre del 2022
Fecha de Vencimiento:	06 de agosto del 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana N°21 se iniciaron las siguientes actividades en el segmento Mandinguilla - Dios me ve

Se realizaron 10.500 metros de desmonte y limpieza de zona no boscosa, roceria

Se realizaron 16100 metros de limpieza de bermas con un ancho promedio de 30,59 cm

En la semana N°21 se iniciaron las siguientes actividades en el segmento Via nacional - Pueblo bello

Se instalaron 140,6 metros de defensa metalica

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

-Se tomó registro climatico de la semana

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

-Acta de inicio de intervencionde obra: 6 de Diciembre 2022.
-Inicio intervencion primer segmento Callao - Los calabazos (19 de Diciembre 2022)
-Inicio intervencion segundo segmento Ramal- Pueblo Bello(28 de Diciembre 2022)
-Inicio intervencion tercer segmento San Diego - Las Pitillas (26 de Enero 2023)
-Inicio intervencion cuarto segmento San Diego - Los Tupes (30 de Enero 2023)
-Inicio intervencion quinto segmento San Diego - Media Luna (6 de Febrero 2023)
-Inicio de intervencion sexto segmento Patillal - Tzemuake (27 de Febrero de 2023)
Inicio de intervencion septimo segmento Atanquez - Guatapuri (6 de marzo de 2023)
-Inicio de intervencion octavo segmento Subramal - Chemesquemena (6 de marzo de 2023)
-Inicio de intervencion de noveno segmento Los venaos - El perro (13 de marzo de 2023)
-Segunda intervencion segmento San diego - Las pitillas (20 de marzo de 2023)
- segunda intervencio San diego - Los tupes (20 de marzo de 2023)
segunda intervencion segmento San diego - Media luna (03 abril de 2023)
-Inicio intervencion noveno segmento Los venaos - El perro - Guaymaral (11 de abril de 2023)
-Inicio 2 intervencion segmento via nacional- pueblo bello (11 de abril de 2023)
-Intervencion intervencion noveno segmento Los venaos - El perro - Guaymaral (17 de abril de 2023)
-Intervencion segmento Los venaos - El perro - Guaymaral (24 de abril de 2023)
- Intervencion segmento via nacional- pueblo bello (24 de abril de 2023)
-Inicio intervencion segmento Mandinguilla - Dios me vea (1 de mayo de 2023)
-Intervencion segmento via nacional- pueblo bello (1 de mayo de 2023)
-Intervencion segmento Mandinguilla - Dios me ve (8 de mayo de 2023)
-Intervencion segmento via nacional- pueblo bello (8 de mayo de 2023)

	%Programado	% Ejecutado
Avance semanal	3,50%	0,28%
Avance Acumulado	32,26%	50,77%

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma CESAR M. MONTENEGRO C.

Nombre OSCAR MAURICIO MONTENERO


REGISTRO FOTOGRÁFICO

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CÓDIGO: CCE-EICP-IDI-22	VERSIÓN: 01
LO HACEMOS MEJOR	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		




Descripción:

FOTO 1. Evidencia de reoceria - tramo Mandinguilla - Dios me vé

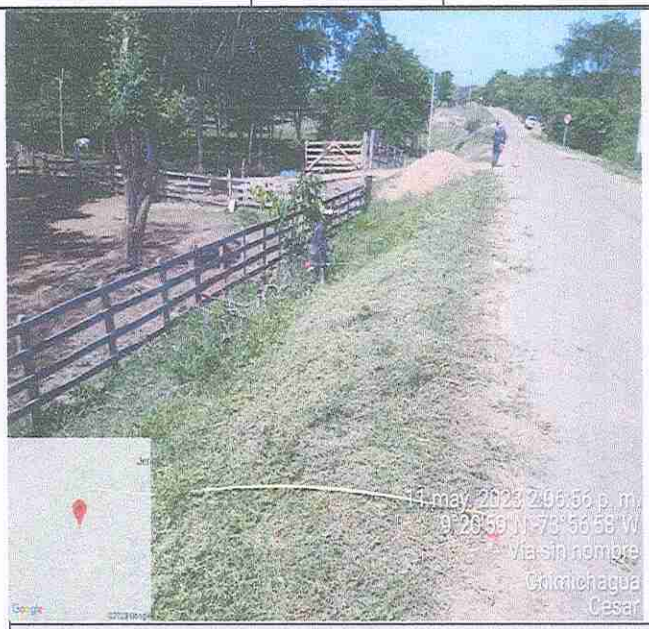

Descripción:

FOTO 2. Evidencia de reoceria - tramo Mandinguilla - Dios me vea

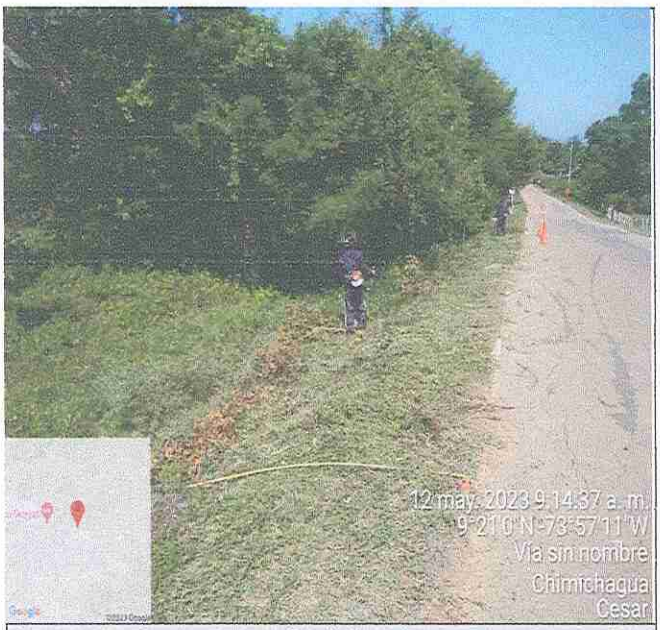

Descripción:


FOTO 3. Evidencia de reoceria - tramo Mandinguilla - Dios me vé



Descripción:

FOTO 4. Evidencia de reoceria - tramo Mandinguilla - Dios me vé

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CÓDIGO: CCE-EICP-IDI-22	VERSIÓN: 01
LO HACEMOS MEJOR	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

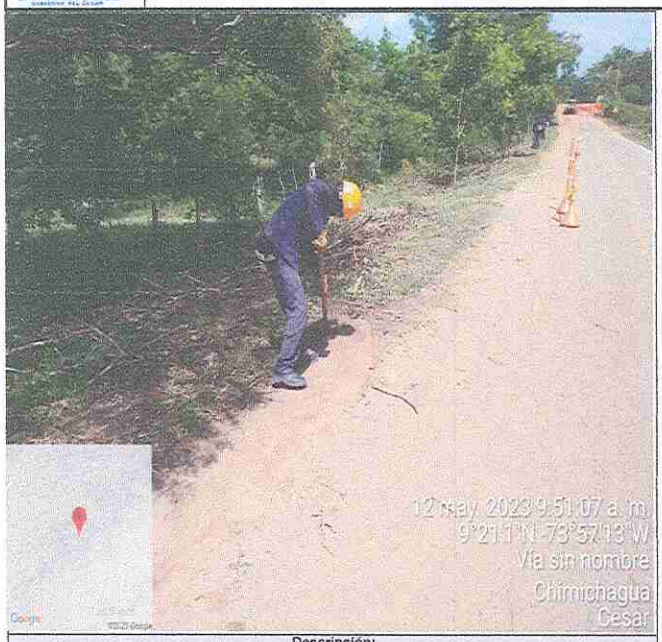

Descripción:

FOTO 5. Evidencia limpieza de bermas Mandinguilla - Dios me vé

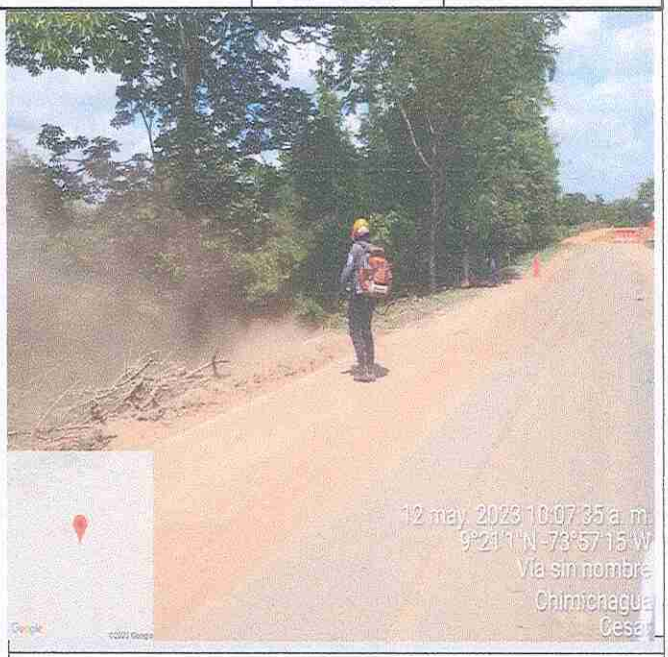


FOTO 6. Evidencia limpieza de bermas Mandinguilla - Dios me vé



FOTO 7. Evidencia instalacion de defensa metalica tramo Via nacional - pueblo bello



Descripción:

FOTO 8. Evidencia instalacion de defensa metalica tramo Via nacional - pueblo bello

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CÓDIGO: CCE-EICP-IDI-22	VERSIÓN: 01
LO HACEMOS MEJOR	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INFRAVIALES — CONTRATO No: 2022 04 0011

INTERVENTORIA: DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS — CONTRATO No: 2022 05 0021

Semana Número: 22 — Del: 15 5 2023 — Al: 20 5 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 141 Días

Supervisor Contrato de Interventoría: MARIA GABRIELA RUMBO, SAID LOZANO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINRIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,24%	36,50%
Valor básico de la Obra	$ 113.461.524,00	$ 976.732.462,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,28%	51,06%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 7.594.117,00	$ 1.366.286.806,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	Consorcio Infraviales
Contrato No.	2022 04 0011
Valor Inicial:	$ 2.675.979.349,00
Valor Actualizado:	$ 2.675.979.349,00
Plazo Inicial:	Ocho (8) meses
Plazo Actualizado:	Ocho (8) meses
Fecha de Iniciación:	06 de Diciembre del 2022
Fecha de Vencimiento:	06 de agosto del 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS
Contrato No.	2022 05 0021
Valor Inicial:	$ 198.623.292,00
Valor Actualizado:	$ 198.623.292,00
Plazo Inicial:	Ocho (8) meses
Plazo Actualizado:	Ocho (8) meses
Fecha de Iniciación:	06 de Diciembre del 2022
Fecha de Vencimiento:	06 de agosto del 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana N°22 se iniciaron las siguientes actividades en el segmento Ramal - Candelaria

Se realizaron 3600 metros de desmonte y limpieza de zona no boscosa, roceria, para un total de 1,06 HA

Se realizaron 3600 metros de limpieza de bermas con un ancho promedio de 20 cm

En la semana N°22 se iniciaron las siguientes actividades en el segmento Ramal - Simaña

Se realizaron 3000 metros de desmonte y limpieza de zona no boscosa, roceria para un total de 0,90 HA

Se realizaron 3000 metros de limpieza de bermas con un ancho promedio de 0,85 cm

En la semana N°22 se iniciaron las siguientes actividades en el segmento Tamalameque - Antequera

Se realizaron 7000 metros de desmonte y limpieza de zona no boscosa, roceria, para un total de 2,1 HA

Se realizaron 70 metros de limpieza a mano de encoles y descoles de alcantarillas

Se realizaro limpieza a mano de 7 alcantarillas de tubo de 600mm y 900mm

En la semana N°22 se iniciaron las siguientes actividades en el segmento La raya - Zapatosa

Se realizaron 2200 metros de desmonte y limpieza de zona no boscosa, roceria, para un total de 0,06 HA

Se realizaron 20 metros de limpieza a mano de encoles y descoles de alcantarillas

Se realizaro limpieza a mano de 2 alcantarillas de tubo de 600mm y 900mm

Se realizaron 40 metros de limpieza a mano de cunetas en concreto

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

-Se tomó registro climatico de la semana

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

-Acta de inicio de intervencionde obra: 6 de Diciembre 2022.
-Inicio intervencion primer segmento Callao - Los calabazos (19 de Diciembre 2022)
-Inicio intervencion segundo segmento Ramal- Pueblo Bello(28 de Diciembre 2022)
-Inicio intervencion tercer segmento San Diego - Las Pitillas (26 de Enero 2023)
-Inicio intervencion cuarto segmento San Diego - Los Tupes (30 de Enero 2023)
-Inicio intervencion quinto segmento San Diego - Media Luna (6 de Febrero 2023)
-Inicio de intervencion sexto segmento Patillal - Tzemuake (27 de Febrero de 2023)
Inicio de intervencion septimo segmento Atanquez - Guatapuri (6 de marzo de 2023)
-Inicio de intervencion octavo segmento Subramal - Chemesquemena (6 de marzo de 2023)
-Inicio de intervencion de noveno segmento Los venaos - El perro (13 de marzo de 2023)
-Segunda intervencion segmento San diego - Las pitillas (20 de marzo de 2023)
- segunda intervencio San diego - Los tupes (20 de marzo de 2023)
segunda intervencion segmento San diego - Media luna (03 abril de 2023)
-Inicio intervencion noveno segmento Los venaos - El perro - Guaymaral (11 de abril de 2023)
-Inicio 2 intervencion segmento via nacional- pueblo bello (11 de abril de 2023)
-Intervencion intervencion noveno segmento Los venaos - El perro - Guaymaral (17 de abril de 2023)
-Intervencion segmento Los venaos - El perro - Guaymaral (24 de abril de 2023)
- Intervencion segmento via nacional- pueblo bello (24 de abril de 2023)
-Inicio intervencion segmento Mandinguilla - Dios me vea (1 de mayo de 2023)
-Intervencion segmento via nacional- pueblo bello (1 de mayo de 2023)
-Intervencion segmento Mandinguilla - Dios me ve (8 de mayo de 2023)
-Inicio intervencion segmento via nacional- pueblo bello (8 de mayo de 2023)
-Inicio intervencion segmento Ramal - Candelaria (15 de mayo de 2023)
-Inicio intervencion segmento Ramal - Simaña (16 de mayo de 2023)
-Inicio intervencion segmento Tamalameque - Antequera (16 de mayo de 2023)
-Inicio intervencion segmento La raya - Zapatosa (19 de mayo de 2023)

	%Programado	% Ejecutado
Avance semanal	4,24%	0,28%
Avance Acumulado	36,50%	51,06%

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE INTERVENTORIA


CESAR A. MATEUS

LO HACEMOS MEJOR	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CÓDIGO: CCE-EICP-IDI-22	VERSIÓN: 01
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		



Descripción:

FOTO 1. Evidencia de reoceria - tramo Ramal - Candelaria

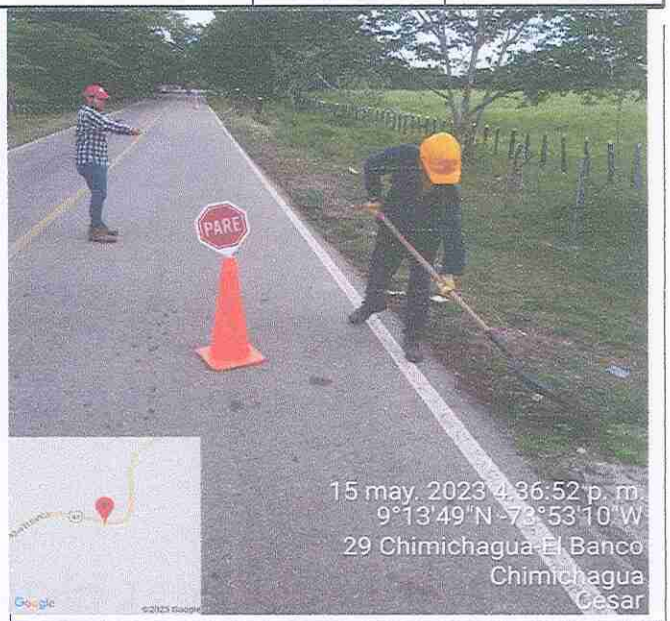

Descripción:

FOTO 2. Evidencia de limpieza de bermas tramo - Ramal - Candelaria



Descripción:

FOTO 3. Evidencia de limpieza de bermas tramo La raya - Zapatosa



Descripción:

FOTO 4. Evidencia de reoceria - tramo La raya - Zapatosa

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CÓDIGO: CCE-EICP-IDI-22	VERSIÓN: 01
LO HACEMOS MEJOR	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		



Descripción:

FOTO 5. Evidencia limpieza de roceria tramo Ramal - Simaña

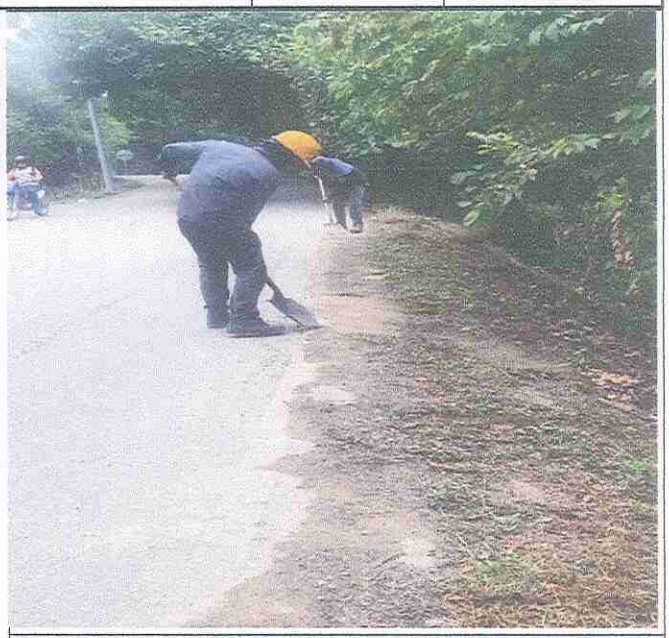


FOTO 6. Evidencia limpieza de bermas tramo Ramal - Simaña



Descripción:

FOTO 7. Evidencia de limpieza de alcantarillas tramo Tamalameque - Antequera



Descripción:

FOTO 8. Evidencia roceria tramo Tamalameque - Antequera

LO HACEMOS MEJOR	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CÓDIGO: CCE-EICP-IDI-22	VERSIÓN: 01
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INFRAVIALES — CONTRATO No: 2022 04 0011

INTERVENTORIA: DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS — CONTRATO No: 2022 05 0021

Semana Número: 23 — Del: 22 5 2023 — Al: 27 5 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 141 Días

Supervisor Contrato de Interventoría: MARIA GABRIELA RUMBO, SAID LOZANO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINRIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,00%	41,50%
Valor básico de la Obra	$ 133.798.967,00	$ 1.110.531.430,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,19%	51,25%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 5.028.494,00	$ 1.371.315.299,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	Consorcio Infraviales
Contrato No.	2022 04 0011
Valor Inicial:	$ 2.675.979.349,00
Valor Actualizado:	$ 2.675.979.349,00
Plazo Inicial:	Ocho (8) meses
Plazo Actualizado:	Ocho (8) meses
Fecha de Iniciación:	06 de Diciembre del 2022
Fecha de Vencimiento:	06 de agosto del 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS
Contrato No.	2022 05 0021
Valor Inicial:	$ 198.623.292,00
Valor Actualizado:	$ 198.623.292,00
Plazo Inicial:	Ocho (8) meses
Plazo Actualizado:	Ocho (8) meses
Fecha de Iniciación:	06 de Diciembre del 2022
Fecha de Vencimiento:	06 de agosto del 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana N°23 se iniciaron las siguientes actividades en el segmento La raya - Zapatosa

Se realizaron 7500 metros de desmonte y limpieza de zona no boscosa, roceria, para un total de 2,25 HA

Se realizaron 4500 metros de limpieza de bermas con un ancho promedio de 20.5 cm

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

-Se tomó registro climatico de la semana

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

-Acta de inicio de intervencionde obra: 6 de Diciembre 2022.
-Inicio intervencion primer segmento Callao - Los calabazos (19 de Diciembre 2022)
-Inicio intervencion segundo segmento Ramal- Pueblo Bello(28 de Diciembre 2022)
-Inicio intervencion tercer segmento San Diego - Las Pitillas (26 de Enero 2023)
-Inicio intervencion cuarto segmento San Diego - Los Tupes (30 de Enero 2023)
-Inicio intervencion quinto segmento San Diego - Media Luna (6 de Febrero 2023)
-Inicio de intervencion sexto segmento Patillal - Tzemuake (27 de Febrero de 2023)
Inicio de intervencion septimo segmento Atanquez - Guatapuri (6 de marzo de 2023)
-Inicio de intervencion octavo segmento Subramal - Chemesquemena (6 de marzo de 2023)
-Inicio de intervencion de noveno segmento Los venaos - El perro (13 de marzo de 2023)
-Segunda intervencion segmento San diego - Las pitillas (20 de marzo de 2023)
- segunda intervencio San diego - Los tupes (20 de marzo de 2023)
segunda intervencion segmento San diego - Media luna (03 abril de 2023)
-Inicio intervencion noveno segmento Los venaos - El perro - Guaymaral (11 de abril de 2023)
-Inicio 2 intervencion segmento via nacional- pueblo bello (11 de abril de 2023)
-Intervencion intervencion noveno segmento Los venaos - El perro - Guaymaral (17 de abril de 2023)
-Intervencion segmento Los venaos - El perro - Guaymaral (24 de abril de 2023)
- Intervencion segmento via nacional- pueblo bello (24 de abril de 2023)
-Inicio intervencion segmento Mandinguilla - Dios me vea (1 de mayo de 2023)
-Intervencion segmento via nacional- pueblo bello (1 de mayo de 2023)
-Intervencion segmento Mandinguilla - Dios me ve (8 de mayo de 2023)
-Intervencion segmento via nacional- pueblo bello (8 de mayo de 2023)
-Inicio intervencion segmento Ramal - Candelaria (15 de mayo de 2023)
-Inicio intervencion segmento Ramal - Simaña (16 de mayo de 2023)
-Inicio intervencion segmento Tamalameque - Antequera (16 de mayo de 2023)
-Inicio intervencion segmento La raya - Zapatosa (19 de mayo de 2023)
-Intervencion segmento La raya - Zapatosa (22 de mayo de 2023)

	%Programado	% Ejecutado
Avance semanal	5,00%	0,19%
Avance Acumulado	41,50%	51,25%

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CÓDIGO: CCE-EICP-IDI-22	VERSIÓN: 01
LO HACEMOS MEJOR	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		



Descripción:
FOTO 1. Evidencia de reoceria - tramo La raya - Zapatosa



Descripción:
FOTO 2. Evidencia de reoceria - tramo La raya - Zapatosa



Descripción:
FOTO 3. Evidencia de reoceria - tramo La raya - Zapatosa



Descripción:
FOTO 4. Evidencia de reoceria - tramo La raya - Zapatosa

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	CÓDIGO: CCE-EICP-IDI-22	VERSIÓN: 01
LO HACEMOS MEJOR	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		



Descripción:

FOTO 5. Evidencia de reoceria - tramo La raya - Zapatosa

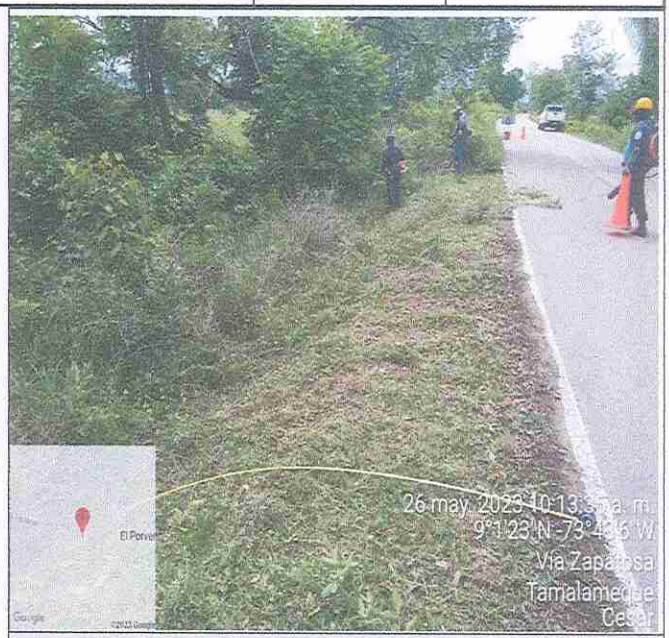


FOTO 6. Evidencia de reoceria - tramo La raya - Zapatosa



Descripción:

FOTO 7. Evidencia de limpieza de bermas tramo La raya - Zapatosa



Descripción:

FOTO 8. Evidencia de limpieza de bermas tramo La raya - Zapatosa

Anexo de Interventoría N. 9. Soporte alquiler de vehículo

DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS		COMPROBANTE DE EGRESO Nº:	8
	Fecha: 13 de junio de 2023	Valor:	$ 4.616.933,00
Pagado a:	GLADYS TINOCO HERRERA		
Por concepto de:			
La suma de: (valor en letras):	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE		

CODIGO P.U.C	CONCEPTO	VALOR
	PAGO TRANSPORTE DE INTERVENTORÍA MAYO DE 2023	4.616.933,00
OBSERVACIONES:		4.616.933,00

Nº Cheque:	AG850774	Efectivo	☑
Banco:	Bancolombia	Sucursal	
Debitese a:			

Elaborado	Aprobado

Gladys Tinoco H.

C.C. 20.631.611 NIT.

Fecha de recibido D 13 M 06 A 23.

ORIGINAL

Anexo de Interventoría N. 10. Informe mensual SST

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LISTA DE CHEQUEO

COMPONENTE SST

ACTA DE SUPERVISION INTERVENTORIA

#	DESCRIPCIÓN	¿CUMPLIÓ?		RESPONSABLE	OBSERVACION
		SI	NO		
1.	SUPERVISION DEL INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA	X		AREA SST	Cumplió con la revisión y aprobación del informe del contratista
2.	SUPERVISION DEL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	X		AREA SST	
3.	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA	X		AREA SST	

Por medio de la presente acta se deja constancia que hasta el corte correspondiente al mes de junio del año 2023; la interventoría cuyo objeto es: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**" con contrato de obra número **2022 05 0021** se encuentra al día con el Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo.

El suscrito supervisor del componente de seguridad salud en el trabajo, del citado contrato, deja constancia que la información que soporta los informes presentados, son de entera responsabilidad de la Interventoría.

Tatiana Suarez G

TATIANA SUAREZ GUERRA
Componente S.S.T

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2022050021

OBJETO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO No.6

PERIODO DEL INFORME:
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023


ENTIDAD CONTRATANTE:
GOBERNACIÓN DEL CESAR

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

DAM
SOLUCIONES E INGENIERIA

VALLEDUPAR, JUNIO DE 2023

CLASE DE DOCUMENTO: INFORME DE GESTIÓN SST N. 6	CODIGO:	FECHA:
REVISIÓN Y ESTADO DE DOCUMENTO	INFSSTMAC2022050021	10/06/2023

REVISIÓN	No. DE REVISIONES	1	2	3	4
	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN: Johanna López Coordinación de Interventoría				
	RESPONSABLE REVISIÓN: José Luis Stapper Director de Interventoría				
	RESPONSABLE APROBACIÓN: Johanna López Representante legal de Interventoría				

CONTROL DE MODIFICACIONES

REVISION No.	MODIFICACION	FECHA DE MODIFICACION	OBSERVACIONES
01	Emisión de informe	10 de junio de 2023	

LISTA DE DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

DESTINATARIO DEL INFORME	No. DE COPIAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DEL CESAR	1

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
   2.1. Objetivo General 6
   2.2. Objetivos Específicos 6
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
   3.1. Localización del proyecto 8
   3.2. Características técnicas del proyecto 9
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 10
   4.1. Información general (Incluye seguimiento de garantías contractuales) 10
5. ACTIVIDADES EN SG-SST 11
   5.1. Cumplimiento a obligaciones SST del contrato 11
   5.2. Componente de Gestión y Seguridad en el Trabajo 11
      5.2.1. Personal de obra 11
      5.2.2. Administración de riesgos 12
      5.2.3. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo 12
      5.2.4. Subprograma de higiene y seguridad ocupacional 13
      5.2.5. Plan de emergencias y contingencias 13
      5.2.6. Programa de inducción 13
      5.2.7. Conformación COPASST 13
   5.3. Componente Programa de señalización 13
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14
7. REGISTRO FOTOGRAFICO 15

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación del proyecto 8

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. manejo de señalización y manejo de trafico 15
Fotografía 2. Señalización para actividades de rocería 15
Fotografía 3. Uso adecuado de EPP, instalación de señalización 15
Fotografía 4. Uso adecuado de EPP 15

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Priorización de tramos viales 8
Tabla 2 Actividades contractuales 9
Tabla 3 Datos generales del Contrato de Interventoría 10
Tabla 4 Datos generales del Contrato de Obra 10
Tabla 5 Profesionales de Interventoría 11
Tabla 6 Profesional contratista de obra 12
Tabla 6 Relación de actividades de inducción y/o capacitación 12

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe mensual No. 6 que comprende el periodo de tiempo del 1 al 31 de mayo de 2023, este contiene seguimiento de las actividades desarrolladas en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente del contrato de obra No. 2022 040011 que tiene por objeto "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIA DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Describir las actividades del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo llevadas a cabo durante el periodo del informe, garantizando el cumplimiento de las obligaciones y normatividad vigente.

2.2. Objetivos Específicos

- Demostrar la gestión realizada por el contratista e interventoría en el área de gestión SST del contrato mitigando los impactos negativos que se pudieran generar.
- Registrar mediante tablas y registro fotográfico la información de la gestión del área SST.
- Evaluar periódicamente la implementación y el cumplimiento de los elementos SST.
- Dar a conocer las actividades de identificación, evaluación y control de los agentes y factores de riesgo ocupacionales presentes en el trabajo, que pueden causar lesiones agudas o crónicas de acuerdo con las labores que desempeñan.
- Capacitar y sensibilizar al personal en relación con la práctica y cumplimiento de las medidas definidas en el protocolo de bioseguridad con el fin de prevenir y mitigar el riesgo de contagio por COVID-19.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El alcance del mantenimiento rutinario incluye actividades para conservar una vía de regular a buen estado, donde se ejecutarán procedimientos de reparación vial para recuperar elementos menores dañados, deteriorados o destruidos como serian: bacheos, sello localizado, limpieza de alcantarillas, control de vegetación, mantenimiento de cunetas, mantenimiento de puentes, colocación de defensas, limpieza de señales, limpieza permanente de la calzada, bermas y drenajes y la reparación y limpieza de los dispositivos para el control del tránsito.

También, incluye la limpieza y reparaciones menores y localizadas de las obras hidráulicas. Aunque el mantenimiento rutinario se debe realizar durante todo el período de vida del pavimento, constituye prácticamente la única actividad que se ejecuta durante su etapa inicial de servicio por lo que este proyecto se plantea para periodos anuales.

Realizar en la red vial del departamento del Cesar un mantenimiento rutinario para garantizar el tránsito vehicular y peatonal en forma continua y aceptable, donde la superficie de rodadura presente las condiciones apropiadas para el tráfico en un nivel razonable de transitabilidad y visibilidad.

Garantizar que todas las obras hidráulicas (alcantarillas, cunetas, pontones, box coulvert) estén en funcionamiento para el correcto drenaje de las aguas lluvias, que no presenten obstrucciones en los encoles y descoles, que impidan la tarea de defensa que poseen dichas estructuras.

Las actividades y acciones de mantenimiento que se llevan a cabo en una vía tienen como objetivo principal preservar en buen estado los elementos que la componen, controlar los daños y, en lo posible, conservar las condiciones iniciales de construcción o rehabilitación.


Con el fin de minimizar los riesgos de accidentalidad del personal y de los usuarios de la vía durante la ejecución de las actividades de mantenimiento, se recomienda tener en cuenta lo sugerido en las normas vigentes para la seguridad vial y el manejo provisional del tránsito, así como las condiciones particulares de la actividad que hacen parte del mantenimiento rutinario para la red vial de segundo y tercer orden pavimentada y en afirmado.

El mantenimiento rutinario está conformado por las actividades permanentes de conservación localizada de pequeños defectos en una vía, para garantizar la seguridad y la comodidad del usuario.

3.1. Localización del proyecto

En la siguiente imagen se presenta la localización municipal y departamental del proyecto a realizar.

Figura 1. *Ubicación del proyecto*

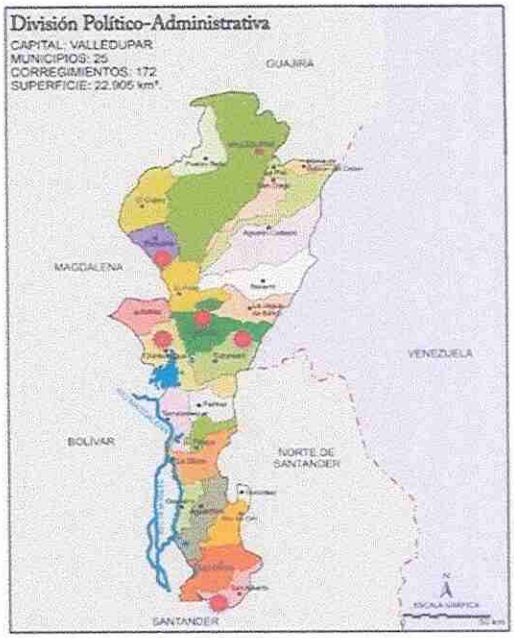

El proyecto contempla la intervención de 22 vías ubicadas en el departamento del Cesar, así:

Tabla 1 *Priorización de tramos viales*

CÓDIGO	CORREDOR	MUNICIPIO	TIPO MANTENIMIENTO
83895	AGUSTÍN CODAZZI- LA DUDA - SAN JACINTO BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA	AGUSTÍN CODAZZI	RUTINARIO
85435	PATILLAL- TZEMUAKE (VILLA RUEDA)	VALLEDUPAR	RUTINARIO
	SAN DIEGO – LAS PITILLAS	SAN DIEGO	RUTINARIO
	SAN DIEGO – LOS TUPES	SAN DIEGO	RUTINARIO
49CS01	SAN DIEGO - MEDIA LUNA	SAN DIEGO	RUTINARIO
	VIA NACIONAL - LA VICTORIA DE SAN ISIDRO	LA JAGUA DE IBIRICO	RUTINARIO
83600	VIA NACIONAL - ESTADOS UNIDOS	BECERRIL	RUTINARIO
85300	LOS VENAOS - EL PERRO - GUAYMARAL – EL VALLITO	VALLEDUPAR / EL PASO	RUTINARIO
	LA LOMA - POTRERILLO	EL PASO	RUTINARIO
82120	MANDINGUILLA - DIOS ME VEA - HIGOAMARILLO	CHIMICHAGUA	RUTINARIO
	RAMAL A CANDELARIA	CHIMICHAGUA	RUTINARIO
45CS06	LAS VEGAS - SALOA	CHIMICHAGUA	RUTINARIO
45CS05	LA RAYA -ZAPATOZA	TAMALAMEQUE	RUTINARIO
74CS01	RAMAL A SIMAÑA	LA GLORIA	RUTINARIO
84310	CARACOLICITO - CHIMILA	EL COPEY	RUTINARIO

20001-	RUTA 8003 (CALLAO) - LOS CALABAZOS	VALLEDUPAR	RUTINARIO
	BECERRIL - LA GUAJIRITA	BECERRIL	RUTINARIO
20001-1	SUBRAMAL A CHEMESQUEMENA	VALLEDUPAR	RUTINARIO
20001-3	ATANQUEZ - GUATAPURÍ	VALLEDUPAR	RUTINARIO
80CS01	RAMAL A PUEBLO BELLO	PUEBLO BELLO	RUTINARIO

3.2. Características técnicas del proyecto

Para la ejecución del contrato que tiene como objeto "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento periódico y rutinario de vías en el departamento del cesar" Se establecieron las actividades y medidas necesarias para realizar la conservación de las vías en el departamento del Cesar, así como la implementación de las actividades de obra necesarias para prolongar la vida útil de las vías que se encuentran a cargo de la gobernación del departamento del Cesar, Colombia.

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

Tabla 2 Actividades contractuales

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTIVIDADES	UNIDADES	TIPO DE ACTIVIDADES	
LIMPIEZA		RUTINARIO	PERIODICO
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	Ha	SI	
LIMPIEZA DE BERMAS	M2	SI	
LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN TIERRA	ML	SI	
LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO	ML	SI	
LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLES DE ALCANTARILLAS	ML	SI	
LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600MM Y 900MM	UN	SI	
CARPETA ASFÁLTICA			
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE AGLOMERADO ASFÁLTICO	M3		SI
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0	M2		SI
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2		SI
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3		SI
SUB-BASE Y BASE			
REMOCIÓN DE BASE Y/O SUBBASE	M3		SI
CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2		SI
SUB BASE GRANULAR CLASE C (LOS VENAOS - EL PERRO - GUAYMARAL - EL VALLITO)	M3		SI
SUB BASE GRANULAR (LAS VEGAS- SALOA)	M3		SI
SUB BASE GRANULAR (BECERRIL - LA GUAJIRITA)	M3		SI
SUB BASE GRANULAR (ARJONA - ASTREA)	M3		SI
BASE GRANULAR (LOS VENAOS - EL PERRO - GUAYMARAL - EL VALLITO)	M3		SI
BASE GRANULAR (LAS VEGAS- SALOA)	M3		SI
BASE GRANULAR (BECERRIL - LA GUAJIRITA)	M3		SI
BASE GRANULAR (ARJONA - ASTREA)	M3		SI
RETIRO			
TRANSPORTE REMOCIÓN DE: PAVIMENTO, BASE Y SUBBASE	M3-KM		
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL			
LINEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA	ML	SI	

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

4.1. Información general (Incluye seguimiento de garantías contractuales)

A continuación, se relaciona los datos del contrato de obra en la siguiente tabla:

Tabla 3 *Datos generales del Contrato de Interventoría*

CONTRATO No	CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL CESAR
CONTRATISTA	DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JOHANNA LOPEZ TINOCO
VALOR INICIAL	$ 198.623.292
PLAZO	ocho (08) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Nueve (9) de noviembre de 2022
FECHA DE INICIO	Seis (06) de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	Seis (06) de agosto de 2023

Fuente: Elaboración propia interventoría

Tabla 4 *Datos generales del Contrato de Obra*

CONTRATO No	2022-04-0011
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Obra
OBJETO	"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIA DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL CESAR
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAVIALES Nit.: 901.625.796-5
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Javier Enrique Triana Morales Cedula de ciudadanía 1.020.756.779
VALOR INICIAL	$ 2.675.979.349
PLAZO	8 meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17 de agosto de 2022

FECHA DE INICIO	SEIS (06) de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	Cinco (06) de agosto de 2023

Fuente: Elaboración propia interventoría

5. ACTIVIDADES EN SG-SST

- Seguimiento al ingreso y afiliación del personal al Sistema General de Seguridad Social y realización de Examen Médico Ocupacional.
- Seguimiento a la entrega de Elementos de Protección Individual.
- Acompañamiento en actividades de Inducción, capacitación y notificación de riesgos.
- Revisión a los documentos preliminares de plan de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, Protocolo de bioseguridad y seguimiento a la gestión de implementación de planes de Manejo de Tráfico.
- Revisión, aprobación y trámite de informe mensual de gestión SST.

5.1. Cumplimiento a obligaciones SST del contrato

Durante el periodo del informe se realiza el seguimiento al personal propuesto por el contratista de obra para la implementación del componente SST y así mismo se dará cumplimiento a la dedicación del profesional de interventoría que realiza seguimiento a las actividades como se relaciona a continuación:

***Tabla 5** Profesionales de Interventoría*

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
José Luis Stapper	Director de interventoría	27,11%
Mauricio Montenegro	Residente de Interventoría	100%
Carlos Cabana Birtto	Inspector de Interventoría	100%

Fuente: Elaboración propia Interventoría

5.2. Componente de Gestión y Seguridad en el Trabajo

Con el fin de dar cumplimiento al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realiza la descripción de cada uno de los aspectos contemplados en los requerimientos del contrato y normatividad vigente.

5.2.1. Personal de obra

Se realizó seguimiento diario al ingreso de personal al proyecto verificando los soportes de afiliación y planillas de pago de Seguridad Social correspondientes al periodo y exámenes médicos. El personal profesional de interventoría cuenta con las afiliaciones correspondientes al Sistemas de SS para los cuales se remiten las planillas de pago de aportes de forma mensual.

Durante el periodo del informe el contratista vinculó al personal profesional avalado por la interventoría, así como personal de obra para el inicio de las actividades constructivas.

Tabla 6 *Profesional contratista de obra*

CARGO	NOMBRE
Director de obra (Ingeniero Civil.)	Javier Enrique Triana Morales
Residente de Obra (Ingeniero Civil)	Carlos Enrique Silva Góngora
Especialista pavimentos	Adriana Patricia Agudelo Castañeda
Residente Ambiental (Ingeniera Ambiental)	Kateryn Julieth Castillo Rodríguez

5.2.2. Administración de riesgos

Se estableció la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos en los procesos constructivos a ejecutar durante el proyecto y la respectiva notificación a los trabajadores según el cargo a desempeñar.

Se verificó el cumplimiento de los aspectos generales del Plan Básico Legal, donde se tienen en cuenta los siguientes temas:

- Inducción al cargo
- Política de Seguridad y salud en el trabajo
- Política de Tabaquismo y Alcoholismo
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Sistema General de Seguridad Social
- Notificación de riesgos
- Plan de Emergencias
- Uso de Elementos de Protección Individual
- Examen Médico Ocupacional de ingreso
- Generalidades COPASST

A continuación, se relacionan las actividades de inducción llevadas a cabo durante el inicio de las actividades de obra:

Tabla 7 *Relación de actividades de inducción y/o capacitación*

FECHA	TEMA	ASISTENTES
6 de mayo de 2023	Charlas de seguridad	6
6 de mayo de 2023	Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	6

Fuente: Elaboración propia interventoría

5.2.3. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo

Se verifica que el personal vinculado al proyecto cuente con las afiliaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social y se realice el Examen Médico Ocupacional.

Se realiza seguimiento a las actividades de promoción y prevención establecidas en el SG-SST.

5.2.4. Subprograma de higiene y seguridad ocupacional

Se realizó seguimiento a la entrega y uso adecuado de los Elementos de Protección Individual por los trabajadores del proyecto garantizando que en cada una de las actividades se salvaguarde la integridad del personal.

Para el periodo del informe no se registraron accidentes de trabajo, se realiza revisión mensual de los indicadores de accidentalidad y ausentismo en el informe de gestión SST del contratista.

Se realizará seguimiento a las actividades de acuerdo con la programación de gestión SST inspecciones a los equipos para el control de emergencias, vehículos, maquinaria y orden y aseo.

5.2.5. Plan de emergencias y contingencias

En la actividad de inducción del personal, se realizó la socialización del Plan de Emergencias correspondiente, donde se encuentran las rutas de evacuación, puntos de encuentro, teléfonos y direcciones de las entidades que se pudieran necesitar, en caso de que se presentara una emergencia en el frente de obra.

Así mismo se verificará la publicación de esta información en los campamentos de obra.

5.2.6. Programa de inducción

El personal que ingresó al proyecto, recibió la respectiva inducción y Notificación de Riesgos, abarcando los siguientes temas: la política SST, Política de Alcohol y Drogas, funciones y responsabilidades, notificación al trabajador sobre los riesgos a los que se encuentra expuesto, notificación de derecho a examen de egreso, Reglamento de Higiene, Seguridad y salud en el trabajo, prevención de accidentes, uso de elementos de Protección personal, COPASST y su funcionamiento, de la misma forma, se notificaron deberes y derechos al trabajador.

5.2.7. Conformación COPASST

Para el periodo del informe, durante el primer informe, se llevó a cabo la conformación del comité COPASST con el personal del proyecto, en el cual se realiza seguimiento y se verifica el cumplimiento de los compromisos establecidos en cada una de las reuniones y la realización de las actividades propuestas.

5.3. Componente Programa de señalización

Durante el periodo reportado, el Área SST realizó la respectiva señalización de áreas, instalaciones y vías de evacuación. La señalización estuvo encaminada a alertar e indicar los riesgos presentes en el trabajo a través de avisos, cinta de seguridad, barricadas y personal de tráfico brindando además información a la comunidad.

El contratista CONSORCIO INFRAVIALES desarrollo las actividades del área según el Plan de Manejo de trafico propuesto, según se evidencia en el registro fotográfico.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Se hizo seguimiento al componente de gestión SST; el contratista realizó los pagos al sistema de seguridad social, exámenes médicos ocupacionales, actividades de inducción, capacitación, COPASST e inspecciones.

Durante el periodo del informe, no se reportaron accidentes de trabajo por parte del contratista ni la interventoría.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1. *manejo de señalización y manejo de trafico*

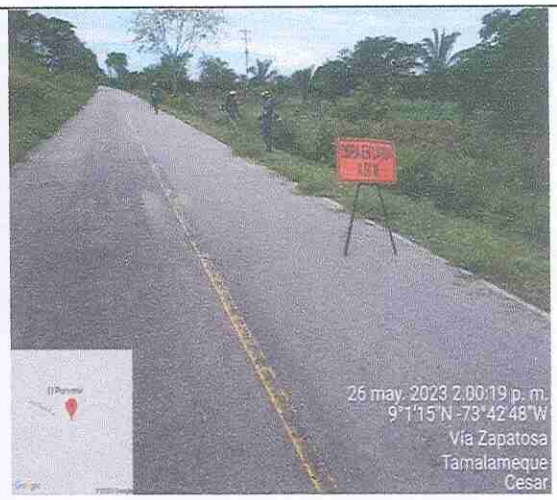

Fotografía 2. *Señalización para actividades de rocería*



Fotografía 3. *Uso adecuado de EPP, instalación de señalización*



Fotografía 4. *Uso adecuado de EPP*



Fotografía 5. *Entrega de dotación y epp a personal operativo*



Fotografía 6. *Verificación de botiquines y camillas en campo*



Fotografía 7. *Charlas de seguridad*



Fotografía 8. *Capacitación en seguridad y salud en el trabajo*

LO HACEMOS MEJOR GOBIERNO DEL CESAR	PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA /PAGO APORTES PARAFISCALES	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE

FECHA 31 (Día) 5 (Mes) 2023 (A

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DEL CESAR

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: MAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2022-05-0021

CARRETERA Y/O PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIA DE VIAS EN EL C

INTERVENTOR: DAM SOLUCIONES E INGENIERIA

SECTOR:

NOMBRE	CARGO	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	
JOSE LUIS STTAPPER SEGRERA	DIRECTOR INTERVENTORIA						68489607				
OSCAR MAURICIO MONTENEGRO RODRIGUEZ	RESIDENTE INTERVENTORIA						7887968839				
CARLOS CABANA BRITTO	INSPECTOR						945147162				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma CESAR MONTENEGRO R.

Nombre: Oscar Montenegro Rodriguez
Residente de Interventoría

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900311008-8	SYM INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA LTDA	CLL 11 No 8-54 OF. 206	3125302542	SYMINGENIERIA1@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	JLSS	JLSS	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E		68489607	$360.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	46.400	0		0		0	3	200	0	46.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	3	700	0	186.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	80.800				80.800	3	300	81.100			808	81.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	46.400	3	200	46.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	46.600
Pensión	1	185.600	186.300
Riesgos Laborales	1	80.800	81.100
CCF	1	46.400	46.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	359.200	360.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900311008-8	SYM INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA LTDA		CLL 11 No 8-54 OF. 206	3125302542	SYMINGENIERIA1@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	JLSS	JLSS	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E		68489607	$360.600	

..LE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de dentificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
79724383	STAPPER SEGRERA JOSE LUIS	1	0			5																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900503599
AL:		DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
	CALLE 64 G BIS N 85 J 42	TELÉFONO:	4764358
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
ÓN:	ÚNICO		
O PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7887968839	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Junio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		11			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		32957600

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
0201- PROTECCION	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 0	$ 480.000	$ 6.100	$ 486.100
									$ 480.000	$ 6.100	$ 486.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
5005-SANITAS S A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 120.000	$ 1.600	$ 0	$ 121.600
												$ 120.000	$ 1.600	$ 0	$ 121.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 208.800	$ 208.800	$ 2.700	$ 0	$ 211.500
								$ 208.800	$ 2.700	$ 0	$ 211.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
F22-COLSUBSIDIO	1	$ 120.000	$ 1.600	$ 121.600
		$ 120.000	$ 1.600	$ 121.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
EPEND		$ 3.000.000	FUD			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	SEGURIDAD SOCIAL – ARP: ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 3.000.000	$	$ 208.800	30	$ 3.000.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 940.800

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
00503599	3	DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CRA 7 180 30 OF 507	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2516320	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-04	2023-05	2105307455	9451471762	E	2023/05/24	2023/05/29	BANCOLOMBIA	5	$1,059,400

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
rsal: COLSUBSIDIO (2 Afiliados)					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$236,700		$0	$0
ro de Trabajo: VALLEDUPAR - CESAR (2 ados)					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$236,700		$0	$0
d: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$236,700		$0	$0
CC	1065837309	CABANA CARLOS	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
CC	1003994661	FAJARDO DANIELA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS041	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
al Afiliados(2)					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$236,700		$0	$0

en línea

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
00503599	3	DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CRA 7 180 30 OF 507	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2516320	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
04	2023-05	2105307455	9451471762	E	2023/05/24	2023/05/29	BANCOLOMBIA	5	$1,059,400

SUMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 2)				2	$544,000	$3,400	$0	$547,400
ORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$1,600	$0	$257,600
ROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$1,800	$0	$289,800
(ADMINISTRADORAS: 1)				2	$236,700	$1,500	$0	$238,200
OLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$236,700	$1,500	$0	$238,200
(ADMINISTRADORAS: 1)				2	$136,000	$900	$0	$136,900
OLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$136,000	$900	$0	$136,900
ADMINISTRADORAS: 2)				2	$136,000	$900	$0	$136,900
UEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$72,000	$500	$0	$72,500
UEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$64,000	$400	$0	$64,400
AL				2	$1,052,700	$6,700	$0	$1,059,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Anexo de Interventoría N. 11. Informe de seguimiento plan de calidad

SOLUCIONES E INGENIERIA

Bogotá D. C., 10 de junio de 2023

Señores:
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Referencia: CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Asunto: CERTIFICACION DE PLAN DE CALIDAD N. 6 DEL CONTRATO DE OBRA No. 2022 04 0011

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, en cumplimiento a las obligaciones especificas del contrato en referencia, esta interventoría certifica que el contratista CONSORCIO INFRAVIALES cumple con lo descrito en el plan de calidad, donde se les hizo un estricto seguimiento a las actividades realizadas en el mes de junio en los tramos, Ramal- Pueblo Bello, Mandinguilla- Dios me ve, Ramal a candelaria, Ramal a Simaña, Tamalameque – Antequera, La Raya – Zapatosa, que fueron recibidas a satisfacción por esta interventoría.

SOLUCIONES E INGENIERIA

Cra 7 N. 180 - 30 Oficina 507
Bogotá
Tel. (1) 8058201
damsoluing@gmail.com

MANDINGUILLA – DIOS ME VE

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA	TIPO DE INSPECCIÓN	PRODUCTO (CONFORME/ NO CONFORME)	ENTREGA A SATISFACCION
1	CAPITULO 1 – LIMPIEZA			
1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA NO BOSCOSA	VISUAL	CONFORME	SI
1,2	LIMPIEZA DE BERMAS	VISUAL	CONFORME	SI
1,4	LIMPIEZA DE CUNETA EN CONCRETO	VISUAL	CONFORME	SI
1,5	LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLE DE ALCANTARILLAS	VISUAL	CONFORME	SI
1,6	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600 MM Y 900 MM	VISUAL	CONFORME	SI
NP	ÍTEMS NO PREVISTOS			
NP-	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOES TIPO IV (NO INCLUYE TRANSPORTE)	VISUAL	CONFORME	SI

Cra 7 N. 180 - 30 Oficina 507
Bogotá
Tel. (1) 8058201
damsoluing@gmail.com

RAMAL – LA CANDELARIA

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA	TIPO DE INSPECCIÓN	PRODUCTO (CONFORME/ NO CONFORME)	ENTREGA A SATISFACCION
1	CAPITULO 1 – LIMPIEZA			
1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA NO BOSCOSA	VISUAL	CONFORME	SI
1,2	LIMPIEZA DE BERMAS	VISUAL	CONFORME	SI

RAMAL – SIMAÑA

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA	TIPO DE INSPECCIÓN	PRODUCTO (CONFORME/ NO CONFORME)	ENTREGA A SATISFACCION
1	CAPITULO 1 – LIMPIEZA			
1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA NO BOSCOSA	VISUAL	CONFORME	SI
1,2	LIMPIEZA DE BERMAS	VISUAL	CONFORME	SI
NP	ÍTEMS NO PREVISTOS			
NP-	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV (NO INCLUYE TRANSPORTE)	VISUAL	CONFORME	SI

SOLUCIONES E INGENIERIA

TAMALAMEQUE – ANTEQUERA

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA	TIPO DE INSPECCIÓN	PRODUCTO (CONFORME/ NO CONFORME)	ENTREGA A SATISFACCION
1	CAPITULO 1 – LIMPIEZA			
1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA NO BOSCOSA	VISUAL	CONFORME	SI
1,5	LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLE DE ALCANTARILLAS	VISUAL	CONFORME	SI
1,6	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600 MM Y 900 MM	VISUAL	CONFORME	SI

LA RAYA – ZAPATOSA

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA	TIPO DE INSPECCIÓN	PRODUCTO (CONFORME/ NO CONFORME)	ENTREGA A SATISFACCION
1	CAPITULO 1 – LIMPIEZA			
1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA NO BOSCOSA	VISUAL	CONFORME	SI
1,2	LIMPIEZA DE BERMAS	VISUAL	CONFORME	SI
1,4	LIMPIEZA DE CUNETAS EN CONCRETO	VISUAL	CONFORME	SI
1,5	LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLE DE ALCANTARILLAS	VISUAL	CONFORME	SI

Cra 7 N. 180 - 30 Oficina 507
Bogotá
Tel. (1) 8058201
damsoluing@gmail.com

1,6	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600 MM Y 900 MM	VISUAL	CONFORME	SI

NP	ÍTEMS NO PREVISTOS			
NP-	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOES TIPO IV (NO INCLUYE TRANSPORTE)	VISUAL	CONFORME	SI

RAMAL A PUEBLO BELLO

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA	TIPO DE INSPECCIÓN	PRODUCTO (CONFORME/ NO CONFORME)	ENTREGA A SASTIFACCION SI/NO
NP	ÍTEMS NO PREVISTOS			
NP-04	DEFENSA METÁLICA	VISUAL/DOCUMENTAL	CONFORME	si


Atentamente,

JOHANNA I. LÓPEZ TINOCO
Representante legal
DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORÍA CTO 2022 05 0021

ANEXO FOTOGRAFICO PLAN DE CALIDAD

RAMAL – PUEBLO BELLO

DEFENSA METALICA

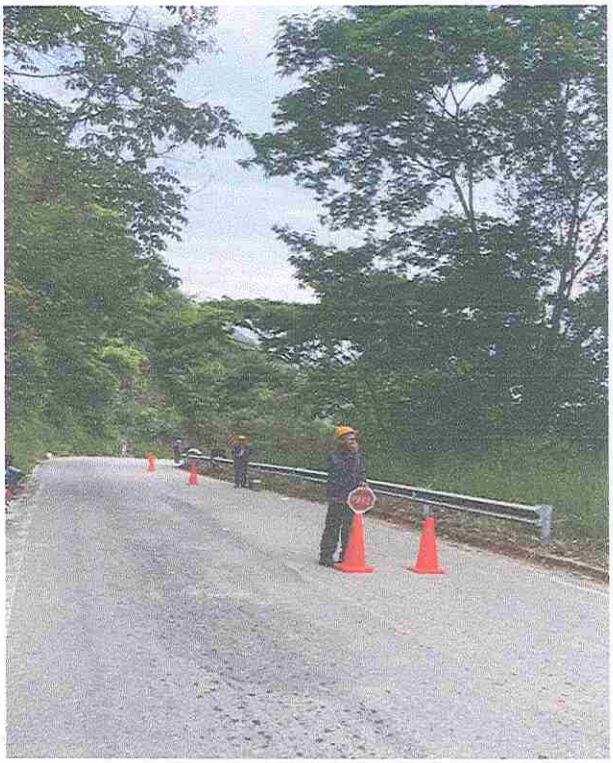








MANDINGUILLA – DIOS ME VE- HIGO AMARILLO

LIMPIEZA ZONA NO BOSCOSA




LIMPIEZA DE BERMAS

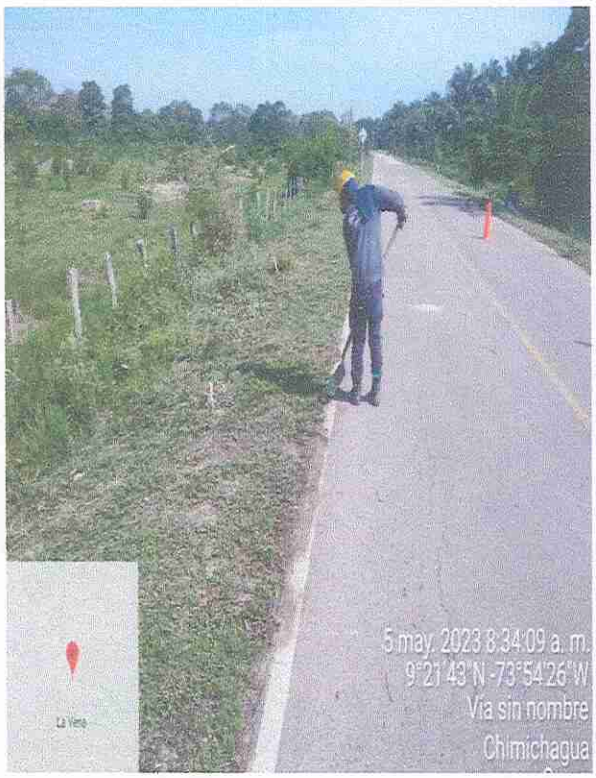

LIMPIEZA DE ALCANTARILLA




LIMPIEZA DE CUNETAS EN CONCRETO

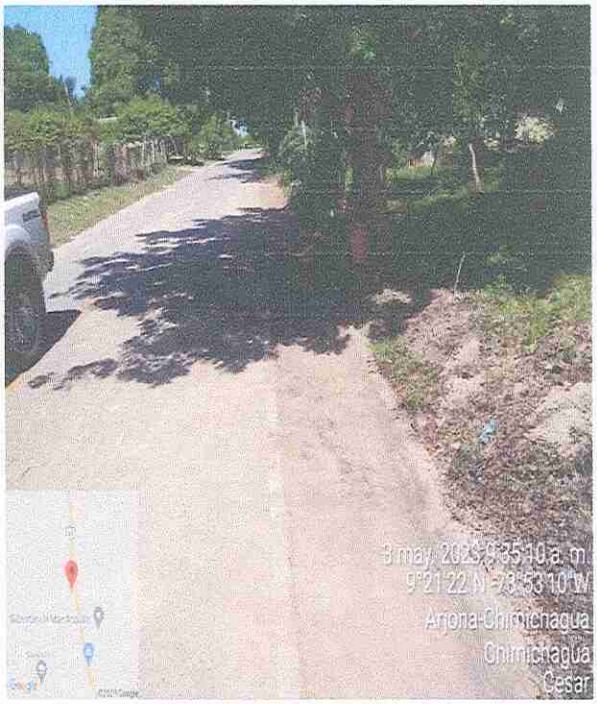


RAMAL – LA CANDELARIA

LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA

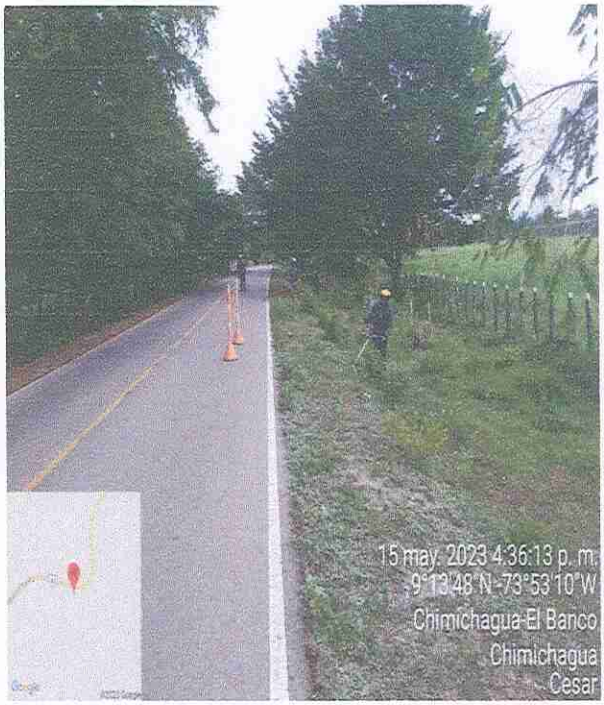



LIMPIEZA DE BERMAS

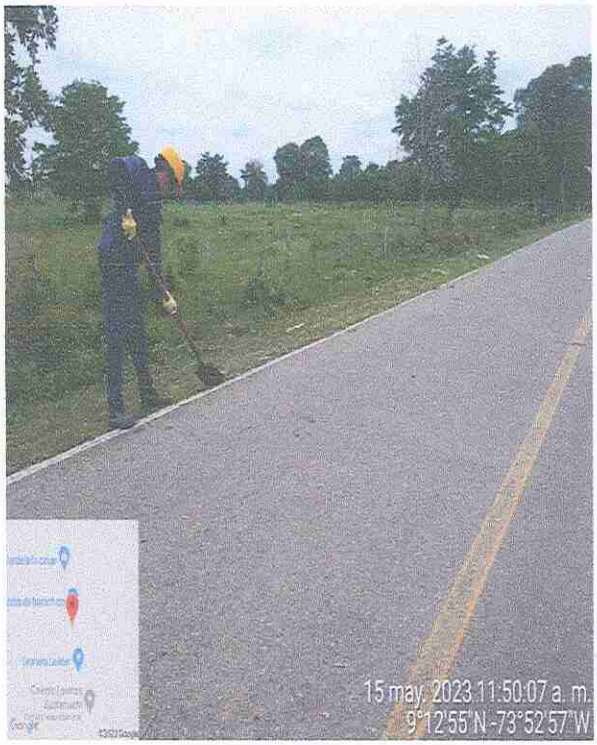



TAMALAMEQUE – ANTEQUERA


LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA






LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



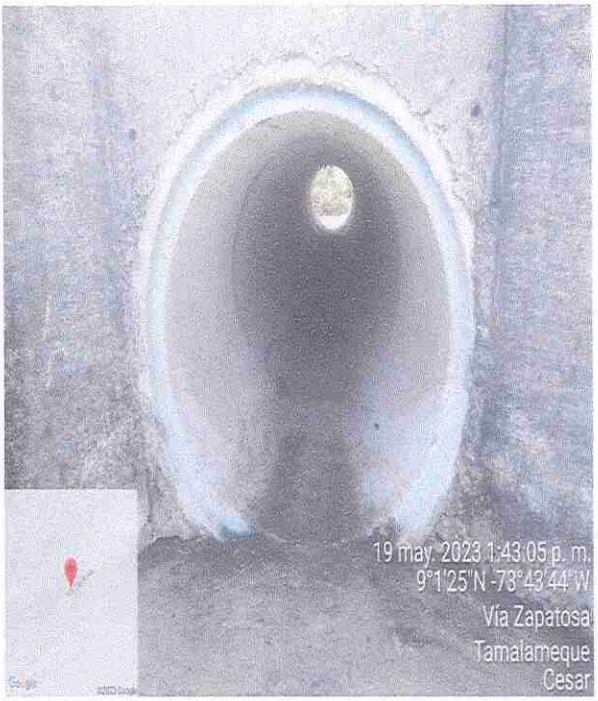


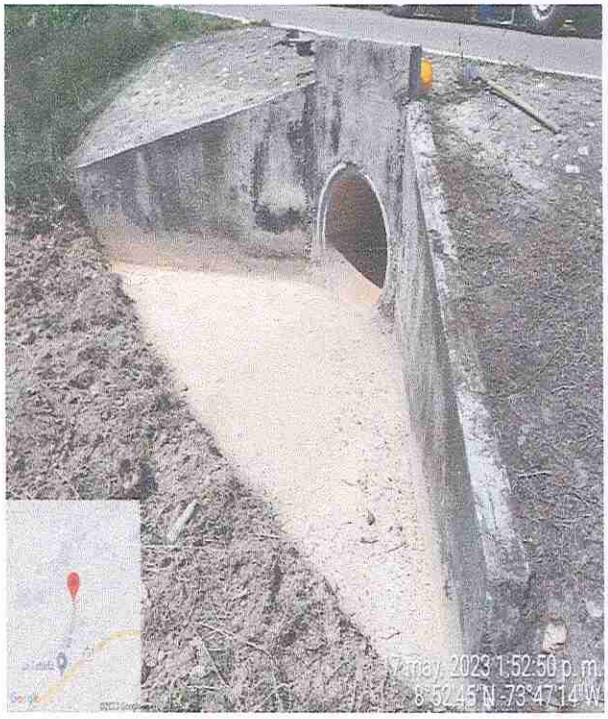



LA RAYA – ZAPATOSA

LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA

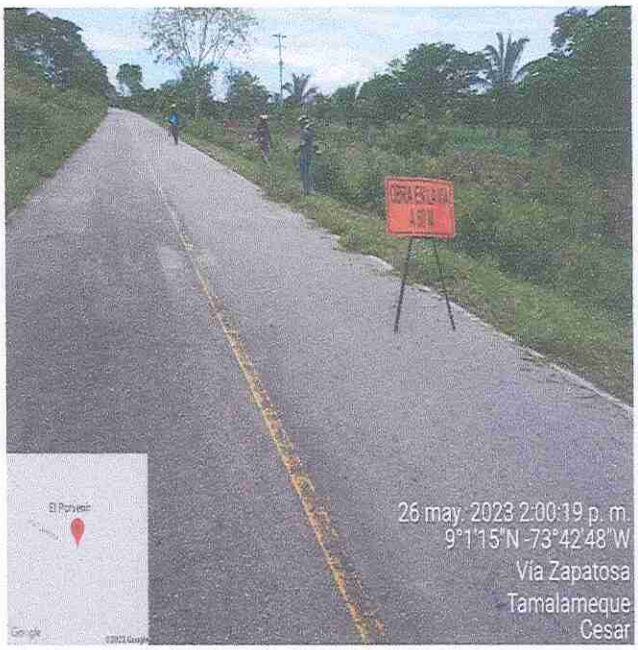



PODA AEREA DE ARBOLES TIPO IV






LIMPIEZA DE BERMAS



LIMPIEZA DE CUNETAS EN CONCRETO

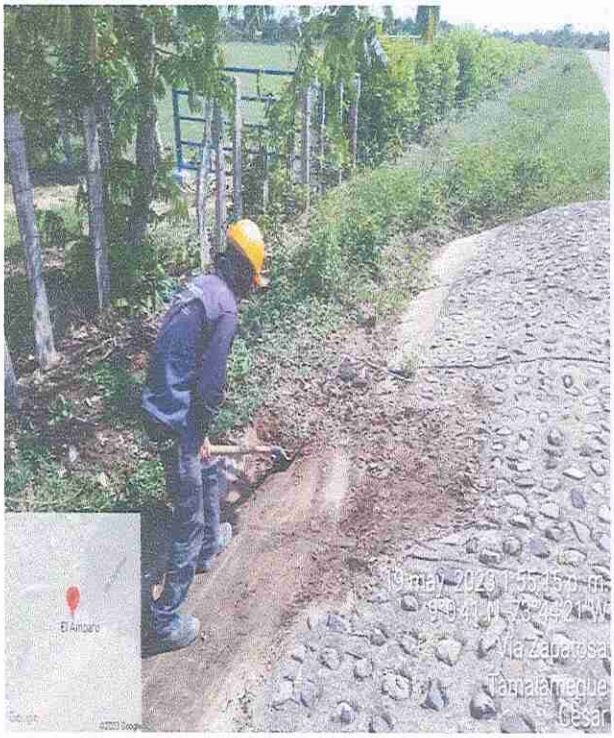

RAMAL – SIMAÑA

LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA





LIMPIEZA DE BERMAS





PODA AEREA DE ARBOLES TIPO IV



