CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	30/05/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Jorge Alvarez - Andres Amaya - Juan José Zapata.
DIA:	martes		
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 65 x calle	SC	S-N	*retiro de herraje y tapa plastica	8:30am	4:30pm	157
51	SC	S-N	*suministro e instalacion de herraje metalica 50x50			OE
			*suministro e instalacion de tapa metalica 50x50			OC
	SC	N-S	*retiro de herraje y tapa plastica			157
			*suministro e instalacion de herraje metalica 50x50			DE
			*suministro e instalacion de tapa metalica 50x50			DE
	SC	N-S	*se realiza reconstruccion y acabado de bordillo 0.5 m x 0,15 m x 0,25 m			—

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE				
REVISÓ	Carlos D	FIRMA				
CARGO		CARGO				

CIVILEC NIT: 890.941.557-7	**PLAN DE CALIDAD**	CIV-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
		ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".**
NÚMERO DEL CONTRATO:	**4600096067 DE 2022**

FECHA:	31/05/2023	**RESPONSABLES EJECUCIÓN:** Kender Perozo - Leomar - Juan José Zapata.
DIA:	Miércoles	
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 70xcalle 9	S-W	N-S	*se realizan 2 perforaciones en poste recto	8:30am	10:05am	218
	S-W	N-S	*Suministro e instalacion de 2 semaforos peatonales dinamicos.			54
	S-W	N-S	*construccion de 2 empalmes para cables de semaforizacion 4x18. en semaforos peatonales dinamicos.			72
			*se utilizan 80cm de cinto bandi - 2 hebillas - 6 conectores resorte para empalme.			—
Carrera 65 x calle 89			*reportan semaforos vehiculares apagados.	10:30am	4:00 pm	
	S-O	S-N	*se encuentra cable de semaforizacion vandalizado en camara MH.			
			*Suministro e instalacion de 100 mts de cable para semaforizacion 4x18. (50 mts Grupo 6) (50 mts Grupo 7)			60
	S-O	S-N	*Construccion de 4 empalmes para cables de semaforizacion 4x18. en camaras MH.			78
	S-O	S-N				
			*Notese paran actividades de 12:40 pm - 1:30 pm por lluvia en el punto de trabajo.			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Carlos D.	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
		ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	31-05-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Miercoles	Cesar Santos, Oslor lopez, Jose Luis, Gustavo betancur
VEHÍCULO:	IKN741	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR65 CL 51	S-E.	E-W.	Retiro de 1 semaforo Vehicular a poste golpeado	7:10	A-40	142
			instalación de 1 semaforo Vehicular a poste de segunda con instalación de 3 visera nuevas.			175
			Suministro e instalación de 1 semaforo ciclista			179
			Construcción de 3 empalmes electricos en			58
			semaforo peatonal, semaforo ciclista y Vehicular			78
	S-E	S-N.	Perforada de Poste para instalar cable de Peatonal			218
			1 hueco.			
			Construcción de 2 empalmes electricos en semaforo			78
			Peatonal y Vehicular			
			Soldadura de cable de puesta a tierra que se			DE
			encontro rebentado.			
		S-N	Separador central sur.			
			Construcción de 4 empalmes electricos			78
			en 2 semaforos Peatonales, Un ciclista y un Vehicular			
	N-W	N-S	Perforada de 2 hueco en Poste Vehicular para			218
			instalar cable de grupo peatonales			
			Suministro e instalación de 1 semaforo Peatonal.			52
			Construcción de 3 empalmes electricos 2 para			78
			Peatonales y uno para Vehicular			
			Soldadura de 4 cordones a 1 tapa de foso actual			230

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Domenzo	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
		ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	31-05-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Miercoles	Cesar Santos, oscar lopez, jose luis, Gustavo betancur
VEHÍCULO:	IKN 721	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR65 CL51		N-S	Separador central Norte.	7-10	4-00	
			Construcción de 4 esquinas Peatonales en 2 semaforos Peatonales, un ciclista y en Vehiculos			78
			Retiro de 4 cordon de soldadura en 1 tapa de 50x50 metalica			153
			Soldadura de 4 cordones en 1 tapa de 50x50 metalica			230
	N-E		Retiro de 8 cordones de soldadura en 2 tapas de 50x50 metalicas			153
			Soldadura de 4 cordones de soldadura en 1 tapa de 50x50.			230
			se le allian puntos de soldadura a 1 tapa de 50x50.			
	S-E		Retiro de 1 tapa de concreto de 50x50 de control trolador local.			139
			Suministro e instalación de 1 tapa metalica de 50x50.			0E
			Soldadura de 4 cordones en 1 tapa metalica de 50x50			-
			Retiro de 8 cordones de soldadura en 2 tapas de 50x50 metalicas			153
			Retiro de 4 cordones de soldadura en 1 tapa de 60x80.			153
			se le allian puntos de soldadura en 2 tapas de 50x50			-
			se le allian puntos de soldadura en 1 tapa de 60x80			-

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
		ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	31-05-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Miercoles	Cesar Santos, Oslor Lopez, Jose Luis, Gustavo Betancur
VEHÍCULO:	IKN721.	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
~~CR65~~	S-W.		Soldadura de 4 cordones a 1 toma de 60x80	7:00	A-12	230
CR65 CL51	X		Se le aplican 4 puntos de soldadura a 1 toma de 60x80. en esta costado hay 2 tomas de 60x80.			
			Nota en esta intersección queda pendiente por soldar definitiva 4 tomas de 50x50 y 2 de 60x80.			
			Se utilizan. 76 conectores de resorte. 46 electrodos, 15 discos de corte de metal, 1 disco de pulir. una broca cierra. 1 broca de hormigon de 1/2 y una de 1/8			
CR65 CL51			Retiro de (11mt + 17mt + 44mt + 20mt + 35mt) = 127mts de cable 4x18 y 4x16. Para reintegro. estas se reemplazaron por goteras nuevas			143

VERIFICACIÓN					
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE			
REVISÓ		FIRMA			
CARGO		CARGO			

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD PRODUCTO NO CONFORME	CIV-SGC-F-011 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022
FECHA: Mayo 31 del 2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN: Carlos Alberto Díaz, Lina Maria Giraldo

1. IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O HALLAZGO

ACCIÓN CORRECTIVA Nº	X	ACCIÓN PREVENTIVA Nº		ACCIÓN DE MEJORA	

Fuente	
Auditoría interna	
Queja o Reclamo	
Sugerencia Interna	
Revisión por la Gerencia	
Producto no conforme	X
Impacto ambiental	
Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seguimiento procesos (Indicadores)	
No conformidad menor	X
Reunión de calidad o Comité de calidad	
Otra _____	

No Conformidad o Descripción de la Situación

Durante el recorrido de verificación para validación y recepción de obras por parte de la Interventoría en los siguientes puntos: cruce nuevo carrera 77D con entre calles 57 y 60, y complementos peatonales: carrera 70 con calle 9 y 14, Carrera 68A con calle 47D, Carrera 65 con calle 51, se presentan las siguientes no conformidades.

*** Carrera 77D entre calles 57 y 60:** Subir los discos direccionales de la posición actual en la que se encuentran.
*Retocar pintura de ménsula sentido oriente-occidente y occidente-oriente
*Instalación de caucho en la abrazadera metálica adosada al puente.
*Instalación de pavimento en frio en el lugar del apique, o instalación de pavimento en caliente en toda la brecha

***Carrera 68A con calle 47D:**
*Reubicar discos direccionales (subirlos)
*Cambio de tres discos direccionales por deficiencia en el acabado
*Retocar pintura de postes
*Quitar zuncho sobrante semáforo costado Nororiental

***Carrera 65 con calle 51:**
*Cambio de soldaduras tapa Norte-Sur
*Cambio de marco y soldadura separador central
*Marco y soldadura Nororiental

Detectada Por:	Contratista e Interventoría, durante recorrido
Responsable del proceso que la generó:	Proceso de Ampliación de la red de semáforos

Norma que afecta	ISO 9001	X	ISO 14001		ISO 18001	

Numeral de la norma o requisito del proceso que se incumple: _____

2. CORRECCIÓN

Se debe asignar la ejecución de los correctivos a una o varias de las cuadrillas que operan para el proyecto de ampliación y reposición de la red de semáforos

3. ANÁLISIS DE CAUSAS

¿Por qué? Posible falta de experiencia o rigurosidad en el desarrollo de la actividad por parte del personal a cargo

4. PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO

Asignar las actividades pendientes a cuadrillas con experiencia, previa explicación específica de las necesidades y especificaciones para instalación de elementos y acabados.

Responsable de implementar (nombre y cargo):	Carlos Alberto Diáz (Ingeniero Electricista)	Fecha estimada:	15 de junio del 2023
Responsable del seguimiento (nombre y cargo):	Lina Maria Giraldo Botero (Asesora calidad)	Fecha de seguimiento:	20 de junio del 2023

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-011 VERSIÓN 1
	PRODUCTO NO CONFORME	ED: DIC 2022

5. SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN

SEGUIMIENTO 1	Fecha: 20/06/23	**SEGUIMIENTO 2**	**APLICA: SI NO X**	Fecha:

Se Aplicó Plan de Acción SI X NO	Se Aplicó Plan de Acción SI NO:
Evidencia de la Aplicación y Verificación de la Eficacia Registro fotográfico	Evidencia de la Aplicación y Verificación de la Efica
EFICACIA SI: X NO:	**EFICACIA SI:** **NO:**
Observaciones: Las actividades realizadas cumplen con subsanar las no conformidades evidenciadas por parte de la interventoría, se autoriza el pago del cruce nuevo de la carrera 77D co	Observaciones finales
firma responsbable de implementar: Carlos D	
Firma responsable seguimiento:	Firma responsable seguimiento:

REGISTRO FOTOGRÁFICO NO CONFORMIDAD

CIVILEC	PLAN DE CALIDAD
	CONTROL DE DAÑOS Y ATENCIÓNES REPORTADAS, PROGRAMADAS Y ATENDIDAS
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN:
CARLOS ALBERTO DÍAZ

PRIORIDAD DE ATENCIÓN:
ALTA: Intersecciones apagadas. MEDIA-ALTA. Intersecciones en intermitencia. MEDIA: Intersecciones funcionales pero con algún elemento defectuoso. BAJA: Mantenimiento preventivo.
NO PRIORITARIO: No genera afectaciones sobre la funcionalidad de la red semafórica, principalmente aspectos estéticos

#	FECHA	DIRECCIÓN	DAÑO O REPORTE	MEDIO DEL REPORTE	QUIEN REPORTA O SOLICITA	PRIORIDAD DE ATENCIÓN					FECHA DE PROGRAMACIÓN ATENCIÓN	ATENCIÓN COMPLETA	FECHA DE CIERRE
						ALTA	MEDIA-ALTA	MEDIA	BAJA	NO PRIORITARIO			
189	1/6/2023	CR 53 X CL 30A	TAPA PERFORADA	plataforma	Interventoría				x		1/6/2023		
190	1/6/2023	CR 78 X CL 30	SOLDAR TAPA	plataforma	Interventoría				x		1/6/2023	ok	15/6/2023
191	1/6/2023	CR 76 X CL 30	POSTE GOLPEADO	plataforma	Interventoría				x		1/6/2023		15/6/2023
192	1/6/2023	CR 70 X CL 44	PEATONAL MALO	plataforma	Interventoría				x		1/6/2023	OK	6/6/2023
193	1/6/2023	CR 51 X CL 64	COMUNICACION MALA	plataforma	Interventoría				x		1/6/2023	OK	15/6/2023
194	1/6/2023	CR 99 X CL 47D	PEATONAL MALO	plataforma	Interventoría				x		1/6/2023	ok	10/6/2023
195	1/6/2023	CR 47 X CL 58	LAMPARA VERDE A MENSULA MALA	plataforma	Interventoría				x		1/6/2023	ok	8/6/2023
196	1/6/2023	CR 65 X CL 81	SOLDAR TAPAS	plataforma	Interventoría				x		1/6/2023	ok	10/9/2023
197	1/6/2023	CR 76 X CL 33	PEATONAL APAGADO	plataforma	Interventoría				x		1/6/2023		
198	5/6/2023	CR 45 X CL 52	PEATONAL APAGADO	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023		
199	1/6/2023	CR 84 X CL 44	INDEPENDIZAR GRUPOS	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023	ok	8/6/2023

CIVILEC	PLAN DE CALIDAD
	CONTROL DE DAÑOS Y ATENCIÓNES REPORTADAS, PROGRAMADAS Y ATENDIDAS
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN:
CARLOS ALBERTO DÍAZ

PRIORIDAD DE ATENCIÓN:
ALTA: Intersecciones apagadas. MEDIA-ALTA. Intersecciones en intermitencia. MEDIA: Intersecciones funcionales pero con algún elemento defectuoso. BAJA: Mantenimiento preventivo.
NO PRIORITARIO: No genera afectaciones sobre la funcionalidad de la red semafórica, principalmente aspectos estéticos

#	FECHA	DIRECCIÓN	DAÑO O REPORTE	MEDIO DEL REPORTE	QUIEN REPORTA O SOLICITA	PRIORIDAD DE ATENCIÓN					FECHA DE PROGRAMACIÓN ATENCIÓN	ATENCIÓN COMPLETA	FECHA DE CIERRE
						ALTA	MEDIA-ALTA	MEDIA	BAJA	NO PRIORITARIO			
200	5/6/2023	DIAG 74 B x CL 32	Reparación	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023	ok	8/6/2023
201	5/6/2023	CR 76 x CL 32 F	Cara vehicular girada o golpeada	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023	ok	8/6/2023
202	5/6/2023	CR 43 A x CL 30 PEATONAL PREMIUM	Lámpara Mala	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023	OK	20/6/2023
203	5/6/2023	CR 48 x CL 31 Tierragro	Semáforo Girado	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023	ok	8/6/2023
204	5/6/2023	CR 65 x TV 78	Peatonal apagado	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023	OK	20/6/2023
205	5/6/2023	CR 43 C x CL 11	instalación sonorizadores	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023	OK	17/6/2023
206	5/6/2023	CR 66 x CL 94	Lámpara mala	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023	OK	10/6/2023
207	5/6/2023	CR 66 x CL 95	Lámpara mala	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023	OK	10/6/2023
208	5/6/2023	CR 74 x CL 44	vehicular apagado	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023	OK	17/6/2023
209	5/6/2023	CR 52 x CL 25	Lámpara mala	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023	OK	17/6/2023
210	5/6/2023	AV 80 x CR 65 Campos de paz	Semáforo Girado	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023	ok	8/6/2023

CIVILEC	PLAN DE CALIDAD
	CONTROL DE DAÑOS Y ATENCIÓNES REPORTADAS, PROGRAMADAS Y ATENDIDAS
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN:
CARLOS ALBERTO DÍAZ

PRIORIDAD DE ATENCIÓN:
ALTA: Intersecciones apagadas. MEDIA-ALTA. Intersecciones en intermitencia. MEDIA: Intersecciones funcionales pero con algún elemento defectuoso. BAJA: Mantenimiento preventivo.
NO PRIORITARIO: No genera afectaciones sobre la funcionalidad de la red semafórica, principalmente aspectos estéticos

#	FECHA	DIRECCIÓN	DAÑO O REPORTE	MEDIO DEL REPORTE	QUIEN REPORTA O SOLICITA	PRIORIDAD DE ATENCIÓN					FECHA DE PROGRAMACIÓN ATENCIÓN	ATENCIÓN COMPLETA	FECHA DE CIERRE
						ALTA	MEDIA-ALTA	MEDIA	BAJA	NO PRIORITARIO			
211	5/6/2023	CR 64 C x CL 57 Unal.	Semáforo Girado	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023	ok	6/6/2023
212	5/6/2023	CR 66 A x CL 33 LAT OCCIDENTAL	Lámpara mala	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023	ok	11/6/2023
213	5/6/2023	CR 43 C x CL 5 SUR (C. EJECUTIVO)	Semáforo Girado	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023	ok	11/6/2023
214	5/6/2023	CR 46 x CL 54	Peatonal apagado	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023		
215	5/6/2023	CR 108 BB x CL 62 D (Ye VIA AL MAR)	Semáforo Girado	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023	ok	11/6/2023
216	5/6/2023	CR 78 x CL 30 A	Peatonal apagado	plataforma	Interventoría				x		5/6/2023	OK	20/6/2023
217	13/6/2023	CR 45 x CL 84	Corto circuito	plataforma	Redes sociales			x			13/6/2023	ok	17/6/2023
218	14/6/2023	CR 52 x CL 61	Mantenimiento	plataforma	Redes sociales			x			14/6/2023	OK	20/6/2023
219	19/6/2023	CR 51 x CL 35	Mantenimiento	plataforma	INTERVENTORIA			x			19/6/2023	OK	20/6/2023
220	19/6/2023	CR 57 x CL 36	Mantenimiento	plataforma	INTERVENTORIA			x			19/6/2023	OK	20/6/2023
221	19/6/2023	CR 51 x CL 36	Mantenimiento	plataforma	INTERVENTORIA			x			19/6/2023	OK	20/6/2023

CIVILEC	PLAN DE CALIDAD
	CONTROL DE DAÑOS Y ATENCIÓNES REPORTADAS, PROGRAMADAS Y ATENDIDAS
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN:
CARLOS ALBERTO DÍAZ

PRIORIDAD DE ATENCIÓN:
ALTA: Intersecciones apagadas. MEDIA-ALTA. Intersecciones en intermitencia. MEDIA: Intersecciones funcionales pero con algún elemento defectuoso. BAJA: Mantenimiento preventivo.
NO PRIORITARIO: No genera afectaciones sobre la funcionalidad de la red semafórica, principalmente aspectos estéticos

#	FECHA	DIRECCIÓN	DAÑO O REPORTE	MEDIO DEL REPORTE	QUIEN REPORTA O SOLICITA	PRIORIDAD DE ATENCIÓN					FECHA DE PROGRAMACIÓN ATENCIÓN	ATENCIÓN COMPLETA	FECHA DE CIERRE
						ALTA	MEDIA-ALTA	MEDIA	BAJA	NO PRIORITARIO			
222	19/6/2023	CR 46 x CL 41	Mantenimiento	plataforma	INTERVENTORIA			x			19/6/2023	OK	20/6/2023
223	19/6/2023	CR 57 x CL 56 FATELARES SURORIENTAL	Reposición	plataforma	INTERVENTORIA			x			19/6/2023	ok	21/6/2023
224	19/6/2023	CR 57 x CL 57 FATELARES SUROCCIDENTAL	Reposición	plataforma	INTERVENTORIA			x			19/6/2023	ok	21/6/2023
225	19/6/2023	CR 46 x CL 78	Mantenimiento	plataforma	INTERVENTORIA			x			19/6/2023	OK	4/7/2023
226	20/6/2023	CR 50 x CL 43	Mantenimiento	plataforma	INTERVENTORIA			x			20/6/2023	OK	4/7/2023
227	20/6/2023	CR 50 x CL 41	Mantenimiento	plataforma	INTERVENTORIA			x			20/6/2023	OK	4/7/2023
228	20/6/2023	CR 51 x CL 41	Vandalismo	plataforma	INTERVENTORIA			x			20/6/2023	OK	4/7/2023
229	20/6/2023	CR 51 x CL 41	Mantenimiento	plataforma	INTERVENTORIA			x			20/6/2023	OK	5/7/2023
230	20/6/2023	CR 52 x CL 41	Mantenimiento	plataforma	INTERVENTORIA			x			20/6/2023	OK	5/7/2023
231	20/6/2023	CR 43 X CL 31	Mantenimiento	plataforma	INTERVENTORIA			x			20/6/2023	OK	6/7/2023
232	20/6/2023	CR 70 x CL 27	Mantenimiento	plataforma	INTERVENTORIA			x			20/6/2023	OK	6/7/2023


CIVILEC	PLAN DE CALIDAD
	CONTROL DE DAÑOS Y ATENCIÓNES REPORTADAS, PROGRAMADAS Y ATENDIDAS
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN: CARLOS ALBERTO DÍAZ	PRIORIDAD DE ATENCIÓN: ALTA: Intersecciones apagadas. MEDIA-ALTA. Intersecciones en intermitencia. MEDIA: Intersecciones funcionales pero con algún elemento defectuoso. BAJA: Mantenimiento preventivo. NO PRIORITARIO: No genera afectaciones sobre la funcionalidad de la red semafórica, principalmente aspectos estéticos

#	FECHA	DIRECCIÓN	DAÑO O REPORTE	MEDIO DEL REPORTE	QUIEN REPORTA O SOLICITA	PRIORIDAD DE ATENCIÓN					FECHA DE PROGRAMACIÓN ATENCIÓN	ATENCIÓN COMPLETA	FECHA DE CIERRE
						ALTA	MEDIA-ALTA	MEDIA	BAJA	NO PRIORITARIO			
233	20/6/2023	CR 63 x CL 42 Paso peatonal unidad colseguros parques del rio	Mantenimiento	plataforma	INTERVENTORIA			x			20/6/2023	OK	6/7/2023
234	20/6/2023	CR 35 x CL 29 C (LOMA INDIO)	Mantenimiento	plataforma	INTERVENTORIA			x			20/6/2023	OK	6/7/2023

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA

ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ
NOMBRE: CARLOS ALBERTO DÍAZ	NOMBRE:
FIRMA 	FIRMA
CARGO Ingeniero electricista	CARGO

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	01-06-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	
DIA:	Jueves	Cesar Santos, Leonar riera, Jose Luis, Gustavo betancur	
VEHÍCULO:	IKN 741		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
			Se Presentan lluvias en horas de la mañana en Zona de la bodega Por tal motivo no Podemos cargue y descargue del Vehiculo con los elementos	9:30	11:10	
*CR67-70 CL50 Telecomunicaciones			Red telefonica de equipos de control semaforico se hace seguimiento a cable telefonico de los Pozos desde CR67 CL50 al occidente Por Canaleta de tuyo unen Se localiza cable cortado en calle 50 # 67-94 Continuamos con el seguimiento al occidente hasta calle 50 # 68-38 y no encontramos la otra Punta Por ninguno lado. Se suspenden actividades Por los motivos de Soldado de Platinas para Poder hacer Puntos	9-30	11:10	229

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE				
REVISÓ	Cristian	FIRMA				
CARGO		CARGO				

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
		ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	01-06-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Jueves	Cesar Santos, Joselu.T, Leomer viera
VEHÍCULO:	IKN 721	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRA5-CL51	S-W		Suministro e instalación de 1 Poste recto con Platon	~~8-30~~ 11-50	16-40	46
			Suministro e instalación de 2 semaforos peatonales de conteo regresivo.			52
			Suministro e instalación de 1 semaforo Ciclista			58
			Construcción de 43 cm de ducto electrico			78
			Nota: se Presentan lluvias intermitentes desde de la 12-30 PM.			
			Soldadura de 4 cordones a 1 tapa de 60x80.			230
			Se Paralizo Central Sur.			
			Soldadura de 4 cordones a 1 tapa metalica de 50x50.			230
	S-E		Soldadura de 8 cordones a 2 tapas de 50x50 metalicas			230
			Soldadura de 4 cordones a 1 tapa de 60x80.			230
	N-E		Soldadura de 4 Cordones a 1 tapa metalica de 50x50.			230
			Nota: Queda Pendiente por Chequear a tension grupo amer			

VERIFICACIÓN					
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	Victoria Dorango	NOMBRE			
REVISÓ	Collazo	FIRMA			
CARGO		CARGO			

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	1/06/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	William Chavarría
DIA:	Jueves		Andres Arango S.
VEHÍCULO:	Camioneta		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 74			Cruce semaforos malos (grupo 3 en cinta).	07:00 Am		
Calle 44						
	N-E	N-S	demolicion de tapa de 0,50x0,50 (caja de inspeccion).			
			Suministro e instalación de 30 metros de cable semaforo 4 X 18 (grupo 3)			60
	N-E	N-S	limpieza de caja de 0,50 x 0,50			
	N-E	E-W	limpieza de caja de 0,50 x 0,50 (caja contador).			
	N-W	N-S	construcción de un empalme en poste (tapa bornera) 5 cables.			78
	N-W	N-S	suministro e instalación de 5 conectores de resorte (Amarillos)			—
	N-W	N-S	suministro e instalación de tapa metalica 0,50 x 0,50			
	N-E	E-W	Suministro e instalacion de tapa metalica 0,50 x 0,50			
	N-E	N-S	suministro e instalación de tapa metalica 0,50 x 0,50			
			construcción de soldadura en 3 tapas metalicas 0,50 x 0,50 (4 cordones)			—
			Retiro de 21 metros de cable 4 x 16 malo (grupo 3).			143
		Nota	pendiente cambio de lente malo Cilo de frente derecha sentido			
			Norte Sur costado Noroccidental (grupo 5).		4:30 pm	

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	02-06-2023.	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Viernes	Cesar Santos, Leomar neta, Joselo.S, Gustavo Betancur
VEHÍCULO:	IKN 708	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*CRA6-45 calle. 52			Red telefonica de controladores con daños motivos Vandalismo. Se le hace seguimiento a cable telefonico de comunicación de 6 pares. de 20 pares. Se localiza cable cortado a la altura del conservico en camara de una Vivienda en el centro de los ciclomotos Retiro de 52mts. de cable telefonico de 20 pares Para reemplazo Vandalizado.	8-10	16-20	170
			Instalación de 64m de cable telefonico de 10 pares desde conservico hasta cortado S-E de la CR46 calle 52			182
			Suministro e instalación de # 2 cubiertas telefonicas una en CR 46 calle 52 cortado S-E y una a la altura de conservico. Se utilizan 40 conectores CY.			79
			Nota: Programar retiro de cable Pargos del Parque. que esta cortado en otro otro.			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ		FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	02-06-23	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Angelo Gomez.
DIA:	Viernes		Juan Esteban Osorio.
VEHÍCULO:	WLY 897.		

	DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*	Cra 67 x Cll 104	S	WE	Ajustar y Enderezar peatonal Golpeado, torcido y ajuste de Flege	8:40		226
				Se coloca (1) Sunchada con (1) Hebilla Metalica.		9:00.	88
*	Cra 65 x Cll 103EE	W	NS	Retiro de Lámpara China #3 Vehicular Verde. (quemada)	9:06		165
				Instalación de (1) lampara china #3 Verde Buena.			186
				Construcción de (1) Empalme. y (4) Conectores.		9:30	78
*	Cra 66 x Cll 94	ES	WE	Exclusiva Peatonal Golpeado, se retira Semaforo Peatonal Malo.	9:37.		142
				Instalación de (1) Semáforo Peatonal con lámpara Estaticas Municipio			175
				Instalación de (2) accesorios de Pasta.			-
				Construcción de (1) Empalme y (3) Conectores		10:20	78
*	Cra 65 x Trans V 78.			Revisión de Peatonales apagados. (8) unidades Grupos 14-15-16	10:25		
				(NS-ambos) (NS-S ambos) (SN-ambos) (SN-N ambos) (EW-ambos).			
		SW	NS	→ Cambio de Linea Verde por la amarilla			
				→ Construcción de (1) Empalme. y (3) Conectores.			78
				Nota = Se dejan encendidos los Peatonales en funcionamiento		12:45	
*	Cra 43c x Cll 11	W	NS	Grupo Peatonal Color Verde apagados. (en corto)	14:20		
				→ Construcción de (1) Empalme. y (3) Conectores (retiro de Bornera)			78
				→ Retiro de (1) Sonorizador, (En corto y dañado).		15:10	146

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE				
REVISÓ	Carlos	FIRMA				
CARGO		CARGO				

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	02/06/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Kender Perozo-Juan José Zapata.- Juan Fernando
DIA:	Viernes		
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*Carrera 47 x calle 54		E-W	*Se realiza canalización en zona dura. 1.32 mts largo x 83cm - 76 cm.	8:00 am	4:00 pm	16

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ	Victoria Durango		NOMBRE				
REVISÓ	Carlos		FIRMA				
CARGO			CARGO				

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

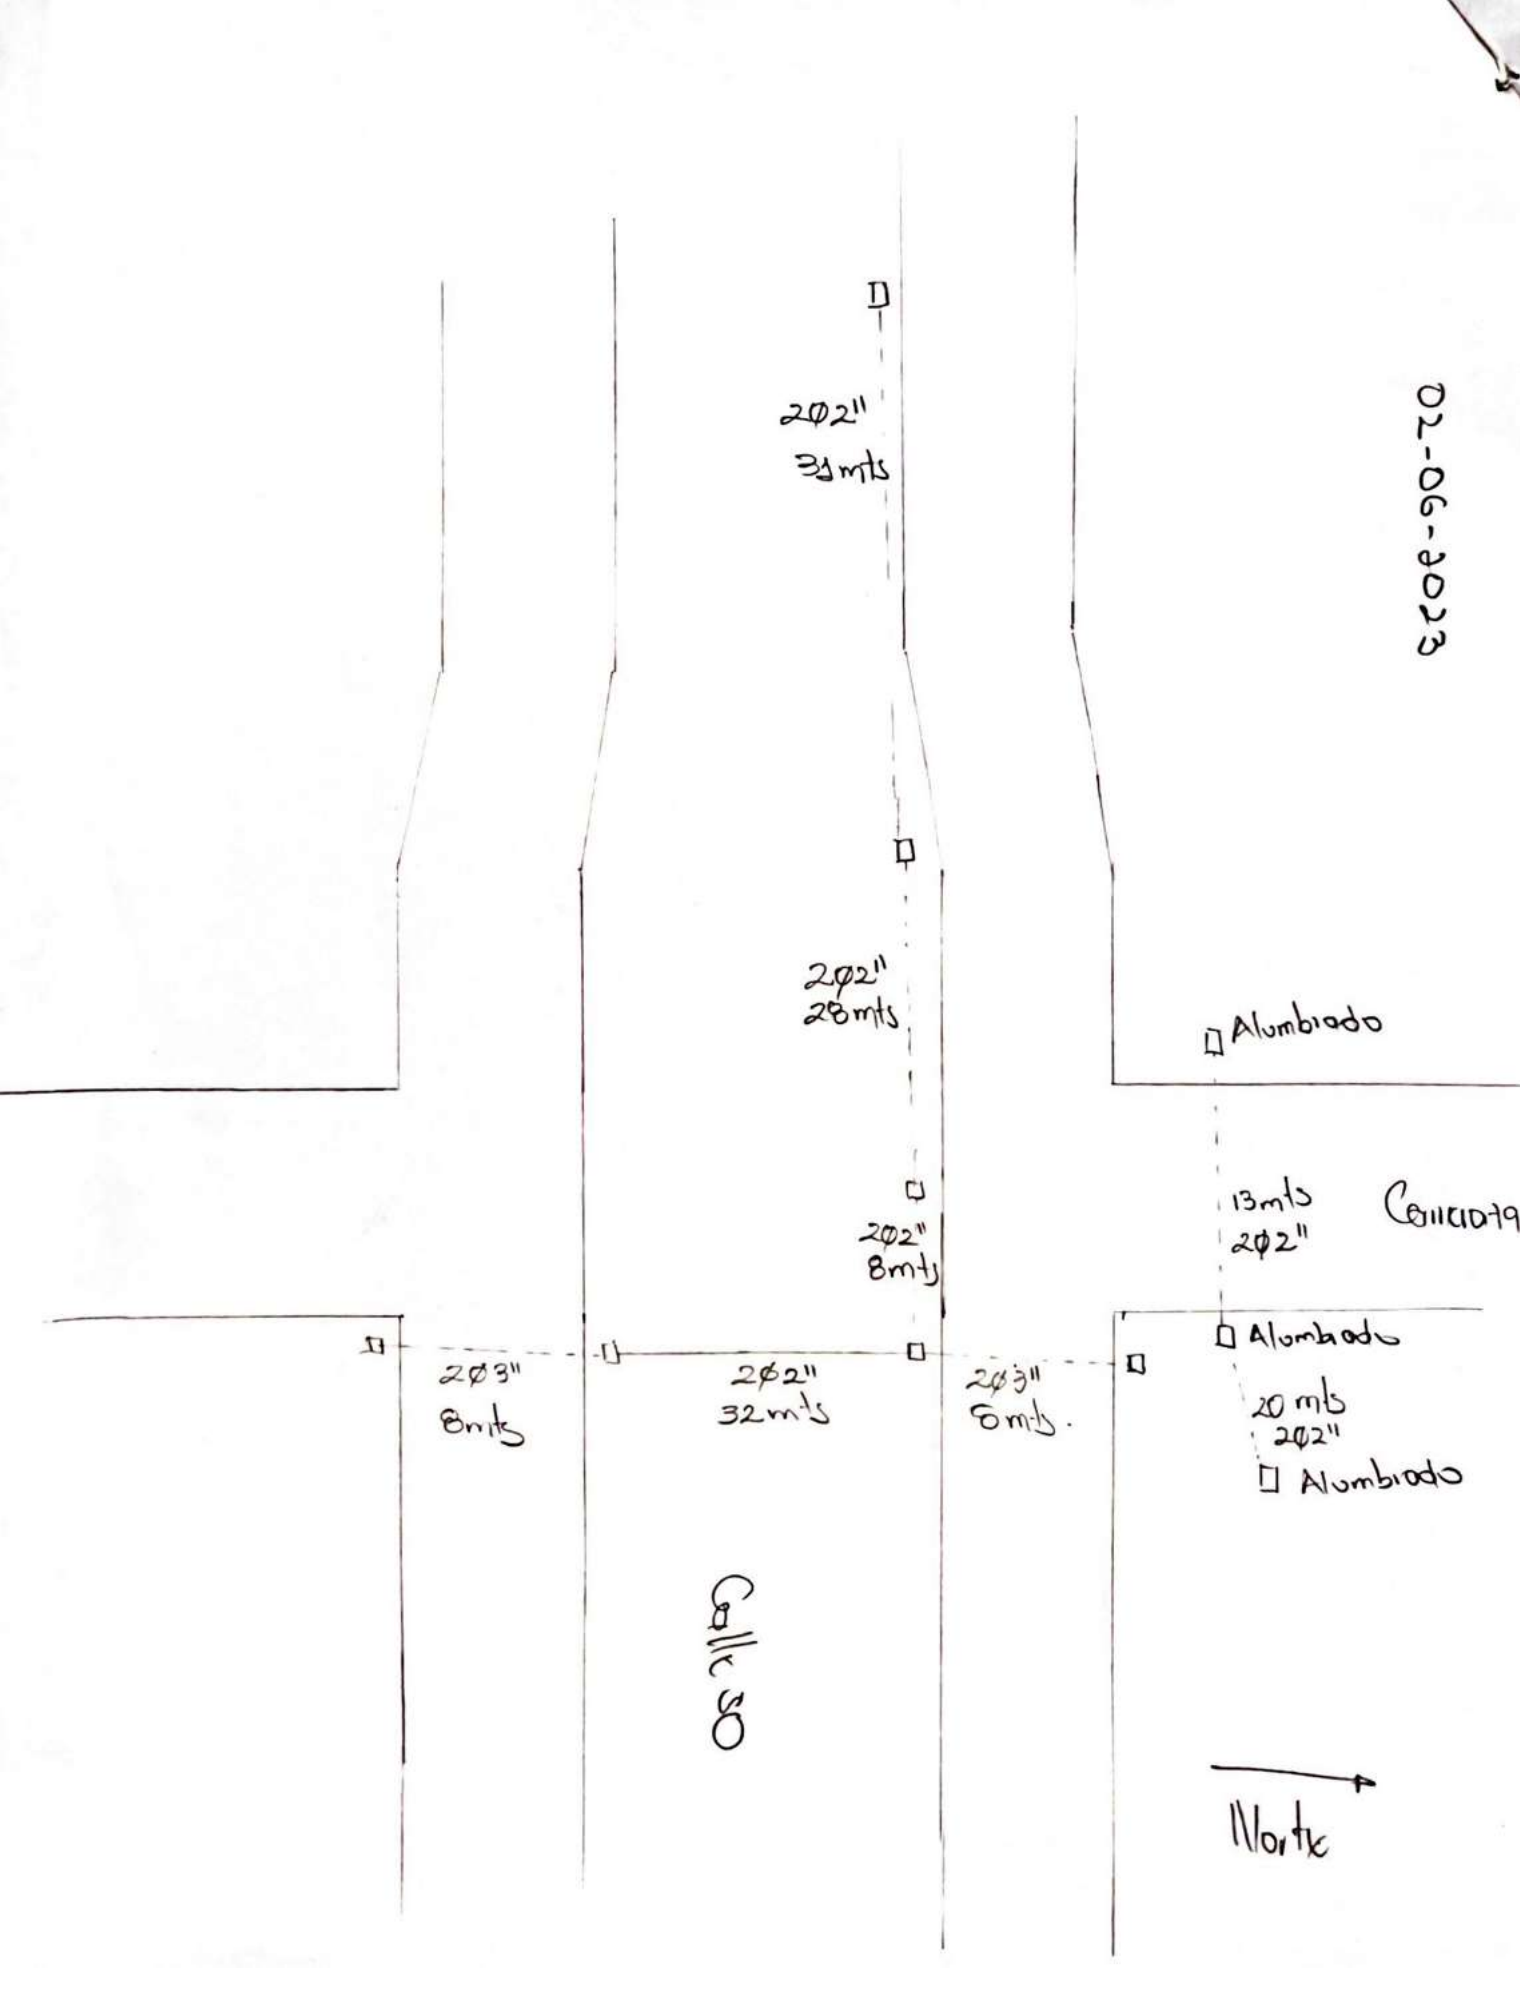
NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	2-06-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	viernes	Andrés Amaya - Willian Chavarría
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Av 80 x CL 50			Sondeo de canalizaciones y búsqueda de cajas. Levantamiento de plano			2.12

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	


02-06-2023
2Ø2"
39 mts
2Ø2"
28 mts
Alumbrado
13 mts
2Ø2"
Calle 79
2Ø2"
8 mts
Alumbrado
2Ø3"
8 mts
2Ø2"
32 mts
2Ø3"
6 mts.
20 mts
2Ø2"
Alumbrado
Calle 80
Norte

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	03-06-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	
DIA:	Sabado.	Cesar Santos, Willian chavarria, Jose luis, Javier Jaramillo.	
VEHÍCULO:	JYW 576		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* CR 54 CL 92			Glorieta madre laura. aranjuez.	8-10	11-35	
			Reatonales arreglador. en carro.			
			construcción de 2 empalmes electricos en caja			78
			de 30x30. metalica debajo del puente			
	E.		construcción de 1 empalme electrico en caja de			78
			50x50.			
		S-N.	separador central del puente			
			construcción de 1 empalme electrico en			78
			semaforo ciclista.			
			Suministro 2 pca semaforo Peatonal y ciclista			88
			golpeador. 2 Endrezados			226
* CR 48 CL 58.	S-W	W-E	Vandalismo en cable de potencia de 2 postes	12-00	15-20	
			Peatonales y una Vehicular.			
			Retiro de (31 x 7m) = 21 m de cable 4x10.			143
			para reciclaje			
			Suministro e instalación de (32x16m de cable			60
			4x18 awg (0952 - 1000).			
			construcción de 3 empalmes electricos en			78
			camara de energia de EPM.			
			Construcción de 3 empalmes electricos en			78
			2 Peatonales y un Vehicular			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Cuibo D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	03/06-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN: Kendel Perozo - Icomar - Juan José Zapata.
DIA:	Sabado.	
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Calle 47 x Calle 54.	W-S	E-W	#suministro e instalacion de 272 mts de cable para semaforizacion 4x18. (2272-2000).	8:00 am	3:00 pm	60
	W-S	E-W	#construccion de 5 empalmes para cables de semaforizacion 4x18. (2 empalme en caja vehicular-1 empalme en caja peatonal)-3 empalmes en caja 50x50			78
			#construccion de 2 empalmes para cables de semaforizacion 4x18. (empalme en semaforo peatonal-1 empalme en semaforo vehicular.).			78
	W-S	E-W	#demolicion de tapa 60x60			1
			#limpieza de caja 60x60			
			#suministro e instalacion de tapa metalica 60x60			
			#suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa metalica.			-
	W-S	E-W	#retiro de 4 cordones de soldadura 60x80			153

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE				
REVISÓ	Caiba R	FIRMA				
CARGO		CARGO				

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	**PLAN DE CALIDAD** REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".**
NÚMERO DEL CONTRATO:	**4600096067 DE 2022**

FECHA:	03-06-23	**RESPONSABLES EJECUCIÓN:**	Angelo Gomez.
DIA:	Sabado		Ivan Esteban Osorio
VEHÍCULO:	wly 897.		Jorge Luis Alvarez.

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Cra 66 x Cll 95.	E	NS	Suministro de (23) mts de Cable para Vehicular de 4X18 Nuevo.	7:00		60
			Instalación del Cable 4X18 Nuevo. para dar			-
			Instalación de (1) Semáforo Vehicular del Municipio con lampara china #3			175
			Instalación de (3) viceras de Pasta para el vehicular.			179
			Instalación de (2) viceras de Pasta para el Peatonal.			179
			Construcción de (1) Empalme y (4) Conectores.			78
			Gasto de (4) Hebillas para Sunchar el Semáforo.			-
	W	NS	Suministro de (36) mts de Cable para Vehicular de 4X18 Nuevo.			60
			Instalación del Cable 4X18 Nuevo. para dar Giro al occidente.			-
			Retiro de Viceras Metalicas, Instalación de (3) Viceras de Pasta al Vehicular			168
			Retiro de (3) lamparas chinas #3, Instalación de (3) lampara leotek. con flechas			165-186
			Construcción de (2) Empalmes y (5) Conectores en el Vehicular.			78
			Gasto de (2) hebillas para Sunchar el Semáforo.			-
	S	EW	Retiro de (3) lamparas Chinas #3 del Vehicular.			165
			Instalación de (3) lamparas leotek con flechas (Giro hacia el Sur)			186
			Construcción de (1) Empalme y (4) Conectores			78
			Instalación de (3) viceras de Pasta para el vehicular			179
	E	SN	Retiro de (1) Semáforo vehicular			142
	E	SN	Retiro de (1) disco direccional		13:00	149

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ		NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	03-06-23	RESPONSABLES EJECUCIÓN: Arnoldo Gomez Juan Fernando Rios. Jorge Luis Alvarez
DIA:	Sabado	
VEHÍCULO:	Wly 897	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*Cra 66 x Cll 94.	E	NS	Suministro, Instalación de (65) mts de cable 4X18 Nuevo para Vehiculares.	13:00		60
	N	WE	Suministro, Instalación de (35) mts de cable 4X18 Nuevo para Vehiculares.			60
	S	WE	Suministro, Instalación de (20) mts de cable 4X18 Nuevo para Vehiculares			60
	E	SN	Retiro de (1) Semáforo Vehicular.			142
	E	SN	Retiro de (1) disco direccional		16:00	149

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ		NOMBRE	
REVISÓ	Collazo	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	04/06/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN: William Chavarria-Juan José zapata.
DIA:	Domingo	
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 70x calle 44	S-E	W-E	*se realiza lavado de poste recto	7:40 am	8:15 am	205
			*se realiza lavado de semaforo peatonal estatico			206
	S-E	N-S	*se realiza lavado de poste recto	8:20 am	9:00 am	205
			*se realiza lavado de 2 semaforos peatonales estaticos - Ciclista			206
			*se realiza lavado de sonorizador. *se realiza lavado de disco (sonorizador).			207 211
	S-W	N-S	*se realiza lavado de poste recto	9:05 am	9:40 am	205
			*se realiza lavado de semaforo peatonal estatico.			206
			*se realiza lavado de sonorizador. *se realiza lavado de disco sonorizador.			207-211
	SC	W-E	*se realiza lavado de poste recto.	9:50 am	10:40 am	205
			*se realiza lavado de semaforo vehicular con contraste.			209
			*se realiza lavado de 2 semaforos peatonales estaticos.			206
			*se realiza lavado de disco direccional frente 1.			211
	N-W	E-W	*se realiza lavado de poste recto	10:50 am	11:00 am	205
			*se realiza lavado de semaforo peatonal			206
			*se realiza lavado de disco sonorizador *se lava el sonorizador			211-207
	SC	E-W	*se realiza lavado de poste recto	11:05 am	11:00 am	205
			*se realiza lavado de semaforo vehicular con contraste			209
			*se realiza lavado de 2 semaforos peatonales estaticos.			206
			*se realiza lavado de disco direccional 1 frente.			211

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE				
REVISÓ	Cuidado	FIRMA				
CARGO		CARGO				

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
		ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	4/06/2022	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	William chavarria - Juan José zapata.
DIA:	Domingo.		
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 73 x Calle 44	S-E	W-E	*Se realiza lavado de poste	12:16 am		205
			*se realiza lavado de semaforo peatonal dinamico.	12:16 pm	12:36 pm	206
	S-E	S-N	*se realiza lavado de poste recto	12:40 pm	1:05 pm	205
			*se realiza lavado de semaforo peatonal dinamico			206
			*se realiza lavado de semaforo vehicular con contraste.			209
	S-W	S-N	*se realiza lavado de poste recto	1:10 pm	1:40 pm	205
			*se realiza lavado de semaforo vehicular con contraste			209
			*se realiza lavado de semaforo peatonal dinamico			206
			*se realiza lavado de disco direccional frente izquierda ⇦			211
	SC.	W-E	*se realiza lavado de poste recto	1:50 pm	2:28 pm	205
			*se realiza lavado de semaforo vehicular con contraste			209
			*se realiza lavado de 2 semaforos peatonales dinamicos			206
			*se realiza lavado de disco direccional de frente ↑			211

VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	05-06-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Lunes	Cesar Santos, Leonar Rivera, Joseluis, Gustavo Betancur.
VEHÍCULO:	IKN781	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 45-46 calle 52			Continuamos con el seguimiento de cable telefonico de 20 Pares Vandalizado. Se localiza cable cortado en carrera 46 calle 52 costado S-W. camara telefonica de una en VIA Se hacen Ventanas Para construir empalme Suministro e instalación de 1 cobierta telefonica Se utilizan 20 conectores UY.	8-05	10-25.	79
CR 65 calle 51	S-W.		Garantia semaforo Peatonal en corto. del grupo #8. motivo cable Pizado. en Platina Retiro de 4 cordones de soldadura a 1 tapa de 60x80. construcción del empalme electrico en semaforo Peatonal de conteo regresivo Retiro de #2 Sinchadas Instalación de 2 Sinchadas. Para Semaforo Peatonal Soldadura de 4 cordones a 1 tapa de 60x80. se utilizan 0,9m de cinta bandi. 2 Herrajes 4 electrodos.	11-00	12-35.	

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	Victoria Durango		NOMBRE			
REVISÓ	Cuello		FIRMA			
CARGO			CARGO			

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
		ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NUMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FEHA:	05-06-23	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA	lunes	Cesar Sanchez, Leomar Perez, Joselito, Gustavo Betancur
VEHÍCULO:	IKN 741.	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRA3-A5			Red telefonica de contratistas caiden	13-40	16-50	
Calle 52.			Se hace seguimiento a calle telefonica de 20 pares			
			desde carrera A5 call 52 al Oriente.			
			Se localiza calle cortada en via en la misma			
			linea.			
			Continuamos con el seguimiento de calle se			
			localiza calle cortada en CRA5 CL52 cortada S-E			
			cambia telefonica de cna en adelante.			
			Retiro de 62m de calle telefonica de 10 pares			170
			quedan muy corto para empalmar.			
			Instalación de 85mts de calle telefonica de 10			182
			Pares de Agundas			
			Suministro e instalación de 2 cubiertas			79
			telefonicas una en CRA5CL52 y una sobre altura			
			del cerca via de ciclorruta			
			Soldadura de 12 cordones a 3 tapas de cama-			230
			-ras telefonicas de tipo cna			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	05-06-23.	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Angelo Gaviez
DIA:	Lunes.		Juan fernando Rios.
VEHÍCULO:	WLY 897.		Juan Esteban Osono

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Cra66 x Cll 94	S	WE	Retiro de (3) lamparas Chinas #3 Vehiculares.	11:30.		165
			Retiro de (3) Viceras de lamina			168
			Retiro de (1) Contraste.			169
			Instalación de (3) lamparas Leotek con flecha del Municipio			186
			Instalación de (3) Viceras de Pasta del Municipio.			179
			Instalación de (1) Contraste Recuperado. Pintado			201
			Construcción de (2) Empalmes y (8) Conectores.		13:20	78
* Cra66 x Cll 94	N	WE	Instalación de (1) Semáforo Vehicular del Municipio.	14:10		175
			Retiro de (1) Contraste.			169
			Retiro de (3) viceras de lamina.			168
			Instalación de (3) lámparas Chinas #3.			186
			Instalación de (3) viceras de Pasta para el Vehicular.			179
			Instalación de (2) accesorios de Pasta..			—
			Construcción de (1) Empalme y (4) Conectores.			78
			Instalación de (1) Contraste Recuperado Pintado.		14:30	201
* Cra66 x Cll 94	E	NS	Instalación de (1) Semáforo Vehicular del Municipio	14:40		175
			Retiro de (1) Contraste.			169
			Retiro de (3) viceras de lamina.			168
			Retiro de (3) lamparas Chinas #3.			165
			Instalación de (1) Contraste. Recuperado Pintado.			201
			Instalación de (3) viceras de Pasta para el Vehicular			179
			Instalación de (2) accesorios de Pasta.			—
			Construcción de (1) Empalme y (4) conectores.			78
			Instalación de (3) lamparas leotek con flecha. del Municipio			186
			Gasto de Hebillas = (7) Hebillas Metalicas		15:00	

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango Collazo	NOMBRE	
REVISÓ		FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	5-06-23	RESPONSABLES EJECUCIÓN: Angelo Gómez.
DIA:	Lunes	Juan Fernando Rios.
VEHÍCULO:	Wly 897.	Juan Esteban Osorio.

	DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*	Cra 66 x Cll 94.	W	NS	Retiro de (3) viceras de laming.	15:00		168
				Retiro de (1) disco direccional.			149
				Instalación de (3) viceras de pasta para Semáforo Vehicular.		15:20.	179
*	Cra 66 x Cll 95	S	WE	Retiro de (1) Semáforo Vehicular	15:40		142
				Retiro de (1) disco direccional.		16:00.	149

VERIFICACIÓN					
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE			
REVISÓ	Collazo	FIRMA			
CARGO		CARGO			

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	05/06/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	William chavarria - Jorge alvarez - Juan José zapata.
DIA:	Lunes		
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 77x calle 55	E-S	E-W	*Se realiza retoque de pintura en poste recto	9:00am	9:10am	—
	E-N	E-W	*Se realiza retoque de pintura en poste de mensula.			—
Carrera 76x calle 33	S-W	S-N	*retiro de lampara peatonal estatica roja	9:30am	10:10am	165
			*instalacion de lampara peatonal estatica roja Nueva del municipio.			186
			*construccion de un 1 empalme para cables de semaforizacion 4x18.			78
			*retiro de lampara peatonal estatica verde			165
			*instalacion de lampara peatonal peatonal estatica verde nueva del municipio.			186
			*construccion de 1 empalme			78
Carrera 76x calle 31	W-S	E-W	*retiro de lampara peatonal estatica roja	10:30am	11:00am	165
	W-S	E-W	*instalacion de lampara peatonal estatica roja del municipio nueva.	10:30am	1:00pm	186
			*construccion de 1 empalme para cables de semaforizacion 4x18.			78
Carrera 76x calle 31	W-S	E-W	*retiro de lampara peatonal estatica roja			165
			*instalacion de lampara peatonal estatica roja del municipio nueva.			186
			*construccion de 1 empalme para cables de semaforizacion 4x18.			78

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Cumplido	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	05/06/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN: William Chavarria-Jorge alvarez-Jean Jose zapata
DIA:	Lunes	
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 76x calle 31	N-E	N-S	*retiro de lampara peatonal estatica roja	10:30am	1:00 pm	165
			*instalacion de lampara peatonal roja estatica nueva del municipio			186
			*construccion de 1 empalme para cables de semaforizacion 4x18.			78
	E-N	W-E	*retiro de lampara peatonal estatica roja			165
			*instalacion de lampara peatonal roja estatica nueva del municipio.			186
			*construccion de 1 empalme para cables de semaforizacion 4x18.			78
	SC	W-E	*retiro de lampara peatonal estatica roja.			165
			*instalacion de lampara peatonal roja estatica nueva del municipio.			186
			*construccion de 1 empalme para cables de semaforizacion 4x18.			78
Carrera 76x calle 28.	S-W	W-E	*retiro de lampara peatonal estatica roja.	1:30pm	3:30pm	165
			*instalacion de lampara peatonal roja estatica nueva del municipio.			186
			*construccion de 1 empalme para cables de semaforizacion 4x18.			78
			*se esperan lamparas peatonales traidas de bodega 1:30pm - 2:30pm			

VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Calad	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	05/06/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN: William Chavarria-Jorge alvarez-Juan Jose Espitia.
DIA:	Lunes	
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 76x Calle 28			*retiro de lampara peatonal estatica Roja *instalacion de lampara peatonal estatica Roja del municipio nueva. *construccion de 1 empalme para cables de semaforizacion 4x18. *se esperan las lamparas traidas de la bodega 1:30pm-2:30pm.	1:30pm	3:30pm	165 186 78
Carrera 70 x calle 44.	S-W	W-E	*Reparan semaforo peatonal apagado se revisa el cruze y todos los semaforos se encuentran operando con normalidad.	3:50pm	4:10pm	229

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE				
REVISÓ	Caiced	FIRMA				
CARGO		CARGO				

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	5/06/23.	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Brayan Dagado A.
DIA:	Viancs.		Wilian Chavoma
VEHÍCULO:	Bodega.		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*Bodega.			Suministro de Pintura de sinbolo en lampara de Semaforo Total (12 und).	4:00	7:00	217

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE				
REVISÓ	Collado	FIRMA				
CARGO		CARGO				

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	5-06-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Lunes	Andrés Amaya - Oscar López
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Av 80 x Cl 50			Sondeo de canalizaciones y búsqueda de cajas Levantamiento de Plano			212

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Cailos	FIRMA	
CARGO		CARGO	

Norte
9 mts 20ø3"
9 mts 20ø3"
Mercado Madrid
Loja Roldo
18 mts 20ø2"
9 mts 20ø3"
Loja Roldo
Calle 80
Calle 80
8 mts 20ø3"
8 mts 20ø3"
Parque
8 mts 20ø2"
30 mts 20ø2"
Loja Roldo
16 mts 20ø2"
6 mts 20ø3"
20 mts 20ø2"
9 mts 20ø3"

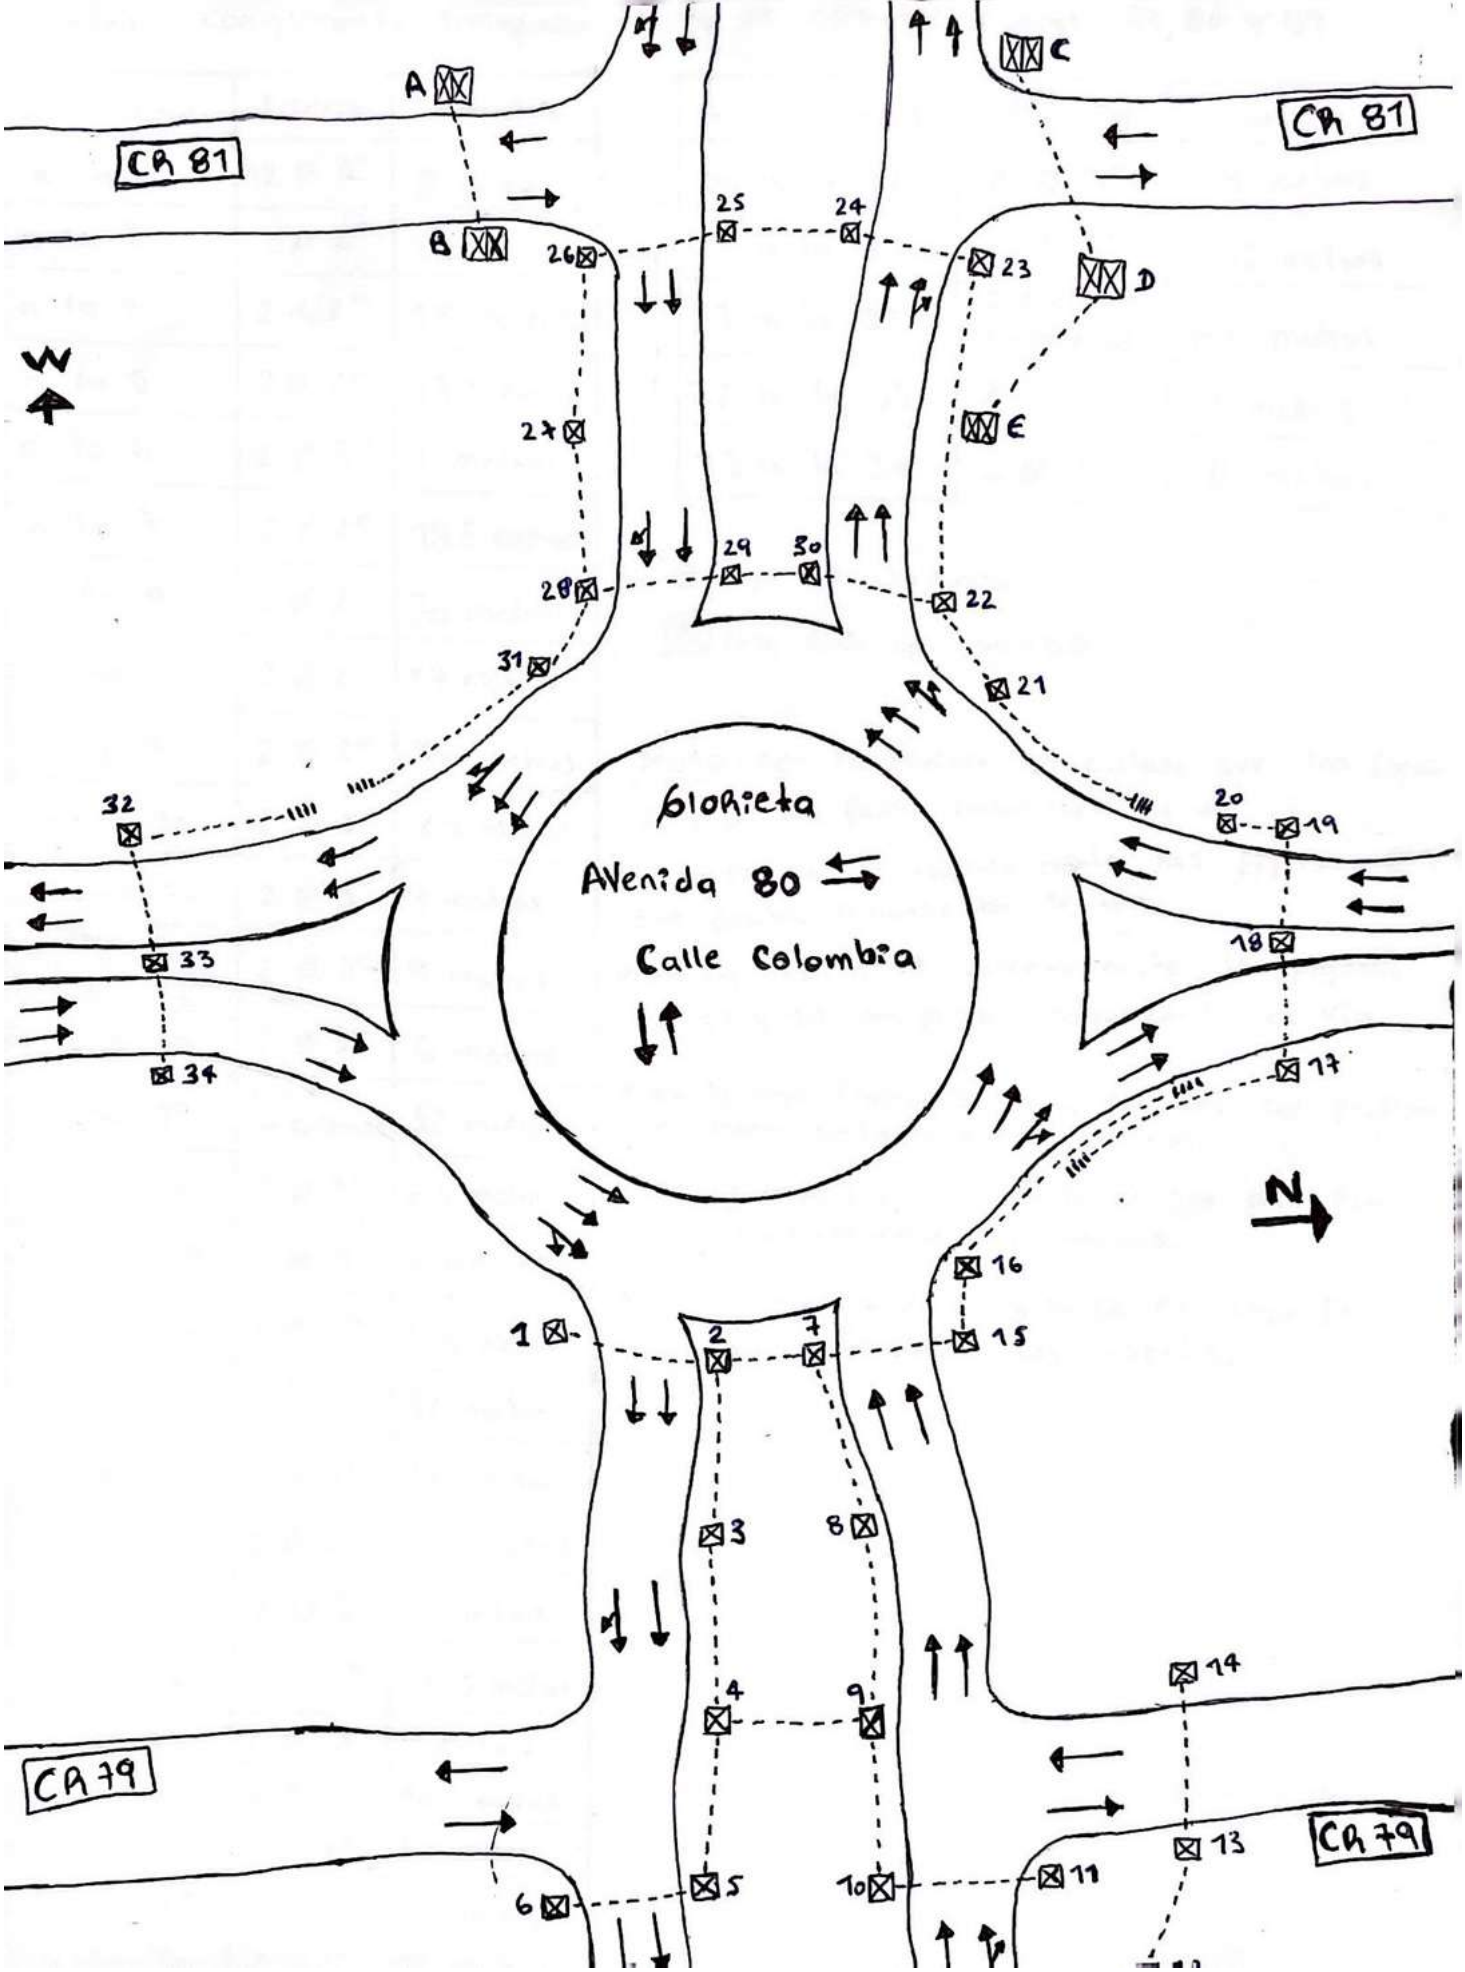
CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	06-06-2023.	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:		Cesar Santos, Juan Zapata, Jose Luis, Gustavo Betancur
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
X CR 46 Calles 49-52			Este hace seguimiento a cable telefónico de 30 Pares de comunicación de equipos por cámaras de tipo una desde CR 46 calle 52 del Sur. en Un Se localiza cable cortado en cámara 46 Call 49B. al Frente de Rollos Friskly cámara de tipo una Continuamos con el seguimiento de cable y se nos pasó en CR 46 Call 49. • Continuamos con el seguimiento de cable telefónico desde CR 46 calle 49 costado S-E Contabilizo y se localiza Cable cortado en Cajas 2T. Suministro e Instalación de 1 Cubierta telefónica Para cable de 30 Pares Vandalizado Se utilizan 60 conectores UY. Continuamos con el seguimiento de cable de 30 pares y se localiza en CR 46 cl 49 cortado N-W cámara de tipo una. Retiro de 49m de cable telefónico de 30 Pares Vandalizado ; Estaba muy corto para empalmar Instalación de 56mts de cable telefónico de 30 Pares de segunda Suministro e instalación de 2 Cubiertas telefónicas una en CR 46 calle 49 costado N-W. y una de altura de Rollos Friskly Se utilizan 40 conectores UY.	7-45.	16-20	79 170 182 79

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ		NOMBRE				
REVISÓ	Cortés	FIRMA				
CARGO		CARGO				


CR 81
CR 81
CR 79
CR 79
A
B
C
D
E
W
N
Glorieta
Avenida 80
Calle Colombia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Sondeo Complemento semaforizo Calle 50 entre las carreras 79, 80 y 81

# entre cajas	tubería	longitud
1 a la 2	2 Ø 3"	8 metros
2 a la 3	2 Ø 2"	28.5 metros
3 a la 4	2 Ø 2"	18 metros
4 a la 5	2 Ø 2"	17.5 metros
5 a la 6	2 Ø 3"	9 metros
2 a la 7	2 Ø 2"	18.5 metros
7 a la 8	2 Ø 2"	30 metros
8 a la 9	2 Ø 2"	27 metros
9 a la 4	2 Ø 2"	30 metros
9 a la 10	2 Ø 2"	7.5 metros
10 a la 11	2 Ø 3"	9. metros
7 a la 15	2 Ø 3"	9 metros
15 a la 16	2 Ø 2"	6 metros
16 a la 17	1 Ø 2" sin continuedad	52 metros
17 a la 18	2 Ø 3"	8.5 metros
18 a la 19	2 Ø 3"	8 metros
19 a la 20	2 Ø 2"	6.5 metros
20 a la 21	2 Ø 2" sin continuedad	32 metros
21 a la 22	2 Ø 2"	18 metros
22 a la 23	2 Ø 2"	27.5 metros
23 a la 24	2 Ø 3"	8 metros
24 a la 25	2 Ø 2"	28.5 metros
25 a la 26	2 Ø 3"	8 metros
26 a la 27	2 Ø 2"	10.5 metros
27 a la 28	2 Ø 2"	22 metros
28 a la 29	2 Ø 3"	8 metros
29 a la 30	2 Ø 2"	18 metros

# entre cajas	tubería	longitud
30 a la 22	2 Ø 3"	8 metros
28 a la 31	2 Ø 2"	6.5 metros
31 a la 32	2 Ø 2" sin continuedad	67 metros
32 a la 33	2 Ø 3"	8 metros
33 a la 34	2 Ø 3"	8 metros

⊠ Caja de 0,50 x 0,50

⊠⊠ Caja doble de 0,60 x 0,80

Nota: *en la carrera 81 costado sur las figuras A y B son posible comunicación de vía.

*en la carrera 81 costado norte las figuras C, D son posible comunicación de vía.

* en la carrera 79 costado norte las figuras 12, 13 y 14 son posible comunicación de vía.

* en la caja figura 16 a la 17 hay caja perdida no tienen continuedad las tuberías.

* en la caja figura 20 a la 21 hay caja perdida no tiene continuedad las tuberías.

* en la caja figura 31 a la 32 hay caja perdida. no tienen continuedad las tuberías.

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	6-06-23.	RESPONSABLES EJECUCIÓN: Angelo Gomez.
DIA:	Martes	Juan Fernando Rios.
VEHÍCULO:	WLY 897.	Juan Esteban Osorio.

	DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*	Cra 55 x Cll 57.	S	WE	(Zona Verde Interna) Glorieta de la Minorista, Retiro de (1) Ménsula Completa.	8:30.		138
				Retiro de (2) Semáforos en Ménsula (tipo semex).			141
				Retiro de (2) arañas y (2) flautas.			—
			•	Retiro de (20) mts de Cable 4X18			143
				Retiro de (1) disco direccional			149
				Instalación de (1) Ménsula con Planche. (Reparada) de 4,50 mts			197-17
			•	Instalación de (20) mts de Cable 4X18. (Existente)			182
				Suministro Instalación de (1) flauta y (1) araña Nueva.			—
				Instalación de (1) Semáforo Vehicular con lámparas Cluus #3, este.			174
				Con la araña y la flauta. (Semáforo Principal) en Ménsula.			
				Instalación de (1) Semáforo Vehicular con lámparas cluus #3, este			174
				es en el Segundo Semáforo Suncluado a Ménsula con (4) Bobillas.			
				Construcción de (2) Empalmes y (8) Conectores.			78
				Instalación de (6) Viceras de Pasta en los Semáforos Vehiculares.			179
				Instalación de (4) accesorios de Pasta.		13:25	—
*	Cra 55 x Cll 60	N	EW	(Zona Verde Interna) Glorieta de la Minorista, Retiro de (1) Ménsula Completa	13:35.		138
				Retiro de (1) Semáforo en Ménsula (tipo spark)			141
				Retiro de (1) Semáforo en poste de Ménsula (tipo spark)			142
				Retiro de (2) ~~(Semáforos)~~ Contrastes. Placas.			169
				Retiro de (1) disco direccional			149
				Retiro de (8) mts de Cable del brazo y (4) mts del Poste.			143
				Recolección de Residuos arenosos de la brecha cimetrica.			—
				Instalación de (1) Ménsula con Planche (Reparada) de 4,50 mts			197-17
			•	Instalación de (12) mts de Cable 4X18 (Existentes).			182
				Suministro de (6) mts de Cable 4X18 (Nuevo para el Segundo Semáforo)		16:15.	60

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ		NOMBRE	
REVISÓ	Coiba D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	6-06-23.	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Angelo Gomez
DIA:	martes		Juan. fernando Rios.
VEHÍCULO:	WLY 897		Juan Esteban Osorio.

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Cra 55 x Cll 60	N.	EW	Instalación de (1) Semáforo Vehicular Con lámparas Led #3.	13:35		174
			Instalación de (1) Semáforo Vehicular Con lámparas Led #3.			175
			Instalación de (3) Viceras de Pasta en uno de los Semáforos Vehiculares			179
			→ Nota = Ambos Semáforos Instalados a Ménsula, Uno de ellos (El Segundo) Suncluido Con (4) Hebillas.			
			Suministro, Instalación de (1) araña y (1) Flauta. (Nvena.)			—
			Instalación de (4) accesorios de Pasta para Vehiculares.			—
			Construcción de (2) Empalmes y (8) Conectores en Semáforos			78
			Construcción de (1) Empalme. de 4X18 Sin Conectores en el Poste.		16:15.	78
			Gastos totales. de Hebillas = (16) und.			
			Gastos totales de Conectores = (16) und.			
			Suministro de Cable Nuevo 4X18 = (6) mts.			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ		NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	6/06/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	martes	Zhokender - Willian - Jorge.
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*Cl 70 x Cl 9			Suministro e Instalación de 2 Tapa borneras			95
*Cl 70 x Cl 44A			Cambio de cable verde por amarillo Construcción de 4 empalmes			78
*Cl 82A x Cl 30			Zunchada en semáforos peatonales.			-

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ		NOMBRE	
REVISÓ		FIRMA	
CARGO		CARGO	

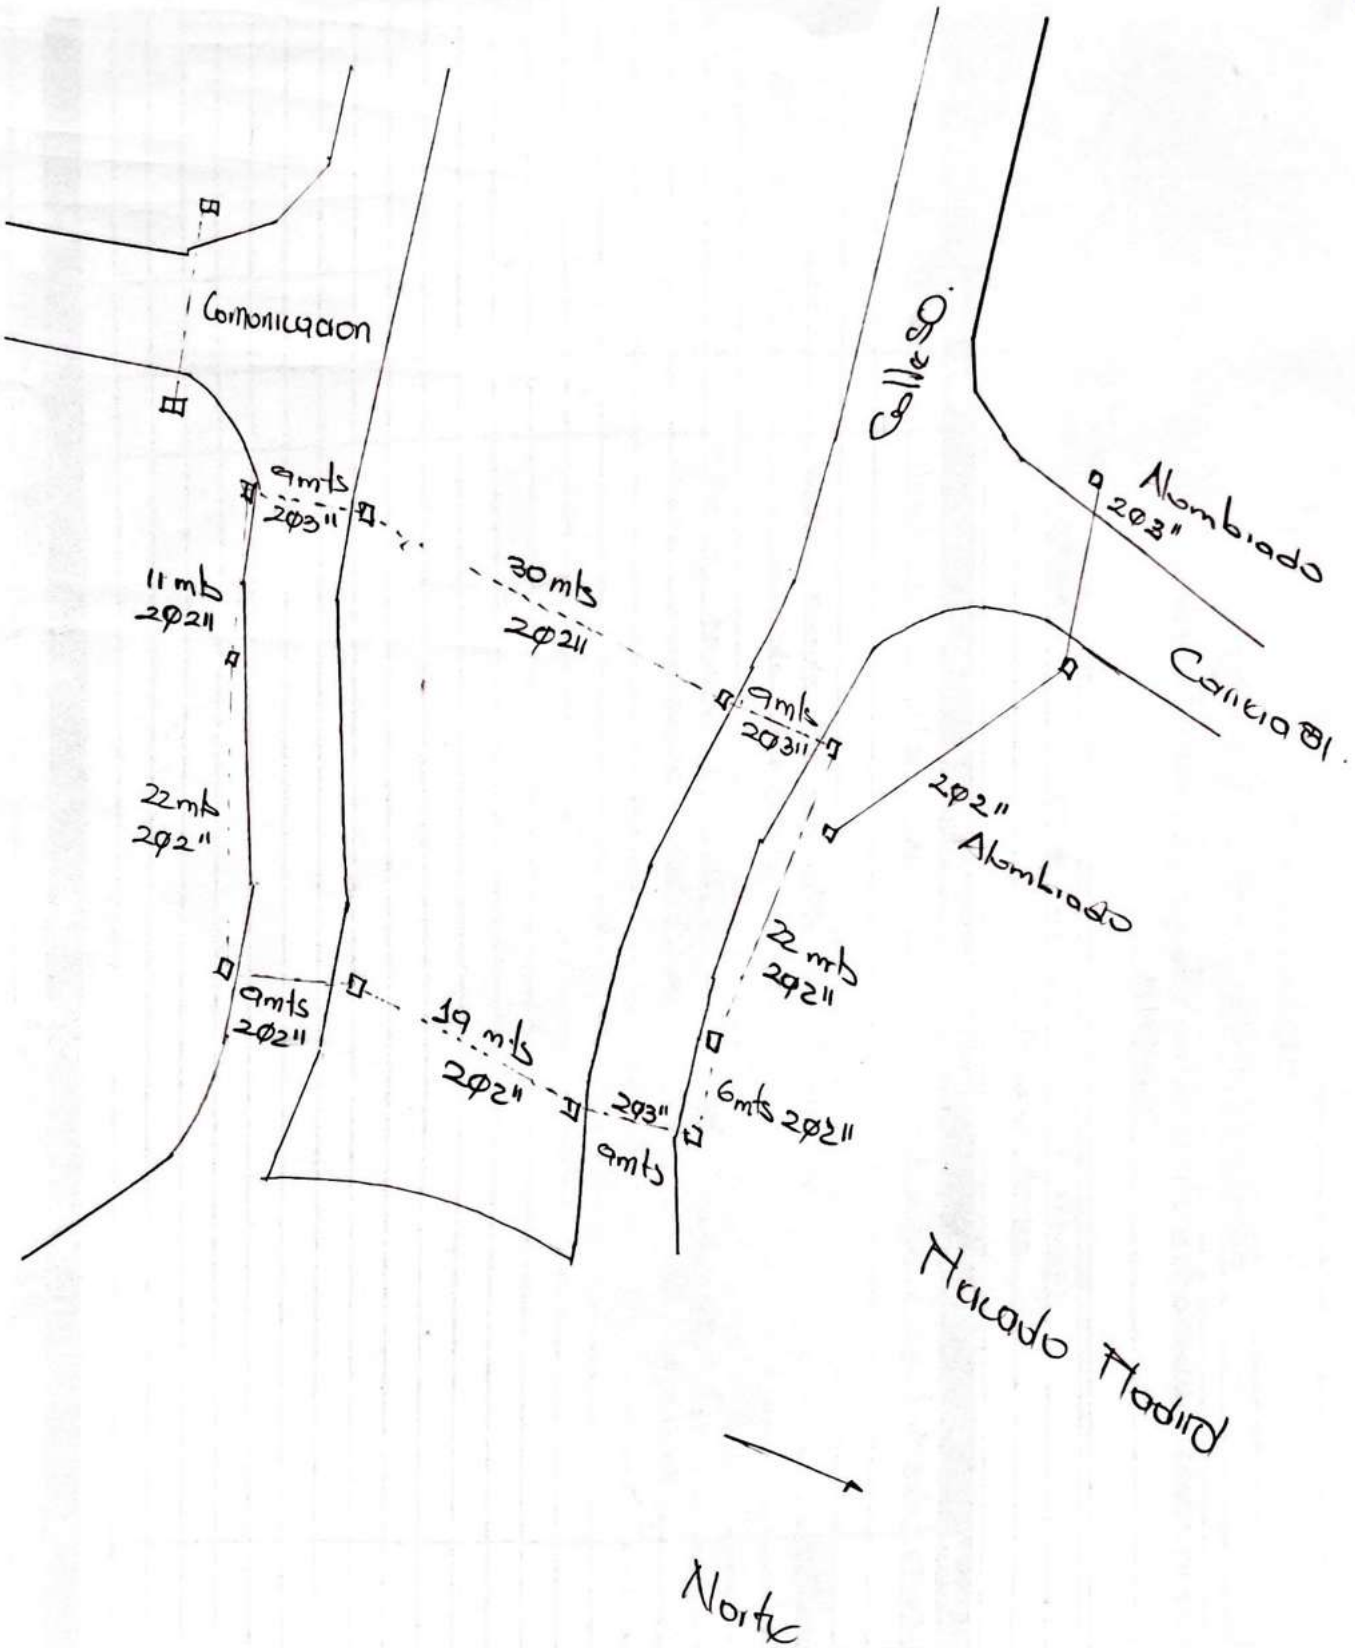
CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	6/06/23	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Oscar Lopez - Jorge Alvarez
DIA:	martes		Andres Amaya
VEHÍCULO:	Camioneta		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Carrera 43	N-W	N-S	Llenado y concreteado de caja de 0,60 x 0,80 (tapa Vandalizada)	07:00 AM		224
Calle 50					10:00 AM	231
* avenida 80	W		Sondeo avenida 80 con calle 50 terminación.	10:30 AM		212
Calle 50	W		Costado Occidental y Sur			
					5:00 pm	
			Nota: se termina el sondeo dando como resultado			
			varias conexiones inconclusas y varias cajas Perdidas			

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE				
REVISÓ	Carlos	FIRMA				
CARGO		CARGO				


Comunicacion
9mts
2Ø3"
11 mts
2Ø2"
22mts
2Ø2"
9mts
2Ø2"
19 mts
2Ø2"
2Ø3"
9mts
30mts
2Ø2"
9mts
2Ø3"
Calle 90.
Alambrado
2Ø3"
Carretera
2Ø2"
Alambrado
22 mts
2Ø2"
6mts 2Ø2"
Mercado Madrid
North

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	07-06-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Miercoles	Cesar Sanchez, William chavarro, Joseluis, Bartolo betancur
VEHÍCULO:	IKN 721.	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* CR 64B Calle 50			Vandalismo en acometida electrica se le hace seguimiento a cable encauchetado 2x12 por todo el sotano de alumbrado publico y se localizan cable cortado al interior de Porta de energia en sector Norte del Parque CR 64B Call 51. Cortado 5-E del Poste suministro e instalación de 1m de cable encauchetado 2x12 para reponer acometida.	7-40	10-50	
			Construcción de 2 empalmes electricos para acometida al interior de porta de energia Perforado.			78
			Instalación de lamina con 4 sunchos de cinta Vandi. Se utilizan. (1,2m x 4) = 4.8m de cinta Vandi para sunchos de porta y lamina para cellar brecha			88
CR 48 CL 45 Sur.			Cables de potencia Vandalizados en sector sur occidental de la glorieta grupo 18-23. Reatomb y corto en grupo #6 peatonal cable de fuerza Vandalizado de polipropileno.	11-15	17-00	
			Suministro e instalación de (21 x 5m) = 10m de cable 4x16 mm			60
			Construcción de 4 empalmes electricos en 2 cable de sotano			78

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ		NOMBRE	
REVISÓ	Cabezo	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	07-06-23	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Miercu	Cesar Sentes, William Chavarria, Jose Luis, Gustavo Betancur
VEHÍCULO:	IKN 781	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 48 CL 85 Sur			Construcción de 1 empalme electrico en semaforo Peatonal (Nota semaforo en cortocircuito) Sector Sur occidental de la Glorieta			78
			Endurecido de 1 semaforo Peatonal Colgando Separador Central Sur Nota Programar cambio de lampara Peatonal Verde quemada estructura del grupo #18.			226
			Sector Norte de la glorieta Separador central Norte Construcción de 1 empalme electrico en semaforo Peatonal corto en semaforizador por el motivo quemado Fusibles			78
			Retiro de 2 Fusibles quemados en controlador local - en targetas de potencia grupo #6 Y 18. Suministro e instalación de 2 Fusibles			85

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ		NOMBRE				
REVISÓ	Carlos D	FIRMA				
CARGO		CARGO				

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	7-06-23	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Angelo Gomez. Juan Fernando Ríos.
DIA:	Miercoles		Juan Esteban Osorio.
VEHÍCULO:	WLY 897		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 55 x Cll 57	S	WE	(Zona Verde) Glorieta Minorista · Retiro de (1) Ménsula Completa	8:30		138
			Retiro de (1) disco direccional			149
			Retiro de (1) semaforo a Poste de Ménsula			142
			Retiro de (1) semaforo a Ménsula.			141
			Retiro de (3) mts de Cable del brazo y (3) mts del Poste.			143
			Retiro de (2) Contrastes, Retiro de (3) viceras de lamina.			169-168
			Instalación de (1) Ménsula Reparada de 4,50 mts.			171-170
			Suministro de (1) Araña y (1) flauta Nuevas.			—
			Suministro de (2) mts de Calde Nuevo de 4x18. para brazo de Mensula			60
			Instalación de (1) Semáforo a Ménsula Con la araña y Flauta.			174
			Instalación de (3) viceras de Pasta en el Vehicular.			179
			Instalación de (1) Semaforo a Mensula (Sunchado Fijo).			175
			Instalación de (6) mts de Cable 4x18 existente para Segundo Semaforo.			182
			Construcción de (2) Empalmes en Semaforos y (8) conectores			78
			Construcción de (1) Empalme en Poste de Ménsula (Sin Conectores)			78
			Limpieza de base de ménsula de la tierra y el cuadrante arenoso.			—
			Instalación de (4) accesorios de Pasta para Semaforos Vehiculares.			—
			Gasto de Hebillas. = (8) unidades			
			Gasto de Conectores = (8) unidades			
			flauta Nueva = (1)			
			araña Nueva = (1).			
			Viceras Pasta = (3)			
			accesorios Pasta = (4)		11:45	

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ		NOMBRE	
REVISÓ	Collazo	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	7-06-23.	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Angelo Gomez Juan Fernando Rios. Juan Esteban Osorio.
DIA:	miercoles		
VEHÍCULO:	Wly 897.		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 55 x Cl 57.	55	WE	(Zona verde) Glorieta Minorista Retiro de (1) Ménsula Completa.	13:15		138
			Retiro de (1) disco direccional.			149
			Retiro de (1) Semáforo a poste de Ménsula			142
			Retiro de (1) semáforo a Ménsula.			141
			Retiro de (8) mts de Cable del brazo y (3) mts del Poste.			143
			Retiro de (2) Contrastes, Retiro de (6) viceras de lamina			169-168
			Instalación de (1) Ménsula Reparada de 4,50 mts.			171-197
			Suministro de (8) de Cable Nuevo de 4x18 para brazo de Ménsula.			60
			Suministro de (1) araña Nueva y (1) flauta Nueva			-
			Instalación de (1) semáforo a Ménsula Con la araña y flauta.			174
			Instalación de (6) viceras de Pasta en los Vehiculares			179
			Instalación de (1) semáforo a Ménsula (Sunchado Fijo)			175
			Instalación de (6) mts de Cable 4x18 existente para Segundo Semáforo			182
			Construcción de (2) Empalmes en semáforos y (8) Conectores.			78
			Construcción de (1) Empalme en Poste de Ménsula (Sin Conectores)			78
			Limpieza de base de Ménsula de la tierra y el Cuadrante arenoso.			-
			Instalación de (4) accesorios de Pasta para semáforos Vehiculares			-
			Gasto de Hebillas = (8) unidades			
			Gasto de Conectores = (8) unidades			
			Flauta Nueva = (1)			
			araña Nueva = (1)			
			Viceras de Pasta = (6)			
			accesorios de Pasta = (4)		15:30	

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ		NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	07/06/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Kender Pelozo-Jorge alvarez-Juan Jose zapata.
DIA:	miercoles		
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Calle 51x Calle 62	S-W	S-N	*retiro de 718 mts de cable para semaforizacion 4x18 correspondiente al grupo #7 vehicular.	9:00am	4:30pm	143
			*suministro e instalacion de 718 mts de cable para semaforizacion 4x18 correspondiente al grupo #7 vehicular.			60
	N-W	N-S	*retiro de 4 cordones de soldadura 15 cm en tapa metalica 50x50			153
	N-W	N-S	*retiro de 4 cordones de soldadura 15 cm en tapa metalica 50x50			153
	N-W	N-S	*retiro de 4 cordones de soldadura 15 cm en tapa metalica 50x50			153
	S-W	N-S	*retiro de 4 cordones de soldadura 15 cm en tapa 60x80			153
	SC	N-S	*retiro de 4 cordones de soldadura 15 cm en tapa metalica 50x50			153
	SC	N-S	*retiro de 4 cordones de soldadura 15 cm en tapa metalica 50x50			153
	N-E	S-N	*retiro de 4 cordones de soldadura 15 cm en tapa metalica 50x50			153
	N-E	E-W	*retiro de 4 cordones de soldadura 15 cm en tapa metalica 50x60			153
	S-E	E-W	*retiro de 4 cordones de soldadura 15 cm en tapa metalica 50x50			153
	S-E	S-N	*retiro de 4 cordones de soldadura 15 cm en tapa metalica 50x50			153

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ		NOMBRE	
REVISÓ	Collazo	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	07/06/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Yender Perozo-Jorge Alvarez-Juan José Zapata
DIA:	miercoles		
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 51 x Calle 62	S-E	S-N	*retiro de 4 cordones de soldadura 15 cm en tapa metalica 50x50	8:000m	4:30pm	153
	N-W	N-S	*retiro de 4 cordones de soldadura 15 cm en tapa ~~metalica 50x50~~ 60x80.			153
	N-W	N-S	*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 50x50 metalica.			230
	N-W	N-S	*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa metalica 50x50.			230
	N-W	N-S	*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa metalica 50x50.			230
	N-W	N-S	*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80.			230
	SC	N-S	*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa metalica 50x50.			230
	SC	N-S	*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa metalica 50x50			230
	N-E	S-N	*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa metalica 50x50			230
	N-E	E-W	*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa metalica 50x50			230
	S-E	E-W	*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa metalica 50x50.			230
			*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa metalica 50x50			230

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ		NOMBRE				
REVISÓ	Carlos R	FIRMA				
CARGO		CARGO				

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	07/06/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Kendel Pinzon-Jorge Alvarez-Juan Jose Zapata.
DIA:	Miercoles		
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 51 x calle 62	S-E	S-N	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 50x50 metalica.	8:00am	4:30pm	230
	N-W	N-S	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80.			230

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		NOMBRE				
REVISÓ	Carlos D	FIRMA				
CARGO		CARGO				

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	07/06/23	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Oscar Lopez - Jose Luis Andres Amaya S
DIA:	miercoles		
VEHÍCULO:	camioneta		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 51			Apoyo a cuadrilla de Kender (Activo de soldaduras en tapas,	07:00 Am		
calle 61			Instalación de cable grupo 3 peatonal).		11:00 Am	—
Carrera 48	W	N-S	Activo de 4 Herrajes Plasticos. y tapa	11:30 Am		157
Calle 4 Sur	W		Suministro einstalacion de 4 Herrajes Metalicos. 0,50 x 0,50			
	W		Construcción de Soldadura en 4 tapas metalicas 0,50 x 0,50			
	W		(4 cordones cada uno).		7:30 Pm	

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE				
REVISÓ	Carlos Diaz	FIRMA				
CARGO		CARGO				

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	08-06-23	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Jueves	Cesar Santos, William chavarria, Joselvis, Gustavo Betancur.
VEHÍCULO:	KNJ 781	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*CR48CL30			Linea caida de acometida Electrica motivo caja Primaria de transformador Primario con fusible quemado. (Esa reparación solo la hace Personal directo de EPM.). desconectado de cable 2x10 de acometida Construcción de 1 empalme electrico para acometida electrica Nota se traslada para otro circuito electrico Publico.	8-10	10-10	78
*CR45CL90	E.		caida de tensión en acometida electrica mantenimiento. Retiro de tramo de cable 2x16 duplex Suministro e instalación de 10m de cable encauchetado 2x12 numeral para acometida electrica nueva construcción de 1 empalme electrico para acometida en caja de 60x80. Caja de EPM Suministro e instalación de 1 placa identificadora de cable para evitar que EPM lo confunda con Fraude. Retiro de 1 luminaria vapor sodio Peatonal quemada Instalación de 1 luminaria vapor sodio Peatonal nueva montada.	10-35	14-10	143 62 78 82 165 186

VERIFICACIÓN					
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE			
REVISÓ	Carlos Diaz	FIRMA			
CARGO		CARGO			

NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
		ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	08-06-2022	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	
DIA:	Lunes	Cesar Sanchez, William Echeverria, Jose Luis, Gustavo Beltran	
VEHÍCULO:	IKN 781.		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*CR 45 CL 90	E.		Construcción de 1 empalme eléctrico en semáforo peatonal	10-35	14-10	78
			Se pondrá peatonal.			
			Retiro de 1 bombera roja peatonal fucsia			165
			Instalación de 1 bombera roja peatonal nueva del municipio.			186
			Se utilizan 8 conectores de resorte			
*CR 46 CL 78. S-W.			Poste peatonal de enfrentamiento directo.	14-25	17-10	
			dañado.			
			Nota: El poste no se encontro en el esta.			
			Se desplaza socia el poste por concreto			
			muy grueso.			
			Canalización en 90m Vereda de 0,5m tubo de 4"			18
			Suministro e instalación de 1 Poste de enfrentamiento			45
			directo.			
			Instalación de 1 semáforo peatonal de segunda			195
			mentura			
			Instalación de 6m de cable 4x16 existente			182
			Construcción de 1 empalme eléctrico en semáforo			78
			peatonal			
			Nota: Queda pendiente concretada la			
			cuadra. No se termina por lluvia.			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos Diaz	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	08/06/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Kendel Pertuz-Jorge Alvarez-Juan José Zapata.
DIA:	Jueves		
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*Carrera 84 x calle 44	S-E	S-N	*Retiro de herraje *retiro de tapa 50x50	8:00am	2:40 pm	157
			*Suministro e instalacion de herraje metalico.			
			*Suministro e instalacion de tapa metalica 50x50			
			*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa metalica. 50x50			—
	N-W	N-S	*retiro de 4 cordones de soldadura en tapa 50x50			153
			*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa metalica 50x50. (Para revisar cable Grupo 3 vehicular e independizarlo de la mensula)			230
	N-E	N-S	*retiro de 4 cordones de soldadura en tapa 50x50			153
			*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa metalica 50x50.			230
Porteria	SC	E-W	*Se endereza semaforo peatonal estatico			226
	N-W	E-W	*Se acomoda visera en aspecto verde de semaforo peatonal estatico			228
	S-W	S-N	*Construccion de 7 empalmes para cables de semaforizacion 4x18 Grupo 8 peatonal.			78
	S-W	S-N				
*Carrera 76 x calle 37F	S-E	S-N	*Se endereza cara vehicular	2:52 pm	3:05 pm	226

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos Ortiz	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	08/06/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN: Kender Perozo - Jorge Alvarez - Juan José Zapata
DIA:	Jueves	
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*Carrera 74Bx Calle 32F	S-W	W-E	*Se endereza Cara Peatonal	3:15 pm	3:33 pm	226
*Carrera 48XCalle 31	SC	W-E	*Se endereza cara peatonal dinamico *Se endrezan viseras de semaforo ciclista	3:51 pm	4:00 pm	226 228

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Duarte	NOMBRE	
REVISÓ	Cobos Diaz	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	8/06/23	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Oscar lopez – Andres Amaya.
DIA:	Jueves		
VEHÍCULO:	camioneta		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 57 Calle 54	S-E	S-N	demolición y corte de pata de mensula (motivo cambio de mensula).	07:00 Am	11:00 Am	
* Carrera 48 Calle 4 Sur	S-E	S-N	-- Retiro de 2 Herrajes de 0,50 x 0,50 (Herrajes de Plastico)	11:30 Am		157
			Suministro e instalación de 2 Herrajes metalicos de 0,50 x 0,50. con tapa			
			Construcción de soldadura en 2 tapas metalicas (4 cordones).		7:00 pm	—

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos Diaz	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	8-06-23	**RESPONSABLES EJECUCIÓN:**	Angelo Gomez
DIA:	Jueves.		Juan Esteban Ospina
VEHÍCULO:	Colq 897		Juan Fernando Ros

	DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*	Cra 57 x Cll 57.	SE.	NS	(carril del Metroplus) Retiro de (1) Ménsula Completa	8:20.		138
				Retiro de (1) Semáforo a Ménsula / Retiro (1) araña (1) Flauta.			141
				Retiro de (1) semáforo a Poste de Ménsula.			142
				Retiro de (1) disco direccional			149
				Retiro de (8) mts de Cable del brazo y (3) mts del Poste.			143
				Retiro de (2) Contrastes			148
				Retiro de (6) Viceras Metalicas			168
				Suministro, Instalación de (13) mts de Cable 4X18 para brazo de Ménsula para 2 semáforos en Ménsula.			60
				Suministro, Instalación de (1) araña y (1) Flauta Nuevo			—
				Instalación de (2) Semáforos a Ménsula, (1) de ellos Sincelado Fto.			174
				Construcción de (2) empalmes y (8) Conectores en Semáforos.			78
				Instalación de (4) accesorios de Poste.			
				Instalación de (6) viceras de Poste.			179
				Construcción de (1) Empalme. Sin Conectores en Poste de Ménsula.			78
				Gasto de Hebillas = (8) unidades. Instalación de (1) Ménsula Reparada 4,50mts			171-19
				Gasto de Conectores = (8) unidades			
				Gasto de accesorios = (4) unidades			
				Gasto de Viceras Poste = (6) unidades			
				araña Nueva = (1) und			
				Flauta Nueva = (1) und		13:40	
*	Cra 80 x Cra 65	W	SN	Ajuste y enderezada de Semáforo Vehicular torcido.	14:10.	14:20	226
*	Cra 47 x Cll 58	W	NS	Retiro de (1) lámpara Verde Vehicular a Ménsula (Mala).	14:45		166
				Instalación de (1) lámpara Verde Vehicular a Ménsula.			187
				Construcción de (1) empalme y conectores existentes.		15:20	78

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ		NOMBRE	
REVISÓ		FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	8/06/23	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Oscar Lopez - Andres Arenas.
DIA:	jueves		
VEHÍCULO:	camioneta		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 48	E	S-E	Retiro de Herrage plastico y limpieza			157-39
Calle 4 Sur	W	S-E	Retiro de Herrage plastico y limpieza			157-39
	E	S-E	Suministro instalación de Herrage de hierro con su respectiva tapa.			0E9
	W	S-E	Suministro instalación de Herrage de hierro con su respectiva tapa			0E9
			Construcción de soldadura en 2 tapas metalicas (4 cordones cada una).		4:30 pm	-

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE				
REVISÓ		FIRMA				
CARGO		CARGO				

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	9-06-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Viernes	Cesar santos, Jose luis, william cuadrado, Gustavo Betancur
VEHÍCULO:	IKN 701	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* CR 52 cl 7 Sur a 9 Sur.			Red telefónica de comunicación de equipos caídos	9-20	16-35.	
			Se hace seguimiento a cable telefónico de comunicación de equipos de 20 pares desde CR 52 call 9 Sur al norte por calzada (S-N.) se localiza cable cortado en calle 8 Sur cámara telefónica de tipo uno en vía continuamos con el seguimiento de cable telefónico esta vez de CR 52 cl 7 Sur al Sur. a cable telefónico de 50 pares y se localiza cable cortado de 50 pares en cámara de tipo uno en costado N-E en la vía			
			Retiro de 72 mts de cable telefónico de 20 pares para reinstalar.			143
			Suministro e instalación de 155 mts de cable utp. nuevo desde call 7 Sur costado (N-E hasta calle 8 Sur. costado N-E cámara de tipo uno en la vía			94
			Suministro e instalación de 4 placas identificadoras de cable.			82
			Suministro e instalación de 2 cubiertas telefónicas			79

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	C.T.S.D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	9-06-23	RESPONSABLES EJECUCIÓN: Angelo Cortez
DIA:	Viernes	Juan Esteban Osorio
VEHÍCULO:	WLY 897	Juan Fernando Ruiz

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Cra 57 x cll 54	E	SN	Retiro de (1) Mensula Completa.	9:40.		138
			Retiro de (1) disco direccional			149
			Retiro de (1) Hausing Individual Con Luz para Regresivo, araña y flauta.			141
			Retiro de (1) Semaforo Vehicular a Mensula.			141
			Retiro de (8) mts de Cable 4X18 del brazo. y (3) mts del Poste.			143
			Instalación de (1) Mensula Reforzado de 4,50 mts			171-197
			Instalación de (1) Semaforo Vehicular a Mensula. Sin Contraste.			174
			Suministro, Instalación de (1) araña y (1) flauta.			—
			Suministro, Instalación de (8) mts de Cable 4X18 para brazo de Mensula.			60
			Instalación de (1) Semaforo Vehicular a Poste de Mensula Con Contraste			175
			Construcción de (2) Empalmes y (8) Conectores en Semaforos.			78
			Construcción de (1) Empalme Sin Conectores a Poste.			78
			Gasto de Hebillas = (8) und.			
			Gasto de Conectores = (8) und.			
			Gasto de araña = (1) und			
			Gasto de flauta = (1) und			
			Instalación de (4) accesorios de Pasta.		15:00.	

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	09/06/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN: Kendel peroza-Jorge olivoez-Juan José zapata.
DIA:	viernes	
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	SENTIDO		TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
carrera 51x calle 64	W-S	W-E	*construccion de 1 empalme para cables de semaforizacion 4x18. en grupo vehicular #4 en caja 50x50 *se inician actividades a las 11:00am por capacitacion en la empresa. *el vehiculo llega a las 10:40 am	11:00am	12:00pm	78
):			*se recoje tapas 50x50-60x80 donde Jhon wilson hengo.	1:10pm	1:40pm	—
carrera 67Ax calle 51			*suministro e instalacion de 118 metros de cable para semaforizacion 4x18. *construccion de 4 empalmes para cables de semaforizacion 4x18 en cajas de semaforo. (2490-2611).	2:00pm	7:00pm	60 78
	N-E	E-W	*retiro de 4 cordones de soldadura en tapa 50x50			153
	SC	E-W	*retiro de 4 cordones de soldadura en tapa 50x50			153
	S-W	E-W	*retiro de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80			153
	S-W	E-W	*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80.			230
	SC	E-W	*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 50x50			230
	N-E	E-W	*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 50x50.			230
	S-W	E-W	*suministro e instalacion de tapa metalica 50x50 *suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa metarica 50x50			OEB 230

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE				
REVISÓ		FIRMA				
CARGO		CARGO				

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	09/06/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Fernder Perozo-Jorge Galvez-Juan Jose Zapata
DIA:	viernes		
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Calle 19 67 A x Cra 51	S-W	E-W	*Suministro e instalacion de 1 semaforo peatonal dinamico	1:00 pm	7:00 pm	54
	SC	E-W	*Suministro e instalacion de 1 semaforo peatonal dinamico.			54
	SC	E-W	*Suministro e instalacion de 1 semaforo peatonal dinamico.			54
	N-W	E-W	*Suministro e instalacion de 1 semaforo peatonal dinamico.			54

VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Arango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

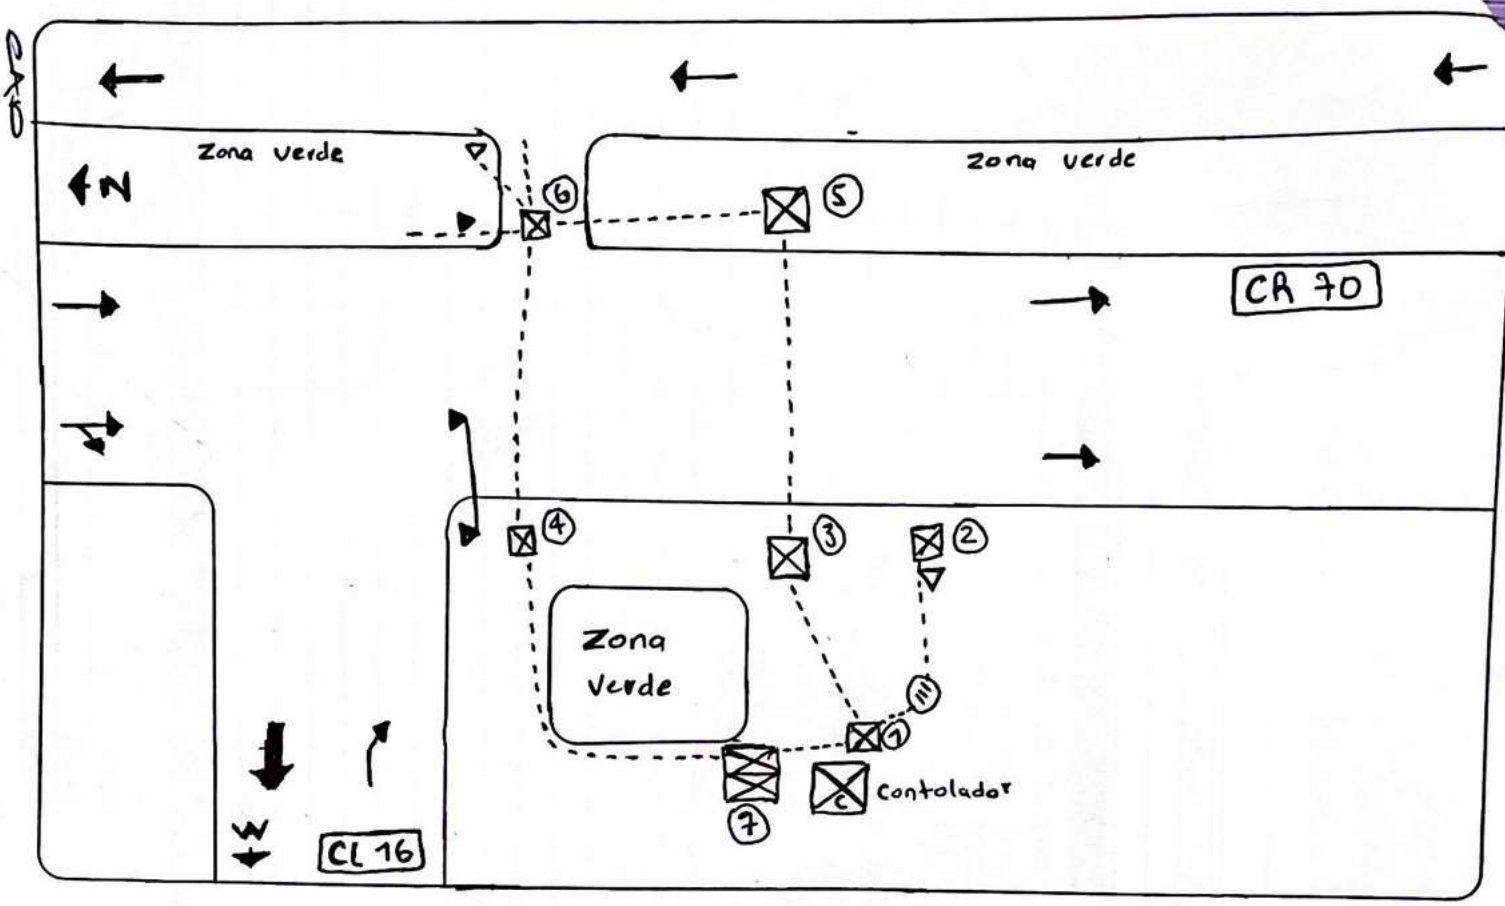
FECHA:	9/06/23	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Oscar Lopez - Andres Amaya.
DIA:	Viernes		
VEHÍCULO:	Camioneta		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 70	W-E	N-S	Sondeo de ~~calle~~ Sdo carril Carrera 70 sentido Norte Sur.			212
Calle 96						
			Se realiza el sondeo de este tramo de via dando como resultado			
			Cruce en buen estado, solo se encuentra tuberia de 1 1/2 en cruce			
			vial 2 Ø,			
		Nota	Se recomienda canalización nueva ya que la tuberia es demasiado		4:00 pm	
			pequeña para los posibles cantidad de cables.			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ		FIRMA	
CARGO		CARGO	

Sondeo tramo de via carrera 70 calle 16 (N-S)



# Entre cajas	tuberia	Cable	longitud
1 a la 7	2 Ø 2"	11 Cables	1 metro
7 a la 4	2 Ø 2"	11 Cables	6 metros
4 a la 6	1 Ø 2"	11 Cables	14 metros
6 a la 5	2 Ø 1½"	4 Cables	4 metros
5 a la 3	2 Ø 1½"	4 Cables	14 metros
3 a la 1	2 Ø 1½"	4 Cables	4 metros
1 a la 2	1 Ø 2"	2 Cables	7 metros

- Controlador
- Caja 0,50 x 0,50 - 1, 2, 4, 6
- Caja 0,60 x 0,60 - 3, 5
- Caja 0,60 x 0,80 doble - 7
- Semaforo vehicular
- Semaforo a mensula
- Semaforo peatonal
- obstruccion

Andres Amaya - oscar lopez

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	10/06/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN: Gustavo betancour-Juan Osorio-Juan José zapata.
DIA:	sabado	
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 80x calle 46	S-E	S-N	*Se cierra asfecto verde abierto en semaforo peatonal estatico	7:00 am	7:00 pm	228
			*retiro de Lampara peatonal roja estatica			165
	S-W	N-S	*instalacion de Lampara peatonal estatica roja del muni-cipio.			186
			*construccion de 1 empalme para cables de semaforizacion 4x18.			78
	S-W	N-S	*retiro de Lampara peatonal estatica roja			165
			*instalacion de lampara peatonal estatica roja del municipio.			186
			*construccion de 1 empalme para cables de semaforizacion 4x18.			78
	N-W	N-S	*retiro de Lampara peatonal estatica roja.			165
			*instalacion de lampara peatonal estatica roja del municipio.			186
			*construccion de 1 empalme para cables de semaforiza-cion 4x18.			78
Carrera 48x calle 37	S-E	W-E	*se realiza revision del cruze y se encuentra en perfecto Funcionamiento.			—
*Carrera 48 cx Calle 10	S-W	S-N	*Se cierra asfecto rojo caido			228
			*Se realiza ajuste de visera plastica en asfecto rojo.			228
*Carrera 32b x cal 1c 10	SC	S-N	*se endereza semaforo peatonal estatico			226
	S-E	S-N	*Se endereza semaforo peatonal estatico			226

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos B	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRÁTO:	4600096067 DE 2022

ECHA:	7010612023	RESPONSABLES EJECUCIÓN: William Chavarria - Kender Perozo - Jorge Alvarez -
IA:	Sabado	
EHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 65 x Calle 81	S-E	W-E	*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa redonda camara.	8:00am	2:00pm	230
			*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa redonda camara.			230
			*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa redonda camara.			230
Carrera 99 x Calle 47A	S-E	W-E	*repartan peatonales apagados *suministro e instalacion de 75 mts de cable para semaforizacion 4x18.			60
			*construccion de 2 empalmes para cables de semaforizacion 4x18 en semaforos peatonales.			78
			*construccion de 1 empalme para cables de semaforizacion 4x18.			78

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Collazo	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	11-06-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	William Chavarria.
DIA:	Domingo		Juan Rios.
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr. 52 Cll-73 sur	Separado	S-N	Lavado de poste recto			205
			Lavado de semáforo vehicular			209
			Lavado de semáforo peatonal			206
			Lavado de disco direccional			211
			Lavado de disco P.E.P			211
			Lavado de sonorizador			207
	Separado	N-S	Lavado de poste recto			205
			Lavado de semáforo vehicular			209
			Lavado de semáforo peatonal			206
			Lavado de disco direccional			211
			Lavado de disco P.E.P			211
			Lavado de sonorizador			207
Cr. 52 Cll-72 sur	SW	S-N	Lavado de poste recto			205
			Lavado de semáforo vehicular			209
			Lavado de semáforo peatonal			206
			Lavado de disco direccional			211
	NW	S-N	Lavado de poste recto			205
			Lavado de semáforo peatonal			206

VERIFICACIÓN					
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE			
REVISÓ	Collazo	FIRMA			
CARGO		CARGO			

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	11-06-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Willian Chavarria
DIA:	Domingo		Juan Rios
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr=52 Cll=72sur	Separado	N-S	lavado de poste recto			205
			lavado de semáforo vehicular			209
			lavado de dos semáforos peatonales			206
	NE	E-W	lavado de poste recto			205
			lavado de semáforo vehicular			209
			lavado de semáforo peatonal			206
			lavado de disco direccional			211
	SE	E-W	lavado de poste recto			205
			lavado de semáforo vehicular			209
			lavado de dos semáforos peatonales			206
			lavado de disco direccional			211
Cr-52 Cll-71sur	Separado	S-N	lavado de poste recto			205
			lavado de semáforo vehicular			209
			lavado de disco direccional.			211
	SW	E-W	lavado de poste recto			205
			lavado de semáfore peatonal			206
	Separado	WE	lavado de poste recto			205
			lavado de semáforo vehicular			209
			lavado de dos semáforos peatonales			206
			lavado de disco direccional			211

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE				
REVISÓ		FIRMA				
CARGO		CARGO				

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	11-06-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Willian Chavarria
DIA:	Domingo		Juan Rios
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr. 52 Cll 7 sur	NW	N-S	lavado de poste recto			205
			lavado de semáforo peatonal			206

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ		FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	11/06/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Kender Pelozo - Andres Amaya - Jose vargas - Juan Jose zapata.
DIA:	Domingo		
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 70 x Calle 14 - hasta la calle 9.	S-W	N-S	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80	8:00am	3:00pm	230
	S-W	N-S	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80.			230
	S-W	N-S	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80			230
	S-W	N-S	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80			230
	S-W	N-S	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80.			230
	S-W	N-S	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80.			230
	S-W	N-S	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80.			230
Carrera 77 x Calle 55-60	N-W	E-W	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 50x50.			230
	N-W	E-W	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 50x50.			230
	S-W	E-W	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 50x50.			230
	S-W	W-E	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 50x50			230
	S-W	W-E	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 50x50.			230

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos D	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

ECHA:	11/10/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Kendri Perozo - Andres Amaya - jose vargas - Juan José Zapata.
IA:	Domingo		
EHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Calle 77x Calle 5-W 55-60		SW-E	Suministro e instalación de 4 cordones de soldadura en tapa caja 50x50	8:00am	3:00pm	230

VERIFICACIÓN					
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE			
REVISÓ		FIRMA			
CARGO		CARGO			

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	11/06/23	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Gustavo - Juan Osorio - Jorje Alvarez
DIA:	Domingo		
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* CR 43 C115	Nor	occ-or	Semaforo Vehicular Golpeado			
Sur			Se enderieza semaforo vehicular			226
* CR 66 B C11	Nor	occ-or	Lampara Peatonal Dinamica verde Mala			164
33			Retiro de lampara verde dinamica Mala			165
			Istalacion de lampara verde dinamica + empalme			186
						78
* 108 via al	ori	sur-occ	Cuarto Aspecto Abierto			
Mar		Nor	SG Ajusta Aspecto			228

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE				
REVISÓ	Carlos D	FIRMA				
CARGO		CARGO				

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	12/06/2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN: Andres amaya - Juan Jose zapata.
DIA:	Lunes	
VEHÍCULO:		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*Carrera 80 a calle 79 77 A.	N-W	S-N	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en camara (tapa redondo).	8:00 am	3:00 Pm	230
			*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80			230
			*suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en camara (tapa redonda).			230
*Carrera 80bx calle 30A	S-E	E-W	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa redonda camara.			230
*Carrera 80x calle 30A	S-E	E-W	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa redonda camara.			230
	S-E	E-W	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa redonda camara.			230
*Carrera 79x calle 30A	S-E	E-W	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa redonda camara.			230
*Carrera 78AX calle 30A	S-E	E-W	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa redonda camara.			230
*Carrera 78x calle 30A	S-E	E-W	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa redonda camara.			230
	S-E	E-W	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa redonda camara.			230

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Calidad	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	12/06/2022	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Andres Amaya- Juan Jose Zapata.
DIA:	Lunes		
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*Carrera 78x Calle 30A	N-W	E-W	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa camara redonda.	8:00am	3:00pm	230
	N-W	E-W	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa redonda camara.			230
*Carrera 78x Calle 30A	N-W	N-S	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa camara redonda.			230
	N-W	N-S	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 50x50.			230
*Carrera 77A x Calle 31	N-W	E-W	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80			230
	N-W	E-W	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80			230
	N-W	E-W	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80			230
			*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80			230
			*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80			230
*Carrera 77x Calle 31	S-W	E-W	*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 60x80			230
			*Suministro e instalacion de 4 cordones de soldadura en tapa 50x50.			230

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Carlos P	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	12-06-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Willian Chavarria
DIA:	Lunes		Juan Rios
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Cr 52 Cll 11 Sur	Separador	N-S	lavado de poste recto			205
			lavado de semáforo vehicular			209
			lavado de dos semáforos peatonales			206
			lavado de disco direccional			211
* Cr 52 Cll 10 Sur	Separador	S-N	lavado de poste recto			205
			lavado de semáforo vehicular			209
			lavado de semáforo peatonal			206
			lavado de disco direccional			211
			lavado de disco P.E.P			211
			lavado de pulsador			207
	Separador	N-S	lavado de poste recto			205
			lavado de semáforo vehicular			209
			lavado de semáforo peatonal			206
			lavado de disco direccional			211
* Cr 52 Cll 9 Sur	SW	S-N	lavado de poste recto			205
			lavado de semáforo vehicular			209
			lavado de semáforo peatonal			206
			lavado de disco direccional			211
	NW	S-N	lavado de poste recto			205
			lavado de semáforo peatonal			206

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	Victoria Durango		NOMBRE			
REVISÓ	Carlos D		FIRMA			
CARGO			CARGO			

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	CIV-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	12-06-2023	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Willian Chavarria
DIA:	Lunes		Juan Rios
VEHÍCULO:			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr. 52 Cll. 9 Sur	NE	N-S	lavado de poste recto			205
			lavado de semáforo vehicular			209
			lavado de semáforo peatonal			206
			lavado de disco direccional			211
	NE	E-W	lavado de poste recto			205
			lavado de semáforo peatonal			206
	SE	N-S	lavado de poste recto			205
			lavado de semáforo peatonal			206
Cr. 52 Cll. 5 Sur	Separada	S-N	lavado de poste recto			205
			lavado de semáforo vehicular			209
			lavado de semáforo peatonal			206
			lavado de disco direccional			211
			lavado de disco P.E.P			211
			lavado de pulsador			207
	Separal	N-S	lavado de poste recto			205
			lavado de semáforo vehicular			209
			lavado de semáforo peatonal			206
			lavado de disco direccional			211
			lavado de disco P.E.P			211
			lavado de pulsador			207

VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE				
REVISÓ	Carlos D	FIRMA				
CARGO		CARGO				

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
		VERSIÓN 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	13-06-23	RESPONSABLES EJECUCIÓN:
DIA:	Martes	Cesar Santos, William chavarria, Jose luis, Gustavo betancur
VEHÍCULO:	IKN781	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*CRAG			Vandalismo en semaforos vehiculares a poste	7-40	16-35	
CR56-56C			caller de potencia en camara de tigo une.			
calle 50.			en CR 56C call 50 san benito			
CR56C call 50	N-E.	E-W.	Instalación de 1 semaforo vehicular a poste			175
			de segunda con lamparas chinas 3. lavado.			
			se lavaran semaforos en la tigo			209
			construcción de 1 empalme electrico en semaforo			78
			vehicular.			
			se utilizo. 4 conectores de resorte, 3 sunchos de 0,45m			
			(1.35m, 3 hevillas			
	S-E.	E-W.	Instalación de 1 semaforo vehicular a poste de segunda (lavado.)			175
			con lamparas chinas 3.			209
			construcción de 1 empalme electrico en semaforo vehicular			78
			se utilizan 4 conectores de resorte, 3 sunchos de 0,45m.			
			1.35m, 3 hevillas			
	S-E	S-N	Instalación de 1 semaforo vehicular a poste de segunda			175
			lavado			209
			construcción de 1 empalme electrico en semaforo vehicular			78
			se utilizan 4 conectores de resorte 3 sunchos de			
			0,45m x 1.35m, 3 hevillas			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Calado	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	**PLAN DE CALIDAD**	CIV-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
		ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".**
NÚMERO DEL CONTRATO:	**4600096067 DE 2022**

FECHA:	13-06-2023	**RESPONSABLES EJECUCIÓN:**
DIA:	Martes	Cesar Santos, William Chavarria, Jose Luis, Gustavo Betancur
VEHÍCULO:	IKN 741	

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 56C CL50	S-W	N-S	San bladto.	7-40	16-35.	
			Demolición de concreto a 1 caja de 50x50.			1
			limpieza de triturado existente en 1 caja de 50x50			39
			Instalación de 1 semaforo Vehicular a poste de segunda localidad.			175
						209
			Construcción de 1 empalme eléctrico en semaforo Vehicular			78
			retiro de (42x6m) 2A de cable 4x18 Vandelizado			143
			Suministro e instalación de (31x10mt+15m)=45m de cable 4x18 nuevo			60
			Construcción de 4 empalmes eléctricos en camara telefonica de tipo uno en Us.			78
			construcción 3 empalmes eléctricos en caja de 50x50.			78
			llenado con triturado existente en caja de 50x50.			OE16
			concretada en 1 caja de 50x50.			231
			Malla herrafe de Polipropileno.			
			Soldada de 3 cordones en 1 tapa de camara de tipo uno con platina.			230
			Se utilizan 6 electrodos, 32 conectores de resorte, 3 hebillas, 1.35m de cinta Vand.,			

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ	Cailoos	FIRMA	
CARGO		CARGO	

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
		ED: DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ".
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600096067 DE 2022

FECHA:	13-06-23	RESPONSABLES EJECUCIÓN:	Angelo Gómez.
DIA:	Martes		Juan fernando Ríos.
VEHÍCULO:	(WLY 891).		Leonar Viera.

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Cra 55 x Cll 59.	W	SN	Retiro de (1) Ménsula Completa.	8:30.		138
		.	Retiro de (1) Semáforo a Ménsula con araña y Flauta			141
		.	Retiro de (1) Semáforo a Poste de Ménsula.			142
			Retiro de (2) mts de Cable 4X18 del brazo y (3) mts del Poste.			143
			Retiro de (1) disco direccional.			149
			Instalación de (1) Ménsula Reparada de 4,50 mts			171-197
		.	Instalación de (1) Semáforo a Ménsula (existente).			174
			Suministro, Instalación de (1) araña y (1) Flauta (nuevas).			—
			Suministro, Instalación de (8) mts y (6) mts de Cable para brazo Ménsula.			60
		.	Instalación de (1) Semáforo a poste de Ménsula (existente).			175
			Gasto de Hebillas = (8) unidades.			
			Construcción de (2) Empalmes en Semáforos con (2) conectores		11:30.	78
* AV 80 x Cll 44.	W	WE	Retiro de (1) Contraste a ménsula.	12:40		148
	E	WE	Retiro de (1) Contraste a ménsula.			148
	E	EW	Retiro de (1) Contraste a ménsula			148
	W	EW	Retiro de (1) Contraste a ménsula.			148
Cra 79AA x Cll 44	W	WE	Retiro de (1) Contraste a ménsula			148
	E	WE	Retiro de (1) Contraste a ménsula.		14:15.	148

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	Victoria Durango	NOMBRE	
REVISÓ		FIRMA	
CARGO		CARGO	
