
ESQUEMA PLANTEADO INTERSECCIÓN CRA 10 CON CLL 41

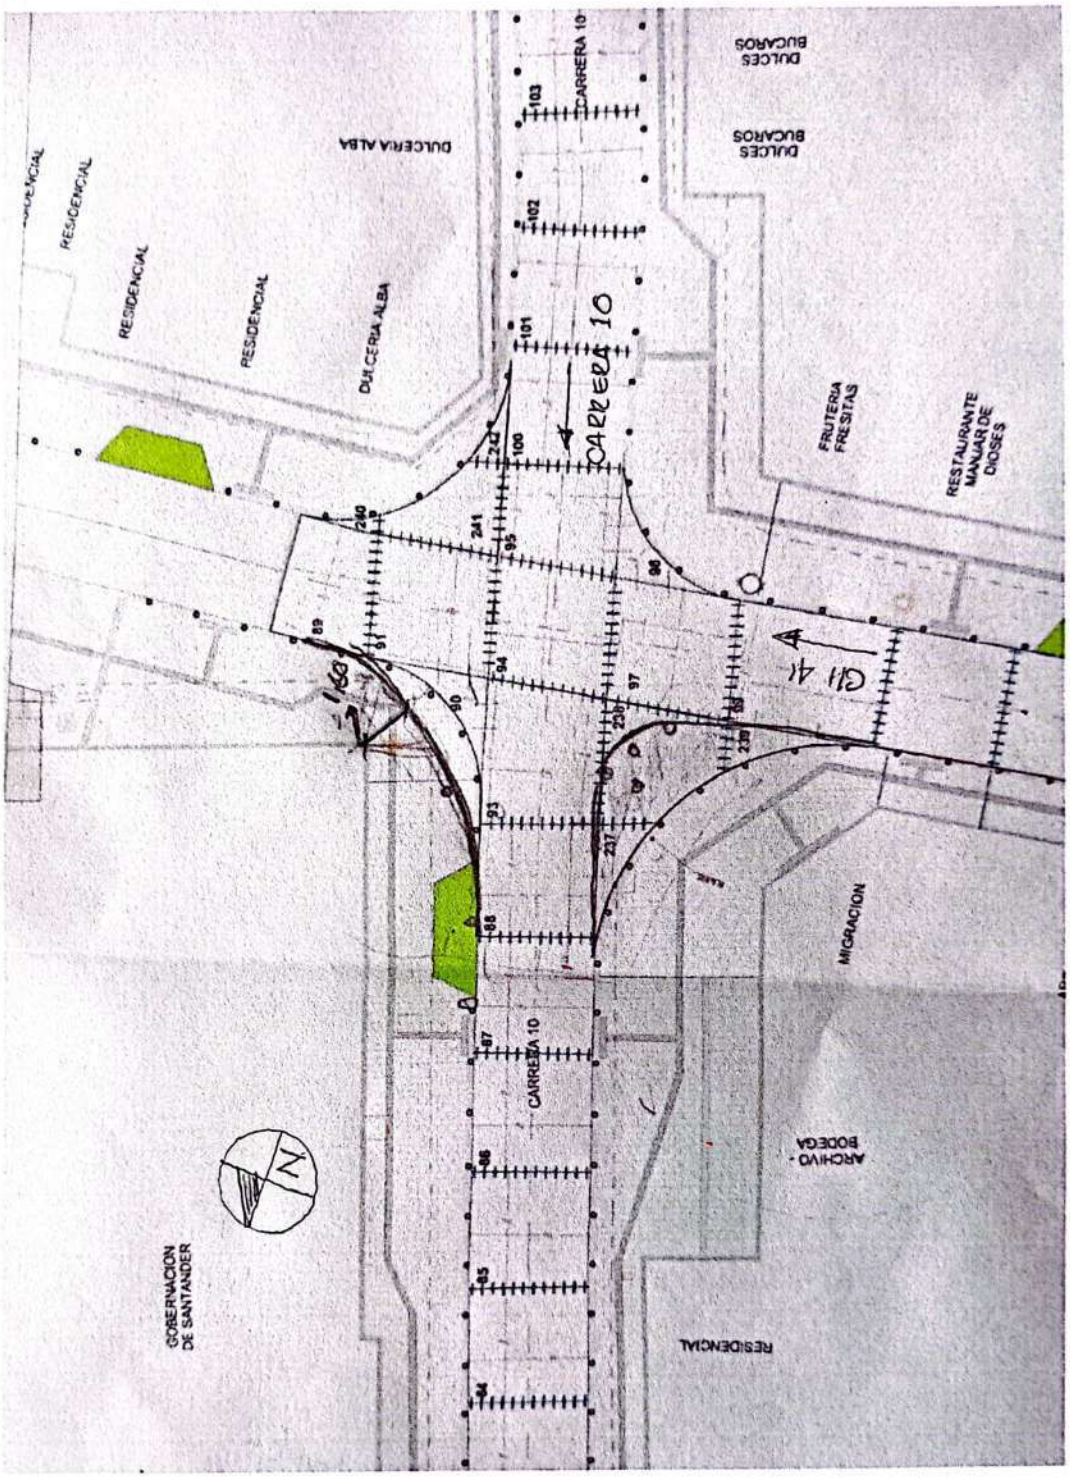

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Informe inspeccion con camara tuberia sanitaria Cra 13 y Cll 37	Contratista	12 de Octubre 2023
normativa para realizacion de bebederos	Contratista - Interventoria	12 de Octubre 2023
Informe limpieza monoblock a la alcaldia	Contratista	10 de Octubre 2023
Propuesta por especialista pavimentos del Contratista accesos vehiculares con travertino de 3 cm	Contratista	12 de Octubre 2023
Soporte de la ARB de que no haran Intervenciones dentro del proyecto	Contratista	Seguimiento.
Recorrido con Personal de Claro definicion acometidas telecom.	Contratista - Interventoria	10 de Octubre 2023.

Powered by CamScanner

SOLIUN INGENIERÍA

REGISTRO DE ASISTENCIA

Alcaldía de Bucaramanga

CONTRATO	"INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Comite semanal seguimiento de obra.
LUGAR:	Cra 10 Con Cll 41
FECHA: 05-10-2023	Hora de inicio: 8:55 am — Hora Finalización: 11:00 am

NOMBRE	CÉDULA	ENTIDAD / DEPENDENCIA	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Andres Ocla Pulla	1'098.792.368	Malla incal	3013532636	Consorciomallaincal@gmail	
Eliana Carolina Jaimes	1'098.724225	malla incal	3053251639	Gmi matenconsocial@gmail.com	
Josue Torres Rojas	1095813748	Interventoria	3188639459	proyectos2@soliunsas.com	
Camilo Macias	1095939907	Malla Incal	3155222812	concorciomallaincal@gmail.com	
Edgar Bayona F	91243324	Scc. Infraest	3174402934		
Wilmer Ochoa	91.280.249	Malla Incal	3153811278		
Camila Vélez G.	1.098.715.802	Malla Incal	3166078360		
Nelson Cortes	1049619892	Solium ing / interv.	3175459085	proyectos2@soliunsas.com	
Yuriany Rodriguez B.	1.098.7211.259.	ARQ. Infraestructura.	3102382546	myrodriguezb@bucaramanga.gov.co	
Sergio A Benavides	13871828	ARQ/INTERV/Solium Ingº	3006153857		
Ricardo Arguero B	91.235296	rarguero@bucmga	3144703992	rarguero@bucmga.gov.co	
Fernando Duarte	13806582	INCAL	3002082970	N.A	

Observaciones:

	FORMATO: ACTA DE COMITÉ DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-034 Versión: 0.0 Página 1 de 4

ACTA No.	207

OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Lugar: 9:00 Am	**Fecha:** 12 de oct 2023.
Hora Inicio: Obra.	**Hora Fin:** 11:30 Am

TEMAS TRATAR:

comite tecnico Semanal de obra.

DESARROLLO DEL COMITÉ

Se inica recorrido en obra sobre cra 10 con calle 41 contratista informo inicio de construcción de cajas electricas. cajas para el dia de mañana.

Por solicitud de alcaldia y comite con gobernación se solicita al contratista por parte del coordinador de plan centro ricardo azuero utilizar concreto acelerado fastrack. a 3 dias. con el fin de terminar en el menor tiempo posible esta intersección y dar apertura vial.

Cra 10 entre calle 42 y 43 se termina instalación red de alcantarillado pendientes 2 acometidas domiciliarias contratista se compromete a terminar acometidas el proximo sabado e iniciar instalación de redes electricas el dia (jueves). viernes 13 de octubre.

Cra 10 con calle 43 se inicia construcción de manoblock proximo a cra 11. para fundir intersecación cll 43 sobre cra 11 y dar paso vial. sobre cra 11.


Powered by CamScanner

tramite de bebederos para legalizar en el empas y solicitud de acompañamiento por parte de empas, cuando se inicie el proceso contratista informa a empas para acompañamiento.
Se solicita al contratista por parte de la supervisión. iniciar fresado sobre cll 37 cra 14 y 15. sin el informe de inspección de las redes debido a los tiempos de programación.
Por parte de interventoría se le solicita al contratista entregar diseño marshall de mezcla MDC-19 a utilizar. se entregara proxima semana. comite

Terminación de zona peatonal cra 11 con calle 43. y peatonales cll 44. sector bomberos finalizando proxima semana.
Contratista informa llegada de dos contenedores. travertino peru. el dia sabado (travertino peatonal).

Programación y balance continua pendiente entrega con subsanación de observaciones realizadas al contratista por la interventoria
Se solicita por la alcaldia un stock de sumideros tipo monobloch, se propone un 10%. sin embargo se estudiara el metodo de pago y de entrega de este suministro..
Se socializa posibles soluciones para guia usual, con suspensión, interventoria. y contratista en pintura especial. con fuerte adherencia. se revisara ancho de franja. con la normativa vigente y se le solicita al contratista ir estructurando NP.

Powered by CamScanner

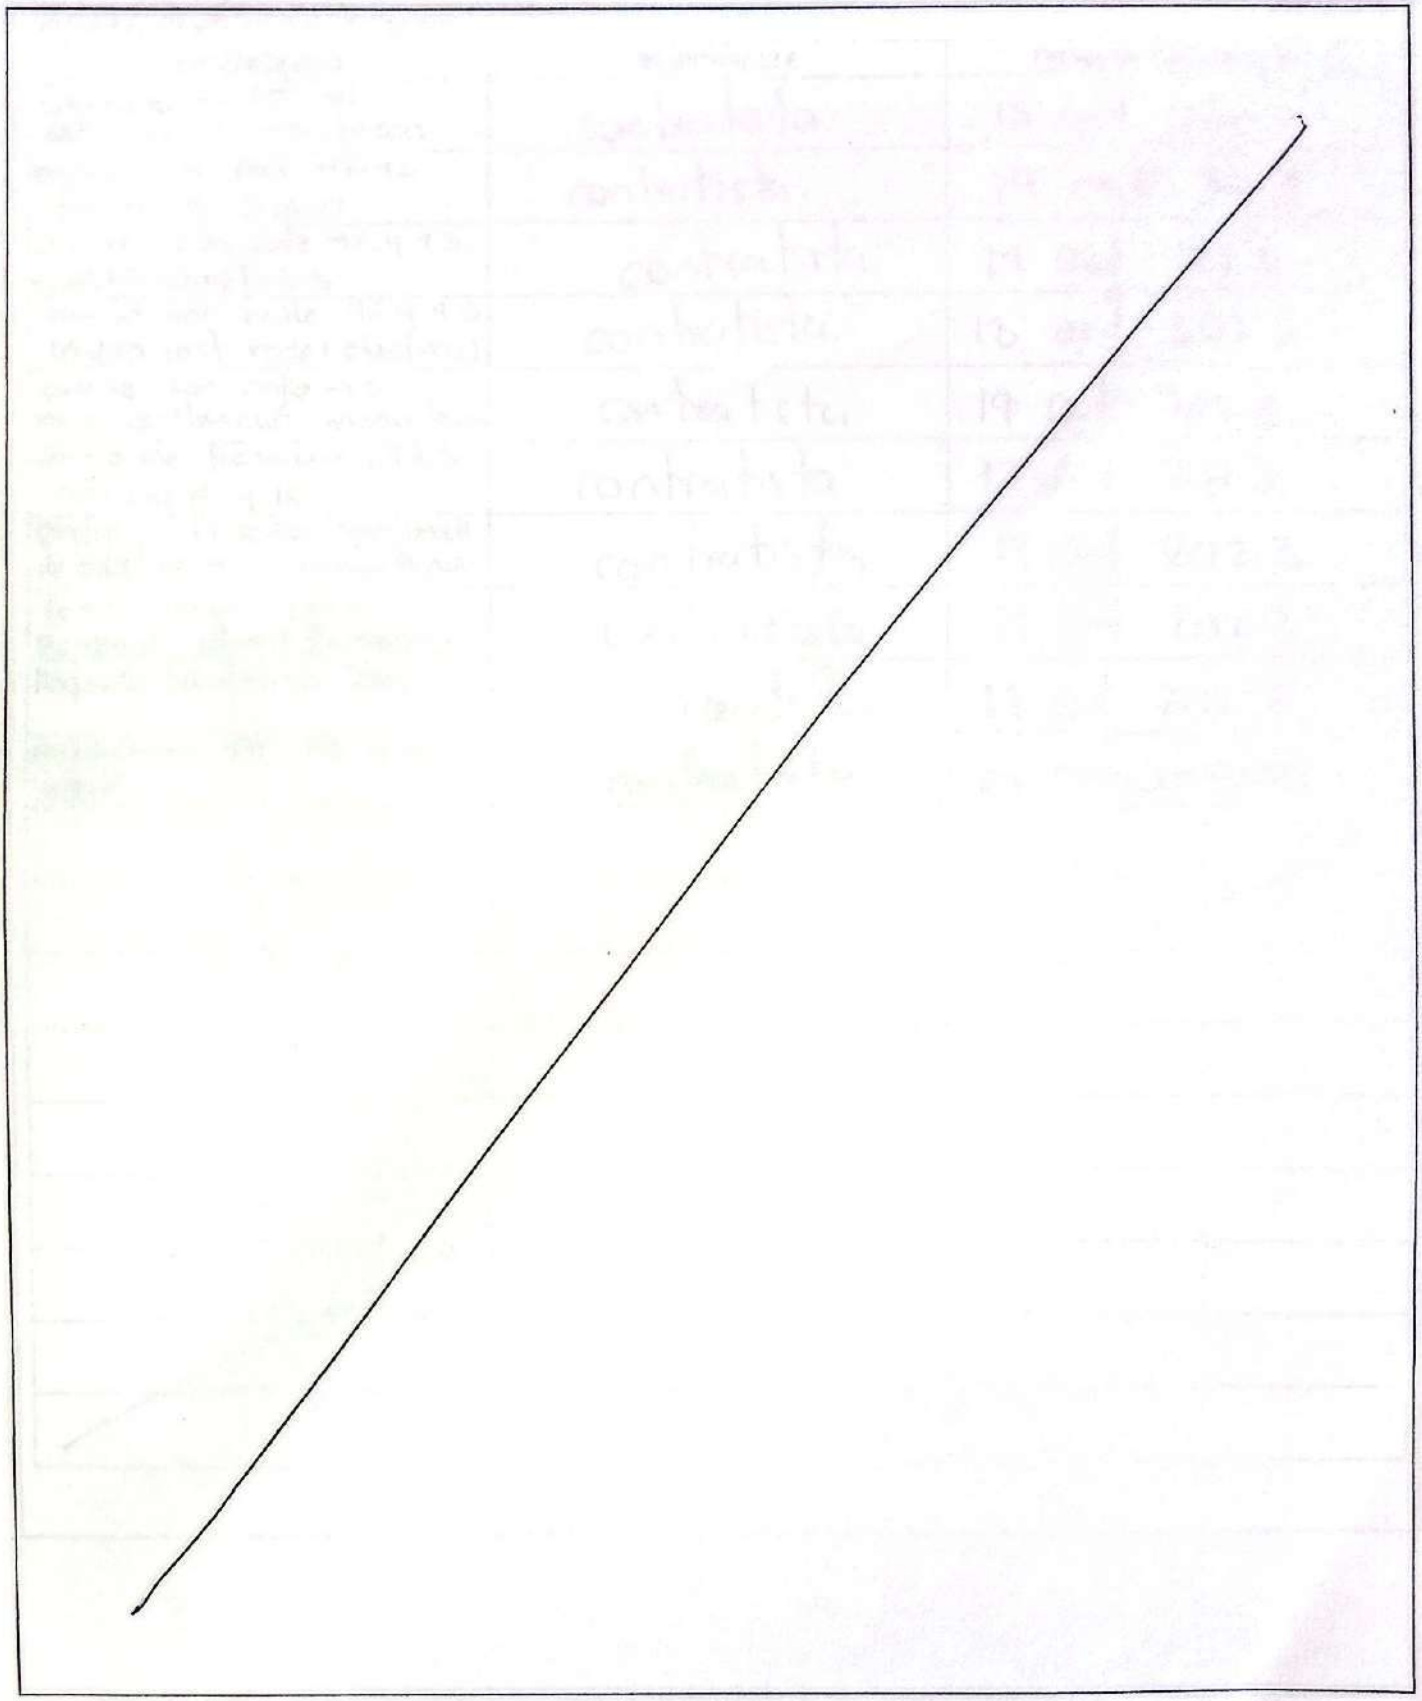

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Cra 10 con calle 41 inicio cajas electricas	contratista.	13 oct 2023
entrega de NPs MR-42 fasttrack. 3 dias	contratista.	19 oct 2023
cra 10 con calle 42 y 43. finaliza comelidas	contratista.	19 oct 2023
cra 10 con calle 42 y 43 INICIO inst redes electricas	contratista.	13 oct 2023
cra 10 con calle 43 inicio construcción monoblock	contratista.	19 oct 2023
inicio de fresado cll 37 con cra 14 y 15.	contratista.	17 oct 2023
entrega diseño marshall de MDC-19 a interventoria	contratista	19 oct 2023.
terminación zona peatonal cll 44 bomberos.	contratista.	19 oct 2023.
llegada travertino pen.	contratista.	14 oct 2023
estructurar NP de gua visual	contratista	en seguimiento

Powered by CamScanner

SOLIUN INGENIERÍA

REGISTRO DE ASISTENCIA

Alcaldía de Bucaramanga

CONTRATO	"INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	comite tecnico Semanal de obra.
LUGAR:	obra. cra 10 con cll 41
FECHA:	Hora de inicio: 9:00 Am — Hora Finalización: 11:30 Am

NOMBRE	CÉDULA	ENTIDAD / DEPENDENCIA	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
JOSUE TORRES	1075813728	Social INTERVENTORIA	3188689159	proyectos2@soliun.com	
Eliana C. Jaimes	1.098724225	Soc al Malla incal	3053251639	omi.atencionsoat@gmail.com	
Fernando Dueñas	13806582	" " "	3002082976	" "	
Laneth A Perez	1098666790	Soliun ing Sas.	3187953960	——	
Nelson Castro	1049619892	Soliun ing. / interv.	3125459083	proyectos2@soliunsas.com	
Carlos Andrés Figueroa Ayala	1049.609.534	Soliun ing / Especialista en vías	3143773215	proyectos2@soliunsas.com	
Edgar Bayona F.	91.243.324	Sec. Infraest.	317 AB02934		
Johnny Serrato	91.280 259	Malla Incal	3105811375		
Raul D. Pelaez C	79573492	Interv ad / Soliun Ing.	3213980386	——	
Ricardo Rivero B	91.235.296	coord Sec. Infra	3144703994	rrazevedo@bucaramanga.gov.co	
Yindy Poda Villamizar	1004273973	Malla Incal	3139185 16		
Sergio A Benavides	13871828	RESIDENCIA / INTERVIAL	3006153857.	——	
Camilo Florez Sanabria	1.098.715.802	Malla Incal	3160787360		
Camilo Macias	1095939907	Malla Incal	3155222812	consorciomallaincal@gmail.com	

Observaciones:

Powered by CamScanner

	FORMATO: ACTA DE COMITÉ DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-034
		Versión: 0.0
		Página 1 de 4

ACTA No.	211

OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Lugar: Cruce con Cll 41	**Fecha:** 26 -oct -2023
Hora Inicio: 8:50 Am.	**Hora Fin:** 11:00 Am

TEMAS TRATAR:

Comite tecnico semanal de obra,

DESARROLLO DEL COMITÉ

Se inicia comite de obra con lectura de compromisos pendientes

se toca el tema de solicitud de construcción de cajas y ductos red telematicos adicionados por parte de la empresa claro, se atiende funcionario con solicitud de intervención de construcción de cajas y acometidas. a cargo del proyecto.

supervisor Edgar Bayona y coordinador plan centro Ing Ricardo Ozuna manifiestan no estar de acuerdo con llevar a cabo las solicitudes de la empresa claro debido a que la obra ya esta adelantada y no estan de acuerdo con asignar recursos para beneficio de empresa privada.

Se solicita iniciar labores de fachada en Casa Bolivar contratista informa inicio de actividades proxima semana previa socialización con encargada del predio. proximo comite.

tramite de contador del deck esta en tramite por documentación pendiente de la alcaldia. a cargo del supervisor

Powered by CamScanner

El dia de hoy se realizara prueba de Salida bomberos. cra 11 para verificar radio de giro.

Se realizara reunion con supervisión 3:00 pm hoy para revisar tema de balance, programación con Solicitud de prorroga #3.

Se revisa presentación de APU MR-42 para reajuste de precio por mayores cantidades a instalar interventoria revisa estructura tecnica del APU presentado, se solicita revisión por parte de la alcaldia debido a que el contrato no contempla reajuste de precio

Estructuración NP Guia visual para zona peatonal de espacio publico. se definira por parte de la alcaldia el diseño y se presentara en el proximo comite

Inicio de instalación de piso sobre calle 37 y 41 cra 10. para Proximo comite


Contratista manifesta informar en el transcurso de la Proxima semana antes de comite el inicio de fresado por disponibilidad de fresadora.

Manual de mantenimiento de pilonas se revisara en seguimiento. se tocan temas de conexion de red telematica y seguridad de datos que requieren las pilonas para su funcionamiento.

Se socializa reunión realizada con proveedor de travertino donde se le solita travertino vehicular pero planta cantera Malaga se niega a la entrega de este tipo de material. Este material es necesario para instalar en cra 12 con cll 41 y 42. se estudiaron soluciones de piso para cra 12 con cll 41 y 42 en Caso de no suministrarse el adoquin vehicular la intervention recomienda realizarlo en MR-42 por compromisos de entrega pactados y cumplimiento programación.

Powered by CamScanner

Informe sobre incidente en casa sobre cra 11 con calle 42 y 43 afectada por lluvias solicita suspensor sobre los sucesos

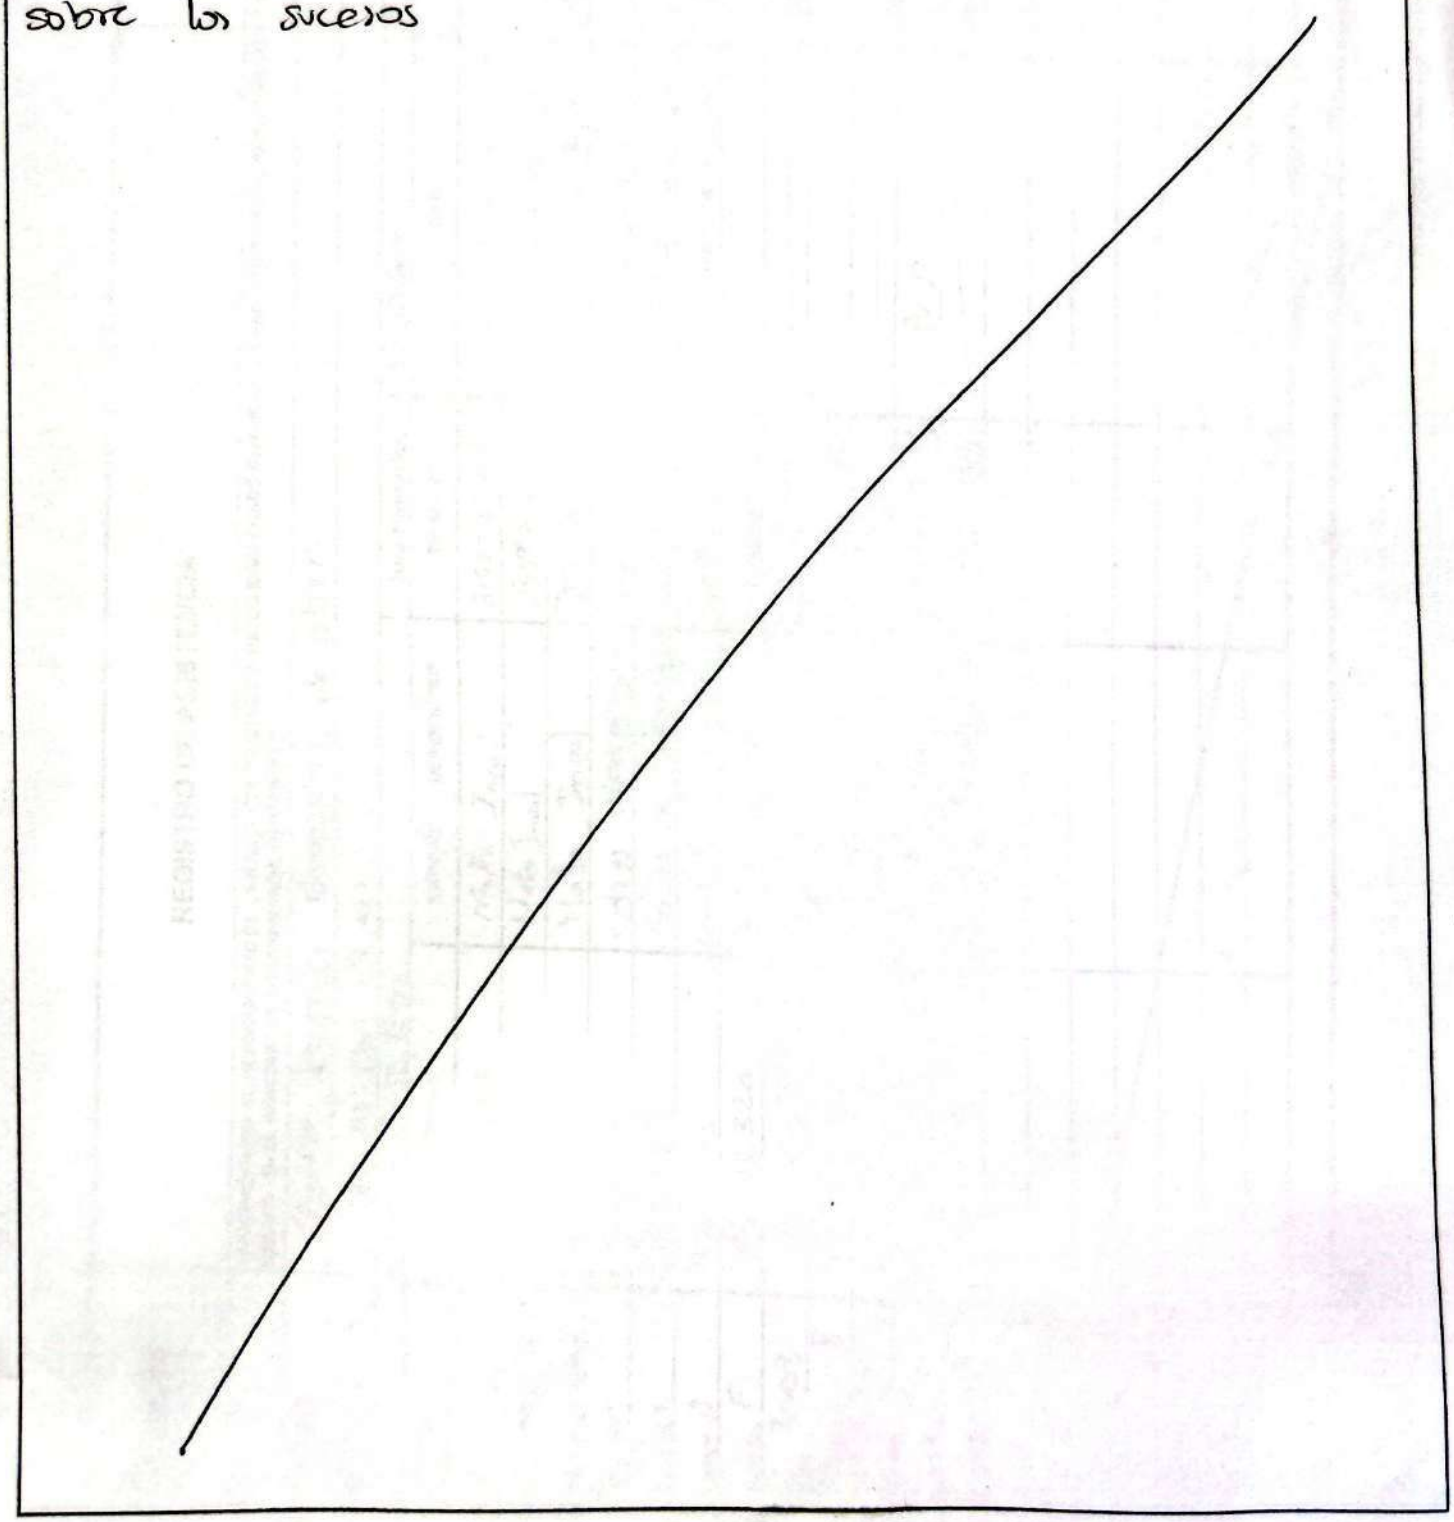

Powered by CamScanner

SOLIUN INGENIERÍA

REGISTRO DE ASISTENCIA

Alcaldía de Bucaramanga

CONTRATO	"INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Comite tecnico semanal de obra
LUGAR: 26/oct/2023-	cra 10 con cll 41.
FECHA:	Hora de inicio: 8:50 Am — Hora Finalización: 11:00 Am

NOMBRE	CÉDULA	ENTIDAD / DEPENDENCIA	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Camilo Macias	1095939907	Malla Incal	3155222812	consorciomallaincal@gmail.com	
Yindy Paola Villamizar Baron	1094273973	Malla Incal	3133918568	consorciomallaincal@gmail.com	
Eliana Carolina Jaimes	1098742725	Malla Incal	3053261631	cmiatencionsocial@gmail.com	
Josue Torres	1095815728	Solun Interventoria	3188619159	proyectos2@solunsas.com	
Nelson Cortes	1019619892	Solun ing / interventoria	3125459083	proyectos1@solunsas.com	
Ricardo Alvaro B.	91.235.296	coord. Sec. infraestruc.	3144703992	rvezuela@bucaramanga.gov.co	
Edgar Bayona F.	91.243.324	Sec Infraest.	3174402934		
Javieth A Perez	1098666798	Solun intervent	3187453980		
Eduwing Quintero B	91.280.259	Malla Incal	3153811375		
Raul O. Rebolledo C	79573492 Bta	SOLIUN ING./ Intervent.	3213980386		
Fabio Bueños	13806562	Malla Incal	3007062976	N.A.	
Sergio A Benavides	13871828	Solun Ing / RESIDENTE	3008153857		

Observaciones:

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Inicio actividades casa Bolivar fachada	contratista	02 - nov - 2023.
tramite contador agua zona DECK	Supervisor / Alcaldia.	02 - nov - 2023
revisión promoga reunion balance y Programacaõ	contratista / super / Alcald.	26 - octobre 2023 : 3:00pm
Diseño guia visual Peatonal	Alcaldia.	02 - nov - 2023
Instalación pso peatonal cra 10 dl 37 y 41	contratista	02 - nov - 2023.
Cronograma de fresado cll 37 y cra 13	contratista.	02 - nov - 2023.
Pilonas conexion y wifi para funcionamiento	contratista	en seguimiento
seguimiento despacho traverti no vehicular	contratista	02 - nov - 2023
Informe sobre casa con afectación cra 11 dl 12 y 13. para supervisor	contratista	02 - nov - 2023.

Powered by CamScanner

	FORMATO: ACTA DE COMITÉ DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-034
		Versión: 0.0
		Página 1 de 4

ACTA No.	213

OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Lugar: Cra 10 cll 37 y cll 41	**Fecha:** 02-nov-2023.
Hora Inicio: 8:50 Am	**Hora Fin:**

TEMAS TRATAR:

comite tecnico semanal de obra.

DESARROLLO DEL COMITÉ

Se inicia comite aprobando acta anterior enviada por correo a diferentes partes.

Adecuaciones casa de Bolivar se realizara acta de inicio para intervención de fachadas parte social y tecnica se informa a supervisión que por parte de contratista e interventoria se entrega presupuesto de fachadas institucionales con acta de facturación de precios No 10. la cual esta para aprobación del ordenador del gasto. con relación a la intervención de las fachadas institucionales.
Queda compromiso supervisor pasarle presupuesto a secretaria de inf para su aprobación.

Inspección con ramales informe sera entregado a interventoria el dia martes. por parte del contratista cll 39 y cra 13.

Bomberos pendiente diseño de iluminación para ubicación de poste, definición de rampa y empalme de escaleras en cll 44.

Np's pendientes para entregar por parte del contratista se compromete a entregar el dia Sabado. Bajajes, señalización y MR-42 pectoral.

Powered by CamScanner

Fundida de MR-42 vehicular intersección cra 10 con Call 41 para poxima semana. antes de comite de obra
Intervención calle 37 y cra 13 fresado y MDC-19 esta en revisión marshall por parte interventoría.
Visita social rampa peatonal san Bazar con supervisor viernes 2:30 pm.


Manual de uso y mantenimiento de paloras esta en tramite pendiente definiones de fibra optica y tenas de funcionamento.
Interventora solicita reunion con funcionario de las TIC de la alcaldia para definición de piloras en cuanto a su funcionamento.
contratista informa para 22 de dic se entregara piloras instaladas y funcionando de manera local pero no de manera unificada por falta de sofware opera para piloras.
cra 12 con calle 42 esta pendiente la definición del paso por falta de insumo fraverfino por parte del proveedor interventoría solicita utilizar MR-42 estampado para. arranzar
intersecciones cra 11 con cll 42 y 43, cll 42 en fraverfino y cll 43 en MR-42 se realizara reunion dia de hoy para entrega de estos frentes.
fresado y aplicación de carpeta cll 37 entre cra 13 y 15 cra 13 entre calle 36 y 44. especialista de pavimento. envia memorando donde relaciona cra 13 e informa insuficiencia de estructura de pavimento. propone posibilidad de reparcheo en puntos criticos y refrazamento con carpeta de 5cm para cra 13.

Powered by CamScanner

Especialista de pavimentos del contratista manifesta que debido a las deficiencias de la estructura existente la intervención a realizar sobre la cra 13 no sera estructural sino de tipo funcional. o cosmetico a la capa de rodadura. desde el area de especialistas de pavimentos se realizaran otras posibles intervenciones para su durabilidad. con bacheo y parcheo.

Para gua usual en zona peatonal se definira en 8 dias por parte de la alcaldia.

Supervisor y coordinador del proyecto informan que y solicitan colocar bolardos frente a accesos a parqueaderos que no esten en uso independiente que tenga licencia vigente esta situación se revisara a fondo con la parte social y juridica del contratista entenderan.

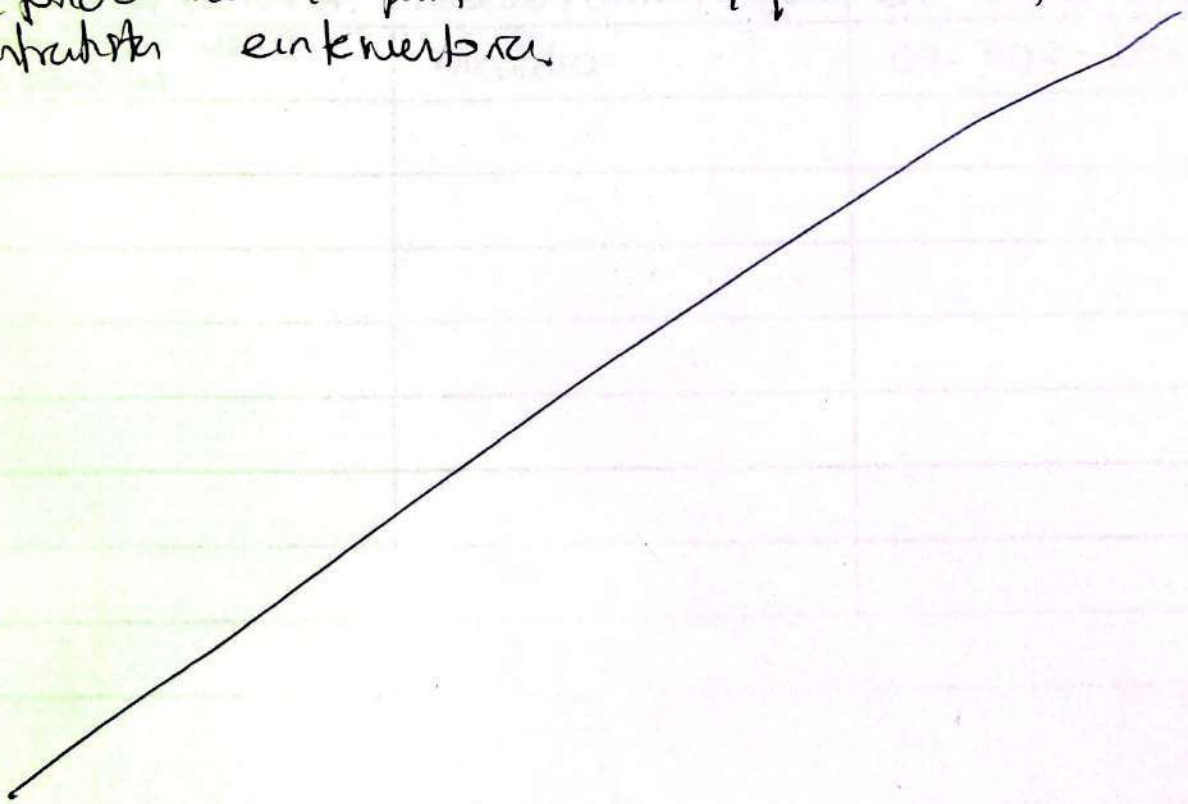

Powered by CamScanner
