OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
acta de estado inicial antes de actividad fachadas casa Bolivar	Contratista.	09-nov-2023
Aprobación / revisión presupuesto intervención fachadas institucio.	Supervisor	09-nov-2023
Entrega informe inspección comarcas	contratista	07-nov-2023
Diseño iluminación Bomberos. Por reubicación de poste	Alcaldia	en seguimiento
NPIS Semaforización, barrajes y MR-42	contratista	04-nov-2023
Fundida MR42 Intersección cra 10 cll 41	contratista	08-nov-2023.
Reunion funcionario TIC interventoria y contratista. toma pilonas.	Alcaldia	en seguimiento.
Entrega pilonas instaladas. y funcionando mesa local	contratista	22-Dic-2023.
Definición piso cra 12 cll 41 y 42 vehicular	Alcaldia/contra/interv	en seguimiento
terminación intersecciones cra 11 con cll 42 y cll 43.	contratista.	en seguimiento.
definición intervención de cra 13 y cll 34 cra 15 y 14.	Alcaldia/contra/inter.	en seguimiento
definición gua usual. zona peatonal	Alcaldia	09-nov-2023.

Powered by CamScanner

SOLIUN INGENIERÍA

REGISTRO DE ASISTENCIA

Alcaldía de Bucaramanga

CONTRATO	"INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	comite tecnico semanal de obra.
LUGAR:	cra 10 en cll 37 y 41
FECHA: 02-nov-2023	Hora de inicio: 8:50 Am — Hora Finalización:

NOMBRE	CÉDULA	ENTIDAD / DEPENDENCIA	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
SERGIO A BENAVIDES	13871828	INTERV / Soliun INC	3006153857	———	
Edgar Bayona F.	91243324	Sec. Infraest	317 440 2934	—	
Jhowing Quintero	91.280.249	Malla Vial	315 [illegible] 1375		
Carlos Andres Figueroa Ayala	1.049.629.534	Interventoria / Especialista en vias	3143773215	proyectos2@soliunsas.com	
Nelson Javier Cortes	1049619892	Interventoria / Soliun ing.	3125890883	proyectos2@soliunsas.com	
Yinsy Paola Villamizar	1094273973	Malla Incal	3133918568		
Camilo Macias	1095939907	Malla Incal	3155222812	consorciomallaincal@gmail.com	
Efrand Carolina Gomez	1098.724.225	Malla Incal	3053251639	cmi.atencionsocial@gmail.com	
Ricardo Arenas	91.235.296	Sec. Infraest	3144703991	rarenas@bucaramanga.gov.co	
Lonetty A Perez	1098666798	interv / Soliun ing.	3187953980	———	
Fernando Dueñas	13866582	Malla INCA	3002884976	N-21	

Observaciones:

Powered by CamScanner

	FORMATO: ACTA DE COMITÉ DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-034 Versión: 0.0 Página 1 de 4

ACTA No.	215

OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Lugar: cra 10 con calle 41	**Fecha:** 09 - nov - 2023.
Hora Inicio: 9:00 Am.	**Hora Fin:** 10:45 Am

TEMAS TRATAR:

comite tecnico semanal de obra.

DESARROLLO DEL COMITÉ

Adecuación casa Bolivar se inician las labores de adecuación de las fachadas. con actividades de retiro en soGalo.

Se solicita poder por parte de la alcaldia a profesional hidraulico del contratista, se realizara mesa de trabajo Alcaldia - contratista - interventoria para medidor de bebedero. de zona deck. para el dia de hoy.

Entrega informe de revisión de redes alcantarillado cra 13 perdiente proxima semana,

Actividad gua usual peatonal exita el compromiso por parte de la alcaldia. definición de diseño. por parte de supervisor informa que se realice en pintura roja ancho 20 cm. con un puente de adherencia.

Se solicita entregar informe sobre la definición de tratamiento en cra 13 y cll 37 con bacheo y reparcheo por parte del especialista en pavimento. se realizara la entrega al proximo comite

El proximo martes se realizara visita de oscultación en vias para realizar bacheos y reparcheos.

Powered by CamScanner

Intersecaón cra 11 con calles 42 y calle 43 se solicita al contratista inicial intervención en estas zonas.

Intersecaón calle 41 con cra 10 se inicia fundida. el sabado. proximo jueves terminada.


Intersecaón cra 11 con calle 43 se iniciara tan pronto se termine fundida de calle 41 con cra 10. proximo comite se requiere en base.

Se toca tema de solicitud de adicional en tiempo para contratista. de obra que se presenta a la supervisión el 25 de octubre de 2023. a la fecha no ha tenido respuesta. se solicita al supervisor respuesta formal por parte de la entidad, se compromete en dar respuesta entre el dia de hoy y el dia de mañana.

Contratista reitera la necesidad del sofware para pilonas tratado en comite pasado y este presupuesto no esta contemplado dentro del balance de solicitud primera No 3. Por lo que se come el riesgo de entrega final de pilonas como un solo sistema para manejo de voz y datos de manera remota.

Por parte del contratista esta pendiente informe de voz y datos sobre funcionamiento de pilonas para entrega a interventoria y alcaldia, esta supeto a reunión con proveedor de pilonas el dia de mañana y se espera entrega el proximo comite.

Powered by CamScanner

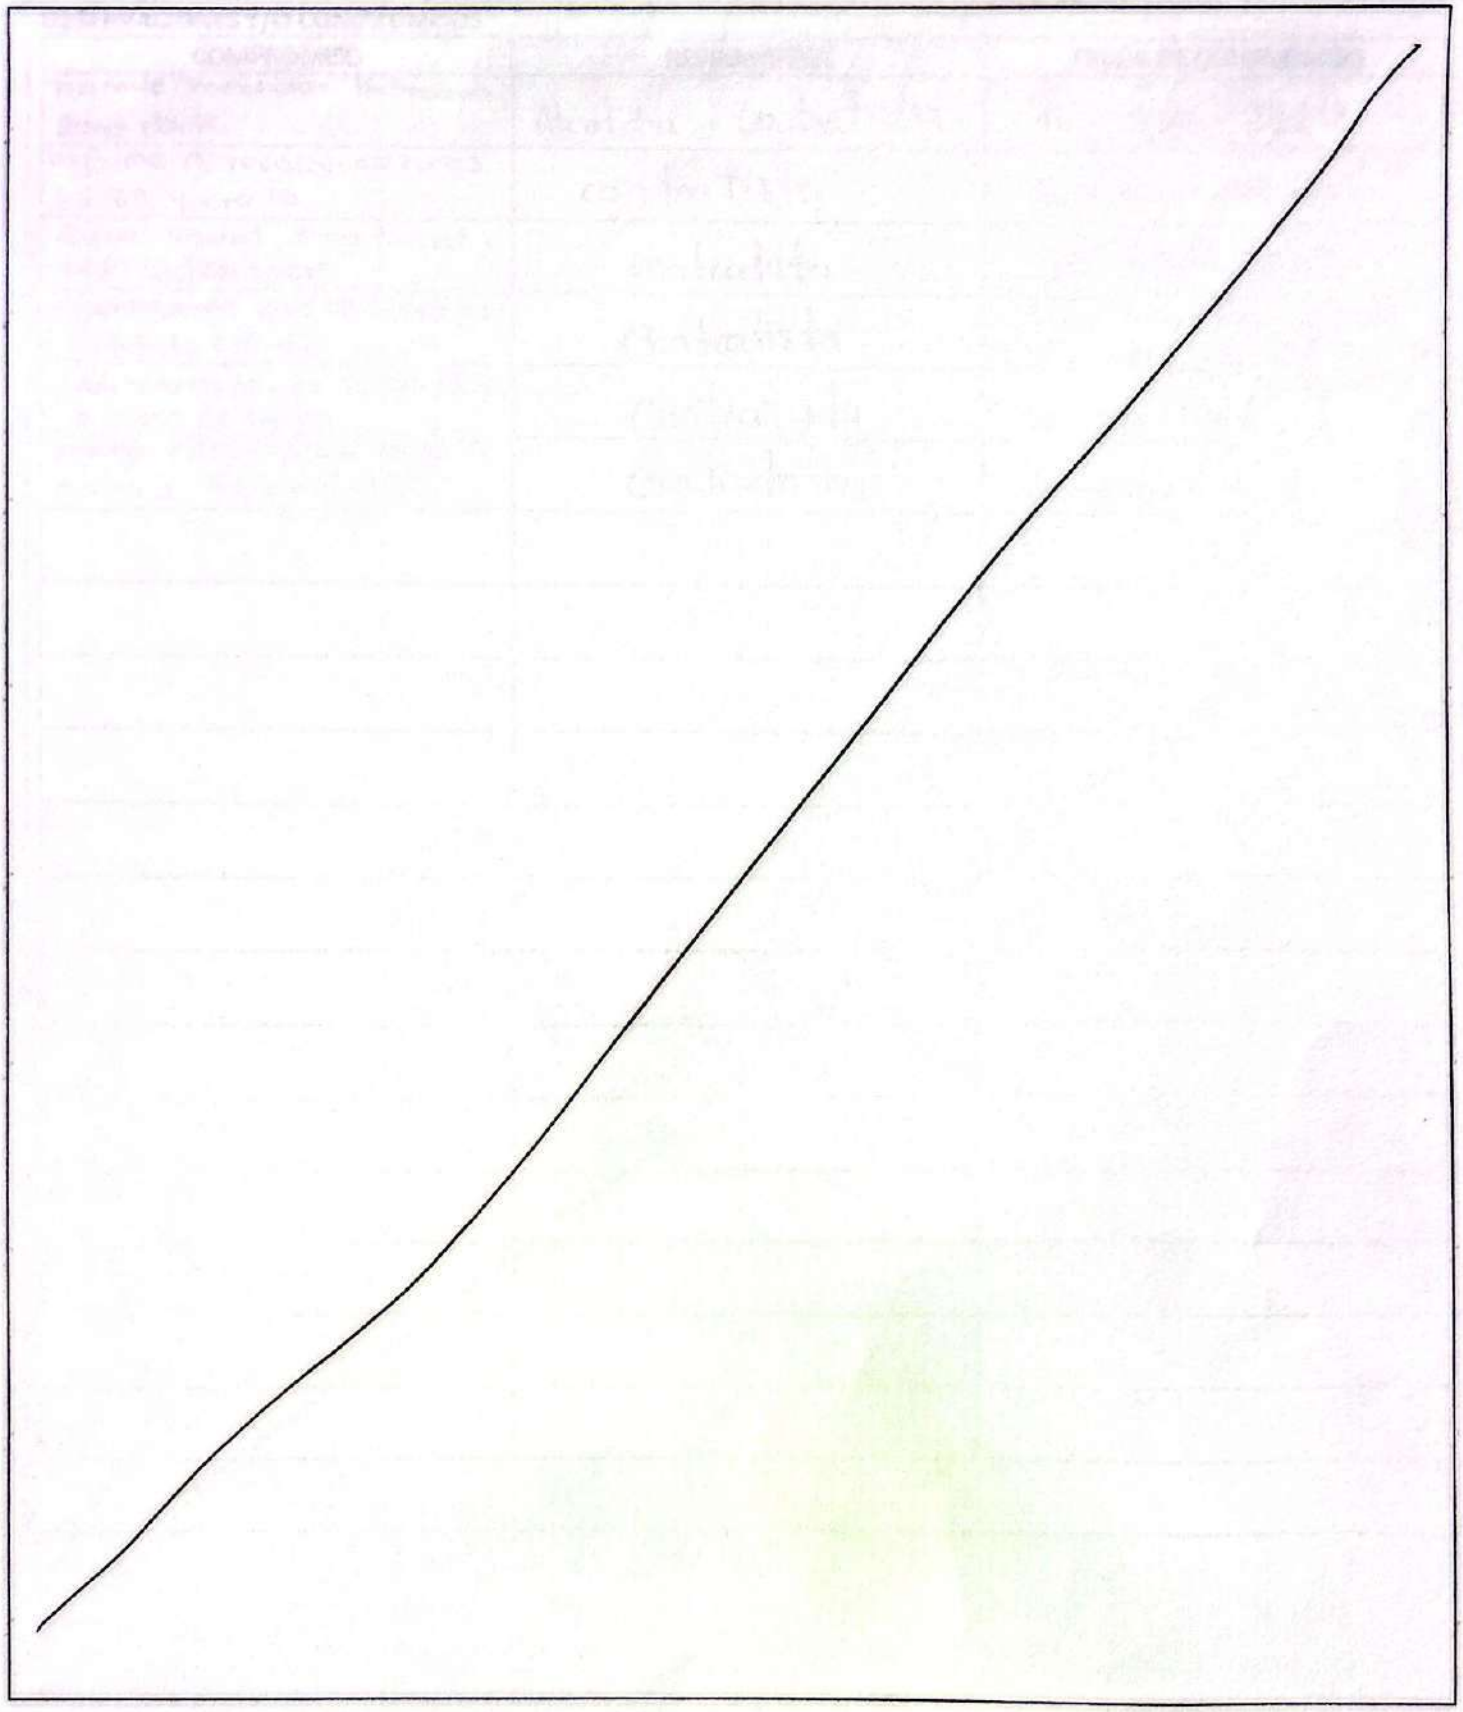

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
tramite medidor bebedero zona deck	Alcaldia – contratista.	16 - nov - 2023
Infome de revision de redes cll 34 y cra 13	contratista	16 - nov - 2023
Guia visual peatonal NP estructurar	contratista	16 - nov - 2023
interseccion cra 10 con cll 41 Fundida MR-42	Contratista	11 - nov - 2023 inicio. 16 - nov - 2023 terminada
interseccion cra11 con cll 43 a nivel de base	Contratista	16 - nov - 2023. nivel de base
entrega infome voz y datos de Pilonas financiamiento	contratista	16 - nov - 2023

Powered by CamScanner

SOLIUN INGENIERÍA

REGISTRO DE ASISTENCIA

Alcaldía de Bucaramanga

CONTRATO	"INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	
LUGAR:	
FECHA:	Hora de inicio: / Hora Finalización:

NOMBRE	CÉDULA	ENTIDAD / DEPENDENCIA	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Nelson Cortes	1049614892	Soliun Ing. / Interventoria	3125459083	proyectos@soliunsas.com	
Yuridy Paola Villamizar	1094273973	Consorcio Malla Incal	3133818568	consorciomallaincal@gmail.com	
Edgar Bayona F.	91213324	Sec. Infraest.	3174106934		
Yowing Quintero	91.280.259	Malla Incal	3153811370		
Raul D. Delgado C	7957392 Bta	Soliun Ing. / Interventoria	3213980386		
Camilo Macias	1095939907	Consorcio Malla Incal	3155222812	consorciomallaincal@gmail.com	
Fernando Dueñas	13806582	" "	3002082976	N-A-	
JOSUE TOBOS ROJAS	1095813748	Soliun Ingenieria	3188639159		
Elbana Carolina Jaimes	1094XXX279	Malla Incal	3015501499	comunicacionsocial@gmail.com	
SERGIO BENAVIDES	13871828	Soliun Ing.	3006153857		
Laireth A. Perez	1098666798	Soliung ing SAS.	3187153980		

Observaciones:

Powered by CamScanner
