CONSORCIO SED-DISTRITAL	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	RM-FT- 002
		Versión 00
		Pág.__ de __

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

INFORME No.	Informe No.	**37**	**Desde**	**11/09/2023**	**Hasta**	**17/09/2023**

* COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE A , en Comite del 12 de Julio de 2023 se presenta propuesta de intervencion integral del comedor, el asesor estructural de la SED realiza ajuste a la propuesta del contratista; con este ajuste el contratista adelanta la construccion de la estructura.

* En el Colegio SAN MARTIN DE PORRES se define por parte de la SED intervencion terraza. (zona no transitable)

* Teniendo en cuenta el saldo actualizado del Contrato y que segun lo informado por la supervision se pueden balancear Contrato inicial y adicional al margen de los CDP , Se incopora al alcance del Colegio CRISTOBAL COLON SEDE A la intervencionde las canchas polideportivas (2) y restituicion de cubiertas bloque 2 por esta razon se incrementa el valor correpondiente a este Colegio.

* Emergencia COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C, las obras a ejecutar son para mitigar la emergencia , se recomienda a la SED contratar una consultoria para la solucion definitiva, las obras se ecuentran terminadas.

* Se notifica al contratista atencion de emergencia en el Colegio Monteverde sede B , se raeliza una nueva visita el 4 de Septiembre al sitio y se requiere al contratista presentacion de presupuesto y programacion para inicio de actividades.

* En El colegio Colon Sede A se realiza por parte del contratista apique en el punto fijo en donde la entidad reporta afectacion de muro en mamposteria , se solicita visita del asesor de la SED para evaluacion y concepto.

* Se notifica al contratista atencion de emergencia en el Colegio Union Colombia sede A , el presupuesto presentado por el Contratista no se ajusta alas actividades a desarrollar , se solicito ajuste, segun diagnostico; de igual forma se encuentra pendiente atencion de emergencias Individuos arboreos Colegios SIMON RODRIGUEZ SEDE C ,USAQUEN SEDE A Y AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A.

* Para el incio del frente Ciudad Maestra se realiza reunion el 14 de septiembre de 2023 con el objeto que se realice el retiro de sensores por parte de OTIC y vigilancia , pendiente verificar desmonte sensores de humo , el contratista dispondra de material en obra el 19 de Septiembre de 2023

* En Comite del pasado 30 de Agosto de 2023 en el frente DILE TESUSAQUILLO , se verifican las condiciones actuales de la ubicacion del baño PMR y se replantea reubicacion en patio posterior; pendiente Definicion.

*Se presenta a la SED presupuesto para impermeabilizacion de terrazas en el Colegio Palermo en calidad de emergencia , se plantea poliurea segun ficha , pendiente aprobacion SED.

*Mediante Comite del 12 de Julio de 2023 la Supervision de la SED informa que se daran unos lineamientos por parte de la SED en cuanto a la distribucion de luminarias en funcion de los m2 de las areas.

* el dia 27 de Julio de 2023 se realizan recorridos para verificar actividades a incorporar al contrato mediante una probable adicion No.2, pedniente que el contratista presente presupuestos y programacion s egun los alcances definidos

* Mediante comunicado RL – IMG1-4146203– 169 dirigido a a la SED con copia la aseguradora se presenta informe de presunto incumplimiento del contratista , derivado de los atrasos ocasionados por la falta de materiales; particularmente en los frentes de Usaquen sede A (Cubierta) y Torca (Estructura de cubierta y cubierta); adicionalmente la atencion de la emergencia de Monteverde sede B. La entidad presenta observaciones.

Elaboro: Residente de interventoría

Vo. Bo. Director de Interventoría

6. Sede y/o Colegio: Cristobal Colon sede C



pintura en los muros externos del colegio.



pintura en los muros externos del colegio.



pintura en los muros externos del colegio.



pintura en los muros externos del colegio.

6. Sede y/o Colegio: Aquileo Parra



demolicion de placa de circulacion en primer de las aulas G, H, I, J, K y L.



demolicion de placa de circulacion en primer de las aulas G, H, I, J, K y L.



demolicion de placa de circulacion en primer de las aulas G, H, I, J, K y L.



demolicion de placa de circulacion en primer de las aulas G, H, I, J, K y L.

6. Sede y/o Colegio: USAQUEN SEDE A COLONIAL VACACIONAL



resanes en muro exterior de cocina



picado de muros en sala de profesores



media caña en baños de 11



resanes en muro exterior de cocina

6. Sede y/o Colegio:: Simón Rodríguez sede A



placa piso educacion fisica



estructura metalica en comedor



estructura metalica en comedor



malla electrosoldada piso educacion fisica

6. Sede y/o Colegio: Usaquen sede B Los Cedritos



estuco y pintura



filos vanos de ventanas



estuco y pintura



filos vanos de ventanas

6. Sede y/o Colegio: Centro de Innovación Ciudad Maestra



frente desocupado listo para intervenir



frente desocupado listo para intervenir

6. Sede y/o Colegio: Divino Maestro sede C



demolicion de acabado de piso



alistado de piso



cubierta en la zona admisnitrativa.



instalación de bocapuerta en las aulas 6 y 7.

6. Sede y/o Colegio: Nuevo Horizobte sede C Torca



entrega de areas intervenidas.



ampliacion de urbanismo



entrega de areas intervenidas.



entrega de areas intervenidas.

6. Sede y/o Colegio: Cristobal Colon sede A



de estuco y pintura en el alua 35



excavacion en la cancha multiple.



nivelacion y compactacion del area de cancha de voleibol.



estuco y pintura en algunas partes en la zona de pasillo.

6. Sede y/o Colegio: Simon Rodriguez sede C



instalacion de estructura metalica en el modulo de aula de preescolar.



instalacion de estructura metalica en el modulo de aula de preescolar.



instalacion de estructura metalica en el modulo de aula de preescolar.



instalacion de estructura metalica en el modulo de aula de preescolar.

6. Sede y/o Colegio: Saludcoop Norte



instalación del manto



instalación del manto



instalación del manto



instalación del manto

6. Sede y/o Colegio: Agustin Fernandez Sede C (Emergencia)



terminación de actividades en este frente



terminación de actividades en este frente



terminación de actividades en este frente



terminación de actividades en este frente

Anexo No.2 Registro Fotográfico.

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Finalización Intervención Costado Occidental	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Finalización Intervención Costado Oriental
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 08 de Septiembre de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:** 08 de Septiembre de 2023
UBICACIÓN: frente de obra AGUSTIN FERNNADEZ SEDE C	**UBICACIÓN:** frente de obra AGUSTIN FERNNADEZ SEDE C

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Zona Intervenida área exterior cerramiento	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Zona de acceso por escaleras área intervenida
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 08 de Septiembre de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:** 08 de Septiembre de 2023
UBICACIÓN: frente de obra AGUSTIN FERNNADEZ SEDE C	**UBICACIÓN:** frente de obra AGUSTIN FERNNADEZ SEDE C

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Entrega Aulas G, H, I, J Bloque de 1 piso	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Entrega Aulas G, H, I, J Bloque de 1 piso
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 15 de Septiembre de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:** 15 de Septiembre de 2023
UBICACIÓN: frente de obra Aquileo Parra	**UBICACIÓN:** frente de obra Aquileo Parra

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Entrega Aulas G, H, I, J Bloque de 1 piso	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Instalacion de salidas eléctricas de iluminación y tomas en aulas del piso 1 bloque de 2 pisos
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 15 de Septiembre de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:** 15 de Septiembre de 2023
UBICACIÓN: frente de obra Aquileo Parra	**UBICACIÓN:** frente de obra Aquileo Parra

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Instalacion estructura metálica y puerta de acceso de aula prefabricada	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Instalacion estructura metálica y puerta de acceso de aula prefabricada
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 14 de Septiembre de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 14 de Septiembre de 2023
UBICACIÓN: Colegio Simón Rodríguez Sede C	**UBICACIÓN:** Colegio Simón Rodríguez Sede C

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Pintura en muros y cielo raso, abertura para instalación de marcos para luminarias en aulas	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Entrega de pasillo a doble altura para habilitación de aulas del piso 2
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 15 de Septiembre de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 15 de Septiembre de 2023
UBICACIÓN: Colegio Cristóbal Colon Sede A	**UBICACIÓN:** Colegio Cristóbal Colon Sede A

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Instalación de estructura B-400 y B-600 en cancha de voleibol	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Excavación mecánica en cancha múltiple
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 15 de Septiembre de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 15 de Septiembre de 2023
UBICACIÓN: Colegio Cristóbal Colon Sede A	**UBICACIÓN:** Colegio Cristóbal Colon Sede A

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Área de fachadas intervenida en baño de profesores y baño de niños	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Área Intervenida en baño de niños
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 05 de Septiembre de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 05 de Septiembre de 2023
UBICACIÓN: Colegio Manuela Beltrán Sede B	**UBICACIÓN:** Colegio Manuela Beltrán Sede B

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Área Intervenida en baño de niños	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Área Intervenida en baño de niños
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 05 de Septiembre de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 05 de Septiembre de 2023
UBICACIÓN: Colegio Manuela Beltrán Sede B	**UBICACIÓN:** Colegio Manuela Beltrán Sede B

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Área intervenida en baño de profesores	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Área intervenida en baño de profesores
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 05 de Septiembre de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 05 de Septiembre de 2023
UBICACIÓN: Colegio Manuela Beltrán Sede B	**UBICACIÓN:** Colegio Manuela Beltrán Sede B

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Área intervenida fachada baño niñas, pmr y sala de profesores	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Área intervenida sala de profesores
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 05 de Septiembre de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 05 de Septiembre de 2023
UBICACIÓN: Colegio Manuela Beltrán Sede B	**UBICACIÓN:** Colegio Manuela Beltrán Sede B

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Área Intervenida baño de niñas	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Área intervenida baño PMR
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 05 de Septiembre de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 05 de Septiembre de 2023
UBICACIÓN: Colegio Manuela Beltrán Sede B	**UBICACIÓN:** Colegio Manuela Beltrán Sede B

CONSORCIO SED-DISTRITAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO**	PI-IN-F 13
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de__

No. DE CONTRATO / NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO SED DISTRITAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MG
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED

	
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Finalizacion intervencion cubierta aulas y reparaciones de afectaciones terraza transitable	**DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA** Finalizacion intervencion cubierta aulas y reparaciones de afectaciones terraza transitable
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA 02 de Septiembre de 2023	**FECHA DE LA FOTOGRAFÍA** 02 de Septiembre de 2023
UBICACIÓN: Colegio Técnico Palermo	**UBICACIÓN:** Colegio Técnico Palermo

OBSERVACIONES

Registro Fotográfico en el periodo comprendido entre el 16 de agosto y el 15 de septiembre de 2023

RESPONSABLE		**FECHA**
NOMBRE	CAMILO TARQUINO	**15/09/2023**
CARGO	RESIDENTE INTERVENTORIA	
FIRMA		

Vo. Bo. DIRECTOR

Anexo No. 3 Resultados de ensayos y fichas técnicas

REPORTE RESULTADOS RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETOS

Codigo	FORD-047
Version	01
Fecha de Emisión	14/02/2014
Páginas	1 de 1

Cliente: INTERLOMAS SAS **Fecha recepción:** 21/08/2023

Contacto: Ing. Lorena Bonilla **Telefono:** 322 - 2357626 **Orden de trabajo:** 7

Proyecto: COLEGIO IED SIMON RODRIGUEZ SEDE A **Informe N.** 007 -23

Sede Laboratório Cra 90 # 88 A - 07 (Piso 1) Bogotá - Tele-fax (057) 4569832

PORCENTAJES PROMEDIO DE EVOLUCION POR EDAD

3 Días	35 - 45%	7 Diás	70 - 80%	28 Diás	> 100%

RESISTENCIA Kg/cm2

Cod. Int.	Cod. Cliente	Fecha Toma	Fecha ensayo	Elemento fundido	Resistencia diseño Kg/Cm2	Edad (Días)	Cilindro # 1,KN	Cilindro # 2,KN	Promedio,Kg/cm2	PSI	% Evolución
61	CO-LG	16/08/2023	23/08/2023	6 ZAPATAS IED SIMON RODRIGUEZ SEDE A	210	7	285,3		159,4	2276,9	75,9
62	CO-LG	16/08/2023	23/08/2023		210	7	285,5		159,5	2278,5	76,0
63	CO-LG	16/08/2023	13/09/2023		210	28			0,0	0,0	0,0
64	CO-LG	16/08/2023	13/09/2023		210	28			0,0	0,0	0,0

Ensayo para determinar la resistencia a compresión. **NTC 673**

Observaciones: Los cilindros fallados a las edades que se enuncian en el formato llevan una evolución aceptable

Ejecutó:

Arq.Deissy Andrea Niño.
Técnico de laboratorio

Reviso:

Ing. Elquier Daza R.
Director de Laboratório

PARED MUNICH GRIS CLARO CD



Referencia: 451239511
Formato: 30X45 cm
Color: GRIS CLARO\LIGHT GRAY
Colección: EXPRESIONES 2020

TRÁFICO | TRAFFIC	Paredes / Walls
ACABADO |FINISH	Mate / Matte
ASPECTO	CD / Caras diferenciadas
M2 POR CAJA SQ FT APPROX	1,89 20,34379069
UNIDADES | PIECES	14
PESO BRUTO CAJA kg WEIGTH LB APPROX	25,704 56,6670384
ESPESOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS	7.9 ± 0.3
CAJAS POR ESTIBA CARTONS PER PALLET	60
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS	0

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

Por las características de las paredes cerámicas (Resistencia Mecánica y al rayado) NO se recomienda el uso en pisos, USE For the characteristics of the ceramic walls (Mechanical Resistence and scratch) them do not are suitable for use in floor.

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:
Pared natural Munich de color gris y fotmato 30x45. Tiene caras diferenciadas y tecnología HD (Alta definición) que permiten lograr mayor realismo en los espacios. Su acabado mate permite que pueda instalarse en espacios diferentes al baño y la cocina

Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 10 Años/Years

Mayor información de garantía consulte www.corona.co/garantia

PARED MUNICH GRIS CLARO CD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		ENSAYO |TEST	ESPECIFICACIÓN SPECIFITACION NTC 919 / ISO 13006	MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/ CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS
ANCHO Y LARGO LENGHT AND WIDTH		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm
PLANIRADIDAD DE LA SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	**Curvatura Central** Central Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(-) 0.30% (+) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
	Curvatura del lado Edge Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(-) 0.30% (+) 0.50% del tamaño de fabricación	(±) 0.30% del tamaño de fabricación
	Ortogonalidad Warpage	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
DEFECTOS SUPERFICIALES SURFACE DEFECTS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Minimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects	Minimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	Mínimo 10% / Minimum 10%	Mínimo 10% / Minimum 10%
RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGHT		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 600 N / Minimum 600 N	Mínimo 750 N / Minimum 750 N
MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 12 N/mm2 / Mínimum 12 N/mm2	Mínimo 21 N/mm2 / Mínimum 21 N/mm2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	No Aplica / Not Applicable	No Aplica / Not Applicable
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION		NTC 4321 - 17 ISO 10545 - 17	Declarado por el fabricante / Metodo de ensayo disponible	No aplica / Not applicable
RESISTENCIA AL MANCHADO RESISTANCE TO STAINING		NTC 4321 - 14 NTC 4321 - 14	Mínimo clase 3 / Mínimum class 3	Mínimo clase 5 / Mínimum class 5
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS RESISTACE TO CHEMICALS		NTC 4321 - 13 NTC 4321-2 - 13	Mínimo clase B / Minimum B class	Mínimo Clase A / Minimun A Class
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE		NTC 4321-2 - 9 NTC 4321 - 9	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	Mínimo clase BA/ Mimimum BA class

Descargar recomendaciones de uso en: http://www.corona.co/instructivos/pisos-y-paredes
Este producto es elaborado en Colombia, en la planta de Girardota (Medellín, Antioquia)

FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:
Colombia

FICHA TECNICA DIVISIONES ACERO INOXIDABLE		
FABRICACION: DICIEMBRE DE 2019	**INDUSTRIAS METÁLICAS HGC SAS**	
PAG 1 DE 3		

CARACTERISTICAS

PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS, con anclaje al piso, diseñada y fabricada con la mejor calidad asegurando su durabilidad; además de ser segura tiene un diseño único que le da una excelente apariencia al proyecto.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y MATERIALES

PUERTA, PANEL FIJO Y PILASTRAS
Lamina en acero inoxidable C 20 304, satinada

ACCESORIOS INOXIDABLES
Perchero, manijas y pasador


ANCLAJES
Chazo plástico 3/8 con tornillo goloso

MEDIDAS

Altura variable entre 1.48 - 1.75 m
Puertas entre 0.60 - 0.92 * 1.48
Panel fijos variables entre 0.23 - 0.83 * 1.75 m
Panel fijos variables entre 0.60 - 0.83 * 1.48 m
Pilastras 0.50 * 1.00 - 1.20 m

INDUSTRIAS METÁLICAS HGC SAS

PLANOS

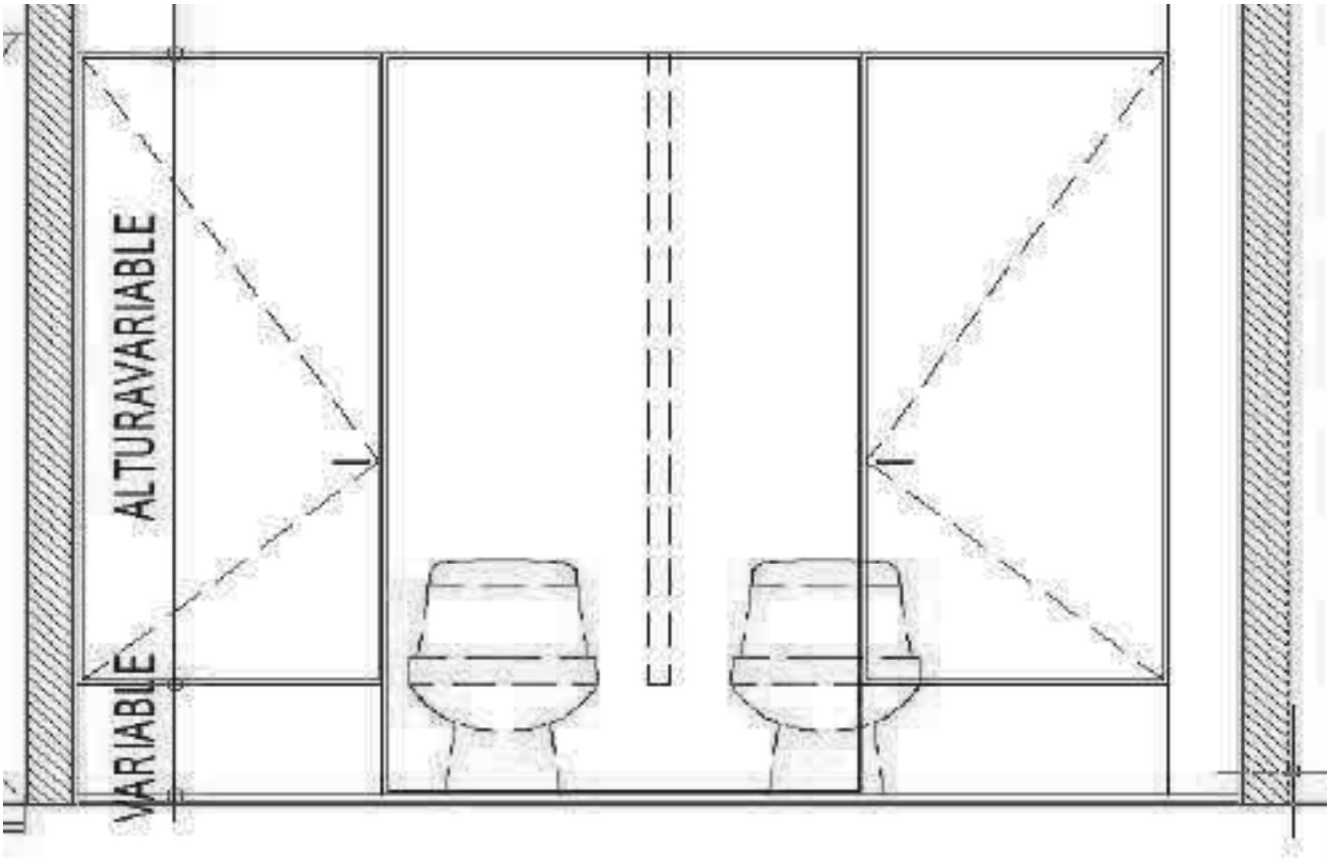

PRESENTACIÓN

DECORPINTURAS, se creó en el año de 1990, pretendiendo de manera oportuna e integral satisfacer la demanda presente y futura del sector en Acabados Arquitectónicos y Diseño Decorativo a nivel nacional.

Es una actividad comercial donde la durabilidad, cubrimiento y protección se han colocado al servicio de personas, empresas y negocios como los que ustedes lideran, para consolidarse como una idónea solución en el manejo de la decoración ofreciendo productos garantizados de excelente calidad.

Nuestra empresa está orientada a la fabricación y desarrollo de nuevos productos como lo es la línea exclusiva de Decoraciones, Revestimientos y Pinturas estos productos fueron creados para brindarle a nuestra distinguida clientela diferentes opciones en el área de Acabados en el sector de la Construcción.

Como toda actividad seria, altamente calificada y competitiva contamos con profesionales especializados que comparten nuestra visión y filosofía, logrando eficiencia, innovación y calidad en beneficio de todos.

Cordialmente,

GUSTAVO POVEDA
Representante legal

FICHA TÉCNICA

ESTUCO PLASTICO

DESCRIPCIÓN:

EL ESTUCO PLASTICO DE DECORPINTURAS, es una masilla fina acrílica blanca que viene lista para usar, tiene buena manejabilidad, se puede aplicar sobre muros y techos en interiores o exteriores según la necesidad del cliente; compuesta por materias primas cuidadosamente seleccionadas, homogenizadas. Una vez aplicado tiene un excelente acabado de fácil lijado para aplicación de vinilos, papel de colgadura.

USOS:

Como revestimiento se utiliza para acabados sobre pañetes, frisos, repellos o revoques sobre superficies lisas de concreto y láminas de fibrocemento.

Especial para hacer resanes en pequeños espesores sobre superficies estucadas, pintadas o morteros que presente fisuras menores.

VENTAJAS:

- ✓ Viene listo para usar, no requiere mezclas previas.
- ✓ Bajo desperdicio en su aplicación, por su consistencia cremosa no permite que caiga.
- ✓ Color blanco y uniforme par acabados de excelente calidad.
- ✓ No es necesario consumir la totalidad del producto una vez utilizada una parte, simplemente cierre bien el empaque con el producto sobrante y úselo cuando lo requiera.

CONSUMOS Y RENDIMIENTO:

El consumo real depende de la superficie en la cual se va a utilizar el producto.

SUPERFICIES LISAS: (Drywall, Aglomerados): Aprox. 1.5 kg x Mt2

SUPERFICIES RUGOSAS: (Revoques Afinados): Aprox. 2.0 Kg X Mt2

El rendimiento del producto dependerá también de la experiencia y habilidad del aplicador, además de la cantidad de manos aplicadas.

MODO DE EMPLEO:

- ✓ **Preparación de la Superficie:** la superficie debe estar detallada, seca, sana, firme y limpia (libre de grasa, polvo, cales, carburos, material suelto, lechada de cemento, curadores u otras sustancias extrañas que impidan la adherencia).
- ✓ **Preparación del Producto:** el **ESTUCO PLASTICO DE DECORPINTURAS** es un producto mono-componente, listo para usar, solo basta con mezclarlo bien hasta ser homogenizado.
- ✓ **Aplicación del Estuco:** se aplica con llana metálica o espátula, obteniendo una superficie lisa y de excelente calidad.

Generalmente se requiere de 3 a 4 manos combinando el sentido horizontal con el vertical para lograr una buena nivelación de la superficie.

Si se utilizan pinturas a base de agua (Vinilos Acrílicos) Como acabados se puede colocar la primera capa 5 horas después de haber terminado la aplicación del **ESTUCO PLASTICO DECORPINTURAS.**

PRESENTACION

¼ de Galón	X	1.5 Kg
1 Galón	X	7 Kg
1 Cuñete	X	28 Kg
1 Tambor	X	300 Kg *

*La cantidad normal que se empaca en un tambor, es de 300 Kg, esto con el fin de facilitar el manejo y movilidad del producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tenga en cuenta todas las precauciones normales de la aplicación de estucos convencionales (Usar guantes y Gafas

No ingerir, ni Inhalar, el **ESTUCO PLASTICO DECORPINTURAS**, es irritante para los ojos y para las mucosas en caso de contacto, lave con abundante agua limpia, no frote ni restriegue.

Se recomienda el uso de protección respiratoria.

DATOS TECNICOS

ASPECTO	**:** Pasta viscosa blanca
COLOR	**:** Blanco
VISCOSIDAD	**:** 600.000 cP + 180.000 cP
DENSIDAD	: El cambio de temperatura no representa una variación en cuando a masa y volumen, el producto no se ve afectado por estas variables.
SECADO	**:** Entre 1 y 3 horas según el espesor, humedad y tipo de soporte.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Se debe almacenar en sitio fresco, bajo techo, sobre estibas de madera y en su empaque original bien cerrado. Transportar en vehículos cerrados protegido de la humedad y la lluvia.

GARANTIA: DecorPinturas brinda una garantía de 4 años sujeto a la óptima manipulación y aplicación del **ESTUCO PLASTICO DECORPINTURAS,** a la calidad del vinilo o recubrimiento que se aplique sobre el producto (recomendamos vinilo tipo 1 de alta resistencia o vinilos tipo acrílico en caso de estar expuesto a la intemperie) y a las condiciones físicas de la superficie a trabajar siempre libre de humedad, moho y/o hongos.

La información y en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia respecto al producto, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales

BAÑOS INSTITUCIONAL CORONA

PETITE

Orinal 1 Lpf. - 0.25 gpf. Ref. 062111001

De colgar

Orinal ideal para destinos educativos y públicos, de diseño compacto perfecto para espacios pequeños.

· Entrada de agua superior
· Diseño orgánico para fácil limpieza
· Para instalación con sifón botella* y grapa plástica



INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Porcelana Sanitaria
Dimensiones Generales (H x L x W)	237 x 286 x 270 mm. 9,3 x 11,3 x 10 5/8 pulg.
Dimensiones empacado (H x L x W)	265 x 325 x 293 mm. 10,4 x 12,8 x 11,5 pulg.
Peso Neto aprox.	6,35 kg. - 14 lbs.
Peso Bruto aprox.	7,1 kg. - 15,6 lbs.


ACCESORIOS REQUERIDOS

Referencia	Descripción
947140001	Accionador push*
753290001	Grifería Orinal Nva. Porcelana*
703200001	Grifería Orinal Tradicional cromado*
933000001	Sifón botella plástico*
019170001	Respuesto niple orinal
019160001	Respuesto racor taza - orinal ¾ pulg.
19190001	Respuesto grapa lavamanos (1 und.)

*Accesorios adquiridos por separado

INSTALACIÓN

Para instalación tradicional de **721 mm. - 28,4 pulg.** del piso terminado.

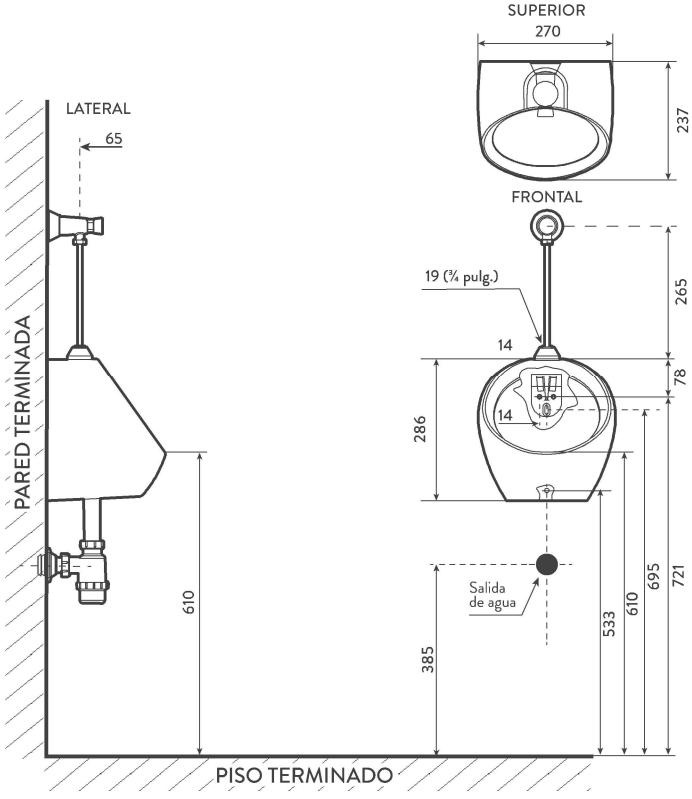

Disponible en color:

100 Blanco

SERVICIO POST VENTA

GARANTÍA INTEGRAL

5 AÑOS DE GARANTÍA (grifería)

AHORRO DE AGUA

CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC No. 920-1 Aparatos Sanitarios de Porcelana Vitrificada

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

PISOS CORONA

PISO MIKONOS ARD BLANCO CD

Referencia: 336392001
Formato: 33.8X33.8 Cm
Color: BLANCO
Colección: #N/D

TRÁFICO | TRAFFIC	**RESIDENCIAL GENERAL / GENERAL RESIDENTIAL**
ACABADO |FINISH	Semimate / Semimatte
ASPECTO	CD / Caras diferenciadas
M2 POR CAJA SQ FT APPROX	1,6 17,8
UNIDADES | PIECES	14
PESO BRUTO CAJA kg WEIGTH LB APPROX	24 52,8
ESPESOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS	7.1 ± 0.3
CAJAS POR ESTIBA CARTONS PER PALLET	72
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS	0

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

Pisos para uso en todas las áreas interiores de viviendas. Importante: Debido al intenso tráfico de las cocinas, es aconsejable usar productos mates o protegidos con granillas. Precaución: A excepción de los productos Corona ARD®, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción.

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

Piso Marmolizado Brillo/Mate MIKONOS color Blanco de formato 33.8X33.8, con caras diferenciadas (CD) baldosas diferentes unas de otras.
Cuenta con tecnología ARD®, Alta resistencia al deslizamiento, textura de alta fricción, ideal para instalar en zonas de alto riesgo de deslizamiento.

Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 10 Años/Years

Mayor información de garantía consulte www.corona.co/garantia

PISO MIKONOS ARD BLANCO CD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		ENSAYO |TEST	ESPECIFICACIÓN SPECIFITACION NTC 919 / ISO 13006	MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/ CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS
ANCHO Y LARGO LENGHT AND WIDTH		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm
PLANIRADIDAD DE LA SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	**Curvatura Central** Central Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
	Curvatura del lado Edge Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% del tamaño de fabricacion	(±) 0.40% del tamaño de fabricación
	Ortogonalidad Warpage	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
DEFECTOS SUPERFICIALES SURFACE DEFECTS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Mínimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects	Mínimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	Mínimo 6% Máximo 10%	Mínimo 6% Máximo 10%
RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGHT		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 500 N / Minimum 500 N	Mínimo 700 N / Minimum 700 N
MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 18 N/mm2 / Mínimum 18 N/mm2	Mínimo 26 N/mm2 / Mínimum 26 N/mm2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	Informe de cumplimiento de la clase de abrasión y los ciclos	Clase 4 / Class 4
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION		NTC 4321 - 17 ISO 10545 - 17	Declarado por el fabricante / Metodo de ensayo disponible	Clase 2 / Class 2
RESISTENCIA AL MANCHADO RESISTANCE TO STAINING		NTC 4321 - 14 NTC 4321 - 14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Mínimo clase 5 / Minimum class 5
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS RESISTACE TO CHEMICALS		NTC 4321 - 13 NTC 4321-2 - 13	Mínimo clase B / Minimum B class	Mínimo Clase A / Minimum A Class
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE		NTC 4321-2 - 9 NTC 4321 - 9	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	Mínimo clase BA / Mimimum BA class

Descargar recomendaciones de uso en: http://www.corona.co/instructivos/pisos-y-paredes
Este producto es elaborado en Colombia, en la planta de Madrid Cundinamarca

FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:
Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puede encontrarlo aquí: http://www.corona.com.co/web/Corporativo/Pages/Corona-Sostenible-Home





VINILTEX® BAÑOS Y COCINAS

Paredes y techos de baños y cocinas

DESCRIPCIÓN

Es una pintura premium 100% acrílica base agua, con Bacter Protec un antibacterial activo que elimina hasta el 99.9% de las bacterias, hongos y moho además cuenta con ultra lavabilidad en ambientes expuestos a manchas, vapor y grasa, cuidando la salud de todos en el hogar. No contiene plomo ni cromo. Cuenta con nuestro desarrollo tecnológico del color, ColorTech®.

USOS

Protege, pinta y decora paredes y techos expuestos a manchas (comida o maquillaje), vapor y grasa, como cocinas y baños, incluyendo el área de la ducha.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Elimina hasta el 99,9% de bacterias y hongos.
- ✓ Alta resistencia a la humedad, vapor y grasa.
- ✓ Única con tecnología superior del color ColorTech®.

COLORES

Miles de colores disponibles
En las siguientes bases: base pastel - base tint - base deep.

ACABADO

Satinado

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

ISO 9001 – 2015
Sistema de gestión de calidad
CO-SC101-1

ISO 14001 – 2015
Sistema de gestión ambiental
CO-SA069-1

OHSAS 18001 – 2007
Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional / CO-OS038-1

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19 A No. 43B-41 / PBX: 384 84 84
Email: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com /Medellín Colombia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad	Método de medición
Brillo, medido a 60°	< 20 a 30	%	
Viscosidad	75 a 80 *según color	KU	
Densidad	4.55 a 4.65 *según color	Kg / Gal	
Cubrimiento	> =96	%	
Solvente para dilución y limpieza	Agua		
Contenido de VOC	120 - 180 *según color	Gramos/Litro menos agua	ASTMD6886
Secamiento al tacto	2 a 3	Horas	
Secamiento al manejo	3 a 4	Horas	
Secamiento entre manos	3 a 4	Horas	
Sólidos por peso	42.96 +/-2	%	ASTM D1644
Rendimiento teórico (A 1 mils de espesor de película seca)	56,85	m^2 / Gal	

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.
**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la Superficie a pintar

Preparación de la superficie

Antes de empezar a pintar con Viniltex® Baños y Concinas verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada.

Elimine completamente con rasqueta o lija los acabados deteriorados, cales, carburos y humedades. Resane los agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie con Estuco Acrílico Profesional® para Exteriores Pintuco® Ref. 27060.

En superficies muy alcalinas (ph >10) como los revoques y morteros modificados con cal, aplique 1 ó 2 manos (capas) de Sellomax® de Pintuco® Ref. 10270 y deje secar durante 1 hora.

Para superficies con pintura brillante lije (lija #180) suavemente para suprimir el brillo. Para superficies con pintura acabado mate limpie y seque bien.

2. Preparación del Producto y Aplicación

Mezcle Viniltex® Baños y Cocinas con una espátula limpia para obtener completa uniformidad.

Diluya con agua según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

EQUIPOS DE APLICACIÓN	PROPORCIÓN	CANTIDAD DE AGUA*
Brocha o Rodillo	1 galón	13% (492 ml/aprox)
Pistola convencional	1 galón	25% (946ml/aprox)
Pistola Airless	1 galón	10% (378ml/aprox)

*Para otros tamaños y/o presentaciones del producto mantener la proporción de dilución equivalente.
*Esta proporción equivale a:
Un 25% equivale a una ¼ parte de la cantidad de pintura a utilizar.

Aplique 2 a 3 manos (capas) de pintura, para obtener un buen acabado.
En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C.
Deje transcurrir mínimo (2) dos horas de secado aproximadamente para aplicar la segunda mano o capa (secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa).
Lave con agua los equipos de aplicación.
Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, evite lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

Sobre	m²/galón
Estuco Profesional Pintuco.	25 a 30 m^2 /gal a 2 manos.
En repinte sobre color diferente	25 a 30 m^2 /gal a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar	30 a 35 m^2 /gal a 2 manos.

*Puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie, método y/o herramienta de aplicación.

PRESENTACIONES

¼ Galón.
Galón.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 36 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Para estibado y almacenamiento tener en cuenta la siguiente tabla:

Envase	Máx. de planchas por estiba
Galón (1GL)	6
Cuarto (1/4GL)	7

- El máximo de apilado de estibas paletizadas es 1 nivel.
- Los envases plásticos no resisten caídas de alturas superiores a su estibado, esto es aproximadamente 1, 20 metros.
- Los envases metálicos no resisten caídas de altura.
- Si los envases metálicos se encuentran abollados, no usar en máquina de agitación.
- Reportar novedades en el material de empaque en la guía de recepción de transporte o durante los 3 días siguientes a la línea de servicio al cliente.

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando. Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 ó desde Medellín 325 25 23.

PRODUCTO NO PELIGROSO PARA EL TRANSPORTE

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001 ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.

PLANTA CERTIFICADA

Los productos elaborados en Pintuco® en la planta ubicada el km 1 vía Belén- Rionegro, Antioquia- Colombia se encuentran fabricados en una empresa con el certificado de neutralidad de carbono.

