Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**CONTRATO DE OBRA No. 054 del 2023**	**29,5 días**	**mar 10/10/23**	**vie 10/11/23**	
2		INICIO DE OBRA	0 días	mar 10/10/23	mar 10/10/23	
3		**AREA DE SALAS DE AUDIENCIA**	**5 días**	**mar 10/10/23**	**sáb 14/10/23**	
4		DEMOLICIÓN PAÑETES	1 día	mar 10/10/23	mié 11/10/23	
5		RASPADO DE SUPERFICIE DE MURO PINTADO EN VINILO	1 día	mar 10/10/23	mié 11/10/23	4CC
6		RESANE FILOS MUROS	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	5
7		PAÑETE LISO MUROS 1:4	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	5
8		ESTUCO MUROS	2 días	mié 11/10/23	jue 12/10/23	5
9		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE DOS MANOS SOBRE ESTUCO	2 días	jue 12/10/23	sáb 14/10/23	8
10		MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.12 m CON AISLANTE ACÚSTICO	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	8CC
11		**AREA JUZGADO PRIMERO**	**1 día**	**mar 17/10/23**	**mié 18/10/23**	
12		DEMOLICIÓN PAÑETES	0,5 días	mar 17/10/23	mié 18/10/23	9FC+2 días
13		RASPADO DE SUPERFICIE DE MURO PINTADO EN VINILO	0,5 días	mar 17/10/23	mié 18/10/23	12CC
14		RESANE FILOS MUROS	0,5 días	mar 17/10/23	mié 18/10/23	13CC
15		PAÑETE LISO MUROS 1:4	0,5 días	mar 17/10/23	mié 18/10/23	13CC
16		ESTUCO MUROS	0,5 días	mar 17/10/23	mié 18/10/23	13CC
17		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE DOS MANOS SOBRE ESTUCO	0,5 días	mié 18/10/23	mié 18/10/23	16
18		MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.12 m CON AISLANTE ACÚSTICO	1 día	mar 17/10/23	mié 18/10/23	16CC
19		**AREA JUZGADO SEGUNDO**	**2 días**	**jue 19/10/23**	**vie 20/10/23**	
20		DEMOLICIÓN PAÑETES	0,5 días	jue 19/10/23	jue 19/10/23	17FC+1 día
21		RASPADO DE SUPERFICIE DE MURO PINTADO EN VINILO	0,5 días	jue 19/10/23	jue 19/10/23	20CC
22		RESANE FILOS MUROS	1 día	jue 19/10/23	vie 20/10/23	21CC
23		PAÑETE LISO MUROS 1:4	1 día	jue 19/10/23	vie 20/10/23	21CC
24		ESTUCO MUROS	0,5 días	jue 19/10/23	jue 19/10/23	21CC
25		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE DOS MANOS SOBRE ESTUCO	2 días	jue 19/10/23	vie 20/10/23	24FC-1 día
26		MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.12 m CON AISLANTE ACÚSTICO	1 día	jue 19/10/23	vie 20/10/23	24CC
27		**AREA PENAL DEL CIRCUITO**	**1 día**	**mié 25/10/23**	**jue 26/10/23**	
28		DEMOLICIÓN PAÑETES	0,5 días	mié 25/10/23	jue 26/10/23	25FC+4 días
29		RASPADO DE SUPERFICIE DE MURO PINTADO EN VINILO	0,5 días	mié 25/10/23	jue 26/10/23	28CC
30		RESANE FILOS MUROS	0,5 días	mié 25/10/23	jue 26/10/23	29CC
31		PAÑETE LISO MUROS 1:4	0,5 días	mié 25/10/23	jue 26/10/23	29CC
32		ESTUCO MUROS	0,5 días	mié 25/10/23	jue 26/10/23	29CC
33		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE DOS MANOS SOBRE ESTUCO	0,5 días	jue 26/10/23	jue 26/10/23	32
34		MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.12 m CON AISLANTE ACÚSTICO	1 día	mié 25/10/23	jue 26/10/23	32CC
35		**AREA JUZGADO**	**1 día**	**vie 27/10/23**	**sáb 28/10/23**	
36		DEMOLICIÓN PAÑETES	0,5 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23	33FC+1 día
37		RASPADO DE SUPERFICIE DE MURO PINTADO EN VINILO	0,5 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23	36CC
38		RESANE FILOS MUROS	0,5 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23	37CC
39		PAÑETE LISO MUROS 1:4	0,5 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23	37CC
40		ESTUCO MUROS	0,5 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23	37CC
41		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE DOS MANOS SOBRE ESTUCO	0,5 días	sáb 28/10/23	sáb 28/10/23	40
42		MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.12 m CON AISLANTE ACÚSTICO	1 día	vie 27/10/23	sáb 28/10/23	40CC
43		**AREA EXTERNA**	**11 días**	**lun 30/10/23**	**vie 10/11/23**	
44		LIMPIEZA, RASPADO Y LAVADO MECÁNICO DE VIGA CANAL EN CONCRETO, ANCHO 0.20 - 0.30 m	3 días	lun 30/10/23	jue 2/11/23	41FC+1 día
45		ARREGLO FILTRACIÓN TUBERÍA AGUA POTABLE 1 1/2"	1,5 días	lun 30/10/23	mar 31/10/23	44CC
46		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA PARA AGUA LLUVIAS	1 día	vie 3/11/23	sáb 4/11/23	44FC+1 día
47		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS + ACCESORIOS	1 día	vie 3/11/23	sáb 4/11/23	46CC
48		ANTIHUMEDAD FACHADAS TRANSPARENTE (2 CAPAS)	3 días	jue 2/11/23	lun 6/11/23	44
49		PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES BLANCA, ROJA, AMARILLA, AZUL	2 días	jue 2/11/23	sáb 4/11/23	48CC
50		ESMALTE PUERTA EN PARALES METÁLICOS DOS MANOS (INCLUYE ANTICORROSIVO)	2 días	sáb 4/11/23	mar 7/11/23	49
51		ESMALTE MARCOS FACHADA (INCLUYE ANTICORROSIVO)	2 días	sáb 4/11/23	mar 7/11/23	50CC
52		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA ASFÁLTICA	3 días	lun 30/10/23	jue 2/11/23	44CC
53		MANTENIMIENTO MANTO ASFÁLTICO	2 días	lun 30/10/23	mié 1/11/23	52CC
54		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA FACHADA LÁMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	2 días	mar 7/11/23	mié 8/11/23	55
55		DESMONTE VIDRIO TEMPLADO	1 día	lun 6/11/23	mar 7/11/23	50CC+1 día
56		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 5 mm	3 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	55FC+1 día

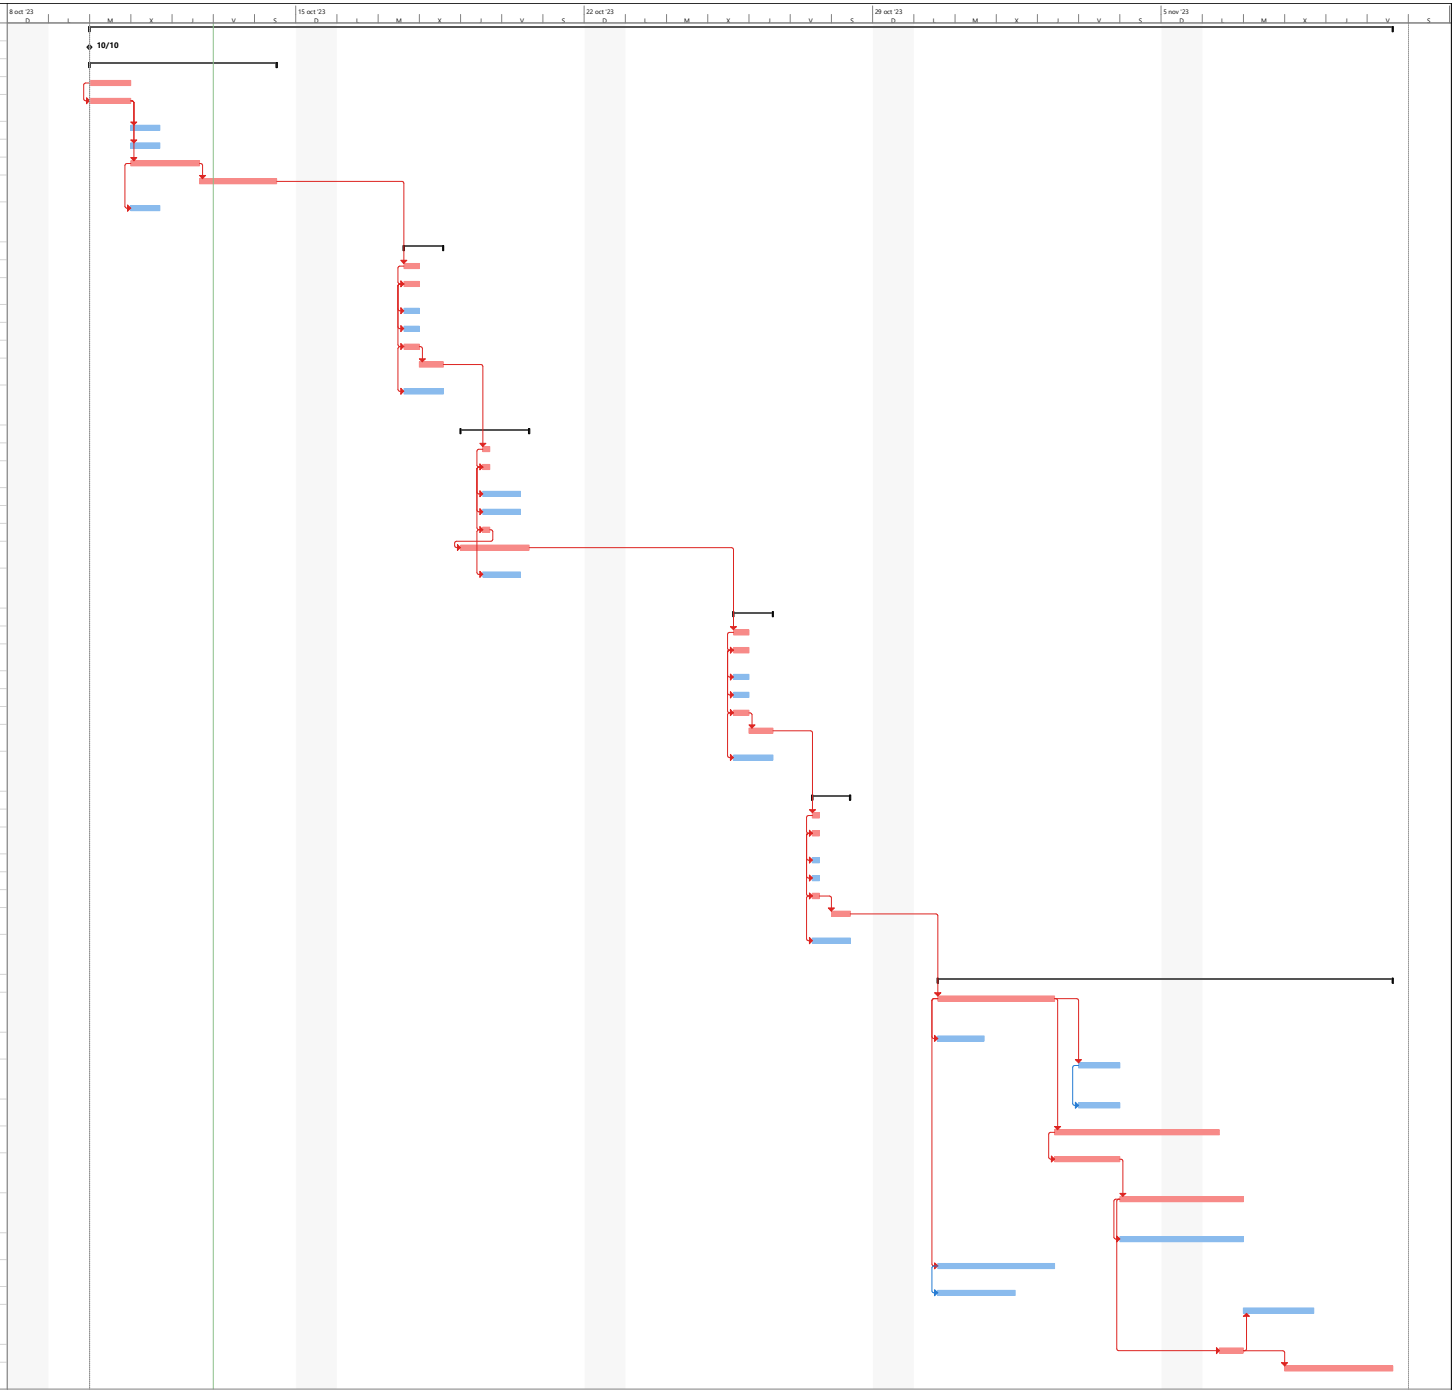

Proyecto: Proyecto1
Fecha: vie 13/10/23

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
