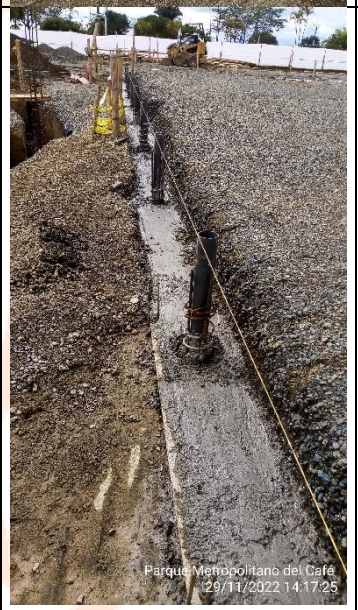
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº23	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 28/11/2022 AL 04/12/2022 - Semana 11 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Programado 67.50% Actividades – Ejecutado 23.87% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	31/12/2022
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Concreto de limpieza 2000 psi	Se finalizan trabajos de instalación de concreto de limpieza sobre fondo de excavación cimentación Auditorio Se tienen lluvias en la semana, se requiere retiro de agua dentro de las excavaciones.	 	Según especificaciones del proyecto. Lluvias retrasan actividades
2) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	Se continua con la instalación de acero de refuerzo para vigas de cimentación Auditorio		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3) Base granular tipo INVIAS	Se retoma actividad de instalación de base granular para cancha de tenis.	 	Según especificaciones del proyecto.
4) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	Se realiza vaciado de concreto de pilotines de cimentación Cerramiento contra impacto (Costados Oriente y Sur). Se realiza instalación de concreto de solado de limpieza.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	Se inicia instalación de acero de refuerzo para vigas de cimentación cerramiento Se trabaja en instalación de formaleta para vigas cerramiento lateral h=2.50 mts.	  	Según especificaciones del proyecto.

Nota: Afectación Clima 18% del tiempo efectivo de las actividades

Se tramita solicitud de adición y prorroga ante secretaria de deporte y recreación

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.
