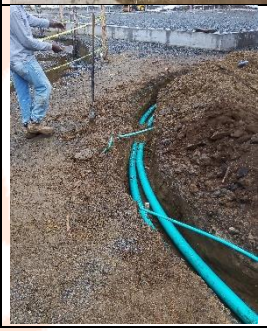
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº27	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 26/12/2022 AL 31/12/2022 - Semana 15 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 27.33% Actividades – Ejecutado 27.33% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	**Auditorio:** Se realiza vaciado de concreto de vigas de cimentación Auditorio, para el restante 50% del costado occidental con concreto premezclado de 3500 psi. Se toman muestras del concreto para control de calidad		Según especificaciones del proyecto.
2) Base granular tipo INVIAS	**Cancha Tenis:** Se encuentra temporalmente suspendida actividad de instalación de base granular para cancha de tenis Actividad se tiene prevista para reiniciar el próximo 02 de enero de 2023		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Tenis:** Se trabaja en instalación de solado de limpieza para vigas de soporte cerramiento contra-impacto costado occidental.		Según especificaciones del proyecto.
4) Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man. 5) Tub PVC Novafort 200 mm	**Cancha Múltiple:** Se realiza excavación para instalación de red de drenaje sector norte, al lado oriental de la cancha. Posteriormente se realiza instalación de tubería sanitaria PVC 200 mm		Según especificaciones del proyecto.
6) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	**Cancha Múltiple:** Se realiza con instalación de acero de refuerzo para cimentación gradería al lado oriental de la cancha.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
7) Viga cimentación C20.7 MPa secc D (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	**Cancha Múltiple:** Se realiza instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto para viga cimentación gradería al lado oriental de la cancha.	 	Según especificaciones del proyecto.
8) Suministro y puesta en servicio de Tubo subsuelo ducto 2"	**Cancha Múltiple:** Se trabaja en instalación de tubería para ductos eléctricos sistema de iluminación de la cancha.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
9) **Plan manejo tráfico**	**Vía acceso parque:** Se realiza instalación de señales informativas de acercamiento al sitio de las obras.	 	Según especificaciones del proyecto.

Nota: Se otorga prórroga al contrato de obra y de interventoría hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.
