Obra 88

Lunes 02 de enero de 2023
Clima: mañana: Parcialmente soleado; tarde: parcialmente soleado, lluvia, nublado
Personal: 05 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 02 operarios, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargador de llanta, 01 vibrocompactador
Se desencofra la viga de cimentación de la graderia norte y se hace la respectiva limpieza.
Se fonde caja de inspección con un área libre de 0.90 x 0.90, y paredes de 10 cm de espesor con concreto de 3000 PSI.
Se continúa compactando y aplicando base granular en la cancha de tenis.
Se continúa armando e instalando el acero de refuerzo para la viga de cimentación del cerramiento contra impacto de la cancha de tenis en el lateral oeste.
Se continúa con las actividades eléctricas tales como excavación de broca, instalación de tuberia eléctrica, excavación de cajas eléctricas y fundición de los pedestales de las cajas eléctricas.
Se inicia la instalación de la formaleta para la viga de cimentación de la graderia sur.
Llueve en horas de la tarde durante 40 minutos aproximadamente desde las 2:45 p.m hasta las 3:20 p.m
Se instalan 97 bloques estructurales en la graderia del lado norte.
Se funde la caja de inspección, quedando un área libre de 0.80m x 0.90m y una profundidad de 70 cm con paredes de 10 cm de espesor.
Se inicia la instalación de la formaleta en la viga de la graderia sur para la fundición.
Se desencofran dos pedestales de las columnas de la cimentación del auditorio cercado.
Se continúa armando e instalando el acero de refuerzo para la viga de cimentación del cerramiento contra

impacto de la cancha de tenis.
Se realiza drenaje para la evacuación del agua debida a la lluvia del día anterior.
Se continúa con la aplicación y compactación de la base granular en la cancha de tenis.

Juliett Cano
Residente de obra

Hoja 69 Martes 03 de enero de 2023
Clima: mañana: llueve - parcialmente soleado, tarde: soleado
Personal: 09 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 02 operarios, 01 almacenista, 01 intendente, 01 SSO, 02 eléctricos, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargador de llanta, 01 vibrocompactador
Debido a que llueve la noche anterior, el personal se dispone a realizar el respectivo manejo de las aguas lluvias. De igual forma, amanece lloviendo durante el horario laboral durante una hora, de 7:00 am. a 8:00 a.m., por lo que las actividades se retrasan un poco.
Se continúa con la instalación de la formaleta en la viga de cimentación de la graderia sur.
Se continúa aplicando y compactando la base granular en la cancha de tenis.
Se realiza visita por parte de los proveedores del asfalto para determinar cuándo se inicia con dicha actividad.
Se comienza a fundir la viga de cimentación de la graderia sur.
Se realiza excavación en la cancha múltiple para poste de iluminación.
Se finaliza el vaciado de la viga de cimentación de la graderia sur.

Juliett Cano
Residente de obra

Powered by CamScanner

Lista 90

Miércoles 04 de enero de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: soleado
Personal: 09 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 02 operarios, 02 soldadores, 01 eléctrico, 01 instrumentista, 01 almacenista, 01 Sisso, 01 inspector, 01 residente.
Maquinaria: 01 minicargador de llanta; 01 vibrocompactador
Llueve durante la noche anterior, por lo que el terreno amanece húmedo.
Se comienza a desencofrar la viga de cimentación de la graderia sur.
Se excava al lado de la viga del lado norte de la cancha múltiple para el cercamo con una profundidad promedio de 30 cm.
Se realizan dos excavaciones más, una en cada cancha en la viga que los divide para la instalación de los postes de luminaria
Se continúa con la actividad de estructura metálica en la viga de cimentación del lateral oeste de la cancha de tenis para el cerramiento contra impacto.
Se instalan 6 tubos para los horcadores en el acero de refuerzo para el dosagiso en la viga de cimentación del lado norte de la cancha de tenis.
Se realiza el traslado del material excavado y de la base granular sobrante en el área del gimnasio techado.
Se comienza a nivelar con el minicargador la cama de la pista de trote de acuerdo con el nivel de la pendiente que tiene la cancha de tenis.
Se inicia la instalación de la formaleta para fundir la viga de cimentación para el cerramiento contra impacto del lado norte de la cancha de tenis.

Juelioth Cross
Residente de obra

Jhon Mayo
Interventoría

Nota 91

Jueves 05 de enero de 2022
Clima: mañana: Soleado; tarde: Soleado
Personal: 09 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 operario, 02 SISO, 01 almacenista, 02 soldadores, 02 eléctricos, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargador de llanta
Se coloca señalización en las excavaciones realizados en la obra, como en las cajas eléctricas y las brechas
Se realiza instalación de carpa y se adecua la zona para visita de la alcaldía y Secretaría de Deporte y Recreación.
Se continúa con la instalación de bloques estructurales en la graderia norte, para un total de 290 bloques instalados.
Se inicia la instalación de los bloques estructurales en la graderia sur.
Se continúa formaleteando la viga de cimentación del lado norte de la cancha de tenis.
Después de instalar la formaleta se comienza a fundir la viga de cimentación con concreto de 3500 PSI.
Se continúa con la nivelación del área del gimnasio Vital según la pendiente de la cancha de tenis.
Llega una volqueta sencilla con placa SBB069 con material de base granular para poder continuar con la actividad en la cancha de tenis.
Se aplica el solado en la brecha para el cárcamo y se instala la malla electrosoldada de 4mm.
Se continúa con las actividades de soldadura y estructura metálica en la cancha de tenis.
Se continúa con las excavaciones para la instalación de la tubería eléctrica y la instalación de los postes.

Juliett Cano
Residente de obra

Bita 92

Viernes 06 de enero de 2022
Clima: mañana: Parcialmente Soleado; tarde: parcialmente soleado, lluvia
Personal: 09 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 02 operarios, 02 eléctricos, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargador de llanta, 01 vibrocompactador
Amanece el terreno húmedo debido a la lluvia de la noche anterior, por lo que no es posible iniciar con la actividad de compactación en la cancha de tenis.
Llegan dos viajes de base granular en un volqueta sencilla con placa SBB 069, para un total de 14 m^3 de material.
Se continúan instalando los bloques estructurales en la graderia sur.
Se continúa con la excavación e instalación de la tubería eléctrica entre la cancha múltiple y las graderías.
Se instala la malla electrosoldada en el cerramiento al lado norte de la cancha múltiple.
Se continúa aplicando la base granular y compactando en la cancha de tenis.
Se arma la formaleta para fundir la caja eléctrica de la cancha de tenis.
Se funde con concreto de 3500 PSI los parados de la caja eléctrica que se encuentra en la cancha de tenis, se funde hasta determinada altura y se dejan los pelos, ya que no se puede fundir completamente por lo que no se tiene la plantilla o ángulo para que encaje la tapa.
Se funde pedestal para poste de iluminación en la cancha múltiple.
Se inicia la instalación de la formaleta en el lado oeste de la cancha de tenis para fundir la viga de cimentación para el cerramiento contra impacto.

Powered by CamScanner

Se instalan los bordeos en el lado oeste de la cancha de tenis para el desagüe de las aguas lluvias por la viga de cimentación
Comienza a llover desde las 4:40 p.m, por lo que se suspenden las actividades de ejecución de obra.
Se determina junto con interventoría, realizar una rampa por la viga de cimentación entre la cancha múltiple y la cancha de tenis para que pueda acceder a la cancha de tenis el vibrocompactador y la maquina para aplicar el asfalto.

Julieth Cano
Residente de obra

JHON MAYE

Obra 93 Sábado 07 de enero de 2023
Clima: mañana: Parcialmente soleado - sábado
Personal: 09 ayudantes, 01 maestro, 02 soldadores, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargadora de llanta
El terreno amanece húmedo debido a la lluvia de la noche anterior, por lo que el personal se dispone a realizar el respectivo manejo de aguas lluvias.
Se continúa con la instalación de los bloques estructurales en la graderia sur.
Se continúa llenando y compactando la graderia norte con material de sitio.
Se inicia la excavación para el cárcamo en el lado norte de la cancha de tenis, con la pendiente hacia la caja de inspección, solicitado por interventoría.
Se continúa con la instalación de la formaleta para la viga de cimentación del lateral oeste.
Se continúa con la actividad de estructura metálica y soldadura para el cerramiento contra impacto de la cancha de tenis.
Se instala la formaleta en la graderia sur para fundir los tableros

de las graderías.
Se funde el lateral derecho de la graderia sur; sin embargo la viga de cimentación quedó con una inclinación el cual se debe corregir.


Residente de obra

Nota 94 Lunes 09 de enero de 2023
Clima: -
Personal: -
Maquinaria: -
No se laboró el día de hoy debido a que es festivo.

Residente de obra

Nota 95 Martes 10 de enero de 2023
Clima: mañana: nublado; tarde: lluvia
Personal: 08 ayudantes, 01 oficial, 01 eléctrico, 04 soldadores, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente
Debido a que llovió durante la noche anterior y amanece lloviendo, el terreno se encuentra humedo, por lo que el día de hoy no se laboran actividades de compactación.
Se aplica anticorrosivo primer color blanco en la estructura metálica, en los tubos del cerramiento contra impacto de la concha múltiple.
Se continúa aplicando material de sitio en la grada norte y se compactan capas de 5cm a 7cm.
Se comienza a remover el material de la base granular suelto en la concha de tenis.
Se organiza la formaleta para el cárcamo en el lado norte de la concha múltiple.
Se acomoda la formaleta de la viga de cimentación

en el lateral oeste, debido a que se encontraba con cierta inclinación.
Se comienza la excavación de los pilotes para la viga de cimentación en la cancha de tenis en el lado sur.
Se acomoda y corrige el lateral derecho de la graderia sur, debido a que quedó con cierta inclinación.
Se define con el interventor el diseño del cárcamo.

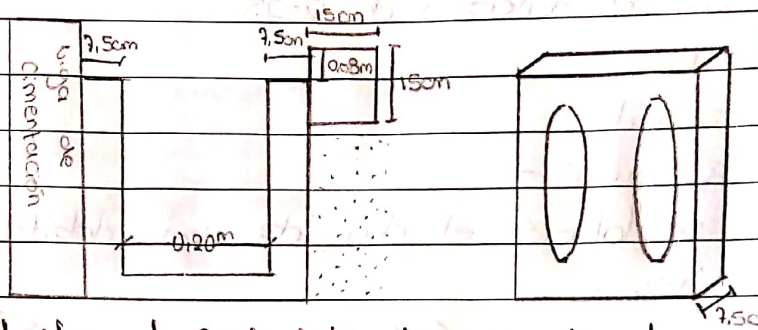

Se le solicita al contratista de mano de obra que realice una tapa de muestra en grafil.
Se corta el acero sobrante de la malla electrosoldada de 4mm del cárcamo para que cumpla con la altura del nivel.
Se bajan 50m de la tierra aplicada en la graderia norte para realizar una capa de dicho espesor con base granular para la losa de 10cm de las graderias.
Se le aplicó cicatrizante a la cabeza de árbol lastimada por las retroexcavadoras.
Se terminan de instalar los tubos para los lloraderos en el lateral izquierdo (oeste) de la cancha de tenis.
Se continúa aplicando y compactando material de sitio, sub rasante, en las graderias.
Comienza a llover desde la 1:39 p.m. de manera leve, sin embargo, desde las 2:00 p.m. se intensifica la lluvia hasta las 4:50 p.m., por lo que se suspenden en la obra las actividades, retrasando el proceso de ejecución de la obra. Se continúa con las actividades de soldadura.

Yeliath Cano
Residente de obra

Jhon Alcaldo
