A6

Actas de compromiso de UAERMV

FORMATO ACTA DE COMPROMISO

CÓDIGO: IMVI-FM-017	VERSIÓN: 8
FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022	

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:	N.A	REHABILITACIÓN:	N.A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N.A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Donación RCD.

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
06/09/23	Sumapaz	C. Rio sumapaz	Vereda Unión Tunal	K2+00	Unión Tunales.	20025001a2027345	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO:





2. SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se verifica un sendero peatonal, Compuesto por material Vegetal y suelo rocoso natural, está delimitado por rollizos y alambre de púas. Los individuos arbóreos están en buen estado.

3. DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO:

Se realiza un traslado de material producto de la excavación, el cual será instalado a lo largo del sendero y nivelado con el Fin de brindar estabilidad. se deja en claro que no se recibirá alguna Compensación económica por alguna de las dos partes.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el Nit 900127032-1 en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través de presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad y/o misional, que serán sometidos al diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que puede consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Rubys Ruiz Nombre: Rubys Ruiz Identificación: 1605551124.	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Adriana Maria CP Nombre: Adriana Maria CP Identificación: 1032656729
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Gilberto Mute Identificación: 80746161	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (Si aplica)	Firma: Isabel Bonilla Nombre: Isabel Bonilla Identificación: 52071921

FORMATO ACTA DE COMPROMISO

CÓDIGO: IMVI-FM-017 | VERSIÓN: 9

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:	N.A.	REHABILITACIÓN:	N.A.	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N.A.	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Instalación Pasacalle.

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
21/09/2023	Sumapaz	C. Rio Sumapaz	Tunal Alto.	Finca. San Marcos	Union Tunales	N.A.	N.A.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO:





2. SITUACIÓN ENCONTRADA:

Predio de Fabiola Polo Rojas, se evidencia cercado, Rollizo de alambre de puas, cobertura vegetal natural, no se evidencia erosión en el suelo, se evidencian 2 individuos arboreos en buen estado

3. DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO:

Se genera un compromiso con el propietario en el cual se hara la instalación de un poste de madera que sirva como soporte para el pendón alusi a las obras. que estará realizando la UMV. una vez termidas las obras se retiraran. no generara beneficio económico por ninguna de las partes

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.umv.gov.co.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Ap. Social Nombre: Kubys Ruiz A. Identificación: 1005551124.	**PROPIETARIO / HABITANTE:**	Firma: Luz Fabiola Polo Rojas. Nombre: Luz Fabiola Polo Rojas. Identificación: 20.816668
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Gilberto Mute Identificación: 80246161	**RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (Si aplica)**	Firma: Isabel Bamal Y. Nombre: Isabel Bamal Y. Identificación: 80421

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE COMPROMISO

CÓDIGO: IMVI-FM-017 | VERSIÓN: 9


FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:	REHABILITACIÓN:	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:
N.A.	N.A.	N.A.	Instalación Pasacalles.

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
22/04/2023	Sumapaz	C. Río Sumapaz	V. Unión Tunales	KR+ 119	Unión Tunales	20076308	91027858

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

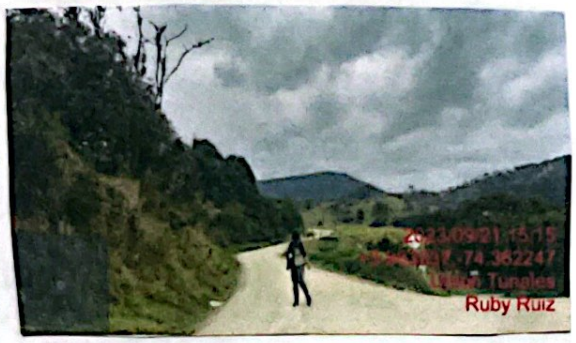



2. SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se evidencia un predio que presenta cobertura vegetal baja, 1 individuo arbóreo de copa alta en buen estado y retirado de la malla vial.

3. DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO:

Se genera compromiso para la instalación de pendón informativo, en el predio, en la cual se realizará la entrega del terreno utilizado en las mismas o mejores condiciones iniciales, Se deja en claro que la entidad, UAERMV. no generara un reconocimiento económico para esta actividad.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.umv.gov.co.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma:	Ap. Social	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma:	Luis Efolina
	Nombre:	Rubys Ruiz N		Nombre:	345 917
	Identificación:	1005551124.		Identificación:	
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma:		RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (Si aplica)	Firma:	Isabel Bamal Y.
	Nombre:	Gilberto Mesa		Nombre:	Isabel Bamal Y.
	Identificación:	80246161		Identificación:	52071821

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE COMPROMISO

CÓDIGO: IMVI-FM-017	VERSIÓN: 9
FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022	

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:	N.A	REHABILITACIÓN:	N.A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N.A.	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Instalacion Pasacalles.

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
22/09/2023	Sumapaz	C. Rio Sumapaz	V. la Unión	Predio El Lucero	Union Tunales	N A.	N A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO:





2. SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se evidencia un predio privado con cercado perimetral en rollizos y alambre de puas en buen estado, cobertura vegetal natural baja; se encuentra un individuo arboreo de copa alta en buen estado y 2 parales de madera alluvia aproximados 2½ mts.

3. DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO:

Se genera un compromiso con el propietario, donde se instalará el pendón informativo con una fecha inicial 23/09/2023 y retiro el dia 31/12/2023, dejando el predio en las mismas o mejores condiciones. Se deja en claro que no se colocara un reconocimiento económico por parte de la UAERMV.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.umv.gov.co.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Ap-Social Nombre: Rubys Ruiz Arrieta Identificación: 1005551124.	**PROPIETARIO / HABITANTE:**	Firma: Maria Lilia Perez Nombre: Maria Lilia Perez Identificación: 52317190
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Gilberto Nieto Identificación: 80246424	**RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (Si aplica)**	Firma: Isabel Bonnal4 Nombre: Isabel Bonnal4 Identificación: 52071821

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE COMPROMISO

CÓDIGO: IMVI-FM-017	VERSIÓN: 9
FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2022	

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:	N.A.	REHABILITACIÓN:	N.A.	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N.A.	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acopio

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
19/09/2023	Sumapaz	C.R.io Sumapaz	Tunal Bajo.	K3+260	Unión Tunal	20036241	91027744

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO:





2. SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se evidencia predio con entrada vehicular en suelo natural, cercos perimetrales en rollizo y alambre de púas, al costado tiene trampas de material vegetal.

3. DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO:

Se determina compromiso para el acopio de materiales, autorizado por el propietario. Una vez terminada la actividad se realizara la entrega del predio en las mismas o mejores condiciones, sin que se genere reconocimiento económico por alguna de las dos partes.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.umv.gov.co.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: AP. social Nombre: Rubys Ruiz Identificación: 1005551124.	**PROPIETARIO / HABITANTE:**	Firma: Leidy E Penagos Hero Nombre: Leidy E Penagos Hero Identificación: 1026.261.819.
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Gilberto Mutis Identificación: 80246161	**RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (Si aplica)**	Firma: Isabel Bamal4. Nombre: Isabel Bamal4. Identificación: 52071821

Powered by CamScanner

PASACALLES (FRENTES DE OBRA CAPITOLIO Y UNIÓN TUNALES)



FRENTE DE OBRA CAPITOLIO 20/09/2023



VEREDA LA UNIÓN 20/09/2023



FRENTE OBRA UNIÓN TUNALES 20/09/2023



FRENTE DE OBRA UNIÓN TUNALES (TUNAL ALTO) 20/09/2023



FRENTE DE OBRA CAPITOLIO 20/09/2023



LA HOYA DEL CABALLO 20/09/2023

A7

Actas de gestión adelantada de UAERMV

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO GESTIÓN SOCIAL ADELANTADA

CÓDIGO: IMVI-FM-021 | **VERSIÓN: 7**

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2022

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:	N°.	REHABILITACIÓN:	N.A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N.A.	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Verificación de cercas Predios.

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
11/09/2023	Sumapaz	C. Río Sumapaz	U: Tunal Bajo	KU +380	Union Tunales.	20023004	91027741

ACCIONES ADELANTADAS EN LAS INTERVENCIONES:

Se realiza un (1) recorrido en Conjunto con el propietario Luis Rey Rey en el cual se verificaron las cercas perimetrales al Predio, evidenciando que no presenta ninguna afectación.

Gilberto Muela

Luis Alberto Rey
19.101807 Bogota

1065551124

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.umv.gov.co

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL: 20023004



CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL: 20023004



CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL: 20023004



CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL: 20023004



CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL:

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL:

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL:

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL:

RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE TÉCNICO	GRUPO DE VALOR
FIRMA: Ap. Social	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Rubys Reins	NOMBRE: Gilberto Muete	NOMBRE: Luis Alberto Lopez
CARGO: Contratista.	CARGO: Contratista.	CARGO: Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO GESTIÓN SOCIAL ADELANTADA

CÓDIGO: IMVI-FM-021 | **VERSIÓN: 7**

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2022

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:	N.A.	REHABILITACIÓN:	N.A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N.A.	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Donación RCD.

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
13/04/2023	Sumapaz	C. Rio Sumapaz	Tunal Bajo	K3+020	Unión Tunales	70076242	91027744.

ACCIONES ADELANTADAS EN LAS INTERVENCIONES:

Gestión de cierre donación material producto de la excavación.

Se realiza visita en Conjunto con el Componente ambiental, con el Fin de verificar cuáles fueron las adecuaciones realizadas en el predio de la señora Edilma Melo el cual recibió 103 m^3 Cantidad de material Producto de La excavación Se recibe a Conformidad del propietario o encargado con el fín de dar cierre a la gestión por parte de la UAERMV y poder tener el respectivo certificado. Cabe acaparar que este tipo de acciones o intervenciones no tendran repercusión económica por alguna de las dos partes.

~~Estudiante~~

Jessica Paola Vidal P.
1030669188.

1005551124.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.umv.gov.co.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	FORMATO GESTIÓN SOCIAL ADELANTADA	
	CÓDIGO: IMVI-FM-021	VERSIÓN: 7
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2022	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL: 2007 67 42



CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL: 9102 7744



CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL: 2007 67 42



CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL: 2007 67 42.



CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL:

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL:

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL:

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL:

RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE TÉCNICO	GRUPO DE VALOR
FIRMA: Ap. Social	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Rubis Peris	NOMBRE: Gilberto Mute	NOMBRE: Edilma Melo P
CARGO: Contratista.	CARGO: Contratista	CARGO: Propetaria del predio

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

FORMATO GESTIÓN SOCIAL ADELANTADA

CÓDIGO: IMVI-FM-021	VERSIÓN: 7
FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2022	

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:	N.A	REHABILITACIÓN:	N.A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N.A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Cercado.

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
08/09/2023	Sumapaz	C. Río Sumapaz	K2+00		Unión Tunales.	20025001	47027745

ACCIONES ADELANTADAS EN LAS INTERVENCIONES:

Si

Se realiza una gestion adelantada, verificando los predios que tuvieran afectaciones por causa de obras en el tramo union tunales,

De acuerdo a estos puntos, se contemplan afectaciones en el predio de Alberto Delgado, donde el cercado perimetral, presenta daño puntual, Para solucionar el percance la unidad ejecutora realiza los arreglos pertinentes y se entrega a conformidad al propietario.

Se realiza registro fotografico de los trabajos sobre el cercado.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.umv.gov.co.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	FORMATO GESTIÓN SOCIAL ADELANTADA	
	CÓDIGO: IMVI-FM-021	VERSIÓN: 7
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2022	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL: 20025001



CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL: 20025001




CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL: 20025001



CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL: 20025001




CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL: 20025001

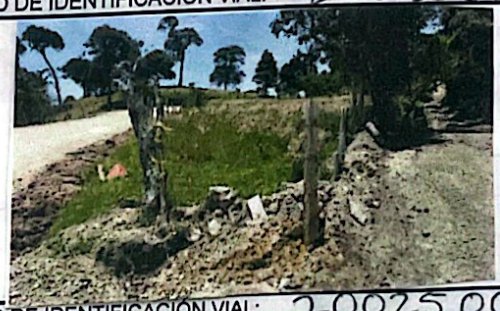

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL: 20025001



CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL: 20025001

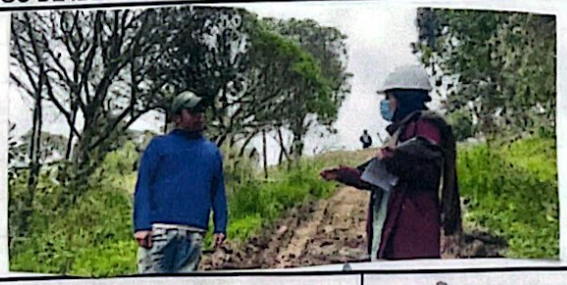

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL:

RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE TÉCNICO	GRUPO DE VALOR
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ruby Ruiz	NOMBRE: Gilberto Muñoz	NOMBRE: Miguel Delgado
CARGO: Contratista	CARGO: Contratista	CARGO: Familia afectada

Powered by CamScanner

A8.

Lista de asistencia y folleto de charla informativa de interventoría

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	ECOVIAS SAS
FO - GIP - 061	FORMATO No.24 - REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	2.0	

FECHA 14/09/2023

SUBDIRECCIÓN GENERAL N/A

DIRECCIÓN TECNICA N/A

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA N/A

CONTRATO No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA D PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 88 DE 2015 EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ

LUGAR Y FECHA: 14/09/2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Isabel Barna Yasso.

EMPRESA: Ecovias SAS

TEMA: Socialización

HORA DE INICIO: 8:52 a.m **HORA DE TERMINACIÓN:**

TIPO

INDUCCIÓN ☐ **CAPACITACIÓN** ☐

CHARLA INFORMATIVA ☑ **ENTRENAMIENTO** ☐

OTRO ☐

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
Rubys Ruiz A.	1005551124	Contratista	UAERMV	
Brayan Stiven Porras	1022997635	Boal	Sintrauniobras	BrayanPorras
Ruben Peñaloza	1022979320	Boal	Sintrauniobras	Ruben
Carlos M. Sabogal	80268420	oficial.	sintrauniobras	
Lindy Yohana Diaz Orea	1069764358	Contratista	UAERMU	
Bellanire Guellal M	39673735	A Trafico	sintrauniobras	
Santiago Perilla	79262790	Conductor	Sintrauni	
Fesney Moriay D.	74.325753	Inspector	Sintrauniobras	
Dora Perez Burbo	1.072.894 823	A. Trafico	Sintrauniobras	Dora Perez
Brayan Mendoza D.	1012400416	Cadenero I	Sintrauniobras	BRAYAN M
Jessica Paola Vidal P	1030669188	Contratista	UAERMU	Jessica Paola Vidal P.
Alfredo Arnulfo Dimate	1032656546	Ayudante obra	Sintrauniobras	Alfredo Dimate G
Holga Yanet Garcia	51973847	Auxiliar trafico	Sintrauniobras	
Adriana Roncio R	20824807	Auxiliar trafico	Sintrauniobras	
Oscar Emilio Beltran	1001176007	Ayudante obra	Sintrauniobras	
Sergio Nicolas T	1001170101	Ayudante de obra	Sintrauniobras	Sergio T
Riyoberto Agui N	3724 373	Ayudante obra	Sintrauniobras	
Wilder Baeza	79579538	Ayudante	Sintrauniobras	

(Firma) Isabel Barna

(Nombre)

Residente Social Interventoría

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	ECOVIAS SAS
FO - GIP - 061	FORMATO No.24 - REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	2.0	

FECHA 14/09/2023

SUBDIRECCIÓN GENERAL N/A

DIRECCIÓN TECNICA N/A

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA N/A

CONTRATO No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA D PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REÁJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 88 DE 2015 EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ

LUGAR Y FECHA: 14/09/2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Isabel Bamal Yasso

EMPRESA: Ecovias SAS

TEMA: Socialización funciones de Interventoría.

HORA DE INICIO: _____ **HORA DE TERMINACIÓN:** _____

TIPO

INDUCCIÓN	☐	CAPACITACIÓN	☐
CHARLA INFORMATIVA	☒	ENTRENAMIENTO	☐
		OTRO	☐

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
Leidy E Penagos M.	1026.26.1819	AUX tráfico	Sintraunidobras	Leidy Penagos
Leidy Yohana Ortiz Orjuela	1069764358	Contratista	UAERMU	Leidy Yohana Ortiz
Olando Suarez F	19315960	Contratista.	UAERMU	
Pilar Rey Rincon	1'030.593.939.	AUX Tráfico	Sintraunidobras	
Edison Di Mai	1023036214	Boal	sintraunidobras	Edison D
Libardo Guzman	81 740 637	Ayudante	Sintraunidobras	
Deivis Reyes D	7069237327	Ayudante	sintraunidobras	
Carlos Andres Rey Polo	1069170084	Boal	Sintraunidobras	Carlos Andres Rey Polo
Nelson Hernandez Vega	72207646	cadenero 1	sintraunidobras	Nelson Hernandez Vega
Patricia Contreras	79.303.597	Cadenero 2	Sintra.	
Luis A Duncan	80434593	Inspector	"	
Giovanni Giraldo	79839669	Topografo	Sintraunidobras	
Jose David López	80810144	Topógrafo	Sintraunidobras	
Luis Hernando Diaz	79.257.996	operador	malla vial	
Hans Rodriguez Pachon	1032379105	Conductor Volquet	Sintraunidobras	Hans R.
Carlos Mauricio Chaves	83091 416	Operario	Sintraunidobras	
Jessica Paola Vidal P	1030669188	Contratista	UAERMU	Jessica Paola Vidal P.
Gabriela Bahl	1004933528	Tec. SST	Sintraunidobras	

(Firma)

(Nombre) Residente Social Interventoría

Isabel Bamal Y.

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	ECOVIAS SAS
FO - GIP - 061	FORMATO No.24 - REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	2.0	

FECHA 14/09/2023

SUBDIRECCIÓN GENERAL N/A

DIRECCIÓN TECNICA N/A

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA N/A

CONTRATO No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA D PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 88 DE 2015 EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ

LUGAR Y FECHA: 14/09/2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Isabel Bernal Yasso

EMPRESA: Ecovías SAS

TEMA: Socialización

HORA DE INICIO: 8:52 a.m **HORA DE TERMINACIÓN:**

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ ENTRENAMIENTO ☐

OTRO ☐

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
Angel Jair maria torres	1072986839	Ayudante	sintraunidos	
Uriel Hurtado P	80451717	Ayudante	Sintraunidos	
Luis Alfonso Ver	79991087	Operario	Sintrau	
Cristian Cortes	1023032346	Cadenero 1	Sintraunidos	Cristian
Miguel A Gonzalez M	1003486903	Cadenero 2	Sintraunidos	
Oscar Felipe Sanz	1049623804	Residente	ECOVIAS	
Cesar Mauricio Wilch	1049624206	Residente	ECOVIAS	
Jesus Antonio Pinzón	79962654	Residente SST	ECOVIAS	
Jose Posada	80381190	Cadenero 1	ECOVIAS	
Elkin yair Porras J	1098742833	Topografo	Ecovias	
Erms A. Hurtado M.	52372232	Director	Ecovas	
Laura Marcela Rojas	1193047676	Contratista FDR Sumapaz	FDRS	
Mauricio Hernández	74170044	Sup Zonal	Sintraunidos	
Gilberto Muek V.	80246161	Contratista	VAERMY	
Pilar Raf Rincon	1030593939	Aux. Trafico	Sintraunid.	
Leidy E Penagos	1026261819	Aux trafico	Sintraunidos	

(Firma) Isabel Bernal Y.

(Nombre)

Residente Social Interventoría

Los Invitamos a toda a conocer quién es la interventoría del contrato en ejecución y que funciones cumplen:

Funciones

✓ Asegurar la calidad integral, buscando los medios necesarios que permitan establecer los mecanismos de control necesarios, tales que le permitan garantizar al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

✓ Exigir a la entidad ejecutora el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ejecución de obra, en las leyes y las normas que le apliquen.

✓ Impartir de manera oportuna y dar claras instrucciones a la entidad ejecutora sobre el cumplimiento de las obligaciones.

✓ Exigir al ejecutor la información que se considere necesaria para el cumplimiento de las obligaciones.





ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

FUNCIONES DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

ELEMENTOS DE CONTROL

La interventoría Ecovías SAS implementará los siguientes elementos de control, para realizar el seguimiento y supervisión a las actividades realizadas por el ejecutor del proyecto.

Formatos de evaluación y seguimiento: Registros donde se consignará la verificación realizada por la Interventoría directamente en campo

Recorridos: Se realiza seguimiento y verificación en campo, con el fin de hacer seguimiento a las actividades realizadas por el ejecutor

Bitácora: Se realiza registro en bitácora, con el fin de registrar las actividades realizadas por el ejecutor.

Registro Fotográfico: Se tomarán registro fotográficos , con el fin de tener evidencia de las actividades realizadas por el ejecutor.

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO

La Interventoría realiza seguimiento a cada una de las actividades programadas, a través de recorridos de obra, acompañamiento a reuniones, programación de mesas de trabajo, comités de obra, para este seguimiento, se implementarán los diferentes formatos validados para el registro de información, registros fotográficos.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

ECOVIAS SAS




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ
ECOVIAS S.A.S. DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

A9

Pantallazo de correo electrónico solicitud de mesa de trabajo.

Pantallazo solicitud de reunión coordinación social de la entidad ejecutora.

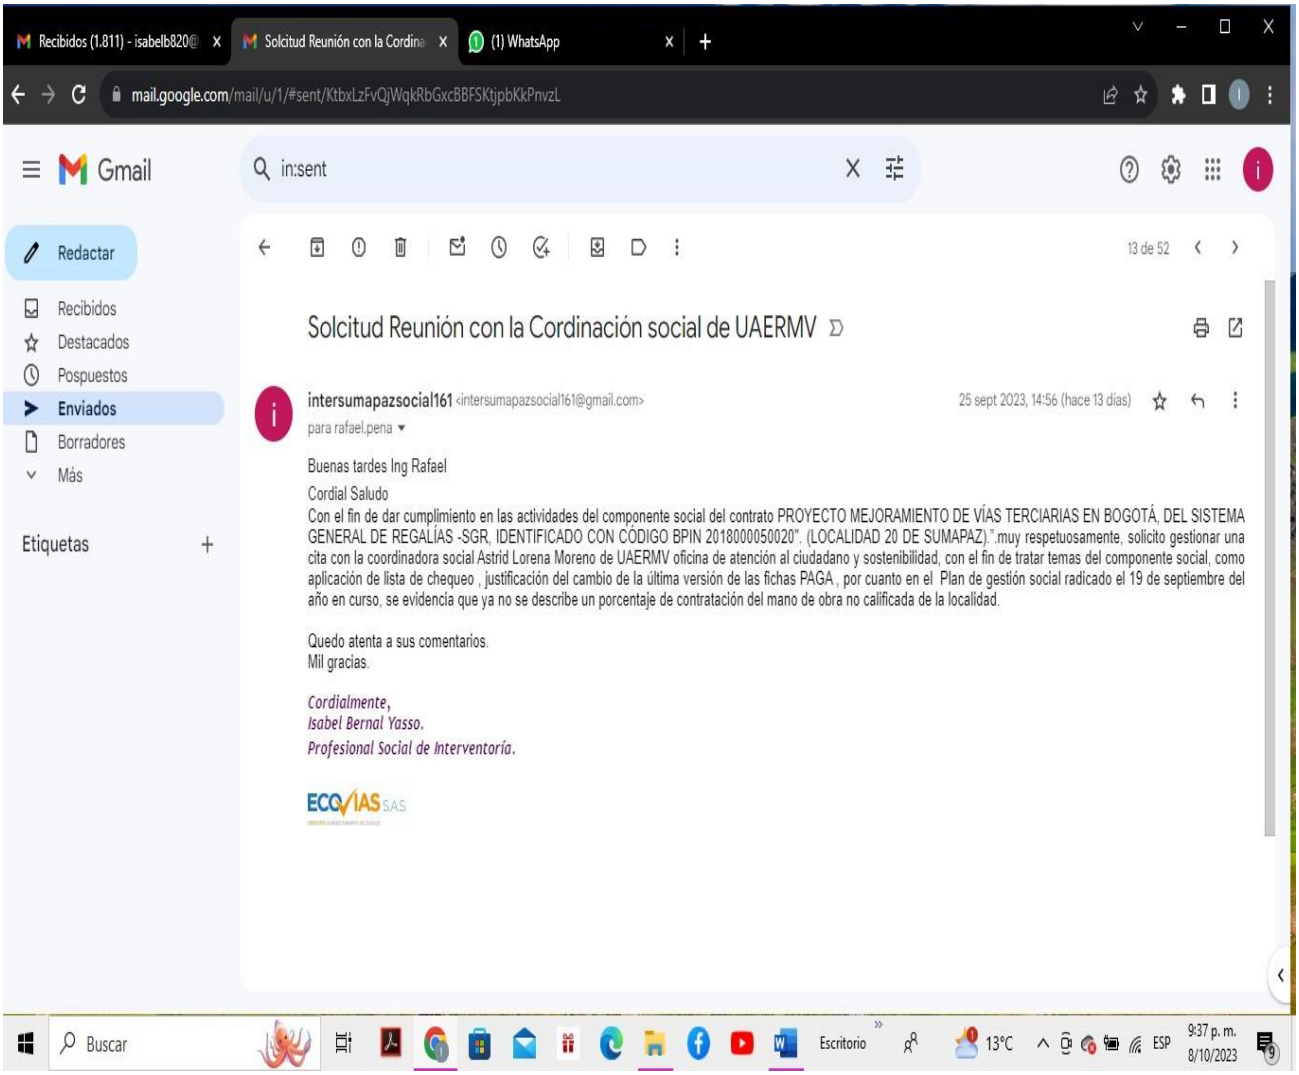

A10.

Oficio186-1-295. del 12 de septiembre del 2023

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-295.

Bogotá D.C. 13 de septiembre de 2023.

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: *"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".*

Asunto: Reiteración solicitud de documentación del componente Social – UAERMV.

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA, CLÁUSULA 9 OBLIGACIONES GENERALES: 1,2,4 y 5 DEL INTERVENTOR CLÁUSULA 10 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR: TÉCNICAS: Subnumerales 2,3,5,6,8,9,10 y 11 ADMINISTRATIVAS:14,18, 23,27,28 y 29 JURÍDICAS: 2,4,6 y 9 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022, se tienen los siguientes requerimientos:

Con la presente nos permitimos solicitar nuevamente a la UAERMV, la documentación que a continuación se relaciona:

1. De acuerdo al comité realizado el 8 de septiembre del año en curso, la profesional social de la UAERMV se comprometió a hacer la entrega del Plan de Gestión Social y el informe mensual del mes de agosto de 2023, para el día 9 de septiembre del 2023, a la fecha del presente oficio no cuenta con los documentos entregados por la UAERMV.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-295.

2. Se solicita a la UAERMV, hacer entrega de los documentos mencionados anteriormente y el informe mensual de julio de 2023, mostrando la trazabilidad ejecutada mes a mes en cada documento.

Con lo relacionado anteriormente y que no se han cumplido los compromisos que el componente social de la UAERMV ha adquirido en los comités semanales y mesas de trabajo realizadas con la interventoría, se le solicita a la UAERMV, allegue a la interventoría lo solicitado en un máximo de 3 días calendario al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Anexos: N/A.

A11.

Informes semanales de la UAERMV

REPORTE DE ACTIVIDADES COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO	NO. CPS- 451-2022
CONTRATISTA	**CHIRLEYS DANITZA FERREIRA LANDAETA**
CEDULA	1.116.791.123
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO Y LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN SOCIAL EN LAS INTERVENCIONES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020.
PLAZO DE EJECUCIÓN CONSULTORIA	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO	14 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR	JOSÉ FERNANDO FRANCO BUITRAGO
CEDULA	1.094.883.661
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ASTRID LORENA MORERA
CEDULA	1032366397

CONTRATO	NO. 447-2022
CONTRATISTA	**RUBYS DEL CARMEN RUIZ ARRIETA**
CEDULA	1005551124
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL ESTABLECIDAS EN EL DOCUMENTO PAGA, PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN SOCIAL EN LOS FRENTES DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020
PLAZO DE EJECUCIÓN CONSULTORIA	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO	10 DE NOVIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR	JOSÉ FERNANDO FRANCO BUITRAGO
CEDULA	1.094.883.661
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ASTRID LORENA MORERA
CEDULA	1032366397

Informe de las actividades realizadas en la semana del 04 al 08 de septiembre 2023 por parte del componente de Gestión Social.

04/09/2023: Se realizaron cinco (5) actividades.

- **ACTIVIDAD 1:**

TEMA: RECORRIDO DE OBRA TRAMO CAPITOLIO

OBJETIVO: Acompañar un (1) recorrido de obra con los trabajadores de obra y el residente técnico.

METODOLOGÍA: Se hace acompañamiento de un (1) recorrido de obra en el tramo Capitolio, con el componente ambiental, los trabajadores de obra y el residente técnico, con el fin de realizar reconocimiento del terreno y avances de la obra.

- **ACTIVIDAD 2:**

TEMA: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA - CAPITOLIO.

OBJETIVO: Acompañar al equipo de obra en las actividades en el tramo Capitolio.

METODOLOGÍA: Se realiza un (1) acompañamiento en obra, con el fin de verificar actividades sociales en el tramo Capitolio, aclarar dudas frente a los procesos y atender a la comunidad.

- **ACTIVIDAD 3:**

TEMA: ACTIVIDADES SST EN EL TRAMO CAPITOLIO.

OBJETIVO: participar de una sensibilización, charla y pausa activa con la profesional SST del Sintrauniobras.

METODOLOGÍA: Se participa de una sensibilización, charla y pausa activa organizada por la profesional SST de Sintrauniobras, en la cual se realizó estiramientos osteomusculares; con el fin de fortalecer la higiene de postura y disminuir el estrés laboral y así continuar con las actividades en obra.





ACTIVIDADES SST EN EL TRAMO CAPITOLIO. 04/09/2023

- **ACTIVIDAD 4:**

TEMA: SENSIBILIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA.

OBJETIVO: Sensibilizar a los trabajadores de obra y operarios frente a los procedimientos de Gestión Social en Obra.

METODOLOGÍA: Se realiza una (1) sensibilización sobre los procedimientos de Gestión Social en Obra, a los trabajadores de obra y operarios del tramo Capitolio, donde se brinda información del proceso de gestión social y se fortalece los canales de comunicación.




SENSIBILIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA. 04/09/2023

- **ACTIVIDAD 5:**

TEMA: MESA DE TRABAJO COMPONENTE SOCIAL.

OBJETIVO: Realizar un (1) cronograma de actividades que se llevaran a cabo durante la semana

METODOLOGÍA: El componente social realiza una (1) mesa de trabajo con el fin de revisar el plan de gestión social y el cronograma de actividades que se ejecutaran durante la semana del 4 al 8 de septiembre.

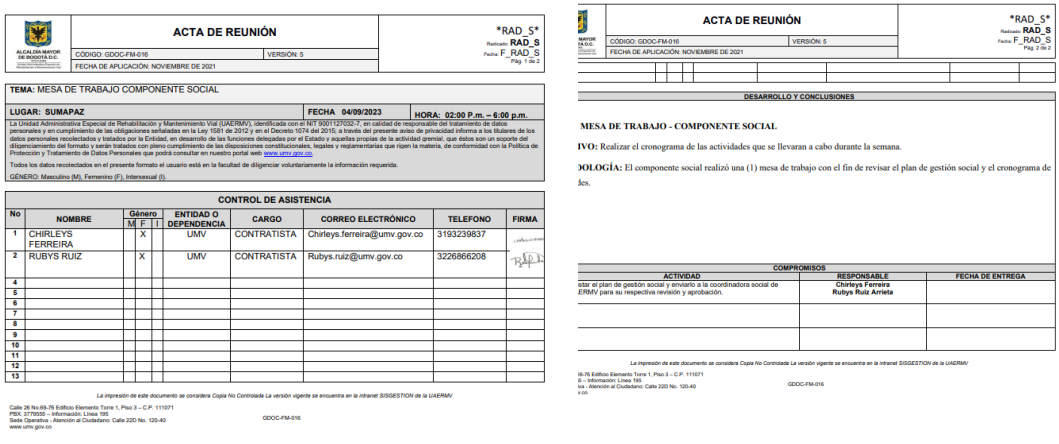

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GDOC-FM-016 | VERSIÓN: 5 | FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021

RAD_S Radicado: RAD_S Fecha: F_RAD_S

TEMA: MESA DE TRABAJO COMPONENTE SOCIAL

LUGAR: SUMAPAZ | FECHA 04/09/2023 | HORA: 02:00 P.m. – 6:00 p.m.

CONTROL DE ASISTENCIA

No	NOMBRE	Género M	F	I	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	CHIRLEYS FERREIRA		X		UMV	CONTRATISTA	Chirleys.ferreira@umv.gov.co	3193239837	
2	RUBYS RUIZ		X		UMV	CONTRATISTA	Rubys.ruiz@umv.gov.co	3226866208	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SIGGESTION de la UAERMV

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P. 111071
PBX: 3779595 – Información: Línea 195
Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40
www.umv.gov.co

GDOC-FM-016

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GDOC-FM-016 | VERSIÓN: 5 | FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021

RAD_S Radicado: RAD_S Fecha: F_RAD_S

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

MESA DE TRABAJO - COMPONENTE SOCIAL

IVO: Realizar el cronograma de las actividades que se llevaran a cabo durante la semana.

OLOGÍA: El componente social realizó una (1) mesa de trabajo con el fin de revisar el plan de gestión social y el cronograma de les.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
star el plan de gestión social y enviarlo a la coordinadora social de ERMV para su respectiva revisión y aprobación.	Chirleys Ferreira Rubys Ruiz Arrieta	

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SIGGESTION de la UAERMV

l9-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P. 111071
6 – Información: Línea 195
ios - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40
v.co

GDOC-FM-016

MESA DE TRABAJO - COMPONENTE SOCIAL 04/09/2023

05/09/2023: Se realizaron tres (3) actividades.

- **ACTIVIDAD 1:**

TEMA: AJUSTES PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

OBJETIVO: Realizar ajustes al Plan de Gestión Social.


METODOLOGÍA: Se realiza ajustes para subsanar el Plan de Gestión Social y se hace envió a la coordinadora y la residente social de la interventoría.

- **ACTIVIDAD 2:**

TEMA: REVISIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.

OBJETIVO: Socializar los ajustes del plan de gestión social.

METODOLOGÍA: Se realiza una (1) reunión (profesionales sociales de la UAERMV, la coordinadora social e Interventoría) con el fin de socializar los ajustes al plan de gestión social, el cual será enviado para revisión y aprobación por parte de la oficina atención a la ciudadanía y sostenibilidad posteriormente será radicado y enviado a la interventoría.

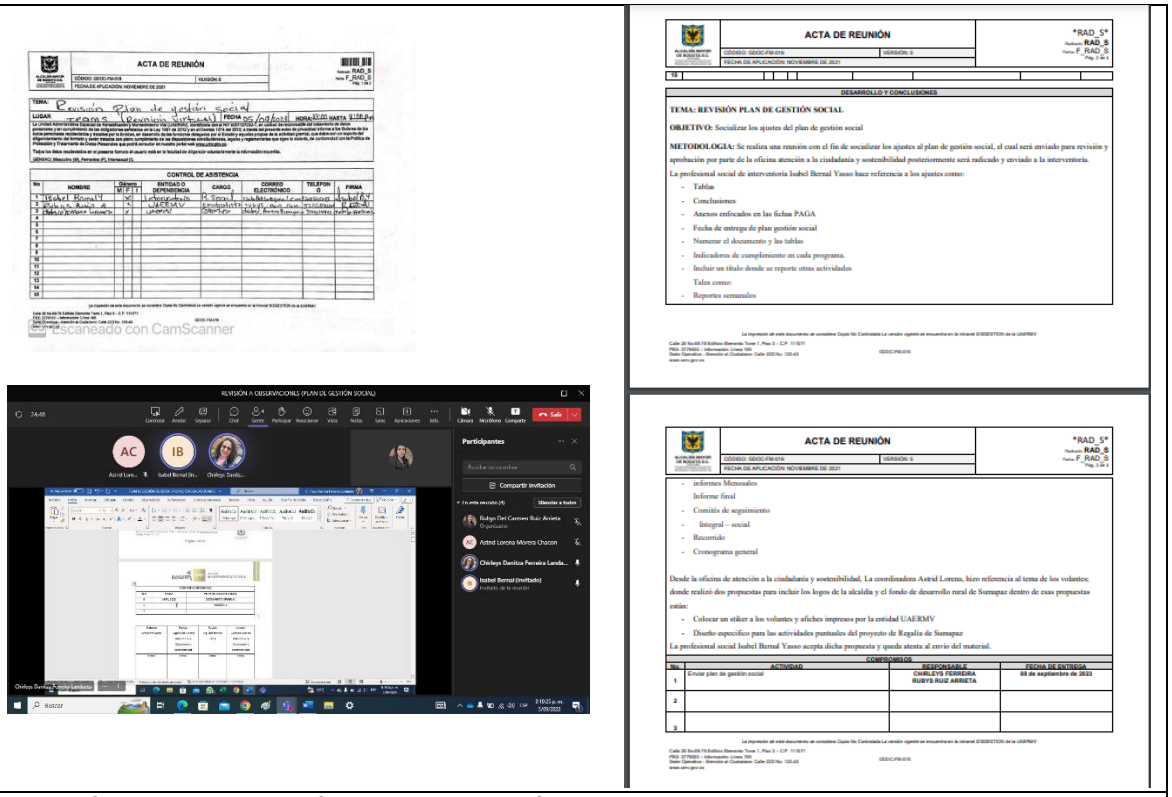

REVISIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL REUNIÓN VIRTUAL 05/09/2023


ACTIVIDAD 3:


OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO

TEMA: GESTIÓN ADELANTADA

OBJETIVO: Brindar información oportuna a la comunidad.

METODOLOGÍA: Se realiza gestión adelantada en punto de atención al usuario tramo Unión Tunales; establecido por el componente social para el proyecto del sistema general de regalías código 20180000050020. La profesional social atiende a una (1) respondiendo preguntas sobre la intervención de la malla vial y demás aspectos en los cuales se tienen dudas.

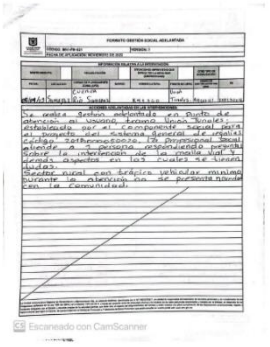

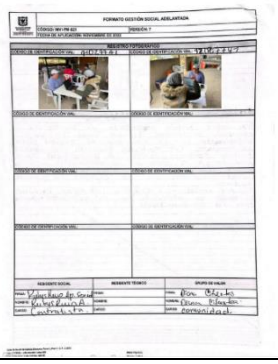

GESTIÓN ADELANTADA UNIÓN TUNALES 05/09/2023

06/09/2023: Se realizaron cinco (5) actividades.

- **ACTIVIDAD 1:**

TEMA: RECORRIDO DE OBRA TRAMO CAPITOLIO

OBJETIVO: Acompañar un (1) recorrido de obra con los trabajadores de obra y el residente técnico.

METODOLOGÍA: Se hace acompañamiento de un (1) recorrido de obra en el tramo Capitolio, con el componente ambiental, los trabajadores de obra y el residente técnico, con el fin de realizar reconocimiento del terreno y avances de la obra.



RECORRIDO DE OBRA TRAMO CAPITOLIO. 06/09/2023.

- **ACTIVIDAD 2:**

TEMA: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA - CAPITOLIO.

OBJETIVO: Acompañar al equipo de obra en las actividades en el tramo Capitolio.

METODOLOGÍA: Se realiza un (1) acompañamiento en obra, con el fin de verificar actividades sociales en el tramo Capitolio, aclarar dudas frente a los procesos y atender a la comunidad.

- **ACTIVIDAD 3:**

TEMA: AJUSTES AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y CRONOGRAMA

OBJETIVO: Realizar ajustes al Plan de Gestión Social y al cronograma.

METODOLOGÍA: Se realiza ajustes para subsanar el Plan de Gestión Social y el cronograma, respectivamente se hace envió a la coordinadora y la residente social de la interventoría.

- **ACTIVIDAD 4:**

PROGRAMA DE CULTURA VIAL


TEMA: SENSIBILIZACION DE HORARIOS DE CIERRE EN EL FRENTE DE OBRA.

OBJETIVO: Concientización de tiempos y movimientos en obra

METODOLOGÍA: Se realiza una sensibilización con la unidad ejecutora en la cual se contemplan diferentes temas acordes con los cierres viales en el frente de obra – unión tunales. De acuerdo con los lineamientos planteados en las fichas PAGA y PMT se concientiza al trabajador, explicándole los horarios de cierre vial, el cual está comprendido de 9:00 am – 12:00m y 1:00 pm – 5:00 pm. Este horario podrá cambiar debido a la intermitencia de llegada de materiales directos para la construcción de malla vial. De acuerdo con lo antes visto se determinan cuáles son las señales móviles implementadas en el plan de manejo de tráfico típico: Señales reglamentarias – Son las de color blanco con un aro de color rojo y que tienen por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito.





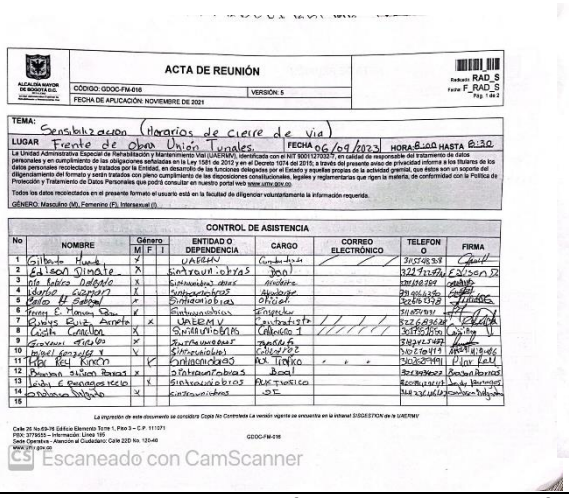

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GDOC-FM-016 | VERSIÓN: 5


FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021

TEMA: Sensibilización (Horarios de cierre de vía)

LUGAR Frente de Obra Unión Tunales. FECHA 06/09/2023 HORA: 8:00 HASTA 8:30

CONTROL DE ASISTENCIA

No	NOMBRE	Género M	Género F	Género I	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	Gilberto Huerta	X			UAERMV	Conductor		3125405838	
2	Edison Olmate	X			Contraun: obras	Boal		3229107821	
3	Ale Fabian Delgado	X			Contratistas	Ayudante		3118102784	
4	Jhonny Garavito	X			Contratistas	Ayudante		3114116456	
5	Carlos H Santana	X			Contratistas	Oficial		3245157218	
6	Franco F. Moreno Rey	X			Contratistas	Ingeniero		3114570731	
7	Dubys Enith Arrieta		X		UAERMV	Contratista		3226863824	
8	Cesar Cardoso	X			Contratistas	Oficial 1		3135210014	
9	Giovanni Prieto	X			Contratistas	Ayuda		3142121483	
10	Angel Gonzalez R	X			Contratistas	Oficial 2		3107209414	
11	Yeiber Raul Rincon		X		Contratistas	Ay. Tunco		3103827991	
12	Brayan Stiven Rojas	X			Contratistas	Boal		3214369622	
13	Jesus E Buenaños Leon		X		Contratistas	Ay. Topografia		3209131417	
14	Adriana Delgado	X			Contratistas	SST		318 437 0612	
15									

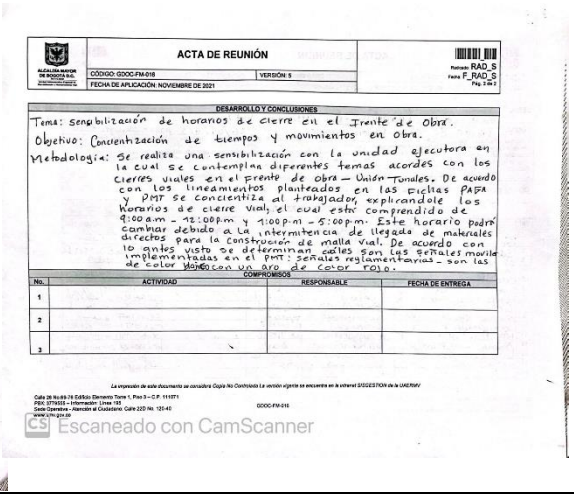

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GDOC-FM-016 | VERSIÓN: 5

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

Tema: Sensibilización de horarios de cierre en el frente de obra.

Objetivo: Concientización de tiempos y movimientos en obra.

Metodología: Se realiza una sensibilización con la unidad ejecutora en la cual se contempla diferentes temas acordes con los cierres viales en el frente de obra – Unión Tunales. De acuerdo con los lineamientos planteados en las Fichas PAFA y PMT se concientiza al trabajador, explicandole los horarios de cierre vial, el cual está comprendido de 9:00 am - 12:00 pm y 1:00 p.m - 5:00 p.m. Este horario podrá cambiar debido a la intermitencia de llegada de materiales directos para la construcción de malla vial. De acuerdo con lo antes visto se determinan calles son las señales reglamentarias - son las de color blanco con un aro de color rojo.

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1			
2			
3			

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO UNIÓN TUNALES 06/09/2023


- **ACTIVIDAD 5:**

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

TEMA: ACTA DE COMPROMISO DONACIÓN DE MATERIA DE EXCAVACIÓN

OBJETIVO: Realizar la recuperación de material producto de la excavación en veneficio de las comunidades aledañas a los frentes de obras

METODOLOGÍA: Se realiza un traslado de material producto de la excavación, el cual será instalado a lo largo del sendero peatonal y nivelado; con el fin de brindar estabilidad.

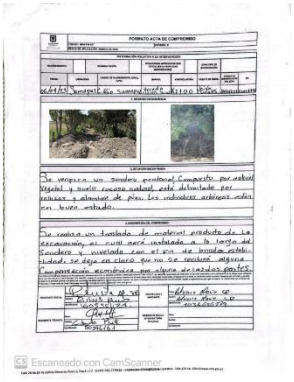

FORMATO ACTA DE COMPROMISO

ACTA DE COMPROMISO DONACIÓN DE MATERIA DE EXCAVACIÓN 06/09/2023

07/09/2023: Se realizaron () actividades.

- **ACTIVIDAD 1:**

TEMA: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

OBJETIVO: Realizar ajustes al Plan de Gestión Social

METODOLOGÍA: Se realiza ajustes para subsanar el Plan de Gestión Social y se hace envió a la coordinadora y la residente social de la interventoría.

- **ACTIVIDAD 2:**

TEMA: MESA DE TRABAJO COMPONENTE SOCIAL.

OBJETIVO: Realizar una (1) mesa de trabajo componente social UAERMV con el fin de revisar los pendientes y las actas de reunión.


METODOLOGÍA: Se realiza una (1) mesa de trabajo componente social UAERMV con el fin de revisar los pendientes y las actas de reunión, el plan de gestión social, los informes semanales y el in forme mensual que debe ser enviado a la interventoría.


- **ACTIVIDAD 3:**

TEMA: COMITÉ COMPONENTE SOCIAL UAERMV E INTERVENTORIA.

OBJETIVO: Participar de un (1) comité del componente social UAERMV e Interventoría, con el fin de revisar los compromisos y el Plan de Gestión Social.

METODOLOGÍA: Se participa del primer comité social entre la Interventoría y la UAERMV, donde se realizo la revisión de los compromisos y el plan de gestión social.





COMITÉ COMPONENTE SOCIAL UAERMV E INTERVENTORIA. 07/09/2023

- **ACTIVIDAD 4:**

TEMA: CONTACTO CON LA LIDER COMUNITARIA DE TUNAL BAJO

OBJETIVO: Informar a la comunidad sobre las diferentes actividades de la malla vial

METODOLOGÍA: Se Mantiene contacto permanente con la líder comunitaria de Unión Tunales con el fin de gestionar los escenarios de participación requeridos durante la ejecución de la obra.




07/09/2023

- **ACTIVIDAD 5:**

TEMA: RECORRIDO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA

OBJETIVO: Acompañar al equipo de obra en las actividades en el tramo Unión Tunales.

METODOLOGÍA: Realizar visitas y acompañamiento social a los frentes de obra, con el fin de atender las novedades de tipo social que se presenten, diligenciando los formatos establecidos



RECORRIDO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA 07/09/2023

08/09/2023: Se realizaron () actividades.

- **ACTIVIDAD 1:**

TEMA: RECORRIDO DE OBRA TRAMO CAPITOLIO

OBJETIVO: Acompañar un (1) recorrido de obra con los trabajadores de obra y el residente técnico.

METODOLOGÍA: Se hace acompañamiento de un (1) recorrido de obra en el tramo Capitolio, con el componente ambiental, los trabajadores de obra y el residente técnico, con el fin de realizar reconocimiento del terreno y avances de la obra.





RECORRIDO DE OBRA TRAMO CAPITOLIO. 08/09/2023

- **ACTIVIDAD 2:**

TEMA: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA - CAPITOLIO.

OBJETIVO: Acompañar al equipo de obra en las actividades en el tramo Capitolio.

METODOLOGÍA: Se realiza un (1) acompañamiento en obra, con el fin de verificar actividades sociales en el tramo Capitolio, aclarar dudas frente a los procesos y atender a la comunidad.


- **ACTIVIDAD 3:**


PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

TEMA: ENTREGA CERCADO

OBJETIVO: Entregar a conformidad la cerca afectada en el transcurso de las actividades en el frente obra Unión Tunales.

METODOLOGÍA: Se realiza entrega a el señor Albeiro Delgado de cercado afectado ubicada en la abscisa K2+00 con CIV 20025001 Predio afectado por la intervención de la malla vial.

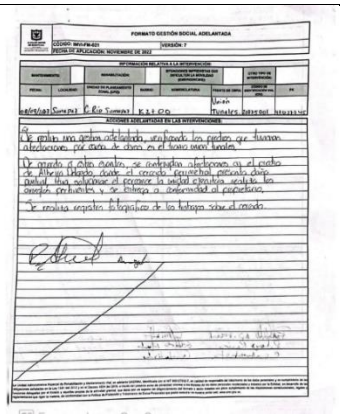
FORMATO GESTIÓN SOCIAL ADELANTADA

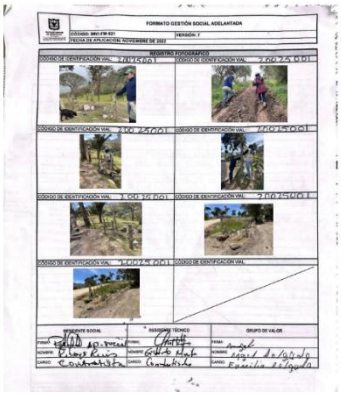
FORMATO GESTIÓN SOCIAL ADELANTADA

ENTREGA CERCADO 08/09/2023

ACTIVIDAD 4:

TEMA: RECORRIDO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA

OBJETIVO: Acompañar al equipo de obra en las actividades en el tramo Unión Tunales.

METODOLOGÍA: Realizar visitas y acompañamiento social a los frentes de obra, con el fin de atender las novedades de tipo social que se presenten, diligenciando los formatos establecidos



RECORRIDO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA 08/09/2023

ACTIVIDAD 5:
TEMA: RECORRIDO EQUIPO PROFESIONAL SOCIAL, INTERVENTORIA -UMV
OBJETIVO: Participar de un recorrido en el frente de obra Unión tunales
METODOLOGÍA: Se participa de un recorrido en el frente de obra Unión Tunales, con el componente social de las dos partes donde se verifican los trabajos que se han venido realizando por parte de la UMV frente al componente y con ello determinar avances y entrega oportuna de documentos.



EQUIPO PROFESIONAL SOCIAL, INTERVENTORIA - UMV TRAMO UNIÓN TUNALES 08/09/2023

ACTIVIDAD 6:

TEMA: COMITÉ # 3 INTERVENTORIA ECOVIAS SAS Y UAERMV – SEGUIMIENTO SEMANAL

TEMA: Comité de obra entre interventoría Ecovias SAS y UAERMV
OBJETIVO: verificación de avances y compromisos en obra
METODOLOGÍA: se reúnen las partes interesadas con el fin de verificar cada uno de los compromisos adquiridos en comités anteriores; de acuerdo con esto se verifican las solicitudes al equipo técnico donde se deja un plazo mayor para completar la información requerida.
Se verifican los avances de obra y cuáles son los segmentos viales aprobados para la instalación de material (fresado estabilizado).
Por otra parte, los demás componentes son presentados frente a sus pares; se determinarán cuáles van a ser los seguimientos en campo y cuál es la documentación recurrente para las diferentes actividades.





COMITÉ # 6 INTERVENTORIA ECOVIAS SAS Y UAERMV – SEGUIMIENTO SEMANAL 08/09/2023

REPORTE DE ACTIVIDADES COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO	NO. CPS- 451-2022
CONTRATISTA	**CHIRLEYS DANITZA FERREIRA LANDAETA**
CEDULA	1.116.791.123
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO Y LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN SOCIAL EN LAS INTERVENCIONES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020.
PLAZO DE EJECUCIÓN CONSULTORIA	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO	14 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR	JOSÉ FERNANDO FRANCO BUITRAGO
CEDULA	1.094.883.661
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ASTRID LORENA MORERA
CEDULA	1032366397

CONTRATO	NO. 447-2022
CONTRATISTA	**RUBYS DEL CARMEN RUIZ ARRIETA**
CEDULA	1005551124
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL ESTABLECIDAS EN EL DOCUMENTO PAGA, PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN SOCIAL EN LOS FRENTES DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020
PLAZO DE EJECUCIÓN CONSULTORIA	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO	10 DE NOVIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR	JOSÉ FERNANDO FRANCO BUITRAGO
CEDULA	1.094.883.661
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ASTRID LORENA MORERA
CEDULA	1032366397

Informe de las actividades realizadas en la semana del 11 al 15 de septiembre 2023 por parte del componente de Gestión Social.

11/09/2023: Se realizaron cinco (5) actividades.

- **ACTIVIDAD 1:**
  ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD.

TEMA: REUNIÓN EXTRAORDINARIA INTERNA.

OBJETIVO: Fortalecer las funciones y roles de los profesionales del Equipo de Atención a la Ciudadanía y Sostenibilidad del Proyecto Regalías.

METODOLOGÍA: Se participa de una reunión convocada por la gerencia, la cual tenía como finalidad fortalecer las funciones y roles de los profesionales del Equipo de Atención a la Ciudadanía y Sostenibilidad del Proyecto Regalías.


COMPROMISOS: Cumplir con los objetivos contractuales.

- **ACTIVIDAD 2:**
  CAPACITACIONES Y/O SENSIBILIZACIONES EXTERNAS.

TEMA: ACTIVIDADES SST EN LA OFICINA.

OBJETIVO: Participar de una sensibilización, charla y pausa activa con la profesional SST de SURA.

METODOLOGÍA: Se participa de una sensibilización, charla y pausa activa organizada por la profesional SST de SURA, en la cual se realizó estiramientos osteomusculares; con el fin de fortalecer la higiene de postura y disminuir el estrés laboral.

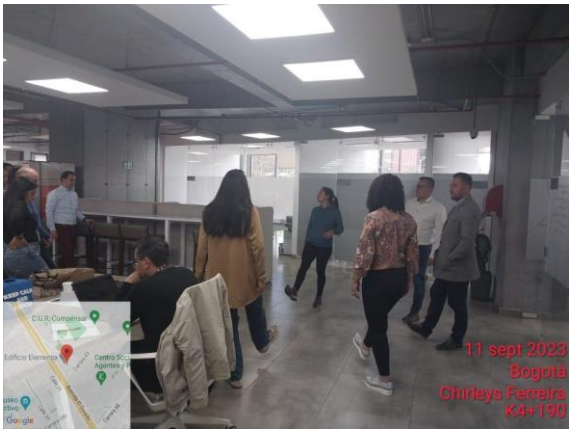




PAUSAS ACTIVAS. 11/09/2023

- **ACTIVIDAD 3:**

TEMA: MESA DE TRABAJO - COMPONENTE SOCIAL

OBJETIVO: Realizar el cronograma de las actividades que se llevaran a cabo durante la semana.

METODOLOGÍA: El componente social realizó una (1) mesa de trabajo con el fin de revisar el cronograma de actividades.



ACTA DE REUNIÓN

RAD_S
Radicado: RAD_S
Fecha: F_RAD_S
Pág. 1 de 2

CODIGO: GDOC-FM-016 | VERSION: 5
FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021

TEMA: MESA DE TRABAJO COMPONENTE SOCIAL

LUGAR: SUMAPAZ | FECHA: 11/09/2023 | HORA: 08:00 a.m. – 10:00 a.m.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), identificada con el NIT 900.173.257-7, y sujeta al régimen de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012, y en el Decreto 1074 de 2015, informa que los presentes datos personales suministrados serán recolectados y tratados por la Entidad en desarrollo de las funciones asignadas por el Estado y aquellas propias de la actividad misional, que estas son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rijan la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co.

Todos los datos resaltados en el presente formato el usuario está en la facultad de diligenciar voluntariamente la información requerida.

GÉNERO: Masculino (M), Femenino (F), Intersexual (I).

CONTROL DE ASISTENCIA

No	NOMBRE	Género M	Género F	Género I	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	CHIRLEYS FERREIRA		X		UMV	CONTRATISTA	Chirleys.ferrera@umv.gov.co	3193239837	
2	RUBYS RUIZ		X		UMV	CONTRATISTA	Rubys.ruiz@umv.gov.co	3226866208	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet DOGCITOH de la UAERMV

Calle 26 No 69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 2 – C.P. 111071
PBX: 3770505 – Información Línea 195
Bogotá: 3226866 – Atención al Ciudadano: Calle 220 No. 128A-48
www.umv.gov.co

GDOC-FM-016



ACTA DE REUNIÓN

RAD_S
Radicado: RAD_S
Fecha: F_RAD_S
Pág. 2 de 2

CODIGO: GDOC-FM-016 | VERSION: 5
FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

TEMA: MESA DE TRABAJO - COMPONENTE SOCIAL

OBJETIVO: Realizar el cronograma de las actividades que se llevaran a cabo durante la semana.

METODOLOGÍA: El componente social realizó una (1) mesa de trabajo con el fin de revisar el cronograma de actividades.

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Enviar cronogrma de actividades semanales a la coordinadora social	Chirleys Ferreira Rubys Ruiz Arrieta	
2			
3			

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet DOGCITOH de la UAERMV

Calle 26 No 69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 2 – C.P. 111071
PBX: 3770505 – Información Línea 195
Bogotá: 3226866 – Atención al Ciudadano: Calle 220 No. 128A-48
www.umv.gov.co

GDOC-FM-016


MESA DE TRABAJO - COMPONENTE SOCIAL 11/09/2023

- **ACTIVIDAD 4:**

TEMA: GESTIÓN ADELANTADA

OBJETIVO: Realizar gestión adelantada con la comunidad.

METODOLOGÍA: Se realiza un (1) recorrido en conjunto con el propietario Luis Rey Rey en el cual se verificaron las cercas perimetrales al predio, evidenciando que no se presenta ninguna afectación.

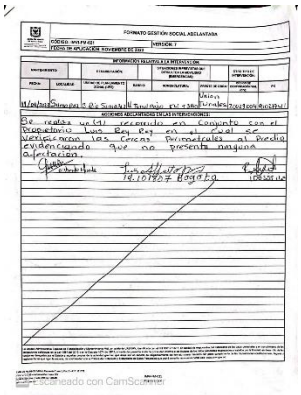

FORMATO GESTIÓN SOCIAL ADELANTADA

CODIGO: GDO-FM-021 | VERSION: 1
FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021

INFORMACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN


INSTRUMENTO	FUNCIONARIO			CONTRATISTA			FECHA APLICACIÓN
PEDIDO	USUARIO	DIRECCIÓN DE PEDIDO O PUNTO DE REFERENCIA	BARRIO	NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN DE APLICACIÓN	

ACCIONES ADELANTADAS EN LA INTERVENCIÓN

Se realiza visita recorrido en conjunto con el Propietario Luis Rey Rey en el cual se verificaron las cercas perimetrales al predio evidenciando que no presenta ninguna afectación.

Luis Rey Rey
18.101987 Bogotá

Escaneado con CamScanner

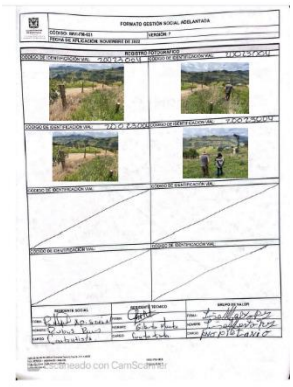

FORMATO GESTIÓN SOCIAL ADELANTADA

REGISTRO FOTOGRAFICO

Escaneado con CamScanner

GESTIÓN ADELANTADA 11/09/2023

- **ACTIVIDAD 5:**

TEMA: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA -TRAMO UNIÓN TUNALES.

OBJETIVO: Acompañar al equipo de obra en las actividades en el tramo Unión Tunales.

METODOLOGÍA: Se realiza una (1) visita y acompañamiento social a los frentes de obra, con el fin de atender las novedades de tipo social que se presenten.



ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA -TRAMO UNIÓN TUNALES. 11/09/2023

12/09/2023: Se realizaron cinco (5) actividades.

- **ACTIVIDAD 1:**
  ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD.

TEMA: TRABAJO ADMINISTRATIVO SEDE PRINCIPAL IJMV.

OBJETIVO: Realizar trabajo administrativo en la sede principal, con el fin de dar respuesta a los ORFEOS y correos.

METODOLOGÍA: Se realiza trabajo administrativo en la sede principal, con el fin de dar respuesta a los ORFEOS y correos.

- **ACTIVIDAD 2:**

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO


PROGRAMA DE CULTURA VIAL

TEMA: SENSIBILIZACION DE HORARIOS DE CIERRE EN EL FRENTE DE OBRA UNIÓN TUNALES.

OBJETIVO: Concientización de tiempos y movimientos en obra


METODOLOGÍA: Se realiza una sensibilización con la unidad ejecutora en la cual se contemplan diferentes temas acordes con los cierres viales en el frente de obra – unión tunales. De acuerdo con

los lineamientos planteados en las fichas PAGA y PMT se concientiza al trabajador, explicándole los horarios de cierre vial, el cual está comprendido diurno: de 9:00 am – 12:00m y 1:00 pm – 5:00 pm. Nocturno: de 05:00 pm – a 06:00am Este horario podrá cambiar debido a la intermitencia de llegada de materiales directos para la construcción de malla vial. De acuerdo con lo antes visto se determinan cuáles son las señales móviles implementadas en el plan de manejo de tráfico típico: Señales reglamentarias – Son las de color blanco con un aro de color rojo y que tienen por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito.



ACTA DE REUNIÓN

CONTROL DE ASISTENCIA

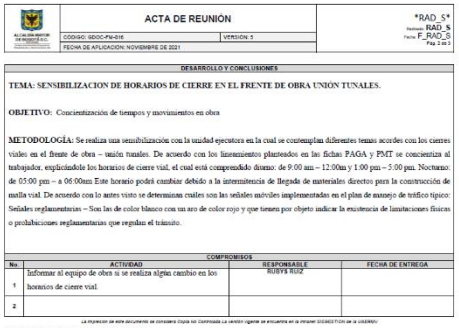

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

TEMA: SENSIBILIZACION DE HORARIOS DE CIERRE EN EL FRENTE DE OBRA UNION TUNALES.

OBJETIVO: Concientización de tiempos y movimientos en obra

METODOLOGÍA: Se realiza una sensibilización con la unidad ejecutora en la cual se contemplan diferentes temas acordes con los cierres viales en el frente de obra – unión tunales. De acuerdo con los lineamiento planteados en las fichas PAGA y PMT se concientiza al trabajador, explicándole los horarios de cierre vial, el cual está comprendido diurno: de 9:00 am – 12:00m y 1:00 pm – 5:00 pm. Nocturno: de 05:00 pm – a 06:00am Este horario podrá cambiar debido a la intermitencia de llegada de materiales directos para la construcción de malla vial. De acuerdo con lo antes visto se determinan cuáles son las señales móviles implementadas en el plan de manejo de tráfico típico: Señales reglamentarias – Son las de color blanco con un aro de color rojo y que tienen por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito.

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Informar al equipo de obra si se realiza algún cambio en los horarios de cierre vial.	RUBYS RUIZ	
2			

HORARIOS DE CIERRE DE VIA FRENTE DE OBRA UNIÓN TUNALES

12/09/2023

- **ACTIVIDAD 3:**

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO

TEMA: ADECUACIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN

OBJETIVO: Se realiza adecuación del punto fijo para atención a los usuarios

METODOLOGIA: Se realiza adecuación del punto de atención donde se coloca cartelera informativa provisional y se organiza espacio para ubicar formatos y la documentación idónea para brindar la atención a los usuarios.

Compromisos:

- Volante, cartelera de la entidad.



ADECUACIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN 12/09/2023


- **ACTIVIDAD 4:**

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO

TEMA: GESTIÓN ADELANTADA

OBJETIVO: Desarrollar una gestión adelantada con el fin de dar cierre a la donación de material producto de la excavación.

METODOLOGÍA: Se realiza una (1) visita en conjunto con el componente ambiental, con el fin de verificar cuales fueron las adecuaciones realizadas en el predio del señor Rafael torres. Se recibe a conformidad por parte del propietario dejando la trazabilidad del cierre y gestión.

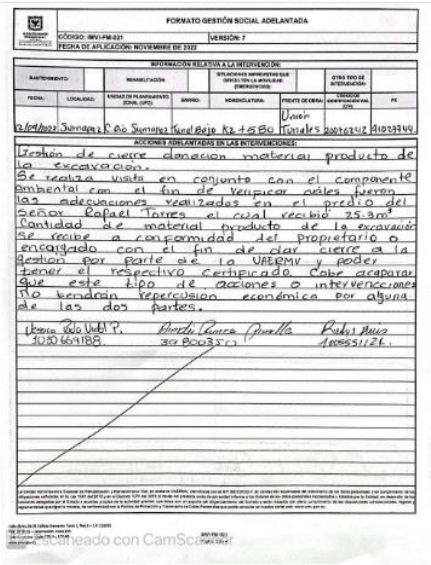
FORMATO GESTIÓN SOCIAL ADELANTADA

CÓDIGO: INVI-FM-021 VERSIÓN: 7

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2022

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:	REHABILITACIÓN:	RELACIONES INFRAESTRUCTURA (VÍAS) CON LA MOVILIDAD (PEATONES/OTRO):	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
12/09/2023	Tunales	R.Río Sumapaz		Troncal Bajo Kr 4 580	Usuario Tunales	20216742	210239749


ACCIONES ADELANTADAS EN LAS INTERVENCIONES:

Gestion de cierre donacion material producto de la excavacion.
Se realiza visita en conjunto con el componente ambiental con el fin de verificar cuales fueron las adecuaciones realizadas en el predio del señor Rafael Torres el cual recibio 25.3m³ Cantidad de material producto de la excavación se recibe a conformidad del propietario o encargado con el fin de dar cierre a la gestion por parte de la UAERMV y poder tener el reservtivo Certificado. Cabe aclarar que este tipo de acciones o intervenciones no tendrán repercusion económica por alguna de las dos partes.

Usaquén Bolívar Tunjuelito Rafael Uribe Uribe Ciudad Bolívar
Suba Kennedy Fontibón Antonio Nariño Puente Aranda
La Candelaria Rafael Uribe Uribe Barrios Unidos Teusaquillo
Los Mártires Santa Fe Chapinero Usme

Nombre: Rafael Torres
Cargo: Contratista
Nombre: Yenny Paola Ruiz Mora
Cargo: Contratista
Nombre: Yenny Paola Ruiz Mora
Cargo: Contratista

Escaneado con CamScanner

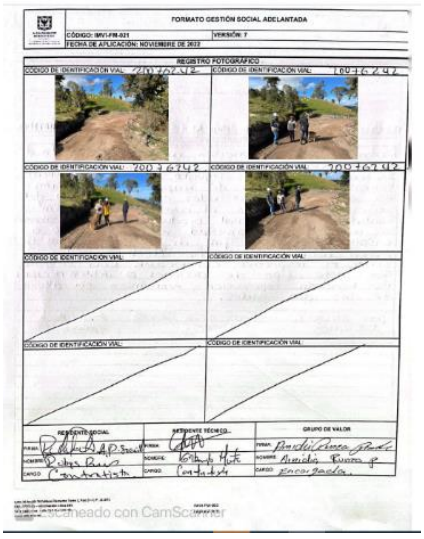
FORMATO GESTIÓN SOCIAL ADELANTADA

CÓDIGO: INVI-FM-021 VERSIÓN: 7

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL: 20216742

RESIDENTE SOCIAL: RESIDENTE TÉCNICO: GRUPO DE VALOR

Escaneado con CamScanner

GESTIÓN ADELANTADA UNIÓN TUNALES 12/09/2023

- **ACTIVIDAD 5:**

TEMA: CONTACTO CON LOS PRESIDENTES DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TUNAL BAJO Y TUNAL ALTO. (VEREDA UNIÓN TUNALES)

OBJETIVO: Informar a la comunidad sobre las diferentes actividades de la malla vial

METODOLOGÍA: Se Mantiene contacto con los lideres comunitarios de Unión Tunales con el fin de gestionar los escenarios de participación requeridos durante la ejecución de la obra e informar a la comunidad de cada una de las actividades que se estarán desarrollando en el frente de obra.



CONTACTO CON LOS PRESIDENTES DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TUNAL BAJO Y TUNAL ALTO. (VEREDA UNIÓN TUNALES) 12/09/2023

13/09/2023: Se realizaron cinco (5) actividades.

- **ACTIVIDAD 1:**
  ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD.

TEMA: TRABAJO ADMINISTRATIVO SEDE PRINCIPAL IJMV.

OBJETIVO: Realizar trabajo administrativo en la sede principal, con el fin de dar respuesta a los ORFEOS y correos.

METODOLOGÍA: Se da continuidad con el trabajo administrativo en la sede principal, con el fin de dar respuesta y cierre a los ORFEOS.

- **ACTIVIDAD 2:**
- **MEDIDA DE MANEJO 4: PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA. PGS-6.4-22.**


TEMA: COMITÉ COMPONENTE SOCIAL UAERMV E INTERVENTORIA.

OBJETIVO: Participar de un (1) comité del componente social UAERMV e Interventoría, con el fin de revisar los compromisos y avances.

METODOLOGÍA: Se participa del primer comité social entre la Interventoría y la UAERMV, donde se realizó la revisión de los compromisos y avances.

COMPROMISOS:

- Entregar el plan de gestión social
- Entregar punto de atención

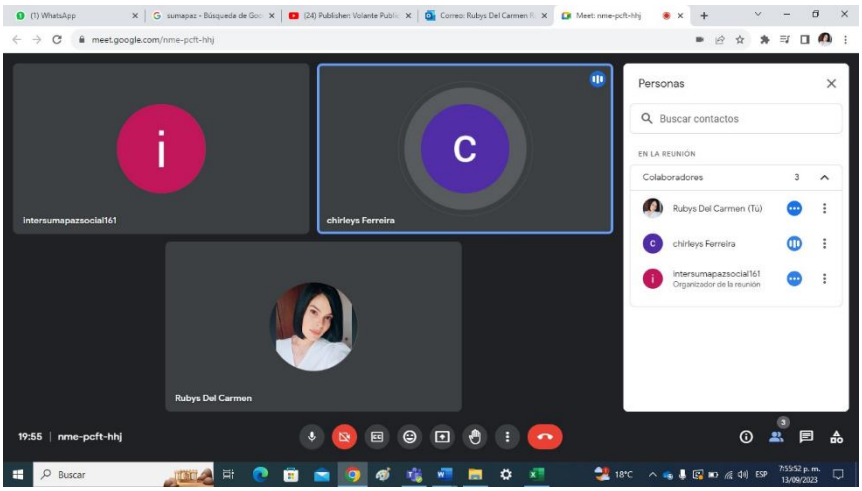

COMITÉ COMPONENTE SOCIAL UAERMV E INTERVENTORIA. 13/09/2023


- **ACTIVIDAD 3:**

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO

TEMA: GESTIÓN ADELANTADA CIERRE DE DONACIÓN RCD

OBJETIVO: Desarrollar una gestión adelantada con el fin de dar cierre a la donación de material producto de la excavación.

METODOLOGÍA: Se realiza una (1) visita en conjunto con el componente ambiental, con el fin de verificar cuales fueron las adecuaciones realizadas en el predio de la señora Edilma Melo. Se recibe a conformidad por parte de la propietaria dejando la trazabilidad del cierre y gestión.

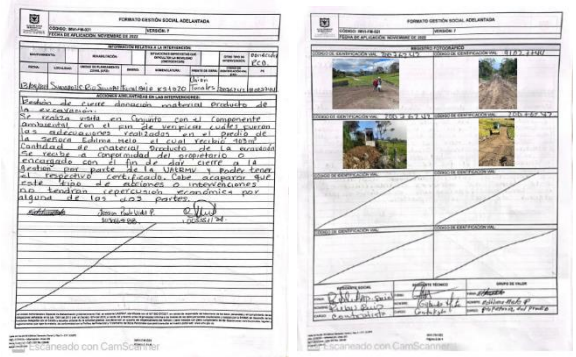

GESTIÓN ADELANTADA CIERRE DE DONACIÓN RCD 13/09/2023

- **ACTIVIDAD 4:**

TEMA: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA -TRAMO UNIÓN TUNALES.

OBJETIVO: Acompañar al equipo de obra en las actividades en el tramo Unión Tunales.

METODOLOGÍA: Se realiza una (1) visita y acompañamiento social a los frentes de obra, con el fin de atender las novedades de tipo social que se presenten.




ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA -TRAMO UNIÓN TUNALES.13/09/2023

- **ACTIVIDAD 5:**

TEMA: VOLANTE DE OBRA (UNIÓN TUNALES)

OBJETIVO: Solicitar la información pertinente con el fin de generar un producto social e informativo para la comunidad.

METODOLOGÍA: La profesional social recopila información por parte del componente técnico sobre las actividades a desarrollar en el frente de obra implantando horarios para no interferir en las necesidades de la unidad ejecutora UAERMV y la población.

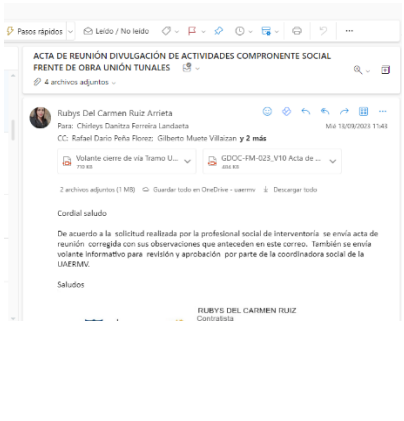





VOLANTE DE OBRA (UNIÓN TUNALES).13/09/2023

14/09/2023: Se realizaron cinco (5) actividades.

- **ACTIVIDAD 1:**
  MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19.

TEMA: RECORRIDO DE OBRA UAERMV E INTERVENTORIA.

OBJETIVO: Participar de un recorrido en el frente de obra Unión Tunales.

METODOLOGÍA: Se participa de un recorrido en el frente de obra Unión Tunales, con el componente social de las dos partes donde se verifican los trabajos que se han venido realizando por parte de la UMV frente al componente y con ello determinar avances y entrega oportuna de documentos.

COMPROMISOS:

- Entregar el plan de gestión social
- Revisión y aprobación de las actas de mesas de trabajos del mes de agosto y actas de comités social 1 y 2
- Entregar punto de atención





RECORRIDO DE OBRA. 14/09/2023

- **ACTIVIDAD 2:**
  MEDIDA DE MANEJO 4: PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA. PGS-6.4-22.

TEMA: COMITÉ CON INTERVENTORIA.







COMITÉ CON INTERVENTORIA. 14/09/2023

- **ACTIVIDAD 3:**
  MEDIDA DE MANEJO 2: EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO. PGS-6.2-20.

TEMA: SENSIBILIZACIÓN A LOS CONDUCTORES DE VOLQUETAS

OBJETIVO: Asistir y participar activamente de una sensibilización sobre seguridad organizada por el componente SST de UMV y SINTRAUNIOBRAS.

METODOLOGÍA: Se asiste y se participa de una sensibilización sobre la seguridad vial a los conductores de las volquetas donde se les socializa las normas de seguridad básica que deben tener

al momento de realizar sus actividades también se fortalece el tema de señales de tránsito, reductores de velocidad y la velocidad máxima en las que pueden conducir en el casco urbano y la zona rural**.** El componente social hace su intervención donde se sensibiliza sobre el contexto social, cultural que se presenta en la región y resalta la importancia del cuidado con niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y población vulnerable y población con capacidades diversas; para el uso adecuado de las vías**.** Se divulgan los puntos de atención a los usuarios y se les abre un espacio de autocuidado del trabajador con el fin de disminuir el estrés, de mejorar su calidad de vida y de bienestar promocionando los hábitos de higiene de salud mental en los trabajadores, se les brinda información sobre los diferentes canales de comunicación que se encuentran en obra.





SENSIBILIZACIÓN A LOS CONDUCTORES DE VOLQUETAS. 14/09/2023

- **ACTIVIDAD 4:**
  MEDIDA DE MANEJO 4: PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA. PGS-6.4-22.

TEMA: DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CIEERES VIALES

OBJETIVO: Concientizar a la comunidad frente a los horarios de los cierres viales en el frente de obra Unión Tunales.

METODOLOGÍA: Se desarrolla una actividad de gestión social abarcando la población directa e indirecta del tramo Unión Tunales; realizando la entrega de volantes los cuales contienen información pertinente sobre el tipo de intervención que se va a realizar en jornada diurno: Instalación de MBR (fresado estabilizado con emulsión asfáltica y cemento gris) y en horarios nocturnos (imprimación de calzada con emulsión de rompimiento lento) se les indica que esta actividad se estará realizando en el predio del señor Rafel torres, de horarios de cierres diurnos de 09:00 am a 12:00m y de 01:00 pm a 05:00pm Con pasos vehiculares intermitente y horario nocturno

de 05:00pm a 06:00 am cierre total de vía de acuerdo con la programación de obra y priorización en caso de emergencia.









SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE VOLANTES A LA COMUNIDAD. 14/09/2023















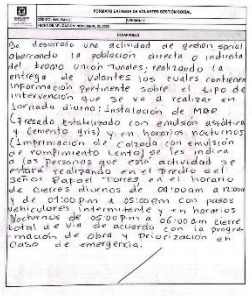




DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CIEERES VIALES 14/09/2023


- **ACTIVIDAD 5:**

TEMA: SENSIBILIZACIÓN FUNCIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA

OBJETIVO: Se participa de una socialización realizada por la firma interventora, con el fin de dar a conocer sus funciones a los trabajadores del contrato sindical de la UAERMV en el frente de obra de Capitolio y Unión Tunales.

METODOLOGÍA: Se participa de una socialización realizada por la firma interventora, con el fin realizar la presentación de cada uno de sus componentes (SST, residentes técnicos, directora de obra, ingeniero de topografía, pro) exponer cada uno sus funciones y responder dudas e inquietudes





SENSIBILIZACIÓN FUNCIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA 14/09/2023

15/09/2023: Se realizaron dos (2) actividades.

- **ACTIVIDAD 1:**
  ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD.

TEMA: TRABAJO ADMINISTRATIVO SEDE PRINCIPAL IJMV.

OBJETIVO: Realizar trabajo administrativo en la sede principal, con el fin de dar respuesta a los ORFEOS y correos.

METODOLOGÍA: Se realiza trabajo administrativo en la sede principal, con el fin de dar respuesta a los ORFEOS y correos.

- **ACTIVIDAD 2:**

TEMA: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA -TRAMO UNIÓN TUNALES.

OBJETIVO: Acompañar al equipo de obra en las actividades en el tramo Unión Tunales.

METODOLOGÍA: Se realiza una (1) visita y acompañamiento social a los frentes de obra, con el fin de atender las novedades de tipo social que se presenten.


ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA -TRAMO UNIÓN TUNALES. 15/09/2023

REPORTE DE ACTIVIDADES COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL TRAMO CAPITOLIO

CONTRATO	NO. CPS- 451-2022
CONTRATISTA	**CHIRLEYS DANITZA FERREIRA LANDAETA**
CEDULA	1.116.791.123
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO Y LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN SOCIAL EN LAS INTERVENCIONES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020.
PLAZO DE EJECUCIÓN CONSULTORIA	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO	14 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR	JOSÉ FERNANDO FRANCO BUITRAGO
CEDULA	1.094.883.661
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ASTRID LORENA MORERA
CEDULA	1032366397

Informe de las actividades realizadas en la semana del 18 al 23 de septiembre 2023 por parte del componente de Gestión Social.

18/09/2023: Se realizó una (1) actividad.

- **ACTIVIDAD 1:**
  ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD.

TEMA: TRABAJO ADMINISTRATIVO SEDE PRINCIPAL IJMV.

OBJETIVO: Realizar trabajo administrativo en la sede principal, con el fin de dar respuesta a los ORFEOS y correos.

METODOLOGÍA: Se da continuidad con el trabajo administrativo en la sede principal, con el fin de dar respuesta y cierre a los ORFEOS.

19/09/2023: Se realizaron dos (2) actividades.

- **ACTIVIDAD 1:**
  MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19

TEMA: RECORRIDO DE OBRA TRAMO CAPITOLIO.

OBJETIVO: Acompañar un (1) recorrido de obra con los trabajadores de obra y el residente técnico.

METODOLOGÍA: Se hace acompañamiento de un (1) recorrido de obra en el tramo Capitolio, con el apoyo del componente ambiental, con el fin de realizar reconocimiento del terreno y avances de la obra.





RECORRIDO DE OBRA. 19/09/2023

- **ACTIVIDAD 2:**
  MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19

TEMA: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA TRAMO CAPITOLIO.

OBJETIVO: Acompañar al equipo de obra en las actividades en el tramo Capitolio.

METODOLOGÍA: Se realiza un (1) acompañamiento en obra, con el fin de verificar actividades sociales en el tramo Capitolio, aclarar dudas frente a los procesos y atender a la comunidad.

20/09/2023: Se realizaron cuatro (4) actividades.

- **ACTIVIDAD 1:**
  MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19

TEMA: RECORRIDO DE OBRA.

OBJETIVO: Acompañar un (1) recorrido de obra con los trabajadores de obra y el residente técnico.

METODOLOGÍA: Se hace acompañamiento de un (1) recorrido de obra en el tramo Capitolio, con el componente ambiental, los trabajadores de obra y el residente técnico, con el fin de realizar reconocimiento del terreno y avances de la obra.







RECORRIDO DE OBRA. 20/09/2023

- **ACTIVIDAD 2:**
  MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19

TEMA: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA.

OBJETIVO: Acompañar al equipo de obra en las actividades en el tramo Capitolio.

METODOLOGÍA: Se realiza un (1) acompañamiento en obra, con el fin de verificar actividades sociales en el tramo Capitolio, aclarar dudas frente a los procesos y atender a la comunidad.





ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA. 20/09/2023

- **ACTIVIDAD 3:**
  MEDIDA DE MANEJO 4: PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA. PGS-6.4-22

TEMA: GESTORÍA SOCIAL.

OBJETIVO: Realizar acompañamiento en la comunidad y el diligenciamiento desde gestoría social.

METODOLOGÍA: Se realiza un acompañamiento a la comunidad, donde el presidente de la Junta de Acción Comunal del tramo Capitolio solicita una reunión con representantes de SINDICATO y UAERMV, para aclarar dudas frente a la contratación del personal y las hojas de vida de las personas que no fueron contratadas, también para conocer el estado financiero del proyecto y los avances de obra, para esta reunión el presidente de la JAC se comprometió a enviar la fecha, la hora y el lugar para llevar a cabo dicha reunión.

COMPROMISOS: Gestionar espacio para reunión con representantes de SINDICATO y UAERMV.

- **ACTIVIDAD 4:**
  MEDIDA DE MANEJO 4: PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA. PGS-6.4-22.

TEMA: ACTAS DE COMPROMISO.

OBJETIVO: Solicitar permiso para colocar cartelera informativa del proyecto en la institución educativa.

METODOLOGÍA: Se solicita permiso a la docente de la Institución Educativa para colocar una cartelera informativa con información de las actividades del proyecto como horario de cierre de vías, reuniones, etc. dirigidas a la comunidad.





ACTAS DE COMPROMISO. 20/09/2023

21/09/2023: Se realizaron tres (3) actividades.

- **ACTIVIDAD 1:**
  MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19

TEMA: RECORRIDO DE OBRA.

OBJETIVO: Acompañar un (1) recorrido de obra con los trabajadores de obra y el residente técnico.

METODOLOGÍA: Se hace acompañamiento de un (1) recorrido de obra en el tramo Capitolio, con el componente ambiental, los trabajadores de obra y el residente técnico, con el fin de realizar reconocimiento del terreno y avances de la obra.







RECORRIDO DE OBRA. 21/09/2023.

- **ACTIVIDAD 2:**
  MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19

TEMA: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA - CAPITOLIO.

OBJETIVO: Acompañar al equipo de obra en las actividades en el tramo Capitolio.

METODOLOGÍA: Se realiza un (1) acompañamiento en obra, con el fin de verificar actividades sociales en el tramo Capitolio, aclarar dudas frente a los procesos y atender a la comunidad.



ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA. 21/09/2023

- **ACTIVIDAD 3:**
  MEDIDA DE MANEJO 4: PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA. PGS-6.4-22

TEMA: ACTAS DE COMPROMISO.

OBJETIVO: Realizar actas de compromiso para permiso de predios para puntos de acopio de material de excavación, materiales de construcción y carpa.

METODOLOGÍA: Se realizan cuatro (4) actas de compromiso para permiso de predios los cuales serán utilizados como puntos de acopio de material de excavación, materiales de construcción e instalación de carpa.





ACTAS DE COMPROMISO. 21/09/2023

22/09/2023: Se realizaron cuatro (4) actividades.

- **ACTIVIDAD 1:**
  MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19

TEMA: RECORRIDO DE OBRA TRAMO CAPITOLIO

OBJETIVO: Acompañar un (1) recorrido de obra con los trabajadores de obra y el residente técnico.

METODOLOGÍA: Se hace acompañamiento de un (1) recorrido de obra en el tramo Capitolio, con el componente ambiental, los trabajadores de obra y el residente técnico, con el fin de realizar reconocimiento del terreno y avances de la obra.

- **ACTIVIDAD 2:**
  MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19

TEMA: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA TRAMO CAPITOLIO.

OBJETIVO: Acompañar al equipo de obra en las actividades en el tramo Capitolio.

METODOLOGÍA: Se realiza un (1) acompañamiento en obra, con el fin de verificar actividades sociales en el tramo Capitolio, aclarar dudas frente a los procesos y atender a la comunidad.

- **ACTIVIDAD 3:**
  MEDIDA DE MANEJO 4: PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA. PGS-6.4-22.

TEMA: MESA DE TRABAJO EQUIPO PROFESIONALES SOCIALES DE LA INTERVENTORIA Y LA UAERMV.

OBJETIVO: Se participa de una (1) mesa de trabajo entre las profesionales sociales de la Interventoría y la UAERMV.

METODOLOGÍA: Se participa de una (1) mesa de trabajo entre las profesionales sociales de la interventoría y la UAERMV, con el fin de revisar los documentos, formatos, actividades que se han ejecutado en cada tramo, los avances y dejar los compromisos plasmados.

COMPROMISOS: Entregar los formatos de gestión social, realizar las tres (3) actas de vecindad y las dos (2) actas de donación de RCD.



MESA DE TRABAJO EQUIPO PROFESIONALES SOCIALES DE LA INTERVENTORIA Y LA UAERMV. 22/09/2023

- **ACTIVIDAD 4:**
  MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19

TEMA: RECORRIDO DE OBRA CON INTERVENTORIA.

OBJETIVO: Participar de un (1) recorrido de obra organizado por la interventoría.

METODOLOGÍA: Se participa de un (1) recorrido de obra organizado por la interventoría, donde asiste la Contraloría, interventoría, Fondo de Desarrollo Rural FDR, representante de la UAERMV y el equipo de obra, con el fin de verificar los avances de obra en el tramo Unión Tunales y Capitolio.

COMPROMISOS: Seguir participando activamente de los recorridos de obra.



RECORRIDO DE OBRA CON INTERVENTORIA. 22/09/2023

23/09/2023: Se realizaron dos (2) actividades.


- **ACTIVIDAD 1:**
  MEDIDA DE MANEJO 4: PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA. PGS-6.4-22.

TEMA: COMITÉ INTERVENTORIA.

OBJETIVO: Participar de un (1) comité de seguimiento semanal organizado por la Interventoría.

METODOLOGÍA: Se participa de un (1) comité de seguimiento semanal organizado por la Interventoría, en el cual hacen referencia a temas de obra, los compromisos de cada componente y los avances de ejecución de obra.

COMPROMISOS: Entregar los formatos respectivamente diligenciados de gestión social del tramo Capitolio, realizar las tres (3) actas de vecindad y las dos (2) actas de donación de RCD del tramo Capitolio.

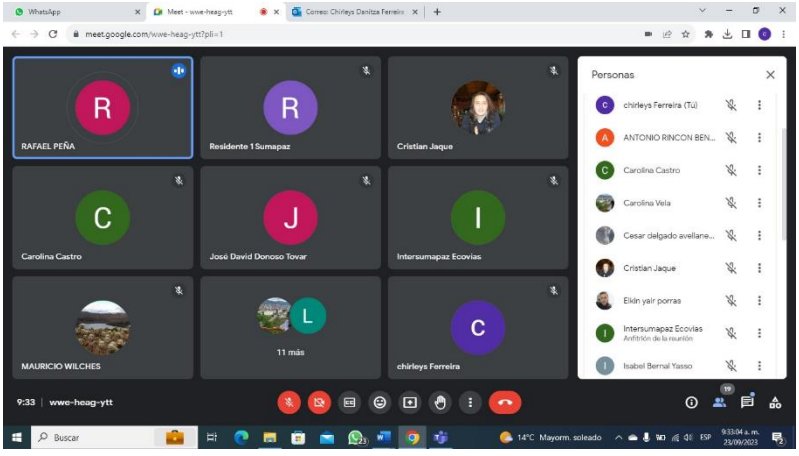

COMITÉ INTERVENTORIA. 23/09/2023

- **ACTIVIDAD 2:**
  INFORMES Y SEGUIMIENTO.

TEMA: INFORME SEMANAL Y PLANEACIÓN

OBJETIVO: Realizar y entregar informe de la semana del 18 al 23 de septiembre de 2023 y la programación de la semana del 25 al 29 de septiembre de 2023.

METODOLOGÍA: Se realiza informe de la semana del 18 al 23 de septiembre de 2023 y se diseña la programación de la semana del 25 al 29 de septiembre de 2023, con el fin de organizar las actividades en cada tramo.

COMPROMISOS: Enviar el informe semanal y la programación a la entidad y la interventoría.

REPORTE DE ACTIVIDADES COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL TRAMO UNIÓN TUNALES

CONTRATO	NO. 447-2022
CONTRATISTA	**RUBYS DEL CARMEN RUIZ ARRIETA**
CEDULA	1005551124
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL ESTABLECIDAS EN EL DOCUMENTO PAGA, PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN SOCIAL EN LOS FRENTES DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020
PLAZO DE EJECUCIÓN CONSULTORIA	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO	10 DE NOVIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR	JOSÉ FERNANDO FRANCO BUITRAGO
CEDULA	1.094.883.661
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ASTRID LORENA MORERA
CEDULA	1032366397

Informe de las actividades realizadas en la semana del 18 de septiembre hasta el 22 de septiembre 2023 por parte del componente de Gestión Social.

18/09/2023: Se realizaron (3) actividades

18/09/2023 ACTIVIDAD 1:

TEMA: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA -TRAMO UNIÓN TUNALES.

OBJETIVO: Acompañar al equipo de obra en las actividades en el tramo Unión Tunales.

METODOLOGÍA: Se realiza una (1) visita y acompañamiento social a los frentes de obra, con el fin de atender las novedades de tipo social que se presenten.




ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA -TRAMO UNIÓN TUNALES18/09/2023

- **18/09/2023 ACTIVIDAD: 2**

TEMA: DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CIEERES VIALES

OBJETIVO: Concientizar a la comunidad frente a los horarios de los cierres viales en el frente de obra Unión Tunales.

METODOLOGÍA: Se desarrolla una actividad de gestión social abarcando la población directa e indirecta del tramo Unión Tunales; realizando la entrega de un volante físico y un volante virtual los cuales contienen información pertinente sobre el tipo de intervención que se va a realizar en jornada diurno: Instalación de MBR (fresado estabilizado con emulsión asfáltica y cemento gris) y en horarios nocturnos (imprimación de calzada con emulsión de rompimiento lento) se les indica que esta actividad se estará realizando en el predio del señor Rafel torres, de horarios de cierres diurnos de 09:00 am a 12:00m y de 01:00 pm a 05:00pm Con pasos vehiculares intermitente y horario nocturno de 05:00pm a 06:00 am cierre total de vía de acuerdo con la programación de obra y priorización en caso de emergencia.

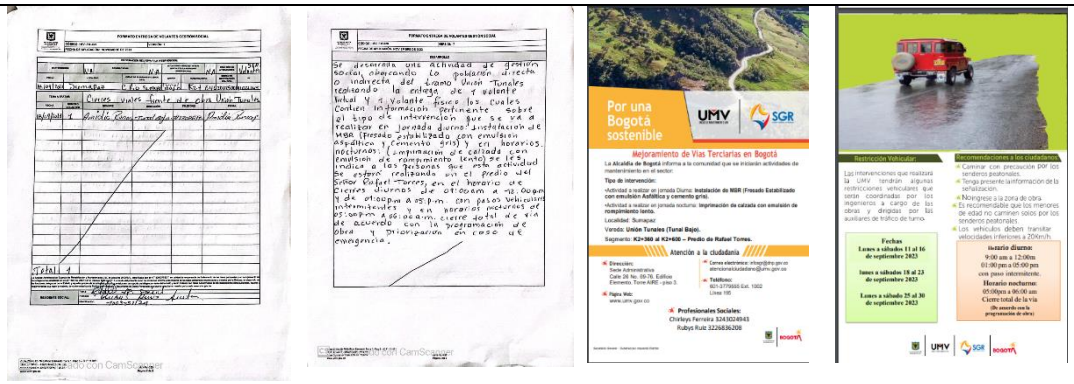

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CIEERES VIALES 18/09/2023

- **19/09/2023 Se realizaron (3) actividades**

ACTIVIDAD: 1

TEMA: CONTACTO CON La PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TUNAL BAJO. (VEREDA UNIÓN TUNALES)

OBJETIVO: Establecer programación de la reunión del comité veedor

METODOLOGIA: Se realiza contacto en compañía de la profesional social de interventoría y con la presidente de la junta de acción comunal Tunal bajo Arnidia Runza con el fin de establecer programación de la reunión del comité veedor, la señora Arnidia Runza manifiesta que el sábado 23 de septiembre con la comunidad realizaran una asamblea el cual establecerá una fecha, se compromete a informar con tiempo a la entidad ejecutora UMV y a la interventoría con el fin de realizar programación.



CONTACTO CON LOS PRESIDENTES DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TUNAL BAJO Y TUNAL ALTO. (VEREDA UNIÓN TUNALES) 19/09/2023


- **19/09/2023 ACTIVIDAD: 2**

TEMA. RECORRIDO FRENTE DE OBRA UNIÓN TUNALES

OBJETIVO: Realizar un recorrido con la profesional social de interventoría en el frente de obra unión Tunales con el fin de organizar documentación**.**

METODOLOGIA:

1. Revisión de actas de vecindad 12 actas, las cuales presentan observaciones. La profesional social de interventoría solicita a la profesional Rubys Ruiz subsanar observaciones y se genera compromiso por parte de la profesional social de la UMV entregar nuevamente estas, para revisión el viernes 22 de septiembre de 2023.
2. Revisión de actas de compromiso 6 actas de capitolio 11 actas de compromiso de Unión Tunales, la profesional social de interventoría realiza observaciones, solicita subsanar y hacer entrega de nuevo para revisión por parte de interventoría.
3. Revisión actas de gestión adelantadas por parte de la profesional social de interventoría (6 actas) realiza observaciones (subsanar)
4. La interventoría realiza revisión del formato entrega de volantes Gestión Social, evidencia que se entregaron 8 volantes físicos y uno virtual a través del grupo informativo donde se encuentran los presidentes de la junta de acción comunal.

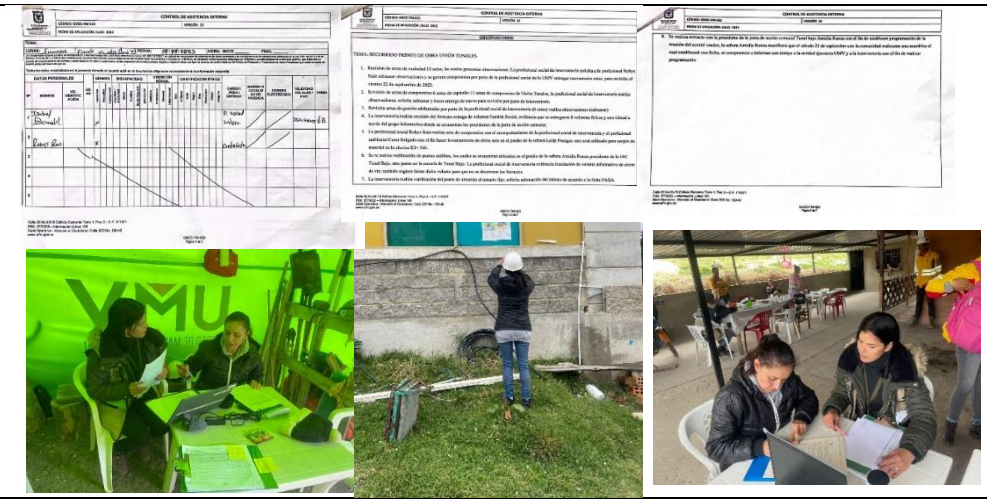

RECORRIDO FRENTE DE OBRA UNIÓN TUNALES 19/09/2023

- **19/09/2023 ACTIVIDAD: 3**

  TEMA: ACTA DE COMPROMISO PUNTO DE ACOPIO PARA MATERIAL.

  OBJETIVO: Realizar acta de compromiso en el tramo Unión Tunales con el fin de concretar punto de acopio para material.

  METODOLOGÍA: La profesional social Rubys Ruiz realiza un acta de compromiso con el acompañamiento de la profesional social de interventoría y el profesional ambiental Cesar Delgado con el fin hacer levantamiento de dicha acta en el predio de la señora Leidy Penagos este será utilizado para acopio de material en la abscisa K3+ 260.



ACTA DE COMPROMISO PUNTO DE ACOPIO PARA MATERIAL. -TRAMO UNIÓN TUNALES19/09/2023

20/09/2023: Se realizaron (2) actividades

- **ACTIVIDAD: 1**

TEMA: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA -TRAMO UNIÓN TUNALES.

OBJETIVO: Acompañar al equipo de obra en las actividades en el tramo Unión Tunales.

METODOLOGÍA: Se realiza una (1) visita y acompañamiento social a los frentes de obra, con el fin de atender las novedades de tipo social que se presenten.



ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA -TRAMO UNIÓN TUNALES. 20/09/2023

20/09/2023 ACTIVIDAD: 2

TEMA: UBICACIÓN ESTRATEGICA PARA LA INSTACIÓN DE PASACALLES INOFORMATIVOS

OBJETIVO: Realizar una ubicación estratégica para brindar información sobre las obras ejecutadas en los diferentes frentes de obra.

METODOLOGÍA: Se efectúa un recorrido con el fin de ubicar puntos para la instalación de pasacalles informativos y con ello levantar un sondeo en el cual la población recibirá de forma asertiva donde se están ejecutando obras de la UAERMV.



UBICACIÓN ESTRATEGICA PARA LA INSTACIÓN DE PASACALLES INOFORMATIVOS 20/09/2023

21/09/2023 Se realizaron (4) actividades


ACTIVIDAD: 1

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO

TEMA: ADECUACIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN

OBJETIVO: Se realiza adecuación del punto fijo para atención a los usuarios

METODOLOGIA: Se realiza adecuación del punto de atención donde se coloca volante informativo, documento de PMT y se organiza espacio para ubicar formatos y la documentación idónea para brindar la atención a los usuarios.

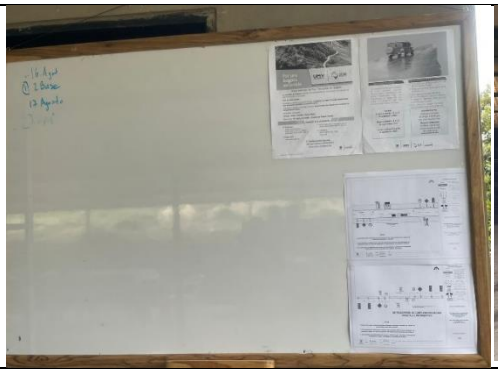



ADECUACIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN 21/09/2023

21/09/2023 ACTIVIDAD: 2

TEMA: ACTA DE COMPROMISO PARA INSTALACIÓN DE POSTE DE MADERA.

OBJETIVO: Revisar los puntos adecuados para el anclaje estructural de los pasacalles informativos.

METODOLOGIA: Se realiza una vivista en el predio de la señora Luz Fabiola en compañía de los componentes socio- ambiental con el fin de verificar impactos relevantes sobre el terreno que se va a utilizar para la instalación de los pasacalles informativos y solicitar permisos para la ubicación de estos.

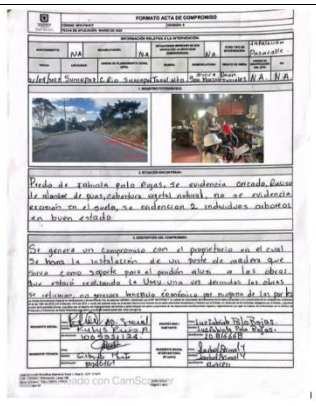
FORMATO ACTA DE COMPROMISO


ACTA DE COMPROMISO PARA INSTALACIÓN DE POSTE DE MADERA 21/09/2023

21/09/2023 ACTIVIDAD: 3


TEMA: RECORRIDO A LOS PUNTOS DONDE SE UBICARÁN LOS PASACALLES INFORMATIVOS.

OBJETIVO: Revisar los puntos adecuados para el anclaje estructural de los pasacalles informativos.

METODOLOGIA: Se realiza recorrido en compañía de los componentes socio- ambiental con el fin de verificar impactos relevantes sobre el terreno que se va a utilizar para la instalación de los pasacalles informativos, en cuanto a esto cabe aclarar que el diagnostico del profesional ambiental indicó que no se presentarán afectaciones a la biodiversidad en este punto.

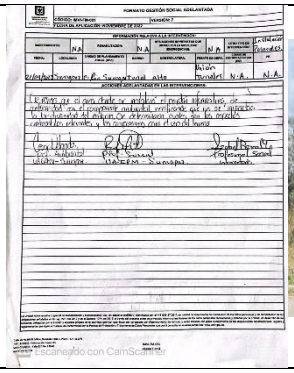



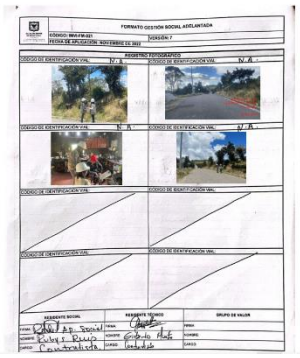

RECORRIDO A LOS PUNTOS DONDE SE UBICARÁN LOS PASACALLES INFORMATIVOS.21/09/2023

21/09/2023 ACTIVIDAD: 4

TEMA: RECORRIDO A LOS PUNTOS DONDE SE UBICARÁN LOS PASACALLES INFORMATIVOS.

OBJETIVO: Revisar los puntos adecuados para el anclaje estructural de los pasacalles informativos.

METODOLOGIA: Se realiza recorrido en compañía de los componentes socio- ambiental con el fin de verificar impactos relevantes sobre el terreno que se va a utilizar para la instalación de los pasacalles informativos, en cuanto a esto cabe aclarar que el diagnóstico del profesional ambiental indicó que no se presentarán afectaciones a la biodiversidad en este punto.



RECORRIDO A LOS PUNTOS DONDE SE UBICARÁN LOS PASACALLES INFORMATIVOS.21/09/2023


22/09/2023 Se realizaron (3) actividades

22/09/2023 ACTIVIDAD: 1

TEMA: ACTA DE COMPROMISO PARA INSTALACIÓN DE POSTE DE MADERA.

OBJETIVO: Revisar los puntos adecuados para el anclaje estructural de los pasacalles informativos.

METODOLOGIA: Se realizan 2 visitas y actas de compromisos en diferentes predios (María Lilia y el señor Luis Molina) en compañía de los componentes socio- ambiental con el fin de verificar impactos relevantes sobre el terreno que se va a utilizar para la instalación de los pasacalles informativos y solicitar permisos para la ubicación de estos.

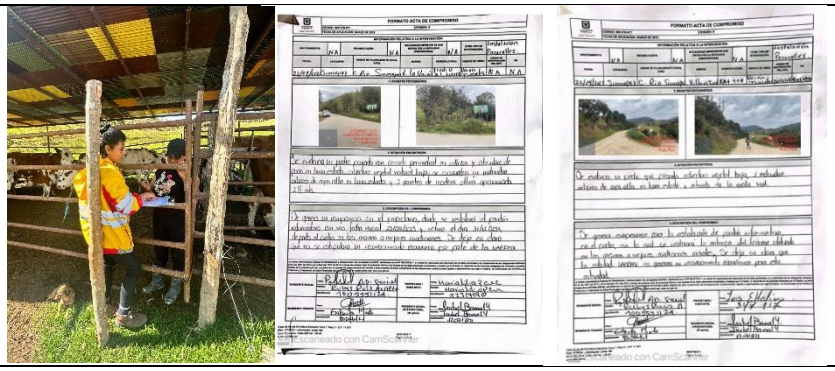

ACTA DE COMPROMISO PARA INSTALACIÓN DE POSTE DE MADERA 22/09/2023

22/09/2023 ACTIVIDAD 2:

TEMA: MESA DE TRABAJO EQUIPO PROFESIONAL SOCIAL, INTERVENTORIA -UMV

OBJETIVO: Participar de un recorrido en el frente de obra Unión tunales

METODOLOGÍA: Se participa de un recorrido en el frente de obra Unión Tunales, con el componente social de las dos partes donde se verifican los trabajos que se han venido realizando por parte de la UMV frente al componente y con ello determinar avances y entrega oportuna de documentos.

COMPROMISO: Enumerar actas de vecindad (frente de obra Unión Tunales)



MESA DE TRABAJO EQUIPO PROFESIONAL SOCIAL, INTERVENTORIA -UMV 22/09/2023

22/09/2023 ACTIVIDAD 3:

TEMA: RECORRIDO EQUIPO UAERMV, CONTRALORIA, INTERVENTORIA Y CONTROL INTERNO DE LA UAERMV.

OBJETIVO: Participar de un recorrido en el frente de obra Unión tunales

METODOLOGÍA: Se participa de un recorrido en el frente de obra Unión Tunales, con el fin de verificar los avances que ha tenido la obra.



RECORRIDO EQUIPO UAERMV, CONTRALORIA, INTERVENTORIA Y CONTROL INTERNO DE LA UAERMV. 22/09/2023

TRAMO CAPITOLIO

Profesional social: Chirleys Danitza Ferreira Landaeta - Residente Social

Lunes 25 de septiembre de 2023

Actividad 1: MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19.

Tema: LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD.
Objetivo: Realizar actas de vecindad en el tramo Capitolio.
Metodología: Se realizan el levantamiento de dos (2) actas de vecindad de predios en el tramo de Capitolio, con apoyo del Ingeniero Técnico y la Profesional Ambiental, donde se hace descripción detallada de los predios, registros fotográficos; con el fin de identificar afecciones en la fachada, cerramientos, etc.
Compromisos: Entregar el día 04 de octubre de 2023 a la interventoría la documentación pendiente, de acuerdo con los lineamientos dados por parte de la Residente Social de la Interventoría.

Actividad 2: MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19.

Tema: RECORRIDO DE OBRA.
Objetivo: Realizar recorrido de obra con el fin de verificar predios para acopios de material, maquinaria e instalación de carpa.
Metodología: Se realiza un (1) recorrido de verificación de predios para acopios de material, maquinaria e instalación de carpa en compañía del Ingeniero Técnico y la Profesional Ambiental, también se hace acompañamiento en obra y se recuerda a los trabajadores los canales de comunicación.
Compromisos: Realizar contacto con el dueño del predio para solicitar los permisos correspondientes para los acopios.

Actividad 3: CAPACITACIONES Y/O SENSIBILIZACIONES EXTERNAS.

Tema: PAUSAS ACTIVAS.
Objetivo: Participar de una sensibilización y pausa activa con la profesional SST de SINTRAUNIOBRAS.
Metodología: Se participa de una sensibilización y pausa activa organizada por la profesional SST de SINTRAUNIOBRAS, donde habló del trabajo en equipo y se realizaron actividades referentes al tema y estiramientos osteomusculares; con el fin de disminuir el estrés laboral.

Actividad 4: MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19.

Tema: PASACALLES
Objetivo: Realizar gestión social con dueños de predios para instalar los pasacalles.
Metodología: Se realiza una (1) gestión social con dueños de predios para instalar pasacalles, los cuales contienen información del proyecto.

Martes 26 de septiembre de 2023

Actividad 1: MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19.

Tema: MESA DE TRABAJO COMPONENTE SOCIAL INTERVENTORIA - UAERMV

Objetivo: Realizar una (1) mesa de trabajo con la residente social de la interventoría y UAERMV, con el fin de dar seguimiento a las actividades.
Metodología: Se realiza una (1) mesa de trabajo con la residente social de la interventoría y UAERMV, con el fin de dar seguimiento a las actividades, revisar documentación, aclarar dudas frente a las acciones que se ejecutan en obra y los informes mensuales.
Compromisos: Entregar documentación completa a la residente de la Interventoría, el día 04/10/2023.

Actividad 2: MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19.

Tema: RECORRIDO SOCIAL INTERVENTORIA - UAERMV
Objetivo: Realizar un (1) recorrido de obra en compañía de la Residente Social de la interventoría con el fin de verificar predios e inventario de predios del tramo Capitolio.
Metodología: Se realiza un (1) recorrido de obra en compañía de la Residente Social de la interventoría donde se verificó el inventario de predios del tramo Capitolio, con el fin de levantar actas de vecindad de predios faltantes; donde se enfoque en los cerramientos; ya que están cerca a la vía a intervenir por parte del proyecto, esto a solicitud de la residente social y el ingeniero residente de la interventoría.

Actividad 3: MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19.

Tema: RECORRIDO DE OBRA.
Objetivo: Realizar recorrido de obra con el fin de verificar predios y sus cerramientos.
Metodología: Se realiza un (1) recorrido de verificación y cerramientos, en compañía del Ingeniero Técnico y la Profesional Ambiental, con el fin de realizar levantamiento de actas de vecindad.

Miércoles 27 de septiembre de 2023

Actividad 1: CAPACITACIONES Y/O SENSIBILIZACIONES INTERNAS UAERMV.

Tema: CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS, BRIGADA DE EMERGENCIA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.
Objetivo: Participar de una (1) capacitación en primeros auxilios, brigada de emergencia y estilos de vida saludables.
Metodología: Se participó de una (1) capacitación en primeros auxilios, brigada de emergencia y estilos de vida saludables, el cual tenía como fin asistir como primer respondiente en caso de accidentes o situaciones de emergencia, perfilar al personal contratista para formar las brigadas de emergencia y proporcionar conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en los diferentes tramos.

Jueves 28 de septiembre de 2023

Actividad 1: MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19.

Tema: LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD.
Realizar actas de vecindad en el tramo Capitolio.
Metodología: Se realiza el levantamiento de dos (2) actas de vecindad de predios en el tramo de Capitolio, con apoyo del Ingeniero Técnico y la Profesional Ambiental, donde se hace descripción detallada de los predios, registros fotográficos; con el fin de identificar afecciones en la fachada y cerramientos de los predios.
Compromisos: Entregar el día 04 de octubre de 2023 a la interventoría todas las actas de vecindad del tramo Capitolio.

Actividad 2: MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19

Tema: RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE PREDIO.
Objetivo: Realizar un (1) recorrido de verificación de predio en compañía del propietario y la profesional ambiental.
Metodología: Se realiza un (1) recorrido de verificación de predio en compañía del propietario y la profesional ambiental, con el fin de concretar permisos para acopios de maquinaria, material e instalar carpa.

Actividad 3: MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19

Tema: GESTORIA SOCIAL.
Objetivo: Realizar una (1) gestión adelantada.
Metodología: Se realiza una (1) gestión adelantada con el fin de solicitar permiso de predio para acopios de maquinaria, material e instalación de carpa.

Actividad 4: MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PGS-6.1-19

Tema: ACTA DE COMPROMISO.
Objetivo: Realizar actas de compromiso para permiso de predios para puntos de acopio de material de excavación, materiales de construcción y carpa.
Metodología: Se realiza una (1) acta de compromiso con dueño de predio en compañía de la profesional Ambiental, con el fin de obtener permiso del predio; el cual será utilizado como punto de acopio de maquinaria, material de excavación, materiales de construcción e instalación de carpa, se aclara que estas actividades no tendrán ningún tipo de reconocimiento económico por alguna de las partes.

Viernes 29 de septiembre de 2023

Actividad 1: CAPACITACIONES Y/O SENSIBILIZACIONES INTERNAS UAERMV.

Tema: IGUALDAD DE GÉNERO.
Objetivo: Realizar sensibilización a los trabajadores de obra en Igualdad de Género.
Metodología: Se realiza una (1) sensibilización en Igualdad de Género a los trabajadores de obra del tramo Capitolio, con el fin de fortalecer conocimientos y promover la construcción del ser desde un enfoque de derechos y enfoque de género, con una perspectiva humanista.

Actividad 2: MEDIDA DE MANEJO 4: PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA. PGS-6.4-22.

Tema: COMITÉ COMPONENTE SOCIAL INTERVENTORÍA Y UAERMV.
Objetivo: Participar de un (1) comité organizado por la Residente de la Interventoría, con el fin de revisar los compromisos pendientes y avances del componente social.
Metodología: Se participa de un (1) comité organizado por la Residente de la Interventoría, con el fin de revisar los compromisos pendientes y avances del componente social, se hace verificación de las actividades y acciones ejecutadas durante la semana y se estipulan fechas para la revisión y entrega de la documentación faltante del tramo Capitolio.

Actividad 3: MEDIDA DE MANEJO 4: PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA. PGS-6.4-22.

Tema: COMITÉ CON INTERVENTORIA.

Objetivo: Participar de un (1) comité organizado por la Interventoría, con el fin de revisar avances de obra y de cada componente.
Metodología: Se participa de un (1) organizado por la Interventoría, donde estuvo el Fondo de Desarrollo Rural y equipo de obra UAERMV, su finalidad fue revisar avances de obra, los compromisos pendientes y los avances de cada componente.
Compromisos: Entregar el día 04 de octubre de 2023 a la interventoría la documentación pendiente, de acuerdo con los lineamientos dados por parte de la Residente Social de la Interventoría.

Actividad 4: INFORMES Y SEGUIMIENTO.

Tema: INFORME SEMANAL Y PLANEACIÓN.
Objetivo: Realizar y enviar informe de la semana del 25 al 29 de septiembre de 2023 y la programación de actividades de la semana del 02 al 06 de octubre de 2023.
Metodología: Se realiza informe de la semana del 25 al 29 de septiembre de 2023 y la programación de actividades de la semana del 02 al 06 de octubre de 2023.
Compromisos: Enviar el informe y la programación semanal a la entidad y la interventoría.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	


REGISTRO FOTOGRÁFICO










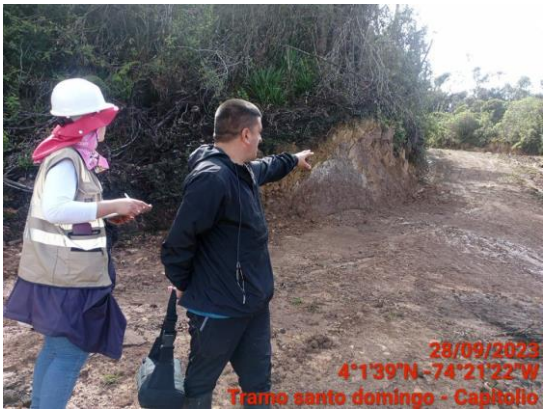

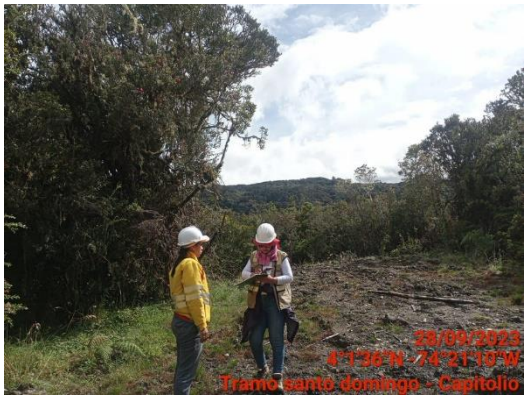

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR PARTE DEL COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL.

PROGRAMA 6: GESTIÓN SOCIAL	
MEDIDA DE MANEJO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO	FICHA:
	PGS-6.1-16

TEMA ATENCION A LA COMUNIDAD

OBJETIVO: Enfocar a la población con respecto de los trabajos realizados en el tramo Unión - Tunales

Metodología: Se realiza atención en el punto fijo de atención al usuario, con el fin de resolver dudas e inquietudes sobre la ejecución de obra.



ATENCION A LA COMUNIDAD 26/09/2023UNIÓN TUNALES

TEMA: RECEPCIÓN DE PASACALLES PARA INSTALACIÓN EN LOS FRENTES DE OBRA

OBJETIVO: Recibir los pasacalles entregados por el proveedor y verificar que estén en buen estado.

METODOLOGÍA: Se realiza una (1) verificación con el proveedor de litográfica con el fin de revisar que el producto se encuentre en óptimas condiciones según las especificaciones de la entidad.





RECEPCIÓN DE PASACALLES PARA INSTALACIÓN EN LOS FRENTES 26/09/2023

TEMA: INSTALACIÓN DE LOS PASACALLES INFORMATIVOS


OBJETIVO: Supervisar la correcta instalación de los pasacalles en los frentes de obra.

METODOLOGIA: Se realiza un acompañamiento al equipo de litografía a los frentes de obras, con el fin de asegurar que los pasacalles se instalen correctamente en los puntos acordados y que cumplan con los estándares de calidad y diseño**.**







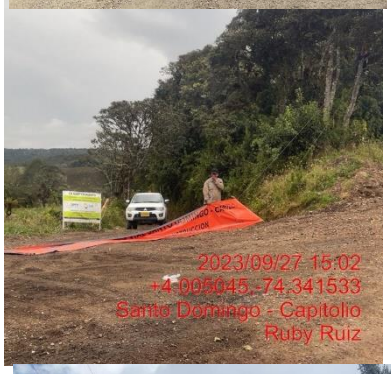






INSTALACIÓN DE LOS PASACALLES INFORMATIVOS 27/09/2023

PROGRAMA 6: GESTIÓN SOCIAL	
MEDIDA DE MANEJO 7: PROGRAMA DE CULTURA VIAL	FICHA: PGS-6.7-19

TEMA: VOLANTE INFORMATIVO DE CIERRES VIALES UNIÓN TUNALES

OBJETIVO: Solicitar la información pertinente con el fin de generar un producto social e informativo para la comunidad.

METODOLOGIA: La profesional social recopila información por parte del componente técnico sobre las actividades a desarrollar en el frente de obra implantando horarios para no interferir en las necesidades de la unidad ejecutora UAERMV y la población.

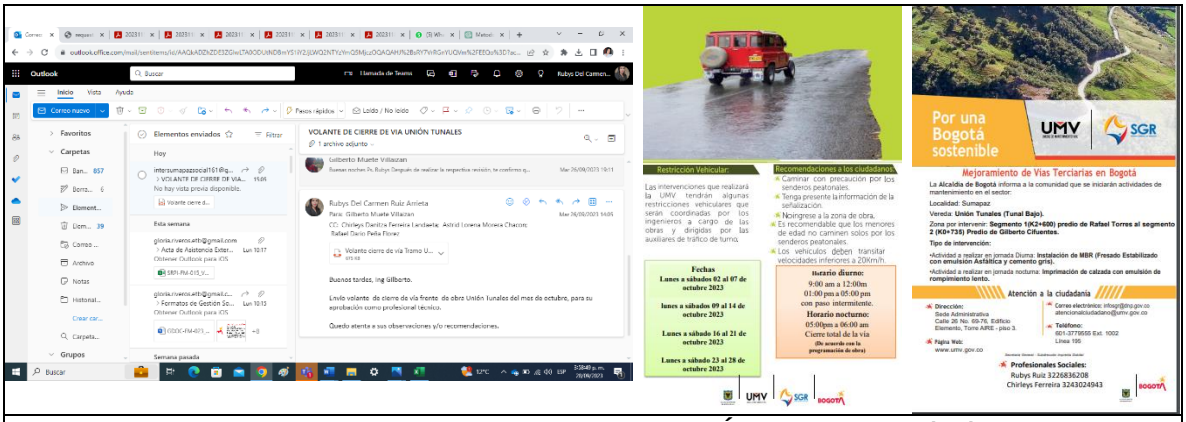

VOLANTE INFORMATIVO DE CIERRES VIALES UNIÓN TUNALES 26/09/2023

ANEXOS	
OBJETIVOS DEL CONTRACTUALES	

TEMA: VISITA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA

OBJETIVO: Acompañar al equipo de obra en las actividades en el tramo Unión Tunales

METODOLOGIA: Se realiza una (1) visita y acompañamiento social a los frentes de obra, con el fin de atender las novedades de tipo social que se presenten**.**



VISITA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA 28/09/2023

TEMA: COORDINACION DE ACTIVIDADES FRENTE DE OBRA UNIÓN TUNALES.

OBJETIVO: Unificar al equipo de trabajo de los diferentes componentes

METODOLOGIA: Se participa de un acompañamiento del equipo de obra proyecto Regalías Sumapaz con el fin de empalmar las diferentes actividades proyectadas para la construcción de la calzada.




COORDINACION DE ACTIVIDADES FRENTE DE OBRA UNIÓN TUNALES. 28/09/2023

TEMA: VISITA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA

OBJETIVO: Acompañar al equipo de obra en las actividades en el tramo Unión Tunales

METODOLOGIA: Se realiza una (1) visita y acompañamiento social de la UMV proyecto Regalías y la profesional social de interventoría ECOVIAS SAS Sumapaz a los frentes de obra, con el fin de atender las novedades de tipo social que se presenten.




VISITA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA. 29/09/2023 UNIÓN TUNALES

TEMA: COMITÉ SOCIAL EN OBRA

OBJETIVO: Hacer seguimiento semanal del componente social

METODOLOGIA: Se participa de un comité social con el fin de revisar los compromisos que quedaron el día 22 de septiembre de 2023.

Entrega de:

- Formatos actas de compromisos
- Formatos actas de gestión adelantadas
- Actas de vecindad
- Formatos de volantes

Se cumplió, Se hizo la entrega de estos documentos del frente de obra Unión Tunales y la profesional social de interventoría hizo su respectiva revisión




COMITÉ SOCIAL EN OBRA. 29/09/2023 UNIÓN TUNALES

TEMA: COMITÉ # 9 INTERVENTORIA ECOVIAS SAS Y UAERMV – SEGUIMIENTO SEMANAL

TEMA: Comité de obra entre interventoría Ecovias SAS y UAERMV

OBJETIVO: verificación de avances y compromisos en obra

METODOLOGÍA: se reúnen las partes interesadas con el fin de verificar cada uno de los compromisos adquiridos en comités anteriores; de acuerdo con esto se verifican las solicitudes al equipo técnico donde se deja un plazo mayor para completar la información requerida.

Se verifican los avances de obra y cuáles son los segmentos viales aprobados para la instalación de material (fresado estabilizado).

Se hace revisión de la documentación del inicio de obra.



COMITÉ # 9 INTERVENTORIA ECOVIAS SAS Y UAERMV – SEGUIMIENTO SEMANAL 29/09/2023

TEMA: CONTACTO CON LA LIDER COMUNITARIA DE TUNAL BAJO

OBJETIVO: Revisar con la líder comunitaria una posible fecha para el comité veedor.

METODOLOGÍA: Se Mantiene contacto permanente con la líder comunitaria de Unión Tunales junto con la profesional social de interventoría, con el fin de gestionar una posible fecha para el comité veedor, donde la comunidad podrá observar el avance que ha tenido la obra. La líder comunitaria manifiesta que el día 29 de septiembre de 2023 realizará una reunión con la comunidad y el lunes proporcionará a la profesional social una posible fecha para el comité veedor.



CONTACTO CON LA LIDER COMUNITARIA DE TUNAL BAJO 29/09/2023

A12.

Actas de comité de seguimiento social

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Interventoría Ecovia S.A.S
FECHA: 7/09/2023 **LUGAR:**
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento Socal #1
HORA DE INICIO: 7:30 p.m **HORA DE FINALIZACIÓN:** 8:30 p.m
ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Chirleys D. Ferreira Landaeta			X						X	UAGRMV.	chirleys.ferreira@amu.gov.co	3243024943	Chirleys Ferreira L
Isabel Barnaly.			X							Interventoría	interventoriasocal161@gmail.com	3204440043	Isabel B.Y.
Rubys Ruiz P			X							UDERMV	rubys-ruiz@amv	//	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Comité Social # 1

Frente Unión Tunales

↓ Programa de atención al Usuario.

La Profesional Social informa que la cerca del Señor Albeiro Delgado, fue arreglada el 15 de agosto / 23 la entidad ejecutora realiza la gestión.

↓ Actas de Vecindad

Se realiza 9 actas de Vecindad, la entidad ejecutora no ha hecho entrega en físico a la interventoría pendiente verificación y aprobación.

↓ La Profesional Social informa que hacer entrega de volantes informativos con el fin informar los cierres programados para Cines.

↓ La profesional Social informa que realizó socialización del PMT.

↓ La entidad ejecutora informa que realiza atención al punto fijo los días Martes y Jueves, de igual manera realiza acta de gestión con el fin de minimizar el impacto negativo que causa la obra.

Capitulo Fonte

→ La profesional Social informa que realizo 4 actas de vecindad.

→ Realiza atención a la comunidad los días Martes y Jueves.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

2- Plan de gestión Social

Se han realizado mesas de trabajo conjuntas con el componente Social de la entidad operadora, profesional Social de interventoría, la cual realiza observaciones la entidad operadora se compromete a realizar subsanación y hacer entrega del documento el 8 de Septiembre del año en curso.

3. El operador hace entrega del informe Semales del mes de julio y agosto a la fecha se encuentra al día.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega del Plan de gestión Social U.t	UARMV	8/09/23
2			
3			

Elaborada por: Isabel Bamaloo

Fecha de la próxima reunión: 13/09/23 Lugar de la próxima reunión: Virtual

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ECOVIAS SAS

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

Periodo: 7 de septiembre del 2023 **Área:** Social

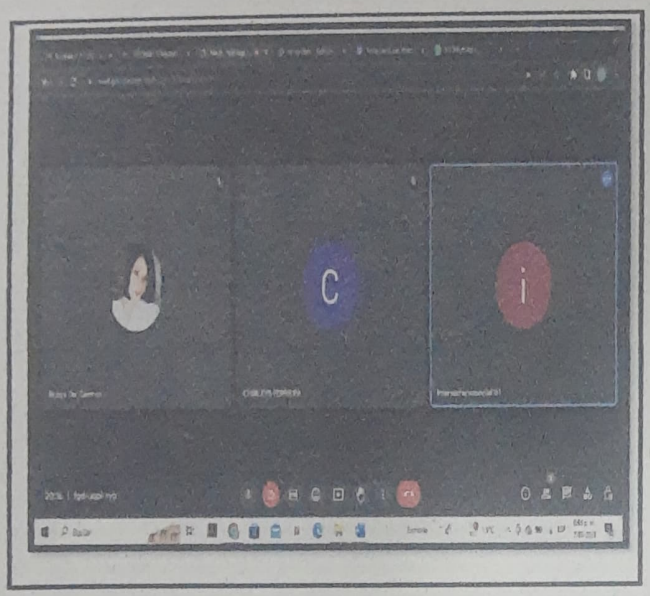


Foto No.: 1
Fecha de toma: 7 de septiembre de 2023
Localización: Sumapaz

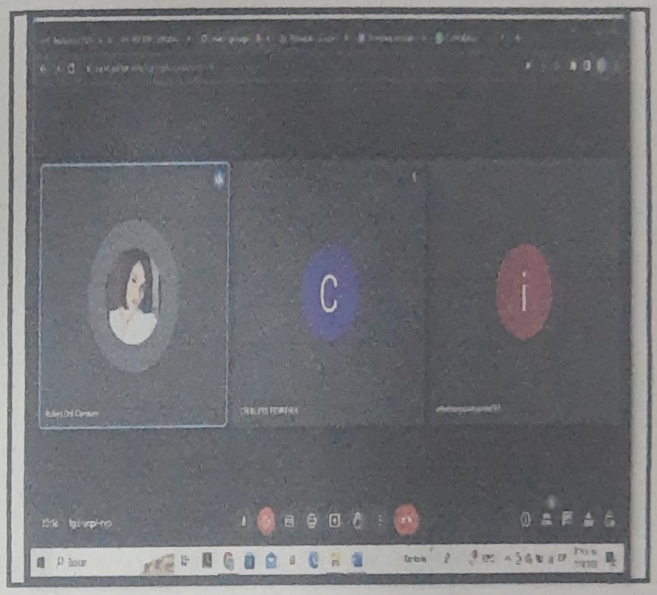


Foto No.: 2
Fecha de toma: 7 de septiembre del 2023
Localización: Sumapaz

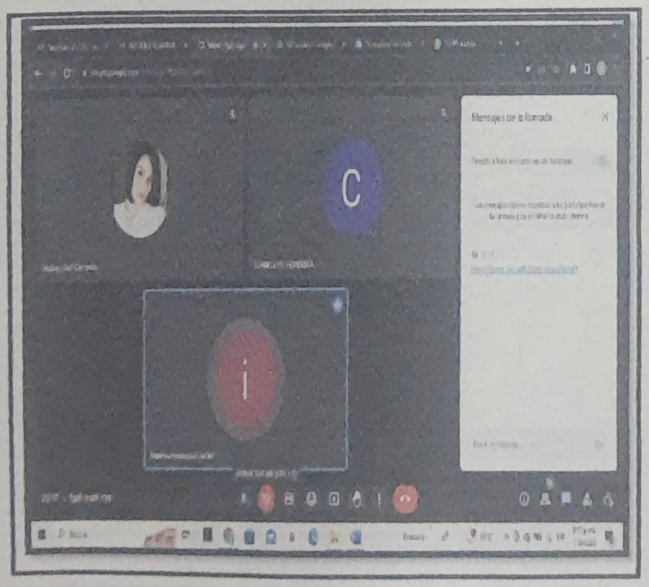


Foto No.: 3
Fecha de toma: 7 de septimbre del 2023
Localización: Sumapaz
Descripción: COMITÉ DE SEGUIMIENTO SOCIAL # 1

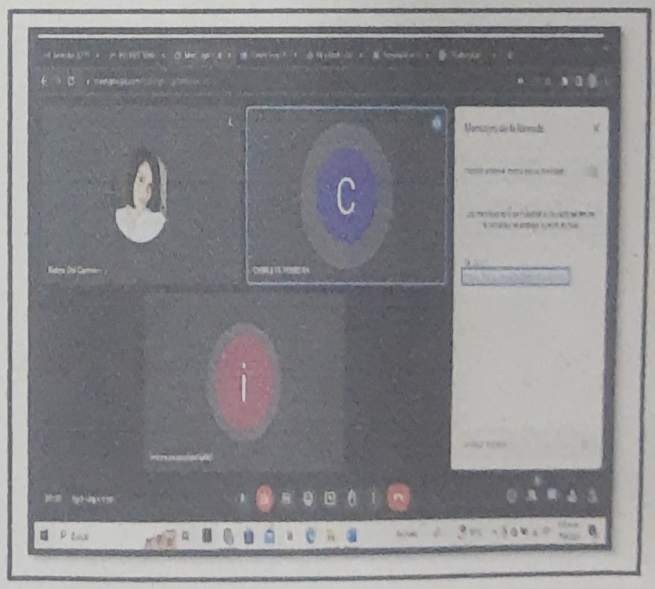


Foto No.:
Fecha de toma: 7 de Septiembre de 2023
Localización: Sumapaz
Descripción: COMITÉ DE SEGUIMIENTO SOCIAL # 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Intervantería Ecovias S.A.S
FECHA: 13/09/23 **LUGAR:**
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento #2
HORA DE INICIO: 7:40 p.m. **HORA DE FINALIZACIÓN:** 8:35 p.m
ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Rubys Ruiz A.			X						X	UAERMV	rubys.ruiz@uaermv	3226836208	
Hirley Ferreira Landeta			X						X	UAERMV.	hirley.ferreira@uaermv.gov.co	3143024443	
Isabel Bamal Y.			X							Intervantería	intersumapaz2social161@gmail.com	3204946093	Isabel B.Y.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Comité Social #2

Frente. Unión Tunales

1- La interventoría Verifica el Cumplimiento a los Compromisos adquiridos en el comité #1

a)- Plan de gestión Social a la fecha no se ha evidenciado entrega del plan de gestión Social la profesional Social, indica que este se encuentra en revisión por parte del gerente y cordinadora de la oficina de atención a la Ciudadanía y Sostenibilidad. la profesional Social de la entidad ejecutora indica que realizara entrega el 20 de Septiembre del año en curso.

2- Programa de atención al Usuario

La interventoría Solicita adecuar la oficina de atención al Ciudadano de acuerdo a lo establecido en las fichas PASA la entidad ejecutora Social se compromete para el día martes 19-2023 tener el punto adecuado.

3- La interventoría informa que se recibio el Volante informativo donde informa la programación de cierres de la Vía y el acta de Socialización realizada con la Comunidad. Se evidencia que se Subsano las Observaciones emitidas por la interventoría al acta y Volante. Se da aprobación

4) La profesional Social de la entidad ejecutora informa que realiza un acta de gestión adelantada con el fin de Verificar Si el predio del Señor Luis Rey presenta afectaciones, el cual indica que se encuentra en buen estado.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

5- La Profesional Social de la Unidad informa que levanto un acta de compromiso con la Señora Edilma Mida, por donación de material de RCD.

6- Frente Capitulo

La Profesional Social de la entidad ejecutora informa, que el 19 de sep/2023, realizara levantamiento de actas de vecindad.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega del Plan de gestión Social.	UAERMV	20/09/23
2	Adecuación el punto de atención al usuario	UAERMV	19/09/23
3	Continuar con el diligenciamiento de acta de usuario de frente capitalo	U.AERMV	19/9/23

Elaborada por: Isabel Bamal Y.

Fecha de la próxima reunión: 22 de sept/2023 Lugar de la próxima reunión: Frente de obra

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ECOVIAS SAS

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

Periodo: 13 de septiembre del 2023 **Área:** Social

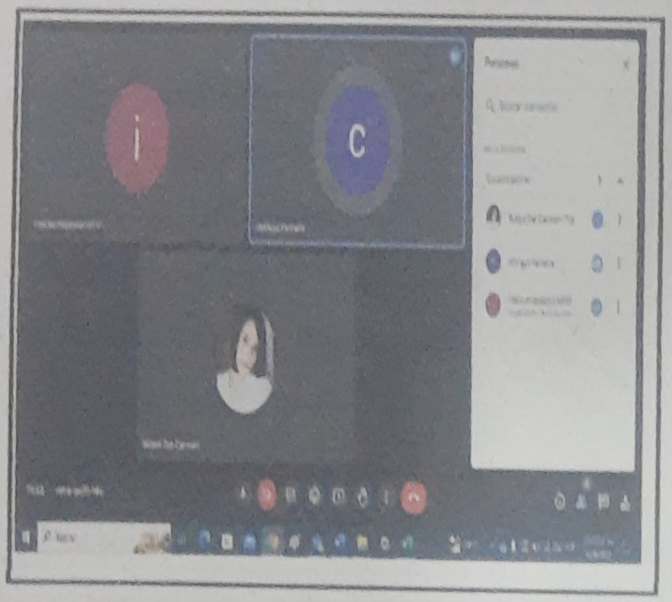


Foto No.: 1
Fecha de toma: 13 de septiembre de 2023
Localización: Sumapaz
Descripción: COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 2

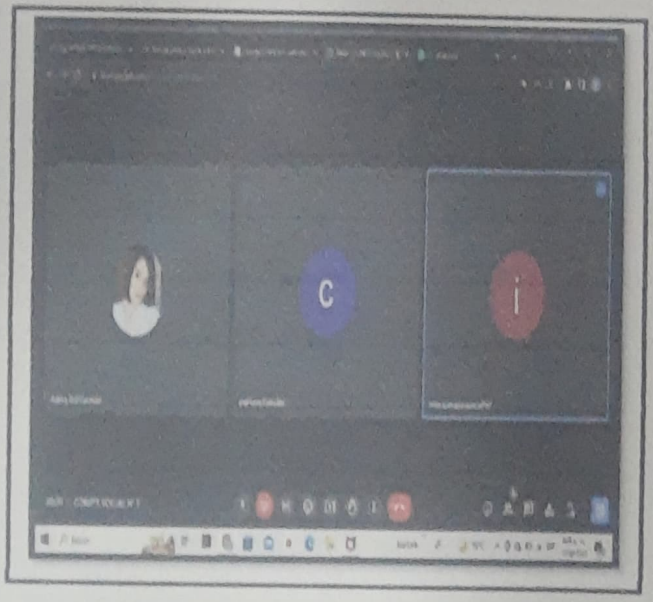


Foto No.: 2
Fecha de toma: 13 de septiembre del 2023
Localización: Sumapaz
Descripción: COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 2

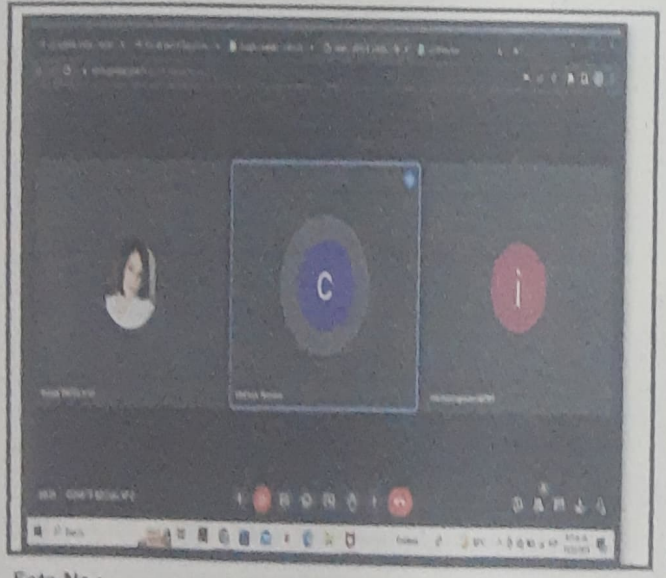


Foto No.: 3
Fecha de toma: 13 de septimbre del 2023
Localización: Sumapaz
Descripción: COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 2

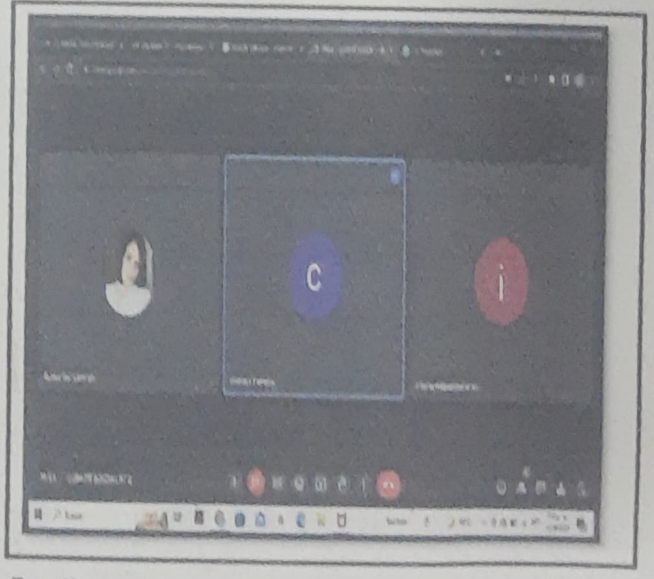


Foto No.:
Fecha de toma: 13 de Septiembre de 2023
Localización: Sumapaz
Descripción: COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Interventoría Ecovigo SAS
FECHA: 22-09-2023 **LUGAR:** Frente de Obra Tunales Unión
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento Social #3
HORA DE INICIO: 9:30 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:30 a.m
ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Chirleys Ferreira Arrieta			X						X	UAERMV.	chirleys.ferreira@umv.gov.co	3243024943	
Isabel Barma L.			X							Interventoría	intersomepasocial16@gmail.com	3204946093	
Rubys Ruiz Arrieta			X						X	UAERMV	rubys.ruiz@umv.gov.	3226836708	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Comité Social #3

Frente de obra Unión Tunales

Verificación de Compromiso adquiridos recorrido del 19/09/23.

↓ la interventoría evidencia Cumplimiento, por cuanto la profesional Social de la entidad ejecutora Subsana las observaciones de las actas de veracidad, la interventoría da aprobación a las mismas.

↓ Continúa pendiente entrega de actas de compromiso y actas de gestión adelantada las cuales presentan observaciones compromiso de entrega para el 29/09/23.

Frente de obra Capitolio

↓ la Profesional Social de la entidad ejecutora presenta 4 actas de veracidad ejecutadas en el mes de julio del año en curso, la interventoría realiza observaciones e indica que las actas son un producto de antes de iniciar actividad técnica por tal motivo a la fecha deberían estar en su totalidad.

↓ la Profesional Social se compromete a realizar las actas faltantes para el martes 26/09/23.

↓ Presenta 6 actas de compromiso las cuales presenta observaciones.

↓ Acta de RCD una presenta observaciones

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

La interventoria Solicita ajustar la documentación, de igual manera hacer presencia en obra, por cuanto se evidencia que la documentación presentada es del mes de Julio.
Subsanar Información presentada entregada el 29/09/23

2). Recorrido

La interventoria realiza recorrido en los frentes de obra de Unión Tunalos y Capitolio.

3) La interventoria informa a los Profesionales Sociales que mensualmente realizará una lista de chequeo evaluando las actividades desarrolladas mes a mes.

4) La interventoria informa que el plan de gestión Social fue radicado, se encuentra en revisión para emitir concepto se evidencia que en el Programa de Vinculación de mano de obra no se establece el Porcentaje del 30% en la contratación de mano de obra no calificada, como se había presentado en el anterior borrador entregado.

Las Profesionales Sociales indican que encuentro a las listas de chequeo y mano de obra no calificada de la localidad contratación no pueden entregar respuesta. Por cuanto es con la Coordinadora Social de la Entidad Ejecutora

La interventoria, Solita realizar Programar mesa de trabajo para tratar los temas anteriormente enunciados.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Actas de compromiso y gestión adelantada Frente Unión Torales	Entidad ejecutora	29/09/23
2	Hacer entrega de actas de Compromiso RLD Frente capitolio	Entidad Ejecutora	29/09/23
3.	Hacer entrega de la documentación Frente Capitolio	Entidad Ejecutora	29/09/23
4	Programar reunión con la Coordinadora Social de la Entidad ejecutora	Entidad Ejecutora	09/23.

Elaborada por: Isabel Bernal Y.

Fecha de la próxima reunión: 29/09/23 Lugar de la próxima reunión: Frente de obra.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ECOVIAS S.A.S.

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

Periodo: 22 de septiembre del 2023 **Área:** Social



Foto No.:	1
Fecha de toma:	22 de septiembre de 2023
Localización:	Sumapaz
Descripción:	Comité social



Foto No.:	2
Fecha de toma:	22 de septiembre del 2023
Localización:	Sumapaz
Descripción:	Comité social



Foto No.:	3
Fecha de toma:	22 de septimbre del 2023
Localización:	Sumapaz
Descripción:	Recorrido integral



Foto No.:	4
Fecha de toma:	22 de Septiembre de 2023
Localización:	Sumapaz
Descripción:	Recorrido integral

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Intracontinia Ecquias, SAS
FECHA: 29/09/23 **LUGAR:** Frente de Unión Terales
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento Componente Social #4.
HORA DE INICIO: 10: am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:00 a.m
ASISTENTES: 3

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIB. REMOMB.	CONTRATISTA				
CHRISTIAN FERREIRA LANDETA			X						X	UAERMV	christian.ferreira@umv.gov.co	3143024943	CHRISTIAN FERREIRA
Rubys Ruiz			X						X	UAERMV.			
Isabel Bainal Y.			X							Intracontinia	isabelbaza@gmail.com	3204946073	Isabel B.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Comité de Seguimiento Social #4
Frente de obra Unión Tunales

1) La interventoría realiza revisión de documentación Se evidencia cumplimiento en la entrega de los mismos estos son:
a). 13 actas de veracidad, 16 actas de compromiso 12 actas de gestión adelantada, 3 formatos de puntos fijos.

2) La Profesional Social de la entidad se compromete a realizar entrega de los registros fílmicos de las actas de veracidad para el día 6 de octubre /2023

3) Se realiza reunión con la Señora Armida Ronza quien manifiesta que el comité veedor Solicita una reunión con los profesionales encargados del contrato con el fin ver los avances del contrato y Solicitan un recorrido, indica que el 29 de Septiembre tendran asamblea general e informará la fecha y hora que el comité plantea, la interventoría y entidad contante informa que estará atentos.

4) La Profesional, indica que se encuentra instalando los pasacalles, la interventoría informa que verificará la instalación.

5). La interventoria informa que realizó revisión del Volante informativo de la programación de los cierres Unión Tunales. La interventoría Solicita que sean instalados al inicio y cierre del frente Unión Tunales.

6) La Profesional Social de la entidad apertura informa que realizará Capacitación con el personal de obra el tema a tratar Igualdad de género programada para el 4/oct/23

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Frente de obra Capitolio

1) Se encuentra Pendiente hacer entrega de la documentación soporte de las actividades realizadas desde el inicio del mes de julio a la fecha, la profesional Social de la entidad ejecutora se compromete a entregar en su totalidad con las observaciones subsanadas el 4/oct/23

2) La Profesional Social de la entidad informa que a la fecha cuenta con 9 actas de vecindad realizadas de las 16 actas.

3) La Profesional Social de la entidad indica que se realizo capacitación con los trabajadores de la obra frente a igualdad de genero. La interventoría el tema desarrollado y solicita hacer entrega del plegable desarrollado durante la capacitación.

4). La interventoría Solicita las actas levantadas con los permisos para instalar los pescaderos, con el fin de continuar con la instalación.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Hacer entrega de los registros R Filmicos de las actas de	Entidad Ejecutora	6/oc/23
	Veracidad		
2	Hacer entrega de la documenta- ción del componente Social	Entidad Ejecutora	4/oc/23
	Frente de obra Capitolio		
3	Capacitación Frente de obra Unión Tunalos	Entidad Ejecutora	4/oc/23
4	Hacer entrega de las actas de comité Social	Interven.	29/09/23
5	Instalar Volante Informativo al Inicio y cierre del Frente de Unión T.	Entidad Ejecutora	2/oc/23

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ECOVIAS SAS

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

Periodo: 29 de septiembre del 2023 **Área:** Social



Foto No.:	1
Fecha de toma:	29 de septiembre de 2023
Localización:	Sumapaz
Descripción:	Comité social N° 4

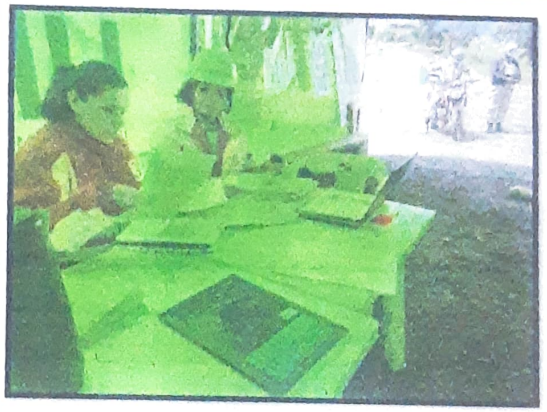


Foto No.:	2
Fecha de toma:	29 de septiembre del 2023
Localización:	Sumapaz
Descripción:	Comité social N° 4



Foto No.:	3
Fecha de toma:	29 de septimbre del 2023
Localización:	Sumapaz
Descripción:	Comité social N° 4



Foto No.:	4
Fecha de toma:	29 de Septiembre de 2023
Localización:	Sumapaz
Descripción:	Comité social N° 4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Intracontinia Ecquias, SAS
FECHA: 29/09/23 **LUGAR:** Frente de Unión Terales
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento Componente Social #4.
HORA DE INICIO: 10: am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:00 a.m
ASISTENTES: 3

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIB. REMOMB.	CONTRATISTA				
CHRISTIAN FERREIRA LANDETA			X						X	UAERMV	christian.ferreira@umv.gov.co	3143024943	CHRISTIAN FERREIRA
Rubys Ruiz			X						X	UAERMV.			
Isabel Bainal Y.			X							Intracontinia	isabelbaza@gmail.com	3204946073	Isabel B.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Comité de Seguimiento Social #4
Frente de obra Unión Tunales

1) La interventoría realiza revisión de documentación Se evidencia cumplimiento en la entrega de los mismos estos son:
a). 13 actas de veracidad, 16 actas de compromiso 12 actas de gestión adelantada, 3 formatos de puntos fijos.

2) La Profesional Social de la entidad se compromete a realizar entrega de los registros fílmicos de las actas de veracidad para el día 6 de octubre /2023

3) Se realiza reunión con la Señora Armida Ronza quien manifiesta que el comité veedor Solicita una reunión con los profesionales encargados del contrato con el fin ver los avances del contrato y Solicitan un recorrido, indica que el 29 de Septiembre tendran asamblea general e informará la fecha y hora que el comité plantea, la interventoría y entidad contante informa que estará atentos.

4) La Profesional, indica que se encuentra instalando los pasacalles, la interventoría informa que verificará la instalación.

5). La interventoria informa que realizó revisión del Volante informativo de la programación de los cierres Unión Tunales. La interventoría Solicita que sean instalados al inicio y cierre del frente Unión Tunales.

6) La Profesional Social de la entidad apertura informa que realizará Capacitación con el personal de obra el tema a tratar Igualdad de género programada para el 4/oct/23

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Frente de obra Capitolio

1) Se encuentra Pendiente hacer entrega de la documentación soporte de las actividades realizadas desde el inicio del mes de julio a la fecha, la profesional Social de la entidad ejecutora se compromete a entregar en su totalidad con las observaciones subsanadas el 4/oct/23

2) La Profesional Social de la entidad informa que a la fecha cuenta con 9 actas de vecindad realizadas de las 16 actas.

3) La Profesional Social de la entidad indica que se realizo capacitación con los trabajadores de la obra frente a igualdad de genero. La interventoría el tema desarrollado y solicita hacer entrega del plegable desarrollado durante la capacitación.

4). La interventoría Solicita las actas levantadas con los permisos para instalar los pescaderos, con el fin de continuar con la instalación.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Hacer entrega de los registros R Filmicos de las actas de	Entidad Ejecutora	6/oc/23
	Veracidad		
2	Hacer entrega de la documenta- ción del componente Social	Entidad Ejecutora	4/oc/23
	Frente de obra Capitolio		
3	Capacitación Frente de obra Unión Tunalos	Entidad Ejecutora	4/oc/23
4	Hacer entrega de las actas de comité Social	Interven.	29/09/23
5	Instalar Volante Informativo al Inicio y cierre del Frente de Unión T.	Entidad Ejecutora	2/oc/23

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ECOVIAS SAS

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

Periodo: 29 de septiembre del 2023 **Área:** Social



Foto No.:	1
Fecha de toma:	29 de septiembre de 2023
Localización:	Sumapaz
Descripción:	Comité social N° 4

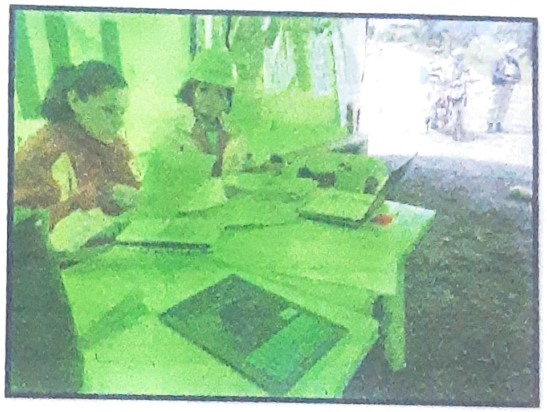


Foto No.:	2
Fecha de toma:	29 de septiembre del 2023
Localización:	Sumapaz
Descripción:	Comité social N° 4



Foto No.:	3
Fecha de toma:	29 de septimbre del 2023
Localización:	Sumapaz
Descripción:	Comité social N° 4



Foto No.:	4
Fecha de toma:	29 de Septiembre de 2023
Localización:	Sumapaz
Descripción:	Comité social N° 4

4.E INFORMES SEMANALES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
PLAZO ACTUALIZADO PRÓRROGA No.1		DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ACTUALIZADO PRÓRROGA No.2		VEINTIDOS (22) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2025	31/12/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Sebastián Saldarriaga Rivera - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz ECOVIAS S.A.S - Interventor	Sebastián Saldarriaga Rivera - Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz ECOVIAS S.A.S - Interventor
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	67	16
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	8	2

SEMANA N. 7 **DEL** lunes, 4 de septiembre de 2023 **AL** domingo, 10 de septiembre de 2023

AVANCES DE OBRA

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado				
Valor del Trabajo Programado				

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	Aprobación por parte de la Interventoría del producto técnico de topografía actualizada del tramo vial ÁNIMAS BAJAS (Levantamiento topográfico y Modelo Digital de Terreno) 4310 m Comunicación de ECOVIAS SAS PENDIENTE POR CONCEPTO DE APROBACION Para el presente periodo, no se presenta actividades de obra en el tramo animas bajas
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	Para el presente periodo, no se presentan actividades de obra en el tramo laguna verde
TRAMO SAN ANTONIO	NA	NA	NA	Elaboración y entregas a la Interventoría del producto técnico "Adaptación del diseño geométrico a la topografía actual", del tramo vial SAN ANTONIO (K0+000-->K13+820). La topografía de San Antonio 1 presenta observaciones por parte de la interventoría. Para el presente periodo, no se presenta actividades de obra en el tramo San Antonio debido a que no hay nuevo diseño geométrico aprobado por la interventoría para el tramo.

TRAMO CAPITOLIO	N/A	N/A	N/A	Elaboración y entregas a la Interventoría del producto técnico "Adaptación del diseño geométrico a la topografía actual", del tramo vial CAPITOLIO Para el presente periodo, no se presenta actividades de obra en el tramo Capitolio debido a que no hay nuevo diseño geométrico aprobado por la interventoría para el tramo. La UAERMV se encuentra reparando fallos de la vía, esto es necesario para la construcción de la estructura de la vía.
TRAMO UNIÓN-TUNALES	N/A	N/A	N/A	Elaboración y entregas a la Interventoría del producto técnico "Adaptación del diseño geométrico a la topografía actual", del tramo vial UNIÓN-TUNALES Para el presente periodo, se está ajustando el diseño geométrico en el tramo 1 entre abscisas k2+560 a k2+969 Nivelación y mejoramiento de rasante actual con material seleccionado. Incluye excavaciones (Ancho de banca 4,60 m) Extendida y compactación de base granular tipo B (Esp=0,15 m). Incluye humectación si es requerido. Imprimación, extendido y compactación de MBR.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	35.684.399.806,00				

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNÍÓN TUNALES

Personal disponible en el tramo:
Director de obra, residente de obra, residente ambiental, apoyo a residente ambiental, apoyo a residente social, residente social, apoyo a residente SST, 2 inspector, 2 oficial, 2 auxiliares de tráfico, 5 ayudantes, 3 BOAL, 2 topógrafos, 4 cadeneros, 1 operador mini cargador, 1 operador compactador neumático, 1 operador motoniveladora, 1 conductor carro tanque, 1 operador vibro compactador, 4 conductores de camioneta.

Personal de interventoría disponible: 2 residentes de interventoría, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 topógrafo, 1 cadenero, 2 conductores de camioneta.

Maquinaria evidenciada: mini cargador, vibro compactador, 1 compactador de neumáticos, 1 motoniveladora, 1 carro tanque, 2 camionetas.

Actividades realizadas:

Lunes 04 de Septiembre de 2023
Los trabajadores de la zona que en su mayoría son ayudantes, BOAL, auxiliares de tráfico y cadeneros ingresaron a la obra a las 7 am. Los trabajadores del contrato sindical que desplazan desde Bogotá urbana, que son en su mayoría inspectores, oficiales y topógrafos ingresaron a la 1 pm a la obra, al igual que los residentes y apoyos de la UAERMV y el personal del contrato de maquinaria. Se extendió material tipo RAP entre abscisas k2+460 y k2+490. Se realizó arreglo de base granular en abscisa k2+570 en el hombro izquierdo. Llegaron 9 viajes de base granular que fueron acopiados.
Clima: Sin lluvias.
Martes 05 de septiembre.
Hay dos comisiones de topografía, la comisión 1 se encuentra replanteando niveles para arreglo de filtro, la comisión 2 se encuentra realizando nivelación y contra nivelación entre deltas para verificar y dar alturas a auxiliares intermedios. Se extendió material tipo RAP de k2+490 hacia mayores. Se continúa con el arreglo del filtro desde k2+360 hasta k2+395. Llegan al tramo 2 viajes de RAP.
Clima: Seco.
Miércoles 06 de Septiembre
Se realizó extendido de material RAP entre abscisas k2+460 y k2+505. Comisión de topografía continúa ejercicio de nivelación y contra nivelación hasta el punto de cambio 8 en el k2+272. Se cierra el filtro reparado en el costado derecho entre abscisas k2+360 y k2+395. Se realiza revisión entre comisiones de topografía de la interventoría y la UAERMV del replanteo de la vía entre k2+515 y k2+605 evidenciando que en el hombro de la vía que debe estar mas cerca al nivel del filtro terminado, la diferencia máxima entre el nivel del filtro y la rasante proyectada se presenta en la abscisa k2+605 en el costado derecho y es de 72 cm. Clima: Seco.
Jueves 07 de Septiembre
Extendido de RAP entre k2+505 y k2+585, comisión de topografía de interventoría realiza levantamiento de los apiques entre k2+665 y k2+800, se revisa el cereo del miércoles 6 de septiembre desde k2+430 hasta k2+510 de material tipo RAP, el personal de obra realizó los correspondientes ajustes. Clima: seco.
Viernes 08 de Septiembre
Compactación de material tipo RAP entre abscisas k2+510 y k2+580, toma de densidades de material tipo RAP en abscisas k2+435, k2+465 costado izquierdo, k2+475 costado derecho, k2+510 costado izquierdo, k2´555 en el eje de la vía y k2+595 costado izquierdo. Se realizó comité semanal de seguimiento de obra de la UAERMV No 6.
Clima: Seco
Sabado 08 de agosto
No se realizan actividades
Domingo 09 de agosto
No se realizan actividades

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA UNIÓN TUNALES

1. Se evidencia fisuras producto de la mala compactación de la base en el MBR instalado en el k2+215 en el hombro derecho a 80 cm del borde de la vía instalada. Como observación general en todo el MBR no se debe instalar y compactar base en los hombros de la vía el dia anterior a la colocación del MBR. En la unión entre la base que ha cereado con anterioridad y la que se aplica luego en los hombros se están generando fisuras en la superficie del MBR en todos los segmentos que hasta la fecha han sido construidos.
2. No colocar RCD dentro de los 5.6 m propuestos de ancho de vía propuesto para lograr una compactación adecuada en las capas de la estructura del pavimento.
3. En la abscisa k2+410, se evidencia la colocación de RCD compactado dentro de los 5.6 m propuestos como ancho de la estructura de la vía. Se aclara que no es viable este procedimiento y se solicita el retiro del material tipo RCD que está siendo colocado. La observación no fue tenida en cuenta y se compactó el RCD en el punto.
4. El material filtrante que se quería utilizar en la construcción del filtro se encontraba sucio y tenía sobre tamaños, se debe garantizar un material no contaminado y con tamaños entre 1" y 3".
5. Realizar limpieza de RCD en costado izquierdo entre abscisas k2+345 y k2+395.
6. Se realiza revisión entre comisiones de topografía de la UAERV y de la interventoría del replanteo de vía entre k2+515 y k2+605 evidenciando que en el hombro de la vía que debe estar más cerca al nivel del filtro terminado, la diferencia máxima entre el nivel del filtro y la rasante proyectada se presenta en la abscisa k2+605 en el costado derecho y es de 72 cm. Se permite que se aplique RAP, base y MBR quedando pendiente la entrega de diseño geométrico en este sector.
7. Del proyecto hay 3 comisiones de topografía que solamente cuentan con 2 estaciones totales y 1 nivel de precisión.
8. A lo largo de todo le MBR colocado se encuentran fisuras transversales y longitudinales, se solicita que se tomen acciones para repararlas.
9. EN el eje del MBR instalado en la vía entre abscisas k2+265 y k2+320 se observan fisuras transversales, se solicita que se tomen acciones para sellar la capa de rodadura.
10. Se solicita limpieza de RCD entre abscisas k2+345 y k2+395.
11. Jueves a las 8:15 AM se detiene la instalación de base granular por falta de compactación del MBR.
12. El viernes se solicita no extender base hasta que no se haya recibido el material tipo RAP por parte de la interventoría entre abscisas k2+430 y k2+580, no se han tomado densidades y el material se encuentra suelto. Se solicita que el residente de obra realice una revisión preliminar de las condiciones de los materiales, previo a realizar acciones que no garantices la calidad de la obra.

TRAMO CAPITOLIO: No se ha dado inicio a las obras en este tramo. El 23 de agosto ingresó una unidad de trabajo del sindicato que hace parte del proyecto de regalías, no se ha dado inicio a la obras de la vía de en el tramo, por lo que no se explica la disposición de este recurso humano

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES REALIZADAS:
La profesional del componente social de la entidad ejecutora realiza recorrido de obra en los frentes activos, con el fin de realizar atención móvil a la comunidad.
La profesional social de la entidad ejecutora realiza acompañamiento a las actividades técnicas de obra.
El 4 de septiembre del año en curso, la profesional social de la entidad ejecutora realiza una sensibilización a los trabajadores de obra y operarios del tramo Capitolio sobre los procedimientos de Gestión Social en Obra, brinda información de los procesos de gestión social y promueve los canales de comunicación.
El 5 de septiembre se realiza mesa de trabajo conjunto con la coordinadora social, profesionales del componente social de la entidad ejecutora y la profesional social de interventoría, con el fin de revisar los adelantos en la subsanación de las observaciones del Plan de gestión social.
El mismo día la profesional social de la entidad ejecutora realiza gestión adelantada en punto de atención al usuario tramo Unión Tunales, atiende preguntas sobre la intervención de la malla vial y demás aspectos en los cuales se tienen dudas con la comunidad.
El 6 de septiembre del 2023, la profesional social de la entidad ejecutora, realiza sensibilización con el personal de obra, donde tratan el tema de los cierres viales en el frente de obra – unión tunales. De acuerdo con los lineamientos planteados en las fichas PAGA donde explican los horarios de cierre vial, el cual está comprendido de 9:00 am – 12:00m y 1:00 pm – 5:00 pm., De acuerdo con lo antes expuesto, se refuerzan conocimientos sobre las señales móviles implementadas en el plan de manejo de tráfico típico.
El mismo día la profesional social realiza acta de compromiso por un traslado de material producto de la excavación, el cual será instalado a lo largo del sendero peatonal y nivelado; con el fin de brindar estabilidad.
El 7 de septiembre se realiza comité social N° 1, en conjunto entre las profesionales sociales de la entidad ejecutora y la interventoría. con el fin de realizar seguimiento al componente social.
El 8 de septiembre la profesional social realiza entrega del arreglo de la cerca al señor Albeiro Delgado, el cual recibe a conformidad en el frente obra Unión Tunales.
El mismo día el componente social de interventoría y entidad ejecutora, participa en el recorrido realizado conjuntamente, con el fin de verificar los avances del proyecto y se participa en el comitéde seguimiento semanal de obra.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Acompañamiento en las actividades que se ejecutan durante la jornada laboral, se realiza mesa de trabajo para definir entregas de documentación del componente SST. Se evidencia el mantenimiento de baños portatiles y se revisan los preoperacionales de todas las maquinas y equipos

OBSERVACIONES Y SOLICTIUDES COMPONENTE SST - UNIÓN TUNALES
1. A la hora del almuerzo se colocó maleta naranja y barricada bloqueando el tráfico sin necesidad, no se estaban ejecutando actividades de obra.
2. Residente SST de interventoría evidencia que compactador neumático reporta falla en tablero, está solicitando grasa. El equipo minicargador se encuentra pinchado.
3. EL jueves se evidencia el ingreso del trabajador Patricio, quien se encontraba incapacitado por accidente laboral, solicitó a la SST de forma verbal las recomendaciones médicas, este trabajador estará prestando sus servicios en el tramo unión tunales.

OBSERVACIONES Y SOLICTIUDES COMPONENTE SST - CAPITOLIO
1. Se reporta en charla de parte de la persona SST del sindicato, accidente laboral del señor Rigoberto Delgado del tramo Capitolio, se espera la investigación respectiva del accidente de trabajo.
2. El jueves se evidencia que los trabajadores ya recogieron PMT y salen hacia sus viviendas a las 4:00 PM.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Acompañamiento en las actividades que se ejecutan durante la jornada laboral.

OBSERVACIONES Y SOLICTIUDES COMPONENTE AMBIENTAL - UNIÓN TUNALES
1. Se mantiene material RCD en varios puntos de la vía generando incomodidad para vehículos que transitan y generando impresión de descuido del tramo.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

El presupuesto no ha sido avalado por la interventoría, por lo tanto no se han formalizado los items que hacen parte de la ejecución de las obras.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Implementación de PMT abscisa k2+670 tramo 01 Unión tunales



Descripción Foto 2.

Reparación de filtro abscisa k2+380 costado derecho



Descripción Foto 3.

Revisión conjunta entre comisiones de topografía de la UAERMV y de la interventoría ubicación y niveles de filtros existentes



Descripción Foto 4.

Extendido de RAP sin cerear desde abscisa k2+505 hacia mayores



Descripción Foto 5.

Extendido de base desde k2+450 hacia mayores



Descripción Foto 6.

Comité semanal se seguimiento de obra entre la UAERMV, el FDRS y la interventoría.



Descripción Foto 7.

Acopio de material y maquinaria disponible.



Descripción Foto 8.

Extendido de RAP desde k2+460 hacia mayores.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". .	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
PLAZO ACTUALIZADO PRÓRROGA No.1		DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ACTUALIZADO PRÓRROGA No.2		VEINTIDOS (22) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2025	31/12/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Sebastián Saldarriaga Rivera - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz ECOVIAS S.A.S - Interventor	Sebastián Saldarriaga Rivera - Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz ECOVIAS S.A.S - Interventor
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	67	16
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	8	2

SEMANA N. 7 **DEL** lunes, 11 de septiembre de 2023 **AL** domingo, 17 de septiembre de 2023

AVANCES DE OBRA

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado				
Valor del Trabajo Programado				

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	Aprobación por parte de la Interventoría del producto técnico de topografía actualizada del tramo vial ÁNIMAS BAJAS (Levantamiento topográfico y Modelo Digital de Terreno) 4310 m Comunicación de ECOVIAS SAS PENDIENTE POR CONCEPTO DE APROBACION Para el presente periodo, no se presenta actividades de obra en el tramo animas bajas
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	Para el presente periodo, no se presentan actividades de obra en el tramo laguna verde
TRAMO SAN ANTONIO	NA	NA	NA	Elaboración y entregas a la Interventoría del producto técnico "Adaptación del diseño geométrico a la topografía actual", del tramo vial SAN ANTONIO (K0+000--->K13+820). La topografía de San Antonio 1 presenta observaciones por parte de la interventoría. Para el presente periodo, no se presenta actividades de obra en el tramo San Antonio debido a que no hay nuevo diseño geométrico aprobado por la interventoría para el tramo.

TRAMO CAPITOLIO	N/A	N/A	N/A	Elaboración y entregas a la Interventoría del producto técnico "Adaptación del diseño geométrico a la topografía actual", del tramo vial CAPITOLIO Para el presente periodo, no se presenta actividades de obra en el tramo Capitolio debido a que no hay nuevo diseño geométrico aprobado por la interventoría para el tramo. La UAERMV se encuentra reparando fallos de la vía, esto es necesario para la construcción de la estructura de la vía.
TRAMO UNIÓN-TUNALES	N/A	N/A	N/A	Elaboración y entregas a la Interventoría del producto técnico "Adaptación del diseño geométrico a la topografía actual", del tramo vial UNIÓN-TUNALES Para el presente periodo, se está ajustando el diseño geométrico en el tramo 1 entre abscisas k2+560 a k2+969 Nivelación y mejoramiento de rasante actual con material seleccionado. Incluye excavaciones (Ancho de banca 4,60 m) Extendida y compactación de base granular tipo B (Esp=0,15 m). Incluye humectación si es requerido. Imprimación, extendido y compactación de MBR.

DESCRIPCIÓN META FISICA	**UNIDAD**	**TOTAL PROYECTO**	**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**	
			SEMANAL	**ACUMULADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	35.684.399.806,00				

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNÍON TUNALES:

Personal disponible en el tramo:
Director de obra, residente de obra, residente ambiental, apoyo a residente ambiental, apoyo a residente social, residente social, apoyo a residente SST, 2 inspector, 2 oficial, 2 auxiliares de tráfico, 5 ayudantes, 3 BOAL, 2 topógrafos, 4 cadeneros, 1 operador mini cargador, 1 operador compactador neumático, 1 operador motoniveladora, 1 conductor carro tanque, 1 operador vibro compactador, 1 operador retroexcavadora, 4 conductores de camioneta.

Personal de interventoría disponible: 2 residentes de interventoría, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 topógrafo, 1 cadenero, 2 conductores de camioneta.

Maquinaria evidenciada: mini cargador, vibro compactador, 1 compactador de neumáticos, 1 motoniveladora, 1 carro tanque, 2 camionetas.

Actividades realizadas:

Lunes 11 de Septiembre de 2023
Se realiza extendido y compactación de base granular sin cerear desde k2+400 hasta k2+475. Desde el k2+475 hacia mayores, el material tipo RAP presenta puntos de baja compactación que requieren ser atendidos. Comisión de topografía de la interventoría realiza revisión de replanteo y de niveles de RAP desde abscisa k2+510 hasta k2+600. Máximo error encontrado fue de 4 cm por encima y de 6 cm por abajo (rellenar), se solicita la corrección al residente de obra.
Martes 12 de septiembre de 2023
Se realiza limpieza del segmento desde k2+390 hacia mayores. Desde k2+475 hasta k2+620 tramo 01, se realiza humectación y compactación de material tipo RAP. Se realiza imprimación desde abscisa en k2+395 hasta k2+475 tramo 01. Se realiza toma de densidades a material tipo BASE en abscisas: k2+475 costado derecho, k2+460 costado izquierdo, k2+435 costado derecho, k2+410 en el eje de la vía.
Miércoles 13 de septiembre de 2023
Se reciben 8 viajes de material tipo MBR, se extiende MBR entre abscisas k2+395 y k2+475. Se instala base granular entre abscisas k2+365 y k2+390 del tramo 01. Comisión de topografía de la UAERMV realiza apiques desde k2+800 hasta el final del tramo 01. El ingeniero Felipe Saenz (Residente de interventoría) y el ingeniero Rafael Peña (Director de obra de la UAERMV) realizan visita a la planta de la UAERMV, sede de producción la esmeralda, en este lugar el contrato de emulsión tiene su propia línea de dosificación independiente. Alginas de las recomendaciones producto de la visita realizada fueron:
- Compactar el RAP en capas de 15 cm cuando las capas sean muy gruesas.
- Para cada producción de MBR se realizan ensayos de laboratorio, la duración de los ensayos hasta obtener resultados es de 20 dias.
- Los ingenieros de la planta manifestaron que el material tipo RAP no compacta por lo que se debe colocar, una vez se cumplan los valores de densidades, una capa de 8 cm de base granular y compactar de inmediato para que la capacidad de soporte del RAP no se pierda.
Jueves 14 de septiembre
Se reciben y acopian 6 viajes de MBR y 2 viajes de RAP. Minicargador tuvo daño en radiador a las 2:00 PM. Se cereó la base en la curva desde k2+360 hasta k2+395, se tomó 1 densidad a la base granular. Se extendió base granular desde k2+480 hacia mayores hasta k2´580 del tramo 01.
Viernes 15 de septiembre
Se evidencia que el replanteo de la vía para ajustar el diseño geométrico se ha realizado en todo el tramo 01, no se han realizado apiques en la zona del gavión en la abscisa k2+800. Se realiza humectación, céreo y compactación de base granular desde la abscisa k2+480 hasta la abscisa k2+610. Se realiza toma de densidades por el método del cono de arena en abscisa k2+455 en el eje de la vía, abscisa k2+510 costado derecho, abscisa k2+580 costado izquierdo y abscisa k2+605 en el eje de la vía. La comisión de topografía de la interventoría verificó el céreo de base.
Sábado 16 de septiembre
Se extendió MBR en los siguientes segmentos: Desde abscisa k2+230 hasta abscisa k2+255, desde abscisa k2+310 hasta abscisa k2+395, desde abscisa k2+475 hasta abscisa k2+610.
Domingo 17 de Septiembre

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA UNIÓN TUNALES

1. Se solicita que el lunes no se aplique imprimación entre abscisas k2+400 y k2+475 ya que la base se encuentra aproximada sin cerear y sin verificación de densidades.
2. En la jornada de la mañana del lunes, las maquinas permanecen paradas y sin operarios, no hay avance de obra, tampoco se evidencia personal de la UMV que reemplace o colabore con las funciones de los inspectores ausentes.
3. Se solicita que todo el personal realice sus labores en obra los lunes desde las 7:00 am.
4. El martes se solicita que no se instale base granular desde k2+475 hasta k2+620. El material tipo RAP en este sector no ha sido recibido por la interventoría y en el momento de esta solicitud no se han realizado la toma de densidades en esta capa.
5. El material tipo RAP que ha sido instalado en los segmentos viales, ha demostrado que no compacta y que se deshace fácilmente. Así los ensayos de densidades muestren resultados satisfactorios, no se recomienda que se utilice como material de relleno o de nivelación sin el uso de algún tipo de aglutinante.
6. Para sellar el material tipo RAP entre abscisas k2+475 y k2+560 se colocó un salado de 8 cm de espesor en base granular, esto no se volverá a aceptar. La mejor solución es extender base justo después de que se cumplan los valores de densidades tomados en el RAP.
7. Para el día miércoles no han sido entregadas las observaciones del diseño geométrico en el sitio donde se está instalando MBR, actividad que fue encomendada por la UAERMV al ingeniero Cristian Jaque.
8. La imprimación aplicada el martes se levanta fácilmente evidenciando que no se limpió correctamente la superficie a imprimar.
9. Se reitera la solicitud de que la limpieza antes de la imprimación se realice con cepillos o sopladoras garantizando el retiro de polvo sin que haya perdida de los finos propios de la base granular.
10. El jueves, tras el no cumplimiento de la entrega del diseño geométrico desde la abscisa k2+400 hasta la abscisa k2+620 de tramo 01 que estaba para el 13-09-2023, el ingeniero Cristian Jaque se compromete a entregarlo el 15-09-2023. Este insumo es necesario para el avance sostenido de la obra.
11. Se solicita que el jueves no se aplique imprimación, se debe corregir material tipo base en abscisa k2+340, el segmento no está listo para imprimar e instalar MBR.
12. El 12 de septiembre la comisión de topografía de interventoría revisó ceredo de base desde k2+400 hasta k2+800.

TRAMO CAPITOLIO: No se ha dado inicio a las obras en este tramo. El 23 de agosto ingresó una unidad de trabajo del sindicato que hace parte del proyecto de regalías, no se ha dado inicio a la obras de la vía de en el tramo, por lo que no se explica la disposición de este recurso humano

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES REALIZADAS:
La profesional del componente social de la entidad ejecutora, realiza recorrido de obra en los frentes activos, con el fin de realizar atención móvil a la comunidad.
La profesional social de la entidad ejecutora realiza acompañamiento a las actividades técnicas de obra.
La profesional social de la entidad ejecutora, realiza gestión adelantada con el propietario Luis Rey Rey, con quien se verificaron las cercas perimetrales al predio, evidenciando que no se presenta ninguna afectación.
El 12 de septiembre del año en curso la profesional social de la entidad ejecutora realiza gestión, adelantada en conjunto con el componente ambiental, con el fin de verificar cuales fueron las adecuaciones realizadas en el predio del señor Rafael torres. El ciudadano recibe a conformidad dejando la trazabilidad del cierre.
El mismo día la entidad ejecutora realiza acta de socialización con los presidentes de las juntas de acción comunal (tunal alto y tunal bajo), con el fin de informar las actividades de cierre de la vía y que serán divulgadas a la comunidad. La profesional social realiza contacto con los presidentes de junta, con el fin de verificar la información suministrada y aclarar dudas al respecto.
El 13 de septiembre la entidad ejecutora realiza gestiónen visita en conjunta con el componente ambiental, con el fin de verificar cuales fueron las adecuaciones realizadas en el predio de la señora Edilma Melo. La ciudadana recibe a conformidad por parte de la propietaria dejando la trazabilidad del cierre.
El mismo día se realiza el segundo comité social con las profesionales sociales de la entidad ejecutora y la interventoría, con el fin de realizar seguimiento al componente social
El 14 de septiembre la interventoría realiza charla informativa con el personal de obra del sindicato, donde la interventoría presenta al equipo de trabajo, explica las funciones que desempeña la interventoría, y canaliza inquietudes y dudas de los trabajadores. Se realizan dos reuniones, una en el frente de obra de Capitolio y otra en Unión Tunales.
El mismo día el componente social de interventoría y de la entidad ejecutora, participa en recorrido realizado conjuntamente, con el fin de verificar los avances del proyecto y se participa en el comité semanal de seguimiento de obra.
Las profesionales sociales de la entidad realizan sensibilización a los conductores de las volquetas sobre la seguridad vial a los conductores de las volquetas, donde se les socializa las normas de seguridad básicas que deben tener al momento de realizar sus actividades, también se fortalece el tema de señales de tránsito, reductores de velocidad y la velocidad máxima a la que pueden conducir en el casco urbano y en la zona rural.
La interventoría solicita a las profesionales sociales de la entidad ejecutora realizar divulgación con la comunidad sobre los horarios de los cierres viales, se debe señalizar al inicio y al final del tramo de Unión tunales. Ellas realizan la divulgación, con el fin de multiplicar la información y que toda la comunidad de afluencia de la obra tenga conocimiento de los cierres.
A la fecha del cierre del presente informe la UAERMV, no han subsanado las observaciones al Plan de Gestión Social.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Acompañamiento en las actividades que se ejecutan durante la jornada laboral, se realiza mesa de trabajo para definir entregas de documentación del componente SST. Se evidencia el mantenimiento de baños portatiles y se revisan los preoperacionales de todas las maquinas y equipos

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES COMPONENTE SST
1. No hay señalización de acopio de material en unión tunales, además este no se encuentra cubierto en las noches como se había acordado en comités de seguimiento semanal de obra anteriores.
2. El martes se realiza imprimación a las 7:00 PM a oscuras, limpiando con escobas domésticas, no hay señalización ni luminarias para trabajar de noche, generando condiciones no seguras para las actividades.
3. El viernes la imprimación se realizó a oscuras y sin luminarias generando condiciones no seguras para los trabajadores.
4. El lunes se evidencia sitio de acopio de combustibles sin etiquetado, además de dique de contención de derrame ausente en tramo Capitolio. Se reitera organización de acopio de combustibles con el etiquetado respectivo SGA.
5. Se reitera curbir material en el acopio del tramo capitolio.
6. Se realiza observación en volqueta placas OBG908, lacual presenta llantas 5 y 6 en avanzado estado de deterioro, representando un peligro inminente.
7. Se realiza inspección en camioneta con placa OLO412, la cual presenta llantas lisas sobre el límite de desgaste.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Acompañamiento en las actividades que se ejecutan durante la jornada laboral.

OBSERVACIONES Y SOLICTIUDES COMPONENTE AMBIENTAL - UNIÓN TUNALES
1. Se mantiene material RCD en varios puntos de la vía generando incomodidad para vehículos que transitan y generando impresión de descuido del tramo.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

El presupuesto no ha sido avalado por la interventoría, por lo tanto no se han formalizado los items que hacen parte de la ejecución de las obras.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Implementación de PMT abscisa k2+270 tramo 01 Unión tunales



Descripción Foto 2.

Toma de densidades por el método del cono de arena a base granular en abscisa k+395



Descripción Foto 3.

Humectación y compactación de cereado de MBR entre abscisas k2+395 y k2+475



Descripción Foto 4.

Compactación y cereado de base granular desde abscisa k2+400 hasta abscisa k2+485



Descripción Foto 5.

Imprimación de base granular para extendido de MBR entre abscisas k2+480 y k2+610




Descripción Foto 6.

Extendido de base granular entre abscisas k2+475 y k2+580



Descripción Foto 7.

Extend do de base granular absicsa k2+520

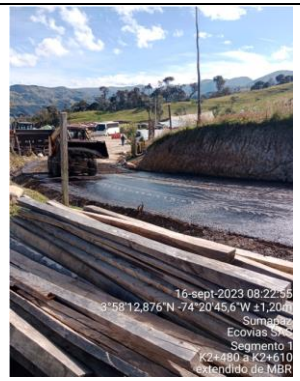

Descripción Foto 8.

Extendiido de MBR entre abscisas k2+480 y k2+610

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". .	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
PLAZO ACTUALIZADO PRÓRROGA No.1		DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ACTUALIZADO PRÓRROGA No.2		VEINTIDOS (22) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2025	2/06/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Sebastián Saldarriaga Rivera - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz ECOVIAS S.A.S - Interventor	Sebastián Saldarriaga Rivera - Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz ECOVIAS S.A.S - Interventor
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	67	16
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	8	2

SEMANA N. **10** **DEL** lunes, 18 de septiembre de 2023 **AL** domingo, 24 de septiembre de 2023

AVANCES DE OBRA

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	-	-	-	-
Valor del Trabajo Programado	-	-	-	-

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	Aprobación por parte de la Interventoría del producto técnico de topografía actualizada del tramo vial ÁNIMAS BAJAS (Levantamiento topográfico y Modelo Digital de Terreno) 4310 m Comunicación de ECOVIAS SAS PENDIENTE POR CONCEPTO DE APROBACION **Para el presente periodo, no se presenta actividades de obra en el tramo animas bajas.**
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	**Para el presente periodo, no se presentan actividades de obra en el tramo laguna verde**
TRAMO SAN ANTONIO	NA	NA	NA	Elaboración y entregas a la Interventoría del producto técnico "Adaptación del diseño geométrico a la topografía actual", del tramo vial SAN ANTONIO (K0+000-->K13+820). La topografía de San Antonio 1 presenta observaciones por parte de la interventoría. **Para el presente periodo, no se presenta actividades de obra en el tramo San Antonio** debido a que no hay nuevo diseño geométrico aprobado por la interventoría para el tramo.

TRAMO CAPITOLIO	N/A	N/A	N/A	Para el presente periodo, no se presenta actividades de obra en el tramo Capitolio debido a que no hay nuevo diseño geométrico aprobado por la interventoría para el tramo. La UAERMV se encuentra reparando fallos de la vía dentro de sus labores misionales, esto es necesario para la construcción de la estructura de la vía.
TRAMO UNIÓN-TUNALES	N/A	N/A	N/A	Elaboración y entregas a la Interventoría del producto técnico "Adaptación del diseño geométrico a la topografía actual", del tramo vial UNIÓN-TUNALES Para el presente periodo, se está ajustando el diseño geométrico en el tramo 1 , se realizan entregas parciales para poder avanzar en obra. - Nivelación y mejoramiento de rasante actual con material seleccionado. Incluye excavaciones (Ancho de banca 4,60 m) - Extendida y compactación de base granular tipo B (Esp=0,15 m). Incluye humectación si es requerido. - Imprimación, extendido y compactación de MBR (Esp=0,15 m)

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	35.684.399.806,00				

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNÍÓN TUNALES

Personal disponible en el tramo:
Personal disponible en el tramo:
Residente de obra, profesional de trazabilidad, residente ambiental, 1 apoyo ambiental, 1 apoyo de residente social, 1 apoyo a residente SST, 1 inspector, 1 oficial, 2 auxiliares de tráfico, 2 ayudantes, 2 BOAL, 2 topógrafos, 4 cadeneros, 1 operador mini cargador, 1 operador compactador neumático, 1 operador motoniveladora, 1 conductor de carro tanque, 1 operador vibro compactador.

Personal de interventoría disponible: 2 residentes de interventoría, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 topógrafo, 1 cadenero, 2 conductores de camioneta.

Maquinaria evidenciada: 2 mini cargador, 1 vibro compactador, 1 compactador sobre neumáticos, 1 compactador tandem, 1 motoniveladora, 1 carro tanque, 2 camionetas, 1 volqueta.

Actividades realizadas:
LUNES 18 DE SEPTIEMBRE
- Humectación y compactación de MBR entre abscisas k2+305 a k2+395 en segmento 1.
- Humectación y compactación de MBR entre abscisas k2+495 a k2+510 en segmento 1.
- Volqueta interna realiza trasiego de material.
- Comisión topográfica de la interventoría realiza levantamiento topográfico de la superficie del terreno natural desde la abscisa k2+800 hasta k2+969, en segmento 1.

MARTES 19 DE SEPTIEMBRE
- Se realiza reparaciones y nivelación de MBR instalado en días anteriores.
- Volqueta interna y retroexcavadora no realizan actividades durante la jornada.

MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE
- Nivelación de MBR entre abscisas k2+340 y k2+360
- Humectación y compactación de MBR entre k2+310 y k2+610
- Comisión topográfica de la interventoría realiza revisión de nivelación (cereo) del MBR desde k2+310 hasta k2+610 del segmento 1.

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE
- Se realiza nivelación de la subrasante utilizando material RAP desde k2+670 hacia mayores.
- No hay pista para ejecutar obra debido a la no entrega del diseño geométrico.

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE
- Se realiza compactación de material RAP desde ka2+670 hacia mayores.
- Se realiza visita de la contraloría, y recorrido a los frentes de obra unión tunales y Capitolio.

SABADO 23 DE SEPTIEMBRE
No se realizaron actividades de obra

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE
No se realizaron actividades de obra

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA UNIÓN TUNALES

OBSERVACIONES
- Presencia de fisuras en los tramos que se están compactando, hay lugares donde el MBR se ha desplazado y requiere ser reparado como entre abscisas k2+370 a k2+395 costado izquierdo. De igual forma en abscisa k2+480, costado izquierdo.
- No se cumple con los compromisos de entrega del diseño geométrico del segmento 1, lo que compromete el avance de obra. No hay pista para ejecutar obra.

TRAMO CAPITOLIO: No se ha dado inicio a las obras en este tramo. El 23 de agosto ingresó una unidad de trabajo del sindicato que hace parte del proyecto de regalías, no se ha dado inicio a la obras de la vía de en el tramo, por lo que no se explica la disposición de este recurso humano

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- La profesional del componente social de la entidad ejecutora realiza recorrido de obra, en los frentes activos, con el fin de realizar atención móvil a la comunidad.
- La profesional social de la entidad ejecutora realiza acompañamiento a las actividades técnicas de obra.
- El 19 de septiembre del 2023, la interventoría realizó recorrido en el frente de obra de Capitolio, no se encontró a la profesional social en obra, no es posible revisar documentación de los soportes de las actividades realizadas. Así mismo se hace recorrido en el frente de Unión Tunales, donde se revisa la documentación de los soportes de las actividades realizadas, se verifica actas de vecindad, actas de compromiso, listado entrega de volantes, acta de gestión adelantada, adecuación del punto de atención al usurario, instalación de punto informativo (PSI). Toda la información presenta observaciones, pendiente aprobación por parte de la interventoría.
- La profesional social y el Ing. Ambiental de la entidad ejecutora realizan un acta de compromiso en el frente de obra de Unión Tunales, con el fin de concretar punto de acopio para material con la señora Leidy Penagos en la abscisa K3+ 260.
- El 20 de septiembre del 2023. La profesional social de la entidad ejecutora efectúa un recorrido con el fin de ubicar puntos para la instalación de pasacalles informativos y con ello levantar un sondeo en el cual la población recibirá información del contrato.
- EL 21 de septiembre del 2023, la profesional social de la entidad ejecutora, realiza adecuación del punto de atención donde se instala volante informativo, documento de PMT y se organiza la documentación correspondiente al componente social. De igual manera realiza acta de comprimo con la señora Luz Fabiola, con el fin de solicitar permiso para la ubicación de los pasacalles y evaluar el impacto ambiental en el terreno a utilizar para su instalación.
- El 22 de septiembre del 2023, la profesional social de la entidad ejecutora, realiza acta de compromiso en los predios de la señora María Lilia Páez y el señor Luis Molina, en compañía del componente ambiental con el fin de verificar impactos relevantes sobre el terreno que se va a utilizar para la instalación de los pasacalles informativos y solicitar permisos para la ubicación de estos.
- La interventoría social realiza comité de seguimiento social N° 3, con el fin de verificar las actividades y compromiso del componente social, se evidencia cumplimiento en la subsanación de observaciones a las actas de vecindad del frente de Unión Tunales, en cuanto al frente de Capitolio se revisa documentación, esta se encuentra incompleta, no se evidencia trazabilidad de actividades sociales, se requiere subsanar observaciones.
- El 23 de septiembre de 2023, se participa en el comité de seguimiento integral.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Acompañamiento en las actividades que se ejecutan durante la jornada laboral

OBSERVACIONES Y SOLICTIUDES COMPONENTE SST

OBSERVACIONES

- Para esta semana se evidenció la ausencia de preoperacional en uno del vibro compactador del tramo Tunales, operado por el señor Alberto Pulido.
- En inspecciones realizadas, se evidencia en las camionetas, placas OLO-412 Y OLO-414, además de la volqueta placa OBG-908 de la UAERMV, con deterioro excesivo en llantas.
- Se sigue presentando transporte de personal en el platón de las camionetas, , lo cual en comités anteriores, ya la interventoría había hecho la observación, de parar con estos actos inseguros.
- Ingresa el 19 de septiembre, dos operadores de minicargador nuevos, Miguel Carvajal, Gabriel Zamora y José Lucumí, los cuales la UAERMV no hizo el reporte respectivo con antelación.

SOLICITUD:

- Se solicita enfáticamente, cuando llegue una maquina o vehículo al proyecto, venga con su preoperacional respectivo y de esta forma el operario pueda hacer las observaciones respectivas y el encargado SST haga el reporte correspondiente.
- Ante el mal estado de llantas en vehículos, la interventoría pide detener operaciones con estos mismos y evitar un posible accidente fatal.
- El transporte de personal se debe realizar de forma segura, ˙por lo tanto la interventoría solicita para con este tipo de acciones que ponen en riesgo la vida de los trabajadores.
- En comités anteriores ya se había hecho el acuerdo con la UAERMV, del reporte de personal nuevo con antelación, lo cual ante el hecho que ingresen trabajadores nuevos sin el reporte de su afiliación a seguridad social y demás, es una violación a los acuerdos pactados, por lo tanto, la interventoría solicita una explicación de porque se está incumpliendo este tema.
- Ante el incidente que ocurrió la 2da semana de septiembre, en donde una de las volquetas engancho un cable de energía y este cayó al lado de varios trabajadores, la interventoria solicita la investigación de lo sucedido y planes de acción implementados para evitar se repitan este tipo de situaciones.
- Se solicita a la UAERMV, corregir tapa capó de la camioneta placas OLO-412, la cual según se evidencia es de difícil apertura, ocasionando que el conductor no revise los líquidos de motor diariamente.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Acompañamiento en las actividades que se ejecutan durante la jornada laboral.

OBSERVACIONES Y SOLICTIUDES COMPONENTE AMBIENTAL:

Observaciones:

- En esta semana en el tramo Capitolio, se evidencia acopio de combustible en desorden y sin el etiquetado en recipientes.
- Se observa material acopiado sin cubrir en los tramos Tunales y Capitolio.
- Se observan canecas donde viene emulsión asfáltica, a lo largo del tramo Tunales.

Solicitud:

- Se solicita de parte de la interventoría generar un orden y aseo en los sitios de acopio de combustible, además del etiquetado de los mismo.
- Por temas de arrastre y contaminación de aguas y suelo, se solicita a la UAERMV, que cubra los materiales que se van a utilizar en la obra, teniendo en cuenta que estos mismos cambian sus características y cualidades al estar expuestos al sol y al agua y no van a generar al instalarlos la misma calidad con la que llegó inicialmente.
- Se solicita a la UAERMV, acopiar de manera y sitio adecuado las canecas donde viene la emulsión asfaltico, eliminando contaminación por un posible derrame de este material además de un accidente si estas se llegan a voltear y salen rodando por la vía.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

El presupuesto no ha sido avalado por la interventoría, por lo tanto no se han formalizado los items que hacen parte de la ejecución de las obras.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Instalación de fresado estabilizado (MBR) entre abscisas k2+510 a k2+580



Descripción Foto 2.

Fresado estabilizado (MBR) desde k2+510 hacia mayores.



Descripción Foto 3.

Compactación sobre neumaticos de MBR en k2+220 - k2+245



Descripción Foto 4.

Reparación, arreglo de niveles del MBR entre k2+340 - k2+360



Descripción Foto 5.

Extendido de material RAP entre k2+640 - k2+765, de manera aproximada.



Descripción Foto 6.

Compactación de material RAP entre k2+670 - k2+765



Descripción Foto 7.

Maquinaria disponible en tramo Union Tunales





Descripción Foto 8.

Maquinaria disponible en tramo Capitolio

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
PLAZO ACTUALIZADO PRÓRROGA No.1		DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ACTUALIZADO PRÓRROGA No.2		VEINTIDOS (22) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2025	2/06/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Sebastián Saldarriaga Rivera - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz ECOVIAS S.A.S - Interventor	Sebastián Saldarriaga Rivera - Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz ECOVIAS S.A.S - Interventor
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	67	16
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	8	2

SEMANA N. **11** **DEL** lunes, 25 de septiembre de 2023 **AL** domingo, 1 de octubre de 2023

AVANCES DE OBRA

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	-	-	-	-
Valor del Trabajo Programado	-	-	-	-

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	Aprobación por parte de la Interventoría del producto técnico de topografía actualizada del tramo vial ÁNIMAS BAJAS (Levantamiento topográfico y Modelo Digital de Terreno) 4310 m Comunicación de ECOVIAS SAS PENDIENTE POR CONCEPTO DE APROBACION **Para el presente periodo, no se presenta actividades de obra en el tramo animas bajas.**
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	**Para el presente periodo, no se presentan actividades de obra en el tramo laguna verde**
TRAMO SAN ANTONIO	NA	NA	NA	Elaboración y entregas a la Interventoría del producto técnico "Adaptación del diseño geométrico a la topografía actual", del tramo vial SAN ANTONIO (K0+000-->K13+820). La topografía de San Antonio 1 presenta observaciones por parte de la interventoría. **Para el presente periodo, no se presenta actividades de obra en el tramo San Antonio** debido a que no hay nuevo diseño geométrico aprobado por la interventoría para el tramo.

TRAMO CAPITOLIO	N/A	N/A	N/A	Para el presente periodo, no se presenta actividades de obra en el tramo Capitolio debido a que no hay nuevo diseño geométrico aprobado por la interventoría para el tramo. La UAERMV se encuentra reparando fallos de la vía dentro de sus labores misionales, esto es necesario para la construcción de la estructura de la vía.
TRAMO UNIÓN-TUNALES	N/A	N/A	N/A	Elaboración y entregas a la Interventoría del producto técnico "Adaptación del diseño geométrico a la topografía actual", del tramo vial UNIÓN-TUNALES Para el presente periodo, se está ajustando el diseño geométrico en el tramo 1 , se realizan entregas parciales para poder avanzar en obra. - Nivelación y mejoramiento de rasante actual con material seleccionado. Incluye excavaciones (Ancho de banca 4,60 m) - Extendida y compactación de base granular tipo B (Esp=0,15 m). Incluye humectación si es requerido. - Imprimación, extendido y compactación de MBR (Esp=0,15 m)

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	35.684.399.806,00				

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNÍÓN TUNALES

Personal disponible en el tramo:
Personal disponible en el tramo:
Residente de obra, profesional de trazabilidad, residente ambiental, 1 apoyo ambiental, 1 apoyo de residente social, 1 apoyo a residente SST, 1 inspector, 1 oficial, 2 auxiliares de tráfico, 2 ayudantes, 2 BOAL, 2 topógrafos, 4 cadeneros, 1 operador mini cargador, 1 operador compactador neumático, 1 operador motoniveladora, 1 conductor de carro tanque, 1 operador vibro compactador.

Personal de interventoría disponible: 2 residentes de interventoría, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 topógrafo, 1 cadenero, 2 conductores de camioneta.

Maquinaria evidenciada: 2 mini cargador, 1 vibro compactador, 1 compactador sobre neumáticos, 1 compactador tandem, 1 motoniveladora, 1 carro tanque, 2 camionetas, 1 volqueta..

Actividades realizadas:
LUNES 25 DE SEPTIEMBRE
- Se realizo conformación de la subrasante (corte) desde abscisa k2+800 a k2+830.
- Se realizo extendido y compactación de RAP desde abscisa k2+670 hasta k2+800.
- Una de las comisiones topográficas de la UAERMV realiza replanteo de niveles de rasante desde k2+830 hacia mayores.
- Clima seco

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE
- Se continua con la instalación de material tipo RAP desde la abscisa k2+800 hasta la abscisa k2+969.
- Comisión de topografía de la interventoría revisa localización y replanteo, y niveles de la subrasante entre k2+880 y k2 +969
- Clima seco

MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE
- No se realizan actividades de obra durante la jornada. La UAERMV no dispone de personal en el frente de obra.
- Se realiza capacitación de brigada de emergencia a la que asistió todo el personal de la UMV y del sindicato, esta se llevo a cabo en el centro poblado de San Juan.

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE
- Humectación y compactación de material RAP entre abscisas k2+675 y k2+969. Se tomaron densidades por el método de cono de arena a este material.
- Se extendió y compacto base entre abscisas k2+670 y k2+845 (de manera aproximada).
- Comisión de topografía de la interventoría revisa localización y replanteo, y niveles de la subrasante entre k2+670 y k2+880.

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE
- Se realizo cereo de base granular entre abscisas k2+670 y k2+850.
- Se lleva a cabo comité de seguimiento semanal de obra de la UAERMV.

SABADO 30 DE SEPTIEMBRE
- Comisión de topografía de la interventoría revisa cereo de base granular desde k2+880 hasta k2+960 del segmento 1.
- Se realizo toma de densidades sobre la base granular por el método del cono de arena, se realizaron 5 ensayos entre k2+675 y k2+850 del segmento 1.
- Se realizo imprimación con emulsión de rompimiento lento entre abscisas k2+670 y k2+770 del segmento 1, tramo Unión Tunales.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA UNIÓN TUNALES

OBSERVACIONES
- Durante el fin de semana de la semana anterior, las lluvias ocasionaron el arrastre de finos de la superficie de MBR, la formación de zanjas sobre el MBR en los hombros de la vía y la socavación de la estructura del pavimento. Se solicita la limpieza de las zanjas laterales y que se permita la salida de agua de la superficie del MBR, ya que el material acumulado en los hombros de la vía no permite el drenaje transversal del agua.
- Se reitera a la UAERMV no realizar trabajos nocturnos hasta que no se garantice iluminación y condiciones de trabajo seguras para los trabajadores. Se aplico emulsión sobre MBR instalado desde k2+460 hasta k2+565 segmento 1.

TRAMO CAPITOLIO: No se ha dado inicio a las obras en este tramo. El 23 de agosto ingresó una unidad de trabajo del sindicato que hace parte del proyecto de regalías, no se ha dado inicio a la obras de la vía de en el tramo, por lo que no se explica la disposición de este recurso humano

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Frente de Capitolio

Se adelantan actividades en los siguientes programas:

•Programa de atención al Usuario
•Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

Frente de Unión Tunales.

Se adelantan actividades en los siguientes programas:

•Programa de atención al Usuario

La interventoría realizó recorrido en el frente de obra de Capitolio, la profesional social, presenta documentación incompleta, realiza observaciones solicita subsanar y hacer entrega de las mismas para el martes 3 de octubre del 2023. De igual manera solicita completar las 16 actas de vecindad que se evidenciaron en el recorrido realizado.

Así mismo se hace recorrido en el frente de Unión Tunales, donde se revisa la documentación de los soportes de las actividades realizadas, se verifica 13 actas de vecindad, 16 actas de compromiso, 12 actas de gestión adelantada, 3 formatos de puntos fijos. La interventoría evidencia cumplimiento a las observaciones emitidas y solicita hacer entrega de los registros fílmicos de las actas de vecindad, la profesional social se compromete a realizar entrega el 6 de octubre del 2023.

La interventoría social realiza comité de seguimiento social N° 4, con el fin de verificar las actividades y compromisos del componente social, se evidencia cumplimiento en la subsanación de observaciones a las actas de vecindad del frente de Unión Tunales y el frente de Capitolio se revisa documentación, esta se encuentra incompleta, no se evidencia trazabilidad de actividades sociales, subsanar observaciones.

El componente social de interventoría y la entidad ejecutora participa en el comité de seguimiento integral.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Acompañamiento en las actividades que se ejecutan durante la jornada laboral

OBSERVACIONES Y SOLICTIUDES COMPONENTE SST
Observaciones
- En inspección a motoniveladora del proyecto se evidencia el mal estado del cinturón de seguridad
- El 27 de septiembre, la UAERMV, realiza capacitación de brigada a todo el personal de obra, generando el cese de actividades en obra durante todo el día.
- En inspecciones entregadas por parte de la residente SST de la UAERMV, y en comité del 29 de septiembre se le hace la observación a la Residente, de las inspecciones entregadas las cuales reportan existencia de botiquín de primeros auxilios sin existir, además del reporte de extintores de Solkaflam en obra los cuales tampoco existen.

Solicitud:
- La interventoría solicita se haga la reparación correspondiente al cinturón de seguridad de la motoniveladora y de esta manera evitar un posible accidente en el operador
- La interventoría pide al personal SST de la UAERMV, se revise a conciencia y detenidamente las inspecciones que presentan y no incurrir en los errores expuestos en comité y señalados anteriormente.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Acompañamiento en las actividades que se ejecutan durante la jornada laboral.

OBSERVACIONES Y SOLICTIUDES COMPONENTE AMBIENTAL:
Observaciones:
- Se observa dique de contención de combustibles bajo el nivel del piso en tramo Tunales, ante esto y después de una lluvia intensa se llenó de agua generando riego de combustible y contaminación en el suelo directamente.

Solicitud:
- La interventoría solicita se adecuen los diques de contención, los cuales no tengan el riesgo de derrames y puedan generar contaminación en el medio ambiente.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

El presupuesto no ha sido avalado por la interventoría, por lo tanto no se han formalizado los items que hacen parte de la ejecución de las obras.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Humectación y compactación de material RAP desde k2+885 hacia mayores



Descripción Foto 2.

Revisión de replanteo y niveles por parte de la interventoría



Descripción Foto 3.

Recorrido a obra ejecutada, previo a comité de seguimiento semanal de obra



Descripción Foto 4.

Cereo de base granular hasta k2+850



Descripción Foto 5.

Maquinaria disponible en el frente de obra Union Tunales.



Descripción Foto 6.

Compactación de base granular entre k2+670 - k2+850



Descripción Foto 7.

Instalación de base granular desde k2+900 hacia mayores - segmento 1



Descripción Foto 8.

Cargue de material RAP con minicargadores

4.F COMUNICACIÓN ESPECIALISTAS

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-294

Bogotá D.C. 28 de septiembre de 2023.

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: JULIO CESAR PINZÓN REYES
Gerente de proyecto.

Atn: RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

Asunto: Observaciones carpeta MBR (Material Bituminoso Reciclado) instalado por la UAERMV – Tramo Tunales.

Respetados señores:

Cordial saludo

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA, CLÁUSULA 10 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR: TÉCNICAS: subnumerales 1,8 y 12 ADMINISTRATIVAS:10,12,13,14,16,19,21,22 y 28 JURÍDICAS: 1,7 y 8 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022. A continuación, se relacionan las observaciones al MBR instalado, producto de inspecciones visuales realizadas durante los recorridos de la interventoría, estas han sido socializadas al residente de obra de la UAERMV durante la ejecución de las obras y reiteradas en comités semanales de obra.

Se aclara que la revisión realizada comprende los siguientes segmentos viales:

Tabla 1 – Segmentos viales donde se realizó inspección visual a MBR en tramo 1 Unión Tunales.

Abscisas de MBR instalado	Día de colocación
K2+030-k2+115	22-08-2023
K2+115-k2+165	25-08-2023
K2+165 – k2+220 y k2+265 –k2+310	29-08-2023

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-294

Se realiza un resumen de los daños evidenciados en cada uno de los segmentos viales relacionados en la *Tabla 1: Segmentos viales donde se realizó inspección visual a MBR en tramo 1 Unión Tunales*. No se incluyen segmentos donde recientemente se instaló el MBR, ya que se encuentra en proceso de compactación y corrección de niveles.

Daños evidenciados entre abscisas K2+030-k2+115:

- Se presentan fisuras longitudinales y transversales a lo largo de todo el segmento, en la fotografía 1, se evidencia la presencia de las fisuras longitudinales y transversales de severidad baja que están formando un patrón de piel de cocodrilo. La fotografía corresponde a la abscisa k2+070 en el costado derecho. La formación de fisuras en la superficie de la vía ha sido catalogada por el residente de obra y el director de obra como algo normal en el MBR que se va mejorando con el tránsito vehicular. Sin embargo, la interventoría ha evidenciado que con el tiempo han aparecido más fisuras y las que se encuentran en el tramo no han mejorado con el tránsito. Las fisuras y la formación del patrón de piel de cocodrilo son el resultado de prácticas deficientes de compactación en cualquiera de las capas de la estructura del pavimento.

- En ambos costados de la vía, en una franja de 40 cm hay fisuras longitudinales a lo largo del segmento, estas fisuras de severidad media son producto del descascaramiento lateral del MBR a falta de confinamiento lateral de la estructura la vía. El MBR compacta en la franja central de la vía, pero si no se cuenta con confinamiento lateral se fisura y descascara con la aplicación de pequeñas cargas en los extremos laterales. Esto se muestra en las fotografías 2, 3 y 4. En las fotografías citadas también se evidencia en el que en el costado, el asfalto segregado está mal perfilado y compactado, se debe revisar el proceso constructivo y la pericia de la cuadrilla instaladora.

- El acabado del MBR instalado se asemeja al de una estructura de pavimento flexible con desgaste superficial de severidad media, es decir presenta irregularidades mayores a 3 mm y se observan las partículas del agregado grueso, esto se muestra en la fotografía 5.

Debido a los daños evidenciados en este segmento, la UAERMV tomó la decisión de ampliar el ancho de la estructura de la vía instalada de 4.6 m a 5.6 m, de manera que se garantice compactación adecuada en el ancho útil de la vía, evitando la fisuración longitudinal de los hombros de la vía en la franja de 4.6 m.

En los comités de seguimiento semanal de obra la UAERMV dejó claro que en cada costado se van a cortar los 0.5 m adicionales de MBR y que en esas franjas de 0.5 m se va a garantizar la limpieza de material tipo RAP y base granular para que el consorcio estabilización vial pueda

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

realizar la actividad de construcción de cunetas. La interventoría también ha indicado que solo se liberarán las cantidades de la franja de 4.6 m de estructura de vía y de los sobre anchos que la UAERMV propone en los cambios al diseño geométrico y que son aprobados por el especialista en diseño geométrico de la interventoría.

En el tramo que ha sido denominado por la UAERMV como el tramo de prueba, que además de los daños evidenciados, presenta errores en los niveles de la rasante de la vía, tal y como se puede observar la *tabla 2: Revisión de niveles de rasante unión tunales.*

A continuación, se presenta el registro fotográfico con o relacionado anteriormente:

Fotografía 1. Patrón de fisuras en abscisa k2+070 costado derecho



Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-294

Fotografía 2. Fisuras longitudinales en abscisa k2+043 costado derecho



Fotografía 3 Perdida de MBR lateral por la aplicación de pequeñas cargas equivalentes a la pisada de una persona



Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-294

Fotografía 4. Fisuras longitudinales en abscisa k2+115 costado derecho



Fotografía 5. Desgaste superficial de severidad media en abscisa k2+100 costado derecho



Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

Tabla 2. Revisión de niveles de rasante Unión tunales

REVISIÓN RASANTE UNIÓN TUNALES POSITIVO: Indica la cantidad en centímetros inferior al nivel de rasante proyectada NEGATIVO: Indica la cantidad en centímetros superior al nivel de rasante proyectada CERO: Indica que el nivel corresponde a la rasante proyectada					
NIVELES DESPUES DE REVISIÓN					
ABSCISAS	**PEN. % TRANSVERSAL**	**IZQ**	**EJE**	**DER**	**PEN. % TRANSVERSAL**
K2+030,00	-2,00%	2	0	3	-2,00%
K2+040,00	-2,00%	3	0	3	-2,00%
K2+050,00	-2,00%	2	-2	2	-2,00%
K2+060,00	-2,00%	2	-1	2	-2,00%
K2+070,00	-2,00%	2	-1	1	-1,40%
K2+080,00	-2,00%	3	2	2	1,00%
K2+090,00	-2,60%	0	0	3	2,60%
K2+100,00	-2,60%	0	0	2	2,60%
K2+110,00	-1,20%	1	0	-1	1,20%
K2+120,00	1,70%	-2	0	-2	-1,70%
K2+130,00	4,40%	1	0	-3	-4,40%
K2+140,00	4,40%	1	0	0	-4,40%
K2+150,00	0,40%	0	1	-1	-0,40%
K2+160,00	-5,20%	-4	-2	0	5,20%
K2+170,00	-5,20%	-4	-2	1	5,20%
K2+180,00	-5,20%	-2	1	1	5,20%
K2+190,00	-5,20%	-3	0	0	5,20%
K2+200,00	-4,80%	0	0	1	4,80%
K2+210,00	-2,80%	0	0	2	2,80%
K2+220,00	-0,80%	-2	0	0	0,80%
K2+230,00	1,20%	1	0	0	-1,20%
K2+240,00	3,20%	0	1	0	-3,20%
K2+250,00	5,20%	1	-2	-4	-5,20%
K2+260,00	3,80%	-2	-2	-3	-3,80%
K2+270,00	1,30%	-1	-1	-2	-2,00%
K2+280,00	-0,50%	-2	0	-3	-1,50%
K2+290,00	-1,40%	0	0	-1	-0,60%
K2+300,00	-2,00%	-2	-1	-1	0,90%
K2+310,00	-3,30%	-3	-1	-1	3,30%

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-294

De la tabla 2: *Revisión de niveles de rasante Unión tunales*, se concluye que desde la abscisa k2+030 hasta la abscisa k2+100, el MBR quedó con espesores de 0.12 m y 0.13 m, la capa de MBR instalada debe ser de 0.15 m.

Daños evidenciados entre abscisas K2+115-k2+165:

En este tramo se construyó una estructura de vía con un ancho de 5.6 m, el proyecto contempla un ancho de vía de 4.6 m, por lo que los daños evidenciados corresponden a sitios localizados al menos a 0.5 m de cada costado de la vía. Se encuentran los mismos tipos de daños que entre abscisas K2+030 y k2+115, a excepción que en este tramo, según la tabla *2: Revisión de niveles de rasante Unión tunales*, el MBR presenta espesores superiores a 0.15 m, estos espesores son aceptables ya que no afectan el bombeo y el peralte de diseño de la vía,

A continuación de indican algunos de los daños evidenciados:

- Desprendimiento de agregado fino y grueso por evidentes defectos en el proceso de compactación, como ejemplo se evidencia en la abscisa K2+160 costado derecho y en la abscisa k2+165 costado derecho, como se muestra en las fotografías 6 y 7.

Fotografía 6 – Desprendimiento de agregado fino y grueso en abscisa k2+160 costado derecho



Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

Fotografía 7– Desprendimiento de agregado fino y grueso en abscisa k2+165 costado derecho



Daños evidenciados entre abscisas K2+165 – k2+220 y k2+265 –k2+310:

En este tramo se construyó una estructura de vía con un ancho de 5.6 m, el proyecto contempla un ancho de vía de 4.6 m, por lo que los daños evidenciados corresponden a sitios localizados al menos a 0.5 m de cada costado de la vía. Se encuentran los mismos tipos de daños que en los segmentos anteriores. En este tramo, según la tabla *2: Revisión de niveles de rasante Unión tunales*, el MBR presenta espesores superiores a 0.15 m, estos espesores son aceptables ya que no afectan el bombeo y el peralte de diseño de la vía.

Algunos de los daños evidenciados son:

- Ahuellamiento de severidad baja en abscisa k2+290 sobre el eje de la vía, es común en los tramos anteriores, aunque no se evidencia mediante fotografías. Esto se muestra en la fotografía 8. En la fotografía también se observan varios defectos de acabado como la compactación de materiales sueltos sobre la capa terminada, segregación y fisuración del pavimento.

- En la abscisa k2+185 en el costado derecho se presentan fisuras longitudinales de

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-294

severidad alta. Los lugares donde hay que rellenar con RAP e instalar la estructura de la vía han mostrado que entre más alto sea la nivelación con material tipo RAP, el hombro de la vía tiende a desprenderse al paso del vibro compactador, motivo por el cual el diseño geométrico tendrá que ser modificado para evitar espesores de más de 15 cm de aplicación de material tipo RAP por debajo de la estructura de la vía. Se aclara que el daño mostrado en la fotografía no está dentro de la franja de 4.6 m, sin embargo, la localización de estas fisuras dependerá del material aplicado en capas inferiores y de las prácticas de compactación. En la fotografía 9 se muestra que la prolongación de la fisura se encuentra en dirección al interior de la vía por lo que se deben tomar medidas para el control de este tipo de daño.

Fotografía 8: Ahuellamiento en abscisa k2+290 sobre el eje de la vía.



Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-294

Fotografía 9 Fisuras de severidad alta en abscisa k2+165 costado derecho



En general el acabado evidenciado en todo el MBR que ha sido instalado en las fechas mencionadas, no es el adecuado, se están compactando superficies contaminadas, dejando zonas segregadas y en los costados no se le está dando el soporte adecuado a la capa asfáltica, lo que ha derivado en la aparición prematura de fisuras y ahuellamientos, estos defectos de soporte al parecer provienen de la capa de RAP instalada, que en los costados no es compactada adecuadamente y se desconfina fácilmente, todos estos defectos deben ser solucionados por la UAERMV quien como primera medida debe garantizar que el material tipo RAP compacte adecuadamente, para esto debe garantizar una granulometría que facilite este proceso o en su defecto debe implementar la adición ligantes que lo faciliten, posteriormente se deben implementar controles más exigentes en el extendido de la capa de MBR que garanticen una superficie uniforme y bien compactada, para la Interventoría es claro que mientras no se solucionen los problemas de compactación, el soporte de la capa de RAP y mientras no se mejore el acabado de la capa final, se seguirán presentado fallas prematuras en el pavimento, adicionalmente se indica que la medida implementada por la UAERMV de colocar sobreanchos en la estructura del pavimento para garantizar la compactación de los bordes de la vía establecidos por el diseño no corresponde a una solución efectiva, dado que claramente la génesis de las patologías descritas en los párrafos anteriores surge en los defectos de compactación de los bordes de la capa de RAP instalada, hacer sobreanchos corresponde a sobrecostos de la UAERMV que esta Interventoría no avalará para pago.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-294

Los daños y su severidad se estimaron teniendo como referencia el manual para la inspección visual de pavimentos flexibles de la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto nacional de vías, INVIAS.

En lugares donde el espesor verificado del MBR exceda el espesor de diseño (0.15 m), se verifica si se afecta el bombeo y el peralte de la vía. Se conmina a la UAERMV a realizar un control riguroso de las especificaciones y espesores de diseño de manera que no se malgaste material y se incurra en sobrecostos innecesarios.

Se reitera que es necesario modificar el diseño geométrico vertical, ya que el actual proyecta la realización de llenos significativos con material tipo RAP a pesar de que la rasante actual ofrece buenas condiciones de soporte, estos llenos implican la realización de inversiones onerosas innecesarias que pueden ser evitadas...

Con lo relacionado anteriormente, y en consideración a que este tipo de afectaciones no se deberían estar presentando en la carpeta de MBR recién instalada, se le solicita a la UAERMV, que emita concepto por parte de sus especialistas e informe a la interventoría qué medidas se van a tomar para que no se sigan presentando. Adicionalmente, se explique cómo se van a reparar las ya presentadas y se presente para revisión de la interventoría un cronograma de reparación de daños.

Los tramos viales no serán liberados por la interventoría hasta que no se garantice la reparación de todos los daños en la superficie de la capa de rodadura y se garantice un terminado homogéneo. Se deben cumplir los parámetros de calidad propios del material, verificados a través del plan de ensayos, que no ha sido aprobado por la interventoría.

Se solicita se entregue lo solicitado en un máximo de 3 días, calendario al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoría

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Nelson Estrada – Profesional Infraestructura FDRS.

ELABORO:
Esp. PAV Dani Ricardo Acevedo
Esp. EST Manuel Alarcon Badillo
Esp HID Ignacio de la Hoz Castro

Reviso: Ermy Hurtado
