INFORME EJECUTIVO SEMANAL DE INTERVENTORÍA

"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	51	DEL	23/10/2023	HASTA EL	29/10/2023	FECHA DE ENTREGA INFORME	30/10/2023
OBJETO DE LA OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE						
CONTRATISTA:	CONSORCIO PONAL LYM						
CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA NIT: 800.141.397 – 5						
INTERVENTOR:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE NIT: 79.508.558 - 7						
SUPERVISOR:	MAYOR GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO						

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA CIVIL			
CONTRATO No.:	06-3-10086-22			CONTRATO No.:	06-6-10178-22		
VALOR INICIAL:	$ 443.997.728,00			VALOR INICIAL:	$ 6.974.591.904,74		
VALOR ADICIÓN 1:	N.A.			VALOR ADICIÓN 1:	N.A.		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 443.997.728,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.974.591.904,74		
PLAZO INICIAL:	20/12/2022		64	PLAZO INICIAL:	20/12/2022		64
PRÓRROGA No 1:	19/05/2023		150	PRÓRROGA No 1:	19/05/2023		150
PRÓRROGA No 2:	6/10/2023		140	PRÓRROGA No 2:	6/10/2023		140
PRÓRROGA No 3:	5/12/2023		60	PRÓRROGA No 3:	5/12/2023		60
PLAZO ACTUALIZADO:	5/12/2023		414	PLAZO ACTUALIZADO:	5/12/2023		414
PLAZO FALTANTE	37	EQUIVALE AL:	9%	PLAZO FALTANTE	37	EQUIVALE AL:	9%
FECHA DE INICIACIÓN:	18/10/2022			FECHA DE INICIACIÓN:	18/10/2022		
FECHA DE TERMIN. INICIAL:	20/12/2022			FECHA DE TERMIN. INICIAL:	20/12/2022		
ACLARAC. FECHA DE TERMIN.:				ACLARAC. FECHA DE TERMIN.:			
FECHA DE TERMINAC. ACTUAL:	5/12/2023			FECHA DE TERMINAC. ACTUAL:	5/12/2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.		
VALOR EJECUTADO SEMANA:	$ 19.702.654,98		4,44%	VALOR EJECUTADO SEMANA	$ 309.501.534,03		4,44%
VALOR ACUMULADO PAGO	$ 372.806.956,51		83,97%	VALOR ACUMULADO PAGO	$ 5.856.283.077,40		83,97%
VALOR POR EJECUTAR:	$ 71.190.771,49		16,03%	VALOR POR EJECUTAR:	$ 1.118.308.827,34		16,03%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
Licencia de Construcción	Planeación Municipal en documento DAP – DOT DE 247 conceptúa en relación con la licencia de construcción del proyecto, recomendando acogerse al Decreto 19 del 2012, articulo N° 192, en el que se describe lo siguiente: "REGIMEN ESPECIAL EN MATERIA DE LICENCIAS RBANISTICAS, 1. No se requiera licencia urbanística de urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de las modalidades para: …. C. *la construcción de las edificaciones necesarias para la infraestructura militar y policial destinadas a la defensa y seguridad nacional.*	Marzo 26 de 2021
Provisional de Agua y Alcantarillado	El suministro de agua se hará mediante camión cisterna ya que no se cuenta con servicio de acueducto en el sector	Sin definir
Provisional de Energía	Se otorgo el permiso por parte de Helectrohuila para la provisional, el contratista realizo la instalacion de los poste, transformador y redes internas, Helectrohuila realice la coneccion a la red principal.	Mayo 11 de 2023
Escombrera	Se acopiara temporalmente en el lote hasta definir escombrera y material a reutilizar como relleno del predio.	Sin definir

3.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO


	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	79,4%	79,5%	-0,09%
Acumulado semana	2,45%	4,44%	-1,99%
Acumulado Actual	81,9%	84,0%	-2,08%

3.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo Total Contractual	Tiempo Transcurrido	Tiempo Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
414,00	104,00	110,00	**-8,61**

De acurdo a la reprogramacion acorde a la prorroga N°3 tenemos un avance esta semana del 4,44 %, y de acuerdo al programado de 2,45% tenemos tenemos un adelanto de 1,99% para un adelanto acumulado de 2,08%

3.4 GRÁFICA DE AVANCE DEL TIEMPO CONTRACTUAL

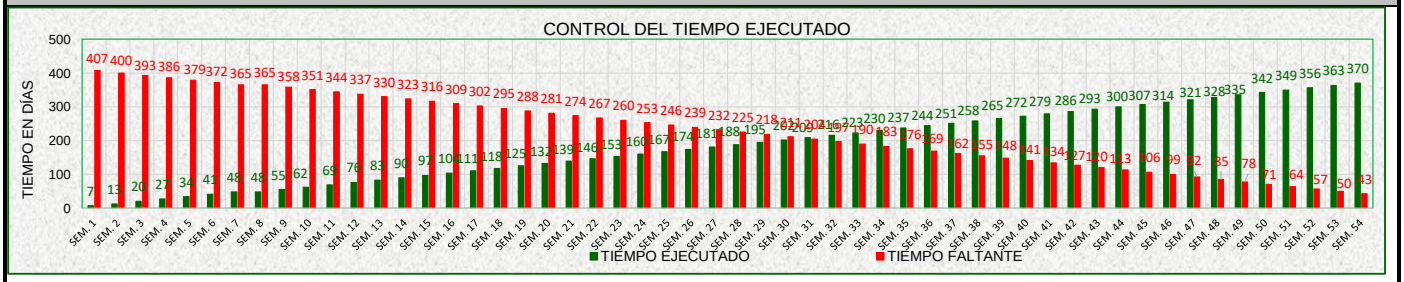


INFORME EJECUTIVO SEMANAL DE INTERVENTORÍA

"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	51	DEL	23/10/2023	HASTA EL	29/10/2023	FECHA DE ENTREGA INFORME	30/10/2023
OBJETO DE LA OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE						
CONTRATISTA:	CONSORCIO PONAL LYM						
CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA NIT: 800.141.397 – 5						
INTERVENTOR:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE NIT: 79.508.558 - 7						
SUPERVISOR:	MAYOR GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO						

3.5 GRÁFICA DE AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

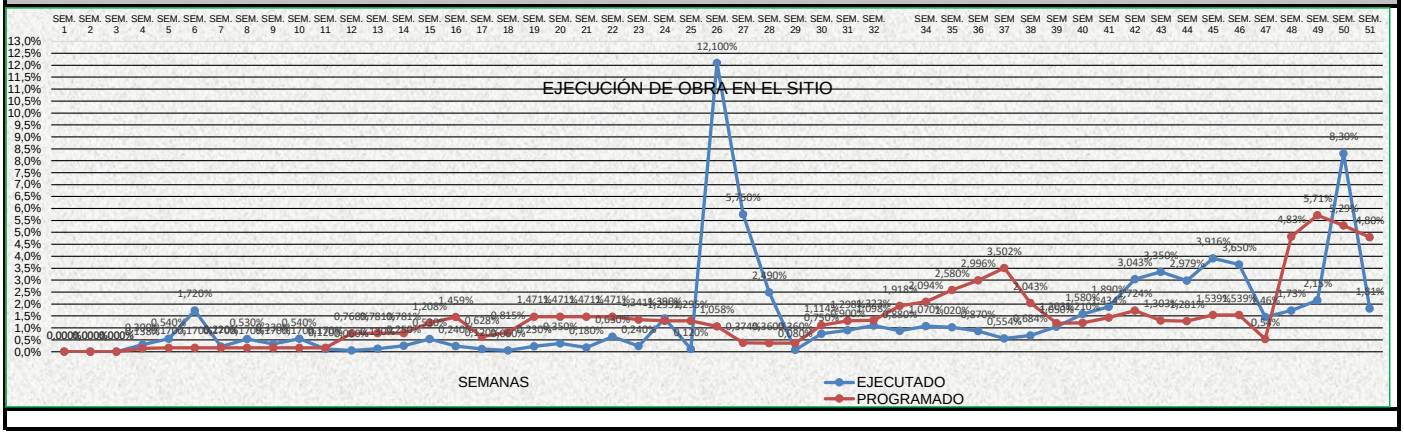

4. CONTROL ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
PAÑETES, AFINADOS E IMPERMEABILIZACIONES		EDIFICIO OAC	
Suministro e instalación de Pañete liso muros interiores 1:3. Espesor de 2cm	50,00%	Acero para Elementos de imentación, incluye vigas y zapatas fy=60000 PSI	1,02%
INSTALACIONS SANITARIAS		Acero para Columnas fy=60000 PSI	1,39%
Red de suministro	7,50%	Malla electrosoldada para losa contrapiso	6,30%
Red aguas residuales	7,50%	SUBTOTAL CAPITULO 3.2	
Red aguas lluvias		MAMPOSTERIA	
INSTALACIONES ELECTRICAS		Suministro e instalación de dinteles h= 10 cm, en concreto 2500 psi 25 cm	3,67%
ALIMENTADORES BAJA TENSION Y CANALIZACION		SUBTOTAL CAPITULO 4	
TABLEROS ELÉCTRICOS Y PROTECCIONES		PAÑETES, AFINADOS E IMPERMEABILIZACIONES	21,80%
SALIDAS ELÉCTRICAS	6,67%	Suministro e instalación de Pañete liso muros interiores 1:3.Espesor de 2cm	
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN	8,57%	Suministro e instalación de Pañete impermeabilizado liso fachadas 1:3 incluye filos y dilataciones. Espesor de 2 cm	
CARPINTERIA METALICA		**RED DE SUMINISTRO**	17,20%
NO PREVISTOS		**RED DE AGUAS RESIDUALES**	
NP-01 DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL		RED DE AGUAS LLUVIAS	22,41%
NP-02 CONCRETO SOLADOS 2500 PSI		INSTALACIONES ELECTRICAS	
NP-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA ALAMBRE DE PUA 3 HILOS		TABLEROS ELÉCTRICOS Y PROTECCIONES	25,00%
NP-04 MALLA ELECTRO SOLDADA PLACA DE CUBIERTA		SALIDAS ELÉCTRICAS	78,16%
NP-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL DE SUB BASE TAM MAX 3¨		INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN	18,22%
NP-06 CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, ALTAMENTE FLUIDO PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 5000 PSI		RELLENOS Y EXCAVACIONES	
NP-07 CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2¨ ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMPACTANTE PARA COLUMNAS DE 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA		Excavación mecánica según planos. Incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes a sitio autorizado por el ente ambiental encargado.	12,50%
NP-08 CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2¨ LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI		Relleno en Recebo comun Compactado	12,02%
NP-09 CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2¨ ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMPACTANTE PARA VIGAS AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE CUBIERTA 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA		SUBTOTAL CAPITULO 13	
NP-10 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 8 1/2" DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD (120 M) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUYE EQUIPO DE BOMBA ELECTROSUMERGIBLE, CON CAPACIDAD DE 6LPS Y 7,86 HP ADEMÁS TABLEROS DE PROTECCIÓN, MANEJO Y CONTROL. ARBOL DE FONTANERIA, TUBERÍA, FILTROS Y ACCESORIOS DE IMPULSIÓN A PTAP CON ANALISIS FISICO QUIMICO Y BARCTERIOLÓGICO DEL AGUA		**ITEMS NO PREVISTOS**	
NP-11 SISTEMA ELECTRICO FOTOVOLTAICO PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO - BASES EN CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE - ACCESORIOS, CABLEADO, VARIADOR DE BOMBEO SOLAR		MALLA ELECTRO SOLDADA PLACA DE CUBIERTA	
NP-12 PLASTICO POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO		CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2¨ LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI	
NP-13 TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 10¨´ PARA ACCESO PRINCIPAL		SISTEMA ELECTRICO FOTOVOLTAICO PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO - BASES EN CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	
NP-14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO FLEXA No 5	20,00%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO FLEXA No 5	
NP-15 CONCRETO CICLOPEO 20,7 MPA (3000 PSI) PARA SOBRE ANCHOS EN CIMENTACIÓN	20,00%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO FLEXA No 5	

INFORME EJECUTIVO SEMANAL DE INTERVENTORÍA

"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	51	DEL	23/10/2023	HASTA EL	29/10/2023	FECHA DE ENTREGA INFORME	30/10/2023
OBJETO DE LA OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE						
CONTRATISTA:	CONSORCIO PONAL LYM						
CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA NIT: 800.141.397 – 5						
INTERVENTOR:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE NIT: 79.508.558 - 7						
SUPERVISOR:	MAYOR GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO						

4.1 CONTROL DE LA EJECUCIÓN SEMANAL DE LA OBRA

LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA

CONTRACTUAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	CONTRACTUAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO
1. PRELIMINARES			12. VIDRIOS Y ESPEJOS		
2. ESTRUCTURAS TECNICAS			SUBESTACION 0 Y 1		
3. EDIFICIO OAC			13. RELLENOS Y EXCAVACIONES		
4. MAMPOSTERIA		0,05%	14. ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
5. PAÑETES, AFINADOS E IMPERMEHABILIZACIONES	0,99%	0,14%	15. MAMPOSTERIA		
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0,06%	0,14%	16. PAÑETES, AFINADOS E IMPERMEABILIZACIONES		
7. INSTALACIONES ELECTRICAS	0,50%	4,11%	17. CARPINTEIA METALICA		
8. CARPINTERIA METALICA			18. PISOS		
9. PISOS			19. PINTURA		
10. ENCHAPES MUROS Y ACCESORIOS			20. VIDRIOS Y ESPEJOS		
10. ENCHAPES MUROS Y ACCESORIOS			21. INSPECTORIA Y TRAMITES		
11. PINTURA			NO PREVISTOS	0,90%	
TOTALES LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO:	2,45%	4,44%	ATRASO / ADELANTO	1,99%	

PROGRAMADO:	$ 171.029.363,3	**EJECUTADO:**	$ 309.501.534	**ATRASO:**	$ -138.472.171

Vemos que esta semana se evidencia un equilibrio en los porcentajes programado vs ejecutados, se ve reflejado en la ejecución de las actividades.

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN SEMANAL DE LA OBRA

1-Colocación de concreto ciclopeo bloque C entre los ejes B-D/3-4, eje C entre los ejes 4-5, Levante de muros fachada bloque de ladrillo muro fachada bloque A eje C entre los ejes 7-6, Retiro de formaletas de madera, eje A entre los ejes 7-5, Levante de muros fachada bloque de ladrillo muro fachada bloque A eje C entre los ejes 7-6, Colocación de concreto para viga de amarre eje C entre los 1-2, eje 1 entre los ejes A-C, eje A entre los ejes 1-2 para muros en bloque B.
2-Instalación de relleno, compactado y serriado con matrrial de excavación bloque B entre los ejes 3-4/B-D, Se realiza instalación y armado de canastilla acero de refuerzo para muro pantalla en muro entre columnas C1-C3, bloque B, Levante de muros fachada bloque de ladrillo muro fachada bloque A eje C entre los ejes 5-4, Instalación de malla electrosoldada para placa aeréa entre los ejes A-D/7-5 bloque A NE+5.65 bloque B, Instalación de tubería y punto sanitario para desague en bloque C.

6. PERSONAL EN OBRA

CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES SEMANA
DIRECTOR DE OBRA	0	0	0	0	0	0		**0**
ING. RESIDENTE OBRA 1	1	1	1	1	1	1		**6**
INSPECTOR SISOMA	1	1	1	1	1	1		**6**
TOPOGRAFO	0	0	0	0	0	0		**0**
OPERADOR	0	0	0	0	0	0		**0**
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1	1		**6**
OFICIAL DE OBRA	4	4	4	4	4	4		**24**
AYUDANTE DE OBRA	18	15	21	15	23	23		**115**
TOTALES OBRA	**25**	**22**	**28**	**22**	**30**	**30**	**0**	**157**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1	1		**6**
RESID. DE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1	1		**6**
RESID. HSEQ INTERVENT.	1	1	1	1	1	1		**6**
TOTALES INTERVENT.	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**18**
TOTAL PERSONAL	**28**	**25**	**31**	**25**	**33**	**33**	**0**	**175**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se le recomienda al contratista realizar una programación semanal de las actividades, una programacion de concreto y aumento de cuadrillas.

Carmen Contreras Suarez

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

35,260% 36,635%

INFORME EJECUTIVO SEMANAL DE INTERVENTORÍA

"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	51	DEL	23/10/2023	HASTA EL	29/10/2023	FECHA DE ENTREGA INFORME	30/10/2023
OBJETO DE LA OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE						
CONTRATISTA:	CONSORCIO PONAL LYM						
CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA NIT: 800.141.397 – 5						
INTERVENTOR:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE NIT: 79.508.558 - 7						
SUPERVISOR:	MAYOR GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO						

TRANSCURRIDO	CONTRACTUAL	FALTANTE	
401	414	13	
23/11/2023	5/12/2023		
18/10/2022	18/10/2022		

41400,00%

	EJECUTADO	PROGRAMADO		TIEMPO EJECUTADO
SEM. 1	0,000%	0,000%	SEM. 1	7
SEM. 2	0,000%	0,000%	SEM. 2	13
SEM. 3	0,000%	0,000%	SEM. 3	20
SEM. 4	0,300%	0,138%	SEM. 4	27
SEM. 5	0,540%	0,170%	SEM. 5	34
SEM. 6	1,720%	0,170%	SEM. 6	41
SEM. 7	0,220%	0,170%	SEM. 7	48
SEM. 8	0,530%	0,170%	SEM. 8	48
SEM. 9	0,330%	0,170%	SEM. 9	55
SEM. 10	0,540%	0,170%	SEM. 10	62
SEM. 11	0,120%	0,170%	SEM. 11	69
SEM. 12	0,060%	0,768%	SEM. 12	76
SEM. 13	0,130%	0,781%	SEM. 13	83
SEM. 14	0,250%	0,781%	SEM. 14	90
SEM. 15	0,530%	1,208%	SEM. 15	97
SEM. 16	0,240%	1,459%	SEM. 16	104
SEM. 17	0,120%	0,628%	SEM. 17	111
SEM. 18	0,060%	0,815%	SEM. 18	118
SEM. 19	0,230%	1,471%	SEM. 19	125
SEM. 20	0,350%	1,471%	SEM. 20	132
SEM. 21	0,180%	1,471%	SEM. 21	139
SEM. 22	0,630%	1,471%	SEM. 22	146
SEM. 23	0,240%	1,341%	SEM. 23	153
SEM. 24	1,390%	1,295%	SEM. 24	160
SEM. 25	0,120%	1,295%	SEM. 25	167
SEM. 26	12,100%	1,058%	SEM. 26	174
SEM. 27	5,750%	0,374%	SEM. 27	181
SEM. 28	2,490%	0,360%	SEM. 28	188
SEM. 29	0,080%	0,360%	SEM. 29	195
SEM. 30	0,750%	1,114%	SEM. 30	202
SEM. 31	0,900%	1,298%	SEM. 31	209
SEM. 32	1,098%	1,323%	SEM. 32	216
	0,880%	1,918%	SEM. 33	223
SEM. 34	1,070%	2,094%	SEM. 34	230
SEM. 35	1,020%	2,580%	SEM. 35	237
SEM 36	0,870%	2,996%	SEM. 36	244
SEM 37	0,554%	3,502%	SEM. 37	251
SEM 38	0,684%	2,043%	SEM. 38	258
SEM 39	1,050%	1,203%	SEM. 39	265
SEM 40	1,580%	1,210%	SEM. 40	272
SEM 41	1,890%	1,434%	SEM. 41	279
SEM 42	3,043%	1,724%	SEM. 42	286
SEM 43	3,350%	1,303%	SEM. 43	293
SEM 44	2,979%	1,281%	SEM. 44	300
SEM. 45	3,916%	1,539%	SEM. 45	307
SEM. 46	3,650%	1,539%	SEM. 46	314

TRANSCURRIDO	CONTRACTUAL	FALTANTE	
401	414	13	
23/11/2023	5/12/2023		
18/10/2022	18/10/2022		

	SEM. 47	1,46%	0,54%	
	SEM. 48	1,73%	4,83%	
	SEM. 49	2,15%	5,71%	
	SEM. 50	8,30%	5,29%	
	SEM. 51	1,81%	4,80%	
	SEM. 52	2,42%	5,38%	
	SEM. 53	3,15%	3,04%	
0,00%	SEM. 54	4,44%	2,45%	
	SEM. 55			

SEM. 47	321
SEM. 48	328
SEM. 49	335
SEM. 50	342
SEM. 51	349
SEM. 52	356
SEM. 53	363
SEM. 54	370
SEM. 55	377
SEM. 55	384
SEM. 63	391
SEM. 78	#¡REF!
SEM. 79	#¡REF!
SEM. 80	#¡REF!
SEM. 81	#¡REF!

TRANSCURRIDO	CONTRACTUAL	FALTANTE	
401	414	13	
23/11/2023	5/12/2023		
18/10/2022	18/10/2022		

	57,93%	56,24%	$ 4.040.701.365,27	$ 3.922.236.976,49	$ -118.464.388,78	-1,70%	SEM. 87	#¡REF!
	58,78%	57,58%	$ 4.099.861.629,65	$ 4.016.112.429,12	$ -83.749.200,53	-1,20%	SEM. 88	#¡REF!
	61,06%	59,28%	$ 4.258.752.648,58	$ 4.134.713.673,96	$ -124.038.974,62	-1,78%	SEM. 89	#¡REF!
	63,15%	60,34%	$ 4.404.784.191,25	$ 4.208.176.442,71	$ -196.607.748,54	-2,82%	SEM. 90	#¡REF!
SEM. 97	66,11%	72,50%	$ 4.611.118.966,01	$ 5.056.304.160,05	$ 445.185.194,04	6,38%	SEM. 97	#¡REF!
SEM. 98	67,83%	73,43%	$ 4.730.602.253,58	$ 5.121.635.228,35	$ 391.032.974,77	5,61%	SEM. 98	#¡REF!
SEM. 99	69,04%	75,43%	$ 4.815.564.634,45	$ 5.260.980.062,23	$ 445.415.427,78	6,39%	SEM. 99	#¡REF!

4,83%

5,71%

TRANSCURRIDO	CONTRACTUAL	FALTANTE	
401	414	13	
23/11/2023	5/12/2023		
18/10/2022	18/10/2022		

5,29%

4,80%

5,38%

3,04%

2,45%

3,32%

3,32%


2,82%

1,44%

0,93%

6,28%


TIEMPO FALTANTE	PORCENT. TIEMPO EJECUTADO	PORCENT. TIEMPO FALTANTE	
407	1,69%	98,31%	
400	3,38%	96,86%	
393	5,07%	95,17%	
386	6,76%	93,48%	1
379	8,45%	91,79%	2
372	10,14%	90,10%	3
365	11,84%	88,41%	
365	11,84%	88,41%	
358	13,53%	86,71%	4
351	15,22%	85,02%	5
344	16,91%	83,33%	6
337	18,60%	81,64%	7
330	20,29%	79,95%	8
323	21,98%	78,26%	9
316	23,67%	76,57%	10
309	25,36%	74,88%	11
302	27,05%	73,19%	12
295	28,74%	71,50%	13
288	30,43%	69,81%	14
281	32,13%	68,12%	15
274	33,82%	66,43%	16
267	35,51%	64,73%	17
260	37,20%	63,04%	18
253	38,89%	61,35%	19
246	40,58%	59,66%	20
239	42,27%	57,97%	
			21
232	43,96%	56,28%	22
225	45,65%	54,59%	23
218	47,34%	52,90%	24
211	49,03%	51,21%	25
204	50,72%	49,52%	26
197	52,42%	47,83%	27
190	54,11%	46,14%	28
183	55,80%	44,44%	
176	57,49%	42,75%	
169	59,18%	41,06%	
162	60,87%	39,37%	
155	62,56%	37,68%	
148	64,25%	35,99%	
141	65,94%	34,30%	
134	67,63%	32,61%	
127	69,32%	30,92%	
120	71,01%	29,23%	
113	72,71%	27,54%	
106	74,40%	25,85%	
99	76,09%	24,15%	

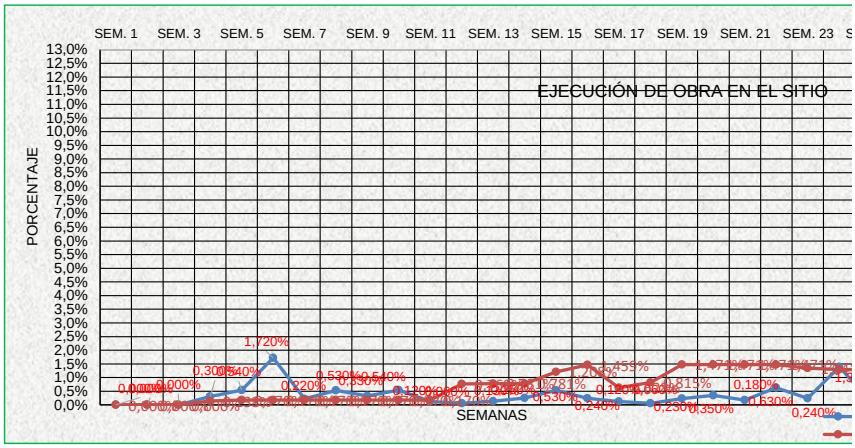

92	77,78%	22,46%
85	79,47%	20,77%
78	81,16%	19,08%
71	82,85%	17,39%
64	84,54%	15,70%
57	86,23%	14,01%
50	87,92%	12,32%
43	89,61%	10,63%
36	91,30%	8,94%
29	93,00%	7,25%
356	14,01%	5,56%
#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

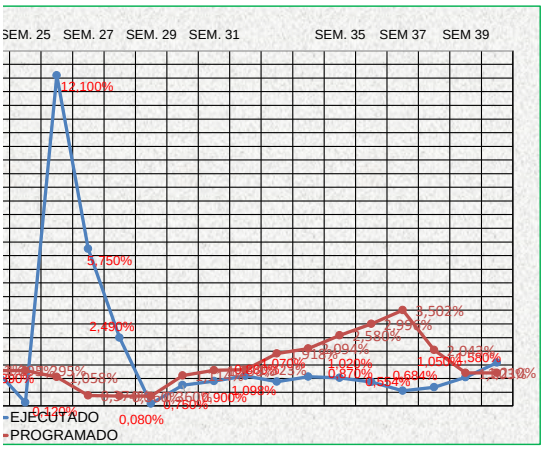
SEM. 25
SEM. 27
SEM. 29
SEM. 31
SEM. 35
SEM 37
SEM 39
12,100%
5,750%
2,490%
0,080%
EJECUTADO
PROGRAMADO

POLICIA NACIONAL	INFORME HSEQ DE INTERVENTORIA SEMANAL	CARLOS VERGARA NEGRETE

FECHA DEL INFORME	
DESDE	23/10/2023
HASTA	29/10/2023

OBJETO DEL CONTRATO
"INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

INFORME
51

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

Durante la semana se recibió documentación correspondiente al personal que estaría laborando en las actividades correspondientes.
- Se desarrollaron medidas ambientales para mitigar el impacto en los recursos suelo, aire y agua, haciendo uso de racional de los mismos y previniendo la contaminación.
- Actualmente el personal de obra se encuentra en buen estado de salud y siguiendo los lineamiento para el cumplimiento de las normas bioseguridad
- Se realiza acompañamiento continuo a las actividades de obra, esto con el fin de verificar practicas de seguridad y salud en el trabajo adecuadas.

1.1. Alcance o Avance de la Actividad que se Programó

El 100% de las actividades se realizaron como estaba programado	Si	Porcentaje del avance	100%
El 100% de las actividades se realizaron como estaba programado	NOTA:		

2. Gestión Ambiental

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo	Cantidad m3	Acumulado	Sitio de Disposición	Observaciones
Escombro mampostería y demolición	0	0	No hay generación	No hay observaciones
Retiro de escombro	0	0	No hay generación	No hay observaciones
Material de excavación	0	0	No hay generación	No hay observaciones
Material de madera	5	5	Acopio temporal en obra.	Se reutiliza para formaleta.

2.2. Manipulación de Productos Químicos

Tipo de Residuo	Cantidad Lt	Acumulado	Sitio de Disposición	Observaciones
A C P M	20	220	se utiliza todo el ACPM.	Se utiliza para maquinaria que requiere ACPM.
Gasolina	20	1.760	Se utiliza todo el combustible	Utilizada para suministro de equipos.
Epóxico	0.1	1.9	Acopio temporal en obra.	Utilizado para anclajes.

3. Gestión en Salud Ocupacional (Seguridad e Higiene Industrial)

3.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación	Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por enfermedad Común	Casos Ausentismo por Accidentes de Trabajo
Total Semanales	**1.440,00**	**2,00**	**144,00**	**0,00**	**0,00**
Total Acumulado	**55.370,00**	**30,00**	**7.068,00**	**18,00**	**0,00**

3.1.1.Incidendentalidad

	Fatalidades	Casos Con días Perdidos	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Incidente	Casi Accidentes	Accidentes	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Dias de Incapacidad (tratamiento medico)
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Registro Fotográfico












Ispecciones de actividades de obra

ANEXO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN CASETONES Y MALLA ELECTROSOLDADA BLOQUE B.

##



INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y PUNTO SANITARIO PARA DESAGUE, BLOQUE C.



INSTALACIÓN CONCRETO CICLOPEO EN BLOQUE C.



LEVANTE DE MURO CON BLOQUE LADRILLO # 5 BLOQUE A.
