Largo: 2,50 M

Perfil media caña sanitario plástico de diseño cóncavo para adaptación y habilitación de zonas donde se requiere control básico biosanitario.

Puede usarse en áreas clínicas, hospitalarias, de complejidad media y baja.

FICHA TÉCNICA

3 DISPONIBLES

1

+ Añadir al carrito

Añadir a la lista de deseos

SKU: SRP250.01

Categoría: Línea Higiénico Sanitaria

Etiquetas: Biosanitario, higiene, Media caña, media caña sanitario, PVC, Sanitario, Zocalo

Descargar catalogo en PDF

Comparte Este Producto

Descripción Información adicional Valoraciones (0)

Zócalo media caña sanitario de diseño rígido y curvo lo hace lo suficientemente robusto para terminar cualquier instalación que requiera un cordón interno mientras tiene una apariencia atractiva. El media caña se puede utilizar en el lugar horizontal o vertical, alrededor de una superficie de trabajo, o como zócalo en el suelo o como moldura alrededor del techo.

Productos **Relacionados**


Silicona Sikasil IA blanca

SALE



~~$19.900~~ $16.915

Esquineros sanitarios PVC mediacaña

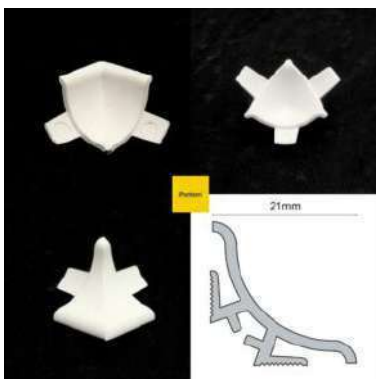

$12.750

Solicita ahora una cotización HAZ CLIC AQUÍ

Somos una organización que te ayuda a implementar tus ideas de diseño arquitectónico, gracias a los complementos y revestimientos caracterizados por ser productos de vanguardia

Cita previa en Bodega:

A partir del 31 de marzo de 2023 hasta el 10 de abril de 2023, **no tendremos servicio de atención presencial.** Puedes contactarnos a nuestra línea de atención y WhatsApp +57 310 8114455

Carrera 69b # 95 -36 La Alborada, barrio La Floresta

¿Necesitas ayuda?

+57 310 8114455

Escríbenos

sac@ipontem.com

Información

Términos y condiciones

Políticas de garantía y devoluciones

Política de privacidad

Preguntas frecuentes

Blog

Productos

Terminaciones Arquitectónicas

Pisos

Cortinas

Servicios

Suscríbete


Obtén más información y promociones del día.

Escríbe tu correo electrónico. ENVIAR

Empresa 100% Colombiana

Copyright © iPontem SAS. 2022 Todos los derechos reservados.

Diseño y Desarrollo por SrDigital

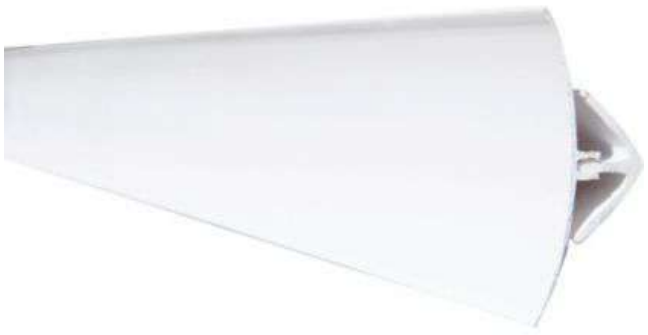



INPERPLAS

Código 305265

Media caña coextruida 6 x 300 cm

0.0 (0)

$37.900 und

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Disponible
Retiro en tienda ver tiendas

Disponible
Stock en tienda más tiendas

Ficha técnica

Tipo	Plástico
Material	PVC
Aplicación	Este guarda escoba se instala en pisos, paredes y techos ya terminados con el objetivo de dar un acabado limpio y sobretodo para otorgar asepsia total en el espacio y así minimizar las filtraciones en rincones. Se puede utilizar en espacios como gimnasios, clínicas, restaurantes, cuartos fríos, estéticas, entre otros.
Largo	Longitud 300 cm - Altura 6 cm
Origen	Colombia
Color	Blanco
Procedencia	Colombia

Opiniones de clientes

Aún no tenemos comentarios de otros clientes, ¡Sé el primero! Escribir opinión

Factura Electrónica | Consulta el estado de tu | Nuestras Tiendas y Horarios | Dejanos tu opinion

− 1 + Agregar al carro

Servicio al Cliente

Todos los derechos Reservados

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RINCONERA EN PVC

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de rinconera en PVC previo a la instalación del piso en vinilo para obtener un mejor acabado contra muros. Esta actividad se realizará previa aprobación de la interventoría y en los lugares donde sea aprobado.

EJECUCIÓN:

- Luego de la instalación del mastico para piso se procederá a la instalación de la rinconera
- Se verificará la alineación de los muros contra los cuales se realizará la instalación de la rinconera.
- Se revisará la longitud de muros y se realizarán los cortes correspondientes, ya sea en ángulo en esquinas o perpendicular en puertas.

MATERIALES:

- Perfil rinconera Media Caña

EQUIPOS:

- Herramienta menor

TRANSPORTE:

- N/A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro (M) de suministro e instalación de rinconera en PVC recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 20/01/2023 **FECHA TERMINACIÓN** 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-11	JUNTAS DE MANTO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, INCLUYE REPARACIÓN DE JUNTA, PINTURA BITUMINOSA, ANCHO NO MAYOR A 20 CM (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	10.458,95	522,9
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	1,000	4.500,0
				SUBTOTAL	5.022,9

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
ALUMOL 3 KG O SIMILAR	kg	0,022	56164	$ 1.235,61
Rodillo 5"	un	0,01	15000	$ 150,00
Brocha 3"	un	0,01	13500	$ 135,00
Cinta de enmascarar 40 mts 12mm	un	0,05	6500	$ 325,00
			SUBTOTAL	1.846

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,0500	10.459,0
				SUBTOTAL	10.459
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 17.327,51
AIU CONTRACTUAL 28,19%				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 4.884,62
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 22.212,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



Alumol Pintura Para Protección De Cubiertas 3kg

Alumol Pintura Para Protección De Cubiertas 3kg

$196,701

IVA Incluído

☆☆☆☆☆ 0 Calificaciones

1

AÑADIR AL CARRITO

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Unidad de Medida: UN
Referencia: 2594546
Código de ERP: 41943
Categoría: IMPERMEABILIZANTES ASFALTICO PARA CUBIERTAS

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo. ESTOY DE ACUERDO POLITICAS DE COOKIES

GetButton

DESCRIPCIÓN

Alumol®
PINTURA REFLECTIVA DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sika Alumol es una pintura reflectiva de aluminio listo para su uso para proteger las impermeabilizaciones y cubiertas como capa protectora sobre impermeabilizaciones asfálticas, emulsiones y mantos.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar, es gran resistencia a la intemperie.
- Refleja los rayos solares, disminuyendo la temperatura interior.
- Excelente adherencia a los materiales de construcción y no requiere imprimación.
- Consumo: Sobre una base asfáltica: Aprox. 110 gr/m2 • Sobre mortero y concreto: Aprox. 200 gr/m2

MÉTODO DE APLICACIÓN

- La superficie debe estar seca y limpia (libre de polvo, grasas, óxidos u otras materias extrañas).
- La aplicación puede hacerse con brocha o rodillo de felpa, cubriendo uniformemente la superficie. Lave las herramientas con un solvente convencional cuando el producto aún esté fresco.

USOS

- Como capa protectora sobre impermeabilizaciones asfálticas, emulsiones y mantos.

Detalles

Atributos	Detalle
Categoria b2c	IMPERMEABILIZANTES ASFALTICO PARA CUBIER
Criterio adicional descuento	SIKA PROMOCION
Grupo	SIKA
Lineas mayores	IMPERMEABILIZANTES Y LIMPIADORES
Lineas menores	IMPERMEABILIZANTES
Visible b2b	VISIBLE B2B
Visible b2c	SI

Calificaciones del
PRODUCTO

No existen calificaciones para el producto.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

GetButton

Productos

RELACIONADOS

15%



PLACCO K-89 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO GALÓN ALGRECO

$ 48,274

Antes: ~~$ 56,793~~

IVA Incluído

AÑADIR

10%



EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA X 3.5 KG SIKA

$ 41,742

Antes: ~~$ 46,380~~

IVA Incluído

AÑADIR

10%

Oferta



SIKA TECHO E IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO X 1.6 KILOS SIKA

$ 23,872

Antes: ~~$ 26,525~~

IVA Incluído

AÑADIR

15%



PLACCO K-89 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO CANECA ALGRECO

$ 205,118

Antes: ~~$ 241,315~~

IVA Incluído

AÑADIR

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

GetButton

10%



SIKA TECHO E IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTA Y TERRAZA 3.5KG SIKA

$ 38,406

Antes: ~~$ 42,674~~

IVA Incluído

AÑADIR

15%



PLACCORETA CANECA 5 GALONES ALGRECO


$ 264,331

Antes: ~~$ 310,978~~

IVA Incluído

AÑADIR

15%

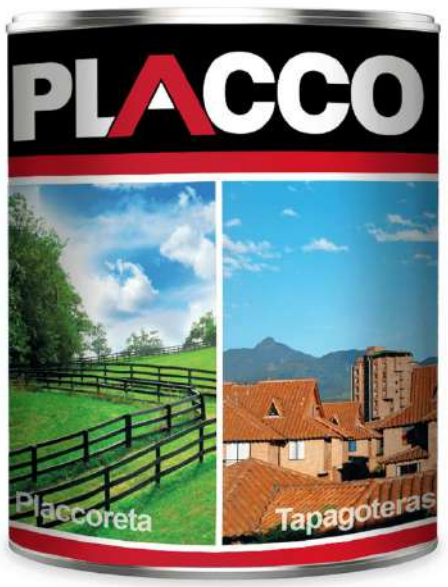

PLACCORETA 1 GALÓN ALGRECO

$ 60,732

Antes: ~~$ 71,450~~

IVA Incluído

AÑADIR

15%



PLACCO K-89 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO BALDE ALGRECO

$ 120,283

Antes: ~~$ 141,509~~

IVA Incluído

AÑADIR

INSCRÍBETE AL BOLETÍN

Ingresa tu nombre

Ingresa tu email

SUSCRÍBETE

*Al hacer clic en suscríbete, estás aceptando nuestros términos y condiciones.

COVAL

Somos una compañía especializada en la comercialización de materiales para la construcción, ferretería y acabados, con sedes en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, conoce mas en coval.com.co.

INFORMACIÓN

- Nosotros
- Blog
- Preguntas Frecuentes

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

GetButton

- Términos y Condiciones
- Políticas de Tratamiento de Datos
- Derecho al Retracto y Devoluciones
- Puntos de Venta
- Contáctenos

MI CUENTA

- Iniciar Sesión
- Registrarse
- Recuperar Contraseña

CONTÁCTO

Autopista Medellín Km 2.5 Parque Industrial Guadalajara, Bodega 3

PBX +57 60 (1) 875-9100
tiendavirtual@coval.com.co
COTA

SÍGUENOS EN

TRANSACCIONES SEGURAS



Copyright 2023 © Coval - Todos los derechos reservados | Powered by Siesa E-Commerce

www.coval.com.co

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

GetButton

Cuenta

LOENCUENTRAS .com.co

INICIO / MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN / IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS / ALUMOL SIKA 3 KILOS






Alumol Sika 3 Kilos

Referencia: 94545

Estado: Producto nuevo

Precio corresponde a la ubicación de BOGOTA
El precio puede cambiar si obedece a otra zona de envío.

$ 185,000

Presentaciones de Producto

◉3 kg

¿Preguntas?
Por favor deje su mensaje

Contáctanos por Whatsapp

1

MÁS INFORMACIÓN

FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Impermeabilizantes
Características	Pintura reflectiva de aluminio de baja viscosidad, protege las impermeabilizaciones y cubiertas de los rayos solares, reduce la temperatura interior en la edificación y vivienda.
Contenido	3 kilos
Uso	Para reducir temperatura interior en edificaciones techadas con laminas de asbesto, cemento, zinc, concreto, etc
Recomendaciones	El producto contiene solventes volátiles por lo cual se debe tener ventilación adecuada en recintos
Superficie a aplicar	Asfálticas y cubiertas
Preparación de la superficie	La superficie debe estar cerca y limpia, libre de polvo, grasas y óxido
Dilusión	Listo para su uso
Rendimiento aprox. (m2/galón)	Aproximadamente 110 gramos / m2

Productos relacionados



Sika-101 Mortero Plus

$ 133,000

En Stock

¿Preguntas?

Por favor deje su mensaje

Arriba

Contáctanos por Whatsapp



Sika Anchorfix S 300 ml

$ 77,000

En Stock



SikaGrout - 200 30 Kg

$ 211,000

En Stock



Sikadur-32 Primer 3Kg

$ 418,000

En Stock

¿Preguntas?

Por favor deje su mensaje

Arriba

Contáctanos por Whatsapp



¿Preguntas?
Por favor deje su mensaje
Arriba
Contáctanos por Whatsapp

Venta telefónica: (601) 746 0344 - Lunes a sábado de 8:00 am a 6:00 pm y domingos de 8:00 am a 5:00 pm

BLOG | Metro | SPID | JUMBO

¡Hola! ¿Hoy qué quieres estrenar?

Configura tu método de entrega | Registrate | Mi Cuenta

CATEGORIAS | OFERTAS | CATÁLOGOS | MUNDO EXPERTO | VENTA EMPRESAS | TIENDAS | SERVICIOS



tiendaseasy.co | Construcción | Impermeabilización en frío | Impermeabilizantes | ALUMOL 3 KG



ALUMOL 3 KG

SIKA | Código de producto: 2191671

Características principales:

ALUMOL 3 KG

$ 168.490 (gr a $ 56,16)

1 +

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

MEDIOS DE ENVÍO

Envío a Domicilio

Este producto es vendido, facturado y entregado por CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Características | **Reseñas**

Comentarios

☆☆☆☆☆

0 Calificación promedio (0 comentarios)

Por favor inicia sesión para escribir un

Más reciente | Todos

No hay comentarios.

Recomendados para ti



SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE 4 KG
SIKA
$ 91.590
(gr a $ 22,9)

20 %



JUNTA CERESIT CE 33 BLANCO 1.5 KG
CERESIT
Precio Regular ~~$ 14.200~~
Precio Ahora $ 11.360
(gr a $ 7,57)
$ 10.508

20 %




JUNTA CERESIT CE 33 HUESO 1.5 KG
CERESIT
Precio Regular ~~$ 14.200~~
Precio Ahora $ 11.360
(gr a $ 7,57)
$ 10.508



FESTER HIDROPRIMER PLUS NEGRO 4 L
FESTER
$ 67.290
(ml a $ 16,82)



Calidad **Fácil y seguro** **Exclusividad** **Entrega en tu ciudad**

EASY

- Acerca de EASY
- Catálogos
- Tiendas y Horarios
- Mundo Experto
- ¿Cómo comprar?
- Trabaja con Nosotros
- Tarjeta Cencosud
- Responsabilidad Social
- Proveedores

POLÍTICAS

- Preguntas Frecuentes
- Cambios y Devoluciones
- Términos y Condiciones
- Protección de Datos
- Política de Cookies
- Superintendencia de industria y comercio SIC

SÍGUENOS EN:

CONTÁCTANOS

TIENDAS: Horario: 7:00 am – 9:00 pm Lunes a Sábado 8:00 am – 8:00 pm Domingos y Festivos Bogotá: (601) 7460340 clientes@easy.com.co
VENTA TELEFÓNICA: Horario: 8:00 am – 6:00 pm Lunes a Sábado 8:00 am – 5:00 pm Domingos Bogotá: (601) 7460344 Medellín: (604) 6044775 Resto del país: 018000180340
EMAIL: clientes@easy.com.co

Haz tus compras con estos Medios de Pago

© 2023 Easy | Esta tienda está autorizada por Visa para realizar transacciones electrónicas. | Copyright © Cencosud

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-11 JUNTAS DE MANTO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, INCLUYE REPARACIÓN DE JUNTA, PINTURA BITUMINOSA, ANCHO NO MAYOR A 20 CM (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro e instalación pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad para proteger las impermeabilizaciones y cubiertas. Esta actividad se realizará sobre juntas de manto asfaltico en un ancho no mayor a 20 cm y se cobrará

EJECUCIÓN:

- Identificar las áreas donde se requiere la implementación de esta actividad.
- La superficie debe estar seca y limpia (libre de polvo, grasas, óxidos u otras materias extrañas).
- La pintura reflectiva de aluminio viene listo para su uso. Para obtener una superficie de color uniforme mezcle muy bien el producto antes y durante la aplicación.
- La aplicación puede hacerse con brocha o rodillo de felpa, cubriendo uniformemente la superficie. Lave las herramientas con un solvente convencional cuando el producto aún esté fresco.
- Dejar secar.

MATERIALES:

- ALUMOL 3 KG O SIMILAR
- Rodillo 5"
- Brocha 3"
- Cinta de enmascarar 40 mts 12mm

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Sección andamio certificado (alquiler)

TRANSPORTE:

- N/A

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 20/01/2023 **FECHA TERMINACIÓN** 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-12	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA)	M	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	10.458,95	522,9
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	1,000	4.500,0
				SUBTOTAL	5.022,9

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Cepillo De Alambre Grata 64 Pinceles Acero Truper 11559	un	0,1	12000	$ 1.200,00
Lija Agua # 150 x Pliego	un	0,5	1200	$ 600,00
			SUBTOTAL	1.800

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,0500	10.459,0
				SUBTOTAL	10.459
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 17.281,90
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 4.871,77
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 22.154,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-12 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA)

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este ítem se refiere al mantenimiento de estructura metálica soporte de cubierta existente, para dar una mejor apariencia a estas previo a la aplicación de la y la fachada de la casa, que se requieren para la ejecución de la obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

EJECUCIÓN:

- Ubicar la estructura a la cual se le debe hacer mantenimiento previo a pintura.
- Limpiar el polvo, mugre o grasa que puede tener la estructura.
- Lijar las superficies de la estructura para retirar cualquier material ajeno a está. Este lijado se realizará con grata o lija de acuerdo a la necesidad.
- Limpiar nuevamente la estructura para eliminar residuos de la lijada y mejorar la posterior adherencia la pintura.

MATERIALES:

- Cepillo De Alambre Grata 64 Pinceles Acero Truper 11559
- Lija Agua # 150 x Pliego

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Sección andamio certificado (alquiler)

TRANSPORTE:

- N/A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro (M) de mantenimiento de estructura metálica recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 20/01/2023 **FECHA TERMINACIÓN** 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA SECCIÓN DE DESARROLLO MÁXIMA 1M. CAL 22	M	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	22.185,60	1.109,3
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	1,500	6.750,0
				SUBTOTAL	**7.859,3**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Canal en lámina galvanizada calibre 22 con un desarrollo de 1 metro	M	1	150000	$ 150.000,00
			SUBTOTAL	**150.000**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	**-**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla MM- Carpinteria metalica (soldador+ayud)	145.833	52,13%	221.856	0,1000	22.185,6
				SUBTOTAL	**22.186**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 180.044,88**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 50.754,65**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 230.800,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

DISEMET COLOMBIA

FECHA: 30 MARZO 2023

ESTRUCTURAS METÁLICAS CUBIERTAS TRABAJOS EN ACERO Y ALUMINIO
DISEÑO SOBRE PLANOS

COTIZACION DE COLEGIO JOSÉ MARTI

CLIENTE: PROCASA
NIT: 901531834-2

Nombre del contacto: LUIS ALFONSO

RODRIGUEZCel.: 3118491908
Email.: disemetcolombia9@gmail.com

- **Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada calibre 22 con un desarrollo de 1 metro**

  Valor metro lineal: 150.000
  Total metros: 40

- **Suministro e instalación de soportes para canal en ángulos de 1-1/4 x3/16 y platina de 20x10 en 3/16 con perforaciones para chasos metálicos de 5/16.**
  Valor soportes
  50.000

OBSERVACIONES:

- Cotización válida por 10 días debido a la inestabilidad en el valor de los materiales.
- **Se recibe con el 60% de anticipo y el restante un 20% en avance de obra y el 20% restante al recibirobra a total satisfacción.**

N° CUENTA 488417988596 / BANCO DAVIVIENDA –CUENTA DE AHORROS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA SECCIÓN DE DESARROLLO MÁXIMA 1M. CAL 22

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de canal en lámina galvanizada sección de desarrollo máxima 1M de calibre 22, para la recolección de aguas lluvias en cubierta de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

EJECUCIÓN:

- Ubicar el lugar de la canal y trazar el desnivel que deberá llevar para el flujo del agua. Para esto utilizar la manguera de nivel y marcar los bordes de la canal.
- Anclar los soporte para canal con perforaciones para chazos metálicos de 5/16.
- Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes.
- Colocar la canal sobre los soportes anclados y verificar los niveles.
- Anclar con remaches la canal a los soportes.
- Instalar posteriormente la bajante.

MATERIALES:

- Canal en lámina galvanizada calibre 22 con un desarrollo de 1 metro

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Sección andamio certificado (alquiler)

TRANSPORTE:

- N/A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro (M) de mantenimiento de estructura metálica recibidos a satisfacción por la interventoría.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSORCIO MIA GP

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 20/01/2023 **FECHA TERMINACIÓN** 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA CANAL EN ÁNGULOS DE 1-1/4 X3/16 Y PLATINA DE 20X10 EN 3/16 CON PERFORACIONES PARA CHAZOS METÁLICOS DE 5/16	UN	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	11.092,80	554,6
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	1,500	6.750,0
				SUBTOTAL	7.304,6

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Soportes para canal en ángulos de 1-1/4 x3/16 y platina de 20x10 en 3/16 con perforaciones para chazos m	U	1	50000	$ 50.000,00
			SUBTOTAL	50.000

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla MM- Carpinteria metalica (soldador+ayud)	145.833	52,13%	221.856	0,0500	11.092,8
				SUBTOTAL	11.093
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 68.397,44
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 19.281,24
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 87.679,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

DISEMET COLOMBIA

FECHA: 30 MARZO 2023

ESTRUCTURAS METÁLICAS CUBIERTAS TRABAJOS EN ACERO Y ALUMINIO
DISEÑO SOBRE PLANOS

COTIZACION DE COLEGIO JOSÉ MARTI

CLIENTE: PROCASA
NIT: 901531834-2

Nombre del contacto: LUIS ALFONSO

RODRIGUEZCel.: 3118491908
Email.: disemetcolombia9@gmail.com

- **Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada calibre 22 con un desarrollo de 1 metro**

  Valor metro lineal: 150.000
  Total metros: 40

- **Suministro e instalación de soportes para canal en ángulos de 1-1/4 x3/16 y platina de 20x10 en 3/16 con perforaciones para chasos metálicos de 5/16.**
  Valor soportes
  50.000

OBSERVACIONES:

- Cotización válida por 10 días debido a la inestabilidad en el valor de los materiales.
- **Se recibe con el 60% de anticipo y el restante un 20% en avance de obra y el 20% restante al recibirobra a total satisfacción.**

N° CUENTA 488417988596 / BANCO DAVIVIENDA –CUENTA DE AHORROS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA CANAL EN ÁNGULOS DE 1-1/4 X3/16 Y PLATINA DE 20X10 EN 3/16 CON PERFORACIONES PARA CHASOS METÁLICOS DE 5/16

UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de soportes para canal en ángulos de 1-1/4 x3/16 y platina de 20x10 en 3/16 con perforaciones para chazos metálicos de 5/16, para el soporte del canal para la recolección de aguas lluvias en cubierta de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

EJECUCIÓN:

- Ubicar el lugar de la canal y trazar el desnivel que deberá llevar para el flujo del agua. Para esto utilizar la manguera de nivel y marcar los bordes de la canal.
- Anclar los soporte para canal con perforaciones para chazos metálicos de 5/16.
- Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes.
- Colocar la canal sobre los soportes anclados y verificar los niveles.
- Anclar con remaches la canal a los soportes.
- Instalar posteriormente la bajante.

MATERIALES:

- Soportes para canal en ángulos de 1-1/4 x3/16 y platina de 20x10 en 3/16 con perforaciones para chasos metálicos de 5/16

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Sección andamio certificado (alquiler)

TRANSPORTE:

- N/A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro (M) de mantenimiento de estructura metálica recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 20/01/2023 **FECHA TERMINACIÓN** 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-15	DESMONTE Y RETIRO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS	M	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	10.458,95	522,9
Equipo de trabajo en alturas certificado (alquiler)			17.500,00	0,030	525,0
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	0,030	135,0
				SUBTOTAL	**1.182,9**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	**-**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	**-**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,0500	10.459,0
				SUBTOTAL	**10.459**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 11.641,90**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 3.281,85**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 14.924,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: Pamela Beltrán

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-15 DESMONTE Y RETIRO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este ítem se refiere al desmonte y retiro de canal de aguas lluvias que se encuentren en la estructura existente y que deban ser retirados ya sea por deterioro o por diseño. Esta actividad se realizará en donde indique los planos de diseño o donde lo apruebe la interventoría.

EJECUCIÓN:

- Ubicar lugar de trabajo.
- Asegurarse que las tejas y estructura de la cubierta ya estén retiradas.
- Retirar los puntos o tubos de desagües y soscos.
- Retirar o cortar los amarres que sostienen la canal.
- Halar la canal.

MATERIALES:

- N/A

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Sección andamio certificado (alquiler)

TRANSPORTE:

- N/A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro (M) de desmonte y retiro de canal de aguas lluvias recibidos a satisfacción por la interventoría.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTICO PARA PISOS DE VINILO (UNA CAPA)

UNIDAD: M2

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la inclusión de este ítem no previsto debido a que el acabado de pisos existente o después de alistado en mortero no es el idóneo para la instalación de vinilo generando superficies irregulares y que se pueden desprender con mayor facilidad. Mediante la aplicación de Mastico se logra una superficie resanada que prolonga la instalación del vinilo.

NP-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RINCONERA EN PVC

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la inclusión de este ítem no previsto debido a que la instalación de rinconeras genera un mejor acabado al piso en vinilo y evita las juntas perpendiculares a muro que son los primeros sitios donde se despega este tipo de piso. Sin la instalación de este accesorio no se puede garantizar que el piso en vinilo perdure adherido en los bordes contra muro.

NP-11 JUNTAS DE MANTO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, INCLUYE REPARACIÓN DE JUNTA, PINTURA BITUMINOSA, ANCHO NO MAYOR A 20 CM (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

La actividad se requiere ya que durante la instalación del impermeabilizante se pierde parte de capa superficial de manto asfaltico en las juntas, la cual protege de los rayos solares al asfalto. Con la pintura bituminosa se logra una protección contra las inclemencias del clima a demás de generar un capa que refleja los rayos solares prolongando la vida del manto y sus propiedades de impermeabilización.

NP-12 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA)

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

La actividad se requiere ya que no existe ninguna actividad contractual para la limpieza de las estructura metálica. Esta es una actividad que se debe previo a la pintura de la estructura debido a que con el tiempo y la falta de mantenimiento, la estructura metálica recolecta capas de polvo, grasa y oxido además de pintura desprendida lo cual no permitiría una adecuada adherencia con la pintura nueva, sin poderse garantizar la nueva actividad.

NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA SECCIÓN DE DESARROLLO MÁXIMA 1M. CAL 22

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

Entre los ítems contractuales no existe un canal con las dimensiones adecuadas para las necesidades de las cubiertas nuevas a instalar.

NP-14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA CANAL EN ÁNGULOS DE 1-1/4 X3/16 Y PLATINA DE 20X10 EN 3/16 CON PERFORACIONES PARA CHASOS METÁLICOS DE 5/16

UNIDAD: UN

JUSTIFICACIÓN:

Debido a que se requiere un canal de mayores especificaciones que los que se encuentran contractualmente, el canal presentado mediante NP 13 requiere un soporte especial para su correcta instalación.

NP-15 DESMONTE Y RETIRO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la inclusión de este ítem no previsto debido a que contractualmente no existe ninguna actividad para el desmonte y retiro de canales de aguas lluvias

Bogotá D.C., 03 de abril de 2023

2023_RUU_MGP_116

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Presupuesto San Agustín sede A.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se adjunta actualización del presupuesto del colegio San Agustín sede A, teniendo en cuenta los requerimientos de la institución, los diseños y actividades no previstas que han surgido en la institución, de lo cual se destaca lo siguiente:

- Inclusión de elementos de recubrimiento en superboard para la protección de vigas metálicas.



- Se precede iniciar la actividad de remodelación de baños teniendo en cuenta la propuesta enviada por el Consorcio MIA GP, mediante oficio 2023_RUU_MGP_065 -

Entrega propuesta baños colegio San Agustín Sede A, enviado el 28 de febrero de 2023, teniendo en cuenta las implicaciones manifestadas en comunicado 2023_RUU_MGP_110 - Diseño baños San Agustín Sede A, enviado el 28 de marzo de 2023, frente a la propuesta enviada por la entidad el 24 de febrero 2023. Se socializo en obra el 30 de febrero de 2023 con la interventoría la alternativa dando aval con el fin de avanzar con la actividad.

La actividad se iniciará con los acabados propuestos por el contratista de obra el día 07 de marzo de 2023 con el aval de la entidad y con el aval de la interventoría de la actividad no prevista mediante oficio TIG-MEM-115 el 30 de marzo de 2023.



- Se incluye en presupuesto 4 unidades de reflector para los costados oriente y occidente, los cuales no cuentan con iluminación a la parte interna, también se propone el cambio del cableado del sistema ya que presenta fallas ya que no cuenta con el tipo de cableado adecuado y ha presentado cortos en el sistema.



- No se incluye en presupuesto el desmonte de tubería y cableado de fibra óptica, sin embargo, al realizar el desmonte del cielorraso existente, se evidencia que el cableado no se encuentra instalado de manera ordenada visualmente.



- No se incluye el desmonte e instalación de piso en el área de sistemas, toda vez que la institución manifiesta la imposibilidad de desmonte de equipos como rack, así las cosas, el contratista no puede dar garantía de la instalación de desmonte y cambio de piso.



De acuerdo con la actualización se cuenta con un presupuesto de mil doscientos cincuenta y nueve millones ciento cincuenta y seis mil doscientos noventa y un pesos M/CPTE ($1,259,156,291), el cual se encuentra por debajo del presupuesto inicial contemplado por la entidad en un valor de Ciento veintidós millones trescientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y nueve con treinta pesos M/CTE ($122,332,959)

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Gmail **CONSORCIO TIG <consorciotig@gmail.com>**

TIG-MEM-107-ALCANCE MERGENCIA TALUD RESTREPO MILLÁN SEDE C

ALEXANDER OSORIO PAEZ <ALOSORIO@educacionbogota.gov.co> 29 de marzo de 2023, 14:36
Para: CONSORCIO TIG <consorciotig@gmail.com>, HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS <htibaquira@educacionbogota.gov.co>
Cc: OBRAS MIA-GP <obrasmiagp@gmail.com>, ConsorcioMiaGPRU <consorciomiagpru2022@gmail.com>, "vale.osorio@gmail.com" <vale.osorio@gmail.com>

Ing. Pamela Beltrán

Directora interventoría CONSORCIO TIG

Buenas tardes,

Una vez evaluada la respuesta del asunto emitida por la firma interventora del Grupo 8 de Mejoramientos 2022, me permito aclarar:

1. Las intervenciones previstas adelantar como medida de prevención o mitigación de la amenaza por las afectaciones que se presentan en area aledaña a la institución, se deben adelantar dentro del predio del colegio en el area de influencia del riesgo; por lo tanto es necesario evaluar de manera conjunta las actividades requeridas ejecutar.

2. En cuanto a los profesionales especializados de los cuales se requiere concepto técnico, se puede precisar que aunado a las apreciaciones de los representantes que deben disponer tanto la firma contratista de obra, como la interventoría externa, igualmente se cuenta con especialistas pertenecientes a la DCCEE dentro de los cuales está un profesional geotecnista, por lo que es necesario programar una reunion técnica con la participación de las partes y así establecer las recomendaciones sobre las acciones a realizar.

3. Mientras se realiza dicha mesa técnica, es necesario aclarar la recomendación dada por la interventoría como conclusión, en cuanto a que se solicita la (evaluación) de la sede educativa:

> Sin ánimo de incidir en los procedimientos que a bien tenga la entidad para atender la emergencia, se solicita la evaluación de la sede educativa hasta que se solucione el tema de estabilización del talud en riesgo de remoción.
>
> Evaluar el alcance de las emergencias.

Por favor precisar si se refiere a evaluar o evacuar dicha sede.

A la espera de la realización de la reunión técnica solicitada, quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

Arq. Alexander Osorio Páez

LIDER TERRITORIAL ORIENTE

Supervisor Contratos de mejoramiento SED

Dirección de Construcción y Conservación

de Establecimientos Educativos

alosorio@educacionbogota.gov.co

[El texto citado está oculto]

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales. _____ _____ La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

PABLO SIMBAQUEBA BARRERA
INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO
ESPECIALISTA EN REDES HIDRAULICAS
MBA MERCADEO Y DIRECCION

Bogotá DC., marzo 22 de 2023

INF RHYS COLEGIO SAN AGUSTIN 01- 220323 V1
Para respuesta a este oficio citar esta referencia.

SEÑORES CONSORCIO MIA GP	***JESUS GUILLERMO GOMEZ LOPEZ*** ***DIRECTOR DE OBRA***

ASUNTO

CONCEPTO PRUEBAS DE PRESIÓN TUBERIAS EN FUNCIONAMIENTO COLEGIO SAN AGUSTIN.

Cordial saludo

De acuerdo con su solicitud reitero por este medio la imposibilidad de efectuar prueba de presión hidrostática/neumática en las tuberías existentes para verificar el estado de las reparaciones realizadas, ya que no es posible garantizar la capacidad hermética de la estructura en funcionamiento.

Se recomienda poner en funcionamiento el sistema y realizar inspección de los elementos, verificando que no existan filtraciones y/o deformaciones.

Cordialmente,



PABLO SIMBAQUEBA
Consultor Hidráulico.
Ingeniero Ambiental y Sanitario.

CARLOS ALBERTO MAYORGA VELA
INGENIERO CIVIL – Msc ESTRUCTURAS – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Bogotá, D.C. 10 de abril de 2023 23-03-061
PN°313-23

Señores
CONSORCIO TIG

REF: REVISIÓN CARACTERIZACIÓN INFORME PRELIMINAR DE OBRA PISO DE CANCHA COLEGIO ALEXANDER FLEMING VERSIÓN 3.

Respetados Señores

A continuación, se presenta la revisión correspondiente al concepto técnico estructural sobre la placa de contrapiso de cancha versión 3 del colegio Alexander Fleming elaborado por el ingeniero Geovanny Alexander Castaño Castaño.

1. **Documento recibido**
   - Concepto técnico Colegio Alexander Fleming, sobre placa de contrapiso de cancha versión 3.

2. **Descripción general del documento recibido**
   En el documento relacionado se realiza un marco teórico correspondiente a la patología y se presenta evaluación de restitución de la placa de contrapiso existente en el colegio Alexander Fleming y que presenta fisuras en la actualidad.

3. **Observaciones placa de contrapiso**
   - De acuerdo a inspección por medio de detector de metales, se establece que la placa no presenta acero de refuerzo en su

interior, excepto en la tapa del tanque de almacenamiento de agua, la cual de acuerdo al concepto revisado no se demolerá.

- Para el caso del documento se proponen juntas de contracción de 30 mm de profundidad y 6mm de espesor, lo cual se considera apropiado.
- Se proponen cortes tipo rombos en los puntos como cajas de inspección existentes con una profundidad de 10 mm, lo cual se considera apropiado
- En la gráfica de junta de construcción (ilustración 5) la junta presenta una profundidad de 50mm, la cual se recomienda cambiar para que sea consistente con los 30mm de profundidad relacionados en la página 6 del documento y evitar confusiones de procedimientos en el momento de la construcción de la placa.
- Se proponen juntas de aislamiento de 20mm contra estructuras existentes, lo cual se considera apropiado.
- Se proponen juntas de dilatación con detalle de rombo inducido, lo que se considera apropiado.
- Se recomienda instalar las varillas de transferencia de cargas o pasadores lisos propuestos en el documento.
- La resistencia del concreto tomado para la placa a construir de 21 MPa se considera apropiado.
- El uso de malla electrosoldada de 6.5 mm C/.15m como refuerzo en toda la extensión de la placa, se considera apropiado.
- El espesor de la placa propuesto de 12.5 cm se considera apropiado.
- Se debe seguir lo establecido para la base o relleno de apoyo de la placa.
- Se recomienda dejar una nota en el documento que aclare que durante el proceso constructivo de las juntas realizadas por corte, no deben en ningún caso cortar el acero de refuerzo de los pasadores o la malla electrosoldada, teniendo presente que

la profundidad de 30mm de la junta no debería alcanzar a cortar el acero de la malla presente a 50 mm de profundidad.

- Se considera apropiado seguir las conclusiones y recomendaciones descritas en el documento revisado.

Cordialmente,



ING. CARLOS MAYORGA VELA
Mat. 25202-131425 CND
C.C. 80.020.496 de Bta.

Bogotá D.C., 3 de abril de 2023

2023_RUU_MGP_117

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Respuesta oficio TIG-MEM-129 - OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.2.

Cordial Saludo,

Atendiendo a lo solicitado mediante oficio TIG-MEM-129, por medio de la presenten se realiza la subsanación al informe mensual de obra No 2, respondiendo de la siguiente manera las consideraciones dadas por interventoría:

1. El personal presentado debe ser el que se encuentra aprobado por esta interventoría

   R/: Se revisa el personal presentado y se coloca el mismo que el presentado en el informe SST por cada frente de obra, no se incluye el persona que no se presentó en los frentes.

2. Se deben anexar las bitácoras de todos los frentes presentados en el informe, solo del mes de marzo.

   R/: Se incluye la bitácoras faltantes y se elimina las hojas de meses pasados en las bitácoras presentadas.

3. Es claro para esta interventoría que cada frente tiene un personal distinto para la elaboración de los informes, por favor conservar el mismo formato para todo el documento.

   R/: Se procura unificar aun mas el formato pero agradecemos las observaciones sean mas puntuales para lograr obtener un mejor resultado.

Se envía nuevamente el informe mensual teniendo en cuenta las observaciones recibidas.

Sin otro particular, agradecemos su apoyo,



MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Informe mensual No 2 Bitácoras de obra
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

INFORME MENSUAL DE OBRA No 2

PROYECTO:

CONTRATO No CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

CONTRATISTA :
CONSORCIO MIA GP

PERIODO 20 DE FEBRERO DE 2023 A 19 DE MARZO DE 2023

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Educación del Distrito es un organismo del Sector Central del Distrito Capital, con autonomía administrativa y financiera, encargada del sector educativo, la cual tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral, esto de acuerdo con el artículo 25 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el Decreto Distrital 593 de 2017.

Dentro de sus funciones, de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, está el Desarrollo estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades.

En las metas del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá Del Siglo XXI” y el proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C,” se establece intervenir setecientas treinta (730) sedes educativas existentes de obras de mejoramiento de la Infraestructura y atención de emergencias con el fin de ampliar cobertura, garantizando los ambientes de aprendizaje. De igual forma intervenir sedes administrativas con reparaciones locativas.

La estructura organizacional de esta Secretaría, está conformada por Subsecretarias de acuerdo a las funciones y áreas estratégicas, y estas últimas, se encuentran conformadas por Direcciones, estando en cabeza de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia las funciones de formular, dirigir y coordinar los programas y proyectos de disponibilidad, acceso y permanencia, así como las de dirigir y coordinar los programas de construcción de nuevos colegios educativos, así como del mejoramiento y ampliación de los existentes, logrando tales fines a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

Ahora bien, esta Dirección, en el ejercicio de sus funciones, y en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación y en atención a los requerimientos del sector educativo del Distrito, determinó la necesidad, conveniencia y viabilidad de “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

La finalidad de este informe es expresar las inquietudes y e inconsistencias encontradas en la revisión preliminar de diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios e hidráulicos, para que sean aclaradas y definidas en pro del correcto avance de la obra en ejecución.

Dejar en evidencia CUALITATIVAMENTE las deficiencias en la construcción de algunos elementos estructurales que puedan afectar el normal comportamiento de los elementos no estructurales como cubiertas, pisos y muros de mampostería, así como el comportamiento de la misma estructura

La información con la que se ha realizado este informe recopila lo estudiado entre las especificaciones técnicas, presupuesto, planimetría y estado actual de obra.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Las actividades a realizar dentro del alcance del contrato de obra se encuentran en la zona oriente de la ciudad de Bogotá y más específicamente en la localidad de Rafael Uribe Uribe, los colegios a intervenir se listan a continuación:

- Colegio Alexander Fleming Sede B, Antonio Ricaurte
- Colegio Alfredo Iriarte A Sede A, Los Chircales
- Colegio Alfredo Iriarte Sede B, El Mirador
- Colegio Diana Turbay Sede B, Diana Turbay
- Colegio El Libertador Sede B, Manuel Murillo Toro
- Colegio Enrique Olaya Herrera Sede A, Enrique Olaya Herrera
- Colegio José Martí Sede A, Luis López De Mesa
- Colegio José Martí Sede C, Granjas De San Pablo
- Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño Sede A, Liceo Femenino Mercedes Nariño
- Colegio Manuel Del Socorro Rodríguez A Sede A, Manuel Del Socorro Rodríguez
- Colegio Manuel Del Socorro Rodríguez B Sede B, Republica De Israel
- Colegio Rafael Delgado Salguero Sede A, General Páez
- Colegio Reino De Holanda Sede A, Reino De Holanda
- Colegio Restrepo Millán Sede B, Isabel II De Inglaterra
- Colegio Restrepo Millán Sede D, Gabriela Mistral
- Colegio San Agustín Sede A, San Agustín
- Colegio El Libertador Sede C, Juan Del Rizo

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

La Secretaría de Educación del Distrito requiere realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SED, dentro de las cuales se encuentra el mantenimiento PROGRAMADO y la atención de EMERGENCIAS, con el fin de mantener en óptimas condiciones los equipamientos de la SED en donde presta sus servicios.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO: El proyecto incluye la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios y las sedes administrativas. Dentro del listado de sedes a intervenir del presente

contrato, se priorizaran sedes de acuerdo a las indicaciones dadas por la SED y la disponibilidad de los recursos.

REPARACIONES DE EMERGENCIA: Refiere a intervención de Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales o de sus sedes administrativas que no están programadas y que por necesidad urgente o por circunstancias sobrevinientes deben ser intervenidas de forma inmediata. Se incluyen dentro de estas, actividades o cantidades no programadas que no hayan sido incluidas en el diagnóstico inicial realizado a cada equipamiento postulado, debido a circunstancias inesperadas causados por fenómenos naturales, accidentes, situaciones antrópicas no previsibles y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales y de sus sedes administrativas.

2. CONTRATO SUSCRITO

2.1. CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTUR FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATISTA:	Consorcio MIA GP
NIT:	901.634.703-9
REPRESENTANTE LEGAL:	Mateo Luzardo Villamizar
CONTACTO:	Cra 8 No 12-21 MN edificio Restrepo Bogotá D.C
VALOR INICIAL:	$11.941.262.150,00
PLAZO INICIAL:	Once (11) Meses
FECHA DE INICIO:	20 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de diciembre de 2023

3. CONTROL DE PÓLIZAS

3.1. PÓLIZAS INICIALES

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**NACIONAL DE SEGUROS**		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA No:	**400044676**		
ANEXO	**1**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**15/12/2022**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURAD**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/10/2022	18/03/2024	$ 2.288.252.430,oo
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/10/2022	18/09/2026	$ 1.194.126.215,oo
ESTABILIDAD DE LA OBRA	18/09/2023	18/09/2025	$ 2.388.252.430,oo
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA N°:	**400044675**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**15/12/2022**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	18/10/2022	18/09/2023	$ 597.063.107,50
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	18/10/2022	18/09/2023	$ 298.531.552,75
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	18/10/2022	18/09/2023	$ 298.531.552,75
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	18/10/2022	18/09/2023	$ 298.531.552,75
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	18/10/2022	18/09/2023	$ 298.531.552,75

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**BERKLEY COLOMBIA SEGUROS**		
PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE			
PÓLIZA No:	**1547/0**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**22/11/2022**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURAD**
	INICIAL	**FINAL**	
COBERTURA PRINCIPAL A	22/12/2022	26/10/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA TERREMOTO, TEMBLOR MAREMOTO, ERUPCIÓN VOLCÁNICA	22/12/2022	26/10/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA PARA HMACC-AMIT INCLUYENDO SABOTAJE Y TERRORISMO	22/12/2022	26/10/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA CICLÓN, HURACÁN, INUNDACIÓN, OTROS EVENTOS	22/12/2022	26/10/2023	$ 11.941.262.150,oo
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL COBERTURA E	22/12/2022	26/10/2023	$ 1.300.000.000,oo

3.2. PÓLIZAS ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**NACIONAL DE SEGUROS**		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA No:	**400044676**		
ANEXO	**2**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**31/01/2023**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURAD**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/01/2023	20/06/2024	$ 2.288.252.430,oo
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/01/2023	20/12/2026	$ 1.194.126.215,oo
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/12/2023	20/12/2025	$ 2.388.252.430,oo

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA N°:	**400044675**		
ANEXO	**2**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**31/01/2023**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	20/01/2023	20/12/2023	$ 597.063.107,50
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	20/01/2023	20/12/2023	$ 298.531.552,75
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	20/01/2023	20/12/2023	$ 298.531.552,75
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	20/01/2023	20/12/2023	$ 298.531.552,75
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	20/01/2023	20/12/2023	$ 298.531.552,75
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**BERKLEY COLOMBIA SEGUROS**		
PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE			
PÓLIZA No:	**1547/0**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**22/11/2022**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURAD**
	INICIAL	**FINAL**	
COBERTURA PRINCIPAL A	20/01/2023	19/12/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA TERREMOTO, TEMBLOR MAREMOTO, ERUPCIÓN VOLCÁNICA	20/01/2023	19/12/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA PARA HMACC-AMIT INCLUYENDO SABOTAJE Y TERRORISMO	20/01/2023	19/12/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA CICLÓN, HURACÁN, INUNDACIÓN, OTROS EVENTOS	20/01/2023	19/12/2023	$ 11.941.262.150,oo
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL COBERTURA E	20/01/2023	19/12/2023	$ 1.300.000.000,oo

4. INFORME DE LOS COLEGIOS INTERVENIDOS

4.1. COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II

El Colegio Diana Turbay Sede B, Diana Turbay encuentra ubicado en la Cl. 49 Sur #2a-38 2a-14 a.





4.1.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Residente de obra
Valentina Osorio	1.094.944.405	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Jose Elias Michelly	19490651	Maestro de obra
Brayan Andres Marin Salsas	1023967015	Ayudante de Obra
Neudo Jose Gonzalez	22095569	Ayudante de Obra
Cristian Camilo Uribe Valbuena	1069724034	Instalador
Edgar Moreno Reyes	1005195748	Instalador
Frannkyn Roosevelth mendez	1024484580	Instalador
Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	Instalador
Gina Kterine Casas	1069754573	Inspector de obra

4.1.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante esta fase del proyecto se da inicio a las intervenciones preliminares contempladas dentro del alcance contractual para El Colegio Diana Turbay Sede B:

- **DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS):** Se realizó el desmonte de la cubierta del edificio 3 con la finalidad de empezar con las actividades del suministro de la estructura metálica que soporta la cubierta.

- **DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS):** Siguiendo las actividades del desmonte se realiza la desinstalación de las salidas eléctricas encontradas en las aulas donde se estaba realizando las demás actividades de desmonte.

- **DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA:** Se realizó el desmonte de la canaleta contigua a la cubierta que se desmonto previamente.

- **DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):** Se continua con el desmonte de las lámparas restantes que estaban en el edificio.

- **DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS):** A consecuencia del desmonte de la cubierta se realizó la desinstalación de la red eléctrica existente en las aulas donde ya no existe la cubierta a reemplazar. Dentro de esta actividad se tienen en cuenta también el desmonte de las tuberías de EMT y PVC que hacen parte de la red eléctrica.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA):** Con la finalidad de realizar la instalación de la nueva cubierta se realizó el suministro de la estructura metálica que soportara la nueva cubierta.

4.1.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)







imagen 1. DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE

- DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)



imagen 2. Desmonte de salidas eléctricas.

- DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA:



Imagen 3. Desmonte de canal.

- DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)



imagen 4 Desmonte de lámparas.

- DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)



imagen 5. Desmonte de la tubería eléctrica.

4.1.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el período reportado, se realizaron varios comités de obra con interventoría y supervisión, para determinar alcance contractual para el mejoramiento correctivo de dicha institución. Se pacto entregar diseños de las nuevas redes a ejecutar en la independización de baños y la adecuación del baño de docentes, para ser aprobados y ejecutados.

4.2. COLEGIO JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LÓPEZ DE MESA

El Colegio José Martí Sede A, Luis López De Mesa se encuentra ubicado en la Dg. 32 Bis Sur #14-97.





imagen 6. Colegio José Martí- Luis López de Mesa- Sede A

4.2.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Mauricio Rodriguez	79.715.893	Residente de obra
Yesenia Arenas	1.049.638.441	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
John Benal	7.956.608	Maestro de obra
Yeison Manuel Romero	1.681.368.777	Ayudante de Obra
Jonathan Londoño Quiñonez	80.111.297	Ayudante de Obra
Jiaro Sanchez	79.451.618	Ayudante de Obra
Jhon Jairo Hincapie	79.482.086	Ayudante de Obra
Jonathan Alberto Zapata	80.773.320	Ayudante de Obra

4.2.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante esta fase del proyecto se da inicio a las intervenciones preliminares contempladas dentro del alcance contractual para la Institución Educativa José Martí Sede A-Luis López de Mesa:

- **CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO:** Se realiza cerramiento para aislar las áreas en que se está interviniendo, impidiendo el paso de personal no autorizado a orientación y auditorio por segundo piso.

- **DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORRASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS):** Se realiza desmonte de cielo falso en madera existente en oficina de orientación.

- **DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS):** Se realiza desinstalación de tubería y cableado existente en orientación, escaleras y pasillo.

- **DESMONTE DE LÁMPARAS:** Se realiza desinstalación de luminarias existentes en orientación, escaleras y pasillo.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA):** Se realiza instalación de estructura metálica de refuerzo para anclaje de teja standing seam en aula de profesores, orientación, escaleras y pasillo.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN:** Se realiza instalación de interruptor en aula de profesores.

- **SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN:** Se realiza instalación de tomacorrientes en aula de profesores.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN:** Se realiza instalación de tubería galvanizada EMT para circuitos internos aula de profesores.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN:** Se realiza instalación de cable para circuitos en aula de profesores.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS:** Se realiza instalación de paneles LED de 120x30cm en aula de profesores.

- **VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):** Se realiza instalación de pintura vinilo tres manos en muros internos de aula de profesores.

- **ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS:** Se realiza instalación de esmalte sobre puerta y marco en aula profesores.

- **ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):** Se realiza instalación de 3 en 1 sobre estructura metálica existente soporte de cubierta y estructura instalada para anclaje de teja standing seam.

- **FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO:** Se realiza instalación de flanches en cubierta aula de profesores.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGÚN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIÉSTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS):** Se realiza instalación de cubierta tipo sándwich ancho de 500mm con aislante de poliuretano en aula profesores, pasillo y escaleras.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH:** Se realiza instalación de caballete interno y externo en aula de profesores, pasillo y escaleras.

4.2.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO.



imagen 7. Cerramiento en área de circulación y trasiego interno desde áreas de desmonte de cubierta hasta acopio temporal

- DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORRASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)



imagen 8. Desmonte de cielo falso en orientación

- DESMONTE DE LÁMPARAS:



imagen 9. Desmonte de luminarias en orientación

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA):



imagen 10. Perfil en C instalado perimetralmente para evitar que se levante la teja





imagen 11. Angulo de 2"x2"x3mm instalado en cherchas existentes

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN:



imagen 12. Interruptor y tomacorrientes en aula profesores

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN:



imagen 13. Tubería EMT y cableado en aula profesores

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS:



imagen 14. Paneles Led 120x30cm en aula profesores

- VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):



imagen 15. Pintura vinilo muros interiores en aula profesores

- ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):



imagen 16. Pintura estructura metálica soporte cubierta en aula profesores

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGÚN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIÉSTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS):



imagen 17. Cubierta standing sean.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH:

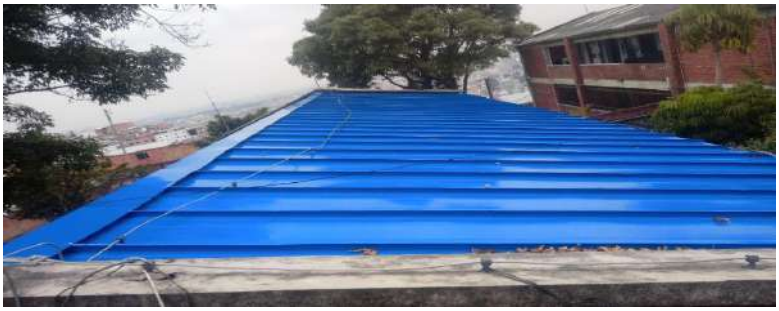


imagen 18. Caballete

4.2.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el período reportado, se solicitó a interventoría considerar las alternativas de intervención en cubierta de baño de orientación, dado que actualmente es una placa de techo, la cual, dado a la escorrentía, déficit en su drenaje, colmatación del dren con material vegetal, genera una evidente humedad tanto en los muros internos como en fachada.



imagen 19. Estado actual de Placa de techo baño orientación.

- Se remitió una vez más el diseño actualizado del refuerzo a la estructura metálica soporte de cubierta existente a interventoría, a la fecha no se tiene observaciones.

- Durante el período reportado se registran lluvias de media y alta intensidad de manera intermitente, que condicionan el avance en obra.

- Especialista hidráulico de Consorcio Mia GP, emite informe y análisis de la sección transversal de las canales a instalar en las cubiertas a intervenir, esto como soporte y aval para aumentar la capacidad acorde al caudal que deberá evacuar.

- Cabe resaltar que durante la semana del 13 de marzo al 24 de marzo en la institución educativa tenían programado una actividad (grabaciones de una producción de T.V.) es así que informaron a consorcio Mía GP, del condicionamiento para trabajar en exteriores, así como generar ruidos propios de herramienta menor. Situación que preocupa a contratista, dado que condiciona las jornadas laborales y por ende el avance en obra.

- Durante este período, tras evidenciar la filtración de agua por la ventana existente en aula profesores costado en dirección a serigrafía, se identifica que la filtración se da por la incorrecta ubicación del vidrio de la ventana, se procede a desmontar y reinstalar el vidrio de manera correcta, y se subsana la filtración presentada.



imagen 20. Subsanación filtración por ventana en aula profesores.

4.3. COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA

El Colegio Restrepo Millán Sede B, Isabel II De Inglaterra se encuentra ubicado en la Dg. 37b Sur #17c98 17c- a.





imagen 21. Colegio Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra

4.3.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Mauricio Rodriguez	79.715.893	Residente de obra
Yesenia Arenas	1.049.638.441	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Fabio Toro	3082270	Maestro de obra
Luis Fernando Londoño Ruiz	10058843089	Ayudante de Obra
Anderson Mauricio Galindo	1022958502	Ayudante de Obra
Jose Alfredo Corena	1033811872	Ayudante de Obra
William Mauricio Castro	1003805819	Ayudante de Obra
Javier Guilombo	7687771	Ayudante de Obra

4.3.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante este período del proyecto se continúa con la intervención planteada en la fase 2 (correspondiente al mantenimiento de estructura metálica, demolición de placa existente en corredor 33 y aula 32 en edificio 3 piso 1, así como el relleno y compactación de B-400) en la Institución Educativa Restrepo Millán Sede B-Reina Isabel II de Inglaterra descritas a continuación:

- **CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M):** Se realiza aislamiento de las áreas a intervenir en edificio 2, en aras de evitar el paso a personal no autorizado y teniendo en cuenta que el edificio 1 y exterior está habilitado para niños de primaria, se pretende brindar seguridad a la comunidad estudiantil.

- **DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)** Se realiza demolición de placa de contrapiso existente en aula 32 y corredor 33 edificio 2.

- **DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS):** Se realiza desmonte de salidas eléctricas existentes en aulas del edificio 2 en piso 2.

- **DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):** Se realiza desmonte de luminarias existentes en aulas del edificio 2 en piso 1 y en corredor 33.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN):** Se realiza relleno y compactación de subbase granular en pasillo 33 y aula 32 edificio 2 primer piso.

- **ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):** Se realiza mantenimiento de cerchas existentes, y aplicación de 3 en 1 a estructura metálica de soporte cubierta existente piso 1 edificio 2.

4.3.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M):



imagen 22. Cerramiento para aislar edificio 2 Colegio Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra

- DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

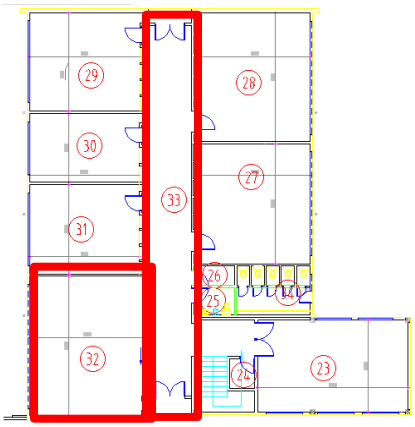










imagen 23. Demolición placa de piso en corredor 33 y aula 32 edificio 2

- DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS):



imagen 24. Desmonte de salidas eléctricas existentes en edificio 2, piso 1 Colegio Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra

- DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):



imagen 25. Desmonte de luminarias existentes en edificio 2, piso 1 Colegio Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN):



imagen 26. Relleno y compactación de subbase granular B-400 en edificio 2, piso 1 Colegio Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra

- ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):

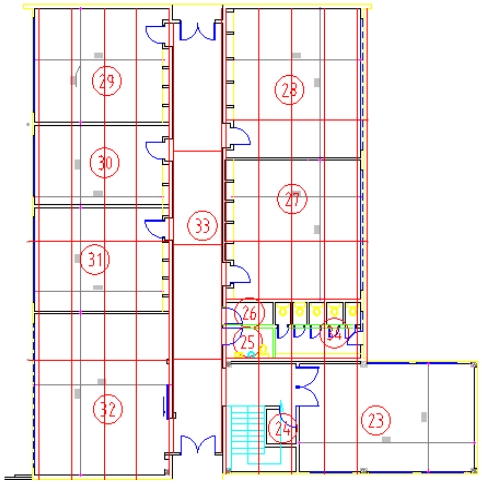




imagen 27. Mantenimiento de cerchas existentes en edificio 2, piso 1 Colegio Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra

4.3.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se remiten fichas técnicas de las alternativas y marcas de piso tipo vinilo a interventoría, quien aprueba el piso MINI DE LG HAUSYS, y así mismo, supervisión define un patrón de colores de piso a instalar.

- Tras presentar a interventoría y supervisión múltiples alternativas de alcance para intervención, Interventoría solicita se ajuste el presupuesto incluyendo piso tipo vinilo en todas las aulas y corredores, mantenimiento y adecuación de unidades sanitarias, el cual se compila y remite para revisión y aprobación, solicitando la definición final del alcance a ejecutar, dado que es una de las condicionantes para el avance en obra.

- Se realiza reunión entre contratista e interventoría con participación de especialistas estructurales con quienes se socializa el diseño contemplado para la estructura de soporte de la cubierta a instalar dando el mayor posible cumplimiento a la NSR-10 teniendo en cuenta las condiciones físicas de los muros y cerchas existentes, a su vez, interventoría solicita consolidar una alternativa con la menor intervención de la estructura existente que posibilite el anclaje de la teja a instalar.

- De acuerdo a auscultación visual realizada desde la cubierta, se sugiere a interventoría no cambiar las canales existentes en corredor 33 edificio 2 piso 1, dado que su condición actual no está en alto grado de deterioro, al contrario, la corrosión es mínima, solo requiere limpieza y mantenimiento, así como su impermeabilización. De esta misma manera se propone realizar una limpieza a las bajantes existentes que están en buen estado y que no requieran ser reemplazadas.

Se evidencia y remite a interventoría mediante registro fotográfico y fílmico el funcionamiento en condiciones de lluvia de las cajas de inspección existentes en pasillo 33, evidenciando que es tubería de gres, solicitando de esta manera definir si se realiza excavación para revisión de las mismas, así como el cambio por tubería sanitaria PVC.

4.4. COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN

El Colegio San Agustín Sede A, San Agustín se encuentra ubicado en la Cl. 50a Sur #5C-40.



4.4.1. RELACIÓN DE PERSONAL


CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Mauricio Rodriguez	79.715.893	Residente de obra
Juan Camilo Cristancho Bohada	1.049.638.441	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Fabio Toro	3082270	Maestro de obra
Luis Fernando Londoño Ruiz	10058843089	Ayudante de Obra
Anderson Mauricio Galindo	1022958502	Ayudante de Obra
Javier Castro	7630373	Ayudante de Obra
Neider Antonio Polo	1041890049	Ayudante de Obra
Carlos Beltrán	19497864	Ayudante de Obra
Cristian Camilo Uribe Valbuena	1069724034	Instalador
Edgar Moreno Reyes	1005195748	Instalador
Frannkyn Roosevelth mendez	1024484580	Instalador
Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	Instalador
Gina Kterine Casas	1069754573	Inspector de obra

4.4.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

- **DEMOLICIONES:** Se realiza demolición de enchape en pisos y paredes de los baños de niños, niñas, profesores y cuarto de aseo del piso 3. La propuesta inicial de acabado de piso nuevo es baldosa de granito pulido. Sin embargo, esto conllevaría a un aumento del nivel de acabado con respecto al pasillo y el cambio de las puertas de acceso a los espacios. Por lo cual el contratista manifiesta a la interventoría la recomendación del cambio del acabado de piso.
- **ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA:** Se realiza instalación de estructura adicional a estructura existente, con el fin de cumplir con los distanciamientos mínimos de apoyo entre tejas. Se realiza actividad de pintura sobre estructura existe y estructura instalada para proyección de esta y evitar corrosión. Se realiza desmonte de teja existente, se realiza embalaje y disposición final en lugar certificado. Se realiza instalación de teja tipo sándwich en el área liberada, se realiza instalación caballete y remates de cubierta.

- **PROPUESTA ARQUITECTÓNICA:** La propuesta arquitectónica de distribución se entrega por parte del contratista el día 28 de febrero del 2023, se espera aprobación por parte de la SED para realizar la modificación de redes. El 07 de marzo del 2023 se presenta propuesta de acabado disponible para el área de baños, el cual no coincide con los formatos contractuales, ya que no se encuentra disponibilidad en el mercado por circunstancias ajenas al contratista.

  Se presenta a la interventoría y supervisión propuesta de distribución arquitectónica en donde se expone el cambio de sanitarios y acabado de piso.

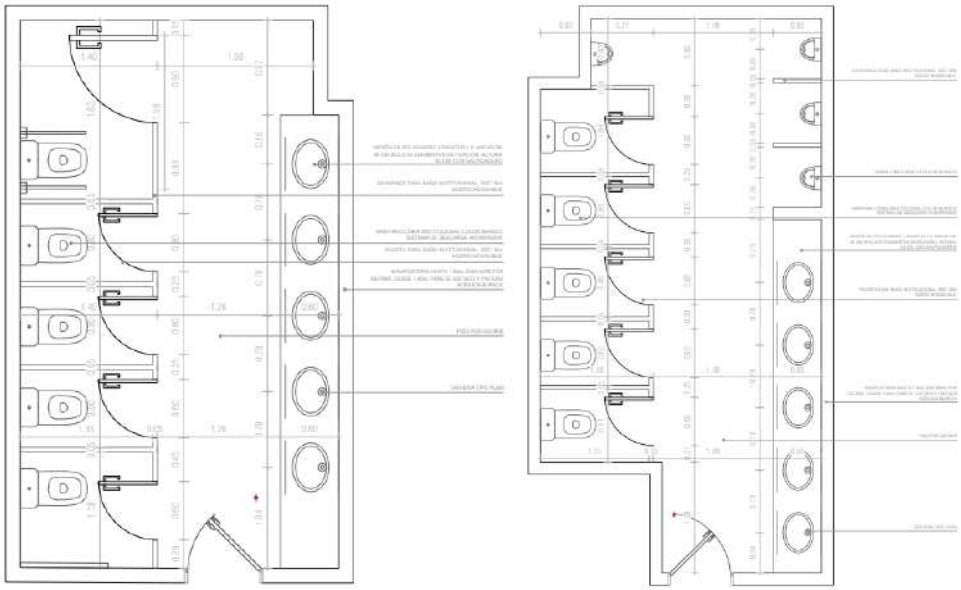

4.4.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **DEMOLICIONES**



imagen 28. Demolición de enchape de piso y pared

- **ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**



imagen 29. Perfiles adicionales para instalación de teja



imagen 30. Desmonte y montaje de teja tipo sándwich primera cama



imagen 31. Desmonte de cubierta existente





imagen 32. Instalación cubierta tipo sándwich



imagen 33. Instalación de primera capa cubierta, asilamiento y segunda capa



imagen 34. teja tipo sándwich con caballete y remates

4.4.4. EMERGENCIA POR FUGA HIDRÁULICA

Se recibió por parte de la interventoría notificación de nueva emergencia en el colegio san Agustín sede B piso 1 – Área bachillerato donde se presentaba fuga hidráulica.

El 21 de febrero se realiza inspección en el sitio donde se evidencia fuga de agua en piso 1, se procede a realizar demolición de muro de donde parece provenir el agua.

Se define que la procedencia de la fuga es bajo placa de contrapiso, por lo que se debe realizar demolición de enchape de piso, placa de contrapiso y excavación bajo placa.





Se recibe a probación por lo que se realiza demolición, de placa de contrapiso, no se evidencian elementos estructurales como vigas, en el proceso de demolición.



Se solicita cierre del suministro de agua potable para realizar reposición de tubería existente. Se realiza el cierre y la reposición el 2 de marzo del 2023. Se pone en funcionamiento la red y no se evidencian fugas, se da revisión por parte de la interventoría y se da procede a rellenar, realizar reemplazo de placa de contrapiso, enchape de piso y pared del área afectada.



4.5. COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A

El Instituto educativo Enrique Olaya Herrera se encuentra ubicado en Cra. 10 #31 Sur-29, Bogotá.



Imagen 35. Colegio Enrique Olaya Herrera

4.5.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Residente de obra
Valentina Osorio	1.094.944.405	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
Hugo Guillermo Perez	1.065.881.660	Ingeniero Ambiental
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Jose Elias Michelly	19.490.651	Maestro de obra
Ubaldo Marquez Marquez	7.038.443	Ayudante de obra
Jorge Stiven Quiroga Gomez	1.027.521.715	Ayudante de obra
Luis Antonio Barajas	6.762.943	Ayudante de obra

4.5.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante esta fase del proyecto se da inicio a las actividades de demoliciones, desmontes, retiros, y suministros e instalaciones contemplados dentro del alcance contractual para la I.E.D Enrique Olaya Herrera descritas a continuación:

- **DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE** Se inician actividades de desmonte de cubiertas contemplado en el alcance en el bloque de preescolar.

- **DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO** Se realiza el desmonte de red eléctrica bajo cubierta existente.

- **DESMONTE DE RED ELÉCTRICA** Se realiza desmonte de redes existentes en el aula de preescolar.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA** Se suministra estructura metálica para el correcto funcionamiento de la cubierta modular tipo sándwich

- **ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA** Se pinta estructura metálica con anticorrosivo y pintura blanco esmalte.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES.**

- **FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA**

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGÚN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIÉSTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.**

- **DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO.**

4.5.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE** Se inician actividades de desmonte de cubiertas contemplado en el alcance en el bloque de preescolar.



Imagen 36. Desmonte de cubierta existente

- **DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO** Se realiza el desmonte de red eléctrica bajo cubierta existente.



Imagen 37. Desmonte de salidas eléctricas.

- **DESMONTE DE RED ELÉCTRICA** Se realiza desmonte de redes existentes en el aula de preescolar.



Imagen 38. Desmonte de red eléctrica.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA** Se suministra estructura metálica para el correcto funcionamiento de la cubierta modular tipo sándwich

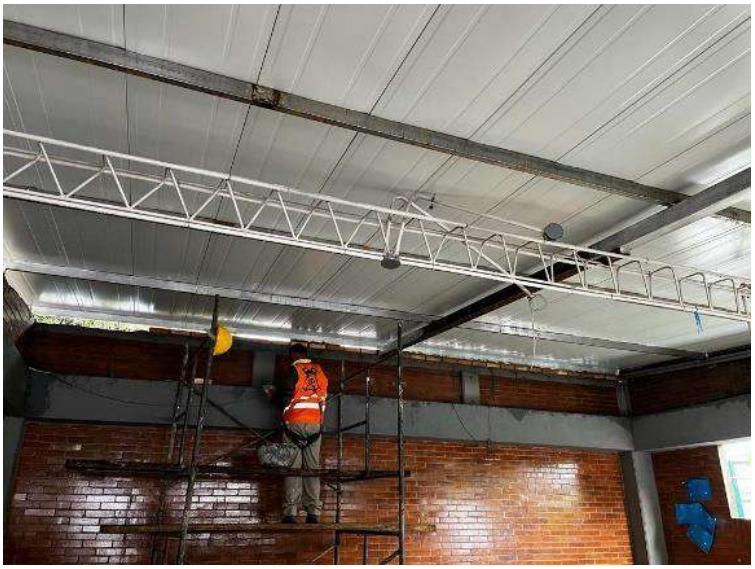


Imagen 39. Suministro e instalación de estructura metálica.

- **ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA** Se pinta estructura metálica con anticorrosivo y pintura blanco esmalte.

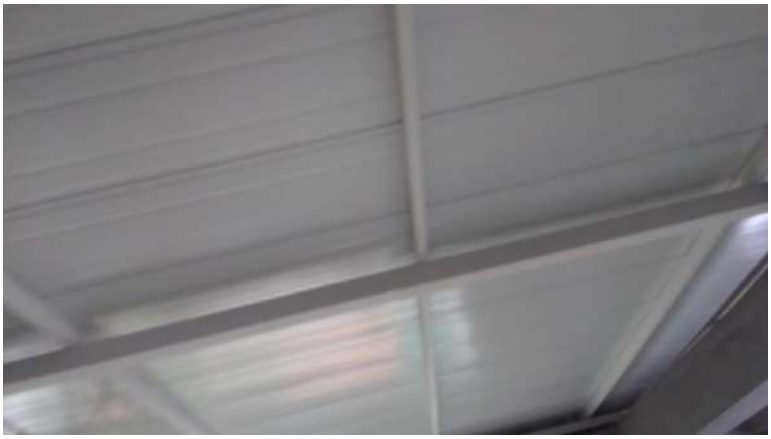


Imagen 40. Pintura sobre estructura.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES.**



Imagen 41. Suministro e instalación de carpintería aluminio.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGÚN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA**

POLIÉSTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.



Imagen 42. Suministro e instalación de cubierta modular tipo sándwich.

- **DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO.**



Imagen 43. Disposición final teja de asbesto cemento.

4.5.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza socialización de ficha de diagnóstico con rectoría de la institución educativa, supervisión e interventoría en donde se presenta ante el colegio el alcance que

contemplará el techo de inversión asignado para las adecuaciones en el establecimiento educativo.

- Se inician actividades dentro del plazo establecido, y se adelantan actividades Inicialmente en el bloque de preescolar.
- Se realiza visita por parte de secretaria de educación y nos aclara temas de diseño de carpintería y colores para el área intervenida.
- Y se evalúa el inicio de otros frentes de trabajo contemplados dentro del alcance para este próximo periodo.

4.6. COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A LOS CHIRCALES

El colegio Alfredo Iriarte Sede A Los Chircales ubicado en la dirección Transversal 5 J No. 48F-69 Sur





4.6.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Residente de obra
Valentina Osorio	1.094.944.405	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Jose Elias Michelly	19490651	Maestro de obra
Manuel Antonio Cardenas	79461540	Ayudante de Obra
Hector Veloza Duitama	79726908	Ayudante de Obra

4.6.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante esta fase del proyecto se da inicio a las intervenciones preliminares contempladas dentro del alcance contractual para El Colegio Alfredo Iriarte Sede A:

- **CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M):** Debido a las actividades a realizar se debe hacer un cerramiento preventivo para evitar el contacto de los estudiantes con el personal y las actividades de obra.

- **DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS):** Se realizan actividades de demolición del enchape que se encuentra deteriorado con la finalidad de reemplazarlo por uno nuevo.

- **DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS):** Se retiran las puertas del baño de los niños en el tercer piso del edificio principal para su posterior reemplazo.

- **MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS:** Se realiza el mantenimiento a las cubiertas del edificio 2 con el fin de complementar las actividades de impermeabilización.

- **PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO:** Se hace el retiro de la membrana existente en las placas de la cubierta para realizar la instalación de la nueva membrana.

- **LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES:** Se realiza la limpieza de las canales y las bajantes de la cubierta con el fin de quitar las membranas existentes deterioradas y eliminar residuos que pueden generar atascos en el flujo del agua.

- **MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD):** De acuerdo con el proceso de la impermeabilización de las cubiertas es necesario realizar el reemplazo del manto asfaltico existente en la cubierta.

4.6.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)





- DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)



- MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS





- PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO.




- LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES





- MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)





4.7. COLEGIO DISTRITAL REINO DE HOLANDA SEDE A

El Colegio Distrital Reino de Holanda se encuentra ubicado en Dg. 46 sur #13 i-15, Bogotá

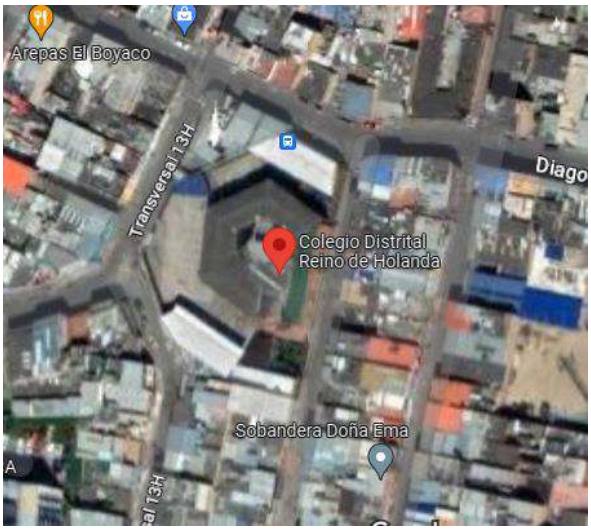


Imagen 44. Ubicación colegio Distrital Reino De Holanda.

4.7.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Residente de obra
Valentina Osorio	1.094.944.405	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
Hugo Guillermo Perez	1.065.881.660	Ingeniero Ambiental
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Jose Elias Michelly	19490651	Maestro de obra
Juan Carlos Campos	1094979136	Ayudante de Obra
Brayan Alexis Lopera Arevalo	1033766735	Ayudante de Obra
Yerimy Gabriel Gutierrez	6971469	Ayudante de Obra
Jose Ignacio Seco	976767020101993	Ayudante de Obra
Cristian Camilo Uribe Valbuena	1069724034	Instalador
Edgar Moreno Reyes	1005195748	Instalador
Frannkyn Roosevelth mendez	1024484580	Instalador
Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	Instalador
Gina Kterine Casas	1069754573	Inspector de obra

4.7.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante esta fase del proyecto se da inicio a las actividades preliminares, de desmontes, retiros, y suministros e instalaciones contemplados dentro del alcance contractual para el Colegio Distrital Reino de Holanda sede A descritas a continuación:

- **REPLANTEO** Se inician actividades de cubierta.
- **CERRAMIENTO EN LONA** Se realiza cerramiento para ingreso de obra, y depósito de materiales
- **DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS** Se realiza desmonte de carpintería metálica existente
- **DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE.** Se realiza desmonte de cubierta de asbesto cemento existente del área de trabajo.
- **DESMONTE DE LÁMPARAS** Se realiza desmonte de lámparas existentes en aulas.
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON REJILLA SUPERIOR** Se realiza Fabricación e instalación de módulos de ventanas en aulas.
- **ESMALTE SOBRE CERCHAS PUENTES Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA.** Se realiza pintura de cerchas existentes.
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH.** Se realiza instalación de cubierta del área habilitada, equivalente a un 50% de la totalidad.

4.7.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **REPLANTEO** Se inician actividades de cubierta.



Imagen 45. Replanteo cubierta.

- **CERRAMIENTO EN LONA** Se realiza cerramiento para ingreso de obra, y depósito de materiales



Imagen 46. Cerramiento

- **DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS** Se realiza desmonte de carpintería metálica existente



Imagen 47. Desmonte de Carpintería metálica.

- **DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE.** Se realiza desmonte de cubierta de asbesto cemento existente del área de trabajo.



Imagen 48. Desmonte de Cubierta existente

- **DESMONTE DE LÁMPARAS** Se realiza desmonte de lámparas existentes en aulas.



Imagen 49. Desmonte de Lámparas

- **ESMALTE SOBRE CERCHAS PUENTES Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA.** Se realiza pintura de cerchas existentes.



Imagen 50. Pintura de cerchas existentes.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH.** Se realiza instalación de cubierta del área habilitada, equivalente a un 50% de la totalidad.



Imagen # Instalación cubierta modular tipo sándwich.

4.7.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza socialización de ficha de diagnóstico con rectoría de la institución educativa, supervisión e interventoría en donde se presenta ante el colegio el alcance que

contemplará el techo de inversión asignado para las adecuaciones en el establecimiento educativo.

- Se inician actividades dentro del plazo establecido, y se adelantan actividades constructivas en las áreas habilitadas para ejecución (aulas 308-307-306-305).

- Se solicita al área de interventoría esclarecer el alcance de los baños a intervenir en la institución para programar ejecución y tiempo de inicio de ese frente de trabajo.

4.8. COLEGIO DISTRITAL LICEO FEMENINO DE CUNDINAMARCA MERCEDES NARIÑO.

El Colegio Distrital **Liceo Femenino De Cundinamarca Mercedes Nariño** se encuentra ubicado en Av. Caracas #23-24, Bogotá.

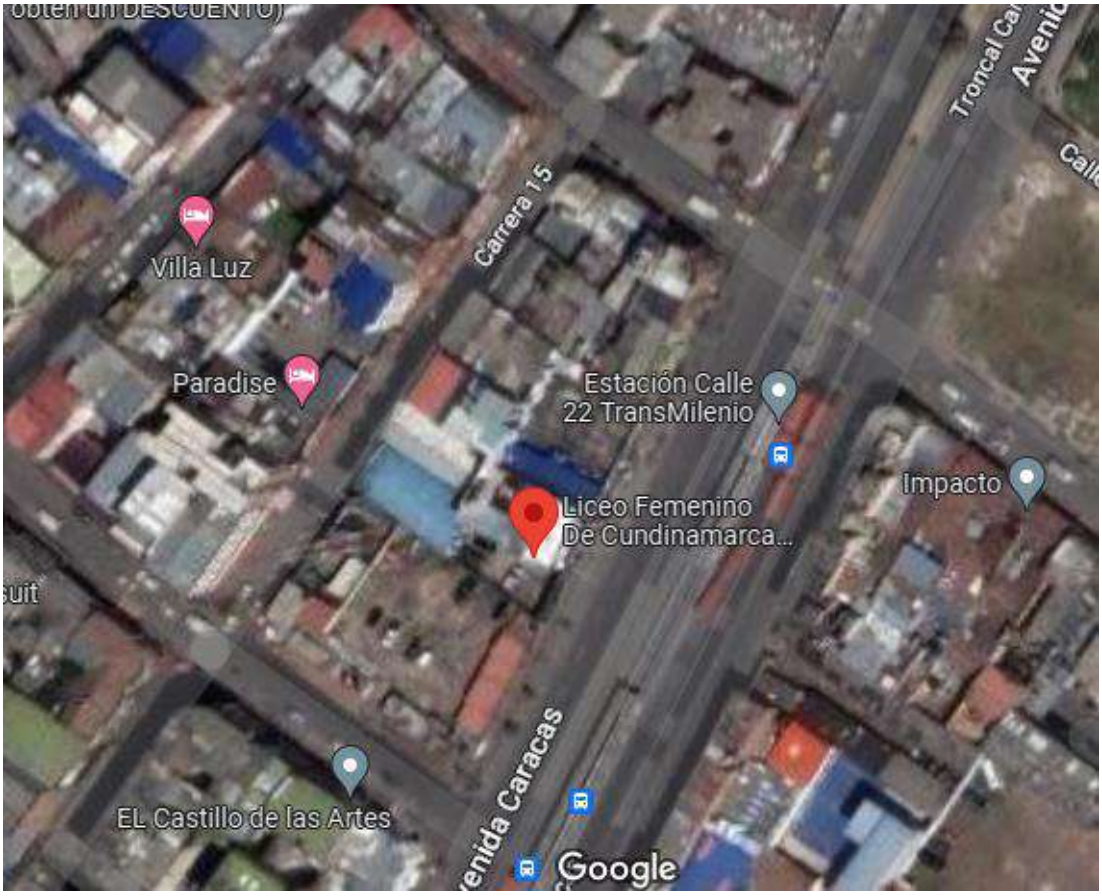


Imagen 51. Colegio Distrital Liceo Femenino de Cundinamarca Mercedes Nariño

4.8.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Residente de obra
Valentina Osorio	1.094.944.405	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
Hugo Guillermo Perez	1.065.881.660	Ingeniero Ambiental

CONSORCIO MIA GP		OBRA
Jose Elias Michelly	19.490.651	Maestro de obra
Nelson Felipe Guanipa	7.129.348	Ayudante de obra
Eduardo Jose Zoteranis Riera	5.620.895	Ayudante de obra
Hector Veloza Duitama	79.726.908	Ayudante de Obra
Manuel Antonio Cardenas	79.461.540	Ayudante de Obra

4.8.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante esta fase del proyecto se da inicio a las actividades preliminares, de demoliciones, retiros, y suministros e instalaciones contemplados dentro del alcance contractual para el Colegio DISTRITAL Liceo Femenino De Cundinamarca Mercedes Nariño descritas a continuación:

- **DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA 0.20M** Se inician actividades de cubierta.
- **DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM**
- **DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA**
- **DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC.,**
- **DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2"**
- **RELLENO CON RECEBO COMPACTADO.**

4.8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA 0.20M** Se realizan demoliciones de pisos y se encuentra ese hallazgo en la mitad del laboratorio de biología.




- **DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM,** Se evidencian concretos reforzados en todos los muebles y pocetas de los laboratorios.






- **DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDA ESCOBA**




- **DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2"**







4.8.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el período reportado, se adelantaron comités de obra con interventoría supervisión, y secretaria de Educación para determinar el alcance del proyecto en los espacios del bachillerato internacional, en donde se nos solicitó plantear el presupuesto de acuerdo a las áreas priorizadas por supervisión, una vez aprobado si iniciaron actividades dentro del plazo establecido, teniendo en cuenta la prioridad de la intervención.

- De acuerdo a lo plasmado inicialmente en informe preliminar del estado de las instalaciones del colegio Liceo Femenino de Cundinamarca Mercedes Nariño, se realizan unos ajustes al presupuesto debido a los hallazgos y patologías presentadas en los pisos de la institución.

- Se realiza recorrido a los 15 días de inicio de actividades por parte de secretaria de educación, y se realizan nuevas solicitudes en relación al alcance inicial, como cielo raso en laboratorio de biología, aprobación de cambio de piso sobre el el existente del área de tecnología #2, y se definen tipos de acabados.

- Se solicita la remisión de diseños del área de laboratorios para definir niveles y continuar con las actividades sin salirnos dentro del cronograma inicial establecido.

4.9. COLEGIO DISTRITAL SANTA LUCIA CAFAM.

4.9.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Mauricio Rodriguez	79.715.893	Residente de obra
Juan Camilo Cristancho Bohada	1.049.638.441	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Fabio Toro	3.082.270	Maestro de obra
Jose Ricardo Rodriguez	79.057.932	Ayudante de Obra
Honorio Martinez Arenas	79.526.595	Ayudante de Obra
Duglas Orlando Reyes	1.031.160.183	Ayudante de Obra
Pedro Hurtado Uribe	1.416.839	Ayudante de Obra
Daniel Gregorio Munevar	79.808.874	Ayudante de Obra
Juan De Jesus Sogamoso	5.969.876	Ayudante de Obra

4.9.2. EMERGENCIA ATENDIDA EN LA INSTITUCIÓN

El día 09 de marzo de 2023 se recibió por parte de la interventoría el llamado al contratista informando la necesidad de su presencia el día siguiente para la atención de una emergencia en el colegio Santa Lucia Cafam. El día 10 de marzo de 2023 el contratista asiste a la sede con el fin de realizar inspección junto con la interventoría, supervisión, rectores y personal de la institución. Se da conocimiento al contratista de obra que se realizó un cierre por parte de la secretaria de salud por inconvenientes de salubridad a causa de humedades en la institución.

El día 11 de marzo de adjunta presupuesto de obra de acuerdo con las recomendaciones contratista como impermeabilización muros de cubierta y pintura de muros internos por un valor de 339,653,303.00. Posteriormente, el 13 de marzo se realiza ampliación del alcance contemplando mantenimiento de cubiertas por el estado en el que se encuentran aumentando el valor del presupuesto en $ 785.534.106,00 el 14 de marzo se toma la decisión de ser incluido como frente de trabajo teniendo alcance de la impermeabilización de muros de cubierta del bloque morado y amarillo 2 por un valor de $ 110,836,631.00. Finalmente, se da alcance incluyendo la intervención en los edificios de la ilustración 1, contemplando impermeabilización de muros de cubierta, pintura interior y mantenimiento de cubiertas realizando diagnóstico y reparación de fisuras de tejas, este presupuesto fue enviado el 16 de marzo $ 427,077,647.00, del cual se recibió aprobación como frente independiente de obra. Sin embargo, es atendido inicialmente los bloques morado y amarillo como emergencia, teniendo en cuenta las

necesidades de la institución, ya que actualmente el bloque morado se encuentra sellado por la secretaria de salud por las condiciones de humedad.

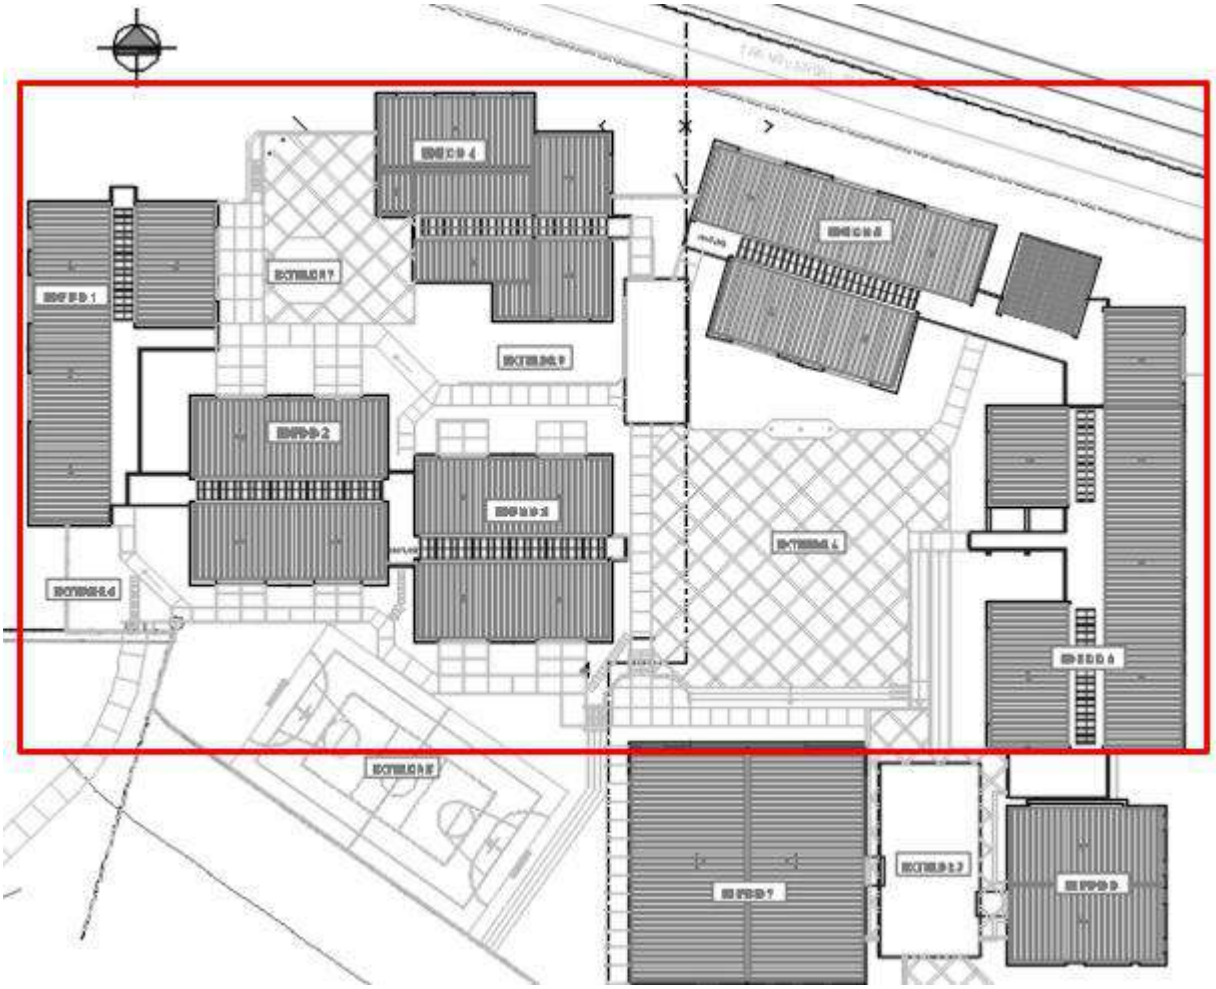


Imagen 52. Área intervención

Dadas las condiciones el contratista Consorcio Mia GP inicio actividades en la institución el 11 de marzo en el edificio morado.

Las condiciones climáticas han afectado el desempeño de las actividades toda vez que por ser actividades en cubierta por seguridad y por los trabajos a desarrollar no se permitió trabajar continuamente.

Se realiza demolición de pañete en remate de muro de cubierta, ya que se presenta levantamiento de este permitiendo filtraciones de agua.



Se realizo retiro de manto asfaltico actual, ya que se encuentra en deterioro, presenta desprendimiento, lo cual hace que no cumpla su función y se genere humedad en el interior.



Se realiza pañete en muro perimetral, reemplazando el pañete demolido, para posterior instalación de emulsión y manto asfaltico.



Se realiza instalación de emulsión asfáltica en las superficies donde será instalado el manto asfaltico.



Se realiza instalación de manto asfaltico con foil de aluminio como medida correctiva de los hallazgos de humedad presentados en la edificación.



Se realiza actividad de pañete y pintura sobre placa del bloque amarillo.





BITÁCORA COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II

13 febrero 2023
Lunes . Maestro 3 ayudantes
Menor
Se ejecutan actividades de demolicion en edificio 3 piso y se inicia la demolicion de muros en mamposteria de edificio 2 piso 1
Firma Luis Miguel Cruz PamelaB
14-02-23.
3 ayudantes
Herramienta Menor.
Se continuan actividades demolicion desmonte de redes edificio 2 y 3
Firma Luis Miguel Cruz PamelaB.
13-Febero 2023
3 ayudantes
Herramienta menor.
Se continuan actividades en edificio 2 y 3 inian desmonte de aparatos sanitarios.
Firma Luis Miguel Cruz PamelaB.
fecha 16 febero
se inician actividades de desmonte de ventaneria a interior de la edificacion
Firma: Luis Miguel Cruz PamelaB
Fecha 17 febrero.
3 ayudantes
Herramienta menor.
Continuan actividades de desmonte de ventaneria.
Firma Luis Miguel Cruz. PamelaB.
Fecha 20 febrero
Se realizo recorrido con inventoria y se atienden inquietudes del paso solicita planos de diseños del bano niños y bano de docentes, Solicitan prueba de anilina / 3 ayudantes
Firma: Luis Miguel Cruz PamelaB.

Fecha 21-2023
Se continuan actividades de demolición en cocineta y desmonte de muebles en esta propiedad - 3 ayudantes en obra
Firma Luis Miguel Pamela B.
Fecha 22-2023
Se finaliza demolicion en cocineta de edificio 2 para definir diseño
3 ayudantes en obra
Firma Luis Miguel Pamela B
Fecha 23-02-2023
3 ayudantes de obra
herramienta menor.
Se hace revisión de cubierta con contratista cubierta, revisión de cubierta existente, queda pendiente el dueño para evaluarlo e iniar actividades de desmonte.
Continuan demoliendo piso edificio 1 piso 2.
Firma: Se hace recorrido con interventoria y sst de interventoria.
se deja registro fotografico de avance de obra a la fecha
Firma: Luis Miguel Cortes Firma Interventoria: Jhan R.
Fecha: 24 de Febrero de 2023
3 Ayudantes
Herramienta menor.
se realiza el acopio de los escombros para su posterior retiro y se separan de acuerdo a su tipologia
Firma: Jhan R. Luis Miguel Cortes
27 de Febrero de 2023.
3 Ayudantes
Herramienta menor.
se empieza con el retiro de los escombros producidos por el desmonte de los pisos y demas demoliciones realizadas en el edificio en la vivienda AEH 864.
Firma: Jhan R. Luis Miguel Cortes
Fecha: 28 de Febrero de 2023
3 Ayudantes
Herramienta menor.
se continua con el retiro de los escombros producidos por las demoliciones.

se presentan los planos de los baños nuevos a intervenirse y se comienza con el acopio del material para las adecuaciones.
Firma: Jhon R.
Fecha: 01 de Marzo de 2023.
3 Ayudantes.
Herramienta menor.

se inicia la demolición de la placa de piso del baño del primer piso del edificio 1 con la finalidad de tener una adecuada superficie para las nuevas redes hidraulicas. se realiza visita por parte del personal encargado de las redes electricas para evaluar las actividades a realizar
Firma. Jhon R.
Fecha: 02 de Marzo de 2023.
3 Ayudantes
Herramienta menor.

se continua con la demolición de la placa de piso del baño del primer piso del edificio 1 y se reciben las estructuras metalicas nuevas para el reemplazo de la cubierta de los edificios. se realizo recorrido con el personal de SST de la interventoria para verificar las condiciones de trabajo seguro.
Firma: Jhon R.
Fecha: 03 de Marzo de 2023.
3 Ayudantes
Herramienta menor.

se inicia la demolición del baño del segundo piso del edificio 1 comenzando por el enchape del baño, se continua con la demolición del piso del baño del primer piso.
Firma: Jhon R.
Fecha: 04 de Marzo de 2023.
2 Ayudantes
Herramienta menor.

se continua la demolicion del baño del segundo piso del edificio 1 y se finaliza con la demolición del baño del primer piso.
Firma. Pamela Beltran.

Fecha: 06 de marzo de 2023
Personal en obra: 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 SST.
Se realizo visita del Ingeniero Carlos Mayorga, especialista estructural de la Interventoria, para revisar las observaciones presentadas por el contratista el dia 3 de marzo en comité de seguimiento.
Se evalian las evidencias en campo, las muros fisuracos, las submuracion del baño de primer piso. Se deja la recomendacion de la señalizacion para el desmonte de cubierta, en el area exterior (calle). Se recomienda cubrir el material granular que se encuentra en el patio central, en la interpegie.
Firma. PamelaBeltran. Luis Miguel Ortiz
Fecha: 07 de Marzo de 2023.
2 oficiales. 2 Ayudantes
Herramienta menor.
se realizo visita por parte de secretaria de educacion e interventoria, con el fin de definir los cambios necesarios para reforzar las estructuras de los edificios. todo queda referenciado en el acta de reunion de la fecha presente. Adicionalmente se realizo el retiro de la cubierta del edificio 2. y se pasan los niveles para los sitios donde se requiere colocar los nuevos pisos.
Firma. Luis Miguel Ortiz PamelaB
Fecha: 08 de Marzo de 2023.
1 oficial, 2 ayudantes
Herramienta menor.
se comienza el retiro de los marcos de las puertas y las puertas de las aulas 1, y 2, con el fin de dar cumplimiento a las sugerencias realizadas.
Firma. Luis Miguel Ortiz PamelaB
Fecha: 09 de Marzo de 2023.
1 oficial, 2 ayudantes.
Herramienta menor.
se inicia con la nivelación del piso del aula 1 del edificio 1, con el fin de arreglar la superficie para la posterior instalación del enchape del piso.
Firma. Luis Miguel Ortiz PamelaB

Fecha 10 de Marzo 2023
Interventoria Ambiental Se verifico manejo de RCD (acopios), se encuentran areas, ordenadas, RCD excavador, chatarra, tejas en areas definidas, se solicito programa retiro de tejas con proveedor autorizado,
se realizo reunion con personal de interventoria y SED con el fin de definir los cambios a realizar en el frente, quedado a la espera del diseño arquitectonico que se sugiere por parte de la SED.
1 Ayudante Pamela B.
Int ambiental
Consorcio T16

Fecha: 11 de Marzo de 2023
1 Ayudante
Se realiza jornada de aseo en el frente de obra con el fin de evitar acumulaciones de residuos. Se registran fuentes/llaves durante toda la jornada.
Firma: Pamela B.

Fecha: 13 de Marzo de 2023
1 Ayudante
Herramienta menor.
Se hizo acopio del material recibido para continuar con la intervención, asi mismo se continua en jornada de aseo.
Firma. Pamela B.

Fecha: 14 de Marzo de 2023
1 Ayudante
Herramienta menor.
Se realiza el acopio de los residuos dejados por el desmonte de la cubierta del edificio 2.
Firma: Pamela B.

Fecha: 15 de Marzo de 2023
1 Ayudante.
Herramienta menor.
Se continua con el desmonte del sobrepiso existente en las aulas 1 y 2. para dejar la superficie adecuada para el enchape.
Firma Luis Miguel Pamela3.

Fecha: 16 de Marzo de 2023
1 Ayudante.
Herramienta menor.
Se continua con el desmonte del sobrepiso de las aulas del primer piso del edificio 7.
Firma. Luis Miguel Pamela3

Fecha: 17 de Marzo de 2023.
1 Ayudante.
Herramienta menor.
Se continua con el desmonte del sobrepiso de las aulas 1 y 2. Se continua a la espera de los diseños por parte de SED de la parte arquitectonica.
Firma. Luis Miguel Pamela3
Fecha 18 de Marzo de 2023
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma. Luis Miguel
Fecha: 21-03-2023
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma: Luis Miguel
Fecha 22-03-2023
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma. Luis Miguel
Fecha. 22-03-2023
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma Luis Miguel

BITÁCORA COLEGIO JOSÉ MARTÍ SEDE A, LUIS LÓPEZ DE MESA

18-febrero-23 CLIMA: Lluvia de media intensidad
RECURSOS HUMANOS: Inspector Obra, Oficial, 2 Auxiliares.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con desmonte red eléctrica existente en aula de profesores.

Consorcio MIA GP — Ing. Carlos A. Goyz - Residente Obra, Consorcio MIA GP — Residente Interventoría, Consorcio TK

19-febrero-23. Día domingo. No se laboró.

20-febrero-23 Clima: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Oficial, 2 Auxiliares
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza cerramiento con polisombra y Cinta de seguridad en área contigua a aula de profesores, Área de acopio temporal de RCD y escombros.
OBSERVACIONES: Se expone ante interventoría la situación en que al estar árboles en el perímetro del edificio de aula de profesores representa que las canales estén colmatadas, siempre con capa vegetal, situación que afectará la funcionalidad de las mismas. Así que, se sugiere que las canales no queden expuestas, o dicho de otra manera queden internas. Interventoría manifiesta que se presente la alternativa mediante presupuesto y forma de instalación. Adicionalmente interventoría solicita incluir cambio de ventana en costado de serigrafía en aula profesores, pintura interna y subsanación de humedad en las paredes de aula profesores.





La interventoría solicita el reemplazo de los andamios que se despuecan en la obra por andamios certificados, toda vez que los que se encuentran en obra no deben ser utilizados por seguridad y salud en el trabajo.

Ing. Carlos A Cujeat - Residente Obra
Consorcio MIA GP

Residente Interventoría.
Consorcio TIG

21 - febrero - 23 CLIMA: Soleado

RECURSOS HUMANOS: Maestro General, 1 Oficial, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia con mantenimiento de estructura metálica existente en aula profesores.

Residente Obra
Consorcio MIA GP

Residente Interventoría
Consorcio TIG

22-febrero-23 CLIMA: Soleado

RECURSOS HUMANOS: Maestro General, 1 Oficial, 2 Ayudantes
Herramienta y equipos. Herramienta Menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua mantenimiento de estructura metálica existente en cada profesores.

Residente Obra
Consorcio MIA GP

Residente Interventoría
Consorcio TIG

23-febrero 23 CLIMA: Soleado

RECURSOS HUMANOS: Maestro General, 1 Oficial, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa mantenimiento de estructura metálica existente en aula profesores.
OBSERVACIONES: Se realiza recorrido con interventoría

Ing. Alcano Granado, Ing. Ambiental Dalia Briceño; a quienes se les expone condición de colmatación de canales en bloque aula profesores, exponiendo las alternativas de dejar canales internos o mantener la sección o trazado existente. ante la presencia de árboles en todo el perímetro.

La interventoria Ambiental solicito no acopiar materiales en las zonas verdes, el contratista rebrico varas de madera, se evidencia cerramiento bien adecuado y en buen estado, se solicito etiquetar los productos químicos (pintura, thinner, silicona, entre otros), se recomendo en caso de hacer acopios de material en la parte exterior dentro del cerramiento proteger los 2 sumideros evidenciados junto con Angela SST del consorcio, se recomendo punto ecologico en el área de trabajo.

Se evidencia colmatación y afectaciones de los canales existentes por hojarasca procedente de los individuos arboreos en el perimetro de los bloques, se recomienda realizar la tala y el manejo silvicultural adecuado para evitar caer material en los canales, para la interventoría es necesario validar la actualización de esta actividad al no haberse incluido en la propuesta económica del contratista, por lo cual se socializara con la supervisión.


Profesional Amb. Interventoría
Consorcio TIG.

Residente Interventoría
Consorcio TIG

Consorcio MINSP- refiere a interventoría necesidad de observaciones y/o aprobación del Diseño para refuerzo estructural de cubierta existente. Adicionalmente, contratista analiza diferentes opciones de acuerdo a la estructura metálica existente con el especialista estructural y se consolidan mas alternativas que se socializaran y remitiran a interventoría formalmente

- La primera opción contempla un ángulo en la parte superior como se planteó inicialmente en el diseño remitido a interventoría.

1RA OPCION

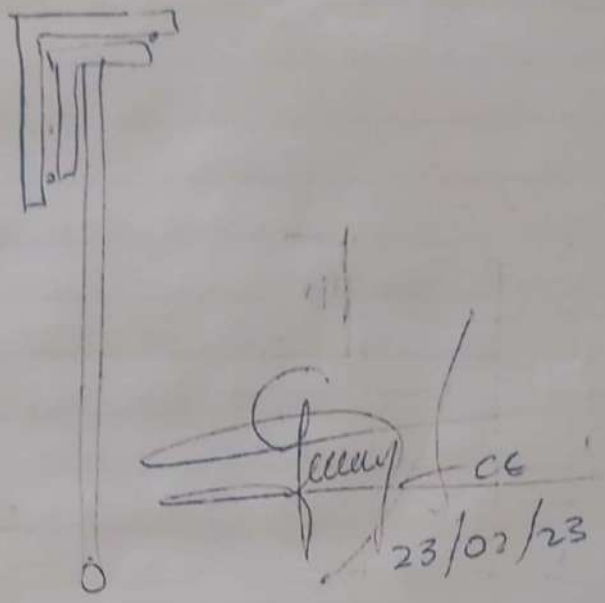

ANGULO EN LA PARTE SUPERIOR COMO SE HABIA PLANTEADO


En la opción 2. se propone instalar PTS de 50x100x3mm adicional entre cerchas.

2DA OPCION SIN MODIFICAR CERCHA


SE INSTALA PTS ADICIONAL ENTRE CERCHAS

PTS DE 50X100X3mm

ACERO ASTM A 36

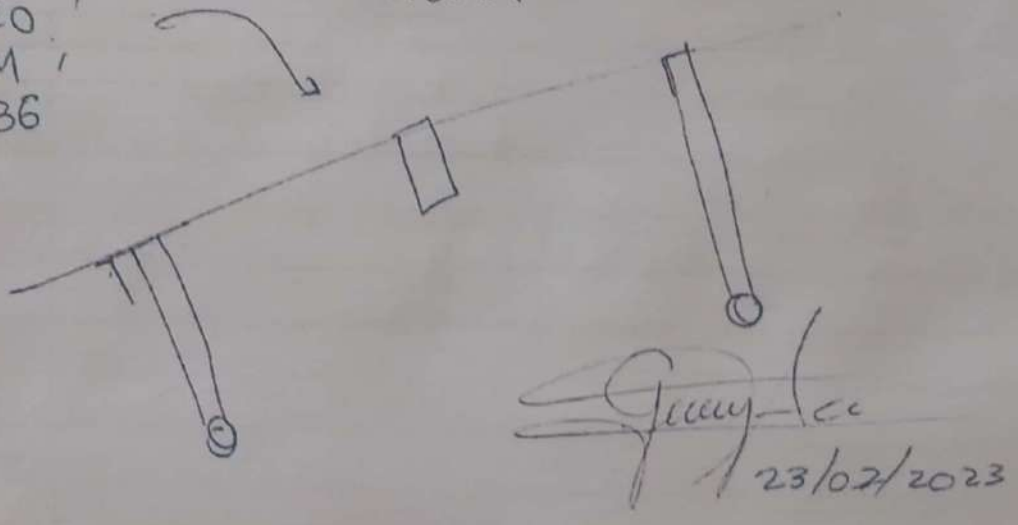

3 Recomendación

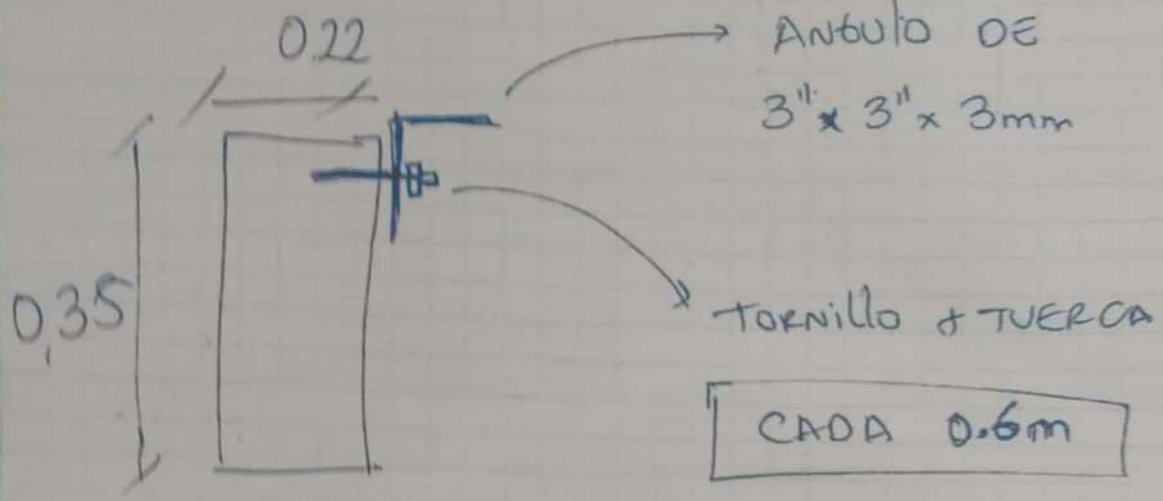

Esto sirve para fijar perimetralmente la tela sin tener que realizar mayores ajustes a la nivelación que tiene la cercha.

PERNO HELICOIDAL
TITEN HD $\frac{1}{4}$" x 2 1/2"

23/02/2023

Residente Obra
Consorcio VIA GP

La inventaria colocada al reemplazo de los botiquines que se despacharon en los obras por botiquines certificados, toda vez que los que se encuentran en obra no deben ser utilizados por seguridad y salud en el trabajo.

Ing. Carlos Cayetano - Residente Obra
Consorcio MIA GP

Residente Interventoría
Consorcio TIG

21 - febrero - 23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Maestro General, 1 Oficial, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia con mantenimiento de estructura metálica existente en aula profesores

Residente Obra
Consorcio MIA GP

Residente Interventoría
Consorcio TIG

22 - febrero - 23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Maestro General, 1 Oficial, 2 Ayudantes
Herramienta y equipos: Herramienta Menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua mantenimiento de estructura metálica existente en cada profesores.

Residente Obra
Consorcio MIA GP

Residente Interventoría
Consorcio TIG

23 - febrero 23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Maestro General, 1 Oficial, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua mantenimiento de estructura metálica existente en aula profesores.
OBSERVACIONES: Se realiza recorrido con interventoría

Ing. Alcano Cronado, Ing. Ambiental Dalia Briceño; a quienes se les expone condición de colmatación de canales en bloque acta profesores, exponiendo las alternativas de dejar canales internos o mantener la sección o trazado existente. ante la presencia de árboles en todo el perímetro.

La interventoria Ambiental solicito no acopiar materiales en las zonas verdes, el contratista retiro varas de madera, se evidencia cerramiento bien colocado y en buen estado, se solicito etiquetar los productos químicos (pintura, thinner, silicona, entre otros), se recomendo en caso de hacer acopios de material en la parte exterior dentro del cerramiento proteger los 2 sumideros evidenciados junto con Angela SST del consorcio, se recomendo punto ecológico en el área de trabajo.


Se evidencia colmatación y afectaciones de los canales existentes por hojarasca procedente de los individuos arbóreos en el perimetro de los bloques, se recomienda realizar la tala y el manejo silvicultural adecuado para evitar caso material en los canales, para la interventoría es necesario validar la actualización de esta actividad al no haberse incluido en la propuesta económica del contratista, por lo cual se socializara con la supervisión.

Profesional Amb. Interventoría Consorcio TIG.	Residente Interventoría Consorcio TIG

Consorcio MINGP- Remite a interventoría necesidad de observaciones y/o aprobación del Diseño para refuerzo estructural de cubierta existente. Adicionalmente, contratista analizo diferentes opciones de acuerdo a la estructura metálica existente con el especialista estructural y se consolidan mas alternativas que se socializarán y remitirán a interventoría formalmente

- La primera opción contempla un ángulo en la parte superior como se planteó inicialmente en el diseño remitido a interventoría.


1ra opcion

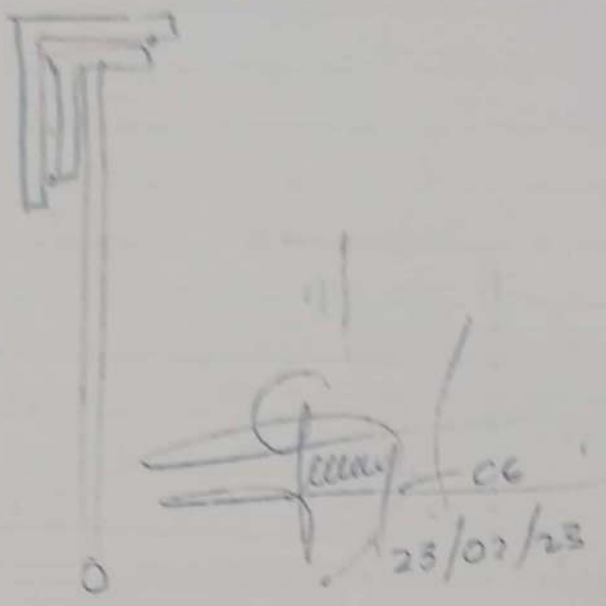


Angulo en la parte superior como se había planeado

En la opción 2 se propone rotular PTS de 50x100x3mm adicional entre cerchas.

2da opcion SIN MODIFICAR CERCHA
SE INSTALA PTS ADICIONAL ENTRE CERCHAS

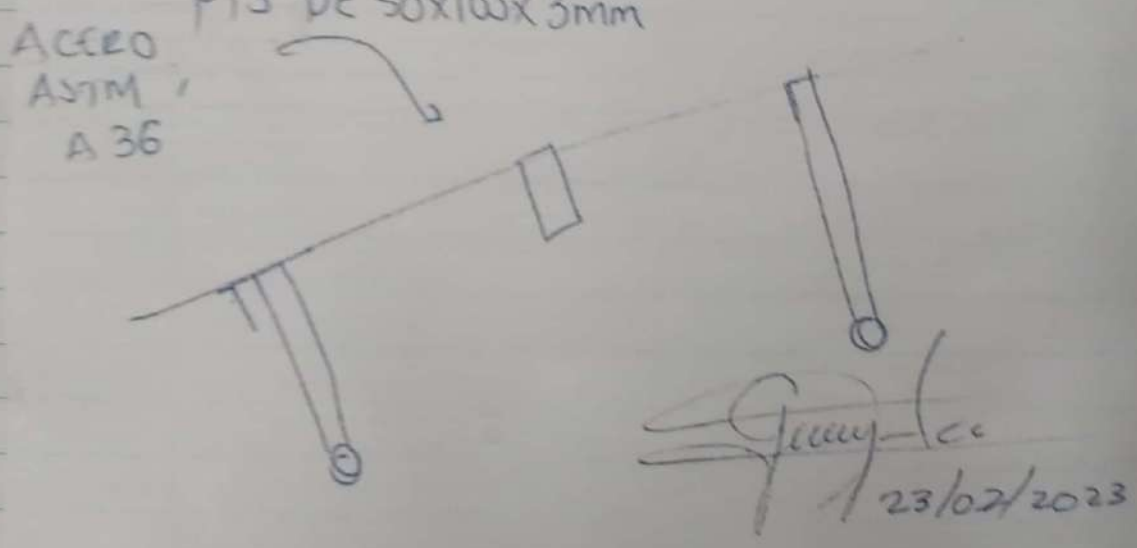

3 Recomendación

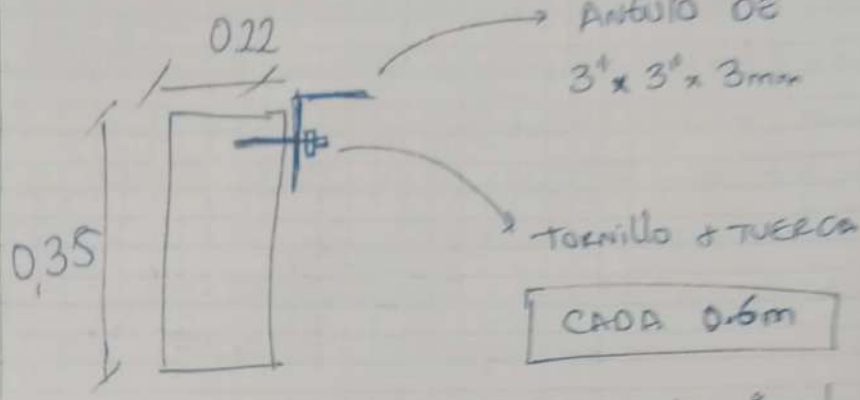

Esto sirve para fijar perimetralmente la teja sin tener que realizar mayores ajustes a la inclinación que tiene la cercha.

PERNO HELICOIDAL TIPO HD $\frac{1}{4}$" x 2 $\frac{1}{2}$"

23/02/2023

Residente Obra
Consorcio MIA GP

Residente Interventoría
Consorcio TIG

24-febrero-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Inspector obra, SISO, Oficial, 2 ayudantes
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con mantenimiento estructura metálica de soporte cubierta (Lijada, Aplicación anticorrosivo y pintura). Se solicita presentar formalmente los preceptos de reforzamiento y adecuación de la estructura de cubierta para el tramo de aprobación y aval del Especialista del área estructural.

Residente Interventoría
Consorcio TIG

25-Febrero-23 CLIMA: Estable
RECURSO HUMANO: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de cubierta (Teja Natural tercera ondulada) y se realizó traslado interno desde parte de descargue hasta área de acopio temporal en obra. Se continúa con mantenimiento estructura metálica existente soporte cubierta en todas posiciones.

ACG
Residente Interventoría
Consorcio TIG

27-Febrero-23 CLIMA: Estable
RECURSO HUMANO: 1 Inspector de obra, 1 Oficial 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Compresor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de anticorrosivo y pintura a estructura metálica de soporte cubierta. Y recibe Teja tipo C a instalar ubicado a orden perimetral costado Noroeste
OBSERVACIONES:

Por parte de interventoría SST se da el aval para el uso de andamios convencionales, siempre y cuando se encuentren en optimas condiciones y que las tareas a realizar no sean de alto impacto

SST Consorcio TIG
Interventoría.

ACG
Residente Interventoría
Consorcio TIG


28-Febrero-23 Clima: Estable
Personal en obra 1 Oficial y 2 ayudantes
Aplicación de anticorrosivo y pintura en la estructura metálica.
A la fecha, la interventoría no ha recibido formalmente la propuesta del especialista estructural para la aprobación de los ajustes planteados en campo. Por otro lado, el contratista pretende la

opción de alargar la cubierta y que se descarge sobre las zonas verdes para evitar el mantenimiento de los canales. Esto se va a trasladar a la supervisión para aprobación.

Residente Interventoría
Consorcio TIG

Jefe Técnico de obra

se reitera a interventoría las opciones planteadas y plasmadas en esta bitácora el día 23 de febrero, así como con especialista estructural de la interventoría las opciones propuestas, se determina consolidar las últimas 4 propuestas en un documento y enviarlo formalmente a interventoría para el análisis y aprobación pertinente. Con la última opción solicitada y aclarando que se darán las diferentes opciones en casos específicos de las cubiertas a intervenir.

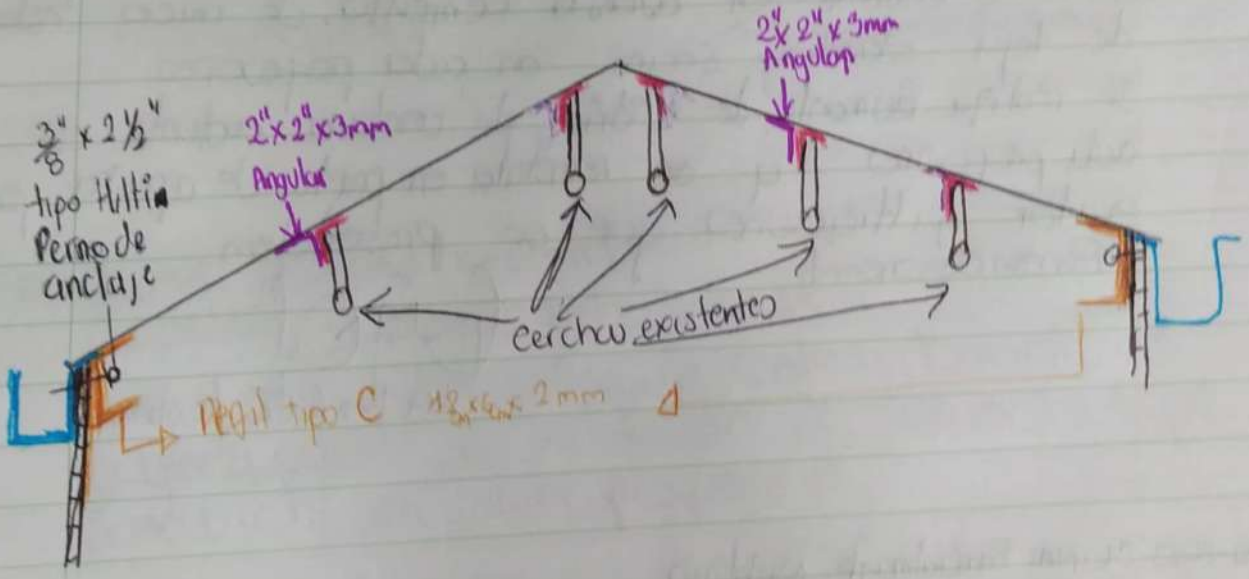

Cabe aclarar que la opción de no instalar canales y alargar cubierta fue propuesta antes del 23 de febrero, y para tal día interventoría plasma en esta bitácora que se debe hacer poda de árboles y manejo silvicultural, no suspender canales ni bajantes, por tanto consorcio Mía GP realizó el pedido de los tejas de acuerdo a medidas tomadas en campo contemplando canales y bajantes. En este sentido, la teja ya se encuentra en el frente de obra.

1-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: 5 uso, Inspector Obra, 3-Ayudantes
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa mantenimiento de estructura metálica de soporte de cobierta. Cercamiento en primer paso aula profesores
FARFAN BECERRA

Ing Residente de Obra

2-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: 5 uso, Inspector Obra, 3-Ayudantes.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa mantenimiento de estructura metálica soporte de cobierta, Se continúa desmonte de cubierta existente en asbesto cemento. de inicia instalación de teja standing seam en aula profesores.
Se realiza desmonte de vidrio de ventana existente en aula profesores y se reubica en parte de afuera para evitar filtraciones que se presentaban.
FARFAN BECERRA

Ing Residente de Obra

3-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Inspector obra, 3-Ayudantes
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza desmonte de cubierta existente en aula profesores, y se realiza instalación de teja tipo Sandwisch.
FARFAN BECERRA

Ing Residente de Obra

4-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Inspector Obra, 3 Ayudantes Obra
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza cerramiento para cubrir area de acopio de RCD' Peligrosos y escombros.

PAREJA BELTRÁN

Ing Residente de Obra

6-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Inspector obra, 3 Ayudantes obra
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa desmonte de cubierta existente en aula profesores.

PAREJA BELTRÁN

Ing Residente de Obra

7-Marzo-2023 CLIMA: Nublado intermitente
RECURSOS HUMANOS: 3 Ayudante obra
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua desmonte de cubierta existente e instalación de cubierta tipo Sandwich en aula profesores.

PAREJA BELTRÁN

Ing Residente de Obra

8-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Inspector obra, SSTD, 4 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta Menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de cubierta tipo Sandwich en aula profesores.

PAREJA BELTRÁN

Ing Residente de obra

04 Marzo 2023 CLIMA: Presencia de lluvia de media y alta intensidad
RECURSOS HUMANOS: Inspector obra, 5 Ayudantes Obra, 1 Oficial
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Compresor.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de teja Standing Seam en cada profesores
OBSERVACIONES: El avance en obra se ve condicionado por la presencia de lluvias de alta intensidad.
Se solicita a la institución la disponibilidad de área de acentación pasillo y escaleras.

Residente de obra

Consorcio TIG

0-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente nublado, lluvia de alta intensidad
RECURSOS HUMANOS: 5 Ayudantes Obra 1 Oficial
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Compresor.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia instalación de circuitos y tubería emt en cada profesores.
OBSERVACIONES: No se puede avanzar en instalación teja standing seam por presencia constante de lluvias. Se realiza inspección del frente de obra pero siempre presentado en la madrugada, no se identifican afectaciones.

Residente de obra

Consorcio TIG

11-Marzo-2023 CLIMA: Lluvia de alta intensidad.
RECURSOS HUMANOS: 5 Ayudantes 1 Oficial
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa instalación de tubería emt, cajas eléctricas, salidas para luminarias LED 120x30.

Residente de obra

Consorcio TIG

13 Marzo 2023 CLIMA: Lluvias de Alta y media intensidad
RECURSOS HUMANOS: 5 Ayudantes, 1 Oficial, SST, 1 Inspectora.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Compresor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza desmonte cielo falso en madera existente en orientación, se evidencia teja Canaleta en asbesto cemento, Canal metálica interna, placa de techo baño con afectación por la humedad.
Se inicia refuerzo estructura metálica en área pasillo y escaleras, se inicia mantenimiento estructura metálica existente.

ACG
Consorcio TIG

Residente de obra

14-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: 4 Ayudantes, 1 Oficial, Inspectora. SST.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Compresor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación pintura en muros internos y división ingreso aula profesores, Instalación luminarias y salida luminaria panel led 120 x 30. en aula profesores

ACG
Consorcio TIG

Residente de obra

15-Marzo-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: 4 Ayudantes, Oficial, Ing. Residente
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Compresor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación pintura muros interno, y división ingreso aula profesores. Mantenimiento estructura metálica de soporte cubierta pasillo y escaleras frente a Orientación

ACG
Consorcio TIG

Residente de obra.

16 Marzo-2023 Clima: Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, 1 Oficial, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Andamios,
ACTIVIDADES REALIZADAS: Retiro estructura soporte cubierta
pasillo y escaleras frente a oficinas con apoyo 2x2"x3m
en techos existentes. Se inicia desmonte teja asbesto cemento
e instalación cubierta standing seam en pasillo y escaleras
ala 1.

Ana Residente de Obra Maestro TIG

17-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, 1 Oficial, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Andamios, Compresor.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de pintura y
mantenimiento de estructura metálica refuerzo en pasillo
y escaleras. Se realiza instalacion de cubierta Standing
Seam en pasillo y escaleras.
OBSERVACIONES: La I.E. y dirección de graduación de un programa de
T.V. solicitan suspender actividades a las 3:00 pm debido
al ruido generado en las intervenciones adelantadas en
cubiertas. Maestro Mia GP mira con preocupación la
frecuencia de dicha situación que condiciona las jornadas
laborales, limitando el avance en obra.
Se finaliza jornada laboral a las 3:30 p.m.

Ana Residente de Obra Maestro TIG

18 Marzo 25 CLIMA: Soleado

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor

RECURSOS HUMANOS: Ingeniero residente, 4 ayudantes, 1 Oficial

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se finaliza instalación de cobertura en pasillo y escaleras. Traslado de Teja asbesto cemento desde área intervención hasta punto acopio temporal contiguo al parqueadero asignado por la Institución.

OBSERVACIONES: Personal de portería (seguridad, solicita información sobre hora de finalización jornada laboral y manifiesta personal de grabación de T.V que se realiza en la I.E. que requieren disponibilidad de los espacios y suspender la jornada laboral para no interrumpir sus labores con el ruido generado en la obra a medio día.

Ing Residente de obra.

Constructora

BITÁCORA COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA

18-febrero-23 CLIMA: Precipitaciones de media intensidad
RECURSOS HUMANOS: Maestro General, 3 Auxiliares Obra, Ing. Residente.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta Menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa demolición acabado de piso, se realiza acopio temporal de RCDs en lonas para posterior retiro a botadero

Residente Interventoría.
Consorcio TIG

Ing. Carlos A Cuyet - Residente Obra
Consorcio HIA GP

20-febrero-23 OBSERVACIONES: Se realiza recorrido para verificar estado y medidas de estructura metálica de soporte y mampostería de muros para el diseño estructural: Se evidencian deformaciones en muros, estructura metálica adosada a mampostería ante la ausencia de elementos estructurales. Especialista estructural consolidará concepto de condiciones actuales del edificio 1 y 2, se procede a citar a interventoría y supervisión mesa de trabajo conjunta para exponer las consideraciones necesarias a contemplar y buscar una solución que garantice estabilidad, calidad y que no represente un riesgo. Expuesto lo anterior se considera pertinente postergar las actividades en obra hasta tanto se tenga definido el alcance final y materiales a instalar en acabado de piso.
*Se realiza visita de campo con asesoría de 26 Haus y S, empresa proveedora de piso vinílico, para revisar la superficie sobre la cual se instalaría el piso, identificando que para un piso vinílico el tratamiento del alistado debe ser contemplado en el techo de inversión al llevar un proceso constructivo diferente al piso cerámico, por tanto se remite a interventoría las opciones del tipo de piso solicitado por supervisión para definición y aclaración.

Estado actual Muros en Mampostería Estático 1.



Estático 2: Estado estructura metálica soporte de Cubierta



Ing. Carlos A. Cuya H. - Residente Obra
Consorcio MIA GP

Residente Interventoría
Consorcio TIG

28-febrero-23 Se realiza comité técnico en obra con presencia de interventoría y Contratista. Se socializa ficha técnica de piso vinílico referencia mini: Se socializa estado de placa en área a intervenir se solicita aprobación por parte de interventoría para demoler placa dado a las grietas que se presentan. Se identifica cajas de inspección de las cuales se levanta tapa e identifica tubería de gres proveniente de bajantes.

1° La interventoría solicita: 1) Propuesta de Diseño (esquema de la distribución de los colores y Figuras o aparejos) 2) Realizar la demolición de la placa existente y verificar el nivel de subrasante, su estado y mejoramiento de las condiciones para la construcción de la placa de contrapiso (e=[0,8 - 1,0] dm) reforzada de acuerdo a la propuesta del contratista. 3) Dadas las condiciones de la red de desagües, se requiere verificar el estado de las cajas de inspección y se autoriza realizar la renovación de la tubería existente (Gres) por PVC. Se realiza visita por parte del asesor estructural de la interventoria con la intención de identificar las características de la estructura, el paso a seguir es esperar la entrega de la propuesta de intervención del contratista para evaluar esta, de acuerdo al alcance de la intervención. Carlos Mayorga. Ing. Asesor estructural interventoría

AFCG
Residente Interventoría
Consorcio TIG

1-Marzo-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Maestro General, Inspecta obra, 2 Auxiliares obra
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Rotomartillo.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia demolición de placa de concreto en corredor 33, edificio 2.

Arq. Mauricio Rodriguez
Residente Obra
Consorcio Mia 6P


AFCG
Consorcio TIG


2-Marzo-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Maestro General, Inspecta obra, 2 Auxiliares Obra
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Rotomartillo
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con demolición placa de concreto existente en corredor 33 edificio 2


Arq. Mauricio Rodriguez
Residente obra
Consorcio Mia 6P.

AFCG
Interventoría TIG

3-Marzo-2023

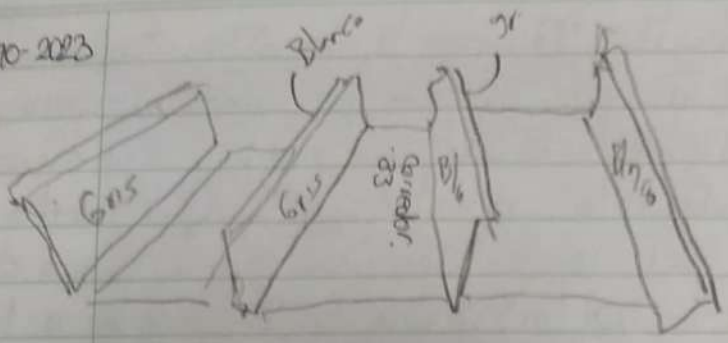

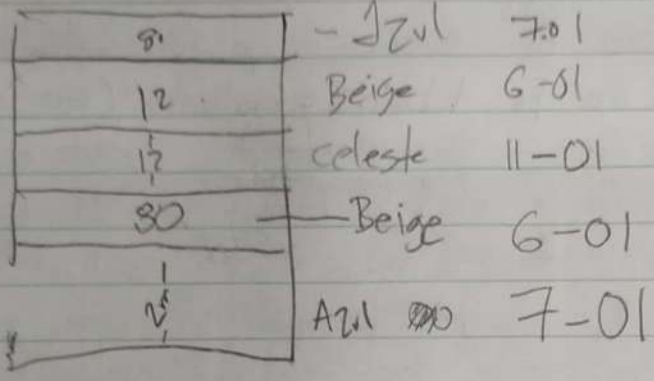



CLIMA: Soleado

RECURSOS HUMANOS: Inspector obra, 3 Ayudantes Obra, Maestro General

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Roto Martillo

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con demolición de placa existente en aula 38 edificio 2. Se inicia Retiro de escombros a botadero.

OBSERVACIONES: Se realiza comité técnico de obra con presencia de interventoría, Secretaría de educación Arq. Alejandro Herrera quien define el diseño, colores y tipo de piso a instalar, así, como se observa en los esquemas; Se definen colores de pintura a instalar. Así mismo, STO, Arq. Alejandro Herrera solicita incluir en presupuesto la instalación de piso vinílico en todas las aulas, pasillos, áreas de baño. así como incluir en el alcance la adecuación de baterías sanitarias existentes en la sede. y descartar

la demolición de aclogras en mayor edificio 1 y nichos de libros en edificio 2, para instalar cerramos, ergo, no se instalaron las ventanas en pasillos.

Secretaría de Educación Supervisión.

Consorcio TIG

Ing. Mauricio Rodríguez Residente de obra

4-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Inspector obra, 3 Ayudantes, Maestro General
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza traslado de material proveniente de demolición realizada de piso y placa de PBO en corredor 33 y aula 32. Se realiza Retiro de dichos escombros a botadero

PAMELA BELTRÁN
CONSORCIO TIG.

Ing. Mauricio Rodríguez
Residente de obra

5-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: 3 Ayudantes obra
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor, Roto Martillo
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con retiro de escombros a botadero, Se realiza cerramiento de área a intervenir, aislando el edificio 2 de las áreas habilitadas de la I.E para actividades educativas. Se continúa demolición de placa de piso existente en aula 32. de edificio 2.

PAMELA BELTRÁN
CONSORCIO TIG.

Ing. Mauricio Rodríguez
Residente de obra

7-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: ferramenta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Retiro escombros y botados
PANERA BERRÁN
CONSORCIO TIG.

Ing. Mauricio Rodríguez
Residente de obra

8-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSO HUMANOS: 2 Ayudantes, SST, inspector obra
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Se finaliza retiro de escombros provenientes de demolición placa piso y acabado piso aula 32 y corredor 33 edificio 2
PANERA BERRÁN
CONSORCIO TIG

Arq. Mauricio Rodríguez
Residente de obra

9-Marzo-2023 CLIMA: Lluvia de alta intensidad
RECURSOS HUMANOS: 2 Ayudantes, SST, Inspector Obra
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Se inicia, demole de tubería PVC y luminarias existentes en edificio 2, Se inicia mantenimiento de estructura metálica existente. soporte cubierta.
PANERA BERRÁN
CONSORCIO TIG

Residente de obra

10-marzo de 23 Clima: Soleado
Personal en obra: 3 instaladores de cubierta
mantenimiento de estructura metálica existente.

PANERA BERRÁN
CONSORCIO TIG

Residente de obra

11-Mar-23 Clima: Lluvia.
Personal en obra: 3 instaladores de cubierta
Mantenimiento de cubierta (estructura)

Ayudante Instalador
Soldador TIG.

Área Residente

13-Marzo-2023 CLIMA: Lluvia de alta intensidad
PERSONAL: SST, Inspector Obra, Maestro General, 2-Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Compresor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Mantenimiento de estructura metálica de soporte cubierta existente edificio 2 piso 1.

Área Residente

Soldador TIG

14-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
PERSONAL: SST, Inspector Obra, Maestra General, 2-Ayudantes
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor, Compresor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Mantenimiento de estructura metálica de soporte existente piso 1 Edificio 2.
OBSERVACIONES: Se socializa con interventoría mediante registro fílmico estado actual de las tuberías y Caja de Inspección existentes en corredor.

Área Residente

Soldador TIG

15-Marzo-2023 CLIMA: Soleado
PERSONAL: Inspector Obra, Oficial, 2-Ayudante Obra.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza desmonte de soldado eléctrico, luminarias, tubería existente en edificio 2 piso 1.
OBSERVACIONES: Se realiza acopio de 243m² de teja standing seam en área frente a cuarto en exterior del edificio 2. 172 tejas de 8,65ml x 0,5m ancho, y 300m² de material termo aislante poliestireno. Acopiado dentro del edificio 2.

Se hace revisión del material y se toma registro fotográfico de que está en buen estado.
Se realiza reunión via google meet con especialista estructural de Consorcio MIA GP, Especialista estructural de Consorcio T16, Ing Directora de Interventoría, Ing. Residente Interventoría, Inspector Obra. para revisar alternativas a contemplar con respecto al diseño estructural a emplatar en las áreas a intervenir cubierta.

Consorcio T16 — Área Residente de obra

16-Marzo-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Compresor, herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza mantenimiento estructura metálica soporte existente perimetro edificio 2 paso 1
OBSERVACIONES: De acuerdo a solicitud de interventoría mediante oficio T16-MEM-074 se procede a hacer inclusión de piso vinílico en todas las áreas indicadas así como la intervencion en baños.
Se realiza socialización de áreas a intervenir de dicho piso y las especificaciones técnicas requeridas por el proveedor. con LG Hausys.

Área. Residente de obra

Consorcio T16

17-Marzo-23 CLIMA: Soleado

RECURSO HUMANO: 2 Ayudantes, 1 oficial, SST, Ing. Residente.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Compresor, Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua mantenimiento estructura metálica de soporte. Trasiego de material B-400 al interior del Colegio.
OBSERVACIONES: Se hace revisión del estado actual de bajantes y canales existentes en piso 1 de edificio 2 y se sugiere a interventoría tras evidenciar la necesidad tan solo de mantenimiento, limpieza e impermeabilización de canales y no el cambio contemplado.

*Se socializa con interventoría las especificaciones técnicas requeridas para instalación del piso tipo vinilo, solicitando especificación respecto a juntas con soldadura, empalmes, pañete para guardaescoba en vinilo con rinconera PVC y finalmente Consorcio MIA GP solicita que en baños se cambie la especificación del piso, dado que el piso tipo vinilo no es el más recomendable en áreas humedas.

→La interventoría solicita la socialización de estos temas en el comité de seguimiento para establecer el alcance y el presupuesto ajustado a las nuevas condiciones de obra.

ACG
Consorcio MIA.

Ing. Residente de obra

18-Marzo-23 CLIMA: Soleado

RECURSO HUMANO: 2 Ayudantes, 1 Oficial
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia relleno y compactación de B-400 en pasillo 334 aula 32.

BITÁCORA COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN

Martes 21 de febrero 2023

Personal en obra

1 inspector de obra, 2 ayudantes, 1 plomero, 4 instaladores de cubierta.

Se continua con actividad de demolición de muros y enchapes en área de trabajo. Se avanza en actividad de pintura para estructura metálica existente.

Se realiza demolición de muro regilla para evidenciar fuga de agua, se dificulta la inspección toda vez que proviene de nivel inferior a piso 1 la fuga. El contratista manifiesta que se debe realizar una demolición mucho mayor, afectando placa de contrapiso, por lo que se programa equipo de demolición de concreto reforzado.

FIRMA RESIDENTE

Miercoles 22 de febrero 2023

Personal en obra

1 inspector de obra, 2 ayudantes y 4 instaladores de cubierta.

Se continua con actividades de demolición de muros y enchapes en área de trabajo. Por otro lado, se avanza con actividad de desmonte de tubería eléctrica y se aplica esmalte en estructura metálica existente.

FIRMA RESIDENTE

Jueves 23 de febrero 2023

Personal en obra

1 inspector de obra, 2 ayudantes, 4 instaladores de cubierta, 1 director de interventoría

Se continua con actividades de demolición de muro y enchapes en área de trabajo. Se dispone el material de escombro en lonas para ser trasegado y dispuesto en el lugar designado en costado occidental del piso 1 de la edificación, donde existe cercanía a vía vehicular para posterior disposición a sitio autorizado. Se continua con actividades de pintura consulte en estructura metálica existente en pasillo.

PAREJA BECERRA

Se evidencio que el personal estaba trabajando sobre el antepecho sin ninguna medida de seguridad (arnes, eslingas, linea de vida, andamio)

Febrero 24 de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 ayudantes y 4 instaladores de cubierta. Continua la demolición en el área de los baños. Mantenimiento de estructura de cubierta.

PAREJA BECERRA

Febrero 25 de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 ayudantes y 4 instaladores de cubierta. Continua la demolición en el área de los baños. Desmonte de cubierta aula 307.

PAREJA BECERRA

Febrero 27 de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 ayudantes y 4 instaladores de cubierta. Continua la demolición en el área de los baños, desmonte e instalación de cubierta.

Powered by CamScanner

Febrero 28 de 2023.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 ayudantes, 4 instaladores de cubierta. Demolición de baños piso 3, desmonte e instalación de cubiertas, aulas piso 3.
Ramon Bolivar
se le recomendo al contralista que realizaran una jornada de orden y Aseo. al igual que retirar material que obstruyera los pasillos.

Marzo 1:
Se continua con actividades de demolicion en baños, desmonte e instalacion de teja, se realiza retiro de chatarra y se programa retiro de escombros

Marzo 2 de 2023
se le notifica al contralista el deber de realizar el cerramiento en el primer piso debido a que se puede llegar a presentar algun accidente con los estudiantes mientras se trabaja en la cubierta.
Erick Ramirez
La institucion manifesto que hacia ese costado (occidental) no hay paso de estudiantes por lo cual no se instalo cerramiento en ese costado. Se realiza actividad de emergencia en baño bachillerato, Se verifica la correccion de la tuberia y se pone en funcionamiento

Marzo 03 de 2023
Se continua con actividades de demolicion de baños piso 3, desmonte e instalacion de cubiertas.

Marzo 04 de 2023
Se continua con actividades de demolicion de baños piso 3 y se da inicio con desmonte e instalacion de teja en pasillo

Marzo 05 de 2023
No se realizan actividades, dia festivo

Marzo 06 de 2023
Se continua con actividad de desmonte e instacion de cubierta en pasillo

Marzo 7/23 Personal en obra: 4 instaladores de teja y 1 SST.
Desmonte de cubierta en el área de los baños. piso 3. Se realizo revisión de la emergencia. del baño de primer piso
se encuentra en los muros de aulas que no se hizo el encarozado respectivo antes de la instalación de la cubierta, el cerramiento se fue desmontado y en el remontaje no quedó como estaba antes. se refiere el estado en el que se encuentra el cemento, sin ningún tipo de protección. Por recomendación SST desde el dia 02 de marzo se debia hacer protecciones en el primer piso 1 para evitar accidentes, mientras se trabaja en la cubierta, observación que se ha omitido hasta la fecha.
PAMELA BECERRA

Marzo 8/23
Se continua con la actividad de desmonte y instalacion de teja de pasillo piso 3. Desde el 28 de febrero se remitio propuesta de distribucion para baños de la cual no se ha recibido aprobacion, lo cual genera atrazo de las actividades pertinentes, como, redes y enchapes.

Marzo 9/23 - no se hace presente el profesional encargado de la dora desde el primero de marzo.
- se le reitera al contratista hacer el cerramento con polisombra en las areas donde se esta realizando el cambio de cubierta para evitar que se presente algun accidente con los estudiante profesores y personal que se encuentre en el colegio
Erick Ramirez
Se continua con actividad de desmonte y montaje de teja,
Se dificulta la actividad por fuertes lluvias.

Viernes 10 marzo 2023
Personal en obra: 1 insfector de obra, 4 instaladores de teja, 1 plomero.

Se realizan regatas en muros existentes de baños, se realiza distribucion acorde con la propuesta enviada por el contratista el dia 28 de febrero de 2023 y aun no se ha recibido respuesta por parte de la entidad, se ralizan regatas, sin embargo no se continuara con instalacion de tuberia para evitar reprocesos si existen modificaciones, la no aprobacion de distribucion atrasa actividades de pañete, enchape y compra de aparatos. Se recuerda tambien tener en cuenta las dificultades de adquisicion de enchape en estos momentos en el país.
Se continua con actividades de desmonte de teja y instalacion de la esta.

Sábado 11 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 instaladores de teja
El dia de hoy se programan actividades de desmonte e instalacion de teja junto con la instalacion de remates.
No es posible realizar las actividades programadas por las fuertes lluvias en la jornada.

Domingo 12 de marzo de 2023
No Se realizan actividades, día festivo

Lunes 13 de marzo de 2023.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 instaladors de teja, 1 oficial y 1 ayudante de obra civil.
Se realizan actividades de desmonte e instalacion de teja

Powered by CamScanner

junto con flanches y caballete. Se inicia encorozado de cubierta en aula 1.
Se realiza fundicion de placa de contrapiso de baño bachillerato, Se dificulta la adquisicion de trabion de grano de marmol en el formato existente, Se adquiere uno de tono similar manteniendo las misma caracteristicas, se tiene llegada de este para el 15 de marzo.

Martes 14 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayudante de obra.
Se continua con actividad de encorozado de cubierta. A la fecha no se cuenta con aprobacion de distribucion arquitectonica de baños lo cual atrasa las actividades programadas para esta área. Se realiza disposicion final de teja en asbesto cemento.

Miercoles 15 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayudante de obra.
Se continua con actividad de encorozado de cubierta en aula 2. Se realiza marcacion de puntos electricos de las 2 aulas donde Se estan realizando actividades y se espera la llegada de material electrico.

Powered by CamScanner

Jueves 16 de marzo de 2023
Se continua con actividades de encorozado de cubierta en aula 2. A la fecha no se cuenta con aprobacion de distribucion arquitectonica de baños, esto atrasa las actividades programadas para esta área.

Viernes 17 de marzo de 2023
Personal en obra. 1 inspector de obra, 1 residente de interventoria, 1 oficial y 1 ayudante de obra, 1 electricista.
Se continua con actividades de encorozado de cubierta en aula 2. Se recibe material electrico en obra.

Sabado 18 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayodante.
Se culmina actividad de encorozado, se inicia actividad de estuco en area donde se realiza encorozado, para posterior actividad de pintura en esta área.

Domingo 19 de marzo de 2023
No se realizan actividades de obra, día festivo.

Lunes 20 de marzo de 2023
No se realizan actividades de obra, día festivo.

Powered by CamScanner


BITÁCORA COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A

COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA
Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.4077645 del 2022 y No de Contrato de interventoria CO1.PCCNTR.4155718
Se adelantan obras de adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo de la plantas Fisicas de la Secretaria de Educacion del distrito y se contempla Cambio 100% de cubiertas del edificio de preescolar, cambio de pisos de preescolar, Adecuacion pintura muros exteriores, interiores y de Fachada, cambio de ventanas y puertas edificio 8 (preescolar, cambio de instalaciones electricas, mantenimiento cubierta edificio 2. y remodelacion baterias sanitarias.
20-02-2023 Damos inicio acompañado de socalizacion del alcance del proyecto, iniciamos actividades de cerramiento.
Firma: Luis Miguel Ortiz

21-02-2023
Continuamos actividades de cerramiento e iniciamos actividades de demoliciones de piso y remocion de escombros
Firma: Luis Miguel Ortiz
Fecha 22-02-23
Continuamos actividades de demolicion, desmonte de ventanas desmonte de redes.
Firma Luis Miguel Ortiz
Fecha. 23-02-23.
Continuan actividades de desmonte de ventaneria, se realiza prueba del contiatacto de cubiertas y se hace la respectiva medicion.
Firma: Luis Miguel Ortiz


Powered by CamScanner

24-02-2023
Se continua desmonte de ventaneria y demolición de pisos.
Firma:
25-02-2023
Se realiza jornada de aseo y limpieza.
Firma:
27-02-2023
Se realiza visita contratista para programación de desmonte de cubierta.

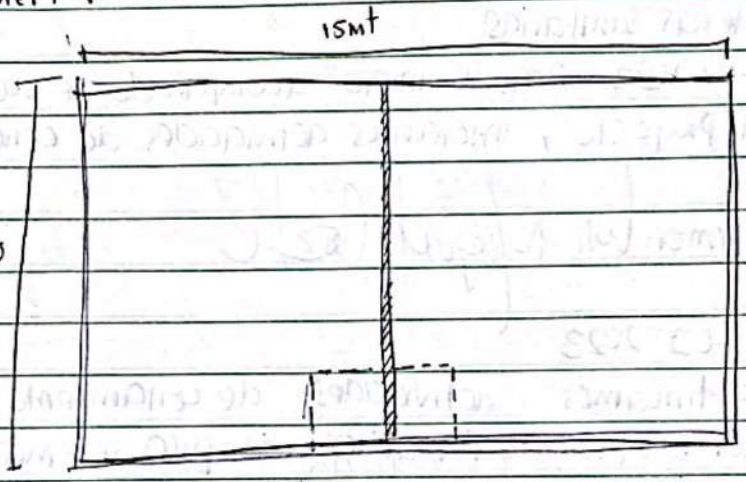

y se evalua el tema electrico. del area de preescolar.
Firma:
Fecha 28-02-2023
Se continuan actividades de limpieza y se recibe material, estructura metalica y
Firma:
Fecha 01-03-2023
Se inician actividades de soldadura en piso.
Firma:
Fecha 02-03-2023
Se continuan actividades de soldadura. y se realiza visita
~~Firma:~~ con el arquitecto Alejandro de secretaria de Educación y se define modulación de ventaneria y se establece picos en vinilo con franjas de colores. (evaluar diseño y color)


Powered by CamScanner

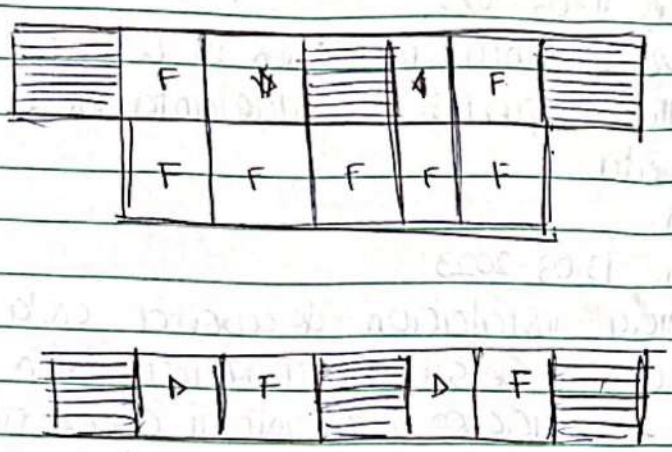

Firma.
Fecha. 04-03-2023
Se continuan actividad de soldadura
Firma.
Fecha 06-03 2023
Se inician actividades de monte de estructura, perfileria soldada
Firma.
Fecha: 07-03-2023
Se continua monte de estructura metalica
Firma:
Fecha. 08-03-2023
Se hace jornada de aseo y se continuan actividades de estructura
Firma:
Fecha. 09-03-2023
Se inician actividades de pintura anticorrosiva de estructura. y se presenta lluvia todo el dia. y no se pueden adelantar actividades de trabajo en altura.
Firma
Fecha: 10-03-2023
Dia lluvioso, se presentan lluvias fuertes en la mañana y durante la tarde esporadicas. lo que no hace posible adelantar oportunamente la actividad de encerrado
Firma.

Powered by CamScanner

Fecha 11-03-2023
No se adelanta instalación de cubierta por presencia de lluvias fuertes. , se adelanta en su medida encerrado de cubierta.
Firma
Fecha. 13-03-2023.
Se inicia instalación de cubierta en la zona de preescolar y se solicita a la institución entrega de baños parciales para inicial con ese frente de trabajo. lo antes posible, inician lluvias fuertes 10:10 am.
Firma:
Fecha: 14-03-2023
Se continuan actividad de instalación de cubierta y se realizan actividad de encerrado simultaneo a pintura de estructura.

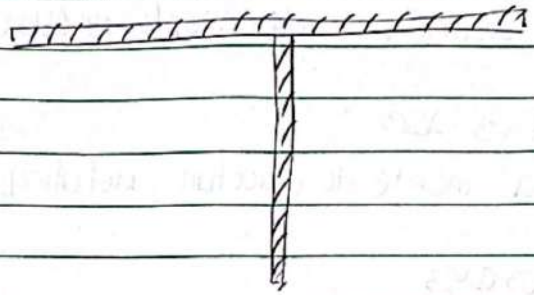

Fecha 15-03-2023.
Se inian actividades en Baños. bloque parqueadero segundo piso, en preescolar se continua instalación de cubierta y pintura de cercha, se inician niveles parcialistado de piso.
Firma:
16-03-23
Se evidencia que se encuentra personal de la obra sin documentacion (Gustavo martinez). se le solicita al contratista de manera inmediata entregar dicha documentacion a la interventoria para su aprobacion
Erick Ramirez

Se realiza verificación de temas ambientales, se recomendo no arrojar residuos en zonas verdes y realizar la separación de los residuos clasificandolos por tipo de residuo Se evidencian canal limpia, individuo arboreo sin afectaciones, cerramiento en buen estado y bien instalado
Dalia M Bivero R
Ing Ambiental
Luis Miguel Arias PAREDES

6-03 2023 Se continuan actividades y se recibe carpinteria en aluminio para ventanas
Firma Luis Miguel Arias

03 2023 Fecha Se inicia la instalación de ventanas en el area de preescolar y se continuan reparaciones locativas en baños.
Firma Luis Miguel Arias PAREDES


-03 2023 Se le hace entrego a la institución por medio del Señor Roberto Muñoz señor de mantenimiento entrega de la ventaneria 4 Ventanas correspondientes a las aulas de preescolar y las puertas desmontadas de los Baños 8 puertas
PAREDES Luis Miguel Arias

03 2023 Dia festivo no se ejecutan actividades

03 2023 Se Finaliza sobre piso aula preescolar uno y se hace jornada de aseo para iniciar aula 2 y continua pintura de cerchas
~~Se~~ cha aclaración de colores de columnas y resanes nevos a interventoria para proceder a pintar.
Su respuesta es "gris" se procede a pintar.
Firma Luis Miguel Arias PAREDES

3 2023 Se continuan actividades de sobre piso en el aula 2 se procede Se inicia cerramiento en lona para abril frente de trabajo en la cancha contemplada en el alcance.
se inicia limpieza de pared ladrillo baños.
Firma Luis Miguel Arias PAREDES

3032023	· Se finaliza cerramiento y se inician actividades de demolicion de placas aconlocar por filtracion de agua, se hace un diagnostico del error y se nota no instalacion de respiraderos.
	se inicia demolicion de dichas placas.
	y se continuan actividades en baños firma: Ing Miguel Cano Pinzon
03 2023	Se inician actividades de instalacion electrica
	Se continua demolicion cancha y actividades en baños.
	· Firma: Ing Miguel Cano Pinzon
3 2023	· Se programa jornada de aseo y limpieza en la obra.
	· firma. Ing Miguel Cano Pinzon.
32023	Se trazan niveles en cancha para ser revisado con
	Interventoria en campo la ejecucion y desarrollo de
	la cancha.
	se continuan actividades de pintura, electrico. En zona de
	preescolar.
	Firma.
3 2023	Se define con interventoria elaboracion de carcamo
	perimetral en primer piente 0.05 cmt por debajo del
	nivel del muro de contencion existente
	Respecto a las placas manejar las
	pendientes que caigan al carcamo.
	e 10cm.
	Rejilla: Marco, contramarco y enrejado angulo con espaciado
	Recebo Compactado.
	Firma.
2023	Se inicien actividades de excavacion en cancha y
	continuan actividades en preescolar, electrico.
	Firma:
2023	Con visita de interventoria se determinan especificacion
	de la cancha y los baños a intervenir y en obra
	se continuan excavaciones.
	Firma



Powered by CamScanner

BITÁCORA COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A LOS CHIRCALES

BITACORA Colegio Alfredo Iriarte Sede A los Chircales
Contrato de obra Lb. CO1. PCCNTP 4077695 - Contrato de Interventoria
Lb CO1PCCNTP 4155738

Se adelantan obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaria de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permita a través de la atención de emergencias y necesidades físicas puntuales garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

El alcance general de la obra se discrimina de la siguiente forma: Mantenimiento de la cubierta, Impermeabilización de cubiertas planas y inclinadas; Adecuaciones de baterías sanitarias; Adecuación de la pintura de muros; Adecuaciones de instalaciones eléctricas, Adecuación de pisos de las baterías sanitarias.

Dirección del Inmueble: Transversal 5j # 48f Sur - 7 a 48f Sur - 99

Fecha: 01 de Marzo de 2023
Personal: 2 Ayudantes
Herramienta Menor
Actividad se hizo el retiro de material vegetal presente en las canales recolectoras de aguas lluvias y en la placa al costado de la cubierta. Se inicio la limpieza de las canales y la placa para retirar el impermeabilizante en mal estado
Firma: Luis Miguel Iriarte

Fecha: 02 de Marzo de 2023.
2 Ayudantes
Herramienta menor
Se inicio el retiro del impermeabilizante existente dado que se encuentra en mal estado, con el fin de dejar la superficie adecuada para el nuevo material
Firma: Luis Miguel Iriarte

Fecha: 03 de Marzo de 2023
2 oficiales
Herramienta menor.
se retiro el manto asfaltico de la viga canal existente que se encontraba en mal estado, adicional se aplico SikaFlex a los muros contiguos a dicha viga canal se hizo el retiro del manto de la placa contigua a la cubierta y se aplico material impermeabilizante.
Firma W.I Ihan R.

Fecha 04 de Marzo de 2023
2 oficiales
Herramienta menor.
se limpiaron los canales restantes y se iniciaron labores de impermeabilización. se realizo limpieza del area de trabajo haciendo acopio de los residuos generados por las actividades.
Firma W.I Ihan R.

Fecha: 06 de Marzo de 2023.
1 oficial.
Herramienta menor.
se finalizaron las labores de impermeabilización de las vigas canales de la exterior del edificio. y se dispuso de los residuos dejados por las actividades realizadas.
Firma. W.I Ihan R

07-Marzo-23 Se le solicita al contratista que tienen que hacer el cambio de las escalera por una tipo tijera, debido a la inestabilidad que presenta dicha escalera. De igual manera, se les solicita de manera urgente los pamisos de trabajo en alturas diligenciados junto con los ATS desde el inicio de dichas actividades en cubierta. al igual que el acompañamiento del SST en la cubierta

Luis Miguel Ortiz

Fecha: 8 de Marzo de 2023
2 oficiales.
Herramienta menor.
Se hizo retiro del mortero existente de los viaductos y se aplico pintura impermeabilizante en algunas secciones de los viaductos.
Firma. Luis Miguel Ortiz Thern R.

Fecha: 09 de Marzo de 2023.
2 oficiales.
Herramienta menor.
Se realizaron los resanes de la tubería de dos bajantes que reciben el agua de los canales, se realizo la nivelación de dicha superficie para su posterior impermeabilización. Se presentaron fuertes lluvias en gran parte del día.
Firma. Luis Miguel Ortiz Thern R.

Fecha: 10 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante
Herramienta menor.
Se limpiaron otros secciones de viaductos que tenían con residuos, y se sellaron los canales rajados por la lluvia para aplicar pintura impermeabilizante se presentan fuertes lluvias a lo largo de la jornada.
Firma Luis Miguel Ortiz Thern R.

Fecha: 11 de Marzo de 2023
No hubo personal
se suspenden las actividades por el dia de hoy, debido las fuertes lluvias que se presentan en la zona, se reanudaran las actividades, para la intervención de los baños del tercer piso del edificio
Firma Wil Miguel Cuellar Jhen R.

Fecha: 13 de Marzo de 2023
No hubo personal
Las actividades se suspenden una jornada mas por las lluvias. Sin embargo se obtiene el permiso por parte de la rectora para inicar la intervención en los baños identificados en la ficha diagnostico
Firma Wil Miguel Cuellar Jhen R

Fecha: 14 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante
Herramienta menor, pulidora.
se inicia la intervencion del baño de los niños ubicado en el tercer piso del edificio 2. Las actividades realizadas fue desmonte de los pocetas de los baños e inicio de desmonte del enchape.
Firma: Wil Miguel Cuellar Jhen R.

Fecha: 15 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante
Herramienta menor.
se continua con el desmonte del enchape en mal estado y se quita la pintura de la pared que debe ser reemplazada.
Firma Wil Miguel Cuellar Jhen R.

Fecha: 16 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante
Herramienta menor.
se finaliza con el desmonte del enchape en mal estado, se comienza con el proceso de estucado y afinado de la parte de la pared que se encontraba

con pintura precisamente retirada. se limpian los muros con ladrillo a la vista con acido muriatico con el fin de eliminar las impurezas depsdas en la superficie.
Firma. Jhon R.

Fecha: 17 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 Ayudante.
Herramienta menor.
se realiza la aplicación de la emulsión asfaltica en las vigas canales y superficies planas en la cubierta del edificio para alistar la superficie para colocar el manto asfaltico.
Firma. Jhon R.

Fecha: 18 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante
Herramienta menor.
se realiza el acopio de los escombros producidos por la limpieza de la cubierta. y se impermeabiliza la placa de concreto contigua a la cubierta con 1 capa de emulsión asfaltica se continua con el estucado en el bajo.
Firma. Jhon R.

Fecha: 21 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante
Herramienta menor.
se complementa la aplicación de la emulsión asfaltica en las placas y en las vigas canales de la cubierta, se continua con el mantenimiento de la cubierta y la limpieza y adecuación de la canal dentro de la cubierta.
FIRMA.

Fecha: 22 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante
Herramienta menor.
se continua con la limpieza y la aplicación de la emulsión asfaltica en la canal que se encuentra dentro de la cubierta y se comienzan con los resanes

BITÁCORA COLEGIO DISTRITAL REINO DE HOLANDA SEDE A

BITACORA OBRA COLEGIO REINO HOLANDA.

Fecha: 20-02-23
Se inician obras de cerramiento y adecuación aula provisional, acompañado de socialización del alcance del proyecto a ejecutar.
Contrato de Obra No CO1.PCCNTR 4077645 de 2022.
Contrato de interventoria No CO1 PC CNTR 4155718.
Alcance: Adelantar obras de Adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas FISICAS de la Secretaria de adecuacion de distrito, asi como la ejecución de Obras menores, que permitan a traves de la atención de emergencias y de necesidades FISICAS prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestacion de servicio de la infraestructua fisica en los colegios distritales y las sedes administrativas
Direcion Dg 46 sur # 13 i -15. Bogotá.
Fecha 20:02-2023
Acuadrilla 1:1.
Herramienta Menor
Inician actividades en comedor de aula provisional, estructura.
Fecha:. Wil Miguel Ardila Pamelas.
Fecha: 21-02-23
1:1.
Herramienta Menor.
Continuan actividades de estructura y laminado. y finalizan. adecuacion.
Firma:. Wil Miguel Ardila Pamelas
Fecha: 22.-02-2023
Inician actividades de desmonte de electrico, lamparas en primera zona a intervenir de zubertas.
Firma. Wil Miguel Ardila Pamelas.
Fecha: 23-02-2023
Continuan actividades de desmonte de ventaneria
Firma. Wil Miguel Ardila Pamelas.


Powered by CamScanner

Fecha 24-02-23.
1 Oficial : 1 ayudante
Herramienta menor, compresor.
Se finaliza la actividad de desmonte de ventanería y se continuan desmonte de electricos.
Firma: Luis Miguel Cedeño PamelaB.
Fecha. 25-02-23
No se realizaron actividades por
Fecha: 27.02.23
1 ayudante 1 Oficial
Herramienta menor
se iniciaron actividades de limpieza y pintura de cielos existentes. y se adelantaron actividades de compra de material.
Firma: Luis Miguel Cedeño PamelaB.
Fecha. 28-02-23
1 ayudante 1 Oficial.
Se continuan actividades de pintura en cielos existente.
Firma: Luis Miguel Cedeño PamelaB.
Fecha: 01-03-23
1 ayudante 1 oficial.
Se realiza recorrido con los contratistas de la parte electrica para evaluar la nueva red electrica y se continuan labores de pintura.
Firma: Luis Miguel Cedeño PamelaB.
Fecha. 02-03-23
1 ay - 1 Oficial
Se continuan actividades de pintura en el aula
firma: Luis Miguel Cedeño PamelaB.
fecha 3-03-23
1 ayudante 1 ayudante
Continuan actividades de pintura en cielos y se realiza visita del contratista de aluminio para verificar medidas en campo de ventanería a fabricar, tambien


Powered by CamScanner

QHD

Se realiza recorrido con el arq Alejandro herrera de SED para aclarar acabados dentro del alcance.

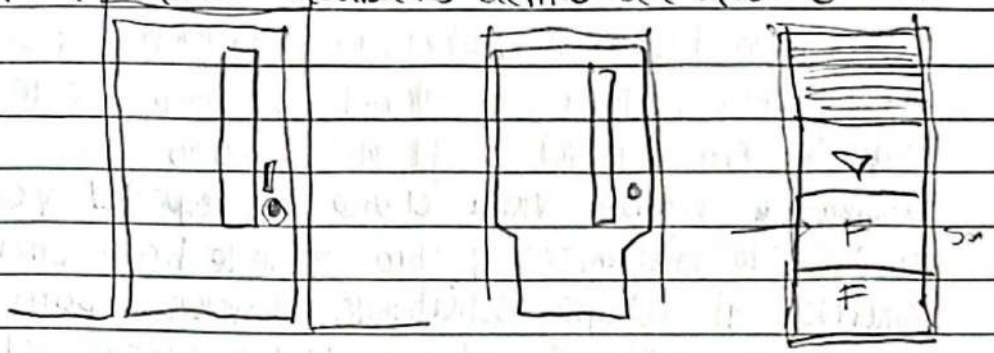


Definir tonalidad
Primero Blanco → para definir
Pasillo - pared de frente



↓Hago cuando intervenir los baños

Volar → Todo → Policarbonato
Cielo raso → liso → lampara bonitas
Divisiones en acero inoxidable
→Pasar plano de Baños
→enchapar
→ cambio de aparatos
→alcance inicial → gestor con rectoria
Cuanto Baños se van a intervenir → aumentar la capacidad
Plano → Baños arquitecto Alejandro



Evaluar el plan de contingencia → y desalojo e
Inhabilitar el desalojo
Protocolo de seguridad → Baño Portable → exterior.
~~Bodegueros~~ → No mas espacios
Firma: Wis Miguel Cadena Pamelas.

Fecha. 06-03-2023

1:1

Se continuan labores de pintura, y coordinación de proximas actividades, pintura de salones y acopio de teja.

Para la semana del 6 al 11 de marzo

Tambien se realiza visita el area de seguridad y salud por parte de interventoria y obra y se le hace una solicitud al colegio solicitando espacios para el acopio de material, el uso de los baños del cerramiento de protección. para ejecución de actividades seguras y se estuvo presente la pagadora Angela que fue la encargada de transmitirle la información

Firma. Ing. Miguel Ortiz Firma SST: int. Firma SST.

Fecha 07-03-2023

se realiza visita por parte del gestor Miguel Turmeque y nos da respuesta del conducto regular para comunicación de las dos partes. Se da respuesta a la solicitud por medio de el en el que nos facilito el baño de los docentes para los trabajadores.

en el tema del acopio no nos habilito espacio en zona esteriores se realizaran estas actividades de acopio en las aulas asignadas.

el ingreso de materiales despues de las 2:30pm., si se trata de material granular en lonas.

cuando se desmonte cubierta esperaremos que haya material suficiente para el respectivo desalojo y se coordinara para hora de la tarde.

Se solicita el cerramiento en lonas de la ventaneria.

se solicita cronograma de obra para ejecuáe de baños. y obra en general. 13-03-2023.

Firma. Arquitecta. Hsp

Firma. Ing. Miguel. Turmeque Gestor. Interventoria

Ing. Miguel Ortiz Res. Obra.

Erick Ramirez Interacon SST

Pamela B

08.03.2023	Se finaliza primera mano pintura esmalte para cercha existente y se inician actividades de resanes en aulas 305-306-307-308. Firma: Luis Miguel Arch Pamela B
9/03/2023	Se realiza cerramiento para deposito de teja de asbesto cemento acordado con la institución. Firma: Luis Miguel Arch Pamela B.
09/03/23	Debido a que se estan presentando trabajos en donde la altura supera los 2 metros como lo establece la resolución 4272 de 2021 se solicita al contratista suministrarle al personal de obra arnes y eslinga. Luis Miguel Arch Pamela B
10/03/23	Se continuan labores de resane, se hace jornada de aseo y se recibe la primera capa de cubierta de los salones en ejecución Firma: Luis Miguel Arch Pamela B.
11/03/2023	Dia lluvioso, se continuan actividades al interior de las aulas de resanes y pintura. Firma: Luis Miguel Arch Pamela B.
13/03/202	Dia lluvioso, se cancela el inicio del desmonte de cubierta por condiciones climaticas, se continuan actividades de resanes al interior de las aulas. Firma: Luis Miguel Arch Pamela B.
14/03/2023	Se inicia actividad de desmonte de cubiertas por el tendido A del aula 308 y se continuan actividades de resane y pintura. Luis Miguel Arch Pamela B

Powered by CamScanner

15/03/2023	se presento emergencia electrica, con lo cual se hizo revisión de las redes diagnosticado un corto en el area del techo lo que no tuvo relacion con el area intervenida. Firma. Ing Miguel Arch PamelaB
16/03/2023	se hacen los resanes de los muros para las cubiertas, sin embargo se suspenden labores de desmonte y suministro de la cubierta por la jornada de hoy debido a que no se autorizo la entrada de los vehiculos del personal Firma.
17/08/2023	se realizaran labores de refuerzo y soldadura de las platinas ubicadas en el pasillo entre las aulas. se continua con el desmonte y suministro de la cubierta. Firma: Ing Miguel Arch PamelaB
18/03/2023	se realizaran labores de afinación de los muros para complementar la cubierta. y se realizo el resane del la canal ubicada en el pasillo se continua con las actividades de desmonte y suministro de cubierta Firma. Ing Miguel Arch
21/03/2023	Se continuan actividades de instalacion de cubierta en ala 1. y rematar de cubiertar, tambien se continuan activdades de resanes y replanteo de red electricas., (desmonte de red electrica, bajo cubierta) Firma. Ing Miguel Arch PamelaB.
22/03/2023	se inician las labores de pintura de las aulas y se continua con el suministro de la cubierta, asimismo se realizaran labores de resane en las zonas donde estan requeridas. Firma. Ing Miguel Arch PamelaB.
23/03/2023	se continua con las labores de pintura de las aulas y las labores de resane, estucado y afinado de los muros. se continua con las actividades de suministro y desmonte de la cubierta. Firma. Ing. Miguel Arch PamelaB

Powered by CamScanner

Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe	CONTRATO No CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022 - ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

BITÁCORA COLEGIO DISTRITAL LICEO FEMENINO DE CUNDINAMARCA MERCEDES NARIÑO

BITACORA OBRA LICEO FEMENINO

Fecha de inicio 27-02-2023

contrato No: Obra:

Contrato de Interventoria.

Alcance: Adelantar obras de adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo de espacios de laboratorios para la adecuacion del bachillerato internacional

Direccion av caracas # localidad Rafael Uribe Uribe.

Areas a intervenir: Laboratorio Fisica, Laboratorio Biologia Laboratorio Quimico. salon Tecnologia 2. Demoliciones varias, (adecuacion general pisos, pintura, cielos) y elaboracion de cuarto de fotografia

Fecha 27/02-2023

Inician actividades de demolicion en laboratorio fisica 2 ayudant e ingresamos 5 percutor para ejecutar.

Firma: Luis Miguel Pamela B

Fecha 28/02-2023

Se continuan actividades de demolicion. y desalojo de escombros

1:1

Firma:

Fecha 01-03-2023

Se continuan actividades de demolicion y desalojo a punto de acopio.

Firma. Luis Miguel Pamela B

Fecha 02-03-2023

Se continuan actividades en el laboratorio de Biologia. y se ingresa otro personal 1 ayudante.

Firma. Luis Miguel Pamela B

Fecha: 03-03-2023

Se realiza recorrido con secretaria de educacion para revisar alcance de obra. se solicita un cronograma de actividades, incluir un ND de Black outs y realizar colocacion con granito y otra alternativa y se da

Paso a inicar otros espacios y se solicita tumbar muro existente
Firma: Luis Miguel Ardila Pamelab.
04-03-023
Se inicia con 3 ayudantes el traslado de material a acopio
Firma: Luis Miguel Ardila Pamelab.
06-03-203
Se programa volqueta para mailes en la tarde para desalojos de rcd. y se continua demolicion y limpieza de labuctorios..
Firma Luis Miguel Ardila Pamelab.
07-03-2023
Se autoriza el ingreso de la volqueta con placas _____ para la evacuacion de escombros.
Firma: Luis Miguel Ardila Pamelab
Fecha. 08-03-2023
Se continuan labores de demolicion en aulas. laboratorio Fisica y Biologia.
Firma Luis Miguel Ardila Pamelab
Fecha 09-03-2023
Se solicita ingresar al laboratorio de quimica y la institucion nos lo habilita el dia lunes 13 de marzo y se continuan actividades de demolicion
Firma Luis Miguel Ardila Pamelab.
Fecha 10-03-2023
Se continuan labores de desalojo de escombro y se programa volqueta para desalojo en horas de la tarde.
Firma: Luis Miguel Ardila Pamelab.
Fecha 11-03-2023. S
Se continuan labores de demolicion y se hace jornada de aseo.
Firma: Luis Miguel Ardila Pamelab.

Powered by CamScanner

	Fecha: 13-03 2023 Se continuan actividades de demolición, se evidencia en el laboratorio de Biología una placa flotante con refuerzo en malla se hace el respectivo relleno para ejecución de la nueva placa.. Se continuan actividades de desalojo de material y se inicia el trazado de niveles. Firma: Lic Miguel Cook Pamela B
14.03.2023	Observaciones por laboratorio: En el laboratorio de física se evidencian placas en concreto reforzadas en lavamanos. y en tarimas. y en mueble auxiliar lateral tambien se evidencia reforzamiento en placas. ·Laboratorio Biología: Tambien se evidencian Placas en concreto reforzadas en mezones, Tarima, mueble auxiliar y encontramos placa flotante en la mitad del salon apoyada en muros en ladrillo cada 1,5mt. y la otra mitad apoyada en relleno compactado y placa mortero. Se realizo relleno de 0,8 mt. Laboratorio Quimica: Se realizo entrega el dia de hoy en horas de la mañana y se inicia demolición de mesones, se evidencia del mismo modo, placa reforzada. Firma Lic Miguel Cook Pamela B.
15-03-2023	Se hace recorrido con SED y se solicitan unas adiciones - cielo raso en salon Biología. en pvc instalado a nivel de viga, se solicita rejilla en aluminio (especificacion vant.). Definen pisos en porcelanato de 60x60 mate tipo urban o similar. para espacios de laboratorios. En el salon de Tecnología #2. determinan no demoler piso, se nivela sobre el existente y se instala piso tipo vinilico tarima, cambiar luminarias 30x120 y en el laboratorio de quimica, se define en

Powered by CamScanner

	porcelantato 60x60 mate tipo urban o similares. Se define altura del enchape de pared a 120ml Firma. Luis Miguel Cadena Pamelab.
16.03.2023	Fecha: Se continuan actividades de demolicion en laboratorio de quimica, se solicita a interventoria diseños electricos, hidraulicos. y los pertinentos para la entinua ejecución. Firma: Luis Miguel Cadena Pamelab.
17.03.2023	Se continuan actividades y se espera los diseños para continuar actividades de sobre piso. Firma: Luis Miguel Cadena Pamelab
18.03.2023	Se realizan actividades de desalojo de material y jornada de aseo y limpieza. (laboratorio Quimica). Firma. Luis Miguel Cadena Pamelab
20.03.2023	Dia festivo no se labora.
21-03-2023	Se realiza recoleccion de rcds en obra. y se continuan actividades de limpieza. Firma: Luis Miguel Cadena Pamelab.
22-03-2023	Se le refiere a la interventoria que por temas de garantias no podemos hacer la instalacion del vinilico como lo solicita SED y por parte de interventoria aprueban demolicion de enchape existente y correcta ejecucion del nuevo vinilico. por ende se inicia demoliciones en el salon de Tegnologia #2. Se realiza visita por medio del area ambiental de la SED y se verifica las actividades y propios. • Pasivos. Biologo. Prof. Ambiental DCEE Luis Miguel Cadena Pamelab.
23-03-2023	Se inicia demolicion aula Tecnologia 2 y se encuentra una patologia muy comun, "enchape sobre enchape". se hace registro fotografico y se remite a interventoria. el cual aprueban la continuacion de la demolicion para proceder a un buen proceso. relleno compactado, placa y sobre piso para enchape vinilico. Firma:

Powered by CamScanner

Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe	CONTRATO No CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022 - ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

BITÁCORA COLEGIO DISTRITAL SANTA LUCIA CAFAM

Viernes 10 de marzo 2023

Personal en obra

1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 director de interventoria, 2 residentes de interventoria, 1 maestro de obra, 2 instaladores de teja.

Se recibe por parte de la interventoria llamado para atender emergencia en la sede de Santa lucia capam, ya que la Secretaria de salud realizo el dia de ayer cierre preventivo de la institucion por humedades en la institucion.

Teniendo en cuenta que el contrato incluye la atencion de emergencias Se hace acercamiento al sitio donde se hace recorrido con la rectora de la institucion y la Supervision del contrato, junto con la interventoria. Se manifiesta que algunos de los lugares que presentan afectacion fueron intervenidos hace muy poco, por lo cual estan cubiertos por garantia y por ende el consorcio MIA GP, No puede hacer intervencion en estas áreas. Sin embargo, aquellas que no, pueden ser intervenidas.

El consorcio mia GP presenta presupuesto para el dia Siguiente, una vez realice el diagnostico.

Sabado 4 de marzo 2023

Personal en obra

4 Inspector de obra, 1 maestro de obra, 1 oficial y 1 ayudante

Se realiza entrega preliminar de presupuesto. Se realiza compra de materiales para el inicio de actividades. No se puede dar inicio a las actividades de impermeabilizacion por las condiciones del clima.

Powered by CamScanner

Domingo 12 de marzo de 2023.
Personal en obra: 1 oficial y 1 ayudante.
No se puede iniciar actividades de impermeabilizacion en cubierta por las fuertes lluvias presentadas en el dia.

Lunes 13 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayudante.
No se puede iniciar actividades de impermeabilizacion en cubierta por las fuertes y constantes lluvias presentas en el dia.

Martes 14 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayudante.
Se inician actividades de raspado de pintura ya que se encuentran libres las áreas para posterior resane, mientras que secan los muros perimetrales de cubierta.
Se realiza actividad de demolicion de pañete suelto, desmonte de plancha y manto existente y se da inicio a la actividad de pañete en repisa de muros y en cara interna de muros,

Miercoles 15 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayudante.
Se inician actividades de imprimacion de las superficies donde se realizo pañete en muros para posterior instalacion de manto.

Powered by CamScanner

Jueves 16 de marzo de 2023.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayudante.
Se continua con actividades de demolicion de pañete, desmonte de manto y retiro de plancha para posterior instalacion de pañete, Planchas y manto asfaltico sobre emulsion asphaltica.

Viernes 17 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 oficiales y 2 ayudante.
Se continua con actividades de impermeabilizacion de muros perimetrales en bloque morado. Se inicia actividad de raspado de pintura en bloque verde (pasillo) el cual tambien es prioritario y presenta humedades marcados en placa.

Sabado 18 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 oficiales y 2 ayudantes
Se continua con actividades de impermeabilizacion de muros perimetrales en bloque morado. Se continua con actividades de raspado de pintura, Se realiza resane de placa para posterior aplicacion de pintura.

Domingo 19 de marzo de 2023.
Personal en obra: 1 oficial y 1 ayudante.
Se realiza actividad de pintura en pasillo del bloque verde en piso 1. Se verifica estado del manto de cubierta, el personal de mantenimiento manifiesta que no se tiene empozamiento

Powered by CamScanner

de agua, por lo que se decide no realizar vaciado en placa para incluir bajante. Se le recomienda a la institución realizar mantenimiento con mayor frecuencia, toda vez que se evidencia hojas y material particulado en las bajantes.

Lunes 20 de marzo de 2023

Personal en obra: 1 inspector, 2 oficiales y 2 ayudantes

Se inicia actividad de resanado de pintura para pared interno en blogue morado, se evidencian humedades en muros superiores y antepechos. Se aplican capas de pintura en espalte en las zonas mas afectadas y vinilo en parte superior. Se continua con actividad de pintura en piso 2 del blogue verde.

Bogotá D.C., 5 de abril de 2023

2023_RUU_MGP_118

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Acta de Pago Parcial No 1 - Subsanada

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO MIA GP realiza la entrega de la siguiente documentación del Acta de Pago Parcial No 1 correspondiente al periodo del 20 de febrero de 2023 al 19 de marzo de 2023:

- Acta parcial en Excel y PDF
- Memorias de Calculo Excel y PDF
- Aportes parafiscales
- FURC - hoja información de pagos
- RUT CONSORCIO MIA GP
- Factura No MGP-01
- Resolución de facturación DIAN
- Certificación Bancaria
- Acta de autorización de pagos

Los mencionados documentos tienen la subsanación de las observaciones recibidas por la SED para su revisión y aprobación.

Agradecemos la atención,

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Lo enunciado
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 20 DE ENERO DE 2023 HASTA 19 DE FEBRERO DE 2023

CONTRATISTA : CONSORCIO MIA GP

DIRECCION : CARRERA 8 No 12 - 21 MN

C.C. ó NIT : 901.634.703-9

TELEFONO : 3.133.876.020

INTERVENTOR : CONSORCIO TIG

DIRECCION : CARRERA 47A No 93-41 BARRIO LA CASTELLANA

C.C. ó NIT : 901.649.890-3

TELEFONO : 311 2004626

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

ESTABLECIMIENTOS :

LOCALIZACION :

VR. INICIAL : $11.941.262.150,00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $11.941.262.150,00

PLAZO INICIAL : 11 MESES

FECHA INICIACION : 20 de enero de 2023

FECHA TERMINAC.INICIAL : 19 de diciembre de 2023

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 11 MESES

FECHA FINAL : 19 de diciembre de 2023

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2232	8-jun-22	4804	18-oct-22	$ 11.941.262.150,00	$ 11.941.262.150,00	$ 203.058.871,00	$ 11.738.203.279,00
				$ 11.941.262.150,00	$ 11.941.262.150,00	$ 203.058.871,00	$ 11.738.203.279,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 203.058.871,00** **SON: DOSCIENTOS TRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE.**

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO TOTAL	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
I	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	GL	1,00	$ 11.941.262.150,00	$ 11.941.262.150,00							
	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS											
	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.570,00		55,00	$ 1.956.350,00			55,00	$ 1.956.350,00	
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA	M2		$ 29.215,00		178,50	$ 5.214.877,50			178,50	$ 5.214.877,50	
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M		$ 8.921,00		80,00	$ 713.680,00			80,00	$ 713.680,00	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.062,00		11,00	$ 55.682,00			11,00	$ 55.682,00	
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 250.250,00		178,50	$ 44.669.625,00			178,50	$ 44.669.625,00	
	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.664,00		112,73	$ 3.456.752,72			112,73	$ 3.456.752,72	
	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.222,00								

1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$	35.570,00		26,67	$	948.651,90				26,67	$	948.651,90	
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	30.664,00		42,64	$	1.307.512,96				42,64	$	1.307.512,96	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	24.791,00		20,48	$	507.719,68				20,48	$	507.719,68	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	8.916,00		78,68	$	701.510,88				78,68	$	701.510,88	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	26.351,00		10,00	$	263.510,00				10,00	$	263.510,00	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$	14.890,00		24,00	$	357.360,00				24,00	$	357.360,00	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	29.215,00		307,90	$	8.995.298,50				307,90	$	8.995.298,50	
1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	18.112,00		0,90	$	16.300,80				0,90	$	16.300,80	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$	5.062,00		18,00	$	91.116,00				18,00	$	91.116,00	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$	4.193,00		48,00	$	201.264,00				48,00	$	201.264,00	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$	16.242,00		843,48	$	13.699.802,16				843,48	$	13.699.802,16	
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$	23.886,00		910,70	$	21.752.980,20				910,70	$	21.752.980,20	
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$	250.250,00		256,00	$	64.064.000,00				256,00	$	64.064.000,00	
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		$	1.898,00		3.072,00	$	5.830.656,00				3.072,00	$	5.830.656,00	
20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG		$	2.272,00		3.072,00	$	6.979.584,00				3.072,00	$	6.979.584,00	
	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II															
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	30.664,00		320,31	$	9.821.985,84				320,31	$	9.821.985,84	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	24.791,00		15,45	$	383.020,95				15,45	$	383.020,95	
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	14.008,00		57,98	$	812.183,84				57,98	$	812.183,84	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$	14.890,00		8,00	$	119.120,00				8,00	$	119.120,00	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$	5.062,00		58,00	$	293.596,00				58,00	$	293.596,00	
	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A															
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
1.1.1	REPLANTEO	M2		$	3.222,00											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$	35.570,00		27,40	$	974.618,00				27,40	$	974.618,00	
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	30.664,00		129,63	$	3.974.974,32				129,63	$	3.974.974,32	
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	14.008,00		19,66	$	275.397,28				19,66	$	275.397,28	
	EMERGENCIAS															
	SAN AGUSTIN															
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	24.791,00		8,40	$	208.244,40				8,40	$	208.244,40	

1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	8.916,00		2,10	$	18.723,60				2,10	$	18.723,60	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$	14.890,00		1,00	$	14.890,00				1,00	$	14.890,00	
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$	16.887,00		9,00	$	151.983,00				9,00	$	151.983,00	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
3.1.10	MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M2		$	125.254,00		8,40	$	1.052.133,60				8,40	$	1.052.133,60	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**															
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3"	UN		$	66.903,00		1,00	$	66.903,00				1,00	$	66.903,00	
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	38.796,00		3,00	$	116.388,00				3,00	$	116.388,00	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2"	UN		$	19.077,00		17,00	$	324.309,00				17,00	$	324.309,00	
4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	16.553,00		3,00	$	49.659,00				3,00	$	49.659,00	
4.3.14	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1"	UN		$	7.490,00		5,00	$	37.450,00				5,00	$	37.450,00	
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	14.651,00		3,00	$	43.953,00				3,00	$	43.953,00	
4.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN		$	5.185,00		6,00	$	31.110,00				6,00	$	31.110,00	
4.11	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$	3.818,00		160,00	$	610.880,00				160,00	$	610.880,00	
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		$	70.077,00		2,10	$	147.161,70				2,10	$	147.161,70	
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$	33.591,00		2,10	$	70.541,10				2,10	$	70.541,10	
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$	7.708,00		217,36	$	1.675.410,88				217,36	$	1.675.410,88	

COSTO DIRECTO CONTRATO				**$**	**11.941.262.150,00**			**$**	**203.058.870,81**					**$**	**203.058.870,81**	**1,7%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL				**$**	**11.941.262.150,00**			**$**	**203.058.870,81**					**$**	**203.058.870,81**	**1,7%**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	**(**		**)**													
VALOR A PAGAR								**$**	**203.058.870,81**					**$**	**203.058.870,81**	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA								**$**	**0,19**					**$**	**0,19**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO								**$**	**203.058.871,00**					**$**	**203.058.871,00**	

SALDO DEL CONTRATO	**$ 11.738.203.279,00**	**SALDO POR AMORTIZAR**		**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**

NOMBRE DE CONTRATISTA : **CONSORCIO MIA GP**
C.C. O NIT : 901.634.703-9
REP. LEGAL : MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
C.C. : C.C. 1.020.791.796 DE BOGOTA

NOMBRE DE INTERVENTORIA : **CONSORCIO TIG**
C.C. O NIT : 901.649.890-3
REP. LEGAL : EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
C.C. : 79.553.539

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.03	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			55,00	1,00	55,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	55,00
				TOTAL	55,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

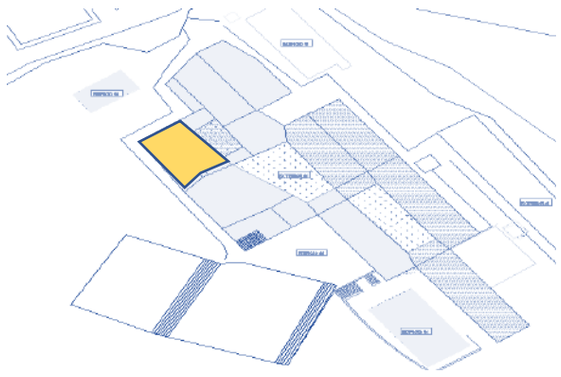



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					
Edificio administrativos y profesores (incluye aula orientación)	178,50	8,50	21,00	1,00	178,50
PASAN:				**SUBTOTAL**	178,50
				TOTAL	178,50

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

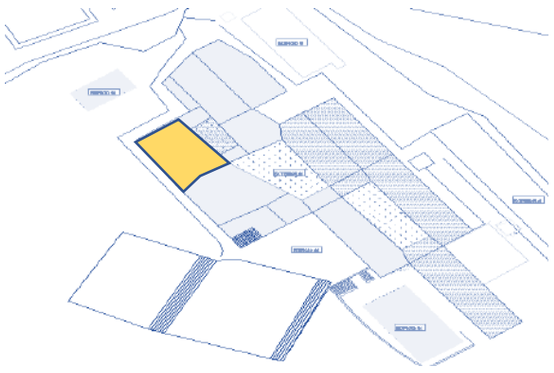



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.42	M	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			40	2,00	80,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	80,00
				TOTAL	80,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
Aula profesores				11,00	11,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	11,00
				TOTAL	11,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDING SEAM (ANCHO = 500mm.) DOBLE CAPA CON AISLANTE DE POLIETILENO DE 50 mm. - SEGUN MEDIDAS IN SITU - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					
Edificio administrativos y profesores y orientación	178,5	8,5	21	1	178,5
PASAN:				**SUBTOTAL**	178,50
				TOTAL	178,5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

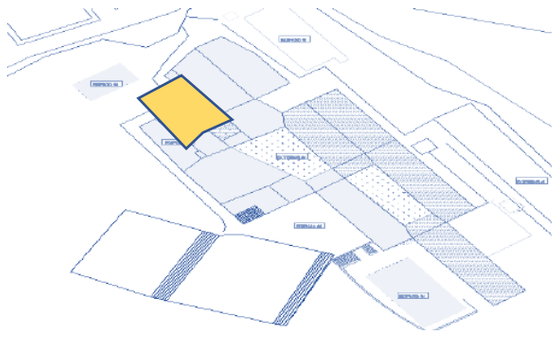



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
AULA 32	57,46	8,22	6,99	1,00	57,46
CORREDOR 33	54,81	2,61	21,00	1,00	54,81
Bocapuertas en en corredor frente a puertas aulas	0,46	1,15	0,40	1,00	0,46
PASAN:				**SUBTOTAL**	112,73
				TOTAL	112,73

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

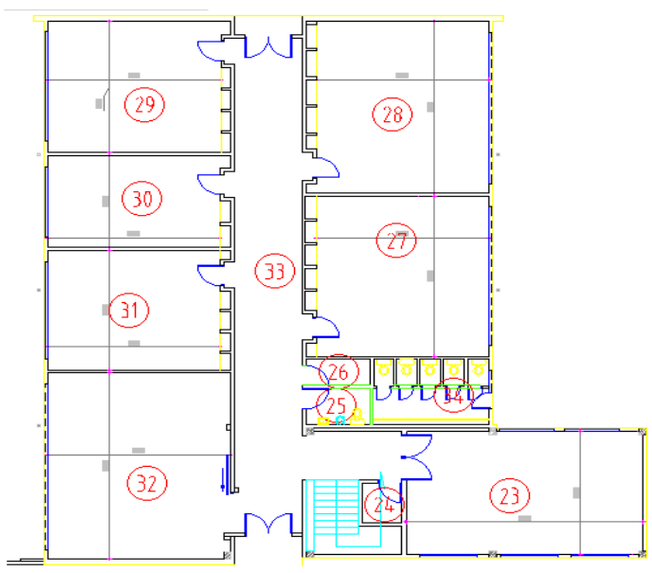



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.3	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Longitud 1	26,67			1	26,67
PASAN:				**SUBTOTAL**	26,67
				TOTAL	26,67

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

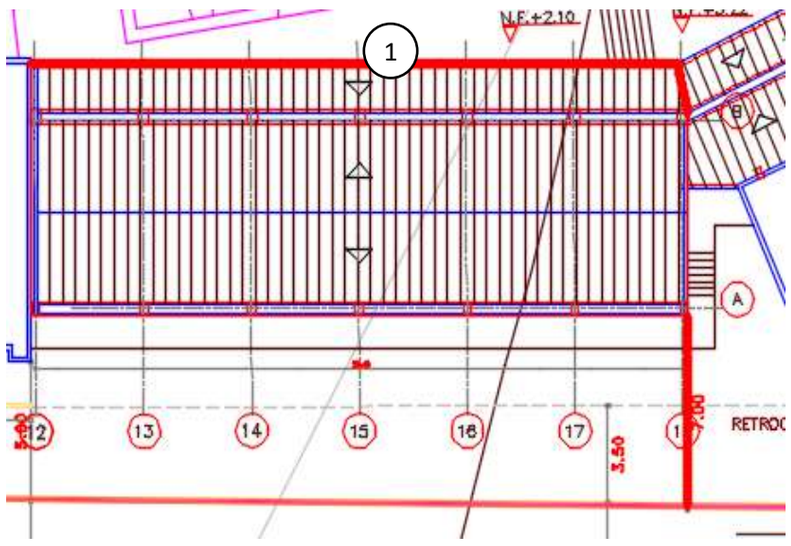



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)


DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	LARGO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Baño mujeres	18,04			1	18,04
Baño hombres	21,44			1	21,44
Baño profesores	1,76			1	1,76
Cuarto aseo	1,40			1	1,40
PASAN:				**SUBTOTAL**	42,64
				TOTAL	42,64

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA


baño mujeres

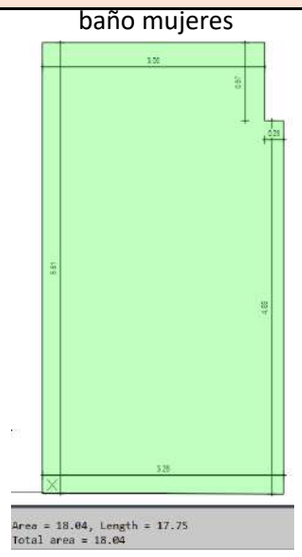


baño hombres



baño profesores

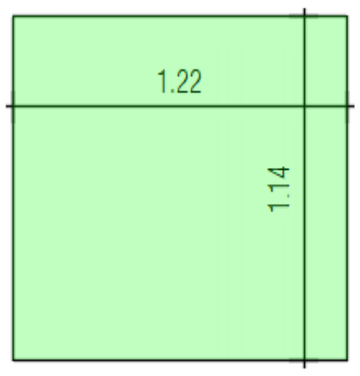

Cuarto aseo

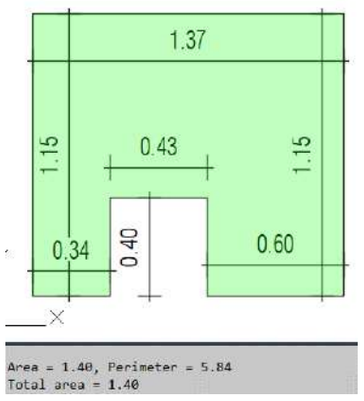

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.15	M2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					0,00
BAÑOS HOMBRES PISO 3	1,30	1,75		4,00	9,10
BAÑO MUJERES PISO 3	1,30	1,75		5,00	11,38
PASAN:				**SUBTOTAL**	20,48
				TOTAL	20,48

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

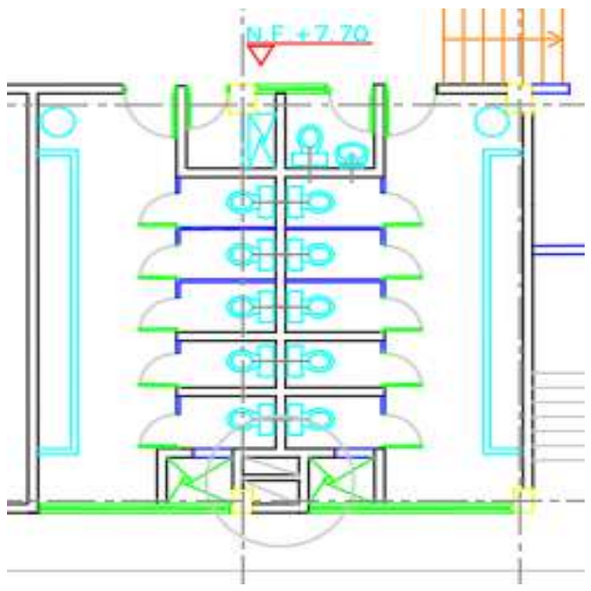



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.20	M2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3	19,84		1,75	1	34,72
BAÑO MUJERES PISO 3	16,95		1,75	1	29,66
BAÑOS PROFESORES PISO 3	4,16		1,75	1	7,28
CUARTO ASEO PISO 3		0,34	1,75	1	0,60
		1,15	1,75	2	4,03
		1,37	1,75	1	2,40
PASAN:				**SUBTOTAL**	78,68
				TOTAL	78,68


REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

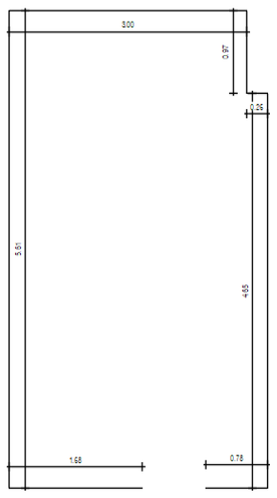


baño mujeres

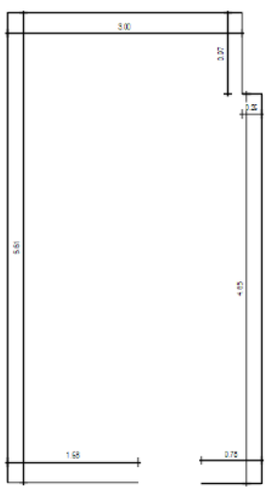

baño hombres

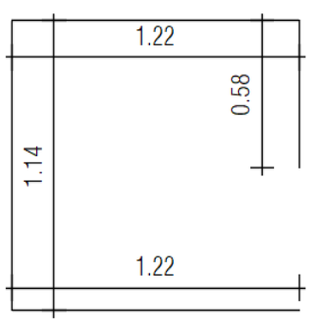

baño profesores

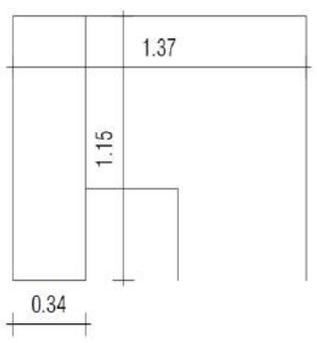

Cuarto aseo

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.28	M2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3			5,00	1	5,00
BAÑO MUJERES PISO 3			5,00	1	5,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	10,00
				TOTAL	10

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

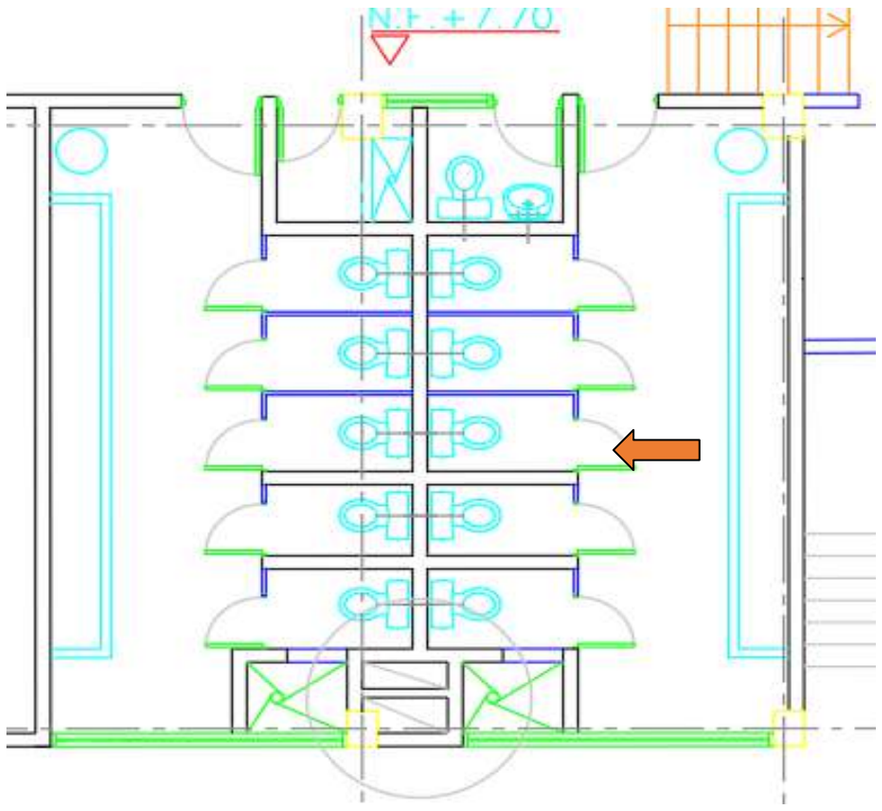





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.30	UN	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3			11,00	1,00	11,00
BAÑO MUJERES PISO 3			11,00	1,00	11,00
BAÑOS PROFESORES PISO 3			2,00	1,00	2,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	24,00
				TOTAL	24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

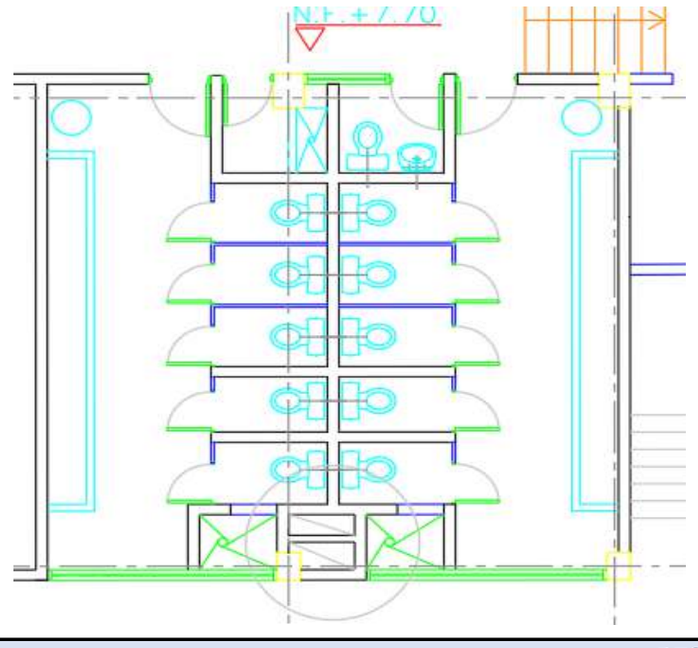

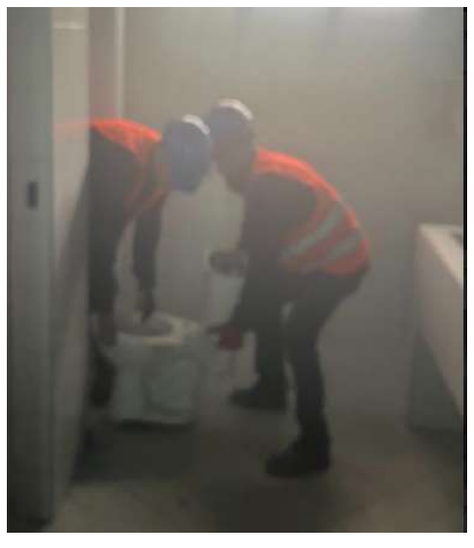

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						
		56,32	2,2	25,60	1	56,32
		199,68	7,8	25,60	1	199,68
		51,90	2,20	23,59	1	51,90
PASAN:					**SUBTOTAL**	307,90
					TOTAL	307,90

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

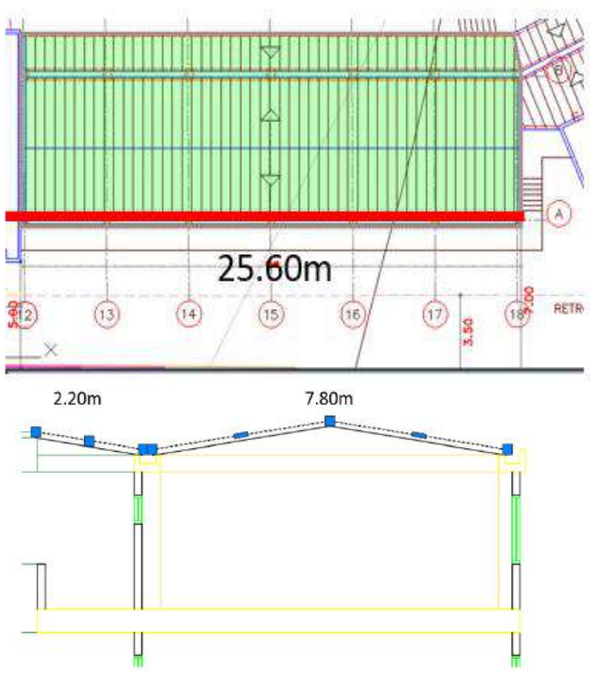

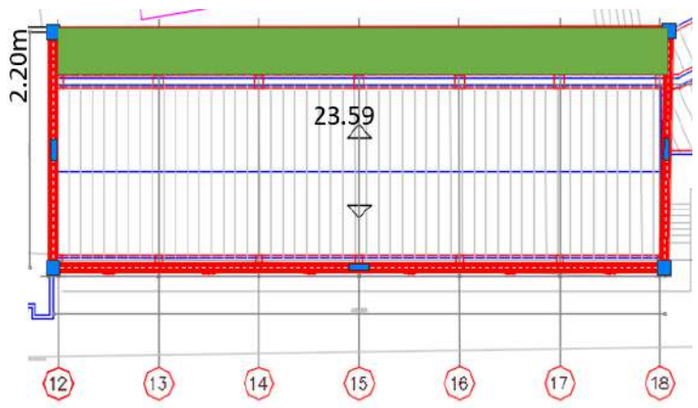

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.35	M2	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3		0,45	1,00	2,00	0,90
PASAN:				**SUBTOTAL**	0,90
				TOTAL	0,9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

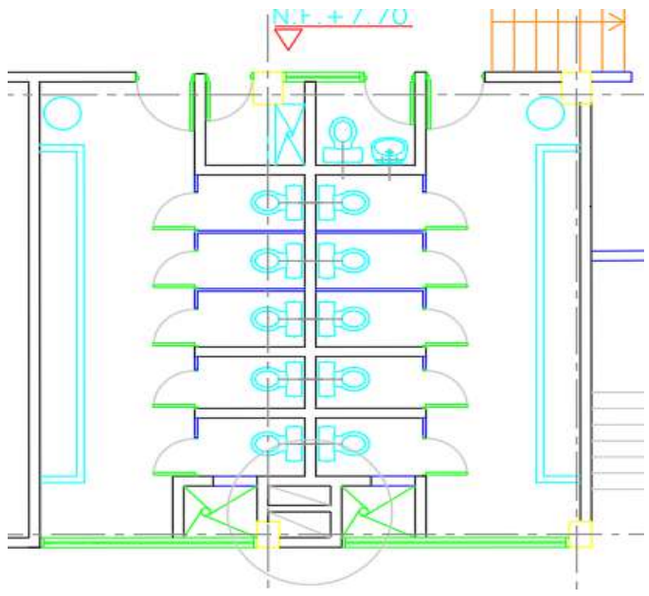



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Aulas			4,00	2	8,00
Paillo			4,00	1	4,00
Baterias sanitarias			6,00	1	6,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	18,00
				TOTAL	18

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.4.10	M	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
CANALES	AREA 1.	24,00			2	48,00
PASAN:					**SUBTOTAL**	48,00
					TOTAL	48

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

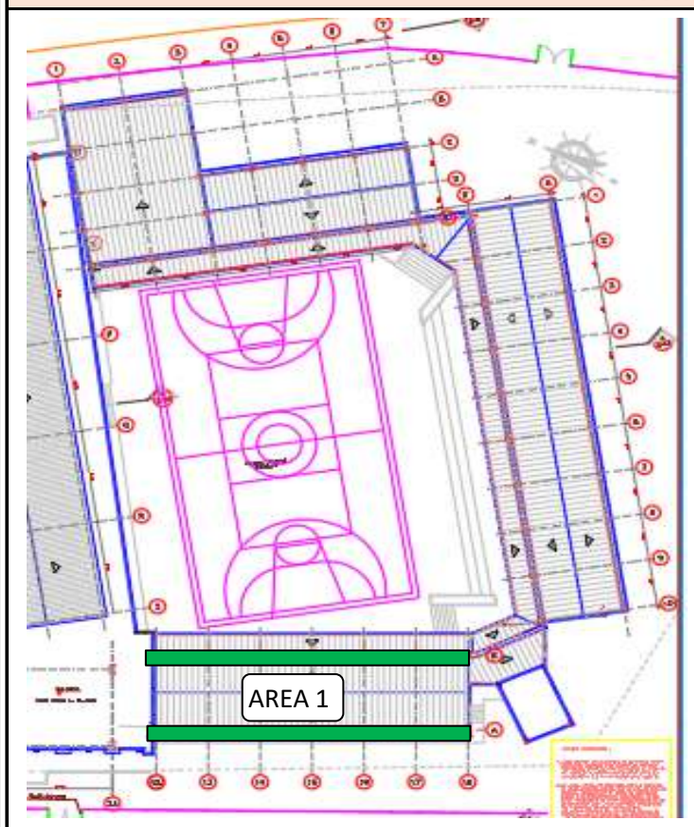



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.5.2	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	KG POR METRO	TOTAL
EDIFICACIONES					
Reforzamiento estructura cubierta			132,00	6,39	843,48
PASAN:				**SUBTOTAL**	843,48
				TOTAL	843,48

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.4.3	M	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LONG	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Bloque 1					
Transversal			8,70	21	182,70
longitudinal			26,00	18	468,00
					0,00
Nuevos perfiles					
Bloque 1					
longitudinal			26,00	10	260,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	910,70
				TOTAL	910,70

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

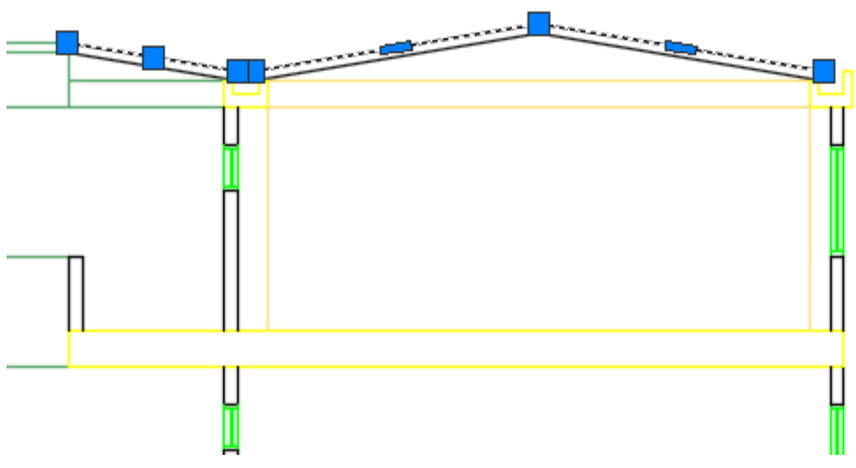

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP – Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						
	AREA 1 - PASILLO	56,32	2,20	25,60	1	56,32
	AREA 1	199,68	7,80	25,60	1	199,68
PASAN:					**SUBTOTAL**	256,00
					TOTAL	256,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

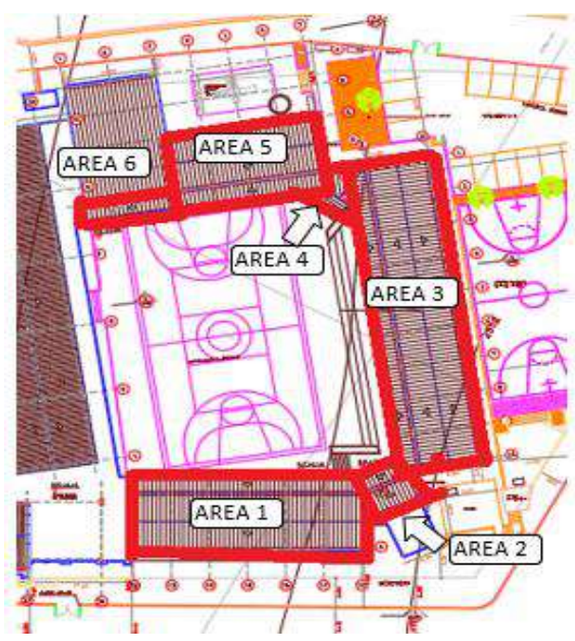



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.2	KG	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						
	PASILLO	56,32	2,2	25,60	1	56,32
	AREA 1	199,68	7,8	25,60	1	199,68
PASAN:					**SUBTOTAL**	256,00
					Kg/m2	12,00
					KG	3072,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

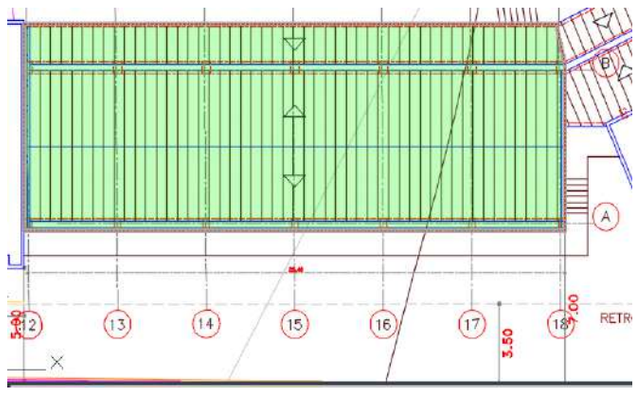



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.3	KG	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						
	AREA 1	56,32	2,2	25,60	1	56,32
	AREA 1 -PASILLO	199,68	7,8	25,60	1	199,68
PASAN:					**SUBTOTAL**	256,00
					Kg/m2	12,00
					KG	3072,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

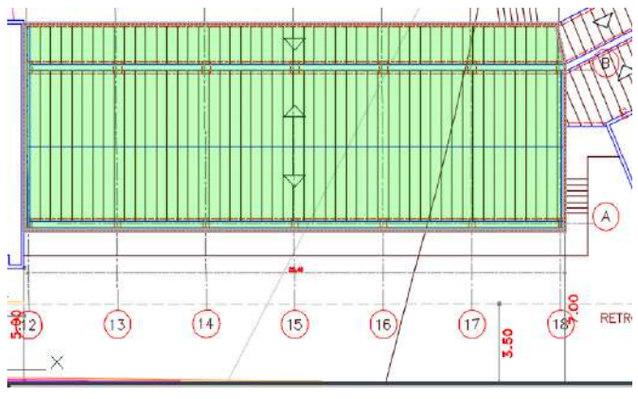



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1 PISO 1					
12	8,97	4,21	2,13	1,00	8,97
13	5,50	2,13	2,58	1,00	5,50
9	47,38	7,45	6,36	1,00	47,38
10	47,06	7,40	6,36	1,00	47,06
EDIFICIO 2 PISO 1					
23	49,93	7,85	6,36	1,00	49,93
24	4,74	2,37	2,00	1,00	4,74
25	15,23	3,50	4,35	1,00	15,23
26	7,45	3,45	2,16	1,00	7,45
27	39,14				39,14
EDIFICIO 3 PISO 1					
19	47,80	7,05	6,78	1,00	47,80
20	47,12	6,95	6,78	1,00	47,12
PASAN:				**SUBTOTAL**	320,31
				TOTAL	320,31

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

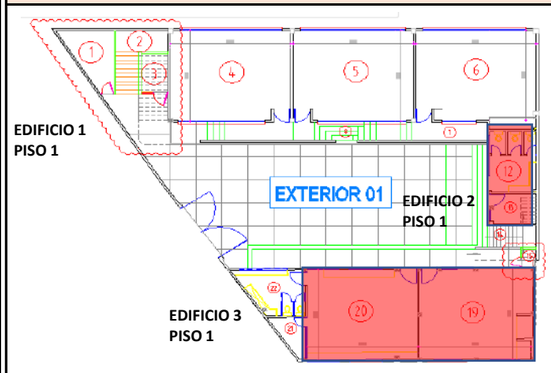

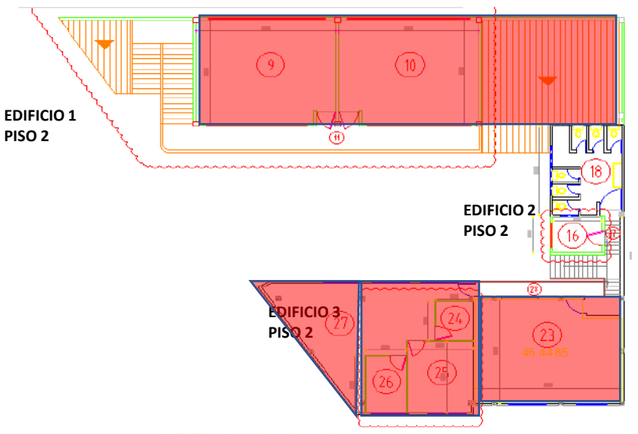













DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.15	M2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ALTO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 1					
12	7,36	1,60	2,30	2,00	7,36
	8,09	2,10	3,85	1,00	8,09
PASAN:				**SUBTOTAL**	15,45
				TOTAL	15,45

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

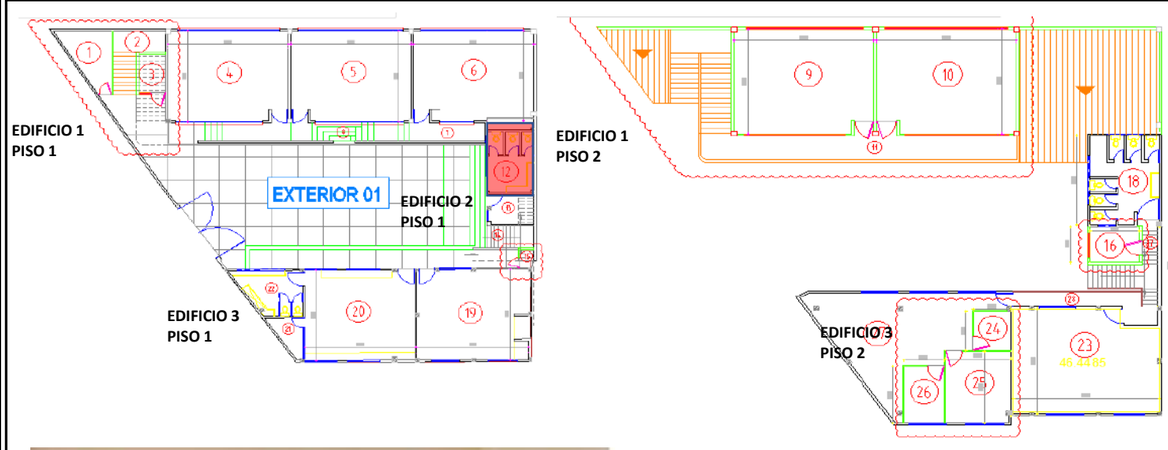





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			
	FRENTE:	**COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.29	M2	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
4	7,59	5,42	1,40	1,00	7,59
	7,78	5,56	1,40	1,00	7,78
	7,78	5,56	1,40	1,00	7,78
9	8,34	5,56	1,50	1,00	8,34
10	8,36	5,50	1,52	1,00	8,36
12	3,20	2,13	1,50	1,00	3,20
13	0,64	0,80	0,80	1,00	0,64
19	7,20	2,00	1,20	3,00	7,20
20	12,00	2,00	1,50	4,00	12,00
23	9,12	2,00	1,52	3,00	9,12
27	9,12	2,00	1,52	3,00	9,12
PASAN:				**SUBTOTAL**	57,98
				TOTAL	57,98

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

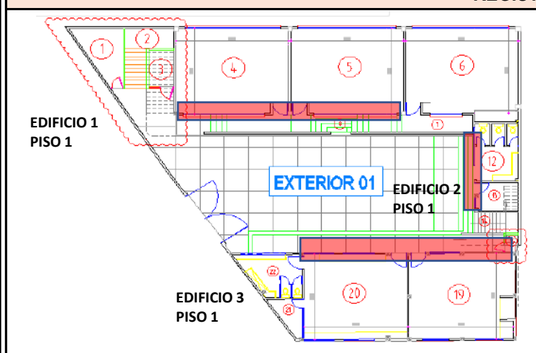

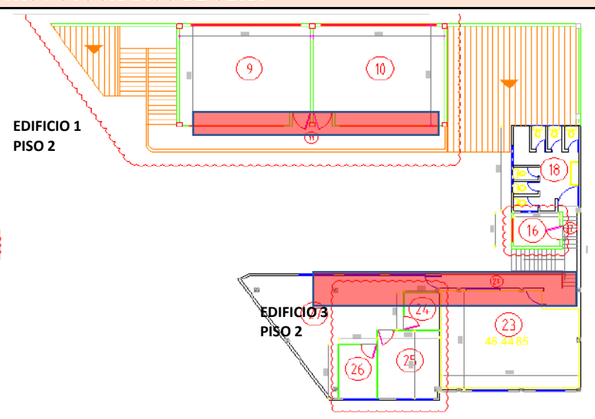















DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.30	UN	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 1					
12 BAÑOS NIÑOS					
INODORO				4,00	4,00
LAVAMANOS				2,00	2,00
ORINAL				2,00	2,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	8,00
				TOTAL	8,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

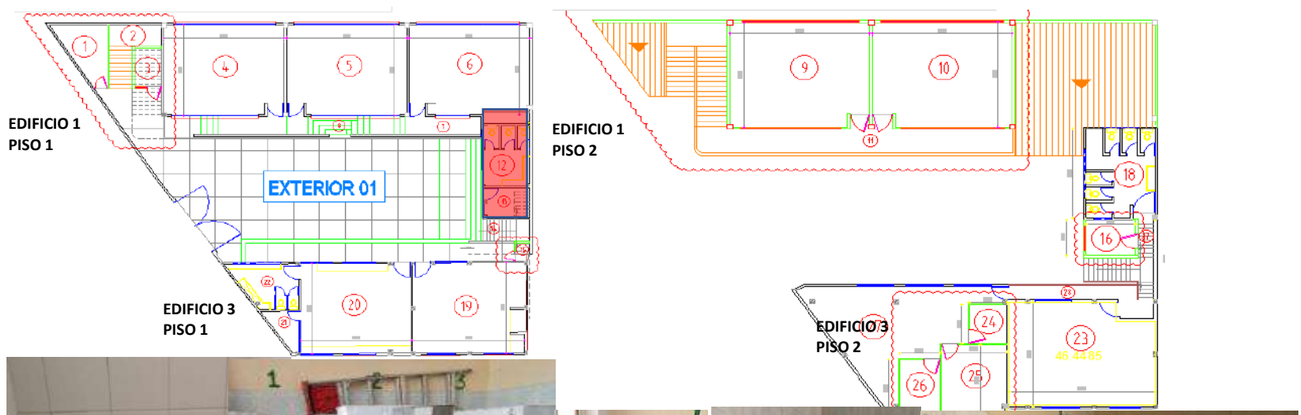



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY**			
	FECHA:	**26**	**12**	**2022**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1 PISO 1					
4				6,00	6,00
5				6,00	6,00
6				6,00	6,00
EDIFICIO 1 PISO 2					0,00
9				6,00	6,00
10				6,00	6,00
11				6,00	6,00
EDIFICIO 2 PISO 1					0,00
12				2,00	2,00
13				2,00	2,00
EDIFICIO 2 PISO 2					0,00
EDIFICIO 3 PISO 1					
19				6,00	6,00
20				6,00	6,00
EDIFICIO 3 PISO 2					0,00
23				2,00	2,00
24				1,00	1,00
25				1,00	1,00
26				1,00	1,00
27				1,00	1,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	58,00
				TOTAL	58,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

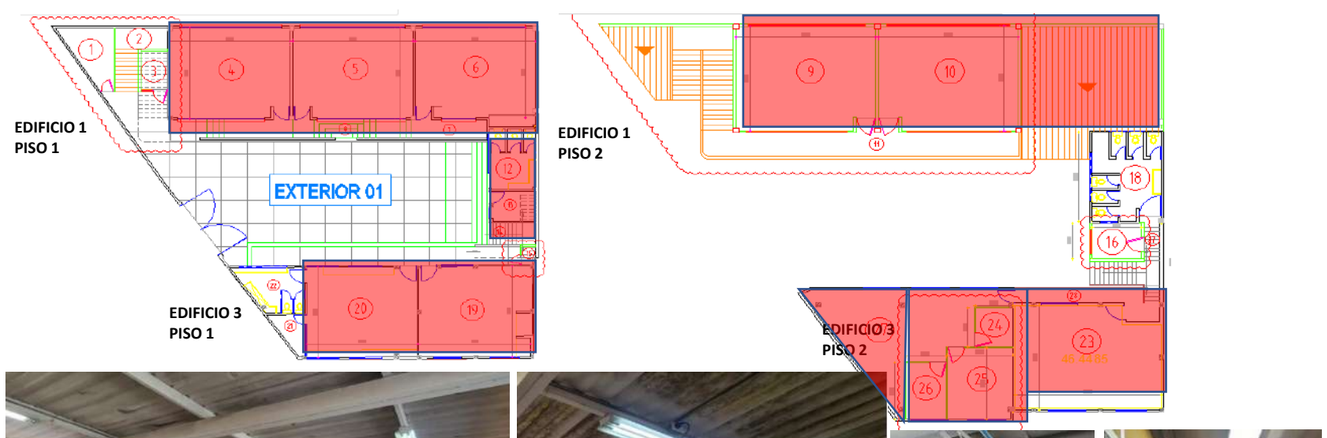










DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.3	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
PREESCOLAR	27,40		-	1	27,40
PASAN:				**SUBTOTAL**	27,40
				TOTAL	27,40

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



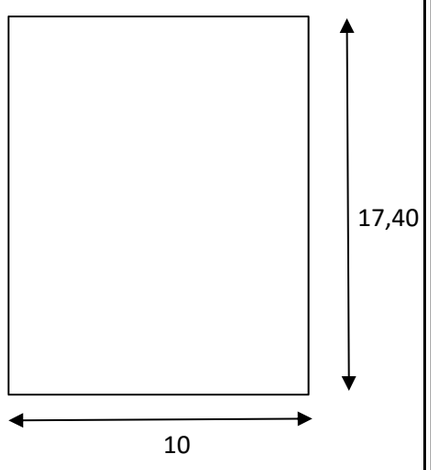

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
EDIFICIO 8	AULAS PREESCOLAR	8,70	7,45		2	129,63
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	129,63
					TOTAL	129,63

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

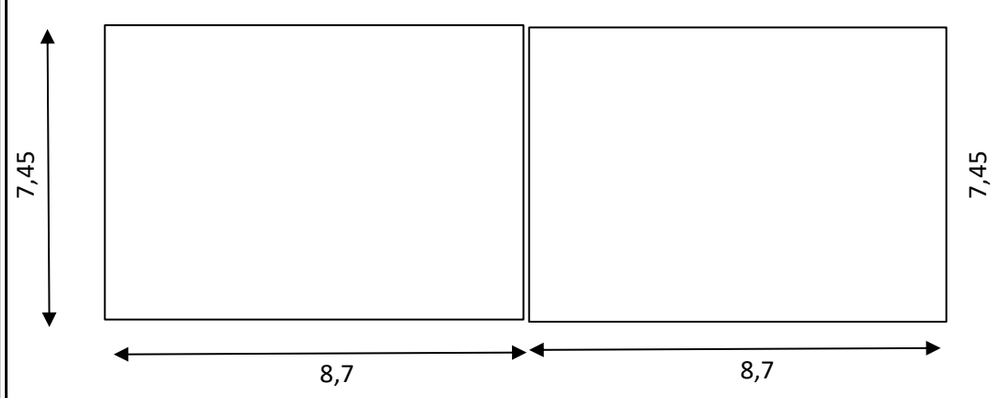



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.29	M2	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ALTO	ANCHO	CANT-BATERIA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
EDIFICIO 8 - AULAS PREESCOLAR	1,45	5,00		2,00	14,50
	0,60	4,30		2,00	5,16
PASAN:				**SUBTOTAL**	19,66
				TOTAL	19,66

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.15	M2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)


DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO HOMBRES 2 PISO	4,2	1,00	2,10	2	4,20
BAÑO HOMBRES 3 PISO	4,2	1,00	2,10	2	4,20
PASAN:				**SUBTOTAL**	8,40
				TOTAL	8,4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

Piso 2

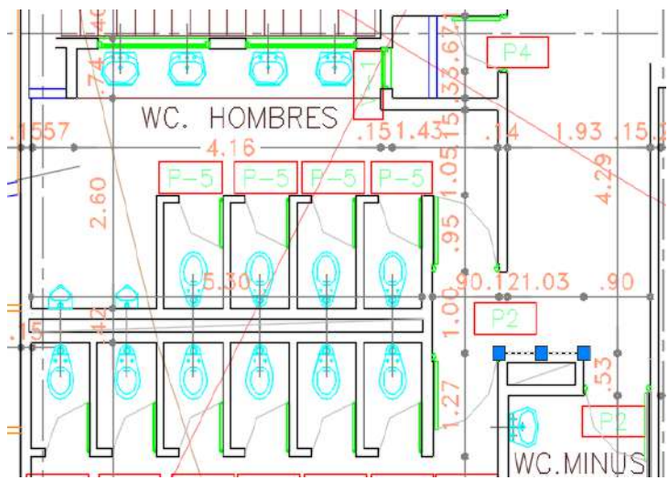

Piso 3

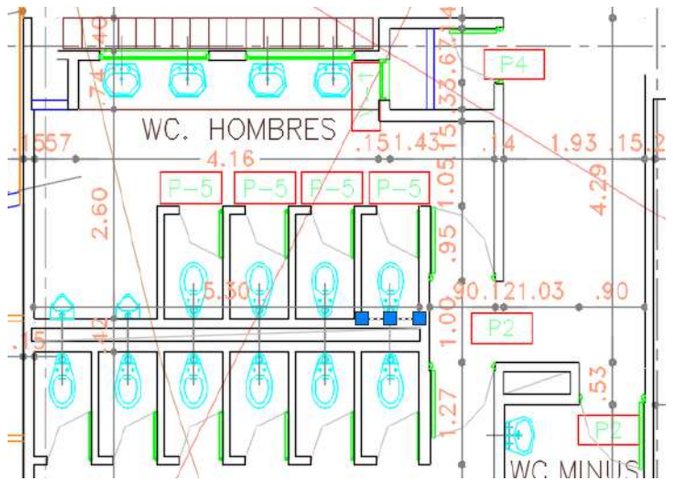

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.20	M2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO HOMBRES 3 PISO	2,1	1,00	2,10	1	2,10
PASAN:				**SUBTOTAL**	2,10
				TOTAL	2,1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





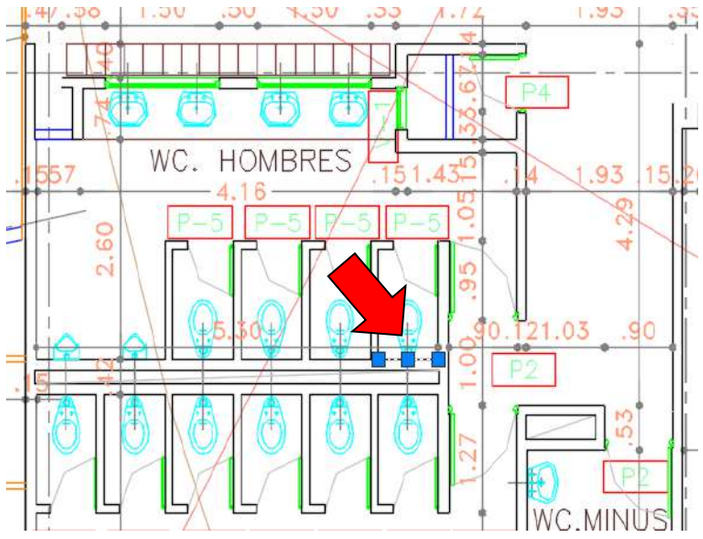

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.30	UN	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	piso	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO HOMBRES 3 PISO			1,00	3	1,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1,00
				TOTAL	1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

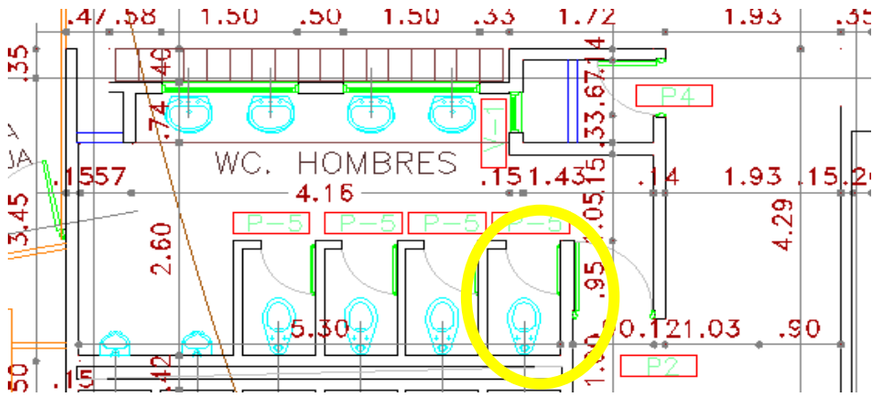



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.31	M	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS	9,00				9,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	9,00
				TOTAL	9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
3.1.10	M2	MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).


DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO HOMBRES 2 PISO	4,2	1,00	2,10	2	4,20
BAÑO HOMBRES 3 PISO	4,2	1,00	2,10	2	4,20
PASAN:				**SUBTOTAL**	8,40
				TOTAL	8,4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

Piso 2

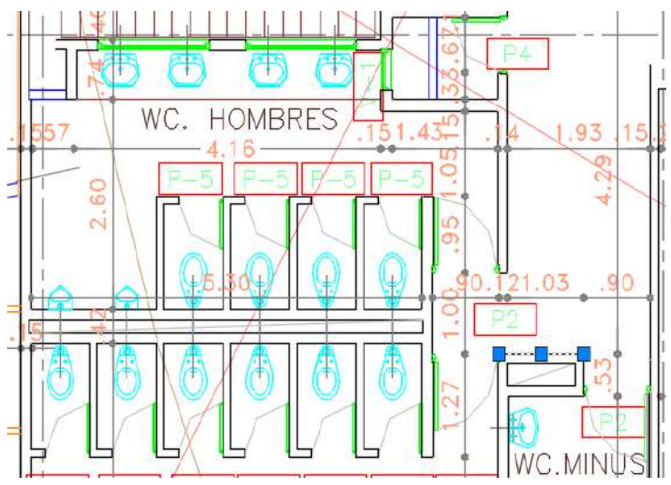

Piso 3

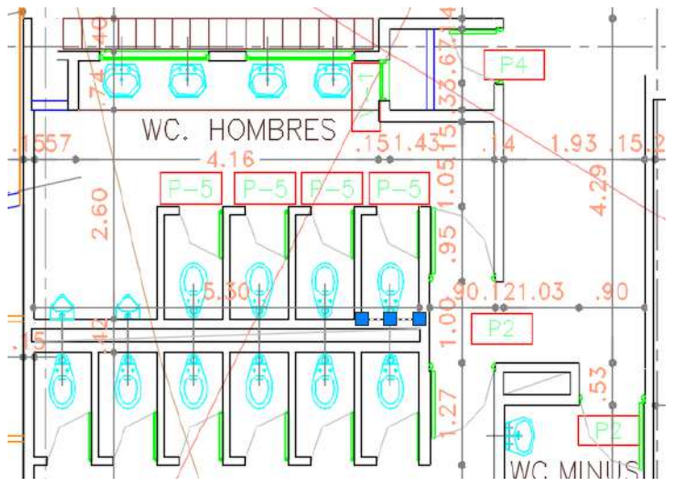

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.4	UN	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3"

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 2				1	1,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1,00
				TOTAL	1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

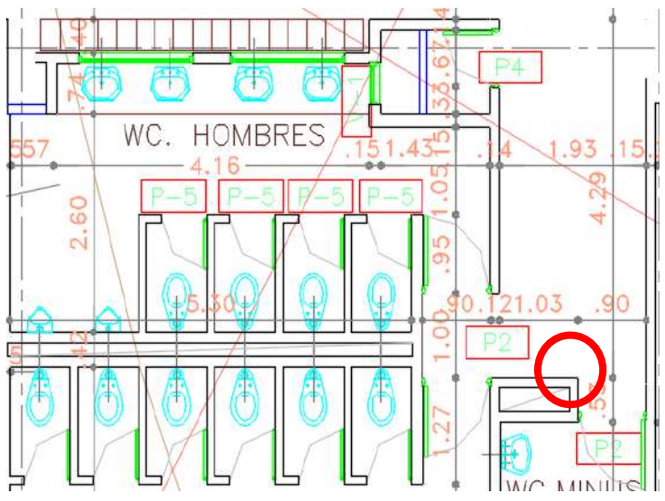



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.7	M	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 2			1,50		1,50
BATERIAS SANITARIAS PISO 3			1,50		1,50
PASAN:				**SUBTOTAL**	3,00
				TOTAL	3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

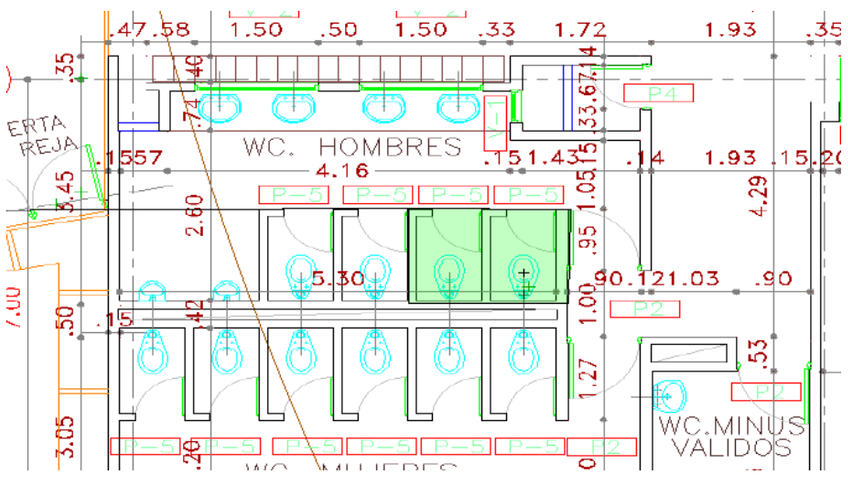



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.8	UN	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2"

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 2				10	10,00
BATERIAS SANITARIAS PISO 3				7	7,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	17,00
				TOTAL	17

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

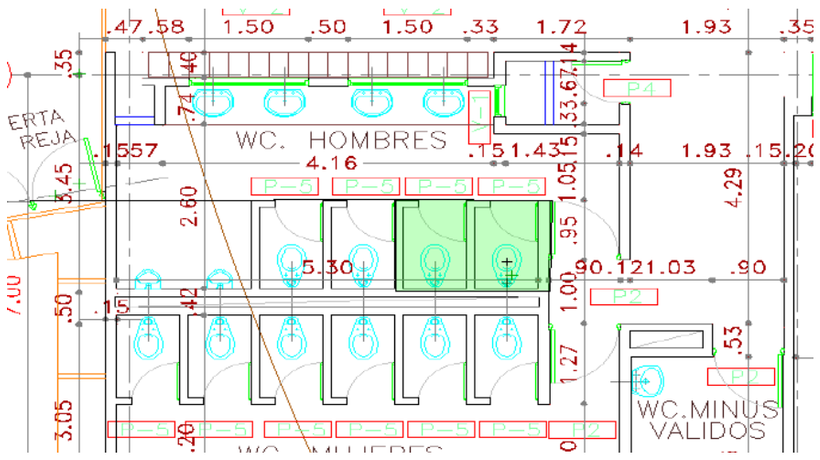

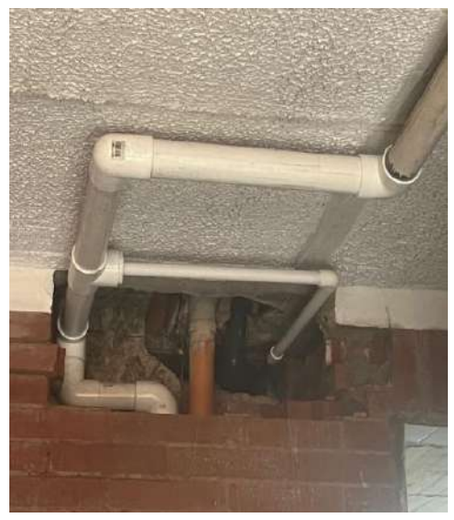

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.13	M	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 2			1,5		1,50
BATERIAS SANITARIAS PISO 3			1,5		1,50
PASAN:				**SUBTOTAL**	3,00
				TOTAL	3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

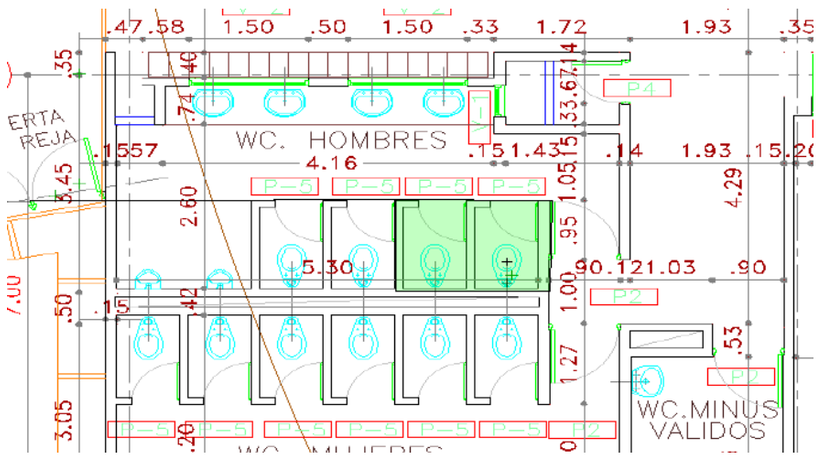

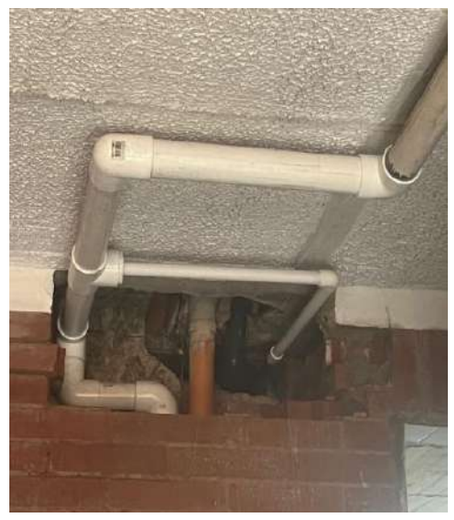

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.14	UN	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1"

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 2				2	2,00
BATERIAS SANITARIAS PISO 3				3	3,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	5,00
				TOTAL	5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

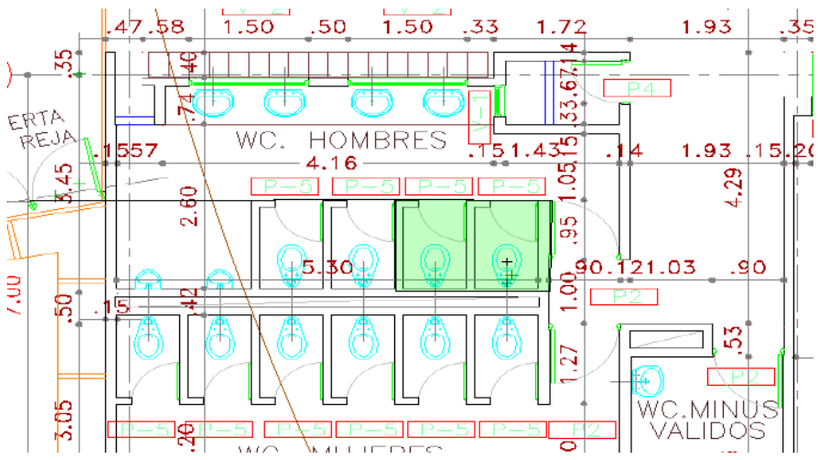

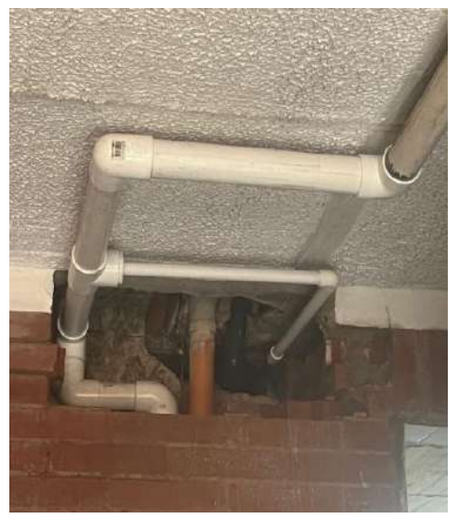

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.15	M	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 2			1,5		1,50
BATERIAS SANITARIAS PISO 3			1,5		1,50
PASAN:				**SUBTOTAL**	3,00
				TOTAL	3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

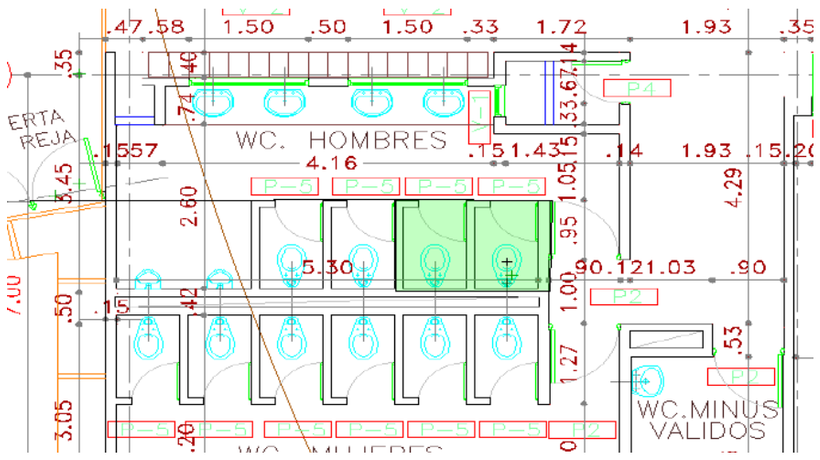

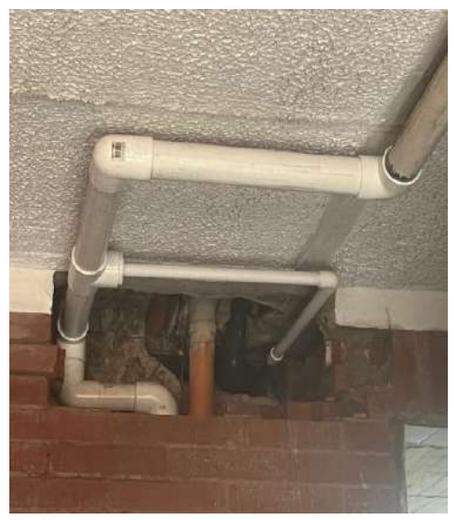

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.16	UN	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3/4'

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 2				3	3,00
BATERIAS SANITARIAS PISO 3				3	3,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	6,00
				TOTAL	6

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

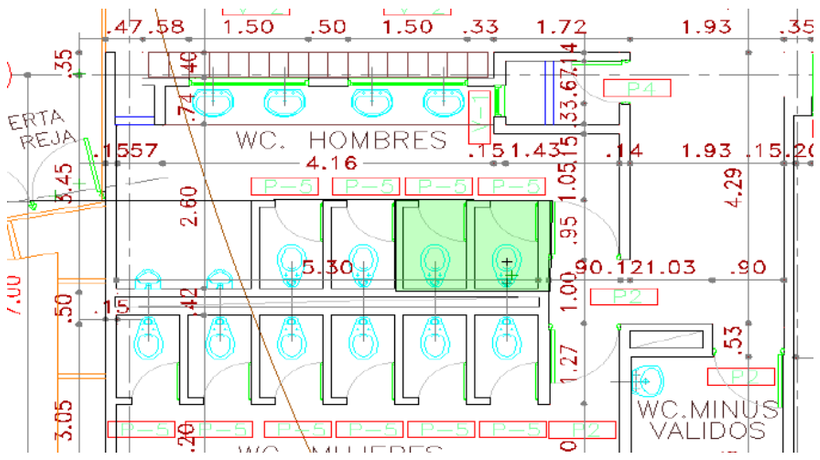

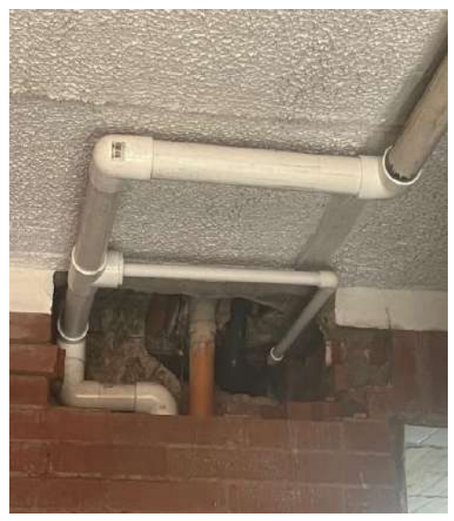

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.11.21	M	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
BATERIAS DE BAÑOS	PRIMER PISO	50,00				50,00
	SEGUNDO PISO	50,00				50,00
	TERCER PISO	60,00				60,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					**SUBTOTAL**	160,00
					TOTAL	160,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

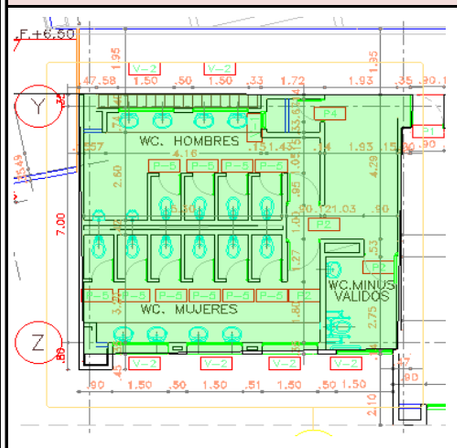



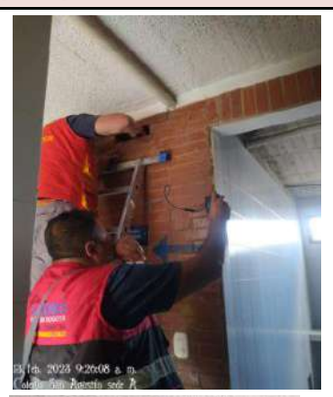







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
8.1.4	M2	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO HOMBRES 2 PISO					
BAÑO HOMBRES 3 PISO	2,1	1,00	2,10	1	2,10
PASAN:				**SUBTOTAL**	2,10
				TOTAL	2,1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



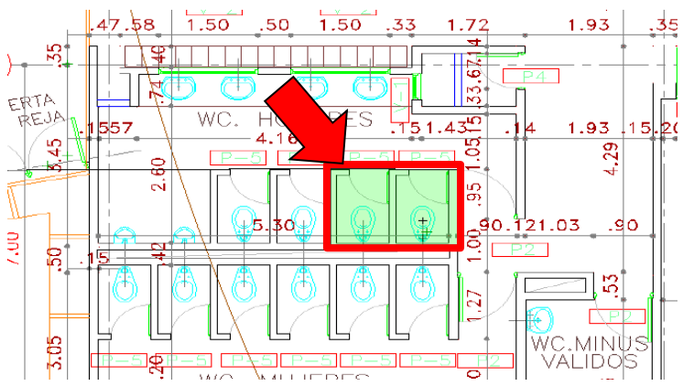

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.1.1	M2	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO HOMBRES 2 PISO					
BAÑO HOMBRES 3 PISO		1,00	2,10	1	2,10
PASAN:				**SUBTOTAL**	2,10
				TOTAL	2,1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





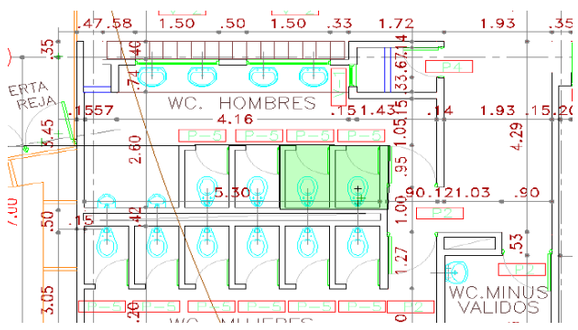

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**20**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.1	M2	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	AREA	TOTAL
EDIFICACIONES						
BATERIAS DE BAÑOS	PRIMER PISO	8,89	8,15	72,45	1	72,45
	SEGUNDO PISO	8,89	8,15	72,45	1	72,45
	TERCER PISO	8,89	8,15	72,45	1	72,45
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					**SUBTOTAL**	217,36
					TOTAL	217,36

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

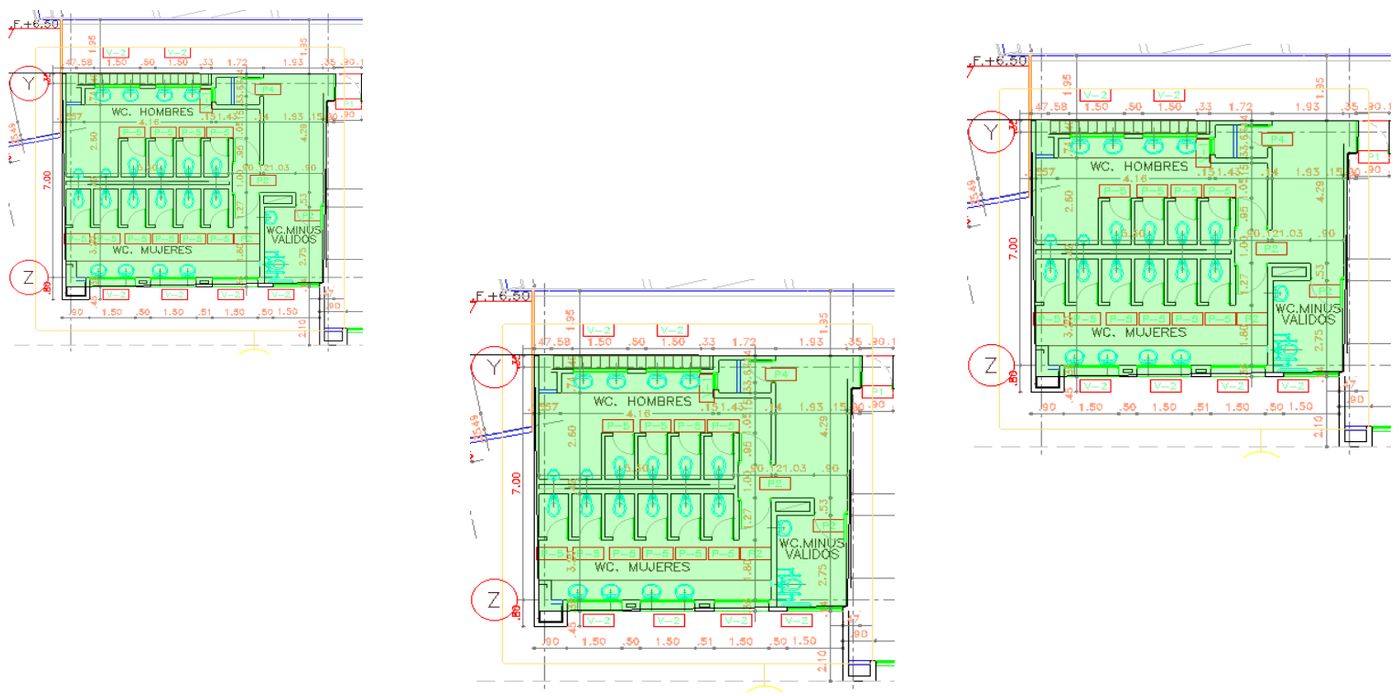

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ

DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN

DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Certificado de pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Fecha: Bogotá, 24 de febrero de 2023.

REF.: CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 CUYO OBJETO ES LA "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

Asunto: Certificación de pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales

Yo, LUIS ALBEIRO BUITRAGO RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.076.659.875 de UBATE y tarjeta profesional de contador No. 283741-T en mi condición de REVISOR FISCAL de la firma **CONSORCIO MIA GP** identificado con Nit 901.634.703-9, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente misiva, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Nota: para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1670 de 2007.



CONSORCIO MIA GP
NIT. 901.634.703-9
LUIS ALBEIRO BUITRAGO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
No. de identificación: 1.076.659.875 de Ubaté
No. de Tarjeta profesional de contador: 283741-T


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.076.659.875
BUITRAGO RODRIGUEZ
LUIS ALBEIRO


FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1993
UBATE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
04-OCT-2011 UBATE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
INDICE DERECHO
P-1530400-01154488-M-1076659875-20200827
0071584792A 1
9912897439


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
283741-T
LUIS ALBEIRO
BUITRAGO RODRIGUEZ
C.C. 1076659875
RES. INSCRIPCION 1874 DEL 22/07/2021
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
306297
325080

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 7 C B 5 C 7 E 1 D 6 0 1 A E C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS ALBEIRO BUI TRAGO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1076659875 de VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 283741-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

GRUPO EMPRESARIAL

M I A

Certificado de pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Fecha: Bogotá, 24 de febrero de 2023.

REF.: CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 CUYO OBJETO ES LA "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

Asunto: Certificación de pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales

Yo, MONICA PATRICIA BARRIOS ARDILA, identificada con cedula de ciudadanía No. 39.674.413 de SOACHA y tarjeta profesional de contador No. 256856-T, en mi condición de REVISOR FISCAL de la firma MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS, con NIT 901.415.289-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente misiva, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1670 de 2007.

MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT 901.415.289-1
MONICA PATRICIA BARRIOS ARDILA
Revisor Fiscal:
No. de identificación: 39.674.413 de SOACHA
No. de Tarjeta profesional de contador: 256856-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

256856-T

MONICA PATRICIA
BARRIOS ARDILA
C.C. 39674413
RES. INSCRIPCION 211 DEL 22/04/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

266675 286496



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.674.413
BARRIOS ARDILA
APELLIDOS
MONICA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-FEB-1978
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-JUL-1996 SOACHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00788108-F-0039674413-20160212 0048326039A 2 1313768171

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3552990E99120E07

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MONICA PATRICIA BARRIOS ARDILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39674413 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 256856-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901415289-1	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	CARRERA 9 85 32 OFC1803	3906417	miagrupoempresarial@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65293273	$918.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	101.000				101.000	0	0	101.000			1.010	101.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	69.600	0	0	69.600	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
34.800	0	0	34.800	2
ICBF				
52.200	0	0	52.200	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	290.000	290.000
Pensión	2	371.200	371.200
Riesgos Laborales	1	101.000	101.000
CCF	1	69.600	69.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	52.200	52.200
MEN	0	0	0
SENA	1	34.800	34.800
TOTALES	8	918.800	918.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901415289-1	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS		CARRERA 9 85 32 OFC1803	3906417	miagrupoempresarial@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65293273	$918.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	14252818	AGUDELO PRIETO ROLANDO	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	34.800	1.160.000	17.400	26.100	0	0
2	CC	32206427	MURILLO DIAZ LUCY DEL CARMEN	1	0			N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	34.800	1.160.000	17.400	26.100	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificado de pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Fecha: Bogotá, 24 de febrero de 2023.

REF.: CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 CUYO OBJETO ES LA "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

Asunto: Certificación de pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales

Yo, CAROLINA HERNANDEZ SOTO, identificado con cedula de ciudadanía No. 52.496.397 de BOGOTÁ y tarjeta profesional de contador No. 122321-T en mi condición de REVISOR FISCAL de la firma GP CARIBE SAS, con NIT 901 110 703-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente misiva, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Nota: para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1670 de 2007.



_____

GP CARIBE SAS
NIT. 901.110.703-1
CAROLINA HERNANDEZ SOTO
Revisor Fiscal
No. de identificación: 52.496.397 DE BOGOTÁ
No. de Tarjeta profesional de contador: 122321-T



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122321-T

CAROLINA
HERNANDEZ SOTO
C.C. 52496397
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132397



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.496.397

CAROLINA
APELLIDOS

HERNANDEZ SOTO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1979
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

20-ENE-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1500110-45148142-F-0052496397-20060622 0335506173N 02 202354530

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AE101470C0A64CE2E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROLINA HERNANDEZ SOTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52496397 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122321-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901110703-1	GP CARIBE SAS	CARRERA 43B 85 76	4457554	agoplasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65288854	$1.207.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	4	1.200	0	251.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	145.000	0		0		0	4	700	0	145.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	4	1.600	0	321.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	4	900	0	186.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	16.600				16.600	4	100	16.700			166	16.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	80.000	4	400	80.400	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	46.400	4	300	46.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
63.200	4	300	63.500	2
ICBF				
94.800	4	500	95.300	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	395.000	396.900
Pensión	2	505.600	508.100
Riesgos Laborales	1	16.600	16.700
CCF	2	126.400	127.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	94.800	95.300
MEN	0	0	0
SENA	1	63.200	63.500
TOTALES	9	1.201.600	1.207.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901110703-1	GP CARIBE SAS		CARRERA 43B 85 76	4457554	agoplasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65288854	$1.207.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13459838	GOMEZ LOPEZ JESUS GUILLERMO	1	0			N																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF07	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
2	CC	4235319	BUITRAGO BUITRAGO LUIS NAZARIO	1	0			N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1065577261	CARLOS ALFONSO CUJIA MANJARREZ	Calle 152D # 103 07	6018078076	ingcujia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	I	02/02/2023	65230672	$330.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	330.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1065577261	CARLOS ALFONSO CUJIA MANJARREZ		Calle 152D # 103 07	6018078076	ingcujia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	I	02/02/2023	65230672	$330.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1065577261	CUJIA MANJARREZ CARLOS ALFONSO	3	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1065881660	HUGO GUILLERMO PEREZ JIMENEZ	CALLE 20 N 32A 39	5650878	guillermoperez2590@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	I	01/02/2023	65147326	$353.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	23.200	0	0	23.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	23.200	23.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	353.800	353.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1065881660	HUGO GUILLERMO PEREZ JIMENEZ	CALLE 20 N 32A 39	5650878	guillermoperez2590@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	I	01/02/2023	65147326	$353.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1065881660	PEREZ JIMENEZ HUGO GUILLERMO	3	0			N																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000		0		0	CCF24	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79715893	LEONARDO MAURICIO RODRIGUEZ MUÑOZ	CALLE 13 N. 54 - 34	3192671554	zaitania@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	20/02/2023	65479357	$330.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	330.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79715893	LEONARDO MAURICIO RODRIGUEZ MUÑOZ		CALLE 13 N. 54 - 34	3192671554	zaitania@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	20/02/2023	65479357	$330.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79715893	RODRIGUEZ MUÑOZ LEONARDO MAURICIO	3	0			N																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085254230	TERESITA DEL PILAR ARGOTY CEPEDA	Calle 16 No 4 - 40	3174161601	tepiarce@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	I	02/02/2023	65033830	$570.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	570.000	570.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085254230	TERESITA DEL PILAR ARGOTY CEPEDA		Calle 16 No 4 - 40	3174161601	tepiarce@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	I	02/02/2023	65033830	$570.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1085254230	ARGOTY CEPEDA TERESITA DEL PILAR	3	0			N																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	250.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
CC	52393579	EUGENIA DEL PILAR ROJAS PUERTO	QUINTAS DE SAN FERNANDO MZ A CS 10	8671137	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
U	I	PRINCIPAL	PPAL	META	VILLAVICENCIO

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
1	2023	1	2023	I	17 01 2023	8364846675	No	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	1	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia
1	CC 52393579	ROJAS PUERTO EUGENIA DEL PILAR	3	0			No	001	50																30	30	EPS005	$1,160,000	12.50%	$145,000	230201	$1,160,000	16.00%	$185,600	$0	$0
																														$145,000				$185,600	$0	$0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018483507		CRISTANCHO BOHADA JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 169B # 88 - 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6923361	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1945792207	9446574098	I	2023/03/02	2023/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$430,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,484,000**	**$237,500**			**$1,484,000**	**$185,500**			**$0**	**$0**			**$1,484,000**		**$7,800**		**$0**	**$0**		**$430,800**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,484,000**	**$237,500**			**$1,484,000**	**$185,500**			**$0**	**$0**			**$1,484,000**		**$7,800**		**$0**	**$0**		**$430,800**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					**$1,484,000**	**$237,500**			**$1,484,000**	**$185,500**			**$0**	**$0**			**$1,484,000**		**$7,800**		**$0**	**$0**		**$430,800**
1	CC	1018483507	CRISTANCHO JUAN																23030 1	30	$1,484,000	$237,500	EPS001	30	$1,484,000	$185,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,484,000	0.522%	$7,800	0	$0	$0	No	$430,800
Total	**Afiliados(1)**																				$1,484,000	$237,500			$1,484,000	$185,500			$0	$0			$1,484,000		$7,800		$0	$0		$430,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018483507		CRISTANCHO BOHADA JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 169B # 88 - 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6923361	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1945792207	9446574098	I	2023/03/02	2023/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$430,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,500	$0	$0	$237,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$237,500	$0	$0	$237,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,800	$0	$0	$7,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,800	$0	$0	$7,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,500	$0	$0	$185,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$185,500	$0	$0	$185,500
TOTAL				**1**	**$430,800**	**$0**	**$0**	**$430,800**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1109297015	0	ROBINSON DAMIAN LEON VILLEGAS	I	1	SINARP - SINARP	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	KR 29 B NO 17 77		3135589730			RODALEVI@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-01	25410617	I	2023-02-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	333.400	2.800	NEQUI

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	25410617	2023-02-06	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 1109297015	LEON VILLEGAS ROBINSON DAMIAN	1.000.000																	0			30	30	0	0	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	145.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	330.600	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1109297015	0	ROBINSON DAMIAN LEON VILLEGAS	I	1	SINARP - SINARP	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	KR 29 B NO 17 77		3135589730			RODALEVI@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-01	25410617	I	2023-02-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	333.400	2.800	NEQUI

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	25410617		Pagada

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	1.600	0	187.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	185.600	0	1.600	0	187.200
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	1.200	0	146.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	145.000	0	1.200	0	146.200
Gran Total					330.600	0	2.800	0	333.400

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 1109297015	LEON VILLEGAS ROBINSON DAMIAN	1.000.000																	0			30	30	0	0	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	145.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	330.600	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1109297015	0	ROBINSON DAMIAN LEON VILLEGAS	I	1	SINARP - SINARP	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	KR 29 B NO 17 77		3135589730			RODALEVI@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-01	25410617	I	2023-02-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	333.400	2.800	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	25410617		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	1.600	0	187.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	185.600	0	1.600	0	187.200
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	1.200	0	146.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	145.000	0	1.200	0	146.200
Gran Total					330.600	0	2.800	0	333.400

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C
Secretaria
EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO INFORMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS

Articulo 6º, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

RECIBIDO POR:							
Hora		**Fecha**				**Folios**	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA			Otro, Cuál?				No.	CO1.PCCNTR.4077645					Fecha:	18	10	2022		
Contratista	CONSORCIO MIA GP							NIT	X	C.C.		No.	901.634.703-9						
Dirección :	CR 8 12 21 MN							Teléfonos	3133876020										
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente					NIT		C.C.		No.							
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC			Valor Aporte			Donde realiza el aporte a Pensión					NIT No:						
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.													Banco						

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	1	5	7	0	6	9	9	9	6	4	8	4				Banco	BANCO DAVIVIENDA		Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria del Contratista

Responsables de IVA		Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos			Apoderado		Aplicar a todo el valor neto del giro:		Aplicar valor parcial												
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?			Valor parcial a aplicar														
Beneficiario									NIT		C.C.		No.										
Cuenta Bancaria																Banco			Ahorros		Corriente		

Firma Contratista

Fecha	24	2	2023

Al presente formato se le debe anexar certificación bancaria.

La certificación bancaria deberá corresponder al contratista y/o beneficiario del pago, no se pueden realizar pagos a cuentas de terceros.

El presente formato y sus soportes deberan ser archivados por el interventor de la SED o funcionario responsable de la SED, con toda la documentación del Contratista

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14895963172

(415)7707212489984(8020) 0000014895963172

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 4 7 0 3	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO MIA GP

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 8 12 21 MN

42. Correo electrónico gpcaribe@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 3 8 7 6 0 2 0	6 0 1 3 9 0 6 4 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 0 7 2 5	7 1 1 2	2 0 2 2 0 7 2 5			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 14 / 08 : 43: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LUZARDO VILLAMIZAR MATEO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895963172

(415)7707212489984(8020) **0000014895963172**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 4 7 0 3	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 7 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 7 2 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 7 2 5	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 9 1 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895963172

(415)7707212489984(8020) **0000014895963172**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 4 7 0 3	9	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 7 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 0 7 9 1 7 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LUZARDO	VILLAMIZAR	MATEO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 7 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 8 3 1 8 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	AYCARDI	NATALIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895963172

(415)7707212489984(8020) **0000014895963172**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 4 7 0 3	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 1 5 2 8 9	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 2 0 7 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 1 0 7 0 3	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GP CARIBE S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 2 0 7 2 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO MIA GP
NIT 901.634.703-9
CRA 8 12 21
Tel: (601) 3906417
Bogotá - Colombia
miagrupoempresarial@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. MGP 1

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3385590
Dirección	Carrera 30 Nº 25-90 P 1 OF CORRESPONDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/04/2023, 11:02
Expedición	05/04/2023, 11:06
Vencimiento	05/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA No 01 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 20 DE ENERO DE 2023 HASTA 19 DE FEBRERO DE 2023 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	1.00	203,058,871.00	0.00	203,058,871.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos tres millones cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y un pesos m/cte

Total Bruto	203,058,871.00
Total a Pagar	**203,058,871.00**

Condiciones de Pago:

Transferencia	$	203,058,871.00

Observaciones:
El AIU del contrato es: A=21,69% I=1,50% U=5,00%
El ajuste al peso es +0,19

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044703178 aprobado en 20230220 prefijo MGP desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 393755e867487a6a715e9aca0074f8574f425a008eb008d21aad302f7d4a1f3107ed607964b5f8baee55dda5e9b05a67

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764044703178

(415)7707212489984(8020) 001876404470317 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 3 4 7 0 3	9				

11. Razón social
CONSORCIO MIA GP

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 8 12 21 MN

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-02-20 / 12:26:10 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres LUZARDO VILLAMIZAR MATEO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1020791796 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO MIA GP

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-02-20/12:26:10

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764044703178

(415)7707212489984(8020) 001876404470317 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 3 4 7 0 3	9				

11. Razón social
CONSORCIO MIA GP

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO MIA GP CR 8 12 21 MN	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	MGP	1	200	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 03/02/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO MIA GP** con NIT **901.634.703-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 157069996484

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 1

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645 de 2022.

Correspondiente al periodo: 20 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 19 DE FEBRERO DE 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de febrero del 2023, se reunieron las siguientes personas: EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL, identificado con cedula No. 79.553.539 en su condición de Representante Legal de CONSORCIO TIG con NIT. 901.649.890-3 en calidad de Interventor, y MATEO LUZARDO VILLAMIZAR, identificado con cedula No. 1.020.791.796 de Bogotá, en su condición de Representante Legal del CONSORCIO MIA GP, con NIT. 901.634.703-9 en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.*
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	($11.941.262.150,00) ONCE NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE.
FORMA DE PAGO:	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos ~~Colom~~bianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad. Sin embargo, si durante la ejecución del contrato se llegare a presentar la necesidad de ejecutar actividades de obra diferentes a las inicialmente cuantificadas en el Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial, éstas serán canceladas por la SED, tal como se describe en la FORMA DE PAGO, establecidas para los contratos resultantes del presente proceso.

PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 1, el cual corresponde a un valor de ($203.058.871,00) DOSCIENTOS TRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 1.7%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



CONTRATISTA
MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante Legal
CONSORCIO MIA GP

INTERVENTOR
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Representante Legal
CONSORCIO TIG

Bogotá D.C., 5 de abril de 2023

2023_RUU_MGP_119

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Acta de Pago Parcial No 2 - Subsanada

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO MIA GP realiza la entrega de la siguiente documentación del Acta de Pago Parcial No 2 correspondiente al periodo del 20 de febrero de 2023 al 19 de marzo de 2023:

- Acta parcial en Excel y PDF
- Memorias de Calculo PDF
- Aportes parafiscales
- FURC - hoja información de pagos Excel y PDF
- RUT CONSORCIO MIA GP
- Pre-factura No MGP-02
- Resolución de facturación DIAN
- Certificación Bancaria
- Acta de autorización de pagos

Los mencionados documentos tienen la subsanación de las observaciones recibidas por la SED para su revisión y aprobación.

Agradecemos la atención,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Lo enunciado
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 2

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 20 DE FEBRERO DE 2023 HASTA 19 DE MARZO DE 2023

CONTRATISTA : CONSORCIO MIA GP

DIRECCION : CARRERA 8 No 12 - 21 MN

C.C. ó NIT : 901.634.703-9

TELEFONO : 3.133.876.020

INTERVENTOR : CONSORCIO TIG

DIRECCION : CARRERA 47A No 93-41 BARRIO LA CASTELLANA

C.C. ó NIT : 901.649.890-3

TELEFONO : 311 2004626

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

ESTABLECIMIENTOS :

LOCALIZACION :

VR. INICIAL : $11.941.262.150,00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $11.941.262.150,00

PLAZO INICIAL : 11 MESES

FECHA INICIACION : 20 de enero de 2023

FECHA TERMINAC.INICIAL : 19 de diciembre de 2023

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 11 MESES

FECHA FINAL : 19 de diciembre de 2023

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2232	8-jun-22	4804	18-oct-22	$ 11.941.262.150,00	$ 11.941.262.150,00	$ 203.058.871,00	$ 11.738.203.279,00
					$ 11.738.203.279,00	$ 1.278.337.626,00	$ 10.459.865.653,00
				$ 11.941.262.150,00		$ 1.481.396.497,00	

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 1.278.337.626,00** **SON: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE.**

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
I	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	GL	1,00	$ 11.941.262.150,00	$ 11.941.262.150,00							
	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS											
	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.570,00		40,00	$ 1.422.800,00	55,00	$ 1.956.350,00	95,00	$ 3.379.150,00	
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA	M2		$ 29.215,00		373,98	$ 10.925.825,70	178,50	$ 5.214.877,50	552,48	$ 16.140.703,20	
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2		$ 22.764,00		24,49	$ 557.490,36			24,49	$ 557.490,36	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 8.634,00		10,00	$ 86.340,00			10,00	$ 86.340,00	
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M		$ 8.921,00				80,00	$ 713.680,00	80,00	$ 713.680,00	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.062,00		10,00	$ 50.620,00	11,00	$ 55.682,00	21,00	$ 106.302,00	
1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 16.194,00		52,00	$ 842.088,00			52,00	$ 842.088,00	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 16.242,00		656,82	$ 10.668.070,44			656,82	$ 10.668.070,44	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 144.994,00		4,00	$ 579.976,00			4,00	$ 579.976,00	
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 42.467,00		64,65	$ 2.745.491,55			64,65	$ 2.745.491,55	
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M		$ 18.061,00		133,95	$ 2.419.270,95			133,95	$ 2.419.270,95	
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 194.999,00		10,00	$ 1.949.990,00			10,00	$ 1.949.990,00	
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 17.773,00		77,48	$ 1.377.052,04			77,48	$ 1.377.052,04	
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											

13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2		$ 22.043,00		9,12	$ 201.032,16			9,12	$ 201.032,16	
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 23.886,00		629,43	$ 15.034.564,98			629,43	$ 15.034.564,98	
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 46.709,00		99,80	$ 4.661.558,20			99,80	$ 4.661.558,20	
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 250.250,00		1.288,24	$ 322.382.060,00	178,50	$ 44.669.625,00	1.466,74	$ 367.051.685,00	
17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M		$ 104.586,00		73,22	$ 7.657.786,92			73,22	$ 7.657.786,92	
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7.708,00		763,08	$ 5.881.820,64			763,08	$ 5.881.820,64	
	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.570,00		30,00	$ 1.067.100,00			30,00	$ 1.067.100,00	
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 55.867,00		115,03	$ 6.426.381,01			115,03	$ 6.426.381,01	
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.664,00		33,09	$ 1.014.671,76	112,73	$ 3.456.752,72	145,82	$ 4.471.424,48	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.351,00		16,83	$ 443.487,33			16,83	$ 443.487,33	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA	M2		$ 29.215,00		466,40	$ 13.625.876,00			466,40	$ 13.625.876,00	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 8.634,00		51,00	$ 440.334,00			51,00	$ 440.334,00	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.062,00		18,00	$ 91.116,00			18,00	$ 91.116,00	
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.244,00		60,00	$ 1.214.640,00			60,00	$ 1.214.640,00	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 75.296,00		4,60	$ 346.361,60			4,60	$ 346.361,60	
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3		$ 174.350,00		4,15	$ 723.552,50			4,15	$ 723.552,50	
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 123.376,00		115,03	$ 14.191.941,28			115,03	$ 14.191.941,28	
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 8.711,00		344,10	$ 2.997.455,10			344,10	$ 2.997.455,10	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2		$ 44.020,00		148,12	$ 6.520.242,40			148,12	$ 6.520.242,40	
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 23.886,00		375,62	$ 8.972.059,32			375,62	$ 8.972.059,32	
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
17.1.8	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 136.173,00		100,50	$ 13.685.386,50			100,50	$ 13.685.386,50	
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 250.250,00		588,20	$ 147.197.050,00			588,20	$ 147.197.050,00	
	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.222,00		234,24	$ 754.721,28			234,24	$ 754.721,28	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.570,00				26,67	$ 948.651,90	26,67	$ 948.651,90	
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.664,00				42,64	$ 1.307.512,96	42,64	$ 1.307.512,96	

1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 24.791,00				20,48	$ 507.719,68	20,48	$ 507.719,68	
1.2.19	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 21.716,00		39,53	$ 858.433,48			39,53	$ 858.433,48	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 8.916,00				78,68	$ 701.510,88	78,68	$ 701.510,88	
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 14.008,00		13,00	$ 182.104,00			13,00	$ 182.104,00	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.351,00				10,00	$ 263.510,00	10,00	$ 263.510,00	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 14.890,00				24,00	$ 357.360,00	24,00	$ 357.360,00	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.215,00				307,90	$ 8.995.298,50	307,90	$ 8.995.298,50	
1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18.112,00		4,32	$ 78.243,84	0,90	$ 16.300,80	5,22	$ 94.544,64	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 8.634,00		22,00	$ 189.948,00			22,00	$ 189.948,00	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.062,00				18,00	$ 91.116,00	18,00	$ 91.116,00	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 4.193,00				48,00	$ 201.264,00	48,00	$ 201.264,00	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 16.242,00		1.352,82	$ 21.972.502,44	843,48	$ 13.699.802,16	2.196,30	$ 35.672.304,60	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 144.994,00		8,00	$ 1.159.952,00			8,00	$ 1.159.952,00	
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 144.482,00		24,00	$ 3.467.568,00			24,00	$ 3.467.568,00	
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 42.467,00		214,88	$ 9.125.308,96			214,88	$ 9.125.308,96	
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M		$ 18.061,00		214,88	$ 3.880.947,68			214,88	$ 3.880.947,68	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 266.905,00		46,00	$ 12.277.630,00			46,00	$ 12.277.630,00	
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 194.999,00		38,00	$ 7.409.962,00			38,00	$ 7.409.962,00	
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		$ 5.481,00		63,23	$ 346.563,63			63,23	$ 346.563,63	
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 11.811,00		126,46	$ 1.493.619,06			126,46	$ 1.493.619,06	
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 23.886,00		1.060,78	$ 25.337.791,08	910,70	$ 21.752.980,20	1.971,48	$ 47.090.771,29	
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 46.709,00		167,36	$ 7.817.218,24			167,36	$ 7.817.218,24	
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 250.250,00		610,70	$ 152.827.675,00	256,00	$ 64.064.000,00	866,70	$ 216.891.675,00	
17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M		$ 104.586,00		41,00	$ 4.288.026,00			41,00	$ 4.288.026,00	
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7.708,00								
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		$ 1.898,00				3.072,00	$ 5.830.656,00	3.072,00	$ 5.830.656,00	
20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG		$ 2.272,00				3.072,00	$ 6.979.584,00	3.072,00	$ 6.979.584,00	
20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG		$ 1.841,00		287,10	$ 528.551,10			287,10	$ 528.551,10	

	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II													
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	30.664,00				320,31	$	9.821.985,84	320,31	$	9.821.985,84	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	24.791,00				15,45	$	383.020,95	15,45	$	383.020,95	
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	14.008,00				57,98	$	812.183,84	57,98	$	812.183,84	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$	14.890,00				8,00	$	119.120,00	8,00	$	119.120,00	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	29.215,00	144,72	$	4.227.994,80				144,72	$	4.227.994,80	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$	8.634,00	60,00	$	518.040,00				60,00	$	518.040,00	
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M		$	8.921,00	110,00	$	981.310,00				110,00	$	981.310,00	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$	5.062,00	51,00	$	258.162,00	58,00	$	293.596,00	109,00	$	551.758,00	
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$	6.882,00	100,00	$	688.200,00				100,00	$	688.200,00	
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$	20.244,00	100,00	$	2.024.400,00				100,00	$	2.024.400,00	
1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$	16.194,00	60,00	$	971.640,00				60,00	$	971.640,00	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$	16.242,00	1.567,50	$	25.459.335,00				1.567,50	$	25.459.335,00	
	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A													
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$	35.570,00				27,40	$	974.618,00	27,40	$	974.618,00	
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	30.664,00				129,63	$	3.974.974,32	129,63	$	3.974.974,32	
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	14.008,00				19,66	$	275.397,28	19,66	$	275.397,28	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	29.215,00	140,76	$	4.112.303,40				140,76	$	4.112.303,40	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$	8.634,00	24,00	$	207.216,00				24,00	$	207.216,00	
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$	6.882,00	32,00	$	220.224,00				32,00	$	220.224,00	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$	16.242,00	1.687,20	$	27.403.502,40				1.687,20	$	27.403.502,40	
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$	623.348,00	16,32	$	10.173.039,36				16,32	$	10.173.039,36	
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$	23.886,00	140,60	$	3.358.371,60				140,60	$	3.358.371,60	
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$	46.709,00	49,00	$	2.288.741,00				49,00	$	2.288.741,00	
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$	250.250,00	140,76	$	35.225.190,00				140,76	$	35.225.190,00	
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		$	1.898,00	3.950,00	$	7.497.100,00				3.950,00	$	7.497.100,00	

	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES												
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.570,00		30,00	$ 1.067.100,00			30,00	$ 1.067.100,00		
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 8.916,00		18,00	$ 160.488,00			18,00	$ 160.488,00		
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.351,00		9,90	$ 260.874,90			9,90	$ 260.874,90		
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.3.1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2		$ 47.638,00		746,88	$ 35.579.869,44			746,88	$ 35.579.869,44		
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.4.5	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2		$ 10.072,00		191,26	$ 1.926.370,72			191,26	$ 1.926.370,72		
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 4.193,00		201,20	$ 843.631,60			201,20	$ 843.631,60		
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2		$ 58.194,00		51,16	$ 2.977.205,04			51,16	$ 2.977.205,04		
	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A												
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.222,00		510,08	$ 1.643.477,76			510,08	$ 1.643.477,76		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.570,00		8,95	$ 318.351,50			8,95	$ 318.351,50		
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14.008,00		48,00	$ 672.384,00			48,00	$ 672.384,00		
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.215,00		510,08	$ 14.901.987,20			510,08	$ 14.901.987,20		
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.062,00		20,00	$ 101.240,00			20,00	$ 101.240,00		
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA	M2		$ 623.348,00		48,00	$ 29.920.704,00			48,00	$ 29.920.704,00		
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 23.886,00		263,08	$ 6.283.928,88			263,08	$ 6.283.928,88		
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 250.250,00		511,09	$ 127.900.272,50			511,09	$ 127.900.272,50		
	COLEGIO LICEO FEMENINO												
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 66.944,00		36,19	$ 2.422.703,36			36,19	$ 2.422.703,36		
1.2.11	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.902,00		151,50	$ 2.560.653,00			151,50	$ 2.560.653,00		
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.664,00		197,31	$ 6.050.313,84			197,31	$ 6.050.313,84		
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 14.890,00		29,00	$ 431.810,00			29,00	$ 431.810,00		
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.887,00		20,00	$ 337.740,00			20,00	$ 337.740,00		
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.1.13	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO B600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 135.197,00		6,40	$ 865.260,80			6,40	$ 865.260,80		

	EMERGENCIAS												
	SAN AGUSTIN EMERGENCIA 1												
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 24.791,00				8,40	$ 208.244,40	8,40	$ 208.244,40		
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 8.916,00				2,10	$ 18.723,60	2,10	$ 18.723,60		
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 14.890,00				1,00	$ 14.890,00	1,00	$ 14.890,00		
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.887,00				9,00	$ 151.983,00	9,00	$ 151.983,00		
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
3.1.10	MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M2		$ 125.254,00				8,40	$ 1.052.133,60	8,40	$ 1.052.133,60		
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**												
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3"	UN		$ 66.903,00				1,00	$ 66.903,00	1,00	$ 66.903,00		
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 38.796,00				3,00	$ 116.388,00	3,00	$ 116.388,00		
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2"	UN		$ 19.077,00				17,00	$ 324.309,00	17,00	$ 324.309,00		
4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 16.553,00				3,00	$ 49.659,00	3,00	$ 49.659,00		
4.3.14	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1"	UN		$ 7.490,00				5,00	$ 37.450,00	5,00	$ 37.450,00		
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 14.651,00				3,00	$ 43.953,00	3,00	$ 43.953,00		
4.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN		$ 5.185,00				6,00	$ 31.110,00	6,00	$ 31.110,00		
4.11	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 3.818,00				160,00	$ 610.880,00	160,00	$ 610.880,00		
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		$ 70.077,00				2,10	$ 147.161,70	2,10	$ 147.161,70		
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 33.591,00				2,10	$ 70.541,10	2,10	$ 70.541,10		
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7.708,00				217,36	$ 1.675.410,88	217,36	$ 1.675.410,88		
	SAN AGUSTIN EMERGENCIA 2												
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 66.944,00	1,64	$ 109.788,16				1,64	$ 109.788,16		
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 24.791,00	1,20	$ 29.749,20				1,20	$ 29.749,20		
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.887,00	3,00	$ 50.661,00				3,00	$ 50.661,00		
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 104.075,00	0,66	$ 68.689,50				0,66	$ 68.689,50		
2.1.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 17.267,00	0,66	$ 11.396,22				0,66	$ 11.396,22		
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 123.376,00	1,64	$ 202.336,64				1,64	$ 202.336,64		
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
3.1.10	MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M2		$ 125.254,00	2,40	$ 300.609,60				2,40	$ 300.609,60		
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**												
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 38.796,00	3,00	$ 116.388,00				3,00	$ 116.388,00		
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2"	UN		$ 19.077,00	11,00	$ 209.847,00				11,00	$ 209.847,00		

4.11	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 3.818,00									
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2		$ 151.381,00		1,64	$ 248.264,84			1,64	$ 248.264,84		
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		$ 70.077,00		0,60	$ 42.046,20			0,60	$ 42.046,20		
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 33.591,00		0,60	$ 20.154,60			0,60	$ 20.154,60		
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7.708,00		24,94	$ 192.237,52			24,94	$ 192.237,52		
	SANTA LUCIA CAFAM												
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.2.19	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 21.716,00		110,04	$ 2.389.628,64			110,04	$ 2.389.628,64		
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20.991,00		60,52	$ 1.270.375,32			60,52	$ 1.270.375,32		
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 33.591,00		544,19	$ 18.279.886,29			544,19	$ 18.279.886,29		
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M		$ 15.323,00		110,04	$ 1.686.142,92			110,04	$ 1.686.142,92		
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 17.773,00		690,23	$ 12.267.457,79			690,23	$ 12.267.457,79		
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2		$ 58.194,00		220,08	$ 12.807.335,52			220,08	$ 12.807.335,52		
17.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2		$ 12.701,00		220,08	$ 2.795.236,08			220,08	$ 2.795.236,08		
COSTO DIRECTO CONTRATO					**$ 11.941.262.150,00**		**$ 1.278.337.625,67**		**$ 203.058.870,81**		**$ 1.481.396.496,49**	**12,4%**	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL	**$ 11.941.262.150,00**	**$ 1.278.337.625,67**	**$ 203.058.870,81**	**$ 1.481.396.496,48**	**12,4%**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )					
VALOR A PAGAR		**$ 1.278.337.625,67**	**$ 203.058.870,81**	**$ 1.481.396.496,48**	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA		**$ 0,33**	**$ 0,19**	**$ 0,52**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		**$ 1.278.337.626,00**	**$ 203.058.871,00**	**$ 1.481.396.497,00**	

SALDO DEL CONTRATO	$ 10.459.865.653,00	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

Mateo Luzardo V.

NOMBRE DE CONTRATISTA : **CONSORCIO MIA GP**
C.C. O NIT : 901.634.703-9
REP. LEGAL : MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
C.C. : C.C. 1.020.791.796 DE BOGOTA

NOMBRE DE INTERVENTORIA : **CONSORCIO TIG**
C.C. O NIT : 901.649.890-3
REP. LEGAL : EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
C.C. : 79.553.539

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.03	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
CORREDOR, ACCESO ORIENTACIÓN, ESCALERAS			40	1.00	40.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	40.00
				TOTAL	40.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÀLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					
PASILLO	27.436	3.61	7.6		27.436
ESCALERAS	7.22	3.61	2		7.22
OFICINA	24.486	3.71	6.6		24.486
AUDITORIO ALA 1	82.34	4.6	17.9		82.34
AUDITORIO ALA 2	232.5	15	15.5		232.5
PASAN:				SUBTOTAL	373.98
				TOTAL	373.98

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA











DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.34	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					
OFICINA ORIENTACION	24.486	3.71	6.6	1	24.486
PASAN:				SUBTOTAL	24.49
				TOTAL	24.49

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					0.00
ORIENTACION				4.00	4.00
AULA DEPORTES				4.00	4.00
ESCALERAS Y PASILLO				2.00	2.00
PASAN:				SUBTOTAL	10.00
				TOTAL	10.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					0.00
ORIENTACION				4.00	4.00
AULA DEPORTES				4.00	4.00
ESCALERAS Y PASILLO				2.00	2.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	10.00
				TOTAL	10.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.47	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
ORIENTACION			18	1.00	18.00
AULA DEPORTES			22	1.00	22.00
ESCALERAS Y PASILLO			12	1.00	12.00
PASAN:				SUBTOTAL	52.00
				TOTAL	52.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.05.02	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	KG	TOTAL
ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS					-
Aula profesores	-			227.50	227.50
Pasillo y escaleras				55.67	55.67
Orientación				73.64	73.64
auditorio				300.00	300.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	656.82
				TOTAL	656.82

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.05.02	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	LONGITUD	ANCHO	LARGO	PESO M/KG	CANTIDAD	TOTAL
AULA PROFESORES (Perfil tipo C 120*60*1,9mm, perimetralmente para evitar que se levante la teja)	17.00	60.00	12	3.06	2.00	104.04



Referencia	Sección Perfil			Espesores en milímetros			
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	3.0	2.5	2.0	1.5
				Peso Kg/m			
Perfil en C 100 x 50	100	50	15	5.06	4.22	3.38	2.53
Perfil en C 120 x 60	120	60	15	6.12	5.10	4.08	3.06
Perfil en C 150 x 50	150	50	17	6.31	5.26	4.21	3.16
Perfil en C ó Z 160 x 60	160	60	20	7.16	5.97	4.77	3.58
Perfil en C ó Z 203 x 67	203	67	19	8.43	7.03	5.62	4.21
Perfil en C ó Z 220 x 80	220	80	20	9.56	7.97	6.37	4.78
Perfil en C ó Z 254 x 67	254	67	18	9.56	7.97	6.37	4.78
Perfil en C ó Z 305 x 80	305	80	25	11.73	9.77	7.82	5.86
Perfil en C ó Z 355 x 110*	355	110	25	14.25	11.87	9.50	

Angulo de 2*3/16 aula profesores	17.00	2"	2"	3.63	2.00	123.46

Lados		Espesor		Peso Teórico
mm	pulg	mm	pulg	Kg/6m
19 x 19	3/4" x 3/4"	2.0	5/64"	3.582
		2.5	3/32"	4.416
		3.0	1/8"	5.226
25 x 25	1" x 1"	3.0	1/8"	7.143
		4.5	3/16"	10.358
		6.0	1/4"	13.304
30 x 30	1 1/4" x 1 1/4"	3.0	1/8"	9.018
		4.5	3/16"	13.215
		6.0	1/4"	17.144
38 x 38	1 1/2" x 1 1/2"	3.0	1/8"	10.983
		4.5	3/16"	16.072
		6.0	1/4"	20.894
50 x 50	2" x 2"	3.0	1/8"	14.733
		4.5	3/16"	21.787
		6.0	1/4"	28.483
		8.0	5/16"	35.002
		9.5	3/8"	41.966

Angulo de 2*3/16 pasillo y escaleras	3.61	2"	2"	3.63	2.00	26.22
PASILLO Y ESCALERAS (Perfil tipo C 120*60*2mm)	3.61	60	12	4.08	2.00	29.46
OFICINA ORIENTACION (Perfil tipo C 120*60*2mm)	3.61	60	12	4.08	5.00	73.64
PLATINAS OFICINA ORIENTACIÓN						
PASAN:				SUBTOTAL		356.82
				TOTAL		356.82

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.1	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
Aula profesores			1,00		1,00
orientacion			1,00		1,00
pasillo			1,00		1,00
escaleras			1,00		1,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	4,00
				TOTAL	4,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.50	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
Aula profesores			44,65		44,65
Orientación, pasillo y escaleras			20,00		20,00
					-
PASAN:				**SUBTOTAL**	64,65
				TOTAL	64,65

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.56	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
aula profesores			133,95		133,95
					-
PASAN:				**SUBTOTAL**	133,95
				TOTAL	133,95

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.80	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
Aula profesores	144,50	8,50	17,00	8,00	8,00
orientacion				2,00	2,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	10,00
				TOTAL	10,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.02.01	M2	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					
AULA PROFESORES					0
división ingreso: doble cara	7,448	1,96	3,8	2	14,896
					0
muros internos	12,6	4,2	3,0	2	25,2
	4,464	1,86	2,4	1	4,464
vigas	5,74	1,4	4,1	3	17,22
COLUMNAS	3,924	1,2	3,27	4	15,696
PASAN:				**SUBTOTAL**	77,48
				TOTAL	77,48

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.04.01	M2	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					
Edificio administrativos y profesores					
AULA PROFESORES	9,12	1,9	2,4	2	9,12
PASAN:				**SUBTOTAL**	9,12
				TOTAL	9,12

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.04.03	ML	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					
Edificio administrativos y profesores					
cerchas longitudinal			17	15	255
perfiles tipo c			17	6	102
angulos			17	4	68
pasillo y escaleras cerchas			3,61	18	64,98
aula deportes cerchas			4,1	12	49,2
oficina orientación perfil tipo c			3,61	15	54,15
pasillo y escalera perfil tipo c			3,61	6	21,66
pasillo y escalera angulos			3,61	4	14,44
PASAN:				**SUBTOTAL**	629,43
				TOTAL	629,43

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



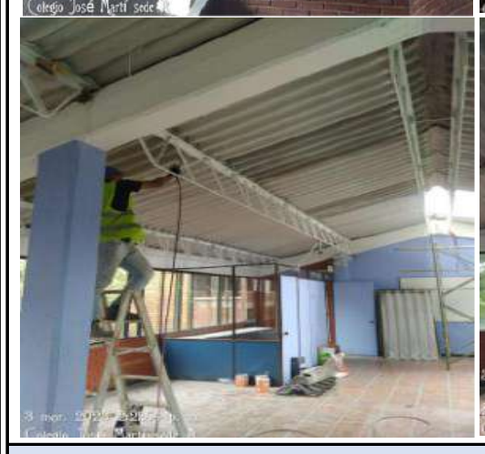

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.01	M	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
aula profesores			8,5	2,0	17,00
orientación			20	1,0	20,00
pasillo y escaleras			22	1,0	22,00
AUDITORIO			20,40	2,0	40,80
PASAN:				**SUBTOTAL**	99,80
				TOTAL	99,80

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					
Edificio aulas frente a administrativos		12	20,00	1	240
Alero adicional en area de sobrecubiertas		2,5	8,60	1	21,5
Edificio area sobre auditorio		15,3	4,60	1	70,38
Edificio area sobre cafeteria		22,7	16,20	1	367,74
Area de entrada escaleras por cafeteria a edificio		8,5	8,2	1	69,7
Area entre edificio administrativos y edificio aulas		4,5	6,8	1	30,6
SERIGRAFIA		8	14	1	112
COMEDOR		14,7	25,6	1	376,32
PASAN:				**SUBTOTAL**	1288,24
				TOTAL	1288,24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

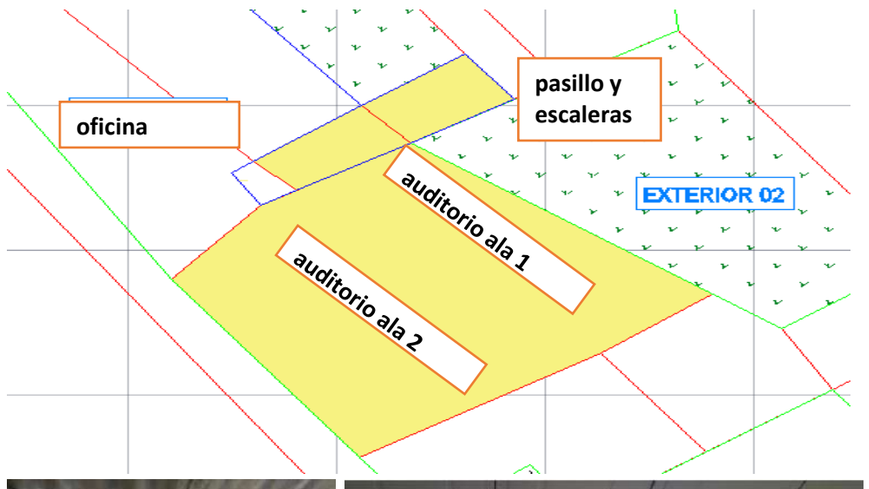









DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.30	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
AULA PROFESORES			17	2,0	34,00
PASILLO Y ESCALERAS			3,6	2,0	7,22
AUDITORIO			16	2,0	32,00
PASAN:				SUBTOTAL	73,22
				TOTAL	73,22

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

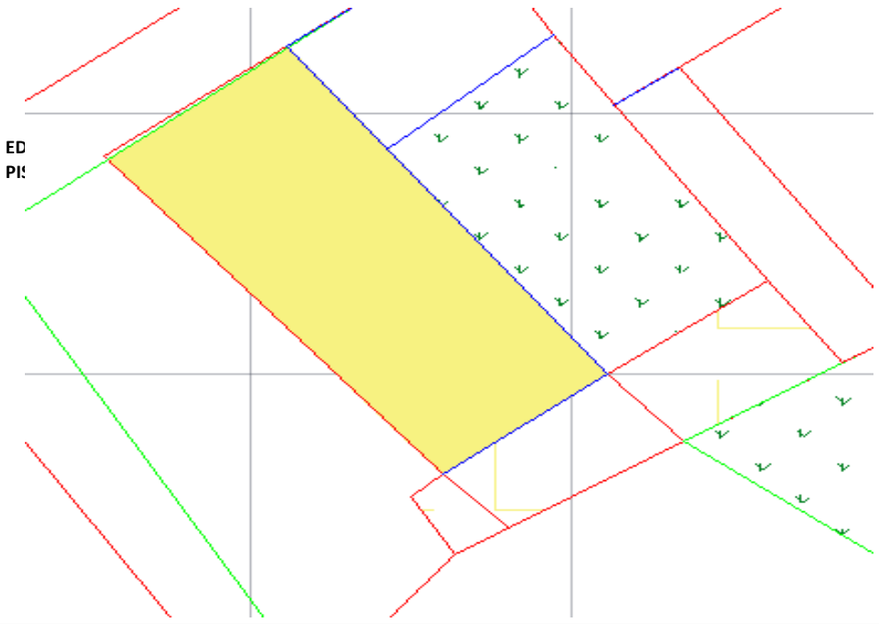



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.01.01	M2	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL	763,08				763,08

PASAN:		SUBTOTAL	763,08
		TOTAL	763,08

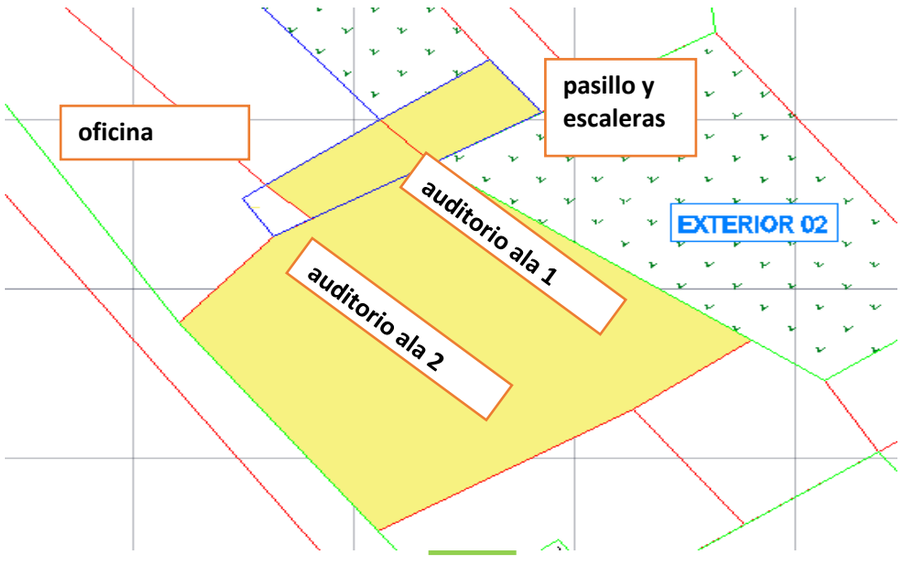

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.03	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
ACOPIO DE MATERIALES, ZONA DE RCD, AISLAMIENTO DE AREAS					30.00

OBSERVACION:

PASAN:	**SUBTOTAL**	30.00
	TOTAL	30

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

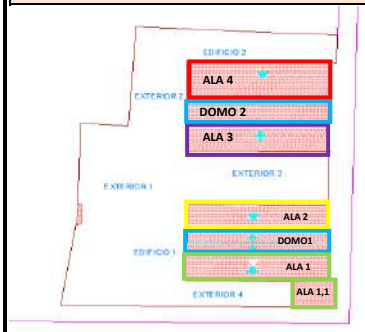



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.7	M2	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
AULA 32	57.46	8.22	6.99	1.00	57.46
CORREDOR 33	54.81	2.61	21.00	1.00	54.81
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	0.46	1.15	0.40	6.00	2.76
PASAN:				**SUBTOTAL**	115.03
				TOTAL	115.03

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



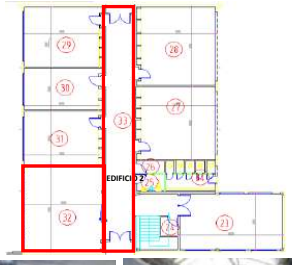







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
AULA 27	46.94	7.09	6.62	1.00	6.62
AULA 28	50.18	7.58	6.62	1.00	6.62
AULA 29	38.57	5.80	6.65	1.00	6.65
AULA 30	26.86	4.07	6.60	1.00	6.60
AULA 31	34.91	5.29	6.60	1.00	6.60
PASAN:				**SUBTOTAL**	33.09
				TOTAL	33.09

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

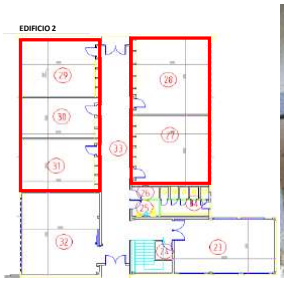







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.28	M2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
AULA 27	1.85	0.90	2.06	1.00	1.85
AULA 28	1.85	0.90	2.06	1.00	1.85
AULA 29	1.85	0.90	2.06	1.00	1.85
AULA 30	1.85	0.90	2.06	1.00	1.85
AULA 31	1.85	0.90	2.06	1.00	1.85
AULA 32	4.07	1.85	2.20	1.00	4.07
CUARTO ASEO 26	1.75	0.84	2.08	1.00	1.75
BAÑO 25	1.75	0.84	2.08	1.000	1.75
PASAN:				**SUBTOTAL**	16.83
				TOTAL	16.83

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

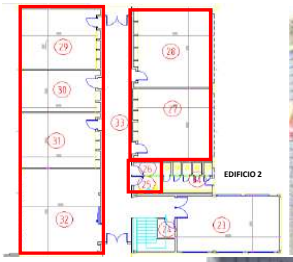







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 2	-				0.00
ALA 3	215.00	8.60	25.00		215.00
ALA 4	154.80	8.60	18.00		154.80
DOMO 2	96.60	4.02	24.03		96.60
PASAN:				**SUBTOTAL**	466.40
				TOTAL	466.40

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

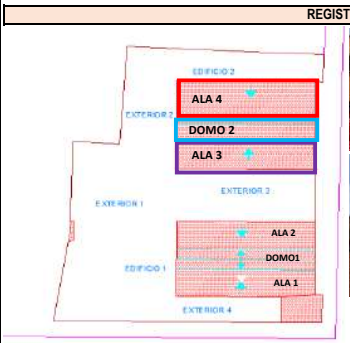



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
AULA 27				6.00	6.00
AULA 28				7.00	7.00
AULA 29				6.00	6.00
AULA 30				6.00	6.00
AULA 31				6.00	6.00
AULA 32				7.00	7.00
CORREDOR 33				7.00	7.00
26				3.00	3.00
25				3.00	3.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	51.00
				TOTAL	51.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 1					
AULA 27				2.00	2.00
AULA 28				2.00	2.00
AULA 29				2.00	2.00
AULA 30				2.00	2.00
AULA 31				2.00	2.00
AULA 32				2.00	2.00
CORREDOR 33				4.00	4.00
BODEGA 26				1.00	1.00
BAÑO 25				1.00	1.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	18.00
				TOTAL	18.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

EDIFICIO 1







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.46	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2			60	1.00	60.00
PASAN:				SUBTOTAL	60.00
				TOTAL	60.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

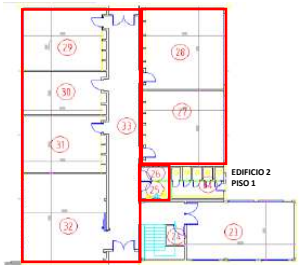





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.01.01	M3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	VOLUMEN	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL
EDIFICIO 2					
AULA 32	11.49	8.22	6.99	0.20	2.30
CORREDOR 33	10.96	2.61	21.00	0.20	2.19
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	0.09	1.15	0.40	0.20	0.11
PASAN:				**SUBTOTAL**	4.60
				TOTAL	4.60

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

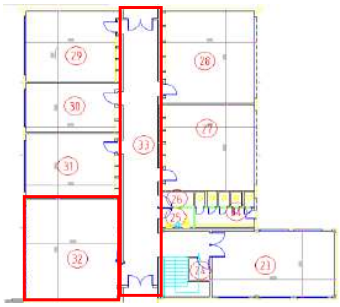



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.01.10	M3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	VOLUMEN	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL
EDIFICIO 2					0.00
AULA 32	10.92	8.22	6.99	0.19	2.07
CORREDOR 33	10.41	2.61	21.00	0.19	1.98
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	0.09	1.15	0.40	0.19	0.10
PASAN:				**SUBTOTAL**	4.15
				TOTAL	4.15

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

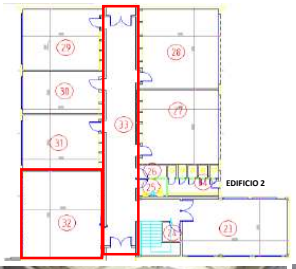







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.2.26	M2	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
AULA 32	57.46	8.22	6.99	1.00	57.46
CORREDOR 33	54.81	2.61	21.00	1.00	54.81
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	0.46	1.15	0.40	6.00	2.76
PASAN:				**SUBTOTAL**	115.03
				TOTAL	115.03

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



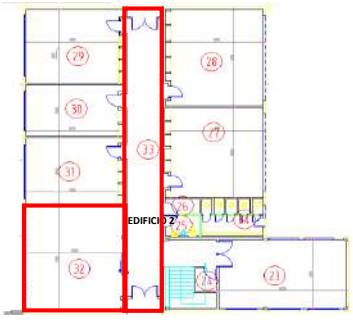

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.4.3	KG	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	CANTIDAD	ANCHO	LARGO	PESO KG*M2	TOTAL
AULA 32	1.00	8.22	6.99	2.99	171.88
CORREDOR 33	1.00	2.61	21.00	2.99	163.96
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	6.00	1.15	0.40	2.99	8.26
PASAN:				**SUBTOTAL**	344.10
				TOTAL	344.10

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



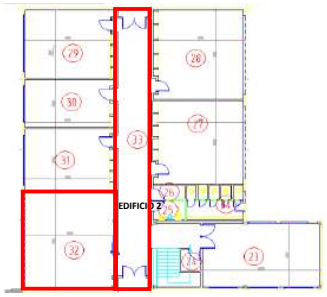

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
07.01.02	M2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
AULA 27	46.94	7.09	6.62	1.00	6.62
AULA 28	50.18	7.58	6.62	1.00	6.62
AULA 29	38.57	5.80	6.65	1.00	6.65
AULA 30	26.86	4.07	6.60	1.00	6.60
AULA 31	34.91	5.29	6.60	1.00	6.60
AULA 32	57.46	8.22	6.99	1.00	57.46
CORREDOR 33	54.81	2.61	21.00	1.00	54.81
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	0.46	1.15	0.40	6.00	2.76
PASAN:				**SUBTOTAL**	148.12
				TOTAL	148.12

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

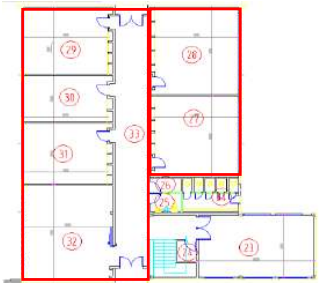

EDIFICIO 2

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.04.08	ML	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO 2					
LONGITUDINAL ALA 3			25.00	6.00	150.00
TRANSVERSAL ALA 3			7.28	2.00	14.56
CANAL			21.91	2.00	43.82
LONGITUNAL ALA 4			18.00	6.00	108.00
TRANSVERSAL ALA 4			7.31	4.00	29.24
ESTRUCTURA DE DOMOS			3.00	10.00	30.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	375.62
				TOTAL	375.62

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

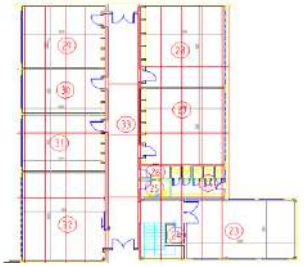



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.08	M2	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 2					
DOMO 2	100.50	4.02	25.00		100.50
PASAN:				**SUBTOTAL**	100.50
				TOTAL	100.50

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

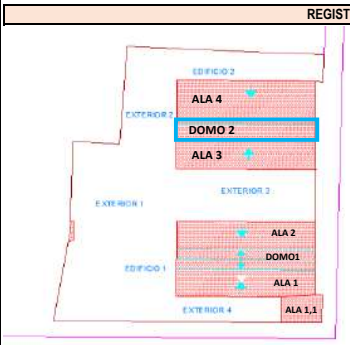





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDING SEAM (ANCHO = 500mm.) DOBLE CAPA CON AISLANTE DE POLIETILENO DE 50 mm. - SEGUN MEDIDAS IN SITU - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).


DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 2	-				
ALA 4	155.70	8.65	18.00		155.70
ALA 3	216.25	8.65	25.00		216.25
EDIFICIO 1	-				
ALA 2	216.25	8.65	25.00		216.25
PASAN:				**SUBTOTAL**	588.20
				TOTAL	588.20

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

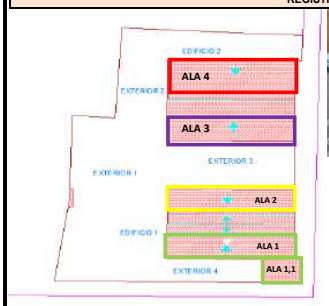









DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.1	M2	REPLANTEO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1	25.60	9.15	234.24	1	234.24
PASAN:					**SUBTOTAL**	234.24
					TOTAL	234.24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

ÁREA 1

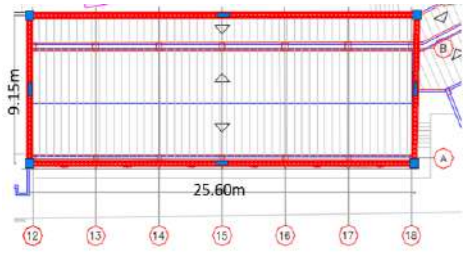

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	19	03	2022	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.19	M	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Baños medida 1	5.61			3.00	16.83
Baños medida 2		1.75		5.00	8.75
Baños medida 3	4.65			3.00	13.95
PASAN:				**SUBTOTAL**	39.53
				TOTAL	39.53

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

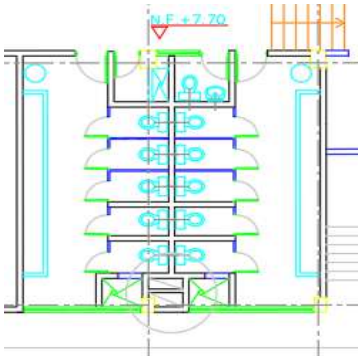

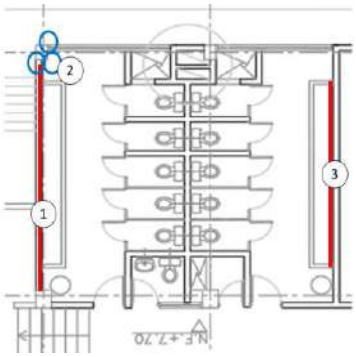

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.23	UN	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3			6.00	1	6.00
BAÑO MUJERES PISO 3			6.00	1	6.00
BAÑOS PROFESORES PISO 3			1.00	1	1.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	13.00
				TOTAL	13

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

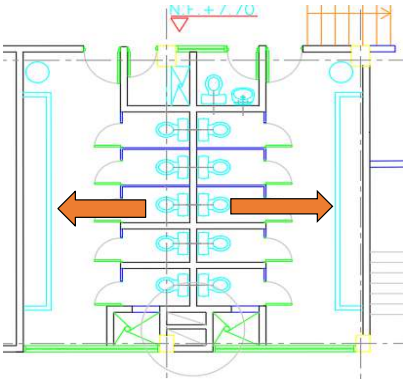





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.35	M2	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3		1.20	1.80	2.00	4.32
PASAN:				**SUBTOTAL**	4.32
				TOTAL	4.32

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

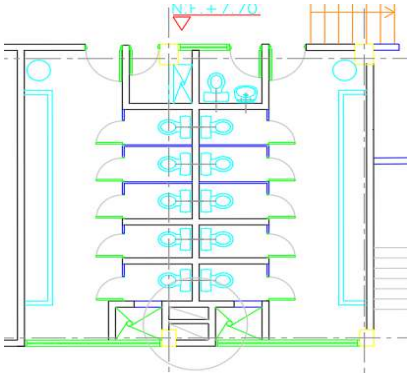



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANT. POR AULA	CANT AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
Aulas			8.00	2	16.00
Baterias sanitarias			6.00	1	6.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	22.00
				TOTAL	22

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

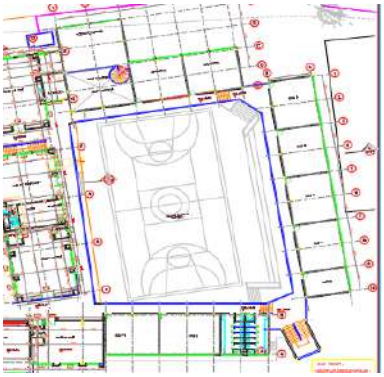



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.5.2	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	KG POR METRO	TOTAL
EDIFICACIONES					
Reforzamiento estructura cubierta			132.00	0.47	62.04
Reforzamiento estructura cubierta			188.16	6.86	1290.78
PASAN:				**SUBTOTAL**	1352.82
				TOTAL	1352.82

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

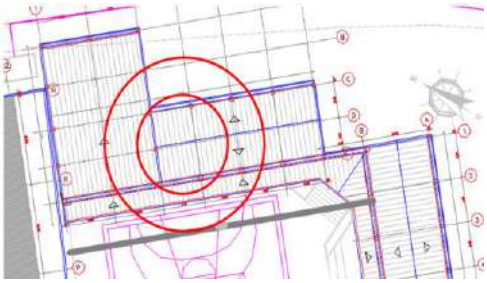





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.1	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta				-	8	8.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	8.00
					TOTAL	8

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

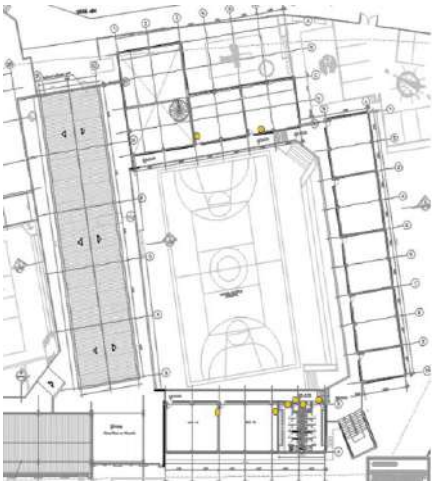

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.11	UN	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						
				-	24	24.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	24.00
					TOTAL	24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

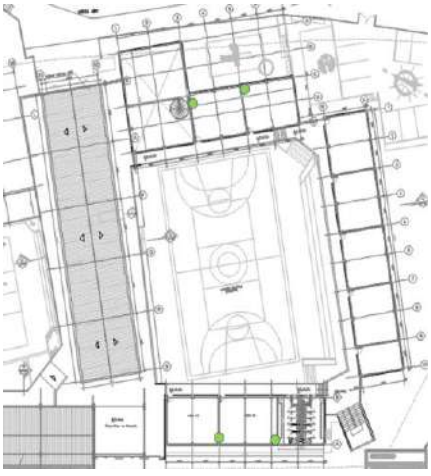

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.50	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	Ala occidente	25.60		-	3	76.80
	Bajan a tomas	3.20			8	25.60
	Bajan a interruptor	2.00			4	8.00
	Ala oriental	31.36		-	3	94.08
	Bajan a tomas	3.20			2	6.40
	Bajan a interruptor	2.00			2	4.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	214.88
					TOTAL	214.88

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

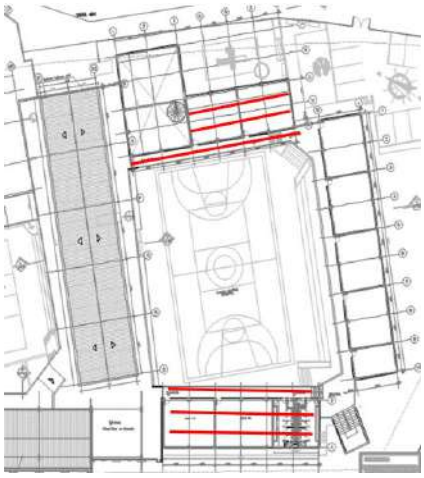

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.56	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	Ala occidente	25.60		-	3	76.80
	Bajan a tomas	3.20			8	25.60
	Bajan a interruptor	2.00			4	8.00
	Ala oriental	31.36		-	3	94.08
	Bajan a tomas	3.20			2	6.40
	Bajan a interruptor	2.00			2	4.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	214.88
					TOTAL	214.88

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

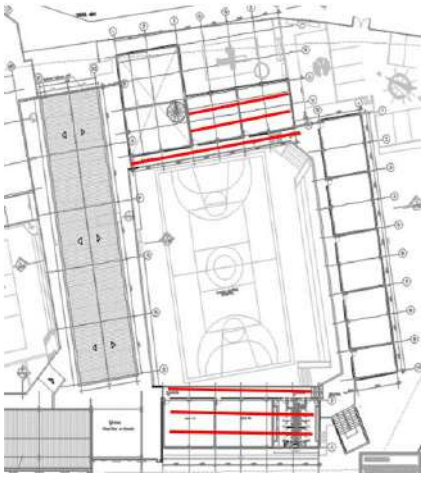

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.72	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta					46	46.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	46.00
					TOTAL	46

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

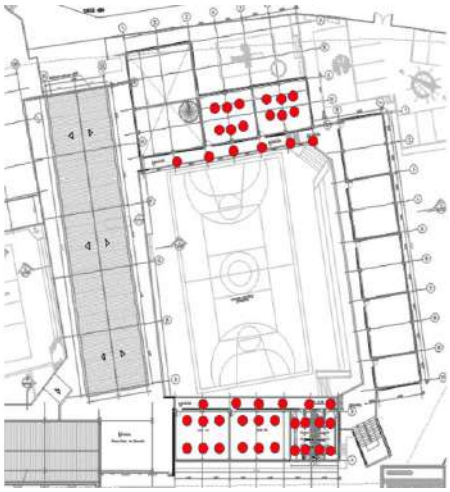

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.80	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta					38	38.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	38.00
					TOTAL	38

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

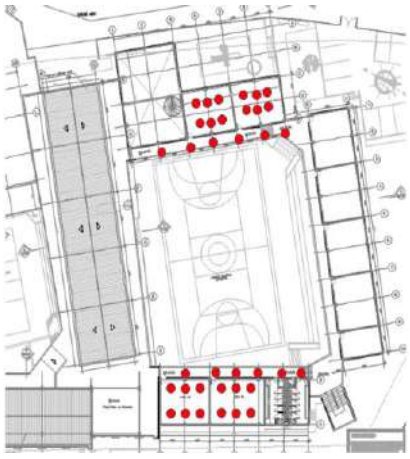

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.1.11	M	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1 - aula 15	32.63			1	32.63
	AREA 1 - aula 16	30.60			1	30.60
PASAN:					**SUBTOTAL**	63.23
					TOTAL	63.23

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

ÁREA 1

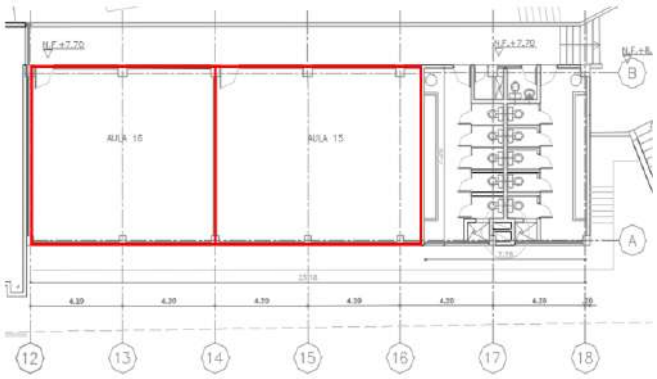

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.2.2	M	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1 - aula 15	32.63			2	65.26
	AREA 1 - aula 16	30.60			2	61.20
PASAN:					**SUBTOTAL**	126.46
					TOTAL	126.46

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

ÁREA 1

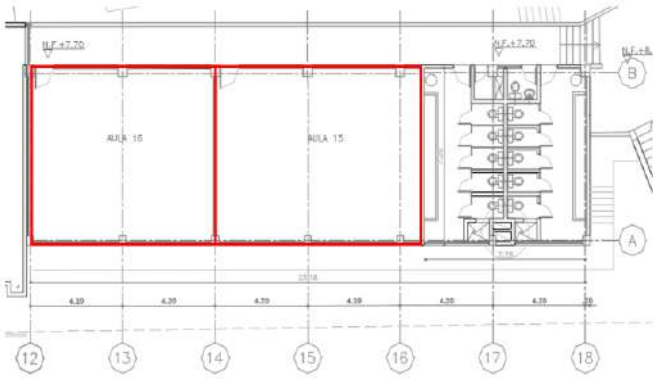

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.4.3	M	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LONG	CANT	TOTAL
Bloque 1					
Transversal			8.70	21	182.70
longitudinal			31.36	18	564.48
Nuevos perfiles					
Bloque 1					
longitudinal			31.36	10	313.60
PASAN:				**SUBTOTAL**	1060.78
				TOTAL	1060.78

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.1	M	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	CUBIERTA	AREA 1		58.90		58.90
		AREA 3		108.46		108.46
PASAN:					**SUBTOTAL**	167.36
					TOTAL	167.36

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

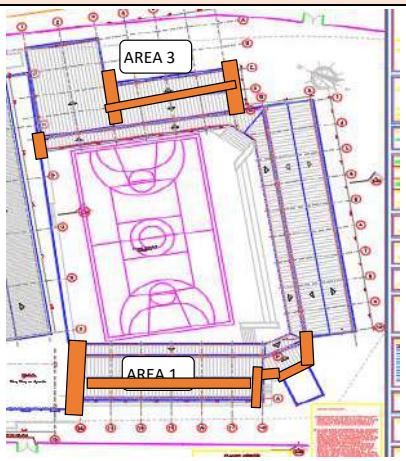



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 2		8.00	6.6	1	52.80
	AREA 2 - PASILLO		8.00	2.5	1	20.00
	AREA 3		38.70	7	1	270.90
	AREA 3 - PASILLO		38.70	2.5	1	96.75
	INTERSECCION AREA 5		3.50	2.5	1	8.75
	AREA 5		17.00	7	1	119.00
	AREA 5 - PASILLO		17.00	2.5	1	42.50
PASAN:					**SUBTOTAL**	610.70
					TOTAL	610.7

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.30	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1	24				24.00
	AREA 3	17				17.00
						0.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	41.00
					TOTAL	41

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

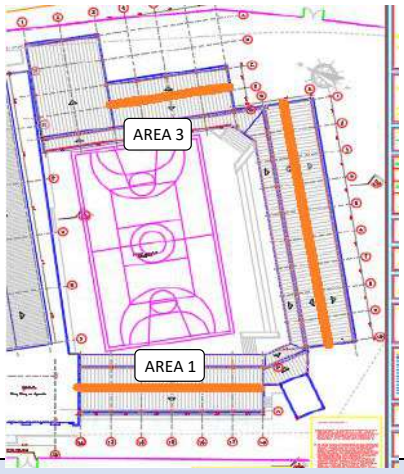





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.4	KG	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3			5.00	1	5.00
BAÑO MUJERES PISO 3			5.00	1	5.00
BAÑOS PROFESORES PISO 3			1.00	1	1.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	11.00
				kg/UN	26.1
				TOTAL	287.1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

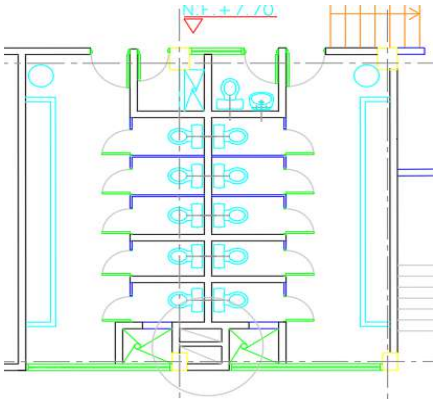

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA No 2**			
	FRENTE:	**COLEGIO DIANA TURBAY COLOMBIA VIVA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 3 PISO 2					
23,24,25,26,27	134.00			8%	144.72
PASAN:				**SUBTOTAL**	144.72
				TOTAL	144.72

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

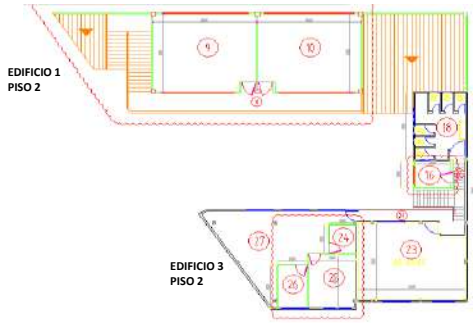

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA No 2**			
	FRENTE:	**COLEGIO DIANA TURBAY COLOMBIA VIVA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 1					0.00
12				8.00	8.00
13				4.00	4.00
EDIFICIO 3 PISO 1					
19				7.00	7.00
EDIFICIO 3 PISO 2					
23				7.00	7.00
24				7.00	7.00
25				7.00	7.00
26				5.00	5.00
27				15.00	15.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	60.00
				TOTAL	60.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



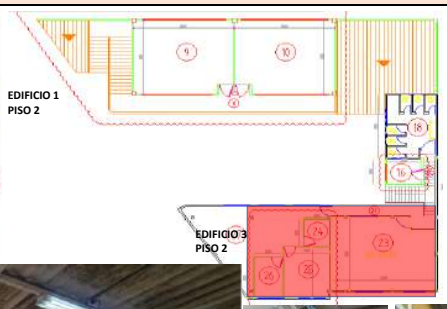















DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA No 2**			
	FRENTE:	**COLEGIO DIANA TURBAY COLOMBIA VIVA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.42	M	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1			20	2.00	40.00
EDIFICIO 2			10.00	2.00	20.00
EDIFICIO 3			25.00	2.00	50.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	110.00
				TOTAL	110.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA No 2**			
	FRENTE:	**COLEGIO DIANA TURBAY COLOMBIA VIVA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 1					0.00
12				6.00	6.00
13				6.00	6.00
EDIFICIO 3 PISO 1					
19				6.00	6.00
EDIFICIO 3 PISO 2					0.00
23				6.00	6.00
24				6.00	6.00
25				7.00	7.00
26				7.00	7.00
27				7.00	7.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	51.00
				TOTAL	51.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



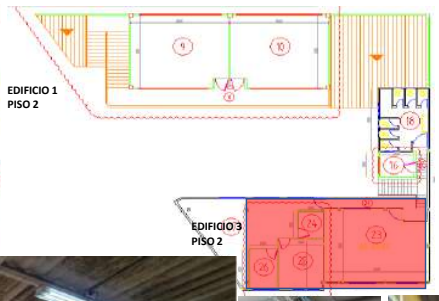















DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA No 2**			
	FRENTE:	**COLEGIO DIANA TURBAY COLOMBIA VIVA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	M	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2			100	1.00	100.00
PASAN:				SUBTOTAL	100.00
				TOTAL	100.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



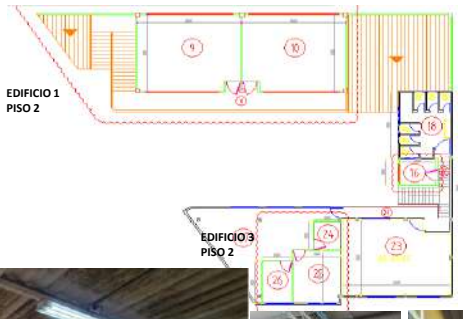















DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA No 2**			
	FRENTE:	**COLEGIO DIANA TURBAY COLOMBIA VIVA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.46	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2			100	1.00	100.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	100.00
				TOTAL	100.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



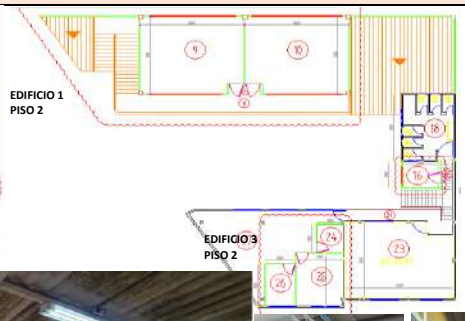















DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA No 2**			
	FRENTE:	**COLEGIO DIANA TURBAY COLOMBIA VIVA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.47	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2			60	1.00	60.00
PASAN:				SUBTOTAL	60.00
				TOTAL	60.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



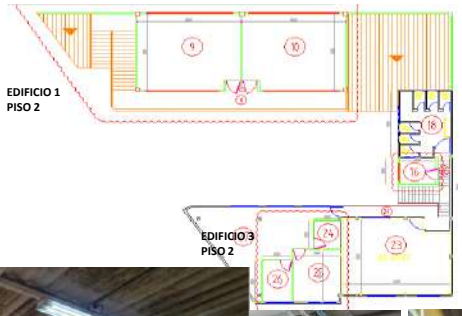















DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA No 2**			
	FRENTE:	**COLEGIO DIANA TURBAY COLOMBIA VIVA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.05.02	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	KG	TOTAL
ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS	142.50			1,567.50	1,567.50
PASAN:				**SUBTOTAL**	1,567.50
				TOTAL	1,567.50

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



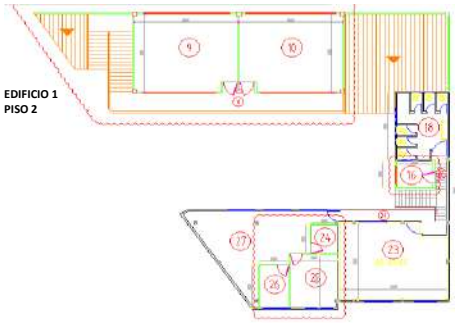

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
EDIFICIO 8	PREESCOLAR	15.30	9.2		1	140.76
PASAN:					SUBTOTAL	140.76
					TOTAL	140.76

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

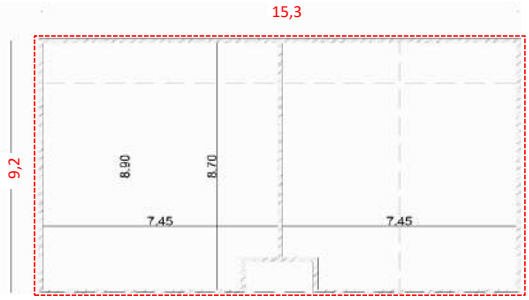





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANT. POR AULA	CANT AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
Edificio 8 - Preescolar.			12.00	2	24.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	24.00
				TOTAL	24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





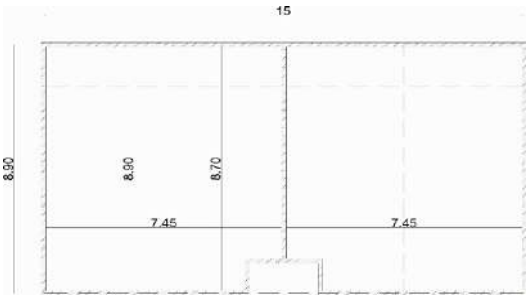

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.45	M	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS PREESCOLAR	16.00			2	32.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	32.00
				TOTAL	32

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





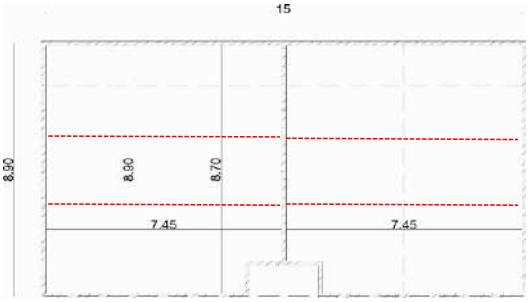

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.5.2	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	CANTIDAD	Total	KG POR METRO	TOTAL
EDIFICACIONES					
Reforzamiento estructura cubierta - Preescolar	8.90	4	35.60	12	427.20
	15.00	7	105.00	12	1260.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1687.20
				TOTAL	1687.2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

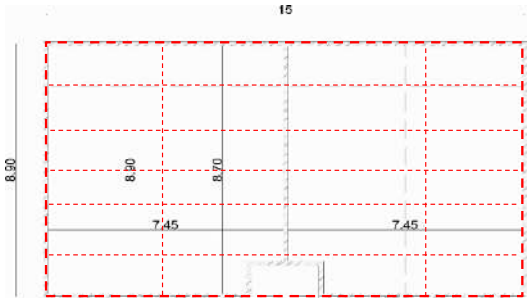



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.2.2	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)


DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	CANT-BATERIA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
EDIFICIO 8 - AULAS PREESCOLAR	4.50	0.60		2.00	5.40
	3.30	1.40		2.00	9.24
REJILLA	0.60	0.70		4.00	1.68
PASAN:				**SUBTOTAL**	16.32
				TOTAL	16.32

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.4.3	M	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
PREESCOLAR	8.9			4	35.60
	15			7	105.00
				7	
PASAN:				**SUBTOTAL**	140.60
				TOTAL	140.6

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

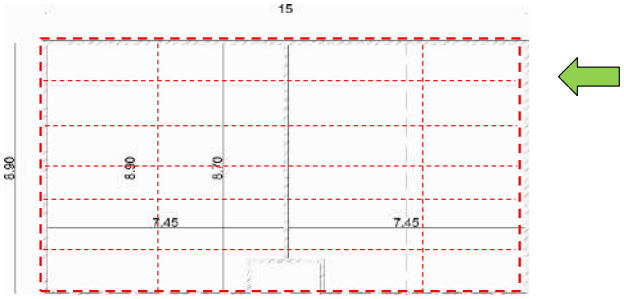

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.1	M	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
					0.00
CUBIERTA DE PREESCOLAR	15.30			2	30.60
	9.20			2	18.40
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	49.00
				TOTAL	49

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

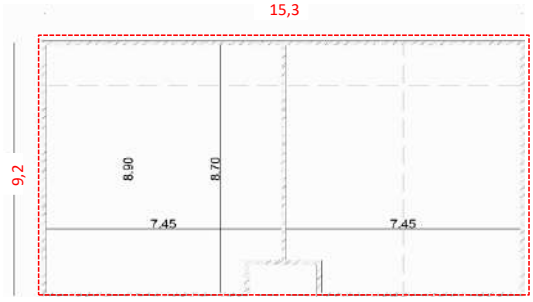



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES					
EDIFICIO 8 - AULAS PREESCOLAR.	15.30	9.2			140.76
PASAN:				**SUBTOTAL**	140.76
				TOTAL	140.76

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

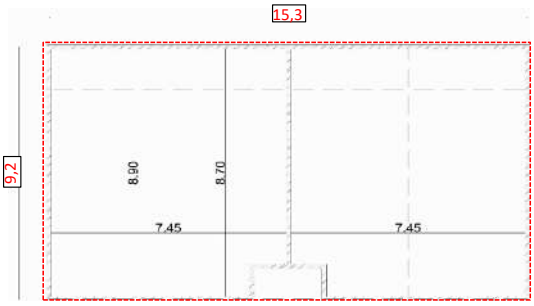



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.2	KG	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	KG	TOTAL
EDIFICACIONES					
TEJA ASRBESTO CEMENTO				3950	3950.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	3950.00
				TOTAL	3950.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
4921	2023-03-15	TEJAS DE ASBESTO	3,950	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A2050, Y36

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ALFREDO IRIARTE**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.3	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS	30.00			1	30.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	30.00
				TOTAL	30

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

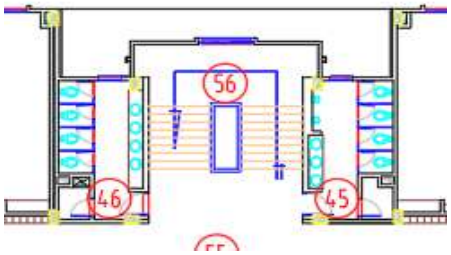

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ALFREDO IRIARTE**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.20	M2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIA	18.00			1	18.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	18.00
				TOTAL	18

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ALFREDO IRIARTE**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.28	M2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	CANT. POR BATERIA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS PISO 3	5.00	0.9	2.20	1	9.90
PASAN:				**SUBTOTAL**	9.90
				TOTAL	9.9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ALFREDO IRIARTE**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.4.5	M2	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
CANALES EDIFICIO 01	18.00			2	36.00
CANALES EDIFICIO 02	34.70			2	69.40
	17.35			2	34.70
CUBIERTA PLANA	6.80	6.2			42.16
	3.00	3			9.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	191.26
				TOTAL	191.26

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ALFREDO IRIARTE**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.3.1	M2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
EDIFICIO 02	38.90	9.6		2	746.88
PASAN:				**SUBTOTAL**	746.88
				TOTAL	746.88

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ALFREDO IRIARTE**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.4.10	M	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
CANALES EDIFICIO 01	18.00			2	36.00
CANALES EDIFICIO 02	38.90			2	77.80
	19.20			2	38.40
BAJANTES	9.80			5	49.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	201.20
				TOTAL	201.2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ALFREDO IRIARTE**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.7	M2	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES					
CUBIERTA PLANA	6.80	6.2			42.16
	3.00	3			9.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	51.16
				TOTAL	51.16

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

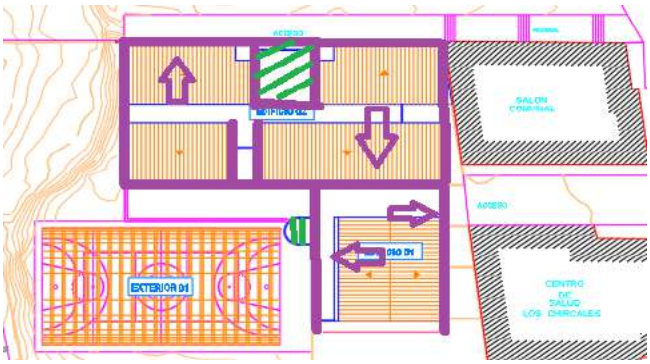

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**		
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA**		
	FECHA:	**20**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.1	M2	REPLANTEO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES						
						0.00
Cubierta	ALA 1	17.30	15.5	16.40	4.4	72.16
	ALA 2	9.60	15.5	12.55	4.4	55.22
	ALA 3	19.30	14.3	16.80	4.4	73.92
	ALA 4	9.30	14.3	11.80	4.4	51.92
	ALA 5	19.90	14.35	17.13	4.5	77.06
	ALA 6	9.30	14.35	11.83	4.5	53.21
	ALA 7	17.26	14.7	15.98	4.5	71.91
	ALA 8	9.60	14.7	12.15	4.5	54.68
PASAN:					**SUBTOTAL**	510.08
					TOTAL	510.08

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

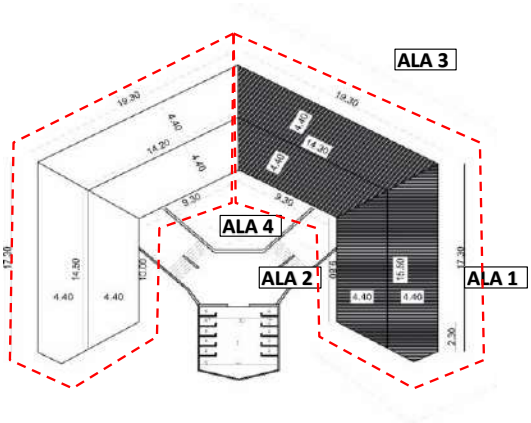





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**		
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA**		
	FECHA:	**20**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.3	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES						
	Cerramiento en lona	5.90	2.2			5.90
		3.05	2.2			3.05
PASAN:					**SUBTOTAL**	8.95
					TOTAL	8.95

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





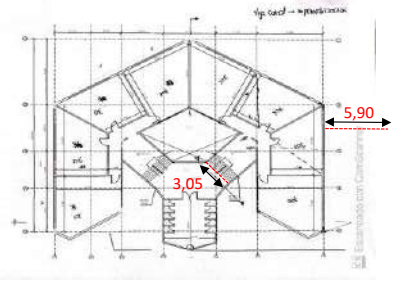

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA**			
	FECHA:	**20**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.29	M2	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION			DIMENSIONES				
			CANT	ANCHO	ALTO	AREA	TOTAL
EDIFICACIONES							
SALON 305		V1-V2-V3-V4-V5-V6	6.00	0.75	2.00	1.5	9.00
		V7-V8-V9-V10	4.00	0.75	2.00	1.5	6.00
SALON 306		V1-V2-V3-V4-V5-V6	6.00	0.75	2.00	1.5	9.00
SALON 307		V1-V2-V3-V4-V5-V6	6.00	0.75	2.00	1.5	9.00
SALON 308		V1-V2-V3-V4-V5-V6	6.00	0.75	2.00	1.5	9.00
		V7-V8-V9-V10	4.00	0.75	2.00	1.5	6.00
PASAN:						**SUBTOTAL**	48.00
						TOTAL	48

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

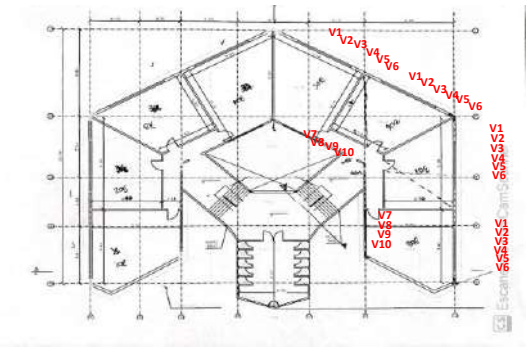



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA**			
	FECHA:	**20**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	ALA 1	17.30	15.5	16.40	4.4	72.16
	ALA 2	9.60	15.5	12.55	4.4	55.22
	ALA 3	19.30	14.3	16.80	4.4	73.92
	ALA 4	9.30	14.3	11.80	4.4	51.92
	ALA 5	19.90	14.35	17.13	4.5	77.06
	ALA 6	9.30	14.35	11.83	4.5	53.21
	ALA 7	17.26	14.7	15.98	4.5	71.91
	ALA 8	9.60	14.7	12.15	4.5	54.68
POLICARBONATO						
ACRILICO						
PASAN:					**SUBTOTAL**	510.08
					TOTAL	510.08

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

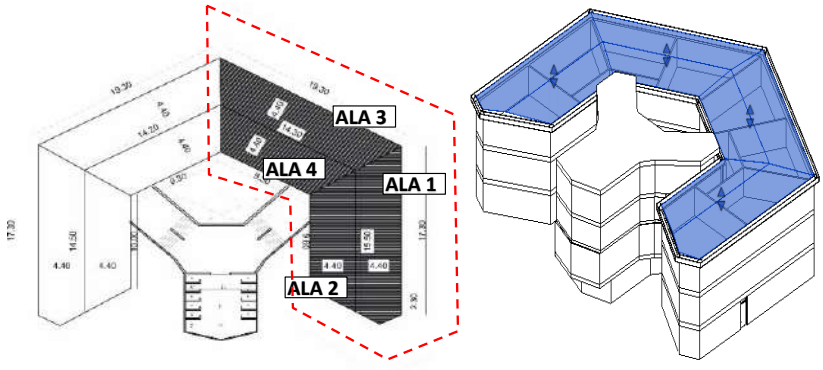

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA**			
	FECHA:	**20**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
	SALON 308				4	4.00
	SALON 307				4	4.00
	SALON 306				4	4.00
	SALON 305				4	4.00
	PASILLO				1	4.00
POLICARBONATO						
ACRILICO						
PASAN:					SUBTOTAL	20.00
					TOTAL	20.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

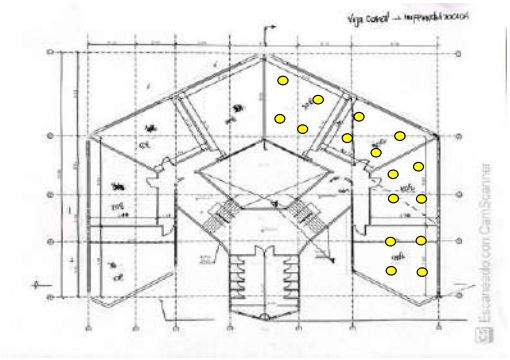



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA**			
	FECHA:	**20**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.2.2	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		CANTIDA D	ANCHO	ALTO	AREA	TOTAL
EDIFICACIONES						
SALON 305	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6.00	0.75	2.00	1.5	9.00
	V7-V8-V9-V10	4.00	0.75	2.00	1.5	6.00
SALON 306	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6.00	0.75	2.00	1.5	9.00
SALON 307	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6.00	0.75	2.00	1.5	9.00
SALON 308	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6.00	0.75	2.00	1.5	9.00
	V7-V8-V9-V10	4.00	0.75	2.00	1.5	6.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	48.00
					TOTAL	48.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

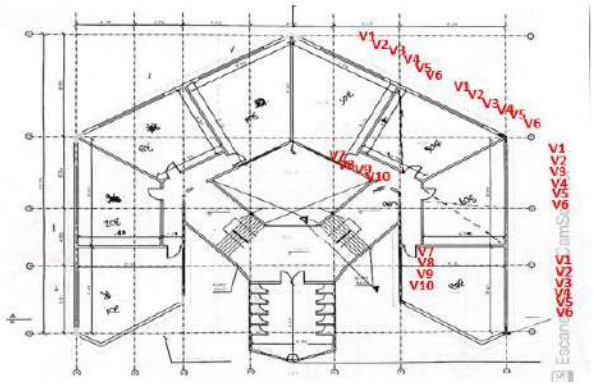

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**		
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA**		
	FECHA:	**20**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.4.3	M	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
SALON 308	4.67			1	4.67
	9.2			1	9.20
	7.79			1	7.79
	8.4			1	8.40
	8.00			1	8.00
	7.00			1	7.00
	7.00			1	7.00
	6.50			1	6.50
	5.70			1	5.70
	5.00			1	5.00
SALON 307	7.45			1	7.45
	8.90			1	8.90
	8.30			1	8.30
	7.65			1	7.65
	6.95			1	6.95
	6.95			1	6.95
	6.15			1	6.15
	5.52			1	5.52
				1	0.00
SALON 306	7.48			1	7.48
	8.95			1	8.95
	8.35			1	8.35
	7.56			1	7.56
	6.85			1	6.85
	6.85			1	6.85
	6.06			1	6.06
	5.50			1	5.50
SALON 305	4.63			1	4.63
	9.35			1	9.35
	8.90			1	8.90
	8.20			1	8.20
	7.62			1	7.62
	6.85			1	6.85
	6.85			1	6.85
	6.20			1	6.20
	5.70			1	5.70
	5.15			1	5.15
PASILLO	5.10			1	5.10
	0.8			1	0.80
	1.5			1	1.50
	1.50			1	1.50
PASAN:				**SUBTOTAL**	263.08
				TOTAL	263.08

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

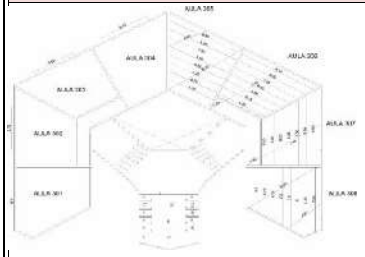



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA**			
	FECHA:	**20**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES						
						0.00
Cubierta	ALA 1	17.26	14.55	15.91	4.5	71.57
	ALA 2	9.60	14.65	12.13	4.5	54.56
	ALA 3	18.93	14.35	16.64	4.5	74.88
	ALA 4	9.30	14.35	11.83	4.5	53.21
	ALA 5	19.90	14.35	17.13	4.5	77.06
	ALA 6	9.30	14.35	11.83	4.5	53.21
	ALA 7	17.26	14.7	15.98	4.5	71.91
	ALA 8	9.60	14.7	12.15	4.5	54.68
						0.00
						0.00
PASAN:					SUBTOTAL	511.09
					TOTAL	511.09

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

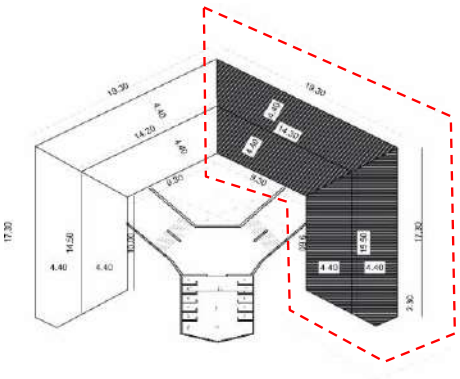





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	LICEO FEMENINO			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.4	M2	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
LABORATORIO DE BIOLOGIA	36.19	7.70	4.70	1.00	36.19
PASAN:				SUBTOTAL	36.19
				TOTAL	36.19

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**LICEO FEMENINO**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.11	M	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT	TOTAL
LABORATORIO DE FISICA	Poceta(Lavamanos)		1	3.8	1.00	3.80
	Muebles laterales		0.7	6.8	3	20.40
			0.7	2.1	5	10.50
	Tarima		1.2	5.3	1	5.30
LABORATORIO DE BIOLOGIA	Poceta(Lavamanos)			2	1	2.00
				1	1	1.00
	Meson experimentos		1	3	6.00	18.00
				1	6.00	6.00
	Mueble lateral			7.7	4	30.80
				2	4	8.00
	Tarima		1.3	4.3	1	4.30
LABORATORIO DE QUIMICA	Mesones experimentos		1	5.3	3.00	15.90
				0.9	9.00	8.10
	Mueble lateral		0.90	1.80	4.00	7.20
			0.90	7.00	2.00	14.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	151.50
					TOTAL	151.5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

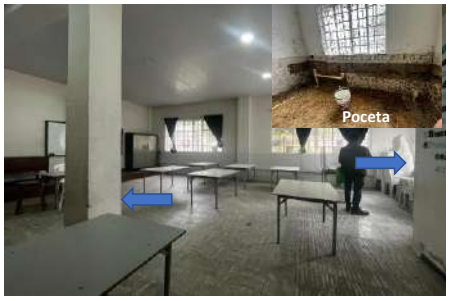







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**LICEO FEMENINO**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
LABORATORIO DE BIOLOGIA		7.7	5.3	1.00	40.81
LABORATORIO DE FISICA		8	10	1.00	80.00
LABORATORIO DE QUIMICA		8.5	9	1.00	76.50
PASAN:				**SUBTOTAL**	197.31
				TOTAL	197.31

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**LICEO FEMENINO**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.30	UN	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
LABORATORIO BIOLOGIA				12.00	12.00
LABOTARIO FISICA				5.00	5.00
LABORATORIO QUIMICA				12.00	12.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	29.00
				TOTAL	29.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**LICEO FEMENINO**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.31	ML	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
LABORATORIO BIOLOGIA				3.00	3.00
LABOTARIO FISICA				5.00	5.00
LABORATORIO QUIMICA				12.00	12.00
PASAN:	**SUBTOTAL**				20.00
	TOTAL				20.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	LICEO FEMENINO			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
16.1.13	M3	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO B600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PROFUNDIDAD	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
LABORATORIO DE BIOLOGIA	0.80	1.50	2.50	8.00	6.40
PASAN:				SUBTOTAL	6.40
				TOTAL	6.40

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.4	M2	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO PISO 1	1.64	1.37	1.20	1	1.64
				TOTAL	1.64

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

Piso 1

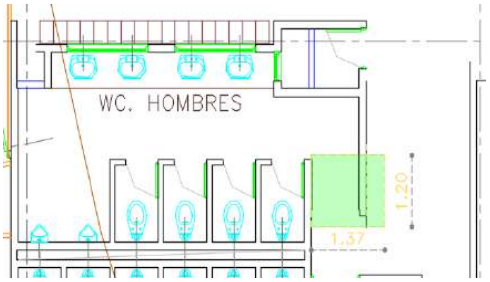



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.15	M2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO PISO 1	1.2	1.20	0.50	2	1.20
				TOTAL	1.20

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

Piso 1

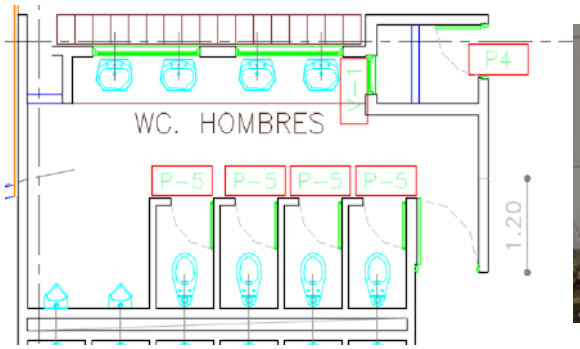



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.31	M	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS	3.00				3.00
					0.00
					0.00
					0.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	3.00
				TOTAL	3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.1.3	M3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PROFUNDIDAD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO PISO 1	0.4	1.37	1.20	1	0.66
				TOTAL	0.66

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

Piso 1

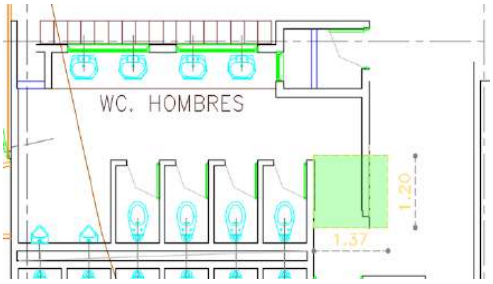



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.1.7	M3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PROFUNDIDAD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO PISO 1	0.4	1.37	1.20	1	0.66
				TOTAL	0.66

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

Piso 1

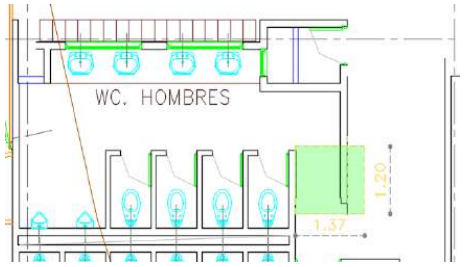



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.2.26	M2	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO PISO 1	1.64	1.37	1.20	1	1.64
				TOTAL	1.64

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

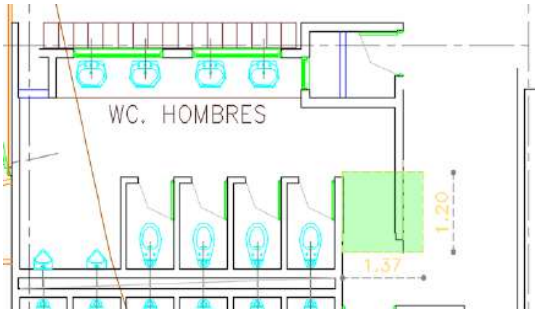



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mia Gp
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
3.1.10	M2	MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO PISO 1	1.2	1.20	0.50	2	2.40
PASAN:				**SUBTOTAL**	2.40
				TOTAL	2.4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

Piso 1

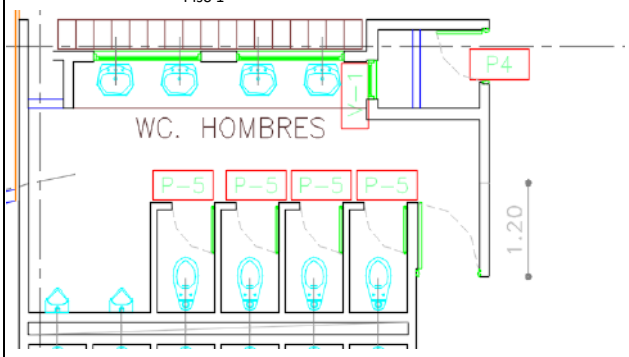

Piso

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.7	M	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 1			3.00		3.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	3.00
				TOTAL	3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

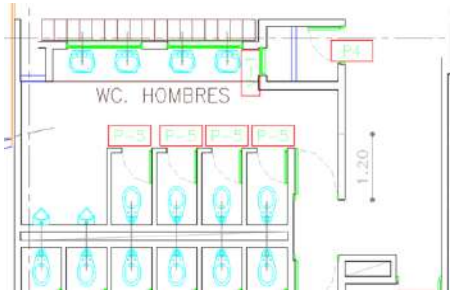



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.8	UN	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2"

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 1				11	11.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	11.00
				TOTAL	11

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

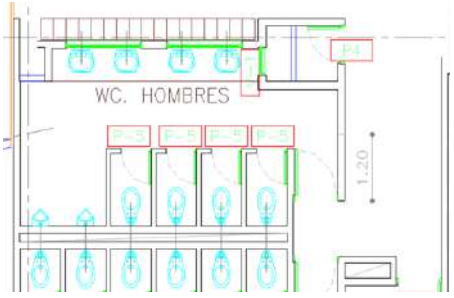



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.2.1	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO PISO 1	1.64	1.37	1.20	1	1.64
				TOTAL	1.64

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

Piso 1

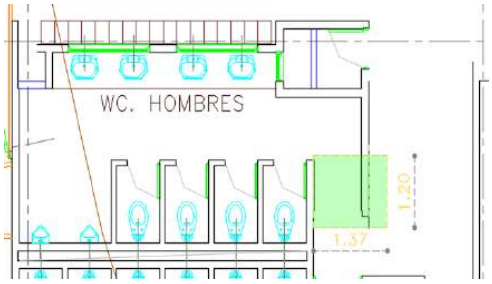



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
8.1.4	M2	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO PISO 1	0.6	1.20	0.50	1	0.60
PASAN:				**SUBTOTAL**	0.60
				TOTAL	0.6

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

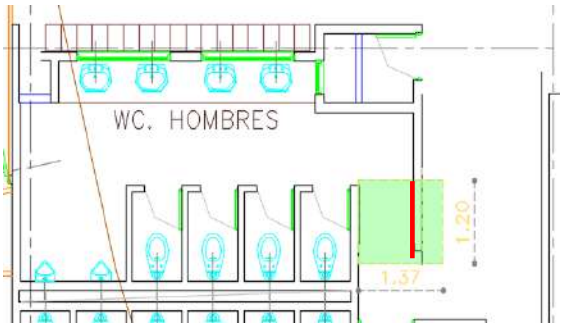

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.1.1	M2	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO PISO 1	0.6	1.20	0.50	1	0.60
PASAN:				**SUBTOTAL**	0.60
				TOTAL	0.6

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

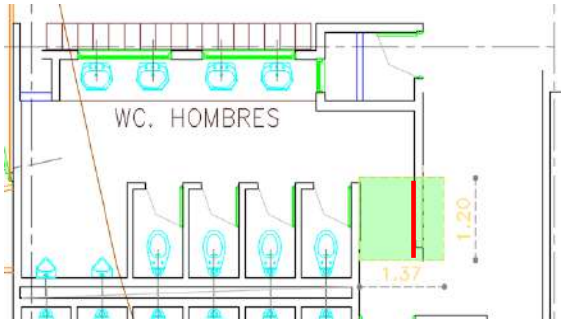

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.1	M2	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	AREA	TOTAL
EDIFICACIONES						
BATERIAS DE BAÑOS	PRIMER PISO			24.94	1	24.94
PASAN:					**SUBTOTAL**	24.94
					TOTAL	24.94

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

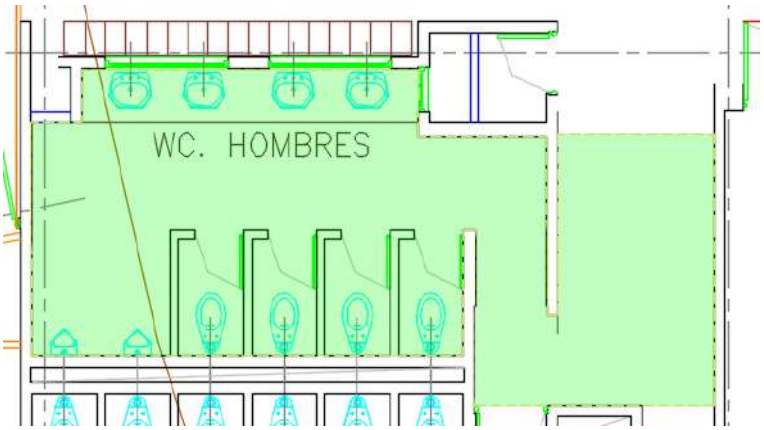

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**EMERGENCIA SANTA LUCIA CAFAM**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.19	M	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. morado					
	Medida 1	5.09			1	5.09
	Medida 2	9.35			1	9.35
	Medida 3	4.85			1	4.85
	Medida 4	14.31			1	14.31
	Medida 5	9.98			1	9.98
	Medida 6	9.98			1	9.98
	Medida 7	9.23			1	9.23
	Medida 8	4.33			1	4.33
	Medida 9	4.61			1	4.61
	Medida 10	18.92			1	18.92
	Medida 11	14.6			1	14.60
	Medida 12	4.79			1	4.79
PASAN:					**SUBTOTAL**	110.04
					TOTAL	110.04

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





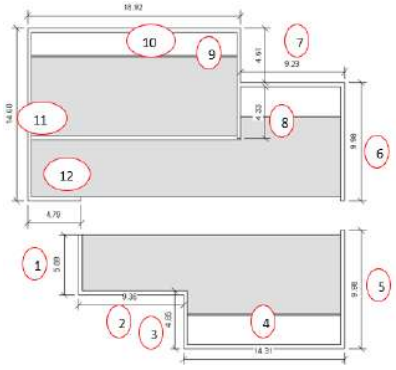

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**EMERGENCIA SANTA LUCIA CAFAM**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.52	M2	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. morado					
	Medida 1	5.09	0.55	2.80	1	2.80
	Medida 2	9.35	0.55	5.14	1	5.14
	Medida 3	4.85	0.55	2.67	1	2.67
	Medida 4	14.31	0.55	7.87	1	7.87
	Medida 5	9.98	0.55	5.49	1	5.49
	Medida 6	9.98	0.55	5.49	1	5.49
	Medida 7	9.23	0.55	5.08	1	5.08
	Medida 8	4.33	0.55	2.38	1	2.38
	Medida 9	4.61	0.55	2.54	1	2.54
	Medida 10	18.92	0.55	10.41	1	10.41
	Medida 11	14.6	0.55	8.03	1	8.03
	Medida 12	4.79	0.55	2.63	1	2.63
PASAN:					**SUBTOTAL**	60.52
					TOTAL	60.52

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





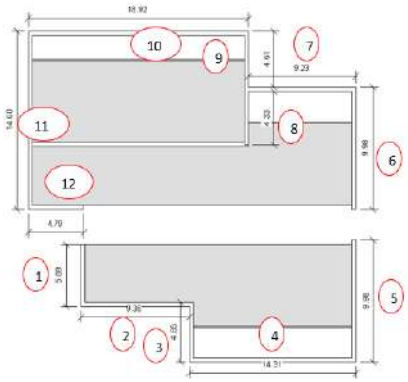

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**EMERGENCIA SANTA LUCIA CAFAM**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.1.3	M2	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. morado					
	Medida 1	5.09	1	5.09	1	5.09
	Medida 2	9.35	1	9.35	1	9.35
	Medida 3	4.85	1	4.85	1	4.85
	Medida 4	14.31	1	14.31	1	14.31
	Medida 5	9.98	1	9.98	1	9.98
	Medida 6	9.98	1	9.98	1	9.98
	Medida 7	9.23	1	9.23	1	9.23
	Medida 8	4.33	1	4.33	1	4.33
	Medida 9	4.61	1	4.61	1	4.61
	Medida 10	18.92	1	18.92	1	18.92
	Medida 11	14.6	1	14.60	1	14.60
	Medida 12	4.79	1	4.79	1	4.79
	E. amarillo 2					
	piso 1			202.84	1	202.84
	piso 2			231.31	1	231.31
PASAN:					**SUBTOTAL**	544.19
					TOTAL	544.19

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



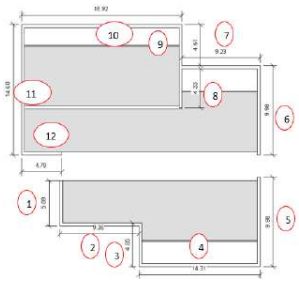





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**EMERGENCIA SANTA LUCIA CAFAM**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.1.2	M	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. morado					
	Medida 1	5.09			1	5.09
	Medida 2	9.35			1	9.35
	Medida 3	4.85			1	4.85
	Medida 4	14.31			1	14.31
	Medida 5	9.98			1	9.98
	Medida 6	9.98			1	9.98
	Medida 7	9.23			1	9.23
	Medida 8	4.33			1	4.33
	Medida 9	4.61			1	4.61
	Medida 10	18.92			1	18.92
	Medida 11	14.6			1	14.60
	Medida 12	4.79			1	4.79
PASAN:					**SUBTOTAL**	110.04
					TOTAL	110.04

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





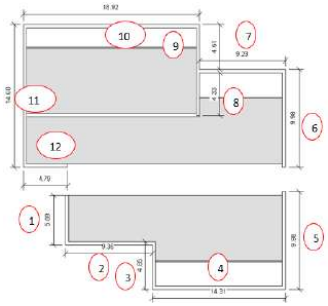

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**EMERGENCIA SANTA LUCIA CAFAM**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.2.1	M2	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. morado					
	Medida 1	5.09	1.5	7.64	1	7.64
	Medida 2	9.35	1.5	14.03	1	14.03
	Medida 3	4.85	1.5	7.28	1	7.28
	Medida 4	14.31	1.5	21.47	1	21.47
	Medida 5	9.98	1.5	14.97	1	14.97
	Medida 6	9.98	1.5	14.97	1	14.97
	Medida 7	9.23	1.5	13.85	1	13.85
	Medida 8	4.33	1.5	6.50	1	6.50
	Medida 9	4.61	1.5	6.92	1	6.92
	Medida 10	18.92	1.5	28.38	1	28.38
	Medida 11	14.6	1.5	21.90	1	21.90
	Medida 12	4.79	1.5	7.19	1	7.19
	E. amarillo 2					
	piso 1			255.34	1	255.34
	piso 2			269.83	1	269.83
PASAN:					**SUBTOTAL**	690.23
					TOTAL	690.23

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

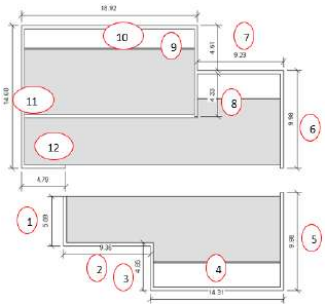







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**EMERGENCIA SANTA LUCIA CAFAM**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.7	M2	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. morado					
	Medida 1	5.09	2	10.18	1	10.18
	Medida 2	9.35	2	18.70	1	18.70
	Medida 3	4.85	2	9.70	1	9.70
	Medida 4	14.31	2	28.62	1	28.62
	Medida 5	9.98	2	19.96	1	19.96
	Medida 6	9.98	2	19.96	1	19.96
	Medida 7	9.23	2	18.46	1	18.46
	Medida 8	4.33	2	8.66	1	8.66
	Medida 9	4.61	2	9.22	1	9.22
	Medida 10	18.92	2	37.84	1	37.84
	Medida 11	14.6	2	29.20	1	29.20
	Medida 12	4.79	2	9.58	1	9.58
PASAN:					**SUBTOTAL**	220.08
					TOTAL	220.08

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

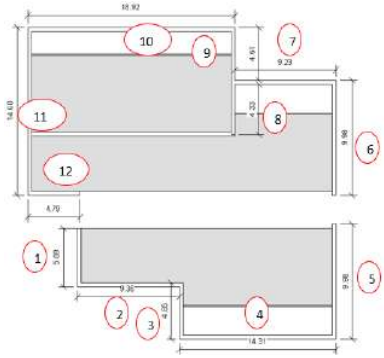



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**EMERGENCIA SANTA LUCIA CAFAM**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.33	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. morado					
	Medida 1	5.09	2	10.18	1	10.18
	Medida 2	9.35	2	18.70	1	18.70
	Medida 3	4.85	2	9.70	1	9.70
	Medida 4	14.31	2	28.62	1	28.62
	Medida 5	9.98	2	19.96	1	19.96
	Medida 6	9.98	2	19.96	1	19.96
	Medida 7	9.23	2	18.46	1	18.46
	Medida 8	4.33	2	8.66	1	8.66
	Medida 9	4.61	2	9.22	1	9.22
	Medida 10	18.92	2	37.84	1	37.84
	Medida 11	14.6	2	29.20	1	29.20
	Medida 12	4.79	2	9.58	1	9.58
PASAN:					**SUBTOTAL**	220.08
					TOTAL	220.08

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

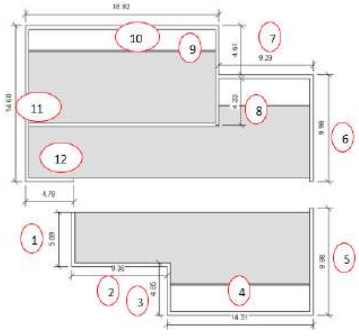



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

Certificado de pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Fecha: Bogotá, 24 de marzo de 2023.

REF.: CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 CUYO OBJETO ES LA "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

Asunto: Certificación de pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales

Yo, LUIS ALBEIRO BUITRAGO RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.076.659.875 de UBATE y tarjeta profesional de contador No. 283741-T en mi condición de REVISOR FISCAL de la firma **CONSORCIO MIA GP** identificado con Nit 901.634.703-9, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente misiva, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Nota: para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1670 de 2007.

CONSORCIO MIA GP
NIT. 901.634.703-9
LUIS ALBEIRO BUITRAGO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
No. de identificación: 1.076.659.875 de Ubaté
No. de Tarjeta profesional de contador: 283741-T


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.076.659.875
BUITRAGO RODRIGUEZ
LUIS ALBEIRO


FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1993
UBATE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
04-OCT-2011 UBATE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
INDICE DERECHO
P-1530400-01154488-M-1076659875-20200827
0071584792A 1
9912897439


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
283741-T
LUIS ALBEIRO
BUITRAGO RODRIGUEZ
C.C. 1076659875
RES. INSCRIPCION 1874 DEL 22/07/2021
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
306297
325080

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 7 C B 5 C 7 E 1 D 6 0 1 A E C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS ALBEIRO BUI TRAGO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1076659875 de VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 283741-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

GRUPO EMPRESARIAL

M I A

Certificado de pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales


Fecha: Bogotá, 24 de marzo de 2023.

REF.: CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 CUYO OBJETO ES LA "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

Asunto: Certificación de pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales

Yo, MONICA PATRICIA BARRIOS ARDILA, identificada con cedula de ciudadanía No. 39.674.413 de SOACHA y tarjeta profesional de contador No. 256856-T, en mi condición de REVISOR FISCAL de la firma MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS, con NIT 901.415.289-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente misiva, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1670 de 2007.



MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT 901.415.289-1
MONICA PATRICIA BARRIOS ARDILA
Revisor Fiscal:
No. de identificación: 39.674.413 de SOACHA
No. de Tarjeta profesional de contador: 256856-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

256856-T

MONICA PATRICIA
BARRIOS ARDILA
C.C. 39674413
RES. INSCRIPCION 211 DEL 22/04/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

266675 286496



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.674.413
BARRIOS ARDILA
APELLIDOS
MONICA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-FEB-1978
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-JUL-1996 SOACHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00788108-F-0039674413-20160212 0048326039A 2 1313768171

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3552990E99120E07

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MONICA PATRICIA BARRIOS ARDILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39674413 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 256856-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901415289-1	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	CARRERA 9 85 32 OFC1803	3906417	miagrupoempresarial@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	21/02/2023	65718622	$505.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	14.500	0		0		0	0	0	0	14.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	18.600	0	0	0	0	0	0		18.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	55.600				55.600	0	0	55.600			556	55.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	38.300	0	0	38.300	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
19.200	0	0	19.200	2
ICBF				
28.800	0	0	28.800	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	159.500	159.500
Pensión	2	204.200	204.200
Riesgos Laborales	1	55.600	55.600
CCF	1	38.300	38.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	28.800	28.800
MEN	0	0	0
SENA	1	19.200	19.200
TOTALES	8	505.600	505.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901415289-1	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS		CARRERA 9 85 32 OFC1803	3906417	miagrupoempresarial@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	21/02/2023	65718622	$505.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	14252818	AGUDELO PRIETO ROLANDO	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	34.800	1.160.000	17.400	26.100	0	0
2	CC	32206427	MURILLO DIAZ LUCY DEL CARMEN	1	0			N	X																25-14	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS010	116.000	14.500	14-11	116.000	4	5.100	CCF24	116.000	3.500	116.000	1.800	2.700	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901415289-1	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	CARRERA 9 85 32 OFC1803	3906417	miagrupoempresarial@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65293273	$918.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	101.000				101.000	0	0	101.000			1.010	101.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	69.600	0	0	69.600	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
34.800	0	0	34.800	2
ICBF				
52.200	0	0	52.200	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	290.000	290.000
Pensión	2	371.200	371.200
Riesgos Laborales	1	101.000	101.000
CCF	1	69.600	69.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	52.200	52.200
MEN	0	0	0
SENA	1	34.800	34.800
TOTALES	8	918.800	918.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901415289-1	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS		CARRERA 9 85 32 OFC1803	3906417	miagrupoempresarial@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65293273	$918.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	14252818	AGUDELO PRIETO ROLANDO	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	34.800	1.160.000	17.400	26.100	0	0
2	CC	32206427	MURILLO DIAZ LUCY DEL CARMEN	1	0			N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	34.800	1.160.000	17.400	26.100	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificado de pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Fecha: Bogotá, 24 de febrero de 2023.

REF.: CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 CUYO OBJETO ES LA "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

Asunto: Certificación de pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales

Yo, CAROLINA HERNANDEZ SOTO, identificado con cedula de ciudadanía No. 52.496.397 de BOGOTÁ y tarjeta profesional de contador No. 122321-T en mi condición de REVISOR FISCAL de la firma GP CARIBE SAS, con NIT 901 110 703-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente misiva, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Nota: para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1670 de 2007.



_____

GP CARIBE SAS
NIT. 901.110.703-1
CAROLINA HERNANDEZ SOTO
Revisor Fiscal
No. de identificación: 52.496.397 DE BOGOTÁ
No. de Tarjeta profesional de contador: 122321-T



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122321-T

CAROLINA
HERNANDEZ SOTO
C.C. 52496397
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132397



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.496.397

CAROLINA
APELLIDOS

HERNANDEZ SOTO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1979
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

20-ENE-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1500110-45148142-F-0052496397-20060622 0335506173N 02 202354530

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AE101470C0A64CE2E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROLINA HERNANDEZ SOTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52496397 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122321-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901110703-1	GP CARIBE SAS	CARRERA 43B 85 76	4457554	agoplasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	06/03/2023	66091501	$1.207.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	4	1.300	0	251.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	145.000	0		0		0	4	800	0	145.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	4	1.600	0	321.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	4	900	0	186.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	16.600				16.600	4	100	16.700			166	16.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	80.000	4	400	80.400	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	46.400	4	300	46.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
63.200	4	400	63.600	2
ICBF				
94.800	4	500	95.300	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	395.000	397.100
Pensión	2	505.600	508.100
Riesgos Laborales	1	16.600	16.700
CCF	2	126.400	127.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	94.800	95.300
MEN	0	0	0
SENA	1	63.200	63.600
TOTALES	9	1.201.600	1.207.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901110703-1	GP CARIBE SAS		CARRERA 43B 85 76	4457554	agoplasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	06/03/2023	66091501	$1.207.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13459838	GOMEZ LOPEZ JESUS GUILLERMO	1	0			N																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF07	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
2	CC	4235319	BUITRAGO BUITRAGO LUIS NAZARIO	1	0			N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901110703-1	GP CARIBE SAS	CARRERA 43B 85 76	4457554	agoplasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65288854	$1.207.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	4	1.200	0	251.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	145.000	0		0		0	4	700	0	145.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	4	1.600	0	321.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	4	900	0	186.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	16.600				16.600	4	100	16.700			166	16.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	80.000	4	400	80.400	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	46.400	4	300	46.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
63.200	4	300	63.500	2
ICBF				
94.800	4	500	95.300	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	395.000	396.900
Pensión	2	505.600	508.100
Riesgos Laborales	1	16.600	16.700
CCF	2	126.400	127.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	94.800	95.300
MEN	0	0	0
SENA	1	63.200	63.500
TOTALES	9	1.201.600	1.207.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901110703-1	GP CARIBE SAS		CARRERA 43B 85 76	4457554	agoplasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65288854	$1.207.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13459838	GOMEZ LOPEZ JESUS GUILLERMO	1	0			N																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF07	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
2	CC	4235319	BUITRAGO BUITRAGO LUIS NAZARIO	1	0			N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C
Secretaria
EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO INFORMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS

Articulo 6º, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

RECIBIDO POR:							
Hora		**Fecha**				**Folios**	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA			Otro, Cuál?				No.	CO1.PCCNTR.4077645					Fecha:	18	10	2022		
Contratista	CONSORCIO MIA GP							NIT	X	C.C.		No.	901.634.703-9						
Dirección :	CR 8 12 21 MN							Teléfonos	3133876020										
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente					NIT		C.C.		No.							
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC			Valor Aporte			Donde realiza el aporte a Pensión					NIT No:						
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.													Banco						

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	1	5	7	0	6	9	9	9	6	4	8	4				Banco	BANCO DAVIVIENDA		Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria del Contratista

Responsables de IVA		Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos			Apoderado		Aplicar a todo el valor neto del giro:		Aplicar valor parcial												
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?			Valor parcial a aplicar														
Beneficiario									NIT		C.C.		No.										
Cuenta Bancaria																Banco			Ahorros		Corriente		

Firma Contratista

Fecha	24	2	2023

Al presente formato se le debe anexar certificación bancaria.

La certificación bancaria deberá corresponder al contratista y/o beneficiario del pago, no se pueden realizar pagos a cuentas de terceros.

El presente formato y sus soportes deberan ser archivados por el interventor de la SED o funcionario responsable de la SED, con toda la documentación del Contratista

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14895963172

(415)7707212489984(8020) 0000014895963172

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 4 7 0 3	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO MIA GP

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 8 12 21 MN

42. Correo electrónico gpcaribe@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 3 8 7 6 0 2 0	6 0 1 3 9 0 6 4 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 0 7 2 5	7 1 1 2	2 0 2 2 0 7 2 5			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 14 / 08 : 43: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LUZARDO VILLAMIZAR MATEO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895963172

(415)7707212489984(8020) **0000014895963172**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 4 7 0 3	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 7 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 7 2 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 7 2 5	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 9 1 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895963172

(415)7707212489984(8020) **0000014895963172**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 4 7 0 3	9	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 7 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 0 7 9 1 7 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LUZARDO	VILLAMIZAR	MATEO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 7 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 8 3 1 8 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	AYCARDI	NATALIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895963172

(415)7707212489984(8020) **0000014895963172**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 4 7 0 3	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 1 5 2 8 9	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 2 0 7 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 1 0 7 0 3	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GP CARIBE S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 2 0 7 2 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO MIA GP

CR 8 12 21 MN

E-MAIL : consorciomiagpru2022@gmail.com - gpcaribe@gmail.com

IVA RÉGIMEN COMÚN

NIT 901.634.703-9

FACTURA PROFORMA

MGP-02

SEÑORES :	
BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN :	**NIT :**
Cra 30 No 25 - 90 P1	899.999.061-9
CIUDAD :	**TELÉFONO :**
BOGOTÁ	6013385590

FECHA FACTURA		
DD	**MM**	**AAAA**
5	04	2023

FECHA VENCIMIENTO		
DD	**MM**	**AAAA**

DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA No 02 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 20 DE FEBRERO DE 2023 HASTA 19 DE MARZO DE 2023			
VALOR TOTAL			**1.278.337.626,00**

SUBTOTAL	**I.V.A**	**TOTAL A PAGAR**
1.278.337.626,00	-	1.278.337.626,00

LA SUMA DE: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE.

Observaciones:

El AIU del contrato es: A=21,69% I=1,50% U=5,00%

El ajuste al peso es +0,33

La mora en el pago de esta factura causa intereses a la máxima tasa legal vigente. *Esta factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Articulo 774 del Código de Comercio). *Cualquier reclamo debe efectuarse dentro de los cinco (5) días siguientes de recibida

CONSORCIO MIA GP	**ACEPTADA**	

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764044703178

(415)7707212489984(8020) 001876404470317 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 3 4 7 0 3	9				

11. Razón social
CONSORCIO MIA GP

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 8 12 21 MN

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-02-20 / 12:26:10 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres LUZARDO VILLAMIZAR MATEO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1020791796 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO MIA GP

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-02-20/12:26:10

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764044703178

(415)7707212489984(8020) 001876404470317 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 3 4 7 0 3	9				

11. Razón social
CONSORCIO MIA GP

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO MIA GP CR 8 12 21 MN	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	MGP	1	200	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 03/02/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO MIA GP** con NIT **901.634.703-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 157069996484

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
