ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.1	M2	REPLANTEO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1	24,00	7	168,00	1	168,00
	AREA 1 -PASILLO	24,00	2,5	60,00	1	60,00
	AREA 2	8,00	6,6	52,80	1	52,80
	AREA 2 - PASILLO	8,00	2,5	20,00	1	20,00
	AREA 3	38,70	7	270,90	1	270,90
	AREA 3 - PASILLO	38,70	2,5	96,75	1	96,75
	INTERSECCION AREA 5	3,50	2,5	8,75	1	8,75
	AREA 5	17,00	7	119,00	1	119,00
	AREA 5 - PASILLO	17,00	2,5	42,50	1	42,50
	AREA 6	10,00	2,5	25,00	1	25,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	863,70
					TOTAL	863,7

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

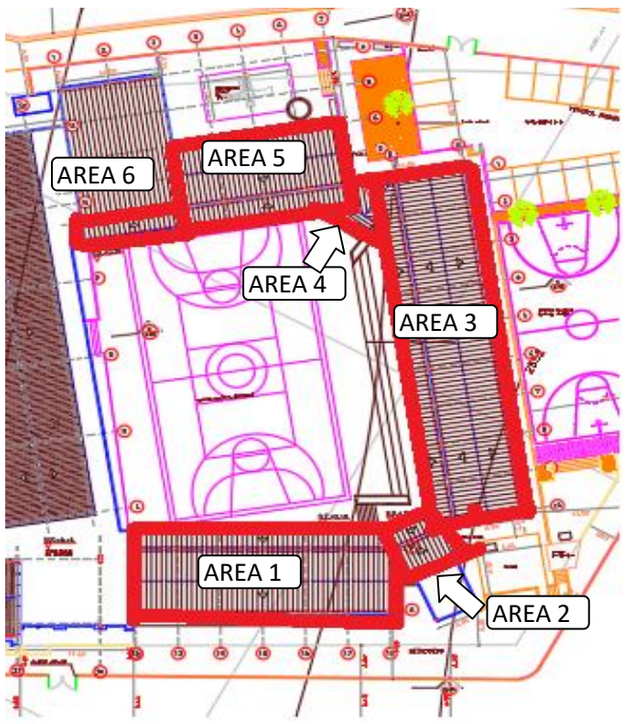



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.3	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
AREA PERIMETRAL CUBIERTA	189,50			1	189,50
BATERIAS SANITARIA	4,50			3	13,50
PASAN:				**SUBTOTAL**	203,00
				TOTAL	203

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	LARGO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 1		5,7	3,60	1	20,52
BAÑO MUJERES PISO 1		5,7	3,60	1	20,52
BAÑOS PROFESORES PISO 1		1,3	1,20	2	3,12
BAÑOS HOMBRES PISO 2		5,7	3,60	1	20,52
BAÑO MUJERES PISO 2		5,7	3,60	1	20,52
BAÑOS PROFESORES PISO 2		1,3	1,20	2	3,12
BAÑOS HOMBRES PISO 3		5,7	3,60	1	20,52
BAÑO MUJERES PISO 3		5,7	3,60	1	20,52
BAÑOS PROFESORES PISO 3		1,3	1,20	2	3,12
					0,00
SALA SISTEMAS		59,24		1	59,24
PASAN:				**SUBTOTAL**	191,72
				TOTAL	191,72

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





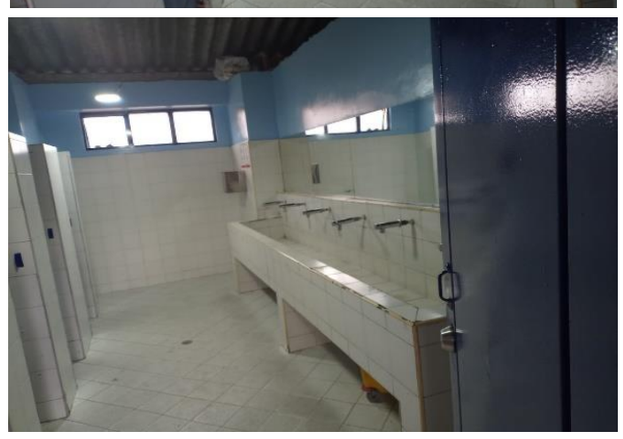

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.15	M2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					0,00
BAÑOS HOMBRES PISO 1	1,30	1,75		4,00	9,10
BAÑO MUJERES PISO 1	1,30	1,75		5,00	11,38
BAÑOS HOMBRES PISO 2	1,30	1,75		4,00	9,10
BAÑO MUJERES PISO 2	1,30	1,75		5,00	11,38
BAÑOS HOMBRES PISO 3	1,30	1,75		4,00	9,10
BAÑO MUJERES PISO 3	1,30	1,75		5,00	11,38
PASAN:				**SUBTOTAL**	61,43
				TOTAL	61,43

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

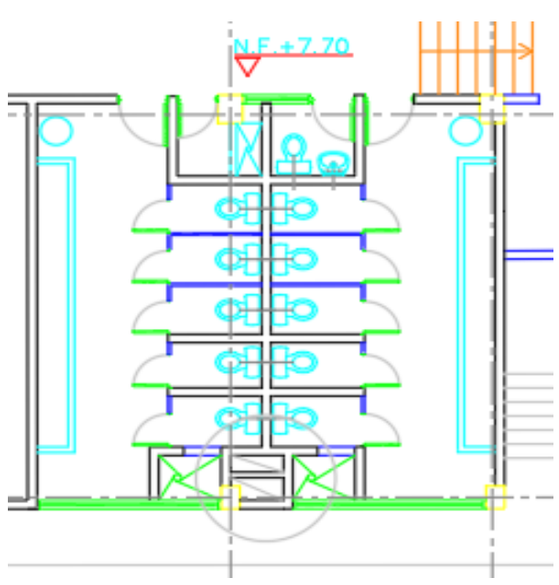



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.18	M2	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS DAMAS PISO 1	17,40		1,92		33,41
BAÑOS HOMBRES PISO 1	17,40		1,90		33,06
BAÑOS PROFESORES 1	2,93		1,88		5,51
CUARTO DE ASEO PISO 1	2,93		1,86		5,45
BAÑOS DAMAS PISO 2	17,40		1,84		32,02
BAÑOS HOMBRES PISO 2	17,40		1,82		31,67
BAÑOS PROFESORES 2	2,93		1,80		5,27
CUARTO DE ASEO PISO 2	2,93		1,78		5,22
BAÑOS DAMAS PISO 3	17,40		1,76		30,62
BAÑOS HOMBRES PISO 3	17,40		1,74		30,28
BAÑOS PROFESORES 3	2,93		1,72		5,04
CUARTO DE ASEO PISO 3	2,93		1,70		4,98
PASAN:				**SUBTOTAL**	222,52
				TOTAL	222,52

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

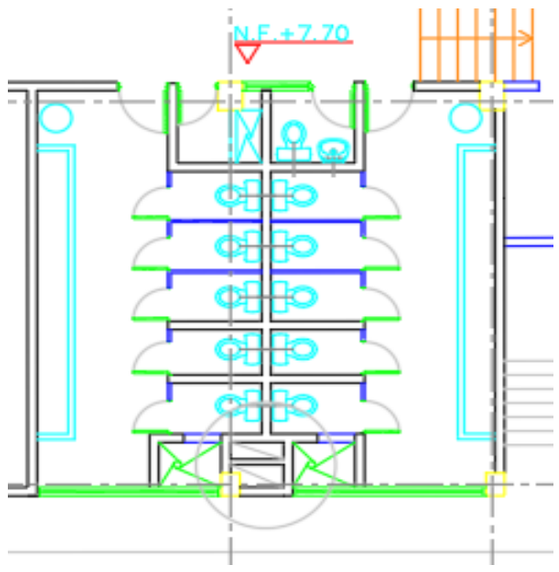

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.19	M	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					0,00
Baños medida 1	5,61			9,00	50,49
Baños medida 2		1,75		15,00	0,00
Baños medida 3	4,65			9,00	41,85
PASAN:				**SUBTOTAL**	92,34
				TOTAL	92,34

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

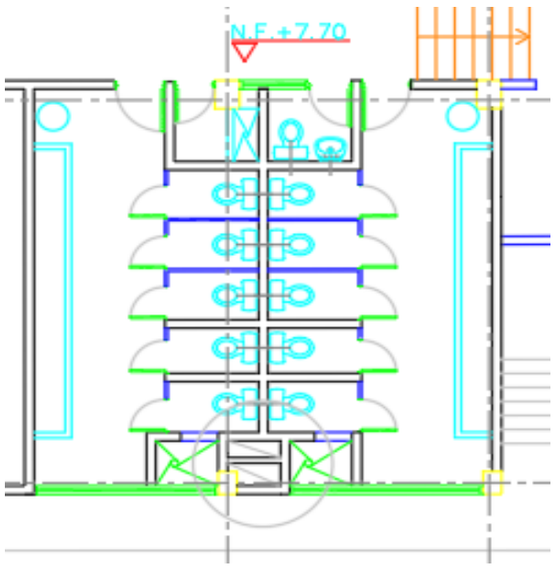

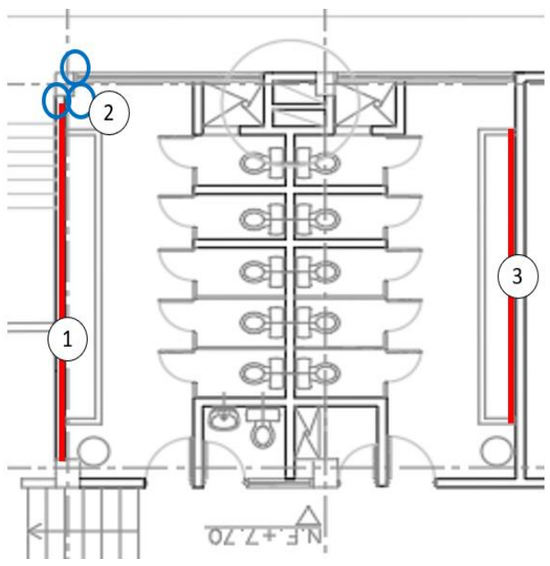

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.20	M2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 1	17,8		1,75		31,15
BAÑO MUJERES PISO 1	17,8		1,75		31,15
BAÑOS PROFESORES PISO 1	4,2		1,75		7,35
BAÑOS HOMBRES PISO 2	17,8		1,75		31,15
BAÑO MUJERES PISO 2	17,8		1,75		31,15
BAÑOS PROFESORES PISO 2	4,2		1,75		7,35
BAÑOS HOMBRES PISO 3	17,8		1,75		31,15
BAÑO MUJERES PISO 3	17,8		1,75		31,15
BAÑOS PROFESORES PISO 3	4,2		1,75		7,35
PASAN:				**SUBTOTAL**	208,95
				TOTAL	208,95

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

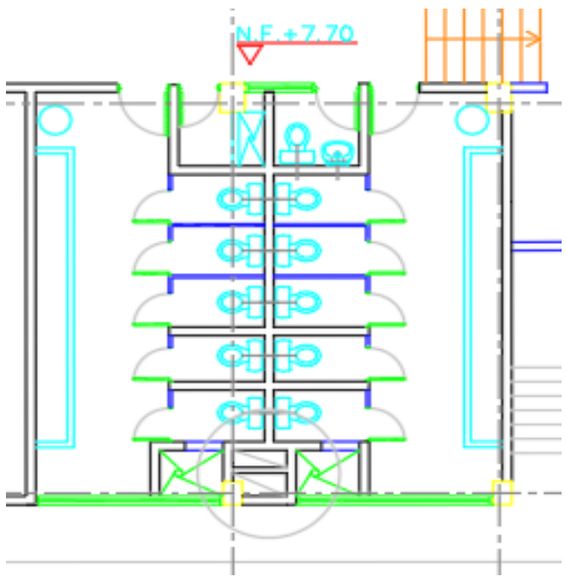



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.23	UN	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 1			6,00	1	6,00
BAÑO MUJERES PISO 1			6,00	1	6,00
BAÑOS PROFESORES PISO 1			1,00	1	1,00
BAÑOS HOMBRES PISO 2			6,00	1	6,00
BAÑO MUJERES PISO 2			6,00	1	6,00
BAÑOS PROFESORES PISO 2			1,00	1	1,00
BAÑOS HOMBRES PISO 3			6,00	1	6,00
BAÑO MUJERES PISO 3			6,00	1	6,00
BAÑOS PROFESORES PISO 3			1,00	1	1,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	39,00
				TOTAL	39

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

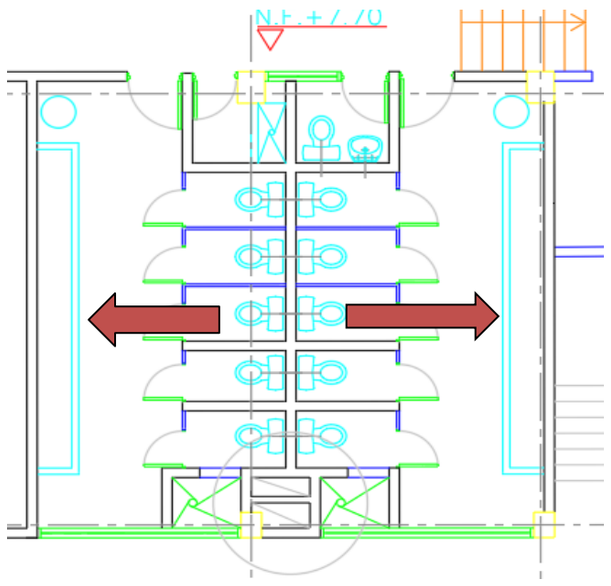



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.28	M2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 1	1,89		6,00	1	11,34
BAÑO MUJERES PISO 1	1,89		6,00	1	11,34
BAÑOS PROFESORES PISO 1	1,89		1,00	1	1,89
BAÑOS HOMBRES PISO 2	1,89		6,00	1	11,34
BAÑO MUJERES PISO 2	1,89		6,00	1	11,34
BAÑOS PROFESORES PISO 2	1,89		1,00	1	1,89
BAÑOS HOMBRES PISO 3	1,89		6,00	1	11,34
BAÑO MUJERES PISO 3	1,89		6,00	1	11,34
BAÑOS PROFESORES PISO 3	1,89		1,00	1	1,89
PASAN:				**SUBTOTAL**	73,71
				TOTAL	73,71

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

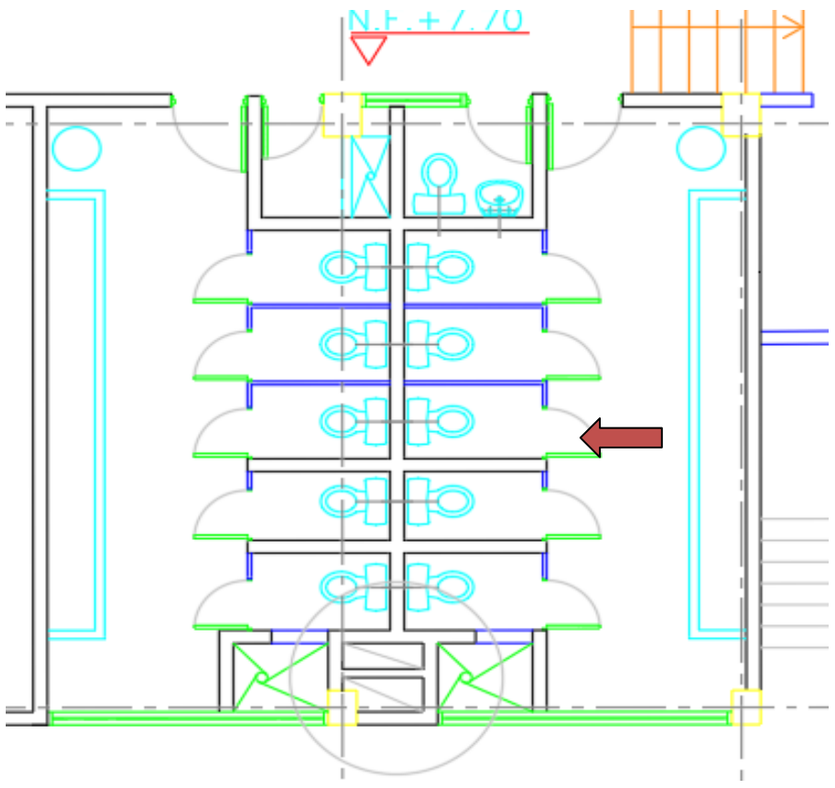





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.30	UN	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 1			7,00	1	7,00
BAÑO MUJERES PISO 1			7,00	1	7,00
BAÑOS PROFESORES PISO 1			2,00	1	2,00
BAÑOS HOMBRES PISO 2			7,00	1	7,00
BAÑO MUJERES PISO 2			7,00	1	7,00
BAÑOS PROFESORES PISO 2			2,00	1	2,00
BAÑOS HOMBRES PISO 3			7,00	1	7,00
BAÑO MUJERES PISO 3			7,00	1	7,00
BAÑOS PROFESORES PISO 3			2,00	1	2,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	48,00
				TOTAL	48

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.31	M	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS	100,00				100,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	100,00
				TOTAL	100

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						
	AREA 1	24,00	7	168,00	1	168,00
	AREA 1 -PASILLO	24,00	2,5	60,00	1	60,00
	AREA 2	8,00	6,6	52,80	1	52,80
	AREA 2 - PASILLO	8,00	2,5	20,00	1	20,00
	AREA 3	38,70	7	270,90	1	270,90
	AREA 3 - PASILLO	38,70	2,5	96,75	1	96,75
	INTERSECCION AREA 5	3,50	2,5	8,75	1	8,75
	AREA 5	17,00	7	119,00	1	119,00
	AREA 5 - PASILLO	17,00	2,5	42,50	1	42,50
	AREA 6	10,00	2,5	25,00	1	25,00
						0,00
						0,00
PASAN:					**SUBTOTAL**	863,70
					TOTAL	863,7

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

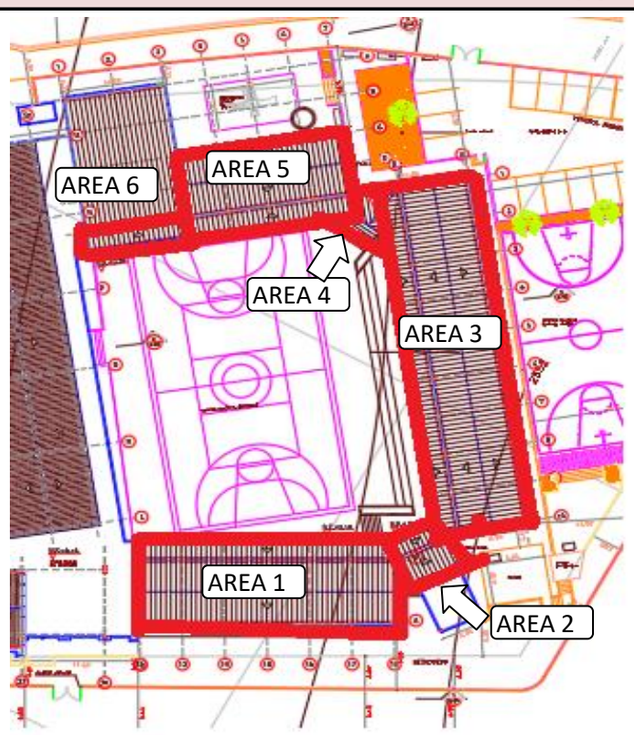



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 3**			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**15**	**05**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.34	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
AREA 1	59,10			1,00	59,10
PASAN:				**SUBTOTAL**	59,10
				TOTAL	59,1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

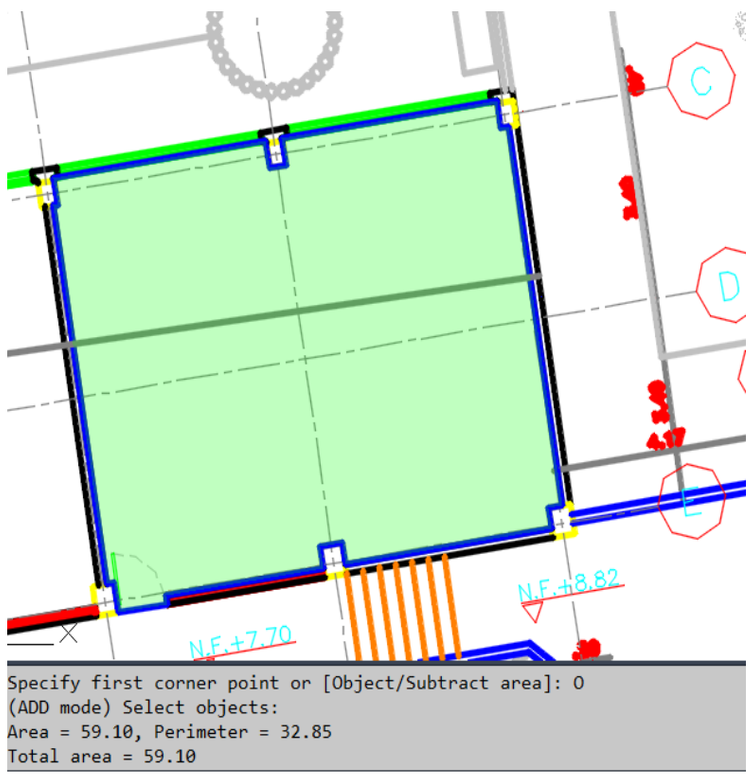

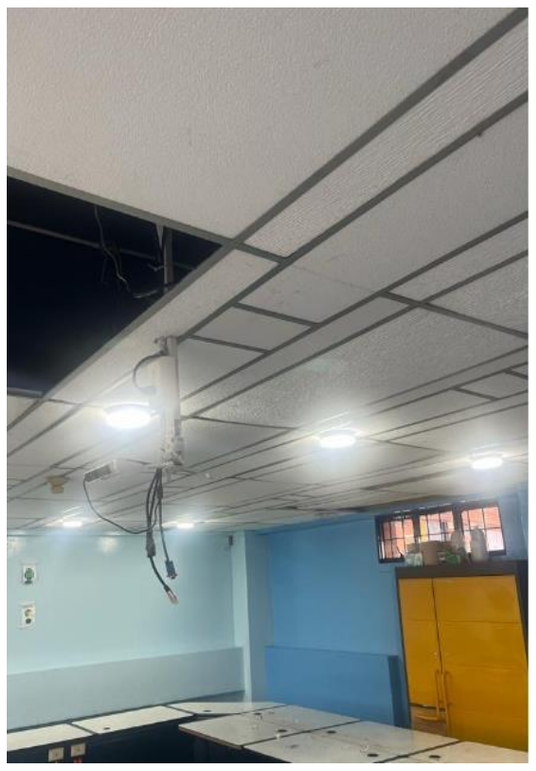

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.35	M2	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 1		1,20	1,80	2,00	4,32
BAÑOS HOMBRES PISO 2		1,20	1,80	2,00	4,32
BAÑOS HOMBRES PISO 3		1,20	1,80	2,00	4,32
PASAN:				**SUBTOTAL**	12,96
				TOTAL	12,96

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

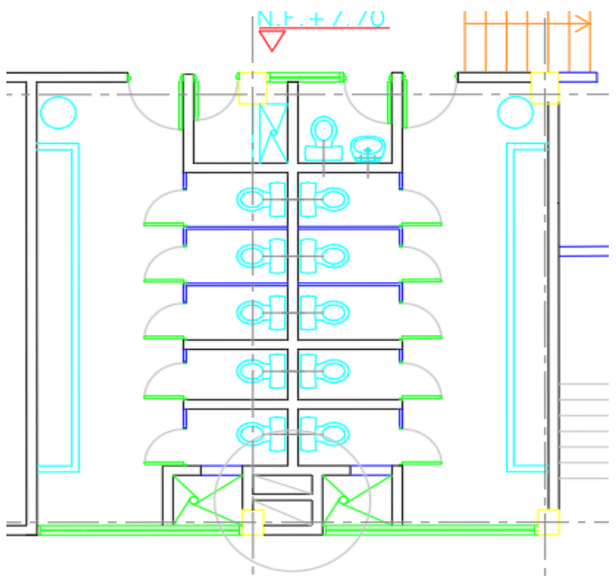

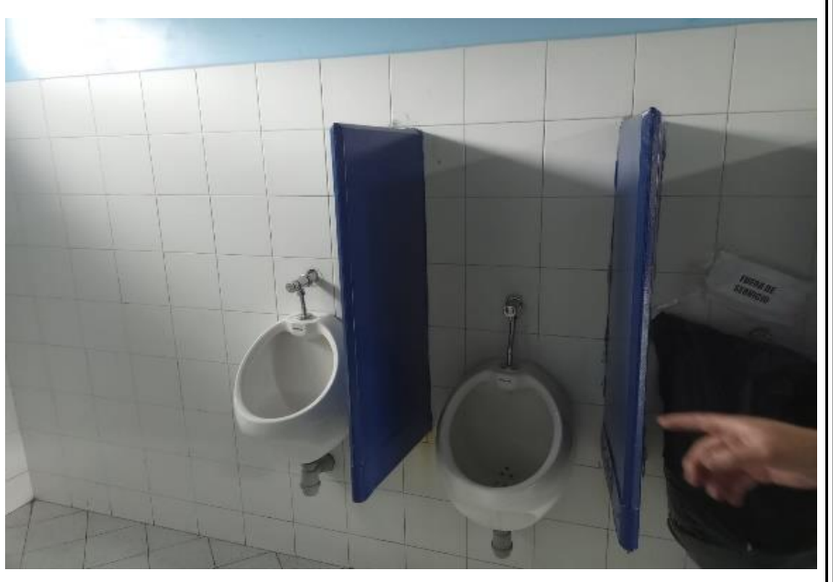

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANT. POR AULA	CANT AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
Aulas			9,00	6	54,00
Paillo			1,00	18	18,00
Baterias sanitarias			8,00	3	24,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	96,00
				TOTAL	96

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.42	M	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
SALA DE COMPUTO				130	130,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	130,00
				TOTAL	130

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.43	UN	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
PISO 3				3	3,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	3,00
				TOTAL	3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

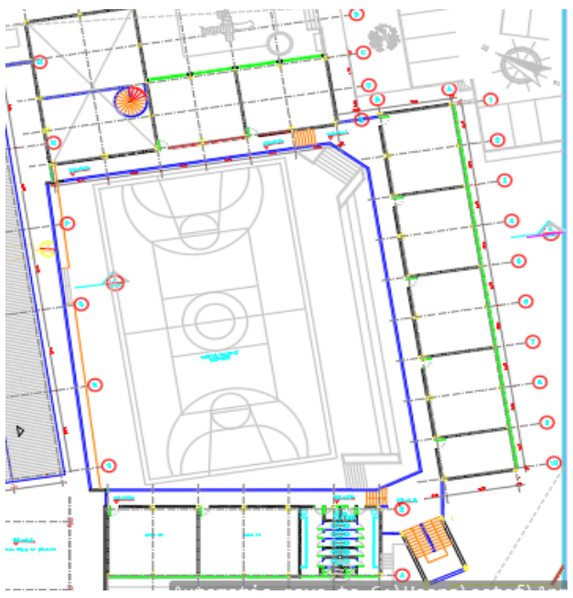



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD POR AULA	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Aulas			9,00	6	54,00
Pasillo			1,00	18	18,00
Baterias sanitarias			8,00	3	24,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	96,00
				TOTAL	96

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

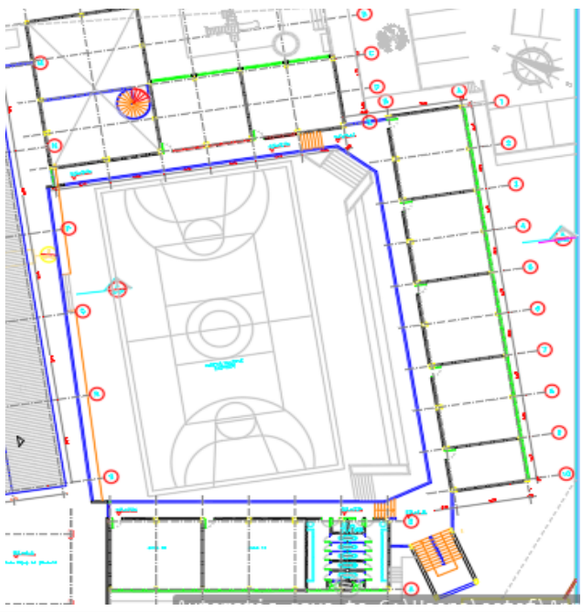



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.45	M	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Ala occidente	36,99			1	36,99
Ala sur	38,20			1	38,20
Ala oriente	27,16			1	27,16
Ala norte	48,43			1	48,43
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	150,78
				TOTAL	150,78

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

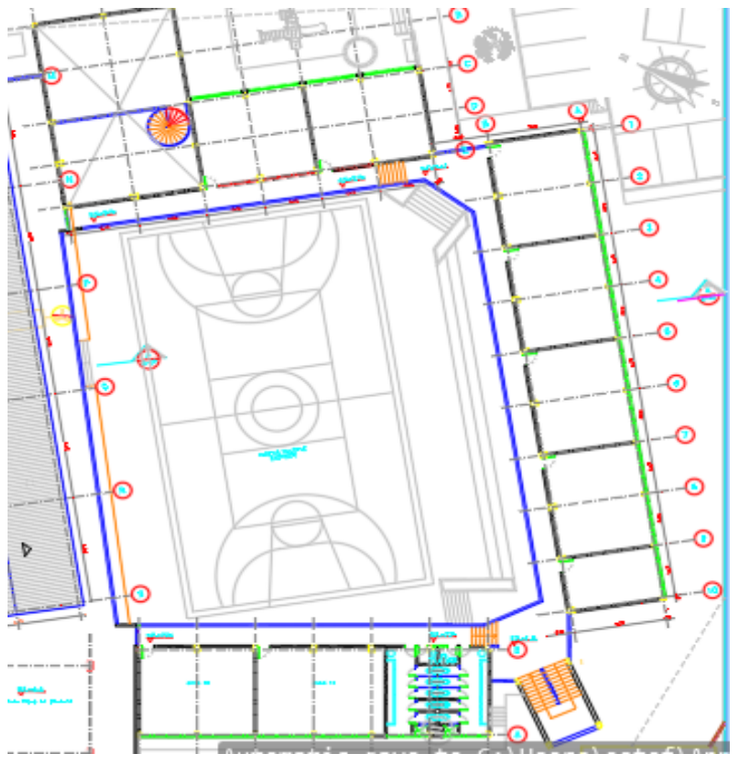



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.46	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Aulas	19,00			9	171,00
Pasillos	36,00			3	108,00
Baterias sanitarias	14,00			6	84,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	363,00
				TOTAL	363

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

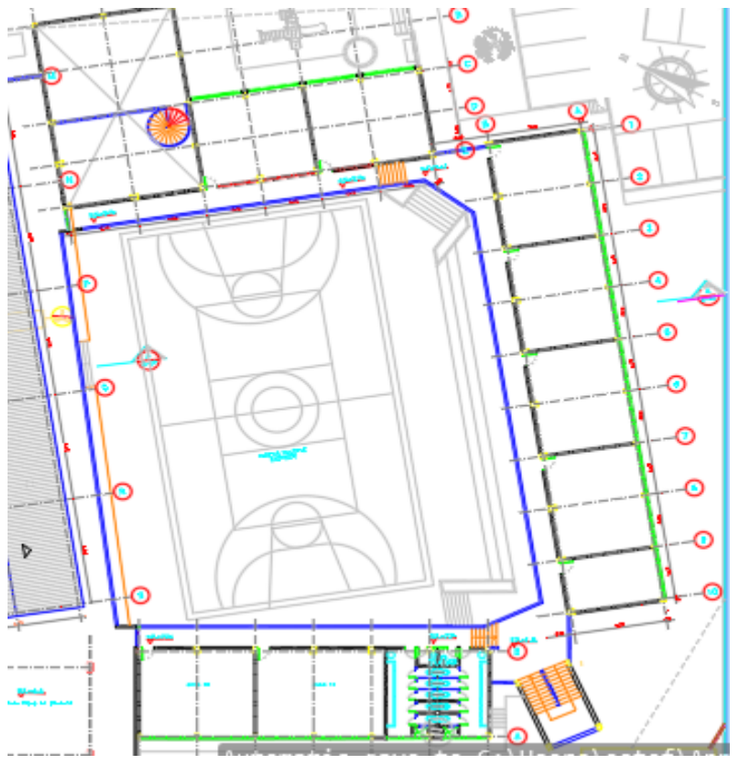



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**15**	**05**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.47	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Aulas	18,00			9	162,00
Pasillos	40,00			3	120,00
Baterias sanitarias	10,00			6	60,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	342,00
				TOTAL	342

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.52	M2	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS				12	12,00
BATERIAS SANITARIAS				8	8,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	20,00
				TOTAL	20

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

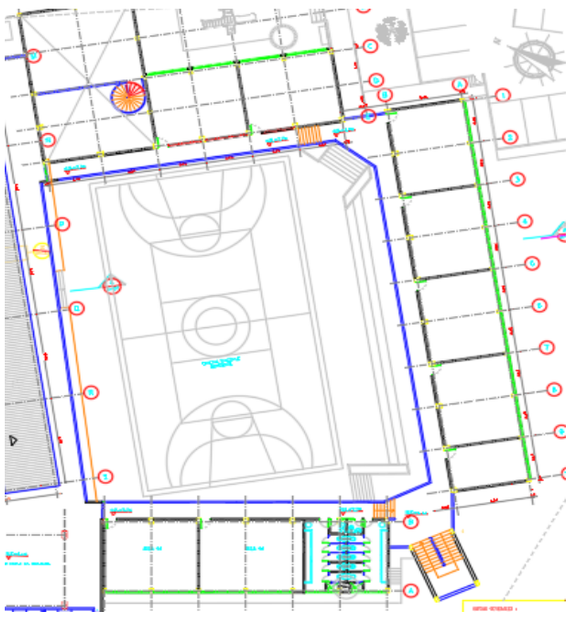



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2022	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.52	M2	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
CANALES	AREA 1.	24,00			2	48,00
		8,00			1	8,00
	AREA 2	38,70			2	77,40
	AREA 3	27,00			1	27,00
		17,00			1	17,00
PASAN:					SUBTOTAL	177,40
					TOTAL	177,4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

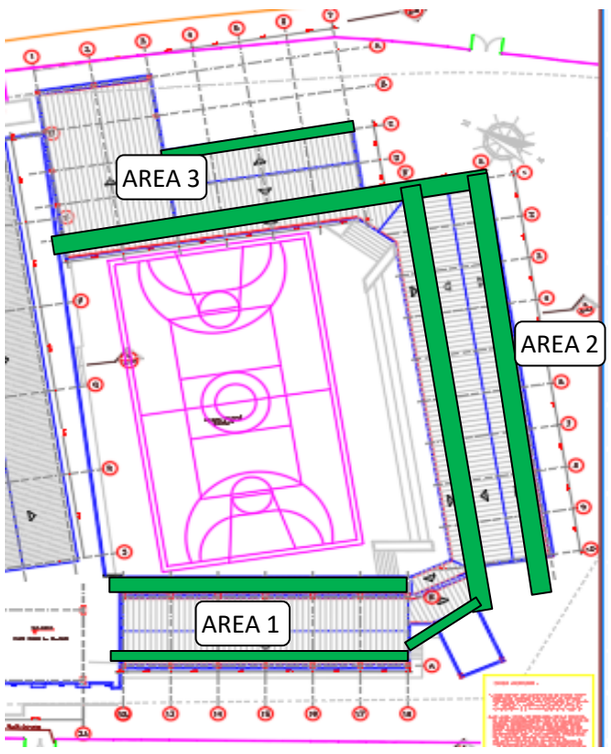



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.4.1	M	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS	19,00			9	171,00
BATERIAS SANITARIAS	12,00			6	114,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	285,00
				TOTAL	285

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

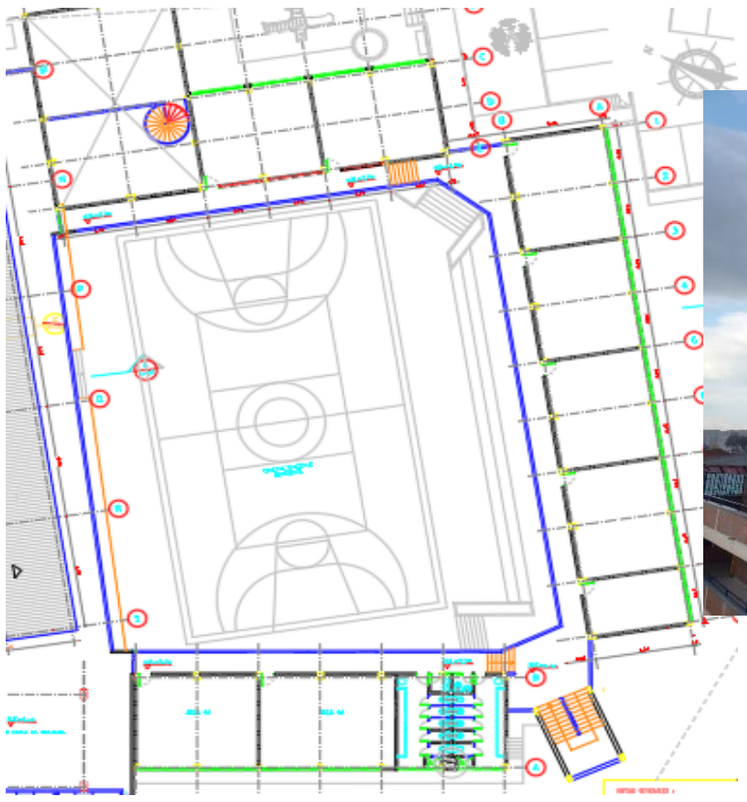



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.4.7	M3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	M3	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
	Trasiego			6,00	6	36,00
PASAN:					SUBTOTAL	36,00
					TOTAL	36

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

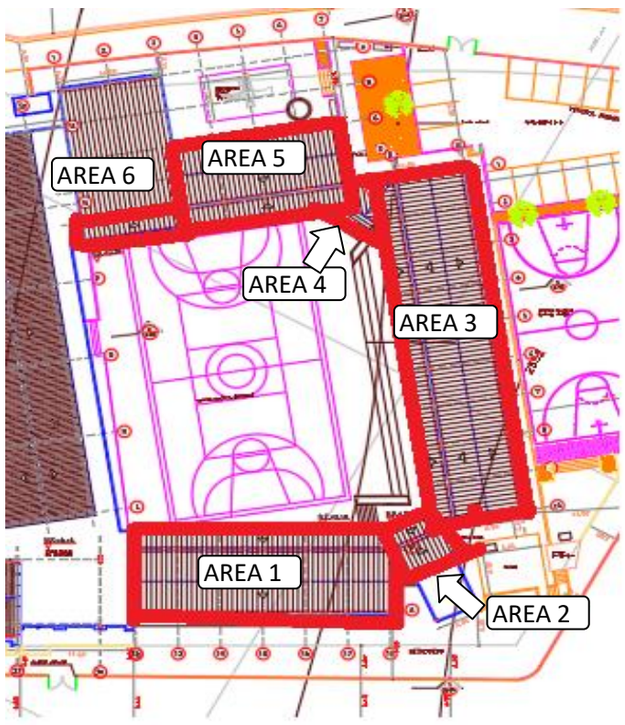



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.4.10	M	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
CANALES	AREA 1.	24,00			2	48,00
		8,00			1	8,00
	AREA 2	38,70			2	77,40
	AREA 3	27,00			1	27,00
		17,00			1	17,00
BAJANTES	AREA 1	13,20			5	66,00
	AREA 2	13,20			8	105,60
	AREA 3	13,20			4	52,80
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					**SUBTOTAL**	401,80
					TOTAL	401,8

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

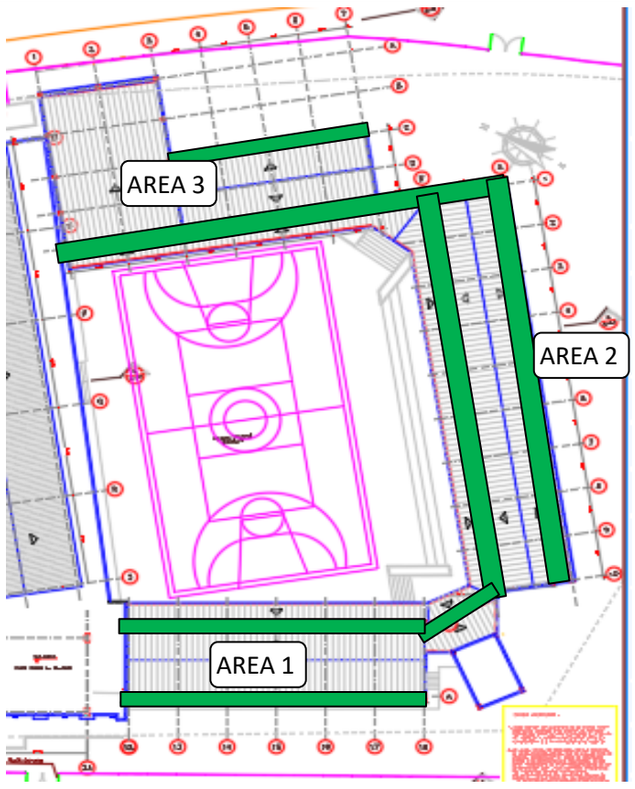



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.2.10	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	CANT. POR AULA	CANT.AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS	9,50		2,00	9	171,00
	8,00		2,00	9	144,00
BATERIAS SANITARIAS	7,20		2,00	3	43,20
	5,70		2,00	3	34,20
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	392,40
				TOTAL	392,4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

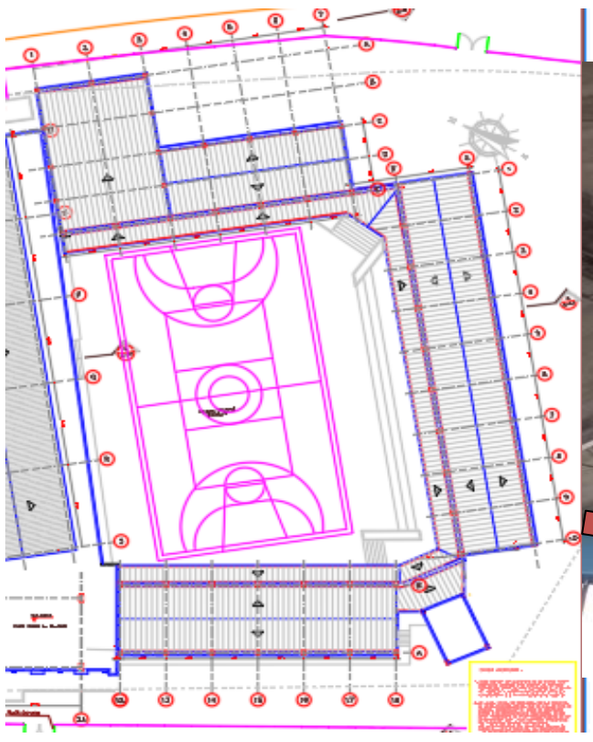

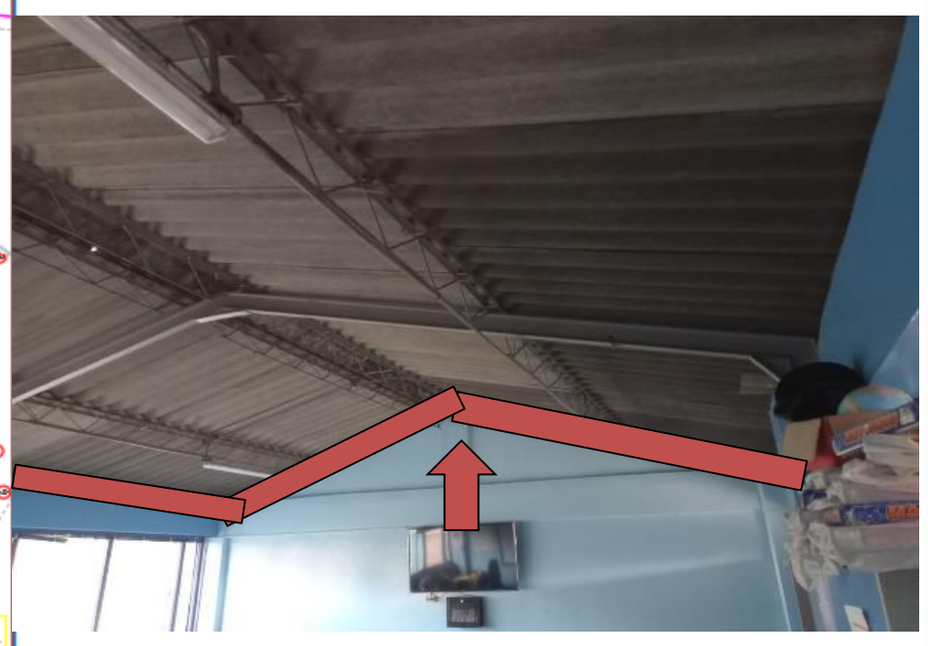

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.5.2	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	KG POR METRO	TOTAL
EDIFICACIONES					
Reforzamiento estructura cubierta	863,70			12	10364,40
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	10364,40
				TOTAL	10364,4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
3.2.10	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						
	AREA 1	10,00			1	10,00
	AREA 2	10,00			2	20,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	30,00
					TOTAL	30

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
3.3.3	UN	ANCLAJES VARILLA 5/8" L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
ANCLAJES PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA				180	180,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	180,00
				TOTAL	180

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

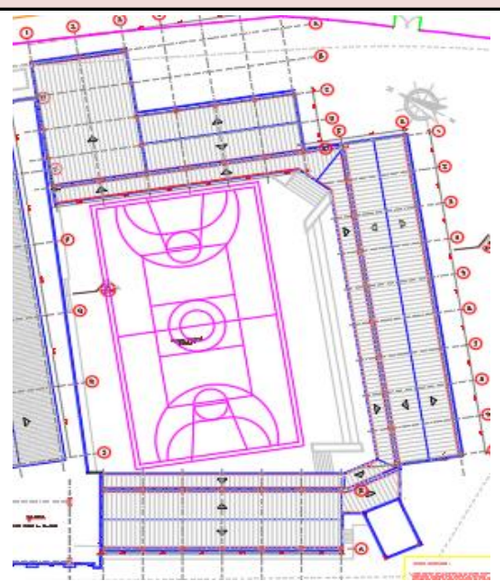



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.2.3	M	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS			16,00	6	96,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	96,00
				TOTAL	96

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

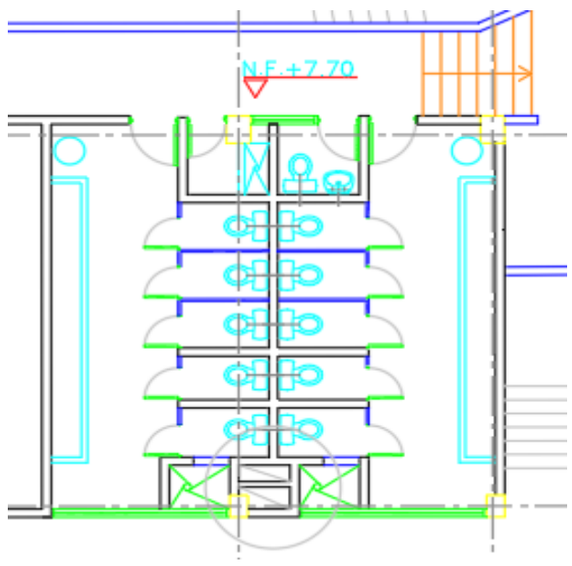

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.2.4	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	CANT. POR BATERIAS	CANTIDAD BATEIRAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS			14,00	6	84,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	84,00
				TOTAL	84

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

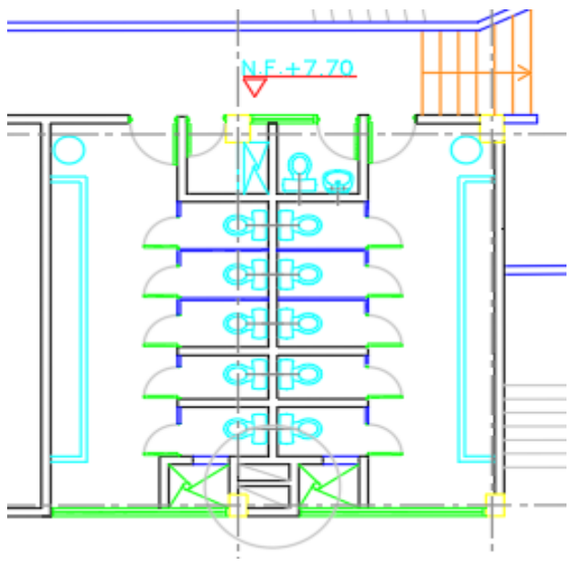

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.2.5	M	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS			9,00	6	54,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	54,00
				TOTAL	54

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

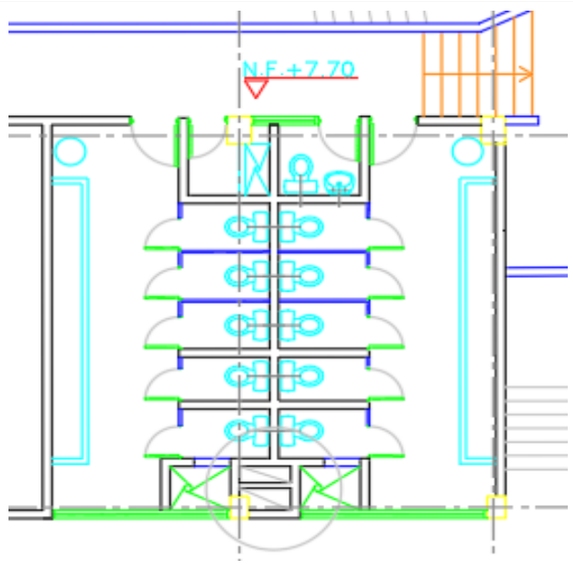

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.2.6	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	CANTID. POR BATERIA	CANTIDAD BATERIAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS			8,00	6	48,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	48,00
				TOTAL	48

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

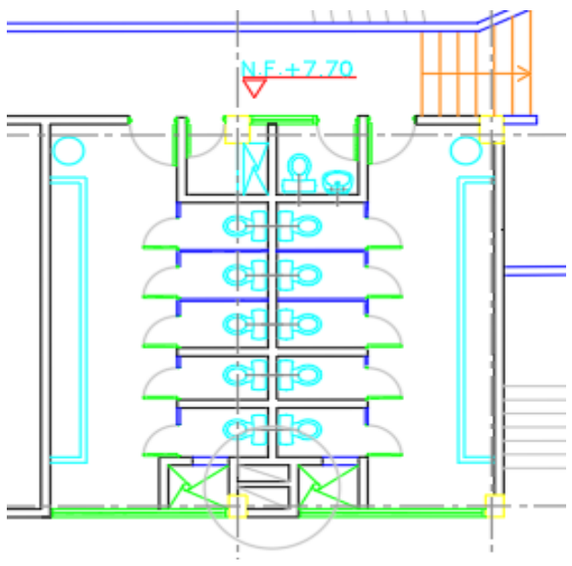

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.2.14	UN	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 1				6	6,00
BATERIAS SANITARIAS PISO 2				6	6,00
BATERIAS SANITARIAS PISO 3				6	6,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	18,00
				TOTAL	18

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

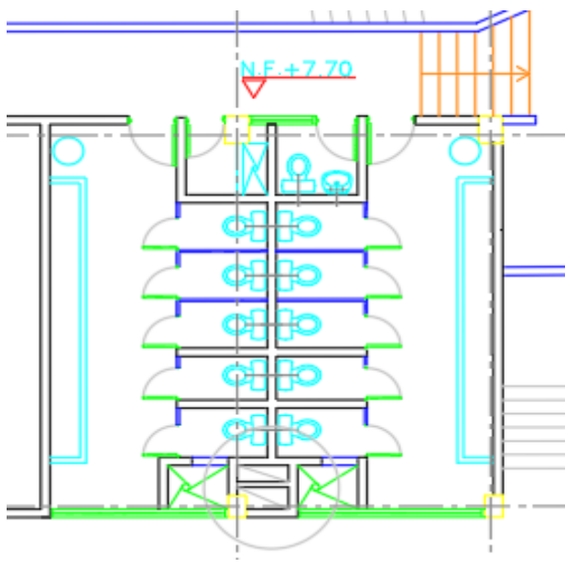

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.2.15	UN	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 1				2	2,00
BATERIAS SANITARIAS PISO 2				2	2,00
BATERIAS SANITARIAS PISO 3				2	2,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	6,00
				TOTAL	6

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

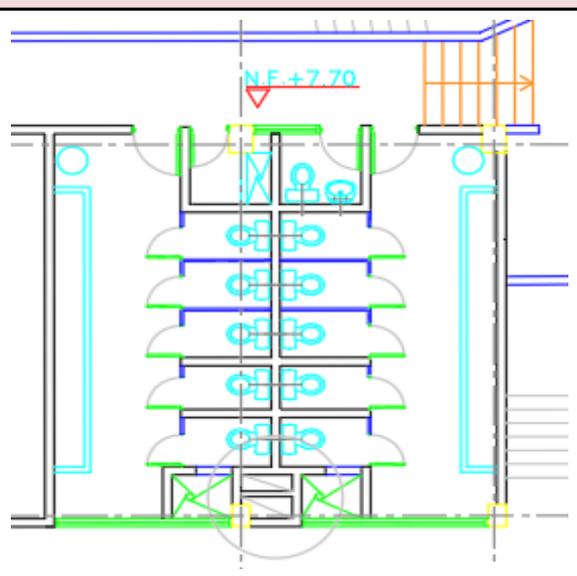

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.9	M	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 " INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 1			18,00		18,00
BATERIAS SANITARIAS PISO 2			18,00		18,00
BATERIAS SANITARIAS PISO 3			18,00		18,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	54,00
				TOTAL	54

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

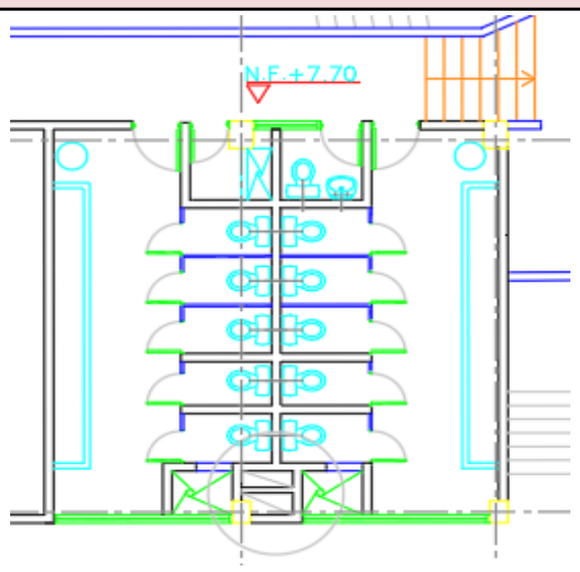

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.10	UN	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 1				8	8,00
BATERIAS SANITARIAS PISO 2				8	8,00
BATERIAS SANITARIAS PISO 3				8	8,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	24,00
				TOTAL	24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

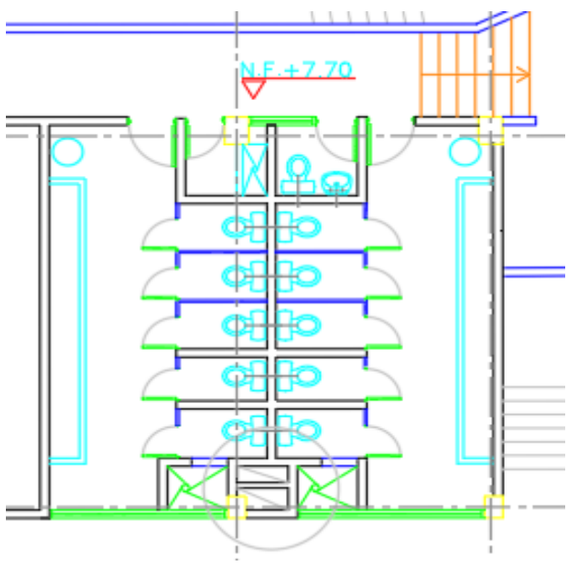

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.8.1	UN	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 1				3	3,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	3,00
				TOTAL	3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

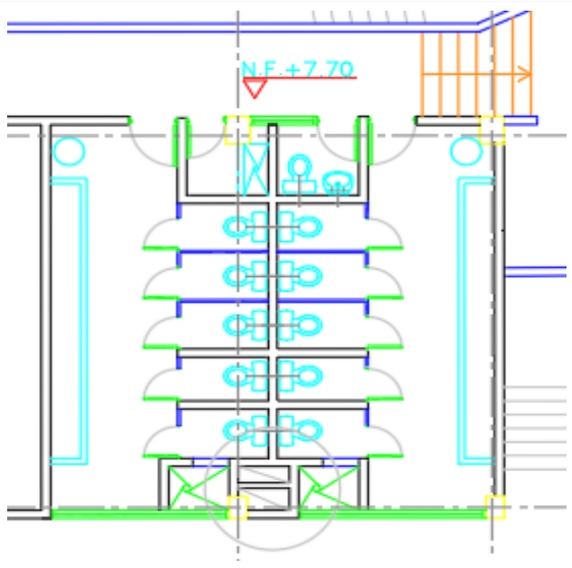

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.1	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	CANT. POR AULA	CANTIDAD AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS BAJO CUBIERTA			2,00	9	18,00
PASILLO			9,00	1	9,00
BATERIAS SANITARIAS			1,00	6	6,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	33,00
				TOTAL	33

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.11	UN	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	CANT. POR AULA	CANTIDAD AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS BAJO LA CUBIERTA			6,00	9	54,00
PASILLO			9,00	1	9,00
BATERIAS SANITARIAS			2,00	6	12,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	75,00
				TOTAL	75

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.50	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	CANT. POR AULA	CANTIDAD AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS BAJO CUBIERTA			24,00	9	216,00
BATERIAS SANITARIAS			26,00	6	156,00
PASILLO			96,00	1	96,00
					0,00
reflectores			150,78	1	150,78
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	618,78
				TOTAL	618,78

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

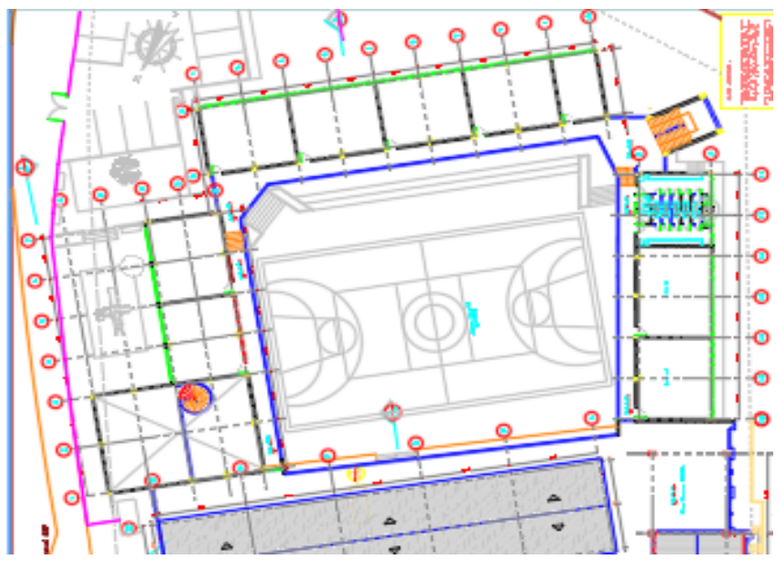

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.56	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS BAJO CUBIERTA			72,00	9	648,00
BATERIAS SANITARIAS			78,00	6	468,00
PASILLO			288,00	1	288,00
					0,00
reflectores			150,78	1	150,78
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1554,78
				TOTAL	1554,78

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

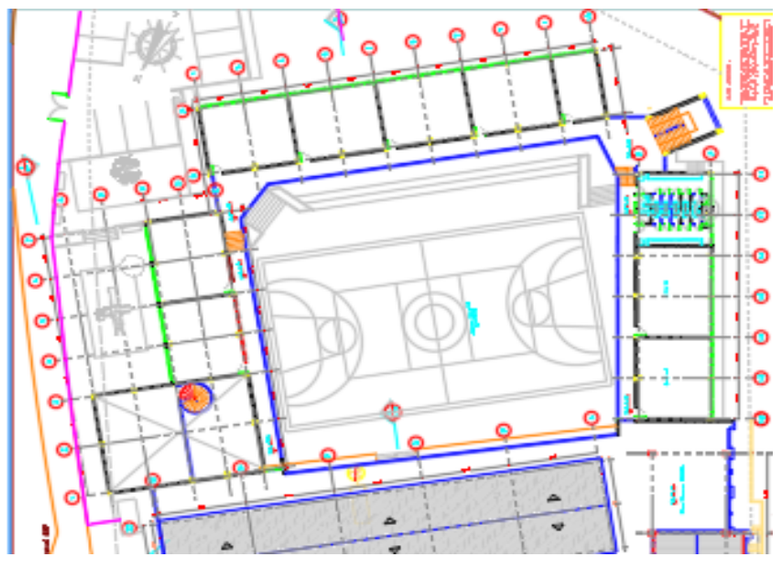

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**15**	**05**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.72	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						
					98	98,00
					4	4,00
PASAN:					**SUBTOTAL**	102,00
					TOTAL	102

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

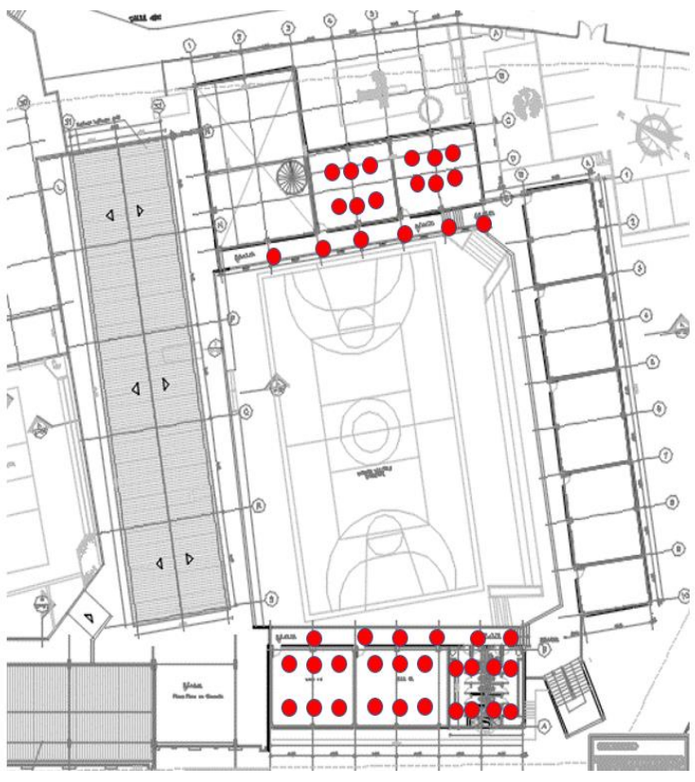

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**15**	**05**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.80	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta					86	86,00
PASAN:					SUBTOTAL	86,00
					TOTAL	86

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

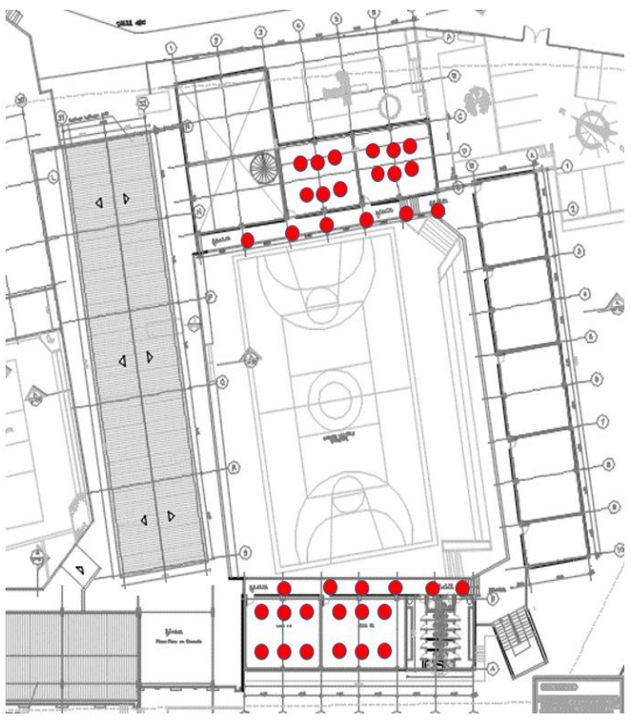

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**15**	**05**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.81	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta					4	4,00
PASAN:					SUBTOTAL	4,00
					TOTAL	4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

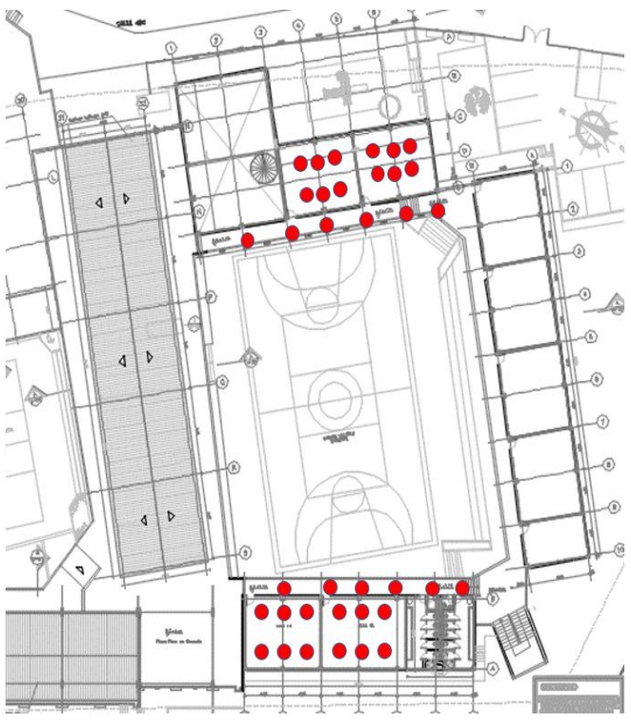

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.88	UN	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	CANT. POR AULA	CANTIDAD AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS			10,00	3	30,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	30,00
				TOTAL	30

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

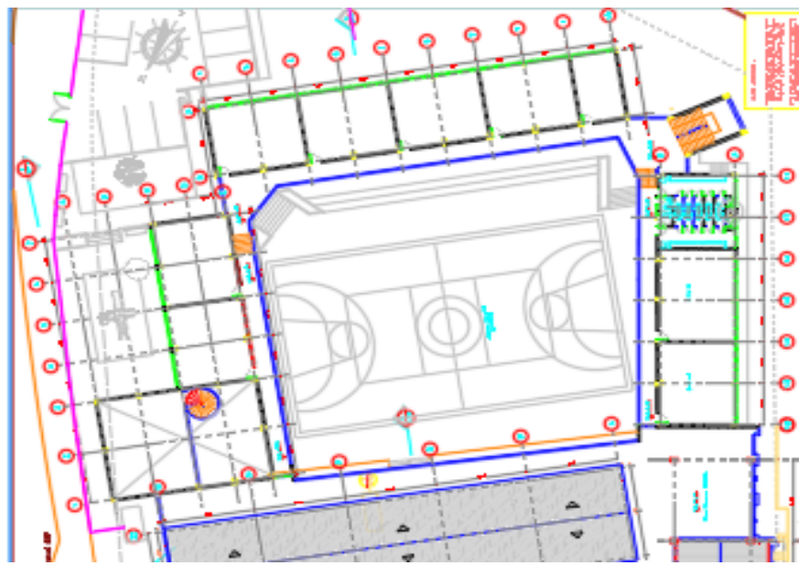

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.1.2	M2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS DAMAS PISO 1		3,6	5,70	1	20,52
BAÑOS HOMBRES PISO 1		3,6	5,70	1	20,52
BAÑOS PROFESORES 1		1,2	1,30	1	1,56
CUARTO DE ASEO PISO 1		1,2	1,30	1	1,56
BAÑOS DAMAS PISO 2		3,6	5,70	1	20,52
BAÑOS HOMBRES PISO 2		3,6	5,70	1	20,52
BAÑOS PROFESORES 2		1,2	1,30	1	1,56
CUARTO DE ASEO PISO 2		1,2	1,30	1	1,56
BAÑOS DAMAS PISO 3		3,6	5,70	1	20,52
BAÑOS HOMBRES PISO 3		3,6	5,70	1	20,52
BAÑOS PROFESORES 3		1,2	1,30	1	1,56
CUARTO DE ASEO PISO 3		1,2	1,30	1	1,56
PASAN:				**SUBTOTAL**	132,48
				TOTAL	132,48

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

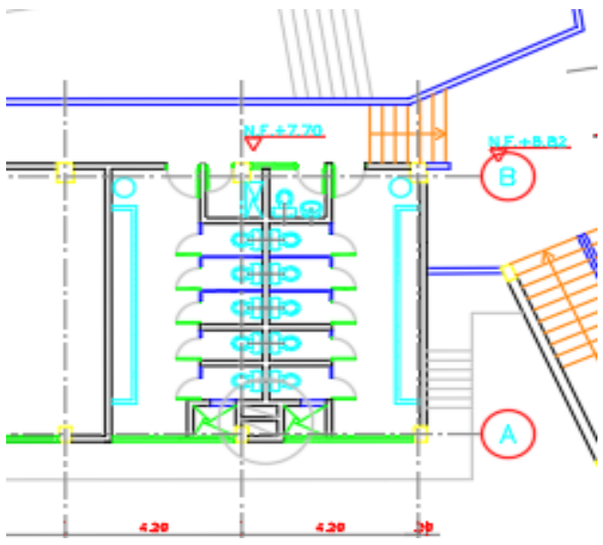



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.2.3	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS DAMAS PISO 1			1,00		1,00
BAÑOS HOMBRES PISO 1			1,00		1,00
BAÑOS PROFESORES 1			0,90		0,90
CUARTO DE ASEO PISO 1			0,90		0,90
BAÑOS DAMAS PISO 2			1,00		1,00
BAÑOS HOMBRES PISO 2			1,00		1,00
BAÑOS PROFESORES 2			0,90		0,90
CUARTO DE ASEO PISO 2			0,90		0,90
BAÑOS DAMAS PISO 3			1,00		1,00
BAÑOS HOMBRES PISO 3			1,00		1,00
BAÑOS PROFESORES 3			0,90		0,90
CUARTO DE ASEO PISO 3			0,90		0,90
PASAN:				**SUBTOTAL**	11,40
				TOTAL	11,4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

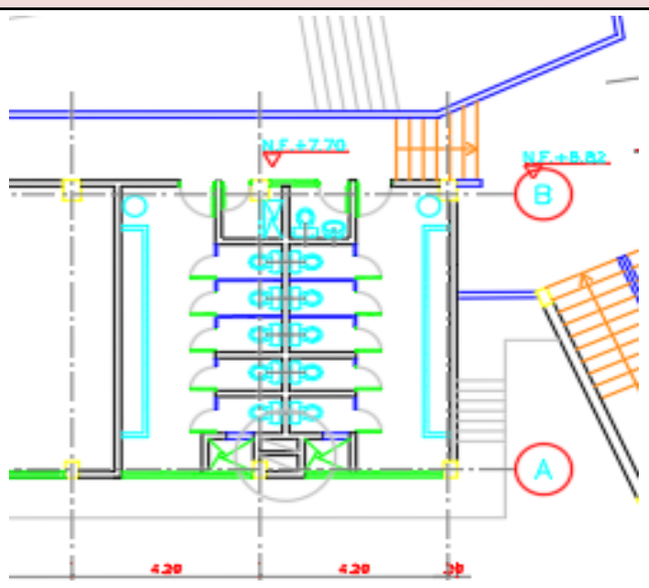

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.2.6	M	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO SOBRE MESONES, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS DAMAS PISO 1			17,40		17,40
BAÑOS HOMBRES PISO 1			17,40		17,40
BAÑOS PROFESORES 1			2,93		2,93
CUARTO DE ASEO PISO 1			2,93		2,93
BAÑOS DAMAS PISO 2			17,40		17,40
BAÑOS HOMBRES PISO 2			17,40		17,40
BAÑOS PROFESORES 2			2,93		2,93
CUARTO DE ASEO PISO 2			2,93		2,93
BAÑOS DAMAS PISO 3			17,40		17,40
BAÑOS HOMBRES PISO 3			17,40		17,40
BAÑOS PROFESORES 3			2,93		2,93
CUARTO DE ASEO PISO 3			2,93		2,93
PASAN:				**SUBTOTAL**	121,98
				TOTAL	121,98

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

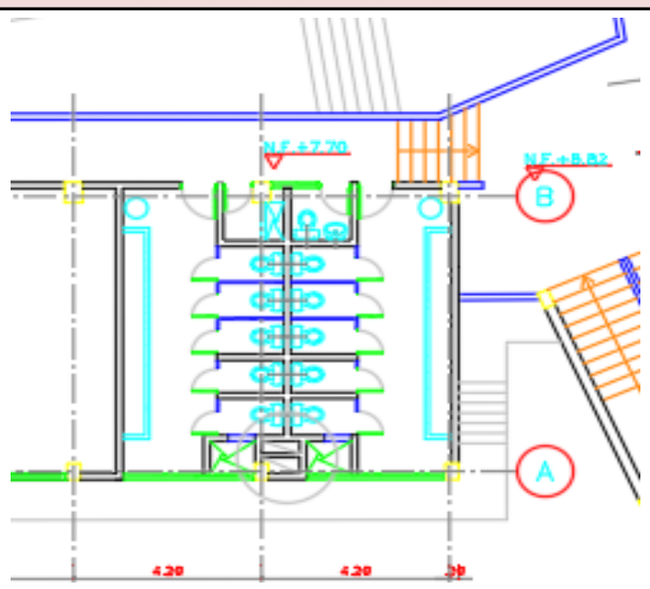

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.2.39	M	WIN DE ALUMINIO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					0,00
Baños medida	5,61			9,00	50,49
Baños medida		1,75		21,00	0,00
Baños medida	4,65			9,00	41,85
Baños medida	0,75			3,00	2,25
PASAN:				**SUBTOTAL**	94,59
				TOTAL	94,59

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

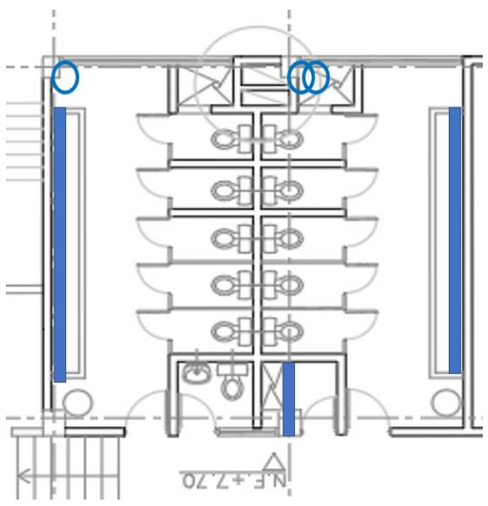

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.2.40	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO TIPO TARALAY O SIMILAR ALTO TRÁFICO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	LARGO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
					0,00
SALA SISTEMAS		59,24		1	59,24
PASAN:				SUBTOTAL	59,24
				TOTAL	59,24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

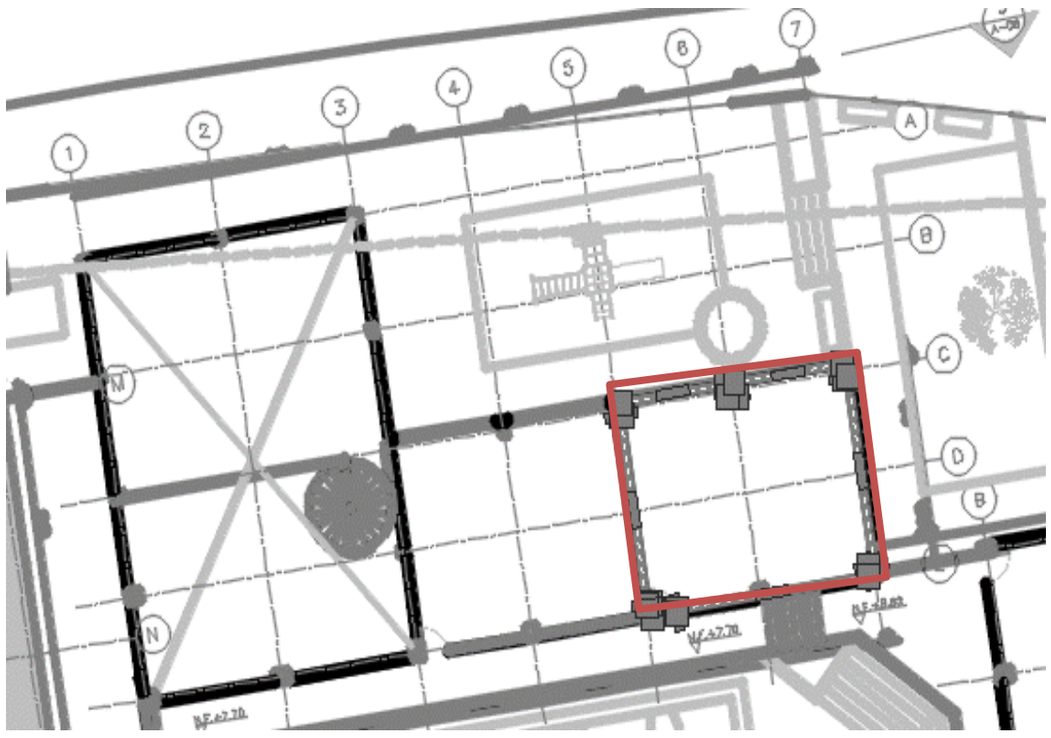

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
8.1.3	M	SUMINISTRO E INSTLACION DE CENEFA EN ENCHAPE 20 x 20 CM

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					0,00
Baños medida 1	5,61			9,00	50,49
Baños medida 2		1,75		15,00	0,00
Baños medida 3	4,65			9,00	41,85
PASAN:				**SUBTOTAL**	92,34
				TOTAL	92,34

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

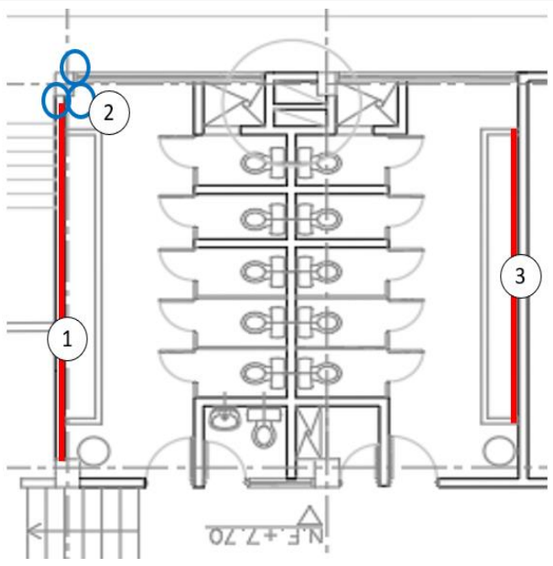

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.3.3	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN POLICUARZO, LONGITUD = X ANCHO DE 60 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA 30 CM, CON SALPICADERO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS	4,50	0,7		6	18,90
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	18,90
				TOTAL	18,9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

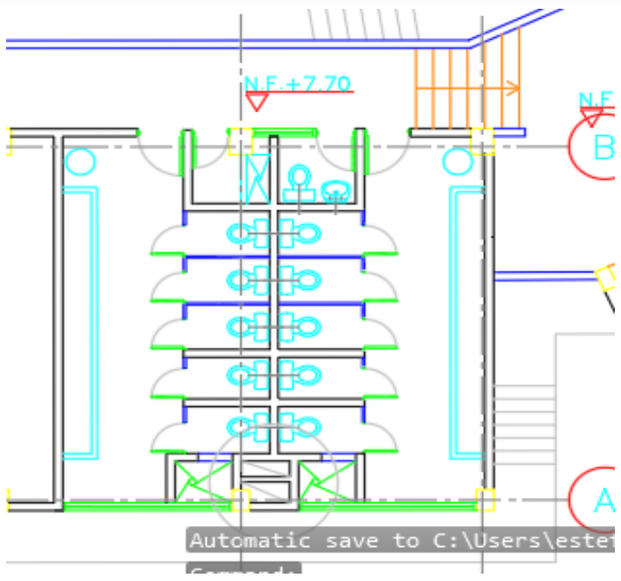



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**15**	**05**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
11.1.1	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 1				6	6,00
BAÑO MUJERES PISO 1				6	6,00
BAÑOS PROFESORES PISO 1				1	1,00
BAÑOS HOMBRES PISO 2				6	6,00
BAÑO MUJERES PISO 2				6	6,00
BAÑOS PROFESORES PISO 2				1	1,00
BAÑOS HOMBRES PISO 3				6	6,00
BAÑO MUJERES PISO 3				6	6,00
BAÑOS PROFESORES PISO 3				1	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	39,00
				TOTAL	39

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

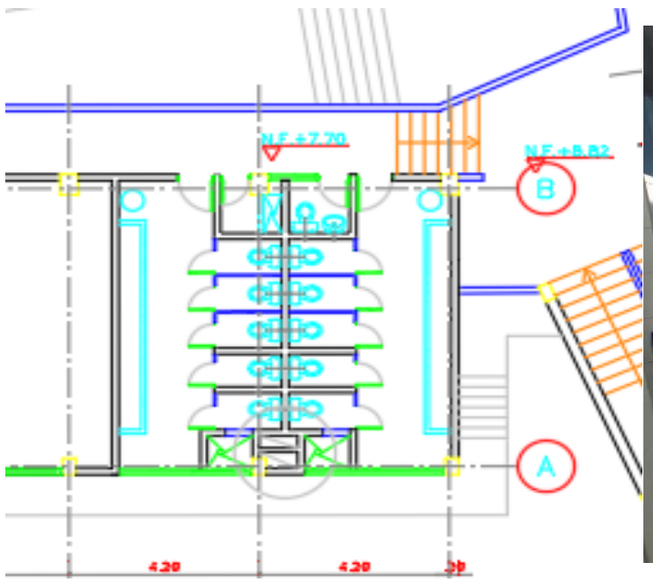



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
11.1.5	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 1				6	6,00
BAÑO MUJERES PISO 1				6	6,00
BAÑOS PROFESORES PISO 1				1	1,00
BAÑOS HOMBRES PISO 2				6	6,00
BAÑO MUJERES PISO 2				6	6,00
BAÑOS PROFESORES PISO 2				1	1,00
BAÑOS HOMBRES PISO 3				6	6,00
BAÑO MUJERES PISO 3				6	6,00
BAÑOS PROFESORES PISO 3				1	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	39,00
				TOTAL	39

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

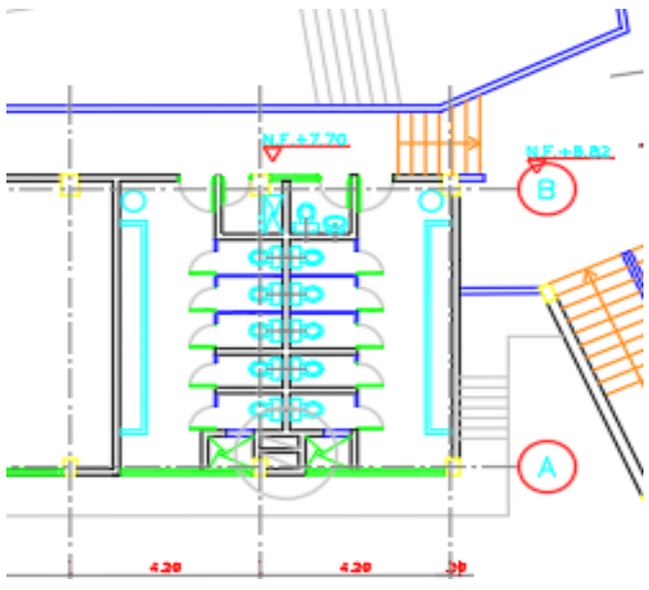



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**15**	**05**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
11.1.8	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIA DE BAÑOS HOMBRES				9	9,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	9,00
				TOTAL	9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



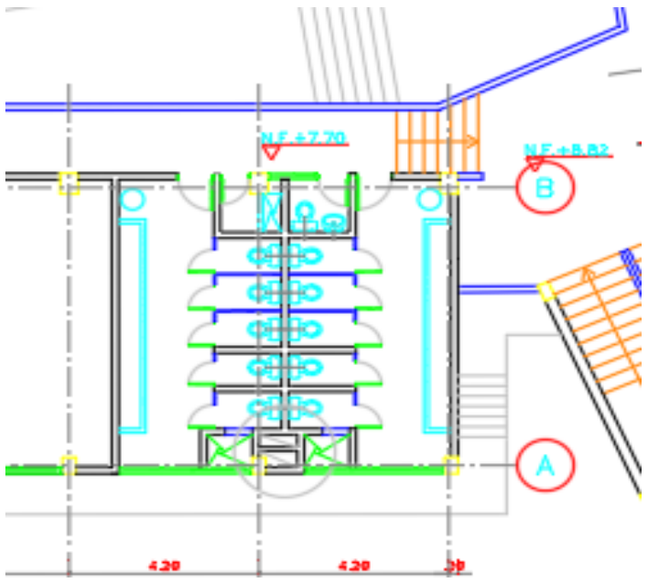

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
11.1.23	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIA SANITARIA				2	2,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	2,00
				TOTAL	2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

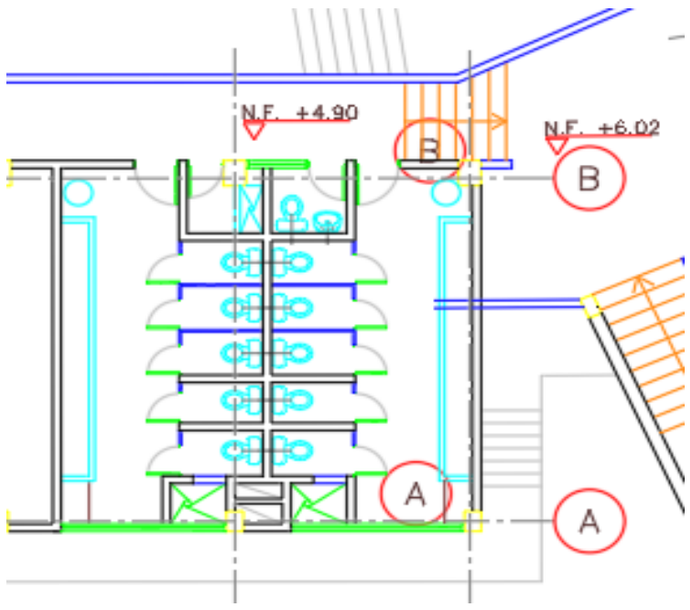

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**15**	**05**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
11.1.23	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						
					1	1,00
PASAN:					SUBTOTAL	1,00
					TOTAL	1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
12.1.8	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	CANTID. POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 1	2,10	0,9	6,00	1	8,89
BAÑO MUJERES PISO 1	2,10	0,9	6,00	1	8,89
BAÑOS PROFESORES PISO 1	2,10	0,9	1,00	1	3,89
BAÑOS HOMBRES PISO 2	2,10	0,9	6,00	1	8,89
BAÑO MUJERES PISO 2	2,10	0,9	6,00	1	8,89
BAÑOS PROFESORES PISO 2	2,10	0,9	1,00	1	3,89
BAÑOS HOMBRES PISO 3	2,10	0,9	6,00	1	8,89
BAÑO MUJERES PISO 3	2,10	0,9	6,00	1	8,89
BAÑOS PROFESORES PISO 3	2,10	0,9	1,00	1	3,89
DIVISIONES SANITARIOS	2,40	2,10	5,00	6	16,04
DIVISIONES ORINALES	0,70	1,40	4,00	3	7,98
PASAN:				**SUBTOTAL**	89,03
				TOTAL	89,03

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

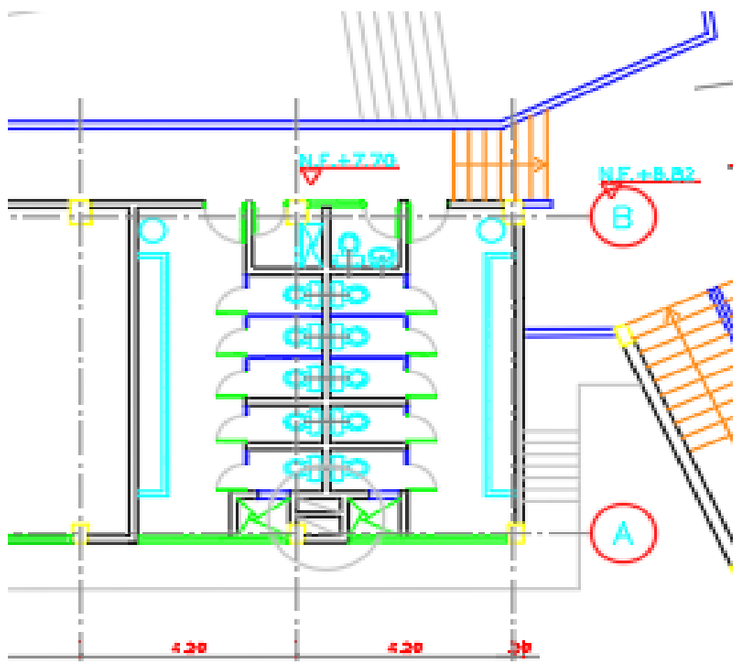



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.1.1	M2	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS DAMAS PISO 1	17,40		1,75		30,45
BAÑOS HOMBRES PISO 1	17,40		1,75		30,45
BAÑOS PROFESORES 1	2,93		1,75		5,13
CUARTO DE ASEO PISO 1	2,93		1,75		5,13
BAÑOS DAMAS PISO 2	17,40		1,75		30,45
BAÑOS HOMBRES PISO 2	17,40		1,75		30,45
BAÑOS PROFESORES 2	2,93		1,75		5,13
CUARTO DE ASEO PISO 2	2,93		1,75		5,13
BAÑOS DAMAS PISO 3	17,40		1,75		30,45
BAÑOS HOMBRES PISO 3	17,40		1,75		30,45
BAÑOS PROFESORES 3	2,93		1,75		5,13
CUARTO DE ASEO PISO 3	2,93		1,75		5,13
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	213,47
				TOTAL	213,47

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

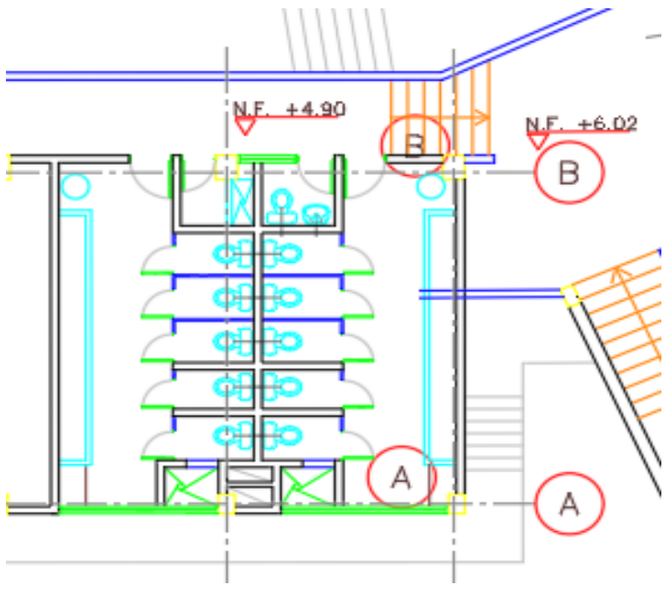

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**15**	**05**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.1.11	M	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1	30,54			1	30,54
	AREA 2	33,80			2	67,60
	AREA 3	20,90			3	62,70
	AREA 4	30,24			4	120,96
	AREA 5	30,25			5	151,25
	AREA 6	30,25			6	181,50
	AREA 7	30,50			7	213,50
	AREA 8	31,31			8	250,48
	AREA 9	30,90			9	278,10
	AREA 10	59,59			10	595,90
PASAN:					SUBTOTAL	1952,53
					TOTAL	1952,53

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

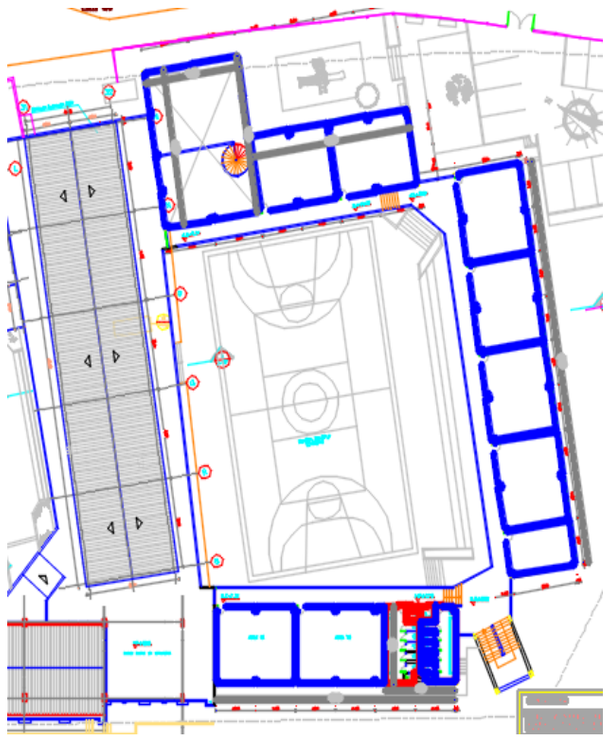

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.2.1	M2	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
AULAS		268,69		2,40	1	644,86
BANOS		110,37		0,65	3	215,22
DOBLE ALTURA		52,59		4,80	1	252,43
VENTANAS AULAS		3,90		1,20	-17	-79,56
VENTANAS BANOS		2,95		0,50	-6	-8,85
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	1024,10
					TOTAL	1024,1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

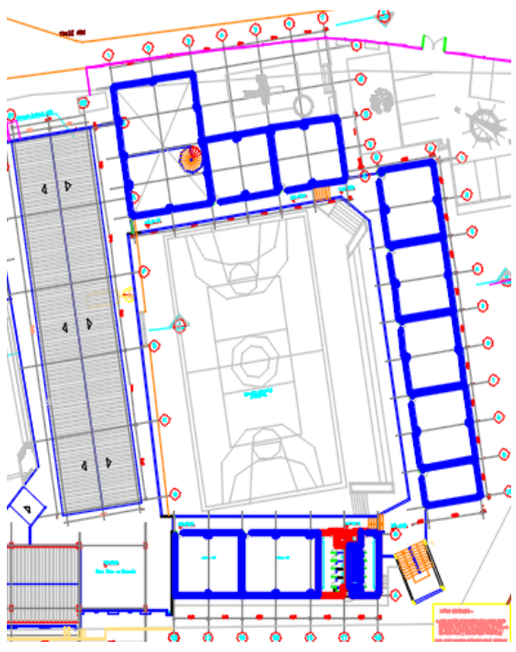

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**15**	**05**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.2.2	M	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1	30,54			1	30,54
	AREA 2	33,80			2	67,60
	AREA 3	20,90			3	62,70
	AREA 4	30,24			4	120,96
	AREA 5	30,25			5	151,25
	AREA 6	30,25			6	181,50
	AREA 7	30,50			7	213,50
	AREA 8	31,31			8	250,48
	AREA 9	30,90			9	278,10
	AREA 10	59,59			10	595,90
PASAN:					SUBTOTAL	1952,53
					TOTAL	1952,53

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

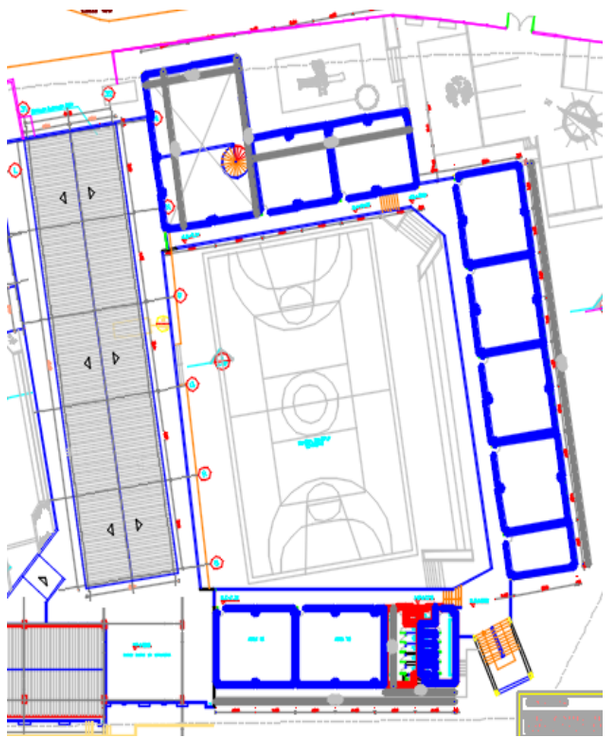

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.2.7	M2	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS DAMAS PISO 1	17,40		1,05		18,27
BAÑOS HOMBRES PISO 1	17,40		1,05		18,27
BAÑOS PROFESORES 1	2,93		1,05		3,08
CUARTO DE ASEO PISO 1	2,93		1,05		3,08
BAÑOS DAMAS PISO 2	17,40		1,05		18,27
BAÑOS HOMBRES PISO 2	17,40		1,05		18,27
BAÑOS PROFESORES 2	2,93		1,05		3,08
CUARTO DE ASEO PISO 2	2,93		1,05		3,08
BAÑOS DAMAS PISO 3	17,40		1,05		18,27
BAÑOS HOMBRES PISO 3	17,40		1,05		18,27
BAÑOS PROFESORES 3	2,93		1,05		3,08
CUARTO DE ASEO PISO 3	2,93		1,05		3,08
PASAN:				**SUBTOTAL**	128,08
				TOTAL	128,08

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

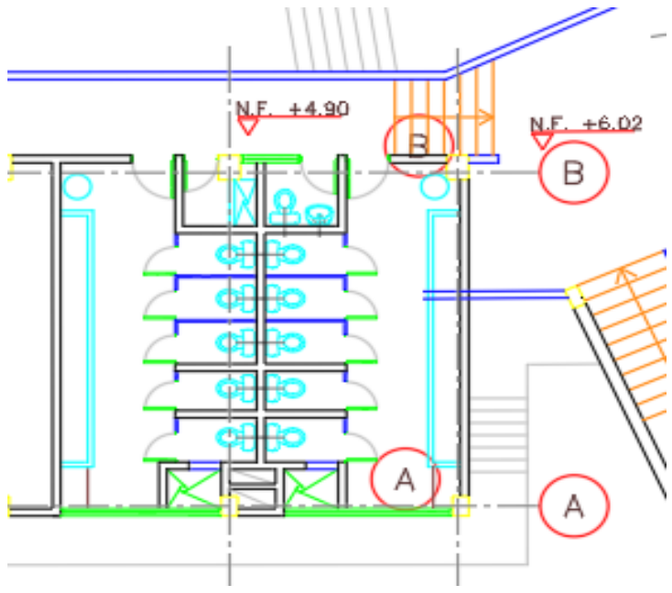

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.4.1	M2	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
AULAS			0,9	2,00	9	16,20
BANOS			0,9	2,00	12	21,60
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	37,80
					TOTAL	37,8

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

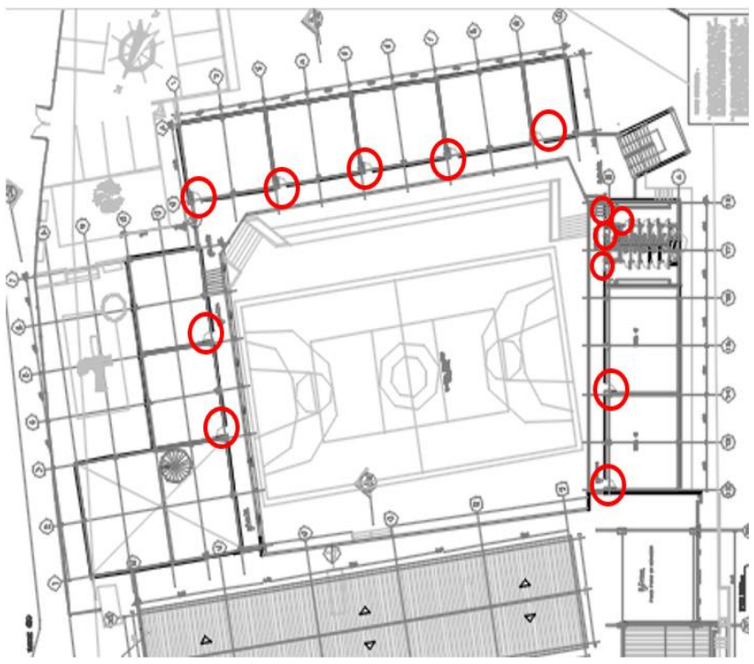

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO
SUPERVISOR	ING.


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	3110287
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.4.3	M	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LONG	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Bloque 1					
Transversal			8,70	21	182,70
longitudinal			26,00	18	468,00
Bloque 2					0,00
Transversal			8,70	30	261,00
longitudinal			39,00	18	702,00
Bloque 3					0,00
Transversal			8,70	24	208,80
longitudinal			28,00	18	504,00
Nuevos perfiles					
Bloque 1					
longitudinal			26,00	10	260,00
Bloque 2					
longitudinal			39,00	10	390,00
Bloque 3					
longitudinal			28,00	10	280,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	3256,50
				TOTAL	3256,50

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

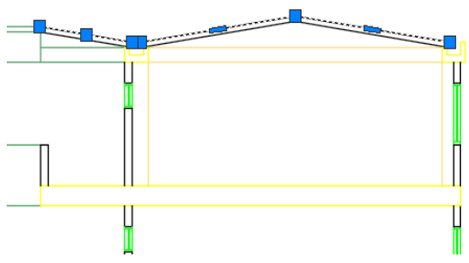

DESCRIPCION

Firma
ING. JHON JAIRO ARBOLEDA ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. CARLOS ANDRES BARRERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
15.2.2	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					0,00
Baño mujeres (1)	4,65	0,85		3,00	11,86
Baño hombres (2)	3,35	0,85		3,00	8,54
Baño profesores (3)	1,22	0,85		3,00	3,11
PASAN:				**SUBTOTAL**	23,51
				TOTAL	23,51

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

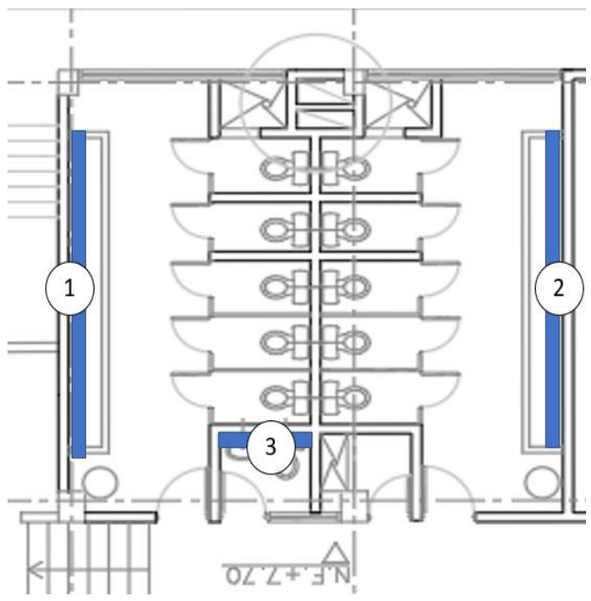

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**15**	**05**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.1	M	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES						
						0,00
CUBIERTA	AREA 1	58,90				58,90
	AREA 2	132,12				132,12
	AREA 3	58,28				58,28
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					**SUBTOTAL**	249,30
					TOTAL	249,3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

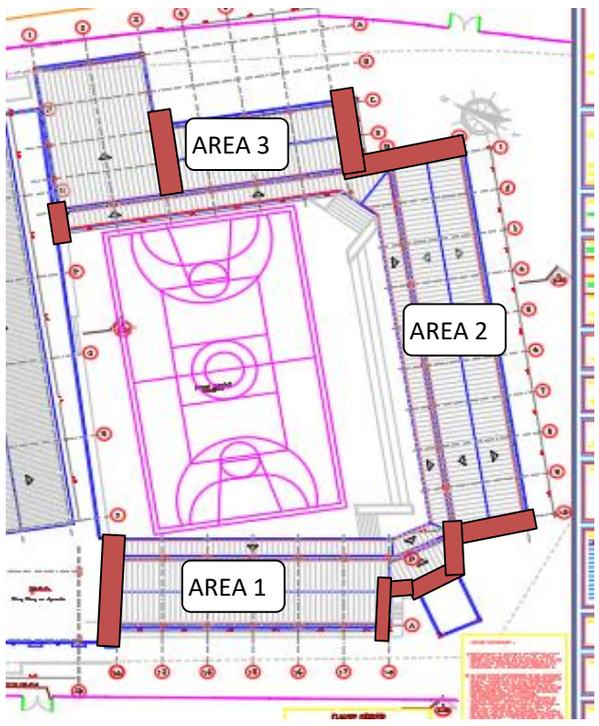



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.5	M	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION			DIMENSIONES				
			LARGO	ANCHO		CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES							
							0,00
Cubierta		Bajantes	14,00			16	224,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
PASAN:						SUBTOTAL	224,00
						TOTAL	224

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.7	M2	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)

DESCRIPCION			DIMENSIONES				
			LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES							
							0,00
CANALES EXISTENTES EN CUBIERTA			24,00			2	48,00
			8,00			1	8,00
			38,70			2	77,40
			27,00			1	27,00
			17,00			1	17,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
PASAN:						SUBTOTAL	177,40
						TOTAL	177,4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

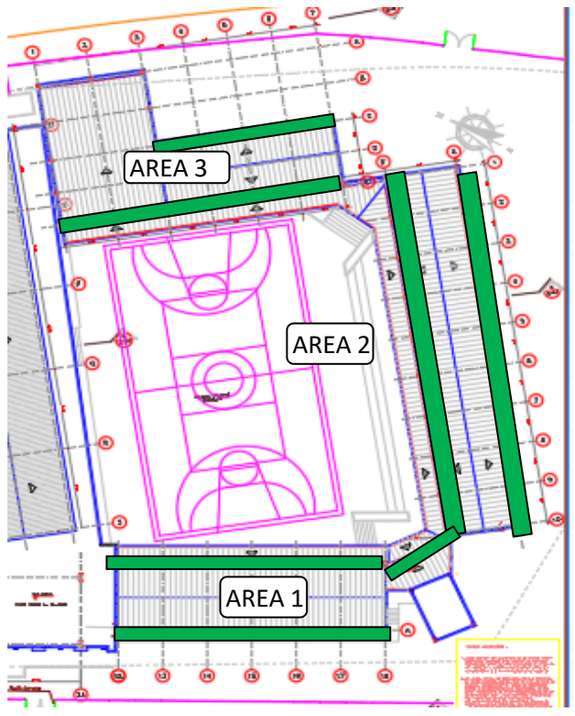



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES						
						0,00
Cubierta	AREA 1	24,00	7	168,00	1	168,00
	AREA 1 -PASILLO	24,00	2,5	60,00	1	60,00
	AREA 2	8,00	6,6	52,80	1	52,80
	AREA 2 - PASILLO	8,00	2,5	20,00	1	20,00
	AREA 3	38,70	7	270,90	1	270,90
	AREA 3 - PASILLO	38,70	2,5	96,75	1	96,75
	INTERSECCION AREA 5	3,50	2,5	8,75	1	8,75
	AREA 5	17,00	7	119,00	1	119,00
	AREA 5 - PASILLO	17,00	2,5	42,50	1	42,50
	AREA 6	10,00	2,5	25,00	1	25,00
	PENDIENTE					215,75
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	1079,45
					TOTAL	1079,45

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

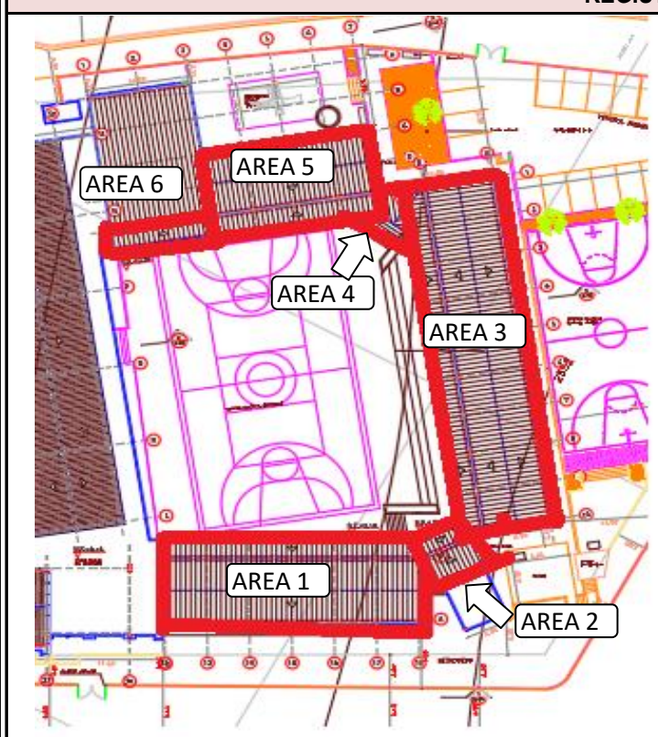



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.30	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						0,00
	AREA 1	24				24,00
	AREA 2	38,7				38,70
	AREA 3	17				17,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	79,70
					TOTAL	79,7

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

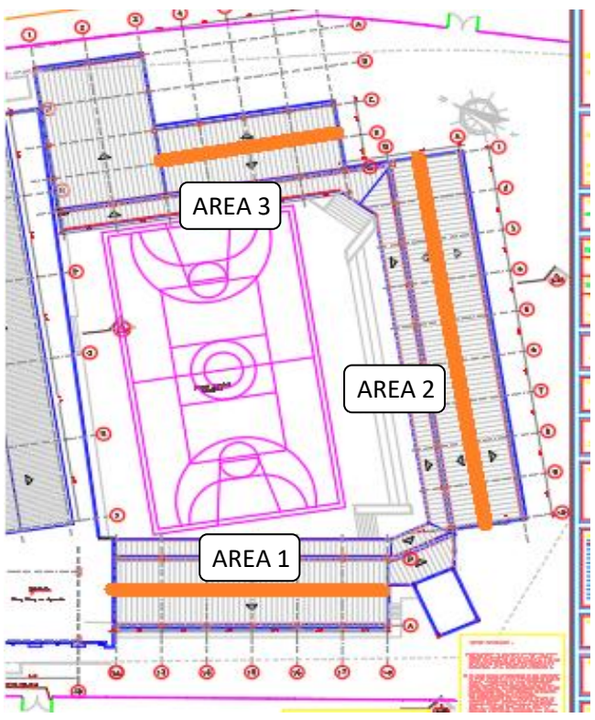



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2022	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.33	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1.	24,00			2	48,00
		8,00			1	8,00
	AREA 2	38,70			2	77,40
	AREA 3	27,00			1	27,00
		17,00			1	17,00
PASAN:					SUBTOTAL	177,40
					TOTAL	177,4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

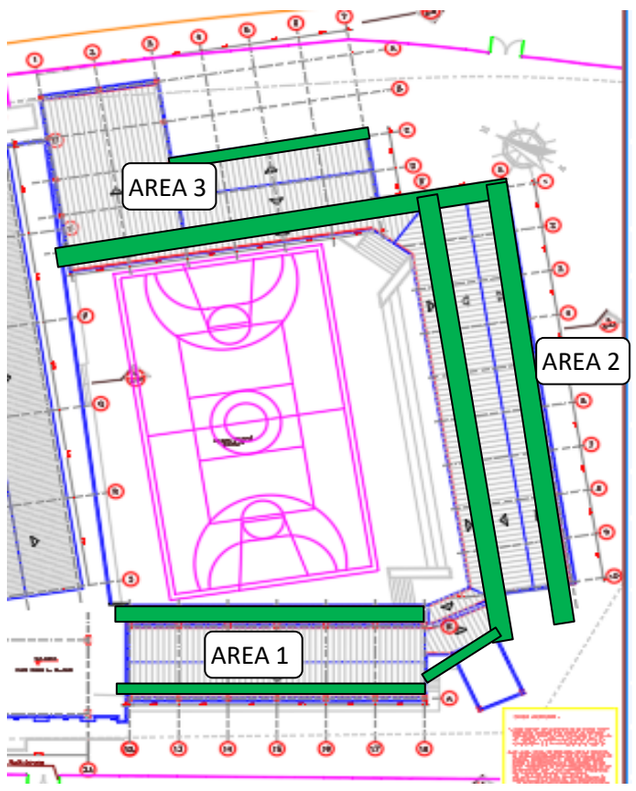



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.1	M2	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	AREA	TOTAL
EDIFICACIONES					
AREA CUBIERTA				863,7	863,70
BATERIAS SANITARIAS	7	7,2		6	302,40
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1166,10
				TOTAL	1166,1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

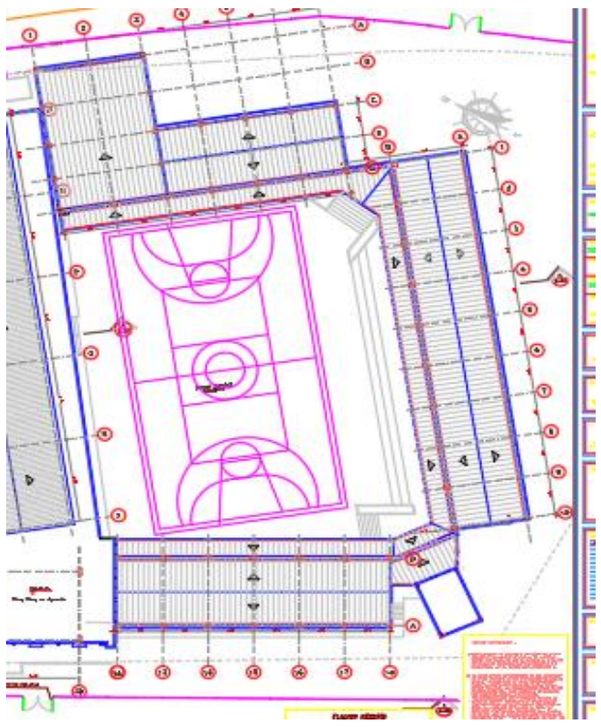

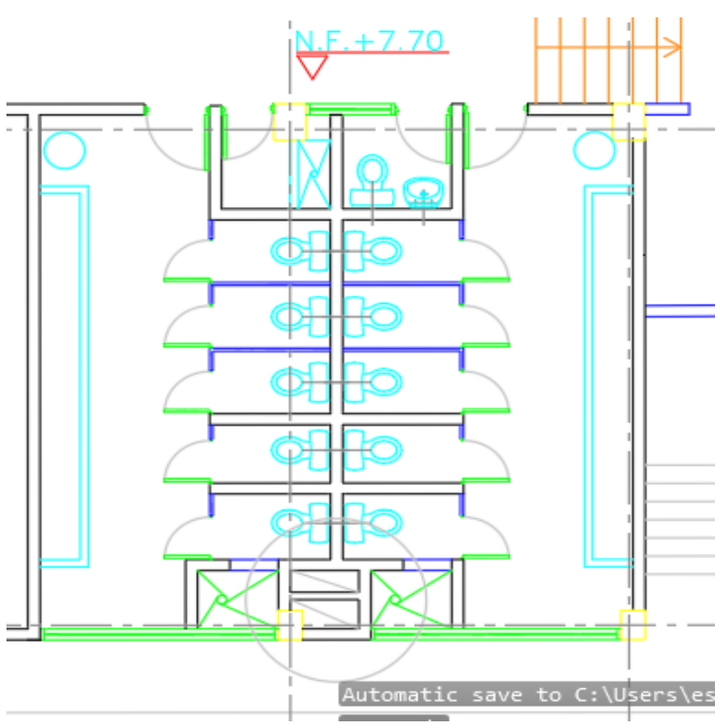

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.2	KG	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	PROMEDIO AREA	KG POR M2	TOTAL
EDIFICACIONES					
AREA CUBIERTA	863,70			12	10364,40
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	10364,40
				TOTAL	10364,4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

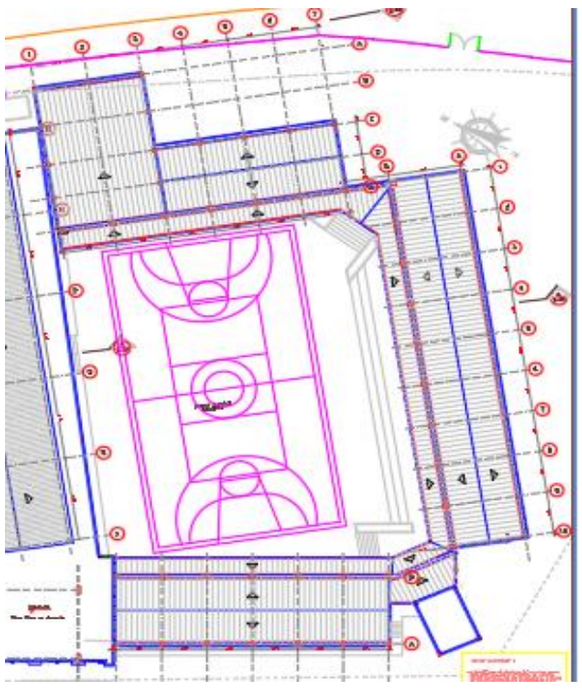



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.3	KG	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	PROMEDIO AREA	KG POR M2	TOTAL
EDIFICACIONES					
AREA CUBIERTA	863,70			12	10364,40
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	10364,40
				TOTAL	10364,4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

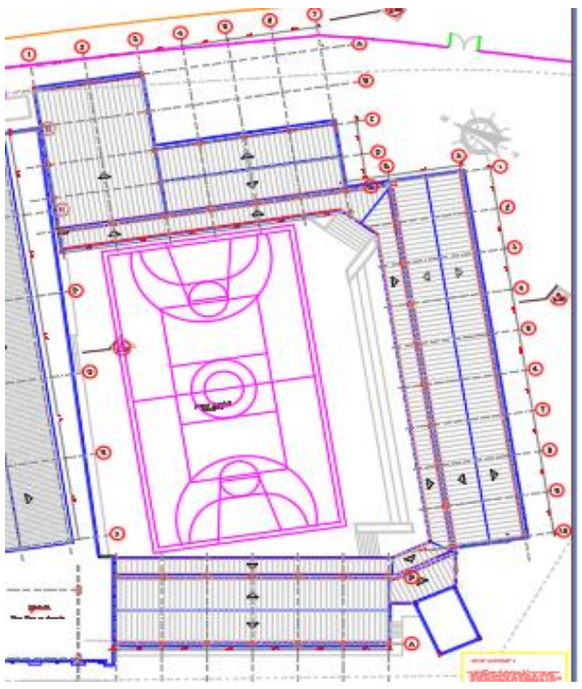



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.4	KG	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3-2-1			5,00	3	15,00
BAÑO MUJERES PISO 3-2-1			5,00	3	15,00
BAÑOS PROFESORES PISO 3-2-1			1,00	3	3,00
PASAN: _____				**SUBTOTAL**	33,00
				kg/UN	26,1
				TOTAL	861,3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

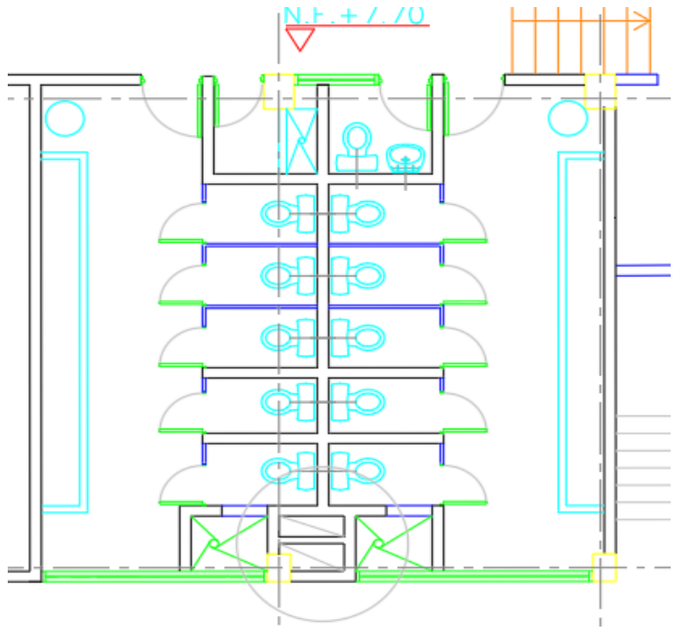

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.5	M2	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						
	AREA 5			59,24	1	59,24
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	59,24
					TOTAL	59,24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
NP-02	M2	DESMONTE DE ESPEJOS (INCLUYE EMBALAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
	hombres	5,22	0,75	3,92	3	11,75
	mujeres	5,22	0,75	3,92	3	11,75
	profesores	1,35	0,75	1,01	3	3,04
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	26,54
					TOTAL	26,54

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



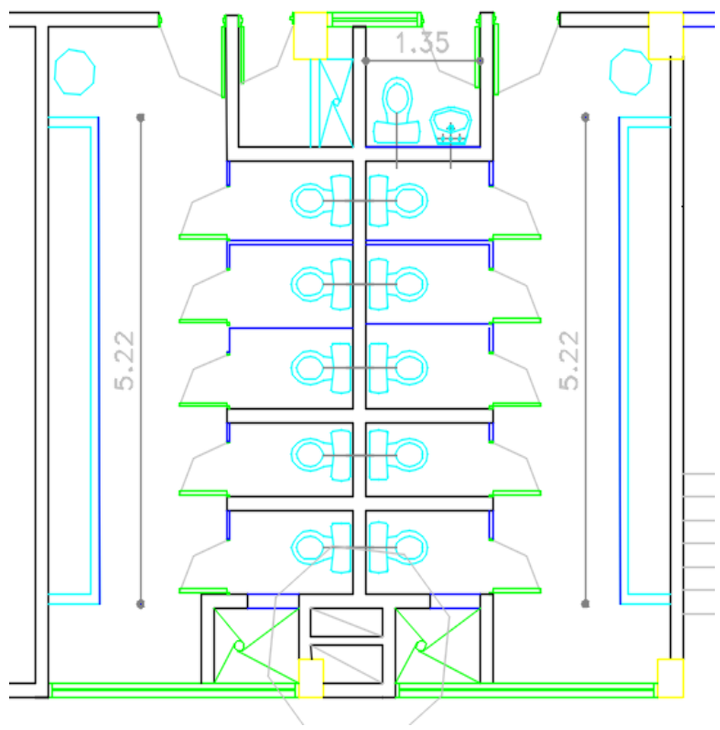

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
NP-04	M	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL H = 30 cm b= 20 cm CON MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1	24,00			2	48,00
	AREA 2	38,70			2	77,40
		4,50			2	9,00
	AREA 3	27,00			1	27,00
		17,00			1	17,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	178,40
					TOTAL	178,4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

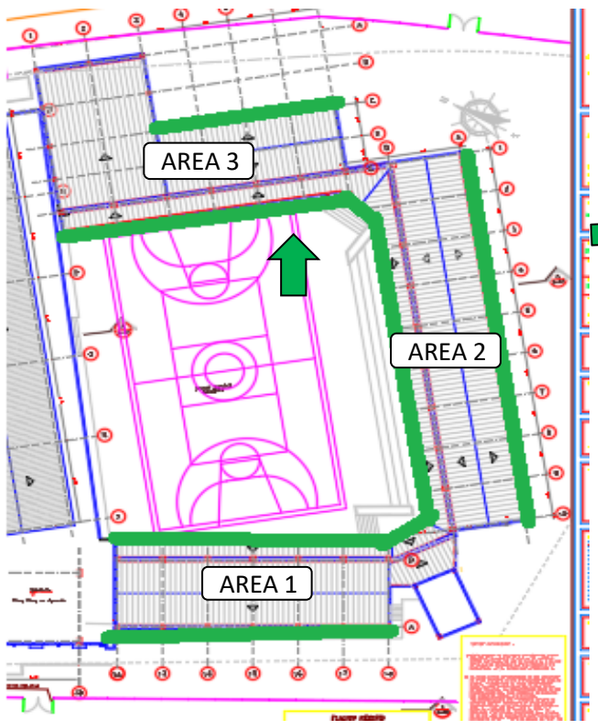



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mía GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
NP-05	M	REMATE DE MAMPOSTERÍA A CUBIERTA TIPO SÁNDWICH H>=30 CIM, INCLUYE MAMPOSTERÍA Y UNA CARA DE PAÑETE

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
	Aula 1	33,00			12	396,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	396,00
					TOTAL	396

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

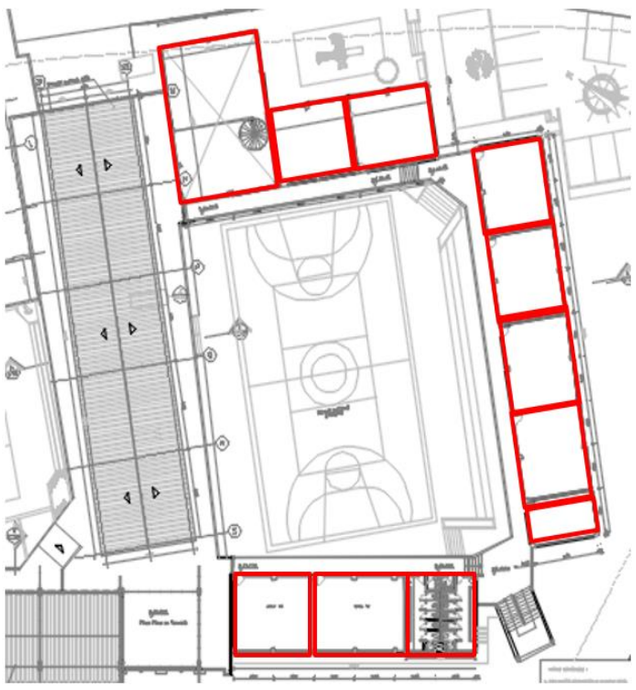

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
NP-07	UN	INSTALACIÓN DE PUERTAS EXISTENTES EN CUALQUIER MATERIAL, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS				9	9,00
BAÑOS				12	12,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	21,00
				TOTAL	21

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

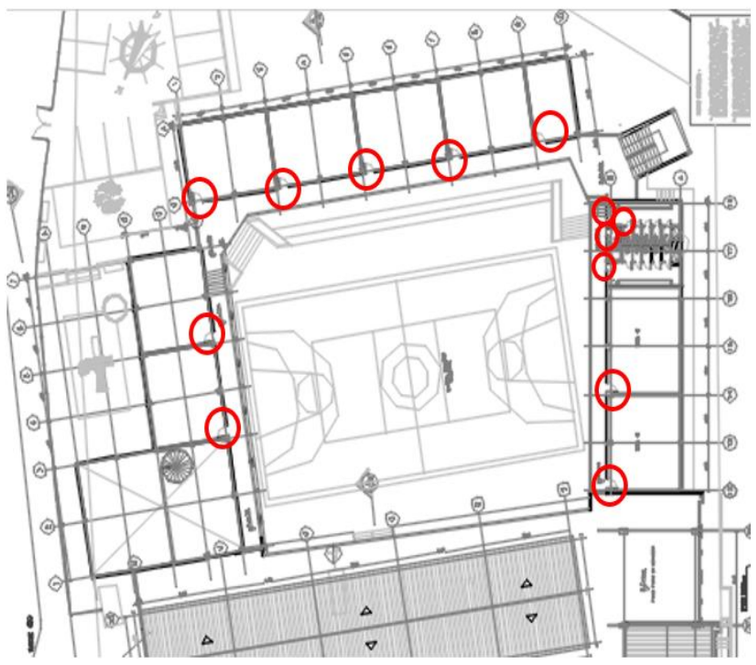

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
NP-08	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X60CM

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Piso	hombres			18,06	3	54,18
	mujeres			24,35	3	73,05
	profesores			3,44	3	10,32
	cuarto aseo			3,44	3	10,32
Piso	hombres			30,22	3	90,66
	mujeres			27,72	3	83,16
	profesores			16,96	3	50,88
	cuarto aseo			8,59	3	25,77
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	398,34
					TOTAL	398,34

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

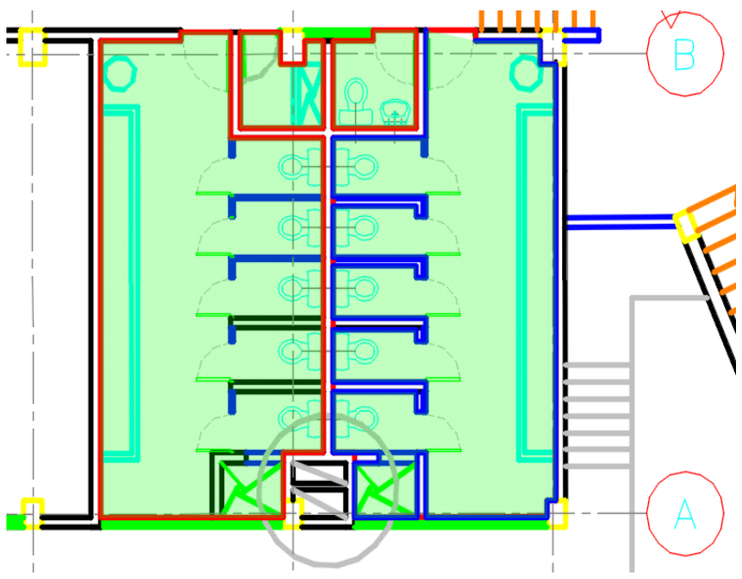

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	15	05	2022	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
NP-11	M2	JUNTAS DE MANTO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, INCLUYE REPARACIÓN DE JUNTA, PINTURA BITUMINOSA, ANCHO NO MAYOR A 20 CM (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
CANALES	AREA 1.	24,00			2	48,00
		8,00			1	8,00
	AREA 2	38,70			2	77,40
	AREA 3	27,00			1	27,00
		17,00			1	17,00
PASAN:					SUBTOTAL	177,40
					TOTAL	177,4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

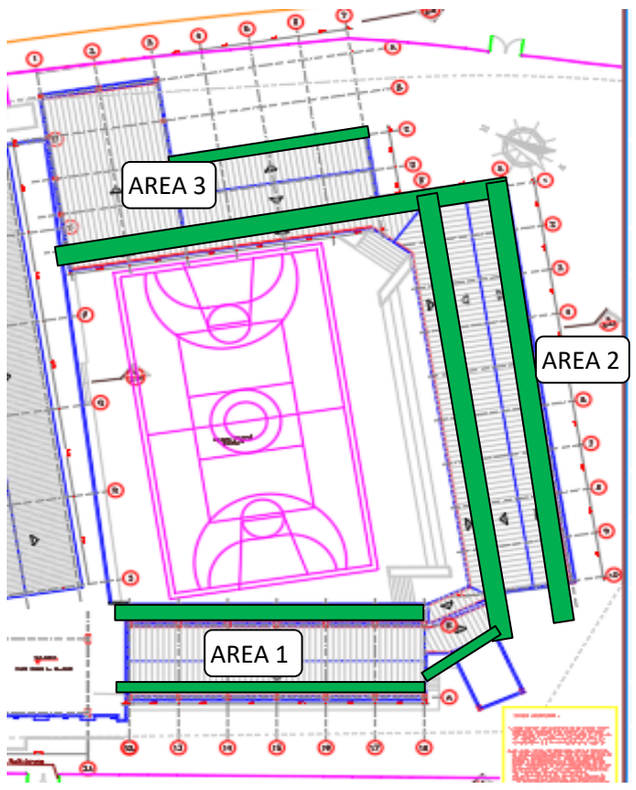



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Bogotá D.C., 24 de abril de 2023

2023_RUU_MGP_131

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega de presupuesto Actualizado Emergencia Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO MIA GP realiza la entrega del presupuesto Actualizado Emergencia Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta., lo anterior para su revisión y aprobación, teniendo en cuenta los alcances solicitados por la SED y el presupuesto general existente.

Agradecemos la atención,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Presupuesto Memorias de Calculo
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO EMERGENCIA COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	234,00	$ 10.878,00	$ 2.545.452,00
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	24,00	$ 26.269,00	$ 630.456,00
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	234,00	$ 20.163,00	$ 4.718.142,00
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	75,00	$ 23.886,00	$ 1.791.450,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 9.685.500,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	225,00	$ 7.708,00	$ 1.734.300,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 1.734.300,00**

VALOR TOTAL	**$ 11.419.800,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	
VALOR TOTAL	**$ 11.419.800,00**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA			
	FECHA:	15	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.1.9	M2	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
Placa ingreso peatonal	50,00	4,5		1	225,00
Placa ingreso peatonal2					
Pared ingreso	3,00	3		1	9,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	234,00
				TOTAL	234

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA			
	FECHA:	15	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO



INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.2.3	M2	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ALTURA	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
Viga Baño	3,00	0,5		1	1,50
Placa cuarto almacenamiento	3,00	3,5		1	10,50
Perimetro	6,00	2		1	12,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	24,00
				TOTAL	24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

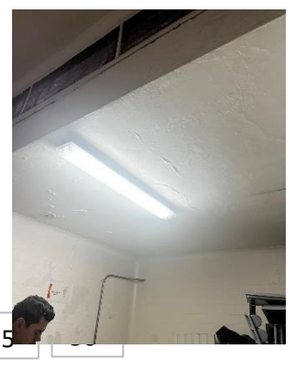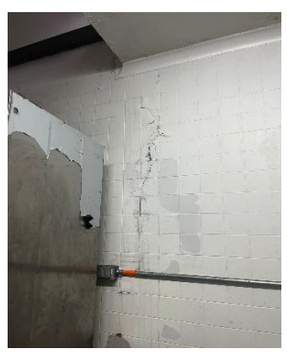DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA			
	FECHA:	15	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.2.4	M2	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
Placa ingreso peatonal	50,00	4,5		1	225,00
Placa ingreso peatonal2					
Pared ingreso	3,00	3		1	9,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	234,00
				TOTAL	234

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA			
	FECHA:	15	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.4.3	M	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
Estructura soporte cilindrica.	2,50			30	75,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	75,00
				TOTAL	75

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

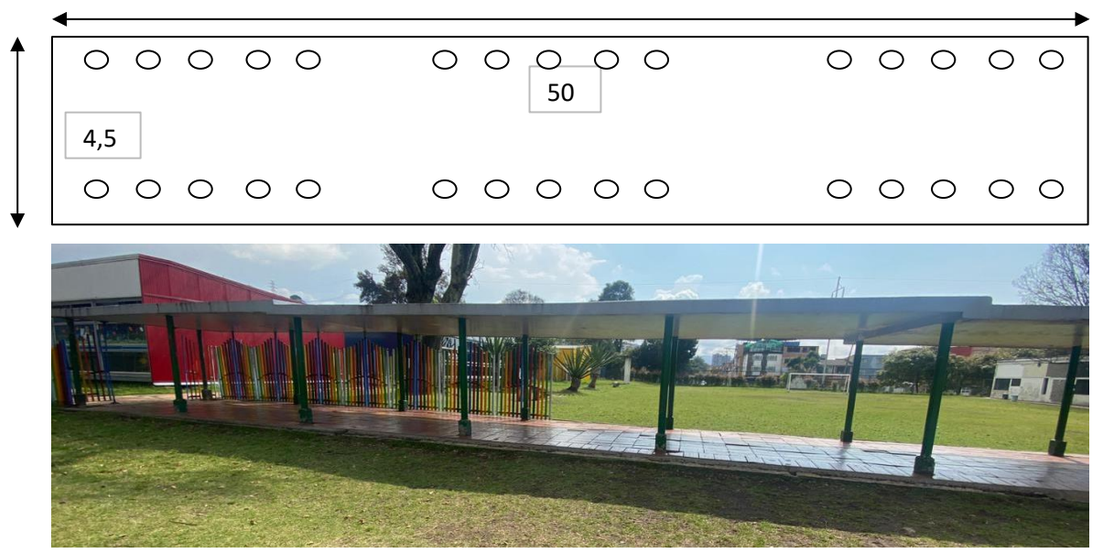

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA			
	FECHA:	15	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.1	M2	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
Aseo General					
Placa ingreso peatonal	50,00	4,5		1	225,00
Placa ingreso peatonal2					
PASAN:				**SUBTOTAL**	225,00
				TOTAL	225

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



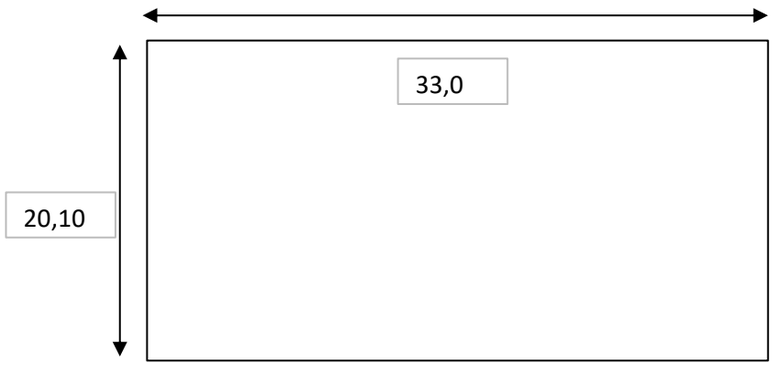

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Bogotá D.C., 25 de abril de 2023

2023_RUU_MGP_132

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega de presupuesto Actualizado Restrepo Millán Sede B, Isabel II de Inglaterra.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO MIA GP realiza la entrega del presupuesto Actualizado Restrepo Millán Sede B, Isabel II de Inglaterra, lo anterior para su revisión y aprobación, teniendo en cuenta los alcances solicitados por la SED y el presupuesto general existente.

Agradecemos la atención,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Presupuesto Memorias de Calculo
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	60,00	$ 35.570,00	$ 2.134.200,00
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	183,86	$ 55.867,00	$ 10.271.706,62
1.2.11	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	79,14	$ 16.902,00	$ 1.337.624,28
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	593,09	$ 30.664,00	$ 18.186.511,76
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	84,14	$ 26.351,00	$ 2.217.173,14
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	0,00	$ 14.890,00	$ 0,00
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	0,00	$ 16.887,00	$ 0,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1032,52	$ 29.215,00	$ 30.165.071,80
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	78,51	$ 22.764,00	$ 1.787.201,64
1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34,75	$ 18.112,00	$ 629.428,00
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	196,00	$ 8.634,00	$ 1.692.264,00
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN	1,00	$ 140.804,00	$ 140.804,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	110,00	$ 5.062,00	$ 556.820,00
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	60,00	$ 20.244,00	$ 1.214.640,00
1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	0,00	$ 16.194,00	$ 0,00
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.4	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	0,00	$ 119.849,00	$ 0,00
1.3.7	MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI	M2	3,58	$ 91.440,00	$ 327.355,20

SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 70.660.800,44**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	32,76	$ 75.296,00	$ 2.466.696,96
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	27,58	$ 174.350,00	$ 4.808.573,00
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	183,86	$ 88.815,00	$ 16.329.525,90
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 123.376,00	$ 0,00
2.2.30	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3	1,51	$ 950.903,00	$ 1.435.863,53
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.3.14	ALFAJÍA EN CONCRETO 2500 PSI 0.25 X 0.10 (NO INCLUYE ACERO)	M	79,14	$ 57.244,00	$ 4.530.290,16
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	271,60	$ 7.952	$ 2.159.763,20
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	647,12	$ 8.711	$ 5.637.062,32
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	9.210,22	$ 16.242	$ 149.592.425,72
2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE	UN	48,00	$ 198.115	$ 9.509.520,00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 196.469.720,79**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.15	PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM)	ml	512,11	$ 16.260	$ 8.326.908,60
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	50,00	$ 9.784	$ 489.200,00
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 8.816.108,60**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,00	$ 68.798	$ 0,00
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	0,00	$ 33.343	$ 0,00
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	6,00	$ 63.687	$ 382.122,00
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	0,00	$ 22.099	$ 0,00
4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	0,00	$ 140.046	$ 0,00
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	0,00	$ 99.155	$ 0,00
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**				
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 " INCLUYE ACCESORIOS	M	0,00	$ 27.292	$ 0,00

4.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	0,00	$ 15.067	$ 0,00
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	3,00	$ 32.839	$ 98.517,00
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 480.639,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	35,00	$ 144.994,00	$ 5.074.790,00
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	0,00	$ 144.482,00	$ 0,00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	69,00	$ 225.499,00	$ 15.559.431,00
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 524.617,00	$ 524.617,00
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	300,00	$ 42.467,00	$ 12.740.100,00
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	300,00	$ 18.061,00	$ 5.418.300,00
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	92,00	$ 194.999,00	$ 17.939.908,00
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 57.257.146,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	593,09	$ 44.020	$ 26.107.821,80
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	404,95	$ 17.513	$ 7.091.889,35
7.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO TIPO TARALAY O SIMILAR ALTO TRÁFICO	M2	593,09	$ 181.970	$ 107.924.587,30
7.2.62	DILATACION EN MORTERO PARA ESTRUCTURA Y BORDILLO, (ANCHO 5-10MM, PROFUNDIDAD 10-20MM) MEDIANTE	M	0,00	$ 6.141	$ 0,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 141.124.298,45**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	84,14	$ 563.283	$ 47.394.631,62
9.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO, ACCESO A CUBIERTA EN TUBO AGUAS NEGRAS EN 1-1/4” Y PASO EN TUBO DE 1"	M	3,00	$ 325.122	$ 975.366,00
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

9.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN POLICUARZO, LONGITUD = X ANCHO DE 60 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA 30 CM, CON SALPICADERO	M2	0,00	$ 882.572,00	$ 0,00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 48.369.997,62**
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	0,00	$ 698.379,00	$ 0,00
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	0,00	$ 878.674,00	$ 0,00
11.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	0,00	$ 493.147,00	$ 0,00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	0,00	$ 693.298,00	$ 0,00
SUBTOTAL	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 0,00**
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	0,00	$ 1.073.302,00	$ 0,00
SUBTOTAL	**12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 0,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	2142,58	$ 29.105,00	$ 62.359.790,90
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	84,30	$ 19.671,00	$ 1.658.265,30
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	ML	3300,10	$ 23.886,00	$ 78.826.188,60
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 142.844.244,80**
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
15.2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	0,00	$ 154.786,00	$ 0,00
SUBTOTAL	**15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 0,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	110,00	$ 46.709,00	$ 5.137.990,00
17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	80,00	$ 69.142,00	$ 5.531.360,00
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	86,00	$ 63.665,00	$ 5.475.190,00
17.1.8	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	175,90	$ 136.173,00	$ 23.952.830,70

17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	923,84	$ 250.250,00	$ 231.190.960,00
17.1.42	LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)	M	602,42	$ 32.922,00	$ 19.832.871,24
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 291.121.201,94**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1032,52	$ 7.708,00	$ 7.958.664,16
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	15017,68	$ 1.898,00	$ 28.503.556,64
20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG	14600,41	$ 2.272,00	$ 33.172.131,52
20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	0,00	$ 1.841,00	$ 0,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 69.634.352,32**
	NO PREVISTOS				
NP05	REMATE DE MAMPOSTERÍA A CUBIERTA TIPO SÁNDWICH H>=30 CIM, INCLUYE MAMPOSTERÍA Y UNA CARA DE PAÑETE	M2	154,06	$ 56.405,00	$ 8.689.754,00
NP06	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 H> A 7CM, HASTA 10 CM INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA D131, AFINADO CON LLANA METÁLICA	m2	593,09	$ 116.376,00	$ 0,00
NP	SUMINISTRO E INSLALACION DE MASTICO PARA PISOS DE VINILO	M2	593,09	$ 26.987,75	$ 0,00
NP	SUMINISTRO E INSLALACION DE RINCONERA EN PVC	M	300,00	$ 22.001,01	$ 0,00
SUBTOTAL	**NO PREVISTOS**				**$ 8.689.754,00**

VALOR TOTAL	**$ 1.035.468.263,96**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	
VALOR TOTAL	**$ 1.035.468.263,96**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.03	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
ACOPIO DE MATERIALES, ZONA DE RCD, AISLAMIENTO DE AREAS					60,00
OBSERVACION:					
PASAN:				SUBTOTAL	60,00
				TOTAL	60

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

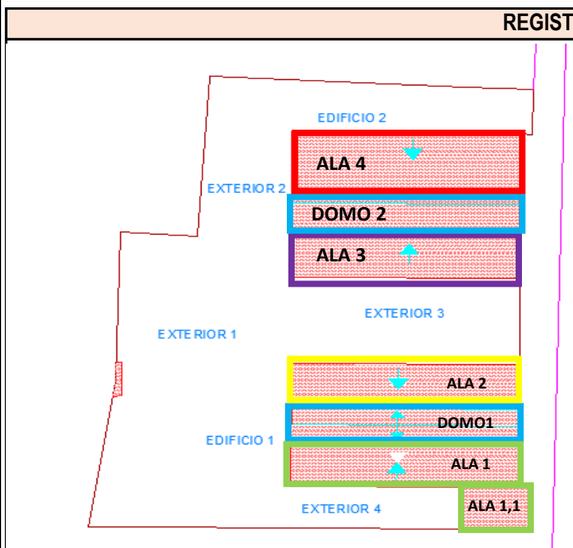



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.7	M2	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)


DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
CORREDOR 20	68,83	2,85	24,15	1,00	68,83
EDIFICIO 2					
AULA 32	57,46	8,22	6,99	1,00	57,46
CORREDOR 33	54,81	2,61	21,00	1,00	54,81
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	0,46	1,15	0,40	6,00	2,76
PASAN:				**SUBTOTAL**	183,86
				TOTAL	183,86

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

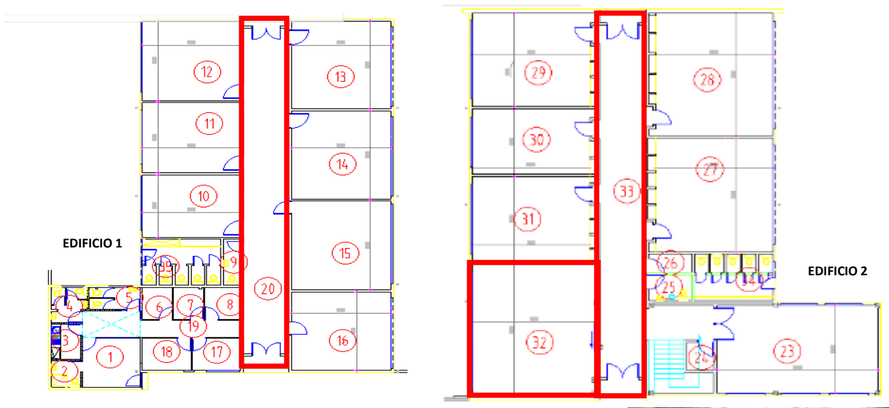





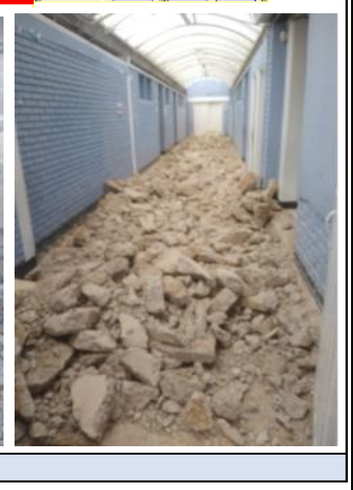

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.11	M	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
AULA 10			5,54	1,00	5,54
AULA 11			5,54	1,00	5,54
AULA 12			5,54	1,00	5,54
AULA 13			5,61	1,00	5,61
AULA 14			5,61	1,00	5,61
AULA 15			5,61	1,00	5,61
AULA 16			5,61	1,00	5,61
EDIFICIO 2					
AULA 27			6,62	1,00	6,62
AULA 28			6,62	1,00	6,62
AULA 29			6,65	1,00	6,65
AULA 30			6,60	1,00	6,60
AULA 31			6,60	1,00	6,60
AULA 32			6,99	1,00	6,99
PASAN:				**SUBTOTAL**	79,14
				TOTAL	79,14

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

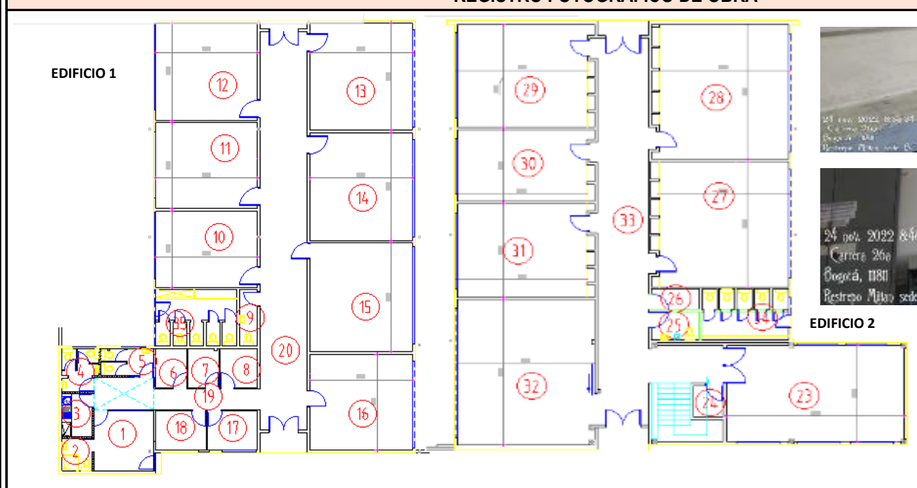





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
CORREDOR 20	68,83	2,85	24,15	1,00	68,83
AULA 10	23,55	4,25	5,54	1,00	23,55
AULA 11	26,48	4,78	5,54	1,00	26,48
AULA 12	30,19	5,45	5,54	1,00	30,19
AULA 13	33,72	6,01	5,61	1,00	33,72
AULA 14	33,66	6,00	5,61	1,00	33,66
AULA 15	34,00	6,06	5,61	1,00	34,00
AULA 16	30,18	5,38	5,61	1,00	30,18
EDIFICIO 2					
AULA 27	46,94	7,09	6,62	1,00	46,94
AULA 28	50,18	7,58	6,62	1,00	50,18
AULA 29	38,57	5,80	6,65	1,00	38,57
AULA 30	26,86	4,07	6,60	1,00	26,86
AULA 31	34,91	5,29	6,60	1,00	34,91
AULA 32	57,46	8,22	6,99	1,00	57,46
CORREDOR 33	54,81	2,61	21,00	1,00	54,81
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	0,46	1,15	0,40	6,00	2,76
PASAN:				**SUBTOTAL**	593,09
				TOTAL	593,09

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

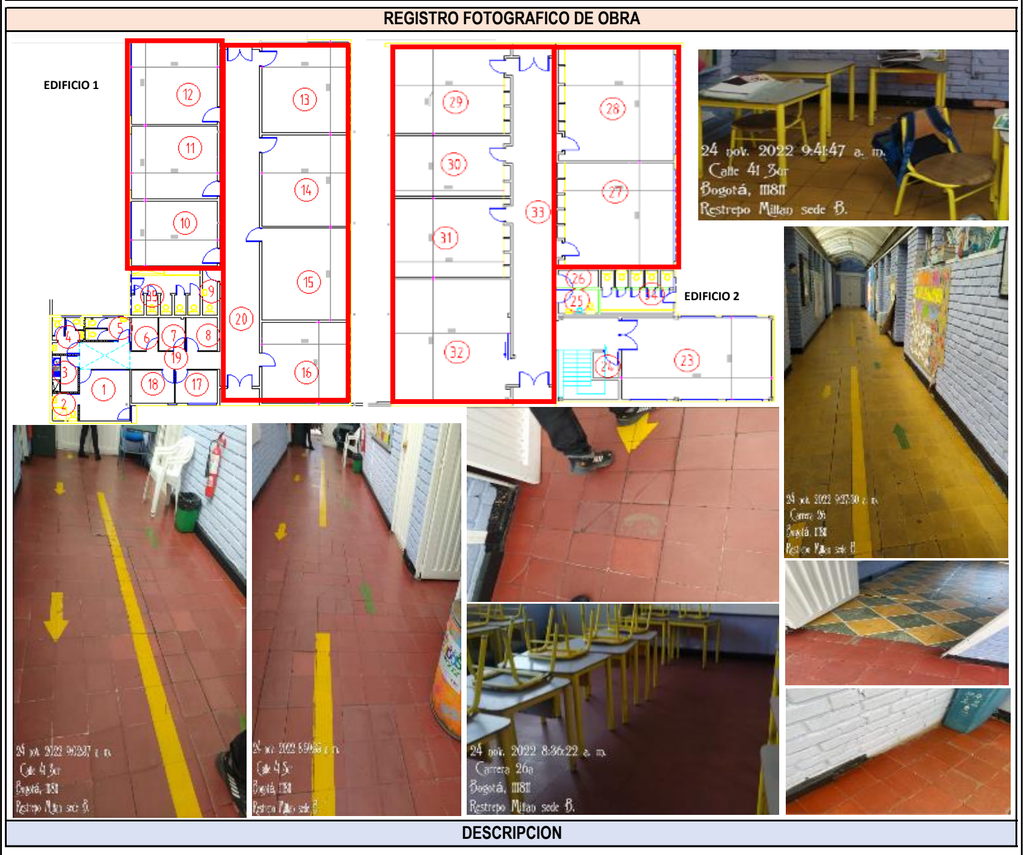

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.28	M2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)


DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
1	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
2	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
3	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
4	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
5	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
6	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
7	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
8	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
9	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
17	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
18	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
35	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
AULA 10	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
AULA 11	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
AULA 12	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
AULA 13	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
AULA 14	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
AULA 15	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
AULA 16	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA	6,48	3,00	2,16	2,00	12,96
EDIFICIO 2	0,00				
AULA 27	1,85	0,90	2,06	1,00	1,85
AULA 28	1,85	0,90	2,06	1,00	1,85
AULA 29	1,85	0,90	2,06	1,00	1,85
AULA 30	1,85	0,90	2,06	1,00	1,85
AULA 31	1,85	0,90	2,06	1,00	1,85
AULA 32	4,07	1,85	2,20	1,00	4,07
AULA 23	1,85	0,90	2,06	1,00	1,85
PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA	3,69	1,80	2,05	2,00	7,38
AULA 21	4,07	1,85	2,20	1,00	4,07
CUARTO ASEO Y BAÑO 25,26	1,75	0,84	2,08	2,00	3,49
PASAN:				**SUBTOTAL**	84,14
				TOTAL	84,14

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

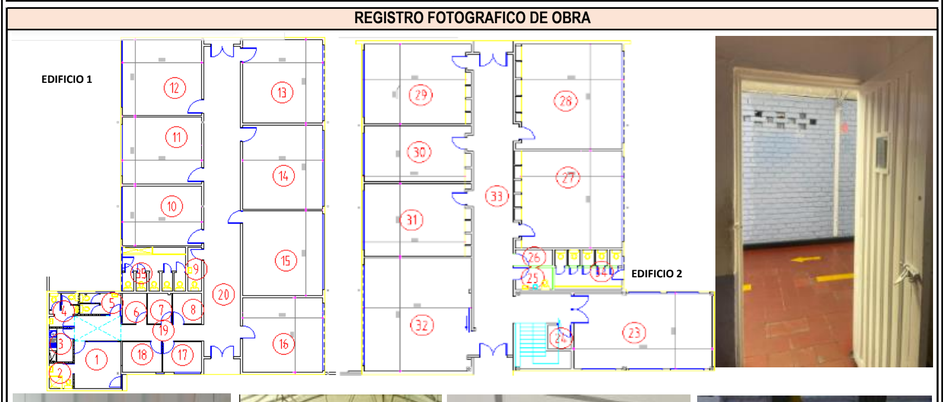





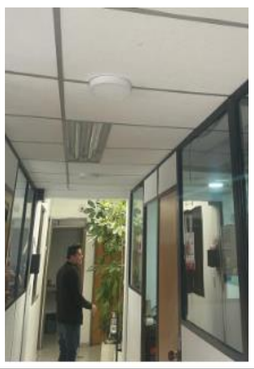



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 1					
ALA 1,1	37,95	5,30	7,16		37,95
ALA 1	154,80	8,6	18,00		154,80
ALA 2	215,00	8,6	25,00		215,00
DOMO 1	82,50	3,3	25,00		82,50
EDIFICIO 2	-				0,00
ALA 3	215,00	8,60	25,00		215,00
ALA 4	154,80	8,6	18,00		154,80
DOMO 2	82,50	3,3	25,00		82,50
CUBIERTA PISO 2 EDIFICIO 2	89,97	6,91	13,02		89,97
PASAN:				**SUBTOTAL**	1032,52
				TOTAL	1032,52

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

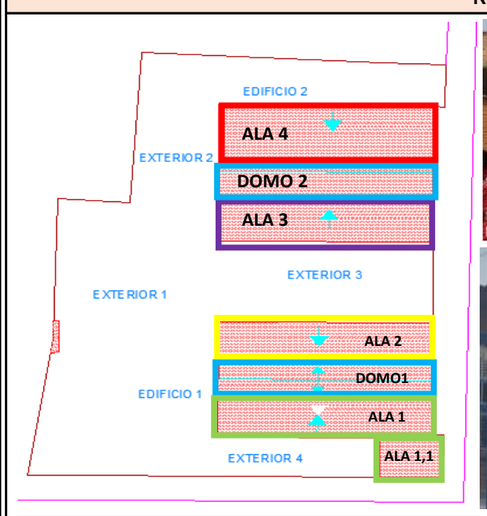









DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**18**	**4**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.34	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
AREA ADMINISTRATIVA EN ZONAS: 1,2,3,4,5,6,7,8,19,18 Y 17	78,51	7,15	10,98	1,00	78,51
PASAN:				**SUBTOTAL**	78,51
				TOTAL	78,51

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**18**	**4**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO
SUPERVISOR	ING.


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	3110287
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.35	M2	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO 1					
DIVISION CUBICULO ZONA 6	2,02	0,96	2,10	1,00	2,02
DIVISION CUBICULO ZONA 7	6,76	3,22	2,10	1,00	6,76
DIVISION CUBICULO ZONA 8	7,67	3,65	2,10	1,00	7,67
DIVISION CUBICULO ZONA 18	8,40	4,00	2,10	1,00	8,40
DIVISION CUBICULO ZONA 17	4,12	1,96	2,10	1,00	4,12
PASAN:				**SUBTOTAL**	34,75
				TOTAL	34,752

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

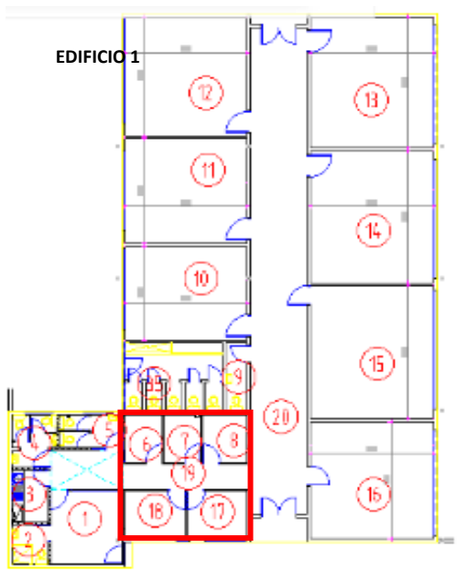





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**18**	**4**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
1				12,00	12,00
2				4,00	4,00
3				4,00	4,00
4				5,00	5,00
5				5,00	5,00
6				3,00	3,00
7				3,00	3,00
8				3,00	3,00
9				3,00	3,00
17				3,00	3,00
18				3,00	3,00
19				5,00	5,00
35				3,00	3,00
AULA 10				7,00	7,00
AULA 11				7,00	7,00
AULA 12				7,00	7,00
AULA 13				7,00	7,00
AULA 14				7,00	7,00
AULA 15				7,00	7,00
AULA 16				7,00	7,00
PASILLO 20				15,00	15,00
EDIFICIO 2					
AULA 27				7,00	7,00
AULA 28				7,00	7,00
AULA 29				7,00	7,00
AULA 30				7,00	7,00
AULA 31				7,00	7,00
AULA 32				7,00	7,00
AULA 23				7,00	7,00
BANOS 34				5,00	5,00
AULA 21 Y PASILLO 22				15,00	15,00
26				3,00	3,00
25				4,00	4,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	196,00
				TOTAL	196,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

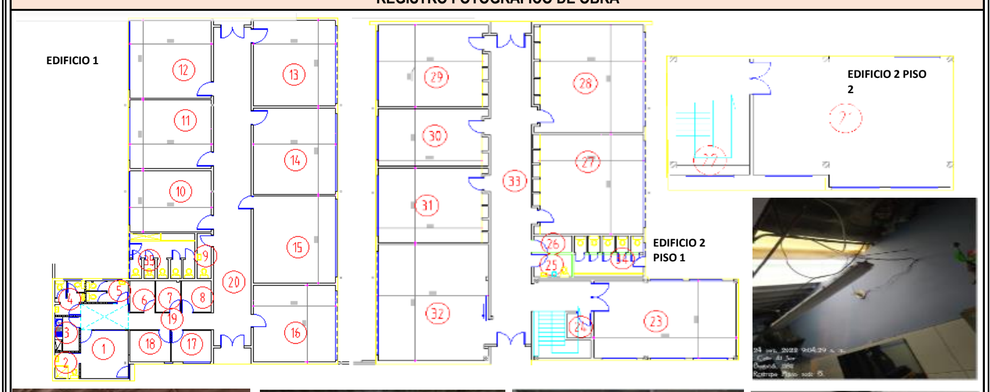



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**		
	FECHA:	**18**	**4**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
1				2,00	2,00
2				1,00	1,00
3				2,00	2,00
4				3,00	3,00
5				3,00	3,00
6				2,00	2,00
7				2,00	2,00
8				2,00	2,00
9				1,00	1,00
17				2,00	2,00
18				2,00	2,00
19				2,00	2,00
35				3,00	3,00
AULA 10				4,00	4,00
AULA 11				4,00	4,00
AULA 12				4,00	4,00
AULA 13				4,00	4,00
AULA 14				4,00	4,00
AULA 15				4,00	4,00
AULA 16				4,00	4,00
PASILLO 20				6,00	6,00
EDIFICIO 2					
AULA 27				4,00	4,00
AULA 28				4,00	4,00
AULA 29				4,00	4,00
AULA 30				4,00	4,00
AULA 31				4,00	4,00
AULA 32				4,00	4,00
AULA 23				8,00	8,00
BANOS 34				3,00	3,00
AULA 21 Y PASILLO 22				10,00	10,00
26				2,00	2,00
25				2,00	2,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	110,00
				TOTAL	110,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

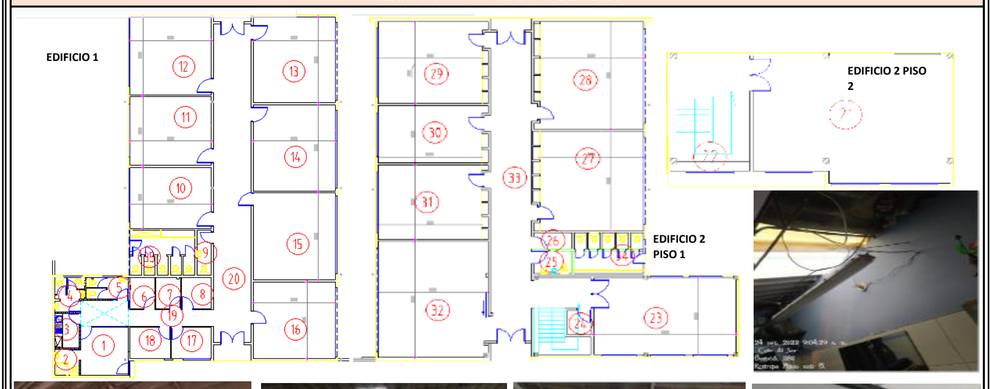



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.03.07	M2	MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
Tapas de alcantarillas en corredor	0,49	0,70	0,70	2,00	0,98
	0,81	0,90	0,90	1,00	0,81
EDIFICIO 2					
Tapas de alcantarillas en corredor	0,49	0,70	0,70	2,00	0,98
	0,81	0,90	0,90	1,00	0,81
PASAN:				**SUBTOTAL**	3,58
				TOTAL	3,58

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.01.01	M3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL
EDIFICIO 1					
CORREDOR 20	68,83	2,85	24,15	0,15	10,32
EDIFICIO 2	0,00				0,00
AULA 32	57,46	8,22	6,99	0,15	8,62
CORREDOR 33	54,81	2,61	21,00	0,15	8,22
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	2,76	1,15	0,40	0,15	0,41
PEDESTALES	0,00				0,00
Pedestales externos edificios 1 y 2 (en total 24)	0,54	0,3	0,30	0,4	5,18
PASAN:				**SUBTOTAL**	32,76
				TOTAL	32,76

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

EDIFICIO 1

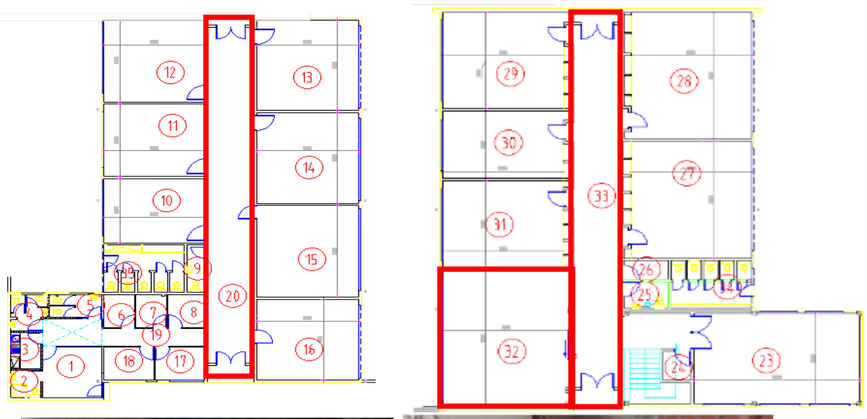





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**18**	**4**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.01.10	M3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	VOLUMEN	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL
EDIFICIO 1					
CORREDOR 20	68,83	2,85	24,15	0,15	10,32
EDIFICIO 2					0,00
AULA 32	57,46	8,22	6,99	0,15	8,62
CORREDOR 33	54,81	2,61	21,00	0,15	8,22
BOCAPUERTAS(total 6) EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	2,76	1,15	0,40	0,15	0,41
PASAN:				**SUBTOTAL**	27,58
				TOTAL	27,58

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

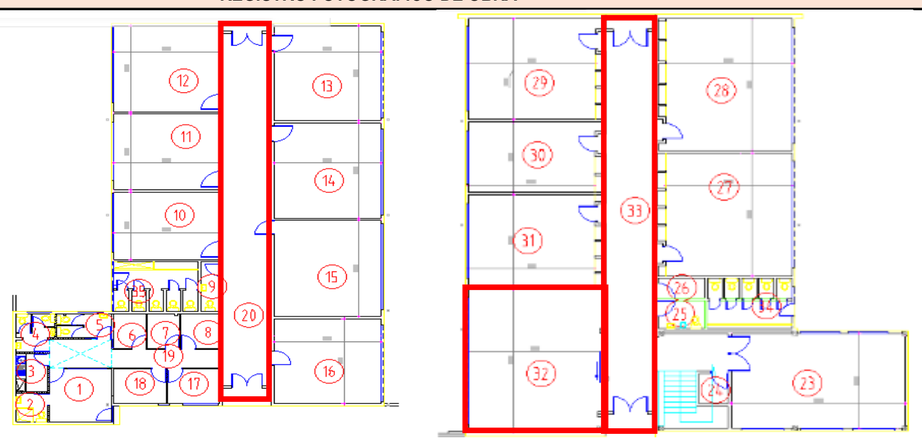





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.02.24	M2	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
CORREDOR 20	68,83	2,85	24,15	1,00	68,83
EDIFICIO 2					
AULA 32	57,46	8,22	6,99	1,00	57,46
CORREDOR 33	54,81	2,61	21,00	1,00	54,81
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	0,46	1,15	0,40	6,00	2,76
PASAN:				**SUBTOTAL**	183,86
				TOTAL	183,86

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



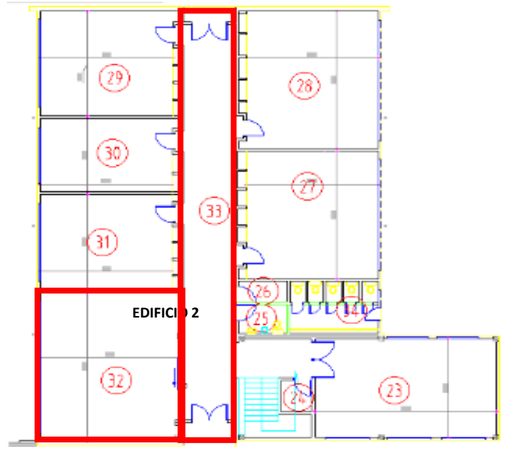





DESCRIPCION

Firma	Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ	ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.02.30	M3	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
PEDESTALES EXTERNOS PARA ANCLAJE COLUMNETAS METALICAS, SON 12	0,09	0,30	0,30	0,70	0,76
EDIFICIO 2					
PEDESTALES EXTERNOS PARA ANCLAJE COLUMNETAS METALICAS, SON 12	0,09	0,30	0,30	0,70	0,76
PASAN:				**SUBTOTAL**	1,51
				TOTAL	1,51

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.03.14	M	ALFAJÍA EN CONCRETO 2500 PSI 0.25 X 0.10 (NO INCLUYE ACERO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
AULA 10			5,54	1,00	5,54
AULA 11			5,54	1,00	5,54
AULA 12			5,54	1,00	5,54
AULA 13			5,61	1,00	5,61
AULA 14			5,61	1,00	5,61
AULA 15			5,61	1,00	5,61
AULA 16			5,61	1,00	5,61
EDIFICIO 2					
AULA 27			6,62	1,00	6,62
AULA 28			6,62	1,00	6,62
AULA 29			6,65	1,00	6,65
AULA 30			6,60	1,00	6,60
AULA 31			6,60	1,00	6,60
AULA 32			6,99	1,00	6,99
PASAN:				**SUBTOTAL**	79,14
				TOTAL	79,14

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

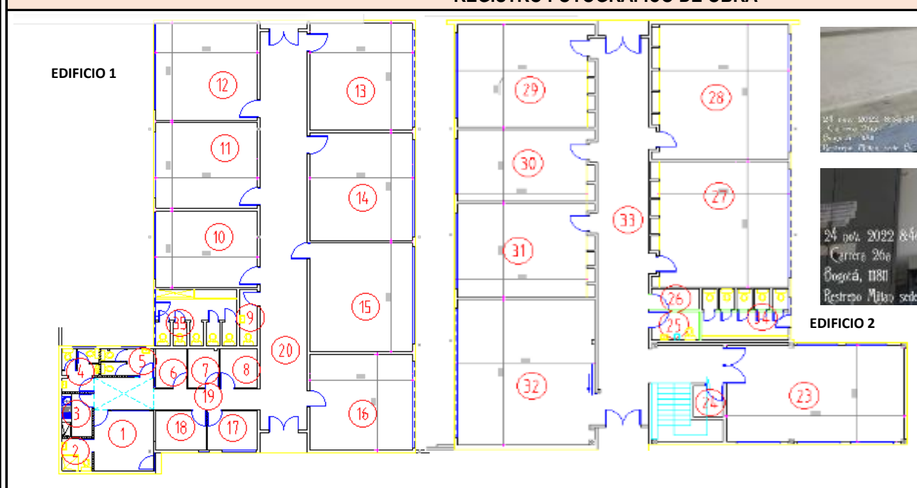





EDIFICIO 2

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.04.01	KG	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI

DESCRIPCION	DIAMETRO	LARGO	PESO M/KG	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO 1 ESTRUCTURA EXISTENTE					
Refuerzo de la cercha con varilla de 3/8”					
ALA 1	3/8"	8,60	0,56	4,00	19,26
ALA 2	3/8"	8,60	0,56	6,00	28,90
EDIFICIO 2					-
ALA 3	3/8"	8,60	0,56	4,00	19,26
ALA 4	3/8"	8,60	0,56	8,00	38,53
REFUERZO PEDESTALES EXTERIORES					-
Refuerzo principal	1/2"	0,75	0,99	96,00	71,57
Estribos	3/8"	1,00	0,56	168,00	94,08
PASAN:				**SUBTOTAL**	271,60
				TOTAL	271,60

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

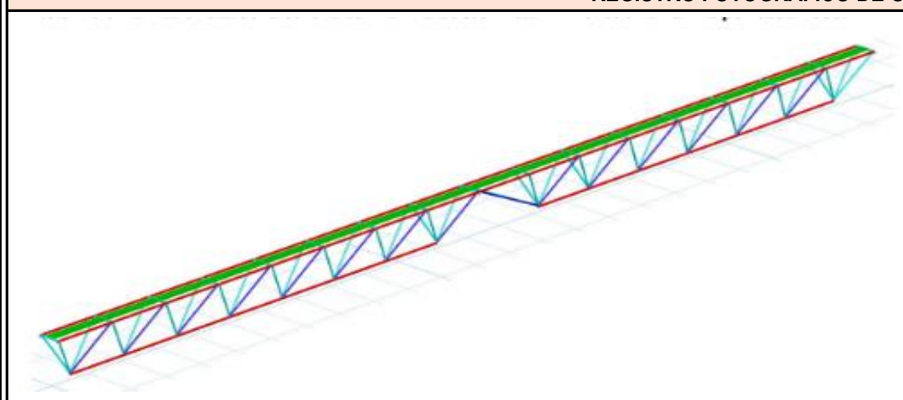



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.4.3	KG	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	CANTIDAD	ANCHO	LARGO	PESO KG*M2	TOTAL
EDIFICIO 1					
CORREDOR 20	1,00	2,85	24,15	2,99	205,90
EDIFICIO 2					
AULA 32	1,00	8,22	6,99	2,99	171,88
CORREDOR 33	1,00	2,61	21,00	2,99	163,96
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	6,00	1,15	0,40	2,99	8,26
AULA 27	46,94	7,09	6,62	1,00	46,94
AULA 28	50,18	7,58	6,62	1,00	50,18
PASAN:				**SUBTOTAL**	647,12
				TOTAL	647,12

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

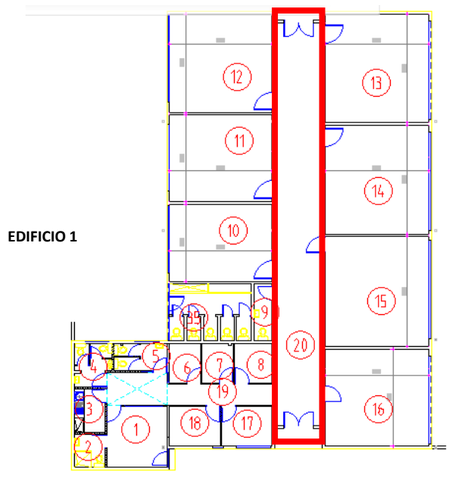

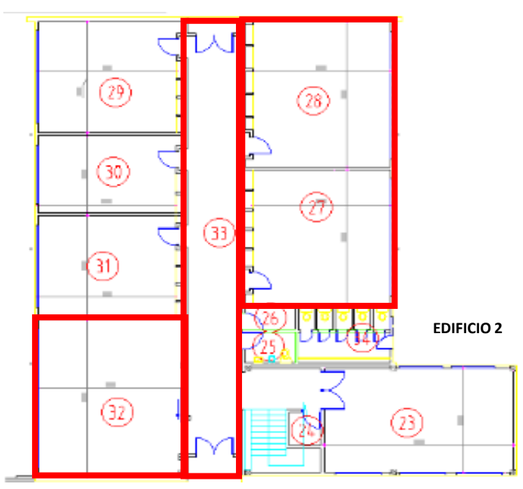







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.05.02	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	KG	TOTAL
ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA EDIFICIO 1 AULAS				3.035,82	3.035,82
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EDIFICIO 1 AREA ADMINISTRATIVA				1.200,00	1.200,00
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EDIFICIO 2 PISO 1				3035,82	3.035,82
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EDIFICIO 2 PISO 2				1500	1.500,00
					-
PASAN:				SUBTOTAL	9.210,22
				TOTAL	9.210,22

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

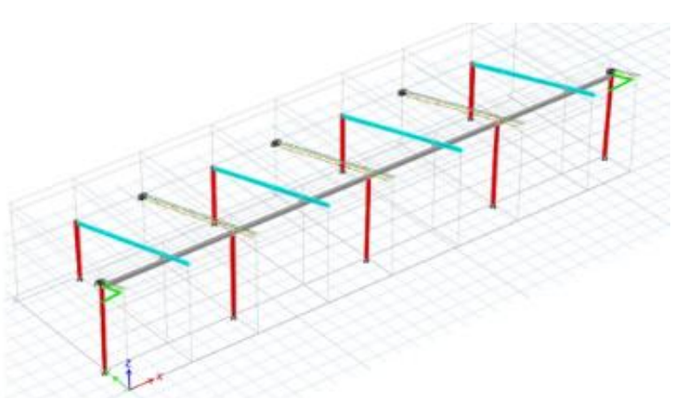

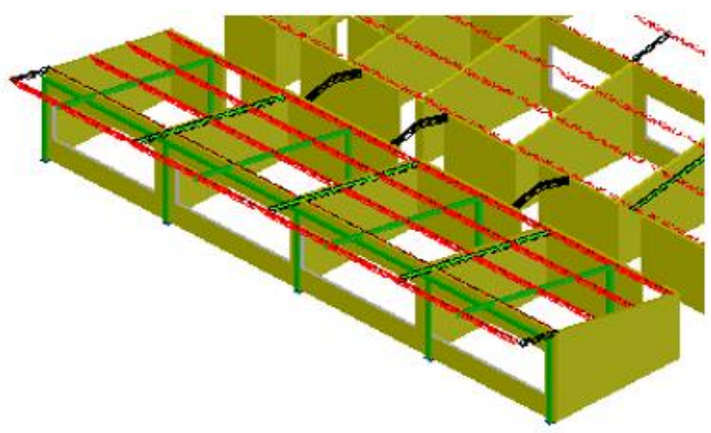

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	CARTILLA E ESTRUCTURA METALICA			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA


CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.05.02	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	LONGITUD	ANCHO	LARGO	PESO M/KG	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO 1						
Portico transversal cintas ala 1 (color cyan)	8,60	150,00	100	15,44	4,00	531,14
Portico transversal cintas ala 2 (color cyan)	8,60	150,00	100	15,44	6,00	796,70
Portico transversal columnetas internas ala 1 (color rojo)	3,00	100,00	100	12,12	4,00	145,44
Portico transversal columnetas externas ala 1 (color rojo)	4,20	100,00	100	12,12	4,00	203,62
Portico transversal columnetas internas ala 2 (color rojo)	3,00	100,00	100	12,12	6,00	218,16
Portico transversal columnetas externa ala 2 (color rojo)	4,20	100,00	100	12,12	6,00	305,42
Portico longitudinal cinta ala 1 (color gris)	18,00	100,00	200	18,58	1,00	334,44
Portico longitudinal cinta ala 2 (color gris)	25,00	100,00	200	18,58	1,00	464,50
Portico ala 1 verde	2,00	50,00	50	4,55	4,00	36,40

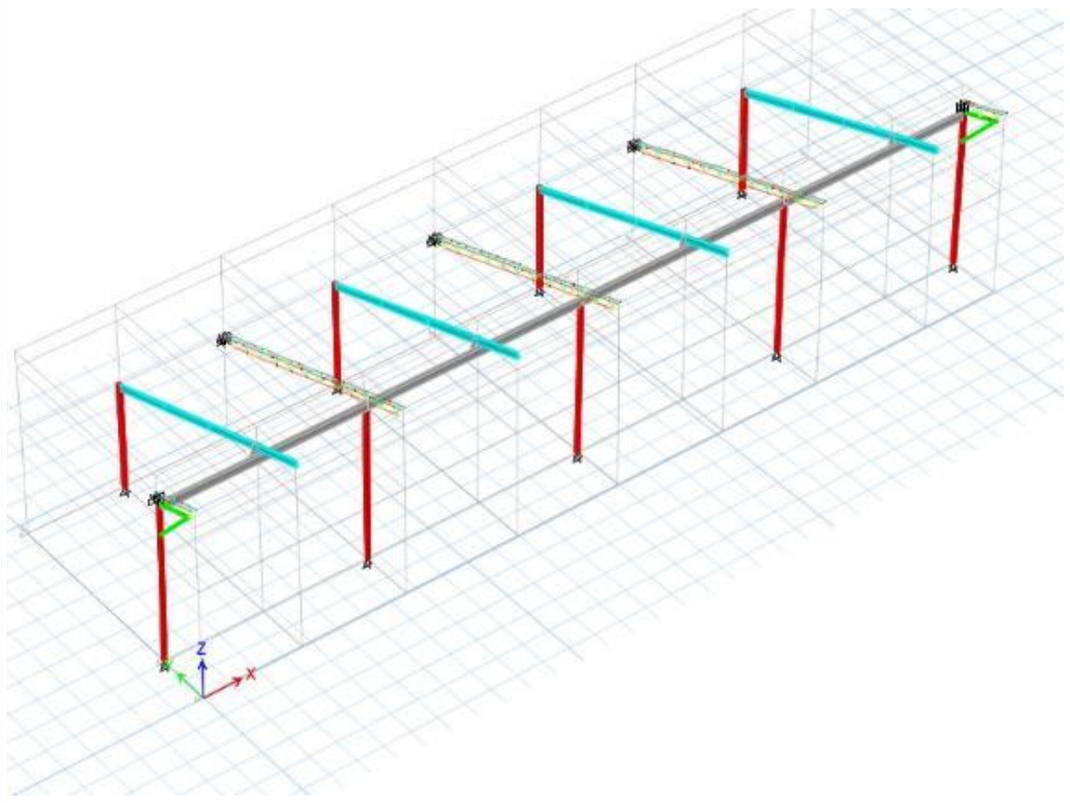

METALTUB TUBERÍA ESTRUCTURAL RECTANGULAR
(ACABADO NEGRO Y GALVANIZADO)

REFERENCIA	ESPESORES EN MILIMETROS											UNIDAD DE EMPAQUE
	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	
Tubos Rectangulares (mm)	Peso Teórico Calculado (kg / m)											
60 x 40	2,34	3,08										100
	2,33	3,07										
76 x 38	2,67	3,52	4,35	5,17								72
	2,66	3,51	4,34	5,16								
90 x 50		4,34	5,37	6,39								60
		4,32	5,36	6,38								
100 x 50		4,65	5,77	6,86								50
		4,64	5,75	6,85								
120 x 60		5,59	6,94	8,28								50
		5,58	6,93	8,26								
150 x 100				11,69	15,44		22,70*					32
200 x 70				12,63	16,69		24,58*					40
200 x 100				14,05	18,58		27,41					28
250 x 100				16,40		26,95						18
250 x 150						30,88						18
300 x 100				18,76		30,88		42,70		54,21*		24
300 x 150									54,77		67,70*	10

EDIFICIO 2						
Portico transversal cintas ala 4 (color cyan)	8,60	150,00	100	15,44	4,00	531,14
Portico transversal cintas ala 3 (color cyan)	8,60	150,00	100	15,44	6,00	796,70
Portico transversal columnetas internas ala 4 (color rojo)	3,00	100,00	100	12,12	4,00	145,44
Portico transversal columnetas externas ala 3 (color rojo)	4,20	100,00	100	12,12	4,00	203,62
Portico transversal columnetas internas ala 4 (color rojo)	3,00	100,00	100	12,12	6,00	218,16
Portico transversal columnetas externa ala 3(color rojo)	4,20	100,00	100	12,12	6,00	305,42
Portico longitudinal cinta ala 4 (color gris)	18,00	100,00	200	18,58	1,00	334,44
Portico longitudinal cinta ala 3 (color gris)	25,00	100,00	200	18,58	1,00	464,50
Portico verde	2,00	50,00	50	4,55	4,00	36,40
PASAN:					SUBTOTAL	6.071,64
					TOTAL	6.071,64

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.05.05	UN	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ALTURA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
PLATINA PEDESTALES EXTERNOS PARA ANCLAJE COLUMNETAS METALICAS		0,20	0,20	12,00	12,00
PLATINA INTERNOS PARA ANCLAJE COLUMNETAS METALICAS		0,20	0,20	12,00	12,00
EDIFICIO 2					
PLATINA PEDESTALES EXTERNOS PARA ANCLAJE COLUMNETAS		0,20	0,20	12,00	12,00
PLATINA INTERNOS PARA ANCLAJE COLUMNETAS METALICAS		0,20	0,20	12,00	12,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	48,00
				TOTAL	48,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
3.01.15	M	PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
CORREDOR 20			24,15	2,00	48,30
AULA 10			5,54	2,00	11,08
			4,25	2,00	8,50
AULA 11			5,54	2,00	11,08
			4,78	2,00	9,56
			5,54	2,00	11,08
AULA 12			5,45	2,00	10,90
AULA 13			5,61	1,00	5,61
			6,01	2,00	12,02
AULA 14			5,61	2,00	11,22
			6,00	2,00	12,00
AULA 15			5,61	2,00	11,22
			6,06	2,00	12,12
AULA 16			5,61	2,00	11,22
			5,38	2,00	10,76
EDIFICIO 2				2,00	0,00
AULA 27			6,62	2,00	13,24
			7,09	2,00	14,18
AULA 28			6,62	2,00	13,24
			7,58	2,00	15,16
AULA 29			6,65	2,00	13,30
			5,80	2,00	11,60
AULA 30			6,60	2,00	13,20
			4,07	2,00	8,14
AULA 31			6,60	2,00	13,20
			5,29	2,00	10,58
AULA 32			6,99	2,00	13,98
			8,22	2,00	16,44
CORREDOR 33			21,00	2,00	42,00
			2,61	2,00	5,22
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS			0,40	12,00	4,80
ENCORAZADO					
EDIFICIO 1					0,00
ALA 1,1			7,16	1,00	7,16
ALA 1			18,00	1,00	18,00
ALA 2			25,00	1,00	25,00
EDIFICIO 2					0,00
ALA 3			25,00	1,00	25,00
ALA 4			18,00	1	18,00
CUBIERTA PISO 2 EDIFICIO 2			14,00	1	14,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	512,11
				TOTAL	512,11

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

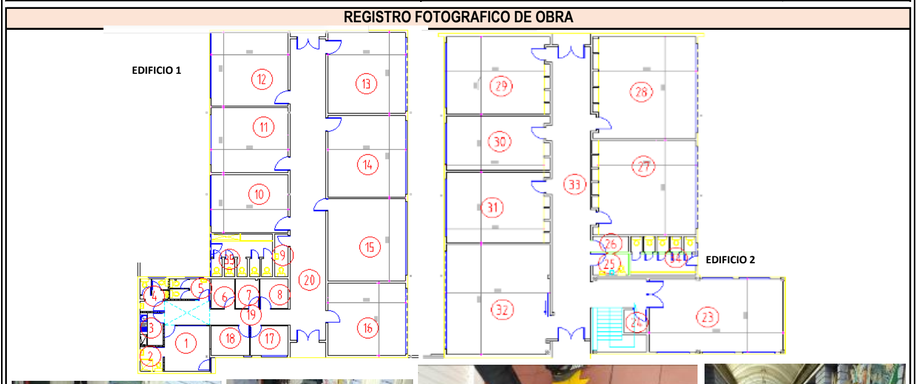



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
03.01.24	M2	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
RESANE DE MUROS	50,00				50,00
PASAN:				SUBTOTAL	50,00
				TOTAL	50,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

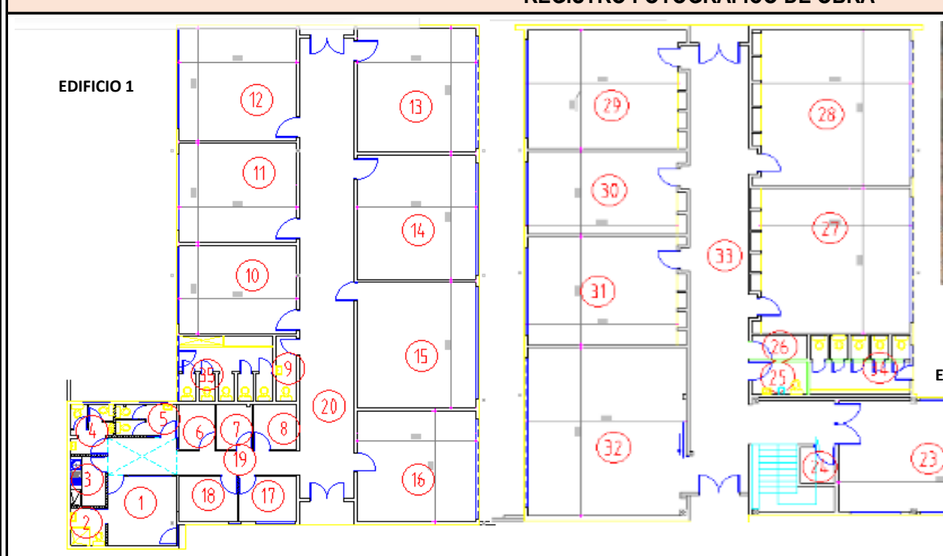





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**18**	**4**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
04.08.07	UN	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO 1				3,00	3,00
EDIFICIO 2				3,00	3,00
					-
PASAN:				**SUBTOTAL**	6,00
				TOTAL	6,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.01	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO 1					
1				1,00	1,00
2				1,00	1,00
3				1,00	1,00
4				1,00	1,00
5				1,00	1,00
6				1,00	1,00
7				1,00	1,00
8				1,00	1,00
9				1,00	1,00
17				1,00	1,00
18				1,00	1,00
35				1,00	1,00
AULA 10				1,00	1,00
AULA 11				1,00	1,00
AULA 12				1,00	1,00
AULA 13				1,00	1,00
AULA 14				1,00	1,00
AULA 15				1,00	1,00
AULA 16				1,00	1,00
CORREDOR 20				2,00	2,00
EDIFICIO 2					-
AULA 27				1,00	1,00
AULA 28				1,00	1,00
AULA 29				1,00	1,00
AULA 30				1,00	1,00
AULA 31				1,00	1,00
AULA 32				1,00	1,00
AULA 23				1,00	1,00
CORREDOR 33				2,00	2,00
AULA 21				1,00	1,00
CUARTO ASEO Y BAÑO 25,26				2,00	2,00
PASILLO 24 PISO 1 Y PISO 2				2,00	2,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	35,00
				TOTAL	35,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

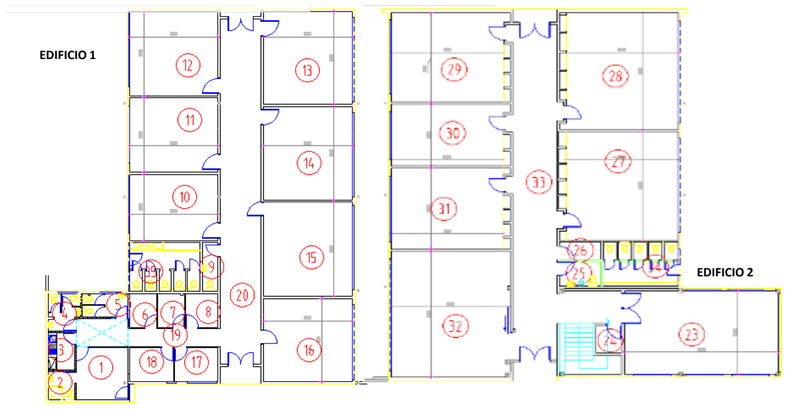

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.12	UN	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO 1					
1				2,00	2,00
2				1,00	1,00
3				1,00	1,00
4				1,00	1,00
5				1,00	1,00
6				1,00	1,00
7				1,00	1,00
8				1,00	1,00
9				1,00	1,00
17				1,00	1,00
18				1,00	1,00
35				1,00	1,00
AULA 10				3,00	3,00
AULA 11				3,00	3,00
AULA 12				3,00	3,00
AULA 13				3,00	3,00
AULA 14				3,00	3,00
AULA 15				3,00	3,00
AULA 16				3,00	3,00
CORREDOR 20				3,00	3,00
EDIFICIO 2					-
AULA 27				3,00	3,00
AULA 28				3,00	3,00
AULA 29				3,00	3,00
AULA 30				3,00	3,00
AULA 31				3,00	3,00
AULA 32				3,00	3,00
AULA 23				3,00	3,00
COREDOR 33				3,00	3,00
AULA 21				3,00	3,00
CUARTO ASEO Y BAÑO 25,26				3,00	3,00
PASILLO 24 PISO 1 Y PISO 2				2,00	2,00
					-
PASAN:				**SUBTOTAL**	69,00
				TOTAL	69,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

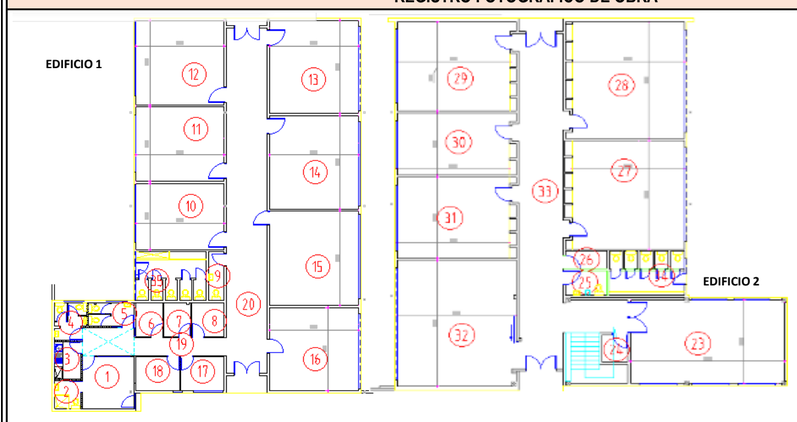

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.50	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
EDIFICIO 1			150,00		150,00
					-
EDIFICIO 2			150,00		150,00
					-
PASAN:				SUBTOTAL	300,00
				TOTAL	300,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

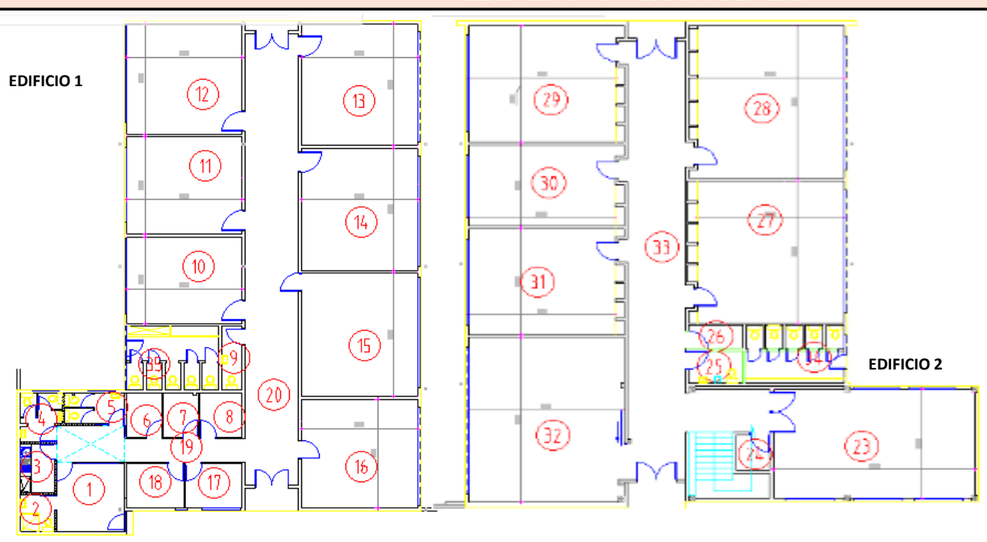

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.56	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
EDIFICIO 1			150,00		150,00
					-
EDIFICIO 2			150,00		150,00
					-
PASAN:				SUBTOTAL	300,00
				TOTAL	300,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

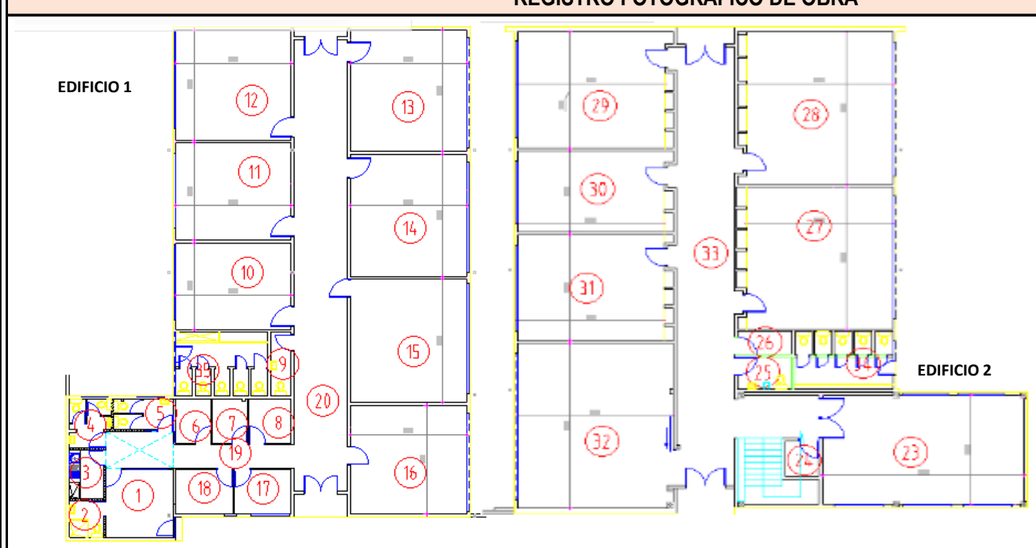

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**18**	**4**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.80	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
1				2,00	2,00
2				1,00	1,00
3				1,00	1,00
4				2,00	2,00
5				2,00	2,00
6				1,00	1,00
7				2,00	2,00
8				1,00	1,00
9				1,00	1,00
17				2,00	2,00
18				2,00	2,00
19				2,00	2,00
35				2,00	2,00
AULA 10				2,00	2,00
AULA 11				3,00	3,00
AULA 12				3,00	3,00
AULA 13				3,00	3,00
AULA 14				3,00	3,00
AULA 15				3,00	3,00
AULA 16				3,00	3,00
PASILLO 20				6,00	6,00
EDIFICIO 2					
AULA 27				4,00	4,00
AULA 28				4,00	4,00
AULA 29				4,00	4,00
AULA 30				3,00	3,00
AULA 31				3,00	3,00
AULA 32				5,00	5,00
AULA 23				8,00	8,00
BANOS 34				2,00	2,00
AULA 21 Y PASILLO 22				10,00	10,00
26				1,00	1,00
25				1,00	1,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	92,00
				TOTAL	92,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

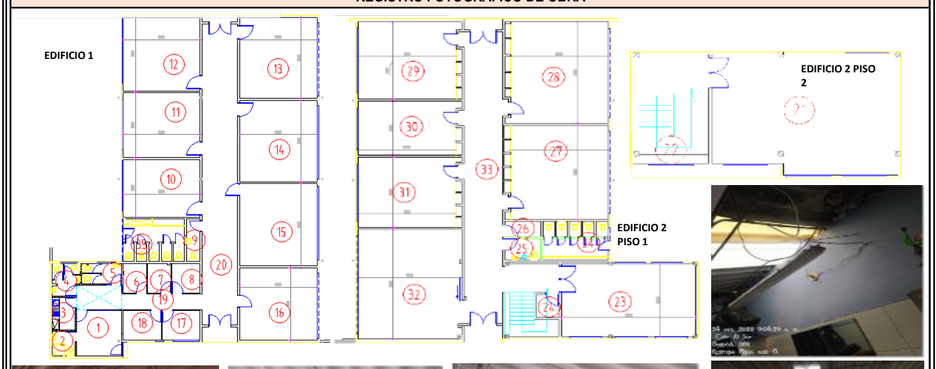



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
07.01.02	M2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
CORREDOR 20	68,83	2,85	24,15	1,00	68,83
AULA 10	23,55	4,25	5,54	1,00	23,55
AULA 11	26,48	4,78	5,54	1,00	26,48
AULA 12	30,19	5,45	5,54	1,00	30,19
AULA 13	33,72	6,01	5,61	1,00	33,72
AULA 14	33,66	6,00	5,61	1,00	33,66
AULA 15	34,00	6,06	5,61	1,00	34,00
AULA 16	30,18	5,38	5,61	1,00	30,18
EDIFICIO 2					
AULA 27	46,94	7,09	6,62	1,00	46,94
AULA 28	50,18	7,58	6,62	1,00	50,18
AULA 29	38,57	5,80	6,65	1,00	38,57
AULA 30	26,86	4,07	6,60	1,00	26,86
AULA 31	34,91	5,29	6,60	1,00	34,91
AULA 32	57,46	8,22	6,99	1,00	57,46
CORREDOR 33	54,81	2,61	21,00	1,00	54,81
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	0,46	1,15	0,40	6,00	2,76
PASAN:				**SUBTOTAL**	593,09
				TOTAL	593,09

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

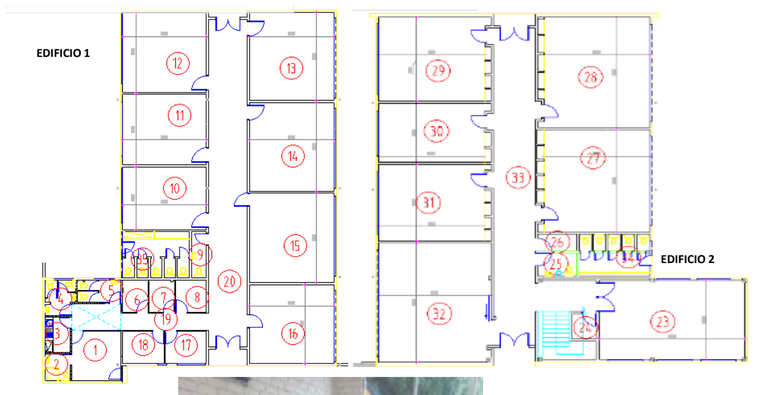

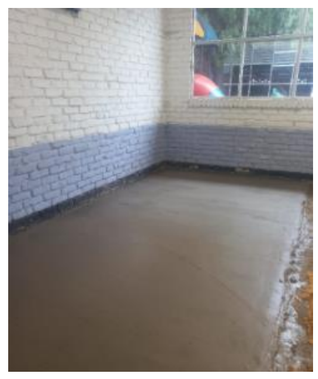

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
07.02.34	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
CORREDOR 20			24,15	2,00	48,30
AULA 10			5,54	2,00	11,08
			4,25	2,00	8,50
AULA 11			5,54	2,00	11,08
			4,78	2,00	9,56
AULA 12			5,54	2,00	11,08
			5,45	2,00	10,90
AULA 13			5,61	1,00	5,61
			6,01	2,00	12,02
AULA 14			5,61	2,00	11,22
			6,00	2,00	12,00
AULA 15			5,61	2,00	11,22
			6,06	2,00	12,12
AULA 16			5,61	2,00	11,22
			5,38	2,00	10,76
EDIFICIO 2				2,00	0,00
AULA 27			6,62	2,00	13,24
			7,09	2,00	14,18
AULA 28			6,62	2,00	13,24
			7,58	2,00	15,16
AULA 29			6,65	2,00	13,30
			5,80	2,00	11,60
AULA 30			6,60	2,00	13,20
			4,07	2,00	8,14
AULA 31			6,60	2,00	13,20
			5,29	2,00	10,58
AULA 32			6,99	2,00	13,98
			8,22	2,00	16,44
CORREDOR 33			21,00	2,00	42,00
			2,61	2,00	5,22
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS			0,40	12,00	4,80
PASAN:				**SUBTOTAL**	404,95
				TOTAL	404,95

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

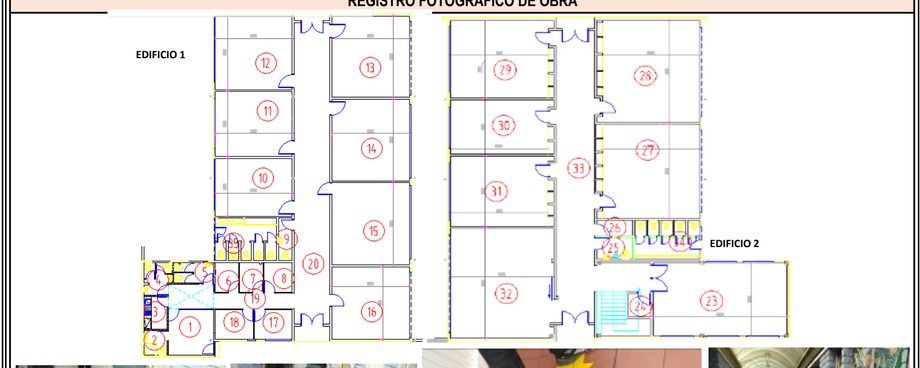



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**18**	**4**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
07.02.40	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO TIPO TARALAY O SIMILAR ALTO TRÁFICO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
CORREDOR 20	68,83	2,85	24,15	1,00	68,83
AULA 10	23,55	4,25	5,54	1,00	23,55
AULA 11	26,48	4,78	5,54	1,00	26,48
AULA 12	30,19	5,45	5,54	1,00	30,19
AULA 13	33,72	6,01	5,61	1,00	33,72
AULA 14	33,66	6,00	5,61	1,00	33,66
AULA 15	34,00	6,06	5,61	1,00	34,00
AULA 16	30,18	5,38	5,61	1,00	30,18
EDIFICIO 2					
AULA 27	46,94	7,09	6,62	1,00	46,94
AULA 28	50,18	7,58	6,62	1,00	50,18
AULA 29	38,57	5,80	6,65	1,00	38,57
AULA 30	26,86	4,07	6,60	1,00	26,86
AULA 31	34,91	5,29	6,60	1,00	34,91
AULA 32	57,46	8,22	6,99	1,00	57,46
CORREDOR 33	54,81	2,61	21,00	1,00	54,81
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	0,46	1,15	0,40	6,00	2,76
PASAN:				**SUBTOTAL**	593,09
				TOTAL	593,09

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
09.01.03	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
1	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
2	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
3	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
4	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
5	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
6	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
7	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
8	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
9	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
17	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
18	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
35	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
AULA 10	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
AULA 11	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
AULA 12	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
AULA 13	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
AULA 14	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
AULA 15	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
AULA 16	2,16	1,00	2,16	1,00	2,16
PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA	6,48	3,00	2,16	2,00	12,96
EDIFICIO 2	0,00				
AULA 27	1,85	0,90	2,06	1,00	1,85
AULA 28	1,85	0,90	2,06	1,00	1,85
AULA 29	1,85	0,90	2,06	1,00	1,85
AULA 30	1,85	0,90	2,06	1,00	1,85
AULA 31	1,85	0,90	2,06	1,00	1,85
AULA 32	4,07	1,85	2,20	1,00	4,07
AULA 23	1,85	0,90	2,06	1,00	1,85
PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA	3,69	1,80	2,05	2,00	7,38
AULA 21	4,07	1,85	2,20	1,00	4,07
CUARTO ASEO Y BAÑO 25,26	1,75	0,84	2,08	2,00	3,49
PASAN:				**SUBTOTAL**	84,14
				TOTAL	84,14

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

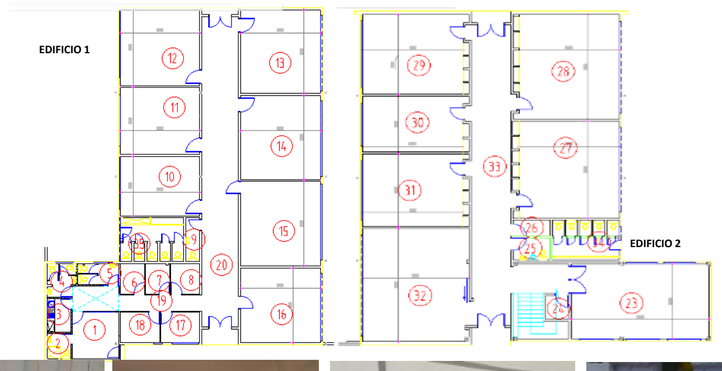



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**18**	**4**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.02.08	M2	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
1	42,00	3,50	3,00	4,00	42,00
2	24,00	2,00	3,00	4,00	24,00
3	36,00	3,00	3,00	4,00	36,00
4	30,00	2,50	3,00	4,00	30,00
5	17,16	2,86	3,00	2,00	17,16
5	15,00	2,50	3,00	2,00	15,00
6,7,8,19,18,17	66,00	5,50	3,00	4,00	66,00
35	48,00	4,00	3,00	4,00	48,00
9	42,00	3,50	3,00	4,00	42,00
AULA 10	25,50	4,25	3,00	2,00	25,50
	33,36	5,56	3,00	2,00	33,36
AULA 11	28,74	4,79	3,00	2,00	28,74
	33,42	5,57	3,00	2,00	33,42
AULA 12	32,88	5,48	3,00	2,00	32,88
	33,48	5,58	3,00	2,00	33,48
AULA 13	33,66	5,61	3,00	2,00	33,66
	36,00	6,00	3,00	2,00	36,00
AULA 14	33,66	5,61	3,00	2,00	33,66
	36,00	6,00	3,00	2,00	36,00
AULA 15	33,66	5,61	3,00	2,00	33,66
	36,00	6,00	3,00	2,00	36,00
AULA 16	33,66	5,61	3,00	2,00	33,66
	36,00	6,00	3,00	2,00	36,00
EDIFICIO 2					
AULA 27	39,72	6,62	3,00	2,00	39,72
	42,54	7,09	3,00	2,00	42,54
AULA 28	39,72	6,62	3,00	2,00	39,72
	45,48	7,58	3,00	2,00	45,48
AULA 29	34,80	5,80	3,00	2,00	34,80
	39,90	6,65	3,00	2,00	39,90
AULA 30	24,42	4,07	3,00	2,00	24,42
	39,60	6,60	3,00	2,00	39,60
AULA 31	39,60	6,60	3,00	2,00	39,60
	31,74	5,29	3,00	2,00	31,74
AULA 32	49,32	8,22	3,00	2,00	49,32
	41,94	6,99	3,00	2,00	41,94
AULA 23	54,48	9,08	3,00	2,00	54,48
	32,82	5,47	3,00	2,00	32,82
BAÑOS 34	17,22	2,87	3,00	2,00	17,22
	26,58	4,43	3,00	2,00	26,58
AULA 21 Y PASILLO 22	79,20	13,2	3,00	2,00	79,20
	41,46	6,91	3,00	2,00	41,46
A DESCONTAR PUERTAS:					-84,14
EXTERIORES					
EDIFICIO 1					
LONGITUDINAL	150,00	25,00	3,00	2,00	150,00
TRANSVERSAL	60,00	10,00	3,00	2,00	60,00
CORREDOR	150,00	25,00	3,00	2,00	150,00
EDIFICIO 2					
LONGITUDINAL	150,00	25,00	3,00	2,00	150,00
TRANSVERSAL	60,00	10,00	3,00	2,00	60,00
CORREDOR	150,00	25,00	3,00	2,00	150,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	2142,58
				TOTAL	2142,58

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.4.2	M2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
17	1,83	1,95	0,94	1,00	1,83
18	1,55	1,27	1,22	1,00	1,55
PUERTA PRINCIPAL	6,30	3,00	2,10	1,00	6,30
INGRESO A AREA ADMINISTRATIVA	3,99	1,90	2,10	1,00	3,99
EDIFICIO 2					
AULA 23	5,10	2,20	2,32	2,00	10,21
PUERTA PRINCIPAL	6,30	3,00	2,10	1,00	6,30
REJAS TECHO EN AULA 21	54,12	9,38	5,77	1,00	54,12
PASAN:				**SUBTOTAL**	84,30
				TOTAL	84,30


REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

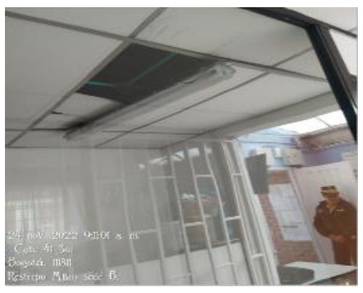

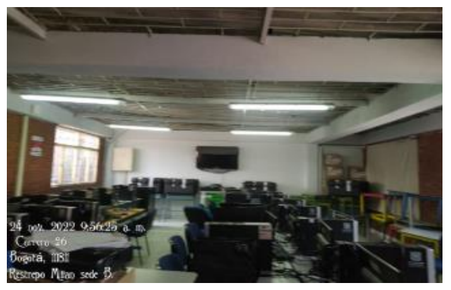





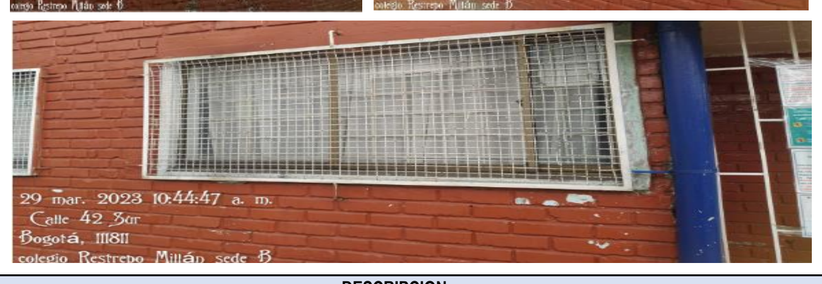

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**		
	FECHA:	**18**	**4**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.04.03	ML	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	CANTIDAD CARAS POR CERCHA	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO 1 ESTRUCTURA EXISTENTE					
LONGITUDINAL ALA 1		3,00	18,00	5,00	270,00
LONGITUDINAL CANAL		3,00	23,00	2,00	138,00
TRANSVERSAL ALA 1		3,00	8,60	2,00	51,60
COLUMNETAS ALA 1		1,00	5,20	2,00	10,40
LONGITUDINAL ALA 2		3,00	25,00	5,00	375,00
TRANSVERSAL ALA 2		3,00	8,60	3,00	77,40
COLUMNETAS ALA 2		1,00	5,30	3,00	15,90
ESTRUCTURA DE DOMOS		3,00	3,10	3,00	27,90
		1,00	3,10	20,00	62,00
EDIFICIO 1 ESTRUCTURA REFUERZO					
Portico transversal cintas ala 1 (color cyan)		1,00	8,60	4,00	34,40
Portico transversal cintas ala 2 (color cyan)		1,00	8,60	6,00	51,60
Portico transversal columnetas internas ala 1 (color rojo)		1,00	3,00	4,00	12,00
Portico transversal columnetas externas ala 1 (color rojo)		1,00	4,20	4,00	16,80
Portico transversal columnetas internas ala 2 (color rojo)		1,00	3,00	6,00	18,00
Portico transversal columnetas externa ala 2 (color rojo)		1,00	4,20	6,00	25,20
Portico longitudinal cinta ala 1 (color gris)		1,00	18,00	1,00	18,00
Portico longitudinal cinta ala 2 (color gris)		1,00	25,00	1,00	25,00
Portico ala 1 verde		1,00	2,00	4,00	8,00
Platina sobre cerchas para anclaje de teja termoacustica					
ala 1		1,00	18,00	7,00	126,00
ala 2		1,00	25,00	5,00	125,00
ala 1,1		1,00	13,00	4,00	52,00
EDIFICIO 2 ESGTRUCTURA EXISTENTE					
LONGITUDINAL ALA 3		3,00	25,00	6,00	450,00
TRANSVERSAL ALA 3		3,00	8,60	2,00	51,60
COLUMNETAS ALA 3		1,00	5,20	2,00	10,40
CANAL		3,00	23,00	2,00	138,00
LONGITUNAL ALA 4		3,00	18,00	6,00	324,00
TRANSVERSAL ALA 4		3,00	8,60	4,00	103,20
COLUMNETAS ALA 4		1,00	5,20	4,00	20,80
ESTRUCTURA DE DOMOS		3,00	3,10	3,00	27,90
		1,00	3,10	20,00	62,00
EDIFICIO 2 ESTRUCTURA REFUERZO					
Portico transversal cintas ala 4 (color cyan)		1,00	8,60	4,00	34,40
Portico transversal cintas ala 3 (color cyan)		1,00	8,60	6,00	51,60
Portico transversal columnetas internas ala 4 (color rojo)		1,00	3,00	4,00	12,00
Portico transversal columnetas externas ala 3 (color rojo)		1,00	4,20	4,00	16,80
Portico transversal columnetas internas ala 4 (color rojo)		1,00	3,00	6,00	18,00
Portico transversal columnetas externa ala 3(color rojo)		1,00	4,20	6,00	25,20
Portico longitudinal cinta ala 4 (color gris)		1,00	18,00	1,00	18,00
Portico longitudinal cinta ala 3 (color gris)		1,00	25,00	1,00	25,00
Portico verde		1,00	2,00	4,00	8,00
Platina sobre cerchas para anclaje de teja termoacustica					
ala 4		1,00	18,00	7,00	126,00
ala 3		1,00	25,00	5,00	125,00
ESTRUCTURA SEGUNDO PISO					
LONGITUDINAL		1,00	14,00	5,00	70,00
TRANSVERSAL		1,00	7,00	6,00	42,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	3300,10
				TOTAL	3300,10

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

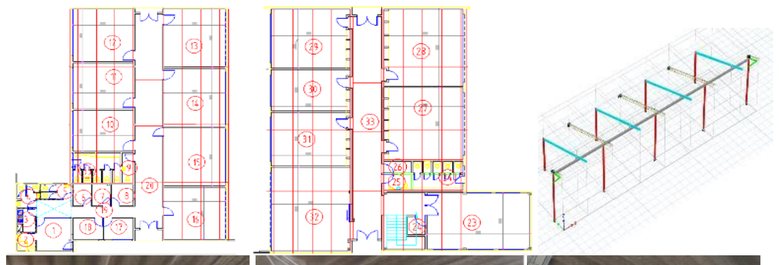





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**18**	**4**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.01	M	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1			40	1,0	40,00
EDIFICIO 2			70	1,0	70,00
PASAN:				SUBTOTAL	110,00
				TOTAL	110,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

EDIFICIO 1

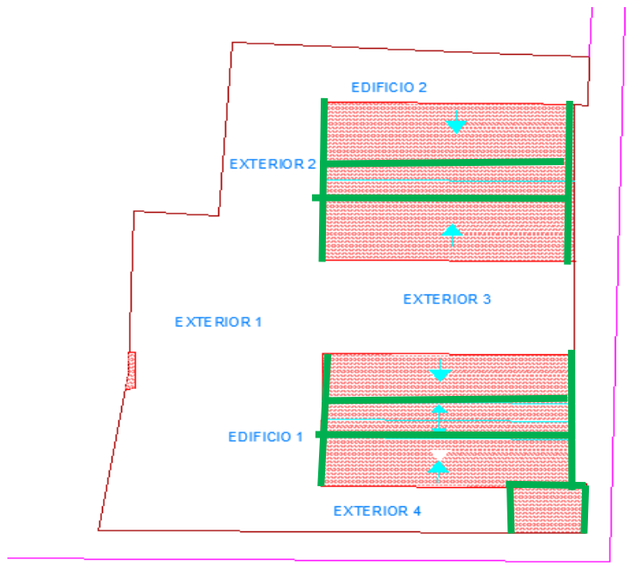



EDIFICIO 2 PISO 2

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.04	M	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)


DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
Canal en pasillo 20			26,00	2,00	52,00
EDIFICIO 2					
canal en aula 23			14,00	2,00	28,00
				SUBTOTAL	80,00
PASAN: Se incluye las canales del edificio 1, dado que aún no se ha tenido acceso al edificio para verificar el estado actual de las mismas				**TOTAL**	80,00


REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

EDIFICIO 1

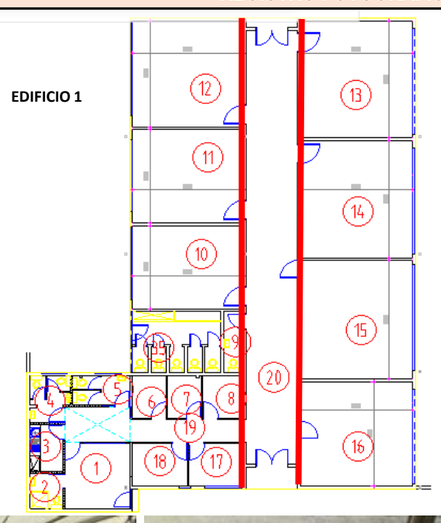

EDIFICIO 2 PISO 2



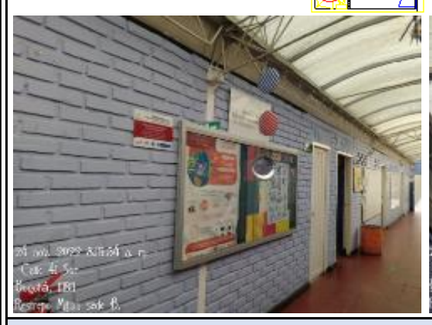





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.05	M	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
Canal en pasillo 20			24,00	2,00	48,00
Area administrativa ala 1.1			12,00	1,00	12,00
EDIFICIO 2					
Canal en pasillo 33				0,00	0,00
canal en aula 23			13,00	2,00	26,00
PASAN: Se deja contemplada en edifciio 1 hasta tanto hacer la verificación del funcionamiento o no de las existentes, en edificio 2 se dejan para segundo piso que si requieren el cambio				**SUBTOTAL**	86,00
				TOTAL	86,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

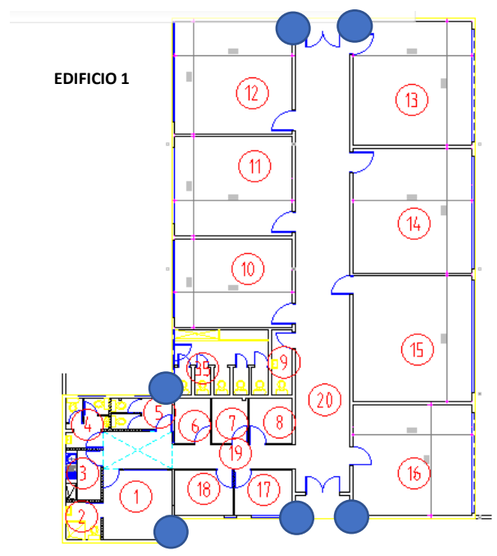

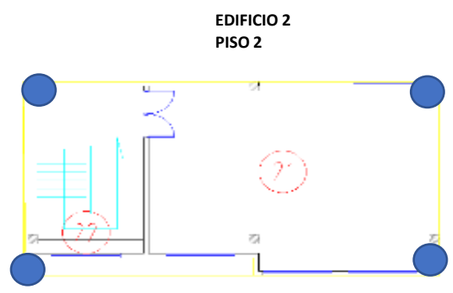

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.08	M2	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO


DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 1					
DOMO 1	96,60	4,02	24,03		96,60
EDIFICIO 2					
DOMO 2	79,30	3,3	24,03		79,30
PASAN:				**SUBTOTAL**	175,90
				TOTAL	175,90

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

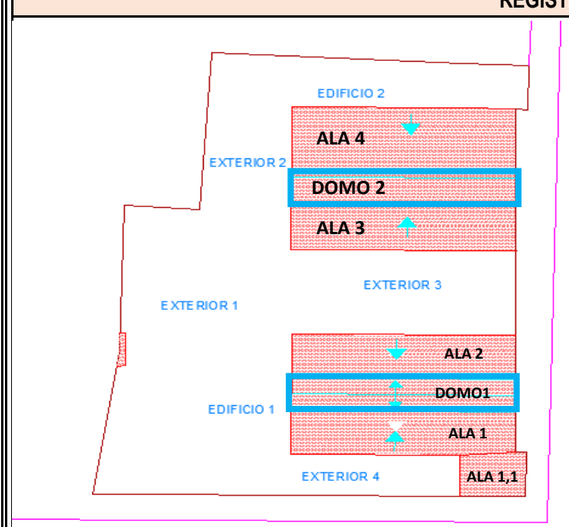





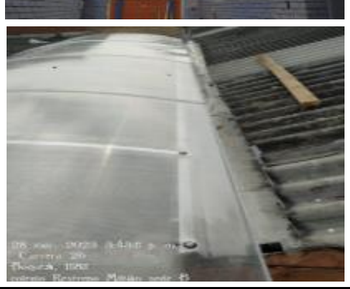



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**18**	**4**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDING SEAM (ANCHO = 500mm.) DOBLE CAPA CON AISLANTE DE POLIETILENO DE 50 mm. - SEGUN MEDIDAS IN SITU - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 1					
ALA 1,1	37,95	5,30	7,16		37,95
ALA 1	155,70	8,65	18,00		155,70
ALA 2	216,25	8,65	25,00		216,25
EDIFICIO 2					
ALA 3	216,25	8,65	25,00		216,25
ALA 4	155,70	8,65	18,00		155,70
CUBIERTA PISO 2 EDIFICIO 2	98,00	7	14,00		98,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	923,84
				TOTAL	923,84

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

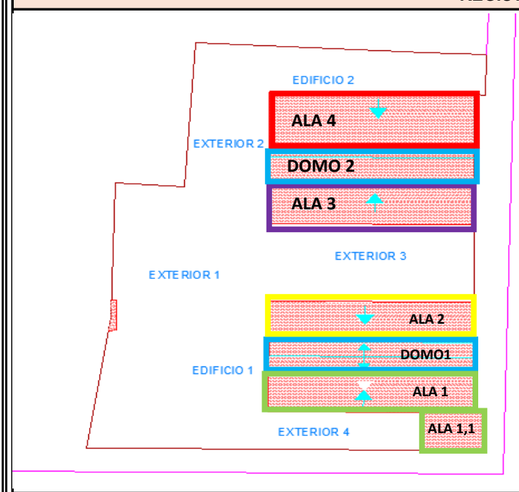









DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.42	M	LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
		ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO 1					
Refuerzo Longitudinal en cerchas ala 1			18,03	7,00	126,21
Refuerzo Longitudinal en cerchas ala 2			25,00	7,00	175,00
EDIFICIO 2			18,03	7,00	126,21
Refuerzo Longitudinal en cerchas ala 3			25,00	7,00	175,00
Refuerzo Longitudinal en cerchas ala 4					
PASAN:				**SUBTOTAL**	602,42
				TOTAL	602,42

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

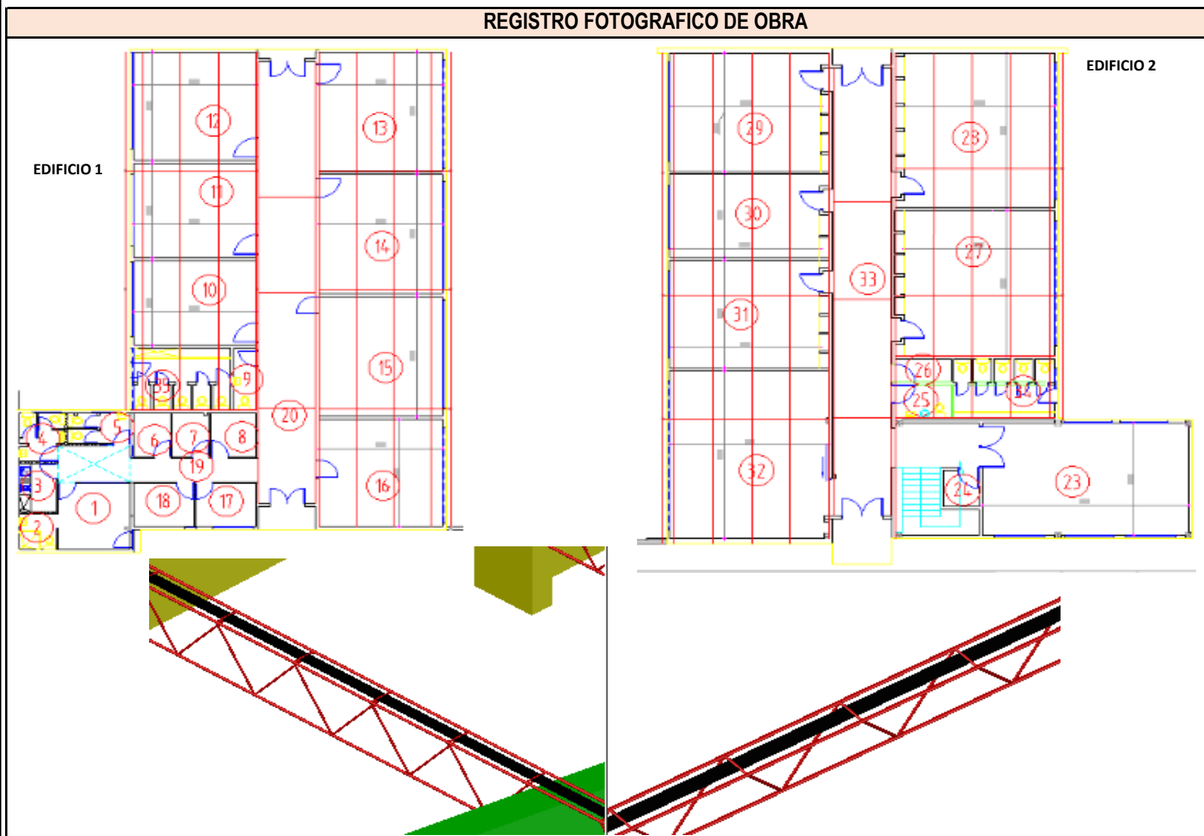

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.01.01	M2	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
ALA 1,1	37,95	5,30	7,16		37,95
ALA 1	154,80	8,6	18,00		154,80
ALA 2	215,00	8,6	25,00		215,00
DOMO 1	82,50	3,3	25,00		82,50
EDIFICIO 2	-				0,00
ALA 3	215,00	8,60	25,00		215,00
ALA 4	154,80	8,6	18,00		154,80
DOMO 2	82,50	3,3	25,00		82,50
CUBIERTA PISO 2 EDIFICIO 2	89,97	6,91	13,02		89,97
PASAN:				**SUBTOTAL**	1032,52
				TOTAL	1032,52

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

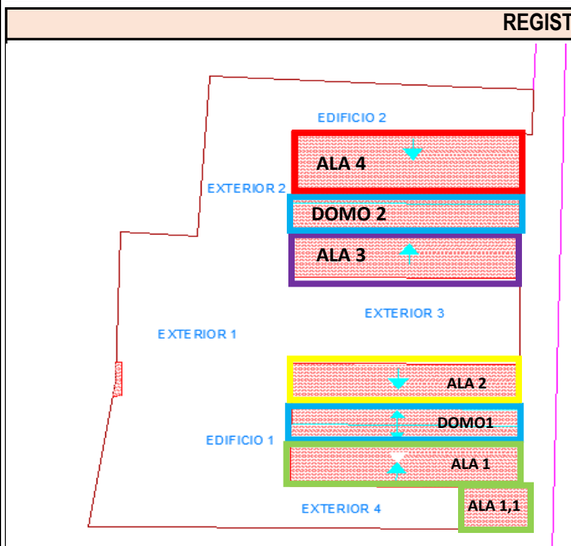





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**18**	**4**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.01.02	KG	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PESO	TOTAL
EDIFICIO 1					
ALA 1,1	37,95	5,30	7,16	17,00	645,12
ALA 1	154,80	8,6	18,00	17,00	2631,60
ALA 2	215,00	8,6	25,00	17,00	3655,00
	-				
EDIFICIO 2	-				
ALA 3	215,00	8,60	25,00	17,00	3655,00
ALA 4	154,80	8,6	18,00	17,00	2631,60
	-				
CUBIERTA PISO 2 EDIFICIO 2	89,97	6,91	13,02	20,00	1799,36
PASAN:				**SUBTOTAL**	15017,68
				TOTAL	15017,68

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

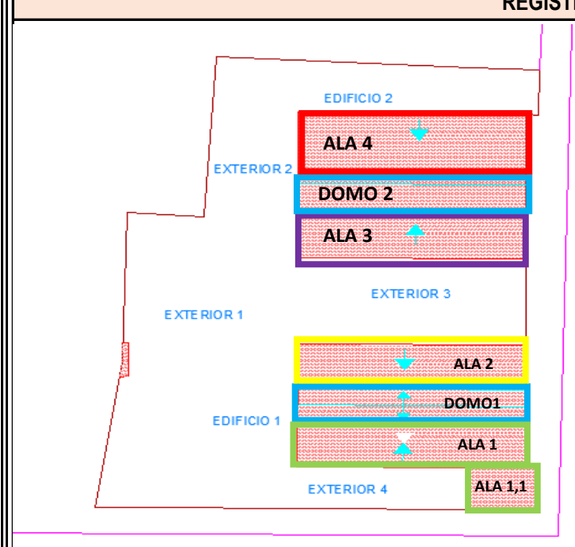









DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2022	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.01.03	KG	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PESO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 1						
ALA 1,1	40,98	5,30	7,16	17,00	8%	696,73
ALA 1	134,43	5,18	24,03	17,00	8%	2285,37
ALA 2	138,59	5,34	24,03	17,00	8%	2355,96
EDIFICIO 2	-					
ALA 3	227,34	8,76	24,03	17,00	8%	3864,83
ALA 4	220,34	8,49	24,03	17,00	8%	3745,71
CUBIERTA PISO 2 EDIFICIO 2	97,17	6,91	13,02	17,00	8%	1651,82
PASAN:					**SUBTOTAL**	14600,41
					TOTAL	14600,41

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

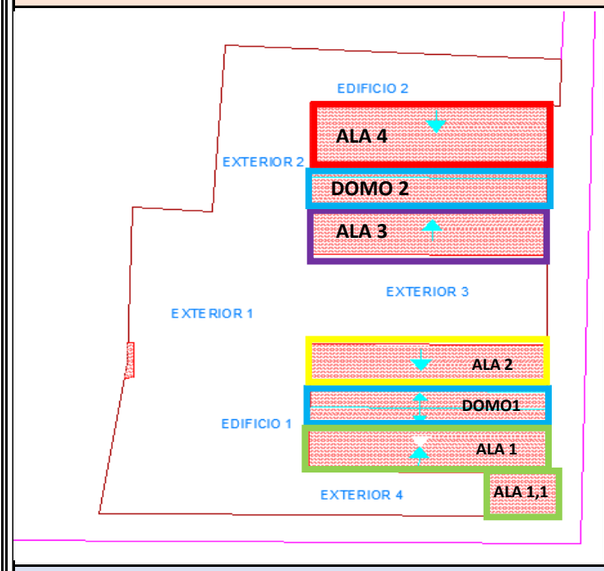









DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	18	4	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
NP05	M	REMATE DE MAMPOSTERÍA A CUBIERTA TIPO SÁNDWICH H>=30 CIM, INCLUYE MAMPOSTERÍA Y UNA CARA DE PAÑETE

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 1					
ALA 1,1	37,95	5,30	7,16		12,46
ALA 1	155,70	8,65	18,00		26,65
ALA 2	216,25	8,65	25,00		33,65
EDIFICIO 2					0,00
ALA 3	216,25	8,65	25,00		33,65
ALA 4	155,70	8,65	18,00		26,65
CUBIERTA PISO 2 EDIFICIO 2	98,00	7	14,00		21,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	154,06
				TOTAL	154,06

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

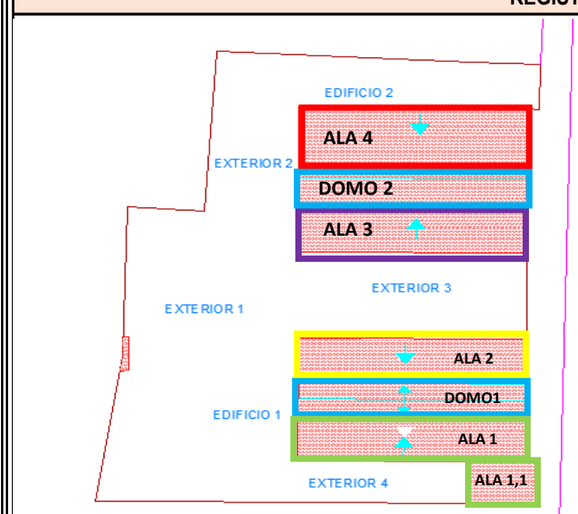



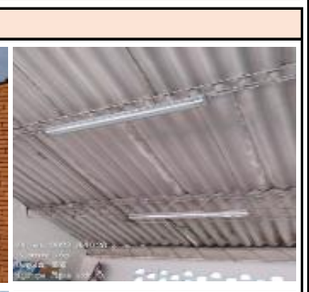





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Bogotá D.C., 25 de abril de 2023

2023_RUU_MGP_133

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega de presupuesto Actualizado Colegio Reino de Holanda

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO MIA GP realiza la entrega del presupuesto Actualizado Colegio Reino de Holanda, lo anterior para su revisión y aprobación, teniendo en cuenta los alcances solicitados por la SED y el presupuesto general existente.

Agradecemos la atención,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Presupuesto Memorias de Calculo
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.1	REPLANTEO	M2	510,44	$ 3.222,00	$ 1.644.638,00
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	72,54	$ 35.570,00	$ 2.580.248,00
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	76,80	$ 30.664,00	$ 2.354.995,00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	69,36	$ 24.791,00	$ 1.719.504,00
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	133,90	$ 8.916,00	$ 1.193.852,00
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4,00	$ 14.008,00	$ 56.032,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	84,78	$ 26.351,00	$ 2.234.038,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	292,95	$ 14.008,00	$ 4.103.644,00
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	41,00	$ 14.890,00	$ 610.490,00
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	120,00	$ 16.887,00	$ 2.026.440,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	565,94	$ 29.215,00	$ 16.533.937,00
1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	28,80	$ 18.112,00	$ 521.626,00
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	70,00	$ 8.921,00	$ 624.470,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40,00	$ 5.062,00	$ 202.480,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	131,60	$ 6.882,00	$ 905.671,00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION TUBERIA	M	10,00	$ 11.598,00	$ 115.980,00
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	170,34	$ 4.193,00	$ 714.236,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 36.497.643,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	230,34	$ 92.298,00	$ 21.259.921,00
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.3.24	SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTO DE ANCLAJE. NORMA EN 795 Y RESOLUCION 1409 DEL 2012 PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA PARA USO DE MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA OBRA DE CONSTRUCCION.	UN	10,00	$ 240.531,00	$ 2.405.310,00
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	6791,28	$ 16.242	$ 110.303.970,00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 133.969.201,00**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	280,00	$ 9.784	$ 2.739.520,00
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 2.739.520,00**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	86,00	$ 68.798,00	$ 5.916.628,00
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	108,00	$ 33.343,00	$ 3.601.044,00
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	44,00	$ 63.687,00	$ 2.802.228,00
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	104,00	$ 22.099,00	$ 2.298.296,00
4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	6,00	$ 140.046,00	$ 840.276,00
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	6,00	$ 99.155,00	$ 594.930,00
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**				
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 '' INCLUYE ACCESORIOS	M	96,00	$ 27.292,00	$ 2.620.032,00
4.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 ''	UN	124,00	$ 15.067,00	$ 1.868.308,00
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	3,00	$ 514.084,00	$ 1.542.252,00
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 22.083.994,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21,00	$ 144.994,00	$ 3.044.874,00
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	35,00	$ 144.482,00	$ 5.056.870,00
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	200,00	$ 42.467,00	$ 8.493.400,00
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	200,00	$ 18.061,00	$ 3.612.200,00
5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	50,00	$ 168.166,00	$ 8.408.300,00

SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 28.615.644,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	61,29	$ 44.020,00	$ 2.697.986,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2	61,29	$ 151.381,00	$ 9.278.141,00
7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2	1585,29	$ 30.770,00	$ 48.779.373,00
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4,08	$ 61.112,00	$ 249.337,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 61.004.837,00**
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1.5	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10 CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	33,75	$ 117.554,00	$ 3.967.448,00
SUBTOTAL	**8. MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.967.448,00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	270,38	$ 246.574,00	$ 66.668.678,00
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	48,00	$ 563.283,00	$ 27.037.584,00
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	388,89	$ 623.348,00	$ 242.413.804,00
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN POLICUARZO, LONGITUD = X ANCHO DE 60 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA 30 CM, CON SALPICADERO	M2	18,10	$ 882.572,00	$ 15.974.553,00
9.3.12	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M, (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M	30,00	$ 1.628.462,00	$ 48.853.860,00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 400.948.479,00**
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	11,00	$ 645.291,00	$ 7.098.201,00
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	24,00	$ 878.674,00	$ 21.088.176,00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	5,00	$ 693.298,00	$ 3.466.490,00

11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA ((INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1,00	$ 2.120.003,00	$ 2.120.003,00
SUBTOTAL	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 33.772.870,00**
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	155,52	$ 1.073.302,00	$ 166.919.927,00
SUBTOTAL	**12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 166.919.927,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	168,14	$ 33.591,00	$ 5.647.991,00
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M	1056,60	$ 5.481,00	$ 5.791.225,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.7	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	34,24	$ 28.677,00	$ 981.900,00
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	3549,26	$ 29.105,00	$ 103.301.212,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	121,44	$ 22.043,00	$ 2.676.902,00
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	474,70	$ 23.886,00	$ 11.338.684,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 129.737.914,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18,00	$ 46.709,00	$ 840.762,00
17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	38,20	$ 69.142,00	$ 2.641.224,00
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	182,00	$ 63.665,00	$ 11.587.030,00
17.1.8	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	54,85	$ 136.173,00	$ 7.469.089,00
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	638,86	$ 250.250,00	$ 159.874.715,00
17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	57,95	$ 104.586,00	$ 6.060.759,00
17.1.42	LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)	M	526,16	$ 32.922,00	$ 17.322.240,00

SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 205.795.819,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	652,58	$ 7.708,00	$ 5.030.087,00
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	8688,53	$ 1.898,00	$ 16.490.830,00
20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG	8688,53	$ 2.272,00	$ 19.740.340,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 41.261.257,00**

VALOR TOTAL	**$ 1.267.314.553,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	
VALOR TOTAL	**$ 1.267.314.553,00**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.1	M2	REPLANTEO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						0,00
	ALA 1	17,30	15,5	16,40	4,4	74,16
	ALA 2	9,60	15,5	12,55	4,4	55,22
	ALA 3	19,30	14,3	16,80	4,4	73,92
	ALA 4	9,30	14,3	11,80	4,4	51,92
	ALA 5					74,16
	ALA 6					55,22
	ALA 7					73,92
	ALA 8					51,92
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	510,44
					TOTAL	510,44

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

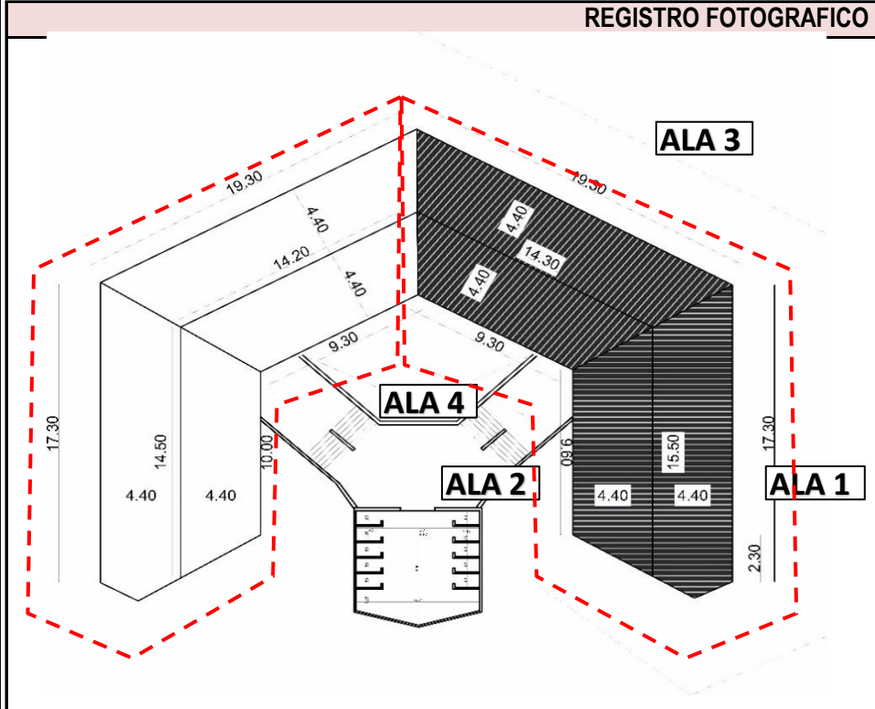





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.3	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
AREA PERIMETRAL CUBIERTA	72,54			1	72,54
PASAN:				**SUBTOTAL**	72,54
				TOTAL	72,54

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

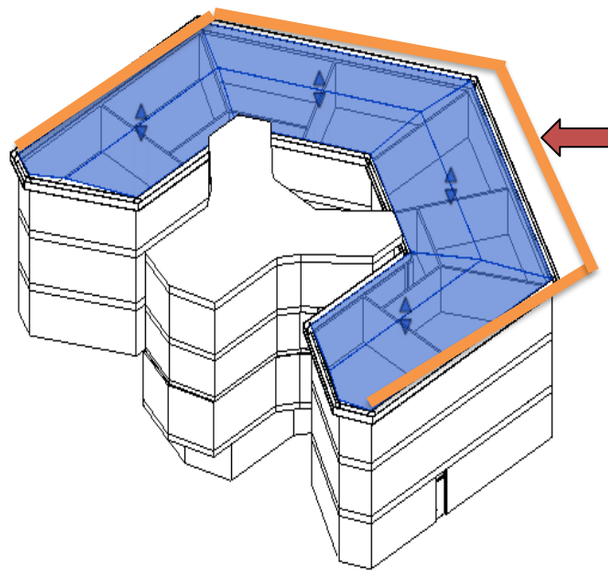



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	LARGO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Piso 1 - Baño niños		6,4	6,00		38,40
Piso 3 - Baño niñas		6,4	6,00		38,40
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	76,80
				TOTAL	76,8

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

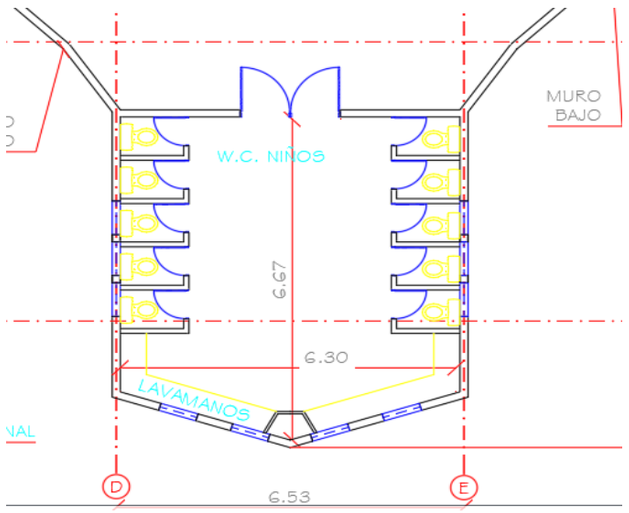





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.15	M2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					0,00
Diviciones baños hombres - piso 1	1,70	1,70		11,00	31,79
					0,00
					0,00
Diviciones baños mujeres - piso 3	1,70	1,70		13,00	37,57
PASAN:				**SUBTOTAL**	69,36
				TOTAL	69,36

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

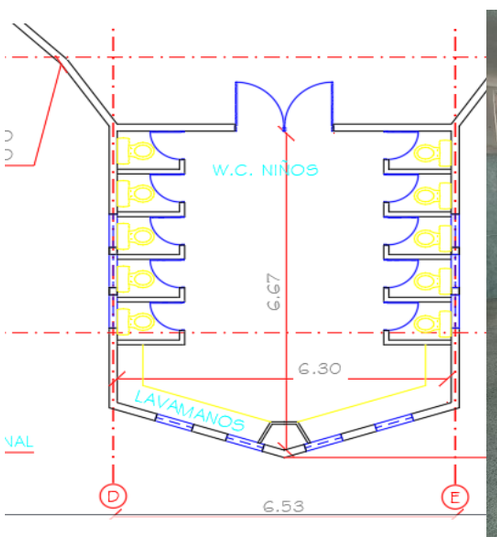

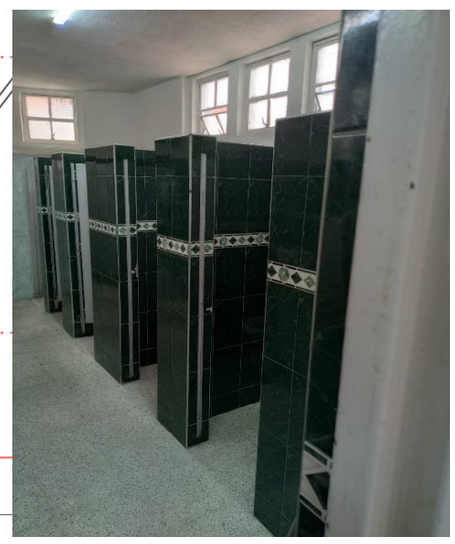



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.20	M2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS NIÑOS - PISO 1	24,80		2,12	1	52,58
					0,00
					0,00
BAÑOS NIÑAS - PISO 3	24,80		1,90		47,12
CUARTO DE ASEO	9,9		1,90		18,81
COCINA	8,1		1,90		15,39
PASAN:				**SUBTOTAL**	133,90
				TOTAL	133,9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

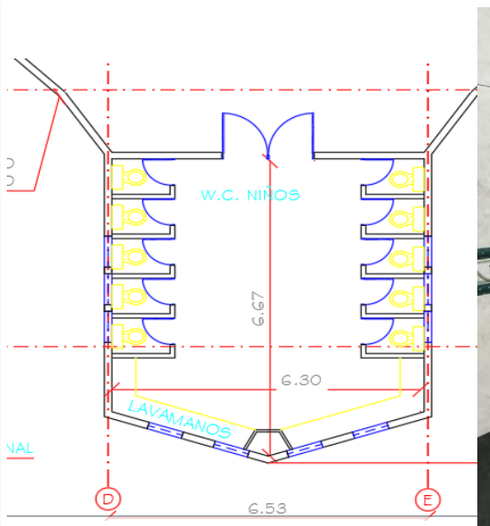

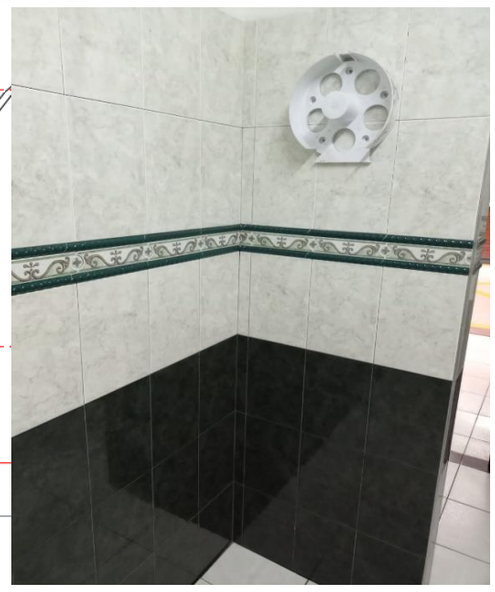



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.23	UN	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS NIÑOS - PISO 1	1,00			1	1,00
					0,00
					0,00
BAÑOS NIÑAS - PISO 3	1,00				1,00
CUARTO DE ASEO	1,00				1,00
COCINA	1,00				1,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	4,00
				TOTAL	4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

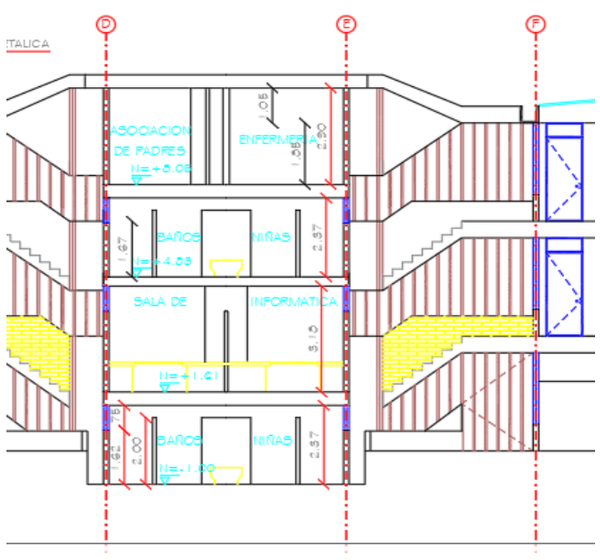





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.28	M2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS NIÑOS - PISO 1		1,26	2,16	12	32,66
					0,00
					0,00
BAÑOS NIÑAS - PISO 3		1,26	2,76	14	48,69
CUARTO DE ASEO		0,78	2,20	1	1,72
COCINA		0,78	2,20	1	1,72
PASAN:				**SUBTOTAL**	84,78
				TOTAL	84,78

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

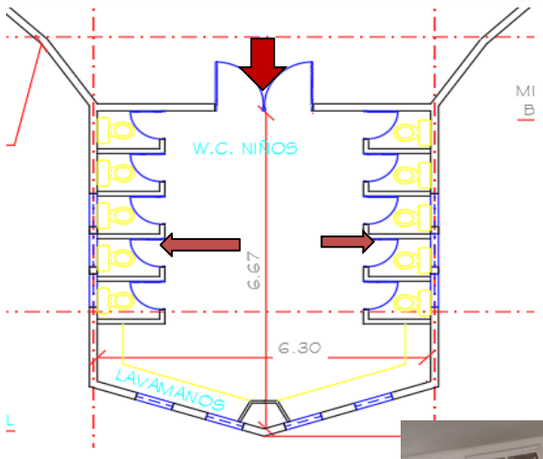







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.29	M2	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)


DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		cantidad por ventana	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
ventanas baños		2,00	0,75	0,55	6	4,95
SALON 308	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 307	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 306	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 305	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 304	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 303	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 302	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 301	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 208	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 207	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 206	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 205	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 204	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 203	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 202	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 201	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 108	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 107	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 106	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 105	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 104	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 103	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 102	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 101	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
PASAN:					**SUBTOTAL**	292,95
					TOTAL	292,95

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



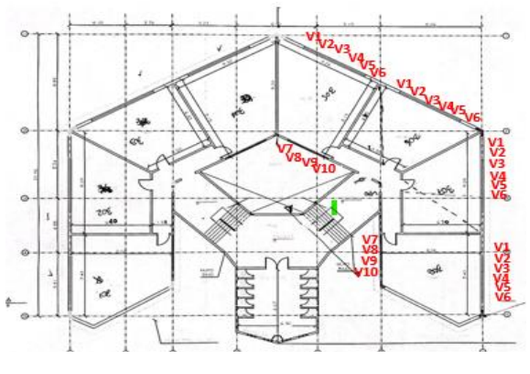



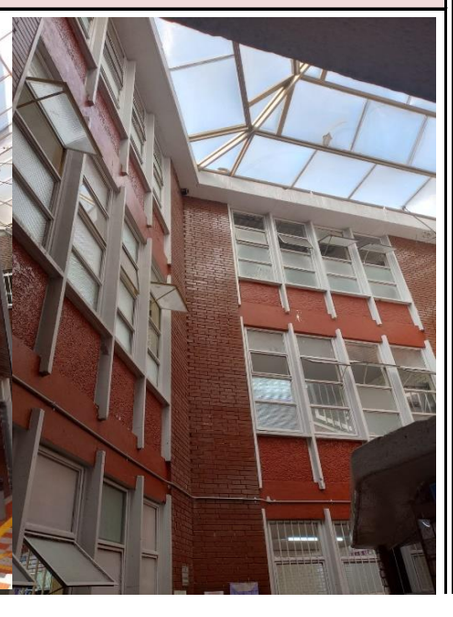

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.29	M2	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	cantidad por ventana	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
DESCRIPCION					

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.30	UN	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BANOS NINOS - PISO 1 - SANITARIOS.				11	11,00
BANOS NINOS - PISO 1 - ORINALES.				5	5,00
BANOS NINOS - PISO 1 - LAVAMANOS				6	6,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
BANOS NINAS - PISO 3				13	13,00
BANOS NINAS - PISO 3 - LAVAMANOS				5	5,00
COCINA - LAVAPLATOS				1	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	41,00
				TOTAL	41

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.31	M	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Baños niños	50,00			1	50,00
					0,00
					0,00
baños niñas	70,00				70,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	120,00
				TOTAL	120

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

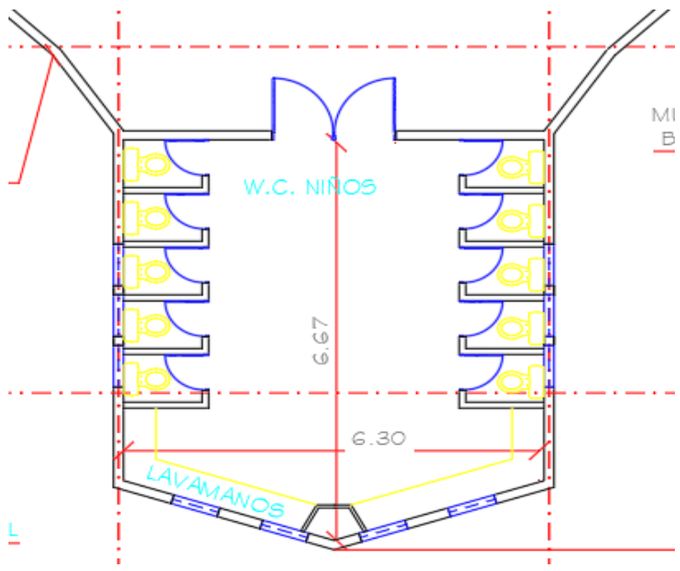

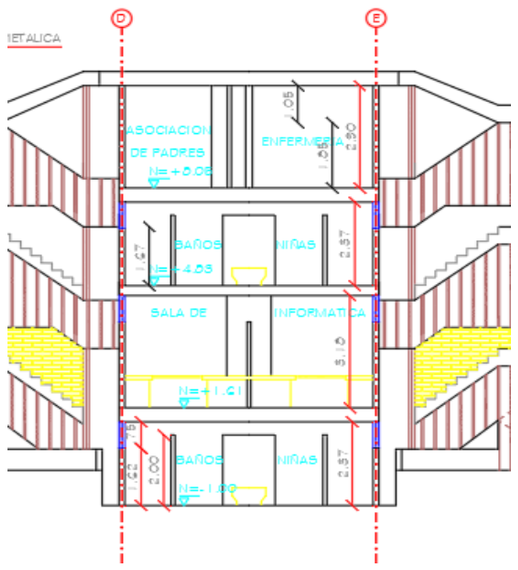

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	ALA 1	17,26	14,55	15,91	4,5	71,57
	ALA 2	9,60	14,65	12,13	4,5	54,56
	ALA 3	18,93	14,35	16,64	4,5	74,88
	ALA 4	9,30	14,35	11,83	4,5	53,21
	ALA 5	19,90	14,35	17,13	4,5	77,06
	ALA 6	9,30	14,35	11,83	4,5	53,21
	ALA 7	17,26	14,7	15,98	4,5	71,91
	ALA 8	9,60	14,7	12,15	4,5	54,68
POLICARBONATO	AREA 9	16,60	5	10,80	1	10,80
	AREA 10	6,30	5	5,65	1	5,65
ACRILICO	AREA 11	9,60	9,6	9,60	2	19,20
	AREA 12	9,60	9,6	9,60	2	19,20
PASAN:					SUBTOTAL	565,94
					TOTAL	565,94

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

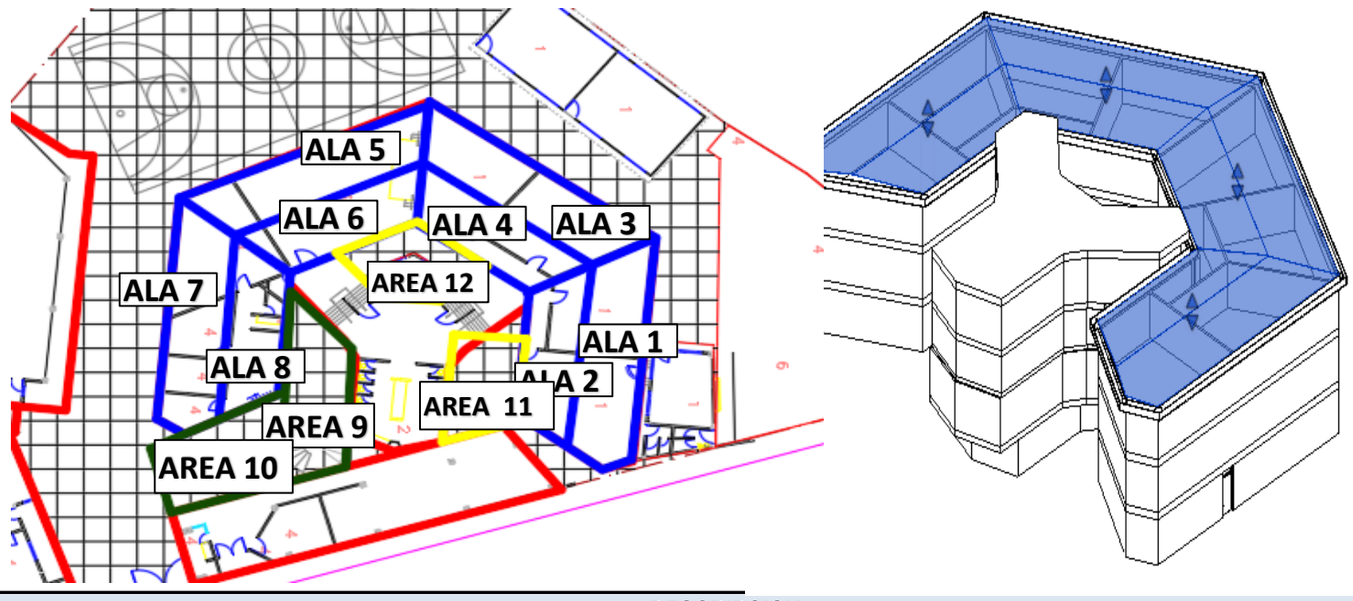

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.35	M2	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
BAÑOS						
			0,8	1,20	24	28,80
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	28,80
					TOTAL	28,8

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

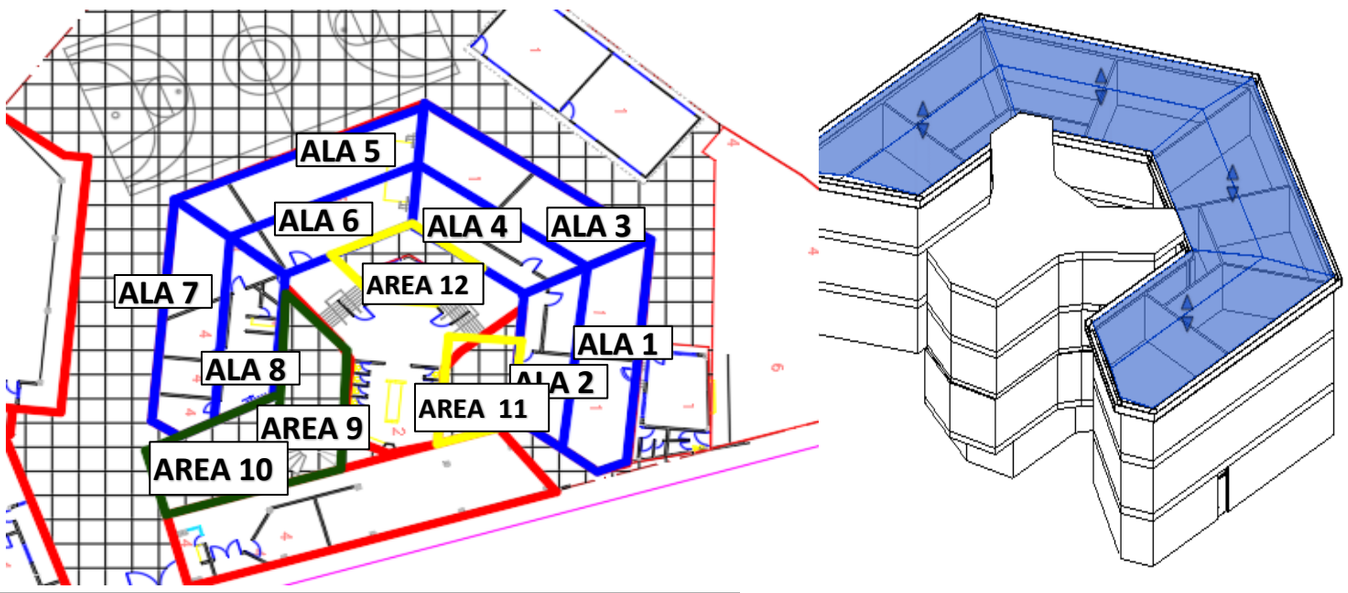

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.42	M	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS NIÑOS - PISO 1	26,00				26,00
					0,00
					0,00
BAÑOS NIÑAS - PISO 3	26,00				26,00
CUARTO DE ASEO	9,00				9,00
COCINA	9,00				9,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	70,00
				TOTAL	70

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

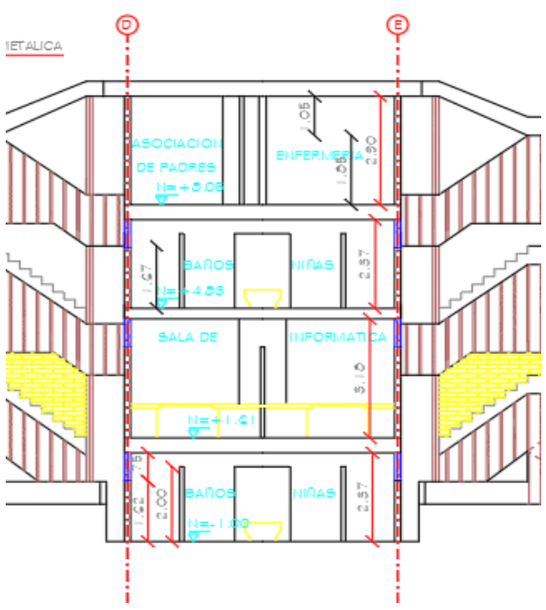



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS NIÑOS - PISO 1				4	4,00
					0,00
					0,00
BAÑOS NIÑAS - PISO 3				4	4,00
AREA BAJO CUBIERTA				32	32,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	40,00
				TOTAL	40

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

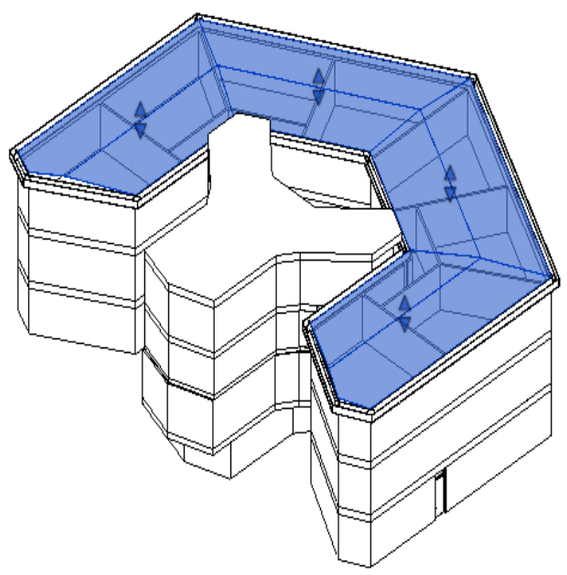



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.45	M	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULA 308	14,50			1	14,50
AULA 307	13,65			1	13,65
AULA 306	13,80			1	13,80
AULA 305	13,85			1	13,85
AULA 304	13,85			1	13,85
AULA 303	13,80			1	13,80
AULA 302	13,65			1	13,65
AULA 301	14,50			1	14,50
PASILLO	10,00			2	20,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	131,60
				TOTAL	131,6

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

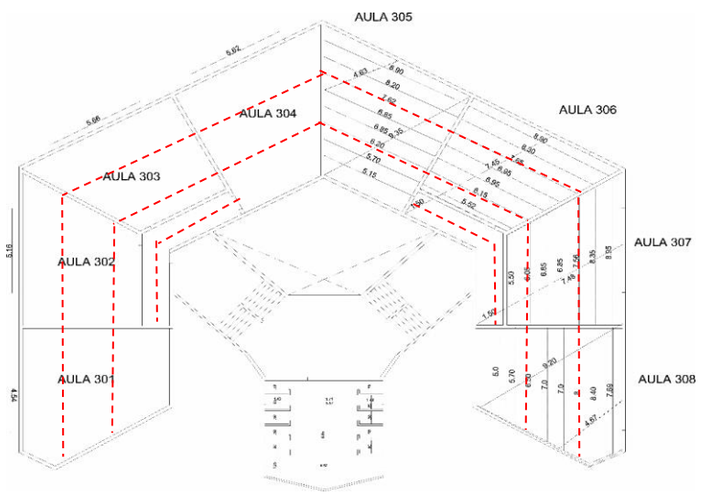

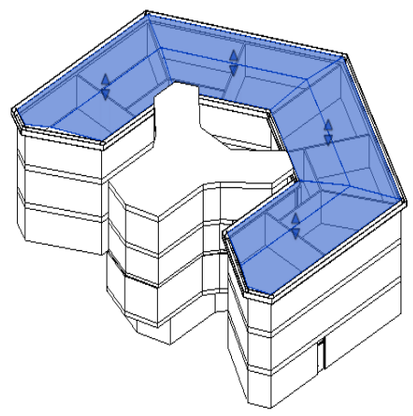

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.4.2	M	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION TUBERIA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
PISO 3	10,00				10,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	10,00
				TOTAL	10

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.4.10	M	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
PERIMETRO EXTERIOR CUBIERTA ETAPA 1	36,27				36,27
PERIMETRO INTERIOR CUBIERTA ETAPA 1	18,90				18,90
TRANSVERSALES ETAPA 1	30,00				30,00
PERIMETRO EXTERIOR CUBIERTA ETAPA 2	36,27				36,27
PERIMETRO INTERIOR CUBIERTA ETAPA 2	18,90				18,90
TRANSVERSALES ETAPA 2	30,00				30,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	170,34
				TOTAL	170,34

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
RELLENO CANCHA	3,40	1,9	1,00	1,35	8,72
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	8,72
				TOTAL	8,72

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

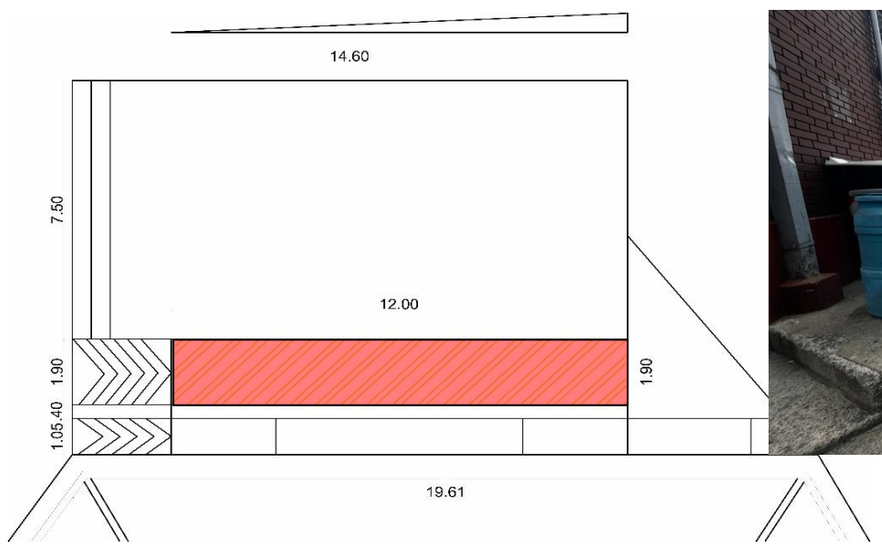

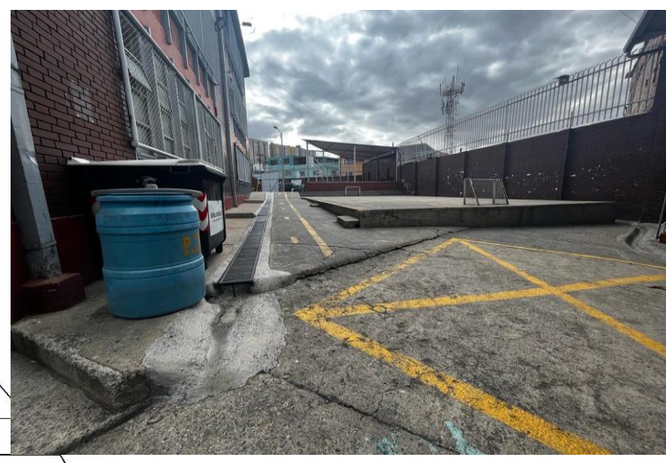

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.2.10	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
PERIMETRO EXTERIOR CUBIERTA	72,54				72,54
PERIMETRO INTERIOR CUBIERTA	37,80				37,80
TRANSVERSALES	120,00				120,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	230,34
				TOTAL	230,34

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.3.24	UN	SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTO DE ANCLAJE. NORMA EN 795 Y RESOLUCION 1409 DEL 2012 PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA PARA USO DE MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA OBRA DE CONSTRUCCION.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
cubierta				10	10,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	10,00
				TOTAL	10

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.5.2	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	KG POR METRO	TOTAL
EDIFICACIONES					
Reforzamiento estructura cubierta	565,94			12	6791,28
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	6791,28
				TOTAL	6791,28

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
3.1.24	M2	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
MUROS BAJO CUBIERTA	280,00			1	280,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	280,00
				TOTAL	280

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.2.3	M	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BANOS NINOS - PISO 1				35	35,00
					0,00
					0,00
BANOS NINAS - PISO 3				35	35,00
CUARTO DE ASEO				8	8,00
COCINA				8	8,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	86,00
				TOTAL	86

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.2.4	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BANOS NINOS - PISO 1				46	46,00
					0,00
					0,00
BANOS NINAS - PISO 3				46	46,00
CUARTO DE ASEO				8	8,00
COCINA				8	8,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	108,00
				TOTAL	108

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.2.5	M	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BANOS NINOS - PISO 1			16,00		16,00
					0,00
					0,00
BANOS NINAS - PISO 3			16,00		16,00
CUARTO DE ASEO			6,00		6,00
COCINA			6,00		6,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	44,00
				TOTAL	44

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.2.6	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BANOS NINOS - PISO 1				44	44,00
					0,00
					0,00
BANOS NINAS - PISO 3				44	44,00
CUARTO DE ASEO				8	8,00
COCINA				8	8,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	104,00
				TOTAL	104

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.2.14	UN	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BANOS NINOS - PISO 1				2	2,00
					0,00
					0,00
BANOS NINAS - PISO 3				2	2,00
CUARTO DE ASEO				1	1,00
COCINA				1	1,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	6,00
				TOTAL	6

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.2.15	UN	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BANOS NINOS - PISO 1				2	2,00
					0,00
					0,00
BANOS NINAS - PISO 3				2	2,00
CUARTO DE ASEO				1	1,00
COCINA				1	1,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	6,00
				TOTAL	6

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.9	M	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 " INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BANOS NINOS - PISO 1			36,00		36,00
					0,00
					0,00
BANOS NINAS - PISO 3			36,00		36,00
CUARTO DE ASEO			12,00		12,00
COCINA			12,00		12,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	96,00
				TOTAL	96

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.10	UN	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BANOS NINOS - PISO 1				48	48,00
					0,00
					0,00
BANOS NINAS - PISO 3				48	48,00
CUARTO DE ASEO				14	14,00
COCINA				14	14,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	124,00
				TOTAL	124

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.8.1	UN	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BANOS NINOS - PISO 1				3	3,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	3,00
				TOTAL	3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.1	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS NIÑOS - PISO 1				3	3,00
CUARTO DE ASEO				1	1,00
COCINA				1	1,00
AULAS - PISO 3				16	16,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	21,00
				TOTAL	21

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

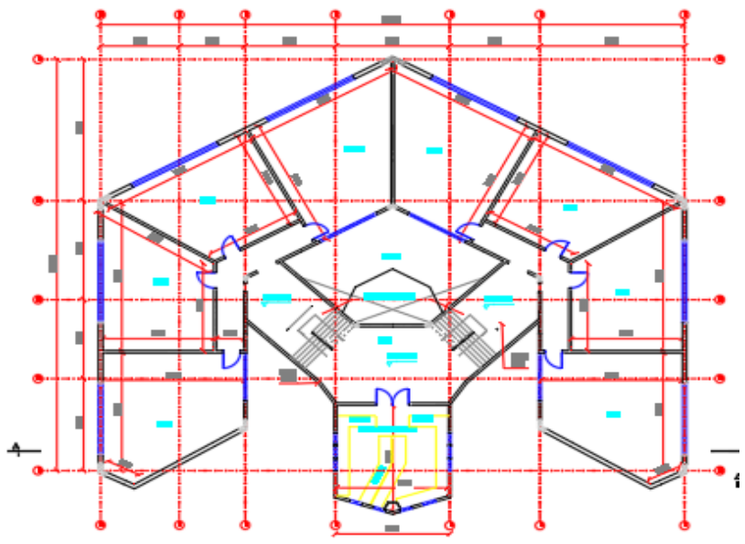



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.11	UN	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BANOS NINOS - PISO 1				5	5,00
					0,00
					0,00
CUARTO DE ASEO				3	3,00
COCINA				3	3,00
AULAS - PISO 3				24	24,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	35,00
				TOTAL	35

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

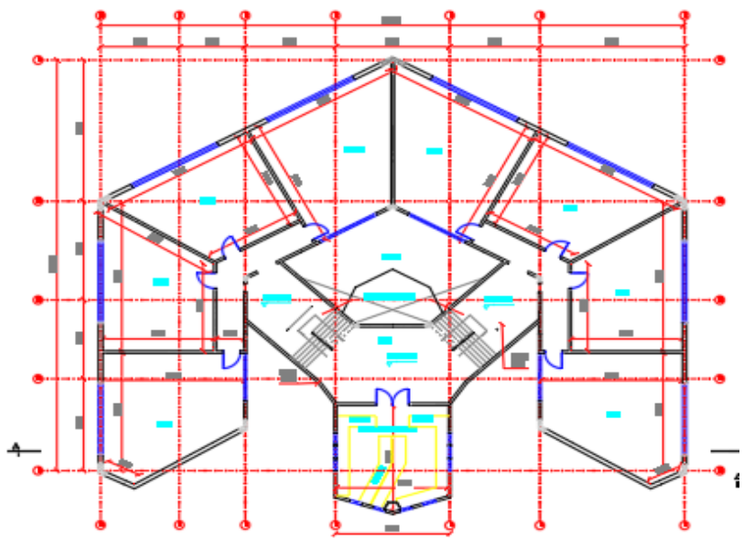



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.50	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS - PISO 3			200,00		200,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	200,00
				TOTAL	200

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

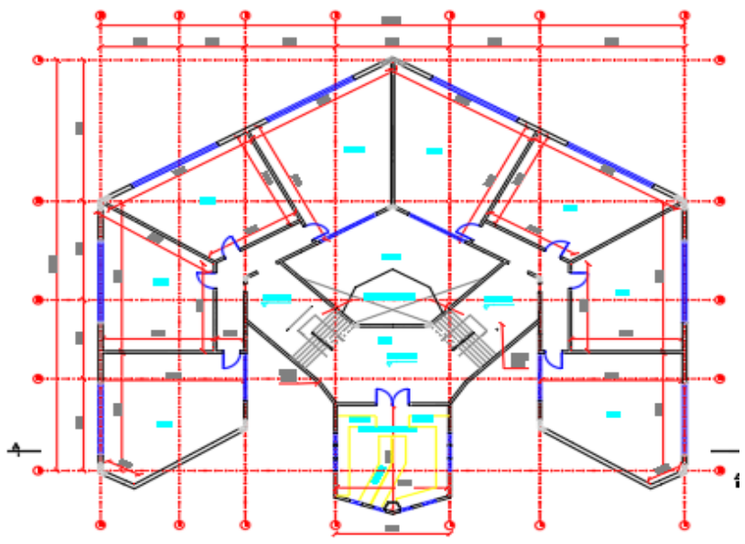



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.56	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS - PISO 3			200,00		200,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	200,00
				TOTAL	200

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

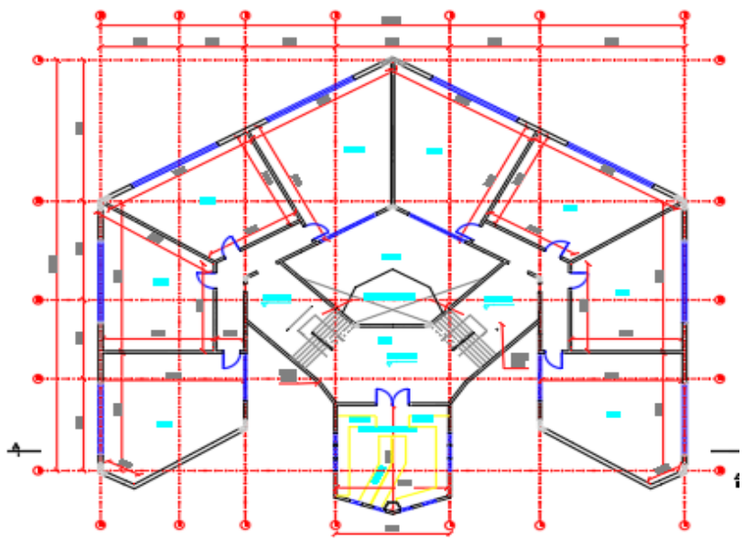



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.88	UN	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS - PISO 3				32	32,00
BANOS NINOS - PISO 1				8	8,00
					0,00
					0,00
BANOS NINAS - PISO 3				8	8,00
CUARTO DE ASEO				1	1,00
COCINA				1	1,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	50,00
				TOTAL	50

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

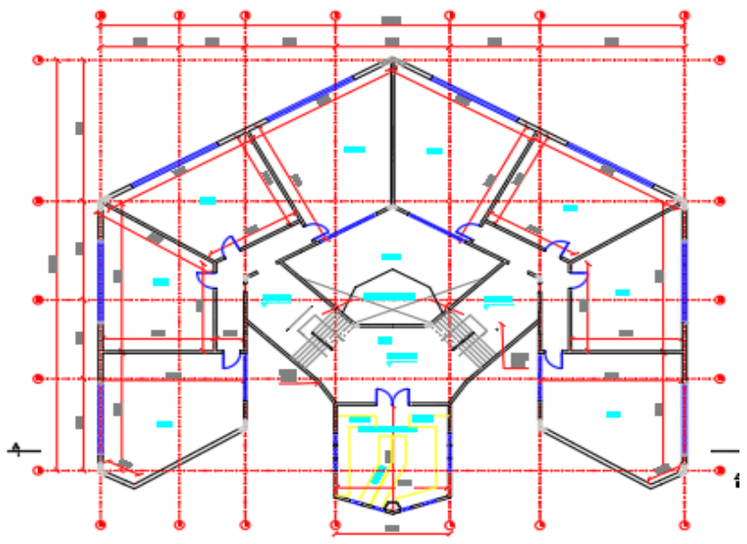



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.1.2	M2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BANOS NINOS - PISO 1		6,4	6,00		38,40
					0,00
					0,00
BANOS NINAS - PISO 3		4,5	2,90		13,05
CUARTO DE ASEO		3,1	1,85		5,74
COCINA		2,05	2,00		4,10
PASAN:				**SUBTOTAL**	61,29
				TOTAL	61,29

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

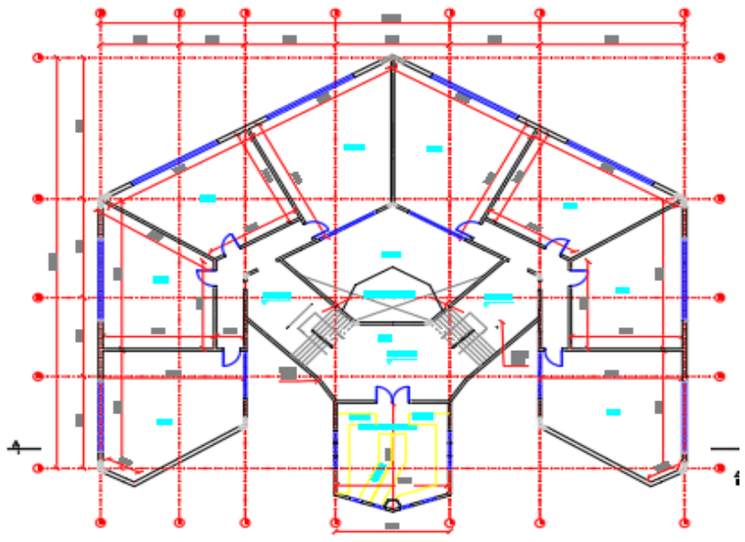



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.2.1	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BANOS NINOS - PISO 1		6,4	6,00		38,40
					0,00
					0,00
BANOS NINAS - PISO 3		4,5	2,90		13,05
CUARTO DE ASEO		3,1	1,85		5,74
COCINA		2,05	2,00		4,10
PASAN:				**SUBTOTAL**	61,29
				TOTAL	61,29

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

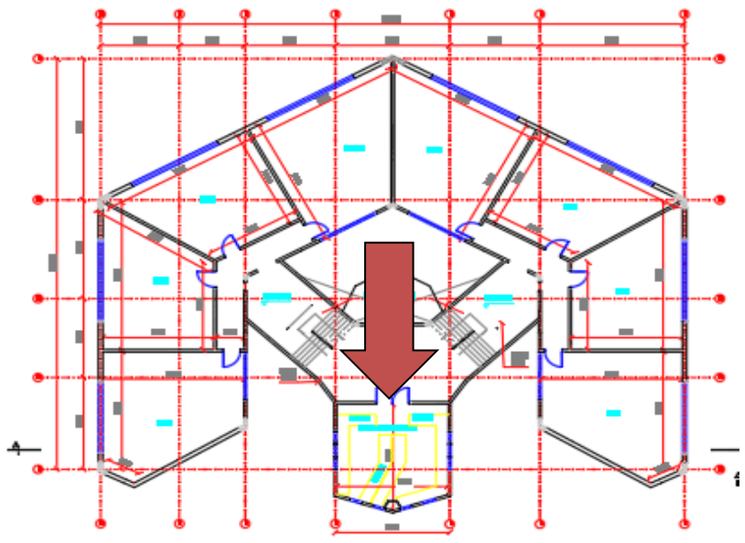



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.2.2	M2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
PISOS AULAS Y CORREDORES PISO 1	508,00			1	508,00
PISOS AULAS Y CORREDORES PISO 2	508,00			1	508,00
PISOS AULAS Y CORREDORES PISO 3	508,00			1	508,00
					0,00
EDIFICACIONES					
BAÑOS NIÑOS - PISO 1		6,4	6,00		38,40
					0,00
					0,00
BAÑOS NIÑAS - PISO 3		4,5	2,90		13,05
CUARTO DE ASEO		3,1	1,85		5,74
COCINA		2,05	2,00		4,10
PASAN:				**SUBTOTAL**	1585,29
				TOTAL	1585,29

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

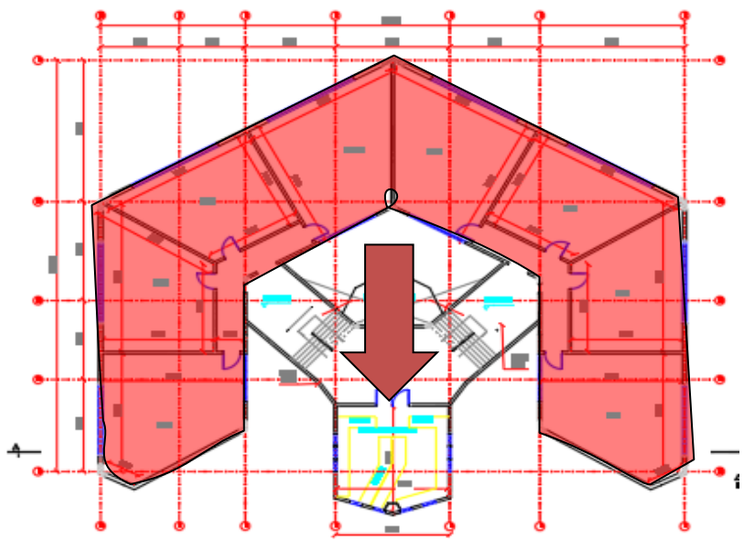

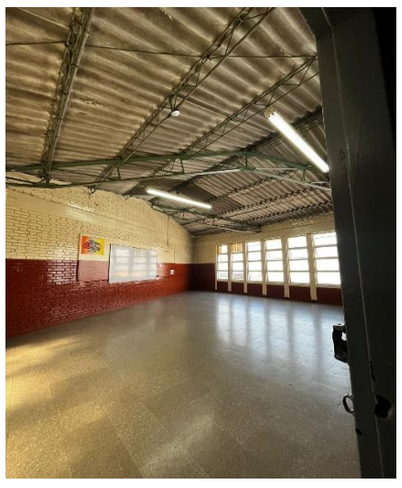

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.2.3	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BANOS NINOS - PISO 1		1,26			1,26
					0,00
					0,00
BANOS NINAS - PISO 3		1,26			1,26
CUARTO DE ASEO		0,78			0,78
COCINA		0,78			0,78
PASAN:				**SUBTOTAL**	4,08
				TOTAL	4,08

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

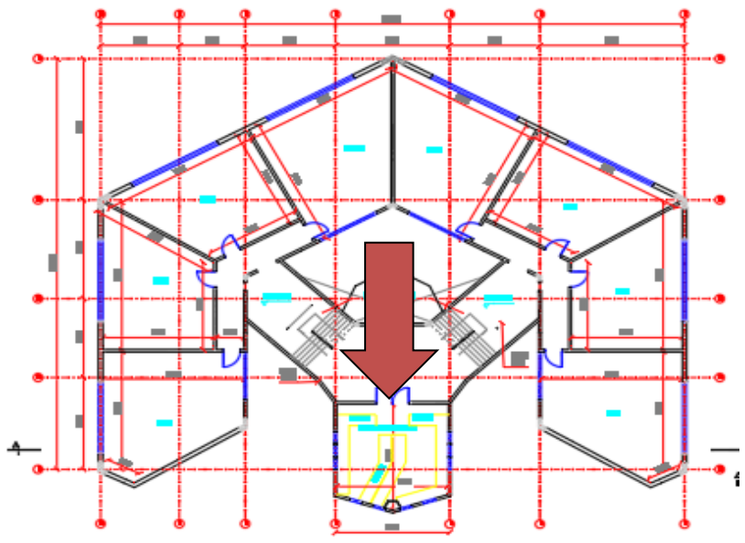



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.2.2	M2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULA PROVISIONAL	11,88	4,4	2,70	1	11,88
	10,53	3,9	2,70	1	10,53
	11,34	4,2	2,70	1	11,34
PASAN:				**SUBTOTAL**	33,75
				TOTAL	33,75

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



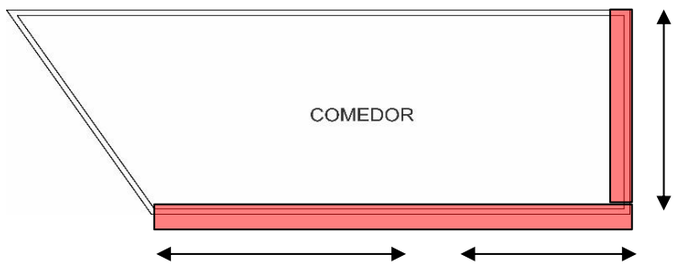

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.1.1	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	cantidad por ventana	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
ventanas externas		1,37	1,20	1	1,64
	5,00	0,80	1,95	24	187,20
		0,90	1,90	1	1,71
ventanas internas	4,00	0,80	1,95	12	74,88
ventanas baños	2,00	0,75	0,55	6	4,95
PASAN:				**SUBTOTAL**	270,38
				TOTAL	270,38

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

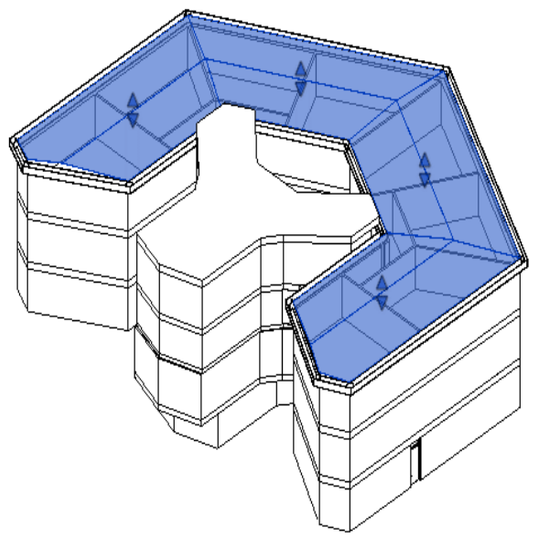



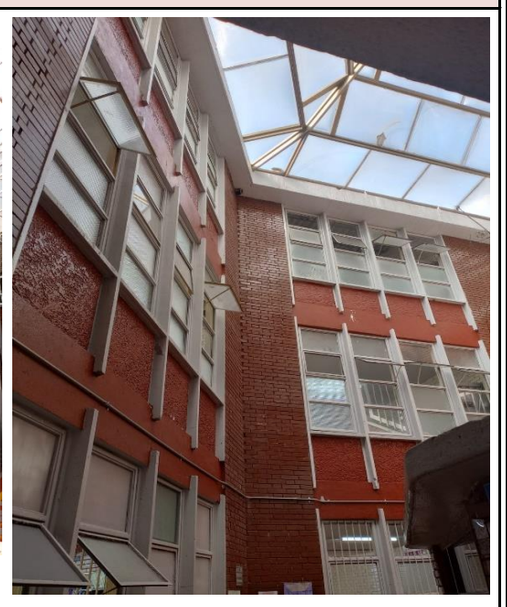

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.1.3	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	cantidad por ventana	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
		1,00	2,00	24	48,00
PASAN:				SUBTOTAL	48,00
				TOTAL	48

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

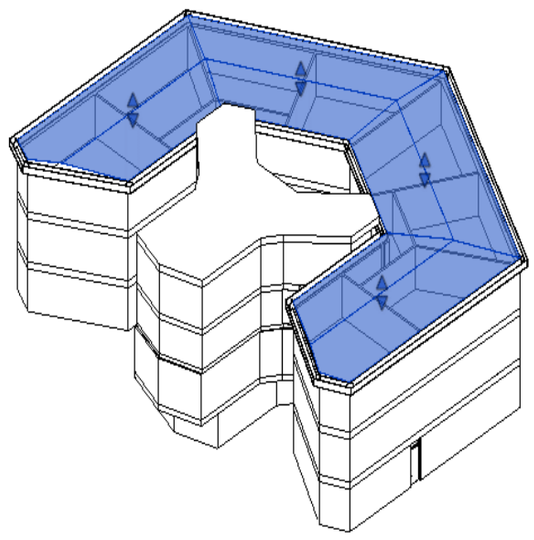



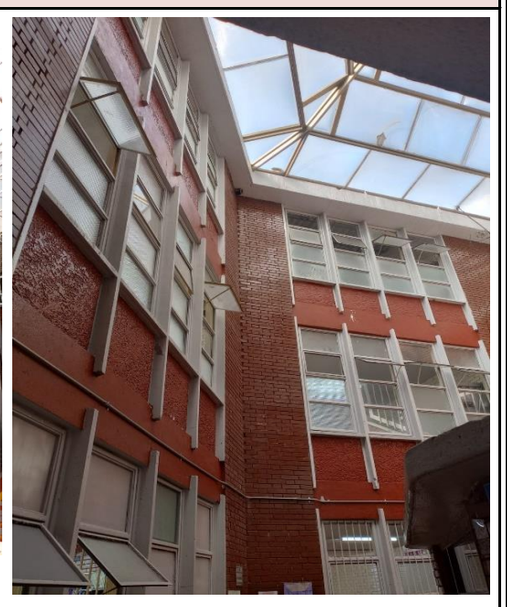

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.2.2	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		CANTIDA D	ANCHO	ALTO	AREA	TOTAL
PISO 3						
SALON 301	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 302	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 303	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 304	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 305	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 306	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 307	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 308	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
PISO 2						
SALON 301	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 302	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 303	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 304	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 305	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 306	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 307	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 308	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
PISO 1						
SALON 301	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 302	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 303	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 304	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 305	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
SALON 306	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 307	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
SALON 308	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6,00	0,75	2,00	1,5	9,00
	V7-V8-V9-V10	4,00	0,75	2,00	1,5	6,00
BAÑOS						
ventanas baños		4,00	0,80	1,95	12	74,88
		2,00	0,75	0,55	6	4,95
		4,00	0,15	1,95	18	21,06

PASAN:	**SUBTOTAL**	388,89
	TOTAL	388,89

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

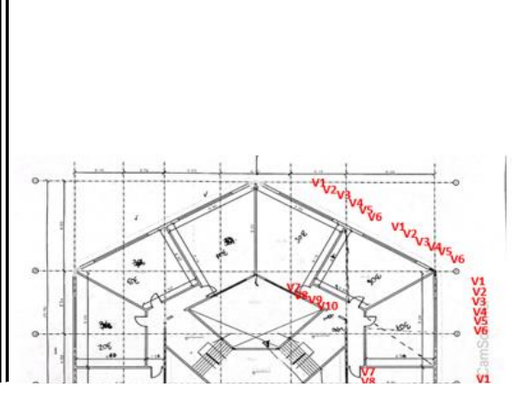





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA


CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.2.2	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	CANTIDA D	ANCHO	ALTO	AREA	TOTAL







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.3.3	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN POLICUARZO, LONGITUD = X ANCHO DE 60 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA 30 CM, CON SALPICADERO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BANOS NINOS - PISO 1	4,00			2	8,00
					0,00
					0,00
BANOS NINAS - PISO 3	4,00			2	8,00
COCINA	2,10			1	2,10
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	18,10
				TOTAL	18,1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.3.12	M	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M, (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
CANCHA					0,00
	15,00			1	15,00
	15,00			1	15,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	30,00
				TOTAL	30

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
11.1.1	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
					0,00
					0,00
BANOS NINOS - PISO 1 - LAVAMANOS				6	6,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
BANOS NINAS - PISO 3 - LAVAMANOS				5	5,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	11,00
				TOTAL	11

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
11.1.5	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS NIÑOS - PISO 1 - SANITARIOS.				11	11,00
					0,00
					0,00
BAÑOS NIÑAS - PISO 3				13	13,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	24,00
				TOTAL	24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
11.1.8	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
					0,00
BAÑOS NIÑOS - PISO 1 - ORINALES.				5	5,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	5,00
				TOTAL	5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
11.1.9	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA ((INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS NIÑOS - PISO 1 - SANITARIOS.				1	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1,00
				TOTAL	1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
12.1.8	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
PUERTA BAÑOS PISO 1		2,4	1,80	12	51,84
PUERTA BAÑOS PISO 2		2,4	1,80	12	51,84
PUERTA BAÑOS PISO 3		2,4	1,80	12	51,84
PASAN:				**SUBTOTAL**	155,52
				TOTAL	155,52

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

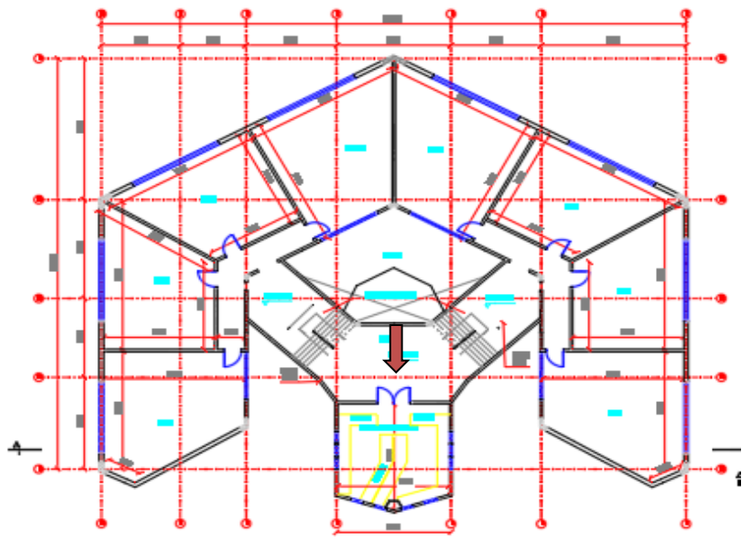



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.1.1	M2	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BANOS NINOS - PISO 1	24,80		2,12	1	52,58
					0,00
					0,00
BANOS NINAS - PISO 3	24,80		2,70		66,96
CUARTO DE ASEO	9,9		2,70		26,73
COCINA	8,1		2,70		21,87
PASAN:				**SUBTOTAL**	168,14
				TOTAL	168,14

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

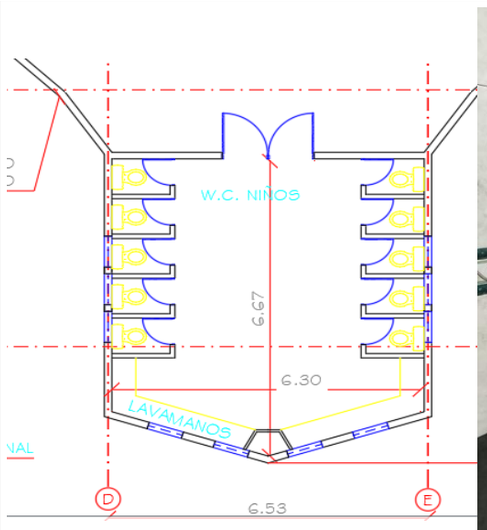

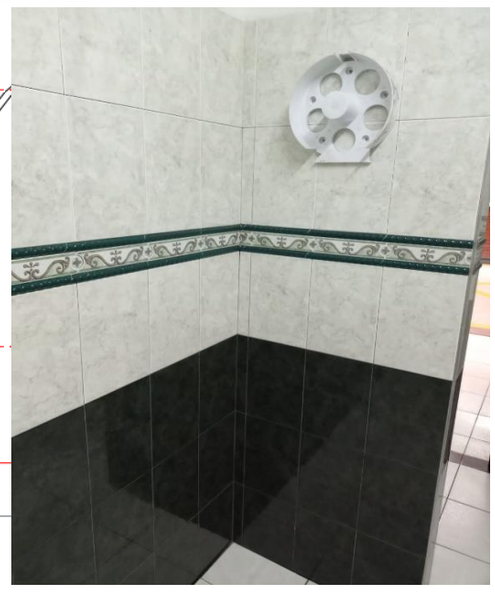



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.1.11	M	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
PISO 3	5,50	0,75	2,00	62	341,00
PISO 2	5,50	0,75	2,00	62	341,00
PISO 1	5,50	0,75	2,00	62	341,00
PUERTAS EXTERIORES PASILLOS PISO 3	11,20	0,125	2,80	4	11,20
PUERTAS EXTERIORES PASILLOS PISO 2	11,20	0,125	2,80	4	11,20
PUERTAS EXTERIORES PASILLOS PISO 1	11,20	0,125	2,80	4	11,20
PASAN:				**SUBTOTAL**	1056,60
				TOTAL	1056,6

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

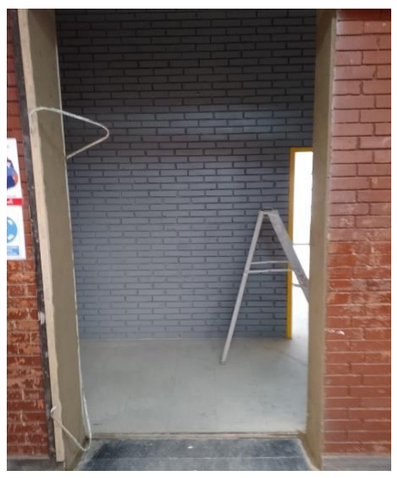



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.2.7	M2	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
					0,00
					0,00
BANOS NINAS - PISO 3	24,80		0,80		19,84
CUARTO DE ASEO	9,9		0,80		7,92
COCINA	8,1		0,80		6,48
PASAN:				**SUBTOTAL**	34,24
				TOTAL	34,24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

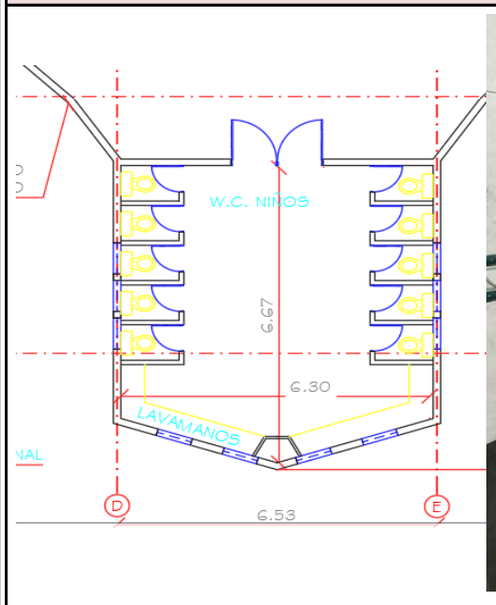

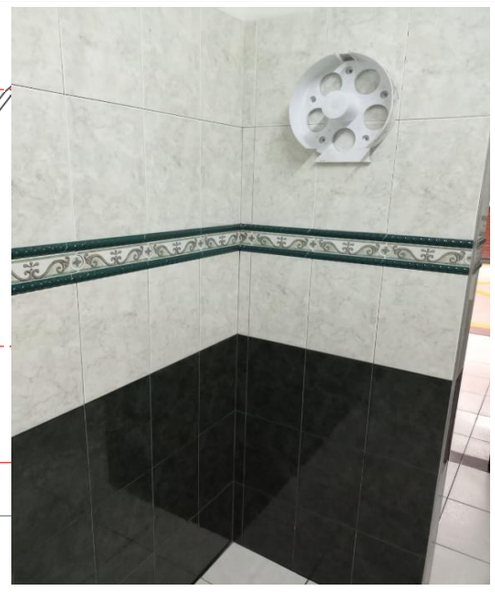

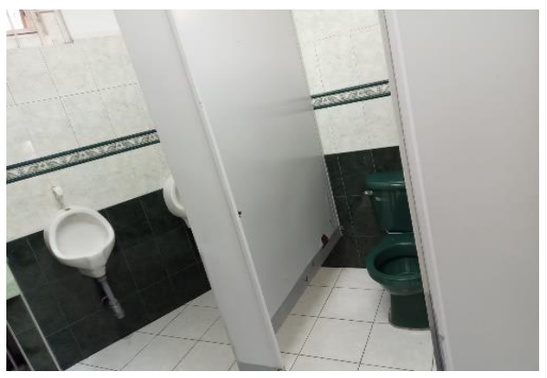

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.2.8	M2	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
					0,00
					0,00
SALONES PISO 1	535,34			1	535,34
SALONES PISO 2	604,94			1	604,94
SALONES PISO 3	793,84			1	793,84
PASILLOS	538,38			3	1615,14
PASAN:				SUBTOTAL	3549,26
				TOTAL	3549,26

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

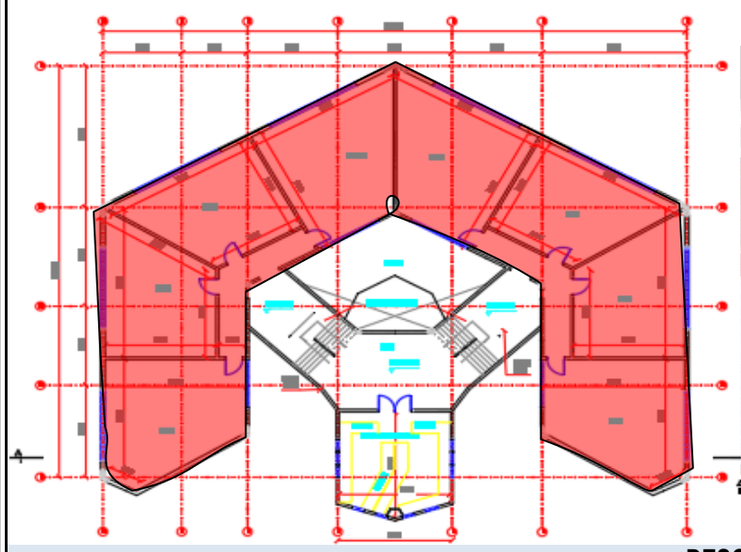

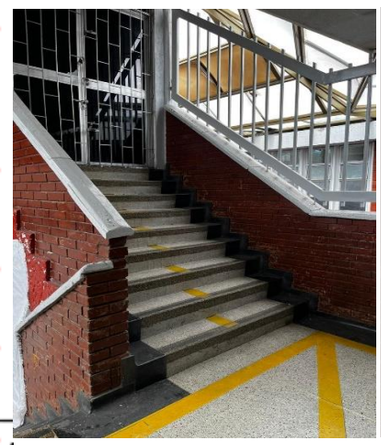

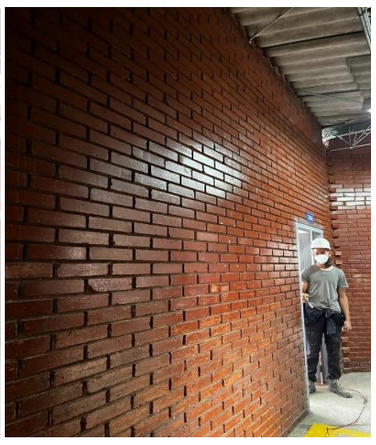

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.4.1	M2	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
PUERTAS SALONES		1,1	2,30	48	121,44
PASAN:				**SUBTOTAL**	121,44
				TOTAL	121,44

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

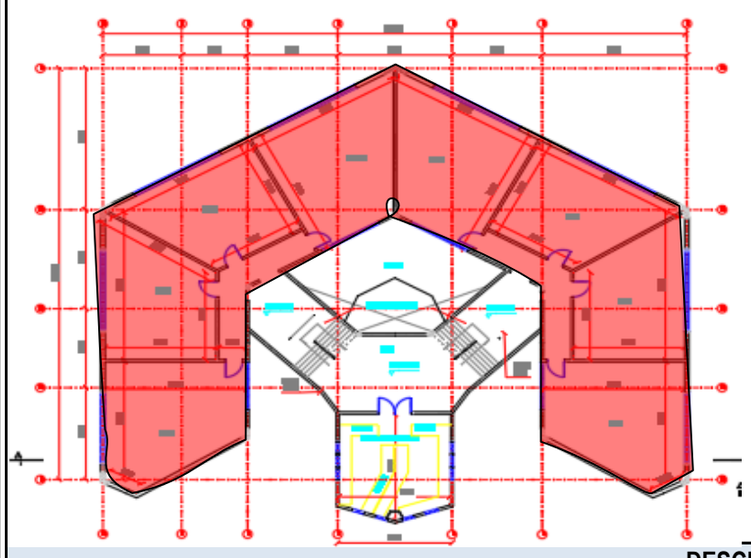



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.4.3	M	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
SALON 308	69,26			1	69,26
SALON 307	57,87			1	57,87
SALON 306	57,6			1	57,60
SALON 305	69,45			1	69,45
SALON 304	69,26			1	17,80
SALON 303	57,87			1	57,87
SALON 302	57,6			1	57,60
SALON 301	69,45			1	69,45
PASILLO	8,90			2	17,80
PASAN:				**SUBTOTAL**	474,70
				TOTAL	474,7

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

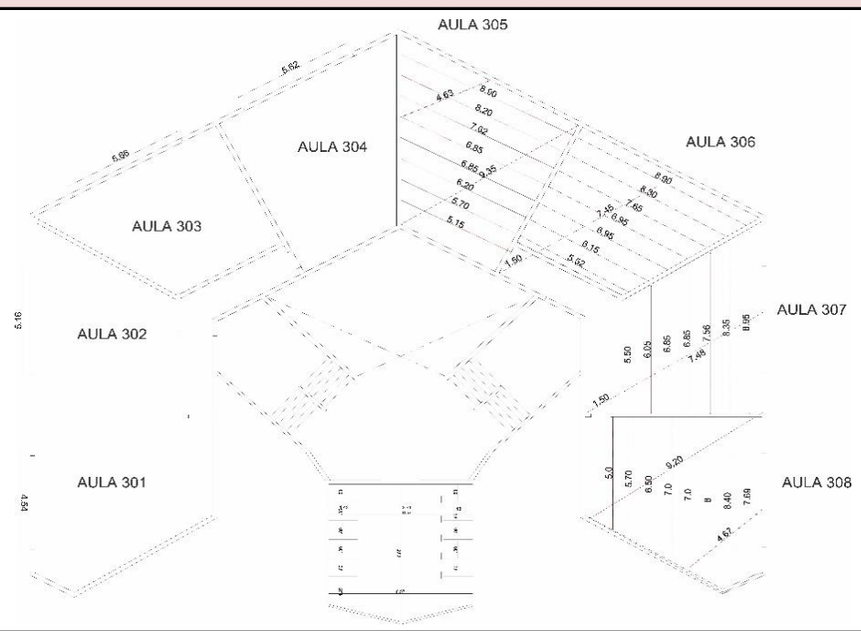

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.1	M	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES						
						0,00
Cubierta	ALA 1	9,00				9,00
	ALA 2	9,00				9,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	18,00
					TOTAL	18

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

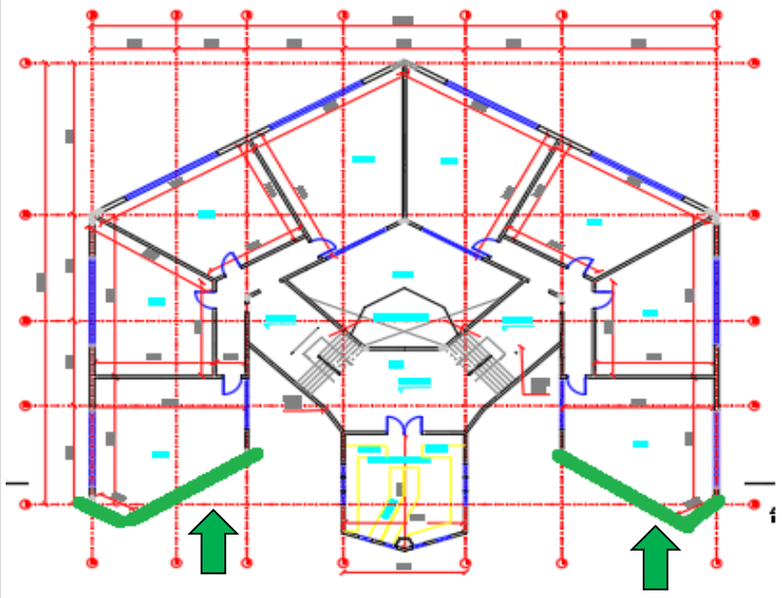





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.4	M	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION			DIMENSIONES				
			LONGITUD				TOTAL
EDIFICACIONES							
							0,00
Cubierta			-		-		0,00
		ALA 2	9,60				9,60
			-				0,00
		ALA 4	9,30				9,30
			-		-		0,00
		ALA 2B	10,00				10,00
			-				0,00
		ALA 4B	9,30				9,30
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
PASAN:						SUBTOTAL	38,20
						TOTAL	38,2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

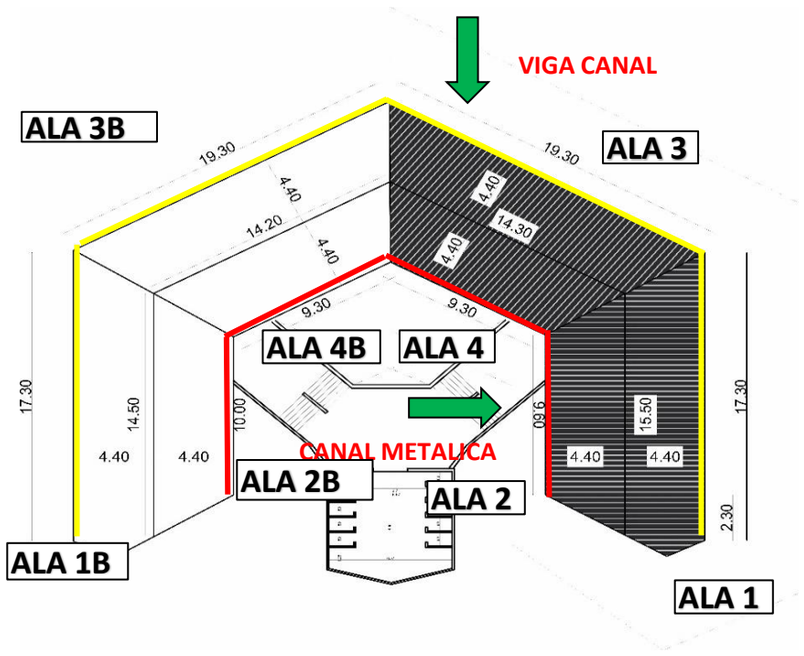





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.5	M	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION			DIMENSIONES				
			LARGO	ANCHO		CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES							
							0,00
Cubierta		Bajantes	14,00			13	182,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
PASAN:						SUBTOTAL	182,00
						TOTAL	182

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

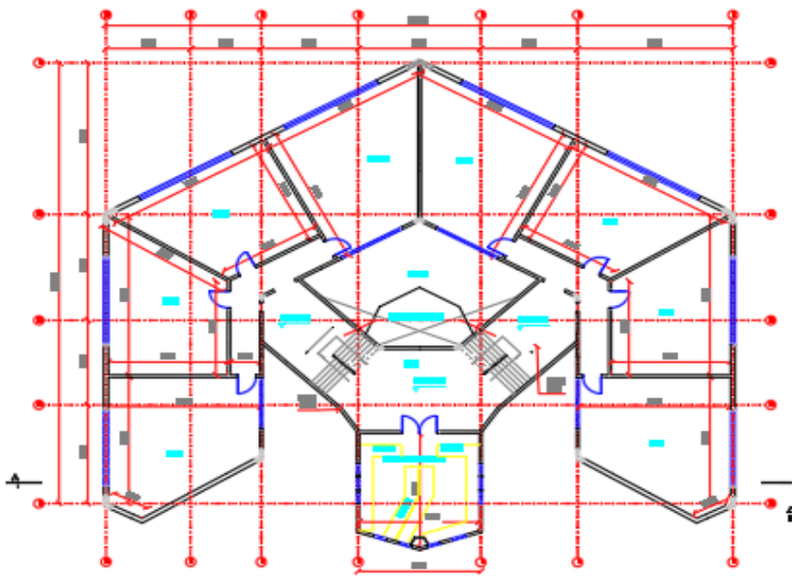



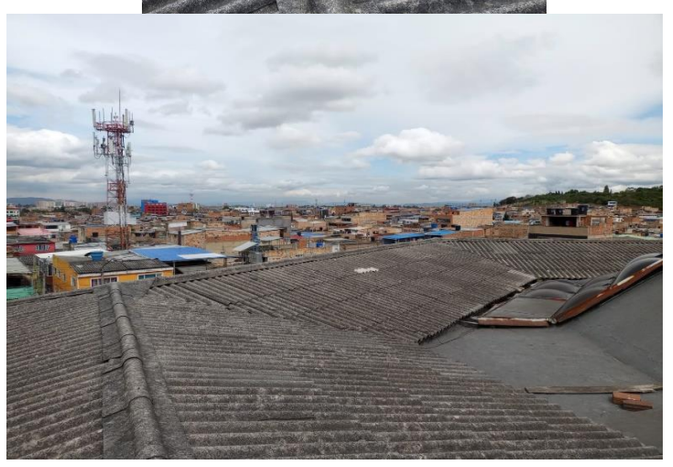

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.8	M2	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES						
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
POLICARBONATO	AREA 9	16,60	5	10,80	1	10,80
	AREA 10	6,30	5	5,65	1	5,65
ACRILICO	AREA 11	9,60	9,6	9,60	2	19,20
	AREA 12	9,60	9,6	9,60	2	19,20
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	54,85
					TOTAL	54,85

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

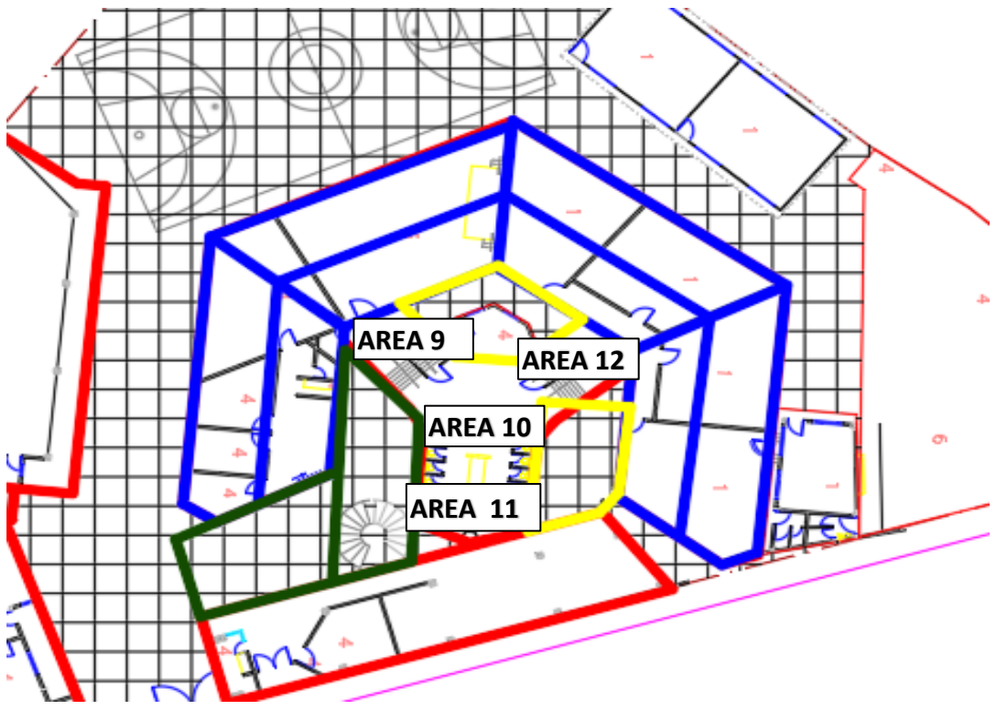

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						0,00
	ALA 1	17,26	14,55	15,91	4,5	71,57
	ALA 2	9,60	14,65	12,13	4,5	54,56
	ALA 3	18,93	14,35	16,64	4,5	74,88
	ALA 4	9,30	14,35	11,83	4,5	53,21
	ALA 5	19,90	14,35	17,13	4,5	77,06
	ALA 6	9,30	14,35	11,83	4,5	53,21
	ALA 7	17,26	14,7	15,98	4,5	71,91
	ALA 8	9,60	14,7	12,15	4,5	54,68
Pendiente				511,09	0,25	127,77
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	638,86
					TOTAL	638,86

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

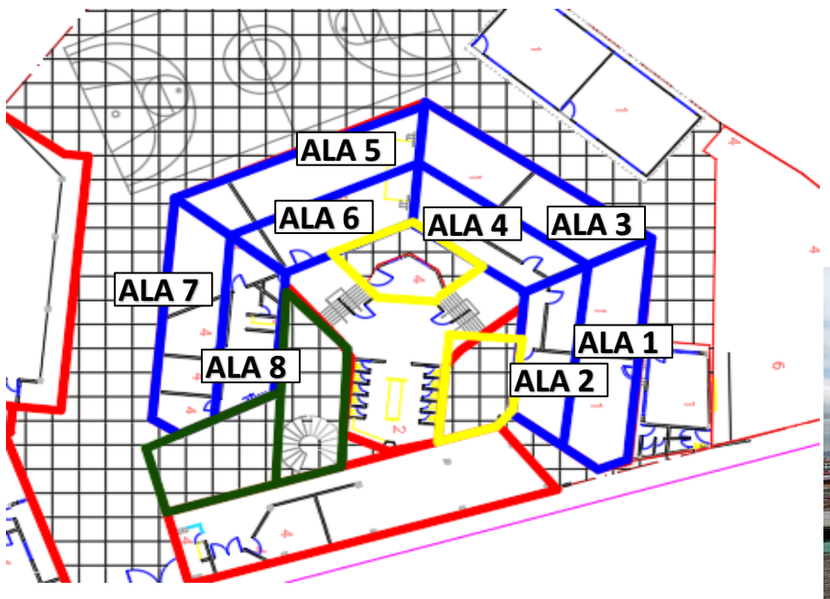





DESCRIPCION

Firma	Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ **DIRECTOR DE OBRA**	ING. PAMELA BELTRAN **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.30	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						0,00
		14,55				14,55
		14,35				14,35
		14,35				14,35
		14,7				14,70
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	57,95
					TOTAL	57,95

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

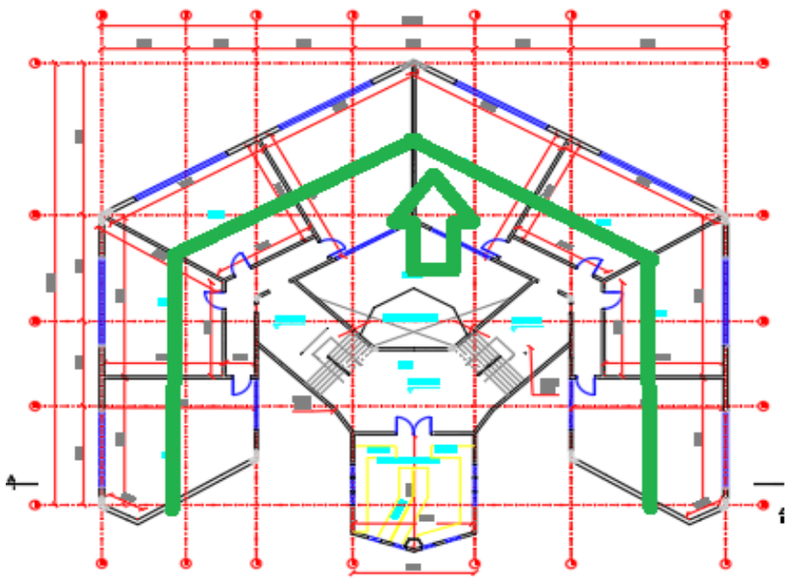



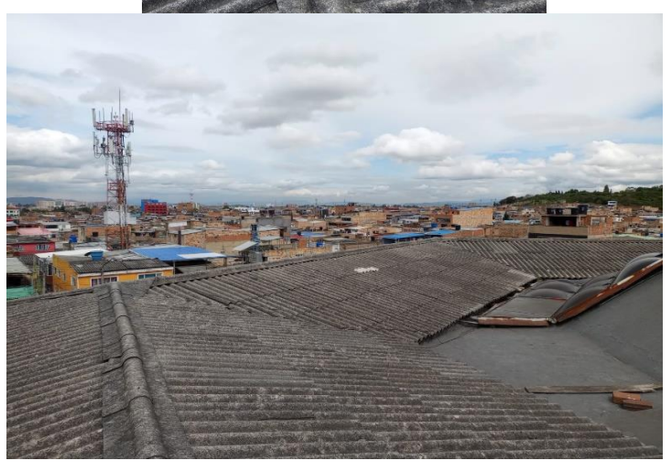

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.42	M	LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
SALON 308	69,26			1	69,26
SALON 307	57,87			1	57,87
SALON 306	57,6			1	57,60
SALON 305	69,45			1	69,45
SALON 304	69,26			1	69,26
SALON 303	57,87			1	57,87
SALON 302	57,6			1	57,60
SALON 301	69,45			1	69,45
PASILLO	8,90			2	17,80
PASAN:				**SUBTOTAL**	526,16
				TOTAL	526,16

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

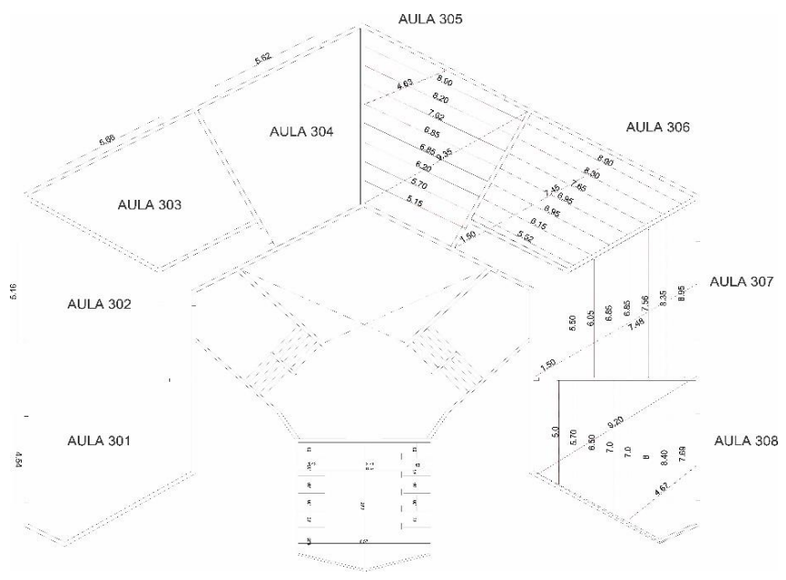

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.1	M2	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	AREA	TOTAL
EDIFICACIONES					
AREA CUBIERTA				511,09	511,09
AREA DOMOS				54,85	54,85
Piso 1 - Baño niños	6,4	6,00			38,40
Piso 3 - Baño niñas	6,4	6,00			38,40
					0,00
					0,00
piso 2 - cuarto de aseo	3,1	1,85			5,74
piso 2 - cocina	2,05	2,00			4,10
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	652,58
				TOTAL	652,58

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

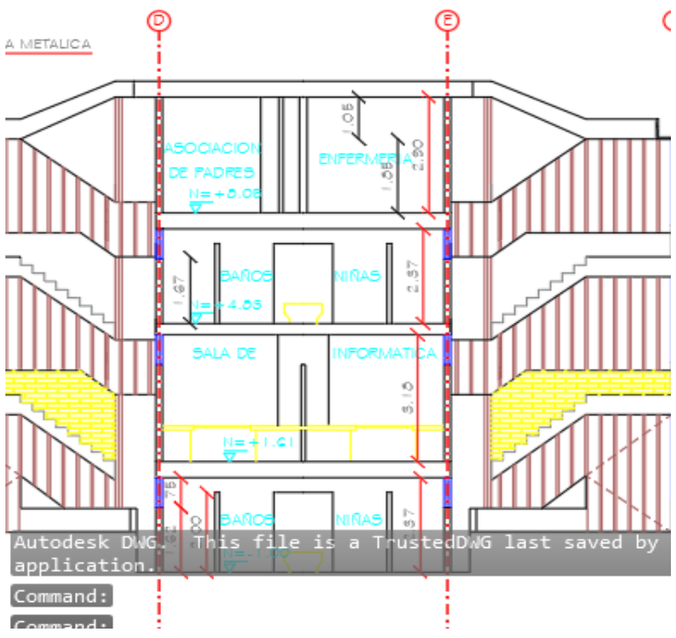

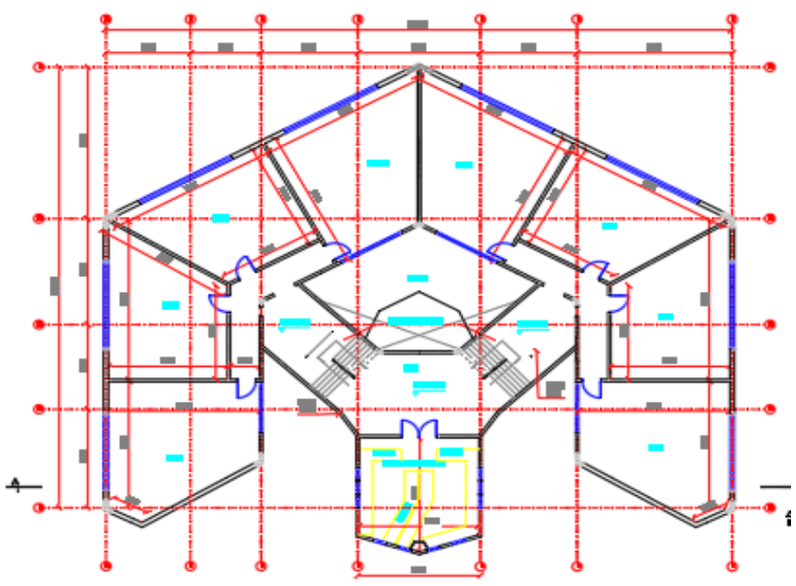

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.2	KG	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	PROMEDIO AREA	KG POR M2	TOTAL
EDIFICACIONES					
AREA CUBIERTA	511,09			17	8688,53
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	8688,53
				TOTAL	8688,53

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

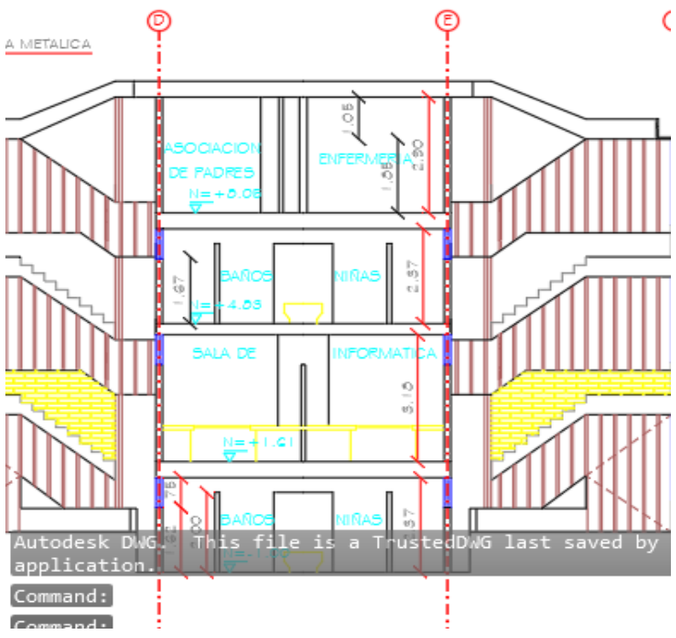

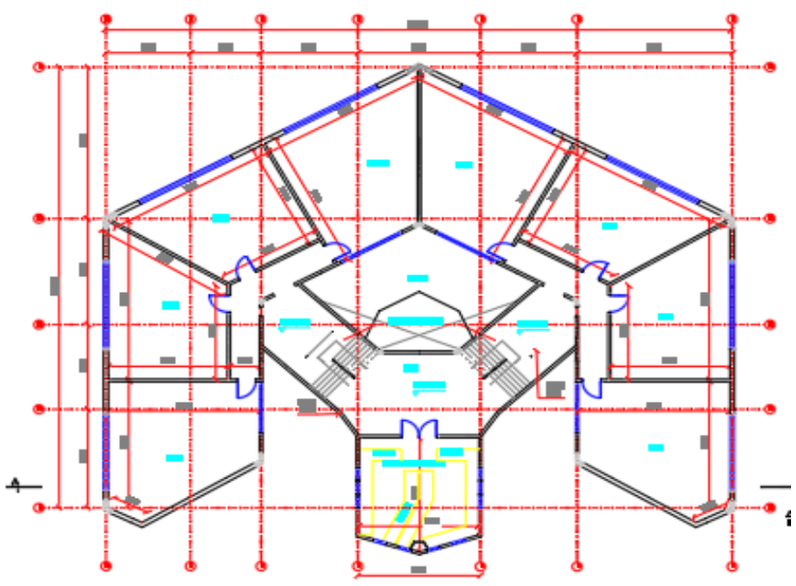

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	REINO DE HOLANDA			
	FECHA:	21	04	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.3	KG	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	PROMEDIO AREA	KG POR M2	TOTAL
EDIFICACIONES					
AREA CUBIERTA	511,09			17	8688,53
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	8688,53
				TOTAL	8688,53

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

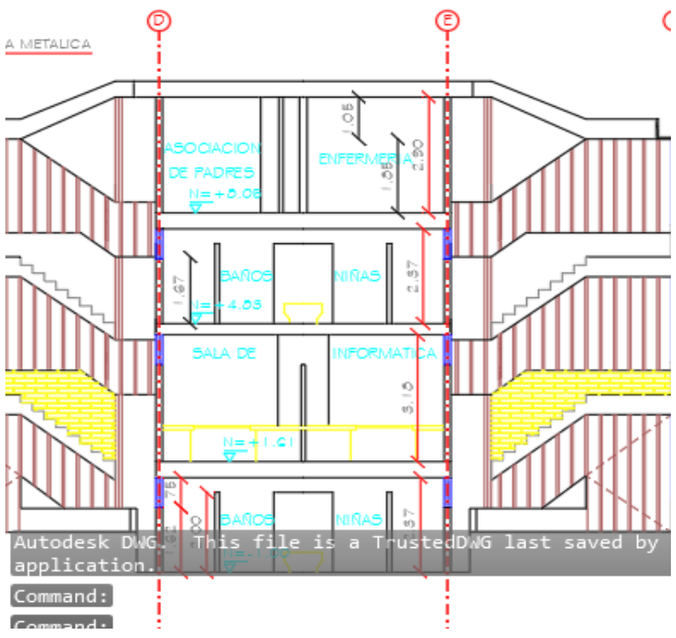

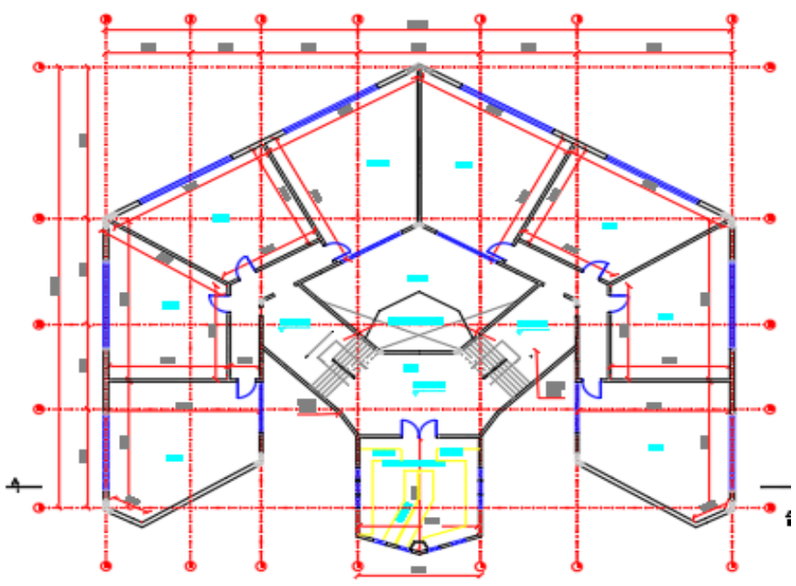

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Bogotá D.C., 25 de abril de 2023

2023_RUU_MGP_135

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega de informe mensual SST No 3.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO MIA GP realiza la entrega del informe mensual SST No 3, correspondiente al periodo del 20 de marzo de 2023 al 19 de abril de 2023.

Agradecemos la atención,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Informe mensual SST No 3
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

BOGOTÁ
Secretaria de Educación

INFORME 3

GESTIÓN SG-SST

CONTRATO No. CO1-PCCNTR 4077645
PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2023 AL 19 DE ABRIL DEL 2023

Consorcio Mia GP
NIT :901634703-9
Contrato de obra -CO1-PCCNTR 4077645

Bogotá, D.C., Colombia
CONTRATO No.
Contrato de obra
CO1-PCCNTR 4077645

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO……..2

1.INTRODUCCION……4
2. OBJETIVOS……5
3. TABLA DE CONTROL DE PERSONAL REPORTADO EN OBRA 6
4 LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA…… 6
5 LISTADO DE VEHICULOS ……..6
6. REPORTE DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD……6-7
7. CERTIFICACIONES DE PARAFISCALES……..,,,.7
8. CUADRO CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS EN PSST…… …..7-11
9. LISTA DE ANEXOS……12

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 01. TABLA DE CONTROL DE PERSONAL REPORTADO EN OBRA

ANEXO 02. SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 03. INDUCCIONES

ANEXO 04. CHARLAS Y CAPACITACIONES

ANEXO 05. ENTREGA EPP

ANEXO 06. INSPECCIONES

ANEXO 07. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ANEXO 08. PERMISOS DE TRABAJO

ANEXO 09. CERTIFICADO DE ALTURAS

ANEXO 10. SOPORTES DE VEHICULO

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

1.INTRODUCCION

En el presente informe tiene plasmado las actividades que se ejecutaron por parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo – SGSST durante el periodo del 20 de Marzo del 2023 al 19 de Abril del 2023, donde se evidencian todas las actividades de SST ejecutadas en las obras de los colegios Enrique Olaya, Reino de Holanda, Alfredo Iriarte, Diana Turbay, Liceo Femenino, María Cano, Restrepo Millán, José Martí, San Agustín, Santa Lucia.

Por parte del área SST se realizó las siguientes actividades: solicitud de documentación del personal que va a ingresar nuevo, Cedula de ciudadanía, EPS, FONDO DE PENSION, ARL, se realizan inducciones al personal, Entrega de Epp, charlas diarias de seguridad y capacitación de acuerdo al SGSST, delimitaciones y señalización de áreas con poli sombra, actividades de orden y aseo, Inspecciones de herramienta menor.

2. OBJETIVOS

- Realizar la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en obra para la reducción de incidencia en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales posiblemente presentados durante la ejecución del proyecto.

- Aplicar, supervisar y verificar los sistemas de control de factores de riesgos ocupacionales en la fuente, en el medio ambiente la necesidad de suministrar elementos de los elementos de protección personal (EPP) y equipos de protección contra caídas.

- Realizar actividades de prevención que mejoren las condiciones salud y trabajo para los empleados vinculados.

3.TABLA DE CONTROL DE PERSONAL REPORTADO EN OBRA.

Para el periodo de gestión del 20 de marzo al 19 de abril del 2023 se presenta tabla en Excel con el reporte y movimiento del personal que realizo actividades en los colegios de la localidad Rafael Uribe. Ver Anexo Tabla de Control del personal.

4.LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Durante el periodo de gestión del 20 de marzo al 19 de abril del 2023 no se utilizaron maquinaria ni equipos por que las obras estaban en actividades de demolición y alistamiento de pisos, desmonte e instalación de ventaneria, cambio de cubierta.

5.LISTADO DE VEHICULOS.

Durante el periodo de gestión del 20 de marzo al 19 de abril del 2023 se realizó la actividad de retiro de RCD en las obras de Diana Turbay, Enrique Olaya.

6. INDICADORES DE SST

Para el periodo de gestión del 20 marzo al 19 de abril del 2023, se presentan los siguientes indicadores SST.

- Número de afiliaciones para el periodo de gestión del 20 marzo al 19 de abril del 2023.

1	Total, trabajadores que ingresaron (12) X100 Total, de trabajadores afiliados (12)	100%

- Número de ingresos de personal para el periodo de gestión 20 marzo al 19 de abril del 2023

2	N.º de inducciones (12) X100 N.º de ingresos (12)	100%

- Número de charlas de seguridad ejecutadas para el periodo de gestión 20 marzo al 19 de abril del 2023

3	Capacitaciones Programadas (4) X100 Capacitaciones Ejecutadas (4)	100%

- Número de accidentes reportados para el periodo de gestión del 20 marzo al 19 de abril del 2023

4	N.º de accidentes reportados (0) X100 N.º de accidentes presentados (0)	100 %

- Número de investigaciones de accidentes laborales para el periodo de gestión del 20 marzo al 19 de abril del 2023

5	Total, de AT investigados (0) X100 Total, accidentes ocurridos en el periodo (0)	100%

- Número de accidentes de trabajo para el periodo de gestión del 20 febrero al 20 marzo al 19 de abril del 2023

6	Número de Accidentes de trabajo en el periodo (0) X100 Promedio De trabajadores de la empresa (0)	100%

- Número de investigaciones de accidentes laborales para el periodo de gestión del 20 marzo al 19 de abril del 2023

7	Número total de AT en el periodo (0) X100 Numero de HHT en el año(10.176) (0)	100%

- Número de investigaciones de accidentes laborales para el periodo de gestión 20 marzo al 19 de abril del 2023

8	Total, de AT investigados (0) X100 Total, accidentes ocurridos en el periodo (0)	100%

7. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

Registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.

- Durante el periodo de gestión del 20 marzo al 19 de abril del 2023
no se presentaron incidentes y accidentes de trabajo en las obras de los colegios de la localidad Rafael Uribe.

- Durante el periodo de gestión del 20 marzo al 19 de abril del 2023 no se presentaron Investigación de incidentes y accidentes de trabajo en las obras de los colegios de la localidad Rafael Uribe.

- Durante el periodo de gestión del 20 marzo al 19 de abril del 2023 no se presentaron planes de acción de incidentes y accidentes de trabajo en las obras de los colegios de la localidad Rafael Uribe.

8. CERTIFICACION DE PARAFISCALES.

- Durante el periodo de gestión del 20 marzo al 19 de abril del 2023 se verifican y se adjuntan las respectivas planillas de seguridad social de todo el personal activo vinculado a obra.

9 ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES DEL PSST.

- Dando cumplimiento al cronograma de actividades presentado al inicio del proyecto, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante este periodo de gestión del 20 marzo al 19 de abril del 2023

9.1. INDUCCIONES

Durante el periodo de gestión del 20 marzo al 19 de abril del 2023 se aplicaron las inducciones a los trabajadores que ingresaron (12) en las cuales se desarrollaron los siguientes temas:

- Inducción General de la empresa
- Horarios de trabajo
- Normas de la empresa
- Política integral del Sistema de Gestión de, Salud en el trabajo. Seguridad y Medio ambiente.
- Que hacer en caso d un accidente de trabajo.
- Que hacer en caso de una enfermedad laboral.
- Sistema de Gestión de Salud en el trabajo Seguridad y Medio Ambiente
- Riesgos a los que están expuestos.
- Elementos de protección personal
- Funciones, responsabilidades y competencias en SST
- Funcionamiento de las Brigadas de Emergencia y tipos de emergencias.
- Que hacer en caso de una emergencia.

Se adjuntan los respectivos formatos debidamente diligenciados y firmados por los trabajadores.

9.2. CAPACITACIONES Y CHARLAS

Durante este periodo de gestión del 20 de marzo del 2023 al 19 de abril del 2023 se realizaron las siguientes charlas de seguridad y salud en el trabajo las cuales se relacionan a continuación, se hacen con el fin de dar a conocer la importancia del autocuidado y las condiciones inseguras que se podrían presentar al no trabajar correctamente, esta documentación es evidenciada en la carpeta de Capacitaciones y charlas.

FECHA	TEMA	COLEGIO
25/3/2023	Capacitación Cuidado de los ojos	Alfredo Iriarte
30/3/2023	Riesgos con Trabajo en alturas	Alfredo Iriarte
14/4/2023	Riesgos asociados al ruido	Alfredo Iriarte
17/4/2023	Flora y fauna del área de influencia directa	Alfredo Iriarte
23/3/2023	Capacitación Cuidado de los ojos	Liceo Femenino
3/4/2023	Riesgos con Trabajo en alturas	Liceo Femenino
11/4/2023	Riesgos asociados al ruido	Liceo Femenino
14/4/2023	Flora y fauna del área de influencia directa	Liceo Femenino
22/3/2023	Capacitación Cuidado de los ojos	Diana Turbay
10/4/2023	Riesgos con Trabajo en alturas	Diana Turbay
14/4/2023	Riesgos asociados al ruido	Diana Turbay
17/4/2023	Flora y fauna del área de influencia directa	Diana Turbay
22/3/2023	Capacitación Cuidado de los ojos	Enrique Olaya
29/3/2023	Riesgos con Trabajo en alturas	Enrique Olaya
4/4/2023	Riesgos asociados al ruido	Enrique Olaya
15/4/2023	Flora y fauna del área de influencia directa	Enrique Olaya
21/3/2023	Capacitación Cuidado de los ojos	Reino de Holanda
29/3/2023	Riesgos con Trabajo en alturas	Reino de Holanda
3/4/2023	Riesgos asociados al ruido	Reino de Holanda

3/4/2023	Flora y fauna del área de influencia directa	Reino de Holanda
28/3/2023	Capacitación Cuidado de los ojos	María Cano
10/4/2023	Riesgos con Trabajo en alturas	María Cano
14/4/2023	Riesgos asociados al ruido	María Cano
17/4/2023	Flora y fauna del área de influencia directa	María Cano
23/3/2023	Capacitación Cuidado de los ojos	Restrepo Millán
29/3/2023	Riesgos con Trabajo en alturas	Restrepo Millán
3/4/2023	Riesgos asociados al ruido	Restrepo Millán
13/4/2023	Flora y fauna del área de influencia directa	Restrepo Millán
22/3/2023	Capacitación Cuidado de los ojos	José Martin
27/3/2023	Riesgos con Trabajo en alturas	José Martin
4/4/2023	Riesgos asociados al ruido	José Martin
12/4/2023	Flora y fauna del área de influencia directa	José Martin
24/3/2023	Capacitación Cuidado de los ojos	San Agustín
25/3/2023	Capacitación Cuidado de los ojos	Santa Lucia
3/4/2023	Riesgos con Trabajo en alturas	Santa Lucia
11/4/2023	Riesgos asociados al ruido	Santa Lucia
15/4/2023	Flora y fauna del área de influencia directa	Santa Lucia

	
Fotografía	Fotografía

9.3. ENTREGA DE EPP

Durante el periodo de gestión del 20 de marzo al 19 de abril del 2023 a todo el personal que ingresó al proyecto, se le proporcionaron elementos de protección personal para el desarrollo adecuado de sus actividades, los cuales se relacionan en los formatos de entrega de EPP debidamente diligenciados y firmados por los trabajadores, esta documentación es evidenciada en la carpeta de entrega de EPP.

	
Fotografía	Fotografía

9.4. INSPECCIONES

Durante el periodo de gestión del 20 de marzo del 2023 al 19 de abril del 2023 se realizaron las respectivas inspecciones de herramienta menor que se utilizó en las obras. esta documentación es evidenciada en la carpeta de Inspecciones.

FECHA	TEMA	COLEGIO
20 de marzo al 19 abril del 2023	Inspección de herramienta menor-inspección contra caídas.	Alfredo Iriarte
20 de marzo al 19 abril del 2023	Inspección de herramienta menor	Liceo Femenino
20 de marzo al 19 abril del 2023	Inspección de herramienta menor	Diana Turbay
20 de marzo al 19 abril del 2023	Inspección de herramienta menor, inspección contra caídas	Enrique Olaya
20 de marzo al 19 abril del 2023	Inspección de herramienta menor, inspección contra caídas,	Reino de Holanda
20 de marzo al 19 abril del 2023	Inspección de herramienta menor	María Cano
20 de marzo al 19 abril del 2023	Inspección de herramienta menor, inspección contra caídas	Restrepo Millán
20 de marzo al 19 abril del 2023	Inspección de herramienta menor, inspección contra caídas	José Martin
20 de marzo al 19 abril del 2023	Inspección de herramienta menor	San Agustin
20 de marzo al 19 abril del 2023	Inspección de herramienta menor	Santa Lucia

9.5. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Durante el periodo de gestión del 20 de marzo del 2023 al 19 de abril del 2023 se realizaron análisis de trabajo seguro en alturas y en caliente.

9.6. PERMISOS DE TRABAJO

Durante el periodo de gestión del 20 de marzo del 2023 al 19 de abril del 2023 se realizaron permiso de trabajo en alturas y en caliente.

9.7. CONFORMACION DE COPASST Y ASIGNACION DE BRIGADISTAS

Se encuentra en proceso de conformación.

9.8. SEÑALIZACION Y DELIMITACION DE AREAS TE TRABAJO

Durante el periodo de gestión del 20 de marzo del 2023 al 19 de abril del 2023 se realizaron las siguientes señalización y delimitación de áreas de trabajo.

	
Fotografía	Fotografía

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de realizar las evaluaciones correspondientes y utilizar los métodos ya conocidos y mencionados con anterioridad, se concluye que se cumplió con los requisitos y planes de mejoras dadas por interventoría, aplicándose en el proyecto para cumplir con las normativas vigentes expedidas por ministerio de trabajo.

De igual manera, se reconoce el esfuerzo realizado por parte de todas las áreas y contratistas que hacen parte del proyecto con el área de SST para el fomento de una cultura de autocuidado en pro de promover procesos seguros durante la ejecución de la obra.

Bogotá D.C., 26 de abril de 2023

2023_RUU_MGP_136

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Acta de Pago Parcial No 3.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO MIA GP realiza la entrega de la siguiente documentación del Acta de Pago Parcial No 3 correspondiente al periodo del 20 de marzo de 2023 al 19 de abril de 2023:

- Acta parcial en Excel y PDF.
- Memorias de Calculo PDF.
- Aportes parafiscales.
- FURC - PDF.
- RUT CONSORCIO MIA GP.
- RIT del consorcio.
- Cedula de representante legal.
- Pre-factura No MGP-03.
- Resolución de facturación DIAN.
- Certificación Bancaria.
- Acta de autorización de pagos.
-

Los mencionados documentos tienen la subsanación de las observaciones recibidas por la SED para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Lo enunciado
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2023

2023_RUU_MGP_137

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Informe Mensual de Obra No 3

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el Consorcio MIA GP hace entrega del Informe Mensual de Obra No 3 el cual comprende las actividades de obra realizadas en periodo del 20 de marzo de 2023 al 19 de abril de 2023.

Agradecemos la atención prestada,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Informe Mensual de Obra No 3 Bitácoras de obra
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

INFORME MENSUAL DE OBRA No 3

PROYECTO:

CONTRATO No CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

CONTRATISTA :
CONSORCIO MIA GP

PERIODO 20 DE MARZO DE 2023 A 19 DE ABRIL DE 2023

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Educación del Distrito es un organismo del Sector Central del Distrito Capital, con autonomía administrativa y financiera, encargada del sector educativo, la cual tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral, esto de acuerdo con el artículo 25 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el Decreto Distrital 593 de 2017.

Dentro de sus funciones, de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, está el Desarrollo estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades.

En las metas del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá Del Siglo XXI” y el proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C,” se establece intervenir setecientas treinta (730) sedes educativas existentes de obras de mejoramiento de la Infraestructura y atención de emergencias con el fin de ampliar cobertura, garantizando los ambientes de aprendizaje. De igual forma intervenir sedes administrativas con reparaciones locativas.

La estructura organizacional de esta Secretaría, está conformada por Subsecretarias de acuerdo a las funciones y áreas estratégicas, y estas últimas, se encuentran conformadas por Direcciones, estando en cabeza de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia las funciones de formular, dirigir y coordinar los programas y proyectos de disponibilidad, acceso y permanencia, así como las de dirigir y coordinar los programas de construcción de nuevos colegios educativos, así como del mejoramiento y ampliación de los existentes, logrando tales fines a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

Ahora bien, esta Dirección, en el ejercicio de sus funciones, y en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación y en atención a los requerimientos del sector educativo del Distrito, determinó la necesidad, conveniencia y viabilidad de “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

La finalidad de este informe es expresar las inquietudes y e inconsistencias encontradas en la revisión preliminar de diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios e hidráulicos, para que sean aclaradas y definidas en pro del correcto avance de la obra en ejecución.

Dejar en evidencia CUALITATIVAMENTE las deficiencias en la construcción de algunos elementos estructurales que puedan afectar el normal comportamiento de los elementos no estructurales como cubiertas, pisos y muros de mampostería, así como el comportamiento de la misma estructura

La información con la que se ha realizado este informe recopila lo estudiado entre las especificaciones técnicas, presupuesto, planimetría y estado actual de obra.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Las actividades a realizar dentro del alcance del contrato de obra se encuentran en la zona oriente de la ciudad de Bogotá y más específicamente en la localidad de Rafael Uribe Uribe, los colegios a intervenir se listan a continuación:

- Colegio Alexander Fleming Sede B, Antonio Ricaurte
- Colegio Alfredo Iriarte A Sede A, Los Chircales
- Colegio Alfredo Iriarte Sede B, El Mirador
- Colegio Diana Turbay Sede B, Diana Turbay
- Colegio El Libertador Sede B, Manuel Murillo Toro
- Colegio Enrique Olaya Herrera Sede A, Enrique Olaya Herrera
- Colegio José Martí Sede A, Luis López De Mesa
- Colegio José Martí Sede C, Granjas De San Pablo
- Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño Sede A, Liceo Femenino Mercedes Nariño
- Colegio Manuel Del Socorro Rodríguez A Sede A, Manuel Del Socorro Rodríguez
- Colegio Manuel Del Socorro Rodríguez B Sede B, Republica De Israel
- Colegio Rafael Delgado Salguero Sede A, General Páez
- Colegio Reino De Holanda Sede A, Reino De Holanda
- Colegio Restrepo Millán Sede B, Isabel II De Inglaterra
- Colegio Restrepo Millán Sede D, Gabriela Mistral
- Colegio San Agustín Sede A, San Agustín
- Colegio El Libertador Sede C, Juan Del Rizo

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

La Secretaría de Educación del Distrito requiere realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SED, dentro de las cuales se encuentra el mantenimiento PROGRAMADO y la atención de EMERGENCIAS, con el fin de mantener en óptimas condiciones los equipamientos de la SED en donde presta sus servicios.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO: El proyecto incluye la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios y las sedes administrativas. Dentro del listado de sedes a intervenir del presente

contrato, se priorizaran sedes de acuerdo a las indicaciones dadas por la SED y la disponibilidad de los recursos.

REPARACIONES DE EMERGENCIA: Refiere a intervención de Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales o de sus sedes administrativas que no están programadas y que por necesidad urgente o por circunstancias sobrevinientes deben ser intervenidas de forma inmediata. Se incluyen dentro de estas, actividades o cantidades no programadas que no hayan sido incluidas en el diagnóstico inicial realizado a cada equipamiento postulado, debido a circunstancias inesperadas causados por fenómenos naturales, accidentes, situaciones antrópicas no previsibles y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales y de sus sedes administrativas.

2. CONTRATO SUSCRITO

2.1. CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTUR FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATISTA:	Consorcio MIA GP
NIT:	901.634.703-9
REPRESENTANTE LEGAL:	Mateo Luzardo Villamizar
CONTACTO:	Cra 8 No 12-21 MN edificio Restrepo Bogotá D.C
VALOR INICIAL:	$11.941.262.150,00
ADICIÓN No 1	$ 5.050.000.000,00
NUEVO VALOR TOTAL	$16.991.262.150
PLAZO INICIAL:	Once (11) Meses
FECHA DE INICIO:	20 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de diciembre de 2023

3. CONTROL DE PÓLIZAS

3.1. PÓLIZAS INICIALES

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**NACIONAL DE SEGUROS**		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA No:	**400044676**		
ANEXO	**1**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**15/12/2022**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURAD**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/10/2022	18/03/2024	$ 2.288.252.430,oo
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/10/2022	18/09/2026	$ 1.194.126.215,oo
ESTABILIDAD DE LA OBRA	18/09/2023	18/09/2025	$ 2.388.252.430,oo
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA N°:	**400044675**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**15/12/2022**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	18/10/2022	18/09/2023	$ 597.063.107,50
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	18/10/2022	18/09/2023	$ 298.531.552,75
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	18/10/2022	18/09/2023	$ 298.531.552,75
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	18/10/2022	18/09/2023	$ 298.531.552,75
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	18/10/2022	18/09/2023	$ 298.531.552,75

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**BERKLEY COLOMBIA SEGUROS**		
PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE			
PÓLIZA No:	**1547/0**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**22/11/2022**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURAD**
	INICIAL	**FINAL**	
COBERTURA PRINCIPAL A	22/12/2022	26/10/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA TERREMOTO, TEMBLOR MAREMOTO, ERUPCIÓN VOLCÁNICA	22/12/2022	26/10/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA PARA HMACC-AMIT INCLUYENDO SABOTAJE Y TERRORISMO	22/12/2022	26/10/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA CICLÓN, HURACÁN, INUNDACIÓN, OTROS EVENTOS	22/12/2022	26/10/2023	$ 11.941.262.150,oo
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL COBERTURA E	22/12/2022	26/10/2023	$ 1.300.000.000,oo

3.2. PÓLIZAS ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**NACIONAL DE SEGUROS**		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA No:	**400044676**		
ANEXO	**2**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**31/01/2023**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURAD**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/01/2023	20/06/2024	$ 2.288.252.430,oo
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/01/2023	20/12/2026	$ 1.194.126.215,oo
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/12/2023	20/12/2025	$ 2.388.252.430,oo

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA N°:	**400044675**		
ANEXO	**2**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**31/01/2023**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	20/01/2023	20/12/2023	$ 597.063.107,50
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	20/01/2023	20/12/2023	$ 298.531.552,75
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	20/01/2023	20/12/2023	$ 298.531.552,75
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	20/01/2023	20/12/2023	$ 298.531.552,75
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	20/01/2023	20/12/2023	$ 298.531.552,75
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**BERKLEY COLOMBIA SEGUROS**		
PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE			
PÓLIZA No:	**1547/0**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**22/11/2022**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURAD**
	INICIAL	**FINAL**	
COBERTURA PRINCIPAL A	20/01/2023	19/12/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA TERREMOTO, TEMBLOR MAREMOTO, ERUPCIÓN VOLCÁNICA	20/01/2023	19/12/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA PARA HMACC-AMIT INCLUYENDO SABOTAJE Y TERRORISMO	20/01/2023	19/12/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA CICLÓN, HURACÁN, INUNDACIÓN, OTROS EVENTOS	20/01/2023	19/12/2023	$ 11.941.262.150,oo
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL COBERTURA E	20/01/2023	19/12/2023	$ 1.300.000.000,oo

4. INFORME DE LOS COLEGIOS INTERVENIDOS

4.1. COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A LOS CHIRCALES

El colegio Alfredo Iriarte Sede A Los Chircales ubicado en la dirección Transversal 5 J No. 48F-69 Sur



imagen 1. COLEGIO ALFREDO IRIARTE

4.1.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Luis Miguel Castaño	1053816598	Residente de obra
Valentina Osorio	10949444045	Inspector de obra
Angela Tarazona	60448725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Jose Elias Michelly	19490651	Maestro de obra
Hector Veloza Duitama	79726908	Ayudante de obra
Manuel Antonio Cardenas	79461540	Ayudante de obra
Cristian Uribe	1069724034	Instalador de cubierta
Johan Rozo	1233692117	Instalador de cubierta
Edgar Moreno	1005195748	Instalador de cubierta
Frannkuyn Moreno	1024484589	Instalador de cubierta
Gina Kterine Casas	1069754573	Inspector SST
Jose Seco	23439129	Ayudante de obra
Santiago Nazareth Márquez	7935136	Ayudante de obra

4.1.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

- **OBRAS PRELIMINARES:** Dentro de estas obras se realiza el picado de la membrana existente en las placas y canales existentes, se desarrolla el mantenimiento de la cubierta del edificio 1 de las instalaciones del colegio y se finalizan las labores de limpieza de las canales y bajantes que se encuentran actualmente.

- **PISOS:** Como actividad complementaria a las labores de impermeabilización se realiza el alistado con mortero a las placas y canales para mejorar la pendiente de dichas estructuras y asi evitar la acumulación de aguas lluvia que se puedan quedar en la superficie de la cubierta.

- **ESTRUCTURAS ESPECIALES:** Se realiza la instalación de dos pérgolas en las instalaciones del colegio, la primera pérgola se instala en la entrada lateral del edificio con el propósito de dar refugio a los usuarios de la comunidad educativa en caso de lluvias y la siguiente pérgola se instala en el patio central del edificio con la misma finalidad de la pérgola expuesta anteriormente.

- **PAÑETE Y PINTURA:** Se aplica pintura en el baño de los niños ubicado en el tercer piso del edificio 2 para eliminar las superficies que se ve deteriorada la pintura y en los lugares en donde se realizaron resanes.

- **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES:** Se ejecutó el cambio de la cubierta que se encuentra en la entrada lateral del edificio 2, y se cambió la canal de desagüe que se encuentra en la misma área, se finalizan las actividades de instalación del manto asfaltico en la cubierta de los edificios y adicionalmente se hace el reemplazo de los remates de la cubierta como flanches y caballetes para garantizar que la impermeabilización funcione correctamente.

4.1.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **OBRAS PRELIMINARES**

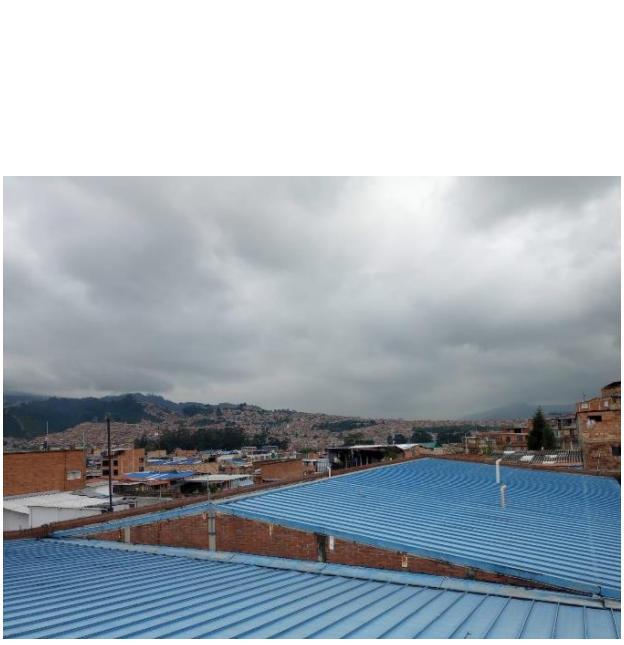



Imagen 2. OBRAS PRELIMINARES



Imagen 3. OBRAS PRELIMINARES

- **PISOS**



Imagen 4. ALISTADO EN MORTERO PARA PISOS



Imagen 5. ALISTADO EN MORTERO PARA PISOS

- **ESTRUCTURAS ESPECIALES**



Imagen 6. ELABORACION DE PERGOLAS.

❖ PAÑETE Y PINTURA



Imagen 7. PINTURA SOBRE MUROS BAÑO 3 PISO EDIFICIO 2.

❖ CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES



Imagen 8. REEMPLAZO DE FLANCHES, CABALLETES Y CUBIERTA.



Imagen 9. REEMPLAZO DE FLANCHES, CABALLETES Y CUBIERTA.

4.1.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el período reportado, se presentaron retrasos debido a que el enchape del baño que se debe reemplazar ya no se fabrica el formato que está instalado actualmente, por ello se ha puesto en discusión cual podría ser el ítem contractual que más se ajusta a las circunstancias particulares que se presentan en la intervención de los baños de la institución.

4.2. COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II

El Colegio Diana Turbay Sede B, Diana Turbay encuentra ubicado en la Cl. 49 Sur #2a-38 2a-14 a.





imagen 10. COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B

4.2.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Luis Miguel Castaño	1053816598	Residente de obra de obra
Valentina Osorio	10949444045	Inspector de obra
Angela Tarazona	60448725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Jose Elias Michelly	19490651	Maestro de obra
Brayan Andres Marin Salsas	1023967015	Ayudante de Obra
Brayan Alexis Lopera Arevalo	1033766735	Ayudante de Obra
Ubaldo Marquez Marquez	7038443	Ayudante de Obra
Manuel Cardenas	79461540	Ayudante de Obra
Brayan Eduardo Rodriguez	1013679448	Ayudante de Obra
Santiago Nazareth Márquez	7935136	Ayudante de Obra
Ali Gusdarwin Martínez	5753578	Ayudante de Obra

4.2.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

- **DESMONTE:** Se realizó el desmonte de la cubierta del edificio 1 con la finalidad de disponer del espacio para realizar el reemplazo de las cubiertas por las que se tienen contempladas presupuestalmente.

- **EXCAVACIÓN MANUAL:** Se ejecutó la excavación manual en el baño del primer piso del edificio 2 para llegar al nivel de la cota de trabajo para realizar la instalación de la tubería y demás redes que sean necesarias para la construcción del edificio.

- **ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA:** Se realiza instalación de estructura adicional a estructura existente, con el fin de cumplir con los distanciamientos mínimos de apoyo entre tejas.

- **PROPUESTAS ARQUITECTONICAS:** De acuerdo a los cambios que se quieren realizar en la infraestructura del colegio intervenido, la SED envió la propuesta de la distribución de los baños, sin embargo, es necesario tener los diseños arquitectónicos de las fachadas de los edificios para complementar los diseños entregados.

4.2.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE**





Imagen 11. DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE

- **EXCAVACIÓN MANUAL**



Imagen 12. EXCAVACIÓN MANUAL



Imagen 13. EXCAVACIÓN MANUAL

4.2.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el período reportado, se realizaron varios comités de obra con interventoría y supervisión, para determinar alcance contractual para el mejoramiento correctivo de dicha institución. Se pacto entregar diseños de las nuevas redes a ejecutar en la independización de baños y la adecuación del baño de docentes, para ser aprobados y ejecutados.

- Se han presentado una serie de atrasos debido a la espera que se ha tenido de la entrega de los diseños por parte de la SED, por lo tanto, durante el periodo actual no se ha tenido mayor actividad.

4.3. COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A

El Instituto educativo Enrique Olaya Herrera se encuentra ubicado en Cra. 10 #31 Sur-29, Bogotá.



Imagen 14. Colegio Enrique Olaya Herrera

4.3.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Luis Miguel Castaño	1053816598	Residente de obra
Valentina Osorio	10949444045	Inspector de obra
Angela Tarazona	60448725	SST
Hugo Guillermo Perez	1065881660	Ingeniero Ambiental
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Jose Elias Michelly	19490651	Maestro de obra
Ubaldo Marquez Marquez	7038443	Ayudante de obra
Jorge Stiven Quiroga Gomez	1027521715	Ayudante de obra
Brayan Eduardo Rodriguez	1013679448	Ayudante de obra
Luis Antonio Barajas	6762943	Ayudante de obra
Santiago Nazareth Márquez	7935136	Ayudante de obra
Victoriano Moreno	11799322	Ayudante de obra
Brayan Alexis Lopera Arevalo	1033766735	Ayudante de Obra
Yerimy Gabriel Gutierrez	6971469	Ayudante de Obra

4.3.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

- **CERRAMIENTOS:** Se efectúa el cerramiento del área a intervenir en la cancha principal del colegio con el propósito de aislar el área intervenida de las actividades de la comunidad educativa.

- **DEMOLICIONES Y DESMONTES:** Se realiza la demolición de la placa de piso de la cancha múltiple con el fin de reemplazar las placas de concreto en mal estado y realizar un cárcamo recolector de aguas de mayor capacidad, además se realizó el desmonte de las puertas de las baterías sanitarias del baño de mujeres y las puertas de las aulas del edificio 8 del área de preescolar.

- **EXCAVACIONES Y RELLENOS:** Se realiza la excavación manual del cárcamo señalado anteriormente para aumentar su capacidad hidráulica y adicionalmente se realiza la excavación del material restante de la demolición de la placa de concreto de la cancha múltiple con la finalidad de proveer un área adecuada para la colocación de la nueva placa a construir. En complemento a esta actividad de excavación en la cancha múltiple se realiza el relleno con material de recebo compactado para definir la subrasante de la placa a instalar nuevamente.

- **ELEMENTOS DE CONCRETO Y REFUERZO ESTRUCTURAL:** Se coloca el concreto correspondiente a la placa de la cancha múltiple y el cárcamo cada estructura se instala con su respectivo refuerzo en acero de 60.000 PSI para el cárcamo y la malla electrosoldada para la placa de la cancha múltiple.

- **MAMPOSTERIA:** Se efectúa el mantenimiento de la pared en ladrillo que se encuentra en las baterías de los baños de, mujeres, del segundo piso, además se realizó la adecuación de la fachada del edificio 8 del preescolar. Dentro de la mampostería también se ejecutó el remate lineal de la cubierta en ladrillo con la finalidad de mejorar el aspecto del edificio del preescolar.

- **INSTALACIONES ELECTRICAS:** Se realizó el reemplazo de las redes eléctricas, teniendo en cuenta todos los accesorios que se tienen en la red como tomacorrientes, interruptores sensores de movimiento, tuberías y lámparas con el fin de modernizar las instalaciones de las aulas del preescolar.

- **PISOS:** Se ejecuto el alistado de los pisos en mortero de las aulas del preescolar para que la superficie quede adecuada para la instalación del nuevo piso vinílico heterogéneo para alto tráfico, dentro de estas actividades también se realizó el reemplazo de los adoquines que se encuentran en la placa de la cancha múltiple el cual se desmonto durante las labores de demolición de la placa de dicha área, y para finalizar se realiza el mantenimiento de los pisos en granito existentes en los baños de los hombres que se están interviniendo actualmente.

- **ENCHAPES:** Se ejecutó el reemplazo del enchape que se encontraba en mal estado del baño con el fin de realizar un cambio en la apariencia de toda el área intervenida.

- **ESTRUCTURAS METALICAS:** Como complemento a las actividades ya mencionadas se realiza la instalación de la rejilla en el cárcamo construido previamente y el montaje de las puertas en acero acero inoxidable de las baterías sanitarias de los baños de las mujeres que se está interviniendo actualmente.

- **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS:** Se ejecutó las actividades de pañete de las vigas y las columnas presentes en las aulas del preescolar para completar las modificaciones de dicha área común.

4.3.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **CERRAMIENTOS:**

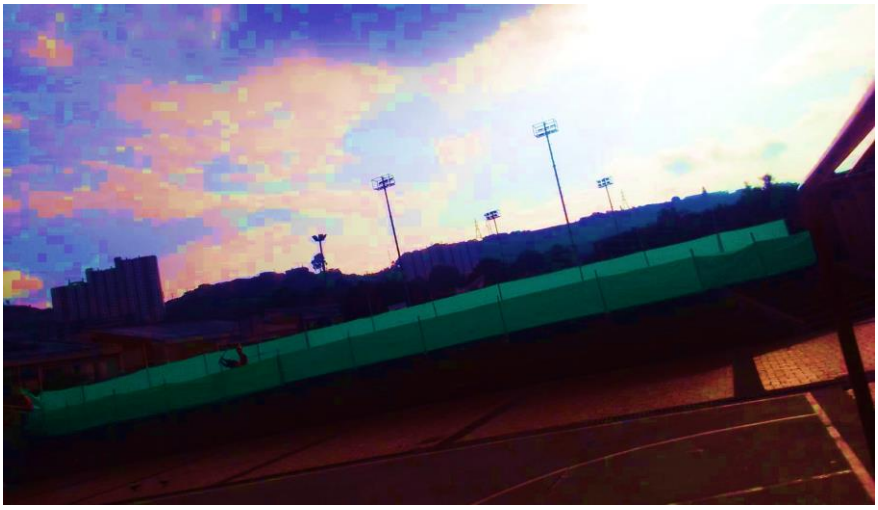


Imagen 15. Colegio Enrique Olaya Herrera

- **DEMOLICIONES Y DESMONTES**



Imagen 16. Colegio Enrique Olaya



Imagen 17. Desmonte puertas

- **EXCAVACIONES Y RELLENOS:**



Imagen 18. Excavación cárcamo-Placas Cancha

- **MAMPOSTERÍA:**



Imagen 19. Pintura mampostería grafiteada.

- **INSTALACIONES ELÉCTRICAS:**



Imagen 20 Instalación de redes eléctricas.

- **PISOS**



Imagen 21 Alistado de piso para piso vinílico

- **ENCHAPES:**

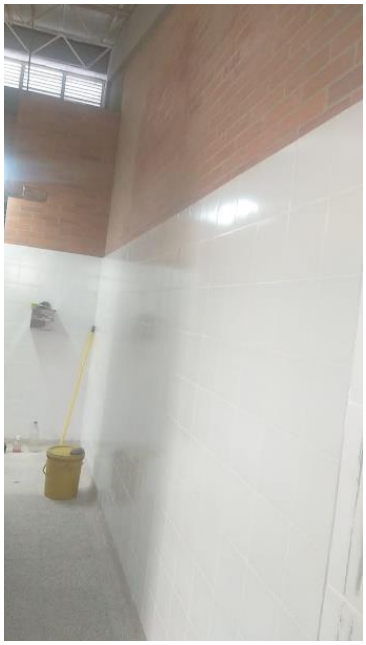


Imagen 22 Cambio de piezas y Re emboquillado para mantenimiento de baños.

- **ESTRUCTURAS METÁLICAS: (Acero inoxidable puertas baño)**



Imagen 23 Fabricación puertas de acero inoxidable


- **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS:**



Imagen 24 Pintura vigas y columnas preescolar

4.3.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante este periodo de ejecución se abrieron dos frentes de trabajo, uno, el mantenimiento de bateria de baños de niñas del bloque 2 a intervenir y dos, la intervención de mantenimiento de cancha principal de la insititución.
- El desalojo de RCDS fue evacuado con minicargador y con autorización previa, en el acceso principal de la institución; lo cual fue resuelto en el menor tiempo posible y solicitado por parte de la interventoría y la dirección de la institución.

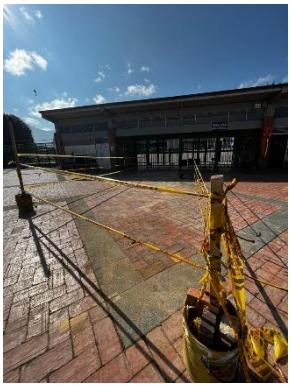



- Se precisa importante evaluar el alcance de la intervención de cubiertas para poder intervenir con otro frente de trabajo la ejecución del capitulo de mantenimiento en cubiertas

4.4. COLEGIO JOSÉ MARTÍ SEDE A, LUIS LÓPEZ DE MESA

El Colegio José Martí Sede A, Luis López De Mesa se encuentra ubicado en la Dg. 32 Bis Sur #14-97.



imagen 25. Colegio José Martí- Luis López de Mesa- Sede A

4.4.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Mauricio Rodriguez	79715893	Residente de obra
Yesenia Arenas	1049638441	Inspector de obra
Angela Tarazona	60448725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
John Benal	7956608	Maestro de obra
Yeison Manuel Romero	10681368777	Ayudante de Obra
Jonathan Londoño Quiñonez	80111297	Ayudante de Obra
Jiaro Sanchez	79451618	Ayudante de Obra
Jhon Jairo Hincapie	79482086	Ayudante de Obra
Jonathan Alberto Zapata	80773320	Ayudante de Obra

4.4.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el período reportado se inicia intervención del segundo piso de auditorio, deportes y música. Se realiza desmonte de cubierta existente en asbesto cemento, refuerzo de estructura metálica soporte para anclaje de cubierta termoacústica. Se realiza mantenimiento de carpintería metálica, Instalación de redes eléctricas en música y según piso de auditorio.

- **CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M):** Se realiza cerramiento para aislar las áreas en que se está interviniendo, impidiendo el paso de personal no autorizado a música y auditorio por segundo piso.

- **DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS):** Se realiza desinstalación de tubería y cableado existente en aula deportes, bodegas segundo piso auditorio y aula música.

- **DESMONTE DE LÁMPARAS:** Se realiza desinstalación de luminarias existentes en aula deportes, bodegas segundo piso auditorio y aula música.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA):** Se realiza instalación de estructura metálica de refuerzo para anclaje de teja standing seam en aula deportes, bodegas segundo piso auditorio y aula música.

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE:** Se realiza instalación de platinas para anclajes de perfiles tipo C, en orientación, pasillo y escaleras, ala 1 auditorio y aula de música.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN:** Se realiza instalación de interruptores en aula deportes, bodegas segundo piso auditorio y aula música.

- **SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN:** Se realiza instalación de tomacorrientes en aula deportes, bodegas segundo piso auditorio y aula música.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN:** Se realiza instalación de tubería galvanizada EMT para circuitos internos aula deportes, bodegas segundo piso auditorio y aula música.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN:** Se realiza instalación de cable para circuitos aula deportes, bodegas segundo piso auditorio y aula música.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS:** Se realiza instalación de paneles LED de 120x30cm en aula deportes, bodegas segundo piso auditorio y aula música.

- **ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):** Se realiza instalación de 3 en 1 sobre estructura metálica existente soporte de cubierta y estructura instalada para anclaje de teja standing seam.

- **FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO:** Se realiza instalación de flanches en cubierta orientación, pasillo y escaleras.

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS):** Se realiza instalación de cubierta tipo sándwich ancho de 500mm con aislante de poliuretano en aula música y en ala 1 de auditorio.

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH:** Se realiza instalación de caballete interno y externo en aula de música.

- **MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD):** Se realiza impermeabilización de placa de techo baño orientación y vigas canales en concreto en pasillo y escaleras, frente a música.

- **MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS:** Se realiza mantenimiento de ventanas en aula profesores, orientación, pasillo, escaleras, y aula de música.

- **CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN:** Se realiza

mantenimiento de puertas existentes en aula de profesores, orientación, aula deportes, y acceso a bodegas segundo piso auditorio.

4.4.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO.**



imagen 26. Cerramiento en área de circulación frente a aula música

- **DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS):**



imagen 27. Desmonte salidas eléctricas

- **DESMONTE DE LÁMPARAS:**



imagen 28. Desmonte luminarias en aula deporte y ala 1 auditorio

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA):**





imagen 29. Instalación estructura metálica en aula música

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE:**





imagen 30. Instalación platinas para anclaje estructura metálica

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN:**





imagen 31. Instalación interruptores

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS:**



imagen 32. Instalación luminarias y red eléctrica en aula música.

- **ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):**



imagen 33. Instalación de pintura en cerchas existentes

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS):**



imagen 34. Instalación cubierta en ala 1 auditorio y en aula de música

- **MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD):**



imagen 35. Impermeabilización viga canal en concreto

- **MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS:**



imagen 36. Mantenimiento ventanería

- **CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN:**



imagen 37. Mantenimiento de puertas

4.4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante este período se finaliza la intervención contemplada dentro del alcance contractual para aula de profesores, sala de orientación, pasillo y escaleras, se realiza la entrega interventoría mediante acta y se habilitan los espacios para uso de la institución.

- Durante este mes se presentaron lluvias intermitentes frecuentes de media y alta intensidad que condicionaron el avance en obra.

4.5. COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A

El Instituto educativo Reino de Holanda se encuentra ubicado en Dg. 46 Sur #13 i-15, Bogotá.



Imagen 38. Colegio Reino de Holanda.

4.5.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Luis Miguel Castaño	1053816598	Residente de obra
Valentina Osorio	10949444045	Inspector de obra
Angela Tarazona	60448725	SST
Hugo Guillermo Perez	1065881660	Ingeniero Ambiental

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Jose Elias Michelly	19490651	Maestro de obra
Juan Carlos Campos	1094979136	Ayudante de Obra
Brayan Alexis Lopera Arevalo	1033766735	Ayudante de Obra
Yerimy Gabriel Gutierrez	6971469	Ayudante de Obra
Hesynjawer Valencia	1005770353	Ayudante de Obra
Johan Gonzalez	1031177585	Ayudante de Obra
Ali Gusdarwin Martínez	5753578	Ayudante de Obra
Jose Ignacio Seco	23439129	Ayudante de Obra
Cristian Camilo Uribe Valbuena	1069724034	Instalador
Edgar Moreno Reyes	1005195748	Instalador
Frannkyn Roosevelth mendez	1024484580	Instalador
Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	Instalador
Gina Kterine Casas	1069754573	Inspector de obra

4.5.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

- **PRELIMINARES:** Como complemento de algunas actividades constructivas se realizó la apertura de regatas en los muros para colocar la tubería necesaria para las instalaciones eléctricas y demás instalaciones necesarias. Además, se desarrollaron actividades de limpieza de las canales y bajantes que se encontraban en las áreas a intervenir.

- **MAMPOSTERÍA:** De acuerdo a las actividades previstas para la apertura de regatas se efectúa el resane de los muros en donde se instaló la tubería necesaria, con el propósito de igualar la superficie y no dejar rastro de la intervención.

- **INSTALACIONES ELECTRICAS:** Se realizó el reemplazo de las redes eléctricas, teniendo en cuenta todos los accesorios que se tienen en la red como tomacorrientes, interruptores sensores de movimiento, tuberías y lámparas con el fin de modernizar las instalaciones de las aulas del tercer piso del edificio central.

- **PISOS:** De acuerdo a las actividades de mantenimiento de las aulas del tercer piso del edificio en la etapa 1 de la intervención es necesario que se realice el pulimento de los pisos puesto que no es oportuno hacer el cambio de los mismos.

- **MAMPOSTERIA SECA:** Se realizó el muro en drywall que se encuentra en el aula provisional que se encuentra en el área del comedor del edificio central con la finalidad de realizar un cerramiento más apropiado para las actividades que se realizan en esa área.

- **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS:** Se ejecutó el pañete sobre los muros donde se realizaron regatas para la tubería y se elaboró la adecuación de los filos de los muros donde se instaló la cubierta, al finalizar estas adecuaciones se aplicó la pintura de los muros con esmalte, la pintura de las cerchas, puertas y marcos de las aulas para que el área a intervenir posea la mejor apariencia posible.

- **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES:** Se desarrolló el reemplazo de la cubierta de las aulas de la etapa 1 de la edificación, donde también se hizo el cambio de los flanches y el caballete elementos proporcionados para evitar las filtraciones de agua del exterior, además se proporcionaron las platinas que son requeridas para garantizar la fijación de la cubierta.

- **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL:** Se realizó la limpieza del área en donde se ejecutaron las actividades constructivas y que generaron residuos en el lugar.

4.5.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **PRELIMINARES**



Imagen 39. corte y regatas en concreto para instalación tubería y limpieza de canales y bajantes

- **MAMPOSTERIA**



Imagen 40. resane de fisuras en muros. incluye acabado similar al existente

- **INSTALACIONES ELECTRICAS**



Imagen 41. instalaciones eléctricas y de comunicaciones (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

- **PISOS**

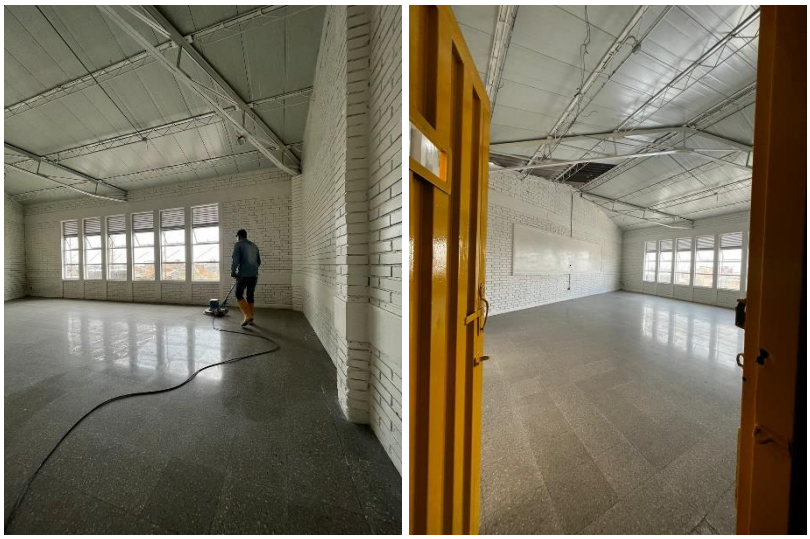


Imagen 42. destronque y pulida de granito existente de 33 x 33

- **MAMPOSTERIA SECA**

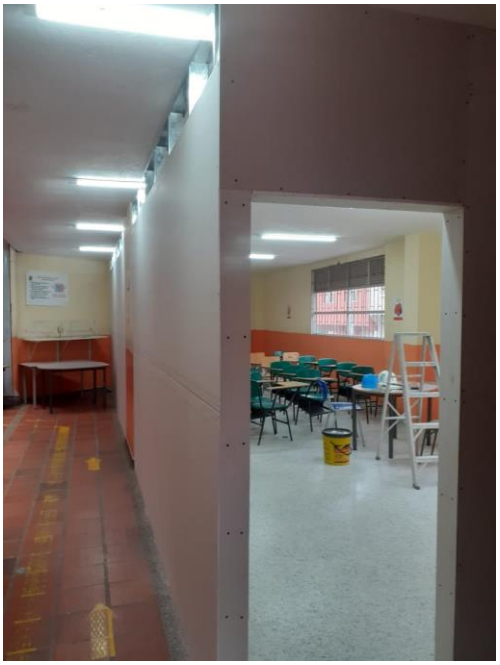


Imagen 43. muro en drywall doble cara e = 10 cm, incluye estructura, accesorios, suministro e instalación.

- **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS**



Imagen 44. pañete y pintura (todas las actividades incluyen el suministro e instalación

- **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES:**



Imagen 45.Suministro e instalación Cubierta, Flanches, Caballete

4.5.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Durante el período reportado, se realizaron múltiples comités de obra con interventoría para esclarecer dudas presentadas durante la ejecución las cuales fueron resueltas oportunamente.

- Se realizó comité con directivos para la aprobación de propuesta funcional de los baños a ejecutar sin embargo aun no se ha definido fecha de inicio de intervención.

- Queda pendiente entrega de la etapa 2 a intervenir por parte de los directivos de la institución para iniciar labores programadas y contempladas en cubierta

4.6. COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA

El Colegio Restrepo Millán Sede B, Isabel II De Inglaterra se encuentra ubicado en la Carrera 26 a sur con calle 41 sur

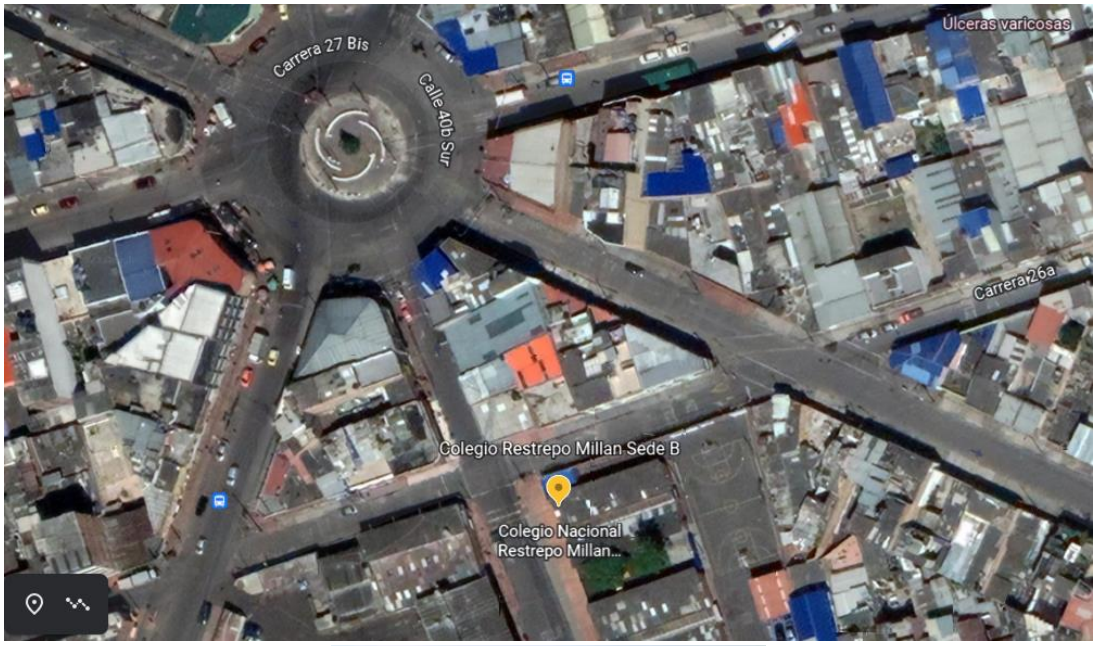




imagen 46. Colegio Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra

4.6.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Mauricio Rodriguez	79715893	Residente de obra
Yesenia Arenas	1049638441	Inspector de obra
Angela Tarazona	60448725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Fabio Toro	3082270	Maestro de obra
Jose Alfredo Corena	1033811872	Ayudante de Obra
William Mauricio Castro	1003805819	Ayudante de Obra
Neider Antonio Polo	1041890049	Ayudante de Obra
Willian Cortes	79040683	Ayudante de Obra
Javier Guilombo	7687771	Ayudante de Obra

4.6.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el período reportado se inicia intervención de ala 3 en primer piso del edificio 2 a nivel de cubiertas y estructura metálica de soporte de cubierta. Se realiza instalación de Subbase granular B-400 y posterior instalación de concreto de 3000PSI para placa de contrapiso de 10cm en corredor 33 y aula 32. Instalación de alistado de piso en primer piso edificio 2.

- **DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS):** Se inicia desmonte de teja asbesto cemento existente en ala 3 edificio 2, se realiza desmonte de policarbonato en domo central en edificio 2.

- **PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION:** Se realiza instalación de concreto de 3000 PSI para placa contrapiso en área pasillo 33 y aula 32

- **PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO):** Se realiza instalación de concreto de 3000 PSI para pedestales en donde se anclan columnetas metálicas externas en ala 3.

- **SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI:** Se realiza corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para pedestales en donde se anclan columnetas metálicas externas en ala 3.

- **SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M:** Se realiza instalación de malla electrosoldada para placa de contrapiso en aula 32 y corredor 33. Se instala malla electrosoldada para alistado de piso en aulas 27 y 28.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA):** Se realiza instalación de estructura metálica de soporte cubierta de acuerdo a diseño estructural planteado por el consorcio y aprobado por interventoría.

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE:** Se realiza instalación de platina para anclaje de estructura metálica a pedestales y placa existente.

- **ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M:** Se realiza instalación de alistado de piso en piso 1 edificio 2.

- **DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO:** Se realiza instalación de policarbonato para domo en corredor 33 edificio 2.

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).:** Se inicia instalación de teja standing seam en ala 3 edificio 2.

- **LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS):** Se realiza instalación de platina tipo regleta para anclaje de teja sobre cerchas existentes.

4.6.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS):**



imagen 47. Desmonte teja asbesto cemento



imagen 48. Desmonte policarbonato en domo sobre pasillo 33

- **PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION:**



imagen 49. Placa de contrapiso en pasillo 33



imagen 50. Placa de contrapiso en aula 32

- **PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO):**



imagen 51. Pedestales externos en ala 3

- **SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI:**



imagen 52. Acero de refuerzo en Pedestales externos en ala 3

- **SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M:**





imagen 53. Malla electrosoldada en corredor 33 y aula 32



imagen 54. Malla electrosoldada en aulas 27 y 28

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA):**



imagen 55. Instalación estructura metálica ala 3



imagen 56. Instalación estructura metálica ala 3

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE:**



imagen 57. Instalación platinas ala 3

- **ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M:**



imagen 58. Instalación de alistado de piso

- **DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO:**





imagen 59. Domo central edificio 2

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).:**





imagen 60. Cubierta ala 3

- **LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS):**



imagen 61. Platina sobre cerchas para anclaje Cubierta ala 3


4.6.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante este período interventoría aprueba la instalación de mortero en área donde se instalará la rinconera pvc para el media caña con piso vinílico, se realiza ajuste en presupuesto.

- Durante este mes se presentaron lluvias intermitentes frecuentes de media y alta intensidad que condicionaron el avance en obra.

- Se reitera a interventoría en múltiples ocasiones la necesidad de contar con la aprobación del material que sellará la superficie de alistados de piso instalados y permitirá la adherencia con el pegante del piso. Por tanto, se anexan las especificaciones técnicas del material.

4.7. COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A

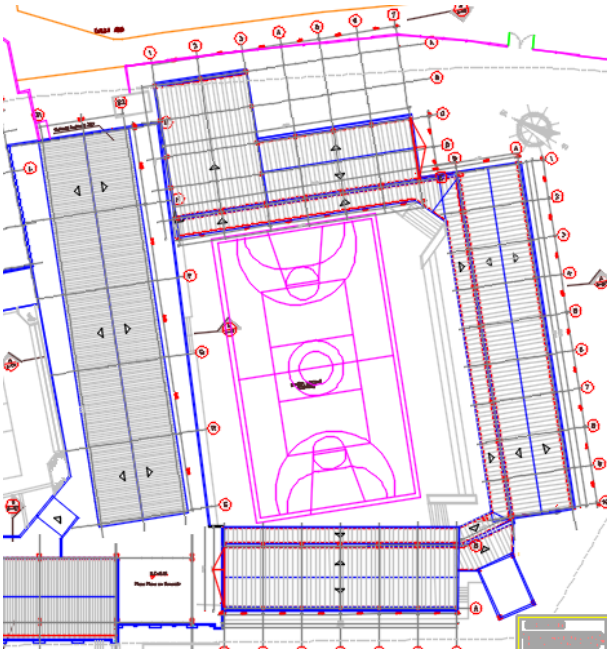



4.7.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Mauricio Rodriguez	79715893	Residente de obra
Juan Camilo Cristancho Bohada	1018843507	Inspector de obra
Angela Tarazona	60448725	SST

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Fabio Toro	3082270	Maestro de obra
Neider Antonio Polo	1041890049	Ayudante de Obra
Carlos Beltrán	19497864	Ayudante de Obra
Cristian Camilo Uribe Valbuena	1069724034	Instalador
Edgar Moreno Reyes	1005195748	Instalador
Frannkyn Roosevelth mendez	1024484580	Instalador
Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	Instalador
Gina Kterine Casas	1069754573	Inspector de obra

4.7.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

- **PRELIMINARES:**
  - Se realiza desmonte de cubierta en asbesto cemento en ala oriental, junto con desmonte de cielo raso en lámina galvanizada en pasillo y cielo raso en lámina de icopor en sala de sistemas.
  - Se realiza desmonte de salidas de iluminación y accesorios en las áreas habilitadas por la institución.
  - Se realiza retiro de manto instalado en calanes, por el grado de deterioro en el que se encuentra impidiendo el correcto funcionamiento.
  - Se realiza a su vez actividad de limpieza de canales, para posterior impermeabilización de viga canal.

- **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES:**
  - Se realiza instalación de interruptos de pasillo ala occidental.
  - Se realiza instalación de tomas corriente adicionales solicitadas por la institución educativa, avaladas por la interventoría y aprobadas por la supervisión.

- **PAÑETE Y PINTURA:**
  - Se realiza actividad de estuco y pintura en parte superior de aulas, en las cuales se realiza intervención por cambio de cubierta.

- **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES:**
  - Se realiza actividad de emulsión asfáltica e instalación de manto en viga canal existentes.
  - Se realiza instalación de remates de cubierta tipo sándwich instalada en las áreas asignadas.

Se presentan observaciones al diseño de baños entregado por el contratista el 28 de febrero de 2023, las modificaciones de reciben el 24 de marzo de 2023, de la cual se presenta comunicado 2023_RUU_MGP_110, el 28 de marzo de 2023, el día 13 de abril en comité de obra la SED solicita se realice replanteo de la propuesta en obra y se estandarice la distancia entre sanitarios.

4.7.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **PRELIMINARES:**

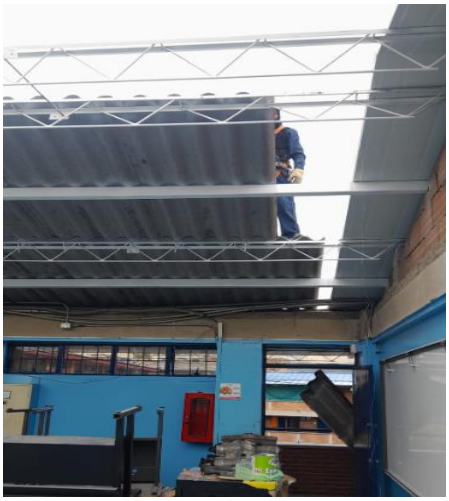


imagen 62. Desmonte de cubierta existente e instalación de teja tipo sándwich

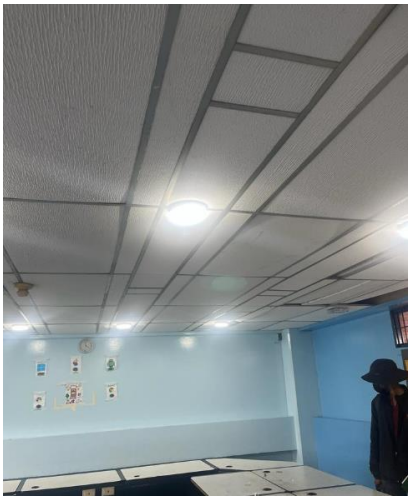


imagen 63. Desmonte de cielo raso y luminarias

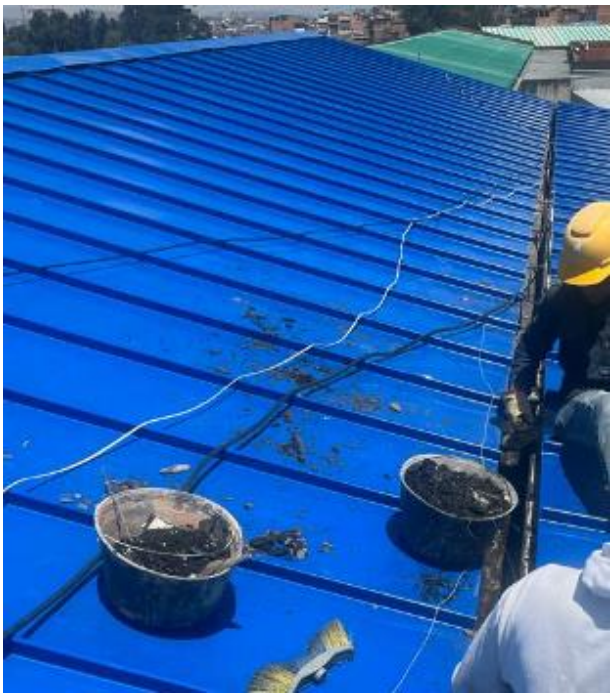


imagen 64. Limpieza y retiro de manto asfáltico en viga canal



imagen 65. Retiro de material de escombro de piso 3



imagen 66. Instalaciones eléctricas pasillo



imagen 67. Tomas eléctricas aulas



imagen 68. Estuco sobre pañete en muros de mampostería



imagen 69. Pintura sobre muros en mampostería



imagen 70. Impermeabilización de viga canal en concreto

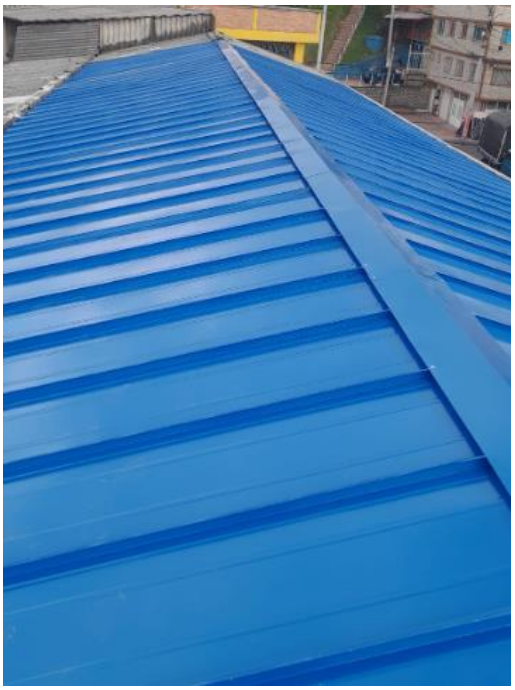


imagen 71. Instalación de remates en cubierta



imagen 72. Entrega de aulas - Costado occidental Piso 3.

4.7.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo se realizó entrega de dos aulas a la institución, con recibo a satisfacción por parte del rector.
- Se continúan actividades en la institución principalmente en cubierta, en los frentes dispuestos por la institución, de acuerdo con el plan de trabajo del contratista.
- Se han presentado atrasos en la ejecución de áreas de baños por las diferentes alternativas arquitectónicas y de materialidad de los espacios.

4.8. COLEGIO LICEO FEMENINO DE CUNDINAMARCA

El Instituto educativo Liceo Femenino de Cundinamarca Mercedes Nariño se encuentra ubicado en Dg. 46 Sur #13 i-15, Bogotá.



Imagen 73. Colegio Liceo Femenino de Cundinamarca.

4.8.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Luis Miguel Castaño	1053816598	Residente de obra
Valentina Osorio	10949444045	Inspector de obra
Angela Tarazona	60448725	SST
Hugo Guillermo Perez	1065881660	Ingeniero Ambiental

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Jose Elias Michelly	19490651	Maestro de obra
Eduardo Jose Zoteranis Riera	5620895	Ayudante de obra
Nelson Felipe Guanipa	7129348	Ayudante de obra
Neudo Jose Gonzalez	22095569	Ayudante de obra
Maicol Estiven Sandoval	1001283172	Ayudante de obra
Hector Veloza Duitama	79726908	Ayudante de obra
Santiago Nazareth Márquez	7935136	Ayudante de obra
Victoriano Moreno	11799322	Ayudante de obra
Jorge Stiven Quiroga Gomez	1027521715	Ayudante de obra
Ali Gusdarwin Martínez	5753578	Ayudante de obra

4.8.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

- **PRELIMINARES:** En las actividades preliminares que se ejecutaron en la institución se encuentra el replanteo de las medidas tomadas inicialmente en los laboratorios a intervenir y posteriormente se realizó el cerramiento para el acopio de los materiales y hacer las mezclas pertinentes de las demás actividades constructivas.

- **DEMOLICIONES Y DESMONTES:** Se ejecutó la demolición de las placas del contrapiso encontradas en los laboratorios que se encuentran en intervención actualmente y adicionalmente se realiza el desmonte de las tuberías y aparatos hidrosanitarios existentes en dichas áreas intervenidas.

- **INSTALACIONES SANITARIAS:** Se reemplazó la tubería sanitaria que se encontraba en el lugar con el fin de que las conexiones queden en el mejor estado al contar con materiales nuevos, este propósito aplica para las cajas de inspección y demás accesorios propios de la red sanitaria.

- **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS:** Se ejecutó el pañete sobre los muros donde hubo afectación a causa del desmonte y la demolición de las estructuras existentes en los laboratorios, se aplicó un pañete de muro con un pequeño refuerzo con malla y un pañete liso ya para ajustar las superficies de los muros para continuar con las demás actividades constructivas.

- **RELLENO CON RECEBO:** Debido a que la demolición de la placa dejo algunos vacíos en la superficie donde se colocara posteriormente el piso cerámico se realizó el relleno con material granular para afinar la superficie final para colocar la placa de piso.

4.8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **PRELIMINARES**



Imagen 74. Cerramiento para el acopio de materiales

- **DEMOLICIONES**



Imagen 75. Demolición de placas de contrapiso aula tecnología

- **INSTALACIONES SANITARIAS**



Imagen 76. instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

- **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS**



Imagen 77. pañete de muros (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)



Imagen 78. estuco de muros (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

- **RELLENO EN RECEBO**

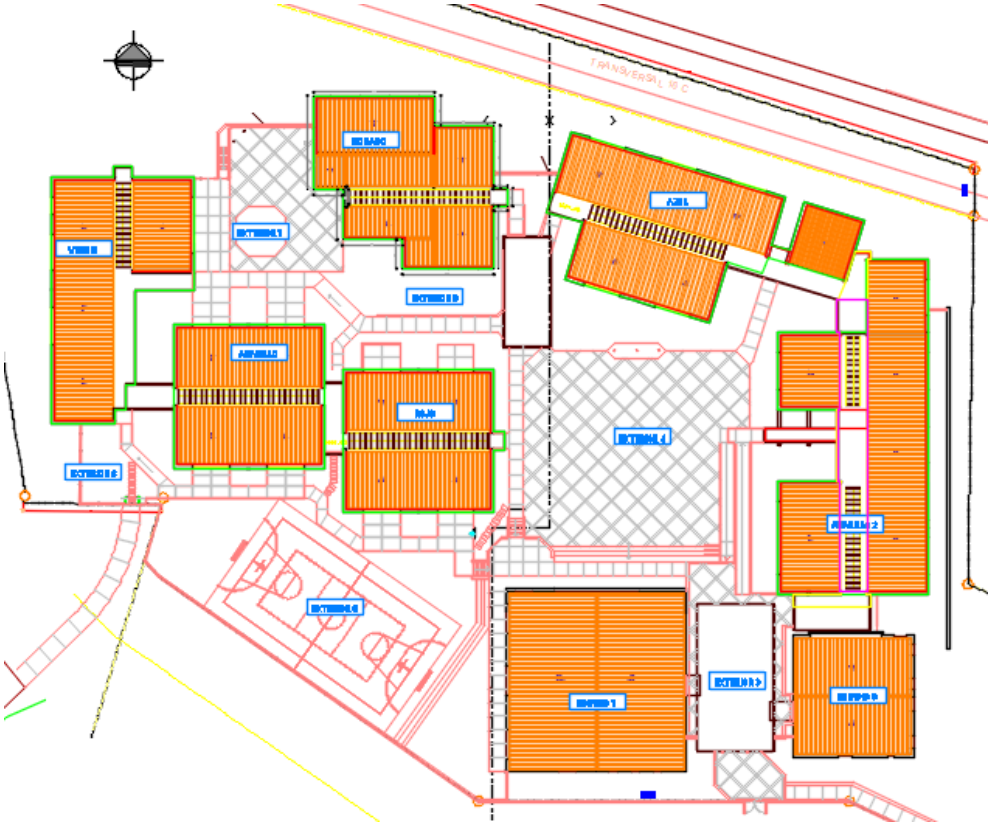


Imagen 79. Relleno con recebo compactado b600 (suministro, extendido, humedecimiento y compactación)

4.8.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Durante el período reportado, se adelantaron comités de obra con interventoría, en donde se nos han informado los parámetros para la ejecución de obras en los laboratorios respecto a los requerimientos de la supervisión.
- Se recibió modelo preliminar de diseño de laboratorios por parte de secretaria el día 28 de marzo, a esa fecha se inicio la adecuación de diseños respecto a obra y se procedió a la ejecución y replanteo de los mismo.

4.9. COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM





4.9.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Mauricio Rodriguez	79715893	Residente de obra
Juan Camilo Cristancho Bohada	1018843507	Inspector de obra
Angela Tarazona	60448725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Fabio Toro	3082270	Maestro de obra
Jose Ricardo Rodriguez	79057932	Ayudante de Obra
Honorio Martinez Arenas	79526595	Ayudante de Obra
Duglas Orlando Reyes	1031160183	Ayudante de Obra
Pedro Hurtado Uribe	1416839	Ayudante de Obra
Daniel Gregorio Munevar	79808874	Ayudante de Obra
Juan De Jesus Sogamoso	5969876	Ayudante de Obra

4.9.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

- **PRELIMINARES:**
  - Se realiza retiro de manto asfaltico existente, el cual presenta filtraciones y mal estado.
  - Se realiza demolición de pañete de remates en cubierta en áreas donde se evidencia desprendimiento de este.
  - Se realiza desmonte y reinstalación de tubería EMT en cubierta para realizar actividades en la superficie donde se encuentran fijadas.
  - Se realiza limpieza de viga canales en concreto, ya que se evidencian empozamientos por elementos que obstruyen la circulación del agua.

- **PAÑETE Y PINTURA:**
  - Se realiza actividad de pañete en áreas afectadas por humedades.
  - Se realiza actividad de pintura en vinilo, una vez se realiza reparación de humedad.
  - Se realiza actividad de pintura en esmalte para aquellas áreas en donde se presentan manchas de humedades posteriores.

- **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES:**
  - Se realiza actividad de emulsión asfáltica e instalación de manto en muros perimetrales de cubiertas en bloque rojo, amarillo y verde.

Se hace entrega a la institución de bloque morado, verde y amarillo, una vez culminadas las actividades dentro del alcance del contratista Consorcio Mia GP.

4.9.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **PRELIMINARES:**



Imagen 80. Limpieza de viga canales

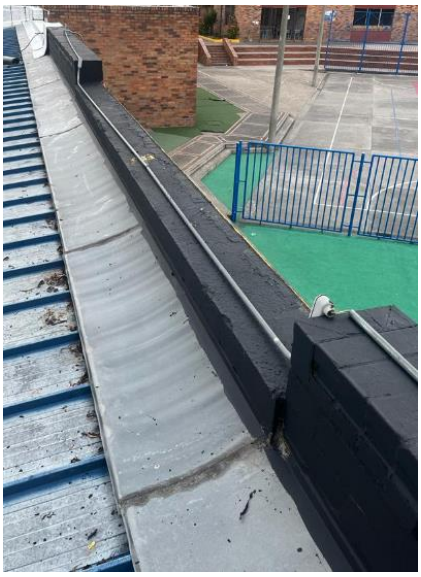


Imagen 81. Reparación de remates de muro perimetral



Imagen 82. Desmonte e reinstalación de tubería EMT en cubierta



Imagen 83. Limpieza de canales

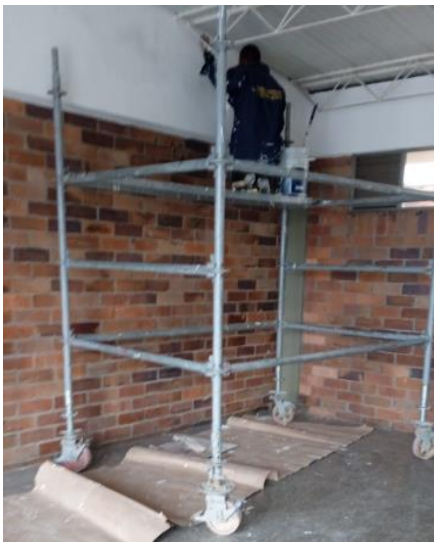


Imagen 84. Resane de muros en mampostería

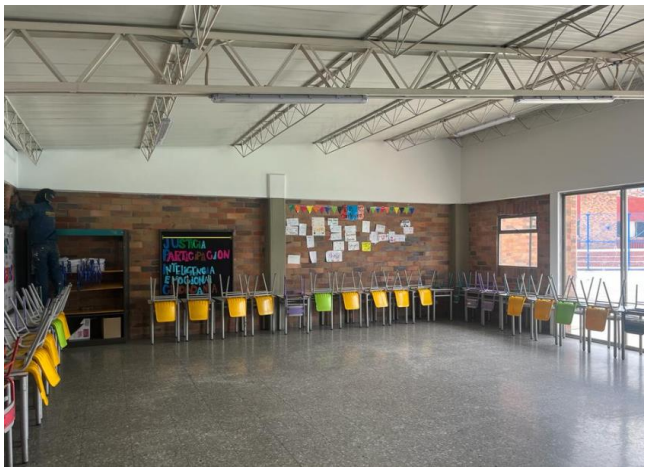


Imagen 85. Pintura es esmalte y vinilo en aulas



Imagen 86. Manto asfaltico en muros perimetrales de cubierta



Imagen 87. Emulsión asfáltica en muros perimetrales de cubierta

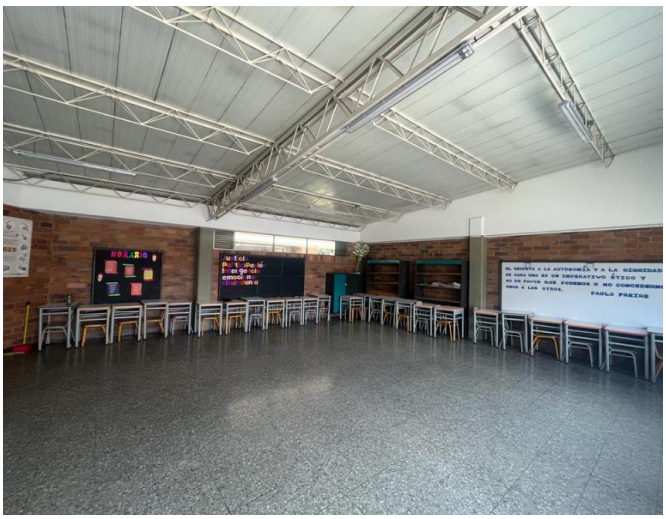


Imagen 88. Entrega de aulas bloque amarillo

4.9.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo se realizo entrega de cubierta de bloque morado, cubierta y aulas de bloque amarillo.
- Se continúan actividades en la institución principalmente en cubierta, en los frentes dispuestos por la institución, de acuerdo con el plan de trabajo del contratista.

4.10. COLEGIO MARÍA CANO IED



imagen 89. Colegio Maria Cano IED. .

El colegio María Cano se encuentra en la dirección Transversal 5U # 48 J - 30 Sur en la zona centro oriente de la localidad Rafael Uribe Uribe. Donde se ofrecen los servicios educativos a los niños y jóvenes desde el preescolar hasta el bachillerato.

4.10.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA EMERGENCIA

- **OBRAS PRELIMINARES:** En las actividades preliminares que se ejecutaron en el frente de obra se contemplan el cerramiento que se elaboró para aislar el área intervenida y evitar que los estudiantes puedan llegar a dicha área y el picado del manto asfaltico que se tenía en mal estado con el propósito de empezar a verificar cuales eran las causas de las infiltraciones.

- **PISOS:** Se elaboró el nuevo pendientado de la placa intervenida para garantizar que la nueva superficie no tenga problemas de acumulación de aguas lluvias debido a la baja pendiente que se tiene en la placa.

- **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES:** Se realiza la impermeabilización de la cubierta del aula polivalente haciendo actividades como la aplicación de emulsión

asfáltica a toda la placa y la instalación del manto asfaltico que complementa la impermeabilización

4.10.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **OBRAS PRELIMINARES**



Imagen 90. OBRAS PRELIMINARES.

- **PISOS**







Imagen 91. PISOS.

❖ CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES





Imagen 92. Impermeabilizaciones .



Imagen 93. Impermeabilizaciones .



Imagen 94. Impermeabilizaciones .

4.11. IED CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA

El IED CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA se encuentra Cl. 29 Sur #29b-61, Bogotá.



imagen 95. El IED CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA.

4.11.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA EMERGENCIA

- **PAÑETE Y PINTURA:** Se realizó únicamente mantenimiento de pintura en corredor del acceso peatonal en cubierta interior de la institución y los soportes cilíndricos que lo comprenden, además se ejecutaron labores de pintura en comedor,
  la placa del cuarto de almacenamiento y el perímetro en general por problemas de humedades, debido al mal estado de la cubierta existente de asbesto cemento.

- **EMERGENCIA HIDRÁULICA COMEDOR**
  Se atiende emergencia hidráulica, debido a una filtración por un marco del acceso principal a la bodega de insumos del comedor de la institución, se realiza inspección

pertinente y se encuentra tubería metálica de suministro de agua potable, se realiza un arreglo provisional para detener la filtración.

- **ASEO Y DISPOSICIÓN:** Se hizo el aseo de las instalaciones intervenidas con el propósito de dejar el área con la mejor apariencia posible y así lograr que las instalaciones de la institución conserven su buen estado.

4.11.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **PAÑETE Y PINTURA**



Imagen 96. ACTIVIDADES DE PAÑETE Y PINTURA.



Imagen 97. ACTIVIDADES DE PAÑETE Y PINTURA.

- **EMERGENCIA HIDRAULICA COMEDOR**



Imagen 98. FILTRACIÓN HIDRAULICA.

4.11.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda a la entidad competente evaluar las condiciones de cubierta del comedor de esta institución para poder atender de raíz todos los inconvenientes y emergencias de salubridad que esta generando el mal estado y la antigüedad de estas instalaciones.

BITÁCORA COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A LOS CHIRCALES

con pintura previamente retirada. se limpian las muros con ladrillo a la vista con acido muriatico con el fin de eliminar las impurezas dejadas en la superficie.
Firma. Luis Miguel Jhon R.

Fecha: 17 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 Ayudante.
Herramienta menor.
se realiza la aplicación de la emulsión asfaltica en las vigas canales y superficies planas en la cubierta del edificio para alistar la superficie para colocar el manto asfaltico.
Firma. Luis Miguel Jhon R.

Fecha: 18 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante.
Herramienta menor.
se realizo el acopio de los escombros producidos por la limpieza de la cubierta. y se impermeabilizo la placa de concreto contigua a la cubierta con 1 capa de emulsión asfaltica. se continua con el estucado en el baño.
Firma. Luis Miguel Jhon R.

Fecha: 21 de Marzo de 2023
1 oficial. 1 ayudante
Herramienta menor.
se complementa la aplicación de la emulsión asfaltica en las placas y en las vigas canales de la cubierta, se continua con el mantenimiento de la cubierta y la limpieza y adecuación de la canal dentro de la cubierta.
Firma. Luis Miguel

Fecha: 22 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante
Herramienta menor.
se continua con la limpieza y la aplicación de la emulsión asfaltica en la canal que se encuentra dentro de la cubierta y se comienzan con los resane

con aditivos para complementar la impermeabilización.
Firma. Wil Miguel Pamela B

Fecha: 23 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante.
Herramienta menor.
se finaliza con la aplicacion de emulsion asfaltica, limpieza y adecuación de las canales en la cubierta. Se afinan las superficies con estuco en la parte superior del baño de niños del tercer piso del edificio 2.
Firma: Wil Miguel Pamela B

Fecha: 24 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 Ayudante
Herramienta menor
Se instala manto frio en el edificio 1 en la parte de la cubierta para rematar las infiltraciones presentes. en dichos mesas se aplica una capa mas de estuco en el baño del tercer piso del edificio 2.
Firma Wil Miguel Pamela B

Fecha: 25 de Marzo de 2023.
1 oficial, 1 ayudante.
Herramienta menor.
se inicia la instalación del manto asfaltico en las placas y las vigas canales. del la cubierta de los edificios 1 y 2. se programa jornada de aseo en el frente de obra.
Firma: Wil Miguel Pamela B

Fecha: 27 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 Ayudante.
Herramienta menor.
Se continua con la instalación del manto asfaltico en las vigas canales existentes en la cubierta de los edificios 1 y 2.
Firma: Wil Miguel

Fecha: 28 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante
Herramienta menor.
se instala el manto asfaltico en la placa superior de la cobierta del edificio 2.
y se realizan los remates correspondientes.
Firma:

Fecha: 29 de Marzo de 2023.
1 oficial, 1 ayudante.
Herramienta menor.
se finaliza la instalación del manto asfaltico en todos los viguetones del edificio 1.
Firma:

Fecha: 30 de Marzo de 2023.
1 oficial, 1 ayudante
Herramienta menor.
se finaliza la instalación del manto asfaltico en todos los viguetones y placas del edificio 2.
Firma.

Fecha: 31 de Marzo de 2023.
1 oficial, 1 ayudante.
Herramienta menor:
se continua las labores de estucado y pintura del baño de los niños en el 3 piso del edificio 2. se realiza afinado de las muros existentes.
Firma:

Fecha: 01 de Abril de 2023.
1 ayudante.
Herramienta menor.
se realizan los ajustes de las tuberias en mal estado en el baño de niños del 3 piso del edificio 2. se finalizan labores de estucado y pintura.
Firma:

Fecha: 03 de Abril de 2023.
No hay presencia de personal debido a la demora en la entrega del material de la cobierta exterior y ademas se sigue en la espera de la definición del tipo de enchape a instalar.
Firma. Luis Miguel Cach ACG

Fecha: 04 de Abril de 2023
No se cuenta con personal debido a la espera de material.
Firma. Luis Miguel Cach ACG

Fecha: 05 de abril de 2023
No se cuenta con personal debido a la espera de material.
Fima: Luis Miguel Cach ACG

Fecha: 10 de abril de 2023.
1 oficial, 2 ayudantes
Herramienta menor:
se inician las actividades de instalación de la cobierta del exterior del colegio. en el edificio 2.
Firma. Luis Miguel Cach ACG

Fecha: 11 de abril de 2023.
1 oficial, 2 ayudantes.
Herramienta menor.
Se continuan con las actividades de instalación de la cobierta del exterior del colegio en el edificio 2. Se reemplaza la canal adyacente a la cobierta.
Firma. Luis Miguel Cach ACG

Fecha: 12 de Abril de 2023
1 oficial, 2 ayudantes.
Herramienta menor.
Se inicia la elaboración de la pergola en el exterior del edificio 2. y se continua con la instalación de la cobierta.
Firma. Luis Miguel Cach ACG

Fecha. 13 de abril de 2023.
1 oficial. 1 ayudante.
Herramienta menor.
se continua con la elaboración de la pergola que se instalara en el exterior del edificio 2, se finaliza la instalación de la cobierta en la misma zona.
Firma. Luis Miguel ACG

Fecha: 14 de abril de 2023.
1 oficial.
Herramienta menor.
se continua con la elaboración de la pergola y se inicia con el reemplazo del embogillado del enchape en el baño de los niños en el 3 piso.
Firma. Luis Miguel ACG

Fecha: 15 de Abril de 2023.
1 ayudante.
Herramienta menor.
se continua con el reemplazo del embogillado del enchape en el baño de los niños en el 3 piso.
Firma. Luis Miguel ACG

Fecha. 17 de abril de 2023.
1 ayudante.
Herramienta menor.
se finaliza con el reemplazo del embogillado del enchape en el baño de los niños en el 3 piso.
Firma. Luis Miguel ACG

Fecha: 18 de abril de 2023.
1 oficial. 1 ayudante.
Herramienta menor.
se colocan los platinos que sostendran los grapos de la pergola del exterior del edificio 2.
Firma. Luis Miguel ACG

Fecha 19 de abril de 2023
1 capataz
Herramienta menor.
Debido a las lluvias que caen en el lugar de la intervención se realiza una limpieza preventiva de las gárgolas como refuerzo a las actividades previamente ejecutadas de limpieza de bajantes y canales.
Firma. Will Miguel Cortez AMCG

Fecha 20 de abril de 2023.
1 oficial, 3 capataz
Herramienta menor.
Se realiza el cambio de los flanches y el caballete que se encuentra en los cobiertas de los edificios principales
Firma. Will Miguel Cortez AMCG.

BITÁCORA COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II

Fecha: 15 de Marzo de 2023
1 Ayudante.
Herramienta menor.
Se continua con el desmonte del sobrepiso existente en las aulas 1 y 2. para dejar la superficie adecuada para el enchape.
Firma [signature] PamelaB.

Fecha: 16 de Marzo de 2023
1 Ayudante.
Herramienta menor.
Se continua con el desmonte del sobrepiso de las aulas del primer piso del edificio 7.
Firma. [signature] PamelaB

Fecha: 17 de Marzo de 2023.
1 Ayudante.
Herramienta menor.
Se continua con el desmonte del sobrepiso de las aulas 1 y 2. Se continua a la espera de los diseños por parte de SED de la parte arquitectonica.
Firma. [signature] PamelaB
Fecha 18 de Marzo de 2023
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma. [signature]
Fecha: 21-03-2023.
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma. [signature]
Fecha 22-03-2023
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma. [signature]
Fecha. 22-03-2023
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma. [signature]

Fecha 23/03/2023
No se han definido diseños por parte de la supervisión.
Firma Luis Miguel PamelaB.

Fecha 24-03-2023
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma Luis Miguel PamelaB.

Fecha 25/03/2023.
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma. Luis Miguel PamelaB.

Fecha 27-03-2023
Se sigue a la espera de los diseños por parte de la supervisión
Firma. PamelaB. Luis Miguel

Fecha 28-03-2023
No se han definido diseños por parte de la supervisión.
Firma. PamelaB. Luis Miguel

Fecha 29-03-2023
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma PamelaB. Luis Miguel

Fecha: 30 de Marzo de 2023.
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma. Luis Miguel

Fecha: 31 de Marzo de 2023.
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma. Luis Miguel

Fecha: 01 de Abril de 2023.
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma: Luis Miguel

Fecha: 03 de Abril de 2023.
De acuerdo a la respuesta enviada por la supervisión, el contratista inicia la elaboración de los diseños faltantes.
Firma:

Fecha: 04 de abril de 2023.
se continua en la elaboración de los diseños faltantes.
Firma.

Fecha: 05 de abril de 2023
se continua en la elaboración de los diseños faltantes.
Firma.

Fecha: 10 de abril de 2023.
1 oficial, 2 ayudantes.
Clima: despejado
Herramienta menor.
Se inician labores de excavación en los baños del primer piso del edificio 2 con la finalidad de tener un solo nivel.
Firma.

Fecha: 11 de abril de 2023.
1 oficial, 2 ayudantes.
Herramienta menor.
Se inician labores de acopio de material de excavación y se continuan las actividades de excavación en los baños del primer piso del edificio 2.
Firma.

Fecha: 12 de abril de 2023.
1 oficial, 1 ayudante.
Herramienta menor.
Se continuan las actividades de excavación en los baños, donde se encuentra una escorrentia de agua de flujo constante haciendo que el suelo este saturado y con una humedad alta, por lo cual se realiza visita por parte de interventoria

donde se realiza la inspección del lugar y se define que la opción mas viable para solucionar la situación es la demolición de ese edificio con la finalidad de que la construcción nueva tenga todas esas excentricidades mitigadas y poder tener garantía sobre la intervención realizada.
Firma: Luis Miguel Ortiz AMG

Fecha: 13 de Abril de 2023
1 oficial, 1 ayudante.
Herramienta menor.
se continuan las actividades de excavación y las actividades de nivelación de los pisos de los altos.
Firma. Luis Miguel Ortiz AMG

Fecha: 14 de Abril de 2023.
1 oficial, 3 ayudantes
Herramienta menor.
se inicia el desmonte del antepecho del segundo piso del edificio 2 de acuerdo a los diseños sugeridos. se continuan actividades de excavación y desmonte de pisos.
Firma. Luis Miguel Ortiz AMG

Fecha: 15 de Abril de 2023
2 ayudantes.
Herramienta menor.
se continuan con las actividades de desmonte del antepecho del segundo piso del edificio 2.
Firma. Luis Miguel Ortiz AMG

Fecha 17 de Abril de 2023.
1 oficial, 3 ayudantes.
Herramienta menor.
se finalizan las actividades de desmonte del antepecho y se procede con el desmonte de los muros del edificio de los baños en el primer piso.
Firma. Luis Miguel Ortiz AMG


Fecha: 18 de Abril de 2023.
1 oficial. 3 ayudantes
Herramienta menor.
se continua con el desmonte de los muros del primer piso del edificio de baños y se hace recolección de RCD proveniente de todas las actividades de demolición y desmonte, además se realiza el desmonte de la cubierta del edificio 3 y se realiza el acopio de dichos residuos.
Firma: Luis Miguel Cortés AYCG

Fecha: 19 de Abril de 2023.
1 oficial. 3 ayudantes. Luis Miguel Cortés
Herramienta menor.
continuan las actividades de desmonte de muros. y recolección de RCD. se realiza comite de obra con personal de SSO y de interventoria para definir los diseños de los baños propuestos anteriormente para dar via libre al desmonte de otras estructuras que se encuentran en mal estado y en general de la mala apariencia del colegio.
Firma. Luis Miguel Cortés AYCG

Fecha: 20 de Abril de 2023.
1 oficial. 3 ayudantes.
Herramienta menor.
se inicia la excavación en el primer piso del edificio de baños con la finalidad de llegar a la cota de trabajo donde se colocara la tuberia sanitaria y demas redes necesarias para la construcción nueva del edificio.
Firma: Luis Miguel Cortés AYCG

BITÁCORA COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A

Fecha 11-03-2023
No se adelanta instalacion de cubierta por presencia de lluvias fuertes., se adelanta en su medida encarozado de cubierta.
Firma
Fecha. 13-03-2023.
Se inicia instalacion de cubierta en la zona de preescolar y se solicita a la institución entrega de baños paricales para inicial con ese frente de trabajo. lo antes posible, inician lluvias fuertes 10:10 am.
Firma:
Fecha: 14-03-2023
Se continuan actividad de instalación de cubierta y se realizan actividad de encorozado simultaneo a pintura de estructura.

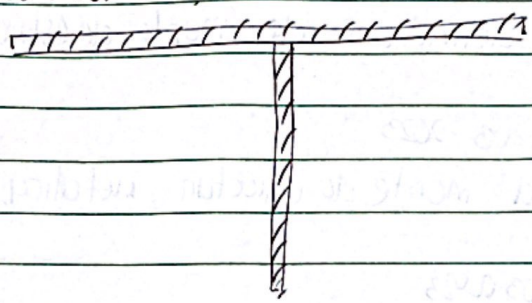

Fecha 15-03-2023.
Se inian actividades en Baños. bloque parqueadero segundo piso, en preescolar se continua instalación de cubierta y pintura de cercha, se inician niveles parcialistado de piso:
Firma:
16-03-23
Se evidencia que se encuentra personal de la obra sin documentacion (Gustavo martinez). se le solicita al contratista de manera inmediata entregar dicha documentacion a la interventoria para su aprobacion
Erick Ramirez

Powered by CamScanner

Se realiza verificación de temas ambientales, se recomendo no arrojar residuos en zonas verdes y realizar la separación de los residuos clasificandolos por tipo de residuo. Se evidencian canal limpia, individuo arboreo sin afectación, cerramiento en buen estado y bien instalado.

Dalia M. Bivero R
Ing Ambiental

Luis Miguel Arch Pareas

6-03 2023 Se continuan actividades y se recibe carpintería en aluminio para ventanas.
Firma Luis Miguel Arch

03 2023 Fecha. Se inicia la instalación de ventanas en el area de preescolar y se continuan reparaciones locativas en baños.
Firma Luis Miguel Arch Pareas

-03 2023 Se le hace entrego a la institución por medio del señor Roberto Muñoz señor de mantenimiento entrega de la ventanería 4 ventanas correspondientes a las aulas de preescolar y las puertas desmontadas de los baños 8 puertas.


Pareas

03 2023 Dia festivo no se ejecutan actividades

03 2023 Se Finaliza sobre piso aula preescolar uno y se hace jornada de aseo para iniciar aula 2 y continua pintura de cerchas. Se solicita aclaración de colores de columnas y resanes nuevos a interventoria para proceder a pintar.
Su respuesta es "gris", se procede a pintar.
Firma Luis Miguel Arch Pareas

3 2023 Se continuan actividades de sobre piso en el aula 2 se procede a inicia cerramiento en lona para abril frente de trabajo en la cancha contemplada en el alcance.
se inicia limpieza de pared ladrillo baños.
Firma Luis Miguel Arch Pareas

3032023	· Se finaliza cerramiento y se inician actividades de demolicion de placas aconlocar por filtracion de agua, se hace un diagnostico del error y se nota no instalacion de respiraderos.
	se inicia demolicion de dichas placas.
	y se continuan actividades en baños firma: Ing Miguel Cano Pinzon
03 2023	Se inician actividades de instalacion electrica
	Se continua demolicion cancha y actividades en baños
	· Firma: Ing Miguel Cano Pinzon
3 2023	· Se programa jornada de aseo y limpieza en la obra.
	· firma. Ing Miguel Cano Pinzon.
32023	Se trazan niveles en cancha para ser revisado con
	interventoria en campo la ejecucion y desarrollo de
	la cancha.
	se continuan actividades de pintura, electrico. En zona de
	preescolar.
	Firma.
3 2023	Se define con interventoria elaboracion de carcamo
	perimetral en primer piente 0.05 cmt por debajo del
	nivel del muro de contencion existente
	Respecto a las placas manejar las
	pendientes que caigan al carcamo.
	e: 10cm.
	Rejilla: Marco, contramarco y enrejado angulo con espaciado
	Receto Compactado.
	Firma.
2023	Se inician actividades de excavacion en cancha y
	continuan actividades en preescolar, electrico.
	Firma:
2023	con visita de interventoria se determinan especificacion
	de la cancha y los baños a intervenir y en obra
	se continuan excavaciones.
	Firma



Powered by CamScanner

31-03-2023	Se continuan actividad de excavación del carcamo. y actividades en baño de limpieza de ladrillo. Firma: Miguel Firma:
01-04-2023	se continuan actividades en cancha de excavacion de carcamo y se continuan labores en baño de limpieza de ladrillo, se informa a interventoria estado de pared para tomar determinación de como se va a realizar el mantenimiento. Firma: Firma:
0°	
03-04-2023	Se continuan actividades en baños de quitar pisos deteriorados de enchape 20x20 Firma: Firma:
04-04-2023	Se continuan labores de mantenimiento en baño, qu se subsanan en area de preescolar observaciones de ventaneria. Firma Firma.
05-04-2023	Se continuan labores de enchape en baño. Firma Firma.
Jueves.	06-04-2023 No se labora
Viernes	07-04-2023 No se labora
08-04-2023	Se continuan labores en baño. Firma. Firma.
10-04-2023	Se continuan labores en baño de enchape y boquilla Firma. Firma:
11-04-2023	Se continuan labores en baño de enchape y boquilla. Firma: Firma:
12-04-2023	Se continuan labores en baño de enchape y boquilla Firma: Firma:
13-04-202	Se continuan labores de enchape y boquilla en baños. Firma Firma.
14-04-2023	Se continuan labores de enchape y boquilla en baños Firma Firma:
15-04-2023	Se realiza recolección de RCDS en zona de concha y se continuan labores en baño de enchape y boquilla.

Powered by CamScanner

	Firma Firma:
17-04-2023	Durante las actividades de retiro de escombros y material de demolición del colegio el día sábado 15 de Abril se presento un ahuellamiento en la terraza del acceso principal en los paños de adoquín. Se socializa con la rectoría los tiempos de reposición de las afectaciones por los ahuellamientos. La interventoría solicito la demarcación de las zonas afectadas y la inmediata intervención de lo concertado. Adecuación de los adoquines y nivelación de la terraza, mejora del material de la estructura y reemplazo de piezas rotas.
	Firma:
18.04.2023	Se inician actividades de recebo y desprendimiento de ladrillo para solucionar incidente ocasionado por el minicargador, tal como se planteo en la reunion con el sero rector y se continuan actividades de nivelación en cancha, y emboquillado en Baños.
	Firma:
19.04.2023	Se continuan actividade de mantenimiento en baño en preescolar se finalizan actividades electricos pendiente (instalación lamparas, sensores movimiento y reflectores) y en el piente de cancha, se realizan excavacion, solado y limpieza de las areas intervenidas. se renivelo y adecuo el corcamo.
	Firma:
20.04.2023	Se continuan actividades de mantenimiento, pintura ladrillo reemboquillado y pintura de cerchas. bajo cubierta. baño intervenido.
	Firma): Se continuan actividades en cancha de adecuación del terreno para fundicion de placas en concreto.
	Firma:
21.04.2023	Se continuan actividades en pientes bajo cubierta debido a clima lluvioso. En preescolar se rematan detalles de acabados y en baño se finiquitan

Powered by CamScanner

BITÁCORA COLEGIO JOSÉ MARTÍ SEDE A, LUIS LÓPEZ DE MESA

18-Marzo-23 CLIMA: Soleado

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor

RECURSOS HUMANOS: Ingeniero, 4 ayudantes, 1 Oficial

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se finaliza instalación de cobertura en pasillo y escaleras. Trasiego de Teja asbesto cemento desde área intervención hasta punto acopio temporal contiguo al parqueadero asignado por la Institución.

OBSERVACIONES: Personal de portería (seguridad), solicita información sobre hora de finalización jornada laboral y manifiesta personal de grabación de T.V que se realiza en la I.E. que requieren disponibilidad de los espacios y suspender la jornada laboral para no interrumpir sus labores con el ruido generado en la obra. la mañana.

Ing Residente de obra.

Constructora Ing

21/Marzo-23 CLIMA: Parcialmente Nublado

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Ing. Residente, 3 Ayudantes, 1 Oficial, Maestro

RECURSOS HUMANOS: Herramienta menor y Soplete.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de cobertura en pasillo. Se realiza desmonte de teja tipo canoa en oficina orientación. Se inicia instalación de perfil estructura soporte de cubierta, anclado a muro mampostería con platinas y pernos.



Ing Residente de obra

Constructora Ing

22-Marzo-23 CLIMA: Lluvia de alta intensidad de 2:00pm a 2:45pm
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, 4 Ayudantes, 1 Oficial
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia mantenimiento a puerta acceso principal de oficina orientación y marcos de ventanas en oficina y aula profesores y ventanas. Se continúa con instalación de estructura metálica de soporte cobierta en orientación.
OBSERVACIONES: En comité de seguimiento del día 21/03/22. con interventoría, consorcio TIG aprueba intervención de marcos de ventanas, ventanas y puertas (mantenimiento) en aula profesores y orientación dado el nivel de deterioro. Así mismo aprueba una cobierta sobre placa de techo en baño orientación. y lacado de fachada en dicha área.

Arq Residente Obra | Consorcio TIG

23-Marzo-23 CLIMA: Día parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, 4 Ayudantes 1 Oficial, Maestro.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de teja tipo sandwich en orientación.

Consorcio TIG | Arq Residente de obra

24-Marzo-23 CLIMA: Se presentan lluvias de baja intensidad durante la mañana.
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, 4 Ayudantes, 1 oficial, Maestro
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación cobierta en área de aula orientación.
OBSERVACIONES: Interventoría solicita instalar manijas de ventanas en donde sea necesario en aula profesores y orientación.

Consorcio TIG | Arq. Residente de obra

Powered by CamScanner

25-Marzo-23 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, Maestro, 4 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con mantenimiento ventanas, instalación de vidrios en cambio de aquellos que estaban rotos, instalación de ununiyos y mantenimiento de marcos
Se recomienda tapar los palomeros bajo techo en los cubiertos terminados.

Asesor TIG Ayte Residente Obra

27 Marzo-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, Maestro, 4 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Soplete
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa mantenimiento de ventanas en orientación y puertas Se realiza retiene en placa de techo, parte interna en bruto orientación. subsanando o humedad.
OBSERVACIONES: Se solicita a interventoría programar entrega de Sala de profesores, puesto que sin habilitar dicha área no tendremos disponibilidad de otras áreas para intervenir.

Asesor TIG Ayte Residente Obra

28/Marzo-2023 CLIMA: Lluvia de media intensidad desde las 10:30am hasta las 12:19pm
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, Maestro 4 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza mantenimiento de carpintería metálica en orientación.
OBSERVACIONES: Se realiza entrega a satisfacción de las intervenciones internas y cubierta en aula profesores a interventoría.
Interventoría autoriza pintura muros internos de orientación. Impermeabilización con manto y dejar en donde más larga

en baño de orientación.

Consorcio TIG

Ing. Residente de obra

29-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente nublado

RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, Maestro General, 3 Aydantes

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con mantenimiento de carpintería metálica y estructura metálica de soporte en deportes, Corredor frente música.

30-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente nublado

RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, Oficial, 4 Aydantes

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor


ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza mantenimiento de estructura metálica de soporte cobertura corredor frente a música y deportes.

31-Marzo-2023 CLIMA: Soleado

RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, Oficial, 4 Aydantes

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza mantenimiento estructura metálica soporte cobertura en corredor. Se realiza instalación de canal en lámina galvanizada Cal. 22.




Longitud total 0.93 m

observaciones: Se realiza entrega a satisfacción de oficina orientación a interventoría y a la institución educativa.
Se realiza acta de recibido de condiciones con los que fue entregado el día de hoy el aula de música y auditorio.
Interventoría aprueba mantenimiento de ventanas y puerta en música, cambio de vidrios roto en esta área.
Contratista expone que en auditorio, dada la altura y ángulo del auditorio, NO es funcional instalar paneles led 120x30, se proponen luminarias industriales UFO 200w.
En aula de música, la institución solicita incluir un punto de voltaje de 220V, interventoría manifiesta que se analizará la alternativa, se informará si se aprueba o nó.

7-Abril-23 CLIMA: Parcialmente nublados
RECURSOS HUMANOS: Maestro, 4 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia, mantenimiento estructura metálica soporte en música.

13-Abril-2023 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Maestro, 4 Ayudantes, Ing Residente
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: se realiza mantenimiento de estructura metálica soporte música, Mantenimiento ventanas en parte exterior aula proyectores

4-Abril-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado.
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, 4 Ayudantes obra
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta y equipos
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de platinas y pernos de anclaje para soporte metálico de cubierta



Se realiza mantenimiento ventanas en aula profesores, area externa.

5-Abril-2023 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, 4 Ayudantes Obra
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta y equipos Menores
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realizo instalación de estructura metálica de refuerto a estructura soporte cubierta en música.

10-Abril-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, 4 Ayudantes obra
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia desmonte de tapa de concreto cemento en aula música y pasillo frente a música. Se continúa con instalación de estructura metálica de soporte cubierta en música.

Powered by CamScanner

11-Abril-23 CLIMA: Presencia lluvia de media intensidad intermitente
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, Ing. SISO, Maestro 4 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa desmonte de teja existente en cubierta en música. Mantenimiento estructura metálica soporte cobertura en música.


12-Abril-2023 CLIMA: Lluvia de media intensidad intermitente.
RECURSOS HUMANOS: SST, Ing. Residente, Maestro, 4 Ayudantes.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con Mantenimiento estructura metálica soporte Cobertura posible. En el área de música se inicia a realizar instalación de teja: standing seam.

13-Abril-2023 CLIMA: soleado
RECURSOS HUMANOS: SST, Ing Residente, Maestro, 4 Ayudantes.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación teja standing seam en música y pasillo frente a música.


14-Abril-2023 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: SST, Ing. Residente, Maestro, 4 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación teja standing seam en música.

Powered by CamScanner


15 Abril-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente SST, Maestro General, 4 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa desmonte teja asbesto cemento. Acopio de cubierta desmontada en punto temporal para posterior disposición final.



17 Abril-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro General, 4 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa desmonte de teja asbesto cemento en ala contigua a mística.



18-Abril-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, 4 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de tubería eléctrica EMT, cableado (circuitos) (caminarios en Mística.



Powered by CamScanner

19-Abril-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 4 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza desmonte cubierta en bodega segundo piso auditorio.

20 Abril-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: SST, Maestro General, Ing. Residente, 4 Ayud
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor,
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación teja standing seam ala 1 auditorio.

21-Abril-2023 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ingresidente, SST, Maestro General, 4 Ayudante
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación teja standing seam ala 1 auditorio

22-Abril-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro General, 4 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herra menor.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación teja standing seam ala 1 auditorio y deportes. Instalación redes a nivel de cubierta.

Powered by CamScanner

BITÁCORA COLEGIO DISTRITAL REINO DE HOLANDA SEDE A

15/03/2023	se presento emergencia electrica, con lo cual se hizo revisión de las redes diagnosticado un corto en el area del techo lo que no tuvo relacion con el area intervenida. Firma. Ing Miguel Arch PamelaB
16/03/2023	se hacen los resanes de los muros para las cubiertas, sin embargo se suspenden labores de desmonte y suministro de la cubierta por la jornada de hoy debido a que no se autorizo la entrada de los vehiculos del personal Firma.
17/08/2023	se realizaron labores de refuerzo y soldadura de las platinas ubicadas en el pasillo entre las aulas. se continua con el desmonte y suministro de la cubierta. Firma: Ing Miguel Arch PamelaB
18/03/2023	se realizaron labores de afinación de los muros para complementar la cubierta. y se realizo el resane del la canal ubicada en el pasillo se continua con las actividades de desmonte y suministro de cubierta Firma. Ing Miguel Arch
21/03/2023.	se continuan actividades de instalacion de cubierta en ala 1. y rematar de cubiertar, tambien se continuan activadades de resanes y replanteo de red electricas., (desmonte de red electrica, bajo cubierta) Firma. Ing Miguel Arch PamelaB.
22/03/2023	se inicioron las labores de pintura de las aulas y se continua con el suministro de la cubierta, asimismo se realizaron labores de resane en las zonas donde eran requeridos. Firma. Ing Miguel Arch PamelaB
23/03/2023	se continua con las labores de pintura de las aulas y las labores de resane, estucado y afinado de los muros. se continua con las actividades de suministro y desmonte de la cubierta. Firma. Ing. Miguel Arch PamelaB

Powered by CamScanner

24/03/2023	se aprueba por parte de la interventoria el cambio de las puertas y el destrangue de los pisos con la finalidad de dar continuidad a las actividades de mantenimiento, se finalizan las actividades de desmonte y suministro de las cubiertas en las aulas 305, 306, 307 y 308. y se continua con actividades de pintura. Firma. Pamela B
25/03/2023	se inician con las actividades del suministro de las ventanas de los salones intervenidos, se continuan con las actividades de pintura de las aulas. Pamela B.
27/03/2023	El pasado 24 de marzo por parte de la interventoria se solicito acta de entrega de las ventanas, vidrios y material electrico desmontado el cual no fue atendido por parte de los directivos porque eran mas de las 2:30pm, se realizo a esta hora debido a las restricciones de movilidad de materiales en la institución, sin embargo el dia 25 de marzo, sin presencia de la interventoria; sacaron de la obra el material y lo depositaron en nuestro lugar de acopio. Firma: PamelaB.
28/03/2023	Se realiza comite de seguimiento y se exponen las propuestas de baño para su eleccion.. Se autoriza el diseño opcion 1 el cual es el baño mixto por piso. y se solicita proyeccion de enchapes neutros, (cobres) se solicita correr cerramiento del acopio asignado, (revisar acta No). PamelaB. Dospues de dicho comite, se cambia la directriz de cambio de puertas. se hara mantenimiento y se pintaran las existentes y se procede a entregar en el menor tiempo posible el area intervenida.
29/03/2023	Firma: PamelaB ↳ se inician actividades electricas, se continuan actividades de acabado e instalacion de ventanas. Firma: PamelaB

Powered by CamScanner

30/03/2023	Se continuan actividades de acabado y pintura, se continuan actividades electricas y se inicia instalación de vidrios de ventanas. Firma: Firma
31/03/2023	Se continuan actividades progrimadas, acabado y pintura, electrico, e instalación de vidrios Firma: Firma
01/04/2023	se inician instalación de rejillas y se inicia actividad de pulida de piso. y se continuan actividades de pintura y electrico. Firma: Firma
02/04/2023	Se labora en pulida de piso Firma
03/04/2023	Se continuan actividades electricas y de pintura en aulas e instalación de rejillas. Firma Firma
04/04/2023	Se finaliza instalacion de aluminio, vidria y rejilla. Se inian actividades de pintura en puertas existente Firma:
05/04/2023	Se continuan actividades electricas y de Pintura en aulas intervenidas Firma: Firma
10/04/2023	Se continuan actividades de pintura y electricas y Finalizan pintura y masilla de puertas amarillas. Firma: Firma:
11.04.2023	Se procede con pintura de pasillo color gris plata. y se continuan actividades electricas. Firma: Firma:
12.04.2023	Se continua pintura de pasillo y desmonte de puertas del pasillo para ingreso a aulas Firma: Firma:
13.04.2023	Se realizan actividades de acabados. resanes de carteras y actividades electricas. Firma Firma:

14.04.2023	Se finalizan actividades de acabados y se realiza jornada de aseo y limpieza, se continuan actividades electricas y se inicia ultima sesion de pulida y destronque de piso. Firma: Firma: AHCG
15.04.2023	Se continua actividad de destronque y pulido de piso. Firma Firma: AHCG
17.04.2023	Se continuan actividades de destronque y pulida de piso y finalizando instalacion de lamparas led 30x120. AHCG
18.04.2023	Se realizan retoques de pintura y se finaliza el destronque y pulida de piso. se realiza levantamiento de riel y se sella con un mortero. Firma:
19.04.2023	Se realiza limpieza de canales correspondientes al area de trabajo y se solicita revision para programacion de entrega del area por parte de interventoria: Firma
20.04.2023	Se realiza jornada de aseo y limpieza y se realizan detalles solicitados por interventoria. Firma
21.04.2023	

Powered by CamScanner

BITÁCORA COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA

21/Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Oficial obra, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor,
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con relleno y compactación de B-400 para corredor 33 y aula 32 en edificio 2.

Ing Residente de obra

Consorcio TLG

22 Marzo-2023 CLIMA: Lluvia de 3:56 a 4:50 pm
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, Oficial, Maestro, 2 Ayudantes.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa relleno y compactación de B400 en corredor 33 y aula 32: Se inicia demonte de puertas y marco en aulas edificio 2.
OBSERVACIONES: Interventoría aprueba demolición de alistado y terminado de piso en área a intervenir edificio 2 piso 1 aulas, tras analizar las opciones planteadas por Consorcio MMOP puesto que para la instalación del piso tipo vinilo Mini de 116 Flexys la superficie sobre la cual se va a emplazar debe estar en optimas condiciones y niveles, de no ser así, para instalar el piso sobre ella enchape existente, se proyectará en el vinisol los desniveles que tenga la superficie existente; Teniendo en cuenta dichas consideraciones se podría instalar un material autonivelante ó hacer demolición de acabado y alistado de piso para emplazar un alistado de piso sobre el cual se instalará el piso vinílico.
La interventoría solicita la presentación de la justificación técnica del autonivelante y su impacto sobre el presupuesto.

Ing Residente de obra

Consorcio TLG

23-Marzo-23 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, Oficial, Maestro, 2 Ayudantes.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa demolición de alistado de piso en aulas edificio 2 piso 1. Se avala la demolición para ofrecer garantías de estabilidad de la obra y posibles (futuras) contratistas por el estado de la existente.

Consorcio TIG

24-Marzo-23 CLIMA: parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, Sst, Oficial, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia demonte de policarbonato en Domo 2 piso 1 de Edificio 2. Mantenimiento estructura metálica soporte de domo. Instalación de Policarbonato para domo.

Consorcio TIG

25-Marzo-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, Oficial, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza retiro de material de demolición a botadero. Se continúa demolición alistado de piso en aulas edificio 2 piso 1..

Consorcio TIG

27 MARZO 23 CLIMA: Soleado
OBSERVACIONES:
Se reitera al contratista la necesidad de arreglar el cerramiento, debido a que los alumnos de la institución frecuentemente ingresan a la obra.
Inspector Inst.

RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, Maestro, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor

ACTIVIDADES REALIZADAS: Mantenimiento estructura soporte cubierta domo. Se realiza instalación de 2 en 1 blanco mate, Lijado, Limpieza con Thinner corrector 33. Se recomienda la limpieza y lijado con mayor esmero antes de ingresar pinturas.

Consorcio TIG.

28-Marzo-2023 CLIMA: Lluvias de alta intensidad de 8:00 am - 10:23 am
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, Oficial, Sst, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación policarbonato en domo corredor 33 Mantenimiento e impermeabilización de canales. Se solicita verificar el estado de los desagües (zoscos) canales, por coincidencia de filtraciones en el área de los Baños ed. 2.

Consorcio TIG.

29-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, Oficial, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza mantenimiento cuarto estructura soporte cobertura.
OBSERVACIONES: Se realiza ensayo de densidades a material de relleno y compactado en calle 32 y corredor 33. Subbase B400.
Se realiza entrega de 18 luminarias, 5 marcos de puertas y 5 puertas metálicas de acceso edificio 2 piso 1 y la institución educativa para el aprovechamiento manifestada la solicitud por parte del colegio.

Consorcio TIG.

30-Marzo-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, Oficial, 5 Ayudantes.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: ~~Herramienta menor~~ Operador.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con mantenimiento de canales.

Se realiza instalación de concreto de 3000 PSI reforzado con malla electrosoldada de 6mm 15x15 para placa de contrapiso de 15 cm en aula 32 y corredor 33 en edificio 2 piso 1. Se solicita evitar realizar mezclas con la calle.

Consorcio TIG

31-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Oficial, 4 Ayudantes
HERRAMIENTA MENOR: Herramienta menor.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua instalación de domo en policarbonato 6mm en corredor 33, mantenimiento estructura soporte cubierta. Se inicia instalación de alistado de piso en aulas primer piso edificio 2. Se solicita revisar desnivel de las aulas y fijar soluciones para el chaqueo de niveles. (pendiente todas aulas)

Consorcio TIG.

1-Abril-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Oficial, 3 Ayudantes obra.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua instalación de policarbonato en domo corredor 33, instalación de alistado de piso en aulas Edificio 2, piso 1.

Consorcio TIG

3-Abl-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Oficial, 2 Ayudantes obra, SST, Residente obra
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua instalación de domo en policarbonato, mantenimiento de canales.
OBSERVACIONES: Contratista propone instalación de bajante justo en vértice de canal domo docentes, dado que el desnivel de la canal existente va en dirección al interior de Edificio y en el cambio de dirección de la bajante se queda empozado el material de escorrentía

situación que colmata y hace rebosar la canal, dejando una película de agua que se filtra al terreno y el pozo 33.

Consorcio TIG

4-Abril-2023 CLIMA: Parcialmente nublado
PERSONAL: Maestro, SST, Ing Residente, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa mantenimiento canales. Se continúa instalación alistado de paso. En acta 28 se identifica instalar alistado superior a 7cm con malla electrosoldada, dado el desnivel que tiene la placa contorte.
OBSERVACIONES: Interventoría aprueba instalación de alistado de paso superior a 4cm con malla electrosoldada. La recomendación se sustenta en la necesidad de evitar las fisuras por $e \geq 0,07$ m en los morteros de alistado.

Consorcio TIG.


5-Abril-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
PERSONAL: SST, Ing Residente, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación alistado de paso superior a 4cm con malla electrosoldada.
Se avala por los asesores encontrados en campo; sobre las franjas medias del acta en el sentido del corredor en el edificio 2.


Consorcio TIG.

8 Abril-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
PERSONAL: SST, Ing. Residente, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación alistado de paso.


Consorcio TIG


10-Abril-2023 CLIMA: Lluvias de media intensidad durante toda la mañana.
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Oficial, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Se continúa con mantenimiento canales y estructura soporte domo. Se realiza instalación alistado piso.






11-Abril-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Oficial, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES RENCANDAS: Se realiza instalación alistado de piso superior a 4cm con malla electrosoldada. Se finaliza instalación de domo policarbonato en corredor 33.





12-Abril-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro General, Oficial, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Se recibe estructura metálica. Se inicia replanteo y localización de acuerdo a diseño estructural.
OBSERVACIONES: Se socializa con interventoría la ubicación de una de las columnas la cual intercepta en marco de mueble madera en muchos en cada 30. Se discute posibilidad de hacer el corte en el marco de madera e instalar allí la columneta metálica. Interventoría resuelve considerar la opinión de la institución sobre dicha intervención, se consulta con Rectora de la intervención planteada. quien manifiesta que no habrá inconveniente en la intervención proyectada. Interventoría autoriza la instalación de estructura metálica acorde a lo planteado por contratista.



13-Abril-2023 CLIMA: soleado

RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SISO, Maestro General, 4 Ayudantes.

HERRAMIENTA MENOR: Herramienta menor

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación 3 en 1 en estructura metálica a instalar para refuerzo. y anclaje de cobertura termoacustica. Se inicia instalación de platinas 20x20cm en la parte interna de ala 3 para anclaje de columnetas metálicas de acuerdo a diseño estructural. Se inicia demolición de concreto en anden, en ala 3, para instalacion de concreto en pedestales para anclaje de columnetas metalicas. Se realiza corte, figurado y amare acero refuerzo para pedestales y zapatas.

ACG
Consorcio TIG.

14-Abril-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado

RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SSO, Maestro General, 4 Ayudantes.

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia desmonte de teja ondulada de asbesto cemento en ala 29. ala 3 edificio 2. Piso 1. Se realiza instalación de platina sobre cercha para anclaje teja standing seam. Se realiza instalación de estructura metalica soporte columnetas metálicas internas. en ala 3. con platina de anclaje a placa 20x20cm.

OBSERVACIONES: Se presenta lluvia de media intensidad desde las 11:10 a.m. intermitentes.

15-Abril-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado

RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro General, 4 Ayudantes

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa instalación de estructura metálica soporte cobertura, Desmonte teja existente.

17-Abril-2023 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 3 Ornamentadores, 2 oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: se inicia instalación alistado piso en corredor 33. Se continúa instalación estructura metálica soporte cubierta ala 3. edificio 2 piso 1 y se realiza instalación teja standing seam.

18-Abril-2023 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, 3 Ornamentadores, 2 oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: se realiza instalación teja standing seam instalación alistado de piso corredor 33. Instalación estructura metálica soporte cubierta.
OBSERVACIONES: se presentan fuertes lluvias desde las 12:30 pm que condicionan avance de ejecución.

19-Abril-2023 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 3 Ornamentadores, 1 Ayudante
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: se continúa instalación estructura metálica soporte, demonte cubierta existente, instalación teja standing seam.

20-Abril-2023 CLIMA: Lluvia de alta intensidad de 1:15 pm a 3:17 pm
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, 3 ornamentadores, ayudante 0
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa instalación estructura metálica de soporte cubierta. Demonte de teja asbesto cemento. aula 30.
OBSERVACIONES: Se realiza recorrido con dirección interventoría, y se analiza la propuesta de dejar en aula 32 una puerta basculante con una sección de cuerpo fijo. Interventoría avala la instalación de Mortero (Rinete) de 10cm en donde se va a instalar rinconera PVC y media caña en piso unido.

21-Abril-2023 Supervisión Noloritta movimiento de tablero de tacos en aula 32 para evitar obstrucción con la estructura metálica que se está instalando de soporte cubierta. Cambio por tablero de 12 breakers.

BITÁCORA COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN

Jueves 16 de marzo de 2023
Se continua con actividades de encorozado de cubierta en aula 2. A la fecha no se cuenta con aprobacion de distribucion arquitectonica de baños, esto atrasa las actividades programadas para esta área.

PAMELA BELTRÁN

Viernes 17 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 residente de interventoria, 1 oficial y 1 ayudant de obra, 1 electricista.
Se continua con actividades de encorozado de cubierta en aula 2. Se recibe material electrico en obra.

PAMELA BELTRÁN

Sabado 18 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayudante.
Se culmina actividad de encorozado, se inicia actividad de estuco en area donde se realiza encorozado, para posterior actividad de pintura en esta área.

PAMELA BELTRÁN

Domingo 19 de marzo de 2023
No se realizan actividades de obra, día festivo.

PAMELA BELTRÁN

Lunes 20 de marzo de 2023
No se realizan actividades de obra, día festivo.

PAMELA BELTRÁN

Powered by CamScanner


Martes 21 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayudante, 2 electricistas.
Se realizan actividades de estuco y pintura en parte superior de muros, se inician actividades de tubería EMT a la vista en aulas y pasillo.



Miercoles 22 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial, 1 ayudante y 2 electricistas
Se realizan actividades de estuco y pintura en parte superior de muros y vigas, se continua con actividades de tubería EMT a la vista en aulas y pasillo



Jueves 23 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial, 1 ayudante y 2 electricistas
Se realizan actividades de pintura y aseo en parte Superior de muros y vigas, Se continua con actividades de tubería EMT y cableado en aulas y pasillo.



Viernes 24 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial, 1 ayudante y 2 electricistas.
Se culmina actividades de pintura en parte superior de muros y vigas, Se culmina actividades de tubería EMT y cableado en aulas y pasillo, junto con la instalación de luminarias,

interruptores y tomas.
Se recibe por parte de la SED planos arquitectonicos de baños, se evidencia que no se contemplan la ubicacion de puntos existente lo cual implica en actividades de demolicion de placa de contrapiso y entrepiso, lo cual no esta contemplado en el presupuesto aprobado. Se realiza la observacion a la Supervision y se programa reunion en Sit para revision.

Sabado 25 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 oficial, 1 ayudante.
Se realizan actividades de resane de pintura en aulas.

Domingo 26 de marzo de 2023
No se realizan actividades de obra, dia festivo.

Lunes 27 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 oficial.
Se realiza actividades de resane de pintura y aseo general en aulas y pasillo. Se programa entrega de espacio para el inicio de actividades en otra área. No se recibe personal de la SED para definir el alcance de baños.

Powered by CamScanner

Martes 28 de marzo de 2023

Personal en obra: 1 inspector, 1 oficial

Se realizan actividades de resane de pintura y aseo general en aulas y pasillo. Se ingresa a la sala de sistemas y aula aledaña, en donde se procede a realizar actividades de cambio de cobertura, Se manifiesta que no es posible realizar movimiento de los equipos y muebles instalados, se manifiesta por parte del Consorcio vía BP que no se hace responsable por los equipos.

Miercoles 29 de marzo de 2023

Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial, 2 electricistas

Se realiza instalacion de 2 tomas adicionales en las aulas a entregar, por solicitud de la instalacion y aprobacion de la supervision.

Jueves 30 de marzo de 2023.

Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 director de interventoria, 2 residentes de interventoria, 1 inspector de obra interventoria y 1 ayudante

Se realiza entrega de 2 aulas en el costado occidental del piso 3 en las cuales se realizo cambio de cubierta, instalaciones electricas y pintura de la parte superior. Se recibe a satisfaccion por parte del rector de la institucion. Se realiza solicitud de reubicamiento de vigas en area de escaleras y se realiza solicitud de incluir cambio de piso en sala de sistemas.

La interventoria da viabilidad a la intervencion de baños con la propuesta enviada por el consorcio el 28 de febrero de 2023 y a su vez viabiliza los acabados presentados mediante oficio TIG-MEM-116 del 30 de marzo de 2023, sin embargo,

Powered by CamScanner

Se espera aprobación de precios unitarios de acabados por parte de la SED, ya que las dimensiones del item contractual estan descontinuadas.
Se da inicio a la actividad de pintura de estructura existente en area de sistemas y aula aledaña.

31 de marzo de marzo 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 4 instaladores de cubierta.
Se continua con actividad de de pintura de estructura metalica existente y se espera llegada el dia de hoy de perfileria para reforzamiento de la estructura segun recomendaciones del ingeniero estructural

Sabado 01 abril de 2023
Personal en obra: 4 instaladores de teja.
Se realiza instalacion de perfileria metalica para reforzamiento de estructura de cubierta de acuerdo con recomendacion del ingeniero estructural, Se realiza pintado de la misma para posterior cambio de cubierta

Domingo 02 abril de 2023
No Se realizan actividades en obra, dia festivo.

Powered by CamScanner

Lunes 03 de abril de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 instaladores de teja
Se continua con actividades de instalacion de perfiles metalicos y pintura de los mismos, para cambio posterior de cubierta.

Martes 04 de abril de 2023
Se esta a la espera de la llegada de material de cubierta para iniciar actividad de desmonte e instalacion.
No se tiene respuesta por parte de la SED con respecto a la actividad no prevista de enchape enviado por parte de la interventoria el 30 de marzo de 2023.

Miercoles 05 de abril de 2023
Se esta a la espera de la llegada de material de cubierta para iniciar actividad de desmonte e instalacion

Jueves 06 de abril de 2023
No se realizan actividades por dia festivo.

Viernes 07 de abril de 2023
No se realizan actividades por dia festivo.

Powered by CamScanner

Sabado 08 de abril de 2023.
Se esta a la espera de la llegada de material de cubierta para iniciar actividades de desmonte y instalacion de esta.

Domingo 09 de abril de 2023
No se realizan actividades en obra por dia festivo

Lunes 10 de abril de 2023
Se esta a la espera de la llegada de material de cubierta, no se realizan actividades en obra.
No se tiene respuesta por parte de la SED con respecto a las actividades no previstas de enchape, enviado por parte de la interventoria el 30 de marzo de 2023.

Martes 11 de abril de 2023
Se esta a la espera de la llegada de material de cubierta, no se realiza actividades en obra en frente costa oriental y área baños, costado occidental.

Miercoles 12 de abril de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 4 instaladores de cubierta.

Powered by CamScanner

Se recibe material de cubierta del costado oriental de la institucion, bloque primaria, Se inicia el desmonte y montaje de cubierta tipo sandwich en pasillo.

Jueves 13 de abril de 2023

Personal en obra: 1 inspector de obra, 4 instaladores de cubierta.

Se continua con actividad de desmonte de cubierta en asbesto cemento, para posterior reemplazo e instalacion de teja tipo sandwich. Se realiza Socializacion con el diseñador arquitectonico de la secretaria de educacion con respecto a la distribucion de baños, el cual Solicita Se mantenga una medida estandar entre sanitarios, Se indica que se puede realizar Sin inconvenientes en los puntos con distancias no mayores a 3centimetros, y para aquellos con mayor distancia, el contratista realizara apique en placa para definir Si es posible hacer el cambio total de la red hidrosanitaria.

Viernes 14 de abril de 2023

Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 director de obra, 1 maestro, 1 oficial, 4 instaladores de teja.

Se culmina actividad de desmonte y montaje de cubierta tipo Sandwich en pasillo y Se procede con la actividad en aula 1. Se realiza apique en placa de entre piso de piso 2, se observa que se presenta placa superior, caseton y placa inferior, no se recomienda la demolicion total de la placa ya que el costo y tiempo no son contemplados inicialmente además del daño estructural en elementos estructurales

existentes, se opta por mantener los puntos y realizar ajuste de punto en aquellos puntos con variacion de 2-3 cm, aquellos con mayor variacion se opta por demolicion parcial de placa superior y modificacion de tuberia sanitaria, la red de suministro si se realizara nueva desde el registro de entrada.

Sabado 15 de abril de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 4 instaladores de cubierta.
Se culmina desmonte en instalacion de cubierta tipo sandwich de aula 1 y se procede con Sala de Sistemas.

Domingo 16 de abril de 2023
No se realizan actividades de obra, día Festivo.

Lunes 17 de abril de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 4 instaladores de cubierta.
Se inicia actividad de desmonte e instalacion de cubierta tipo Sandwich en aula de sistemas

Martes 18 de abril de 2023.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 3 instaladores de cubierta
Se culmina desmonte e instalación de cubierta tipo Sandwich
Se realiza replanteo en barros con la planimetría aprobada y se inician demoliciones de placa superior para realizar modificación de puntos

Miercoles 19 de abril de 2023.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial de plomería y 1 ayudante.
Se realiza demolición de placa superior y regatas en paredes y piso para cambios de tubería sanitaria y agua potable. No se tiene a la fecha aprobación por parte de la SED en cuanto a los apalisis de precios unitarios enviados por la interventoría el 30 de marzo de 2023.

Jueves 20 de abril de 2023
Personal en obra: 2 oficial, 1 ayudante de plomería, 1 electricista y 1 ayudante
Se continua con actividad de demolición de placa para cambio de puntos sanitarios y agua fria. Se inica actividades de tendido de tubería EMT en aulas.
Se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde.

Viernes 21 de abril de 2023.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial, 1 ayudante de

Powered by CamScanner

BITÁCORA COLEGIO DISTRITAL LICEO FEMENINO DE CUNDINAMARCA MERCEDES NARIÑO

BITACORA OBRA LICEO FEMENINO.
Fecha de inicio 27-02-2023
contrato No: Obra:
Contrato de Interventoria.
Alcance: Adelantar obras de adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo de espacios de laboratorios para la adecuación del bachillerato internacional
Dirección av caracas # localidad Rafael Uribe Uribe.
Areas a intervenir: Laboratorio Fisica, Laboratorio Biologia Laboratorio Quimico. salon Tecnologia 2. Demoliciones varias, (adecuacion general pisos, pintura, cielos) y elaboración de cuarto de Fotografia

Fecha 27/02-2023
Inician actividades de demolicion en laboratorio Fisica 2 ayudant e ingresamos / perfor para ejecutar.
Firma: Luis Miguel Pamela B
Fecha 28/02-2023
Se continuan actividades de demolición. y desalojo de escombros
1:1
Firma:
Fecha 01-03-2023
Se continuan actividades de demolicion y desalojo a punto de acopio.
Firma. Luis Miguel Pamela B
Fecha 02-03-2023
Se continuan actividades en el laboratorio de Biologia. y se ingresa otro personal 1 ayudante.
Firma. Luis Miguel Pamela B
Fecha: 03-03-2023
Se realiza recorrido con secretaria de educación para revisar alcance de obra. se solicita un cronograma de actividades, incluir un ND de Black outs y realizar cotizacion con granito y otra alternativa y se da

Paso a iniciar otros espacios y se solicita tumbar muro existente
Firma: Luis Miguel Ardila Pamelas.
04-03-023
Se inicia con 3 ayudantes el traslado de material a acopio
Firma: Luis Miguel Ardila Pamelas.
06-03-203
Se programa volqueta para martes en la tarde para desalojos rcd. y se continua demolicion y limpieza de baños.
Firma Luis Miguel Ardila Pamelas.
07-03-2023
Se autoriza el ingreso de la volqueta con placas _____ para la evacuacion de escombros.
Firma: Luis Miguel Ardila Pamelas
Fecha. 08-03-2023
Se continuan labores de demolicion en aulas. laboratorio Fisica y Biologia.
Firma Luis Miguel Ardila Pamelas
Fecha 09-03-2023
Se solicita ingresar al laboratorio de quimica y la institucion nos lo habilita el dia lunes 13 de marzo y se continuan actividades de demolicion
Firma Luis Miguel Ardila Pamelas.
Fecha 10-03-2023
Se continuan labores de desalojo de escombro y se programa volqueta para desalojo en horas de la tarde.
Firma: Luis Miguel Ardila Pamelas.
Fecha 11-03-2023.
Se continuan labores de demolicion y se hace jornada de aseo.
Firma: Luis Miguel Ardila Pamelas.

Powered by CamScanner

	Fecha: 13.03.2023 Se continuan actividades de demolición, se evidencia en el laboratorio de Biología una placa flotante con refuerzo en malla se hace el respectivo relleno para ejecución de la nueva placa.. Se continuan actividades de desalojo de material y se inicia el trazado de niveles. Firma: Luis Miguel Cock Pamela B
14.03.2023	Observaciones por laboratorio: En el laboratorio de física se evidencian placas en concreto reforzadas en lavamanos. y en tarimas. y en mueble auxiliar lateral tambien se evidencia reforzamiento en placas. ·Laboratorio Biología: Tambien se evidencian Placas en concreto reforzadas en mezones, Tarima, mueble auxiliar y encontramos placa flotante en la mitad del salon apoyada en muros en ladrillo cada 1,5mt. y la otra mitad apoyada en relleno compactado y placa mortero. Se realizo relleno de 0,8mt. Laboratorio Quimica: Se realizo entrega el dia de hoy en horas de la mañana y se inicia demolición de mesones, se evidencia del mismo modo, placa reforzada. Firma Luis Miguel Cock Pamela B.
15.03.2023	Se hace recorrido con SED y se solicitan unas adiciones - cielo raso en salon Biología. en pvc instalado a nivel de viga, se solicita rejilla en aluminio (especificacion vant.). Definen pisos en porcelanato de 60x60 mate tipo urban o similar. para espacios de laboratorios. En el salon de Tecnología #2. determinan no demoler piso, se nivela sobre el existente y se instala piso tipo vinilico tarima, cambiar luminarias 30x120 y en el laboratorio de quimica, se define en

Powered by CamScanner

	porcelantato 60x60 mate tipo urban o similares. Se define altura del enchape de pared a 120ml Firma. Luis Miguel Cadena Pamelab.
16.03.2023	Fecha: Se continuan actividades de demolicion en laboratorio de quimica, se solicita a interventoria diseños electricos, hidraulicos. y los pertinentos para la entinua ejecución. Firma: Luis Miguel Cadena Pamelab.
17.03.2023	Se continuan actividades y se espera los diseños para continuar actividades de sobre piso. Firma: Luis Miguel Cadena Pamelab
18.03.2023	Se realizan actividades de desalojo de material y jornada de aseo y limpieza. (laboratorio Quimica). Firma. Luis Miguel Cadena Pamelab
20.03.2023	Dia festivo no se labora.
21-03-2023	Se realiza recoleccion de rcds en obra. y se continuan actividades de limpieza. Firma: Luis Miguel Cadena Pamelab.
22-03-2023	Se le refiere a la interventoria que por temas de garantias no podemos hacer la instalacion del vinilico como lo solicita SED y por parte de interventoria aprueban demolicion de enchape existente y correcta ejecucion del nuevo vinilico. por ende se inicia demoliciones en el salon de Tegnologia #2. Se realiza visita por medio del area ambiental de la SED y se verifica las actividades y propios. • Paola. Bromon- Prof. Ambiental DCEE Luis Miguel Cadena Pamelab.
23-03-2023	Se inicia demolicion aula Tecnologia 2 y se encuentra una patologia muy comun, "enchape sobre enchape". se hace registro fotografico y se remite a interventoria. el cual aprueban la continuacion de la demolicion para proceder a un buen proceso. relleno compactado, placa y sobre piso para enchape vinilico. Firma:

Powered by CamScanner

24-03-2023	Se continua a la espera de definicion diseños de laboratorios por parte de la SED, se continuan demoliciones en el area de tecnologia 2. Firma. Luis Miguel PamelaB.
25/03/2023	Se coordina jornada de aseo y limpieza. Firma:
27/03/2023	Se presenta un incidente con el pagistro presente en el laboratorio de quimica. lo cual es subsanado en las primeras horas de la mañana, Se envia registro fotografico del incadente resuelto. por otro lado envian Ficha de laboratorios por parte de SED y se hacen respectivos ajustes segun las condiciones actuales de obra. y se remite a interventoria. Firma: PamelaB.
28/03/2023	Se continuan laboes de desalojo de material en aula de tecnologia 2, y Firma: PamelaB.
29/03/2023	Se socaliza con interventoria diseños de laboratorios y se programa visita para dar autorizacion y linea sobre la ejecucion de laboratorios. Firma. PamelaB.
30/03/2023	Se realiza visita tecnica para evaluar las condiciones presentes en obra y asi tomar una determinacion frente a los niveles y diseños de laboratorios (Firma) Laboratorio de quimica se define renovar red electrica, sanitaria, hidraulica y gas. (se solicita que el instalador este certificado), se solicita instalacion sifones (2), incluir tapas en vanos existentes de superboard, incluir medias cañas en piso y ceramica. Laboratorio Fisica: renovar redes. igualmente externas. y laboratorio Biologia: renovar redes igualmente. se solicita impermeabilizar paretes para evitar humedades por vegetacion. se solicita una proxima visita para determinar el

	Ubicación de mesones. Firma: Firma:
31-03-2023	Se inician actividades de localización de tuberías y excavaciones manuales respectivas para las nuevas redes de desagües. en el laboratorio de química se fabrica caja de inspección para dejar las pendientes necesarias y funcionales. Firma: Firma:
01-04-2023	Se continúan actividades de excavaciones manuales. en el laboratorio de física se rehabilita caja de inspección ubicada en el acceso del laboratorio y se ubican los sifones solicitados por interventoría. Firma: Firma:
03-04-2023	Se continúan actividades en laboratorio de física y química y continuo se realiza relleno en aula de Tecnología mientras se evalúa la reubicación de mesones en laboratorio de biología. Firma: Firma:
04-04-2023 05-04-2023	Se continúan actividades de rellenos, excavaciones y adecuación de redes en los 3 laboratorios y aula de Tecnología. Firma: Firma:
Semana Santa.	Jueves. Viernes Santo no se labora.
08-04-2023	Se realiza jornada de evacuación de RCDS y limpieza en áreas de trabajo, y se inician resanes Firma: Firma.
10-04-2023	Se inician actividades de. paretes. en aula de química y se continúan excavaciones manuales y demolición pared para salida de tubo de 3". (conexión a redes existentes) Firma: Firma:
11-04-2023	Se inician actividades de compactación. con recebo. Firma Firma:

Powered by CamScanner

12-04-2023	Se continuan actividades de localizacion de redes hidraulicas y sanitarias, y compactacion con rana en laboratorio de Fisica. Firma: Firma
13-04-2023	Se continuan actividades de pañetes, resanes y compactac con rana, y se avanza a diseño del lab de Biologia por la SED. Firma: Firma:
14-04-2023	Se inicia excavaciones en laboratorio de Biologia y se continuan actividades de compactacion en los otros espacios. Firma Firma.
15-04-2023	Se realiza jornada de aseo y limpieza en todas las areas intervenidas. Firma: Firma:
17-04-2023	Se inicia adecuacion de acopio de material para ejecucion de las placas de concreto de los laboratorios, se realizara mezcla in situ debido a las condiciones y cantidades de obra en ejecucion. Firma:
18-04-2023	Se Finaliza excavaciones y adecuaciones de la Tuberia sanitaria en cada laboratorio, se Finalizan cajas y tapas de inspeccion, continuo a ello se realizan paretes impermeabilizados en algunos sectores con malla vencida por el espesor debido al desplome de muros existentes. Firma:
19-04-2023	Se continuan actividades de parete y continuo se realizan excavaciones y adecuacion de rede hidraulicas en laboratorios y adicional se realiza traslado de material granular al acopio adecuado. Firma:
20-04-2023	Se continuan actividades de parete impermeabilizado renivelacion y adecuacion de placas para actividad de concretos y se revisa el tema de redes de gas Firma

Powered by CamScanner

Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe	CONTRATO No CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022 - ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

BITÁCORA COLEGIO DISTRITAL SANTA LUCIA CAFAM

de agua, por lo que se decide no realizar nivelco en placa para incluir bajante. Se le recomienta a la institucion realizar mantenimiento con mayor frecuencia, toda vez que se evidencia hojas y material particulado en las bajantes.



Lunes 20 de marzo de 2023

Personal en obra: 1 inspector, 2 oficiales y 2 ayudantes

Se inicia actividad de resanado de pintura para pañete interno en bloque morado, se evidencian humedades en muros superiores y antepechos. Se aplican capas de pintura en esmalte en las zonas mas afectadas y vinilo en parte superior. Se continua con actividad de pintura en piso 2 del bloque verde.



Martes 21 de marzo de 2023.

Personal en obra: 1 inspector, 2 oficiales y 2 ayudantes.

Se realizan actividades de pañete y pintura en bloque morado en las areas faltantes y en aquellos donde se evidencian manchones en bloque morado. Se culmina actividad de pintura en bloque verde, area de pasillo piso 1 y 2, Se evidencia humedad en piso 1 en un area pintada, se realiza inspeccion y se evidencia que corresponde a manto levantado con poco tiempo instalado, lo cual indica que se tienen garantias de otro contratista, Se le hace el llamado a la entidad y no se interviene esta area.

Se inicia actividad de impermeabilizacion de superficies en cubierta del bloque rojo con emulsion asfaltica.



Powered by CamScanner

Miercoles 22 de marzo de 2023

Personal en obra: 2 oficiales y 2 ayudantes.

Se continua con actividades de pañete y pintura en blogre morado, Se aplica pintura en esmalte en antepechos donde se evidencian humedades. Se continua con actividad de impermeabilizacion de cubierta del blogre rojo, se evidencian tuberias que impiden la instalacion del manto, Se realiza desmonte e instalacion de las mismas. Se recibe visita por parte de la Secretaria de salud, se levanta la medida de cierre del blogre morado dado el cumplimiento de las medidas de seguridad y Sanidad.

Jueves 23 de marzo de 2023.

Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 2 oficiales y 2 ayudantes.

Se continua actividades de impermeabilizacion en blogre rojo, Se culmina actividades de pintura en blogre morado y se continua en actividades de impermeabilizacion de blogre morado en cubierta. Se procede a entregar el blogre morado a la institucion, sin embargo, no se recibe por detalles de pintura, el contratista se compromete a subsanar para entrega el dia de mañana.

Viernes 24 de marzo de 2023.

Personal en obra: 1 inspector de obra, inspector de interventoria, 2 oficiales y 2 ayudantes.

Se continua actividades de impermeabilizacion de

Powered by CamScanner

muros en cubierta del bloque rojo, de igual manera se continua con esta actividad en el bloque morado. Se realiza entrega del bloque morado (parte interna) a la rectora de la institucion y pasillo de bloque verde. La rectora deja salvedad de inconsistencias que corresponden al contratista anterior y zonas como "comedor", que no seran intervenidas por el consorcio MINEP, ya que no esta incluido en el alcance actual.

Sabado 25 marzo de 2023.
Personal en obra: 2 oficiales y 2 ayudantes.
Se continuan actividades de impermeabilizacion en muros perimetrales de bloque morado y bloque rojo simultaneamente.

Domingo 26 de marzo de 2023
No se realizan actividades en obra, Dia festivo.

Lunes 27 de marzo de 2023
Personal en obra: 2 oficiales y 2 ayudantes, 1 inspector de obra.
Se continua con actividades de impermeabilizacion de muros perimetrales de bloque morado y rojo simultaneamente.

Powered by CamScanner

Martes 28 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 oficiales y 2 ayudantes
Se continua con actividades de impermeabilizacion de muros perimetrales en bloque morado y rojo. Se presentan fuertes lluvias lo cual impide la continuidad de labores en las horas de la tarde.

Miercoles 29 de marzo de 2023.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 oficiales y 2 ayudantes.
Se culmina actividad de impermeabilizacion de muros perimetrales en bloque morado y se continua con esta actividad en bloque rojo.

Jueves 30 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 oficiales y 2 ayudantes.
Se culmina actividad de impermeabilizacion de muros perimetrales en bloque rojo y se procede a iniciar actividades de imprimacion de los muros a impermeabilizar. Se evidencia mal estado del policarbonato traslucido del bloque, al igual que la parte interna de la teja se encuentra doblada, lo que da a entender el deterioro de la teja y el aislante, la interventoria solicita reposicion de ela policarbonato que se encuentra ya permitiendo paso de agua.

Powered by CamScanner

Viernes 31 de marzo de 2023

Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayudante.

Se continuan actividades de impermeabilizacion de muros perimetrales en cubierta, Se realiza conversacion con la rectora de la institucion con el fin de coordinar la habilitacion de aulas para realizar actividades de parete y pintura. Se habilita aulas de bloque amarillo, el bloque rojo se coordinara despues de la Semana Santa.

Sabado 01 de abril de 2023.

Personal en obra: 1 oficial y 1 ayudante

Se continua con actividades de impermeabilizacion de muros perimetrales en cubierta en bloque amarillo. Se evidencia que las aulas aun cuenta con mobiliario y equipos de sonido.

Lunes 03 de abril de 2023

Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 oficial y 2 ayudante

Se inician actividades de raspado de pintura y parete, para posterior actividad de pintura en aulas. Se evidencia que el mobiliario se dispone en el centro del aula para no incomodar y algunos muebles fijados a muro no son retirados, los equipos de sonido y televisores si. Son retirados, se realiza recubrimiento de piso con carton y plastico para muebles.

Martes 04 de abril 2023.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 oficiales y 2 ayudantes
Se inician actividades de pañete y pintura en aulas de bloque amarillo y se continua con instalacion de manto asfaltico en el mismo bloque.

Miercoles 05 de abril 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 oficiales y 2 ayudantes.
Se continua actividades de pintura en aulas de bloque amarillo y se continua con instalacion de manto asfaltico en este bloque.

Jueves 06 de abril 2023
No se realizan actividades, dia festivo

Viernes 07 de abril 2023
No se realizan actividades, dia festivo

Sabado 08 de abril 2023
Personal en obra: 2 oficiales y 2 ayudantes
Se continua con actividades de pintura en aulas de bloque amarillo y se continua con instalacion de manto asfaltico en el mismo bloque.

Domingo 09 de abril 2023
No se realizan actividades, dia festivo.

Powered by CamScanner

Lunes 10 de abril de 2023
Personal obra: 1 inspector obra, 1 inspector interventoria, 1 oficial, 2 ayudantes
El contratista no cuenta con material para continuar actividad de impermeabilizacion de cubierta en el Bloque Amarillo Jhon R.
Se realiza actividad de pintura y limpieza de las areas intervenidad en bloque amarillo

Martes 11 de abril de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial, 2 ayudantes
Se inicia actividad de manto asfaltico en bloque azul, Se continua actividad de manto asfaltico en bloque amarillo y se continua en detalles de pintura en aulas en este bloque para entrega a la institucion y la interventoria.

Miercoles 12 de abril de 2023.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial, 2 ayudantes
Se realiza actividad de limpieza, y correccion de detalles de pintura en horas de la mañana ya que los estudiantes y la institucion requieren el uso del espacio, La actividad se continuara en la jornada de la tarde.
Se continua con instalacion de manto asfaltico en bloque amarillo.

Jueves 13 de abril de 2023.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial, 2 ayudantes
Se realiza actividades de remate de pintura en aulas de bloque amarillo en la tarde.

Powered by CamScanner

Se continua con actividad de manto asfaltico en blogue amarillo.

Viernes 14 de abril de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial, 2 ayudantes.
Se realiza limpieza de aulas de blogue amarillo. Se culmina actividad de manto asfaltico en este blogue. Se realiza montaje y fijacion de tuberia EMT desmontada para instalacion de manto y emulsion asfaltica.

Sabado 15 de abril de 2023.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial, 2 ayudantes.
Se culminan actividades de emulsion y manto asfaltico en blogue amarillo y se continua esta actividad en blogue azul.
Se culmina actividad de pintura y aseo en blogue amarillo para entrega a la institucion y la interventoria. Se toman medidas de cubierta de blogue amarillo de área traslucida ya que se cuenta en alto grado de deterioro.

Domingo 16 de abril de 2023
No se realizan actividades en obra, dia festivo.

Lunes 17 de abril de 2023.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 oficial, 2 ayudantes
Se realiza entrega del blogue amarillo a la institucion y la interventoria y se realiza acta de entrega una vez se revisa que todo este de acuerdo con el debido proceso ejecutado. Se continua con actividad de manto asfaltico en blogue azul.

Powered by CamScanner

Martes 18 de abril de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 2 ayudantes
Se continua con actividades de emulsion asphaltica y manto asphaltico en bloque azul. Se da inicio a la actividad de inspado, pared y pintura en bloque rojo como se coordino con la institucion.

Miercoles 19 de abril de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial, 1 ayudante
Se continua con actividad de impermeabilizacion con manto asphaltico en bloque azul. Se continua con actividad de pintura en bloque rojo.

Jueves 20 de abril de 2023
Personal en obra: 1 oficial y 1 ayudante
Se continua con actividad de impermeabilizacion con manto asphaltico en bloque azul. Se continua con actividad de pintura en bloque rojo. No se cuenta con aprobacion a la fecha para el cambio total de cubierta translucida en bloque amarillo. Se presenta fuertes lluvias en horas de la tarde.

Viernes 21 de abril de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial, 1 ayudante.
Se continua con actividades de pintura en bloque rojo. Se culminan actividad de instalacion de manto asphaltico en bloque azul. Se presentan fuertes lluvias en horas de la mañana.

Powered by CamScanner

Bogotá D.C., 28 de abril de 2023

2023_RUU_MGP_140

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Inicio actividades Colegio Marruecos y Molinos I.E.D.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicitamos definición del alcance de la intervención del colegio marruecos y molinos en cuanto a la impermeabilización de cubierta, toda vez que como se evidencio en el comunicado 2023_RUU_MGP_139 Diagnostico colegio Marruecos y Molinos I.E.D., enviado el 27 de abril de 2023, se encuentra afectaciones en toda la placa, por lo que se recomienda una intervención integral del espacio.

Por otro lado, se esta a la espera de los diseños de la tarima por parte de la secretaria de educación para presupuestar las actividades del proyecto.

Agradecemos su colaboración con el fin de iniciar actividades en la institución teniendo en cuenta los tiempos que se tienen para la intervención, teniendo en cuenta los compromisos con el representante del colegio.

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

Bogotá D.C., 29 de abril de 2023

2023_RUU_MGP_141

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Actividades no previstas.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicitamos mesa de trabajo entre las partes para revisión de las actividades no previstas detectadas por el contratista de obra, allegadas a la interventoría mediante los siguientes comunicados:

- **2023_RUU_MGP_038 - Entrega APU NP 01** del 08 de febrero.
- **2023_RUU_MGP_111 - Respuesta oficio TIG-MEM-094 – Análisis de Precios Unitarios No Previstos** del 29 de marzo de 2023.
- **2023_RUU_MGP_125 - Respuesta TIG-MEM-135 - OBSERVACIONES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NP 09-15** del 13 de abril de 2023.

Los cuales una vez revisado por parte de la interventora se han dado tramite mediante los siguientes comunicados:

- **TIG-MEM-115 VISTO BUENO PARA APROBACIÓN DE LA SED ITEMS NP 02 AL NP08 RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_111** del 30 de marzo de 2023
- **TIG-MEM-136 VISTO BUENO PARA SOLICITIUD DE APROBACIÒN POR PARTE DE LA**
- **SED ITEM NP 11** del 04 de abril de 2023
- **TIG-MEM-148 OBSERVACIONES No. 2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NP 09-14**
- **RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_125** del 19 de abril de 2023
- **TIG-MEM-157 CONSOLIDADO DE ITEMS NO PREVIOS PENDIENTES POR APROBACIÓN NP01 AL NP08** del 28 de abril de 2023

Sin embargo, se evidencia que actividades con el visto bueno por parte de la interventoría no han sido allegadas en el consolidado de ítems. Por consiguiente, requerimos mesa de trabajo con interventoría y la supervisión, para entregar el consolidado con las actividades no previstas, toda vez que estas están generando retrasos en la programación en algunos frentes de obra.

- NP 09 Suministro e instalación de mastico para pisos de vinilo (una capa)



Ilustración 1 Restrepo millan Sede B.



Ilustración 2 San Agustín Sede A.

- NP 08 Suministro e instalación de enchape blanco para baños 30x60cm



Ilustración 3. San Agustín Sede A - Baños piso 3.

Cordialmente,

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

Bogotá D.C., 02 de mayo de 2023

2023_RUU_MGP_142

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Remisión hoja de vida Técnico en Seguridad Industrial y Salud en el trabajo No. 4.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega de hoja de vida del profesional **KATYA ISABEL JULIO SILGADO**, para ocupar el cargo de **Técnico en Seguridad Industrial y Salud en el trabajo No. 4** para la ejecución de la obra en referencia

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2023

2023_RUU_MGP_146

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: **DISEÑO DE MEZCLAS 3000 PSI**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente CONSORCIO MIA GP adjunta diseño de mezclas de concreto para una resistencia de 3000 psi o 21 MPa. Dicha mezcla se elaboró a partir del análisis de granulometría del material que nos suministra el proveedor COLGRAVAS.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Diseño de Mezclas
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Bogotá D.C. 05 de mayo de 2023

Consorcio MIA GP
Obra: Consorcio MIA – Colegios Localidad
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bogotá

Asunto: Diseño de mezcla de concreto

Apreciado Ingeniero:

De manera atenta nos permitimos entregar los informes de laboratorio para la caracterización física de muestras de agregado procedentes de la cantera Horeb. Los informes están identificados con las referencias DPD-0570-21-1 hasta DPD-0570-21-9. A partir de los resultados obtenidos, se dosificaron dichos materiales para una mezcla de concreto para 21 MPa con un asentamiento de 152 mm. Las muestras fueron tomadas y enviadas por ustedes a nuestro laboratorio.

RESULTADOS

1. MATERIALES EMPLEADOS

- Cemento Hidráulico gris Argos tipo UG
- Arena de río cantera
- Grava tamaño máximo 19 mm
- Agua

1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS AGREGADOS

1.1.1. Granulometría: Ver gráficos anexos.

	Arena	Grava
1.1.2. Módulo de finura:	2,80	-----
1.1.3. Tamaño máximo mm:	-----	19
1.1.4. Tamaño máximo nominal mm:	-----	19
1.1.5. Contenido de materia orgánica (ensayo colorimétrico):	1	-----
1.1.6. Absorción %:	1,1	1,7
1.1.7. Densidad relativa (Gravedad Específica) (SH):	2,57	2,49
1.1.8. Densidad relativa (Gravedad Específica) (SSS):	2,59	2,53
1.1.9. Densidad relativa (Gravedad Específica) (Aparente):	2,64	2,60
1.1.10. Densidad volumétrica suelta sss (kg/m^3):	1620	1460
1.1.11. Densidad volumétrica apisonada sss (kg/m^3):	1770	1570
1.1.12. Vacíos en agregado suelto %:	37	42
1.1.13. Vacíos en agregado compacto %:	32	38
1.1.14. Equivalente de arena %:	49	-----

1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CEMENTO ARGOS TIPO UG

1.2.1. Densidad (g/cm^3): 2,831
1.2.2. Finura Blaine (cm^2/g): 5414
