CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.7

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. CO1.PCCNTR.4155718

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08).

PERIODO: DEL 20 DE JULIO DE 2023 AL 19 DE AGOSTO DE 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.7

PERIODO: DEL 20 DE JULIO DE 2023 AL 19 DE AGOSTO DE 2023

CONTRATANTE:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ D.C

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4155718
CONSORCIO TIG

“INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08).”

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645

CONSORCIO MIA GP

“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

VERSIÓN	CONTROL DE CAMBIOS
1	Documento Inicial

PRESENTÓ	APROBÓ
	
ING. JOHN ROCHA RESIDENTE DE OBRA	ING. EDISON RICARDO DUARTE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CODIGO	FECHA
TIG-FO-001	19-08-2023

1. Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 6
1.1.1. Localización y ubicación de territorios 6
1.1.2. Asignación de sedes 7
2. DESCRIPCION PRIMERA ETAPA, VISITA DIAGNÓSTICO 8
2.1. Información sedes primera etapa 8
3. INFORMACION ADMINISTRATIVA LEGAL 10
3.1. Información del contrato de interventoría 11
3.2. Información del contrato de obra 11
3.3 Relación de Correspondencia 12
3.4 Actividades de reunión 12
3.5 Informes Semanales 13
4. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO 14
4.1 Avance físico 14
4.2 Estado de ejecución de los frentes 14
4.3 Control de hitos 16
4.4 Avance financiero 17
5. INFORMACIÓN LEGAL Y PRESUPUESTAL 19
5.1 Contrato de obra – Control actas parciales de obra 19
5.2 Contrato de interventoría – Control actas parciales de interventoría 19
5. CONCLUSIONES 20
2. ANEXOS 21
ANEXO 1. INFORME BÁSICO 21
ANEXO 1.1. INFORME ADMINISTRATIVO 21
Anexo 1.1.1. Control de personal contratista 21
Anexo 1.1.2. Relación de correspondencia 21
Anexo 1.1.3. Actas de reunión 21
Anexo 1.1.4. Control de personal de interventoría 21
ANEXO 1.2. INFORME TÉCNICO 21

ANEXO 1.3. INFORME SST 21
ANEXO 1.4. INFORME AMBIENTAL 21

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de las metas definidas en el plan de desarrollo **"UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI" FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C"**, programa línea estratégica: 4 -inclusión educativa para la equidad, proyecto estratégico: ambientes de aprendizaje para la Vida, se incluyó oportunamente la intervención de obras menores y adecuaciones del cien por ciento de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos, buscando conservar y mejorar los espacios de los colegios ofreciendo espacios dignos de convivencia y que ofrezca las mejores condiciones para una verdadera educación de calidad, para las cuales también se hace necesario contratar el seguimiento, vigilancia y control de las actividades de obra por parte, de un tercero con las calidades técnicas, jurídicas y financieras del caso.

Teniendo en cuenta que, el proyecto anteriormente descrito, trata de la intervención de obra pública mediante actividades de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y la ejecución de obras menores, se hace necesario contratar una interventoría especializada dada la diversidad de actividades, frentes de trabajo y áreas técnicas involucradas en el desarrollo del mismo, situación para las que la SED no cuenta con el personal suficiente para realizar el respectivo seguimiento al proyecto en mención.

Para el grupo No. 8 se asignan 17 sedes a intervenir en mejoramientos que se encuentran en la localidad de Rafael Uribe Uribe, de los cuales, se tiene un diagnóstico inicial por parte de la secretaría de educación y a medida que se realicen las visitas con los contratistas de obra e interventoría, se va a hacer la priorización respectiva de las actividades para cada sede. Posterior a la delimitación de este alcance, se suscribió una adición de recursos para el contrato de obra, donde el mismo se amplió a 8 sedes más, completando así un total de 25 unidades.

El presente informe mensual No.7, comprende la recopilación de la información correspondiente al desarrollo del contrato de obra CO1.PCCNTR.4077645 durante el periodo del 20 de julio de 2023 al 19 de agosto de 2023.

1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El presente contrato de interventoría No. C01.PCCNTR.2749287 tiene por objeto: ***"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08)."***

Para el reconocimiento total del proyecto, se ha realizado en conjunto de todas las partes interesadas (SED, contratista, interventoría y personal administrativo de las sedes escolares), una serie de recorridos para identificación de necesidades prioritarias en atenciones integrales de adecuaciones y mejoramientos en: cubiertas, batería de baños, carpintería metálica, acabados generales, canchas deportivas y zonas exteriores.

1.1.1. Localización y ubicación de territorios

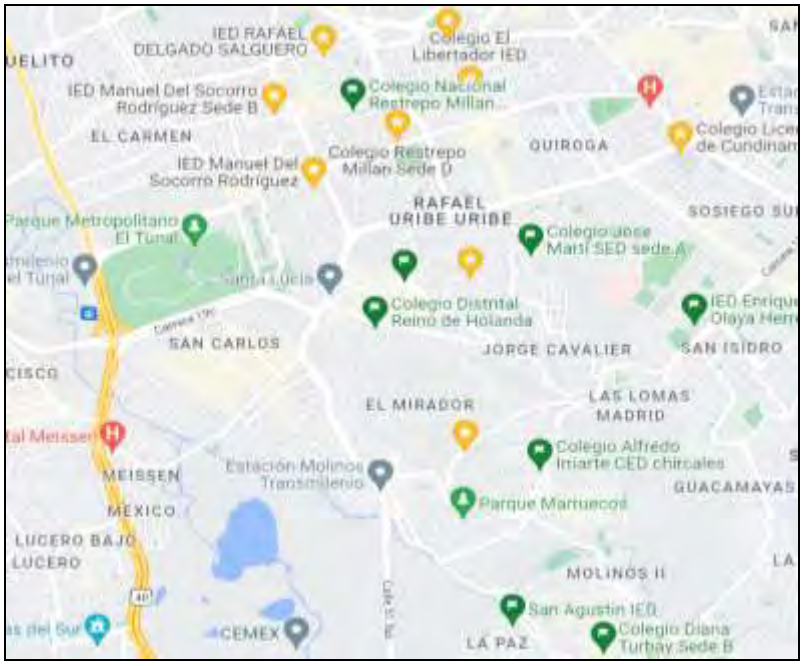


Imagen 1. Localización de las 17 sedes del grupo 8.
Fuente. Google Maps

Las 17 sedes del grupo 8 se encuentran ubicadas dentro de la localidad de Rafael Uribe Uribe; esto, conforme al alcance inicial del contrato de obra, así como las 8 adicionales asignadas a través de la suscripción del otrosí No.1.

1.1.2. Asignación de sedes

Adjudicación de contrato de interventoría No C01.PCCNTR.2749287 y adjudicación de contrato de obra No. No. CO1.PCCNTR.4077645 de territorio oriente ubicados en la localidad de Rafael Uribe Uribe, del Grupo No 8. Se hará intervención a 17 sedes que serán abarcadas inicialmente por etapas, según la programación de obra.

Grupo	Sedes	Localidad
8	17	Rafael Uribe Uribe

Por otra parte, y con base en la adición No.1 de recursos realizada al contrato de obra, se incluyeron 8 sedes adicionales, así:

Grupo	Sedes adicionales	Localidad
8	8	Rafael Uribe Uribe

2. DESCRIPCION PRIMERA ETAPA, VISITA DIAGNÓSTICO

En esta etapa preliminar se realizó la visita de los primeros ocho (8) colegios asignados. Seguidamente y a medida que se coordinó entre la SED y los rectores, se fueron visitando las demás sedes, permitiendo que a hoy se tengan en ejecución quince (15) de las veinticinco (25) sedes.

2.1. Información sedes primera etapa

En relación al primer alcance de ejecución, tenemos las siguientes sedes dentro del grupo 8, a saber:

COLEGIO	SEDE
COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)	B
COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)	A
COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)	B
COLEGIO DIANA TURBAY (IED)	B
COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)	B
COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)	A
COLEGIO JOSE MARTI (IED)	A
COLEGIO JOSE MARTI (IED)	C
COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED)	A
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	A
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	B
COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)	A
COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	A
COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	B
COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	d
COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)	A
COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)	C

La programación general del contrato de obra que incluye el valor actualizado con la adición de recursos, ya fue suministrada en una segunda reprogramación por parte del CONSORCIO MIA GP y para el presente periodo se también involucra dentro del análisis financiero del proyecto, con la cual se identificó una disminución en el atraso financiero causado a la fecha.

Ahora y con ocasión de la adición No.1 de recursos al contrato de obra, se incluyeron las siguientes sedes, a saber:

COLEGIO	SEDE
COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)	A
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	A
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	B
COLEGIO FE Y ALEGRÍA PALERMO SUR (IED)	A
COLEGIO FE Y ALEGRÍA LOS NARANJOS (IED)	A
COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	B
COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED)	A
COLEGIO SANTA LUCÍA CAMFAM (IED)	A

3. INFORMACION ADMINISTRATIVA LEGAL

Territorio oriente: Grupo No. 8

Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4155718 – Consorcio TIG

El presupuesto para la presente contratación de interventoría asciende a la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 878.587.938) incluidos el I.V.A., y los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Adicional a lo anterior, se suscribió una modificación No.1 al contrato, con lo cual se incluyó dentro del alcance 8 sedes, arrojando como valor complementario a la inicial, la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 371.557.799).

Con esto, el valor total de interventoría asciende a MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($ 1.250.145.727).

Territorio oriente: Grupo No 8

Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 - CONSORCIO MIA GP

En contrato de obra se asigna una suma de ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 11.941.262.150) incluido A.I.U. y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

Adicional a lo anterior, se suscribió una modificación No.1 al contrato, con lo cual se incluyó dentro del alcance 8 sedes, arrojando como valor complementario a la inicial, la suma de CINCO MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 5.050.000.000).

Con esto, el valor total de interventoría asciende a DIECISÉISMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 16.991.262.150).

3.1. Información del contrato de interventoría

CONTRATO DE:	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.:	No. CO1.PCCNTR.4155718
CONTRATISTA:	CONSORCIO TIG
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO:	03 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE ENERO DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	DOCE (12) MESES
VALOR INICIAL:	$ 878.587.938
VALOR ADICIONES:	$ 371.557.799
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*):	$ 1.250.145.727
PLAZO TRANSCURRIDO:	SIETE (7) MESES + DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO

3.2. Información del contrato de obra

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	ONCE (11) MESES
VALOR INICIAL:	$11.941.262.150

CONTRATO DE:	OBRA
VALOR ADICIONES:	$ 5.050.000.000
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*):	$ 16.991.262.150
PLAZO TRANSCURRIDO:	SIETE (7) MESES CALENDARIO

3.3 Relación de Correspondencia

Para el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077645 se presenta en el Anexo 1.1.2. El listado relacionando la correspondencia entre contratista e interventoría.

3.4 Actividades de reunión

A la fecha se han ejecutado actas de reunión como soporte del control realizado por esta interventoría para lo cual se adjuntan copia de estos documentos en el Anexo 1.1.3

ACTAS DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO		
FECHA	**ELABORADO POR**	**DESCRIPCIÓN**
21/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión emergencia IED Restrepo Millán sede D
26/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión de alcance a intervenir IED El Libertador sede B
27/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión emergencia en baterías de baños IED República de EEUU.
27/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Comité de seguimiento técnico, SST, ambiental
31/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión de APU's NP09 al NP21
31/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Recibo del bloque No.1 para intervenciones
02/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión emergencia en baterías de baños IED República de EEUU.
03/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión de APU's puertas, cubierta y cerramiento
03/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión de alcance Fe y Alegría
03/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Recorrido para revisión de alcance Fe y Alegría
09/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión del alcance en la IED
10/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Comité para revisión del estado del contrato
11/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Comité de seguimiento técnico
14/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Permiso para la desinstalación de la cubierta del corredor

ACTAS DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO		
FECHA	**ELABORADO POR**	**DESCRIPCIÓN**
14/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Acuerdo para la habilitación de espacios en la IED
15/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión emergencia en baterías de baños IED República de EEUU.
15/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión de avance en la ejecución IED Diana Turbay sede B
15/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Definición fechas de entrega espacios IED Reino de Holanda sede A
16/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión del estado del aula de serigrafía IED Jose Martí sede A
17/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Definición fechas de entrega espacios IED Reino de Holanda sede A
17/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Cerramiento perimetral cancha IED Liceo Femenino
18/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Protocolo de entrega de salón de serigrafía IED Jose Martí sede A

3.5 Informes Semanales

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el momento de corte del presente informe mensual, los cuales se adjuntan en el anexo 1.1.5.

Is No.	Fecha de inicio	Fecha de corte
27	17/07/2023	23/07/2023
28	24/07/2023	30/07/2023
29	31/07/2022	06/08/2023
30	07/08/2023	13/08/2023
31	14/08/2023	20/08/2023

4. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO

4.1 Avance físico

Durante el presente periodo se presenta un avance físico programado de 46,07% (según reprogramación No.2) y ejecutado de 39,77% del valor total del contrato, dando con ello una variación negativa de 6,30%. Cabe resaltar que estos porcentajes son generados sobre el valor total del contrato, incluyendo la respectiva adición No.1 de recursos y partiendo del análisis realizado sobre la reprogramación recientemente allegada por parte del contratista de obra y avalada por esta interventoría y que fue producto de la reunión llevada a cabo el 17 de julio de 2023, donde se expuso ante la SED la causa del atraso, concluyendo en que la programación se debe actualizar, descartando los rubros que no se van a ejecutar y que ya están causados a la fecha.

4.2 Estado de ejecución de los frentes

Los frentes en los que se ejecutaron actividades durante el presente periodo mensual, se relacionan a continuación, así como un recuento de las obras llevadas a cabo:

Colegio José Martí: Se continúa con el desmonte de la cubierta existente, adecuación de la estructura metálica e instalación de la nueva teja en las áreas habilitadas por el colegio. El frente avanza sin mayor contratiempo, pero el rendimiento de la instalación de la cubierta por parte del contratista de obra no es el esperado. Se terminó de instalar la cubierta en zona del comedor, con cual se debió tener el mayor de los cuidados, teniendo en cuenta que se trabajó por la parte de encima, para evitar afectar el cielo raso existente. También se adelantaron actividades en la zona de serigrafía, donde se realizó el proceso de entrega por terminación de esta intervención. Está pendiente que la IED desocupe el espacio del auditorio, para que el contratista proceda con la intervención de esta área.

Colegio Restrepo Millán sede C: Se está a la espera de la definición del procedimiento a seguir por parte de la Entidad Contratante, teniendo en cuenta que esa inestabilidad del talud no puede ser catalogada como una emergencia y su intervención debe involucrar unos estudios y diseños previos y de paso se debe evaluar la disponibilidad del recurso, lo cual no haría parte de este alcance contractual.

Colegio San Agustín sede A: Se completa la totalidad de la reposición de la cubierta de la biblioteca, incluyendo la instalación de la estructura metálica, pintura de la existente, redes eléctricas, entre otros. Se finalizan las actividades en las baterías del segundo piso, con observaciones en proceso de atención. El primer piso de las baterías se encuentra enchapadas, a la espera de la instalación de mesones, divisiones, entre otros.

Colegio Diana Turbay: Ya contando con los lineamientos de intervención dados por la SED, el contratista lleva un ritmo lento de trabajo, principalmente por la frecuencia interrumpida de

suministro de materiales. Se avanzó en la instalación de la mampostería en el bloque No.2, el vaciado de la placa de entrepiso de ese mismo espacio, la construcción del mortero de nivelación en la zona del aula múltiple, destronque y pulida del piso en granito, entre otros.

Colegio Enrique Olaya Herrera: Se continúa con el proceso de reposición de la cubierta del bloque A de la IED. Para esta actividad se realiza la instalación de la platina metálica, de donde se fijan los tornillos autoperforantes. Esta actividad está bastante avanzada y se espera dejar culminada en lo que resta del presente mes. Se continúan las actividades en las baterías sanitarias, donde se identifica daños en push, en válvulas, en aparatos sanitarios, entre otros, pero se ejecuta solo el alcance acordado en un principio.

Colegio Alfredo Iriarte: Se finaliza con el proceso de instalación del enchape en la zona de las baterías sanitarias, bajo las instrucciones impartidas por parte de la SED, en el primer nivel. Se instalan las divisiones en acero inoxidable del primer nivel, pero por problemas relacionados con los accesorios que van desde el push hasta el sanitario, no había sido posible habilitar los baños del segundo. En el primer piso existen taponamientos de la red y los sifones no descargan adecuadamente, por lo cual, se deberá sondear hasta destaparlos.

Colegio Reino de Holanda: Se finaliza con la intervención de los salones 305, 306, 307 y 308 y se procede con la entrega a la IED. De una vez se procede con la intervención de los siguientes cuatro salones del 2 piso, donde se ejecutará el alcance similar a los del nivel superior. Se continúa con la intervención en las baterías del 3 y 1 piso, donde a la fecha del presente informe aún continúan algunas observaciones.

Colegio Liceo Femenino: El ritmo de trabajo de este frente es muy bajo y se han realizado llamados de atención precisamente por el escaso avance. Se realizaron los acabados en los mesones, se aplicó la pintura en el pasillo de la zona de los laboratorios, se aplicó la pintura en muros internos y se está a la espera de la finalización de las actividades relacionadas con la red de gas y mantenimiento de las puertas. También se inicia la intervención en el salón de artes, donde se construirá el cuarto de revelado.

Colegio Santa Lucía CAFAM: Con la aprobación por parte de la SED de los precios de las puertas previstas para esta IED, se procedió con la instalación de las mismas y se queda a la espera de los remates para proceder con su recibo y entrega de este frente.

Colegio Restrepo Millán sede B: Se realiza la entrega del bloque No.1 en espacios por parte de la IED y el contratista inicia de inmediato con su intervención, desmontando la cubierta existente, instalando la perfilería metálica, pintando los elementos existentes e iniciando con la instalación de la cubierta tipo sándwich.

Colegio Fe y Alegría Palermo Sur: Se continúa con el acondicionamiento de la estructura metálica de los bloques inferiores para la instalación de la cubierta de los salones de artes, de sistemas, laboratorios y administrativos. Seguidamente se continúa con la demolición del piso

del área de circulación y se disponen los RCD. En esta sede se están realizando las gestiones para poder solicitar unas conexiones domiciliarias nuevas para la red hidráulica, sanitaria y aguas lluvias. Con respecto a las redes eléctricas, se independizará del tablero que comparte actualmente con el jardín y se construirán las redes internas nuevas. El ritmo no el esperado y por ende se evidencian atrasos en la ejecución de actividades.

Colegio Alexander Fleming sede B: Se procede a realizar los retoques pendientes sobre la cancha construida y da por entregada la totalidad del alcance de este frente.

Colegio Manuel del Socorro sede A: Se continúa con la instalación de la subbase tipo B400 y se compacta debidamente y se toman las debidas densidades. Seguidamente se continúa con el vaciado de las placas de 12cm de espesor, que conforman la plataforma de las canchas previstas dentro del alcance. Se instala el piso en chip en la zona de los juegos de los niños y queda pendiente para realizar la entrega a la IED.

Colegio Rafael Delgado Salguero sede A: Se procede la intervención con la reposición de cubierta de los salones de sistemas. En este caso se desmonta la reja de protección vandálica y se acondiciona la superficie para la instalación de la nueva teja sobre estos salones. El ritmo es un poco lento, en vista que la IED no habilita más espacios, hasta tanto no se le vayan entregando áreas.

Colegio Marruecos y Molinos sede A: Para este periodo se da por finalizada la intervención en las placas de las cubiertas de los bloques intervenidos, donde se reconformaron las pendientes y se le instaló manto asfáltico. Se está a la espera de la definición de los detalles de la tarima, a fin de que el contratista proceda con su materialización.

4.3 Control de hitos

Con base en la programación presentada por parte del contratista de obra y verificando el estado de los frentes en obra, se cuenta con la siguiente información al respecto:

2. CONTROL DE HITOS.					
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO		FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)		20/01/2023	20/01/2023	0
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE		21/01/2023	6/05/2023	-105
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES		21/01/2023	3/03/2023	-41
3	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II		21/01/2023	10/02/2023	-20
4	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA		21/01/2023	21/02/2023	-31
5	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA		21/01/2023	15/02/2023	-25
6	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA		21/01/2023	21/02/2023	-31
7	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA		21/01/2023	15/02/2023	-25
8	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN		21/01/2023	10/02/2023	-20
9	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR		29/07/2023		No iniciado
10	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO		29/07/2023	26/06/2023	33
11	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO		29/07/2023		No iniciado
12	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO		27/02/2023	27/02/2023	0
13	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ		29/07/2023	12/06/2023	47
14	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL		29/07/2023		No iniciado
15	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ		29/07/2023	22/05/2023	68
16	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL		29/07/2023		No iniciado
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO		29/07/2023		No iniciado
18	COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR		28/04/2023	28/04/2023	0
19	COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS		29/07/2023		No iniciado
20	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B		29/07/2023		No iniciado
21	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A		29/07/2023	25/05/2023	65
22	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM		3/04/2023	3/04/2023	0
23	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B		29/07/2023		No iniciado
24	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A		29/07/2023		No iniciado
25	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B		29/07/2023		No iniciado
30	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)				
Plazo transcurrido del proyecto en días			212	DÍAS	

Cabe resaltar que estas fechas de inicio fueron tomadas de la reprogramación No.2 enviada por parte del contratista de obra y avalada por parte de la interventoría.

4.4 Avance financiero

Durante el presente periodo se presenta un avance financiero programado de $ 7.827.417.831,16 (SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 0.16 M/CTE) y ejecutado de $ 6.757.282.520,33 (SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 0.33 M/CTE).

Periodo	Acumulado Mensual	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
MES 7	$ 7.827.417.831,16	$ 6.757.282.520,33



Fuente. Informe semanal de interventoría No.31

5. INFORMACIÓN LEGAL Y PRESUPUESTAL

5.1 Contrato de obra – Control actas parciales de obra

En cuanto al comportamiento financiero del contrato de obra con corte en el periodo actual, el mismo se relaciona a continuación:

CONTROL DE PAGOS DE ACTAS PARCIALES					
Acta No	Fecha	Valor Total	Amortización anticipo	Valor pagado	% pagado acumulado
No.1	19/02/2023	$ 203.058.871	$ 0.00	$ 203.058.871	1,61%
No.2	19/03/2023	$ 1.278.337.626	$ 0.00	$ 1.278.337.626	10,71%
No.3	19/04/2023	$ 704.473.264	$ 0.00	$ 704.473.264	12,86%
No.4	19/05/2023	$ 810.966.333	$ 0.00	$ 810.966.333	17,63%
No.5	19/06/2023	$ 1.256.728.708	$ 0.00	$ 1.256.728.708	25,03%
No.6	19/07/2023	$ 1.921.711.106	$ 0.00	$ 1.921.711.106	36,34%
No.7	19/08/2023	$ 1.626.161.480,00	$ 0.00	En proceso	46,10%

5.2 Contrato de interventoría – Control actas parciales de interventoría

En cuanto al comportamiento financiero del contrato de interventoría con corte en el periodo actual, el mismo se relaciona a continuación:

CONTROL DE PAGOS DE ACTAS PARCIALES				
Acta No	Fecha	Valor Total	% pagado	Concepto
No.1	19/02/2023	$ 14.189.195	1,61%	Avance contrato de obra
No.2	19/03/2023	$ 89.351.980	10,71%	Avance contrato de obra
No.3	19/04/2023	$ 57.187.615	12,86%	Avance contrato de obra
No.4	19/05/2023	$ 59.667.498	17,63%	Avance contrato de obra
No.5	19/06/2023	$ 92.385.769	25,03%	Avance contrato de obra
No.6	19/07/2023	$ 141.391.481	36,34%	Avance contrato de obra
No.7	19/08/2023	$ 122.014.223	46,10%	En proceso

5. CONCLUSIONES

- Se continúa llevando a cabo en campo la toma de medidas para organización de los presupuestos, lo cual permita realizar una delimitación adecuada de los alcances, conforme a los montos agotables que están asignados de manera estimativa para cada frente y bajo las indicaciones de la SED. Esta labor se ha venido exponiendo con la SED, buscando dirimir las dualidades que puedan existir.

- El contratista de obra continúa sin venir correspondiendo de manera diligente con la gestión administrativa que le corresponde, ya que presenta demoras en la entrega de fichas, presupuestos y cronogramas. Esto ha traído consigo una serie de llamados de atención en comités de seguimiento y mediante comunicados, los cuales tampoco han causado el efecto esperado.

- Han venido surgiendo unas nuevas actividades no previstas, de las cuales se han venido proponiendo los APU's no previstos con sus debidos soportes, los cuales ya fueron remitidos en su totalidad a la Entidad Contratante para su revisión y concepto, pero de las cuales aún no se cuenta con respuesta alguna. Este caso particular es relacionado con actividades destinadas para cubrir la emergencia que se requiere en la IED Liceo Femenino.

- Se han realizado llamados de atención relacionados con la entrega de los espacios según compromisos, pero los mismos tampoco han dado el resultado esperado.

- Con base en la reunión llevada a cabo en las instalaciones de la SED el 17 de julio de 2023, el contratista de obra allegó durante el periodo la reprogramación No.2, con la cual se realizó el ajuste debido del informe semanal No.31 y donde el atraso se redujo sustancialmente.

- Por parte de la SED se viene estimando una posible adición de recursos No.2 y una ampliación en el plazo de ejecución, teniendo en cuenta que en primera instancia se adicionó al contrato de obra pero no se prorrogó.

2. ANEXOS

ANEXO 1. INFORME BÁSICO
ANEXO 1.1. INFORME ADMINISTRATIVO
Anexo 1.1.1. Control de personal contratista
Anexo 1.1.2. Relación de correspondencia
Anexo 1.1.3. Actas de reunión
Anexo 1.1.4. Control de personal de interventoría
Anexo 1.1.5. Informes semanales
Anexo 1.1.6. Pólizas Contrato de obra
Anexo 1.1.7. Pólizas Contrato de interventoría

ANEXO 1.2. INFORME TÉCNICO
Anexo 1.2.1. Soportes control de calidad
Anexo 1.2.2 Bitácora de obra
Anexo 1.2.3 Registro fotográfico

ANEXO 1.3. INFORME SST

ANEXO 1.4. INFORME AMBIENTAL

ANEXO 1. INFORME BASICO

ANEXO 1.1 INFORME ADMINISTRATIVO

Anexo 1.1.1. Control de personal de contratista

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL	**7**	**Periodo**	20/07/2023	**al**	19/08/2023

FECHA 19 | 8 | 2023

DÍA DOMINGOS Y FESTIVOS	
PERSONAL QUE ASISTE	**X**
PERSONAL QUE NO ASISTE	**N**
PERSONAL RETIRADO	**R**
PERSONAL INGRESADO	**IN**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESDE		**20-jul-23**									**HASTA**											**19-ago-23**									
DIA		**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**28**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
PERFIL		**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**
Director de obra		X	X			X	X	X	X	X			X		X		X			X			X	X			X		X	X		
Residentes de obra		X	X			X	X	X	X	X			X		X		X			X			X	X			X		X	X		
Asesor Estructural			X			X																										
Asesor Ambiental						X		X		X			X		X		X															
Técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo		X				X							X							X										X		X
Asesor en Redes Eléctricas																																
Asesor Hidrosanitario																																
Profesional de costos																	X						X	X					X			
Inspectores de obra		X	X			X			X	X			X		X	X	X			X		X	X	X					X	X		X
Maestro de obra		X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X

FIRMA: _____

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DÍAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Julio — al: 19 de Agosto
FRENTE DE OBRA:	IED EL LIBERTADOR

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	JF	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
Maestro de obra	—	—												—			—			1							—				
Oficial de obra	—																														
Ayudante de obra	—																			1											
Electricista	—																														
Plomero	—																														
Operador de maquinaria (constante)	—																							1		1	1	—	—	1	1
Soldador	—																														
Carpinteros	—																														
Especialista en redes eléctricas	—																														
Especialista en estructuras	—																						—		—						
Especialista en redes hidrosanitarias	—																														
Asesor ambiental	—																														
Especialista en Suelos	—																									1					
	—																														
	—																														
	—																														

FIRMA: Jhon R.
NOMBRE: Jhon Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 Julio al 19 Agosto
FRENTE DE OBRA:	IED ALFREDO IRIARTE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	JF	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
Maestro de obra	—			—		1					—															—	—	—			
Oficial de obra	—	2		—		2	2	1	1	1	—														1	—	—	—			1
Ayudante de obra	—		1	—	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Electricista	—			—																						—	—	—	—	—	
Plomero	—			—																											
Operador de maquinaria (constante)	—			—																											
Soldador	—			—																											
Carpinteros	—			—																											
Especialista en redes eléctricas	—			—																											
Especialista en estructuras	—			—																											
Especialista en redes hidrosanitarias	—			—																											
Asesor ambiental	—			—																											
	—			—																											
	—			—																											
	—			—																											

FIRMA: Jhon R.
NOMBRE: Jhon Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: ~~EDISON RICARDO~~ DUARTE DIAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Julio al 19 de Agosto
FRENTE DE OBRA:	IED REINO DE HOLANDA SEDE-A

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	JF	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
Maestro de obra																														1	1
Oficial de obra		2	2	2	1	6	1	1	2			2	3	2	2						1	1				1	1	1	1	2	2
Ayudante de obra		1	2	1	1	2	3	1	1			2	2	2	3							1	2	2		2	2	2	3	2	2
Electricista									1																						
Piomero																															
Operador de maquinaria (constante)			1																												
Soldador		1	1	1																											
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental		1																													
SST (rotativo)		1	1																												
Instaladores de Ventanas																													2		2

FIRMA: Jhan R

NOMBRE: Jhan Rocha

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Julio — al: 19 Agosto
FRENTE DE OBRA:	I E D RAFAEL DELGADO SALGUERO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	JE	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
Maestro de obra																															
Oficial de obra	2	1	2		2	2	2	2	2	1		1																			
Ayudante de obra		1			1	1	1	1	1	1		1																			
Electricista					2					2												2	1								
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental															4	4				3	3		2			2	3	3	3	3	3
Instaladores de cobierta																															

FIRMA: Jhon R.
NOMBRE: Jhon Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 Julio al 19 Agosto
FRENTE DE OBRA:	IED MARRUECOS Y MOLINOS

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	JF	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
Maestro de obra	1	1			1	1	1	1	1		—		1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1								
Oficial de obra	3	2	1		2	1	2	2	2	2	—	2	9	2	2	2	2	—	—	3	3	2	2	1		1	1	1	1	2	2
Ayudante de obra	2	4	4		3	4	4	4	4	2	—	2	2	1	2	2	1	—	—	2	2	2	2	3		2				1	1
Electricista																		—	—												
Plomero																		—	—												
Operador de maquinaria (constante)																		—	—												
Soldador																		—	—												
Carpinteros																		—	—												
Especialista en redes eléctricas																		—	—												
Especialista en estructuras																		—	—												
Especialista en redes hidrosanitarias																		—	—												
Asesor ambiental																		—	—												
																		—	—												
																		—	—												
																		—	—												

FIRMA: Jhon R.
NOMBRE: Jhon Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Julio al 19 de Agosto
FRENTE DE OBRA:	Restrepo Millan Sede B

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	J.F	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
Maestro de obra																													1		
Oficial de obra												1	1		1	1			1	1	1	1						1	1	1	1
Ayudante de obra										1		1	1		1	3	3		1			1						1		1	1
Electricista										3																					
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador										1																					
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental															1	1	1		1	1	1		5	5		5	5	4	5	5	5
Cubierta																															

P/P

FIRMA: _____

NOMBRE:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Julio al 19 de Agosto
FRENTE DE OBRA:	Alexande Fleming Sede B

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA / PERSONAL	20 J.f	21 V	22 S	23 D	24 L	25 M	26 M	27 J	28 V	29 S	30 D	31 L	1 M	2 M	3 J	4 V	5 S	6 D	7 L	8 M	9 M	10 J	11 V	12 S	13 D	14 L	15 M	16 M	17 J	18 V	19 S
Maestro de obra										1																					
Oficial de obra	1	1	1		1	1	2	2	1	1		-	1	-								1				1					
Ayudante de obra										1		1	1													1					
Electricista																										1					
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																								-							
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															
Pintura de Concha								4	4	4		3	3	3	4	4	4			4	1	4	4	4							

P/p

FIRMA: _____

NOMBRE:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Julio al 19 de Agosto
RESIDENTE DE OBRA:	Manuel de Socorro Sede A

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	J.F	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
Maestro de obra							1																1								
Oficial de obra	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
Ayudante de obra	4	4	4		2	3	4	2	4			2	3	2	2	2	2		3	2	2	3	2	2		3	3	2	2	2	2
Electricista	1																														
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															

P/p

FIRMA: _____

NOMBRE:

PRESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Julio — al: 19 de Agosto
FRENTE DE OBRA:	Liceo Femenino

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA / PERSONAL	20 J.F	21 V	22 S	23 D	24 L	25 M	26 M	27 J	28 V	29 S	30 D	31 L	1 M	2 M	3 J	4 V	5 S	6 D	7 L.F	8 M	9 M	10 J	11 V	12 S	13 D	14 L	15 M	16 M	17 J	18 V	19 S
Maestro de obra																															
Oficial de obra		1	1		1	1	1	1	1	1		1	2	2	2	1	1					1	1	1		1	1	1	1	1	1
Ayudante de obra		3	3		3	3	3	3	3	3		-	2	2	2	1	1					2	2	2		2	3	3	3	3	3
Electricista						1							2			1	1														
Piomero												1																			
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															
Mesones						2	2	2																							
Cubierta																												1	1		
																														1	-

P/P

FIRMA: _____

NOMBRE:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	**Periodo** 20 de Julio **al** 19 de Agosto
FRENTE DE OBRA:	Santa Lucia Cafam

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	J.F	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	D
Maestro de obra																															
Oficial de obra																															
Ayudante de obra																															
Electricista																															
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															

P/P

FIRMA: _____

NOMBRE:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Julio al 19 de Agosto
FRENTE DE OBRA:	Enrique Olaya Herrera

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	JF	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
Maestro de obra																															
Oficial de obra		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1																
Ayudante de obra		2	2		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1																
Electricista																															
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador					1																										
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															
Cobertura					2											4	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2

P/P

FIRMA: _____

NOMBRE:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de julio de 2023 al 19 de agosto de 2023
FRENTE DE OBRA:	Colegio José Martí

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Mi	JF	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	LF	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S
Maestro de obra			0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Oficial de obra			1	1		1	1	1	1	0	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
Ayudante de obra			4	4		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3		3	1	1	1	3	3
Electricista			0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Plomero			0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Operador de maquinaria (constante)			0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Soldador			0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Carpinteros			0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Especialista en redes eléctricas			1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
Especialista en estructuras			0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Especialista en redes hidrosanitarias			0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Asesor ambiental			0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SST			0	1		0	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Residente de obra			0	1		0	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

FIRMA:

NOMBRE: María Alejandra Angarita

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de julio de 2023 al 19 de agosto de 2023
FRENTE DE OBRA:	Colegio San Agustin

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	JF	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	LF	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S
Maestro de obra		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Oficial de obra		2	2		2	2	1	2	2	2		2	2	1	2	2	2		1	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2
Ayudante de obra		2	2		1	0	1	0	0	2		1	1	1	3	3	3		1	2	2	1	1	0		0	0	0	0	0	0
Electricista		2	0		0	0	0	0	0	0		2	3	2	1	0	0		0	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Plomero		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Operador de maquinaria (constante)		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Soldador		3	3		3	0	0	3	0	0		0	0	0	0	2	0		0	0	3	3	0	0		0	0	0	0	0	0
Carpinteros		0	0		0	0	0	0	0	4		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Especialista en redes eléctricas		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Especialista en estructuras		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Especialista en redes hidrosanitarias		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Asesor ambiental		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

FIRMA:

NOMBRE: María Alejandra Angarita

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de julio de 2023 al 19 de agosto de 2023
FRENTE DE OBRA:	Colegio Fe y Alegria

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA / PERSONAL	20 JF	21 V	22 S	23 D	24 L	25 M	26 Mi	27 J	28 V	29 S	30 D	31 L	1 M	2 Mi	3 J	4 V	5 S	6 D	7 LF	8 M	9 Mi	10 J	11 V	12 S	13 D	14 L	15 M	16 Mi	17 J	18 V	19 S
Maestro de obra		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		1	0				
Oficial de obra		1	0		0	0	0	0	0	0		1	1	1	1	2	2			2	2	2	2	2		2	4	3	3	3	3
Ayudante de obra		3	1		3	3	1	1	1	1		2	2	4	1	4	7			4	3	4	4	5		5	7	7	7	7	7
Electricista		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	2	2	0	0		0	0	0	0	0	0
Plomero		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Operador de maquinaria (constante)		0	0		0	0	0	0	0	0		1	0	0	1	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Soldador		2	2		2	3	2	3	3	3		3	2	3	2	3	3			2	2	2	2	3		2	2	3	3	3	3
Carpinteros		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Especialista en redes eléctricas		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Especialista en estructuras		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Especialista en redes hidrosanitarias		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Asesor ambiental		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SST		0	0		1	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Residente de obra		0	0		1	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

FIRMA

NOMBRE: Maria A. Argaita G.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: EDISON RICARDO IBAÑEZ DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Julio de 2023 al 19 de agosto de 2023
FRENTE DE OBRA:	Colegio Diana Turbay Sede B

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA / PERSONAL	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	F	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	LF	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S
Maestro de obra		0	0		0	0	0	1	1	0		0	0	1	0	0	0			0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0
Oficial de obra		3	3		3	3	2	2	3	3		2	4	4	2	3	3			0	1	1	1	1		2	2	2	2	2	2
Ayudante de obra		4	4		4	4	1	6	6	3		2	4	5	10	11	12			0	1	1	2	2		3	3	3	3	3	3
Electricista		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Plomero		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Operador de maquinaria (constante)		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Soldador		3	0		6	3	0	1	6	0		3	1	1	1	0	1			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Carpinteros		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	3	2	1	1
Especialista en redes electricas		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Especialista en estructuras		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Especialista en redes hidrosanitarias		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Asesor ambiental		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SST		0	0		0	0	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Residente de obra		0	0		0	0	1	0	0	0		0	0	1	0	0	0			0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0

FIRMA:
NOMBRE: María A. Angarita G.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

Anexo 1.1.2. Relación Correspondencia

Relación Salidas

CONSORCIO TIG

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO	NÚMERO DE RADICADO	CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
19/07/2023	TIG-MEM-280	Solicitud de continuidad inmediata con la atención de la emergencia en la IED Gustavo Restrepo sede A	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A
19/07/2023	TIG-MEM-281	REMISIÓN DE APUS NO PREVISTOS DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO Y PUERTAS	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
20/07/2023	TIG-MEM-282	REMISIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS LA IED FE Y ALEGRIA Y MANUEL DEL SOCORRO SEDE A	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
21/07/2023	TIG-MEM-283	Preocupación por el estado de entrega definitiva de baterías sanitarias de la IED Reino de Holanda A e IED Alfredo Iriarte	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A
24/07/2023	TIG-MEM-284	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.27	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
23/07/2023	TIG-MEM-285	Informe de visita con observaciones a atender desde las áreas SST y Ambiental	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A
24/07/2023	TIG-MEM-286	SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE OBRA No. 6	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
25/07/2023	TIG-MEM-287	SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No.6	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
26/07/2023	TIG-MEM-288	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A
27/07/2023	TIG-MEM-289	RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.6	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
28/07/2023	TIG-MEM-290	Respuesta de derecho de petición con radicado E-2023-107301 - IED Gustavo Restrepo sede A	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
30/07/2023	TIG-MEM-291	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.28	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
31/07/2023	TIG-MEM-292	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A
01/08/2023	TIG-MEM-293	Primer llamado de atención por falta de gestión oportuna en el componente ambiental	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A

CONSORCIO TIG

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO	NÚMERO DE RADICADO	CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
02/08/2023	TIG-MEM-294	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A
04/08/2023	TIG-MEM-295	SOLICITUD DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 6 PERIODO 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A
04/08/2023	TIG-MEM-296	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO FE Y ALEGRIA, COLEGIO SAN AGUSTIN Y COLEGIO DIANA TURBAY	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A
04/08/2023	TIG-MEM-297	Segundo llamado de atención por falta de gestión oportuna en el componente ambiental	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A
07/08/2023	TIG-MEM-298	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.29	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
08/08/2023	TIG-MEM-299	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO FE Y ALEGRIA, COLEGIO SAN AGUSTIN	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A
09/08/2023	TIG-MEM-300	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO DIANA TURBAY	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A
09/08/2023	TIG-MEM-301	Solicitud de atención inmediata a garantías en espacios entregados a las IED	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A
09/08/2023	TIG-MEM-302	Tercer llamado de atención por falta de gestión oportuna en el componente ambiental	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A
10/08/2023	TIG-MEM-303	Solicitud de reanudación inmediata de actividades en el Liceo Femenino	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A
11/08/2023	TIG-MEM-304	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO FE Y ALEGRIA	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A
11/08/2023	TIG-MEM-305	Preocupación por el estado de incumplimiento de entrega definitiva de baterías sanitarias de la IED Reino de Holanda A e IED Alfredo Iriarte	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A
13/08/2023	TIG-MEM-306	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.30	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
14/08/2023	TIG-MEM-307	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO REINO HOLANDA	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	N/A	N/A

CONSORCIO TIG

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO	NÚMERO DE RADICADO	CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
14/08/2023	TIG-MEM-308	Remisión de APU's no previstos relacionados con la emergencia de la cubierta del Liceo Femenino Mercedes Nariño	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	**N/A**	**N/A**
15/08/2023	TIG-MEM-309	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO FE Y ALEGRIA, MANUEL DEL SOCORRO Y COLEGIO LICEO FEMENINO	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	**N/A**	**N/A**
15/08/2023	TIG-MEM-310	Respuesta a comunicación 2023_RUU_MGP_218 - Respuesta a comunicado TIG-MEM-297	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	**N/A**	**N/A**
15/08/2023	TIG-MEM-311	Solicitud de reemplazo inmediato del residente No.2 y asesor ambiental	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	**N/A**	**N/A**
17/08/2023	TIG-MEM-312	Remisión de APU's no previstos NP-28 al NP-32	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	**N/A**	**N/A**
17/08/2023	TIG-MEM-313	Remisión solicitud de reemplazo de residente de interventoría No.1	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	**N/A**	**N/A**
18/08/2023	TIG-MEM-314	Respuesta a comunicación 2023_RUU_MGP_228 - Aprobación perfiles residente No.2 e inspector de obra	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR	**N/A**	**N/A**
17/08/2023	TIG-MEM-315	Remisión solicitud de reemplazo de SST de interventoría No.4	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	**N/A**	**N/A**

Nombre: *EDISON RICARDO DUARTE DÍAZ*
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Código	Vigencia
FMI022-1	12/1/2021

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-280

Bogotá, D.C, julio 19 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Solicitud de continuidad inmediata con la atención de la emergencia en la IED Gustavo Restrepo sede A

Respetados señores:

Por medio de la presente, el CONSORCIO TIG quien funge en calidad de interventoría, solicita al CONSORCIO MIA GP la reanudación inmediata de las actividades que hacen parte de la solución a la emergencia identificada en la IED Gustavo Restrepo sede A, la cual iniciaron desde el pasado 26 de junio de 2023. Esto, teniendo en cuenta que las obras quedaron suspendidas dos (2) días después del inicio y las directivas del colegio han reportado grandes malestares ante la SED y ante el personal de la interventoría, por la inoperancia en la que quedó parte su planta física y por el riesgo que las excavaciones representan para los estudiantes y demás personas que usan las instalaciones.

Nuestro requerimiento reiterativo se realiza conforme a lo establecido en el **ANEXO TÉCNICO** del contrato de obra, en su capítulo **1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**, subcapítulo **1.4 Impacto social del proyecto**, inciso **a. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE DEL OBJETO**, donde se indica que:

(…)
REPARACIONES DE EMERGENCIA: Refiere a intervención de Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales o de sus sedes administrativas que no están programadas y que por necesidad o por circunstancias sobrevinientes deben ser intervenidas de forma inmediata, se incluyen dentro de estas, actividades o cantidades no programadas que no hayan sido incluidas en el diagnóstico inicial realizado a cada equipamiento postulado, debido a circunstancias inesperadas causados por fenómenos naturales, accidentes, situaciones antrópicas no previsibles y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales y de sus sedes administrativas.

La atención oportuna con carácter correctivo y/o preventivo para todos los eventos calificados como emergencia, para eliminar el riesgo principal y seguidamente, ejecución de todas las obras para habilitar los espacios afectados como consecuencia de la emergencia (aulas de clase, áreas administrativas, comedores escolares, zonas exteriores, cerramientos, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física, etc.), permitiendo así el normal funcionamiento de la Institución y otros espacios de propiedad de la Defensoría del Espacio Público entregados a la Secretaría de Educación del Distrito y evitando, además, el cierre parcial o total de la misma, en la totalidad del área metropolitana.

La atención de las emergencias en los colegios distritales y sedes administrativas comprende dos (2) etapas: en primera instancia, se realiza la mitigación del riesgo (esto consiste en la atención inmediata para minimizar os efectos de la ocurrencia de la emergencia tales como apuntalamiento de elementos en riesgo de colapso, desmonte de estructuras que puedan colapsar, corte de servicio de acueducto, energía eléctrica o gas natural por escapes o corto circuito, recolección y disposición adecuada de escombros, la suplencia de baterías sanitarias portátiles, tratamientos silviculturales, control de vectores, reparación de redes eléctricas e hidráulicas etc.) ***y una segunda etapa es la ejecución de las obras de mantenimiento correctivo necesarias para adecuar los espacios afectados y ponerlos nuevamente en funcionamiento.***
(Negrita y cursiva fuera de texto)

En respuesta emitida el pasado 11 de julio de 2023 al correo que el contratista de obra denominó ATENCIÓN EMERGENCIA GUSTAVO RESTREPO FASE 2 y que remitió el 07 de julio de 2023, esta interventoría manifestó que las cantidades a reconocer serán las cuantificadas en obra en su debida unidad de medida y que las actividades que surjan y sea del orden de “no previstas” deberán evaluarse a través de un APU con sus debidos soportes; directrices que coincide con lo establecido en la documentación contractual.



Fotografía No.1 Estado actual de la intervención
Fuente. Registro tomado en campo por CONSORCIO TIG

Ahora y teniendo en cuenta que la única actividad que no se podría pagar porque su APU ni siquiera se ha constituido por parte del contratista de obra, sería la de la succión de material vegetal, por lo cual, sugerimos la entrega inmediata de estos soportes y la ejecución también inmediata del resto de actividades, ya que con el pasar de los días se sigue poniendo en riesgo la salud del personal que usufructúa estas instalaciones y ante cualquier novedad de accidente en la zona intervenida, se vería obligado el CONSORCIO MIA GP a dar su parte de responsabilidad.

Por último, recurrimos a este protocolo, en vista que ya hemos requerido en dos (2) ocasiones por correo electrónico la reanudación de las actividades y no hemos contado con una respuesta oportuna por parte del consorcio.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos Tres (3) folios

Gmail **CONSORCIO TIG <consorciotig@gmail.com>**

Solicitud de continuidad de obras producto de la emergencia en la IED Gustavo Restrepo sede A

1 mensaje

CONSORCIO TIG <consorciotig@gmail.com> 5 de julio de 2023, 10:00
Para: ConsorcioMiaGPRU <consorciomiagpru2022@gmail.com>, OBRAS MIA-GP <obrasmiagp@gmail.com>
Cc: HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS <Htibaquira@educacionbogota.gov.co>, ALEXANDER OSORIO PAEZ <Alosorio@educacionbogota.gov.co>, MIGUEL ANGEL TURMEQUE BUSTOS <mturmeque@educacionbogota.gov.co>

Señores
CONSORCIO MIA GP

Cordial saludo.

De la manera más atenta, solicitamos la continuidad de las obras que hacen parte de la solución a la emergencia suscitada en la IED Gustavo Restrepo sede A, ya que se avecina la fecha de retorno de los estudiantes y con su presencia el grado de complejidad de la intervención va a ser mucho mayor.

Tengan que después del 09 de julio de 2023 ya el colegio entrará de nuevo en operaciones y que el sistema a intervenir es utilizado constantemente, por lo cual, es imperante contar con esa solución en lo que resta de esta semana.

Quedamos atentos a su pronta diligencia del caso.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE

Gmail **CONSORCIO TIG <consorciotig@gmail.com>**

ATENCION EMERGENCIA GUSTAVO RESTREPO FASE 2

3 mensajes

ConsorcioMiaGPRU <consorciomiagpru2022@gmail.com> 7 de julio de 2023, 7:36
Para: CONSORCIO TIG <consorciotig@gmail.com>

Buenos dias ingenieros,

Adjunto enviamos para revisión y aprobación, informe con descripción de la segunda fase de intervención en cajas de inspección Colegio Gustavo Restrepo.

Cordialmente,

Sandra Milena Pinzón
DIRECTORA DE OBRA
Consorcio Mia GP

2 adjuntos

199__2023_RUU_MGP_diagnostico gustavo restrepo sede A.pdf
760K

ANEXO COMUNICADO 199 _ PRESUPUESTO COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A -EMERGENCIA.xlsx
1925K

CONSORCIO TIG <consorciotig@gmail.com> 11 de julio de 2023, 7:54
Para: ConsorcioMiaGPRU <consorciomiagpru2022@gmail.com>
Cc: HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS <Htibaquira@educacionbogota.gov.co>, ALEXANDER OSORIO PAEZ <Alosorio@educacionbogota.gov.co>, MIGUEL ANGEL TURMEQUE BUSTOS <mturmeque@educacionbogota.gov.co>, OBRAS MIA-GP <obrasmiagp@gmail.com>

Señores
CONSORCIO MIA GP

Cordial saludo.

Una vez revisado el contenido documental del correo electrónico precedente, esta interventoría se permite realizar las siguientes precisiones:

1. Reiteramos nuestra conformidad en lo que tiene que ver con la separación de los sistemas de aguas residuales con las aguas industriales en el punto donde se generó el inconveniente. Si bien más adelante se vuelven a reintegrar al sistema actual, la IED deberá hacerse responsable del mantenimiento y evitar que el sistema colapse por la misma razón.
2. Sabemos que las cantidades son tentativas y que a la final se pagará la cantidad referente sobre la unidad de medida.
3. El ítem NP-13 no lo vemos procedente en esta propuesta, puesto que esa actividad no se realizó para la inspección.
4. Sobre la actividad de succión de material vegetal no tenemos registro, por lo cual, tampoco la vemos procedente.

CONSORCIO TIG

Bogotá, D.C, julio 19 de 2023

TIG-MEM-281

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: REMISIÓN DE APUS NO PREVISTOS DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO Y PUERTAS

Respetados señores:

Por medio de la presente y dada la premura que existe con la ejecución de estas actividades, donde una de ellas consolida la atención de una emergencia y la otra el condicionante para la entrega definitiva del primer frente, esta interventoría se permite remitir para evaluación de la Entidad, cinco (5) actividades no previstas con sus debidos soportes, las cuales se relacionan a continuación:

- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR.

- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR.

- RETIRO DE CUBIERTA TIPO COLONIAL: TEJA DE BARRO SUPERIOR, TEJA DE ASBESTO Y/O FIBROCEMENTO INFERIOR, ESTERILLA, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL.

CONSORCIO TIG

- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO 3+3MM, SISTEMA MONUMENTAL HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO, CON BARRA ANTIPÁNICO LOCALIZADA EN EL INTERIOR DE ESPACIO Y PELICULA INTERNA INCOLORA CON REJILLA DE VENTILACION FIJA EN LAMINA CAL. 20.

- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO 3+3MM, SISTEMA MONUMENTAL HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO, CON BARRA ANTIPÁNICO LOCALIZADA EN EL INTERIOR DE ESPACIO Y PELICULA INTERNA INCOLORA CON REJILLA DE VENTILACION FIJA EN LAMINA CAL. 20. INCLUYE PERFILES LATERAL PARA SOPORTE DE PUERTA.

La intención es que podamos realizar una mesa de trabajo virtual prontamente y con ello dirimir lo relacionado con el precio unitario de cada actividad no prevista. No obstante, nos permitimos informar que las versiones adjuntas son las constituidas en primera instancia por el contratista de obra y a nuestra consideración las primeras dos (2) actividades acá relacionadas, requieren de unos ajustes en cantidades de los elementos de fijación de la teja (tornillos y ganchos), ya que presuntamente se encuentran muy altos.

Quedamos atentos al resultado de su revisión y a la programación de la mesa de trabajo virtual, a fin de llevar a cabo el consenso final de precios.

Sin otro particular.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo Dos (2) archivos comprimidos en WinRAR: 1,08MB y 1,10MB.

5. El mantenimiento que se realizó con el equipo tipo "vactor" debe ser valorado por medio de un APU con sus debidos soportes y remitido a esta interventoría para su debido análisis.

Así las cosas, en lo que tiene que ver con la obra civil ya existe un preacuerdo verbal, por lo cual instamos nuevamente al CONSORCIO MIA GP a ejecutar estar actividades, con el fin de mitigar el riesgo al que se encuentra expuesto el estudiantado, precisamente por las obras de demolición que adelantaron en la IED.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE

[El texto citado está oculto]

CONSORCIO TIG <consorciotig@gmail.com> 16 de julio de 2023, 16:05
Para: ConsorcioMiaGPRU <consorciomiagpru2022@gmail.com>
Cc: HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS <Htibaquira@educacionbogota.gov.co>, ALEXANDER OSORIO PAEZ <Alosorio@educacionbogota.gov.co>, MIGUEL ANGEL TURMEQUE BUSTOS <mturmeque@educacionbogota.gov.co>, OBRAS MIA-GP <obrasmiagp@gmail.com>

Señores
CONSORCIO MIA GP

Cordial saludo.

Seguimos a la espera de la materialización de esta solución, destacando que actualmente en la IED hay una serie de demoliciones que realizó el CONSORCIO MIA GP y el riesgo de que se presente cualquier accidente es bastante alto. Así mismo, la afectación por los olores es muy grande y en cualquier momento la IED manifestará contundentemente su desacuerdo frente a esta situación, para lo cual, instamos a que se proceda de manera inmediata.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
[El texto citado está oculto]

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-282

Bogotá, D.C, julio 20 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: REMISIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS LA IED FE Y ALEGRIA Y MANUEL DEL SOCORRO SEDE A

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite remitir para su conocimiento y archivo del caso, los levantamientos topográficos de las siguientes sedes:

1. IED FE Y ALEGRÍA PALERMO SUR
2. IED MANUEL DEL SOCORRO SEDE A

Lo anterior, como sustento al pago del ítem 1.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, dado que en estas dos (2) sedes fue necesaria esta actividad, con el fin de identificar lo siguiente:

1. Curvas de nivel del área existente.
2. Áreas aferentes reales de intervención.

Adicionalmente, sirvió como insumo para la realización de los conceptos técnicos o soluciones constructivas, en lo que tiene que ver a manejo de aguas lluvias, entre otros.

Tener presente que en la IED FE Y ALEGRÍA PALERMO SUR se realizó el levantamiento de toda el área, ya que se ha estimado una posible intervención adicional en otro espacio del colegio y se requiere como tal las curvas de nivel y las áreas aferentes, para los análisis que sean requeridos por parte de la SED. Así mismo se destaca que el alcantarillado pluvial se está concibiendo para todo el colegio y era necesario evaluar la velocidad que alcanza el agua desde el punto más distante y para ello se requería la altimetría.

Sin otro particular.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Dos (2) archivos comprimidos en WinRAR. Uno de 2,55Mb y otro de 19,2MB

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-283

Bogotá, D.C, julio 20 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Preocupación por el estado de entrega definitiva de baterías sanitarias de la IED Reino de Holanda A e IED Alfredo Iriarte

Respetados señores:

Por medio de la presente, el CONSORCIO TIG quien funge en calidad de interventoría, se permite reiterar nuevamente su preocupación por el NO cumplimiento del CONSORCIO MIA GP en lo que respecta a la entrega de las obras centralizadas en las baterías sanitarias de la IED Reino de Holanda sede A e IED Alfredo Iriarte sede A.

Lo anterior, ya que en primera instancia el compromiso de entrega de dos (2) niveles de baterías en cada colegio estaba previsto para el 09 de julio de 2023 y a la fecha una vez transcurridos once (11) días calendario del vencimiento de ese plazo perentorio, se siguen sin entregar estos espacios, debido a las obras inconclusas que ha venido causando el contratista de obra.

Comenzando por la IED Reino de Holanda sede A, encontramos que las baterías del primer nivel se encontraban el día de hoy en el siguiente estado:



Fotografía No.1 – Baterías del primer nivel IED Reino de Holanda sede A
Fuente. Registro tomado en obra por el CONSORCIO TIG

Como se logra evidenciar en la fotografía No.1, todavía está pendiente la instalación y fijación de los mesones de los lavamanos, la instalación de las griferías, acabados de los soportes de los mesones, puertas principales de acceso, entre otros. Lo agravante en el asunto, es que colegio está ejerciendo presión constantemente por la urgencia que tienen por el uso de este espacio y el contratista de obra permite que pasen jornadas completas sin realizar labor alguna; caso puntual, el día de hoy.

Continuando con este colegio, las baterías sanitarias del tercer piso y que fueron puestas en funcionamiento por contingencia en la IED, aún continúan presentando fugas a través de algunas griferías, los soportes de los mesones están sin pintar, los sifones de desagüe presentan excesos de varios materiales con los que han intentando controlar las fugas, entre otros. Esta situación puede evidenciarse a través de la siguiente fotografía:



Fotografía No.2 – Baterías del tercer nivel IED Reino de Holanda sede A
Fuente. Registro tomado en obra por el CONSORCIO TIG

Pasando a la IED Alfredo Iriarte sede A, tenemos una situación parecida, donde no se ha podido entregar ninguno de los dos (2) niveles de baterías, ya que los accesorios que abastecen de agua los sanitarios tienen fugas constantemente, no se han repuesto unos aparatos que fueron averiados por el personal operativo del CONSORCIO MIA GP, entre otros.

El día de hoy sucedió exactamente la misma situación, donde el contratista de obra no llevó a cabo labores en este colegio, promoviendo que la tensión con las directivas de la IED se agudice aún más y desconociendo de sobremanera la urgencia que existe con la entrega de estos espacios.



Fotografía No.3 – Baterías del segundo nivel IED Alfredo Iriarte sede A
Fuente. Registro tomado en obra por el CONSORCIO TIG

CONSORCIO TIG

Así las cosas, el CONSORCIO TIG en su calidad de interventoría, conmina al CONSORCIO MIA GP para que a más tardar el domingo 23 de julio de 2023 finalice determinantemente las obras que tienen que ver con estos espacios antes cuestionados, so pena solicitar a la Entidad Contratante que inicie los procedimientos legales a que haya lugar.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos Sin folios

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-284

Bogotá, D.C, julio 24 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACION DE INFORME SEMANAL No.27

Respetados señores:

Por medio del presente, esta interventoría se permite remitir el informe semanal de interventoría No.27, correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente contractual literal *G. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO*. El periodo del informe semanal se relaciona a continuación:

- **Informe semanal No.27:** 17/07/2023 al 23/07/2023

Sin otro particular.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Siete (7) folios

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-285

Bogotá, D.C, julio 24 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Informe de visita con observaciones a atender desde las áreas SST y Ambiental

Respetados señores:

Por medio de la presente, el CONSORCIO TIG quien funge en calidad de interventoría, se permite allegar a ustedes la copia del informe gestado desde la SED y que corresponde a la visita técnica efectuada el pasado 17 de julio de 2023, relacionada con los componentes SST y Ambiental.

Dentro de dicho documento se relacionan una serie de observaciones identificadas por parte de la profesional de la Entidad, de donde le solicitamos especial atención a las que sean de su resorte, ya que hay varias que tienen que ver con hallazgos que no hacen parte de nuestra competencia.

Quedamos atentos al resultado de su gestión y esta misma semana estaremos realizando una verificación in situ, para validar la diligencia con la que el

CONSORCIO TIG

CONSORCIO MIA GP atenderá cada una de las observaciones que le sean de su competencia.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

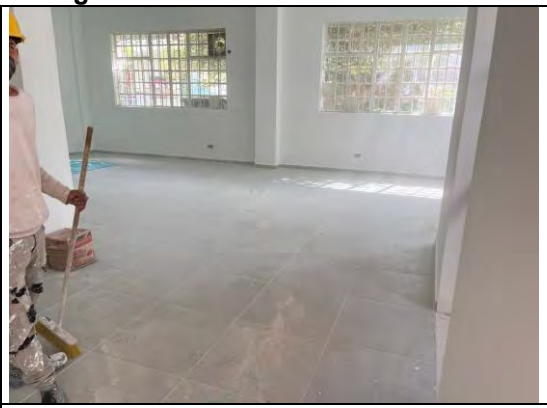
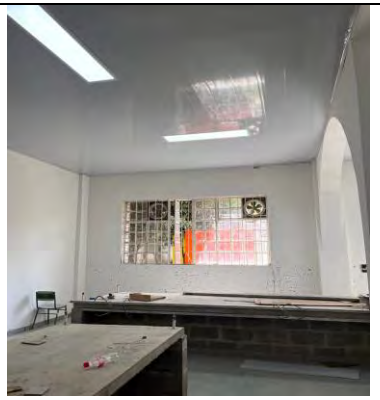
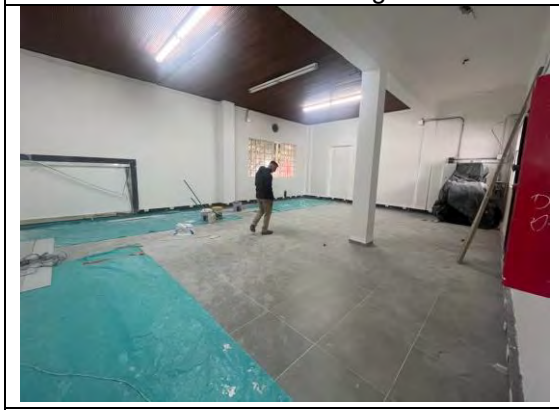
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos Diez (10) folios

INFORME DE VISITA TÉCNICA

Código		**Fecha**	12/07/2023	**Inicio**	**09:00 am**	**Fin**	**2:00pm**	**Lugar**	**Rafael Uribe Uribe**
Proyecto	**Liceo Femenino Mercedes Nariño – Enrique Olaya Herrera – Diana Turbay Sede B – Palermo Sur - San Agustín sede A - Reino de Holanda sede A – Manuel del Socorro Rodríguez sede A**					**Asunto**	Visita ambiental de obras de mejoramientos		
Asistentes	Paula Arango					**Asist. Externos**	Interventoría y contratista		
Fecha de Elaboración	24/07/2023	**Elaborado por**	PAULA ANDREA ARANGO RESTREPO					**Próxima Reunión**	No especificada

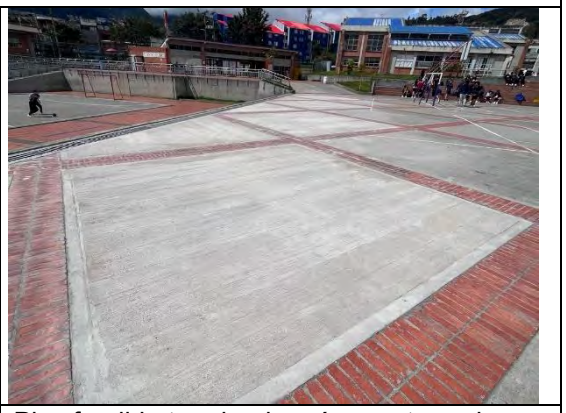
Se realizó nueva visita a los frentes activos del contrato de mejoramientos 2022 de la localidad de Rafael Uribe Uribe (Grupo 8) con el fin de revisar el cumplimiento ambiental y SST de las obras. Se relaciona a continuación el registro fotográfico con lo evidenciado:

Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño

		
Aviso en fachada formato antiguo	Acabados remodelación de laboratorios	Adecuación laboratorios – en orden
		
Terminación adecuación laboratorios – orden y aseo al día	Protección del cárcamo – se recomienda reemplazo	Zona de tala de árboles aprobados por emergencia

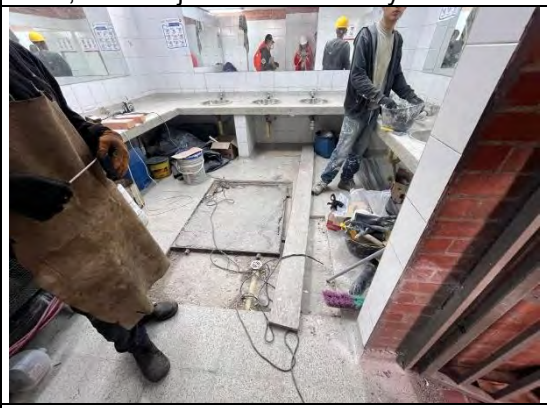
INFORME DE VISITA TÉCNICA

Código		**Fecha**	12/07/2023	**Inicio**	**09:00 am**	**Fin**	**2:00pm**	**Lugar**	**Rafael Uribe Uribe**
Proyecto	**Liceo Femenino Mercedes Nariño – Enrique Olaya Herrera – Diana Turbay Sede B – Palermo Sur - San Agustín sede A - Reino de Holanda sede A – Manuel del Socorro Rodríguez sede A**					**Asunto**	Visita ambiental de obras de mejoramientos		
Asistentes	Paula Arango					**Asist. Externos**	Interventoría y contratista		
Fecha de Elaboración	24/07/2023	**Elaborado por**	PAULA ANDREA ARANGO RESTREPO			**Próxima Reunión**	No especificada		

		
Acopio de material y escombro cubierto y delimitado	Acopio de material delimitado	Adecuación de laboratorios – reforzar uso de EPP y jornada de aseo
Enrique Olaya Herrera		
		
Aviso en fachada formato antiguo	Tocón de árbol aprobado para tala por emergencia	Piso fundido terminado – área entregada en orden

INFORME DE VISITA TÉCNICA

Código		**Fecha**	12/07/2023	**Inicio**	**09:00 am**	**Fin**	**2:00pm**	**Lugar**	**Rafael Uribe Uribe**
Proyecto	**Liceo Femenino Mercedes Nariño – Enrique Olaya Herrera – Diana Turbay Sede B – Palermo Sur - San Agustín sede A - Reino de Holanda sede A – Manuel del Socorro Rodríguez sede A**					**Asunto**	Visita ambiental de obras de mejoramientos		
Asistentes	Paula Arango					**Asist. Externos**	Interventoría y contratista		
Fecha de Elaboración	24/07/2023	**Elaborado por**	PAULA ANDREA ARANGO RESTREPO					**Próxima Reunión**	No especificada

		
Acopio temporal de escombro en desorden, cerramiento en buen estado	Mejoramiento de baños – reforzar uso de EPP, realizar jornada de orden y aseo	Acopio de RCD aprovechable sin delimitar ni cubrir
		
Acopio de RCD aprovechable sin delimitar ni cubrir	Remodelación de baño – falta orden y aseo	Organizar área para ubicar pertenencias de los trabajadores

INFORME DE VISITA TÉCNICA

Código		**Fecha**	12/07/2023	**Inicio**	**09:00 am**	**Fin**	**2:00pm**	**Lugar**	**Rafael Uribe Uribe**
Proyecto	**Liceo Femenino Mercedes Nariño – Enrique Olaya Herrera – Diana Turbay Sede B – Palermo Sur - San Agustín sede A - Reino de Holanda sede A – Manuel del Socorro Rodríguez sede A**					**Asunto**	Visita ambiental de obras de mejoramientos		
Asistentes	Paula Arango					**Asist. Externos**	Interventoría y contratista		
Fecha de Elaboración	24/07/2023	**Elaborado por**	PAULA ANDREA ARANGO RESTREPO					**Próxima Reunión**	No especificada

Diana Turbay sede B

		
Aviso en fachada formato antiguo	Acopio de material granular en espacio público, sin delimitar, cubrir ni proteger piso	Área de trabajo en orden al interior
		
Área adecuación de baños – reforzar ubicación de herramientas	Acopio de material bajo techo en orden	Punto ecológico – reforzar capacitaciones de su uso, implementar las bolsas según código de colores

INFORME DE VISITA TÉCNICA

Código		**Fecha**	12/07/2023	**Inicio**	**09:00 am**	**Fin**	**2:00pm**	**Lugar**	**Rafael Uribe Uribe**
Proyecto	**Liceo Femenino Mercedes Nariño – Enrique Olaya Herrera – Diana Turbay Sede B – Palermo Sur - San Agustín sede A - Reino de Holanda sede A – Manuel del Socorro Rodríguez sede A**					**Asunto**	Visita ambiental de obras de mejoramientos		
Asistentes	Paula Arango					**Asist. Externos**	Interventoría y contratista		
Fecha de Elaboración	24/07/2023	**Elaborado por**	PAULA ANDREA ARANGO RESTREPO			**Próxima Reunión**	No especificada		

		
Batería Sanitaria portátil con mantenimientos periódicos	Acopio de material bajo techo en orden	Reemplazo cubierta asbesto cemento. Reforzar medidas de prevención de caídas al vacío
Palermo Sur		
		
Aviso en fachada formato antiguo	Acopio de materiales granulares sin delimitar ni cubrir	Acopio de materiales prefabricados en orden sin cubrir

INFORME DE VISITA TÉCNICA

Código		**Fecha**	12/07/2023	**Inicio**	**09:00 am**	**Fin**	**2:00pm**	**Lugar**	**Rafael Uribe Uribe**
Proyecto	**Liceo Femenino Mercedes Nariño – Enrique Olaya Herrera – Diana Turbay Sede B – Palermo Sur - San Agustín sede A - Reino de Holanda sede A – Manuel del Socorro Rodríguez sede A**					**Asunto**	Visita ambiental de obras de mejoramientos		
Asistentes	Paula Arango					**Asist. Externos**	Interventoría y contratista		
Fecha de Elaboración	24/07/2023	**Elaborado por**	PAULA ANDREA ARANGO RESTREPO			**Próxima Reunión**	No especificada		

		
Acopio de RCD mezclados, sin delimitar ni cubrir	Reemplazo cubierta asbesto cemento. Recomendación de acopiar RCD	Acopio de arena sin delimitar ni cubrir
		
Acopio de materiales- Se recomienda jornada de aseo y limpieza	Reforzar medidas preventivas por riesgo eléctrico	Reforzar medidas preventivas de riesgo eléctrico y caídas por cables atravesados en áreas de circulación

INFORME DE VISITA TÉCNICA

Código		**Fecha**	12/07/2023	**Inicio**	**09:00 am**	**Fin**	**2:00pm**	**Lugar**	**Rafael Uribe Uribe**
Proyecto	**Liceo Femenino Mercedes Nariño – Enrique Olaya Herrera – Diana Turbay Sede B – Palermo Sur - San Agustín sede A - Reino de Holanda sede A – Manuel del Socorro Rodríguez sede A**					**Asunto**	Visita ambiental de obras de mejoramientos		
Asistentes	Paula Arango					**Asist. Externos**	Interventoría y contratista		
Fecha de Elaboración	24/07/2023	**Elaborado por**	PAULA ANDREA ARANGO RESTREPO			**Próxima Reunión**	No especificada		

San Agustín sede A

		
Aviso en fachada formato actual	Acopio de material y RCD sin delimitar ni cubrir. Realizar jornada de orden y aseo	Adecuación de baños. Reforzar uso de EPP, jornada de orden y aseo
		
Cubierta impermeabilizada. Falta retiro de RCD	Acopio de material y escombro delimitado. El rector solicita despejar área y reducir cerramiento a la estructura demolida	Acopio temporal de RCD y material en cubierta en desorden. Realizar jornada de aseo y limpieza

INFORME DE VISITA TÉCNICA

Código		**Fecha**	12/07/2023	**Inicio**	**09:00 am**	**Fin**	**2:00pm**	**Lugar**	**Rafael Uribe Uribe**
Proyecto	**Liceo Femenino Mercedes Nariño – Enrique Olaya Herrera – Diana Turbay Sede B – Palermo Sur - San Agustín sede A - Reino de Holanda sede A – Manuel del Socorro Rodríguez sede A**					**Asunto**	Visita ambiental de obras de mejoramientos		
Asistentes	Paula Arango					**Asist. Externos**	Interventoría y contratista		
Fecha de Elaboración	24/07/2023	**Elaborado por**	PAULA ANDREA ARANGO RESTREPO					**Próxima Reunión**	No especificada

Reino de Holanda sede A



Aviso en fachada formato antiguo



Acopio estructura de andamio delimitado



Baños remodelados. Ahorradores tipo push



Salones remodelados, cubierta cambiada



Acopios de vidrio mezclados con otros RCD. Falta separación



Acopio de material y RCD en desor5d4en. Requiere jornada de aseo y limpieza

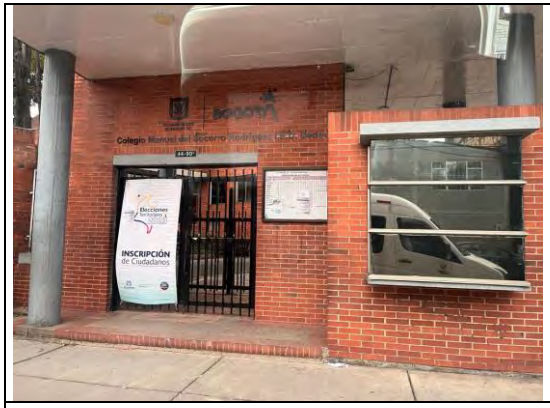
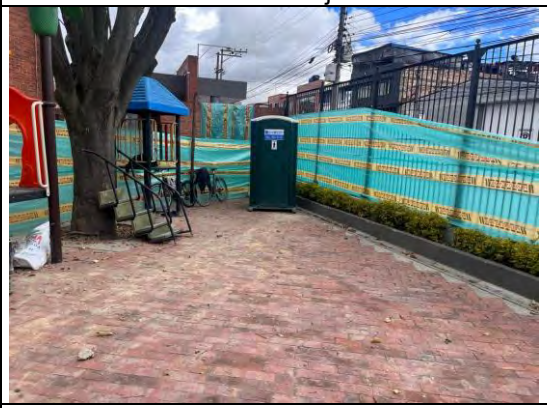
Manuel del Socorro Rodríguez sede A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORME DE VISITA TÉCNICA

BOGOTÁ

Código		**Fecha**	12/07/2023	**Inicio**	**09:00 am**	**Fin**	**2:00pm**	**Lugar**	**Rafael Uribe Uribe**
Proyecto	**Liceo Femenino Mercedes Nariño – Enrique Olaya Herrera – Diana Turbay Sede B – Palermo Sur - San Agustín sede A - Reino de Holanda sede A – Manuel del Socorro Rodríguez sede A**					**Asunto**	Visita ambiental de obras de mejoramientos		
Asistentes	Paula Arango					**Asist. Externos**	Interventoría y contratista		
Fecha de Elaboración	24/07/2023	**Elaborado por**	PAULA ANDREA ARANGO RESTREPO			**Próxima Reunión**	No especificada		

		
Aviso en fachada formato nuevo	Adecuación de cancha. Cerramiento en buen estado, EPP ok, acopios de materiales deben cubrirse al finalizar jornada	Se debe bombear el agua aposada filtrando previamente material suspendido
		
Acopios de materiales deben cubrirse al finalizar jornada	Batería Sanitaria portátil con mantenimientos periódicos	Se recomienda cubrir con polisombra en malla los arbustos para protegerlos del material suspendido y las maniobras

INFORME DE VISITA TÉCNICA

Código		**Fecha**	12/07/2023	**Inicio**	**09:00 am**	**Fin**	**2:00pm**	**Lugar**	**Rafael Uribe Uribe**
Proyecto	**Liceo Femenino Mercedes Nariño – Enrique Olaya Herrera – Diana Turbay Sede B – Palermo Sur - San Agustín sede A - Reino de Holanda sede A – Manuel del Socorro Rodríguez sede A**					**Asunto**	Visita ambiental de obras de mejoramientos		
Asistentes	Paula Arango					**Asist. Externos**	Interventoría y contratista		
Fecha de Elaboración	24/07/2023	**Elaborado por**	PAULA ANDREA ARANGO RESTREPO			**Próxima Reunión**	No especificada		

Conclusiones y Recomendaciones

1. La DCCEE realizó recorrido por los frentes de obra activos, se remite el presente informe con las observaciones puntuales que se pusieron en conocimiento de los profesionales ambientales de obra e interventoría.
2. Se recomendó a los contratistas realizar el nuevo cargue del informe trimestral de RCD.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-286

Bogotá, D.C, julio 24 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE OBRA No. 6

Respetados señores:


Por medio de la presente, nos permitimos remitir el Acta de Pago Parcial de obra No.6, allegado por parte del contratista de obra CONSORCIO MIA GP y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, damos el correspondiente aval con soporte en los documentos anexos para el trámite del acta parcial de obra No.6:

1. Oficio de solicitud de aprobación de obra a interventoría
2. Oficio de solicitud de aprobación de interventoría a la SED
3. Acta parcial en Excel y PDF
4. Memorias de Calculo
5. Aportes parafiscales
6. FURC - hoja información de pagos
7. RUT CONSORCIO
8. Pre Factura No. MGP-05
9. Resolución de facturación DIAN
10. Certificación Bancaria
11. Acta de autorización de pagos

12. Anexos

Esta documentación esta con sus respectivos soportes debidamente revisados, avalados y aprobados por esta Interventoría y por ello recomienda a la Secretaria de Educación tramitar el pago No.6 correspondiente al periodo del 20 DE JUNIO DE 2023 AL 19 DE JULIO DE 2023 con un porcentaje total de avance del contrato a la fecha de 36,88%.

Atentamente,



Edgar Alfredo Salazar Bernal
Representante legal
CONSORCIO TIG
Nit: 90164989-03
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-287

Bogotá, D.C, julio 25 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No.6

Respetados señores:

Por medio de la presente, y en cumplimiento a las obligaciones contractuales esta interventoría realiza la entrega del Acta de cobro Parcial No. 6 correspondiente al periodo del 20 DE JUNIO DE 2023 AL 19 DE JULIO DE 2023, para su correspondiente revisión y aprobación. Dentro de este contexto se anexa los documentos soporte para el trámite del acta parcial:

1. Oficio de solicitud de aprobación de acta interventoría
2. Acta parcial en Excel y PDF
3. Aportes parafiscales
4. FURC - hoja información de pagos
5. RUT CONSORCIO
6. RIT CONSORCIO
7. Pre Factura
8. Resolución de facturación DIAN
9. Certificación Bancaria
10. Acta de autorización de pagos

CONSORCIO TIG

Atentamente,



Edgar Alfredo Salazar Bernal
Representante legal
CONSORCIO TIG
Nit: 90164989-03
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-288

Bogotá, D.C, julio 26 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIOS MARRUECOS Y MOLINOS, FE Y ALEGRIA PALERMO SUR, ALEXANDER FLEMING

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Ricardo Castañeda	79725999	Ayudante	Marruecos y Molinos
2	Ermis Bastos	1094276006	Ayudante	Fe y Alegría
3	Ismael Pineda	1010134416	Ayudante	Alexander Fleming

CONSORCIO TIG

4	Julio Rodriguez	79793644	Ayudante	Alexander Fleming
5	Wilmer Acosta	4559308	Ayudante	Alexander Fleming

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe

Anexo. Documentación del personal

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 18/07/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	154	19/07/2023	CC 1094276006	BASTO MORA ERMIS	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

DE32761431FC65943DDA245434352A8A Certificado impreso el día 7/18/2023 5:14:10 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

ERMIS
BASTO MORA
1094276006
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS

No. de Radicado: 28211859

Fecha de Radicación							
1	8	0	7	2	0	2	3

RADICADO

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1.Tipo de Trámite
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]

2.Tipo de Afiliación
A.Individual [ ] Cotizante o Cabeza Familia [X] Beneficiario o Familiar adicional [ ]
B. Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ]

3. Regimen
C. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5.Tipo de Cotizante
A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

Código (a registrar por la EPS): 01

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
BASTO	MORA	ERMIS	
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo documento de Identidad	8. Número del documento de Identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
CC	1094276006	Femenino [ ] Masculino [X]	22/11/1985

III.DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11.Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
06	Tipo [F][N][M] Condición [T][P]		00

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de Cotización - IBC
POSITIVA S.A.	003 / PORVENIR	1.160.000

18. Residencia			
AVENIDA 34 09 34	3133138066	3133138066	ermisbastp85@hotmail.com
Dirección	Teléfono fijo	Teléfono Celular	Correo electrónico

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
54001 / CUCUTA	Urbana [X] Rural [ ]		54 / NORTE DE SANTANDER

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyugue o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. fecha de Nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Numero del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentescos	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Rural	Departamento	Telefonofijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C	SINERGIA U.P.R.E.C CUCUTA PPR	SINERGIA UNIDAD BASICA CENTRO P P R	30600433	30600437
B				
B				
B				

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	01

39. Ubicación				
CLL 3 # 7B-140 URBANIZACION ALTAMIRA	5801473	obras.joyavi@gmail.com	LOS PATIOS	NORTE DE SANTANDER
Dirección	Teléfono	Correo electronico	Municipio/Distrito	Departamento

Famisanar EPS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y correcciónde datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	1 8 0 7 2 0 2 3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado — Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:	0	0	0	1	0	0	0	0	1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la teminación de la unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Codigo del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70.Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones: _____

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ERMIS BASTO MORA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.094.276.006**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 18 de Julio del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901670495
Número Afiliación:	9015917
Razón social:	SERVICIOS Y ASESORIAS LA MAYA S.A.S.

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1010134416
Nombre:	ISMAEL PINEDA RIOS
Fecha Ingreso:	18/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1110
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	17/7/2023 10:40:56 AM

Famisanar EPS

NIT 830.003.564-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

9010220495

9010220495

No. de Radicación: 26504444

Fecha de Radicación: 17 07 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación: X	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia: X	A. Contributivo: X	A. Cotizante: X	A. Dependiente: X	
B. Reporte de Novedades:	• Beneficiario o afiliado adicional:	B. Subsidiado:	B. Cabeza de familia:	B. Independiente:	
	B. Colectiva:		C. Beneficiario:	C. Pensionado:	
	C. Institucional:				
	D. De oficio:				

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: PINEDA	Segundo Apellido: RIOS	Primer Nombre: ISMAEL	Segundo Nombre:

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1010134416	Femenino: Masculino: X	D D: 02 M M: 10 A A A A: 2000

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
6	Tipo: F N M Condición: T P	0		AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	PORVENIR S. A.

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia			
$1.160.000	Dirección:	Teléfono fijo: NT	Teléfono celular:	

Correo electrónico	Municipio: BOGOTA	Zona: Urbana X Rural	Localidad / Corregimiento	Departamento: DISTRITO CAPITAL

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino: Masculino:	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)	Datos complementarios: 29. Parentesco	Datos complementarios: 30. Etnia
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrarpo rla EPS)
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	1	
B		
B		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
SERVICIOS Y ASESORIAS LA MAYA	NT	901670495	

39. Ubicación				
TV 9 ESTE 3 03 BRR LA	3204724408	Correo electrónico:	Municipio / Distrito: FACATATIVA	Departamento: CUNDINAMARCA

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación ☐ 3. Actualización del documento de identidad ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS ☐ Código ☐ 6. Reinscripción en la EPS ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado ☐ 14. Traslado: A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen ☐ 15. Reporte de fallecimiento ☐
16. Reporte del trámite de protección al cesante ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado ☐

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
		Femenino: Masculino:	D D M M A A A A	17 07 2023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
NINGUNA		

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.	X
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.	
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.	
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.	
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.	X
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.	X
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.	X
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.	X

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☐ PA ☐ CE ☐ CD ☐ SC ☐ Cantidad: ☐ Total ☐

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.	
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.	
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.	
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.	
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.	
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.	
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.	
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.	
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.	

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de la ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación (D D M M A A A A)	69. Fecha de validación (D D M M A A A A)

70. Datos del funcionario que realiza la validación: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:
		CARGO: AYUDANTE DE OBRA

71. Firma del funcionario

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

PONTEDO E.A. NIT. 860.513.413 - 0 TEL. (1)234 55 55

07/2016

INTERNET

9010220495

9010220495

Famisanar EPS

NIT 830.003.564-7

CUESTIONARIO ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO

	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y deberes del Afiliado y del Paciente?	X	
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	X	
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?	X	
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	X	
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	X	
¿Autoriza a EPS Famisanar S.A.S el envio de la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño al correo electrónico?		X

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES

En mi calidad de cotizante, manifiesto de manera clara, expresa, libre, inequívoca y espontánea que le otorgo a la EPS FAMISANAR S.A.S en su calidad de RESPONSABLE del tratamiento de mis datos personales, mi consentimiento previo para recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, reportar y en general para tratar los DATOS PERSONALES, DATOS PERSONALES SENSIBLES y demás información susceptible de tratamiento, registrada a mi nombre y/o de los beneficiarios de mi grupo familiar en sus Bases de Datos, con la finalidad de realizar las actividades propias del aseguramiento en salud y en los términos previstos en su POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN y AVISO DE PRIVACIDAD, disponibles en ***www.famisanar.com.co***, todo lo cual conforme lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás normas que la sustituyan, adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen.

Así mismo manifiesto que mis derechos como titular de los datos son los consagrados en la Constitución Nacional y la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar; y, a suprimir mi información personal y revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales cuando ello fuera procedente (artículo 9° Decreto 1377 de 2013).

"Datos sensibles: *Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos." (Numeral 3° artículo 3° Decreto 1377 de 2013).*

Firma del afiliado:

_____

Nombres y Apellidos _____

Identificación: _____

AUTORIZACIÓN DONACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS - LEY 1805 DE 2016

De acuerdo a lo definido en el articulo 4° de la Ley 1805, manifiesto a continuación que mi voluntad de ser donante de órganos y tejidos es:

SI ☐ **NO** ☒

Firma del afiliado:

_____

Nombres y Apellidos _____

Identificación: _____

"ARTÍCULO 15. Los menores de edad podrán ser donantes de órganos y tejidos, siempre y cando sus representantes legales expresen su consentimiento informado para la donación de órganos y/o tejidos dentro de las (8) horas siguientes a la concurrencia de la muerte cerebral. El médico responsable deberá informarles sus derechos y los beneficios de la donación.

FIRMA A RUEGO

A ruego del señor (a) _____ identificado (a) con el documento _____ No. _____ quien manifiesta no poder o no saber firmar, lo hace en su nombre el (la) señor(a) _____ quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo.

Como testigo, da fe de todo lo anterior y certifica que la huella aquí impuesta pertenece al señor (a) _____

_____

Firmante a Ruego:

_____

Nombres y Apellidos: _____

Identificación: _____

Edad: _____

Dirección de Domicilio: _____

Nombres y Apellidos de quien no sabe o no puede firmar: _____

Huella

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ISMAEL PINEDA RIOS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.010.134.416**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 17 de Julio del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901347653-8	TECNI DEPORTES COLOMBIA SAS	Calle 66 a sur No 66 81	3123381460	alfagrama1@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	23/06/2023	8368609851	$515.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	80.800				80.800	0	0	80.800			808	80.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	46.400	0	0	46.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
23.200	0	0	23.200	1
ICBF				
34.800	0	0	34.800	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	80.800	80.800
CCF	1	46.400	46.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	34.800	34.800
MEN	0	0	0
SENA	1	23.200	23.200
TOTALES	6	515.800	515.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901347653-8	TECNI DEPORTES COLOMBIA SAS		Calle 66 a sur No 66 81	3123381460	alfagrama1@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	23/06/2023	8368609851	$515.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79793644	RODRIGUEZ MORENO JULIO CESAR	1	0			N																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-18, 07:11:50 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 64664359

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 18/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVICIOS Y ASESORIAS LA MAYA				
Documento	NI901670495	**Dirección**	TV 9E NORTE #3 - 03		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	5
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	AMAYA MAURICIO	**Identificación**	CC1070944034		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3057090	ZABALA RICARDO	20	00	X															0	4	4	4	0	PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	EPS SANITAS	$ 154.667	$ 19.400	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 154.667	$ 10.800	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.000
CC 80031830	TORRES VILLANUEVA HERMES	20	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.160.000	$ 80.800	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400
CC 1024608596	BERNAL AFRICANO EDGAR MANUEL	20	00	X															0	5	5	5	0	PORVENIR	$ 193.334	$ 31.000	EPS SANITAS	$ 193.334	$ 24.200	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 193.334	$ 13.500	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.700
CC 1033763916	AGUILAR CONTRERAS MANUEL FERNANDO	20	00	X															0	5	5	5	0	PROTECCION	$ 193.334	$ 31.000	SALUD TOTAL EPS	$ 193.334	$ 24.200	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 193.334	$ 13.500	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.700
PT 4559308	ACOSTA TORRES WILMER ALEXANDER	20	00	X															0	5	5	5	0	PORVENIR	$ 193.334	$ 31.000	NUEVA EPS	$ 193.334	$ 24.200	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 193.334	$ 13.500	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.894.669	$ 1.894.669	$ 1.894.669	$ 0	$ 303.400	$ 0	$ 0	$ 237.000	$ 132.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 672.500	$ 0	$ 672.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 21/07/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	157	22/07/2023	CC 79725999	CASTAÑEDA REYES RICARDO	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

0654C69E091D41B9DC92565839244710 Certificado impreso el día 7/21/2023 9:59:21 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

RICARDO
CASTAÑEDA REYES
79725999
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS

No. de Radicación: 28211861

Fecha de Radicación
2 1 0 7 2 0 2 3

RADICADO

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1.Tipo de Trámite	2.Tipo de Afiliación	3. Regimen
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A.Individual [ ] Cotizante o Cabeza Familia [X] Beneficiario o Otra adicional [ ] B. Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ]	C. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado	5.Tipo de Cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	01

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
CASTAÑEDA	REYES	RICARDO	
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo documento de Identidad	8. Número del documento de Identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
CC	79725999	Femenino [ ] Masculino [X]	0 4 0 3 1 9 9 7

III.DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
0 6	Tipo [F][N][M] Condición [T][P]		0 0

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de Cotización - IBC
POSITIVA S.A.	005 / COLFONDOS	1.160.000

18. Residencia			
AVENIDA 34 09 34	3133138066	3133138066	ricardocas@hotmail.com
Dirección	Teléfono fijo	Teléfono Celular	Correo electrónico

54001 / CUCUTA	Zona Urbana [X] Rural [ ]		54 / NORTE DE SANTANDER
Municipio/Distrito		Localidad/Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyugue o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. fecha de Nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Numero del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentescos	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Telefonofijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C	SINERGIA U.P.R.E.C CUCUTA PPR	SINERGIA UNIDAD BASICA CENTRO P P R	30600433	30600437
B				
B				
B				

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	0 1

39. Ubicación				
CLL 3 # 7B-140 URBANIZACION ALTAMIRA	5801473	obras.joyavi@gmail.com	LOS PATIOS	NORTE DE SANTANDER
Dirección	Teléfono	Correo electronico	Municipio/Distrito	Departamento

Famisanar EPS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y correcciónde datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	2 1 0 7 2 0 2 3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:	0	0	0	1	0	0	0	0	1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la teminación de la unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Codigo del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70.Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones: _____

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) RICARDO CASTAÑEDA REYES identificado con C.C No. 79.725.999, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 21 de julio del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.

Carolina Galvis Castellanos
Gerente de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías

CONSORCIO TIG

Bogotá, D.C, julio 27 de 2023

TIG-MEM-289

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.6

Respetados señores:

Por medio del presente comunicado y dando cumplimiento integral a las obligaciones contractuales, se presenta informe mensual de interventoría No.6 correspondiente al periodo JUNIO 20 DE 2023 A JULIO 19 DE 2023. El cual contiene sus respectivos aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, sociales y ambientales establecidos en los pliegos de condiciones y establecido en el Manual Integrado de Contratación de la SED.

Sin otro particular.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo Un (1) archivo PDF de 1231 folios

CONSORCIO TIG

Bogotá, D.C, julio 28 de 2023

TIG-MEM-290

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Respuesta de derecho de petición con radicado E-2023-107301 - IED Gustavo Restrepo sede A

Respetados señores:

Por medio de la presente y conforme a su solicitud relacionada con la elaboración de la respuesta al derecho de petición allegado a las instalaciones de la SED mediante radicado No. E-2023-107301 y que data del 19 de julio de 2023, esta interventoría se permite realizar las siguientes precisiones, con el firme propósito de que sean tenidas en cuenta para tal fin, a saber:

1. Se sale de nuestra injerencia la problemática descrita y relacionada con el suministro de los almuerzos por parte de la IED. Así mismo, el hecho que tiene que ver con la solicitud del reconocimiento del servicio no prestado durante el periodo referenciado.

2. En lo que respecta a la emergencia propiciada en la IED y que fue atendida de manera parcial por parte del CONSORCIO MIA GP desde el pasado 26 de junio de 2023, esta interventoría manifiesta que a hoy el sistema sanitario

ya quedó liberado de los taponamientos que generaron la problemática de rebose de grasas en las baterías sanitarias contiguas al comedor estudiantil.

3. El procedimiento llevado a cabo por parte de la firma contratista, permite que a hoy el sistema funcione como lo venía haciendo, es decir, con una combinación indebida de aguas residuales con aguas industriales, antes de que estas últimas pasen por la trampa de grasas. No obstante, las redes venían supliendo la necesidad de conducir estas aguas hasta su descarga, muy a pesar de que el sistema no sea el pertinente para este tipo de operatividad.

4. Si bien el sistema no es pertinente como ya se mencionó en el apartado anterior, el aporte constante de las grasas a las redes sin previo manejo, fue el detonante para este taponamiento y/o colapso.

5. En estos momentos las redes permitirían que el comedor funcione, pero con el riesgo que se vuelva a presentar la problemática de taponamiento, precisamente por la combinación de las aguas.

6. En lo que respecta a la separación de los sistemas para aguas residuales y aguas industriales, en estos momentos no se ha iniciado por parte del contratista de obra.

Sin otro particular.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo Sin folios

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-291

Bogotá, D.C, julio 30 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACION DE INFORME SEMANAL No.28

Respetados señores:

Por medio del presente, esta interventoría se permite remitir el informe semanal de interventoría No.28, correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente contractual literal *G. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO*. El periodo del informe semanal se relaciona a continuación:

- **Informe semanal No.28:** 24/07/2023 al 30/07/2023

Sin otro particular.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Siete (7) folios

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	31/07/2023	**PERIODO No.**	**28**	DEL	**24/07/2023**	AL	**30/07/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
PRÓRROGA :	N/A	PRORROGA 1:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	364	PLAZO ACTUALIZADO:	333
PLAZO TRANSCURRIDO:	208 EQUIVALE AL 57%	PLAZO TRANSCURRIDO:	191 EQUIVALE AL 57%
VALOR INICIAL :	$ 878.587.938,00	VALOR INICIAL :	$ 11.941.262.150,00
VALOR ADICION(ES):	$ 371.557.789,00	VALOR ADICION(ES):	$ 5.050.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.250.145.727,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 16.991.262.150,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.250.145.727,00	VALOR POR PAGAR:	$ 16.991.262.150,00
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ	INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	29/07/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	29/07/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	29/07/2023		No iniciado
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	29/07/2023		No iniciado
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS**	29/07/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023		No iniciado
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**191**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR ESTIMADO A EJECUTAR SEGÚN ACTUALIZACIÓN	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 237.764.000,00	$ 127.445.891,00	53,60%	4/07/2023	EN EJECUCIÓN
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 168.134.916,00	$ 189.296.411,36	112,59%	30/06/2023	EN EJECUCIÓN
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO

FECHA	31/07/2023	**PERIODO No.**	**28**	DEL	**24/07/2023**	AL	**30/07/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	$ 1.000.000.000,00	$ 252.167.680,84	25,22%	18/09/2023	EN EJECUCIÓN
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO	$ 516.187.772,00	$ 142.074.125,00	27,52%		EN EJECUCIÓN
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	$ 1.202.848.443,00	$ 367.656.008,89	30,57%	29/07/2023	EN EJECUCIÓN
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	$ 1.118.044.915,00	$ 832.482.091,23	74,46%	18/08/2023	EN EJECUCIÓN
8	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	$ 287.232.101,00	$ 213.473.404,48	74,32%	31/07/2023	EN EJECUCIÓN
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	$ 847.369.811,00	$ 243.153.226,00	28,70%		EN EJECUCIÓN
11	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL	$ 81.857.887,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	$ 706.568.305,00	$ 250.274.491,00	35,42%		EN EJECUCIÓN
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	$ 1.268.959.191,00	$ 641.275.976,69	50,54%	16/09/2023	EN EJECUCIÓN
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	$ 1.102.690.208,00	$ 583.019.585,70	52,87%	12/07/2023	EN EJECUCIÓN
15	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL	$ 498.001.754,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	$ 1.260.609.199,00	$ 997.161.234,25	79,10%	26/08/2023	EN EJECUCIÓN
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	$ 304.703.052,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
19	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	$ 656.544.890,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
20	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	$ 339.352.709,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR	$ 2.428.418.527,00	$ 603.022.889,75	24,83%	28/11/2023	EN EJECUCIÓN
22	COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
23	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	$ 335.852.053,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A	$ 506.413.760,00	$ 260.387.180,00	51,42%		EN EJECUCIÓN
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	$ 260.944.024,79	$ 230.944.024,79	88,50%	16/06/2023	EN EJECUCIÓN
26	EMERGENCIAS	$ 862.485.928,00	$ 143.635.741,07	16,65%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	Se inicia la actividad de resane de muro en la parte frontal de la cancha, y se comienza la actividad de pintura de la cancha con lavado en acido nitrico y sellamiento de juntas.	PERSONAL Profesional y técnico: cinco (5) personas - Rotativos Operativo: dos (2) personas Equipo: herramienta menor
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	Inicia actividad de cambio de grifería superior para sanitarios, se atienden observaciones referente a actividades de cambio de push, pintura y reposición de aparatos afectados durante la intervención.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Herramienta menor

FECHA	31/07/2023	**PERIODO No.**	**28**	DEL	**24/07/2023**	AL	**30/07/2023**

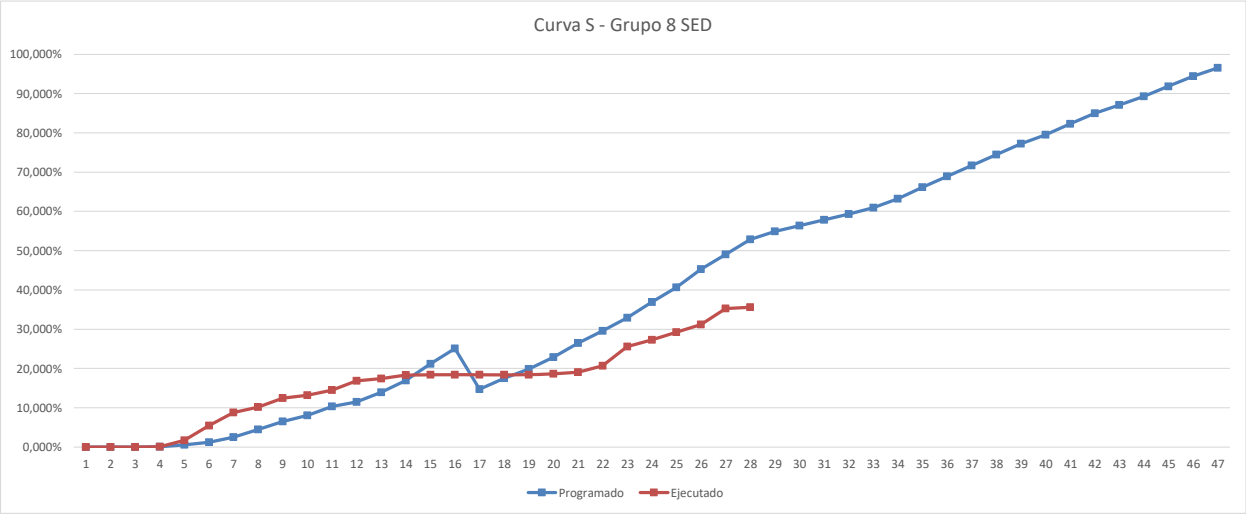
No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Se continua actividad de fundida de columnas a de bloque #2 -bateria de baños, se finalizo actividad de instalación de cubierta en bloque #3 se continua con aplicación de estuco en muros externos en bloque #3,. Finalmente se recomienda como minimo 3 tomas de concreto, rendimiento en obra y cumplimiento de la documentación referente a la seguridad social del pewrosnal operativo.	PERSONAL Maestro de Obra (1) personas - Rotativo Operativo: Seis (6) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	No se realizan actividades durante la semana, a pesar de que falta por instalar el cerramiento de la cubierta de preescolar. La entidad planea cambiar la intervención en la zona de las canchas	PERSONAL Profesional y técnico: Cero (0) persona - Rotativa Operativo: Cero (0) persona Equipo:
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	Se termina la actividad de intalacion de manto asfaltico en las vigas canal, se inicia la actividad de recoger el material y hacer aseo en el area de la cancha.	PERSONAL Profesional y técnico: Tres (3) personas - Rotativos Operativo: tres (3) personas Equipo: volqueta y Herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	Se finaliza el dia 22 de julio 2023, la actividad referente a la instalación de cubierta en el comedor, se requiere terminar las actividades referente a ventananeria, puertas en zona de Serigrafia, para posteriormente iniciar actividad referente a instalación de cubierta en auditorio ala sur.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Sies (6) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	Se continua con la actividad del granito y se comienza a pulir, se inicia la actividad de resane de mamposteria en el area de audiovisuales.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Seis (6) personas Equipo: Herramienta menor
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se continua con la fundida de los paños en concreto, se realiza la excavacion del carcamo perimetral y se continua con el relleno.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Seis (6) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	Continua actividad de instalación de refuerzo sobre muro fisurado, continua actividad de pañete con mortero impermeabilizado. Continua actividad de pintura sobre muro.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	inicia actividad de instalación de marcos y puertas, continua instalación de cubierta en policarbonato, continua actividad de emulsión asfáltica.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor, y equipos de soldadura
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Se realiza la instalación de 2 puntos de toma corriente en el piso 2 del bloque 2, se entrega el bloque numero 2 a la institucion, lo cual se esta esperando que desocupen el bloque 1 para comenzar la intervecnion.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: dos (2) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	Continua con observaciones de acabados en aulas 301-305 referente a encorozado,continuan emboquillado de enchapes en los baños del segundo piso,,el dia sábado 29 de julio de 2023 finalizó la actividad referente a la instalación de cubierta de la biblioteca,se requiere aumentar el personal operativo para mejorar el rendimiento en obra.	PERSONAL Profesional y técnico:Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Dos (02) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Se finalizo el dia 22 de julio la instalación de cubierta en bloque #11, pendiente emboquiilar piso en granito en el mismo bloque, se requiere recebo e instalar flanche, continuan con instalación de cubierta en bloque 12, el cual presento fiuras en muro, el cual en comité el dia 27 de julio 2023 la SED autorizó demoler dicho muro,se requiere mejorar rendimiento en obra.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	Continua actividad de instalación de manto asfáltico, Continua actividad de emulsión asfáltica.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Siete (7) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	Se termina las actividades de pintura y se espera por parte de la S.E.D la respuesta de la puerta antipanico si se va a realizar dicha actividad.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativas Operativo: Tres (1) personas- Rotativo Equipo: Herramienta menor
26	**EMERGENCIAS**	Se está a la espera del envío de la propuesta para la separación de los sistemas de aguas residuales de las aguas industriales en la IED Gustavo Restrepo sede A. Se atendió provisionalmente la emergencia en la IED Restrepo Millán sede D.	

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 8.983.452.059,47	52,87%	-17,28%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 6.047.469.961,69	35,59%	

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	31/07/2023	**PERIODO No.**	**28**	DEL	**24/07/2023**	AL	**30/07/2023**



6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Para el presente periodo, el atraso asciende al 17,28%, a causa del ritmo bajo de ejecución en varios frentes de obra y a la no alineación con la inversión prevista de recursos. Así mismo, esto es causal de la gestión no efectiva que está llevando a cabo el contratista de obra, donde no avanza en los frentes donde cuenta con la total disponibilidad del espacio y esto viene sumando representativamente al atraso causado a hoy.

También es importante tener presente que hay frentes que aparecen con un valor mayor a ejecutar en la programación, lo cual se traduce en que se programa más de lo que se va a ejecutar, causando una carga presupuestal no verás y aumentando el atraso del proyecto. Para evitar este fenómeno, con previo aval de la Entidad, se le ha solicitado al contratista de obra que actualice su programación partiendo de los rubros reales de inversión en cada frente, pero sin modificar las fechas de terminación. Esto sigue sin ser allegado debidamente para nuestra revisión.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
IED Diana Turbay sede B - Limpieza de la unidad sanitaria que está en obra	Contratista de obra	28/07/2023 (Incumplido)
IED Restrepo Millán sede B - Entrega del concepto del bloque No.1 sobre la optimización de la estructura	Contratista de obra	28/07/2023 (Incumplido)
Contrato en general - Exposición del plan de contigencia - Reprogramado	Contratista de obra	11/07/2023 (Incumplido)

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* El martes 11 de julio de 2023, se llevó a cabo reunión presencial en las instalaciones de la SED, con el fin de revisar los APUs no previstos comprendidos desde el NP09 al NP21. La SED informó que requería unos ajustes de forma y de fondo, pero que emitiriá la comunicación definitiva en lo que restaba de la semana y la misma no fue allegada. Sigue pendiente por envío de esa comunicación.
* El 19 de julio de 2023, se le remitió a la Entidad los APU's no previstos que cubren la intervención de la emergencia surgida en el Liceo Femenino y las puertas restantes de la IED Santa Lucía.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:

Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y se está a la espera de la entrega de su concepto técnico. Esto se sigue dilatando en el tiempo.
Colegio Gustavo Restrepo sede A: El contratista realiza el realce de una de las cajas que se destaparon y se funde el piso en concreto.


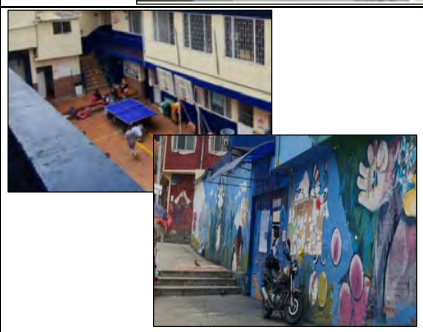


Al contratista de obra se le continúa reconociendo avances teóricos por suministros de materiales en obra, no obstante el avance materializado no es el esperado, ya que se siguen evidenciando atrasos. Esto, a pesar de realizar el análisis sobre la programación actualizada, la cual involucró el 100% de los frentes a ejecutar.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE		

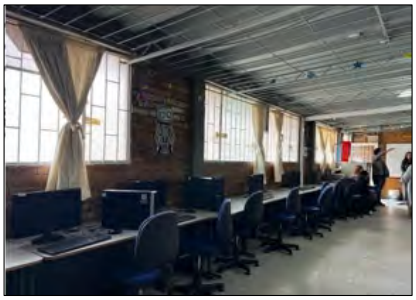
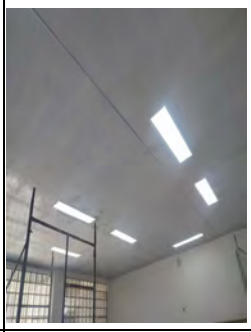


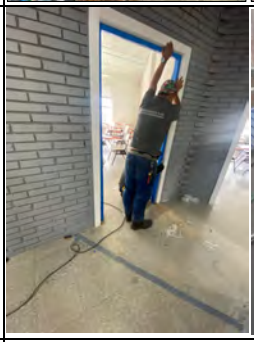




CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	31/07/2023	**PERIODO No.**	**28**	DEL	**24/07/2023**	AL	**30/07/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**		  
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**		  
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**		
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**		  
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		  



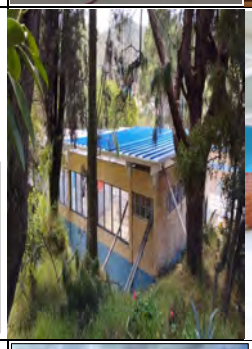
CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	31/07/2023	**PERIODO No.**	**28**	DEL	**24/07/2023**	AL	**30/07/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		  
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	 	  
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	 	  
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		  
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		  

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	31/07/2023	**PERIODO No.**	**28**	DEL	**24/07/2023**	AL	**30/07/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		  
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	 	  
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		  
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		  

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-292

Bogotá, D.C, julio 31 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIOS DIANA TURBAY y JOSE MARTIN

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Yhon Kenedy Gutierrez Sánchez	457290	Ayudante	Jose Martin
2	Yuber Arley Rentería	1078920581	Ayudante	Diana Turbay

CONSORCIO TIG

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe

Anexo. Documentación del personal

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 25/07/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	20	26/07/2023	CC 457290	GUTIERREZ SANCHEZ YHON	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

BC9B82434FC08437DEB1A7D18F4B4F80 Certificado impreso el día 7/25/2023 3:48:04 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

YHON KENEDY
GUTIERREZ SANCHEZ
457290
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación
782822-25072023	25 07 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo).*

1. Tipo de Trámite:	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedad [ ]	A. Individual: X - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ] Código (a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
GUTIERREZ (Primer apellido)	SANCHEZ (Segundo apellido)	YHON (Primer nombre)	KENEDY (Segundo nombre)

7. Tipo documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	457290	Femenino [ ] Masculino [X]	10 02 1966

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
POSITIVA ARL	COLPENSIONES	1.160.000

18. Residencia			
CALLE 23 N 21 90 (Dirección)	67986854 (Teléfono)	3223045698 (Teléfono celular)	yhongu@gmail.com (Correo electrónico)
BOGOTA D.C. (Municipio/Distrito)	Zona: Urbana [X] Rural [ ]	SUBA (Localidad/Comuna)	BOGOTA D.C. (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales
24. Apellidos y nombres completos

	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria
34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS

		Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13.240.346	

39. Ubicación				
CALLE 3A 7B 149 (Dirección)	5801473 (Teléfono)	obras.joyavi@gmail.com (Correo electrónico)	LOS PATIOS (Municipio/Distrito)	NDS (Departamento)

VIGILADO Supersalud

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de Identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo — [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen — [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
GUTIERREZ	SANCHEZ	YHON	KENEDY

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CC	457290	Femenino [ ] Masculino [X]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva. Institucional o de Oficio
YHON KENEDY GUTIERREZ SANCHEZ CC 457290	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Copia documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC — Cantidad [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **YHON KENEDY GUTIERREZ SANCHEZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **457290,** se encuentra afiliado/a desde **06/12/1995** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 25 de julio de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1078920581
Nombre:	YUBER ARLEY RENTERIA RENTERIA
Fecha Ingreso:	28/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	27/7/2023 1:47:18 PM

Powered by CamScanner

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

YUBER ARLEY RENTERIA RENTERIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.078.920.581**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Julio del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Powered by CamScanner

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4010674119	2|8|0|7|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐ B. Colectiva ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
RENTERIA (Primer apellido)	RENTERIA (Segundo apellido)	YUBER (Primer nombre)	ARLEY (Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1078920581	Femenino ☐ Masculino ☒	2|1|0|7|1|9|9|5

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M — Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	PORVENIR FPC	1160000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CR 78 42 32	1415651	3128516504	YUBERRENTERIA@GMAIL.COM

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
CALI	Urbana ☒ Rural ☐		VALLE

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad				
			Tipo			Condición	
			F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
		Urbana	Rural			
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

	C	34. Nombre de la Institucion Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
B		VS UAB UNICENTRO CALI - VS UOD UNICENTRO CALI	VSUNICENTR - VSUODUNICE
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS	NIT	901402105	01

39.Ubicación

Dirección	Teleéfono	Correo electrónico	Municipio/distrito	Departamento
CR 23 B 67 56	3132456789	LMCASTANOC@GMAIL.COM	MANIZALES	CALDAS

Powered by CamScanner

No de Radicacion
4010674119

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		0|5|0|5|2|0|2|3

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no Internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 53. ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX.ANEXOS

- ☐ 56.Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0

- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia
- ☐ 62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capitulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.078.920.581**

RENTERIA RENTERIA

APELLIDOS

YUBER ARLEY

NOMBRES

YUBER

FIRMA



Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-293

Bogotá, D.C, agosto 01 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Primer llamado de atención por falta de gestión oportuna en el componente ambiental

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite realizar el primer llamado de atención al CONSORCIO MIA GP, fundamentado en la falta de gestión oportuna causada al día de hoy, frente al componente ambiental durante el desarrollo de su contrato de obra.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la **RESOLUCIÓN No.1257** que data 23 de noviembre de 2021, en su **artículo 4**, el cual reza:

> *(…)*
> *Así mismo, el reporte de su implementación con sus respectivos soportes deberá ser remitido a la autoridad ambiental competente dentro de los 15 días calendario, contados a partir del final de cada trimestre del año durante la ejecución de la obra, así como un reporte de cierre dentro del los 45 días calendario siguientes a la terminación de la obra.*
> *(Cursiva y subrayado fuera de texto)*

Tal y como lo establece la obligación anterior, el CONSORCIO MIA GP debía haber realizado a hoy el reporte del segundo trimestre del hogaño, pero a la fecha no contamos con el respectivo soporte pertinente, lo cual, representa lo que sería un posible incumplimiento contractual.

CONSORCIO TIG

Así las cosas, esta interventoría otorga un plazo perentorio de UN (1) día hábil contado a partir de la recepción de esta comunicación, para que el contratista de obra remita los soportes pertinentes que surgen como producto de esta gestión, so pena solicitar a la Entidad Contratante que inicie los procedimientos legales a que haya lugar.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Sin folios

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-294

Bogotá, D.C, agosto 02 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO LIBERTADOR

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Sebastián Rivera	1.042.996.208	Ayudante	Libertador
2	Andrés Fonque	1.015.454.312	Ayudante	Libertador

CONSORCIO TIG

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe

Anexo. Documentación del personal

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-295

Bogotá, D.C, agosto 04 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 6 PERIODO 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO

Respetados señores:

Con base en las obligaciones contractuales sujetas a los documentos previos del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645, mediante la presente comunicación solicitamos el informe mensual de obra No. 6 correspondiente al periodo del 20 de junio al 19 de junio de 2023.

El informe mensual de obra debe contener los anexos que demuestren el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión ambiental, SST y gestión social contenidas en el numeral *8. Obligaciones administrativas*. De igual manera se recalca que en compromisos anteriores pactados en acta, se acordó que el informe mensual se entregaría el día 20 de cada mes, sujeto a las obligaciones contenidas en el numeral *18. Obligaciones de información.* Los incumplimientos de estos compromisos siguen afectando la transparencia y el cumplimiento del contrato de obra.

En virtud de lo anterior, esta interventoría establece un plazo perentorio de UN (1) día hábil a partir de la recepción de esta comunicación, para que el CONSORCIO

MIA GP remita los soportes que respalden el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, so pena solicitar a la Entidad Contratante que inicie los procedimientos legales a que haya lugar.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-296

Bogotá, D.C, agosto 04 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO FE Y ALEGRIA, COLEGIO SAN AGUSTIN Y COLEGIO DIANA TURBAY

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Ángel Caicedo Ávila	1.104.544.198	Ayudante	Fé y Alegría
2	Juan Díaz Chingate	11.257.890	Ayudante	Fé y Alegría
3	José Romir Mancilla	94.458.377	Ayudante	Fé y Alegría
4	Wilmar Ruiz Ocasión	1.051.210.962	Ayudante	San Agustín

CONSORCIO TIG

5	Jhonatan Gantiva Gómez	1.000.225.578	Ayudante	Diana Turbay

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe

Anexo. Documentación del personal

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 02/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	178	03/08/2023	CC 1104544198	CAICEDO AVILA ANGEL	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

509507036D670404A66C713E2E121A88 Certificado impreso el día 8/2/2023 10:28:16 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

ANGEL DAVID
CAICEDO AVILA
1104544198

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas
Organización Sanitas Internacional
NIT. 800.251.440-6
CÓDIGO 005, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Fecha de Radicación: 02 08 2023

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X]	A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia [X]	A. Contributivo [X]
B. Reporte de Novedades [ ]	A. Individual - Beneficiario o Afiliado adicional [ ]	B. Subsidiado [ ]
	B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
CAICEDO	AVILA	ANGEL	DAVID
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1.104.544.198	Femenino Masculino X	26 01 2004

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo [F][N][M] Condición [T][P]		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC

18. Residencia Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico

Municipio / Distrito	Zona	Localidad / Comuna	Departamento
	Urbana [ ] Rural [ ]		

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo			Condición	
				F	N	M	T	P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	32. Datos de residencia					33. Valor de la UPC del afiliado adicional
	Municipio / Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	(A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	[X]	13240346	

39. Ubicación Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
CALLE 3A 7B 140	5801473	obras.joyavi@gmail.com	Los Patios	Nd S

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad
  - [ ] A. Régimen Contributivo
  - [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado
  - [ ] A. Mismo Régimen
  - [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo		Fecha de Radicación	42. Fecha
		Femenino	Masculino		D D M M A A A A

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [ ] 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [ ] 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [ ] 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
ANGEL DAVID CAICEDO AVILA CC 1104544198	MAYDA YAÑEZ VASQUEZ

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad

	CN	RC	TI	CC	CE	PA	CD	SC	Total
Cantidad				1					1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial	67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
Código del Municipio / Código del Departamento	Número de Ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Sticker procesamiento
C.C. No.		

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ANGEL DAVID CAICEDO AVILA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.104.544.198**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Agosto del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 02/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	177	03/08/2023	CC 11257890	DIAZ CHINGATE JUAN	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

509507036D670404A66C713E2E121A88 Certificado impreso el día 8/2/2023 10:27:09 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

JUAN LEONARDO
DIAZ CHINGATE
11257890

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUAN LEONARDO DIAZ CHINGATE, identificado(a) con cédula de ciudadanía **11.257.890**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Agosto del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) JUAN LEONARDO DIAZ CHINGATE identificado(a) con CC 11257890 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	01/03/2022
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL RETIRO
Categoría:	A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 3 días del mes de agosto del año 2023.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,



Gerencia de Afiliaciones

Nueva EPS S.A

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-12, 12:08:08 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 64560928

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 12/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	TUNAL	**Código Sucursal**	MOTUNAL
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	46
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 5969876	SOGAMOSO QUESADA JUAN DE JESUS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 11524197	ZAMUDIO CHACON LUIS OMAR	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 52234983	MALDONADO LUNA SARA RUTH	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 52388693	ALVAREZ OSORIO GLORIA ESTHER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 73290321	BARRIOS CARMONA ORLANDO RAFAEL	01	00	X															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 74814093	AREVALO ALFARO JOSE ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79258390	CUBILLOS CHINGATE JOSE YURI	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79526595	MARTINEZ ARENAS HONORIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00	X															0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 386.667	$ 61.900	SALUD TOTAL EPS	$ 386.667	$ 15.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 386.667	$ 27.000	COMPENSAR CCF	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 79583464	MORALES GUARIN YILBER ERNESTO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79770123	ROMERO CRUZ RAUL HUMBERTO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79976026	AVILA PEREZ DIEGO MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80226139	MARTINEZ CAMELO JORGE ARMANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80371258	HERNANDEZ ROJAS FERNEY	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80738455	COLO RODRIGUEZ CESAR ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80749523	ROCHA RUBIANO HUGO	01	00	X															0	17	17	17	17	COLFONDOS	$ 657.334	$ 105.200	SALUD TOTAL EPS	$ 657.334	$ 26.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 657.334	$ 45.800	COMPENSAR CCF	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.600
CC 80777530	BAYONA RODRIGUEZ DILMER JOVANNY	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80812738	RIVERA JEISSON ANTONIO	01	00	X															0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000215101	ACUÑA BERMUDEZ JEISSY ESTEBAN	01	00	X															0	10	10	10	10	COLFONDOS	$ 386.667	$ 61.900	EPS SANITAS	$ 386.667	$ 15.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 386.667	$ 27.000	COMPENSAR CCF	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 1000573770	BENITEZ ALVAREZ VALENTINA	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000987115	YAÑEZ DIAZ ADRIANA MILENA	01	00	X															0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001043676	ORTIZ CRUZ ANDRES OSWALDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001283348	TOQUICA MOYANO KEVIN DANIEL	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001800502	PERTUZ GARCIA DEICY PAOLA	01	00	X															0	5	5	5	5	PORVENIR	$ 193.334	$ 31.000	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 193.334	$ 7.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 193.334	$ 13.500	COMPENSAR CCF	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 1012333574	CUBILLOS LADINO DIEGO FASSBINDER	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1013695841	JIMENEZ DURAN DEIVIS MANUEL	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1014176195	PEREA HURTADO JHON FREYDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1021662387	GARCIA PANQUEVA FARID MERARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023903762	SILVA BONILLA JOHAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023933729	VELASQUEZ GOMEZ YOHAN ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023950419	GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1024503523	MONTAÑO NIÑO DAIRO ALONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1030637166	BEJARANO DIAZ YEISON FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00	X															0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 386.667	$ 61.900	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 386.667	$ 15.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 386.667	$ 27.000	COMPENSAR CCF	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

Pagado: 12/07/2023 | **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** | **Planilla Nro: 64560928** | **Periodo Cotización: junio de 2023** | **Periodo Servicio: julio de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
	STIVEN																																							
CC 1033684535	PARRADO ROJAS CESAR ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1095814868	MONTAÑA CASTILLO DANIEL	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1117490303	RODRIGUEZ HERRERA JESUS DAVID	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1121846956	CRUZ REYES LUIS FERLEY	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1129487822	ARIZA BARRIOS DANIEL ALFREDO	01	00	X															0	23	23	23	23	COLFONDOS	$ 889.334	$ 142.300	SALUD TOTAL EPS	$ 889.334	$ 35.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 889.334	$ 61.900	COMPENSAR CCF	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 48.178.670	$ 48.178.670	$ 48.178.670	$ 48.178.670	$ 7.708.800	$ 0	$ 0	$ 1.927.400	$ 3.356.100	$ 1.927.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.919.700	$ 0	$ 14.919.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 01/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	173	02/08/2023	CC 1051210962	RUIZ OCASION WILMAR	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

1E7FDB13C2B9FD1785AC54546A02C006 Certificado impreso el día 8/1/2023 4:47:22 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

WILMAR ENRIQUE
RUIZ OCASION
1051210962

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación
782965-01082023	01 08 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo).*

1. Tipo de Trámite:	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedad [ ]	A. Individual: X - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	(a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
RUIZ (Primer apellido)	OCASION (Segundo apellido)	WILMAR (Primer nombre)	ENRIQUE (Segundo nombre)

7. Tipo documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1051210962	Femenino [ ] Masculino [X]	2 0 0 8 1 9 9 3

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
POSITIVA ARL	PORVENIR	1.160.000

18. Residencia			
av 67 n 89 21 (Dirección)	67986854 (Teléfono)	3223045698 (Teléfono celular)	wilmarocasion@gmail.com (Correo electrónico)

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
BOGOTA D.C.	Urbana [X] Rural [ ]	SUBA	BOGOTA D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres completos	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13.240.346	

39. Ubicación				
CALLE 3A 7B 149 (Dirección)	5801473 (Teléfono)	obras.jovavi@gmail.com (Correo electrónico)	LOS PATIOS (Municipio/Distrito)	NDS (Departamento)

VIGILADO Supersalud

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de Identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo — [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen — [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
RUIZ	OCASION	WILMAR	ENRIQUE

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CC	1051210962	Femenino [ ] Masculino [X]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	[ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva. Institucional o de Oficio
WILMAR ENRIQUE RUIZ OCASION CC 1051210962	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Copia documento de identidad: [CN] [RC] [TI] [CC] [PA] [CE] [CD] [SC]
  Cantidad [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

WILMAR ENRIQUE RUIZ OCASION, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.051.210.962**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 1 de Agosto del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1000225578
Nombre:	JHONATAN GANTIVA GOMEZ
Fecha Ingreso:	01/08/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	31/07/2023 06:10:21 p.m.

Powered by CamScanner

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JHONATAN GANTIVA GOMEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.000.225.578,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 31 de Julio del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Powered by CamScanner

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud EPS-S
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)* Página 1 de 2

1. Tipo de Trámite:	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedad [ ]	A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia [ ] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código
A. Cotizante [ ] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	(a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido: Gantiva	Segundo apellido: Gomez	Primer nombre: Jhonatan	Segundo nombre:

7. Tipo documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC.	1000225578	Femenino [ ] Masculino [X]	02 04 1994

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo F N M [ ] Condición T P [ ]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
Asa Colpatria	Proyenir	1.160.000

18. Residencia			
Dirección: Calle 55 Sur 102-51	Teléfono: 3124251381	Teléfono celular:	Correo electrónico:
Municipio/Distrito: Bogotá	Zona: Urbana [ ] Rural [ ]	Localidad/Comuna:	Departamento: Bogotá

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres completos	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria
34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS

		Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
Costano Construcciones Consultores	Nit	901.402.105	

39. Ubicación				
Dirección: Cr 21-20-08	Teléfono: 3218565198	Correo electrónico: marce_1343@hotmail.com	Municipio/Distrito: Manizales	Departamento: Caldas

VIGILADO SUPERSALUD

Powered by CamScanner

capitalsalud

Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de Identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo; [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen; [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]		01082023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio
Jhordan Gabriel Gomez	Marcela Serna Osorio

IX. ANEXOS

56. Copia documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
Cantidad [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.000.225.578**

GANTIVA GOMEZ

APELLIDOS

JHONATAN

NOMBRES



Jhonatan Gantiva

FIRMA

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **02-ABR-1994**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O-
G.S. RH

M
SEXO

19-ABR-2012 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

ÍNDICE DERECHO

A-6403000-01077839-M-1000225578-20190628 **0065**67901A 1 9908471974

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-297

Bogotá, D.C, agosto 04 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Segundo llamado de atención por falta de gestión oportuna en el componente ambiental

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite realizar el segundo llamado de atención al CONSORCIO MIA GP, fundamentado en la falta de gestión oportuna causada al día de hoy, frente al componente ambiental durante el desarrollo de su contrato de obra.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la **RESOLUCIÓN No.1257** que data 23 de noviembre de 2021, en su **artículo 4**, el cual reza:

> *(…)*
> *Así mismo, el reporte de su implementación con sus respectivos soportes deberá ser remitido a la autoridad ambiental competente dentro de los 15 días calendario, contados a partir del final de cada trimestre del año durante la ejecución de la obra, así como un reporte de cierre dentro del los 45 días calendario siguientes a la terminación de la obra.*
> *(Cursiva y subrayado fuera de texto)*

Tal y como lo establece la obligación anterior, el CONSORCIO MIA GP debía haber realizado a hoy el reporte del segundo trimestre del hogaño, pero a la fecha no contamos con el respectivo soporte pertinente, lo cual, representa lo que sería un posible incumplimiento contractual.

CONSORCIO TIG

Adicionalmente, mediante comunicación **TIG-MEM-285** que data del 24 de julio de 2023, se le solicitó el informe de atención de las observaciones emitidas por parte de la profesional de la SED, el cual a la fecha sigue sin ser allegado para nuestra revisión.

Así las cosas, esta interventoría otorga un plazo perentorio de UN (1) día hábil contado a partir de la recepción de esta comunicación, para que el contratista de obra remita los soportes pertinentes que surgen como producto de esta gestión, so pena solicitar a la Entidad Contratante que inicie los procedimientos legales a que haya lugar.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Doce (12) folios

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-298

Bogotá, D.C, agosto 07 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACION DE INFORME SEMANAL No.29

Respetados señores:

Por medio del presente, esta interventoría se permite remitir el informe semanal de interventoría No.29, correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente contractual literal *G. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO*. El periodo del informe semanal se relaciona a continuación:

- **Informe semanal No.29:** 31/07/2023 al 06/08/2023

Sin otro particular.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Siete (7) folios

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	7/08/2023	**PERIODO No.**	**29**	DEL	**31/07/2023**	AL	**6/08/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
PRÓRROGA :	N/A	PRORROGA 1:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	364	PLAZO ACTUALIZADO:	333
PLAZO TRANSCURRIDO:	215 EQUIVALE AL 59%	PLAZO TRANSCURRIDO:	198 EQUIVALE AL 59%
VALOR INICIAL :	$ 878.587.938,00	VALOR INICIAL :	$ 11.941.262.150,00
VALOR ADICION(ES):	$ 371.557.789,00	VALOR ADICION(ES):	$ 5.050.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.250.145.727,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 16.991.262.150,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.250.145.727,00	VALOR POR PAGAR:	$ 16.991.262.150,00
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ	INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	29/07/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	29/07/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	29/07/2023		No iniciado
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	29/07/2023		No iniciado
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS**	29/07/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023		No iniciado
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**198**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR ESTIMADO A EJECUTAR SEGÚN ACTUALIZACIÓN	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 237.764.000,00	$ 135.950.115,00	57,18%	4/07/2023	EN EJECUCIÓN
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 168.134.916,00	$ 189.296.411,36	112,59%	30/06/2023	EN EJECUCIÓN
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	7/08/2023	**PERIODO No.**	**29**	DEL	**31/07/2023**	AL	**6/08/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	$ 1.000.000.000,00	$ 265.823.611,84	26,58%	18/09/2023	EN EJECUCIÓN
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	$ 516.187.772,00	$ 142.074.125,00	27,52%		EN EJECUCIÓN
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	$ 1.202.848.443,00	$ 396.699.950,89	32,98%	29/07/2023	EN EJECUCIÓN
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	$ 1.118.044.915,00	$ 838.083.656,19	74,96%	18/08/2023	EN EJECUCIÓN
8	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	$ 287.232.101,00	$ 209.789.023,48	73,04%	31/07/2023	EN EJECUCIÓN
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	$ 847.369.811,00	$ 268.078.505,00	31,64%		EN EJECUCIÓN
11	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL**	$ 81.857.887,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	$ 706.568.305,00	$ 250.916.161,00	35,51%		EN EJECUCIÓN
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	$ 1.268.959.191,00	$ 641.957.249,69	50,59%	16/09/2023	EN EJECUCIÓN
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	$ 1.102.690.208,00	$ 583.294.500,70	52,90%	12/07/2023	EN EJECUCIÓN
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	$ 498.001.754,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	$ 1.260.609.199,00	$ 1.005.354.452,25	79,75%	26/08/2023	EN EJECUCIÓN
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
18	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	$ 304.703.052,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
19	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	$ 656.544.890,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
20	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	$ 339.352.709,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	$ 2.428.418.527,00	$ 615.349.137,75	25,34%	28/11/2023	EN EJECUCIÓN
22	**COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS**	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
23	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	$ 335.852.053,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	$ 506.413.760,00	$ 265.422.538,00	52,41%		EN EJECUCIÓN
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	$ 260.944.024,79	$ 228.640.069,79	87,62%	16/06/2023	EN EJECUCIÓN
26	**EMERGENCIAS**	$ 862.485.928,00	$ 143.635.741,07	16,65%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	Se continua con la actividad de la pintura de la cancha y se inicia la avtividad de impermeabilizacion de canal en la placa, donde se retira el manto asfaltico existente	PERSONAL Profesional y técnico: dos (2) personas - Rotativos Operativo: cuatro (4) personas Equipo: herramienta menor
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	Se atienden observaciones referente a actividades de cambio de push y pintura. Sigue faltando la instalación de las divisiones de baño del primer piso y la reposición de elementos afectados durante la intervención.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Herramienta menor

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	7/08/2023	**PERIODO No.**	**29**	DEL	**31/07/2023**	AL	**6/08/2023**

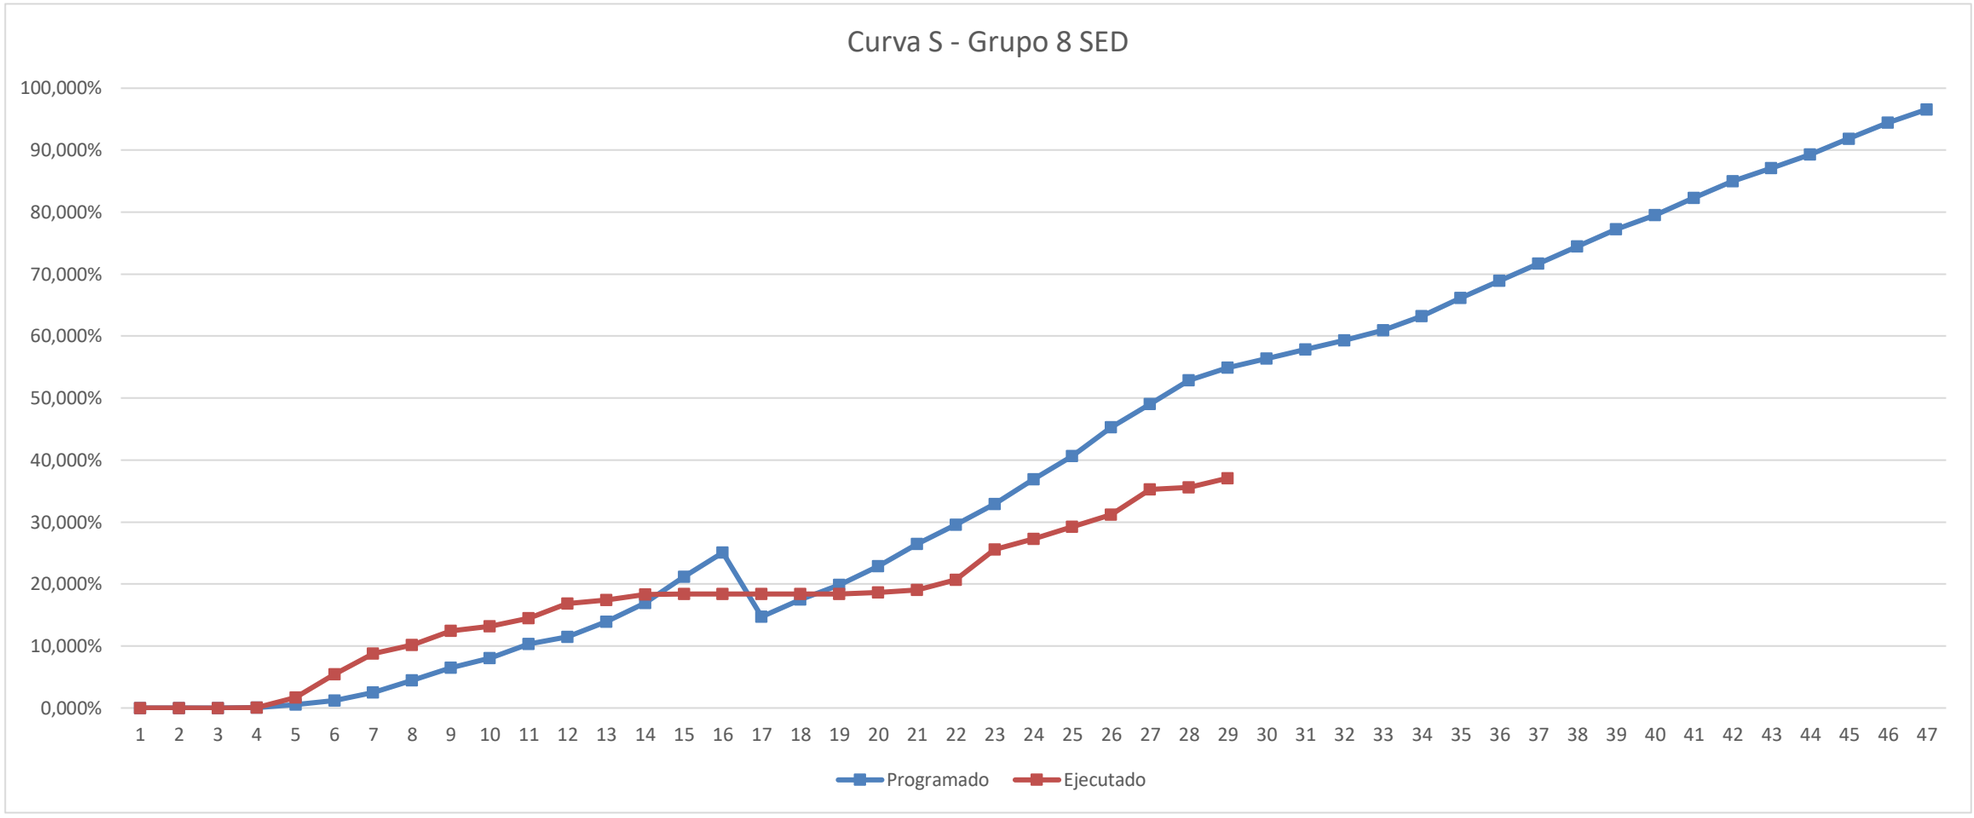
No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Continua con aplicación de estuco en muros externos en bloque #3,. Se inicio actividad de fundida de vigas aéras el dia 05 de agosto 2023, finaliza instalación de piso en granito en aulas del primer piso del bloque#3. Finalmente se recomienda como minimo 3 tomas de concreto, la documentación referente a la seguridad social del personal operativo.	PERSONAL Maestro de Obra (1) personas - Rotativo Operativo: Dieciséis (16) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	No se realizan actividades durante la semana, a pesar de que falta por instalar el cerramiento de la cubierta de preescolar.	PERSONAL Profesional y técnico: Cero (0) persona - Rotativa Operativo: Cero (0) persona Equipo:
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	Se continua con la actividad de instlacion de baldosa en granito en el baño de niños primer piso y se continua con la actividad de pintura de cerchas de la cubierta.	PERSONAL Profesional y técnico: Tres (3) personas - Rotativos Operativo: tres (3) personas Equipo: volqueta y Herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	Se inicia a ligar muros del comedor para posteriormente pintar, se ha realizado mantenimiento en reja exitentes en área del comedo, e instalación de tuberia EMT en comedor. Se requiere terminar las actividades referente a ventananeria, puertas en zona de Serigrafia, para posteriormente iniciar actividad referente a instalación de cubierta en auditorio ala sur.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Sies (6) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	Se inicia la activiidad de pintura de ultima mano, se dejan los puntos de toma corrientes listos en los mesones.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Seis (6) personas Equipo: Herramienta menor
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se continua con la fundida de los paños en concreto, se realiza la excavacion del carcamo perimetral y se continua con el relleno.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Seis (6) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	Continua actividad de pintura sobre cercha existente, se atienden observaciones de pintura y aseo en el aula múltiple, se realiza la reposición del espejo afectado en el aula múltiple.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	inicia actividad de resane sobre muro, inicia actividad de desmonte de ventana, Continua actividad de estuco sobre pañete.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Se inicia la intervención en el bloque 1 donde se comienza a desmontar luminarias pintar la estructrua de la cubierta y el desmonte de las puertas.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: cinco (5) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	Continua con observaciones de acabados en aulas 301-305 referente a encorozado,continuan con aplicación de pintura en muros en los baños del segundo piso, se continua con demolición de enchape y alistado de los baños del primer piso, se requiere aumentar el personal operativo para mejorar el rendimiento en obra.	PERSONAL Profesional y técnico:Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Tres (03) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Se continua con la instalación de cubierta en bloque # 12, e instalación de piso en granito en el mismo bloque, e inicia demolición de alistado y acabado en zona de cafeteria existente y continua con la fabricación de puertas sitio. A la fecha continúa observaciones de acabados en estructura metálica y limpieza de mamposteria en aulas.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Doce (12) cepersonas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	Continua actividad de instalación de manto asfáltico, Continua actividad de emulsión asfáltica.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	Se termina las actividades de pintura y se espera por parte de la S.E.D la respuesta de la puerta antipanico si se va a realizar dicha actividad.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativas Operativo: Tres (1) personas- Rotativo Equipo: Herramienta menor
26	**EMERGENCIAS**	Se está a la espera del envío de la propuesta para la separación de los sistemas de aguas residuales de las aguas industriales en la IED Gustavo Restrepo sede A. Se atendió provisionalmente la emergencia en la IED Restrepo Millán sede D.	

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 9.334.760.212,45	54,94%	-17,86%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 6.300.365.248,63	37,08%	

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	7/08/2023	**PERIODO No.**	**29**	DEL	**31/07/2023**	AL	**6/08/2023**



6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Para el presente periodo, el atraso asciende al 17,86%, a causa del ritmo bajo de ejecución en varios frentes de obra y a la no alineación con la inversión prevista de recursos. Así mismo, esto es causal de la gestión no efectiva que está llevando a cabo el contratista de obra, donde no avanza en los frentes donde cuenta con la total disponibilidad del espacio y esto viene sumando representativamente al atraso causado a hoy.

También es importante tener presente que hay frentes que aparecen con un valor mayor a ejecutar en la programación, lo cual se traduce en que se programa más de lo que se va a ejecutar, causando una carga presupuestal no verás y aumentando el atraso del proyecto. Para evitar este fenómeno, con previo aval de la Entidad, se le ha solicitado al contratista de obra que actualice su programación partiendo de los rubros reales de inversión en cada frente, pero sin modificar las fechas de terminación. Esto sigue sin ser allegado debidamente para nuestra revisión.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
IED Diana Turbay sede B - Limpieza de la unidad sanitaria que está en obra	Contratista de obra	28/07/2023 Cumplido 01/08/2023
IED Restrepo Millán sede B - Entrega del concepto del bloque No.1 sobre la optimización de la estructura	Contratista de obra	28/07/2023 (Incumplido)
Contrato en general - Exposición del plan de contigencia - Reprogramado	Contratista de obra	11/07/2023 (Incumplido)

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* El 19 de julio de 2023, se le remitió a la Entidad los APU's no previstos que cubren la intervención de la emergencia surgida en el Liceo Femenino y las puertas restantes de la IED Santa Lucía, pero solicitaron unos ajustes y la radicación oficial, pero el contratista no ha realizado su labor de remitirlos a la interventoría.
* El 03 de agosto de 2023, la SED informó que la siguiente semana se gestará el memorando de aprobación de las actividades no previstas comprendidas en el 09 y el 21.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:

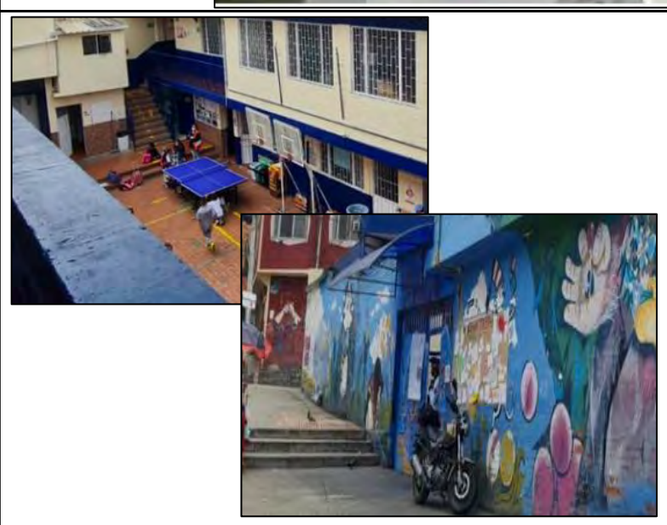
Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y se está a la espera de la entrega de su concepto técnico. Esto se sigue dilatando en el tiempo.
Colegio Gustavo Restrepo sede A: El contratista no ha llevado a cabo las actividades complementarias de esta solución técnica.
Colegio Restrepo Millán sede D: Se evaluó con la Entidad Contratante la intervención en redes eléctricas una vez se proceda con la actividades propias de este frente.
Colegio República de EEUU: El contratista de obra solo realizó el sondeo de las redes, pero no procede con la intervención determinante acordada en visita del 27-07-2023.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**		

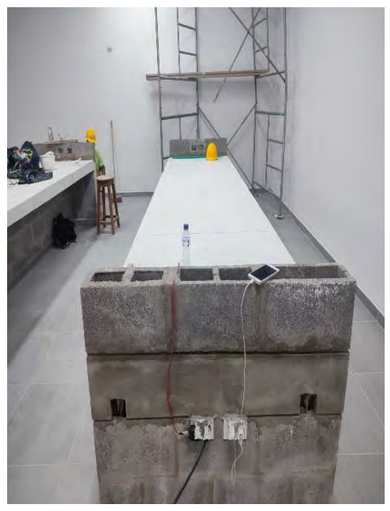
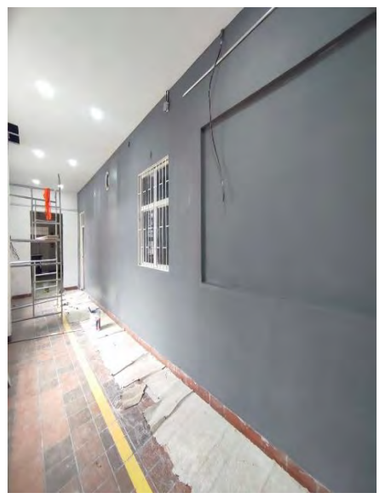
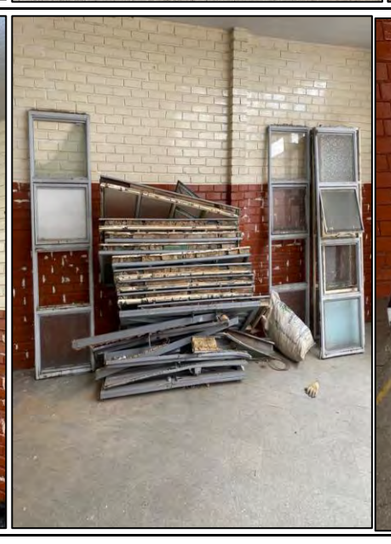
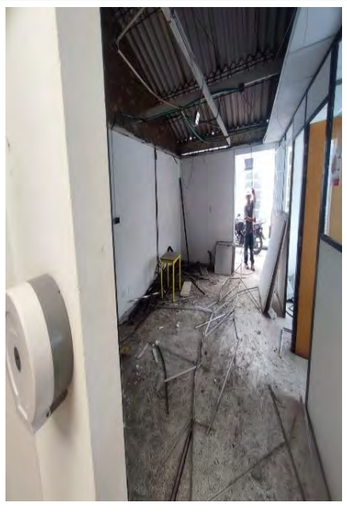
CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	7/08/2023	**PERIODO No.**	**29**	DEL	**31/07/2023**	AL	**6/08/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**		
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**		
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**		
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**		
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		

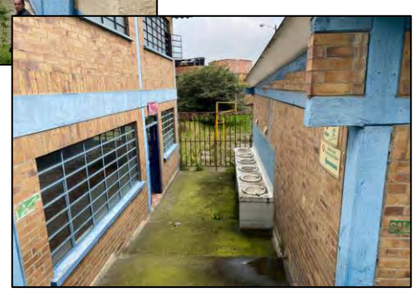
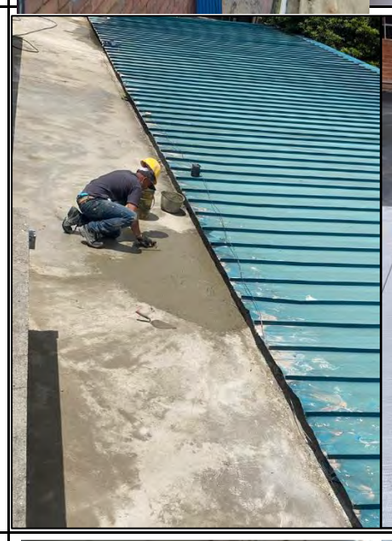
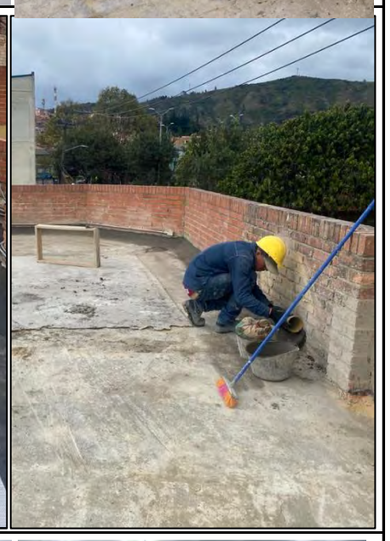
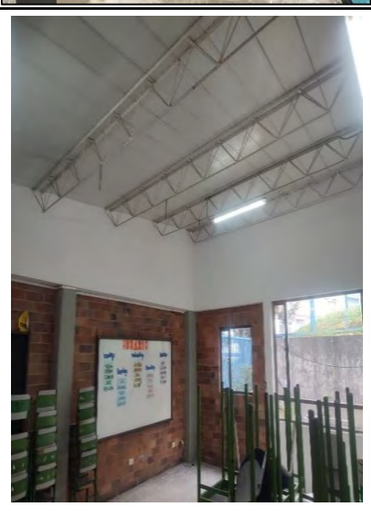
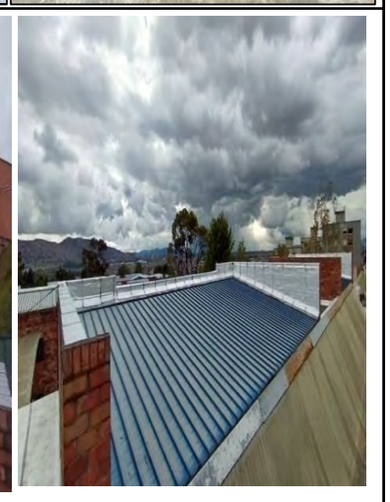
CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	7/08/2023	**PERIODO No.**	**29**	DEL	**31/07/2023**	AL	**6/08/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		  
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	 	  
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	 	  
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		  
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		  

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	7/08/2023	**PERIODO No.**	**29**	DEL	**31/07/2023**	AL	**6/08/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	 	  
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		  
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		  

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-299

Bogotá, D.C, agosto 08 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO FE Y ALEGRIA, COLEGIO SAN AGUSTIN

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Juan David Rozo	1.000.365.542	Ayudante	San Agustín
2	Leyder Jose Vizcaino Conrado	1.041.902.626	Ayudante	Fé y Alegría

CONSORCIO TIG

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe

Anexo. Documentación del personal

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUAN DAVID ROZO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.000.365.542**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 8 de Agosto del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación
782970-08082023	08 08 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo).*

1. Tipo de Trámite:	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedad [ ]	A. Individual: X - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	(a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
ROZO		JUAN	DAVID
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1000365542	Femenino [ ] Masculino [X]	28 02 2002

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
POSITIVA ARL	PORVENIR	1.160.000

18. Residencia			
CALLE 23 N 90 21	67986854	3223045698	juandavidrozo02@gmail.com
Dirección	Teléfono	Teléfono celular	Correo electrónico

BOGOTA D.C.	Zona	Urbana [X] Rural [ ]	SUBA	BOGOTA D.C.
Municipio/Distrito			Localidad/Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres completos	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13.240.346	

39. Ubicación				
CALLE 3A 7B 149	5801473	obras.jovavi@gmail.com	LOS PATIOS	NDS
Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento

VIGILADO Supersalud

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de Identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo — [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen — [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
ROZO		JUAN	DAVID

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CC	1000365542	Femenino [ ] Masculino [X]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	[ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva. Institucional o de Oficio
JUAN DAVID ROZO CC 1000365542	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Copia documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] — Cantidad — Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	181	09/08/2023	CC 1000365542	ROZO JUAN DAVID	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

AA7D5AFB6C5BDB7D07E443114DCA44F4 Certificado impreso el día 8/8/2023 9:32:37 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

JUAN DAVID
ROZO
1000365542

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-12, 12:08:08 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 64560928

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 12/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	TUNAL	**Código Sucursal**	MOTUNAL
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	46
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 5969876	SOGAMOSO QUESADA JUAN DE JESUS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 11524197	ZAMUDIO CHACON LUIS OMAR	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 52234983	MALDONADO LUNA SARA RUTH	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 52388693	ALVAREZ OSORIO GLORIA ESTHER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 73290321	BARRIOS CARMONA ORLANDO RAFAEL	01	00	X															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 74814093	AREVALO ALFARO JOSE ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79258390	CUBILLOS CHINGATE JOSE YURI	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79526595	MARTINEZ ARENAS HONORIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00	X															0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 386.667	$ 61.900	SALUD TOTAL EPS	$ 386.667	$ 15.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 386.667	$ 27.000	COMPENSAR CCF	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 79583464	MORALES GUARIN YILBER ERNESTO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79770123	ROMERO CRUZ RAUL HUMBERTO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79976026	AVILA PEREZ DIEGO MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80226139	MARTINEZ CAMELO JORGE ARMANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80371258	HERNANDEZ ROJAS FERNEY	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80738455	COLO RODRIGUEZ CESAR ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80749523	ROCHA RUBIANO HUGO	01	00	X															0	17	17	17	17	COLFONDOS	$ 657.334	$ 105.200	SALUD TOTAL EPS	$ 657.334	$ 26.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 657.334	$ 45.800	COMPENSAR CCF	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.600
CC 80777530	BAYONA RODRIGUEZ DILMER JOVANNY	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80812738	RIVERA JEISSON ANTONIO	01	00	X															0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000215101	ACUÑA BERMUDEZ JEISSY ESTEBAN	01	00	X															0	10	10	10	10	COLFONDOS	$ 386.667	$ 61.900	EPS SANITAS	$ 386.667	$ 15.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 386.667	$ 27.000	COMPENSAR CCF	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 1000573770	BENITEZ ALVAREZ VALENTINA	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000987115	YAÑEZ DIAZ ADRIANA MILENA	01	00	X															0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001043676	ORTIZ CRUZ ANDRES OSWALDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001283348	TOQUICA MOYANO KEVIN DANIEL	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001800502	PERTUZ GARCIA DEICY PAOLA	01	00	X															0	5	5	5	5	PORVENIR	$ 193.334	$ 31.000	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 193.334	$ 7.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 193.334	$ 13.500	COMPENSAR CCF	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 1012333574	CUBILLOS LADINO DIEGO FASSBINDER	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1013695841	JIMENEZ DURAN DEIVIS MANUEL	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1014176195	PEREA HURTADO JHON FREYDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1021662387	GARCIA PANQUEVA FARID MERARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023903762	SILVA BONILLA JOHAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023933729	VELASQUEZ GOMEZ YOHAN ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023950419	GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1024503523	MONTAÑO NIÑO DAIRO ALONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1030637166	BEJARANO DIAZ YEISON FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00	X															0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 386.667	$ 61.900	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 386.667	$ 15.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 386.667	$ 27.000	COMPENSAR CCF	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

Pagado: 12/07/2023 | **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** | **Planilla Nro: 64560928** | **Periodo Cotización: junio de 2023** | **Periodo Servicio: julio de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
	STIVEN																																							
CC 1033684535	PARRADO ROJAS CESAR ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1095814868	MONTAÑA CASTILLO DANIEL	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1117490303	RODRIGUEZ HERRERA JESUS DAVID	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1121846956	CRUZ REYES LUIS FERLEY	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1129487822	ARIZA BARRIOS DANIEL ALFREDO	01	00	X															0	23	23	23	23	COLFONDOS	$ 889.334	$ 142.300	SALUD TOTAL EPS	$ 889.334	$ 35.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 889.334	$ 61.900	COMPENSAR CCF	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 48.178.670	$ 48.178.670	$ 48.178.670	$ 48.178.670	$ 7.708.800	$ 0	$ 0	$ 1.927.400	$ 3.356.100	$ 1.927.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.919.700	$ 0	$ 14.919.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-300

Bogotá, D.C, agosto 09 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO DIANA TURBAY

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Richard Antonio García	PT 6895199	Ayudante	Diana Turbay
2	Paolo Rafael Quiroz	PT 2113230	Ayudante	Diana Turbay

CONSORCIO TIG

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe

Anexo. Documentación del personal

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-301

Bogotá, D.C, agosto 09 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Solicitud de atención inmediata a garantías en espacios entregados a las IED

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite instar al CONSORCIO MIA GP, para que proceda de manera inmediata con la atención a las garantías de obra presentadas en los espacios entregados a las distintas IED, durante el desarrollo de su contrato de obra.

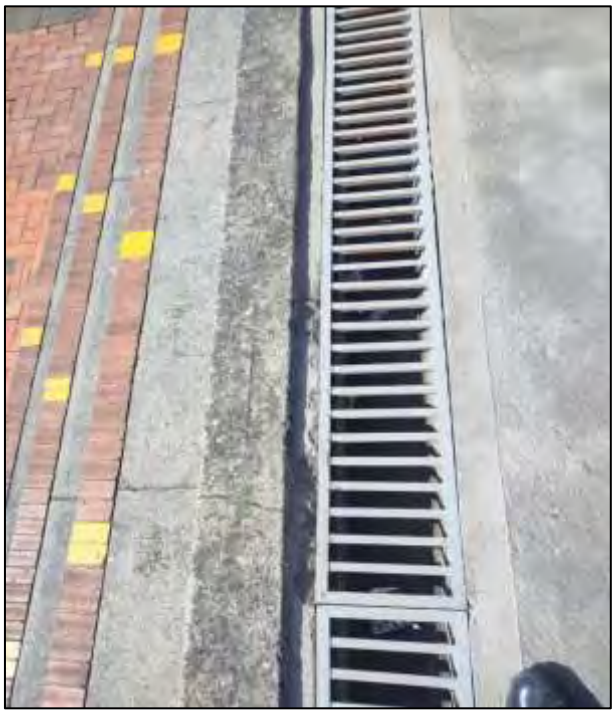
A continuación, procederemos a mencionar la IED en específico, añadiremos un registro fotográfico puntual y haremos referencia a la observación que deberá ser atendida, a saber:

IED ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A

Zona del patio principal



Fotografía No.1 – Falta pieza del adoquín retirado para la instalación del cerramiento



Fotografía No.2 – Ruptura de la esquina del cárcamo que confina la rejilla metálica y oxidación primaria de este elemento.



Fotografía No.3 – Desalineamiento de los cuerpos de la rejilla metálica instalada para el cárcamo

Salones de preescolar



Fotografía No.4 – Filtraciones hacia el interior del bloque a través de la fachada y a través de la canal de aguas lluvias.

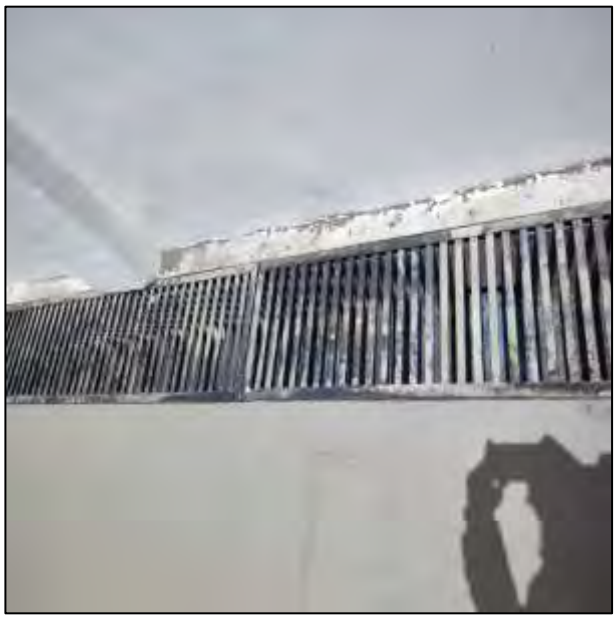




Fotografía No.5 – Filtraciones hacia el interior del bloque a través de la fachada y a través de la canal de aguas lluvias.

IED ALEXANDER FLEMING SEDE B

Cancha principal



Fotografía No.6 – Oxidación primaria en la rejilla del cárcamo construido

IED RESTREPO MILLÁN SEDE B

Bloque No.2



Fotografía No.7 – Fogonazos de pintura en aceite sobre la mampostería existente



Fotografía No.8 – Falta de pañete en los costados laterales de la puerta de acceso posterior, según recomendación del especialista en estructuras de la SED

IED ALFREDO IRIARTE SEDE A

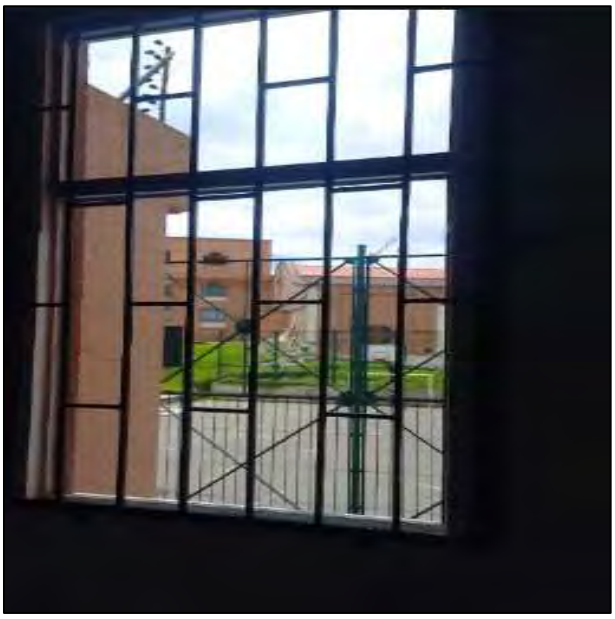
Cubierta zona externa



Fotografía No.9 – Queda pendiente subsanar detalles de pintura en pérgola y cubierta, izado de guaya de la mitad de la pérgola.



Fotografía No.10 – Hace falta reponer el vidrio de la ventana de baño de las niñas del tercer piso.



Fotografía No.11 – Reponer reja de ventana del baño de niños del tercer piso.



Fotografía No.12 – Reposición o mantenimiento a grifería de lavamanos de baño de niñas del tercer piso

IED RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A

Espacios externos a la IED




Fotografía No.13 – Limpieza del andén del muro exterior del aula múltiple

Espacios internos salón múltiple




Fotografía No.14 – Pintura de muro superior en aula múltiple. Fogonazo de esmalte.



Fotografía No.15 – Instalación de bajantes del canal del aula múltiple.



Fotografía No.16 – Reubicación de toma corriente para televisor aula 17.



Fotografía No.17 – Revisión de tomas eléctricas antiguas del aula 15.





Fotografía No.18 – Instalación de guarda escoba aula 16 y 15.

IED REINO DE HOLANDA SEDE A

Salones de clase



Fotografía No.19 – Instalación de película de seguridad.

IED SAN AGUSTÍN SEDE A

Salones de clase



Fotografía No.20 – Luminaria rota en el pasillo



Fotografía No.21 – Todos los paneles LED 120x30 cm de la circulación del tercer piso se encuentran desnivelados.



Fotografía No.22 – La instalación de láminas fibrocemento para cubrir las cerchas existentes en área del pasillo del tercer piso presenta detalles de acabados en pintura.





Fotografía No.23 – Se requiere mejorar acabados de pintura en viga existente ubicada en el tercer piso.



Fotografía No.24 – En zona de circulación en el tercer piso se encuentra un área sin cubrir, cabe la posibilidad que los niños ingresen al vano se recomienda al contratista sellar en lámina superborad, para evitar posibles accidentes.



Fotografía No.25 – En pasillo del tercer piso se requiere mejorar aspecto final de la cercha existente, instalando lámina en fibrocemento

Así las cosas, esta interventoría otorga un plazo perentorio de SIETE (7) días calendario contado a partir de la recepción de esta comunicación, para que el contratista de obra proceda con las intervenciones físicas y remita los soportes pertinentes que surgen como producto de esta gestión.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Sin folios

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-302

Bogotá, D.C, agosto 09 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Tercer llamado de atención por falta de gestión oportuna en el componente ambiental

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite realizar el tercer llamado de atención al CONSORCIO MIA GP, fundamentado en la falta de gestión oportuna causada al día de hoy, frente al componente ambiental durante el desarrollo de su contrato de obra.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la **RESOLUCIÓN No.1257** que data 23 de noviembre de 2021, en su **artículo 4**, el cual reza:

> *(…)*
> *Así mismo, el reporte de su implementación con sus respectivos soportes deberá ser remitido a la autoridad ambiental competente dentro de los 15 días calendario, contados a partir del final de cada trimestre del año durante la ejecución de la obra, así como un reporte de cierre dentro del [SIC] los 45 días calendario siguientes a la terminación de la obra.*
> *(Cursiva y subrayado fuera de texto)*

Tal y como lo establece la obligación anterior, el CONSORCIO MIA GP debía haber realizado a hoy el reporte del segundo trimestre del hogaño, pero a la fecha no contamos con el respectivo soporte pertinente, lo cual, representa lo que sería un un incumplimiento contractual.

Adicionalmente, mediante comunicación **TIG-MEM-285** que data del 24 de julio de 2023, se le solicitó el informe de atención de las observaciones emitidas por parte de la profesional de la SED, el cual a la fecha sigue sin ser allegado para nuestra revisión.

Por otra parte, esta interventoría no evidencia la participación activa y pertinente de su asesor ambiental, el cual, según lo establecido en el ANEXO TÉCNICO del contrato de obra debería tener una dedicación mínima del 50% y difícilmente se le encuentra a este profesional en obra. Claro ejemplo de esta situación, se encuentran los distintos hallazgos que constantemente realiza esta interventoría de índole ambiental, sobre los cuales hay unos tiempos muy extensos para su respuesta, dejando entrever que este asesor no es el más adecuado para desarrollar esta labor, por cual, es pertinente que desde esta interventoría se solicite la evaluación de su reemplazo.

Así las cosas, esta interventoría otorga un plazo perentorio de UN (1) día hábil contado a partir de la recepción de esta comunicación, para que el contratista de obra remita los soportes pertinentes que surgen como producto de la gestión administrativa y por otro lado, un plazo perentorio de TRES (3) días hábiles para que evalué la continuidad de su profesional frente a este cargo, ya que viene siendo el directo responsable de que a la fecha se hayan gestado tres (3) llamados de atención por las mismas razones, so pena solicitar a la Entidad Contratante que inicie los procedimientos legales a que haya lugar.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Sin folios

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-303

Bogotá, D.C, agosto 10 de 2023

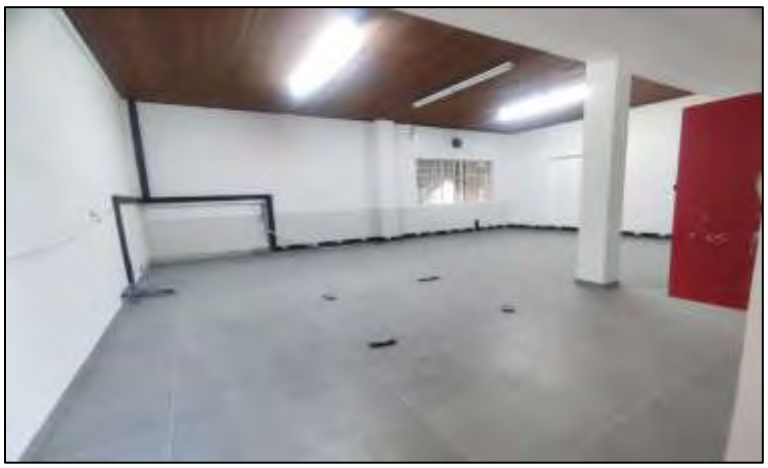
Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Solicitud de reanudación inmediata de actividades en el Liceo Femenino

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite exhortar al CONSORCIO MIA GP, para que de manera inmediata, proceda con la reanudación de las actividades físicas en la IED Liceo Femenino Mercedes Nariño, las cuales fueron suspendidas por razones desconocidas desde el pasado 05 de agosto del año 2023.



Fotografía No.1 – Espacio de obra sin ejecución de actividades
Fuente. Registro fotográfico del CONSORCIO TIG del 09-08-2023



Fotografía No.2 – Espacio de obra sin ejecución de actividades
Fuente. Registro fotográfico del CONSORCIO TIG del 09-08-2023



Fotografía No.3 – Espacio de obra sin ejecución de actividades
Fuente. Registro fotográfico del CONSORCIO TIG del 09-08-2023

Aunado a lo anterior, le recordamos que existe un compromiso que es de carácter ineludible y es la entrega de este colegio para el 15 de agosto del presente año, ya que ese ha sido el requerimiento constante de nuestra Entidad Contratante los últimos dos (2) meses calendario y sobre este ha habido un acuerdo por parte de la firma contratista de obra, considerando que la inversión en esta sede no es la más representativa y no han contado con interrupciones en el desarrollo de sus labores por habilitación parcial de espacios, entre otros.

Otro factor que se trae a colación y que es de gran relevancia, es que la programación de obra que actualmente se encuentra vigente, contemplaba la entrega de esta sede para el 31 de julio de 2023 y claramente no fue posible materializarla. En estos momentos el frente cuenta con un porcentaje de ejecución del 80,00% y será obligación del CONSORCIO MIA GP desplegar la logística necesaria que garantice la terminación de las actividades en la fecha prevista.

CONSORCIO TIG

Así las cosas, esta interventoría le reitera al CONSORCIO MIA GP a través de la presente misiva, la necesidad imperante de cumplir con estos compromisos previamente pactados, ya que la Entidad Contratante cuenta con una programación de entregas y no le he es posible realizar desplazamientos en el tiempo.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Sin folios

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-304

Bogotá, D.C, agosto 11 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO FE Y ALEGRIA

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Oscar Eduardo Ortega Chirinos	PT 5881621	Ayudante	Fé y Alegria

CONSORCIO TIG

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe

Anexo. Documentación del personal

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 10/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	188	11/08/2023	PT 5881621	ORTEGA CHIRINOS OSCAR	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

4B6D75867E10C617C0AE4D8342965F38 Certificado impreso el día 8/10/2023 9:56:05 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

OSCAR EDUARDO
ORTEGA CHIRINOS
5881621

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación
782975-10082023	10 08 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo).*

1. Tipo de Trámite:	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedad [ ]	A. Individual: X - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	(a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
ORTEGA (Primer apellido)	CHIRINOS (Segundo apellido)	OSCAR (Primer nombre)	EDUARDO (Segundo nombre)

7. Tipo documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
PT	5881621	Femenino [ ] Masculino [X]	13 12 1988

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
POSITIVA ARL	COLFONDOS	1.160.000

18. Residencia			
av 113 n 89 23 (Dirección)	67986854 (Teléfono)	3223045698 (Teléfono celular)	oscarortega88@gmail.com (Correo electrónico)

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
BOGOTA D.C.	Urbana [X] Rural [ ]	SUBA	BOGOTA D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres completos	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria
34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS

		Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13.240.346	

39. Ubicación				
CALLE 3A 7B 149 (Dirección)	5801473 (Teléfono)	obras.jovavi@gmail.com (Correo electrónico)	LOS PATIOS (Municipio/Distrito)	NDS (Departamento)

VIGILADO Supersalud

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de Identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo — [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen — [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
ORTEGA	CHIRINOS	OSCAR	EDUARDO

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
PT	5881621	Femenino [ ] Masculino [X]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva. Institucional o de Oficio
OSCAR EDUARDO ORTEGA CHIRINOS PT 5881621	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Copia documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC — Cantidad [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS


CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) OSCAR EDUARDO ORTEGA CHIRINOS identificado con P.T No. 5.881.621, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 10 de agosto del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.



Carolina Galvis Castellanos
Gerente de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-305

Bogotá, D.C, agosto 11 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Preocupación por el estado de incumplimiento de entrega definitiva de baterías sanitarias de la IED Reino de Holanda A e IED Alfredo Iriarte

Respetados señores:

Por medio de la presente, el CONSORCIO TIG quien funge en calidad de interventoría, se permite reiterar una vez más su preocupación por el NO cumplimiento del CONSORCIO MIA GP en lo que respecta a la entrega de las obras centralizadas en las baterías sanitarias de la IED Reino de Holanda sede A e IED Alfredo Iriarte sede A.

Lo anterior, ya que en primera instancia el compromiso de entrega de dos (2) niveles de baterías en cada colegio estaba previsto para el 09 de julio de 2023 y a la fecha una vez transcurridos once (31) días calendario del vencimiento de ese plazo perentorio, se siguen sin entregar estos espacios, debido a las obras inconclusas que ha venido causando el contratista de obra.

Comenzando por la IED Reino de Holanda sede A, encontramos que las baterías del primer nivel se encontraban el día de hoy en el siguiente estado:



Fotografía No.1 – Baterías del primer nivel IED Reino de Holanda sede A
Fuente. Registro tomado en obra por el CONSORCIO TIG

Como se logra evidenciar en la fotografía No.1, los baños siguen deshabilitados; todavía está pendiente la instalación de las griferías, rejillas de sifones, acabados de los soportes de los mesones, puertas principales de acceso, entre otros. Por lo que colegio está ejerciendo presión constantemente debido a la urgencia que tienen del uso de este espacio, desde el día 26 de julio el contratista de obra no ha vuelto a realizar labor alguna para dar cumplimiento con el compromiso.

Continuando con las baterías sanitarias del tercer piso, que fueron puestas en funcionamiento por contingencia en la IED, a la fecha siguen presentando múltiples observaciones como el desprendimiento de una división de baño de niños, se siguen presentando fugas a través de algunas griferías, los soportes de los mesones continúan sin pintar, los desagües de los lavamanos siguen presentando filtraciones lo que genera gran riesgo de accidente entre los alumnos, los sifones de desagüe presentan excesos de varios materiales con los que han intentado controlar las fugas, además del constante desperdicio del agua. Esta situación puede evidenciarse a través de las siguientes fotografías:



Fotografía No.2, 3 y 4 – Baterías del tercer nivel IED Reino de Holanda sede A
Fuente. Registro tomado en obra por el CONSORCIO TIG

Pasando a la IED Alfredo Iriarte sede A, se tiene una situación parecida, donde no se ha podido entregar las baterías sanitarias del nivel uno (1), desde el día 2 de agosto el contratista de obra no ha vuelto a realizar alguna labor para dar cumplimiento con el compromiso. Igualmente, desde este día no han regresado trabajadores a la institución.

Además de las observaciones que faltan por subsanar en los baños del tercer y segundo nivel, no se han suministrado ni instalado las divisiones y las luminarias de los baños del primer nivel.



Fotografía No.3 – Baterías del primer nivel IED Alfredo Iriarte sede A
Fuente. Registro tomado en obra por el CONSORCIO TIG

CONSORCIO TIG

Esto ha causado gran molestia entre la comunidad, que continuamente se pregunta por el abandono de la obra.

Debido a lo anterior, el CONSORCIO TIG en su calidad de interventoría, conmina al CONSORCIO MIA GP para que a más tardar el 15 de julio de 2023 finalice determinantemente las obras que tienen que ver con estos espacios antes cuestionados, so pena solicitar a la Entidad Contratante que inicie los procedimientos legales a que haya lugar.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos Sin folios

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-306

Bogotá, D.C, agosto 13 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACION DE INFORME SEMANAL No.30

Respetados señores:

Por medio del presente, esta interventoría se permite remitir el informe semanal de interventoría No.30, correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente contractual literal *G. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO*. El periodo del informe semanal se relaciona a continuación:

- **Informe semanal No.30:** 07/08/2023 al 13/08/2023

Sin otro particular.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Siete (7) folios

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	14/08/2023	**PERIODO No.**	**30**	DEL	**7/08/2023**	AL	**13/08/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
PRÓRROGA :	N/A	PRORROGA 1:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	364	PLAZO ACTUALIZADO:	333
PLAZO TRANSCURRIDO:	222 EQUIVALE AL 61%	PLAZO TRANSCURRIDO:	205 EQUIVALE AL 62%
VALOR INICIAL :	$ 878.587.938,00	VALOR INICIAL :	$ 11.941.262.150,00
VALOR ADICION(ES):	$ 371.557.789,00	VALOR ADICION(ES):	$ 5.050.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.250.145.727,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 16.991.262.150,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.250.145.727,00	VALOR POR PAGAR:	$ 16.991.262.150,00
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ	INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	29/07/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	29/07/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	29/07/2023		No iniciado
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	29/07/2023		No iniciado
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS**	29/07/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023		No iniciado
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**205**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR ESTIMADO A EJECUTAR SEGÚN ACTUALIZACIÓN	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 170.017.828,00	$ 141.055.798,00	82,97%	4/07/2023	EN EJECUCIÓN
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 210.052.966,00	$ 189.296.411,36	90,12%	30/06/2023	EN EJECUCIÓN
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO

FECHA	14/08/2023	**PERIODO No.**	**30**	DEL	**7/08/2023**	AL	**13/08/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	$ 1.010.000.000,00	$ 268.826.448,84	26,62%	18/09/2023	EN EJECUCIÓN
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO	$ 485.207.002,00	$ 142.284.319,00	29,32%		EN EJECUCIÓN
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	$ 841.548.020,00	$ 397.762.638,89	47,27%	29/07/2023	EN EJECUCIÓN
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	$ 1.267.289.232,00	$ 857.854.805,19	67,69%	18/08/2023	EN EJECUCIÓN
8	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	$ 283.433.330,00	$ 213.346.023,48	75,27%	31/07/2023	EN EJECUCIÓN
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	$ 827.987.076,00	$ 274.483.025,00	33,15%		EN EJECUCIÓN
11	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL	$ 100.000.000,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	$ 762.681.025,00	$ 272.627.723,00	35,75%		EN EJECUCIÓN
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	$ 1.228.838.776,00	$ 642.095.156,69	52,25%	16/09/2023	EN EJECUCIÓN
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	$ 1.206.469.428,00	$ 586.646.776,70	48,63%	12/07/2023	EN EJECUCIÓN
15	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL	$ 498.001.754,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	$ 1.182.923.093,00	$ 1.006.747.671,25	85,11%	26/08/2023	EN EJECUCIÓN
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	$ 304.703.052,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
19	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	$ 656.544.890,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
20	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	$ 339.352.709,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR	$ 2.027.739.816,00	$ 615.721.106,75	30,36%	28/11/2023	EN EJECUCIÓN
22	COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
23	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	$ 335.852.053,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A	$ 702.836.423,00	$ 271.094.138,00	38,57%		EN EJECUCIÓN
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	$ 273.172.058,00	$ 228.640.069,79	83,70%	16/06/2023	EN EJECUCIÓN
26	EMERGENCIAS	$ 862.485.928,00	$ 143.635.741,07	16,65%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	Se termina con la actividad de pintar la cancha, se impermeabiliza la canal de la placa, se pinta la rejilla del carcamo y se pinta las columnas de la fachada en gris basalto.	PERSONAL Profesional y técnico: dos (2) personas - Rotativos Operativo: cuatro (4) personas Equipo: herramienta menor
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	No se ejecutan actividades esta semana, no hay personal en obra. Sigue faltando la instalación de las divisiones de los baño del primer piso, cambio de luminarias de los baño del primer piso y la reposición de elementos afectados durante la intervención.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Herramienta menor

FECHA	14/08/2023	**PERIODO No.**	**30**	DEL	**7/08/2023**	AL	**13/08/2023**

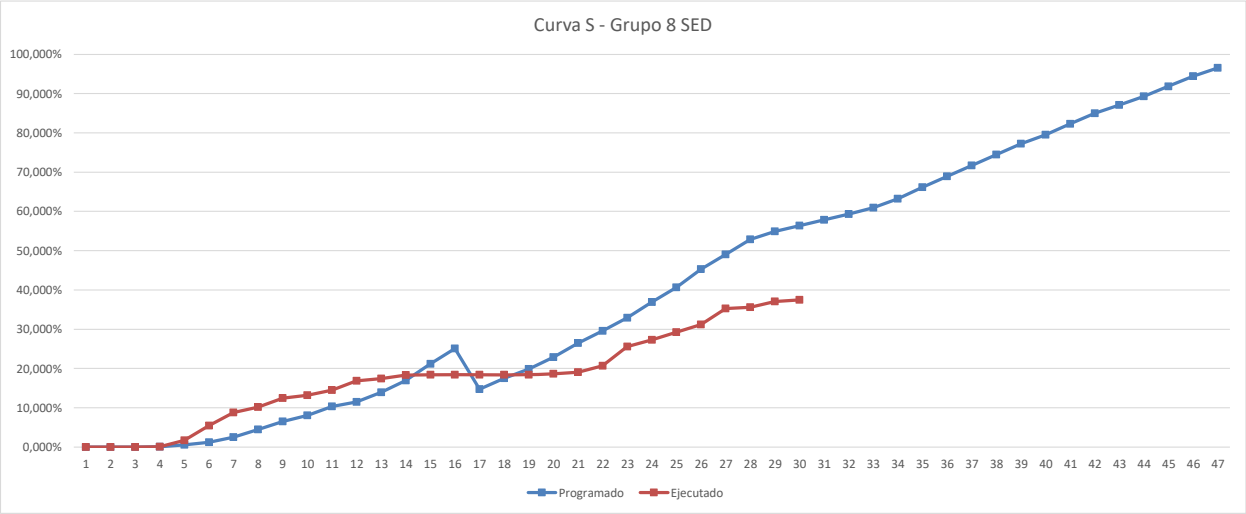
No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Continua con la fundida de las vigas aéreas, se aplian las cajas de inspección, y se espera por parte del contratista allegar la propuesta de facahdas-muro falso junto con el APU Finalmente se recomienda como minimo 3 tomas de concreto, la documentación referente a la seguridad social y aumento del personal operativo para mejor rendimiento	PERSONAL Maestro de Obra (1) personas - Rotativo Operativo: Tres (3). Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	Se reinstala el cerramiento de la cancha, Inicia demolición de placa de la cancha, se suspenden actividades por falla técnica en la maquina excavadora.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Herramienta menor y maquina excavadora.
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	Se continua con la actividad de pintura de cerchas de la cubierta, para comenzar el cambio de la cubierta.	PERSONAL Profesional y técnico: Tres (3) personas - Rotativos Operativo: dos (2) personas Equipo: volqueta y Herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	Se finalizo actividad de pintura en muros y columnas del comedor,se realiza mantenimiento a las puertas y ventanas existentes,se realiza instaalción de ventanas en aluminio en Serigrafía, y se prorama entrega para el dia martes 15 de agosto de 2023	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	No se ejecutan actividadades en el trascurso de la semana, solo se realiza el cerramiento de las cancha de voleibol.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: una (1) personas Equipo: Herramienta menor
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se continua con la fundida de los paños en concreto, se realiza la excavacion del carcamo perimetral y se continua con el relleno, se realiza la compactacion del relleno en el area de la plazoleta	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	Continua actividad de pintura sobre cercha existente, continua actividad de desmonte de cubierta, continua actividad de instalación de cubierta tipo sándwich y translucida, continua instalación de red eléctrica y luminarias en el aula 16.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	Continua actividad de resane sobre muro, continua actividad de pañete sobre vanos de ventanas.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Se inicia el desmonte de puertas en las aulas y el desmonte de la cubierta, se realizan los pedestales en obra y se comienza con la actividad de instalar la estructura de cubierta.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: seis (6) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	Continua con observaciones de acabados en aulas 301-305 referente a encorozado, se instalo el dia viernes 11 de agosto las baterias sanitarias del segundo piso, y continuan con la demolición en baños del primer piso	PERSONAL Profesional y técnico:Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Tres (03) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Se continua con la instalación de cubierta en bloque # 12, e instalación de piso en granito en el mismo bloque, e inicia demolición de alistado y acabado en zona de cafeteria existente y continua con la fabricación de puertas sitio. A la fecha continúa observaciones de acabados en estructura metálica y limpieza de mamposteria en aulas.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Nueve (09) cepersonas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	Continua actividad de instalación de manto asfáltico, Continua actividad de emulsión asfáltica.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	Se termina las actividades de pintura y se espera por parte de la S.E.D la respuesta de la puerta antipanico si se va a realizar dicha actividad.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativas Operativo: Tres (1) personas- Rotativo Equipo: Herramienta menor
26	**EMERGENCIAS**	Se está a la espera del envío de la propuesta para la separación de los sistemas de aguas residuales de las aguas industriales en la IED Gustavo Restrepo sede A. Se atendió provisionalmente la emergencia en la IED Restrepo Millán sede D.	

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 9.582.702.322,44	56,40%	-18,90%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 6.372.117.852,63	37,50%	

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	14/08/2023	**PERIODO No.**	**30**	DEL	**7/08/2023**	AL	**13/08/2023**



6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Para el presente periodo, el atraso asciende al 18,90%, a causa del ritmo bajo de ejecución en varios frentes de obra y a la no alineación con la inversión prevista de recursos. Así mismo, esto es causal de la gestión no efectiva que está llevando a cabo el contratista de obra, donde no avanza en los frentes donde cuenta con la total disponibilidad del espacio y esto viene sumando representativamente al atraso causado a hoy.

También es importante tener presente que hay frentes que aparecen con un valor mayor a ejecutar en la programación, lo cual se traduce en que se programa más de lo que se va a ejecutar, causando una carga presupuestal no verás y aumentando el atraso del proyecto. Para evitar este fenómeno, con previo aval de la Entidad, se le ha solicitado al contratista de obra que actualice su programación partiendo de los rubros reales de inversión en cada frente, pero sin modificar las fechas de terminación. Esto sigue sin ser allegado debidamente para nuestra revisión.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
IED Liceo Femenino Mercedes Nariño - Entrega de la sede incluyendo el cambio de cubierta de la emergencia	Contratista de obra	30/08/2023 (En proceso)
IED Restrepo Millán sede B - Entrega del concepto del bloque No.1 sobre la optimización de la estructura	Contratista de obra	14/08/2023 (Reprogramado)
Contrato en general - Exposición del plan de contigencia - Reprogramado	Contratista de obra	11/07/2023 (Incumplido)

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* El 19 de julio de 2023, se le remitió a la Entidad los APU's no previstos que cubren la intervención de la emergencia surgida en el Liceo Femenino y las puertas restantes de la IED Santa Lucía, pero solicitaron unos ajustes y la radicación oficial, pero el contratista no ha realizado su labor de remitirlos a la interventoría.
* El 03 de agosto de 2023, la SED informó que la siguiente semana se gestará el memorando de aprobación de las actividades no previstas comprendidas en el 09 y el 21.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:

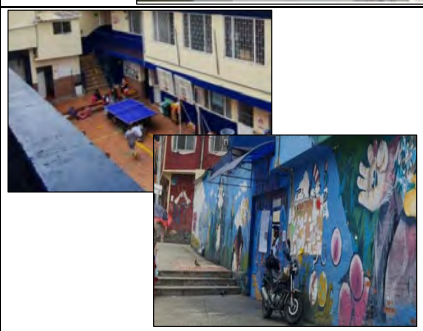




Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y se está a la espera de la entrega de su concepto técnico. Esto se sigue dilatando en el tiempo.
Colegio Gustavo Restrepo sede A: El contratista no ha llevado a cabo las actividades complementarias de esta solución técnica.
Colegio Restrepo Millán sede D: Se evaluó con la Entidad Contratante la intervención en redes eléctricas una vez se proceda con la actividades propias de este frente.
Colegio República de EEUU: El contratista de obra solo realizó el sondeo de las redes, pero no procede con la intervención determinante acordada en visita del 27-07-2023.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE		  

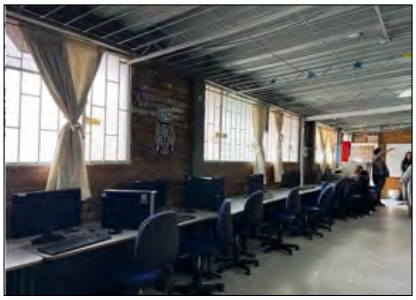
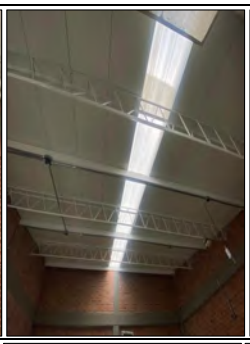
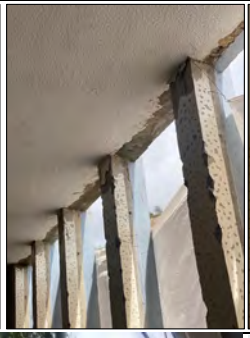

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	14/08/2023	**PERIODO No.**	**30**	DEL	**7/08/2023**	AL	**13/08/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**		
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**		  
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**		  
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**		  
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		  

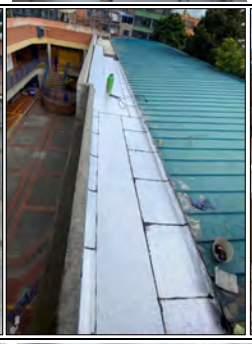
CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	14/08/2023	**PERIODO No.**	**30**	DEL	**7/08/2023**	AL	**13/08/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		  
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	 	  
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	 	  
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		  
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		  

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	14/08/2023	**PERIODO No.**	**30**	DEL	**7/08/2023**	AL	**13/08/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		  
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	 	  
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		  
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		  

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-307

Bogotá, D.C, agosto 14 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO REINO HOLANDA

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Jose Yuri Cubillos Chingate	79.258.390	Ayudante	Reino Holanda

CONSORCIO TIG

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe

Anexo. Documentación del personal

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-308

Bogotá, D.C, agosto 14 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Remisión de APU's no previstos relacionados con la emergencia de la cubierta del Liceo Femenino Mercedes Nariño

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite remitir para evaluación definitiva de la Entidad, tres (3) actividades no previstas con sus debidos soportes, que van relacionadas con la atención de una emergencia evidenciada en la IED Liceo Femenino Mercedes Nariño y las cuales se relacionan a continuación:

- NP-22- RETIRO DE CUBIERTA TIPO COLONIAL A DOBLE ALTURA: TEJA DE BARRO SUPERIOR, TEJA DE ASBESTO Y/O FIBROCEMENTO INFERIOR, ESTERILLA, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL.

- NP-23- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR.

- NP-24- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR.

La intención es que podamos realizar una mesa de trabajo virtual prontamente y con ello dirimir lo relacionado con el precio unitario de cada actividad no prevista, las cuales tienen premura por su ejecución.

Sin otro particular.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo Diecisiete (17) folios.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-22- RETIRO DE CUBIERTA TIPO COLONIAL A DOBLE ALTURA: TEJA DE BARRO SUPERIOR, TEJA DE ASBESTO Y/O FIBROCEMENTO INFERIOR, ESTERILLA, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el RETIRO DE CUBIERTA TIPO COLONIAL A DOBLE ALTURA: TEJA DE BARRO SUPERIOR, TEJA DE ASBESTO Y/O FIBROCEMENTO INFERIOR, ESTERILLA, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR, **NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL**

EJECUCIÓN:

- Realizar armado de cama sobre estructura de madera existente en el área de intervención
- Armar andamios de acceso en parte exterior de edificio para acceso por parte superior de cubierta
- Verificar puntos de anclaje de personal que trabajará sobre cubierta
- Realizar retiro de piezas en barro existentes
- Realizar desamarre de ganchos de cubierta en asbesto existente
- Realizar retiro de cubierta en asbesto existente

MATERIALES:

- MADERA

EQUIPOS:

- PULIDORA
- ANDAMIO
- EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURA

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por METRO CUADRADO (M2) de RETIRO DE CUBIERTA TIPO COLONIAL A DOBLE ALTURA: TEJA DE BARRO SUPERIOR, TEJA DE ASBESTO Y/O FIBROCEMENTO INFERIOR, ESTERILLA, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL recibidos a satisfacción por la interventoría.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-22- RETIRO DE CUBIERTA TIPO COLONIAL A DOBLE ALTURA: TEJA DE BARRO SUPERIOR, TEJA DE ASBESTO Y/O FIBROCEMENTO INFERIOR, ESTERILLA, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL

UNIDAD: M2

JUSTIFICACIÓN:

Existen cubiertas antiguas que presentan fisuras y deterioro que han generado o filtraciones hacia la parte interna de la edificación, lo cual ha generado deterioros sobre los acabados internos e inmuebles, por lo cual es necesario realizar el reemplazo total de la cubierta existente.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-22	RETIRO DE CUBIERTA TIPO COLONIAL A DOBLE ALTURA: TEJA DE BARRO SUPERIOR, TEJA DE ASBESTO Y/O FIBROCEMENTO INFERIOR, ESTERILLA, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	M2	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	83.671,60	4.183,58
Pulidora manual con disco (alquiler)			20.000,00	0,10	2.000,00
Seccion andamio certificado (alquiler)			$ 4.500,00	4,00	18.000,00
				SUBTOTAL	**24.183,58**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	**-**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	**-**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,40	83.671,60
				SUBTOTAL	**83.671,60**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 107.855,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 30.404,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 138.259,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:
Nombre: E. RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-23- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR

EJECUCIÓN:

- Verificar dimensiones de cerchas y correas existentes
- Verificar modulación de teja a instalar
- Verificar en ficha técnica de teja arquitectónica tipo colonial, elementos de fijación, translapos, longitues
- Verificar escuadras, voladizos y dirección de armado de teja
- Suministrar teja en parte superior e iniciar armado garantizando traslapos, fijaciones y voladizos adecuados sobre la estructura existente.

MATERIALES:

- Teja en fibrocemento tipo colonial 160 x 106
- Gancho Teja Estr Metal 14cm Cal 12
- Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Andamios
- Equipo de trabajo en altura

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por METRO CUADRADO (M2) de SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR recibidos a satisfacción por la interventoría.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-23- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR

UNIDAD: M2

JUSTIFICACIÓN:

Existen cubiertas antiguas que presentan fisuras y deterioro que han generado o filtraciones hacia la parte interna de la edificación, lo cual ha generado deterioros sobre los acabados internos e inmuebles, por lo cual es necesario realizar el reemplazo total de la cubierta existente.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR	M2	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	83.671,60	4.183,6
Pulidora manual con disco (alquiler)			20.000,00	0,05	1.000,0
Seccion andamio certificado (alquiler)			$ 4.500,00	4,00	18.000,00
				SUBTOTAL	**23.183,6**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Teja en fibrocemento tipo colonial 160 x 106	UND	0,60	$ 85.900,00	$ 51.540,00
Gancho Teja Estr Metal 14cm Cal 12	un	6,00	$ 720,00	$ 4.320,00
Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8	un	6,00	$ 830,00	$ 4.980,00
DESPERDICIO	%	10%		$ 6.084,00
			SUBTOTAL	**66.924**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de Material (Volqueta acarreo)			1,0000	1.500	1.500,0
				SUBTOTAL	**1.500**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,40	83.671,6
				P	
				SUBTOTAL	**83.672**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 175.279,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 49.411,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 224.690,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para Bogota D.C.

0

Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home › Construcción y Ferretería › Tejas y Drywall › Tejas Fibrocemento › Teja Colonial 160X106 cm Fibrocemento











Ficha técnica

Tipo	Teja Fibrocemento

Proteja

Código 41463

Teja Colonial 160X106 cm Fibrocemento

4.6 (5)

$85.900und

$50.648,58 METRO CUADRADO.

− 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Buscar en falabella

Hola, Inicia sesión Mis comp is

ENVÍO GRATIS en miles de productos desde $99.000*

ngresa tu ubicación Ver

Home > Ferretería y construcción Techos y Aislantes > Techumbre



Devolver es fácil y gratis
Conoce nuestras garantías y derechos >

PROTEJA

Código: 118853122 Cód. tienda: 41463

Teja Colonial 160X106 cm Fibrocemento

4.6 (5) Escribir comentario

Vendido por Homecenter

$ 85.900

Acumula hasta 85 Ver opciones

Despacho a domicilio

Retira tu compra

Stock en tienda
Revisar >

1 + Máximo 999 unidades

Agregar al Carro

¿AÚN NO TIENES TU CMR?
Ábrela ahora y obtén $45.000 de descuento.

Del 13 al 16 de julio de 2023 | 20% DTO. En Herramientas Eléctricas y Manuales
Referencias seleccionadas. Aplican condiciones y restricciones.
Pagando con

10 %



Teja Colonial Proteja

PROTEJA | Código de producto: 1306951

Características principales:

TEJA PROTEJA COLONIAL PINTADA 160CM

Precio Regular ~~$ 99.900~~ (un a $ 89.910)

Precio Ahora **$ 89.910**

$ 79.920

$ 79.920

1 COMPRAR

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

MEDIOS DE ENVÍO

Envío a

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-24- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR

UNIDAD: ML

EJECUCIÓN:

- Verificar dimensiones de cerchas y correas existentes
- Verificar modulación de caballete a instalar
- Verificar en ficha técnica de caballete tipo colonial, elementos de fijación, translapos, longitues
- Verificar escuadras, voladizos y dirección de armado del cabalete
- Suministrar caballete en parte superior e iniciar armado garantizando traslapos, fijaciones y voladizos adecuados sobre la estructura existente.

MATERIALES:

- CABALLETE UNIVERSAL TIPO COLONIAL 106 CM
- Gancho Teja Estr Metal 14cm Cal 12
- Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Andamios
- Equipo de trabajo en altura

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por METRO LINEAL (ML) de SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR recibidos a satisfacción por la interventoría.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-24- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR

UNIDAD:ML

JUSTIFICACIÓN:

Existen cubiertas antiguas que presentan fisuras y deterioro que han generado o filtraciones hacia la parte interna de la edificación, lo cual ha generado deterioros sobre los acabados internos e inmuebles, por lo cual es necesario realizar el reemplazo total de la cubierta existente.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR	M	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	83.671,60	4.183,6
Pulidora manual con disco (alquiler)			$ 20.000,00	0,05	1.000,0
Seccion andamio certificado (alquiler)			$ 4.500,00	4,00	18.000,0
				SUBTOTAL	**23.183,6**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
CABALLETE UNIVERSAL TIPO COLONIAL 106 CM	UND	1,00	$ 31.900,00	$ 31.900,00
Gancho Teja Estr Metal 14cm Cal 12	un	6,00	$ 720,00	$ 4.320,00
Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8	un	6,00	$ 830,00	$ 4.980,00
DESPERDICIO	%	10%		$ 4.120,00
			SUBTOTAL	**45.320**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de Material (Volqueta acarreo)			1,0000	1.500	1.500,0
				SUBTOTAL	**1.500**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,40	83.671,6
				SUBTOTAL	**83.672**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 153.675,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 43.321,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 196.996,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

falabella.com ☰ Menú Buscar en falabella.com Hola, Inicia sesión Mis compras

ENVÍO GRATIS en miles de productos desde $99.000* *Aplican T&C. Ver falabella.com.co/legales

Ingresa tu ubicación falabella. HOMECENTER.CO LINIO Vende en falabella.com Tarjetas y cuentas Venta telefónica Novios

Home > Ferretería y construcción-Techos y Aislantes > Techumbre



PROTEJA

Código: 118864485 Cód. tienda: 267491

Caballete universal Colonial

(0) Escribir comentario

Vendido por Homecenter

Despacho a domicilio

Retira tu compra

Stock en tienda
Revisar

$ 31.900 -25%

~~$ 42.700~~

Acumula hasta 31 puntos Ver opciones

1 + Máximo 999 unidades.

Agregar al Carro

¿AÚN NO TIENES TU CMR?
Ábrela ahora y obtén $45.000 de descuento.

Del 13 al 16 de julio de 2023 | 20% DTO. En Herramientas Eléctricas y Manuales
Referencias seleccionadas. Aplican condiciones y restricciones.
Pagando con

10 %



Caballete Colonial Universal Proteja

PROTEJA | Código de producto: 1306956

Características principales:

CABALLETE UNIVERSAL PROTEJACOLONIAL 46CM

Precio Regular ~~$ 35.900~~ (un a $ 32.310)

Precio Ahora **$ 32.310**

$ 28.720

$ 28.720

1 COMPRAR

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

MEDIOS DE ENVÍO

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para Bogota D.C.

0

Mi Cuent

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Tejas y Drywall > Tejas Fibrocemento > Caballete universal Colonial





Proteja

Código 267491

Caballete Universal Colonial

0.0 (0)

PRECIO INTERNET -25%

$31.900 und

Ahorra $10.800

~~$42.700 und~~

− 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	TEJA COLONIAL 160 X 106 FIBROCEMENTO	UND	$ 85.900	HOMECENTER	$ 79.920	EASY	$ 85.900	FALLABELA	$ 83.907	$ 3.453	$87.359	$80.454	$ 85.900		$ 85.900	$ 85.900
	CABALLETE UNIVERSAL COLONIAL FIBROCEMENTO	UND	$ 31.900	HOMECENTER	$ 32.320	EASY	$ 31.900	FALLABELA	$ 32.040	$ 242	$32.282	$31.798	$ 31.900		$ 31.900	$ 31.900
										$ -						
										$ -						
										$ -						
										$ -						
										$ -						
										$ -						

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-307

Bogotá, D.C, agosto 15 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO FE Y ALEGRIA, MANUEL DEL SOCORRO Y COLEGIO LICEO FEMENINO

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Jose Luis Barrios Conrado	8.572.099	Ayudante	Fé y Alegría
2	Samir Candelo Rentería	1.028.184.319	Ayudante	Fé y Alegría
3	José Calderón Jaimes	PT 4342875	Ayudante	Manuel del Socorro

CONSORCIO TIG

4	Dilmer Jovanny Bayona Rodríguez	80.777.530	Ayudante	Liceo Femenino

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe

Anexo. Documentación del personal


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 8.572.099
BARRIOS CONRADO
APELLIDOS
JOSE LUIS
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 29-DIC-1973
PONEDERA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
31-OCT-1994 PONEDERA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 14/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	192	15/08/2023	CC 8572099	BARRIOS CONRADO JOSE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

46D9866D76DFC8546E6DCE1D1ECF4425 Certificado impreso el día 8/14/2023 3:38:49 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

JOSE LUIS
BARRIOS CONRADO
8572099
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 14/08/2023, el empleador JOSE JOAQUIN YANEZ VILLAMIZAR identificado con NIT número 13240346 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6019411	14/08/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	8572099	JOSE LUIS BARRIOS CONRADO	1160000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2023-08-14

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Agosto del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) JOSE LUIS BARRIOS CONRADO identificado(a) con C.C No. 8.572.099, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 14 de agosto del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.



Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
1.028.184.319
CANDELO RENTERIA
SAMIR


FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-1992
BUENAVENTURA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
30-JUN-2010 BUENAVENTURA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 14/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	194	15/08/2023	CC 1028184319	CANDELO RENTERIA SAMIR	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

46D9866D76DFC8546E6DCE1D1ECF4425 Certificado impreso el día 8/14/2023 3:41:30 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

SAMIR
CANDELO RENTERIA
1028184319
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

El aportante JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR identificado con CC 13240346 inscribio al señor SAMIR CANDELO RENTERIA identificado con CC 1028184319 con fecha de ingreso 14 de agosto de 2023.

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), en Bogotá a los 14 días del mes de agosto de 2023.

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en nuestra Línea de Atención Servicios de Salud (601) 4441234.

Cordialmente,

COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO COMPENSAR

CER-CAR 12786260

VIGILADO Supersalud
VIGILADO SuperSubsidio

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) SAMIR CANDELO RENTERIA identificado(a) con C.C No. 1.028.184.319, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 14 de agosto del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.



Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías


REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL
MIGRACIÓN
NO. 4342875
COL
CALDERON JAIMES
JOSE
VEN
M
7816595160719 77
16-07-1977
17-05-2021 BOGOTA D.C.
30-05-2031
VISIBLE


Frente de este documento debe notificar a Migración Colombia
cualquier cambio en la condición o información migratoria.
MIGRACIÓN
IPCOL4342875<<1<<<<<<<<<<<<<<<
7707168M3105308VENE1762203<<<5
CALDERON<JAIMES<<JOSE<<<<<<<<<

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 14/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	193	15/08/2023	PT 4342875	CALDERON JAIMES JOSE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

46D9866D76DFC8546E6DCE1D1ECF4425 Certificado impreso el día 8/14/2023 3:40:27 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

JOSE
CALDERON JAIMES
4342875
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

El aportante JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR identificado con CC 13240346 inscribio al señor JOSE CALDERON JAIMES identificado con PPT 4342875 con fecha de ingreso 14 de agosto de 2023.

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), en Bogotá a los 14 días del mes de agosto de 2023.

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en nuestra Línea de Atención Servicios de Salud (601) 4441234.

Cordialmente,

COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO COMPENSAR

CER-CAR 12786260

VIGILADO Supersalud
VIGILADO SuperSubsidio

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) JOSE CALDERON JAIMES identificado(a) con P.P.T No. 4.342.875, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 14 de agosto del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.



Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
80.777.530
BAYONA RODRIGUEZ
DIMER JOVANNY


27-JUN-1962
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
1.60
O+
M
29-MAR-2001 BOGOTA D.C

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 14/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	190	15/08/2023	CC 80777530	BAYONA RODRIGUEZ DILMER	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

D9A812E253CDE3A5AAD248CA1A9C8601 Certificado impreso el día 8/14/2023 3:39:39 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

DILMER JOVANNY
BAYONA RODRIGUEZ
80777530

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
40090806730	1|4|0|8|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE **(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)**

1.tipo de tramite — **A.** Afiliación ☐ **B.**Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion — **A.** Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ **B.** Institucional ☐ **B.** De oficio ☐ **B.** Colectiva ☐

3.Regimen — **A.**Contributivo ☒ **B.**Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado — **A.** Cotizante ☒ **B.** Cabeza de Familia ☐ **C.** Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante — **A.** Dependiente ☒ **B.** Independiente ☐ **C.** Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
BAYONA Primer apellido	RODRIGUEZ Segundo apellido	DILMER Primer nombre	JOVANNY Segundo nombre
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	80777530	Femenino ☐ Masculino ☒	2|4|0|3|1|9|8|3

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M — Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COLFONDOS	1000000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
AVENIDA 112 N 09 76	5801473	3133138066	ARD1013@HOTMAIL.COM

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
BOGOTA D.C.	Urbana ☒ Rural ☐		BOGOTA D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		VS UAB JUNIN - SOCIEDAD MÉDICA CAP ODONTOLOGIA	VSJUNIN - BOGOTA
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	01

39.Ubicación

Dirección	Teleéfono	Correo electrónico	Municipio/distrito	Departamento
CL 34 122 SUR 17D BRR ENVIGADO	5801473	ALRODE73@HOTMAIL.COM	ENVIGADO	ANTIOQUIA

No de Radicacion
40090806730

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ **6.** Reinscripción en la EPS
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **12.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **14.**Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **15.** Reporte de fallecimiento
- ☐ **16.**Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **17.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **18.** Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
☐		Femenino ☐ Masculino ☐		1|4|0|8|2|0|2|3

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código: ☐	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- **46.** ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- **47.** ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- **48.** ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- **49.** ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- **50.** ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- **51.** ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- **52.** ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- **53.** ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX.ANEXOS

☐ **56.**Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0

- ☐ **57.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **58.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **59.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **60.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **61.**Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **62.**Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **63.**Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **64.**Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **65.**Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel		
☐	☐	☐	☐	☐		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario
☐		

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) DILMER JOVANNY BAYONA RODRIGUEZ identificado(a) con C.C No. 80.777.530, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 14 de agosto del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.



Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-310

Bogotá, D.C, agosto 15 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Respuesta a comunicación 2023_RUU_MGP_218 - Respuesta a comunicado TIG-MEM-297

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite dar respuesta a su comunicación 2023_RUU_MGP_218, radicada mediante correo electrónico el pasado 10 de agosto de 2023 y que tiene por asunto *"RESPUESTA A COMUNICADO TIG-MEM-297 - Segundo llamado de atención por falta de gestión oportuna en el componente ambiental".*

Con base en el argumento expreso de su parte y por medio del cual asevera que la responsabilidad relacionada con el cargue de los reportes mensuales RCD son endilgables a la Entidad contratante, esta interventoría le informa que ese argumento es completamente falso y que esta responsabilidad es

propia del CONSORCIO MIA GP, tal y como lo establece el **ANEXO TÉCNICO** del contrato de obra, en su capítulo **6. Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental**, subcapítulo **6.4 Residuos de construcción y demolición RCD** e inciso **6.4.4 Informe Ambiental**, el cual reza:

> *(…)*
> *Incluir como mínimo y sin limitarse a lo siguiente:*
>
> - *Resumen de actividades de gestión ambiental realizadas.*
> - *Resumen de actividades de obra realizadas en el periodo.*
> - *Cuadro de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales.*
> - *Registro fotográfico de las actividades ambientales más relevantes de obra.*
> - *Registro de cargue de reportes mensuales RCD generado en el aplicativo web de la SDA, con sus respectivos soportes.*
> - *Verificación y seguimiento a protección de sumideros aledaños.*
> - *Seguimiento y gestión de permisos ambientales.*
> - *Formato diligenciado de los sistemas ahorradores de agua y energía instalados en el periodo.*
>
> *(…)*
> *(Cursiva y subrayado fuera de texto)*

Por lo tanto, seguimos en la misma condición de presunto incumplimiento a la fecha, ya que dicha información debía haberse cargado desde el pasado 15 de julio de 2023, partiendo de lo establecido en la **RESOLUCIÓN No.1257** que data 23 de noviembre de 2021, en su **artículo 4**, el cual reza:

> *(…)*
> *Así mismo, el reporte de su implementación con sus respectivos soportes deberá ser remitido a la autoridad ambiental competente dentro de los 15 días calendario, contados a partir del final de cada trimestre del año durante la ejecución de la obra, así como un reporte de cierre dentro del [SIC] los 45 días calendario siguientes a la terminación de la obra.*
> *(Cursiva y subrayado fuera de texto)*

Ahora y si bien hay unos soportes que anexa el CONSORCIO MIA GP donde sustenta que presuntamente la plataforma presenta inconvenientes, le instamos para que gestionen unas evidencias más claras al respecto, ya que

es imperante sustentarle a la Entidad Contratante las razones por las cuales no se ha podido cumplir con esta obligación contractual.

Así las cosas, esta interventoría otorga un plazo perentorio de DOS (2) días hábiles contado a partir de la recepción de esta comunicación, para que el contratista de obra remita los soportes pertinentes que surgen como producto de la gestión administrativa, ya que viene siendo el directo responsable de que a la fecha se hayan gestado tres (3) llamados de atención por las mismas razones, so pena solicitar a la Entidad Contratante que inicie los procedimientos legales a que haya lugar.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Sin folios

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-311

Bogotá, D.C, agosto 15 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Solicitud de reemplazo inmediato del residente No.2 y asesor ambiental

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite solicitar al CONSORCIO MIA GP, la remisión inmediata de las hojas de vida de los reemplazos de los siguientes perfiles que hacen parte de su personal mínimo requerido:

1. Residente de obra – dedicación 100%.
2. Asesor ambiental – dedicación 50%.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el primer perfil renunció desde el pasado 24 de julio de 2023 y el siguiente no viene haciendo presencia en obra desde la semana anterior, por lo cual, asumimos que se acogieron a la recomendación de realizar cambio del mismo.

Finalmente y teniendo en cuenta la necesidad de contar con los profesionales que lleven a cabo sus funciones de manera oportuna y diligente, solicitamos que estas hojas de vida sean remitidas en un plazo no mayo a tres (3) días calendario

contados a partir de la recepción de la presente comunicación, para evitar cualquier posible riesgo de descuento de los mismos en el rubro de la administración.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Sin folios

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-312

Bogotá, D.C, agosto 17 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: -Remisión de APU's no previstos NP-28 al NP-32

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite remitir para evaluación definitiva de la Entidad, cuatro (4) actividades no previstas con sus debidos soportes, que van relacionadas con la atención de una emergencia evidenciada en la IED Liceo Femenino Mercedes Nariño y las cuales se relacionan a continuación:

- NP-28 - Suministro e instalación de tubería pvcs 8" corrugada incluye accesorios, no incluye excavación.
- NP-29 - Suministro e instalación de poste alumbrado público galvanizado diámetro 4", longitud 6 mts con dos brazos de 1,20 m.
- NP-30 - Suministro e instalación de poste alumbrado público galvanizado diámetro 4", longitud 6 mts con un brazo 1,20 m.
- NP-31 - Suministro e instalación de lampara LED 60 watts en poste de alumbrado público metálico.

CONSORCIO TIG

La intención es que podamos realizar una mesa de trabajo virtual prontamente y con ello dirimir lo relacionado con el precio unitario de cada actividad no prevista, las cuales tienen premura por su ejecución.

Sin otro particular.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo Veintiocho (28) folios + un (1) archivo en EXCEL

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	2220554	**DE**	2022	**FECHA INICIO**	17/03/2022	**FECHA TERMINACIÓN**	16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-28	Suministro e instalacion de tuberia pvcs 8" corrugada incluye accesorios , no incluye excavación	ML	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	21.511,65	1.075,58
Pulidora manual con disco (alquiler)			20.000,00	0,05	1.000,0
				SUBTOTAL	**2.075,58**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
TUBERIA PVCS 8" NOVAVORT X6 ML	und	1,05	$ 62.081,83	$ 65.185,93
Union sanitaria 8"	Und	0,17	$ 65.533,00	$ 10.922,17
Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galón	und	0,10	$ 62.000,00	$ 6.200,00
Soldadura Para Pvc 900 Gramos - 1/4 Galon	und	0,10	$ 99.250,00	$ 9.925,00
			SUBTOTAL	**92.233**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de materiales en furgon			0,0100	350.000	3.500,0
				SUBTOTAL	**3.500**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Oficial plomería	$ 108.420,85	52,13%	164.941	0,08	13.195,25
Ayudante plomería	$ 68.333,00	52,13%	103.955	0,08	8.316,40
				SUBTOTAL	**21.511,65**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 119.320,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 33.636,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 152.956,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-28- Suministro e instalación de tubería pvcs 8" corrugada incluye accesorios, no incluye excavación

UNIDAD:ML

JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo con los cálculos hidráulicos mediante los cuales se pretenden drenar algunas superficies de urbanismo, se requiere la conducción de aguas lluvias en tubería pvcs corrugada de 8" para garantizar la capacidad de carga de la red pluvial.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-28- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 8" CORRUGADA, NO INCLUYE EXCAVACIÓN

UNIDAD:ML

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **Suministro e instalación de tubería pvcs 8" corrugada, no incluye excavación**

EJECUCIÓN:

- Verificar planos hidráulicos
- Verificar pendientes de la red según planos
- Verificar profundidades cota batea de inicio y cota batea de entrega
- Realizar tendido de tubería y uniones garantizando pegas y hermeticidad de cada trazado mediante aplicación de limpiador y soldadura suficiente en cada punto de unión.

MATERIALES:

- TUBERIA PVCS 8" NOVAVORT X6 ML
- Union sanitaria 8"
- Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galón
- Soldadura Para Pvc 900 Gramos - 1/4 Galon

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **METRO LINEAL (ML) de Suministro e instalación de tubería pvcs 8" corrugada, no incluye excavación** recibidos a satisfacción por la interventoría.

NURUEÑA S.A.S.

NIT:860.001.605-0
Pagina WEB: www.fenusas.com.co
Email: fenusa@fenusa.com.co
Direccion: Cr 25 No. 13 - 40 PBX: 3 90 66 66 FAX: 2 01 27 54

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES RES No. 586 DE ABR 25/86
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR IVA, ICA. CODIGO ICA 46632

CODIGO S/N : C901531834 **NIT/C.C :** 901531834-2
NOMBRE : PROCASA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS
DIRECCION : CR 18 60 C 13 S
TELEFONO : 3143826320
CIUDAD : 11001
E-MAIL : PROCASACONSTRUCCION@GMAIL.COM
DIRECCION ENTREGA :

COTIZACION

168872

VALIDEZ DE LA OFERTA

12	9	2023

FECHA ORDEN			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	O. COMPRA
12	8	2023	12	9	2023	PAGO YA INGRESADO	MOSTRADOR CONTADO	

#	BD	CANT.	PRODUCTO	RF FABRI	DESCRIPCION	V. UNITARIO	DCTO	IVA %	V. CON DESCTO	VALOR TOTAL
1	01	1	020096	2909295	TUBO 8 PVC SANIT	637.006	50%	19%	318.503,00	318.503,00
2	01	1	150008	2900079	TUBO 200MM 8"" DURAFORT	307.537	48%	19%	159.919,24	159.919,24

SON : Quinientos sesenta y nueve mil trescientos veintidós con Cuarenta y siete Centésimos ;

OBSERVACIONES
:

SUBTOTAL		$ 478.422,24
DESCUENTO	%	$ 0,00
VALOR NETO		$ 478.422,24
IVA		$ 90.900,23
TOTAL		$ 569.322,47

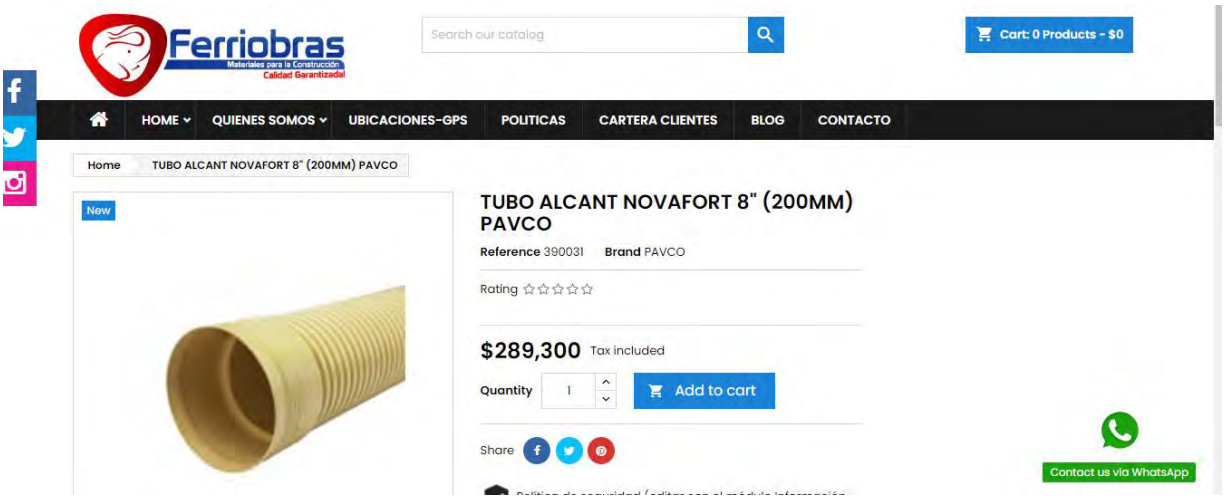


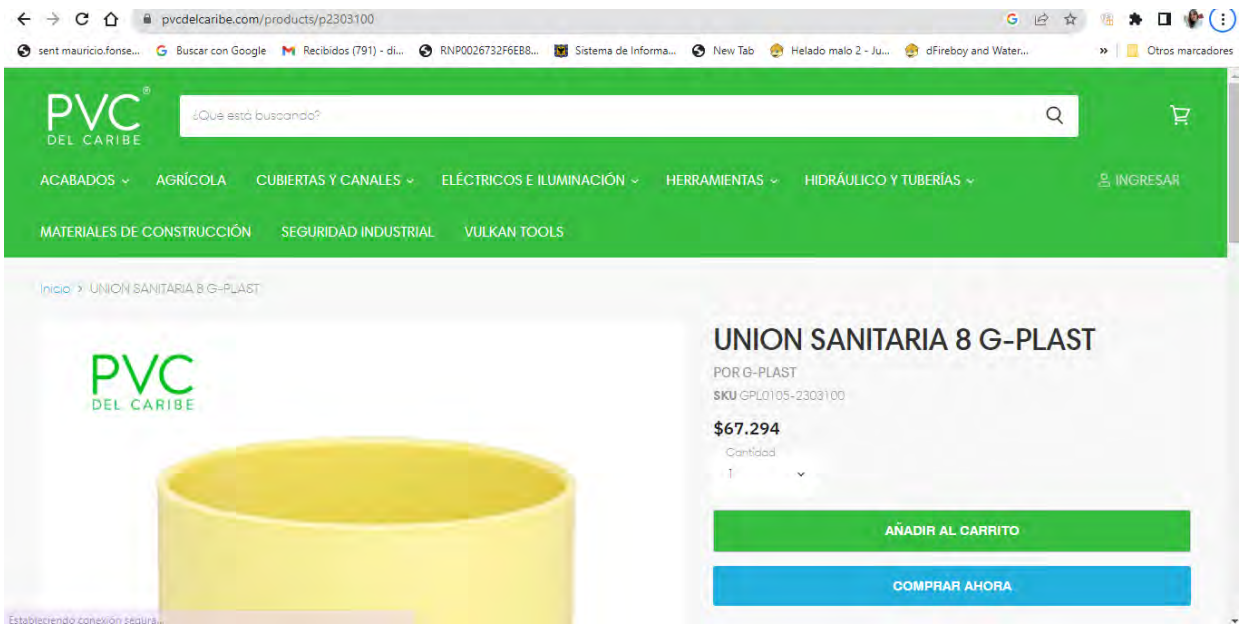
Sistema de tuberías y conexiones
Alcantarillado hermético

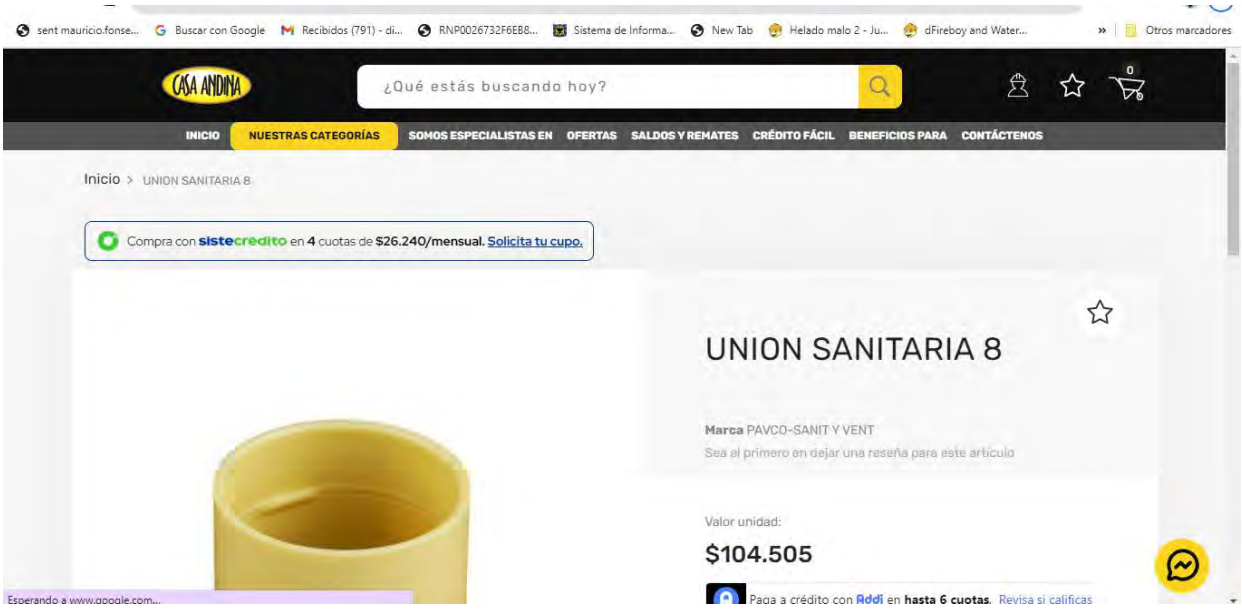
Tuberías

	Referencia	Diámetro mm-pulg.	Unidad de empaque	Precio x tubo $
Tuberías alcantarillado Novafort tramos 6m	2900090	110 mm	1 tubo	$ 132.298
	2900092	160 mm	1 tubo	$ 256.007
	2900094	200 mm	1 tubo	$ 385.963
	2900081	250 mm	1 tubo	$ 534.506
	2900083	315 mm	1 tubo	$ 769.122
	2902493	355 mm	1 tubo	$1.152.632
	2900085	400 mm	1 tubo	$1.409.793
	2900087	450 mm	1 tubo	$1.820.748
	2900089	500 mm	1 tubo	$2.373.717
Tuberías Novafort Tramos 6,5m	2906313	24"	1 tubo	$3.523.765
	2900511	27"	1 tubo	$4.219.270
	2906378	30"	1 tubo	$5.265.241
	2904604	33"	1 tubo	$7.005.889
	2902914	250	1 ud	$ 181.159
	2902917	315	1 ud	$ 309.933
	2910937	355	1 ud	$ 411.404
	2902921	400	1 ud	$ 472.541
	2902924	450	1 ud	$ 497.053
	2902926	500	1 ud	$ 558.432
	2906753	24"	1 ud	$ 654.231
	2900517	27"	1 ud	$ 736.009
	2900518	30"	1 ud	$ 919.105
	2906333	33"	1 ud	$ 2.776.383
	2907224	36"	1 ud	$ 4.008.710
	2907225	39"	1 ud	$ 5.200.808
	2907299	42"	1 ud	$ 5.636.565
	2911972	45"	1 ud	$ 9.658.535

Codos 90°	2901051	110	1 ud	$ 55.724
	2901052	160	1 ud	$ 130.808
Codos 45°				






sent mauricio.fonse...
Buscar con Google
Recibidos (791) - di...
RNP0026732F6EB8...
Sistema de Informa...
New Tab
Helado malo 2 - Ju...
dFireboy and Water...
Otros marcadores
CASA ANDINA
¿Qué estás buscando hoy?
INICIO
NUESTRAS CATEGORÍAS
SOMOS ESPECIALISTAS EN
OFERTAS
SALDOS Y REMATES
CRÉDITO FÁCIL
BENEFICIOS PARA
CONTÁCTENOS
Inicio > UNION SANITARIA 8
Compra con sistecredito en 4 cuotas de $26.240/mensual. Solicita tu cupo.
UNION SANITARIA 8
Marca PAVCO-SANIT Y VENT
Sea el primero en dejar una reseña para este artículo
Valor unidad:
$104.505
Paga a crédito con Addi en hasta 6 cuotas. Revisa si calificas
Esperando a www.google.com...

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

GOBIERNO CIUDAD BOGOTÁ

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	TUBO 8 " PVC SANITARIO NOVAFORT X 6ML	UND	$ 379.019	NUREÑA	289.300,000	FERROOBRAS	$ 365.963	CATALOGO PAVCO	$ 344.761	$ 48.472	$393.232	$296.289	$ 379.019		$ 365.963	$ 372.491
	UNION PVCS 8"	UND	$ 63.772	LISTA PRECIOS PAVCO	$ 67.294	PVC DEL CARIBE	$ 104.505	CASA ANDINA	$ 78.524	$ 22.569	$101.093	$55.954	$ 63.772	67294,00		$ 65.533

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	2220554	**DE**	2022	**FECHA INICIO**	17/03/2022	**FECHA TERMINACIÓN**	16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-29	Suministro e instalacion de poste alumbrado publico galvanizado diamentro 4", longitud 6 mts con dos brazo de 1,20 m	UN	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	874.747,50	43.737,38
				SUBTOTAL	**43.737,38**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Poste alumbrado publico galvanizado diamentro 4", longitud 6 mts con dos brazo de 1,20 m	und	1,00	$ 1.594.600,00	$ 1.594.600,00
PERNOS DE ANCLAJE EN CONCRETO 5/8 X 8 1/2	und	4,00	$ 42.625,00	$ 170.500,00
			SUBTOTAL	**1.765.100**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de materiales en furgon			1,0000	350.000	350.000,0
				SUBTOTAL	**350.000**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	$ 137.500,00	52,13%	209.179	2	418.357,50
CUADRILLA FF ELÉCTRICAS (TECNICO+AYUD)	$ 150.000,00	52,13%	228.195	2	456.390,00
				SUBTOTAL	**874.747,50**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 3.033.585,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 855.168,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 3.888.753,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-29- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE ALUMBRADO PÚBLICO GALVANIZADO DIÁMETRO 4", LONGITUD 6 MTS CON UN BRAZO 1,20 M

UNIDAD:UN

JUSTIFICACIÓN:

El reemplazo de placas de concreto o asfalto en canchas y demás zonas de urbanismo requiere el desmonte de los postes en concreto existentes, los cuales al ser en concreto sufren fracturaciones o perdida de capacidad de carga por lo cual se reemplazan por postes metálicos que garantizan durabilidad y aportan al diseño arquitectónico de los espacios.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-29- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE ALUMBRADO PÚBLICO GALVANIZADO DIÁMETRO 4", LONGITUD 6 MTS CON UN BRAZO 1,20 M

UNIDAD:UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **Suministro e instalación de poste alumbrado público galvanizado diámetro 4", longitud 6 mts con un brazo 1,20 m**

EJECUCIÓN:

- Verificar puntos de anclaje
- Verificar instalaciones eléctricas internas del poste
- Realizar izado de poste con grúa
- Verificar verticalidad y ejes
- Realizar apernado en la parte inferior
-

MATERIALES:

- **POSTE ALUMBRADO PÚBLICO GALVANIZADO DIÁMETRO 4", LONGITUD 6 MTS CON UN BRAZO 1,20 M**
- **PERNOS DE ANCLAJE EN CONCRETO 5/8 X 8 1/2**

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR
- GRUA

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (UN) de SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ALUMBRADO PÚBLICO GALVANIZADO DIAMENTRO 4", LONGITUD 6 MTS CON UN BRAZO 1,20 M** recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	2220554	**DE**	2022	**FECHA INICIO**	17/03/2022	**FECHA TERMINACIÓN**	16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-30	Suministro e instalacion de poste alumbrado público galvanizado diamentro 4", longitud 6 mts con un brazo 1,20 m	UN	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	874.747,50	43.737,38
				SUBTOTAL	**43.737,38**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Poste alumbrado público galvanizado diamentro 4", longitud 6 mts con un brazo 1,20 m	und	1,00	$ 1.514.275,00	$ 1.514.275,00
PERNOS DE ANCLAJE EN CONCRETO 5/8 X 8 1/2	und	4,00	$ 42.625,00	$ 170.500,00
			SUBTOTAL	**1.684.775**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de materiales en furgon			1,0000	350.000	350.000,0
				SUBTOTAL	**350.000**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	$ 137.500,00	52,13%	209.179	2	418.357,50
CUADRILLA FF ELÉCTRICAS (TECNICO+AYUD)	$ 150.000,00	52,13%	228.195	2	456.390,00
				SUBTOTAL	**874.747,50**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 2.953.260,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 832.524,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 3.785.784,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-30-SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ALUMBRADO PÚBLICO GALVANIZADO DIAMENTRO 4", LONGITUD 6 MTS CON UN BRAZO 1,20 M

UNIDAD:UN

JUSTIFICACIÓN:

El reemplazo de placas de concreto o asfalto en canchas y demás zonas de urbanismo requiere el desmonte de los postes en concreto existentes, los cuales al ser en concreto sufren fracturaciones o perdida de capacidad de carga por lo cual se reemplazan por postes metálicos que garantizan durabilidad y aportan al diseño arquitectónico de los espacios.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-30- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ALUMBRADO PÚBLICO GALVANIZADO DIAMENTRO 4", LONGITUD 6 MTS CON UN BRAZO 1,20 M

UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ALUMBRADO PÚBLICO GALVANIZADO DIAMENTRO 4", LONGITUD 6 MTS CON UN BRAZO 1,20 M**

EJECUCIÓN:

- Verificar puntos de anclaje
- Verificar instalaciones eléctricas internas del poste
- Realizar izado de poste con grúa
- Verificar verticalidad y ejes
- Realizar apernado en la parte inferior
-

MATERIALES:

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE ALUMBRADO PÚBLICO GALVANIZADO DIÁMETRO 4", LONGITUD 6 MTS CON UN BRAZO 1,20 M**

- **PERNOS DE ANCLAJE EN CONCRETO 5/8 X 8 1/2**

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR
- GRUA

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (UN)** de **SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ALUMBRADO PÚBLICO GALVANIZADO DIAMENTRO 4", LONGITUD 6 MTS CON UN BRAZO 1,20 M** recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	2220554	**DE**	2022	**FECHA INICIO**	17/03/2022	**FECHA TERMINACIÓN**	16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-31	Suministro e instalacion de lampara LED 60 watts en poste de alumbrado publico metalico	UN	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	159.736,50	7.986,83
Andamio tubular			200%	1.200,00	2.400,00
				SUBTOTAL	**10.386,83**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
LAMPARA LED 60 WATTS PARA POSTE ALUMBRADO PUBLICO	und	1,00	$ 477.286,00	$ 477.286,00
			SUBTOTAL	**477.286**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de materiales en furgon			0,0100	350.000	3.500,0
				SUBTOTAL	**3.500**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
CUADRILLA FF ELÉCTRICAS (TECNICO+AYUD)	$ 150.000,00	52,13%	228.195	0,7	159.736,50
				SUBTOTAL	**159.736,50**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 650.909,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 183.491,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 834.400,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-31- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METALICO

UNIDAD:UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METALICO**

EJECUCIÓN:

- Realizar montaje de lámparas en poste metálico
- Realizar conexiones eléctricas
- Verificar continuidad de energía en instalación eléctrica de poste
- Fijar y/o apernar la luminaria al poste
-

MATERIALES:

- LAMPARA LED 60 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METALICO

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIO TUBULAR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (UN) de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 60 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO METÁLICO** recibidos a satisfacción por la interventoría.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-31-SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METALICO

UNIDAD: UN

JUSTIFICACIÓN:

El reemplazo de placas de concreto o asfalto en canchas y demás zonas de urbanismo requiere el desmonte de los postes en concreto existentes, los cuales al ser en concreto sufren fracturaciones o perdida de capacidad de carga por lo cual se reemplazan por postes metálicos que garantizan durabilidad y aportan al diseño arquitectónico de los espacios. La iluminación en lampara 60 watts es la requerida para instalar en estos postes.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-32	Suministro e instalacion de lampara LED 150 watts en poste de alumbrado publico metalico	UN	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	159.736,50	7.986,83
Andamio tubular			200%	1.200,00	2.400,00
				SUBTOTAL	**10.386,83**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
LAMPARA LED 150 WATTS PARA POSTE ALUMBRADO PUBLICO	und	1,00	$ 724.140,00	$ 724.140,00
			SUBTOTAL	**724.140**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de materiales en furgon			0,0100	350.000	3.500,0
				SUBTOTAL	**3.500**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
CUADRILLA FF ELÉCTRICAS (TECNICO+AYUD)	$ 150.000,00	52,13%	228.195	0,7	159.736,50
				SUBTOTAL	**159.736,50**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 897.763,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 253.079,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 1.150.842,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-32-SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 150 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METALICO

UNIDAD:UN

JUSTIFICACIÓN:

El reemplazo de placas de concreto o asfalto en canchas y demás zonas de urbanismo requiere el desmonte de los postes en concreto existentes, los cuales al ser en concreto sufren fracturaciones o perdida de capacidad de carga por lo cual se reemplazan por postes metálicos que garantizan durabilidad y aportan al diseño arquitectónico de los espacios. La iluminación en lampara 150 watts es la requerida para instalar en estos postes.

L

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-32- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 150 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METALICO

UNIDAD:UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 150 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METALICO**

EJECUCIÓN:

- Realizar montaje de lámparas en poste metálico
- Realizar conexiones eléctricas
- Verificar continuidad de energía en instalación eléctrica de poste
- Fijar y/o apernar la luminaria al poste
-

MATERIALES:

- LAMPARA LED 150 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METÁLICO

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIO TUBULAR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (UN) de SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 150 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METALICO** recibidos a satisfacción por la interventoría.



ELECTRICOS CAMELO S.A.S
900716916-1
CALLE 14 No. 12 - 65 LOCAL M11 - M13 C.C
electricoscamelosas@gmail.com

COTIZACIÓN No. 152

Fecha de Emision
3-ago-23

NIT O C.C:	CLIENTE:	CONSORCIO OBRAS MIA GP
DIRECCION:	TELEFONO:	3219656222
CONCEPTO: COTIZACION	ELEMENTOS ILUMINACION POSTES	

DESCRIPCIÓN	UDS	PRECIO	TOTAL
LAMPARA 60 WATTS	1	$ 403.361,34	$403.361,34
LAMPARA 150 WATTS	1	$ 605.042,02	$605.042,02
PERNOS ANCLAJE CONCRETO 5/8 X 8 1/2"	1	$ 36.554,62	$36.554,62
		SUB-TOTAL	$1.044.957,98
Bancolombia: Cta ahorros No. 05300002433 ELECTRICOS CAMI	IVA %	19%	$ 198.542,02
		TOTAL	***$1.243.500,00***

SOCIOELÉCTRICOS INDUSTRIALES LTDA

DISTRIBUIDORES DIRECTOS DE FABRICA
Telemecánique - Klockner - Moeller - Siemens
Ergon - Electrocontrol - Codelca - Silvania - Philips
Centelsa - Todo en ilumunación e industrial
FERRTERIA Y CONSTRUCCION

DIA	MES	ANO
12	8	2023

COTIZACIÓN
Nº 0991

Señor(es): JORGE MERCHAN

C.C. ó NIT:

Dirección: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
2	POSTES DE 6METROS CON DOS BRAZOS DE 120CMS	1'380,000	2'760.000
4	POSTES DE 6METROS CON UN BRAZO DE 120 CMS	1'295.000	5'180.000
8	LAMPARA 60 CMS	398800	3190.000
8	LAMPARA 150 CMS	612.000	4'896.000
		SUBTOTAL $	16'026.000
		I.V.A. %	3'094.940
		TOTAL $	19'070.940

DESPUÉS DE CORTADO SU CABLE NO SE ACEPTAN RECLAMOS.

FIRMA

Calle 16 No. 10 - 76 - Teléfonos: 334 7662 - 243 1200 - Bogotá, D.C.
SUCURSAL: Cra. 12 No. 16-98 - Tel.: 334 9608
www.socioelectricosindustriales.com.co - E-mail: socio.electricos@gmail.com

IMPRESO POR HUGO FERNANDO DUARTE N. NIT 79.578.005-5 TEL. 494 1303

PrismaLight | Sabemos de **Iluminación**

prismalightsas@gmail.com
(+57) 320 887-5307
(601) 282 4296
Carrera 12 no. 16-06
Bogotá

SEÑORES Jorge Machado.

NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CIUDAD BOGOTÁ
VENDEDOR

CONDICIONES DE PAGO

2984

Fecha de venta D 12 M 8 A 2023

Fecha de vencimiento D M A

- ORDEN DE PEDIDO
- REMISIÓN
- X COTIZACIÓN

REF.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/r UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	Postes de 6 metros galvanizado de 110 cms. Pintado color XL definir.	$1'300.000.	2'600.000.
	4.	Postes de 6 metros con tilla de anclaje galvanizado de 110 cms. Color XL definir.	$1'250000.	5'000.000.
	8.	Lamparas de 60 w/s	$390.000.	3'120.000.
	8.	Lamparas de 150 w/s.	$595.000.	4'760.000.

APROBADO POR
CC. No
FIRMA

OBSERVACIONES

FIRMA COMPRADOR

SUB-TOTAL	$	15.480.000.
I.V.A.	$	2'941.200
TOTAL	**$**	18.421.200.

DIELCO SAS
NIT : 830081566- 4
CL 15 12 57
7439050 - 3208858552
BOGOTA - COLOMBIA
WWW.DIELCO.CO
Actividad económica tarifa 6.9
Agente retenedor de IVA Res.7430 - 22 agosto 2005
Autorretenedor Renta Res.7772 - 15 octubre 2020
Grandes contrubuyentes SHD Res.001- 023769 - 29 noviembre 2021

Bogota, 15 de agosto de 2023

CONSULTA
Atn: PROCASA CONSTRUCCION
COTIZACION
555555

Sibate . Colombia

Ref : Cotización V - 010 - 39215

Estimados señor (es)

En Atención a su solicitud de cotización nos permitimos ofrecerles los siguientes productos distribuidos por nuestra compañia, siendo grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta.

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0310003000007	POSTE METALICO 8M 510	UN	6.00	1,042,521.01	6,255,126.05

Total Bruto	6,255,126.05
IVA 19%	1,188,473.95
Total a Pagar	$7,443,600.00

Disponibilidad:Entrega inmediata en Almacen Dielco Bogota

VALOR NO INCLUYE ENVIO

Precio y disponibilidad salvo venta previa.

-Los materiales se cotizan de acuerdo a nuestra interpretación de las especificaciones y/o requerimientos suministrados por el cliente. Sin embargo, es responsabilidad del cliente revisar que lo cotizado se ajuste de manera óptima e idónea a sus necesidades.	**Los cables y alambres cortados, productos especiales, productos de importación bajo pedido y de fabricación no tienen cambio ni devolución.**
No se aceptan reclamos sobre ruptura, daños de la mercancía o faltantes luego de ser entregados y recibidos de conformidad por el cliente.	**La garantía de los productos no cubre mal uso, descargas eléctricas, ni daños ocasionados por el usuario**
Material disponible para entrega inmediata bajo venta previa o bajo indicaciones del asesor. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso y/o hasta agotar existencias. Se entrega mercancía en plataforma de camión.	
-En caso de efectuar anticipo, tener en cuenta:	**Entrega: 3 días despues de recibir su orden de compra o pedido una vez abonado el valor en nuesrtra cuenta bancaria** **Forma de Pago : Contado** **Validez de la oferta: 5 días a partir de la fecha, agosto 15 2023**

Cordialmente,

Ossa Veloza Jose Luis
Comercial
DIELCO SAS

Dielco Electric Systems

Elaborado e Impreso por Siigo

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-313

Bogotá, D.C, 17 de agosto de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Remisión solicitud de reemplazo de residente de interventoría No.1

Respetados señores:

En el marco de las obligaciones contractuales adquiridas mediante la suscripción del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4155718, nos permitimos solicitarles comedidamente la evaluación del reemplazo de nuestro residente de interventoría No.1, quien venía siendo ocupado por el Ing. Alvaro Coronado y en su reemplazo proponemos al Arq. Yovany Tarazona, quien cumple a cabalidad con lo requerido por parte de la Entidad Contratante.

Se adjunta hoja de vida con sus respectivos soportes para evaluación y consideración de aprobación por parte de la SED.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos: Ocho (8) folios.



YOVANY TARAZONA PABÓN

ARQUITECTO

Universidad Francisco de Paula Santander

MAT. A21282017-91514549

PERFIL

Profesional de Arquitectura, creativo y comprometido en el desarrollo de proyectos de construcción, desarrollo social y cuidado del medio ambiente, capaz de trabajar en grupo, con el carácter suficiente para la toma de decisiones y manejo de personal en obra, ademas manejo de programas de diseño y elaboración de proyectos en 2d y 3d.

ESTUDIOS

2016
Titulo Profesional
ARQUITECTO
Universidad Francisco de Paula Santander
Cúcuta, Norte de S/der

CURSOS

AUTODESK REVIT ARCHITECTURE

Compuarte y Software
Cúcuta, Norte de S/der

MODELADO EN 3D---3DStudioMax

Compuarte y Software
Cúcuta, Norte de S/der

APLICADOR EPOXI

JDT CAPACITACIONES
Cúcuta, Norte de S/der

PRINCIPALES COMPETENCIAS

Responsable y Capaz de diseñar, dirigir, implementar y gestionar soluciones para el desarrollo de proyectos arquitectónicos para el mejoramiento de la calidad de vida y entorno social, teniendo presente los requerimientos adecuados para el mismo; tales como normativas, espacialidad, dinamica del sector y condiciones ambientales entre otros. Mantener canales de comunicación constante que permita el conocimiento y accionar del proceso constructivo de manera dinámica y eficiente.

HABILIDADES

Pro-activo
Responsable
Comprometido
Creativo
Positivo
Motivador

SOFTWARE

- AutoCad
- CorelDraw
- 3dMax
- Revit

YOVANY TARAZONA PABÓN
311-4851836 arq.yovanytarazona@gmail.com



YOVANY TARAZONA PABÓN

ARQUITECTO

Universidad Francisco de Paula Santander

MAT. A21282017-91514549

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN VIVIENDA EN ZONA RURAL

12/Junio/2017-29/Junio/2018

EMPRESA: FERVIC COSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES

FUNCIONES: Desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad campesina generando el mejoramiento de areas de riego, cocinas y áreas comunes.
Manejo de personal
Pedido y control de materiales
Entrega de informes.

CONTACTO: Fernando Jaimes Representante legal
310-3230300 3112657221

ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

23/Julio/2018-25/Julio/2019

EMPRESA: JESE PROYECTOS S.A.S

FUNCIONES: Desarrollo de proyectos no residenciales tales como: colegios e instituciones como la cárcel modelo; en la adecuación y mejoramiento de cielo rasos, pisos y enchapes en baños y zonas de circulación y remodelación de locales comerciales.
Manejo de personal
Pedido y control de materiales
Entrega de informes.

CONTACTO: Jhime Santos Jaimes Representante legal
316-5362524

ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

02/Septiembre/2019-04/Marzo/2020

EMPRESA: EPC CONSTRUCCIONES

FUNCIONES: Intervención y mejoramiento de áreas de oficina y locales comerciales, en la adecuación de divisiones, cielo rasos y zona de circulación.
Manejo de personal
Control de materiales
Entrega de informes.

CONTACTO: Edwin Parada Calvo Representante legal
310-2723541

ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA Y ACABADOS

22/Junio/2021-29/Julio/2022

EMPRESA: DISANTI STUDIO

FUNCIONES: Desarrollo y remodelación de proyectos residenciales; verificación y control de ensambles e instalación de mampostería metálica, carpintería y enchapes con respecto a las especificaciones de diseño y calidad
Manejo de personal
Pedido y control de materiales
Entrega de informes.

CONTACTO: Donisio Javier Paez Representante legal
314-2482685

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Proyecto de ampliación y remodelación de vivienda. Ciudad Jardín.
Cúcuta, N/Stder 2015

Proyecto de diseño y ampliación de vivienda. García Herreros.
Cúcuta, N/Stder 2015

Proyecto de ampliación y remodelación de vivienda. Sabana la Floresta.
Cúcuta, N/Stder 2016

Proyecto de diseño de vivienda. Atalaya.
Cúcuta, N/Stder 2016

REFERENCIAS

LABORALES

Jhime Santos Jaimes
ARQUITECTO
3165362524

Diana Paola Moros
ARQUITECTA
3153853826

Dionisio Javier Paez Valdes
ARQUITECTO
3142482685

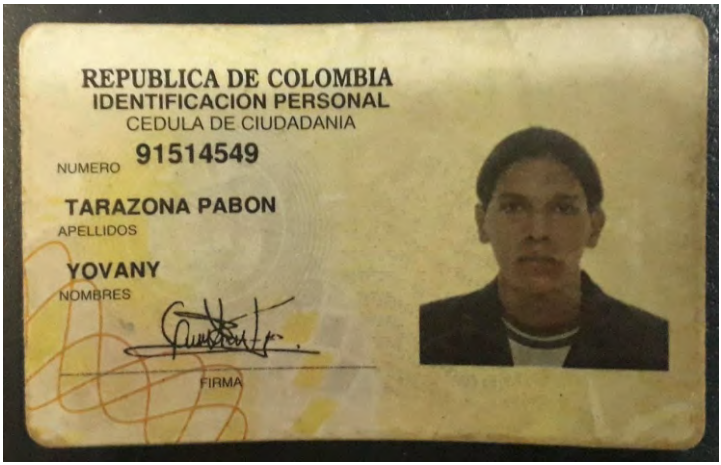
PERSONALES

Yurgen Steven Sanchez
ABOGADO
3006248188

Fabian Mena Uscategui
ARQUITECTO
3112726593

Pablo Cesar Torres
ARQUITECTO
3208531299

YOVANY TARAZONA PABÓN
311-4851836 arq.yovanytarazona@gmail.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
91514549
TARAZONA PABON
APELLIDOS
YOVANY
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1982
SAN ALBERTO
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O-
G.S. RH
M
SEXO
22-DIC-2000 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
P-2700100-59090754-M-0091514549-20010615
04462 01164D 02 069745642

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
y en su nombre

La Universidad Francisco de Paula Santander

Personería Jurídica No 20 Septiembre 19 de 1962 de la Gobernación del Departamento Norte de Santander

Confiere el Título de

Arquitecto

A

YOVANY TARAZONA PABON

C.C. No. 91,514,549 expedida en Bucaramanga

Quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello otorga el presente

DIPLOMA

Expedido en la ciudad de Cúcuta, a 22 de Diciembre de 2016

EL RECTOR

EL DECANO DE LA FACULTAD

LIBRO 38 ACTA 49128 FOLIO 2632

REGISTRO No. 45868

Libertad y Orden

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

Arquitecto

YOVANY TARAZONA PABON

C.C. 91.514.549 de Bucaramanga

Universidad Francisco de Paula Santander

Matrícula Profesional

A21282017-91514549

Fecha de Expedición

26/05/2017


JESE PROYECTOS SAS
NIT: 901.007.727-6

CERTIFICA

Que el señor, **YOVANY TARAZONA PABON** identificado con c.c. 91.514.549 de Bucaramanga, laboró para nosotros como **ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN VIVIENDA EN ZONA RURAL**, desde Julio 23 de 2018 a Julio 25 de 2019, tiempo en el cual demostró responsabilidad, honestidad y cumplimiento en todas sus labores encomendadas.

Para constancia se firma a solicitud del interesado a los 6 días del mes agosto de 2019.

Cordialmente,



Arquitecto JHIME SANTOS JAIMES
Representante Legal
JESE PROYECTOS SAS
Nit: 901.007.727-6

CERTIFICACIÓN LABORAL

Nuestra Empresa certifica que Señor YOVANY TARAZONA PABON identificado con la Cédula de ciudadanía No 91514549 de Bucaramanga, prestó sus servicios profesionales como Arquitecto en labores de residente de interventoría en la construcción de casas de vivienda en zona rural, durante el periodo comprendido entre el 12 de junio de 2017 hasta el 29 de junio del 2018, el cual desempeño con responsabilidad, honestidad y calidad dentro de los términos establecidos.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en San José de Cúcuta a los cinco (05) días del mes de Julio de 2018.

Cordialmente,

FERVIC CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S

FERNANDO JAIMES TARAZONA
Representante Legal


Calle 2AN N° 3ª-19 Barrio Pescadero.
TELEFONO: 097-5776442 – 3103230300, 3112657221

A QUIEN INTERESE

EDWIN PARADA CALVO con **NIT. 79.809.979-6** Certifica Que el ARQUITECTO YOVANY TARAZONA PABON, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.514.549 de Bucaramanga, laboró desde el día 02 de Septiembre del 2019 hasta el 04 de Marzo del 2020, desempeñándose en el cargo como Arquitecto Residente de Interventoría en edificaciones no residenciales, con tipo de contrato, prestación de servicios. Cumpliendo a cabalidad con el trabajo asignado.

La presente constancia se expide a solicitud del interesado y para los fines que le convengan. Cúcuta, Octubre 1 del 2021.

Atentamente,



ARQUITECTO
EDWIN PARADA CALVO
C.C. 79.809.979. DE BOGOTÁ D.C
Calle 30 a sur No 3-20 este: 310 2723541 – / 2067392 Bogotá D.C. –
Correo: Edwin_parada@hotmail.com

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-314

Bogotá, D.C, 18 de agosto de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Respuesta a comunicación 2023_RUU_MGP_228 - Aprobación perfiles residente No.2 e inspector de obra

Respetados señores:

Por medio de la presente y a luz de lo que establecen sus obligaciones contractuales, esta interventoría se permite dar respuesta a su comunicación 2023_RUU_MGP_228 que data del 17 de agosto de 2023, por medio de la cual presenta la actualización de los profesionales que fungirán en los siguientes perfiles, como se describe a continuación:

1. Cambio de residente de obra:

- Se reemplaza al Ingeniero Luis Miguel Castaño, por el Arquitecto Juan Camilo Cristancho.

2. Cambio de inspector de obra:

- Se reemplaza a la Arquitecta Valentina Osorio, por el Arquitecto Juan Sebastián Rivera.

CONSORCIO TIG

Una vez verificados los soportes, identificamos que los profesionales designados cuentan con la experiencia solicitada en los pliegos de condiciones y por lo tanto, emitimos el respectivo aval para que inicien de inmediato a cargo de sus funciones.

Sin otro particular,

~~EDISON RICARDO~~ DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo: Quince (15) folios

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-315

Bogotá, D.C, 17 de agosto de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Remisión solicitud de reemplazo de SST de interventoría No.4

Respetados señores:

En el marco de las obligaciones contractuales adquiridas mediante la suscripción del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4155718, nos permitimos solicitarles comedidamente la evaluación del reemplazo de nuestro SST de interventoría No.4, para lo cual postulamos al señor Oscar Daniel Moreno.

Se adjunta hoja de vida con sus respectivos soportes para evaluación y consideración de aprobación por parte de la SED.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos: Once (11) folios.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **79.984.982**

MORENO PINTO

APELLIDOS

OSCAR DANIEL

NOMBRES



FIRMA



Scanned by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **16-JUL-1978**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-NOV-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00158804-M-0079984982-20090608 **0012**277927A 1 1380014079

Scanned by CamScanner

UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Oscar Daniel Moreno Pinto

CC No. 79.984.982

Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Institución, la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de

Administrador en Salud Ocupacional

en testimonio se firma y sella este diploma

Consejo de Fundadores

Rector General

Rector UVD

Secretario General

SECRETARÍA GENERAL

Personería Jurídica otorgada por resolución 10345 del 1 de agosto de 1990, Ministerio de Educación Nacional

República de Colombia

Documento protegido con Marca de Agua Digital, verifique con SecureDoc

Folio 107 del Libro de Registro No. 009
Bogotá, 03 de abril de 2019
No. 92011

Scanned by CamScanner

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios

ACTA INDIVIDUAL DE GRADO No. 029

La Suscrita Secretaria General de La Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.

Certifica:

Que en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital; el día tres (03) de Abril de dos mil diecinueve (2019), la ***Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO,*** *Institución de Educación Superior, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, previo el juramento reglamentario, confirió el título de* ***Administrador en Salud Ocupacional*** *a* ***Oscar Daniel Moreno Pinto*** *con cédula de ciudadanía No.* ***79.984.982*** *quien aprobó la opción de grado correspondiente y cumplió con las normas legales, los requisitos académicos y las exigencias establecidas en los Estatutos y Reglamentos para el grado, y le otorgó el Diploma No* ***92011*** *que lo acredita como tal, registrado en el Folio* ***107*** *del Libro No.* ***009*** *de Registro de Títulos expedidos por la* ***Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO.***

La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO *está autorizada para conferir este título por la Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992. El programa cuenta con Resolución de Registro Calificado según Código SNIES* ***91236*** *concedido por el Ministerio de Educación Nacional.*

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital; el día tres (03) de Abril de dos mil diecinueve (2019).

Alvaro Campo Cabal
Rector UVD

Linda Lucía Guarín Gutiérrez
Secretaria General

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MD SECRETARÍA GENERAL MINUTO DE DIOS

Documento protegido con Marca de Agua Digital, verifique con SecureDoc

Scanned by CamScanner

ARL

SEGUROS BOLÍVAR

SEGUROS BOLÍVAR

CERTIFICA QUE

OSCAR MORENO

identificado(a) con número de documento 79.984.982

Recibió capacitación en el

Curso de 20 horas del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG SST)

Realizado del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2021 en Bogotá, Colombia

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICACION

Olga C Hernández

Olga Cecilia Hernández
Subgerente Nacional de Prevención y Bienestar Empresarial

CVE.1224.151070.1655.2021-05-01

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RCO-0008

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD

RESOLUCION No 4770 de 06/05/2019

"Por la cual se Concede Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo"

LA DIRECTORA DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

En uso de sus facultades legales conferidas en los artículos 23 de la ley 1562 de 2012 y 1o. de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social y en especial por las que le confiere el Decreto 507 del 6 de noviembre de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y

CONSIDERANDO

Que el (la) señor(a) OSCAR DANIEL MORENO PINTO, Identificado(a) con CC 79984982 de BOGOTA D.C, ha solicitado Licencia para prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo como persona natural;

Que el peticionario ha presentado la documentación necesaria, exigida por el literal A del Artículo Segundo de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que revisada la solicitud presentada con su documentación anexa y verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Resolución No. 4502 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social para el otorgamiento de la licencia de salud ocupacional, se considera procedente la expedición de licencia solicitada.

En mérito de lo expuesto, la Directora de Calidad de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a OSCAR DANIEL MORENO PINTO, Identificado(a) con CC 79984982 de BOGOTA D.C, como ADMINISTRADOR EN SALUD OCUPACIONAL.

ARTICULO SEGUNDO: La licencia otorgada comprende la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo en las siguientes áreas o campos de acción:

- PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- HIGIENE INDUSTRIAL
- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- INVESTIGACION EN ACCIDENTES DE TRABAJO DE ACUERDO CON SU COMPETENCIA
- EDUCACION Y CAPACITACION
- DISEÑO, ADMINISTRACION Y EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Scanned by CamScanner

Continuación de la Resolución No 4770 del 06/05/2019 por la cual se concede Licencia de Prestación de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo

ARTÍCULO TERCERO: La presente Licencia se concede por término de diez (10) años, es de carácter personal e intransferible, tendrá validez en todo el territorio nacional y puede solicitarse su renovación, por un término igual, en cualquier Secretaría Seccional o Distrital del país.

ARTICULO CUARTO: Cuando el titular de la licencia modifique alguna de las condiciones acreditadas en el momento de su obtención, deberá informar tal hecho a la Dirección de Calidad de Servicios de Salud - Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de esta Secretaría de Salud, a fin de que se proceda a modificar la resolución por la cual se otorgó la licencia. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las normas legales vigentes.

ARTICULO QUINTO: El titular de la licencia deberá dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia, en especial a la Ley 1562 de 2012, Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 y demás normas que la modifiquen o adicionen.

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente esta Resolución a OSCAR DANIEL MORENO PINTO informándole que de conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) contra la misma proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales podrá interponer ante esta Secretaría, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este acto administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los 06/05/2019

SANDRA PATRICIA CHARRY ROJAS
Directora de Calidad de Servicios de Salud (E)

Elaboró: JPABRIL
Revisó: Clara Helena Villanueva Herrera
Aprobó: Sandra Patricia Charry Rojas

Bogotá,D.C. 24-10-2019
A la fecha notifiqué personalmente al señor (a) Oscar Daniel Moreno P
C.C #. 79 984 982
Teléfono: 3187378859
Correo: oskardanielmoreno@gmail.com
Firma:

Scanned by CamScanner

CONSORCIO INTERVENTORES 2020

CERTIFICACIÓN LABORAL

A QUIEN LE PUEDA INTERESAR


Por medio de la presente, me permito certificar que el señor **OSCAR DANIEL MORENO PINTO**, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.984.982 de Bogotá, laboró para nuestra firma en el cargo de Profesional SST, en el siguiente contrato de interventoría:

Contrato No:	1380-1101-2020
Objeto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra correspondiente al Grupo 36: Cesar, que comprenden el diagnóstico y/o, actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las instituciones rurales, comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (en adelante FFIE).
Ente contratante:	CONSORCIO FFIE BBVA – Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa.
Fecha de inicio:	15 de junio de 2020
Fecha de terminación:	18 de agosto de 2021
Valor del contrato:	$ 151.388.608
Valor de obra:	$ 650.000.000

Su desempeño durante el periodo fue muy profesional y responsable, y no existe queja alguna.

La presente se firma a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2021.

Cordialmente,



JAVIER AYOLA GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO INTERVENTORES 2020

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 04 de agosto de 2023, a las 14:26:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79984982
Código de Verificación	79984982230804142608

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 228808386

WEB
17:58:10

Bogotá DC, 04 de agosto del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR DANIEL MORENO PINTO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79984982:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Relación Entradas

CONSORCIO TIG

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADA POR	DIRGIDA A	REQUIERE RESPUESTA	DOCUMENTO DE RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
20/7/2023	2023_RUU_MGP_207	Ejecución Tarima Marruecos y Molinos	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	SI	N/A	21/7/2023
21/7/2023	2023_RUU_MGP_208	Presupuesto IED Fe y alegría.	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	NO	N/A	N/A
25/7/2023	2023_RUU_MGP_210	Entrega de informe mensual SST No 6	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	NO	N/A	N/A
25/7/2023	2023_RUU_MGP_211	EXISTENCIA PUNTO GEOREFERENCIADO EN CANCHA - COLEGIO EL LIBERTADOR	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	SI	N/A	31/7/2023
25/7/2023	2023_RUU_MGP_212	Atrasos en ejecución de obras bloque 1 Colegio Restrepo Millán	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	SI	N/A	28/7/2023
29/7/2023	2023_RUU_MGP_214	Reiteración entrega espacios sin mobiliario bloque 1 Colegio Restrepo Millán	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	SI	19. Acta de entrega espacios bloque 1 Restrepo Millán 31-07-2023	31/7/2023
4/8/2023	2023_RUU_MGP_216	Balances intervenciones Colegio Restrepo Millan y José Martí	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	SI	N/A	11/8/2023
10/8/2023	2023_RUU_MGP_217	Acta de Pago Parcial No 6 ajustada.	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	SI	Acta con ajustes	10/8/2023
10/8/2023	2023_RUU_MGP_218	RESPUESTA A COMUNICADO TIG-MEM-297 - Segundo llamado de atención por falta de gestión oportuna en el componente ambiental	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	NO	N/A	N/A
10/8/2023	2023_RUU_MGP_219	Solicitud habilitación espacios IED Enrique Olaya herrera Sede A.	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	NO	N/A	N/A
10/8/2023	2023_RUU_MGP_220	PRESUPUESTO INTERVENCION BLOQUES BACHILLERATO FE Y ALEGRIA	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	NO	N/A	N/A
11/8/2023	2023_RUU_MGP_221	SOLICITUD DE RETIRO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, CAMPANAS Y BAFLES ANCLADOS EN FACHADA EN BLOQUE 1 EN COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	NO	N/A	14/8/2023
11/8/2023	2023_RUU_MGP_222	RESPUESTA A OFICIO TIG-MEM-255 - SOLICITUD DOCUMENTACION DE PERSONAL PARA INGRESO A OBRA PARA EL COLEGIO RESTREPO MILLAN	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	NO	N/A	N/A
12/8/2023	2023_RUU_MGP_223	APUS PARA APROBACION CAMBIO DE CUBIERTA LICEO FEMENINO	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	NO	N/A	N/A
14/8/2023	2023_RUU_MGP_224	APUS 25 HASTA 32	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	NO	N/A	N/A
14/8/2023	2023_RUU_MGP_225	INFORME MENSUAL DE OBRA 06 DESDE 20 DE JUNIO HASTA 19 DE JULIO	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	NO	N/A	N/A
16/8/2023	2023_RUU_MGP_225.1	Entrega diseño V3 tarima marruecos y molinos.	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	SI	Planteamiento estructural	19/8/2023
17/8/2023	2023_RUU_MGP_226	Ajustes arquitectónicos IED Diana Turbay Sede B.	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	NO	N/A	N/A
17/8/2023	2023_RUU_MGP_227	SOLICITUD REUBICACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPOS DE UBICADOS ACTUALMENTE EN BIBLIOTECA COLEGIO LICEO FEMENINO	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	SI	N/A	18/8/2023
17/8/2023	2023_RUU_MGP_228	HOJAS DE VIDA PROPUESTA PARA RESIDENTE DE OBRA E INSPECTOR	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	NO	N/A	N/A
17/8/2023	229-2023_RUU-MGP	DISEÑOS REDES COLEGIO FE Y ALEGRIA	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	NO	N/A	N/A
19/8/2023	2023_RUU_MGP_230	Estudio de suelos y diseño pavimento rígido El Libertador	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Ing. Edison ricardo duarte Director de interventoría	NO	N/A	N/A

Firma:

Nombre: **EDISON RICARDO DUARTE DÍAZ**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Código	Vigencia
FMI022-1	7/1/2021

Bogotá D.C., 20 de julio de 2023

2023_RUU_MGP_207

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Ejecución Tarima Marruecos y Molinos

Cordial saludo,

El Contratista ve con preocupación los inconvenientes que se han presentado para definir el diseño arquitectónico y estructural de la Tarima del Colegio Marruecos y Molinos, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El alcance de las intervenciones definidas para este colegio es impermeabilizar la cubierta del bloque de primaria y construir una tarima para eventos en cancha multiple.
2. El contratista recibió por parte de la SED un diseño arquitectónico en torno al cual debía realizarse el diseño estructural y ejecutar la tarima.
3. El 02 de Junio de 2023, en recorrido dentro del colegio entre la Interventoria, la SED, la Direccion del Colegio y el Contratista, se manifestó por parte del Director del colegio que el diseño entregado por la SED y que seria ejecutado por el Contratista, no atendia a las necesidades del plantel educativo pues, según él, era de dimensiones reducidas y el Colegio necesitaba una tarima mas grande y que tuviera diseñados espacios para almacenamiento de equipos.

   Respecto a esa solicitud, la SED estableció como viables los requerimientos generados por la dirección de la dirección y viabilizó el ajuste al diseño arquitectónico y estructural en torno a estas necesidades expuestas por parte del director del Colegio.

4. El contratista procedió con el ajuste al diseño arquitectónico y estructural de la tarima y presentó el esquema arquitectónico ajustado a la SED y a la INTERVENTORIA en comité de 26 de junio de 2023, en torno al cual se realizaron nuevamente ajustes por parte de la SED, por lo cual debió ajustarse el diseño estructural nuevamente en atención a estas modificaciones arquitectónicas realizadas en este comité.

5. El 10 de Julio el Contratista presentó a la interventoría, diseño estructural de la versión arquitectónica acordada el 23 de junio a fin de que se emitiera el aval de los diseños y presupuesto de ejecución, y de esta manera programar y ejecutar las actividades correspondientes a la construcción de la Tarima.

6. El 13 de Julio, en visita de obra realizada por el ingeniero estructural de la Entidad y el arquitecto apoyo a la supervisión Hugo Tibaquira al Colegio Restrepo Millan, se realizó la consulta respecto al Diseño de la tarima presentado por el Contratista, en torno al cual el ingeniero estructural de la entidad, manifestó que ese diseño arquitectónico y estructural debería evaluarse primero en la SED y que sería la Entidad la que emitiera la instrucción acerca del alcance del diseño y la construcción de la tarima, por lo cual no se daría inicio a ninguna actividad en ese frente hasta tanto no se acordara internamente en la entidad el alcance y diseño de esa tarima.

Tomando en consideración estas dificultades presentadas en torno a la definición del diseño arquitectónico y estructural de la Tarima del **COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS SEDE A,** que obligaron a la suspensión de actividades en ese frente hasta tanto no se emitan los diseños por parte de la SED en torno a los cuales se van a construir la tarima, el contratista informa que continuara con las actividades de impermeabilización de cubierta del bloque de primaría y seguirán suspendidas las obras del frente de tarima hasta tanto se presente instrucción clara por parte de la SED en torno al diseño arquitectónico y estructural de la misma.

Por lo anterior, Contratista presentará reprogramación de actividades en este Colegio, las cuales se encuentran condicionadas a las instrucciones que imparta la SED respecto al diseño de la tarima.

Sin otro particular, agradecemos su gestión y apoyo.

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo: Acta de comité 02 de junio

Bogotá D.C., 21 de julio de 2023

2023_RUU_MGP_208

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Presupuesto IED Fe y alegría.

Cordial saludo,

Por medio de la presente de acuerdo con el compromiso adquirida en comité administrativo del día 11 de julio de 2023 entre contratista, interventoría y supervisión, hacemos entrega del presupuesto preliminar realizado de acuerdo con el diagnóstico e inspección elaborada por el contratista de obra de la siguiente manera:

1. Presupuesto bachillerato: *Tres mil setecientos cincuenta millones quinientos setenta y dos mil cuarenta y dos pesos M/CTE* ($ 3,750,572,042), en donde se contempla la habilitación de los bloques existentes, sin contemplar obras de urbanismo.

2. Presupuesto primaria bloques F y G: *Mil doscientos dieciocho millones setecientos noventa y seis mil novecientos quince pesos M/CTE* ($ 1,218,796,915), en donde se contempla la habilitación de los bloques existentes y andenes perimetrales de las inmediaciones de las aulas.

Las actividades contempladas en los presupuestos se realizaron de manera integral en las áreas a intervenir, con el fin garantizar las labores realizadas como lo son; instalaciones eléctricas, cambios de pisos y cubiertas, con el fin de acarreas con futuras postventas teniendo en cuenta el estado de las edificaciones.

Cabe aclarar que las cantidades contempladas son aproximadas ya que como se ha mencionado por la firma constructora la elaboración de un presupuesto aterrizado al proyecto, conlleva un estudio previo en donde se identifique el estado a detalle de las edificaciones y redes existentes, junto con la elaboración de diseños de las diferentes especialidades que se involucren en el

proyecto, para ser presentado ante la entidad competente con el fin de dar cumplimiento a las normativas legales vigentes.

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Bogotá D.C., 25 de julio de 2023

2023_RUU_MGP_210

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Edison Duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega de informe mensual SST No 6

Cordial saludo,

Por medio del presente el CONSORCIO MIA GP realiza la entrega del informe mensual SST No 6 correspondiente al periodo del 20 de junio al 19 de julio del 2023.

Agradecemos la atención prestada.

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Ficha técnica del material
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

Bogotá D.C., 25 de julio de 2023

2023_RUU_MGP_211

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: EXISTENCIA PUNTO GEOREFERENCIADO EN CANCHA - COLEGIO EL LIBERTADOR

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que procederemos con intervención en las canchas del colegio, para lo cual se requiere demoler la placa y excavar la estructura de pavimento existentes, amablemente solicitamos instrucción acerca de si se debe o no conservar el punto georreferenciado existente en la cancha (ver imágenes) toda vez que en el proceso de construcción de la nueva cancha deberá ser removido el mojón existente.

En el caso de que se requiera conservar esta georreferenciación, deberá realizarse mediante cuadrilla topográfica que se encargue de la actividad, lo que requiere aprobación previa de interventoría.





Sin otro particular, agradecemos su gestión y apoyo.

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Bogotá D.C., 25 de julio de 2023

2023_RUU_MGP_212

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Atrasos en ejecución de obras bloque 1 Colegio Restrepo Millán

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el alcance total de las intervenciones del Colegio Restrepo Millan sede B, es realizar el mantenimiento al bloque 1 y bloque 2 del Colegio y que ya fueron entregados por parte del Contratista las obras en el Bloque 2, solicitamos su gestión para que sean entregados los espacios del bloque 1 del Colegio, a fin de que se puedan iniciar las intervenciones respectivas.

El 17 de julio de 2023 el Contratista entregó las llaves a la institución educativa para que fuera habilitado este espacio en actividades académicas del colegio, ese día, en conversación con coordinadora se acordó que se retiraría el mobiliario (disponiéndolo en el bloque 2) y dejarían libres las áreas del bloque 1 para que el Contratista recibiera estos espacios el 21 de julio de 2023.

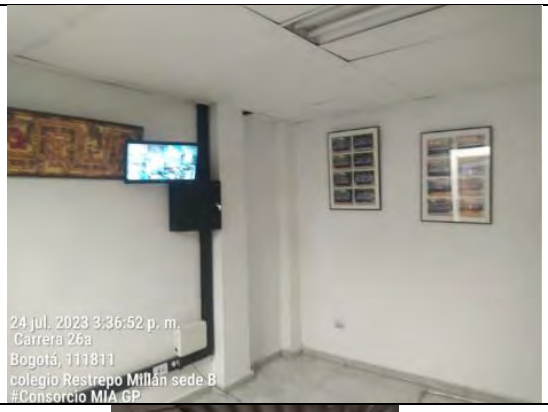
El 21 de julio, la institución educativa informa que no se han desocupado todos los espacios del bloque 1 puesto que aún se encontraba mobiliario dentro de los salones (televisores, monitores en corredor principal y en oficina de coordinación aún se encuentran el monitor de seguridad de la institución). Debido a esta situación no fue posible iniciar las intervenciones, toda vez que el Contratista no se puede hacer cargo de ningún mobiliario o equipo que sea

propiedad del Colegio, por lo cual es responsabilidad del colegio entregar las áreas de trabajo completamente despejadas y sin mobiliario o equipos.

El 24 de julio el Contratista se desplazó al Colegio para verificar el retiro de los equipos pendientes, sin embargo, tal como se evidencia en el registro fotográfico aún se encuentran equipos instalados en aulas y oficinas.

Por la situación expuesta, a la fecha, el Contratista no ha iniciado las intervenciones en el bloque 1 del colegio, afectando esta situación el desarrollo normal de las intervenciones a ejecutar y la programación general del contrato.

Solicitamos su acostumbrada gestión y colaboración para que las directivas del Colegio realicen la entrega de los espacios totalmente libres de mobiliario y equipos, a fin de que el Contratista pueda dar inicio a las intervenciones en el bloque 1.









Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Bogotá D.C., 29 de julio de 2023

2023_RUU_MGP_214

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.


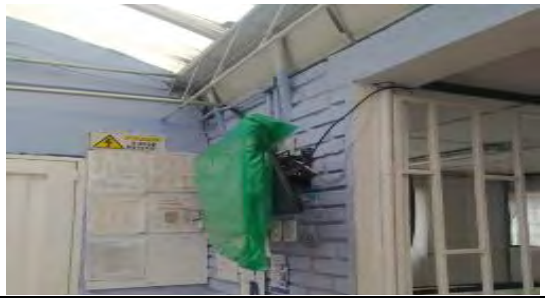
Asunto: Reiteración entrega espacios sin mobiliario bloque 1 Colegio Restrepo Millán

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el 26 de julio en recorrido en bloque 1 del Colegio Restrepo Millán sede B, entre interventoría y contratista para el recibo de espacios, se evidencio que aún se encontraban dentro de los espacios monitores del sistema de seguridad de la institución, respecto a lo cual el Contratista manifestó a las partes la necesidad de retirar dichos monitores porque las intervenciones contempladas en el alcance contractual suponen que las áreas estén a la intemperie durante el lapso que tome el desmonte de la cubierta existente, mantenimiento de estructura metálica existente, instalación de estructura metálica de refuerzo para soporte cubierta e instalación de teja, además de que las condiciones climáticas y las mismas maniobras para ejecutar actividades representan un riesgo de afectación de dichos equipos

Nuevamente solicitamos a la interventoría gestionar ante la entidad contratante y la institución educativa el retiro de los equipos ya mencionados para poder recibir el edificio e iniciar ejecución de la intervención contemplada en el alcance contractual.

Cabe aclarar que, de no ser retirados los equipos relacionados, consorcio Mia GP se exime de la responsabilidad de la custodia, seguridad y estado de los mismos ya que se entiende que es obligatoriedad de la institución entregar los espacios desalojados.

Cordialmente,

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Bogotá D.C., 04 de Agosto de 2023

2023_RUU_MGP_216

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Balances intervenciones Colegio Restrepo Millan y José Martí

Cordial saludo,

Adjunto enviamos para su revisión y aprobacion los Balances de obra de las siguientes instituciones educativas:

- COLEGIO RESTREPO MILLAN SEDE B
- COLEGIO JOSE MARTI SEDE A

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2023

2023_RUU_MGP_217

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Ing. Edison ricardo duarte
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Acta de Pago Parcial No 6 ajustada.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO MIA GP realiza la entrega del Acta de Pago Parcial No 6 correspondiente al periodo del 20 de junio de 2023 al 19 de julio de 2023, atendiendo a las observaciones pro parte de la SED, esto para su revisión, aprobación y posterior gestión ante la entidad contratante.

Se adjunta:

- Acta parcial en Excel y PDF
- Memorias de Calculo Excel y PDF
- Aportes parafiscales
- FURC - Hoja información de pagos
- RUT y RIT CONSORCIO MIA GP
- Pre Factura No MGP-06
- Resolución de facturación DIAN
- Certificación Bancaria

Agradecemos la atención,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Lo enunciado
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

Bogotá D.C., 10 de Agosto de 2023

2023_RUU_MGP_218

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison Ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: RESPUESTA A COMUNICADO TIG-MEM-297 - Segundo llamado de atención por falta de gestión oportuna en el componente ambiental

Cordial saludo,

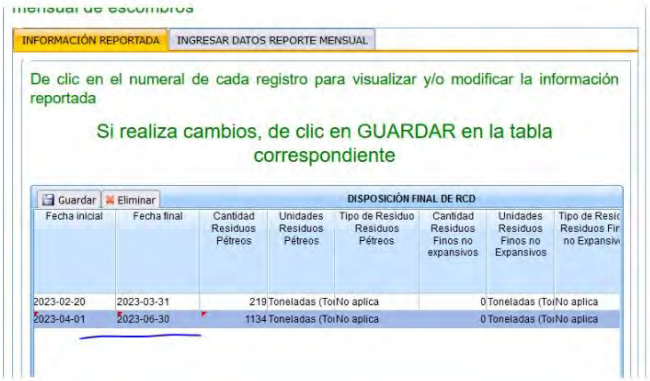
Adjunto enviamos la información solicitada para que a través de la interventoría sea enviada a la Secretaria de Educación a fin de que esta entidad realice el cargue de la información ante la Secretaria Distrital de Medio Ambiente.

Aclaramos que, con el fin de colaborar con la Entidad Contratante, el Contratista intentó en repetidas ocasiones subir la información a la pagina de la Secretaria Distrital de Medio Ambiente sin tener éxito, esto debido a problemas propios de la pagina habilitada por la Secretaria Distrital de Medio Ambiente.

Debido a estos inconvenientes presentados en adelante, como es nuestra obligación, enviaremos la información a la interventoría para que a través de ésta se realice el envío a la Entidad contratante la cual deberá realizar el cargue de la información en la pagina de la Secretaria de Medio Ambiente.

En las imágenes se evidencian de las dificultades presentadas en la pagina de la Secretaria de Medio Ambiente, que han impedido el cargue de la información del proyecto.


Ingrese los datos y de clic en el botón guardar. La información se visualizará como reportada cuando sea apobada por la Secretaría Distrital de Ambiente
Guardar
Agregar
Eliminar
DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
Mes
Año
Cantidad Residuos Pétreos
Unidades Residuos Pétreos
Tipo de Residuo Residuos Pétreos
Cantidad Residuos Finos no expansivos
Unidades Residuos Finos no Expansivos
Junio
2023
1134
Toneladas
No aplica
0
Toneladas
No aplica
REGISTRO MENSUAL DE TRANSPORTE DE RCD
Reporte, consulta y modificación de información
Cancelar
Siguiente


INFORMACIÓN REPORTADA
INGRESAR DATOS REPORTE MENSUAL
De clic en el numeral de cada registro para visualizar y/o modificar la información reportada
Si realiza cambios, de clic en GUARDAR en la tabla correspondiente
Guardar
Eliminar
DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
Fecha inicial
Fecha final
Cantidad Residuos Pétreos
Unidades Residuos Pétreos
Tipo de Residuo Residuos Pétreos
Cantidad Residuos Finos no expansivos
Unidades Residuos Finos no Expansivos
2023-02-20
2023-03-31
219
Toneladas (Toi
No aplica
0
Toneladas (Toi
No aplica
2023-04-01
2023-06-30
1134
Toneladas (Toi
No aplica
0
Toneladas (Toi
No aplica


mensual de escombros
INFORMACIÓN REPORTADA
INGRESAR DATOS REPORTE MENSUAL
DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
Conversión de unidades
Convertir a toneladas
Errores encontrados
java.lang.RuntimeException: Error ejecutando la regla 731 OBRAS_ACTUALIZAR_REGISTRO_ARCHIVO_CSV: org.mozilla.javascript.JavaScriptException: java.lang.RuntimeException: java.sql.SQLException: Invalid conversion requested Query: UPDATE OBRAS.REPORTE_PROYECTO SET RCD_APROVECHABLES = ? WHERE ID_PARAM = ? Parameters: [13897662, null]
Aceptar
COMPONENTES
RCD APROVECHABLES
Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosín, morteros y materiales inertes que no sobrepasen el tamiz # 200 de granulometría
Arcillas (caolín), limos y residuos inertes, poco o no plásticos y expansivos que sobrepasen el tamiz # 200 de granulometría
Arcillas (montmorilonitas) y lodos


Guardar
Eliminar
DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
Mes
Año
Fecha inicial
Fecha final
Cantidad Residuos Pétreos
Unidades Residuos Pétreos
Tipo de Residuo Residuos Pétreos
Abril
2023
2023-02-20
2023-03-31
219
Toneladas (Toi
No aplica
Mayo
2023
0
Toneladas (Toi
No aplica
Seleccionar todo TRANSPORTE RCD
Guardar
Agregar
Eliminar
TRANSPORTE DE RCD
Seleccionar
Fecha transporte
Placa vehículo que transportó los RCD
PIN del transportador
Clasificación del sitio de recepción de RCD
Etapa o actividad de reutilización de RCD en la obra
2023-02-28
SGJ323
13,122
Sitio de Disposición Final (
Etapa de Construcción (De

Adjunto enviamos la siguiente información que deberá ser subida a la plataforma de la Secretaria de Medio Ambiente por parte de la Entidad Contratante, en cumplimiento de la resolución 1257 de 2021,

- Anexo 05
- Reporte trimestral mayo a junio
- Certificación DF Respel
- Reporte Trimestral abril, mayo, junio
- Certificaciones aprovechables

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2023

2023_RUU_MGP_219

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Solicitud habilitación espacios IED Enrique Olaya herrera Sede A.

Cordial saludo,

Por medio de la presente teniendo en cuenta los compromisos de entrega establecidos para el frente en mención, solicitamos de su colaboración para que se realice compromiso con la institución del cual se de cumplimiento, toda vez que desde el pasado 04 de agosto de 2023 se esperaba contar con la disposición de las aulas del bloque 2 – costado occidental en las cuales se contempla realizar cambio de cubiertas tipo sándwich.

El pasado viernes 04 de agosto de 2023, día en el cual se contemplaba inicio de actividades, no se contaba con espacios sin mobiliario y electrodomésticos, teniendo en cuenta que el compromiso para realizar intervenciones dentro de las instituciones ha sido la entrega de espacios sin elementos que puedan interrumpir la actividad o se puedan ver afectados en la ejecución de estas.

El sábado 05 de agosto de 2023, no se liberó por completo tanto aulas como pasillos del área.

El martes 06 de agosto de 2023, se encuentran estudiantes en aulas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la institución en el transcurso de la semana ha liberado un área mínima de intervención, por lo cual solicitamos de su colaboración y gestión, ya que vemos con preocupación el avance de las actividades desarrolladas de cara al compromiso de entrega del frente, teniendo en cuenta que el material para acometer las actividades se encuentra en un 100% en el frente de obra.





Agradecemos de su colaboración y pronta respuesta con el fin de dar cumplimiento con la ejecución de las actividades pertinentes.

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Bogotá D.C., 10 de Agosto de 2023

2023_RUU_MGP_220

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison Ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: PRESUPUESTO INTERVENCION BLOQUES BACHILLERATO FE Y ALEGRIA

Cordial saludo,

De acuerdo con recorrido realizado dentro de las instalaciones del colegio por parte de la SED, el Contratista y la Interventoría el pasado 03 de Agosto de 2023, en el cual se expusieron por parte de la SED las necesidades que se pretenden atender a fin de lograr la habilitación de los bloque de bachillerato del IED FE Y ALEGRIA, el Contratista elaboró presupuesto de acuerdo con las **inspecciones visuales** realizadas en sitio mediante las cuales se estableció de manera preliminar el siguiente alcance:

1. **INSTALACIONES ELECTRICAS:** Se establece por parte de la SED cuantificar presupuesto preliminar eléctrico en función de unos puntos eléctricos definidos por la SED para aulas, pasillos, baños y demás zonas de los bloques en mención. En torno a esta información se cuantificó el valor en función de los precios contractuales definidos dentro del contrato de obra.

   Se establecieron recorridos de circuitos probables, para cuantificar de manera preliminar los posibles circuitos y sus recorridos.

   Se realizó el presupuesto bajo el criterio de que el transformador existente puede suplir la carga de los bloques en mención.

   Nota: Se desconoce el estado real del transformador y el tratamiento a realizar paradejarse en correcto funcionamiento.

No se definieron dentro del presupuesto actividades correspondientes a tableros eléctricos en TGA ni planta eléctrica.

Debido a que el presupuesto se obtuvo bajo los criterios mencionados, el Contratista aclara que éste presupuesto se realiza sin diseños eléctricos o pre-dimensionamientos de carga de las redes, por lo cual la información presentada obedece a un pre-supuesto y presentará cambios en el momento que se aterrice con un diseño técnico eléctrico suministrado por la SED.

2. **INSTALACIONES HIDRAULICAS:** No se cuantifica dentro del presupuesto cambio de red, ya que es incierta la conexión definitiva que se realizara para el proyecto.

   De acuerdo con información suministrada por la **SED**, existen seis cuentas de agua potable para el predio, sin embargo, en recorrido realizado, tan solo se pudo identificar físicamente un medidor. Se debe entonces identificar los puntos físicos de conexión de agua con los que cuenta el predio para de esta manera establecer mediante un **DISEÑO HIDRAULICO**, el sistema mediante el cual se realizará el suministro de agua a estos bloques, tendidos, diámetros, elementos de almacenamiento, elementos de suministro de presión (en caso de ser necesarios o establecidos dentro del diseño).

   Teniendo en cuenta lo anterior, únicamente se encuentra presupuestado el cambio de aparatos sanitarios.

   El tendido hidráulico requerido para el suministro de agua de los bloques deberá ser presupuestado una vez se cuente con diseño hidráulico.

3. **INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS:** En recorrido a las instalaciones se realizó inspección a algunas cajas existentes que se encuentran en las edificaciones, sin embargo, no existe un diagnostico mediante el cual se pueda establecer el tendido general de las redes de aguas lluvias y negras del colegio y tampoco su estado general, que permita identificar el tratamiento a realizar en estas redes y cajas a fin de garantizar que quedaran habilitadas y en funcionamiento.

   Es necesario contar con este diagnóstico para presupuestar las actividades reales necesarias para la habilitación de toda la red de aguas lluvias y negras del sistema.

4. **MANTENIMIENTO EN CUBIERTAS:** Se cuantificaron actividades de instalación de bajantes, mantenimiento en viga canales y mantenimiento de cubiertas existentes, de acuerdo con cantidades calculadas en sitio. sin embargo, se aclara que la cubierta existente es una cubierta en asbesto, que en el desarrollo de la actividad de mantenimiento y debido a que es una cubierta antigua puede fracturarse lo cual obligaría a su remplazo.

Una vez aclarado el alcance y criterios con los que se desarrolló el presupuesto solicitado por la SED, adjunto enviamos el mismo por un valor de **MIL CIENTO OCHENTA MILLONES DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 1,180,002,185).**

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo: **Acta de recorrido en obra 03 agosto**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PROPUESTA ECONÓMICA PROCESO DE SELECCIÓN SED-LP-DCCEE-039-2022

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

VALOR PROPUESTA ECONÓMICA

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	400.88	$ 66,944.00	$ 26,836,511.00
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	54.00	$ 14,890.00	$ 804,060.00
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN	6.00	$ 140,804.00	$ 844,824.00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	348.00	$ 5,062.00	$ 1,761,576.00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	1100.00	$ 6,882.00	$ 7,570,200.00
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.2	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS). NO INCLIUYE CAMBIO DE TEJAS	M2	2324.89	$ 13,332.00	$ 30,995,433.00
1.3.8	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	267.25	$ 7,998.00	$ 2,137,466.00
1.3.9	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CIRCUITOS EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA DE TABLERO, ORGANIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, CAMBIO DE APARATOS.	UN	5.00	$ 369,442.00	$ 1,847,210.00
1.3.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PUESTA EN MARCHA, EQUIPO EYECTOR AGUAS LLUVIAS. INC. DESMONTE, LIMPIEZA, CAMBIO DE EMPAQUES, REPOSICION Y ALINEACION DE COMPLEMENTOS, ARMADO, CABLEADO Y PUESTA MARCHA DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: TANQUE COLECTOR AGUAS LLUVIAS, BOMBA EYECTORA Y TABLERO DE CONTROL	UN	5.00	$ 1,602,543.00	$ 8,012,715.00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION TUBERIA	M	352.89	$ 11,598.00	$ 4,092,818.00
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	232.49	$ 23,023.00	$ 5,352,594.00
1.4.8	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	$ 1,806,420.00	$ 9,032,100.00
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	514.60	$ 4,193.00	$ 2,157,718.00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 101,445,225.00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	400.88	$ 75,296.00	$ 30,184,660.00
2.1.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	400.88	$ 47,385.00	$ 18,995,699.00

2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	400.88	$	95,957.00	$ 38,467,242.00
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	54.12	$	174,350.00	$ 9,435,822.00
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2	400.88	$	123,376.00	$ 49,458,971.00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					**$ 146,542,394.00**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**					
4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	400.00	$	16,553.00	$ 6,621,200.00
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	400.00	$	12,174.00	$ 4,869,600.00
4.6	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	58.00	$	45,582.00	$ 2,643,756.00
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	72.00	$	138,723.00	$ 9,988,056.00
4.7	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN	10.00	$	47,778.00	$ 477,780.00
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	50.00	$	32,839.00	$ 1,641,950.00
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					**$ 26,242,342.00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	82.00	$	207,904.00	$ 17,048,128.00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	160.00	$	225,499.00	$ 36,079,840.00
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	6.00	$	761,265.00	$ 4,567,590.00
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1225.06	$	42,467.00	$ 52,024,623.00
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	3675.18	$	18,061.00	$ 66,377,426.00
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN	M	200.00	$	49,930.00	$ 9,986,000.00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	348.00	$	266,905.00	$ 92,882,940.00
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	262.00	$	194,999.00	$ 51,089,738.00
5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	86.00	$	168,166.00	$ 14,462,276.00

5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	348.00	$	52,323.00	$ 18,208,404.00
5.1.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM (INCLUYE SOPORTES DE FIJACION	M	267.25	$	17,055.00	$ 4,557,949.00
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					**$ 367,284,914.00**
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	54.00	$	817,210.00	$ 44,129,340.00
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	UN	20.00	$	30,486.00	$ 609,720.00
SUBTOTAL	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					**$ 44,739,060.00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5589.24	$	33,591.00	$ 187,748,161.00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	5589.24	$	17,773.00	$ 99,337,563.00
13.2.7	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	2039.38	$	28,677.00	$ 58,483,300.00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					**$ 345,569,024.00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	514.60	$	63,665.00	$ 32,762,009.00
17.1.44	SEI DE VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). Ds = 100 CM - CAL 20	M	299.00	$	117,105.00	$ 35,014,395.00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					**$ 67,776,404.00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	3315.09	$	7,708.00	$ 25,552,714.00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					**$ 25,552,714.00**
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**					
NP-13	INSPECCION Y DESTAPONAMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS POR EMERGENCIA CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS (Incluye alquiler de geofono, sonda metálica, microcamara, excavacion manual donde aplique). Aplica tanto para agua potable como aguas negras evidenciando la fuga y destaponamiento de la tubería según sea el caso.	M	264.25	$	207,569.00	$ 54,850,108.25
SUBTOTAL	**21. ITEMS NO PREVISTOS**					**$ 54,850,108.25**

VALOR TOTAL	**$ 1,180,002,185.25**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	
VALOR TOTAL	**$ 1,180,002,185.25**

Bogotá D.C., 11 de agosto de 2023

2023_RUU_MGP_221

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

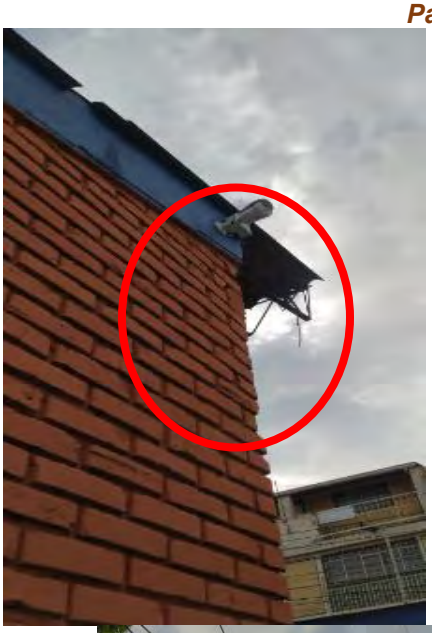
Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: SOLICITUD DE RETIRO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, CAMPANAS Y BAFLES ANCLADOS EN FACHADA EN BLOQUE 1 EN COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B

Cordial saludo,

Se reitera solicitud de retiro de Cámaras del sistema de seguridad de la institución Restrepo Millán sede B, ubicados en el bloque 1, dado que para la intervenciones a nivel de cubierta en la parte exterior tal como se socializó con la institución la necesidad de reubicar dichos elementos los cuales obstaculizan las intervenciones contempladas en el alcance contractual referente a instalación de estructura metálica de refuerzo para soporte cubierta e instalación de teja; por tanto; Se solicita amablemente que interventoría gestione ante la entidad contratante y la institución educativa el retiro de los equipos ya mencionados para continuar con ejecución de la intervención contemplada









Agradecemos la atención y gestión oportuna,

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Bogotá D.C., 11 de agosto de 2023

2023_RUU_MGP_222

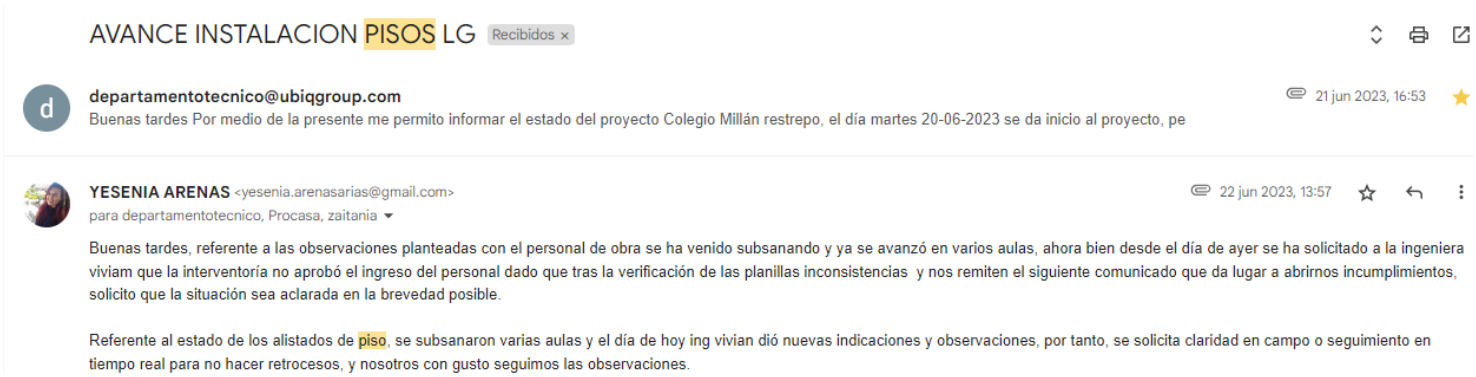
Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: RESPUESTA A OFICIO TIG-MEM-255 - SOLICITUD DOCUMENTACION DE PERSONAL PARA INGRESO A OBRA PARA EL COLEGIO RESTREPO MILLAN

Atendiendo a la solicitud de documentación de personal para ingreso a obra para el Colegio Restrepo Millán, en donde la interventoría expone "(…) Con base a la solicitud de ingreso que realizaron el día de hoy en horas de la mañana por vía correo electrónico y relacionada con los trabajadores Neiver Portilla Muñoz identificado con la CC 1.030.557.207 y del señor Luis Miguel Ruiz López identificado con la CC 1.022.995.427, nos permitimos solicitar de manera oficial la documentación de afiliación de ARL, EPS Y AFP de los trabajadores antes mencionados, debido, a que una vez verificada por parte de la interventoría, las planillas de seguridad social que adjuntaron en el correo electrónico, presuntamente no son veraces (…)".

Acorde a lo expuesto se inició un proceso de verificación seguimiento al proveedor del piso, quienes a su vez estuvieron a cargo de la instalación, situación evidenciada en la siguiente imagen:



AVANCE INSTALACION PISOS LG Recibidos ×

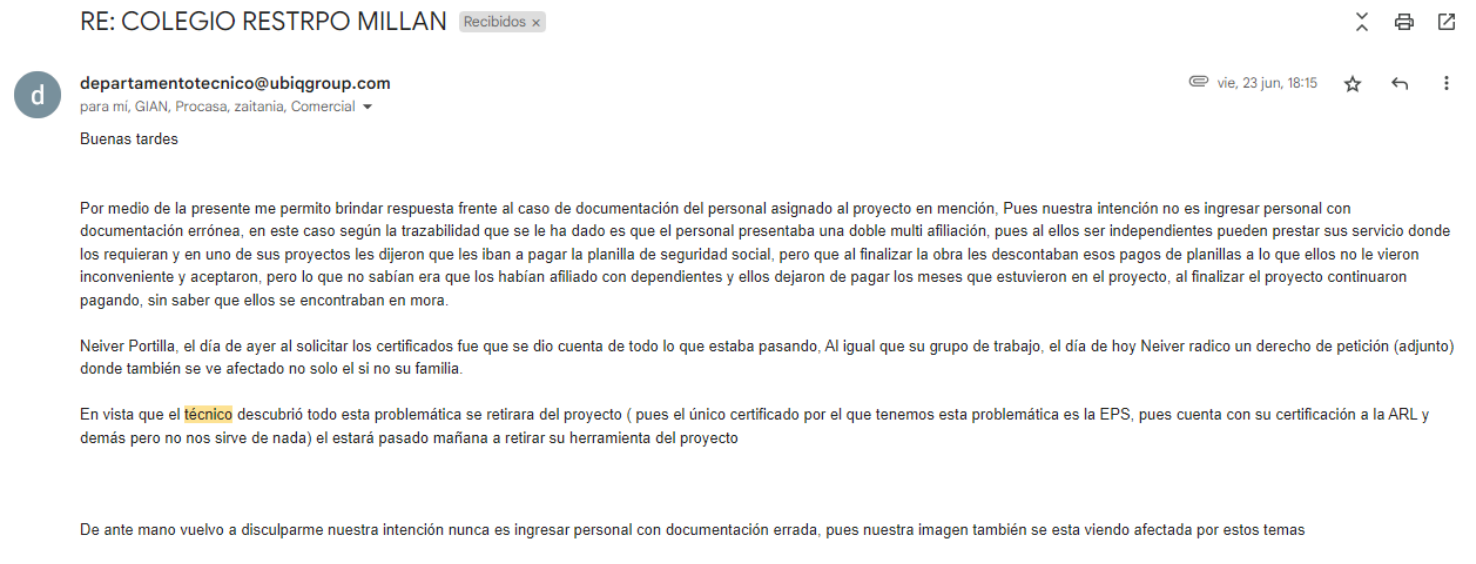
departamentotecnico@ubiqgroup.com 21 jun 2023, 16:53
Buenas tardes Por medio de la presente me permito informar el estado del proyecto Colegio Millán restrepo, el día martes 20-06-2023 se da inicio al proyecto, pe

YESENIA ARENAS <yesenia.arenasarias@gmail.com> 22 jun 2023, 13:57
para departamentotecnico, Procasa, zaitania

Buenas tardes, referente a las observaciones planteadas con el personal de obra se ha venido subsanando y ya se avanzó en varios aulas, ahora bien desde el día de ayer se ha solicitado a la ingeniera viviam que la interventoría no aprobó el ingreso del personal dado que tras la verificación de las planillas inconsistencias y nos remiten el siguiente comunicado que da lugar a abrirnos incumplimientos, solicito que la situación sea aclarada en la brevedad posible.

Referente al estado de los alistados de piso, se subsanaron varias aulas y el día de hoy ing vivian dió nuevas indicaciones y observaciones, por tanto, se solicita claridad en campo o seguimiento en tiempo real para no hacer retrocesos, y nosotros con gusto seguimos las observaciones.

A lo cual finalmente la empresa LG informa lo siguiente:



RE: COLEGIO RESTRPO MILLAN Recibidos ×

departamentotecnico@ubiqgroup.com vie, 23 jun, 18:15
para mí, GIAN, Procasa, zaitania, Comercial

Buenas tardes

Por medio de la presente me permito brindar respuesta frente al caso de documentación del personal asignado al proyecto en mención, Pues nuestra intención no es ingresar personal con documentación errónea, en este caso según la trazabilidad que se le ha dado es que el personal presentaba una doble multi afiliación, pues al ellos ser independientes pueden prestar sus servicio donde los requieran y en uno de sus proyectos les dijeron que les iban a pagar la planilla de seguridad social, pero que al finalizar la obra les descontaban esos pagos de planillas a lo que ellos no le vieron inconveniente y aceptaron, pero lo que no sabían era que los habían afiliado con dependientes y ellos dejaron de pagar los meses que estuvieron en el proyecto, al finalizar el proyecto continuaron pagando, sin saber que ellos se encontraban en mora.

Neiver Portilla, el día de ayer al solicitar los certificados fue que se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, Al igual que su grupo de trabajo, el día de hoy Neiver radico un derecho de petición (adjunto) donde también se ve afectado no solo el si no su familia.


En vista que el técnico descubrió todo esta problemática se retirara del proyecto (pues el único certificado por el que tenemos esta problemática es la EPS, pues cuenta con su certificación a la ARL y demás pero no nos sirve de nada) el estará pasado mañana a retirar su herramienta del proyecto

De ante mano vuelvo a disculparme nuestra intención nunca es ingresar personal con documentación errada, pues nuestra imagen también se esta viendo afectada por estos temas

Evidenciado lo anterior, Consorcio Mia GP, remite a interventoría la documentación de nuevo personal para la ejecución de la instalación del piso, mediante correo electrónico el día 27 de junio, el cual fue verificado por la interventoría y así mismo aprobado.

Cabe aclarar que el personal cuya planilla presentó inconsistencia no laboró en la institución, y que la situación presentada obedeció a una dificultad presentada con nuestro proveedor y no se ocurrió como un hecho malintencionado por parte del **CONSORCIO MIA GP.** Esperando haber aclarado la situación, se agradece la comprensión de la misma.

Cordialmente,



MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2023

2023_RUU_MGP_223

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: APUS PARA APROBACION CAMBIO DE CUBIERTA LICEO FEMENINO

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la SED para ejecutar el cambio de la cubierta colonial en uno de los bloques del Colegio Liceo Femenino, el Contratista aclara que el desmonte de la teja puede ocasionar desprendimientos de material y otros residuos sobre el cielo falso en pvc existente, lo cual puede fracturar o dañar el mismo, por lo cual el Contratista no se hace responsable por estos daños que pueden llegar a presentarse ya que las labores de cambio de la teja generan estos riesgos sobre el cielo falso en pvc existente.

En el caso de presentarse estos daños, deberán realizarse las reparaciones, desmontes o cualquier otra actividad necesaria para la adecuación del cielo falso en pvc y deberán ser reconocidas por parte de la Interventoría y la SED al Contratista, tal como se avaló el 11 de agosto en comité de obra llevado a cabo entre las partes (se adjunta acta).

Adjunto enviamos los apus de las actividades requeridas para realizar el cambio de la cubierta para que su revisión y aprobación.

Nota: Los apus presentados obedecen a actividades previstas de manera preliminar, en si durante el cambio de la cubierta se presenten actividades adicionales no previstas, el Contratista informará a la Interventoría para respectiva aprobación.

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-22- RETIRO DE CUBIERTA TIPO COLONIAL A DOBLE ALTURA: TEJA DE BARRO SUPERIOR, TEJA DE ASBESTO Y/O FIBROCEMENTO INFERIOR, ESTERILLA, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el RETIRO DE CUBIERTA TIPO COLONIAL A DOBLE ALTURA: TEJA DE BARRO SUPERIOR, TEJA DE ASBESTO Y/O FIBROCEMENTO INFERIOR, ESTERILLA, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR, **NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL**

EJECUCIÓN:

- Realizar armado de cama sobre estructura de madera existente en el área de intervención
- Armar andamios de acceso en parte exterior de edificio para acceso por parte superior de cubierta
- Verificar puntos de anclaje de personal que trabajará sobre cubierta
- Realizar retiro de piezas en barro existentes
- Realizar desamarre de ganchos de cubierta en asbesto existente
- Realizar retiro de cubierta en asbesto existente

MATERIALES:

- MADERA

EQUIPOS:

- PULIDORA
- ANDAMIO
- EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURA

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por METRO CUADRADO (M2) de RETIRO DE CUBIERTA TIPO COLONIAL A DOBLE ALTURA: TEJA DE BARRO SUPERIOR, TEJA DE ASBESTO Y/O FIBROCEMENTO INFERIOR, ESTERILLA, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL recibidos a satisfacción por la interventoría.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-22- RETIRO DE CUBIERTA TIPO COLONIAL A DOBLE ALTURA: TEJA DE BARRO SUPERIOR, TEJA DE ASBESTO Y/O FIBROCEMENTO INFERIOR, ESTERILLA, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL

UNIDAD: M2

JUSTIFICACIÓN:

Existen cubiertas antiguas que presentan fisuras y deterioro que han generado o filtraciones hacia la parte interna de la edificación, lo cual ha generado deterioros sobre los acabados internos e inmuebles, por lo cual es necesario realizar el reemplazo total de la cubierta existente.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-22	RETIRO DE CUBIERTA TIPO COLONIAL A DOBLE ALTURA: TEJA DE BARRO SUPERIOR, TEJA DE ASBESTO Y/O FIBROCEMENTO INFERIOR, ESTERILLA, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	M2	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	83.671,60	4.183,58
Pulidora manual con disco (alquiler)			20.000,00	0,10	2.000,00
Seccion andamio certificado (alquiler)			$ 4.500,00	4,00	18.000,00
				SUBTOTAL	**24.183,58**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	**-**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	**-**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,40	83.671,60
				SUBTOTAL	**83.671,60**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 107.855,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 30.404,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 138.259,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-23- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR

EJECUCIÓN:

- Verificar dimensiones de cerchas y correas existentes
- Verificar modulación de teja a instalar
- Verificar en ficha técnica de teja arquitectónica tipo colonial, elementos de fijación, translapos, longitues
- Verificar escuadras, voladizos y dirección de armado de teja
- Suministrar teja en parte superior e iniciar armado garantizando traslapos, fijaciones y voladizos adecuados sobre la estructura existente.

MATERIALES:

- Teja en fibrocemento tipo colonial 160 x 106
- Gancho Teja Estr Metal 14cm Cal 12
- Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Andamios
- Equipo de trabajo en altura

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por METRO CUADRADO (M2) de SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR recibidos a satisfacción por la interventoría.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-23- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR

UNIDAD: M2

JUSTIFICACIÓN:

Existen cubiertas antiguas que presentan fisuras y deterioro que han generado o filtraciones hacia la parte interna de la edificación, lo cual ha generado deterioros sobre los acabados internos e inmuebles, por lo cual es necesario realizar el reemplazo total de la cubierta existente.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR	M2	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	83.671,60	4.183,6
Pulidora manual con disco (alquiler)			20.000,00	0,05	1.000,0
Seccion andamio certificado (alquiler)			$ 4.500,00	4,00	18.000,00
				SUBTOTAL	**23.183,6**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Teja en fibrocemento tipo colonial 160 x 106	UND	0,60	$ 85.900,00	$ 51.540,00
Gancho Teja Estr Metal 14cm Cal 12	un	6,00	$ 720,00	$ 4.320,00
Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8	un	6,00	$ 830,00	$ 4.980,00
DESPERDICIO	%	10%		$ 6.084,00
			SUBTOTAL	**66.924**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de Material (Volqueta acarreo)			1,0000	1.500	1.500,0
				SUBTOTAL	**1.500**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,40	83.671,6
				P	
				SUBTOTAL	**83.672**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 175.279,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 49.411,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 224.690,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para Bogota D.C.

0

Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home › Construcción y Ferretería › Tejas y Drywall › Tejas Fibrocemento › Teja Colonial 160X106 cm Fibrocemento











Ficha técnica

Tipo	Teja Fibrocemento

Proteja

Código 41463

Teja Colonial 160X106 cm Fibrocemento

4.6 (5)

$85.900und

$50.648,58 METRO CUADRADO.

− 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Buscar en falabella

Hola, Inicia sesión Mis comp is

ENVÍO GRATIS en miles de productos desde $99.000*

ngresa tu ubicación Ver

Home > Ferretería y construcción Techos y Aislantes > Techumbre



Devolver es fácil y gratis
Conoce nuestras garantías y derechos >

PROTEJA

Código: 118853122 Cód. tienda: 41463

Teja Colonial 160X106 cm Fibrocemento

4.6 (5) Escribir comentario

Vendido por Homecenter

$ 85.900

Acumula hasta 85 Ver opciones

Despacho a domicilio

Retira tu compra

Stock en tienda
Revisar >

1 + Máximo 999 unidades

Agregar al Carro

¿AÚN NO TIENES TU CMR?
Ábrela ahora y obtén $45.000 de descuento.

Del 13 al 16 de julio de 2023 | 20% DTO. En Herramientas Eléctricas y Manuales
Referencias seleccionadas. Aplican condiciones y restricciones.
Pagando con

10 %



Teja Colonial Proteja

PROTEJA | Código de producto: 1306951

Características principales:

TEJA PROTEJA COLONIAL PINTADA 160CM

Precio Regular ~~$ 99.900~~ (un a $ 89.910)

Precio Ahora **$ 89.910**

$ 79.920

$ 79.920

1 COMPRAR

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

MEDIOS DE ENVÍO

Envío a

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-24- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR

UNIDAD: ML

EJECUCIÓN:

- Verificar dimensiones de cerchas y correas existentes
- Verificar modulación de caballete a instalar
- Verificar en ficha técnica de caballete tipo colonial, elementos de fijación, translapos, longitues
- Verificar escuadras, voladizos y dirección de armado del cabalete
- Suministrar caballete en parte superior e iniciar armado garantizando traslapos, fijaciones y voladizos adecuados sobre la estructura existente.

MATERIALES:

- CABALLETE UNIVERSAL TIPO COLONIAL 106 CM
- Gancho Teja Estr Metal 14cm Cal 12
- Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Andamios
- Equipo de trabajo en altura

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por METRO LINEAL (ML) de SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR recibidos a satisfacción por la interventoría.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-24- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR

UNIDAD:ML

JUSTIFICACIÓN:

Existen cubiertas antiguas que presentan fisuras y deterioro que han generado o filtraciones hacia la parte interna de la edificación, lo cual ha generado deterioros sobre los acabados internos e inmuebles, por lo cual es necesario realizar el reemplazo total de la cubierta existente.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA, INSTALACIÓN POR SUPERFICIE SUPERIOR	M	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	83.671,60	4.183,6
Pulidora manual con disco (alquiler)			$ 20.000,00	0,05	1.000,0
Seccion andamio certificado (alquiler)			$ 4.500,00	4,00	18.000,0
				SUBTOTAL	**23.183,6**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
CABALLETE UNIVERSAL TIPO COLONIAL 106 CM	UND	1,00	$ 31.900,00	$ 31.900,00
Gancho Teja Estr Metal 14cm Cal 12	un	6,00	$ 720,00	$ 4.320,00
Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8	un	6,00	$ 830,00	$ 4.980,00
DESPERDICIO	%	10%		$ 4.120,00
			SUBTOTAL	**45.320**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de Material (Volqueta acarreo)			1,0000	1.500	1.500,0
				SUBTOTAL	**1.500**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,40	83.671,6
				SUBTOTAL	**83.672**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 153.675,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 43.321,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 196.996,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

falabella.com ☰ Menú Buscar en falabella.com Hola, Inicia sesión Mis compras

ENVÍO GRATIS en miles de productos desde $99.000* *Aplican T&C. Ver falabella.com.co/legales

Ingresa tu ubicación falabella. HOMECENTER.CO LINIO Vende en falabella.com Tarjetas y cuentas Venta telefónica Novios

Home > Ferretería y construcción-Techos y Aislantes > Techumbre



PROTEJA

Código: 118864485 Cód. tienda: 267491

Caballete universal Colonial

(0) Escribir comentario

Vendido por Homecenter

Despacho a domicilio

Retira tu compra

Stock en tienda
Revisar

$ 31.900 -25%

~~$ 42.700~~

Acumula hasta 31 puntos Ver opciones

1 + Máximo 999 unidades.

Agregar al Carro

¿AÚN NO TIENES TU CMR?
Ábrela ahora y obtén $45.000 de descuento.

Del 13 al 16 de julio de 2023 | 20% DTO. En Herramientas Eléctricas y Manuales
Referencias seleccionadas. Aplican condiciones y restricciones.
Pagando con

10 %



Caballete Colonial Universal Proteja

PROTEJA | Código de producto: 1306956

Características principales:

CABALLETE UNIVERSAL PROTEJACOLONIAL 46CM

Precio Regular ~~$ 35.900~~ (un a $ 32.310)

Precio Ahora **$ 32.310**

$ 28.720

$ 28.720

1 COMPRAR

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

MEDIOS DE ENVÍO

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para Bogota D.C.

0

Mi Cuent

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Tejas y Drywall > Tejas Fibrocemento > Caballete universal Colonial





Proteja

Código 267491

Caballete Universal Colonial

0.0 (0)

PRECIO INTERNET -25%

$31.900 und

Ahorra $10.800

~~$42.700 und~~

− 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	TEJA COLONIAL 160 X 106 FIBROCEMENTO	UND	$ 85.900	HOMECENTER	$ 79.920	EASY	$ 85.900	FALLABELA	$ 83.907	$ 3.453	$87.359	$80.454	$ 85.900		$ 85.900	$ 85.900
	CABALLETE UNIVERSAL COLONIAL FIBROCEMENTO	UND	$ 31.900	HOMECENTER	$ 32.320	EASY	$ 31.900	FALLABELA	$ 32.040	$ 242	$32.282	$31.798	$ 31.900		$ 31.900	$ 31.900
										$ -						
										$ -						
										$ -						
										$ -						
										$ -						
										$ -						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	11/08/23	**Inicio**	8:10	**Fin :**		**Lugar**	IED Restrepo Millan sede
Proyecto						**Asunto**	Comite de seguimiento		
Asistentes	SED, Interventoria, Consorcio MIA GP					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Interventoria					**Próxima Reunión**	

Se reune el contratista Mia GP, Interventona y la SED

— Inicia el comite con Restrepo Millan sede

- Interventoria solicita al contratista se re evalue las actualizaciones del presupuesto conjuntamente para evitar reprocesos
- la SED informa que el piso no se puede instalar en granito pulido y que el nuevo se instalara sobre el existente
- La sed le recuerda al contratista que la entrega de IED liceo femenino es para el 30 de agosto y que es preocupante la ausencia de personal en la sede.
- la secretaria define que el piso del area faltante al intervenir en la sede será en granito pulido o porcelanato
- La secretaria solicita que el area administrativa sea la ultima en intervenir, mientras se termina de definir
- La secretaria solicita reunion en los siguientes frentes a comenzar para el martes y miercoles 15, 16 de agosto

— IED LICEO FEMENINO

- La SED solicita que se entreguen los laboratorios para el 20 de agosto.
- la SED autoriza cambiar el piso del aula de musica en porcelanato o laminado.
- la sed solicita paquete completo con item no previstos para aprovar, para el lunes 14 de agosto
- la SED solicita presencia de 100% de residente e Inspectores de interventoria y contratista.
- la sed solicita instalar el cerramiento de la cancha hoy 11 de agosto.

— IED Diana Turbay sede B

- La secretaria autoriza la instalacion de puntos de voz y datos en la institucion
- la secretaria autoriza instalar un piso laminado en el area de sistemas, donde la dilatacion/deflexion es de 10 cm
- la secretaria solicita la propuesta de la pasarela al contratista.
- Se convoca reunion en la institución para la siguiente semana, en compañia del estructural y Red P
- la secretaria solicita al contratista la actualizacion del cronograma de obra contemplando condiciones iniciales de los alcances y tiempos, ajustando los rubros reales a invertir en cada frente.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	11/08/23	**Inicio**	8:10	**Fin :**		**Lugar**	IED Restrepo Millan sede
Proyecto						**Asunto**	Comité de seguimiento		
Asistentes	SED, Interventoría, Sensorial MIA SP					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Interventoría					**Próxima Reunión**	

- Secretaría solicita al contratista que se haga un plan de choque para los frentes que están con atrasos
- Reino de Holanda
  - Se autoriza solo el cambio de luminarias y tapas de toma corriente e interruptores para los salones del primer y segundo nivel.
- Jose Martí
  - se autorica el cambio del piso del comedor ~~por~~ gresanito o porcelanato.
- La secretaría autoriza la pintura de los pasillos de en la institución Marruecos y Molinos.
- La Secretaría autoriza instalar el cerramiento (tipo seg) igual al que maneja actualmente la institución en el colegio Gustavo Restrepo sede A y se ejecute de manera inmediata.

- Liceo Femenino
  Respecto a la atención de emergencia de la cubierta, que implica su reemplazo, la SED manifiesta que en caso de presentarse daño sobre el cielo falso en PVC existente, durante el desarrollo de la actividad, se reconocerá al contratista las actividades necesarias para la reposición del cielo falso afectado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin :		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por					Próxima Reunión		

No.	Frente de ejecución	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1	Restrepo Millan Sede B	Revaluación de estructura Metalica	Consorcio MIA GP	14/08/2023
2	Liceo Femenino	Entrega de laboratorios y Cubierta	Consorcio MIA GP	30/08/2023
3				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**		**Inicio**		**Fin :**		**Lugar**
Proyecto						**Asunto**		
Asistentes						Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**					**Próxima Reunión**	

NOMBRE:
CARGO: Ay Cont Sed

NOMBRE: HUGO TILLQUIZA
CARGO: SED DOBLE APOYO SUPERVISOR

NOMBRE:
CARGO: JUAN CAMILO AUSTENCHO

NOMBRE: Sebastián Rivera L
CARGO:

NOMBRE: Sandra Pinzón
CARGO: Directora de obras

NOMBRE: Ricardo Duarte
CARGO: Director de interventoría

NOMBRE: Yesenia Arenas Arias
CARGO: Consorcio MAGE.

NOMBRE: Juan Diego Duarte
CARGO: 1022380000

NOMBRE:
CARGO:

Bogotá D.C., 14 de agosto de 2023

2023_RUU_MGP_224

Señores:

CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: APUS 25 HASTA 32


Cordial saludo,

Adjunto enviamos los apus correspondientes a las siguientes actividades no previstas para su revisión y aprobación:

APU	DESCRIPCION
NP 25	Suministro e instalación de puerta p-01 suministro e instalación de puerta en vidrio 3+3mm, sistema monumental hoja con marco perimetral e intermedio, con barra antipánico localizada en el interior de espacio y película interna incolora con rejilla de ventilación fija en lamina cal. 20. Puerta de 2,50 - 2.80x 2.50
NP 26	Suministro e instalación de puerta p-02 suministro e instalación de puerta en vidrio 3+3mm, sistema monumental hoja con marco perimetral e intermedio, con barra antipánico localizada en el interior de espacio y película interna incolora con rejilla de ventilación fija en lamina cal. 20. incluye perfiles laterales para soporte de puerta. Puerta 2,20m x 2,65m.
NP 27	Suministro e instalación de protección en malla expandida calibre 18, arco en angulo 1 1/2 x 1/8, incluye pintura
NP 28	Suministro e instalación de tubería pvcs 8" corrugada, no incluye excavación
NP 29	Suministro e instalación de poste alumbrado público metálico de 6 mts con dos brazo 1,20 m
NP 30	Suministro e instalación de poste alumbrado publico metálico de 6 mts con un brazo 1,20 m

NP 31	Suministro e instalación de lampara 60 watts en poste de alumbrado público metálico
NP 32	Suministro e instalación de lampara 150 watts en poste de alumbrado público metálico

Cordialmente,



MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-25- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO 3+3MM, SISTEMA MONUMENTAL HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO, CON BARRA ANTIPÁNICO LOCALIZADA EN EL INTERIOR DE ESPACIO Y PELÍCULA INTERNA INCOLORA CON REJILLA DE VENTILACIÓN FIJA EN LAMINA CAL. 20. PUERTA DE 2,50 - 2.80X 2.50

UNIDAD:UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **NP-25- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO 3+3MM, SISTEMA MONUMENTAL HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO, CON BARRA ANTIPÁNICO LOCALIZADA EN EL INTERIOR DE ESPACIO Y PELÍCULA INTERNA INCOLORA CON REJILLA DE VENTILACIÓN FIJA EN LAMINA CAL. 20. PUERTA DE 2,50 - 2.80X 2.50**

EJECUCIÓN:

- Verificar plomos y niveles de los vanos sobre los cuales se instalará la puerta
- Verificar planos arquitectónicos para evidenciar que la materialidad y diseño de la puerta que se va a instalar corresponde a los elementos diseñados
- Verificar puntos de fijación y anclaje de la puerta en los vanos existentes, si hay necesidad se deben reforzar los vanos para garantizar anclaje de las puertas
- Instalar la puerta
- Verificar que no existan luces entre hojas y marcos
- Verificar los plomos de las puertas instaladas y luces en placa
- Verificar adecuada apertura y funcionamiento de barra antipánico.
-

MATERIALES:

PUERTA EN VIDRIO 3+3MM, SISTEMA MONUMENTAL HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO, CON BARRA ANTIPÁNICO LOCALIZADA EN EL INTERIOR DE ESPACIO Y PELÍCULA INTERNA INCOLORA CON REJILLA DE VENTILACIÓN FIJA EN LAMINA CAL. 20. PUERTA DE 2,50 - 2.80X 2.50

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (UN) de SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO 3+3MM, SISTEMA MONUMENTAL HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO, CON BARRA ANTIPÁNICO LOCALIZADA EN EL INTERIOR DE ESPACIO Y PELÍCULA INTERNA INCOLORA CON REJILLA DE VENTILACIÓN FIJA EN LAMINA CAL. 20. PUERTA DE 2,50 - 2.80X 2.50** recibidos a satisfacción por la interventoría.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-25- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO 3+3MM, SISTEMA MONUMENTAL HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO, CON BARRA ANTIPÁNICO LOCALIZADA EN EL INTERIOR DE ESPACIO Y PELÍCULA INTERNA INCOLORA CON REJILLA DE VENTILACIÓN FIJA EN LAMINA CAL. 20. PUERTA DE 2,50 - 2.80X 2.50

UNIDAD: UN

JUSTIFICACIÓN:

Se requieren en algunos espacios dentro de las instituciones educativas a fin de garantizar la evacuación en caso de emergencia por parte de los usuarios y estudiantes.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-25	Suministro e instalación de puerta p-01 suministro e instalación de puerta en vidrio 3+3mm, sistema monumental hoja con marco perimetral e intermedio, con barra antipánico localizada en el interior de espacio y película interna incolora con rejilla de ventilación fija en lamina cal. 20. Puerta de 2,50 - 2.80x 2.50	UND	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	-	-
				SUBTOTAL	-

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Suministro e instalación de puerta p-01 suministro e instalación de puerta en vidrio 3+3mm, sistema monumental hoja con marco perimetral e intermedio, con barra antipánico localizada en el interior de espacio y película interna incolora con rejilla de ventilación fija en lamina cal. 20. Puerta de 2,50 - 2.80x 2.50	und	1,00	$ 7.371.500,00	$ 7.371.500,00
			SUBTOTAL	7.371.500

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
					-
				SUBTOTAL	-
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 7.371.500,00
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 2.078.026,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 9.449.526,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-25- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO 3+3MM, SISTEMA MONUMENTAL HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO, CON BARRA ANTIPÁNICO LOCALIZADA EN EL INTERIOR DE ESPACIO Y PELÍCULA INTERNA INCOLORA CON REJILLA DE VENTILACIÓN FIJA EN LAMINA CAL. 20. INCLUYE PERFILES LATERALES PARA SOPORTE DE PUERTA. PUERTA 2,20M X 2,65M.

UNIDAD:UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **Suministro e instalación de puerta p-02 suministro e instalación de puerta en vidrio 3+3mm, sistema monumental hoja con marco perimetral e intermedio, con barra antipánico localizada en el interior de espacio y película interna incolora con rejilla de ventilación fija en lamina cal. 20. incluye perfiles laterales para soporte de puerta. Puerta 2,20m x 2,65m.**

EJECUCIÓN:

- Verificar plomos y niveles de los vanos sobre los cuales se instalará la puerta
- Verificar planos arquitectónicos para evidenciar que la materialidad y diseño de la puerta que se va a instalar corresponde a los elementos diseñados
- Verificar puntos de fijación y anclaje de la puerta en los vanos existentes, si hay necesidad se deben reforzar los vanos para garantizar anclaje de las puertas
- Instalar la puerta
- Verificar que no existan luces entre hojas y marcos
- Verificar los plomos de las puertas instaladas y luces en placa
- Verificar adecuada apertura y funcionamiento de barra antipánico.
-

MATERIALES:

puerta p-02 suministro e instalación de puerta en vidrio 3+3mm, sistema monumental hoja con marco perimetral e intermedio, con barra antipánico localizada en el interior de espacio y película interna incolora con rejilla de ventilación fija en lamina cal. 20. incluye perfiles laterales para soporte de puerta. Puerta 2,20m x 2,65m.

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (UN) de Suministro e instalación de puerta p-02 suministro e instalación de puerta en vidrio 3+3mm, sistema monumental hoja con marco perimetral e intermedio, con barra antipánico localizada en el interior de espacio y película interna incolora con rejilla de ventilación fija en lamina cal. 20. incluye perfiles laterales para soporte de puerta. Puerta 2,20m x 2,65m** recibidos a satisfacción por la interventoría.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-26- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO 3+3MM, SISTEMA MONUMENTAL HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO, CON BARRA ANTIPÁNICO LOCALIZADA EN EL INTERIOR DE ESPACIO Y PELÍCULA INTERNA INCOLORA CON REJILLA DE VENTILACIÓN FIJA EN LAMINA CAL. 20. INCLUYE PERFILES LATERALES PARA SOPORTE DE PUERTA. PUERTA 2,20M X 2,65M.

UNIDAD: UN

JUSTIFICACIÓN:

Se requieren en algunos espacios dentro de las instituciones educativas a fin de garantizar la evacuación en caso de emergencia por parte de los usuarios y estudiantes.



Carrera 8 No.12-21 Bogotá - Tel: 313 3876020
E-mail: consorciomiagpru2022@gmail.com

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-26	Suministro e instalación de puerta p-02 suministro e instalación de puerta en vidrio 3+3mm, sistema monumental hoja con marco perimetral e intermedio, con barra antipánico localizada en el interior de espacio y película interna incolora con rejilla de ventilación fija en lamina cal. 20. incluye perfiles laterales para soporte de puerta. Puerta 2,20m x 2,65m.	UND	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	-	-
				SUBTOTAL	-

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Suministro e instalación de puerta p-02 suministro e instalación de puerta en vidrio 3+3mm, sistema monumental hoja con marco perimetral e intermedio, con barra antipánico localizada en el interior de espacio y película interna incolora con rejilla de ventilación fija en lamina cal. 20. incluye perfiles laterales para soporte de puerta. Puerta 2,20m x 2,65m.	UND	1,00	$ 7.589.000,00	$ 7.589.000,00
DESPERDICIO	%	10%		$ 758.900,00
			SUBTOTAL	8.347.900

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
				P	
				SUBTOTAL	-
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 8.347.900,00
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 2.353.273,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 10.701.173,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:
Nombre: E. RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

VIDRIOS ALUMINIOS GALEANO
CONSTRUCCIONES ALUVIGAL SAS
Bogotá, D.C. 10 DE JULIO 2023

COTIZACION N 05

Señor(es)

Arq. juan camilo cristancho

Respetado cliente

Bogotá

De acuerdo con su amable solicitud, me permito presentar la siguiente cotización de suministro e instalación.

M	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	valor TOTAL
P-01	Suministro e instalación de puerta p-01 suministro e instalación de puerta en vidrio 3+3mm, sistema monumental hoja con marco perimetral e intermedio, con barra antipánico localizada en el interior de espacio y película interna incolora con rejilla de ventilación fija en lamina cal. 20. Puerta de 2,50 - 2.80x 2.50	2	6.170.588	12.341.176
P-02	Suministro e instalación de puerta p-02 suministro e instalación de puerta en vidrio 3+3mm, sistema monumental hoja con marco perimetral e intermedio, con barra antipánico localizada en el interior de espacio y película interna incolora con rejilla de ventilación fija en lamina cal. 20. incluye perfiles laterales para soporte de puerta. Puerta 2,20m x 2,65m.	1	6.410.084	6.410.084
			Subtotal	18.751.260
			19%	3.562.739
			total	22.313.999

CONDICIONES DE SERVICIO: Forma de pago: 60% anticipo y 40% contra entrega

Validez de oferta 15 días

DIOSELIN GALEANO CORZO.

Gerente

CEL. 312.456.258

Bogotá, D.C., 12 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO MIA GP
Att. Ing. JUAN CAMILO CRISTANCHO
Bogota

COTIZACION No. 127/2023

Agradeciendo su interés por los productos de nuestra compañía, tenemos el gusto de presentar para su estudio y consideración la siguiente oferta

ITEM	DESCRIPCIÓN				
NPC-01	P-01 Suministro e instalación de puertas entamboradas en tablero en lamina RH de 6mm, enchapadas en formica blanca con canto rigido de 2,50m - 2.80m x2,50m chapa manija o schlage	UN	2	6.729,078	13.458,156
NPC-02	P-02 Suministro e instalación de puertas entamboradas en tablero en lamina RH de 6mm, enchapadas en formica color blanco con canto rigido de 2,20mx2,65m chapa manija o schlage.	UN	1	6.896,097	6.896,097

SUBTOTAL	**20.354.253,00**
ADMINISTRACION 6%	**1.221.255,00**
IMPREVISTOS 3%	**610.628,00**
UTILIDAD 4%	**814.170,00**
IVA 19%	**154.692,00**
COSTO TOTAL	**23.154.998,00**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO

50% Anticipo 40% Contra avances de obra 10% Contraentrega

TIEMPO DE EJECUCION

De acuerdo a programación de obra

GARANTIA

Una año por defectos de fabricación

Cordialmente

ALLISSON POLO CIFUENTES
Gerente

Calle 12 C No. 71 C 30 Int 6 Of. 502
Teléfono: 7 57 85 83 - 310 232 0779 – 310 814 1464
Pagina web: espaciosmueblesyacabados.com
E-Mail: espaciosmueblesyacabados@hotmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

COCINAS & ACEROS S.A.S.
A LA VANGUARDIA DEL DISEÑO

Bogotá D.C. JULIO 11 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Ciudad.

Cordial saludo, atendiendo su amable solicitud le presentamos la siguiente cotización:

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
Suministro e instalación de puerta p-01 (2,50m-2,80m x 2,50m) suministro e instalación de puerta en vidrio 3+3mm, sistema monumental hoja con marco perimetral e intermedio, con barra antipánico localizada en el interior de espacio y película interna incolora con rejilla de ventilación fija en lamina cal. 20	2	$ 6’218.487	$ 12’436.974
Suministro e instalación de puerta p-02 (2,20mx2,65m) suministro e instalación de puerta en vidrio 3+3mm, sistema monumental hoja con marco perimetral e intermedio, con barra antipánico localizada en el interior de espacio y película interna incolora con rejilla de ventilación fija en lamina cal. 20. incluye perfiles laterales para soporte de puerta.	1	$ 6’344.538	$ 6’344.538
		SUBTOTAL	$ 18’781.512
		IVA 19%	$ 3’568.487
		TOTAL	$ 22’349.999

Condiciones:

- Forma de pago: A convenir
- Tiempo de entrega: A convenir

Cualquier modificación en planos o especificaciones cambiaran precio y tiempo de entrega.

En espera de poder ampliar la información aquí consignada

Cordialmente,



Jaqueline Vega

NIT:901 433 275-5

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	Suministro e instalación de puerta p-01 suministro e instalación de puerta en vidrio 3+3mm, sistema monumental hoja con marco perimetral e intermedio, con barra antipánico localizada en el interior de espacio y pelicula interna incolora con rejilla de ventilación fija en lamina cal. 20. Puerta de 2,50 - 2.80x 2.50	UND	$ 7.343.000	VIDRIOS ALUMINIOS GALEANO	7.657.690,764	ESPACIOS MUEBLES Y ACABADOS	$ 7.400.000	COCINAS Y ACCESORIOS	$ 7.466.897	$ 167.672	$7.634.569	$7.299.224	$ 7.343.000		$ 7.400.000	$ 7.371.500
	Suministro e instalación de puerta p-02 suministro e instalación de puerta en vidrio 3+3mm, sistema monumental hoja con marco perimetral e intermedio, con barra antipánico localizada en el interior de espacio y pelicula interna incolora con rejilla de ventilación fija en lamina cal. 20. incluye perfiles laterales para soporte de puerta. Puerta 2,20m x 2,65m.	UND	$ 7.628.000	VIDRIOS ALUMINIOS GALEANO	$ 7.847.758	ESPACIOS MUEBLES Y ACABADOS	$ 7.550.000	COCINAS Y ACCESORIOS	$ 7.675.253	$ 154.401	$7.829.654	$7.520.852	$ 7.628.000		$ 7.550.000	$ 7.589.000

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, ARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1/8, INCLUYE PINTURA	M2	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	151.141,20	7.557,1
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	0,60	2.700,0
				SUBTOTAL	10.257,1

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Ángulo G50 1/8" x 1.1/2" x 6m (10.98kg)	und	1,5	85262	$ 127.893,00
Soldadura 6013 1/8west arco	kg	0,75	21105	$ 15.828,75
Malla Expandida CR IMT 30 X 1 CAL 18	m2	1,05	51894	$ 54.488,70
pintura en aceite	gl	0,10	112000	$ 11.200,00
Disolvente o Diluyente thiner	litro	0,25	32000	$ 8.000,00
			SUBTOTAL	217.410

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de Material (Volqueta acarreo)	1		m3/km	1.500	1.500,0
				SUBTOTAL	1.500

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Soldador	94.279	52,13%	143.427	0,6000	86.056,2
Ayudante soldadura	71.304	52,13%	108.475	0,6000	65.085,0
				SUBTOTAL	151.141
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 380.308,71
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 107.209,03
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 487.518,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) dias del mes de agosto del año 2023

,

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: Edisson Ricardo Duarte

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

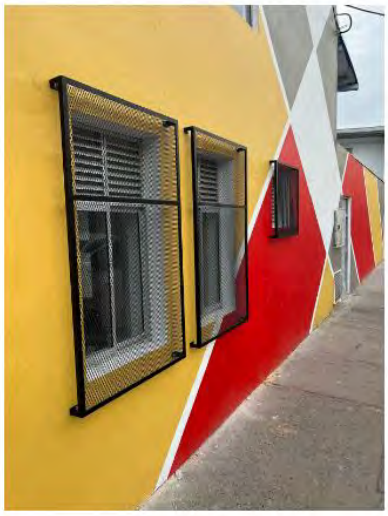
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-27 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1/8, INCLUYE PINTURA

UNIDAD: M2

JUSTIFICACIÓN:

El SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1/8, INCLUYE PINTURA, se requiere para proteger vidrios y ventanas y también impedir el ingreso de elementos que puedan golpear o lastimar a los estudiantes en el interior de las aulas y espacios de los colegios.



Hola

Imagen modelo de malla de protección a instalar.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-27- SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1/8, INCLUYE PINTURA

UNIDAD:m2

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1/8, INCLUYE PINTURA

EJECUCIÓN:

- Establecer la ubicación del marco
- Rectificar medidas del elemento
- Verificar puntos de anclaje
- Ensamblar el elemento de acuerdo con el área de la ventana interna a proteger
- Verificar niveles, plomos y escuadras de elemento a instalar
- Realizar fijación con tornillo en cuatro aristas de la ventana
-

MATERIALES:

- Ángulo G50 1/8" x 1.1/2" x 6m (10.98kg)
- Soldadura 6013 1/8west arco
- Malla Expandida CR IMT 30 X 1 CAL 18
- pintura en aceite
- Disolvente o Diluyente thiner

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Andamios
- Equipo de trabajo en altura

TRANSPORTE:

- Furgón.
-

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1/8, INCLUYE PINTURA ,recibidos a satisfacción por la interventoría.

Cotización: OV143885

PROCASA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SAS NIT: 901531834

CR 18 60C 13
Colombia Bogotá
3143826320 - 3143826320
procasaconstrucción@gmail.com

Peso Total
490.44
Fecha
25-07-2023
Vigencia 1 día

Descripción	Cantidad	Medida	Peso	Precio Unitario	Precio Total
Tubo Cerramiento Galvanizado 1.1/2" (D.Ext. 48.3mm) (2.0mm) x 6m	17.00	Unidades	232.90	82,200.00	1,397,400.00
Soldadura West Arco ZIP10T (E6010) 1/8" (Ref.504195)	5.00	kg	5.00	19,756.80	98,784.00
Ángulo G50 1/8" x 1.1/2" x 6m (10.98kg)	15	Unidades	252.54	75,762.00	1,136,430.00
Malla Expandida CR IMT 30 X 1 CAL 18	56	M2		42,716.00	2,395.000

Observaciones:
Validez oferta en precios 5 días
Inventario sujeto a disponibilidad al momento de la compra formal.
Forma de pago: Contado anticipado.
Disponibilidad del material: Inmediata.
Tiempo de entrega: De 2 a 3 dias sobre disponibilidad.
Sitio de entrega: El material se ofrece puesto sobre camión en su bodega en Bogotá y/o su perimetro urbano. (Material se ofrece libre de descargue).
Despacho minimo de nuestra cuenta: 1000 kilos en longitud. de 6 metros y/o 5.000 kilos en longitud de 12 metros.
Materiales certificados por el molino del país de origen.

Base:	$ 5,027,614.00
Impuestos:	$ 955,246000
Total:	$ 5,982,860.66

¡APRECIADO CLIENTE!
ES OBLIGATORIO PRESENTAR PLANILLA DE ARL AL DÍA, PARA EL INGRESO A NUESTRAS INSTALACIONES AL MOMENTO DE RETIRAR CUALQUIER MATERIAL.

Estimado cliente Recuerde que también ofrecemos
productos suplementarios como soldadura West Arco o ESAB,
discos de corte Abracol,discos de pulir Abracol,
anticorrosivo y esmalte marca Bler y si es de su interes la plancha masterdeck, quedo atento a su requerimiento

FERROPETROL

INICIO CONTACTO

Inicio / Perfiles, Mallas y Anjeos / Mallas Expandidas / Malla Expandida Cr IMT 30 X 1 Cal 18



Malla Expandida Cr IMT 30 X 1 Cal 18

30 disponibles

$44.000

SKU 10770 | Categoría Mallas Expandidas

Información adicional

Unidad	Metro
Subcategoría	Malla Expandida HR y CR

STECKERL ACEROS S.A.S.

NIT: 900 499 032 - 2

Calle 7 # 27-79 Tel:(071) 7446262 - (071) 7434242

BOGOTA - CUNDINAMARCA (COLOMBIA)

COTIZACIÓN: 27COT2023001301

Cotizado a	Datos de la Transacción		Doc. Origen	
CONSORCIO MIA GP	**Orden de Compra:**	WHATSAPP	**Fecha**	**25/07/2023**
CR 18 No 60 C - 13 S	**Condición Pago:**	MOSTRADOR	**Fecha Venc.**	**25/07/2023**
BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C	**Id. vendedor:**	ADRIANAC	**Elaborado por**	**JENNYCH**
(314) 382-6320 Ext. 0000	**Modo de envío:**	CLIENTE RECOGE	**Enviar a:**	
	Fecha Entrega:	25/07/2023	PROCASA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS CR 18 No 60 C - 13 S BOGOTÁ	
	Moneda:	COP		

Cantidad	Peso	Peso Extendido	Descripción	UM	Bga	Precio m2	Precio Unidad	Valor Extendido
50	11.5	575	Malla Expandida CR IMT 30 X 1 CAL 18	m2	27	$44.500	$44,500.00	$2.225.000

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
EXISTENCIAS SUJETAS A VENTAS. Y DISPONIBILIDAD DE INVENTARIOS

Moneda: COP

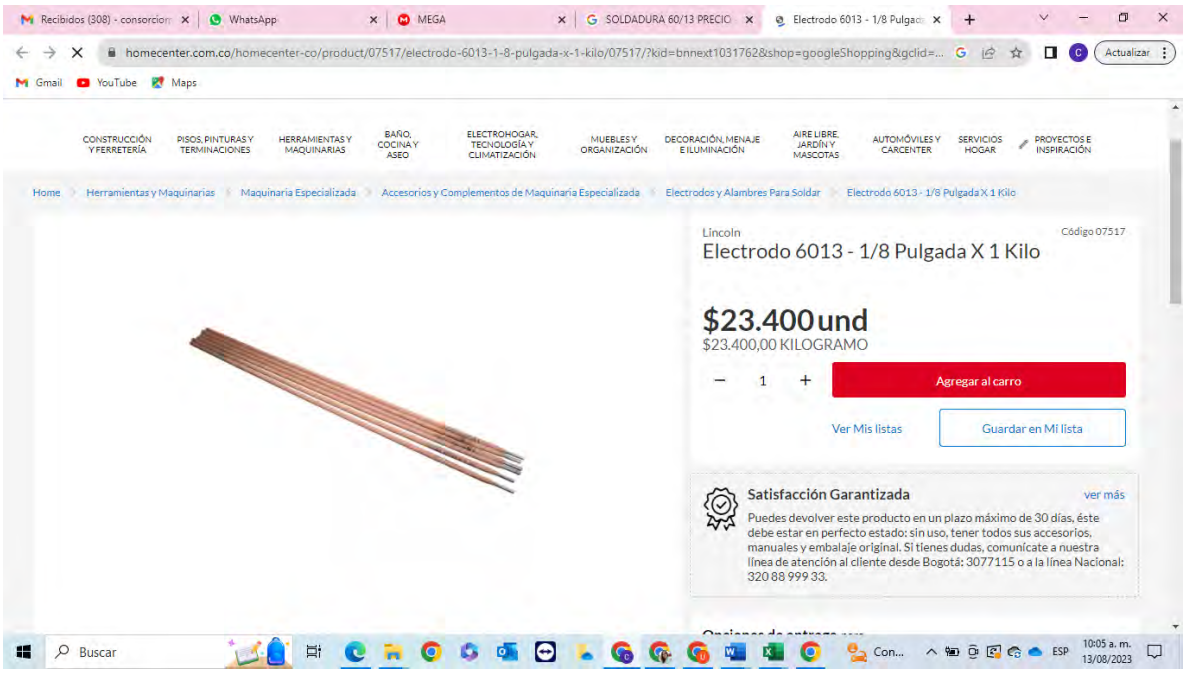
Subtotal	$2.225.000.00
Dto. Comercial:	$ 0.00
Flete:	$ 0.00
IVA:	$422.750.00
Rete Iva :	$0.0000
Rete Fuente:	$0.00
Total a pagar:	$2.647.750.00
Peso Total	**575**

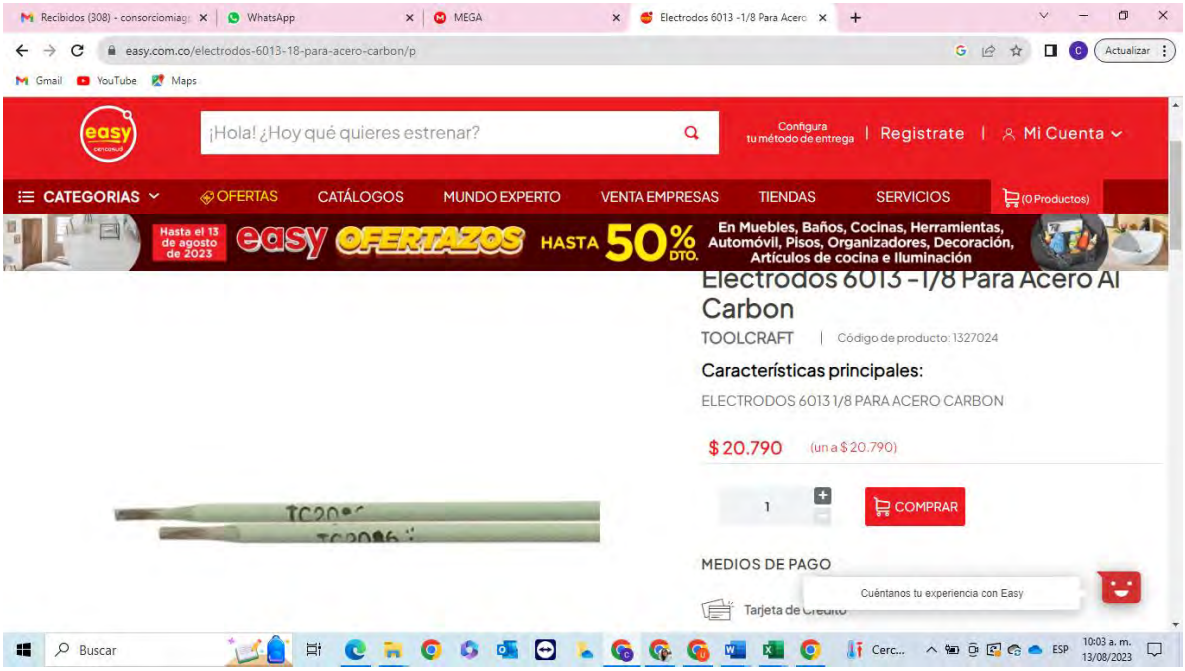
* Impuestos: Somos grandes contribuyentes segun resolucion No 012635 del 14 dic 2018.Somos AUTORETENEDORES Resl:4060 Mayo 26 2014. IVA Regimen común. Actividad economica principal 4663 tarifa CREE 0.40%.

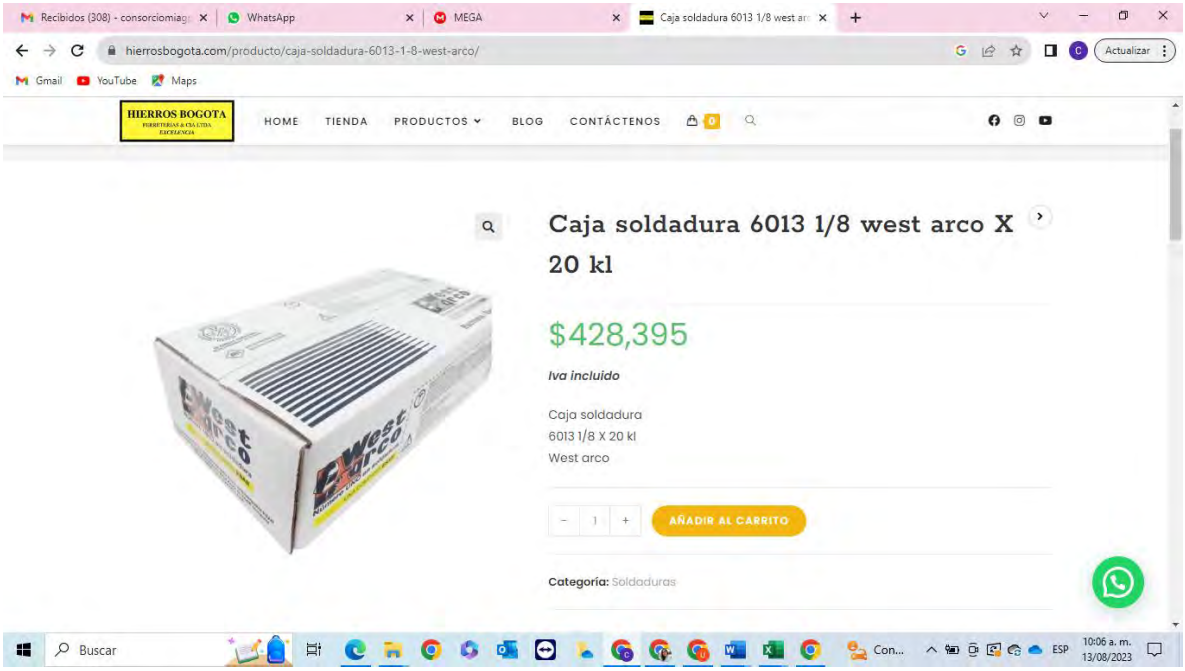
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA EL RICAURTE

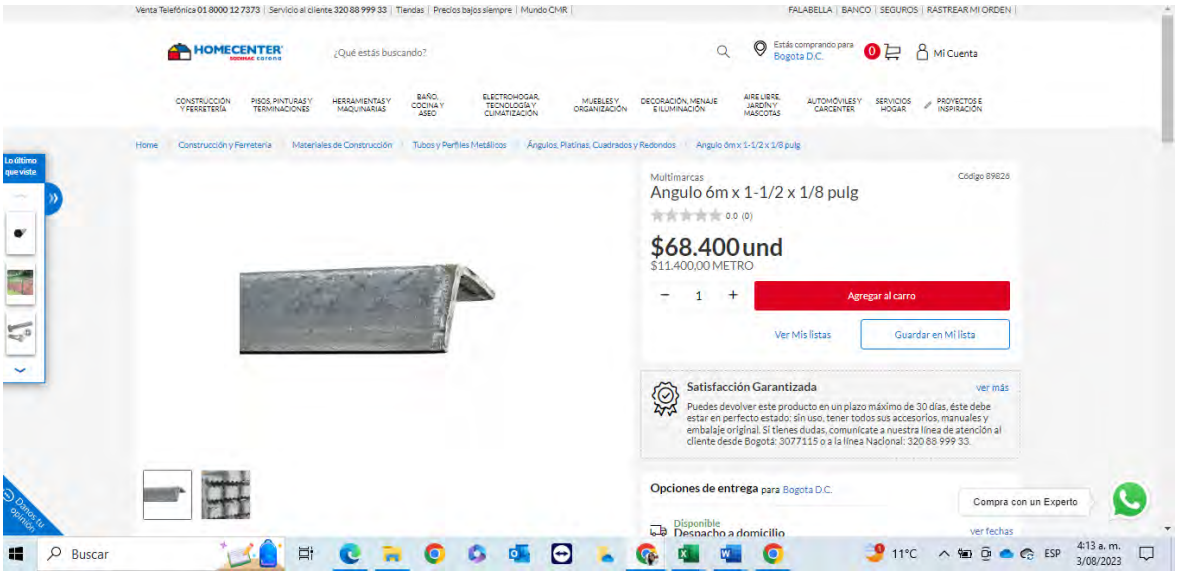
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 28 CENTAVOS

Num. Artículos: 1 25/07/2023 3:42:10 p.m.


Recibidos (308) - consorcion
WhatsApp
MEGA
SOLDADURA 60/13 PRECIO
Electrodo 6013 - 1/8 Pulgad
homecenter.com.co/homecenter-co/product/07517/electrodo-6013-1-8-pulgada-x-1-kilo/07517/?kid=bnnext1031762&shop=googleShopping&gclid=...
Actualizar
Gmail
YouTube
Maps
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
BAÑO, COCINA Y ASEO
ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN
MUEBLES Y ORGANIZACIÓN
DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN
AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS
AUTOMÓVILES Y CARCENTER
SERVICIOS HOGAR
PROYECTOS E INSPIRACIÓN
Home
Herramientas y Maquinarias
Maquinaria Especializada
Accesorios y Complementos de Maquinaria Especializada
Electrodos y Alambres Para Soldar
Electrodo 6013 - 1/8 Pulgada X 1 Kilo
Lincoln
Código 07517
Electrodo 6013 - 1/8 Pulgada X 1 Kilo
$23.400 und
$23.400,00 KILOGRAMO
1
Agregar al carro
Ver Mis listas
Guardar en Mi lista
Satisfacción Garantizada
ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Buscar
Con...
ESP
10:05 a. m.
13/08/2023


Recibidos (308) - consorciomiag
WhatsApp
MEGA
Electrodos 6013 -1/8 Para Acero
easy.com.co/electrodos-6013-18-para-acero-carbon/p
Actualizar
Gmail
YouTube
Maps
¡Hola! ¿Hoy qué quieres estrenar?
Configura tu método de entrega
Registrate
Mi Cuenta
CATEGORIAS
OFERTAS
CATÁLOGOS
MUNDO EXPERTO
VENTA EMPRESAS
TIENDAS
SERVICIOS
(0 Productos)
Hasta el 13 de agosto de 2023
easy OFERTAZOS
HASTA 50% DTO.
En Muebles, Baños, Cocinas, Herramientas, Automóvil, Pisos, Organizadores, Decoración, Artículos de cocina e Iluminación
Electrodos 6013 -1/8 Para Acero Al Carbon
TOOLCRAFT
Código de producto: 1327024
Características principales:
ELECTRODOS 6013 1/8 PARA ACERO CARBON
$ 20.790
(un a $ 20.790)
1
COMPRAR
MEDIOS DE PAGO
Tarjeta de Crédito
Cuéntanos tu experiencia con Easy
Buscar
Cerc...
ESP
10:03 a. m.
13/08/2023


Recibidos (308) - consorciomiag
WhatsApp
MEGA
Caja soldadura 6013 1/8 west arc
hierrosbogota.com/producto/caja-soldadura-6013-1-8-west-arco/
Actualizar
Gmail
YouTube
Maps
HIERROS BOGOTA
HOME
TIENDA
PRODUCTOS
BLOG
CONTÁCTENOS
Caja soldadura 6013 1/8 west arco X 20 kl
$428,395
Iva incluido
Caja soldadura
6013 1/8 X 20 kl
West arco
AÑADIR AL CARRITO
Categoría: Soldaduras
Buscar
ESP
10:06 a. m.
13/08/2023


Venta Telefónica 01 8000 12 7373 | Servicio al cliente 320 88 999 33 | Tiendas | Precios bajos siempre | Mundo CMR |
FALABELLA | BANCO | SEGUROS | RASTREAR MI ORDEN |
HOMECENTER
¿Qué estás buscando?
Estás comprando para Bogota D.C.
Mi Cuenta
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
BAÑO, COCINA Y ASEO
ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN
MUEBLES Y ORGANIZACIÓN
DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN
AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS
AUTOMÓVILES Y CARCENTER
SERVICIOS HOGAR
PROYECTOS E INSPIRACIÓN
Home / Construcción y Ferretería / Materiales de Construcción / Tubos y Perfiles Metálicos / Ángulos, Platinas, Cuadrados y Redondos / Angulo óm x 1-1/2 x 1/8 pulg
Lo último que viste
Multimarcas
Código 89826
Angulo óm x 1-1/2 x 1/8 pulg
0.0 (0)
$68.400 und
$11.400,00 METRO
1
Agregar al carro
Ver Mis listas
Guardar en Mi lista
Satisfacción Garantizada
ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Opciones de entrega para Bogota D.C.
Compra con un Experto
Disponible
Despacho a domicilio
ver fechas
Buscar
11°C
ESP
4:13 a. m.
3/08/2023

STECKERL ACEROS S.A.S.

NIT: 900 499 032 - 2

Calle 7 # 27-79 Tel:(071) 7446262 - (071) 7434242

BOGOTA - CUNDINAMARCA (COLOMBIA)

COTIZACIÓN: 27COT2023001299

Cotizado a	Datos de la Transacción		Doc. Origen	
CONSORCIO MIA GP	**Orden de Compra:**	WHATSAPP	**Fecha**	**25/07/2023**
CR 18 No 60 C - 13 S	**Condición Pago:**	MOSTRADOR	**Fecha Venc.**	**25/07/2023**
BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C	**Id. vendedor:**	ADRIANAC	**Elaborado por**	**JENNYCH**
(314) 382-6320 Ext. 0000	**Modo de envío:**	CLIENTE RECOGE	**Enviar a:**	
	Fecha Entrega:	25/07/2023	PROCASA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS CR 18 No 60 C - 13 S BOGOTÁ	
	Moneda:	COP		

Cantidad	Peso	Peso Extendido	Descripción	UM	Bga	Precio Kilo	Precio Unidad	Valor Extendido
17	16.08	273.36	ANG HO 1.1/2" x 3/16" x 6MTS A572 GR 50	UN	27	$4,200.00	$67,536.00	$1,148,112.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
EXISTENCIAS SUJETAS A VENTAS. Y DISPONIBILIDAD DE INVENTARIOS

Moneda: COP

Subtotal	$1,148,112.00
Dto. Comercial:	$ 0.00
Flete:	$ 0.00
IVA:	$218,141.28
Rete Iva :	$0.0000
Rete Fuente:	$0.00
Total a pagar:	$1,366,253.28
Peso Total	**273,36**

* Impuestos: Somos grandes contribuyentes segun resolucion No 012635 del 14 dic 2018.Somos AUTORETENEDORES Resl:4060 Mayo 26 2014. IVA Regimen común. Actividad economica principal 4663 tarifa CREE 0.40%.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA EL RICAURTE

UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 28 CENTAVOS

Num. Artículos: 1 25/07/2023 3:42:10 p.m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

BOGOTÁ

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	Malla Exoandida CR IMT 30 X 1 CAL 18	M2	$ 50.832	PROCASA	44.000,000	FERROPETROL	$ 52.955	steckrel aceros	$ 49.262	$ 4.679	$53.942	$44.583	$ 50.832		$ 52.955	$ 51.894
	Ángulo G50 1/8" x 1.1/2" x 6m (10.98kg)	UN	$ 90.156,78	PROCASA	$ 80.367,84	STECKEREL ACEROS	68400	HOMECENTER	$ 79.642	$ 10.897	$90.538	$68.745	$ 90.157	80367,84		$ 85.262
	Ángulo G50 1/8" x 1.1/2" x 6m (10.98kg)	UN	$ 23.400,00	HOMECENTER	$ 20.790,00	EASY	21419,75	HERREROS BOGOTA	$ 21.870	$ 1.362	$23.232	$20.508		20790,00	$ 21.420	$ 21.105

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-28	Suministro e instalacion de tuberia pvcs 8" corrugada, no incluye excavación	ML	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	53.779,13	2.688,96
Pulidora manual con disco (alquiler)			20.000,00	0,05	1.000,0
				SUBTOTAL	**3.688,96**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
TUBERIA PVCS 8" NOVAVORT X6 ML	und	1,05	$ 62.081,83	$ 65.185,93
Union sanitaria 8"	Und	0,17	$ 65.533,00	$ 10.922,17
Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galón	und	0,10	$ 62.000,00	$ 6.200,00
Soldadura Para Pvc 900 Gramos - 1/4 Galon	und	0,10	$ 99.250,00	$ 9.925,00
			SUBTOTAL	**92.233**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de materiales en furgon			0,0100	350.000	3.500,0
				SUBTOTAL	**3.500**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Oficial plomería	$ 108.420,85	52,13%	164.941	0,20	32.988,13
Ayudante plomería	$ 68.333,00	52,13%	103.955	0,2	20.791,00
				SUBTOTAL	**53.779,13**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 153.201,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 43.187,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 196.388,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-28- Suministro e instalación de tubería pvcs 8" corrugada, no incluye excavación

UNIDAD:ML

JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo con los cálculos hidráulicos mediante los cuales se pretenden drenar algunas superficies de urbanismo, se requiere la conducción de aguas lluvias en tubería pvcs corrugada de 8" para garantizar la capacidad de carga de la red pluvial.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-28- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 8" CORRUGADA, NO INCLUYE EXCAVACIÓN

UNIDAD:ML

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **Suministro e instalación de tubería pvcs 8" corrugada, no incluye excavación**

EJECUCIÓN:

- Verificar planos hidráulicos
- Verificar pendientes de la red según planos
- Verificar profundidades cota batea de inicio y cota batea de entrega
- Realizar tendido de tubería y uniones garantizando pegas y hermeticidad de cada trazado mediante aplicación de limpiador y soldadura suficiente en cada punto de unión.

MATERIALES:

- TUBERIA PVCS 8" NOVAVORT X6 ML
- Union sanitaria 8"
- Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galón
- Soldadura Para Pvc 900 Gramos - 1/4 Galon

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **METRO LINEAL (ML) de Suministro e instalación de tubería pvcs 8" corrugada, no incluye excavación** recibidos a satisfacción por la interventoría.

NURUEÑA S.A.S.

NIT:860.001.605-0
Pagina WEB: www.fenusas.com.co
Email: fenusa@fenusa.com.co
Direccion: Cr 25 No. 13 - 40 PBX: 3 90 66 66 FAX: 2 01 27 54

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES RES No. 586 DE ABR 25/86
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR IVA, ICA. CODIGO ICA 46632

CODIGO S/N : C901531834 **NIT/C.C :** 901531834-2
NOMBRE : PROCASA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS
DIRECCION : CR 18 60 C 13 S
TELEFONO : 3143826320
CIUDAD : 11001
E-MAIL : PROCASACONSTRUCCION@GMAIL.COM
DIRECCION ENTREGA :

COTIZACION

168872

VALIDEZ DE LA OFERTA

12	9	2023

FECHA ORDEN			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	O. COMPRA
12	8	2023	12	9	2023	PAGO YA INGRESADO	MOSTRADOR CONTADO	

#	BD	CANT.	PRODUCTO	RF FABRI	DESCRIPCION	V. UNITARIO	DCTO	IVA %	V. CON DESCTO	VALOR TOTAL
1	01	1	020096	2909295	TUBO 8 PVC SANIT	637.006	50%	19%	318.503,00	318.503,00
2	01	1	150008	2900079	TUBO 200MM 8"" DURAFORT	307.537	48%	19%	159.919,24	159.919,24

SON : Quinientos sesenta y nueve mil trescientos veintidós con Cuarenta y siete Centésimos ;

OBSERVACIONES
:

SUBTOTAL		$ 478.422,24
DESCUENTO	%	$ 0,00
VALOR NETO		$ 478.422,24
IVA		$ 90.900,23
TOTAL		$ 569.322,47

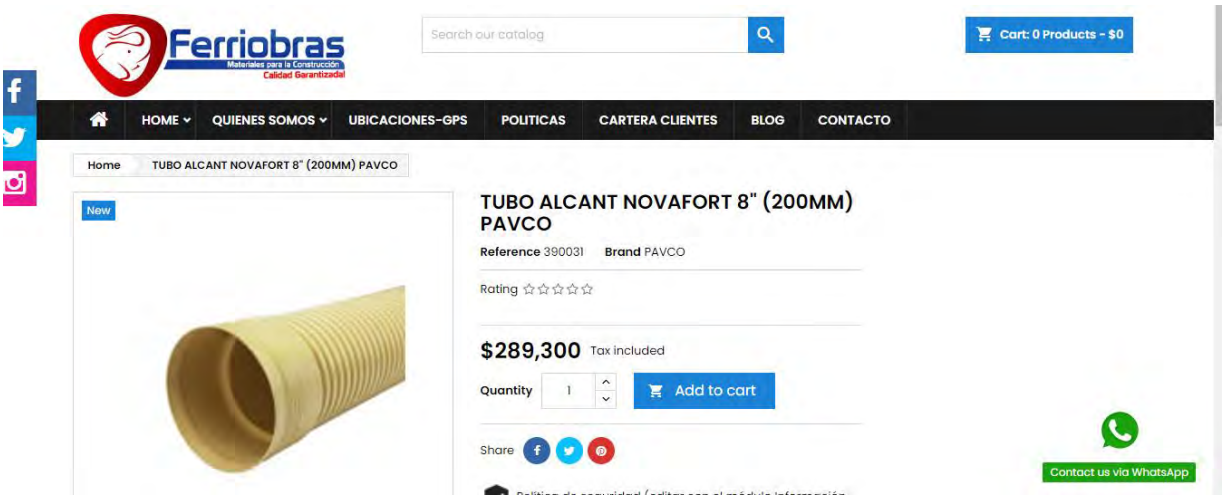


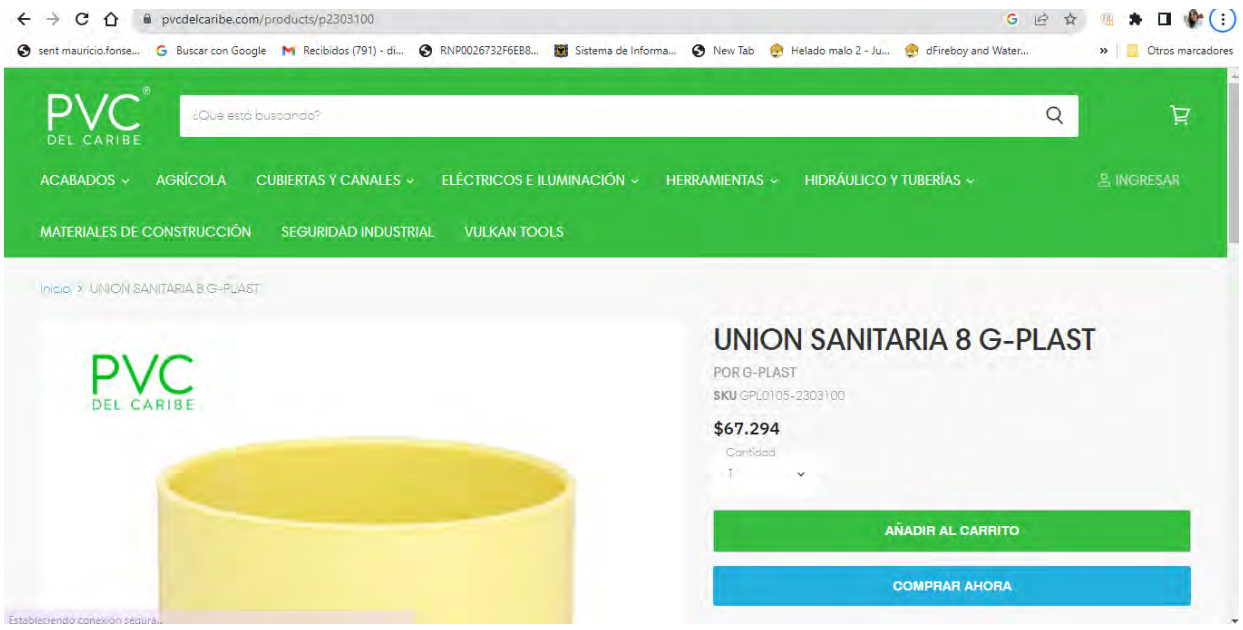
Sistema de tuberías y conexiones
Alcantarillado hermético

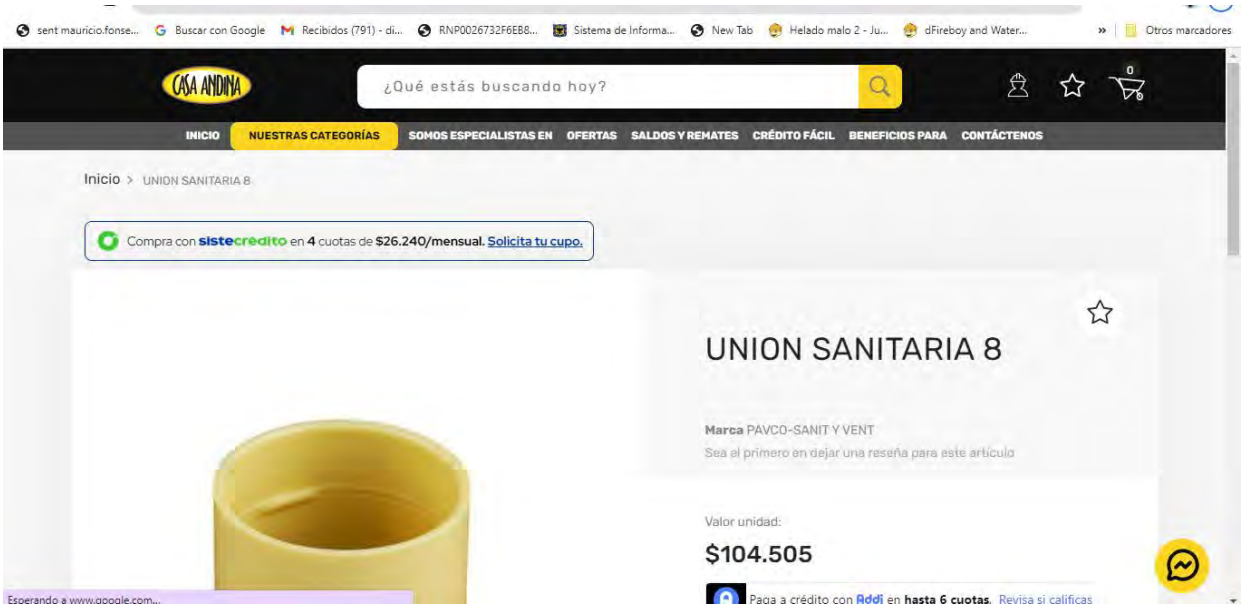
Tuberías

	Referencia	Diámetro mm-pulg.	Unidad de empaque	Precio x tubo $
Tuberías alcantarillado Novafort tramos 6m	2900090	110 mm	1 tubo	$ 132.298
	2900092	160 mm	1 tubo	$ 256.007
	2900094	200 mm	1 tubo	$ 385.963
	2900081	250 mm	1 tubo	$ 534.506
	2900083	315 mm	1 tubo	$ 769.122
	2902493	355 mm	1 tubo	$1.152.632
	2900085	400 mm	1 tubo	$1.409.793
	2900087	450 mm	1 tubo	$1.820.748
	2900089	500 mm	1 tubo	$2.373.717
Tuberías Novafort Tramos 6,5m	2906313	24"	1 tubo	$3.523.765
	2900511	27"	1 tubo	$4.219.270
	2906378	30"	1 tubo	$5.265.241
	2904604	33"	1 tubo	$7.005.889
	2902914	250	1 ud	$ 181.159
	2902917	315	1 ud	$ 309.933
	2910937	355	1 ud	$ 411.404
	2902921	400	1 ud	$ 472.541
	2902924	450	1 ud	$ 497.053
	2902926	500	1 ud	$ 558.432
	2906753	24"	1 ud	$ 654.231
	2900517	27"	1 ud	$ 736.009
	2900518	30"	1 ud	$ 919.105
	2906333	33"	1 ud	$ 2.776.383
	2907224	36"	1 ud	$ 4.008.710
	2907225	39"	1 ud	$ 5.200.808
	2907299	42"	1 ud	$ 5.636.565
	2911972	45"	1 ud	$ 9.658.535

Codos 90°	2901051	110	1 ud	$ 55.724
	2901052	160	1 ud	$ 130.808
Codos 45°				






sent mauricio.fonse...
Buscar con Google
Recibidos (791) - di...
RNP0026732F6EB8...
Sistema de Informa...
New Tab
Helado malo 2 - Ju...
dFireboy and Water...
Otros marcadores
CASA ANDINA
¿Qué estás buscando hoy?
INICIO
NUESTRAS CATEGORÍAS
SOMOS ESPECIALISTAS EN
OFERTAS
SALDOS Y REMATES
CRÉDITO FÁCIL
BENEFICIOS PARA
CONTÁCTENOS
Inicio > UNION SANITARIA 8
Compra con sistecredito en 4 cuotas de $26.240/mensual. Solicita tu cupo.
UNION SANITARIA 8
Marca PAVCO-SANIT Y VENT
Sea el primero en dejar una reseña para este artículo
Valor unidad:
$104.505
Paga a crédito con Addi en hasta 6 cuotas. Revisa si calificas
Esperando a www.google.com...

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

GOBIERNO CIUDAD BOGOTÁ

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	TUBO 8 " PVC SANITARIO NOVAFORT X 6ML	UND	$ 379.019	NUREÑA	289.300,000	FERROOBRAS	$ 365.963	CATALOGO PAVCO	$ 344.761	$ 48.472	$393.232	$296.289	$ 379.019		$ 365.963	$ 372.491
	UNION PVCS 8"	UND	$ 63.772	LISTA PRECIOS PAVCO	$ 67.294	PVC DEL CARIBE	$ 104.505	CASA ANDINA	$ 78.524	$ 22.569	$101.093	$55.954	$ 63.772	67294,00		$ 65.533

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-29	Suministro e instalacion de poste alumbrado publico metalico de 6 mts con dos brazo 1,20 m	UN	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	874.747,50	43.737,38
Pulidora manual con disco (alquiler)			20.000,00	0,05	1.000,0
				SUBTOTAL	**44.737,38**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
#¡REF!	und	1,00	#¡REF!	#¡REF!
PERNOS DE ANCLAJE	und	4,00	#¡REF!	#¡REF!
			SUBTOTAL	**#¡REF!**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de materiales en furgon			1,0000	350.000	350.000,0
				SUBTOTAL	**350.000**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	$ 137.500,00	52,13%	209.179	2	418.357,50
CUADRILLA FF ELÉCTRICAS (TECNICO+AYUD)	$ 150.000,00	52,13%	228.195	2	456.390,00
				SUBTOTAL	**874.747,50**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**#¡REF!**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**#¡REF!**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**#¡REF!**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**#¡REF!**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-29- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ALUMBRADO PUBLICO METALICO DE 6 MTS CON DOS BRAZO 1,20 M

UNIDAD:UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **Suministro e instalación de poste alumbrado publico metálico de 6 mts con dos brazo 1,20 m**

EJECUCIÓN:

- Verificar puntos de anclaje
- Verificar instalaciones eléctricas internas del poste
- Realizar izado de poste con grúa
- Verificar verticalidad y ejes
- Realizar apernado en la parte inferior
-

MATERIALES:

- **POSTE METALICO 6 MTSCON DOS BRAZOS 1,20 M**
- **PERNOS DE ANCLAJE**

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR
- GRUA

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (UN) de SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ALUMBRADO PUBLICO METALICO DE 6 MTS CON DOS BRAZO 1,20 M** recibidos a satisfacción por la interventoría.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-30-SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ALUMNBRADO PUBLICO METALICO DE 6 MTS CON DOS BRAZOS 1,20 M

UNIDAD:UN

JUSTIFICACIÓN:

El reemplazo de placas de concreto o asfalto en canchas y demás zonas de urbanismo requiere el desmonte de los postes en concreto existentes, los cuales al ser en concreto sufren fracturaciones o perdida de capacidad de carga por lo cual se reemplazan por postes metálicos que garantizan durabilidad y aportan al diseño arquitectónico de los espacios.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-30	Suministro e instalacion de poste alumnbrado publico metalico de 6 mts con un brazo 1,20 m	UN	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	874.747,50	43.737,38
Pulidora manual con disco (alquiler)			20.000,00	0,05	1.000,0
				SUBTOTAL	**44.737,38**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
#¡REF!	und	1,00	#¡REF!	#¡REF!
PERNOS DE ANCLAJE	und	4,00	#¡REF!	#¡REF!
			SUBTOTAL	**#¡REF!**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de materiales en furgon			1,0000	350.000	350.000,0
				SUBTOTAL	**350.000**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	$ 137.500,00	52,13%	209.179	2	418.357,50
CUADRILLA FF ELÉCTRICAS (TECNICO+AYUD)	$ 150.000,00	52,13%	228.195	2	456.390,00
				SUBTOTAL	**874.747,50**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**#¡REF!**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**#¡REF!**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**#¡REF!**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**#¡REF!**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-30- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ALUMBRADO PUBLICO METALICO DE 6 MTS CON UN BRAZO 1,20 M

UNIDAD:UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ALUMBRADO PUBLICO METALICO DE 6 MTS CON UN BRAZO 1,20 M**

EJECUCIÓN:

- Verificar puntos de anclaje
- Verificar instalaciones eléctricas internas del poste
- Realizar izado de poste con grúa
- Verificar verticalidad y ejes
- Realizar apernado en la parte inferior
-

MATERIALES:

- **POSTE ALUMBRADO PUBLICO METALICO DE 6 MTS CON UN BRAZO 1,20 M**
- **PERNOS DE ANCLAJE**

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR
- GRUA

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (UN) de SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ALUMBRADO PUBLICO METALICO DE 6 MTS CON UN BRAZO 1,20 M** recibidos a satisfacción por la interventoría.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-31- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 60 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METÁLICO

UNIDAD:UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 60 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METÁLICO**

EJECUCIÓN:

- Realizar montaje de lámparas en poste metálico
- Realizar conexiones eléctricas
- Verificar continuidad de energía en instalación eléctrica de poste
- Fijar y/o apernar la luminaria al poste
-

MATERIALES:

- LAMPARA 60 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METÁLICO

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIO TUBULAR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (UN) de SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 60 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METÁLICO** recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-31	Suministro e instalacion de lampara 60 watts en poste de alumbrado publico metalico	UN	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	159.736,50	7.986,83
Andamio tubular			200%	1.200,00	2.400,00
				SUBTOTAL	**10.386,83**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
#¡REF!	und	1,00	#¡REF!	#¡REF!
			SUBTOTAL	**#¡REF!**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de materiales en furgon			0,0100	350.000	3.500,0
				SUBTOTAL	**3.500**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
CUADRILLA FF ELÉCTRICAS (TECNICO+AYUD)	$ 150.000,00	52,13%	228.195	0,7	159.736,50
				SUBTOTAL	**159.736,50**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**#¡REF!**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**#¡REF!**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**#¡REF!**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**#¡REF!**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-30-SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ALUMNBRADO PUBLICO METALICO DE 6 MTS CON UN BRAZO 1,20 M

UNIDAD:UN

JUSTIFICACIÓN:

El reemplazo de placas de concreto o asfalto en canchas y demás zonas de urbanismo requiere el desmonte de los postes en concreto existentes, los cuales al ser en concreto sufren fracturaciones o perdida de capacidad de carga por lo cual se reemplazan por postes metálicos que garantizan durabilidad y aportan al diseño arquitectónico de los espacios.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-31-SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 60 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METALICO

UNIDAD:UN

JUSTIFICACIÓN:

El reemplazo de placas de concreto o asfalto en canchas y demás zonas de urbanismo requiere el desmonte de los postes en concreto existentes, los cuales al ser en concreto sufren fracturaciones o perdida de capacidad de carga por lo cual se reemplazan por postes metálicos que garantizan durabilidad y aportan al diseño arquitectónico de los espacios. La iluminación en lampara 60 watts es la requerida para instalar en estos postes.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-32	Suministro e instalacion de lampara 150 watts en poste de alumbrado publico metalico	UN	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	159.736,50	7.986,83
Andamio tubular			200%	1.200,00	2.400,00
				SUBTOTAL	**10.386,83**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
#¡REF!	und	1,00	#¡REF!	#¡REF!
			SUBTOTAL	**#¡REF!**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de materiales en furgon			0,0100	350.000	3.500,0
				SUBTOTAL	**3.500**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
CUADRILLA FF ELÉCTRICAS (TECNICO+AYUD)	$ 150.000,00	52,13%	228.195	0,7	159.736,50
				SUBTOTAL	**159.736,50**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**#¡REF!**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**#¡REF!**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**#¡REF!**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**#¡REF!**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-31- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 150 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METÁLICO

UNIDAD:UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 150 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METÁLICO**

EJECUCIÓN:

- Realizar montaje de lámparas en poste metálico
- Realizar conexiones eléctricas
- Verificar continuidad de energía en instalación eléctrica de poste
- Fijar y/o apernar la luminaria al poste
-

MATERIALES:

- LAMPARA 150 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METÁLICO

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIO TUBULAR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (UN) de SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 150 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METÁLICO** recibidos a satisfacción por la interventoría.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-32-SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 150 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO METALICO

UNIDAD:UN

JUSTIFICACIÓN:

El reemplazo de placas de concreto o asfalto en canchas y demás zonas de urbanismo requiere el desmonte de los postes en concreto existentes, los cuales al ser en concreto sufren fracturaciones o perdida de capacidad de carga por lo cual se reemplazan por postes metálicos que garantizan durabilidad y aportan al diseño arquitectónico de los espacios. La iluminación en lampara 150 watts es la requerida para instalar en estos postes.


PrismaLight

SOCIOELÉCTRICOS INDUSTRIALES LTDA

DISTRIBUIDORES DIRECTOS DE FABRICA
Ferretería - Electrodomésticos - Cerrajería - Todo en Iluminación e Industrial
FERRETERIA Y CONSTRUCCION

DIA	MES	AÑO
12	8	2023

COTIZACIÓN
Nº 9991

Señor(es): JORGE MERCHAN
C.C. o NIT:
Dirección: Tel.:

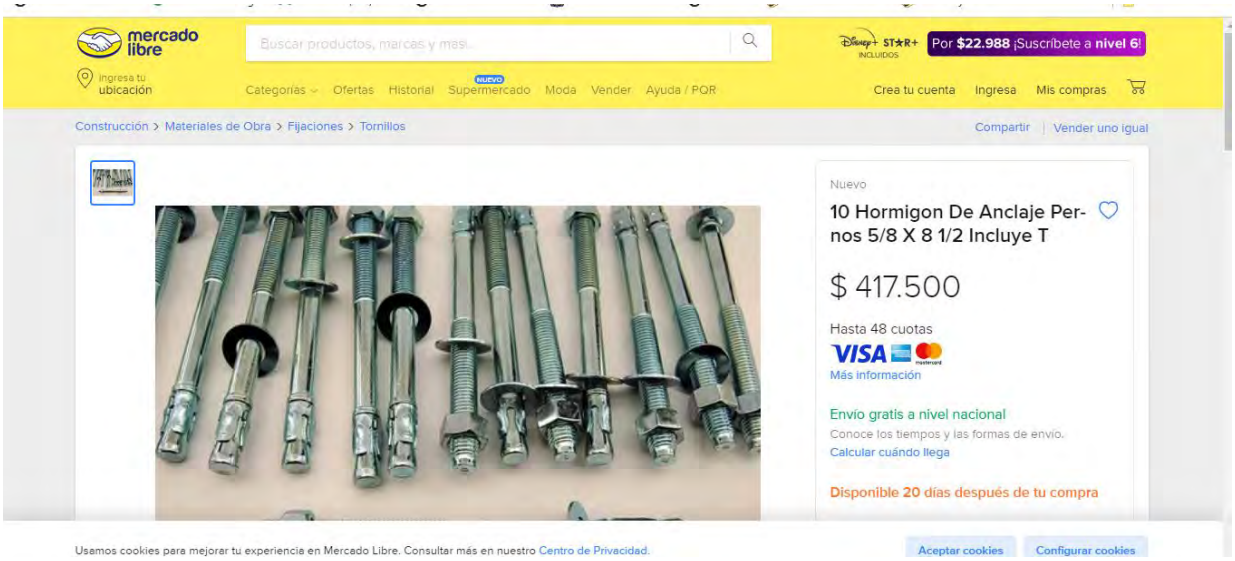
CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
2	POSTES DE 6 METROS CON DOS BRAZOS DE 120CMS	1'380.000	2'760.000
4	POSTES DE 6 METROS CON UN BRAZO DE 120 CMS	1'295.000	5'180.000
8	LAMPARA 60 CMS	398.800	3190.000
8	LAMPARA 150 CMS	612.000	4.896.000

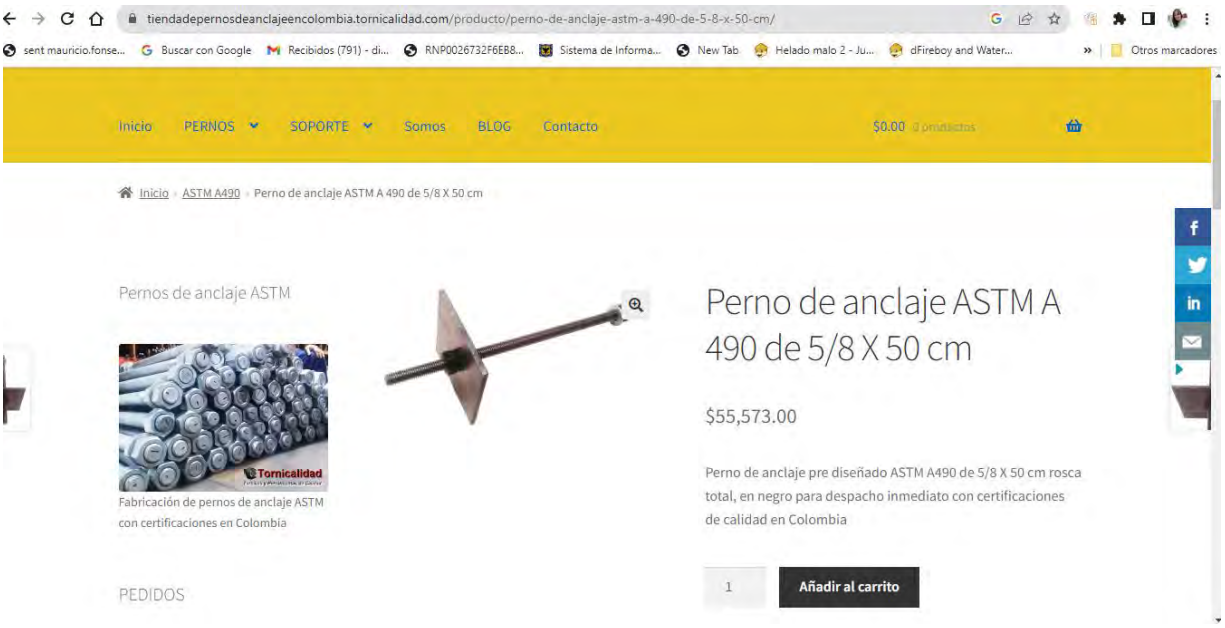
DESPUES DE CORTADO SU CABLE NO SE ACEPTAN RECLAMOS

SUBTOTAL $		16'026.000
I.V.A.	%	3'094.940
TOTAL	$	19'070.940

FIRMA

Calle 16 No. 10 - 76 - Teléfonos: 334 7662 - 243 1200 - Bogotá, D.C.
SUCURSAL: Cra. 12 No. 16-98 - Tel.: 334 9608


mercado libre
Buscar productos, marcas y más...
Por $22.988 ¡Suscríbete a nivel 6!
Categorías
Ofertas
Historial
Supermercado
Moda
Vender
Ayuda / POR
Crea tu cuenta
Ingresa
Mis compras
Construcción > Materiales de Obra > Fijaciones > Tornillos
Compartir
Vender uno igual
Nuevo
10 Hormigon De Anclaje Pernos 5/8 X 8 1/2 Incluye T
$ 417.500
Hasta 48 cuotas
Más información
Envío gratis a nivel nacional
Conoce los tiempos y las formas de envío.
Calcular cuándo llega
Disponible 20 días después de tu compra
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en Mercado Libre. Consultar más en nuestro Centro de Privacidad.
Aceptar cookies
Configurar cookies


tiendadepernosdeanclajeencolombia.tornicalidad.com/producto/perno-de-anclaje-astm-a-490-de-5-8-x-50-cm/
Inicio
PERNOS
SOPORTE
Somos
BLOG
Contacto
$0.00
Inicio › ASTM A490 › Perno de anclaje ASTM A 490 de 5/8 X 50 cm
Pernos de anclaje ASTM
Tornicalidad
Fabricación de pernos de anclaje ASTM con certificaciones en Colombia
Perno de anclaje ASTM A 490 de 5/8 X 50 cm
$55,573.00
Perno de anclaje pre diseñado ASTM A490 de 5/8 X 50 cm rosca total, en negro para despacho inmediato con certificaciones de calidad en Colombia
1
Añadir al carrito
PEDIDOS

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	POSTE METALICO 6 MTSCON DOS BRAZOS 1,20 M	UND	$ 1.642.200	SOCIOELECTRICOS INDUSTRIALES	1.547.000,000	PROSMARTHLIGHT			$ 1.594.600	$ -	$1.642.200	$1.547.000	$ 1.642.200	1547000,00		$ 1.594.600
	POSTE METALICO 6 MTS 1 BRAZO 1,20 M	UND	$ 1.541.050	SOCIOELECTRICOS INDUSTRIALES	$ 1.487.500	PROSMARTHLIGHT			$ 1.514.275	$ -	$1.541.050	$1.487.500	$ 1.541.050	1487500,00		$ 1.514.275
	PERNOS DE ANCLAJE EN CONCRETO	UND	$ 55.573	TIENDA DE PERNOS DE ANCLAJES	$ 41.750	MERCADOLIBRE			$ 48.662	$ -	$55.573	$41.750	$ 55.573	41750,00		$ 48.662
	LAMPARA 60 WATTS	UND	$ 474.572	SOCIOELECTRICOS INDUSTRIALES	$ 467.670	PROSMARTHLIGHT			$ 471.121	$ -	$474.572	$467.670	$ 474.572	467670,00		$ 471.121
	LAMPARA 150 WATTS	UND	$ 728.280	SOCIOELECTRICOS INDUSTRIALES	$ 708.050	PROSMARTHLIGHT			$ 718.165	$ -	$728.280	$708.050	$ 728.280	708050,00		$ 718.165

Bogotá D.C., 14 de agosto de 2023

2023_RUU_MGP_225

Señores:

CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: INFORME MENSUAL DE OBRA 06 DESDE 20 DE JUNIO HASTA 19 DE JULIO

Cordial saludo,

Adjunto enviamos para su revisión y fines pertinentes **INFORME MENSUAL DE OBRA 06 DESDE 20 DE JUNIO HASTA 19 DE JULIO.**

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Bogotá D.C., 16 de agosto de 2023

2023_RUU_MGP_225

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega diseño V3 tarima marruecos y molinos.

Cordial saludo,

Por medio de la presente teniendo en cuenta el compromiso adquirido el 09 de agosto de 2023, teniendo en cuenta el cambio de cimentación de la propuesta arquitectónica de la tarima para la IED en mención, nos permitimos hacer entrega del diseño estructural para su revisión y aprobación con el fin de dar inicio a las actividades en el frente.

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Bogotá D.C., 17 de agosto de 2023

2023_RUU_MGP_226

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

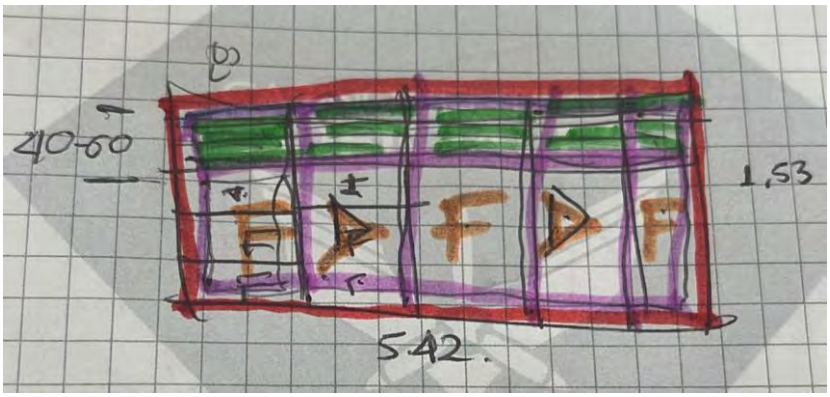
Asunto: Ajustes arquitectónicos IED Diana Turbay Sede B.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en comité de seguimiento del 11 de agosto de 2023, en donde se manifestó por parte del contratista las diferentes inquietudes que se presentan respecto al diseño para dar cumplimiento al alcance de obra, a continuación presentan los detalles realizados en comités de obra entre la SED, la interventoría y el Contratista, a fin de que sean aclarados y/o viabilizados según sea el caso y se programe su ejecución.

1. **Ventaneria**

Se instalarán ventanas en aulas hacia el interior del colegio de acuerdo con el siguiente esquema entregado por parte de la SED.



No se realizará intervención a la ventanera perimetral



2. Placa aula múltiple

Una vez verificado el estado de la placa existente del aula definida como aula múltiple, en donde se evidencia un desnivel uniforme de aproximadamente de 10cm , no se observan fallas estructurales en la placa. Sin embargo, por el estado de construcción, se considera la instalación de alistado de piso con fibra y acabado final en vinilo con el fin de no generar mayor peso a la estructura existente.

Nota: Se aclara que el alcance del contrato obra es de mejoramiento y que la estructura existente es antigua y carece norma sismorresistente, por lo cual el Contratista no se hace responsable por las afectaciones que las actividades de mantenimiento que se ejecutarán puedan ocasionar sobre la estructura.

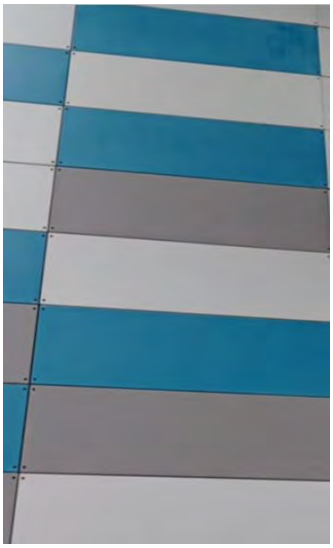


Se solicita a la SED se allegue el diseño de la modulación del piso en vinilo.

3. Muro fachada

Con el propósito de lograr una mejor apariencia y durabilidad, de acuerdo con el uso y finalidad del elemento, presentamos a continuación propuesta de recubrimiento en Panel liso de fachada de 1.22cmx1.22cm en lámina galvanizada, calibre 18, con acabado con pintura poliéster lisa, en reemplazo del muro en super board propuesto inicialmente.

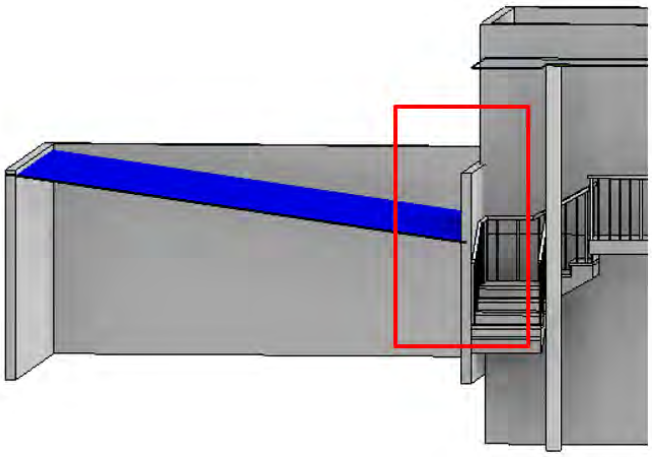




4. Remate bloque 1 a bloque 2

En recorrido de obra se define realizar la prolongación del aula final del bloque 1, en donde se define como área administrativa. Se solicita definición frente a la ejecución de actividades de voz y datos, no se ha dado respuesta por parte de la SED si serán acometidas por REDP o el consorcio MIA GP.





5. Sistema constructivo bloque 2.

Se define dar continuidad el sistema constructivo de pórticos en concreto para el nivel 2, teniendo en cuenta que los muros de cerramiento dispondrán de mesones colgados por lo que se generaría mayor reforzamiento al interior del muro liviano, además de la facilidad para instalación de redes sanitarias y de agua potable.



Por otro lado, se solicita dar continuidad al vano de ventana en la parte superior del área de baños.

Por último se decide dar abastecimiento directo de la red y no suministrar tanques de almacenamiento para la sede.

6. Pasarela conexión edificaciones existentes

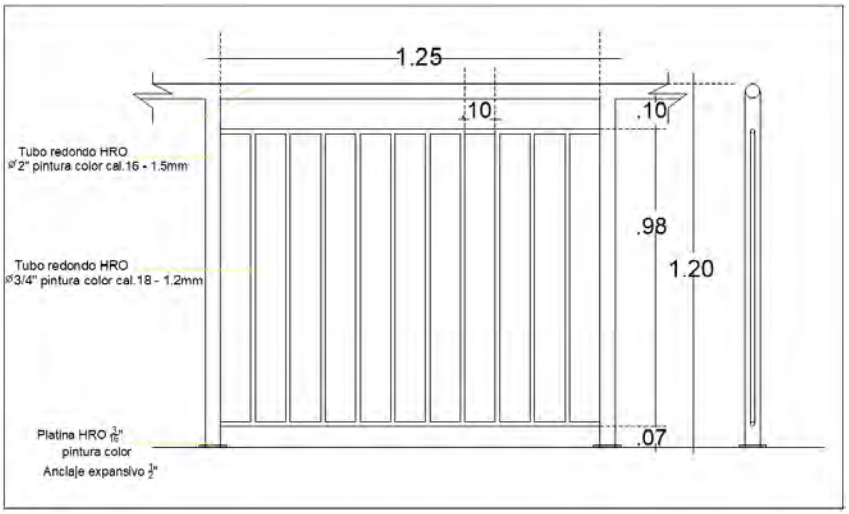
Se realizará conexión a las edificaciones por medio de una pasarela con un ancho efectivo de 1.10m y una longitud total de 8.70m, se propone realizarse en estructura metálica y placa en Steeldeck.

Se solicita claridad de quien realizara el diseño estructural de la pasarela de conexión.



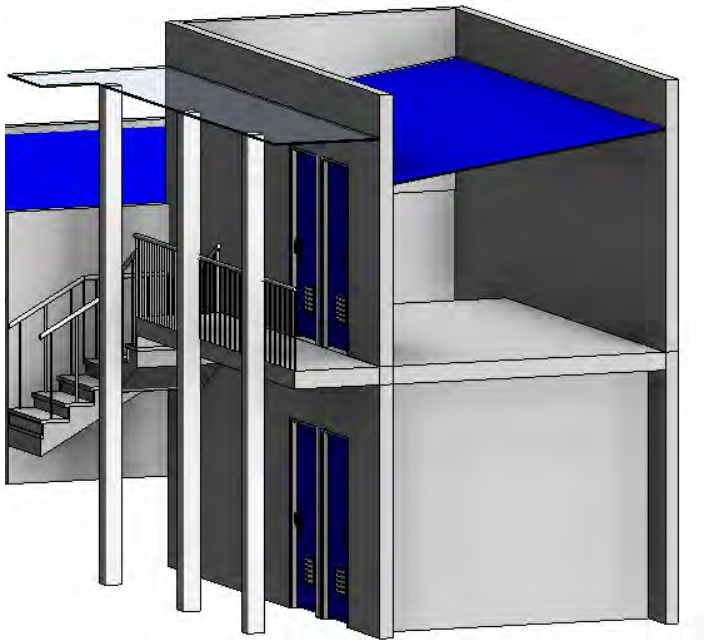
7. Barandas

Se llevarán a cabo de acuerdo con el detalle SED.



8. Pendientes por definir

De acuerdo con lo acordado, se realizará fundación de elementos a nivel de piso 2 (pasarela sujeta a diseño) y posteriormente se llevara a cabo del planteamiento de cubierta del bloque 2.



Solicitamos emitir concepto en torno a las inquietudes expresadas en este documento toda vez que se requiere tener claridad en cuanto a los detalles constructivos, los cuales requieren ser definidos en su totalidad a fin de programarlos y ejecutaros.

Mientras se evalúan estas inquietudes el Contratista continuara con la ejecución de las demás actividades que ya se encuentran definidas.

Cordialmente,



MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Bogotá D.C., 17 de agosto de 2023

2023_RUU_MGP_227

Señores:

CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

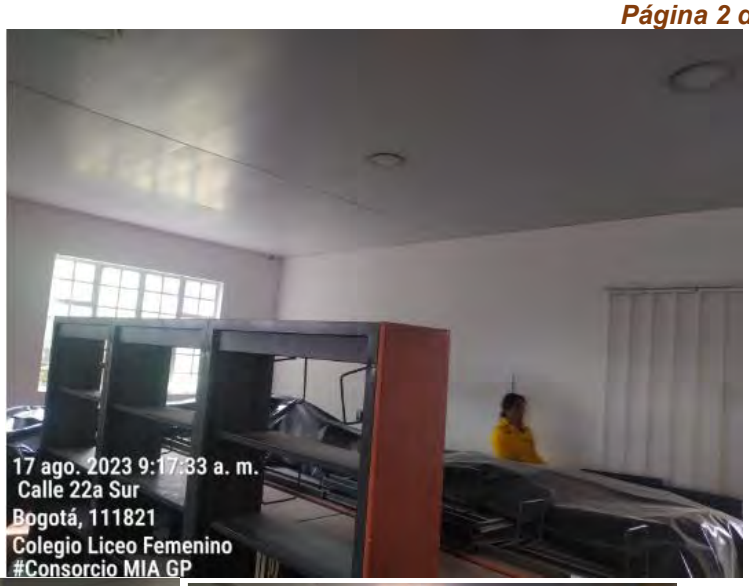
Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

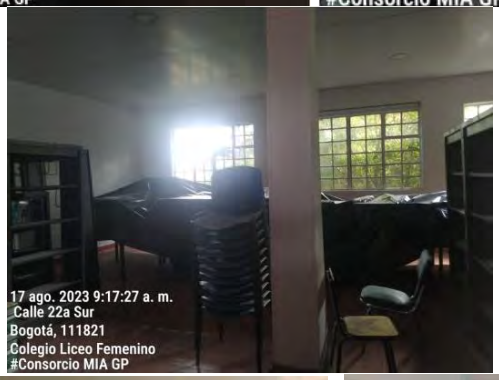
Asunto: SOLICITUD REUBICACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPOS DE UBICADOS ACTUALMENTE EN BIBLIOTECA COLEGIO LICEO FEMENINO

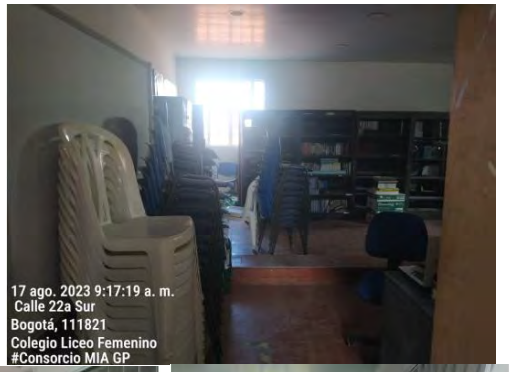
Cordial saludo,

Atendiendo a la necesidad de intervenir la cubierta de biblioteca del Colegio Liceo Femenino dada la emergencia ocurrida, para el día de hoy 17 de agosto de 2023, en aras de proceder a realizar acta de vecindad del espacio, se evidencia que actualmente se ubica en esta área equipos de cómputo, estantes, libros, escritorios, sillas, mesas y antena de seguridad en la entrada. Dicha situación representa para Consorcio MIA GP un condicionamiento en la ejecución de las actividades puesto que dichos elementos estarían en riesgo de afectación por las condiciones climáticas y por la maniobrabilidad misma de las actividades contempladas.


17 ago. 2023 9:17:49 a. m.
Calle 22a Sur
Bogotá, 111821
Colegio Liceo Femenino
#Consorcio MIA GP


17 ago. 2023 9:17:33 a. m.
Calle 22a Sur
Bogotá, 111821
Colegio Liceo Femenino
#Consorcio MIA GP


17 ago. 2023 9:17:27 a. m.
Calle 22a Sur
Bogotá, 111821
Colegio Liceo Femenino
#Consorcio MIA GP


17 ago. 2023 9:17:19 a. m.
Calle 22a Sur
Bogotá, 111821
Colegio Liceo Femenino
#Consorcio MIA GP



17 ago. 2023 9:17:24 a. m.
Calle 22a Sur
Bogotá, 111821
Colegio Liceo Femenino
#Consorcio MIA GP




17 ago. 2023 9:17:07 a. m.
Colegio Liceo Femenino
#Consorcio MIA GP

Expuesto lo anterior, solicitamos a interventoría y a la entidad contratante la gestión ante la institución para la reubicación de los equipos y mobiliario existentes en el biblioteca, con el objetivo de hacer inicio del alcance de la intervención contemplada en dicha área y subsanar la emergencia presentada.

Cordialmente,



MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Bogotá D.C., 17 de agosto de 2023

2023_RUU_MGP_228

Señores:

CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: HOJAS DE VIDA PROPUESTA PARA RESIDENTE DE OBRA E INSPECTOR

Cordial saludo,

Adjunto enviamos hojas de vida propuestas por el Contratista para los cargos de:

- Residente de obra: Arquitecto Juan Camilo Cristancho, en reemplazo del ingeniero Luis Miguel Castaño, se anexa titulación de maestría mediante la cual se homologan 36 meses de experiencia general de acuerdo con lo establecido en numeral 9 el Anexo técnico del contrato de obra.
- Inspector de obra: Arquitecto Juan Sebastián Rivera en reemplazo del arquitecto Juan Camilo Cristancho.

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Bogotá D.C., 17 de agosto de 2023

2023_RUU_MGP_226

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: INSTALACIONES ELECTRICAS e HIDROSANITARIAS COLEGIO FE Y ALEGRIA

Cordial saludo,

A fin de dar continuidad con la ejecución de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias del Colegio Fe y Alegría, amablemente solicitamos lo siguiente:

1. Emitir concepto aprobatorio de diseños hidrosanitarios presentados a la interventoría y cuyas ultimas observaciones se subsanaron el 10 de julio por parte del contratista.

2. Informar resultado de la consulta que realizaría la SED respecto a la ubicación física de las acometidas hidráulicas del predio, compromiso adquirido por parte de la SED el 04 de julio de 2023.

3. Informar el estado de los permisos para conexión de la red de alcantarillado y pluvial a la red pública, toda vez que los tendidos de redes actualmente solo definen un punto de entrega dentro de la institución educativa, es decir no existe disponibilidad de servicio de alcantarillado para el colegio en este momento, por lo cual no podría entrar en servicio el sistema hasta tanto no se pueda conectar al sistema de alcantarillado público. Estas gestiones deben ser adelantadas y resueltas por parte de la SED.

   Solicitud que se reiteró en comunicado 2023_RUU_MGP_193, de 29 de junio y del cual no se ha recibido respuesta.

4. Respecto a las instalaciones eléctricas, el Contratista presentó un planteamiento eléctrico preliminar de acuerdo con lo que se le solicito en comité técnico de 10 de mayo en el colegio Fe y Alegría, el 11 de Julio la interventoría emitió observaciones mediante comunicación TIG-MEM-275, en torno a las cuales el Contratista manifiesta que deberá realizarse un diseño eléctrico completamente soportado a fin de atender técnicamente las necesidades de las instalaciones y obtener así la aprobación de la interventoría.

   Solicitamos a la interventoría, aprobar la ejecución del diseño eléctrico por parte del contratista, cuyo costo es de Quince Millones de pesos m/cte ($15.000.000) para proceder con su elaboración, o informar si estos diseños serán entregados por parte de la SED.

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexos: **Acta de comité 10 de mayo 2023**
Comunicación TIG-MEM-275

Bogotá D.C., 19 de agosto de 2023

2023_RUU_MGP_230

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Estudio de suelos y diseño pavimento rígido El Libertador

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que una vez iniciado el retiro de placa en asfalto en canchas de colegio El Libertador se evidenció deterioro en la base existente y suelo aparentemente arcilloso, fue necesario realizar ensayos sobre los suelos encontrados que permitieran identificar los espesores de estructura de pavimento (base y subbase) que deberán ser instalados para garantizar la estabilidad de la cancha.

El 14 de agosto el Contratista se desplazó a sitio con la firma GEOCRETOS INGENIERIA SAS, para realizar las tomas de muestras respectivas con el fin de establecer en el menor tiempo posible el diseño de la estructura para el pavimento en concreto que se va a instalar en las canchas.





Registro fotográfico obtención muestra de suelos para ensayos y diseño

Adjunto enviamos oferta económica de GEOCRETOS INGENIERIA SAS, a fin de que sea avalada por la interventoría.

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Bogotá DC, 12 de agosto de 2023

Señores
PROCASA
Ciudad.

Referencia: COT - 120221-234-151

Proyecto: Estudio de suelos y diseño pavimento rigido.

Respetados Señores;

De acuerdo a su gentil solicitud realizamos nuestra propuesta técnica y económica para los trabajos de campo, ensayos de laboratorio (estudio de suelos), a realizar en el Colegio El Liberador Sede B en Bogota DC, sitio en el cual se proyecta la rehabilitación de cancha multiple.

ALCANCE

Se propone realizar 3 apiques distribuidos en la cancha, teniendo en cuenta los sitios más críticos, a una profundidad de 1.50 metros, con equipo manual o hasta encontrar rechazo según SPT, y/o CDP, para esta propuesta se tendrá en cuenta la profundidad de sondeo según el titulo H (H325) del reglamento NSR-10, dependiendo de la variabilidad del suelo.

Posteriormente se clasifican los materiales extraídos en la exploración (subsuelo), se halla la resistencia del suelo por medio de CDP y/o CBR según sea el caso y se realizan los diferentes cálculos para las recomendaciones finales del informe.

PROPUESTA

En el interior del informe incluye lo siguiente:

1. Perfil estratigráfico del subsuelo
2. Clasificación de materiales extraídos
3. Penetración a muestras INSITU con penetró metro de bolsillo (S/A)
4. Análisis granulométrico con lavado en tamiz No 200
5. Ensayos de CDP y/o CBR
6. Humedades naturales
7. Límites de consistencia: liquido, plástico e indica de plasticidad
8. Registro fotográfico
9. Descripción del proyecto
10. Croquis localizacion de apiques
11. Normativa y características del proyecto
12. Alcance y objetivos
13. Investigación del subsuelo
14. Metodo diseño (RIGIDO)
15. Carta de compromise tecnico
16. Conclusiones y recomendaciones

VALOR DE LA PROPUESTA

Esta propuesta tiene un valor global de.....**$5.250.000.oo**

SON CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA

- Respuesta oportuna requerimientos
- Profesionales con más de 15 años de experiencia en el área

CONDICIONES DE LA PROPUESTA

- La propuesta tiene validez tres meses de esta propuesta
- Se entregará el informe máximo, diez días hábiles luego de la exploración.
- Este costo es neto, por lo tanto, si se va a realizar alguna retención deberá ser agregado a este valor.
- Cualquier modificación y/o actualización del informe antes de 365 días, no tendrá ningún costo adicional
- La entidad contratante entregara la mayor información posible del proyecto como topografía, diseño arquitectónico entre otros (si fuera posible)
- Las muestras de ensayos se almacenan por un periodo de (30) días calendario, después de emitido el informe.
- Cualquier inquietud, duda, acerca del estudio, se hará por medio escrito a nuestro correo electrónico (geocretoslaboratorio@gmail.com)
- La duración de cada ensayo depende del proceso según norma y se estiman en días hábiles
- Las muestras de ensayos no destructivas se almacenan por un periodo de (30) días después de emitido el informe de resultados y las muestras destructivos se desechan un día después del ensayo.
- La entidad deberá suministrar los datos necesarios para la realización del informe por lo menos dos días hábiles antes del tiempo previsto para la entrega
- Confidencialidad: El laboratorio asegura que toda la información relacionada con los datos suministrados por el cliente u otras fuentes y sus resultados, serán tratados de manera confidencial. Cuando sea requerido por alguna autoridad de control o por disposiciones contractuales, se podrá revelar información confidencial, salvo que esté prohibido por ley. El laboratorio asegurará que la divulgación de esta información, sea debidamente protegida y se encuentre cobijada por acuerdos de confidencialidad, excepto para la autoridad de control. Los resultados de los servicios serán entregados

únicamente al solicitante; en caso de que los resultados se pongan a disposición de carácter público, se informará al cliente oportunamente.

- Cualquier inquietud, duda, acerca de Informes, se hará por medio escrito a nuestro correo electrónico (geocretoslaboratorio@gmail.com)

FORMA DE PAGO

Anticipo del 50% inicio de labores y otro 50% contra entrega informe

DISPONIBILIDAD

Inmediata, luego de la Orden de servicio

Agradeciendo la atención prestada al presente y deseándole éxitos en su labor, esperamos cualquier comunicación para ampliar detalles de nuestro laboratorio.

Cordialmente

GEOCRETOS INGENIERIA S.A.S. NIT.: 900.802.749 - 4

ING. RICARDO LARROTA MANRIQUE
Gerente
GEOCRETOS
Ingenieria SAS

Anexo 1.1.3. Actas de reunión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	22-07-2023	Inicio	08:00am	Fin : 09:20am		Lugar	IED Restrepo Millan, sede D
Proyecto	Mejoramientos SED - Grupo 8					Asunto	Revisión emergencia IED Restrepo Millan sede D		
Asistentes	Contratista de obra e Interventoría					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		22-07-2023	Elaborado por		Convoca TIG - Interventoría			Próxima Reunión	

Se realiza visita a la IED por parte del contratista de obra y la interventoría, tras solicitud de parte de la SED, para revisión de la emergencia presentada y relacionada con las redes electricas del colegio.

Se procede con la inspección al tablero principal y se evidencia una sobrecarga en el sistema, que terminó por generar un corto en la barra de los neutros. Se revisa el resto del sistema por encima y no se evidencian mas daños, aclarando que no se pudo ingresar al salón de sistemas donde por información de los vigilantes existe otro tablero de circuitos. Se realiza maniobra provisional por parte del contratista, donde se reemplaza un breaker y la barra, dejando habilitado el sistema, pero con la condición de que no se utilice el salon de sistemas por el riesgo de una sobrecarga y posible daño.

Se queda a la espera del envió de la propuesta por parte del contratista de obra, para revisarlo con la SED y delimitar el alcance de la ~~esp~~ intervención.

Ricardo Duarte
Director de interventoría

Juan Camilo C.
Consorcio MMO app

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	26/07/23	**Inicio**	10:00	**Fin**		**Lugar**	IED EL LIBERTADOR SEDE B
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes	Contratista MIA GP, SED, INTERVENTORIA JTG					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	26/07/23	**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

Se reune la SED, interventoria y Contratista para inspeccionar las instalaciones del colegio

- La SED solicita que se haga un mantenimiento superficial a las canchas. Tambien Considerar el cambio de cubierta del ala restante, con sus respectivas redes electricas e iluminación.
- Se realizara la revisión presupuestal para que al final sea la SED quien tome la decisión.

Ricardo Duarte

Ing. Carlos A. Ceyla
Residente Obra

Ing. Miguel Formoso D.

Sandra Pinzón
Directora Obra

Colegio República Estados Unidos de América Institución Educativa Distrital
PEI: "GESTORES DE CALIDAD DE VIDA A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA"
"Quality of life promoters through effective communication"

SECRETARIA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

N°		Fecha	27/07/2023	Inicio		Fin		Lugar	Rectoria - Recorrido
Tipo de Reunión	Reunión emergencia baños								
Asistentes	SED - Contratista Obra - Interventoria - Rectora - madre de familia								
Fecha de Elaboración			Elaborado por				Próxima Reunión		

Se efectúa recorrido zona baños situación emergencia con contratista e interventoria se debe ubicar salida tubería hasta cajas, dado que a simple vista no se evidencia el punto de ubicación. Para aclarar las acciones a seguir, se solicita al especialista hidráulico efectuar visita para emitir un concepto por parte de la SED, junto con el especialista del contratista.

Se establece que:

1. Entre la semana del 31 de julio al 4 de agosto se realizará la visita con los especialistas hidrosanitarios.
2. Inspección mediante demolición de contrapiso para identificar las rutas de las redes y evaluar la intervención de la emergencia en la semana del 31 de julio al 4 de agosto, se entra en contingencia con el PAE mientras se soluciona.

Hugo Vilaquiran SED DCCEE

Clara Puertas Madre Familia

Ana F. Díaz Rectora

Oscar Mendoza Arquitecto

Gestora Territorio SED DCCEE

Sandra Patricia Contratista GI

Ricardo Duarte

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	27-07-2023	**Inicio**		**Fin :**		**Lugar**	IED Liceo Femenino
Proyecto	Mejoramientos SED - Grupo 8					**Asunto**	Comité de seguimiento tecnico, SST, Ambiental		
Asistentes	Contratista de obra, interventoría y SED					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	27-07-2023	**Elaborado por**	Interventoría - Consorcio TIG					**Próxima Reunión**	

Se llevo a cabo comité de seguimiento tecnico, ambiental y SST en las instalaciones del Liceo Femenino.

En lo que respecta al componente SST:

- Es importante que no se deje de utilizar los EPP porque el riesgo de accidentalidad es muy alto.
- Se le requiere al contratista que revisen la documentación antes de que sea enviada a la interventoría.
- Se le sugiere nuevamente la ampliación del equipo SST, para que alcancen más espacios en simultáneo y se evite cualquier incumplimiento del personal.

En lo que respecta al componente ambiental:

- Se sugiere atender a la mayor brevedad posible las observaciones emitidas por parte de la SED.
- No se evidencia gestión ambiental constante por parte del contratista de obra en campo.
- La interventoría semanalmente remite listado de observaciones ligadas al orden y aseo, de todos los frentes de obra.
- Se sugiere nuevamente la incorporación de un apoyo para esta área, porque no se evidencia atención oportuna de las observaciones que se evidencian desde la interventoría.
- Se sugiere desde la interventoría el trabajo en equipo para atender observaciones desde el componente ambiental y SST.
- Es necesario el envío de un informe que muestre las observaciones atendidas y soportadas con fotos.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin :		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

- Se contaba con límite hasta el 15 de julio de 2023 para realizar el cargue de la información en la plataforma de la SDA. El contratista informa que faltan unas soportes y que presionarán para que se emitan prontamente. Interventoría exige especial atención frente a esta situación.

Se pasa al componente técnicos, buscando la definición de varios aspectos en obra:

1. Diana Turbay sede B
   - Se aclara que se requieren ventanas de 0,60m altas para ambos niveles, con dos laterales de persiana y un cuerpo con corredizo y esto con sandblasting. Esto para las baterías sanitarias.
   - Frente al muro liviano del tercer bloque, la SED aclara que es una fachada falsa, con una estructura metálica liviana. Desde el contratista debe venir la propuesta de la modulación de la estructura metálica. El Arq. Alejandro explica la modulación al contratista de obra, mediante esquema dibujado a mano alzada.
   - En relación a las dimensiones de las ventanas de gran dimensión, se debe modular la longitud en tramos entre 0,60 y 0,80 y aplicar el diseño que viene en la cartilla.
   - En relación a la cubierta que queda al fondo del bloque 1, ~~se~~ la SED pide que se reemplace la cubierta en el nivel en que se encuentra actualmente, pero que se tenga cuidado con el manejo de las aguas lluvias.
   - La SED dibuja a mano alzada la propuesta de la pérgola de la zona del corredor del bloque de la batería sanitaria y el contratista queda con esa información. Lo mismo en relación al detalle del cuerpo de la escalera de acceso.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin :		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

2. Fe y Alegría:
   - La SED recomienda evaluar la demolición del muro divisorio donde se generó una dilatación, porque aparentemente no le aporta nada.
   - En relación a la escalera de acceso al nivel superior, se mantiene la propuesta de ampliar la zona de circulación.

3. Liceo Femenino:
   - El contratista ya cuenta con el aval para iniciar con la atención de la emergencia en este colegio, en vista que la interventoría ya avaló los APU's y la supervisión dio visto bueno al corteo.

4. Clemencia de Caycedo:
   - Se visitará el martes 01 de agosto de 2023, para revisar la solución a la inundación en el colegio.

5. Bodega de plantas físicas (Taller de bicicletas)
   - Está pendiente el traslado de las aulas modulares, lo cual se deberá realizar la semana siguiente.

6. IED República de Estados Unidos
   - La SED solicita sondear para destaponar inmediatamente el sistema y buscar una solución inmediata con la construcción de una caja, así represente la demolición del piso existente.

7. IED Manuel del Socorro sede A
   - La SED manifiesta que está pendiente la entrega de la propuesta constructiva por parte del contratista de obra

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin :		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

porque sin eso no es posible acordar lo que se va a materializar.
- La SED solicita la modulación de las propuestas para el cuadro del parque infantil para poder tomar la decisión.

8. Reino de Holanda sede A:
- Se está revisando el funcionamiento del sistema hidráulico, para garantizar la presión en cada punto hidráulico.

9. Restrepo Millán sede B:
- La interventoría le pide al contratista recibir el espacio con la observación que los monitores los debe retirar el colegio, a la mayor brevedad posible. Se realizará presión para que queden retirados lo más pronto posible.
- El contratista entregará a más tardar mañana la revaluación de la estructura metálica del bloque 1.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	27-07-2023	**Inicio**		**Fin :**		**Lugar**	IED Liceo Femenino
Proyecto	Mejoramiento SED - Grupo 8					**Asunto** : Comité de seguimiento tecnico, SST, Ambiental			
Asistentes	Contratista de obra, Interventoria y SED					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	27-07-2023	**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

No.	Frente de ejecución	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1	Diana Turbay	Limpieza de baño Portatil	Consorcio MiaGP	28/07/2023
2	Todos los Frentes	Informe de Respuesta Por Parte de la SED Ambiental	cons. Mia GP	1/08/2023
3	Todos los Frentes	Pendientes del informe mensual para la parte ambiental	Cons. Mia GP	28/07/2023
L1	Restrepo Millan Sede B	Entrega del concepto de la estructura del bloque 1	cons. Mia GP	28/07/2023

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	27/02/2023	Inicio		Fin :		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

Erick Steven Ramirez A.
NOMBRE:
CARGO: Interventoria SST

Angela Tarazona Daenz
NOMBRE: Angela T
CARGO: Inspector SST

Katia Julio Silgado.
NOMBRE: Katya Julio
CARGO: Inspector SST.

Alejandro Herrera
NOMBRE:
CARGO: Sed DCC EE

Dalia M
NOMBRE: Dalia M. Briceño R
CARGO: Profesional Ambiental

Guillermo Perez
NOMBRE: Guillermo Perez
CARGO: Residente Ambiental

NOMBRE: Maria Angarita
CARGO: R. Interventoria

NOMBRE:
CARGO: Supervisor DCCEE.

NOMBRE:
CARGO: SED DCCEE

Erika Gutierrez
Erika Gutierrez
SED - DCCEE
Sandra Tinoco
1024464486

Andrei Torres
Inspector de obra.

Firma Valentina Inspectora.

Ricardo Duarte
Director de interventoria

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	31-07-2023	Inicio	09:00am	Fin :		Lugar	SED
Proyecto	Mejoramientos SED - Grupo 8					Asunto	Revisión de APU's no previstos NP9-21		
Asistentes	SED, Contratista de obra e Interventoría					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		31-07-2023	Elaborado por	Consorcio T16 - Interventoría				Próxima Reunión	

En el desarrollo de la reunión, se informan los siguientes aspectos:

* NP-09 → La SED manifiesta que no lo reconocerá, porque consideran que la actividad del piso en vinilo la lleva implícita. Se evaluaría la pertinencia del mismo, siempre y cuando se ajuste la descripción y se refiera a un piso existente. Se realiza el ajuste de ipso facto. Se suspende de momento la revisión del ítem.
* NP-10 → Se redondea la cifra a cero (0) decimales, y el resto de soportes se encuentran OK.
* NP-11 → La inclusión de esta actividad no procede.
* NP-14 → Se redondea la cifra a cero (0) decimales y el resto del soportes se encuentran OK.
* NP-16 → Se redondea la cifra a cero (0) decimales y el resto de soportes se encuentran OK.
* NP-15 → Se ajusta el precio a $ 221.138 en corte directo. El resto de soportes se encuentran OK.
* NP-17 → Se redondea la cifra a cero (0) decimales y el resto de soportes se encuentran OK.
* NP-18 y NP-19 → Se unificará en una sola actividad.
* NP-20 → Se redondea la cifra a cero (0) decimales y el resto de soportes se encuentran OK.
* NP-21 → Estan pendientes las cotizaciones.

En lo que respecta a las actividades de las puertas destinadas para el colegio Santa Lucía, se realizó la revisión y se hicieron unos ajustes de forma, que serán enviados nuevamente al correo de la SED.

Con relación a las actividades de la emergencia de la cubierta del liceo, se propone unos ajustes por parte de la SED y se terminará de revisar en la próxima reunión.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**		**Inicio**		**Fin :**	**Lugar**	
Proyecto						**Asunto**		
Asistentes						**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**					**Próxima Reunión**	

NOMBRE: Ricardo Duarte
CARGO: Director de interventoría

NOMBRE: Oscar Orea
CARGO: Estudios Previos

NOMBRE: Sandra Tinjaca
CARGO: Directora Obra.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	31-07-2023	Inicio		Fin :		Lugar	Restrepo Millan Sede B
Proyecto						Asunto	Recibo del Bloque 1 para intervenciones		
Asistentes	Contratista, Rectora, Interventoría					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	31-07-2023	Elaborado por	Interventoría.					Próxima Reunión	

- Se realiza una Reunión de manera Presencial en la I.E.D. Restrepo Millan Sede B donde la señora rectora entrega el espacio del bloque 1 para su respectiva intervención, donde se solicita al consorcio MIA GP un revestimiento donde proteja los equipos de filtraciones de aguas lluvias, para poder realizar de esta manera la intervención.

la señora rectora hace la solicitud que el domo del bloque 1, que queda en el pasillo sea de color azul.

5149133.97
Marina Castelblanco.

Insp. Interventoría Cons. TIG

Consorcio MIA GP.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	2-08-2023	Inicio		Fin :		Lugar	I.E.D. Republica de Estados Unidos
Proyecto						Asunto	Emergencias de baterias Sanitarias		
Asistentes	Contratista, SED, Interventoria					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	02-08-2023	Elaborado por	Interventoria					Próxima Reunión	

Se realiza una reunión de manera Presencial en la I.E.D. Republica de Estados de Unidos. donde el contratista explica la intervención que realizó al Profesional de la SED. en la primera fasé que foe Sondear. ~~La SED~~ El profesional Hidrosanitario Solicita romper un área para identifica el tipo de Tuberia y la dirección que se dirige.
Ba. El profesional Hidrosanitario de la SED solicita que en la baterio Sanitaria agregar tinte de color a ver si frota en la parte del anden para ver si el agua que frota es de las baterias Sanitarias.

observación: La rectora informa que el colegio continua en contingencia debido a la Emergencia Presenta en las baterias Sanitarias.

Rectora

Inp. Interventoria

ING. MARIO QUIROZ P.
SED.- DCCEE

Consorcio MIA GP

Clara Puertas
Padre de Familia

SIG-IF-005
V 1

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	03-08-2023	**Inicio**		**Fin :**		**Lugar**	Instalaciones de la SED
Proyecto	Mejoramientos SED - Grupo 8					**Asunto**	Revisión de APUs puertas, cubierta y cerramiento		
Asistentes	SED, Contratista de obra e interventoría					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	03-08-2023	**Elaborado por**	Interventoría – Consorcio TIC					**Próxima Reunión**	

Se lleva a cabo reunión en las instalaciones de la SED, para continuar con el proceso de revisión de los APU's no previstos. La SED informa que a más tardar el 10 de agosto de 2023 se estará generando el memorando de aprobación de los NP9 al NP21

Ricardo Duarte
Director de interventoría

Oscar Olea
E.P. SED.

Sandra Pinzón

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	03-08-2023	Inicio		Fin :		Lugar	Instalaciones de la SED
Proyecto	Mejoramiento SED, interventoría y contratista					Asunto	Revisión alcance Fe y Alegría
Asistentes	SED, Contratista de obra e interventoría					Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración	03-08-2023	Elaborado por	Interventoría - Consorcio TIG				Próxima Reunión	

En las instalaciones de la SED, se cita al contratista de obra y de interventoría, para dar indicaciones frente al alcance que se estima ejecutar con el prospecto de la adición No.2 de recursos.

La SED solicita que con el recurso que restan y que oscilan entre 600 y 800 millones, se centrarán en la habilitación del bloque de bachillerato, que son los 2 edificios de 3 pisos y que están interconectados. en la parte superior del lote. Agregan que lo que se encuentra bien se deberá dejar así, caso puntual la cubierta, y solo se repararán las filtraciones.

Solicitan que con ese lineamiento se revalúe el alcance y se entregue ese resultado la semana siguiente, pero siendo muy puntuales en la intervención.

El contratista de obra manifiesta que la intervención en teminos de costos quedaría corta y no es probable que se dejen los bloques funcionales.

La interventoría manifiesta que no existen redes eléctricas y que solo ese componente se estaría posiblemente pasando del rubro destinado.

La profesional en redes eléctricas SED describe lo que podría ser la intervención de este componente

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin :		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

en estos bloques. Indica que hay muchas cantidades elevadas dentro de la propuesta propuesta 1 y que al ajustarlas habría una disminución en la inversión.

El contratista aclara que realizó una estimación y que si quieren unas cantidades ajustadas solicita que reconozcan el diseño. Que en caso que Entidad se haga responsable del planteamiento técnico o diseño de redes secas y redes húmedas, se procederá con la intervención.

Se acuerda entre las partes que las recomendaciones constructivas tanto de redes secas como de redes húmedas serán suministradas por parte de la Entidad contratante y con estos lineamientos se formularán los presupuestos.

Se aclara que se realizará una visita conjunta entre las partes para determinar las acciones que conduzcan a la habilitación de los espacios BA y BB.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**		**Inicio**		**Fin :**		**Lugar**	
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

NOMBRE: Alexander Osorio P.
CARGO: Supervisor DCCEE

NOMBRE: Sandra Pinzon
CARGO: Directora Obra

NOMBRE: Erika Alejandra Gutierrez C.
CARGO: Gestora Territorial SED DCCEE

NOMBRE: Alba Luz Lopez Osorio
CARGO: Ing Electricista SED - DCCEE

NOMBRE: Charles Castiblanco
CARGO: Contratista DCCEE

NOMBRE: Gabriel B. Sierra G.
CARGO: Ing. Civil

NOMBRE: Edison Ricardo Duarte
CARGO: Director de Interventoría

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	03/08/2023 Inicio	1:00pm	Fin :	2:30 pm	Lugar	Colegio Fe y Alegría
Proyecto	Fe y Alegría				Asunto	Alcance presupuestal		
Asistentes					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por					Próxima Reunión	

En Colegio Fe y Alegría se reunen conjuntamente la SED, contratista e interventoría para definir alcance una parte del bloque de bachillerato referente a las siguientes actividades:

- Verificar estado de funcionalidad de redes hidrosanitaños.
- Cambio de sanitarios en bloque de bachillerato.
- Habilitar tanques existentes.
- La SED manifiesta que hablará con el Colegio Fe y Alegría para que se logre establecer un convenio referente al suministro de agua para el bloque de bachillerato.
- Realizar mantenimiento de cubierta y canales por parte del contratista avalado por interventoría.
- Realizar la intervención del componente eléctrico como: Tomacorrientes, lámparas, Cableado eléctrico, tubería EMT por parte del contratista avalado por interventoría.
- La SED manifiesta hacerle mantenimiento al transformador existente; que no hay necesidad de cambiarlo, ya que funciona.
- Evaluar mantenimiento de pintura en columnas y vigas
- Mantenimiento de vidrios e instalación de claraboyas.
- El contratista solicita a la SED el diseño eléctrico para poder determinar la intervención.
- Verificación fotográfica medidor existente por parte del contratista y hacer llegar a la SED.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin :		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

NOMBRE: Alba Luz Lopez Osorio
CARGO: Ing Electricista DCCEE-SED

NOMBRE: Mario Duque
CARGO: Ing. Hidros. SED-DCCEE

NOMBRE: Erika Gutierrez
CARGO: Gestora Territorial DCCEE SED

NOMBRE: Carlos Castro
CARGO: Contratista DCCEE

NOMBRE: [illegible]
CARGO: Ing. DCCEE

NOMBRE: Juan Ocampo
CARGO: Contratista DCCEE

NOMBRE: Mario Tibaquira
CARGO: SED DCCEE

NOMBRE: Juan Carlos Cortes
CARGO:

NOMBRE: María Alejandra Angarita
CARGO: R. Interventoría TIC

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	09/08/23	**Inicio**	10:20	**Fin**	12:10	**Lugar**	IED Marruecos y Molinos
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes	La SED, Consorcio MIAGP, Interventoria, Recto IED					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

Inicia la reunion encompañia de el rector de la institucion, el personero, el representante de padres de familia, Profesores de la institucion, la SED, el contratista e Interventoria.

-la secretaria explica algunas generalidades del contrato y el alcance de la intervencion en el colegio.
- la secretaria expone que no se puede construir la tarima bajo muros de contencion; lo que implica evaluar la construcc en muros estructurales.
- Interventoria muestra la propuesta de diseño de la tarima al rector de la institución
- El rector expone la problematica que se presenta en la institucion por el retraso en la ejecucion de la obra.
- La secretaria indica que el plazo para la entrega de la tarima será para el mes de noviembre.
- El rector solicita que la entrega sea para el mes de octubre.
- La secretaría se compromete a definir una fecha de entrega para el viernes 11 de agosto.
- El rector solicita que se complemente la respuesta de entrega de obra con un cronograma de ejecución y diseño de la tarima para poder socializarlo con la comunidad.
- La secretaria informa que la ~~secretaria~~ aseguradora cubriva 250 m2 de pintura para espacios del segundo nivel, en el area de cielo rasos.
- El rector solicita que se termine la intervencion en el aula de ingles, la cual quedo incompleta.*
- La secretaria expone que solo entregará impermeabilización de cubierta y construccion de tarima.
- Se acuerda la ejecucion de pintura en vigas, Paredes lisas y columnas y Placa en cinco salones

*- El colegio se compromete a terminar la adecuación del aula de ingles.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	09/08/23	**Inicio**	10:20	**Fin**	12:10	**Lugar**	IED Manuelas y Molinos
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes	La SED. Consorcio MIA SP, Interventoría, Rectora IED					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

NOMBRE: Erika Gutierrez
CARGO: Gestora Territorial JCCEE-SED

NOMBRE: Luis Edd Hurtado
CARGO: Rectora

NOMBRE: Alexandra Osorno
CARGO: SUPERV. - DCCEE

NOMBRE: Omar A Barreto Q
CARGO: Docente MyM.

NOMBRE: [illegible]
CARGO: SED-DCCEE-Apoyo Supervisión

NOMBRE: Roger Beltran Caicedo
CARGO: Personero Estudiantil

NOMBRE: Blanca Flor Calcedo
CARGO: Madre familia

NOMBRE: EDWARD VARGAS
CARGO: PADRE FAMILIA

NOMBRE: Edwin Camilo Santander
CARGO: Consorcio MIA SP

Ricardo Duarte
Consorcio TIG

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	10-08-2023	Inicio		Fin :		Lugar	Instalaciones de la interventoría
Proyecto	Mejoramientos SED, Grupo 8					Asunto	Comité para revisión del estado del contrato		
Asistentes	Contratista de obra e interventoría					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	10-08-2023	Elaborado por	Interventoría - Consorcio T16					Próxima Reunión	

La mesa de trabajo se llevo a cabo ~~ejecutó~~ en las instalaciones de la interventoría, donde se revisan los siguientes temas:

1. Reprogramación de obra - Plan de contingencia: Se solicita nuevamente por parte de la interventoría, en vista que a hoy el atraso de la ejecución asciende al 17,86%.
2. Informe mensual de obra: El contratista de obra sigue sin remitirlo y presenta 12 días de atraso en su entrega.
3. Componente ambiental: El contratista justificará los llamados de atención y realizará cambio de profesional.
4. Ensayos de control de calidad: Se anexarán al informe mensual de obra No.6.
5. Pendiente la entrega de otros APU's no previstos:
6. Ajustes al acta parcial de obra No.7: Se hará la revisión de manera conjunta.

Se revisa lo que tiene que ver con la ejecución en cada frente y se evidencian varios aspectos que deberán definirse en el comité del día de mañana.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin :		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

No.	Frente de ejecución	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1.	Todos los contratos	Entrega de la reprogramación de obra	Consorcio MIA GP	16-08-2023
2.	Contrato de obra	Entrega del informe mensual de obra Soportes de los resultados de los controles de calidad	Consorcio MIA GP	14-08-2023

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**		**Inicio**		**Fin :**		**Lugar**	
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

NOMBRE: Yadira Contreras F.
CARGO: GTE DE PROYECTOS.

NOMBRE: Edison Ricardo Duarte
CARGO: Director de interventoría

NOMBRE: Juan Camilo Cristancho
CARGO: Consorcio MIP GP

JUDA FERNANDA PRADOS

NOMBRE: JUDA F. PRADOS
CARGO: APOYO DIETICISTA

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	11/08/23	**Inicio**	8:10	**Fin :**		**Lugar**	IED Restrepo Millan sede
Proyecto						**Asunto**	Comite de seguimiento		
Asistentes	SED, Interventoria, Consorcio MIA GP					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Interventoria					**Próxima Reunión**	

Se reune el contratista Mia GP, Interventona y la SED

— Inicia el comite con Restrepo Millan sede

- Interventoria solicita al contratista se re evalue las actualizaciones del presupuesto conjuntamente para evitar reprocesos
- la SED informa que el piso no se puede instalar en granito pulido y que el nuevo se instalara sobre el existente
- La sed le recuerda al contratista que la entrega de IED liceo femenino es para el 30 de agosto y que es preocupante la ausencia de personal en la sede.
- la secretaria define que el piso del area faltante al intervenir en la sede será en granito pulido o porcelanato
- La secretaria solicita que el area administrativa sea la ultima en intervenir, mientras se termina de definir
- La secretaria solicita reunion en los siguientes frentes a comenzar para el martes y miercoles 15, 16 de agosto

— IED LICEO FEMENINO

- La SED solicita que se entreguen los laboratorios para el 20 de agosto.
- la SED autoriza cambiar el piso del aula de musica en porcelanato o laminado.
- la sed solicita paquete completo con item no previstos para aprovar, para el lunes 14 de agosto
- la SED solicita presencia de 100% de residente e Inspectores de interventoria y contratista.
- la sed solicita instalar el cerramiento de la cancha hoy 11 de agosto.

— IED Diana Turbay sede B

- La secretaria autoriza la instalacion de puntos de voz y datos en la institucion
- la secretaria autoriza instalar un piso laminado en el area de sistemas, donde la dilatacion/deflexion es de 10 cm
- la secretaria solicita la propuesta de la pasarela al contratista.
- Se convoca reunion en la institución para la siguiente semana, en compañia del estructural y Red P
- la secretaria solicita al contratista la actualizacion del cronograma de obra contemplando condiciones iniciales de los alcances y tiempos, ajustando los rubros reales a invertir en cada frente.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	11/08/23	**Inicio**	8:10	**Fin :**		**Lugar**	IED Restrepo Millan sede
Proyecto						**Asunto**	Comité de seguimiento		
Asistentes	SED, Interventoría, Sensorial MIA SP					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Interventoría					**Próxima Reunión**	

- Secretaría solicita al contratista que se haga un plan de choque para los frentes que están con atrasos
- Reino de Holanda
  - Se autoriza solo el cambio de luminarias y tapas de toma corriente e interruptores para los salones del primer y segundo nivel.
- Jose Martí
  - se autorica el cambio del piso del comedor ~~por~~ gresanito o porcelanato.
- La secretaría autoriza la pintura de los pasillos de en la institución Marruecos y Molinos.
- La Secretaría autoriza instalar el cerramiento (tipo seg) igual al que maneja actualmente la institución en el colegio Gustavo Restrepo sede A y se ejecute de manera inmediata.

- Liceo Femenino
  Respecto a la atención de emergencia de la cubierta, que implica su reemplazo, la SED manifiesta que en caso de presentarse daño sobre el cielo falso en PVC existente, durante el desarrollo de la actividad, se reconocerá al contratista las actividades necesarias para la reposición del cielo falso afectado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin :		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por					Próxima Reunión		

No.	Frente de ejecución	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1	Restrepo Millan Sede B	Revaluación de estructura Metalica	Consorcio MIA GP	14/08/2023
2	Liceo Femenino	Entrega de laboratorios y Cubierta	Consorcio MIA GP	30/08/2023
3				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**		**Inicio**		**Fin :**		**Lugar**
Proyecto						**Asunto**		
Asistentes						Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**					**Próxima Reunión**	

NOMBRE:
CARGO: Ay Cont Sed

NOMBRE: HUGO TILLQUIZA
CARGO: SED DOBLE APOYO SUPERVISOR

NOMBRE:
CARGO: JUAN CAMILO AUSTENCHO

NOMBRE: Sebastián Rivera L
CARGO:

NOMBRE: Sandra Pinzón
CARGO: Directora de obras

NOMBRE: Ricardo Duarte
CARGO: Director de interventoría

NOMBRE: Yesenia Arenas Arias
CARGO: Consorcio MAGE.

NOMBRE: Juan Diego Duarte
CARGO: 1022380000

NOMBRE:
CARGO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	14/08/23	Inicio	11 50 a.m.	Fin :	Lugar IED El Libertador
Proyecto						Asunto	Desmonte cubierta acceso
Asistentes	Interventoria, Consorcio MINEP, Rector de la institución					Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración		Elaborado por	Interventoria				Próxima Reunión

Se reune el contratista, Interventoria y el rector de la institución educativa donde se acuerda que;

Teniendo encuenta las condiciones plasmadas en el acta de vecindad, el contratista consorcio MINEP manifiesta que necesita el desmonte de la cubierta de la entrada a la institución, con la finalidad de garantizar la circulación de las volquetas que retiraran el material sobrante de las obras que se estan ejecutando en la zona de las canchas, Por lo tanto el contratista se compromete a realizar el desmonte y la reinstalación de la cubierta, garantizando su funcionamiento y que quede como aparece en el registro de la respectiva acta de vecindad

Silvestre Pinzón
Consorcio MINEP

Interventoria

SIG-IF-005
V 1

	ACTA DE VISITA - VECINDAD	CODIGO	FC-DIS-02
		VERSION No	01
		FECHA	14/08/2023

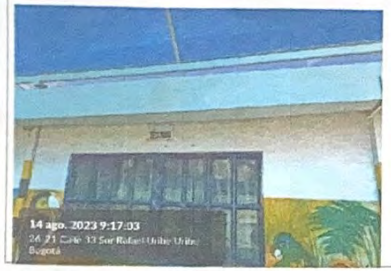
BARRIO Murillo Toro PREDIO IED EL LIBERTADOR SEDE B

REGISTRO No. 1 FECHA 14/08/2023 ELABORÓ Sandra Pinzón REVISÓ Jhon Rocha

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO









2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION / RICHARD MALDONADO/RECTOR

Dirección CRA 31 NO 32 79

Teléfono No. de pisos 1

Long. Del frente (mtrs) Estrato 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

TIPO DEL PREDIO:

1. Monumento Nacional ☐
2. Valor Constructivo ☐
3. Valor Intermedio ☐
4. Sin edificar ☐
5. Reedificable ☐

USO ACTUAL

1. Vivienda ☐
2. Comercial ☐
3. Oficinas ☐
4. Institucional ☐
5. Parqueadero ☐
6. Recreacional ☐
7. Baldío ☐
8. Inst. educativa sup. ☐

3. ESTADO DEL PREDIO

ESTRUCTURA: Se observan muros dilatados sobre los dinteles en ventaneria fachada lateral izquierda (costado acceso vehicular)

MUROS: En mamposterira, se observan muros dilatados sobre los dinteles en ventaneria fachada lateral izquierda (costado acceso vehicular)

CUBIERTA: Cubierta en estructura metalica, con canales en lamina galvanizada y policarbonato en buen estado.

PISO: piso en acceso a canchas en concreto con fisuras ; piso en aula en porcelana en buen estado

GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia agrietamiento es placa de concreto acceso a canchas existente, se evidencian muros de aula fisurados en area de dintees, fisuras se evidencian en la parte exterior y en la parte interior de la edificacion.

HUMEDADES: No se evidencian filtraciones o humedades en la cubierta del acceso existente. No se evidencia humedades en la cubierta del salon existente.

VO BO

Sandra Pinzon
CONSORCIO MIAGT

Richard Maldonado
Rector

Jhon Rocha
Interventoria

1 4

1/3

	ACTA DE VISITA - VECINDAD	CODIGO	FC-DIS-02
		VERSION No	01
		FECHA	14/08/2023

4. OBSERVACIONES:

Se requiere el desmonte de la estructura metalica, canales galvanizadas y cubierta en policarbonato para habilitar area de ingreso de volquetas que se encargaran del retiro de material demolido en canchas.

Salon:

Se evidencia en sala contigua construccion en mamposteria, no se evidencia estructura de confinamiento del salon (columnas -vigas), cubierta en estructura de madera y teja en aspesto, que evidencian dilataciones en muros (area de ventanas), pisos en porcelanato en buen estado.







Sandra Pinzón
CONSORCIO TI AGP

Richard Maldonado
Rector

Jhon R
Jhon Rocha
Interventoria

23

	ACTA DE VISITA - VECINDAD	CODIGO	FC-DIS-02
		VERSION No	01
		FECHA	14/08/2023

CUBIERTA:

La cubierta que se desmontará consta de estructua metalica, calanes galvanizadas y cubierta en policarbonato azul. Se encuentran en buen estado.



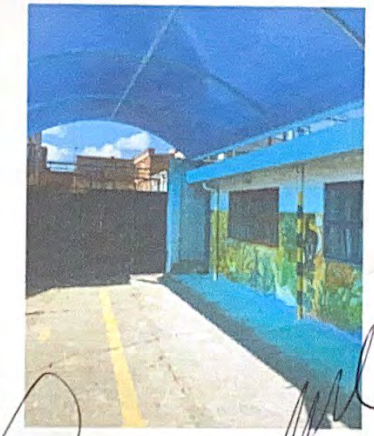




PLACA DE CONCRETO ACCESO:

Se evidencia una placa de concreto en acceso vehicular en concreto con fisuras.







VO BO

Sandra Pinzon
Consorcio 711 XGT

Interventoria

3/3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	08-14-2023	Inicio		Fin :		Lugar	IED Enrique Olaya
Proyecto						Asunto	Acuerdo para la habilitación de Espacios		
Asistentes	Interventoria, SED, Rector					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	08-14-2023	Elaborado por	Interventoria					Próxima Reunión	

Se realiza una Reunión de manera Presencial en la IED Enrique Olaya Herrera, donde la interventoria Presenta la problematica de la habilitación de espacios para la intervención de la Cubierta, Donde el rector espone que por actividades escolares no ha podido habilitar el las espacios. El contatista solicita ha que le habititen dos salones diarios para el cambio de Cubierta. donde el rector solicita el numero de los salones Para gestionar que los desocupen, El señor rector Tambien Solicita si pueden intervenir salones de frente no hoy problema para la intervencion. La idea es realizar el Plan de Trabajo para afirmarle a rector los espacios que se van a intervenir con Fechas El acuerdo es que los Salones esten totalmente desocupados, Para evitar riesgo de daño del mobiliario. El plan de Trabajo debe tener en cuenta los alrededores para evitar riesgo con los estudiantes.

El contratista remitira el Plan de trabajo el dia de hoy.

Ricardo Duarte

Rector (E)

Miguel Turmequé B.
Gestor · RUU - SED.

Sebastian Rivera
Ksi TIC

SIG-IF-005
V.1

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	15-08-2023	Inicio		Fin :		Lugar	IED Republica Estados Unidos
Proyecto	Mejoramiento 2023					Asunto	Emergencia Sanitaria		
Asistentes	Interventoria, SED, Rectora					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	15-08-2023	Elaborado por	Interventoria					Próxima Reunión	

Se realiza una reunión de manera Presencial en la IED Republica de Estados Unidos donde la SED da las indicaciones de romper el piso y hacer una araña y una caja de Inp. ~~Para~~ El especialista hidrosanitario solicita romper y revisar las distribuciones de la red para evaluar e ~~inspe~~ inspeccionar Para dar una solución.

- La SED solicita no tocar muros ni divisiones de la baterias sanitarria, se Puede Afectar el piso y la media caña.

El contratista se compromete que el 17/08/2023 se comienza la intervención

Observación: El colegio sigue en Emergencia

IDG. HIDROSANITARIO
SED - DACEE.

Ana F Díaz.
Rectora.

Consorcio MA GP.

Ricardo Ducke

Observación: El contratista manifiesta que el dia 16/08/2023 se va realizar un sondeo con geofonono para diagnosticar la red existente, el resultado del ~~dan~~sondeo se lo tiene que enviar al hidrosanitarro de la SED para ~~que~~ definir el Paso a seguir

Arq. Hugo Tibaquira
SED-DACEE

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	15/09/2023	Inicio	11:00 Am	Fin :		Lugar	
Proyecto	Colegio Diana Turbay Sede B					Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

En colegio Diana Turbay nos reunimos: SED, obra e interventoría para definir conceptos de diseño en fachada en bloque #3 y piso en área administrativa lo cual el Arq. Hugo Tibaquira manifiesta que se instale piso ~~laminado~~ Vinilo, PVC en color blanco en área de baticias de barros, y pergola en policarbonato blanco que cubra la zona de circulación en pasarela, y en bloque #1 - Aula 5 demoler mocheta y generar Ventanal en forma de L a las 12:00 pm llega al colegio Diana Turbay Sede B, la rectora para definir el traslado de espacio en cuanto al área administrativa para posiblemente sea en área multiple para niños de 2 y 3 primaria - edad entre 7 y 9 años Por Medio de la SED se solicita que se evalue el cronograma de actividades frente a la entrega del mes de septiembre del año en curso, teniendo como ultima fecha de entrega el 15 de OCTubre de 2023.

Rectora Diana Turbay.

Coordinadora Diana Turbay

Arq. Hugo Tibaquira SED - Sede B

Arq. Alejandra Bogotá Interventoría

Ricardo Duarte
Director de Interventoría

Juan Camilo C.
Consorcio Milgo

SIG-IF-005
V.1

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	15-08-2023	Inicio	02:00pm	Fin :		Lugar	IED Reino de Holanda, sede A
Proyecto	Mejoramiento SED - Grupo 8					Asunto	Definición de fechas de entrega		
Asistentes	SED, Rectora, Interventoría y Contratista de obra					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		15-08-2023	Elaborado por		Consorcio T16 - Interventoría			Próxima Reunión	

Se realiza reunión con la rectora en la IED, donde presenta una serie de requerimientos hacia el contratista de obra y hacia la interventoría. Solicita fechas específicas de entrega de las baterías que estaban previstas para el 20 de julio de 2023. Informa que ~~tan~~ ya se le venció el plazo para contar con las baterías sanitarias terminadas y en funcionamiento y se corre el riesgo que salga una sanción hacia la secretaría de Educación Distrital.

Se acuerda lo siguiente:

1. El jueves 17 de agosto de 2023 se entregará por parte del contratista de obra las baterías del primer nivel operando.
2. El viernes 18 de agosto de 2023 después de las 2:30pm entrará a realizar las correcciones en las baterías del tercer nivel y se les recibirá el 22 de agosto de 2023 al colegio a las 09:00am.

La rectora exige que se verifique el anclaje de las láminas de policarbonato, ya que una de ellas se desprendió. Así mismo de la estructura metálica, la cual se nota débil.

Rectora

Milena Cargas
Auxiliar Administrativa

Jun Camilo L
Consorcio M16 GP

Arq Pablo Tibaquirá
SED DOCENTE

Ricardo Duarte
Director de interventoría

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	16/08/2023	Inicio	11:00 Am	Fin :	12:04pm	Lugar	Luis Lopez de Mesa
Proyecto	Colegio José Martí					Asunto	Seguimiento de Actividades		
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	16/08/23	Elaborado por						Próxima Reunión	18/08/23.

Siendo las 11:30 a.m. se reunen en Colegio Jose Martí sede A, Contratista e interventoría con el objetivo de realizar recorrido en el frente de obra para revisión de las actividades ejecutadas.

① SERIGRAFIA: En serigrafia se evidencia cubierta en teja standing seam, estructura metálica existente con pintura y anticorrosivo; Suministro e instalación de estructura metálica soporte de cubierta, suministro e instalación de redes electricas a nivel de cubierta (luminarias, salidas para tomacorrientes) y demás redes eléctricas con luminarias, interruptores, ..., cajas de paso, tomacorrientes y salidas para luminarias en todo el bloque serigrafia. Instalación de ventanas en aluminio con vidrio laminado 3+3 6mm y persianas. Divisiones de talleres en superboard muro doble cara con pintura. mantenimiento de puertas existentes. Suministro e instalación de puerta en madera Entamborada con marco.
Interventoría solicita a puertas de madera instaladas en talleres de serigrafía se les aplique Barniz, así mismo solicita instalar película de seguridad en ventana de baño en serigrafia.

Sobre las actividades exteriores Consorcio MA GP expone que la malla antibandalica se instalará acorde a la aprobación del No previsto por supervisión. Y solicita tanto a interventora como a la I.E. programar habilitar el area de Auditorio para intervención contemplada en el alcance contractual y se solicita la reubicación del mobiliario allí ubicado para el dia 22/08/23.

Así mismo al dia de hoy se evidencia el correcto funcionamiento de las ventanas instaladas en serigrafia y subsanadas las observaciones emitidas por interventoria el pasado Martes.

Finalmente interventoria, I.E. y Contratista concluyen programando reunión el dia viernes 18/08/23 a las 10:00 a.m para entrega del bloque de serigrafia a la I.E y a interventoria.

Consorcio MA GP.

A.G. Alejandra Angarita
R. Interventoría CTIG

William Piamonte
Interv. Cons. TIG

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	17/08/23	Inicio	8:30 am	Fin :		Lugar	IED Reino de Holanda
Proyecto						Asunto			
Asistentes	SED, Interventoría, consorcio MIA GP, Rectora, Constructores					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración			Elaborado por	Interventoría				Próxima Reunión	

Se reune la sed, Interventoría, la rectora de la institución y el contratista de obra donde se acuerda;

1 - Entrega de baterías sanitarias completamente funcionales del tercer y primer nivel, para el día martes 22 de agosto
2 - Entrega de cronograma de ejecución a la institución
3 - Entrega de salones 201, 202, 203 y 204 para el jueves 31 de agosto.
4 - Se solicita al contratista aumentar el personal operativo y que se trabaje durante el fin de semana
5 - Se aprueba el cambio de red electrica en los salones con tuberia EMT
6 - Se acuerda implementar en los diseños de los baños del segundo nivel pocetas
7 - Se aprueba instalación de 4 tomacorrientes por salones.
8 - Evaluar y toma de niveles para intervención en la cancha

Miguel Tormaso
Gestor SED

Luis Pinzón

SED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	17/08/2023	Inicio		Fin		Lugar	I.E.D. Liceo Femenino
Proyecto						Asunto	Cerramiento		
Asistentes	Interventoría, Rector					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	17/08/2023	Elaborado por	Interventoría					Próxima Reunión	

Se realiza una reunión de manera Presencial en la I.E.D. Liceo Femenino manifestando que el sector de la cancha de voleibol se realizó el cerramiento perimetral en lona. del area a intervenir.

Observación: de la I.E.D. el señor rector manifiesta que en el sector de la zona verde no se ha ejecutado ya que no hay un aval al respecto, zona verde que corresponde al area al costado derecho de la cancha de voleibol.

Inp Interventoría

Ovany.
Arquitecto Interventoria.

SIG-IF-005
V.1

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	18/08/23	Inicio	10:53	Fin : 1	11:30	Lugar	Colegio José Martí
Proyecto	Colegio José Martí					Asunto	Entrega serigrafía		
Asistentes	Contratista, Interventoría, Institución educativa.					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	18/08/23	Elaborado por						Próxima Reunión	24/08/23.

Siendo las 10:53am se reunen en José Martí sede A, Contratista, interventoría y institución educativa (Rector y Almacenista) con el objetivo de hacer entrega a la institución del bloque de serigrafía en donde se ejecutaron las siguientes actividades Culminadas 100% y entregadas a satisfacción tanto a Interventoría y a I.E:

* Puertas en madera entamboradas con marco en tablero serigrafía.
* Cambio de cubierta en asbesto cemento onduladá por teja standing seam.
* Mantenimiento de estructura metálica soporte de cubierta
* Suministro e instalación de estructura metálica soporte de cubierta
* Suministro e instalación de luminarias 120x30 led (7); luminarias herméticas (4)
* Red eléctrica en tubería EMT
* Suministro e instalación de interruptores (6)+(1)
* Suministro e instalación de tomacorrientes (22)
* Salida para luminarias y tomacorrientes en cable encacchetado.
* Instalación de extractores.
* Mantenimiento de puertas metálicas existentes
* Pintura de Muros internos
* Muros en superboard para divisiones de tablero internas
* Suministro e instalación de ventanas en aluminio y película de seguridad en baños, Con vidrio laminado 3+3 6mm.

Se hace entrega a satisfacción de la institución y de interventoría, aclarando que la intervención en la parte exterior del bloque (reja antivandalica, canales y bajantes) se realizará en la etapa final del proyecto acorde a la aprobación del Item de Rejas.

SIG-IF-005 V.1

A partir del momento la I.E. puede habilitar el espacio serigrafía y se programa entrega a contratista de Comedor el día 24/08/23.

Powered by CamScanner

ALC ALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	18/08/23	Inicio	10:53	Fin :	11:30	Lugar	Serigrafía
Proyecto	Colegio José Martí Mantenimiento					Asunto	entrega serigrafía.		
Asistentes	Contratista, Interventoría, Institución Educativa					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	18/08/23	Elaborado por						Próxima Reunión	24/08/23

NOMBRE: Fabian Rodriguez Cuma
CARGO: Rector (e)

NOMBRE: Yesenia Arenas Arias
CARGO: Consorcio MIA 6 P.

NOMBRE: ~~Maria A. Angarita~~
CARGO: P. Interventoría

NOMBRE: Arturo Medina
CARGO: Almacenista

NOMBRE:
CARGO: Contratista obra

NOMBRE: William Yovany Piamonte P.
CARGO: Insp. Interventoría.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

Powered by CamScanner

Anexo 1.1.4. Control de personal de interventoría

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO	C01.PCCNTR.2749287
OBJETO	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08)."
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL	**7**	**Periodo**	20/07/2023	**al**	19/08/2023

FECHA: 19 | 8 | 2023

DÍA DOMINGOS Y FESTIVOS	
PERSONAL QUE ASISTE	**X**
PERSONAL QUE NO ASISTE	**N**
PERSONAL RETIRADO	**R**
PERSONAL INGRESADO	**IN**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESDE		**20-jun-23**									**HASTA**											**19-jul-23**										
DIA		**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**28**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
PERFIL		**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**
Director de interventoría	**1**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Residente de interventoría	**4**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Asesor Estructural	**1**		**X**			**X**																									
Asesor Ambiental	**1**		**X**			**X**		**X**		**X**			**X**		**X**		**X**			**X**		**X**		**X**			**X**		**X**		**X**	
Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo	**3**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Asesor en Redes Eléctricas	**1**																															
Asesor Hidrosanitario	**1**		**X**			**X**				**X**			**X**				**X**			**X**				**X**			**X**				**X**	
Profesional de costos	**1**		**X**				**X**	**X**					**X**			**X**	**X**						**X**	**X**			**X**			**X**		
Inspector de interventoría	**4**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Maestro de obra	**2**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	
Asesor Jurídico	**1**																**X**							**X**								

FIRMA: _____

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DÍAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo 1.1.5. Informes semanales

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	24/07/2023	**PERIODO No.**	**27**	DEL	**17/07/2023**	AL	**23/07/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
PRÓRROGA :	N/A	PRORROGA 1:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	364	PLAZO ACTUALIZADO:	333
PLAZO TRANSCURRIDO:	201 EQUIVALE AL 55%	PLAZO TRANSCURRIDO:	184 EQUIVALE AL 55%
VALOR INICIAL :	$ 878.587.938,00	VALOR INICIAL :	$ 11.941.262.150,00
VALOR ADICION(ES):	$ 371.557.789,00	VALOR ADICION(ES):	$ 5.050.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.250.145.727,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 16.991.262.150,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.250.145.727,00	VALOR POR PAGAR:	$ 16.991.262.150,00
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ	INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	29/07/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	29/07/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	29/07/2023		No iniciado
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	29/07/2023		No iniciado
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS**	29/07/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023		No iniciado
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**184**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 354.706.368,00	$ 127.121.051,00	35,84%	4/07/2023	EN EJECUCIÓN
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 298.698.658,00	$ 187.294.411,36	62,70%	30/06/2023	EN EJECUCIÓN
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO

FECHA	24/07/2023	**PERIODO No.**	**27**	DEL	**17/07/2023**	AL	**23/07/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	$ 825.556.509,00	$ 243.936.528,84	29,55%	18/09/2023	EN EJECUCIÓN
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	$ 516.187.772,00	$ 141.096.807,00	27,33%		EN EJECUCIÓN
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	$ 924.714.131,00	$ 365.744.173,89	39,55%	29/07/2023	EN EJECUCIÓN
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	$ 1.438.352.552,00	$ 829.874.134,23	57,70%	18/08/2023	EN EJECUCIÓN
8	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	$ 408.412.332,00	$ 212.816.898,48	52,11%	31/07/2023	EN EJECUCIÓN
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	$ 852.757.422,00	$ 227.838.069,00	26,72%		EN EJECUCIÓN
11	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL**	$ 227.195.808,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	$ 671.327.930,00	$ 249.842.220,00	37,22%		EN EJECUCIÓN
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	$ 1.069.620.410,00	$ 628.339.025,69	58,74%	16/09/2023	EN EJECUCIÓN
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	$ 688.067.369,00	$ 578.862.449,70	84,13%	12/07/2023	EN EJECUCIÓN
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	$ 498.001.754,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	$ 1.381.489.250,00	$ 997.158.681,25	72,18%	26/08/2023	EN EJECUCIÓN
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
18	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	$ 304.703.052,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
19	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	$ 656.544.890,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
20	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	$ 339.352.709,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	$ 2.027.739.816,00	$ 603.022.889,75	29,74%	28/11/2023	EN EJECUCIÓN
22	**COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS**	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
23	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	$ 335.852.053,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	$ 502.836.423,00	$ 258.510.435,00	51,41%		EN EJECUCIÓN
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	$ 427.077.647,00	$ 230.944.024,79	54,08%	16/06/2023	EN EJECUCIÓN
26	**EMERGENCIAS**	$ 862.485.928,00	$ 143.635.741,07	16,65%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	Se realiza la actividad de media caña en el perimetro de la cancha y en el carcamo,	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: dos (2) personas Equipo: herramienta menor
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	No se realizan actividades durante la semana, Se atienden observaciones referente a actividades de cambio de push, pintura y reposición de aparatos afectados durante la intervención.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) persona Equipo: Herramienta menor

FECHA	24/07/2023	**PERIODO No.**	**27**	DEL	**17/07/2023**	AL	**23/07/2023**

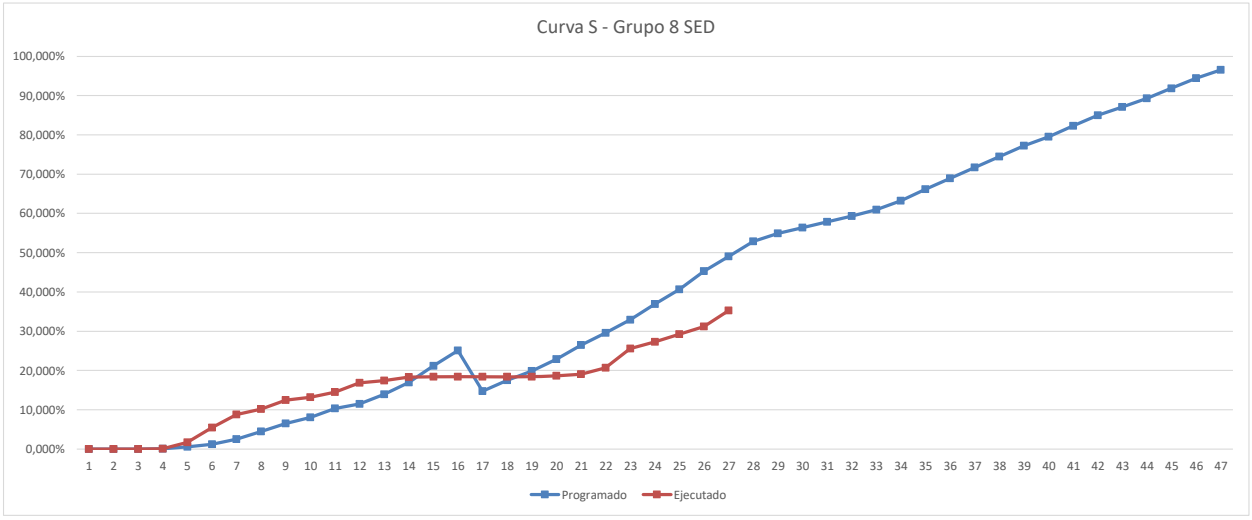
No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Se continua actividad de mamposteria de bloque #2 -bateria de baños, el dia 14 de julio 2023 se inicio actividad de instalacion de redes sanitarias en bloque #2, se encuentra a un 80% la instalación de cubierta en bloque #3, se continua con aplicación de estuco en muros internos en bloque #3Finalmente se recomienda como minimo 3 tomas de concreto, y rendimiento en obra.	PERSONAL Maestro de Obra (1) personas - Rotativo Operativo: Siete (7) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	No se realizan actividades durante la semana, Se trabajo un solo día atendió observaciones referente a actividades de red eléctrica, luminarias y pintura sobre cerchas.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) persona Equipo: Andamios y herramienta menor
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	Se instala la cubierta en el primer tramo, se remboquilla y se cambia las piesas de enchape en el baño de niñas primer piso, en el baño de niños segundo piso se instala las puertas en acero inoxidable y las divisones de los orinales.	PERSONAL Profesional y técnico: Tres (3) personas - Rotativos Operativo: Siete (5) personas Equipo: volqueta y Herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	Se finaliza el dia 22 de julio 2023, la actividad referente a la instalación de cubierta en el comedor, se requiere terminar las actividades referente a ventananeria, puertas en zona de Serigrafia y mejorar acabados en muros superboard del mismo.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Sies (6) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	Se comienza la actividad de instalación del granito en los mesones, se continua con los acabados en los laboratorios, se continua con el enchape de los muros.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Seis (6) personas Equipo: Herramienta menor
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se continua con la instalacion de la malla electrosoldada y la fundida de los paños en concreto, se realiza la excavacion del carcamo perimetral y se continua con el relleno.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Seis (6) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	Continua actividad de instalación de refuerzo sobre muro fisurado. Continua actividad de demolición de enchape, continua actividad de pañete con mortero impermeabilizado.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	Continua actividad de instalación de sanitarios, Continua actividad de instalación de mesones y lavamanos, Continua actividad de retiro de manto asfaltico.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor, y equipos de soldadura
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Se realiza la isntalacion de 2 puntos de toma corriente en el piso 2 del bloque 2, se entrega el bloque numero 2 a la institucion, lo cual se esta esperando que desocupen el bloque 1 para comenzar la intervecnion.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: dos (2) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	Continua con observaciones de acabados en aulas 301-305 referente a encorozado,finalizaron las actividades de acabados en baños del tercer piso, continuan enchapando en baños del segundo piso, se instalo cubierta en biblioteca, pendiente instalar teja traslúcida, se requiere aumentar el personal operativo para mejor rendimiento en obra.	PERSONAL Profesional y técnico:Uno (1) personas - Rotativos Operativo: Tres(03) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Se finalizo el dia 22 de julio la instalación de cubierta en bloque #11, pendiente emboquiilar piso en granito en el mismo bloque, se requiere recebo e instalar flanche, continuan con instalación de platina en bloque 12, el cual presento fiuras en muros, el contratsita manifesto que realizara dicha corrección, a causa de frecuentes lluvias no se ha avanzado lo suficiente.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Seis (6) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	Continua el suministro de mortero impermeabilizado y endurecido con refuerzo de microfibra para la terraza. Continua actividad de instalación de manto asfáltico. Continua actividad de construcción de mediacaña en mortero, Continua actividad de emulsión asfáltica.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Seis (6) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	Se termina las actividades de pintura y se espera por parte del contratista enviar la propuestas de la puerta antipanico.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativas Operativo: Tres (1) personas- Rotativo Equipo: Herramienta menor
26	**EMERGENCIAS**	Se está a la espera del envío de la propuesta para la separación de los sistemas de aguas residuales de las aguas industriales en la IED Gustavo Restrepo sede A. Se atendió provisionalmente la emergencia en la IED Restrepo Millán sede D.	

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 8.336.139.049,51	49,06%	-13,77%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 5.996.037.540,70	35,29%	

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	24/07/2023	**PERIODO No.**	**27**	DEL	**17/07/2023**	AL	**23/07/2023**



6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Para el presente periodo, el atraso asciende al 13,77%, a causa del ritmo bajo de ejecución en varios frentes de obra y a la no alineación con la inversión prevista de recursos. Así mismo, esto es causal de la gestión no efectiva que está llevando a cabo el contratista de obra, donde no avanza en los frentes donde cuenta con la total disponibilidad del espacio y esto viene sumando representativamente al atraso causado a hoy.

También es importante tener presente que hay frentes que aparecen con un valor mayor a ejecutar en la programación, lo cual se traduce en que se programa más de lo que se va a ejecutar, causando una carga presupuestal no verás y aumentando el atraso del proyecto. Para evitar este fenómeno, con previo aval de la Entidad, se le ha solicitado al contratista de obra que actualice su programación partiendo de los rubros reales de inversión en cada frente, pero sin modificar las fechas de terminación. Esto sigue sin ser allegado debidamente para nuestra revisión.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
IED Fe y Alegría - Actualizar presupuesto dividido en las 3 zonas requeridas por la SED - Reprogramado	Contratista de obra	19/07/2023 (Cumplido 21/07/2023)
IED Reino de Holanda sede A - Entrega de los ocho (8) salones terminados y con puertas de las cubiertas de los corredores	Contratista de obra	10/07/2023 (Cumplido parcial)
Contrato en general - Exposición del plan de contigencia - Reprogramado	Contratista de obra	11/07/2023 (Incumplido)

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* El martes 11 de julio de 2023, se llevó a cabo reunión presencial en las instalaciones de la SED, con el fin de revisar los APUs no previstos comprendidos desde el NP09 al NP21. La SED informó que requería unos ajustes de forma y de fondo, pero que emitiriá la comunicación definitiva en lo que restaba de la semana y la misma no fue allegada. Siue pendiente por envío de esa comunicación.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:

Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y se está a la espera de la entrega de su concepto técnico. Esto se sigue dilatando en el tiempo.
Colegio Gustavo Restrepo sede A: El contratista realiza el realce de una de las cajas que se destaparon y se funde el piso en concreto.


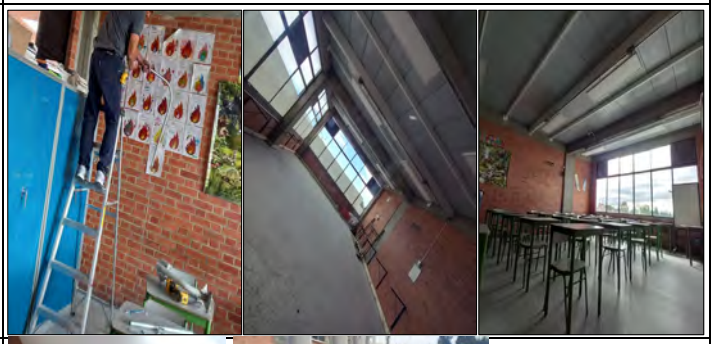
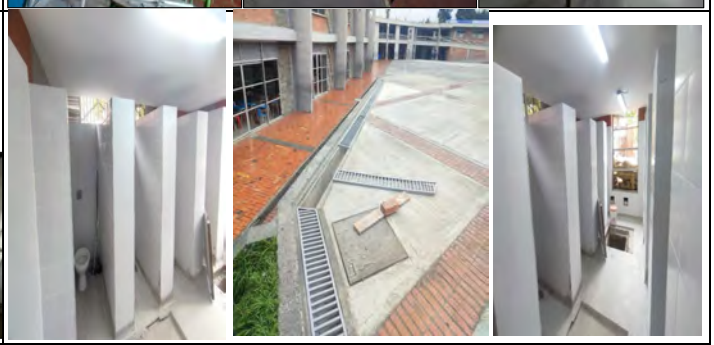
Al contratista de obra se le continúa reconociendo avances teóricos por suministros de materiales en obra, no obstante el avance materializado no es el esperado, ya que se siguen evidenciando atrasos. Esto, a pesar de realizar el análisis sobre la programación actualizada, la cual involucró el 100% de los frentes a ejecutar.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE		

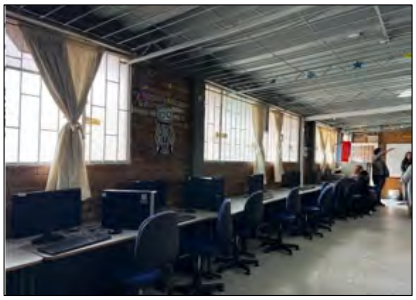








CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	24/07/2023	**PERIODO No.**	**27**	DEL	**17/07/2023**	AL	**23/07/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**		
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**		
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**		
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**		
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		


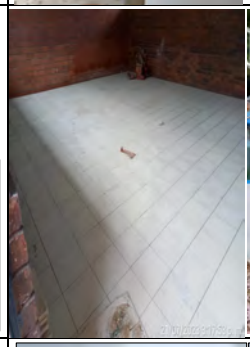


CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	24/07/2023	**PERIODO No.**	**27**	DEL	**17/07/2023**	AL	**23/07/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		  
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	 	  
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	 	  
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		  
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		  

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	24/07/2023	**PERIODO No.**	**27**	DEL	**17/07/2023**	AL	**23/07/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		  
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	 	  
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		  
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		  

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	31/07/2023	**PERIODO No.**	**28**	DEL	**24/07/2023**	AL	**30/07/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
PRÓRROGA :	N/A	PRORROGA 1:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	364	PLAZO ACTUALIZADO:	333
PLAZO TRANSCURRIDO:	208 EQUIVALE AL 57%	PLAZO TRANSCURRIDO:	191 EQUIVALE AL 57%
VALOR INICIAL :	$ 878.587.938,00	VALOR INICIAL :	$ 11.941.262.150,00
VALOR ADICION(ES):	$ 371.557.789,00	VALOR ADICION(ES):	$ 5.050.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.250.145.727,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 16.991.262.150,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.250.145.727,00	VALOR POR PAGAR:	$ 16.991.262.150,00
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ	INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	29/07/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	29/07/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	29/07/2023		No iniciado
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	29/07/2023		No iniciado
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS**	29/07/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023		No iniciado
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**191**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR ESTIMADO A EJECUTAR SEGÚN ACTUALIZACIÓN	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 237.764.000,00	$ 127.445.891,00	53,60%	4/07/2023	EN EJECUCIÓN
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 168.134.916,00	$ 189.296.411,36	112,59%	30/06/2023	EN EJECUCIÓN
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO

FECHA	31/07/2023	**PERIODO No.**	**28**	DEL	**24/07/2023**	AL	**30/07/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	$ 1.000.000.000,00	$ 252.167.680,84	25,22%	18/09/2023	EN EJECUCIÓN
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO	$ 516.187.772,00	$ 142.074.125,00	27,52%		EN EJECUCIÓN
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	$ 1.202.848.443,00	$ 367.656.008,89	30,57%	29/07/2023	EN EJECUCIÓN
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	$ 1.118.044.915,00	$ 832.482.091,23	74,46%	18/08/2023	EN EJECUCIÓN
8	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	$ 287.232.101,00	$ 213.473.404,48	74,32%	31/07/2023	EN EJECUCIÓN
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	$ 847.369.811,00	$ 243.153.226,00	28,70%		EN EJECUCIÓN
11	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL	$ 81.857.887,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	$ 706.568.305,00	$ 250.274.491,00	35,42%		EN EJECUCIÓN
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	$ 1.268.959.191,00	$ 641.275.976,69	50,54%	16/09/2023	EN EJECUCIÓN
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	$ 1.102.690.208,00	$ 583.019.585,70	52,87%	12/07/2023	EN EJECUCIÓN
15	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL	$ 498.001.754,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	$ 1.260.609.199,00	$ 997.161.234,25	79,10%	26/08/2023	EN EJECUCIÓN
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	$ 304.703.052,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
19	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	$ 656.544.890,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
20	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	$ 339.352.709,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR	$ 2.428.418.527,00	$ 603.022.889,75	24,83%	28/11/2023	EN EJECUCIÓN
22	COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
23	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	$ 335.852.053,00	$ -	0,00%		NO HA INICIADO
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A	$ 506.413.760,00	$ 260.387.180,00	51,42%		EN EJECUCIÓN
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	$ 260.944.024,79	$ 230.944.024,79	88,50%	16/06/2023	EN EJECUCIÓN
26	EMERGENCIAS	$ 862.485.928,00	$ 143.635.741,07	16,65%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	Se inicia la actividad de resane de muro en la parte frontal de la cancha, y se comienza la actividad de pintura de la cancha con lavado en acido nitrico y sellamiento de juntas.	PERSONAL Profesional y técnico: cinco (5) personas - Rotativos Operativo: dos (2) personas Equipo: herramienta menor
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	Inicia actividad de cambio de grifería superior para sanitarios, se atienden observaciones referente a actividades de cambio de push, pintura y reposición de aparatos afectados durante la intervención.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Herramienta menor

FECHA	31/07/2023	**PERIODO No.**	**28**	DEL	**24/07/2023**	AL	**30/07/2023**

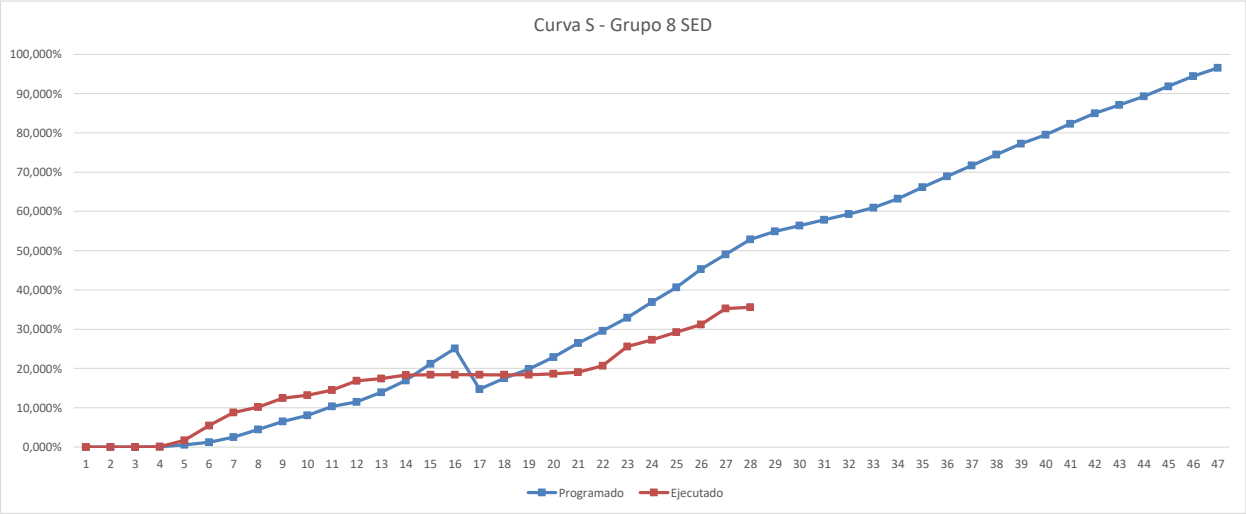
No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Se continua actividad de fundida de columnas a de bloque #2 -bateria de baños, se finalizo actividad de instalación de cubierta en bloque #3 se continua con aplicación de estuco en muros externos en bloque #3,. Finalmente se recomienda como minimo 3 tomas de concreto, rendimiento en obra y cumplimiento de la documentación referente a la seguridad social del pewrosnal operativo.	PERSONAL Maestro de Obra (1) personas - Rotativo Operativo: Seis (6) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	No se realizan actividades durante la semana, a pesar de que falta por instalar el cerramiento de la cubierta de preescolar. La entidad planea cambiar la intervención en la zona de las canchas	PERSONAL Profesional y técnico: Cero (0) persona - Rotativa Operativo: Cero (0) persona Equipo:
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	Se termina la actividad de intalacion de manto asfaltico en las vigas canal, se inicia la actividad de recoger el material y hacer aseo en el area de la cancha.	PERSONAL Profesional y técnico: Tres (3) personas - Rotativos Operativo: tres (3) personas Equipo: volqueta y Herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	Se finaliza el dia 22 de julio 2023, la actividad referente a la instalación de cubierta en el comedor, se requiere terminar las actividades referente a ventananeria, puertas en zona de Serigrafia, para posteriormente iniciar actividad referente a instalación de cubierta en auditorio ala sur.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Sies (6) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	Se continua con la actividad del granito y se comienza a pulir, se inicia la actividad de resane de mamposteria en el area de audiovisuales.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Seis (6) personas Equipo: Herramienta menor
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se continua con la fundida de los paños en concreto, se realiza la excavacion del carcamo perimetral y se continua con el relleno.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Seis (6) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	Continua actividad de instalación de refuerzo sobre muro fisurado, continua actividad de pañete con mortero impermeabilizado. Continua actividad de pintura sobre muro.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	inicia actividad de instalación de marcos y puertas, continua instalación de cubierta en policarbonato, continua actividad de emulsión asfáltica.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor, y equipos de soldadura
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Se realiza la instalación de 2 puntos de toma corriente en el piso 2 del bloque 2, se entrega el bloque numero 2 a la institucion, lo cual se esta esperando que desocupen el bloque 1 para comenzar la intervecnion.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: dos (2) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	Continua con observaciones de acabados en aulas 301-305 referente a encorozado,continuan emboquillado de enchapes en los baños del segundo piso,,el dia sábado 29 de julio de 2023 finalizó la actividad referente a la instalación de cubierta de la biblioteca,se requiere aumentar el personal operativo para mejorar el rendimiento en obra.	PERSONAL Profesional y técnico:Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Dos (02) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Se finalizo el dia 22 de julio la instalación de cubierta en bloque #11, pendiente emboquiilar piso en granito en el mismo bloque, se requiere recebo e instalar flanche, continuan con instalación de cubierta en bloque 12, el cual presento fiuras en muro, el cual en comité el dia 27 de julio 2023 la SED autorizó demoler dicho muro,se requiere mejorar rendimiento en obra.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	Continua actividad de instalación de manto asfáltico, Continua actividad de emulsión asfáltica.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Siete (7) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	Se termina las actividades de pintura y se espera por parte de la S.E.D la respuesta de la puerta antipanico si se va a realizar dicha actividad.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativas Operativo: Tres (1) personas- Rotativo Equipo: Herramienta menor
26	**EMERGENCIAS**	Se está a la espera del envío de la propuesta para la separación de los sistemas de aguas residuales de las aguas industriales en la IED Gustavo Restrepo sede A. Se atendió provisionalmente la emergencia en la IED Restrepo Millán sede D.	

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 8.983.452.059,47	52,87%	-17,28%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 6.047.469.961,69	35,59%	

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	31/07/2023	**PERIODO No.**	**28**	DEL	**24/07/2023**	AL	**30/07/2023**



6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Para el presente periodo, el atraso asciende al 17,28%, a causa del ritmo bajo de ejecución en varios frentes de obra y a la no alineación con la inversión prevista de recursos. Así mismo, esto es causal de la gestión no efectiva que está llevando a cabo el contratista de obra, donde no avanza en los frentes donde cuenta con la total disponibilidad del espacio y esto viene sumando representativamente al atraso causado a hoy.

También es importante tener presente que hay frentes que aparecen con un valor mayor a ejecutar en la programación, lo cual se traduce en que se programa más de lo que se va a ejecutar, causando una carga presupuestal no verás y aumentando el atraso del proyecto. Para evitar este fenómeno, con previo aval de la Entidad, se le ha solicitado al contratista de obra que actualice su programación partiendo de los rubros reales de inversión en cada frente, pero sin modificar las fechas de terminación. Esto sigue sin ser allegado debidamente para nuestra revisión.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
IED Diana Turbay sede B - Limpieza de la unidad sanitaria que está en obra	Contratista de obra	28/07/2023 (Incumplido)
IED Restrepo Millán sede B - Entrega del concepto del bloque No.1 sobre la optimización de la estructura	Contratista de obra	28/07/2023 (Incumplido)
Contrato en general - Exposición del plan de contigencia - Reprogramado	Contratista de obra	11/07/2023 (Incumplido)

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* El martes 11 de julio de 2023, se llevó a cabo reunión presencial en las instalaciones de la SED, con el fin de revisar los APUs no previstos comprendidos desde el NP09 al NP21. La SED informó que requería unos ajustes de forma y de fondo, pero que emitiriá la comunicación definitiva en lo que restaba de la semana y la misma no fue allegada. Sigue pendiente por envío de esa comunicación.
* El 19 de julio de 2023, se le remitió a la Entidad los APU's no previstos que cubren la intervención de la emergencia surgida en el Liceo Femenino y las puertas restantes de la IED Santa Lucía.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:

Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y se está a la espera de la entrega de su concepto técnico. Esto se sigue dilatando en el tiempo.
Colegio Gustavo Restrepo sede A: El contratista realiza el realce de una de las cajas que se destaparon y se funde el piso en concreto.


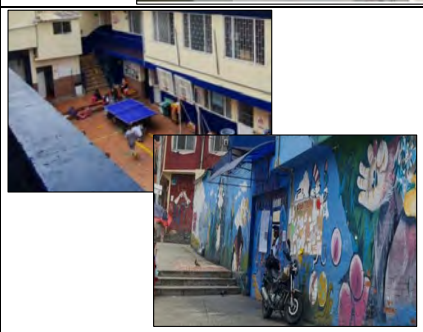


Al contratista de obra se le continúa reconociendo avances teóricos por suministros de materiales en obra, no obstante el avance materializado no es el esperado, ya que se siguen evidenciando atrasos. Esto, a pesar de realizar el análisis sobre la programación actualizada, la cual involucró el 100% de los frentes a ejecutar.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE		

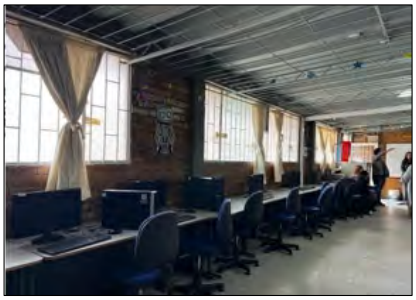
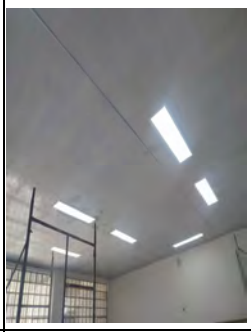


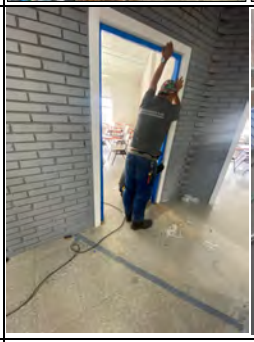




CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	31/07/2023	**PERIODO No.**	**28**	DEL	**24/07/2023**	AL	**30/07/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**		  
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**		  
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**		
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**		  
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		  



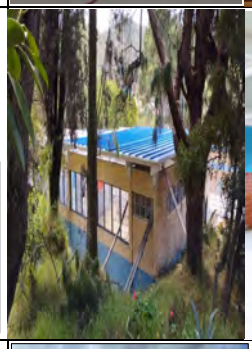
CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	31/07/2023	**PERIODO No.**	**28**	DEL	**24/07/2023**	AL	**30/07/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		  
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	 	  
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	 	  
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		  
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		  

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	31/07/2023	**PERIODO No.**	**28**	DEL	**24/07/2023**	AL	**30/07/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		  
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	 	  
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		  
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		  

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN
