CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.8

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. CO1.PCCNTR.4155718

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08).

PERIODO: DEL 20 DE AGOSTO DE 2023 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.8

PERIODO: DEL 20 DE AGOSTO DE 2023 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATANTE:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ D.C

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4155718
CONSORCIO TIG

“INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08).”

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645

CONSORCIO MIA GP

“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

VERSIÓN	CONTROL DE CAMBIOS
1	Documento Inicial

PRESENTÓ	APROBÓ
	
ING. JOHN ROCHA RESIDENTE DE OBRA	ING. EDISON RICARDO DUARTE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CODIGO	FECHA
TIG-FO-001	19-09-2023

1. Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 6
1.1.1. Localización y ubicación de territorios 6
1.1.2. Asignación de sedes 7
2. DESCRIPCION PRIMERA ETAPA, VISITA DIAGNÓSTICO 8
2.1. Información sedes primera etapa 8
3. INFORMACION ADMINISTRATIVA LEGAL 10
3.1. Información del contrato de interventoría 11
3.2. Información del contrato de obra 11
3.3 Relación de Correspondencia 12
3.4 Actividades de reunión 12
3.5 Informes Semanales 13
4. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO 14
4.1 Avance físico 14
4.2 Estado de ejecución de los frentes 14
4.3 Control de hitos 16
4.4 Avance financiero 17
5. INFORMACIÓN LEGAL Y PRESUPUESTAL 19
5.1 Contrato de obra – Control actas parciales de obra 19
5.2 Contrato de interventoría – Control actas parciales de interventoría 19
5. CONCLUSIONES 20
2. ANEXOS 21
ANEXO 1. INFORME BÁSICO 21
ANEXO 1.1. INFORME ADMINISTRATIVO 21
Anexo 1.1.1. Control de personal contratista 21
Anexo 1.1.2. Relación de correspondencia 21
Anexo 1.1.3. Actas de reunión 21
Anexo 1.1.4. Control de personal de interventoría 21
ANEXO 1.2. INFORME TÉCNICO 21

ANEXO 1.3. INFORME SST 21
ANEXO 1.4. INFORME AMBIENTAL 21

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de las metas definidas en el plan de desarrollo **"UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI" FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C"**, programa línea estratégica: 4 -inclusión educativa para la equidad, proyecto estratégico: ambientes de aprendizaje para la Vida, se incluyó oportunamente la intervención de obras menores y adecuaciones del cien por ciento de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos, buscando conservar y mejorar los espacios de los colegios ofreciendo espacios dignos de convivencia y que ofrezca las mejores condiciones para una verdadera educación de calidad, para las cuales también se hace necesario contratar el seguimiento, vigilancia y control de las actividades de obra por parte, de un tercero con las calidades técnicas, jurídicas y financieras del caso.

Teniendo en cuenta que, el proyecto anteriormente descrito, trata de la intervención de obra pública mediante actividades de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y la ejecución de obras menores, se hace necesario contratar una interventoría especializada dada la diversidad de actividades, frentes de trabajo y áreas técnicas involucradas en el desarrollo del mismo, situación para las que la SED no cuenta con el personal suficiente para realizar el respectivo seguimiento al proyecto en mención.

Para el grupo No. 8 se asignan 17 sedes a intervenir en mejoramientos que se encuentran en la localidad de Rafael Uribe Uribe, de los cuales, se tiene un diagnóstico inicial por parte de la secretaría de educación y a medida que se realicen las visitas con los contratistas de obra e interventoría, se va a hacer la priorización respectiva de las actividades para cada sede. Posterior a la delimitación de este alcance, se suscribió una adición de recursos para el contrato de obra, donde el mismo se amplió a 8 sedes más, completando así un total de 25 unidades.

El presente informe mensual No.8, comprende la recopilación de la información correspondiente al desarrollo del contrato de obra CO1.PCCNTR.4077645 durante el periodo del 20 de agosto de 2023 al 19 de septiembre de 2023.

1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El presente contrato de interventoría No. C01.PCCNTR.2749287 tiene por objeto: ***"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08)."***

Para el reconocimiento total del proyecto, se ha realizado en conjunto de todas las partes interesadas (SED, contratista, interventoría y personal administrativo de las sedes escolares), una serie de recorridos para identificación de necesidades prioritarias en atenciones integrales de adecuaciones y mejoramientos en: cubiertas, batería de baños, carpintería metálica, acabados generales, canchas deportivas y zonas exteriores.

1.1.1. Localización y ubicación de territorios

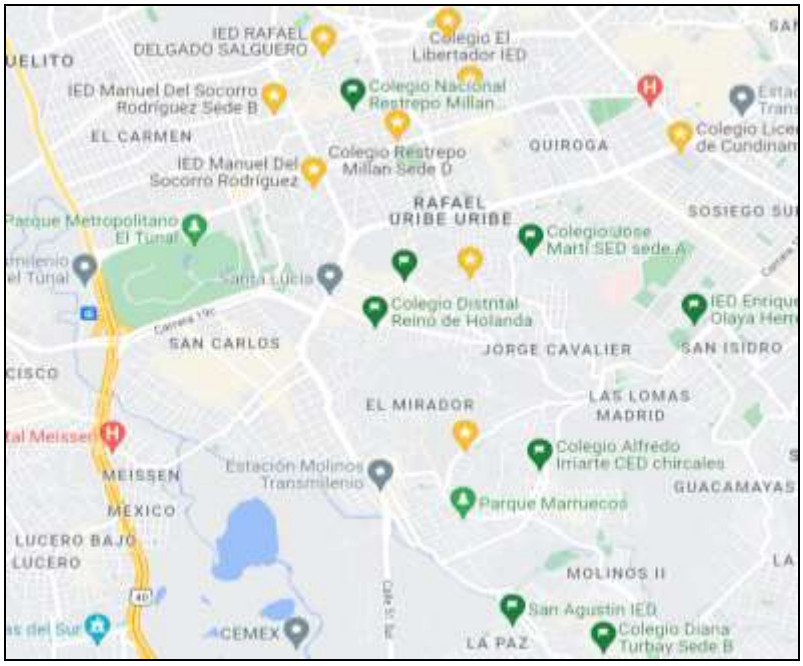


Imagen 1. Localización de las 17 sedes del grupo 8.
Fuente. Google Maps

Las 17 sedes del grupo 8 se encuentran ubicadas dentro de la localidad de Rafael Uribe Uribe; esto, conforme al alcance inicial del contrato de obra, así como las 8 adicionales asignadas a través de la suscripción del otrosí No.1.

1.1.2. Asignación de sedes

Adjudicación de contrato de interventoría No C01.PCCNTR.2749287 y adjudicación de contrato de obra No. No. CO1.PCCNTR.4077645 de territorio oriente ubicados en la localidad de Rafael Uribe Uribe, del Grupo No 8. Se hará intervención a 17 sedes que serán abarcadas inicialmente por etapas, según la programación de obra.

Grupo	Sedes	Localidad
8	17	Rafael Uribe Uribe

Por otra parte, y con base en la adición No.1 de recursos realizada al contrato de obra, se incluyeron 8 sedes adicionales, así:

Grupo	Sedes adicionales	Localidad
8	8	Rafael Uribe Uribe

2. DESCRIPCION PRIMERA ETAPA, VISITA DIAGNÓSTICO

En esta etapa preliminar se realizó la visita de los primeros ocho (8) colegios asignados. Seguidamente y a medida que se coordinó entre la SED y los rectores, se fueron visitando las demás sedes, permitiendo que a hoy se tengan en ejecución quince (15) de las veinticinco (25) sedes.

2.1. Información sedes primera etapa

En relación al primer alcance de ejecución, tenemos las siguientes sedes dentro del grupo 8, a saber:

COLEGIO	SEDE
COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)	B
COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)	A
COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)	B
COLEGIO DIANA TURBAY (IED)	B
COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)	B
COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)	A
COLEGIO JOSE MARTI (IED)	A
COLEGIO JOSE MARTI (IED)	C
COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED)	A
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	A
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	B
COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)	A
COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	A
COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	B
COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	d
COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)	A
COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)	C

La programación general del contrato de obra que incluye el valor actualizado con la adición de recursos, ya fue suministrada en una segunda reprogramación por parte del CONSORCIO MIA GP y para el presente periodo se también involucra dentro del análisis financiero del proyecto, con la cual se identificó una disminución en el atraso financiero causado a la fecha.

Ahora y con ocasión de la adición No.1 de recursos al contrato de obra, se incluyeron las siguientes sedes, a saber:

COLEGIO	SEDE
COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)	A
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	A
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	B
COLEGIO FE Y ALEGRÍA PALERMO SUR (IED)	A
COLEGIO FE Y ALEGRÍA LOS NARANJOS (IED)	A
COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	B
COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED)	A
COLEGIO SANTA LUCÍA CAMFAM (IED)	A

3. INFORMACION ADMINISTRATIVA LEGAL

Territorio oriente: Grupo No. 8

Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4155718 – Consorcio TIG

El presupuesto para la presente contratación de interventoría asciende a la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 878.587.938) incluidos el I.V.A., y los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Adicional a lo anterior, se suscribió una modificación No.1 al contrato, con lo cual se incluyó dentro del alcance 8 sedes, arrojando como valor complementario a la inicial, la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 371.557.799).

Con esto, el valor total de interventoría asciende a MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($ 1.250.145.727).

Territorio oriente: Grupo No 8

Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 - CONSORCIO MIA GP

En contrato de obra se asigna una suma de ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 11.941.262.150) incluido A.I.U. y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

Adicional a lo anterior, se suscribió una modificación No.1 al contrato, con lo cual se incluyó dentro del alcance 8 sedes, arrojando como valor complementario a la inicial, la suma de CINCO MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 5.050.000.000).

Con esto, el valor total de interventoría asciende a DIECISÉISMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 16.991.262.150).

3.1. Información del contrato de interventoría

CONTRATO DE:	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.:	No. CO1.PCCNTR.4155718
CONTRATISTA:	CONSORCIO TIG
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO:	03 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE ENERO DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	DOCE (12) MESES
VALOR INICIAL:	$ 878.587.938
VALOR ADICIONES:	$ 371.557.799
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*):	$ 1.250.145.727
PLAZO TRANSCURRIDO:	OCHO (8) MESES + DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO

3.2. Información del contrato de obra

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	ONCE (11) MESES
VALOR INICIAL:	$11.941.262.150

CONTRATO DE:	OBRA
VALOR ADICIONES:	$ 5.050.000.000
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*):	$ 16.991.262.150
PLAZO TRANSCURRIDO:	OCHO (8) MESES CALENDARIO

3.3 Relación de Correspondencia

Para el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077645 se presenta en el Anexo 1.1.2. El listado relacionando la correspondencia entre contratista e interventoría.

3.4 Actividades de reunión

A la fecha se han ejecutado actas de reunión como soporte del control realizado por esta interventoría para lo cual se adjuntan copia de estos documentos en el Anexo 1.1.3

ACTAS DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO		
FECHA	**ELABORADO POR**	**DESCRIPCIÓN**
22/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Observaciones sobre la entrega del frente de ejecución
24/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión del alcance y avance las obras en la IED Manuel del Socorro A
24/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Recorrido frente de la obra por daños en vidrios IED Liceo Femenino
25/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión del alcance de posible emergencia IED Jose Marti sede B
25/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión del alcance de posible emergencia IED Maria Cano
25/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Definición de carcamos IED Manuel del Socorro sede A
29/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión de observaciones para entrega de salones IED Reino de Holanda sede A
29/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión de alcance en el bloque 1 de la IED Restrepo Millán sede B
29/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Entrega de espacios intervenidos durante emergencias IED República de EEUU
31/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Comité de seguimiento técnico del contrato
23/08/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión del alcance de posible emergencia IED Clemencia Holguín

ACTAS DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO		
FECHA	**ELABORADO POR**	**DESCRIPCIÓN**
01/09/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Entrega de espacios para intervenir IED Reino de Holanda sede A
01/09/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión de alcance de intervención IED Reino de Holanda sede B
01/09/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Entrega del parque infantil IED Manuel del Socorro sede A
01/09/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión del alcance de posible emergencia IED Maria Cano
04/09/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Recorrido para evaluar afectaciones por lluvias IED Liceo Femenino
06/09/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Evaluación de afectaciones por daños en pintura
06/09/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión propuesta eléctrica para bloques de intervención IED Fe y Alegría
07/09/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Comité de seguimiento técnico del contrato
07/09/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión alcance de obra IED Gustavo Restrepo sede A
07/09/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión áreas de implantación IED Manuel del Socorro sede A
08/09/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Entrega preliminar de baterías sanitarias IED San Agustín sede A
11/09/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Entrega para intervención baños primer piso IED Enrique Olaya sede A
13/09/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión de espacios intervenidos IED Liceo Femenino
13/09/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Definiciones en la IED Fe y Alegría
14/09/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Comité de seguimiento técnico del contrato

3.5 Informes Semanales

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el momento de corte del presente informe mensual, los cuales se adjuntan en el anexo 1.1.5.

Is No.	Fecha de inicio	Fecha de corte
32	21/08/2023	27/08/2023
33	28/08/2023	03/09/2023
34	04/09/2022	10/09/2023
35	11/09/2023	17/09/2023

4. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO

4.1 Avance físico

Durante el presente periodo se presenta un avance físico programado de 60,27% (según reprogramación No.2) y ejecutado de 51,46% del valor total del contrato, dando con ello una variación negativa de 8,81%. Cabe resaltar que estos porcentajes son generados sobre el valor total del contrato, incluyendo la respectiva adición No.1 de recursos y partiendo del análisis realizado sobre la reprogramación recientemente allegada por parte del contratista de obra y avalada por esta interventoría y que fue producto de la reunión llevada a cabo el 17 de julio de 2023, donde se expuso ante la SED la causa del atraso, concluyendo en que la programación se debe actualizar, descartando los rubros que no se van a ejecutar y que ya están causados a la fecha.

4.2 Estado de ejecución de los frentes

Los frentes en los que se ejecutaron actividades durante el presente periodo mensual, se relacionan a continuación, así como un recuento de las obras llevadas a cabo:

Colegio José Martí: Se realiza la reposición de la cubierta de la zona del auditorio, donde involucra la aplicación de pintura de esmalte sobre las cerchas existentes, instalación de nuevos elementos metálicos para apoyo de la cubierta, entre otros. Se realiza la instalación de las redes eléctricas, incluyendo la instalación de las luminarias y tomacorrientes. Se repone el piso en la zona del comedor del restaurante en la IED y se estima la entrega de este espacio para finales del mes.

Colegio Restrepo Millán sede C: Se está a la espera de la definición del procedimiento a seguir por parte de la Entidad Contratante, teniendo en cuenta que esa inestabilidad del talud no puede ser catalogada como una emergencia y su intervención debe involucrar unos estudios y diseños previos y de paso se debe evaluar la disponibilidad del recurso, lo cual no haría parte de este alcance contractual.

Colegio San Agustín sede A: Se finalizan las actividades en las baterías del primer piso, con observaciones en proceso de atención. El resto de baterías se encuentran finalizadas, así como los demás espacios que se intervinieron dentro del alcance. Prácticamente el frente se entregó con observaciones, pero ya todas las áreas se encuentran habilitadas y en uso por parte de la IED.

Colegio Diana Turbay: Ya contando con los lineamientos de intervención dados por la SED, el contratista lleva un ritmo lento de trabajo, principalmente por la frecuencia interrumpida de suministro de materiales. Se continuó con la instalación de la mampostería en el bloque No.2, pañete de esos muros, construcción de vigas aéreas, entre otros. Se instala la cubierta tipo

sándwich en los espacios faltantes y se avanza con las redes eléctricas en todos los ambientes.

Colegio Enrique Olaya Herrera: Se finaliza con la intervención de cubierta de las aulas del bloque A y se procede con el desmonte de la teja traslucida en el pasillo, esta actividad contempla la pintura de cerchas y la instalación de la teja traslucida, Se inicia la actividad de desmonte de las puertas de las baterías sanitarias del baño de niños primer piso una vez termina la desinstalación, se continua con el desmonte del cielo raso y de luminarias, se prosigue a la instalación del cielo raso, luminarias, divisiones de las baterías sanitarias y de los orinales.

Colegio Alfredo Iriarte: Se finaliza con las intervenciones en las baterías de los 3 niveles, pero con una serie de observaciones relacionadas con la funcionalidad de los sistemas por presión elevada, taponamiento en sifones, deficiencias en redes existentes, entre otros. Por otra parte, se llevó a cabo la atención de una emergencia en la IED, la cual consistió en cubrir un espacio en enchape.

Colegio Reino de Holanda sede A: Se inicia intervención de los salones 201, 202, 203, y 204 donde se ejecutará el alcance similar a los del nivel superior, se realiza la instalación de las puertas principales de las baterías sanitarias del 3 y 1 piso, donde a la fecha del presente informe aún continúan algunas observaciones.

Colegio Liceo Femenino: El ritmo de trabajo de este frente es muy bajo y se han realizado llamados de atención precisamente por el escaso avance. Se inicia la actividad del desmonte de cielo raso en el aula de tecnología y se prosigue con la instalación del cielo raso en PVC, Se instalan las puertas en aluminio en la bodega de las aulas de física, Biología y artes, Se realiza demolición del acabado de piso en el salón de música y se inicia con la instalación del porcelanato.

Colegio Santa Lucía CAFAM: Se procede con la instalación de las puertas principales antipánico en el área del comedor, de biblioteca y de zona administrativa, se queda a la espera de los remates para proceder con su recibo y entrega de este frente.

Colegio Restrepo Millán sede B: Se finaliza con la instalación de la cubierta tipo sándwich y se continua con el desmonte del domo en policarbonato en el área del pasillo del bloque No.1, pintando la estructura metálica existente e instalando el domo en policarbonato, Se inicia la actividad de demolición del acabado del piso existente se prosigue con la instalación del alistado de piso e instalación del porcelanato.

Colegio Fe y Alegría Palermo Sur: Se continúa con el acondicionamiento de la estructura metálica de los bloques inferiores para la instalación de la cubierta de los salones de artes, de sistemas, laboratorios y administrativos. En esta sede se están realizando las gestiones para poder solicitar unas conexiones domiciliarias nuevas para la red hidráulica, sanitaria y aguas

lluvias. Con respecto a las redes eléctricas, se independizará del tablero que comparte actualmente con el jardín y se construirán las redes internas nuevas. Se hicieron reuniones con los profesionales de la SED relacionadas con redes húmedas y secas, donde se impartieron unos lineamientos frentes a las necesidades de estos servicios. También se realizó una solicitud de trámite para el mantenimiento del transformador que abastece los bloques inferiores, ya que el mismo venía presentando una serie de fallas.

Colegio Alexander Fleming sede B: Se procede a realizar los retoques pendientes sobre la cancha construida y se da por entregada la totalidad del alcance de este frente.

Colegio Manuel del Socorro sede A: Se continúa con la instalación de la subbase tipo B400 y se compacta. Seguidamente se continúa con el vaciado de las placas de 12cm de espesor, que conforman la plataforma de las canchas previstas dentro del alcance. Se instala la tubería PVC Conduit en los puntos que van a quedar los postes, Se inicia con la actividad de fundir los cárcamos perimetrales y la cuneta central que van a recolectar las aguas lluvia.

Colegio Rafael Delgado Salguero sede A: Se procede la intervención con la reposición de cubierta de los salones contiguos a los de sistemas. El ritmo continúa siendo lento, en vista que la IED no habilita más espacios, hasta tanto no se le vayan entregando áreas.

Colegio Marruecos y Molinos sede A: Para este periodo se inicia con la construcción de la tarima que va implantada en el parque principal de la IED. Sobre este elemento hubo una serie de cuestionamientos por parte del rector y se vio la necesidad de realizar reuniones adicionales, buscando dirimir esos temas en particular. Al corte del presente informe todavía esta pendiente llevar a cabo una reunión en las instalaciones de la SED para definir ciertos puntos en específico.

4.3 Control de hitos

Con base en la programación presentada por parte del contratista de obra y verificando el estado de los frentes en obra, se cuenta con la siguiente información al respecto:

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO DE INICIO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR	29/07/2023		No iniciado
10	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO	29/07/2023	26/06/2023	33
11	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO	29/07/2023		No iniciado
12	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	27/02/2023	27/02/2023	0
13	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	29/07/2023	12/06/2023	47
14	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL	29/07/2023		No iniciado
15	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	29/07/2023	22/05/2023	68
16	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL	29/07/2023		No iniciado
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	29/07/2023		No iniciado
18	COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR	28/04/2023	28/04/2023	0
19	COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS	29/07/2023		No iniciado
20	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	29/07/2023		No iniciado
21	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A	29/07/2023	25/05/2023	65
22	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	3/04/2023	3/04/2023	0
23	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	29/07/2023		No iniciado
24	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	29/07/2023		No iniciado
25	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	29/07/2023		No iniciado

Cabe resaltar que estas fechas de inicio fueron tomadas de la reprogramación No.2 enviada por parte del contratista de obra y avalada por parte de la interventoría.

4.4 Avance financiero

Durante el presente periodo se presenta un avance financiero programado de $ 10.241.120.631,17 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 0.17 M/CTE) y ejecutado de $ 8.743.742.464,66 (OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 0.66 M/CTE).

Periodo	Acumulado Mensual	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
MES 8	$ 10.241.120.631,17	$ 8.743.742.464,66



Fuente. Informe semanal de interventoría No.35

5. INFORMACIÓN LEGAL Y PRESUPUESTAL

5.1 Contrato de obra – Control actas parciales de obra

En cuanto al comportamiento financiero del contrato de obra con corte en el periodo actual, el mismo se relaciona a continuación:

CONTROL DE PAGOS DE ACTAS PARCIALES					
Acta No	Fecha	Valor Total	Amortización anticipo	Valor pagado	% pagado acumulado
No.1	19/02/2023	$ 203.058.871	$ 0.00	$ 203.058.871	1,61%
No.2	19/03/2023	$ 1.278.337.626	$ 0.00	$ 1.278.337.626	10,71%
No.3	19/04/2023	$ 704.473.264	$ 0.00	$ 704.473.264	12,86%
No.4	19/05/2023	$ 810.966.333	$ 0.00	$ 810.966.333	17,63%
No.5	19/06/2023	$ 1.256.728.708	$ 0.00	$ 1.256.728.708	25,03%
No.6	19/07/2023	$ 1.921.711.106	$ 0.00	$ 1.921.711.106	36,34%
No.7	19/08/2023	$ 1.639.064.784	$ 0.00	En proceso	45,99 %

5.2 Contrato de interventoría – Control actas parciales de interventoría

En cuanto al comportamiento financiero del contrato de interventoría con corte en el periodo actual, el mismo se relaciona a continuación:

CONTROL DE PAGOS DE ACTAS PARCIALES				
Acta No	Fecha	Valor Total	% pagado	Concepto
No.1	19/02/2023	$ 14.189.195	1,61%	Avance contrato de obra
No.2	19/03/2023	$ 89.351.980	10,71%	Avance contrato de obra
No.3	19/04/2023	$ 57.187.615	12,86%	Avance contrato de obra
No.4	19/05/2023	$ 59.667.498	17,63%	Avance contrato de obra
No.5	19/06/2023	$ 92.385.769	25,03%	Avance contrato de obra
No.6	19/07/2023	$ 141.391.481	36,34%	Avance contrato de obra
No.7	19/08/2023	$ 120.639.063	45,99%	En proceso

5. CONCLUSIONES

- Se continúa llevando a cabo en campo la toma de medidas para la actualización constante de los presupuestos, lo cual permita realizar una delimitación adecuada de los alcances, conforme a los montos agotables que están asignados de manera estimativa para cada frente y bajo las indicaciones de la SED. Esta labor se ha venido exponiendo con la SED, buscando dirimir las dualidades que puedan existir.

- El contratista de obra continúa sin venir correspondiendo de manera diligente con la gestión administrativa que le corresponde, ya que presenta demoras en la entrega de fichas, presupuestos y cronogramas. Esto ha traído consigo una serie de llamados de atención en comités de seguimiento y mediante comunicados, los cuales tampoco han causado el efecto esperado.

- Han venido surgiendo unas nuevas actividades no previstas, de las cuales se han venido proponiendo los APU's no previstos con sus debidos soportes y se han enviado a la Entidad Contratante, encontrando una serie de demoras en su respuesta y atrasando con ello la ejecución de la mayoría de estas actividades.

- Con base en la reunión llevada a cabo en las instalaciones de la SED el 17 de julio de 2023, el contratista de obra allegó durante el periodo la reprogramación No.2, con la cual se realizó el ajuste de la curva S.

- Por parte de la SED se viene estimando una posible adición de recursos No.2 y una ampliación en el plazo de ejecución, teniendo en cuenta que en primera instancia se adicionó al contrato de obra pero no se prorrogó.

2. ANEXOS

ANEXO 1. INFORME BÁSICO
ANEXO 1.1. INFORME ADMINISTRATIVO
Anexo 1.1.1. Control de personal contratista
Anexo 1.1.2. Relación de correspondencia
Anexo 1.1.3. Actas de reunión
Anexo 1.1.4. Control de personal de interventoría
Anexo 1.1.5. Informes semanales
Anexo 1.1.6. Pólizas Contrato de obra
Anexo 1.1.7. Pólizas Contrato de interventoría

ANEXO 1.2. INFORME TÉCNICO
Anexo 1.2.1. Soportes control de calidad
Anexo 1.2.2 Bitácora de obra
Anexo 1.2.3 Registro fotográfico

ANEXO 1.3. INFORME SST

ANEXO 1.4. INFORME AMBIENTAL

ANEXO 1. INFORME BASICO

ANEXO 1.1 INFORME ADMINISTRATIVO

Anexo 1.1.1. Control de personal de contratista

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL	**8**	**Periodo**	20/08/2023	**al**	19/09/2023

FECHA: 19 / 9 / 2023

DÍA DOMINGOS Y FESTIVOS	
PERSONAL QUE ASISTE	**X**
PERSONAL QUE NO ASISTE	**N**
PERSONAL RETIRADO	**R**
PERSONAL INGRESADO	**IN**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESDE		**20-ago-23**									**HASTA**											**19-sep-23**									
DIA		**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**28**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
PERFIL		**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**
Director de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Residentes de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Asesor Estructural			X	X		X																									
Asesor Ambiental				X		X		X		X			X		X		X														
Técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Asesor en Redes Eléctricas																																
Asesor Hidrosanitario																																
Profesional de costos																	X							X								
Inspectores de obra			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Maestro de obra			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X

FIRMA: _____

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DÍAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Agosto al 19 de Septiembre
FRENTE DE OBRA:	IED ALFREDO IRIARTE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	D	LF	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
Maestro de obra																															
Oficial de obra							1		1		1	1					1		1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	1
Ayudante de obra							1		1		1		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	1
Electricista			2																												
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															

FIRMA: _____

NOMBRE: Jhon Rocha

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 Agosto al 19 septiembre
FRENTE DE OBRA:	IED EL LIBERTADOR

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	D	LF	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
Maestro de obra																			1												
Oficial de obra				1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	—	2	1
Ayudante de obra																															
Electricista																															
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															

FIRMA: _____
NOMBRE: Jhon Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____
NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Agosto al 19 de septiembre
FRENTE DE OBRA:	IED MARRUECOS Y MOLINOS

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA / PERSONAL	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	D	LF	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
Maestro de obra																1						—	1	1	1	1		1			
Oficial de obra			1													3	3	3	3	3	3	—		2	2	2	1	2	—	2	
Ayudante de obra			2	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	—	2	
Electricista																															
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																		2													
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															

FIRMA: _____

NOMBRE: Jhon Rocha

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Agosto al 19 de septiembre
FRENTE DE OBRA:	IED RAFAEL DELGADO SALGUERO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	D	LF	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
Maestro de obra																															
Oficial de obra													1																		
Ayudante de obra									1	1	1	1	1	—	—	—				—			—								
Electricista				2								1															2			2	
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															
Instaladores subcont.			3		3												4	4	4	—	4			2	2						

FIRMA: _____

NOMBRE: Jhon Rocha

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de agosto al 19 de septiembre
FRENTE DE OBRA:	Colegio Fe y Alegría

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	D	LF	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M
Maestro de obra			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0	0		1	1
Oficial de obra			3	3	3	3	3		2	2	3	3	3	3		3	4	3	3	3	3		3	2	2	2	2	2		3	4
Ayudante de obra			7	7	7	7	7		5	8	7	6	6	6		7	6	5	0	0	5		5	2	2	7	7	7		7	7
Electricista			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Plomero			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Operador de maquinaria (constante)			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Soldador			3	3	3	3	3		3	2	2	2	2	2		2	2	2	1	1	1		1	2	2	1	1	1		1	1
Carpintero			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Especialista en redes eléctricas			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Especialista en estructuras			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Especialista en redes hidrosanitarias			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Asesor ambiental			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0

FIRMA: _____

NOMBRE: María Alejandra Angarita G

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de agosto al 19 de Septiembre
FRENTE DE OBRA:	Colegio Diana Turbay

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	D	LF	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M
Maestro de obra	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Oficial de obra	/	/	2	2	2	2	2	/	2	2	2	4	4	4	/	4	4	5	5	3	3	/	2	2	2	2	2	1	/	1	2
Ayudante de obra	/	/	3	3	3	3	3	/	2	3	3	6	6	6	/	5	3	5	5	6	6	/	2	0	2	2	2	1	/	2	2
Electricista	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	3	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Plomero	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Operador de maquinaria (constante)	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Soldador	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	2	2	2	/	4	4	0	0	0	0	/	2	2	4	6	2	0	/	0	0
Carpinteros	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Especialista en redes eléctricas	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Especialista en estructuras	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Especialista en redes hidrosanitarias	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Asesor ambiental	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Inspector de obra	/	/	0	0	1	0	0	/	1	0	0	1	1	1	/	0	1	0	1	0	1	/	1	0	0	0	1	0	/	0	0

FIRMA: _____
NOMBRE: María Alejandra Angarita G.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____
NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de agosto al 19 de Septiembre
FRENTE DE OBRA:	Colegio San Agustín.

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	D	LF	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M
Maestro de obra	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Oficial de obra	/	/	2	2	2	2	2	/	2	2	1	2	2	2	/	1	1	1	1	1	2	/	0	0	1	2	2	1	/	1	2
Ayudante de obra	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	1	1	/	1	0	0	0	0	0	/	0	2	0	0	0	2	/	2	2
Electricista	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	1	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Plomero	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Operador de maquinaria (constante)	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Soldador	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Carpinteros	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Especialista en redes eléctricas	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	2	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Especialista en estructuras	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Especialista en redes hidrosanitarias	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Asesor ambiental	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Inspector obra	/	/	1	1	0	1	1	/	1	1	1	0	1	1	/	1	0	0	0	1	1	/	0	1	1	1	1	1	/	1	0

FIRMA: _____

NOMBRE: María Alejandra Angarita G.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de agosto al 19 de septiembre
FRENTE DE OBRA:	Colegio José Martí

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	D	LF	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M
Maestro de obra	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Oficial de obra	/	/	1	1	1	1	1	/	1	1	1	1	1	1	/	1	1	1	1	1	1	/	1	1	2	2	2	2	/	2	2
Ayudante de obra	/	/	2	2	2	2	2	/	2	2	2	3	4	4	/	4	4	4	4	4	4	/	4	4	3	4	4	4	/	4	4
Electricista	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Plomero	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Operador de maquinaria (constante)	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Soldador	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Carpinteros	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Especialista en redes eléctricas	/	/	1	1	1	1	1	/	1	1	1	1	1	1	/	1	1	1	1	0	0	/	0	0	0	1	1	1	/	0	1
Especialista en estructuras	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Especialista en redes hidrosanitarias	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Asesor ambiental	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
S.S.T	/	/	0	0	0	0	0	/	1	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0
Residente de obra	/	/	0	0	0	0	0	/	1	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0

FIRMA: _____
NOMBRE: María Alejandra Angarita G
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____
NOMBRE: ~~EDISON RICARDO~~ DUARTE DIAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Agosto al 19 de Septiembre
FRENTE DE OBRA:	Alexander Aeming

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
Maestro de obra																															
Oficial de obra																															
Ayudante de obra				1																											
Electricista																															
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															

FIRMA: Yovany J.
NOMBRE: Yovany Tarazona P.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Agosto al 19 de septiembre
FRENTE DE OBRA:	Manuel de Socorro Sede A

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	D	LF	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
Maestro de obra																									1						
Oficial de obra			1	1	1	1	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	1	1	1	1		1	1
Ayudante de obra			3	3	3	3	3		3	3	3	2	2	2		2	2	1	1	1	1		2	2	4	3	2	2		2	2
Electricista																									1						
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															
Piso en chip							3		3	3																					

FIRMA: Yorany T.

NOMBRE: Yorany Tarazona T.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Agosto al 19 de Septiembre
FRENTE DE OBRA:	Enrique Olaya Herrera

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	D	LF	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
Maestro de obra																															
Oficial de obra																										1			1		
Ayudante de obra																											1		1		
Electricista																															
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental				2	2	2	2		5	2	2																				
Cubierta																															
Instaladores de Puerta Garo											2	2																			

FIRMA: Yovany T.

NOMBRE: Yovany Tarazona P.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Agosto al 19 de Septiembre
FRENTE DE OBRA:	Restrepo Millan Sede B

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	D	LF	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
Maestro de obra																							1	1							
Oficial de obra										1	1					1	1	1	1	1	1		2	2			2	2		2	2
Ayudante de obra																1	1	1	1	1	1		1	1			3	1		1	1
Electricista																1	1	1													
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															
Cubierta	4	4	4	4	5	5	5		7	5	5	5	5	5		3	3	3	3	3	3		2	2	4	4	3	2		2	2

FIRMA: Yovany T.

NOMBRE: Yovany Tarazona P.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Agosto al 19 de Septiembre
FRENTE DE OBRA:	Santa Lucia Cafam

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL																	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V				
Maestro de obra																															
Oficial de obra																															
Ayudante de obra																															
Electricista																															
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															
Instalador de Puertas																		3	2	2				2		4					

FIRMA: Jovany T.

NOMBRE: Jovany Tarazona P.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 Agosto al 19 de Septiembre
FRENTE DE OBRA:	Liceo Femenino

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	D	LF	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
Maestro de obra												1																			
Oficial de obra			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				1	1	1							1	1		1	1
Ayudante de obra			1	1	1	1	1		1	3				2													1	1		1	1
Electricista														1																	
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															
Cubierta			1	1	2	2	2			1		3	4	4		5	5	5	5	4	4		4	5	5	5	5	4		3	3
Fas																					1										
Instalador de Pisos																								2							

FIRMA: Giovany Tarazona

NOMBRE: Giovany Tarazona P.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Agosto al 19 de septiembre
FRENTE DE OBRA:	IED Reino de Holanda

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	D	LF	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
Maestro de obra	1	1	1	1	1	1	1					1				1	1	1	1	1	1		1								
Oficial de obra	1	2	1	2	2	1	1		1	1	1	1				1	1	1	2	2	2		2	1	1	1	1	1		1	1
Ayudante de obra	1	2	2	2	2	2	2		5	2	2	2				1	1	1	1	1	1		1	2	2	2	2	2		2	2
Electricista		2			1	2	2		5	1	1													2	2		2	2			
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															

FIRMA: Jovany T.

NOMBRE: Jovany Tarazona P.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

Anexo 1.1.2. Relación Correspondencia

Relación Salidas

CONSORCIO TIG

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO	NÚMERO DE RADICADO	CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
22/08/2023	TIG-MEM-316	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO LIBERTADOR, DIANA TURBAY.	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	**N/A**	**N/A**
21/08/2023	TIG-MEM-317	Respuesta a oficio 2023_RUU_MG_226 de fecha 17 de agosto de 2023-Ajustes arquitectónicos IED Diana Turbay Sede B	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	**N/A**	**N/A**
22/08/2023	TIG-MEM-318	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO LIBERTADOR, DIANA TURBAY.	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	**N/A**	**N/A**
22/08/2023	TIG-MEM-319	Remisión ajuste de la programación de obra según reunión del 17 de julio de 2023 en la SED	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	**N/A**	**N/A**
22/08/2023	TIG-MEM-320	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.31	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	**N/A**	**N/A**
23/08/2023	TIG-MEM-321	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO DIANA TURBAY, LIBERTADOR	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	**N/A**	**N/A**
24/08/2023	TIG-MEM-322	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO LICEO FEMENINO, RESTREPO MILLAN, REINO DE HOLANDA, DIANA TURBAY	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	**N/A**	**N/A**
25/08/2023	TIG-MEM-323	SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE OBRA No. 7	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	**N/A**	**N/A**
26/08/2023	TIG-MEM-324	SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No.7	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	**N/A**	**N/A**
28/08/2023	TIG-MEM-325	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.32	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	**N/A**	**N/A**

CONSORCIO TIG

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO	NÚMERO DE RADICADO	CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
28/08/2023	TIG-MEM-326	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO Y DIANA TURBAY	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	**N/A**	**N/A**
29/08/2023	TIG-MEM-327	Remisión comunicación 2023_RUU_MGP_233 en respuesta a correo del 29-08-2023	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	**N/A**	**N/A**
30/08/2023	TIG-MEM-328	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO DIANA TURBAY, FE Y ALEGRIA Y JOSE MARTIN	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	**N/A**	**N/A**
31/08/2023	TIG-MEM-329	Pendientes del componente ambiental	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	**N/A**	**N/A**
31/08/2023	TIG-MEM-330	Notificación de posibles incumplimientos de índole SST	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	**N/A**	**N/A**
31/08/2023	TIG-MEM-331	RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.7	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	**N/A**	**N/A**
01/09/2023	TIG-MEM-332	Remisión de APU's no previstos ajustados de la emergencia de la cubierta del Liceo Femenino Mercedes Nariño	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	**N/A**	**N/A**
01/09/2023	TIG-MEM-333	Respuesta a radicado I-2023-89714 - Memorando de respuesta a la solicitud I-2023-76855	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	**N/A**	**N/A**
04/09/2023	TIG-MEM-334	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.33	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	**N/A**	**N/A**
04/09/2023	TIG-MEM-335	Respuesta a correo del 28 de agosto de 2023 - Diseño tarima Marruecos y Molinos	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	**N/A**	**N/A**

CONSORCIO TIG

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO	NÚMERO DE RADICADO	CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
05/09/2023	TIG-MEM-336	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO DIANA TURBAY, FE Y ALEGRIA, MANUEL DEL SOCORRO, LIBERTADOR.	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	**N/A**	**N/A**
11/09/2023	TIG-MEM-337	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.34	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	**N/A**	**N/A**
11/09/2023	TIG-MEM-338	Remisión de APU's no previstos NP-27 y NP-39	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	**N/A**	**N/A**
11/09/2023	TIG-MEM-339	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO DIANA TURBAY, FE Y ALEGRIA, MANUEL DEL SOCORRO, LIBERTADOR.	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	**N/A**	**N/A**
12/09/2023	TIG-MEM-340	Solicitud de gestión ante ENEL para mantenimiento de transformador ubicado en la IED Fe y Alegría	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	**N/A**	**N/A**
13/09/2023	TIG-MEM-341	Respuesta a correos electrónicos del 01 y 12 de septiembre de 2023 - Aprobación perfil asesor ambiental	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	**N/A**	**N/A**
18/09/2023	TIG-MEM-342	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.35	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	**N/A**	**N/A**
18/09/2023	TIG-MEM-343	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO DIANA TURBAY, LIBERTADOR, JOSE MARTIN y RESTREPO MILLAN.	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	**N/A**	**N/A**

CONSORCIO TIG

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO	NÚMERO DE RADICADO	CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
19/09/2023	TIG-MEM-344	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO BICICLETERO Y FE Y ALEGRIA	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	**N/A**	**N/A**

Nombre: *EDISON RICARDO DUARTE DÍAZ*
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Código	Vigencia
FMI022-1	12/1/2021

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-316

Bogotá, D.C, agosto 22 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO LIBERTADOR, DIANA TURBAY.

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Jose Agustín Ortiz	79.925.721	Ayudante	Libertador
2	Jose Pedronel Cocoma Bocanegra	1.024.531.850	Ayudante	Diana Turbay
3	Jorge Armando Martinez Camelo	80.226.139	Ayudante	Diana Tubay

4	Jose Jamir Bocanegra Giron	5.970.811	Ayudante	Diana Turbay
5	Jose Alfredo Vega Gamba	80.154.738	Ayudante	Diana Turbay

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe

Anexo. Documentación del personal


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.925.721
ORTIZ
JOSE AGUSTIN


17-FEB-1982
FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
O+
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
06-SEP-2000 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
01485 07104A 02 203523110

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 16/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	199	17/08/2023	CC 79925721	ORTIZ JOSE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

B6041213529 61F064E77F19C0320D4FC Certificado impreso el día 8/16/2023 4:29:48 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JOSE AGUSTIN
ORTIZ
79925721

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS

No. Radicado Sistema: 28211876

Fecha de Radicación
1 6 0 8 2 0 2 3

RADICADO

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1.Tipo de Trámite	2.Tipo de Afiliación	3. Regimen
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A.Individual [ ] Cotizante o Cabeza Familia [X] Beneficiario o Otra adicional [ ] B. Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ]	C. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado	5.Tipo de Cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	01

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
ORTIZ		JOSE	AGUSTIN
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo documento de Identidad	8. Número del documento de Identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
CC	79925721	Femenino [ ] Masculino [X]	1 7 0 2 1 9 8 2

III.DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
0 6	Tipo [F][N][M] Condición [T][P]		0 0

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de Cotización - IBC
POSITIVA S.A.	003 / PORVENIR	1.160.000

18. Residencia			
AVENIDA 34 09 34	3133138066	3133138066	jamortiz@hotmail.com
Dirección	Teléfono fijo	Teléfono Celular	Correo electrónico

54001 / CUCUTA	Zona: Urbana [X] Rural [ ]		54 / NORTE DE SANTANDER
Municipio/Distrito		Localidad/Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyugue o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. fecha de Nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Numero del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentescos	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Telefonofijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C	SINERGIA U.P.R.E.C CUCUTA PPR	SINERGIA UNIDAD BASICA CENTRO P P R	30600433	30600437
B				
B				
B				

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	0 1

39. Ubicación				
CLL 3 # 7B-140 URBANIZACION ALTAMIRA	5801473	obras.joyavi@gmail.com	LOS PATIOS	NORTE DE SANTANDER
Dirección	Teléfono	Correo electronico	Municipio/Distrito	Departamento

Famisanar EPS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y correcciónde datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	1 6 0 8 2 0 2 3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:	0	0	0	1	0	0	0	0	1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la teminación de la unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Codigo del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70.Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones: _____

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JOSE AGUSTIN ORTIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **79.925.721**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 16 de Agosto del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.024.531.850
COCOMA BOCANEGRA
APELLIDOS
JOSE PEDRONEL
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 18-JUN-1992
ORTEGA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
18-AGO-2010 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
A-1500150-01078004-M-1024531850-20190629
0065692417A 1
9908358067

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 16/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	197	17/08/2023	CC 1024531850	COCOMA BOCANEGRA JOSE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

B6041213529 61F064E77F19C0320D4FC Certificado impreso el día 8/16/2023 03:33:08 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JOSE PEDRONEL
COCOMA BOCANEGRA
1024531850

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 16/08/2023, el empleador JOSE JOAQUIN YANEZ VILLAMIZAR identificado con NIT número 13240346 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6069087	16/08/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1024531850	JOSEPEDRONEL COCOMA BOCANEGRA	1160000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2023-08-16

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Agosto del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **COCOMA BOCANEGRA JOSE PEDRONEL** identificado(a) con **CC** número **1.024.531.850** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 09 de agosto de 2013 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 16 de agosto de 2023.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2023081616015



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.226.139
MARTINEZ CAMELO
APELLIDOS
JORGE ARMANDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-ABR-1979
SAN JUAN DE RIOSECO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

18-FEB-1998 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00288365-M-0080226139-20110401 00265071 89A 1 30083799

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 16/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	198	17/08/2023	CC 80226139	MARTINEZ CAMELO JORGE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

B6041213529 61F064E77F19C0320D4FC Certificado impreso el día 8/16/2023 4:28:48 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JORGE ARMANDO
MARTINEZ CAMELO
80226139

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación
782975-16082023	16 08 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo).*

1. Tipo de Trámite:	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedad [ ]	A. Individual: X - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	(a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
MARTINEZ (Primer apellido)	CAMELO (Segundo apellido)	JOSE (Primer nombre)	ARMANDO (Segundo nombre)

7. Tipo documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	80226139	Femenino [ ] Masculino [X]	15 04 1979

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
POSITIVA ARL	COLPENSIONES	1.160.000

18. Residencia			
calle 23 n 45 78 (Dirección)	67986854 (Teléfono)	3223045698 (Teléfono celular)	jamcamelo@gmail.com (Correo electrónico)

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
BOGOTA D.C.	Urbana [X] Rural [ ]	SUBA	BOGOTA D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres completos

	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13.240.346	

39. Ubicación				
CALLE 3A 7B 149 (Dirección)	5801473 (Teléfono)	obras.joyavi@gmail.com (Correo electrónico)	LOS PATIOS (Municipio/Distrito)	NDS (Departamento)

VIGILADO Supersalud

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de Identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo; [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen; [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
MARTINEZ	CAMELO	JOSE	ARMANDO

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CC	80226139	Femenino [ ] Masculino [X]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	[ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva. Institucional o de Oficio
JOSE ARMANDO MARTINEZ CAMELO CC 80226139	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Copia documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
  Cantidad CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

Colpensiones 10 años

GOBIERNO DE COLOMBIA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JORGE ARMANDO MARTINEZ CAMELO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **80226139,** se encuentra afiliado/a desde **15/04/2005** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 16 de agosto de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
5.970.811
BOCANEGRA GIRON
JOSE JAMIR


10-MAY-1968
ORTEGA
(TOLIMA)
1.69
B+
M
11-DIC-1989 ORTEGA

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 16/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	196	17/08/2023	CC 5970811	BOCANEGRA GIRON JOSE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

B6041213529 61F064E77F19C0320D4FC Certificado impreso el día 8/16/2023 12:18:23 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JOSE JAMIR
BOCANEGRA GIRON
5970811

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación
782974-16082023	16 08 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo).*

1. Tipo de Trámite:	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedad [ ]	A. Individual: X - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	(a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido: BOCANEGRA	Segundo apellido: GIRON	Primer nombre: JOSE	Segundo nombre: JAMIR

7. Tipo documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	5970811	Femenino [ ] Masculino [X]	10 05 1968

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
POSITIVA ARL	PORVENIR	1.160.000

18. Residencia			
Dirección: av 67 n 89 21	Teléfono: 67986854	Teléfono celular: 3223045698	Correo electrónico: jjbocanegra@gmail.com

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
BOGOTA D.C.	Urbana [X] Rural [ ]	SUBA	BOGOTA D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres completos

	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13.240.346	

39. Ubicación				
Dirección: CALLE 3A 7B 149	Teléfono: 5801473	Correo electrónico: obras.joyavi@gmail.com	Municipio/Distrito: LOS PATIOS	Departamento: NDS

VIGILADO Supersalud

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de Identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo — [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen — [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
BOCANEGRA	GIRON	JOSE	JAMIR

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CC	5970811	Femenino [ ] Masculino [X]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva. Institucional o de Oficio
JOSE JAMIR BOCANEGRA GIRON CC 5970811	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Copia documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] — Cantidad — Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

Colpensiones 10 años

GOBIERNO DE COLOMBIA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JOSE JAMIR BOCANEGRA GIRON** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **5970811,** se encuentra afiliado/a desde **26/09/2005** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 16 de agosto de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **80.154.738**

VEGA GAMBA

APELLIDOS

JOSE ALFREDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-MAR-1981**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

23-JUN-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00952608-M-0080154738-20171107 **0058**05121A 1 9902089019

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 17/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	202	18/08/2023	CC 80154738	VEGA GAMBA JOSE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

D41A352A12720F7D8321E4C9DAB8242B Certificado impreso el día 8/17/2023 4:03:46 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JOSE ALFREDO
VEGA GAMBA
80154738

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación
782977-17082023	17 08 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo).*

1. Tipo de Trámite:	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedad [ ]	A. Individual: X - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	(a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
VEGA (Primer apellido)	GAMBA (Segundo apellido)	JOSE (Primer nombre)	ALFREDO (Segundo nombre)

7. Tipo documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	80154738	Femenino [ ] Masculino [X]	25 03 1981

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
POSITIVA ARL	COLPENSIONES	1.160.000

18. Residencia			
CALLE 12 N 90 32 (Dirección)	67986854 (Teléfono)	3223045698 (Teléfono celular)	javega@gmail.com (Correo electrónico)

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
BOGOTA D.C.	Urbana [X] Rural [ ]	SUBA	BOGOTA D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres completos

	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13.240.346	

39. Ubicación				
CALLE 3A 7B 149 (Dirección)	5801473 (Teléfono)	obras.jovavi@gmail.com (Correo electrónico)	LOS PATIOS (Municipio/Distrito)	NDS (Departamento)

VIGILADO Supersalud

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de Identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo — [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen — [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
VEGA	GAMBA	JOSE	ALFREDO

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CC	80154738	Femenino [ ] Masculino [X]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva. Institucional o de Oficio
JOSE ALFREDO VEGA GAMBA CC 80154738	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Copia documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
  Cantidad [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

Colpensiones 10 años

GOBIERNO DE COLOMBIA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JOSE ALFREDO VEGA GAMBA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **80154738,** se encuentra afiliado/a desde **01/12/2004** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 17 de agosto de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-317

Bogotá, D.C, 21 de agosto de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Respuesta a oficio 2023_RUU_MG_226 de fecha 17 de agosto de 2023-Ajustes arquitectónicos IED Diana Turbay Sede B

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite dar respuesta a su comunicación 2023_RUU_MGP_226 que data del 17 de agosto de 2023, allegada mediante correo electrónico y que tiene por asunto “Ajustes arquitectónicos IED Diana Turbay Sede B”.

Ahora y como resultado de las solicitudes que describe a través de su misiva, esta interventoría se permite realizar las siguientes precisiones, a saber:

1. **VENTANERIA:** Efectivamente y como ustedes lo mencionan, las ventanas internas se construirán bajo es esquema indicado por parte de la SED ya hace más de un (1) mes calendario. Por otra parte y en lo que respecta a las ventanas que dan contra las distintas fachadas (perimetrales), las mismas ya fueron consideradas por parte nuestra en la última actualización del presupuesto, por lo cual, consideramos consecuente la inclusión de este alcance dentro de ejecución, haciendo la salvedad de que las rejas

antivandálicas se deberán conservar y a las mismas se les realizará únicamente mantenimiento.

2. **PLACA AULA MÚLTIPLE**: Se verifico en campo entre las partes involucradas (obra e interventoría) los niveles de los cuales hacen referencia y efectivamente cuentan con una irregularidad bastante representativa, y es por eso, que esta interventoría recomendó la instalación de un mortero nivelante con microfibras y un acabado en piso en vinilo, con el firme propósito de disminuir el peso del acabado en comparación al anterior.

   Con respecto a su acotación relacionada con la responsabilidad sobre la estabilidad de la estructura, esta interventoría es consciente que la misma es muy antigua, que adolece de cumplimiento bajo la normatividad vigente y que el alcance solo se contempla en términos de mejoramientos locativos.

   Por otra parte y frente a su solicitud de la "modulación del piso en vinilo" se sugiere que para evitar quejas relacionadas con el desperdicio del material en el desarrollo del contrato, sea el CONSORCIO MIA GP desde su experiencia en el desarrollo de la actividad, quien proponga por los menos dos (2) alternativas.

3. **MURO FACHADA:** Con respecto a la propuesta emitida referente a panel liso de fachada 1.22x1.22 en lámina galvanizada cal. 18 con pintura poliéster lisa, en remplazo de muro de fibrocemento propuesto inicialmente, se requiere que se allegue a esta interventoría el A.P.U, especificaciones técnicas, detalles constructivos que permita realizar un análisis integral de la propuesta y concertarlo de manera directa con el Ente Contratante.

4. **REMATE BLOQUE 1 A BLOQUE 2:** Con respecto a la solicitud de definición de actividades de voz y datos en área administrativa ubicada ahora en última aula del bloque 1 y según reunión el día 15 de agosto 2023, la Entidad Contratante nos informa que ese alcance lo realizará REDP.

5. **SISTEMA CONSTRUCTIVO BLOQUE 2:** Se aprobó el sistema constructivo de pórticos en concreto y se solicita nuevamente el A.P.U para las columnas en concreto. En dicho alcance no se contempla tanques de almacenamiento, en vista que el suministro es directo desde la red pública que abastece el colegio.

6. **PASARELA CONEXIÓN EDIFICACIONES EXISTENTES:** Se le recuerda al CONSORCIO MIA GP que en anteriores reuniones había informado a esta interventoría que se encontraba realizando esta propuesta, haciendo uso de su asesor estructural vinculado al proyecto como cumplimiento a sus obligaciones contractuales, pero a la fecha no ha sido remitida dicha propuesta. Se solicita estructurar el concepto y remitirlo para que entre la interventoría y la SED puedan realizar sus consideraciones del caso.

7. **BARANDAS:** Efectivamente se debe realizar según la cartilla ilustrativa mantenimientos de infraestructura –SED, y se recomienda iniciar su pronta fabricación.

8. **PENDIENTES POR DEFINIR:** Esto hace parte de lo conversado en obra, por lo cual, una vez se haya avanzado en la ejecución, se tomarán las decisiones pertinentes a que haya lugar.

Así las cosas, esta interventoría otorga un plazo perentorio de DOS (2) días calendario contado a partir de la recepción de esta comunicación, para que el contratista de obra proceda con la remisión de la documentación solicitada en los apartados anteriores y un periodo máximo de TRES (3) días calendario, para que inicie con la ejecución de las actividades que estamos refrendando es este comunicado, pero que ya habían sido acordadas en campo el pasado 12 y 15 de agosto de 2023; so pena solicitar a la Entidad Contratante que tome las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la baja dinámica que se lleva a cabo en este frente.

Sin otro particular,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo: Sin folios

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-316

Bogotá, D.C, agosto 22 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO LIBERTADOR, DIANA TURBAY.

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Jose Agustín Ortiz	79.925.721	Ayudante	Libertador
2	Jose Pedronel Cocoma Bocanegra	1.024.531.850	Ayudante	Diana Turbay
3	Jorge Armando Martinez Camelo	80.226.139	Ayudante	Diana Tubay

4	Jose Jamir Bocanegra Giron	5.970.811	Ayudante	Diana Turbay
5	Jose Alfredo Vega Gamba	80.154.738	Ayudante	Diana Turbay

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe

Anexo. Documentación del personal


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.925.721
ORTIZ
JOSE AGUSTIN


17-FEB-1982
FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
O+
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
06-SEP-2000 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
01485 07104A 02 203523110

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 16/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	199	17/08/2023	CC 79925721	ORTIZ JOSE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

B6041213529 61F064E77F19C0320D4FC Certificado impreso el día 8/16/2023 4:29:48 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JOSE AGUSTIN
ORTIZ
79925721

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS

No. Radicado Sistema: 28211876

Fecha de Radicación
1 6 0 8 2 0 2 3

RADICADO

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1.Tipo de Trámite	2.Tipo de Afiliación	3. Regimen
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A.Individual [ ] Cotizante o Cabeza Familia [X] Beneficiario o Otra adicional [ ] B. Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ]	C. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado	5.Tipo de Cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	01

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
ORTIZ		JOSE	AGUSTIN
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo documento de Identidad	8. Número del documento de Identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
CC	79925721	Femenino [ ] Masculino [X]	1 7 0 2 1 9 8 2

III.DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
0 6	Tipo [F][N][M] Condición [T][P]		0 0

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de Cotización - IBC
POSITIVA S.A.	003 / PORVENIR	1.160.000

18. Residencia			
AVENIDA 34 09 34	3133138066	3133138066	jamortiz@hotmail.com
Dirección	Teléfono fijo	Teléfono Celular	Correo electrónico

54001 / CUCUTA	Zona: Urbana [X] Rural [ ]		54 / NORTE DE SANTANDER
Municipio/Distrito		Localidad/Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyugue o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. fecha de Nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Numero del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentescos	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Telefonofijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C	SINERGIA U.P.R.E.C CUCUTA PPR	SINERGIA UNIDAD BASICA CENTRO P P R	30600433	30600437
B				
B				
B				

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	0 1

39. Ubicación				
CLL 3 # 7B-140 URBANIZACION ALTAMIRA	5801473	obras.joyavi@gmail.com	LOS PATIOS	NORTE DE SANTANDER
Dirección	Teléfono	Correo electronico	Municipio/Distrito	Departamento

Famisanar EPS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y correcciónde datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	1 6 0 8 2 0 2 3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:	0	0	0	1	0	0	0	0	1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la teminación de la unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Codigo del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70.Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones: _____

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JOSE AGUSTIN ORTIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **79.925.721**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 16 de Agosto del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.024.531.850
COCOMA BOCANEGRA
APELLIDOS
JOSE PEDRONEL
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 18-JUN-1992
ORTEGA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
18-AGO-2010 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
A-1500150-01078004-M-1024531850-20190629
0065692417A 1
9908358067

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 16/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	197	17/08/2023	CC 1024531850	COCOMA BOCANEGRA JOSE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

B6041213529 61F064E77F19C0320D4FC Certificado impreso el día 8/16/2023 03:33:08 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JOSE PEDRONEL
COCOMA BOCANEGRA
1024531850

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 16/08/2023, el empleador JOSE JOAQUIN YANEZ VILLAMIZAR identificado con NIT número 13240346 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6069087	16/08/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1024531850	JOSEPEDRONEL COCOMA BOCANEGRA	1160000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2023-08-16

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Agosto del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **COCOMA BOCANEGRA JOSE PEDRONEL** identificado(a) con **CC** número **1.024.531.850** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 09 de agosto de 2013 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 16 de agosto de 2023.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2023081616015



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.226.139
MARTINEZ CAMELO
APELLIDOS
JORGE ARMANDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-ABR-1979
SAN JUAN DE RIOSECO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

18-FEB-1998 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00288365-M-0080226139-20110401 00265071 89A 1 30083799

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 16/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	198	17/08/2023	CC 80226139	MARTINEZ CAMELO JORGE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

B6041213529 61F064E77F19C0320D4FC Certificado impreso el día 8/16/2023 4:28:48 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JORGE ARMANDO
MARTINEZ CAMELO
80226139

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación
782975-16082023	16 08 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo).*

1. Tipo de Trámite:	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedad [ ]	A. Individual: X - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	(a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
MARTINEZ (Primer apellido)	CAMELO (Segundo apellido)	JOSE (Primer nombre)	ARMANDO (Segundo nombre)

7. Tipo documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	80226139	Femenino [ ] Masculino [X]	15 04 1979

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
POSITIVA ARL	COLPENSIONES	1.160.000

18. Residencia			
calle 23 n 45 78 (Dirección)	67986854 (Teléfono)	3223045698 (Teléfono celular)	jamcamelo@gmail.com (Correo electrónico)

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
BOGOTA D.C.	Urbana [X] Rural [ ]	SUBA	BOGOTA D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres completos

	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13.240.346	

39. Ubicación				
CALLE 3A 7B 149 (Dirección)	5801473 (Teléfono)	obras.joyavi@gmail.com (Correo electrónico)	LOS PATIOS (Municipio/Distrito)	NDS (Departamento)

VIGILADO Supersalud

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de Identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo; [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen; [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
MARTINEZ	CAMELO	JOSE	ARMANDO

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CC	80226139	Femenino [ ] Masculino [X]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	[ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva. Institucional o de Oficio
JOSE ARMANDO MARTINEZ CAMELO CC 80226139	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Copia documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
  Cantidad CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

Colpensiones 10 años

GOBIERNO DE COLOMBIA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JORGE ARMANDO MARTINEZ CAMELO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **80226139,** se encuentra afiliado/a desde **15/04/2005** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 16 de agosto de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
5.970.811
BOCANEGRA GIRON
JOSE JAMIR


10-MAY-1968
ORTEGA
(TOLIMA)
1.69
B+
M
11-DIC-1989 ORTEGA

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 16/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	196	17/08/2023	CC 5970811	BOCANEGRA GIRON JOSE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

B6041213529 61F064E77F19C0320D4FC Certificado impreso el día 8/16/2023 12:18:23 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JOSE JAMIR
BOCANEGRA GIRON
5970811

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación
782974-16082023	16 08 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo).*

1. Tipo de Trámite:	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedad [ ]	A. Individual: X - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	(a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido: BOCANEGRA	Segundo apellido: GIRON	Primer nombre: JOSE	Segundo nombre: JAMIR

7. Tipo documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	5970811	Femenino [ ] Masculino [X]	10 05 1968

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
POSITIVA ARL	PORVENIR	1.160.000

18. Residencia			
Dirección: av 67 n 89 21	Teléfono: 67986854	Teléfono celular: 3223045698	Correo electrónico: jjbocanegra@gmail.com

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
BOGOTA D.C.	Urbana [X] Rural [ ]	SUBA	BOGOTA D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres completos

	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13.240.346	

39. Ubicación				
Dirección: CALLE 3A 7B 149	Teléfono: 5801473	Correo electrónico: obras.joyavi@gmail.com	Municipio/Distrito: LOS PATIOS	Departamento: NDS

VIGILADO Supersalud

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de Identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo — [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen — [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
BOCANEGRA	GIRON	JOSE	JAMIR

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CC	5970811	Femenino [ ] Masculino [X]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva. Institucional o de Oficio
JOSE JAMIR BOCANEGRA GIRON CC 5970811	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Copia documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] — Cantidad — Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

Colpensiones 10 años

GOBIERNO DE COLOMBIA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JOSE JAMIR BOCANEGRA GIRON** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **5970811,** se encuentra afiliado/a desde **26/09/2005** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 16 de agosto de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **80.154.738**

VEGA GAMBA

APELLIDOS

JOSE ALFREDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-MAR-1981**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

23-JUN-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00952608-M-0080154738-20171107 **0058**05121A 1 9902089019

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 17/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	202	18/08/2023	CC 80154738	VEGA GAMBA JOSE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

D41A352A12720F7D8321E4C9DAB8242B Certificado impreso el día 8/17/2023 4:03:46 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JOSE ALFREDO
VEGA GAMBA
80154738

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación
782977-17082023	17 08 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo).*

1. Tipo de Trámite:	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedad [ ]	A. Individual: X - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	(a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
VEGA (Primer apellido)	GAMBA (Segundo apellido)	JOSE (Primer nombre)	ALFREDO (Segundo nombre)

7. Tipo documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	80154738	Femenino [ ] Masculino [X]	25 03 1981

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
POSITIVA ARL	COLPENSIONES	1.160.000

18. Residencia			
CALLE 12 N 90 32 (Dirección)	67986854 (Teléfono)	3223045698 (Teléfono celular)	javega@gmail.com (Correo electrónico)

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
BOGOTA D.C.	Urbana [X] Rural [ ]	SUBA	BOGOTA D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres completos

	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13.240.346	

39. Ubicación				
CALLE 3A 7B 149 (Dirección)	5801473 (Teléfono)	obras.jovavi@gmail.com (Correo electrónico)	LOS PATIOS (Municipio/Distrito)	NDS (Departamento)

VIGILADO Supersalud

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de Identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo — [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen — [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
VEGA	GAMBA	JOSE	ALFREDO

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CC	80154738	Femenino [ ] Masculino [X]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva. Institucional o de Oficio
JOSE ALFREDO VEGA GAMBA CC 80154738	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Copia documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
  Cantidad [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

Colpensiones 10 años

GOBIERNO DE COLOMBIA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JOSE ALFREDO VEGA GAMBA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **80154738,** se encuentra afiliado/a desde **01/12/2004** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 17 de agosto de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-319

Bogotá, D.C, agosto 22 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Remisión ajuste de la programación de obra según reunión del 17 de julio de 2023 en la SED

Respetados señores:

Por medio de la presente y con base en el compromiso adquirido por parte del contratista de obra el pasado 17 de julio de 2023, nos permitimos allegar para su conocimiento y fines pertinentes, el ajuste de la programación propuesto por el CONSORCIO MIGA GP de cara al desarrollo general del proyecto, el cual ya incluye la totalidad de las sedes a intervenir, bajo las siguientes consideraciones:

1. Se reprogramaron las fechas de entrega de las sedes que a hoy están en desarrollo, contemplando las condiciones reales de ejecución, alcances, limitaciones, entre otros.

2. Las sedes que aún no se han abierto en ejecución, están estimadas con unos valores tentativos a monto agotable, pero sin detalle de actividades, a la espera de la definición de las mismas.

3. Muy seguramente cuando se definan los alcances de los frentes que aún están sin iniciar y con ello la fecha de inicio, la misma diferirá de la

propuesta tentativamente en esta entrega. Para ese momento se irá actualizando la información por parte del CONSORCIO MIGA GP.

4. Sobre esta propuesta el CONSORCIO TIG irá realizando la revisión constante de la ejecución de las obras y notificará a las partes en caso que exista algún atraso en la programación.

5. Vemos necesaria la comunicación de la SED con los rectores de cada una de las sedes intervinientes, en especial las que están en ejecución, a fin de darles a conocer esta actualización en fechas y con esto evitar inconvenientes por estimaciones no reales.

Quedamos atentos al resultado de su revisión y a las indicaciones a que haya lugar.

Atentamente,




EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CONSORCIO MIA GP, Mateo Luzardo Villamizar, Representante Legal
Anexo. Catorce (14) folios + Un (1) archivo en formato MPP de 2,72MB

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION


ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8

Id	Item	COLEGIO	Unid	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1		**ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8**		**$ 14.130.809.306,58**	**270 días**	**vie 20/01/23**	**mar 19/12/23**		
2		ACTA DE INICIO DE OBRA		$ 0,00	0 días	vie 20/01/23	vie 20/01/23		1489FC+100 días;140FC
3		APROBACION ADICION PRESUPUESTAL No 1		$ 0,00	0 días	lun 3/04/23	lun 3/04/23		1203FC+110 días;1207F
4		**MANTENIMIENTO PROGRAMADO**		**$ 13.268.323.378,58**	**270 días**	**vie 20/01/23**	**mar 19/12/23**		
5		**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURT**		**$ 229.837.434,00**	**167 días**	**vie 20/01/23**	**mar 15/08/23**		
6		Etapa preconstructiva		$ 0,00	62 días	sáb 21/01/23	mar 4/04/23	2FC+1 día	9;18
7	**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 25.064.366,00**	**73 días**	**mié 5/04/23**	**vie 7/07/23**		
8	**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 533.550,00**	**8 días**	**mié 5/04/23**	**lun 17/04/23**		
9	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN	M	$ 533.550,00	8 días	mié 5/04/23	lun 17/04/23	6	14;12;40FC+5 días;37FC+15
10	**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 23.932.298,00**	**45 días**	**lun 17/04/23**	**sáb 10/06/23**		
11	1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 16.766.245,00	25 días	mar 18/04/23	sáb 10/06/23	9;18	15CC;21FC-15 días
12	1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 0,00	0 días	lun 17/04/23	lun 17/04/23	9;18	15CC;21FC-15 días
13	1.2.22	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 6.716.684,00	45 días	mar 18/04/23	sáb 10/06/23	9;18	15CC;21FC-15 días
14	1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M	$ 405.288,00	45 días	mar 18/04/23	sáb 10/06/23	9;18	15CC;21FC-15 días
15	1.2.50	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	UN	$ 0,00	0 días	mar 18/04/23	mar 18/04/23	14CC;12CC;11CC;	77
16	1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 44.081,00	15 días	sáb 29/04/23	mié 17/05/23	9FC+10 días;18FC+10 días	20
17	**1.3**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 548.016,00**	**8 días**	**mié 5/04/23**	**lun 17/04/23**		
18	1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y	UN	$ 548.016,00	8 días	mié 5/04/23	lun 17/04/23	6	14;12;40FC+5 días;37FC+15 días;16FC+10 días;11;13
19	**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 50.502,00**	**40 días**	**jue 18/05/23**	**vie 7/07/23**		
20	1.4.5	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	$ 21.151,00	30 días	jue 18/05/23	sáb 24/06/23	16	22;55CC+10 días;62CC+3 días;54CC+10
21	1.4.9	LIMPIEZA DE PLACA BASE MEJORAMIENTO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS	M2	$ 0,00	15 días	jue 25/05/23	sáb 10/06/23	14FC-15 días;12FC-15	25CC+20 días;77;47CC+3 días
22	1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	$ 29.351,00	10 días	lun 26/06/23	vie 7/07/23	20	77
23	**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 72.895.772,00**	**73 días**	**sáb 6/05/23**	**vie 4/08/23**		
24	**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 22.714.228,00**	**38 días**	**mar 20/06/23**	**vie 4/08/23**		
25	2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M3	$ 4.733.444,00	30 días	mar 20/06/23	mié 26/07/23	21CC+20 días	27CC+3 días;77;26CC+3 días
26	2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	M3	$ 16.986.921,00	35 días	vie 23/06/23	vie 4/08/23	25CC+3 días	29CC+3 días;77
27	2.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE 20 CM	M3	$ 993.863,00	35 días	vie 23/06/23	vie 4/08/23	25CC+3 días	29CC+3 días;77
28	**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 32.765.868,00**	**18 días**	**mar 27/06/23**	**mar 18/07/23**		
29	2.2.25	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	$ 32.765.868,00	18 días	mar 27/06/23	mar 18/07/23	27CC+3 días;26CC+3 días	31CC+7 días;35CC;57
30	**2.3**	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 4.981.767,00**	**21 días**	**sáb 1/07/23**	**jue 27/07/23**		
31	2.3.9	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	$ 4.981.767,00	18 días	jue 6/07/23	jue 27/07/23	29CC+7 días	34CC
32	2.3.13	ALFAJÍA EN CONCRETO 3000 PSI 0.12 X 0.12 M. INCLUYE BORDES ACHAFLANADOS	M	$ 0,00	7 días	sáb 1/07/23	lun 10/07/23	37	77
33	**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 7.972.394,00**	**25 días**	**mar 27/06/23**	**jue 27/07/23**		
34	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	$ 0,00	18 días	jue 6/07/23	jue 27/07/23	31CC;51CC	77
35	2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	$ 7.972.394,00	20 días	mar 27/06/23	vie 21/07/23	29CC;49CC	77
36	**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 4.461.515,00**	**45 días**	**sáb 6/05/23**	**vie 30/06/23**		
37	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE	KG	$ 4.461.515,00	45 días	sáb 6/05/23	vie 30/06/23	9FC+15 días;18FC+15	74;32;73;43CC
38	**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 42.960.019,00**	**66 días**	**lun 24/04/23**	**vie 14/07/23**		
39	**3.1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 39.791.898,00**	**66 días**	**lun 24/04/23**	**vie 14/07/23**		
40	3.1.18	LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFICIES A LA VIST/	M2	$ 3.852.410,00	60 días	lun 24/04/23	vie 7/07/23	9FC+5 días;18FC+	41CC+1 día;77
41	3.1.20	IMPERMEABILIZANTE DE PAREDES Y PISO CONM MORTERO MONO COMPONENTE FLEXIBLE E IMPERMEABLE A PRESIÓN DIRECTA E INDIRECTA PARA HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA. DOS MANOS.	M2	$ 35.939.488,00	65 días	mar 25/04/23	vie 14/07/23	40CC+1 día	65;67;77
42	**3.3**	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 3.168.121,00**	**56 días**	**sáb 6/05/23**	**vie 14/07/23**		
43	3.3.3	ANCLAJES VARILLA 5/8" L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	UN	$ 1.275.061,00	55 días	sáb 6/05/23	jue 13/07/23	37CC	44CC+1 día;77
44	3.3.8	JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AISLAMIENTO 2 CM H: 0.50	M	$ 1.893.060,00	55 días	lun 8/05/23	vie 14/07/23	43CC+1 día	65;67;77
45	**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 4.134.274,00**	**164 días**	**vie 20/01/23**	**vie 11/08/23**		
46	**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 352.884,00**	**60 días**	**lun 29/05/23**	**vie 11/08/23**		
47	4.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 352.884,00	60 días	lun 29/05/23	vie 11/08/23	21CC+3 días	77
48	**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**		**$ 2.005.104,00**	**18 días**	**vie 20/01/23**	**jue 9/02/23**		
49	4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 2.005.104,00	18 días	vie 20/01/23	jue 9/02/23		51CC+7 días;35CC;57
50	**4,8**	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 1.776.286,00**	**18 días**	**sáb 28/01/23**	**vie 17/02/23**		
51	4.8.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	$ 1.776.286,00	18 días	sáb 28/01/23	vie 17/02/23	49CC+7 días	34CC
52	**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 29.770.309,00**	**55 días**	**mié 31/05/23**	**mar 8/08/23**		
53	**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 725.954,00**	**55 días**	**mié 31/05/23**	**mar 8/08/23**		
54	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	$ 92.442,00	55 días	mié 31/05/23	mar 8/08/23	20CC+10 días	70CC+3 días;71CC+3 días;72CC+3
55	7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	$ 633.512,00	55 días	mié 31/05/23	mar 8/08/23	20CC+10 días	70CC+3 días;71CC+3 día
56	**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 29.044.355,00**	**15 días**	**mié 19/07/23**	**sáb 5/08/23**		
57	7.2.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE (BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	$ 29.044.355,00	15 días	mié 19/07/23	sáb 5/08/23	29;49	77
58	**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 15.158.316,00**	**60 días**	**mar 23/05/23**	**vie 4/08/23**		
59	**9.1**	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 2.972.109,00**	**60 días**	**mar 23/05/23**	**vie 4/08/23**		
60	9.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA PARA CÁRCAMO EN ÁNGULO DE 1-1/4" x 1/8" (MARCO), PLATINA DE ARRIOSTRAMIENTO EN 1" x 1/8", Y CONTRA MARCO EN ANGULO DE 1" x 3/16", INCLYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE TIPO	M	$ 2.972.109,00	60 días	mar 23/05/23	vie 4/08/23	20CC+3 días	70CC+3 días;71CC+3 días;72CC+3 días;77;79CC+3 días;80CC+3 días
61	**9.3**	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 12.186.207,00**	**60 días**	**mar 23/05/23**	**vie 4/08/23**		
62	9.3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	$ 12.186.207,00	60 días	mar 23/05/23	vie 4/08/23	20CC+3 días	70CC+3 días;71CC+3 días;72CC+3
63	**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 6.986.674,00**	**23 días**	**sáb 15/07/23**	**sáb 12/08/23**		
64	**13.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 4.227.841,00**	**23 días**	**sáb 15/07/23**	**sáb 12/08/23**		
65	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 4.227.841,00	23 días	sáb 15/07/23	sáb 12/08/23	41;44	77
66	**13.4**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 2.758.833,00**	**23 días**	**sáb 15/07/23**	**sáb 12/08/23**		
67	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 2.758.833,00	23 días	sáb 15/07/23	sáb 12/08/23	41;44	77
68	**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 13.500.897,00**	**57 días**	**sáb 3/06/23**	**lun 14/08/23**		
69	**17.1**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 13.500.897,00**	**57 días**	**sáb 3/06/23**	**lun 14/08/23**		
70	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 763.980,00	45 días	sáb 3/06/23	sáb 29/07/23	55CC+3 días;62CC+3	77
71	17.1.8	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 2.621.330,00	45 días	sáb 3/06/23	sáb 29/07/23	55CC+3 días;62CC+3 días;54CC+3 días;60CC+3 días	77
72	17.1.2	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	$ 9.152.579,00	45 días	sáb 3/06/23	sáb 29/07/23	55CC+3 días;62CC+3 días;54CC+3 días;60CC+3 días	77
73	17.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS CON TECNOLOGÍA DFX Y FIBRAS 3 MANOS.	M2	$ 61.299,00	35 días	sáb 1/07/23	lun 14/08/23	37	77
74	17.1.4	SEI DE VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). Ds = 100 CM - CAL 20	M	$ 901.709,00	35 días	sáb 1/07/23	lun 14/08/23	37	77
75	**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 4.301.372,00**	**1 día**	**mar 15/08/23**	**mar 15/08/23**		
76	**20.1**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 4.301.372,00**	**1 día**	**mar 15/08/23**	**mar 15/08/23**		
77	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 4.301.372,00	1 día	mar 15/08/23	mar 15/08/23	74;72;73;57;34;3!	1490
78	**NP**	**NO PREVISTOS**		**$ 15.065.435,00**	**45 días**	**sáb 3/06/23**	**sáb 29/07/23**		
79	NP-18	REPARACIÓN TUBERÍA GALVANIZADA MEDIANTE UNIÓN MECÁNICA TIPO DRESSER 3HD. INCLUYE TUBERÍA DE PRESIÓN 3" Y ACCESORIOS	GL	$ 14.218.835,00	45 días	sáb 3/06/23	sáb 29/07/23	55CC+3 días;62CC+3 días;54CC+3	77
80	NP-20	RETIRO DE PINTURA SUELTA EN ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA DE TODAS LAS	M	$ 846.600,00	45 días	sáb 3/06/23	sáb 29/07/23	55CC+3 días;62CC+3	77
81		**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**		**$ 198.655.641,00**	**178 días**	**sáb 21/01/23**	**mié 30/08/23**		
82		Etapa preconstructiva		$ 0,00	33 días	sáb 21/01/23	mar 28/02/23	2FC+1 día	85
83	**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 58.918.591,00**	**138 días**	**mié 1/03/23**	**mar 22/08/23**		
84	**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 1.946.390,00**	**5 días**	**mié 1/03/23**	**lun 6/03/23**		
85	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN	M	$ 1.946.390,00	5 días	mié 1/03/23	lun 6/03/23	82	87;88;89;90;95;106;94
86	**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 1.562.448,00**	**15 días**	**mar 7/03/23**	**vie 24/03/23**		
87	1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 789.690,00	15 días	mar 7/03/23	vie 24/03/23	85	131
88	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 622.674,00	15 días	mar 7/03/23	vie 24/03/23	85	131
89	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	UN	$ 89.340,00	15 días	mar 7/03/23	vie 24/03/23	85	131
90	1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 60.744,00	15 días	mar 7/03/23	vie 24/03/23	85	102FC+45 días;99FC+45 días
91	**1.3**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 52.596.163,00**	**48 días**	**lun 10/04/23**	**mar 6/06/23**		
92	1.3.1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	$ 52.596.163,00	48 días	lun 10/04/23	mar 6/06/23	95;94	96;110;109
93	**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 2.813.590,00**	**133 días**	**mar 7/03/23**	**mar 22/08/23**		
94	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA	M	$ 119.943,00	25 días	mar 7/03/23	mié 5/04/23	85	92;128FC+25 días;125FC+25 días;124FC+25 días;127FC+25 días;135FC+25 días;136FC+25
95	1.4.5	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	$ 1.685.650,00	25 días	mar 7/03/23	mié 5/04/23	85	92;128FC+25 días;125FC+25 días;124FC+25
96	1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	$ 1.007.997,00	60 días	mié 7/06/23	mar 22/08/23	92	131
97	**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 1.386.805,00**	**65 días**	**mar 23/05/23**	**vie 11/08/23**		
98	**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 1.386.805,00**	**65 días**	**mar 23/05/23**	**vie 11/08/23**		
99	2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS	UN	$ 1.386.805,00	65 días	mar 23/05/23	vie 11/08/23	90FC+45 días	132;103CC
100	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 2.887.956,00**	**65 días**	**mar 23/05/23**	**vie 11/08/23**		
101	**5.1**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 2.887.956,00**	**65 días**	**mar 23/05/23**	**vie 11/08/23**		
102	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	UN	$ 869.964,00	65 días	mar 23/05/23	vie 11/08/23	90FC+45 días	132;103CC
103	5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 2.017.992,00	65 días	mar 23/05/23	vie 11/08/23	99CC;102CC	132
104	**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 3.786.600,00**	**45 días**	**mar 7/03/23**	**mié 3/05/23**		
105	**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 3.786.600,00**	**45 días**	**mar 7/03/23**	**mié 3/05/23**		
106	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	$ 3.786.600,00	45 días	mar 7/03/23	mié 3/05/23	85	131
107	**12**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 41.238.819,00**	**65 días**	**mié 7/06/23**	**lun 28/08/23**		
108	**12.1**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 41.238.819,00**	**65 días**	**mié 7/06/23**	**lun 28/08/23**		
109	12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO,	M2	$ 22.818.401,00	65 días	mié 7/06/23	lun 28/08/23	92	117CC;120CC;132;114C
110	12.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA OCTOGONAL. PERFIL RECTANGULAR PPAL DE 80X40MM Y PERFILES INTERMEDIOS DE 25X25MM	M2	$ 18.420.418,00	65 días	mié 7/06/23	lun 28/08/23	92	117CC;120CC;132;114C
111	**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 9.812.143,00**	**65 días**	**mié 7/06/23**	**lun 28/08/23**		
112	**13.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 7.299.827,00**	**65 días**	**mié 7/06/23**	**lun 28/08/23**		
113	13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 6.530.426,00	65 días	mié 7/06/23	lun 28/08/23	109CC;110CC	132
114	13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 769.401,00	65 días	mié 7/06/23	lun 28/08/23	109CC;110CC	132
115	**13.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 2.512.316,00**	**65 días**	**mié 7/06/23**	**lun 28/08/23**		
116	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 2.318.666,00	65 días	mié 7/06/23	lun 28/08/23	109CC;110CC	132
117	13.2.5	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS	M	$ 193.650,00	65 días	mié 7/06/23	lun 28/08/23	109CC;110CC	132
118	**15**	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 1.102.471,00**	**65 días**	**mié 7/06/23**	**lun 28/08/23**		
119	**15.2**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 1.102.471,00**	**65 días**	**mié 7/06/23**	**lun 28/08/23**		
120	15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E =4 MM	M2	$ 1.102.471,00	65 días	mié 7/06/23	lun 28/08/23	109CC;110CC	132
121	**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 33.856.163,00**	**85 días**	**mié 10/05/23**	**jue 24/08/23**		
122	**17.1**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 33.856.163,00**	**85 días**	**mié 10/05/23**	**jue 24/08/23**		

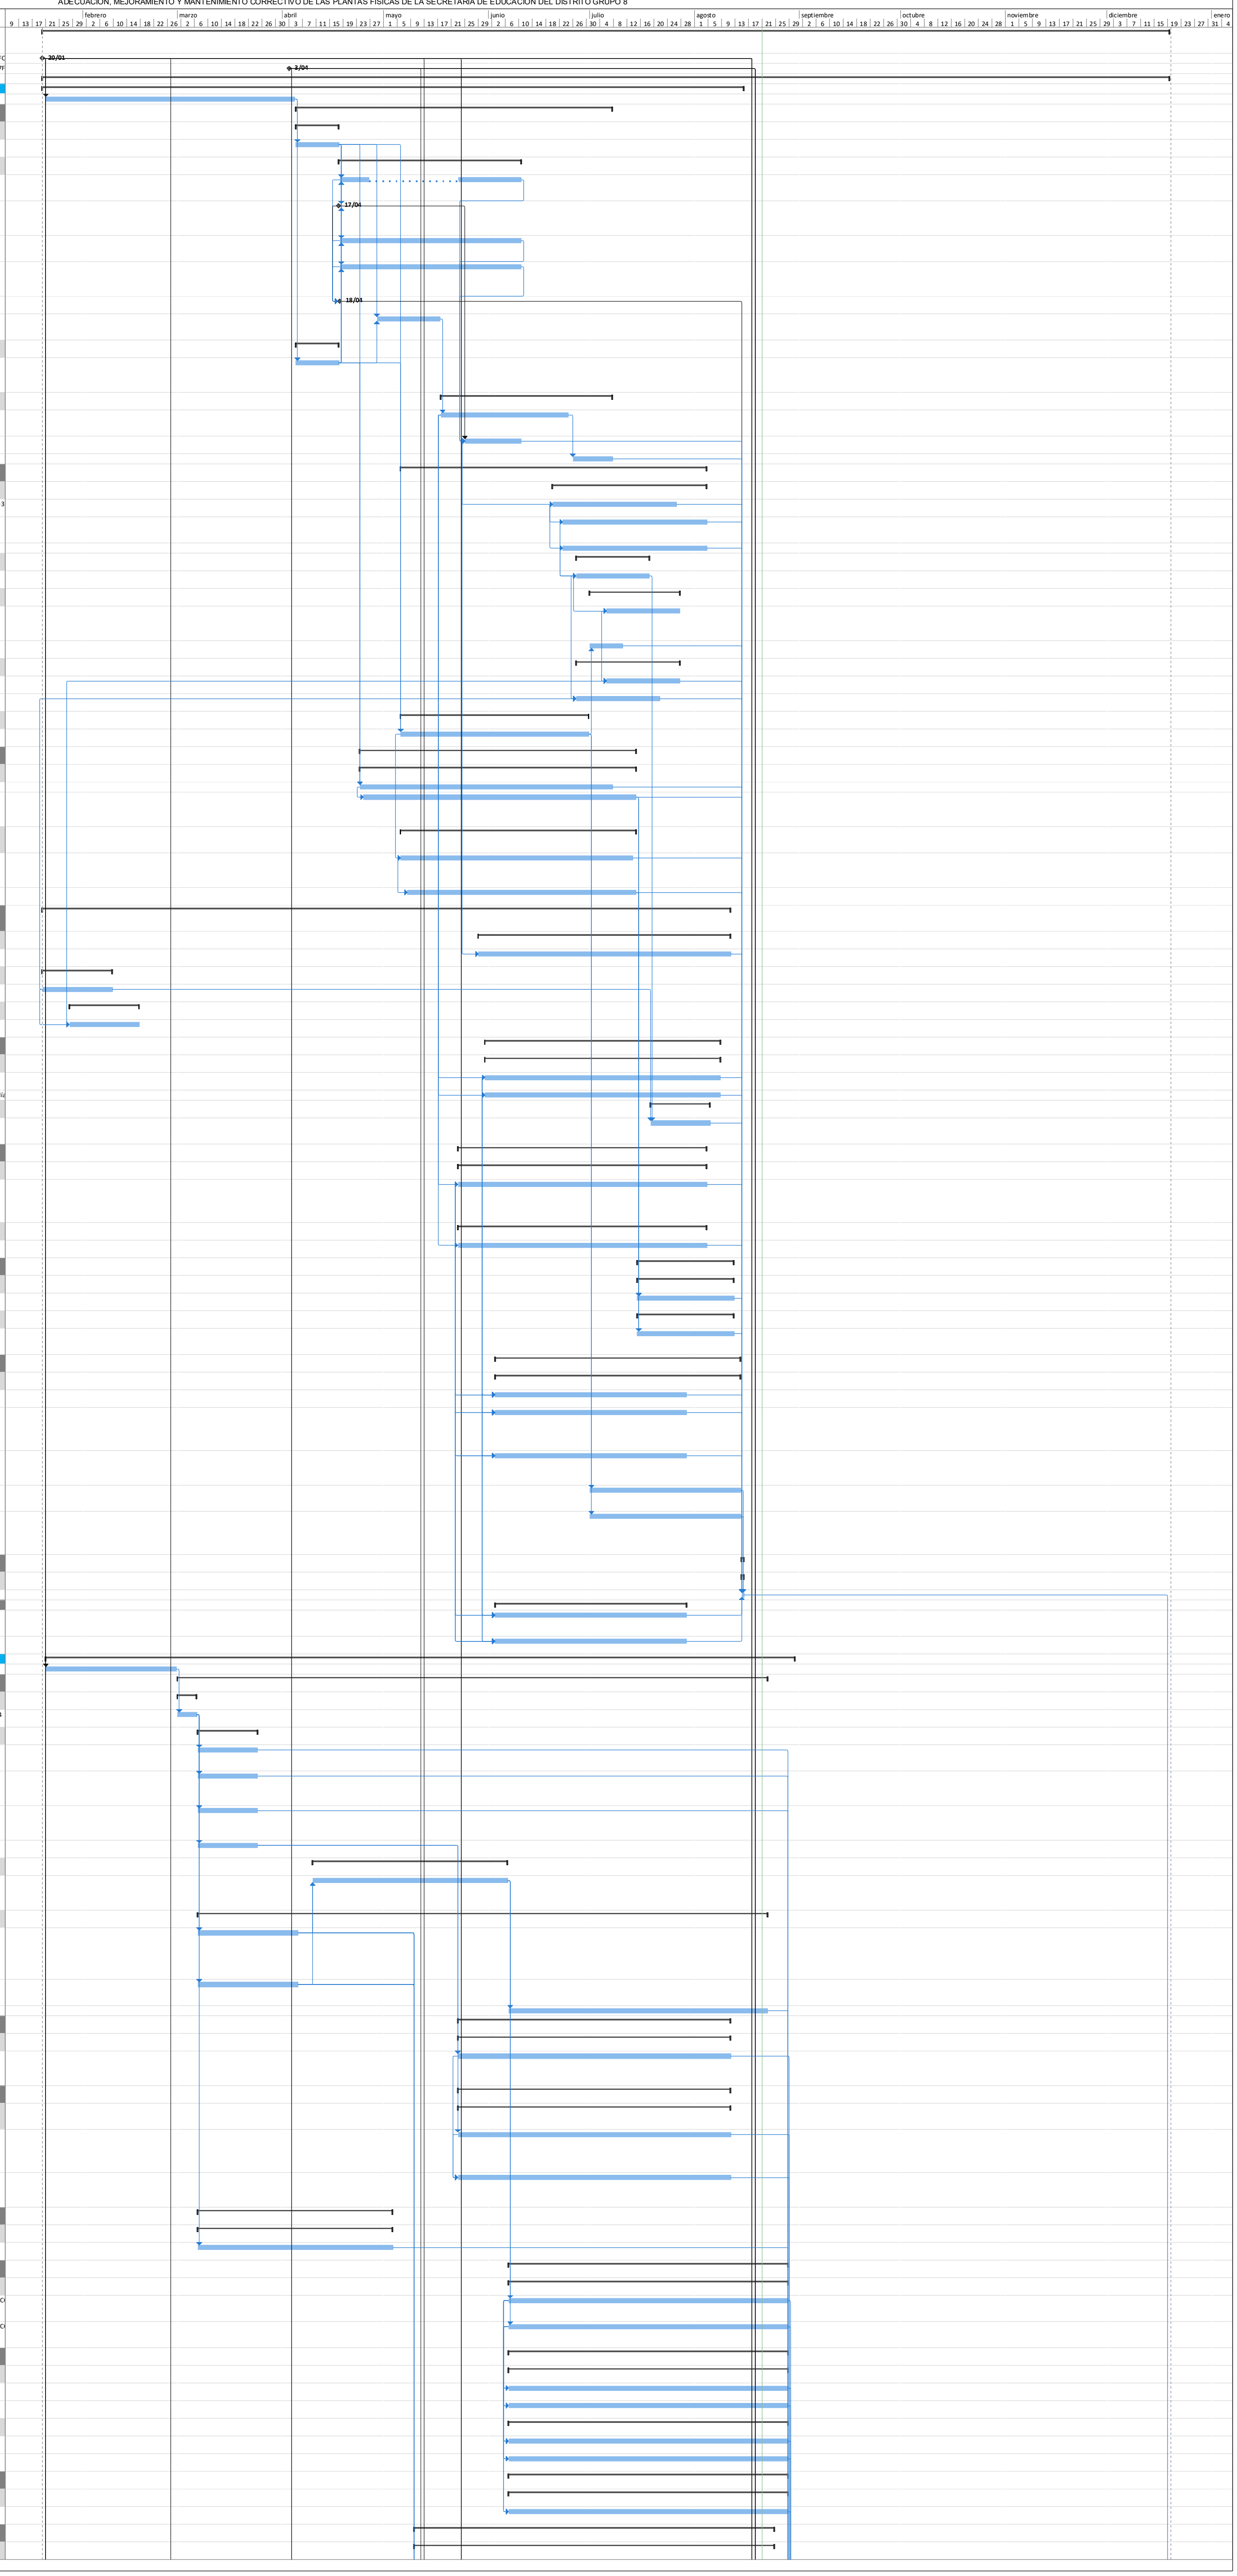

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8

Id	Item	COLEGIO	Unid	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
123	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO	M	$ 5.044.572,00	85 días	mié 10/05/23	jue 24/08/23	128CC;125CC;124	131
124	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 815.876,00	85 días	mié 10/05/23	jue 24/08/23	94FC+25 días;95FC+25	123CC;132;126CC
125	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 572.985,00	85 días	mié 10/05/23	jue 24/08/23	94FC+25 días;95FC+25	123CC;132;126CC
126	17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE	M2	$ 7.034.491,00	85 días	mié 10/05/23	jue 24/08/23	124CC;125CC	131
127	17.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	$ 5.329.272,00	85 días	mié 10/05/23	jue 24/08/23	94FC+25 días;95FC+25 días	123CC;132;129CC
128	17.1.2	LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	M2	$ 10.206.619,00	85 días	mié 10/05/23	jue 24/08/23	94FC+25 días;95FC+25 días	123CC;132;129CC;134C
129	17.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL	M2	$ 4.852.348,00	85 días	mié 10/05/23	jue 24/08/23	127CC;128CC	131
130	**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 10.730.153,00**	**2 días**	**mar 29/08/23**	**mié 30/08/23**		
131	**20.1**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 10.730.153,00**	**2 días**	**mar 29/08/23**	**mié 30/08/23**	**87;88;89;96;106;**	
132	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 10.730.153,00	2 días	mar 29/08/23	mié 30/08/23	99;102;103;109;1	
133	**NP**	**ÍTEMS NO PREVISTOS**		**$ 34.935.940,00**	**85 días**	**mié 10/05/23**	**jue 24/08/23**		
134	NP-02	DESMONTE DE ESPEJOS (INCLUYE EMBALAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS)	M	$ 134.105,00	85 días	mié 10/05/23	jue 24/08/23	128CC;136CC;135	
135	NP-03	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHE EN LAMINA GALVAN	M	$ 1.058.832,00	85 días	mié 10/05/23	jue 24/08/23	94FC+25 días;95F	132;134CC;137CC
136	NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X60CM	M2	$ 12.935.447,00	85 días	mié 10/05/23	jue 24/08/23	94FC+25 días;95FC+25	132;134CC;137CC
137	NP-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUSH ANTIVANDALICO PARA SANITARIO (INCLUYE RETIRO DE PUSH PARA SANITARIO EXISTENTE)	UN	$ 20.229.552,00	85 días	mié 10/05/23	jue 24/08/23	135CC;136CC	
138	NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LUMINARIAS 30X120	UN	$ 578.004,00	85 días	mié 10/05/23	jue 24/08/23	94FC+25 días;95FC+25	132;134CC
139		COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR		$ 0,00	100 días	vie 18/08/23	mar 19/12/23		
140		Priorizacion de la necesidad		$ 0,00	0 días	vie 18/08/23	vie 18/08/23	2FC+170 días	141FC+6 días
141		Etapa preconstructiva		$ 0,00	0 días	sáb 26/08/23	sáb 26/08/23	140FC+6 días	142FC+10 días
142		Ejecucion de obras		$ 0,00	84 días	vie 8/09/23	mar 19/12/23	141FC+10 días	1490
143		**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**		**$ 1.023.178.986,00**	**223 días**	**sáb 21/01/23**	**lun 23/10/23**		
144		Etapa preconstructiva		$ 0,00	50 días	sáb 21/01/23	mar 21/03/23	2FC+1 día	147
145	**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 57.335.352,00**	**45 días**	**mié 22/03/23**	**mié 17/05/23**		
146	**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 51.338.202,00**	**30 días**	**mié 22/03/23**	**vie 28/04/23**		
147	1.2.5	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 1.791.754,00	18 días	mié 22/03/23	vie 14/04/23	144	151CC;152CC;153CC;15
148	1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 1.479.744,00	18 días	mié 22/03/23	vie 14/04/23	147CC	258
149	1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 505.039,00	18 días	mié 22/03/23	vie 14/04/23	147CC	258
150	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 13.914.403,00	18 días	mié 22/03/23	vie 14/04/23	147CC	258
151	1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 2.923.107,00	18 días	mié 22/03/23	vie 14/04/23	147CC	258
152	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 491.973,00	18 días	mié 22/03/23	vie 14/04/23	147CC	258
153	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 1.790.222,00	18 días	mié 22/03/23	vie 14/04/23	147CC	258
154	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	UN	$ 297.800,00	18 días	mié 22/03/23	vie 14/04/23	147CC	258
155	1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M	$ 1.688.700,00	18 días	mié 22/03/23	vie 14/04/23	147CC	258
156	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC.,	M2	$ 12.737.740,00	25 días	mié 22/03/23	sáb 22/04/23	147CC	174;259FC+15 días;164;173;172;171;1
157	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	$ 1.243.296,00	30 días	mié 22/03/23	vie 28/04/23	147CC	258
158	1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	$ 981.310,00	30 días	mié 22/03/23	vie 28/04/23	147CC	258
159	1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 440.394,00	30 días	mié 22/03/23	vie 28/04/23	147CC	258
160	1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	$ 2.064.600,00	30 días	mié 22/03/23	vie 28/04/23	147CC	258
161	1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS	M	$ 6.073.200,00	30 días	mié 22/03/23	vie 28/04/23	147CC	258
162	1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS	M	$ 2.914.920,00	30 días	mié 22/03/23	vie 28/04/23	147CC	164
163	**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 5.997.150,00**	**15 días**	**sáb 29/04/23**	**mié 17/05/23**		
164	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA	M	$ 5.997.150,00	15 días	sáb 29/04/23	mié 17/05/23	156;162	
165	**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 110.916.327,00**	**110 días**	**mié 22/03/23**	**mar 8/08/23**		
166	**2,1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 14.267.469,00**	**85 días**	**mié 22/03/23**	**vie 7/07/23**		
167	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 5.014.714,00	50 días	mié 22/03/23	mié 24/05/23	147CC	168CC+25 días;258
168	2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	M3	$ 9.252.755,00	60 días	lun 24/04/23	vie 7/07/23	167CC+25 días	258
169	**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 19.194.918,00**	**55 días**	**lun 24/04/23**	**vie 30/06/23**		
170	2.2.2	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.186.910,00	55 días	lun 24/04/23	vie 30/06/23	156	176CC;179FC-15 días;178FC-15 días
171	2.2.4	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.785.279,00	55 días	lun 24/04/23	vie 30/06/23	156	176CC;179FC-15 días;178FC-15 días
172	2.2.5	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE	M3	$ 4.310.764,00	55 días	lun 24/04/23	vie 30/06/23	156	176CC;179FC-15 días;178FC-15 días
173	2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE	M2	$ 5.470.492,00	55 días	lun 24/04/23	vie 30/06/23	156	176CC;179FC-15 días;178FC-15 días
174	2.2.27	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"	M2	$ 6.441.473,00	55 días	lun 24/04/23	vie 30/06/23	156	176CC;179FC-15 días;178FC-15 días
175	**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 17.145.069,00**	**55 días**	**lun 24/04/23**	**vie 30/06/23**		
176	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	$ 17.145.069,00	55 días	lun 24/04/23	vie 30/06/23	174CC;173CC;172	258
177	**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 60.308.871,00**	**45 días**	**mar 13/06/23**	**mar 8/08/23**		
178	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE	KG	$ 57.139.031,00	45 días	mar 13/06/23	mar 8/08/23	174FC-15 días;173FC-15	258;182;190
179	2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS	UN	$ 3.169.840,00	45 días	mar 13/06/23	mar 8/08/23	174FC-15 días;173FC-15 días;172FC-15 días;171FC-15	258
180	**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 23.491.640,00**	**55 días**	**mié 9/08/23**	**jue 12/10/23**		
181	**3.1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 22.421.690,00**	**55 días**	**mié 9/08/23**	**jue 12/10/23**		
182	3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2	$ 2.300.085,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	178	187CC;210CC+15 días;2
183	3.1.8	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL E = 0.15 M (A LA VISTA DOS CARAS)	M2	$ 870.311,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	182CC	187CC;210CC+15 días;234CC;258;241CC
184	3.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 18.762.094,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	182CC	187CC;210CC+15 días;234CC;258;241CC
185	3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	$ 489.200,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	182CC	187CC;210CC+15 días;234CC;258;241CC
186	**3.2**	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 1.069.950,00**	**30 días**	**mié 9/08/23**	**mié 13/09/23**		
187	3.2.2	POYOS E = 0.10 CM, ANCHO ENTRE 0.45 Y 0.60 M (INCLUYE MAMPOSTERÍA, PAÑETE, ACABADO EN GRANITO PULIDO)	M	$ 1.069.950,00	30 días	mié 9/08/23	mié 13/09/23	185CC;184CC;183	212CC+15 días;258
188	**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 57.185.185,00**	**55 días**	**mié 9/08/23**	**jue 12/10/23**		
189	**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 46.390.620,00**	**55 días**	**mié 9/08/23**	**jue 12/10/23**		
190	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 10.319.700,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	178	191CC;192CC;193CC;19
191	4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	$ 3.000.870,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	190CC	258
192	4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 9.553.050,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	190CC	258
193	4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	$ 1.988.910,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	190CC	258
194	4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	$ 12.604.140,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	190CC	258
195	4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	$ 8.923.950,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	190CC	258
196	**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**		**$ 6.353.850,00**	**55 días**	**mié 9/08/23**	**jue 12/10/23**		
197	4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 '' INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 4.093.800,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	190CC	258
198	4.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1	UN	$ 2.260.050,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	190CC	258
199	**4.8**	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 4.440.715,00**	**55 días**	**mié 9/08/23**	**jue 12/10/23**		
200	4.8.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	$ 4.440.715,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	190CC	258
201	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 89.017.592,00**	**55 días**	**mié 9/08/23**	**jue 12/10/23**		
202	**5.1**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 89.017.592,00**	**55 días**	**mié 9/08/23**	**jue 12/10/23**		
203	5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	UN	$ 12.474.240,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	190CC	258
204	5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	UN	$ 16.912.425,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	190CC	258
205	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	M	$ 31.850.250,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	190CC	258
206	5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	$ 13.545.750,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	190CC	258
207	5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 14.234.927,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	190CC	258
208	**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 123.388.349,00**	**45 días**	**lun 28/08/23**	**jue 19/10/23**		
209	**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 22.474.411,00**	**35 días**	**lun 28/08/23**	**vie 6/10/23**		
210	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	$ 22.474.411,00	35 días	lun 28/08/23	vie 6/10/23	185CC+15 días;184CC+15	258
211	**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 100.913.938,00**	**45 días**	**lun 28/08/23**	**jue 19/10/23**		
212	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2	$ 76.848.565,00	45 días	lun 28/08/23	jue 19/10/23	187CC+15 días	213CC;214CC;215CC;22 días;218CC+10
213	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES	M	$ 3.055.600,00	45 días	lun 28/08/23	jue 19/10/23	212CC	258
214	7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	$ 3.611.252,00	45 días	lun 28/08/23	jue 19/10/23	212CC	258
215	7.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN CUARTERÓN ANCHO E = 6 CM 26X6X6,	M2	$ 17.398.521,00	45 días	lun 28/08/23	jue 19/10/23	212CC	258
216	**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 98.425.676,00**	**35 días**	**vie 8/09/23**	**jue 19/10/23**		
217	**9.1**	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 20.070.832,00**	**35 días**	**vie 8/09/23**	**jue 19/10/23**		
218	9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y	M2	$ 20.070.832,00	35 días	vie 8/09/23	jue 19/10/23	212CC+10 días	258
219	**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 78.354.844,00**	**35 días**	**vie 8/09/23**	**jue 19/10/23**		
220	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA	M2	$ 78.354.844,00	35 días	vie 8/09/23	jue 19/10/23	212CC+10 días	258
221	**11**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 11.114.028,00**	**12 días**	**sáb 7/10/23**	**sáb 21/10/23**		
222	**11.1**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 11.114.028,00**	**12 días**	**sáb 7/10/23**	**sáb 21/10/23**		
223	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	$ 6.983.790,00	12 días	sáb 7/10/23	sáb 21/10/23	212FC-10 días	258;224CC;225CC;226C
224	11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y	UN	$ 1.757.348,00	12 días	sáb 7/10/23	sáb 21/10/23	223CC	258
225	11.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO	UN	$ 986.294,00	12 días	sáb 7/10/23	sáb 21/10/23	223CC	258
226	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO	UN	$ 1.386.596,00	12 días	sáb 7/10/23	sáb 21/10/23	223CC	258
227	**12**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 65.698.855,00**	**10 días**	**sáb 7/10/23**	**jue 19/10/23**		
228	**12.1**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 65.698.855,00**	**10 días**	**sáb 7/10/23**	**jue 19/10/23**		
229	12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO,	M2	$ 17.310.215,00	10 días	sáb 7/10/23	jue 19/10/23	223CC	258;247CC;244CC
230	12.1.2	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20 M CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40 CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	M	$ 35.735.362,00	10 días	sáb 7/10/23	jue 19/10/23	223CC	258;247CC;244CC
231	12.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA OCTOGONAL. PERFIL RECTANGULAR PPAL DE 80X40MM Y PERFILES INTERMEDIOS DE 25X25MM	M2	$ 12.653.278,00	10 días	sáb 7/10/23	jue 19/10/23	223CC	258;247CC;244CC;253C
232	**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 136.820.140,00**	**60 días**	**mié 9/08/23**	**jue 19/10/23**		
233	**13.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 71.940.418,00**	**60 días**	**mié 9/08/23**	**jue 19/10/23**		
234	13.1.3	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO	M2	$ 60.207.175,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	185CC;184CC;183	235CC+15 días;237CC+7 días;258
235	13.1.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 11.733.243,00	45 días	lun 28/08/23	jue 19/10/23	234CC+15 días;241CC+15	237CC+17 días;258
236	**13.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 64.879.722,00**	**28 días**	**sáb 16/09/23**	**jue 19/10/23**		
237	13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 35.168.937,00	28 días	sáb 16/09/23	jue 19/10/23	234CC+7 días;235CC+17	238CC;258
238	13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 29.710.785,00	28 días	sáb 16/09/23	jue 19/10/23	237CC	258
239	**14**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 3.343.194,00**	**40 días**	**mié 9/08/23**	**lun 25/09/23**		
240	**14.1**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 3.343.194,00**	**40 días**	**mié 9/08/23**	**lun 25/09/23**		

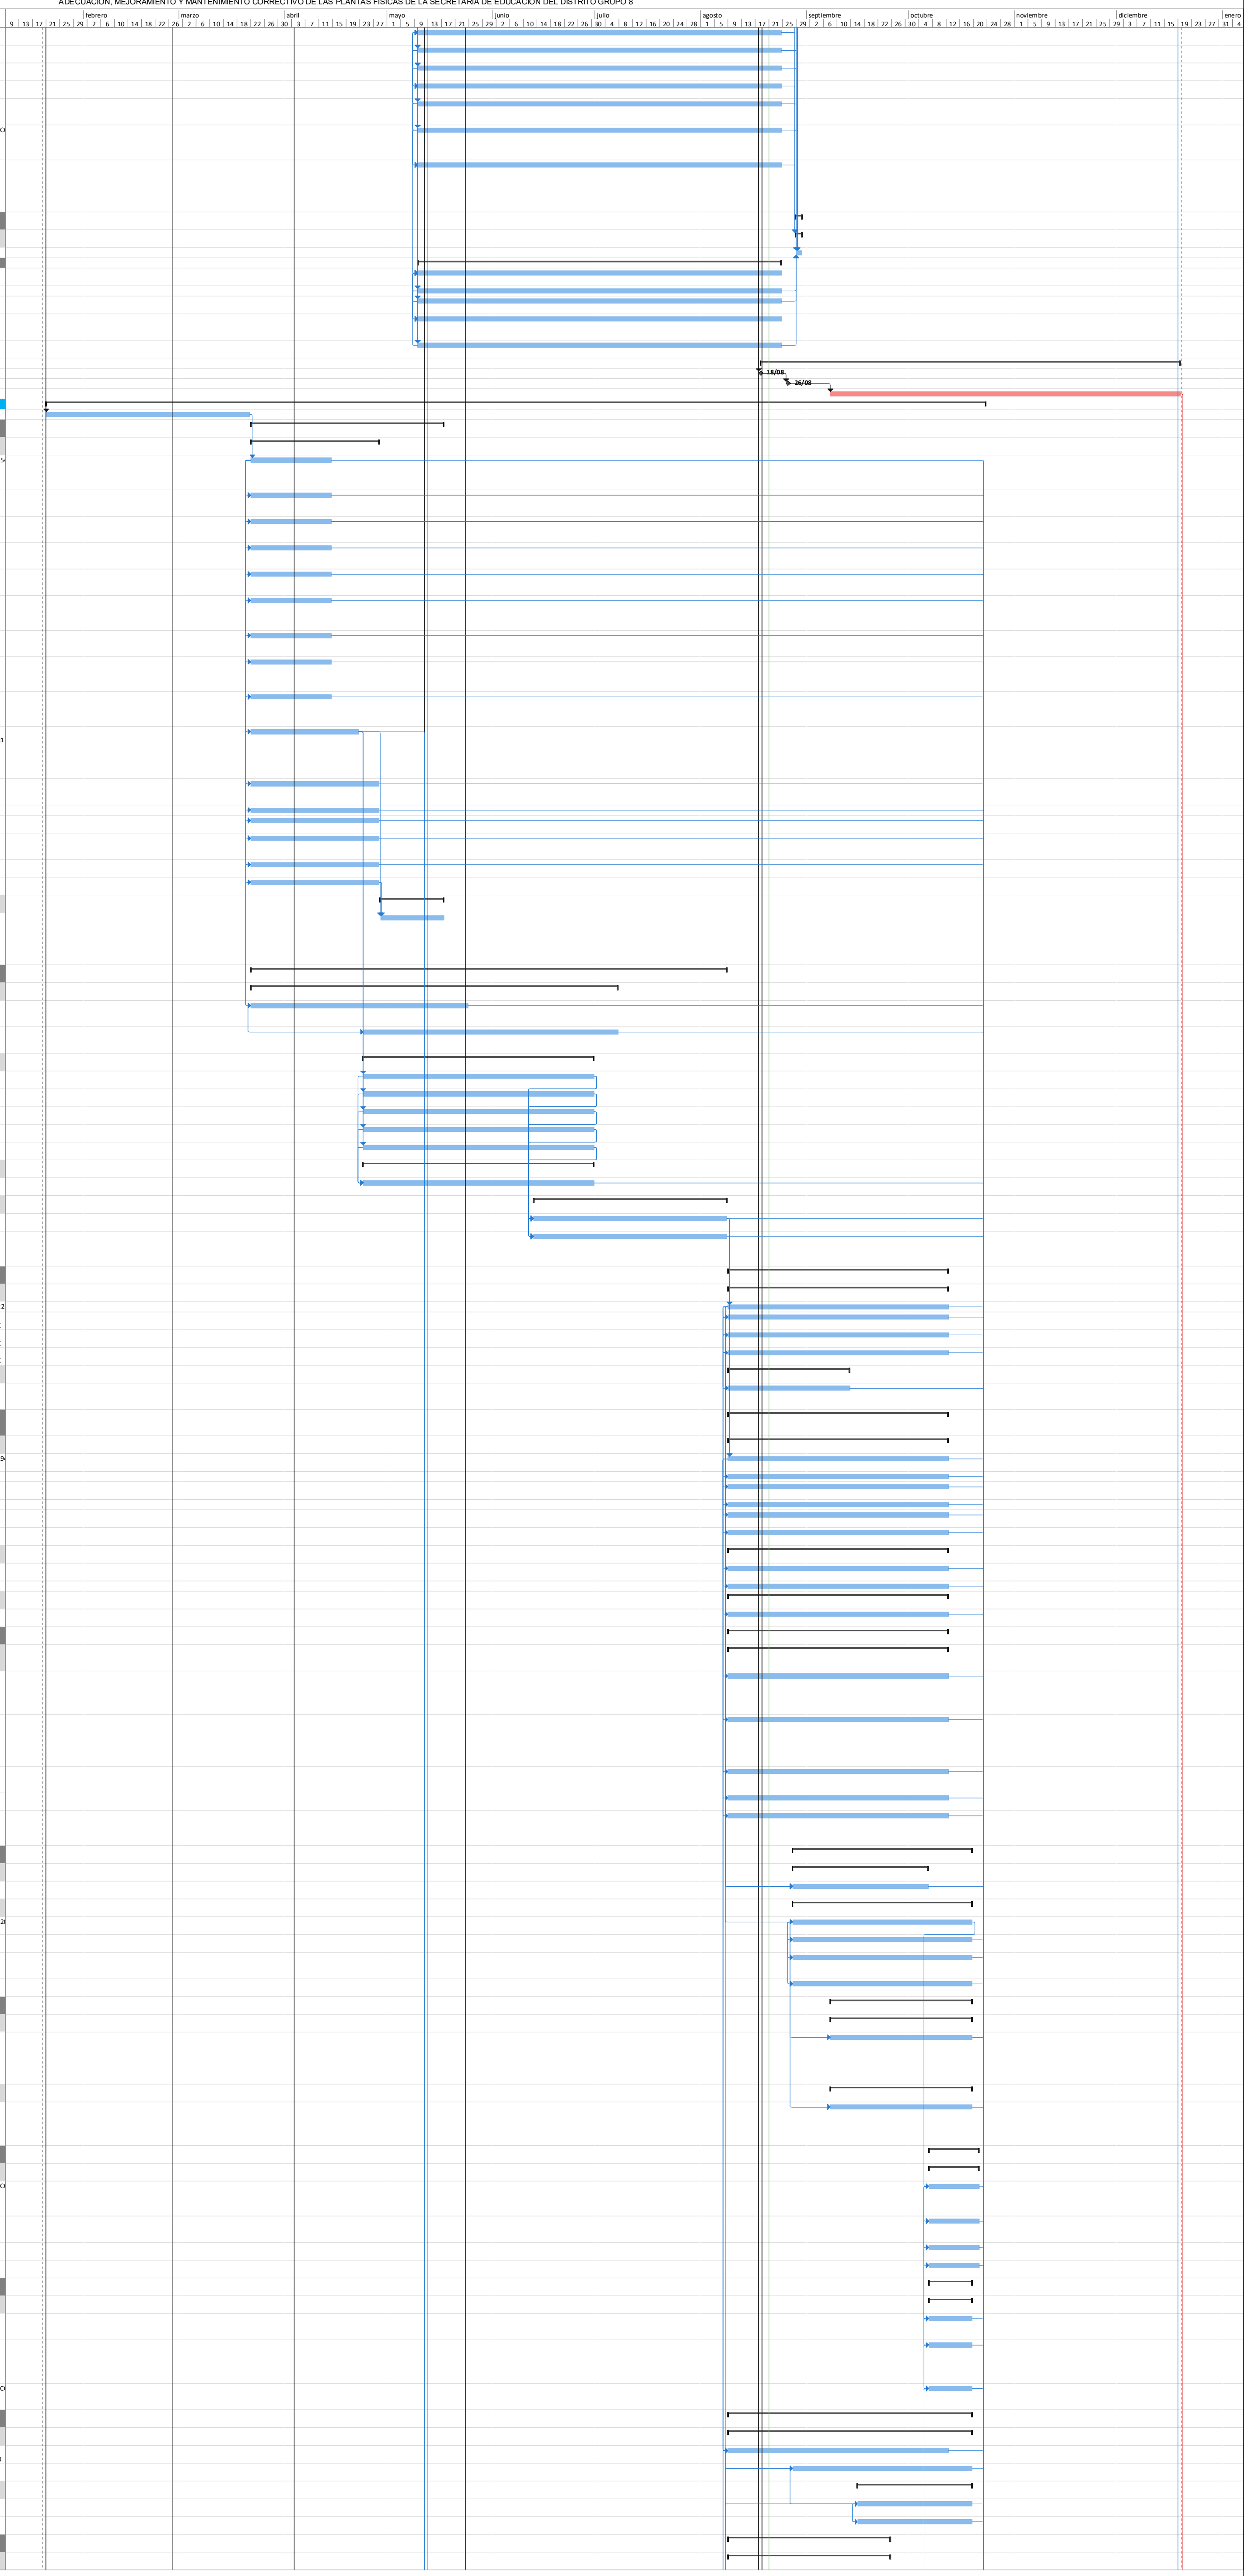

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION


ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8

Id	Item	COLEGIO		Unid	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
241	14.1.1		CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM)	M2	$ 3.343.194,00	40 días	mié 9/08/23	lun 25/09/23	185CC;184CC;183	235CC+15 días;237CC+7 días;258
242	15		**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 1.950.304,00**	**8 días**	**sáb 7/10/23**	**mar 17/10/23**		
243	15.2		**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 1.950.304,00**	**8 días**	**sáb 7/10/23**	**mar 17/10/23**		
244	15.2.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	$ 1.950.304,00	8 días	sáb 7/10/23	mar 17/10/23	231CC;230CC;229	258
245	16		**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 10.974.654,00**	**8 días**	**sáb 7/10/23**	**mar 17/10/23**		
246	16.1		**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 10.974.654,00**	**8 días**	**sáb 7/10/23**	**mar 17/10/23**		
247	16.1.1		CANCHA MÚLTIPLE PARA NIÑOS PEQUEÑOS: BALONCESTO - MICROFUTBOL - (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	$ 10.974.654,00	8 días	sáb 7/10/23	mar 17/10/23	231CC;230CC;229	258
248	17		**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 152.334.355,00**	**12 días**	**sáb 7/10/23**	**sáb 21/10/23**		
249	17.1		**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 152.334.355,00**	**12 días**	**sáb 7/10/23**	**sáb 21/10/23**		
250	17.1.1		FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO	M	$ 3.275.702,00	12 días	sáb 7/10/23	sáb 21/10/23	253CC	258
251	17.1.4		CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 3.370.673,00	12 días	sáb 7/10/23	sáb 21/10/23	253CC	258
252	17.1.5		BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 8.276.450,00	12 días	sáb 7/10/23	sáb 21/10/23	253CC	258
253	17.1.8		DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 13.154.312,00	12 días	sáb 7/10/23	sáb 21/10/23	231CC	258;250CC;251CC;252C
254	17.1.2		LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	M2	$ 7.011.089,00	12 días	sáb 7/10/23	sáb 21/10/23	253CC	258
255	17.1.2		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL	M2	$ 117.246.129,00	12 días	sáb 7/10/23	sáb 21/10/23	253CC	258;262CC
256	20		**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 28.811.982,00**	**133 días**	**vie 12/05/23**	**lun 23/10/23**		
257	20.1		**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 28.811.982,00**	**133 días**	**vie 12/05/23**	**lun 23/10/23**		
258	20.1.1		ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 5.781.000,00	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	231;247;238;220;	1490
259	20.1.2		DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	$ 9.452.647,00	40 días	vie 12/05/23	vie 30/06/23	156FC+15 días	260CC
260	20.1.3		EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG	$ 13.578.335,00	40 días	vie 12/05/23	vie 30/06/23	259CC	258
261	NP		**NO PREVISTOS**		**$ 52.371.353,00**	**47 días**	**lun 28/08/23**	**sáb 21/10/23**		
262	NP-05		REMATE DE MAMPOSTERÍA A CUBIERTA TIPO SÁNDWICH H>=30 CIM, INCLUYE MAMPOSTERÍA Y	M	$ 3.330.975,00	12 días	sáb 7/10/23	sáb 21/10/23	255CC	258
263	NP-08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X60CM	M2	$ 10.304.006,00	45 días	lun 28/08/23	jue 19/10/23	182CC+15 días	258;264CC;265CC
264	NP-09		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO EXTERIOR DE 14 MM E INTERIOR DE 10 MM CON DILATACIONES SEGÚN DISEÑO, REMACHES O TACHES, NO INCLUYE PINTURA	M2	$ 33.192.814,00	45 días	lun 28/08/23	jue 19/10/23	263CC	258
265	NP-14		SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON CORRIDO A DOBLE ALTURA EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON DE 15CM, REENGRUESE DE 2CM TERMINADO ANCHO 60CM. NO INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE	M	$ 5.543.558,00	45 días	lun 28/08/23	jue 19/10/23	263CC	258
266			**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**		**$ 545.402.098,00**	**221 días**	**sáb 21/01/23**	**vie 20/10/23**		
267			Etapa preconstructiva		$ 0,00	110 días	sáb 21/01/23	lun 5/06/23	2FC+1 día	270
268	1		**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 37.567.195,00**	**27 días**	**mar 6/06/23**	**lun 10/07/23**		
269	1.1		**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 4.146.061,00**	**15 días**	**mar 6/06/23**	**sáb 24/06/23**		
270	1.1.2		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	$ 2.936.681,00	15 días	mar 6/06/23	sáb 24/06/23	267	271CC;273;274;275;276
271	1.1.3		CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN	M	$ 1.209.380,00	15 días	mar 6/06/23	sáb 24/06/23	270CC	273;274;275;276;277;2
272	1.2		**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 33.421.134,00**	**12 días**	**lun 26/06/23**	**lun 10/07/23**		
273	1.2.10		DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 20.972.192,00	12 días	lun 26/06/23	lun 10/07/23	271;270	286
274	1.2.24		DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACION Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA; (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 1.898.340,00	12 días	lun 26/06/23	lun 10/07/23	271;270	286
275	1.2.28		DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 79.053,00	12 días	lun 26/06/23	lun 10/07/23	271;270	286
276	1.2.33		DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC.,	M2	$ 9.358.733,00	12 días	lun 26/06/23	lun 10/07/23	271;270	286
277	1.2.44		DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 91.116,00	12 días	lun 26/06/23	lun 10/07/23	271;270	286
278	1.2.45		DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	$ 0,00	12 días	lun 26/06/23	lun 10/07/23	271;270	286
279	1.2.50		DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	UN	$ 1.021.700,00	12 días	lun 26/06/23	lun 10/07/23	271;270	286
280	2		**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 242.157.153,00**	**77 días**	**lun 26/06/23**	**mié 27/09/23**		
281	2.1		**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 80.609.652,00**	**42 días**	**lun 26/06/23**	**mié 16/08/23**		
282	2.1.1		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 22.059.469,00	25 días	lun 26/06/23	mié 26/07/23	270	284CC+7 días;283CC+7 días
283	2.1.14		SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE 20 CM	M3	$ 7.470.863,00	35 días	mié 5/07/23	mié 16/08/23	282CC+7 días	286
284	2.1.10		SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	M3	$ 51.079.320,00	35 días	mié 5/07/23	mié 16/08/23	282CC+7 días	286
285	2.2		**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 62.752.517,00**	**30 días**	**jue 17/08/23**	**jue 21/09/23**		
286	2.2.25		PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	$ 62.752.517,00	30 días	jue 17/08/23	jue 21/09/23	284;283;273;274	288CC;290CC;301CC+5 días;304CC;306CC;296C
287	2.3		**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 36.058.504,00**	**30 días**	**jue 17/08/23**	**jue 21/09/23**		
288	2.3.9		CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	$ 36.058.504,00	30 días	jue 17/08/23	jue 21/09/23	286CC	290CC
289	2.4		**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 31.697.531,00**	**30 días**	**jue 17/08/23**	**jue 21/09/23**		
290	2.4.1		SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	$ 14.464.211,00	30 días	jue 17/08/23	jue 21/09/23	286CC;288CC	291CC
291	2.4.3		SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	$ 17.233.320,00	30 días	jue 17/08/23	jue 21/09/23	290CC	345
292	2.5		**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 31.038.949,00**	**30 días**	**jue 24/08/23**	**mié 27/09/23**		
293	2.5.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE	KG	$ 31.038.949,00	30 días	jue 24/08/23	mié 27/09/23	299CC	336
294	3		**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 12.016.098,00**	**28 días**	**jue 24/08/23**	**lun 25/09/23**		
295	3,1		**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 8.813.050,00**	**28 días**	**jue 24/08/23**	**lun 25/09/23**		
296	3.1.13		SUMINISTRO E INSTALACION MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 1.673.493,00	28 días	jue 24/08/23	lun 25/09/23	286CC+5 días	328
297	3.1.18		LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFICIES A LA VISTA	M2	$ 7.139.557,00	28 días	jue 24/08/23	lun 25/09/23	286CC+5 días	328
298	3.2		**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 864.736,00**	**28 días**	**jue 24/08/23**	**lun 25/09/23**		
299	3.2.4		REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	ML	$ 864.736,00	28 días	jue 24/08/23	lun 25/09/23	286CC+5 días	293CC;328
300	3.3		**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 2.338.312,00**	**28 días**	**jue 24/08/23**	**lun 25/09/23**		
301	3.3.5		ANCLAJE PARA SUJECIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 10 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN -	UN	$ 2.338.312,00	28 días	jue 24/08/23	lun 25/09/23	286CC+5 días	328
302	4		**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 8.302.014,00**	**35 días**	**jue 17/08/23**	**mié 27/09/23**		
303	4.1		**REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 3.902.316,00**	**35 días**	**jue 17/08/23**	**mié 27/09/23**		
304	4.1.22		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	ML	$ 3.902.316,00	35 días	jue 17/08/23	mié 27/09/23	286CC	345
305	4.8		**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 4.399.698,00**	**35 días**	**jue 17/08/23**	**mié 27/09/23**		
306	4.8.2		CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METALICA E = 0.20 M	UND.	$ 4.399.698,00	35 días	jue 17/08/23	mié 27/09/23	286CC	345
307	5		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 15.807.288,00**	**17 días**	**jue 28/09/23**	**mié 18/10/23**		
308	5.1		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 15.807.288,00**	**17 días**	**jue 28/09/23**	**mié 18/10/23**		
309	5.1.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	UN	$ 831.616,00	17 días	jue 28/09/23	mié 18/10/23	336CC	345;310CC;311CC;312C
310	5.1.12		SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	UN	$ 225.499,00	17 días	jue 28/09/23	mié 18/10/23	309CC	345
311	5.1.20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA	UN	$ 0,00	17 días	jue 28/09/23	mié 18/10/23	309CC	345
312	5.1.33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A	UN	$ 43.054,00	17 días	jue 28/09/23	mié 18/10/23	309CC	345
313	5.1.39		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y	UN	$ 594.936,00	17 días	jue 28/09/23	mié 18/10/23	309CC	345
314	5.1.50		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	M	$ 679.472,00	17 días	jue 28/09/23	mié 18/10/23	309CC	345
315	5.1.56		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	$ 1.423.207,00	17 días	jue 28/09/23	mié 18/10/23	309CC	345
316	5.1.72		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES,	UN	$ 6.939.530,00	17 días	jue 28/09/23	mié 18/10/23	309CC	345
317	5.1.80		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 5.069.974,00	17 días	jue 28/09/23	mié 18/10/23	309CC	345
318	7		**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 54.259.841,00**	**17 días**	**lun 28/08/23**	**vie 15/09/23**		
319	7.1		**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 432.796,00**	**15 días**	**lun 28/08/23**	**mié 13/09/23**		
320	7.1.7		MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	$ 432.796,00	15 días	lun 28/08/23	mié 13/09/23	286CC+8 días	322CC+2 días
321	7.2		**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 53.827.045,00**	**15 días**	**mié 30/08/23**	**vie 15/09/23**		
322	7.2.42		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE (BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	$ 53.827.045,00	15 días	mié 30/08/23	vie 15/09/23	320CC+2 días	345;325CC+10 días
323	9		**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 0,00**	**15 días**	**lun 11/09/23**	**mié 27/09/23**		
324	9.1		**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 0,00**	**15 días**	**lun 11/09/23**	**mié 27/09/23**		
325	9.1.26		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA	M2	$ 0,00	15 días	lun 11/09/23	mié 27/09/23	322CC+10 días	328;330
326	13		**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 13.145.397,00**	**15 días**	**jue 28/09/23**	**sáb 14/10/23**		
327	13.2		**PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 7.142.367,00**	**15 días**	**jue 28/09/23**	**sáb 14/10/23**		
328	13.2.8		PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 7.142.367,00	15 días	jue 28/09/23	sáb 14/10/23	325;301;296;297;	345
329	13.4		**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 6.003.030,00**	**15 días**	**jue 28/09/23**	**sáb 14/10/23**		
330	13.4.3		ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 6.003.030,00	15 días	jue 28/09/23	sáb 14/10/23	325	345
331	16		**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 40.870.644,00**	**18 días**	**jue 24/08/23**	**mié 13/09/23**		
332	16.1		**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 40.870.644,00**	**18 días**	**jue 24/08/23**	**mié 13/09/23**		
333	16.1.1		CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E	UN	$ 40.870.644,00	18 días	jue 24/08/23	mié 13/09/23	286CC+5 días	345
334	17		**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 98.212.641,00**	**10 días**	**jue 28/09/23**	**lun 9/10/23**		
335	17.1		**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 98.212.641,00**	**10 días**	**jue 28/09/23**	**lun 9/10/23**		
336	17.1.2		FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO	M	$ 1.647.740,00	10 días	jue 28/09/23	lun 9/10/23	293	309CC;337CC;338CC;33
337	17.1.4		CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 0,00	10 días	jue 28/09/23	lun 9/10/23	336CC	345
338	17.1.7		MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE	M2	$ 1.879.666,00	10 días	jue 28/09/23	lun 9/10/23	336CC	345
339	17.1.8		DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 336.347,00	10 días	jue 28/09/23	lun 9/10/23	336CC	345
340	17.1.2		TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	$ 17.600.165,00	10 días	jue 28/09/23	lun 9/10/23	336CC	345
341	17.1.2		LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	M2	$ 17.279.313,00	10 días	jue 28/09/23	lun 9/10/23	336CC	345
342	17.1.2		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL	M2	$ 59.469.410,00	10 días	jue 28/09/23	lun 9/10/23	336CC	345;347CC
343	20		**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 7.782.613,00**	**2 días**	**jue 19/10/23**	**vie 20/10/23**		
344	20.1		**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 7.782.613,00**	**2 días**	**jue 19/10/23**	**vie 20/10/23**		
345	20.1.1		ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 7.782.613,00	2 días	jue 19/10/23	vie 20/10/23	322;347;348;342;	1490
346	NP		**NO PREVISTO**		**$ 15.281.214,00**	**15 días**	**jue 28/09/23**	**sáb 14/10/23**		
347	NP		Marco y soporte de sobreponer para luminaria de 30x120cm	UN	$ 916.734,00	15 días	jue 28/09/23	sáb 14/10/23	342CC	345;348CC
348	NP		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN CON MALLA EXP # 25 CALIBRE 18	M2	$ 14.364.480,00	15 días	jue 28/09/23	sáb 14/10/23	347CC	345
349			**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**		**$ 919.012.618,16**	**180 días**	**vie 20/01/23**	**jue 31/08/23**		
350			Etapa preconstructiva		$ 0,00	60 días	sáb 21/01/23	sáb 1/04/23	2FC+1 día	353
351	1		**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 55.070.808,96**	**90 días**	**lun 3/04/23**	**mié 26/07/23**		

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8


Id	Item	COLEGIO	Unid	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
352	**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 5.620.060,00**	**20 días**	**lun 3/04/23**	**vie 28/04/23**		
353	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN	M	$ 5.620.060,00	20 días	lun 3/04/23	vie 28/04/23	350	356;355
354	**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 45.141.354,94**	**60 días**	**sáb 29/04/23**	**jue 13/07/23**		
355	1.2.6	DEMOLICION PLACA MAOZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 896.227,50	60 días	sáb 29/04/23	jue 13/07/23	353	357CC;358CC;359CC;36
356	1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 10.395.182,00	60 días	sáb 29/04/23	jue 13/07/23	353	357CC;358CC;359CC;36 días;374CC+25 días;455;362CC;367CC;3
357	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 3.974.974,00	60 días	sáb 29/04/23	jue 13/07/23	356CC;355CC	455
358	1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 594.984,00	60 días	sáb 29/04/23	jue 13/07/23	356CC;355CC	455
359	1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 1.589.723,00	60 días	sáb 29/04/23	jue 13/07/23	356CC;355CC	455
360	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 1.744.858,00	60 días	sáb 29/04/23	jue 13/07/23	356CC;355CC	455
361	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 317.421,00	60 días	sáb 29/04/23	jue 13/07/23	356CC;355CC	455
362	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	UN	$ 1.578.340,00	60 días	sáb 29/04/23	jue 13/07/23	356CC;355CC	455
363	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC.,	M2	$ 9.090.539,00	60 días	sáb 29/04/23	jue 13/07/23	356CC;355CC	455
364	1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 2.050.581,00	60 días	sáb 29/04/23	jue 13/07/23	356CC;355CC	455
365	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	$ 207.216,00	60 días	sáb 29/04/23	jue 13/07/23	356CC;355CC	456;385
366	1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 141.736,00	60 días	sáb 29/04/23	jue 13/07/23	356CC;355CC	455
367	1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	$ 220.224,00	60 días	sáb 29/04/23	jue 13/07/23	356CC;355CC	397
368	1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 12.339.349,44	60 días	sáb 29/04/23	jue 13/07/23	356CC;355CC	397
369	**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 4.309.394,02**	**45 días**	**mié 31/05/23**	**mié 26/07/23**		
370	1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	$ 1.898.419,02	45 días	mié 31/05/23	mié 26/07/23	356CC+25 días;355CC	455
371	1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	$ 2.410.975,00	45 días	mié 31/05/23	mié 26/07/23	356CC+25 días;35	455
372	**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 151.511.185,75**	**70 días**	**mié 31/05/23**	**sáb 26/08/23**		
373	**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 67.914.073,75**	**40 días**	**mié 31/05/23**	**mié 19/07/23**		
374	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 11.233.184,00	35 días	mié 31/05/23	jue 13/07/23	356CC+25 días;355CC	376CC+10 días;455;375CC+10 días;459
375	2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	$ 6.045.291,00	30 días	mar 13/06/23	mié 19/07/23	374CC+10 días	378CC+8 días;455
376	2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	M3	$ 50.635.598,75	30 días	mar 13/06/23	mié 19/07/23	374CC+10 días	378CC+8 días;455
377	**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 31.210.427,00**	**33 días**	**vie 23/06/23**	**mié 2/08/23**		
378	2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE	M2	$ 31.210.427,00	33 días	vie 23/06/23	mié 2/08/23	376CC+8 días;375CC+8	383CC;382CC;455;408
379	**2.3**	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 12.295.796,00**	**15 días**	**mié 2/08/23**	**sáb 19/08/23**		
380	2.3.6	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM)	M	$ 12.295.796,00	15 días	mié 2/08/23	sáb 19/08/23	452CC;451CC;450	455
381	**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 12.656.202,00**	**35 días**	**vie 23/06/23**	**vie 4/08/23**		
382	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	$ 4.941.373,00	35 días	vie 23/06/23	vie 4/08/23	378CC	455
383	2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	$ 7.714.829,00	35 días	vie 23/06/23	vie 4/08/23	378CC	455
384	**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 27.434.687,00**	**35 días**	**vie 14/07/23**	**sáb 26/08/23**		
385	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE	KG	$ 27.434.687,00	35 días	vie 14/07/23	sáb 26/08/23	365	452CC+15 días;455;451CC+15
386	**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 5.396.045,00**	**20 días**	**mié 2/08/23**	**sáb 26/08/23**		
387	**3.1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 4.340.190,00**	**15 días**	**jue 3/08/23**	**mar 22/08/23**		
388	3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE	M2	$ 4.340.190,00	15 días	jue 3/08/23	mar 22/08/23	408CC	455
389	**3.2**	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 1.055.855,00**	**20 días**	**mié 2/08/23**	**sáb 26/08/23**		
390	3.2.4	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	$ 1.055.855,00	20 días	mié 2/08/23	sáb 26/08/23	452CC;451CC;450	455
391	**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 4.631.059,00**	**176 días**	**vie 20/01/23**	**sáb 26/08/23**		
392	**4.8**	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 4.631.059,00**	**176 días**	**vie 20/01/23**	**sáb 26/08/23**		
393	4.8.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	$ 4.440.715,00	20 días	mié 2/08/23	sáb 26/08/23	452CC;451CC;450	455
394	4.8.8	RENIVELACION DE CAJAS DE INSPECCION	UN	$ 190.344,00	40 días	vie 20/01/23	mar 7/03/23		455
395	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 33.755.063,00**	**35 días**	**vie 14/07/23**	**sáb 26/08/23**		
396	**5.1**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 33.755.063,00**	**35 días**	**vie 14/07/23**	**sáb 26/08/23**		
397	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	UN	$ 579.976,00	35 días	vie 14/07/23	sáb 26/08/23	368;367	399CC;400CC;401CC;40
398	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN	$ 443.012,00	35 días	vie 14/07/23	sáb 26/08/23	397CC	455
399	5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	UN	$ 2.022.748,00	35 días	vie 14/07/23	sáb 26/08/23	397CC	455
400	5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y	UN	$ 99.156,00	35 días	vie 14/07/23	sáb 26/08/23	397CC	455
401	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	M	$ 1.826.081,00	35 días	vie 14/07/23	sáb 26/08/23	397CC	455
402	5.1.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 146.042,00	35 días	vie 14/07/23	sáb 26/08/23	397CC	455
403	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) A WG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES,	UN	$ 16.548.110,00	35 días	vie 14/07/23	sáb 26/08/23	397CC	455
404	5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 12.089.938,00	35 días	vie 14/07/23	sáb 26/08/23	397CC	455
405	5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 0,00	35 días	vie 14/07/23	sáb 26/08/23	397CC	455
406	**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 74.226.793,60**	**20 días**	**jue 3/08/23**	**lun 28/08/23**		
407	**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 39.424.368,00**	**20 días**	**jue 3/08/23**	**lun 28/08/23**		
408	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	$ 28.974.844,00	20 días	jue 3/08/23	lun 28/08/23	378	412CC;409CC;410CC;41 días;388CC
409	7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	$ 6.361.487,00	20 días	jue 3/08/23	lun 28/08/23	408CC	455
410	7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	$ 4.088.037,00	20 días	jue 3/08/23	lun 28/08/23	408CC	455
411	**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 34.802.425,60**	**20 días**	**jue 3/08/23**	**lun 28/08/23**		
412	7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2	$ 6.354.620,00	20 días	jue 3/08/23	lun 28/08/23	408CC	455;420CC+10 días
413	7.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN CUARTERÓN ANCHO E = 6 CM 2.6X6X6,	M2	$ 4.316.763,60	20 días	jue 3/08/23	lun 28/08/23	408CC	455
414	7.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO TIPO TARALAY O SIMILAR ALTO	M2	$ 24.131.042,00	20 días	jue 3/08/23	lun 28/08/23	408CC	455
415	**8**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 5.606.160,00**	**16 días**	**jue 10/08/23**	**mar 29/08/23**		
416	**8.1**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 5.606.160,00**	**16 días**	**jue 10/08/23**	**mar 29/08/23**		
417	8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2	$ 5.606.160,00	16 días	jue 10/08/23	mar 29/08/23	408CC+5 días	455
418	**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 31.596.868,80**	**10 días**	**mié 16/08/23**	**lun 28/08/23**		
419	**9.1**	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 19.341.846,80**	**10 días**	**mié 16/08/23**	**lun 28/08/23**		
420	9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SENCILLA, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E	M2	$ 2.414.393,80	10 días	mié 16/08/23	lun 28/08/23	412CC+10 días	455;421CC;422CC;424C
421	9.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON	M2	$ 8.564.360,00	10 días	mié 16/08/23	lun 28/08/23	420CC	455
422	9.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE REJILLA METALICA PARA CARCAMO, INC MARCO Y CONTRAMARCO B= 0.35 a 0.45, INC	M	$ 8.363.093,00	10 días	mié 16/08/23	lun 28/08/23	420CC	455
423	**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 12.255.022,00**	**10 días**	**mié 16/08/23**	**lun 28/08/23**		
424	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA	M2	$ 12.255.022,00	10 días	mié 16/08/23	lun 28/08/23	420CC	455
425	**11**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 31.439.440,00**	**10 días**	**vie 4/08/23**	**mié 16/08/23**		
426	**11.1**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 31.439.440,00**	**10 días**	**vie 4/08/23**	**mié 16/08/23**		
427	11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y	UN	$ 17.573.480,00	10 días	vie 4/08/23	mié 16/08/23	452FC-18 días;451FC-18 días;450FC-18	455
428	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO	UN	$ 13.865.960,00	10 días	vie 4/08/23	mié 16/08/23	452FC-18 días;451FC-18	455
429	**12**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 97.434.356,00**	**11 días**	**mar 15/08/23**	**lun 28/08/23**		
430	**12.1**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 97.434.356,00**	**11 días**	**mar 15/08/23**	**lun 28/08/23**		
431	12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO,	M2	$ 97.434.356,00	11 días	mar 15/08/23	lun 28/08/23	434CC+10 días;443CC+10 días	455
432	**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 53.886.785,05**	**20 días**	**mié 2/08/23**	**sáb 26/08/23**		
433	**13.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 1.054.757,40**	**20 días**	**mié 2/08/23**	**sáb 26/08/23**		
434	13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 1.054.757,40	20 días	mié 2/08/23	sáb 26/08/23	452CC;451CC;450	431CC+10 días;455
435	**13.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 25.835.831,65**	**20 días**	**mié 2/08/23**	**sáb 26/08/23**		
436	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 6.054.016,99	20 días	mié 2/08/23	sáb 26/08/23	452CC;451CC;450	455
437	13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	$ 7.929.196,74	20 días	mié 2/08/23	sáb 26/08/23	452CC;451CC;450	455
438	13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 11.852.617,92	20 días	mié 2/08/23	sáb 26/08/23	452CC;451CC;450	455
439	**13.4**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 26.996.196,00**	**20 días**	**mié 2/08/23**	**sáb 26/08/23**		
440	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 26.996.196,00	20 días	mié 2/08/23	sáb 26/08/23	452CC;451CC;450	455
441	**14**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 12.786.135,00**	**20 días**	**mié 2/08/23**	**sáb 26/08/23**		
442	**14.1**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 12.786.135,00**	**20 días**	**mié 2/08/23**	**sáb 26/08/23**		
443	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS	M2	$ 12.786.135,00	20 días	mié 2/08/23	sáb 26/08/23	452CC;451CC;450	431CC+10 días;455
444	**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 319.975.139,00**	**20 días**	**mié 2/08/23**	**sáb 26/08/23**		
445	**17.1**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 319.975.139,00**	**20 días**	**mié 2/08/23**	**sáb 26/08/23**		
446	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO	M	$ 16.488.277,00	20 días	mié 2/08/23	sáb 26/08/23	452CC;451CC;450	455
447	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 7.926.293,00	20 días	mié 2/08/23	sáb 26/08/23	452CC;451CC;450	455
448	17.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL	M2	$ 238.278.040,00	20 días	mié 2/08/23	sáb 26/08/23	452CC;451CC;450	455
449	17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	$ 11.295.288,00	20 días	mié 2/08/23	sáb 26/08/23	385CC+15 días	446CC;447CC;448CC;45 días;428FC-18
450	17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO,	M2	$ 30.689.951,00	20 días	mié 2/08/23	sáb 26/08/23	385CC+15 días	446CC;447CC;448CC;45 días;428FC-18
451	17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	$ 12.347.150,00	20 días	mié 2/08/23	sáb 26/08/23	385CC+15 días	446CC;447CC;448CC;45 días;428FC-18
452	17.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	$ 2.950.140,00	20 días	mié 2/08/23	sáb 26/08/23	385CC+15 días	446CC;447CC;448CC;45 días;428FC-18
453	**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 40.839.210,00**	**39 días**	**vie 14/07/23**	**jue 31/08/23**		
454	**20.1**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 40.839.210,00**	**39 días**	**vie 14/07/23**	**jue 31/08/23**		
455	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 33.342.110,00	2 días	mié 30/08/23	jue 31/08/23	452;440;431;424;	1490
456	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	$ 7.497.100,00	35 días	vie 14/07/23	sáb 26/08/23	365	455
457	**21**	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 857.569,00**	**10 días**	**vie 14/07/23**	**mié 26/07/23**		
458	**21.1**	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 857.569,00**	**10 días**	**vie 14/07/23**	**mié 26/07/23**		
459	21.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN	$ 857.569,00	10 días	vie 14/07/23	mié 26/07/23	374	1490
460		**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		**$ 1.289.556.669,86**	**176 días**	**sáb 21/01/23**	**lun 28/08/23**		
461		Etapa preconstructiva		$ 0,00	30 días	sáb 21/01/23	vie 24/02/23	2FC+1 día	464
462	**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 116.465.909,00**	**100 días**	**sáb 25/02/23**	**vie 30/06/23**		
463	**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 7.540.840,00**	**15 días**	**sáb 25/02/23**	**mar 14/03/23**		
464	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN	M	$ 7.540.840,00	15 días	sáb 25/02/23	mar 14/03/23	461	546;469;468;467;466

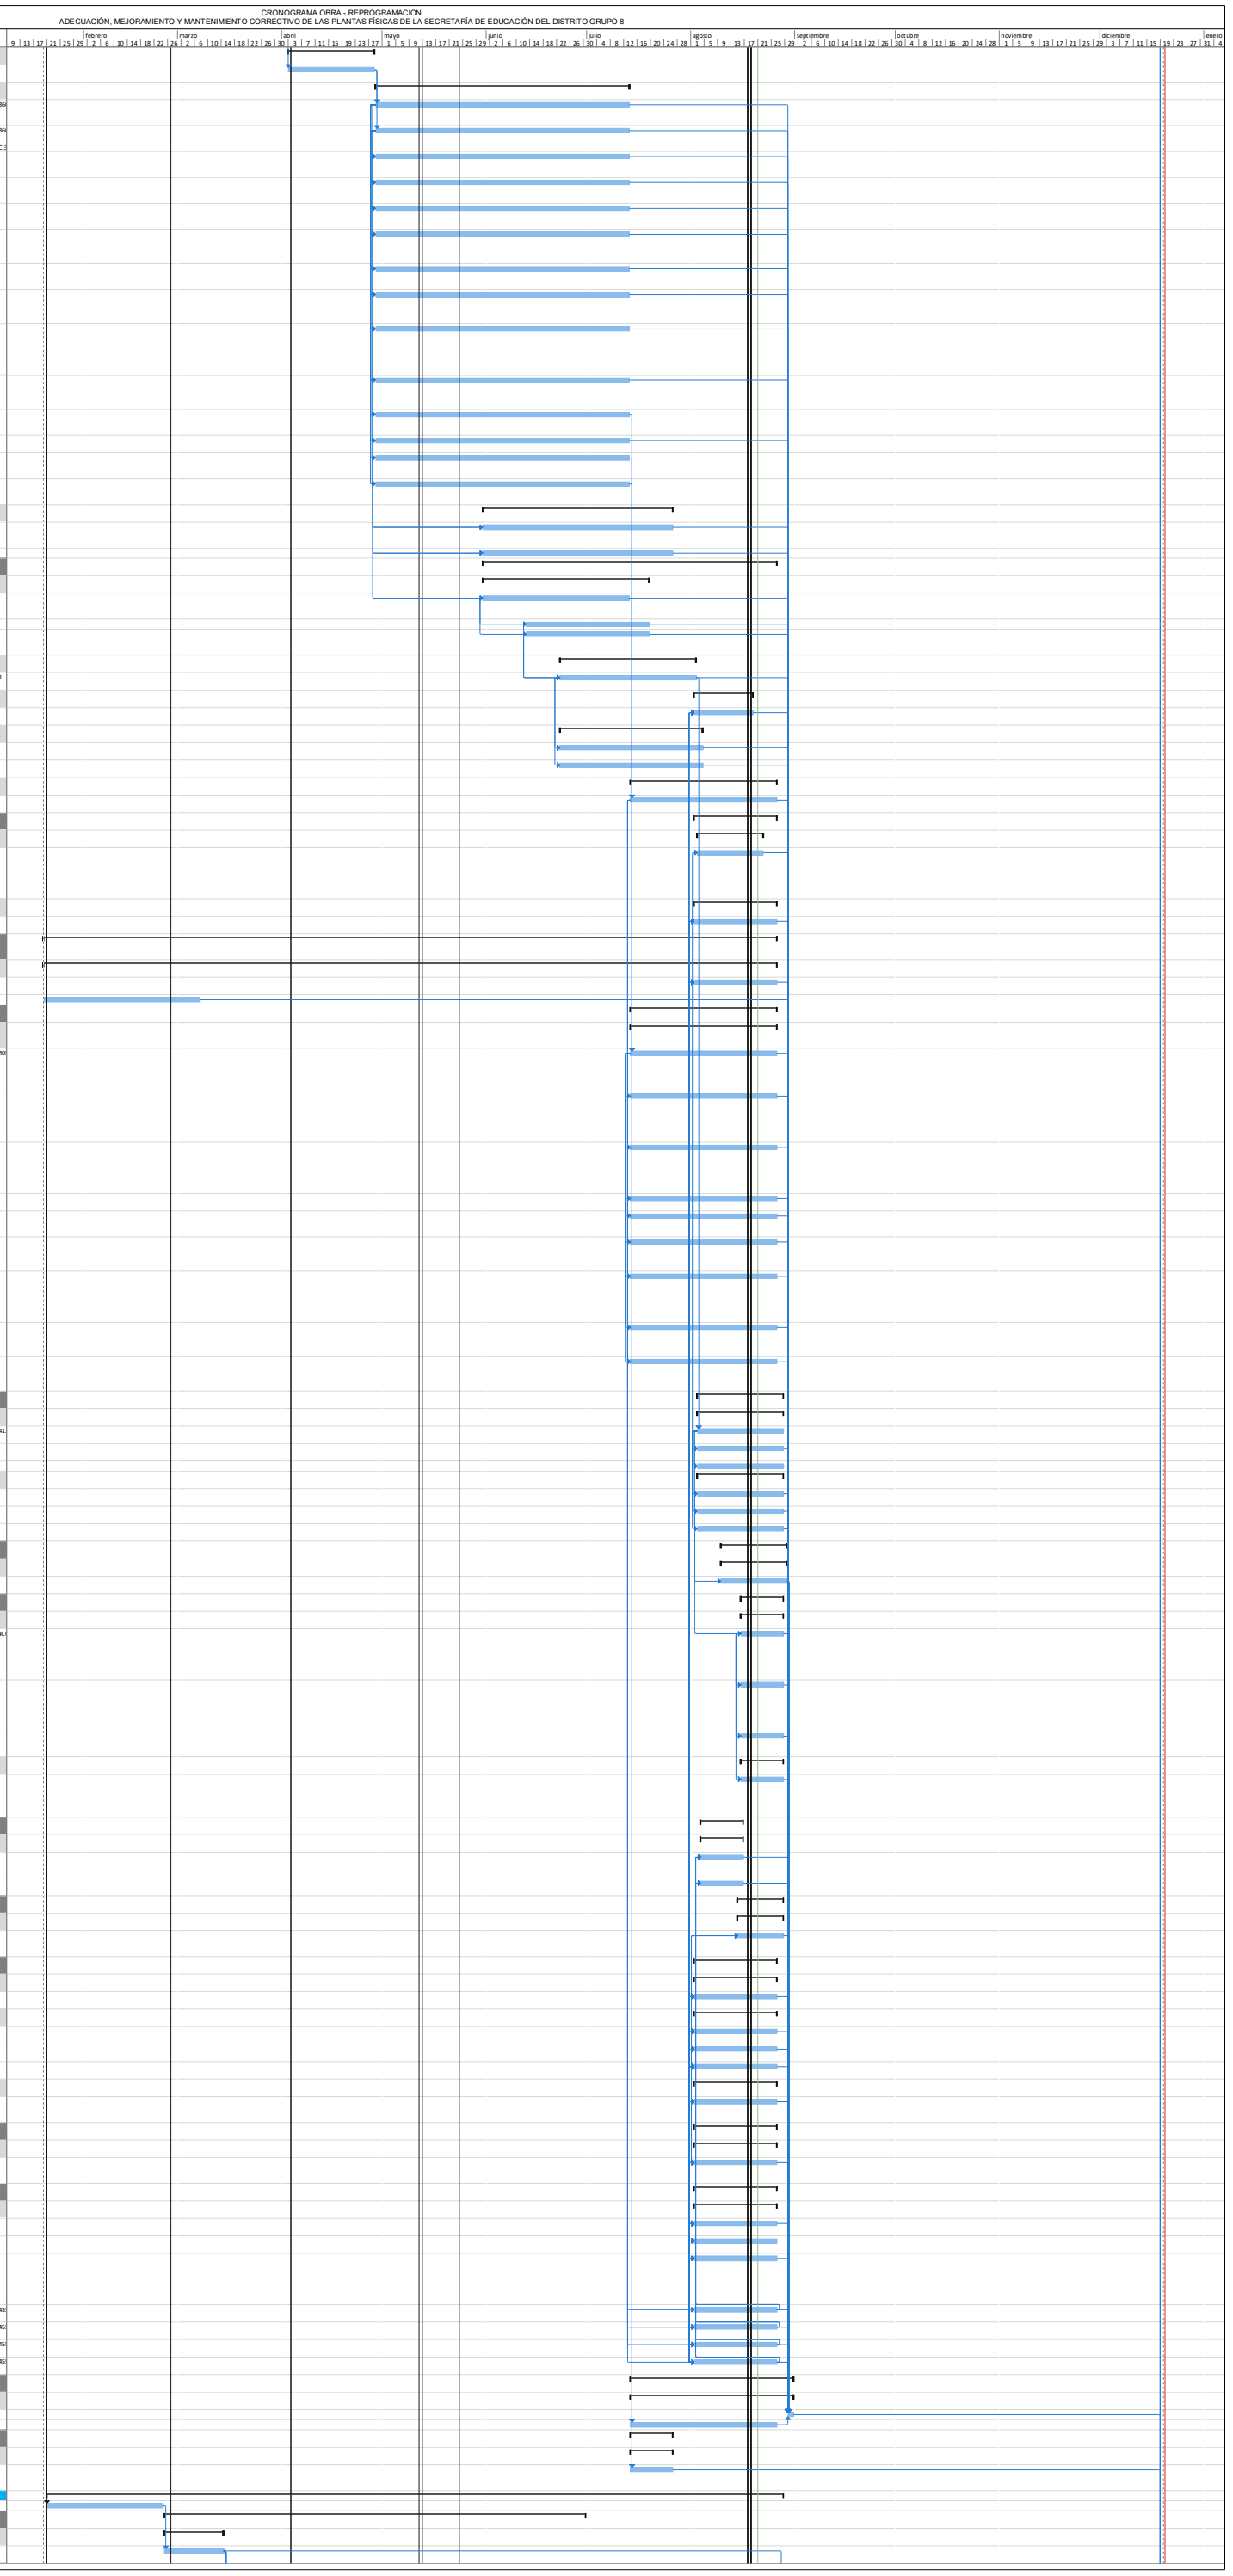

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8


Id	Item	COLEGIO	Unid	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
465	**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 77.414.844,00**	**45 días**	**mar 14/03/23**	**jue 11/05/23**		
466	1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 6.056.659,00	45 días	mié 15/03/23	jue 11/05/23	464	470CC;471CC;472CC;47
467	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 5.188.763,00	45 días	mié 15/03/23	jue 11/05/23	464	470CC;471CC;472CC;47
468	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 0,00	0 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	464	470CC;471CC;472CC;47
469	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 298.651,00	45 días	mié 15/03/23	jue 11/05/23	464	470CC;471CC;472CC;47
470	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC.,	M2	$ 53.468.417,00	45 días	mié 15/03/23	jue 11/05/23	469CC;468CC;467	521;532;540CC;519;552
471	1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 3.839.376,00	45 días	mié 15/03/23	jue 11/05/23	469CC;468CC;467	485;547FC+40 días;484;488
472	1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 660.726,00	45 días	mié 15/03/23	jue 11/05/23	469CC;468CC;467	546
473	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	$ 1.415.976,00	45 días	mié 15/03/23	jue 11/05/23	469CC;468CC;467	546
474	1.2.42	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 0,00	0 días	mié 15/03/23	mié 15/03/23	469CC;468CC;467	546
475	1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 658.060,00	45 días	mié 15/03/23	jue 11/05/23	469CC;468CC;467	546
476	1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	$ 3.496.262,00	45 días	mié 15/03/23	jue 11/05/23	469CC;468CC;467	546
477	1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS	M	$ 242.928,00	45 días	mié 15/03/23	jue 11/05/23	469CC;468CC;467	546
478	1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS	M	$ 2.089.026,00	45 días	mié 15/03/23	jue 11/05/23	469CC;468CC;467	546
479	**1,3**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 31.510.225,00**	**65 días**	**mié 12/04/23**	**vie 30/06/23**		
480	1.3.4	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y	M2	$ 28.566.009,00	65 días	mié 12/04/23	vie 30/06/23	469CC+20 días;468CC;467C	491FC-5 días;492FC-5 días
481	1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y	UN	$ 2.944.216,00	65 días	mié 12/04/23	vie 30/06/23	469CC+20 días;468CC;467C	491FC-5 días;492FC-5 días
482	**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 137.237.565,00**	**55 días**	**vie 12/05/23**	**mié 19/07/23**		
483	**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 137.237.565,00**	**55 días**	**vie 12/05/23**	**mié 19/07/23**		
484	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE	KG	$ 108.709.005,00	55 días	vie 12/05/23	mié 19/07/23	471	546
485	2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS	UN	$ 28.528.560,00	55 días	vie 12/05/23	mié 19/07/23	471	546
486	**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 7.154.992,00**	**55 días**	**vie 12/05/23**	**mié 19/07/23**		
487	**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 7.154.992,00**	**55 días**	**vie 12/05/23**	**mié 19/07/23**		
488	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 7.154.992,00	55 días	vie 12/05/23	mié 19/07/23	471	546
489	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 143.785.594,00**	**50 días**	**lun 26/06/23**	**sáb 26/08/23**		
490	**5.1**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 143.785.594,00**	**50 días**	**lun 26/06/23**	**sáb 26/08/23**		
491	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	UN	$ 0,00	0 días	lun 26/06/23	lun 26/06/23	481FC-5 días;480FC-5 días	497CC;503CC;504CC;49
492	5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	UN	$ 7.068.736,00	50 días	lun 26/06/23	sáb 26/08/23	481FC-5 días;480FC-5 días	546;497CC;503CC;504C
493	5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	UN	$ 0,00	0 días	lun 26/06/23	lun 26/06/23	491CC;492CC	546
494	5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	UN	$ 18.265.419,00	50 días	lun 26/06/23	sáb 26/08/23	491CC;492CC	546
495	5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA	UN	$ 524.617,00	50 días	lun 26/06/23	sáb 26/08/23	491CC;492CC	546
496	5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A	UN	$ 344.432,00	50 días	lun 26/06/23	sáb 26/08/23	491CC;492CC	546
497	5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 150X150CM CON PUERTA Y	UN	$ 2.016.172,00	50 días	lun 26/06/23	sáb 26/08/23	491CC;492CC	546
498	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	M	$ 26.732.127,00	50 días	lun 26/06/23	sáb 26/08/23	491CC;492CC	546
499	5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	M	$ 1.430.610,00	50 días	lun 26/06/23	sáb 26/08/23	491CC;492CC	546
500	5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	$ 14.325.082,00	50 días	lun 26/06/23	sáb 26/08/23	491CC;492CC	546
501	5.1.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T)	M	$ 4.291.140,00	50 días	lun 26/06/23	sáb 26/08/23	491CC;492CC	546
502	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES,	UN	$ 40.569.560,00	50 días	lun 26/06/23	sáb 26/08/23	491CC;492CC	546
503	5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 19.304.901,00	50 días	lun 26/06/23	sáb 26/08/23	491CC;492CC	546
504	5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 8.912.798,00	50 días	lun 26/06/23	sáb 26/08/23	491CC;492CC	546
505	**7**	**PISOS TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 49.200.517,00**	**47 días**	**mar 6/06/23**	**lue 3/08/23**		
506	**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 5.922.303,00**	**45 días**	**mar 6/06/23**	**mar 1/08/23**		
507	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	$ 5.922.303,00	45 días	mar 6/06/23	mar 1/08/23	469FC+20 días;46	546
508	**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 43.278.214,00**	**45 días**	**jue 8/06/23**	**jue 3/08/23**		
509	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2	$ 25.615.709,00	45 días	jue 8/06/23	jue 3/08/23	469FC+22 días;468;467;466	546;510CC;511CC;514C días
510	7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2	$ 5.206.699,00	45 días	jue 8/06/23	jue 3/08/23	509CC	546
511	7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	$ 12.455.806,00	45 días	jue 8/06/23	jue 3/08/23	509CC	546
512	**8**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 5.420.507,00**	**45 días**	**jue 8/06/23**	**jue 3/08/23**		
513	**8.1**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 5.420.507,00**	**45 días**	**jue 8/06/23**	**jue 3/08/23**		
514	8.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO	M2	$ 5.420.507,00	45 días	jue 8/06/23	jue 3/08/23	509CC	546
515	**9**	**CARPINTERIA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 61.759.866,00**	**62 días**	**vie 12/05/23**	**vie 28/07/23**		
516	**9.1**	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 1.224.362,00**	**40 días**	**jue 8/06/23**	**vie 28/07/23**		
517	9.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE CERRAMIENTO CON SOPORTE PRINCIPAL EN TUBO CUADRADO DE 100X100 EN 2MM TUBO PERIMETRAL DE 2" POR 1-1/8", MALLA ONDULADA GALVANIZADA DE 2" PISADORES EN ANGULO, FALLEBAS Y PASADOR EN	M2	$ 1.224.362,00	40 días	jue 8/06/23	vie 28/07/23	509CC	546
518	**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 13.289.779,00**	**55 días**	**vie 12/05/23**	**mié 19/07/23**		
519	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA	M2	$ 13.289.779,00	55 días	vie 12/05/23	mié 19/07/23	470	546
520	**9.3**	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 47.245.725,00**	**55 días**	**vie 12/05/23**	**mié 19/07/23**		
521	9.3.14	CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40	M	$ 47.245.725,00	55 días	vie 12/05/23	mié 19/07/23	470	546
522	**10**	**CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 2.015.874,00**	**40 días**	**mié 28/06/23**	**mié 16/08/23**		
523	**10.1**	**CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 2.015.874,00**	**40 días**	**mié 28/06/23**	**mié 16/08/23**		
524	10.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DETRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METÁLICA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA	M2	$ 2.015.874,00	40 días	mié 28/06/23	mié 16/08/23	509CC+15 días	546
525	**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 57.249.310,00**	**70 días**	**vie 12/05/23**	**mar 8/08/23**		
526	**13.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 2.109.495,00**	**70 días**	**vie 12/05/23**	**mar 8/08/23**		
527	13.1.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE (NCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 2.109.495,00	70 días	vie 12/05/23	mar 8/08/23	469;468;467;466	546
528	**13.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 13.581.758,00**	**70 días**	**vie 12/05/23**	**mar 8/08/23**		
529	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 9.732.317,00	70 días	vie 12/05/23	mar 8/08/23	469;468;467;466	546
530	13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	$ 3.849.441,00	70 días	vie 12/05/23	mar 8/08/23	469;468;467;466	546
531	**13.4**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 41.558.057,00**	**70 días**	**vie 12/05/23**	**mar 8/08/23**		
532	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 41.558.057,00	70 días	vie 12/05/23	mar 8/08/23	470	546
533	**15**	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 6.229.711,00**	**70 días**	**vie 12/05/23**	**mar 8/08/23**		
534	**15.2**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 6.229.711,00**	**70 días**	**vie 12/05/23**	**mar 8/08/23**		
535	15.2.1	INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	$ 6.229.711,00	70 días	vie 12/05/23	mar 8/08/23	469;468;467;466	546
536	**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 521.487.527,00**	**125 días**	**mié 15/03/23**	**sáb 19/08/23**		
537	**17.1**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 521.487.527,00**	**125 días**	**mié 15/03/23**	**sáb 19/08/23**		
538	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO	M	$ 14.853.462,00	75 días	lun 24/04/23	mié 26/07/23	540CC+30 días	546
539	17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE	M2	$ 4.178.329,00	75 días	lun 24/04/23	mié 26/07/23	540CC+30 días	546
540	17.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 100 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL	M2	$ 454.576.623,00	65 días	mié 15/03/23	sáb 19/08/23	470CC	546;538CC+30 días;539CC+30 días;543CC+30 días;542CC+30 días;541CC+30 días
541	17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	$ 18.407.136,00	70 días	lun 24/04/23	mié 19/07/23	540CC+30 días;552CC+30	546
542	17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	$ 8.275.972,00	70 días	lun 24/04/23	mié 19/07/23	540CC+30 días;552CC+30	546
543	17.1.4	SEI DE VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). Ds = 100 CM - CAL 20	M	$ 21.196.005,00	70 días	lun 24/04/23	mié 19/07/23	540CC+30 días;552CC+30 días	546
544	**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 148.884.336,00**	**46 días**	**sáb 1/07/23**	**lun 28/08/23**		
545	**20.1**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 148.884.336,00**	**46 días**	**sáb 1/07/23**	**lun 28/08/23**		
546	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 12.063.883,00	1 día	lun 28/08/23	lun 28/08/23	521;514;540;517;	1490
547	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	$ 62.274.633,00	40 días	sáb 1/07/23	sáb 19/08/23	471FC+40 días	548CC;546
548	20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG	$ 74.545.820,00	40 días	sáb 1/07/23	sáb 19/08/23	547CC	546
549	**NP**	**NO PREVISTOS**		**$ 32.664.961,86**	**125 días**	**mié 15/03/23**	**sáb 19/08/23**		
550	NP-05	REMATE DE MAMPOSTERÍA A CUBIERTA TIPO SÁNDWICH H>=30 CM, INCLUYE MAMPOSTERÍA Y	M	$ 1.247.797,36	75 días	lun 24/04/23	mié 26/07/23	552CC+30 días	546
551	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIJOS EN ANGULO Y TE DE 1/8" CON MALLA EXP #25 CALIBRE 18 O MARCO CORRIENTE PARA VENTANA Y TE VENTANA EN CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTATICA	M2	$ 9.756.032,00	75 días	lun 24/04/23	mié 26/07/23	552CC+30 días	546
552	NP-20	RETIRO DE PINTURA SUELTA EN ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA DE TODAS LAS	M	$ 21.661.132,50	65 días	mié 15/03/23	sáb 19/08/23	470CC	550CC+30 días;551CC+30
553		**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**		**$ 0,00**	**100 días**	**vie 18/08/23**	**mar 19/12/23**		
554		Priorizacion de la necesidad		$ 0,00	0 días	vie 18/08/23	vie 18/08/23	2FC+170 días	555FC+6 días
555		Etapa preconstructiva		$ 0,00	0 días	sáb 26/08/23	sáb 26/08/23	554FC+6 días	556FC+10 días
556		Ejecucion de obras		$ 0,00	84 días	vie 8/09/23	mar 19/12/23	555FC+10 días	1490
557		**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		**$ 345.768.173,00**	**208 días**	**lun 27/02/23**	**sáb 11/11/23**		
558		Etapa preconstructiva		$ 0,00	40 días	lun 27/02/23	mar 18/04/23	2FC+32 días	562
559	**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 31.256.041,00**	**38 días**	**mar 4/07/23**	**vie 18/08/23**		
560	**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 6.554.383,00**	**18 días**	**mar 4/07/23**	**mar 25/07/23**		
561	1.1.1	REPLANTEO	M2	$ 1.218.883,00	10 días	jue 13/07/23	mar 25/07/23	562	564CC
562	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN	M	$ 5.335.500,00	8 días	mar 4/07/23	mié 12/07/23	558;652	561
563	**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 22.569.338,00**	**30 días**	**jue 13/07/23**	**vie 18/08/23**		
564	1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 7.242.671,00	30 días	jue 13/07/23	vie 18/08/23	561CC	565CC;566CC;567C;56 días
565	1.2.11	DEMOLICIÓN ALFAÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	$ 2.560.653,00	30 días	jue 13/07/23	vie 18/08/23	564CC	
566	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 8.693.244,00	30 días	jue 13/07/23	vie 18/08/23	564CC	
567	1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 272.701,00	30 días	jue 13/07/23	vie 18/08/23	564CC	
568	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 63.242,00	30 días	jue 13/07/23	vie 18/08/23	564CC	
569	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 136.438,00	30 días	jue 13/07/23	vie 18/08/23	564CC	
570	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	UN	$ 431.810,00	30 días	jue 13/07/23	vie 18/08/23	564CC	

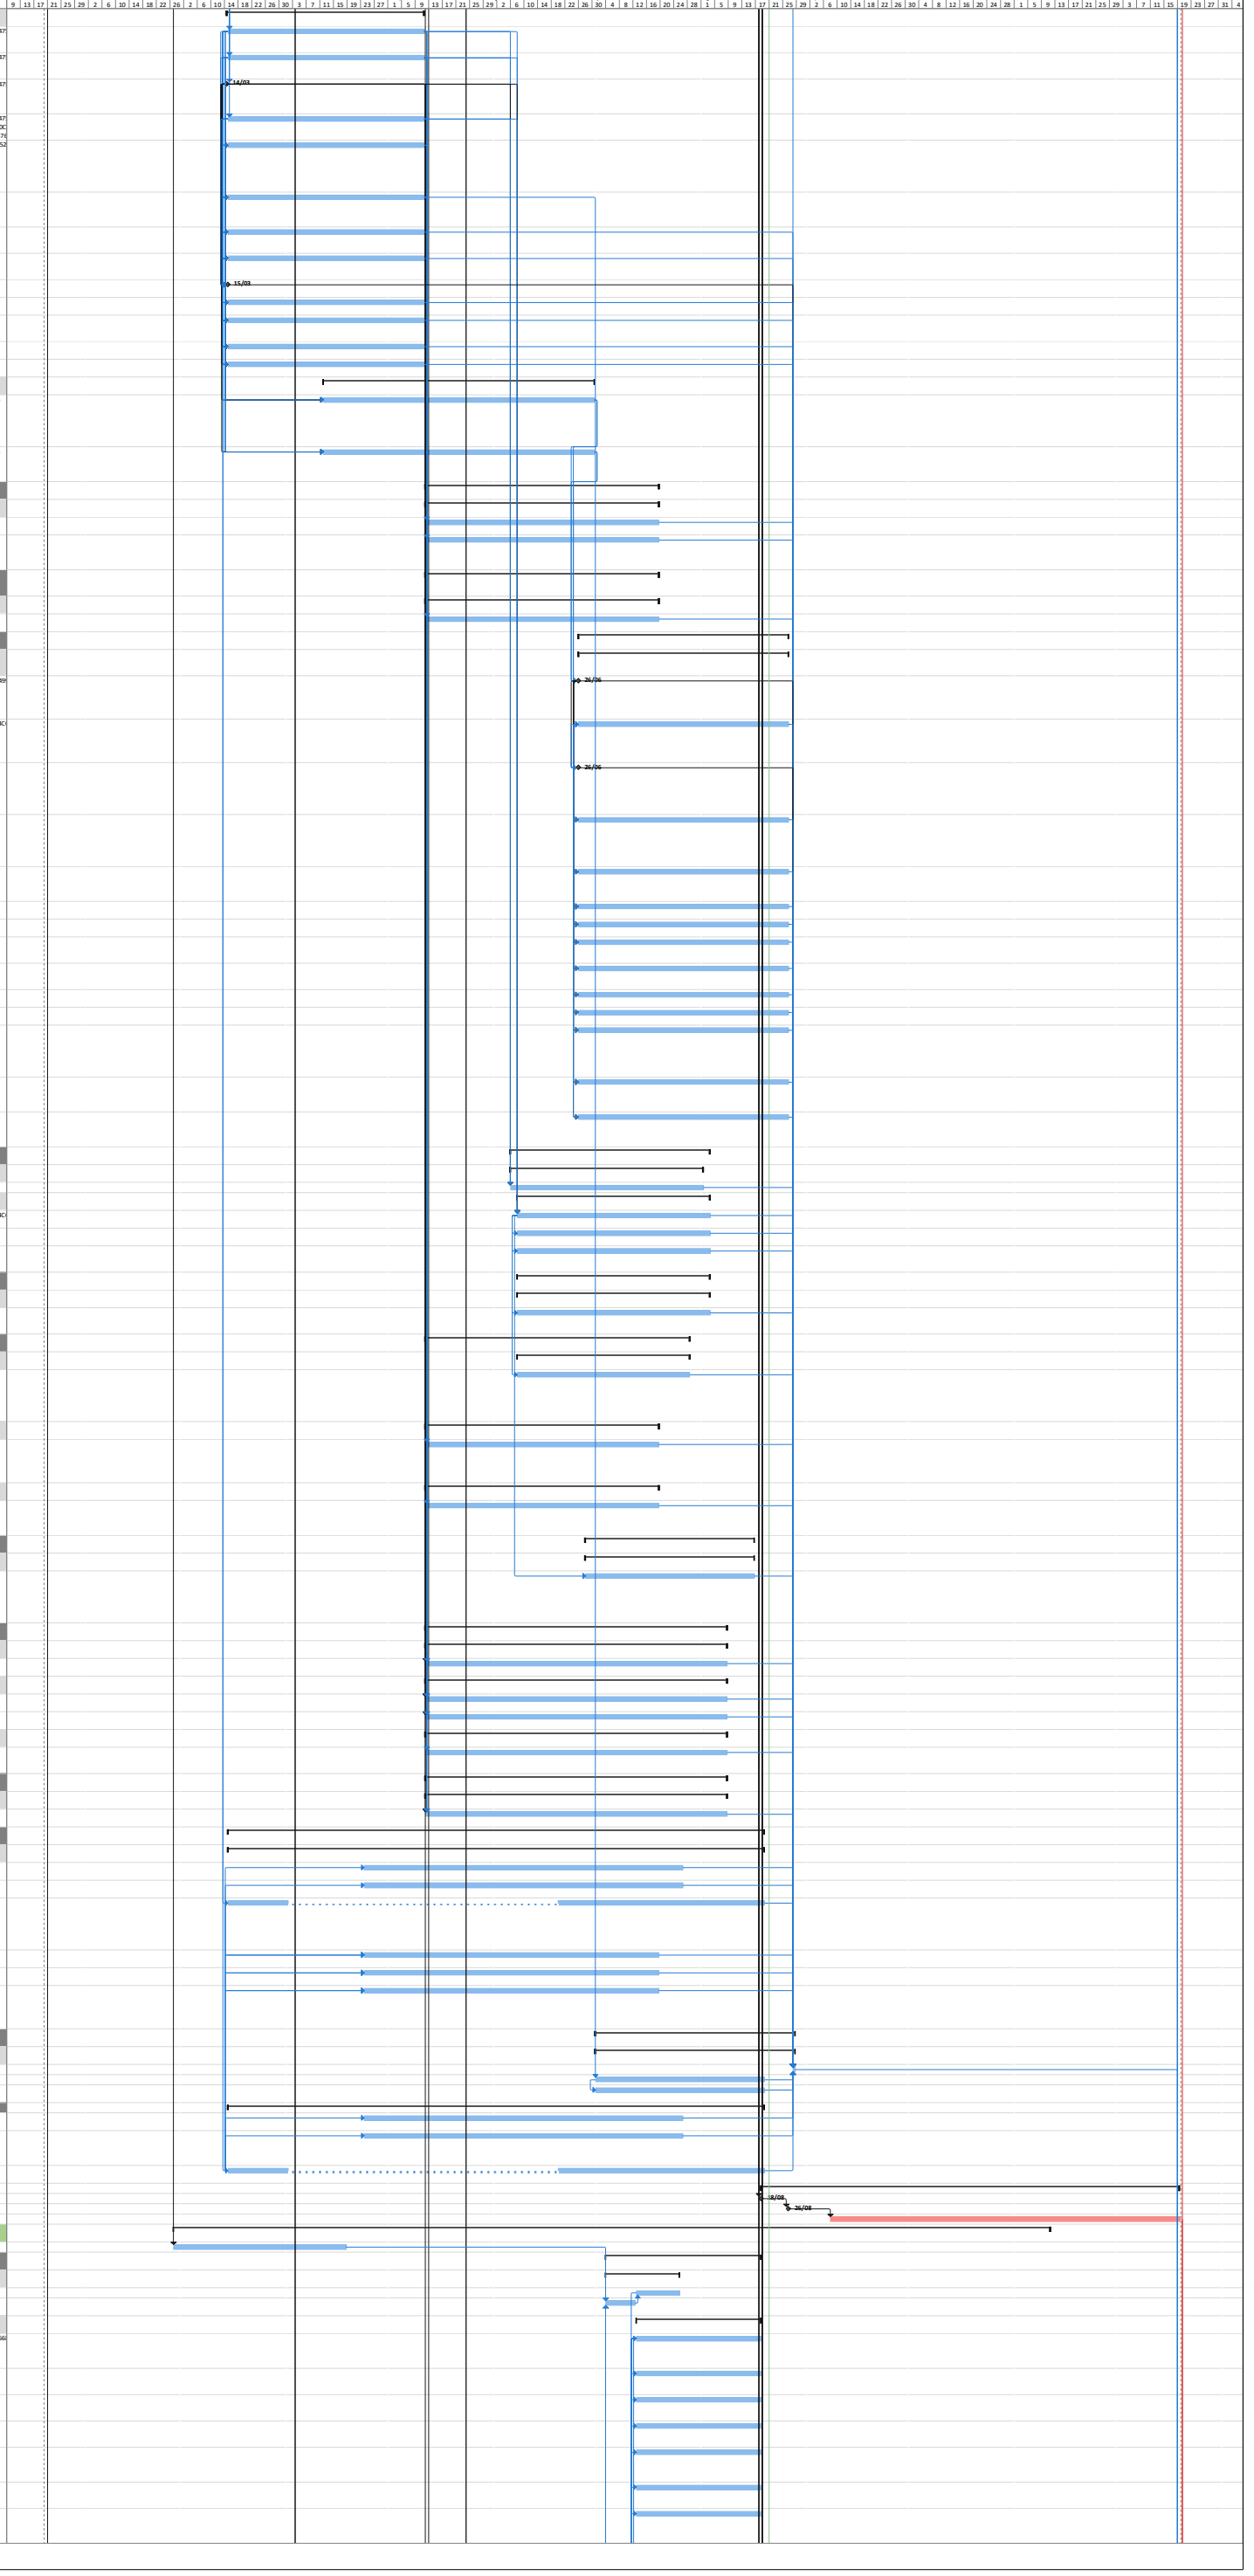

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8

Id	Item	COLEGIO	Unid	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
571	1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M	$ 624.819,00	30 días	jue 13/07/23	vie 18/08/23	564CC	
572	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	$ 1.381.440,00	30 días	jue 13/07/23	vie 18/08/23	564CC	
573	1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 212.604,00	30 días	jue 13/07/23	vie 18/08/23	564CC	
574	1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	$ 949.716,00	30 días	jue 13/07/23	vie 18/08/23	564CC	
575	**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 2.132.320,00**	**30 días**	**jue 13/07/23**	**vie 18/08/23**		
576	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA	M	$ 2.132.320,00	30 días	jue 13/07/23	vie 18/08/23	564CC	590
577	**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 46.905.861,00**	**25 días**	**lun 17/07/23**	**mié 16/08/23**		
578	**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 38.061.496,00**	**25 días**	**lun 17/07/23**	**mié 16/08/23**		
579	2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE	M2	$ 38.061.496,00	25 días	lun 17/07/23	mié 16/08/23	647CC	585CC+3 días;584CC+3 días
580	**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 8.844.365,00**	**15 días**	**jue 27/07/23**	**lun 14/08/23**		
581	2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	$ 8.844.365,00	15 días	jue 27/07/23	lun 14/08/23	587CC+5 días	
582	**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 5.220.555,00**	**30 días**	**vie 21/07/23**	**sáb 26/08/23**		
583	**3.1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 4.528.654,00**	**30 días**	**vie 21/07/23**	**sáb 26/08/23**		
584	3.1.6	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	$ 3.677.446,00	30 días	vie 21/07/23	sáb 26/08/23	579CC+3 días	587CC;634CC+15 días;6
585	3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	$ 851.208,00	30 días	vie 21/07/23	sáb 26/08/23	579CC+3 días	587CC;634CC+15 días;644CC+5 días
586	**3.2**	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 691.901,00**	**30 días**	**vie 21/07/23**	**sáb 26/08/23**		
587	3.2.2	POYOS E = 0.10 CM, ANCHO ENTRE 0.45 Y 0.60 M (INCLUYE MAMPOSTERÍA, PAÑETE, ACABADO EN GRANITO PULIDO)	M	$ 691.901,00	30 días	vie 21/07/23	sáb 26/08/23	585CC;584CC	581CC+5 días;615CC
588	**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 25.311.727,00**	**55 días**	**sáb 19/08/23**	**mar 24/10/23**		
589	**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 7.846.189,00**	**55 días**	**sáb 19/08/23**	**mar 24/10/23**		
590	4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 5.652.858,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	576	591CC;592CC;594CC;59
591	4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	$ 309.386,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	590CC	
592	4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	$ 1.883.945,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	590CC	
593	**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**		**$ 2.564.749,00**	**55 días**	**sáb 19/08/23**	**mar 24/10/23**		
594	4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 '' INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 2.022.337,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	590CC	
595	4.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1	UN	$ 542.412,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	590CC	
596	**4.8**	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 2.664.429,00**	**55 días**	**sáb 19/08/23**	**mar 24/10/23**		
597	4.8.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	$ 2.664.429,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	590CC	
598	**4.8**	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 12.236.360,00**	**55 días**	**sáb 19/08/23**	**mar 24/10/23**		
599	4.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y	M	$ 2.106.324,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	590CC	
600	4.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO DE COBRE	UN	$ 198.144,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	590CC	
601	4.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS, INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y CORAZA	M	$ 8.479.440,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	590CC	
602	4.9.4	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO DE COBRE	UN	$ 498.000,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	590CC	
603	4.9.5	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA PARA GAS 3/4"	UN	$ 119.836,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	590CC	
604	4.9.6	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA PARA GAS 1/2"	UN	$ 367.192,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	590CC	
605	4.9.7	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO GAS COBRE DE	UN	$ 467.424,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	590CC	
606	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 46.924.101,00**	**55 días**	**sáb 19/08/23**	**mar 24/10/23**		
607	**5.1**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 46.924.101,00**	**55 días**	**sáb 19/08/23**	**mar 24/10/23**		
608	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	UN	$ 3.914.838,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	590CC	
609	5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	UN	$ 17.337.840,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	590CC	
610	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	M	$ 14.438.780,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	590CC	
611	5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	$ 3.160.675,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	590CC	
612	5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 8.071.968,00	55 días	sáb 19/08/23	mar 24/10/23	590CC	
613	**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 77.111.528,00**	**65 días**	**vie 21/07/23**	**vie 6/10/23**		
614	**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 15.318.960,00**	**30 días**	**vie 21/07/23**	**sáb 26/08/23**		
615	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	$ 15.318.960,00	30 días	vie 21/07/23	sáb 26/08/23	587CC	617CC+20 días;621CC+15 días
616	**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 61.792.568,00**	**45 días**	**mar 15/08/23**	**vie 6/10/23**		
617	7.2.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	$ 58.882.635,00	45 días	mar 15/08/23	vie 6/10/23	615CC+20 días;621CC	618CC;624FC-20 días;631CC+3 días
618	7.2.44	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE AL	M	$ 2.909.933,00	45 días	mar 15/08/23	vie 6/10/23	617CC	
619	**8**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 3.173.958,00**	**40 días**	**mié 9/08/23**	**lun 25/09/23**		
620	**8.1**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 3.173.958,00**	**40 días**	**mié 9/08/23**	**lun 25/09/23**		
621	8.1.5	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10 CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO	M2	$ 3.173.958,00	40 días	mié 9/08/23	lun 25/09/23	615CC+15 días	617CC
622	**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 10.071.005,00**	**40 días**	**jue 14/09/23**	**mar 31/10/23**		
623	**9.1**	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 1.351.879,00**	**40 días**	**jue 14/09/23**	**mar 31/10/23**		
624	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE	M2	$ 1.351.879,00	40 días	jue 14/09/23	mar 31/10/23	617FC-20 días	628CC;626CC;650
625	**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 6.071.410,00**	**40 días**	**jue 14/09/23**	**mar 31/10/23**		
626	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA	M2	$ 6.071.410,00	40 días	jue 14/09/23	mar 31/10/23	624CC	
627	**9.3**	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 2.647.716,00**	**40 días**	**jue 14/09/23**	**mar 31/10/23**		
628	9.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN POLICUARZO, LONGITUD = X ANCHO DE 60 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA 30 CM,	M2	$ 2.647.716,00	40 días	jue 14/09/23	mar 31/10/23	624CC	
629	**11**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 3.291.208,00**	**15 días**	**vie 18/08/23**	**mar 5/09/23**		
630	**11.1**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 3.291.208,00**	**15 días**	**vie 18/08/23**	**mar 5/09/23**		
631	11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ANTIVANDÁLICA DE PARED INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA Y VÁLVULA DE DESCARGA	UN	$ 3.291.208,00	15 días	vie 18/08/23	mar 5/09/23	617CC+3 días	650
632	**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 31.917.661,00**	**50 días**	**mié 9/08/23**	**vie 6/10/23**		
633	**13.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 27.396.230,00**	**45 días**	**mié 9/08/23**	**sáb 30/09/23**		
634	13.1.3	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO	M2	$ 12.519.926,00	45 días	mié 9/08/23	sáb 30/09/23	585CC+15 días;584CC+15	636CC;639CC+5 días;635CC;638CC+5
635	13.1.8	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MALLA CON VENA MUROS 1:3.	M2	$ 12.436.406,00	45 días	mié 9/08/23	sáb 30/09/23	634CC	650
636	13.1.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 2.439.898,00	45 días	mié 9/08/23	sáb 30/09/23	634CC	650
637	**13.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 4.217.238,00**	**45 días**	**mar 15/08/23**	**vie 6/10/23**		
638	13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 4.055.934,00	45 días	mar 15/08/23	vie 6/10/23	634CC+5 días	650
639	13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 161.304,00	45 días	mar 15/08/23	vie 6/10/23	634CC+5 días	650
640	**13.4**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 304.193,00**	**20 días**	**mar 15/08/23**	**jue 7/09/23**		
641	13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	$ 304.193,00	20 días	mar 15/08/23	jue 7/09/23	634CC+5 días;644CC+3	650
642	**14**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 49.620.849,00**	**30 días**	**jue 27/07/23**	**vie 1/09/23**		
643	**14.1**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 49.620.849,00**	**30 días**	**jue 27/07/23**	**vie 1/09/23**		
644	14.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM)	M2	$ 49.620.849,00	30 días	jue 27/07/23	vie 1/09/23	585CC+5 días;584CC+5 días	641CC+3 días
645	**16**	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 12.281.295,00**	**15 días**	**lun 17/07/23**	**jue 3/08/23**		
646	**16.1**	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 12.281.295,00**	**15 días**	**lun 17/07/23**	**jue 3/08/23**		
647	16.1.1	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO B600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y	M3	$ 12.281.295,00	15 días	lun 17/07/23	jue 3/08/23	564CC+3 días	579CC;650
648	**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 2.682.384,00**	**9 días**	**mié 1/11/23**	**sáb 11/11/23**		
649	**20.1**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 2.682.384,00**	**9 días**	**mié 1/11/23**	**sáb 11/11/23**		
650	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 2.682.384,00	9 días	mié 1/11/23	sáb 11/11/23	631;641;639;624;	1490
651		**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**		**$ 1.138.257.853,00**	**138 días**	**sáb 13/05/23**	**lun 30/10/23**		
652		Etapa preconstructiva		$ 0,00	40 días	sáb 13/05/23	sáb 1/07/23	2FC+92 días	562;655;656
653	**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 94.087.501,00**	**40 días**	**mar 4/07/23**	**mar 22/08/23**		
654	**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 35.485.992,00**	**15 días**	**mar 4/07/23**	**vie 21/07/23**		
655	1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	$ 7.641.796,00	15 días	mar 4/07/23	vie 21/07/23	652	658;659;660
656	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN	M	$ 27.844.196,00	15 días	mar 4/07/23	vie 21/07/23	652	658;659;660
657	**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 58.601.509,00**	**25 días**	**sáb 22/07/23**	**mar 22/08/23**		
658	1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 54.573.587,00	25 días	sáb 22/07/23	mar 22/08/23	655;656	663CC+15 días;668CC+15 días;671CC+5 días
659	1.2.12	DEMOLICIÓN POSTE EN CONCRETO ALUMBRADO PÚBLICO, ALTURA 10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS YANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	$ 3.006.222,00	25 días	sáb 22/07/23	mar 22/08/23	655;656	708
660	1.2.50	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	UN	$ 1.021.700,00	25 días	sáb 22/07/23	mar 22/08/23	655;656	708
661	**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 300.567.082,00**	**61 días**	**vie 28/07/23**	**lun 9/10/23**		
662	**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 134.720.304,00**	**51 días**	**jue 10/08/23**	**lun 9/10/23**		
663	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 68.882.287,00	45 días	jue 10/08/23	lun 2/10/23	658CC+15 días	708;666CC+3 días
664	2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	$ 65.838.017,00	45 días	jue 17/08/23	lun 9/10/23	666CC+3 días	708
665	**2.3**	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 56.934.480,00**	**45 días**	**lun 14/08/23**	**jue 5/10/23**		
666	2.3.9	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	$ 56.934.480,00	45 días	lun 14/08/23	jue 5/10/23	663CC+3 días	708;664CC+3 días
667	**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 73.303.337,00**	**45 días**	**jue 10/08/23**	**lun 2/10/23**		
668	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	$ 28.464.423,00	45 días	jue 10/08/23	lun 2/10/23	658CC+15 días	708;669CC
669	2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	$ 44.838.914,00	45 días	jue 10/08/23	lun 2/10/23	668CC	708
670	**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 35.608.961,00**	**60 días**	**vie 28/07/23**	**sáb 7/10/23**		
671	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE	KG	$ 35.608.961,00	60 días	vie 28/07/23	sáb 7/10/23	658CC+5 días	705CC+8 días;674CC+30 días
672	**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 20.976.150,00**	**35 días**	**lun 4/09/23**	**vie 13/10/23**		
673	**3,1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 20.976.150,00**	**35 días**	**lun 4/09/23**	**vie 13/10/23**		
674	3.1.17	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO	M2	$ 456.144,00	35 días	lun 4/09/23	vie 13/10/23	671CC+30 días	689CC;675CC;676CC
675	3.1.18	LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFICIES A LA VIST	M2	$ 18.578.470,00	35 días	lun 4/09/23	vie 13/10/23	674CC	689CC
676	3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE	M2	$ 1.941.536,00	35 días	lun 4/09/23	vie 13/10/23	674CC	689CC
677	**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 44.695.430,00**	**35 días**	**sáb 26/08/23**	**jue 5/10/23**		
678	**4.1**	**REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 37.362.600,00**	**35 días**	**sáb 26/08/23**	**jue 5/10/23**		
679	4.1.22	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	ML	$ 37.362.600,00	35 días	sáb 26/08/23	jue 5/10/23	705CC+15 días	689CC
680	**4.8**	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 7.332.830,00**	**35 días**	**sáb 26/08/23**	**jue 5/10/23**		
681	4.8.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METALICA E = 0.20 M	UND.	$ 7.332.830,00	35 días	sáb 26/08/23	jue 5/10/23	705CC+15 días	689CC
682	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 58.307.868,00**	**20 días**	**sáb 30/09/23**	**mar 24/10/23**		
683	**5.1**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 58.307.868,00**	**20 días**	**sáb 30/09/23**	**mar 24/10/23**		
684	5.1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/2" INSTALADO EMBEBIDO EN	ML	$ 5.772.864,00	20 días	sáb 30/09/23	mar 24/10/23	705	685CC;686CC
685	5.1.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°2 (F) + 1N°2 (N) + 1N°4 (T)	ML	$ 30.250.752,00	20 días	sáb 30/09/23	mar 24/10/23	684CC	708
686	5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED STREET PARA ALUMBRADO RECREATIVO DE CANCHA DEPORTIVA TIPO EXTERIOR DE 60W, 100V A 277V. INCLUYE ESTRUCTURA TIPO POSTE METÁLICO, ESTRUCTURA CIVIL, CABLE DE PUESTA A TIERRA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS PARA SU	UND.	$ 22.284.252,00	20 días	sáb 30/09/23	mar 24/10/23	684CC	708
687	**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 421.289.814,00**	**45 días**	**lun 4/09/23**	**jue 26/10/23**		
688	**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 67.117.294,00**	**40 días**	**lun 4/09/23**	**vie 20/10/23**		
689	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	$ 67.117.294,00	40 días	lun 4/09/23	vie 20/10/23	674CC;675CC;676	691CC+10 días
690	**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 354.172.520,00**	**35 días**	**vie 15/09/23**	**jue 26/10/23**		
691	7.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	$ 35.593.040,00	35 días	vie 15/09/23	jue 26/10/23	689CC+10 días	692CC;693CC
692	7.2.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE (BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	$ 130.468.093,00	35 días	vie 15/09/23	jue 26/10/23	691CC	
693	2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE	M2	$ 188.111.387,00	35 días	vie 15/09/23	jue 26/10/23	691CC	699CC+20 días

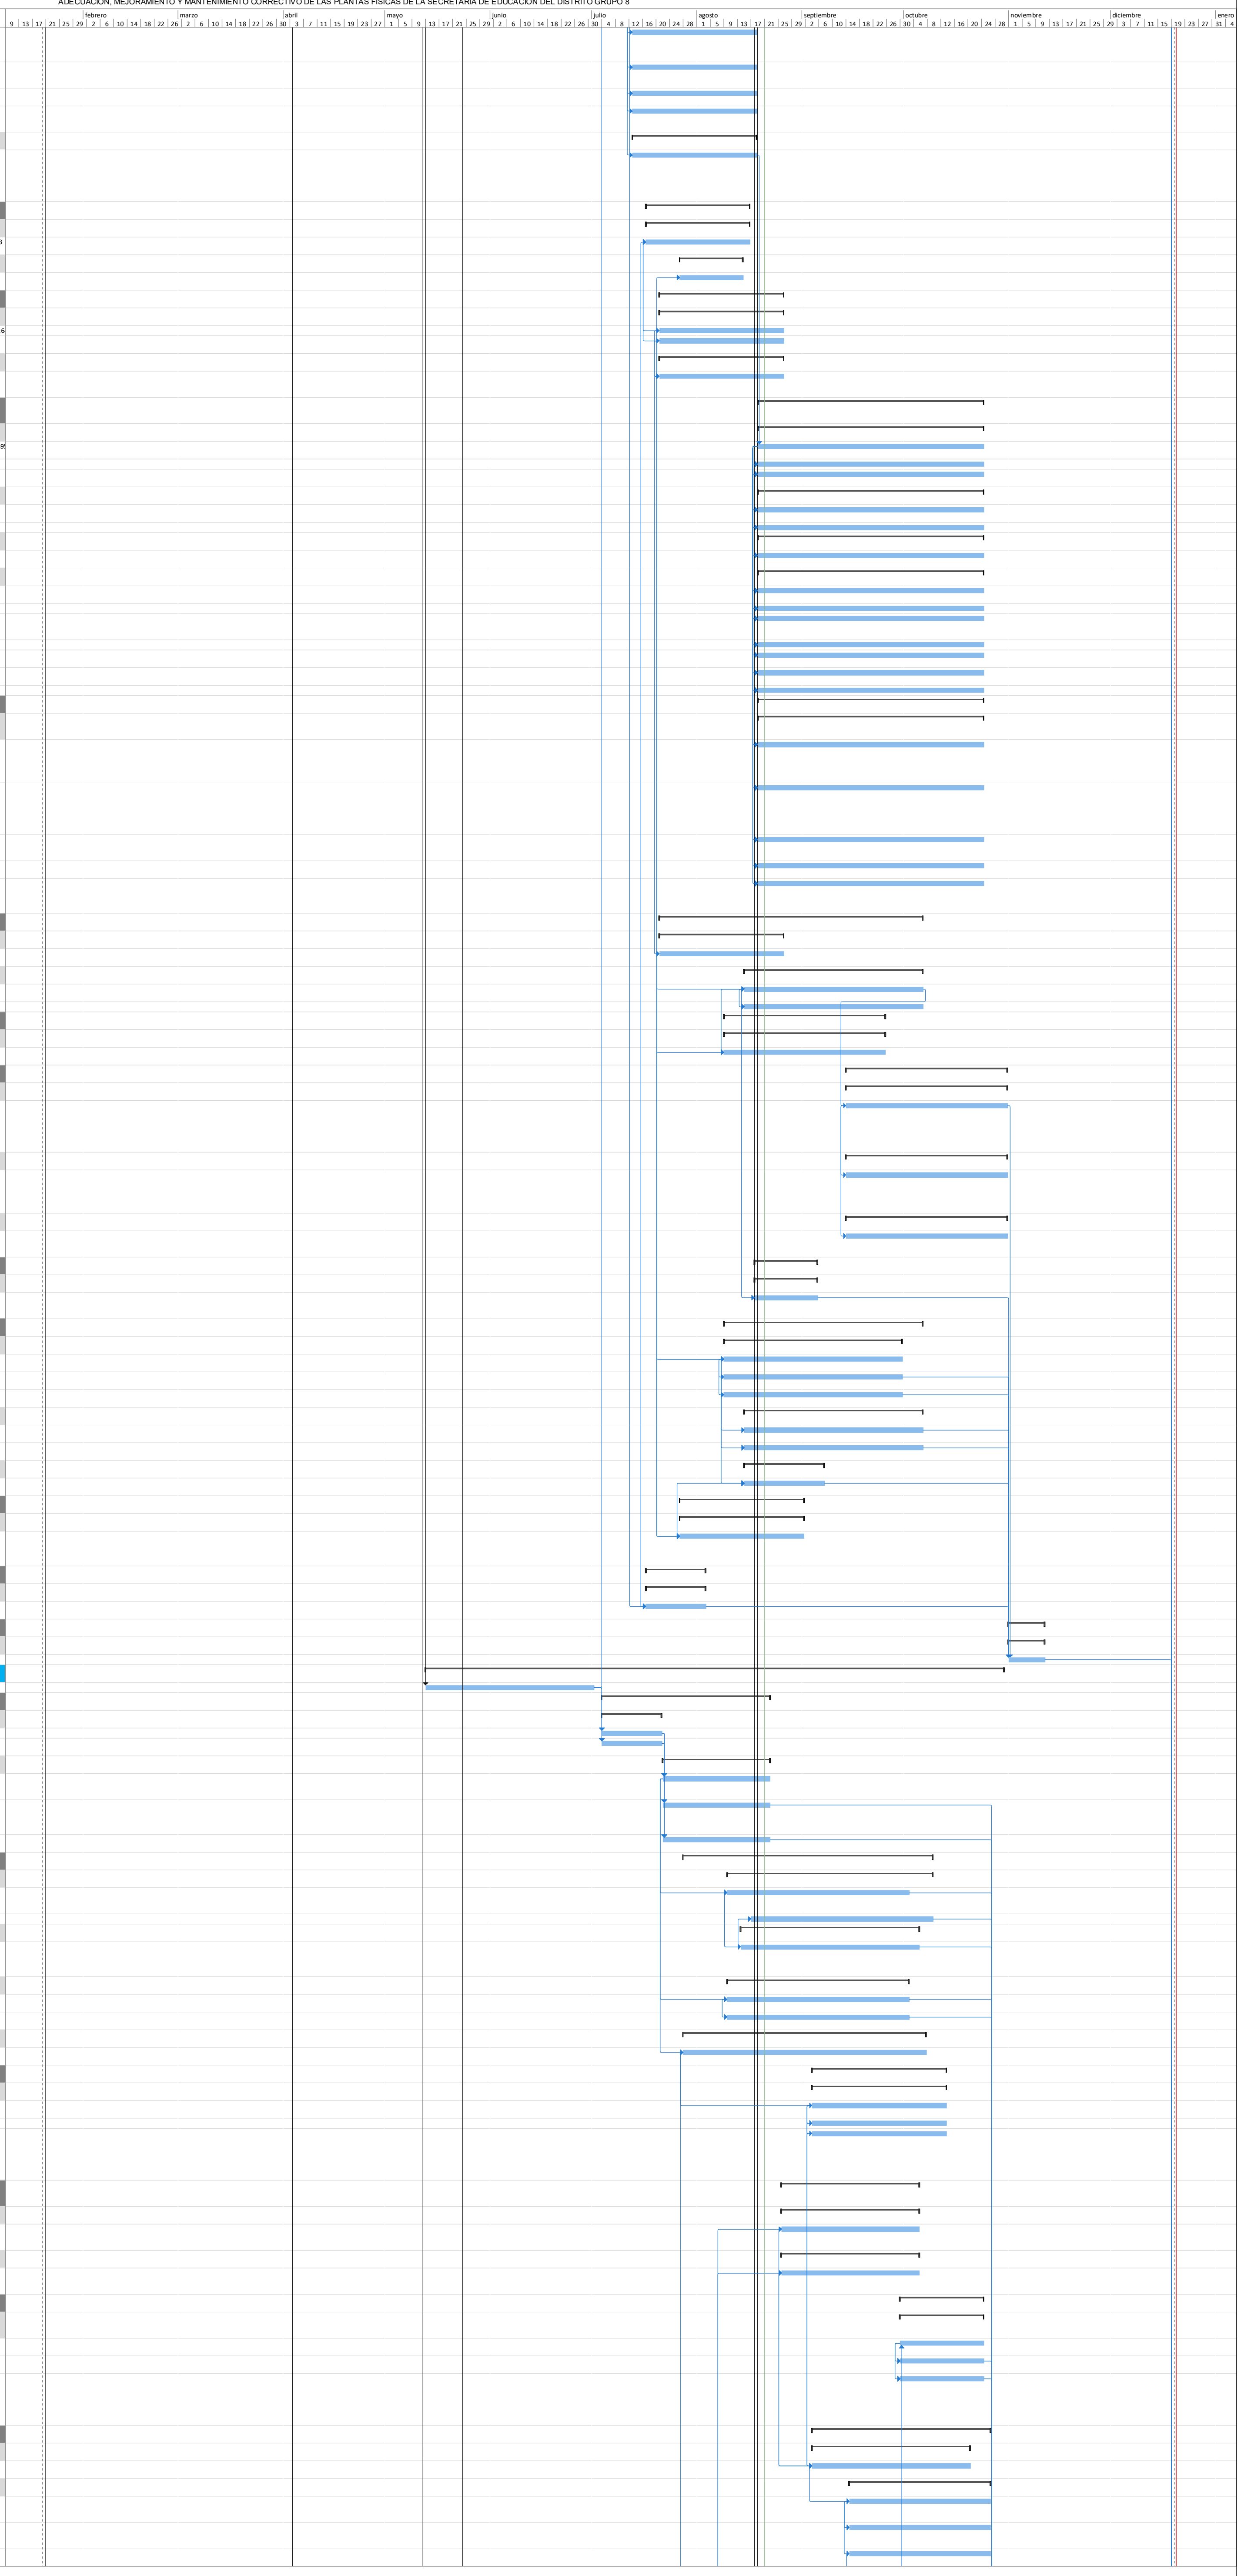

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8

Id	Item	COLEGIO	Unid	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
694	**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 358.860,00**	**12 días**	**jue 12/10/23**	**jue 26/10/23**		
695	**13.4**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 358.860,00**	**12 días**	**jue 12/10/23**	**jue 26/10/23**		
696	13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	$ 358.860,00	12 días	jue 12/10/23	jue 26/10/23	699CC+3 días	708
697	**16**	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 40.870.644,00**	**12 días**	**lun 9/10/23**	**lun 23/10/23**		
698	**16**	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 40.870.644,00**	**12 días**	**lun 9/10/23**	**lun 23/10/23**		
699	16.1.1	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA. - TRANSPORTE - E	M2	$ 40.870.644,00	12 días	lun 9/10/23	lun 23/10/23	693CC+20 días	696CC+3 días
700	**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 69.443.282,00**	**45 días**	**mar 8/08/23**	**vie 29/09/23**		
701	**17.1**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 69.443.282,00**	**45 días**	**mar 8/08/23**	**vie 29/09/23**		
702	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 2.973.106,00	40 días	mar 8/08/23	sáb 23/09/23	705CC	708
703	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 4.106.393,00	40 días	mar 8/08/23	sáb 23/09/23	705CC	708
704	17.1.2	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	$ 45.777.912,00	40 días	mar 8/08/23	sáb 23/09/23	705CC	708
705	17.1.8	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM , TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 16.585.871,00	45 días	mar 8/08/23	vie 29/09/23	671CC+8 días	702CC;681CC+15 días;710;711;712;713;6 días;684;703CC;704CC
706	**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 12.691.222,00**	**3 días**	**vie 27/10/23**	**lun 30/10/23**		
707	**20.1**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 12.691.222,00**	**3 días**	**vie 27/10/23**	**lun 30/10/23**		
708	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 12.691.222,00	3 días	vie 27/10/23	lun 30/10/23	696;659;660;663;1490	
709	**NP**	**NO PREVISTOS**		**$ 74.970.000,00**	**22 días**	**sáb 30/09/23**	**jue 26/10/23**		
710	NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 8"	ML	$ 3.690.000,00	22 días	sáb 30/09/23	jue 26/10/23	705	708
711	NP	DESMONTE , MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL	Gbl	$ 12.500.000,00	22 días	sáb 30/09/23	jue 26/10/23	705	708
712	NP	BORDILLO DE CONTECCIÓN EN CONCRETO DE DIMENSIONES 0.15*0,25 . INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A NIVELES EN SITIO	ML	$ 44.380.000,00	22 días	sáb 30/09/23	jue 26/10/23	705	708
713	NP	POSTES EN ACERO GALVANIZADO PARA ILUMINACION DE CANCHAS. DOBLE BRAZO	UND	$ 14.400.000,00	22 días	sáb 30/09/23	jue 26/10/23	705	708
714		**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL**		**$ 0,00**	**100 días**	**vie 18/08/23**	**mar 19/12/23**		
715		Priorizacion de la necesidad		$ 0,00	0 días	vie 18/08/23	vie 18/08/23	2FC+170 días	716FC+6 días
716		Etapa preconstructiva		$ 0,00	0 días	sáb 26/08/23	sáb 26/08/23	715FC+6 días	717FC+10 días
717		Ejecucion de obras		$ 0,00	84 días	vie 8/09/23	mar 19/12/23	716FC+10 días	1490
718		**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL P**		**$ 770.138.768,23**	**170 días**	**mié 24/05/23**	**mar 19/12/23**		
719		Etapa preconstructiva		$ 0,00	20 días	mié 24/05/23	vie 16/06/23	2FC+100 días	723
720	**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 92.535.709,81**	**55 días**	**sáb 17/06/23**	**vie 25/08/23**		
721	**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 12.012.784,34**	**25 días**	**sáb 17/06/23**	**mar 18/07/23**		
722	1.1.1	REPLANTEO	M2	$ 2.976.225,84	15 días	vie 30/06/23	mar 18/07/23	723	725CC
723	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN	M	$ 9.036.558,50	10 días	sáb 17/06/23	jue 29/06/23	719	722
724	**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 75.502.437,34**	**45 días**	**vie 30/06/23**	**vie 25/08/23**		
725	1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y	M3	$ 1.013.929,00	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	722CC	726CC;727CC;728CC;72
726	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 2.452.506,72	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	725CC	746CC
727	1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 166.099,70	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	725CC	
728	1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 1.256.902,92	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	725CC	
729	1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 59.737,20	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	725CC	
730	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 105.404,00	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	725CC	
731	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	UN	$ 14.890,00	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	725CC	
732	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC.,	M2	$ 26.986.479,80	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	725CC	749
733	1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 7.967.400,00	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	725CC	
734	1.2.36	DESMONTE DE BARANDA METALICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M	$ 1.263.084,00	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	725CC	
735	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	$ 1.510.950,00	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	725CC	
736	1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	$ 2.141.040,00	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	725CC	
737	1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 582.130,00	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	725CC	
738	1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	$ 24.606.700,00	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	725CC	
739	1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS	M	$ 4.955.364,00	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	725CC	
740	1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 419.820,00	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	725CC	800;801;802
741	**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 5.020.488,13**	**45 días**	**vie 30/06/23**	**vie 25/08/23**		
742	1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	$ 4.990.005,02	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	725CC	
743	1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	$ 30.483,11	45 días	vie 30/06/23	vie 25/08/23	725CC	
744	**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 79.265.089,72**	**95 días**	**vie 30/06/23**	**mar 24/10/23**		
745	**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 1.476.178,52**	**60 días**	**vie 30/06/23**	**mar 12/09/23**		
746	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	$ 489.048,00	60 días	vie 30/06/23	mar 12/09/23	726CC	754CC+3 días;753CC+3 días;747CC
747	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	$ 987.130,52	60 días	vie 30/06/23	mar 12/09/23	746CC	754CC+3 días;753CC+3 días
748	**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 77.788.911,20**	**50 días**	**sáb 26/08/23**	**mar 24/10/23**		
749	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE	KG	$ 75.015.301,20	50 días	sáb 26/08/23	mar 24/10/23	732	754CC+3 días;753CC+3 días;750CC
750	2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3 -1/2") - INCLUYE N CARTELAS	UN	$ 2.773.610,00	50 días	sáb 26/08/23	mar 24/10/23	749CC	754CC+3 días;753CC+3 días
751	**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 11.612.941,00**	**50 días**	**mié 30/08/23**	**vie 27/10/23**		
752	**3.1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 5.990.541,00**	**50 días**	**mié 30/08/23**	**vie 27/10/23**		
753	3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	$ 2.578.573,00	50 días	mié 30/08/23	vie 27/10/23	747CC+3 días;750CC+3	756CC;777CC+15 días;786CC+25 días
754	3.1.21	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2	$ 3.411.968,00	50 días	mié 30/08/23	vie 27/10/23	747CC+3 días;750CC+3 días;746CC+3	756CC;777CC+15 días;786CC+25 días
755	**3.3**	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 5.622.400,00**	**50 días**	**mié 30/08/23**	**vie 27/10/23**		
756	3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y	UN	$ 5.622.400,00	50 días	mié 30/08/23	vie 27/10/23	753CC;754CC	771CC;770CC;769CC
757	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 132.779.616,00**	**50 días**	**mar 10/10/23**	**lun 11/12/23**		
758	**5.1**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 132.779.616,00**	**50 días**	**mar 10/10/23**	**lun 11/12/23**		
759	5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	UN	$ 11.850.528,00	50 días	mar 10/10/23	lun 11/12/23	796CC+10 días;795CC+10 días;794CC+10 días;793CC+10 días;792CC+10	760CC;761CC;762CC;76
760	5.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	$ 267.727,00	50 días	mar 10/10/23	lun 11/12/23	759CC	799
761	5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	UN	$ 33.599.351,00	50 días	mar 10/10/23	lun 11/12/23	759CC	799
762	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	M	$ 20.808.830,00	50 días	mar 10/10/23	lun 11/12/23	759CC	799
763	5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	$ 35.399.560,00	50 días	mar 10/10/23	lun 11/12/23	759CC	799
764	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES,	UN	$ 16.014.300,00	50 días	mar 10/10/23	lun 11/12/23	759CC	799
765	5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 11.699.940,00	50 días	mar 10/10/23	lun 11/12/23	759CC	799
766	5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	$ 3.139.380,00	50 días	mar 10/10/23	lun 11/12/23	759CC	799
767	**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 34.742.436,00**	**65 días**	**mié 30/08/23**	**jue 16/11/23**		
768	**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 2.512.760,00**	**45 días**	**mié 30/08/23**	**sáb 21/10/23**		
769	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	$ 880.400,00	45 días	mié 30/08/23	sáb 21/10/23	756CC	773CC+20 días
770	7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	$ 1.318.740,00	45 días	mié 30/08/23	sáb 21/10/23	756CC	773CC+20 días
771	7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	$ 313.620,00	45 días	mié 30/08/23	sáb 21/10/23	756CC	773CC+20 días
772	**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 12.229.676,00**	**45 días**	**vie 22/09/23**	**jue 16/11/23**		
773	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2	$ 12.107.452,00	45 días	vie 22/09/23	jue 16/11/23	771CC+20 días;770CC+20	774CC
774	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES	M	$ 122.224,00	45 días	vie 22/09/23	jue 16/11/23	773CC	
775	**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 45.366.316,64**	**50 días**	**sáb 16/09/23**	**jue 16/11/23**		
776	**13.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 7.640.671,64**	**45 días**	**sáb 16/09/23**	**jue 9/11/23**		
777	13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 4.796.795,00	45 días	sáb 16/09/23	jue 9/11/23	753CC+15 días;754CC+15	778CC;783CC+5 días;780CC+5
778	13.1.4	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 2.843.876,64	45 días	sáb 16/09/23	jue 9/11/23	777CC	799
779	**13.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 2.537.984,00**	**45 días**	**vie 22/09/23**	**jue 16/11/23**		
780	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 2.537.984,00	45 días	vie 22/09/23	jue 16/11/23	777CC+5 días	799
781	**13.4**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 35.187.661,00**	**45 días**	**vie 22/09/23**	**jue 16/11/23**		
782	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 34.622.757,00	45 días	vie 22/09/23	jue 16/11/23	777CC+5 días	799
783	13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS	M2	$ 564.904,00	45 días	vie 22/09/23	jue 16/11/23	777CC+5 días	799
784	**14**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 334.906.094,22**	**45 días**	**jue 28/09/23**	**mié 22/11/23**		
785	**14.1**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 334.906.094,22**	**45 días**	**jue 28/09/23**	**mié 22/11/23**		
786	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO	M	$ 8.874.710,00	45 días	jue 28/09/23	mié 22/11/23	753CC+25 días;754CC+25	759CC+10 días;787CC;788CC;789C
787	17.1.3	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO	M	$ 2.957.064,00	45 días	jue 28/09/23	mié 22/11/23	786CC	759CC+10 días
788	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 733.420,80	45 días	jue 28/09/23	mié 22/11/23	786CC	759CC+10 días
789	17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE	M2	$ 1.163.880,00	45 días	jue 28/09/23	mié 22/11/23	786CC	759CC+10 días
790	17.1.2	LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	M2	$ 17.201.809,12	45 días	jue 28/09/23	mié 22/11/23	786CC	759CC+10 días
791	17.1.2	TEJA TRASLUCIDA EN FIBRA ACDPLADA A CUBIERTA TIPO SANDWICH (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO)	M	$ 22.980.960,00	45 días	jue 28/09/23	mié 22/11/23	786CC	759CC+10 días
792	17.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL	M2	$ 231.160.930,00	45 días	jue 28/09/23	mié 22/11/23	786CC	759CC+10 días
793	17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	$ 12.136.159,00	45 días	jue 28/09/23	mié 22/11/23	786CC	759CC+10 días
794	17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	$ 254.020,00	45 días	jue 28/09/23	mié 22/11/23	786CC	759CC+10 días
795	17.1.4	SEI DE VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). Ds = 100 CM - CAL 20	M	$ 36.302.550,00	45 días	jue 28/09/23	mié 22/11/23	786CC	759CC+10 días
796	17.1.4	INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"X1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	$ 1.140.591,30	45 días	jue 28/09/23	mié 22/11/23	786CC	759CC+10 días
797	**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 58.930.564,84**	**95 días**	**sáb 26/08/23**	**mar 19/12/23**		
798	**20.1**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 58.930.564,84**	**95 días**	**sáb 26/08/23**	**mar 19/12/23**		
799	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 7.120.033,76	7 días	mar 12/12/23	mar 19/12/23	778;783;760;761;1490	
800	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	$ 21.038.646,72	35 días	sáb 26/08/23	jue 5/10/23	740	799
801	20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG	$ 25.184.302,08	35 días	sáb 26/08/23	jue 5/10/23	740	799
802	20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE	M2	$ 5.587.582,28	35 días	sáb 26/08/23	jue 5/10/23	740	799
803		**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		**$ 1.185.769.271,89**	**254 días**	**sáb 21/01/23**	**jue 30/11/23**		
804		Etapa preconstructiva		$ 0,00	100 días	sáb 21/01/23	mié 24/05/23	2FC+1 día	807
805	**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 40.519.820,29**	**73 días**	**jue 25/05/23**	**jue 24/08/23**		
806	**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 1.636.220,00**	**8 días**	**jue 25/05/23**	**vie 2/06/23**		
807	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN	M	$ 1.636.220,00	8 días	jue 25/05/23	vie 2/06/23	804	809;831;829
808	**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 35.645.963,00**	**65 días**	**sáb 3/06/23**	**jue 24/08/23**		
809	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 3.882.982,00	22 días	sáb 3/06/23	vie 30/06/23	807	810CC;811CC;812CC;81
810	1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 1.820.651,00	22 días	sáb 3/06/23	vie 30/06/23	809CC	917;921
811	1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 1.402.933,00	65 días	sáb 3/06/23	jue 24/08/23	809CC	917;921

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8

Id	Item	COLEGIO		Unid	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
812	1.2.23		DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 308.176,00	22 días	sáb 3/06/23	vie 30/06/23	809CC	917;921
813	1.2.28		DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 1.555.763,00	22 días	sáb 3/06/23	vie 30/06/23	809CC	917;921
814	1.2.29		DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 4.110.648,00	22 días	sáb 3/06/23	vie 30/06/23	809CC	917;921
815	1.2.30		DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	UN	$ 461.590,00	22 días	sáb 3/06/23	vie 30/06/23	809CC	917;921
816	1.2.31		DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M	$ 759.915,00	22 días	sáb 3/06/23	vie 30/06/23	809CC	917;921
817	1.2.33		DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC.,	M2	$ 16.976.252,00	22 días	sáb 3/06/23	vie 30/06/23	809CC	918CC+25 días;836FC-10 días;912CC;833FC-10 días;835FC-10 días
818	1.2.35		DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 304.282,00	22 días	sáb 3/06/23	vie 30/06/23	809CC	917;921
819	1.2.42		DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	$ 216.780,00	22 días	sáb 3/06/23	vie 30/06/23	809CC	917;921
820	1.2.44		DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 242.976,00	22 días	sáb 3/06/23	vie 30/06/23	809CC	917;921
821	1.2.45		DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	$ 905.671,00	22 días	sáb 3/06/23	vie 30/06/23	809CC	917;921
822	1.2.52		RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 2.697.344,00	22 días	sáb 3/06/23	vie 30/06/23	809CC	917;921
823	**1.4**		**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 3.237.637,29**	**57 días**	**sáb 3/06/23**	**lun 14/08/23**		
824	1.4.2		CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION TUBERIA	M	$ 998.588,00	35 días	sáb 1/07/23	lun 14/08/23	809	845FC+15 días;842;841;840;839
825	1.4.7		TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	$ 1.524.813,29	35 días	sáb 3/06/23	lun 17/07/23	809CC	917;921
826	1.4.10		LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	$ 714.236,00	35 días	sáb 3/06/23	lun 17/07/23	809CC	917;921
827	**2**		**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 44.581.274,00**	**32 días**	**sáb 3/06/23**	**jue 13/07/23**		
828	**2.2**		**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 865.298,00**	**5 días**	**sáb 3/06/23**	**jue 8/06/23**		
829	2.2.14		COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1.0 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	$ 865.298,00	5 días	sáb 3/06/23	jue 8/06/23	807	917;921
830	**2.3**		**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 1.376.485,00**	**5 días**	**sáb 3/06/23**	**jue 8/06/23**		
831	2.3.22		PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E = 0.10 M	UN	$ 1.376.485,00	5 días	sáb 3/06/23	jue 8/06/23	807	917;921
832	**2.4**		**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 355.852,00**	**20 días**	**mar 20/06/23**	**jue 13/07/23**		
833	2.4.1		SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	$ 355.852,00	20 días	mar 20/06/23	jue 13/07/23	817FC-10 días	917;921
834	**2.5**		**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 41.983.639,00**	**20 días**	**mar 20/06/23**	**jue 13/07/23**		
835	2.5.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE	KG	$ 37.215.295,00	20 días	mar 20/06/23	jue 13/07/23	817FC-10 días	917;921
836	2.5.4		SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TRANSVERSAL SISMORESISTENTE DE 2-4"	UN	$ 4.768.344,00	20 días	mar 20/06/23	jue 13/07/23	817FC-10 días	917;921
837	**3**		**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 6.228.447,00**	**25 días**	**mar 15/08/23**	**mié 13/09/23**		
838	**3.1**		**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 6.228.447,00**	**25 días**	**mar 15/08/23**	**mié 13/09/23**		
839	3.1.1		MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2	$ 2.411.200,00	25 días	mar 15/08/23	mié 13/09/23	824	896;893;905
840	3.1.2		PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M	$ 1.420.749,00	25 días	mar 15/08/23	mié 13/09/23	824	896;893;905
841	3.1.15		PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM)	M	$ 1.827.461,00	25 días	mar 15/08/23	mié 13/09/23	824	896;893;905
842	3.1.24		RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	$ 569.037,00	25 días	mar 15/08/23	mié 13/09/23	824	896;893;905
843	**4**		**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 29.141.530,00**	**30 días**	**sáb 2/09/23**	**vie 6/10/23**		
844	**4.2**		**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 18.089.362,00**	**30 días**	**sáb 2/09/23**	**vie 6/10/23**		
845	4.2.3		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 8.324.558,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	824FC+15 días	846CC;847CC;848CC;84
846	4.2.5		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 3.056.976,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
847	4.2.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	$ 1.679.524,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
848	4.2.14		SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	$ 1.260.414,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
849	4.2.15		SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	$ 3.767.890,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
850	**4.3**		**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**		**$ 5.772.192,00**	**30 días**	**sáb 2/09/23**	**vie 6/10/23**		
851	4.3.9		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 " INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 3.602.544,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
852	4.3.10		SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1	UN	$ 2.169.648,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
853	**4.6**		**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 3.737.724,00**	**30 días**	**sáb 2/09/23**	**vie 6/10/23**		
854	4.6.2		SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	$ 3.737.724,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
855	**4.8**		**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 1.542.252,00**	**30 días**	**sáb 2/09/23**	**vie 6/10/23**		
856	4.8.1		CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	$ 1.542.252,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
857	**5**		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 48.993.053,00**	**30 días**	**sáb 2/09/23**	**vie 6/10/23**		
858	**5.1**		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 48.993.053,00**	**30 días**	**sáb 2/09/23**	**vie 6/10/23**		
859	5.1.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	UN	$ 0,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
860	5.1.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	UN	$ 2.702.752,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
861	5.1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN	$ 886.024,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
862	5.1.11		SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	UN	$ 0,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
863	5.1.12		SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	UN	$ 7.215.968,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
864	5.1.50		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	M	$ 12.616.946,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
865	5.1.56		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	$ 2.476.163,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
866	5.1.72		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES,	UN	$ 13.345.250,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
867	5.1.80		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 9.749.950,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
868	5.1.88		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 0,00	30 días	sáb 2/09/23	vie 6/10/23	845CC	917;921
869	**7**		**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 68.883.714,00**	**25 días**	**mar 10/10/23**	**jue 9/11/23**		
870	**7.1**		**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 6.095.890,00**	**20 días**	**mar 10/10/23**	**jue 2/11/23**		
871	7.1.2		ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	$ 6.095.890,00	20 días	mar 10/10/23	jue 2/11/23	912FC-15 días	873CC;917;921
872	**7.2**		**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 62.787.824,00**	**25 días**	**mar 10/10/23**	**jue 9/11/23**		
873	7.2.2		DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2	$ 46.893.480,00	25 días	mar 10/10/23	jue 9/11/23	871CC	875CC;881FC-5 días;874CC;886FC-5
874	7.2.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES	M	$ 336.116,00	25 días	mar 10/10/23	jue 9/11/23	873CC	917;921
875	7.2.43		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	$ 15.558.228,00	25 días	mar 10/10/23	jue 9/11/23	873CC	917;921
876	**8**		**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 3.967.448,00**	**20 días**	**sáb 28/10/23**	**mié 22/11/23**		
877	**8.1**		**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 3.967.448,00**	**20 días**	**sáb 28/10/23**	**mié 22/11/23**		
878	8.1.5		MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10 CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO	M2	$ 3.967.448,00	20 días	sáb 28/10/23	mié 22/11/23	912	917;921
879	**9**		**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**		**$ 383.753.385,00**	**15 días**	**vie 3/11/23**	**mié 22/11/23**		
880	**9.1**		**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 92.485.721,00**	**15 días**	**vie 3/11/23**	**mié 22/11/23**		
881	9.1.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE	M2	$ 65.448.137,00	15 días	vie 3/11/23	mié 22/11/23	873FC-5 días	882CC;884CC;917;921
882	9.1.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE	M2	$ 27.037.584,00	15 días	vie 3/11/23	mié 22/11/23	881CC	902FC-8 días
883	**9.2**		**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 242.413.804,00**	**15 días**	**vie 3/11/23**	**mié 22/11/23**		
884	9.2.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA	M2	$ 242.413.804,00	15 días	vie 3/11/23	mié 22/11/23	881CC;886CC	917;921
885	**9.3**		**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 48.853.860,00**	**15 días**	**vie 3/11/23**	**mié 22/11/23**		
886	9.3.12		CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M, (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C/.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN	M	$ 48.853.860,00	15 días	vie 3/11/23	mié 22/11/23	873FC-5 días	902FC-8 días;884CC;917;921
887	**11**		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 35.373.094,00**	**10 días**	**vie 10/11/23**	**mié 22/11/23**		
888	**11.1**		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 35.373.094,00**	**10 días**	**vie 10/11/23**	**mié 22/11/23**		
889	11.1.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y	UN	$ 26.360.220,00	10 días	vie 10/11/23	mié 22/11/23	873	917;890CC;921
890	11.1.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO	UN	$ 9.012.874,00	10 días	vie 10/11/23	mié 22/11/23	889CC	917;921
891	**12**		**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 104.485.950,00**	**40 días**	**jue 14/09/23**	**mar 31/10/23**		
892	**12.1**		**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 104.485.950,00**	**40 días**	**jue 14/09/23**	**mar 31/10/23**		
893	12.1.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO;	M2	$ 104.485.950,00	40 días	jue 14/09/23	mar 31/10/23	842;841;840;839	897CC+5 días;900CC+5 días;899CC+5 días;917;921
894	**13**		**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 137.242.420,00**	**59 días**	**jue 14/09/23**	**vie 24/11/23**		
895	**13.1**		**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 14.135.229,00**	**50 días**	**jue 14/09/23**	**mar 14/11/23**		
896	13.1.1		PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 8.344.004,00	45 días	jue 14/09/23	mar 7/11/23	842;841;840;839	897CC+5 días;900CC+5 días;899CC+5
897	13.1.1		ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A .60CM	M	$ 5.791.225,00	45 días	mié 20/09/23	mar 14/11/23	896CC+5 días;893CC+5	917;921
898	**13.2**		**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 104.283.112,00**	**50 días**	**mié 20/09/23**	**lun 20/11/23**		
899	13.2.7		PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 981.900,00	50 días	mié 20/09/23	lun 20/11/23	896CC+5 días;893CC+5	917;921
900	13.2.8		PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 103.301.212,00	50 días	mié 20/09/23	lun 20/11/23	896CC+5 días;893CC+5	917;921
901	**13.4**		**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 18.824.079,00**	**10 días**	**mar 14/11/23**	**vie 24/11/23**		
902	13.4.3		ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 18.824.079,00	10 días	mar 14/11/23	vie 24/11/23	882FC-8 días;886FC-8 días	917;921
903	**15**		**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 460.975,00**	**45 días**	**jue 14/09/23**	**mar 7/11/23**		
904	**15.2**		**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 460.975,00**	**45 días**	**jue 14/09/23**	**mar 7/11/23**		
905	15.2.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E =4 MM	M2	$ 460.975,00	45 días	jue 14/09/23	mar 7/11/23	842;841;840;839	897CC+5 días;900CC+5 días;899CC+5
906	**17**		**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 173.903.914,00**	**129 días**	**sáb 3/06/23**	**jue 9/11/23**		
907	**17.1**		**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 173.903.914,00**	**129 días**	**sáb 3/06/23**	**jue 9/11/23**		
908	17.1.1		FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO	M	$ 840.762,00	50 días	lun 11/09/23	jue 9/11/23	912FC-40 días	917;921
909	17.1.4		CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 2.641.224,00	50 días	lun 11/09/23	jue 9/11/23	912FC-40 días	917;921
910	17.1.5		BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 11.587.030,00	50 días	lun 11/09/23	jue 9/11/23	912FC-40 días	917;921
911	17.1.2		LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM., TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	M2	$ 7.551.626,00	50 días	lun 11/09/23	jue 9/11/23	912FC-40 días	917;921
912	17.1.2		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL	M2	$ 127.900.273,00	40 días	sáb 3/06/23	vie 27/10/23	817CC	909FC-40 días;910FC-40 días;911FC-40 días;917;873FC-15 días;878;908FC-40 días;914FC-40
913	17.1.3		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	$ 6.060.759,00	50 días	lun 11/09/23	jue 9/11/23	912FC-40 días	917;921
914	17.1.4		LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)	M	$ 17.322.240,00	50 días	lun 11/09/23	jue 9/11/23	912FC-40 días	917;921
915	**20**		**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 66.773.450,00**	**121 días**	**jue 6/07/23**	**jue 30/11/23**		
916	**20.1**		**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 66.773.450,00**	**121 días**	**jue 6/07/23**	**jue 30/11/23**		
917	20.1.1		ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 5.099.150,00	5 días	sáb 25/11/23	jue 30/11/23	881;902;912;919	1490
918	20.1.2		DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	$ 28.071.420,00	40 días	jue 6/07/23	jue 24/08/23	817CC+25 días	919CC
919	20.1.3		EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG	$ 33.602.880,00	40 días	jue 6/07/23	jue 24/08/23	918CC	917;921
920	**NP**		**ITEMS NO PRELISTOS**		**$ 41.460.797,60**	**27 días**	**sáb 28/10/23**	**jue 30/11/23**		
921	NP-02		DESMONTE DE ESPEJOS (INCLUYE EMBALAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS)	M2	$ 116.145,00	5 días	sáb 25/11/23	jue 30/11/23	881;902;912;919	1490
922	NP-08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE BLANCO 30X60	M2	$ 22.614.146,60	20 días	sáb 28/10/23	mié 22/11/23	912	917;921
923	NP-14		SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON CORRIDO A DOBLE ALTURA EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON DE 15CM, REENGRUESE DE 2CM TERMINADO ANCHO 60CM. NO INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE	M	$ 18.730.506,00	20 días	sáb 28/10/23	mié 22/11/23	912	917;921
924		**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATER**			**$ 1.243.774.832,32**	**217 días**	**sáb 21/01/23**	**sáb 14/10/23**		
925			Aprobacion de presupuesto por parte de SED		$ 0,00	40 días	sáb 21/01/23	mié 8/03/23	2FC+1 día	928

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION


ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8

Id	Item	COLEGIO	Unid	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
926	**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 66.680.060,00**	**175 días**	**jue 9/03/23**	**jue 12/10/23**		
927	**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 2.134.200,00**	**25 días**	**jue 9/03/23**	**mar 11/04/23**		
928	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN	M	$ 2.134.200,00	25 días	jue 9/03/23	mar 11/04/23	925	930
929	**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 63.997.220,00**	**45 días**	**mié 12/04/23**	**lun 5/06/23**		
930	1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 6.501.243,00	45 días	mié 12/04/23	lun 5/06/23	928	931CC;932CC;933CC;93
931	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 15.249.820,00	45 días	mié 12/04/23	lun 5/06/23	930CC	946FC-20 días;1033;945FC-20 días
932	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 2.217.173,00	45 días	mié 12/04/23	lun 5/06/23	930CC	1032
933	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	UN	$ 29.780,00	45 días	mié 12/04/23	lun 5/06/23	930CC	1032
934	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC.,	M2	$ 30.808.678,00	45 días	mié 12/04/23	lun 5/06/23	930CC	1032
935	1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 1.787.202,00	45 días	mié 12/04/23	lun 5/06/23	930CC	1032
936	1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 629.428,00	45 días	mié 12/04/23	lun 5/06/23	930CC	1032
937	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	$ 1.700.898,00	45 días	mié 12/04/23	lun 5/06/23	930CC	1032
938	1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN	$ 422.412,00	45 días	mié 12/04/23	lun 5/06/23	930CC	1032
939	1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 521.386,00	45 días	mié 12/04/23	lun 5/06/23	930CC	1032
940	1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	$ 4.129.200,00	45 días	mié 12/04/23	lun 5/06/23	930CC	1032
941	**1.3**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 548.640,00**	**30 días**	**vie 8/09/23**	**jue 12/10/23**		
942	1.3.7	MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI	M2	$ 548.640,00	30 días	vie 8/09/23	jue 12/10/23	1000CC;999CC	1032
943	**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 243.440.408,00**	**98 días**	**vie 12/05/23**	**lun 11/09/23**		
944	**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 4.423.574,00**	**28 días**	**vie 12/05/23**	**jue 15/06/23**		
945	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 1.379.423,00	28 días	vie 12/05/23	jue 15/06/23	931FC-20 días	958FC-15 días;955CC;954CC;957F días;967CC+15
946	2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	M3	$ 3.044.151,00	28 días	vie 12/05/23	jue 15/06/23	931FC-20 días	958FC-15 días;955CC;954CC;957F días;967CC+15
947	**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 26.871.605,00**	**70 días**	**vie 16/06/23**	**lun 11/09/23**		
948	2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	$ 10.335.402,00	25 días	sáb 12/08/23	lun 11/09/23	950	1032
949	2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE	M2	$ 0,00	0 días	vie 11/08/23	vie 11/08/23	950	1032
950	2.2.30	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3	$ 16.536.203,00	45 días	vie 16/06/23	vie 11/08/23	945	948;949
951	**2.3**	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 0,00**	**0 días**	**vie 8/09/23**	**vie 8/09/23**		
952	2.3.14	ALFAJÍA EN CONCRETO 2500 PSI 0.25 X 0.10 (NO INCLUYE ACERO)	M	$ 0,00	0 días	vie 8/09/23	vie 8/09/23	1000CC;999CC	1032
953	**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 6.880.442,00**	**70 días**	**vie 12/05/23**	**mar 8/08/23**		
954	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	$ 1.317.249,00	70 días	vie 12/05/23	mar 8/08/23	946CC;945CC	1032
955	2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	$ 5.563.193,00	70 días	vie 12/05/23	mar 8/08/23	946CC;945CC	1032
956	**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 205.264.787,00**	**50 días**	**lun 29/05/23**	**sáb 29/07/23**		
957	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE	KG	$ 191.792.967,00	50 días	lun 29/05/23	sáb 29/07/23	946FC-15 días;945FC-15	1027CC+12 días;1032;1040CC+12
958	2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS	UN	$ 13.471.820,00	50 días	lun 29/05/23	sáb 29/07/23	946FC-15 días;945FC-15 días	1027CC+12 días;1032;1040CC+12 días
959	**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 3.882.012,00**	**50 días**	**mié 31/05/23**	**mar 1/08/23**		
960	**3.1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 3.882.012,00**	**50 días**	**mié 31/05/23**	**mar 1/08/23**		
961	3.1.15	PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM)	ml	$ 3.392.812,00	50 días	mié 31/05/23	mar 1/08/23	946CC+15 días;945CC+15	970CC+15 días;1032
962	3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	$ 489.200,00	50 días	mié 31/05/23	mar 1/08/23	946CC+15 días;945CC+15	970CC+15 días;1032
963	**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 1.627.005,00**	**55 días**	**mié 31/05/23**	**mar 8/08/23**		
964	**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 1.528.488,00**	**50 días**	**mié 31/05/23**	**mar 1/08/23**		
965	4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 1.528.488,00	50 días	mié 31/05/23	mar 1/08/23	946CC+15 días;945CC+15	970CC+15 días;1032
966	**4.8**	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 98.517,00**	**55 días**	**mié 31/05/23**	**mar 8/08/23**		
967	4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	$ 98.517,00	55 días	mié 31/05/23	mar 8/08/23	946CC+15 días;94	970CC+15 días;1032
968	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 123.130.599,00**	**30 días**	**vie 8/09/23**	**jue 12/10/23**		
969	**5.1**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 123.130.599,00**	**30 días**	**vie 8/09/23**	**jue 12/10/23**		
970	5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	UN	$ 7.068.736,00	30 días	vie 8/09/23	jue 12/10/23	967CC+15 días;961CC+15 días;962CC+15 días;965CC+15 días;988CC+15	971CC;983CC;984CC;98
971	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN	$ 886.024,00	30 días	vie 8/09/23	jue 12/10/23	970CC	1032
972	5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	UN	$ 15.559.431,00	30 días	vie 8/09/23	jue 12/10/23	970CC	1032
973	5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA	UN	$ 2.098.468,00	30 días	vie 8/09/23	jue 12/10/23	970CC	1032
974	5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A 50 KA	UN	$ 1.038.616,00	30 días	vie 8/09/23	jue 12/10/23	970CC	1032
975	5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A	UN	$ 430.540,00	30 días	vie 8/09/23	jue 12/10/23	970CC	1032
976	5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A	UN	$ 129.162,00	30 días	vie 8/09/23	jue 12/10/23	970CC	1032
977	5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y	UN	$ 826.300,00	30 días	vie 8/09/23	jue 12/10/23	970CC	1032
978	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	M	$ 1.358.944,00	30 días	vie 8/09/23	jue 12/10/23	970CC	1032
979	5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	M	$ 6.199.310,00	30 días	vie 8/09/23	jue 12/10/23	970CC	1032
980	5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	$ 11.848.016,00	30 días	vie 8/09/23	jue 12/10/23	970CC	1032
981	5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T)	M	$ 7.639.290,00	30 días	vie 8/09/23	jue 12/10/23	970CC	1032
982	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES,	M	$ 35.765.270,00	30 días	vie 8/09/23	jue 12/10/23	970CC	1032
983	5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 19.889.898,00	30 días	vie 8/09/23	jue 12/10/23	970CC	1032
984	5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 5.381.312,00	30 días	vie 8/09/23	jue 12/10/23	970CC	1032
985	5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	$ 7.011.282,00	30 días	vie 8/09/23	jue 12/10/23	970CC	1032
986	**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 123.724.002,00**	**100 días**	**mar 30/05/23**	**sáb 30/09/23**		
987	**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 21.892.026,00**	**55 días**	**mar 13/06/23**	**sáb 19/08/23**		
988	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	$ 21.892.026,00	55 días	mar 13/06/23	sáb 19/08/23	946CC+25 días;945CC+25	970CC+15 días;992;990CC+4 días
989	**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 101.831.976,00**	**100 días**	**mar 30/05/23**	**sáb 30/09/23**		
990	7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2	$ 5.538.600,00	55 días	sáb 17/06/23	vie 25/08/23	988CC+4 días	970CC+15 días;1032;991CC+5
991	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	$ 3.757.064,00	55 días	sáb 24/06/23	jue 31/08/23	990CC+5 días	970CC+15 días;1032
992	7.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO TIPO TARALAY O SIMILAR ALTO	M2	$ 61.010.902,00	35 días	mar 22/08/23	sáb 30/09/23	988	970CC+15 días;1032
993	7.2.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	$ 31.525.410,00	0 días	mar 30/05/23	mar 30/05/23	946CC+15 días;945CC+15	970CC+15 días
994	**8**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 7.223.007,00**	**20 días**	**mar 15/08/23**	**jue 7/09/23**		
995	**8.1**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 7.223.007,00**	**20 días**	**mar 15/08/23**	**jue 7/09/23**		
996	8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 7.223.007,00	20 días	mar 15/08/23	jue 7/09/23	1027CC+50 días;1040CC+50 días	1032
997	**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 56.544.956,00**	**16 días**	**vie 8/09/23**	**mar 26/09/23**		
998	**9.1**	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 56.544.956,00**	**16 días**	**vie 8/09/23**	**mar 26/09/23**		
999	9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y	M2	$ 55.569.590,00	16 días	vie 8/09/23	mar 26/09/23	970CC	942CC;952CC;1032
1000	9.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO, ACCESO A CUBIERTA EN TUBO AGUAS NEGRAS EN 1-1/4" Y PASO EN TUBO DE 1"	M	$ 975.366,00	16 días	vie 8/09/23	mar 26/09/23	970CC	942CC;952CC;1032
1001	**9.3**	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 0,00**	**0 días**	**vie 8/09/23**	**vie 8/09/23**		
1002	9.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN POLICUARZO, LONGITUD = X ANCHO DE 60 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA 30 CM,	M2	$ 0,00	0 días	vie 8/09/23	vie 8/09/23	970CC	1032
1003	**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 137.777.594,00**	**40 días**	**mar 15/08/23**	**sáb 30/09/23**		
1004	**13.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 2.584.186,00**	**35 días**	**mar 15/08/23**	**lun 25/09/23**		
1005	13.1.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 1.056.851,00	35 días	mar 15/08/23	lun 25/09/23	1027CC+50 días;1040CC+50	1032
1006	13.1.1	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M	$ 1.527.335,00	35 días	mar 15/08/23	lun 25/09/23	1027CC+50 días;1040CC+50	1032
1007	**13.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 85.244.817,00**	**35 días**	**mar 15/08/23**	**lun 25/09/23**		
1008	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 799.963,00	35 días	mar 15/08/23	lun 25/09/23	1027CC+50 días;1040CC+50	1032
1009	13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	$ 7.925.772,00	35 días	mar 15/08/23	lun 25/09/23	1027CC+50 días;1040CC+50	1032
1010	13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 76.519.082,00	35 días	mar 15/08/23	lun 25/09/23	1027CC+50 días;1040CC+50	1032
1011	**13.4**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 49.948.591,00**	**40 días**	**mar 15/08/23**	**sáb 30/09/23**		
1012	13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	$ 1.658.265,00	40 días	mar 15/08/23	sáb 30/09/23	1027CC+50 días;1040CC+50	1032
1013	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	ML	$ 48.290.326,00	40 días	mar 15/08/23	sáb 30/09/23	1027CC+50 días;1040CC+50 días	1032
1014	**11**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 1.186.085,00**	**40 días**	**mar 15/08/23**	**sáb 30/09/23**		
1015	**11.1**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 1.186.085,00**	**40 días**	**mar 15/08/23**	**sáb 30/09/23**		
1016	11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UND	$ 817.210,00	40 días	mar 15/08/23	sáb 30/09/23	1027CC+50 días;1040CC+50	1032
1017	11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UND	$ 368.875,00	40 días	mar 15/08/23	sáb 30/09/23	1027CC+50 días;1040CC+50	1032
1018	**15**	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 38.880.155,00**	**40 días**	**mar 15/08/23**	**sáb 30/09/23**		
1019	**15.2**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 38.880.155,00**	**40 días**	**mar 15/08/23**	**sáb 30/09/23**		
1020	15.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS	M2	$ 2.730.360,00	40 días	mar 15/08/23	sáb 30/09/23	1027CC+50 días;1040CC+50	1032
1021	15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION FIJA O MOVIL EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. INC PELICULA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS POR UNA CARA, ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS COMO BARRAS DE GIRO,	M2	$ 36.149.795,00	40 días	mar 15/08/23	sáb 30/09/23	1027CC+50 días;1040CC+50 días	1032
1022	**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 293.071.537,00**	**95 días**	**mar 13/06/23**	**vie 6/10/23**		
1023	**17.1**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 293.071.537,00**	**95 días**	**mar 13/06/23**	**vie 6/10/23**		
1024	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO	M	$ 5.137.990,00	55 días	mié 2/08/23	vie 6/10/23	1027CC+40 días	1032
1025	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 5.475.190,00	55 días	mié 2/08/23	vie 6/10/23	1027CC+40 días	1032
1026	17.1.8	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 23.952.831,00	55 días	mié 2/08/23	vie 6/10/23	1027CC+40 días	1032
1027	17.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL	M2	$ 231.060.830,00	55 días	mar 13/06/23	vie 29/09/23	958CC+12 días;957CC+12 días	1024CC+40 días;1025CC+40 días;1026CC+40 días;1029CC+40 días;1032;1013CC+50 días;1012CC+50
1028	17.1.4	LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)	M	$ 19.832.871,00	55 días	mié 2/08/23	vie 6/10/23	1027CC+40 días	1032
1029	17.1.4	SEI DE VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). Ds = 100 CM - CAL 20	M	$ 7.611.825,00	55 días	mié 2/08/23	vie 6/10/23	1027CC+40 días;1040CC+40 días	1032
1030	**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 101.913.923,00**	**107 días**	**mar 6/06/23**	**sáb 14/10/23**		
1031	**20.1**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 101.913.923,00**	**107 días**	**mar 6/06/23**	**sáb 14/10/23**		
1032	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 6.686.844,00	2 días	vie 13/10/23	sáb 14/10/23	1033;1013;1027;	1490
1033	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	$ 43.205.503,00	50 días	mar 6/06/23	mar 8/08/23	931	1032;1035;1034
1034	20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG	$ 51.719.126,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	1033	1032
1035	20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE	M2	$ 302.450,00	55 días	mié 9/08/23	jue 12/10/23	1033	1032

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8


Id	Item	COLEGIO	Unid	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1036	**NP**	**NO PREVISTOS**		**$ 44.693.489,32**	**90 días**	**mar 13/06/23**	**sáb 30/09/23**		
1037	NP-05	REMATE DE MAMPOSTERÍA A CUBIERTA TIPO SÁNDWICH H>=30 CIM, INCLUYE MAMPOSTERÍA Y	M	$ 2.220.280,00	45 días	mié 2/08/23	lun 25/09/23	1040CC+40 días	1032
1038	NP06	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 H> A 7CM, HASTA 10 CM INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA D131, AFINADO CON LLANA METÁLICA	m2	$ 10.069.984,32	45 días	mié 2/08/23	lun 25/09/23	1040CC+40 días	1032
1039	NP-09	SUMINISTRO E INSLALACION DE MASTICO PARA PISOS DE VINILO (UNA CAPA), APLICA PARA ACABADOS DE PISO EXISTENTES	M2	$ 3.400.410,00	45 días	mié 2/08/23	lun 25/09/23	1040CC+40 días	1032
1040	NP-20	RETIRO DE PINTURA SUELTA EN ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA DE TODAS LAS	un	$ 25.170.165,00	55 días	mar 13/06/23	vie 29/09/23	958CC+12 días;957CC+12	1037CC+40 días;1038CC+40
1041	NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LUMINARIOS 20*120	un	$ 3.832.650,00	50 días	mié 2/08/23	sáb 30/09/23	1040CC+40 días	1032
1042		**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**		**$ 0,00**	**100 días**	**vie 18/08/23**	**mar 19/12/23**		
1043		Priorizacion de la necesidad		$ 0,00	0 días	vie 18/08/23	vie 18/08/23	2FC+170 días	1044FC+6 días
1044		Etapa preconstructiva		$ 0,00	0 días	sáb 26/08/23	sáb 26/08/23	1043FC+6 días	1045FC+10 días
1045		Ejecucion de obras		$ 0,00	84 días	vie 8/09/23	mar 19/12/23	1044FC+10 días	1490
1046		**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		**$ 1.277.252.363,00**	**179 días**	**vie 20/01/23**	**mié 30/08/23**		
1047		Etapa preconstructiva		$ 0,00	10 días	sáb 21/01/23	mié 1/02/23	2FC+1 día	1051
1048	**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 84.868.382,00**	**124 días**	**jue 2/02/23**	**jue 6/07/23**		
1049	**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 10.003.551,00**	**102 días**	**jue 2/02/23**	**mié 7/06/23**		
1050	1.1.1	REPLANTEO	M2	$ 2.782.841,00	100 días	sáb 4/02/23	mié 7/06/23	1051CC+2 días	1054CC+7 días;1053CC+
1051	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN	M	$ 7.220.710,00	102 días	jue 2/02/23	mié 7/06/23	1047	1050CC+2 días;1185
1052	**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 64.849.506,00**	**115 días**	**lun 13/02/23**	**jue 6/07/23**		
1053	1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 1.305.769,00	105 días	lun 13/02/23	vie 23/06/23	1050CC+7 días	1055CC;1056CC;1057CC
1054	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 4.062.367,00	105 días	lun 13/02/23	vie 23/06/23	1050CC+7 días	1055CC;1056CC;1057CC
1055	1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 1.522.911,00	111 días	lun 13/02/23	vie 30/06/23	1054CC;1053CC	1185
1056	1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 3.136.197,00	111 días	lun 13/02/23	vie 30/06/23	1054CC;1053CC	1185;1191CC
1057	1.2.19	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 2.005.255,00	111 días	lun 13/02/23	vie 30/06/23	1054CC;1053CC	1185
1058	1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 1.862.998,00	111 días	lun 13/02/23	vie 30/06/23	1054CC;1053CC	1185
1059	1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 546.312,00	105 días	lun 13/02/23	vie 23/06/23	1054CC;1053CC	1185
1060	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 1.942.332,00	105 días	lun 13/02/23	vie 23/06/23	1054CC;1053CC	1185
1061	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 25.635,00	105 días	lun 13/02/23	vie 23/06/23	1054CC;1053CC	1185
1062	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	UN	$ 1.131.640,00	100 días	lun 13/02/23	vie 16/06/23	1054CC;1053CC	1077CC;1185
1063	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC.,	M2	$ 32.095.307,00	108 días	lun 13/02/23	mar 27/06/23	1050CC+7 días	1064CC;1065CC;1066CC
1064	1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 7.284.480,00	106 días	lun 13/02/23	sáb 24/06/23	1063CC	1185
1065	1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 234.732,00	115 días	lun 13/02/23	jue 6/07/23	1063CC	1185
1066	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	$ 1.105.152,00	99 días	lun 13/02/23	jue 15/06/23	1063CC	1185
1067	1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	$ 2.312.858,00	99 días	lun 13/02/23	jue 15/06/23	1063CC	1185
1068	1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 551.758,00	99 días	lun 13/02/23	jue 15/06/23	1063CC	1077CC
1069	1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 3.723.803,00	99 días	lun 13/02/23	jue 15/06/23	1054CC;1053CC;1	1185
1070	**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 10.015.325,00**	**106 días**	**lun 13/02/23**	**sáb 24/06/23**		
1071	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA	M	$ 3.798.195,00	45 días	mar 21/03/23	mar 16/05/23	1083CC+15 días	1088CC+15 días;1185
1072	1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION TUBERIA	M	$ 1.769.623,00	45 días	mar 21/03/23	mar 16/05/23	1083CC+15 días	1088CC+15 días;1185
1073	1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	$ 2.762.760,00	106 días	lun 13/02/23	sáb 24/06/23	1054CC;1053CC;1	1088CC;1185
1074	1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	$ 1.684.747,00	80 días	lun 13/02/23	mar 23/05/23	1054CC;1053CC;1	1185
1075	**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 141.609.555,00**	**110 días**	**lun 13/02/23**	**jue 29/06/23**		
1076	**2.3**	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 11.440.044,00**	**100 días**	**lun 13/02/23**	**vie 16/06/23**		
1077	2.3.23	PERFORACIÓN NÚCLEO DE 6" E = 0.10 M	UN	$ 11.440.044,00	100 días	lun 13/02/23	vie 16/06/23	1068CC;1062CC	1080CC;1083CC+15 días
1078	**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 130.169.511,00**	**110 días**	**lun 13/02/23**	**jue 29/06/23**		
1079	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE	KG	$ 121.484.313,00	110 días	lun 13/02/23	jue 29/06/23	1077CC	1180CC+5 días;1164;1163;1185
1080	2.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TRANSVERSAL SISMORESISTENTE DE 2-4"	UN	$ 8.685.198,00	110 días	lun 13/02/23	jue 29/06/23	1077CC	1180CC+5 días;1164;1163;1185
1081	**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 7.151.939,00**	**98 días**	**jue 2/03/23**	**mar 4/07/23**		
1082	**3.1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 662.524,00**	**26 días**	**jue 2/03/23**	**sáb 1/04/23**		
1083	3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2	$ 662.524,00	26 días	jue 2/03/23	sáb 1/04/23	1077CC+15 días	1072CC+15 días;1071CC
1084	**3,2**	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 6.489.415,00**	**13 días**	**sáb 17/06/23**	**mar 4/07/23**		
1085	3.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA	M	$ 6.489.415,00	13 días	sáb 17/06/23	mar 4/07/23	1077	1185;1196
1086	**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 39.173.805,00**	**85 días**	**mar 11/04/23**	**mar 25/07/23**		
1087	**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 18.479.335,00**	**80 días**	**mar 11/04/23**	**mar 18/07/23**		
1088	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 6.604.608,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1072CC+15 días;1073CC;1071	1089CC;1090CC;1092CC
1089	4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	$ 2.800.812,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1185
1090	4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 3.439.098,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1185
1091	4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	$ 88.396,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1185
1092	4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 1.559.332,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1185
1093	4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN	$ 3.801.825,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1185
1094	4.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 185.264,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1185
1095	**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**		**$ 4.602.440,00**	**80 días**	**mar 11/04/23**	**mar 18/07/23**		
1096	4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 747.865,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1108CC+15 días;1105CC+15
1097	4.3.14	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1	UN	$ 921.270,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1108CC+15 días;1105CC
1098	4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 568.752,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1108CC+15 días;1105CC+15
1099	4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 1.089.451,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1108CC+15 días;1105CC+15
1100	4.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1	UN	$ 1.275.102,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1108CC+15 días;1105CC
1101	**4.6**	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 13.531.617,00**	**70 días**	**vie 28/04/23**	**mar 25/07/23**		
1102	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	$ 2.187.936,00	70 días	vie 28/04/23	mar 25/07/23	1096CC+15 días;1100CC+15	1185
1103	4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	$ 2.871.666,00	70 días	vie 28/04/23	mar 25/07/23	1096CC+15 días;1100CC+15	1185
1104	4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	$ 4.577.859,00	70 días	vie 28/04/23	mar 25/07/23	1096CC+15 días;1	1185
1105	4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	$ 3.894.156,00	70 días	vie 28/04/23	mar 25/07/23	1096CC+15 días;1	1185
1106	**4.11**	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 2.560.413,00**	**70 días**	**vie 28/04/23**	**mar 25/07/23**		
1107	4.11.2	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 520.725,00	70 días	vie 28/04/23	mar 25/07/23	1096CC+15 días;1100CC+15 días;1099CC+15	1185
1108	4.11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE ROSCA RANURA 3" ACERO INOXIDABLE	UN	$ 2.039.688,00	70 días	vie 28/04/23	mar 25/07/23	1096CC+15 días;1100CC+15	1185
1109	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 133.680.981,00**	**80 días**	**mar 11/04/23**	**mar 18/07/23**		
1110	**5.1**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 133.680.981,00**	**80 días**	**mar 11/04/23**	**mar 18/07/23**		
1111	5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	UN	$ 6.860.832,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1185
1112	5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	UN	$ 16.912.425,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1185
1113	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	M	$ 26.277.730,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1185
1114	5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	$ 28.080.882,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1185
1115	5.1.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES,	UN	$ 93.391,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1185
1116	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES,	UN	$ 27.224.310,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1185
1117	5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 16.769.914,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1185
1118	5.1.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 292.084,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1185
1119	5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 5.044.980,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1185
1120	5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	$ 5.964.822,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1185
1121	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	$ 159.611,00	80 días	mar 11/04/23	mar 18/07/23	1088CC	1185
1122	**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 31.552.695,00**	**70 días**	**sáb 22/04/23**	**mar 18/07/23**		
1123	**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 5.831.770,00**	**70 días**	**sáb 22/04/23**	**mar 18/07/23**		
1124	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	$ 5.831.770,00	70 días	sáb 22/04/23	mar 18/07/23	1180CC+50 días	1126CC+23 días;1185
1125	**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 25.720.925,00**	**45 días**	**sáb 20/05/23**	**sáb 15/07/23**		
1126	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES	M	$ 696.677,00	45 días	sáb 20/05/23	sáb 15/07/23	1124CC+23 días	1129CC;1131CC;1136CC días;1128CC;1127CC;11
1127	7.2.36	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU	M	$ 737.852,00	45 días	sáb 20/05/23	sáb 15/07/23	1126CC	1185
1128	7.2.37	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS	M	$ 851.813,00	45 días	sáb 20/05/23	sáb 15/07/23	1126CC	1185
1129	7.2.39	WIN DE ALUMINIO	M	$ 1.115.122,00	45 días	sáb 20/05/23	sáb 15/07/23	1126CC	1185
1130	7.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO TIPO TARALAY O SIMILAR ALTO	M2	$ 11.282.140,00	45 días	sáb 20/05/23	sáb 15/07/23	1126CC	1185
1131	7.2.68	AFINADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E = VARIABLE (MAYOR A	M3	$ 11.037.321,00	45 días	sáb 20/05/23	sáb 15/07/23	1126CC	1185
1132	**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 7.099.967,00**	**35 días**	**vie 2/06/23**	**sáb 15/07/23**		
1133	**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 4.188.899,00**	**35 días**	**vie 2/06/23**	**sáb 15/07/23**		
1134	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA	M2	$ 4.188.899,00	35 días	vie 2/06/23	sáb 15/07/23	1126CC+10 días	1162FC-10 días;1171CC;1167CC;11
1135	**9.3**	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 2.911.068,00**	**35 días**	**vie 2/06/23**	**sáb 15/07/23**		
1136	9.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MAXIMO 1.00 X 1.00 EN LAMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE	UN	$ 2.911.068,00	35 días	vie 2/06/23	sáb 15/07/23	1126CC+10 días	1162FC-10 días;1171CC;1167CC;11
1137	**11**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 80.486.695,00**	**45 días**	**vie 20/01/23**	**lun 13/03/23**		
1138	**11.1**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 80.486.695,00**	**45 días**	**vie 20/01/23**	**lun 13/03/23**		
1139	11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y	UN	$ 25.166.349,00	45 días	vie 20/01/23	lun 13/03/23		1141CC;1143CC;1145CC
1140	11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)	UN	$ 1.596.072,00	45 días	vie 20/01/23	lun 13/03/23	1139CC	1185
1141	11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	$ 33.552.648,00	45 días	vie 20/01/23	lun 13/03/23	1139CC	1185
1142	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO	UN	$ 6.239.682,00	45 días	vie 20/01/23	lun 13/03/23	1139CC	1185
1143	11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH,	UN	$ 13.257.762,00	45 días	vie 20/01/23	lun 13/03/23	1139CC	1185
1144	11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	UN	$ 274.374,00	45 días	vie 20/01/23	lun 13/03/23	1139CC	1185
1145	11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	$ 399.808,00	45 días	vie 20/01/23	lun 13/03/23	1139CC	1185
1146	**12**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 101.024.525,00**	**50 días**	**sáb 17/06/23**	**vie 18/08/23**		
1147	**12.1**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 101.024.525,00**	**50 días**	**sáb 17/06/23**	**vie 18/08/23**		
1148	12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO,	M2	$ 95.556.077,00	50 días	sáb 17/06/23	vie 18/08/23	1077	1185
1149	12.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	UN	$ 5.468.448,00	50 días	sáb 17/06/23	vie 18/08/23	1077	1185
1150	**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 151.961.399,00**	**130 días**	**jue 2/03/23**	**sáb 12/08/23**		
1151	**13.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 21.045.315,00**	**120 días**	**jue 2/03/23**	**lun 31/07/23**		
1152	13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 7.170.671,00	75 días	vie 28/04/23	lun 31/07/23	1077CC+60 días	1185
1153	13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M	$ 1.107.853,00	110 días	jue 2/03/23	mar 18/07/23	1077CC+15 días	1185

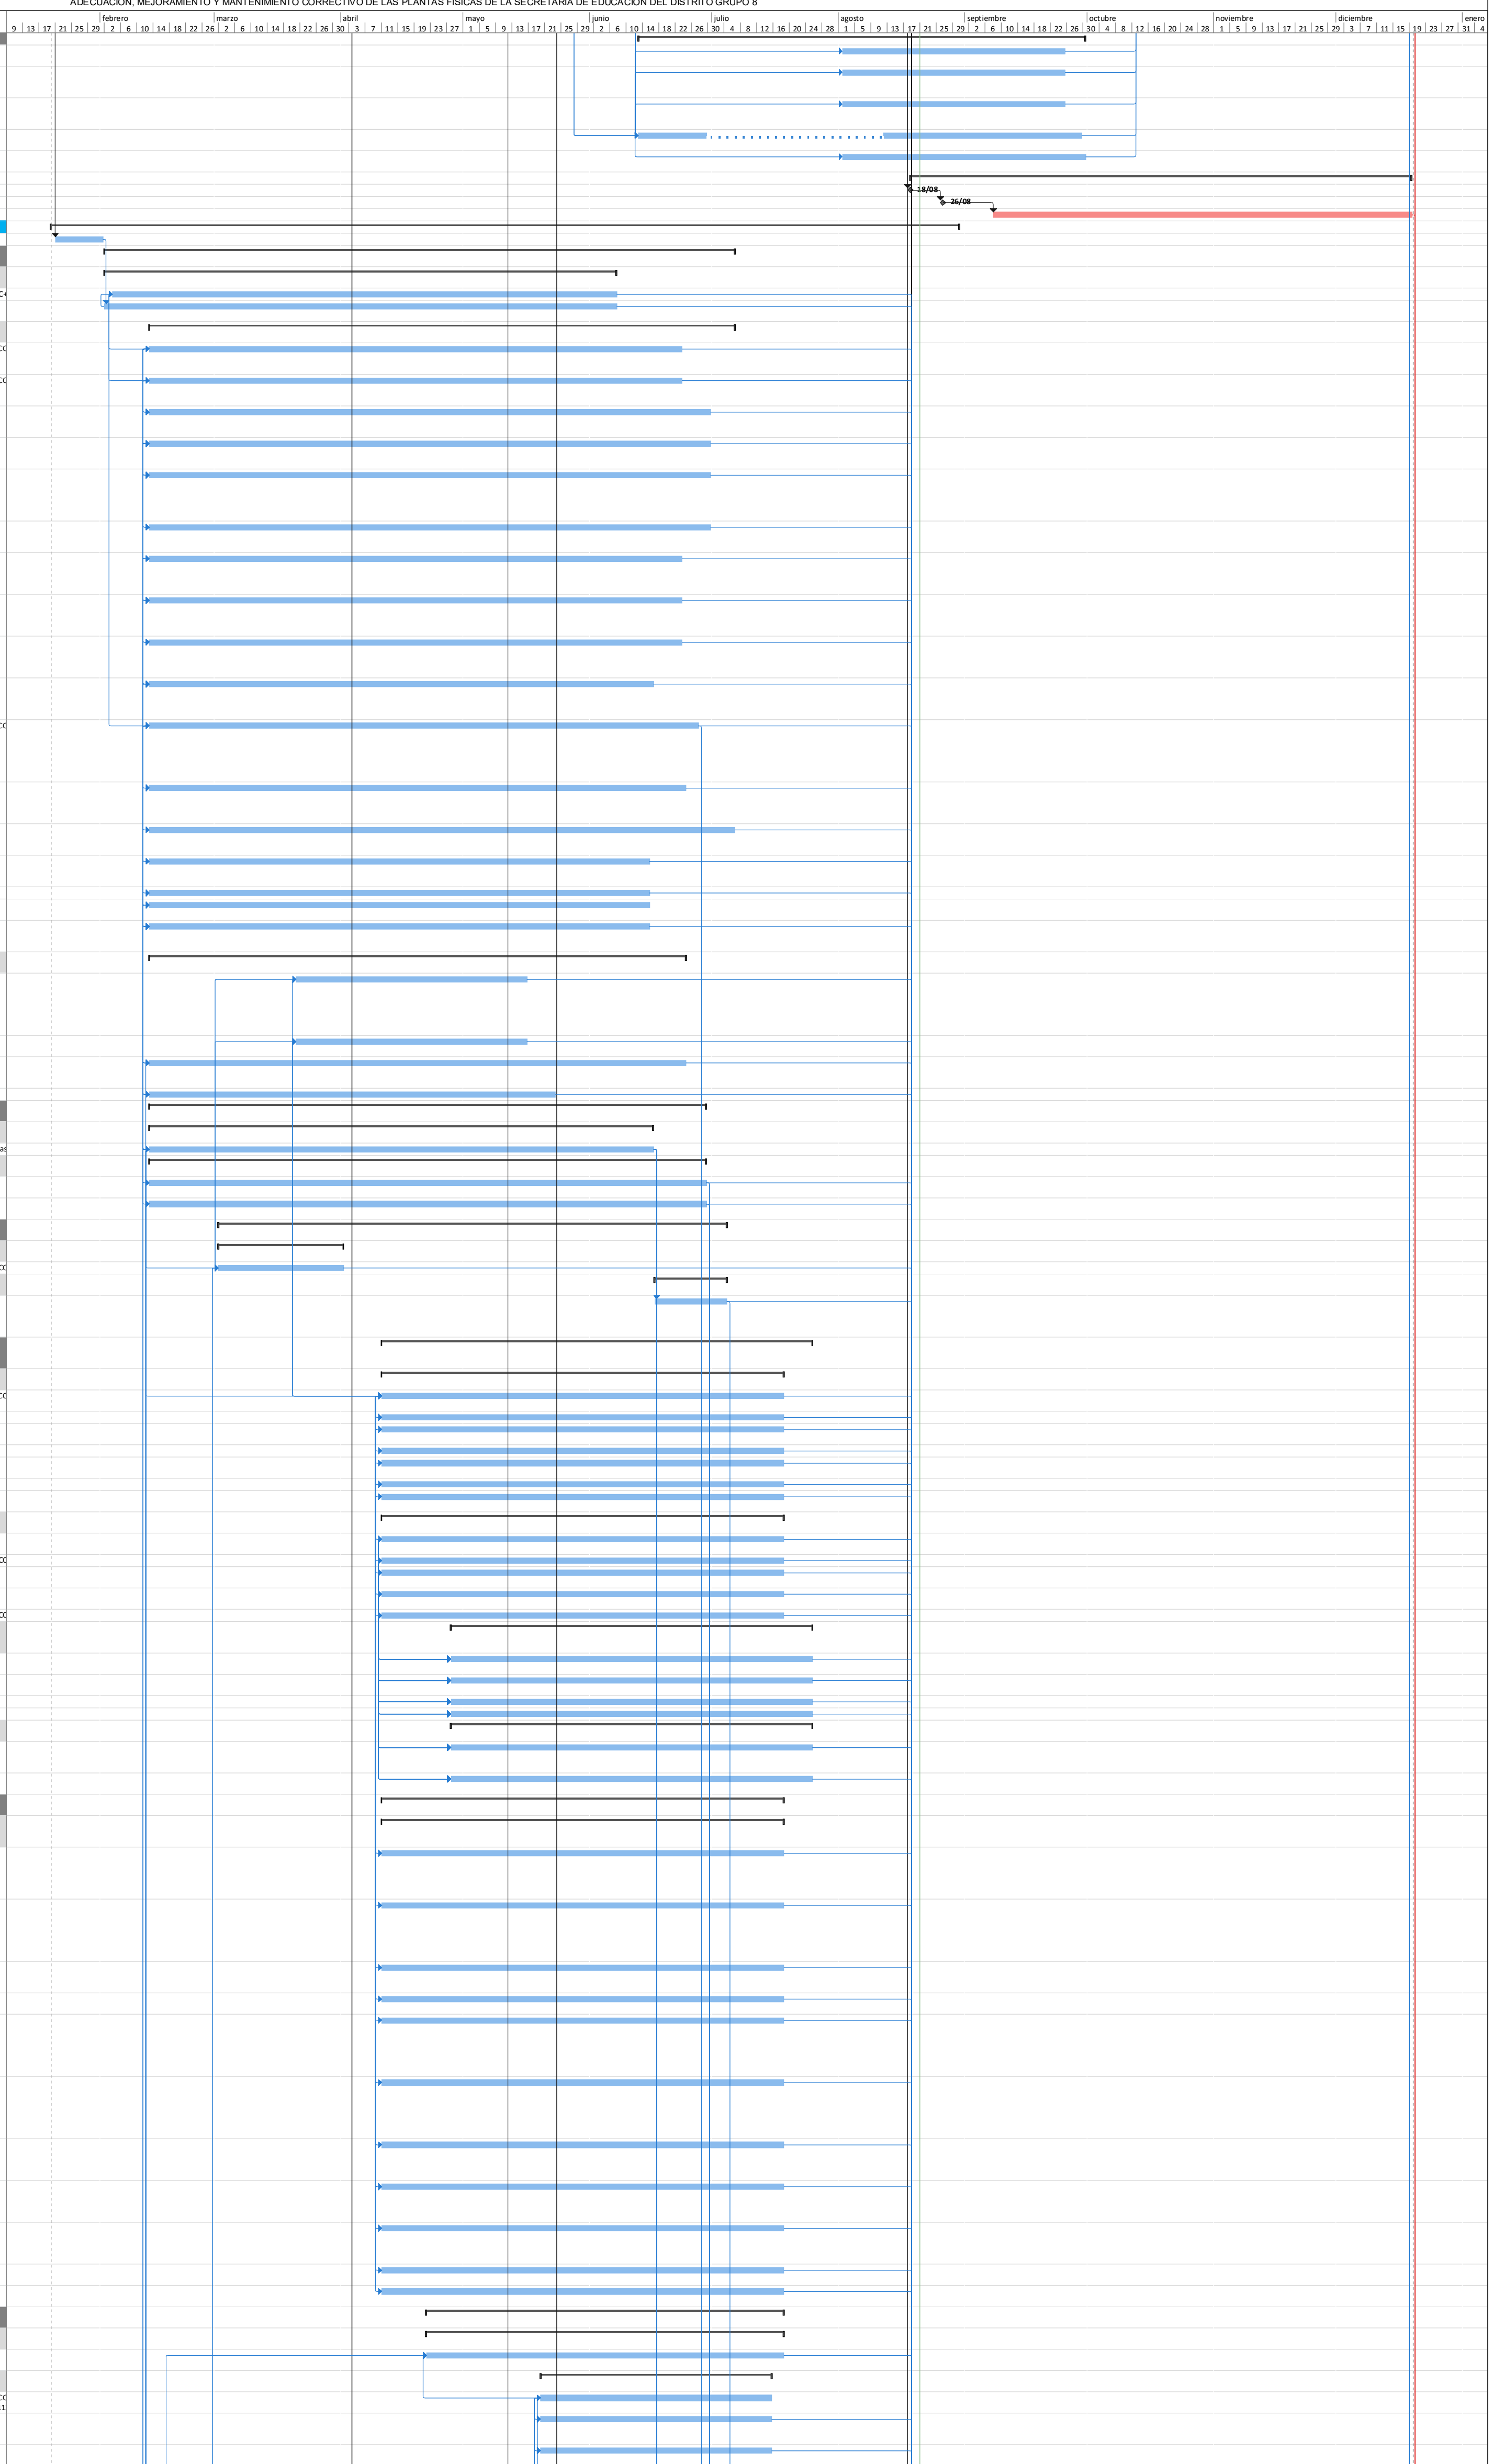

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8


Id	Item	COLEGIO	Unid	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1154	13.1.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 2.064.974,00	110 días	jue 2/03/23	mar 18/07/23	1077CC+15 días	1185
1155	13.1.1	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M	$ 10.701.817,00	110 días	jue 2/03/23	mar 18/07/23	1077CC+15 días	1185
1156	**13.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 50.960.978,00**	**130 días**	**jue 2/03/23**	**sáb 12/08/23**		
1157	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 18.201.329,00	130 días	jue 2/03/23	sáb 12/08/23	1077CC+15 días	1185
1158	13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	$ 23.061.332,00	130 días	jue 2/03/23	sáb 12/08/23	1077CC+15 días	1185
1159	13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 7.320.490,00	130 días	jue 2/03/23	sáb 12/08/23	1077CC+15 días	1185
1160	13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 2.377.827,00	130 días	jue 2/03/23	sáb 12/08/23	1077CC+15 días	1185
1161	**13.4**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 79.955.106,00**	**28 días**	**vie 30/06/23**	**jue 3/08/23**		
1162	13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	$ 833.225,00	25 días	mié 5/07/23	jue 3/08/23	1136FC-10 días;1134FC-10	1185
1163	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 79.084.396,00	25 días	vie 30/06/23	lun 31/07/23	1080;1079	1185
1164	13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS	M2	$ 37.485,00	25 días	vie 30/06/23	lun 31/07/23	1080;1079	1185
1165	**14**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 18.118.896,00**	**35 días**	**vie 2/06/23**	**sáb 15/07/23**		
1166	**14.1**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 18.118.896,00**	**35 días**	**vie 2/06/23**	**sáb 15/07/23**		
1167	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS	M2	$ 18.118.896,00	35 días	vie 2/06/23	sáb 15/07/23	1136CC;1134CC	1185
1168	**15**	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 2.561.973,00**	**35 días**	**vie 2/06/23**	**sáb 15/07/23**		
1169	**15.2**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 2.561.973,00**	**35 días**	**vie 2/06/23**	**sáb 15/07/23**		
1170	15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E =4 MM	M2	$ 2.411.253,00	35 días	vie 2/06/23	sáb 15/07/23	1136CC;1134CC	1185
1171	15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	$ 150.720,00	35 días	vie 2/06/23	sáb 15/07/23	1136CC;1134CC	1185
1172	**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 323.438.418,00**	**140 días**	**sáb 18/02/23**	**sáb 12/08/23**		
1173	**17.1**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 323.438.418,00**	**140 días**	**sáb 18/02/23**	**sáb 12/08/23**		
1174	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO	M	$ 11.644.554,00	100 días	sáb 18/02/23	vie 4/08/23	1180CC	1185
1175	17.1.2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO	M	$ 4.994.634,00	100 días	sáb 18/02/23	vie 4/08/23	1180CC	1185
1176	17.1.3	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO	M	$ 448.040,00	100 días	sáb 18/02/23	vie 4/08/23	1180CC	1185
1177	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 5.347.860,00	100 días	sáb 18/02/23	vie 4/08/23	1180CC	1185
1178	17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE	M2	$ 10.323.616,00	100 días	sáb 18/02/23	vie 4/08/23	1180CC	1185
1179	17.1.2	TEJA TRASLUCIDA EN FIBRA ACOPLADA A CUBIERTA TIPO SANDWICH (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO)	M	$ 4.510.013,00	100 días	sáb 18/02/23	vie 4/08/23	1180CC	1185
1180	17.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL	M2	$ 274.922.148,00	100 días	sáb 18/02/23	sáb 12/08/23	1080CC+5 días;1079CC+5 días	1174CC;1177CC;1179CC días;1181CC;1182CC;11
1181	17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	$ 8.994.396,00	100 días	sáb 18/02/23	vie 4/08/23	1180CC	1185
1182	17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	$ 2.253.157,00	100 días	sáb 18/02/23	vie 4/08/23	1180CC	1185
1183	**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 54.817.656,00**	**51 días**	**mié 28/06/23**	**mié 30/08/23**		
1184	**20.1**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 54.817.656,00**	**51 días**	**mié 28/06/23**	**mié 30/08/23**		
1185	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 8.988.299,00	9 días	sáb 19/08/23	mié 30/08/23	1160;1164;1180;	1490
1186	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	$ 19.671.631,00	20 días	mié 28/06/23	sáb 22/07/23	1187CC	1185
1187	20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG	$ 23.547.917,00	20 días	mié 28/06/23	sáb 22/07/23	1063	1186CC;1188CC;1189CC
1188	20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC,	KG	$ 1.585.653,00	20 días	mié 28/06/23	sáb 22/07/23	1187CC	1185
1189	20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE	M2	$ 1.024.156,00	20 días	mié 28/06/23	sáb 22/07/23	1187CC	1185
1190	**NP**	**NO PREVISTOS**		**$ 99.705.477,00**	**133 días**	**lun 13/02/23**	**vie 28/07/23**		
1191	NP-02	DESMONTE DE ESPEJOS (INCLUYE EMBALAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS)	M2	$ 538.895,00	111 días	lun 13/02/23	vie 30/06/23	1056CC	1490
1192	NP-05	REMATE DE MAMPOSTERÍA A CUBIERTA TIPO SÁNDWICH H>=30 CIM, INCLUYE MAMPOSTERÍA Y	M	$ 21.980.772,00	30 días	jue 2/03/23	lun 10/04/23	1083CC	1185
1193	NP-07	REINSTALACIÓN DE PUERTAS EXISTENTES EN CUALQUIER MATERIAL, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTO	UN	$ 1.792.791,00	30 días	jue 2/03/23	lun 10/04/23	1083CC	
1194	NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X60CM	M2	$ 51.357.578,00	100 días	lun 13/02/23	vie 16/06/23	1063CC	1185
1195	NP-10	DESMONTE Y RETIRO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS (todo tipo de canales)	M	$ 25.060,00	100 días	lun 13/02/23	vie 16/06/23	1063CC	1185
1196	NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON CORRIDO A DOBLE ALTURA EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON DE 15CM, REENGRUESE DE 2CM TERMINADO ANCHO 60CM. NO INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE	M	$ 23.308.141,00	20 días	mié 5/07/23	vie 28/07/23	1085	1185
1197	NP-20	RETIRO DE PINTURA SUELTA EN ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA DE TODAS LAS	M	$ 702.240,00	35 días	vie 2/06/23	sáb 15/07/23	1134CC	1185
1198		**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**		**$ 0,00**	**100 días**	**vie 18/08/23**	**mar 19/12/23**		
1199		Priorizacion de la necesidad		$ 0,00	0 días	vie 18/08/23	vie 18/08/23	2FC+170 días	1200FC+6 días
1200		Etapa preconstructiva		$ 0,00	0 días	sáb 26/08/23	sáb 26/08/23	1199FC+6 días	1201FC+10 días
1201		Ejecucion de obras		$ 0,00	84 días	vie 8/09/23	mar 19/12/23	1200FC+10 días	1490
1202		**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**		**$ 0,00**	**99 días**	**sáb 19/08/23**	**mar 19/12/23**		
1203		Priorizacion de la necesidad		$ 0,00	0 días	sáb 19/08/23	sáb 19/08/23	3FC+110 días	1204FC+6 días
1204		Etapa preconstructiva		$ 0,00	0 días	lun 28/08/23	lun 28/08/23	1203FC+6 días	1205FC+10 días
1205		Ejecucion de obras		$ 0,00	83 días	sáb 9/09/23	mar 19/12/23	1204FC+10 días	1490
1206		**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**		**$ 0,00**	**99 días**	**sáb 19/08/23**	**mar 19/12/23**		
1207		Priorizacion de la necesidad		$ 0,00	0 días	sáb 19/08/23	sáb 19/08/23	3FC+110 días	1208FC+6 días
1208		Etapa preconstructiva		$ 0,00	0 días	lun 28/08/23	lun 28/08/23	1207FC+6 días	1209FC+10 días
1209		Ejecucion de obras		$ 0,00	83 días	sáb 9/09/23	mar 19/12/23	1208FC+10 días	1490
1210		**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**		**$ 0,00**	**99 días**	**sáb 19/08/23**	**mar 19/12/23**		
1211		Priorizacion de la necesidad		$ 0,00	0 días	sáb 19/08/23	sáb 19/08/23	3FC+110 días	1212FC+6 días
1212		Etapa preconstructiva		$ 0,00	0 días	lun 28/08/23	lun 28/08/23	1211FC+6 días	1213FC+10 días
1213		Ejecucion de obras		$ 0,00	83 días	sáb 9/09/23	mar 19/12/23	1212FC+10 días	1490
1214		**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**		**$ 2.167.986.702,12**	**192 días**	**lun 3/04/23**	**mar 28/11/23**		
1215		Etapa preconstructiva		$ 0,00	19 días	lun 3/04/23	jue 27/04/23	3	1219
1216	**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 147.370.858,00**	**38 días**	**vie 28/04/23**	**mié 14/06/23**		
1217	**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 34.419.984,00**	**23 días**	**vie 28/04/23**	**vie 26/05/23**		
1218	1.1.1	REPLANTEO	M2	$ 28.728.784,00	20 días	mié 3/05/23	vie 26/05/23	1219	1242CC+20 días;1332;1
1219	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN	M	$ 5.691.200,00	3 días	vie 28/04/23	mar 2/05/23	1215	1242CC+20 días;1221;1239;1218;12
1220	**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 100.360.977,00**	**35 días**	**mié 3/05/23**	**mié 14/06/23**		**1296;1298**
1221	1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 25.972.010,00	30 días	mié 3/05/23	mié 7/06/23	1219	1242CC+20 días;1246CC+25 días;1264
1222	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 29.416.588,00	30 días	mié 3/05/23	mié 7/06/23	1219	1261CC+12 días;1314;1332;1288;12 días
1223	1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 431.363,00	30 días	mié 3/05/23	mié 7/06/23	1219	1310
1224	1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 0,00	30 días	mié 3/05/23	mié 7/06/23	1219	1310
1225	1.2.22	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 0,00	30 días	mié 3/05/23	mié 7/06/23	1219	1261CC+12 días;1314;1332;1259CC días
1226	1.2.24	DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACION Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA; (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 0,00	30 días	mié 3/05/23	mié 7/06/23	1219	1332
1227	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 1.202.133,00	30 días	mié 3/05/23	mié 7/06/23	1219	1332
1228	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	UN	$ 297.800,00	30 días	mié 3/05/23	mié 7/06/23	1219	1261CC+12 días;1314;1332;1259CC días
1229	1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	ML	$ 1.688.700,00	30 días	mié 3/05/23	mié 7/06/23	1219	1261CC+12 días;1314;1332;1259CC días
1230	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC.,	M2	$ 36.649.633,00	10 días	mié 3/05/23	sáb 13/05/23	1219	1329;1256;1255;1328
1231	1.2.36	DESMONTE DE BARANDA METALICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M	$ 291.840,00	35 días	mié 3/05/23	mié 14/06/23	1219	1332
1232	1.2.37	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y RELLENO DE SUELO)	UN	$ 289.976,00	35 días	mié 3/05/23	mié 14/06/23	1219	1261CC+12 días;1314;1332;1259CC días
1233	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	$ 707.988,00	35 días	mié 3/05/23	mié 14/06/23	1219	1332
1234	1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN	$ 422.412,00	35 días	mié 3/05/23	mié 14/06/23	1219	1332
1235	1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 415.084,00	35 días	mié 3/05/23	mié 14/06/23	1219	1261CC+12 días;1314;1332;1259CC
1236	1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	$ 2.064.600,00	35 días	mié 3/05/23	mié 14/06/23	1219	1332
1237	1.2.50	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	UN	$ 510.850,00	35 días	mié 3/05/23	mié 14/06/23	1219	1332
1238	**1,3**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 12.589.897,00**	**35 días**	**mié 3/05/23**	**mié 14/06/23**		
1239	1.3.4	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y	M2	$ 12.589.897,00	35 días	mié 3/05/23	mié 14/06/23	1219	1332
1240	**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 393.183.387,00**	**45 días**	**lun 15/05/23**	**lun 10/07/23**		
1241	**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 23.969.216,00**	**25 días**	**sáb 27/05/23**	**mar 27/06/23**		
1242	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 14.861.172,00	25 días	sáb 27/05/23	mar 27/06/23	1221CC+20 días;1219CC+20 días;1218CC+20	1243CC;1244CC;1332;1
1243	2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M3	$ 0,00	25 días	sáb 27/05/23	mar 27/06/23	1242CC	1332
1244	2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	M3	$ 9.108.044,00	25 días	sáb 27/05/23	mar 27/06/23	1242CC	1332
1245	**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 60.083.257,00**	**30 días**	**vie 2/06/23**	**lun 10/07/23**		
1246	2.2.17	ESCALERA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 20.917.737,00	30 días	vie 2/06/23	lun 10/07/23	1221CC+25 días;1219CC+25 días;1218CC+25	1247CC;1248CC;1252CC
1247	2.2.20	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.12 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	$ 4.240.242,00	30 días	vie 2/06/23	lun 10/07/23	1246CC	1332
1248	2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE	M3	$ 34.925.278,00	30 días	vie 2/06/23	lun 10/07/23	1246CC	1332
1249	**2.3**	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 61.679.020,00**	**30 días**	**vie 2/06/23**	**lun 10/07/23**		
1250	2.3.9	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	$ 61.679.020,00	30 días	vie 2/06/23	lun 10/07/23	1246CC	1332
1251	**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 27.176.324,00**	**30 días**	**vie 2/06/23**	**lun 10/07/23**		
1252	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	$ 14.313.600,00	30 días	vie 2/06/23	lun 10/07/23	1246CC	1253CC;1332
1253	2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	$ 12.862.724,00	30 días	vie 2/06/23	lun 10/07/23	1252CC	1332
1254	**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 220.275.570,00**	**40 días**	**lun 15/05/23**	**mar 4/07/23**		
1255	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE	KG	$ 208.784.900,00	40 días	lun 15/05/23	mar 4/07/23	1230	1321;1335
1256	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE	KG	$ 11.490.670,00	40 días	lun 15/05/23	mar 4/07/23	1230	1321;1335
1257	**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 59.746.522,00**	**30 días**	**mié 17/05/23**	**vie 23/06/23**		
1258	**3.1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 46.574.022,00**	**30 días**	**mié 17/05/23**	**vie 23/06/23**		
1259	3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE	M2	$ 46.574.022,00	30 días	mié 17/05/23	vie 23/06/23	1235CC+12 días;1232CC+12 días;1229CC+12 días;1222CC+12 días;1225CC+12 días;1228CC+12	1262CC;1307CC;1332;1
1260	**3.3**	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 13.172.500,00**	**30 días**	**mié 17/05/23**	**vie 23/06/23**		
1261	3.3.3	ANCLAJES VARILLA 5/8" L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	UN	$ 10.745.500,00	30 días	mié 17/05/23	vie 23/06/23	1235CC+12 días;1232CC+12 días;1229CC+12 días;1222CC+12	1262CC;1307CC;1332;1
1262	3.3.8	JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AISLAMIENTO 2 CM H: 0.50	M	$ 2.427.000,00	30 días	mié 17/05/23	vie 23/06/23	1261CC;1259CC	1332
1263	**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 55.877.814,00**	**120 días**	**mar 27/06/23**	**mié 22/11/23**		
1264		INICIO CONEXIONES DOMICILIARIAS		$ 0,00	0 días	mar 27/06/23	mar 27/06/23	1221;1242	1266
1265	**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 36.382.100,00**	**120 días**	**mié 28/06/23**	**mié 22/11/23**		
1266	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 34.399.000,00	120 días	mié 28/06/23	mié 22/11/23	1264	1267CC;1332;1269CC;1
1267	4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	$ 1.983.100,00	35 días	mié 28/06/23	jue 10/08/23	1266CC	1332;1275
1268	**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**		**$ 2.434.800,00**	**40 días**	**mié 28/06/23**	**mié 16/08/23**		
1269	4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 2.434.800,00	40 días	mié 28/06/23	mié 16/08/23	1266CC	1332;1275
1270	**4.6**	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 5.445.894,00**	**120 días**	**mié 28/06/23**	**mié 22/11/23**		
1271	4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UND	$ 729.312,00	120 días	mié 28/06/23	mié 22/11/23	1266CC	1332;1275
1272	4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UND	$ 4.716.582,00	120 días	mié 28/06/23	mié 22/11/23	1266CC	1332;1275
1273	**4.8**	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 11.615.020,00**	**120 días**	**mié 28/06/23**	**mié 22/11/23**		
1274	4.8.6	CAJA DE INSPECCION 100 X 100. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UND	$ 11.615.020,00	120 días	mié 28/06/23	mié 22/11/23	1266CC	1332;1275
1275		FIN CONEXIONES DOMICILIARIAS		$ 0,00	0 días	mié 22/11/23	mié 22/11/23	1266;1267;1269	1332
1276	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 117.726.594,00**	**16 días**	**mar 11/07/23**	**sáb 29/07/23**		
1277	**5.1**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 117.726.594,00**	**16 días**	**mar 11/07/23**	**sáb 29/07/23**		
1278	5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	M	$ 6.237.120,00	16 días	mar 11/07/23	sáb 29/07/23	1321CC+5 días;1335CC+5 días	1282CC;1283CC;1284CC

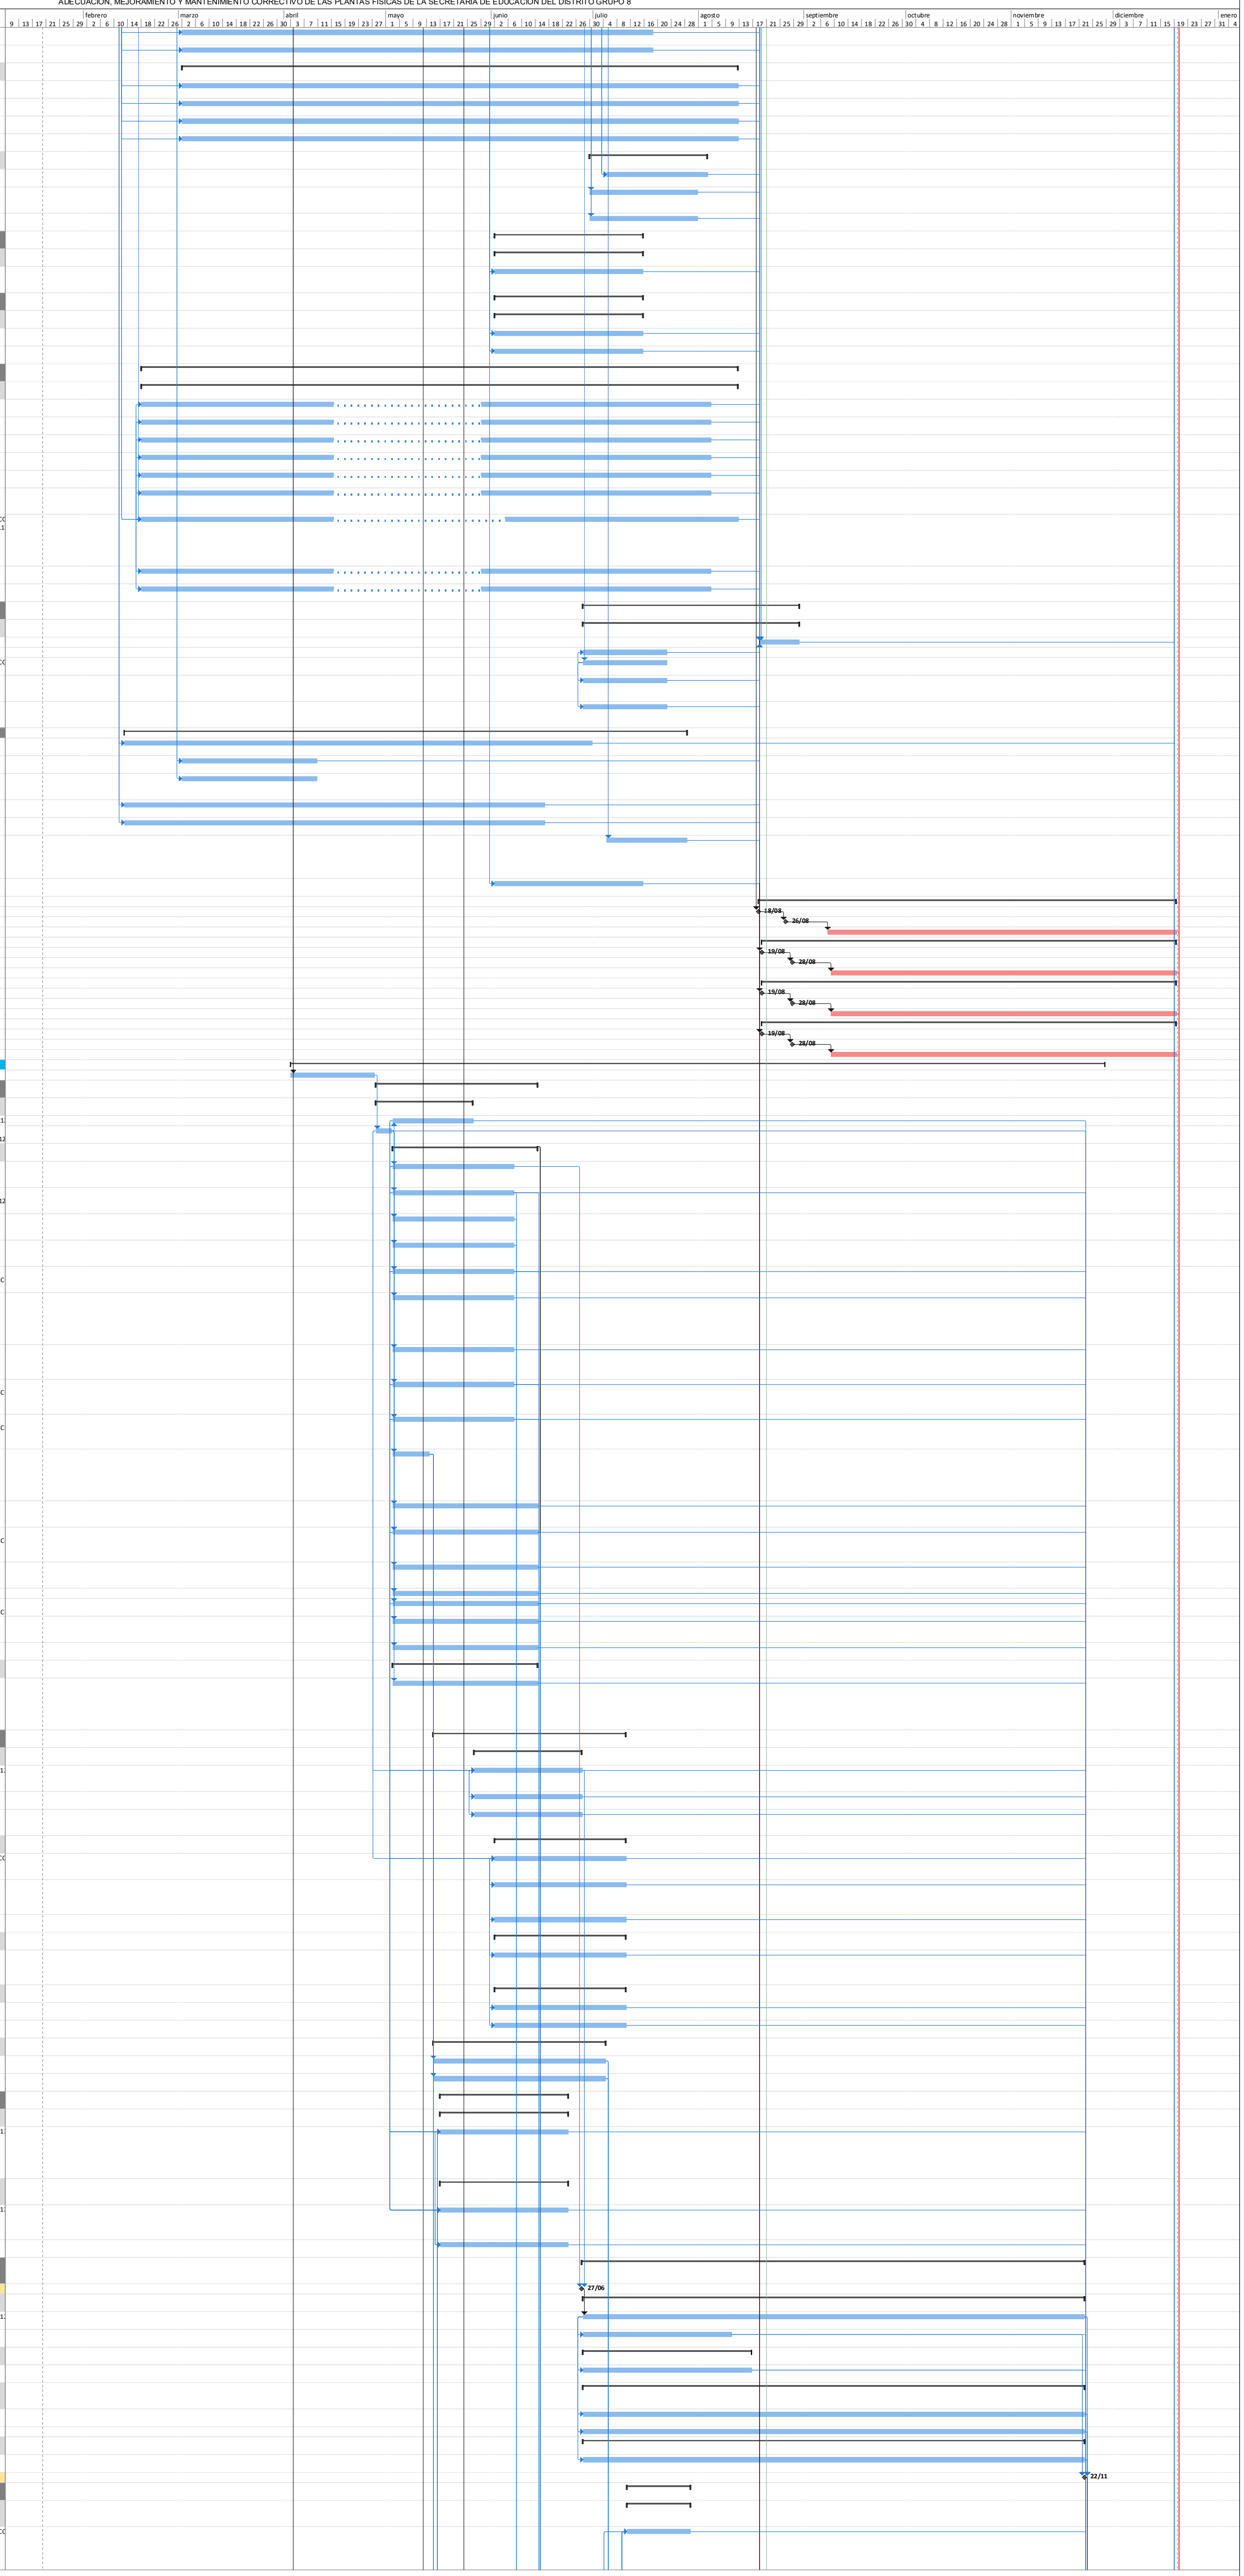

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8

Id	Item	COLEGIO	Unid	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1279	5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA	UND	$ 3.045.060,00	16 días	mar 11/07/23	sáb 29/07/23	1278CC	1332
1280	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	$ 25.480.200,00	16 días	mar 11/07/23	sáb 29/07/23	1278CC	1332
1281	5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	$ 32.509.800,00	16 días	mar 11/07/23	sáb 29/07/23	1278CC	1332
1282	5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T)	M	$ 7.489.500,00	16 días	mar 11/07/23	sáb 29/07/23	1278CC	1332
1283	5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y	UN	$ 1.976.112,00	16 días	mar 11/07/23	sáb 29/07/23	1278CC	1332
1284	5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 23.399.880,00	16 días	mar 11/07/23	sáb 29/07/23	1278CC	1332
1285	5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	UN	$ 17.588.922,00	16 días	mar 11/07/23	sáb 29/07/23	1278CC	1332
1286	**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 236.920.243,00**	**50 días**	**jue 8/06/23**	**jue 10/08/23**		
1287	**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 22.195.666,00**	**40 días**	**jue 8/06/23**	**vie 28/07/23**		
1288	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	m2	$ 22.195.666,00	40 días	jue 8/06/23	vie 28/07/23	1222	1332;1292CC+5 días
1289	**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 214.724.577,00**	**45 días**	**jue 15/06/23**	**jue 10/08/23**		
1290	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2	$ 145.222.821,00	45 días	jue 15/06/23	jue 10/08/23	1298CC;1292CC	1332;1301;1305
1291	7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2	$ 29.518.276,00	45 días	jue 15/06/23	jue 10/08/23	1298CC;1292CC	1332;1301;1305
1292	7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	$ 39.983.480,00	45 días	jue 15/06/23	jue 10/08/23	1288CC+5 días	1291CC;1293CC;1290CC
1293	7.2.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE (BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	$ 0,00	0 días	jue 15/06/23	jue 15/06/23	1298CC;1292CC	1332
1294	**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 149.710.469,00**	**25 días**	**jue 15/06/23**	**sáb 15/07/23**		
1295	**9.1**	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 29.603.776,00**	**25 días**	**jue 15/06/23**	**sáb 15/07/23**		
1296	9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y	M2	$ 29.603.776,00	25 días	jue 15/06/23	sáb 15/07/23	1220	1332
1297	**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 120.106.693,00**	**25 días**	**jue 15/06/23**	**sáb 15/07/23**		
1298	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA	M2	$ 120.106.693,00	25 días	jue 15/06/23	sáb 15/07/23	1220	1291CC;1293CC;1290CC
1299	**11**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 21.039.970,00**	**12 días**	**vie 11/08/23**	**vie 25/08/23**		
1300	**11.1**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 21.039.970,00**	**12 días**	**vie 11/08/23**	**vie 25/08/23**		
1301	11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y	UN	$ 17.573.480,00	12 días	vie 11/08/23	vie 25/08/23	1290;1291	1302CC;1332
1302	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO	UN	$ 3.466.490,00	12 días	vie 11/08/23	vie 25/08/23	1301CC;1261CC;1	1332
1303	**12**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 38.475.617,00**	**14 días**	**vie 11/08/23**	**lun 28/08/23**		
1304	**12.1**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 38.475.617,00**	**14 días**	**vie 11/08/23**	**lun 28/08/23**		
1305	12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO,	M2	$ 30.061.357,00	14 días	vie 11/08/23	lun 28/08/23	1290;1291	1306CC;1307CC
1306	12.1.2	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20 M CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40 CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	M	$ 8.414.260,00	14 días	vie 11/08/23	lun 28/08/23	1305CC	1332
1307	12.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TUBO RECTANGULAR 50X50X2MM, DIVISIONES VERTICALES EN TUBO RECTANGULAR 40X20X2MM, TUBO RECTANGULAR DE 50X30X2MM, PLATINAS SUJECIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU	M	$ 0,00	14 días	vie 11/08/23	lun 28/08/23	1305CC;1261CC;1	1332
1308	**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 99.662.147,00**	**53 días**	**jue 8/06/23**	**lun 14/08/23**		
1309	**13.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 14.219.070,00**	**35 días**	**jue 8/06/23**	**sáb 22/07/23**		
1310	13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 14.219.070,00	35 días	jue 8/06/23	sáb 22/07/23	1223;1224	1312;1332
1311	**13.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 46.891.073,00**	**18 días**	**lun 24/07/23**	**lun 14/08/23**		
1312	13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS	M2	$ 46.891.073,00	18 días	lun 24/07/23	lun 14/08/23	1310	1332
1313	**13.4**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 38.552.004,00**	**30 días**	**jue 15/06/23**	**sáb 22/07/23**		
1314	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 38.552.004,00	30 días	jue 15/06/23	sáb 22/07/23	1235;1232;1229;	1332;1317
1315	**16**	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 0,00**	**0 días**	**sáb 22/07/23**	**sáb 22/07/23**		
1316	**16.1**	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 0,00**	**0 días**	**sáb 22/07/23**	**sáb 22/07/23**		
1317	16.1.1	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E	UN	$ 0,00	0 días	sáb 22/07/23	sáb 22/07/23	1314	1332
1318	**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 575.439.680,00**	**100 días**	**mié 5/07/23**	**jue 2/11/23**		
1319	**17.1**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 575.439.680,00**	**100 días**	**mié 5/07/23**	**jue 2/11/23**		
1320	17.1.2	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	ML	$ 0,00	0 días	mié 5/07/23	mié 5/07/23	1321CC	1332
1321	17.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL	M2	$ 533.467.935,00	100 días	mié 5/07/23	jue 2/11/23	1256;1255	1322CC;1324CC;1320CC días;1332;1323CC
1322	17.1.4	SEI DE VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). Ds = 100 CM - CAL 20	M	$ 21.898.635,00	20 días	mié 5/07/23	vie 28/07/23	1321CC	1332
1323	17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	$ 15.687.900,00	20 días	mié 5/07/23	vie 28/07/23	1321CC	1332
1324	17.1.4	LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)	M	$ 4.385.210,00	20 días	mié 5/07/23	vie 28/07/23	1321CC	1332
1325	**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 137.019.700,00**	**22 días**	**lun 15/05/23**	**vie 9/06/23**		
1326	**20.1**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 137.019.700,00**	**22 días**	**lun 15/05/23**	**vie 9/06/23**		
1327	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 7.708.000,00	11 días	lun 29/05/23	vie 9/06/23	1329;1328	1332
1328	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	$ 58.856.980,00	11 días	lun 15/05/23	sáb 27/05/23	1230	1327
1329	20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG	$ 70.454.720,00	11 días	lun 15/05/23	sáb 27/05/23	1230	1327
1330	**21**	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 3.282.312,00**	**5 días**	**jue 23/11/23**	**mar 28/11/23**		
1331	**21.1**	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 3.282.312,00**	**5 días**	**jue 23/11/23**	**mar 28/11/23**		
1332	21.1.7	PODA DE CESPED.	M2	$ 3.282.312,00	5 días	jue 23/11/23	mar 28/11/23	1317;1322;1324;	1490
1333	**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 132.531.389,12**	**100 días**	**mié 5/07/23**	**jue 2/11/23**		
1334	NP-03	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHE EN LAMINA GALVAN	M	$ 196.080,00	0 días	mié 5/07/23	mié 5/07/23	1335CC	1332
1335	NP-05	REMATE DE MAMPOSTERÍA A CUBIERTA TIPO SÁNDWICH H>=30 CIM, INCLUYE MAMPOSTERÍA Y	M	$ 27.087.416,00	100 días	mié 5/07/23	jue 2/11/23	1256;1255	1334CC;1339CC;1341CC días;1332;1340CC;1338
1336	NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X60CM	M2	$ 30.592.273,12	20 días	mié 5/07/23	vie 28/07/23	1335CC	1332
1337	NP-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON CORRIDO A DOBLE ALTURA EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISIONES POR MODULO DE SERVISIO. FALDON DE 15CM, REENGRUESE DE 2CM TERMINADO ANCHO 60CM. NO INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE	ML	$ 10.483.600,00	20 días	mié 5/07/23	vie 28/07/23	1335CC	1332
1338	NP-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INDIVIDUAL PARA MESON CORRIDO EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISIÓN POR MODULO DE	UN	$ 4.077.720,00	20 días	mié 5/07/23	vie 28/07/23	1335CC	1332
1339	NP-20	RETIRO DE PINTURA SUELTA EN ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE LIJADO, LIMPIEZA DE TODAS LAS	M	$ 20.094.300,00	20 días	mié 5/07/23	vie 28/07/23	1335CC	1332
1340	NP	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ACOMETIDA PRINCIPAL PARA GARANTIZAR SERIVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL	GL	$ 18.000.000,00	20 días	mié 5/07/23	vie 28/07/23	1335CC	1332
1341	NP	CONEXIÓN A REDES PRINCIPALES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA INDEPENDIZAR EL COLEGIO DE LAS REDES COMPARTIDAS CON EL JARDIN	GL	$ 22.000.000,00	20 días	mié 5/07/23	vie 28/07/23	1335CC	1332
1342		**COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS**		**$ 0,00**	**99 días**	**sáb 19/08/23**	**mar 19/12/23**		
1343		Priorizacion de la necesidad		$ 0,00	0 días	sáb 19/08/23	sáb 19/08/23	3FC+110 días	1344FC+6 días
1344		Etapa preconstructiva		$ 0,00	0 días	lun 28/08/23	lun 28/08/23	1343FC+6 días	1345FC+10 días
1345		Ejecucion de obras		$ 0,00	83 días	sáb 9/09/23	mar 19/12/23	1344FC+10 días	1490
1346		**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**		**$ 0,00**	**99 días**	**sáb 19/08/23**	**mar 19/12/23**		
1347		Priorizacion de la necesidad		$ 0,00	0 días	sáb 19/08/23	sáb 19/08/23	3FC+110 días	1348FC+6 días
1348		Etapa preconstructiva		$ 0,00	0 días	lun 28/08/23	lun 28/08/23	1347FC+6 días	1349FC+10 días
1349		Ejecucion de obras		$ 0,00	83 días	sáb 9/09/23	mar 19/12/23	1348FC+10 días	1490
1350		**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		**$ 665.005.624,00**	**170 días**	**lun 3/04/23**	**mar 31/10/23**		
1351		Etapa preconstructiva		$ 0,00	55 días	lun 3/04/23	sáb 10/06/23	3	1355
1352	**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 66.499.726,00**	**45 días**	**mar 13/06/23**	**mar 8/08/23**		
1353	**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 2.947.928,00**	**30 días**	**mar 13/06/23**	**mié 19/07/23**		
1354	1.1.1	REPLANTEO	M2	$ 228.246,00	20 días	lun 26/06/23	mié 19/07/23	1355	1380CC+20 días;1456;1
1355	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN	M	$ 2.719.682,00	10 días	mar 13/06/23	sáb 24/06/23	1351	1354;1380CC+20 días;1358;1377;1370;13
1356	**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 55.611.236,00**	**35 días**	**lun 26/06/23**	**mar 8/08/23**		**1428;1430;1427**
1357	1.2.5	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 2.264.260,00	30 días	lun 26/06/23	mar 1/08/23	1355	1380CC+20 días;1384CC+25 días
1358	1.2.8	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 4.206.250,00	30 días	lun 26/06/23	mar 1/08/23	1355	1380CC+20 días;1384CC+25 días
1359	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 23.479.731,00	30 días	lun 26/06/23	mar 1/08/23	1355	1402CC+12 días;1438;1439;1456;14 días;1421
1360	1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 2.470.423,00	30 días	lun 26/06/23	mar 1/08/23	1355	1433
1361	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 300.401,00	30 días	lun 26/06/23	mar 1/08/23	1355	1456
1362	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	$ 110.243,00	30 días	lun 26/06/23	mar 1/08/23	1355	1456
1363	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	UN	$ 14.890,00	30 días	lun 26/06/23	mar 1/08/23	1355	1402CC+12 días;1438;1439;1456;13 días
1364	1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M	$ 168.870,00	30 días	lun 26/06/23	mar 1/08/23	1355	1402CC+12 días;1438;1439;1456;13 días
1365	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC.,	M2	$ 2.454.060,00	15 días	lun 26/06/23	jue 13/07/23	1355	1454;1396;1395
1366	1.2.36	DESMONTE DE BARANDA METALICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M	$ 327.444,00	35 días	lun 26/06/23	mar 8/08/23	1355	1456
1367	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	$ 215.850,00	35 días	lun 26/06/23	mar 8/08/23	1355	1456
1368	1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	$ 93.671,00	35 días	lun 26/06/23	mar 8/08/23	1355	1456
1369	1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 50.620,00	35 días	lun 26/06/23	mar 8/08/23	1355	1456
1370	1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	$ 345.821,00	35 días	lun 26/06/23	mar 8/08/23	1355	1402CC+12 días;1438;1439;1456;13 días
1371	1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS	M	$ 741.133,00	35 días	lun 26/06/23	mar 8/08/23	1355	1456
1372	1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS	M	$ 212.141,00	35 días	lun 26/06/23	mar 8/08/23	1355	1456
1373	1.2.51	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 63.495,00	35 días	lun 26/06/23	mar 8/08/23	1355	1456
1374	1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 18.091.933,00	35 días	lun 26/06/23	mar 8/08/23	1355	1456
1375	**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 7.940.562,00**	**35 días**	**lun 26/06/23**	**mar 8/08/23**		
1376	1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	$ 7.531.744,00	35 días	lun 26/06/23	mar 8/08/23	1355	1456
1377	1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	$ 408.818,00	35 días	lun 26/06/23	mar 8/08/23	1355	1456
1378	**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 192.682.796,00**	**40 días**	**vie 14/07/23**	**vie 1/09/23**		
1379	**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 15.306.860,00**	**35 días**	**vie 21/07/23**	**vie 1/09/23**		
1380	2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 5.203.750,00	35 días	vie 21/07/23	vie 1/09/23	1354CC+20 días;1355CC+20 días;1358CC+20	1381CC;1382CC;1456;1 días
1381	2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	$ 3.345.340,00	35 días	vie 21/07/23	vie 1/09/23	1380CC	1456
1382	2.1.13	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 6.757.770,00	35 días	vie 21/07/23	vie 1/09/23	1380CC	1456
1383	**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 71.441.874,00**	**30 días**	**jue 27/07/23**	**vie 1/09/23**		
1384	2.2.4	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 3.941.525,00	30 días	jue 27/07/23	vie 1/09/23	1354CC+25 días;1355CC+25	1388CC;1389CC;1393CC
1385	2.2.6	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI DE 25 X 15 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	$ 5.671.721,00	30 días	jue 27/07/23	vie 1/09/23	1384CC	1456
1386	2.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 42.816.907,00	30 días	jue 27/07/23	vie 1/09/23	1384CC	1456
1387	2.2.20	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.12 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	$ 445.225,00	30 días	jue 27/07/23	vie 1/09/23	1384CC	1456
1388	2.2.29	PLACA EN VOLADIZO DE 7 CM DE ESPESOR CON VIGAS DESCOLGADAS (0.35M X 0.2 M) - CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI.	M2	$ 16.636.163,00	30 días	jue 27/07/23	vie 1/09/23	1384CC	1456
1389	2.2.30	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3	$ 1.930.333,00	30 días	jue 27/07/23	vie 1/09/23	1384CC	1456
1390	**2.3**	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 1.001.080,00**	**30 días**	**jue 27/07/23**	**vie 1/09/23**		
1391	2.3.22	PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E = 0.10 M	UN	$ 1.001.080,00	30 días	jue 27/07/23	vie 1/09/23	1384CC	1456

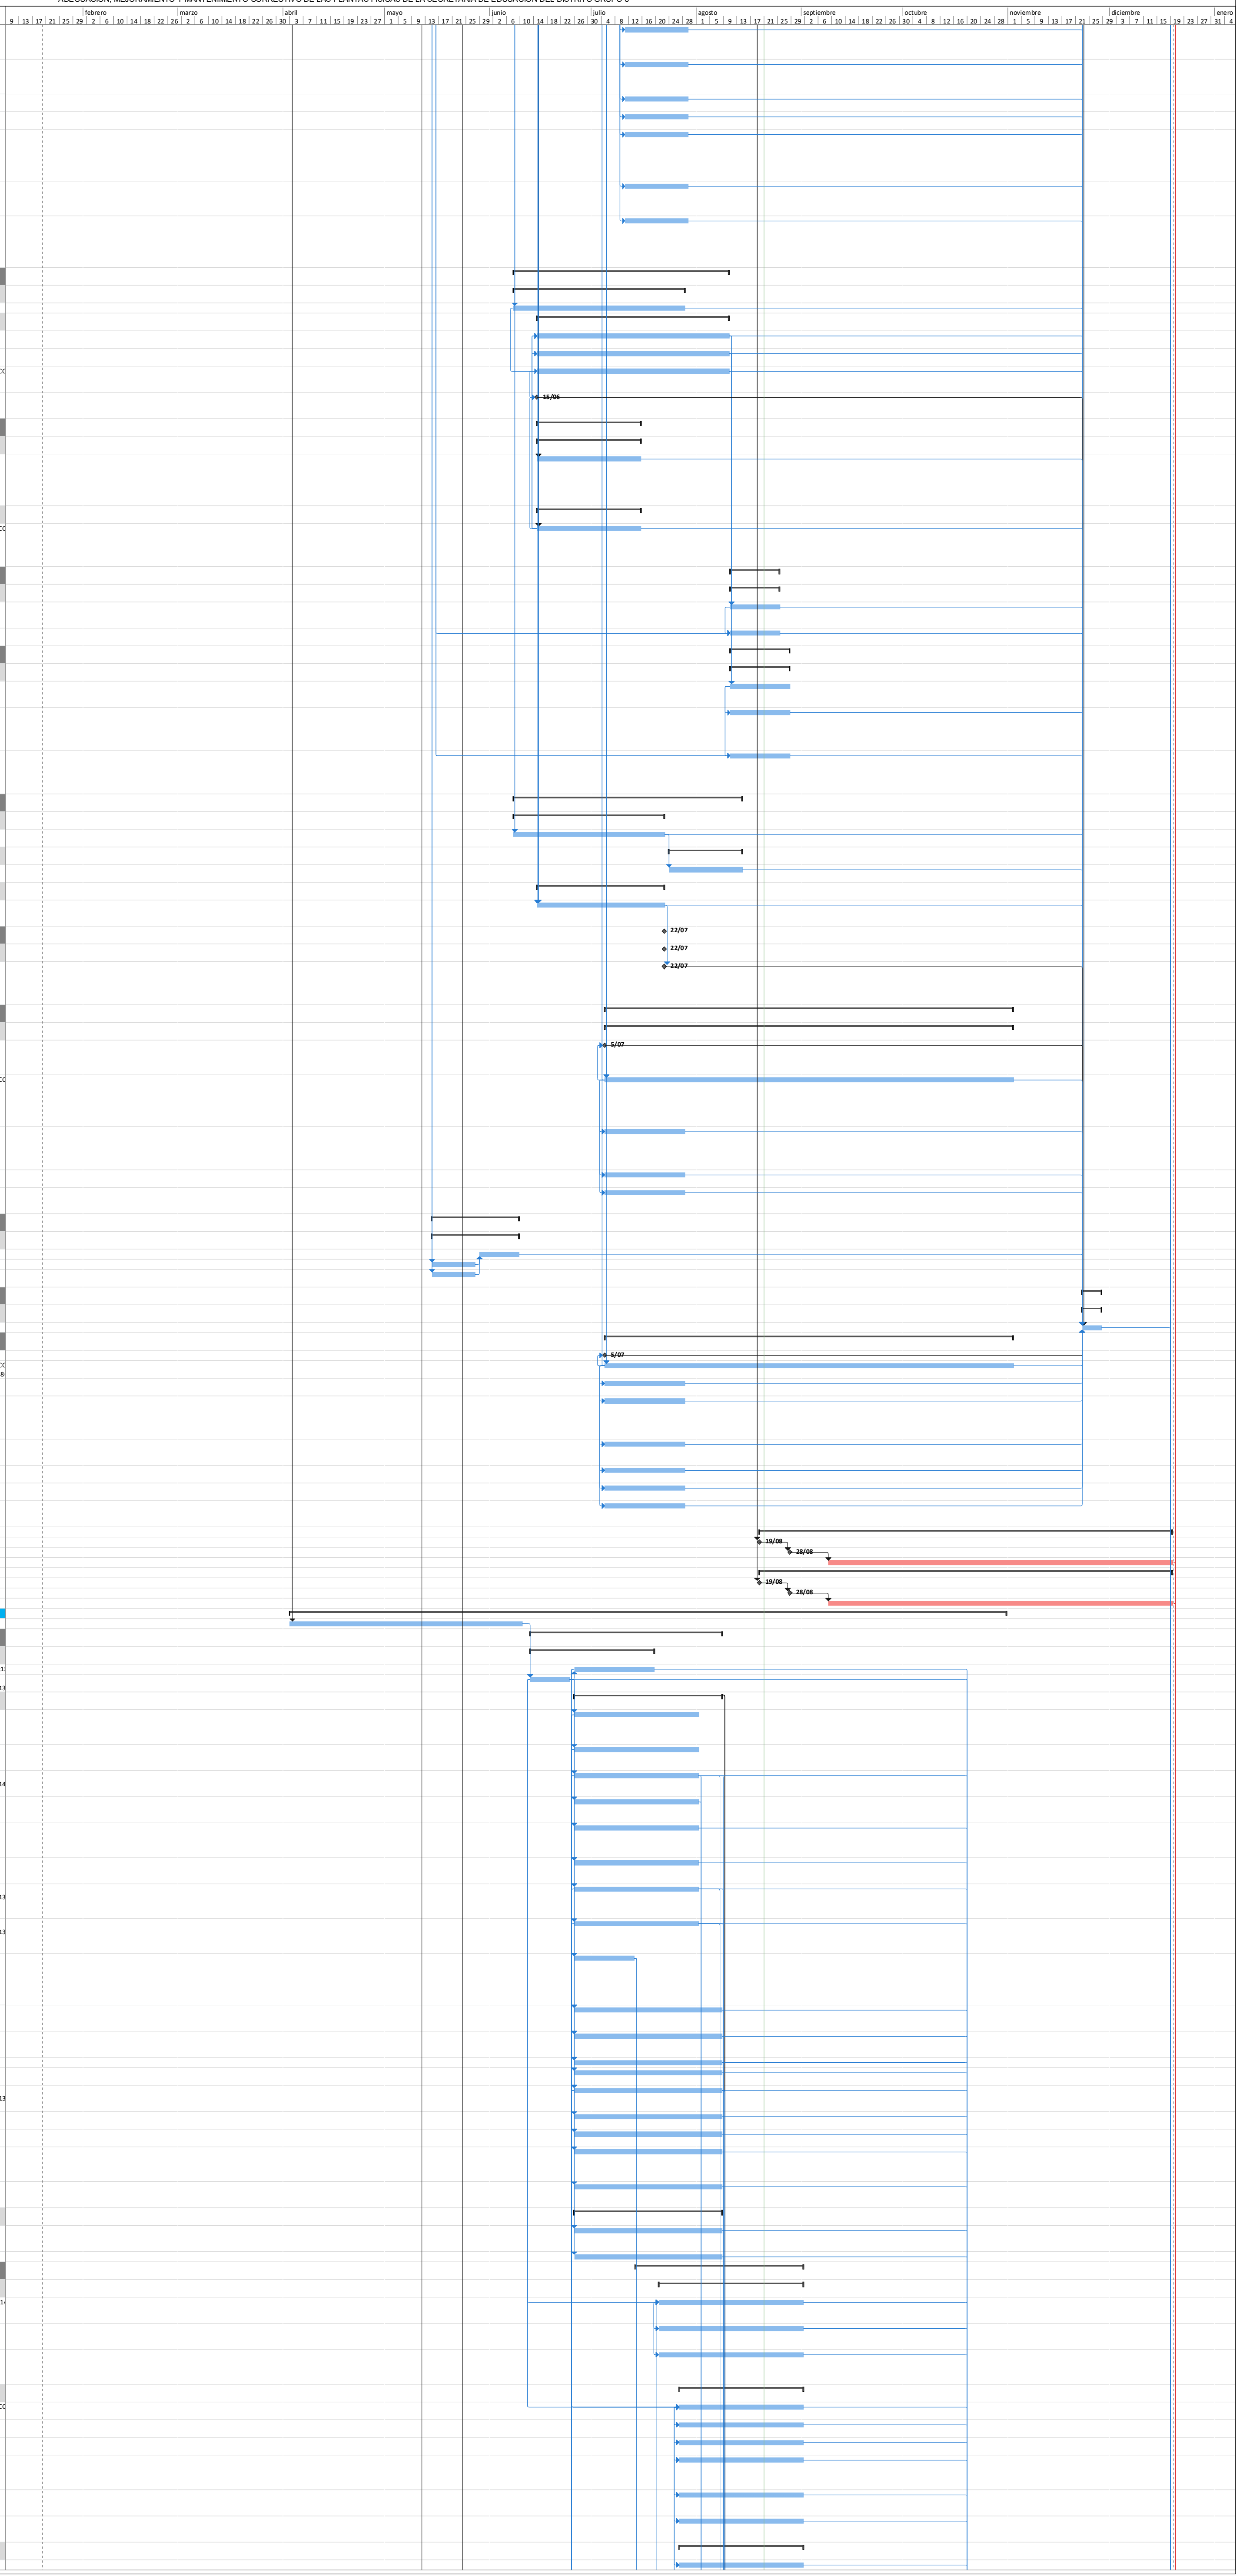

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8

Id	Item	COLEGIO	Unid	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1392	**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 13.862.722,00**	**30 días**	**jue 27/07/23**	**vie 1/09/23**		
1393	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	$ 13.862.722,00	30 días	jue 27/07/23	vie 1/09/23	1384CC	1456
1394	**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 91.070.260,00**	**40 días**	**vie 14/07/23**	**vie 1/09/23**		
1395	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE	KG	$ 81.956.970,00	40 días	vie 14/07/23	vie 1/09/23	1365	1448;1447;1446;1445;1
1396	2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS	UN	$ 9.113.290,00	40 días	vie 14/07/23	vie 1/09/23	1365	1448;1447;1446;1445;1
1397	**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 6.250.978,00**	**50 días**	**mar 11/07/23**	**sáb 9/09/23**		
1398	**3.1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 4.603.930,00**	**30 días**	**mar 11/07/23**	**mié 16/08/23**		
1399	3.1.4	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30 X 12 CM INCLUYE CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M2	$ 3.527.103,00	30 días	mar 11/07/23	mié 16/08/23	1359CC+12 días;1363CC+12 días;1364CC+12	1400CC;1456
1400	3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	$ 1.076.827,00	30 días	mar 11/07/23	mié 16/08/23	1399CC	1456
1401	**3.3**	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 1.647.048,00**	**50 días**	**mar 11/07/23**	**sáb 9/09/23**		
1402	3.3.6	DOVELAS MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, GROUTING 3000 PSI	M	$ 323.232,00	50 días	mar 11/07/23	sáb 9/09/23	1359CC+12 días;1363CC+12	1403CC;1456
1403	3.3.7	JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AISLAMIENTO	M2	$ 1.323.816,00	50 días	mar 11/07/23	sáb 9/09/23	1402CC	1456
1404	**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 3.853.216,00**	**45 días**	**mié 9/08/23**	**sáb 30/09/23**		
1405	**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 3.853.216,00**	**45 días**	**mié 9/08/23**	**sáb 30/09/23**		
1406	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 498.786,00	45 días	mié 9/08/23	sáb 30/09/23	1380CC+15 días	1408CC;1456;1407CC
1407	4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	$ 133.372,00	45 días	mié 9/08/23	sáb 30/09/23	1406CC	1456
1408	4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	$ 3.221.058,00	45 días	mié 9/08/23	sáb 30/09/23	1406CC	1456
1409	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 22.165.644,00**	**22 días**	**mié 20/09/23**	**sáb 14/10/23**		
1410	**5.1**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 22.165.644,00**	**22 días**	**mié 20/09/23**	**sáb 14/10/23**		
1411	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	UN	$ 144.994,00	22 días	mié 20/09/23	sáb 14/10/23	1448CC+5 días;1447CC+5 días;1446CC+5 días;1445CC+15 días;1444CC+15	1416CC;1417CC;1418CC
1412	5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N° 12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	UN	$ 722.410,00	22 días	mié 20/09/23	sáb 14/10/23	1411CC	1456
1413	5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA	UN	$ 524.617,00	22 días	mié 20/09/23	sáb 14/10/23	1411CC	1456
1414	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	M	$ 1.796.354,00	22 días	mié 20/09/23	sáb 14/10/23	1411CC	1456
1415	5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	$ 13.128.541,00	22 días	mié 20/09/23	sáb 14/10/23	1411CC	1456
1416	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES,	UN	$ 3.202.860,00	22 días	mié 20/09/23	sáb 14/10/23	1411CC	1456
1417	5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$ 2.017.992,00	22 días	mié 20/09/23	sáb 14/10/23	1411CC	1456
1418	5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	$ 627.876,00	22 días	mié 20/09/23	sáb 14/10/23	1411CC	1456
1419	**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 15.399.535,00**	**50 días**	**mié 2/08/23**	**sáb 30/09/23**		
1420	**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 8.026.862,00**	**40 días**	**mié 2/08/23**	**mar 19/09/23**		
1421	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	$ 3.186.608,00	40 días	mié 2/08/23	mar 19/09/23	1359	1456;1424CC+5 días
1422	7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	$ 4.840.254,00	40 días	mié 2/08/23	mar 19/09/23	1359	1456;1424CC+5 días
1423	**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 7.372.673,00**	**45 días**	**mié 9/08/23**	**sáb 30/09/23**		
1424	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2	$ 7.372.673,00	45 días	mié 9/08/23	sáb 30/09/23	1422CC+5 días;1421CC+5	1456
1425	**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 32.328.191,00**	**25 días**	**mié 9/08/23**	**jue 7/09/23**		
1426	**9.1**	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 9.250.891,00**	**25 días**	**mié 9/08/23**	**jue 7/09/23**		
1427	9.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACION, Y ESCALERILLA VERTICAL EN TUBERIA DE 3/4" CON SEPARACION CADA 9CM PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN	M	$ 7.681.196,00	25 días	mié 9/08/23	jue 7/09/23	1356	1456
1428	9.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE CERRAMIENTO CON SOPORTE PRINCIPAL EN TUBO CUADRADO DE 100X100 EN 2MM TUBO PERIMETRAL DE 2" POR 1-1/8", MALLA ONDULADA GALVANIZADA DE 2" PISADORES EN ANGULO, FALLEBAS Y PASADOR EN	M2	$ 1.569.695,00	25 días	mié 9/08/23	jue 7/09/23	1356	1456
1429	**9.3**	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 23.077.300,00**	**25 días**	**mié 9/08/23**	**jue 7/09/23**		
1430	9.3.16	REJA ENROLLABRE EN LAMINA CAL. 20	M2	$ 23.077.300,00	25 días	mié 9/08/23	jue 7/09/23	1356	1456
1431	**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 72.059.732,00**	**53 días**	**mié 2/08/23**	**mié 4/10/23**		
1432	**13.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 23.258.072,00**	**35 días**	**mié 2/08/23**	**mié 13/09/23**		
1433	13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 23.258.072,00	35 días	mié 2/08/23	mié 13/09/23	1360	1435
1434	**13.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 25.863.829,00**	**18 días**	**jue 14/09/23**	**mié 4/10/23**		
1435	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 12.305.847,00	18 días	jue 14/09/23	mié 4/10/23	1433	1436CC
1436	13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 13.557.982,00	18 días	jue 14/09/23	mié 4/10/23	1435CC	1456
1437	**13.4**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 22.937.831,00**	**30 días**	**mar 8/08/23**	**mié 13/09/23**		
1438	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 22.709.853,00	0 días	mar 8/08/23	mar 8/08/23	1359;1363;1364;	1456
1439	13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS	M2	$ 227.978,00	30 días	mié 9/08/23	mié 13/09/23	1359;1363;1364;	1456
1440	**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 215.761.761,00**	**40 días**	**sáb 2/09/23**	**jue 19/10/23**		
1441	**17.1**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 215.761.761,00**	**40 días**	**sáb 2/09/23**	**jue 19/10/23**		
1442	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO	M	$ 1.634.815,00	20 días	sáb 2/09/23	lun 25/09/23	1448CC;1447CC;1	1456
1443	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 719.077,00	40 días	sáb 2/09/23	jue 19/10/23	1396;1395	1411CC+15 días;1442CC;1449CC;14
1444	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 4.902.205,00	40 días	sáb 2/09/23	jue 19/10/23	1396;1395	1411CC+15 días;1442CC;1449CC;14
1445	17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE	M2	$ 44.559.728,00	40 días	sáb 2/09/23	jue 19/10/23	1396;1395	1411CC+15 días;1442CC;1449CC;14
1446	17.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO ,	M2	$ 25.723.704,00	40 días	sáb 2/09/23	jue 19/10/23	1396;1395	1411CC+5 días;1442CC;1449CC;14
1447	17.1.2	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	$ 9.271.829,00	40 días	sáb 2/09/23	jue 19/10/23	1396;1395	1411CC+5 días;1442CC;1449CC;14
1448	17.1.2	LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	M2	$ 7.949.080,00	40 días	sáb 2/09/23	jue 19/10/23	1396;1395	1411CC+5 días;1442CC;1449CC;14
1449	17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	$ 9.725.283,00	20 días	sáb 2/09/23	lun 25/09/23	1448CC;1447CC;1	1456
1450	17.1.4	AFINADO PARA CUBIERTA CON MORTERO CON ADICIÓN DE MICROFIBRA, ENDURECIDO CON ROCKTOP, ACABADO CON LLANA METÁLICA.	M2	$ 111.276.040,00	20 días	sáb 2/09/23	lun 25/09/23	1448CC;1447CC;1	1456
1451	**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 20.835.295,00**	**55 días**	**vie 14/07/23**	**mar 19/09/23**		
1452	**20.1**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 20.835.295,00**	**55 días**	**vie 14/07/23**	**mar 19/09/23**		
1453	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 14.594.481,00	30 días	mar 15/08/23	mar 19/09/23	1454	1456
1454	20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE	M2	$ 6.240.814,00	25 días	vie 14/07/23	lun 14/08/23	1365	1453
1455	**NP**	**NO PREVISTOS**		**$ 17.168.750,00**	**10 días**	**vie 20/10/23**	**mar 31/10/23**		
1456	NP-11	JUNTAS DE MANTO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, INCLUYE REPARACIÓN DE JUNTA, PINTURA BITUMINOSA, ANCHO NO MAYOR A 20 CM (INCLUYE ANDAMIOS	M	$ 17.168.750,00	10 días	vie 20/10/23	mar 31/10/23	1354;1355;1359;	1490
1457	**COLEGIO SANTA LUGA CAFAM**			**$ 268.726.344,00**	**102 días**	**vie 12/05/23**	**vie 15/09/23**		
1458		Etapa preconstructiva		$ 0,00	25 días	vie 12/05/23	sáb 10/06/23	3FC+30 días	1461;1462;1463;1465;1
1459	**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 23.693.198,00**	**50 días**	**mar 13/06/23**	**lun 14/08/23**		
1460	**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 23.264.254,00**	**45 días**	**mar 13/06/23**	**mar 8/08/23**		
1461	1.2.19	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 8.032.966,00	45 días	mar 13/06/23	mar 8/08/23	1458	1484
1462	1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS	M	$ 10.825.277,00	45 días	mar 13/06/23	mar 8/08/23	1458	1484
1463	1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	$ 4.406.011,00	45 días	mar 13/06/23	mar 8/08/23	1458	1484
1464	**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 428.944,00**	**50 días**	**mar 13/06/23**	**lun 14/08/23**		
1465	1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	$ 428.944,00	50 días	mar 13/06/23	lun 14/08/23	1458	1484
1466	**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 1.127.508,00**	**45 días**	**mar 13/06/23**	**mar 8/08/23**		
1467	**3.1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 1.127.508,00**	**45 días**	**mar 13/06/23**	**mar 8/08/23**		
1468	3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	$ 1.127.508,00	45 días	mar 13/06/23	mar 8/08/23	1458	1484;1471CC+15 días;1481CC+10 días
1469	**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 113.108.404,00**	**55 días**	**sáb 1/07/23**	**jue 7/09/23**		
1470	**13.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 49.669.367,00**	**45 días**	**sáb 1/07/23**	**sáb 26/08/23**		
1471	13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 37.678.353,00	45 días	sáb 1/07/23	sáb 26/08/23	1468CC+15 días	1484;1472CC;1474CC+5 días
1472	13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M	$ 11.991.014,00	45 días	sáb 1/07/23	sáb 26/08/23	1471CC	1484
1473	**13.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 63.439.037,00**	**50 días**	**sáb 8/07/23**	**jue 7/09/23**		
1474	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 24.276.496,00	50 días	sáb 8/07/23	jue 7/09/23	1471CC+5 días	1484;1475CC;1476CC;1 días;1488CC+10 días
1475	13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	$ 14.073.043,00	50 días	sáb 8/07/23	jue 7/09/23	1474CC	1484
1476	13.2.7	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 14.783.567,00	50 días	sáb 8/07/23	jue 7/09/23	1474CC	1484
1477	13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 10.305.931,00	50 días	sáb 8/07/23	jue 7/09/23	1474CC	1484
1478	**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 65.528.957,00**	**45 días**	**lun 26/06/23**	**sáb 19/08/23**		
1479	**17.1**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**		**$ 65.528.957,00**	**45 días**	**lun 26/06/23**	**sáb 19/08/23**		
1480	17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE	M2	$ 53.789.296,00	45 días	lun 26/06/23	sáb 19/08/23	1481CC	1484
1481	17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	$ 11.739.661,00	45 días	lun 26/06/23	sáb 19/08/23	1468CC+10 días	1484;1480CC;1486CC
1482	**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 35.580.976,00**	**7 días**	**vie 8/09/23**	**vie 15/09/23**		
1483	**20.1**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**$ 35.580.976,00**	**7 días**	**vie 8/09/23**	**vie 15/09/23**		
1484	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 35.580.976,00	7 días	vie 8/09/23	vie 15/09/23	1461;1462;1463;	1490
1485	**NP**	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**		**$ 29.687.301,00**	**50 días**	**lun 26/06/23**	**sáb 26/08/23**		
1486	NP-03	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHE EN LAMINA GALVA	M	$ 1.059.910,00	45 días	lun 26/06/23	sáb 19/08/23	1481CC	1484
1487	NP-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-01 (2,50M- 2,80M X 2,50M) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO 3+3MM, SISTEMA MONUMENTAL HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO, CON BARRA ANTIPÁNICO LOCALIZADA EN EL INTERIOR DE ESPACIO Y PELÍCULA INTERNA I	UND.	$ 18.899.052,00	30 días	vie 21/07/23	sáb 26/08/23	1474CC+10 días	1484
1488	NP-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-02 (2,20m x 2,65m) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO 3+3MM, SISTEMA MONUMENTAL HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO, CON BARRA ANTIPÁNICO LOCALIZADA EN EL INTERIOR DE ESPACIO Y PELÍCULA INTERNA INCOLOR	UND.	$ 9.728.339,00	30 días	vie 21/07/23	sáb 26/08/23	1474CC+10 días	1484
1489		**ATENCION DE EMERGENCIAS**		**$ 862.485.928,00**	**170 días**	**mié 24/05/23**	**mar 19/12/23**	**2FC+100 días**	**1490**
1490		ENTREGA DE OBRA		$ 0,00	0 días	mar 19/12/23	mar 19/12/23	77;1332;1191;141	



Costo			Año	Mes														Total general
			2023															
Tarea	Tarea 2	Tarea 3	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
programacion	ACTA DE INICIO DE OBRA		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	APROBACION ADICION PRESUPUESTAL No 1					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	MANTENIMIENTO PROGRAMADO	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	$ 1.409.994,34	$ 2.371.395,66	$ -	$ 10.073.663,66	$ 34.057.399,55	$ 57.444.543,39	$ 103.959.640,99	$ 20.520.796,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 229.837.433,99
		COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	$ -	$ -	$ 6.792.616,12	$ 21.863.682,68	$ 42.655.992,14	$ 42.044.841,58	$ 40.661.876,90	$ 44.636.631,62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 198.655.641,04
		COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR								$ -	$ 68.106.021,05	$ 85.132.526,32	$ 81.727.225,26	$ 51.079.515,79	$ 286.045.288,42			
		COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	$ -	$ -	$ 22.044.921,92	$ 37.691.850,48	$ 37.088.814,60	$ 53.480.097,06	$ 32.935.794,12	$ 106.298.497,40	$ 306.803.176,69	$ 426.835.833,72	$ -	$ -	$ 1.023.178.985,99			
		COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.483.427,29	$ 73.946.208,88	$ 110.229.973,29	$ 226.451.971,44	$ 112.290.517,10	$ -	$ -	$ 545.402.098,00			
		COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	$ 47.586,00	$ 114.206,40	$ 28.551,60	$ 6.372.415,92	$ 19.225.610,32	$ 65.549.719,08	$ 100.698.111,29	$ 726.976.417,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 919.012.618,17			
		COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	$ -	$ 1.508.168,00	$ 83.455.918,75	$ 135.928.238,71	$ 224.086.320,33	$ 277.479.013,66	$ 369.484.157,91	$ 197.614.852,51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.289.556.669,87			
		COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO								$ -	$ 68.106.020,00	$ 85.132.525,00	$ 81.727.224,00	$ 51.079.515,00	$ 286.045.284,00			
		COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.136.231,11	$ 146.184.887,38	$ 96.181.674,36	$ 38.582.996,16	$ 2.682.384,00	$ -	$ 345.768.173,01			
		COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ					$ -	$ -	$ 56.018.922,93	$ 188.280.572,48	$ 440.009.012,63	$ 453.949.344,96	$ -	$ -	$ 1.138.257.853,00			
		COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL								$ -	$ 68.106.020,00	$ 85.132.525,00	$ 81.727.224,00	$ 51.079.515,00	$ 286.045.284,00			
		COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ					$ -	$ 11.048.974,88	$ 46.313.842,43	$ 52.159.632,69	$ 120.089.956,93	$ 307.397.325,42	$ 204.764.263,58	$ 28.364.772,32	$ 770.138.768,25			
		COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.227.165,00	$ 83.591.283,39	$ 81.378.165,01	$ 60.376.958,12	$ 176.619.362,94	$ 242.714.305,96	$ 539.862.031,46	$ -	$ 1.185.769.271,88			
		COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	$ -	$ -	$ 1.621.992,00	$ 23.266.775,10	$ 83.605.738,57	$ 183.475.583,47	$ 211.683.962,13	$ 240.500.402,16	$ 436.611.316,55	$ 63.009.062,35	$ -	$ -	$ 1.243.774.832,33			
		COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL								$ -	$ 68.106.020,00	$ 85.132.525,00	$ 81.727.224,00	$ 51.079.515,00	$ 286.045.284,00			
		COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	$ 17.885.932,22	$ 100.684.952,77	$ 181.631.504,22	$ 160.385.600,91	$ 201.188.265,60	$ 243.743.335,43	$ 307.331.510,10	$ 64.401.261,89	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.277.252.363,14			
		COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO								$ -	$ 68.106.020,00	$ 85.132.525,00	$ 81.727.224,00	$ 51.079.515,00	$ 286.045.284,00			
		COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B								$ -	$ 65.480.245,73	$ 86.158.218,07	$ 82.711.889,35	$ 51.694.930,84	$ 286.045.283,99			
		COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A								$ -	$ 65.480.245,73	$ 86.158.218,07	$ 82.711.889,35	$ 51.694.930,84	$ 286.045.283,99			
		COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B								$ -	$ 65.480.245,73	$ 86.158.218,07	$ 82.711.889,35	$ 51.694.930,84	$ 286.045.283,99			
		COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR				$ 3.794.133,33	$ 362.584.188,64	$ 500.702.685,17	$ 692.919.685,00	$ 278.448.744,01	$ 156.894.039,30	$ 150.859.653,16	$ 21.783.573,51	$ -	$ 2.167.986.702,12			
		COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS								$ -	$ 65.480.245,73	$ 86.158.218,07	$ 82.711.889,35	$ 51.694.930,84	$ 286.045.283,99			
		COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B								$ -	$ 65.480.245,73	$ 86.158.218,07	$ 82.711.889,35	$ 51.694.930,84	$ 286.045.283,99			
		COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A				$ -	$ -	$ 13.109.084,83	$ 101.457.776,91	$ 230.991.724,61	$ 250.955.189,57	$ 68.491.848,09	$ -	$ -	$ 665.005.624,01			
		COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM					$ -	$ 15.658.033,53	$ 107.914.275,67	$ 101.960.374,34	$ 43.193.660,44	$ -	$ -	$ -	$ 268.726.343,98			
	ATENCION DE EMERGENCIAS						$ 35.514.126,45	$ 121.762.719,25	$ 121.762.719,25	$ 126.836.165,88	$ 131.909.612,52	$ 126.836.165,88	$ 121.762.719,25	$ 76.101.699,53	$ 862.485.928,01			
	ENTREGA DE OBRA													$ -	$ -			
Total programacion			$ 19.343.512,56	$ 104.678.722,83	$ 295.575.504,61	$ 399.376.360,79	$ 1.041.233.621,20	$ 1.691.573.342,01	$ 2.510.602.880,63	$ 2.696.417.892,34	$ 3.053.650.303,07	$ 2.847.420.769,47	$ 1.713.050.539,81	$ 618.338.701,84	$ 16.991.262.151,16			
Total general			$ 19.343.512,56	$ 104.678.722,83	$ 295.575.504,61	$ 399.376.360,79	$ 1.041.233.621,20	$ 1.691.573.342,01	$ 2.510.602.880,63	$ 2.696.417.892,34	$ 3.053.650.303,07	$ 2.847.420.769,47	$ 1.713.050.539,81	$ 618.338.701,84	$ 16.991.262.151,16			

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-320

Bogotá, D.C, agosto 22 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACION DE INFORME SEMANAL No.31

Respetados señores:

Por medio del presente, esta interventoría se permite remitir el informe semanal de interventoría No.31, correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente contractual literal *G. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO*. El periodo del informe semanal se relaciona a continuación:

- **Informe semanal No.31:** 14/08/2023 al 20/08/2023

Sin otro particular.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Siete (7) folios

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	21/08/2023	**PERIODO No.**	**31**	DEL	**14/08/2023**	AL	**20/08/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
PRÓRROGA :	N/A	PRORROGA 1:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	364	PLAZO ACTUALIZADO:	333
PLAZO TRANSCURRIDO:	229 EQUIVALE AL 63%	PLAZO TRANSCURRIDO:	212 EQUIVALE AL 64%
VALOR INICIAL :	$ 878.587.938,00	VALOR INICIAL :	$ 11.941.262.150,00
VALOR ADICION(ES):	$ 371.557.789,00	VALOR ADICION(ES):	$ 5.050.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.250.145.727,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 16.991.262.150,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.250.145.727,00	VALOR POR PAGAR:	$ 16.991.262.150,00
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ	INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	29/07/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	29/07/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	29/07/2023		No iniciado
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	29/07/2023		No iniciado
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS**	29/07/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023		No iniciado
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**212**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR ESTIMADO A EJECUTAR SEGÚN ACTUALIZACIÓN	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 212.405.866,00	$ 212.405.866,00	100,00%	15/08/2023	EN EJECUCIÓN
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 210.052.966,00	$ 189.296.411,36	90,12%	30/08/2023	EN EJECUCIÓN
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO

FECHA	21/08/2023	**PERIODO No.**	**31**	DEL	**14/08/2023**	AL	**20/08/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	$ 1.010.000.000,00	$ 274.553.210,84	27,18%	23/10/2023	EN EJECUCIÓN
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO	$ 485.207.002,00	$ 165.103.262,00	34,03%	20/10/2023	EN EJECUCIÓN
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	$ 841.548.020,00	$ 429.651.151,89	51,05%	31/08/2023	EN EJECUCIÓN
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	$ 1.267.289.232,00	$ 940.170.408,19	74,19%	28/08/2023	EN EJECUCIÓN
8	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	$ 283.433.330,00	$ 218.815.612,48	77,20%	15/09/2023	EN EJECUCIÓN
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	$ 827.987.076,00	$ 275.554.015,00	33,28%	30/10/2023	EN EJECUCIÓN
11	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL	$ 100.000.000,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	$ 762.681.025,00	$ 282.122.983,00	36,99%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	$ 1.228.838.776,00	$ 662.286.558,69	53,90%	30/11/2023	EN EJECUCIÓN
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	$ 1.206.469.428,00	$ 629.776.238,70	52,20%	14/10/2023	EN EJECUCIÓN
15	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL	$ 498.001.754,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	$ 1.182.923.093,00	$ 948.782.089,97	80,21%	30/08/2023	EN EJECUCIÓN
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	$ 304.703.052,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
19	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	$ 656.544.890,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
20	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	$ 339.352.709,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR	$ 2.027.739.816,00	$ 759.239.629,75	37,44%	28/11/2023	EN EJECUCIÓN
22	COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
23	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	$ 335.852.053,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A	$ 702.836.423,00	$ 277.106.992,00	39,43%	31/10/2023	EN EJECUCIÓN
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	$ 273.172.058,00	$ 228.640.069,79	83,70%	15/09/2023	EN EJECUCIÓN
26	EMERGENCIAS	$ 862.485.928,00	$ 143.635.741,07	16,65%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	Se terminan las actividades de la pintura de la cancha y el alcalce del colegio lo cual esta a la espera de que la SED entregue los espacios al colegio.	PERSONAL Profesional y técnico: dos (2) personas - Rotativos Operativo: dos (2) personas Equipo: herramienta menor
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	No se ejecutan actividades esta semana, no hay personal en obra. Sigue faltando el cambio de luminarias de los baño del primer piso y la reposición de elementos afectados durante la intervención.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cero (0) personas Equipo: Herramienta menor

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	21/08/2023	**PERIODO No.**	**31**	DEL	**14/08/2023**	AL	**20/08/2023**


No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Se fundio la placa del segundo nivel en área de bateria de baños, fundida de alistado del bloque #1 en segundo piaso en zona de circulación, instalación de tuberia EMT 3/4" del primer y segundo piso e instalación de tablero de 12 circuitos, Se requiere aumentar el personal de obra operativo	PERSONAL Maestro de Obra (1) personas - Rotativo Operativo: Cinco (5). Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	Continua demolición de placa de la cancha, se realiza la toma de muestras de suelo, Inicia la excavación de material común. Se realiza el desmonte de cubierta de la entrada, para el ingreso de volquetas.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Herramienta menor y maquina excavadora.
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	Se inicia con el desmonte de cubierta e instalacion de la cubierta en el ala 1 de bloque, y se comienza la actividad de desmonte y monte de cubierta en el ala 2	PERSONAL Profesional y técnico: Tres (3) personas - Rotativos Operativo: dos (2) personas Equipo: volqueta y Herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	Se entrego el área de Serigrafia el dia Miércoles 16/08/2023, se finalizo actividad de acabados de estuco y pintura en el comedor y se continua con demolición de alistado en piso en zona de comedor.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Cuatro(4) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	Se comienza con la pintura de mesones de color amarillo, se inicia la actividad de desmonte de machimbre en el area de tecnologias.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: una (1) personas Equipo: Herramienta menor
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se continua con la fundida de los paños en concreto, se realiza la excavacion del carcamo perimetral y se continua con el relleno, se realiza la compactacion del relleno en el area de la plazoleta	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	Continua actividad de pintura sobre cercha existente, Inicia actividad de desmonte reja bajo cubierta, continua actividad de pintura sobre canal, inicia instalación de perfiles tubulares para el mejoramiento estructural de la cubierta.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	Continua actividad de resane sobre muro, continua actividad de pañete sobre vanos de ventanas, inicia instalación de ventana en los salones del segundo nivel. Se llevan a cabo dos reuniones en conjunto con la rectora y el contratista para revisar el estado actual de las obra y solicitar un plan de choque frente al atraso.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Se continua con el desmonte de cubierta y se inicia la instalacion de pedestales y de la estructura de la cubierta.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: seis (6) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	Continua con la instalación de enchape en baños del primer piso, se requiere que el contratista subsane a la brevedad posible las observaciones prersentadas en los baños del tercer piso.	PERSONAL Profesional y técnico:Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Dos (02) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Finaliza la actividad revferente a la instalación de cubierta en bloque # 12, e instalación de piso en granito en el mismo bloque, e inicia demolición de alistado y acabado en zona de cafeteria existente y continua con la fabricación de puertas sitio. A la fecha continúa observaciones de acabados en estructura metálica y limpieza de mamposteria en aulas,e inicia con la instalación de estructura metálica en área de sistemas y laboratorio,	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Nueve (08) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	Inicia actividad de pintura sobre muros, continua actividad de instalación de manto asfáltico, Continua actividad de emulsión asfáltica.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	Se termina las actividades de pintura y se espera por parte de la S.E.D la respuesta de la puerta antipanico si se va a realizar dicha actividad.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativas Operativo: Tres (1) personas- Rotativo Equipo: Herramienta menor
26	**EMERGENCIAS**	Se está a la espera del envío de la propuesta para la separación de los sistemas de aguas residuales de las aguas industriales en la IED Gustavo Restrepo sede A. Se atendió provisionalmente la emergencia en la IED Restrepo Millán sede D.	

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 7.827.417.831,16	46,07%	-6,30%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 6.757.282.520,33	39,77%	

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	21/08/2023	**PERIODO No.**	**31**	DEL	**14/08/2023**	AL	**20/08/2023**

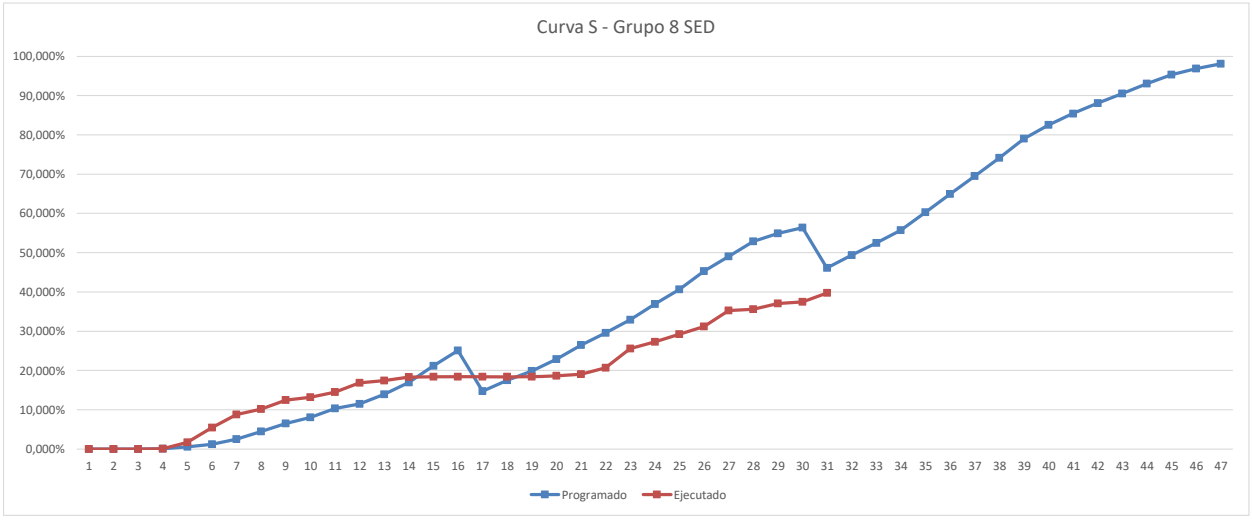

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Para el presente periodo, el atraso asciende al 6,30%, el cual representa una disminución importante en relación al periodo inmediatamente anterior, ya que el contratista de obra allegó el ajuste de la programación acordado el pasado 17 de julio de 2023, donde ajustó los montos a ejecutar en cada uno de los frentes que se encuentran en ejecución, actualizó las fechas que se tienen previstas para la entrega de estos frentes, entre otros.

No obstante al ajuste, el contrato sigue presentando un atraso que si bien no es tan representativo, es importante que el contratista de obra no lo deje aumentar considerando que la Entidad está contemplando una posible adición de recursos No.2, dentro de la cual también estima una posible ampliación en plazo.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
IED Liceo Femenino Mercedes Nariño - Entrega de la sede incluyendo el cambio de cubierta de la emergencia (actualizado)	Contratista de obra	15/09/2023 (En proceso)
IED Restrepo Millán sede B - Entrega del concepto del bloque No.1 sobre la optimización de la estructura	Contratista de obra	14/08/2023 (Incumplido)
Contrato en general - Exposición del plan de contigencia - Reprogramado	Contratista de obra	11/07/2023 (Cumplido 21-08-2023)

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* Durante el presente periodo semanal se remitió el ajuste de los APU's relacionados con la emergencia a ejecutar en la IED Liceo Femenino

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:


Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y se está a la espera de la entrega de su concepto técnico. Esto se sigue dilatando en el tiempo.
Colegio Gustavo Restrepo sede A: El contratista ya realizó la reparación de las cajas por donde realizó lon sondeos al sistema sanitario.
Colegio Restrepo Millán sede D: Se evaluó con la Entidad Contratante la intervención en redes eléctricas una vez se proceda con la actividades propias de este frente.
Colegio República de EEUU: El contratista de obra procedió con la demolición de parte del piso de la batería sanitaria y logró identificar dos (2) cajas de inspección sobre las cuales realizó el destaponamiento en el sistema existente.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE		







CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	21/08/2023	**PERIODO No.**	**31**	DEL	**14/08/2023**	AL	**20/08/2023**

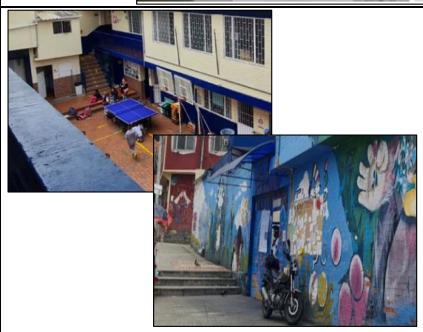No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES		
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II		
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO		
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA		
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA		





CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	21/08/2023	**PERIODO No.**	**31**	DEL	**14/08/2023**	AL	**20/08/2023**

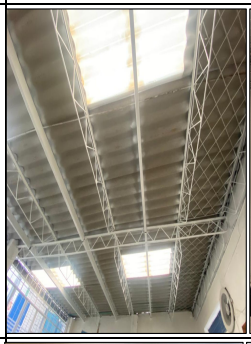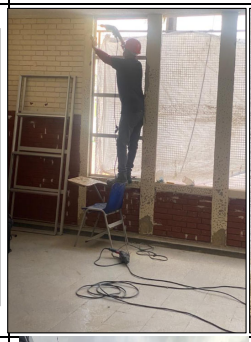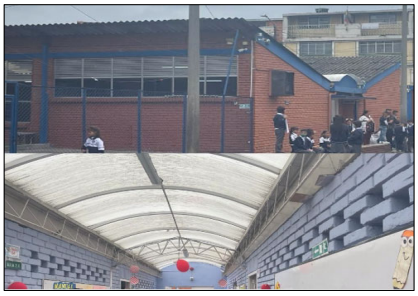No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		  
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	 	  
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	 	  
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		  
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		  

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	21/08/2023	**PERIODO No.**	**31**	DEL	**14/08/2023**	AL	**20/08/2023**

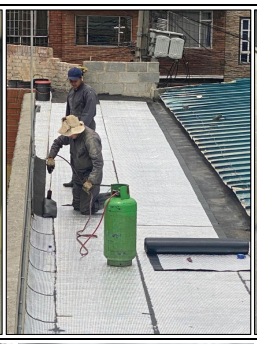No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		  
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	 	  
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		  
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		  

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-321

Bogotá, D.C, agosto 23 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO DIANA TURBAY, LIBERTADOR

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Randy Bello Martínez	PT 5192383	Ayudante	Diana Turbay
2	Jaime Londoño Bustos	79.632.384	Ayudante	Libertador
3	Alexandra Perdomo Quintero	52.210.303	Ayudante	Libertador

CONSORCIO TIG

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe

Anexo. Documentación del personal

REPÚBLICA DE COLOMBIA

PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN

No. 5192383

COL

BELLO MARTINEZ
APELLIDOS

RANDY
NOMBRES

VEN
NACIONALIDAD

M
SEXO

17218568
DNI Nro.

27-08-1986
FECHA DE NACIMIENTO

27-05-2021 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

30-05-2031
FECHA DE VENCIMIENTO



FIRMA

Powered by CamScanner

E1726789

INDICE DERECHO

El titular de este documento debe notificar a Migración Colombia cualquier cambio en la condición o información migratoria.

Juan Francisco Espinosa Palacios
Director General de Migración Colombia

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
www.migracioncolombia.gov.co

IPCOL5192383<<9<<<<<<<<<<<<<<<
8608273M3105308VENE1726789<<<0
BELLO<MARTINEZ<<RANDY<<<<<<<<<

Powered by CamScanner

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 18/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	203	19/08/2023	PT 5192383	BELLO MARTINEZ RANDY	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

FDD157D4D8B7A9720589082884D37E83 Certificado impreso el día 8/18/2023 11:52:01 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

RANDY
BELLO MARTINEZ
5192383

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS

No. de Radicación: 28211882

Fecha de Radicación
1 8 0 8 2 0 2 3

RADICADO

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1.Tipo de Trámite	2.Tipo de Afiliación	3. Regimen
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A.Individual [ ] Cotizante o Cabeza Familia [X] Beneficiario o Otra adicional [ ] B. Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ]	C. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado	5.Tipo de Cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	01

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
BELLO	MARTINEZ	RANDY	
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo documento de Identidad	8. Número del documento de Identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
PT	5192383	Femenino [ ] Masculino [X]	27/08/1986

III.DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
06	Tipo [F][N][M] Condición [T][P]		00

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de Cotización - IBC
POSITIVA S.A.	002 / COLFONDOS	1.160.000

18. Residencia			
CALLE 34 N 32 90	3133138066	3133138066	randy86@hotmail.com
Dirección	Teléfono fijo	Teléfono Celular	Correo electrónico

54001 / CUCUTA	Zona Urbana [X] Rural [ ]		54 / NORTE DE SANTANDER
Municipio/Distrito		Localidad/Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyugue o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. fecha de Nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Numero del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentescos	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo			Condición	
			F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia	Zona				33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
	Municipio/Distrito	Urbana	Rural	Departamento	Telefonofijo y/o Celular	
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C	SINERGIA U.P.R.E.C CUCUTA PPR	SINERGIA UNIDAD BASICA CENTRO P P R	30600433	30600437
B				
B				
B				

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	01

39. Ubicación				
CLL 3 # 7B-140 URBANIZACION ALTAMIRA	5801473	obras.joyavi@gmail.com	LOS PATIOS	NORTE DE SANTANDER
Dirección	Teléfono	Correo electronico	Municipio/Distrito	Departamento

Famisanar EPS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y correcciónde datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	1 8 0 8 2 0 2 3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado — Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:	0	0	0	1	0	0	0	0	1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la teminación de la unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Codigo del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70.Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones: _____

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) RANDY BELLO MARTINEZ identificado(a) con P.P.T No. 5.192.383, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 18 de agosto del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.

Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.632.384
LONDOÑO BUSTOS

APELLIDOS
JAIME

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-NOV-1975
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

20-JUN-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00613739-M-0079632384-20140822 0039662005A 3 1162986551

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 22/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	205	23/08/2023	CC 79632384	LONDOÑO BUSTOS JAIME	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

FDD157D4D8B7A9720589082884D37E83 Certificado impreso el día 8/22/2023 11:32:25 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JAIME
LONDOÑO BUSTOS
79632384

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4010339876	2|2|0|8|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion
B. Colectiva ☐
A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐
B. Institucional ☐ B. De oficio ☐

3.Regimen
A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante
A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
LONDOÑO Primer apellido	BUSTOS Segundo apellido	JAIME Primer nombre	Segundo nombre
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	79632384	Femenino ☐ Masculino ☒	2|4|1|1|1|9|7|5

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	PORVENIR	1160000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
AVENIDA 45 N 43 89	67928810	3054578748	Obras.ard@hotmail.com

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
BOGOTA D.C	Urbana ☒ Rural ☐		BOGOTA D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número documento identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad				
			Tipo			Condición	
			F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
		Urbana	Rural			
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		VS UAB CENTRO - SOCIEDAD MEDICA BOGOTA CAP	VSCENTRO - BOGOTA
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	01

39.Ubicación

Dirección	Teleéfono	Correo electrónico	Municipio/distrito	Departamento
CL 34 122 SUR 17D BRR ENVIGADO	5801473	ALRODE73@HOTMAIL.COM	ENVIGADO	ANTIOQUIA

No de Radicacion
4010339876

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ **6.** Reinscripción en la EPS
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **12.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **14.**Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **15.** Reporte de fallecimiento
- ☐ **16.**Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **17.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **18.** Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		2|2|0|8|2|0|2|3

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- **46.** ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- **47.** ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- **48.** ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- **49.** ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- **50.** ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- **51.** ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- **52.** ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- **53.** ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

JAIME LONDOÑO BUSTOS CC 79632384	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	**55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio**

IX.ANEXOS

- ☐ **56.**Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐
  Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0
- ☐ **57.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **58.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **59.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **60.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **61.**Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **62.**Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **63.**Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **64.**Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **65.**Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JAIME LONDOÑO BUSTOS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **79.632.384**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de Agosto del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
52.210.303
PERDOMO QUINTERO
ALEXANDRA


FECHA DE NACIMIENTO 09-SEP-1975
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
04-OCT-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 22/08/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	204	23/08/2023	CC 52210303	PERDOMO QUINTERO ALEXANDRA	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

FDD157D4D8B7A9720589082884D37E83 Certificado impreso el día 8/22/2023 11:22:01 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

ALEXANDRA
PERDOMO QUINTERO
52210303

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4010339875	2|2|0|8|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion
B. Colectiva ☐
A. Individual:
B. Institucional ☐
-Cotizante Cabeza de familia ☒
-Beneficiario afiliado adicional ☐
B. De oficio ☐

3.Regimen
A.Contributivo ☒
B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante
A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
PERDOMO Primer apellido	QUINTERO Segundo apellido	ALEXANDRA Primer nombre	Segundo nombre
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	52210303	Femenino ☒ Masculino ☐	0|5|0|9|1|9|7|5

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	PORVENIR	1160000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CALLE 9 N 45 98	67928810	3054578748	Obras.ard@hotmail.com

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
BOGOTA D.C	Urbana ☒ Rural ☐		BOGOTA D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad				
			Tipo			Condición	
			F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
		Urbana	Rural			
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		VS UAB CENTRO - SOCIEDAD MEDICA BOGOTA CAP	VSCENTRO - BOGOTA
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	01

39.Ubicación

Dirección	Teleéfono	Correo electrónico	Municipio/distrito	Departamento
CL 34 122 SUR 17D BRR ENVIGADO	5801473	ALRODE73@HOTMAIL.COM	ENVIGADO	ANTIOQUIA

No de Radicacion
4010339875

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ **6.** Reinscripción en la EPS
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **12.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **14.**Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **15.** Reporte de fallecimiento
- ☐ **16.**Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **17.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **18.** Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
☐		Femenino ☐ Masculino ☐		2|2|0|8|2|0|2|3

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código: ☐	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- **46.** ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- **47.** ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- **48.** ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- **49.** ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- **50.** ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- **51.** ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- **52.** ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- **53.** ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

ALEXANDRA PERDOMO QUINTERO CC 52210303	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	**55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio**

IX.ANEXOS

- ☐ **56.**Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐
  Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0
- ☐ **57.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **58.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **59.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **60.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **61.**Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **62.**Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **63.**Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **64.**Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **65.**Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

ALEXANDRA PERDOMO QUINTERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **52.210.303**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de Agosto del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-323

Bogotá, D.C, 25 de agosto de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE OBRA No. 7

Respetados señores:

Por medio de la presente, nos permitimos remitir el Acta de Pago Parcial de obra No.7, allegado por parte del contratista de obra CONSORCIO MIA GP y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, damos el correspondiente aval con soporte en los documentos anexos para el trámite del acta parcial de obra No.7:

1. Oficio de solicitud de aprobación de obra a interventoría
2. Oficio de solicitud de aprobación de interventoría a la SED
3. Acta parcial en Excel y PDF
4. Memorias de Calculo
5. Aportes parafiscales
6. FURC - hoja información de pagos
7. RUT CONSORCIO
8. Pre Factura No. MGP-05
9. Resolución de facturación DIAN
10. Certificación Bancaria
11. Acta de autorización de pagos

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-324

Bogotá, D.C, 26 de agosto de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No.7

Respetados señores:


Por medio de la presente, y en cumplimiento a las obligaciones contractuales esta interventoría realiza la entrega del Acta de cobro Parcial No. 6 correspondiente al periodo del 20 DE JULIO DE 2023 AL 19 DE AGOSTO DE 2023, para su correspondiente revisión y aprobación. Dentro de este contexto se anexa los documentos soporte para el trámite del acta parcial:

1. Oficio de solicitud de aprobación de acta interventoría
2. Acta parcial en Excel y PDF
3. Aportes parafiscales
4. FURC - hoja información de pagos
5. RUT CONSORCIO
6. RIT CONSORCIO
7. Pre Factura
8. Resolución de facturación DIAN
9. Certificación Bancaria

CONSORCIO TIG

10. Acta de autorización de pagos

Atentamente,



Edgar Alfredo Salazar Bernal
Representante legal
CONSORCIO TIG
Nit: 90164989-03
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
