	tercer piso hombres.
08-09-23	1 maestro 1 ayudante Se realiza acopio de material para la intervencion en las aulas del primer nivel - JhonR
09-09-23	No hay personal en obra Se programa entrega de baños para el martes 12 de sep en compañia de la sed, el rector, contratista e interventoria JhonR
10-09-23	No hay personal en obra. dia festivo JhonR
11-09-23	1 oficial 1 ayudante Inicia actividad de retiro de pintura sobre muro, con grata y removedor de pintura. JhonR Se aplica estarriada sobre muro.
12-09-23	1 oficial 1 ayudante Inicia actividad de aplicación de mortero para revoque de muro en salón 108 DISEÑO. El mortero esta preparado con producto sika impermeabilizante. Residente MISTEP Arq Sebastian Rivera
13-09-23	1 oficial 1 ayudante Continua actividad de aplicacion de mortero impermeabilizado en aula 108 Inicia actividad de instalacion de enchape. Interventoria recomienda que se deje secar mas el mortero antes de seguir la instalacion del enchape. JhonR Residente MISTEP Arq Sebastian Rivera Se adiciona muro, ventana para impermeabilizacion y enchape y parte baja muro dentro de mueble de almacenamiento donde se evidencia tambien humedad
14-09-2023	1 Oficial 1 ayudante

14-09-2023 Continua instalación de cerámica sobre pared, se realiza instalación de mortero y cerámica sobre los dos muros adicionados. Se realizo la aplicación de boquilla y limpieza de muro. Se evidencia fallas en el suministro de agua potable dificultando corrección de compromisos adquiridos en baños.

Residente Consorcio MIAGP
Arq Sebastian Rivera

15-09-2023 Finaliza instalación de cerámica con su respectiva boquilla en salón 108. Continua daño en bomba hidráulica de institución por lo que no es posible realizar correcciones en zona de baños.
A la espera del retiro de conduleta red voz y datos en salón 208 y entrega para intervención por parte de la institución

Residente Consorcio MIAGP
Arq Sebastian Rivera

Queda pendiente subsanar observaciones de boquilla en el salon 108
JhonR

16-09-23 No hay personal en obra
Se presenta un fallo en las bombas de la institución, por lo que no es posible continuar con las actividades en los baños; se espera a que la institución continue con el desalojo del aula 107 JhonR

17-09-23 No hay personal en obra, dia festivo JhonR

18-09-23 2 oficiales 1 ayudante
Inicia actividad de limpieza de muro a intervenir en aula 108 Inicia pañete impermeabilizado sobre muro. Se atiendan observaciones en los baños del primer y segundo nivel. JhonR

19-09-23 1 oficial 1 ayudante
Continua actividad de pañete impermeabilizado sobre muro del aula 108. El contratista no hace entrega de los baños, los accesorios siguen presentando filtraciones. JhonR

Residente Consorcio MIAGP
Arq Sebastian Rivera

20-23-09	Continua actividad de instalación de enchape en aula 107 Thank Residente Concepción MDA 6-P Arq Sebastian Rivera

02.08.23 No hay personal en obra Jhon R. Camacho R. Obra

03.08.23 No hay personal en obra Jhon R. Camacho R. Obra

04.08.23 No hay personal en obra Jhon R. Camacho R. Obra

05.08.23 No hay personal en obra Jhon R. Camacho R. Obra

06.08.23 No hay personal en obra Jhon R. Camacho R. Obra

07.08.23 No hay personal en obra Jhon R. Camacho R. Obra

08.08.23 1 maestro 1 oficial

Se re-instala el cerramiento de la cancha y se recibe maquina excavadora.

Jhon R. Camacho R. Obra

09.08.23 1 operario de maquina 1 maestro 1 ayudante

Comienza actividad de demolición de cancha, se detiene al medio dia por descomposición de la maquina. Jhon R. Camacho R. Obra

10.08.23 No hay personal en Obra Jhon R. Camacho R. Obra

11.08.23 No hay personal en Obra Jhon R. Camacho R. Obra

12.08.23 1 operario de maquina

Continua actividad de demolición de placa. Jhon R. Camacho R. Obra

13.08.23 No hay personal en obra, dia festivo Jhon R. Camacho R. Obra

14.08.23 1 operario de maquina

Se realiza la toma de muestra de suelos, Jhon R. Camacho R. Obra

15.08.23 1 operario 1 ayudante

Se desmonta la cobertura en policarbonato de la entrada del colegio, se realiza retiro de material de demolición de la cancha. Se trabaja hasta medio dia. Jhon R. Camacho R. Obra

16.08.23 No hay personal en obra Jhon R. Camacho R. Obra

17.08.23 No hay personal en obra Jhon R. Camacho R. Obra

18.08.23 1 operario de maquina

Comienza la excavación de material de sobre de la cancha. Jhon R. Camacho R. Obra

19.08.23

1 Operario de Maquina

Continua la excavación de material comun de la cancha Jhon R. Camacho R. Obra

20.08.23 No hay personal en obra. Jhon R. Camacho R. Obra

21.08.23 No hay personal en obra Jhon R. Camacho R. Obra

22.08.23 1 operario de maquina

Continua excavación en material comun. Jhon R. R Obra

23.08.23 1 operario de maquina 1 oficial
Continua excavación en material comun. 55cm desde el nivel de la placa. Jhon R. R. Obra

24.08.23 1 operario de maquina 1 oficial
Continua excavación de material comun y disposicion final.
Residente Obra

25.08.23 1 operario de maquina 1 oficial
continua excavación de material comun y disposicion final Jhon R.

26.08.23 1 operario de maquina 1 oficial
Continua excavación de material comun y disposicion final Jhon R.

27.08.23 No hay personal en obra. dia festivo Jhon R.

28.08.23 1 operario de maquina 1 oficial
Se realiza la revision de niveles de excavación de la concha, por parte de la empresa de vigilancia de la institución se hace entrega del aula casa Gaudí al contratista MIAGP. Continua actividad de excavación. Jhon R.

29.08.23 1 operario 1 oficial
Continua actividad de excavación, llega primer viaje de material piedra rajon. se espera la llegada de maquina compactadora y revision de niveles antes de iniciar con el extendido del material. Jhon R.
Se realiza compactación sobre nivel de excavación para proceder con colocación de

30.08.23 1 operario 1 oficial
Inica actividad de compactación de terraza, llega material piedra rajon, inica extendido de piedra rajon.
El diametro de la piedra rajon es muy grande, la interventoria sugiere intalar otro de mayor diametro ya que no permitiran el paso de los rines para su correcta compactación. Jhon R.
Se realiza fractura de Pajmer existente para disminuir tamaño

31.08.23 1 operario 1 oficial
Continua actividad de compactación y extendido de material. Jhon R.
Se atiende dejar por estudios izquierdo Supervisor


01.09.23 1 operario de maquina 1 oficial
Continua actividad de compactación y extendido de material rajon
Se extiende rajon costado izquierdo interior en cancha
Dia Soleado - El maestro 1 operario maquinaria
Sandra Pinzón Jhan R.


02.09.23 1 operario de maquina 1 oficial
Continua actividad de extendido de material rajon. Jhan R.

03.09.23 No hay personal en obra, dia festivo. Jhan R.

04.09.23 1 operario de maquina 2 oficiales
Inicia actividad de extendido y compactación de recebo.
Se le reitera al contratista la solicitud de correcion de observaciones de la estructura de la cubierta en la zona de preescolar y la correcta instalacion del policarbonato.
Jhan R.

05.09.23 1 operario de maquina 2 oficiales
Continua actividad de extendido y compactación de base granular Jhan R.
Se le solicita al contratista plan de ensayos.
Se continua con extendido y Compactacion recebo costado izquierdo superior → Perfil a tener en cuenta



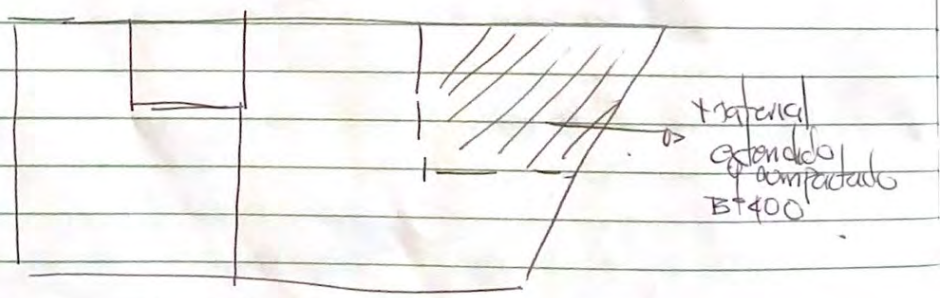

Jornada con llueva de 9:00 a 11:00 am.
Sandra Pinzón Jhan R.

06.09.23 2oficiales 1operador de maquinaria
Continua actividad de extendido y compactacion de base granular

07/09/2023 2 oficiales + 1 operador de maquinaria
Continua actividad de extendido de material base, se realiza toma muestras para verificar compactacion en 4 puntos.
% compactacion
Muestra 1 96.6%
2 97.3%
3 96.3%
4 100.5%

Sandra Pinzon JhunR

08/09/2023 2 oficiales + 1 operador de maquinaria
Continua actividad de nivelacion de Base para posterior fundida (extendido) de placa en concreto 10 cm

Sandra Pinzon JhunR

09/09/23 2oficiales 1operador de maquinaria
Continua actividad de demolicion de placa frente al arco Gaudi

Sandra Pinzon

11/09/23 2oficiales + 1operador maquina
Se realiza excavacion acceso a parqueadero en area 150 m²
Dia soleado
Excavacion de 70 m² aproximadamente

Sandra Pinzon JhunR

12/09/23 2oficiales + 1operador maquina
Se inicia con instalacion tapial acceso parqueadero area
150 m² / dia soleado
Area de 70m² aproximadamente.

Sandra Pinzon JhunR

13/09/23 2oficiales + 1operador maquina
Continua instalacion tapial area acceso Parqueadero.
Dia Soleado

Sandra Pinzon JhunR

14/09/23 1 operario de maquina 2 oficiales
Se espera llegada de material hasta las 11:00 am. Continua actividad de extendido y compactacion de recebo. Jhon R.

15/09/23 1 operador de maquina 2 oficiales
Se espera llegada de material para continuar con actividades. Jhon R.

16/09/23 1 operador de maquina 2 oficiales
Continua actividad de extendido y compactacion de material. Jhon R.

17/09/23 No hay personal en obra dia festivo Jhon R.

18/09/23 2 oficiales 1 operario de maquina
Se espera la llegada de material.
Finaliza tarea de recebo y compactacion: 1 maestro + 1 operario + 1 oficial Sandra Pinzon Jhon R.

19/09/23 1 oficial 1 operario de maquina
Se espera la llegada de material hasta la 1:00 pm, llega malla electrosoldada para placa. Jhon R.

20/09/23 Dia festivo
1 oficial + 1 maestro
Se inicia amarre malla 6mm en placa costado derecho. Jhon R.

se inicio la instalación y se continua con desmonte de cielo raso en salo de computadores. JhonR.

Jueves 17 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 3 Instaladores de cubierta.
Se realiza actividad de reforzamiento de pintura y estructura metalica en cerchas de aula de computadores, se retira cubierta desmontada de la institución. JhonR.

Viernes 18 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 3 Instaladores de cubierta.
Se realiza actividad de pintura en cerchas y estructuración metalica en sala de computadores. JhonR.

Sabado 19 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 3 Initaladores de cubierta
Se realiza actividad de reforzamiento estructural y se instala canal del area de los computadores con su respectiva pintura. JhonR.

Domingo 19 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra.
No se realiza actividad en obra, día festivo. JhonR.

Lunes 20 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra.
No se realiza actividad en obra día festivo. JhonR.

Martes 21 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 3 Instaladores de cubierta
Se realiza actividad de desmonte de cubierta en aula de

computadores 2, se procede a instalar cubierta tipo sandwich en este mismo espacio. Jhon R

Miercoles 22 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 3 Instaladores de cubierta, 2 Electricos.
Se realiza actividad de desmonte de cubierta de salo de de computadores 1, se procede a instalar cubierta tipo sandwich en este mismo espacio, se inicio instalación de tubería EMT en aulas de computadores Jhon R.

Jueves 23 de Agosto de 2023
Personal: 1 Inspector de obra, 3 Initaladores de cubierta
Se realiza actividad de reforzamiento de pintura en aulas de computadores, se habla con la institución respecto al color de la estructura del pasillo y se llego a un acuerdo de que sea color blanco. Jhon R.

Viernes 25 de Agosto de 2023
Personal: 1 Inspector de obra,
No hay pasonal en obra. El contratista se queda sin material para continuar con actividades. Jhon R.

26·08·23 No hay personal en obra, sigue la espera de material para continuar con las actividades. Jhon R.

27·08·23 No hay personal en obra, dia festivo. Jhon R.

28·08·23 1 ayudante
Inicia actividad de encorozado en la sala de computadores el personal se retira a medio dia por cita medica.
Se le solicita al contratista el aumento del personal operativo

en obra, se le recuerda que hasta que no finalice todas las actividades en las aulas 01 y 02 de informatica, la institución no le asignara mas espacios para intervenir. Jhun R.

29.08.23 1 ayudante

Continua actividad de encarozado en aulas de informatica 01, 02 Jhun

30.08.23 1 ayudante

Continua actividad de encarozado en aulas de informatica 01, 02. Jhun R.

31.08.23 1 ayudante 1 electricista

Continua actividad de encarozado y pintura en aulas de informatica, continua actividad de instalacion de red electrica, luminarias y toma corriente. Jhun R

01.09.23 1 opcal y 1 ayudante

Inicia actividad de pintura sobre estructura metalica de cubierta de pasillo. Jhun R.

02.09.23 No hay personal en obra. El contratista no cuenta con material para continuar con las actividades. Jhun R.

03.09.23 No hay personal en obra, dia festivo. Jhun R.

04.09.23 No hay personal en obra. El contratista no cuenta con material para continuar con las actividades. Jhun R.

Martes 5 de Septiembre de 2023.

Personal: 1 Inspector de obra, 3 Electricos, 4 Instaladores de cubierta.

Se realiza actividad de traslado de material (Teja) a otro

indicado por la institucion ya que el rector pidio quedarse con el material, se instalan dos puntos nuevos de interruptores en sala de sistemas. JhonR

Miercoles 6 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta
Se realiza actividad de instalación de cubierta en el pasillo, con sus respectivos remates. La institución da el visto bueno del aula de computadores. JhonR

Jueves 7 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta
Se realiza actividad de instalación de cubierta en area del pasillo con sus respectivos remates. JhonR

Viernes 8 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta.
Se finaliza actividad de instalación de cubierta en policarbonato en area del pasillo. El personal se retira a las 9:0
JhonR

Sabado 9 de Septiembre de 2023
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Electricos
Se finaliza instalación electrica en el area de aulas de 702 computadores. El personal se retira a las 10:00 am JhonR

Domingo 10 de Septiembre de 2023
No se realiza actividad en obra, día festivo. JhonR

Lunes 11 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Initaladores de cubierta
Se realiza actividad de pintura en aula 702 en cerchas y se realiza actividad de instalación de estructura metalica.
JhunR

Martes 12 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Initaladores de cubierta.
Se realiza actividad de pintura en estructura metalica del aula 702 e instalación de estructura metalica. JhunR

Miercoles 13 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Initaladores de cubierta.
Se realiza desmonte de cubierta de asberto cemento del aula 702.
JhunR.

Jueves 14 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Initaladores de cubierta
Se realito instalación de cubierta tipo sandwich en aula 702.
JhunR

Viernes 15 de Septiembre de 2023.
No hubo actividad en obra JhunR.

Sabado 16 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 INspector de obra.
No hubo actividad en obra. JhunR

Domingo 17 de Septiembre de 2023.
No se realiza actividad en obra, día festivo. JhunR

Lunes 18 de Septiembre de 2023
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Electricos, 4 Instaladores de
Se realiza actividad de instalación de interruptores, toma
y iluminarias en aula 702. Jhon R.

Martes 19 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra
Llega material a obra (Canal). No se realizaron ac

Miercoles 20 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta
Se finaliza actividad de instalación de cubierta en aula
702 e instalación de canal. Se llega a conclusion
con la institución de iniciar actividades el día lunes
25 de Septiembre ya que hasta esa fecha desocup
el area. El personal se retira a los 9:00 am

21/09/23 No hay personal en obra. Jhon R.

22/09/23 4 Instadores de teja
Inicia desmonte de aeb raso en el bloque 1 y Secretar

23/09/23 3 Instaladores de Cubiertas
Continua actividad de desmonte de cielo raso. Jhon R.

19-Agosto-2023 CLIMA: Soleado.
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro General, 4 Ayudantes, 0 ornamentadores, 3 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Destroncadora de pisos
ACTIVIDADES REALIZADAS Se realiza trasiego de materiales producto de demoliciones hasta área de acopio temporal. Se realiza instalación de cubierta en bloque 13. Se continua con instalación de enchape en granito en bloque 12. Se realiza instalación de concreto de 3000 PSI en depósito bloque 11

R. Interventoría CTG.

20-Agosto-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro General, 4 Ayudantes Ornamentadores, 3 oficiales
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor, Destroncadora de pisos
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalacion de concreto de 3000 PSI en acta 1 bloque 11. Se continua con retiro de escombros a ~~pala~~dera. Se realiza instalación de flanche en lámina galvanizada en cubierta bloque 14. Se continua con instalación de estructura metálica con pintura y anticorrosivo bloque laboratorios

R. Interventoría CTG

21-Agosto-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, 4 Ayudantes, 0 ornamentadores, 3 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua instalación de estructura metálica en bloque laboratorios Se inicia con excavación en pasillo frente a bloques 13 y 12.

R. Interventoría

22-Agosto-2023 CLIMA: Soleado

RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, Maestro General, SST, 4 Ayudantes 3 oficiales Ornamentadores

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza desmonte de cubierta existente en cuba deposito de bloque 11. Se continúa con instalación de piso en granito pulido, se realiza retiro de materiales a botadero. se realiza destronque de pisos instalados.

R. Interventoría C.T.I.C

23 Agosto-2023 CLIMA: Soleado

RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, Maestro General, SST, 4 Ayudantes, 3 oficiales Ornamentadores

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza excavación en corredor entre bloques 13 y 12. Se realiza instalación de cubierta en bloque laboratorios. Se realiza destronque y polida de pisos instalados

R. Interventoría C.T.I.C

24-Agosto-2023 CLIMA: Soleado

RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro General, SST, 4 Ayudantes Ornamentadores 3 Oficiales

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de cubierta bloque laboratorios. Retiro de escombro a botadero. fabricación de cerramiento en aluminio

R. Interventoría C.T.I.C

25-Agosto-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, Maestro SST, 4 Ayudantes, Ornamentadores 3 oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación teja standing seam en bloque laboratorios. Se realiza instalación de base granular B-400 en corredor entre bloques 12 y 13. Se continúa con fabricación de puertas y ventanas en aluminio.

R. Interventoría CTG

26-Agosto-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, Maestro, SST, 4 Ayudantes, Ornamentadores 3 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de teja standing seam en bloque 13. Se realiza instalación de piso enchape granito pulido en bloque 13. Se continúa instalación de B-400 en corredor entre bloques 13 y 12. Se continua fabricación de puertas y ventanas. Se realiza jornada de aseo general.

R. Interventoría CTG.

27-Agosto-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ornamentadores
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de cubierta bloque laboratorios.

R. Interventoría CTG

28/Agosto-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SSI, Maestro, 4 Ayudantes, 2 Oficiales Ornamentadores
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, plancha vibradora tipo rana, Destroncadora de Disco.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de B-400 en corredor entre bloques 12 y 13. Se realiza traslado de escombros a punto de acopio temporal. Se continúa con demolición de escaleras y muro de acceso a Bloque 12 y 11.
Se continúa con instalación de piso enchape granito pulido. y destronque del mismo. Se inicia con instalación de embaquillado en área de pasos y instalación Bloques 12-T1

29-Agosto-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SSI, Maestro, 4 Ayudantes, 2 Oficiales Ornamentadores.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor plancha vibradora, tipo rana Destroncadora de piso
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de Cabierta en Bloque 13. Se realiza instalación de Pintura 3 en 1 en Estructura metálica. Instalación de ventanas en Bloque 14 piso 2. Relleno y Compactación de B-400 en Corredor.

30-Agosto-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS, SST, Ing Residente, Maestro, 4 Ayudantes
2 oficiales, 0 ornamentadores
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con relleno y compactación de B-400 en corredor. Se realiza Retiro de escombros a botadero. Se realiza Rotida y destronque de pisos instalados en bloque 11 y 14
Se continúa con fabricación de ventanas para bloques 14 y 11
Instalación de teja Standing Seam en Bloque laboratorios.
OBSERVACIONES: Se realiza anuncio de oficio 2023_ROU_MGP_238 con propuesta arquitectónica escalera de acceso. para aprobación de interventoría.

31 Agosto-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 4 Ayudantes, 2 oficiales
Ornamentadores
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de base granular B-400 en corredor. Se realiza excavación para cárcamo entre Bloque 14 y 11
Se realiza fabricación de ventanas y puertas en Bloque 14.

1-Septiembre-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 4 Ayudantes, 2 oficiales
Ornamentadores
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de concreto para base en piso de cárcamo entre bloques 14 y 11. Se realiza trasiego interno de materiales. Se realiza instalación de cubierta en Bloque laboratorios.
Se realiza fabricación de ventanas. Se realiza encerramiento a nivel de cubierta en bloque 14 piso 2.

2-Septiembre-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: SST, Residente Ing, Ornamentadores, Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de Cobreta en bloque laboratorios. Se continua con instalación de puertas en bloque 14.

R. Interventoría

3-Septiembre 2023
Día no laboral.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría C-116

4-Sep-2023 clima soleado en el día - lluviosa Tarde
Recursos humanos: SST, Ing Residente, 2 Ornamentadores, 4 oficiales, 7 ayudantes
Herramienta y equipos: Herramienta menor.
Actividades realizadas: se continua con instalación de piso en granito pulido en bloque #13 en aulas de sistema, destronque de piso en bloque # 11, pulida de piso en auditorio, aplicación de pintura en gris basalto en interior de aulas en vigas y columnas, se requiere mejorar aseo en orden en obra.

R. Interventoría C-116.

5-Sep-2023 clima nublado.
Recursos humanos: sst, maestro, ing residente 2 ornamentadores, 3 oficiales, 7 ayudantes.
Herramienta y equipo: Herramienta menor.
Actividades realizadas: Se continua con emboquillada de piso en granito en bloque #14 e inicia armado de refuerzo para cárcamo e inicia instalacion de piso granito en aula del bloque #11, instalación de ventanal en aluminio y vidrio 3+3 en bloque #14, demolición de muro de confección en zona de escaleras
La interventoria solicita al contratista programar reunión de comité con el profesional eléctrico en campo para definir el funcionamiento electrico de los cuatro bloques intervenidos.
Igualmente se solicita la intervención en zona de baterias de baños.

Arq. Alejandra Angarita
P. Interventoria C.T16.

6-09-2023 clima soleado.
Recursos humanos: sst, maestro, Residente, dos soldadores, 4 oficiales, 5 ayudantes
Se realiza la instalación malla electrosoldada de refuerzo para realizar el cárcamo ubicado entre bloques # 11, 14, y pulida de piso en auditorio, y continua con aplicación de pintura en estructura metálica de cubierta en bloque # 11 y 12. y excavación en zona de escaleras.
Se requiere agilizar las actividades referente a componente eléctrica con el fin de no afectar la fundida de circulaciones, Mejorar orden y aseo en obra.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría A-116.

7-09-2023 clima: Seco.
Recursos humanos: SST, maestro, Residente 1 soldador, 3 oficiales, 5 ayudantes.
Actividades Realizadas: Instalación de formaleta para fundida de cárcamo, e inicia a medir y cortar estructura metálica para estructural la cubierta en zona de depósito de materiales, continua con la excavación de escaleras y muro de contención.
Se le solicita al contratista la toma de muestra de concreto de todos los elementos estructurales placa, cárcamos y escaleras y mejorar el rendimiento en obra.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría CT16

8-09-2023 clima seco.
Recursos humanos: SST, maestro, Residente, 1 soldador 4 oficiales, 5 ayudantes, Actividades realizadas: fundida de cárcamo entre bloque #11 y 14 y pulida de piso bloque #13

Arq. Alejandra Angarita - R. Interventoría.

09-09-2023 clima Seco.
Recursos humanos: SST, maestro, Residente, 1 soldador, 2 oficiales 5 ayudantes: Actividades realizadas: continua con la fundida de cárcamo pulida de piso en granito en bloque #13, 13 aplicación de pintura en vigas y columnas en bloque #14

Arq. Alejandra Angarita CT16
Residente de interventoría.

10-09-2023 Domingo

Día no se laboro.

Ing. Alejandra Angarita
R. Interventoría C.T.C.

11-09-2023 clima soleado.

Recursos humanos: SST, maestro, residente, 1 soldador 1 oficial, 6 ayudantes, Actividades Realizadas: Desencofrado de cárcamo, excavación de circulación entre bloques # 11, y 14. e instalación de estructura metálica para cubierta en zona de depósito de materiales. llega a obra tubería eléctrica.

se requiere mejorar orden y aseo en obra.

Arq. Alejandra Angarita
R Interventoría C.T.C.

12-09-2023 clima seco.

Recursos humanos: SST, maestro, Residente, 1 soldador, 2 oficiales, 6 ayudantes, 2 eléctricos.

Actividades Realizadas: se continua con retiro de sobrantes producto de demolición de anden existente en segundo nivel, excavación para la instalación de tubería eléctrica y parciales, continua con fabricación de ventanas en aluminio en sitio.

Observaciones: se solicita resultados de ensayos de laboratorio de muestra de concreto y certificado calidad de materiales y terminar actividad de instalación de piso en granito del aula 4 del bloque #11 e instalación de guardaescoba y avanzar con la actividad instalación eléctrica interna.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría C.T.I.6.

13-09-2023 Clima seco.

Recursos humanos: SST, maestro, Residente, 1 Soldador, dos oficiales, 6 ayudantes, 3 eléctricos


Actividades realizadas: Inicio a instalar redebo 2 capas de 0.10 cm de espesor en segundo nivel en anden, compactación, instalación de puertas y fabricación y demolición de piso en circulación frente a bloque #11.

Se realizo recorrido en obra con la secretaria de Educación para verificar el estado actual y definir funcionalidad en donde posiblemente los baños serán reubicados en las dos aulas en zona administrativa existente, y se programo reunión nuevamente para el día miércoles 20/09/2023.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría CTIG

14-09-2023 Clima nublado.
Recursos humanos: 5 maestro, Residente, 1 soldador dos oficiales, 6 ayudantes, 2 eléctricos.
Actividades realizadas: Se funde piso del carcamo y se continua con la compactacion del recebo en anden del segundo nivel frente al bloque #14, Terminando demolicion de anden frente al bloque #11, fabricacion de puertas y ventanas bloque #11.
Observaciones: Se requiere perfileria para finalizar la actividad de instalacion de estructura metalica en salon de materiales.


Arq. Alejandra Anganta
R. Interventoria CITIG.




DEFINICIONES ARQUITECTÓNICAS.

x DEMOLICIÓN PLACAS EN CONCRETO Ó ESCALINATAS QUE SUBEN A PLAZOLETA CENTRAL.

+ ADECUACIÓN DE TERRENO PARA NIVELACIÓN DE CIRCULACIONES

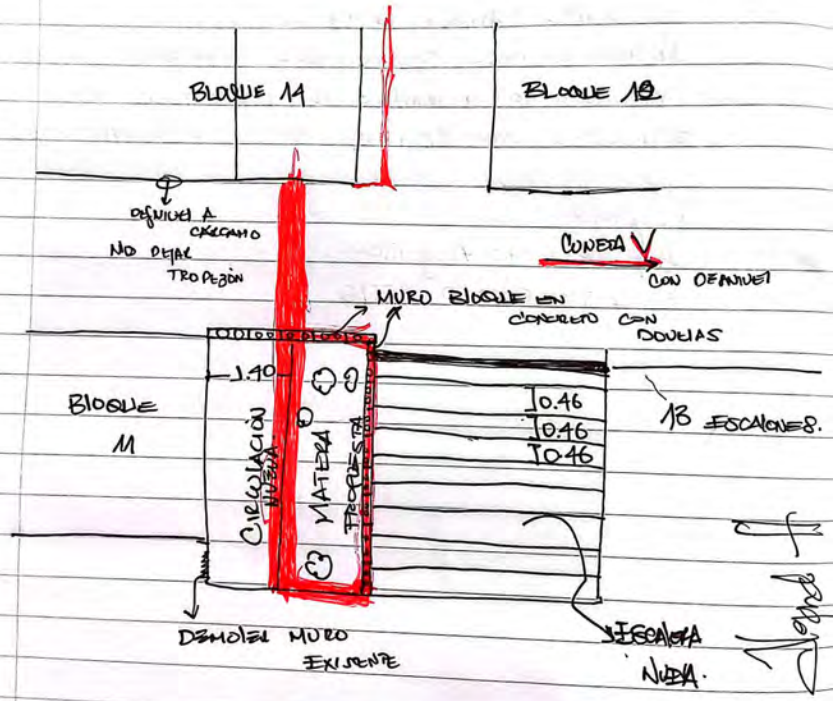

Nota: Demolición muro al acceso del bloque 11 zona de circulación.

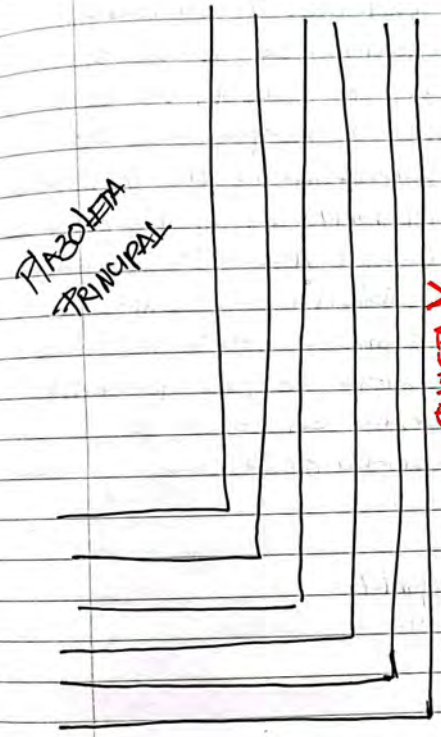

15 Sep 2023 clima seco

Recursos humanos SST, maestro, Residente de obra, 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 soldador.

Actividades realizadas: Se realiza excavación en zona de circulación entre bloques 11 y 14. y posteriormente se inicia relleno con recebo, e instalación tubería eléctrica Emt 3/4" en aulas del bloque #14, y fabricación de ventanas y puertas para el bloque #11.

Se solicita perfilería para el salón de materiales y camisas para la toma de concreto, mejorar rendimiento en obra.

Ing. Residente
T.P. 16.

16 Sep 2023 clima seco.

Recursos humanos SST, maestro, Residente, dos oficiales, 6 ayudantes, 1 soldador.

Actividades Realizadas: se continua con la excavación de circulación contigua a la cancha frente al bloque #11, se continua con la fabricación de ventanas y puertas para instalarlas en el bloque #11.

Observaciones: se refuerza la solicitud de perfilería de cubierta en salón de materiales y las camisas para la toma de muestras de concreto de los elementos estructurales a fundir en obra, se requiere mejorar rendimiento, orden y aseo.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria CTIG.

17 Sep 2023 Domingo
Día no se laboro.

18 Sep 2023 Clima Nublado.
Recursos humanos: SOT, maestro, Residente
2 oficiales, 1 soldador, 7 ayudantes.
Actividades Realizadas: continua con la compactación de recebo en circulación entre bloques #11 y #14, y continua con la instalación de tubería eléctrica Emt 3/4" y cajas de paso en aulas del bloque #14 e inicia el encarocado en bloque #11
Se requiere las camisas para las muestras del concreto a fundir en obra y mejorar el rendimiento y acabado en pintura de la estructura metálica de los 4 bloques intervenidos, se solicita el retiro de soportes metálicos existentes en bloque #12.

Arq Alejandra Angarita
R. Interventoría C.716

19-Sep 2023 clima seco.
Recursos humanos: SST, maestro, Residente, 3 oficiales, 7 ayudantes, 1 soldador.
Actividades Realizadas: Se inicia la excavación de circulación frente a baños y porteria a bloque #13 frente a cancha, continua con encofrado en bloque #11 e instalación de ventanas en el mismo bloque e instalación de malla electrosoldada en zona de circulación entre bloques 11 y 14. continua con la compactación de recebo en circulación frente a bloque 11.
Se realiza toma de densidades en las circulaciones entre bloques. y se instala remate de cubierta en bloque 13 y 14.
Se requiere las camisas para toma de muestras de concreto y mejorar rendimiento en obra. Nota: Se realiza inspección por parte de [redacted] obra con sonda con camara caja inspección
Arq. Alejandra Angarita bachillerato.
R. Interventoria C.T.S.

20-Sep-23 clima Nublado.

Recursos humanos: SST, maestro, residente 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 soldador.

Actividades Realizadas: se da inicia a la fundida de anden entre bloques 11 y 14. se continua con la actividad de remate de cubierta en bloque 11 e instalacion de ventanas, se tomaron 3 muestras de concreto del anden de circulacion entre bloques 11 y 14. Continua con la instalacion electrica en aulas del bloque #14. Se requiere terminar la instalacion de piso en granito en aula 4 bloque 11 e instalacion general de granito en aula y bocacercas.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria C-116.

baños del primer piso, se finalizan actividades en biblioteca y se realiza fecha de entrega viernes 25 de Agosto.

Arq. Alejandra Angarita. R. Interventoría.

Jueves 17 de Agosto de 2023.

Personal: 1 Inspector de obra, 2 Oficiales

Se realiza actividad de fundido de piso en baño de niñas y niñas del primer piso

Arq. Alejandra R. Interventoría.

Viernes 18 de Agosto de 2023

Personal: 1 Inspector de obra, 2 Oficiales

Se realiza actividad de fundido de alistado de baño de niñas y niños en el area de primer piso, llega material de tubería a obra.

Arq Alejandra Angarita R. Interventoría.

Sabado 19 de Agosto 2023.

Personal: 1 Inspector de obra, 2 Oficiales.

Se realiza actividad de instalación sanitaria y de presión en el area de los baños del primer piso.

Arq. Alejandra Angarita R. Interventoría

Domingo 20 de Agosto de 2023.

Personal: 1 Inspector, 1 Oficial.

Se realiza actividad de enchape en baños del primer piso. Se requiere mejorar el estado del piso en biblioteca

R. Interventoría

Lunes 21 de Agosto de 2023.

Personal: 1 Inspector de obra, 2 Oficiales.

Se realiza actividad de enchape en baños del primer piso, se instalación griferia en baños del segundo piso.

Se requiere mejorar estado de piso en biblioteca

Arq. Alejandra Angarita R. Interventoría.

Martes 22 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante
Se realiza actividad de henchape en el area de baño del primer piso.
R/ Interventoría

Miercoles 23 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante
Se continua con actividad de enchape en area de los baños del primer piso.
R/ Interventoría

Jueves 24 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Se realiza actividad de enchape en area de los baños del primer piso.
R/ Interventoría.

Viernes 25 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Se realiza actividad de enchape en area de los baños del primer piso.
R/ Interventoría

Sabado 26 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Se realiza actividad de enchape en baños del primer piso, se realiza un ajuste a los baños del segundo piso.
R/ Interventoría

Domingo 27 de Agosto de 2023.
No se realiza actividad en obra, día festivo.
R/ Interventoría

Lunes 28 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Se realiza actividad de enchape en area de los baños del primero piso.

R. Interventoría

Martes 29 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Se realiza actividad de enchape en area de baños del primer piso.

R. Interventoría

Miercoles 30 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Se inicia actividad de pintura en techo y muros de baño de niñas del primer piso.

R. Interventoría

Jueves 31 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Se realiza actividaad de pintura en techos y muros de baños del primer piso.

R. Interventoría

Viernes 1 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante, 2 Initaladores de divisiones, 1 Electrico
Se inicia la instalación de divisiones en baños de niñas, se realiza actividad de pintura en baños, se instalan nueva griferia, Se inicia actividad electrica en baños del primer piso.

R. Interventoría

Sabado 2 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Oficiales, 2 Instaladores de divisiones
3 Instaladores de cubierta
Se realiza actividad de enchape en el area de los baños del primer piso, se realiza actividad de pintura en puertas de los baños del segundo piso, se continua con actividad de instalación de divisiones de baño en primer piso.

R/ Interventoria

Domingo 3 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Oficiales.
Se finaliza actividad de enchape del baño del primer piso.

R/ Interventoria

Lunes 4 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 2 Instaladores de divisiones
3 Instaladores de cubierta.
Se realiza instalación de puertas del segundo piso, se continua con actividad de instalación de divisiones en los baños

R/ Interventoria

Martes 5 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obras, 2 Instaladores de divisiones.
Se realiza actividad de instalación de divisiones de baño en el area de los baños del primer piso.

R/ Interventoria

Miercoles 6 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Instaladores de (cubierta) divisiones
Se realiza actividad de instalación de divisiones de baño en el area del primer piso.

R/ Interventoria.

Miercoles

Jueves 7 de Septiembre de 2023.

Personal: 1 Inspector de obras, 2 Instaladores de divisiones.

Se realiza actividad de instalación de divisiones de baño en area del baño del primer piso.

R. Interventoría

Viernes 8 de Septiembre de 2023.

Personal: 1 Inspector de obra, 1 Instalador de divisiones

Se realiza actividad de instalación de divisiones de baño en area del primer piso.

R. Interventoría

Sabado 9 de Septiembre de 2023.

Personal: 1 Inspector de obra, 1 Instalador de divisiones.

Se realiza actividad de instalación de divisiones de baño en area del primer piso.

R. Interventoría

Domingo 10 de Septiembre de 2023.

No se realiza actividad en obra, día festivo.

R. Interventoría

Lunes 11 de Septiembre de 2023.

Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.

La interventoria solicita que se subsanen las observaciones presentadas en los baños del 3, 2 piso y dar cumplimiento de entrega final el dia 18/09/2023.

Arq. Alejandra Angarita

R. Interventoría OTK

Martes 12 de Septiembre de 2023.
Personal: 2 Inspectores de obra, 1 Instalador de divisiones, 2 Ayudantes
Se realiza entrega de 3er y 2do piso junto con interventoria de los baños con gran satisfacción por parte de la institución se continua con la instalación de divisiones en el primer piso. y se realiza recogida de teja en alberto

Arq. R. Interventoria

Miercoles 13 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Instalador de divisiones
Se realiza actividad de instalación de divisiones en area de baños del primer piso.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria.

Jueves 14 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta, 1 Instalador de divisiones, 2 Instaladores de mesones
Se realiza actividad de instalación de mesones, divisiones y pie de amigos en area de los baños del primer piso.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria.

Viernes 15 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta, 1 Ayudante, 1 Instalador de divisiones.
Se realiza recogida de Teja en alberto en el area de la cubierta y recogida de basura. Se realiza actividad de pintura de marcos y puertas del primer piso del baño, se inicia actividad de instalación de sanitarios, se continuo con instalación de divisiones.

Arq. Alejandra Angarita R. Interventoria

Sabado 16 de Septiembre de 2023
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Oficiales, 4 Instaladores de cubierta
Se realiza instalaciones de puertas en el area de los baños del primer piso, se continua instalación de sanitarios.

Domingo 17 de Septiembre de 2023.
No se realiza actividad en obra, día festivo.
R. Interventoría.

Lunes 18 de Septiembre de 2023.
Clima: Nublado.
El día de hoy se programo entrega de los baños del 1, 2, 3 piso y biblioteca, donde la interventoría evidencia observaciones en los baños del primer piso a saber:

- Baño niños:
  - Presenta filtración en el desagüe de los tres orinales.
  - Existe un sanitario que no descarga bien.
  - Se requiere retoque de pintura en los pie de amigos
  - pendiente instalar sifones
  - Pendiente instalar interruptores en baño y pasillo.
  - pendiente mejorar acabados en pintura.
  - pendiente mejorar acabado en filo de ventana
- Baño Niñas:
  - cambiar 3 llaves de lavamanos ya que no son de la misma referencias que se encuentran instaladas en los demás baños.
  - se requiere retoque de pintura en pie de amigos.
  - pendiente instalar interruptor. e instalados sifones.
  - pendiente mejorar acabado de pintura en placa.
  - pendiente mejorar acabado en filo de ventana.
  - Arreglar filtración en desagüe de un lavamanos.
- cuarto de ASEO:
  - pendiente instalar lámpara
  - pendiente instalar interruptor, mejorar pintura.

Arq. Alejandra Angarita R. Interventoría.

Martes 19 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 2 Electricos
Se realiza la instalación de los interruptores faltantes (5), tambien se instala lavamanos en baño de profesores, se realiza detalles de pintura. Se instalan los sifones de piso en baños del primer piso

R/ Interventoria C.T.G

Miercoles 20 de Septiembre de 2023
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial
Se subsanan las observaciones hechas a los trabajos hechos en el primer piso.
La interventoria evidencia que la puerta del baño del primer piso en baño de niños no cierra bien pendiente instalar pelicula de seguridad de las ventanas en los baños 1, 2, 3 piso.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria

Se aclara con interventoria que el tema de la puerta no fue una actividad de daño ya que al demoler el muro para instalar la ventana perdia la sostenibilidad el marco.

22-A 15-Agosto-2023	Se subsanan las observaciones entabladas por interventoria y se subsanan las afectaciones causadas por la I.E. Mediante acta de Comité consorcio MINGP aclara que ya se finalizó la intervención contemplada en el alcance contractual en el área de la cancha, y subsanadas todas las observaciones emitidas por Interventoría. Se recuerda que el mal uso y/o afectación que sea causada será responsabilidad de la institución pues ya no habrá personal en obra y se tiene un cerramiento, así mismo se solicita a interventoría recibir el área intervenida para habilitar el área al uso de la I.E Interventoría programa entrega el día 16/08/23 a las 8:00 a.m.
3-A	Interventoría manifiesta que no fueron subsanadas todas las observación tanto en pintura de la cancha como en pintura de los arcos, quedando pendiente de igual forma desintalar o el retiro de los adesivos del marco de las personas. Yovany T.
16-Agosto-2023	Se realiza comité de obra en donde se realiza entrega a satisfacción de todas las áreas intervenidas a interventoría, la I.E no hará recibo ni habilitará hasta recibir directamente de la SED. Sin embargo se deja el cerramiento y se espera a programación de la SED. y Yovany T.
4-A 22-Agosto-2023	El día 22 de agosto se reunen en la I.E. Interventoría, Arq. Hugo Trigos de SED y rectora de la institución en donde fue la visita la SED y la interventoría solicitan a contratista pintar de azul la alfagia del cuarto de refrigeros y hacer aseo al área asignada como bodega. Tambien solicitan incluir en el alcance contractual una excalla de acceso a la cubierta. y reprogramon entrega para el día 24/08/23 a las 8:00

líder:

Powered by CamScanner

23-Agosto-23	Se realiza aseo y se pinta altagia de cuarto de refrigerio. Jovany T.
24-Agosto-23	Contratista se presenta para la entrega del frente de obra de SED a la Institución acorde a Compromisos asumidos por las partes el día 22/8/23, pero SED no se presenta. Jovany T.
25-Agosto-23	Se realiza entrega de Manual de Mantenimiento, Recomendaciones de uso y fichas técnicas de las obras ejecutadas se firma acta de entrega final del frente de obra con SED, interventoría y Contratista a la Institución Educativa. Se retira el cerramiento y se habilitan los espacios para las actividades propias de la Institución. Interventoría reitera que queda pendiente la realización de la escotilla de inspección de cubierta en un area de los sabores. y del mismo modo se reitera el retiro de los adesivos en el marco de las persianas queda pendiente. Jovany T.

Powered by CamScanner

Martes 15 de Agosto
No se realizan actividades de obra

Yovany T.

Miercoles 16 de Agosto
No se realizan Actividades de obra

Yovany T.

Jueves 17 de Agosto
No se realizan actividades de obra

Yovany T.

Viernes 18 de Agosto
No se realizan actividades de obra

Yovany T.

Sabado 19 de Agosto
No se realizan Actividades de obra

Yovany T.

Domingo 20 de Agosto
No se realizan Actividades de obra

Yovany T

Lunes 21 de Agosto
No se realizan Actividades de obra

Yovany T

Martes 22 de Agosto

Yovany T.

Se realizo: la actividad, de medir las puertas del comedor, de administración y de biblioteca los ornamentadores: Personal 2

Powered by CamScanner

Miercoles 23 de agosto
Se inicia fabricacion de puertas, no se realizan actividades en obra.
Yovany T

Jueves 24 de agosto
No se realizan actividades en obra.
Yovany T.

Viernes 25 de agosto
No se realizan actividades en obra
Yovany T.

Sabado 26 de agosto
No se realizan actividades en obra.
Yovany T.

Domingo 27 de agosto
No se realizan actividades en obra.
Yovany T.

Lunes 28 de agosto
No se realizan actividades en obra
Yovany T.

Martes 29 de Agosto
No se realiza actividades en obra
Yovany T

Miercoles 30 de Agosto
No se realiza actividades en obra Yovany T.

Powered by CamScanner

Jueves 31 de Agosto
No se realizan actividades en obra

Viernes 1 de Septiembre
No se realizan actividades en obra

Sabado 2 de Septiembre
No se realizan actividades de obra

Domingo 3 de Septiembre
No se realizan actividades de obra

Lunes 4 de Septiembre
No se realizan actividades de obra

Martes 5 de Septiembre
No se realizan adividades de obra

Miercoles 6 de Septiembre
Llegada de Puertas y Marcos a la institución e
Instalación de Puertas y marcos en el Area de biblioteca

Powered by CamScanner

Jueves 7 de septiembre
se realiza el desmonte de la puerta principal del bloque administrativo y se instala los vidrios delas puertas del bloque de biblioteca y del bloque administrativo, se entrega las puertas desmontadas a la institución. del bloque administrativo y de biblioteca. lo cual la institución al cerrar cierra duro la puerta y afecta un vidrio Instalado.

Yovany T.

Viernes 8 de Septiembre

Se realiza el desmonte de la puerta principal en el Area del comedor y se le entrega a la institución. de igual manera se inicia la instalación de la puerta y la instalación de lo vidrios. Se deja Constancia la instalación del vidrio y el funcionamiento.

Yovany T.

Sabado 9 de Septiembre

- No se realizan actividades de obra.

Yovany T.

Domingo 10 de Septiembre

- No se realizan actividades de obra.

Yovany T.

Lunes 11 de Septrembre.

- No se realizan actividades de obra

Yovany T.

Martes 12 de Septiembre
La institución daño un vidrio en el área del comedor lo cual el contratista sella la parte que se afecto el vidrio

Yovany T.

Miercoles 13 de Septiembre
No se realizan actividades en obra

Yovany T.

Jueves 14 de Septiembre
se realiza la instalación del vidrio afectado por la institución lo cual se le aplica la silicona alrededor del vidrio sellando cualquier afectacion, se le hace la solicitud a la institución dejar que se seque bien la silicona.

Yovany T.

Viernes 15 de Septrembre
No se realizan actividades de obra

Yovany T.

Sabado 16 de Septiembre
No se realizan actividades de obra.

Yovany T.

Domingo 17 de Septiembre
No se realizan actividades de obra

Yovany T.

Lunes 18 de Septiembre
No se realizan actividades de obra

Yovany T.

Powered by CamScanner

Martes 19 de septiembre
No se realizan actividades en obra Yovany T.

Miercoles 20 de septiembre
No se realizan actividades en obra Yovany T.

Fecha: Viernes 18 de Agosto 2023
clima: llovizna
personal operativo: 1 maestro, 1 oficial
3 ayudantes.
se inicia a fundir la placa en segundo piso de baterías de baños utilizando steel deck, continua con la instalación de tubería EMT 3/4" en segundo piso del bloque #3.
Se requiere aumentar el personal de obra y tener en sitio todos los materiales para evitar más atrasos en obra.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría CTIG.

Arq. Sebastian Rivera
R. Consorcio PIG

Fecha: Sábado 19 de Agosto 2023.
Clima: Nublado en el día y seco por la tarde.
Personal operativo: 1 oficial, 4 ayudantes
continuan con instalación de tubería EMT 3/4" en bloque #3 e instalación de tablero de 12 circuitos.
Se requiere realizar aseo general en obra y aumentar el personal, se requiere 4 ayudantes de maestras de concreto bloque #2

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría CTIG.

Arq. Sebastian Rivera
Res Obra Consorcio PIG

Fecha: Domingo 20 de Agosto 2023.
Día no laboral

Arq. Alejandra Angarita R. Interventoría CTIG

Fecha: lunes festivo 21 de Agosto 2023
Personal operativo: 1 oficial, 2 ayudantes.
clima: Nublado.
continuan con la fundida de placa con fibra en bloque #3 segundo piso - Aula Multiple
se aclara que dicha placa tiene diferentes espesores
En obra no se cuenta con arena para terminar de fundir la placa en aula multiple.
Se requiere al contratista de obra aumentar el personal, mejorar el rendimiento, aseo general y resultado de Muestras de concreto de los elementos estructurales del bloque #2 (Bateria de baños)

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria C.T.I.S.

Arq Sebastian Rivera
Res Obra Consocio PDG

Fecha: Martes 22 de Agosto 2023
Personal Operativo: 1 Oficiales 2 ayudantes
Se realizó armado de refuerzo de columnas en Bloque #2 piso 2. Se acuerda dejar las tres columnas frontales de 2,80 m de altura y las tres columnas posteriores de 3,00 m de altura.
Nota: Se solicita resultados de ensayo de laboratorio

Arq Alejandra Angarita
R. Interventoria
C. T.I.S

Arq Sebastian Rivera
Res Obra Consocio PDG

Fecha: 23 de Agosto 2023.
clima: soleado.
Personal operativo: 1 oficial, 3 ayudantes
Se realiza la fundida de alistado en área multiple espesor 7 cm, se continua con instalacion de mamposteria en bloque #2 (Bateria de baños). Actualmente se encuentra suspendida parcialmente la actividad de fachada muro falso en bloque #3, se reitera al contratista el A.P.U. especificaciones técnicas y detalles constructivos de esta fachada ya que proponen en lámina galvanizada y no en lámina en fibro cemento como lo habian planteado inicialmente. Se requiere mejorar rendimiento en obra y resultados de ensayos de las muestras de concreto Bloque #2.

Arq. Alejandra Angarita R. Interventoría C.T16 — Arq Sebastian Rivera Res Obra Consorcio PBG

Fecha: 24 de agosto 2023
clima: soleado
Personal operativo: 2 oficiales, 3 ayudantes
continua con la instalación de mamposteria en bateña sanitarias (segundo piso).
Continua con pañete de baño profesores bloque #2 bateña de baño 1 piso. se solicita al contratista la revisión y corrección de los traslapos del acero en columnas del segundo nivel de bateria de baños ya que no cumple con la unión entre estos, se requiere mejorar rendimiento de obra. y que el personal cuenta con dotación y epp.

Sebastian Rivera Vs Res Consorcio PBG

Arq. Alejandra Angarita R. Interventoría

Fecha: 25/08/2023 Viernes
clima. seco.
Personal operativo: 1 Oficial, 4 ayudantes
continua con instalación de mampostería en bloque #2 (Batería de baños) 2 piso y pañete en muros en 1 piso del mismo bloque.
La interventoría solicita resultados de ensayos de laboratorio de los elementos estructurales del bloque #2, A.p.U de fachada en muro falso en bloque #3, modulación de aula múltiple.
Se requiere aumentar el personal, ya que no se evidencia avance en obra.

Residente Obra
Arq Sebastián Rivera

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria C.T.I.G.

Fecha: sábado 26/08/2023
clima: seco.
Personal operativo: 1 oficial, 4 ayudantes.
continua con la instalación de mampostería en bloque #2 segundo piso y pañete en primer piso del mismo bloque.
NO se evidencia suficiente avance y las demás actividades no se estan ejecutando alternamente a saber:
① Instalación de porcelanato gris en circulaciones
② Instalación de puertas y ventanas.
③ Finalización de instalación eléctrica Tubería EMT
④ Instalación de barandas.
⑤ Instalación de pérgola frente en entrada de la institución.

⑥ Pulida de pisos en granito e instalación de guardaescoba, dilataciones en bronce en bocapuesta.
⑦ A.P.U de fachada, muro falso en bloque #3 - Aula múltiple, especificaciones técnicas y detalle de instalación con referencia a estructura metálica instalada.
⑧ Contar en obra con materiales, equipos y herramientas para evitar más atrasos en obra.
⑨ Se requiere camisas, mínimo tres unidades para la toma de muestras de concreto de elementos estructurales
⑩ Se requiere aumento del personal, y con más frecuencia la presencia del profesional SST y Residente de obra.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría C.T.I.G.

Residente Obra
Arq Sebastian Rivera

Fecha: Domingo 27/08/2023.
Día no laborable.

Arq. Alejandra Angarita R. Interventoría.

Residente Obra
Arq Sebastian Rivera

Fecha: Lunes 28/08/2023.
Clima: Soleado. Personal Operativo: 4 oficiales, 2 ayudantes
Se continua con la instalación de mampostería, 2 piso bloque # 2 y pañete en 1° piso del mismo bloque.
Se reitera el aumento del personal y cumplir con las observaciones realizadas mediante acta libro del día 26/08/2023.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría

Residente Obra
Arq Sebastian Rivera

Fecha: Martes 29/08/2023
Clima: seco.
Personal operativo: 2 oficiales, 3 ayudantes, 3 soldadores, 3 eléctricos.
Continua con la instalación de mampostería bloque #2 e inicia instalación de muro en mampostería estructural en bloque #1.
Se requiere mejorar rendimiento en obra y realizar actividades simultaneas.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría.

Residente Obra
Arq Sebastian Rivera

Fecha: Miercoles 30/08/2023
Clima: seco.
Personal operativo: 2 oficiales, 3 ayudante. 2 mamposteros, 3 eléctricos, 3 soldadores.
Continua con la instalación de mampostería en bloque #2 y bloque #1.
Continua con la instalación de cableado eléctrico en aulas del bloque #1
Se requiere en obra contar con todos los materiales, cilindros para la toma de muestras de concreto de los elementos estructurales del bloque #2, si no se cuenta con las camisas para toma de muestras la interventoría suspenderá la actividad de fundida de columnas del bloque #2- Batería de baños.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría.

Residente Obra
Arq Sebastian Rivera

Observaciones interventoria - componente ambiental: Se solicita al lider opical de obra civil realizar jornada de orden y aseo (ubicar madera en un solo sitio, recoger bolsas - empaques de cemento, proteger acopios de material petreo) todas las solicitudes se realizaron. Se revisaron recibos del retiro de la unidad sanitaria ultimo aseo 26 Agosto 2023. Se organizo el punto ecologico con los 3 conenes (blanca - negra - verde), se solicita al contratista mantener las condiciones anteriormente mencionadas.

Ing. Ambiental y Sanitaria
Prof. Interventoria

Residente Obra
Arq. Sebastian Rivera

Fecha: Jueves 31/08/2023
Clima: Seco
Personal Operativo: 6 oficiales, 4 ayudantes, 2 mamposteros 3 soldadores.
Finaliza instalación de mamposteria de antepecho en salón de piso bloque 1, se realiza hormigonado de alfajía en antepecho salon bloque 1. Continua aplicación de revogue en muros de baños piso 1 bloque 2. Continua instalación de mamposteria en piso 2 bloque 1. Se realiza nivelación de huellas de escaleras de circulación piso 1 bloque 1. Se realiza toma de muestras de concreto correspondientes al hormigonado de columnas piso 2 bloque 2. Aplicación de pintura anticorrosiva sobre estructura metalica fachada de piso 2 bloque 3.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria OTV

Residente Obra
Arq Sebastian Rivera

Fecha: Viernes 1/09/2023
Clima: Seco
Personal Operativo: 3 Oficiales, 4 ayudantes, 3 soldadores, 2 mamposteros.
Continua aplicación de pañete sobre muros de piso 1 Bloque 2, se realiza encofrado y hormigonado de columnas piso 2 bloque 2. Inicia instalación de estructura para techo pvc en salón piso 1 Bloque 3. Inicia instalación de mampostería para muro y antepechos en salón piso 1 Bloque 1. Continua instalación de estructura metálica para cubierta en salón piso 1 bloque 1.

Residente Obra
Arq Sebastian Rivera

R. Interventoria.

Fecha: Sabado 2/09/2023
Clima: Seco
Personal Operativo: 3 oficiales, 4 ayudantes, 2 mamposteros
Continua aplicación de pañete muro exterior bloque 2, inicia demolición de placa para ampliación de caja de inspección sanitaria frente a baños de piso 1 bloque 2, pasa de 0.60m x 0.60m a 1.00m x 1.00m. Se realiza hormigonado de última columna de piso 2 bloque 2. Finaliza instalación de mampostería en muro salon bloque 1 piso 1. Finaliza instalación de estructura metalica para cubierta sobre este mismo salón. Continua instalación de estructura para techo PVC en salón de piso 1 bloque 3. Continua destronado de piso granito en salón piso 2 bloque 3.
La interventoria solicita apo de fachada muro falso y de columnas y resultado de ensayo de laboratorio del concreto

Residente de Obra
Arq Sebastian Rivera

Arq Alejandra Angarita
E Interventoria C.T.C

Fecha: 4/9/2023
Clima: Seco
Personal Operativo: 3 oficiales, 3 ayudantes, 3 soldadores, 1 pulidor de piso 1 Carpintero metálico.
Continua aplicación de Encape sobre muros exteriores de bloque 2.
Inicia instalación de estructura metálica para cubierta de bloque 2.
Continua instalación de estructura para techo pvc en salón piso 1 bloque 3 donde también se realiza la instalación de tubería para red eléctrica. Finaliza demolición de placa y viga encontrada para la ampliación de caja de inspección sanitaria.
Continua instalación de mampostería en bloque para muros divisorios de baños piso 2 bloque 2. Inicia destroncado de piso en salón de piso 1 bloque 3.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría

Residente de Obra
Arq Sebastian Rivera

Fecha: 05/09/23

Se evidencia personal fumando dentro de la obra, lo cual se le recomienda al contratista tomar medidas pertinentes para evitar que se siga presentando dicho suceso.

Erick Ramirez SST interventoria

La interventoría solicita que no se vuelva a presentar dicho inconveniente manifestado por SST, o de lo contrario se retirara el personal.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría

Residente Obra
Arq Sebastian Rivera

Fecha: 06 Septiembre 2023.
Clima: Soleado.
Personal: Inspector de obra
Personal Operativo: 2 oficiales 3 ayudantes.
Se continua pañetando el segundo nivel en batería de baños, e instalación de PVC en cielo raso en primer piso del bloque # 3.
Se continua con instalación de cableado eléctrico en bloque #1 segundo piso.
La interventoría reitera que se deben realizar actividades simultaneas para dar cumplimiento a la entrega del colegio el día 15 de octubre de 2023.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría C.T.G.

Residente de Obra
Arq. Sebastian Rivera

Fecha: 07 Septiembre 2023
Clima: Seco
Personal Operativo: 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 inspector
Se continua pañete muros segundo piso batería de baños y se realiza filos en escaleras, se funde alfagia en aula 8 en Bloque 1 segundo piso, instalación tubería Emt en área múltiple, e instalación de cielo raso en pvc en aula 1 bloque #3 primer piso se requiere orden en obra

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría C.T.G.

Residente Obra
Arq Sebastian Rivera

Fecha: 08 Septiembre 2023.
clima: Seco.
Se continua con pañete en segundo piso en zona batería de baño e instalación tubería EMT, instalación cielo falso en aula 1 bloque #3 e inicia la fabricación de barandas en sitio.

Arq. Alejandra Anganita
R- Interventoría T-76

Residente Obra
Arq Sebastian Rivera

Fecha: 09 Septiembre 2023
Clima: Seco.
Personal operativo: 3 oficiales, 5 ayudantes.
continua con la instalación de mampostería en segundo piso bloque #1, continua con pañete segundo piso bloque #2, continua con instalación EMT 1"
Se requiere mejorar avance de obra para dar cumplimiento a la fecha de entrega 15/octubre/2023.
Se requiere resultados de ensayos de laboratorio de los elementos estructurales:

Arq. Alejandra Anganita
R. Interventoría

Residente Obra
Arq Sebastian Rivera

Fecha: 10 Septiembre 2023
Domingo día no laborable.

Arq. Alejandra Anganita R-Interventoría

Fecha: 11 Septiembre 2023
Clima: seco.
Personal Operativo: 2 oficiales, 2 ayudantes
2 soldadores
Inicia la actividad de porcelanato en circulaciones segundo piso Bloque 1
instalación de alistado en zona de escaleras y continua instalación de pared, pintura de estructura metálica en área administrativa, fundida de mocheta de baño segundo piso, desmoldes de enchape en aula 2 piso 1 bloque #3.
Se requiere resultados de muestra de concreto enviada a laboratorio, y el certificado de calidad de los materiales.

Arq. Alejandra Angaña
R. Interventoría C-116.

Residente Obra
Arq Sebastian Rivera

Fecha: 12 Septiembre 2023
Clima: seco
Personal Operativo: 3 oficiales, 2 soldadores, 1 ayudante
continua con la instalación de piso en porcelanato en zona de circulación, segundo piso bloque #1, continua con la fabricación de barandas en sitio, se realiza encorozado en zona de baños segundo piso e instalación de la teja tipo sandwich en zona de administración
~~Humigonado~~ ~~columnetas~~

Arq. Alejandra Angaña
R. Interventoría C-116.

Residente Obra
Arq Sebastian Rivera

Fecha: 13 Septiembre 2023
Clima: Seco
Personal Operativo: 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 2 soldadores cubierta.
Finaliza instalación de teja tipo sandwich en salon piso 1 bloque 1 con remates e impermeabilización, avanza aplicación de pintura sobre estructura de cubierta salón piso 1 bloque 1. Inicia instalación de tubería para estructura metalica de cubierta piso 2 bloque 2. Inicia instalación de canal para cubierta piso 2 bloque 2. Se realiza fundida de macheta en concreto para puerta de acceso baño piso 1 bloque 3.
Se requiere resultados de ensayos de laboratorio.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria GTIS

Residente Obra
Arq. Sebastian Rivera

Fecha 14 Septiembre 2023
Clima: Mañana lluviosa, tarde seca
Personal Operativo: 3 Oficiales 3 Ayudantes 1 Soldador
Finaliza instalación cubierta tipo sandwich bloque 2, avanza aplicación de estuco y resane de muros salón piso 2 bloque 3, Finaliza instalación de mamposteria para remate en cubierta salón piso 1 bloque 1. Inicia instalación red sanitaria baño placa piso 2 bloque 2. Avanza pulida soldadura de barandas. Finaliza instalación de ceramica piso pasillo circulación piso 2 bloque 1.

Residente de Obra
Arq. Sebastian Rivera

Fecha: 15 de Septiembre de 2023
Clima: Seco
Personal Operativo: 3 Oficiales 3 ayudantes
Continua aplicación de estuco y pintura salón piso 2 bloque 3. Se evidencia multiples detalles en la aplicación de estuco sobre muros que no pueden ser subsanados con lija por lo que es necesario realizar la aplicación de otra mano. Instalación de estructura y lamina de fibrocemento en dintel salón piso 1 bloque 1. Continua instalación de tubería sanitaria en baños de piso 1 y 2 de bloque 2

Residente Obra
Arq Sebastian Rivera

Arq. Alejandra Angarita R. Interventoria.

Fecha 16 de Septiembre 2023.
Clima: Seco.
Personal operativo: 2 oficiales, 4 ayudantes.
Se finaliza actividad de instalación de cubierta tipo sándwich en bloque #2 Cafetería de baños se continua con la instalación de tubería sanitaria en bloque #2 e instalación de porcelanato en circulación del segundo piso en bloque #1
Se requiere mejorar rendimiento en obra, y los resultados de ensayos de laboratorio de los elementos estructurales.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria C.T16.

Residente Obra
Arq Sebastian Rivera

Fecha 17 de Septiembre de 2023
Dia Domingo no se labora

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria.

Residente Obra
Arq Sebastian Rivera

Fecha: lunes 18 de Septiembre de 2023
Clima: Seco.
Personal Operativo: 1 Oficial, 3 ayudantes
continua con la instalación de tubería sanitaria en bloque #2 Batería de baños, y sacando filos en dintel en segundo piso de batería de baños e instalación de porcelanato en circulación del segundo piso bloque # 1.
Se requiere los resultados de ensayos de laboratorio de los elementos estructurales, certificado de calidad de materiales y rendimiento en obra, ya que el colegio debe ser entregado para el 15/oct/2023.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría CTI6.

Residente Obra
Arq. Sebastian Rivera

Fecha: Martes 19 de Septiembre 2023.
Clima: Nublado.
Personal operativo: 1 oficial, 4 ayudantes.
El día de hoy inicia la instalación de lámina en fibrocemento en zona de área multiple, y continua con la fabricación de puertas y detalle de filo de muros en segundo piso batería de baños, a la fecha la interventoria evidencia que la estructura metálica no esta bien pintada ocasionando que al realizar esta actividad después de que se encuentra instalada la cubierta y tubería Emt se manchen dichos elementos, se requiere mejorar rendimiento en obra, el orden y aseo.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría CTI6.

Arq. Sebastian Rivera
Residente Obra

Fecha: Miercoles 20 septiembre 2023
Clima: Seco - lluviena
Personal Operativo: 2 Oficiales 2 Ayudantes 2 soldadores 2 Estucadores
Finaliza instalación de laminas de Fibrocemento en aula multiple y procede a realizar remates con estuco. Continua fabricación de barandas y puertas. Inicia instalación de red hidraulica en baños mujeres piso 1 bloque 2 y baños mujeres piso 2 bloque 2. Se realiza replanteo de ubicación estructura plataforma circulación para baños piso 2 bloque 2. Inicia resane de muros para estuco en aula multiple piso 2 bloque 3.
Se requiere resultados de ensayos del concreto e instalación de Ventanas.

Ing Sebastian Rivera
Residente Obra

Arq. Alejandra Angarita
Interventoria C.T.I.C.

18-Agosto-2023
CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 2 oficiales, 4 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con mantenimiento de puertas de laboratorio de física, tecnología y biología. Instalación de pintura a mampostería mesones de laboratorios.
Trasiego interno de materiales.
OBSERVACIONES: Interventoría informa que la I.E. ya recibió el inmobiliario ubicado en biblioteca.

19-Agosto-2023
CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, Maestro, SST, 2 Oficiales, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Trasiego de escombros hasta área de ingreso para posterior retiro a botadero realizado. Se continua con pintura de mampostería en mesones de laboratorio.
OBSERVACIONES: Se solicita a Interventoría el detalle de la salida de gas a instalar en laboratorios. para proceder con la respectiva instalación.
Interventoría solicita a la S.E.D. definir la especificación de la salida de gas.

22-Agosto-2023
CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, Maestro, SST, 2 Oficiales, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia con instalación de teja española existente en biblioteca, se ha claridad de la existencia de cielo falso en PVC en biblioteca por tanto, se procede a la maniobrabilidad por la parte externa de biblioteca.

Powered by CamScanner

23-Agosto-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, Maestro, SST, Ornamentadores 2 Oficiales, 4 Ayudantes
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de pintura de muros mesones, Se continua con desmonte de teja esparcido existente en biblioteca. capa superior. ya que se identifica que en ver capa inferior hay teja de asbesto Cemento.

24-Agosto-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente Maestro, SST, Ornamentadores, 2 oficiales 4 Ayudantes
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con desmonte de capa superior de cubierta existente en biblioteca. Se continua mantenimiento de Puertas en laboratorios de física y biología.
Trasiego interno de materiales y escombros.
Se realiza acta de vecindad donde interventoria solicita a contratista subsanar las afectaciones causadas en la cubierta aledaña al retiro de teja.

25-Agosto-23 CLIMA: Parcialmente Nublado.
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, Maestro, SST, Ornamentadores, 2 oficiales 4 Ayudantes
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza desmonte de cubierta existente en área de biblioteca. Se realiza trasiego interno de materiales desde área de intervención hasta punto de acopio temporal.

Powered by CamScanner

25-Agosto-2023	CLIMA: Parcialmente nublado RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SSI, Maestro, Ornamentadores, 2 oficiales. HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con desmonte de teja tipo española capa superior en área de biblioteca. Se realiza instalación de pintura en muros laboratorio física: Trasiego interno de materiales. Al final de la jornada se instala plástico para cubrir las áreas expuestas en donde se está realizando el cambio de cobertura.
28-Agosto-2023	CLIMA: Lluvia intermitente RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SSI, Maestro, Ornamentadores, 2 oficiales HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza trasiego interno de materiales escombro desde punto de acopio hasta área de recogida por la volqueta. Se realiza instalación de pintura en aula de audiovisuales se inicia con replanteo para cuarto de fotografía en audiovisuales.

Powered by CamScanner

29-Agosto-23 CLIMA: Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, 2 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de estructura soporte cenizo superboard 10mm para cuarto fotografía en laboratorio de audiovisuales. Traslado interno de materiales desde área acopio teja tipo española hasta área de instalación.

30-Agosto-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, 2 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de teja tipo española en biblioteca. Se realiza desmonte de teja de asbesto cemento, capa inferior de la cubierta existente en biblioteca. Se continúa con construcción de cuarto de fotografía en laboratorio de audiovisuales

31-Agosto-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Ornamentadores 2 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de teja tipo española en área de biblioteca. Se continúa construcción de cuarto fotografía en Superboard 10mm muros doble cara.

Powered by CamScanner


1-Septiembre-2023 CLIMA: Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SSI, Maestro, Ornamentadores, 2 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación de teja española. Instalación de mesones en aleroinoxidable en laboratorios de química, física y se continúa con instalación de muros doble cara 10mm Superboard en laboratorio de auxiliares.

2-Septiembre-2023 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SSI, Maestro, Ornamentadores, 2 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de teja tipo española de 1,31m en biblioteca. Se realiza instalación de estuco y pintura en muros externos del cuarto de fotografía.
OBSERVACIONES: Se presenta lluvia de alta intensidad en horas de la tarde dificultó cuando se cubrió con plástico fue imposible la filtración al interior del área intervenida.

4-Septiembre-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SSI, Maestro, Ornamentadores, 2 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta Menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Traslado interno de teja tipo española desde portería hasta área de intervención atrás bloque biblioteca.
Se presentan lloviznas intermitentes por lo tanto se limita la instalación de cubierta.
OBSERVACIONES: Dichas las presentes lluvias y condiciones externas climáticas se ve comprometido el cielo falso y piso en área de Hall frente a biblioteca.

Powered by CamScanner

Tras revisión con interventoría se evidencia que la afectación ocurrida es por causa de las condiciones climáticas. Por tanto el cambio de cielo falso se incluirá en el alcance contractual y se estará a la espera de que SED defina que se hará con el piso. Cabe aclarar que el cielo falso venía afectarse incluso desde antes de iniciar intervenciones. Tal como se evidencia en acta de vecindad del día 24/07/23.

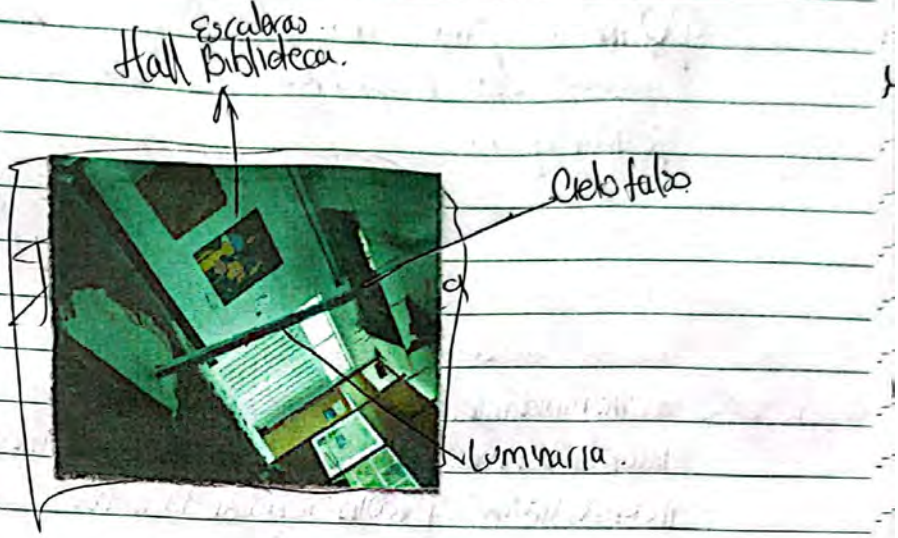

Durante recorrido junto con interventoría en el frente de obra se evidencia que en el bloque donde están ubicados los laboratorios de física, Biología y tecnología, OTIC de SED se encuentra desarrollando en paralelo al contrato de mantenimientos 2022 un contrato de instalación de Redes de voz y datos. Quienes en el curso de desarrollo de sus actividades mancharon los muros de laboratorios y corredor previamente estucados y pintados por Consorcio Mica GP. Se realiza acta de Comité con interventoría y el contratista, y OTIC en donde ellos (SED OTIC) se comprometen a subsanar las afectaciones efectuadas. Sin que esto genere inconvenientes al momento de la entrega y los días a intervenidas.

05 septiembre-23 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, 1 Maestro Ornamentadores, 2 oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de cobierta en teja tipo española en biblioteca. Se realiza traslado de material desde punto de acopio hasta área de intervención.
Se realiza demolición en muro de laboratorio de química para dirigir punto hidrosanitario para mesón de laboratorio audio visuales cuarto de fotografía.

06 septiembre-23 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, 2 oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con desmonte de cobierta existente capas superior e inferior en biblioteca.
OBSERVACIONES: Dadas las lluvias presentadas se ve afectado el cielo falso existente en Hall frente a biblioteca, en donde antes de iniciar intervenciones tal como se evidencia en acta de veracidad del día 24/08/23, el área sufría filtraciones que produjeron afectación a la estructura del cielo falso, por tanto el deterioro aunado a la constante lluvia ocasionaron que una sección del cielo falso se desprendiera, se cayó una luminaria la cual afectó el piso en madera existente.
Se realizó instalación de cerramiento para aislar el área que representa riesgo para quienes transiten, desde el día 4/09/23.

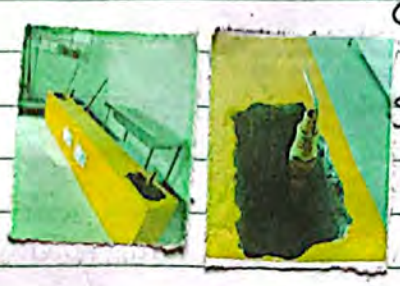


Foto Cerramiento

07 septiembre 25 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, 2 Oficiales,
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza trasiego de escombros desde punto de acopio de teja desmontada hasta área de retiro. en ingreso por Portería transporte. Se realiza instalación de celotex en cuarto de fotografía y de laboratorio audiovisuales.

8 septiembre 25 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, 2 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: se realiza instalación de pintura y ~~estuco~~ en muros de cuarto fotografía.
Se continua con desmonte de cubierta existente en biblioteca.

9 Septiembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, Peones
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de soldados de gas en laboratorio de química y en laboratorio de biología, acorde a lo definido por ESD, de intervención.



11 Septiembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de estuco y lijado para posterior instalación de pintura negra en área interna y blanco en anteros exteriores. Se continúa con desmonte de teja existente en biblioteca.

12-Septiembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa instalación de pintura negra en muros internos de cuarto: fotografía. Se realiza instalación de teja tipo española libre de asbesto en biblioteca.

Powered by CamScanner

13-Septiembre-23

CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Ornamentadores
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de teja tipo expanda, se realiza instalación de grifería en mesón de laboratorio de química para aprobación por parte de SSO y interventoría.
OBSERVACIONES: Se realizo comité de seguimiento con interventoría y SSO en donde se hace recorrido del frente de obra, se les expone la situación del cielo falso y piso del Hall frente a biblioteca. Se define instalar (por parte de SSO) en mesones con lavaplatos grandes llaves tipo industrial y la grifería instalada como muestra en mesones de 1,20 dejados contiguo a salidas de gas.

14-Septiembre-23

CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalacion de cubierta en biblioteca.
OBSERVACIONES: Se realiza visita con SSO e interventoria en lote frente al colegio Liceo femenino, denominado taller de bicicleta, para hacer revisión del alcance.

Powered by CamScanner

15-Septiembre-23

CLIMA: Parcialmente Nublado. Con lluvias intermitentes.
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro General, Ornamentadores
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de cobertura libre de cubierta tipo española en biblioteca.
OBSERVACIONES: Se solicita a la institución y a la interventoría habilitar el área de música para iniciar intervenciones contempladas

16-Septiembre-23

CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro General, Ornamentadores, 2 Oficiales 2 Ayudantes
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor, Pulmanillo
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación cubierta en biblioteca. Se realiza embalaje con cinipel de teja desmontada en biblioteca para hacer el retiro y disposición final de RCD's peligrosos. Se inicia demolición piso en música
OBSERVACIONES: Se realiza acta de recorrido del aula de música con interventoría para iniciar con la intervención del aula. Se le solicita a interventoría definición del alcance en el área de música, dado que no se tiene claridad con lo que está definido para tal área, entendiendo que se está realizando demolición de piso, pero dentro de música hay un cuarto entonces es imperativo definir si la intervención también se hará en dicho cuarto

18-Septiembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, 2 Oficiales 2 Ayudantes.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramientas y equipos menores, Rotomartillo
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza demolición de piso en aula música
Se inicia instalación de cielo falso en laboratorio de tecnología
Se continúa con instalación de cobierta en área de biblioteca

19 Septiembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Ornamentadores
2 Oficiales, 2 Ayudantes.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta y equipo menores rotomartillo
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de alistado de piso en aula de música. Se continúa con instalación de cubierta lámina galvanizada en biblioteca.
Se continúa con instalación de cielo falso en laboratorio de tecnología.
OBSERVACIONES: Tras la instalación de las salidas de gas en laboratorios de química y Biología se le informa a interventoría que la institución ya puede hacer la habilitación del servicio de gas para hacer las pruebas a las salidas instaladas pues se evidencia que está suspendida la línea que conecta al laboratorio de química y deben instalar el regulador en la parte externa del laboratorio de biología tal como estaba inicialmente.

Powered by CamScanner

20 septiembre 23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Oficiales, 3 Ayudantes, 2 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de canal en área de fachada posterior de biblioteca. Se realiza instalación de enchape de piso en madera, instalación cielo falso en tecnología.
OBSERVACIONES: Durante la instalación de canal en parte posterior de biblioteca se afecta un tubo de agua potable ubicado con la parte inferior a nivel de piso en huerta, y se realiza la subsanación del mismo



21 septiembre 23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Oficiales, 3 Ayudantes, 2 Oficiales
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de cubierta en biblioteca. Instalación de enchape de piso en madera, instalación de cielo falso en tecnología. Se realiza traslado de materiales desmontados desde biblioteca hasta punto de acopio temporal.

17-Agosto-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, 3 Ayudantes.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de base o bateo de piso de carcamo contiguo a fachada principal de 10cm
Instalación de B400 en área de cunchos multiples.

18-Agosto-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, 3 Auxiliares
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de Refuerzo para cárcamo contiguo a fachada, principal

19-Agosto-2023 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 3 Auxiliares
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con relleno y compactación de B-400 en área de zona peatonal contigua a caseta.

21-Agosto-2023 Clima Soleado
Recursos Humanos: ing Residente, SST, Maestro 2 OFICIALES, 2 Ayudantes.
Herramienta menor: Herramienta menor, Mezcladora Plancha vibradora tipo Rana.
Actividades Realizadas: se continua con Relleno y compactación de B400 en area de zona Peatonal continua a caseta. Yovany T.

Se realiza aseo de obra.

22/Agosto/2023 Clima Soleado
Personal en obra: Ing Residente, Sst, Maestro, 2 oficiales 2 Ayudantes: Herramienta menor; Herramienta menor Plancha Vibradora tipo Rana, Mezcladora.
Actividades Realizadas: Se Continua con Relleno y Compactación de B400 en area de zona Peatonal.

Yovany T.

23/Agosto/2023 Clima nublado
Recursos Humanos: Ing Residente, Sst, Maestro, 2 oficiales 2 Ayudantes, Herramienta menor: Herramienta menor Plancha Vibradora tipo Rana, Mezcladora
Actividades Realizadas. Se Continua con Relleno y Compactación de B400 en area de zona Peatonal.

Yovany T.

24/Agosto/2023 Clima nublado.
Recursos Humanos: Ing Residente, sst, Maestro, 2 oficiales 2 Ayudantes, Herramienta Menor: Herramienta Menor Plancha Vibradora tipo Rana, Mezcladora.
Actividades Realizadas. se Continua Con Relleno y Compactación de B400 en area de zona Peatonal.

Yovany T.

25/Agosto/2023 Clima Soleado
Recursos Humanos: ing Residente, sst, Maestro, 2 oficiales, 2 Ayudantes. Herramienta Menor: Herramienta Menor, Plancha Vibradora tipo Rana Mezcladora, Actividades Realizadas: se continua

Powered by CamScanner

Con relleno y compactacion de B400 en area de zona Peatonal.

Yovany T.

26/Agosto/2023 Clima Soleado
Recursos Humanos: Ing Residente, SST, Maestro 2 oficiales, 2 Ayudantes Herramienta Menor. Herramienta menor, Plancha Vibradora tipo Rana, Mezcladora, Actividades realizadas Se continua Con relleno y compactación de B400 en area de zona Peatonal.

Yovany T.

28-Agosto-2023 Clima Soleado
Recursos Humanos: Ing Residente, SST, Maestro 2 oficiales, 2 Ayudantes, Herramienta Menor Herramienta menor, Plancha Vibradora tipo Rana, Mezcladora, Actividades realizadas Se continua con relleno y compactación de B400 en area de zona Peatonal.

Yovany T.

29-Agosto-2023 Clima Soleado
Recursos Humanos: Ing Residente, SST, Maestro 2 oficiales, 2 Ayudantes, Herramienta menor Herramienta menor, Plancha vibradora tipo Rana, Mezcladora, Actividades realizadas Se continua con relleno y compactación de B400 en area de zona Peatonal.

Yovany T.

Powered by CamScanner

30-Agosto-2023 Clima Soleado
Recursos Humanos: Ing Residente, SST, Maestro 2 oficiales, 2 Ayudantes, Herramienta Menor Herramienta Menor, Plancha Vibradora, tipo Rana, Mezcladora, Actividades Realizadas Se Continua con relleno y Compactación de B400 en área de zona Peatonal, aseo de obra en areas intervenidas.

Yovany T.

31-Agosto-2023 Clima Soleado
Recursos Humanos: Ing Residente, SST, Maestro 2 oficiales, 2 Ayudantes, Herramienta Menor Herramienta Menor, Plancha Vibradora tipo Rana Mezcladora, Actividades realizadas.
Se Continua con relleno y Compactación de B400 en area de zona Peatonal, aseo en obra en Areas intervenidas.

Yovany T.

01 Sep/2023 Dia Soleado 2 ayudantes 2 oficiales en dord Se hace entrega a Ivan ; Almacenista de Colegio. de la placa con piso en caucho parque niños, Se recibe parcial de Colegio y de Interventoria, Se funde franja derecha interna carcamo y Sobado carcamo Costado derecho Superior. Se continua con actividades de aseo en area placoleta

Yovany T.

02 Sep 2023
Personal en obra. Dos oficiales + 2 ayudantes + 1 maestro de contratos con actividades de Encamado costado derecho en concreto; Expandida y compactación de recebo en area plazoleta.

Yovany T.

03 Sep 2023 Domingo
No se realizan Actividades


Yovany T.

09/Sep/23 En visita realizada, siendo las 8:15 am se encuentra el trabajador: Pedro Antonio Rosas, cc. 80.381.325, el cual se verifica y no cuenta con seguridad social, y tampoco con el ingreso correspondiente. Se notifica de inmediato al trabajador y es retirado de la Obra.
Así mismo, se pone en conocimiento la novedad a Angela Tarazona, jefe encargada.

Se realiza encofrado Encamado costado derecho en concreto Se esparce y compacta Recebo area plazoleta.

Yovany T.

05/Sep/2023
Dos oficiales + 2 ayudantes + 1 maestro
llovizna en la mañana, de 9:00 a 12 m
se continua con entramado y fundida Carcamo costado derecho
se continua con recebo extendido y compactación en área plazoleta
se recibira material en area plazoleta a fin de garuntizar y
desagüe y funcionamiento Carcamo costado derecho

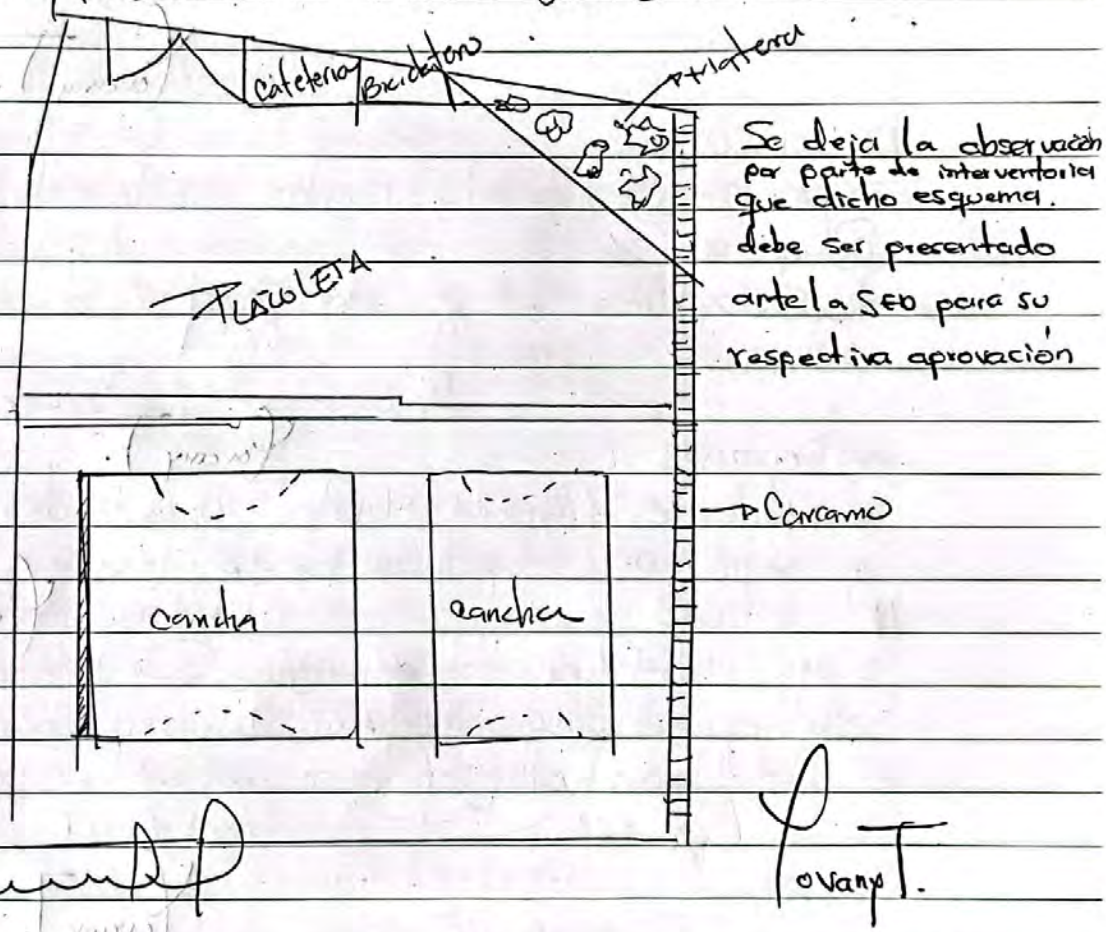

Se deja la observación por parte de interventoria que dicho esquema. debe ser presentado ante la SEO para su respectiva aprovación

Ovany T.

06/Sep/2023
3 ayudantes + 1 oficial + 1 maestro
Diligenciado se continua con excavación para instalación de Sanitarios 8': Se continua con Compactación recebo plazoleta; se suspende labor por lluvia a solicitud de Patricia

Sandra Pinzon

Ovany T.

Powered by CamScanner

07/Sep/2023
3 ayudantes + 1 oficial + 1 Maestro Día Soleado
Se socializa mediante acta la decisión de formar cuadrilla de mujeres en plazoleta entre intervenidas; contratista y Rector del Colegio; se continua con compactación en área de plazoleta.

Sandra Pinzon
Yovany T.

08/Sep/2023
3 ayudantes + 1 oficial + 1 Maestro Día Soleado
Se continua con compactación en área de plazoleta faltando tubería 8" para drenaje de 8"; se culmina pañada de cargamo.

Sandra Pinzon
Yovany T.

09/Sep/2023
3 ayudantes + 1 oficial + 1 Maestro Día Soleado
Se continua con compactación Recibo

Sandra Pinzon
Yovany T.

10/Sep/2023
3 ayudantes + 1 oficial + 1 maestro Día Soleado
Se funden 8 m³ Concreto para concreto sobre tubería 8"; Instalación malla para cargamo costado izq Cancha

Sandra Pinzon
Yovany T.

12/Sep/2023
3 ayudantes + 1 oficial + 1 maestro Día Soleado
Frente Cargamo costado izquierdo; y Placa en Se tiende malla para fundida placa costado derecho plazoleta / Se funde Cuneta frente derecho zona

Sandra Pinzon
Yovany T.

Powered by CamScanner

13/Sep/2023 Miercoles
3ayudantes + 1 oficial + 1x maestro
Se fundieron 2 paños sobre sector tubería 8"; Se formaleteca Cuneta, Costado izquierdo y 8vo Concreto Costado derecho plazoleta / Se efectua mechecatra en Cuneta Costado derecho 20ml.
Cancha Pidzño
Jovany T.

14 Sep/2023 Jueves
3ayudantes + 1oficial + 1maestro
Instalacion malla electrosoldada para fundida de placas costado derecho superior plazoleta paño 25.
Costado Cancamo izquierdo en cancha
Jovany T.

15/Sep/2023 Viernes
3 ayudantes + 1 oficial + 1maestro
fundida placa contrapiso en plazoleta paños 2 Costado derecho ~~izquierdo~~ superior / encofrado Cancamo; costado izquierdo en cancha
Jovany T.
Inicio fundicion tramo 1 Cancamo Costado izquierdo inferior Cancamo Cancha

16/Sep/2023 Sabado
3 ayudantes + 1oficial + 1maestro
Malla electrosoldada paños para concreto 3ra filas
Costado derecho Superior area plazoleta;
Jovany T.

17/Sep/2023 Domingo
No se realizan actividades
Jovany T.

18/Sep/2023 Lunes
3 ayudantes + 1 maestro + 1 oficial
Se encofra caracamo costado izquierdo superior
Se instala malla costado superior derecho linea 3.

Lovany T.

19/Sep/2023 4 postes
3 ayudantes + 1 maestro + 1 oficial
Se encofra caracamo costado izquierdo superior Cancha 1
Se tiende malla puno 3 costado superior derecho.
Plazoleta

Lovany T.

20/Sep/2023 4 postes
3 ayudantes + 1 maestro + 1 oficial
Se funde dos puños tramo 3 costado derecho superior
plazoleta y pendiente costado izquierdo superior cancha 1.

Lovany T.

21/Sep/2023 Jueves
3 ayudantes + 1 maestro + 1 oficial + 1 soldador
Se inicia con Reparacion en estructura metalica Canchas
Se continua con instalacion malla y encofre placas
plazoleta. Se continua con instalaciones electricas
para postes. llegan 4 postes metalicas

Lovany T.

Powered by CamScanner

Domingo 20 de Agosto de 2023.
No se realiza actividad en obra, día festivo. Jhon R.

Lunes 21 de Agosto de 2023.
No se realiza actividad en obra, día festivo. Jhon R.

Martes 22 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 2 Instaladores de manto.
Se realiza actividad de resane en areas de humedad de salones del segundo piso, se finaliza actividad de manto en cubierta de la institución. Jhon R.

Miercoles 23 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial.
Se realiza actividad de pintura en aula del segundo piso Jhon R

Jueves 24 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial.
Se realiza actividad de pintura en aula del segundo piso, llega material a obra. Jhon R

Viernes 25 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial.
Se realiza actividad de pintura en el aula 209, se realiza raspado en techo y se aplica resane en zonas afectadas por la humedad. Jhon R

Sabado 26 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial.
Se realiza actividad de pintura en aula del segundo piso de la institución, se realiza raspado de techo donde se encuentra humedad. Jhon R

Domingo 27 de Agosto de 2023.
No se realiza actividad en obra, día festivo. Jhon R

Lunes 28 de Agosto de 2023
Personal: 1 Inspector de Obra, 1 Oficial.
Se realiza actividad de pintura en muros y techo del aula del segundo piso de la institución. Jhon R

Martes 29 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de Obra, 1 Oficial
Se continua con actividad de pintura en muros y techos del aula del segundo piso de la institución Jhon R

Miercoles 30 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial.
Se continua con actividad de pintura en muros y techos del aula del segundo piso de la institución Jhon R

Jueves 31 de Agosto de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial
Se continua con actividad de pintura en muros y techos del aula del segundo piso de la institución Jhon R

Viernes 1 de Septiembre. de 2023

Personal: 1 Inspector de Obra, 1 Oficial

Se continua con actividad de pintura en murol y techos del aulo del segundo piso de la institución JhonR

Sabado 2 de Septiembre de 2023

Se continua con actividad de pintura en murol y techos del aula segundo piso de la institución JhonR

Domingo 3 de Septiembre de 2023

No se realiza actividad en obra, día festivo. JhonR

Lunes 4 de Septiembre de 2023.

Personal: 1 Inspector de obra, 3 Oficiales, 1 Maestro, 1 Ayudante.

Se inicio actividades en el area de la tarima, se realiza actividad de replanteo y se continua con actividad de pintura en muros y techos de aulas del segundo piso. JhonR

Martes 5 de Septiembre de 2023.

Personal: 1 Inspector de obra, 1 Maestro, 3 Oficiales, 1 Ayudante

Se realiza actividad de pintura en aula A 202, se inicia actividad de perforación de placa contrapiso en el area de la tarima. Se realiza retiro de escombros de la tarima.

JhonR

Miercoles 6 de Septiembre de 2023.

Personal: 1 Inspector de obra, 1 Maestro, 3 Oficiales, 1 Ayudante.

Se realiza actividad de pintura en aula 204, se continua con actividad de excavación manual en el area de la tarima JhonR

Jueves 7 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 3 Oficiales, 1 Ayudante.
Se realiza actividad de pintura en aula 203 y se continua con actividad de excavación manual en el area de la tarima. JhonR

Viernes 8 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 3 Oficiales, 1 Ayudante.
Se realiza actividad de pintura en aula 203 y computadoras se continua con actividad de excavación manual en area de la tarima. JhonR.

Sabado 9 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 3 Oficiales, 1 Ayudante.
Se finaliza actividad de pintura en sala de computadoras, se continua con actividad de excavación manual en area de la tarima. JhonR

Domingo 10 de Septiembre de 2023.
No se realiza actividad en obra, día festivo. JhonR

Lunes 11 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 3 Oficiales, 1 Ayudante.
Se continua con actividad de excavación en el area de la tarima. JhonR

Martes 12 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 3 Oficiales, 1 Ayudante.
Se continua actividad de excavación manual en el area

perimetral de la tarima. JhonR

Miercoles 13 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 3 Oficiales, 1 Ayudante.
Se realiza actividad de excavación manual en parte perimetral de la tarima, llega material a obra (Acero, blogue) se realiza el respectivo trasiego de material. JhonR

Jueves 14 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 3 Oficiales, 1 Ayudante.
Se realiza actividad de excavación manual en parte perimetral de tarima. JhonR

Viernes 15 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Oficiales, 1 Ayudante.
Se realiza actividad de excavación manual en parte perimetral de tarima. JhonR

Sabado 16 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Oficiales, 1 Ayudante
Se realiza retiro de material (escombro) de obra, jornada de limpieza JhonR

Domingo 17 de Septiembre de 2023
No se realiza actividad en obra, día festivo. JhonR

Lunes 18 de Septiembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 3 Oficiales, 1 Ayudante.

Se realiza actividad de amarre de acero de las vigas 1 y se continua con la excavación manual en parte perimetra de la tarima. Jhon R.

Martes 19 de Septiembre 2023.
Personal: 3 Oficiales, 1 Inspector de obra, 1 Ayudante.
Se continua con instalación de amarre de acero de las vigas, se continua con la excavación manual en parte perimetral de la tarima. Jhon R.

20.09.23 3 oficiales 1 ayudante
Continuar armado de acero para vigas de cimentacion, conti actividad de excavacion para vigas. Jhon R.

17-08-2023 1 Oficial 3 Ayudantes
Inicia instalación de carpintería metálica para ventanas de aulas piso 2. Continua aplicación de mortero para marcos de tableros y remarcos de puertas en salones de piso 2 JhonR.

18-08-2023 1 Maestro, 2 Oficiale, 2 ayudantes
Se realiza cambio de grifería en baños de piso 3. Inicia aplicación de pintura en aulas de piso 2. Continua aplicación de mortero en marcos para tableros y remarcos de puertas de acceso a salones de piso 2 JhonR

19-08-2023 1 Maestro, 2 Oficiales, 2 ayudantes, 2 Instaladores ventanas
Continua instalación de carpintería metálica de ventanas en salones de piso 2. Inicia aplicación de estuco en marcos de ventanas, marcos de tableros y remarcos de puertas de acceso a aulas de piso 2.
JhonR

20-08-2023 1 Maestro. 1 Ayudante 1 Pulidor de piso
Se realiza limpieza y destapado de dos sifones en area de circulación baños piso 1. Inicia destronque de piso en salones piso 2. JhonR

Powered by CamScanner

21-08-2023 1 Maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes, 2 electricos, 1 pulidor piso. Inicia instalación de tubería EMT para instalación electrica. Continua destronque de piso en aula de piso 2. Continua aplicación de estuco en bordes de ventanas, marcos de tableros y remarcos de puertas de acceso a salones de piso 2 Jhon R.

22-08-2023 1 Maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes, 2 electricos, 1 pulidor piso 2 instaladores impermeabilizacion abierta.
Continua instalación de tubería EMT para instalación electrica. Se debe parar destronque de piso por ordenes de la institución educativa. Continua aplicación de estuco en marcos de tableros, ventanas y remarcos de puertas de acceso a salones de piso 2. Inicia instalación de manto asfaltico en cubierta.
Se realizan inspeccion en los baños del primer nivel, donde se encuentra que no estan aseados; los orinales presentan fugas en el desague y mangueras de suministro, hay un sanitario que presenta fuga en el desague y otro que no hace la descarga del tanque adecuadamente. se le solicita al contratista realizar la correccion de las observaciones mensionadas anteriormente, antes del medio dia. Tambien se solicita mantener aseado las escaleras frente al cerramiento delos salones del segundo nivel.
En los baños del tercer nivel se solicita al contratista realizar revision de divisiones de baños y correccion a las baldosas porque se debe realizar retoque de pintura a los soportes del meson del lavamanos.

23-08-2023 Al momento de la inspeccion de la obra, se evidencia que los dos trabajadores: Andres Becerra (cc.1023917095) y Fabian Batista (cc.1047480460), los cuales se encontraban realizando labores de impermeabilizacion no se encontraban afiliados, sin seguridad social y sin ingreso reportado

23-08-2023 Por lo cual se procede a informar y se les notifica que se deben retirar de la institución inmediatamente. Se notifica así mismo, a la inspectora SISO Katia la situación, también al señor contratista.

1 Maestro 1 Oficial 1 Ayudante
Se realiza reparación de orinales en baños de primer piso, avanza aplicación de pintura en muros de salones de piso 2.

Al finalizar la jornada estudiantil todavía siguen deshabilitados los baños del primer nivel. Jhon R.

24.08.23 1 Maesto 2 oficiales 2 ayudantes 1 electricista
Continua actividad de pintura sobre muros de pasillos, continua instalación de red eléctrica en salones del nivel 2, continua actividad de pañete sobre, continua actividad de destronque y pulida de piso.

Todavía los baños del primer nivel presentan observaciones, siguen deshabilitados, el contratista no esta trabajando en solucionarlas durante la jornada. Jhon R.

25-08-23 1 Maestro 2 oficiales 2 ayudantes 1 Electricistas
Continua actividad de pintura sobre muros de pasillos, continua instalación de red electrica y destronque y pulida de piso en salones de piso 2.

Oscar T.

26-08-23 1 Oficiales 2 ayudantes 1 Electricistas
Continua actividad de pintura sobre muros de pasillos, continua instalación de red electrica avanza llenado de juntas en piso de salones piso 2. Se realiza ajuste de llaves de lavamanos en baños de piso 1 y 3 además de limpieza para entrega

Oscar T.

Powered by CamScanner

27-08-23	No se realizan actividades en obra. Día festivo. Yovany T.
28-08-23	1 Oficiales, 1 Ayudantes 2 Electricos Se realiza entrega de baños para uso de la institución con la observación de que falta los puertas de ingreso. Continua aplicación de pintura en muros de pasillos y salones de piso 2. avanza instalación de red electrica, destroncado de piso. Yovany T.
29-08-23	2 Oficiales 2 Ayudantes 2 Electricos Continua aplicación de pintura sobre muros en salones y pasillos. Se realiza instalación de tubería en area de circulación salones piso 2. Yovany T.
30-08-23	2 Oficiales 2 Ayudantes 1 Electrico Finaliza aplicación de pintura sobre muros de pasillo y salones de piso 2. Se realiza instalación de luminarias y aparatos electricos en la totalidad de salones y área de circulación de piso 2. finaliza instalación de puertas de acceso a salones donde se evidencia daños en una de ellos por lo cual debera ser remplazada. finaliza brillado de piso en salones piso 2 Yovany T.
31-08-23	1 Oficial 1 Ayudante Finaliza instalación de luminaria y rejillas de las mismas, a lo largo de todos los salones de piso 2. Se realiza limpieza y aseo a todas las aulas para entrega Yovany T.

Powered by CamScanner

01-09-23	Se realiza entrega salones 201 - 202 - 203 - 204 con interventoría SED e institución representada por su rectora. Donde se evidencia el correcto funcionamiento de instalación eléctrica. Y reciben a conformidad con las observaciones de cambio de puerta salones 203 por abovedera. Instalación de tapas ciegas en salones 202 - 203 - 204. La institución hace entrega de salones 205 - 206 - 207 - 208 para iniciar con intervención. Ovany T. Residente Consorcio MIAGP Arq Sebastian Rivera
02-09-23	Inicia desistalación de carpintería metálica, puertas de acceso a salones 205 - 206 - 207 - 208, se realiza la demolición de borde de tableros en salones, se desistala riel de piso salon 206-207. Se realiza desistalación de cubierta en ventanería externa de salones 201 - 202 - 203 - 204. Se realiza instalación de tapacriegos en salon 203 - 204 - 202. Ovany T. Residente Consorcio MIAGP Arq. Sebastian Rivera
03-09-23	No hay personal en obra (Día festivo) Residente Consorcio MIAGP Arq Sebastian Rivera Ovany T.
04-09-23	Inicia desistalación de carpintería metálica correspondiente a ventanas de salones 205 - 206 - 207, se realiza desistalación de marco puerta de acceso pasillo salones. Ovany T Residente Consorcio MIAGP Arq Sebastian Rivera
05-09-23	Continua desistalación de carpintería metálica correspondiente a ventanas de salones 205 - 206 - 207 - 208, inicia conformación de pañete para marcos de puertas en salones 205 - 206. Se realiza la demolición de rieles en pisos de pasillo y salones 206 - 207. Ovany T. Residente Consorcio MIAGP Arq Sebastian Rivera

Powered by CamScanner

06-09-23 Continua instalación de poliet para conformación de marcos para puertas en salones 205-206-207-208. Inicia aplicación de pintura en techos de salones 205-206. En reunión con rectora de la institución se habilita salón 101 el cual debe ser intervenido al mismo tiempo que los salones del segundo piso con el objetivo de desalojar la biblioteca en la próxima habilitación de espacios.
Inicia aplicación de molter en borde superior de ventanas en salones 205-206.

Ovany T. Residente Consorcio MPA6P
Arq Sebastian Rivera

07-09-23 Continua instalación de poliet para conformación de marcos para puertas en salones 205-206-207-208. Continua aplicación de pintura en techos de estos salones. Inicia resane de piso donde se retiraron los cielos. Continua resane de muros en pasillo y salones de piso 2.

Ovany T. Residente Consorcio MPA6P
Arq Sebastian Rivera

08-09-23 2 Oficiales 1 Ayudantes
Continua instalación de poliet para conformación de marcos para puertas en salones 205-206-207-208. Inicia demolición de marcos de metal en puertas de acceso pasillo. Se realiza fundida de borde de tablero salón 207. Inicia aplicación de estuco en marcos de ventana salón 208. Continua aplicación de pintura para techo en salón 208.

Ovany T. Residente Consorcio MPA6P
Arq Sebastian Rivera

09-09-23 2 Oficiales 2 Ayudantes
Continua instalación de poliet para conformación de marcos en puertas de salones y pasillo circulación. Finaliza demolición de marcos de metal en puertas de acceso pasillo circulación. Se realiza afinado molter borde de tablero salón 207. Continua aplicación de estuco en borde de tablero salón 207 y 208. Continua aplicación de pintura techo salón 207 y 208. Retiro escombros.

Ovany T. Residente Consorcio MPA6P
Arq Sebastian Rivera

Powered by CamScanner

10-09-2023 No hay personal en obra (Día Festivo) Residente consorcio MLA6P Arq Sebastian Rivera

11-09-2023 2 Oficiales 2 ayudantes Yovany T.
Se realiza desinstalación de ventanas salon 205. Continua aplicación de estuco sobre marcos de ventanas salónes 208 y 207. Aplicación de estuco, sobre tableros en estos mismos espacios Se realiza prueba de aplicación de pintura sobre paredes para optimización de actividad y materiales en salón 208. Inicia instalación de ventaneria en aluminio salon 208. Inicia trabajo destroque piso granito salon 205. Instalación Tubería EMT.
Yovany T. Residente Consorcio MLA6P Arq Sebastian Rivera

12-09-2023 2 Oficiales 1 Ayudante
Continua aplicación de estuco sobre marcos de ventanas salones 206-207-208. Se realiza instalación de marcos en aluminio de ventanas de salón 207. -Construcción de borde de tablero con marco en salón 206. Continua aplicación de pintura con compresor sobre muros de salón 208. Se realiza instalación de tubería EMT sobre salones 205 206 207 y 208. Inicia aplicación de pañete sobre marcos de puertas de acceso pasillo circulación. Aplicación de estuco sobre tablero salón 206.
Yovany T. Residente Consorcio MLA6P Arq Sebastian Rivera

13-09-2023 Inicia prueba aplicación de pintura de aceite sobre muro en salón 207 en un area de 1 m² se realiza aplicación de 3 manos con registro fotografico de prueba. Se realiza acta de entrega con elementos desinstalados de ventanas de salones 205-206-207 y 208 firmada por interventoria y institución. Continua aplicación de estuco sobre marcos de puertas y ventanas, tableros de salones 205-206-207-208 de piso 2. Avanza actividad de pulida de pisos en salones 205 y 206.
Se evidencia por parte de interventoria que en la franja vinotinto al aplicarsele la pintura blanca no cubre su totalidad, portanto quedaria en revision.
Residente Consorcio MLA 6P Arq Sebastian Rivera
Yovany T.

14-09-2023 Continua aplicación de estuco para filos de marcos ventanas salón 205-206-207-208, aplicación de estuco en marcos de puertas. Inicia instalación de tubería EMT eléctrica. Avanza aplicación de pintura sobre muros de salon 208.

Arq Sebastian Ruvalcaba
Consorcio MBA-6P
Ovany T.

15-09-2023 Se realiza demolición de riel en piso pasillo circulación, ademas de resane del riel ya retirado, continua aplicación de pintura sobre muros y techos, avanza instalación de tubería y puntos electricos EMT.

Arq Sebastian Ruvalcaba
Consorcio MBA-6P
Ovany T.

16-09-2023 Se realiza instacion de puertas con marcos de bandas niños y niñas en primer y tercer piso. Avanza resane de riel en piso de pasillo circulación. Avanza instalación de tubería y puntos electricos EMT. Avanza aplicación de pintura sobre muros y techos en salones. Se realiza pulida y detroque de piso en salones 205-206-207-208.

Arq Sebastian Ruvalcaba
Consorcio MBA 6-P
Ovany T.

17-09-2023 Domingo ha hay personal en obra día festivo.

Ovany T

18-09-2023. Avanza aplicación de pintura sobre muros, continua aplicación de estuco sobre ventanas, puertas y talderas de salones 205-206-207-208. Se realiza instalaciones de ventanería.

Arq Sebastian Ruvalcaba
Consorcio MBA 6-P
Ovany T.

Powered by CamScanner

19-09-2023 Inicio instalación de luminarias y operatos electricos. Continua aplicación de estuco y pintura en salones 205-206-207-208

Arq. Sebastian Rivera
Consorcio MCA GP

20-09-2023 Continua aplicación de pintura y estuco sobre muros marcos de ventanas, marcos de puertas, tableros de salones 205-206-207-208. Continua instalación de accesorios y luminaria electrica. Inicio instalación de manto en cubierta de hogue.

Arq. Sebastian Rivera
Consorcio MCA GP

Powered by CamScanner

17-Agosto-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de estructura metálica soporte de cubierta, se realiza desmonte de damper en policarbonato existente en corredor.
Yovany.

18-Agosto-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con desmonte de policarbonato existente en área de corredor. Pintura y anticorrosivo en estructura metálica instalada y existente soporte de cubierta.
Yovany. T

19-Junio-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SSTT, Maestro General, Ornamentadores.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de estructura metálica soporte de cubierta. Instalación de 3 en 1 y anticorrosivo en estructura metálica.
Yovany T.

Powered by CamScanner

22-Agosto-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SSt, Maestro, Ornamentadores
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación estructura metalica soporte de cubierta. Yovany T.

23-Agosto-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SSt, Maestro, Ornamentadores
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa mantenimiento de estructura soporte de cubierta, se inicia instalación de teja standing seam en ala 2. se realiza desmonte cubierta en ala 1
Yovany T.

23-Agosto-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa instalación de estructura soporte de cubierta y se continúa instalación de teja standing seam en ala 2. se realiza desmonte cubierta ala 1
Yovany T.

24-Agosto-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: se continúa con instalación de estructura metálica y teja en ala 2. se realiza embalaje y disposicion final de tejas de asbesto cemento. Yovany T.

Powered by CamScanner

25-Agosto-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de estructura metálica en ala 1 y 2, instalación de teja en ala 2.
Lovany T.

26-Agosto-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación estructura metálica soporte de cubierta y teja standing seam en ala 2.
Lovany T.

27-Agosto-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación de teja standing seam de 55cm x 720cm en ala 2.
Lovany T.

28Agosto-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de estructura metálica en área administrativa. Se realiza demolición de alistado y acabado de piso en aulas.
Lovany T.

Powered by CamScanner

24 Agosto-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, 20 ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza demolición de alistado de piso en aulas. Se continua con instalación pintura a estructura metálica en área administrativa.

Yovany T.

25 Agosto-23 CLIMA: Parcialmente Nublado.
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, 2 ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de estructura metálica en área administrativa, se continúa con demolición de alistado y acabado de piso en aulas.
OBSERVACIONES: Se solicita a interventoría definición del color del policarbonato a instalar en corredor, para iniciar con la intervención contemplada en el alcance contractual. Interventoría indaga directamente con arquitecto Hugo Tabaquirá y expone la situación en que la Sta Rectora de la institución solicita sea en color Azul, así que SED (Arq. Hugo Tabaquira) define que sea en color Azul el domo a instalar en policarbonato en corredor edificio 1, así mismo se realiza acta de comité con firma de interventoría y rectora.

Yovany T.

28 Agosto-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores 2 ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de teja standing seam en área administrativa.

Yovany T.

Se continúa con desmonte de puertas existentes en aulas y en área de cuarto portería. Se continúa con demolición de alistado de piso en aulas edificio 1.

1-Septiembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, Oficial, 3 Ayudantes
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con demolición de piso en área corredor. Se continúa con demolición de piso existente en aulas y corredor. Se realiza desmonte de policarbonato existente en corredor edificio 1.

Jovany T.

2-Septiembre-23 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, Oficial, 3 Ayudantes
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con desmonte de policarbonato en corredor. Se continúa con demolición y traslado interno de escombros hasta punto temporal de acopio
Se presenta lluvia de alta intensidad que condiciona actividades de instalación de cubierta.

Jovany T.

4-Septiembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado.
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, Oficial, 3 Ayudantes
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con demolición de piso en aulas, se continúa con instalación de cubierta en área administrativa.

Jovany T.

Powered by CamScanner

septiembre-23 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro General, Ornamentadores, 2 oficiales, 3 Ayudantes,
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de retratos en área de cubierta en aulas 1 y 2. Se inicia con instalación de alistado de piso en aulas aula 1 edificio 1.

Yovany T.

septiembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro General, Ornamentadores, 2 oficiales, 3 Ayudantes
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de U de remate en cubierta instalada en aulas 1 y 2.
Se continúa con instalación de alistado de piso en aulas aula 2.

Yovany T.

Septiembre-23 CLIMA: Soleado.
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, 2 oficiales, 3 Ayudantes
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de alistado de piso en aulas. Se continúa con instalación de cubierta en área administrativa
Se realiza retiro de escombro a botadero.

Yovany T.

Septiembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, 2 oficiales, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de monitero para alistado de piso en aulas. Se realiza instalación de cubierta en área administrativa.

Yovany T.

Powered by CamScanner

9-Septiembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, 2 oficiales 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia con instalación de domo en policarbonato azul en corredor edificio 1. Se continúa con instalación de alistado de piso en aulas.

Yovany T.

11-Septiembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, 2 oficiales, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con desmonte de cobierta existente en aula 1.1, parte de baños y coordinación en área administrativa edificio 1. y desmonte luminarias, puntos electricos, y cielo falso. existente en aula 1.1. Se protegen equipos existentes en oficina de coordinación (estabilizador, gabinete con fuente de poder red de seguridad de la I.E.

Yovany T.

12-Septiembre-23 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, 2 oficiales, 3 Ayudante
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con desmonte de cobierta existente en area administrativa. Se realiza mantenimiento de canales existentes en aula 1.1. Se realiza instalación de plancha zinc y pintura a estructura metalica en aula 1.1.

Yovany T.

Powered by CamScanner

4 septiembre 23 CLIMA: Soleado.
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, Oficiales, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia con instalación de enchape en pisos de aula ala 1. Se realiza instalación de estructura metálica en ala 1.1 en área administrativa - coordinación - baños.

Yovany T.

5 septiembre 23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, Oficiales, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de enchape de piso en aulas ala 1 edificio 1. Se continúa con instalación de platina para anclaje de estructura metálica soporte de cubierta a mampostería existente en ala 1.1.

Yovany T.

6 septiembre 23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro general, Ornamentadores, Oficiales, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de enchape de pisos en ala 1 y 2. Se realiza instalación de cubierta tipo steadmans foam en área de coordinación (ala 1.1).

Yovany T.

Powered by CamScanner

16-Septiembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, 2 Ayudantes, 3 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa instalacion de cubierta tipo standing seam en cda 1,1 y de 8 tejas trasladadas instaladas acorde a solicitud de SST en área de Hall frente a coordinación.

Yovany T.

18-Septiembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores, 2 Ayudante, 3 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de enchape de piso y guardaescoba en áulas. Se realiza instalación de tubería EMT en aulas 01 a 2.

Yovany T.

19-Septiembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 3 Ayudantes, 3 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de red tubería EMT en aula 2. Se continúa con instalación de enchape en aulas. Se realiza inicio de fabricación de puertas para aulas.

Yovany T.

Powered by CamScanner

20 Septiembre 23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro General, 2 Oficiales, 3 Ayudantes instalador eléctrico.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de cajas para salidas eléctricas tomacorrientes y encendedores en todos edificio 1 ala 2.
Se continúa instalación de enchape en piso y guardaescoba.

Yovany T.

21-Septiembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes cuadrilla eléctrica
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de tubería EMT. en corredor. Se realiza instalación de boquilla a enchape de piso instalado se realiza instalación de encorchado a nivel de cubierta en ala 2 Se realiza pañete de muros en área con mayor fracturamiento en todos ala 2 edificio 1.
Interventoría deja claridad que la actividad de pañete realizada en el ala 2 del edificio 1 no esta contemplada en el alcance.

Yovany T.

22-Septiembre CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 2 Oficiales 3 Ayudantes, cuadrilla electrica
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de cable #12 para circuitos de luminarias, tomacorrientes y encendedores.
Se continúa con enchape de piso aula en edificio 1.
Se realiza instalación de pintura en muros internos de todos.

Yovany T.

Powered by CamScanner

18-08-2023	Se realiza resbaje con pintura sobre platinas instaladas. Finaliza instalación de cubierta nueva con doble capa y aislante termoacustico en area de aula 25. Yovany T. Residente Obra PIG Sebastian Rivera
19-08-2023	Se realiza aplicación de pintura sobre cerchas ubicadas en el area de circulación de salones. Yovany T. Residente Obra PIG Sebastian Rivera
20-08-2023	No se realizan actividades. Día festivo Yovany T. Residente Obra PIG Sebastian Rivera
21-08-2023	No se realizan actividades. Día Festivo Residente Obra PIG Sebastian Rivera
22-08-2023	Se realiza desistalación de cubierta existente en aula 16 seguido de la instalación de platinas y su respectivo resbaje con pintura. Se realiza instalación de primera capa cubierta nueva Yovany T. Residente Obra PIG Sebastian Rivera
23-08-2023	Se realiza desistalación de cubierta existente en aula 17 y 18. Se instala platina sobre cerchas de aula 17 y se finaliza instalación de cubierta nueva con dos capas y aislante en aulas 16 y 17. Yovany T. Residente Obra PIG Sebastian Rivera
24-08-2023	Se realiza desistalación de cubierta existente en aula 19, se instala platina sobre cerchas de aula 18 y 19 20 Se finaliza instalación de cubierta nueva con dos capas y aislante en aulas 17 y 18, 19. Yovany T. Residente Obra PIG Arq Sebastian Rivera

Powered by CamScanner

Se realiza instalación de cubierta aula 20. Yovany T.

Se realizo instalación teja traslucida, en area de circulación salones piso 2 Bloque B. Se realizo instalación de remates en gale superior de cubierta. Se realizo repello en concreto pared costado de patio

No hay personal en obra. Día festivo

Yovany T.

Se realizo instalación de remates en cubierta de piso 2 Bloque. Finalizo instalación de cubierta.

Yovany T.

Se hace entrega de baño niños piso 2 a institución con observación de la puerta de acceso debe ser instalada. Se realiza entrega de instalación de cubierta donde se debe corregir fugas de pintura en vigas y resane de vigas.

Yovany T.

Se hacen retoques de Pintura en vigas y retiro de cinta aislante en la tuberia EMT que utilizaron para protejer la Tuberia, Se inicia la actividad de Instalación de divisiones en la baterias sanitarias de baños niñas primer piso.

Yovany T.

Se Termina la instalación de divisiones de las baterias Sanitarias de niñas primer piso.

Yovany T.

No se realizan Actividades de obra

Yovany T.

No se realizan Actividades de obra.

Yovany T.

03-09-23	No hay personal en obra (Día festivo)
04-09-23	No hay personal en obra ~~(Día festivo)~~
05-09-23	No hay personal en obra
06-09-23	No hay personal en obra En comité se define que no se realizará cambio de piezas cerámicas en las adecuaciones que se realizaron en los baños
07-09-23	No hay personal en obra
08-09-23	No hay personal en obra
09-09-23	No hay personal en obra
11-09-23	No hay personal en obra
12-09-23	No hay personal en obra.
13-09-23	No hay personal en obra
14-09-23	Se inicia actividad de desmonte de cielo raso en las baterías sanitarias baño niños primer piso
15-09-23	Se realiza trasiego de material desmontado a sitio bodega.
16-09-23	No hubo personal en obra
17-09-23	Se inicia instalación de cielo raso en las baterías sanitarias baño niños primer piso

Powered by CamScanner

18-09-23	No hubo personal en obra
19-09-23	No hay personal en obra
20-09-23	No hay personal en obra
21-09-23	No hay personal en obra

Powered by CamScanner

21-Agosto-23 CLIMA: Lluvia de media intensidad
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, 2 Oficiales, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con demolición de piso en comedor. Se realiza instalación de estuco y pintura en área de cielo falso instalado en cocina.

Interventoría.

Residente Obra

22-Agosto-23 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, 2 Oficiales, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con traslado interno de escombros producto de demolición de piso en comedor. Se continúa con instalación de estuco y pintura en área intervenida de cielo falso en cocina.

Interventoría

Residente Obra

23-Agosto-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 2 Oficiales, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se finaliza pintura en cielo falso instalado en comedor y cocina. Se continúa con demolición de piso en Comedor.
OBSERVACIONES: Interventoría solicita pintar placa de techo en área de cocina contigua a cielo falso instalado para que no quede parche.

Interventoría.

Residente Obra

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

24-Agosto-23	CLIMA: Soleado RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, 3 Ayudantes, 2 Oficiales HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con demolición de piso existente en comedor. Se realiza traslado de escombros a punto de acopio temporal. Arq. Alejandra Angarita R. Interventoría CTIG
25-Agosto-23	CLIMA: Parcialmente Nublado RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 3 Ayudantes 2 Oficiales HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Rotomartillo ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con traslado interno de escombros a área temporal de acopio para posterior retiro Se realiza demolición de piso en área de comedor con rotomartillo. Arq. Alejandra Angarita R. Interventoría CTIG
26-Agosto-23	CLIMA: Parcialmente Nublado RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 3 Ayudantes, 2 Oficiales HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Rotomartillo ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con demolición de piso existente en Comedor. Arq. Alejandra Angarita R. Interventoría CTIG.
28-Agosto-23	CLIMA: Parcialmente Nublado RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 3 Ayudantes, 2 Oficiales HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Rotomartillo ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con traslado de escombros hasta punto de acopio temporal. Se continua con demolición de piso en Comedor. R. Interventoría Arq. Alejandra Angarita

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

29 Agosto-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 3 Ayudantes, 2 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: de inicia intervención en auditorio. Se realiza mantenimiento de estructura metálica existente soporte de cubierta. Se inicia demonte de cubierta existente

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría GTIC.

30 Agosto-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, 3 Ayudante, 2 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de Pintura en cerchas existentes en auditorio. Se realiza lijado y limpieza de estructura metálica existente en auditorio. Se realiza impermeabilización de viga canal existente en auditorio. Se realiza limpieza de viga canal existente en auditorio.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría GTIC.

31-Agosto-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 3 Ayudantes, 2 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de pintura y anticorrosivo en cerchas existentes auditorio. Se continua con limpieza e impermeabilización de viga canal auditorio.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría GTIC.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

1-Septiembre-23	CLIMA: Soleado RECORSOS HUMANOS: Ing Residente, sst, Maestro, 2 oficiales, 3 Ayudantes ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de anticorrosivo y pintura en cerchas existentes. Se continua con instalación de impermeabilización de viga canal en auditorio. Arq. Alejandra Angaita R. Interventoría C.T16.
2-Septiembre-23	CLIMA: Parcialmente nublado RECORSOS HUMANOS: Ing Residente, sst, Maestro, 2 oficiales, 3 Ayudantes ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con mantenimiento de cerchas existentes en auditorio. Arq. Alejandra Angaita R. Interventoría C.T16
4-Septiembre-23	CLIMA: Parcialmente nublado. RECORSOS HUMANOS: Ing Residente, sst, Maestro, 2 oficiales, 3 Ayudantes ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con mantenimiento de cerchas existentes en auditorio. Se continua con impermeabilización de viga canal existente en auditorio. Se inicia con instalación de platina de anclaje de estructura metálica a mampostería en auditorio. Arq. Alejandra Angaita R. Interventoría C.T16.
5-Septiembre-23	CLIMA: Soleado RECORSOS HUMANOS: Ing Residente, sst, Maestro, 2 oficiales, 3 Ayudantes ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de estructura metálica soporte de cobierta en auditorio e instalación de pintura, anticorrosivo. Arq. Alejandra Angaita R. Interventoría C.T16.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

6-Septiembre-23 CLIMA: Parcialmente. Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro General, 2 Oficiales, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de estructura metálica soporte de Cubierta en auditorio, se continua con instalación de anticorrosivo y pintura en estructura metálica instalada.
Se realiza trasiego interno de escombros, desde corredor hasta punto de acopio temporal.
Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría CTIG.

7-Septiembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menores.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de estructura metálica soporte de cubierta en auditorio. Se realiza trasiego interno de escombros a punto acopio. Se continua con desmonte cubierta asbesto cemento en auditorio
Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría CTIG.

8-Septiembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación estructura metálica, desmonte de cubierta en auditorio. Trasiego de tejas desmontadas hasta punto de acopio temporal.
Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría CTIG.

9-Septiembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza desmonte de cubierta en auditorio y trasiego de las tejas desmontadas a punto de acopio.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

11-Septiembre-23	CLIMA: Soleado RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 3 Ayudantes, 2 Oficiales HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia con instalación de alistado de piso en comedor. Se realiza instalación de enchape tipo granito en comedor. Se continua con desmonte cubierta en auditorio Arq. Alejandra Angarita R. Interventoría CTI6.
12-Septiembre-23	CLIMA: Parcialmente nublado RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 3 Ayudantes, 2 Oficiales HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de alistado de piso y enchape en comedor. Se continúa con desmonte de cubierta asbesto cemento en auditorio. Trasiego de Materiales. Arq. Alejandra Angarita R. Interventoría CTI6.
13-Septiembre-23	CLIMA: Soleado RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 3 Ayudantes, 2 Oficiales HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de enchape granito en Comedor. Se inicia pintura y mantenimiento centanos en auditorio Desmonte de cubierta en auditorio. Arq. Alejandra Angarita R. Interventoría CTI6.
14-Septiembre-23	CLIMA: Parcialmente Nublado RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 3 Ayudantes, 2 Oficiales HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de enchape de Comedor. Instalación de teja standing seam en auditorio. R. Interventoría

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

15 Septiembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 4 Oficiales, 3 Ayudantes
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación enchape piso en comedor. Nivelación de piso superior a 4cm. Instalación Teja standing seam auditorio.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
Ing. Alejandra Angarita
R. Interventoría CTG.

16-Septiembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 4 Oficiales, 3 Ayudantes
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación de cubierta standing seam en auditorio. Se realiza instalación de enchape en granito pulido en comedor.
Arq Alejandra Angarita
R Interventoría CTG.

18-Septiembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, 4 Oficiales, 3 Ayudantes.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación de cubierta standing seam en auditorio. Se continúa con instalación de enchape en granito pulido en comedor
Arq Alejandra Angarita
R. Interventoría CTG.

20-Septiembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 4 Oficiales, 3 Ayudantes
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación de cubierta standing seam en auditorio.
Interventoría

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

21-Septiembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 4 Oficiales, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de enchape de piso en comedor. Se inicia electronique de piso Se realiza instalación cubierta en auditorio. Se inicia instalación pintura en muros internos de auditorio y cuartos en tarima.
Mylena
Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria

22-Septiembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 4 Oficiales, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de pintura en muros internos auditorio. Mantenimiento de puertas y ventanas en área interna de auditorio.
Mylena
Arq Alejandra Angarita
R. Interventoria

23-Septiembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, 4 Oficiales, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de pintura en muros internos en auditorio. Mantenimiento carpintería metálica auditorio. Electronique de piso instalado en comedor
Mylena
Arq Alejandra Angarita
R. Interventoría C.116.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

25 Septiembre 23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, sst, Maestro, 3 Ayudantes, 4 Oficiales
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza pulida de piso instalado en comedor. Se continua pintura de muros auditorio, y mantenimiento carpintería metálica en auditorio

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría

26 Septiembre CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente. SST, Maestro, 3

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Anexo 1.2.3. Registro Fotográfico



Fotografía No.1	Instalación de piso en granito en aulas del bloque13



Fotografía No.2	Excavación para zona de circulación entre bloques 13 y 12



Fotografía No.3	Instalación de perfileria para cubierta del bloque 13



Fotografía No.4	Brillado de piso en granito en aulas de bloque 14



Fotografía No.5	Corte y armado de ventaneria para bloques11 y 12



Fotografía No.6	Retiro de cubierta en fibrocemento en salon de materiales bloque 11



Fotografía No.7	Colcación de platinas en L para anclaje de perfileria de cubierta en bloque 13



Fotografía No.8	Demolición de escaleras existentes entre bloques 14 y 11 para construcción de muro de contención



Fotografía No.9	Fundida de placa de contrapiso para posterior instalación de piso en granito en aula de bloque 11



Fotografía No.10	Relleno con recebo en zona de circulación entre bloques 12 y 13



Fotografía No.11	Instalación de ventanas en aluminio y puertas en aulas del bloque 14.



Fotografía No.12	Construcción de tramo de carcamo en concreto en circulación de bloques 11 y 14



Fotografía No.1	Cambio de sifón de piso



Fotografía No.2	Demolición de placa y piso




Fotografía No.3	Instalación de baldosa granito pulido



Fotografía No.4	Instalación de enchape sobre muro



Fotografía No.5	Instalación de luminarias

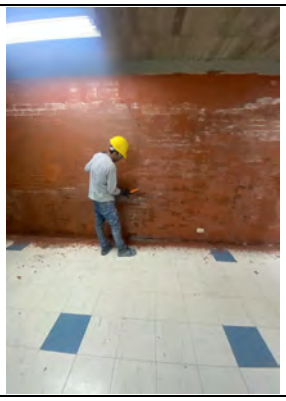

Fotografía No.6	Lavado y preparación de superficies



Fotografía No.7	Lavado y preparación de superficies



Fotografía No.8	Instalación de enchape sobre muro



Fotografía No.9	Instalación de enchape sobre muro



Fotografía No.10	Instalación de enchape sobre muro



Fotografía No.11	Instalación de enchape sobre muro



Fotografía No.12	Instalación de enchape sobre muro



Fotografía No.1	Armado de acero para columnas de segundo piso en bateria de baños



Fotografía No.2	Alistado de piso en aula multiple segundo piso del bloque 3



Fotografía No.3	Demolición de enchape existente en escaleras de bloque 1



Fotografía No.4	Pañete de muros en bateria de baños primer piso del bloque 2



Fotografía No.5	Alzado de muro antepecho en aula 3 con posterior fundida de dovelas



Fotografía No.6	Aplicación de anticorrosivo en estructura de muro falso segundo piso bloque 3



Fotografía No.7	Demolición de pañete en placa de entrepiso en aula multiple parte inferior



Fotografía No.8	Pañete de muros de segundo piso en bateria de baños bloque 2



Fotografía No.9	Instalación de cieloraso en PVC en placa de entrepiso en aula 1 del bloque 3



Fotografía No.10	Instalación de cubierta tipo sandwich en bateria de baños



Fotografía No.11	Instalación de tuberia sanitaria para desagues de baños en primer piso.



Fotografía No.12	Estucado de muros en aula 6 segundo piso bloque 3



Fotografía No.1	Estado inicial de la cubierta del auditorioen fibrocemento



Fotografía No.2	Aplicación de pintura para la perfileria de apoyo de la cubierta tipo sandwich en auditorio



Fotografía No.3	Aplicación de pintura para la perfileria de apoyo de la cubierta tipo sandwich en auditorio



Fotografía No.4	Retiro de cubierta en fibrocemento para posteriro instalación de la nueva cubierta



Fotografía No.5	Demolición de encorosado de cubierta para mejor apoyo de la nueva cubierta



Fotografía No.6	Inicio de instalación de cubierta tipo sandwich



Fotografía No.7	Demolición de piso en area de comedor



Fotografía No.8	Inicio de instalación de piso tipo gramito en zona de comedor



Fotografía No.9	Espesor de pega de pisoen granito



Fotografía No.10	Avance instalación de piso en granito en zona de comedor



Fotografía No.11	Avance instalación de piso en granito en zona de comedor



Fotografía No.12	Destronque y pulida de piso en granito



Fotografía No.1	Demolicion de bordillo en el marco del tablero



Fotografía No.2	Desmonte de puertas



Fotografía No.3	Pañete en marcos de la puerta



Fotografía No.4	Resane en muros



Fotografía No.5	Pañete en marcos de la puerta



Fotografía No.6	Desmonte de marco



Fotografía No.7	Aplicación de estuco en filos



Fotografía No.8	Aplicación de puntos electricos




Fotografía No.9	Aplicación de estuco en filos



Fotografía No.10	Aplicación de pintura



Fotografía No.11	Demolicion de riel

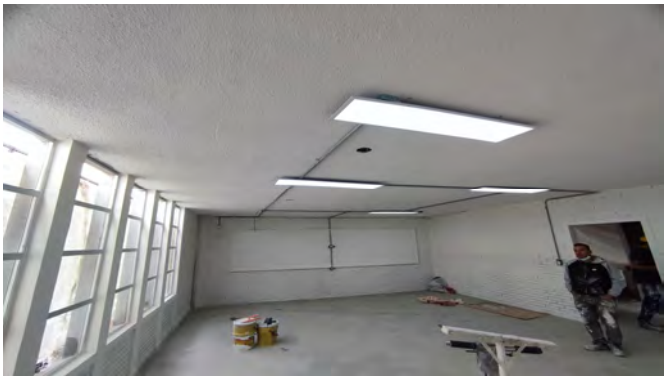

Fotografía No.12	Instalacion de luminarias



Fotografía No.1	Instalación de enchape de muros y piso en bateria de baños del primer piso en baño de niñas



Fotografía No.2	instalaciones hidrosanitarias en bateria de baños de niños n primer piso



Fotografía No.3	Instalación de enchape de muros y piso en bateria de baños del primer piso en baño de niñas




Fotografía No.4	Corte y demolición de mamposteria para instalación de ventana en aluminio



Fotografía No.5	Aplicaión de pintura en techo de bateria de baños primer piso



Fotografía No.6	Aplicación de pintura en muros de bateria de baños primer piso

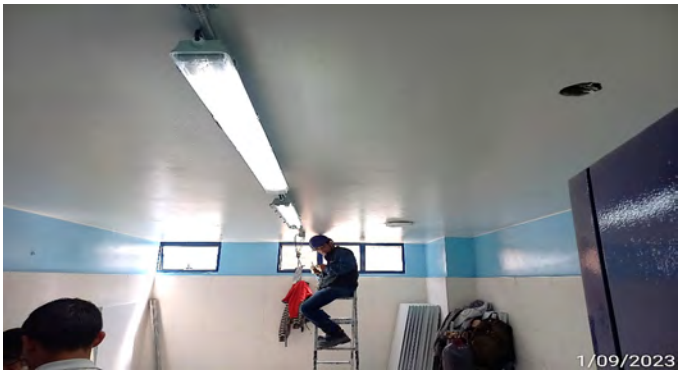

Fotografía No.7	Instalación de lamparas hermeticas en bateria de baños, baño profesores y cuarto de aseo



Fotografía No.8	Instalación de ventana en aluminio en bateria de baños



Fotografía No.9	Instalación de lavamanos y griferia en baño de niñas y niños



Fotografía No.10	Instalación de divisiones de baños en bateria de baños de primer piso



Fotografía No.11	Instalación de orinales en baño de niños primer piso



Fotografía No.12	Instalación de espejos en baños de primer piso



Fotografía No.1	Desmonte de cubierta



Fotografía No.2	Instalacion de estructura metalica



Fotografía No.3	Pintura de cerchas



Fotografía No.4	Instalacion de teja



Fotografía No.5	Instalacion de teja



Fotografía No.6	Desmonte de teja



Fotografía No.7	Alistado de piso



Fotografía No.8	Alistado de piso



Fotografía No.9	Alistado de piso



Fotografía No.10	Alistado de piso



Fotografía No.11	Resane de fusuras y encorosado



Fotografía No.12	Instalacion de puntos electricos



Fotografía No.1	Pintura de muro en mesones



Fotografía No.2	Desmonte de cubierta



Fotografía No.3	Mantenimiento de puertas



Fotografía No.4	Instalacion de perfiles parales



Fotografía No.5	Instalacion de perfiles parales



Fotografía No.6	Mesone en acero inoxidable



Fotografía No.7	Instalacion de canal de cubierta



Fotografía No.8	Instalacion de lamina de superboard



Fotografía No.9	Llegada de material



Fotografía No.10	Instalacion de estructura del cielo raso



Fotografía No.11	Instalacion de cielo raso pvc



Fotografía No.12	Instalacion de cubierta



Fotografía No.1	Pintura de cerchas



Fotografía No.2	Instalacion de teja



Fotografía No.3	Instalacion de teja traslucida



Fotografía No.4	Instalacion de cubierta



Fotografía No.5	Instalcion de flanche




Fotografía No.6	Desmonte de puertas de baterias sanitarias



Fotografía No.7	Intalacion de divisiones de baterias sanitarias



Fotografía No.8	Llegada del materia de divisiones de orinales

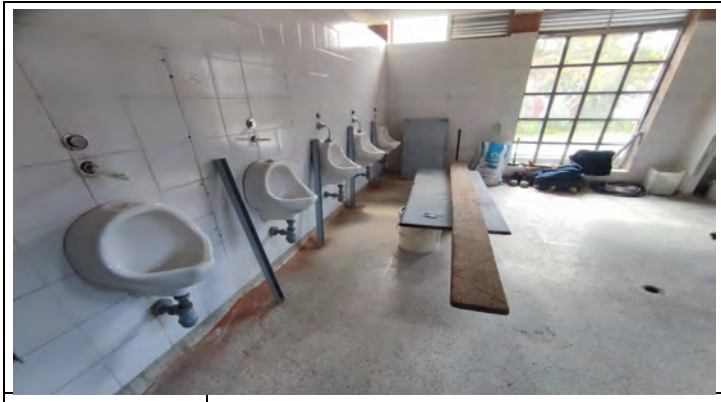

Fotografía No.9	Llegada del materia de divisiones de orinales



Fotografía No.10	Desmonte de cielo raso



Fotografía No.11	Desmonte de luminarias



Fotografía No.12	Instalacion de cielo raso




Fotografía No.1	Resane de pintra en media caña



Fotografía No.2	Retoque de pintura en cancha



Fotografía No.3	Retoque de pintura en cancha

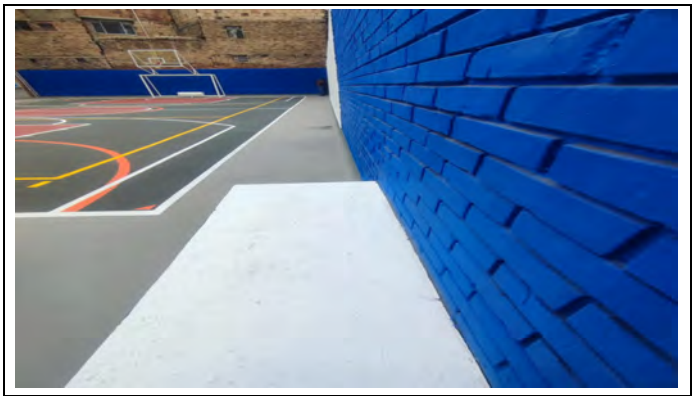

Fotografía No.4	Retoque de pintura en muro



Fotografía No.5	Aseo y limpieza



Fotografía No.6	Aseo y limpieza




Fotografía No.1	Excavacion manual



Fotografía No.2	Instalacion de tuberia conduit



Fotografía No.3	Excavacion manual

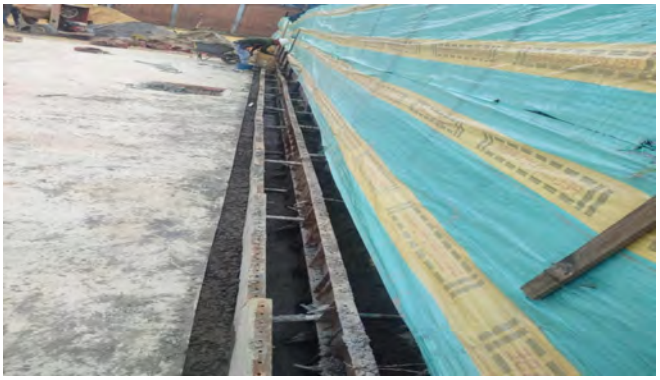

Fotografía No.4	Instalacion de formaleta en carcamo



Fotografía No.5	Instalacion de formaleta en carcamo



Fotografía No.6	Compactacion del terreno



Fotografía No.7	Excavacion manual para caja de aguas lluvias



Fotografía No.8	Instalacion de piso en chip



Fotografía No.9	Instalacion de malla electrosoldada



Fotografía No.10	Fundida de cuneta




Fotografía No.11	Dilatacion de cuneta



Fotografía No.12	Media caña de cuneta




Fotografía No.1	Desmonte de puerta exitente

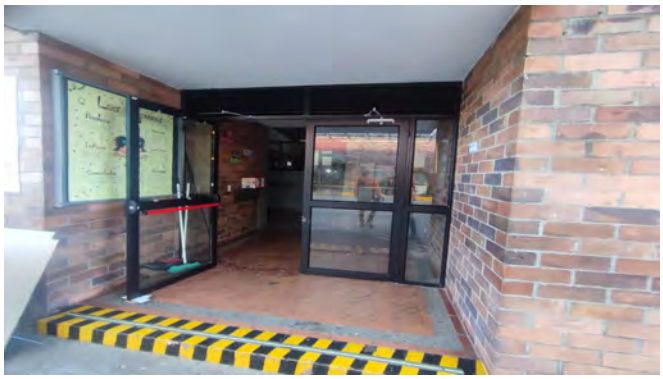

Fotografía No.2	Instalacion de puerta



Fotografía No.3	Instalacion de vidrios con pelicula de seguridad

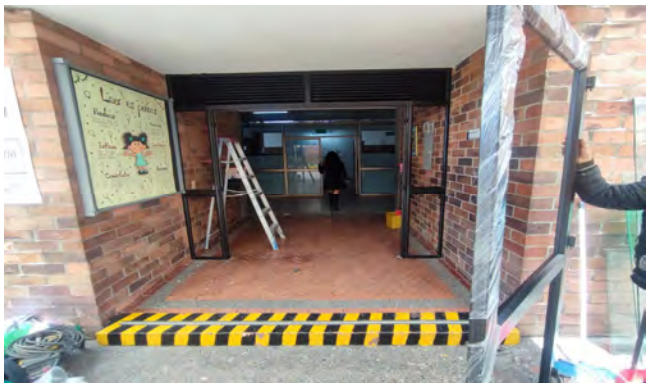


Fotografía No.4	Instalacion de marco



Fotografía No.5	Instalacion de puerta antipanico



Fotografía No.6	Instalacion de vidrios con pelicula de seguridad

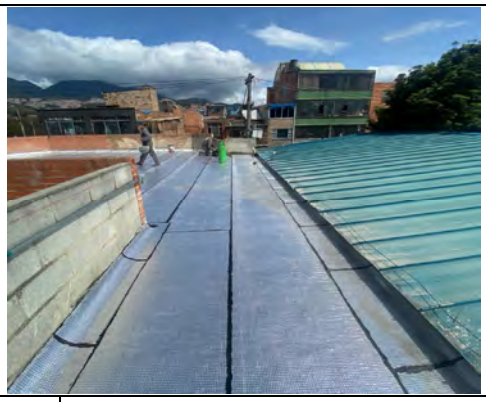

Fotografía No.1	Instalación de manto asfáltico



Fotografía No.2	Pintura sobre muros



Fotografía No.3	Pintura sobre muros



Fotografía No.4	Demolición de placa



Fotografía No.5	Excavación de material común



Fotografía No.6	Excavación de material común



Fotografía No.7	Demolición de placa



Fotografía No.8	Demolición de placa



Fotografía No.9	Excavación de material común



Fotografía No.10	Demolición de placa de rampa



Fotografía No.11	Acero de refuerzo para vigas de cimentación



Fotografía No.12	Acero de refuerzo para vigas de cimentación




Fotografía No.1	Instalación red eléctrica



Fotografía No.2	Instalación red eléctrica




Fotografía No.3	Encorozado

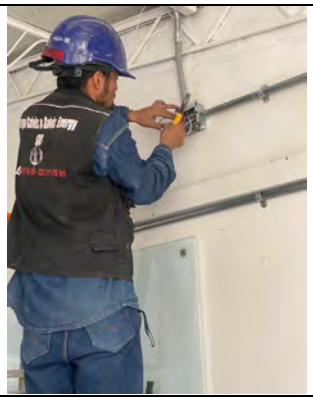

Fotografía No.4	Instalación red eléctrica



Fotografía No.5	Pintura de estructura metálica

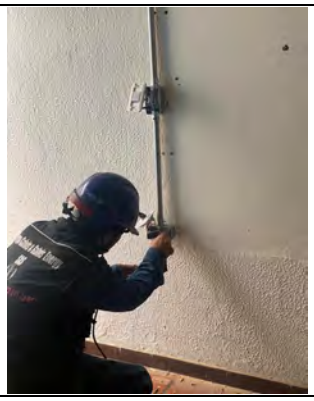

Fotografía No.6	Instalación tomacorriente



Fotografía No.7	Instalación de luminaria




Fotografía No.8	Instalación de cubierta en policarbonato



Fotografía No.9	Instalación de cubierta en policarbonato



Fotografía No.10	Instalación de cubierta tipo sándwich

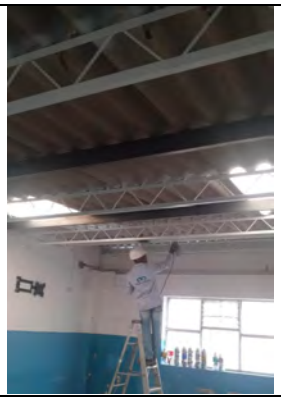

Fotografía No.11	Pintura de estructura metálica



Fotografía No.12	Instalación de cubierta en policarbonato



Fotografía No.1	Demolición de placa de cancha



Fotografía No.2	Demolición de placa de cancha



Fotografía No.3	Traslado y disposición de material de demolición



Fotografía No.4	Excavación de material común



Fotografía No.5	Traslado y disposición de material de demolición



Fotografía No.6	Extendido capa rajón



Fotografía No.7	Extendido capa rajón



Fotografía No.8	Extendido y compactación subbase B-400



Fotografía No.9	Extendido y compactación subbase B-400



Fotografía No.10	Extendido y compactación subbase B-400



Fotografía No.11	Extendido y compactación subbase B-400



Fotografía No.12	Toma ensayo de compactación

ANEXO 1.3 INFORME SST

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO.1.PCCNTR.4155718

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

INFORME MENSUAL

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME NO. 08

DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INTERVENTOR

CONSORCIO TIG

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO.1.PCCNTR.4155718

OBJETO INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCION 4

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 5

2.1 LOCALIZACION 5

3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 6

3.1 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA 6

4. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7

4.1 RECURSOS 7

4.1.1 RELACION DE PERSONAL SST POR CONTRATISTA 7

4.1.2 RELACION DE PERSONAL SST POR INTERVENTORIA 9

4.2 AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 10

4.3 CAPACITACION Y/O CHARLA PREOPERACIONAL SST 10

4.4 INSPECCIONES PREOPERACIONALES 11

4.5 INCIDENTES Y ACCIDENTE DE TRABAJO EN OBRA 11

5. CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL/ CONTADOR PUBLICO DONDE SE EXPRESE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 11

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12

1. INTRODUCCION

La seguridad y salud laboral tiene como objeto la aplicación de las medidas necesarias para evitar, o al menos minimizar, los riesgos en el trabajo y promocionar la salud entre los trabajadores.

No obstante, la planificación, organización y control de la gestión en materia de seguridad laboral debe realizarse de forma consensuada entre el empleador y trabajadores, con la supervisión de las administraciones. Desafortunadamente, en determinadas actividades laborales no es posible llegar a un riesgo cero. Aunque siempre se puede reducir el número de accidentes y minimizar sus consecuencias mediante el empleo adecuado de equipos de protección individual (EPIs): cascos, botas de seguridad, arneses, etc. y con medidas de seguridad colectiva. Otra área de gran importancia en el campo de la prevención es la formación de los trabajadores y la concienciación de éstos de la necesidad de seguir al pie de la letra todos los protocolos y medidas de seguridad.

La función de la Interventoría consiste en supervisar y verificar el cumplimiento de seguridad, Salud en el Trabajo (SST), desarrollada por el Contratista de obra para el cumplimiento de las labores en SST detalladas en el Capítulo SST del Contrato.

El presente informe se realiza teniendo en cuenta el periodo de tiempo de ejecución establecido entre 20 de agosto al 19 de septiembre de 2023, donde se establece algunas variables en temas de seguridad y salud en el trabajo presentado por el contratista, donde realizó actividades de diagnóstico; por lo anterior, las actividades en temas de SST son muy básicas, por no encontrarse en ejecución del contrato.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION

La localidad 18 Rafael Uribe Uribe está ubicada en el sur oriente de la ciudad y limita, al norte, con la localidad de Antonio Nariño; al sur, con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de San Cristóbal, y al occidente, con la localidad de Tunjuelito.

Tiene una extensión total de 1.388 hectáreas (ha) urbanas. Para el presente estudio sólo se trabajará sobre la 1267 hectárea que corresponden a las UPZ San José, Quiroga, Marco Fidel Suárez, Marruecos, Diana Turbay, las 121 hectáreas restantes ubicadas en suelo protegido que corresponden a la UPZ 60 Parque Entre Nubes fueron abordadas en el estudio de la localidad 05 de Usme.

Esta localidad no tiene suelo rural y es la sexta localidad en el Distrito con menor extensión.

Imagen No.1 Localización de la localidad



Fuente: imagen tomada de Google Earth

Imagen No.2 Ubicación de los colegios



Fuente: imagen tomada de Google Earth

3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

3.1 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

NUMERO PROCESO DE SELECCIÓN	LICITACION PUBLICA NO. CO1.PCCNTR.4155718
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4155718
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CONTRATISTA	CONSORCIO TIG
INTEGRANTES	
VALOR TOTAL INICIAL	$
PLAZO INCIAL	DOCE (12) MESES
ORDEN DE INICIO	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	11 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2023
DIRECCIÓN	CRA 47ª NO. 93-41
NUMERO DE TELEFONO	3208534050

4. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El presente informe, describe la manera como se lleva a cabo la supervisión y revisión del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo implementado por el contratista CONSORCIO MIA GP, basándonos en la normatividad vigente, resolución 0312 de 2019 y decreto ley 1072 de 2015.

A continuación, se relacionan las actividades de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la gestión adelantada por el contratista.

4.1 RECURSOS

CONSORCIO MIA GP, cuenta con la profesional en salud ocupacional, Alejandra Tarazona, quien es la persona encargada en la implementación y ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

4.1.1 RELACION DE PERSONAL SST POR CONTRATISTA

Cristian Camilo Uribe Valbuena	1069724034
Edgar Moreno Reyes	1005195748
Frannkyn Roosevelth mendez	1024484580
Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117
Fabio Toro	3082270
William Cortes	79040683
Marco Antonio Patiño	79051816
William Caicedo	93413312
Edgar Carrillo Garcia	79454728
Edgar Urian Lozano	79819641
Ricardo Urian Lozano	79638592
John Bernal	7956608
Yeison Manuel Romero	10681368777
Jonathan Londoño Quiñonez	80111297
Jhon Jairo Hincapie	79482086
Juan Esteban Pinilla Mosquera	1023363554
Angel Galvis	1014182771
Juan Jose Avila	11522038
Donni Jose Aquino	6010959
Pedro Chaverra Castro	6513909
Yorsuan Castro Saldaña	7353844
Luis Fernando Coronado Miranda	80369941
Manuel Alvarez Beltran	1007519804

Jose Caro	1000685444
Diego Carrillo	1010007822
Carlos Julio Suarez	79560984
Jhon Anderson Suarez	1031131349
Vladimiro Vasquez	10185609
Brandon Primera	1047222711
Andres Ortiz	1001043676
Michael Mondragon	1032374371
Jorge merchán	79383377
Luis Alfonso Bonilla	93413044
Kevin Gonzalez	1033770247
Diego Cubillos	13240346
Ermis Bastos	1094276006
Luis Ferley Cruz	1121846956
Angel Caicedo	1104544198
Juan Diaz	11257890
Jose Mancilla	94458377
Leyder Vizcaino	1041902626
Jorge Orobio	1114881453
Juan Rozo	1000365542
Richard Garcia	6895199
Paolo Quiroz	2113230
Oscar Ortega	5881621
Jose Cubillos	79258390
Jose Barrios	8572099
Samir Candelo	1028184319
Jose Calderon	4342875
Dilmer Bayona	80777530
Jorge Martinez	80226139
Jose Bocanegra	5970811
Jose Cocoma	1024531850
Jorge merchán	79383377
Randy Bello	5192383
Alexandra Perdomo	52210303
Jaime Londoño	79632384
Miller Florez	1000971901
Kevin Gonzalez	1033770247
Juan Sebastian Rivera	1010225386
Juan Jose Mendoza	78322868
Dario Prieto	1033736464

Honorio Martinez	79526595
Jairo Sanchez	79451618
Rigoberto Segura	3079792
Christian Uzcategui	4960037
Marvin Vilora	6993424
Ferney Valencia	1024497739
Johan Silva	1023903762
Karen Acosta	1000224211
Pedro Rosas	80381325
Jhon Perdomo	1024466590
Carlos Vasquez	2949177
Dilan Gonzalez	1000065396
Jorge Luis González	80774773
Diego Pulgarin	1115064017
Arley Poveda	1022333260
Cristian Andres Gonzalez	1023950419
Dairo Montaño	1024503523
Kevin Daniel Toquita	1001283348
Madeleine Macias	1123997352

ANEXO 1. AFILIACIONES DEL PERSONAL CONTRATISTA

4.1.2 RELACION DE PERSONAL SST POR INTERVENTORIA

NOMBRE PROFESIONAL	CARGO
Edison Ricardo Duarte Díaz	Director de Interventoría
María Alejandra Angarita Garay	Residente de interventoría
Jhon Freyder Rocha Caicedo	Residente de interventoría
Carlos Alberto Mayorga	Asesor estructural
Dalia Minerva Briceño Rodríguez	Asesor ambiental y seguridad industrial
Jesús Alberto López Velandia	Asesor de redes eléctricas
Juan Carlos Morales Rivera	Asesor de costos de presupuestos
Omar Archila Mendoza	Asesor Hidrosanitario
María Alejandra Gutiérrez Parra	Asesor Jurídico

Juan Felipe Hernández Ballesteros	Inspector de interventoría
William Yovany Piamonte Pérez	Inspector de interventoría
Erick Steven Ramírez Avendaño	Tecnólogo SST
Katherine Guañarita Díaz	Tecnólogo SST
Oscar Moreno Pinto	Tecnólogo SST
José Argemiro Pedraza Ángel	Maestro de obra

ANEXO 2. SOPORTE PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

4.2 AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO TIG, realiza la supervisión y verificación de la afiliación del personal que cuenta el contratista CONSORCIO MIA, dando cumplimiento a la ley 100 de 1993, resolución 0312 de 2019 y decreto ley 1072 de 2015.

Por lo anterior, el contratista CONSORCIO MIA, cumplió con la afiliación y el pago de la seguridad social, correspondiente al mes agosto de 2023.

ANEXO 2.1 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

4.3 CAPACITACION Y/O CHARLA PREOPERACIONAL SST

Las capacitaciones y/o charla preoperacional permite analizar y controlar los riesgos o situaciones que puedan llevar a un accidente. Además, demuestra el grado de compromiso de la empresa con la seguridad y los trabajadores.

También permite el cumplimiento de procesos, procedimientos y funciones, donde garantizan el ejercicio laboral.

En el mes de agosto - septiembre, el contratista CONSORCIO MIA, realizó inducción a 25 trabajadores y según el programa de capacitaciones, se dictó capacitación en: Capacitación trabajo seguro en alturas, levantamiento de cargas, actos inseguros, autocuidado.

Por parte de la interventoría, CONSORCIO TIG, realizó capacitaciones sobre los siguientes temas, según el programa implementado en el SGSST: Capacitación identificación de peligros y riesgos, controles preventivos, capacitación peligro psicosocial, peligro biomecánico e higiene postural.

ANEXO 3. SOPORTE REGISTRO DE CAPACITACIONES E INDUCCIONES CONTRATISTA

ANEXO 3.1 SOPORTE REGISTRO DE CAPACITACIONES E INDUCCIONES INTERVENTORIA

4.4 INSPECCIONES PREOPERACIONALES

El principal objetivo de las inspecciones de seguridad es el detectar las situaciones de riesgos antes de que se produzcan. Al realizar la inspección se puede cumplir con los siguientes objetivos: identificar problemas no previstos durante el análisis de trabajo, establecer las deficiencias de los equipos de trabajo, identificar todas las acciones inapropiadas que realizan los empleados, identificar todos los efectos indeseados de cambios, establecer soluciones a los problemas, demostrar el compromiso.

En los meses de agosto - septiembre, el contratista CONSORCIO MIA, realizó INSPECCION DE HERRAMIENTA MENOR, PULIDORA

ANEXO 4. INSPECCION

4.5 INCIDENTES Y ACCIDENTE DE TRABAJO EN OBRA

En el periodo transcurrido en los meses de agosto - septiembre, no se presentó reporte de accidente laboral ni incidente por parte de la empresa contratista. Se recomienda al contratista, continuar con las actividades de prevención para conservar el indicador de 0 accidentalidad que llevan actualmente.

De igual manera, la interventoría, no presentó reporte de accidente laboral ni incidente en el periodo de agosto a septiembre.

5. CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL/ CONTADOR PUBLICO DONDE SE EXPRESE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

En los periodos de agosto a septiembre, el contratista entregó a la presente interventoría, el certificado de paz y salvo en concepto de seguridad social se encuentra evidenciada en el informe numero 6 presentado por parte del contratista.

La interventoría, presenta certificado de paz y salvo en concepto de seguridad social.

ANEXO 5. CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL CONTRATISTA

ANEXO 5.1 CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL INTERVENTORIA

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista CONSORCIO MIA, cumplió con los parámetros mínimos establecidos en temas de seguridad y salud en el trabajo.

- Se le recomienda al contratista, seguir los lineamientos que nuestro personal de interventoría realiza cuando ejecutan actividades de alto riesgo, y evitar tener malos entendidos entre personal de ustedes e interventoría.

- Se solicita al contratista, entregar los informes mensuales en las fechas pactadas, debido a que la demora en la entrega del mismo, atrasa todo el proceso de revisión y ejecución de informes mensuales para cortes de pago.

- Se le recuerda al contratista CONSORCIO MIA, entregar las afiliaciones de seguridad social del personal nuevo que va a ingresar a las instalaciones de los diferentes colegios que tienen establecidos según el objeto del contrato.

- A la fecha no se han presentado incidentes de trabajo relacionados con las actividades de alto riesgo desarrollados actualmente en obra, lo cual es muestra de la efectividad de las medidas implementadas.

ANEXOS

(SE ADJUNTA CD CON LOS ANEXOS)

ANEXO 1.4 INFORME AMBIENTAL

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES AMBIENTALES INTERVENTORIA No. 08

20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 2
2. OBJETIVOS 2
2.1 OBJETIVO GENERAL 2
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2
3. GENERALIDADES 3
3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 3
3.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 4
3.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 6
3.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 6
4. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 7
5. CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA 10
6. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS POR INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA 12
6.1 ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA 12
6.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERVENTORÍA 17
6.2.1 Revisión del documento Informe ambiental del Contratista No 8 17
6.2.2 Recorridos por los planteles educativos 17
6.2.3 Procesos de atención de emergencia ambiental por individuos arbóreos 18
6.2.4 Inspección ambiental por parte de la Secretaria de Educación Distrital (SED) 19
6.2.5 Hallazgos ambientales prioritarios 20
6.2.6 Inspección ambiental por parte de la interventoría 21
6.2.7 Verificación de Plan de Manejo ambiental Contratista 23
6.2.7.1 Programa de gestión integral de residuos sólidos (ordinarios, orgánicos, reciclables, RCD´s y peligrosos). 23
6.2.7.1.1 Registro de cargue de reportes trimestrales RCD 28
6.2.7.2 Programa de control de emisiones atmosféricas y ruido 30
6.2.7.3 Programa de uso y almacenamiento adecuado de materiales y elementos de construcción 31
6.2.7.4 Programa de implementación de terrazas, jardines o fachadas verdes y compras verdes. 31
6.2.7.5 Programa de prevención sobre la contaminación de vertimientos en cuerpos de agua y redes de servicios públicos 31
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO CON LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES MÁS RELEVANTES DE OBRA. 32
8. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA PROTECCIÓN A LOS SUMIDEROS ALEDAÑOS 32
9. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS AL PROYECTO 32
10. CONCLUSIONES 34

1. INTRODUCCION

El seguimiento al componente ambiental de la obra está encaminado a la verificación del cumplimiento de los requerimientos establecidos en la "Guía de Manejo Ambiental para el sector de la construcción de la SDA", "Guía Integral de Residuos de construcción y demolición RCD", la normatividad ambiental vigente y al Plan de Manejo Ambiental (PMA) elaborado y presentado por el contratista CONSORCIO MIA GP (contrato de obra No C01.PCCNTR.4077645)

Este seguimiento se realizó de acuerdo a los requerimientos del contrato de interventoría que adelanta el CONSORCIO TIG, el cual tiene por objeto la "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8".

En el presente informe, se describen las actividades ambientales ejecutadas por el contratista y la interventoría durante el periodo comprendido entre el 20 de agosto al 19 de septiembre de 2023; con el objetivo de prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los impactos negativos y/o maximizar los impactos positivos, que se puedan generar como consecuencia de las actividades de ejecución de obra; y bajo los criterios de preservación, optimización y racionalización del uso de los recursos naturales, económicos y culturales.

El contenido del presente informe es producto de los registros consignados en el informe ambiental No 8 del contratista, y del seguimiento y verificación de la interventoría por medio de inspecciones directas en obra, la revisión, aprobación y trazabilidad de documentos del componente ambiental.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo del presente Informe Mensual de Interventoría es el de presentar el desempeño y gestión ambiental implementado por el contratista CONSORCIO MIA GP, bajo el seguimiento y supervisión de la Interventoría CONSORCIO TIG, de acuerdo con las especificaciones técnicas ambientales de la Secretaria de Educación Distrital (SED), así como los documentos contractuales y los presentados por el contratista.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir las actividades desarrolladas por la Interventoría durante el periodo de ejecución reportado en el presente informe

- Describir las actividades desarrolladas por el Contratista durante el periodo de ejecución reportado en el presente informe
- Supervisar que los procesos constructivos reduzcan el impacto generado por los elementos de desecho y/o demolición y acopio de materiales, en el frente de obra.
- Presentar el estado de avance de las actividades ejecutadas en relación con las actividades programadas
- Presentar observaciones y recomendaciones con relación al estado de avance del proyecto

3. GENERALIDADES

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Las actividades constructivas más relevantes que realizara el contratista son las siguientes:

- Terminar la instalación de pisos, mampostería, muros en bloque, carpintería metálica, ventanería, paisajismo, elementos no estructurales.
- Impermeabilización de cubiertas, suministro e instalación de equipos, terminación de tendido de instalaciones hidráulicas, sanitarias, de gas para laboratorios y cocina escolar y energía
- Luminarias, alumbrado exterior.
- Aparatos sanitarios, griferías, obtención de certificaciones RETIE y RETILAP.

Además de lo ya mencionado se pueden nombrar las siguientes actividades de acuerdo a la propuesta económica del proyecto:

Actividades Preliminares

- Replanteo
- Cerramiento en lona con parales de madera anclados al piso (amarre en alambre h = 3.0 m)

Demoliciones, desmontes, retiros (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

- Demolición de estructuras en concreto (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
- Demolición columna existente en concreto de dimensiones de 30 x 30 x 3 m hasta 3.40 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)

Excavaciones y rellenos (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

- Excavación manual en material común, (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
- Excavaciones en zanjas para instalación de tuberías, ancho<= 1.00 m profundidad <= 1.20 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)

Concretos (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

- Concreto ciclópeo - 40 % de concreto f´c = 3000 psi concretos para cimentación
- Vigas de amarre en concreto 3000 psi (incluye formaleta, vibrado, no incluye acero)

Mampostería (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

- Suministro e instalación de codo 45º alcantarillado 315mm
- Suministro e instalación de silla y alcantarillado 315mm x 110 mm

3.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como finalidad adecuaciones en los siguientes planteles educativos del distrito, ubicados en la localidad Rafael Uribe Uribe.

A continuación, la identificación los planteles educativos:

Tabla 1 Planteles Educativos objeto del contrato

N°	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE
1	RAFAEL URIBE	COLEGIO ALEXANDER FLEMING	B	ANTONIO RICAURTE
2	RAFAEL URIBE	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A	A	LOS CHIRCALES
3	RAFAEL URIBE	COLEGIO ALFREDO IRIARTE	B	EL MIRADOR
4	RAFAEL URIBE	COLEGIO DIANA TURBAY	B	DIANA TURBAY II
5	RAFAEL URIBE	COLEGIO EL LIBERTADOR	B	MANUEL MURILLO TORO
6	RAFAEL URIBE	COLEGIO LIBERTADOR	C	JUAN DEL RIZO
7	RAFAEL URIBE	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA	A	ENRIQUE OLAYA HERRERA
8	RAFAEL URIBE	COLEGIO JOSÉ MARTÍ	A	LUIS LÓPEZ DE MESA
9	RAFAEL URIBE	COLEGIO JOSÉ MARTÍ	C	GRANJAS DE SAN PABLO
10	RAFAEL URIBE	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	A	LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO
11	RAFAEL URIBE	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A	A	MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ
12	RAFAEL URIBE	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B	B	REPUBLICA DE ISRAEL
13	RAFAEL URIBE	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO	A	GENERAL PÁEZ
14	RAFAEL URIBE	COLEGIO REINO DE HOLANDA	A	REINO DE HOLANDA
15	RAFAEL URIBE	COLEGIO RESTREPO MILLÁN	B	ISABEL II DE INGLATERRA
16	RAFAEL URIBE	COLEGIO RESTREPO MILLÁN	D	GABRIELA MISTRAL
17	RAFAEL URIBE	COLEGIO SAN AGUSTÍN	A	SAN AGUSTÍN

N°	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE
18	RAFAEL URIBE	COLEGIO FE Y ALEGRIA	-	FE Y ALEGRIA
19	RAFAEL URIBE	COLEGIO MARIA CANO	-	MARIA CANO
20	RAFAEL URIBE	COLEGIO CAFAM SANTA LUCIA	-	CAFAM SANTA LUCIA
21	RAFAEL URIBE	COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS	-	MARRUECOS Y MOLINOS


Fuente. Estudio previo del contrato de obra

Nota 1: Es importante mencionar que durante el proyecto se pueden presentar emergencias en planteles educativos que no están incluidos en la tabla No 1.

Nota 2: Contractualmente al comienzo del proyecto se asignaron 17 colegios, se han incluido colegios en la Tabla 1 de acuerdo a la instrucción y asignación de la SED.

A continuación, se realiza una ubicación espacial de los planteles educativos en la Localidad Rafael Uribe Uribe

Ilustración 1 Ubicación Planteles Educativos - Localidad Rafael Uribe Uribe

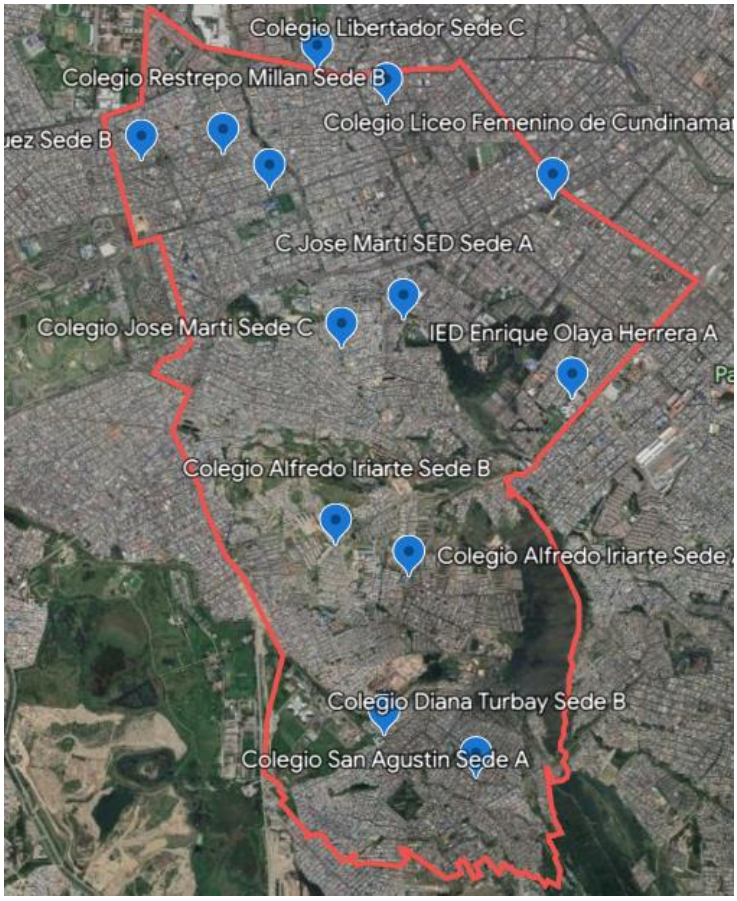

Fuente: Google Earth

3.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El contrato de interventoría se describe a continuación:

Tabla 2 Empresa de Interventoría

Empresa de interventoría	CONSORCIO TIG
Contrato No	C01.PCCNTR.4155718
Objeto del Contrato	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

Fuente. CONSORCIO TIG

3.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato del contratista de obra se describe a continuación:

Tabla 3 Empresa contratista de obra

Empresa Contratista	CONSORCIO MIA GP
Contrato de obra No	C01.PCCNTR.4077645
Objeto del Contrato	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

Fuente. CONSORCIO MIA GP

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del presente informe, se realizaron actividades en dieciséis (16) planteles educativos; trece (13) colegios que hacen parte del listado de planteles educativos a remodelar, y tres (3) colegios que fueron atendidos por emergencia. Las actividades se describen a continuación:

Tabla 4 Actividades de obra realizados durante el periodo

PLANTEL EDUCATIVO	ACTIVIDADES
COLEGIO JOSÉ MARTÍ (Sede A)	• Suministro e instalación de estructura metálica • Alistado de pisos • Instalación de baldosas • Suministro e instalación de ventana en aluminio. • Aplicación de esmalte en estructuras metálicas. • Disposición y embalaje de teja de asbesto.
COLEGIO SAN AGUSTÍN (Sede A)	• Aseo final y limpieza • Disposición y embalaje de teja de asbesto.
COLEGIO RESTREPO MILLÁN (Sede B)	• Demolición y alistado de piso • Suministro e instalación de estructura metálica • Alistado de pisos • Instalación de baldosas • Instalación de puertas • Instalación de teja traslúcida. • Suministro e instalación de cubierta • Disposición y embalaje de teja de asbesto
COLEGIO REINO DE HOLANDA (Sede A)	• Cerramiento en lona con parales de madera • demolición de pañete lineal columnas y vigas • Desmonte de puertas y ventanas • Suministro e instalación de accesorios eléctricos • Suministro e instalación de puertas y ventanas • Pintura en esmalte • retiro de material sobrante de obra con características peligrosas contaminantes y/o no biodegradables (vidrios, espejos, PVC, etc.) • Aseo final y limpieza
COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (Sede A)	• Desmonte de cubiertas y estructuras metálicas • Desmonte de cielo rasos • Alistado de pisos • Pintura de muros • Instalación de teja traslúcida. • Aseo general y limpieza final

PLANTEL EDUCATIVO	ACTIVIDADES
COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (Sede A)	• Cerramiento en lona con parales de madera • Demolición de acabado y alistado de piso • Instalación de baldosas • Pintura en esmalte • Instalación de cielo raso en PVC • Disposición y embalaje de teja de asbesto • Instalación de viga cala • Instalación de marco luminarias • Destaponamiento de redes hidrosanitarias • Mamposterías • Pisos en vinil • Instalación de lavamanos • Instalación de enchape • Retiro de cubierta tipo colonial a doble altura: teja de barro superior, teja de asbesto inferior y esterilla • Instalación de teja y caballete en fibrocemento • Aseo final y limpieza
COLEGIO ALFREDO IRIARTE (Sede A)	• Demolición de placa de contrapiso • Desmonte y desconexión de aparatos hidrosanitarios • Desmonte y retiro de tuberías hidrosanitarias • Excavación en material común • Relleno con material seleccionado • Suministro e instalación de tubería y accesorias en PVC • Suministro e instalación de accesorios eléctricos • Alistado de pisos • Lavado y preparación de superficies a la vista • Impermeabilización de paredes y pisos • Aseo final y limpieza
COLEGIO DIANA TURBAY (Sede B)	• Demolición de viga en concreto y placa maciza. • Demolición de enchapes de muro y encorazado • Desmonte de puertas, cubierta y canaleta • Excavación en material común • Construcción de columnas y viguetas • Suministro e instalación de estructura metálica • Construcción de muro y mampostería estructural • Suministro e instalación de tubería y accesorios en PVC • Suministro e instalación de accesorios eléctricos • Alistado de pisos • Instalación de baldosas • Suministro e instalación de puertas metálicas y barandas • Pañetes • Aplicación de esmalte sobre estructuras metálicas • Instalación de cielo raso en PVC • Suministro e instalación de cubierta

PLANTEL EDUCATIVO	ACTIVIDADES
COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS	• Demolición de placa • Excavación en material común • Relleno con recebo • Construcción de vigas en concreto y mampostería estructural • Pintura con vinilo • retiro de material sobrante de obra con características peligrosas contaminantes y/o no bio degradables (vidrios, espejos, PVC, etc.)
COLEGIO FE Y ALEGRIA	• Demolición de estructuras en concreto • Demolición de placas y muros de mampostería • Excavación en material común • Relleno con sub base granular • Construcción de placa de contrapiso y cárcamo • Suministro e instalación de accesorios eléctricos • Suministro e instalación de tubería y accesorios en PVC • Alistado de pisos • Instalación de baldosa • Instalación de puertas
COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO	• Demolición de encorazado de cubierta • Desmonte de cubierta • Suministro e instalación de estructura metálica • Suministro e instalación de accesorios eléctricos • Suministro e instalación de tubería y accesorios en PVC • Alistado de pisos • Instalación de baldosa • Instalación de teja traslúcida • Aseo final y limpieza
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B (Sede A)	• Construcción de cárcamo y cuneta en concreto • Suministro e instalación de tubería y accesorios en PVC • Instalación de piso caucho
COLEGIO EL LIBERTADOR (Sede B)	• Demolición de placa de contrapiso • Excavación en material común • Relleno con sub base granular y rajón • Suministro e instalación de malla electrosoldada
COLEGIO REINO HOLANDA (Sede B)	• Desmonte de cubierta • Suministro e instalación de accesorios eléctricos • Suministro e instalación de tubería y accesorios en PVC • Esmalte sobre cerchas • Instalación de cubierta modular.

PLANTEL EDUCATIVO	ACTIVIDADES
COLEGIO REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS	• Demolición de placa • Demolición de acabado y alistado de pisos • Desmonte de aparatos hidrosanitarios • Excavación en material común • Construcción de Placa de contrapiso • Suministro e instalación de malla electrosoldada • Instalación de baldosa • Aseo final y limpieza
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (Sede A	• Demolición de placa • Construcción de placa y cajas de inspección

Fuente. CONSORCIO MIA GP

5. CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

La interventoría CONSORCIO TIG, realizo el seguimiento y control sobre los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos, garantizando el cumplimiento de las "Especificaciones técnicas y ambientales" contenidos en el Estudio previo del contrato de obra.

Para ello se hace seguimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra consignadas en las "Especificaciones técnicas y ambientales" contenidos en el Estudio previo del contrato de obra. Se verifico si la especificación aplicaba a las actividades del Grupo 8, así mismo se verifico que estas aplicaran para el periodo del informe No 8, evaluando lo siguiente:

Tabla 5 Especificaciones técnicas ambientales

EPECIFICACIÓN TECNICA AMBIENTAL	APLICA AL PROYECTO SI/NO/No aplica (NA)	APLICA EN EL PERIODO DEL INFORME	
		SI/NO/NA	CUMPLE
Permiso de manejo silvicultural	SI	NA	--
Seguimiento y control a la implementación Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SED	SI	SI	X
Seguimiento y control a la implementación Legislación Ambiental vigente	SI	SI	X
Seguimiento y control a la implementación Plan de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones	SI	NA	--
Seguimiento y control a la implementación Legislación en Arqueología y en materia cultural vigente	SI	NA	--

EPECIFICACIÓN TECNICA AMBIENTAL	APLICA AL PROYECTO SI/NO/No aplica (NA)	APLICA EN EL PERIODO DEL INFORME	
		SI/NO/NA	CUMPLE
Seguimiento y control a la implementación Manual de silvicultura Urbana del Jardín Botánico de Bogotá	SI	NA	--
Seguimiento y control a la implementación Plan de Manejo Ambiental para el Contrato	SI	SI	X
Seguimiento y control a la implementación Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente	SI	SI	X
Seguimiento y control a la implementación Guía para implementación de terrazas, jardines o fachadas verdes de la Secretaría Distrital de Ambiente	NA	--	--
Seguimiento y control a la implementación Manual de compras verdes.	SI	SI	X
Adecuado manejo, disposición final y aprovechamiento de RCD de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1115-2012 y sus modificatorias	SI	SI	X
Seguimiento al cumplimiento de las Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental al contrato de obra mediante el suministro de informes mensuales de gestión.	SI	SI	X
Informe final ambiental	SI	NA	--

Fuente. Estudio previo del contrato de obra

6. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS POR INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA

A continuación, se informan las actividades realizadas por el contratista y la interventoría correspondientes al periodo del 20 de agosto al 19 de septiembre de 2023.

6.1 ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA

El contratista CONSORCIO MIA GP, realizo actividades relacionadas con el cumplimiento documental y las actividades relacionadas en los programas ambientales consignados en el Plan de Manejo Ambiental del contratista que aplicaron para las actividades del periodo del informe ambiental No 8:

Las actividades realizadas fueron:

Tabla 6 Actividades realizadas por el contratista durante el periodo del informe

ACTIVIDADES		DESCRIPCIÓN
1	**Conformación del grupo de gestión ambiental**	Se contó con el personal requerido para el desarrollo ambiental del proyecto, la ingeniera Angela Ciendua, quien realizo las visitas de control ambiental en los dieciséis (16) planteles educativos. Se reporta la elaboración y envío de los informes ambientales
2	**Capacitaciones ambientales del personal de obra**	Se realizó al personal una (1) jornada de capacitación, relacionada con: • Manejo de residuos en obra La cobertura de personal capacitado fue del 8,42% Se presentan soportes de asistencia a la capacitación
3	**Cumplimiento de requisitos legales**	Se aplico lista de chequeo ambiental, para el control de las actividades consignadas en el PMA. Los colegios donde se aplicó fueron: • San Agustín • Restrepo Millán sede A y B • Enrique Olaya Herrera • Liceo Femenino • Fe y Alegría • Alexander Fleming • Rafael Delgado Salguero • Marruecos y Molinos Se presenta lista de chequeo diligenciada.

ACTIVIDADES		DESCRIPCIÓN
4	**Manejo de sustancias químicas**	Se continuo con la organización de carpetas que contienen las fichas de seguridad de los productos químicos utilizados en las actividades, para este periodo del informe se utilizó pintura, limpiador de tubería sanitaria, mineral rojo, pegacord, soldadura liquida, ajustador epóxido, pegante de porcelanatoa y tinner Las carpetas se encuentran en: • San Agustín • Restrepo Millán • José Martí • Enrique Olaya Herrera • Liceo Femenino • Manuel del Socorro Se presentan las MSDS, de los productos químicos utilizados en el periodo del informe (pintura, limpiador de tubería sanitaria, mineral rojo, pegacord, soldadura liquida, ajustador epóxido, pegante de porcelanatoa y tinner)
5	**Programa de gestión integral de residuos sólidos (ordinarios, orgánicos, reciclables, escombros y peligrosos).**	A. DISPOSICION FINAL RCD: Se reporta el retiro y disposición final de 189 $m^{3,}$ se presentan los soportes (vales – folios) correspondientes de esta entrega: - Empresa Transportadora: Colgravas MG y William Riaño - Empresa de disposición final: CEMEX COLOMBIA SA - Centro de aprovechamiento: Granulados reciclados de Colombia GRECO, Reciclados Industriales de Colombia. El contratista presenta las **certificaciones de disposición final de agosto (correspondiente al periodo del informe)**, generadas por los proveedores donde se dispuso el RCD. Estas son requeridas para el cargue de la información en el aplicativo web de la SDA. El contratista presenta los formatos diligenciados y requeridos por la SED: • Formato estimación de costos de tratamiento de residuos de construcción y demolición en obra

ACTIVIDADES		DESCRIPCIÓN
		B. RESIDUOS ORDINARIOS El contratista verifico y valido la existencia de puntos ecológicos facilitados por los colegios para la separación de residuos en la fuente, sin embargo, se han generado hallazgos en visitas de interventoría por lo que los puntos ecológicos de los colegios no están siendo utilizados por el personal de la obra y se solicita de manera urgente al contratista solventar la situación, al corte de este informe no se ha subsanado la solicitud. Para este periodo el contratista de obra realizo las siguientes acciones: - Inicio el proceso de capacitación del personal en cuanto al manejo de residuos y uso de puntos ecológicos. - Inicio el acondicionamiento de canecas y recipientes para ser usados como puntos ecológicos. - Inicio la dotación a los puntos ecológicos de bolsas de colores correspondientes. - Se aseguro que los frentes de trabajo en los cuales hay puntos ecológicos en uso, se mantengan con la dotación de bolsas y se les del uso adecuado. C. RESIDUOS APROVECHABLES No se realizo entrega de este tipo de residuos. D. RESIDUOS PELIGROSOS Se refiere a las tejas con asbesto, se reporta el retiro y entrega de 12460 kg de tejas con asbesto, de los colegios: ✓ San Agustín ✓ Restrepo Millán Se presentan los soportes correspondientes al mes de agosto de entrega y disposición final • Empresa transportadora: RECICLAJES LYV SAS • Empresa de disposición final: CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P (Ciudad Limpia)
6	**Manejo de descapote y cobertura vegetal**	Se identificó por parte del contratista que, en los colegios, donde se adelantaron obras durante el periodo del informe No 08, no se causaron afectaciones a las zonas verdes, por lo que no se generaron residuos de material de descapote y/o cobertura vegetal

<table>
<tr><th colspan="2">ACTIVIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>7</td><td>Programa de control de emisiones atmosféricas y ruido</td><td>Se presento a la interventoría la documentación y listado de diez (10) vehículos, los cuales serían los asignados para el retiro de los RCD, Respel y traslado de material en obra.

Estos vehículos son:

<table>
<tr><th>PLACA VEHICULO</th><th>PIN AMBIENTAL</th></tr>
<tr><td>AEH864</td><td>20651</td></tr>
<tr><td>AUK388</td><td>22751</td></tr>
<tr><td>ACE001</td><td>18319</td></tr>
<tr><td>TDY592</td><td>22361</td></tr>
<tr><td>THL518</td><td>23548</td></tr>
<tr><td>OAI495</td><td>910</td></tr>
<tr><td>AAI171</td><td>4585</td></tr>
<tr><td>WAJ977</td><td>18927</td></tr>
<tr><td>BBJ438</td><td>20325</td></tr>
<tr><td>AJB574</td><td>1945</td></tr>
</table>

Todos los vehículos cuentan con la RTM vigente.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Programa de prevención sobre la contaminación de vertimientos en cuerpos de agua y redes de servicios públicos</td><td>Para este periodo se protegió 1 sumidero ubicado en el colegio Libertadores, los demás sumideros de los centros educativos, debido a que estos no están ubicados en el Área de Influencia Directa AID de las actividades de obra no tuvieron la necesidad de ser protegidos, también se definió que los acopios de material pétreo quedaran lejos de los sumideros mencionados.

Para este periodo se utilizaron cuatro (4) unidades sanitarias en los Colegios: Diana Turbay, Libertadores, Fe y Alegría y Manuel del Socorro. El proveedor Saniport SAS, presento acta de disposición final de julio (reporta mes vencido) con la empresa ECOBIOR S.A.S E.S.P.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Programa de uso y almacenamiento adecuado de materiales y elementos de construcción</td><td>Se realizo la compra de 178,5 m^3 de material
B- 400
B - 600
Arena de pozo
Arena de rio
Gravilla
Mixto
Rajon
Se presentan soportes del trasportador y entrega en el sitio.</td></tr>
</table>

ACTIVIDADES		DESCRIPCIÓN
		El proveedor donde se compró el material se encuentra en listado de proveedores pétreos y agregados aprobados por la SDA e incluidos en el PMA presentado por el contratista.
10	**Programa de manejo adecuado de la vegetación y del paisaje**	Zonas Verdes: De los colegios visitados en el periodo se evidenció posible afectación a zonas verdes en el Colegio Liceo Femenino, para ello se instaló cerramiento aislando la zona y previniendo su deterioro. Individuos Arbóreos: No se identificó presencia de árboles ubicados en el área de Influencia directa de las obras, por lo que no hubo la necesidad de aislarlos por medio de un cerramiento en lona o malla.
11	**Programa de señalización interna y externa de la obra**	Se reporta la limitación de las actividades de la obra manteniendo la instalación de cerramientos en los colegios donde se requiere (Restrepo Millán, Fe y alegría, Liceo Femenino, Manuel del Socorro, Reino de Holanda, Marruecos y Molinos, Libertador, San Agustín). Los cerramientos y broches, son la barrera de protección de las actividades de la obra y los estudiantes del colegio.
12	**Programa de implementación de terrazas, jardines o fachadas verdes y compras verdes.**	Se reporta en el formato de inventario aparatos eléctricos – sanitarios, la instalación de: • 140 lámparas herméticas led • 24 push sanitarios • 3 sanitarios
13	**Formato trimestral de RCDs para la Secretaría Distrital de Ambiente SDA**	El contratista al corte de este informe no presento evidencia del cargue de RCD en el aplicativo web de la SDA, correspondiente al segundo trimestre del año (abril – mayo – junio)

Fuente. Informe ambiental No 8. Contratista CONSORCIO MIA GP

Todas las actividades y soportes del contratista CONSORCIO MIA GP, están consignadas y sustentadas en el informe ambiental del contratista No 8.

Ver Anexo 1. Informe ambiental contratista No 8 – Informe ambiental de interventoría No 8.

6.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERVENTORÍA

La interventoría ambiental CONSORCIO TIG, realizo actividades de revisión relacionadas con el cumplimiento documental, y seguimiento de las actividades consignadas en los programas ambientales definidos en el PMA presentado por el contratista CONSORCIO MIA GP, y que aplicaron para las actividades ejecutadas en el periodo que comprende del 20 de agosto al 19 de septiembre 2023.

Estas actividades fueron:

6.2.1 Revisión del documento Informe ambiental del Contratista No 8

Se realizo la revisión al documento informe ambiental del contratista CONSORCIO MIA GP, el cual fue remitido a la interventoría a través del correo electrónico el día 26 de septiembre de 2023.

Se realizaron observaciones puntuales, las cuales fueron informadas en reunión de mesa de trabajo el día 27 de septiembre, realizada entre los profesionales ambientales de la interventoría y del contratista de obra.

Ver Anexo 1. Informe ambiental contratista No 8 – Informe ambiental de interventoría No 8.

Ver Anexo 2. Correo electrónico radicación informe ambiental contratista - Informe ambiental de interventoría No 8

Ver Anexo 3. Acta mesa de trabajo observaciones puntuales - Informe ambiental de interventoría No 8

6.2.2 Recorridos por los planteles educativos

Los recorridos realizados a los planteles educativos, son programados de acuerdo al porcentaje de tiempo contractual definido para el profesional ambiental de la interventoría (1 vez por semana), por lo tanto, se planearon y realizaron los siguientes:

Tabla 7 Programación de recorridos

FECHA DE RECORRDIO	PLANTEN EDUCATIVO VERIFICADO
30 de agosto 2023	1. COLEGIO SAN AGUSTÍN (sede A) 2. COLEGIO DIANA TURBAY (Sede B) 3. COLEGIO FE Y ALEGRIA 4. COLEGIO ALFREDO IRIARTE 5. COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (Sede A) COLEGIO LIBERTADOR (Sede B)
11 de septiembre 2023	1. COLEGIO RESTREPO MILLAN (Sede B) 2. COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (sede A) 3. COLEGIO DIANA TURBAY (Sede B) 4. COLEGIO FE Y ALEGRIA COLEGIO SAN AGUSTÍN (sede A)
14 de septiembre	1. COLEGIO RESTREPO MILLAN (Sede B) 2. COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (Sede A) 3. COLEGIO REINO DE HOLANDA (sede A) 4. COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (sede A) 5. COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (sede A)

Fuente. CONSORCIO TIG

Como evidencia de estas visitas se generó el registro fotográfico y diligenciamiento de listas de inspección ambiental.

Ver Anexo 4. Lista de inspección ambiental para proyecto de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de plantas físicas – Informe ambiental de interventoría No 8.

Ver Anexo 5. Registro Fotográfico – Informe ambiental de interventoría No 8.

6.2.3 Procesos de atención de emergencia ambiental por individuos arbóreos

Se continua a la espera de la firma por parte del área técnica de la SED de las Fichas SAES, generadas para la atención a emergencias ambientales relacionadas con tala o aprovechamiento forestal de 5 individuos arbóreos, ubicados en el Colegio Enrique Olaya Herrera (sede A) y Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño (sede A), el pasado 6 de mayo 2023.

Una vez estas sean firmadas se concluirá el proceso de emergencia ambiental.

6.2.4 Inspección ambiental por parte de la Secretaria de Educación Distrital (SED)

Se recibió el día 24 de julio el informe por parte de la SED, relacionado con los hallazgos evidenciados durante la segunda visita llevada a cabo el 12 de julio por la Profesional Especializada Paula Andrea Arango Restrepo, quien hace parte de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED.

El informe por parte de la SED contiene un total de 54 observaciones, de la cuales 41 estuvieron relacionadas con el componente ambiental:

Tabla 8 Observaciones ambientales

OBSERVACIONES AMBIENTALES	
Positivas	12
Recomendaciones	3
Hallazgos por mejorar	26
TOTAL	**41**

Fuente. Informe SED


La interventoría durante las inspecciones realizadas durante los meses de julio, agosto y septiembre, verificó las subsanaciones realizadas por parte del contratista, evidenciando la gestión realizada a los 26 hallazgos por mejorar:

Tabla 9 Estado de hallazgos SED

OBSERVACIONES AMBIENTALES	
Hallazgos cerrados	20
Hallazgos parcialmente trabajados	1
Hallazgos abiertos	5
TOTAL	**26**

Fuente. CONSORCIO TIG

Ilustración 2 Estado hallazgos visita SED

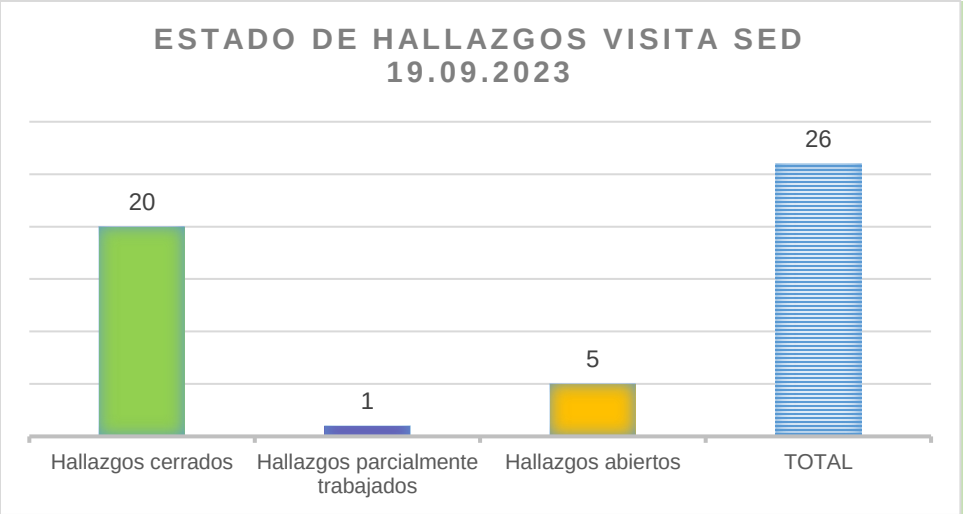

Fuente. CONSORCIO TIG

Por parte del contratista se espera recibir el informe de cierre de subsanaciones, en el siguiente periodo (sep – oct).

Por parte de la interventoría el 31 de agosto se envió al contratista de obra oficio TIG-MEM-329- Pendientes del componente ambiental, solicitando el informe correspondiente.

Ver Anexo 12. Informe ambiental SED visita Grupo 8 - Informe ambiental de interventoría No 8.

Ver Anexo 13. Oficios TIG-MEM-329- Pendientes del componente ambienta- Informe ambiental de interventoría No 8

6.2.5 Hallazgos ambientales prioritarios

Durante los recorridos realizados por la interventoría ambiental, se generan hallazgos que le son informados al profesional ambiental del contratista por vía WhatsApp, llamada telefónica y a través de tabla en Excel que compila todos los hallazgos ambientales generados y el estado de gestión (abierto – parcial – cerrado).

Esta tabla en Excel contiene hallazgos desde el 19 de mayo hasta el 05 de julio.

Ver Anexo 14. Tabla en Excel hallazgos ambientales - Informe ambiental de interventoría No 8.

La interventoría evidencio que las medidas tomadas por el contratista de obra son reactivas por lo que los hallazgos son repetitivos y se tardan demasiado tiempo en hacer los cierres.

Debido a lo anterior, el día 11 de septiembre 2023 se realizó junto con el contratista (profesional ambiental y dirección de obra) recorrido por los planteles educativos, con el fin de explicar los hallazgos y la necesidad de tomar acciones.

A la fecha de corte del presente informe y de acuerdo a lo evidenciado en obra, se han obtenido los siguientes resultados frente a la subsanación de los hallazgos:


Tabla 10 Estado de hallazgos Ambientales

ESTADO DE LOS HALLAGOS	CANTIDAD
Hallazgos cerrados	32
Hallazgos parcialmente trabajados	5
Hallazgos abiertos	8
TOTAL	**45**

Fuente. CONSORCIO TIG

Como se muestra en la gráfica se verifico avance en el cierre de hallazgos y se están trabajando los 13 hallazgos restantes. Estos se generalizan en falta de orden y aseo de los frentes de trabajo, falta de puntos ecológicos, inadecuado separación de RCD y demás residuos.

Ilustración 3 Estado de hallazgos Ambientales

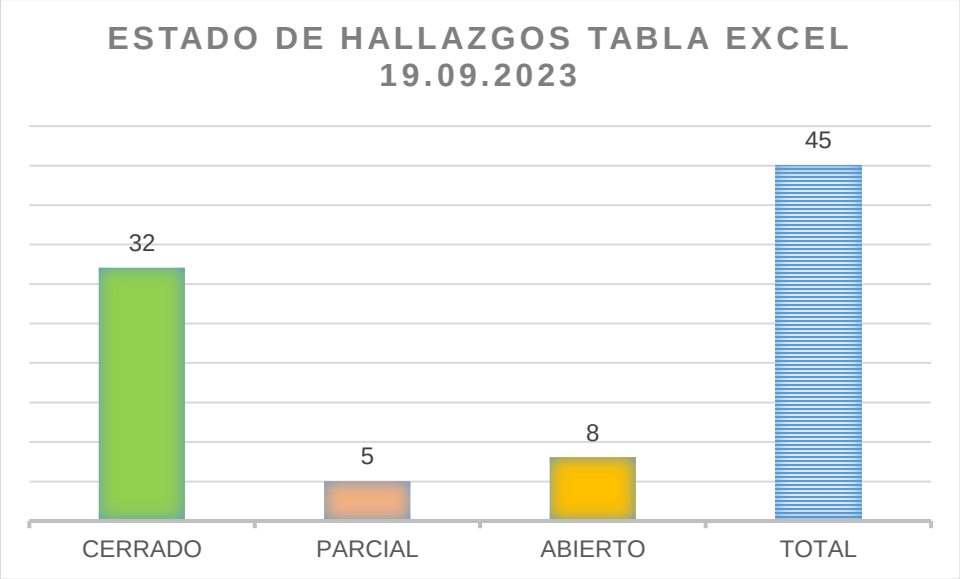

Fuente. CONSORCIO TIG

6.2.6 Inspección ambiental por parte de la interventoría

La profesional ambiental de la interventoría del CONSORCIO TIG, realizó recorridos a los planteles educativos que presentaron actividades de obra en el periodo del 20 de agosto al 19 de septiembre 2023.

Con el fin de verificar de una forma más completa, la interventoría ambiental aplica formato "Lista de inspección ambiental para proyecto de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de plantas física", el cual contiene ítems de verificación de los programas ambientales consignados en el PMA del contratista.

El formato de Lista de inspección ambiental, se compartió con el contratista, para que este pudiera verificar los criterios ambientales aplicando la lista.

De los dieciséis (16) planteles educativos intervenidos en este periodo, se generó lista de inspección ambiental por parte de la interventoría, para tres (3) colegios, realizando las siguientes observaciones:

Nota: En la tabla 11, se tienen en cuenta aquellos hallazgos evidenciados en periodos anteriores y que no han sido cerrados o que fueron cerrados en el periodo del presente informe:

Tabla 11 Aplicación Lista de inspección ambiental

APLICACIÓN LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL			
FECHA DE	**PLANTEN EDUCATIVO DONDE SE APLICO**	**HALLAZGOS IDENTIFICADO**	**ESTADO DEL HALLAZGO**
07 de Junio 2023	COLEGIO ALFREDO IRIARTE (sede A)	Esta solicitud ya se había realizado, no fue corregida. Se solicita contar con punto ecológico. Separar los residuos de acuerdo al tipo de residuo. Mejorar sitio de acopio de residuos	CERRADO POR TERMINACIÓN DE OBRA
29 de Junio 2023	ENRIQUE OLAYA HERRERA	Dar solución a la solicitud de puntos ecológicos en las obras. Orden y Aseo	ABIERTO SE VOLVIO HACER LA SOLICITUD
05 de Julio 2023	COLEGIO DIANA TURBAY	Frente de obra desordenado, Se evidencian canecas con todo tipo de residuos (tanto del punto ecológico como canecas de obra), se evidencia lonas con todo tipo de residuos (tenis, icopor), los empaques de bolsa de cemento mal acopiados, se evidencia acopio de RCD mezclado.	ABIERTO SE VOLVIO HACER LA SOLICITUD
05 de Julio 2023	COLEGIO FE Y ALEGRIA	Se evidencian acopio de residuo de madera sin señalizar (estos se deben retirar), se evidencian acopios de material sin protección	CERRADO
04 de mayo 2023 **05 de agosto 2023**	COLEGIO FE Y ALEGRIA	Se solicitan punto ecológico o bolsas de colores Mejorar orden y aseo, protección de material pétreo, buen manejo de acopios de RCD	ABIERTO SE VOLVIO HACER LA SOLICITUD
29 de Junio 2023 **05 de agosto 2023**	COLEGIO LICEO FEMENINO	Se encontró acopio de RCD mezclado (cartón, con RCD), se solicitó al oficial encargado Héctor que realizar una correcta separación y organizar ese acopio	CERRADO POR TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
11 de septiembre 2023	COLEGIO LICEO FEMENINO	Individuos arbóreos sin demarcación, acumulación de acopios de RCD (tejas)	ABIERTO

APLICACIÓN LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL			
FECHA DE	**PLANTEN EDUCATIVO DONDE SE APLICO**	**HALLAZGOS IDENTIFICADO**	**ESTADO DEL HALLAZGO**
14 de septiembre 2023	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO	Se debe mantener protegido los acopios de material pétreo	ABIERTO
14 de septiembre 2023	COLEGIO RESTREPO MILLAN (Sede B)	Se identifico acopio de residuos con todo mezclado (bolsas de cemento, tejas, plástico)	ABIERTO

Fuente. CONSORCIO TIG

Los formatos diligenciados se encuentran en el Anexo 4. Lista de inspección ambiental para proyecto de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de plantas físicas – Informe ambiental de interventoría No 8.

Ver Anexo 4. Lista de inspección ambiental para proyecto de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de plantas físicas – Informe ambiental de interventoría No 8.

6.2.7 Verificación de Plan de Manejo ambiental Contratista

Se realizo la verificación de los programas ambientales propuestos y aprobados por el contratista en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), como puntos relevantes se encuentran los siguientes:

6.2.7.1 Programa de gestión integral de residuos sólidos (ordinarios, orgánicos, reciclables, RCD´s y peligrosos).

Se verifico la gestión del contratista a través de la revisión y trazabilidad del reporte de entrega de residuos, cada uno de los datos consignados en las tablas a continuación, fueron validados por la interventoría:

- Residuos de Construcción y Demolición (RCD):

Durante el periodo el contratista reporto la entrega de 189 m^3 de RCD, en la trazabilidad realizada se identifica tipo de material, datos empresa trasportadora (nombre, entrega de vale y fecha de vale) y datos de la empresa de disposición final (nombre, tipo de tratamiento, número de folio, fecha, certificación):

Tabla 12 Reporte entrega de RCD en el periodo del informe

CONSORCIO TIG										
	CONSORCIO TIG									
	SEGUIMIENTO POR PARTE DE INTERVENTORIA									
	Fecha de Seguimiento			Numero o razon social del contratista			NIT o CC	No de Contrato		REPORTE No
	Desde el 20 de agosto del 2023 hasta 19 de septiembredel 2023			CONSORCIO MIA GP			901634703-9	Contrato de obra No C01.PCCNTR.4077645		7

Gestión ambiental RCD											
					Empresa Transportadora			Empresa disposición final			
No	Fecha de retiro	Cantidad	Unidad de medida	Tipo de material	NOMBRE EMPRESA	VALE	FECHA DE VALE	EMPRESA DISPOSICIÓN FINAL	VALE/FOLIO	FECHA DE RECIBIDO	CERTIFICADO
1	23/08/2023	7	m3	EXCAVACIÓN SENCILLO	Wilson Riaño	SI	23/08/2023	CEMEX	238186705	23/08/2023	PENDIENTE
2	23/08/2023	7	m3	EXCAVACIÓN SENCILLO	Wilson Riaño	SI	23/08/2023	CEMEX	238187013	23/08/2023	PENDIENTE
3	29/08/2023	7	m3	EXCAVACIÓN SENCILLO	Colgravas MG	SI	29/08/2023	CEMEX	238614435	29/08/2023	PENDIENTE
4	30/08/2023	7	m3	EXCAVACIÓN SENCILLO	Wilson Riaño	SI	30/08/2023	CEMEX	238689330	30/08/2023	PENDIENTE
5	30/08/2023	7	m3	EXCAVACIÓN SENCILLO	Wilson Riaño	SI	30/08/2023	CEMEX	238672263	30/08/2023	PENDIENTE
6	30/08/2023	7	m3	EXCAVACIÓN SENCILLO	Wilson Riaño	SI	30/08/2023	CEMEX	238693154	30/08/2023	PENDIENTE
7	30/08/2023	7	m3	HETEROGENEO	Colgravas MG	SI	30/08/2023	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	AA2803-0012-2023	30/08/2023	PENDIENTE
8	31/08/2023	7	m3	EXCAVACIÓN SENCILLO	Wilson Riaño	SI	31/08/2023	CEMEX	238758008	31/08/2023	PENDIENTE
9	1/09/2023	7	m3	CONCRETO SENCILLO	Colgravas MG	SI	1/09/2023	CEMEX	238866072	1/09/2023	PENDIENTE
10	5/09/2023	7	m3	CONCRETO SENCILLO	Colgravas MG	SI	5/09/2023	CEMEX	238917659	7/09/2023	PENDIENTE
11	5/09/2023	7	m3	EXCAVACIÓN SENCILLO	Colgravas MG	SI	5/09/2023	CEMEX	238895240	5/09/2023	PENDIENTE
12	5/09/2023	7	m3	EXCAVACIÓN SENCILLO	Colgravas MG	SI	5/09/2023	CEMEX	238888946	5/09/2023	PENDIENTE
13	7/09/2023	7	m3	CONCRETO SENCILLO	Colgravas MG	SI	7/09/2023	CEMEX	238936203	7/09/2023	PENDIENTE
14	7/09/2023	7	m3	EXCAVACIÓN SENCILLO	Colgravas MG	SI	7/09/2023	CEMEX	238935331	7/09/2023	PENDIENTE
15	7/09/2023	7	m3	EXCAVACIÓN SENCILLO	Colgravas MG	SI	7/09/2023	CEMEX	238935498	7/09/2023	PENDIENTE
16	9/09/2023	7	m3	CONCRETO SENCILLO	Colgravas MG	SI	9/09/2023	CEMEX	239006226	11/09/2023	PENDIENTE
17	11/09/2023	7	m3	HETEROGENEO	Colgravas MG	SI	11/09/2023	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	A002803-0020-2023	11/09/2023	PENDIENTE
18	12/09/2023	7	m3	SENSILLO - DEMOLICIÓN - CONCRETO - MANPOSTERIA	Colgravas MG	SI	12/09/2023	MAQUINAS AMARILLAS SAS	48554	12/09/2023	PENDIENTE
19	13/09/2023	7	m3	CONCRETO SENCILLO	Colgravas MG	SI	13/09/2023	CEMEX	238025152	13/09/2023	PENDIENTE
20	14/09/2023	7	m3	CONCRETO SENCILLO	Colgravas MG	SI	14/09/2023	CEMEX	239034594	14/09/2023	PENDIENTE
21	14/09/2023	7	m3	SENSILLO - DEMOLICIÓN - CONCRETO - MANPOSTERIA	Colgravas MG	SI	14/09/2023	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBOA SAS	14546	14/09/2023	PENDIENTE
22	15/09/2023	7	m3	SENSILLO - DEMOLICIÓN - CONCRETO - MANPOSTERIA	Colgravas MG	SI	15/09/2023	MAQUINAS AMARILLAS SAS	49072	15/09/2023	PENDIENTE
23	15/09/2023	7	m3	CONCRETO SENCILLO	Colgravas MG	SI	15/09/2023	CEMEX	239051056	15/09/2023	PENDIENTE
24	16/09/2023	7	m3	EXCAVACIÓN SENCILLO	Colgravas MG	SI	16/09/2023	CEMEX	239067110	16/09/2023	PENDIENTE
25	16/09/2023	7	m3	EXCAVACIÓN SENCILLO	Colgravas MG	SI	16/09/2023	CEMEX	239057628	16/09/2023	PENDIENTE
26	19/09/2023	7	m3	EXCAVACIÓN SENCILLO	Colgravas MG	SI	19/09/2023	CEMEX	239091434	19/09/2023	PENDIENTE
27	19/09/2023	7	m3	SENSILLO - DEMOLICIÓN - CONCRETO - MANPOSTERIA	Colgravas MG	SI	19/09/2023	MAQUINAS AMARILLAS SAS	49699	19/09/2023	PENDIENTE
	TOTAL	189									

Fuente. CONSORCIO MIA GP

Ver Anexo 8 Registros verificados y aprobados por interventoría (RCD) – Informe ambiental de interventoría No 8, donde se encontrará:

- Vales/ folios de la empresa de disposición final.
- Certificaciones de Disposición final (meses agosto correspondiente al periodo)
- Documentación legal de proveedores de disposición final.
- Formatos RCD (incluido el solicitado en la Resolución MADS 1257 de 2021)

Realizando la trazabilidad del reporte 1 (Informe No 2), reporte 2 (informe No 3), reporte 3 (Informe No 4), reporte 4 (informe 5), reporte 5 (informe 6), reporte 6 (informe 7) y reporte 7 (informe 8) del contratista CONSORCIO MIA GP, se puede establecer los siguientes datos de seguimiento en cuanto a la disposición de RCD:

Tabla 13 Seguimiento mes a mes Disposición final RCD

MES	PROVEEDORES DISPOSICIÓN FINAL DE RCD										
	CEMEX		MAQUINAS AMARILLAS SAS		GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS		INGEOMINERIA		RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA		TOTALES DEL MES m3
	VIAJES	TOTAL m3	VIAJES	TOTAL m3	VIAJES	TOTAL m3	VIAJES	TOTAL m3	VIAJES	TOTAL m3	
FEBRERO	4	28	No se retiraron	0	No se retiraron	0	No se retiraron	0	No se retiraron	0	28
MARZO	14	98	1	7	1	7	No se retiraron	0	No se retiraron	0	112
ABRIL	10	70	3	21	2	14	1	7	No se retiraron	0	112
MAYO	19	133	11	77	4	28	No se retiraron	0	No se retiraron	0	238
JUNIO	23	161	1	7	10	133	3	37	No se retiraron	0	338
JULIO	14	98	5	35	31	31	No se retiraron	0	No se retiraron	0	164
AGOSTO	17	119	No se retiraron	0	3	21	No se retiraron	0	No se retiraron	0	140
SEPTIEMBRE	14	98	3	21	1	7	No se retiraron	0	1	7	133
TOTAL POR PROVEEDOR m3		**805**		**168**		**241**		**44**		**7**	**1265**

Certificado entregado por el proveedor

Pendiente entrega de certificado por el proveedor

Fuente. CONSORCIO MIA GP

Nota: Los certificados de disposición final del mes de septiembre, son entregados por los proveedores mes vencido.

- Residuos Peligrosos

Durante el periodo el contratista reporto la entrega de 12460 kg de Residuos Peligrosos (tejas con asbesto), en la trazabilidad realizada se identifica tipo de material, datos empresa trasportadora (nombre, entrega de vale y fecha) y datos de la empresa de disposición final (nombre, tipo de tratamiento, número de certificado y fecha):

Tabla 14 Reporte entrega RESPEL en el periodo

CONSORCIO TIG	CONSORCIO TIG				
	SEGUIMIENTO POR PARTE DE INTERVENTORIA				
	Fecha de Seguimiento	Numero o razon social del contratista	NIT o CC	No de Contrato	REPORTE No 6
	Desde el 20 de agosto del 2023 hasta 19 de septiembredel 2023	CONSORCIO MIA GP	901634703-9	Contrato de obra No C01.PCCNTR.4077645	

Gestión ambiental RESPEL											
No	Fecha de retiro	Cantidad	Unidad de medida	Tipo de material	Empresa Transportadora			Empresa disposición final			
					NOMBRE EMPRESA	CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICADO	TIPÓ DE TRATAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL	EMPRESA DISPOSICIÓN FINAL	CERTIFICADO	FECHA DE RECIBIDO
1	24/08/2023	1810	Kg	Teja con asbesto	Reciclajes LIV SAS	297	24/08/2023	Disposición directa en celda de seguridad - Peligrosos	CENTRO DE GETSIÓN SOSTENIBLE S.A.S E.S.P	43362	28/08/2023
2	12/09/2023	1650	Kg	Teja con asbesto	Reciclajes LIV SAS	312	12/09/2023	Disposición directa en celda de seguridad - Peligrosos	CENTRO DE GETSIÓN SOSTENIBLE S.A.S E.S.P	PENDIENTE	PENDIENTE
3	12/09/2023	4700	Kg	Teja con asbesto	Reciclajes LIV SAS	313	12/09/2023	Disposición directa en celda de seguridad - Peligrosos	CENTRO DE GETSIÓN SOSTENIBLE S.A.S E.S.P	PENDIENTE	PENDIENTE
4	15/09/2023	2900	Kg	Teja con asbesto	Reciclajes LIV SAS	317	15/09/2023	Disposición directa en celda de seguridad - Peligrosos	CENTRO DE GETSIÓN SOSTENIBLE S.A.S E.S.P	PENDIENTE	PENDIENTE
5	15/09/2023	1400	Kg	Teja con asbesto	Reciclajes LIV SAS	317®	15/09/2023	Disposición directa en celda de seguridad - Peligrosos	CENTRO DE GETSIÓN SOSTENIBLE S.A.S E.S.P	PENDIENTE	PENDIENTE
Total		12460									

Fuente. CONSORCIO MIA GP

Anexo 8 Registros verificados y aprobados por interventoría (Residuos Peligrosos) – Informe ambiental de interventoría No 8, donde se encontrará:

- Certificado de recolección de la empresa de transporte
- Certificaciones de Disposición final (agosto)
- Documentación legal de proveedores de disposición final.

Nota: Los certificados de disposición final del mes de septiembre, son entregados por los proveedores mes vencido

Realizando la trazabilidad del reporte 1 (Informe No 2), reporte 2 (Informe 4), reporte 3 (informe 5), reporte 4 (informe 6), reporte 5 (informe 7) y reporte 6 (informe 8) del contratista CONSORCIO MIA GP, se puede establecer los siguientes datos de seguimiento en cuanto a la disposición de residuos peligrosos (tejas con asbesto y manto):

Tabla 15 Seguimiento mes a mes Disposición final RESPEL

MES	PROVEEDORES DISPOSICIÓN FINAL DE RESPEL	
	CENTRO DE GESTIÓN DISPONIBLE SAS E.S.P	TOTALES DEL MES Kg
	TOTAL Kg	
FEBRERO	No se retiraron	0
MARZO	5930	5930
ABRIL	No se retiraron	0
MAYO	57220	57220
JUNIO	22080	22080
JULIO	9930	9930
AGOSTO	6510	6510
SEPTIEMBRE	10650	10650
TOTAL POR PROVEEDOR Kg	**112320**	

Certificado entregado por el proveedor
Pendiente entrega de certificado por el proveedor

Fuente. CONSORCIO MIA GP

- Residuos Reciclables

Durante el periodo el contratista CONSORCIO MIA GP, no reporta entrega para disposición final de residuos aprovechables.

Realizando la trazabilidad de reportes 1 (informe 1), reporte 2 (informe 5), reporte 3 (informe 6), reporte 4 (informe 7) del contratista CONSORCIO MIA GP, se puede establecer los siguientes datos de seguimiento en cuanto a la disposición de residuos aprovechables (chatarra y aluminio):

Tabla 16 Seguimiento mes a mes Disposición final Residuos Aprovechables

MES	PROVEEDORES DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	
	RECICLAJES MARTHA SAS ACERRIAS PAZ DEL RIO	TOTALES DEL MES Kg
	TOTAL Kg	
FEBRERO	211	211
MARZO	No se retiraron	0
ABRIL	No se retiraron	0
MAYO	No se retiraron	0
JUNIO	710	710
JULIO	295	295
AGOSTO	0	0
SEPTIEMBRE	0	0
TOTAL POR PROVEEDOR Kg	1216	

Certificado entregado por el proveedor
Pendiente entrega de certificado por el proveedor

Fuente. CONSORCIO MIA GP

6.2.7.1.1 Registro de cargue de reportes trimestrales RCD

A corte de este informe no se ha recibido por parte del contratista de obra CONSORCIO MIA GP, el registro del cargue de la información de RCD en el aplicativo web de la SDA, correspondiente al segundo trimestre del año.

Sin embrago para el mes de septiembre el contratista de obra realizo cambio de profesional ambiental, a quien se le informo la situación y se le solicito realizar el respetivo cargue en el aplicativo web de la SDA.

Por lo tanto, se explica en este informe la trazabilidad de la gestión realizada por parte de la interventoría, para lograr el cumplimiento de este requisito:

a) De acuerdo a la normatividad ambiental vigente Resolución No.1257 de 2021, artículo 4, el cual modifico el articulo 13 de la Resolución No. 0472 de 201, el cual cita que:

Así mismo, el reporte de su implementación con sus respectivos soportes deberá ser remitido a la autoridad ambiental competente dentro de los 15 días calendario, contados a partir del final de cada trimestre del año durante la ejecución de la obra, así como un reporte de cierre dentro de los 45 días calendarios siguientes a la terminación de la obra.

Se aclara para todos los generadores, que el plazo de cargue de la información de RCD en el aplicativo web de la Secretaria Distrital de Ambiente (RCD), es de 15 días calendario, contados a partir del final de cada trimestre, siendo: el 15 de abril, 15 julio, 15 de octubre y 15 de enero, las fechas de cumplimiento normativo.

b) Por motivos de obtención de certificaciones, organización de la información y revisión de la misma, se estableció el 31 de julio como día máximo para el cargue del segundo trimestre del año.

c) El contratista de obra mostro incumplimiento en este compromiso, por lo que se emitieron tres (3) llamados de atención:

- Primer llamado de atención: 01 de agosto 2023
- Segundo llamado de atención: 04 de agosto 2023
- Tercer llamado de atención: 09 de agosto 2023

Ver Anexo 15. Oficios llamados de atención ambiental – Informe ambiental de interventoría No 8.

d) El contratista dio respuesta, al tercer llamado de atención donde manifiesto lo siguiente:

“Debido a inconvenientes en la plataforma, como es nuestra obligación, enviaremos la información a la interventoría para que a través ésta se realice el envío a la Entidad contratante la cual deberá realizar el cargue de la información en la página de la Secretaria de Medio Ambiente”.

Ver Anexo 16. Respuesta contratista a llamados de atención ambiental – Informe ambiental de interventoría No 8.

e) La interventoría dio respuesta a través de comunicado el día 15 de agosto, donde se le da claridad al contratista de obra de sus Obligaciones en materia ambiental establecidos el ANEXO TÉCNICO del contrato de obra, en su capítulo 6. Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental, subcapítulo 6.4 Residuos de construcción y demolición RCD e inciso 6.4.4 Informe Ambiental, donde se establece como obligación del contratista de obra:

“Registro de cargue de reportes mensuales RCD generado en el aplicativo web de la SDA, con sus respectivos soportes”.

Ver Anexo 17. Oficios aclaración de obligaciones ambientales – Informe ambiental de interventoría No 8.

f) Una vez aclarado el tema el contratista de obra realiza el día 21 de agosto 2023, el cargue correspondiente a la gestión de RCD del segundo trimestre del año, así mismo el día 22 de agosto la interventoría realiza la validación y verificación cargada y, genera observaciones por encontrarse incompleta la información.

Ver Anexo 18. Registro de cargue RCD plataforma SDA segundo trimestre del no aprobado 21.08.2023– Informe ambiental de interventoría No 8.

Ver Anexo 19 Observaciones de interventoría al cargue RCD plataforma SDA – Informe ambiental de interventoría No 8.

g) Una vez validado el tema con la dirección de obra de la interventoría, se procede el 31 de agosto a generar un oficio TIG-MEM-329- Pendientes del componente ambiental, donde se solicita nuevamente el respectivo cargue.

Ver Anexo 13. Oficios TIG-MEM-329-Pendientes del componente ambienta- Informe ambiental de interventoría No 8.

6.2.7.2 Programa de control de emisiones atmosféricas y ruido

A través de este programa se verifica pin ambiental y la documentación de los vehículos que transportan materiales, residuos de construcción y demolición, residuos peligrosos y residuos aprovechables, estos se mencionan a continuación:

Tabla 17 Vehículos que transportan materiales y residuos

PLACA VEHICULO	PIN AMBIENTAL	SERVICIO QUE PRESTA
AEH864	20651	Transporte RCD
AUK388	22751	Transporte RCD
ACE001	18319	Transporte RCD
TDY592	22361	Transporte de Respel
THL518	23548	Transporte de Respel
OAI495	910	Transporte RCD
AAI171	4585	Transporte RCD
WAJ977	18927	Transporte RCD
BBJ438	20325	Transporte RCD
AJB574	1945	Transporte RCD

Fuente. CONSORCIO TIG

Los vehículos que transportan RCD´s y materiales de obra, cuentan con Pin ambiental vigente. Todos los vehículos que prestan servicios a CONSORCIO MIA GP cuentan con revisión tecnicomecanica vigente y documentos al día.

Ver Anexo 9 Documentación vehículos– Informe ambiental de interventoría No 8.

6.2.7.3 Programa de uso y almacenamiento adecuado de materiales y elementos de construcción

Se realizo la verificación del proveedor de B- 400, B - 600, mixto, rajón, arena de rio, gravilla y arena de pozo, los cuales se encuentra en el listado de proveedores autorizados, y se cuenta con la documentación ambiental vigente.

Durante el periodo se realizó la siguiente compra 155,5 m^3

Ver Anexo 10 Proveedor de material pétreo– Informe ambiental de interventoría No 8, donde se encontrará:

- Vale de trasportador
- Documentos legales proveedor

6.2.7.4 Programa de implementación de terrazas, jardines o fachadas verdes y compras verdes.

En este programa se verifico la instalación de accesorios ahorradores eléctricos y/o sanitarios, los datos reportados por el área ambiental del contratista se compararon con los datos del área técnica y se diligencio el formato correspondiente.

Igualmente, la instalación reportada por el contratista fue verificada en las obras, obteniendo los siguientes datos:

Tabla 18 Instalación de accesorios ahorradores

ACCESORIO INSTALADO	CANTIDAD
Lámparas herméticas led	140 UNIDADES
Push sanitario	24 UNIDADES
Tomacorrientes	2 UNIDADES

Fuente. CONSORCIO MIA GP

Ver Anexo 11. Inventario aparatos ahorradores– Informe ambiental de interventoría No 8.

6.2.7.5 Programa de prevención sobre la contaminación de vertimientos en cuerpos de agua y redes de servicios públicos

Se realizo seguimiento a la instalación de cuatro (4) baterías sanitarias en el Colegio Fe y Alegría, Colegio Libertadores, Colegio Diana Turbay y Colegio Manuel del Socorro.

Se verifico mantenimiento periódico, certificación a corte del 31 de agosto, del proveedor de disposición final ECOBIOR SAS ESP.

Se verificaron:

- Documentos legales del proveedor
- Certificado de disposición final de las aguas residuales

- Recibos o vales de mantenimiento de las unidades sanitarias

Ver Anexo 20. Mantenimiento de unidades sanitarias-– Informe ambiental de interventoría No 8

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO CON LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES MÁS RELEVANTES DE OBRA.

El registro fotográfico es el consolidado entre las actividades del contratista CONSORCIO MIA GP y la interventoría CONSORCIO TIG.

Este es presentado en el anexo 5.

Ver Anexo 5 Registro Fotográfico - Informe ambiental de interventoría No 8.

8. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA PROTECCIÓN A LOS SUMIDEROS ALEDAÑOS

En el periodo que comprende el informe ambiental No 8 (20 de agosto al 19 de septiembre 2023), en los planteles educativos intervenidos, se realizó protección del sumidero ubicado en el colegio Libertadores Sede B.

En los demás planteles educativos no se realizó la protección a sumideros aledaños, ya que se evidencio que el área de influencia de las actividades realizadas, no afectaba ninguno de estos elementos, por lo tanto, la interventoría genera certificación donde consta lo anterior.

Nota: Se indico al contratista que, si se identifica la posible afectación a los sumideros, se realice la respectiva protección del elemento (sumidero).

Ver Anexo 6. Certificación protección a sumideros – Informe ambiental de interventoría No 8

9. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS AL PROYECTO

En el periodo que comprende el informe ambiental No 8 (20 de agosto al 19 de septiembre 2023), se realizó la protección a zonas verdes aledañas en el Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño (sede A), ya que se evidencio que por la actividad de mezcla de concreto y acopio de materiales en el área de influencia de las actividades se podría afectar alguno de estos elementos, por lo tanto, la interventoría genera certificación donde consta lo anterior.

En cuanto a los demás planteles educativos intervenidos en el periodo del presente informe, no se realizó intervención de las zonas verdes aledañas al proyecto, por lo tanto, la interventoría genera certificación donde consta lo anterior.

Nota: Se indico al contratista que si se identifica la posible afectación a zonas verdes e individuos arbóreos se realice la respectiva protección del elemento.

Ver Anexo 7. Certificación intervención zonas verdes – Informe ambiental de interventoría No 8

10. CONCLUSIONES

- En el informe ambiental de interventoría No 8, se realiza la revisión y trazabilidad de las actividades ejecutadas por el contratista con el fin de validar el cumplimiento ambiental.

- Se realizo mesa de trabajo entre la interventoría y el contratista, con el fin de aclarar dudas y subsanar observaciones del informe ambiental del contratista No 8.

- Los programas ambientales consignados en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) elaborado por el contratista son diecisiete (17) en total, se da cumplimiento a doce (12) de los programas ambientales, los otros cinco programas ambientales, se verificaron y para el periodo del informe No 8, no aplican.

- De la atención a las emergencias ambientales solicitadas por la Secretaria de Educación Distrital (SED) y autorizadas por la Secretaria Distrital de Ambienta (SDA), donde se talaron un total de cinco (5) individuos arbóreos, solo está pendiente la firma de las fichas SAE por parte de la supervisión del contrato.

- El contratista de obra realiza el día 21 de agosto 2023, el cargue correspondiente a la gestión de RCD del segundo trimestre del año, así mismo el día 22 de agosto la interventoría realiza la validación y verificación cargada y, genera observaciones por encontrarse incompleta la información. A corte de este informe no se presenta el cargue completo de la información solicitada por el aplicativo web de la SDA.

- La interventoría realiza el 31 de agosto oficio TIG-MEM-329- Pendientes del componente ambiental, donde comunica al contratista de obra cuatro (4) pendientes ambientales relevantes para la gestión ambiental:

  - SOLICITUD No 1: Completar cargue de RCD en aplicativo web de la SDA
  - SOLICITUD No 2: Presentación de informe de subsanaciones a los hallazgos ambientales generados en la visita de la SED el pasado 12 de julio 2023
  - SOLICITUD No 3: Cierre de hallazgos tabla Excel compartida al profesional ambiental del contratista
  - SOLICITUD No 4: Envío de informe ambiental No 7 con las correcciones solicitadas el pasado 28 de agosto.

  Los pendientes y solicitudes realizados al contratista a la fecha del informe No 8, no han sido subsanados en su totalidad.

ANEXOS

Anexo 1. Informe ambiental contratista No 8 – Informe ambiental de interventoría No 8.

Anexo 2. Correo electrónico radicación informe ambiental contratista - Informe ambiental de interventoría No 8

Anexo 3. Acta mesa de trabajo observaciones puntuales - Informe ambiental de interventoría No 8

Anexo 4. Lista de inspección ambiental para proyecto de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de plantas físicas – Informe ambiental de interventoría No 8.

Anexo 5. Registro Fotográfico – Informe ambiental de interventoría No 8.

Anexo 6. Certificación protección a sumideros – Informe ambiental de interventoría No 8

Anexo 7. Certificación intervención zonas verdes – Informe ambiental de interventoría No 8

Anexo 8. Registros verificados y aprobados por interventoría (RCD) – Informe ambiental de interventoría No 8

Anexo 9. Documentación vehículos– Informe ambiental de interventoría No 8.

Anexo 10. Proveedor de material pétreo– Informe ambiental de interventoría No 8

Anexo 11. Inventario aparatos ahorradores– Informe ambiental de interventoría No 8.

Anexo 12. Informe ambiental SED visita Grupo 8 - Informe ambiental de interventoría No 8.

Anexo 13. Oficios TIG-MEM-329- Pendientes del componente ambienta- Informe ambiental de interventoría No 8

Anexo 14. Tabla en Excel hallazgos ambientales - Informe ambiental de interventoría No 8

Anexo 15 Oficios llamados de atención ambiental – Informe ambiental de interventoría No 8.

Anexo 16 Respuesta contratista a llamados de atención ambiental – Informe ambiental de interventoría No 8

Anexo 17. Oficios aclaración de obligaciones ambientales – Informe ambiental de interventoría No 8

Anexo 18. Registro de cargue RCD plataforma SDA segundo trimestre del no aprobado 21.08.2023– Informe ambiental de interventoría No 8.

Anexo 19. Observaciones de interventoría al cargue RCD plataforma SDA – Informe ambiental de interventoría No 8.

Anexo 20. Mantenimiento de unidades sanitarias-– Informe ambiental de interventoría No 8
