CONSORCIO TIG

TIG-MEM-354

Bogotá, D.C, 02 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACION DE INFORME SEMANAL No.37

Respetados señores:

Por medio del presente, esta interventoría se permite remitir el informe semanal de interventoría No.37, correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente contractual literal *G. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO*. El periodo del informe semanal se relaciona a continuación:

- **Informe semanal No.37:** 25/09/2023 al 01/10/2023

Sin otro particular.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Ocho (8) folios

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	2/10/2023	**PERIODO No.**	**37**	DEL	**25/09/2023**	AL	**1/10/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
PRÓRROGA :	N/A	PRORROGA 1:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	364	PLAZO ACTUALIZADO:	333
PLAZO TRANSCURRIDO:	271 EQUIVALE AL 74%	PLAZO TRANSCURRIDO:	254 EQUIVALE AL 76%
VALOR INICIAL :	$ 878.587.938,00	VALOR INICIAL :	$ 11.941.262.150,00
VALOR ADICION(ES):	$ 371.557.789,00	VALOR ADICION(ES):	$ 5.050.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.250.145.727,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 16.991.262.150,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.250.145.727,00	VALOR POR PAGAR:	$ 16.991.262.150,00
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ	INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO DE INICIO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	29/07/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	29/07/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	29/07/2023		No iniciado
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	29/07/2023		No iniciado
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS**	29/07/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023	13/09/2023	-46
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023		No iniciado
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**254**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR ESTIMADO A EJECUTAR SEGÚN ACTUALIZACIÓN	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 217.989.209,00	$ 217.989.209,00	100,00%	15/08/2023	FINALIZADO
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 210.052.966,00	$ 195.417.869,36	93,03%	30/08/2023	EN EJECUCIÓN
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	2/10/2023	PERIODO No.	37	DEL	25/09/2023	AL	1/10/2023

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	$ 1.010.000.000,00	$ 518.820.824,34	51,37%	23/10/2023	EN EJECUCIÓN
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO	$ 485.207.002,00	$ 282.347.788,00	58,19%	20/10/2023	EN EJECUCIÓN
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	$ 841.548.020,00	$ 603.955.393,54	71,77%	31/08/2023	EN EJECUCIÓN
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	$ 1.267.289.232,00	$ 1.150.690.205,85	90,80%	28/08/2023	EN EJECUCIÓN
8	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	$ 283.433.330,00	$ 401.752.674,48	141,75%	15/09/2023	EN EJECUCIÓN
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	$ 827.987.076,00	$ 499.547.789,00	60,33%	30/10/2023	EN EJECUCIÓN
11	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL	$ 100.000.000,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	$ 762.681.025,00	$ 406.302.497,00	53,27%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	$ 1.228.838.776,00	$ 949.133.645,69	77,24%	30/11/2023	EN EJECUCIÓN
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	$ 1.206.469.428,00	$ 876.339.838,70	72,64%	14/10/2023	EN EJECUCIÓN
15	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL	$ 498.001.754,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	$ 1.193.215.393,25	$ 1.193.215.393,25	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	$ 304.703.052,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
19	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	$ 656.544.890,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
20	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	$ 339.352.709,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR	$ 2.027.739.816,00	$ 1.153.955.624,58	56,91%	28/11/2023	EN EJECUCIÓN
22	COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
23	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	$ 335.852.053,00	$ 159.508.716,00	47,49%	19/12/2023	NO HA INICIADO
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A	$ 702.836.423,00	$ 347.769.636,00	49,48%	31/10/2023	EN EJECUCIÓN
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	$ 256.734.268,00	$ 256.734.268,00	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
26	EMERGENCIAS	$ 862.485.928,00	$ 496.114.593,00	57,52%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	Se entrega a la institucion los alcalces realizados en los diferentes espacios intercenidos	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	Se atienden observación de instalación de accesorios para sanitarios, se corrigen filtraciones en cubierta de aulas, se realiza el des taponamiento de dos sifones del baño de niños.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Herramienta menor

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	2/10/2023	**PERIODO No.**	**37**	DEL	**25/09/2023**	AL	**1/10/2023**

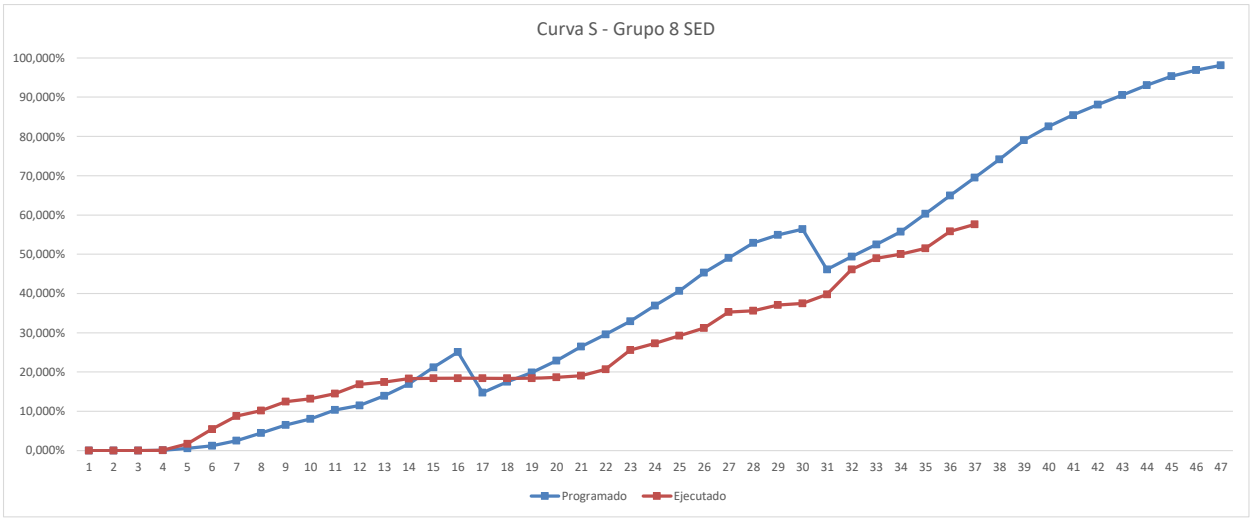
No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Se continua con la instalación de enchape en bateria de baños en primer piso, se inicia la instalción de ventanas el dia 29 de septiembre de 2023, y continua con la fabricación de puertas coolroll, se instala acero para la cimentación de la pasarela.Se requiere mejorar el orden y aseo en obra.	PERSONAL Técnico profesional (1) personas - Rotativo Operativo: doce (12). Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	Continua actividad fundida de placa para cancha de 3000 PSI, Continuactivida de intalacion malla de refuerzo para placa.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Herramienta menor, vibro compactador y maquina excavadora.
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	Se realiza la instalacion del cielo raso y la pintura perimetral de baños de niños primer piso y la instalacion de las divisiones en acero inoxidable.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: uno (1) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	Se realizo la entrega del área del comedor el dia viernes 29 de septiembre de 2023 a entera satisfacción del Sr. Rector,se notificá a la SED que alrededor de dicho espacio presenta una fuerte humedad.Se programa entrega en espacio del auditorio para el dia 6 de octubre 2023.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo: cuatro (4) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	Se agregan las rejillas de gas en los laboratorios de quimica y biologia, se realizan los resanes y retoques de pintura para hacer la entrega de los laboratorios, se desmonta el cielo raso en el area de bliblioteca.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: cinco (5) personas Equipo: Herramienta menor
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se realiza el relleno en la parte de la rampa y se extiende la malla en ese espacio, se hacen las perforaciones para la instalacion de los arcos metalicos.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	C continua actividad de pintura sobre cercha, Continua actividad de instalación de salidas para tomacorriente, Continua actividad de instalación de salidas para luminarias, continua actividad de instalación de canal en lamina galvanizada.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	Se realiza la entrega de los salones 205, 206, 207 y 208 se comienza con la intervencion de las aulas del primer piso con desmonte de luminarias.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (3) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Se inicia la actividad de pintura en los muros de las aulas y con los resanes, se instalan los puntos electricos y las luminarias	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	Se encuentra finalizando actividades en baños del primer piso como instalación de sanitarios, divisiones, e instalación de espejos, se programa entrega para el dia lunes 18/09/2023.	FRENTE TERMINADO
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Se continua con la excavación y acondicionamiento del terreno para la construcción de zarpa y muro de contención en circulación hacia los bloque 11 y 14, se fundio la cuneta freneta bloque #11, y se continua con la instalación eléctrica en laboratorio, y se realiza limpieza y pintura en cerchas existentes en bloque de bachilleratro e instalación de redes eléctricas.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Diez (10) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	Continua actividad de instalación de refuerzo en acero para columnetas.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios y herramienta menor
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	Se realiza el proceso de instalación de las puertas faltantes y con ello se da por cerrada la intervención en este frente.	FRENTE TERMINADO
27	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	Se inicia con el frente con la intervencion de la cubierta en el aula de arudiovisuales pintura de la estructura metalica y el cambio de la cubierta.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
28	**EMERGENCIAS**	Se continúa con la ejecución de la emergencia del cambio de la cubierta en la IED Liceo Femenino.	

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	2/10/2023	**PERIODO No.**	**37**	DEL	**25/09/2023**	AL	**1/10/2023**

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 11.812.452.139,18	69,52%	-11,92%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 9.787.502.775,42	57,60%	



6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Para el presente periodo, el atraso asciende al 11,92%, calculado a partir de la actualización de la programación autorizada por las partes el pasado 17 de julio de 2023. En obra se está gestionando de manera directa con el contratista de obra, a fin de que avance con la ejecución y busque ponerse al día con el desarrollo de las actividades. Se le insiste a la gerencia de obra la necesidad de avanzar y realizar la entrega de los frentes que aún continúan en ejecución, teniendo en cuenta que esto representa una alta carga administrativa para las distintas partes, aparte que nos crean coyunturas con los rectores por las dilaciones.

No obstante al ajuste, el contrato sigue presentando un atraso que ya empieza a ser representativo, es importante que el contratista de obra se renivele prontamente, considerando que la Entidad está contemplando una posible adición de recursos No.2, dentro de la cual también estima una posible ampliación en plazo. Esto se le ha hecho saber a través de los distintos comités, registros en bitácora, entre otros.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
IED Santa Lucía - Entrega de la totalidad del frente de ejecución y de la emergencia	Contratista de obra Interventoría	11/09/2023 (Cumplido
IED Marruecos y Molinos - Entrega de los salones pintados y de las placas impermeabilizadas al 100%	Contratista de obra Interventoría	11/09/2023 (Cumplido

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* El 26 de septiembre de 2023 se atendieron las observaciones relacionadas con los APU's no previstos NP33 al NP39.
* El contratista de obra sigue sin atender las observaciones correspondientes al APU relacionado con la reparación de la red hidráulica de la IED Alexander Fleming.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

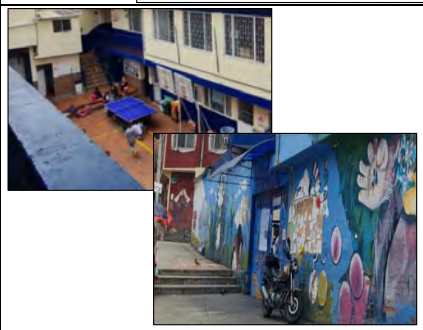
Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:

Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos. Esta pendiente la verificación de una fuga de agua en la IED que ya fue revisada entre las partes y se procederá con su reparación a la mayor breveddad.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y se está a la espera de la entrega de su concepto técnico.
Colegio Gustavo Restrepo sede A: El contratista ya realizó la reparación de las cajas por donde realizó los sondeos al sistema sanitario y el sistema actualmente se encuentra en uso.
Colegio Restrepo Millán sede D: Se evaluó con la Entidad Contratante la intervención en redes eléctricas una vez se proceda con la actividades propias de este frente.
Colegio Liceo Femenino: Se continúa con el desarrollo de las labores relacionadas con la reposición de la teja tipo colonial en la cubierta de la biblioteca.

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

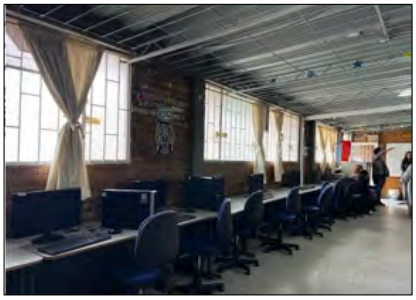
FECHA	2/10/2023	**PERIODO No.**	**37**	DEL	**25/09/2023**	AL	**1/10/2023**

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**		
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**		
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**		
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**		
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**		





CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	2/10/2023	**PERIODO No.**	**37**	DEL	**25/09/2023**	AL	**1/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**		
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**		
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		


CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	2/10/2023	**PERIODO No.**	**37**	DEL	**25/09/2023**	AL	**1/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		  
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		  
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	 	  
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		  
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		  

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	2/10/2023	**PERIODO No.**	**37**	DEL	**25/09/2023**	AL	**1/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
25	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**		  

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-358

Bogotá, D.C, octubre 05 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Solicitud de gestión de reubicación del sistema de seguridad - taller de la Bicicleta.

Cordial saludo.

Por medio del presente, el CONSORCIO TIG quien funge en calidad de interventoría, se permite solicitar su colaboración con la gestión que conlleve al traslado y/o reubicación del sistema de alarmas de la caseta de vigilancia del predio donde se construirá el taller de la Bicicleta, teniendo en cuenta que el sitio donde se encuentran ubicados actualmente va ser demolido, según propuesta técnica suministrada de su parte.

Dicha situación se puede apreciar de la mejor manera a través del siguiente registro fotográfico:



Fotografía No.1,2,3 y 4 – Caseta de vigilancia Taller de la Bicicleta
Fuente. Registro tomado en obra por el CONSORCIO TIG

Agradeciendo de antemano su colaboración del caso, quedamos atentos a su pronta diligencia, propendiendo por evitar posibles atrasos en el desarrollo de las labores.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos Sin folios

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-359

Bogotá, D.C, 06 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Remisión de costeo para la intervención de la cancha en la IED Liceo Femenino

Respetados señores:

Por medio de la presente y con base en los compromisos adquiridos por parte de obra y de interventoría en el comité de seguimiento celebrado el 05 de octubre de 2023, el CONSORCIO TIG se permite trasladar la propuesta de costos elaborada por parte del CONSORCIO MIA GP, frente al prospecto de intervención que se tiene prevista realizar en la zona donde actualmente existe una cancha de voleibol y que por indicación de la SED se tiene cerrada con lona verde.

La propuesta ofrecida comprende la demolición total de la placa existente, excavación de la estructura de apoyo del pavimento (aproximadamente 25cm) y reposición por material clasificado, construcción de una nueva placa de 12cm, demarcación de la superficie, instalación de canchas y una serie de obras complementarias como lo son los cárcamos para el manejo de las aguas lluvias y unas lámparas para la iluminación de los espacios previstos. También es importante destacar que es necesario construir un sendero vehicular con cerramiento en lámina de zinc desde el acceso a la IED, llegando hasta el punto de

intervención, dado el riesgo que representa la movilidad de vehículos de carga en el interior del colegio y la afluencia constante de estudiantes sobre estas áreas.

Ahora y en lo que concierne a la propuesta técnica solicitada por parte de la SED a esta interventoría, en primera instancia nos permitimos informar que vemos procedente la propuesta de reconstruir por completo el escenario deportivo, teniendo en cuenta que sería una obra que quedaría en perfectas condiciones y cubierta por una garantía por lo menos durante los próximos cinco (5) años. No obstante y en el ejercicio de nuestras funciones, a continuación, describiremos lo que sería otra propuesta pero relacionada con la rehabilitación de lo existente, donde no se podría garantizar la regularidad total de la superficie (en comparación a la prevista por parte del contratista de obra), la durabilidad de estas obras en el tiempo, en vista que la causa de esta patología presentada a hoy no se mitigaría, entre otros.

Dado lo anterior, se describe lo que sería tal propuesta, a saber:

1. Corrección de las equinas de las placas existentes que generan resaltos en esos vértices: Incluye lo que sería la demolición de por lo menos 1/3 de las placas involucradas, nivelación de la superficie y reconstrucción de la capa de rodadura. Esta actividad se percibe mejor a través de las siguientes imágenes:

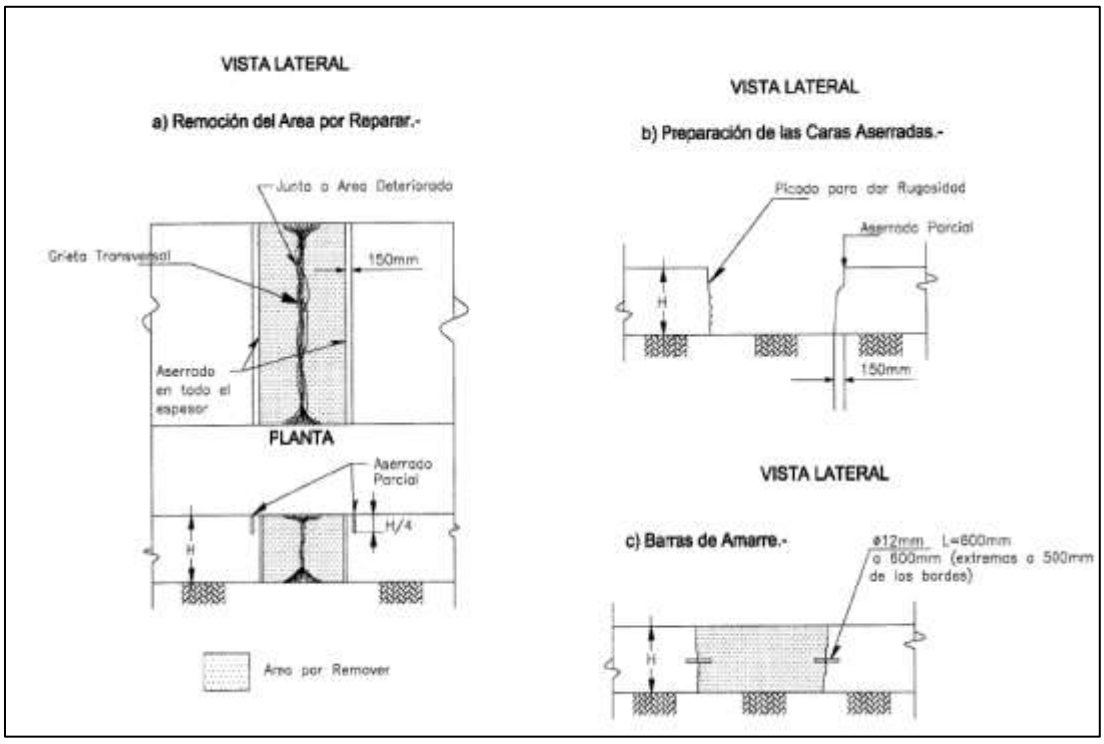


Imagen No.1 Proceso para reposición de un área de la placa afectada
Fuente. www.cedex.es

Cabe resaltar que este proceso involucraría puentes adherentes para concretos nuevos y viejos y otros aditivos para la adecuada instalación del mismo.



Fotografía No.1 Estado actual de las placas in situ
Fuente. Registro fotográfico tomado por CONSORCIO TIG

2. Relleno de juntas demarcadas sobre toda la superficie: Una vez mejorados los vértices creados por la unión de estas losas, se deberá proceder con el relleno de la totalidad de las juntas presentadas en el área de intervención, con el uso de un concreto que posea buenas características de adherencia, fluidez y durabilidad. Se aclara que esas características no evitaran que se presenten juntas en frío, pero si que no fracture tan fácilmente a pesar de su espesor tan bajo.

3. Una vez ya se cuente con la rehabilitación de esta área, se determinará los siguientes pasos a seguir según alcance que delimite la SED para este espacio.

Se aclara que no se cuantifica lo que podría costar este proceso, hasta tanto no se tenga vía libre a lo que sería la materialización de esta alternativa.

Por todo lo anterior, desde esta interventoría se sugiere nuevamente que la intervención sea integral y con ello el CONSORCIO MIA GP pueda cubrir la garantía de las obras, ya que con la otra propuesta no se podría garantizar la regularidad total del nivel de la superficie y tampoco controlar las dilataciones en frio que se pronunciarían a causa de la diferencia entre las edades de los concretos.

CONSORCIO TIG

Así las cosas, quedamos atentos a las instrucciones que sean impartidas directamente desde nuestro Ente Contratante, a fin de proceder de manera diligente con lo que sería esta intervención, en caso que se finiquite su realización.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CONSORCIO MIA GP, Mateo Luzardo Villamizar, Representante Legal
Anexo. Un (1) folio

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO CANCHA - LICEO FEMENINO

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	400,00	$ 35.570,00	$ 14.228.000,00
1.1.4	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	200,00	$ 120.021,00	$ 24.004.200,00
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	551,00	$ 66.944,00	$ 36.886.144,00
SUBTOTAL	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 75.118.344,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	192,85	$ 75.296,00	$ 14.520.834,00
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	192,85	$ 95.957,00	$ 18.505.307,00
2.2.25	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	551,00	$ 123.376,00	$ 67.980.176,00
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.3.6	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM)	M	58,00	$ 230.086,00	$ 13.344.988,00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	2200,00	$ 8.711,00	$ 19.164.200,00
SUBTOTAL	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 133.515.505,00**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	29,40	$ 124.059	$ 3.647.335,00
4.8.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METALICA E = 0.20 M	UND.	2,00	$ 733.283	$ 1.466.566,00
SUBTOTAL	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 5.113.901,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	40,20	$ 15.621,00	$ 627.964,00
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO.	M	69,50	$ 21.890,00	$ 1.521.355,00
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC CONDUIT 2" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	$ 26,80	$ 148.566,00	$ 3.981.569,00
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED STREET PARA ALUMBRADO RECREATIVO DE CANCHA DEPORTIVA TIPO EXTERIOR DE 60W, 100V A 277V. INCLUYE ESTRUCTURA TIPO POSTE METÁLICO, ESTRUCTURA CIVIL, CABLE DE PUESTA A TIERRA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND.	4,00	$ 5.571.063,00	$ 22.284.252,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 28.415.140,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE (BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	551,00	$ 91.866,00	$ 50.618.166,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 50.618.166,00**
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.18	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UND.	2,00	$ 10.217.661,00	$ 20.435.322,00
SUBTOTAL	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 20.435.322,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	551,00	$ 7.708,00	$ 4.247.108,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.247.108,00**

VALOR TOTAL	**$ 317.463.486,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	
VALOR TOTAL	**$ 317.463.486,00**

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-360

Bogotá, D.C, octubre 06 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIO DIANA TURBAY Y REINO DE HOLANDA

Respetados señores:


En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Jesús David Cruz Pinzón	1.007.829.211	Ayudante	Diana Turbay
2	Luis Fernando Coronado	80.369.941	Ayudante	Bicicletero
3	Alexander Guavita	1.032.400.484	Ayudante	Bicicletero
4	Edwin Casallas	1.026.260.140	Ayudante	Bicicletero

CONSORCIO TIG

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



~~EDISON RICARDO~~ DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe
Anexo. Documentación del personal

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRASEÑA



DUPLICADO CC
1.007.829.211

APELLIDOS / NOMBRES
CRUZ PINZON
JESUS DAVID

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
27-MAR-2001
BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA

FECHA DE EXPEDICIÓN
16-MAY-2019

SEXO
MASCULINO

LUGAR DE PREPARACIÓN
BOGOTA D.C. - TUNJUELITO BOGOTA DC

OFICINA DE ENTREGA
BOGOTA D.C. - TUNJUELITO BOGOTA DC

- Escanee el código para verificar su autenticidad.
- El titular tendrá un plazo máximo de un (1) año para reclamar el documento a partir de la fecha de producción.

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO HASTA EL 11-MAR-2024

8509470447
11-SEP-2023

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 05/10/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	291	06/10/2023	CC 1007829211	CRUZ PINZON JESUS	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

99A0C188B6DF5AB796087911DEBBFD01 Certificado impreso el día 10/5/2023 9:32:37 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

JESUS DAVID
CRUZ PINZON
1007829211
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
40103400584	0|5|1|0|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion
B. Colectiva ☐
A. Individual:
B. Institucional ☐
-Cotizante Cabeza de familia ☒
-Beneficiario afiliado adicional ☐
B. De oficio ☐

3.Regimen
A.Contributivo ☒
B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante
A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
CRUZ Primer apellido	PINZON Segundo apellido	JESUS Primer nombre	DAVID Segundo nombre
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1007829211	Femenino ☐ Masculino ☒	2|7|0|3|2|0|0|1

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	PORVENIR	1160000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CALLE 87 BIS N 92-10	67928810	3054578748	Obras.ard@hotmail.com

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
BOGOTA D.C	Urbana ☒ Rural ☐		BOGOTA D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
		Femenino	Masculino	
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

Datos complementarios

29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad				
		Tipo			Condición	
		F	N	M	T	P
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

32. Datos de residencia

Municipio/Distrito	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
	Urbana	Rural			
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Seleccion de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS		Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS UAB CENTRO - SOCIEDAD MEDICA BOGOTA CAP	VSCENTRO - BOGOTA
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	01

39.Ubicación

Dirección	Teleéfono	Correo electrónico	Municipio/distrito	Departamento
CL 34 122 SUR 17D BRR ENVIGADO	5801473	ALRODE73@HOTMAIL.COM	ENVIGADO	ANTIOQUIA

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ **6.** Reinscripción en la EPS
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **12.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **14.** Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **15.** Reporte de fallecimiento
- ☐ **16.** Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **17.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **18.** Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		0|5|1|0|2|0|2|3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- **46.** ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- **47.** ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- **48.** ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- **49.** ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- **50.** ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- **51.** ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- **52.** ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- **53.** ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

JESUS DAVID CRUZ PINZON CC 1007829211	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	**55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio**

IX. ANEXOS

- ☐ **56.** Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐
  Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0
- ☐ **57.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **58.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **59.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **60.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **61.** Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **62.** Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **63.** Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **64.** Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **65.** Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JESUS DAVID CRUZ PINZON, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.007.829.211**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Octubre del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-19, 05:45:54 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 65789843

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 19/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	COLEGIOS RAFAEL URIBE	**Código Sucursal**	COLEGIOSLU
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	47
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 457290	GUTIERREZ SANCHEZ YHON KENEDY	01	00		X														0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8572099	JOSE LUIS BARRIOS CONRADO	01	00	X															0	17	17	17	17	COLFONDOS	$ 657.334	$ 105.200	NUEVA EPS	$ 657.334	$ 26.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 657.334	$ 45.800	COMPENSAR CCF	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.600
CC 10185609	VASQUEZ ARCE VLADIMIRO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 11257890	DIAZ CHINGATE JUAN LEONARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 11524197	ZAMUDIO CHACON LUIS OMAR	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 72097594	POLO GUETTE ANTONIO LUIS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79040683	CORTES RUBIANO WILLIAM	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79051816	PATIÑO WALTEROS MARCO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79383377	MERCHAN RODRIGUEZ JORGE ELIECER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79451618	SANCHEZ BENAVIDES JAIRO ANTONIO	01	00	X															0	3	3	3	3	PORVENIR	$ 116.000	$ 18.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 116.000	$ 4.700	POSITIVA DE SEGUROS	$ 116.000	$ 8.100	COMPENSAR CCF	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
CC 79482086	HINCAPIE JOHN JAIRO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79526595	MARTINEZ ARENAS HONORIO	01	00	X															0	3	3	3	3	PROTECCION	$ 116.000	$ 18.600	FAMISANAR EPS	$ 116.000	$ 4.700	POSITIVA DE SEGUROS	$ 116.000	$ 8.100	COMPENSAR CCF	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79566080	BERNAL VARGAS JOHN ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79925721	ORTIZ JOSE AGUSTIN	01	00	X															0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	FAMISANAR EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 79972033	ACOSTA DOMINGUEZ LUIS GABRIEL	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80111297	LONDOÑO QUIÑONEZ JONATHAN	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80369941	CORONADO MIRANDA LUIS FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80777530	BAYONA RODRIGUEZ DILMER JOVANNY	01	00	X															0	17	17	17	17	COLFONDOS	$ 657.334	$ 105.200	SALUD TOTAL EPS	$ 657.334	$ 26.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 657.334	$ 45.800	COMPENSAR CCF	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.600
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93413312	CAICEDO ARDILA WILLIAM	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000971901	FLOREZ INFANTE MILLER ANDREW	01	00	X															0	8	8	8	8	PROTECCION	$ 309.334	$ 49.500	FAMISANAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1001043676	ORTIZ CRUZ ANDRES OSWALDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001874380	POLO ARIZA DEIMER ANTONIO	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023363554	PINILLA MOSQUERA JUAN ESTEBAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1024497739	VALENCIA ROBAYO FERNEY ALEXANDER	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1028184319	CANDELO RENTERIA SAMIR	01	00	X															0	17	17	17	17	PORVENIR	$ 657.334	$ 105.200	NUEVA EPS	$ 657.334	$ 26.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 657.334	$ 45.800	COMPENSAR CCF	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.600
CC 1028880680	URREA DIAZ BRAYAN MANUEL	01	00		X														0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL STIVEN	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1033770247	GONZALEZ MURILLO KEVIN ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1033811872	CORENA JIMENEZ JOSE ALFREDO	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1047222741	PRIMERA CORTES BRANDON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1068136877	ROMERO FLORENTINO YEISON MANUEL	01	00		X														0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1094276006	BASTO MORA ERMIS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

Pagado: 19/09/2023 **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** **Planilla Nro: 65789843** **Periodo Cotización: agosto de 2023** **Periodo Servicio: septiembre de**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1104544198	CAICEDO AVILA ANGEL DAVID	01	00	X	X														0	27	27	27	27	PORVENIR	$ 1.044.000	$ 167.100	EPS SANITAS	$ 1.044.000	$ 41.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.044.000	$ 72.700	COMPENSAR CCF	$ 1.044.000	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.400
CC 1110541642	FRANCO MARTINEZ CRISTIAN FERNANDO	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1121846956	CRUZ REYES LUIS FERLEY	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 4342875	CALDERON JAIMES JOSE ANTONIO	01	00	X															0	17	17	17	17	COLFONDOS	$ 657.334	$ 105.200	COMPENSAR EPS	$ 657.334	$ 26.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 657.334	$ 45.800	COMPENSAR CCF	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.600
PT 5881621	ORTEGA CHIRINOS OSCAR EDUARDO	01	00	X															0	21	21	21	21	COLFONDOS	$ 812.000	$ 130.000	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
PT 6513909	CHAVERRA CASTRO PEDRO PASCUAL	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 7353844	CASTRO SALDAÑA YORSUAN JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 47.405.337	$ 47.405.337	$ 47.405.337	$ 47.405.337	$ 7.585.200	$ 0	$ 0	$ 1.896.500	$ 3.302.200	$ 1.896.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.680.400	$ 113.300	$ 14.793.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900565744-0	TECNISERVICIOS RCR S.A.S.	CRA. 13 #32-51 TORRE 3 OF. 901	3003482	tecniserviciosrcrsas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	CALLEJA	CALLEJA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	22/09/2023	71093802	$3.302.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	92.800	0		0		0	10	1.100	0	93.900	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	55.800	0		0		0	10	700	0	56.500	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	232.000	0		0		0	10	2.600	0	234.600	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	18.600	0		0		0	10	300	0	18.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	868.000	0	0	0	0	10	9.500	0	877.500	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	904.800	0	0	0	0	10	10.000	0	914.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	694.900				694.900	10	7.700	702.600			6.949	702.600	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	399.200	10	4.400	403.600	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	399.200	403.900
Pensión	2	1.772.800	1.792.300
Riesgos Laborales	1	694.900	702.600
CCF	1	399.200	403.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.266.100	3.302.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900565744-0	TECNISERVICIOS RCR S.A.S.		CRA. 13 #32-51 TORRE 3 OF. 901	3003482	tecniserviciosrcrsas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	CALLEJA	CALLEJA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	22/09/2023	71093802	$3.302.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000134310	SOTO CAMACHO MARIA CAMILA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1026260140	CASALLAS TAUTIVA EDWIN RICARDO	1	0			S																	231001	270.667	43.400	0	0	0	0	EPS008	270.667	10.900	14-23	270.667	5	18.900	CCF24	270.667	10.900	0	0	0	0	0
3	CC	1026260140	CASALLAS TAUTIVA EDWIN RICARDO	1	0			S									X								231001	889.334	106.800	0	0	0	0	EPS008	889.334	0	14-23	889.334	5	0	CCF24	889.334	0	0	0	0	0	0
4	CC	1030585235	CASALLAS TAUTIVA NATALIA ROCIO	1	0			S																	231001	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS008	541.334	21.700	14-23	541.334	5	37.700	CCF24	541.334	21.700	0	0	0	0	0
5	CC	1030585235	CASALLAS TAUTIVA NATALIA ROCIO	1	0			S									X								231001	618.667	74.300	0	0	0	0	EPS008	618.667	0	14-23	618.667	5	0	CCF24	618.667	0	0	0	0	0	0
6	CC	413357	PULIDO JOSE ANCIZAR	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	79343958	CASALLAS ROJAS RICARDO	1	0			S																	25-14	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS008	580.000	23.200	14-23	580.000	5	40.400	CCF24	580.000	23.200	0	0	0	0	0
8	CC	79343958	CASALLAS ROJAS RICARDO	1	0			S									X								25-14	580.000	69.600	0	0	0	0	EPS008	580.000	0	14-23	580.000	5	0	CCF24	580.000	0	0	0	0	0	0
9	CC	79562243	CASALLAS ROJAS ALVARO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	PT	1066733	NIEVES MENDEZ DANIEL MOISES	1	0	X		S																		0	0	0	0	0	0	EPS041	464.000	18.600	14-23	464.000	5	32.300	CCF24	464.000	18.600	0	0	0	0	0
11	PT	1066733	NIEVES MENDEZ DANIEL MOISES	1	0	X		S									X									0	0	0	0	0	0	EPS041	696.000	0	14-23	696.000	5	0	CCF24	696.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	1032400484	GUAVITA PUIN JAIME ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
13	CC	79481382	BUITRAGO BERNAL RICARDO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
14	CC	1023862776	FONSECA MARTINEZ JOHN FREDY	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
15	CC	79963844	BUITRAGO BERNAL PEDRO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-361

Bogotá, D.C, 06 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Respuesta a informe de hallazgos ambientales en visita del 12-07-2023

Respetados señores:

Por medio de la presente, el CONSORCIO TIG quien funge en calidad de interventoría, se permite remitir la respuesta relacionada con el informe de hallazgos ambientales evidenciados por parte de la profesional ambiental de la SED en visita efectuada el pasado 12 de julio de 2023.

Como anexo a la presente misiva, se encuentran adjuntos los soportes que sustentan los correctivos pertinentes llevados a cabo por la firma contratista en compañía de esta interventoría, en atención a dichas observaciones.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CONSORCIO MIA GP, Mateo Luzardo Villamizar, Representante Legal
Anexo. Trece (13) folios

ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	REALIZAR LA TOMA DE AUTO-LIBERACIÓN DE CONDICIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE MEDIDAS FÍSICAS PREVENTIVAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 2
CONTRATISTA	CONSORCIO TIB
INTERVENTOR	CONSORCIO TIB
UBICACIÓN	LOCAL - BOGOTÁ
MOTIVO	LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA [illegible] EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA SEDE [illegible]

AULAS 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 Y CIRCULACIÓN BLOQUE 2

ITEM - ESPACIO - ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	ITEM - ESPACIO - ELEMENTO
CUBIERTA SALONES PISO 2 ALA ORIENTE	CUBIERTA TIPO SANDWICH CON LAMINA GALVANIZADA	[illegible]
CUBIERTA SALONES PISO 2 ALA OCCIDENTE	CUBIERTA TIPO SANDWICH CON LAMINA GALVANIZADA	[illegible]
CUBIERTA CIRCULACIÓN PISO 2	CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA	[illegible]
MURO ANTE EL ANDEN CUBIERTA	MURO DE FLOTANTE EN LADRILLO TOLETE	[illegible]

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

En Bogotá D.C a los [illegible] días del mes de [illegible] de 2024 se deja constancia de la entrega de los elementos descritos, por las personas que firman a continuación

FIRMAS

[illegible]
[illegible] Y SUPERVISOR
ALMACENISTA ITELLIGO ENRIQUE OLAYA HERRERA

[illegible]
YOVANY T. AMAZURNA
INTERVENTORA CONSORCIO TIB

Sebastian Rivera V.
SEBASTIAN RIVERA
CONTRATISTA CONSORCIO TIB

Powered by CamScanner

	Consorcio MIA GP NIT :901634703-9 Contrato de obra -CO1-PCCNTR 4077645			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
	Registro de Asistencia a Capacitaciones			
	Página: 1 de 1	Código:	Versión:	Fecha: Enero de 2022

Fecha:	20-09-2023	Duración:	30 min
Tema de capacitación:	Manejo de Residuos		
Nombre de capacitador:	Angela Cienfuegos	Firma:	

No.	Empresa Prestadora de Salud (EPS)	Nombre y apellidos	Cédula	Firma
1		Josa Aquino	6010959	
2		Richard Garcia	30.422087	Garcia.
3		Manuel Beltran	1007-519-806	Manuel
4		Marcia Tolores	6993424	Tolores
5		Pablo Quiroz	2113230	Quiroz
6		CARLOS VAZQUES	2949177	CARLOS
7	Consorcio MIA GP	Sebastian Rivera	1070225386	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

	Consorcio MIA GP NIT :901634703-9 Contrato de obra -CO1-PCCNTR 4077645			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
	Registro de Asistencia a Capacitaciones			
Página: 1 de 1	Código:	Versión:	Fecha: Enero de 2022	

Fecha:	20/09/2023	Duración:	30 m.n
Tema de capacitación:	Orden y Aseo		
Nombre de capacitador: #1	Mauricio Paez	Firma:	
#2	Angeh Oliveira		

No.	Empresa Prestadora de Salud (EPS)	Nombre y apellidos	Cédula	Firma
1	Consorcio	Yorsyan castro	7353844	Yorsyan
2	Consorcio	William cortes	79040677	
3	Consorcio	Pedro Rosas	80381325	Pedro Rosas
4	Consorcio Mia GP	JHON Pedroza	1024465590	JHON P6
5	Consorcio	Diego Quigarin C	1115.064077	Diego Quigarin
6	Consorcio	Alexander Calderon	52216302	Alexander
7	Consorcio	Jose Calderon	13302212	
8	Consorcio	Elmis Bello	1094276006	Elmis Bello
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

	Consorcio MIA GP NIT :901634703-9 Contrato de obra -CO1-PCCNTR 4077645			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
	Registro de Asistencia a Capacitaciones			
	Página: 1 de 1	Código:	Versión:	Fecha: Enero de 2022

Fecha:	21/09/2023	Duración:	1 30 min
Tema de capacitación:	Orden y Aseo		
Nombre de capacitador: #1	Maicol Pérez	Firma:	
#2	Angela Cienfuegos		

No.	Empresa Prestadora de Salud (EPS)	Nombre y apellidos	Cédula	Firma
1	Probenis	LEIDER VIZCAINO	1.049.626.626	
2	Mi Bienestar	Leyla.	9.579.044	
3	Semi-salud	Semi x candelo	1.098.681.314	
4	Jorge Gonzalez	Salud Total	80.744.113	
5	Dilan Gonzalez	Salud Total	1000065396	
6	Porvenir	Leonardo Diaz	1125 7890	
7	Capital Salud	Oscar Ortega	5881 621	
8	Familiar de Colombia	Pedro Castro	6513909	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

	Consorcio MIA GP NIT :901634703-9 Contrato de obra -CO1-PCCNTR 4077645			ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
	Registro de Asistencia a Capacitaciones			
Página: 1 de 1	Código:	Versión:	Fecha: Enero de 2022	

Fecha:	21/09/2023	Duración:	30 min
Tema de capacitación:	Orden y Aseo		
Nombre de capacitador:	Angela Acosta	Firma:	

No.	Empresa Prestadora de Salud (EPS)	Nombre y apellidos	Cédula	Firma
1	Jose Aquino	Jose Aquino	6010959	
2		Richard Garcia	30.412.087	
3		Manuel Beltran	1007-519-904	
4		Yoram Urbano	6993424	
5		Paolo Mora	2113230	
6		CARLOS VAZQUES	2949177	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

	Consorcio MIA GP NIT :901634703-9 Contrato de obra -CO1-PCCNTR 4077645			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
	Registro de Asistencia a Capacitaciones			
	Página: 1 de 1	Código:	Versión:	Fecha: Enero de 2022

Fecha: 22-09-2023		Duración:	30 min
Tema de capacitación:	Manejo de Residuos		
Nombre de capacitador: #1	Daniel Peña	Firma:	
#2	Angela Cicadua		

No.	Empresa Prestadora de Salud (EPS)	Nombre y apellidos	Cédula	Firma
1	Sanitas Colombia	pedro lastro	6513909	
2	Capital Salud	Ortega Oscar	5881621	
3	Porvenir	Leonardo Diaz	1125789[illegible]	
4	Salud Total	Dilan Gonzalez	1000065396	
5	Salud Total	Jose Gonzalez	80.144.713	
6	Saludtotal	Samir Cardelo	1092[illegible]	
7	COOSalud	(E) Derlicardo	1091907676	
8	Coosalud	Mb. Burria	3.572099	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

	Consorcio MIA GP NIT :901634703-9 Contrato de obra -CO1-PCCNTR 4077645			ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE EDUCACIÓN
	Registro de Asistencia a Capacitaciones			
	Página: 1 de 1	Código:	Versión:	Fecha: Enero de 2022

Fecha: 13 - 09 - 2023		Duración:	30 min
Tema de capacitación:	Manejo de Residuos		
Nombre de capacitador: #1	Maicol Pinzón	Firma:	
#2	Angela Cienfuegos		

No.	Empresa Prestadora de Salud (EPS)	Nombre y apellidos	Cédula	Firma
1	Consorcio MIA GP	Diego Puigarin C.	1115.064.077	Diego Puigarin
2	consorcio Mia GP	JHON Perdomo	1024466590	JHONP6
3	consorcio MGP	Pedro Rosas	80.381.325	Pedro Rosas
4	consorcio mio GP	Yorsvan castro	7353844	Yorsvan
5	consorcio	William costes	79040687	
6	Consorcio	Calderon Jose	13302212	
7	Concorcio	Alejandro Pellar	52210337	
8	Consorcio	Cruis Bustillo M	1094276006	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				


	CONSORCIO MIA GP Contrato de obra N° C01.PCCNTR.4077645	

FRENTE DE OBRA	HALLAZGO	EVIDENCIA DE CIERRE O AVANCE	
LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO			
Protección del cárcamo - Se recomienda reemplazo	El 05 de agosto se terminaron actividades en esa área y se retiró la protección del sumidero, el cual se encuentra operativo y en las mismas condiciones encontradas inicialmente.		
Adecuación de laboratorio - Reforzar uso de EPP y jornada de	El 05 de agosto se terminaron actividades en esta área, los espacios fueron entregados en condiciones de orden y aseo.		
ENRIQUE OLAYA			
Acopio temporal de escombro en desorden	Se terminaron actividades en el frente de obra, previamente se retiró la totalidad de RCD y residuos; se entrega el espacio a conformidad.		
Orden y aseo - En zona de baños	Se realizaron jornadas de orden y aseo, se evacuaron los residuos y el área se preparó para entrega al terminar actividades.		
Acopio de RCD aprovechable sin delimitar	Los RCD aprovechables, fueron entregados al Colegio, por solicitud expresa de los mismos, se adjunta acta de entrega.		

	CONSORCIO MIA GP Contrato de obra N° C01.PCCNTR.4077645	

FRENTE DE OBRA	HALLAZGO	EVIDENCIA DE CIERRE O AVANCE	
Remodelación de baño - orden y aseo.	Se realizaron jornadas de orden y aseo, se evacuaron los residuos y el área se preparó para entrega al terminar actividades.		
DIANA TURBAY sede B			
Acopio de material granular en espacio público	Debido a la dificultad de acceso de un vehículo de gran porte al frente de trabajo, esporádicamente se acopia el material sobre el área adyacente a la puerta, pero se le indica a los trabajadores, que deben ingresarlo de manera inmediata, evitar la obstrucción del tránsito peatonal y dejar el área en buenas condiciones de aseo.		
Punto ecológico - capacitaciones	Se instalaron los puntos ecológicos y se inició el proceso de capacitación del personal		
PALERMO SUR - FEY ALEGRÍA			
Acopio de materiales granulares sin delimitar ni cubrir	El frente de trabajo cuenta con plástico para cubrir los acopios de materiales y de RCD al finalizar la jornada de trabajo.		
Acopio de prefabricados	Los acopios de prefabricados no requieren ser cubiertos, toda vez que no generan material particulado. Los materiales se acopian de acuerdo a su tipo bajo cubierta o a la intemperie, implementando las medidas de manejo que apliquen en cada caso.		
Acopio de RCD mezclados, sin delimitar ni cubrir	Se retiró el acopio de RCD, los cuales fueron llevados a disposición final y se liberó el área. El frente de trabajo cuenta con plástico para cubrir los acopios de materiales y de RCD al finalizar la jornada de trabajo.		


	CONSORCIO MIA GP Contrato de obra N° C01.PCCNTR.4077645	

FRENTE DE OBRA	HALLAZGO	EVIDENCIA DE CIERRE O AVANCE	
Recomienda acopiar RCD	Se realizaron jornadas de orden y aseo, se evacuaron los residuos y el área se preparó para entrega al terminar actividades.		
Acopio de arena sin cubrir	El frente de trabajo cuenta con plástico para cubrir los acopios de materiales y de RCD al finalizar la jornada de trabajo.		
Acopio de materiales - orden y aseo	Se realizaron jornadas de orden y aseo, se evacuaron los residuos y el área se preparó para entrega al terminar actividades.		
SAN AGUSTÍN SEDE A			
Acopio de materiales y RCD	Este frente de trabajo está en proceso de entrega, a la fecha de este informe, se retiró la totalidad de RCD y residuos especiales. Queda pendiente por evacuar del área el material pétreo que se encuentra acopiado en lonas.		
Orden y aseo - Zona de baños	Se realizaron jornadas de orden y aseo, se evacuaron los residuos y el área se preparó para entrega al terminar actividades.		

	CONSORCIO MIA GP Contrato de obra N° C01.PCCNTR.4077645	

FRENTE DE OBRA	HALLAZGO	EVIDENCIA DE CIERRE O AVANCE	
Retiro de RCD en cubierta	Se evacuó la totalidad de RCD ubicados en la cubierta. Se realizaron jornadas de orden y aseo, se evacuaron los residuos y el área se preparó para entrega al terminar actividades.		
Jornada de aseo y limpieza	Se realizaron jornadas de orden y aseo, se evacuaron los residuos y el área se preparó para entrega al terminar actividades.		
MOLINOS Y MARRUECOS			
El cerramiento	Frente activo, se requiere el espacio usado para el cerramiento, se quitó la lona y se volvió a instalar.		
Acopio temporal de RCD y material en cubierta en desorden.	Se realizaron jornadas de orden y aseo, se evacuaron los residuos y el área se preparó para entrega al terminar actividades.		
REINO DE HOLANDA SEDE A			
Acopios de vidrio mezclados con otros RCD. Falta separación	A la fecha de este informe, se retiró parte los de RCD acopiados y residuos especiales. Parte del material presente en el área, pertenece al colegio.		

	CONSORCIO MIA GP Contrato de obra N° C01.PCCNTR.4077645	

FRENTE DE OBRA	HALLAZGO	EVIDENCIA DE CIERRE O AVANCE	
Acopio de material y RCD en desor5d4en. Requiere jornada d	A la fecha de este informe, se retiró parte los de RCD acopiados y residuos especiales. Parte del material presente en el área, pertenece al colegio. Se empezaron a liberar espacios y separar materiales		
MANUEL DEL SOCORRO			
Adecuación de cancha. Cerramiento en buen estado, EPP ok, acopios de materiales deben cubrirse al finalizar jornada	El frente de trabajo cuenta con plástico para cubrir los acopios de materiales y de RCD al finalizar la jornada de trabajo. Se realizaron jornadas de orden y aseo, se evacuaron parte de los residuos		
Acopios de materiales deben cubrirse al finalizar jornada	El frente de trabajo cuenta con plástico para cubrir los acopios de materiales y de RCD al finalizar la jornada de trabajo. Se realizaron jornadas de orden y aseo, se evacuaron parte de los residuos		
Se recomienda cubrir con polisombra en malla los arbustos para protegerlos del material suspendido y las maniobras	Se realiza la protección de la cerca viva, y se evidencia que se mantuvieron en buen estado, durante la ejecución de actividades en el área.		

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-362

Bogotá, D.C, 08 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACION DE INFORME SEMANAL No.38

Respetados señores:

Por medio del presente, esta interventoría se permite remitir el informe semanal de interventoría No.38, correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente contractual literal *G. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO*. El periodo del informe semanal se relaciona a continuación:

- **Informe semanal No.38:** 02/10/2023 al 08/10/2023

Sin otro particular.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Ocho (8) folios

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	9/10/2023	**PERIODO No.**	**38**	DEL	**2/10/2023**	AL	**8/10/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022		CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645	
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES		PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	
PRÓRROGA :	N/A		PRORROGA 1:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023	
PLAZO ACTUALIZADO:	364		PLAZO ACTUALIZADO:	333	
PLAZO TRANSCURRIDO:	278 EQUIVALE AL	76%	PLAZO TRANSCURRIDO:	261 EQUIVALE AL	78%
VALOR INICIAL :	$	878.587.938,00	VALOR INICIAL :	$	11.941.262.150,00
VALOR ADICION(ES):	$	371.557.789,00	VALOR ADICION(ES):	$	5.050.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO:	$	1.250.145.727,00	VALOR ACTUALIZADO:	$	16.991.262.150,00
VALOR PAGADO:	$	-	VALOR PAGADO:	$	-
VALOR POR PAGAR:	$	1.250.145.727,00	VALOR POR PAGAR:	$	16.991.262.150,00
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ		INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO DE INICIO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	29/07/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	29/07/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	29/07/2023		No iniciado
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	29/07/2023		No iniciado
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS**	29/07/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023	13/09/2023	-46
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023		No iniciado
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**261**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR ESTIMADO A EJECUTAR SEGÚN ACTUALIZACIÓN	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 217.989.209,00	$ 217.989.209,00	100,00%	15/08/2023	FINALIZADO
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 210.052.966,00	$ 194.795.502,36	92,74%	30/08/2023	EN EJECUCIÓN
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	9/10/2023	PERIODO No.	38	DEL	2/10/2023	AL	8/10/2023

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	$ 1.010.000.000,00	$ 538.985.252,34	53,36%	23/10/2023	EN EJECUCIÓN
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO	$ 485.207.002,00	$ 282.347.788,00	58,19%	20/10/2023	EN EJECUCIÓN
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	$ 841.548.020,00	$ 603.955.393,54	71,77%	31/08/2023	EN EJECUCIÓN
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	$ 1.169.838.192,85	$ 1.169.838.192,85	100,00%	28/08/2023	FINALIZADO
8	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	$ 283.433.330,00	$ 401.752.674,48	141,75%	15/09/2023	EN EJECUCIÓN
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	$ 827.987.076,00	$ 501.090.789,00	60,52%	30/10/2023	EN EJECUCIÓN
11	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL	$ 100.000.000,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	$ 762.681.025,00	$ 411.288.506,00	53,93%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	$ 1.228.838.776,00	$ 952.023.795,69	77,47%	30/11/2023	EN EJECUCIÓN
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	$ 1.206.469.428,00	$ 903.028.786,70	74,85%	14/10/2023	EN EJECUCIÓN
15	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL	$ 498.001.754,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	$ 1.193.215.393,25	$ 1.193.215.393,25	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	$ 304.703.052,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
19	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	$ 656.544.890,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
20	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	$ 339.352.709,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR	$ 2.027.739.816,00	$ 1.167.159.830,58	57,56%	28/11/2023	EN EJECUCIÓN
22	COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
23	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	$ 335.852.053,00	$ 159.508.716,00	47,49%	19/12/2023	NO HA INICIADO
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A	$ 702.836.423,00	$ 347.876.572,00	49,50%	31/10/2023	EN EJECUCIÓN
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	$ 256.734.268,00	$ 256.734.268,00	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
26	EMERGENCIAS	$ 862.485.928,00	$ 496.114.593,00	57,52%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	Se entrega a la institucion los alcalces realizados en los diferentes espacios intercenidos	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	Se re instala aparato sanitario en el baño de niñas del segundo nivel	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) persona Equipo: Herramienta menor

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	9/10/2023	**PERIODO No.**	**38**	DEL	**2/10/2023**	AL	**8/10/2023**

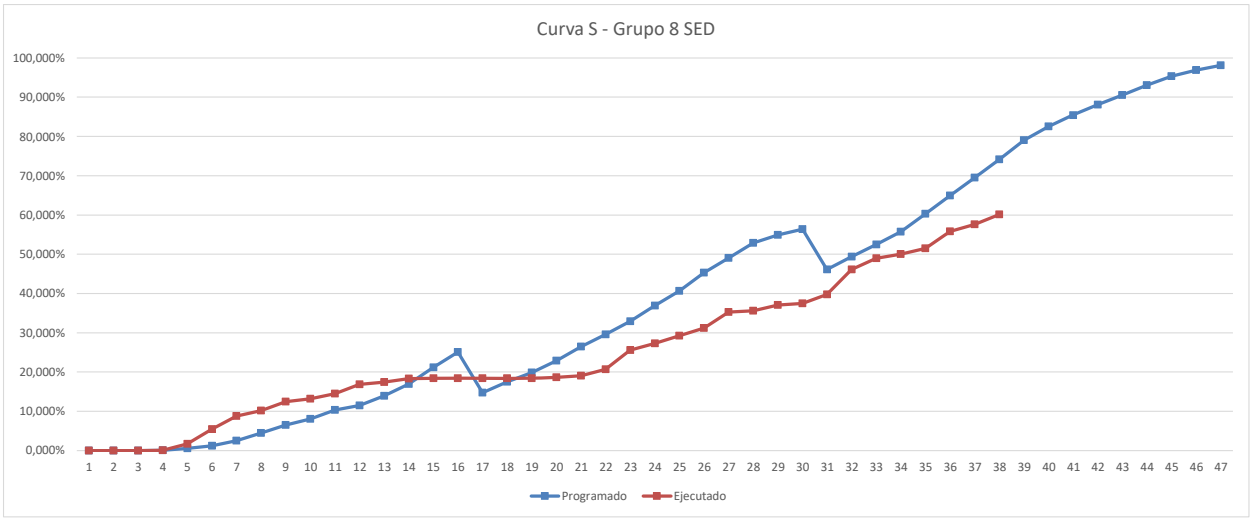
No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Se continua con la instalación de enchape en bateria de baños en segundo piso, se continua con la instalción de ventamas en aluminio, y continua con la fabricación de puertas coolroll, se instala acero para la cimentación de la pasarela, e instalación de estructura metálica para soporte de pasarela.Se requiere mejorar el orden y aseo en obra.	PERSONAL Técnico profesional (1) personas - Rotativo Operativo: doce (12). Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	Continua actividad fundida de placa para cancha de 3000 PSI, Continuactivida de intalacion malla de refuerzo para placa.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Herramienta menor, vibro compactador y maquina excavadora.
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	Se realiza la instalacion del cielo raso y la pintura perimetral de baños de niños primer piso y la instalacion de las divisiones en acero inoxidable.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: uno (1) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	Se realizo la subsanación de aplicación de pintura en cielo raso en almacen en áreas de comedor, se inagurara la apertura posilemente el dia 17 octubre, se finalizó actividad de auditorio se realizará la entrega el dia 09 de octubre 2023, pendiente la instalación de canales, bajantes en los demás espacios para finalizar el proyecto de mantenimiento.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo: cuatro (4) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	Se desmonta el cielo raso en el area del hall segundo piso bliblioteca, se realiza instalacion cielo raso pvc en salon contiguo a biblioteca	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: cinco (4) personas Equipo: Herramienta menor
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se funde placa en un tramo de la rampa y se extiende la malla en ese espacio contiguo, se funde placa en paños centrales	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	Inicia actividad de instalaciones cielo raso en PVC, se realiza reunión con la SED y el rector donde se autoriza la instalación de cinco tomacorrientes adicionales.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	Se continua intervencion en aulas primer piso, desmonte de rieles en piso, desmonte puertas y ventanas y se inicia resane de muros	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (3) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Se continua la actividad de pintura en los muros de las aulas, se instalan los puntos electricos y las luminarias del pasillo	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	Se encuentra finalizando actividades en baños del primer piso como instalación de sanitarios, divisiones, e instalación de espejos, se programa entrega para el dia lunes 18/09/2023.	FRENTE TERMINADO A LA FECHA PENDIENTE POR SUBSANAR OBSERVACIONES COMO REPARAR MURO DE SALÓN SEGUNDO PISO Y ARREGLO MURO DE FACHADA 2 PISO Y ASEO FINAL
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Se continua con la excavación y acondicionamiento del terreno para la construcción de zarpa y muro de contención en circulación hacia los bloque 11 y 14, se fundio la cuneta freneta bloque #11, y se continua con la instalación eléctrica en laboratorio, y se realiza limpieza y pintura en cerchas existentes en bloque de bachilleratro e instalación de redes eléctricas.No se evidencia suficiente avance ya que el personal no cuenta con materiales en obra que permita avanzar.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Once (11) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	Continua actividad corte de placa, Se lleva acabo reunión con el Rector de la institución, La SED y representantes de la comunidad estudiantil; no se llega algún acuerdo con el diseño de la tarima. El Rector suspende actividades.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, herramienta menor y rotomartillo
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	Se realiza el proceso de instalación de las puertas faltantes y con ello se da por cerrada la intervención en este frente.	FRENTE TERMINADO
27	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	Se inicia con el frente con la intervencion de la cubierta en las aulas 5,6,7 y 8 del bloque central pintura de la estructura metalica y el cambio de la cubierta.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
28	**EMERGENCIAS**	Se continúa con la ejecución de la emergencia del cambio de la cubierta en la IED Liceo Femenino.	

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	9/10/2023	**PERIODO No.**	**38**	DEL	**2/10/2023**	AL	**8/10/2023**

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 12.602.643.655,91	74,17%	-14,01%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 10.221.441.199,40	60,16%	



6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Para el presente periodo, el atraso asciende al 14,01%, calculado a partir de la actualización de la programación autorizada por las partes el pasado 17 de julio de 2023. En obra se está gestionando de manera directa con el contratista de obra, a fin de que avance con la ejecución y busque ponerse al día con el desarrollo de las actividades. Se le insiste a la gerencia de obra la necesidad de avanzar y realizar la entrega de los frentes que aún continúan en ejecución, teniendo en cuenta que esto representa una alta carga administrativa para las distintas partes, aparte que nos crean coyunturas con los rectores por las dilaciones.

No obstante al ajuste, el contrato sigue presentando un atraso que ya empieza a ser representativo, es importante que el contratista de obra se renivele prontamente, considerando que la Entidad está contemplando una posible adición de recursos No.2, dentro de la cual también estima una posible ampliación en plazo. Esto se le ha hecho saber a través de los distintos comités, registros en bitácora, entre otros.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
IED Manuel del Socorro sede B - Entrega de presupuesto actualizado Inicio de actividades en obra	Contratista de obra	06/10/2023 (Incumplido) En proceso
Taller de la bicibleta - Envío del presupuesto	Contratista de obra	06/10/2023 (Incumplido)

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* El 26 de septiembre de 2023 se atendieron las observaciones relacionadas con los APU's no previstos NP33 al NP39.
* El contratista de obra sigue sin atender las observaciones correspondientes al APU relacionado con la reparación de la red hidráulica de la IED Alexander Fleming.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

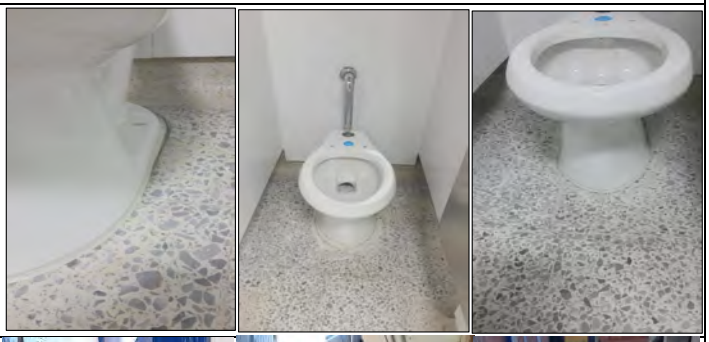

Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:

Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos. Esta pendiente la verificación de una fuga de agua en la IED que ya fue revisada entre las partes y se procederá con su reparación a la mayor breveddad.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y se está a la espera de la entrega de su concepto técnico.
Colegio Gustavo Restrepo sede A: El contratista ya realizó la reparación de las cajas por donde realizó los sondeos al sistema sanitario y el sistema actualmente se encuentra en uso.
Colegio Restrepo Millán sede D: Se evaluó con la Entidad Contratante la intervención en redes eléctricas una vez se proceda con las actividades propias de este frente.
Colegio Liceo Femenino: Se continúa con el desarrollo de las labores relacionadas con la reposición de la teja tipo colonial en la cubierta de la biblioteca.

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

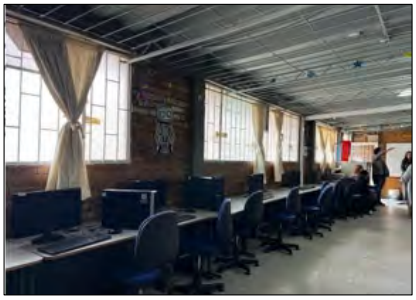
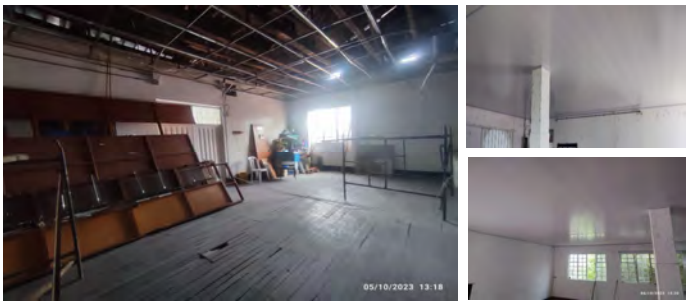
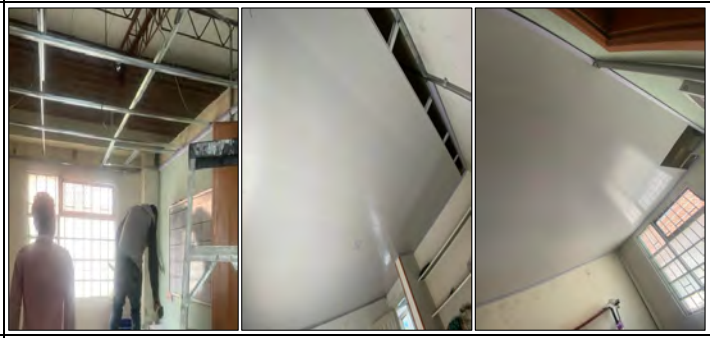
FECHA	9/10/2023	**PERIODO No.**	**38**	DEL	**2/10/2023**	AL	**8/10/2023**

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**		
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**		
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**		
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**		
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**		






CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	9/10/2023	**PERIODO No.**	**38**	DEL	**2/10/2023**	AL	**8/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**		
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**		
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		



CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	9/10/2023	**PERIODO No.**	**38**	DEL	**2/10/2023**	AL	**8/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		  
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		  
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	 	  
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		  
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		  

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	9/10/2023	**PERIODO No.**	**38**	DEL	**2/10/2023**	AL	**8/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
25	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**		  

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-363

Bogotá, D.C, 09 de octubre de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Solicitud de atención inmediata a garantías en espacios entregados a las IED grupo 2

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite instar al CONSORCIO MIA GP, para que proceda de manera inmediata con la atención a las garantías de obra presentadas en los espacios entregados a las distintas IED, durante el desarrollo de su contrato de obra y referenciados como grupo 2 de observaciones.

A continuación, procederemos a mencionar la IED en específico, añadiremos un registro fotográfico puntual y haremos referencia a la observación que deberá ser atendida, a saber:

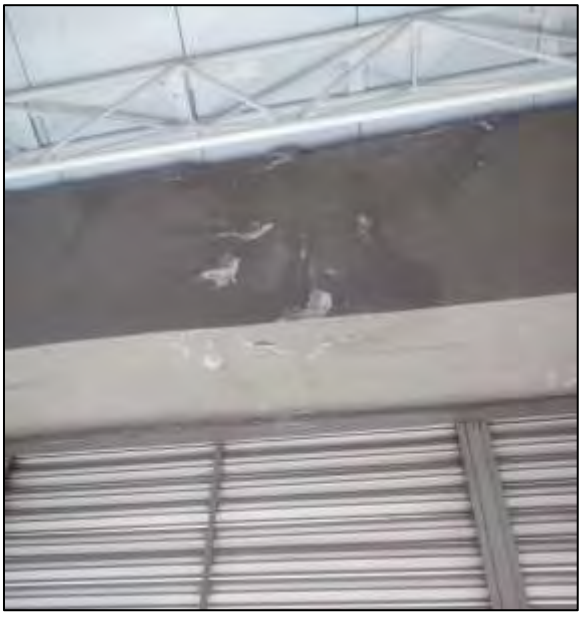
IED ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A

Zona del patio principal



Fotografía No.1 – Retoque de pintura de rejilla de cárcamo

Bloque donde se intervino la cubierta



Fotografía No.2 – Resane y pintura de la viga

IED REINO DE HOLANDA SEDE A

Zona baños primer piso y tercer piso



Fotografía No.3 – Subsanar puertas principales de los baños del primer piso y tercer piso

Zona de divisiones de baños del primer piso y tercer piso



Fotografía No.4 – Ajuste de puertas y divisiones de las baterías sanitarias

Zona de baños primer piso.





Fotografía No.5 – Habilitación de caja de inspección en el interior de baño de niñas, hacer la poceta de lavado en la parte de atrás del baño de niñas y hacer sondeo del sifón que queda enfrente de los baños.

Zona de aulas segundo piso



Fotografía No.6 – Cambio de puerta en el aula del segundo piso

Zona de aulas tercer piso



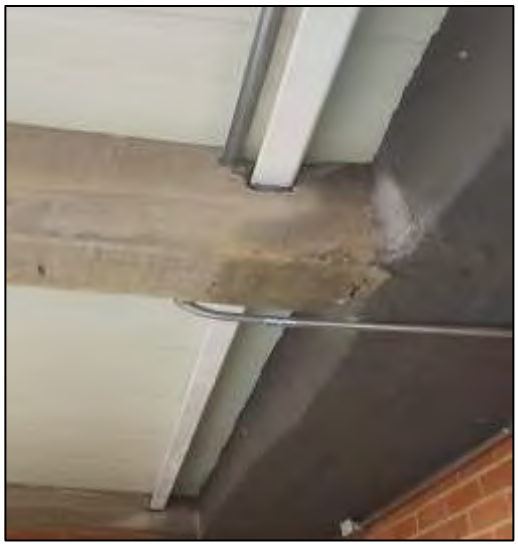


Fotografía No.7 – Resanar la terminación del piso y de los remates de los muros, ajustar las luces del perímetro de las puertas.

IED REINO DE HOLANDA SEDE B

Zona de audiovisuales





Fotografía No.8 – Resanar las vigas y subsanar los remates de pintura de la estructura metálica.

Zona de audiovisuales



Fotografía No.9 – Reubicar punto de salida de tomacorriente por extrusión al televisor.

IED ALEXANDER FLEMING SEDE B

Cancha principal



Fotografía No.10 – Subsanar dilatación de la cancha

Domo en policarbonato central



Fotografía No.11 – Retirar el adhesivo de las persianas y hacer la escotilla de acceso hacia la cubierta.

IED RESTREPO MILLÁN SEDE B

Bloque No.2





Fotografía No.12 – Fogonazos de pintura en aceite sobre la mampostería existente

Bloque No.2



Fotografía No.13 – Falta de pañete en los costados laterales de la puerta de acceso posterior, según recomendación del especialista en estructuras de la SED

Bloque No.2



Fotografía No.14 – Subsanar las áreas del piso en vinilo que se ven sopladas

IED MANUEL DE SOCORRO SEDE A

Parque infantil



Fotografía No.15 – Dejar dilatada las cajas de inspección en el piso en chip para dejarlas inspeccionables.

IED ALFREDO IRIARTE SEDE A

Cubierta zona externa



Fotografía No.16 – Queda pendiente subsanar detalles de pintura en pérgola y cubierta, izado de guaya de la mitad de la pérgola.



Fotografía No.17 – Hace falta subsanar gotera presente en el aula 304

IED RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A

Espacios externos a la IED





Fotografía No.18 – Limpieza del andén del muro exterior del aula múltiple

Espacios internos salón múltiple





Fotografía No.19 – Pintura de muro superior en aula múltiple. Fogonazo de esmalte.



Fotografía No.20 – Reubicación de toma corriente para televisor aula 17.



Fotografía No.21 – Revisión de tomas eléctricas antiguas del aula 15.



Fotografía No.22 – Instalación de guarda escoba aula 16 y 15.

IED EL LIBERTADOR SEDE B

Zona preescolar



Fotografía No.23 – En la cubierta de la zona de preescolar esta pendiente instalar perfiles metálicos de refuerzo por ondulaciones que presenta el policarbonato.

Así las cosas, esta interventoría otorga un plazo perentorio de SIETE (7) días calendario contado a partir de la recepción de esta comunicación, para que el contratista de obra proceda con las intervenciones físicas y remita los soportes pertinentes que surgen como producto de esta gestión. Es importante destacar que en estos momentos ya está trascurriendo el plazo otorgado por el Ministerio de Educación para el segundo receso estudiantil, lo cual permite que no existan limitantes para la ocupación de espacios en las distintas instituciones educativas.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Sin folios

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-364

Bogotá, D.C, 09 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Notificación de suspensión de actividades en la IED Marruecos y Molinos e inconvenientes con el rector

Respetados señores:

Por medio de la presente, el CONSORCIO TIG quien funge en calidad de interventoría, se permite trasladar copia de la comunicación 2023_RUU_MGP_250 que data del 06 de octubre de 2023 y que tiene por asunto “Suspensión de actividades frente de obra Marruecos y molinos IED”, allegada por parte del CONSORCIO MIA GP, con ocasión a la ejecución de las actividades específicas de este frente.

Tal y como lo expresa el contratista de obra en su misiva, el pasado 06 de octubre de 2023 a las 11:46am recibieron ordenes de parte del rector de retirar todo el personal que se encontraba adelantando labores en la IED, fundamentando su total y absoluto desacuerdo con el diseño y por consiguiente con la implantación del mismo (ver acta de comité anexa). Esta situación trajo consigo un trato déspota del representante de la IED hacia los representantes de las firmas contratista de obra e interventoría, inclusive hacia la supervisión.

Es importante traer a colación que esta situación ha sido muy repetitiva, donde el rector se dirige hacia las partes involucradas con tonos de voz muy altos, apoyado en personas completamente ajenas a la obra como padres de familia, estudiantes, entre otros, inclusive, ingresándolos a motu proprio a los espacios de intervención, exponiéndolos a cualquier posible accidente.

Como consecuencia de todo lo descrito, en estos momentos la IED tiene en custodia de todos los materiales y equipos con los que contaba la firma contratista en el momento en que fue expulsado de las instalaciones del colegio, por cual, ellos deberán entrar a responder en el momento en que se tomen decisiones al respecto, precisamente por decidir retener objetos que no son de su propiedad.

Por lo tanto, solicitamos de la manera más cordial a ustedes quienes se desempeñan en calidad de Ente Contratante, interceder para dirimir esta situación álgida, la cual está trayendo un si numero de complicaciones a los contratistas de obra e interventoría y de paso retrasos importantes que afectará la fecha de terminación del frente y posiblemente del proyecto en general. Así mismo, es imperante contar con un documento que sustente el acuerdo radical por parte del rector frente a la propuesta constructiva y con ello evitar nuevamente este tipo de acontecimientos, donde también se comprometa a mantenerse a la margen de las obras y respete los criterios de los profesionales que actualmente estamos a cargo de estas funciones.

Así las cosas, quedamos atentos a las instrucciones que sean impartidas directamente desde nuestro Ente Contratante, a fin de proceder de manera diligente con lo que sería la reanudación de las actividades o la finalización de las mismas.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CONSORCIO MIA GP, Mateo Luzardo Villamizar, Representante Legal
Anexo. Cinco (05) folios

Bogotá D.C., 06 de octubre de 2023

2023_RUU_MGP_250

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Suspensión de actividades frente de obra Marruecos y molinos IED.

Cordial saludo,

Siendo las 10:45 am del presente día, se hace presencia del contratista de obra en conjunto con la interventoría y la supervisión en la cual se encontraba en la ejecución de actividades de mampostería estructural desde el nivel -1.10m en los ejes 1,2 y 3 entre ejes C y B.

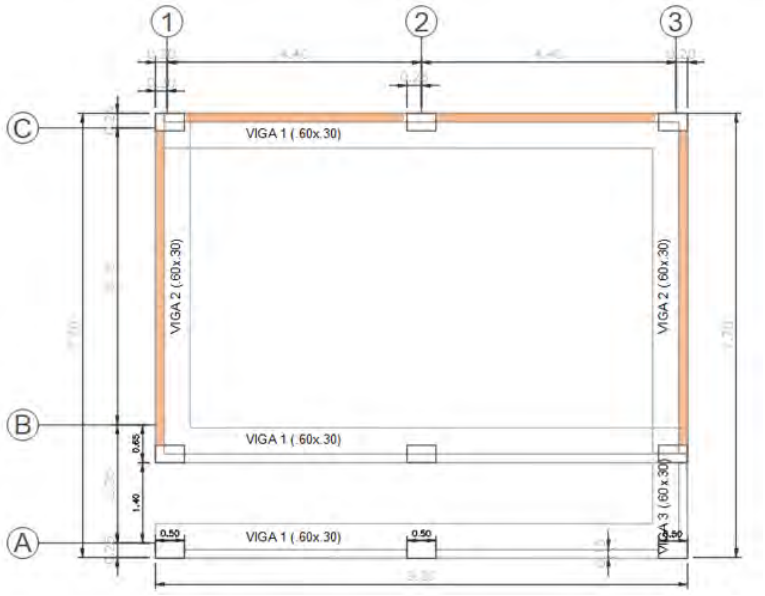


Ilustración 1 Actividades de mampostería estructural adelantas hasta la fecha.

El rector de la institución hace presencia con personal del consejo directivo de la IED, se le manifiesta al rector el resultado de la revisión realizada por parte del ingeniero estructural del contratista, la cual tenia como objetivo revisar la posibilidad de la eliminación del apoyo

intermedio ubicado en el eje 2B, lo cual fue enviado mediante oficio 2023_RUU_MGP_249 - Revisión estructura tarima IED Marruecos y Molinos, en donde se expone que no se viabiliza la opción teniendo en cuenta que la luz supera los 9m entre apoyos.

Frente a lo anterior, el Rector Luis Eduardo hurtado López menciona que no permite la continuidad de las actividades en el frente de obra si el apoyo intermedio persiste y el apoyo principal continua sobre el eje B. Respecto a la determinación manifestamos las siguientes preocupaciones:

1. Las actividades ejecutadas se encuentran acorde con el diseño estructura aprobado el 4 de septiembre de 2023 y la arquitectura presentada y aprobada al rector el 9 agosto de 2023.

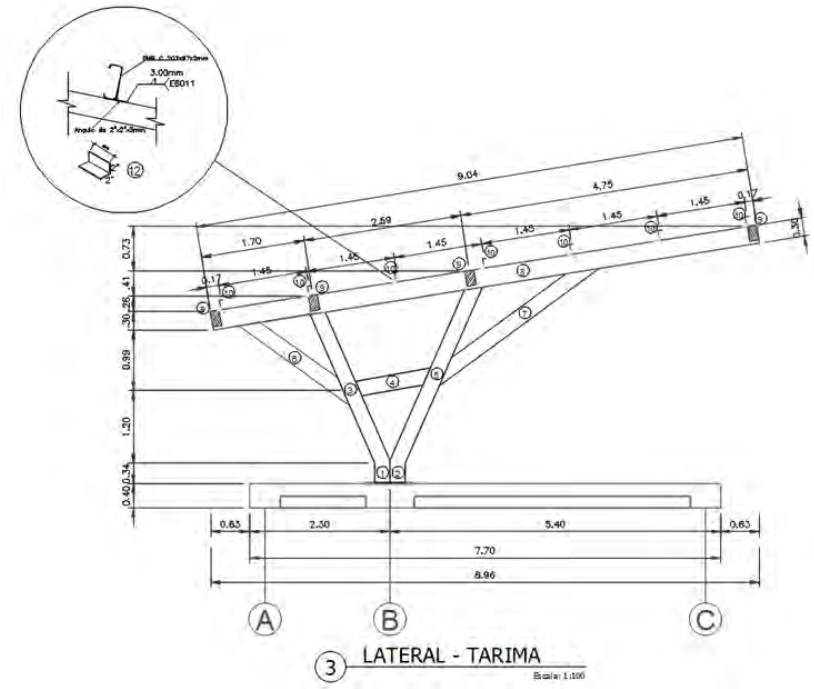


Ilustración 2 Arquitectura tarima aprobada.

2. Se encuentra en obra el 90% del material para la ejecución de la placa de cimentación y entrepiso del diseño aprobado, el rector el día de hoy manifiesta que no permite la ejecución de las actividades y la salida de materiales, se realiza inventario de lo existente responsabilizando a la institución por el material, dejando en claro que materiales como cemento de no ser usado con prontitud puede quedar inutilizable.



Ilustración 3 Insumos en obra a la fecha.

3. Se cuentan con excavaciones abiertas lo cual con las condiciones climáticas se pueden ver afectadas las estructuras existentes y aquellas en construcción además de la contaminación de los elementos.



Ilustración 4 Estado actividades en ejecución.



Ilustración 5 Estado actividades en ejecución.

4. Las intervenciones han sufrido obstrucción por parte de la institución principalmente el pasado 22 de septiembre de 2023 y el día de hoy 6 de octubre de 2023, hecho que genera atrasos de obra, afectando el cumplimiento de los tiempos de la programación.

De acuerdo con lo anterior, debido a la imposibilidad de continuar con la construcción del diseño avalado y viabilizado desde el componente arquitectónico y estructural por el inconformismo y el desconocimiento del comportamiento de la estructura por parte del rector de la IED, se nos solicita por parte del mismo a retirar el personal siendo las 11:45 am del día de hoy 6 de septiembre de 2023, sin la posibilidad de retirar ningún insumo que se encuentra en el lugar adquirido por el contratista, dejando la obra inconclusa, representando un riesgo para la comunidad estudiantil, toda vez que la obra se encuentra en actividades de cimentación con excavaciones abiertas y aceros expuestos, escenario bajo el cual el contratista no se hace responsable en ningún momento de cualquier eventualidad que se presente ya que se nos solicitó el desalojo de inmediato de la obra.

Se solicita de manera urgente a la SED que informe la hoja de ruta que se debe seguir frente a estas actividades que se dejaran de ejecutar toda vez que impacta la programación de obra.

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	06/10/23	**Inicio**	11:00 am	**Fin**		**Lugar**	IED Marruecos Y Molinos
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes	Coordinación MIAGP, SED, Rector, Interventoría, Representante de					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración				**Elaborado por**	Interventoría			**Próxima Reunión**	

- Se reune el Rector, La SED, Interventoria y Contratista. Se realizar recorrido, El Rector manifiesta inconformidad y saca el personal de obra de la institución

El Rector manifiesta realizar otro tipo de diseño, donde esta interventoria manifiesta que no esta de acuerdo, al no cumplir con la norma y/o especificacion.

Se manifiesta que esta obra se fera, ocacionando retrazos. Por la mala actitud del rector

Arthuro Tibaquira
SED. DOCENTE

- El dia de hoy 06 de octubre se realizo visita en la institucion con el fin de socializar la revision por parte del estructural enviada el martes 03 de octubre de 2023, pero la actitud tomada por parte del rector no lo permitió.

Ricardo Duarte

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-365

Bogotá, D.C, 09 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Respuesta a correo del 05-10-2023 observaciones APU's no previstos NP-27, NP-33 al NP-36 y NP-39

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite dar respuesta al correo electrónico emitido por parte de la supervisión el pasado 05 de octubre de 2023 y relacionados con las siguientes actividades no previstas, a saber:

- NP-27 - Suministro e instalación de protección en malla expandida calibre 18, arco en ángulo 1 x 1/8, incluye pintura.

- NP-33 - Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largo (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cm de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cm de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

- NP-34 - Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

- NP-35 - SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PLASTICA PARA CARCAMO ancho = 40cm X espesor = 5cm.

- NP-36 - Suministro e instalación de conexión sanitaria para sanitario fluxómetro.

- NP-39 - Suministro e instalación de PANEL LISO DE FACHADA dimensión frontal: medida estándar del panel ancho 1.14 cm x 0.53 cm alto en lámina GALVANIZADA, Calibre 18, equivalente a 1.3 m.m., con protección: Acabado con pintura poliéster (polvo electroestático) con protección UV. Marca VITRACOAT (Qualicoat Tipo 2/ AAMA 2604). 2 colores Estos acabados son impermeables a agentes externos como contaminación ambiental vehicular. La pintura es superficie lisa, Aplicación de pintura electroestática por las dos caras del panel, Espesor de pintura: 50 micras sobre superficie, por cada cara A y B. El panel será fabricado por sus (4) lados, con el sistema pestaña 2.5 cm y contra pestaña 2.5 cm posterior que evitan la deformación del panel al momento de instalarlos, Dilatación de 10 mm. por todos los (4) lados en cada panel, con el fin de absorber los asentamientos de la estructura y los movimientos sísmicos, Sistema BRAZO ROBOTIZADO para la aplicación de pintura. NO MANUAL

La presente entrega comprende los ajustes requeridos desde la SED, propendiendo por su aval definitivo y posterior materialización en obra.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo Cincuenta y cinco (55) folios

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, ARCO EN ANGULO 1 X 1/8, INCLUYE PINTURA	M2	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	113.355,90	5.667,8
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	0,60	2.700,0
				SUBTOTAL	8.367,8

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Ángulo G50 1/8" x 1" x 6m	und	1,145	44818	$ 51.316,61
Soldadura 6013 1/8west arco	kg	0,3	21105	$ 6.331,50
Malla Expandida CR IMT 30 X 1 CAL 18	m2	1,05	51894	$ 54.488,70
pintura en aceite	gl	0,07	112000	$ 7.466,67
Disolvente o Diluyente thiner	litro	0,1	32000	$ 3.200,00
			SUBTOTAL	122.803

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de Material (Volqueta acarreo)	1		m3/km	1.500	1.500,0
				SUBTOTAL	1.500

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Soldador	94.279	52,13%	143.427	0,4500	64.542,2
Ayudante soldadura	71.304	52,13%	108.475	0,4500	48.813,8
				SUBTOTAL	113.356
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 246.027,17
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 69.355,06
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 315.382,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) dias del mes de agosto del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: Edisson Ricardo Duarte
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

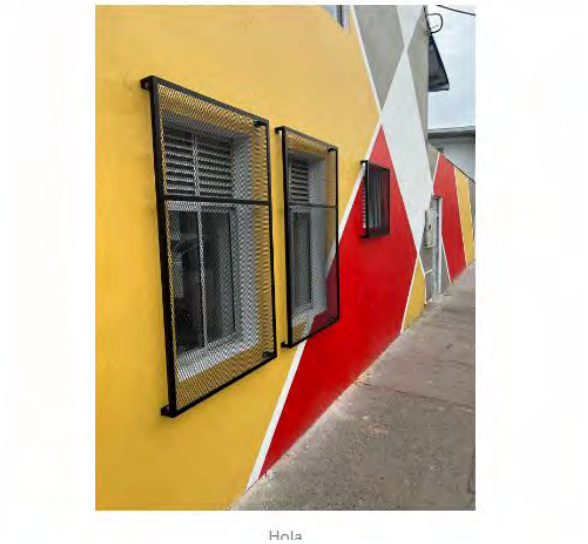
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-27 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1 X 1/8, INCLUYE PINTURA

UNIDAD: M2

JUSTIFICACIÓN:

El SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1 X 1/8, INCLUYE PINTURA, se requiere para proteger vidrios y ventanas y también impedir el ingreso de elementos que puedan golpear o lastimar a los estudiantes en el interior de las aulas y espacios de los colegios.



Hola

Imagen modelo de malla de protección a instalar.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-27- SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1 X 1/8, INCLUYE PINTURA

UNIDAD:m2

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1X 1/8, INCLUYE PINTURA

EJECUCIÓN:

- Establecer la ubicación del marco
- Rectificar medidas del elemento
- Verificar puntos de anclaje
- Ensamblar el elemento de acuerdo con el área de la ventana interna a proteger
- Verificar niveles, plomos y escuadras de elemento a instalar
- Realizar fijación con tornillo en cuatro aristas de la ventana
-

MATERIALES:

- Ángulo G50 1/8" x 1"x 6m (10.98kg)
- Soldadura 6013 1/8west arco
- Malla Expandida CR IMT 30 X 1 CAL 18
- pintura en aceite
- Disolvente o Diluyente thiner

EQUIPOS:

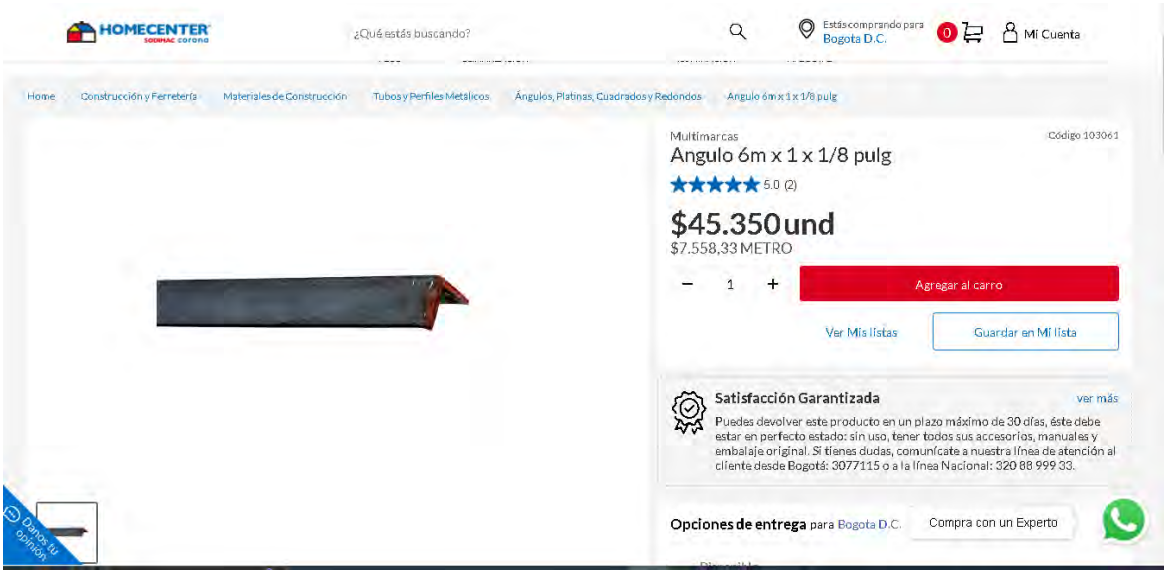
- Herramienta menor
- Andamios
- Equipo de trabajo en altura

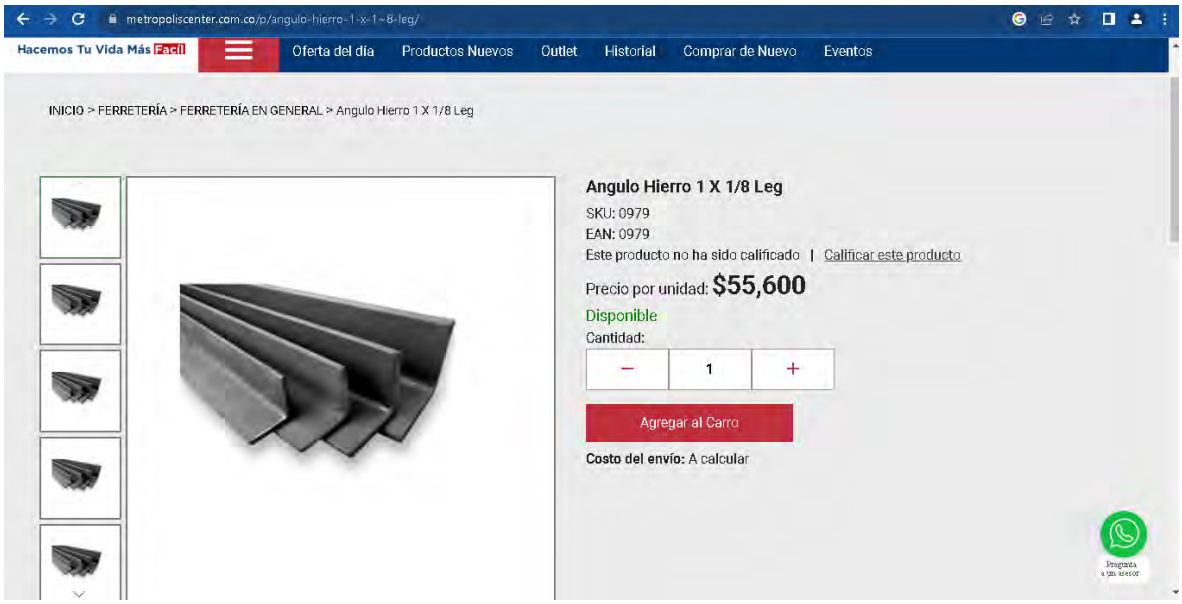
TRANSPORTE:

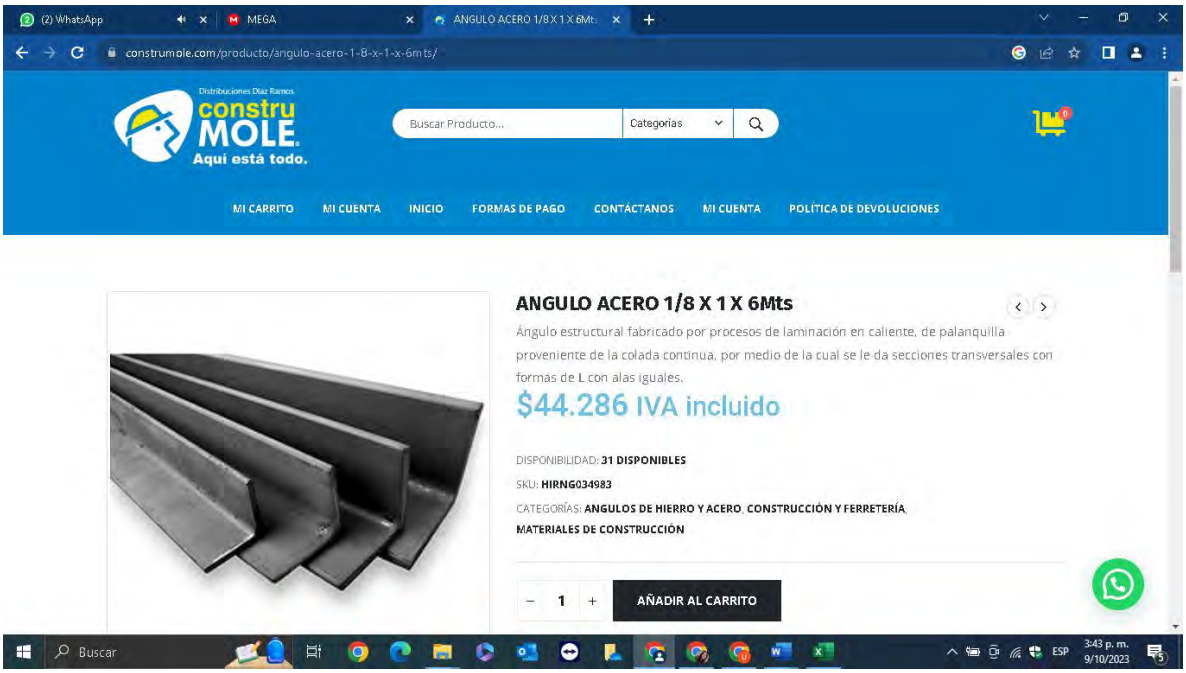
- Furgón.
-

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1 X 1/8, INCLUYE PINTURA ,recibidos a satisfacción por la interventoría.


HOMECENTER
¿Qué estás buscando?
Estás comprando para
Bogota D.C.
Mi Cuenta
Home
Construcción y Ferretería
Materiales de Construcción
Tubos y Perfiles Metálicos
Ángulos, Platinas, Cuadrados y Redondos
Angulo 6m x 1 x 1/8 pulg
Multimarcas
Código 103061
Angulo 6m x 1 x 1/8 pulg
5.0 (2)
$45.350 und
$7.558,33 METRO
1
Agregar al carro
Ver Mis listas
Guardar en Mi lista
Satisfacción Garantizada
ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Opciones de entrega para Bogota D.C.
Compra con un Experto


metropoliscenter.com.co/p/angulo-hierro-1-x-1-8-leg/
Hacemos Tu Vida Más Fácil
Oferta del día
Productos Nuevos
Outlet
Historial
Comprar de Nuevo
Eventos
INICIO > FERRETERÍA > FERRETERÍA EN GENERAL > Angulo Hierro 1 X 1/8 Leg
Angulo Hierro 1 X 1/8 Leg
SKU: 0979
EAN: 0979
Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto
Precio por unidad: $55,600
Disponible
Cantidad:
1
Agregar al Carro
Costo del envío: A calcular


(2) WhatsApp
MEGA
ANGULO ACERO 1/8 X 1 X 6Mts
construmole.com/producto/angulo-acero-1-8-x-1-x-6mts/
Distribuciones Díaz Ramos
construMOLE
Aquí está todo.
Buscar Producto...
Categorías
MI CARRITO
MI CUENTA
INICIO
FORMAS DE PAGO
CONTÁCTANOS
MI CUENTA
POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
ANGULO ACERO 1/8 X 1 X 6Mts
Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, por medio de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales.
$44.286 IVA incluido
DISPONIBILIDAD: 31 DISPONIBLES
SKU: HIRNG034983
CATEGORÍAS: ANGULOS DE HIERRO Y ACERO, CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1
AÑADIR AL CARRITO
Buscar
ESP
3:43 p. m.
9/10/2023

FERROPETROL

INICIO CONTACTO

Inicio / Perfiles, Mallas y Anjeos / Mallas Expandidas / Malla Expandida Cr IMT 30 X 1 Cal 18



Malla Expandida Cr IMT 30 X 1 Cal 18

30 disponibles

$44.000

SKU 10770 | Categoría Mallas Expandidas

Información adicional

Unidad	Metro
Subcategoría	Malla Expandida HR y CR

Cotización: OV143885

PROCASA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SAS NIT: 901531834

CR 18 60C 13
Colombia Bogotá
3143826320 - 3143826320
procasaconstrucción@gmail.com

Peso Total
490.44
Fecha
25-07-2023
Vigencia 1 día

Descripción	Cantidad	Medida	Peso	Precio Unitario	Precio Total
Tubo Cerramiento Galvanizado 1.1/2" (D.Ext. 48.3mm) (2.0mm) x 6m	17.00	Unidades	232.90	82,200.00	1,397,400.00
Soldadura West Arco ZIP10T (E6010) 1/8" (Ref.504195)	5.00	kg	5.00	19,756.80	98,784.00
Ángulo G50 1/8" x 1.1/2" x 6m (10.98kg)	15	Unidades	252.54	75,762.00	1,136,430.00
Malla Expandida CR IMT 30 X 1 CAL 18	56	M2		42,716.00	2,395.000

Observaciones:
Validez oferta en precios 5 días
Inventario sujeto a disponibilidad al momento de la compra formal.
Forma de pago: Contado anticipado.
Disponibilidad del material: Inmediata.
Tiempo de entrega: De 2 a 3 dias sobre disponibilidad.
Sitio de entrega: El material se ofrece puesto sobre camión en su bodega en Bogotá y/o su perimetro urbano. (Material se ofrece libre de descargue).
Despacho minimo de nuestra cuenta: 1000 kilos en longitud. de 6 metros y/o 5.000 kilos en longitud de 12 metros.
Materiales certificados por el molino del país de origen.

Base:	$ 5,027,614.00
Impuestos:	$ 955,246000
Total:	$ 5,982,860.66

¡APRECIADO CLIENTE!
ES OBLIGATORIO PRESENTAR PLANILLA DE ARL AL DÍA, PARA EL INGRESO A NUESTRAS INSTALACIONES AL MOMENTO DE RETIRAR CUALQUIER MATERIAL.

Estimado cliente Recuerde que también ofrecemos
productos suplementarios como soldadura West Arco o ESAB,
discos de corte Abracol,discos de pulir Abracol,
anticorrosivo y esmalte marca Bler y si es de su interes la plancha masterdeck, quedo atento a su requerimiento

STECKERL ACEROS S.A.S.

NIT: 900 499 032 - 2

Calle 7 # 27-79 Tel:(071) 7446262 - (071) 7434242

BOGOTA - CUNDINAMARCA (COLOMBIA)

COTIZACIÓN: 27COT2023001301

Cotizado a	Datos de la Transacción		Doc. Origen	
CONSORCIO MIA GP	**Orden de Compra:**	WHATSAPP	**Fecha**	**25/07/2023**
CR 18 No 60 C - 13 S	**Condición Pago:**	MOSTRADOR	**Fecha Venc.**	**25/07/2023**
BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C	**Id. vendedor:**	ADRIANAC	**Elaborado por**	**JENNYCH**
(314) 382-6320 Ext. 0000	**Modo de envío:**	CLIENTE RECOGE	**Enviar a:**	
	Fecha Entrega:	25/07/2023	PROCASA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS CR 18 No 60 C - 13 S BOGOTÁ	
	Moneda:	COP		

Cantidad	Peso	Peso Extendido	Descripción	UM	Bga	Precio m2	Precio Unidad	Valor Extendido
50	11.5	575	Malla Expandida CR IMT 30 X 1 CAL 18	m2	27	$44.500	$44,500.00	$2.225.000

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
EXISTENCIAS SUJETAS A VENTAS. Y DISPONIBILIDAD DE INVENTARIOS

Moneda: COP

Subtotal	$2.225.000.00
Dto. Comercial:	$ 0.00
Flete:	$ 0.00
IVA:	$422.750.00
Rete Iva :	$0.0000
Rete Fuente:	$0.00
Total a pagar:	$2.647.750.00
Peso Total	**575**

* Impuestos: Somos grandes contribuyentes segun resolucion No 012635 del 14 dic 2018.Somos AUTORETENEDORES Resl:4060 Mayo 26 2014. IVA Regimen común. Actividad economica principal 4663 tarifa CREE 0.40%.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA EL RICAURTE

UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 28 CENTAVOS

Num. Artículos: 1 25/07/2023 3:42:10 p.m.

FERROPETROL

INICIO CONTACTO

Inicio / Soldadura / Electrodos / Soldadura 6010X 3/32 Zip 10T WEST ARCO



Soldadura 6010X 3/32 Zip 10T WEST ARCO

39 disponibles

$19.400

SKU 20876 | Categoría Electrodos Marca: West Arco

Información adicional

Unidad	Kilogramo

Buscar 11°C ESP 4:08 a. m. 3/08/2023

sent mauricio.fonse... Buscar con Google Recibidos (791) - di... RNP0026732F6EB8... Sistema de Informa... New Tab Helado malo 2 - Ju... dFireboy and Water... Otros marcadores

¡La industria en un solo lugar!

TECTUL

¿Qué estás buscando?

CATEGORÍAS INICIO GUIA DE COMPRA NOSOTROS BLOG SERVICIOS CATÁLOGO CONTÁCTANOS

Inicio > Soldadura > West Arco

Soldadura E6010 Zip 10t

Se vende por **Paquetes (Paq.)**

Soldadura 6010, electrodo de muy buena penetración, con polvo de hierro (Comercial). Envios toda Col. Whatsapp ☎ 3161111666.

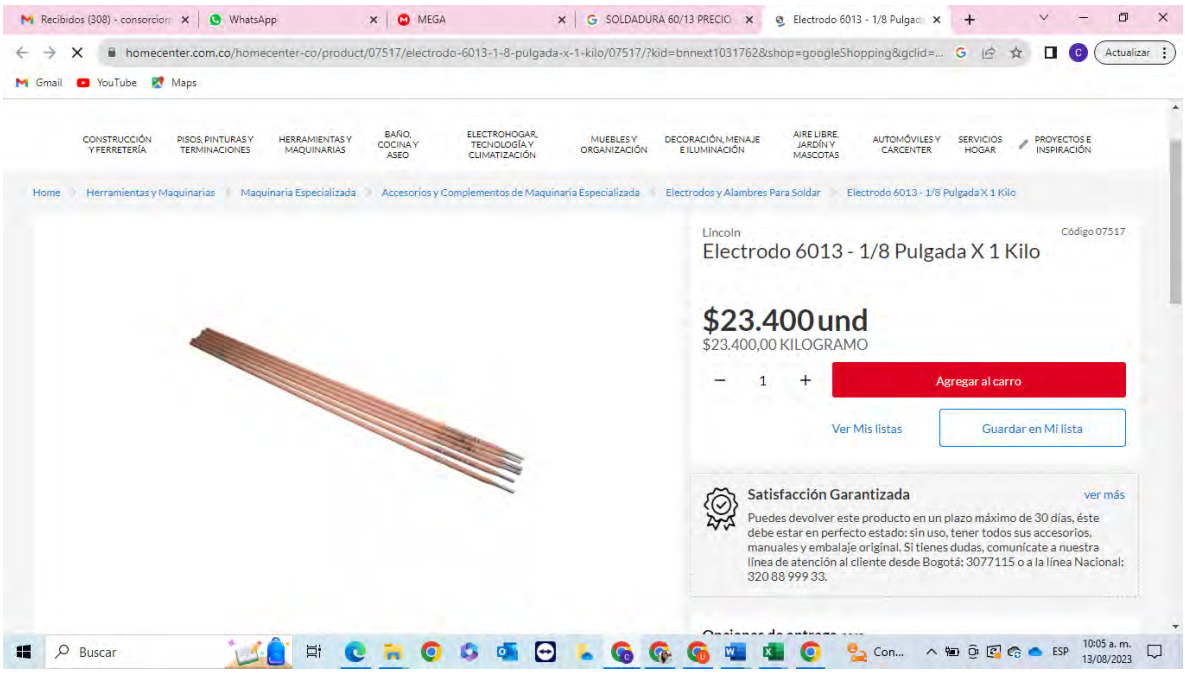
Precio **$32.088**

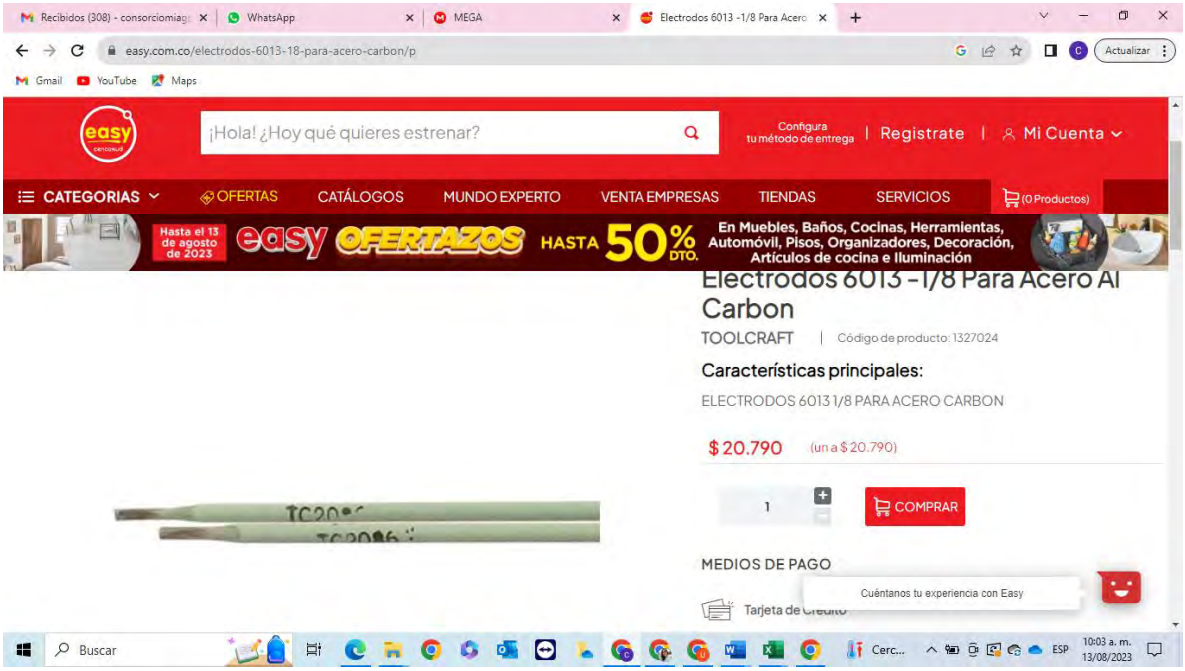
Opciones Selecciona

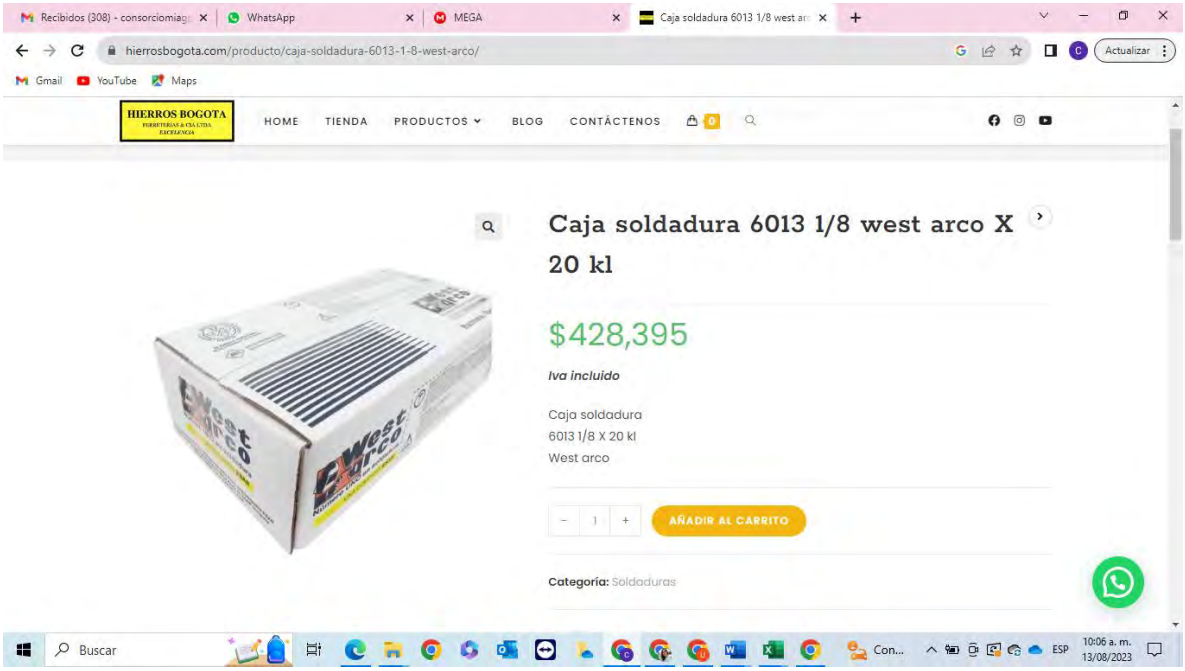
WhatsApp

AGREGAR AL CARRITO

iperando a www.google.com...


Recibidos (308) - consorcion
WhatsApp
MEGA
SOLDADURA 60/13 PRECIO
Electrodo 6013 - 1/8 Pulgad
homecenter.com.co/homecenter-co/product/07517/electrodo-6013-1-8-pulgada-x-1-kilo/07517/?kid=bnnext1031762&shop=googleShopping&gclid=...
Actualizar
Gmail
YouTube
Maps
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
BAÑO, COCINA Y ASEO
ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN
MUEBLES Y ORGANIZACIÓN
DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN
AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS
AUTOMÓVILES Y CARCENTER
SERVICIOS HOGAR
PROYECTOS E INSPIRACIÓN
Home
Herramientas y Maquinarias
Maquinaria Especializada
Accesorios y Complementos de Maquinaria Especializada
Electrodos y Alambres Para Soldar
Electrodo 6013 - 1/8 Pulgada X 1 Kilo
Lincoln
Código 07517
Electrodo 6013 - 1/8 Pulgada X 1 Kilo
$23.400 und
$23.400,00 KILOGRAMO
1
Agregar al carro
Ver Mis listas
Guardar en Mi lista
Satisfacción Garantizada
ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Buscar
Con...
ESP
10:05 a. m.
13/08/2023


Recibidos (308) - consorciomiag
WhatsApp
MEGA
Electrodos 6013 -1/8 Para Acero
easy.com.co/electrodos-6013-18-para-acero-carbon/p
Actualizar
Gmail
YouTube
Maps
¡Hola! ¿Hoy qué quieres estrenar?
Configura tu método de entrega
Registrate
Mi Cuenta
CATEGORIAS
OFERTAS
CATÁLOGOS
MUNDO EXPERTO
VENTA EMPRESAS
TIENDAS
SERVICIOS
(0 Productos)
Hasta el 13 de agosto de 2023
easy OFERTAZOS
HASTA 50% DTO.
En Muebles, Baños, Cocinas, Herramientas, Automóvil, Pisos, Organizadores, Decoración, Artículos de cocina e Iluminación
Electrodos 6013 -1/8 Para Acero Al Carbon
TOOLCRAFT
Código de producto: 1327024
Características principales:
ELECTRODOS 6013 1/8 PARA ACERO CARBON
$ 20.790
(un a $ 20.790)
1
COMPRAR
MEDIOS DE PAGO
Tarjeta de Crédito
Cuéntanos tu experiencia con Easy
Buscar
Cerc...
ESP
10:03 a. m.
13/08/2023


Recibidos (308) - consorciomiag
WhatsApp
MEGA
Caja soldadura 6013 1/8 west arc
hierrosbogota.com/producto/caja-soldadura-6013-1-8-west-arco/
Actualizar
Gmail
YouTube
Maps
HIERROS BOGOTA
HOME
TIENDA
PRODUCTOS
BLOG
CONTÁCTENOS
Caja soldadura 6013 1/8 west arco X 20 kl
$428,395
Iva incluido
Caja soldadura
6013 1/8 X 20 kl
West arco
AÑADIR AL CARRITO
Categoría: Soldaduras
Buscar
ESP
10:06 a. m.
13/08/2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

BOGOTÁ

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	Malla Exoandida CR IMT 30 X 1 CAL 18	M2	$ 50.832	PROCASA	44.000,000	FERROPETROL	$ 52.955	steckrel aceros	$ 49.262	$ 4.679	$53.942	$44.583	$ 50.832		$ 52.955	$ 51.894
	Ángulo G50 1/8" x 1" x 6m	UN	$ 45.350,00	HOMECENTER	$ 55.600,00	METROPOLICENTER	44286	CONSTRUMOLE	$ 48.412	$ 6.248	$54.660	$42.164	$ 45.350		$ 44.286	$ 44.818
	Soldadura 6013 1/8west arco	UN	$ 23.400,00	HOMECENTER	$ 20.790,00	EASY	21419,75	HERREROS BOGOTA	$ 21.870	$ 1.362	$23.232	$20.508		20790,00	$ 21.420	$ 21.105

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-33	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	UN	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	68.750,00	3.437,50
				SUBTOTAL	3.437,50

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	und	1,00	$ 9.086.600,00	$ 9.086.600,00
			SUBTOTAL	9.086.600

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	JORNAL	52,13%	137.500	0,50	68.750,00
				SUBTOTAL	68.750,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 9.158.788,00
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 2.581.862,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 11.740.650,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:
Nombre: E. RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-33- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

UNIDAD:ML

JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo con los requerimientos específicos de los laboratorios de Química, Física y Biología, se requiere la instalación de pocetas en materiales durables, con facilidad de limpieza y lavado adaptados a los espacios existentes.

Atendiendo a estas necesidades se instalarán pocetas en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-33- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

UNIDAD:UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la **Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.**

EJECUCIÓN:

- Verificar medidas en sitio
- Verificar puntos de conexión y tamaños de pocetas

MATERIALES:

- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **METRO UNIDAD (UND) de Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa,** recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-34	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	UN	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	68.750,00	3.437,50
				SUBTOTAL	3.437,50

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	und	1,00	$ 3.513.950,00	$ 3.513.950,00
			SUBTOTAL	3.513.950

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	JORNAL	52,13%	137.500	0,50	68.750,00
				SUBTOTAL	68.750,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.586.138,00
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 1.010.932,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 4.597.070,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:
Nombre: E. RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-34- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.
UNIDAD:ML

JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo con los requerimientos específicos de los laboratorios de Química, Física y Biología, se requiere la instalación de pocetas en materiales durables, con facilidad de limpieza y lavado adaptados a los espacios existentes.

Atendiendo a estas necesidades se instalarán pocetas en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-34- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

UNIDAD:UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.**

EJECUCIÓN:

- Verificar medidas en sitio
- Verificar ubicación de puntos hidráulicos y eléctricos

MATERIALES:

- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (UN) de Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa,** recibidos a satisfacción por la interventoría.

HACER ACEROS LG

MANUFACTURAS EN ACERO INOXIDABLE

BOGOTA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Señores.

CONSORCIO MIA GP

Consultorio / espacio	Medidas	Observación	Valor
LABORATORIOS LICEO FEMENINO	LARGO (Entre 3.25 y 3.80) ANCHO (Entre 0.60 y 0.65) ALTURA (0.90)	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	$8.965.000
LABORATORIOS LICEO FEMENINO	LARGO (Entre 3.25 y 3.80) ANCHO (1.20) ALTURA (0.90)	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	$3.400.000

NO ASUMIMOS RETENCIONES NI IVA YAQUE SOMOS REGIMEN SIMPLIFICADO, EN CASO DESER NECESARIO SE AUMENTARIA AL TOTAL.

Garantía de un año por defectos de fabricación

Cra. 27 No. 8-80 telefax: 5601389
- E-mail: haceraceroSlg@hotmail.com - Bogotá D.C. Colombia

HACER ACEROS LG

MANUFACTURAS EN ACERO INOXIDABLE

La fecha de entrega está sujeta a lo pactado con el cliente al momento de llegar a un acuerdo de trabajo.

Los precios son netos pues HACER ACEROS LG es régimen simplificado, para el pago se envía cuenta de cobro y se adjunta RUT y cámara de comercio de ser necesario.

El trabajo se inicia con un abono del 60% y el otro 40% se cancela al momento de la entrega.

Cra. 27 No. 8-80 telefax: 5601389
- E-mail: haceraceroSlg@hotmail.com - Bogotá D.C. Colombia

ALUVIDRIOS

Bogotá, 25 de septiembre de 2023

Señores:

CONSORCIO MIA GP

REF. COTIZACION MESONES ACERO INOXIDABLE LICEO FEMENINO

M	DESCRIPCIÓN	CAN	VALOR UNITARIO	valor TOTAL
P-01	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	1	$7.640.000	$7.640.000
P-02	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	1	$ 2.950.378	$ 2.950.378
			Subtotal	10.590.378
			19%	2.012.172
			total	12.602.550

Forma de pago: 60% al iniciar y 40% contra entrega

Tiempo de entrega: 8 días hábiles

De ante mano agradezco su pronta y favorable respuesta.

Atentamente

Luis Omar Zamudio

CC. 11.524.197

Cel. 3202458501

IGT S.A.S

LINEA INSTITUCIONAL PARA AREAS PUBLICAS
PRODUCTOS ANTIVANDALICOS PARA PENITENCIARIAS
PRESTACION DE SERVICIOS METALMECANICOS

Bogotá 25 SEPTIEMBRE 2023 Cotización No. 10085

Señores (as):
CONSORCIO MIA GP

Atn. Sr(a). ING. SANDRA PINZON
CR 18 60 C 13 S

Bogota D.C. TEL. 3143826320
HOSPITAL TUNAL

Validez de la Oferta:
15 DÍAS ACORDE A TRM DÓLAR

Garantía:
1 AÑO POR DEFECTOS DE FÁBRICA
Tiempo de Entrega: 20 DÍAS HÁBILES

Forma de Pago: CONTADO
Anticipo: 50%
Saldo: CONTRA ENTREGA

En atención a su solicitud y de la manera más cordial nos dirigimos a ustedes con el objeto de hacerle llegar la siguiente cotización:

Referencia	Descripción	Cant.	Uni	Vlr Unit.	IVA	Total
	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 3000mm X 600mm X 900mmh AISI SAE 304CALIBRE 16 EN CUBIERTA, POCETA DE 500mm X 400 X 300mmP EN CALIBRE 18,OMEGAS Y ENTREPAÑO EN CALIBRE 20, PATAS EN ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304 TUBERÍA DE 1 1/2" SALPICADERO DE100mm (FRENTE CAMILLAS TERAPIA)	1	U	$ 7.631.596	19%	$9.081.600
	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 860mm X 600mm X 900mmh AISI SAE 304CALIBRE 16 EN CUBIERTA, POCETA DE 500mm X 400 X 300mmP EN CAIBRE 18,OMEGAS Y ENTREPAÑO EN CALIBRE 20, PATAS EN ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304 TUBERÍA DE 1 1/2" SALPICADERO DE100mm (ENTREVISTA)	1	U	$ 2.955.420	19%	$3.516.950

Valor en Letras
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.587.016,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**2.011.533,19**
TOTAL DOCUMENTO	**12.598.550,00**

Esperamos satisfacer sus expectativas y quedamos atentos a una pronta y positiva respuesta.
Cordialmente,

GUSTAVO ALEJANDRO RODRIGUEZ DIAZ
Asesor Comercial
gustavo.rodriguez@igtsas.co
3713566-3008633269

WILLIAM J. GONZALEZ TORRES
Gerente General

servicioalcliente@igtsas.com

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	UND	$ 8.965.000	HACER ACEROS LG	$ 9.091.600	ALUVIDRIOS	$ 9.081.600	IGT SAS	$ 9.046.067	$ 70.384	$9.116.450	$8.975.683		9091600,00	$ 9.081.600	$ 9.086.600
	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	UND	$ 3.400.000	HACER ACEROS LG	$ 3.510.950	ALUVIDRIOS	$ 3.516.950	IGT SAS	$ 3.475.967	$ 65.857	$3.541.824	$3.410.109		3510949,82	$ 3.516.950	$ 3.513.950

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-35	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PLASTICA PARA CARCAMO ancho = 40cm X espesor = 5cm	ML	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	13.750,00	687,50
Pulidora manual con disco (alquiler)			20.000,00	0,05	1.000,0
				SUBTOTAL	**1.687,50**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
REJILLA PLASTICA 40 CM X 5 CM	ml	1,00	$ 246.172,00	$ 246.172,00
			SUBTOTAL	**246.172**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	**-**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	JORNAL	52,13%	137.500	0,10	13.750,00
				SUBTOTAL	**13.750,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 261.610,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 73.748,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 335.358,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Teniendo en cuenta que dentro de la oferta económica no hay una actividad que se asemeje a la presente, ya que las contractuales difieren en el ancho del elemento, se vio la necesidad de formular el actual ítem, para cubrir esa necesidad.

Firma:
Nombre: E. RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-35- SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PLASTICA PARA CARCAMO ancho = 40cm X espesor = 5cm

UNIDAD:ML

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la instalación de rejillas plásticas en plazoletas, parques, canchas y demás áreas de urbanismo dentro de las instalaciones educativas a fin de garantizar la retención de solidos de manera que se proteja la integralidad de los sumideros y cárcamos existentes.

Las rejillas plásticas poseen la bondad de ser fáciles de retirar para cualquier mantenimiento o adecuación, ser de fácil lavado, y generar seguridad a los estudiantes y demás personal debido a que mantiene su superficie totalmente integral y rígida, sin deformaciones que generen un riesgo al transitar sobre ellas o manipularlas.

De acuerdo con los dimensionamientos de cárcamos generados a partir de los cálculos sanitarios para descargue pluvial en canchas, cuyos anchos útiles son de 30 cm es necesario instalar rejillas para cárcamos de 40 cm de ancho.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-35- SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PLASTICA PARA CARCAMO ancho = 40cm X espesor = 5cm

UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PLASTICA PARA CARCAMO ancho = 40cm X espesor = 5cm**

EJECUCIÓN:

- Verificar medidas de pestañas y anchos útiles de cárcamos
- Verificar linealidad de cárcamos
- Instalar rejillas

MATERIALES:

- REJILLA PLASTICA PARA CARCAMO 69X40X5

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **METRO LINEAL (ML) de SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PLASTICA PARA CARCAMO ancho = 40cm X espesor = 5cm,** recibidos a satisfacción por la interventoría.

DISEÑOS EN PLASTICO REFORZADO SAS.

NIT 800046899-4

Sogamoso, 05 de septiembre de 2023

Señores:
PROCASA


Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos cotizar productos plásticos requeridos.

DESCRIPCION	COLOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO antes de iva	Total
Rejilla de 69*40*05 espesor Trafico liviano	Verde	50	$ 142.016	$ 7.100.800
			Sub total	$ 7.100.800
			Iva	$ 1.349.152
			total	$ 8.449.000

Lugar de entrega: Puestas en Bogotá
Forma de Pago: Anticipado
Tiempo de entrega: inmediata
Color: Rejilla Azul y negra
Validez de oferta: 30 septiembre 2023

Cordialmente,



TATIANA PESCA
3214856793
ASESOR COMERCIAL DPR SAS
Kilómetro 0, vía Sogamoso-tibasosa

INGENIERIA DE POLIMEROS S.A.S.
CL 81 52 D 107
Itagüí Antioquia
Colombia

PROCASA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS
CARRERA 18 # 60C 13S
BOGOTA Cundinamarca
Colombia
NIT: 9015318342

Cotización # S03846

Fecha de cotización:
30-08-2023

Vendedor:
NIDIA MEZA MENDOZA

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Importe
[1030119] REJILLA 69CMX40CMX5CM	145,000 Unidades	135.546,00	IVA 19%	$ 19.654.170,00
[1] COSTO DE ENVIO	1,000 Unidades	1.150.000,00	IVA 19%	$ 1.150.000,00
PESO UND. REJILLA 10 KILOS. PESO TOTAL 1450 KILOS				
REJILLAS EN COLOR NATURAL VERDE CLARO				
SE ANEXA FICHA TECNICA				
SE ANEXAN FOTOS DE LAS MISMAS ESPECIFICACIONES INSTALADAS EN OTROS COLEGIOS BOGOTA				

Subtotal	$ 20.804.170,00
IVA 19% en $ 20.804.170,00	$ 3. 952.792,00
Total	$ 24.756.962,30

GANADOR DEL PREMIO A LA INNOVACIÓN CAMACOL 2022

CONDICIONES COMERCIALES

- Formas de pago:

*50% anticipo y 50% antes de despacho.
*Consignar a cuentas Bancolombia / corriente #616 119 678 36

INGENIERIA DE POLIMEROS S.A.S.
CL 81 52 D 107
Itagüí Antioquia
Colombia

*Debe anexar su RUT.
*Enviar comprobante de pago.

- Entregas y/o despachos:

*Solo se entrega con el número de pedido suministrado por el asesor.

- Producto:

*El material tiene superficie con rugosidades.
*El material no queda con la misma homogeneidad en su color.
*Es importante resaltar que nuestros productos por ser elementos fabricados con Polipropileno, son productos que se dilatan y se contraen según la temperatura del ambiente.
*Los precios varían de acuerdo a las condiciones del contratante.

- Después de 3 días de ser anunciado el pedido para su entrega se cobrará bodegaje.

- Esta cotización puede variar sus precios dependiendo de las condiciones durante el desarrollo y ejecución de la obra.

Plazo de pago: Pago inmediato

COTIZACION

MADERPLAST S.A. NIT: 900.092.518-1

ASESORA COMERCIAL - OLGA PINEDA 3186071123/3178227194

ACTUALIZACION 10	
MAD-06-CO-03	
VIGENTE: 26 DE OCTUBRE DE 2022	

FECHA:	15/09/2023 0:00	COTIZACIÓN N.	CT18-655-23
EMPRESA:	PROCASA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS	TEL:	3219656222
CLIENTE:	SRA, SANDRA PINZON	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCIÓN:	BOGOTOA	ASESOR COMERCIAL:	OLGA PINEDA
EMAIL:	diazsami123@gmail.com	CEL: ASESOR COMERCIAL	CEL:3186071123-3178227194 Pbx: 4855555 - Ext. 214

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
		FABRICACION Y SOLO SUMINISTRO		
1	100	FABRICACION Y SOLO SUMINISTRO DE: Rejillas 100% plasticas maderplast de 40 cms ancha x 100 cms larga x 5 cms espesor, con filtracion de 2 cms, para trafico vehicular liviano, colores de linea verde, gris, azul o café . Nota: la rejilla es de 45 cms ancha y se le corta a 40 cms el costo del corte esta incluiod en el valor unitario del producto,	$ 505.500	$ 50.550.000
		 		
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ 50.550.000
		DESCUENTO	0%	$ -
			SUBTOTAL	$ 50.550.000
		IVA	19%	$ 9.604.500
			TOTAL	$ 60.154.500
		MERCANCIA PUESTA EN BOGOTA POR VALOR MAYOR A $ 1,000,000, SI ES POR FUERA DE BOGOTA EL CLIENTE CANCELA EL TRANSPORTE		

CONDICIONES DE PAGO: 50% ANTICIPO PARA INICIAR PRODUCCION Y 50% ANTES DE LA ENTREGA, SI ES CHEQUE SON 3 DIAS DE CANJE QUE SE DEBEN DE TENER EN CUENTA PARA LA ENTREGA.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

GARANTIA DEL FABRICANTE: 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION, BAJO UN USO NORMAL

FECHA DE ENTREGA DE NUESTROS PRODUCTOS: 15 A 20 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDO EL SOPORTE Y CONFIRMACION DEL PAGO Y SI SE REQUIEREN PLANOS EL TIEMPO DE FABRICACION DEL PRODUCTO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS POR PARTE DEL CLIENTE. NOTA: SEGÚN CANTIDAD Y COMPLEJIDAD DEL PRODUCTO A FABRICAR EL TIEMPO DE ENTREGA SE ESTABLECERA EN COMÚN ACUERDO CON EL CLIENTE

CONSIGNAR A MADERPLAST S.A. A BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE N° 03230341609 O BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE N° 724020177 O BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 060157922 O EN UN FORMATO DE RECAURDO EMPRESARIAL.

FAVOR ENVIAR ORDEN DE COMPRA Y ANTICIPO POR EMAIL: ventas3@maderplast.com / Pbx: 4855555 Ext. 214 CEL:317 822 71 94 / 318 607 11 23 - CON ATENCION A OLGA PINEDA ASESORA COMERCIAL

TERMINOS Y CONDICIONES: UNA VEZ SEA NOTIFICADO QUE PUEDE RECOGER SU PRODUCTO DISPONDRA DE 15 DIAS CALENDARIO PARA RECOGERLO, A PARTIR DEL DIA 16 NO SE RESPONDE POR EL PRODUCTO Y SE COBRARA BODEGAJE.

NOTA: EL MATERIAL TIENE UNA DILATACIÓN +/- 5MM.

NOTA: Estos productos son reciclables. Aplica restricciones



NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO DESPUES DE RECIBIDO EL ANTICIPO E INICIADA LA FABRICACION DEL PRODUCTO

EN LA ORDEN DE COMPRA INFORMAR EL DIA DE CIERRE DE FACTURAS Y ENVIAR EL RUT PARA REALIZAR LA RESPECTIVA FACTURA

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

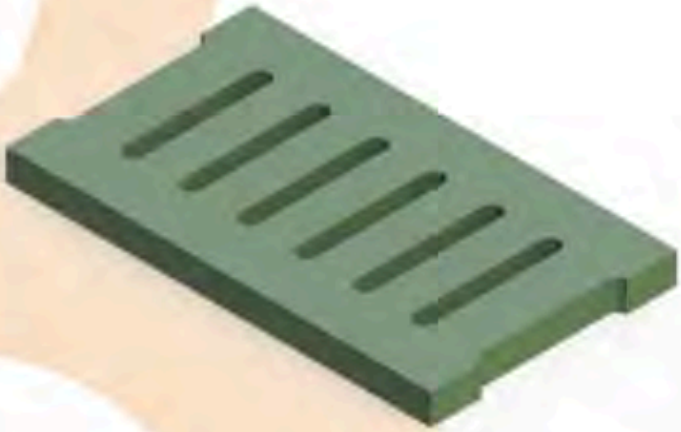
LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

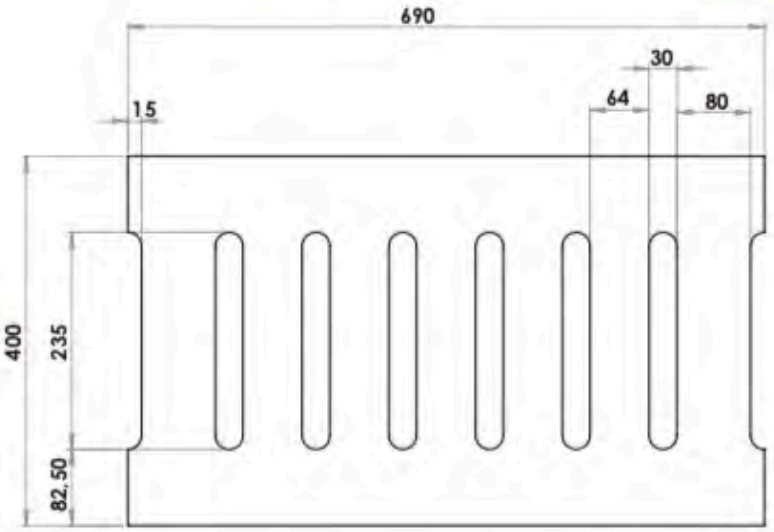
ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	REJILLA PLASTICA 40 CM X 5 CM	ML	$ 247.446	INGEPOL	601.545,000	MADERPLAST	$ 244.899	DPR SAS	$ 364.630	$ 205.179	$569.808	$159.451	$ 247.446		$ 244.899	$ 246.172


REJILLA 69cmx40cmx5cm

FICHA TECNICA DE PRODUCTO


LINEA CONSTRUCCION







SECCIÓN A-A



APLICACION:

Rejillas utilizadas en sistemas de drenaje. cárcamos y sumideros con paso peatonal. Permiten la retención de solidos desde tamaños relativamente pequeños por el diseño de sus aberturas

unidades en mm



	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN SANITARIA PARA SANITARIO FLUXOMETRO	UND	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	72.916,67	3.645,83
				SUBTOTAL	3.645,83

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
CONEXIÓN SUPERIOR SANITARIA	Un	1,00	$ 94.597,00	$ 94.597,00
CEMENTO SOLVENTE PARA PVC 1/4 GL	Un	0,10	$ 124.250,00	$ 12.425,00
Cinta teflon 1/2" x 10m	Un	0,05	$ 16.200,00	$ 810,00
			SUBTOTAL	107.832

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla HH instalaciones hidraulicas (ofc+ayud)	JORNAL	52,13%	145.833	0,50	72.916,67
				SUBTOTAL	72.916,67
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 184.395,00
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 51.981,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 236.376,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, esa es la razón del rendimiento y la necesidad de contar con suficientes equipos de andamios

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-36- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN SANITARIA PARA SANITARIO FLUXOMETRO

UNIDAD:U

JUSTIFICACIÓN:

Se han identificado daños en los accesorios que conectan los sanitarios de fluxómetro con la tubería de suministro, por lo cual se evidencian fugas de agua y perdida de presión en las descargas de los sanitarios.

Se requiere realizar el reemplazo de este accesorio a fin de corregir las fugas de agua y garantizar la presión en cada descarga.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-36- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN SANITARIA PARA SANITARIO FLUXOMETRO

UNIDAD: U

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN SANITARIA PARA SANITARIO FLUXOMETRO**

EJECUCIÓN:

- Desmontar accesorio existente
- Verificar medidas de acoples y accesorios de conexión
- Verificar altura de sanitario a conectar
- Instalar conexión sanitaria
- Verificar hermeticidad de la instalación

MATERIALES:

- CONEXIÓN SUPERIOR SANITARIA
- CEMENTO SOLVENTE PARA PVC 1/4 GL
- Cinta teflon 1/2" x 10m

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (U) de SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN SANITARIA PARA SANITARIO FLUXOMETRO,** recibidos a satisfacción por la interventoría.

SOELCO

Busca tu producto

Categorías

Inicio Ofertas Tiendas Soelco Blog Contáctenos

Iniciar Sesión

Inicio / Hogar Y Muebles / Baños / Grifería para Baño / Conexión Superior Sanitario Gricol Is-Co02-211

No puedes añadir «Conexión Superior Sanitario Gricol Is-Co02-211» al carrito porque el producto está agotado.



Conexión Superior Sanitario Gricol Is-Co02-211

Referencia / Modelo: IS-CO02-211

Tiempo de Garantía: 2 años

$84.966

Medios de Pago:

Tarjeta de Crédito

Billetera Digital

Transferencia

Efecty

Formas de Envío:

Más información sobre envíos

AGOTADO

Añadir a la Lista de deseos

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?

Entregar pedido para Bogotá D.C.

¡Hola Luis M

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTRO HOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMOTRIZ Y CARPENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home Construcción y Ferretería Plomería Repuestos y Accesorios para Sanitario, Ducha y Lavamanos Conexión Superior Sanitario



Gricol

Código 460880

Conexión Superior Sanitario

0.0 (0)

$94.900

− 1 + Agregar al carro Comprar ahora

Ver Mis Listas Guardar en Mi Lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 83 999 33.

Opciones de entrega para Bogotá D.C.

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

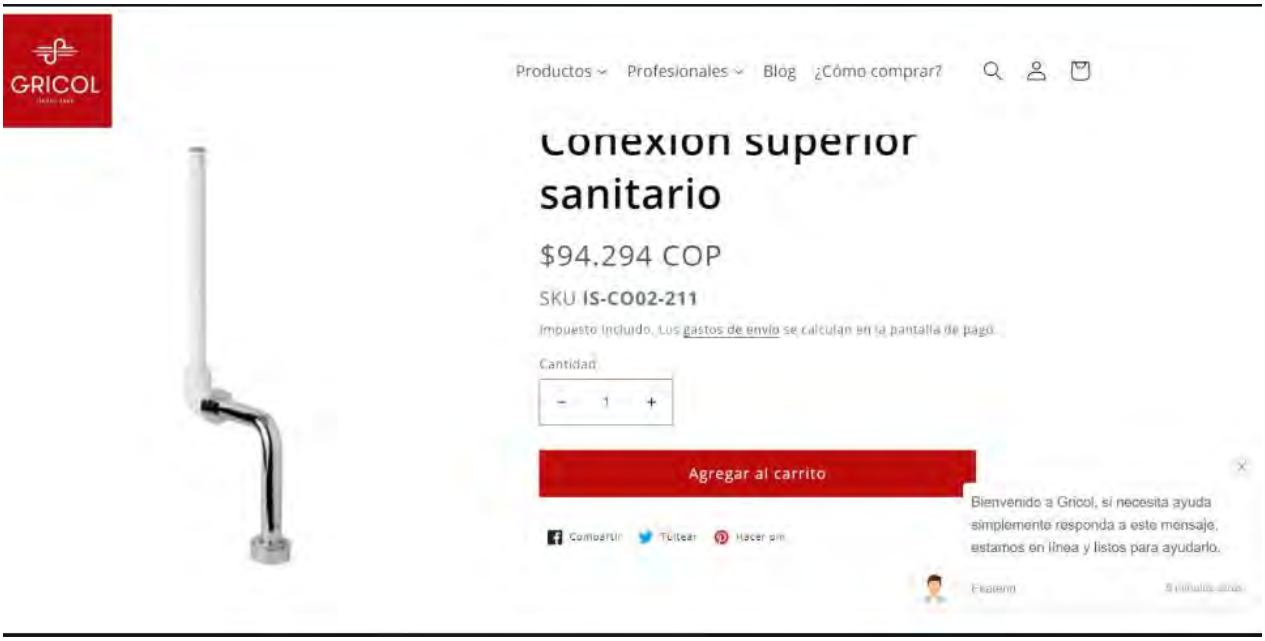
Disponible
Retiro en tienda ver tiendas

Ficha técnica

Opiniones de clientes

Aún no tenemos comentarios de otros clientes, ¡Sé el primero!

Escribir opinión


GRICOL
Productos
Profesionales
Blog
¿Cómo comprar?
Conexión superior sanitario
$94.294 COP
SKU IS-CO02-211
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
1
Agregar al carrito
Compartir
Tuitear
Hacer pin
Bienvenido a Gricol, si necesita ayuda simplemente responda a este mensaje, estamos en línea y listos para ayudarlo.

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	CONEXIÓN SUPERIOR SANITARIA	UND	$ 84.966	SOELCO	94.900,000	HOMECENTER	$ 94.294	GRICOL	$ 91.387	$ 5.569	$96.955	$85.818		94900,00	$ 94.294	$ 94.597

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	**DE**	2022	**FECHA INICIO**	20/01/2023	**FECHA TERMINACIÓN**	19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PAEZ

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-39	**Suministro e instalacion de PANEL LISO DE FACHADA dimensión frontal: medida estándar del panel ancho 1.14 cm x 0.53 cm alto en lámina GALVANIZADA, Calibre 18, equivalente a 1.3 m.m., con protección: Acabado con pintura poliéster (polvo electroestático) con protección UV.Marca VITRACOAT (Qualicoat Tipo 2/ AAMA 2604). 2 colores Estos acabados son impermeables a agentes externos como contaminación ambientalvehicular. La pintura es superficie lisa, Aplicación de pintura electroestática por las dos caras del panel, Espesor de pintura: 50 micras sobre superficie, por cada cara A y B. El panel será fabricado por sus (4) lados, con el sistema pestaña 2.5 cm y contra pestaña 2.5 cm posterior que evitan la deformación del panel al momento de instalarlos, Dilatación de 10 m.m. por todos los (4) lados en cada panel, con el fin de absorber los asentamientos de la estructura y los movimientos sísmicos, Sistema BRAZO ROBOTIZADO para la aplicación de pintura. NO MANUAL**	**UND**	**31,00**

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
					-
				SUBTOTAL	**-**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Suministro e instalacion de PANEL LISO DE FACHADA dimensión frontal: medida estándar del panel ancho 1.14 cm x 0.53 cm alto en lámina GALVANIZADA, Calibre 18, equivalente a 1.3 m.m., con protección: Acabado con pintura poliéster (polvo electroestático) con protección UV.Marca VITRACOAT (Qualicoat Tipo 2/ AAMA 2604). 2 colores Estos acabados son impermeables a agentes externos como contaminación ambientalvehicular. La pintura es superficie lisa, Aplicación de pintura electroestática por las dos caras del panel, Espesor de pintura: 50 micras sobre superficie, por cada cara A y B. El panel será fabricado por sus (4) lados, con el sistema pestaña 2.5 cm y contra pestaña 2.5 cm posterior que evitan la deformación del panel al momento de instalarlos, Dilatación de 10 m.m. por todos los (4) lados en cada panel, con el fin de absorber los asentamientos de la estructura y los movimientos sísmicos, Sistema BRAZO ROBOTIZADO para la aplicación de pintura. NO MANUAL	UN	1	$ 816.988,00	$ 816.988,00
			SUBTOTAL	**816.988**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	**-**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
					-
				SUBTOTAL	**-**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 816.988,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 230.309**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 1.047.297**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ 32.466.204**

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá a los veinticinco dias del mes de septiembre de 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombr Edinson ricardo duarte
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-39- Suministro e instalación de PANEL LISO DE FACHADA dimensión frontal: medida estándar del panel ancho 1.14 cm x 0.53 cm alto en lámina GALVANIZADA, Calibre 18, equivalente a 1.3 m.m., con protección: Acabado con pintura poliéster (polvo electroestático) con protección UV.Marca VITRACOAT (Qualicoat Tipo 2/ AAMA 2604). 2 colores Estos acabados son impermeables a agentes externos como contaminación ambiental vehicular. La pintura es superficie lisa, Aplicación de pintura electroestática por las dos caras del panel, Espesor de pintura: 50 micras sobre superficie, por cada cara A y B. El panel será fabricado por sus (4) lados, con el sistema pestaña 2.5 cm y contra pestaña 2.5 cm posterior que evitan la deformación del panel al momento de instalarlos, Dilatación de 10 m.m. por todos los (4) lados en cada panel, con el fin de absorber los asentamientos de la estructura y los movimientos sísmicos, Sistema BRAZO ROBOTIZADO para la aplicación de pintura. NO MANUAL

UNIDAD:M2

JUSTIFICACIÓN:

Existen fachadas que requieren ser instaladas en materialidad especial debido al uso que se da a los espacios intervenidos, pues por ser espacios educativos son de alto tránsito y también se encuentran dentro de áreas deportivas que requieren de materiales resistentes a golpes de balones y al tránsito normal de estudiantes.

Se requiere la instalación de paneles debido a que son materiales que cuentan con alta duración ante la intemperie, tienen la propiedad de conservar sus características físicas de color ante la acción de la lluvia y el sol, garantizando que se conserve la estética de la fachada a largo plazo.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-39- Suministro e instalacion de PANEL LISO DE FACHADA dimensión frontal: medida estándar del panel ancho 1.14 cm x 0.53 cm alto en lámina GALVANIZADA, Calibre 18, equivalente a 1.3 m.m., con protección: Acabado con pintura poliéster (polvo electroestático) con protección UV.Marca VITRACOAT (Qualicoat Tipo 2/ AAMA 2604). 2 colores Estos acabados son impermeables a agentes externos como contaminación ambientalvehicular. La pintura es superficie lisa, Aplicación de pintura electroestática por las dos caras del panel, Espesor de pintura: 50 micras sobre superficie, por cada cara A y B. El panel será fabricado por sus (4) lados, con el sistema pestaña 2.5 cm y contra pestaña 2.5 cm posterior que evitan la deformación del panel al momento de instalarlos, Dilatación de 10 m.m. por todos los (4) lados en cada panel, con el fin de absorber los asentamientos de la estructura y los movimientos sísmicos, Sistema BRAZO ROBOTIZADO para la aplicación de pintura. NO MANUAL

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **Suministro e instalación de PANEL LISO DE FACHADA dimensión frontal: medida estándar del panel ancho 1.14 cm x 0.53 cm alto en lámina GALVANIZADA, Calibre 18, equivalente a 1.3 m.m., con protección: Acabado con pintura poliéster (polvo electroestático) con protección UV.Marca VITRACOAT (Qualicoat Tipo 2/ AAMA 2604). 2 colores Estos acabados son impermeables a agentes externos como contaminación ambiental vehicular. La pintura es superficie lisa, Aplicación de pintura electroestática por las dos caras del panel, Espesor de pintura: 50 micras sobre superficie, por cada cara A y B. El panel será fabricado por sus (4) lados, con el sistema pestaña 2.5 cm y contra pestaña 2.5 cm posterior que evitan la deformación del panel al momento de instalarlos, Dilatación de 10 m.m. por todos los (4) lados en cada panel, con el fin de absorber los asentamientos de la estructura y los movimientos sísmicos, Sistema BRAZO ROBOTIZADO para la aplicación de pintura. NO MANUAL**

EJECUCIÓN:

- Se verifica estructura metálica instalada, niveles, dimensiones, recubrimientos, plomos
- Se verifica modulación de elementos
- Se instalan paneles de acuerdo con detalle en planos arquitectónicos
- Se colocan pernos en cada panel verificando su adecuada fijación a la estructura existente, luces, verticalidad, horizontalidad

MATERIALES:

- Panel para revestimiento de fachada en lámina galvanizada, calibre 18, modulación 1,14 x 0,53 m, con acabado con pintura poliéster lisa. Incluye tornillería de fijación , perforaciones y dobleces.

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIOS

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **METRO CUADRADO (M2) de Suministro e instalación de PANEL LISO DE FACHADA dimensión frontal: medida estándar del panel ancho 1.14 cm x 0.53 cm alto en lámina GALVANIZADA, Calibre 18, equivalente a 1.3 m.m., con protección: Acabado con pintura poliéster (polvo electroestático) con protección UV.Marca VITRACOAT (Qualicoat Tipo 2/ AAMA 2604). 2 colores Estos acabados son impermeables a agentes externos como contaminación ambiental vehicular. La pintura es superficie lisa, Aplicación de pintura electroestática por las dos caras del panel, Espesor de pintura: 50 micras sobre superficie, por cada cara A y B. El panel será fabricado por sus (4) lados, con el sistema pestaña 2.5 cm y contra pestaña 2.5 cm posterior que evitan la deformación del panel al momento de instalarlos, Dilatación de 10 m.m. por todos los (4) lados en cada panel, con el fin de absorber los asentamientos de la estructura y los movimientos sísmicos, Sistema BRAZO ROBOTIZADO para la aplicación de pintura. NO MANUAL** a satisfacción por la interventoría.



Geometrix®
Ingenieria de Fachadas

CALIDAD
CUMPLIMIENTO
EFICIENCIA
Y ORGANIZACIÓN
En todos sus proyectos.

(+57) 301 714 2566

Panel con Aluminio Liso

Geometrix®
Ingenieria de Fachadas

Bogotá D.C. Agosto 28 del 2023.

Señores:
JIC Arquitectura Diseño y Construcción SAS.
Colegio Diana Turbay Sede B.
NIT 901.646.396-2
Arq. Juan Camilo Cristancho.
Directora de Obra

ASUNTO: COTIZACION DE FACHADA CON PANEL LISO.

ITEM	DESCRIPCION	M2	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1.1.	**PANEL LISO DE FACHADA** **1. *Dimensión frontal: medida estándar del panel ancho 1.14 cm x 0.53 cm alto.*** **2.** La instalación del panel será en posición horizontal. ***3. Se producirá con lámina GALVANIZADA, Calibre 18, equivalente a 1.3 m.m.*** ***4.*** *Protección: Acabado con pintura poliéster (polvo electroestático) con protección UV. Marca VITRACOAT (Qualicoat Tipo 2/ AAMA 2604). 2 colores* *Estos acabados son impermeables a agentes externos como contaminación ambiental vehicular. La pintura es superficie lisa.* ***5****. Garantía 3 años, según ficha Técnica.* ***6****. Aplicación de pintura electroestática por las dos caras del panel.* *Espesor de pintura: 50 micras sobre superficie, por cada cara A y B.* ***7****. El panel será fabricado por sus (4) lados, con el sistema pestaña 2.5 cm y contra pestaña 2.5 cm posterior que evitan la deformación del panel al momento de instalarlos.* ***8****. Para sujeción de panel a la estructura matriz de aluminio, se usará tornillo de copa Hexagonal auto perforante Tipo R22 con aislante de neopreno, (3) por cada lado.* ***9.*** *Perfilería estructural en Coll Rolled 5 cm x 10 cm. Espesor 1.3 m.m.* ***10****. Hemos diseñado una forma eficiente de ángulos en los (4) lados del panel, que impiden el efecto de contaminación acelerado conocido como (Chorreo) sobre la superficie, causado por la acumulación de partículas contaminantes del ambiente.* ***11****. Se deja una dilatación de 10 m.m. por todos los (4) lados en cada panel, con el fin de absorber los asentamientos de la estructura y los movimientos sísmicos.* ***12****. Sistema BRAZO ROBOTIZADO para la aplicación de pintura.* ***NO MANUAL.***	31	682.000	21.142.000=
	INSTALACION: *1. Director de Obra con experiencia de 10 años en el montaje técnico de fachadas.* *2. No incluye la Ventaneria.* *3. Instalación en la ciudad de Bogotá. Jornada Diurna* *4. NO INCLUYE, la Pintura negra Tipo Coraza, en la zona posterior de mampostería.* *5. Geometrix, realizara el montaje de Estructura mediante la técnica de Andamio Estándar.*			

Costos Directos	***$ 21.142.000=***	***85%***
Administración	$ 1.057.100=	5%
Imprevistos	$ 1.057.100=	5%
Utilidad	$ 1.057.100=	5%
IVA 19% s/utilidad	$ 200.849=	
TOTAL	**$ 24.514.149=**	

CONDICIONES COMERCIALES:

1. El costo de transporte de todo el material está incluido
2. Tiempo de entrega, según cronograma:
   (3) semanas en fabricación y montaje, después de recibir el anticipo.
   * Tener en cuenta Imprevistos por factores climáticos.

3. Forma de pago: 50% a la firma del contrato, 30% Para despacho del panel a obra. 20% saldo contra entrega. SIN RETEGARANTIA.

4. Garantía de (3) años, por defecto de fábrica
5. Oferta válida hasta Agosto 30 del 2023.
7. El cronograma de tiempos para la entrega lo cumplimos trabajando (8) horas diarias, sábado hasta la 1 pm.
8. No trabajamos extras ni festivos para evitar aumentar los costos al proyecto.
9. Todos los adicionales deben ser solicitados por escrito a GEOMETRIX, cuando lo firme el Gerente de Proyecto y el Interventor de la obra autorizando las cantidades y valores se procederá a ejecutar la orden.
10. Toda la herramienta que usaremos en obra queda bajo responsabilidad de la obra durante la noche. La pérdida de equipo extraído de nuestras cajas será cobrada a la obra.
11. LA OBRA TIENE LA RESPONSABILIDAD de entregar los niveles y plomos de pisos y paredes en óptimas condiciones para poder garantizar la calidad de la instalación
12. La obra nos asignara un espacio de trabajo adecuado para realizar nuestra actividad de ensamble
13. Los valores finales pueden experimentar cambios por medidas adicionales que aparezcan durante el desarrollo de la obra.
14. ***Todos los trabajos ADICIONALES, deberán ser cancelados POR ANTICIPADO para ser instalados en la obra.***
15. ***El contrato final será liquidado con las unidades de medidas que presento el contratista. En caso de ser más metraje, será cancelado con el saldo final.***
16. LOS DISEÑOS 3D PRESENTADOS HACEN PARTE DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE GEOMETRIX SAS. NO PUEDEN SER COPIADOS, NI IMITADOS PARA LA EJECUCION EN OBRA POR PARTE DE UNA EMPRESA AJENA A LA NUESTRA.
17. El nivel de fachada debe ser uniforme por todos sus lados. Este trabajo debe ser revisado por parte del consorcio.

GE0METRIX SAS
Gerente de Planeación y Proyectos
Bogotá-Medellín-Miami
Cel 301 7142566



COMERCIALIZADORA METAL GED
CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

Fabricación de productos metálicos para uso estructural • Construcción y remodelación de edificios residenciales y no residenciales • Construcción de obras de ingeniería civil.

BOGOTÁ, 23 AGOSTO DE 2023
COLEGIO DIANA TURBAY
SEÑORES: CONSORCIO MIA GP

COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V UNIDAD	V TOTAL
1	Suministro e instalación de panel para fachada en lamina galvanizada calibre 18 (1.14x0.53m), con acabado con pintura para fachada ventilada en poliester lisa (2 tonos). Incluye tornilleria de fijación , perforaciones y dobleces.	UN	31	528.000	16.368.000
SUBTOTAL					16.368.000
ADMINISTRACION				**5%**	818.400
IMPREVISTO				**3%**	491.040
UTILIDAD				**5%**	818.400
IVA				**19%**	155.496
TOTAL					18.651.336

Atentamente,

EDISON RICAURTE DIAZ PEDRAZA
CC. 93391901

Bogotá, 1 de septiembre de 2023

Señores
CONSORCIO MIA GP
ARQ. JUAN CAMILO CRISTANCHO
PROYECTO: DIANA T arq.juancristancho55@gmail.com
Ciudad

Cotizacion No 3980 A - 22

Cotizacion Productos **Hunter Douglas - FACHADAS - Opcion 1**

PRODUCTO	UND	CANT	VR-UNIT.	VR-TOTAL
Construcción Revestimiento **Lamina galvanizada** - Calibre 18 - Colores a escoger 2 cara decorativa - laminas 1,14 x 0,53 m. Incluye Accesorios de instalación y sopore y nivelación en aluminio. -	M2	31,00	710.000	22.010.000

* TIEMPO DE ENTREGA APROX 3 SEMANAS

Sub total		**22.010.000**
SUB TOTAL		**22.010.000**
Administracion	**8%**	**1.760.800**
Imprevistos	**6%**	**1.320.600**
Utilidad	**4%**	**880.400**
I.V.A. sobre Utilidad	**19%**	**167.276**
Total		**26.139.076**

CONDICIONES COMERCIALES
Forma de Pago: 50% Anticipo - 50% Cortes Quincenales
Instalacion: A convenir según programacion de obra
Validez de la Oferta: 30 dias

JUAN CARLOS RIVERA
Cel. 310 871 0060

INGRID ORTIZ AREVALO
Cel. 310 5839936

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	Suministro e instalacion de panel para revestimiento de fachada en lamina galvanizada, calibre 18, modulacion 1,14 x 0,53 m, con acabado con pintura poliester lisa. Incluye tornilleria de fijacion , perforaciones y dobleces.	Un	$ 790.779	GEOMETRIX SAS	$ 601.656	COMERCIALIZADORA METAL GED	$ 843.196	SUN LIGHT SOLUCIONES	$ 745.210	$ 127.054	$872.265	$618.156	$ 790.779		$ 843.196	$ 816.988
										$ -						
										$ -						

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-366

Bogotá, D.C, octubre 11 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 BICICLETERO

Respetados señores:


En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Jose Antonio Calderón Jaimes	PT 4342875	Ayudante	Bicicletero
2	Ermis Basto Mora	1.094.275.006	Ayudante	Bicicletero
3	Manuel Danilo Rincón Rojas	1.013.611.612	Ayudante	Bicicletero

CONSORCIO TIG

Sin otro particular,

Atentamente,



~~EDISON RICARDO~~ DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe
Anexo. Documentación del personal

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-19, 05:45:54 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 65789843

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 19/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	COLEGIOS RAFAEL URIBE	**Código Sucursal**	COLEGIOSLU
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	47
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 457290	GUTIERREZ SANCHEZ YHON KENEDY	01	00		X														0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8572099	JOSE LUIS BARRIOS CONRADO	01	00	X															0	17	17	17	17	COLFONDOS	$ 657.334	$ 105.200	NUEVA EPS	$ 657.334	$ 26.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 657.334	$ 45.800	COMPENSAR CCF	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.600
CC 10185609	VASQUEZ ARCE VLADIMIRO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 11257890	DIAZ CHINGATE JUAN LEONARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 11524197	ZAMUDIO CHACON LUIS OMAR	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 72097594	POLO GUETTE ANTONIO LUIS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79040683	CORTES RUBIANO WILLIAM	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79051816	PATIÑO WALTEROS MARCO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79383377	MERCHAN RODRIGUEZ JORGE ELIECER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79451618	SANCHEZ BENAVIDES JAIRO ANTONIO	01	00	X															0	3	3	3	3	PORVENIR	$ 116.000	$ 18.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 116.000	$ 4.700	POSITIVA DE SEGUROS	$ 116.000	$ 8.100	COMPENSAR CCF	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
CC 79482086	HINCAPIE JOHN JAIRO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79526595	MARTINEZ ARENAS HONORIO	01	00	X															0	3	3	3	3	PROTECCION	$ 116.000	$ 18.600	FAMISANAR EPS	$ 116.000	$ 4.700	POSITIVA DE SEGUROS	$ 116.000	$ 8.100	COMPENSAR CCF	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79566080	BERNAL VARGAS JOHN ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79925721	ORTIZ JOSE AGUSTIN	01	00	X															0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	FAMISANAR EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 79972033	ACOSTA DOMINGUEZ LUIS GABRIEL	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80111297	LONDOÑO QUIÑONEZ JONATHAN	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80369941	CORONADO MIRANDA LUIS FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80777530	BAYONA RODRIGUEZ DILMER JOVANNY	01	00	X															0	17	17	17	17	COLFONDOS	$ 657.334	$ 105.200	SALUD TOTAL EPS	$ 657.334	$ 26.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 657.334	$ 45.800	COMPENSAR CCF	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.600
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93413312	CAICEDO ARDILA WILLIAM	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000971901	FLOREZ INFANTE MILLER ANDREW	01	00	X															0	8	8	8	8	PROTECCION	$ 309.334	$ 49.500	FAMISANAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1001043676	ORTIZ CRUZ ANDRES OSWALDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001874380	POLO ARIZA DEIMER ANTONIO	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023363554	PINILLA MOSQUERA JUAN ESTEBAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1024497739	VALENCIA ROBAYO FERNEY ALEXANDER	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1028184319	CANDELO RENTERIA SAMIR	01	00	X															0	17	17	17	17	PORVENIR	$ 657.334	$ 105.200	NUEVA EPS	$ 657.334	$ 26.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 657.334	$ 45.800	COMPENSAR CCF	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.600
CC 1028880680	URREA DIAZ BRAYAN MANUEL	01	00		X														0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL STIVEN	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1033770247	GONZALEZ MURILLO KEVIN ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1033811872	CORENA JIMENEZ JOSE ALFREDO	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1047222741	PRIMERA CORTES BRANDON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1068136877	ROMERO FLORENTINO YEISON MANUEL	01	00		X														0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1094276006	BASTO MORA ERMIS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

Pagado: 19/09/2023 **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** **Planilla Nro: 65789843** **Periodo Cotización: agosto de 2023** **Periodo Servicio: septiembre de**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1104544198	CAICEDO AVILA ANGEL DAVID	01	00	X	X														0	27	27	27	27	PORVENIR	$ 1.044.000	$ 167.100	EPS SANITAS	$ 1.044.000	$ 41.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.044.000	$ 72.700	COMPENSAR CCF	$ 1.044.000	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.400
CC 1110541642	FRANCO MARTINEZ CRISTIAN FERNANDO	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1121846956	CRUZ REYES LUIS FERLEY	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 4342875	CALDERON JAIMES JOSE ANTONIO	01	00	X															0	17	17	17	17	COLFONDOS	$ 657.334	$ 105.200	COMPENSAR EPS	$ 657.334	$ 26.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 657.334	$ 45.800	COMPENSAR CCF	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.600
PT 5881621	ORTEGA CHIRINOS OSCAR EDUARDO	01	00	X															0	21	21	21	21	COLFONDOS	$ 812.000	$ 130.000	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
PT 6513909	CHAVERRA CASTRO PEDRO PASCUAL	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 7353844	CASTRO SALDAÑA YORSUAN JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 47.405.337	$ 47.405.337	$ 47.405.337	$ 47.405.337	$ 7.585.200	$ 0	$ 0	$ 1.896.500	$ 3.302.200	$ 1.896.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.680.400	$ 113.300	$ 14.793.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.013.611.612**

RINCON ROJAS

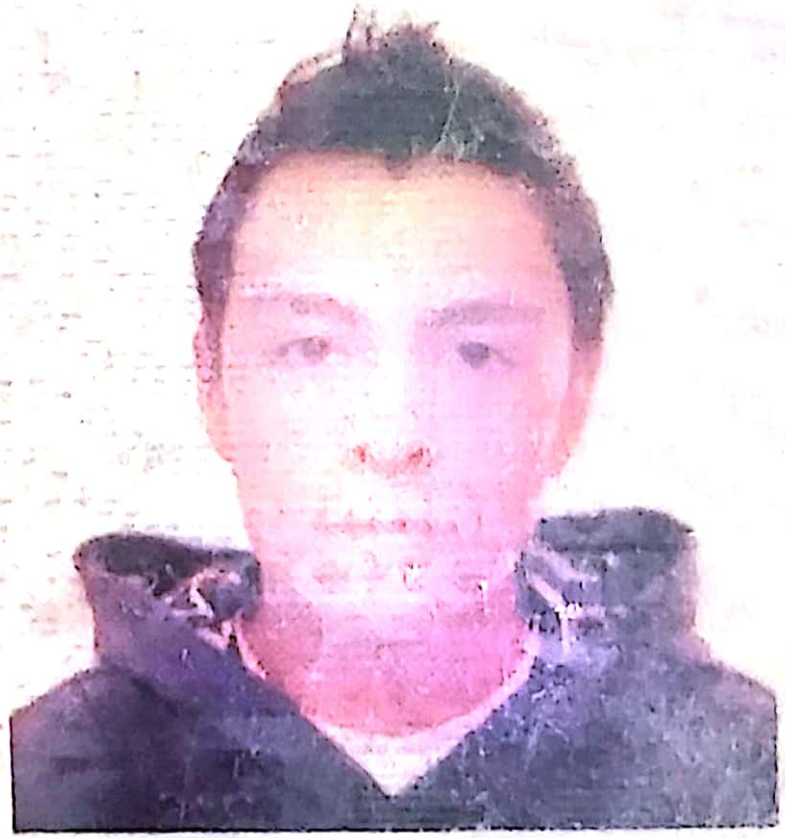
APELLIDOS

MANUEL DANILO

NOMBRES

MANUEL RINCON

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-ABR-1990**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-ABR-2008 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00083743-M-1013611612-20080930 **0003**860985A 1 28610312

Powered by CamScanner

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 10/10/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901634703	**Cédula Usuario:**	CC 1020791796
Nombre:	CONSORCIO MIA GP				
Dirección:	CL 108 23 34				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	LUZARDOMATEO574@GMAIL.COM				
Teléfono:	3133138066		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1020791796	MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	296	11/10/2023	CC 1013611612	RINCON ROJAS MANUEL	5	6.960	**Independiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

66BC95CA5A680861D08C21B767276A17 Certificado impreso el día 10/10/2023 5:24:32 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

MANUEL DANILO
RINCON ROJAS
1013611612

CONSORCIO MIA GP
901634703

Este carné es personal e intransferible.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013611612	MANUEL DANILO RINCON ROJAS	cll 14b # 119a-17 t10 apto 501	0000000	mdrincon90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	10/10/2023	71290164	$342.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	150.000	0		0		0	0	0	0	150.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	192.000	0	0	0	0	0	0		192.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	150.000	150.000
Pensión	1	192.000	192.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	342.000	342.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013611612	MANUEL DANILO RINCON ROJAS	cll 14b # 119a-17 t10 apto 501	0000000	mdrincon90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	10/10/2023	71290164	$342.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013611612	RINCON ROJAS MANUEL DANILO	3	0			N																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS002	1.200.000	150.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-367

Bogotá, D.C, 12 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Respuesta a puntos particulares sobre comunicación adjunta a correo enviado el 11-10-2023

Respetados señores:

Por medio de la presente, el CONSORCIO TIG quien funge en calidad de interventoría, se permite dar respuesta a los puntos particulares requeridos desde la supervisión en relación a la comunicación 2023EE16711 y que fue allegada mediante correo electrónico el 11 de octubre de 2023 a las 15:57.

Con base en las directrices impartidas desde la supervisión y teniendo en cuenta el alcance de la información requerida a través de la misiva, a continuación, procederemos a dar respuesta puntual a los incisos solicitados, a saber:

6. ¿Qué intervenciones físicas se le están haciendo a la infraestructura actual del colegio?

Respuesta: A continuación, el alcance de las obras que hacen parte de las intervenciones:

- Bloques de primaria (edificaciones ubicadas en la zona más baja del predio y que en total son 4 volúmenes): Las actividades que comprende el alcance definido a la fecha para estos espacios son:

  - ✓ Mejoramiento de la cubierta.
  - ✓ Mejoramiento de pisos interiores.
  - ✓ Mejoramiento de la carpintería metálica.
  - ✓ Mejoramiento de circulaciones.
  - ✓ Mejoramiento del sistema de recolección de aguas lluvias.
  - ✓ Mejoramiento de baterías sanitarias.
  - ✓ Mejoramiento de las redes eléctricas.

7. Por favor adjuntar el cronograma de las obras de adecuación que se le hacen a la infraestructura.

Respuesta: En vista que solo contamos con un único cronograma general para todo el contrato de obra y el cual contiene información de otras sedes y que por consiguiente no es de este resorte, resumiremos lo concerniente a la intervención en este colegio, así:

- Fecha de inicio: 01 de mayo de 2023.

- Fecha de terminación actual: 19 de diciembre de 2023 (la misma está sujeta a posibles cambios de las condiciones contractuales).

8. ¿Cuál es la inversión de las adecuaciones físicas de la infraestructura?

Respuesta: Bajo las condiciones contractuales en curso, este colegio tiene una asignación a monto agotable del orden de los $ 2.027.739.819,00 (DOS MIL VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE).

9. ¿Cuál es el contrato bajo el cual se están haciendo las intervenciones en la infraestructura?

Respuesta: Los contratos que están ligados de manera directa a esta intervención son los siguientes:

- Contrato de obra: CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 y cuyo objeto es "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08)".

- Contrato de interventoría: CO1.PCCNTR.4155718 de 2022 y cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Así las cosas, esperamos haber coadyuvado de manera pertinente con el proceso de respuesta sobre el documento allegado a la SED y quedamos atentos a las aclaraciones adicionales que puedan suscitar.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CONSORCIO MIA GP, Mateo Luzardo Villamizar, Representante Legal
Anexo. Sin folios

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-368

Bogotá, D.C, 12 de octubre de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Respuesta a correo electrónico del 11 de octubre de 2023 - Aprobación perfil inspector de obra

Respetados señores:

Por medio de la presente y a luz de lo que establecen sus obligaciones contractuales, esta interventoría se permite dar respuesta a su correo electrónico que data del 11 de octubre de 2023, por medio de la cual presentan el perfil del inspector de obra.

Dicho cambio se refleja a continuación:

- Se reemplaza al Ingeniero Luis Felipe López, por el tecnólogo Manuel Danilo Rincón.

CONSORCIO TIG

Una vez verificados los soportes, identificamos que el tecnólogo designado cuenta con la experiencia solicitada en los pliegos de condiciones y por lo tanto, emitimos el respectivo aval para que inicie de inmediato a cargo de sus funciones.

Sin otro particular,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo: Siete (07) folios

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.013.611.612**

RINCON ROJAS

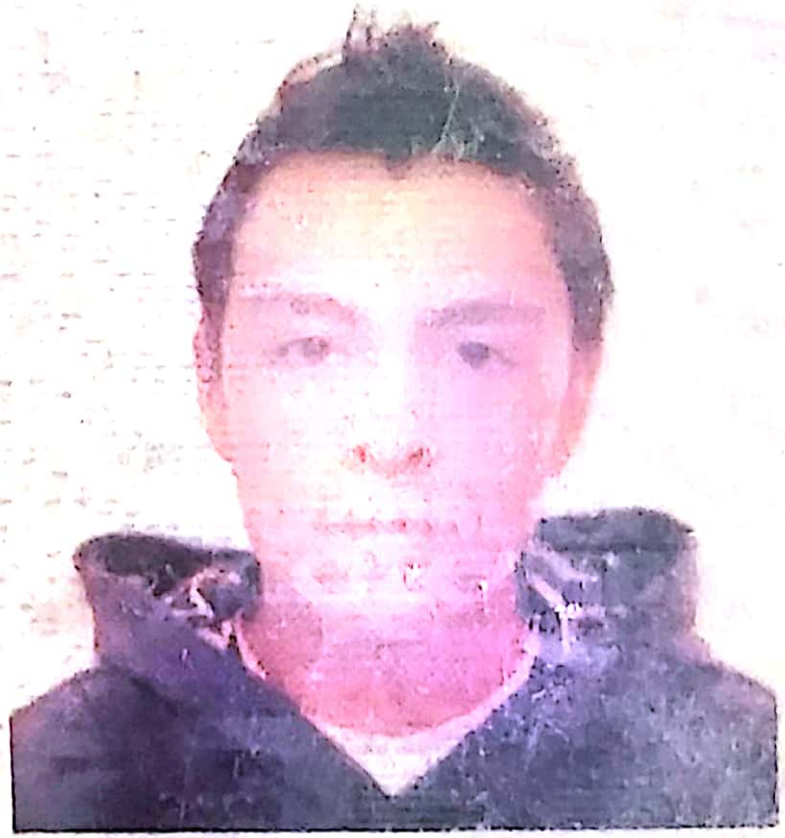
APELLIDOS

MANUEL DANILO

NOMBRES

MANUEL RINCON

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-ABR-1990**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-ABR-2008 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00083743-M-1013611612-20080930 **0003**860985A 1 28610312

Powered by CamScanner

REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA

ACTA DE GRADO

No Y FECHA REGISTRO 283224 - 27/10/2011

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CONSIDERANDO

Que: MANUEL DANILO RINCON ROJAS, Con Cédula de Ciudadanía No. 1.013.611.612

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR EL SENA, RESUELVE OTORGARLE EL TÍTULO DE:

TECNÓLOGO EN CONSTRUCCION

En constancia de lo anterior se firma la presente en Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil once (2011)

Firmado Digitalmente por
WILLIAM OROZCO DAZA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

WILLIAM OROZCO DAZA
SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 920900204S2CC1013611612A.

Powered by CamScanner

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

MANUEL DANILO RINCON ROJAS

Con Cédula de Ciudadanía No. 1.013.611.612

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TECNÓLOGO EN

CONSTRUCCION

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil once (2011)

Firmado Digitalmente por
WILLIAM OROZCO DAZA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

WILLIAM OROZCO DAZA
SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

283224 - 27/10/2011
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 92090020452CC1013611612C.

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
PROFESIONAL AUXILIAR No.

25867-039538 CND
TECNOLOGO CONSTRUCCION

DE FECHA 22/01/2015
MANUEL DANILO
RINCON ROJAS
C.C. 1013611612
SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE "SENA"

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2316995

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:


1. Que MANUEL DANILO RINCON ROJAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1013611612, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de TECNOLOGIA CONSTRUCCION con CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR 25867-039538 desde el 22 de Enero de 2015, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 70.

2. Que el(la) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de Octubre del año dos mil veintitres (2023).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que el señor **MANUEL DANILO RINCON ROJAS**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.013.611.612 de Bogotá, se desempeñó como **INSPECTOR DE OBRA 2**, al proyecto con las siguientes características:

NUMERO DE CONTRATO:	256 de 2017
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO, ZONA CENTRO (Grupo 9).
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de Noviembre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN :	20 de Diciembre de 2019
VALOR DEL CONTRATO :	$13.269.971.487
AREA CONSTRUIDA CUBIERTA :	3.806 M2
CUMPLIMIENTO :	Excelente
Actividades Ejecutadas :	PRELIMINARES, CIMENTACION, DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS, ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICA, MAMPOSTERIA, INSTALCIONES HIDROSANITARIAS, RED CONTRA INCEDIOS, RED GAS, INSTALCIONES ELECTRICAS, RED DE VOZ Y DATOS, APANTALLAMIENTO, REDES EXTERIORES, PAÑETES, PISOS Y ENCHAPES, ACABADOS, CUBIERTAS, PISOS, ASEO Y LIMPIEZA.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2019.

Cordialmente,

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ LOPEZ
C.C 13.459.838 CUCUTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCAR 2017

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-367

Bogotá, D.C, 12 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Remisión copia de la comunicación 2023_RUU_MGP_252 del 08-10-2023 Cierre de hallazgos ambientales

Respetados señores:

Por medio de la presente, el CONSORCIO TIG quien funge en calidad de interventoría, se permite remitir para su conocimiento y fines pertinentes, copia de la comunicación 2023_RUU_MGP_252 que fue allegada el 08 de octubre de 2023 y que tiene por asunto “Cierre de hallazgos ambientales”.

Lo anterior, para sean enterados de los soportes con los cuales el CONSORCIO MIA GP dio atención a dichos hallazgos emitidos en su momento por parte de la profesional de la SED.

CONSORCIO TIG

Quedamos atentos a sus comentarios a que haya lugar.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CONSORCIO MIA GP, Mateo Luzardo Villamizar, Representante Legal
Anexo. Un (1) archivo comprimido de WinRAR de 21,6MB

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-370

Bogotá, D.C, 16 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACION DE INFORME SEMANAL No.39

Respetados señores:

Por medio del presente, esta interventoría se permite remitir el informe semanal de interventoría No.39, correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente contractual literal *G. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO*. El periodo del informe semanal se relaciona a continuación:

- **Informe semanal No.39:** 09/10/2023 al 15/10/2023

Sin otro particular.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Ocho (8) folios

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	16/10/2023	**PERIODO No.**	**39**	DEL	**9/10/2023**	AL	**15/10/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
PRÓRROGA :	N/A	PRORROGA 1:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	364	PLAZO ACTUALIZADO:	333
PLAZO TRANSCURRIDO:	285 EQUIVALE AL 78%	PLAZO TRANSCURRIDO:	268 EQUIVALE AL 80%
VALOR INICIAL :	$ 878.587.938,00	VALOR INICIAL :	$ 11.941.262.150,00
VALOR ADICION(ES):	$ 371.557.789,00	VALOR ADICION(ES):	$ 5.050.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.250.145.727,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 16.991.262.150,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.250.145.727,00	VALOR POR PAGAR:	$ 16.991.262.150,00
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ	INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO DE INICIO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	29/07/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	29/07/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	29/07/2023	13/10/2023	-76
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	29/07/2023		No iniciado
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS**	29/07/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023	13/09/2023	-46
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023	4/10/2023	-67
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
29	**TALLER BICICLETERO**		9/10/2023	
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**268**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR ESTIMADO A EJECUTAR SEGÚN ACTUALIZACIÓN	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 217.989.209,00	$ 217.989.209,00	100,00%	15/08/2023	FINALIZADO
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 210.052.966,00	$ 194.795.502,36	92,74%	30/08/2023	EN EJECUCIÓN
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO

FECHA	16/10/2023	**PERIODO No.**	**39**	DEL	**9/10/2023**	AL	**15/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	$ 1.010.000.000,00	$ 538.985.252,34	53,36%	23/10/2023	EN EJECUCIÓN
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO	$ 485.207.002,00	$ 283.377.856,00	58,40%	20/10/2023	EN EJECUCIÓN
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	$ 841.548.020,00	$ 606.467.969,54	72,07%	31/08/2023	EN EJECUCIÓN
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	$ 1.169.838.192,85	$ 1.169.838.192,85	100,00%	28/08/2023	FINALIZADO
8	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	$ 283.433.330,00	$ 401.752.674,48	141,75%	15/09/2023	EN EJECUCIÓN
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	$ 827.987.076,00	$ 502.668.321,00	60,71%	30/10/2023	EN EJECUCIÓN
11	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL	$ 100.000.000,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	$ 762.681.025,00	$ 459.533.849,00	60,25%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	$ 1.228.838.776,00	$ 1.001.836.456,69	81,53%	30/11/2023	EN EJECUCIÓN
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	$ 1.206.469.428,00	$ 910.391.720,70	75,46%	14/10/2023	EN EJECUCIÓN
15	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL	$ 498.001.754,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	$ 1.193.215.393,25	$ 1.193.215.393,25	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	$ 304.703.052,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
19	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	$ 656.544.890,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
20	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	$ 339.352.709,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR	$ 2.027.739.816,00	$ 1.229.249.327,58	60,62%	28/11/2023	EN EJECUCIÓN
22	COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
23	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	$ 335.852.053,00	$ 176.499.338,00	52,55%	19/12/2023	NO HA INICIADO
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A	$ 702.836.423,00	$ 347.876.572,00	49,50%	31/10/2023	EN EJECUCIÓN
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	$ 256.734.268,00	$ 256.734.268,00	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
29	TALLER BICICLETERO	$ 250.000.000,00	$ 7.148.000,00	2,86%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN
27	EMERGENCIAS	$ 862.485.928,00	$ 496.114.593,00	57,52%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	Se entrega a la institucion los alcalces realizados en los diferentes espacios intercenidos	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	Se atienden observaciones en la cubierta del aula 304, por goteras.	PERSONAL Técnico profesional (1) personas - Rotativo Operativo: 1 (una).personas Equipo: Herramienta menor.

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	16/10/2023	**PERIODO No.**	**39**	DEL	**9/10/2023**	AL	**15/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Se continua con la instalación de enchape en bateria de baños en segundo piso, se continua con la instalción de ventanas en aluminio, y continua con la fabricación de puertas coolroll, se programa entrega para el dia lunes 23/10/2023.	PERSONAL Técnico profesional (1) personas - Rotativo Operativo: 10 (Diez). Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	Continua actividad fundida de placa para cancha de 3000 PSI, Continuactivida de intalacion malla de refuerzo para placa.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Herramienta menor, vibro compactador
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	Se inicia con la actividad de remboquillado en la bateria sanitaria de niños primer piso, se hacen mantenimiento a las puertas y se comienza con el aseo.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: dos (2) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	Se finalizan actividades, en comité la SED Autorizo la no instalción de bajantes y canales, se programa entrega para el dia 19 de Octubre de 2023.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo: frente finalizado Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	Se instala el cielo raso en pvc en el hall del segundo piso, y se inicia con la instalacion en drywall del primer piso, se entregan las duchas de emergencia y estractores a las institucion.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: cinco (4) personas Equipo: Herramienta menor
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se continua con la fundida de los paños y se hace el estampado del concreto, se instala la tuberia de 6" de aguas lluvias al carcamo	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	Inicia actividad de cambio de cubierta en el ala central, continua actividad de instalación de luminarias, continua actividad de instalación de estructura metálica para la cubierta.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	Se inicia la intervencion de las baterias sanitarias del segundo piso, se demule el enchape, el desmonte de baterias etc, se continua con la intervencion del piso uno, donde se instalan los puntos electricos, la pintura en muros y filos en estuco.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Se continua la actividad de pintura en los muros de las aulas y del pasillo, se hacen los filos en los marcos de las puertas de los salones y se hace la instalacion de las puertas de las aulas.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	Frente finalizado el dia 18 de septiembre de 2023	Frente finalizado y entregado a satisfacción por la institución.
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Se realiza el armado de acero para la construcción del muro contención, se continua con la fabricación de ventans en aluminio e instalación de redes eléctricas y excavación en zona de cafeteria existente para la instalación de redes hidrosanoitarias de los baños a construir.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Once (11) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	El Rector suspende actividades.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cero (0) personas Equipo: Andamios, herramienta menor y rotomartillo
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	Se realiza el proceso de instalación de las puertas faltantes y con ello se da por cerrada la intervención en este frente.	FRENTE TERMINADO
27	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	Se continua con la instalacion de la teja tipo sandwich y pintura de estructura metalica, se inicia el desmonte de la teja traslucida ubicada en el pasillo y la instalacion de la nueva teja.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	Se inician actividades de cerramiento en polisombra e ingreso de materiales para realizar la intervención del cerramiento tipico SED, a la fecha se ha fabricado 15 módulos de 2.40x2.45 m2.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor

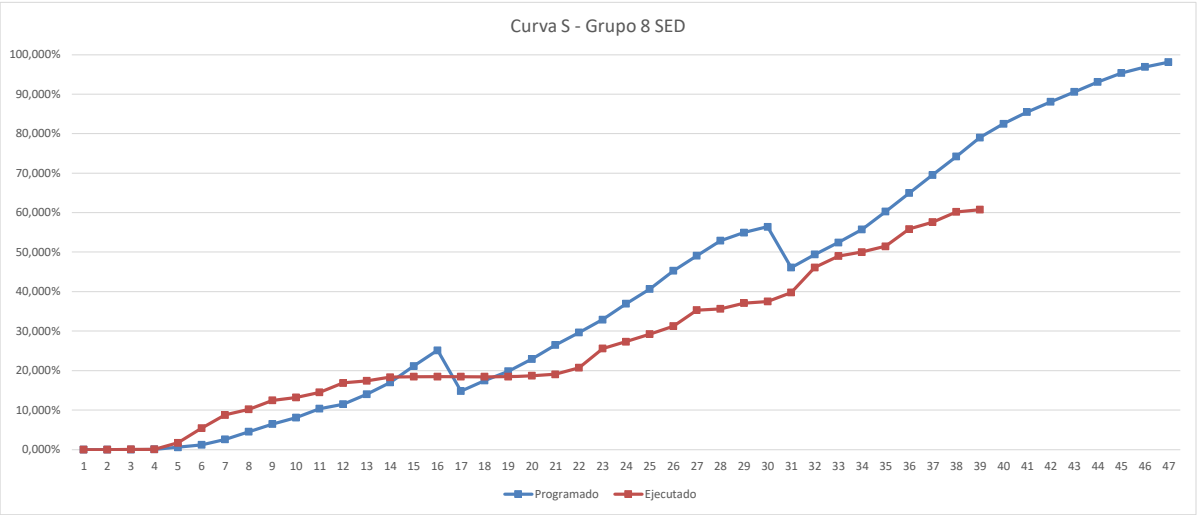
CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	16/10/2023	**PERIODO No.**	**39**	DEL	**9/10/2023**	AL	**15/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
29	**TALLER BICICLETERO**	Inicia actividad de excavacion	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Herramienta menor y maquina excavadora
28	**EMERGENCIAS**	Se continúa con la ejecución de la emergencia del cambio de la cubierta en la IED Liceo Femenino.	

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 13.426.020.246,07	79,02%	-18,27%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 10.321.441.199,39	60,75%	



6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Para el presente periodo, el atraso asciende al 18,27%, calculado a partir de la actualización de la programación autorizada por las partes el pasado 17 de julio de 2023. En obra se está gestionando de manera directa con el contratista de obra, a fin de que avance con la ejecución y busque ponerse al día con el desarrollo de las actividades. Se le insiste a la gerencia de obra la necesidad de avanzar y realizar la entrega de los frentes que aún continúan en ejecución, teniendo en cuenta que esto representa una alta carga administrativa para las distintas partes, aparte que nos crean coyunturas con los rectores por las dilaciones.

No obstante al ajuste, el contrato sigue presentando un atraso que ya empieza a ser representativo, es importante que el contratista de obra se renivele prontamente, considerando que la Entidad está contemplando una posible adición de recursos No.2, dentro de la cual también estima una posible ampliación en plazo. Esto se le ha hecho saber a través de los distintos comités, registros en bitácora, entre otros. También es importante destacar que la siguiente semana se realizará la entrega de la reprogramación de obra con ocasión a la prórroga antes mencionada, lo cual permitirá una renivelación de los porcentajes y por consiguiente del atraso materializado.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
IED Manuel del Socorro sede B - Entrega de presupuesto actualizado Inicio de actividades en obra	Contratista de obra	06/10/2023 (Incumplido) En proceso
Taller de la bicibleta - Envío del presupuesto	Contratista de obra	06/10/2023 (Incumplido)

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* El 26 de septiembre de 2023 se atendieron las observaciones relacionadas con los APU's no previstos NP33 al NP39.
* El contratista de obra sigue sin atender las observaciones correspondientes al APU relacionado con la reparación de la red hidráulica de la IED Alexander Fleming.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR


Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:

Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos. Esta pendiente la verificación de una fuga de agua en la IED que ya fue revisada entre las partes y se procederá con su reparación a la mayor breveddad.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y se está a la espera de la entrega de su concepto técnico.
Colegio Gustavo Restrepo sede A: El contratista ya realizó la reparación de las cajas por donde realizó los sondeos al sistema sanitario y el sistema actualmente se encuentra en uso.
Colegio Restrepo Millán sede D: Se evaluó con la Entidad Contratante la intervención en redes eléctricas una vez se proceda con la actividades propias de este frente.
Colegio Liceo Femenino: Se continúa con el desarrollo de las labores relacionadas con la reposición de la teja tipo colonial en la cubierta de la biblioteca.

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública



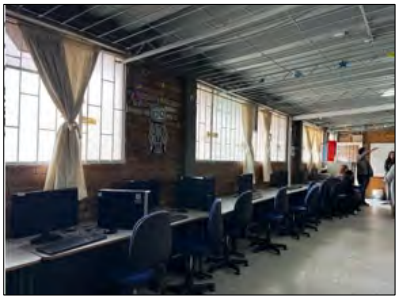




FECHA	16/10/2023	**PERIODO No.**	**39**	DEL	**9/10/2023**	AL	**15/10/2023**

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE		
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES		
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II		
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO		
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA		





CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	16/10/2023	**PERIODO No.**	**39**	DEL	**9/10/2023**	AL	**15/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		  
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		  
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	 	  
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	 	  
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		  


CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública



FECHA	16/10/2023	**PERIODO No.**	**39**	DEL	**9/10/2023**	AL	**15/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		  
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		  
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	 	  
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		No hubo avance por suspensión forzada del frente
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		  

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	16/10/2023	**PERIODO No.**	**39**	DEL	**9/10/2023**	AL	**15/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
25	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**		  

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**		  
29	**TALLER BICICLETERO**		  

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-371

Bogotá, D.C, octubre 17 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 TODAS LAS SEDES

Respetados señores:


En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Angela Liced Ciendua Castro	52.788.213	Ingeniero Ambiental	Todas las sedes
2	Maicol Stiven Perez Salamanca	1.022.995.377	Ingeniero Ambiental	Todas las sedes

CONSORCIO TIG

Sin otro particular,

Atentamente,



~~EDISON RICARDO~~ DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe
Anexo. Documentación del personal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52.788.213
NUMERO

CIENDUA CASTRO
APELLIDOS

ANGELA LICED
NOMBRES

ANGELA CIENDUA
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1980
BELEN
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-JUN-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500117-42134611-F-0052788213-20050822 01715 05234A 02 149933781

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52788213		CIENDUA CASTRO ANGELA LICED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 70 105G 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4888939	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	198580275	9457298523	I	2023/10/04	2023/10/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$775,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	52788213	CIENDUA CASTRO ANGELA LICED	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$312,500	CCF22	30	$2,500,000	$50,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$312,500			$2,500,000	$50,000			$2,500,000	$13,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,100	$0	$0	$13,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$13,100	$0	$0	$13,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$0	$0	$50,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$50,000	$0	$0	$50,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,500	$0	$0	$312,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$312,500	$0	$0	$312,500
TOTAL				1	$775,600	$0	$0	$775,600

2023/10/03 07:44 PM

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 04/10/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901634703	**Cédula Usuario:**	CC 1020791796
Nombre:	CONSORCIO MIA GP				
Dirección:	CL 108 23 34				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	LUZARDOMATEO574@GMAIL.COM				
Teléfono:	3133138066		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1020791796	MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	290	05/10/2023	CC 52788213	CIENDUA CASTRO ANGELA	5	6.960	**Independiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

EFB5C12C514190CB8F99BEE8B2C03BF0 Certificado impreso el día 10/4/2023 4:24:16 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

ANGELA LICED

CIENDUA CASTRO
52788213

CONSORCIO MIA GP
901634703

Este carné es personal e intransferible.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.995.377

PEREZ SALAMANCA

APELLIDOS

MAICOL STIVEN

NOMBRES

Maicol Stiven P.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-MAY-1994

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

14-MAY-2012 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00381412-M-1022995377-20120604 0030130607A 1 38480176

ESTADO CIVIL

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022995377		PEREZ SALAMANCA MAICOL STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 1D NO 898J 16 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5511243	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	206433170	9457077456	I	2023/10/19	2023/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$494,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,599,255	$255,900			$1,599,255	$200,000			$0	$0			$1,599,255	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,599,255	$255,900			$1,599,255	$200,000			$0	$0			$1,599,255	$39,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,599,255	$255,900			$1,599,255	$200,000			$0	$0			$1,599,255	$39,000		$0	$0
1	CC	1022995377	PEREZ MAICOL	230301	30	$1,599,255	$255,900	EPS008	30	$1,599,255	$200,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,599,255	$39,000	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,599,255	$255,900			$1,599,255	$200,000			$0	$0			$1,599,255	$39,000		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022995377		PEREZ SALAMANCA MAICOL STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 1D NO 898J 16 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5511243	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	206433170	9457077456	I	2023/10/19	2023/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$494,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,900	$0	$0	$255,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$255,900	$0	$0	$255,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$0	$0	$39,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$494,900	$0	$0	$494,900

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 04/10/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901634703	**Cédula Usuario:**	CC 1020791796
Nombre:	CONSORCIO MIA GP				
Dirección:	CL 108 23 34				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	LUZARDOMATEO574@GMAIL.COM				
Teléfono:	3133138066		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1020791796	MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	289	05/10/2023	CC 1022995377	PEREZ SALAMANCA MAICOL	5	6.960	**Independiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MDS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

EFB5C12C514190CB8F99BEE8B2C03BF0 Certificado impreso el día 10/4/2023 4:21:56 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

MAICOL STIVEN
PEREZ SALAMANCA
1022995377

CONSORCIO MIA GP
901634703

Este carné es personal e intransferible.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-371

Bogotá, D.C, 17 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Respuesta a memorando I-2023-114486 del mes de octubre de 2023

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite dar respuesta al memorando I-2023-114486 que data del mes de octubre de 2023 allegado mediante electrónico por parte de la supervisión y relacionados con las siguientes actividades no previstas, a saber:

- NP-27 - Suministro e instalación de protección en malla expandida calibre 18, arco en ángulo 1 x 1/8, incluye pintura.

- NP-33 - Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largo (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cm de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cm de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

- NP-34 - Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

- NP-36 - Suministro e instalación de conexión sanitaria para sanitario fluxómetro.

Teniendo en cuenta las observaciones identificadas por parte del área de estudios previos de la Entidad, se remite los archivos debidamente ajustados para su nueva revisión.

Por otra parte y en relación al memorando I-2023-101567 del mes de septiembre de 2023, nos permitimos remitir los APU's relacionados con la atención de la emergencia del Liceo Femenino que presentaron duplicidad en el consecutivo, ya que por error de edición se tomaron indebidamente los numerales 23 y 24, cuando realmente correspondían los numerales 25 y 26. Se anexan los APU's nuevamente con los ajustes de forma, a fin de que la Entidad Contratante proceda con la aclaración y con ello la autorización para el pago de estas actividades. En resumen, las actividades que merecen tal ajuste se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO APROBADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO APROBADO INCLUIDO AIU (28.19%) DEL CONTRATISTA
NP-25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL A SEIS (6) AGUAS CON CORTES TRANSVERSALES SIGNIFICATIVOS POR DESPIECE, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR PARA EVITAR DAÑO EN CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL SUPERIOR A 150M, CON INTERVENCIONES INTERMITENTES POR PRESENCIA DE ESTUDIANTES	M2	$ 194.509,00	$ 249.341,00
NP-26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR PARA EVITAR DAÑO EN CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL SUPERIOR A 150M, CON INTERVENCIONES INTERMITENTES POR PRESENCIA DE ESTUDIANTES	M2	$ 149.282,00	$ 191.365,00

Adicional a todo lo anterior, adjuntamos el APU NP-40 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, SECCION INTERNA 30 cm x 50 cm (altura); e= 10 cm (no incluye acero), le cual ya fue revisado de manera extraoficial y cuenta con un preacuerdo entre las partes, con el fin de que se expida un ultimátum sobre el mismo.

CONSORCIO TIG

Quedamos atentos a sus comentarios a que haya lugar, propendiendo por su aval definitivo y posterior materialización en obra.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo Cincuenta y siete (57) folios

CONSORCIO TIG

APU'S AJUSTADOS SEGÚN MEMORANDO I-2023-114486 del mes de octubre de 2023

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 DE 2022 FECHA INICIO 17/03/2022 FECHA TERMINACIÓN 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, ARCO EN ANGULO 1 X 1/8, INCLUYE PINTURA	M2	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	113.355,90	5.667,8
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	0,60	2.700,0
				SUBTOTAL	8.367,8

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Ángulo G50 1/8" x 1" x 6m	und	0,95	44818	$ 42.577,10
Soldadura 6013 1/8west arco	kg	0,3	21105	$ 6.331,50
Malla Expandida CR IMT 30 X 1 CAL 18	m2	1,05	51894	$ 54.488,70
pintura en aceite	gl	0,07	112000	$ 7.466,67
Disolvente o Diluyente thiner	litro	0,1	32000	$ 3.200,00
			SUBTOTAL	114.064

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de Material (Volqueta acarreo)	1		m3/km	1.500	1.500,0
				SUBTOTAL	1.500

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Soldador	94.279	52,13%	143.427	0,4500	64.542,2
Ayudante soldadura	71.304	52,13%	108.475	0,4500	48.813,8
				SUBTOTAL	113.356
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 237.287,66
AIU CONTRACTUAL 28,19%				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 66.891,39
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 304.179,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) dias del mes de agosto del año 2023

,

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: Edisson Ricardo Duarte

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

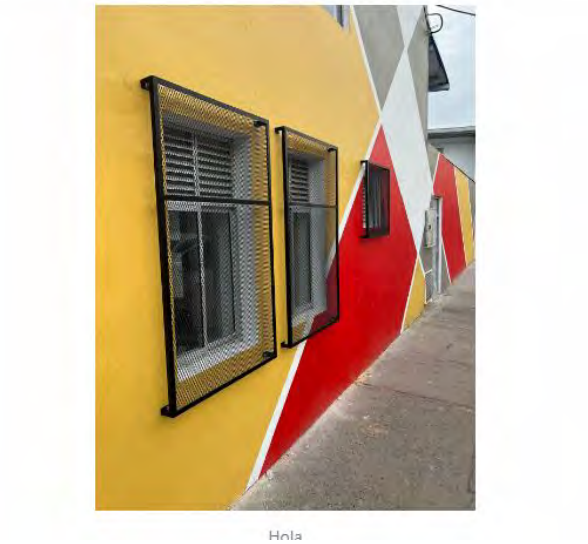
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-27 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1 X 1/8, INCLUYE PINTURA

UNIDAD: M2

JUSTIFICACIÓN:

El SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1 X 1/8, INCLUYE PINTURA, se requiere para proteger vidrios y ventanas y también impedir el ingreso de elementos que puedan golpear o lastimar a los estudiantes en el interior de las aulas y espacios de los colegios.



Hola

Imagen modelo de malla de protección a instalar.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-27- SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1 X 1/8, INCLUYE PINTURA

UNIDAD:m2

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1X 1/8, INCLUYE PINTURA

EJECUCIÓN:

- Establecer la ubicación del marco
- Rectificar medidas del elemento
- Verificar puntos de anclaje
- Ensamblar el elemento de acuerdo con el área de la ventana interna a proteger
- Verificar niveles, plomos y escuadras de elemento a instalar
- Realizar fijación con tornillo en cuatro aristas de la ventana
-

MATERIALES:

- Ángulo G50 1/8" x 1"x 6m (10.98kg)
- Soldadura 6013 1/8west arco
- Malla Expandida CR IMT 30 X 1 CAL 18
- pintura en aceite
- Disolvente o Diluyente thiner

EQUIPOS:

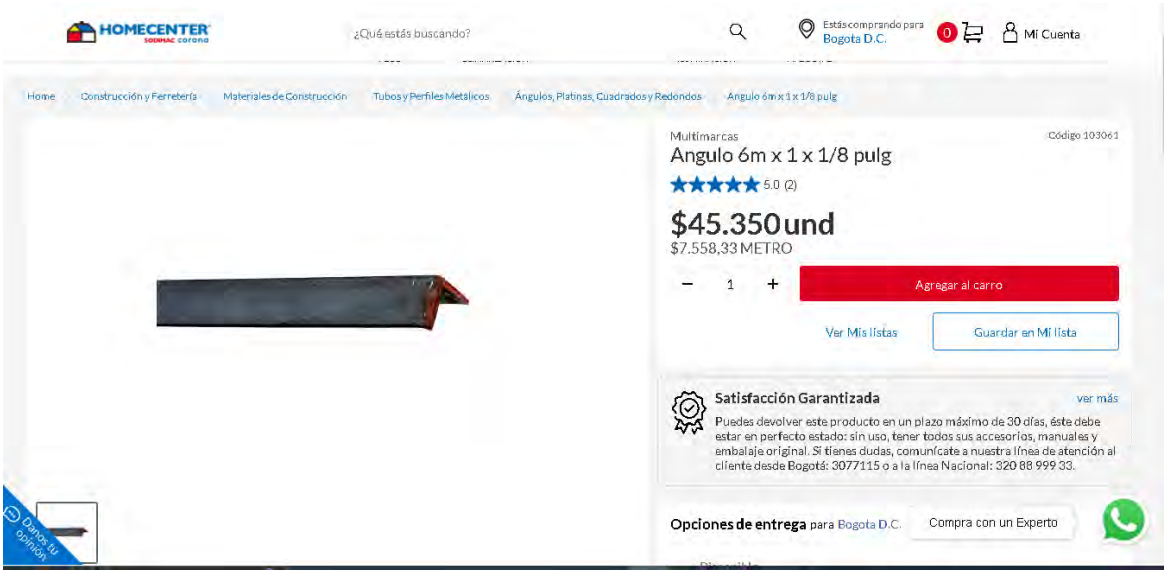
- Herramienta menor
- Andamios
- Equipo de trabajo en altura

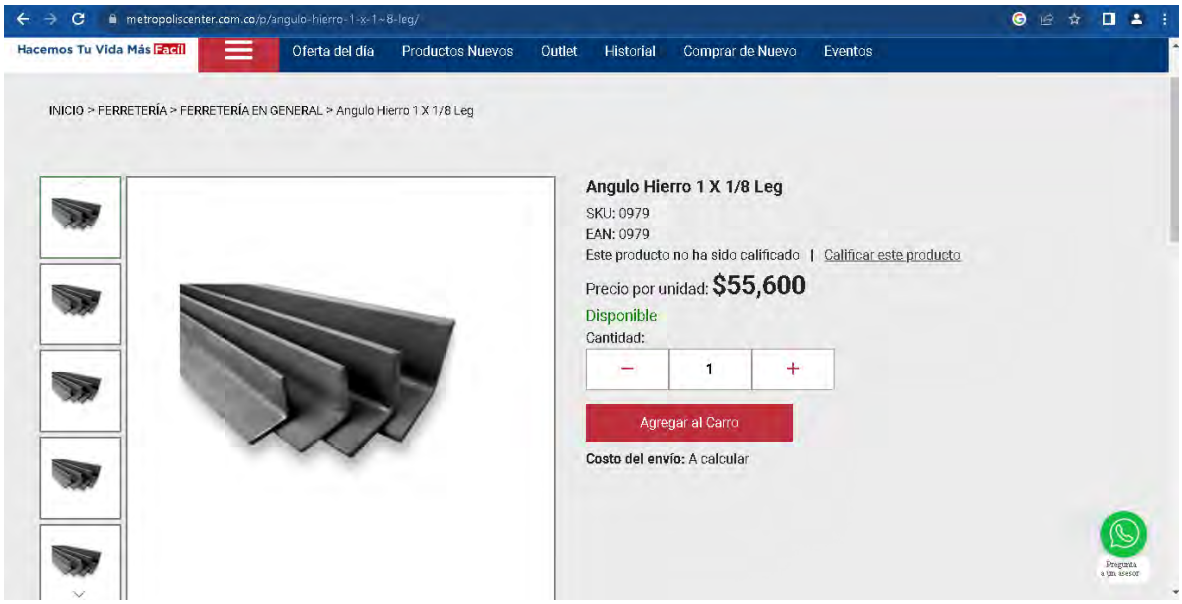
TRANSPORTE:

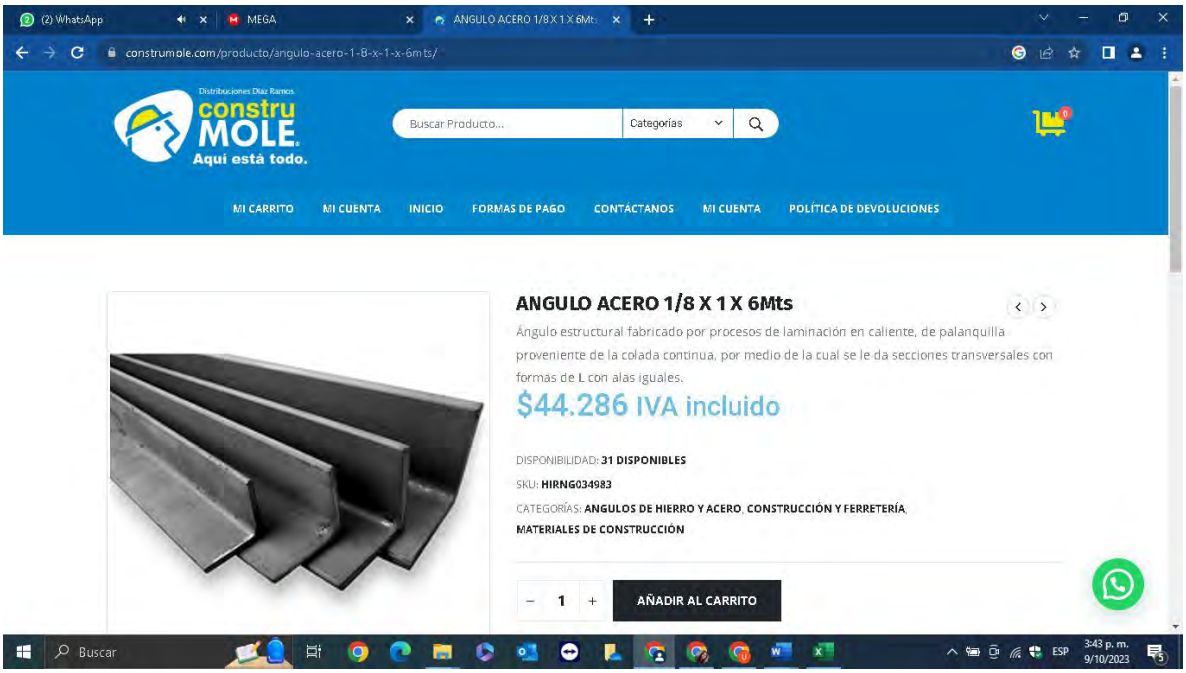
- Furgón.
-

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1 X 1/8, INCLUYE PINTURA ,recibidos a satisfacción por la interventoría.


HOMECENTER
¿Qué estás buscando?
Estás comprando para
Bogota D.C.
Mi Cuenta
Home
Construcción y Ferretería
Materiales de Construcción
Tubos y Perfiles Metálicos
Ángulos, Platinas, Cuadrados y Redondos
Angulo 6m x 1 x 1/8 pulg
Multimarcas
Código 103061
Angulo 6m x 1 x 1/8 pulg
5.0 (2)
$45.350 und
$7.558,33 METRO
1
Agregar al carro
Ver Mis listas
Guardar en Mi lista
Satisfacción Garantizada
ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Opciones de entrega para Bogota D.C.
Compra con un Experto


metropoliscenter.com.co/p/angulo-hierro-1-x-1-8-leg/
Hacemos Tu Vida Más Fácil
Oferta del día
Productos Nuevos
Outlet
Historial
Comprar de Nuevo
Eventos
INICIO > FERRETERÍA > FERRETERÍA EN GENERAL > Angulo Hierro 1 X 1/8 Leg
Angulo Hierro 1 X 1/8 Leg
SKU: 0979
EAN: 0979
Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto
Precio por unidad: $55,600
Disponible
Cantidad:
1
Agregar al Carro
Costo del envío: A calcular


(2) WhatsApp
MEGA
ANGULO ACERO 1/8 X 1 X 6Mts
construmole.com/producto/angulo-acero-1-8-x-1-x-6mts/
Distribuciones Díaz Ramos
construMOLE
Aquí está todo.
Buscar Producto...
Categorías
MI CARRITO
MI CUENTA
INICIO
FORMAS DE PAGO
CONTÁCTANOS
MI CUENTA
POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
ANGULO ACERO 1/8 X 1 X 6Mts
Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, por medio de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales.
$44.286 IVA incluido
DISPONIBILIDAD: 31 DISPONIBLES
SKU: HIRNG034983
CATEGORÍAS: ANGULOS DE HIERRO Y ACERO, CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1
AÑADIR AL CARRITO
Buscar
ESP
3:43 p. m.
9/10/2023

FERROPETROL

INICIO CONTACTO

Inicio / Perfiles, Mallas y Anjeos / Mallas Expandidas / Malla Expandida Cr IMT 30 X 1 Cal 18



Malla Expandida Cr IMT 30 X 1 Cal 18

30 disponibles

$44.000

SKU 10770 | Categoría Mallas Expandidas

Información adicional

Unidad	Metro
Subcategoría	Malla Expandida HR y CR

Cotización: OV143885

PROCASA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SAS NIT: 901531834

CR 18 60C 13
Colombia Bogotá
3143826320 - 3143826320
procasaconstrucción@gmail.com

Peso Total
490.44
Fecha
25-07-2023
Vigencia 1 día

Descripción	Cantidad	Medida	Peso	Precio Unitario	Precio Total
Tubo Cerramiento Galvanizado 1.1/2" (D.Ext. 48.3mm) (2.0mm) x 6m	17.00	Unidades	232.90	82,200.00	1,397,400.00
Soldadura West Arco ZIP10T (E6010) 1/8" (Ref.504195)	5.00	kg	5.00	19,756.80	98,784.00
Ángulo G50 1/8" x 1.1/2" x 6m (10.98kg)	15	Unidades	252.54	75,762.00	1,136,430.00
Malla Expandida CR IMT 30 X 1 CAL 18	56	M2		42,716.00	2,395.000

Observaciones:
Validez oferta en precios 5 días
Inventario sujeto a disponibilidad al momento de la compra formal.
Forma de pago: Contado anticipado.
Disponibilidad del material: Inmediata.
Tiempo de entrega: De 2 a 3 dias sobre disponibilidad.
Sitio de entrega: El material se ofrece puesto sobre camión en su bodega en Bogotá y/o su perimetro urbano. (Material se ofrece libre de descargue).
Despacho minimo de nuestra cuenta: 1000 kilos en longitud. de 6 metros y/o 5.000 kilos en longitud de 12 metros.
Materiales certificados por el molino del país de origen.

Base:	$ 5,027,614.00
Impuestos:	$ 955,246000
Total:	$ 5,982,860.66

¡APRECIADO CLIENTE!
ES OBLIGATORIO PRESENTAR PLANILLA DE ARL AL DÍA, PARA EL INGRESO A NUESTRAS INSTALACIONES AL MOMENTO DE RETIRAR CUALQUIER MATERIAL.

Estimado cliente Recuerde que también ofrecemos
productos suplementarios como soldadura West Arco o ESAB,
discos de corte Abracol,discos de pulir Abracol,
anticorrosivo y esmalte marca Bler y si es de su interes la plancha masterdeck, quedo atento a su requerimiento

STECKERL ACEROS S.A.S.

NIT: 900 499 032 - 2

Calle 7 # 27-79 Tel:(071) 7446262 - (071) 7434242

BOGOTA - CUNDINAMARCA (COLOMBIA)

COTIZACIÓN: 27COT2023001301

Cotizado a	Datos de la Transacción		Doc. Origen	
CONSORCIO MIA GP	**Orden de Compra:**	WHATSAPP	**Fecha**	**25/07/2023**
CR 18 No 60 C - 13 S	**Condición Pago:**	MOSTRADOR	**Fecha Venc.**	**25/07/2023**
BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C	**Id. vendedor:**	ADRIANAC	**Elaborado por**	**JENNYCH**
(314) 382-6320 Ext. 0000	**Modo de envío:**	CLIENTE RECOGE	**Enviar a:**	
	Fecha Entrega:	25/07/2023	PROCASA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS CR 18 No 60 C - 13 S BOGOTÁ	
	Moneda:	COP		

Cantidad	Peso	Peso Extendido	Descripción	UM	Bga	Precio m2	Precio Unidad	Valor Extendido
50	11.5	575	Malla Expandida CR IMT 30 X 1 CAL 18	m2	27	$44.500	$44,500.00	$2.225.000

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
EXISTENCIAS SUJETAS A VENTAS. Y DISPONIBILIDAD DE INVENTARIOS

Moneda: COP

Subtotal	$2.225.000.00
Dto. Comercial:	$ 0.00
Flete:	$ 0.00
IVA:	$422.750.00
Rete Iva :	$0.0000
Rete Fuente:	$0.00
Total a pagar:	$2.647.750.00
Peso Total	**575**

* Impuestos: Somos grandes contribuyentes segun resolucion No 012635 del 14 dic 2018.Somos AUTORETENEDORES Resl:4060 Mayo 26 2014. IVA Regimen común. Actividad economica principal 4663 tarifa CREE 0.40%.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA EL RICAURTE

UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 28 CENTAVOS

Num. Artículos: 1 25/07/2023 3:42:10 p.m.

FERROPETROL

INICIO CONTACTO

Inicio / Soldadura / Electrodos / Soldadura 6010X 3/32 Zip 10T WEST ARCO



Soldadura 6010X 3/32 Zip 10T WEST ARCO

39 disponibles

$19.400

SKU 20876 | Categoría Electrodos Marca: West Arco

Información adicional

Unidad	Kilogramo

Buscar 11°C ESP 4:08 a. m. 3/08/2023

sent mauricio.fonse... Buscar con Google Recibidos (791) - di... RNP0026732F6EB8... Sistema de Informa... New Tab Helado malo 2 - Ju... dFireboy and Water... Otros marcadores

¡La industria en un solo lugar!

TECTUL

¿Qué estás buscando?

CATEGORÍAS INICIO GUIA DE COMPRA NOSOTROS BLOG SERVICIOS CATÁLOGO CONTÁCTANOS

Inicio > Soldadura > West Arco

Soldadura E6010 Zip 10t

Se vende por **Paquetes (Paq.)**

Soldadura 6010, electrodo de muy buena penetración, con polvo de hierro (Comercial). Envios toda Col. Whatsapp ☎ 3161111666.

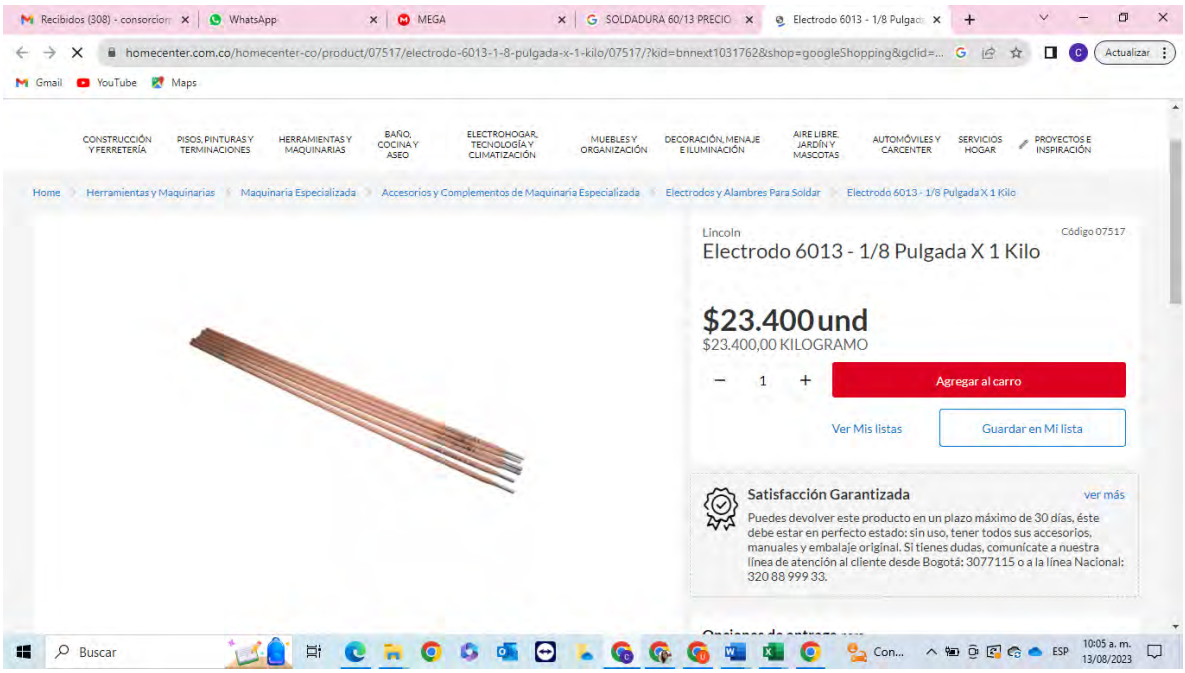
Precio **$32.088**

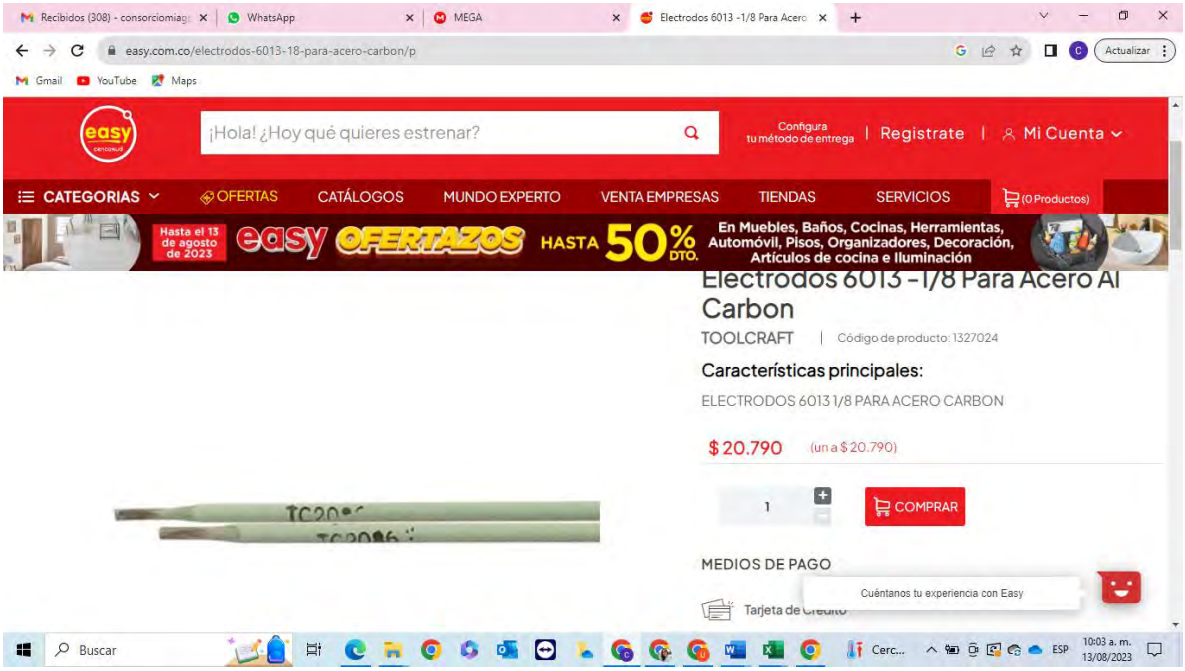
Opciones Selecciona

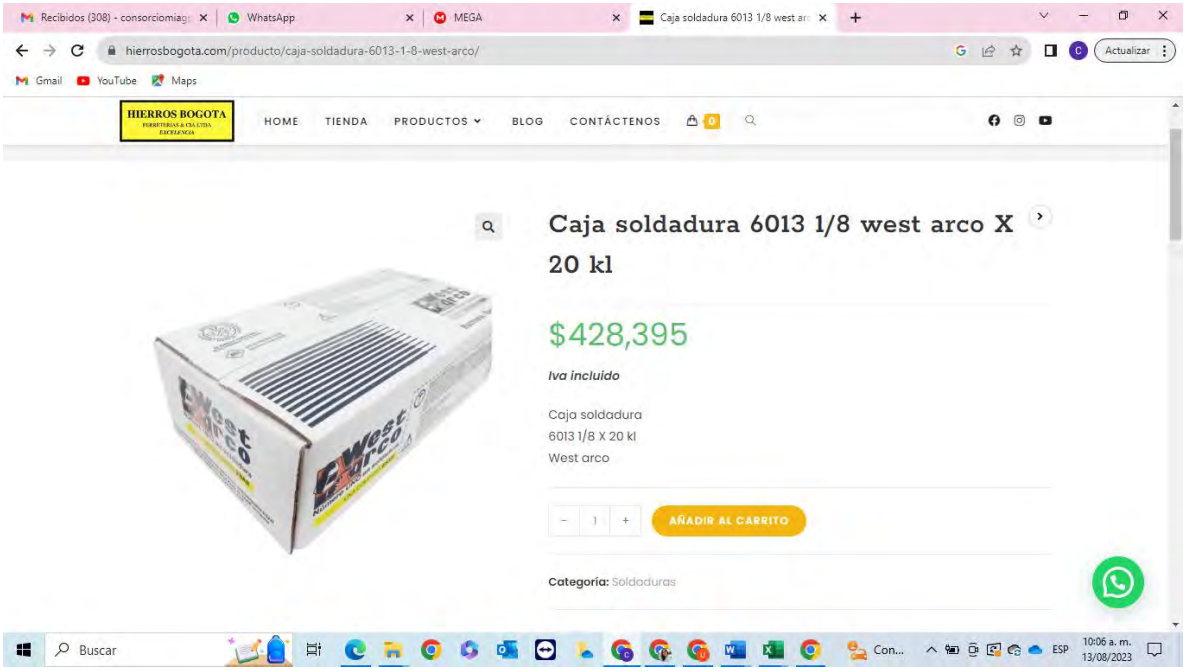
WhatsApp

AGREGAR AL CARRITO

iperando a www.google.com...


Recibidos (308) - consorcion
WhatsApp
MEGA
SOLDADURA 60/13 PRECIO
Electrodo 6013 - 1/8 Pulgad
homecenter.com.co/homecenter-co/product/07517/electrodo-6013-1-8-pulgada-x-1-kilo/07517/?kid=bnnext1031762&shop=googleShopping&gclid=...
Actualizar
Gmail
YouTube
Maps
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
BAÑO, COCINA Y ASEO
ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN
MUEBLES Y ORGANIZACIÓN
DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN
AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS
AUTOMÓVILES Y CARCENTER
SERVICIOS HOGAR
PROYECTOS E INSPIRACIÓN
Home
Herramientas y Maquinarias
Maquinaria Especializada
Accesorios y Complementos de Maquinaria Especializada
Electrodos y Alambres Para Soldar
Electrodo 6013 - 1/8 Pulgada X 1 Kilo
Lincoln
Código 07517
Electrodo 6013 - 1/8 Pulgada X 1 Kilo
$23.400 und
$23.400,00 KILOGRAMO
1
Agregar al carro
Ver Mis listas
Guardar en Mi lista
Satisfacción Garantizada
ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Buscar
Con...
ESP
10:05 a. m.
13/08/2023


Recibidos (308) - consorciomiag
WhatsApp
MEGA
Electrodos 6013 -1/8 Para Acero
easy.com.co/electrodos-6013-18-para-acero-carbon/p
Actualizar
Gmail
YouTube
Maps
¡Hola! ¿Hoy qué quieres estrenar?
Configura tu método de entrega
Registrate
Mi Cuenta
CATEGORIAS
OFERTAS
CATÁLOGOS
MUNDO EXPERTO
VENTA EMPRESAS
TIENDAS
SERVICIOS
(0 Productos)
Hasta el 13 de agosto de 2023
easy OFERTAZOS
HASTA 50% DTO.
En Muebles, Baños, Cocinas, Herramientas, Automóvil, Pisos, Organizadores, Decoración, Artículos de cocina e Iluminación
Electrodos 6013 -1/8 Para Acero Al Carbon
TOOLCRAFT
Código de producto: 1327024
Características principales:
ELECTRODOS 6013 1/8 PARA ACERO CARBON
$ 20.790
(un a $ 20.790)
1
COMPRAR
MEDIOS DE PAGO
Tarjeta de Crédito
Cuéntanos tu experiencia con Easy
Buscar
Cerc...
ESP
10:03 a. m.
13/08/2023


Recibidos (308) - consorciomiag
WhatsApp
MEGA
Caja soldadura 6013 1/8 west arc
hierrosbogota.com/producto/caja-soldadura-6013-1-8-west-arco/
Actualizar
Gmail
YouTube
Maps
HIERROS BOGOTA
HOME
TIENDA
PRODUCTOS
BLOG
CONTÁCTENOS
Caja soldadura 6013 1/8 west arco X 20 kl
$428,395
Iva incluido
Caja soldadura
6013 1/8 X 20 kl
West arco
AÑADIR AL CARRITO
Categoría: Soldaduras
Buscar
ESP
10:06 a. m.
13/08/2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

BOGOTÁ

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	Malla Exoandida CR IMT 30 X 1 CAL 18	M2	$ 50.832	PROCASA	44.000,000	FERROPETROL	$ 52.955	steckrel aceros	$ 49.262	$ 4.679	$53.942	$44.583	$ 50.832		$ 52.955	$ 51.894
	Ángulo G50 1/8" x 1" x 6m	UN	$ 45.350,00	HOMECENTER	$ 55.600,00	METROPOLICENTER	44286	CONSTRUMOLE	$ 48.412	$ 6.248	$54.660	$42.164	$ 45.350		$ 44.286	$ 44.818
	Soldadura 6013 1/8west arco	UN	$ 23.400,00	HOMECENTER	$ 20.790,00	EASY	21419,75	HERREROS BOGOTA	$ 21.870	$ 1.362	$23.232	$20.508		20790,00	$ 21.420	$ 21.105

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-33	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	UN	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	68.750,00	3.437,50
				SUBTOTAL	3.437,50

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	und	1,00	$ 9.086.600,00	$ 9.086.600,00
			SUBTOTAL	9.086.600

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	JORNAL	52,13%	137.500	0,50	68.750,00
				SUBTOTAL	68.750,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 9.158.788,00
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 2.581.862,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 11.740.650,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-33- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

UNIDAD:ML

JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo con los requerimientos específicos de los laboratorios de Química, Física y Biología, se requiere la instalación de pocetas en materiales durables, con facilidad de limpieza y lavado adaptados a los espacios existentes.

Atendiendo a estas necesidades se instalarán pocetas en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-33- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

UNIDAD:UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la **Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.**

EJECUCIÓN:

- Verificar medidas en sitio
- Verificar puntos de conexión y tamaños de pocetas

MATERIALES:

- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **METRO UNIDAD (UND) de Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa,** recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-34	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	UN	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	68.750,00	3.437,50
				SUBTOTAL	3.437,50

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	und	1,00	$ 3.513.950,00	$ 3.513.950,00
			SUBTOTAL	3.513.950

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	JORNAL	52,13%	137.500	0,50	68.750,00
				SUBTOTAL	68.750,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.586.138,00
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 1.010.932,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 4.597.070,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: E. RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-34- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.
UNIDAD:ML

JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo con los requerimientos específicos de los laboratorios de Química, Física y Biología, se requiere la instalación de pocetas en materiales durables, con facilidad de limpieza y lavado adaptados a los espacios existentes.

Atendiendo a estas necesidades se instalarán pocetas en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-34- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

UNIDAD:UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.**

EJECUCIÓN:

- Verificar medidas en sitio
- Verificar ubicación de puntos hidráulicos y eléctricos

MATERIALES:

- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (UN) de Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa,** recibidos a satisfacción por la interventoría.
